

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		**CONSORCIO DEMOLICIONES MV - CTO No. 109 DE 2025**	**164 días**	**mar 9/09/25**	**vie 10/04/26**
2		**Inicio Contrato**	0 días	mar 9/09/25	mar 9/09/25
3		**PRELIMINARES**	**34 días**	**mar 9/09/25**	**mar 21/10/2**
4		Acta de inicio	1 día	mar 9/09/25	mar 9/09/25
5		Procedimiento de demolicion según tipologia de los predios y areas a intervenir	10 días	mar 9/09/25	sáb 20/09/25
6		Primer Recorrido de obra con interventoria, entidad y especialistas	0 días	vie 12/09/25	vie 12/09/25
7		Revision de los insumos tecnicos y apropiación de la información	10 días	mar 9/09/25	sáb 20/09/25
8		Revisión de los usos y clasificaciones del suelo y normativas de cada uno de los predios	10 días	mar 9/09/25	sáb 20/09/25
9		Entrega de los predios IE8 y IE9 por parte de la interventoria	10 días	mar 9/09/25	sáb 20/09/25
10		Plan de Manejo Ambiental y Social - PMAS	10 días	mar 9/09/25	sáb 20/09/25
11		Entrega Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (PGRCD) a la interventoria	10 días	mar 9/09/25	sáb 20/09/25
12		Obtención del PIN de obra	1 día	jue 25/09/25	vie 26/09/25
13		Inventario Forestal de los arboles en interferencia con los predios a demoler	15 días	mar 9/09/25	vie 26/09/25
14		Radicacion del PMT correspondiente a predios IE8 - IE9 ante la SDM	0 días	jue 11/09/25	jue 11/09/25

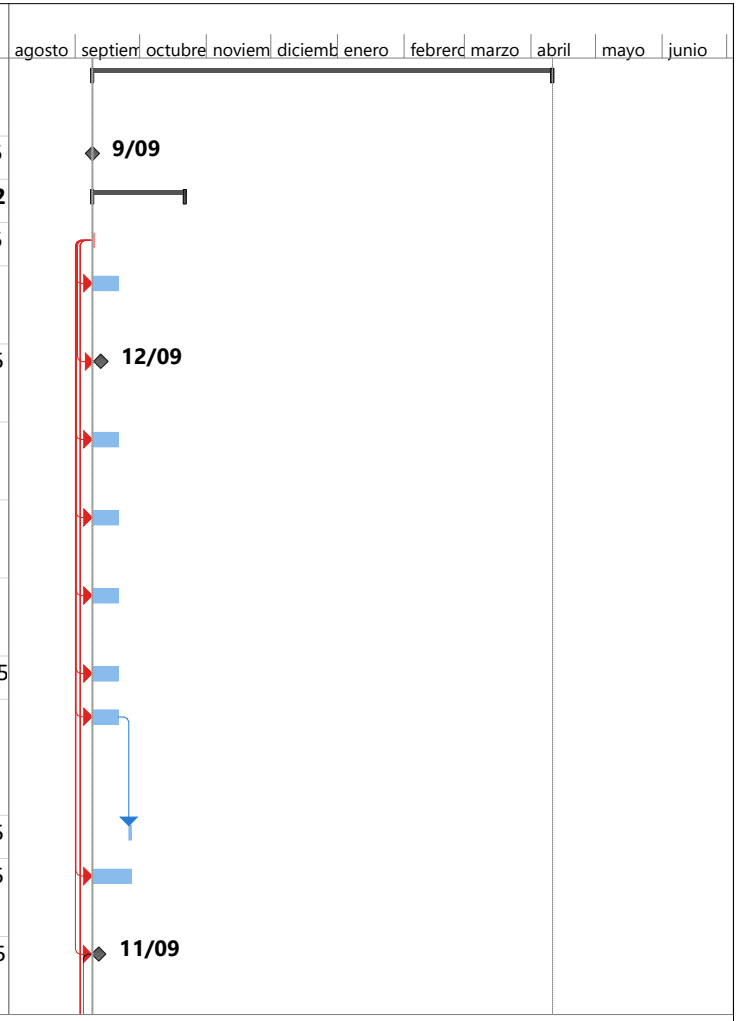

Proyecto: Programación Metro
Fecha: mar 9/09/25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
15		Aprobacion del PMT correspondiente a predios IE8 - IE9 ante la SDM	0 días	jue 18/09/25	jue 18/09/25
16		Diseño de volantes socialización - Reunión de Inicio predios IE8-IE9	2 días	mié 10/09/25	vie 12/09/25
17		Diseño de volantes socialización - Actas de vecindad predios IE8-IE9	2 días	mié 10/09/25	vie 12/09/25
18		Diseño de volantes socialización - Fumigación predios IE8-IE9	2 días	mié 10/09/25	vie 12/09/25
19		Entrega de volantes reunión de inicio predios IE8-IE9	1 día	lun 22/09/25	mar 23/09/25
20		Reunion de Inicio predios IE8-IE9	0 días	lun 29/09/25	lun 29/09/25
21		Entrega de volantes actas de vecindad predios IE8-IE9	2 días	lun 29/09/25	mié 1/10/25
22		Entrega de volantes fumigación predios IE8-IE9	2 días	lun 29/09/25	mié 1/10/25
23		Levantamiento de actas de vecindad predios IE8-IE9	3 días	mié 1/10/25	lun 6/10/25
24		Entrega de actas de vecindad a los propietarios de los predios IE8-IE9	15 días	mié 1/10/25	mar 21/10/25
25		**Etapa de obra Tramo SUR en los predios IE8-IE9**	**37 días**	**lun 6/10/25**	**lun 24/11/25**
26		**1. DEMOLICION PREDIAL**	**20 días**	**lun 6/10/25**	**vie 31/10/25**
27		Demolición construcciones de 1 piso teja. Incluye el cargue, transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado (distancia de transporte 28 km).	3 días	lun 6/10/25	jue 9/10/25

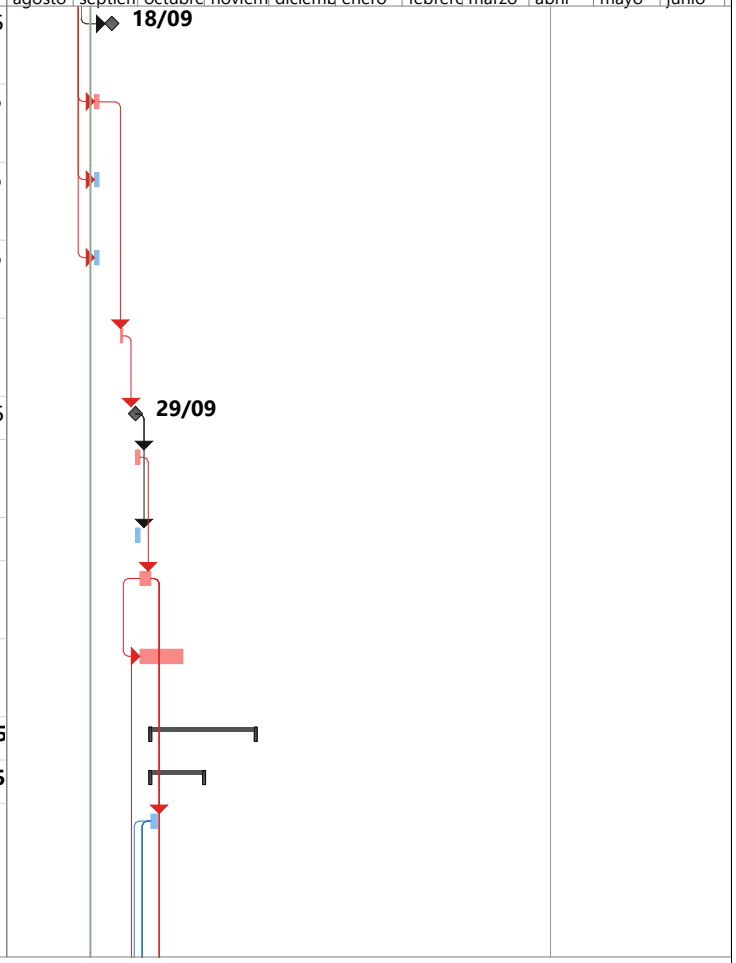

Proyecto: Programación Metro
Fecha: mar 9/09/25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
28		Demolición construcciones de 1 piso placa. Incluye el cargue, transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado (distancia de transporte 28 km).	3 días	lun 6/10/25	jue 9/10/25
29		Demolición construcciones de 2 hasta 3 pisos. Incluye el cargue, transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado (distancia de transporte 28 km).	12 días	jue 9/10/25	vie 24/10/25
30		Demolición construcciones de 4 hasta 6 pisos. Incluye el cargue, transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado (distancia de transporte 28 km).	12 días	jue 9/10/25	vie 24/10/25
31		Demolición de bodegas con doble altura. Incluye el cargue, transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado (distancia de transporte 28 km).	12 días	lun 6/10/25	mar 21/10/25
32		Demolición mezanine en madera y/o prefabricado. Incluye el cargue, transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado (distancia de transporte 28 km).	5 días	lun 6/10/25	vie 10/10/25
33		Demolición de placa (incluye cargue, retiro de material, transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado)	15 días	sáb 11/10/25	vie 31/10/25
34		**2. INTERVENCIÓN DE ANTEJARDINES**	**10 días**	**mié 8/10/25**	**mar 21/10/2**

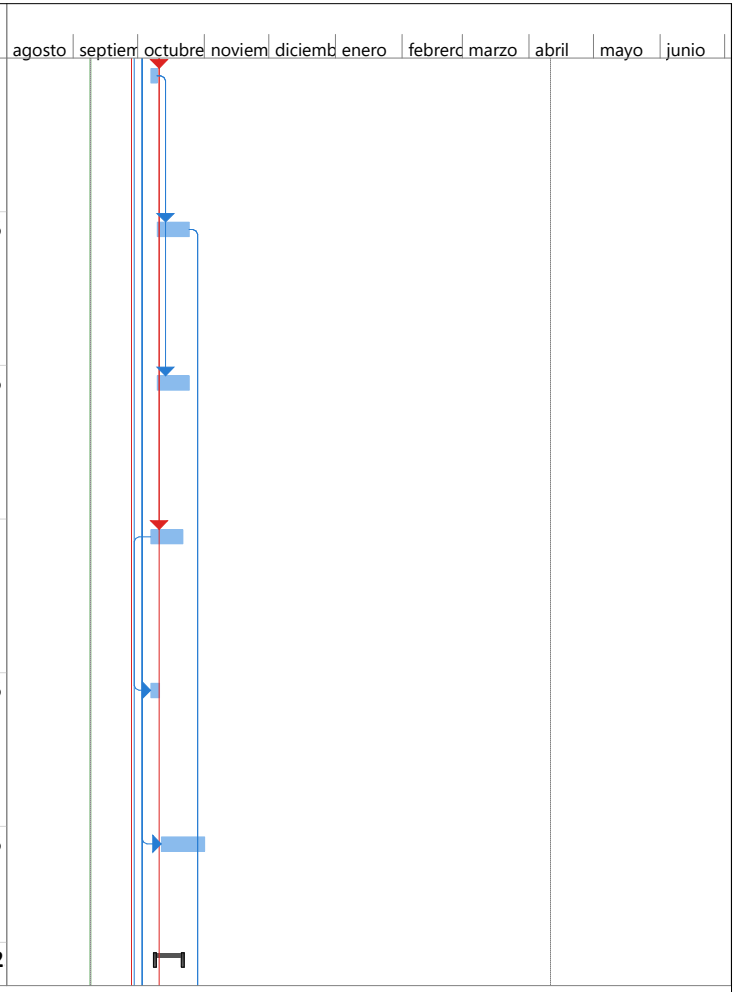

Proyecto: Programación Metro
Fecha: mar 9/09/25

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
35		Desmonte y retiro de reja de cerramiento. Incluye demolición de cimentación, base y reja. incluye transporte a 21 km y disposición de materiales en sitio autorizado.	3 días	mié 8/10/25	vie 10/10/25
36		Demolición antepechos (incluye cargue, transporte y disposición final de sobrantes).	2 días	sáb 11/10/25	mié 15/10/25
37		Desmonte y montaje de luminarias existentes incluye mano de obra. No incluye materiales.	2 días	mié 15/10/25	vie 17/10/25
38		Desmonte y montaje cajas electricas metalicas existentes. Incluye mano de obra. No incluye materiales.	2 días	mié 15/10/25	vie 17/10/25
39		Demolición pisos de concreto (incluye cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	3 días	vie 17/10/25	mar 21/10/25
40		Demolición pisos de concreto - rampas vehiculares y peatonales existentes (espesor variable hasta 0.10 m incluye cargue, transporte y disposición final de sobrantes escombrera autorizada)	3 días	vie 17/10/25	mar 21/10/25
41		**3. CERRAMIENTO DEFINITIVO**	**15 días**	**vie 31/10/25**	**vie 21/11/25**
42		Cerramiento (8 hileras de alambre de púas calibre 12.5, con poste de madera rolliza de 8 cm de diámetro y 2.00 m de altura, enterrado como min. 0.40, con 2.00 m., entre postes)	15 días	vie 31/10/25	vie 21/11/25
43		Cerramiento Nylofor 3d Pro, altura 2.00 m	15 días	vie 31/10/25	vie 21/11/25

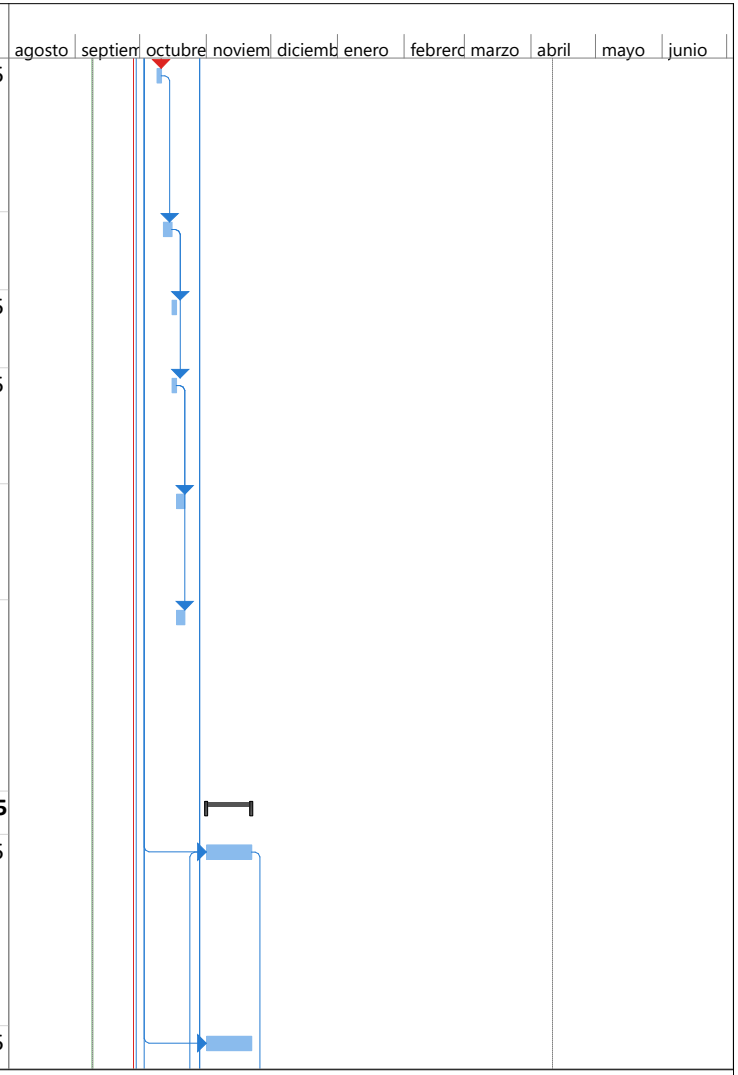

Proyecto: Programación Metro
Fecha: mar 9/09/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
44		**4. EXCAVACIÓN, RELLENO Y LIMPIEZA**	**15 días**	**sáb 11/10/25**	**vie 31/10/25**
45		Transporte y disposicion final de escombros en sitio autorizado (distancia de transporte 28 km).	15 días	sáb 11/10/25	vie 31/10/25
46		Limpieza y acopio manual de basuras.	15 días	sáb 11/10/25	vie 31/10/25
47		Cargue, transporte y disposición final de residuos tipo aglomerado y guadua.	15 días	sáb 11/10/25	vie 31/10/25
48		Cargue, transporte y disposición final de madera.	15 días	sáb 11/10/25	vie 31/10/25
49		Excavación, cargue, transporte y disposición final de placa y suelo contaminado con derivados de hidrocarburos o caracteristicas de peligrosidad, hasta una profundidad de 2.60 mts medidos desde el nivel superior de la placa de contrapiso.	15 días	sáb 11/10/25	vie 31/10/25
50		**5. MANTENIMIENTO**	**35 días**	**lun 6/10/25**	**vie 21/11/25**
51		Mata maleza (una aplicación).	8 días	vie 24/10/25	mié 5/11/25
52		Fumigación contra roedores (raticida - una aplicación).	8 días	vie 24/10/25	mié 5/11/25
53		Fumigación contra insectos (insecticidas- incluye levantamiento de animales y basuras, desinfectación contra virus, bacterias y hongos).	15 días	lun 6/10/25	vie 24/10/25
54		Motobomba sumergible ø 2" o 3" - incluye combustible	30 días	sáb 11/10/25	vie 21/11/25
55		**Fin obra predios IE8-IE9**	**2 días**	**vie 21/11/25**	**lun 24/11/25**

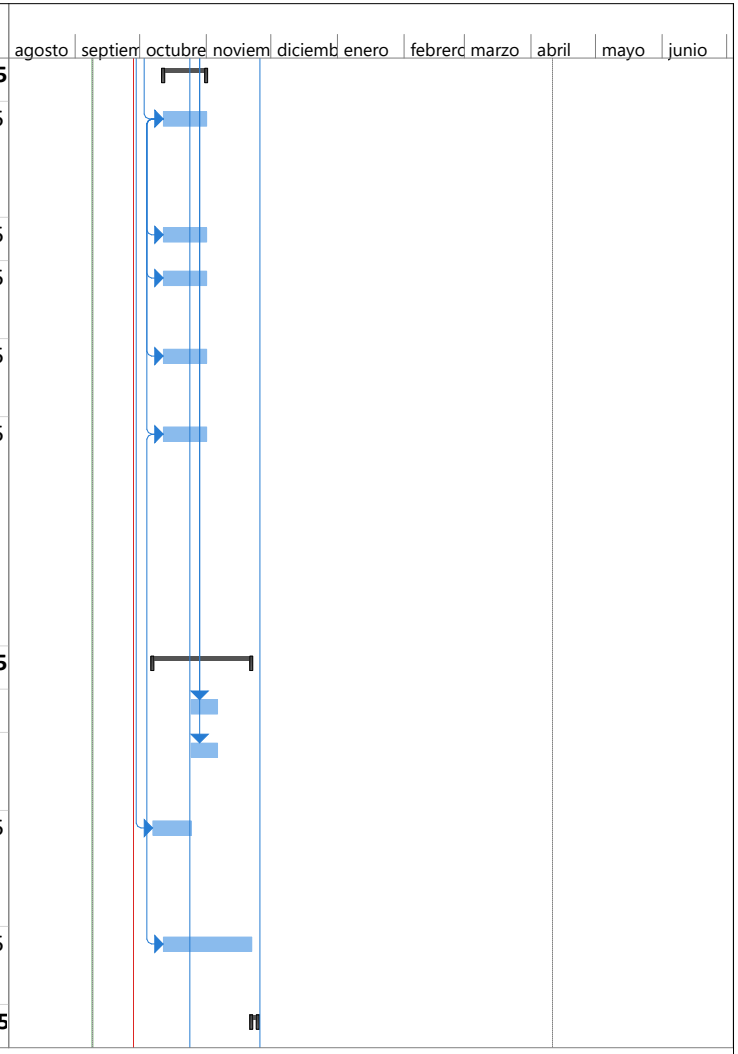

Proyecto: Programación Metro
Fecha: mar 9/09/25

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
56		Entrega de Predios Intervenidos a la EMB S.A.	2 días	vie 21/11/25	lun 24/11/25
57		**PRELIMINARES Predios IE15-IE16**	**32 días**	**mié 15/10/2**	**mié 26/11/2**
58		Entrega de los predios I15 y I16 por parte de la interventoria	10 días	vie 31/10/25	jue 13/11/25
59		Radicacion del PMT correspondiente a predios IE15 - IE16 ante la SDM	0 días	jue 6/11/25	jue 6/11/25
60		Aprobacion del PMT correspondiente a predios I15 - I16 ante la SDM	0 días	jue 13/11/25	jue 13/11/25
61		Diseño de volantes socialización - Reunión de Inicio predios IE15-IE16	2 días	mié 15/10/25	vie 17/10/25
62		Diseño de volantes socialización - Actas de vecindad predios IE15-IE16	2 días	mié 15/10/25	vie 17/10/25
63		Diseño de volantes socialización - Fumigación predios IE15-IE16	2 días	mié 15/10/25	vie 17/10/25
64		Entrega de volantes reunión de inicio predios IE15-IE16	1 día	lun 27/10/25	mar 28/10/25
65		Reunion de Inicio predios IE15-IE16	0 días	mar 4/11/25	mar 4/11/25
66		Entrega de volantes actas de vecindad predios IE15-IE16	2 días	mar 4/11/25	jue 6/11/25
67		Entrega de volantes fumigación predios IE15-IE16	2 días	mar 4/11/25	jue 6/11/25
68		Levantamiento de actas de vecindad predios IE15-IE16	3 días	jue 6/11/25	lun 10/11/25

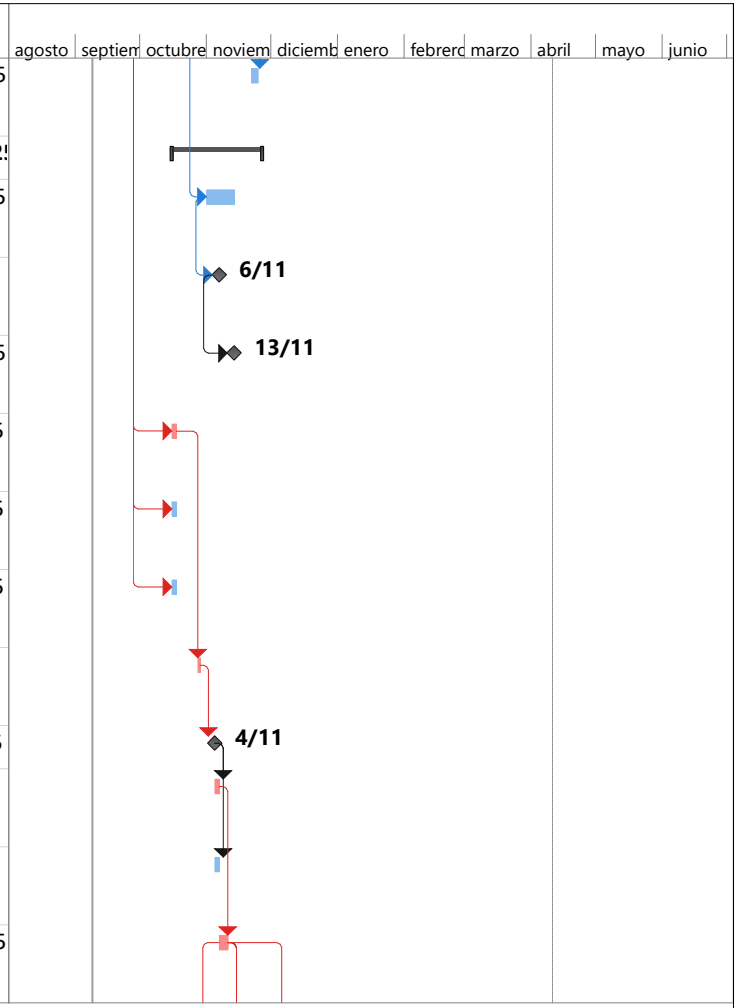

Proyecto: Programación Metro
Fecha: mar 9/09/25

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
69		Entrega de actas de vecindad a los propietarios de los predios IE15-IE16	15 días	jue 6/11/25	mié 26/11/25
70		**Etapa de obra en los predios IE15-IE16**	**115 días**	**lun 10/11/25**	**vie 10/04/26**
71		**1. DEMOLICION PREDIAL**	**80 días**	**lun 10/11/25**	**lun 23/02/26**
72		Demolición construcciones de 1 piso teja. Incluye el cargue, transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado (distancia de transporte 28 km).	10 días	lun 10/11/25	lun 24/11/25
73		Demolición construcciones de 1 piso placa. Incluye el cargue, transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado (distancia de transporte 28 km).	10 días	lun 10/11/25	lun 24/11/25
74		Demolición construcciones de 2 hasta 3 pisos. Incluye el cargue, transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado (distancia de transporte 28 km).	60 días	lun 24/11/25	mié 11/02/26
75		Demolición construcciones de 4 hasta 6 pisos. Incluye el cargue, transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado (distancia de transporte 28 km).	60 días	lun 24/11/25	mié 11/02/26
76		Demolición de bodegas con doble altura. Incluye el cargue, transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado (distancia de transporte 28 km).	60 días	lun 10/11/25	jue 29/01/26

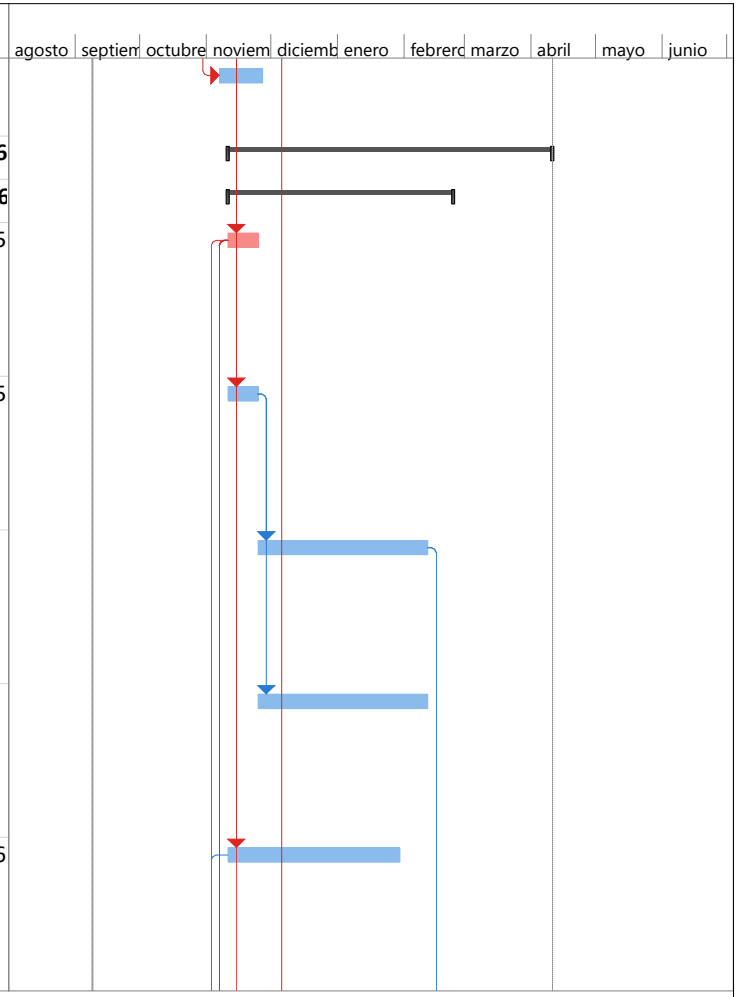

Proyecto: Programación Metro
Fecha: mar 9/09/25

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
77		Demolición mezanine en madera y/o prefabricado. Incluye el cargue, transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado (distancia de transporte 28 km).	20 días	lun 10/11/25	vie 5/12/25
78		Demolición de placa (incluye cargue, retiro de material, transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado)	60 días	vie 5/12/25	lun 23/02/26
79		**2. INTERVENCIÓN DE ANTEJARDINES**	**60 días**	**mié 12/11/2**	**lun 2/02/26**
80		Desmonte y retiro de reja de cerramiento. Incluye demolición de cimentación, base y reja. incluye transporte a 21 km y disposición de materiales en sitio autorizado.	18 días	mié 12/11/25	vie 5/12/25
81		Demolición antepechos (incluye cargue, transporte y disposición final de sobrantes).	12 días	vie 5/12/25	lun 22/12/25
82		Desmonte y montaje de luminarias existentes incluye mano de obra. No incluye materiales.	12 días	lun 22/12/25	jue 8/01/26
83		Desmonte y montaje cajas electricas metalicas existentes. Incluye mano de obra. No incluye materiales.	12 días	lun 22/12/25	jue 8/01/26
84		Demolición pisos de concreto (incluye cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	18 días	jue 8/01/26	lun 2/02/26

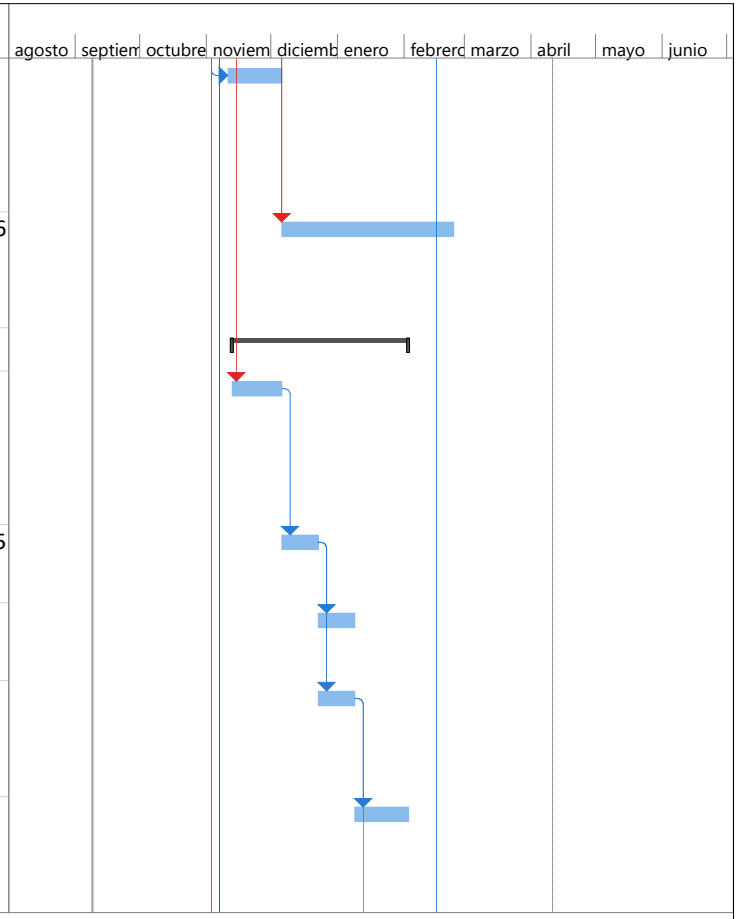

Proyecto: Programación Metro
Fecha: mar 9/09/25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
85		Demolición pisos de concreto - rampas vehiculares y peatonales existentes (espesor variable hasta 0.10 m incluye cargue, transporte y disposición final de sobrantes escombrera autorizada)	18 días	jue 8/01/26	lun 2/02/26
86		**3. CERRAMIENTO DEFINITIVO**	**90 días**	**vie 5/12/25**	**lun 6/04/26**
87		Cerramiento (8 hileras de alambre de púas calibre 12.5, con poste de madera rolliza de 8 cm de diámetro y 2.00 m de altura, enterrado como min. 0.40, con 2.00 m., entre postes)	90 días	vie 5/12/25	lun 6/04/26
88		Cerramiento Nylofor 3d Pro, altura 2.00 m	20 días	lun 2/02/26	mié 25/02/26
89		**4. EXCAVACIÓN, RELLENO Y LIMPIEZA**	**75 días**	**mar 18/11/2**	**lun 23/02/26**
90		Transporte y disposicion final de escombros en sitio autorizado (distancia de transporte 28 km).	75 días	mar 18/11/25	lun 23/02/26
91		Limpieza y acopio manual de basuras.	75 días	mar 18/11/2	lun 23/02/26
92		Cargue, transporte y disposición final de residuos tipo aglomerado y guadua.	75 días	mar 18/11/25	lun 23/02/26
93		Cargue, transporte y disposición final de madera.	75 días	mar 18/11/25	lun 23/02/26

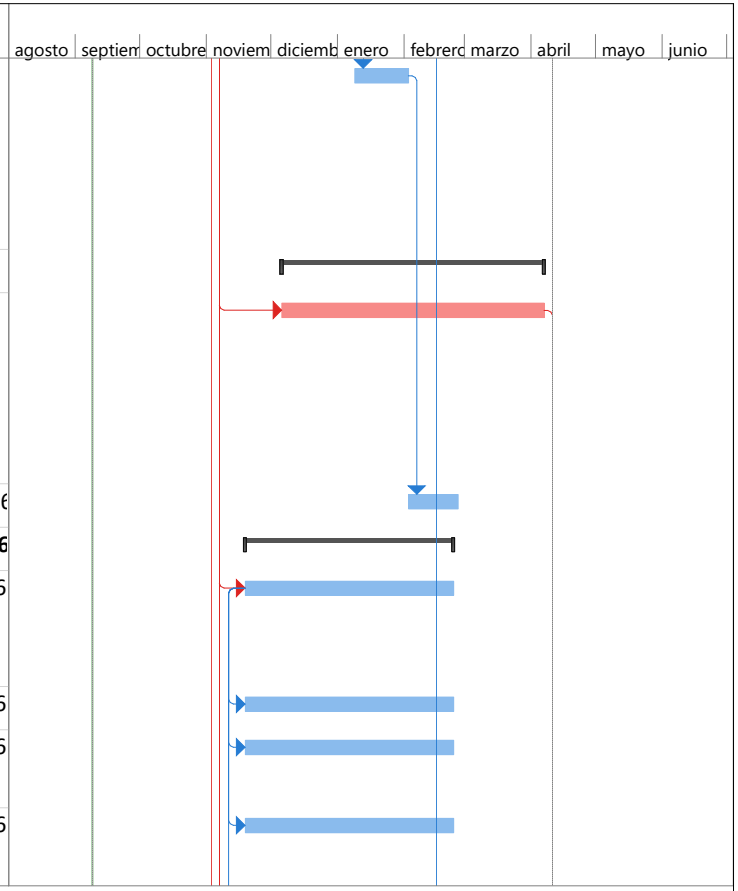

Proyecto: Programación Metro
Fecha: mar 9/09/25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
94		Excavación, cargue, transporte y disposición final de placa y suelo contaminado con derivados de hidrocarburos o caracteristicas de peligrosidad, hasta una profundidad de 2.60 mts medidos desde el nivel superior de la placa de contrapiso.	75 días	mar 18/11/25	lun 23/02/26
95		**5. MANTENIMIENTO**	**110 días**	**lun 10/11/25**	**lun 6/04/26**
96		Mata maleza (una aplicación).	40 días	mié 11/02/26	lun 6/04/26
97		Fumigación contra roedores (raticida - una aplicación).	40 días	mié 11/02/26	lun 6/04/26
98		Fumigación contra insectos (insecticidas- incluye levantamiento de animales y basuras, desinfectación contra virus, bacterias y hongos).	50 días	lun 10/11/25	vie 16/01/26
99		Tala de arboles menores a 5 m de altura. (incluye desenraíce, retiro y disposición final)	1 día	vie 19/12/25	sáb 20/12/25
100		Tala de arboles entre 5 m y 10 m de altura. (incluye desenraíce, retiro y disposición final)	2 días	vie 19/12/25	lun 22/12/25
101		Tala de arboles entre 10 m y 20 m de altura. (incluye desenraíce, retiro y disposición final)	3 días	vie 19/12/25	mar 23/12/25
102		Tala de arboles entre 20 m y 30 m de altura. (incluye desenraíce, retiro y disposición final)	4 días	vie 19/12/25	mié 24/12/25
103		Motobomba sumergible ø 2" o 3" - incluye combustible	85 días	mar 18/11/25	vie 6/03/26
104		**Fin obra predios IE15-IE16**	**5 días**	**lun 6/04/26**	**vie 10/04/26**

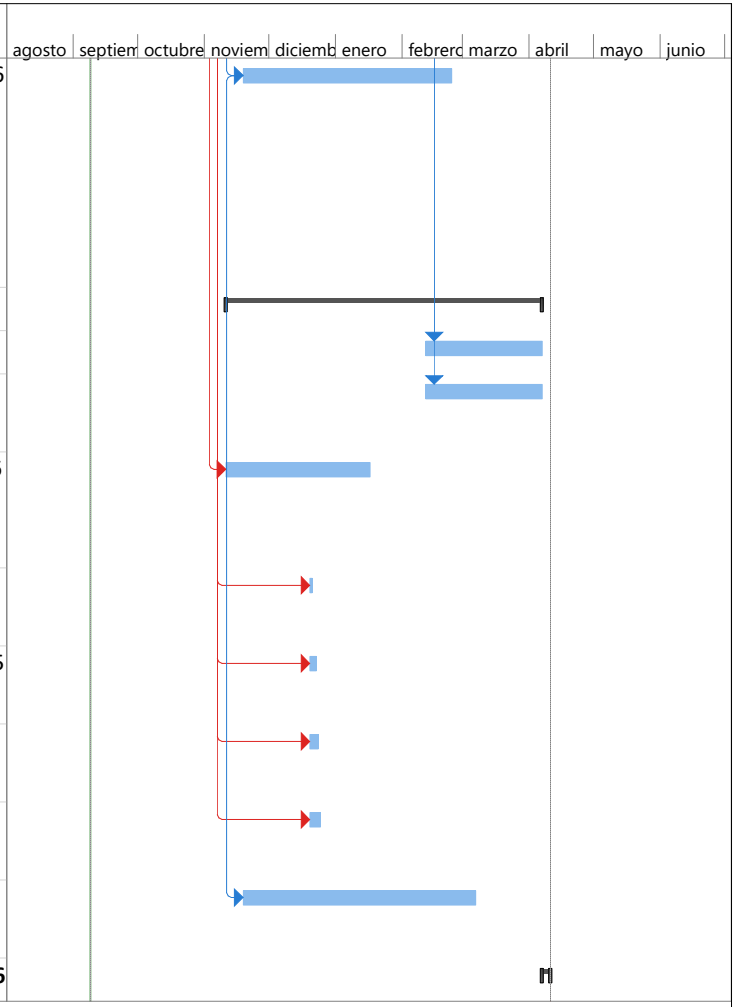

Proyecto: Programación Metro
Fecha: mar 9/09/25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
105		Entrega de Predios Intervenidos a la EMB S.A.	5 días	lun 6/04/26	vie 10/04/26
106		**Fin contrato**	0 días	vie 10/04/26	vie 10/04/26



Proyecto: Programación Metro
Fecha: mar 9/09/25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	
