CONTRATO No. 3884-2023

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA A LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II DEL PROYECTO DENOMINADO: PUENTES UBICADOS EN TERRITORIO UNIPA EN LOS SECTORES DE GUIZA, PULGANDE, RIO NULPE, RIO ÑAMBÍ, RIO TELEMBÍ, PALVI Y GUELMAMBI DE LAS SUBREGIONES DE TELEMBI Y PACIFICO SUR - DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

INFORME DE SUPERVISION No 9

PERIODO INFORME: 01/12/2024 AL 31/12/2024

San Juan de Pasto, Diciembre de 2024

Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS **SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS** **FORMATO: INFORME DE SUPERVISION - FICHA INFORMATIVA DE CONVENIO Y/O CONTRATO**	Código.: SIVEYC.FTO. Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

FECHA DE PRESENTACION:	17-jul-25	CORTE	30/12/2024

1. ASPECTOS ADMISTRATIVOS

PROCESO LICITATORIO:	**IMC049-2023**				
CONTRATO No:	GN3884-2023				
CDP DEPARTAMENTAL No.:	2023030039	FECHA:	6-mar-23	VALOR	$ 400.000.000,00
REGISTRO DEPARTAMENTAL No:	2023110414	FECHA:	22-nov-23	VALOR	$ 63.330.610,00
OBJETO DEL CONTRATO:	**INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA A LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II DEL PROYECTO DENOMINADO: PUENTES UBICADOS EN TERRITORIO UNIPA EN LOS SECTORES DE GUIZA, PULGANDE, RIO NULPE, RIO ÑAMBÍ, RIO TELEMBÍ, PALVI Y GUELMAMBI DE LAS SUBREGIONES DE TELEMBI Y PACIFICO SUR - DEPARTAMENTO DE NARIÑO**				
CONTRATISTA DE CONSULTORIA:	CONSORCIO NOGAC R.L. ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA - Nit. 901737531-1				
CONTRATISTA INTERVENTORIA:	**HELBER VALENCIA MEJIA** Nit: 79745984-7				
SUPERVISOR	**GABRIEL FERNANDO OSEJO AGUIRRE** Secretario de Infraestructura y Minas				
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION	**JUAN ALBERTO BURGOS FIGUEROA**				
META FISICA	INTERVENTORIA DISEÑO 7 PUENTES FASE II				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 63.330.610,00				
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22-nov-23				
APORTE DEPARTAMENTO CONTRATO:	$ 63.330.610,00				
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Cinco (5) Meses, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejeecucion				
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	21-dic-23				
FECHA DE ACTA INICIO:	12-abr-24				
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	11-sep-24				
MODIFICATORIO No 1:	11-sep-24 Prórroga del plazo de ejecucion contractual por tres (**3**) meses				
FECHA DE TERMINACION MOD No 1:	10-dic-24				
MODIFICATORIO No 2:	10-dic-24 Prórroga del plazo de ejecucion hasta 31 diciembre de 2024				
FECHA DE TERMINACION MOD No 2:	**31-dic-24**				
ACTA RECIBO ESTUDIOS Y DISEÑOS:	**30-dic-24**				

Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS **SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS** **FORMATO: INFORME DE SUPERVISION - FICHA INFORMATIVA DE CONVENIO Y/O CONTRATO**	Código.: SIVEYC.FTO. Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

PORCENTAJE ANTICIPO	20% del valor del contrato			
TOTAL ANTICIPO 20%	$	12.666.122,00		
VALOR PAGADO ACTAS + ANTICIPO	$	-		
GARANTIAS:	SEGUROS MUNDIAL			
PÓLIZA No.:	COQ-100001658			
% AVANCE FISICO CONTRATO:	% PROGRAMADO:	100%	% EJECUTADO:	100%
% AVANCE FINANCIERO	% PROGRAMADO	100%	% EJECUTADO	52%
META FISICA A LA FECHA	INTERVENTORIA DISEÑO 7 PUENTES FASE II		% EJECUTADO	100%

2. DESCRIPCION AVANCE GENERAL DEL CONTRATO

ASPECTOS TECNICOS: El alcance del contrato es ejercer la interventoria técnica, administrativa, ambiental y financiera al Diseño Fase II (Fase Factibilidad) de Siete (7) Puentes Vehiculares en Territorio Unipa, los volúmenes tecnicos a supervisar son: Volumen I Estudio de Tránsito, Volumen II Levantamiento Topográfico, Volumen III Estudio y Diseño Geométrico, Volumen IV Estudio Geologia y Geomorfologia, Volumen V Estudio Geotécnico, Volumen VI Estudio de Estabilidad de Taludes, Volumnen VII Estudio de Pavimentos, Volumen VIII Estudio Hidrológico e Hidráulico, Volumen IX Estudio Estructural, Volumen X Estudio Impacto Ambiental, Volúmen XI Estimacion Costos, Volúmen XII Documentacion SGR, Volumen XIII Informe Final. **ABRIL 2024:** Se adelanta Evaluacion del Equipo Profesional de Interventoria (**08-04-2024**), Comite Técnico (**24-04-2024**) **Unipa-Gobernacion-Consultor-Interventoria** para Acompañamiento Visitas de Campo: Guiza, Pulgande, Rio Nulpe, Rio Ñambi, Rio Telembí, Palvi y Guelmambi. **MAYO 2024:** Se aprueba el Informe de Visita de Campo (**31-05-2024**) presentado por el consultor, donde se puede identificar las condiciones de cada una de las siete zonas a intervenir. Según comite celebrado con Unipa-Contratistas-SIMD-Interventoria, la organizacion UNIPA plantea los tipos de puente asi: **1. Puentes Vehiculares:** Guiza, Pulgande, Nulpe, Ñambi, Telembí y Guelmambi. **2. Puentes Peatonales:** Palvi. El informe de Visita de Campo identifico que no existe accesibilidad vehícular en ninguna de las 7 zonas a intervenir, por lo anteriormente expresado se adelantará comites tecnicos con UNIPA para dar claridad a la viabilidad tecnica de diseñar puentes vehículares. **JUNIO 2024:** Se adelantan Comites Técnicos con la organizacion **UNIPA** y la **SIMD** con el propósito de socializar los hallazgos de las Visitas de Campo y el tipo de puentes a implementarse**. UNIPA** manifiesta que existen compromisos con **INVIAS, e**n virtud del **AUTO 620** de **2017**, segun el cual se obliga al Gobierno Nacional a la Proteccion de los derechos fundamentales de los pueblos indigenas y se ordena a la **Vicepresidencia de la Republica de Colombia** adelantar obras de infraestructura vial en los territorios jurisdicción de la organizacion **UNIPA.** Entre dichos compromisos esta la adecuacion de corredores para transito vehicular en los cuales se encuentran ubicados algunos de los puentes objeto del presente proceso**. JULIO 2024:** Se adelantan Comites Técnicos con **INVIAS** y **VICEPRESIDENCIA** de la República con el propósito de identificar cuales de los puentes a diseñarse estan sobre corredores viales a adecuarse como vehiculares dentro de compromisos del **AUTO 620** de **2017.** Una vez adelantados dichos comites y articulada la informacion de la consultoria con los compromisos del **INVIAS** y la **VICEPRESIDENCIA**, se concluyó lo siguiente: **1.** Puentes Vehiculares: **Guiza, Pulgande, Nulpe, Ñambi y Telembí 2.** Puentes Peatonales: **Palvi y Guelmambi.** Se presentan los productos de Topografia y Estudio de Tránsito, por parte del Consultor, debidamente avalados por Interventoria. **AGOSTO 2024:** La definicion del tipo de Puentes a diseñarse en cada una de las **7** zonas, se reafirma y valida por parte de la Organizacion **UNIPA**, mediante comunicado **UNIPA-CONSMAY-2024-621** (**14-08-2024**). Lo anterior ha atrazado la ejecucion contractual del proyecto. La consultoria presenta los perfiles transversales de Puente Vehicular y Peatonal; propuesta que deberá ser avalada por interventoria, lo cual se solicita segun **SIM-1272-2020** (**28-08-2024**).

SEPTIEMBRE 2024: Interventoria segun documento **HMV-OF-02-3884** (**02-09-2024**) aprueba los perfiles transversales de los puentes vehiculares y peatonales. El contratista solicita prórroga al plazo de ejecucion contractual con lo cual se hace necesario reprogramar la supervision a la entrega de productos. Se continua con la ejecucion contractual de la interventoria. **OCTUBRE 2024:** Se revisa por parte de Interventoria la ejecucion de llos Estudios Hidráulicos de Cuatro (**4**) Puentes y los Estudios Geotécnicos de Cuatro (**4**) Puentes. **NOVIEMBRE 2024:** Se entrega revisados y aprobados por parte de Interventoria, los productos del mes de Octubre de **2024,** segun Cronograma del Modificatorio No **1*; relacionados asi:*** **VOLUMEN V - GEOTECNIA** (Guelmambi, Palbí, Nulpe, Pulgande). **VOLUMEN VII - HIDRÁULICA E HIDROLOGIA** (Guelmambi, Palbí. Guiza, Nulpe, Ñambí, Pulgande). Es importante mencionar que para este periodo de informe se entregán los Estudios Geotécnicos de dos (**2**) puentes mas. **DICIEMBRE 2024: Se aprueba por parte de Interventoria los volúmenes de los siete (7) puentes, sin embargo en virtud a observaciones de la Secretaría de Infraestructura y Minas y de la organizacion UNIPA. VIGENCIA 2025: Solamente una vez adelantadas las subsanaciones según los siguientes comites y requerimientos: UNIPA-CONSMAY-2025-141 (13-02-2025), SIM-0172-2025 (21-02-2025), UNIPA-CONSMAY-2025-469 (02-04-2025), Requerimiento Complemento (22-04-2025), Acta Compromisos Consultor (30-04-2025), SIM-0522-2025 (21-05-2025) Reiteracion Ajustes, Comite Tecnico (10-06-2025), SIM-0823-2025 (15-07-2025).**

Se adelanta el recibo a satisfacion de los productos por parte de INTERVENTORIA. Los puentes entregados son:

1. PUENTE VEHICULAR PULGANDE (L=50m) Volúmenes I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-XI-XII-XIII
2. PUENTE VEHICULAR NULPE (L=140m) Volúmenes I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-XI-XII-XIII
3. PUENTE VEHICULAR GUIZA (L=120m) Volúmenes I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-XI-XII-XIII
4. PUENTE PEATONAL GUELMAMBI (L=70m) Volúmenes I-II-IV-V-VI-VIII-IX-X-XI-XII-XIII
5. PUENTE VEHICULAR ÑAMBI (L=100m) Volúmenes I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-XI-XII-XIII
6. PUENTE PEATONAL PALBI (L=70m) Volúmenes I-II-IV-V-VI-VIII-IX-X-XI-XII-XIII
7. PUENTE VEHICULAR TELEMBI (L=80m) Volúmenes I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-XI-XII-XIII

ASPECTOS FINANCIEROS: Según la forma de pago establecida en el anexo contractual, se pactó la entrega de un anticipo equivalente al 20% del valor del contrato (**$ 12'666.12260**), Pagos Parciales Mensuales, equivalentes en porcentaje al avance del contrato de consultoria, segun actividades ejecutadas por el consultor y aprobadas por interventoria y supervisión, con la amortizacion del anticipo respectivo. **ABRIL 2024:** Plan de Inversion Anticipo (**22-04-2024**). Aprobacion Anticipo Supervisión (**22-04-2024**). **MAYO 2024:** Pago Anticipo (**$ 12'666.122,00**) (**02-05-2024**)**. JUNIO 2024:** No se adelantó tramites de pago durante este periodo de informe. **JULIO 2024:** No se adelantó tramites de pago durante este periodo de informe. **AGOSTO 2024: No se adelantó tramites de pago durante este periodo de informe. SEPTIEMBRE 2024:** No se adelantó tramites de pago durante este periodo de informe**. OCTUBRE 2024:** Se recomienda a Interventoria la presentacion de los pagos correspondientes a los dos primeros meses de ejecucion de Interventoria**. NOVIEMBRE 2024: No** se adelantó tramites de pago durante este periodo de informe. **DICIEMBRE 2024: Se entrega por parte de Tesoreria los Comprobantes de Egreso Parcial No 1 y No 2 del 30-12-2024. El avance financiero establecido en este informe hace referencia al recurso efectivamente desembolsado y los cuales cuentan con comprobante de egreso.**

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS: ABRIL 2024: Acta Inicio (**12-04-2024**). Comité Técnico (**24-04-2024**). Informe Interventoria No **1**. **MAYO 2024:** Comité Técnico (**28-05-2024**)**. JUNIO 2024:** Comité Tecnico (**14-06-2024**). Comité Tecnico (**24-06-2024**). Informe Interventoria No **2. JULIO 2024:** Comité Técnico Vicepresidencia (**07-07-2024**), Comite Técnico **Vicepresidencia-INVIAS** (**26-07-2024**)**,** Comite Técnico **Vicepresidencia-INVIAS** (**30-07-2024**)**. SIM-1045-2024** (**19-07-2024**) Tipo Puentes, Acta Parcial No 1 (**12-07-2024**), Certificacion Parcial Cumplimiento No 1 (**17-07-2024**). **AGOSTO 2024:** Informe Interventoria No **3**, Informe Interventoria No **4**, Comite Técnico (**23-08-2024**) Perfiles Puentes**. SEPTIEMBRE 2024:** Informe Supervision Modificatorio No **1** (**10-09-2024**) Modificatorio No **1** (**09-11-2024**) Prórroga tres (**3**) meses. **OCTUBRE 2024:** Presentacion Informe Interventoria No **5** e Informe Interventoria No **6.** Se adelanta por parte de Interventoria la revision de los productos entregados por el Consultor. Se adelanta Comite Técnico con Vicepresidencia, en virtud del **AUTO 620** de **2017** (**09-10-2024**)**. NOVIEMBRE 2024:** Se suscribe Acta Parcial No **1 (22-11-2024),** Certificacion Cumplimiento Parcial No 1 (**22-11-2024**), Acta Parcial No **2 (22-11-2024),** Certificacion Cumplimiento Parcial No **2 (22-11-2024). DICIEMBRE 2024: Se suscribe Modificatorio No 2 (10-12-2025) prórroga hasta el 31-12-2024, Se proyecta Acta Parcial No 3 (22-11-2024), Acta Parcial No 4 (22-11-2024), Acta Parcial No 5 (22-11-2024), Acta Parcial No 6 (22-11-2024), Acta Parcial No 7 (30-12-2024), Acta Parcial No 8 (30-12-2024); aclarandose que queda pendiente la validacion de los aportes de seguridad social para emitir los certificado de cumplimiento respectivos.**

ASPECTOS LEGALES: ABRIL 2024: Certificado Legalizacion Inicial (**21-12-2023**), Correo Trámite Póliza Inicial (**17-04-2024 MAYO 2024:** Radicacion Poliza Acta Inicio (**02-05-2024**), la cual se remite al DAC para legalizacion**. JUNIO 2024:** Se aprueba Póliza Acta Inicio por el **DAC**. **JULIO 2024:** No se adelantan legalizaciones durante este periodo de informe. **AGOSTO 2024:** No se adelantan legalizaciones durante este periodo de informe. **SEPTIEMBRE 2024:** Se solicita al contratista trámite de póliza en virtud del Modificatorio No **1** (**12-09-2024**). La poliza del Modificatorio No **1** se remite al **DAC** para aprobacion y cargue en **SECOP II. OCTUBRE 2024:** Se aprueba la Poliza del Modificatorio No **1** por parte del **DAC.** Se remite al Apoyo Juridico documentacion para legalizacion Modificatorio No **1. NOVIEMBRE 2024: Pendiente legalizacion Modificatorio No 1 y No 2 por parte del DAC. DICIEMBRE 2024: Se remite para legalizacion al DAC la documentacion del Modificatorio No 1 y Modificatorio No 2 VIGENCIA 2025: Se legaliza por parte del DAC el Modificatorio No 1 mediante Certificado de Legalizacion del 24-07-2025. Se legaliza por parte del DAC el Modificatorio No 2 mediante Certificado de Legalizacion del 24-07-2025**

3.OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se debe debe hacer entrega de la VERSION FINAL AJUSTADA, a la organizacion UNIPA, en virtud al AUTO 620 de 2017. Se recomienda una vez tramitados los pagos pendientes, avanzar en la liquidacion del presente Contrato..



Proyecto: Ing. **JUAN ALBERTO BURGOS FIGUEROA**
Contratista Apoyo a la Supervisión - SIMD
Gobernación de Nariño



Revisó: Ing. **GABRIEL FERNANDO OSEJO AGUIRRE**
Secretario de Infraestructura y Minas - SIMD
Gobernación de Nariño

4. REGISTRO PRODUCTOS

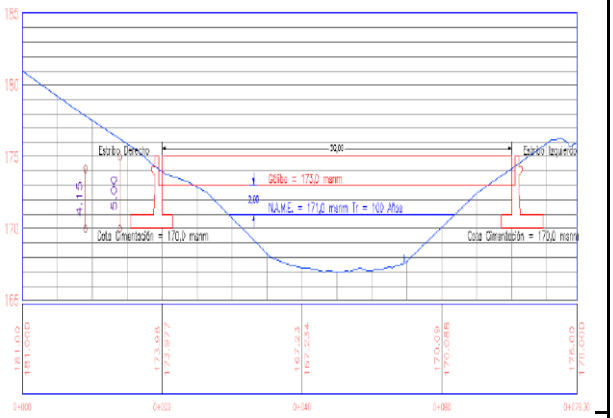


Imagen 1: Puente Pulgande

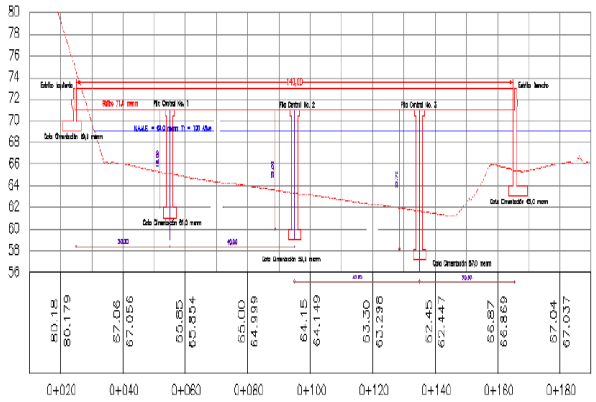


Imagen 2: Puente Nulpe

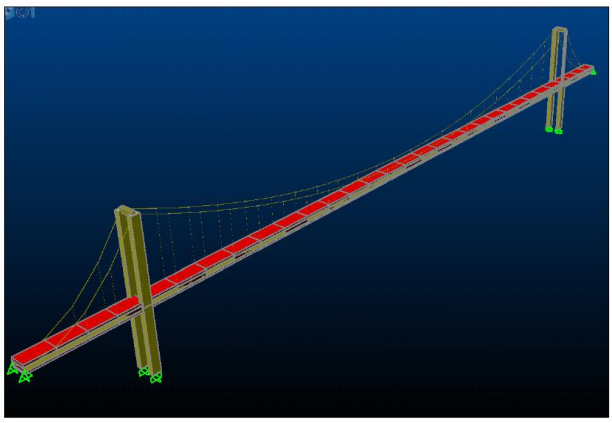


Imagen 3: Puente Guelmambi

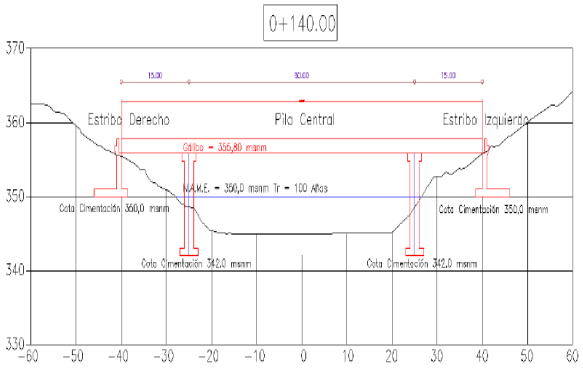


Imagen 4: Puente Guelmambi

Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS **SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS** **FORMATO: SEGUIMIENTO CONTRATO Y/O CONVENIO - SEGUIMIENTO FINANCIERO**	Código.: SIVEYC.FTO. Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

5. INFORME FINANCIERO

CONTRATO No:	**GN3884-2023**

ACTAS	FECHA	VALOR TOTAL	ACUMULADO	AMORTIZACION ANTICIPO	VALOR NETO	VALOR EGRESO	TOTAL DESCUENTOS	COM EGRESO No	FECHA PAGO
ANTICIPO	2/05/2024				$ 12.666.122,00	$ 12.666.122,00	$ -	2024002291	2/05/2024
ACTA PARCIAL No 1	22/11/2024	$ 12.666.122,00	$ 12.666.122,00	$ 2.533.224,40	$ 10.132.897,60	$ 8.658.897,60	$ 1.474.000,00	2024016007	30/12/2024
ACTA PARCIAL No 2	22/11/2024	$ 12.666.122,00	$ 25.332.244,00	$ 2.533.224,40	$ 10.132.897,60	$ 8.658.897,60	$ 1.474.000,00	2024016009	30/12/2024
ACTA PARCIAL No 3	22/11/2024	$ 6.333.061,00	$ 31.665.305,00	$ 1.266.612,20					
ACTA PARCIAL No 4	22/11/2024	$ 6.333.061,00	$ 37.998.366,00	$ 1.266.612,20					
ACTA PARCIAL No 5	22/11/2024	$ 6.333.061,00	$ 44.331.427,00	$ 1.266.612,20					
ACTA PARCIAL No 6	22/11/2024	$ 6.333.061,00	$ 50.664.488,00	$ 1.266.612,20					
ACTA PARCIAL No 7	30/12/2024	$ 6.333.061,00	$ 56.997.549,00	$ 1.266.612,20					
ACTA PARCIAL No 8	30/12/2024	$ 6.333.061,00	$ 63.330.610,00	$ 1.266.612,20					
TOTAL		**$ 63.330.610,00**		**$ 12.666.122,00**	**$ 32.931.917,20**	**$ 29.983.917,20**	**$ 2.948.000,00**		

AVANCE FISICO	**100%**
AVANCE FINANCIERO	**52%**

Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS **FORMATO: SEGUIMIENTO CONTRATO Y/O CONVENIO - CONTROL POLIZAS**	Código.: SIVEYC.FTO. Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

6. CONTROL POLIZAS

CONTRATO No:	GN3884-2023
GARANTIAS:	SEGUROS MUNDIAL
PÓLIZA No:	COQ-100001658

AMPARO	VALOR	TIEMPO
Cumplimiento del Contrato	20% del valor del contrato	Plazo ejecucion del contrato y 6 meses mas
Buen Manejo Anticipo	100% del valor del anticipo	Plazo ejecucion del contrato y 6 meses mas
Salarios, Prestaciones Sociales	10% del valor del contrato	Plazo ejecucion del contrato y 3 años mas
Calidad Servicio	20% del valor del contrato	Plazo ejecucion contrato y 3 años mas

ANEXO 0			FECHA APROBACION	21/12/2023	FECHA EXPEDICION	24/11/2023
DETALLE	**VALOR**	**%**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	**OBSERVACIONES**	**ALERTA**
Cumplimiento del Contrato	$ 12.666.122,00	20%	22-nov-23	22-oct-24	Póliza Inicial del Contrato	(268)
Buen Manejo Anticipo	$ 12.666.122,00	100%	22-nov-23	22-oct-24	Póliza Inicial del Contrato	(268)
Salarios, Prestaciones Sociales	$ 6.333.061,00	10%	22-nov-23	22-abr-27	Póliza Inicial del Contrato	644
Calidad Servicio	$ 12.666.122,00	20%	22-nov-23	22-abr-27	Póliza Inicial del Contrato	644

ANEXO 1			FECHA APROBACION		FECHA EXPEDICION	19/04/2024
DETALLE	**VALOR**	**%**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	**OBSERVACIONES**	**ALERTA**
Cumplimiento del Contrato	$ 12.666.122,00	20%	12-abr-24	13-mar-25	Poliza Acta de Inicio	(126)
Buen Manejo Anticipo	$ 12.666.122,00	100%	12-abr-24	13-mar-25	Poliza Acta de Inicio	(126)
Salarios, Prestaciones Sociales	$ 6.333.061,00	10%	12-abr-24	11-sep-27	Poliza Acta de Inicio	786
Calidad Servicio	$ 12.666.122,00	20%	12-abr-24	11-sep-27	Poliza Acta de Inicio	786

ANEXO 3			FECHA APROBACION		FECHA EXPEDICION	20/09/2024
DETALLE	**VALOR**	**%**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	**OBSERVACIONES**	**ALERTA**
Cumplimiento del Contrato	$ 12.666.122,00	20%	11-sep-24	13-jun-25	Poliza Modificatorio No 1	(34)
Buen Manejo Anticipo	$ 12.666.122,00	100%	11-sep-24	13-jun-25	Poliza Modificatorio No 1	(34)
Salarios, Prestaciones Sociales	$ 6.333.061,00	10%	11-sep-24	11-dic-27	Poliza Modificatorio No 1	877
Calidad Servicio	$ 12.666.122,00	20%	11-sep-24	11-dic-27	Poliza Modificatorio No 1	877

Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS **FORMATO: SEGUIMIENTO CONTRATO Y/O CONVENIO - CONTROL POLIZAS**	Código.: SIVEYC.FTO. Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016


ANEXO 4			FECHA APROBACION		FECHA EXPEDICION	23/03/2025
DETALLE	**VALOR**	**%**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	**OBSERVACIONES**	**ALERTA**
Cumplimiento del Contrato	$ 12.666.122,00	20%	11-sep-24	30-jun-25	Poliza Modificatorio No 2	(17)
Buen Manejo Anticipo	$ 12.666.122,00	100%	11-sep-24	30-jun-25	Poliza Modificatorio No 2	(17)
Salarios, Prestaciones Sociales	$ 6.333.061,00	10%	11-sep-24	31-dic-27	Poliza Modificatorio No 2	897
Calidad Servicio	$ 12.666.122,00	20%	11-sep-24	31-dic-27	Poliza Modificatorio No 2	897

Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO	Código.: SIVEYC.FTO.
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS	
	SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS	Versión: 0.0
	FORMATO: SEGUIMIENTO CONTRATO Y/O CONVENIO- BALANCE CONTRATACION VS EJECUCION	Vig: 23/05/2016

7. BALANCE CONTRATACION VS EJECUCION

CONTRATO No.:	**GN3884-2023**

CAP.	ACTIVIDAD	DETALLE - ACTIVIDADES	VALOR CONTRATADO	VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	DIFERENCIA	%
1	**MES 1**	Visita Campo-Informe Visita	$ 12.666.122,00	$ 12.666.122,00	$ 12.666.122,00	$ -	100,00%
2	**MES 2**	Tránsito-Topografia	$ 12.666.122,00	$ 12.666.122,00	$ 12.666.122,00	$ -	100,00%
3	**MES 3**	Definicion Tipo Puentes INVIAS-UNIPA-MIN TRANSPORTE	$ 6.333.061,00	$ 6.333.061,00	$ 6.333.061,00	$ -	100,00%
4	**MES 4**	Definicion Tipo Puentes INVIAS-UNIPA-MIN TRANSPORTE	$ 6.333.061,00	$ 6.333.061,00	$ 6.333.061,00	$ -	100,00%
5	**MES 5**	Hidrológico-Geologia-Geotecnia	$ 6.333.061,00	$ 6.333.061,00	$ 6.333.061,00	$ -	100,00%
6	**MES 6**	Hidrológico-Geologia-Geotecnia	$ 6.333.061,00	$ 6.333.061,00	$ 6.333.061,00	$ -	100,00%
7	**MES 7**	Geométrico-Hidrologico-Ambiental-Geotecnia-Estructural	$ 6.333.061,00	$ 6.333.061,00	$ 6.333.061,00	$ -	100,00%
8	**MES 8**	Geométrico-Ambiental-Estructural-Costos-SGR-Informe Final	$ 6.333.061,00	$ 6.333.061,00	$ 6.333.061,00	$ -	100,00%
9	FINAL	COSTO TOTAL	$ 63.330.610,00	$ 63.330.610,00	$ 63.330.610,00	$ -	100,00%

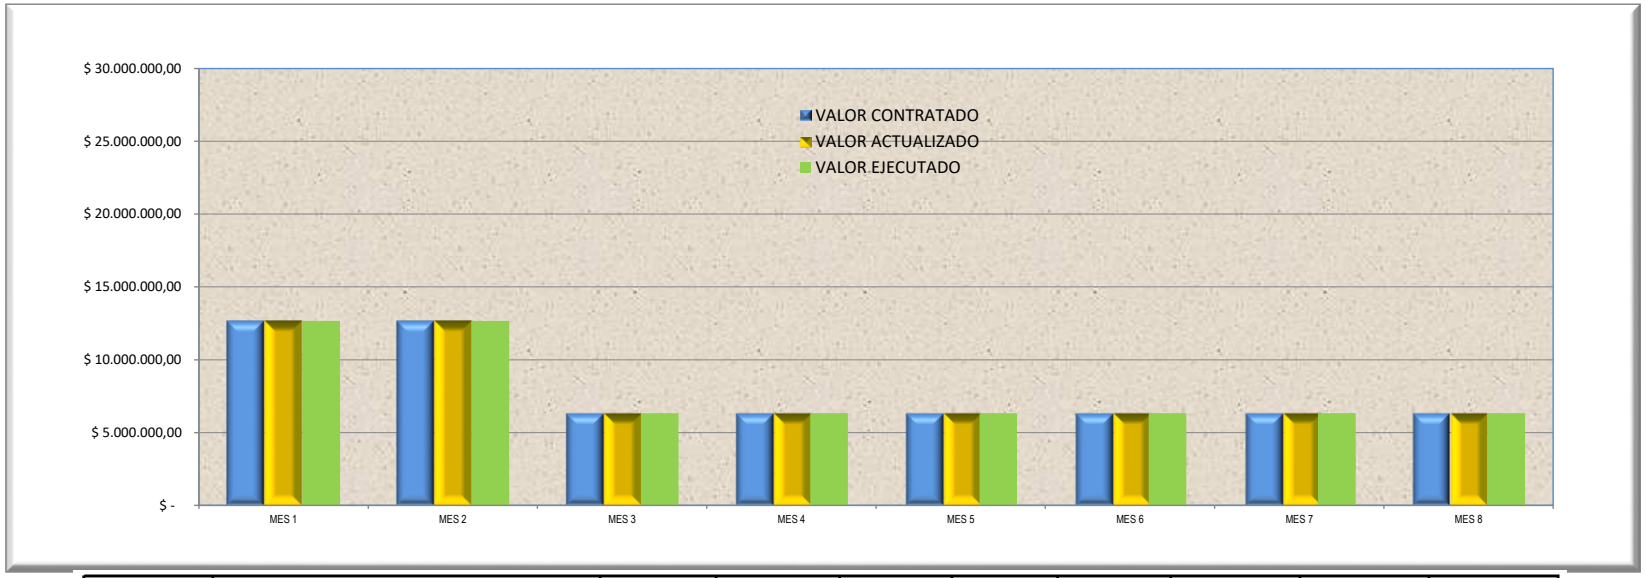

CODIGO.	DESCRIPCIÓN	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8
1	VISITA A CAMPO	7 PUENTES							
2	TOPOGRAFÍA		7 PUENETS						
3	ESTUDIO DE TRANSITO		7 PUENTES						
4	DISEÑO GEOMETRICO							3 PUENTES	4 PUENTES
5	ESTUDIO HIDRAULICO					1 PUENTE	3 PUENTES	3 PUENTES	
5	AMBIENTAL							3 PUENTES	4 PUENTES
6	GEOTECNIA					1 PUENTE	3 PUENTES	3 PUENTES	
7	DISEÑO ESTRUCTURAL							3 PUENTES	4 PUENTES
8	PRESUPUESTO								7 PUENTES
9	INFORME FINAL								7 PUENTES
