Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

CONTRATO	4600102792 DE 2024	
OBJETO: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.		
VALOR INCIAL	$ 11.732.637.297	
PLAZO INICIAL:	5 MESES	
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL VG-VNF	
INTERVENTORÍA	SITELSA SAS	
FECHA ACTA:	**PERIODO**	
	16-jun.-25	**3-ago.-25**

[La entidad puede utilizar este formulario de presentación de **propuesta económica** de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.] [Los proponentes emplearán el formulario establecido por la entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad]

Cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.

CONDICIONES CONTRACTUALES									ACTA N°6		ACUMULADO	
N°	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD INICIAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR									
1				**PRELIMINARES**								
	1.1			LOCALIZACIÓN, TRAZADO, REPLANTEO Y CONTROL. Este ítem incluye la topografía general necesaria para todo el proyecto y durante todo el plazo de ejecución de la obra. Se entiende por el trabajo que debe realizarse para localizar, replantear y fijar en el terreno los niveles y trazos establecidos en los planos (coordenadas, altimetría BM, linderos, ejes, mampostería, verticales, entre otros) y el control durante el proceso de ejecución de la obra. Se utilizará personal experto y calificado (topógrafo con su respectiva matrícula profesional vigente), utilizando equipo moderno y actualizado de precisión. Incluye teodolito electrónico o estación total ((boif bts-962e o similar); colector de datos rígido, mira profesional; nivel circular; medidor de laser horizontal, vertical, inclinación y azimut; dendrómetro electrónico (medidor de diámetro); bastón profesional; trípode profesional; prisma; plomada en zamak (aleación de zinc con aluminio, magnesio y cobre); libretas; cinta métrica 30m, y todos los demás materiales, elementos, equipos, seguros de equipos, instalaciones, combustibles, lubricantes, energía, transporte, mano de obra, necesarios para una correcta ejecución de los trabajos. Se harán los chequeos o revisiones necesarios, con la frecuencia que indique la interventoría. Incluye elaboración de planos.	dia	55,00	$ 986.161	$ 54.238.855		$ -	24,00	$ 23.667.864
	1.2			ROCERÍA Y LIMPIEZA, hasta altura de la vegetación de 0,50 m, La rocería se realizará a ras de piso. Se utilizará guadaña o machete.	m2	4.099,00	$ 1.266	$ 5.197.532		$ -	2043,58	$ 2.591.259
Subtotal						0,00		**$ 59.436.387**		**$ -**	0,00	**$ 26.259.123**
2				**RETIROS Y DEMOLICIONES**		0					0,00	
	2.1			Demolición de piso o andén en concreto. e = hasta 15 cm. Incluye transporte interno hasta el sitio de almacenamiento. Se contempla el equipo necesario para su correcta ejecución.	m2	15.634,63	$ 33.222	$ 526.058.077	3983,2472	$ 132.331.438,48	14357,49	$ 476.984.639
	2.2			Desmonte de piso en adoquín . Incluye recuperación de los materiales y su transporte hasta el sitio que indique la interventoría.	m2	1.039,75	$ 17.291	$ 17.978.317	52,12	$ 901.206,92	144,16	$ 2.492.871
	2.3			Demolición de andenes o pisos de cualquier espesor. INCLUYE ENTRESUELO, retiro de: tapas de medidores de acueducto cualquier diámetro, tapas de energía, tapas cajas de teléfonos, entre otros.	m2	3.569,42	$ 65.474	$ 233.704.205	117,33	$ 7.681.992,40	2654,44	$ 173.796.916
	2.4			Retiro de: tapas de medidores de acueducto cualquier diámetro, tapas de energía, tapas cajas de teléfonos.	un	1.904,00	$ 19.024	$ 36.221.696	349,00	$ 6.639.376,00	1498,00	$ 28.497.952
Subtotal						0,00		**$ 813.962.295**		**$ 147.554.014**	0,00	**$ 681.772.178**
3				**MOVIMIENTOS DE TIERRA**		0					0,00	
3.1				Excavaciones		0,00					0,00	$ -
	3.1.1			EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo DE 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, volumen inferior a 0.30 m³. Su medida será en el sitio. No incluye entibado.	m3	2.763,79	$ 63.568,00	$ 175.688.539	562,35	$ 35.747.542,99	2067,97	$ 131.456.594
3.2				Llenos		0,00				$ -	0,00	$ -
	3.2.1			LLENOS EN ARENILLA compactados mecánicamente hasta obtener una densidad mínima del 98%, de la máxima obtenida en el ensayo del proctor modificado. Incluye: el suministro, transporte, colocación de la arenilla, la compactación de la misma y transporte interno. Y su medida será en sitio ya compactado.	m3	784,00	$ 172.066	$ 134.899.744	392,24	$ 67.490.603,81	720,52	$ 123.977.746
	3.2.2			Suministro, transporte y colocación de subbase granular de máximo Ø 2½", reacomodado con medios MECÁNICOS y compactado al 100% mínimo del ensayo del proctor modificado según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado.	m3	3.870,62	$ 337.253	$ 1.305.378.207	857,35	$ 289.143.226,86	3260,30	$ 1.099.547.260
3.3						0,00				$ -	0,00	
	3.3.1			Cargue (Mecánico o Manual) y transporte del material proveniente de las EXPLANACIONES, EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y/O VOLADURAS DE ROCA, hasta el sitio que indique la interventoría. Su medida será en sitio. En caso de requerir el pago de derecho de botadero, se pagará en su ítem respectivo.	m3-km	149.055,50	$ 3.357	$ 500.379.314	36.664,08	$ 123.146.460,76	134083,31	$ 450.117.661
	3.3.2			Derechos de Botadero en sitio autorizado por la Autoridad Ambiental	m3	6.167,20	$ 7.486	$ 46.167.659	1.796,79	$ 13.443.260,32	6054,52	$ 45.324.162
Subtotal						0,00		**$ 2.162.513.463**		**$ 528.973.095**	0,00	**$ 1.850.423.423**
4				**CONCRETOS**		0					0,00	
4.1				Concretos para Andenes, rampas y Escalas		0,00					0,00	$ -
	4.1.1			Construcción de ANDÉN en concreto de 21 Mpa, espesor de 0.08 m (8 centímetros) Vaciado alternado (Junta fría). Incluye suministro y transporte de los materiales, acabado escobillado y llaneado 0.10 m en los bordes TIPO METRO, los demás elementos necesarios para su correcta construcción. Se ejecutarán los rebajes que sean necesarios para garantizar el acceso de los discapacitados y hasta una huellas y una contrahuella necesarias en los lugares que indique la interventoría. Las excavaciones o descapotes, malla y material de soporte (base, sub base, entresuelo o arenilla) así como las llaves en caso de requerirse, se pagarán en su ítem respectivo.	m2	330,00	$ 120.530	$ 39.774.900	-	$ -	63,29	$ 7.628.332
	4.1.2			Construcción de ESCALAS sobre entresuelo, en concreto 21 MPa , según diseño y condiciones del sitio. Incluye suministro, transporte y la colocación del concreto, formaleta de primera calidad en súper "T" de 18 mm. o su equivalente para acabado a la vista, contrahuellas, moldura chafián en contrahuellas, vibrado, protección, curado, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción.	m3	73,00	$ 1.337.462	$ 97.636.186	6,38	$ 11.211.175,37	9,92	$ 13.268.557
	4.1.3			Construccion de contenedor de raices U350, incluye viga de fundacion en concreto de 17.5 mpa (20x20m), muro en bloque de concreto (15x20x40m). No incluye marco para alcorque, refuerzo, excavación. Según detalle de MEP	m	30,00	$ 210.925	$ 6.327.750		$ -	0,00	$ -

	4.1.4			Construcción de cárcamo en concreto de 17.5 Mpa. Incluye Tapa prefabricada de 40x40x8 cm, dimensiones 30x25 medidas internas, muros de 10 cm. La excavación y acero se pagara en su ítem respectivo.	m	80,00	$ 359.151	$ 21.549.060	30,00	$ 10.774.530,00	30,00	$ 10.774.530
	4.1.5			Suministro, transporte y vaciado de concreto MR 35 kg/cm2 adicionado con microfibra de polipropileno para construcción de andén, espesor e=0.10 m. Incluye aditivo plastificante, corte y sellado de juntas cada 2,0 m. Acabado esgrafiado tipo Metro, según diseño S.I.F. El material de soporte (base o subsase) se pagará en su ítem respectivo. La interventoría y/o supervisión solicitarán los ensayos necesarios para verificar el MR requerido mediante la norma INVIAS E-414-22.	m2	16.922,57	$ 136.000	$ 2.301.469.520	4.136,03	$ 562.771.527,97	14963,01	$ 2.034.969.640
4.2				Concreto para solado, cunetas y cordones		0,00				$ -	0,00	$ -
	4.2.1			Suministro, transporte y colocación de Cordon prefabricado de concreto de 21 Mpa, tres caras, juntas ranuradas. Incluye conformación del terreno, ajustes de concreto o pavimento donde sea necesario, mortero de asiento y pega en las longitudes más adecuadas para el desarrollo de la obra. De 15 x 45 x 80 cm. (BOBAR)	m	13.824,00	$ 120.703,00	$ 1.668.598.272	2.988,69	$ 360.743.849,07	11965,55	$ 1.444.277.782
	4.2.2			Construcción de CUNETA AUXILIAR EN "V" en concreto de 21 Mpa. 0,30 x 0,25 x 0,20 m. según ficha U180 del MEP. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, entresuelo 15 cm de piedra y 5 cm de arenilla y todos lo demás elementos necesarios para su correcta construcción.	m	260,00	$ 139.398,00	$ 36.243.480		$ -	0,00	$ -
	4.2.3			Suministro, transporte y Construccion de cordon-cuneta en concreto de 21 MPa. Incluye ajustes en concreto donde sea necesario y triturado de fondo. Según detalle S.I.F. No incluye refuerzo.	m	132,00	$ 201.501,00	$ 26.596.132	273,08	$ 55.025.893,08	282,08	$ 56.839.402
	4.2.4			Suministro, transporte y colocación de concreto de 14 Mpa para SOLADO, con un espesor de mínimo 0.05 m. Incluye: transporte interno y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción.	m2	2.586,20	$ 42.090,00	$ 108.853.158	775,25	$ 32.630.390,35	2261,99	$ 95.207.134
Subtotal						0,00		**$ 4.307.050.458**		**$ 1.033.157.365**	0,00	$ 3.662.965.376
5				ACERO DE REFUERZO		0					0,00	
	5.1			Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.	kg	2200,00	$ 9.328	$ 20.517.200	537,53	$ 5.013.004,78	769,78	$ 7.178.968
	5.2			Suministro, transporte y colocación de malla electrosoldada Tipo D84. Incluye el suministro y transporte del material y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	m2	2733,26	$ 15.704	$ 42.923.115	448,00	$ 7.035.446,98	2330,01	$ 36.580.468
	5.3			Acarreo interno de ACERO para lugares de difícil acceso, pendiente y/o escalas. Se pagará según lo aprobado por la Interventoría. Distancia mayor a 100 m.	kg	1645,63	$ 663	$ 1.091.051		$ -	0,00	$ -
Subtotal						0,00		**$ 64.531.366**		**$ 12.048.452**	0,00	$ 43.759.436
6				INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS		0					0,00	$ -
	6.1			Realce para cajas de acueducto y alcantarillado existente y recuperacion de herrajes de andenes. Altura 15 - 20 cm. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción.	un	2015,00	$ 83.564	$ 168.381.460	310,00	$ 25.904.840,00	1465,00	$ 122.421.260
	6.2			Suministro, transporte e instalación de Tapa en polipropileno para caja de inspección de 0.40x 0.40 m, incluye marco.	un	510,00	$ 172.204	$ 87.824.040		$ -	7,00	$ 1.205.428
	6.3			Construcción de caja de inspección y/o empatme de 80x80x80 cm medidas internas (L=80cm) en concreto de 17.5 mpa, espesor 10 cm. Incluye tapa y herraje. Según diseño EIF Municipio de Medellín.	un	370,00	$ 907.292	$ 335.698.040	117,00	$ 106.153.164,00	169,00	$ 153.332.348
Subtotal						0,00		**$ 591.903.540**		**$ 132.058.004**	0,00	$ 275.959.036
7				COMPLEMENTARIOS EN ADOQUIN PARA PISOS		0					0,00	
	7.1			Suministro, transporte y colocación de adoquín táctil guía o alerta discapacitados visuales de 20X20X8 cm LOSTAL. Incluye arena de apoyo 5 cm, sello de juntas con arena,cortes a maquina . Según diseño. Seguir recomendaciones MEP color AMARILLO.	m2	326,00	$ 214.709	$ 69.995.134	46,12	$ 9.902.379,08	271,48	$ 58.280.015
	7.2			Colocación de ADOQUÍN TÁCTIL GUÍA O ALERTA 20 x 20 x 8. Color oliva, marrón, chocolate, ocre, tojo y terracota. Para un ancho de 0,20m. Incluye suministro y transporte de los materiales, perfilación, nivelación del terreno y adecuación de la superficie, mortero 1:3 para la instalación, corte de piezas, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño.	m	3719,10	$ 45.895	$ 170.688.095	840,36	$ 38.568.322,20	2902,12	$ 133.192.797
	7.3			Suministro, transporte y colocación de franja demarcadora para limitados visuales en adoquín ADOP-A de 10x20x8 cm, en color amarillo, salmón o jaspe, según diseño. Incluye cama de arena de apoyo e = 5 cm, sello de juntas con arena de revoque, cortes a maquina y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Cumplir norma NTC 2017, seguir recomendaciones del MEP y patronaes de instalación del ICPC. el adoquín deberá resellarse por 2 veces en un lapso de 4 meses luego de su instalación.	m	3629,00	$ 36.909	$ 133.942.761	930,89	$ 34.358.219,01	2734,18	$ 100.915.850
Subtotal						0,00		**$ 374.625.990**		**$ 82.828.920**	0,00	$ 292.388.662
8				BARANDAS Y PASAMANOS		0					0,00	
	8.1			Suministro, transporte e instalacion de baranda con pasamanos con una altura de 1,00 m, en tubería galvanizada tipo acueducto en diametros de 2" calibre 10, 1 1/2" calibre 14 y 3/4" calibre 14, segun diseño. Incluye soldadura en todas las uniones, pulida y masillada, anticorrosivo, wash primer, pintura esmalte color a definir, con los espesores especificados en el diseño. Los barrotes verticales de 3/4" deben ir cada 0,10 m centro a centro; los tubos verticales estructurales de soporte de 2" van cada 1,50 m. el anclaje al piso se hará con platinas de 0.15x0.15x1/4" de acero galvanizado y 4 pernos de expansión de diámetro de 1/2" y longitud mínima de 3" y/o concreto de 21 MPa en caso de ser necesario. Los pasamanos irán fijados a la baranda mediante platinas de acero galvanizado de acuerdo a la figura que se plantea en el diseño; incluye todo lo necesario para su correcto anclaje, fijación y funcionamiento.	m	290,00	$ 687.922	$ 199.497.380		$ -	0,00	$ -
Subtotal						0,00		**$ 199.497.380**		**$ -**	0,00	$ -
9				ARBORIZACIÓN Y PAISAJISMO		0					0,00	
	9.1			Suministro, transporte e instalación de grama tipo San Agustín, para conformación de zonas verdes. Incluye perfilación y nivelación de la superficie hasta un espesor de 5 cm , adición de tierra abonada con un espesor de 5 cm, anclaje inicial y final con ganchos de sujeción, regado y todo lo necesario para su correcta siembra y total prendimiento, capote mínimo 5 cm.	m2	2.918,00	$ 38.160,00	$ 111.350.880	396,07	$ 15.114.164,76	1576,80	$ 60.170.864
Subtotal								**$ 111.350.880**		**$ 15.114.165**	0,00	$ 60.170.864
								SUBTOTAL OBRAS		**$ 1.951.734.015**		$ 6.894.718.097

OBRAS EXTRA													
	OE-01			Corte de losa existente para demolición	ml	5.305,00	$ 14.661	$ 77.776.605	750,36	$ 11.001.027,96	4603,84	$ 67.496.898
	OE-02			Demolición y excavación de bordillos.	ml	9.100,00	$ 39.730	$ 361.543.000	1.718,22	$ 68.264.880,60	7981,89	$ 317.120.490
	OE-03			Suministro, transporte e instalación de señal vertical 60x60 en lámina galvanizada.	un	40,00	$ 547.850	$ 21.914.000	10,00	$ 5.478.500,00	10,00	$ 5.478.500
	OE-04			Demolición y excavación de jardineras con alturas entre 30 y 50 cm, incluye demolicion de viga de amarre y excavacion para la cimentacion del bordillo	ml	5.440,00	$ 27.804	$ 151.253.760	863,18	$ 23.999.856,72	4870,42	$ 135.417.158
	OE-05			Suministro, transporte e instalación de andén en concreto permeable de espesor 15 cm y los elementos necesarios para su correcta instalación.	m2	240,00	$ 278.542	$ 66.850.080	96,60	$ 26.907.157,20	96,60	$ 26.907.157
	OE-06			Suministro, transporte e instalación de caja de contadores prefabricados de acueducto.	un	500,00	$ 129.096	$ 64.548.000	83,00	$ 10.714.968,00	265,00	$ 34.210.440
	OE-07			EXCAVACIÓN MANUAL de material rocoso en volúmenes de roca superio al 40%, incluye cargue (mecánico y manual) y transporte del material proveniente de excavación	m3	900,00	$ 196.668	$ 177.001.200	160,86	$ 31.635.750,94	902,62	$ 177.517.129
	OE-08			Suministro, transporte y colocación de cordón prefabricado de concreto de 21 Mpa de tres caras y juntas ranuradas para instalación en curvas de rebajes. Incluye conformación del terreno, ajustes de concreto o pavimento donde ses necesario, mortero de asiento y pega en las longitudes más adecuadas para el desarrollo de la obra. De 15 x 45 x 40 cm.	ml	1.278,00	$ 145.462	$ 185.900.436	399,30	$ 58.082.976,60	1288,89	$ 187.484.517
	OE-09			Suministro, transporte y colocación de malla electrosoldada Tipo D-335 (8mm). Incluye el suministro y transporte del material y todos los elementos necesarios para su correcta colocación. En accesos a parqueaderos con espesores de 15 cm y 20 cm que la requieran	m2	100,00	$ 54.115	$ 5.411.500		$ -	0,00	$ -
	OE-10			Suministro, transporte y vaciado de concreto MR 35 kg/cm2 adicionado con microfibra de polipropileno para construcción de andén, espesor e=0.20 m. Incluye aditivo plastificante, corte y sellado de juntas cada 2,0 m. Acabado egrafiado tipo Metro, según diseño S.I.F. El material de soporte (base o subsase) se pagará en su item respectivo. La interventoría y/o supervisión solicitarán los ensayos necesarios para verificar el MR requerido mediante la norma INVIAS E-414-22.	m2	382,00	$ 305.936	$ 116.867.552	193,33	$ 59.147.830,62	473,64	$ 144.902.762
	OE-11			Suministro, transporte y vaciado de concreto MR 35 kg/cm2 adicionado con microfibra de polipropileno para construcción de andén, espesor e=0.15 m. Incluye aditivo plastificante, corte y sellado de juntas cada 2,0 m. Acabado egrafiado tipo Metro, según diseño S.I.F. El material de soporte (base o subsase) se pagará en su item respectivo. La interventoría y/o supervisión solicitarán los ensayos necesarios para verificar el MR requerido mediante la norma INVIAS E-414-22.	m2	40,00	$ 235.316	$ 9.412.640	34,20	$ 8.047.807,20	57,72	$ 13.582.440
	OE-12			Suministro, transporte y aplicación manual de pintura plástico en frío sobre superficie de concreto.	m2	601,00	$ 111.191	$ 66.825.791	231,07	$ 25.693.126,75	231,07	$ 25.693.127
	OE-13			Suministro e instalación de anden Deck elevado en madera plástica color a definir, incluye largueros para la estructura, estacones de apoyo embebidos en pilotes, incluye excavación y vaciado de pilotes y todos los elementos para su correcta instalación.	m2	310,00	$ 1.547.022	$ 479.576.820	56,79	$ 87.860.020,45	119,44	$ 184.769.346
	OE-14			Reubicación de redes hidráulicas. Comprende el suministro, transporte e instalación de tubería PVC, accesorios (codos, uniones, etc.); empalmes, pruebas hidráulicas, limpieza y verificación del correcto funcionamiento del sistema.	un	770,00	$ 138.740	$ 106.829.800		$ -	0,00	$ -
	OE-15			Construcción de canales con altura libre hasta 60cm y espesor de 15cm, ancho de losa libre de 30cm y rejilla prefabricada de uso peatonal de 40x40x6cm.	ml	182,00	$ 535.347	$ 86.726.214	44,50	$ 23.822.941,50	105,48	$ 56.468.402
							SUBTOTAL OBRAS EXTRAS	$ 1.978.437.398		$ 440.656.845		$ 1.377.048.365

SUBTOTAL OBRAS				$ 10.663.309.157,00	COSTO DIRECTO SIN AIU		$ 1.803.128.475,00
Destinación pago de Reajustes			NO MODIFICAR	$ 428.702.068,00	A	26,68%	$ 481.074.677,00
Inversión Socio-Ambiental-Implementación PMT- Gasto Reembolsable-			NO MODIFICAR	$ 428.958.108,00	I	1,00%	$ 18.031.285,00
Pólizas - Gasto Reembolsable-			NO MODIFICAR	$ 44.717.244,00	U	5,00%	$ 90.156.424,00
Personal PMT - Reembolsable				$ 166.950.720,00	TOTAL CON AIU	32,68%	$ 2.392.390.861,00
VALOR TOTAL DE ACUERDO A MODIFICACIÓN 03 DEL CONTRATO				$ 11.732.637.297	TOTAL SIN I	31,68%	$ 2.374.359.576,00
					PERSONAL PMT		$ 134.960.162,00
					VALOR TOTAL ACTA SIN I Y CON PERSONAL PMT		$ 2.509.319.738,00

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	DESCRIPCION		PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	ADMINISTRACIÓN	A=	26,68%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	IMPREVISTO	I=	1,00%
NOTA 4: El valor definido por la Entidad por concepto de pólizas es un valor estimado que será un gasto reembolsable comprobable, la entidad reconocerá al contratista el valor real efectivamente causado por este concepto (Gasto Reembolsable), para el efecto, el contratista deberá presentar los documentos que soporten el valor facturado por las garantías.	UTILIDAD	U=	5,00%
NOTA 5: El valor total presupuestado por la Entidad por concepto de "Inversión Ambiental - Social - Implementación PMT" reflejado en sus respectivos anexos, es un valor estimado que será un gasto reembolsable demostrable. Lo anterior, con la finalidad de ser ejecutados en la proporción requerida y durante los tiempos en que se presenten las necesidades que cada uno de ellos busca satisfacer. Dichas actividades serán reconocidas a cargo de reembolso de gastos.	TOTAL A.I.U	A.I.U.=	32,68%
NOTA 6: El valor total presupuestado por la Entidad por concepto de "Destinación pago de Reajustes" es un valor estimado, con el cual se realizara el pago de los reajuste de precios que se puedan llegar a causar durante la ejecución del contrato en atención a la forma de pago definida en los documentos del proceso.	Consorcio Vial VG-VNF - Representante Legal		
NOTA 7: Las operaciones y/o formulas que se presentan en estos formularios, solo son de ayuda para la formulación de la oferta, es responsabilidad del proponente verificar las mismas y efectuar sus propios cálculos para la formulación de su oferta.			
NOTA 8: Los valores Definidos para los ítems Destinación pago de Reajustes, Inversión Socio-Ambiental e Implementación PMT y Pólizas NO PODRÁN ALTERARSE O MODIFICARSE.			

CONTRATISTA
ERNESTO MILLAN
DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	1
FECHA	DD	3	MM	8	AA	2025	PERÍODO	16/06/2025 - 3/08/2025	ELABORÓ		ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	

ÍTEM	2.1	DESCRIPCIÓN	Demolición de piso o andén en concreto. e = hasta 15 cm. Incluye transporte interno hasta el sitio de almacenamiento. Se contempla el equipo necesario para su correcta ejecución.	UNID.		m2	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.	











LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	CANTIDAD (M2)	MEDIDA TOTAL
Del 16 al 22 de junio					
POBLADO - LAS LOMAS					
CR 31A - CLL 11A Y 11		11,20	1,50	16,80	**16,80**
CLL 11B - CR 34 Y CL 11A		12,00	1,30	15,60	
CLL 11B - CR 34 Y CL 11A		5,80	1,10	6,38	
CLL 11B - CR 34 Y CL 11A		9,00	2,35	21,15	
CLL 11B - CR 34 Y CL 11A		10,00	2,35	23,50	
CLL 11B - CR 34 Y CL 11A		3,50	1,30	4,55	
CLL 11B - CR 34 Y CL 11A		3,00	2,35	7,05	
MENOS CAJAS				-1,01	**77,22**
POBLADO - FLORIDA					
CLL 5G - CR 33		9,00	0,30	2,70	
CLL 5G - CR 33		0,55	0,30	0,17	
CLL 5G - CR 33		12,20	1,50	18,30	
CLL 5G - CR 33		14,80	1,25	18,50	
CLL 5G - CR 33		0,90	1,00	0,90	**40,57**
BOMBONÁ I					
CL 49A - CR 37 Y 38		5,80	4,90	28,42	
CL 49A - CR 37 Y 38		10,17	2,15	21,87	
CL 49A - CR 37 Y 38		1,78	1,81	3,22	
CL 49A - CR 37 Y 38		5,48	1,95	10,69	
CL 49A - CR 37 Y 38		32,05	2,40	76,92	
CL 49A - CR 37 Y 38		2,93	2,38	6,97	
MENOS CAJAS				-0,20	**147,89**
LA CANDELARIA - BOSTON					
CR 40 - CL 54 Y 56		17,37	2,22	38,56	
CR 40 - CL 54 Y 56		4,98	2,41	12,00	
CR 40 - CL 54 Y 56		5,06	2,41	12,19	
CR 40 - CL 54 Y 56		10,37	2,35	24,37	
CR 40 - CL 54 Y 56		3,79	2,30	8,72	
CR 40 - CL 54 Y 56		7,61	2,35	17,88	
CR 40 - CL 54 Y 56		17,15	2,30	39,45	
MENOS CAJAS				-6,88	**146,49**
Del 23 al 29 de junio					
POBLADO - LAS LOMAS					
CR 31A - CLL 11A Y 11		3,50	2,74	9,59	
CR 31A - CLL 11A Y 11		2,10	1,50	3,15	
CR 31A - CLL 11A Y 11		4,60	2,90	13,34	
CR 31A - CLL 11A Y 11		2,10	1,50	3,15	
CR 31A - CLL 11A Y 11		10,00	3,70	37,00	
CR 31A - CLL 11A Y 11		5,50	2,94	16,17	
MENOS CAJAS				-0,25	**82,15**
CLL 11 - CR 31A Y 30		2,60	2,60	6,76	
CLL 11 - CR 31A Y 30		5,00	3,30	16,50	
CLL 11 - CR 31A Y 30		33,20	1,50	49,80	
MENOS CAJAS				-2,21	**70,85**
CLL 11B - CR 34 Y CL 11A		60,00	1,40	84,00	
CLL 11B - CR 34 Y CL 11A		20,00	1,50	30,00	
CLL 11B - CR 34 Y CL 11A		18,00	1,50	27,00	
CLL 11B - CR 34 Y CL 11A		5,90	2,95	17,41	
MENOS CAJAS				-0,24	**158,17**
BOMBONÁ I					
CR 38 - CLL 49A Y 48		5,70	4,70	26,79	
CR 38 - CLL 49A Y 48		16,83	2,60	43,76	
CR 38 - CLL 49A Y 48		9,87	3,55	35,04	
CR 38 - CLL 49A Y 48		29,08	2,99	86,95	
MENOS CAJAS				-4,56	**187,98**
LA CANDELARIA - BOSTON					
CR 40 - CL 54 Y 56		9,54	4,79	45,70	
CR 40 - CL 54 Y 56		19,18	2,02	38,74	
MENOS CAJAS				-0,20	**84,24**
BOSTON - ENCISO					
CLL 57 - CR 36A Y CR 37		3,06	3,44	10,53	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37		9,57	1,83	17,51	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37		5,16	1,43	7,38	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37		4,50	3,40	15,30	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37		11,07	2,05	22,69	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37		5,63	1,35	7,60	**81,01**
Del 30 de junio al 06 de julio					
LA CANDELARIA - SAN DIEGO					
CLL 31 - CR 42B Y 42A		12,00	1,50	18,00	
CLL 31 - CR 42B Y 42A		3,30	1,50	4,95	
CLL 31 - CR 42B Y 42A		0,90	2,40	2,16	
CLL 31 - CR 42B Y 42A		19,00	1,20	22,80	
CLL 31 - CR 42B Y 42A		5,90	1,15	6,79	**54,70**
BOMBONÁ I					
CR 38 - CLL 49A Y 48		44,25	2,50	110,63	

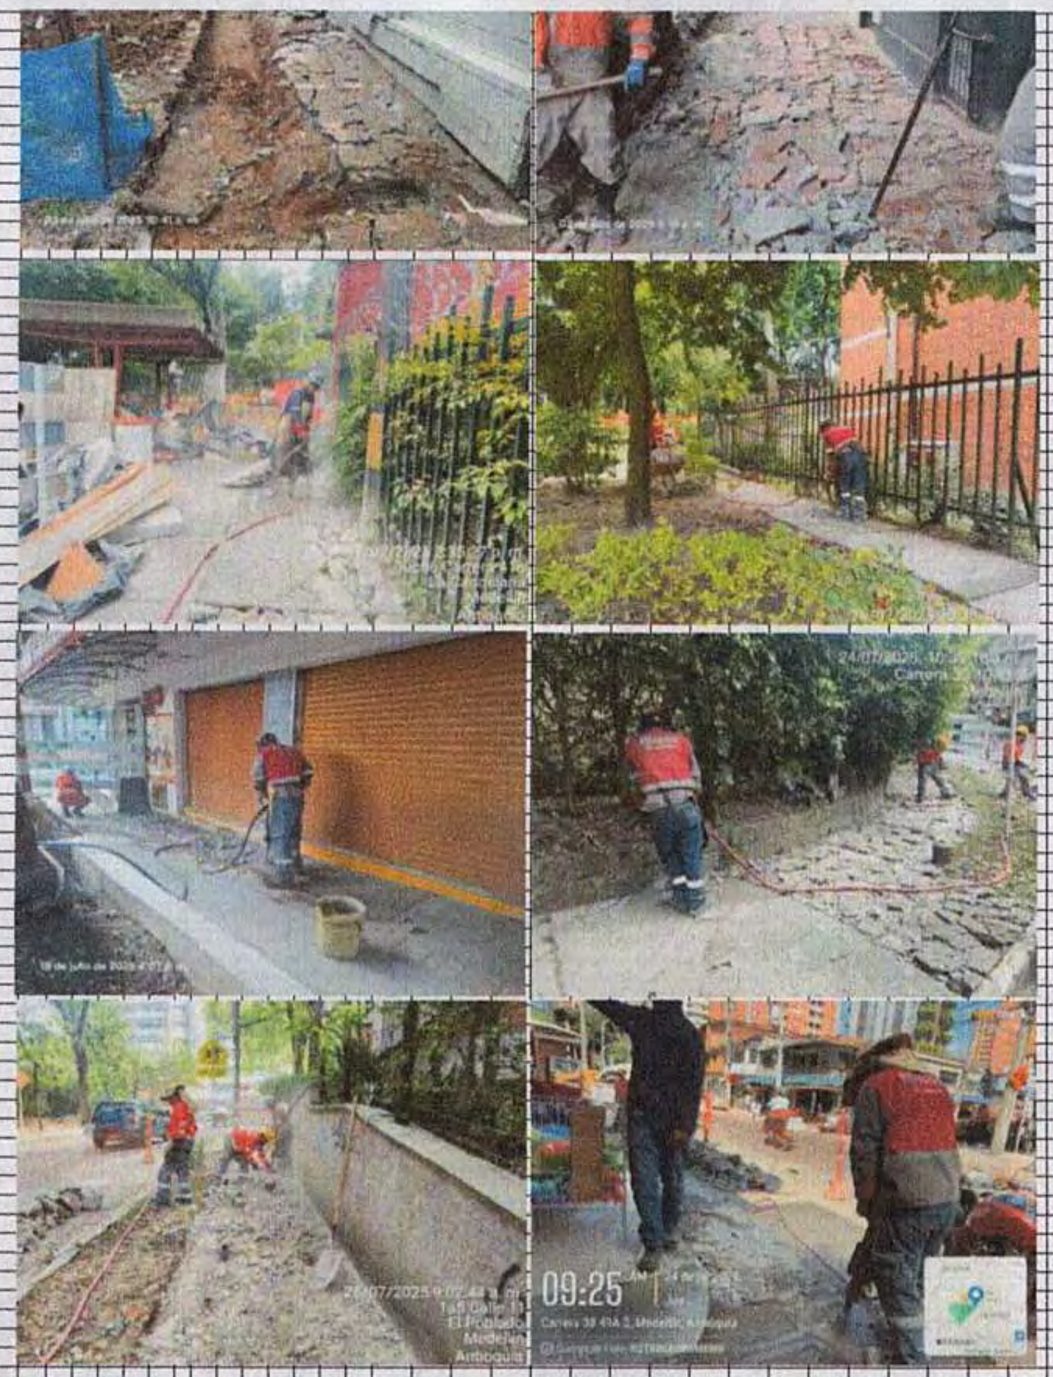

CR 38 - CLL 49A Y 48		1,75	2,60	4,55		
CR 38 - CLL 49A Y 48		1,92	2,75	5,28		
CR 38 - CLL 49A Y 48		19,20	3,50	67,20		
CR 38 - CLL 49A Y 48		5,31	3,62	19,22		
CR 38 - CLL 49A Y 48		18,65	1,15	21,45		
MENOS CAJAS				-6,84		**221,48**
BOSTON - ENCISO						
CR 36A - CL 54 Y 58		14,20	1,60	22,72		**22,72**
LA CANDELARIA - BOSTON						
CL 54 - CR 41 Y 40		15,40	2,40	36,96		
CL 54 - CR 41 Y 40		3,00	2,10	6,30		
CL 54 - CR 41 Y 40		4,34	1,84	7,99		**51,25**
Del 7 al 13 de julio						
POBLADO - LAS LOMAS						
CLL 11B - CR 34 Y CLL 11A		6,50	2,30	14,95		
CLL 11B - CR 34 Y CLL 11A		12,20	1,38	16,84		
CLL 11B - CR 34 Y CLL 11A		8,00	1,10	8,80		
CLL 11B - CR 34 Y CLL 11A		5,13	1,60	8,21		
CLL 11B - CR 34 Y CLL 11A		28,70	1,25	35,88		
MENOS CAJAS				-1,87		**82,80**
CR 31A - CLL 11A Y 11		2,00	2,00	4,00		
CR 31A - CLL 11A Y 11		28,00	1,45	40,60		
CR 31A - CLL 11A Y 11		17,00	2,85	48,45		
CR 31A - CLL 11A Y 11		41,30	1,50	61,95		
MENOS CAJAS				-4,55		**150,45**
SAN DIEGO						
CLL 31 - CR 42B Y 42A		50,00	1,10	55,00		
CLL 31 - CR 42B Y 42A		7,10	2,60	18,46		
CLL 31 - CR 42B Y 42A		11,60	9,80	113,68		
MENOS CAJAS				-2,29		**184,85**
BOMBONÁ I						
CLL 49A - CR 37 Y 38		3,04	2,33	7,08		
CLL 49A - CR 37 Y 38		5,33	4,70	25,05		
CLL 49A - CR 37 Y 38		3,19	2,45	7,82		
CLL 49A - CR 37 Y 38		2,90	4,62	13,96		
CLL 49A - CR 37 Y 38		1,64	2,35	3,85		
MENOS CAJAS				-1,20		**59,58**
CR 38 - CLL 49A Y 48		24,00	1,50	36,00		
CR 38 - CLL 49A Y 48		3,63	6,80	24,68		
CR 38 - CLL 49A Y 48		10,65	3,63	38,66		
CR 38 - CLL 49A Y 48		6,52	4,07	26,54		
CR 38 - CLL 49A Y 48		51,91	1,09	56,58		
MENOS CAJAS				-9,01		**173,45**
BOSTON - ENCISO						
CR 36A - CLL 54 Y 58		22,50	1,45	32,63		
CR 36A - CLL 54 Y 58		21,00	2,00	42,00		
CR 36A - CLL 54 Y 58		44,50	0,70	31,15		**106,78**
LA CANDELARIA - BOSTON						
CLL 54 - CR 41 Y CR 40		41,55	2,16	89,75		
CLL 54 - CR 41 Y CR 40		20,60	2,20	45,32		
CLL 54 - CR 41 Y CR 40		6,60	1,95	12,87		
CLL 54 - CR 41 Y CR 40		14,30	2,16	30,89		
CLL 54 - CR 41 Y CR 40		4,00	2,20	8,80		
CLL 54 - CR 41 Y CR 40		3,85	2,20	8,47		
CLL 54 - CR 41 Y CR 40		2,55	2,20	5,61		
CLL 54 - CR 41 Y CR 40		1,68	2,20	3,70		
CLL 54 - CR 41 Y CR 40		1,68	2,20	3,70		**209,10**
Del 14 al 20 de julio						
SAN DIEGO						
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS		9,80	2,40	23,52		
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS		61,40	1,20	73,68		
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS		61,40	0,15	9,21		
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS		64,00	0,15	9,60		
MENOS CAJAS				-0,84		**115,17**
CLL 31 - CR 42B Y 42A		5,74	2,50	14,35		
CLL 31 - CR 42B Y 42A		7,20	1,20	8,64		
CLL 31 - CR 42B Y 42A		2,86	1,00	2,88		
CLL 31 - CR 42B Y 42A		10,00	2,00	20,00		
CLL 31 - CR 42B Y 42A		15,93	1,00	7,97		
CLL 31 - CR 42B Y 42A		8,64	1,00	4,32		
CLL 31 - CR 42B Y 42A		6,80	1,00	6,80		
CLL 31 - CR 42B Y 42A		3,30	2,50	8,25		
CLL 31 - CR 42B Y 42A		35,50	1,20	42,60		
CLL 31 - CR 42B Y 42A		14,40	1,20	17,28		
CLL 31 - CR 42B Y 42A		16,20	1,00	16,20		
CLL 31 - CR 42B Y 42A		59,05	1,00	59,05		
CLL 31 - CR 42B Y 42A		11,55	1,00	11,55		**219,88**
BOMBONÁ I						
CR 38 - CLL 49A Y 48		11,60	1,50	17,40		
CR 38 - CLL 49A Y 48		1,90	1,50	2,85		
CR 38 - CLL 49A Y 48		12,50	4,00	50,00		
CR 38 - CLL 49A Y 48		13,18	3,96	52,19		**122,44**
CLL 49A - CR 37 Y 38		74,02	1,10	81,42		
MENOS CAJAS				-4,18		**77,24**
BOSTON - ENCISO						
CR 36A - CLL 54 Y 58		1,40	1,40	1,96		
CR 36A - CLL 54 Y 58		1,20	1,20	1,44		
CR 36A - CLL 54 Y 58		3,10	1,20	3,72		
CR 36A - CLL 54 Y 58		1,20	1,40	1,68		
CR 36A - CLL 54 Y 58		10,00	1,30	13,00		
CR 36A - CLL 54 Y 58		1,40	1,20	1,68		
CR 36A - CLL 54 Y 58		4,30	1,40	6,02		
CR 36A - CLL 54 Y 58		1,35	1,20	1,62		
CR 36A - CLL 54 Y 58		5,20	1,25	6,50		
CR 36A - CLL 54 Y 58		3,00	2,20	6,60		**44,22**
BOMBONÁ II						
CR 9A - CLL 44AA 45		5,60	1,85	10,36		**10,36**



Del 21 al 27 de julio					
SAN DIEGO					
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS	7,00	3,00	21,00		
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS	49,00	1,70	83,30		
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS	5,30	5,00	26,50		
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS	5,10	2,75	14,03		
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS	20,20	1,19	24,04		**168,86**
CLL 31 - CR 42B Y 42A	4,10	1,10	4,51		
CLL 31 - CR 42B Y 42A	2,00	2,50	5,00		
CLL 31 - CR 42B Y 42A	2,25	1,95	4,39		
CLL 31 - CR 42B Y 42A	11,20	1,25	14,00		
CLL 31 - CR 42B Y 42A	4,00	2,10	8,40		
CLL 31 - CR 42B Y 42A	20,80	1,10	22,99		
CLL 31 - CR 42B Y 42A	2,60	2,40	6,24		
MENOS CAJAS			-1,44		**64,09**
POBLADO - LAS LOMAS					
CR 31A - CLL 11A Y 11	50,00	1,40	70,00		
CR 31A - CLL 11A Y 11	3,80	2,80	10,64		
CR 31A - CLL 11A Y 11	40,00	1,60	64,00		**144,64**
BOMBONÁ I					
CLL 49A - CR 37 Y 38	9,90	3,30	32,67		
CLL 49A - CR 37 Y 38	11,04	1,02	11,26		
CLL 49A - CR 37 Y 38	1,15	2,34	2,69		
CLL 49A - CR 37 Y 38	24,56	1,01	24,81		
CLL 49A - CR 37 Y 38	2,90	2,52	7,31		
CLL 49A - CR 37 Y 38	6,54	1,09	7,13		
CLL 49A - CR 37 Y 38	1,40	1,18	1,65		
CLL 49A - CR 37 Y 38	10,50	1,30	13,65		
CLL 49A - CR 37 Y 38	3,12	3,46	10,80		
CLL 49A - CR 37 Y 38	1,70	1,05	1,79		
CLL 49A - CR 37 Y 38	1,70	1,07	1,82		
CLL 49A - CR 37 Y 38	1,97	3,60	7,09		
CLL 49A - CR 37 Y 38	1,12	2,35	2,63		
CLL 49A - CR 37 Y 38	4,90	3,55	17,40		
CLL 49A - CR 37 Y 38	0,80	1,10	0,88		
CLL 49A - CR 37 Y 38	0,80	1,55	1,24		
CLL 49A - CR 37 Y 38	5,30	3,35	17,76		
CLL 49A - CR 37 Y 38	4,70	1,70	7,99		
CLL 49A - CR 37 Y 38	69,30	1,40	97,02		
CLL 49A - CR 37 Y 38	17,04	3,55	60,49		
CLL 49A - CR 37 Y 38	4,98	1,94	9,66		
CLL 49A - CR 37 Y 38	9,06	2,04	18,48		**358,20**
CR 38 - CLL 49A Y 48	20,00	1,50	30,00		**30,00**
BOSTON - ENCISO					
CR 36A - CLL 54 Y 58	3,80	1,30	4,94		
CR 36A - CLL 54 Y 58	3,60	1,80	6,48		
CR 36A - CLL 54 Y 58	2,30	0,40	0,92		
MENOS CAJAS			-2,56		**9,78**
LA CANDELARIA - BOSTON					
CLL 54 - CR 41 Y CR 40	2,06	2,00	4,12		**4,12**
LA AMÉRICA - FERRINI					
Demolición para instalación de madera plástica	11,80	1,96	23,36		**23,36**
LAURELES - ACACIAS					
Demolición para instalación de madera plástica	4,70	1,32	6,20		
Demolición para instalación de madera plástica	8,4	1,4	11,76		**17,96**
Del 28 de julio al 03 de agosto					
SAN DIEGO					
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS	6,43	2,22	14,27		
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS	64,00	1,10	70,40		**84,67**
BOMBONÁ I					
CLL 49A - CR 37 Y 38	40,00	1,40	56,00		
CLL 49A - CR 37 Y 38	4,80	2,51	12,05		
CLL 49A - CR 37 Y 38	12,06	1,30	15,68		**83,73**
			Subtotal		**3.983,26**
			TOTAL		**3.983,25**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA Nº	2
FECHA	DD	3	MM	8	AA	2025	PERÍODO	16/06/2025 - 3/08/2025	ELABORÓ		ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
CONTRATO No	4600102792 DE 2024 — FECHA DE INICIO

ÍTEM	2.2	DESCRIPCIÓN	Desmonte de piso en adoquín . Incluye recuperación de los materiales y su transporte hasta el sitio que indique la interventoría.	UNID.		m2	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.





LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	CANTIDAD (M2)	MEDIDA TOTAL
Del 16 al 22 de junio					
POBLADO - LAS LOMAS					
CLL 11 - CR 31A Y 30		7,70	1,00	7,70	**7,70**
Del 30 de junio al 06 de julio					
LA CANDELARIA - SAN DIEGO					
CLL 31 - CR 42B Y 42A		5,80	3,30	19,14	**19,14**
Del 14 al 20 de julio					
SAN DIEGO					
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS		2,20	2,40	5,28	**5,28**
Del 21 al 27 de julio					
SAN DIEGO					
CLL 31 - CR 42B Y 42A		8,00	2,50	20,00	**20,00**
			Subtotal		**52,12**
TOTAL					**52,12**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF					HOJA Nº	3	
FECHA	DD	3	MM	8	AA	2025	PERÍODO	16/06/2025 - 3/08/2025	ELABORÓ		ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA		

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
CONTRATO No	4600102792 DE 2024 — FECHA DE INICIO

ITEM	2.3	DESCRIPCIÓN	Demolición de andenes o pisos de cualquier espesor. INCLUYE ENTRESUELO, retiro de: tapas de medidores de acueducto cualquier diámetro, tapas de energía, tapas cajas de teléfonos, entre otros.	UNID.	m2	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.





LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	CANTIDAD (M2)	MEDIDA TOTAL
Del 16 al 22 de junio					
BOSTON - ENCISO		8,94	2,23	19,9362	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37		0,78	1,35	1,053	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37		2,28	1,6	3,648	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37		0,81	1,45	1,1745	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37		6,876	1,7	11,6892	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37		0,81	1	0,81	
MENOS CAJAS				-3,19	**35,12**
Del 30 de junio al 06 de julio					
BOSTON - ENCISO					
CR 36A - CL 54 Y 58		22,00	1,45	31,90	**31,90**
Del 7 al 13 de julio					
LA CANDELARIA - BOSTON					
CLL 54 - CR 41 Y CR 40		4,97	2,20	10,93	
CLL 54 - CR 41 Y CR 40		3,30	2,20	7,26	
CLL 54 - CR 41 Y CR 40		6,20	2,20	13,64	**31,83**
Del 14 al 20 de julio					
BOSTON - ENCISO					
CR 36A - CLL 54 Y 58		1,30	1,50	1,95	
CR 36A - CLL 54 Y 58		3,00	5,10	15,30	**17,25**
Del 21 al 27 de julio					
BOSTON - ENCISO					
CR 36A - CLL 54 Y 58		1,36	0,90	1,22	**1,22**
Subtotal					**117,33**
TOTAL					**117,33**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	4
FECHA	DD	3	MM	8	AA	2025	PERÍODO	16/06/2025 - 3/08/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
CONTRATO No	4600102792 DE 2024 — FECHA DE INICIO

ÍTEM	2.4	DESCRIPCIÓN	Retiro de: tapas de medidores de acueducto cualquier diámetro, tapas de energía, tapas cajas de teléfonos.	UNID.	Und	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.








LOCALIZACIÓN	CANTIDAD (UND)	CANTIDAD TOTAL
Del 16 al 22 de junio		
POBLADO - LAS LOMAS	6,00	**6,00**
POBLADO - FLORIDA	4,00	**4,00**
BOMBONÀ I	14,00	**14,00**
LA CANDELARIA - BOSTON	21,00	**21,00**
BOSTON - ENCISO	17,00	**17,00**
Del 23 al 29 de junio		
POBLADO - LAS LOMAS	14,00	**14,00**
BOMBONÀ I	19,00	**19,00**
LA CANDELARIA - BOSTON	15,00	**15,00**
Del 30 de junio al 06 de julio		
POBLADO - LAS LOMAS	2,00	**2,00**
BOMBONÀ I	26,00	**26,00**
BOSTON - ENCISO	5,00	**5,00**
LA CANDELARIA - BOSTON	12,00	**12,00**
Del 7 al 13 de julio		
POBLADO - LAS LOMAS		
CLL 11B - CR 34 Y CLL 11A	5,00	**5,00**
CR 31A - CLL 11A Y 11	10,00	**10,00**
SAN DIEGO		
CLL 31 - CR 42B Y 42A	2,00	**2,00**
BOMBONÀ I		
CR 38 - CLL 49A Y 48	31,00	**31,00**
BOSTON - ENCISO		
CR 36A - CLL 54 Y 58	5,00	**5,00**
LA CANDELARIA - BOSTON		
CLL 54 - CR 41 Y CR 40	5,00	**5,00**
Del 14 al 20 de julio		
SAN DIEGO		
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS	2,00	**2,00**
CLL 31 - CR 42B Y 42A	2,00	**2,00**
BOMBONÀ I		
CR 38 - CLL 49A Y 48	3,00	**3,00**
CLL 49A - CR 37 Y 38	19,00	**19,00**
LA CANDELARIA - BOSTON		
CLL 54 - CR 41 Y CR 40	5,00	**5,00**
BOSTON - ENCISO		
CR 36A - CLL 54 Y 58	2,00	**2,00**
Del 21 al 27 de julio		
SAN DIEGO		
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS	9,00	**9,00**
POBLADO - LAS LOMAS		
CR 31A - CLL 11A Y 11	7,00	**7,00**
BOMBONÀ I		
CLL 49A - CR 37 Y 38	38,00	**38,00**
CR 38 - CLL 49A Y 48	15,00	**15,00**

BOSTON - ENCISO		
CR 36A - CLL 54 Y 58	10,00	**10,00**
LA CANDELARIA - BOSTON		
CLL 54 - CR 41 Y CR 40	1,00	**1,00**
Del 28 de julio al 03 de agosto		
SAN DIEGO		
CL 31 CR 42B Y 42A	3,00	**3,00**
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS	3,00	**3,00**
POBLADO - LAS LOMAS		
CR 31A - CLL 11A Y 11	2,00	**2,00**
BOMBONÁ I		
CLL 49A - CR 37 Y 38	14,00	**14,00**
LA CANDELARIA - BOSTON		
CLL 54 - CR 41 Y CR 40	1,00	**1,00**
Subtotal		**349,00**
TOTAL		**349,00**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA Nº	5
FECHA	DD	3	MM	8	AA	2025	PERÍODO	16/06/2025 - 3/08/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
CONTRATO No	4600102792 DE 2024 — FECHA DE INICIO

ÍTEM	3.1.1	DESCRIPCIÓN	EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo DE 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, volumen inferior a 0.30 m³. Su medida será en el sitio. No incluye entibado.	UNID.	m3	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.








LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES ESPESOR	CANTIDAD (M3)	MEDIDA TOTAL
Del 16 al 22 de junio						
POBLADO - FLORIDA						
CLL 5G - CR 33		12,20	1,50	0,15	2,75	
CLL 5G - CR 33		14,80	1,25	0,15	2,78	**5,52**
BOMBONÁ I						
CL 49A - CR 37 Y 38		5,80	4,90	0,15	4,26	
CL 49A - CR 37 Y 38		3,43	2,80	0,40	3,84	
CL 49A - CR 37 Y 38		10,17	2,15	0,15	3,28	
CL 49A - CR 37 Y 38		1,78	1,81	0,15	0,48	
CL 49A - CR 37 Y 38		5,48	1,95	0,15	1,60	
CL 49A - CR 37 Y 38		32,05	2,40	0,15	11,54	
CL 49A - CR 37 Y 38		2,93	2,38	0,15	1,05	
MENOS CAJAS					-0,03	**26,02**
LA CANDELARIA - BOSTON						
CR 40 - CL 54 Y 56		17,37	2,22	0,15	5,78	
CR 40 - CL 54 Y 56		4,98	2,41	0,15	1,80	
CR 40 - CL 54 Y 56		5,06	2,41	0,15	1,83	
CR 40 - CL 54 Y 56		10,37	2,35	0,15	3,66	
CR 40 - CL 54 Y 56		3,79	2,30	0,15	1,31	
CR 40 - CL 54 Y 56		7,61	2,35	0,15	2,68	
CR 40 - CL 54 Y 56		17,15	2,30	0,15	5,92	
MENOS CAJAS					-1,01	**21,97**
BOSTON - ENCISO						
CLL 57 - CR 36A Y CR 37		8,94	2,23	0,50	9,97	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37		0,78	1,35	0,50	0,53	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37		2,28	1,60	0,50	1,82	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37		0,81	1,45	0,50	0,59	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37		6,88	1,70	0,50	5,84	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37		0,81	1,00	0,50	0,41	
MENOS CAJAS					-1,60	**17,56**
Del 23 al 29 de junio						
POBLADO - LAS LOMAS						
CLL 11 - CR 31A Y 30		31,00	1,35	0,10	4,19	**4,19**
BOMBONÁ I						
CR 38 - CLL 49A Y 48		5,70	4,70	0,15	4,02	
CR 38 - CLL 49A Y 48		16,83	2,60	0,15	6,56	
CR 38 - CLL 49A Y 48		9,87	3,55	0,15	5,26	
CR 38 - CLL 49A Y 48		29,08	2,99	0,15	13,04	
MENOS CAJAS					-0,69	**28,19**
LA CANDELARIA - BOSTON						
CR 40 - CL 54 Y 56		9,54	4,79	0,15	6,85	
CR 40 - CL 54 Y 56		19,18	2,02	0,15	5,81	**12,67**
BOSTON - ENCISO						
CLL 57 - CR 36A Y CR 37		3,06	3,44	0,15	1,58	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37		9,57	1,83	0,15	2,63	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37		5,16	1,43	0,15	1,11	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37		4,50	3,40	0,15	2,30	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37		11,07	2,05	0,15	3,40	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37		5,63	1,35	0,15	1,14	**12,15**
Del 30 de junio al 06 de julio						
POBLADO - LAS LOMAS						
CLL 11 - CR 31A Y 30		5,00	3,30	0,25	4,13	**4,13**
LA CANDELARIA - SAN DIEGO						
CLL 31 - CR 42B Y 42A		12,00	1,50	0,15	2,70	
CLL 31 - CR 42B Y 42A		3,30	1,50	0,15	0,74	
CLL 31 - CR 42B Y 42A		0,90	2,40	0,15	0,32	
CLL 31 - CR 42B Y 42A		19,00	1,20	0,15	3,42	
CLL 31 - CR 42B Y 42A		5,90	1,15	0,15	1,02	
CLL 31 - CR 42B Y 42A		5,80	3,30	0,25	4,79	**12,99**
BOMBONÁ I						










CR 38 - CLL 49A Y 48		44,25	2,50	0,15	16,59	
CR 38 - CLL 49A Y 48		1,75	2,60	0,15	0,68	
CR 38 - CLL 49A Y 48		1,92	2,75	0,15	0,79	
CR 38 - CLL 49A Y 48		88,50	0,35	0,30	9,29	
CR 38 - CLL 49A Y 48		40,73	0,35	0,50	7,13	
CR 38 - CLL 49A Y 48		61,70	0,35	0,30	6,48	
CR 38 - CLL 49A Y 48		47,70	0,35	0,50	8,35	
CR 38 - CLL 49A Y 48		68,86	0,35	0,30	7,23	
CR 38 - CLL 49A Y 48		19,20	3,50	0,15	10,08	
CR 38 - CLL 49A Y 48		19,20	0,35	0,50	3,36	
CR 38 - CLL 49A Y 48		26,70	0,35	0,30	2,80	
CR 38 - CLL 49A Y 48		24,38	0,35	0,30	2,56	
CR 38 - CLL 49A Y 48		105,89	0,35	0,50	18,53	
CR 38 - CLL 49A Y 48		5,31	3,62	0,15	2,88	
CR 38 - CLL 49A Y 48		18,65	1,15	0,15	3,22	
CR 38 - CLL 49A Y 48		23,96	0,35	0,30	2,52	
MENOS CAJAS					-1,03	**101,47**
BOSTON - ENCISO						
CR 36A - CL 54 Y 58		22,00	1,45	0,10	3,19	**3,19**
LA CANDELARIA - BOSTON						
CL 54 - CR 41 Y 40		15,40	2,40	0,15	5,54	
CL 54 - CR 41 Y 40		9,00	1,20	0,10	1,08	
CL 54 - CR 41 Y 40		4,34	1,75	0,15	1,14	**7,76**
Del 7 al 13 de julio						
SAN DIEGO						
CLL 31 - CR 42B Y 42A		50,00	1,10	0,10	5,50	
CLL 31 - CR 42B Y 42A		7,10	2,60	0,10	1,85	
CLL 31 - CR 42B Y 42A		11,60	9,80	0,10	11,37	
MENOS CAJAS					-0,22	**18,49**
BOMBONÁ I						
CLL 49A - CR 37 Y 38		3,04	2,33	0,15	1,06	
CLL 49A - CR 37 Y 38		5,33	4,70	0,15	3,76	
CLL 49A - CR 37 Y 38		3,19	2,45	0,15	1,17	
CLL 49A - CR 37 Y 38		2,90	4,82	0,15	2,10	
CLL 49A - CR 37 Y 38		1,64	2,35	0,15	0,58	
MENOS CAJAS					-0,19	**8,48**
CR 38 - CLL 49A Y 48		24,00	1,50	0,15	5,40	
CR 38 - CLL 49A Y 48		3,63	6,80	0,15	3,70	
CR 38 - CLL 49A Y 48		10,65	3,63	0,15	5,80	
CR 38 - CLL 49A Y 48		6,52	4,07	0,15	3,98	
CR 38 - CLL 49A Y 48		51,91	1,09	0,15	8,49	
MENOS CAJAS					-1,37	**26,00**
BOSTON - ENCISO						
CR 36A - CLL 54 Y 58		22,50	1,45	0,15	4,89	
CR 36A - CLL 54 Y 58		21,00	1,85	0,15	5,83	
CR 36A - CLL 54 Y 58		44,50	0,60	0,50	13,35	**24,07**
LA CANDELARIA - BOSTON						
CLL 54 - CR 41 Y CR 40		4,00	2,20	0,15	1,32	
CLL 54 - CR 41 Y CR 40		3,85	2,20	0,15	1,27	
CLL 54 - CR 41 Y CR 40		2,55	2,20	0,15	0,84	
CLL 54 - CR 41 Y CR 40		1,68	2,20	0,15	0,55	
CLL 54 - CR 41 Y CR 40		1,68	2,20	0,15	0,55	**4,54**
Del 14 al 20 de julio						
SAN DIEGO						
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS		2,20	2,40	0,12	0,63	
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS		9,80	2,40	0,12	2,82	
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS		61,40	1,20	0,12	8,84	
MENOS CAJAS					-0,10	**12,20**
CLL 31 - CR 42B Y 42A		5,74	2,50	0,13	1,87	
CLL 31 - CR 42B Y 42A		7,20	1,20	0,13	1,12	
CLL 31 - CR 42B Y 42A		2,88	1,00	0,13	0,37	
CLL 31 - CR 42B Y 42A		10,00	2,00	0,13	2,60	
CLL 31 - CR 42B Y 42A		15,93	1,00	0,13	2,07	
CLL 31 - CR 42B Y 42A		8,64	1,00	0,13	1,12	
CLL 31 - CR 42B Y 42A		6,80	1,00	0,13	0,88	
CLL 31 - CR 42B Y 42A		3,30	2,50	0,13	1,07	
CLL 31 - CR 42B Y 42A		35,50	1,20	0,13	5,54	
CLL 31 - CR 42B Y 42A		14,40	1,20	0,13	2,25	
CLL 31 - CR 42B Y 42A		16,20	1,00	0,13	2,11	
CLL 31 - CR 42B Y 42A		59,05	1,00	0,13	7,68	
MENOS CAJAS					-0,09	**28,59**
BOMBONÁ I						
CR 38 - CLL 49A Y 48		11,60	1,50	0,15	2,61	
CR 38 - CLL 49A Y 48		1,90	1,50	0,15	0,43	





CR 38 - CLL 49A Y 48		37,50	0,35	0,30	3,94	**6,98**
CLL 49A - CR 37 Y 38		74,02	1,10	0,15	12,21	
CLL 49A - CR 37 Y 38		74,02	0,35	0,30	7,77	
MENOS CAJAS					-0,63	**19,36**
BOSTON - ENCISO						
CR 36A - CLL 54 Y 58		1,20	1,35	0,15	0,24	
CR 36A - CLL 54 Y 58		5,20	1,40	0,15	1,09	
CR 36A - CLL 54 Y 58		3,00	2,20	0,15	0,99	
CR 36A - CLL 54 Y 58		3,00	5,10	0,05	0,77	
MENOS CAJAS					-0,38	**2,71**
BOMBONÁ II						
CR 9A - CLL 44AA 45		5,60	1,85	0,13	1,35	**1,35**
Del 21 al 27 de julio						
SAN DIEGO						
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS		7,00	3,00	0,15	3,15	
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS		49,00	1,70	0,15	12,50	
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS		5,30	5,00	0,15	3,98	
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS		5,10	2,75	0,15	2,10	
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS		20,20	1,19	0,15	3,61	**25,33**
BOMBONÁ I						
CLL 49A - CR 37 Y 38		9,90	3,30	0,15	4,90	
CLL 49A - CR 37 Y 38		11,04	1,02	0,15	1,69	
CLL 49A - CR 37 Y 38		1,15	2,34	0,15	0,40	
CLL 49A - CR 37 Y 38		10,50	1,30	0,15	2,05	
CLL 49A - CR 37 Y 38		3,12	3,46	0,15	1,62	
CLL 49A - CR 37 Y 38		1,70	1,05	0,15	0,27	
CLL 49A - CR 37 Y 38		1,70	1,07	0,15	0,27	
CLL 49A - CR 37 Y 38		1,97	3,60	0,15	1,06	
CLL 49A - CR 37 Y 38		1,12	2,35	0,15	0,39	
CLL 49A - CR 37 Y 38		4,90	3,55	0,15	2,61	
CLL 49A - CR 37 Y 38		0,80	1,10	0,15	0,13	
CLL 49A - CR 37 Y 38		0,80	1,55	0,15	0,19	
CLL 49A - CR 37 Y 38		5,30	3,35	0,15	2,66	
CLL 49A - CR 37 Y 38		4,70	1,70	0,15	1,20	
CLL 49A - CR 37 Y 38		28,17	0,35	0,30	2,96	
CLL 49A - CR 37 Y 38		69,30	1,40	0,15	14,55	
CLL 49A - CR 37 Y 38		17,04	3,55	0,15	9,07	
CLL 49A - CR 37 Y 38		4,98	1,94	0,15	1,45	
CLL 49A - CR 37 Y 38		9,06	2,04	0,15	2,77	
CLL 49A - CR 37 Y 38		100,38	0,35	0,30	10,54	**60,79**
CR 38 - CLL 49A Y 48		12,50	4,00	0,15	7,50	
CR 38 - CLL 49A Y 48		13,18	3,96	0,15	7,83	
CR 38 - CLL 49A Y 48		49,65	0,30	0,15	2,23	
CR 38 - CLL 49A Y 48		20,00	1,50	0,15	4,50	**22,06**
BOSTON - ENCISO						
CR 36A - CLL 54 Y 58		1,40	1,40	0,15	0,29	
CR 36A - CLL 54 Y 58		1,20	1,20	0,15	0,22	
CR 36A - CLL 54 Y 58		3,10	1,20	0,15	0,56	
CR 36A - CLL 54 Y 58		1,20	1,40	0,15	0,25	
CR 36A - CLL 54 Y 58		10,00	1,30	0,15	1,95	
CR 36A - CLL 54 Y 58		1,40	1,20	0,15	0,25	
CR 36A - CLL 54 Y 58		4,30	1,40	0,15	0,90	
CR 36A - CLL 54 Y 58		3,80	1,30	0,15	0,74	
CR 36A - CLL 54 Y 58		3,60	1,80	0,15	0,97	**6,14**
LA AMÉRICA - FERRINI						
Excavación para instalación de madera plástica		11,80	1,98	0,05	1,17	**1,17**
LAURELES - ACACIAS						
Excavación para instalación de madera plástica		4,70	1,32	0,05	0,31	**0,31**
POBLADO - FLORIDA						
Demolición para instalación de madera plástica		1,20	1,10	0,05	0,07	**0,07**
Del 28 de julio al 03 de agosto						
SAN DIEGO						
CL 31 CR 42B Y 42A		4,10	1,10	0,15	0,68	
CL 31 CR 42B Y 42A		2,00	2,50	0,15	0,75	
CL 31 CR 42B Y 42A		2,25	1,95	0,15	0,66	
CL 31 CR 42B Y 42A		11,20	1,25	0,15	2,10	
CL 31 CR 42B Y 42A		4,00	2,10	0,15	1,26	
CL 31 CR 42B Y 42A		20,90	1,10	0,15	3,45	
CL 31 CR 42B Y 42A		2,60	2,40	0,15	0,94	
CL 31 CR 42B Y 42A		8,00	2,50	0,25	5,00	
MENOS CAJAS					-0,22	**14,61**
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS		6,43	2,22	0,10	1,43	
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS		64,00	1,10	0,10	7,04	**8,47**
BOMBONÁ I						
CLL 49A - CR 37 Y 38		40,00	1,40	0,15	8,40	
CLL 49A - CR 37 Y 38		4,80	2,51	0,15	1,81	
CLL 49A - CR 37 Y 38		12,06	1,30	0,15	2,35	**12,56**
BOSTON - ENCISO						
CR 36A - CLL 54 Y 58		1,30	1,50	0,15	0,29	**0,29**
	Subtotal					**562,35**
TOTAL						**562,35**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	8
FECHA	DD	3	MM	8	AA	2025	PERÍODO	16/06/2025 - 3/08/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	

ÍTEM	3.2.1	DESCRIPCIÓN	LLENOS EN ARENILLA compactados mecánicamente hasta obtener una densidad mínima del 98%, de la máxima obtenida en el ensayo del proctor modificado. Incluye: el suministro, transporte, colocación de la arenilla, la compactación de la misma y transporte interno. Y su medida será en sitio ya compactado.	UNID.	m3	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.








LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES ESPESOR	CANTIDAD (M3)	MEDIDA TOTAL
Del 16 al 22 de junio						
POBLADO - FLORIDA						
CLL 5G - CR 33		87.90	0.80	0.20	14.06	
CLL 5G - CR 33		8.00	1.67	0.30	4.01	
CLL 5G - CR 33		5.60	0.30	0.30	0.50	
CLL 5G - CR 33		4.80	1.10	0.30	1.58	
CLL 5G - CR 33		4.00	0.40	0.30	0.48	**20,64**
Del 23 al 29 de junio						
BOSTON - ENCISO						
CLL 57 - CR 36A Y CR 37		8.40	1.32	0.25	2.77	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37		9.60	1.42	0.25	3.41	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37		2.10	1.43	0.25	0.75	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37		1.26	1.38	0.25	0.43	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37		7.00	1.44	0.25	2.52	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37		7.00	1.47	0.25	2.57	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37		8.00	1.50	0.25	2.25	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37		7.00	1.30	0.25	2.28	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37		5.32	1.63	0.25	2.17	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37		1.26	1.56	0.25	0.49	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37		5.00	1.50	0.25	1.88	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37		2.10	1.45	0.25	0.76	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37		2.54	1.44	0.25	0.91	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37		3.20	1.32	0.25	1.06	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37		1.40	0.92	0.25	0.32	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37		5.85	0.99	0.25	1.45	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37		8.40	1.13	0.25	2.37	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37		8.73	1.30	0.25	2.84	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37		0.98	1.35	0.25	0.33	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37		4.20	1.38	0.25	1.45	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37		2.47	1.32	0.25	0.82	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37		3.31	1.29	0.25	1.07	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37		8.30	1.30	0.25	2.70	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37		5.00	1.22	0.25	1.53	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37		2.47	1.66	0.25	1.03	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37		3.19	1.57	0.25	1.25	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37		2.46	1.42	0.25	0.87	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37		10.70	1.42	0.25	3.80	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37		9.52	1.52	0.25	3.62	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37		10.20	1.57	0.25	4.00	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37		1.21	1.59	0.25	0.48	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37		2.42	1.70	0.25	1.03	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37		7.76	1.51	0.25	2.93	**58,12**
Del 30 de junio al 06 de julio						
POBLADO - FLORIDA						
CLL 5G - CR 33		45.00	2.00	0.15	13.50	
CLL 5G - CR 33		9.80	1.50	0.12	1.76	
CLL 5G - CR 33		16.70	1.00	0.20	3.34	
CLL 5G - CR 33		35.00	1.20	0.30	12.60	
CLL 5G - CR 33		25.40	2.00	0.35	17.78	
CLL 5G - CR 33		12.00	1.50	0.20	3.60	**52,58**
Del 7 al 13 de julio						
POBLADO - LAS LOMAS						
CLL 11B - CR 34 Y CLL 11A		3.79	0.50	0.45	0.85	
CLL 11B - CR 34 Y CLL 11A		1.70	2.00	0.35	1.19	
CLL 11B - CR 34 Y CLL 11A		13.00	0.95	0.35	4.32	
CLL 11B - CR 34 Y CLL 11A		8.65	0.85	0.35	2.57	
CLL 11B - CR 34 Y CLL 11A		2.40	0.85	0.20	0.41	
CLL 11B - CR 34 Y CLL 11A		3.80	0.85	0.35	1.13	
CLL 11B - CR 34 Y CLL 11A		5.00	0.90	0.45	2.03	
CLL 11B - CR 34 Y CLL 11A		9.00	0.90	0.15	1.22	
CLL 11B - CR 34 Y CLL 11A		8.20	0.95	0.40	3.12	
CLL 11B - CR 34 Y CLL 11A		4.50	0.95	0.20	0.86	
CLL 11B - CR 34 Y CLL 11A		6.60	0.95	1.00	6.27	
CLL 11B - CR 34 Y CLL 11A		7.50	0.90	0.35	2.36	
CLL 11B - CR 34 Y CLL 11A		9.50	0.90	0.25	2.14	
CLL 11B - CR 34 Y CLL 11A		13.00	0.80	0.25	2.60	
CLL 11B - CR 34 Y CLL 11A		23.40	1.00	0.35	8.19	**39,25**
CLL 11 - CR 31A Y 30		1.40	0.94	0.30	0.39	
CLL 11 - CR 31A Y 30		0.80	0.90	0.25	0.18	
CLL 11 - CR 31A Y 30		0.98	0.84	0.35	0.29	
CLL 11 - CR 31A Y 30		0.80	1.10	0.32	0.28	
CLL 11 - CR 31A Y 30		1.94	1.10	0.32	0.68	
CLL 11 - CR 31A Y 30		32.00	0.70	0.45	10.08	
CLL 11 - CR 31A Y 30		42.00	0.70	0.25	7.35	
CLL 11 - CR 31A Y 30		0.94	1.70	0.35	0.56	**19,82**
CR 31A - CLL 11A Y 11		1.40	0.94	0.30	0.39	
CR 31A - CLL 11A Y 11		0.80	0.90	0.25	0.18	
CR 31A - CLL 11A Y 11		0.98	0.84	0.35	0.29	

CR 31A - CLL 11A Y 11		0,80	1,10	0,32	0,28	
CR 31A - CLL 11A Y 11		1,94	1,10	0,32	0,68	
CR 31A - CLL 11A Y 11		9,94	1,70	0,35	0,56	
CR 31A - CLL 11A Y 11		32,00	0,70	0,45	10,08	
CR 31A - CLL 11A Y 11		42,00	0,70	0,25	7,35	
CR 31A - CLL 11A Y 11		31,00	1,00	0,28	8,68	
CR 31A - CLL 11A Y 11		45,00	1,00	0,36	16,20	
CR 31A - CLL 11A Y 11		12,10	1,00	0,27	3,27	
CR 31A - CLL 11A Y 11		32,00	1,00	0,31	9,92	
CR 31A - CLL 11A Y 11		2,15	1,00	0,29	0,62	
CR 31A - CLL 11A Y 11		0,70	0,85	0,39	0,23	
CR 31A - CLL 11A Y 11		2,00	1,30	0,48	1,25	**59,99**
Del 21 al 27 de julio						
POBLADO - LAS LOMAS						
CR 31A - CLL 11A Y 11		69,00	1,20	0,35	28,98	**28,98**
CLL 11B - CR 34 Y CLL 11A		46,00	1,00	0,35	16,10	
CLL 11B - CR 34 Y CLL 11A		28,70	1,20	0,25	8,61	**24,71**
LA CANDELARIA - BOSTON						
CLL 54 - CR 41 Y CR 40		6,80	1,45	0,30	2,96	
CLL 54 - CR 41 Y CR 40		14,80	1,42	0,30	6,30	
CLL 54 - CR 41 Y CR 40		6,20	2,50	0,32	4,96	
CLL 54 - CR 41 Y CR 40		2,04	2,04	0,20	0,83	
CLL 54 - CR 41 Y CR 40		2,94	2,03	0,30	1,79	
CLL 54 - CR 41 Y CR 40		2,07	0,67	0,40	0,55	
CLL 54 - CR 41 Y CR 40		2,28	0,30	0,35	0,24	
CLL 54 - CR 41 Y CR 40		1,18	1,70	0,30	0,60	
CLL 54 - CR 41 Y CR 40		9,45	0,15	0,36	0,51	
CLL 54 - CR 41 Y CR 40		2,20	3,65	0,30	2,41	
CLL 54 - CR 41 Y CR 40		19,00	1,52	0,30	8,66	
CLL 54 - CR 41 Y CR 40		4,30	0,20	0,40	0,34	
CLL 54 - CR 41 Y CR 40		2,12	10,41	0,31	6,84	
CLL 54 - CR 41 Y CR 40		11,75	2,05	0,30	7,23	
CLL 54 - CR 41 Y CR 40		15,40	0,20	0,40	1,23	
CLL 54 - CR 41 Y CR 40		8,90	0,15	0,35	0,47	
CLL 54 - CR 41 Y CR 40		23,70	1,31	0,30	9,31	
CLL 54 - CR 41 Y CR 40		12,70	1,64	0,32	6,66	
CLL 54 - CR 41 Y CR 40		2,50	1,25	0,30	0,94	
CLL 54 - CR 41 Y CR 40		1,77	1,27	0,30	0,67	
CLL 54 - CR 41 Y CR 40		2,45	1,23	0,25	0,75	
CLL 54 - CR 41 Y CR 40		2,40	1,44	0,30	1,04	
CLL 54 - CR 41 Y CR 40		1,40	11,80	0,30	4,96	**70,27**
Del 28 de julio al 03 de agosto						
SAN DIEGO						
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS		5,50	1,30	2,50	17,88	**17,88**
				Subtotal		**392,24**
				TOTAL		**392,24**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	INTERVENTORIA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA							CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA Nº	7
FECHA	DD	3	MM	8	AA	2025	PERÍODO	16/06/2025 - 3/08/2025	ELABORÓ		ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	

ÍTEM	3.2.2	DESCRIPCIÓN	Suministro, transporte y colocación de subbase granular de máximo Ø 2½", reacomodado con medios MECÁNICOS y compactado al 100% mínimo del ensayo del proctor modificado según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado.	UNID.	m3	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.











LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES ESPESOR	CANTIDAD (M3)	MEDIDA TOTAL
Del 16 al 22 de junio						
POBLADO - LAS LOMAS						
CR 31A - CLL 11A Y 11		11.20	1.50	0.15	2.52	2,52
CLL 11 - CR 31A Y 30		24.00	2.50	0.15	9.00	
CLL 11 - CR 31A Y 30		7.70	2.50	0.15	2.89	
CLL 11 - CR 31A Y 30		90.40	0.30	0.15	4.07	
CLL 11 - CR 31A Y 30		7.70	0.30	0.20	0.46	
CLL 11 - CR 31A Y 30		31.00	1.35	0.10	4.19	
CLL 11 - CR 31A Y 30		7.70	1.00	0.15	1.16	
MENOS CAJAS					-0.32	21,44
CLL 11B - CR 34 Y CL 11A		12.00	1.30	0.15	2.34	
CLL 11B - CR 34 Y CL 11A		5.60	1.10	0.15	0.96	
CLL 11B - CR 34 Y CL 11A		9.00	2.35	0.15	3.17	
CLL 11B - CR 34 Y CL 11A		10.00	2.35	0.15	3.53	
CLL 11B - CR 34 Y CL 11A		3.60	1.30	0.15	0.68	
CLL 11B - CR 34 Y CL 11A		3.00	2.35	0.15	1.06	
MENOS CAJAS					-0.15	11,59
POBLADO - FLORIDA						
CLL 5G - CR 33		12.20	1.50	0.15	2.75	
CLL 5G - CR 33		14.80	1.25	0.15	2.78	5,52
BOMBONÁ I						
CL 49A - CR 37 Y 38		5.80	4.90	0.15	4.26	
CL 49A - CR 37 Y 38		3.43	2.80	0.40	3.84	
CL 49A - CR 37 Y 38		9.50	4.81	0.15	6.85	
CL 49A - CR 37 Y 38		6.80	2.52	0.15	2.49	
CL 49A - CR 37 Y 38		1.20	2.40	0.15	0.43	
CL 49A - CR 37 Y 38		6.54	2.66	0.15	2.61	
CL 49A - CR 37 Y 38		3.73	3.25	0.15	1.82	
CL 49A - CR 37 Y 38		5.55	2.25	0.15	1.67	
CL 49A - CR 37 Y 38		8.64	4.80	0.15	6.36	
CL 49A - CR 37 Y 38		6.93	2.26	0.15	2.35	
MENOS CAJAS					-0.76	32,14
LA CANDELARIA - BOSTON						
CR 40 - CL 54 Y 56		17.37	2.22	0.15	5.78	
CR 40 - CL 54 Y 56		4.98	2.41	0.15	1.80	
CR 40 - CL 54 Y 56		5.06	2.41	0.15	1.83	
CR 40 - CL 54 Y 56		10.37	2.35	0.15	3.66	
CR 40 - CL 54 Y 56		3.79	2.30	0.15	1.31	
CR 40 - CL 54 Y 56		7.61	2.35	0.15	2.68	
CR 40 - CL 54 Y 56		17.15	2.30	0.15	5.92	
MENOS CAJAS					-1.01	21,97
BOSTON - ENCISO						
CLL 57 - CR 36A Y CR 37		8.94	2.23	0.50	9.97	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37		0.78	1.36	0.50	0.53	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37		2.28	1.60	0.50	1.82	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37		0.81	1.45	0.50	0.59	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37		6.88	1.70	0.50	5.84	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37		0.81	1.00	0.50	0.41	
MENOS CAJAS					-1.60	17,56
Del 23 al 29 de junio						
POBLADO - LAS LOMAS						
CLL 11 - CR 31A Y 30		2.60	2.60	0.15	1.01	
CLL 11 - CR 31A Y 30		5.00	3.30	0.15	2.48	
CLL 11 - CR 31A Y 30		33.20	1.50	0.15	7.47	
CLL 11 - CR 31A Y 30					-0.33	10,63
MENOS CAJAS						
CLL 11B - CR 34 Y CL 11A		60.00	1.40	0.15	12.60	
CLL 11B - CR 34 Y CL 11A		20.00	1.50	0.15	4.50	
CLL 11B - CR 34 Y CL 11A		18.00	1.50	0.15	4.05	
CLL 11B - CR 34 Y CL 11A		6.38	2.95	0.15	2.82	
MENOS CAJAS					-0.25	23,72
BOMBONÁ I						
CR 38 - CLL 49A Y 48		10.17	2.15	0.10	2.19	
CR 38 - CLL 49A Y 48		1.78	1.81	0.10	0.32	
CR 38 - CLL 49A Y 48		5.48	1.95	0.10	1.07	
CR 38 - CLL 49A Y 48		32.05	2.40	0.10	7.69	
CR 38 - CLL 49A Y 48		2.93	2.38	0.10	0.70	
CR 38 - CLL 49A Y 48		5.70	4.70	0.15	4.02	
CR 38 - CLL 49A Y 48		16.83	2.60	0.15	6.56	
CR 38 - CLL 49A Y 48		9.87	3.55	0.15	5.26	
CR 38 - CLL 49A Y 48		29.08	2.99	0.15	13.04	
MENOS CAJAS					-0.70	40,15
LA CANDELARIA - BOSTON						
CR 40 - CL 54 Y 56		9.54	4.79	0.15	6.85	
CR 40 - CL 54 Y 56		19.18	2.02	0.15	5.81	12,67
BOSTON - ENCISO						
CLL 57 - CR 36A Y CR 37		3.06	3.44	0.15	1.58	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37		9.57	1.83	0.15	2.63	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37		5.16	1.43	0.15	1.11	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37		4.50	3.40	0.15	2.30	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37		11.07	2.05	0.15	3.40	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37		5.63	1.35	0.15	1.14	12,15
Del 30 de junio al 06 de julio						

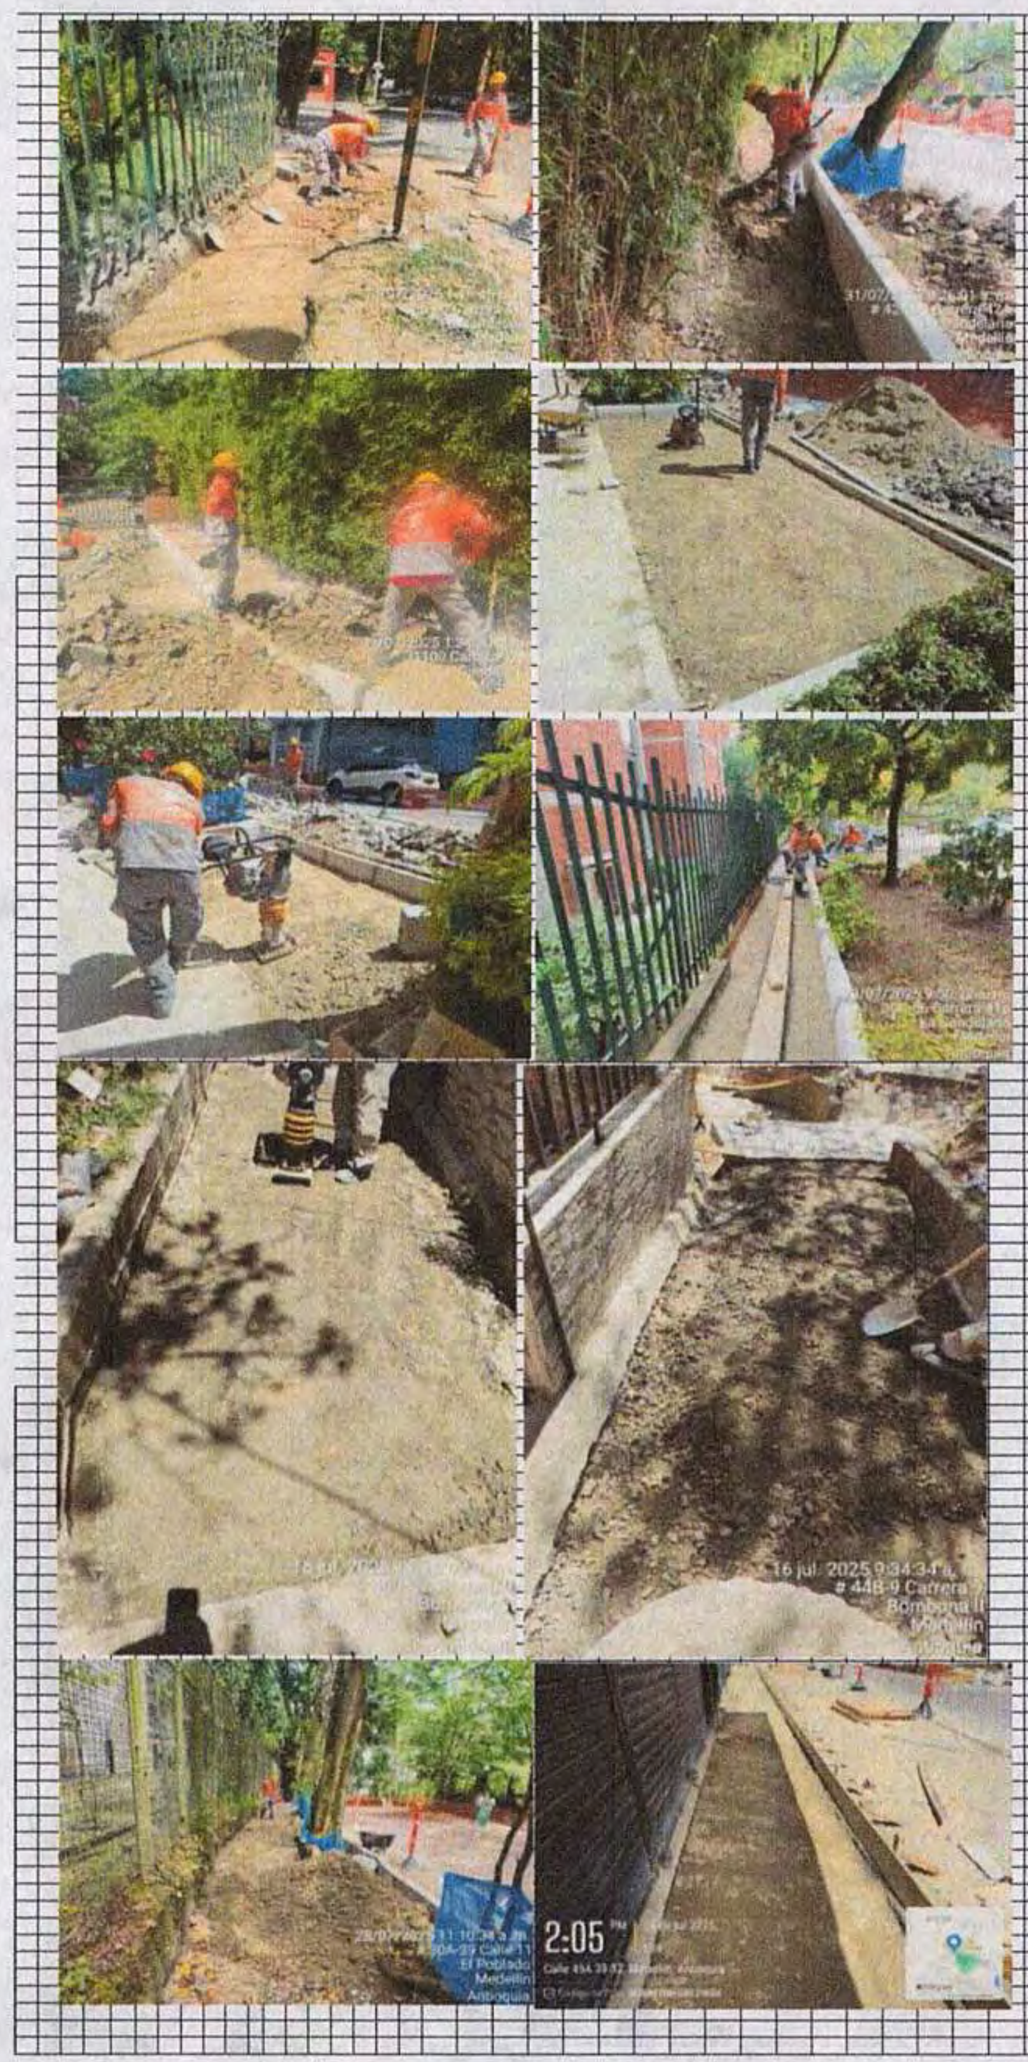

POBLADO - LAS LOMAS						
CLL 11 - CR 31A Y 30		5,00	3,30	0,15	2,48	**2,48**
CR 31A - CLL 11A Y 11		3,50	2,74	0,15	1,44	
CR 31A - CLL 11A Y 11		2,10	1,50	0,15	0,47	
CR 31A - CLL 11A Y 11		4,60	2,90	0,15	2,00	
CR 31A - CLL 11A Y 11		2,10	1,50	0,15	0,47	
CR 31A - CLL 11A Y 11		10,00	3,70	0,15	5,55	
CR 31A - CLL 11A Y 11		5,50	2,94	0,15	2,43	
MENOS CAJAS					-0,04	**12,32**
LA CANDELARIA - SAN DIEGO						
CLL 31 - CR 42B Y 42A		12,00	1,50	0,15	2,70	
CLL 31 - CR 42B Y 42A		3,30	1,50	0,15	0,74	
CLL 31 - CR 42B Y 42A		0,90	2,40	0,15	0,32	
CLL 31 - CR 42B Y 42A		19,00	1,20	0,15	3,42	
CLL 31 - CR 42B Y 42A		5,90	1,15	0,15	1,02	
CLL 31 - CR 42B Y 42A		5,60	3,30	0,15	2,87	**11,08**
BOMBONA I						
CR 38 - CLL 49A Y 48		44,25	2,50	0,15	16,59	
CR 38 - CLL 49A Y 48		1,75	2,60	0,15	0,68	
CR 38 - CLL 49A Y 48		1,92	2,75	0,15	0,79	
CR 38 - CLL 49A Y 48		19,20	3,50	0,15	10,08	
MENOS CAJAS					-1,03	**27,12**
BOSTON - ENCISO						
CR 36A - CL 54 Y 58		22,00	1,45	0,20	6,38	**6,38**
LA CANDELARIA - BOSTON						
CL 54 - CR 41 Y 40		15,40	2,20	0,15	5,08	
CL 54 - CR 41 Y 40		15,40	0,25	0,20	0,77	
CL 54 - CR 41 Y 40		4,34	1,75	0,15	1,14	**6,99**
Del 7 al 13 de julio						
POBLADO - LAS LOMAS						
CLL 11B - CR 34 Y CLL 11A		6,50	2,30	0,15	2,24	
CLL 11B - CR 34 Y CLL 11A		12,20	1,38	0,15	2,53	
CLL 11B - CR 34 Y CLL 11A		6,00	1,10	0,15	1,32	
CLL 11B - CR 34 Y CLL 11A		5,13	1,60	0,15	1,23	
CLL 11B - CR 34 Y CLL 11A		28,70	1,26	0,15	5,38	
MENOS CAJAS					-0,28	**12,42**
CLL 11 - CR 31A Y 30		5,00	3,30	0,45	7,43	**7,43**
CR 31A - CLL 11A Y 11		2,00	2,00	0,25	1,00	
CR 31A - CLL 11A Y 11		28,00	1,45	0,25	10,15	
CR 31A - CLL 11A Y 11		17,00	2,85	0,25	12,11	
CR 31A - CLL 11A Y 11		69,00	1,50	0,05	5,18	
MENOS CAJAS					-0,44	**28,00**
SAN DIEGO						
CLL 31 - CR 42B Y 42A		60,00	1,10	0,15	8,25	
CLL 31 - CR 42B Y 42A		7,10	2,60	0,15	2,77	
CLL 31 - CR 42B Y 42A		11,60	9,80	0,15	17,05	
MENOS CAJAS					-0,33	**27,74**
BOMBONA I						
CLL 49A - CR 37 Y 38		3,04	2,33	0,15	1,06	
CLL 49A - CR 37 Y 38		5,33	4,70	0,15	3,76	
CLL 49A - CR 37 Y 38		3,19	2,45	0,15	1,17	
CLL 49A - CR 37 Y 38		2,90	4,82	0,15	2,10	
CLL 49A - CR 37 Y 38		1,64	2,35	0,15	0,58	
CLL 49A - CR 37 Y 38		3,63	6,80	0,15	3,70	
CLL 49A - CR 37 Y 38		5,31	3,92	0,15	2,86	
MENOS CAJAS					-0,67	**14,59**
CR 38 - CLL 49A Y 48		10,65	3,63	0,15	5,80	
CR 38 - CLL 49A Y 48		6,52	4,07	0,15	3,98	
CR 38 - CLL 49A Y 48		51,91	1,09	0,15	8,49	
CR 38 - CLL 49A Y 48		18,65	1,15	0,15	3,22	
MENOS CAJAS					-0,17	**21,31**
BOSTON - ENCISO						
CR 36A - CLL 54 Y 58		22,50	1,45	0,15	4,89	
CR 36A - CLL 54 Y 58		21,00	1,85	0,15	5,83	**10,72**
LA CANDELARIA - BOSTON						
CLL 54 - CR 41 Y CR 40		41,55	2,16	0,18	16,15	
CLL 54 - CR 41 Y CR 40		20,60	2,20	0,18	8,16	
CLL 54 - CR 41 Y CR 40		6,60	1,95	0,18	2,32	
CLL 54 - CR 41 Y CR 40		4,97	2,20	0,17	1,86	
CLL 54 - CR 41 Y CR 40		3,30	2,20	0,17	1,23	
CLL 54 - CR 41 Y CR 40		6,20	2,20	0,17	2,32	
CLL 54 - CR 41 Y CR 40		4,00	2,20	0,15	1,32	
CLL 54 - CR 41 Y CR 40		3,85	2,20	0,15	1,27	
CLL 54 - CR 41 Y CR 40		2,55	2,20	0,15	0,84	
CLL 54 - CR 41 Y CR 40		1,68	2,20	0,15	0,55	
CLL 54 - CR 41 Y CR 40		1,68	2,20	0,15	0,55	**36,58**
Del 14 al 20 de julio						
POBLADO - LAS LOMAS						
CR 31A - CLL 11A Y 11		89,00	1,40	0,08	7,73	**7,73**
BOMBONA I						
CR 38 - CLL 49A Y 48		24,00	1,50	0,15	5,40	
CR 38 - CLL 49A Y 48		11,60	1,50	0,15	2,61	
CR 38 - CLL 49A Y 48		1,90	1,50	0,15	0,43	
MENOS CAJAS					-0,71	**7,73**
BOSTON - ENCISO						
CR 36A - CLL 54 Y 58		1,20	1,35	0,15	0,24	
CR 36A - CLL 54 Y 58		5,20	1,40	0,15	1,09	
CR 36A - CLL 54 Y 58		3,00	2,20	0,15	0,99	
CR 36A - CLL 54 Y 58		3,00	5,10	0,05	0,77	
CR 36A - CLL 54 Y 58		17,50	0,20	0,20	0,70	
MENOS CAJAS					-0,38	**3,41**
BOMBONA II						
CR 9A - CLL 44AA 45		5,60	1,85	0,13	1,35	**1,35**
Del 21 al 27 de julio						
SAN DIEGO						
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS		5,74	2,50	0,15	2,15	
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS		7,20	1,20	0,15	1,30	
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS		2,68	1,00	0,15	0,43	
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS		10,00	2,00	0,15	3,00	
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS		15,93	1,00	0,15	2,39	
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS		8,64	1,00	0,15	1,30	
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS		6,80	1,00	0,15	1,02	
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS		3,30	2,50	0,15	1,24	
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS		35,50	1,20	0,15	6,39	
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS		14,40	1,20	0,15	2,59	
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS		16,20	1,00	0,15	2,43	
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS		59,05	1,00	0,15	8,86	
MENOS CAJAS					-0,11	**32,98**
CLL 31 - CR 42B Y 42A		2,20	2,40	0,15	0,79	
CLL 31 - CR 42B Y 42A		9,80	2,40	0,15	3,53	
CLL 31 - CR 42B Y 42A		61,40	1,20	0,15	11,05	
MENOS CAJAS					-0,13	**15,24**
POBLADO - LAS LOMAS						



	CR 31A - CLL 11A Y 11			3,80	2,80	0,15		1,00	
	CR 31A - CLL 11A Y 11			40,00	1,00	0,15		9,00	
	CR 31A - CLL 11A Y 11			50,00	1,40	0,25		17,50	28,70
	BOMBONA I								
	CLL 49A - CR 37 Y 38			9,90	3,30	0,15		4,80	
	CLL 49A - CR 37 Y 38			11,04	1,02	0,15		1,99	
	CLL 49A - CR 37 Y 38			1,15	2,34	0,15		0,40	
	CLL 49A - CR 37 Y 38			74,92	1,10	0,15		12,21	
	CLL 49A - CR 37 Y 38			10,50	1,30	0,15		2,06	
	CLL 49A - CR 37 Y 38			3,12	3,49	0,15		1,62	
	CLL 49A - CR 37 Y 38			1,70	1,06	0,15		0,27	
	CLL 49A - CR 37 Y 38			1,70	1,07	0,15		0,27	
	CLL 49A - CR 37 Y 38			1,97	3,60	0,15		1,06	
	CLL 49A - CR 37 Y 38			1,12	2,35	0,15		0,39	
	CLL 49A - CR 37 Y 38			4,90	3,55	0,15		2,61	
	CLL 49A - CR 37 Y 38			0,80	1,10	0,15		0,13	
	CLL 49A - CR 37 Y 38			5,50	1,55	0,15		0,19	
	CLL 49A - CR 37 Y 38			4,70	1,70	0,15		2,66	
	MENOS CAJAS							1,20	
	CR 38 - CLL 49A Y 48			12,50	4,00	0,15		-0,83	31,03
	CR 38 - CLL 49A Y 48			13,18	3,98	0,15		7,83	
	CR 38 - CLL 49A Y 48			20,00	1,50	0,15		4,50	19,83
	BOSTON - ENCISO								
	CR 36A - CLL 54 Y 58			3,80	1,30	0,15		0,74	
	CR 36A - CLL 54 Y 58			3,80	1,80	0,15		0,97	
	CR 36A - CLL 54 Y 58			8,80	1,40	0,15		1,71	
	CR 36A - CLL 54 Y 58			3,00	1,23	0,35		1,29	
	CR 36A - CLL 54 Y 58			3,15	1,23	0,15		0,58	
	MENOS CAJAS							-0,38	4,92
	LA CANDELARIA - BOSTON								
	CLL 54 - CR 41 Y CR 40			2,05	1,28	0,18		0,47	
	CLL 54 - CR 41 Y CR 40			74,40	0,18	0,15		1,79	
	CLL 54 - CR 41 Y CR 40			20,20	0,20	0,15		0,61	
	CLL 54 - CR 41 Y CR 40			5,80	0,20	0,15		0,17	3,04
	Del 28 de julio al 03 de agosto								
	SAN DIEGO								
	CL 31 CR 42B Y 42A			4,10	1,10	0,15		0,68	
	CL 31 CR 42B Y 42A			2,00	2,50	0,15		0,75	
	CL 31 CR 42B Y 42A			2,25	1,95	0,15		0,66	
	CL 31 CR 42B Y 42A			11,30	1,25	0,15		2,10	
	CL 31 CR 42B Y 42A			4,00	2,10	0,15		1,26	
	CL 31 CR 42B Y 42A			20,90	1,10	0,15		3,45	
	CL 31 CR 42B Y 42A			2,60	2,40	0,15		0,94	
	CL 31 CR 42B Y 42A			8,00	2,50	0,25		5,00	
	MENOS CAJAS							-0,22	14,61
	CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS			7,00	3,00	0,15		3,15	
	CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS			49,00	1,70	0,15		12,50	
	CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS			5,30	5,00	0,15		3,98	
	CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS			5,10	2,75	0,15		2,10	
	CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS			20,30	1,18	0,15		3,61	
	CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS			6,43	2,22	0,15		2,14	
	CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS			64,00	1,10	0,15		10,56	38,03
	POBLADO - LAS LOMAS								
	CR 31A - CLL 11A Y 11			69,00	1,50	0,15		15,53	
	CR 31A - CLL 11A Y 11			50,00	1,40	0,10		7,00	22,53
	BOMBONA I								
	CLL 49A - CR 37 Y 38			69,30	1,40	0,15		14,55	
	CLL 49A - CR 37 Y 38			17,04	3,55	0,15		9,07	
	CLL 49A - CR 37 Y 38			4,96	1,94	0,15		1,45	
	CLL 49A - CR 37 Y 38			8,08	2,04	0,15		2,77	
	CLL 49A - CR 37 Y 38			4,60	2,51	0,15		1,81	
	LA CANDELARIA - BOSTON			12,00	1,30	0,15		2,34	52,01
	Del 30 de junio al 06 de julio								
	BOSTON - ENCISO								
	CR 36A - CLL 54 Y 58			1,40	1,40	0,15		0,29	
	CR 36A - CLL 54 Y 58			1,20	1,20	0,15		0,22	
	CR 36A - CLL 54 Y 58			3,10	1,20	0,15		0,56	
	CR 36A - CLL 54 Y 58			1,20	1,40	0,15		0,28	
	CR 36A - CLL 54 Y 58			10,00	1,30	0,15		1,95	
	CR 36A - CLL 54 Y 58			1,40	1,20	0,15		0,25	
	CR 36A - CLL 54 Y 58			4,30	1,40	0,15		0,90	
	CR 36A - CLL 54 Y 58			1,30	1,80	0,15		0,29	4,72
	SUBBASE PARA LA INSTALACIÓN DE BORDILLOS								
	Del 16 al 22 de junio								
	POBLADO - LAS LOMAS			210,60	0,20	0,25		10,54	
	POBLADO - FLORIDA			117,33	0,20	0,25		5,87	
	BOMBONA I			204,03	0,20	0,25		10,20	
	LA CANDELARIA - BOSTON			52,83	0,20	0,25		2,64	
	Del 23 al 29 de junio								
	POBLADO - LAS LOMAS			246,00	0,20	0,25		12,30	
	BOMBONA I			187,87	0,20	0,25		8,39	
	LA CANDELARIA - BOSTON			69,90	0,20	0,25		3,50	93,44
	Del 30 de junio al 06 de julio								
	POBLADO - LAS LOMAS			161,10	0,20	0,25		8,06	
	POBLADO - FLORIDA			60,00	0,20	0,25		3,00	
	LA CANDELARIA - SAN DIEGO			35,00	0,20	0,25		1,75	
	BOMBONA I			49,20	0,20	0,25		2,46	
	LA CANDELARIA - BOSTON			23,04	0,20	0,25		1,15	16,42
	Del 7 al 13 de julio								
	POBLADO - LAS LOMAS								
	CLL 11B - CR 34 Y CLL 11A			130,03	0,20	0,25		6,50	
	CR 31A - CLL 11A Y 11			32,00	0,20	0,25		1,60	
	SAN DIEGO								
	CLL 31 - CR 42B Y 42A			78,15	0,20	0,25		3,91	
	BOMBONA I								
	CLL 49A - CR 37 Y 38			75,87	0,20	0,25		3,79	
	CR 38 - CLL 49A Y 48			150,92	0,20	0,25		7,55	
	BOSTON - ENCISO								
	CR 36A - CLL 54 Y 58			21,00	0,20	0,25		1,05	
	LA CANDELARIA - BOSTON								
	CLL 54 - CR 41 Y CR 40			164,00	0,20	0,25		8,20	
	Del 14 al 20 de julio								
	SAN DIEGO								
	CLL 31 - CR 42B Y 42A			80,00	0,20	0,25		4,00	
	POBLADO - LAS LOMAS								
	CLL 11B - CR 34 Y CLL 11A			64,20	0,20	0,25		3,21	
	BOMBONA I								
	CR 39 - CLL 49A Y 48			69,70	0,20	0,25		3,49	
	BOSTON - ENCISO								
	CR 36A - CLL 54 Y 58			133,16	0,20	0,25		6,66	
	Del 21 al 27 de julio								
	SAN DIEGO								
	CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS			120,80	0,20	0,25		6,04	
	CLL 31 - CR 42B Y 42A			109,00	0,20	0,25		5,26	
	POBLADO - LAS LOMAS								
	CR 31A - CLL 11A Y 11			45,00	0,20	0,25		2,25	
	BOMBONA I								
	CLL 49A - CR 37 Y 38			83,00	0,20	0,25		4,15	

BOSTON - ENCISO						
CR 36A - CLL 54 Y 58		21,00	0,20	0,25	1,05	
LA CANDELARIA - BOSTON						
CLL 64 - CR 41 Y CR 40		10,00	0,20	0,25	0,50	
Del 28 de julio al 03 de agosto						
SAN DIEGO						
CL 31 CR 42B Y 42A		94,10	0,20	0,25	4,71	
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS		63,93	0,20	0,25	3,20	
POBLADO - LAS LOMAS						
CR 31A - CLL 11A Y 11		55,40	0,20	0,25	2,77	
BOMBONÁ I						
CLL 49A - CR 37 Y 38		27,71	0,20	0,25	1,39	
CR 38 - CLL 49A Y 48		20,00	0,20	0,25	1,00	
BOSTON - ENCISO						
CR 36A - CLL 54 Y 58		4,30	0,20	0,25	0,22	82,46
	Subtotal					857,35
	TOTAL					857,35

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	INTERVENTORÍA MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF					8
FECHA	DD	3	MM	8	AA	2025	PERÍODO	16/06/2025 - 3/08/2025	ELABORÓ		

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	

ÍTEM	3.3.1	DESCRIPCIÓN	Cargue (Mecánico o Manual) y transporte del material proveniente de las EXPLANACIONES, EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y/O VOLADURAS DE ROCA, hasta el sitio que indique la interventoría. Su medida será en sitio. En caso de requerir el pago de derecho de botadero, se pagará en su ítem respectivo.	UNID.		PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.













LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN	DISTANCIA	CANTIDAD (M3KM)	MEDIDA TOTAL
Del 16 al 22 de junio							
POBLADO - LAS LOMAS							
CR 31A - CLL 11A Y 11	11,2	1,5	0,06	1,008	25	25,20	
CR 31A - CLL 11A Y 11	11,2	0,3	0,5	1,68	25	42,00	
CR 31A - CLL 11A Y 11	13,2	0,3	0,35	1,386	25	34,65	101,85
CLL 11 - CR 31A Y 30	15,15	0,3	0,4	1,818	25,00	45,45	
CLL 11 - CR 31A Y 30	11,55	1	0,15	1,7325	25,00	43,31	88,76
CLL 11B - CR 34 Y CL 11A	12	1,3	0,08	1,248	25,00	31,20	
CLL 11B - CR 34 Y CL 11A	5,8	1,1	0,08	0,5104	25,00	12,76	
CLL 11B - CR 34 Y CL 11A	9	2,35	0,08	1,692	25,00	42,30	
CLL 11B - CR 34 Y CL 11A	10	2,35	0,08	1,88	25,00	47,00	
CLL 11B - CR 34 Y CL 11A	3,5	1,3	0,08	0,364	25,00	9,10	
CLL 11B - CR 34 Y CL 11A	3	2,35	0,08	0,564	25,00	14,10	
CLL 11B - CR 34 Y CL 11A	43,3	0,3	0,5	6,495	25,00	162,38	
CLL 11B - CR 34 Y CL 11A	23,5	0,3	0,35	2,4675	25,00	61,69	380,52
POBLADO - FLORIDA							
CLL 5G - CR 33	34,58	0,35	0,3	3,63	25,00	90,77	
CLL 5G - CR 33	7,45	0,35	0,5	1,30	25,00	32,59	
CLL 5G - CR 33	24,67	0,35	0,3	2,59	25,00	64,76	
CLL 5G - CR 33	21,2	0,35	0,3	2,23	25,00	55,65	
CLL 5G - CR 33	27,8	0,35	0,3	2,92	25,00	72,98	
CLL 5G - CR 33	12,2	1,5	0,1	1,83	25,00	45,75	
CLL 5G - CR 33	12,2	1,5	0,15	2,75	25,00	68,63	
CLL 5G - CR 33	14,8	1,25	0,1	1,85	25,00	46,25	
CLL 5G - CR 33	14,8	1,25	0,1	1,85	25,00	46,25	
CLL 5G - CR 33	16,35	0,35	0,2	1,14	25,00	28,61	
CLL 5G - CR 33	0,9	1	0,3	0,27	25,00	6,75	
CLL 5G - CR 33	1,53	0,35	0,5	0,27	25,00	6,69	
CLL 5G - CR 33	0,55	0,3	0,16	0,03	25,00	0,66	566,34
BOMBONÁ I							
CL 49A - CR 37 Y 38	5,8	4,9	0,10	2,84	25,00	71,05	
CL 49A - CR 37 Y 38	10,17	2,15	0,10	2,19	25,00	54,66	
CL 49A - CR 37 Y 38	1,78	1,81	0,10	0,32	25,00	8,05	
CL 49A - CR 37 Y 38	5,48	1,95	0,10	1,07	25,00	26,72	
CL 49A - CR 37 Y 38	32,05	2,4	0,10	7,69	25,00	192,30	
CL 49A - CR 37 Y 38	2,93	2,38	0,10	0,70	25,00	17,43	
CL 49A - CR 37 Y 38	5,8	4,9	0,15	4,26	25,00	106,58	
CL 49A - CR 37 Y 38	3,43	2,8	0,4	3,84	25,00	96,04	
CL 49A - CR 37 Y 38	10,17	2,15	0,15	3,28	25,00	82,00	
CL 49A - CR 37 Y 38	1,78	1,81	0,15	0,48	25,00	12,08	
CL 49A - CR 37 Y 38	5,48	1,95	0,15	1,60	25,00	40,07	
CL 49A - CR 37 Y 38	32,05	2,4	0,15	11,54	25,00	288,45	
CL 49A - CR 37 Y 38	2,93	2,38	0,15	1,05	25,00	26,15	1.021,58
LA CANDELARIA - BOSTON							
CR 40 - CL 54 Y 56	17,37	2,22	0,1	3,86	25,00	96,40	
CR 40 - CL 54 Y 56	4,98	2,41	0,1	1,20	25,00	30,00	
CR 40 - CL 54 Y 56	5,06	2,41	0,1	1,22	25,00	30,49	
CR 40 - CL 54 Y 56	10,37	2,35	0,1	2,44	25,00	60,92	
CR 40 - CL 54 Y 56	3,79	2,3	0,1	0,87	25,00	21,79	
CR 40 - CL 54 Y 56	7,61	2,35	0,1	1,79	25,00	44,71	
CR 40 - CL 54 Y 56	17,15	2,3	0,1	3,94	25,00	98,61	382,93
CR 40 - CL 54 Y 56	17,37	2,22	0,15	5,78	25,00	144,61	
CR 40 - CL 54 Y 56	4,98	2,41	0,15	1,80	25,00	45,01	
CR 40 - CL 54 Y 56	5,06	2,41	0,15	1,83	25,00	45,73	
CR 40 - CL 54 Y 56	10,37	2,35	0,15	3,66	25,00	91,39	
CR 40 - CL 54 Y 56	3,79	2,3	0,15	1,31	25,00	32,69	
CR 40 - CL 54 Y 56	7,61	2,35	0,15	2,68	25,00	67,06	
CR 40 - CL 54 Y 56	17,15	2,3	0,15	5,92	25,00	147,92	574,40
BOSTON - ENCISO							
CLL 57 - CR 36A Y CR 37	8,94	2,23	0,1	1,99	25,00	49,84	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37	0,78	1,35	0,1	0,11	25,00	2,63	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37	2,28	1,6	0,1	0,36	25,00	9,12	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37	0,81	1,45	0,1	0,12	25,00	2,94	

















CLL 57 - CR 36A Y CR 37	6,876	1,7	0,1	1,17	25,00	29,22	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37	0,81	1	0,1	0,08	25,00	2,03	95,78
CLL 57 - CR 36A Y CR 37	8,94	2,23	0,5	9,97	25,00	249,20	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37	0,78	1,35	0,5	0,53	25,00	13,16	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37	2,28	1,6	0,5	1,82	25,00	45,60	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37	0,81	1,45	0,5	0,59	25,00	14,68	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37	6,876	1,7	0,5	5,84	25,00	146,12	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37	0,81	1	0,5	0,41	25,00	10,13	478,89
Del 23 al 29 de junio							
POBLADO - LAS LOMAS							
CR 31A - CLL 11A Y 11	3,5	2,74	0,06	0,58	25,00	14,39	
CR 31A - CLL 11A Y 11	2,1	1,5	0,06	0,19	25,00	4,73	
CR 31A - CLL 11A Y 11	4,6	2,9	0,06	0,80	25,00	20,01	
CR 31A - CLL 11A Y 11	2,1	1,5	0,06	0,19	25,00	4,73	
CR 31A - CLL 11A Y 11	10	3,7	0,06	2,22	25,00	55,50	
CR 31A - CLL 11A Y 11	5,5	2,94	0,06	0,97	25,00	24,26	
CR 31A - CLL 11A Y 11	13	0,3	0,5	1,95	25,00	48,75	
CR 31A - CLL 11A Y 11	5	0,3	0,35	0,53	25,00	13,13	185,48
CLL 11 - CR 31A Y 30	2,6	2,6	0,07	0,47	25,00	11,83	
CLL 11 - CR 31A Y 30	5	3,3	0,07	1,16	25,00	28,88	
CLL 11 - CR 31A Y 30	33,2	1,5	0,07	3,49	25,00	87,15	
CLL 11 - CR 31A Y 30	31	1,35	0,1	4,19	25,00	104,63	
CLL 11 - CR 31A Y 30	63,1	0,3	0,5	9,47	25,00	236,63	469,11
CLL 11B - CR 34 Y CL 11A	60	1,4	0,08	6,72	25,00	168,00	
CLL 11B - CR 34 Y CL 11A	20	1,5	0,08	2,40	25,00	60,00	
CLL 11B - CR 34 Y CL 11A	18	1,5	0,08	2,16	25,00	54,00	
CLL 11B - CR 34 Y CL 11A	5,9	2,95	0,08	1,39	25,00	34,81	
CLL 11B - CR 34 Y CL 11A	109,9	0,3	0,5	15,59	25,00	389,63	
CLL 11B - CR 34 Y CL 11A	62	0,3	0,35	6,51	25,00	162,75	869,19
BOMBONÁ I							
CR 38 - CLL 49A Y 48	5,7	4,7	0,10	2,68	25,00	66,98	
CR 38 - CLL 49A Y 48	16,83	2,6	0,10	4,38	25,00	109,40	
CR 38 - CLL 49A Y 48	9,87	3,55	0,10	3,50	25,00	87,60	
CR 38 - CLL 49A Y 48	29,08	2,99	0,10	8,69	25,00	217,37	
CR 38 - CLL 49A Y 48	5,7	4,7	0,15	4,02	25,00	100,46	
CR 38 - CLL 49A Y 48	16,83	2,6	0,15	6,56	25,00	164,09	
CR 38 - CLL 49A Y 48	9,87	3,55	0,15	5,26	25,00	131,39	
CR 38 - CLL 49A Y 48	29,08	2,99	0,15	13,04	25,00	326,06	1.203,35
LA CANDELARIA - BOSTON				-		-	
CR 40 - CL 54 Y 56	9,54	4,79	0,1	4,57	25,00	114,24	
CR 40 - CL 54 Y 56	19,18	2,02	0,1	3,87	25,00	96,86	
CR 40 - CL 54 Y 56	9,54	4,79	0,15	6,85	25,00	171,36	
CR 40 - CL 54 Y 56	19,18	2,02	0,15	5,81	25,00	145,29	527,75
BOSTON - ENCISO							
CLL 57 - CR 36A Y CR 37	3,06	3,44	0,1	1,05	25,00	26,32	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37	9,57	1,83	0,1	1,75	25,00	43,78	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37	5,16	1,43	0,1	0,74	25,00	18,45	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37	4,5	3,4	0,1	1,53	25,00	38,25	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37	11,07	2,05	0,1	2,27	25,00	56,73	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37	5,63	1,35	0,1	0,76	25,00	19,00	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37	3,06	3,44	0,15	1,58	25,00	39,47	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37	9,57	1,83	0,15	2,63	25,00	65,67	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37	5,16	1,43	0,15	1,11	25,00	27,67	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37	4,5	3,4	0,15	2,30	25,00	57,38	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37	11,07	2,05	0,15	3,40	25,00	85,10	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37	5,63	1,35	0,15	1,14	25,00	28,50	506,33
Del 30 de junio al 06 de julio							
POBLADO - LAS LOMAS							
CLL 11B - CR 34 Y CL 11A	46,8	0,3	0,5	7,02	25,00	175,50	
CLL 11B - CR 34 Y CL 11A	21,5	0,3	0,35	2,26	25,00	56,44	231,94
CLL 11 - CR 31A Y 30	5	3,3	0,25	4,13	25,00	103,13	
CLL 11 - CR 31A Y 30	68,1	0,3	0,5	10,22	25,00	255,38	
CLL 11 - CR 31A Y 30	15,8	0,3	0,35	1,66	25,00	41,48	399,98
CR 31A - CLL 11A Y 11	38	0,3	0,5	5,70	25,00	142,50	
CR 31A - CLL 11A Y 11	25	0,3	0,35	2,63	25,00	65,63	208,13
LA CANDELARIA - SAN DIEGO							
CLL 31 - CR 42B Y 42A	12,00	1,50	0,10	1,80	25,00	45,00	
CLL 31 - CR 42B Y 42A	3,30	1,50	0,10	0,50	25,00	12,38	
CLL 31 - CR 42B Y 42A	0,90	2,40	0,10	0,22	25,00	5,40	
CLL 31 - CR 42B Y 42A	19,00	1,20	0,10	2,28	25,00	57,00	
CLL 31 - CR 42B Y 42A	5,90	1,15	0,10	0,68	25,00	16,96	
CLL 31 - CR 42B Y 42A	12,00	1,50	0,15	2,70	25,00	67,50	
CLL 31 - CR 42B Y 42A	3,30	1,50	0,15	0,74	25,00	18,56	
CLL 31 - CR 42B Y 42A	0,90	2,40	0,15	0,32	25,00	8,10	
CLL 31 - CR 42B Y 42A	19,00	1,20	0,15	3,42	25,00	85,50	
CLL 31 - CR 42B Y 42A	5,90	1,15	0,15	1,02	25,00	25,44	
CLL 31 - CR 42B Y 42A	5,80	3,30	0,25	4,79	25,00	119,63	
CLL 31 - CR 42B Y 42A	35,00	0,50	0,30	5,25	25,00	131,25	592,72
BOMBONÁ I							
CR 38 - CLL 49A Y 48	44,25	2,50	0,15	16,59	25,00	414,84	
CR 38 - CLL 49A Y 48	1,75	2,60	0,15	0,68	25,00	17,06	
CR 38 - CLL 49A Y 48	1,92	2,75	0,15	0,79	25,00	19,80	
CR 38 - CLL 49A Y 48	44,25	2,50	0,10	11,06	25,00	276,56	
CR 38 - CLL 49A Y 48	1,75	2,60	0,10	0,46	25,00	11,38	
CR 38 - CLL 49A Y 48	1,92	2,75	0,10	0,53	25,00	13,20	
CR 38 - CLL 49A Y 48	88,50	0,35	0,30	9,29	25,00	232,31	
CR 38 - CLL 49A Y 48	40,73	0,35	0,50	7,13	25,00	178,19	
CR 38 - CLL 49A Y 48	61,70	0,35	0,30	6,48	25,00	161,96	
CR 38 - CLL 49A Y 48	47,70	0,35	0,50	8,35	25,00	208,69	
CR 38 - CLL 49A Y 48	68,86	0,35	0,30	7,23	25,00	180,76	
CR 38 - CLL 49A Y 48	19,20	3,50	0,15	10,08	25,00	252,00	
CR 38 - CLL 49A Y 48	19,20	3,50	0,10	6,72	25,00	168,00	
CR 38 - CLL 49A Y 48	19,20	0,35	0,50	3,36	25,00	84,00	













CR 38 - CLL 49A Y 48	26,70	0,35	0,30	2,80	25,00	70,09	
CR 38 - CLL 49A Y 48	24,38	0,35	0,30	2,56	25,00	64,00	
CR 38 - CLL 49A Y 48	105,89	0,35	0,50	18,53	25,00	463,27	
CR 38 - CLL 49A Y 48	5,31	3,62	0,15	2,88	25,00	72,08	
CR 38 - CLL 49A Y 48	18,65	1,15	0,15	3,22	25,00	80,43	
CR 38 - CLL 49A Y 48	5,31	3,62	0,10	1,92	25,00	48,06	
CR 38 - CLL 49A Y 48	18,65	1,15	0,10	2,14	25,00	53,62	
CR 38 - CLL 49A Y 48	23,96	0,35	0,30	2,52	25,00	62,90	3.133,19
BOSTON - ENCISO							
CR 36A - CL 54 Y 58	14,20	1,60	0,10	2,27	25,00	56,80	
CR 36A - CL 54 Y 58	22,00	1,45	0,20	6,38	25,00	159,50	
CR 36A - CL 54 Y 58	22,00	1,45	0,10	3,19	25,00	79,75	
CR 36A - CL 54 Y 58	168,90	0,35	0,30	17,73	25,00	443,36	
CR 36A - CL 54 Y 58	159,75	0,35	0,50	27,96	25,00	698,91	1.438,32
LA CANDELARIA - BOSTON							
CL 54 - CR 41 Y 40	15,40	2,40	0,12	4,44	25,00	110,88	
CL 54 - CR 41 Y 40	3,00	2,10	0,10	0,63	25,00	15,75	
CL 54 - CR 41 Y 40	4,34	1,84	0,10	0,80	25,00	19,96	
CL 54 - CR 41 Y 40	15,40	2,40	0,15	5,54	25,00	138,60	
CL 54 - CR 41 Y 40	9,00	1,20	0,10	1,08	25,00	27,00	
CL 54 - CR 41 Y 40	4,34	1,75	0,15	1,14	25,00	28,48	
CL 54 - CR 41 Y 40	384,65	0,30	0,30	34,62	25,00	865,46	
CL 54 - CR 41 Y 40	127,99	0,30	0,50	19,20	25,00	479,96	1.686,10
Del 7 al 13 de julio							
POBLADO - LAS LOMAS							
CLL 11B - CR 34 Y CLL 11A	6,50	2,30	0,08	1,20	25,00	29,90	
CLL 11B - CR 34 Y CLL 11A	12,20	1,38	0,08	1,35	25,00	33,67	
CLL 11B - CR 34 Y CLL 11A	8,00	1,10	0,08	0,70	25,00	17,60	
CLL 11B - CR 34 Y CLL 11A	5,13	1,60	0,08	0,66	25,00	16,42	
CLL 11B - CR 34 Y CLL 11A	28,70	1,25	0,08	2,87	25,00	71,75	
CLL 11B - CR 34 Y CLL 11A	89,00	0,30	0,50	13,35	25,00	333,75	
CLL 11B - CR 34 Y CLL 11A	73,43	0,30	0,35	7,71	25,00	192,75	695,84
CR 31A - CLL 11A Y 11	2,00	2,00	0,10	0,40	25,00	10,00	
CR 31A - CLL 11A Y 11	28,00	1,45	0,10	4,06	25,00	101,50	
CR 31A - CLL 11A Y 11	17,00	2,85	0,10	4,85	25,00	121,13	
CR 31A - CLL 11A Y 11	41,30	1,50	0,10	6,20	25,00	154,88	
CR 31A - CLL 11A Y 11	32,00	0,30	0,50	4,80	25,00	120,00	
CR 31A - CLL 11A Y 11	12,00	0,30	0,35	1,26	25,00	31,50	539,00
SAN DIEGO							
CLL 31 - CR 42B Y 42A	50,00	1,10	0,15	8,25	25,00	206,25	
CLL 31 - CR 42B Y 42A	7,10	2,60	0,15	2,77	25,00	69,23	
CLL 31 - CR 42B Y 42A	11,60	9,80	0,15	17,05	25,00	426,30	
CLL 31 - CR 42B Y 42A	50,00	1,10	0,10	5,50	25,00	137,50	
CLL 31 - CR 42B Y 42A	7,10	2,60	0,10	1,85	25,00	46,15	
CLL 31 - CR 42B Y 42A	11,60	9,80	0,10	11,37	25,00	284,20	
CLL 31 - CR 42B Y 42A	103,00	0,30	0,50	15,45	25,00	386,25	1.555,88
BOMBONÁ I							
CLL 49A - CR 37 Y 38	3,04	2,33	0,15	1,06	25,00	26,56	
CLL 49A - CR 37 Y 38	5,33	4,70	0,15	3,76	25,00	93,94	
CLL 49A - CR 37 Y 38	3,19	2,45	0,15	1,17	25,00	29,31	
CLL 49A - CR 37 Y 38	2,90	4,82	0,15	2,10	25,00	52,42	
CLL 49A - CR 37 Y 38	1,64	2,35	0,15	0,58	25,00	14,45	
CLL 49A - CR 37 Y 38	3,04	2,33	0,10	0,71	25,00	17,71	
CLL 49A - CR 37 Y 38	5,33	4,70	0,10	2,51	25,00	62,63	
CLL 49A - CR 37 Y 38	3,19	2,45	0,10	0,78	25,00	19,54	
CLL 49A - CR 37 Y 38	2,90	4,82	0,10	1,40	25,00	34,95	
CLL 49A - CR 37 Y 38	1,64	2,35	0,10	0,39	25,00	9,64	
CLL 49A - CR 37 Y 38	8,23	0,35	0,50	1,44	25,00	36,01	
CLL 49A - CR 37 Y 38	60,15	0,35	0,30	6,32	25,00	157,89	
CR 38 - CLL 49A Y 48	24,00	1,50	0,15	5,40	25,00	135,00	
CR 38 - CLL 49A Y 48	3,63	6,80	0,15	3,70	25,00	92,57	
CR 38 - CLL 49A Y 48	10,65	3,63	0,15	5,80	25,00	144,97	
CR 38 - CLL 49A Y 48	6,52	4,07	0,15	3,98	25,00	99,51	
CR 38 - CLL 49A Y 48	51,91	1,09	0,15	8,49	25,00	212,18	
CR 38 - CLL 49A Y 48	24,00	1,50	0,10	3,60	25,00	90,00	
CR 38 - CLL 49A Y 48	3,63	6,80	0,10	2,47	25,00	61,71	
CR 38 - CLL 49A Y 48	10,65	3,63	0,10	3,87	25,00	96,65	
CR 38 - CLL 49A Y 48	6,52	4,07	0,10	2,65	25,00	66,34	
CR 38 - CLL 49A Y 48	51,91	1,09	0,10	5,66	25,00	141,45	
CR 38 - CLL 49A Y 48	17,45	0,35	0,30	1,83	25,00	45,81	
CR 38 - CLL 49A Y 48	75,87	0,35	0,50	13,28	25,00	331,93	2.073,16
BOSTON - ENCISO							
CR 36A - CLL 54 Y 58	22,50	1,45	0,10	3,26	25,00	81,56	
CR 36A - CLL 54 Y 58	22,50	1,45	0,15	4,89	25,00	122,34	
CR 36A - CLL 54 Y 58	21,00	1,85	0,10	3,89	25,00	97,13	
CR 36A - CLL 54 Y 58	21,00	1,85	0,15	5,83	25,00	145,69	
CR 36A - CLL 54 Y 58	44,50	0,70	0,15	4,67	25,00	116,81	
CR 36A - CLL 54 Y 58	44,50	0,60	0,50	13,35	25,00	333,75	897,28
LA CANDELARIA - BOSTON							
CLL 54 - CR 41 Y CR 40	41,55	2,16	0,10	8,97	25,00	224,37	
CLL 54 - CR 41 Y CR 40	20,60	2,20	0,10	4,53	25,00	113,30	
CLL 54 - CR 41 Y CR 40	6,60	1,95	0,10	1,29	25,00	32,18	
CLL 54 - CR 41 Y CR 40	14,30	2,16	0,15	4,63	25,00	115,83	
CLL 54 - CR 41 Y CR 40	4,00	2,20	0,10	0,88	25,00	22,00	
CLL 54 - CR 41 Y CR 40	3,85	2,20	0,10	0,85	25,00	21,18	
CLL 54 - CR 41 Y CR 40	2,55	2,20	0,10	0,56	25,00	14,03	
CLL 54 - CR 41 Y CR 40	1,68	2,20	0,10	0,37	25,00	9,24	
CLL 54 - CR 41 Y CR 40	1,68	2,20	0,10	0,37	25,00	9,24	
CLL 54 - CR 41 Y CR 40	4,97	2,20	0,27	2,95	25,00	73,80	

CLL 54 - CR 41 Y CR 40	3.30	2.20	0.27	1.86	25.00	49.01	
CLL 54 - CR 41 Y CR 40	6.20	2.20	0.27	3.68	25.00	92.07	
CLL 54 - CR 41 Y CR 40	4.00	2.20	0.15	1.32	25.00	33.00	
CLL 54 - CR 41 Y CR 40	3.85	2.20	0.15	1.27	25.00	31.76	
CLL 54 - CR 41 Y CR 40	2.55	2.20	0.15	0.84	25.00	21.04	
CLL 54 - CR 41 Y CR 40	1.68	2.20	0.15	0.55	25.00	13.86	
CLL 54 - CR 41 Y CR 40	1.68	2.20	0.15	0.55	25.00	13.86	
CLL 54 - CR 41 Y CR 40	11.754	0.35	0.30	12.34	25.00	308.64	
CLL 54 - CR 41 Y CR 40	71.256	0.35	0.50	12.82	25.00	313.08	1.811.37
Del 14 al 20 de julio							
SAN DIEGO							
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS	9.80	2.40	0.13	3.06	25.00	76.44	
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS	61.40	1.20	0.13	9.58	25.00	239.46	
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS	61.40	0.15	0.13	1.20	25.00	29.93	
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS	64.00	0.15	0.13	1.25	25.00	31.20	
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS	2.20	2.40	0.12	0.63	25.00	15.84	
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS	9.80	2.40	0.12	2.82	25.00	70.56	
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS	61.40	1.20	0.12	8.84	25.00	221.04	
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS	61.40	0.30	0.50	9.21	25.00	230.25	
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS	64.00	0.30	0.35	6.72	25.00	168.00	1.082.72
CLL 31 - CR 42B Y 42A	5.74	2.50	0.12	1.72	25.00	43.05	
CLL 31 - CR 42B Y 42A	7.20	1.20	0.12	1.04	25.00	25.92	
CLL 31 - CR 42B Y 42A	2.88	1.00	0.12	0.35	25.00	8.64	
CLL 31 - CR 42B Y 42A	10.00	2.00	0.12	2.40	25.00	60.00	
CLL 31 - CR 42B Y 42A	15.83	1.00	0.12	1.91	25.00	47.79	
CLL 31 - CR 42B Y 42A	8.64	1.00	0.12	1.04	25.00	25.92	
CLL 31 - CR 42B Y 42A	6.80	1.00	0.12	0.82	25.00	20.40	
CLL 31 - CR 42B Y 42A	3.30	2.50	0.12	0.99	25.00	24.75	
CLL 31 - CR 42B Y 42A	35.50	1.20	0.12	5.11	25.00	127.80	
CLL 31 - CR 42B Y 42A	14.40	1.20	0.12	2.07	25.00	51.84	
CLL 31 - CR 42B Y 42A	16.20	1.00	0.12	1.94	25.00	48.60	
CLL 31 - CR 42B Y 42A	59.05	1.00	0.12	7.09	25.00	177.15	
CLL 31 - CR 42B Y 42A	11.55	1.00	0.12	1.39	25.00	34.64	
CLL 31 - CR 42B Y 42A	5.74	2.50	0.13	1.87	25.00	46.64	
CLL 31 - CR 42B Y 42A	7.20	1.20	0.13	1.12	25.00	28.08	
CLL 31 - CR 42B Y 42A	2.88	1.00	0.13	0.37	25.00	9.36	
CLL 31 - CR 42B Y 42A	10.00	2.00	0.13	2.60	25.00	65.00	
CLL 31 - CR 42B Y 42A	15.83	1.00	0.13	2.07	25.00	51.77	
CLL 31 - CR 42B Y 42A	8.64	1.00	0.13	1.12	25.00	28.08	
CLL 31 - CR 42B Y 42A	6.80	1.00	0.13	0.88	25.00	22.10	
CLL 31 - CR 42B Y 42A	3.30	2.50	0.13	1.07	25.00	26.81	
CLL 31 - CR 42B Y 42A	35.50	1.20	0.13	5.54	25.00	138.45	
CLL 31 - CR 42B Y 42A	14.40	1.20	0.13	2.25	25.00	56.16	
CLL 31 - CR 42B Y 42A	16.20	1.00	0.13	2.11	25.00	52.65	
CLL 31 - CR 42B Y 42A	59.05	1.00	0.13	7.68	25.00	191.91	
CLL 31 - CR 42B Y 42A	102.50	0.30	0.50	15.38	25.00	384.38	
CLL 31 - CR 42B Y 42A	9.80	0.30	0.35	1.03	25.00	25.73	1.823.61
BOMBONA I							
CR 38 - CLL 49A Y 48	11.60	1.50	0.10	1.74	25.00	43.50	
CR 38 - CLL 49A Y 48	1.90	1.50	0.10	0.29	25.00	7.13	
CR 38 - CLL 49A Y 48	12.50	4.00	0.10	5.00	25.00	125.00	
CR 38 - CLL 49A Y 48	13.18	3.96	0.10	5.22	25.00	130.48	
CR 38 - CLL 49A Y 48	11.60	1.50	0.15	2.61	25.00	65.25	
CR 38 - CLL 49A Y 48	1.90	1.50	0.15	0.43	25.00	10.69	
CR 38 - CLL 49A Y 48	37.50	0.35	0.30	3.94	25.00	98.44	480.48
CLL 49A - CR 37 Y 38	74.02	1.10	0.10	8.14	25.00	203.56	
CLL 49A - CR 37 Y 38	74.02	1.10	0.15	12.21	25.00	305.33	
CLL 49A - CR 37 Y 38	74.02	0.35	0.30	7.77	25.00	194.30	703.19
BOSTON - ENCISO							
CR 36A - CLL 54 Y 58	1.40	1.40	0.10	0.20	25.00	4.90	
CR 36A - CLL 54 Y 58	1.20	1.20	0.10	0.14	25.00	3.60	
CR 36A - CLL 54 Y 58	3.10	1.20	0.10	0.37	25.00	9.30	
CR 36A - CLL 54 Y 58	1.20	1.40	0.10	0.17	25.00	4.20	
CR 36A - CLL 54 Y 58	10.00	1.30	0.10	1.30	25.00	32.50	
CR 36A - CLL 54 Y 58	1.40	1.20	0.10	0.17	25.00	4.20	
CR 36A - CLL 54 Y 58	4.30	1.40	0.10	0.60	25.00	15.05	
CR 36A - CLL 54 Y 58	1.35	1.20	0.10	0.16	25.00	4.05	
CR 36A - CLL 54 Y 58	5.20	1.25	0.10	0.65	25.00	16.25	
CR 36A - CLL 54 Y 58	106.96	0.35	0.30	11.23	25.00	280.77	
CR 36A - CLL 54 Y 58	26.20	0.35	0.50	4.59	25.00	114.63	
CR 36A - CLL 54 Y 58	1.20	1.35	0.15	0.24	25.00	6.08	
CR 36A - CLL 54 Y 58	5.20	1.40	0.15	1.09	25.00	27.30	
CR 36A - CLL 54 Y 58	3.00	2.20	0.10	0.66	25.00	16.50	
CR 36A - CLL 54 Y 58	3.00	2.20	0.15	0.99	25.00	24.75	
CR 36A - CLL 54 Y 58	3.00	5.10	0.20	3.06	25.00	76.50	
CR 36A - CLL 54 Y 58	3.00	5.10	0.05	0.77	25.00	19.13	659.70
BOMBONA II							
CR 9A - CLL 44AA 45	20.00	2.00	0.25	10.00	25.00	250.00	250.00
Del 21 al 27 de julio							
SAN DIEGO							
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS	7.00	3.00	0.10	2.10	25.00	52.50	
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS	49.00	1.70	0.10	8.33	25.00	208.25	
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS	5.30	5.00	0.10	2.65	25.00	66.25	
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS	5.10	2.75	0.10	1.40	25.00	35.06	
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS	20.20	1.19	0.10	2.40	25.00	60.10	
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS	7.00	3.00	0.15	3.15	25.00	78.75	
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS	49.00	1.70	0.15	12.50	25.00	312.38	
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS	5.30	5.00	0.15	3.98	25.00	99.38	
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS	5.10	2.75	0.15	2.10	25.00	52.59	
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS	20.20	1.19	0.15	3.61	25.00	90.14	
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS	89.50	0.30	0.50	13.43	25.00	335.63	
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS	54.80	0.30	0.35	5.75	25.00	143.85	1.534.87
CLL 31 - CR 42B Y 42A	4.10	1.10	0.10	0.45	25.00	11.28	

CLL 31 - CR 42B Y 42A	2.00	2.50	0.10	0.50	25.00	12.50	
CLL 31 - CR 42B Y 42A	2.25	1.95	0.10	0.44	25.00	10.97	
CLL 31 - CR 42B Y 42A	11.20	1.25	0.10	1.40	25.00	35.00	
CLL 31 - CR 42B Y 42A	4.00	2.10	0.10	0.84	25.00	21.00	
CLL 31 - CR 42B Y 42A	20.90	1.10	0.10	2.30	25.00	57.48	
CLL 31 - CR 42B Y 42A	2.60	2.40	0.10	0.62	25.00	15.60	
CLL 31 - CR 42B Y 42A	66.85	0.30	0.50	8.53	25.00	213.19	
CLL 31 - CR 42B Y 42A	9.80	0.30	0.35	1.03	25.00	25.73	402.73
POBLADO - LAS LOMAS							
CR 31A - CLL 11A Y 11	50.00	1.40	0.10	7.00	25.00	175.00	
CR 31A - CLL 11A Y 11	3.80	2.80	0.10	1.06	25.00	26.60	
CR 31A - CLL 11A Y 11	40.00	1.60	0.10	6.40	25.00	160.00	
CR 31A - CLL 11A Y 11	95.80	0.30	0.50	14.37	25.00	359.25	
CR 31A - CLL 11A Y 11	49.60	0.30	0.35	5.21	25.00	130.20	851.06
BOMBONA I							
CLL 49A - CR 37 Y 38	9.90	3.30	0.10	3.27	25.00	81.68	
CLL 49A - CR 37 Y 38	11.04	1.02	0.10	1.13	25.00	28.15	
CLL 49A - CR 37 Y 38	1.15	2.34	0.10	0.27	25.00	6.73	
CLL 49A - CR 37 Y 38	24.56	1.01	0.10	2.48	25.00	62.01	
CLL 49A - CR 37 Y 38	2.90	2.52	0.10	0.73	25.00	18.27	
CLL 49A - CR 37 Y 38	6.54	1.09	0.10	0.71	25.00	17.82	
CLL 49A - CR 37 Y 38	1.40	1.18	0.10	0.17	25.00	4.13	
CLL 49A - CR 37 Y 38	10.50	1.30	0.10	1.37	25.00	34.13	
CLL 49A - CR 37 Y 38	3.12	3.46	0.10	1.08	25.00	26.99	
CLL 49A - CR 37 Y 38	1.70	1.05	0.10	0.18	25.00	4.46	
CLL 49A - CR 37 Y 38	1.70	1.07	0.10	0.18	25.00	4.55	
CLL 49A - CR 37 Y 38	1.97	3.60	0.10	0.71	25.00	17.73	
CLL 49A - CR 37 Y 38	1.12	2.35	0.10	0.26	25.00	6.58	
CLL 49A - CR 37 Y 38	4.90	3.55	0.10	1.74	25.00	43.49	
CLL 49A - CR 37 Y 38	0.80	1.10	0.10	0.09	25.00	2.20	
CLL 49A - CR 37 Y 38	0.80	1.55	0.10	0.12	25.00	3.10	
CLL 49A - CR 37 Y 38	5.30	3.35	0.10	1.78	25.00	44.39	
CLL 49A - CR 37 Y 38	4.70	1.70	0.10	0.80	25.00	19.98	
CLL 49A - CR 37 Y 38	69.30	1.40	0.10	9.70	25.00	242.55	
CLL 49A - CR 37 Y 38	17.04	3.55	0.10	6.05	25.00	151.23	
CLL 49A - CR 37 Y 38	4.98	1.94	0.10	0.97	25.00	24.15	
CLL 49A - CR 37 Y 38	9.06	2.04	0.10	1.85	25.00	46.21	
CLL 49A - CR 37 Y 38	9.90	3.30	0.15	4.90	25.00	122.51	
CLL 49A - CR 37 Y 38	11.04	1.02	0.15	1.69	25.00	42.23	
CLL 49A - CR 37 Y 38	1.15	2.34	0.15	0.40	25.00	10.09	
CLL 49A - CR 37 Y 38	10.50	1.30	0.15	2.05	25.00	51.19	
CLL 49A - CR 37 Y 38	3.12	3.46	0.15	1.62	25.00	40.46	
CLL 49A - CR 37 Y 38	1.70	1.05	0.15	0.27	25.00	6.69	
CLL 49A - CR 37 Y 38	1.70	1.07	0.15	0.27	25.00	6.82	
CLL 49A - CR 37 Y 38	1.97	3.60	0.15	1.06	25.00	26.60	
CLL 49A - CR 37 Y 38	1.12	2.35	0.15	0.39	25.00	9.87	
CLL 49A - CR 37 Y 38	4.90	3.55	0.15	2.61	25.00	65.23	
CLL 49A - CR 37 Y 38	0.80	1.10	0.15	0.13	25.00	3.30	
CLL 49A - CR 37 Y 38	0.80	1.55	0.15	0.19	25.00	4.65	
CLL 49A - CR 37 Y 38	5.30	3.35	0.15	2.66	25.00	66.59	
CLL 49A - CR 37 Y 38	4.70	1.70	0.15	1.20	25.00	29.96	
CLL 49A - CR 37 Y 38	28.17	0.35	0.30	2.96	25.00	73.95	
CLL 49A - CR 37 Y 38	69.30	1.40	0.15	14.55	25.00	363.83	
CLL 49A - CR 37 Y 38	17.04	3.55	0.15	9.07	25.00	226.85	
CLL 49A - CR 37 Y 38	4.98	1.94	0.15	1.45	25.00	36.23	
CLL 49A - CR 37 Y 38	9.06	2.04	0.15	2.77	25.00	69.31	
CLL 49A - CR 37 Y 38	100.38	0.35	0.30	10.54	25.00	263.50	2410.37
CR 38 - CLL 49A Y 48	12.50	4.00	0.15	7.50	25.00	187.50	
CR 38 - CLL 49A Y 48	13.18	3.96	0.15	7.83	25.00	195.72	
CR 38 - CLL 49A Y 48	12.50	4.00	0.10	5.00	25.00	125.00	
CR 38 - CLL 49A Y 48	13.18	3.96	0.10	5.22	25.00	130.48	
CR 38 - CLL 49A Y 48	49.65	0.30	0.15	2.23	25.00	55.86	
CR 38 - CLL 49A Y 48	20.00	1.50	0.15	4.50	25.00	112.50	
CR 38 - CLL 49A Y 48	20.00	1.50	0.10	3.00	25.00	75.00	882.06
BOSTON - ENCISO							
CR 38A - CLL 5A Y 58	1.40	1.40	0.15	0.29	25.00	7.35	
CR 38A - CLL 5A Y 58	1.20	1.20	0.15	0.22	25.00	5.40	
CR 38A - CLL 5A Y 58	3.10	1.20	0.15	0.58	25.00	13.95	
CR 38A - CLL 5A Y 58	1.20	1.40	0.15	0.25	25.00	6.30	
CR 38A - CLL 5A Y 58	10.00	1.30	0.15	1.95	25.00	48.75	
CR 38A - CLL 5A Y 58	1.40	1.20	0.15	0.25	25.00	6.30	
CR 38A - CLL 5A Y 58	4.30	1.40	0.15	0.90	25.00	22.58	
CR 38A - CLL 5A Y 58	3.80	1.30	0.10	0.49	25.00	12.35	
CR 38A - CLL 5A Y 58	3.60	1.80	0.10	0.65	25.00	16.20	
CR 38A - CLL 5A Y 58	3.80	1.30	0.15	0.74	25.00	18.53	
CR 38A - CLL 5A Y 58	3.60	1.80	0.15	0.97	25.00	24.30	
CR 38A - CLL 5A Y 58	1.36	0.90	0.40	0.49	25.00	12.24	
CR 38A - CLL 5A Y 58	21.00	0.35	0.50	3.68	25.00	91.88	286.12
LA CANDELARIA - BOSTON							
CLL 5A - CR 4 Y CR 40	2.06	2.00	0.10	0.41	25.00	10.30	
CLL 5A - CR 4 Y CR 40	9.92	0.35	0.30	1.04	25.00	26.04	36.34
Del 28 de julio al 03 de agosto							
SAN DIEGO							
CL 31 CR 42B Y 42A	4.10	1.10	0.15	0.68	25.00	16.91	
CL 31 CR 42B Y 42A	2.00	2.50	0.15	0.75	25.00	18.75	
CL 31 CR 42B Y 42A	2.25	1.95	0.15	0.66	25.00	16.45	
CL 31 CR 42B Y 42A	11.20	1.25	0.15	2.10	25.00	52.50	
CL 31 CR 42B Y 42A	20.90	1.10	0.15	3.45	25.00	86.21	
CL 31 CR 42B Y 42A	4.00	2.10	0.15	1.26	25.00	31.50	
CL 31 CR 42B Y 42A	2.60	2.40	0.15	0.94	25.00	23.40	
CL 31 CR 42B Y 42A	8.00	2.50	0.25	5.00	25.00	125.00	
CL 31 CR 42B Y 42A	47.05	0.30	0.50	7.06	25.00	176.44	547.17
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS	6.43	2.22	0.10	1.43	25.00	35.69	

CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS	64,00	1,10	0,10	7,04	25,00	176,00	
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS	6,43	2,22	0,15	2,14	25,00	53,53	
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS	64,00	1,10	0,15	10,56	25,00	264,00	
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS	70,43	0,30	0,35	7,40	25,00	184,88	714,10
BOMBONÁ I							
CLL 49A - CR 37 Y 38	69,30	1,40	0,15	14,55	25,00	363,83	
CLL 49A - CR 37 Y 38	17,04	3,55	0,15	9,07	25,00	226,85	
CLL 49A - CR 37 Y 38	4,98	1,94	0,15	1,45	25,00	36,23	
CLL 49A - CR 37 Y 38	9,06	2,04	0,15	2,77	25,00	69,31	
CLL 49A - CR 37 Y 38	69,30	1,40	0,10	9,70	25,00	242,55	
CLL 49A - CR 37 Y 38	17,04	3,55	0,10	6,05	25,00	151,23	
CLL 49A - CR 37 Y 38	4,98	1,94	0,10	0,97	25,00	24,15	
CLL 49A - CR 37 Y 38	9,06	2,04	0,10	1,85	25,00	46,21	
CLL 49A - CR 37 Y 38	4,80	2,51	0,15	1,81	25,00	45,18	
CLL 49A - CR 37 Y 38	12,06	1,30	0,15	2,35	25,00	58,79	
CLL 49A - CR 37 Y 38	4,80	2,51	0,10	1,20	25,00	30,12	
CLL 49A - CR 37 Y 38	12,06	1,30	0,10	1,57	25,00	39,20	
CLL 49A - CR 37 Y 38	100,38	0,35	0,30	10,54	25,00	263,50	1.597,13
BOSTON - ENCISO							
CR 36A - CLL 54 Y 58	1,30	1,50	0,15	0,29	25,00	7,31	7,31

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				9
FECHA	DD	3	MM	8	AA	2025	PERÍODO	16/06/2025 - 3/08/2025	ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
CONTRATO No	4600102792 DE 2024 — FECHA DE INICIO

ÍTEM	3.3.2	DESCRIPCIÓN	Derechos de Botadero en sitio autorizado por la Autoridad Ambiental	UNID.		PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.









LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN	MEDIDA TOTAL
Del 16 al 22 de junio					
POBLADO - LAS LOMAS					
CR 31A - CLL 11A Y 11	11,20	1,50	0,06	1,01	
CR 31A - CLL 11A Y 11	11,20	0,30	0,50	1,68	
CR 31A - CLL 11A Y 11	13,20	0,30	0,35	1,39	
CR 31A - CLL 11A Y 11	16,80	1,50	0,19	4,79	
CR 31A - CLL 11A Y 11	102,00	0,30	0,50	15,30	
CR 31A - CLL 11A Y 11	54,60	0,30	0,50	8,19	
CR 31A - CLL 11A Y 11	59,40	0,30	0,35	6,24	**38,59**
CLL 11 - CR 31A Y 30	15,15	0,30	0,40	1,82	
CLL 11 - CR 31A Y 30	11,55	1,00	0,15	1,73	**3,55**
CLL 11B - CR 34 Y CL 11A	12,00	1,30	0,08	1,25	
CLL 11B - CR 34 Y CL 11A	5,80	1,10	0,08	0,51	
CLL 11B - CR 34 Y CL 11A	9,00	2,35	0,08	1,69	
CLL 11B - CR 34 Y CL 11A	10,00	2,35	0,08	1,88	
CLL 11B - CR 34 Y CL 11A	3,50	1,30	0,08	0,36	
CLL 11B - CR 34 Y CL 11A	3,00	2,35	0,08	0,56	
CLL 11B - CR 34 Y CL 11A	43,30	0,30	0,50	6,50	
CLL 11B - CR 34 Y CL 11A	23,50	0,30	0,35	2,47	**15,22**
CLL 11B - CR 34 Y CL 11A	18,00	1,30	0,17	3,98	
CLL 11B - CR 34 Y CL 11A	8,70	1,10	0,17	1,63	
CLL 11B - CR 34 Y CL 11A	13,50	2,35	0,17	5,39	
CLL 11B - CR 34 Y CL 11A	15,00	2,35	0,17	5,99	
CLL 11B - CR 34 Y CL 11A	5,25	1,30	0,17	1,16	
CLL 11B - CR 34 Y CL 11A	4,50	2,35	0,17	1,80	
CLL 11B - CR 34 Y CL 11A	64,95	0,30	0,50	9,74	
CLL 11B - CR 34 Y CL 11A	35,25	0,30	0,35	3,70	**33,39**
POBLADO - FLORIDA					
CLL 5G - CR 33	34,58	0,35	0,30	3,63	
CLL 5G - CR 33	7,45	0,35	0,50	1,30	
CLL 5G - CR 33	24,67	0,35	0,30	2,59	
CLL 5G - CR 33	21,20	0,35	0,30	2,23	
CLL 5G - CR 33	27,80	0,35	0,30	2,92	
CLL 5G - CR 33	12,20	1,50	0,10	1,83	
CLL 5G - CR 33	12,20	1,50	0,15	2,75	
CLL 5G - CR 33	14,80	1,25	0,10	1,85	
CLL 5G - CR 33	14,80	1,25	0,10	1,85	
CLL 5G - CR 33	16,35	0,35	0,20	1,14	
CLL 5G - CR 33	0,90	1,00	0,30	0,27	
CLL 5G - CR 33	1,53	0,35	0,50	0,27	
CLL 5G - CR 33	0,55	0,30	0,16	0,03	**22,65**
BOMBONÁ I					
CL 49A - CR 37 Y 38	5,80	4,90	0,10	2,84	
CL 49A - CR 37 Y 38	10,17	2,15	0,10	2,19	
CL 49A - CR 37 Y 38	1,78	1,81	0,10	0,32	
CL 49A - CR 37 Y 38	5,48	1,95	0,10	1,07	
CL 49A - CR 37 Y 38	32,05	2,40	0,10	7,69	
CL 49A - CR 37 Y 38	2,93	2,38	0,10	0,70	
CL 49A - CR 37 Y 38	5,80	4,90	0,15	4,26	
CL 49A - CR 37 Y 38	3,43	2,80	0,40	3,84	
CL 49A - CR 37 Y 38	10,17	2,15	0,15	3,28	
CL 49A - CR 37 Y 38	1,78	1,81	0,15	0,48	
CL 49A - CR 37 Y 38	5,48	1,95	0,15	1,60	
CL 49A - CR 37 Y 38	32,05	2,40	0,15	11,54	
CL 49A - CR 37 Y 38	2,93	2,38	0,15	1,05	**40,86**
LA CANDELARIA - BOSTON					
CR 40 - CL 54 Y 56	17,37	2,22	0,10	3,86	

















CR 40 - CL 54 Y 56	4,98	2,41	0,10	1,20	
CR 40 - CL 54 Y 56	5,06	2,41	0,10	1,22	
CR 40 - CL 54 Y 56	10,37	2,35	0,10	2,44	
CR 40 - CL 54 Y 56	3,79	2,30	0,10	0,87	
CR 40 - CL 54 Y 56	7,61	2,35	0,10	1,79	
CR 40 - CL 54 Y 56	17,15	2,30	0,10	3,94	
CR 40 - CL 54 Y 56	17,37	2,22	0,15	5,78	
CR 40 - CL 54 Y 56	4,98	2,41	0,15	1,80	
CR 40 - CL 54 Y 56	5,06	2,41	0,15	1,83	
CR 40 - CL 54 Y 56	10,37	2,35	0,15	3,66	
CR 40 - CL 54 Y 56	3,79	2,30	0,15	1,31	
CR 40 - CL 54 Y 56	7,61	2,35	0,15	2,68	
CR 40 - CL 54 Y 56	17,15	2,30	0,15	5,92	**38,29**
BOSTON - ENCISO					
CLL 57 - CR 36A Y CR 37	8,94	2,23	0,10	1,99	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37	0,78	1,35	0,10	0,11	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37	2,28	1,60	0,10	0,36	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37	0,81	1,45	0,10	0,12	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37	6,88	1,70	0,10	1,17	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37	0,81	1,00	0,10	0,08	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37	8,94	2,23	0,50	9,97	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37	0,78	1,35	0,50	0,53	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37	2,28	1,60	0,50	1,82	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37	0,81	1,45	0,50	0,59	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37	6,88	1,70	0,50	5,84	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37	0,81	1,00	0,50	0,41	**22,99**
Del 23 al 29 de junio					
POBLADO - LAS LOMAS					
CR 31A - CLL 11A Y 11	3,50	2,74	0,06	0,58	
CR 31A - CLL 11A Y 11	2,10	1,50	0,06	0,19	
CR 31A - CLL 11A Y 11	4,60	2,90	0,06	0,80	
CR 31A - CLL 11A Y 11	2,10	1,50	0,06	0,19	
CR 31A - CLL 11A Y 11	10,00	3,70	0,06	2,22	
CR 31A - CLL 11A Y 11	5,50	2,94	0,06	0,97	
CR 31A - CLL 11A Y 11	13,00	0,30	0,50	1,95	
CR 31A - CLL 11A Y 11	5,00	0,30	0,35	0,53	
CR 31A - CLL 11A Y 11	5,25	2,74	0,19	2,73	
CR 31A - CLL 11A Y 11	3,15	1,50	0,19	0,90	
CR 31A - CLL 11A Y 11	8,25	2,94	0,19	4,61	
CR 31A - CLL 11A Y 11	19,50	0,30	0,50	2,93	
CR 31A - CLL 11A Y 11	8,25	0,30	0,35	0,87	**19,45**
CLL 11 - CR 31A Y 30	2,60	2,60	0,07	0,47	
CLL 11 - CR 31A Y 30	5,00	3,30	0,07	1,16	
CLL 11 - CR 31A Y 30	33,20	1,50	0,07	3,49	
CLL 11 - CR 31A Y 30	31,00	1,35	0,10	4,19	
CLL 11 - CR 31A Y 30	63,10	0,30	0,50	9,47	
CLL 11 - CR 31A Y 30	2,60	2,60	0,18	1,22	
CLL 11 - CR 31A Y 30	5,00	3,30	0,18	2,97	
CLL 11 - CR 31A Y 30	33,20	1,50	0,18	8,96	**31,92**
CLL 11B - CR 34 Y CL 11A	60,00	1,40	0,08	6,72	
CLL 11B - CR 34 Y CL 11A	20,00	1,50	0,08	2,40	
CLL 11B - CR 34 Y CL 11A	18,00	1,50	0,08	2,16	
CLL 11B - CR 34 Y CL 11A	5,90	2,95	0,08	1,39	
CLL 11B - CR 34 Y CL 11A	103,90	0,30	0,50	15,59	
CLL 11B - CR 34 Y CL 11A	62,00	0,30	0,35	6,51	
CLL 11B - CR 34 Y CL 11A	90,00	1,40	0,17	21,42	
CLL 11B - CR 34 Y CL 11A	90,00	0,30	0,50	13,50	
CLL 11B - CR 34 Y CL 11A	93,00	0,30	0,35	9,77	
CLL 11B - CR 34 Y CL 11A	30,00	1,50	0,17	7,65	
CLL 11B - CR 34 Y CL 11A	27,00	1,50	0,17	6,89	
CLL 11B - CR 34 Y CL 11A	9,09	2,95	0,17	4,56	
CLL 11B - CR 34 Y CL 11A	65,85	0,30	0,50	9,88	**108,42**
BOMBONÁ I					
CR 38 - CLL 49A Y 48	5,70	4,70	0,10	2,68	
CR 38 - CLL 49A Y 48	16,83	2,60	0,10	4,38	
CR 38 - CLL 49A Y 48	9,87	3,55	0,10	3,50	
CR 38 - CLL 49A Y 48	29,08	2,99	0,10	8,69	
CR 38 - CLL 49A Y 48	5,70	4,70	0,15	4,02	
CR 38 - CLL 49A Y 48	16,83	2,60	0,15	6,56	
CR 38 - CLL 49A Y 48	9,87	3,55	0,15	5,26	
CR 38 - CLL 49A Y 48	29,08	2,99	0,15	13,04	**48,13**
LA CANDELARIA - BOSTON				0,00	
CR 40 - CL 54 Y 56	9,54	4,79	0,10	4,57	
CR 40 - CL 54 Y 56	19,18	2,02	0,10	3,87	
CR 40 - CL 54 Y 56	9,54	4,79	0,15	6,85	
CR 40 - CL 54 Y 56	19,18	2,02	0,15	5,81	**21,11**
BOSTON - ENCISO					
CLL 57 - CR 36A Y CR 37	3,06	3,44	0,10	1,05	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37	9,57	1,83	0,10	1,75	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37	5,16	1,43	0,10	0,74	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37	4,50	3,40	0,10	1,53	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37	11,07	2,05	0,10	2,27	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37	5,63	1,35	0,10	0,76	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37	3,06	3,44	0,15	1,58	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37	9,57	1,83	0,15	2,63	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37	5,16	1,43	0,15	1,11	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37	4,50	3,40	0,15	2,30	

















CLL 57 - CR 36A Y CR 37	11,07	2,05	0,15	3,40	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37	5,63	1,35	0,15	1,14	**20,25**
Del 30 de junio al 06 de julio					
POBLADO - LAS LOMAS					
CLL 11B - CR 34 Y CL 11A	46,8	0,3	0,5	7,02	
CLL 11B - CR 34 Y CL 11A	21,5	0,3	0,35	2,26	**9,28**
CLL 11 - CR 31A Y 30	5	3,3	0,25	4,13	
CLL 11 - CR 31A Y 30	68,1	0,3	0,5	10,22	
CLL 11 - CR 31A Y 30	15,8	0,3	0,35	1,66	**16,00**
CR 31A - CLL 11A Y 11	38	0,3	0,5	5,70	
CR 31A - CLL 11A Y 11	25	0,3	0,35	2,63	**8,33**
LA CANDELARIA - SAN DIEGO					
CLL 31 - CR 42B Y 42A	12,00	1,50	0,10	1,80	
CLL 31 - CR 42B Y 42A	3,30	1,50	0,10	0,50	
CLL 31 - CR 42B Y 42A	0,90	2,40	0,10	0,22	
CLL 31 - CR 42B Y 42A	19,00	1,20	0,10	2,28	
CLL 31 - CR 42B Y 42A	5,90	1,15	0,10	0,68	
CLL 31 - CR 42B Y 42A	12,00	1,50	0,15	2,70	
CLL 31 - CR 42B Y 42A	3,30	1,50	0,15	0,74	
CLL 31 - CR 42B Y 42A	0,90	2,40	0,15	0,32	
CLL 31 - CR 42B Y 42A	19,00	1,20	0,15	3,42	
CLL 31 - CR 42B Y 42A	5,90	1,15	0,15	1,02	
CLL 31 - CR 42B Y 42A	5,80	3,30	0,25	4,79	
CLL 31 - CR 42B Y 42A	35,00	0,50	0,30	5,25	**23,71**
BOMBONÁ I					
CR 38 - CLL 49A Y 48	44,25	2,50	0,15	16,59	
CR 38 - CLL 49A Y 48	1,75	2,60	0,15	0,68	
CR 38 - CLL 49A Y 48	1,92	2,75	0,15	0,79	
CR 38 - CLL 49A Y 48	44,25	2,50	0,10	11,06	
CR 38 - CLL 49A Y 48	1,75	2,60	0,10	0,46	
CR 38 - CLL 49A Y 48	1,92	2,75	0,10	0,53	
CR 38 - CLL 49A Y 48	88,50	0,35	0,30	9,29	
CR 38 - CLL 49A Y 48	40,73	0,35	0,50	7,13	
CR 38 - CLL 49A Y 48	61,70	0,35	0,30	6,48	
CR 38 - CLL 49A Y 48	47,70	0,35	0,50	8,35	
CR 38 - CLL 49A Y 48	68,86	0,35	0,30	7,23	
CR 38 - CLL 49A Y 48	19,20	3,50	0,15	10,08	
CR 38 - CLL 49A Y 48	19,20	3,50	0,10	6,72	
CR 38 - CLL 49A Y 48	19,20	0,35	0,50	3,36	
CR 38 - CLL 49A Y 48	26,70	0,35	0,30	2,80	
CR 38 - CLL 49A Y 48	24,38	0,35	0,30	2,56	
CR 38 - CLL 49A Y 48	105,89	0,35	0,50	18,53	
CR 38 - CLL 49A Y 48	5,31	3,62	0,15	2,88	
CR 38 - CLL 49A Y 48	18,65	1,15	0,15	3,22	
CR 38 - CLL 49A Y 48	5,31	3,62	0,10	1,92	
CR 38 - CLL 49A Y 48	18,65	1,15	0,10	2,14	
CR 38 - CLL 49A Y 48	23,96	0,35	0,30	2,52	**125,33**
BOSTON - ENCISO					
CR 36A - CL 54 Y 58	14,2	1,6	0,1	2,27	
CR 36A - CL 54 Y 58	22	1,45	0,2	6,38	
CR 36A - CL 54 Y 58	22	1,45	0,1	3,19	
CR 36A - CL 54 Y 58	168,9	0,35	0,3	17,73	
CR 36A - CL 54 Y 58	159,75	0,35	0,5	27,96	**57,53**
LA CANDELARIA - BOSTON					
CL 54 - CR 41 Y 40	15,40	2,40	0,12	4,44	
CL 54 - CR 41 Y 40	3,00	2,10	0,10	0,63	
CL 54 - CR 41 Y 40	4,34	1,84	0,10	0,80	
CL 54 - CR 41 Y 40	15,40	2,40	0,15	5,54	
CL 54 - CR 41 Y 40	9,00	1,20	0,10	1,08	
CL 54 - CR 41 Y 40	4,34	1,75	0,15	1,14	
CL 54 - CR 41 Y 40	384,65	0,30	0,30	34,62	
CL 54 - CR 41 Y 40	127,99	0,30	0,50	19,20	**67,44**
Del 7 al 13 de julio					
POBLADO - LAS LOMAS					
CLL 11B - CR 34 Y CLL 11A	6,50	2,30	0,08	1,20	
CLL 11B - CR 34 Y CLL 11A	12,20	1,38	0,08	1,35	
CLL 11B - CR 34 Y CLL 11A	8,00	1,10	0,08	0,70	
CLL 11B - CR 34 Y CLL 11A	5,13	1,60	0,08	0,66	
CLL 11B - CR 34 Y CLL 11A	28,70	1,25	0,08	2,87	
CLL 11B - CR 34 Y CLL 11A	89,00	0,30	0,50	13,35	
CLL 11B - CR 34 Y CLL 11A	73,43	0,30	0,35	7,71	
CLL 11B - CR 34 Y CLL 11A	9,75	2,30	0,17	3,81	
CLL 11B - CR 34 Y CLL 11A	7,70	1,60	0,17	2,09	
CLL 11B - CR 34 Y CLL 11A	18,30	1,38	0,17	4,29	
CLL 11B - CR 34 Y CLL 11A	12,00	1,10	0,17	2,24	
CLL 11B - CR 34 Y CLL 11A	43,05	1,25	0,17	9,15	
CLL 11B - CR 34 Y CLL 11A	133,50	0,30	0,50	20,03	
CLL 11B - CR 34 Y CLL 11A	110,15	0,30	0,35	11,57	**81,01**
CR 31A - CLL 11A Y 11	2,00	2,00	0,10	0,40	
CR 31A - CLL 11A Y 11	28,00	1,45	0,10	4,06	
CR 31A - CLL 11A Y 11	17,00	2,85	0,10	4,85	
CR 31A - CLL 11A Y 11	41,30	1,50	0,10	6,20	
CR 31A - CLL 11A Y 11	32,00	0,30	0,50	4,80	
CR 31A - CLL 11A Y 11	12,00	0,30	0,35	1,26	
CR 31A - CLL 11A Y 11	3,00	2,00	0,20	1,20	
CR 31A - CLL 11A Y 11	42,00	1,45	0,20	12,18	
CR 31A - CLL 11A Y 11	25,50	2,85	0,20	14,54	

CR 31A - CLL 11A Y 11	48.00	0.30	0.50	7.20	
SAN DIEGO				-	
CR 31A - CLL 11A Y 11	18.00	0.30	0.35	1.89	58.57
CLL 31 - CR 42B Y 42A	50.00	1.10	0.15	8.25	
CLL 31 - CR 42B Y 42A	7.10	2.60	0.15	2.77	
CLL 31 - CR 42B Y 42A	11.60	9.80	0.15	17.05	
CLL 31 - CR 42B Y 42A	50.00	1.10	0.10	5.50	
CLL 31 - CR 42B Y 42A	7.10	2.60	0.10	1.85	
CLL 31 - CR 42B Y 42A	11.60	9.80	0.10	11.37	
BOMBONA I					
CLL 31 - CR 42B Y 42A	103.00	0.30	0.50	15.45	62.24
CLL 49A - CR 37 Y 38	3.04	2.33	0.15	1.06	
CLL 49A - CR 37 Y 38	5.33	4.70	0.15	3.76	
CLL 49A - CR 37 Y 38	3.19	2.45	0.15	1.17	
CLL 49A - CR 37 Y 38	2.90	4.82	0.15	2.10	
CLL 49A - CR 37 Y 38	1.64	2.35	0.15	0.58	
CLL 49A - CR 37 Y 38	3.04	2.33	0.10	0.71	
CLL 49A - CR 37 Y 38	5.33	4.70	0.10	2.51	
CLL 49A - CR 37 Y 38	3.19	2.45	0.10	0.78	
CLL 49A - CR 37 Y 38	2.90	4.82	0.10	1.40	
CLL 49A - CR 37 Y 38	1.64	2.35	0.10	0.39	
CLL 49A - CR 37 Y 38	8.23	0.35	0.50	1.44	
CLL 49A - CR 37 Y 38	60.15	0.35	0.30	6.32	
CR 38 - CLL 49A Y 48	24.00	1.50	0.15	5.40	
CR 38 - CLL 49A Y 48	3.63	6.80	0.15	3.70	
CR 38 - CLL 49A Y 48	10.65	3.63	0.15	5.80	
CR 38 - CLL 49A Y 48	6.52	4.07	0.15	3.96	
CR 38 - CLL 49A Y 48	51.91	1.09	0.15	8.49	
CR 38 - CLL 49A Y 48	24.00	1.50	0.10	3.60	
CR 38 - CLL 49A Y 48	3.63	6.80	0.10	2.47	
CR 38 - CLL 49A Y 48	10.65	3.63	0.10	3.87	
CR 38 - CLL 49A Y 48	6.52	4.07	0.10	2.65	
CR 38 - CLL 49A Y 48	51.91	1.09	0.10	5.66	
CR 38 - CLL 49A Y 48	17.45	0.35	0.30	1.83	
CR 38 - CLL 49A Y 48	75.87	0.35	0.50	13.28	82.93
BOSTON - ENCISO					
CR 38A - CLL 54 Y 58	22.50	1.45	0.10	3.26	
CR 38A - CLL 54 Y 58	22.50	1.45	0.15	4.89	
CR 38A - CLL 54 Y 58	21.00	1.85	0.10	3.89	
CR 38A - CLL 54 Y 58	21.00	1.85	0.15	5.83	
CR 38A - CLL 54 Y 58	44.50	0.70	0.15	4.67	
CR 38A - CLL 54 Y 58	44.50	0.60	0.50	13.35	35.89
LA CANDELARIA - BOSTON					
CLL 54 - CR 41 Y CR 40	41.55	2.16	0.10	8.97	
CLL 54 - CR 41 Y CR 40	20.60	2.20	0.10	4.53	
CLL 54 - CR 41 Y CR 40	6.60	1.85	0.10	1.29	
CLL 54 - CR 41 Y CR 40	14.30	2.16	0.15	4.63	
CLL 54 - CR 41 Y CR 40	4.00	2.20	0.10	0.88	
CLL 54 - CR 41 Y CR 40	3.85	2.20	0.10	0.85	
CLL 54 - CR 41 Y CR 40	2.55	2.20	0.10	0.56	
CLL 54 - CR 41 Y CR 40	1.68	2.20	0.10	0.37	
CLL 54 - CR 41 Y CR 40	1.68	2.20	0.10	0.37	
CLL 54 - CR 41 Y CR 40	4.97	2.20	0.27	2.95	
CLL 54 - CR 41 Y CR 40	3.30	2.20	0.27	1.96	
CLL 54 - CR 41 Y CR 40	6.20	2.20	0.27	3.68	
CLL 54 - CR 41 Y CR 40	4.00	2.20	0.15	1.32	
CLL 54 - CR 41 Y CR 40	3.85	2.20	0.15	1.27	
CLL 54 - CR 41 Y CR 40	2.55	2.20	0.15	0.84	
CLL 54 - CR 41 Y CR 40	1.68	2.20	0.15	0.55	
CLL 54 - CR 41 Y CR 40	117.54	0.35	0.30	12.34	
CLL 54 - CR 41 Y CR 40	1.68	2.20	0.15	0.55	
CLL 54 - CR 41 Y CR 40	71.56	0.35	0.50	12.52	
CLL 54 - CR 41 Y CR 40	41.55	2.16	0.18	16.15	
CLL 54 - CR 41 Y CR 40	20.60	2.20	0.18	8.16	
CLL 54 - CR 41 Y CR 40	6.60	1.85	0.18	2.32	87.08
Del 14 al 20 de Julio					
SAN DIEGO					
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS	9.80	2.40	0.13	3.06	
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS	61.40	1.20	0.13	9.58	
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS	61.40	0.15	0.13	1.20	
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS	64.00	0.15	0.13	1.25	
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS	2.20	2.40	0.12	0.63	
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS	9.80	2.40	0.12	2.82	
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS	61.40	1.20	0.12	8.84	
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS	61.40	0.30	0.50	9.21	
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS	64.00	0.30	0.35	6.72	43.31
CLL 31 - CR 42B Y 42A	5.74	2.50	0.12	1.72	
CLL 31 - CR 42B Y 42A	7.20	1.20	0.12	1.04	
CLL 31 - CR 42B Y 42A	2.88	1.00	0.12	0.35	
CLL 31 - CR 42B Y 42A	10.00	2.00	0.12	2.40	
CLL 31 - CR 42B Y 42A	15.93	1.00	0.12	1.91	
CLL 31 - CR 42B Y 42A	8.64	1.00	0.12	1.04	
CLL 31 - CR 42B Y 42A	6.80	1.00	0.12	0.82	
CLL 31 - CR 42B Y 42A	3.30	2.50	0.12	0.99	
CLL 31 - CR 42B Y 42A	35.50	1.20	0.12	5.11	
CLL 31 - CR 42B Y 42A	14.40	1.20	0.12	2.07	
CLL 31 - CR 42B Y 42A	16.20	1.00	0.12	1.94	

CLL 31 - CR 42B Y 42A	59.05	1.00	0.12	7.09	
CLL 31 - CR 42B Y 42A	11.55	1.00	0.12	1.39	
CLL 31 - CR 42B Y 42A	5.74	2.50	0.13	1.87	
CLL 31 - CR 42B Y 42A	7.20	1.20	0.13	1.12	
CLL 31 - CR 42B Y 42A	2.88	1.00	0.13	0.37	
CLL 31 - CR 42B Y 42A	10.00	2.00	0.13	2.60	
CLL 31 - CR 42B Y 42A	15.93	1.00	0.13	2.07	
CLL 31 - CR 42B Y 42A	8.64	1.00	0.13	1.12	
CLL 31 - CR 42B Y 42A	6.80	1.00	0.13	0.88	
CLL 31 - CR 42B Y 42A	3.30	2.50	0.13	1.07	
CLL 31 - CR 42B Y 42A	35.50	1.20	0.13	5.54	
CLL 31 - CR 42B Y 42A	14.40	1.20	0.13	2.25	
CLL 31 - CR 42B Y 42A	16.20	1.00	0.13	2.11	
CLL 31 - CR 42B Y 42A	59.05	1.00	0.13	7.68	
CLL 31 - CR 42B Y 42A	102.60	0.30	0.60	15.38	
CLL 31 - CR 42B Y 42A	8.80	0.30	0.35	1.03	72.94
BOMBONA I					
CR 38 - CLL 49A Y 48	11.60	1.50	0.10	1.74	
CR 38 - CLL 49A Y 48	1.90	1.50	0.10	0.29	
CR 38 - CLL 49A Y 48	12.50	4.00	0.10	5.00	
CR 38 - CLL 49A Y 48	13.18	3.96	0.10	5.22	
CR 38 - CLL 49A Y 48	11.60	1.50	0.15	2.61	
CR 38 - CLL 49A Y 48	1.90	1.50	0.15	0.43	
CR 38 - CLL 49A Y 48	37.50	0.35	0.30	3.94	19.22
CLL 49A - CR 37 Y 38	74.02	1.10	0.10	8.14	
CLL 49A - CR 37 Y 38	74.02	1.10	0.15	12.21	
CLL 49A - CR 37 Y 38	74.02	0.35	0.30	7.77	28.13
BOSTON - ENCISO					
CR 36A - CLL 54 Y 58	1.40	1.40	0.10	0.20	
CR 36A - CLL 54 Y 58	1.20	1.20	0.10	0.14	
CR 36A - CLL 54 Y 58	3.10	1.20	0.10	0.37	
CR 36A - CLL 54 Y 58	1.20	1.40	0.10	0.17	
CR 36A - CLL 54 Y 58	10.00	1.30	0.10	1.30	
CR 36A - CLL 54 Y 58	1.40	1.20	0.10	0.17	
CR 36A - CLL 54 Y 58	4.30	1.40	0.10	0.60	
CR 36A - CLL 54 Y 58	1.35	1.20	0.10	0.16	
CR 36A - CLL 54 Y 58	5.20	1.25	0.10	0.65	
CR 36A - CLL 54 Y 58	106.96	0.35	0.30	11.23	
CR 36A - CLL 54 Y 58	26.20	0.35	0.50	4.59	
CR 36A - CLL 54 Y 58	1.20	1.35	0.15	0.24	
CR 36A - CLL 54 Y 58	5.20	1.40	0.15	1.09	
CR 36A - CLL 54 Y 58	3.00	2.20	0.10	0.66	
CR 36A - CLL 54 Y 58	3.00	2.20	0.15	0.99	
CR 36A - CLL 54 Y 58	3.00	5.10	0.20	3.06	
CR 36A - CLL 54 Y 58	3.00	5.10	0.05	0.77	26.39
BOMBONA II					
CR 9A - CLL 44AA 45	20.00	2.00	0.25	10.00	10.00
Del 21 al 27 de Julio					
SAN DIEGO					
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS	7.00	3.00	0.10	2.10	
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS	49.00	1.70	0.10	8.33	
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS	5.30	5.00	0.10	2.65	
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS	5.10	2.75	0.10	1.40	
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS	20.20	1.19	0.10	2.40	
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS	7.00	3.00	0.15	3.15	
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS	49.00	1.70	0.15	12.50	
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS	5.30	5.00	0.15	3.98	
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS	5.10	2.75	0.15	2.10	
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS	20.20	1.19	0.15	3.61	
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS	89.60	0.30	0.50	13.43	
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS	54.80	0.30	0.35	5.75	61.38
CLL 31 - CR 42B Y 42A	4.10	1.10	0.10	0.45	
CLL 31 - CR 42B Y 42A	2.00	2.50	0.10	0.50	
CLL 31 - CR 42B Y 42A	2.25	1.95	0.10	0.44	
CLL 31 - CR 42B Y 42A	11.20	1.25	0.10	1.40	
CLL 31 - CR 42B Y 42A	4.00	2.10	0.10	0.84	
CLL 31 - CR 42B Y 42A	20.90	1.10	0.10	2.30	
CLL 31 - CR 42B Y 42A	2.60	2.40	0.10	0.62	
CLL 31 - CR 42B Y 42A	56.85	0.30	0.50	8.53	
CLL 31 - CR 42B Y 42A	9.80	0.30	0.35	1.03	16.11
POBLADO - LAS LOMAS					
CR 31A - CLL 11A Y 11	50.00	1.40	0.10	7.00	
CR 31A - CLL 11A Y 11	3.80	2.80	0.10	1.08	
CR 31A - CLL 11A Y 11	40.00	1.60	0.10	6.40	
CR 31A - CLL 11A Y 11	95.80	0.30	0.50	14.37	
CR 31A - CLL 11A Y 11	49.60	0.30	0.35	5.21	
CR 31A - CLL 11A Y 11	45.80	0.30	0.50	6.87	
CR 31A - CLL 11A Y 11	49.60	0.30	0.35	5.21	
CR 31A - CLL 11A Y 11	3.80	2.80	0.25	2.66	
CR 31A - CLL 11A Y 11	40.00	1.60	0.15	9.60	
CR 31A - CLL 11A Y 11	17.00	0.30	0.50	2.55	60.93
BOMBONA I					
CLL 49A - CR 37 Y 38	9.90	3.30	0.10	3.27	
CLL 49A - CR 37 Y 38	11.04	1.02	0.10	1.13	
CLL 49A - CR 37 Y 38	1.15	2.34	0.10	0.27	
CLL 49A - CR 37 Y 38	24.56	1.01	0.10	2.48	
CLL 49A - CR 37 Y 38	2.90	2.52	0.10	0.73	

CLL 49A - CR 37 Y 38	6.54	1.09	0.10	0.71	
CLL 49A - CR 37 Y 38	1.40	1.18	0.10	0.17	
CLL 49A - CR 37 Y 38	10.50	1.30	0.10	1.37	
CLL 49A - CR 37 Y 38	3.12	3.46	0.10	1.08	
CLL 49A - CR 37 Y 38	1.70	1.05	0.10	0.18	
CLL 49A - CR 37 Y 38	1.70	1.07	0.10	0.18	
CLL 49A - CR 37 Y 38	1.97	3.60	0.10	0.71	
CLL 49A - CR 37 Y 38	1.12	2.35	0.10	0.26	
CLL 49A - CR 37 Y 38	4.90	3.55	0.10	1.74	
CLL 49A - CR 37 Y 38	0.80	1.10	0.10	0.09	
CLL 49A - CR 37 Y 38	0.80	1.55	0.10	0.12	
CLL 49A - CR 37 Y 38	5.30	3.35	0.10	1.78	
CLL 49A - CR 37 Y 38	4.70	1.70	0.10	0.80	
CLL 49A - CR 37 Y 38	69.30	1.40	0.10	9.70	
CLL 49A - CR 37 Y 38	17.04	3.55	0.10	6.05	
CLL 49A - CR 37 Y 38	4.98	1.94	0.10	0.97	
CLL 49A - CR 37 Y 38	9.06	2.04	0.10	1.85	
CLL 49A - CR 37 Y 38	9.90	3.30	0.15	4.90	
CLL 49A - CR 37 Y 38	11.04	1.02	0.15	1.68	
CLL 49A - CR 37 Y 38	1.15	2.34	0.15	0.40	
CLL 49A - CR 37 Y 38	10.50	1.30	0.15	2.05	
CLL 49A - CR 37 Y 38	3.12	3.46	0.15	1.62	
CLL 49A - CR 37 Y 38	1.70	1.05	0.15	0.27	
CLL 49A - CR 37 Y 38	1.70	1.07	0.15	0.27	
CLL 49A - CR 37 Y 38	1.97	3.60	0.15	1.06	
CLL 49A - CR 37 Y 38	1.12	2.35	0.15	0.39	
CLL 49A - CR 37 Y 38	4.90	3.55	0.15	2.61	
CLL 49A - CR 37 Y 38	0.80	1.10	0.15	0.13	
CLL 49A - CR 37 Y 38	0.80	1.55	0.15	0.19	
CLL 49A - CR 37 Y 38	5.30	3.35	0.15	2.66	
CLL 49A - CR 37 Y 38	4.70	1.70	0.15	1.20	
CLL 49A - CR 37 Y 38	28.17	0.35	0.30	2.96	
CLL 49A - CR 37 Y 38	69.30	1.40	0.15	14.55	
CLL 49A - CR 37 Y 38	17.04	3.55	0.15	9.07	
CLL 49A - CR 37 Y 38	4.98	1.94	0.15	1.45	
CLL 49A - CR 37 Y 38	9.06	2.04	0.15	2.77	
CLL 49A - CR 37 Y 38	69.30	1.40	0.10	9.70	
CLL 49A - CR 37 Y 38	17.04	3.55	0.10	6.05	
CR 38A - CLL 54 Y 58	1.20	1.40	0.15	0.22	
BOSTON - ENCINO					
CR 38 - CLL 49A Y 48	20.00	1.50	0.10	3.00	35.28
CR 38 - CLL 49A Y 48	20.00	1.50	0.15	4.50	
CR 38 - CLL 49A Y 48	49.65	0.30	0.15	2.23	
CR 38 - CLL 49A Y 48	13.18	3.96	0.10	5.22	
CR 38 - CLL 49A Y 48	12.50	4.00	0.10	5.00	
CR 38 - CLL 49A Y 48	13.18	3.96	0.15	7.83	
CR 38 - CLL 49A Y 48	12.50	4.00	0.15	7.50	
CLL 49A - CR 37 Y 38	100.38	0.35	0.30	10.54	96.41
CLL 49A - CR 37 Y 38	9.06	2.04	0.15	2.77	
CLL 49A - CR 37 Y 38	4.98	1.94	0.15	1.45	
CLL 49A - CR 37 Y 38	17.04	3.55	0.15	9.07	
CLL 49A - CR 37 Y 38	69.30	1.40	0.15	14.55	
CLL 49A - CR 37 Y 38	28.17	0.35	0.30	2.96	
CLL 49A - CR 37 Y 38	4.70	1.70	0.15	1.20	
CLL 49A - CR 37 Y 38	5.30	3.35	0.15	2.66	
CLL 49A - CR 37 Y 38	0.80	1.55	0.15	0.19	
CLL 49A - CR 37 Y 38	0.80	1.10	0.15	0.13	
CLL 49A - CR 37 Y 38	4.90	3.55	0.15	2.61	
CLL 49A - CR 37 Y 38	1.12	2.35	0.15	0.39	
CLL 49A - CR 37 Y 38	1.97	3.60	0.15	1.06	
CLL 49A - CR 37 Y 38	1.70	1.07	0.15	0.27	
CLL 49A - CR 37 Y 38	1.70	1.05	0.15	0.27	
CLL 49A - CR 37 Y 38	3.12	3.46	0.15	1.62	
CLL 49A - CR 37 Y 38	10.50	1.30	0.15	2.05	
CLL 49A - CR 37 Y 38	1.15	2.34	0.15	0.40	
CLL 49A - CR 37 Y 38	11.04	1.02	0.15	1.68	
CLL 49A - CR 37 Y 38	9.90	3.30	0.15	4.90	
CLL 49A - CR 37 Y 38	9.06	2.04	0.10	1.85	
CLL 49A - CR 37 Y 38	4.98	1.94	0.10	0.97	
CLL 49A - CR 37 Y 38	17.04	3.55	0.10	6.05	
CLL 49A - CR 37 Y 38	69.30	1.40	0.10	9.70	
CLL 49A - CR 37 Y 38	4.70	1.70	0.10	0.80	
CLL 49A - CR 37 Y 38	5.30	3.35	0.10	1.78	
CLL 49A - CR 37 Y 38	0.80	1.55	0.10	0.12	
CLL 49A - CR 37 Y 38	0.80	1.10	0.10	0.09	
CLL 49A - CR 37 Y 38	4.90	3.55	0.10	1.74	
CLL 49A - CR 37 Y 38	1.12	2.35	0.10	0.26	
CLL 49A - CR 37 Y 38	1.97	3.60	0.10	0.71	
CLL 49A - CR 37 Y 38	1.70	1.07	0.10	0.18	
CLL 49A - CR 37 Y 38	1.70	1.05	0.10	0.18	
CLL 49A - CR 37 Y 38	3.12	3.46	0.10	1.08	
CLL 49A - CR 37 Y 38	10.50	1.30	0.10	1.37	
CLL 49A - CR 37 Y 38	1.40	1.18	0.10	0.17	
CLL 49A - CR 37 Y 38	6.54	1.09	0.10	0.71	

CLL 49A - CR 37 Y 38	4,98	1,94	0,10	0,97		
CLL 49A - CR 37 Y 38	9,06	2,04	0,10	1,85		
CLL 49A - CR 37 Y 38	4,80	2,51	0,15	1,81		
CLL 49A - CR 37 Y 38	12,06	1,30	0,15	2,35		
CLL 49A - CR 37 Y 38	4,80	2,51	0,10	1,20		
CLL 49A - CR 37 Y 38	12,06	1,30	0,10	1,57		
CLL 49A - CR 37 Y 38	100,38	0,35	0,30	10,54		**63,89**
BOSTON - ENCISO						
CR 36A - CLL 54 Y 58	1,30	1,50	0,15	0,29		**0,29**
					Subtotal	**1.795,79**
					TOTAL	**1.795,79**

OBSERVACIONES: Las celdas señaladas de color verde, hacen referencia a la demolición y las de color azul, a las excavaciones pertinentes por frente de trabajo.

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA Nº	11
FECHA	DD	3	MM	8	AA	2025	PERÍODO	16/06/2025 - 3/08/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	

ÍTEM	4.1.2	DESCRIPCIÓN	Construcción de ESCALAS sobre entresuelo, en concreto 21 MPa., según diseño y condiciones del sitio. Incluye suministro, transporte y la colocación del concreto, formaleta de primera calidad en súper "T" de 18 mm. o su equivalente para acabado a la vista, contrahuellas, moldura chaflán en contrahuellas, vibrado, protección, curado, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción.	UNID.	m3	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.





LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			CANTIDAD (M3)	MEDIDA TOTAL
		LARGO	ANCHO	ESPESOR		
POBLADO - FLORIDA						
CLL 5G - CR 33		1,7	1,5	0,3	0,765	
CLL 5G - CR 33		0,6	1,2	0,2	0,144	**0,91**
Del 30 de junio al 06 de julio						
POBLADO - FLORIDA						
CLL 5G - CR 33		4,5	1,7	0,3	2,295	**2,30**
Del 14 al 20 de julio						
BOSTON - ENCISO						
CR 36A - CLL 54 Y 58		1,00	0,30	0,15	0,05	**0,05**
Del 28 de julio al 03 de agosto						
BOSTON - ENCISO						
CR 36A - CLL 54 Y 58		1,36	0,90	0,45	0,55	**0,55**
LA CANDELARIA - BOSTON						
CLL 54 - CR 41 Y CR 40		8,6	0,6	0,25	1,29	
CLL 54 - CR 41 Y CR 40		8,6	0,15	0,25	0,3225	
CLL 54 - CR 41 Y CR 40		8,46	0,6	0,25	1,269	
CLL 54 - CR 41 Y CR 40		8,46	0,15	0,25	0,31725	
CLL 54 - CR 41 Y CR 40		7,38	0,6	0,25	1,107	
CLL 54 - CR 41 Y CR 40		7,38	0,15	0,25	0,27675	**4,58**
Subtotal						**8,38**
TOTAL						**8,38**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	12
FECHA	DD	3	MM	8	AA	2025	PERÍODO	16/06/2025 - 3/08/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	

ÍTEM	4.1.4	DESCRIPCIÓN	Construcción de cárcamo en concreto de 17.5 Mpa. Incluye Tapa prefabricada de 40x40x8 cm. dimensiones 30x25 medidas internas, muros de 10 cm. La excavación y acero se pagara en su ítem respectivo.	UNID.	m	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.



LOCALIZACIÓN	LONGITUD	MEDIDA TOTAL
Del 16 al 22 de junio		
BOSTON - ENCISO	30,00	30,00
Subtotal		30,00
TOTAL		30,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN	CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA Nº	13
FECHA	DD	3	MM	8	AA	2025	PERÍODO	16/06/2025 - 3/08/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	

ÍTEM	4.1.5	DESCRIPCIÓN	Suministro, transporte y vaciado de concreto MR 35 kg/cm2 adicionado con microfibra de polipropileno para construcción de andén, espesor e=0,10 m. Incluye aditivo plastificante, corte y sellado de juntas cada 2,0 m. Acabado esgrafiado tipo Metro, según diseño S.I.F. El material de soporte (base o subsase) se pagará en su ítem respectivo. La interventoría y/o supervisión solicitarán los ensayos necesarios para verificar el MR requerido mediante la norma INVIAS E-414-22.	UNID.	m2	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.












LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES		CANTIDAD (M2)	MEDIDA TOTAL
		LARGO	ANCHO		
Del 16 al 22 de junio					
POBLADO - LAS LOMAS					
CR 31A - CLL 11A Y 11		12,00	1,45	17,40	
CR 31A - CLL 11A Y 11		13,20	2,35	31,02	
CR 31A - CLL 11A Y 11		11,20	1,15	12,88	**61,30**
CLL 11 - CR 31A Y 30		24,00	2,30	55,20	
CLL 11 - CR 31A Y 30		7,70	2,30	17,71	
CLL 11 - CR 31A Y 30		11,00	1,15	12,65	
CLL 11 - CR 31A Y 30		7,70	1,00	7,70	
MENOS CAJAS				-9,33	**83,93**
POBLADO - FLORIDA					
CLL 5G - CR 33		23,80	1,20	28,56	
CLL 5G - CR 33		3,70	1,10	4,07	
CLL 5G - CR 33		3,57	1,00	3,57	
CLL 5G - CR 33		2,70	2,20	5,94	
MENOS CAJAS				-2,53	**39,61**
BOMBONÁ I					
CL 49A - CR 37 Y 38		6,54	2,66	17,40	
CL 49A - CR 37 Y 38		3,73	3,25	12,12	
CL 49A - CR 37 Y 38		5,55	2,25	12,49	
CL 49A - CR 37 Y 38		8,64	4,80	42,43	
CL 49A - CR 37 Y 38		6,93	2,26	15,66	
CL 49A - CR 37 Y 38		3,43	2,80	9,60	
CL 49A - CR 37 Y 38		9,50	4,81	45,70	
CL 49A - CR 37 Y 38		6,60	2,52	16,63	
CL 49A - CR 37 Y 38		1,20	2,40	2,88	
CL 49A - CR 37 Y 38		5,80	4,90	28,42	
CL 49A - CR 37 Y 38		26,58	2,43	64,59	
CL 49A - CR 37 Y 38		2,20	2,30	5,06	
CL 49A - CR 37 Y 38		2,40	2,30	5,52	
CL 49A - CR 37 Y 38		5,40	2,51	13,55	
CL 49A - CR 37 Y 38		2,45	2,07	5,07	
MENOS CAJAS				-11,06	**266,08**
LA CANDELARIA - BOSTON					
CR 40 - CL 54 Y 56		17,37	2,22	38,56	
CR 40 - CL 54 Y 56		4,98	2,41	12,00	
CR 40 - CL 54 Y 56		5,06	2,41	12,19	
CR 40 - CL 54 Y 56		10,37	2,35	24,37	
CR 40 - CL 54 Y 56		3,79	2,30	8,72	
CR 40 - CL 54 Y 56		7,61	2,35	17,88	
CR 40 - CL 54 Y 56		17,15	2,30	39,45	
CR 40 - CL 54 Y 56		11,86	3,25	38,55	
CR 40 - CL 54 Y 56		31,18	3,25	101,34	
MENOS CAJAS				-6,68	**286,37**
BOSTON - ENCISO					
CLL 57 - CR 36A Y CR 37		0,68	2,14	1,46	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37		0,68	1,73	1,18	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37		0,49	1,30	0,64	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37		0,22	3,50	0,77	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37		1,10	3,50	3,85	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37		1,46	2,10	3,07	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37		0,54	1,90	1,03	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37		0,15	1,20	0,18	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37		0,58	3,50	2,03	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37		1,03	1,65	1,70	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37		0,48	3,36	1,61	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37		1,21	1,80	2,18	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37		0,20	1,60	0,32	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37		3,47	1,83	6,35	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37		8,05	2,10	16,91	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37		4,80	1,90	9,12	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37		14,90	2,23	33,23	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37		1,30	1,35	1,76	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37		3,80	1,60	6,08	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37		1,35	1,45	1,96	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37		11,46	1,70	19,48	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37		1,35	1,00	1,35	
MENOS CAJAS				-5,79	**110,43**
Del 23 al 29 de junio					
POBLADO - LAS LOMAS					
CLL 11B - CR 34 Y CL 11A		12,00	1,30	15,60	
CLL 11B - CR 34 Y CL 11A		5,80	1,10	6,38	
CLL 11B - CR 34 Y CL 11A		9,00	2,25	20,25	
CLL 11B - CR 34 Y CL 11A		10,00	2,25	22,50	

CLL 11B - CR 34 Y CLL 11A		12.20	1.18	14.40	
CLL 11B - CR 34 Y CLL 11A		1.33	1.40	1.86	
CLL 11B - CR 34 Y CLL 11A		6.60	2.00	13.00	
POBLADO - LAS LOMAS					
MENOS CAJAS				-0.73	84.76
CLL 31 - CR 42B Y 42A		3.30	2.60	8.25	
CLL 31 - CR 42B Y 42A		6.80	1.00	6.80	
CLL 31 - CR 42B Y 42A		8.64	1.00	8.64	
CLL 31 - CR 42B Y 42A		15.93	1.00	15.93	
CLL 31 - CR 42B Y 42A		10.00	2.00	20.00	
CLL 31 - CR 42B Y 42A		2.88	1.00	2.88	
CLL 31 - CR 42B Y 42A		7.20	1.20	8.64	
CLL 31 - CR 42B Y 42A		5.74	2.50	14.35	
SAN DIEGO					
Del 14 al 20 de julio					
MENOS CAJAS				-1.16	80.28
CLL 54 - CR 41 Y CR 40		47.65	1.86	81.44	
LA CANDELARIA - BOSTON					
MENOS CAJAS				-0.71	70.77
CR 39A - CLL 54 Y 56		21.00	1.85	38.85	
CR 39A - CLL 54 Y 56		22.50	1.45	32.63	
BOSTON - ENCISO					
MENOS CAJAS				-2.34	153.09
CR 38 - CLL 49A Y 48		36.81	1.13	41.58	
CR 38 - CLL 49A Y 48		18.65	1.15	21.45	
CR 38 - CLL 49A Y 48		5.31	3.62	19.22	
CR 38 - CLL 49A Y 48		10.65	3.63	38.66	
CR 38 - CLL 49A Y 48		3.63	6.80	24.68	
CR 38 - CLL 49A Y 48		1.82	2.75	5.28	
CR 38 - CLL 49A Y 48		1.75	2.60	4.55	
MENOS CAJAS				-6.88	82.25
CLL 49A - CR 37 Y 38		14.25	2.20	31.35	
CLL 49A - CR 37 Y 38		1.64	2.35	3.85	
CLL 49A - CR 37 Y 38		2.90	4.62	13.38	
CLL 49A - CR 37 Y 38		3.18	2.45	7.82	
CLL 49A - CR 37 Y 38		5.33	4.70	25.05	
CLL 49A - CR 37 Y 38		3.04	2.33	7.08	
BOMBONA I					
CLL 31 - CR 42B Y 42A		7.10	2.50	17.75	122.46
CLL 31 - CR 42B Y 42A		60.00	1.00	60.00	
CLL 31 - CR 42B Y 42A		5.90	1.15	6.79	
CLL 31 - CR 42B Y 42A		19.00	1.20	22.80	
CLL 31 - CR 42B Y 42A		0.90	2.40	2.16	
CLL 31 - CR 42B Y 42A		3.30	1.50	4.95	
CLL 31 - CR 42B Y 42A		12.00	1.50	18.00	
SAN DIEGO					
MENOS CAJAS				-0.26	74.15
CLL 11B - CR 34 Y CLL 11A		5.90	2.85	17.41	
CLL 11B - CR 34 Y CLL 11A		18.00	1.50	27.00	
CLL 11B - CR 34 Y CLL 11A		20.00	1.60	30.00	
POBLADO - LAS LOMAS					
Del 7 al 13 de julio					
CL 54 - CR 41 Y 40		4.94	1.75	7.60	41.48
CL 54 - CR 41 Y 40		15.40	2.20	33.88	
LA CANDELARIA - BOSTON					
MENOS CAJAS				-1.44	48.26
CR 39A - CL 54 Y 58		1.20	1.20	0.56	
CR 39A - CL 54 Y 58		0.80	0.70	-0.56	
CR 39A - CL 54 Y 58		22.00	1.45	31.90	
CR 39A - CL 54 Y 58		13.40	1.37	18.36	
BOSTON - ENCISO					
MENOS CAJAS				-2.89	203.22
CR 38 - CLL 49A Y 48		24.38	2.99	72.90	
CR 38 - CLL 49A Y 48		19.20	3.50	67.20	
CR 38 - CLL 49A Y 48		30.00	2.20	66.00	
BOMBONA I					
CLL 50 - CR 33		8.80	1.75	17.15	40.91
CLL 50 - CR 33		3.80	1.80	6.84	
CLL 50 - CR 33		8.70	1.50	13.05	
CLL 50 - CR 33		21.50	0.18	3.87	
POBLADO - FLORIDA					
MENOS CAJAS				-0.25	82.15
CR 31A - CLL 11A Y 11		5.50	2.94	16.17	
CR 31A - CLL 11A Y 11		10.00	3.70	37.00	
CR 31A - CLL 11A Y 11		2.10	1.50	3.15	
CR 31A - CLL 11A Y 11		4.60	2.90	13.34	
CR 31A - CLL 11A Y 11		2.10	1.50	3.15	
CR 31A - CLL 11A Y 11		3.60	2.74	9.59	
MENOS CAJAS				-2.21	77.35
CLL 11 - CR 31A Y 30		20.00	1.15	23.00	
CLL 11 - CR 31A Y 30		33.20	1.50	49.80	
CLL 11 - CR 31A Y 30		2.60	2.60	6.76	
CLL 11B - CR 34 Y CL 11A		60.00	1.40	84.00	84.00
POBLADO - LAS LOMAS					
Del 30 de junio al 06 de julio					
MENOS CAJAS				-0.20	84.24
CR 40 - CL 54 Y 56		19.18	2.02	38.74	
CR 40 - CL 54 Y 56		9.64	4.79	45.70	
LA CANDELARIA - BOSTON					
MENOS CAJAS				-1.89	198.28
CR 38 - CLL 49A Y 48		9.87	3.55	35.04	
CR 38 - CLL 49A Y 48		16.63	2.60	43.24	
CR 38 - CLL 49A Y 48		5.70	4.70	26.79	
CR 38 - CLL 49A Y 48		2.93	2.38	6.97	
CR 38 - CLL 49A Y 48		32.05	2.40	76.92	
CR 38 - CLL 49A Y 48		5.48	1.85	10.09	
BOMBONA I					
CLL 11B - CR 34 Y CL 11A		3.50	1.30	4.55	
MENOS CAJAS				-1.01	76.02
CLL 11B - CR 34 Y CL 11A		3.00	2.25	6.75	
CLL 11B - CR 34 Y CLL 11A		3.50	1.30	4.55	

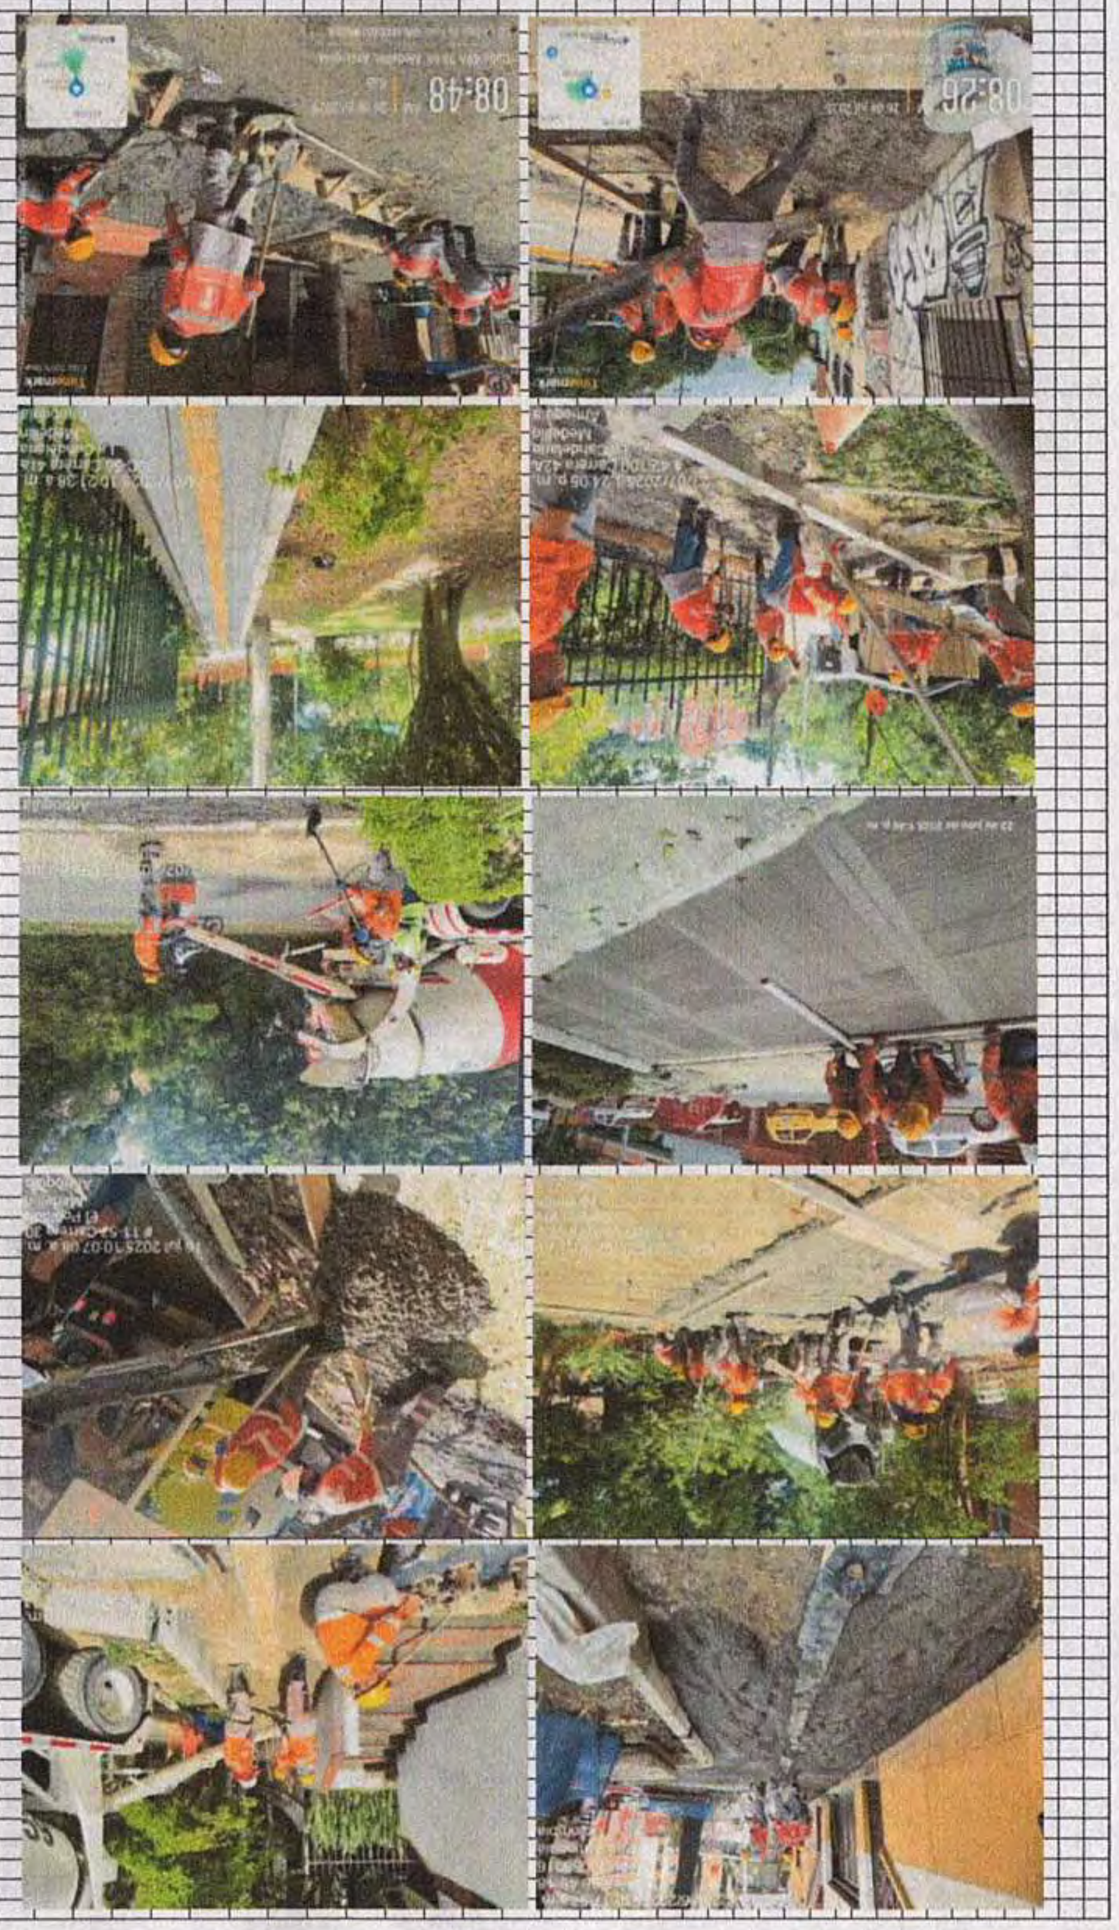

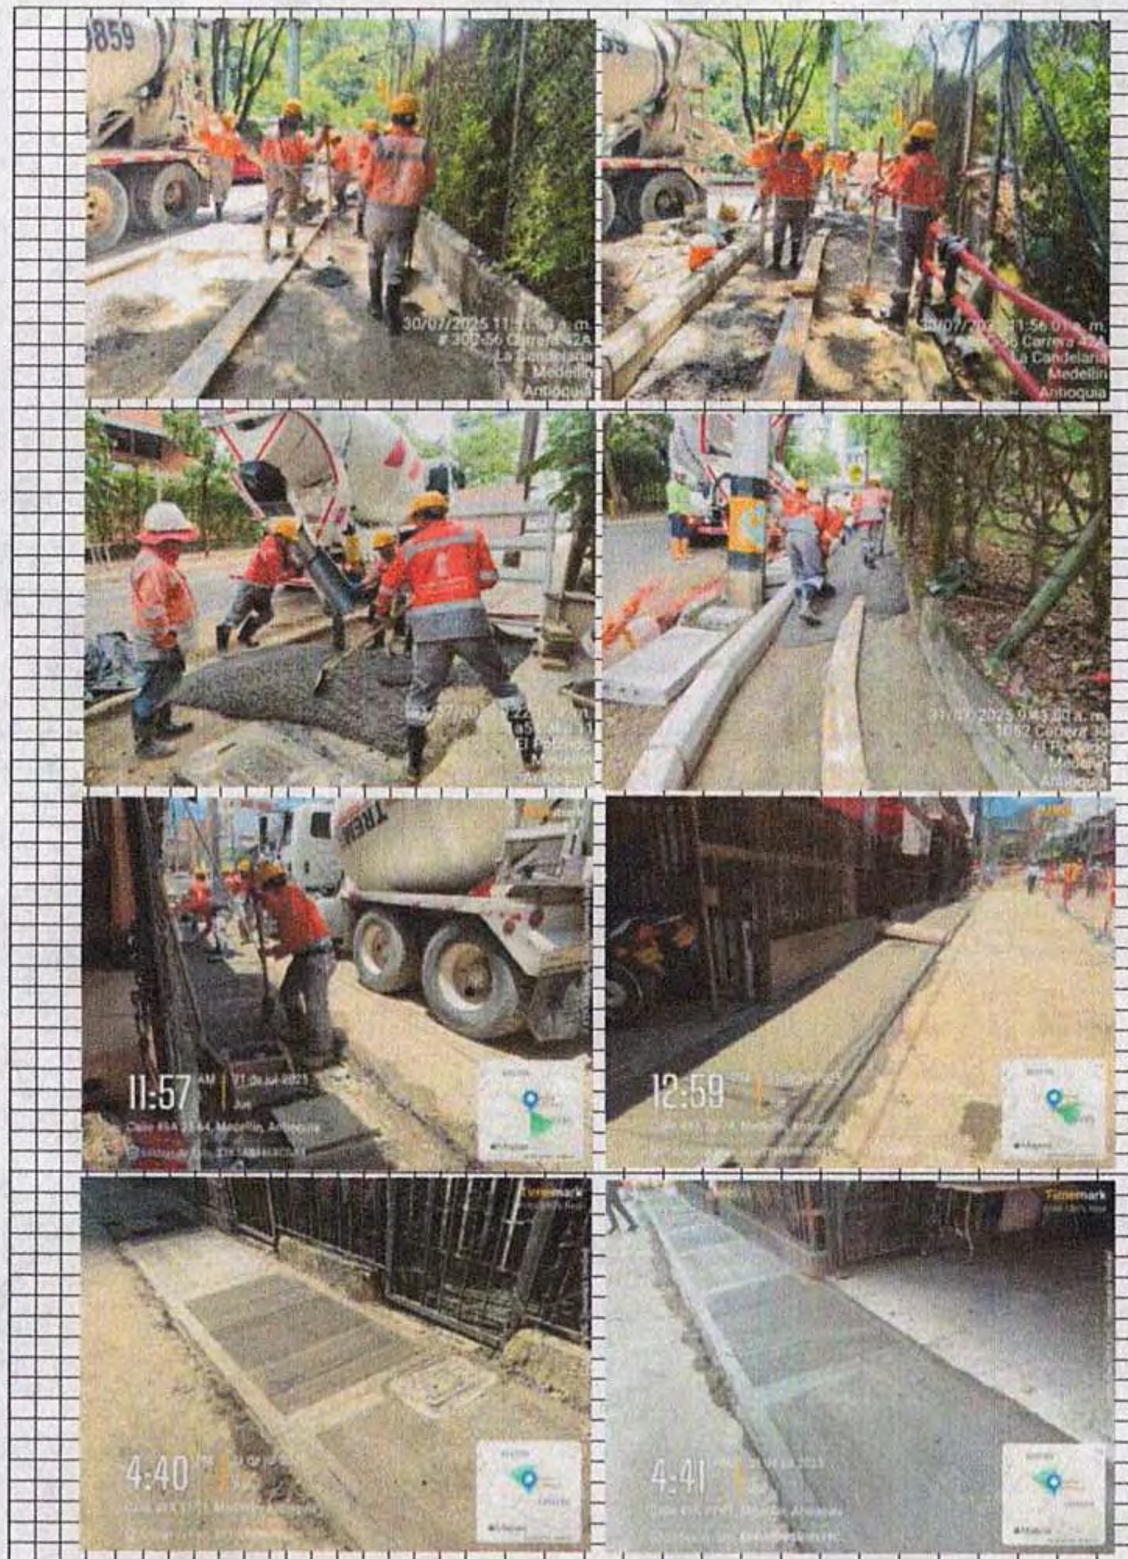

CLL 11B - CR 34 Y CLL 11A		8,00	1,10	8,80	
CLL 11B - CR 34 Y CLL 11A		3,80	1,40	5,32	
CLL 11B - CR 34 Y CLL 11A		28,70	1,05	30,14	
MENOS CAJAS				-1,87	**71,64**
BOMBONÁ I					
CR 38 - CLL 49A Y 48		24,00	1,50	36,00	
CR 38 - CLL 49A Y 48		11,60	1,50	17,40	
CR 38 - CLL 49A Y 48		1,90	1,50	2,85	
CR 38 - CLL 49A Y 48		19,02	3,68	70,00	
MENOS CAJAS				-4,73	**121,62**
LA CANDELARIA - BOSTON					
CLL 54 - CR 41 Y CR 40		27,20	1,75	47,60	
CLL 54 - CR 41 Y CR 40		4,97	2,10	10,44	
CLL 54 - CR 41 Y CR 40		3,30	2,10	6,93	**64,97**
BOSTON - ENCISO					
CR 36A - CLL 54 Y 56		5,20	1,40	7,28	**7,28**
Del 21 al 27 de Julio					
SAN DIEGO					
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS		35,50	1,20	42,60	
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS		14,40	1,20	17,28	
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS		16,20	1,00	16,20	
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS		59,05	1,00	59,05	
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS		5,30	5,00	26,50	
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS		5,10	2,75	14,03	
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS		20,20	1,19	24,04	
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS		11,60	9,80	113,68	**313,37**
CLL 31 - CR 42B Y 42A		2,20	2,40	5,28	
CLL 31 - CR 42B Y 42A		9,80	1,30	12,74	
CLL 31 - CR 42B Y 42A		61,40	1,05	64,47	
MENOS CAJAS				-2,28	**80,21**
POBLADO - LAS LOMAS					
CR 31A - CLL 11A Y 11		14,70	2,46	36,46	
MENOS CAJAS				-0,36	**36,10**
BOMBONÁ I					
CLL 49A - CR 37 Y 38		9,90	3,30	32,67	
CLL 49A - CR 37 Y 38		11,04	1,02	11,26	
CLL 49A - CR 37 Y 38		1,15	2,34	2,69	
CLL 49A - CR 37 Y 38		24,56	1,01	24,81	
CLL 49A - CR 37 Y 38		2,90	2,52	7,31	
CLL 49A - CR 37 Y 38		6,54	1,09	7,13	
CLL 49A - CR 37 Y 38		1,40	1,18	1,65	
CLL 49A - CR 37 Y 38		74,02	1,10	81,42	
CLL 49A - CR 37 Y 38		10,50	1,30	13,65	
CLL 49A - CR 37 Y 38		3,12	3,46	10,80	
CLL 49A - CR 37 Y 38		1,70	1,05	1,79	
CLL 49A - CR 37 Y 38		1,70	1,07	1,82	
CLL 49A - CR 37 Y 38		1,97	3,60	7,09	
CLL 49A - CR 37 Y 38		1,12	2,35	2,63	
CLL 49A - CR 37 Y 38		4,90	3,55	17,40	
CLL 49A - CR 37 Y 38		0,80	1,10	0,88	
CLL 49A - CR 37 Y 38		0,80	1,55	1,24	
CLL 49A - CR 37 Y 38		5,30	3,35	17,76	
CLL 49A - CR 37 Y 38		4,70	1,70	7,99	
MENOS CAJAS				-4,18	**247,79**
CR 38 - CLL 49A Y 48		13,18	4,22	55,63	**55,63**
LA CANDELARIA - BOSTON					
CLL 54 - CR 41 Y CR 40		6,20	2,10	13,02	
CLL 54 - CR 41 Y CR 40		4,00	2,10	8,40	
CLL 54 - CR 41 Y CR 40		3,85	2,10	8,09	
CLL 54 - CR 41 Y CR 40		2,56	2,10	5,38	
CLL 54 - CR 41 Y CR 40		1,69	2,10	3,55	
CLL 54 - CR 41 Y CR 40		1,69	2,10	3,55	
CLL 54 - CR 41 Y CR 40		2,06	1,28	2,64	
CLL 54 - CR 41 Y CR 40		3,00	0,80	2,40	**47,02**
Del 28 de julio al 03 de agosto					
SAN DIEGO					
CL 31 CR 42B Y 42A		4,10	1,10	4,51	
CL 31 CR 42B Y 42A		2,00	2,50	5,00	
CL 31 CR 42B Y 42A		2,25	1,95	4,39	
CL 31 CR 42B Y 42A		11,20	1,25	14,00	
CL 31 CR 42B Y 42A		4,00	2,10	8,40	
CL 31 CR 42B Y 42A		20,90	1,10	22,99	
CL 31 CR 42B Y 42A		2,60	2,40	6,24	
MENOS CAJAS				-1,44	**64,09**
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS		7,00	3,00	21,00	
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS		49,00	1,70	83,30	
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS		6,43	2,22	14,27	
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS		64,00	1,10	70,40	**188,97**
POBLADO - LAS LOMAS					
CR 31A - CLL 11A Y 11		40,00	1,60	64,00	**64,00**
BOMBONÁ I					
CLL 49A - CR 37 Y 38		69,30	1,40	97,02	
CLL 49A - CR 37 Y 38		17,04	3,55	60,49	
CLL 49A - CR 37 Y 38		4,98	1,94	9,66	
CLL 49A - CR 37 Y 38		9,06	2,04	18,48	
CLL 49A - CR 37 Y 38		4,80	2,51	12,05	
CLL 49A - CR 37 Y 38		12,06	1,30	15,68	**213,38**
CR 38 - CLL 49A Y 48		20,00	1,50	30,00	**30,00**

BOSTON - ENCISO						
CR 36A - CLL 54 Y 58		3,80	1,30	4,94		
CR 36A - CLL 54 Y 58		3,60	1,80	6,46		
CR 36A - CLL 54 Y 58		6,80	1,40	9,52		
CR 36A - CLL 54 Y 58		6,15	1,25	7,69		
CR 36A - CLL 54 Y 58		1,40	1,40	1,96		
CR 36A - CLL 54 Y 58		1,20	1,20	1,44		
CR 36A - CLL 54 Y 58		3,10	1,20	3,72		
CR 36A - CLL 54 Y 58		1,20	1,40	1,68		
CR 36A - CLL 54 Y 58		1,20	1,30	1,56		
CR 36A - CLL 54 Y 58		10,00	1,30	13,00		
CR 36A - CLL 54 Y 58		1,40	1,20	1,68		
CR 36A - CLL 54 Y 58		4,30	1,40	6,02		
CR 36A - CLL 54 Y 58		1,30	1,50	1,95		
MENOS CAJAS				-2,56		**59,08**
LA CANDELARIA - BOSTON						
CLL 54 - CR 41 Y CR 40		2,06	1,28	2,64		**2,64**
				Subtotal		**4.138,03**
				TOTAL		**4.138,03**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORIA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	14
FECHA	DD	3	MM	8	AA	2025	PERÍODO	16/06/2025 - 3/08/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
CONTRATO No	4600102792 DE 2024 — FECHA DE INICIO

ÍTEM	4.2.1	DESCRIPCIÓN	Suministro, transporte y colocación de Cordon prefabricado de concreto de 21 Mpa, tres caras, juntas ranuradas. Incluye conformación del terreno, ajustes de concreto o pavimento donde sea necesario, mortero de asiento y pega en las longitudes más adecuadas para el desarrollo de la obra. De 15 x 45 x 80 cm. (BOBAR)	UNID.	m	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.



LOCALIZACIÓN	LONGITUD	MEDIDA TOTAL
Del 16 al 22 de junio		
POBLADO - LAS LOMAS	192,80	192,80
POBLADO - FLORIDA	108,29	108,29
BOMBONÁ I	204,03	204,03
LA CANDELARIA - BOSTON	49,19	49,19
Del 23 al 29 de junio		
POBLADO - LAS LOMAS	219,00	219,00
BOMBONÁ I	167,87	167,87
LA CANDELARIA - BOSTON	69,90	69,90
Del 30 de junio al 06 de julio		
POBLADO - LAS LOMAS	161,10	161,10
POBLADO - FLORIDA	60,00	60,00
LA CANDELARIA - SAN DIEGO	35,00	35,00
BOMBONÁ I	49,20	49,20
LA CANDELARIA - BOSTON	23,04	23,04
Del 7 al 13 de julio		
POBLADO - LAS LOMAS		
CLL 11B - CR 34 Y CLL 11A	130,03	130,03
CR 31A - CLL 11A Y 11	32,00	32,00
SAN DIEGO		
CLL 31 - CR 42B Y 42A	78,15	78,15
BOMBONÁ I		
CLL 49A - CR 37 Y 36	75,87	75,87
CR 38 - CLL 49A Y 48	150,92	150,92
BOSTON - ENCISO		
CR 36A - CLL 54 Y 58	21,00	21,00
LA CANDELARIA - BOSTON		
CLL 54 - CR 41 Y CR 40	164,00	164,00
Del 14 al 20 de julio		
SAN DIEGO		
CLL 31 - CR 42B Y 42A	80,00	80,00
POBLADO - LAS LOMAS		
CLL 11B - CR 34 Y CLL 11A	64,20	64,20
BOMBONÁ I		
CR 38 - CLL 49A Y 48	69,70	69,70
BOSTON - ENCISO		
CR 36A - CLL 54 Y 58	133,16	133,16
Del 21 al 27 de julio		
SAN DIEGO		
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS	120,80	120,80
CLL 31 - CR 42B Y 42A	105,00	105,00
POBLADO - LAS LOMAS		
CR 31A - CLL 11A Y 11	45,00	45,00
BOMBONÁ I		
CLL 49A - CR 37 Y 36	83,00	83,00
BOSTON - ENCISO		
CR 36A - CLL 54 Y 58	21,00	21,00
LA CANDELARIA - BOSTON		
CLL 54 - CR 41 Y CR 40	10,00	10,00
Del 28 de julio al 03 de agosto		
SAN DIEGO		
CL 31 CR 42B Y 42A	94,10	94,10
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS	63,93	63,93
POBLADO - LAS LOMAS		
CR 31A - CLL 11A Y 11	55,40	55,40
BOMBONÁ I		
CLL 49A - CR 37 Y 36	27,71	27,71
CR 38 - CLL 49A Y 48	20,00	20,00
BOSTON - ENCISO		
CR 36A - CLL 54 Y 58	4,30	4,30
Subtotal		2.988,69
TOTAL		**2.988,69**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	15
FECHA	DD	3	MM	8	AA	2025	PERÍODO	16/06/2025 - 3/08/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
CONTRATO No	4600102792 DE 2024
FECHA DE INICIO	

ÍTEM	4.2.3	DESCRIPCIÓN	Suministro, transporte y Construccion de cordon-cuneta en concreto de 21 MPa. Incluye ajustes en concreto donde sea necesario y triturado de fondo. Según detalle S.I.F. No incluye refuerzo.	UNID.	m	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.



LOCALIZACIÓN	LONGITUD	MEDIDA TOTAL
Del 16 al 22 de junio		
BOSTON - ENCISO	23,42	23,42
Del 23 al 29 de junio		
BOSTON - ENCISO	7,56	7,56
Del 30 de junio al 06 de julio		
BOSTON - ENCISO	33,25	33,25
Del 7 al 13 de julio		
BOSTON - ENCISO		
CR 36A - CLL 54 Y 58	11,25	11,25
Del 14 al 20 de julio		
BOSTON - ENCISO		
CR 36A - CLL 54 Y 58	17,50	17,50
Del 21 al 27 de julio		
LA CANDELARIA - BOSTON		
CLL 54 - CR 41 Y CR 40	100,40	100,40
Del 28 de julio al 03 de agosto		
LA CANDELARIA - BOSTON		
CLL 54 - CR 41 Y CR 40	79,70	79,70
Subtotal		273,08
TOTAL		273,08

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	16
FECHA	DD	3	MM	8	AA	2025	PERÍODO	16/06/2025 - 3/08/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	

ÍTEM	4.2.4	DESCRIPCIÓN	Suministro, transporte y colocación de concreto de 14 Mpa para SOLADO, con un espesor de mínimo 0.05 m. incluye: transporte interno y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción.	UNID.	m2	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.





LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	CANTIDAD (M2)	MEDIDA TOTAL
Del 16 al 22 de junio					
POBLADO - LAS LOMAS					
CLL 11 - CR 31A Y 30		62,70	0,45	28,22	**28,22**
POBLADO - FLORIDA					
CLL 5G - CR 33		1,53	0,10	0,15	
CLL 5G - CR 33		56,24	0,10	5,62	
CLL 5G - CR 33		5,82	0,20	1,16	
CLL 5G - CR 33		21,20	0,10	2,12	
CLL 5G - CR 33		27,80	0,10	2,78	
CLL 5G - CR 33		1,20	1,20	1,44	
CLL 5G - CR 33		0,60	0,60	0,36	
CLL 5G - CR 33		1,00	1,00	1,00	**14,84**
BOSTON - ENCISO					
CLL 57 - CR 36A Y CR 37		2,78	0,60	1,67	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37		9,57	0,60	5,74	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37		11,07	0,60	6,64	**14,05**
Del 23 al 29 de junio					
POBLADO - LAS LOMAS					
CLL 11 - CR 31A Y 30		53,00	0,30	15,90	**15,90**
CLL 11B - CR 34 Y CL 11A		60,00	0,30	18,00	
CLL 11B - CR 34 Y CL 11A		43,90	0,35	15,37	
CLL 11B - CR 34 Y CL 11A		43,30	0,45	19,49	**52,85**
BOSTON - ENCISO					
CLL 57 - CR 36A Y CR 37		3,06	0,60	1,84	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37		4,50	0,60	2,70	**4,54**
Del 30 de junio al 06 de julio					
BOSTON - ENCISO		33,25	0,60	19,95	**19,95**
LA CANDELARIA - BOSTON					
CL 54 - CR 41 Y 40		2,32	1,00	2,32	
CL 54 - CR 41 Y 40		1,92	1,00	1,92	
CL 54 - CR 41 Y 40		84,79	0,12	10,17	**14,41**
Del 28 de julio al 03 de agosto					
BOSTON - ENCISO					
CR 36A - CLL 54 Y 58		1,00	1,20	1,20	**1,20**
LA CANDELARIA - BOSTON					
CLL 54 - CR 41 Y CR 40		2,2	0,1	0,22	**0,22**
SOLADO PARA LA INTALACIÓN DE BORDILLOS					
Del 16 al 22 de junio					
POBLADO - LAS LOMAS		210,80	0,20	42,16	
POBLADO - FLORIDA		117,33	0,20	23,47	
BOMBONÁ I		204,03	0,20	40,81	
LA CANDELARIA - BOSTON		52,83	0,20	10,57	
Del 23 al 29 de junio					
POBLADO - LAS LOMAS		246,00	0,20	49,20	
BOMBONÁ I		167,87	0,20	33,57	
LA CANDELARIA - BOSTON		69,90	0,20	13,98	
Del 30 de junio al 06 de julio					
POBLADO - LAS LOMAS		161,10	0,20	32,22	
POBLADO - FLORIDA		60,00	0,20	12,00	
LA CANDELARIA - SAN DIEGO		35,00	0,20	7,00	
BOMBONÁ I		49,20	0,20	9,84	
LA CANDELARIA - BOSTON		23,04	0,20	4,61	
Del 7 al 13 de julio					
POBLADO - LAS LOMAS					
CLL 11B - CR 34 Y CLL 11A		130,03	0,20	26,01	
CR 31A - CLL 11A Y 11		32,00	0,20	6,40	
SAN DIEGO					
CLL 31 - CR 42B Y 42A		78,15	0,20	15,63	
BOMBONÁ I					
CLL 49A - CR 37 Y 38		75,87	0,20	15,17	
CR 38 - CLL 49A Y 48		150,92	0,20	30,18	
BOSTON - ENCISO					
CR 36A - CLL 54 Y 58		21,00	0,20	4,20	
LA CANDELARIA - BOSTON					
CLL 54 - CR 41 Y CR 40		164,00	0,20	32,80	
Del 14 al 20 de julio					
SAN DIEGO					
CLL 31 - CR 42B Y 42A		80,00	0,20	16,00	
POBLADO - LAS LOMAS					
CLL 11B - CR 34 Y CLL 11A		64,20	0,20	12,84	

BOMBONÁ I						
CR 38 - CLL 49A Y 48		69,70	0,20	13,94		
BOSTON - ENCISO						
CR 36A - CLL 54 Y 58		133,16	0,20	26,63		
Del 21 al 27 de julio						
SAN DIEGO						
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS		120,80	0,20	24,16		
CLL 31 - CR 42B Y 42A		105,00	0,20	21,00		
POBLADO - LAS LOMAS						
CR 31A - CLL 11A Y 11		45,00	0,20	9,00		
BOMBONÁ I						
CLL 49A - CR 37 Y 38		83,00	0,20	16,60		
BOSTON - ENCISO						
CR 36A - CLL 54 Y 58		21,00	0,20	4,20		
LA CANDELARIA - BOSTON						
CLL 54 - CR 41 Y CR 40		10,00	0,20	2,00		
Del 28 de julio al 03 de agosto						
SAN DIEGO						
CL 31 CR 42B Y 42A		94,10	0,20	18,82		
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS		63,93	0,20	12,79		
POBLADO - LAS LOMAS				0,00		
CR 31A - CLL 11A Y 11		55,40	0,20	11,08		
BOMBONÁ I						
CLL 49A - CR 37 Y 38		27,71	0,20	5,54		
CR 38 - CLL 49A Y 48		20,00	0,20	4,00		
BOSTON - ENCISO						
CR 36A - CLL 54 Y 58		4,30	0,20	0,86		**609,27**
	Subtotal					**775,25**
TOTAL						**775,25**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORIA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	17
FECHA	DD	3	MM	8	AA	2025	PERÍODO	16/06/2025 - 3/08/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
CONTRATO No	4600102792 DE 2024 — FECHA DE INICIO

ÍTEM	5.1	DESCRIPCIÓN	Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.	UNID.	kg	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.





LOCALIZACIÓN	KG	MEDIDA TOTAL
Del 16 al 22 de junio		
POBLADO - FLORIDA	31,85	31,85
BOSTON - ENCISO	146,62	146,62
BOMBONÁ II	33,60	33,60
Del 30 de junio al 06 de julio		
POBLADO - FLORIDA	4,00	4,00
BOSTON - ENCISO	214,40	214,40
Del 7 al 13 de julio		
BOSTON - ENCISO		
CR 36A - CLL 54 Y 58	71,90	71,90
Del 14 al 20 de julio		
BOMBONÁ II		
CR 9A - CLL 44AA 45	24,50	24,50
Del 21 al 27 de julio		
BOSTON - ENCISO		
CR 36A - CLL 54 Y 58	10,66	10,66
	Subtotal	537,53
	TOTAL	537,53

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín — Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN	CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	18
FECHA	DD	3	MM	8	AA	2025	PERÍODO	16/06/2025 - 3/08/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	

ÍTEM	5.2	DESCRIPCIÓN	Suministro, transporte y colocación de malla electrosoldada Tipo D84. Incluye el suministro y transporte del material y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	UNID.	m2	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.





LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	CANTIDAD (M2)	MEDIDA TOTAL
Del 16 al 22 de junio					
POBLADO - FLORIDA					
CLL 5G - CR 33		2,00	1,00	2,00	
CLL 5G - CR 33		2,00	1,00	2,00	
CLL 5G - CR 33		3,00	2,00	6,00	**10,00**
BOMBONÁ I					
CL 49A - CR 37 Y 38		2,80	1,10	3,08	
CL 49A - CR 37 Y 38		2,30	1,20	2,76	
CL 49A - CR 37 Y 38		3,00	1,10	3,30	
CL 49A - CR 37 Y 38		2,30	1,30	2,99	
CL 49A - CR 37 Y 38		2,30	1,40	3,22	
CL 49A - CR 37 Y 38		1,60	1,40	2,24	
CL 49A - CR 37 Y 38		3,00	1,40	4,20	
CL 49A - CR 37 Y 38		2,30	1,30	2,99	**24,78**
LA CANDELARIA - BOSTON					
CR 40 - CL 54 Y 56		3,00	2,19	6,57	
CR 40 - CL 54 Y 56		2,45	1,75	4,29	
CR 40 - CL 54 Y 56		3,65	1,68	6,13	
CR 40 - CL 54 Y 56		3,11	1,73	5,38	
CR 40 - CL 54 Y 56		4,71	1,65	7,77	
CR 40 - CL 54 Y 56		1,68	2,05	3,44	
CR 40 - CL 54 Y 56		2,50	0,64	1,60	
CR 40 - CL 54 Y 56		3,70	0,64	2,37	
CR 40 - CL 54 Y 56		2,00	1,17	2,34	
CR 40 - CL 54 Y 56		4,49	1,73	7,77	**47,66**
BOSTON - ENCISO					
CLL 57 - CR 36A Y CR 37		2,30	1,30	2,99	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37		2,30	1,30	2,99	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37		2,30	1,65	3,80	
CLL 57 - CR 36A Y CR 37		2,30	1,65	3,80	**13,57**
Del 23 al 29 de junio					
POBLADO - LAS LOMAS					
CLL 11B - CR 34 Y CL 11A		6,00	2,00	12,00	
MENOS CAJAS				-1,01	**10,99**
BOMBONÁ I					
CR 38 - CLL 49A Y 48		2,00	1,00	2,00	
CR 38 - CLL 49A Y 48		1,40	1,40	1,96	
CR 38 - CLL 49A Y 48		1,00	1,00	1,00	**4,96**
Del 30 de junio al 06 de julio					
POBLADO - FLORIDA					
CLL 5G - CR 33		8,00	2,00	16,00	
MENOS CAJAS				-0,93	**15,07**
BOSTON - ENCISO					
CR 36A - CL 54 Y 58		2,00	1,00	2,00	
CR 36A - CL 54 Y 58		1,00	1,00	1,00	
CR 36A - CL 54 Y 58		2,00	1,00	2,00	
CR 36A - CL 54 Y 58		1,00	1,00	1,00	**6,00**
LA CANDELARIA - BOSTON					
CL 54 - CR 41 Y 40		2,10	1,00	2,10	
CL 54 - CR 41 Y 40		3,00	1,00	3,00	
CL 54 - CR 41 Y 40		2,00	1,00	2,00	
CL 54 - CR 41 Y 40		2,00	1,00	2,00	
CL 54 - CR 41 Y 40		2,00	1,00	2,00	
CL 54 - CR 41 Y 40		2,00	1,00	2,00	
CL 54 - CR 41 Y 40		3,10	1,00	3,10	

CL 54 - CR 41 Y 40		2,00	1,00	2,00	
CL 54 - CR 41 Y 40		2,00	1,20	2,40	
		2,50	1,60	4,00	**24,60**
Del 7 al 13 de julio					
POBLADO - LAS LOMAS					
CLL 11B - CR 34 Y CLL 11A		20,00	1,40	28,00	
CLL 11B - CR 34 Y CLL 11A		10,00	1,50	15,00	
MENOS CAJAS				- 3,19	**39,81**
CR 31A - CLL 11A Y 11		8,00	2,00	16,00	
MENOS CAJAS				- 0,25	**15,75**
BOMBONÁ I					
CLL 49A - CR 37 Y 38		3,90	0,80	3,12	
CLL 49A - CR 37 Y 38		2,25	0,70	1,58	
CLL 49A - CR 37 Y 38		2,55	0,75	1,91	**6,61**
CR 38 - CLL 49A Y 48		2,50	1,50	3,75	
CR 38 - CLL 49A Y 48		1,50	1,50	2,25	
CR 38 - CLL 49A Y 48		1,80	2,00	3,60	
CR 38 - CLL 49A Y 48		1,80	1,80	3,24	
CR 38 - CLL 49A Y 48		2,50	1,10	2,75	
CR 38 - CLL 49A Y 48		2,50	1,10	2,75	
CR 38 - CLL 49A Y 48		1,60	1,80	2,88	
CR 38 - CLL 49A Y 48		2,30	1,10	2,53	
CR 38 - CLL 49A Y 48		3,60	1,10	3,96	
CR 38 - CLL 49A Y 48		1,50	1,10	1,65	
CR 38 - CLL 49A Y 48		1,20	1,30	1,56	
CR 38 - CLL 49A Y 48		2,60	2,20	5,72	
CR 38 - CLL 49A Y 48		1,40	2,30	3,22	
CR 38 - CLL 49A Y 48		1,30	1,40	1,82	
CR 38 - CLL 49A Y 48		4,00	1,50	6,00	
CR 38 - CLL 49A Y 48		4,15	1,50	6,23	
CR 38 - CLL 49A Y 48		2,40	1,50	3,60	
CR 38 - CLL 49A Y 48		3,30	1,50	4,95	**62,46**
BOSTON - ENCISO					
CR 36A - CLL 54 Y 58		1,80	0,80	1,44	
CR 36A - CLL 54 Y 58		2,00	1,00	2,00	
CR 36A - CLL 54 Y 58		2,00	1,00	2,00	
CR 36A - CLL 54 Y 58		2,00	0,80	1,60	
CR 36A - CLL 54 Y 58		2,00	0,80	1,60	**8,64**
LA CANDELARIA - BOSTON					
CLL 54 - CR 41 Y CR 40		2,00	0,97	1,94	
CLL 54 - CR 41 Y CR 40		2,00	0,97	1,94	
CLL 54 - CR 41 Y CR 40		2,00	0,97	1,94	
CLL 54 - CR 41 Y CR 40		2,00	0,97	1,94	
CLL 54 - CR 41 Y CR 40		2,00	0,80	1,60	**9,36**
Del 14 al 20 de julio					
LA CANDELARIA - BOSTON					
CLL 54 - CR 41 Y CR 40		2,00	1,00	2,00	
CLL 54 - CR 41 Y CR 40		2,00	0,97	1,94	
CLL 54 - CR 41 Y CR 40		2,00	1,00	2,00	
CLL 54 - CR 41 Y CR 40		2,00	0,97	1,94	
CLL 54 - CR 41 Y CR 40		2,00	1,00	2,00	**9,88**
BOSTON - ENCISO					
CR 36A - CLL 54 Y 58		3,00	5,00	15,00	
CR 36A - CLL 54 Y 58		3,50	5,10	17,85	**32,85**
Del 28 de julio al 03 de agosto					
SAN DIEGO					
CL 31 CR 42B Y 42A		5,00	1,20	6,00	
CL 31 CR 42B Y 42A		2,50	1,20	3,00	
MENOS CAJAS				- 0,98	**8,02**
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS		6,00	2,00	12,00	
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS		6,00	8,00	48,00	
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS		2,00	0,70	1,40	
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS		18,00	0,70	12,60	**74,00**
POBLADO - LAS LOMAS					
CR 31A - CLL 11A Y 11		1,00	1,00	1,00	
CR 31A - CLL 11A Y 11		1,00	1,00	1,00	**2,00**
BOMBONÁ I					
CLL 49A - CR 37 Y 38		6,00	3,00	18,00	**18,00**
LA CANDELARIA - BOSTON					
CLL 54 - CR 41 Y CR 40		3,00	1,00	3,00	**3,00**
SUBTOTAL					**448,00**
TOTAL					**448,00**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORIA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	19
FECHA	DD	3	MM	8	AA	2025	PERÍODO	16/06/2025 - 3/08/2025	ELABORÒ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	

ÍTEM	6.1	DESCRIPCIÓN	Realce para cajas de acueducto y alcantarillado existente y recuperacion de herrajes de andenes. Altura 15 - 20 cm. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción.	UNID.	Und	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.



LOCALIZACIÓN	CANTIDAD (UNO)	CANTIDAD TOTAL
Del 16 al 22 de junio		
POBLADO - LAS LOMAS	8,00	8,00
POBLADO - FLORIDA	1,00	1,00
LA CANDELARIA - BOSTON	21,00	21,00
BOSTON - ENCISO	17,00	17,00
Del 23 al 29 de junio		
POBLADO - LAS LOMAS	11,00	11,00
BOMBONÁ I	19,00	19,00
LA CANDELARIA - BOSTON	15,00	15,00
Del 30 de junio al 06 de julio		
POBLADO - LAS LOMAS	2,00	2,00
BOMBONÁ I	26,00	26,00
BOSTON - ENCISO	5,00	5,00
LA CANDELARIA - BOSTON	12,00	12,00
Del 7 al 13 de julio		
POBLADO - LAS LOMAS		
CLL 11B - CR 34 Y CLL 11A	5,00	5,00
SAN DIEGO		
CLL 31 - CR 42B Y 42A	2,00	2,00
BOMBONÁ I		
CR 38 - CLL 49A Y 48	15,00	15,00
BOSTON - ENCISO		
CR 36A - CLL 54 Y 58	1,00	1,00
LA CANDELARIA - BOSTON		
CLL 54 - CR 41 Y CR 40	5,00	5,00
Del 14 al 20 de julio		
BOMBONÁ I		
CR 38 - CLL 49A Y 48	19,00	19,00
LA CANDELARIA - BOSTON		
CLL 54 - CR 41 Y CR 40	5,00	5,00
BOSTON - ENCISO		
CR 36A - CLL 54 Y 58	2,00	2,00
Del 21 al 27 de julio		
POBLADO - LAS LOMAS		
CR 31A - CLL 11A Y 11	5,00	5,00
BOMBONÁ I		
CLL 49A - CR 37 Y 38	37,00	37,00
CR 38 - CLL 49A Y 48	15,00	15,00
BOSTON - ENCISO		
CR 36A - CLL 54 Y 58	10,00	10,00
LA CANDELARIA - BOSTON		
CLL 54 - CR 41 Y CR 40	1,00	1,00
Del 28 de julio al 03 de agosto		
SAN DIEGO		
CL 31 CR 42B Y 42A	3,00	3,00
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS	11,00	11,00
POBLADO - LAS LOMAS		
CR 31A - CLL 11A Y 11	2,00	2,00
BOMBONÁ I		
CLL 49A - CR 37 Y 38	34,00	34,00
LA CANDELARIA - BOSTON		
CLL 54 - CR 41 Y CR 40	1,00	1,00
Subtotal		310,00
TOTAL		310,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	INTERVENTORIA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						**CONSORCIO VIAL VG - VNF**				**HOJA N°**	20
FECHA	**DD**	3	**MM**	8	**AA**	2025	**PERÍODO**	16/06/2025 - 3/08/2025	**ELABORÓ**	**ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA**	

OBJETO DEL CONTRATO	**CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.**
CONTRATO No	4600102792 DE 2024 — **FECHA DE INICIO**

ÍTEM	**6.3**	**DESCRIPCIÓN**	Construcción de caja de inspección y/o empalme de 80x80x80 cm medidas internas (L=80cm) en concreto de 17.5 mpa, espesor 10 cm. Incluye tapa y herraje. Según diseño SIF Municipio de Medellín.	**UNID.**	Und	**PROYECTO**	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.





LOCALIZACIÓN	**CANTIDAD (UND)**	**CANTIDAD TOTAL**
Del 16 al 22 de junio		
POBLADO - LAS LOMAS	1,00	**1,00**
POBLADO - FLORIDA	3,00	**3,00**
Del 23 al 29 de junio		
POBLADO - LAS LOMAS	1,00	**1,00**
Del 30 de junio al 06 de julio		
POBLADO - LAS LOMAS	2,00	**2,00**
Del 7 al 13 de julio		
POBLADO - LAS LOMAS		
CLL 11B - CR 34 Y CLL 11A	1,00	**1,00**
SAN DIEGO		
CLL 31 - CR 42B Y 42A	1,00	**1,00**
Del 21 al 27 de julio		
POBLADO - LAS LOMAS		
CR 31A - CLL 11A Y 11	1,00	**1,00**
LA CANDELARIA - BOSTON		
CLL 54 - CR 41 Y CR 40	27,00	**27,00**
Del 28 de julio al 03 de agosto		
SAN DIEGO		
CL 31 CR 42B Y 42A	2,00	**2,00**
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS	1,00	**1,00**
POBLADO - LAS LOMAS		
CR 31A - CLL 11A Y 11	2,00	**2,00**
BOMBONÁ I		
CLL 49A - CR 37 Y 38	**34,00**	**34,00**
BOSTON - ENCISO		
CR 36A - CLL 54 Y 58	**4,00**	**4,00**
LA CANDELARIA - BOSTON		
CLL 54 - CR 41 Y CR 40	**37,00**	**37,00**
Subtotal		**117,00**
TOTAL		**117,00**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL VG - VNF	HOJA N°	21
FECHA: DD 3 MM 8 AA 2025	PERÍODO: 16/06/2025 - 3/08/2025	ELABORÓ: ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	

ÍTEM	7.1	DESCRIPCIÓN	Suministro, transporte y colocación de adoquín táctil guía o alerta discapacitados visuales de 20X20X6 cm LOST-AL. Incluye arena de apoyo 5 cm, sello de juntas con arena,cortes a maquina. Según diseño. Seguir recomendaciones MEP color AMARILLO.	UNID.	m2	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS










LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	CANTIDAD (M2)	MEDIDA TOTAL
Del 16 al 22 de junio					
POBLADO - LAS LOMAS					
CR 31A - CLL 11A Y 11		0,60	0,60	0,36	**0,36**
POBLADO - FLORIDA		1,20	1,20	1,44	
CLL 5G - CR 33		0,60	0,60	0,36	
CLL 5G - CR 33		1,00	1,00	1,00	**2,80**
BOMBONÁ I					
CL 49A - CR 37 Y 38		0,60	0,60	0,36	
CL 49A - CR 37 Y 38		1,20	0,80	0,96	
LA CANDELARIA - BOSTON		0,60	0,80	0,48	**1,80**
CR 40 - CL 54 Y 56					
CR 40 - CL 54 Y 56		1,20	1,20	1,44	
CR 40 - CL 54 Y 56		1,20	1,20	1,44	
CR 40 - CL 54 Y 56		1,20	1,20	1,44	
CR 40 - CL 54 Y 56		0,60	0,60	0,36	**4,68**
Del 30 de junio al 06 de julio					
LA CANDELARIA - BOSTON					
CL 54 - CR 41 Y 40		2,32	1,00	2,32	
		1,92	1,00	1,92	**4,24**
Del 7 al 13 de julio					
POBLADO - LAS LOMAS					
CLL 11B - CR 34 Y CLL 11A		0,60	0,60	0,36	
CLL 11B - CR 34 Y CLL 11A		0,60	0,60	0,36	
CLL 11B - CR 34 Y CLL 11A		0,60	0,60	0,36	
CLL 11B - CR 34 Y CLL 11A		0,60	0,60	0,36	**1,44**
SAN DIEGO					
CLL 31 - CR 42B Y 42A		1,20	1,20	1,44	
CLL 31 - CR 42B Y 42A		1,20	1,20	1,44	
CLL 31 - CR 42B Y 42A		1,20	1,20	1,44	**4,32**
BOMBONÁ I					
CLL 49A - CR 37 Y 38		1,20	1,20	1,44	**1,44**
CR 38 - CLL 49A Y 48		0,60	0,60	0,36	
CR 38 - CLL 49A Y 48		0,60	0,60	0,36	**0,72**
LA CANDELARIA - BOSTON					
CLL 54 - CR 41 Y CR 40		1,28	1,00	1,28	**1,28**
Del 21 al 27 de julio					
SAN DIEGO					
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS		1,20	1,20	1,44	
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS		1,20	1,20	1,44	
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS		0,60	0,60	0,36	**3,24**
CLL 31 - CR 42B Y 42A		1,20	1,20	1,44	**1,44**
POBLADO - LAS LOMAS					
CR 31A - CLL 11A Y 11		1,20	1,20	1,44	
CR 31A - CLL 11A Y 11		0,60	0,60	0,36	
CR 31A - CLL 11A Y 11		1,20	1,20	1,44	
CR 31A - CLL 11A Y 11		1,20	1,20	1,44	
CR 31A - CLL 11A Y 11		1,20	1,20	1,44	
CR 31A - CLL 11A Y 11		0,60	0,60	0,36	**6,48**
BOMBONÁ I					
CLL 49A - CR 37 Y 38		1,20	1,20	1,44	**1,44**
CR 38 - CLL 49A Y 48		0,60	0,60	0,36	**0,36**
Del 28 de julio al 03 de agosto					
SAN DIEGO					
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS		1,20	1,20	1,44	
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS		1,20	1,20	1,44	
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS		1,20	1,20	1,44	
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS		1,20	1,20	1,44	
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS		1,20	1,20	1,44	
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS		1,20	1,20	1,44	**8,64**
BOSTON - ENCISO					
CR 36A - CLL 54 Y 56		1,20	1,20	1,44	**1,44**
			Subtotal		**46,12**
			TOTAL		**46,12**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	22
FECHA	DD	3	MM	8	AA	2025	PERÍODO	16/06/2025 - 3/08/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	

ÍTEM	7.2	DESCRIPCIÓN	Colocación de ADOQUÍN TÁCTIL GUÍA O ALERTA 20 x 20 x 6. Color oliva, marrón, chocolate, ocre, tojo y terracota. Para un ancho de 0.20m. Incluye suministro y transporte de los materiales, perfilación, nivelación del terreno y adecuación de la superficie, mortero 1:3 para la instalación, corte de piezas, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño.	UNID.	m	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.



LOCALIZACIÓN	LONGITUD	MEDIDA TOTAL
Del 16 al 22 de junio		
POBLADO - LAS LOMAS	99,10	99,10
POBLADO - FLORIDA	57,17	57,17
BOMBONÁ I	77,15	77,15
LA CANDELARIA - BOSTON	72,12	72,12
Del 23 al 29 de junio		
BOMBONÁ I	37,75	37,75
LA CANDELARIA - BOSTON	28,72	28,72
Del 30 de junio al 06 de julio		
BOMBONÁ I	30,00	30,00
LA CANDELARIA - BOSTON	13,60	13,60
Del 7 al 13 de julio		
POBLADO - LAS LOMAS		
CLL 11B - CR 34 Y CLL 11A	51,20	51,20
BOMBONÁ I		
CR 38 - CLL 49A Y 48	40,00	40,00
LA CANDELARIA - BOSTON		
CLL 54 - CR 41 Y CR 40	41,55	41,55
Del 14 al 20 de julio		
BOMBONÁ I		
CR 38 - CLL 49A Y 48	32,20	32,20
LA CANDELARIA - BOSTON		
CLL 54 - CR 41 Y CR 40	26,60	26,60
Del 21 al 27 de julio		
SAN DIEGO		
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS	86,60	86,60
POBLADO - LAS LOMAS		
CR 31A - CLL 11A Y 11	75,00	75,00
CLL 11B - CR 34 Y CLL 11A	25,00	25,00
Del 28 de julio al 03 de agosto		
POBLADO - LAS LOMAS		
CR 31A - CLL 11A Y 11	46,60	46,60
Subtotal		840,36
TOTAL		840,36

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	23
FECHA	DD	3	MM	8	AA	2025	PERÍODO	16/06/2025 - 3/08/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
CONTRATO No	4600102792 DE 2024 — FECHA DE INICIO

ÍTEM	7.3	DESCRIPCIÓN	Suministro, transporte y colocación de franja demarcadora para limitados visuales en adoquín ADOP-A de 10x20x6 cm, en color amarillo, salmón o jaspe, según diseño. Incluye cama de arena de apoyo e = 5 cm, sello de juntas con arena de revoque, cortes a maquina y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Cumplir norma NTC 2017, seguir recomendaciones del MEP y patrones de instalación del ICPC. el adoquín deberá resellarse por 2 veces en un lapso de 4 meses luego de su instalación.	UNID.	m	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.







LOCALIZACIÓN	LONGITUD	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
Del 16 al 22 de junio			
POBLADO - LAS LOMAS		42,90	42,90
POBLADO - FLORIDA		8,62	8,62
BOMBONÁ I		28,61	28,61
LA CANDELARIA - BOSTON		109,44	109,44
Del 23 al 29 de junio			
POBLADO - LAS LOMAS		5,90	5,90
BOMBONÁ I		5,70	5,70
LA CANDELARIA - BOSTON		28,72	28,72
Del 30 de junio al 06 de julio			
BOMBONÁ I		45,90	45,90
LA CANDELARIA - BOSTON		11,83	11,83
BOMBONÁ II		4,80	4,80
Del 7 al 13 de julio			
POBLADO - LAS LOMAS			
CLL 11B - CR 34 Y CLL 11A		12,00	12,00
SAN DIEGO			
CLL 31 - CR 42B Y 42A		86,60	86,60
BOMBONÁ I			
CLL 49A - CR 37 Y 38		75,87	75,87
CR 38 - CLL 49A Y 48		54,76	54,76
LA CANDELARIA - BOSTON			
CLL 54 - CR 41 Y CR 40		2,80	2,80
Del 14 al 20 de julio			
BOMBONÁ I			
CR 38 - CLL 49A Y 48		69,70	69,70
LA CANDELARIA - BOSTON			
CLL 54 - CR 41 Y CR 40		28,23	28,23
Del 21 al 27 de julio			
SAN DIEGO			
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS		121,80	121,80
CLL 31 - CR 42B Y 42A		4,00	4,00
POBLADO - LAS LOMAS			
CR 31A - CLL 11A Y 11		33,00	33,00
CLL 11B - CR 34 Y CLL 11A		30,00	30,00
BOMBONÁ I			
CLL 49A - CR 37 Y 38		72,20	72,20
LA CANDELARIA - BOSTON			
CLL 54 - CR 41 Y CR 40		1,28	1,28
Del 28 de julio al 03 de agosto			
SAN DIEGO			
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS		6,43	6,43
POBLADO - LAS LOMAS			
CR 31A - CLL 11A Y 11		16,00	16,00
BOMBONÁ I			
CR 38 - CLL 49A Y 48		20,00	20,00
BOSTON - ENCISO			
CR 36A - CLL 54 Y 58		3,80	3,80
Subtotal			930,89
TOTAL			930,89

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA Nº	24
FECHA	DD	3	MM	8	AA	2025	PERÍODO	16/06/2025 - 3/08/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	

ÍTEM	9.1	DESCRIPCIÓN	Suministro, transporte e instalación de grama tipo San Agustín, para conformación de zonas verdes. Incluye perfilación y nivelación de la superficie hasta un espesor de 5 cm , adición de tierra abonada con un espesor de 5 cm, anclaje inicial y final con ganchos de sujeción, regado y todo lo necesario para su correcta siembra y total prendimiento, capote mínimo 5 cm.	UNID.	m2	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.





LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES		CANTIDAD (M2)	MEDIDA TOTAL
		LARGO	ANCHO		
POBLADO - FLORIDA					
CL 5G ENTRE CL6 Y 5F		4,10	1,60	6,56	
CL 5G ENTRE CL6 Y 5F		1,65	1,05	1,73	
CL 5G ENTRE CL6 Y 5F		14,00	1,60	22,40	
CL 5G ENTRE CL6 Y 5F		4,80	1,50	7,20	
CL 5G ENTRE CL6 Y 5F		38,50	1,60	61,60	
CL 5G ENTRE CL6 Y 5F		11,10	1,45	16,10	
CL 5G ENTRE CL6 Y 5F		10,90	1,45	15,81	
CL 5G ENTRE CL6 Y 5F		19,00	1,10	20,90	
CL 5G ENTRE CL6 Y 5F		2,50	1,60	4,00	
CL 5G ENTRE CL6 Y 5F		2,90	1,68	4,87	
CL 5G ENTRE CL6 Y 5F		6,70	1,30	8,71	
CL 5G ENTRE CL6 Y 5F		17,20	2,20	37,84	
CL 5G ENTRE CL6 Y 5F		1,85	1,40	2,59	
CL 5G ENTRE CL6 Y 5F		3,20	1,50	4,80	
CL 5G ENTRE CL6 Y 5F		4,70	1,50	7,05	
CL 5G ENTRE CL6 Y 5F		13,50	1,50	20,25	
CL 5G ENTRE CL6 Y 5F		5,12	1,60	8,19	
CL 5G ENTRE CL6 Y 5F		5,12	1,60	8,19	
CL 5G ENTRE CL6 Y 5F		8,10	1,10	8,91	
CL 5G ENTRE CL6 Y 5F		3,50	0,85	2,98	
CL 5G ENTRE CL6 Y 5F		3,00	0,50	1,50	
CL 5G ENTRE CL6 Y 5F		13,20	1,50	19,80	
CL 5G ENTRE CL6 Y 5F		24,50	2,70	66,15	
CL 5G ENTRE CL6 Y 5F		25,30	1,50	37,95	**396,07**
			Subtotal		**396,07**
			TOTAL		**396,07**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN


CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA Nº	25
FECHA	DD	3	MM	8	AA	2025	PERÍODO	16/06/2025 - 3/08/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
CONTRATO No	4600102792 DE 2024 — FECHA DE INICIO

ÍTEM	OE-1	DESCRIPCIÓN	Corte de losa existente para demolición	UNID.	m	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.



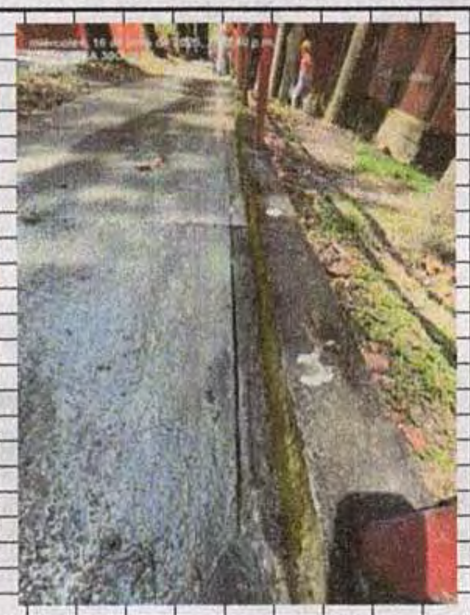

LOCALIZACIÓN	LONGITUD	MEDIDA TOTAL
Del 30 de junio al 06 de julio		
POBLADO - LAS LOMAS		
POBLADO - LAS LOMAS	35,00	**35,00**
POBLADO - FLORIDA	15,00	**15,00**
LA CANDELARIA - SAN DIEGO	5,80	**5,80**
Del 7 al 13 de julio		
POBLADO - LAS LOMAS		
CR 31A - CLL 11A Y 11	25,00	**25,00**
BOMBONÁ I		
CLL 49A - CR 37 Y 38	25,00	**25,00**
CR 38 - CLL 49A Y 48	84,35	**84,35**
BOMBONÁ I		
CR 38 - CLL 49A Y 48	69,70	**69,70**
CLL 49A - CR 37 Y 38	74,02	**74,02**
BOSTON - ENCISO		
CR 36A - CLL 54 Y 58	4,40	**4,40**
Del 21 al 27 de julio		
SAN DIEGO		
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS	47,00	**47,00**
CLL 31 - CR 42B Y 42A	10,00	**10,00**
POBLADO - LAS LOMAS		
CR 31A - CLL 11A Y 11	15,00	**15,00**
BOMBONÁ I		
CLL 49A - CR 37 Y 38	205,49	**205,49**
CR 38 - CLL 49A Y 48	20,00	**20,00**
LA CANDELARIA - BOSTON		
CLL 54 - CR 41 Y CR 40	76,60	**76,60**
Del 28 de julio al 03 de agosto		
SAN DIEGO		
CL 31 CR 42B Y 42A	8,00	**8,00**
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS	20,00	**20,00**
POBLADO - LAS LOMAS		
CR 31A - CLL 11A Y 11	10,00	**10,00**
Subtotal		**750,36**
TOTAL		**750,36**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	26
FECHA	DD	3	MM	8	AA	2025	PERÍODO	16/06/2025 - 3/08/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	

ÍTEM	OE-2	DESCRIPCIÓN	Demolición y excavación de bordillos.	UNID.	m	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS





LOCALIZACIÓN	LONGITUD	MEDIDA TOTAL
Del 30 de junio al 06 de julio		
POBLADO - LAS LOMAS	152,90	152,90
POBLADO - FLORIDA	68,90	68,90
LA CANDELARIA - SAN DIEGO	35,00	35,00
BOMBONÁ I	87,41	87,41
LA CANDELARIA - BOSTON	23,04	23,04
Del 7 al 13 de julio		
POBLADO - LAS LOMAS		
CLL 11B - CR 34 Y CLL 11A	89,00	89,00
CR 31A - CLL 11A Y 11	32,00	32,00
SAN DIEGO		
CLL 31 - CR 42B Y 42A	103,00	103,00
BOMBONÁ I		
CLL 49A - CR 37 Y 38	51,91	51,91
CR 38 - CLL 49A Y 48	49,68	49,68
BOSTON - ENCISO		
CR 36A - CLL 54 Y 58	21,00	21,00
LA CANDELARIA - BOSTON		
CLL 54 - CR 41 Y CR 40	71,56	71,56
Del 14 al 20 de julio		
SAN DIEGO		
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS	61,4	61,40
CLL 31 - CR 42B Y 42A	102,5	102,50
POBLADO - LAS LOMAS		
CLL 11B - CR 34 Y CLL 11A	70	70,00
BOMBONÁ I		
CR 38 - CLL 49A Y 48	45,7	45,70
CLL 49A - CR 37 Y 38	74,02	74,02
BOSTON - ENCISO		
CR 36A - CLL 54 Y 58	26,20	26,20
Del 21 al 27 de julio		
SAN DIEGO		
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS	89,50	89,50
CLL 31 - CR 42B Y 42A	56,85	56,85
POBLADO - LAS LOMAS		
CR 31A - CLL 11A Y 11	95,80	95,80
BOMBONÁ I		
CLL 49A - CR 37 Y 38	218,50	218,50
CR 38 - CLL 49A Y 48	20,00	20,00
BOSTON - ENCISO		
CR 36A - CLL 54 Y 58	21,00	21,00
Del 28 de julio al 03 de agosto		
SAN DIEGO		
CL 31 CR 42B Y 42A	47,05	47,05
BOSTON - ENCISO		
CR 36A - CLL 54 Y 58	4,30	4,30
Subtotal		1.718,22
TOTAL		1.718,22

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA Nº	27
FECHA	DD	3	MM	8	AA	2025	PERÍODO	16/06/2025 - 3/08/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
CONTRATO No	4600102792 DE 2024 — FECHA DE INICIO:

ÍTEM	OE-3	DESCRIPCIÓN	Suministro, transporte e instalación de señal vertical 60x60 en lámina galvanizada.	UNID.	un	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.

SIMÓN BOLÍVAR





BELÉN GRANADA

POBLADO - FLORIDA



LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
LA AMÉRICA - SIMÓN BOLÍVAR		
Cra82A entre Calle 36 y 37D.	7,00	**7,00**
BELÉN GRANADA		
Cl 28 entre CRA 75 y 74.	1,00	**1,00**
POBLADO - FLORIDA		
CRA 33 CL 7 Y 6	2,00	**2,00**
Subtotal		**10,00**
TOTAL		**10,00**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA Nº	28
FECHA	DD	3	MM	8	AA	2025	PERÍODO	16/06/2025 - 3/08/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
CONTRATO No	4600102792 DE 2024 — FECHA DE INICIO

ÍTEM	OE-4	DESCRIPCIÓN	Demolición y excavación de jardineras con alturas entre 30 y 50 cm, incluye demolicion de viga de amarre y excavacion para la cimentacion del bordillo	UNID.	m	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.





LOCALIZACIÓN	LONGITUD	MEDIDA TOTAL
Del 30 de junio al 06 de julio		
POBLADO - LAS LOMAS	62,30	**62,30**
BOMBONÁ I	44,25	**44,25**
BOSTON - ENCISO	17,00	**17,00**
Del 7 al 13 de julio		
POBLADO - LAS LOMAS		
CLL 11B - CR 34 Y CLL 11A	73,43	**73,43**
CR 31A - CLL 11A Y 11	12,00	**12,00**
BOMBONÁ I		
CR 38 - CLL 49A Y 48	73,35	**73,35**
LA CANDELARIA - BOSTON		
CLL 54 - CR 41 Y CR 40	117,54	**117,54**
Del 14 al 20 de julio		
SAN DIEGO		
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS	64,00	**64,00**
CLL 31 - CR 42B Y 42A	9,80	**9,80**
POBLADO - LAS LOMAS		
CLL 11B - CR 34 Y CLL 11A	20,00	**20,00**
BOSTON - ENCISO		
CR 36A - CLL 54 Y 58	106,96	**106,96**
Del 21 al 27 de julio		
SAN DIEGO		
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS	54,80	**54,80**
CLL 31 - CR 42B Y 42A	9,80	**9,80**
POBLADO - LAS LOMAS		
CR 31A - CLL 11A Y 11	49,60	**49,60**
LA CANDELARIA - BOSTON		
CLL 54 - CR 41 Y CR 40	9,92	**9,92**
Del 28 de julio al 03 de agosto		
SAN DIEGO		
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS	70,43	**70,43**
POBLADO - LAS LOMAS		
CR 31A - CLL 11A Y 11	68,00	**68,00**
Subtotal		**863,18**
		863,18

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA Nº	29
FECHA	DD	3	MM	8	AA	2025	PERÍODO	16/06/2025 - 3/08/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	

ÍTEM	OE 5	DESCRIPCIÓN	Suministro, transporte e instalación de andén en concreto permeable de espesor 15 cm y los elementos necesarios para su correcta instalación.	UNID.	m2	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.





LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES		CANTIDAD (M2)	MEDIDA TOTAL
		LARGO	ANCHO		
Del 21 al 27 de julio					
POBLADO - LAS LOMAS					
CR 31A - CLL 11A Y 11		69	1,4	96,6	**96,60**
Subtotal					**96,60**
TOTAL					**96,60**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA Nº	30
FECHA	DD	3	MM	8	AA	2025	PERÍODO	16/06/2025 - 3/08/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
CONTRATO No	4600102792 DE 2024 — FECHA DE INICIO:

ÍTEM	OE-6	DESCRIPCIÓN	Suministro, transporte e instalación de caja de contadores prefabricados de acueducto.	UNID.	un	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.





LOCALIZACIÓN	LONGITUD	MEDIDA TOTAL
Del 14 al 20 de julio		
LA CANDELARIA - BOSTON		
CLL 54 - CR 41 Y CR 40	30,00	**30,00**
BOSTON - ENCISO		
CR 36A - CLL 54 Y 58	30,00	**30,00**
Del 21 al 27 de julio		
LA CANDELARIA - BOSTON		
CLL 54 - CR 41 Y CR 40	9,00	**9,00**
Del 28 de julio al 03 de agosto		
BOSTON - ENCISO		
CR 36A - CLL 54 Y 58	14,00	**14,00**
Subtotal		**83,00**
TOTAL		**83,00**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	31
FECHA	DD	3	MM	8	AA	2025	PERÍODO	16/06/2025 - 3/08/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	

ÍTEM	OE-7	DESCRIPCIÓN	EXCAVACIÓN MANUAL de material rocoso en volúmenes de roca superio al 40%, incluye cargue (mecánico y manual) y transporte del material proveniente de excavación	UNID.	m3	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.



LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			CANTIDAD (M3)	MEDIDA TOTAL
		LARGO	ANCHO	ESPESOR		
Del 7 al 13 de julio						
POBLADO - LAS LOMAS						
CLL 11B - CR 34 Y CLL 11A		9.75	2.30	0.17	3.81	
CLL 11B - CR 34 Y CLL 11A		7.70	1.60	0.17	2.09	
CLL 11B - CR 34 Y CLL 11A		18.50	1.38	0.17	4.29	
CLL 11B - CR 34 Y CLL 11A		12.00	1.10	0.17	2.24	
CLL 11B - CR 34 Y CLL 11A		43.05	1.25	0.17	9.15	
CLL 11B - CR 34 Y CLL 11A		133.50	0.30	0.50	20.03	
CLL 11B - CR 34 Y CLL 11A		110.15	0.30	0.35	11.57	
MENOS CAJAS					-0.47	52,71
CR 31A - CLL 11A Y 11		3.00	2.00	0.20	1.20	
CR 31A - CLL 11A Y 11		42.00	1.45	0.20	12.18	
CR 31A - CLL 11A Y 11		25.50	2.85	0.20	14.54	
CR 31A - CLL 11A Y 11		48.00	0.30	0.50	7.20	
CR 31A - CLL 11A Y 11		18.00	0.30	0.35	1.89	
MENOS CAJAS					-0.35	36,66
LA CANDELARIA - BOSTON						
CLL 54 - CR 41 Y CR 40		41.55	2.18	0.18	16.15	
CLL 54 - CR 41 Y CR 40		20.60	2.20	0.18	8.16	
CLL 54 - CR 41 Y CR 40		6.60	1.95	0.18	2.32	26,63
Del 21 al 27 de julio						
POBLADO - LAS LOMAS						
CR 31A - CLL 11A Y 11		45.80	0.30	0.50	6.87	
CR 31A - CLL 11A Y 11		49.60	0.30	0.35	5.21	
CR 31A - CLL 11A Y 11		3.80	2.80	0.25	2.66	
CR 31A - CLL 11A Y 11		40.00	1.60	0.15	9.60	
CR 31A - CLL 11A Y 11		17.00	0.30	0.50	2.55	26,89
BOSTON - ENCISO						
CR 36A - CLL 54 Y 58		3.40	1.40	0.10	0.48	0,48
Del 28 de julio al 03 de agosto						
POBLADO - LAS LOMAS						
CR 31A - CLL 11A Y 11		50.00	1.40	0.25	17.50	17,50
				Subtotal		160,86
				TOTAL		160,86

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	INTERVENTORÍA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA Nº	32
FECHA	DD	3	MM	8	AA	2025	PERÍODO	16/06/2025 - 3/08/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	

ÍTEM	OE-8	DESCRIPCIÓN	Suministro, transporte y colocación de cordón prefabricado de concreto de 21 Mpa de tres caras y juntas ranuradas para instalación en curvas de rebajes. Incluye conformación del terreno, ajustes de concreto o pavimento donde sea necesario, mortero de asiento y pega en las longitudes más adecuadas para el desarrollo de la obra. De 15 x 45 x 40 cm.	UNID.	m	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.



LOCALIZACIÓN	LONGITUD	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
Del 30 de junio al 06 de julio			
POBLADO - LAS LOMAS		55,10	**55,10**
POBLADO - FLORIDA		8,90	**8,90**
Del 7 al 13 de julio			
POBLADO - LAS LOMAS			
CLL 11B - CR 34 Y CLL 11A		32,40	**32,40**
CR 31A - CLL 11A Y 11		12,00	**12,00**
SAN DIEGO			
CLL 31 - CR 42B Y 42A		25,30	**25,30**
LA CANDELARIA - BOSTON			
CLL 54 - CR 41 Y CR 40		25,40	**25,40**
Del 14 al 20 de julio			
POBLADO - LAS LOMAS			
CLL 11B - CR 34 Y CLL 11A		25,80	**25,80**
Del 21 al 27 de julio			
SAN DIEGO			
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS		31,40	**31,40**
CLL 31 - CR 42B Y 42A		40,00	**40,00**
POBLADO - LAS LOMAS			
CR 31A - CLL 11A Y 11		30,00	**30,00**
Del 28 de julio al 03 de agosto			
SAN DIEGO			
CR 42A - CLL 31 Y AV PALMAS		30,00	**30,00**
POBLADO - LAS LOMAS			
CR 31A - CLL 11A Y 11		83,00	**83,00**
Subtotal			**399,30**
TOTAL			**399,30**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	33
FECHA	DD	3	MM	8	AA	2025	PERÍODO	16/06/2025 - 3/08/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	

ÍTEM	OE 10	DESCRIPCIÓN	Suministro, transporte y vaciado de concreto MR 35 kg/cm2 adicionado con microfibra de polipropileno para construcción de andén, espesor e=0.20 m. Incluye aditivo plastificante, corte y sellado de juntas cada 2,0 m. Acabado esgrafiado tipo Metro, según diseño S.I.F. El material de soporte (base o subsase) se pagará en su ítem respectivo. La interventoría y/o supervisión solicitarán los ensayos necesarios para verificar el MR requerido mediante la norma INVIAS E-414-22.	UNID.	m2	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.





LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	CANTIDAD (M2)	MEDIDA TOTAL
Del 30 de junio al 06 de julio					
POBLADO - LAS LOMAS					
CLL 11 - CR 31A Y 30		5	3,3	16,5	**16,50**
Del 7 al 13 de julio					
POBLADO - LAS LOMAS					
CLL 11B - CR 34 Y CLL 11A		6,00	2,70	16,20	**16,20**
SAN DIEGO					
CLL 31 - CR 42B Y 42A		5,80	3,20	18,56	**18,56**
BOMBONÁ I					
CR 38 - CLL 49A Y 48		76,30	0,35	26,71	**26,71**
Del 14 al 20 de julio					
POBLADO - LAS LOMAS					
CR 31A - CLL 11A Y 11		16,00	2,48	39,68	
MENOS CAJAS				-1,38	**38,30**
BOSTON - ENCISO					
CR 36A - CLL 54 Y 58		3,00	2,20	6,60	
MENOS CAJAS				-2,56	**4,04**
Del 28 de julio al 03 de agosto					
SAN DIEGO					
CL 31 CR 42B Y 42A		8,00	2,50	20,00	**20,00**
POBLADO - LAS LOMAS					
CR 31A - CLL 11A Y 11		5,00	2,80	14,00	**14,00**
BOMBONÁ I					
CR 38 - CLL 49A Y 48		5,33	4,70	25,05	
CR 38 - CLL 49A Y 48		2,90	4,82	13,98	**39,03**
Subtotal					**193,33**
TOTAL					**193,33**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA Nº	34
FECHA	DD	3	MM	8	AA	2025	PERÍODO	16/06/2025 - 3/08/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	

ÍTEM	OE 11	DESCRIPCIÓN	Suministro, transporte y vaciado de concreto MR 35 kg/cm2 adicionado con microfibra de polipropileno para construcción de andén, espesor e=0.15 m. Incluye aditivo plastificante, corte y sellado de juntas cada 2,0 m. Acabado esgrafiado tipo Metro, según diseño S.I.F. El material de soporte (base o subsase) se pagará en su ítem respectivo. La interventoría y/o supervisión solicitarán los ensayos necesarios para verificar el MR requerido mediante la norma INVIAS E-414-22.	UNID.	m2	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.



LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	CANTIDAD (M2)	MEDIDA TOTAL
Del 7 al 13 de julio					
BOMBONÁ I					
CLL 49A - CR 37 Y 38		15,00	1,09	16,35	**16,35**
Del 14 al 20 de julio					
BOSTON - ENCISO					
CR 36A - CLL 54 Y 58		3,50	5,10	17,85	**17,85**
Subtotal					**34,20**
TOTAL					**34,20**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF			HOJA Nº	35
FECHA	DD	3	MM	8	AA	2025	PERÍODO	16/06/2025 - 3/08/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
CONTRATO No	4600102792 DE 2024 — FECHA DE INICIO

ÍTEM	OE 12	DESCRIPCIÓN	Suministro, transporte y aplicación manual de pintura plástico en frío sobre superficie de concreto.	UNID.	m2	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.








LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	CANTIDAD (M2)	MEDIDA TOTAL
LA AMÉRICA - SIMÓN BOLÍVAR					
Cra81A entre Calle 35 y 36.	12,00	3,00	0,40	14,40	
Cra81A entre Calle 35 y 36.	1,00	3,90	0,40	1,56	
Cra81A entre Calle 35 y 36.	15,00	3,00	0,40	18,00	**33,96**
Cra82A entre Calle 36 y 37D.	11,00	3,00	0,40	13,20	
Cra82A entre Calle 36 y 37D.	1,00	3,90	0,40	1,56	
Cra82A entre Calle 36 y 37D.	13,00	3,00	0,40	15,60	
Cra82A entre Calle 36 y 37D.	1,00	3,90	0,40	1,56	
Cra82A entre Calle 36 y 37D.	11,00	3,00	0,40	13,20	
Cra82A entre Calle 36 y 37D.	1,00	3,90	0,40	1,56	
Cra82A entre Calle 36 y 37D.	11,00	3,00	0,40	13,20	
Cra82A entre Calle 36 y 37D.	1,00	3,90	0,40	1,56	
Cra82A entre Calle 36 y 37D.	9,00	2,00	0,40	7,20	
Cra82A entre Calle 36 y 37D.	1,00	3,90	0,40	1,56	
Cra82A entre Calle 36 y 37D.	9,00	2,00	0,40	7,20	
Cra82A entre Calle 36 y 37D.	1,00	4,60	0,40	1,84	
Cra82A entre Calle 36 y 37D.	10,00	3,00	0,40	12,00	
Cra82A entre Calle 36 y 37D.	1,00	3,90	0,40	1,56	**92,80**
CL 37D con 82A.	13,00	2,00	0,40	10,40	
Línea horizontal calle 37D	1,00	3,90	0,40	1,56	
CL 37D con 83A, Esquina.	9,00	3,00	0,40	10,80	**22,76**
CL 40A-83A	14,00	2,00	0,40	11,20	
CL 40A-84	11,00	2,00	0,40	8,80	**20,00**
LA AMÉRICA - FERRINI					
Cl 53A entre CRA 81 y 80.	12,00	3,00	0,40	14,40	
Cl 53A entre CRA 81 y 80.	1,00	3,90	0,40	1,56	
Cl 53A entre CRA 81 y 80.	7,00	2,50	0,40	7,00	**22,96**
BELÉN GRANADA					
Cl 28 entre CRA 75 y 74.	12,00	3,00	0,40	14,40	
Cl 28 entre CRA 75 y 74.	6,00	3,00	0,40	7,20	**21,60**
POBLADO - FLORIDA					
CRA 33 CL 7 Y 6	7,00	2,14	0,40	5,99	
CRA 33 CL 7 Y 6	10,00	2,75	0,40	11,00	**16,99**
Subtotal					**231,07**
TOTAL					**231,07**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA Nº	36
FECHA	DD	3	MM	8	AA	2025	PERÍODO	16/06/2025 - 3/08/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
CONTRATO No	4600102792 DE 2024 — FECHA DE INICIO:

ÍTEM	OE 13	DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación de anden Deck elevado en madera plástica color a definir, incluye largueros para la estructura, estacones de apoyo embebidos en pilotes, incluye excavación y vaciado de pilotes y todos los elementos para su correcta instalación.	UNID.	m2	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.



LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	CANTIDAD (M2)	MEDIDA TOTAL
LA AMÉRICA - FERRINI					
CL 53A-CR 81 Y 80		11,80	1,98	23,36	**23,36**
LAURELES - ACACIAS					
Calle 36 entre Cra 10 Y 81		4,70	1,32	6,20	
Calle 36 entre Cra 10 Y 81		1,50	0,70	1,05	
Calle 36 entre Cra 10 Y 81		0,80	0,85	0,68	
Calle 36 entre Cra 10 Y 81		4,60	1,50	6,90	**14,83**
POBLADO - FLORIDA					
Clle 5f #30-101.		1,20	1,10	1,32	**1,32**
BOSTON - ENCISO					
Cra36A entre Calle 57 y 56.		5,15	1,30	6,70	**6,70**
POBLADO - LOMAS					
Clle 11 entre Cra 30 y 31A		2,10	1,20	2,52	
Clle 11 entre Cra 30 y 31A		6,20	1,30	8,06	**10,58**
			Subtotal		**56,79**
			TOTAL		**56,79**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	37
FECHA	DD	3	MM	8	AA	2025	PERÍODO	16/06/2025 - 3/08/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	

ÍTEM	OE-15	DESCRIPCIÓN	Construcción de canales con altura libre hasta 60cm y espesor de 15cm, ancho de losa libre de 30cm y rejilla prefabricada de uso peatonal de 40x40x8cm.	UNID.	m	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.





LOCALIZACIÓN	LONGITUD	MEDIDA TOTAL
Del 30 de junio al 06 de julio		
BOSTON - ENCISO	22,00	**22,00**
Del 7 al 13 de julio		
BOSTON - ENCISO		
CR 36A - CLL 54 Y 58	22,50	**22,50**
Subtotal		**44,50**
		44,50

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín	CONTRATO	4600102792 DE 2024			
	OBJETO: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.				
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VALOR PPTO	$ 331.937.335			
	PLAZO INICIAL:	5 MESES			
	CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL VG-VNF			
	INTERVENTORÍA	SITELSA SAS			
	FECHA ACTA:	PERIODO			
		1-dic.-24	31-ene.-25		
CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS					
Fecha de realizacion del presupuesto		4/30/2024			
APLICACIÓN DE GUÍA SOCIOAMBIENTAL					

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACTA N°9					
GESTIÓN AMBIENTAL											
1,0	Manejo de residuos sólidos		PPTO CONTRACTUAL			JUNIO		JULIO		ACUMULADO	
1,1	Canecas de 5 gl con tapa y debidamente rotuladas (Tres recipientes reciclable, ordinario y organicos)	Juego	9,00	$ 175.030,00	$ 1.575.270,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	2	$ 350.060,00
1,2	Canecas metálica de 55 gl con tapa, pintadas de acuerdo los colores según la Resol N° 2184 de 2019, debidamente rotuladas (Cuatro recipientes recipientes: No aprovechables, Aprovechables, Orgánicos aprovechables, especiales)*	Juego	27,00	$ 541.116,00	$ 14.610.132,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	22	$ 11.904.552,00
1,3	Bolsas plásticas para los frentes de obra color negro (residuos no aprovechables), según Resolución No. 2184 de 2019 (Tamaño 90*115) - (Calibre 1,6)	un	2210,00	$ 694,00	$ 1.533.740,00	50	$ 34.700,00	25	$ 17.350,00	525	$ 364.350,00
1,4	Bolsas plásticas para los frentes de obra color blanco (residuos aprovechables) según Resolución No. 2184 de 2019 (Tamaño 90*115) - (Calibre 1,6)	un	2210,00	$ 708,00	$ 1.564.680,00	30	$ 21.240,00	38	$ 26.904,00	463	$ 327.804,00
1,5	Bolsas plásticas para los frentes de obra color verde (residuos orgánicos aprovechables) según Resolución No. 2184 de 2019 (Tamaño 90*115) -(Calibre 1,6)	un	2210,00	$ 638,00	$ 1.409.980,00	50	$ 31.900,00	38	$ 24.244,00	498	$ 317.724,00
1,6	Bolsas plásticas para los frentes de obra color rojo (residuos peligrosos) (Tamaño 90*115) - (Calibre 1,6)	un	1110,00	$ 1.077,00	$ 1.195.470,00	25	$ 26.925,00	30	$ 32.310,00	285	$ 306.945,00
1,7	Construcción de caseta de 4 m2 aproximadamente para el acopio de residuos sólidos comunes, Incluye teleras, tejas de zinc, largueros	un	30,00	$ 297.507,00	$ 8.925.210,00	1	$ 297.507,00	1	$ 297.507,00	7	$ 2.082.549,00
1,8	Recolección y disposición de residuos sólidos peligrosos por parte de una empresa autorizada. (Incluye Transporte). Mínimo por recolección - 50 Kg.	kg	301,00	$ 5.236,00	$ 1.576.036,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	59	$ 308.308,00
1,9	Recolección de residuos de Madera por parte de una empresa autorizada	m3	20,00	$ 51.487,00	$ 1.029.740,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00
1,10	Kit aseo y limpieza en obra (pala y cepillo carretero)	un	49,00	$ 63.008,00	$ 3.087.392,00	2	$ 126.016,00	8	$ 504.064,00	47	$ 2.961.376,00
1,11	Bascula colgante Industrial digital capacidad maxima 300 Kg *	un	1,00	$ 87.424,00	$ 87.424,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00
1,12	Señalización en sitios de disposicion temporal de residuos. (Rotulado plastificado (Dimensiones: 50x35 cm, bond 90 gr, tintas 4x0, incluye producción y diseño). Debe permanecer durante la duración de la obra. Se estiman tres cambios	Global	64,00	$ 12.000,00	$ 768.000,00	1	$ 12.000,00	2	$ 24.000,00	53	$ 636.000,00
2,00	Maquinaria, vehículos y equipo en obra										
2,1	Lona banner, 13 onzas para vehículo (volqueta o camion) de 1,5m x 0,8m con dobléz repisado 3 cm por el contorno y ojaletes 1 en cada esquina, impresión inkjet resistente a la intperie según diseño del Manual de Identidad del Municipio.	un	21,00	$ 35.000,00	$ 735.000,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	15	$ 525.000,00
3,00	Ahorro y uso eficiente de agua y energía										
3,1	Hidrolavadora portatil acople rápido doble filtro *	un	1,00	$ 264.710,00	$ 264.710,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1	$ 264.710,00
4,00	Manejo de sustancias químicas										
4,1	Kit de emergencia para derrames químicos de 10 galones. Incluye bolsa con arena, caneca de 10 galones, bolsas plásticas, pala pequeña, guantes y mascarilla para concentración de particulas y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento).	un	9,00	$ 260.048,00	$ 2.340.432,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	8	$ 2.080.384,00
4,2	Estiba de contención de 55 litros fabricada en polietileno de alta densidad, para almacenamiento de sustancias químicas	un	8,00	$ 443.258,00	$ 3.546.064,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 443.258,00	6	$ 2.659.548,00
5,00	Uso y almacenamiento adecuado de materiales de construcción										
5,1	Teleras 1,35m x 0,90 m para construcción de acopios	un	90,00	$ 20.000,00	$ 1.800.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	280	$ 5.600.000,00
5,2	Plástico Negro, calibre 4 y ancho de 2 m.	kg	550,00	$ 8.300,00	$ 4.565.000,00	55,00	$ 456.500,00	55,00	$ 456.500,00	845	$ 7.013.500,00
5,3	Cinta Señalización Naranja (calibre 4, rollo por 500 m) para adecuación o provisión de senderos peatonales y demarcación de áreas de trabajo	un	72,00	$ 38.735,00	$ 2.788.920,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	22	$ 852.170,00
5,4	Bolizas (Alto 1,4m) Base negra *	un	90,00	$ 27.846,50	$ 2.506.185,00	15,00	$ 417.697,50	0,00	$ 0,00	59	$ 1.642.943,50
5,5	Señalización de zonas de acopio (Rotulado plastificado (Dimensiones: 50x35 cm, bond 90 gr, tintas 4x0, incluye producción y diseño). Debe permanecer durante la duración de la obra. Se estiman tres cambios	Estimado	70,00	$ 12.000,00	$ 840.000,00	4,00	$ 48.000,00	3,00	$ 36.000,00	83	$ 756.000,00
6,00	Control de emisiones atmosféricas										
6,1	Manguera multicapa con refuerzo textil interior y exterior para trabajo pesado. Incluye accesorios de conexión y regulación de agua - Pistola -.	m	510,00	$ 9.802,00	$ 4.999.020,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	400	$ 3.920.800,00
6,2	Cubierta para la concretadora. Incluye largueros y plástico	un	4,00	$ 87.663,00	$ 350.652,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0	$ 0,00

7,00	**Protección del suelo**										
7,1	Plástico Negro, calibre 4 y ancho de 2 m. para la protección del suelo durante el almacenamiento o preparación de materiales de construcción	kg	465,00	$ 8.300,00	$ 3.859.500,00	165,00	$ 1.369.500,00	30,00	$ 249.000,00	960	$ 7.968.000,00
8,00	**Manejo de campamento e instalaciones temporales**										
8,1	Señalización para campamento o instalaciones temporales (Rotulado plastificado (Dimensiones: 50x35 cm, bond 90 gr, tintas 4x0, incluye producción y diseño). Debe permanecer durante la duración de la obra. Se estiman tres cambios .	Global	67,00	$ 12.000,00	$ 804.000,00	1,00	$ 12.000,00	2,00	$ 24.000,00	38	$ 456.000,00
8,2	Balizas para adecuación o provisión de senderos peatonales 1,4 m base negra*	un	155,00	$ 27.846,50	$ 4.316.207,50	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	44	$ 1.225.246,00
8,3	Cinta Señalización Naranja (calibre 4, rollo por 500 m) para adecuación o provisión de senderos peatonales y demarcación de áreas de trabajo	un	42,00	$ 38.735,00	$ 1.626.870,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	22	$ 852.170,00
9,00	**Prevención de contaminación de cuerpos de agua de redes de servicios públicos**										
9,1	Caja desarenadora móvil para la concretadora	un	8,00	$ 51.878,00	$ 415.024,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0	$ 0,00
9,2	Malla tipo polisombra color azúl para proteger sumideros	m	550,00	$ 1.994,00	$ 1.096.700,00	100,00	$ 199.400,00	100,00	$ 199.400,00	940	$ 1.874.360,00
9,3	Alquiler de baño estandar con 2 limpieza por semana (Zona urbana)	mes	98,00	$ 716.115,00	$ 70.179.270,00	14,00	$ 10.025.610,00	14,00	$ 10.025.610,00	59	$ 42.250.785,00
10,00	**Gestión de la fauna y la flora**										
10,1	Malla tipo polisombra color azúl para protección de 1,50 m de ancho para proteccion de árboles	m	400,00	$ 1.994,00	$ 797.600,00	200,00	$ 398.800,00	100,00	$ 199.400,00	1150	$ 2.293.100,00
10,2	Estacón en madera común fijación vertical diámetro 0,10 m x 2,80 m de alto	un	115,00	$ 9.940,00	$ 1.143.100,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	70	$ 695.800,00
	Plan de Manejo de Tránsito										
11,00	**Señalización y Desvios**										
11,1	Señales informativa. Dimensiones y caracteristicas según lo establecido por el Manual de Señalización Vial 2015. Vias secundarias. 60x60 *	un	150,00	$ 166.041,00	$ 24.906.150,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	99	$ 16.438.059,00
11,2	Señales reglamentarias. Dimensiones y caracteristicas según lo establecido por el Manual de Señalización Vial 2015. Vias secundarias. 60x60 *	un	150,00	$ 164.779,00	$ 24.716.850,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	108	$ 17.796.132,00
11,3	Señales preventivas. Dimensiones y caracteristicas según lo establecido por el Manual de Señalización Vial 2015. vias secundarias. 60x60 *	un	150,00	$ 166.041,00	$ 24.906.150,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	116	$ 19.260.756,00
11,4	Paleta de PARE y SIGA. Dimensiones y caracteristicas según lo establecido por el Manual de Señalización Vial 2015 - Numeral 4.10.5 *	un	21,00	$ 40.000,00	$ 840.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	10	$ 400.000,00
11,5	Maletin (2.0 x 1.0 m) *	un	28,00	$ 274.976,00	$ 7.699.328,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	8	$ 2.199.808,00
11,6	Balizas (1,4 m) *	un	550,00	$ 27.847,00	$ 15.315.850,00	25,00	$ 696.175,00	110,00	$ 3.063.170,00	660	$ 18.379.020,00
11,7	Conos (0,90 m de altura, material plástico color naranja, lámina reflectiva tipo III ó IV) *	un	36,00	$ 54.232,00	$ 1.952.352,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	16	$ 867.712,00
11,8	Barricadas con franjas reflectivas tipo 3 con 1,50m alto y 2,40m de ancho *	un	58,00	$ 210.384,00	$ 12.201.112,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	33	$ 6.942.012,00
11,9	Cinta Señalización Naranja (calibre 4, rollo por 500 m)	un	32,00	$ 38.735,00	$ 1.239.520,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0	$ 0,00
11,10	Malla plástica naranja (polietileno de alta densidad, rollo por 50 m, ancho 1,40 m)	m	2000,00	$ 1.749,00	$ 3.498.000,00	200,00	$ 349.800,00	750,00	$ 1.311.750,00	2450	$ 4.285.050,00
11,11	Teleras 1,35m x 0,90 m	un	70,00	$ 20.000,00	$ 1.400.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	70	$ 1.400.000,00
11,12	Capacitación y entrenamiento para auxiliares de tránsito para obras en vías	un	26,00	$ 222.013,00	$ 5.772.338,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	9	$ 1.998.117,00
12,0	**Subprograma de seguridad y salud en el trabajo**										
12,1	Extintor multiproposito 10 Lb (incluye recarga en caso de necesitarse)*	un	16,00	$ 34.769,00	$ 556.304,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	9	$ 312.921,00
12,2	Silvato brigadista	un	20,00	$ 8.571,00	$ 171.420,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	8	$ 68.568,00
12,3	Camilla emergencia polietileno 185 cm x 0.45 cm con inmovilizador de cuello y arnés *	un	16,00	$ 144.086,00	$ 2.305.376,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	8	$ 1.152.688,00
12,4	Botiquín primeros auxilios (en lona) TIPO A	un	16,00	$ 171.898,00	$ 2.750.368,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	9	$ 1.547.082,00
13,0	**Personal para brigada Ambiental**										
13,1	Reconocimiento de personal para labores de brigada ambiental	hr	6140,50	$ 9.017,00	$ 55.368.888,50	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	9525	$ 85.886.925,00
	TOTAL				**$ 331.937.335,00**		**$ 14.523.771**		**$ 16.934.467**		**$ 281.423.033**
							TOTAL	**$ 31.458.238**			

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA
DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	1
FECHA	DD	31	MM	7	AA	2025	PERÍODO	01/08/2025 - 31/07/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	6/11/2024

ÍTEM	1,30	DESCRIPCIÓN	Bolsas plásticas para los frentes de obra color negro (residuos no aprovechables), según Resolución No. 2184 de 2019 (Tamaño 90*115) - (Calibre 1,6)	UNID.	un	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.









		CANTIDAD
FRENTE:		
Las Americas		
Simón Bolivar	Cra 82a entre Cll 36 y 37b	-
Simón Bolivar	Clle 37D entre Cra 82a y 83a	-
Simón Bolivar	Clle 40a entre Cra 83a y 84	-
Ferrini	Cll 53A entre Cra 81 y 80	-
Calasanz	Cll 50A entre Cra 86 y 86C	-
Laureles		
Las Acacias	Clle 30 entre Cra 80 y 81	-
Lorena	Cra 79 entre Clle 38 y TV 39b (38b)	-
Candelaria		
Calle Nueva	Cra 50 entre Clle 45 y 46	-
San Diego	Clle 31 entre Cra 42B y 42A	8,00
Belén Granada		
Belén Granada	Cra 75 entre Clle 30a y 28	-
	Cra 74 entre Clle 28 y 26B	-
	Clle 28 entre Cra 75 y 74	-
Boston/Enciso		
Boston/Enciso	Cra 36A entre Calle 58 y 57	14,00
	Clle 57 entre Cra 36A y 35	6,00
Boston		
Boston	Cra 40 entre Calle 54 y 56	10,00
Poblado		
Florida	Calle 5G entre Calle 6 y 5F	10,00
	Cra 33 entre Calle 7 y 6	6,00
Lomas	Cra 31A entre Calle 11A y 11	10,00
Buenos Aires		
Bombona #2	Cra 9A entre Calle 44AA y 45	1,00
	Calle 44A entre Cra 9A y 9	-
Candelaria		
Bombona #1	Calle 49A entre Cra 37 y 38	8,00
	Cra 38 entre Calle 49A y 48	-
Subtotal		75,00
TOTAL		75,00

OBSERVACIONES: No se presentan observaciones.

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO - DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

Alcaldia de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	2
FECHA	DD	31	MM	7	AA	2025	PERÍODO	01/06/2025 - 31/07/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	6/11/2024

ÍTEM	1,40	DESCRIPCIÓN	Bolsas plásticas para los frentes de obra color blanco (residuos aprovechables) según Resolución No. 2184 de 2019 (Tamaño 90*115) - (Calibre 1,6)	UNID.	un	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.









FRENTE:		CANTIDAD
Las Americas		
Simón Bolivar	Cra 82a entre Cll 36 y 37b	-
Simón Bolivar	Clle 37D entre Cra 82a y 83a	-
Simón Bolivar	Clle 40a entre Cra 83a y 84	-
Ferrini	Cll 53A entre Cra 81 y 80	-
Calasanz	Cll 50A entre Cra 86 y 86C	-
Laureles		
Las Acacias	Clle 30 entre Cra 80 y 81	-
Lorena	Cra 79 entre Clle 38 y TV 39b (38b)	-
Candelaria		
Calle Nueva	Cra 50 entre Clle 45 y 46	-
San Diego	Clle 31 entre Cra 42B y 42A	5,00
Belén Granada		
Belén Granada	Cra 75 entre Clle 30a y 28	-
	Cra 74 entre Clle 28 y 28B	-
	Clle 28 entre Cra 75 y 74	-
Boston/Enciso		
Boston/Enciso	Cra 36A entre Calle 58 y 57	10,00
	Clle 57 entre Cra 36A y 35	8,00
Boston		
Boston	Cra 40 entre Calle 54 y 56	10,00
Poblado		
Florida	Calle 5G entre Calle 6 y 5F	10,00
	Cra 33 entre Calle 7 y 6	6,00
Lomas	Cra 31A entre Calle 11A y 11	12,00
Buenos Aires		
Bombona #2	Cra 9A entre Calle 44AA y 45	1,00
	Calle 44A entre Cra 9A y 9	-
Candelaria		
Bombona #1	Calle 49A entre Cra 37 y 38	6,00
	Cra 38 entre Calle 49A y 48	-
Subtotal		68,00
TOTAL		68,00

OBSERVACIONES: No se presentan observaciones.

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO - DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA Nº	3
FECHA	DD	31	MM	7	AA	2025	PERÍODO	01/06/2025 - 31/07/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
CONTRATO No	4600102792 DE 2024 — FECHA DE INICIO: 6/11/2024

ÍTEM	1,50	DESCRIPCIÓN	Bolsas plásticas para los frentes de obra color verde (residuos orgánicos aprovechables) según Resolución No. 2184 de 2019 (Tamaño 90*115) -(Calibre 1,6)	UNID.	un	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.









OBSERVACIONES: No se presentan observaciones.

FRENTE:		CANTIDAD
Las Americas		
Simón Bolivar	Cra 82a entre Cll 36 y 37b	-
Simón Bolivar	Clle 37D entre Cra 82a y 83a	-
Simón Bolivar	Clle 40a entre Cra 83a y 84	-
Ferrini	Cll 53A entre Cra 81 y 80	-
Calasanz	Cll 50A entre Cra 86 y 96C	-
Laureles		
Las Acacias	Clle 30 entre Cra 80 y 81	-
Lorena	Cra 79 entre Clle 38 y TV 39b (38b)	-
Candelaria		
Calle Nueva	Cra 50 entre Clle 45 y 46	-
San Diego	Clle 31 entre Cra 42B y 42A	8,00
Belén Granada		
Belén Granada	Cra 75 entre Clle 30a y 28	-
	Cra 74 entre Clle 28 y 26B	-
	Clle 28 entre Cra 75 y 74	-
Boston/Enciso		
Boston/Enciso	Cra 36A entre Calle 58 y 57	14,00
	Clle 57 entre Cra 36A y 35	10,00
Boston		
Boston	Cra 40 entre Calle 54 y 56	11,00
Poblado		
Florida	Calle 5G entre Calle 6 y 5F	12,00
	Cra 33 entre Calle 7 y 6	9,00
Lomas	Cra 31A entre Calle 11A y 11	15,00
Buenos Aires		
Bombona #2	Cra 9A entre Calle 44AA y 45	1,00
	Calle 44A entre Cra 9A y 9	-
Candelaria		
Bombona #1	Calle 49A entre Cra 37 y 38	8,00
	Cra 38 entre Calle 49A y 48	-
Subtotal		88,00
TOTAL		88,00

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORIA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO - DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

Alcaldia de Medellín — Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN	CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	4
FECHA	DD	31	MM	7	AA	2025	PERÍODO	01/06/2025 - 31/07/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	6/11/2024

ÍTEM	1,60	DESCRIPCIÓN	Bolsas plásticas para los frentes de obra color rojo (residuos peligrosos) (Tamaño 90*115) - (Calibre 1,6)	UNID.	un	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.









		CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
		CANTIDAD
FRENTE:		
Las Americas		
Simón Bolivar	Cra 82a entre Cll 36 y 37b	-
Simón Bolivar	Clle 37D entre Cra 82a y 83a	-
Simón Bolivar	Clle 40a entre Cra 83a y 84	-
Ferrini	Cll 53A entre Cra 81 y 80	-
Calasanz	Cll 50A entre Cra 86 y 96C	-
Laureles		
Las Acacias	Clle 30 entre Cra 80 y 81	-
Lorena	Cra 79 entre Clle 38 y TV 39b (38b)	-
Candelaria		
Calle Nueva	Cra 50 entre Clle 45 y 46	-
San Diego	Clle 31 entre Cra 42B y 42A	9,00
Belén Granada		
Belén Granada	Cra 75 entre Clle 30a y 28	-
	Cra 74 entre Clle 28 y 26B	-
	Clle 28 entre Cra 75 y 74	-
Boston/Enciso		
Boston/Enciso	Cra 36A entre Calle 58 y 57	10,00
	Clle 57 entre Cra 36A y 35	4,00
Boston		
Boston	Cra 40 entre Calle 54 y 56	4,00
Poblado		
Florida	Calle 5G entre Calle 6 y 5F	4,00
	Cra 33 entre Calle 7 y 6	4,00
Lomas	Cra 31A entre Calle 11A y 11	10,00
Buenos Aires		
Bombona #2	Cra 9A entre Calle 44AA y 45	-
	Calle 44A entre Cra 8A y 9	-
Candelaria		
Bombona #1	Calle 49A entre Cra 37 y 38	4,00
	Cra 38 entre Calle 49A y 48	6,00
Subtotal		55,00
TOTAL		55,00

OBSERVACIONES: No se presentan observaciones.

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO - DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	5
FECHA	DD	31	MM	7	AA	2025	PERÍODO	01/06/2025 - 31/07/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	6/11/2024

ÍTEM	1,70	DESCRIPCIÓN	Construcción de caseta de 4 m2 aproximadamente para el acopio de residuos sólidos comunes. Incluye teleras, tejas de zinc, largueros	UNID.	un	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.





FRENTE:		CANTIDAD
Las Americas		
Simón Bolivar	Cra 82a entre Cll 36 y 37b	-
Simón Bolivar	Clle 37D entre Cra 82a y 83a	-
Simón Bolivar	Clle 40a entre Cra 83a y 84	-
Ferrini	Cll 53A entre Cra 81 y 80	-
Calasanz	Cll 50A entre Cra 86 y 96C	-
Laureles		
Las Acacias	Clle 30 entre Cra 80 y 81	-
Lorena	Cra 79 entre Clle 38 y TV 39b (38b)	-
Candelaria		
Calle Nueva	Cra 50 entre Clle 45 y 46	-
San Diego	Clle 31 entre Cra 42B y 42A	1,00
Belén Granada		
Belén Granada	Cra 75 entre Clle 30a y 28	-
	Cra 74 entre Clle 28 y 26B	-
	Clle 28 entre Cra 75 y 74	-
Boston/Enciso		
Boston/Enciso	Cra 36A entre Calle 58 y 57	-
	Clle 57 entre Cra 36A y 35	-
Boston		
Boston	Cra 40 entre Calle 54 y 56	-
Poblado		
Florida	Calle 5G entre Calle 6 y 5F	-
	Cra 33 entre Calle 7 y 6	-
Lomas	Cra 31A entre Calle 11A y 11	-
Buenos Aires		
Bombona #2	Cra 9A entre Calle 44AA y 45	-
	Calle 44A entre Cra 9A y 9	-
Candelaria		
Bombona #1	Calle 49A entre Cra 37 y 38	
	Cra 38 entre Calle 49A y 48	1,00
Subtotal		2,00
TOTAL		2,00

OBSERVACIONES: No se presentan observaciones.

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO - DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	6
FECHA	DD	31	MM	7	AA	2025	PERÍODO	01/06/2025 - 31/07/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	6/11/2024

ÍTEM	1,10	DESCRIPCIÓN	Kit aseo y limpieza en obra (pala y cepillo carretero)	UNID.	un	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.








FRENTE:		CANTIDAD
Las Americas		
Simón Bolivar	Cra 82a entre Cll 36 y 37b	-
Simón Bolivar	Clle 37D entre Cra 82a y 83a	-
Simón Bolivar	Clle 40a entre Cra 83a y 84	-
Ferrini	Cll 53A entre Cra 81 y 80	-
Calasanz	Cll 50A entre Cra 86 y 86C	-
Laureles		
Las Acacias	Clle 30 entre Cra 80 y 81	-
Lorena	Cra 79 entre Clle 38 y TV 39b (38b)	-
Candelaria		
Calle Nueva	Cra 50 entre Clle 45 y 46	-
San Diego	Clle 31 entre Cra 42B y 42A	4,00
Belén Granada		
Belén Granada	Cra 75 entre Clle 30a y 28	-
	Cra 74 entre Clle 28 y 28B	-
	Clle 28 entre Cra 75 y 74	-
Boston/Enciso		
Boston/Enciso	Cra 38A entre Calle 58 y 57	1,00
	Clle 57 entre Cra 38A y 35	-
Boston		
Boston	Cra 40 entre Calle 54 y 56	1,00
Poblado		
Florida	Calle 5G entre Calle 6 y 5F	-
	Cra 33 entre Calle 7 y 6	-
Lomas	Cra 31A entre Calle 11A y 11	1,00
Buenos Aires		
Bombona #2	Cra 9A entre Calle 44AA y 45	-
	Calle 44A entre Cra 9A y 9	-
Candelaria		
Bombona #1	Calle 49A entre Cra 37 y 38	3,00
	Cra 38 entre Calle 49A y 48	-
Subtotal		10,00
TOTAL		10,00

OBSERVACIONES: No se presentan observaciones.

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO - DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN	CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	7
FECHA	DD	31	MM	7	AA	2025	PERÍODO	01/06/2025 - 31/07/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	6/11/2024

ÍTEM	1,12	DESCRIPCIÓN	Señalización en sitios de disposicion temporal de residuos. (Rotulado plastificado (Dimensiones: 50x35 cm, bond 90 gr, tintas 4x0, incluye producción y diseño). Debe permanecer durante la duración de la obra. Se estiman tres cambios	UNID.	un	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.







OBSERVACIONES: No se presentan observaciones.

FRENTE:		CANTIDAD
Las Americas		
Simón Bolivar	Cra 82a entre Cll 36 y 37b	-
Simón Bolivar	Clle 37D entre Cra 82a y 83a	-
Simón Bolivar	Clle 40a entre Cra 83a y 84	-
Ferrini	Cll 53A entre Cra 81 y 80	-
Calasanz	Cll 50A entre Cra 86 y 95C	-
Laureles		
Las Acacias	Clle 30 entre Cra 80 y 81	-
Lorena	Cra 79 entre Clle 38 y TV 39b (38b)	-
Candelaria		
Calle Nueva	Cra 50 entre Clle 45 y 46	-
San Diego	Clle 31 entre Cra 42B y 42A	1,00
Belén Granada		
Belén Granada	Cra 75 entre Clle 30a y 28	-
	Cra 74 entre Clle 28 y 26B	-
	Clle 28 entre Cra 75 y 74	-
Boston/Enciso		
Boston/Enciso	Cra 36A entre Calle 58 y 57	-
	Clle 57 entre Cra 36A y 35	-
Boston		
Boston	Cra 40 entre Calle 54 y 56	-
Poblado		
Florida	Calle 5G entre Calle 6 y 5F	-
	Cra 33 entre Calle 7 y 6	-
Lomas	Cra 31A entre Calle 11A y 11	1,00
Buenos Aires		
Bombona #2	Cra 9A entre Calle 44AA y 45	-
	Calle 44A entre Cra 9A y 9	-
Candelaria		
Bombona #1	Calle 49A entre Cra 37 y 38	1,00
	Cra 38 entre Calle 49A y 48	-
Subtotal		3,00
TOTAL		3,00

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO - DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN	CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	6
FECHA	DD	31	MM	7	AA	2025	PERÍODO	01/06/2025 - 31/07/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	6/11/2024

ÍTEM	4.2	DESCRIPCIÓN	Estiba de contención de 55 litros fabricada en polietileno de alta densidad, para almacenamiento de sustancias químicas	UNID.	un	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.



OBSERVACIONES: No se presentan observaciones.

CONTRATISTA ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	INTERVENTORÍA MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO - DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

Las Americas		
Simón Bolivar	Cra 82a entre Cll 36 y 37b	-
Simón Bolivar	Clle 37D entre Cra 82a y 83a	-
Simón Bolivar	Clle 40a entre Cra 83a y 84	-
Ferrini	Cll 53A entre Cra 81 y 80	-
Calasanz	Cll 50A entre Cra 86 y 86C	-
Laureles		
Las Acacias	Clle 30 entre Cra 80 y 81	-
Lorena	Cra 79 entre Clle 38 y TV 39b (38b)	-
Candelaria		
Calle Nueva	Cra 50 entre Clle 45 y 46	-
San Diego	Clle 31 entre Cra 42B y 42A	1,00
Belén Granada		
Belén Granada	Cra 75 entre Clle 30a y 28	-
	Cra 74 entre Clle 28 y 28B	-
	Clle 28 entre Cra 75 y 74	-
Boston/Enciso		
Boston/Enciso	Cra 36A entre Calle 58 y 57	-
	Clle 57 entre Cra 36A y 35	-
Boston		
Boston	Cra 40 entre Calle 54 y 56	-
Poblado		
Florida	Calle 5G entre Calle 6 y 5F	-
	Cra 33 entre Calle 7 y 6	-
Lomas	Cra 31A entre Calle 11A y 11	-
Buenos Aires		
Bombona #2	Cra 9A entre Calle 44AA y 45	-
	Calle 44A entre Cra 9A y 9	-
Candelaria		
Bombona #1	Calle 49A entre Cra 37 y 38	-
	Cra 38 entre Calle 49A y 48	-
Subtotal		1,00
TOTAL		1,00

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	9
FECHA	DD	31	MM	7	AA	2025	PERÍODO	01/06/2025 - 31/07/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	6/11/2024

ÍTEM	5.2	DESCRIPCIÓN	Plástico Negro, calibre 4 y ancho de 2 m.	UNID.	un	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.





OBSERVACIONES: No se presentan observaciones.

	Las Americas	
Simón Bolivar	Cra 82a entre Cll 36 y 37b	-
Simón Bolivar	Clle 37D entre Cra 82a y 83a	-
Simón Bolivar	Clle 40a entre Cra 83a y 84	-
Ferrini	Cll 53A entre Cra 81 y 80	-
Calasanz	Cll 50A entre Cra 86 y 96C	-
	Laureles	
Las Acacias	Clle 30 entre Cra 80 y 81	-
Lorena	Cra 79 entre Clle 38 y TV 39b (38b)	-
	Candelaria	
Calle Nueva	Cra 50 entre Clle 45 y 46	-
San Diego	Clle 31 entre Cra 42B y 42A	55,00
	Belén Granada	
Belén Granada	Cra 75 entre Clle 30a y 28	-
	Cra 74 entre Clle 28 y 26B	-
	Clle 28 entre Cra 75 y 74	-
	Boston/Enciso	
Boston/Enciso	Cra 36A entre Calle 58 y 57	-
	Clle 57 entre Cra 36A y 35	-
	Boston	
Boston	Cra 40 entre Calle 54 y 56	-
	Poblado	
Florida	Calle 5G entre Calle 6 y 5F	-
	Cra 33 entre Calle 7 y 6	-
Lomas	Cra 31A entre Calle 11A y 11	-
	Buenos Aires	
Bombona #2	Cra 9A entre Calle 44AA y 45	-
	Calle 44A entre Cra 9A y 9	-
	Candelaria	
Bombona #1	Calle 49A entre Cra 37 y 38	55,00
	Cra 38 entre Calle 49A y 48	-
Subtotal		110,00
TOTAL		110,00

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO - DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN	CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	10
FECHA	DD	31	MM	7	AA	2025	PERÍODO	01/06/2025 - 31/07/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	6/11/2024

ÍTEM	5.4	DESCRIPCIÓN	Balizas (Alto 1,4m) Base negra *	UNID.	un	PROYECTO	





OBSERVACIONES: No se presentan observaciones.

CONTRATISTA ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	INTERVENTORÍA MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO - DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

Las Americas		
Simón Bolivar	Cra 82a entre Cll 36 y 37b	-
Simón Bolivar	Clle 37D entre Cra 82a y 83a	-
Simón Bolivar	Clle 40a entre Cra 83a y 84	-
Ferrini	Cll 53A entre Cra 81 y 80	-
Calasanz	Cll 50A entre Cra 86 y 86C	-
Laureles		
Las Acacias	Clle 30 entre Cra 80 y 81	-
Lorena	Cra 79 entre Clle 38 y TV 39b (38b)	-
Candelaria		
Calle Nueva	Cra 50 entre Clle 45 y 46	-
San Diego	Clle 31 entre Cra 42B y 42A	-
Belén Granada		
Belén Granada	Cra 75 entre Clle 30a y 28	-
	Cra 74 entre Clle 28 y 26B	-
	Clle 28 entre Cra 75 y 74	-
Boston/Enciso		
Boston/Enciso	Cra 36A entre Calle 58 y 57	
	Clle 57 entre Cra 36A y 35	
Boston		
Boston	Cra 40 entre Calle 54 y 56	
Poblado		
Florida	Calle 5G entre Calle 6 y 5F	
	Cra 33 entre Calle 7 y 6	
Lomas	Cra 31A entre Calle 11A y 11	
Buenos Aires		
Bombona #2	Cra 9A entre Calle 44AA y 45	-
	Calle 44A entre Cra 9A y 9	-
Candelaria		
Bombona #1	Calle 49A entre Cra 37 y 38	15,00
	Cra 38 entre Calle 49A y 48	-
Subtotal		15,00
TOTAL		15,00

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF					HOJA N°	11	
FECHA	DD	31	MM	7	AA	2025	PERÍODO	01/06/2025 - 31/07/2025		ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA		

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
CONTRATO No	4600102792 DE 2024 — FECHA DE INICIO: 6/11/2024

ÍTEM	5,5	DESCRIPCIÓN	Señalización de zonas de acopio (Rotulado plastificado (Dimensiones: 50x35 cm, bond 90 gr, tintas 4x0, incluye producción y diseño). Debe permanecer durante la duración de la obra. Se estiman tres cambios	UNID.	un	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.











OBSERVACIONES: No se presentan observaciones.

CONTRATISTA ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	INTERVENTORÍA MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO - DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

Las Americas		
Simón Bolivar	Cra 82a entre Cll 36 y 37b	-
Simón Bolivar	Clle 37D entre Cra 82a y 83a	-
Simón Bolivar	Clle 40a entre Cra 83a y 84	-
Ferrini	Cll 53A entre Cra 81 y 80	-
Calasanz	Cll 50A entre Cra 86 y 96C	-
Laureles		
Las Acacias	Clle 30 entre Cra 80 y 81	-
Lorena	Cra 79 entre Clle 38 y TV 39b (38b)	-
Candelaria		
Calle Nueva	Cra 50 entre Clle 45 y 46	-
San Diego	Clle 31 entre Cra 42B y 42A	3,00
Belén Granada		
Belén Granada	Cra 75 entre Clle 30a y 28	-
	Cra 74 entre Clle 28 y 26B	-
	Clle 28 entre Cra 75 y 74	-
Boston/Enciso		
Boston/Enciso	Cra 36A entre Calle 58 y 57	-
	Clle 57 entre Cra 36A y 35	-
Boston		
Boston	Cra 40 entre Calle 54 y 56	-
Poblado		
Florida	Calle 5G entre Calle 6 y 5F	-
	Cra 33 entre Calle 7 y 6	-
Lomas	Cra 31A entre Calle 11A y 11	-
Buenos Aires		
Bombona #2	Cra 9A entre Calle 44AA y 45	-
	Calle 44A entre Cra 9A y 9	-
Candelaria		
Bombona #1	Calle 49A entre Cra 37 y 38	4,00
	Cra 38 entre Calle 49A y 48	-
Subtotal		7,00
TOTAL		7,00

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	12
FECHA	DD	31	MM	7	AA	2025	PERÍODO	01/06/2025 - 31/07/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
CONTRATO No	4600102792 DE 2024 — FECHA DE INICIO: 6/11/2024

ÍTEM	7.1	DESCRIPCIÓN	Plástico Negro, calibre 4 y ancho de 2 m. para la protección del suelo durante el almacenamiento o preparación de materiales de construcción













OBSERVACIONES: No se presentan observaciones.

UNID.	un	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
Las Americas			
Simón Bolivar	Cra 82a entre Cll 36 y 37b		-
Simón Bolivar	Clle 37D entre Cra 82a y 83a		-
Simón Bolivar	Clle 40a entre Cra 83a y 84		-
Ferrini	Cll 53A entre Cra 81 y 80		-
Calasanz	Cll 50A entre Cra 86 y 96C		-
Laureles			
Las Acacias	Clle 30 entre Cra 80 y 81		-
Lorena	Cra 79 entre Clle 36 y TV 39b (38b)		-
Candelaria			
Calle Nueva	Cra 50 entre Clle 45 y 46		-
San Diego	Clle 31 entre Cra 42B y 42A		30,00
Belén Granada			
Belén Granada	Cra 75 entre Clle 30a y 28		-
	Cra 74 entre Clle 28 y 26B		-
	Clle 28 entre Cra 75 y 74		-
Boston/Enciso			
Boston/Enciso	Cra 36A entre Calle 58 y 57		20,00
	Clle 57 entre Cra 36A y 35		15,00
Boston			
Boston	Cra 40 entre Calle 54 y 56		25,00
Poblado			
Florida	Calle 5G entre Calle 6 y 5F		15,00
	Cra 33 entre Calle 7 y 6		15,00
Lomas	Cra 31A entre Calle 11A y 11		25,00
Buenos Aires			
Bombona #2	Cra 9A entre Calle 44AA y 45		10,00
	Calle 44A entre Cra 9A y 9		-
Candelaria			
Bombona #1	Calle 49A entre Cra 37 y 38		40,00
	Cra 38 entre Calle 49A y 48		-
Subtotal			195,00
TOTAL			195,00

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO - DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

Alcaldía de Medellín — Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN	CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	13
FECHA	DD	31	MM	7	AA	2025	PERÍODO	01/06/2025 - 31/07/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	6/11/2024

ÍTEM	8,1	DESCRIPCIÓN	Señalización para campamento o instalaciones temporales (Rotulado plastificado (Dimensiones: 50x35 cm, bond 90 gr, tintas 4x0, incluye producción y diseño). Debe permanecer durante la duración de la obra. Se estiman tres cambios .	UNID.	un	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.





OBSERVACIONES: No se presentan observaciones.

CONTRATISTA ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	INTERVENTORÍA MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO - DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

Las Americas		
Simón Bolivar	Cra 82a entre Cll 36 y 37b	-
Simón Bolivar	Clle 37D entre Cra 82a y 83a	-
Simón Bolivar	Clle 40a entre Cra 83a y 84	-
Ferrini	Cll 53A entre Cra 81 y 80	-
Calasanz	Cll 50A entre Cra 86 y 96C	-
Laureles		
Las Acacias	Clle 30 entre Cra 80 y 81	-
Lorena	Cra 79 entre Clle 38 y TV 39b (38b)	-
Candelaria		
Calle Nueva	Cra 50 entre Clle 45 y 46	-
San Diego	Clle 31 entre Cra 42B y 42A	2,00
Belén Granada		
Belén Granada	Cra 75 entre Clle 30a y 28	-
	Cra 74 entre Clle 28 y 26B	-
	Clle 26 entre Cra 75 y 74	-
Boston/Enciso		
Boston/Enciso	Cra 36A entre Calle 58 y 57	-
	Clle 57 entre Cra 36A y 35	-
Boston		
Boston	Cra 40 entre Calle 54 y 56	-
Poblado		
Florida	Calle 5G entre Calle 6 y 5F	-
	Cra 33 entre Calle 7 y 6	-
Lomas	Cra 31A entre Calle 11A y 11	-
Buenos Aires		
Bombona #2	Cra 9A entre Calle 44AA y 45	-
	Calle 44A entre Cra 9A y 9	-
Candelaria		
Bombona #1	Calle 49A entre Cra 37 y 38	1,00
	Cra 38 entre Calle 49A y 48	-
Subtotal		3,00
TOTAL		3,00

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	14
FECHA	DD	31	MM	7	AA	2025	PERÍODO	01/06/2025 - 31/07/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
CONTRATO No	4600102792 DE 2024 — FECHA DE INICIO: 6/11/2024

ÍTEM	9.2	DESCRIPCIÓN	Malla tipo polisombra color azúl para proteger sumideros	UNID.	un	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.







OBSERVACIONES: No se presentan observaciones.

Las Americas		
Simón Bolivar	Cra 82a entre Cll 36 y 37b	-
Simón Bolivar	Clle 37D entre Cra 82a y 83a	-
Simón Bolivar	Clle 40a entre Cra 83a y 84	-
Ferrini	Cll 53A entre Cra 81 y 80	-
Calasanz	Cll 50A entre Cra 86 y 96C	-
Laureles		
Las Acacias	Clle 30 entre Cra 80 y 81	-
Lorena	Cra 79 entre Clle 38 y TV 39b (38b)	-
Candelaria		
Calle Nueva	Cra 50 entre Clle 45 y 46	-
San Diego	Clle 31 entre Cra 42B y 42A	100,00
Belén Granada		
Belén Granada	Cra 75 entre Clle 30a y 28	-
	Cra 74 entre Clle 28 y 28B	-
	Clle 28 entre Cra 75 y 74	-
Boston/Enciso		
Boston/Enciso	Cra 36A entre Calle 58 y 57	10,00
	Clle 57 entre Cra 36A y 35	10,00
Boston		
Boston	Cra 40 entre Calle 54 y 56	20,00
Poblado		
Florida	Calle 5G entre Calle 6 y 5F	20,00
	Cra 33 entre Calle 7 y 6	10,00
Lomas	Cra 31A entre Calle 11A y 11	20,00
Buenos Aires		
Bombona #2	Cra 9A entre Calle 44AA y 45	-
	Calle 44A entre Cra 9A y 9	-
Candelaria		
Bombona #1	Calle 49A entre Cra 37 y 38	10,00
	Cra 38 entre Calle 49A y 48	-
Subtotal		200,00
TOTAL		200,00

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO - DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

Alcaldía de Medellín — Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN	CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	15
FECHA	DD	31	MM	7	AA	2025	PERÍODO	01/06/2025 - 31/07/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	6/11/2024

ÍTEM	9,3	DESCRIPCIÓN	Alquiler de baño estandar con 2 limpieza por semana (Zona urbana)	UNID.	un	PROYECTO	



OBSERVACIONES: No se presentan observaciones.

Las Americas		
Simón Bolivar	Cra 82a entre Cll 36 y 37b	-
Simón Bolivar	Clle 37D entre Cra 82a y 83a	-
Simón Bolivar	Clle 40a entre Cra 83a y 84	-
Ferrini	Cll 53A entre Cra 81 y 80	-
Calasanz	Cll 50A entre Cra 86 y 96C	-
Laureles		
Las Acacias	Clle 30 entre Cra 80 y 81	2,00
Lorena	Cra 79 entre Clle 38 y TV 39b (38b)	-
Candelaria		
Calle Nueva	Cra 50 entre Clle 45 y 46	-
San Diego	Clle 31 entre Cra 42B y 42A	2,00
Belén Granada		
Belén Granada	Cra 75 entre Clle 30a y 28	-
	Cra 74 entre Clle 28 y 26B	-
	Clle 28 entre Cra 75 y 74	-
Boston/Enciso		
Boston/Enciso	Cra 36A entre Calle 58 y 57	4,00
	Clle 57 entre Cra 36A y 35	-
Boston		
Boston	Cra 40 entre Calle 54 y 56	4,00
Poblado		
Florida	Calle 5G entre Calle 6 y 5F	2,00
	Cra 33 entre Calle 7 y 6	-
Lomas	Cra 31A entre Calle 11A y 11	8,00
Buenos Aires		
Bombona #2	Cra 9A entre Calle 44AA y 45	2,00
	Calle 44A entre Cra 9A y 9	-
Candelaria		
Bombona #1	Calle 49A entre Cra 37 y 38	4,00
	Cra 38 entre Calle 49A y 48	-
Subtotal		28,00
TOTAL		28,00

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO - DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN	CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA Nº	16
FECHA	DD	31	MM	7	AA	2025	PERÍODO	01/06/2025 - 31/07/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	6/11/2024

ÍTEM	10,1	DESCRIPCIÓN	Malla tipo polisombra color azúl para protección de 1,50 m de ancho para proteccion de árboles	UNID.	un	PROYECTO	










OBSERVACIONES: No se presentan observaciones.

	Las Americas		
Simón Bolivar	Cra 82a entre Cll 36 y 37b	-	
Simón Bolivar	Cle 37D entre Cra 82a y 83a	-	
Simón Bolivar	Cle 40a entre Cra 83a y 84	-	
Ferrini	Cll 53A entre Cra 81 y 80	-	
Calasanz	Cll 50A entre Cra 86 y 86C	-	
	Laureles		
Las Acacias	Cle 30 entre Cra 80 y 81	-	
Lorena	Cra 79 entre Cle 38 y TV 39b (38b)	-	
	Candelaria		
Calle Nueva	Cra 50 entre Cle 45 y 46	-	
San Diego	Cle 31 entre Cra 42B y 42A	100,00	
	Belén Granada		
Belén Granada	Cra 75 entre Cle 30a y 28	-	
	Cra 74 entre Cle 28 y 26B	-	
	Cle 28 entre Cra 75 y 74	-	
	Boston/Enciso		
Boston/Enciso	Cra 36A entre Calle 58 y 57	20,00	
	Cle 57 entre Cra 36A y 35	20,00	
	Boston		
Boston	Cra 40 entre Calle 54 y 56	40,00	
	Poblado		
Florida	Calle 5G entre Calle 6 y 5F	40,00	
	Cra 33 entre Calle 7 y 6	20,00	
Lomas	Cra 31A entre Calle 11A y 11	40,00	
	Buenos Aires		
Bombona #2	Cra 9A entre Calle 44AA y 45	-	
	Calle 44A entre Cra 9A y 9	-	
	Candelaria		
Bombona #1	Calle 49A entre Cra 37 y 38	20,00	
	Cra 38 entre Calle 49A y 48	-	
Subtotal		300,00	
TOTAL		300,00	

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO - DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

Alcaldía de Medellín — Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN	CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	17
FECHA	DD	31	MM	7	AA	2025	PERÍODO	01/06/2025 - 31/07/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	6/11/2024

ÍTEM	11,6	DESCRIPCIÓN	Balizas (1,4 m) *	UNID.	un	PROYECTO	





OBSERVACIONES: No se presentan observaciones.

		Las Americas	
Simón Bolivar	Cra 82a entre Cll 36 y 37b		-
Simón Bolivar	Clle 37D entre Cra 82a y 83a		-
Simón Bolivar	Clle 40a entre Cra 83a y 84		-
Ferrini	Cll 53A entre Cra 81 y 80		-
Calasanz	Cll 50A entre Cra 86 y 96C		-
	Laureles		
Las Acacias	Clle 30 entre Cra 80 y 81		-
Lorena	Cra 79 entre Clle 38 y TV 39b (38b)		-
	Candelaria		
Calle Nueva	Cra 50 entre Clle 45 y 46		-
San Diego	Clle 31 entre Cra 42B y 42A		20,00
	Belén Granada		
Belén Granada	Cra 75 entre Clle 30a y 28		-
	Cra 74 entre Clle 26 y 26B		-
	Clle 28 entre Cra 75 y 74		-
	Boston/Enciso		
Boston/Enciso	Cra 36A entre Calle 58 y 57		25,00
	Clle 57 entre Cra 36A y 35		
	Boston		
Boston	Cra 40 entre Calle 54 y 56		50,00
	Poblado		
Florida	Calle 5G entre Calle 6 y 5F		
	Cra 33 entre Calle 7 y 6		
Lomas	Cra 31A entre Calle 11A y 11		
	Buenos Aires		
Bombona #2	Cra 9A entre Calle 44AA y 45		-
	Calle 44A entre Cra 9A y 9		-
	Candelaria		
Bombona #1	Calle 49A entre Cra 37 y 38		40,00
	Cra 38 entre Calle 49A y 48		-
Subtotal			135,00
TOTAL			135,00

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO - DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN	CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	16
FECHA	DD	31	MM	7	AA	2025	PERÍODO	01/06/2025 - 31/07/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	6/11/2024

ÍTEM	11,10	DESCRIPCIÓN	Malla plástica naranja (polietileno de alta densidad, rollo por 50 m, ancho 1,40 m)	UNID.	un	PROYECTO	











OBSERVACIONES: No se presentan observaciones.

CONTRATISTA ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	INTERVENTORÍA MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO - DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

Las Americas		
Simón Bolivar	Cra 82a entre Cll 36 y 37b	-
Simón Bolivar	Clle 37D entre Cra 82a y 83a	-
Simón Bolivar	Clle 40a entre Cra 83a y 84	-
Ferrini	Cll 53A entre Cra 81 y 80	-
Calasanz	Cll 50A entre Cra 86 y 86C	-
Laureles		
Las Acacias	Clle 30 entre Cra 80 y 81	-
Lorena	Cra 79 entre Clle 38 y TV 39b (38b)	-
Candelaria		
Calle Nueva	Cra 50 entre Clle 45 y 46	-
San Diego	Clle 31 entre Cra 42B y 42A	450,00
Belén Granada		
Belén Granada	Cra 75 entre Clle 30a y 28	-
	Cra 74 entre Clle 28 y 26B	-
	Clle 28 entre Cra 75 y 74	-
Boston/Enciso		
Boston/Enciso	Cra 36A entre Calle 58 y 57	100,00
	Clle 57 entre Cra 36A y 35	
Boston		
Boston	Cra 40 entre Calle 54 y 56	100,00
Poblado		
Florida	Calle 5G entre Calle 6 y 5F	
	Cra 33 entre Calle 7 y 6	
Lomas	Cra 31A entre Calle 11A y 11	
Buenos Aires		
Bombona #2	Cra 9A entre Calle 44AA y 45	-
	Calle 44A entre Cra 9A y 9	-
Candelaria		
Bombona #1	Calle 49A entre Cra 37 y 38	300,00
	Cra 38 entre Calle 49A y 48	-
Subtotal		950,00
TOTAL		950,00

APLICACIÓN DE GUÍA DE MANEJO SOCIOAMBIENTAL													
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	**Programa de información y comunicación a la comunidad**					**Presupuesto modificación 2**			**ACTA N°9 Del 1 al 30 de Junio y del 1 al 31 de Julio 2025**		**ACUMULADO**	
1,1	Impresión de volantes. Tamaño: media carta 21,59 cm x 14 cm Tintas: 4x0 Material: propalcote 115	un	11000	$ 165,00	$ 1.815.000	6000	$ 165	$ 990.000	458,00	$ 75.570,00	2.364,00	$ 390.060,00
1,2	Cartelera informativa (corcho con marco de madera y banner en adhesivo full color.) 120x80 (incluye diseño y producción).	un	8	$ 164.000,00	$ 1.312.000	$ 14	$ 164.000	$ 2.296.000	1,00	$ 164.000,00	8,00	$ 1.312.000,00
1,3	Buzón de sugerencias 24cm de Ancho 16cm de alto por 15c de fondo, material en acrílico, impresión adhesivo en inkjet.	un	8	$ 120.210,00	$ 961.680	$ 14	$ 120.210	$ 1.682.940	1,00	$ 120.210	7,00	$ 841.470,00
1,4	Valla tijera 1x1 en lámina galvanizada calibre 26, decorada con adhesivo ambas caras.(según manual de identidad gráfica) **Incluye producción y diseño.**	un	8	$ 393.410,00	$ 3.147.280	24	$ 393.410	$ 9.441.840	6,00	$ 2.360.460,00	14,00	$ 5.507.740,00
1,5	Valla tijera 1x1 en lámina galvanizada calibre 26, decorada con adhesivo ambas caras.(según manual de identidad gráfica) Incluye producción y diseño).unidades adicionales por reposición, robo, durabilidad	un		$ 393.410,00	$ -	$ 0	$ 393.410	$ 0	0,00	$ -	-	$ -
1,6	Imantado para vehiculos Foto Vinilo impreso a 720 Dpi 0,5x0,3 (Según manual de obra).	un	2	$ 65.570,00	$ 131.140	2	$ 65.570	$ 131.140	0,00	$ -	2,00	$ 131.140,00
2	**Programa de participación comunitaria**					0		0				
2,1	Logística reuniones informativas comunidad /(incluye video beam+ silletería + auditorio para 30 personas)	un	17	$ 43.700,00	$ 742.900	$ 48	$ 43.700	$ 2.097.600	8,00	$ 349.600,00	17,00	$ 742.900,00
2,2	Refrigerios para reuniones con comunidad (reuniones inicio y finalización para 30 personas por reunion/ reuniones) Refrigerio básico empacado con las siguientes características: Bebida: Jugo en cajita 200 ml Pastelería dulce o salada de 150 gr (Croissant, pazerotti, pastel, empanada de queso, jamón y queso, hawaiano, ranchero, verduras o carnes, etc.) Presentación: Empacado en material que no sea icopor	un	510	$ 8.190,00	$ 4.176.900	$ 1.440	$ 8.190	$ 11.793.600	240,00	$ 1.965.600,00	508,00	$ 4.160.520,00
2,3	Logística reuniones Comité Ciudadano de Obra (incluye video beam+ silletería para 20 personas)	un	5	$ 43.700,00	$ 218.500	$ 15	$ 43.700	$ 655.500	5,00	$ 218.500,00	8,00	$ 349.600,00
2,4	Refrigerios para reuniones con CCO / 20 personas por CCO/ 7 reuniones de CCO) Refrigerio básico empacado con las siguientes características: Bebida: Jugo en cajita 200 ml Pastelería dulce o salada de 150 gr (Croissant, pazerotti, pastel, empanada de queso, jamón y queso, hawaiano, ranchero, verduras o carnes, etc.) Presentación: Empacado en material que no sea icopor	un	140	$ 8.190,00	$ 1.146.600	$ 300	$ 8.190	$ 2.457.000	100,00	$ 819.000,00	155,00	$ 1.269.450,00

3	**Programa de formación y capacitación**					**0**		**0**				
3,1	Logística para talleres de capacitación con comunidad / (materiales para el desarrollo del taller, + video beam)	un	17	$ 150.000,00	$ 2.550.000	18	$ 150.000	$ 2.700.000	1,00	$ 150.000,00	3,00	$ 450.000,00
3,2	Refrigerios para talleres de capacitación con comunidad/ 20 personas por taller/ 17 talleres Refrigerio básico empacado con las siguientes características: Bebida: Jugo en cajita 200 ml Pastelería dulce o salada de 150 gr (Croissant, pazerotti, pastel, empanada de queso, jamón y queso, hawaiano, ranchero, verduras o carnes, etc.) Presentación: Empacado en material que no sea icopor	un	340	$ 8.190,00	$ 2.784.600	380	$ 8.190	$ 3.112.200	20,00	$ 163.800,00	55,00	$ 450.450,00
4	**Programa de Sostenibilidad y calidad de la obra**					**$ 0**		**$ 0**				
4,1	Actividades de sostenibilidad y apropiación de obras /(logística de la actividad asociada de acuerdo al objeto de contrato).	un	17	$ 400.000,00	$ 6.800.000	$ 18	$ 400.000	$ 7.200.000	0,00	$ -	-	$ -
4,2	Refrigerios para talleres de capacitación con comunidad/ 11 actividades/ 20 personas Refrigerio básico empacado con las siguientes características: Bebida: Jugo en cajita 200 ml Pastelería dulce o salada de 150 gr (Croissant, pazerotti, pastel, empanada de queso, jamón y queso, hawaiano, ranchero, verduras o carnes, etc.) Presentación: Empacado en material que no sea icopor	un	340	$ 8.190,00	$ 2.784.600	360	$ 8.190	$ 2.948.400	0,00	$ -	-	$ -
5	**Plan de divulgación (Plan de Manejo de Tránsito (PMT)**					0		0				
5,1	Instalación de pasacalle con las siguientes características: Lona impresa full color **Tamaño:** 90 cms de alto x 9 mts de ancho con 5 palos, uno en cada lateral y 3 distribuidos en el centro. **Incluye:**producción, instalación y desinstalación.	un	8	$ 276.426,00	$ 2.211.408	0	$ 276.426	$ -	0,00	$ -	-	$ -
	TOTAL				**$ 30.782.608**			**$ 47.506.220**		**$ 6.386.740,00**		**$ 15.605.330**

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA
DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIERREZ
DIRECTORA DE INTERVENTORIA

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación


SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	1
FECHA	DD	31	MM	7	AA	2025	PERÍODO	01/06/2025 - 31/7/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	6/11/2024

ÍTEM	1,1	DESCRIPCIÓN	Impresión de volantes. Tamaño: media carta 21,59 cm x 14 cm Tintas: 4x0 Material: propalcote 115	UNID.	un	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.

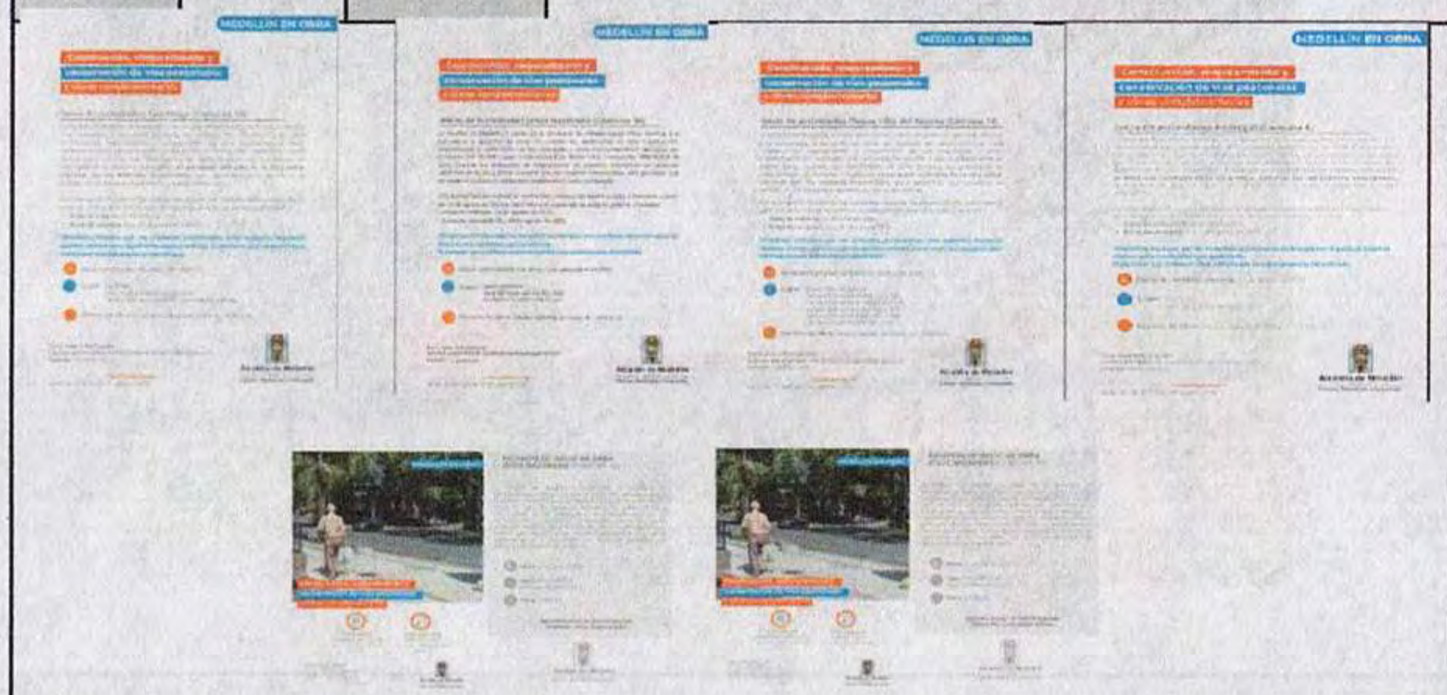

LOCALIZACIÓN			CANTIDAD
FRENTE:			
	REUNIÓN DE INICIO		
Puerta del sol			14,00
San Diego			72,00
Simón			12,00
Aures II			54,00
Jesús de Nazareno			38,00
Aranjuez			88,00
Pablo VI			56,00
Pedregal			48,00
Poblado			26,00
Ferrini			22,00
Boston			23,00
Bomboná			5,00
			-
Subtotal			
TOTAL			458,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIERREZ - DIRECTORA DE INTERVENTORIA

Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN	CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	2
FECHA	DD	31	MM	7	AA	2025	PERÍODO	01/06/2025 - 31/7/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	6/11/2024

ÍTEM	1,2	DESCRIPCIÓN	Cartelera informativa (corcho con marco de madera y banner en adhesivo full color.) 120x80 (incluye diseño y producción).	UNID.	un	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.



LOCALIZACIÓN			CANTIDAD
FRENTE:			-
Comuna 10	San Diego		1,00
			-
		Subtotal	1,00
		TOTAL	1,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	INTERVENTORÍA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIERREZ - DIRECTORA DE INTERVENTORIA

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA Nº	3
FECHA	DD	31	MM	7	AA	2025	PERÍODO	01/06/2025 - 31/7/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	6/11/2024

ÍTEM	1,3	DESCRIPCIÓN	Buzón de sugerencias 24cm de Ancho 16cm de alto por 15c de fondo, material en acrílico, impresión adhesivo en inkjet.	UNID.	un	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.



LOCALIZACIÓN			CANTIDAD
FRENTE:			
Comuna 10	San Diego		1,00

Subtotal	1,00
TOTAL	1,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIERREZ - DIRECTORA DE INTERVENTORIA

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	4
FECHA	DD	31	MM	7	AA	2025	PERÍODO	01/06/2025 - 31/7/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
CONTRATO No	4600102792 DE 2024
FECHA DE INICIO	6/11/2024

ÍTEM	1,4	DESCRIPCIÓN	Valla tijera 1x1 en lámina galvanizada calibre 26, decorada con adhesivo ambas caras.(según manual de identidad gráfica) Incluye producción y diseño.	UNID.	un	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.









LOCALIZACIÓN			CANTIDAD
FRENTE:			
Comuna 10	Bomboná I		1,00
Comuna 10	Boston		1,00
Comuna 9	Bomboná 2		1,00
Comuna 14	Lomas		1,00
Comuna 14	Florida		1,00
Comuna 10	Boston Enciso		1,00
		Subtotal	6,00
		TOTAL	6,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIERREZ - DIRECTORA DE INTERVENTORIA

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	5
FECHA	DD	31	MM	7	AA	2025	PERÍODO	01/06/2025 - 31/7/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
CONTRATO No	4600102792 DE 2024 — FECHA DE INICIO: 6/11/2024

ÍTEM	2,1	DESCRIPCIÓN	Logistica reuniones informativas comunidad /(incluye video beam+ silleteria + auditorio para 30 personas)	UNID.	un	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.









LOCALIZACIÓN			CANTIDAD
FRENTE:			
	San Diego		1,00
	Jesus de Nazareno		1,00
	Aranjuez		1,00
	Pablo VI		1,00
	Villa de Aburrá		1,00
	Pedregal		1,00
	Aures II		1,00
	Puerta del sol		1,00
			-
Subtotal			8,00
TOTAL			8,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIERREZ - DIRECTORA DE INTERVENTORIA

Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN	CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA Nº	6
FECHA	DD	31	MM	7	AA	2025	PERÍODO	01/06/2025 - 31/7/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	6/11/2024

ÍTEM	2,2	DESCRIPCIÓN	Refrigerios para reuniones con comunidad (reuniones inicio y finalización para 30 personas por reunion/ reuniones) Refrigerio básico empacado con las siguientes características: Bebida: Jugo en cajita 200 ml Pastelería dulce o salada de 150 gr (Croissant, pazerotti, pastel, empanada de queso, jamón y queso, hawaiano, ranchero, verduras o carnes, etc.) Presentación: Empacado en material que no sea icopor	UNID.	un	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.









LOCALIZACIÓN	CANTIDAD
FRENTE:	
San Diego	30,00
Jesus de Nazareno	30,00
Aranjuez	30,00
Pablo VI	30,00
Villa de Aburrá	30,00
Pedregal	30,00
Aures II	30,00
Puerta del sol	30,00
	-
Subtotal	240,00
TOTAL	240,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	INTERVENTORÍA MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIERREZ - DIRECTORA DE INTERVENTORIA

Alcaldía de Medellín — Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN	CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	7
FECHA	DD	31	MM	7	AA	2025	PERÍODO	01/06/2025 - 31/7/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	6/11/2024

ÍTEM	2.3	DESCRIPCIÓN	Logística reuniones Comité Ciudadano de Obra (incluye video beam+ silletería para 20 personas)	UNID.	un	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.









LOCALIZACIÓN	CANTIDAD
FRENTE:	
Bomboná 1	1,00
Las Lomas	
La Florida	1,00
Boston - Enciso	1,00
Bomboná 2	1,00
Ferrini	1,00
	-
Subtotal	5,00
TOTAL	5,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIERREZ - DIRECTORA DE INTERVENTORIA

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						**CONSORCIO VIAL VG - VNF**				**HOJA N°**	8
FECHA	**DD**	31	**MM**	7	**AA**	2025	**PERÍODO**	01/06/2025 - 31/7/2025	**ELABORÓ**	**ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA**	

OBJETO DEL CONTRATO	**CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS**
CONTRATO No	4600102792 DE 2024 — **FECHA DE INICIO** — **6/11/2024**

ÍTEM	2.4	**DESCRIPCIÓN**	Refrigerios para reuniones con CCO / 20 personas por CCO/ 7 reuniones de CCO) Refrigerio básico empacado con las siguientes características: Bebida: Jugo en cajita 200 ml Pastelería dulce o salada de 150 gr (Croissant, pazerotti, pastel, empanada de queso, jamón y queso, hawaiano, ranchero, verduras o carnes, etc.) Presentación: Empacado en material que no sea icopor	**UNID.**	un	**PROYECTO**	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.







LOCALIZACIÓN		CANTIDAD
FRENTE:		
Bomboná 1		20,00
Las Lomas		20,00
La Florida		
Boston - Enciso		20,00
Bomboná 2		20,00
Ferrini		20,00
Subtotal		100,00
TOTAL		100,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIERREZ - DIRECTORA DE INTERVENTORIA

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	9
FECHA	DD	31	MM	7	AA	2025	PERÍODO	01/06/2025 - 31/7/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
CONTRATO No	4600102792 DE 2024 — FECHA DE INICIO: 6/11/2024

ÍTEM	3,1	DESCRIPCIÓN	Logística para talleres de capacitación con comunidad / (materiales para el desarrollo del taller, + video beam)	UNID.	un	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.



LOCALIZACIÓN			CANTIDAD
FRENTE:			
	Boston Enciso		1,00

Subtotal	1,00
TOTAL	1,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIERREZ - DIRECTORA DE INTERVENTORIA

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	10
FECHA	DD	31	MM	7	AA	2025	PERÍODO	01/06/2025 - 31/7/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	6/11/2024

ÍTEM	3.2	DESCRIPCIÓN	Refrigerios para talleres de capacitación con comunidad/ 20 personas por taller/ 17 talleres Refrigerio básico empacado con las siguientes caracteristicas: Bebida: Jugo en cajita 200 ml Pastelería dulce o salada de 150 gr (Croissant, pazerotti, pastel, empanada de queso, jamón y queso, hawaiano, ranchero, verduras o carnes, etc.) Presentación: Empacado en material que no sea icopor	UNID.	un	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.



LOCALIZACIÓN			CANTIDAD
FRENTE:			
	Enciso		20,00

OBSERVACIONES:	Subtotal	20,00
	TOTAL	20,00

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIERREZ - DIRECTORA DE INTERVENTORIA

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 2 5 Solicitud de inscripción Unión temporal y/o Consorcio

4. Número de formulario 141126588964

(415)7707212489984(8020) 000014112658896 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 7 1 6 8 9	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO VIAL VG-VNF

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 127 # 13 A - 54 OF 603

42. Correo electrónico facturacion@vnfsas.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 8 5 4 1 1 2 6	6 0 1 7 1 8 8 6 9 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 4 0 9 1 7						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7		1 4		4 8		5 5																			

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 09 - 18 / 16 : 47: 23

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre VEGA CARDENAS HORACIO

985. Cargo Representante Legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 18-09-2024 04:54:19PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141126588964

(415)7707212489984(8020) **000014112658896 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 7 1 6 8 9	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 4 0 7 2 6	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 4 0 7 2 6	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generación documento PDF: 18-09-2024 04:54:19PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141126588964

(415)7707212489984(8020) **000014112658896 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 7 1 6 8 9	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 7 2 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	9 1 2 0 9 9 7 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VEGA	CARDENAS	HORACIO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 0 7 2 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 2 0 7 7 2 7 4 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VEGA	GARCIA	NATALIA	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141126588964

(415)7707212489984(8020) **000014112658896 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 8 7 1 6 8 9	9	Impuestos de Bogotá	3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 0 4 9 2 7 4	8	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: VNF S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
0	5 0	2 0 2 4 0 7 2 6	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 7 6 7 5 8 7	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CONSTRUCTORA VG SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5 0	2 0 2 4 0 7 2 6	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Gmail **Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>**

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y/O ACREEDORES

Gestion de Proveedores <gestion.proveedores@medellin.gov.co> 28 de noviembre de 2024, 4:17 p.m.
Para: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>

Buenas tardes,

Consorcio Vial VG VNF, se encuentra registrado desde el **24.09.2024** con el consecutivo interno (Acreedor) N°**1200056338** Tener en cuenta que la inscripción en el registro de proveedores se hace una sola vez y este le sirve para futuros trámites con el Distrito de Medellín, en caso tal que sus datos generales y bancarios hayan cambiado, deben solicitar actualización del registro a este mismo correo.

Se aclara que:

En esta dependencia "Gestión de Proveedores" (Secretaría de Suministros y Servicios), SOLO realizamos la Inscripción como proveedores de personas naturales o jurídicas en el Dato Maestro de Proveedores y Contratistas del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín por diferentes conceptos. Debe seguir gestionando el trámite con la dependencia con quien lo inició (Secretaría de Movilidad, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Gestión Humana, Secretaría General, entre otras) para que procedan a realizar el contrato o hacer el pago respectivo de ser pertinente, una vez verifiquen la totalidad de los requisitos exigidos y los documentos que debe adjuntar.

Este pantallazo es la prueba de su registro, puede imprimir este correo y adjuntarlo como evidencia que está registrado:



Cordialmente,

Bogotá D.C., 23 de septiembre del 2024

Señores
A Quien interese
Ciudad

Nos permitimos certificar que nuestro cliente CONSORCIO VIAL VG-VNF identificado con NIT 901.871.689-9 se encuentra vinculado a nuestra entidad financiera desde el 20/09/2024 a través del (los) producto (s):

Producto	No. producto	Fecha de apertura	Estado del producto
CUENTA AHORROS	096-07423-5	23/09/2024	Activo

La (s) cuenta (s) corriente (s) o de ahorros que se incluyen en este certificado, pertenece (n) al código 06 para transferencias ACH.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Operaciones
Banco Itaú

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901871689	9	CONSORCIO VIAL VG-VNF	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OPERATIVO COMFAMA	CALLE 127 13A 54 OFICINA 603	MEDELLIN-ANTIOQUIA	7188690	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1670518867	9489878504	E	2025/08/25	2025/08/01	BANCO ITAU	0	$21,558,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OPERATIVO COMFAMA (22 Afiliados)																					$67,169,583	$10,867,600			$69,336,431	$2,774,000			$69,165,876	$2,767,200			$69,336,431		$4,800,400		$0	$0		$21,209,200

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901871689	9	CONSORCIO VIAL VG-VNF	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OPERATIVO COMFAMA	CALLE 127 13A 54 OFICINA 603	MEDELLIN-ANTIOQUIA	7188690	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1670518867	9489878504	E	2025/08/25	2025/08/01	BANCO ITAU	0	$21,558,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				22	$11,095,400	$0	$0	$11,095,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$944,000	$0	$0	$944,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$2,516,000	$0	$0	$2,516,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$2,981,900	$0	$0	$2,981,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	9	$4,653,500	$0	$0	$4,653,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$4,807,900	$0	$0	$4,807,900
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	23	$4,807,900	$0	$0	$4,807,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				23	$2,824,200	$0	$0	$2,824,200
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$57,000	$0	$0	$57,000
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	22	$2,767,200	$0	$0	$2,767,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				23	$2,831,000	$0	$0	$2,831,000
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$57,000	$0	$0	$57,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	11	$1,679,000	$0	$0	$1,679,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$627,400	$0	$0	$627,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$119,700	$0	$0	$119,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$288,000	$0	$0	$288,000
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	$59,900	$0	$0	$59,900
TOTAL				23	$21,558,500	$0	$0	$21,558,500

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
7ae2b0f7ecaefa11872dbd111384fb15ddae16916f94a8e48d2bfa171a56514f6f2854df6b49181b14018e700be69899

Número de Factura: FVE-21
Fecha de Emisión: 19/08/2025
Fecha de Vencimiento: 18/09/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CONSORCIO VIAL VG-VNF
Nombre Comercial: CONSORCIO VIAL VG-VNF
Nit del Emisor: 901871689
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4290

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 127 # 13 A - 54 OF 603
Teléfono / Móvil: 3108541126
Correo: facturacion@vnfsas.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890905211
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Medellín
Dirección: CL 44 52 165
Teléfono / Móvil: 3855513
Correo: recepcionfacturas@medellin.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	01	Acta de recibo parcial de obra No 9 del contrato No 4600102792 de 2024 cuy o objeto es la construcción, mejoramiento y conser vación de vías peatonales y obras complementarias, periodo comprendido entr e el 16 de junio al 03 de agosto 2025	94	1,00	$ 2.374.359.576,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.374.359.576,00
2	02	Personal PMT	94	1,00	$ 134.960.162,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 134.960.162,00
3	03	Acta Socioambiental No 9	94	1,00	$ 37.844.978,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 37.844.978,00

Notas Finales

Linea de negocio: Consorcio Vial VG- VNF, Porcentaje de Participación: Constructora VG SAS (Nit. 901.767.587-1) 50%, VNF SAS (Nit. 900.049.274-8) 50%. AU:31.68%

Datos Totales

Documento generado el:
19/08/2025 19:39:06
Documento validado por la DIAN:
19/08/2025 19:39:06
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		2547164716
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		2547164716
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		2547164716
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 2547164716

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		2.547.164.716,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		2.547.164.716,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		2.547.164.716,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP**	$ 2.547.164.716,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764082863001 Rango desde: 1 Rango hasta: 50 Vigencia: 2026-11-05

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-GEHA-TES DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura / 2. Información Interviniente / 3. Datos para el pago

Número	FVE21	Titular del pago Nombre		Consorcio Vial VG VNF	Receptor del pago	CONSORCIO VIAL VG VNF
Fecha	19.08.2025	Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:		Entidad Bancaria	BANCO ITAÚ
			Nombre		No.Cuenta Bancaria	096074235
Valor	2.547.164.716,00	Receptor Alternativo			Tipo de cuenta	02

Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un contrato de arrendamiento
4. Contrato de arrendamiento

Nombre o Razón Social del Propietario	N.I.T o C.C

5. Datos Presupuestales del Pago / 6. Cuenta Bancaria Giradora

Número Contrato	4600102792	Cuenta bancaria especifica del fondo

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM	S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
5000768834	5100008518	200030	160070124	1.497.921.059,00	No			
5000768852	5100008583	240095	110000225	1.049.243.657,00	No			

Valor Total Entrada de Mercancía	2.547.164.716,00

Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un convenio
7. Convenios

Número	Fecha	Objeto

8. Interventor/Supervisor o Responsable del Pago

Nombres y apellidos	Cargo	Dependencia	Teléfono
JOHN BAYRON SERNA VALENCIA	SUPERVISOR	204	3855555 EXT 6245

Creado por: John Bayron Serna Valencia
Registrado: 20.08.2025 08:48:40

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000768834 **División:01**
Pedido 5100008518
Contrato 4600102792
Secretaría Infraestruc.Fisica

Fecha Documento: 20.08.2025 **Dependencia:** Despacho Secretaría de Infraestructura F
Descripción del pago: FVE21
Objeto del contrato: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Proveedor

Codigo: 1200056338 **Nit:** 9018716899 **Nombre:** Consorcio Vial VG VNF

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	310001	CONSTRUCCION DE OBRAS VARIAS	576.163.431	576.163.431,00	5111150000	160070124	200030	020
002	310001	CONSTRUCCION DE OBRAS VARIAS	921.757.628	921.757.628,00	5111150000	160070124	200030	030
		TOTAL	**1497.921.059**	**1497.921.059,00**				

Creado por John Bayron Serna Valencia
Registrado el 20.08.2025 08:19:56

Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.	Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.
Retención Fuente Renta				Estampilla U de A			
Retención Fuente IVA				Estampilla Adulto Mayor			
Retención ICA				Estampilla Procultura			
Contribución Especial				Cuenta Contable			
Contador que Califico							

Aunque los bienes o servicios han sido revisados por la interventoría y su calidad parece ser buena, esto no significa que han sido aceptados enforma definitiva.
En caso de obra pública, estos serán objeto de revisión permanente, no solo durante la ejecución de la obra sino en el periodo que cubre la póliza de estabilidad. En caso de ser otro tipo de adquisición de bieneso servicios que posea garantías adicionales, durante el periodo de vigencia del mismo.

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000768852 **División:01**
Pedido 5100008583
Contrato 4600102792
Secretaría Infraestruc.Fisica

Fecha Documento: 20.08.2025 **Dependencia:** Despacho Secretaría de Infraestructura F
Descripción del pago: FVE21
Objeto del contrato: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Proveedor

Codigo: 1200056338 **Nit:** 9018716899 **Nombre:** Consorcio Vial VG VNF

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	310001	CONSTRUCCION DE OBRAS VARIAS - Ad1	1049243.657	1049.243.657,00	5111150000	110000225	240095	010
		TOTAL	**1049.243.657**	**1049.243.657,00**				

Creado por John Bayron Serna Valencia
Registrado el 20.08.2025 08:47:03

Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.	Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.
Retención Fuente Renta				Estampilla U de A			
Retención Fuente IVA				Estampilla Adulto Mayor			
Retención ICA				Estampilla Procultura			
Contribución Especial				Cuenta Contable			
Contador que Califico							

Aunque los bienes o servicios han sido revisados por la interventoría y su calidad parece ser buena, esto no significa que han sido aceptados enforma definitiva.
En caso de obra pública, estos serán objeto de revisión permanente, no solo durante la ejecución de la obra sino en el periodo que cubre la póliza de estabilidad. En caso de ser otro tipo de adquisición de bieneso servicios que posea garantías adicionales, durante el periodo de vigencia del mismo.

Alcaldía de Medellín

ORDEN DE PAGO

No. 5100454261

División: 01

Fecha: 19.08.2025
Factura/Número cuenta cobro: FVE21
Secretaría: Secretaría de Infraestructura Física
Dirección: CL 127 13 A 54 OF 603
Teléfono: 6017188690
Fecha Vcto: 20.08.2025
Detalle: CONSTRUCCION DE OBRAS VARIAS

Acreedor: Consorcio Vial VG VNF
NIT Acreedor: 9018716899
Codigo del Acreedor: 1200056338

ClvCtabl	Cuenta	Nombre	Valor	PosPre	BP	ID	CtaBan	Rcso	Proyecto
31	1200056338	Consorcio Vial VG VNF	-1.288.511.953	2320202005				0701	200030
86	2425909999	Puente Mcia Transito	576.163.431	2320202005					200030
86	2425909999	Puente Mcia Transito	921.757.628	2320202005					200030
86	2425909999	Puente Mcia Transito	1.049.243.657	23201010010302					240095
31	1200056338	Consorcio Vial VG VNF	-902.559.032	2320202005				0002	200030
50	2436260200	RF Contrat Const.2%	-29.958.421	2320202005					200030
50	2917040200	Retencion Ind y Ccio	-2.696.000	2320202005					200030
50	4110610100	Contribuc.Especial	-74.896.053	2320202005					200030
50	2407220200	Rec Terc Estamp UdeA	-14.979.211	2320202005					200030
50	4105760200	Estamp.Adulto Mayor	-29.958.421	2320202005					200030
50	4105760100	Estamp.Procultura	-7.489.605	2320202005					200030
50	4105820100	Tasa Pro Deporte	-19.472.974	2320202005					200030
50	4105760400	Estam.Justic.Familia	-29.958.421	2320202005					200030
50	2436260200	RF Contrat Const.2%	-20.984.873	2320202005					200030
50	2917040200	Retencion Ind y Ccio	-1.889.000	2320202005					200030
50	4110610100	Contribuc.Especial	-52.462.183	2320202005					200030
50	2407220200	Rec Terc Estamp UdeA	-10.492.437	2320202005					200030
50	4105760200	Estamp.Adulto Mayor	-20.984.873	2320202005					200030
50	4105760100	Estamp.Procultura	-5.246.218	2320202005					200030
50	4105820100	Tasa Pro Deporte	-13.640.168	2320202005					200030
50	4105760400	Estam.Justic.Familia	-20.984.873	2320202005					200030

TOTAL A PAGAR: 0

ORDENADO POR: Jaime Naranjo Medina Impreso el 21.08.2025 **Página** **1 de 1**

DATOS PARA PAGO
GIRAR A NOMBRE DE: Consorcio Vial VG VNF **CEDULA:** 9018716899 **TELEFONO:** 6017188690
CUENTA PARA ABONO/CONSIGNACIÓN: 096074235.
TIPO DE CUENTA: Ahorro. **DEL BANCO:** BANCO ITAÚ
CONDICION DE PAG0: 0001.

DOCUMENTO CAUSADO POR: LREYES (LEADY JOHANA REYES JIMENEZ).
