CONSORCIO VIAS NACIONALES
NIT 901.474.028-8
Barrio el Cabrero Carrera 2 # 6-12
Tel: (605) 6939255
Cartagena - Colombia
J_BERTEL@KMA.COM.CO

Factura electrónica de venta
No. CVN 91

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
NIT	800.215.807-2	**Teléfono**	(605) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CL 25 G 73 B 90 ED CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	07/03/2025, 09:30
Expedición	07/03/2025, 09:31
Vencimiento	06/04/2025

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	01	ACTA 44- OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 MODULO 4	SERVICIO	1.00	1,326,582,772.00	0 %	0.00	1,326,582,772.00
2	02	ADMINISTRACION 20%	SERVICIO	1.00	265,316,554.41	0 %	0.00	265,316,554.41
3	03	IMPREVISTOS 5%	SERVICIO	1.00	66,329,143.18	0 %	0.00	66,329,143.18
4	04	UTILIDAD 5%	SERVICIO	1.00	66,329,136.84	19 %	12,602,536.00	78,931,672.84
5	05	REVISION ESTUDIOS Y DISEÑOS	SERVICIO	1.00	17,324,757.89	19 %	3,291,704.00	20,616,461.89
6	08	GESTION PREDIAL	SERVICIO	1.00	12,368,000.00	19 %	2,349,920.00	14,717,920.00
7	06	GESTION SOCIAL	SERVICIO	1.00	34,007,000.00	0 %	0.00	34,007,000.00
8	07	ADMINISTRACIÓN 2,5% GESTION SOCIAL	SERVICIO	1.00	850,173.68	19 %	161,533.00	1,011,706.68

Total items: 8

Valor en Letras: Mil cuatrocientos noventa y siete millones quinientos veinticuatro mil setecientos doce pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-06 por $ 1,497,524,712.00

Total Bruto	1,789,107,538.00
IVA 19%	18,405,693.00
IVA 0%	0.00
Copago / Anticipo	309,988,519.00
Total a Pagar	**1,497,524,712.00**

Observaciones: PERIODO: ENERO 2025
OBSERVACIONES:
#$24-02-00;978 DE 2021;jcanon@invias.gov.co#$
FAVOR CONSIGNAR A:
CONSORCIO VIAS NACIONALES
NIT: 901.474.028-8
BANCO DAVIVIENDA: CUENTA CORRIENTE Nº: 055-9699-98461
INTEGRANTES DEL CONSORCIO:
KMA CONSTRUCCIONES SAS-PARTCIPACION: 90%: 830.094.920-5
CICON SAS- PARTICIPACION: 5%: 890.403.235-3
CONSTRUCTORA EMMA LTDA- PARTICIPACION: 5%: 806.014.108-1

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764077062524 aprobado en 20240812 prefijo CVN desde el número 77 al 100 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril Tarifa
CUFE: 019358ac377d1583157ef2c8ca3dbceeff6367c31286e6fe85493eb765cbf3bd0952adb41113b1069f3a6df137416ed3

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 1/02/2025

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES, GRUPO ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACA Y CASANARE PERIODO MES: ene-25

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 44 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 1,789,107,538

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	8-feb-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING. EDWIN MENESES		El Contratista mediante comunicación CVN-0978-120-2025, hace presentacion del documento para revision y aprobacion de la Interventoria.
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	10-feb-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING. WILLIAM ORJUELA		La Interventoria mediante comunicación C.1468/RL3132/25/6.2, hace devolucion del documento para atencion de observaciones por parte del Contratista.
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	12-feb-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING. EDWIN MENESES		El Contratista mediante comunicación CVN-0978-133-2025, hace nuevamente presentacion del documento para revision y aprobacion de la Interventoria.
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	14-feb-25	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	ING. FERNANDO CARO		La Interventoria mediante comunicación C.1468/RL3147/25/6.2, hace presentacion del documento para aprobacion por parte del Instituto.
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE	19-02-2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	HENRY ANTONIO MELENDEZ O	MELENDEZ ORTIZ HENRY ANTONIO Firmado digitalmente por MELENDEZ ORTIZ HENRY ANTONIO	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	05-03-2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	HENRY ANTONIO MELENDEZ O	MELENDEZ ORTIZ HENRY ANTONIO Firmado digitalmente por MELENDEZ ORTIZ HENRY ANTONIO	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA	17-feb-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	GUSTAVO FERNANDEZ	Firmado digitalmente por GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	19-feb-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	GUSTAVO FERNANDEZ	Firmado digitalmente por GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	5-03-2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JAIME NILTON RAMIREZ GUTIERREZ		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	6-Marzo-2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Javier Augusto Cañón Bonilla		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 978 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES **NIT.** 901.474.028-8

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, JAVIER AUGUSTO CAÑON BONILLA (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VIAS NACIONALES

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 1,497,524,712.00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 44 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** ENERO 2025 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma: Firmado digitalmente por GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO	Firma: Firmado digitalmente por GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO	Firma: MELENDEZ ORTIZ HENRY ANTONIO Firmado digitalmente por MELENDEZ ORTIZ HENRY ANTONIO	Firma: MELENDEZ ORTIZ HENRY ANTONIO Firmado digitalmente por MELENDEZ ORTIZ HENRY ANTONIO	Firma:
Nombre: Ing. Gustavo Gamaliel Fernández Niño	Nombre: Ing. Gustavo Gamaliel Fernández Niño	Nombre: Ing. Henry Antonio Meléndez Ortiz	Nombre: Ing. Henry Antonio Meléndez Ortiz	Nombre: Jaime Nilton Ramírez Gutiérrez
Matricula profesional No.: 15219-17469 BYC	Matricula profesional No.: 15219-17469 BYC	Matricula profesional No.: 25202-289272 CND	Matricula profesional No.: 25202-289272 CND	Matricula Profesional No.: 25335-147616 CND
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA RUTA 6404	DIRECTOR TERRITORIAL BOYACÁ	SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA RUTAS 6405 Y 6514	DIRECTOR TERRITORIAL CASANARE	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)

Firma:
Nombre: Ing. Javier Augusto Cañon Bonilla
Matrícula Profesional No.: 01108-0943-BOY
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO No: 978 DE 2021

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		0%	ACTA DE OBRA	X	44	ene-25
PAGO ANTICIPADO		_____	ACTA DE INTERVENTORIA			
DESEMBOLSO		_____	ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL? _____			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	RP 420921	RUBRO No.	C-2401-0600-108-0-2401008-02	RECURSO No.	54	VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO	RP 420921	RUBRO No.	C-2401-0600-108-0-2401023-02	RECURSO No.	54	VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO	RP 420921	RUBRO No.	C-2401-0600-132-0-2401008-02	RECURSO No.	54	VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO	RP 420921	RUBRO No.	C-2401-0600-132-0-2401023-02	RECURSO No.	54	VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO	RP 420921	RUBRO No.	C-2401-0600-108-0-2401041-02	RECURSO No.	54	VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO	RP 195622	RUBRO No.	C-2401-0600-108-0-2401008-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO	RP 195622	RUBRO No.	C-2401-0600-108-0-2401023-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO	RP 284122	RUBRO No.	C-2401-0600-108-0-2401008-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO	RP 284122	RUBRO No.	C-2401-0600-108-0-2401023-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO	RP 125323	RUBRO No.	C-2401-0600-108-0-2401008-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO	RP 125323	RUBRO No.	C-2401-0600-108-0-2401023-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO	RP 449823	RUBRO No.	C-2401-0600-108-0-2401008-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO	RP 449823	RUBRO No.	C-2401-0600-108-0-2401023-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO	RP 167624	RUBRO No.	C-2401-0600-108-51102D-2401008-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO	RP 167624	RUBRO No.	C-2401-0600-108-51102D-2401008-02	RECURSO No.	16	VALOR AFECTADO	$ 615.459.773,00
No. COMPROMISO	RP 167624	RUBRO No.	C-2401-0600-108-51102D-2401023-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	$ 252.544.598,00
No. COMPROMISO	RP 223124	RUBRO No.	C-2401-0600-132-51102D-2401023-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	$ 81.157.242,00
No. COMPROMISO	RP 223124	RUBRO No.	C-2401-0600-132-51102D-2401008-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	$ 548.363.099,00
						TOTAL ACTA	1.497.524.712,00

NOTA: Si el recurso es No. 14, favor indicar Entidad Financiadora:_____
(BID, USAID, CAF, Etc.…)

MELENDEZ ORTIZ HENRY ANTONIO
Firmado digitalmente por MELENDEZ ORTIZ HENRY ANTONIO

HENRY ANTONIO MELÉNDEZ ORTIZ
Matrícula No. 25202-289272 CND
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA RUTAS 6405 Y 6514

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES, GRUPO ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL** BOYACA Y CASANARE **ACTA Nª** 44 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1.789.107.538,00 **MES** ene-25

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 978 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES RUTA: 6404: BELEN-SACAMA /6405: SACAMA-LA CABUYA /6514: PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1038 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA

PLAZO INICIAL: 102 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: **98 MESES Y 7 DIAS** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2029 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N.A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A** $ **322.790.128.920,00** (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ **20.059.840.972,00**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ **342.849.969.892,00**

No. DE ORDEN	No. DE ITEM	ICCP	ICOCIV	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 12 de fecha 29/11/2024		OBRA EJECUTADA			
													PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRUPO DE AJUSTE		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
EXPLANACIONES																
1	200.1	1		200-13		Desmonte y limpieza en bosque	Ha	4,00	$ 1.816.892,00	$ 7.267.568,00		$ -				$ -
1.1	200.1	1	11601	200-13		Desmonte y limpieza en bosque	Ha		$ 1.816.892,00		4,00	$ 7.267.568,00				$ -
2	200.2	1		200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	13,00	$ 1.187.326,00	$ 15.435.238,00		$ -				$ -
2.1	200.2	1	11601	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha		$ 1.187.326,00		13,00	$ 15.435.238,00				$ -
3	201.7	1		201-13		Demolición de Estructuras	m3	8.042,00	$ 113.989,00	$ 916.699.538,00		$ -				$ -
3.1	201.7	1	11601	201-13		Demolición de Estructuras	m3		$ 113.989,00		8.042,00	$ 916.699.538,00		$ -	916,00	$ 104.413.924,00
4	201.15	1		201.13		Remoción de alcantarillas	m	1.254,00	$ 69.636,00	$ 87.323.544,00		$ -		$ -		$ -
4.1	201.15	1	11601	201.13		Remoción de alcantarillas	m		$ 69.636,00		1.254,00	$ 87.323.544,00		$ -	342,00	$ 23.815.512,00
5	201.16	1		201-13		Remoción de cercas de alambre	m	8.000,00	$ 4.475,00	$ 35.800.000,00		$ -		$ -		$ -
5.1	201.16	1	11601	201-13		Remoción de cercas de alambre	m		$ 4.475,00		8.000,00	$ 35.800.000,00		$ -	159,00	$ 711.525,00
6	210.1.2	1		210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	90.504,00	$ 12.579,00	$ 1.138.449.816,00		$ -		$ -		$ -
6.1	210.1.2	1	11601	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3		$ 12.579,00		9.687,32	$ 121.856.798,28		$ -		$ -
7	210.2.1	1		210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	21.312,00	$ 62.892,00	$ 1.340.354.304,00		$ -		$ -		$ -
7.1	210.2.1	1	11601	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3		$ 62.892,00		26.562,00	$ 1.670.537.304,00	672,00	$ 42.263.424,00	21.573,00	$ 1.356.769.116,00
8	210.2.2	1		210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	1.051.379,00	$ 10.387,00	$ 10.920.673.673,00		$ -		$ -		$ -
8.1	210.2.2	1	11601	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3		$ 10.387,00		535.965,30	$ 5.567.071.571,10	2.672,00	$ 27.754.064,00	57.418,00	$ 596.400.766,00
8.2	210.2.2	1	11606	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3		$ 10.387,00		90.413,70	$ 939.127.101,90		$ -	23.734,00	$ 246.525.058,00
9	211.1	1		211-13		Remoción de Derrumbes	m3	15.000,00	$ 9.747,00	$ 146.205.000,00	2.064,00	$ 20.117.808,00		$ -	2.064,00	$ 20.117.808,00
9.1	211.1	1	11601	211-13		Remoción de Derrumbes	m3		$ 9.747,00		29.936,00	$ 291.786.192,00		$ -	18.171,00	$ 177.112.737,00
10	220.1	1		220-13		Terraplenes	m3	301.680,00	$ 12.804,00	$ 3.862.710.720,00		$ -		$ -		$ -
10.1	220.1	1	11601	220-13		Terraplenes	m3		$ 12.804,00		15.613,33	$ 199.913.077,32		$ -		$ -
11	221.1	1		221-13		Pedraplén compacto	m3	1.376,00	$ 18.609,00	$ 25.605.984,00		$ -		$ -		$ -
11.1	221.1	1	11601	221-13		Pedraplén compacto	m3		$ 18.609,00		1.376,00	$ 25.605.984,00		$ -	123,00	$ 2.288.907,00
12	231.1	8		231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	48.500,00	$ 7.521,00	$ 364.768.500,00		$ -		$ -		$ -
12.1	231.1	8	11601	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2		$ 7.521,00		20.000,00	$ 150.420.000,00		$ -		$ -
Subtotal										**$ 18.861.293.885,00**	**Subtotal**	**$ 10.048.961.724,60**	**Subtotal**	**$ 70.017.488,00**	**Subtotal**	**$ 2.528.155.353,00**
BASES. SUBBASES Y AFIRMADOS																
13	310.1	2		310-13		Conformación de la calzada existente	m2	309.750,00	$ 927,00	$ 287.138.250,00	306.373,00	$ 284.007.771,00		$ -	306.373,00	$ 284.007.771,00
13.1	310.1	2	11602	310-13		Conformación de la calzada existente	m2		$ 927,00		2.153.377,00	$ 1.996.180.479,00		$ -	1.272.550,00	$ 1.179.653.850,00
14	311.1	2		311-13		Afirmado	m3	32.928,00	$ 129.940,00	$ 4.278.664.320,00	1.255,00	$ 163.074.700,00		$ -	1.255,00	$ 163.074.700,00
14.1	311.1	2	11602	311-13		Afirmado	m3		$ 129.940,00		68.673,00	$ 8.923.369.620,00	104,00	$ 13.513.760,00	50.268,70	$ 6.531.914.878,00
15	320.1	2		320-13		Subbase Granular clase A	m3	53.487,00	$ 150.000,00	$ 8.023.050.000,00		$ -		$ -		$ -
15.1	320.1	2	11602	320-13		Subbase Granular clase A	m3		$ 150.000,00		44.813,68	$ 6.722.052.000,00	613,30	$ 91.995.000,00	1.675,80	$ 251.370.000,00
16	330.1	2		330-13		Base granular clase A	m3	130.475,00	$ 170.000,00	$ 22.180.750.000,00		$ -		$ -		$ -
16.1	330.1	2	11602	330-13		Base granular clase A	m3		$ 170.000,00		146.475,00	$ 24.900.750.000,00	252,10	$ 42.857.000,00	34.281,70	$ 5.827.889.000,00
17	330.4	2		330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	6.300,00	$ 216.357,00	$ 1.363.049.100,00		$ -		$ -		$ -
17.1	330.4	2	11602	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3		$ 216.357,00		6.300,00	$ 1.363.049.100,00		$ -	390,00	$ 84.379.230,00
18	340.1	2		340-13		Base estabilizada con emulsión tipo BEE-38	m3	13.071,00	$ 217.561,00	$ 2.843.739.831,00		$ -		$ -		$ -
18.1	340.1	2	11602	340-13		Base estabilizada con emulsión tipo BEE-38	m3		$ 217.561,00		904,12	$ 196.701.251,32		$ -		$ -
Subtotal										**$ 38.976.391.501,00**	**Subtotal**	**$ 44.549.184.921,32**	**Subtotal**	**$ 148.365.760,00**	**Subtotal**	**$ 14.322.289.429,00**
PAVIMENTOS ASFALTICOS																
19	411.2	8		411-13		Emulsión asfáltica de rotura lenta CRL-1 ARD	Lt	392.145,00	$ 2.406,00	$ 943.500.870,00		$ -		$ -		$ -
19.1	411.2	8	11603	411-13		Emulsión asfáltica de rotura lenta CRL-1 ARD	Lt		$ 2.406,00		52.145,00	$ 125.460.870,00		$ -		$ -
20	420.2	8		420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	740.556,00	$ 2.848,00	$ 2.109.103.488,00	30.372,00	$ 86.499.456,00		$ -		$ -
20.1	420.2	8	11603	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2		$ 2.848,00		718.694,57	$ 2.046.842.135,36	1.165,00	$ 3.317.920,00	19.639,00	$ 55.931.872,00
21	421.1	8		421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	118.832,00	$ 1.849,00	$ 219.720.368,00	23.867,00	$ 44.130.083,00		$ -	8.867,00	$ 16.395.083,00
21.1	421.1	8	11603	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2		$ 1.849,00		433.151,00	$ 800.896.199,00	2.633,00	$ 4.868.417,00	417.269,00	$ 771.530.381,00
22	450.2P	8			450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	67.863,00	$ 800.000,00	$ 54.290.400.000,00	3.576,80	$ 2.861.440.000,00		$ -	3.576,80	$ 2.861.440.000,00
22.1	450.2P	8	11603		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3		$ 800.000,00		69.286,20	$ 55.428.960.000,00	247,30	$ 197.840.000,00	32.940,40	$ 26.352.320.000,00
23	450.9P	8			450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	2.835,00	$ 844.484,00	$ 2.394.112.140,00		$ -		$ -		$ -
23.1	450.9P	8	11603		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3		$ 844.484,00		3.390,00	$ 2.862.800.760,00		$ -	256,50	$ 216.610.146,00
24	460.1P	8			460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	1.575,00	$ 72.822,00	$ 114.694.650,00	3.540,40	$ 257.819.009,00		$ -	3.540,40	$ 257.819.009,00
24.1	460.1P	8	11603		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3		$ 72.822,00		51.304,60	$ 3.736.103.581,20		$ -	20.183,70	$ 1.469.817.401,00
25	465.1	1		465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	3.150,00	$ 78.894,00	$ 248.516.100,00		$ -		$ -		$ -
25.1	465.1	1	11601	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3		$ 78.894,00		3.150,00	$ 248.516.100,00		$ -	9,20	$ 725.825,00
26	466.1	8		466-13		Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo	m	1.142,00	$ 4.342,00	$ 4.958.564,00		$ -		$ -		$ -
26.1	466.1	8	11603	466-13		Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo	m		$ 4.342,00		1.142,00	$ 4.958.564,00		$ -		$ -
Subtotal										**$ 60.325.006.180,00**	**Subtotal**	**$ 68.504.426.757,56**	**Subtotal**	**$ 206.026.337,00**	**Subtotal**	**$ 32.002.589.717,00**
ESTRUCTURAS Y DRENAJES																
27	600.1.1	1		600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	105.596,00	$ 31.883,00	$ 3.366.717.268,00	420,70	$ 13.413.179,00		$ -	420,70	$ 13.413.179,00
27.1	600.1.1	1	11601	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3		$ 31.883,00		131.175,30	$ 4.182.262.089,90	629,90	$ 20.083.102,00	20.178,70	$ 643.357.492,00

GT

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES, GRUPO ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL** BOYACA Y CASANARE **ACTA Nª** 44 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1.789.107.538,00 **MES** ene-25

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 978 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES RUTA: 6404: BELEN-SACAMA /6405: SACAMA-LA CABUYA /6514: PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1038 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA

PLAZO INICIAL: 102 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: **98 MESES Y 7 DIAS** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2029 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N.A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A** $ **322.790.128.920,00** (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ **20.059.840.972,00**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ **342.849.969.892,00**

No. DE ORDEN	No. DE ITEM	ICCP	ICOCIV	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 12 de fecha 29/11/2024		OBRA EJECUTADA			
													PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRUPO DE AJUSTE		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
28	600.2.1	1		600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	21.312,00	$ 79.917,00	$ 1.703.191.104,00		$ -		$ -		$ -
28.1	600.2.1	1	11601	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3		$ 79.917,00		26.312,00	$ 2.102.776.104,00		$ -	431,10	$ 34.452.219,00
29	610.1	2		610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	31.679,00	$ 44.832,00	$ 1.420.232.928,00		$ -		$ -		$ -
29.1	610.1	2	11604	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3		$ 44.832,00		19.130,81	$ 857.672.473,92		$ -	104,20	$ 4.671.495,00
30	610.2	2		610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	59.447,00	$ 111.264,00	$ 6.614.311.008,00		$ -		$ -		$ -
30.1	610.2	2	11604	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3		$ 111.264,00		68.447,00	$ 7.615.687.008,00	170,00	$ 18.914.880,00	3.149,80	$ 350.459.348,00
31	621.1.2P	6			621.1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase	m	434,00	$ 3.064.921,00	$ 1.330.175.714,00		$ -		$ -		$ -
31.1	621.1.2P	6	11604		621.1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase	m		$ 3.064.921,00		493,00	$ 1.511.006.053,00		$ -	129,60	$ 397.213.762,00
32	630.3	6		630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	7.441,00	$ 850.001,00	$ 6.324.857.441,00		$ -		$ -		$ -
32.1	630.3	6	11604	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3		$ 850.001,00		8.441,00	$ 7.174.858.441,00	48,40	$ 41.140.048,00	1.279,20	$ 1.087.321.280,00
33	630.4	6		630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	21.805,00	$ 703.582,00	$ 15.341.605.510,00		$ -		$ -		$ -
33.1	630.4	6	11604	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3		$ 703.582,00		17.444,00	$ 12.273.284.408,00		$ -		$ -
33.2	630.4	6	11606	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3		$ 703.582,00		4.361,00	$ 3.068.321.102,00		$ -	152,60	$ 107.366.614,00
34	630.6	6		630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	6.331,00	$ 533.062,00	$ 3.374.815.522,00		$ -		$ -		$ -
34.1	630.6	6	11604	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3		$ 533.062,00		7.331,00	$ 3.907.877.522,00	14,00	$ 7.462.868,00	220,90	$ 117.753.397,00
35	630.7	6		630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	698,00	$ 491.194,00	$ 342.853.412,00		$ -		$ -		$ -
35.1	630.7	6	11604	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3		$ 491.194,00		698,00	$ 342.853.412,00	19,60	$ 9.627.402,00	242,40	$ 119.065.427,00
36	630P	6			630P	Suministro e instalación de bolsacretos	m3	5.000,00	$ 676.111,00	$ 3.380.555.000,00		$ -		$ -		$ -
36.1	630P	6	11604		630P	Suministro e instalación de bolsacretos	m3		$ 676.111,00		4.877,83	$ 3.297.954.519,13		$ -	356,80	$ 241.236.404,00
37	640.1	5		640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	2.572.492,00	$ 5.378,00	$ 13.834.861.976,00		$ -		$ -		$ -
37.1	640.1	5	11604	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5.378,00		2.195.593,60	$ 11.807.902.380,80		$ -		$ -
37.2	640.1	5	11606	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5.378,00		548.898,40	$ 2.951.975.595,20	28.403,00	$ 152.751.334,00	383.576,20	$ 2.062.872.804,00
38	661.1	6		661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	2.731,00	$ 609.158,00	$ 1.663.610.498,00		$ -		$ -		$ -
38.1	661.1	6	11604	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m		$ 609.158,00		2.731,00	$ 1.663.610.498,00	48,00	$ 29.239.584,00	529,00	$ 322.244.582,00
39	663.3P	6			663.3P	Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm	m	119.860,00	$ 37.198,00	$ 4.458.552.280,00	632,40	$ 23.524.016,00		$ -	632,40	$ 23.524.016,00
39.1	663.3P	6	11604		663.3P	Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm	m		$ 37.198,00		119.227,60	$ 4.435.028.264,80	10,00	$ 371.980,00	18.685,60	$ 695.066.949,00
40	671.1	6		671-13		Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de	m3	7.131,00	$ 652.790,00	$ 4.655.045.490,00		$ -		$ -		$ -
40.1	671.1	6	11604	671-13		Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de	m3		$ 652.790,00		3.833,37	$ 2.502.385.602,30		$ -		$ -
41	671.1.1P	6			671.1.1P	Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de	m3	49.089,00	$ 651.419,00	$ 31.977.507.291,00		$ -		$ -		$ -
41.1	671.1.1P	6	11604		671.1.1P	Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de	m3		$ 651.419,00		27.517,04	$ 17.925.122.679,76		$ -	1.765,80	$ 1.150.275.671,00
42	673.1	8		673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	474.366,00	$ 7.535,00	$ 3.574.347.810,00	2.023,60	$ 15.247.826,00		$ -	2.023,60	$ 15.247.826,00
42.1	673.1	8	11604	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2		$ 7.535,00		472.342,40	$ 3.559.099.984,00	1.106,30	$ 8.335.971,00	62.960,10	$ 474.404.355,00
43	673.2	2		673-13		Material granular drenante	m3	90.895,00	$ 158.463,00	$ 14.403.494.385,00	379,40	$ 60.120.863,00		$ -	379,40	$ 60.120.863,00
43.1	673.2	2	11604	673-13		Material granular drenante	m3		$ 158.463,00		90.515,60	$ 14.343.373.522,80	6,30	$ 998.317,00	11.623,30	$ 1.841.862.989,00
44	673.3	2		673-13		Material de cobertura tipo SBG	m3	18.179,00	$ 201.065,00	$ 3.655.160.635,00		$ -		$ -		$ -
44.1	673.3	2	11602	673-13		Material de cobertura tipo SBG	m3		$ 201.065,00		18.179,00	$ 3.655.160.635,00		$ -	1.013,40	$ 203.759.271,00
45	681.1	6		681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1:	m3	682,00	$ 266.301,00	$ 181.617.282,00		$ -		$ -		$ -
45.1	681.1	6	11606	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1:	m3		$ 266.301,00		882,00	$ 234.877.482,00		$ -	604,00	$ 160.845.804,00
Subtotal										**$ 121.603.512.554,00**	**Subtotal**	**$ 109.525.395.661,61**	**Subtotal**	**$ 288.925.486,00**	**Subtotal**	**$ 10.126.535.747,00**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD																
46	1P	6		700-13 Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	349.035,00	$ 1.794,00	$ 626.168.790,00		$ -		$ -		$ -
46.1	1P	6	11607	700-13 Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m		$ 1.794,00		549.035,00	$ 984.968.790,00		$ -	406.588,20	$ 729.419.231,00
47	2P	6		700-13 Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	585,00	$ 22.076,00	$ 12.914.460,00		$ -		$ -		$ -
47.1	2P	6	11607	700-13 Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2		$ 22.076,00		585,00	$ 12.914.460,00		$ -		$ -
48	4P	6		701-13 Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	29.027,00	$ 8.346,00	$ 242.259.342,00		$ -		$ -		$ -
48.1	4P	6	11607	701-13 Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u		$ 8.346,00		29.027,00	$ 242.259.342,00		$ -		$ -
49	5P	4		731-13 Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	1.157,00	$ 399.892,00	$ 462.675.044,00		$ -		$ -		$ -
49.1	5P	4	11607	731-13 Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u		$ 399.892,00		1.157,00	$ 462.675.044,00		$ -	60,00	$ 23.993.520,00
50	6P	4		731-13 Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	785,00	$ 327.917,00	$ 257.414.845,00		$ -		$ -		$ -
50.1	6P	4	11607	731-13 Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u		$ 327.917,00		785,00	$ 257.414.845,00		$ -		$ -
51	720.1	4		731-13 Manual de Señalización Vial 2015		Poste de referencia	u	94,00	$ 257.885,00	$ 24.241.190,00		$ -		$ -		$ -
51.1	720.1	4	11607	731-13 Manual de Señalización Vial 2015		Poste de referencia	u		$ 257.885,00		94,00	$ 24.241.190,00		$ -		$ -

GT

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES, GRUPO ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL** BOYACA Y CASANARE **ACTA Nª** 44 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1.789.107.538,00 **MES** ene-25

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 978 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES RUTA: 6404: BELEN-SACAMA /6405: SACAMA-LA CABUYA /6514: PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1038 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA

PLAZO INICIAL: 102 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: **98 MESES Y 7 DIAS** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2029 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N.A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A** $ **322.790.128.920,00** (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ **20.059.840.972,00**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ **342.849.969.892,00**

No. DE ORDEN	No. DE ITEM	ICCP	ICOCIV	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 12 de fecha 29/11/2024		OBRA EJECUTADA			
													PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRUPO DE AJUSTE		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
52	730.1	4		730-13		Defensa metálica	m	7.969,00	$ 224.999,00	$ 1.793.017.031,00		$ -		$ -		$ -
52.1	730.1	4	11607	730-13		Defensa metálica	m		$ 224.999,00		7.969,00	$ 1.793.017.031,00		$ -		$ -
53	730.2	4		730-13		Sección final	u	1.113,00	$ 103.189,00	$ 114.849.357,00		$ -		$ -		$ -
53.1	730.2	4	11607	730-13		Sección final	u		$ 103.189,00		1.113,00	$ 114.849.357,00		$ -		$ -
54	740.1	6		740-13		Captafaros	u	7.284,00	$ 22.031,00	$ 160.473.804,00		$ -		$ -		$ -
54.1	740.1	6	11607	740-13		Captafaros	u		$ 22.031,00		7.284,00	$ 160.473.804,00		$ -		$ -
Subtotal										**$ 3.694.013.863,00**	**Subtotal**	**$ 4.052.813.863,00**	**Subtotal**	**$ -**	**Subtotal**	**$ 753.412.751,00**
OBRAS VARIAS																
55	800.1	6		800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	8.000,00	$ 17.838,00	$ 142.704.000,00		$ -		$ -		$ -
55.1	800.1	6	11605	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m		$ 17.838,00		8.000,00	$ 142.704.000,00		$ -		$ -
56	801.6P	6			801.6P	Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 o 900 mm	m	39,00	$ 29.898,00	$ 1.166.022,00		$ -		$ -		$ -
56.1	801.6P	6	11604		801.6P	Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 o 900 mm	m		$ 29.898,00		39,00	$ 1.166.022,00		$ -		$ -
57	810.3	6		810-13		Protección de Taludes con Hidrosiembra Controlada.	m2	116.226,00	$ 37.879,00	$ 4.402.524.654,00		$ -		$ -		$ -
57.1	810.3	6	11606	810-13		Protección de Taludes con Hidrosiembra Controlada.	m2		$ 37.879,00		66.226,00	$ 2.508.574.654,00		$ -		$ -
Subtotal										**$ 4.546.394.676,00**	**Subtotal**	**$ 2.652.444.676,00**	**Subtotal**	**$ -**	**Subtotal**	**$ -**
TRANSPORTES																
58	900.1	3		900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	1.052.001,00	$ 1.057,00	$ 1.111.965.057,00		$ -		$ -		$ -
58.1	900.1	3	11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E		$ 1.057,00		740.491,09	$ 782.699.082,13		$ -	218.165,00	$ 230.600.405,00
59	900.2	3		900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	11.631.950,00	$ 1.000,00	$ 11.631.950.000,00		$ -		$ -		$ -
59.1	900.2	3	11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km		$ 1.000,00		10.631.950,00	$ 10.631.950.000,00	42.452,00	$ 42.452.000,00	426.078,00	$ 426.078.000,00
60	900.3	3		900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	195.000,00	$ 1.175,00	$ 229.125.000,00	1.960,00	$ 2.303.000,00		$ -	1.960,00	$ 2.303.000,00
60.1	900.3	3	11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km		$ 1.175,00		448.042,65	$ 526.450.113,75		$ -	150.399,70	$ 176.719.648,00
Subtotal										**$ 12.973.040.057,00**	**Subtotal**	**$ 11.943.402.195,88**	**Subtotal**	**$ 42.452.000,00**	**Subtotal**	**$ 835.701.053,00**
ITEMS NO PREVISTOS																
61	NP1	8	11604		NP1	Zanja de coronación flexible sección trapezoidal ancho base 0,40m, altura 0,50m, ancho superior 1,0m. Mas aletas de anclaje.	m		$ 104.235,00		3.000,00	$ 312.705.000,00		$ -	140,00	$ 14.592.900,00
62	NP2	6	11604		NP2	Disipador de energía en concreto de 21 Mpa, Incluye Conformación, No incluye refuerzo.	m3		$ 947.589,00		65,00	$ 61.593.285,00		$ -		$ -
63	NP3	1	11606		NP3	Concreto Ciclópeo para protección de estribos, con roca de sitio (Incluye Concreto 21 Mpa)	m3		$ 530.414,00		400,00	$ 212.165.600,00		$ -	23,30	$ 12.358.646,00
64	NP4	4	11606		NP4	Suministro e Instalación de Malla Electrosoldada.	m2		$ 44.931,00		2.500,00	$ 112.327.500,00		$ -		$ -
65	NP5	1	11601		NP5	Perfilado de talud para sitio Critico PR 30+300 Ruta 6404	m2		$ 3.820,00		397,00	$ 1.516.540,00		$ -	397,00	$ 1.516.540,00
66	NP6	4	11606		NP6	Suministro e Instalación de Camisa para Pilote de 1.5m de Diámetro (No Recuperable)	m		$ 6.434.238,00		40,00	$ 257.369.520,00		$ -	21,50	$ 138.336.117,00
67	NP7	6	11606		NP7	Pilote de concreto Tremie Clase 28 Mpa con Piloteadora diámetro 1.5m.	m		$ 3.817.732,00		120,00	$ 458.127.840,00		$ -	113,90	$ 434.839.675,00
68	NP8	6	11606		NP8	Suministro y manejo de Bentonita.	kg		$ 22.199,00		240,00	$ 5.327.760,00		$ -		$ -
69	NP9	6	11606		NP9	Concreto lanzado de 28 Mpa, para sitio critico sector PR30+300 ruta 6404	m3		$ 1.772.400,00		62,00	$ 109.888.800,00		$ -	62,00	$ 109.888.800,00
70	NP10	6	11606		NP10	Mejoramiento de subrasante con rajón incluye sello con material de afirmado	m3		$ 199.376,00		13.800,00	$ 2.751.388.800,00	16,80	$ 3.349.517,00	8.969,40	$ 1.788.283.095,00
71	NP11	6	11606		NP11	New jersey, no incluye acero	m		$ 242.921,00		180,00	$ 43.725.780,00		$ -		$ -
72	NP12	1	11601		NP12	Tala de arboles clase 1 - H: 1 a 5 metros	u		$ 146.983,00		93,00	$ 13.669.419,00		$ -		$ -
73	NP13	1	11601		NP13	Tala de árboles clase 2 - H: 5.1 a 10 metros	u		$ 180.401,00		166,00	$ 29.946.566,00		$ -		$ -
74	NP14	1	11601		NP14	Tala de arboles clase 3 - H: 10.1 a 20 metros	u		$ 254.778,00		184,00	$ 46.879.152,00		$ -		$ -
75	NP15	1	11601		NP15	Tala de arboles clase 4 - H:20.1 a 30 metros	u		$ 470.148,00		23,00	$ 10.813.404,00		$ -		$ -
76	NP16	8	11606		NP16	Suministro e instalación de cinta PVC tipo V-15 o similar	m		$ 46.514,00		400,00	$ 18.605.600,00	182,00	$ 8.465.548,00	305,00	$ 14.186.770,00
77	NP17	8	11602		NP17	Suministro e instalación de Geomalla triaxial 30*30 o similar	m2		$ 15.137,00		14.000,00	$ 211.918.000,00	440,00	$ 6.660.280,00	6.950,80	$ 105.214.260,00
78	NP18	8	11602		NP18	Suministro e instalación de Geotextil NT4000 o similar	m2		$ 12.364,00		4.000,00	$ 49.456.000,00	400,00	$ 4.945.600,00	1.846,40	$ 22.828.890,00
79	NP19	3	11608		NP19	Retiro y disposición final de residuos de construcción y demolición de la estructura puente Ramon Bazurto en el rio Ariporo	m3		$ 49.017,00		588,00	$ 28.821.996,00		$ -	588,00	$ 28.821.996,00
80	NP20	6	11607		NP20	Control vial - turno diurno y nocturno de Lunes a Sábado (No incluye disposición de señalización)	día		$ 628.799,00		1.306,00	$ 821.211.494,00	50,00	$ 31.439.950,00	1.298,00	$ 816.181.102,00
81	NP21	6	11607		NP21	Control vial - turno diurno y nocturno de Dominicales y Festivos (No incluye disposición de señalización)	día		$ 994.956,00		286,00	$ 284.557.416,00	1,00	$ 994.956,00	286,00	$ 284.557.416,00

GT

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	DE
FECHA	1/02/2025

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES, GRUPO ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL** BOYACA Y CASANARE **ACTA Nª** 44 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1.789.107.538,00 **MES** ene-25

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 978 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES RUTA: 6404: BELEN-SACAMA /6405: SACAMA-LA CABUYA /6514: PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1038 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA

PLAZO INICIAL: 102 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: **98 MESES Y 7 DIAS** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2029 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N.A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A** $ **322.790.128.920,00** (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: **$ 20.059.840.972,00**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 342.849.969.892,00**

No. DE ORDEN	No. DE ITEM	ICCP	ICOCIV	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 12 de fecha 29/11/2024		OBRA EJECUTADA			
													PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRUPO DE AJUSTE		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
82	NP22	4	14104		NP22	Transporte de estructura metálica desde acopio Bogotá	kg		$ 447,00		90.905,00	$ 40.634.535,00		$ -	80.619,00	$ 36.036.693,00
83	NP23	4	14104		NP23	Montaje de estructura metálica para puente provisional en sector el Boche	kg		$ 5.647,00		90.905,00	$ 513.340.535,00		$ -	90.904,30	$ 513.336.582,00
84	NP24	6	14104		NP24	Suministro e instalación de saco suelo para plataforma de acceso de puente metálico	u		$ 46.217,00		127,00	$ 5.869.559,00		$ -	77,00	$ 3.558.709,00
85	NP25	6	11604		NP25	Construcción de dados para cimentación provisional de puente metálico en el sector el Boche	u		$ 3.331.201,00		6,00	$ 19.987.206,00		$ -	4,00	$ 13.324.804,00
86	NP26	6	11603		NP26	Pavimento rígido en concreto Hidráulico MR42. No incluye acero de refuerzo	m3		$ 936.820,00		1.016,00	$ 951.809.120,00		$ -	193,80	$ 181.555.716,00
87	NP27	6	14102		NP27	Pilote excavado in situ f´c=28 Mpa tipo tremie con Ø =1,2 m para puente El Boche incluye excavación en suelo duro	m		$ 6.662.989,00		488,00	$ 3.251.538.632,00	53,00	$ 353.138.417,00	408,50	$ 2.721.831.007,00
88	NP28	4	14102		NP28	Suministro e instalación de camisa para pilote de 1,2 m de diámetro (No recuperable) para puente Boche PR 30+300	m		$ 6.050.909,00		160,00	$ 968.145.440,00	19,00	$ 114.967.271,00	128,00	$ 774.516.352,00
89	NP29	6	11604		NP29	Corte de pavimento para cuneta	m		$ 9.645,00		48.000,00	$ 462.960.000,00	1.568,50	$ 15.128.183,00	4.882,50	$ 47.091.713,00
90	NP30	4	14104		NP30	Fabricación y suministro de cordones de refuerzo L=6,10 m (referencia AB621 acero dureza 65) para complemento de Puente Acrow tipología TSR3 suministrado por INVIAS para sector Boche Km 30+300 ruta 6404	kg		$ 35.418,00		2.800,00	$ 99.170.400,00		$ -	2.800,00	$ 99.170.400,00
91	NP31	4	14104		NP31	Fabricación y suministro de apoyos cojinete (referencia AB587 acero dureza 65) para complemento de Puente Acrow tipología TSR3 suministrado por INVIAS para sector Boche Km 30+300 ruta 6404	kg		$ 35.418,00		348,00	$ 12.325.464,00		$ -	348,00	$ 12.325.464,00
92	NP32	4	14104		NP32	Fabricación y suministro de pernos T de piso (Ø=9mm L=73mm) (referencia AB546 acero dureza 65) para complemento de Puente Acrow tipología TSR3 suministrado por INVIAS para sector Boche Km 30+300 ruta 6404	u		$ 79.100,00		70,00	$ 5.537.000,00		$ -	70,00	$ 5.537.000,00
93	NP33	8	11601		NP33	Geotextil tejido TR3000 o similar, no incluye elementos de fijación	m2		$ 9.729,00		2.134,00	$ 20.761.686,00		$ -		$ -
94	NP34	6	14105		NP34	Dren horizontal de longitud hasta 25 metros, para el sector PR30+300 El Boche de la ruta 6404	m		$ 361.040,00		1.828,00	$ 659.981.120,00		$ -		$ -
95	NP35	8	11606		NP35	Suministro e instalación de Geocontenedor por volteo impregnado de 4,5*2,5*1,3 m. Incluye material de relleno y transporte de material. No incluye conformación de accesos, terraplenes o llenos provisionales.	u		$ 5.625.050,00		545,00	$ 3.065.652.250,00	-2,00	-$ 11.250.100,00	480,00	$ 2.700.024.000,00
96	NP36	1	11606		NP36	Conformación de Jarillón con material de sitio para atención de emergencia. No incluye suministro de material granular	m3		$ 16.409,00		34.800,00	$ 571.033.200,00	2.590,00	$ 42.499.310,00	15.944,00	$ 261.625.096,00
97	NP37	1	11606		NP37	Excavación y cargue de material de rio para atención de emergencia.	m3		$ 35.025,00		31.500,00	$ 1.103.287.500,00		$ -	14.114,00	$ 494.342.850,00
98	NP 38.P	4	11603		NP 38.P	Suministro e Instalacion de canastillas pasajuntas para pavimento Rigido Ø=1-1/4". (Incluye el esqueleto)	u		$ 250.649,00		290,00	$ 72.688.210,00		$ -	53,00	$ 13.284.397,00
99	NP 39.P	7	14101		NP 39.P	Pilote pre excavado in situ tipo caisson Ø =1,3 m, f'c=28 Mpa. No incluye acero de refuerzo	m		$ 3.461.782,00		522,00	$ 1.807.050.204,00	60,00	$ 207.706.920,00	327,00	$ 1.132.002.714,00
100	NP 40.P	8	11604		NP 40.P	Suministro e instalación de geodren planar H=0,5 m	m2		$ 52.125,00		35,80	$ 1.866.075,00		$ -		$ -
101	NP 41.P	6	11606		NP 41.P	Suministro e instalación de bolsacreto de 1,20*2,4*0,35 m. (concreto bombeable) - Sector El Boche	m3		$ 906.724,00		2.742,00	$ 2.486.237.208,00	26,80	$ 24.300.203,00	26,80	$ 112.071.086,00
102	NP 42.P	6	11606		NP 42.P	Llaves de protección en concreto de 28 Mpa para protección de cauce con concreto bombeable- Sector El Boche (no incluye acero de refuerzo)	m3		$ 1.234.805,00		315,40	$ 389.457.497,00		$ -		$ -
103	NP 43.P	6	11604		NP 43.P	Cuneta en concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo ni acero de refuerzo (concreto f´c 21 Mpa)	m3		$ 763.065,00		7.900,00	$ 6.028.213.500,00	541,00	$ 166.424.477,00	541,00	$ 412.818.166,00
Subtotal											**Subtotal**	**$ 28.379.561.813,00**	**Subtotal**	**$ 968.770.532,00**	**Subtotal**	**$ 13.306.058.956,00**
Ajuste al peso												$ 117,03				-$ 256,86

		SUBTOTAL OBRAS (A)	**$ 260.979.652.716,00**		**$ 279.656.191.730,00**	**$ 1.724.557.603,00**		**$ 73.874.742.749,00**
*		PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$ 31.071.278.494,00		$ 29.447.914.451,00	**$ -**		$ 13.059.502.879,00
*		PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)	$ 990.000.000,00		$ 990.000.000,00			
*		**VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)**	**$ 293.040.931.210,00**		**$ 310.094.106.181,00**	**$ 1.724.557.603,00**		**$ 86.934.245.628,00**
*		VALOR DEL IVA (OBRA) (E) (19% SOBRE UTILIDAD)	$ 2.141.452.959,00		$ 2.266.072.314,00	$ 12.602.536,00		$ 635.288.718,00
*		VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D+E)	**$ 295.182.384.169,00**		**$ 312.360.178.495,00**	**$ 1.737.160.139,00**		**$ 87.569.534.346,00**
*		VALOR BASICO DE LA REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (G)	$ 1.038.890.000,00		$ 3.460.777.938,00	$ 17.324.760,00		$ 3.193.244.248,00
*		VALOR DEL IVA (19%) DE LA REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (H)	$ 197.389.100,00		$ 657.547.808,00	$ 3.291.704,00		$ 606.716.408,00
*		TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H	**$ 1.236.279.100,00**		**$ 4.118.325.746,00**	**$ 20.616.464,00**		**$ 3.799.960.656,00**
*		**GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA E IVA 19%) (J)**	**$ 25.739.616.633,00**		$ 25.739.616.633,00	**$ 49.736.628,00**		$ 335.365.771,00
*		**VALOR DE LA PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA DEL 19%) (K)**	**$ 631.849.018,00**		$ 631.849.018,00			$ 6.766.453,00
*		**VALOR TOTAL (F+I+J+K)**	**$ 322.790.128.920,00**		**$ 342.849.969.892,00**	**$ 1.807.513.231,00**	**$ -**	**$ 91.711.627.226,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

GT

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE

FECHA: 1/02/2025

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES, GRUPO ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL** BOYACA Y CASANARE **ACTA Nº** 44 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1.789.107.538,00 **MES** ene-25

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 978 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES RUTA: 6404: BELEN-SACAMA /6405: SACAMA-LA CABUYA /6514: PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1038 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA

PLAZO INICIAL: 102 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: **98 MESES Y 7 DIAS** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2029 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N.A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A** $ **322.790.128.920,00** (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ **20.059.840.972,00**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ **342.849.969.892,00**

No. DE ORDEN	No. DE ITEM	ICCP / GRUPO DE AJUSTE	ICOCIV / GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 12 29/11/2024 de fecha CANTIDAD	VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO CANTIDAD	ACUMULADO VALOR

AIU 30 30 %

Utilidad 5 5 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ 53.059.840.972,00	16,99%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ 309.988.519,00	17,15%
Valor Amortizado Acumulado	$ 8.806.813.118,00	2,82%
Valor Saldo por Amortizar	$ 44.253.027.854,00	14,17%

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BASICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	$ 1.724.557.603,00	$ 12.602.536,00	$ 1.737.160.139,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACION			$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 17.324.760,00	$ 3.291.704,00	$ 20.616.464,00
GESTION PREDIAL (PREACTA)	$ 12.368.000,00	$ 2.349.920,00	$ 14.717.920,00
GESTION SOCIAL (PREACTA)	$ 34.857.175,00	$ 161.533,00	$ 35.018.708,00
GESTION AMBIENTAL (PREACTA)			$ -
IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19			$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 1.789.107.538,00	$ 18.405.693,00	$ 1.807.513.231,00

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	$ 70.017.488,00	$ 2.528.155.353,00
SB	$ 148.365.760,00	$ 14.322.289.429,00
B	$ -	$ -
P	$ 206.026.337,00	$ 32.002.589.717,00
OA	$ 288.925.486,00	$ 10.126.535.747,00
SCT	$ -	$ 753.412.751,00
OV	$ -	$ -
T	$ 42.452.000,00	$ 835.701.053,00
NP	$ 968.770.532,00	$ 13.306.058.956,00
TOTAL	$ 1.724.557.603,00	$ 73.874.742.749,00

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica) ICCP

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación	$ 132.599.900,00	$ 3.989.947.200,00
2 Sub bases y Bases	$ 168.278.957,00	$ 16.783.163.395,00
3 Transporte de materiales	$ 42.452.000,00	$ 864.523.049,00
4 Aceros y elementos metálicos	$ 114.967.271,00	$ 1.616.536.525,00
5 Acero Estructural y cables de acero	$ 152.751.334,00	$ 2.062.872.804,00
6 Concretos, morteros y obras varias	$ 682.617.585,00	$ 12.077.334.426,00
7 Concreto para superestructuras	$ 207.706.920,00	$ 1.132.002.714,00
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	$ 223.183.636,00	$ 35.348.362.893,00
TOTAL	$ 1.724.557.603,00	$ 73.874.742.749,00

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica) ICOCIV

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
11601 Preliminares y Explanación	$ 90.100.590,00	$ 2.941.564.563,00
11602 Afirmados, subbases y bases	$ 159.971.640,00	$ 14.207.009.379,00
11603 Pavimentos Asfálticos / Concretos	$ 206.026.337,00	$ 29.061.049.913,00
11604 Estructuras hidráulicas y drenajes	$ 297.643.710,00	$ 7.289.403.242,00
11605 Obras de urbanismo	$ -	$ -
11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental	$ 220.115.812,00	$ 8.643.566.415,00
11607 Señalización y control de tránsito	$ 32.434.906,00	$ 1.854.151.269,00
11608 Transporte y Sobreacarreos	$ 42.452.000,00	$ 862.220.049,00
14101 Subestructura y cimentación	$ 207.706.920,00	$ 1.132.002.714,00
14102 Subestructura y cimentación	$ 468.105.688,00	$ 3.496.347.359,00
14104 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	$ -	$ 669.964.848,00
14105 Drenajes	$ -	$ -
TOTAL	$ 1.724.557.603,00	$ 70.157.279.751,00
TOTAL CONTRATO		

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 1.789.107.538

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 1.479.119.019

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 1.497.524.712 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS M/CTE

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma
Nombre: ANIBAL OJEDA CARRIAZO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista: CONSORCIO VIAS NACIONALES
Matrícula No: 25202-57327 CND

Firma
Nombre: FERNANDO CARO RIVERA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor: CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA
Matrícula No: 25202 - 26432

GT

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato No. 978 DE 2021 Contratista CONSORCIO VIAS NACIONALES

Objeto del Contrato: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4

Acta No. **44** Valor básico **$ 1.789.107.538,00** Período: ene-25

Valor incluido el Iva: **$ 1.807.513.231,00**

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Ítem	Ruta (código vía)	Denominación (Carretera - Puente-Túnel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	subtotal
1	6404	*BELEN-SOCHA-SACAMA*	$ 646.882.817,00	$ -	$ 643.217.184,00	**$ 1.290.100.001,00**
2	6405	*SACAMA - LA CABUYA -HATO COROZAL*	$ 457.875.602,00	$ -	$ -	**$ 457.875.602,00**
3	6514	*PAZ DE ARIPORO - HATO COROZAL - LA CABUYA*	$ -	$ 20.616.464,00	$ 38.921.164,00	**$ 59.537.628,00**
TOTALES			**$ 1.104.758.419,00**	**$ 20.616.464,00**	**$ 682.138.348,00**	**$ 1.807.513.231,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

DEPARTAMENTO 1 - BOYACA (RUTA 6404)			**VALOR CON IVA**	**VALOR SIN IVA**
800099199-4	MUNICIPIO 1	BELEN	$ 19.124,00	$ 19.036,00
891855015-2	MUNICIPIO 2	PAZ DEL RIO	$ 1.613.724,00	$ 1.359.036,00
800099210-8	MUNICIPIO 3	SOCHA	$ 641.584.336,00	$ 636.659.827,00
800026911-1	MUNICIPIO 4	SOCOTA	$ 646.882.817,00	$ 640.464.779,00
891801962-0	MUNICIPIO 5	CHITA	$ -	$ -
TOTAL DEPARTAMENTO 1 - BOYACA (RUTA 6404)			**$ 1.290.100.001,00**	**$ 1.278.502.678,00**
DEPARTAMENTO 2 - CASANARE (RUTA 6404)			**VALOR CON IVA**	**VALOR SIN IVA**
800103657-3	MUNICIPIO 6	LA SALINA	$ -	$ -
800103663-8	MUNICIPIO 7	SACAMA	$ -	$ -
TOTAL DEPARTAMENTO 2 - CASANARE (RUTA 6404)			**$ -**	**$ -**
DEPARTAMENTO 2 - CASANARE (RUTA 6405)			**VALOR CON IVA**	**VALOR SIN IVA**
800103663-8	MUNICIPIO 7	SACAMA	$ 457.875.602,00	$ 454.553.913,00
800012638-2	MUNICIPIO 8	HATO COROZAL	$ -	$ -
TOTAL DEPARTAMENTO 2 - CASANARE (RUTA 6405)			**$ 457.875.602,00**	**$ 454.553.913,00**
DEPARTAMENTO 2 - CASANARE (RUTA 6514)			**VALOR CON IVA**	**VALOR SIN IVA**
800012638-2	MUNICIPIO 8	HATO COROZAL	$ 37.550.373,00	$ 34.177.011,00
800103659-8	MUNICIPIO 9	PAZ DE ARIPORO	$ 21.987.255,00	$ 21.873.936,00
TOTAL DEPARTAMENTO 2 - CASANARE (RUTA 6514)			**$ 59.537.628,00**	**$ 56.050.947,00**
TOTAL			**$ 1.807.513.231,00**	**$ 1.789.107.538,00**

ANIBAL OJEDA CARRIAZO
Representante Legal
CONSORCIO VIAS NACIONALES
Matrícula No: 25202-57327 CND

FERNANDO CARO RIVERA
Representante Legal
CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA
Matrícula No: 25202 - 26432

GT

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE 3
		FECHA	1/02/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES, GRUPO ORIENTE — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACA Y CASANARE

CONTRATO DE OBRA No: 978 DE 2021 — **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAS NACIONALES

MES INFORME MENSUAL: ene-25 — **PROYECTO:** RUTA DE LOS LIBERTADORES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1038 DE 2021 — **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	RP 420921	C-2401-0600-108-0-2401008-02	54	NACION	978 DE 2021	$ 6,703,084,932.00	$ 0.00
		C-2401-0600-108-0-2401023-02	54	NACION	978 DE 2021	$ 128,815,368.00	$ 0.00
		C-2401-0600-132-0-2401008-02	54	NACION	978 DE 2021	$ 1,643,914,710.00	$ 0.00
		C-2401-0600-132-0-2401023-02	54	NACION	978 DE 2021	$ 62,085,290.00	$ 0.00
		C-2401-0600-108-0-2401041-02	54	NACION	978 DE 2021	$ 770,360,488.00	$ 0.00
2021	RP 1060021	C-2401-0600-108-0-2401008-02	54	NACION	ADICIONAL No. 1	$ 12,211,840,972.00	$ 0.00
		C-2401-0600-108-0-2401008-02	54	NACION	ADICIONAL No. 1	$ 3,848,000,000.00	$ 0.00
		C-2401-0600-108-0-2401008-02	54	NACION	ADICIONAL No. 1	$ 4,000,000,000.00	$ 0.00
2022	RP 195622	C-2401-0600-108-0-2401008-02	11	NACION	978 DE 2021	$ 31,768,358,982.12	$ 0.00
		C-2401-0600-108-0-2401008-02	11	NACION	978 DE 2021	$ 220,652,006.88	$ 0.00
	RP 284122	C-2401-0600-108-0-2401008-02	11	NACION	978 DE 2021	$ 4,918,842,757.35	$ 0.00
		C-2401-0600-108-0-2401008-02	11	NACION	978 DE 2021	$ 81,157,242.65	$ 0.00
2023	RP 125323	C-2401-0600-108-0-2401008-02	11	NACION	978 DE 2021	$ 27,226,280,331.00	$ 0.00
		C-2401-0600-108-0-2401023-02	11	NACION	978 DE 2021	$ 189,104,304.00	$ 0.00
	RP 449823	C-2401-0600-132-0-2401008-02	11	NACION	978 DE 2021	$ 4,869,654,330.00	$ 0.00
		C-2401-0600-132-0-2401023-02	11	NACION	978 DE 2021	$ 80,345,670.00	$ 0.00
2024	RP 167624	C-2401-0600-108-51102D-2401008-02	11	NACION	978 DE 2021	$ 17,685,092,765.00	$ 0.00
		C-2401-0600-108-51102D-2401008-02	16	NACION	978 DE 2021	$ 18,675,000,000.00	$ 0.00
		C-2401-0600-108-51102D-2401023-02	11	NACION	978 DE 2021	$ 252,544,598.00	$ 0.00
	RP 223124	C-2401-0600-132-51102D-2401023-02	11	NACION	978 DE 2021	$ 81,157,242.00	$ 0.00
		C-2401-0600-132-51102D-2401008-02	11	NACION	978 DE 2021	$ 4,918,842,758.00	$ 4,370,479,660.00
				TOTAL		$ 140,335,134,747.00	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ **342,849,969,892.00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF SI	Indicar pago según reporte SIIF NO	Observaciones
1	PARCIAL	jun-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	RP. 420921 (21//05/2021)	$ 9,308,260,788.00	$ 322,790,128,920.00			x	EL VALOR DEL ACTA ES CERO
2	PARCIAL	jul-21	$ 11,855,060.00	$ 86,633.00	$ 11,941,693.00	$ -	$ 11,941,693.00	$ -	RP. 420921 (21//05/2021)	$ 9,296,319,095.00	$ 322,778,187,227.00		x		
3	PARCIAL	ago-21	$ 54,599,244.00	$ 398,995.00	$ 66,939,932.00	$ -	$ 54,998,239.00	$ -	RP. 420921 (21//05/2021)	$ 9,241,320,856.00	$ 322,723,188,988.00		x		
4	PARCIAL	sep-21	$ 981,650,908.00	$ 7,173,603.00	$ 1,055,764,443.00	$ -	$ 988,824,511.00	$ -	RP. 420921 (21//05/2021)	$ 8,252,496,345.00	$ 321,734,364,477.00		x		
5	PARCIAL	oct-21	$ 1,073,590,564.00	$ 7,845,466.00	$ 2,137,200,473.00	$ -	$ 1,081,436,030.00	$ -	RP. 420921 (21//05/2021)	$ 7,171,060,315.00	$ 319,597,164,004.00		x		
										ADICIÓN 1	$ 20,059,840,972.00				
1	AJUSTE	jun-21	$ -	$ -	$ 2,137,200,473.00	$ -	$ -	$ -	RP. 420921 (21//05/2021)	$ 7,171,060,315.00	$ 340,712,769,419.00			x	EL VALOR DEL ACTA ES CERO
2	AJUSTE	jul-21	$ 152,239.00	$ 1,110.00	$ 2,137,353,822.00	$ -	$ 153,349.00	$ -	RP. 420921 (21//05/2021)	$ 7,170,906,966.00	$ 340,712,616,070.00		x		
6	PARCIAL	nov-21	$ 871,236,823.00	$ 6,366,731.00	$ 3,014,957,376.00	$ -	$ 877,603,554.00	$ -	RP. 420921 (21//05/2021)	$ 6,293,303,412.00	$ 339,835,012,516.00		x		
7	PARCIAL	dic-21	$ 811,030,111.00	$ 5,926,759.00	$ 3,831,914,246.00	$ -	$ 816,956,870.00	$ -	RP. 420921 (21//05/2021)	$ 5,476,346,542.00	$ 339,018,055,646.00		x		
3	PROV.	ago-21	$ 1,539,480.00	$ 11,250.00	$ 3,833,464,976.00	$ -	$ 1,550,730.00	$ -	RP. 420921 (21//05/2021)	$ 5,474,795,812.00	$ 339,016,504,916.00		x		
4	PROV.	sep-21	$ 42,120,541.00	$ 307,804.00	$ 3,875,893,321.00	$ -	$ 42,428,345.00	$ -	RP. 420921 (21//05/2021)	$ 5,432,367,467.00	$ 338,974,076,571.00		x		
5	PROV.	oct-21	$ 34,026,751.00	$ 248,657.00	$ 3,910,168,729.00	$ -	$ 34,275,408.00	$ -	RP. 420921 (21//05/2021)	$ 5,398,092,059.00	$ 338,939,801,163.00		x		
6	PROV.	nov-21	$ 18,117,762.00	$ 132,399.00	$ 3,928,418,890.00	$ -	$ 18,250,161.00	$ -	RP. 420921 (21//05/2021)	$ 5,379,841,898.00	$ 338,921,551,002.00		x		
7	PROV.	dic-21	$ 17,842,641.00	$ 130,389.00	$ 3,946,391,920.00	$ -	$ 17,973,030.00	$ -	RP. 420921 (21//05/2021)	$ 5,361,868,868.00	$ 338,903,577,972.00		x		
8	PARCIAL	ene-22	$ 894,569,675.00	$ 6,537,240.00	$ 4,847,498,835.00	$ -	$ 901,106,915.00	$ -	RP. 420921 (21//05/2021)	$ 4,460,761,953.00	$ 338,002,471,057.00		x		
					ANTICIPO 1			$ 20,059,840,972.00	RP. 1060021 (23/12/2021)	$ -	$ 338,002,471,057.00				
9	PARCIAL	feb-22	$ 952,772,657.00	$ 6,962,569.00	$ 5,807,234,061.00	$ 58,159,955.00	$ 901,575,271.00	$ 20,001,681,017.00	RP. 420921 (21//05/2021)	$ 3,559,186,682.00	$ 337,042,735,831.00	No. 33780 05 abril 2022	x		
10	PARCIAL	mar-22	$ 1,617,078,642.00	$ 11,817,113.00	$ 7,436,129,816.00	$ 98,873,972.00	$ 1,530,021,783.00	$ 19,902,807,045.00	RP. 420921 (21//05/2021)	$ 2,029,164,899.00	$ 335,413,840,076.00	No. 36695 11 abril 2022	x		
11	PARCIAL	abr-22	$ 1,049,402,068.00	$ 7,668,707.00	$ 8,493,200,591.00	$ 64,481,317.00	$ 992,589,458.00	$ 19,838,325,728.00	RP. 420921 (21//05/2021)	$ 1,036,575,441.00	$ 334,356,769,301.00	No. 37173 12 abril 2022	x		
12	PARCIAL	may-22	$ 790,917,099.00	$ 5,779,779.00	$ 9,289,897,469.00	$ 48,598,510.00	$ 748,098,368.00	$ 19,789,727,218.00	RP. 420921 (21//05/2021)	$ 288,477,073.00	$ 333,560,072,423.00	No. 70828 11 julio 2022	x		
Vigencia fiscal 2022									RP. 195622 (09//02/2022)	**$ 31,989,010,989.00**					
13	PARCIAL	jun-22	$ 1,005,706,095.00	$ 96,771,795.00	$ 10,392,375,359.00	$ 67,251,151.00	$ 1,035,226,739.00	$ 19,722,476,067.00	RP. 195622 (09//02/2022)	$ 31,242,261,318.00	$ 332,457,594,533.00	No. 89590 23 agosto 2022			
14	PARCIAL	jul-22	$ 626,693,961.00	$ 4,579,687.00	$ 11,023,649,007.00	$ 38,507,693.00	$ 592,765,955.00	$ 19,683,968,374.00	RP. 195622 (09//02/2022)	$ 30,649,495,363.00	$ 331,826,320,885.00	No. 99049 14 septiembre 2022			
15	PARCIAL	ago-22	$ 871,466,851.00	$ 6,368,412.00	$ 11,901,484,270.00	$ 53,547,951.00	$ 824,287,312.00	$ 19,630,420,423.00	RP. 195622 (09//02/2022)	$ 29,825,208,051.00	$ 330,948,485,622.00	No. 101877 21 septiembre 2022			
16	PARCIAL	sep-22	$ 1,712,649,095.00	$ 12,515,513.00	$ 13,626,648,878.00	$ 105,235,041.00	$ 1,619,929,567.00	$ 19,525,185,382.00	RP. 195622 (09//02/2022)	$ 28,205,278,484.00	$ 329,223,321,014.00				
17	PARCIAL	oct-22	$ 2,379,194,378.00	$ 49,827,094.00	$ 16,055,670,350.00	$ 148,170,310.00	$ 2,280,851,162.00	$ 19,377,015,072.00	RP. 195622 (09//02/2022)	$ 25,924,427,322.00	$ 326,794,299,542.00				
18	PARCIAL	nov-22	$ 1,383,916,593.00	$ 10,113,237.00	$ 17,449,700,180.00	$ 85,035,820.00	$ 1,308,994,010.00	$ 19,291,979,252.00	RP. 195622 (09//02/2022)	$ 24,615,433,312.00	$ 325,400,269,712.00				
19	PARCIAL	dic-22	$ 2,702,484,078.00	$ 19,730,915.00	$ 20,171,915,173.00	$ 166,055,115.00	$ 2,556,159,878.00	$ 19,125,924,137.00	RP. 195622 (09//02/2022)	$ 22,059,273,434.00	$ 322,678,054,719.00				
3	AJUSTE	ago-21	$ -	$ -	$ 20,171,915,173.00	$ -	$ -	$ 19,125,924,137.00	RP. 195622 (09//02/2022)	$ 22,059,273,434.00	$ 322,678,054,719.00			X	EL VALOR DEL ACTA ES CERO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
VERSIÓN	1
PÁGINA	DE 3
FECHA	1/02/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES, GRUPO ORIENTE — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACA Y CASANARE

CONTRATO DE OBRA No: 978 DE 2021 — **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAS NACIONALES
MES INFORME MENSUAL: ene-25 — **PROYECTO:** RUTA DE LOS LIBERTADORES
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1038 DE 2021 — **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF SI	Indicar pago según reporte SIIF NO	Observaciones
4	AJUSTE	sep-21	$ -	$ -	$ 20,171,915,173.00	$ -	$ -	$ 19,125,924,137.00	RP. 195622 (09//02/2022)	$ 22,059,273,434.00	$ 322,678,054,719.00			X	EL VALOR DEL ACTA ES CERO
5	AJUSTE	oct-21	$ -	$ -	$ 20,171,915,173.00	$ -	$ -	$ 19,125,924,137.00	RP. 195622 (09//02/2022)	$ 22,059,273,434.00	$ 322,678,054,719.00			X	EL VALOR DEL ACTA ES CERO
6	AJUSTE	nov-21	$ -	$ -	$ 20,171,915,173.00	$ -	$ -	$ 19,125,924,137.00	RP. 195622 (09//02/2022)	$ 22,059,273,434.00	$ 322,678,054,719.00			X	EL VALOR DEL ACTA ES CERO
7	AJUSTE	dic-21	$ -	$ -	$ 20,171,915,173.00	$ -	$ -	$ 19,125,924,137.00	RP. 195622 (09//02/2022)	$ 22,059,273,434.00	$ 322,678,054,719.00			X	EL VALOR DEL ACTA ES CERO
8	AJUSTE	ene-22	$ 42,339,347.00	$ 309,403.00	$ 20,214,563,923.00	$ -	$ 42,648,750.00	$ 19,125,924,137.00	RP. 195622 (09//02/2022)	$ 22,016,624,684.00	$ 322,635,405,969.00				
9	AJUSTE	feb-22	$ 43,163,066.00	$ 315,422.00	$ 20,258,042,411.00	$ -	$ 43,478,488.00	$ 19,125,924,137.00	RP. 195622 (09//02/2022)	$ 21,973,146,196.00	$ 322,591,927,481.00				
10	AJUSTE	mar-22	$ 63,712,183.00	$ 465,589.00	$ 20,322,220,183.00	$ -	$ 64,177,772.00	$ 19,125,924,137.00	RP. 195622 (09//02/2022)	$ 21,908,968,424.00	$ 322,527,749,709.00				
11	AJUSTE	abr-22	$ 65,930,973.00	$ 481,803.00	$ 20,388,632,959.00	$ -	$ 66,412,776.00	$ 19,125,924,137.00	RP. 195622 (09//02/2022)	$ 21,842,555,648.00	$ 322,461,336,933.00				
12	AJUSTE	may-22	$ 49,788,186.00	$ 363,837.00	$ 20,438,784,982.00	$ -	$ 50,152,023.00	$ 19,125,924,137.00	RP. 195622 (09//02/2022)	$ 21,792,403,625.00	$ 322,411,184,910.00				
13	AJUSTE	jun-22	$ 28,873,797.00	$ 211,001.00	$ 20,467,869,780.00	$ -	$ 29,084,798.00	$ 19,125,924,137.00	RP. 195622 (09//02/2022)	$ 21,763,318,827.00	$ 322,382,100,112.00				
14	AJUSTE	jul-22	$ 33,670,143.00	$ 246,051.00	$ 20,501,785,974.00	$ -	$ 33,916,194.00	$ 19,125,924,137.00	RP. 195622 (09//02/2022)	$ 21,729,402,633.00	$ 322,348,183,918.00				
15	AJUSTE	ago-22	$ 38,186,804.00	$ 279,057.00	$ 20,540,251,835.00	$ -	$ 38,465,861.00	$ 19,125,924,137.00	RP. 195622 (09//02/2022)	$ 21,690,936,772.00	$ 322,309,718,057.00				
16	AJUSTE	sep-22	$ 132,202,189.00	$ 966,093.00	$ 20,673,420,117.00	$ -	$ 133,168,282.00	$ 19,125,924,137.00	RP. 195622 (09//02/2022)	$ 21,557,768,490.00	$ 322,176,549,775.00				
17	AJUSTE	oct-22	$ 116,042,328.00	$ 848,002.00	$ 20,790,310,447.00	$ -	$ 116,890,330.00	$ 19,125,924,137.00	RP. 195622 (09//02/2022)	$ 21,440,878,160.00	$ 322,059,659,445.00				
18	AJUSTE	nov-22	$ 86,156,750.00	$ 629,607.00	$ 20,877,096,804.00	$ -	$ 86,786,357.00	$ 19,125,924,137.00	RP. 195622 (09//02/2022)	$ 21,354,091,803.00	$ 321,972,873,088.00				
19	AJUSTE	dic-22	$ 303,053,620.00	$ 2,214,623.00	$ 21,182,365,047.00	$ -	$ 305,268,243.00	$ 19,125,924,137.00	RP. 195622 (09//02/2022)	$ 21,048,823,560.00	$ 321,667,604,845.00				
20	PARCIAL	ene-23	$ 548,411,954.00	$ 59,988,234.00	$ 21,790,765,235.00	$ 37,112,411.00	$ 571,287,777.00	$ 19,088,811,726.00	RP. 195622 (09//02/2022)	$ 20,477,535,783.00	$ 321,059,204,657.00				
20	AJUSTE	ene-23	$ 20,515,911.00	$ 149,924.00	$ 21,811,431,070.00	$ -	$ 20,665,835.00	$ 19,088,811,726.00	RP. 195622 (09//02/2022)	$ 20,456,869,948.00	$ 321,038,538,822.00				
21	PARCIAL	feb-23	$ 467,744,818.00	$ 3,418,135.00	$ 22,282,594,023.00	$ 28,740,940.00	$ 442,422,013.00	$ 19,060,070,786.00	RP. 195622 (09//02/2022)	$ 20,014,447,935.00	$ 320,567,375,869.00				
21	AJUSTE	feb-23	$ 38,382,701.00	$ 280,489.00	$ 22,321,257,213.00	$ -	$ 38,663,190.00	$ 19,060,070,786.00	RP. 195622 (09//02/2022)	$ 19,975,784,745.00	$ 320,528,712,679.00				
22	PARCIAL	mar-23	$ 790,931,260.00	$ 43,230,837.00	$ 23,155,419,310.00	$ 50,883,935.00	$ 783,278,162.00	$ 19,009,186,851.00	RP. 195622 (09//02/2022)	$ 19,192,506,583.00	$ 319,694,550,582.00				
22	AJUSTE	mar-23	$ 74,655,300.00	$ 545,558.00	$ 23,230,620,168.00	$ -	$ 75,200,858.00	$ 19,009,186,851.00	RP. 195622 (09//02/2022)	$ 19,117,305,725.00	$ 319,619,349,724.00				
23	PARCIAL	abr-23	$ 1,023,534,365.00	$ 23,120,821.00	$ 24,277,275,354.00	$ 63,845,966.00	$ 982,809,220.00	$ 18,945,340,885.00	RP. 195622 (09//02/2022)	$ 18,134,496,505.00	$ 318,572,694,538.00				
23	AJUSTE	abr-23	$ 125,719,877.00	$ 918,722.00	$ 24,403,913,953.00	$ -	$ 126,638,599.00	$ 18,945,340,885.00	RP. 195622 (09//02/2022)	$ 18,007,857,906.00	$ 318,446,055,939.00				
24	PARCIAL	may-23	$ 2,370,102,199.00	$ 76,809,252.00	$ 26,850,825,404.00	$ 149,261,599.00	$ 2,297,649,852.00	$ 18,796,079,286.00	RP. 195622 (09//02/2022)	$ 15,710,208,054.00	$ 315,999,144,488.00				
24	AJUSTE	may-23	$ 320,261,608.00	$ 2,340,374.00	$ 27,173,427,386.00	$ -	$ 322,601,982.00	$ 18,796,079,286.00	RP. 195622 (09//02/2022)	$ 15,387,606,072.00	$ 315,676,542,506.00				
25	PARCIAL	jun-23	$ 1,408,587,918.00	$ 22,316,782.00	$ 28,604,332,086.00	$ 87,285,187.00	$ 1,343,619,513.00	$ 18,708,794,099.00	RP. 195622 (09//02/2022)	$ 14,043,986,559.00	$ 314,245,637,804.00				
25	AJUSTE	jun-23	$ 240,452,922.00	$ 1,757,156.00	$ 28,846,542,164.00		$ 242,210,078.00	$ 18,708,794,099.00	RP. 195622 (09//02/2022)	$ 13,801,776,481.00	$ 314,003,427,728.00				
26	PARCIAL	jul-23	$ 2,151,872,073.00	$ 58,487,788.00	$ 31,056,902,025.00	$ 134,831,952.00	$ 2,075,527,909.00	$ 18,573,962,147.00	RP. 195622 (09//02/2022)	$ 11,726,248,572.00	$ 311,793,067,867.00				
26	AJUSTE	jul-23	$ 294,349,868.00	$ 2,151,018.00	$ 31,353,402,911.00	$ -	$ 296,500,886.00	$ 18,573,962,147.00	RP. 195622 (09//02/2022)	$ 11,429,747,686.00	$ 311,496,566,981.00				
27	PARCIAL	ago-23	$ 1,718,078,825.00	$ 46,789,538.00	$ 33,118,271,274.00	$ 107,656,970.00	$ 1,657,211,393.00	$ 18,466,305,177.00	RP. 195622 (09//02/2022)	$ 9,772,536,293.00	$ 309,731,698,618.00				
27	AJUSTE	ago-23	$ 282,625,884.00	$ 2,065,343.00	$ 33,402,962,501.00	$ -	$ 284,691,227.00	$ 18,466,305,177.00	RP. 195622 (09//02/2022)	$ 9,487,845,066.00	$ 309,447,007,391.00				
28	PARCIAL	sep-23	$ 2,122,882,102.00	$ 60,046,611.00	$ 35,585,891,214.00	$ 133,158,651.00	$ 2,049,770,062.00	$ 18,333,146,526.00	RP. 195622 (09//02/2022)	$ 7,438,075,004.00	$ 307,264,078,678.00				
28	AJUSTE	sep-23	$ 319,543,323.00	$ 2,335,124.00	$ 35,907,769,661.00	$ -	$ 321,878,447.00	$ 18,333,146,526.00	RP. 195622 (09//02/2022)	$ 7,116,196,557.00	$ 306,942,200,231.00				
29	PARCIAL	oct-23	$ 1,964,376,986.00	$ 43,695,173.00	$ 37,915,841,820.00	$ 122,492,402.00	$ 1,885,579,757.00	$ 18,210,654,124.00	RP. 195622 (09//02/2022)	$ 5,230,616,800.00	$ 304,934,128,072.00				
29	AJUSTE	oct-23	$ 321,465,343.00	$ 2,349,170.00	$ 38,239,656,333.00	$ -	$ 323,814,513.00	$ 18,210,654,124.00	RP. 195622 (09//02/2022)	$ 4,906,802,287.00	$ 304,610,313,559.00				
					ANTICIPO 2			$ 4,686,150,278.12	RP. 195622 (09//02/2022)	$ -	$ 304,610,313,559.00				
					ANTICIPO 2			$ 220,652,006.88	RP. 195622 (09//02/2022)	$ -	$ 304,610,313,559.00				
					ANTICIPO 2			$ 4,918,842,757.35	RP. 284122	$ -	$ 304,610,313,559.00				
					ANTICIPO 2			$ 81,157,242.65	RP. 284122	$ -	$ 304,610,313,559.00				
					ANTICIPO 2			$ 23,093,197,715.00	RP 125323 (08/02/2023)	$ 4,322,186,920.00	$ 304,610,313,559.00				
30	PARCIAL	nov-23	$ 2,295,400,550.00	$ 26,721,118.00	$ 40,561,778,001.00	$ 141,649,422.00	$ 2,180,472,246.00	$ 18,069,004,702.00	RP 125323 (08/02/2023)	$ 2,141,714,674.00	$ 302,288,191,891.00				
30	AJUSTE	nov-23	$ 512,366,240.00	$ 3,744,215.00	$ 41,077,888,456.00	$ -	$ 516,110,455.00	$ 18,069,004,702.00	RP. 195622 (09//02/2022)	$ 1,625,604,219.00	$ 301,772,081,436.00				
31	PARCIAL	dic-23	$ 1,613,724,803.00	$ 11,879,416.00	$ 42,703,492,675.00	$ -	$ 1,625,604,219.00	$ 51,069,004,702.00	RP 125323 (08/02/2023)	$ 0.00	$ 300,146,477,217.00				
31	PARCIAL	dic-23	$ 588,896,804.00	$ 4,216,665.00	$ 43,296,606,144.00	$ 135,341,779.00	$ 457,771,690.00	$ 50,933,662,923.00	RP. 449823 (27/04/2023)	$ 4,492,228,310.00	$ 299,553,363,748.00				
31	AJUSTE	dic-23	$ 634,505,266.00	$ 4,636,769.00	$ 43,935,748,179.00	$ -	$ 639,142,035.00	$ 50,933,662,923.00	RP. 449823 (27/04/2023)	$ 3,853,086,275.00	$ 298,914,221,713.00				
32	PARCIAL	ene-24	$ 1,601,384,660.00	$ 15,592,114.00	$ 45,552,724,953.00	$ 277,311,517.00	$ 1,339,665,257.00	$ 50,656,351,406.00	RP. 449823 (27/04/2023)	$ 2,513,421,018.00	$ 297,297,244,939.00				

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE 3

FECHA: 1/02/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES, GRUPO ORIENTE — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACA Y CASANARE

CONTRATO DE OBRA No: 978 DE 2021 — **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAS NACIONALES

MES INFORME MENSUAL: ene-25 — **PROYECTO:** RUTA DE LOS LIBERTADORES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1038 DE 2021 — **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF	Observaciones
Vigencia fiscal 2023									RP. 449823 (27/04/2023)	**$ 4,950,000,000.00**				
33	PARCIAL	feb-24	$ 1,730,976,787.00	$ 25,803,310.00	$ 47,309,505,050.00	$ 301,287,787.00	$ 1,455,492,310.00	$ 50,355,063,619.00	RP. 449823 (27/04/2023)	$ 1,057,928,708.00	$ 295,540,464,842.00			
32	AJUSTE	ene-24	$ 215,765,865.00	$ 1,576,751.00	$ 47,526,847,666.00	$ -	$ 217,342,616.00	$ 50,355,063,619.00	RP. 449823 (27/04/2023)	$ 840,586,092.00	$ 295,323,122,226.00			
33	AJUSTE	feb-24	$ 300,944,926.00	$ 2,199,213.00	$ 47,829,991,805.00	$ -	$ 303,144,139.00	$ 50,355,063,619.00	RP. 449823 (27/04/2023)	$ 537,441,953.00	$ 295,019,978,087.00			
34	PARCIAL	mar-24	$ 533,514,492.00	$ 3,927,461.00	$ 48,367,433,758.00	$ -	$ 537,441,953.00	$ 50,355,063,619.00	RP. 449823 (27/04/2023)	$ 0.00	$ 294,482,536,134.00			
Vigencia fiscal 2024									RP. 167624 (08/03/2024)	**$ 36,612,637,363.00**				
34	PARCIAL	mar-24	$ 1,824,657,173.00	$ 36,131,201.00	$ 50,228,222,132.00	$ 411,296,501.00	$ 1,449,491,873.00	$ 49,943,767,118.00	RP. 167624 (08/03/2024)	$ 35,163,145,490.00	$ 292,621,747,760.00			
35	PARCIAL	abr-24	$ 2,226,834,988.00	$ 31,758,043.00	$ 52,486,815,163.00	$ 387,348,705.00	$ 1,871,244,326.00	$ 49,556,418,413.00	RP. 167624 (08/03/2024)	$ 33,291,901,164.00	$ 290,363,154,729.00			
34	AJUSTE	mar-24	$ 321,041,145.00	$ 2,346,070.00	$ 52,810,202,378.00		$ 323,387,215.00	$ 49,556,418,413.00	RP. 167624 (08/03/2024)	$ 32,968,513,949.00	$ 290,039,767,514.00			
35	AJUSTE	abr-24	$ 402,437,260.00	$ 2,940,888.00	$ 53,215,580,526.00		$ 405,378,148.00	$ 49,556,418,413.00	RP. 167624 (08/03/2024)	$ 32,563,135,801.00	$ 289,634,389,366.00			
36	PARCIAL	may-24	$ 2,066,412,651.00	$ 42,768,380.00	$ 55,324,761,557.00	$ 361,724,547.00	$ 1,747,456,484.00	$ 49,194,693,866.00	RP. 167624 (08/03/2024)	$ 30,815,679,317.00	$ 287,525,208,335.00			
37	PARCIAL	jun-24	$ 2,582,542,305.00	$ 53,215,871.00	$ 57,960,519,733.00	$ 452,032,527.00	$ 2,183,725,649.00	$ 48,742,661,339.00	RP. 167624 (08/03/2024)	$ 28,631,953,668.00	$ 284,889,450,159.00			
36	AJUSTE	may-24	$ 437,761,352.00	$ 3,199,026.00	$ 58,401,480,111.00		$ 440,960,378.00	$ 48,742,661,339.00	RP. 167624 (08/03/2024)	$ 28,190,993,290.00	$ 284,448,489,781.00			
37	AJUSTE	jun-24	$ 747,434,544.00	$ 5,462,021.00	$ 59,154,376,676.00		$ 752,896,565.00	$ 48,742,661,339.00	RP. 167624 (08/03/2024)	$ 27,438,096,725.00	$ 283,695,593,216.00			
38	PARCIAL	jul-24	$ 2,537,558,752.00	$ 28,287,199.00	$ 61,720,222,627.00	$ 440,042,581.00	$ 2,125,803,370.00	$ 48,302,618,758.00	RP. 167624 (08/03/2024)	$ 25,312,293,355.00	$ 281,129,747,265.00			
39	PARCIAL	ago-24	$ 2,685,040,517.00	$ 27,248,540.00	$ 64,432,511,684.00	$ 465,157,573.00	$ 2,247,131,484.00	$ 47,837,461,185.00	RP. 167624 (08/03/2024)	$ 23,065,161,871.00	$ 278,417,458,208.00			
40	PARCIAL	sep-24	$ 3,893,503,471.00	$ 36,150,968.00	$ 68,362,166,123.00	$ 673,935,736.00	$ 3,255,718,703.00	$ 47,163,525,449.00	RP. 167624 (08/03/2024)	$ 19,809,443,168.00	$ 274,487,803,769.00			
41	PARCIAL	oct-24	$ 3,907,909,893.00	$ 32,468,653.00	$ 72,302,544,669.00	$ 675,774,921.00	$ 3,264,603,625.00	$ 46,487,750,528.00	RP. 167624 (08/03/2024)	$ 16,544,839,543.00	$ 270,547,425,223.00			
38	AJUSTE	jul-24	$ 710,195,396.00	$ 5,189,890.00	$ 73,017,929,955.00		$ 715,385,286.00	$ 46,487,750,528.00	RP. 167624 (08/03/2024)	$ 15,829,454,257.00	$ 269,832,039,937.00			
39	AJUSTE	ago-24	$ 649,277,279.00	$ 4,744,718.00	$ 73,671,951,952.00		$ 654,021,997.00	$ 46,487,750,528.00	RP. 167624 (08/03/2024)	$ 15,175,432,260.00	$ 269,178,017,940.00			
40	AJUSTE	sep-24	$ 986,097,513.00	$ 7,206,098.00	$ 74,665,255,563.00		$ 993,303,611.00	$ 46,487,750,528.00	RP. 167624 (08/03/2024)	$ 14,182,128,649.00	$ 268,184,714,329.00			
41	AJUSTE	oct-24	$ 935,694,999.00	$ 6,837,771.00	$ 75,607,788,333.00		$ 942,532,770.00	$ 46,487,750,528.00	RP. 167624 (08/03/2024)	$ 13,239,595,879.00	$ 267,242,181,559.00			
42	PARCIAL	nov-24	$ 5,205,346,827.00	$ 41,235,542.00	$ 80,854,370,702.00	$ 899,788,876.00	$ 4,346,793,493.00	$ 45,587,961,652.00	RP. 167624 (08/03/2024)	$ 8,892,802,386.00	$ 261,995,599,190.00			
42	PROV	nov-24	$ 1,318,297,410.00	$ 9,633,712.00	$ 82,182,301,824.00		$ 1,327,931,122.00	$ 45,587,961,652.00	RP. 167624 (08/03/2024)	$ 7,564,871,264.00	$ 260,667,668,068.00			
43	PARCIAL	dic-24	$ 5,933,000,768.00	$ 43,356,544.00	$ 88,158,659,136.00	$ 1,024,945,279.00	$ 4,951,412,033.00	$ 44,563,016,373.00	RP. 167624 (08/03/2024)	$ 2,613,459,231.00	$ 254,691,310,756.00			
43	PROV	dic-24	$ 1,732,792,147.00	$ 12,662,712.00	$ 89,904,113,995.00	$ -	$ 1,745,454,859.00	$ 44,563,016,373.00	RP. 167624 (08/03/2024)	$ 868,004,372.00	$ 252,945,855,897.00			
44	PARCIAL	ene-25	$ 861,661,263.00	$ 6,343,109.00	$ 90,772,118,367.00		$ 868,004,372.00	$ 44,563,016,373.00	RP. 167624 (08/03/2024)	$ 0.00	$ 252,077,851,525.00			
									RP. 223124 (18/03/2024)	**$ 5,000,000,000.00**				
44	PARCIAL	ene-25	$ 927,446,275.00	$ 12,062,584.00	$ 91,711,627,226.00	$ 309,988,519.00	$ 629,520,340.00	$ 44,253,027,854.00	RP. 223124 (18/03/2024)	$ 4,370,479,660.00	$ 251,138,342,666.00			
TOTALES			**$ 90,432,652,260.00**	**$ 1,278,974,966.00**		**$ 8,806,813,118.00**	**$ 82,904,814,108.00**	**$ 44,253,027,854.00**		**$ 4,370,479,660.00**	**$ 251,138,342,666.00**			

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 73,874,742,749.00	$ 539,853,889.00	$ 74,414,596,638.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES	$ 13,059,502,879.00	$ 95,434,829.00	$ 13,154,937,708.00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 3,193,244,248.00	$ 606,716,408.00	$ 3,799,960,656.00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ 191,813,500.00	$ 36,444,565.00	$ 228,258,065.00
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ 106,613,643.00	$ 494,063.00	$ 107,107,706.00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			$ -
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	$ 6,735,241.00	$ 31,212.00	$ 6,766,453.00
VALOR TOTAL	**$ 90,432,652,260.00**	**$ 1,278,974,966.00**	**$ 91,711,627,226.00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
WILLIAM ANDRES ORJUELA BARBOSA
Director de Obra
Matrícula No.: 252021-87778 CND

Firma
EDWIN JAVIER MENESES HERNANDEZ
Director de Interventoría
Matrícula No.: 19202-59281 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato /Subdirección Administrativa
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 10
FECHA	1/02/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES, GRUPO ORIENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACA Y CASANARE

ACTA DE RECIBO PARCIAL No 44 DE ene-25

SEGUIMIENTO No. 44 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 978-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 6404: "Belén-Sácama" / 6405: "Sácama - La Cabuya" / 6514: "Paz de Ariporo - La Cabuya" (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1038 DE 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA

PLAZO INICIAL: 102 MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 98 MESES Y 7 DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2029 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 322.790.128.920 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 20.059.840.972,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 342.849.969.892,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	AÑO 2021							AÑO 2022		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					23-jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	1-ene-22	feb-22	mar-22
EXPLANACIONES (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12)	$18.861.293,89	7,227%	0,90%	% P		0,004%	0,004%	0,008%	0,014%	0,016%	0,008%	0,029%	0,035%	0,046%
				$ P		$9.635	$11.619	$21.254	$35.423	$42.508	$21.254	$75.949	$90.490	$119.573
	$10.048.961,72	3,593%	$2.528.155,3530000	$ E		$9.552	$8.187	$760	$390		$1.228			$384
				% E		0,004%	0,003%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (13, 14, 15, 16, 17, 18)	$38.976.391,50	14,935%	$0,0512	% P			0,018%	0,042%	0,179%	0,239%	0,119%	0,150%	0,174%	0,249%
				$ P			$46.734	$109.047	$467.342	$623.123	$311.562	$391.920	$455.109	$650.369
	$44.549.184,92	15,930%	$14.322.289,429000	$ E			$26.327	$75.166	$112.421	$173.880	$59.289	$5.291		$102.393
				% E			0,010%	0,029%	0,043%	0,067%	0,02%	0,00%		0,04%
PAVIMENTOS ASFALTICOS (19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26)	$60.325.006,18	23,115%	$0,1144	% P			0,016%	0,049%	0,081%	0,114%	0,065%	0,158%	0,190%	0,277%
				$ P			$42.460	$127.379	$212.298	$297.218	$169.839	$413.980	$495.041	$722.607
	$68.504.426,76	24,496%	$32.002.589,7170	$ E			$20.085	$905.725	$960.780	$619.240	$716.324	$889.278	$882.966	$1.321.574
				% E			0,008%	0,347%	0,368%	0,237%	0,27%	0,34%	0,34%	0,51%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45)	$121.603.512,55	46,595%	$0,0362	% P				0,494%	0,494%	0,494%	0,165%	0,339%	0,376%	0,474%
				$ P				$1.288.165	$1.288.165	$1.288.165	$429.388	$883.948	$982.378	$1.236.638
	$109.525.395,66	39,164%	$10.126.535,747000	$ E						$78.117	$34.189			
				% E						0,03%	0,01%			
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54)	$3.694.013,86	1,415%	$0,0027	% P					0,005%	0,010%	0,014%	0,019%	0,005%	0,008%	0,013%
				$ P					$12.548	$25.096	$37.644	$50.192	$13.074	$19.612	$32.686
	$4.052.813,86	1,449%	$753.412,751000	$ E										$76.807	$192.015
				% E										0,03%	0,07%
OBRAS VARIAS (55, 56, 57)	$4.546.394,68	1,742%	$0,0000	% P					0,029%	0,029%	0,029%	0,010%	0,005%	0,008%	0,013%
				$ P					$76.192	$76.192	$76.192	$25.397	$13.389	$20.083	$33.472
	$2.652.444,68	0,948%	$0,000000	$ E											
				% E											
TRANSPORTES (58, 59, 60)	$12.973.040,06	4,971%	$0,0030	% P		0,001%	0,001%	0,009%	0,035%	0,047%	0,023%	0,020%	0,030%	0,050%
				$ P		$2.279	$3.798	$24.305	$91.244	$121.525	$60.762	$52.015	$78.022	$130.037
	$11.943.402,20	4,271%	$835.701,052950	$ E		$2.303								$712
				% E		0,001%								0,00%
TOTAL OTROS ITEMS NO PREVISTOS (61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 y 103)	$0,00	0,000%	$0,0476	% P										
				$ P										
	$28.379.561,81	10,148%	$13.306.058,956000	$ E										
				% E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 260.979.652,72	100,00%	$0,2831											
AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE	$ 0,12		-$ 0,26											
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 279.656.191,73**	107,16%	$73.874.742,75											

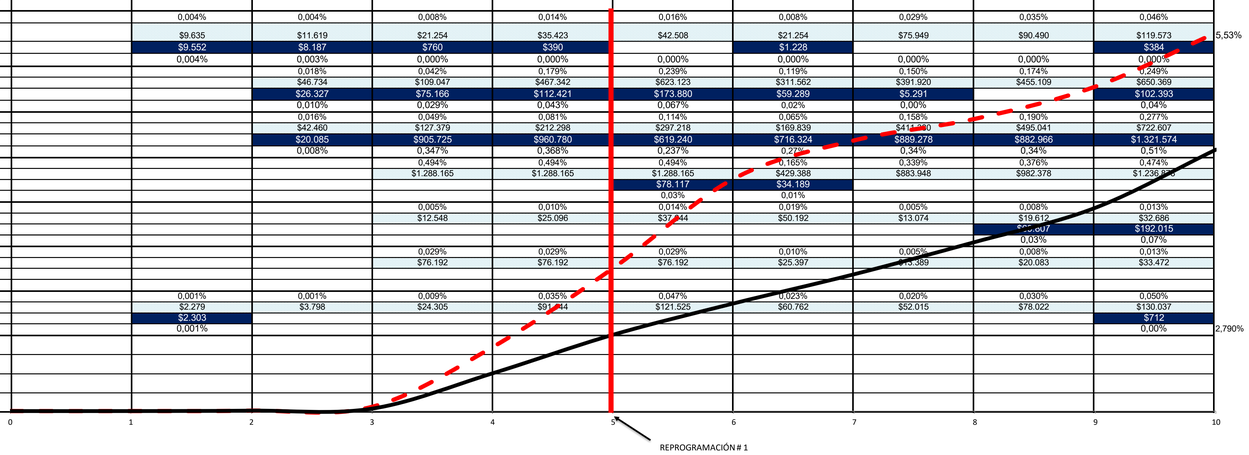

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA (AÑO)	%	**0,00%**	**0,00%**	**0,04%**	**0,64%**	**0,84%**	**0,95%**	**0,41%**	**0,71%**	**0,82%**	**1,12%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0,000**	**$11.914**	**$104.610**	**$1.658.889**	**$2.195.660**	**$2.486.373**	**$1.068.394**	**$1.841.675**	**$2.140.736**	**$2.925.622**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**0,00%**	**0,00%**	**0,04%**	**0,68%**	**1,52%**	**2,47%**	**2,88%**	**3,59%**	**4,41%**	**5,53%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$ 0,000**	**$ 11.914**	**$ 116.524**	**$ 1.775.413**	**$ 3.971.072**	**$ 6.457.446**	**$ 7.525.839**	**$ 9.367.515**	**$ 11.508.250**	**$ 14.433.872**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA (AÑO)	%	**0,00%**	**0,00%**	**0,02%**	**0,38%**	**0,41%**	**0,33%**	**0,31%**	**0,34%**	**0,37%**	**0,62%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0,00**	**$11.855**	**$54.599**	**$981.651**	**$1.073.591**	**$871.237**	**$811.030**	**$894.570**	**$952.773**	**$1.617.079**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**0,00%**	**0,00%**	**0,03%**	**0,40%**	**0,81%**	**1,15%**	**1,46%**	**1,80%**	**2,17%**	**2,79%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0,000**	**$11.855**	**$66.454**	**$1.048.105**	**$2.121.696**	**$2.992.933**	**$3.803.963**	**$4.698.532**	**$5.651.305**	**$7.268.384**

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$31.071.278.494,000 / $29.447.914.451,000	$ 13.059.502.879,00	3,8091%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)	$990.000.000,000 / $990.000.000,000	$ -	0,0000%
VALOR DEL IVA (OBRA) (E) (19% SOBRE UTILIDAD)	$2.141.452.959,000 / $2.266.072.314,000	$ 635.288.718,00	0,1853%
VALOR BASICO DE LA REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (G)	$1.038.890.000,000 / $3.460.777.938,000	$ 3.193.244.248,00	0,9314%
VALOR DEL IVA (19%) DE LA REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (H)	$197.389.100,000 / $657.547.808,000	$ 606.716.408,00	0,1770%
GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA E IVA 19%) (J)	$25.739.616.633,000 / $25.739.616.633,000	$ 335.365.771,00	0,0978%
VALOR DE LA PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA DEL 19%) (K)	$631.849.018,000 / $631.849.018,000	$ 6.766.453,00	0,0020%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$61.810.476.204,000	$ 17.836.884.477,00	5,2025%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$63.193.778.162,000		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$322.790.128.920,000**	**$ 91.711.627.226,00**	**26,75%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$342.849.969.892,000**		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el período real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES			
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMACIÓN	REPROGRAMACIÓN	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor	$ Valor
CURVAS			

OBSERVACIONES:

POR PARTE DEL CONTRATISTA: Se procede con la Reprogramación No. 10 del programa de inversiones, teniendo en cuenta el balance de cantidades realizado en el Acta Modificatoria de Cantidades de Obra No. 12, con fecha del 29 de noviembre de 2024 presentado con el comunicado CVN-0978-1006-2024.
El contratista aclara que este es un programa dinámico que se puede ir ajustando según las condiciones de la obra.

Aprueba: Firma:
Nombre: ANÍBAL ENRÍQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.:25202-57327 CND

Aprueba: Firma:
Nombre: FERNANDO CARO RIVERA
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula No.: 25202 - 26432 CND

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES, GRUPO ORIENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACA Y CASANARE

ACTA DE RECIBO PARCIAL No 44 DE ene-25

SEGUIMIENTO No. 44 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 978-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 6404: "Belén-Sácama" / 6405: "Sácama - La Cabuya" / 6514: "Paz de Ariporo - La Cabuya" (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1038 DE 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA

PLAZO INICIAL: 102 MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 98 MESES Y 7 DIAS (En meses según las prorrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2029 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 322.790.128.920 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 20.059.840.972,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 342.849.969.892,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	RA PROGRAMADA	(%) OBRA PROGRAMADA) / VALOR TOTAL OBRA		% Programado	AÑO 2022									AÑO 2023	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
					abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22	1-ene-23	
EXPLANACIONES (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12)	$18.861.293,89	7,227%	0,90%	% P	0,063%	0,085%	0,085%	0,085%	0,085%	0,085%	0,115%	0,115%	0,096%	0,015%	16,74%
	$10.048.961,72	3,593%	$2.528.155,35	$ P	$163.196	$221.360	$221.360	$221.360	$221.360	$221.360	$300.000	$300.000	$250.000	$38.286	
				$ E	$6.911	$18.055	$5.504	$10.483	$43.866	$335.667	$541.953	$83.306	$89.262	$11.360	
				% E	0,003%	0,007%	0,002%	0,004%	0,017%	0,129%	0,208%	0,032%	0,034%	0,004%	
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (13, 14, 15, 16, 17, 18)	$38.976.391,50	14,935%	5,12%	% P	0,322%	0,419%	0,419%	0,498%	0,498%	0,498%	0,146%	0,146%	0,115%	0,030%	
	$44.549.184,92	15,930%	$14.322.289,43	$ P	$839.937	$1.092.695	$1.092.695	$1.299.338	$1.299.338	$1.299.338	$380.000	$380.000	$300.000	$79.117	
				$ E	$17.152	$17.806	$143.583	$173.382	$220.366	$164.853	$803.419	$793.808	$478.438	$6.581	
				% E	0,01%	0,01%	0,06%	0,07%	0,08%	0,06%	0,31%	0,30%	0,18%	0,003%	
PAVIMENTOS ASFALTICOS (19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26)	$60.325.006,18	23,115%	11,44%	% P	0,373%	0,501%	0,501%	0,571%	0,571%	0,571%	0,956%	0,956%	0,766%	0,047%	
	$68.504.426,76	24,496%	$32.002.589,72	$ P	$973.590	$1.308.233	$1.308.233	$1.488.967	$1.488.967	$1.488.967	$2.493.680	$2.493.680	$2.000.000	$122.452	
				$ E	$1.013.142	$683.878	$217.530	$152.046	$69.079	$890.165		$128.913	$1.414.439	$4.240	
				% E	0,39%	0,26%	0,08%	0,06%	0,03%	0,34%		0,05%	0,54%	0,002%	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45)	$121.603.512,55	46,595%	3,62%	% P	0,587%	0,738%	0,738%	0,804%	0,804%	0,804%	0,113%	0,113%	0,095%	0,095%	
	$109.525.395,66	39,164%	$10.126.535,75	$ P	$1.532.169	$1.925.890	$1.925.890	$2.098.809	$2.098.809	$2.098.809	$295.234	$295.234	$246.730	$246.840	
				$ E	$9.603	$63.229	$149.535	$288.624	$414.504	$268.463	$398.941	$270.537	$889.460	$124.869	
				% E	0,00%	0,03%	0,06%	0,11%	0,16%	0,11%	0,15%	0,11%	0,26%	0,048%	
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54)	$3.694.013,86	1,415%	0,27%	% P	0,007%	0,017%	0,017%	0,017%	0,017%	0,017%	0,021%	0,021%	0,011%	0,003%	
	$4.052.813,86	1,449%	$753.412,75	$ P	$19.472	$45.621	$45.621	$45.621	$45.621	$45.621	$56.000	$56.000	$30.000	$7.498	
				$ E					$83.948			$9.328			
				% E					0,03%			0,00%		0,000%	
OBRAS VARIAS (55, 56, 57)	$4.546.394,68	1,742%	0,00%	% P	0,012%	0,022%	0,022%	0,022%	0,022%	0,022%				0,004%	
	$2.652.444,68	0,948%	$0,00	$ P	$31.311	$58.089	$58.089	$58.089	$58.089	$58.089				$9.229	
				$ E											
				% E										0,000%	
TRANSPORTES (58, 59, 60)	$12.973.040,06	4,971%	0,30%	% P	0,020%	0,060%	0,060%	0,060%	0,060%	0,060%	0,006%	0,008%	0,005%	0,010%	
	$11.943.402,20	4,271%	$835.701,05	$ P	$52.338	$156.367	$156.367	$156.367	$156.367	$156.367	$16.545	$16.545	$13.363	$26.334	
				$ E	$2.593	$2.949	$1.084	$1.529	$39.703	$35.501	$166.989	$33.253	$24.150	$11.239	
				% E	0,001%	0,00%	0,0004%	0,00%	0,02%	0,01%	0,06%	0,01%	0,01%	0,004%	
TOTAL OTROS ITEMS NO PREVISTOS (61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 y 103)	$0,00	0,000%	4,76%	% P							0,068%	0,107%	0,145%		
				$ P							$178.223	$278.223	$378.223		
	$28.379.561,81	10,148%	$13.306.058,96	$ E							$290.322	$58.783		$83.711	
				% E							0,11%	0,02%		0,032%	5,530%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 260.979.652,72	100,00%	28,31%												
AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE	$ 0,12		-$ 0,26												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 279.656.191,73**	107,16%	$73.874.742,75		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

REPROGRAMACIÓN # 2 — REPROGRAMACIÓN # 3 — REPROGRAMACIÓN # 4

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA (AÑO)	%	**1,38%**	**1,84%**	**1,84%**	**2,06%**	**2,06%**	**2,06%**	**1,43%**	**1,46%**	**1,23%**	**0,20%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$3.612.012**	**$4.808.254**	**$4.808.254**	**$5.368.551**	**$5.368.551**	**$5.368.551**	**$3.719.682**	**$3.819.682**	**$3.218.316**	**$529.757**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**6,91%**	**8,77%**	**10,61%**	**12,67%**	**14,72%**	**16,78%**	**13,85%**	**15,31%**	**16,53%**	**16,74%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$ 18.045.885**	**$ 22.854.139**	**$ 27.662.394**	**$ 33.030.944**	**$ 38.399.495**	**$ 43.768.046**	**$ 36.114.003**	**$ 39.933.685**	**$ 43.152.001**	**$ 43.681.758**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA (AÑO)	%	**0,40%**	**0,30%**	**0,20%**	**0,24%**	**0,33%**	**0,66%**	**0,84%**	**0,53%**	**1,03%**	**0,09%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$1.049.402**	**$790.917**	**$516.236**	**$626.694**	**$871.467**	**$1.712.649**	**$2.201.624**	**$1.383.917**	**$2.695.749**	**$241.992**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**3,19%**	**3,49%**	**3,69%**	**3,93%**	**4,26%**	**4,92%**	**5,76%**	**6,29%**	**7,33%**	**7,42%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$8.317.786**	**$9.108.703**	**$9.624.939**	**$10.251.633**	**$11.123.100**	**$12.835.749**	**$15.037.373**	**$16.421.290**	**$19.117.039**	**$19.359.030**

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$31.071.278.494,000 / $29.447.914.451,000	$ 13.059.502.879,00	3,8091%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)	$990.000.000,000 / $990.000.000,000	$ -	0,0000%
VALOR DEL IVA (OBRA) (E) (19% SOBRE UTILIDAD)	$2.141.452.959,000 / $2.266.072.314,000	$ 635.288.718,00	0,1853%
VALOR BASICO DE LA REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (G)	$1.038.890.000,000 / $3.460.777.938,000	$ 3.193.244.248,00	0,9314%
VALOR DEL IVA (19%) DE LA REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (H)	$197.389.100,000 / $657.547.808,000	$ 606.716.408,00	0,1770%
GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA E IVA 19%) (J)	$25.739.616.633,000 / $25.739.616.633,000	$ 335.365.771,00	0,0978%
VALOR DE LA PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA DEL 19%) (K)	$631.849.018,000 / $631.849.018,000	$ 6.766.453,00	0,0020%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$61.810.476.204,000	$ 17.836.884.477,00	5,2025%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$63.193.778.162,000		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$322.790.128.920,000**	**$ 91.711.627.226,00**	**26,75%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$342.849.969.892,000**		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el período real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES			
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMACIÓN	REPROGRAMACIÓN	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor	$ Valor
CURVAS			

OBSERVACIONES:

POR PARTE DEL CONTRATISTA: Se procede con la Reprogramación No. 10 del programa de inversiones, teniendo en cuenta el balance de cantidades realizado en el Acta Modificatoria de Cantidades de Obra No. 12, con fecha del 29 de noviembre de 2024 presentado con el comunicado CVN-0978-1006-2024.
El contratista aclara que este es un programa dinámico que se puede ir ajustando según las condiciones de la obra.

Aprueba: Firma:
Nombre: ANÍBAL ENRÍQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.:25202-57327 CND

Aprueba: Firma:
Nombre: FERNANDO CARO RIVERA
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula No.: 25202 - 26432

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES, GRUPO ORIENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACA Y CASANARE

ACTA DE RECIBO PARCIAL No 44 DE ene-25

SEGUIMIENTO No. 44 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 978-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 6404: "Belén-Sácama" / 6405: "Sácama - La Cabuya" / 6514: "Paz de Ariporo - La Cabuya" (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1038 DE 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA

PLAZO INICIAL: 102 MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 98 MESES Y 7 DIAS (En meses según las prorrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2029 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 322.790.128.920 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 20.059.840.972,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 342.849.969.892,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	AÑO 2023									
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
					feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	1-ago-23	sep-23	oct-23	nov-23
EXPLANACIONES (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12)	$18.861.293,89	7,227%	0,90%	% P	0,022%	0,025%	0,024%	0,036%	0,049%	0,067%	0,078%	0,115%	0,146%	0,152%
				$ P	$57.261	$65.850	$61.968	$92.917	$126.869	$175.569	$204.673	$300.170	$380.731	$397.579
	$10.048.961,72	3,593%	$2.528.155,35	$ E	$35.626	$29.221	$11.625	$20.874	$31.161	$224.178	$34.193	$472	$58.899	$15.869
				% E	0,014%	0,011%	0,004%	0,008%	0,012%	0,086%	0,013%		0,036%	0,006%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (13, 14, 15, 16, 17, 18)	$38.976.391,50	14,935%	5,12%	% P	0,045%	0,052%	0,049%	0,074%	0,100%	0,139%	0,162%	0,238%	0,301%	0,315%
				$ P	$118.328	$136.077	$128.055	$192.011	$262.171	$362.809	$422.952	$620.294	$786.771	$821.586
	$44.549.184,92	15,930%	$14.322.289,43	$ E	$96.212	$66.646	$45.873	$170.195	$30.393	$154.415	$200.096	$117.521	$429.413	$474.905
				% E	0,037%	0,026%	0,018%	0,065%	0,012%	0,06%	0,08%		0,16%	0,18%
PAVIMENTOS ASFALTICOS (19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26)	$60.325.006,18	23,115%	11,44%	% P	0,070%	0,081%	0,076%	0,114%	0,155%	0,215%	0,251%	0,368%	0,467%	0,487%
				$ P	$183.139	$210.610	$198.195	$297.182	$405.770	$561.530	$654.616	$960.049	$1.217.711	$1.271.595
	$68.504.426,76	24,496%	$32.002.589,72	$ E	$8.226	$363.405	$626.631	$1.441.086	$1.152.973	$1.252.572	$1.208.795	$975.202	$1.080.993	$1.411.095
				% E	0,003%	0,139%	0,240%	0,553%	0,442%	0,480%	0,463%	0,37%	0,41%	0,54%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45)	$121.603.512,55	46,595%	3,62%	% P	0,141%	0,163%	0,153%	0,230%	0,313%	0,434%	0,506%	0,742%	0,941%	0,982%
				$ P	$369.174	$424.550	$399.523	$599.061	$817.954	$1.131.936	$1.319.578	$1.935.273	$2.454.668	$2.563.289
	$109.525.395,66	39,164%	$10.126.535,75	$ E	$303.597	$101.983	$243.897	$247.169	$108.992	$274.722	$82.839	$74.265	$59.937	$116.813
				% E	0,116%	0,039%	0,093%	0,095%	0,042%	0,105%	0,032%			0,04%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54)	$3.694.013,86	1,415%	0,27%	% P	0,004%	0,005%	0,005%	0,007%	0,010%	0,013%	0,015%	0,023%	0,029%	0,030%
	$4.052.813,86	1,449%	$753.412,75	$ P	$11.215	$12.897	$12.137	$18.198	$24.847	$34.385	$40.086	$58.789	$74.567	$77.866
				$ E										$73.100
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,00%		
OBRAS VARIAS (55, 56, 57)	$4.546.394,68	1,742%	0,00%	% P	0,005%	0,006%	0,006%	0,009%	0,012%	0,016%	0,019%	0,028%	0,035%	0,037%
				$ P	$13.802	$15.873	$14.937	$22.397	$30.581	$42.329	$49.335	$72.354	$91.773	$95.834
	$2.652.444,68	0,948%	$0,00	$ E										
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
TRANSPORTES (58, 59, 60)	$12.973.040,06	4,971%	0,30%	% P	0,015%	0,017%	0,016%	0,024%	0,033%	0,046%	0,054%	0,079%	0,100%	0,105%
				$ P	$39.385	$45.292	$42.622	$63.910	$87.262	$120.758	$140.777	$206.461	$261.872	$273.460
	$11.943.402,20	4,271%	$835.701,05	$ E	$23.683	$24.682	$9.895	$10.016	$19.257	$11.916	$4.769	$23.382	$20.818	$21.451
				% E	0,009%	0,009%	0,004%	0,004%	0,007%	0,005%	0,002%		0,01%	0,01%
TOTAL OTROS ITEMS NO PREVISTOS (61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 y 103)	$0,00	0,000%	4,76%	% P										
				$ P										
	$28.379.561,81	10,148%	$13.306.058,96	$ E				$154.236				$688.279	$153.918	$127.601
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,059%	0,000%	0,000%	0,000%	0,264%	0,059%	0,049%
					20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 260.979.652,72	100,00%	28,31%
AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE	$ 0,12		-$ 0,26
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 279.656.191,73**	107,16%	$73.874.742,75

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA (AÑO)	%	**0,30%**	**0,35%**	**0,33%**	**0,49%**	**0,67%**	**0,93%**	**1,09%**	**1,59%**	**2,02%**	**2,11%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$792.303**	**$911.148**	**$857.438**	**$1.285.676**	**$1.755.454**	**$2.429.308**	**$2.832.016**	**$4.153.390**	**$5.268.092**	**$5.501.208**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**17,04%**	**17,39%**	**17,72%**	**18,21%**	**18,88%**	**19,81%**	**20,90%**	**22,49%**	**24,51%**	**26,62%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$ 44.474.061**	**$ 45.385.209**	**$ 46.242.647**	**$ 47.528.323**	**$ 49.283.776**	**$ 51.713.084**	**$ 54.545.100**	**$ 58.698.490**	**$ 63.966.582**	**$ 69.467.790**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA (AÑO)	%	**0,18%**	**0,22%**	**0,36%**	**0,78%**	**0,51%**	**0,73%**	**0,59%**	**0,72%**	**0,69%**	**0,86%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$467.745**	**$585.937**	**$937.920**	**$2.044.477**	**$1.342.776**	**$1.917.803**	**$1.530.691**	**$1.879.121**	**$1.803.778**	**$2.240.954**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**7,60%**	**7,82%**	**8,18%**	**8,96%**	**9,48%**	**10,21%**	**10,80%**	**11,52%**	**12,21%**	**13,07%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$19.826.775**	**$20.412.712**	**$21.350.631**	**$23.395.108**	**$24.737.885**	**$26.655.688**	**$28.186.379**	**$30.065.500**	**$31.869.278**	**$34.110.232**

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$31.071.278.494,000 / $29.447.914.451,000	$ 13.059.502.879,00	3,8091%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)	$990.000.000,000 / $990.000.000,000	$ -	0,0000%
VALOR DEL IVA (OBRA) (E) (19% SOBRE UTILIDAD)	$2.141.452.959,000 / $2.266.072.314,000	$ 635.288.718,00	0,1853%
VALOR BASICO DE LA REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (G)	$1.038.890.000,000 / $3.460.777.938,000	$ 3.193.244.248,00	0,9314%
VALOR DEL IVA (19%) DE LA REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (H)	$197.389.100,000 / $657.547.808,000	$ 606.716.408,00	0,1770%
GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA E IVA 19%) (J)	$25.739.616.633,000 / $25.739.616.633,000	$ 335.365.771,00	0,0978%
VALOR DE LA PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA DEL 19%) (K)	$631.849.018,000 / $631.849.018,000	$ 6.766.453,00	0,0020%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$61.810.476.204,000	$ 17.836.884.477,00	5,2025%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$63.193.778.162,000		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$322.790.128.920,000**	**$ 91.711.627.226,00**	**26,75%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$342.849.969.892,000**		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el período real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES			
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMACIÓN	REPROGRAMACIÓN	EJECOTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor	$ Valor
CURVAS			

OBSERVACIONES:

POR PARTE DEL CONTRATISTA: Se procede con la Reprogramación No. 10 del programa de inversiones, teniendo en cuenta el balance de cantidades realizado en el Acta Modificatoria de Cantidades de Obra No. 12, con fecha del 29 de noviembre de 2024 presentado con el comunicado CVN-0978-1006-2024.
El contratista aclara que este es un programa dinámico que se puede ir ajustando según las condiciones de la obra.

Aprueba: Firma:
Nombre: ANÍBAL ENRÍQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.:25202-57327 CND

Aprueba: Firma:
Nombre: FERNANDO CARO RIVERA
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula No.: 25202 - 26432

GT

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	2 DE 10
FECHA	1/02/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES, GRUPO ORIENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACA Y CASANARE

ACTA DE RECIBO PARCIAL No 44 DE ene-25

SEGUIMIENTO No. 44 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 978-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 6404: "Belén-Sácama" / 6405: "Sácama - La Cabuya" / 6514: "Paz de Ariporo - La Cabuya" (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1038 DE 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA

PLAZO INICIAL: 102 MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 98 MESES Y 7 DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2029 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 322.790.128.920 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 20.059.840.972,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 342.849.969.892,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado	AÑO 2023	AÑO 2024									
				$ Valor programado	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor Ejecutado	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	
				% Ejecutado											
EXPLANACIONES (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12)	$18.861.293,89	7,227%	0,90%	% P	0,139%	0,006%	0,009%	0,038%	0,029%	0,049%	0,055%	0,096%	0,110%	0,137%	22,92%
	$10.048.961,72	3,593%	$2.528.155,35	$ P	$361.567	$15.615.047	$22.693.632	$99.819.853	$76.624.773	$127.459.844	$143.888.119	$250.551.452	$286.344.516	$357.930.645	
				$ E	$17.139	$6.679	$162.871	$72.418	$7.551	$14.706	$101.467	$32.604	$88.294	$17.627	
				% E	0,007%	0,003%	0,062%	0,028%	0,003%	0,006%	0,039%	0,012%	0,034%	0,007%	
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (13, 14, 15, 16, 17, 18)	$38.976.391,50	14,935%	5,12%	% P	0,286%	0,013%	0,018%	0,081%	0,062%	0,104%	0,117%	0,204%	0,233%	0,292%	
	$44.549.184,92	15,930%	$14.322.289,43	$ P	$747.169	$33.190.209	$48.235.934	$208.169.925	$162.945.702	$270.841.726	$305.838.129	$532.553.956	$608.633.092	$760.791.365	
				$ E	$302.116	$404.522	$419.759	$803.335	$904.167	$517.268	$536.829	$776.074	$873.562	$1.063.743	
				% E	0,12%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%				
PAVIMENTOS ASFALTICOS (19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26)	$60.325.006,18	23,115%	11,44%	% P	0,443%	0,016%	0,023%	0,103%	0,079%	0,131%	0,148%	0,257%	0,294%	0,368%	
	$68.504.426,76	24,496%	$32.002.589,72	$ P	$1.156.418	$41.878.071	$60.862.163	$267.707.358	$205.598.338	$341.737.205	$385.894.259	$671.955.178	$767.948.775	$959.935.969	
				$ E	$1.823.440	$332.440	$786.979	$660.882	$872.234	$522.779	$759.472	$901.829	$498.073	$809.117	
				% E	0,70%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%		
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45)	$121.603.512,55	46,595%	3,62%	% P	0,893%	0,026%	0,038%	0,167%	0,128%	0,213%	0,240%	0,418%	0,478%	0,597%	
	$109.525.395,66	39,164%	$10.126.535,75	$ P	$2.331.114	$67.978.006	$98.793.674	$434.552.306	$333.734.689	$554.720.243	$626.397.577	$1.090.742.050	$1.246.562.343	$1.558.202.928	
				$ E		$105.236	$220.313	$259.899	$107.540	$245.365	$248.293	$716.494	$259.508	$528.000	
				% E		0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%		
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54)	$3.694.013,86	1,415%	0,27%	% P	0,027%	0,001%	0,001%	0,005%	0,004%	0,007%	0,008%	0,013%	0,015%	0,019%	
	$4.052.813,86	1,449%	$753.412,75	$ P	$70.813	$2.178.726	$3.166.382	$13.927.599	$10.696.348	$17.779.036	$20.076.327	$34.958.778	$39.952.889	$49.941.111	
				$ E	$59.927		$68.530	$111.892	$31.647						
				% E			0,026%	0,043%	0,012%						
OBRAS VARIAS (55, 56, 57)	$4.546.394,68	1,742%	0,00%	% P	0,033%	0,001%	0,002%	0,009%	0,007%	0,011%	0,013%	0,022%	0,026%	0,031%	
	$2.652.444,68	0,948%	$0,00	$ P	$87.153	$3.574.055	$5.194.239	$22.847.298	$17.546.647	$29.165.324	$32.933.877	$57.347.548	$65.540.055	$81.925.068	
				$ E											
				% E	0,000%										
TRANSPORTES (58, 59, 60)	$12.973.040,06	4,971%	0,30%	% P	0,095%	0,004%	0,005%	0,024%	0,019%	0,031%	0,035%	0,061%	0,069%	0,087%	
	$11.943.402,20	4,271%	$835.701,05	$ P	$248.690	$9.863.210	$14.334.382	$63.050.989	$48.422.945	$80.486.851	$90.906.412	$158.260.270	$180.868.880	$226.086.100	
				$ E		$11.899	$525	$3.650	$1.739	$8.790	$71.406	-$24.629	$32.866	$8.892	
				% E		0,005%	0,000%	0,001%	0,002%	0,003%	0,027%	-0,009%	0,013%	0,003%	
TOTAL OTROS ITEMS NO PREVISTOS (61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 y 103)	$0,00	0,000%	4,76%	% P		0,003%	0,004%	0,018%	0,014%	0,023%	0,026%	0,045%	0,051%	0,064%	
	$28.379.561,81	10,148%	$13.306.058,96	$ P		$7.261.555	$10.553.359	$46.419.801	$35.650.249	$59.256.396	$66.913.121	$116.515.385	$133.160.440	$166.450.549	
				$ E		$19.317		$321.155	$123.996	$206.062	$677.089	$81.854	$850.322	$1.423.986	
				% E	0,000%	0,276%		0,123%	0,048%	0,079%	0,259%	0,031%	0,326%	0,546%	26,620%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 260.979.652,72	100,00%	28,31%												
AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE	$ 0,12		-$ 0,26												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 279.656.191,73**	107,16%	$73.874.742,75												

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

REPROGRAMACION # 5 (ACTA FIJACION DE PRECIOS No.3A Y 4) — REPROGRAMACION # 6 (ACTA FIJACION DE PRECIOS No. 5) — REPROGRAMACION # 7 (ACTA FIJACION DE PRECIOS No. 6 y 7) — REPROGRAMACION # 8 (ACTA FIJACION DE PRECIOS No. 8, 9 y 10) — REPROGRAMACION # 9 (MODIFICATORIA No 11)

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA (AÑO)	%	**1,92%**	**0,07%**	**0,10%**	**0,44%**	**0,34%**	**0,57%**	**0,64%**	**1,12%**	**1,28%**	**1,59%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$5.002.925**	**$181.539**	**$263.834**	**$1.160.495**	**$891.220**	**$1.481.446**	**$1.672.828**	**$2.912.885**	**$3.329.011**	**$4.161.264**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**28,54%**	**28,60%**	**28,71%**	**29,15%**	**17,72%**	**18,29%**	**18,93%**	**20,05%**	**21,32%**	**22,92%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$ 74.470.715**	**$ 74.652.254**	**$ 74.916.088**	**$ 76.076.583**	**$ 46.254.262**	**$ 47.735.708**	**$ 49.408.536**	**$ 52.321.421**	**$ 55.650.432**	**$ 59.811.696**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA (AÑO)	%	**0,84%**	**0,61%**	**0,64%**	**0,86%**	**0,82%**	**0,73%**	**0,92%**	**0,95%**	**1,00%**	**1,48%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$2.202.622**	**$1.580.094**	**$1.658.977**	**$2.233.230**	**$2.142.075**	**$1.914.969**	**$2.394.557**	**$2.484.226**	**$2.602.624**	**$3.851.365**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**13,91%**	**14,52%**	**15,16%**	**16,01%**	**16,83%**	**17,57%**	**18,48%**	**19,43%**	**20,43%**	**21,91%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$36.312.854**	**$37.892.947**	**$39.551.924**	**$41.785.154**	**$43.927.229**	**$45.842.198**	**$48.236.755**	**$50.720.981**	**$53.323.605**	**$57.174.970**

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$31.071.278.494,000 / $29.447.914.451,000	$ 13.059.502.879,00	3,8091%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)	$990.000.000,000 / $990.000.000,000	$ -	0,0000%
VALOR DEL IVA (OBRA) (E) (19% SOBRE UTILIDAD)	$2.141.452.959,000 / $2.266.072.314,000	$ 635.288.718,00	0,1853%
VALOR BASICO DE LA REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (G)	$1.038.890.000,000 / $3.460.777.938,000	$ 3.193.244.248,00	0,9314%
VALOR DEL IVA (19%) DE LA REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (H)	$197.389.100,000 / $657.547.808,000	$ 606.716.408,00	0,1770%
GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA E IVA 19%) (J)	$25.739.616.633,000 / $25.739.616.633,000	$ 335.365.771,00	0,0978%
VALOR DE LA PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA DEL 19%) (K)	$631.849.018,000 / $631.849.018,000	$ 6.766.453,00	0,0020%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$61.810.476.204,000	$ 17.836.884.477,00	5,2025%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$63.193.778.162,000		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$322.790.128.920,000**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$342.849.969.892,000**	**$ 91.711.627.226,00**	**26,75%**

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el período real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES			
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMACIÓN	REPROGRAMACIÓN	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor	$ Valor
CURVAS			

OBSERVACIONES:

POR PARTE DEL CONTRATISTA: Se procede con la Reprogramación No. 10 del programa de inversiones, teniendo en cuenta el balance de cantidades realizado en el Acta Modificatoria de Cantidades de Obra No. 12, con fecha del 29 de noviembre de 2024 presentado con el comunicado CVN-0978-1006-2024.
El contratista aclara que este es un programa dinámico que se puede ir ajustando según las condiciones de la obra.

Aprueba: Firma:
Nombre: ANÍBAL ENRÍQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.:25202-57327 CND

Aprueba: Firma:
Nombre: FERNANDO CARO RIVERA
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula No.: 25202 - 26432

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	2 DE 10
FECHA	1/02/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES, GRUPO ORIENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACA Y CASANARE

ACTA DE RECIBO PARCIAL No 44 DE ene-25

SEGUIMIENTO No. 44 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 978-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 6404: "Belén-Sácama" / 6405: "Sácama - La Cabuya" / 6514: "Paz de Ariporo - La Cabuya" (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1038 DE 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA

PLAZO INICIAL: 102 MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 98 MESES Y 7 DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2029 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 322.790.128.920** (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 20.059.840.972,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 342.849.969.892,00**

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	AÑO 2024			AÑO 2025							
					41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
					oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	
EXPLANACIONES (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12)	$18.861.293,89	7,227%	0,90%	% P	0,165%	0,274%	0,403%	0,025%	0,025%	0,062%	0,062%	0,099%	0,099%	0,124%	
	$10.048.961,72	3,593%	$2.528.155,35	$ P	$429.516,774	$715.861,290	$1.053.000,507	$64.861,649	$64.861,649	$162.154,123	$162.154,123	$259.446,597	$259.446,597	$324.308,246	38,490%
				$ E	$29.582	$100.226	$178.067	$70.017							
				% E	0,011%	0,038%	0,068%	0,027%							
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (13, 14, 15, 16, 17, 18)	$38.976.391,50	14,935%	5,12%	% P	0,350%	0,583%	0,858%	0,059%	0,059%	0,147%	0,147%	0,234%	0,234%	0,293%	
	$44.549.184,92	15,930%	$14.322.289,43	$ P	$912.949,639	$1.521.582,731	$2.238.181,347	$152.946,701	$152.946,701	$382.366,752	$382.366,752	$611.786,802	$611.786,802	$764.733,503	
				$ E	$493.782	$899.066	$1.019.876	$148.366							
				% E	0,189%	0,344%	0,391%	0,057%							
PAVIMENTOS ASFALTICOS (19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26)	$60.325.006,18	23,115%	11,44%	% P	0,441%	0,736%	1,082%	0,067%	0,067%	0,167%	0,167%	0,267%	0,267%	0,333%	
	$68.504.426,76	24,496%	$32.002.589,72	$ P	$1.151.923,163	$1.919.871,938	$2.824.047,272	$173.952,778	$173.952,778	$434.881,945	$434.881,945	$695.811,112	$695.811,112	$869.763,890	
				$ E	$457.802	$980.426	$1.979.810	$208.622							
				% E	0,175%	0,376%	0,759%	0,079%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45)	$121.603.512,55	46,595%	3,62%	% P	0,716%	1,194%	1,756%	0,114%	0,114%	0,285%	0,285%	0,456%	0,456%	0,570%	
	$109.525.395,66	39,164%	$10.126.535,75	$ P	$1.869.843,514	$3.116.405,857	$4.584.096,095	$297.447,960	$297.447,960	$743.619,900	$743.619,900	$1.189.791,841	$1.189.791,841	$1.487.239,801	
				$ E	$359.207	$573.434	$690.525	$288.625							
				% E	0,368%	0,220%	0,265%	0,111%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54)	$3.694.013,86	1,415%	0,27%	% P	0,023%	0,038%	0,056%	0,003%	0,003%	0,009%	0,009%	0,014%	0,014%	0,017%	
	$4.052.813,86	1,449%	$753.412,75	$ P	$59.929,333	$99.882,222	$146.922,360	$9.049,973	$9.049,973	$22.624,934	$22.624,934	$36.199,894	$36.199,894	$45.249,867	
				$ E	$46.621		$6.398								
				% E	0,018%		0,002%		0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	
OBRAS VARIAS (55, 56, 57)	$4.546.394,68	1,742%	0,00%	% P	0,038%	0,063%	0,092%	0,006%	0,006%	0,014%	0,014%	0,023%	0,023%	0,028%	
	$2.652.444,68	0,948%	$0,00	$ P	$98.310,082	$163.850,136	$241.016,352	$14.845,879	$14.845,879	$37.114,697	$37.114,697	$59.383,516	$59.383,516	$74.229,395	
				$ E											
				% E					0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	
TRANSPORTES (58, 59, 60)	$12.973.040,06	4,971%	0,30%	% P	0,104%	0,173%	0,253%	0,016%	0,016%	0,039%	0,039%	0,063%	0,063%	0,078%	
	$11.943.402,20	4,271%	$835.701,05	$ P	$271.303,320	$452.172,199	$665.125,439	$40.969,717	$40.969,717	$102.424,293	$102.424,293	$163.878,869	$163.878,869	$204.848,586	
				$ E	$26.987	$16.149	$140.100	$42.452							
				% E	0,010%	0,006%	0,054%	0,016%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	
TOTAL OTROS ITEMS NO PREVISTOS (61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 y 103)	$0,00	0,000%	4,76%	% P	0,077%	0,120%	0,188%								
	$28.379.561,81	10,148%	$13.306.058,96	$ P	$169.741	$332.901	$489.683								
				$ E	$1.872.469	$2.586.411	$1.917.787	$968.771							
				% E	0,717%	0,991%	0,735%	0,371%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	22,920%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 260.979.652,72	100,00%	28,31%												
AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE	$ 0,12		-$ 0,26												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 279.656.191,73**	107,16%	$73.874.742,75												

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

REPROGRAMACION #10 (MODIFICATORIA No12 y ACTA FIJACION No.11)

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA (AÑO)	%	**1,91%**	**3,19%**	**4,69%**	**0,29%**	**0,29%**	**0,72%**	**0,72%**	**1,16%**	**1,16%**	**1,44%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$4.993.516**	**$8.322.527**	**$12.242.072**	**$754.075**	**$754.075**	**$1.885.187**	**$1.885.187**	**$3.016.299**	**$3.016.299**	**$3.770.373**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**24,83%**	**28,02%**	**32,71%**	**33,00%**	**33,29%**	**34,01%**	**34,73%**	**35,89%**	**37,05%**	**38,49%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$ 64.805.212**	**$ 73.127.740**	**$ 85.369.812**	**$ 86.123.887**	**$ 86.877.961**	**$ 88.763.148**	**$ 90.648.334**	**$ 93.664.633**	**$ 96.680.932**	**$ 100.451.305**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA (AÑO)	%	**1,49%**	**1,98%**	**2,27%**	**0,66%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$3.886.503**	**$5.155.712**	**$5.933.001**	**$1.724.558**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**23,40%**	**25,37%**	**27,65%**	**28,31%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$61.061.473**	**$66.217.185**	**$72.150.185**	**$73.874.743**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$31.071.278.494,000 / $29.447.914.451,000	$ 13.059.502.879,00	3,8091%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)	$990.000.000,000 / $990.000.000,000	$ -	0,0000%
VALOR DEL IVA (OBRA) (E) (19% SOBRE UTILIDAD)	$2.141.452.959,000 / $2.266.072.314,000	$ 635.288.718,00	0,1853%
VALOR BASICO DE LA REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (G)	$1.038.890.000,000 / $3.460.777.938,000	$ 3.193.244.248,00	0,9314%
VALOR DEL IVA (19%) DE LA REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (H)	$197.389.100,000 / $657.547.808,000	$ 606.716.408,00	0,1770%
GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA E IVA 19%) (J)	$25.739.616.633,000 / $25.739.616.633,000	$ 335.365.771,00	0,0978%
VALOR DE LA PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA DEL 19%) (K)	$631.849.018,000 / $631.849.018,000	$ 6.766.453,00	0,0020%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$61.810.476.204,000	$ 17.836.884.477,00	5,2025%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$63.193.778.162,000		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$322.790.128.920,000**	**$ 91.711.627.226,00**	**26,75%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$342.849.969.892,000**		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el período real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES			
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMACIÓN	REPROGRAMACIÓN	EJECOTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor	$ Valor
CURVAS			

OBSERVACIONES:

POR PARTE DEL CONTRATISTA: Se procede con la Reprogramación No. 10 del programa de inversiones, teniendo en cuenta el balance de cantidades realizado en el Acta Modificatoria de Cantidades de Obra No. 12, con fecha del 29 de noviembre de 2024 presentado con el comunicado CVN-0978-1006-2024.
El contratista aclara que este es un programa dinámico que se puede ir ajustando según las condiciones de la obra.

Aprueba: Firma:

Nombre: ANÍIBAL ENRÍQUE OJEDA CARRIAZO

Representante legal o apoderado del Contratista

Matrícula No.:25202-57327 CND

Aprueba: Firma:

Nombre: FERNANDO CARO RIVERA

Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula No.: 25202 - 26432

GT

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 10
		FECHA	1/02/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES, GRUPO ORIENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACA Y CASANARE

ACTA DE RECIBO PARCIAL No 44 DE ene-25

SEGUIMIENTO No. 44 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 978-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 6404: "Belén-Sácama" / 6405: "Sácama - La Cabuya" / 6514: "Paz de Ariporo - La Cabuya" (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1038 DE 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA

PLAZO INICIAL: 102 MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 98 MESES Y 7 DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2029 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 322.790.128.920** (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 20.059.840.972,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 342.849.969.892,00**

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado $ Valor programado $ Valor Ejecutado % Ejecutado	AÑO 2025					AÑO 2026					
					51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	
					ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	
EXPLANACIONES (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12)	$18.861.293,89	7,227%	0,90%	% P	0,124%	0,137%	0,137%	0,162%	0,186%	0,027%	0,027%	0,069%	0,069%	0,110%	
				$ P	$324.308	$356.739	$356.739	$421.601	$486.462	$71.586,129	$71.586,129	$178.965,323	$178.965,323	$286.344,516	50,670%
	$10.048.961,72	3,593%	$2.528.155,35	$ E											
				% E				0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (13, 14, 15, 16, 17, 18)	$38.976.391,50	14,935%	5,12%	% P	0,293%	0,322%	0,322%	0,381%	0,440%	0,065%	0,065%	0,162%	0,162%	0,259%	
				$ P	$764.734	$841.207	$841.207	$994.154	$1.147.100	$168.803,328	$168.803,328	$422.008,320	$422.008,320	$675.213,312	
	$44.549.184,92	15,930%	$14.322.289,43	$ E											
				% E				0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	
PAVIMENTOS ASFALTICOS (19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26)	$60.325.006,18	23,115%	11,44%	% P	0,333%	0,367%	0,367%	0,433%	0,500%	0,074%	0,074%	0,184%	0,184%	0,294%	
				$ P	$869.764	$956.740	$956.740	$1.130.693	$1.304.646	$191.987,194	$191.987,194	$479.967,984	$479.967,984	$767.948,775	
	$68.504.426,76	24,496%	$32.002.589,72	$ E											
				% E				0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45)	$121.603.512,55	46,595%	3,62%	% P	0,570%	0,627%	0,627%	0,741%	0,855%	0,126%	0,126%	0,314%	0,314%	0,503%	
				$ P	$1.487.240	$1.635.964	$1.635.964	$1.933.412	$2.230.860	$328.285,641	$328.285,641	$820.714,102	$820.714,102	$1.313.142,563	
	$109.525.395,66	39,164%	$10.126.535,75	$ E											
				% E				0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54)	$3.694.013,86	1,415%	0,27%	% P	0,017%	0,019%	0,019%	0,023%	0,026%	0,004%	0,004%	0,010%	0,010%	0,015%	
				$ P	$45.250	$49.775	$49.775	$58.825	$67.875	$9.988,222	$9.988,222	$24.970,556	$24.970,556	$39.952,889	
	$4.052.813,86	1,449%	$753.412,75	$ E											
				% E				0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	
OBRAS VARIAS (55, 56, 57)	$4.546.394,68	1,742%	0,00%	% P	0,028%	0,031%	0,031%	0,037%	0,043%	0,006%	0,006%	0,016%	0,016%	0,025%	
				$ P	$74.229	$81.652	$81.652	$97.498	$111.344	$16.385,014	$16.385,014	$40.962,534	$40.962,534	$65.540,055	
	$2.652.444,68	0,948%	$0,00	$ E											
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	
TRANSPORTES (58, 59, 60)	$12.973.040,06	4,971%	0,30%	% P	0,078%	0,086%	0,086%	0,102%	0,118%	0,017%	0,017%	0,043%	0,043%	0,069%	
				$ P	$204.849	$225.333	$225.333	$266.303	$307.273	$45.217,220	$45.217,220	$113.043,050	$113.043,050	$180.868,880	
	$11.943.402,20	4,271%	$835.701,05	$ E											
				% E				0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	
TOTAL OTROS ITEMS NO PREVISTOS (61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 y 103)	$0,00	0,000%	4,76%	% P											
				$ P											
	$28.379.561,81	10,148%	$13.306.058,96	$ E											
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	38,490%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 260.979.652,72	100,00%	28,31%												
AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE	$ 0,12		-$ 0,26												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 279.656.191,73**	107,16%	$73.874.742,75												

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA (AÑO)	%	**1,44%**	**1,59%**	**1,59%**	**1,88%**	**2,17%**	**0,32%**	**0,32%**	**0,80%**	**0,80%**	**1,28%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$3.770.373**	**$4.147.411**	**$4.147.411**	**$4.901.485**	**$5.655.560**	**$832.253**	**$832.253**	**$2.080.632**	**$2.080.632**	**$3.329.011**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**39,93%**	**41,52%**	**43,11%**	**44,99%**	**47,16%**	**47,48%**	**47,80%**	**48,59%**	**49,39%**	**50,67%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$ 104.221.678**	**$ 108.369.089**	**$ 112.516.500**	**$ 117.417.985**	**$ 123.073.545**	**$ 123.905.797**	**$ 124.738.050**	**$ 126.818.682**	**$ 128.899.314**	**$ 132.228.325**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA (AÑO)	%	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$31.071.278.494,000 $29.447.914.451,000	$ 13.059.502.879,00	3,8091%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)	$990.000.000,000 $990.000.000,000	$ -	0,0000%
VALOR DEL IVA (OBRA) (E) (19% SOBRE UTILIDAD)	$2.141.452.959,000 $2.266.072.314,000	$ 635.288.718,00	0,1853%
VALOR BASICO DE LA REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (G)	$1.038.890.000,000 $3.460.777.938,000	$ 3.193.244.248,00	0,9314%
VALOR DEL IVA (19%) DE LA REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (H)	$197.389.100,000 $657.547.808,000	$ 606.716.408,00	0,1770%
GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA E IVA 19%) (J)	$25.739.616.633,000 $25.739.616.633,000	$ 335.365.771,00	0,0978%
VALOR DE LA PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA DEL 19%) (K)	$631.849.018,000 $631.849.018,000	$ 6.766.453,00	0,0020%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$61.810.476.204,000	$ 17.836.884.477,00	5,2025%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$63.193.778.162,000		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$322.790.128.920,000**	**$ 91.711.627.226,00**	**26,75%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$342.849.969.892,000**		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el período real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES			
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMACIÓN	REPROGRAMACIÓN	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor	$ Valor
CURVAS			

OBSERVACIONES:

POR PARTE DEL CONTRATISTA: Se procede con la Reprogramación No. 10 del programa de inversiones, teniendo en cuenta el balance de cantidades realizado en el Acta Modificatoria de Cantidades de Obra No. 12, con fecha del 29 de noviembre de 2024 presentado con el comunicado CVN-0978-1006-2024.
El contratista aclara que este es un programa dinámico que se puede ir ajustando según las condiciones de la obra.

Aprueba: Firma:
Nombre: ANÍBAL ENRÍQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.:25202-57327 CND

Aprueba: Firma:
Nombre: FERNANDO CARO RIVERA
Representante legal o apoderado del Interventor GT
Matrícula No.: 25202 - 26432

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES, GRUPO ORIENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACA Y CASANARE

ACTA DE RECIBO PARCIAL No 44 DE ene-25

SEGUIMIENTO No. 44 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 978-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 6404: "Belén-Sácama" / 6405: "Sácama - La Cabuya" / 6514: "Paz de Ariporo - La Cabuya"
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1038 DE 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA

PLAZO INICIAL: 102 MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 98 MESES Y 7 DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2029 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 322.790.128.920** (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 20.059.840.972,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 342.849.969.892,00**

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		AÑO 2026							AÑO 2027			
				% Programado											
				$ Valor programado	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	
				$ Valor Ejecutado / % Ejecutado	jun-26	jul-26	ago-26	sep-26	oct-26	nov-26	dic-26	ene-27	feb-27	mar-27	
EXPLANACIONES (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12)	$18.861.293,89	7,227%	0,90%	% P	0,110%	0,137%	0,137%	0,151%	0,151%	0,178%	0,206%	0,023%	0,023%	0,058%	
				$ P	$286.345	$357.931	$357.931	$393.724	$393.724	$465.310	$536.896	$60.924	$60.924	$152.434	64,330%
	$10.048.961,72	3,593%	$2.528.155,35	$ E											
				% E	0,000%	0,000%	0,000%					0,000%	0,000%	0,000%	
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (13, 14, 15, 16, 17, 18)	$38.976.391,50	14,935%	5,12%	% P	0,259%	0,323%	0,323%	0,356%	0,356%	0,420%	0,485%	0,055%	0,055%	0,138%	
				$ P	$675.213	$844.017	$844.017	$928.418	$928.418	$1.097.222	$1.266.025	$143.779	$143.779	$359.446	
	$44.549.184,92	15,930%	$14.322.289,43	$ E											
				% E	0,012%							0,000%	0,000%	0,000%	
PAVIMENTOS ASFALTICOS (19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26)	$60.325.006,18	23,115%	11,44%	% P	0,294%	0,368%	0,368%	0,405%	0,405%	0,478%	0,552%	0,063%	0,063%	0,157%	
				$ P	$767.949	$959.936	$959.936	$1.055.930	$1.055.930	$1.247.917	$1.439.904	$163.525	$163.525	$408.814	
	$68.504.426,76	24,496%	$32.002.589,72	$ E											
				% E	0,000%	0,000%	0,000%					0,000%	0,000%	0,000%	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45)	$121.603.512,55	46,595%	3,62%	% P	0,503%	0,629%	0,629%	0,692%	0,692%	0,818%	0,943%	0,107%	0,107%	0,268%	
				$ P	$1.313.143	$1.641.428	$1.641.428	$1.805.571	$1.805.571	$2.133.857	$2.462.142	$279.618	$279.618	$699.045	
	$109.525.395,66	39,164%	$10.126.535,75	$ E											
				% E	0,000%	0,000%	0,000%					0,000%	0,000%	0,000%	
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54)	$3.694.013,86	1,415%	0,27%	% P	0,015%	0,019%	0,019%	0,021%	0,021%	0,025%	0,029%	0,003%	0,003%	0,008%	
				$ P	$39.953	$49.941	$49.941	$54.935	$54.935	$64.923	$74.912	$8.507	$8.507	$21.269	
	$4.052.813,86	1,449%	$753.412,75	$ E				$0							
				% E	0,000%	0,000%	0,000%					0,000%	0,000%	0,000%	
OBRAS VARIAS (55, 56, 57)	$4.546.394,68	1,742%	0,00%	% P	0,025%	0,031%	0,031%	0,035%	0,035%	0,041%	0,047%	0,005%	0,005%	0,013%	
				$ P	$65.540	$81.925	$81.925	$90.118	$90.118	$106.503	$122.888	$13.956	$13.956	$34.890	
	$2.652.444,68	0,948%	$0,00	$ E											
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	
TRANSPORTES (58, 59, 60)	$12.973.040,06	4,971%	0,30%	% P	0,069%	0,087%	0,087%	0,095%	0,095%	0,113%	0,130%	0,015%	0,015%	0,037%	
				$ P	$180.869	$226.086	$226.086	$248.695	$248.695	$293.912	$339.129	$38.514	$38.514	$96.285	
	$11.943.402,20	4,271%	$835.701,05	$ E											
				% E	0,000%	0,000%	0,000%					0,000%	0,000%	0,000%	
TOTAL OTROS ITEMS NO PREVISTOS (61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 y 103)	$0,00	0,000%	4,76%	% P											
				$ P											
	$28.379.561,81	10,148%	$13.306.058,96	$ E											
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	50,670%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 260.979.652,72	100,00%	28,31%												
AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE	$ 0,12		-$ 0,26												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 279.656.191,73**	107,16%	$73.874.742,75												

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA (AÑO)	%	**1,28%**	**1,59%**	**1,59%**	**1,75%**	**1,75%**	**2,07%**	**2,39%**	**0,27%**	**0,27%**	**0,68%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$3.329.011**	**$4.161.264**	**$4.161.264**	**$4.577.390**	**$4.577.390**	**$5.409.643**	**$6.241.896**	**$708.873**	**$708.873**	**$1.772.182**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**51,94%**	**53,54%**	**55,13%**	**56,88%**	**58,64%**	**60,71%**	**63,10%**	**63,37%**	**63,65%**	**64,33%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$ 135.557.336**	**$ 139.718.600**	**$ 143.879.863**	**$ 148.457.254**	**$ 153.034.644**	**$ 158.444.286**	**$ 164.686.182**	**$ 165.395.055**	**$ 166.103.928**	**$ 167.876.109**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA (AÑO)	%	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$31.071.278.494,000 / $29.447.914.451,000	$ 13.059.502.879,00	3,8091%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)	$990.000.000,000 / $990.000.000,000	$ -	0,0000%
VALOR DEL IVA (OBRA) (E) (19% SOBRE UTILIDAD)	$2.141.452.959,000 / $2.266.072.314,000	$ 635.288.718,00	0,1853%
VALOR BASICO DE LA REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (G)	$1.038.890.000,000 / $3.460.777.938,000	$ 3.193.244.248,00	0,9314%
VALOR DEL IVA (19%) DE LA REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (H)	$197.389.100,000 / $657.547.808,000	$ 606.716.408,00	0,1770%
GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA E IVA 19%) (J)	$25.739.616.633,000 / $25.739.616.633,000	$ 335.365.771,00	0,0978%
VALOR DE LA PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA DEL 19%) (K)	$631.849.018,000 / $631.849.018,000	$ 6.766.453,00	0,0020%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B) / VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$61.810.476.204,000 / $63.193.778.162,000	$ 17.836.884.477,00	5,2025%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B) / **VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')**	**$322.790.128.920,000** / **$342.849.969.892,000**	**$ 91.711.627.226,00**	**26,75%**

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el período real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES			
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMACIÓN	REPROGRAMACIÓN	EJECOTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor	$ Valor
CURVAS			

OBSERVACIONES:

POR PARTE DEL CONTRATISTA: Se procede con la Reprogramación No. 10 del programa de inversiones, teniendo en cuenta el balance de cantidades realizado en el Acta Modificatoria de Cantidades de Obra No. 12, con fecha del 29 de noviembre de 2024 presentado con el comunicado CVN-0978-1006-2024.
El contratista aclara que este es un programa dinámico que se puede ir ajustando según las condiciones de la obra.

Aprueba: Firma:
Nombre: ANlÍBAL ENRÍQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.:25202-57327 CND

Aprueba: Firma:
Nombre: FERNANDO CARO RIVERA
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula No.: 25202 - 26432

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	2 DE 10
FECHA	1/02/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES, GRUPO ORIENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACA Y CASANARE

ACTA DE RECIBO PARCIAL No 44 DE ene-25

SEGUIMIENTO No. 44 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 978-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 6404: "Belén-Sácama" / 6405: "Sácama - La Cabuya" / 6514: "Paz de Ariporo - La Cabuya" (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1038 DE 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA

PLAZO INICIAL: 102 MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 98 MESES Y 7 DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2029 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 322.790.128.920 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 20.059.840.972,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 342.849.969.892,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		AÑO 2027									AÑO 2028	
				$ Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	
					abr-27	may-27	jun-27	jul-27	ago-27	sep-27	oct-27	nov-27	dic-27	ene-28	
EXPLANACIONES (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12)	$18.861.293,89	7,227%	0,90%	% P	0,058%	0,093%	0,093%	0,117%	0,117%	0,128%	0,128%	0,152%	0,175%	0,027%	77,000%
				$ P	$152.434	$243.894	$243.894	$304.868	$304.868	$335.355	$335.355	$396.328	$457.302	$71.586	
	$10.048.961,72	3,593%	$2.528.155,35	$ E											
				% E	0,000%	0,000%	0,000%					0,000%	0,000%	0,000%	
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (13, 14, 15, 16, 17, 18)	$38.976.391,50	14,935%	5,12%	% P	0,138%	0,220%	0,220%	0,275%	0,275%	0,303%	0,303%	0,358%	0,413%	0,055%	
				$ P	$359.446	$575.114	$575.114	$718.893	$718.893	$790.782	$790.782	$934.560	$1.078.339	$168.803	
	$44.549.184,92	15,930%	$14.322.289,43	$ E											
				% E	0,012%							0,000%	0,000%	0,000%	
PAVIMENTOS ASFALTICOS (19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26)	$60.325.006,18	23,115%	11,44%	% P	0,157%	0,251%	0,251%	0,313%	0,313%	0,345%	0,345%	0,408%	0,470%	0,074%	
				$ P	$408.814	$654.102	$654.102	$817.627	$817.627	$899.390	$899.390	$1.062.915	$1.226.441	$191.987	
	$68.504.426,76	24,496%	$32.002.589,72	$ E											
				% E	0,000%	0,000%	0,000%					0,000%	0,000%	0,000%	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45)	$121.603.512,55	46,595%	3,62%	% P	0,268%	0,429%	0,429%	0,536%	0,536%	0,589%	0,589%	0,696%	0,804%	0,126%	
				$ P	$699.045	$1.118.471	$1.118.471	$1.398.089	$1.398.089	$1.537.898	$1.537.898	$1.817.516	$2.097.134	$328.286	
	$109.525.395,66	39,164%	$10.126.535,75	$ E											
				% E	0,000%	0,000%	0,000%					0,000%	0,000%	0,000%	
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54)	$3.694.013,86	1,415%	0,27%	% P	0,008%	0,013%	0,013%	0,016%	0,016%	0,018%	0,018%	0,021%	0,024%	0,004%	
				$ P	$21.269	$34.030	$34.030	$42.537	$42.537	$46.791	$46.791	$55.299	$63.806	$9.988	
	$4.052.813,86	1,449%	$753.412,75	$ E				$0							
				% E	0,000%	0,000%	0,000%					0,000%	0,000%	0,000%	
OBRAS VARIAS (55, 56, 57)	$4.546.394,68	1,742%	0,00%	% P	0,013%	0,021%	0,021%	0,027%	0,027%	0,029%	0,029%	0,035%	0,040%	0,006%	
				$ P	$34.890	$55.824	$55.824	$69.780	$69.780	$76.758	$76.758	$90.714	$104.670	$16.385	
	$2.652.444,68	0,948%	$0,00	$ E											
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	
TRANSPORTES (58, 59, 60)	$12.973.040,06	4,971%	0,30%	% P	0,037%	0,059%	0,059%	0,074%	0,074%	0,081%	0,081%	0,096%	0,111%	0,017%	
				$ P	$96.285	$154.055	$154.055	$192.569	$192.569	$211.826	$211.826	$250.340	$288.854	$45.217	
	$11.943.402,20	4,271%	$835.701,05	$ E											
				% E	0,000%	0,000%	0,000%					0,000%	0,000%	0,000%	
TOTAL OTROS ITEMS NO PREVISTOS (61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 y 103)	$0,00	0,000%	4,76%	% P											
				$ P											
	$28.379.561,81	10,148%	$13.306.058,96	$ E											
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	64,330%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 260.979.652,72	100,00%	28,31%												
AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE	$ 0,12		-$ 0,26												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 279.656.191,73**	107,16%	$73.874.742,75												

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA (AÑO)	%	**0,68%**	**1,09%**	**1,09%**	**1,36%**	**1,36%**	**1,49%**	**1,49%**	**1,77%**	**2,04%**	**0,32%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$1.772.182**	**$2.835.491**	**$2.835.491**	**$3.544.364**	**$3.544.364**	**$3.898.800**	**$3.898.800**	**$4.607.673**	**$5.316.545**	**$832.253**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**65,00%**	**66,09%**	**67,18%**	**68,54%**	**69,89%**	**71,39%**	**72,88%**	**74,65%**	**76,68%**	**77,00%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$ 169.648.291**	**$ 172.483.782**	**$ 175.319.273**	**$ 178.863.636**	**$ 182.408.000**	**$ 186.306.800**	**$ 190.205.600**	**$ 194.813.273**	**$ 200.129.818**	**$ 200.962.071**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA (AÑO)	%	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$31.071.278.494,000 / $29.447.914.451,000	$ 13.059.502.879,00	3,8091%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)	$990.000.000,000 / $990.000.000,000	$ -	0,0000%
VALOR DEL IVA (OBRA) (E) (19% SOBRE UTILIDAD)	$2.141.452.959,000 / $2.266.072.314,000	$ 635.288.718,00	0,1853%
VALOR BASICO DE LA REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (G)	$1.038.890.000,000 / $3.460.777.938,000	$ 3.193.244.248,00	0,9314%
VALOR DEL IVA (19%) DE LA REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (H)	$197.389.100,000 / $657.547.808,000	$ 606.716.408,00	0,1770%
GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA E IVA 19%) (J)	$25.739.616.633,000 / $25.739.616.633,000	$ 335.365.771,00	0,0978%
VALOR DE LA PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA DEL 19%) (K)	$631.849.018,000 / $631.849.018,000	$ 6.766.453,00	0,0020%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B) / VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$61.810.476.204,000 / $63.193.778.162,000	$ 17.836.884.477,00	5,2025%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$322.790.128.920,000**	**$ 91.711.627.226,00**	**26,75%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$342.849.969.892,000**		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el período real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES			
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMACIÓN	REPROGRAMACIÓN	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor	$ Valor
CURVAS			

OBSERVACIONES:

POR PARTE DEL CONTRATISTA: Se procede con la Reprogramación No. 10 del programa de inversiones, teniendo en cuenta el balance de cantidades realizado en el Acta Modificatoria de Cantidades de Obra No. 12, con fecha del 29 de noviembre de 2024 presentado con el comunicado CVN-0978-1006-2024.
El contratista aclara que este es un programa dinámico que se puede ir ajustando según las condiciones de la obra.

Aprueba: Firma:
Nombre: ANÍBAL ENRÍQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.:25202-57327 CND

Aprueba: Firma:
Nombre: FERNANDO CARO RIVERA
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula No.: 25202 - 26432

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES, GRUPO ORIENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACA Y CASANARE

ACTA DE RECIBO PARCIAL No 44 DE ene-25

SEGUIMIENTO No. 44 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 978-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 6404: "Belén-Sácama" / 6405: "Sácama - La Cabuya" / 6514: "Paz de Ariporo - La Cabuya" (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1038 DE 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA

PLAZO INICIAL: 102 MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 98 MESES Y 7 DIAS (En meses según las prorrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2029 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 322.790.128.920** (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 20.059.840.972,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 342.849.969.892,00**

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA		AÑO 2028										
				% Programado	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	
				$ Valor programado											
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor Ejecutado	feb-28	mar-28	abr-28	may-28	jun-28	jul-28	ago-28	sep-28	oct-28	nov-28	
				% Ejecutado											
EXPLANACIONES (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12)	$18.861.293,89	7,227%	0,90%	% P	0,027%	0,069%	0,069%	0,110%	0,110%	0,137%	0,137%	0,151%	0,151%	0,178%	90,240%
				$ P	$71.586	$178.965	$178.965	$286.345	$286.345	$357.931	$357.931	$393.724	$393.724	$465.310	
	$10.048.961,72	3,593%	$2.528.155,35	$ E											
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%					0,000%	
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (13, 14, 15, 16, 17, 18)	$38.976.391,50	14,935%	5,12%	% P	0,065%	0,162%	0,162%	0,259%	0,259%	0,323%	0,323%	0,356%	0,356%	0,420%	
				$ P	$168.803	$422.008	$422.008	$675.213	$675.213	$844.017	$844.017	$928.418	$928.418	$1.097.222	
	$44.549.184,92	15,930%	$14.322.289,43	$ E											
				% E	0,000%	0,000%	0,012%							0,000%	
PAVIMENTOS ASFALTICOS (19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26)	$60.325.006,18	23,115%	11,44%	% P	0,074%	0,184%	0,184%	0,294%	0,294%	0,368%	0,368%	0,405%	0,405%	0,478%	
				$ P	$191.987	$479.968	$479.968	$767.949	$767.949	$959.936	$959.936	$1.055.930	$1.055.930	$1.247.917	
	$68.504.426,76	24,496%	$32.002.589,72	$ E											
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%					0,000%	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45)	$121.603.512,55	46,595%	3,62%	% P	0,126%	0,314%	0,314%	0,503%	0,503%	0,629%	0,629%	0,692%	0,692%	0,818%	
				$ P	$328.286	$820.714	$820.714	$1.313.143	$1.313.143	$1.641.428	$1.641.428	$1.805.571	$1.805.571	$2.133.857	
	$109.525.395,66	39,164%	$10.126.535,75	$ E											
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%					0,000%	
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54)	$3.694.013,86	1,415%	0,27%	% P	0,004%	0,010%	0,010%	0,015%	0,015%	0,019%	0,019%	0,021%	0,021%	0,025%	
				$ P	$9.988	$24.971	$24.971	$39.953	$39.953	$49.941	$49.941	$54.935	$54.935	$64.923	
	$4.052.813,86	1,449%	$753.412,75	$ E						$0	$0				
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%					0,000%	
OBRAS VARIAS (55, 56, 57)	$4.546.394,68	1,742%	0,00%	% P	0,006%	0,016%	0,016%	0,025%	0,025%	0,031%	0,031%	0,035%	0,035%	0,041%	
				$ P	$16.385	$40.963	$40.963	$65.540	$65.540	$81.925	$81.925	$90.118	$90.118	$106.503	
	$2.652.444,68	0,948%	$0,00	$ E											
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	
TRANSPORTES (58, 59, 60)	$12.973.040,06	4,971%	0,30%	% P	0,017%	0,043%	0,043%	0,069%	0,069%	0,087%	0,087%	0,095%	0,095%	0,113%	
				$ P	$45.217	$113.043	$113.043	$180.869	$180.869	$226.086	$226.086	$248.695	$248.695	$293.912	
	$11.943.402,20	4,271%	$835.701,05	$ E											
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%					0,000%	
TOTAL OTROS ITEMS NO PREVISTOS (61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 y 103)	$0,00	0,000%	4,76%	% P											
				$ P											
	$28.379.561,81	10,148%	$13.306.058,96	$ E											
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	77,000%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 260.979.652,72	100,00%	28,31%												
AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE	$ 0,12		-$ 0,26												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 279.656.191,73**	107,16%	$73.874.742,75												

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA (AÑO)	%	**0,32%**	**0,80%**	**0,80%**	**1,28%**	**1,28%**	**1,59%**	**1,59%**	**1,75%**	**1,75%**	**2,07%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$832.253**	**$2.080.632**	**$2.080.632**	**$3.329.011**	**$3.329.011**	**$4.161.264**	**$4.161.264**	**$4.577.390**	**$4.577.390**	**$5.409.643**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**77,32%**	**78,12%**	**78,92%**	**80,19%**	**81,47%**	**83,06%**	**84,66%**	**86,41%**	**88,16%**	**90,24%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$ 201.794.324**	**$ 203.874.955**	**$ 205.955.587**	**$ 209.284.598**	**$ 212.613.609**	**$ 216.774.873**	**$ 220.936.137**	**$ 225.513.527**	**$ 230.090.917**	**$ 235.500.560**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA (AÑO)	%	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$31.071.278.494,000 / $29.447.914.451,000	$ 13.059.502.879,00	3,8091%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)	$990.000.000,000 / $990.000.000,000	$ -	0,0000%
VALOR DEL IVA (OBRA) (E) (19% SOBRE UTILIDAD)	$2.141.452.959,000 / $2.266.072.314,000	$ 635.288.718,00	0,1853%
VALOR BASICO DE LA REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (G)	$1.038.890.000,000 / $3.460.777.938,000	$ 3.193.244.248,00	0,9314%
VALOR DEL IVA (19%) DE LA REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (H)	$197.389.100,000 / $657.547.808,000	$ 606.716.408,00	0,1770%
GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA E IVA 19%) (J)	$25.739.616.633,000 / $25.739.616.633,000	$ 335.365.771,00	0,0978%
VALOR DE LA PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA DEL 19%) (K)	$631.849.018,000 / $631.849.018,000	$ 6.766.453,00	0,0020%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$61.810.476.204,000	$ 17.836.884.477,00	5,2025%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$63.193.778.162,000		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$322.790.128.920,000**	**$ 91.711.627.226,00**	**26,75%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$342.849.969.892,000**		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el período real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES			
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMACIÓN	REPROGRAMACIÓN	EJECOTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor	$ Valor
CURVAS			

OBSERVACIONES:

POR PARTE DEL CONTRATISTA: Se procede con la Reprogramación No. 10 del programa de inversiones, teniendo en cuenta el balance de cantidades realizado en el Acta Modificatoria de Cantidades de Obra No. 12, con fecha del 29 de noviembre de 2024 presentado con el comunicado CVN-0978-1006-2024.
El contratista aclara que este es un programa dinámico que se puede ir ajustando según las condiciones de la obra.

Aprueba: Firma:
Nombre: ANÍBAL ENRÍQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.:25202-57327 CND

Aprueba: Firma:
Nombre: FERNANDO CARO RIVERA
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula No.: 25202 - 26432

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 10
		FECHA	1/02/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES, GRUPO ORIENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACA Y CASANARE

ACTA DE RECIBO PARCIAL No 44 DE ene-25

SEGUIMIENTO No. 44 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 978-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 6404: "Belén-Sácama" / 6405: "Sácama - La Cabuya" / 6514: "Paz de Ariporo - La Cabuya" (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1038 DE 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA

PLAZO INICIAL: 102 MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 98 MESES Y 7 DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2029 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 322.790.128.920 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 20.059.840.972,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 342.849.969.892,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA		AÑO 2028	AÑO 2029								
				% Programado										
				$ Valor programado	91	92	93	94	95	96	97	98	99	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor Ejecutado % Ejecutado	dic-28	ene-29	feb-29	mar-29	abr-29	may-29	jun-29	jul-29	ago-29	
EXPLANACIONES (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12)	$18.861.293,89	7,227%	0,90%	% P	0,206%	0,037%	0,075%	0,087%	0,137%	0,150%	0,237%	0,250%	0,275%	107,16%
				$ P	$536.896	$97.834	$195.669	$228.280	$358.726	$391.338	$619.618	$652.229	$717.452	
	$10.048.961,72	3,593%	$2.528.155,35	$ E										
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%					
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (13, 14, 15, 16, 17, 18)	$38.976.391,50	14,935%	5,12%	% P	0,485%	0,088%	0,177%	0,206%	0,324%	0,354%	0,560%	0,589%	0,648%	
				$ P	$1.266.025	$230.698	$461.396	$538.295	$845.892	$922.792	$1.461.087	$1.537.986	$1.691.784	
	$44.549.184,92	15,930%	$14.322.289,43	$ E										
				% E	0,000%	0,000%	0,012%							
PAVIMENTOS ASFALTICOS (19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26)	$60.325.006,18	23,115%	11,44%	% P	0,552%	0,101%	0,201%	0,235%	0,369%	0,402%	0,637%	0,670%	0,737%	
				$ P	$1.439.904	$262.382	$524.765	$612.226	$962.069	$1.049.530	$1.661.756	$1.749.217	$1.924.138	
	$68.504.426,76	24,496%	$32.002.589,72	$ E										
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%					
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45)	$121.603.512,55	46,595%	3,62%	% P	0,943%	0,172%	0,344%	0,401%	0,630%	0,688%	1,089%	1,146%	1,261%	
				$ P	$2.462.142	$448.657	$897.314	$1.046.866	$1.645.076	$1.794.628	$2.841.485	$2.991.047	$3.290.152	
	$109.525.395,66	39,164%	$10.126.535,75	$ E										
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%					
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54)	$3.694.013,86	1,415%	0,27%	% P	0,029%	0,005%	0,010%	0,012%	0,019%	0,021%	0,033%	0,035%	0,038%	
				$ P	$74.912	$13.651	$27.301	$31.851	$50.052	$54.602	$86.454	$91.004	$100.104	
	$4.052.813,86	1,449%	$753.412,75	$ E						$0				
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%					
OBRAS VARIAS (55, 56, 57)	$4.546.394,68	1,742%	0,00%	% P	0,047%	0,009%	0,017%	0,020%	0,031%	0,034%	0,054%	0,057%	0,063%	
				$ P	$122.888	$22.393	$44.786	$52.250	$82.107	$89.571	$141.821	$149.286	$164.214	
	$2.652.444,68	0,948%	$0,00	$ E										
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	
TRANSPORTES (58, 59, 60)	$12.973.040,06	4,971%	0,30%	% P	0,130%	0,024%	0,047%	0,055%	0,087%	0,095%	0,150%	0,158%	0,174%	
				$ P	$339.129	$61.797	$123.594	$144.193	$226.589	$247.187	$391.380	$411.979	$453.177	
	$11.943.402,20	4,271%	$835.701,05	$ E										
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%					
TOTAL OTROS ITEMS NO PREVISTOS (61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 y 103)	$0,00	0,000%	4,76%	% P										
				$ P										
	$28.379.561,81	10,148%	$13.306.058,96	$ E										
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	90,240%
					90	91	92	93	94	95	96	97	98	99
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 260.979.652,72	100,00%	28,31%											
AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE	$ 0,12		-$ 0,26											
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 279.656.191,73**	107,16%	$73.874.742,75											

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA (AÑO)	%	**2,39%**	**0,44%**	**0,87%**	**1,02%**	**1,60%**	**1,74%**	**2,76%**	**2,91%**	**3,20%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$6.241.896**	**$1.137.412**	**$2.274.824**	**$2.653.962**	**$4.170.511**	**$4.549.648**	**$7.203.610**	**$7.582.747**	**$8.341.022**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**92,63%**	**93,06%**	**93,94%**	**94,95%**	**96,55%**	**98,29%**	**101,05%**	**103,96%**	**107,16%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$ 241.742.455**	**$ 242.879.868**	**$ 245.154.692**	**$ 247.808.653**	**$ 251.979.164**	**$ 256.528.813**	**$ 263.732.422**	**$ 271.315.170**	**$ 279.656.192**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA (AÑO)	%	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$31.071.278.494,000 $29.447.914.451,000	$ 13.059.502.879,00	3,8091%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)	$990.000.000,000 $990.000.000,000	$ -	0,0000%
VALOR DEL IVA (OBRA) (E) (19% SOBRE UTILIDAD)	$2.141.452.959,000 $2.266.072.314,000	$ 635.288.718,00	0,1853%
VALOR BASICO DE LA REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (G)	$1.038.890.000,000 $3.460.777.938,000	$ 3.193.244.248,00	0,9314%
VALOR DEL IVA (19%) DE LA REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (H)	$197.389.100,000 $657.547.808,000	$ 606.716.408,00	0,1770%
GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA E IVA 19%) (J)	$25.739.616.633,000 $25.739.616.633,000	$ 335.365.771,00	0,0978%
VALOR DE LA PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA DEL 19%) (K)	$631.849.018,000 $631.849.018,000	$ 6.766.453,00	0,0020%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$61.810.476.204,000	$ 17.836.884.477,00	5,2025%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$63.193.778.162,000		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$322.790.128.920,000**	**$ 91.711.627.226,00**	**26,75%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$342.849.969.892,000**		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el período real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES			
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMACIÓN	REPROGRAMACIÓN	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor	$ Valor
CURVAS			

OBSERVACIONES:

POR PARTE DEL CONTRATISTA: Se procede con la Reprogramación No. 10 del programa de inversiones, teniendo en cuenta el balance de cantidades realizado en el Acta Modificatoria de Cantidades de Obra No. 12, con fecha del 29 de noviembre de 2024 presentado con el comunicado CVN-0978-1006-2024.
El contratista aclara que este es un programa dinámico que se puede ir ajustando según las condiciones de la obra.

Aprueba: Firma:
Nombre: ANÍBAL ENRÍQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.:25202-57327 CND

Aprueba: Firma:
Nombre: FERNANDO CARO RIVERA
Representante legal o apoderado del Interventor GT
Matrícula No.: 25202 - 26432

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Uptc® Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC ORDENANZA 030 DE 2005	ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD MULTICAMPUS RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN / 6 AÑOS

Número Estampilla	7673324		
Contratista:	CONSORCIO VIAS NACIONALES		
C.C. / Nit / Identificación Contratista:	901474028		
Objeto del Contrato	ACTA 44 PROVISIONAL- OBRAS DE CONSTRUCCIONPARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL,SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DELOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CARUYA		
Contratante:	INVIAS - 800215807 /NIT		
	Numero de Contrato: 978	Vigencia:	2021
	Base Gravable $1.283.477.458	Tarifa: 1% del valor neto de cada contrato	$ 12,835,000.00
	Fecha de Pago: 07/02/2025		

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

CÓDIGO	MASPS-MINT-IN-1-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 1 (Día) 2 (Mes) 2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES GRUPO ORIENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ Y CASANARE

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 44
(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO _____ (Indicar con una X)

Resolución N° _____ (Indicar N° de Resolución día, mes y año)

NO LICENCIADO (PMA o PAGA) X

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES

OBJETO MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4

N° CONTRATO 0978 DE 2021 **FECHA DE INICIO** 23/06/2021 **FECHA DE TERMINACION** 31/08/2029

Valor Inicial Contrato Obra	$	322,790,128,920.00
Valor Adicional No.	$	20,059,840,972.00
Valor Adicional No.	$	-
Valor Adicional No.	$	-
Valor Total	$	342,849,969,892.00

Valor Provisión Ambiental Inicial	$	-
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Total Provisión Ambiental	$	-
Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado	$	-
Valor Provisión Ambiental por ejecutar	$	-

AIU %	30%
IVA %	0.05

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA

OBJETO INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA- SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" - MODULO 5

N° CONTRATO 1038 DE 2021 **FECHA DE INICIO** 23/06/2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/08/2029

Valor Inicial Contrato Interventoría	$	27,399,730,108.00
Valor Adicional No.	$	-
Valor Adicional No.	$	-
Valor Adicional No.	$	-
Valor Total	$	27,399,730,108.00

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

CODIGO / FICHA	NOMBRE DEL INSUMO O ITEM			MEDIDA A EJECUTAR					CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSION AMBIENTAL Nº ____ Fecha _____									EJECUTADO EN EL MES							ACUMULADO EJECUTADO		VALOR POR EJECUTAR		REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	CONTROL	PREVENCIÓN	MITIGACIÓN	CORRECCIÓN	COMPENSACIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO BASICO (sin IVA) ($)	VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A			VALOR TOTAL IVA CON CARGO A:			TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:			CANTIDAD	VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO			IVA	TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:			CANTIDAD	VALORTOTAL ACUMULADO ($)	CANTIDAD	VALORTOTAL ($)		
												VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO		VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO		VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO						
											$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00			$ 0.00				$ 0.00												
											$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00	0			$ 0.00				$ 0.00										
											$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00			$ 0.00			$ 0.00				$ 0.00									
										SUBTOTAL		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	**$ 0.00**	$ 0.00	0	$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00	**0**	$ 0.00									

VALOR REEMBOLSO DE GASTOS	$ 0.00
VALOR BASICO GESTION	$ 0.00
VALOR TOTAL BASICO PRE-ACTA	$ 0.00
VALOR IVA	$ 0.00
VALOR TOTAL PRE-ACTA GESTION AMBIENTAL	$ 0.00

NOTAS

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversion Ambiental son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualemente.
2. A partir del Plan de Inversión Ambiental No. 2 la aprobación de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoria.
3. La aprobacion del Plan de Inversión Ambiental esta sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Ambiental así como las obligaciones.
4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningun motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente.

Firma
Nombre: ANIBAL OJEDA CARRAZO
Representante Legal o Apoderado
Contratista: CONSORCIO VIAS NACIONALES
Matrícula No. : 25202-57327

Firma
Nombre: FERNANDO CARO RIVERA
Representante Legal o Apoderado
Interventoría: CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA
Matrícula No. : 25202 - 26432

GT

Vo. Bo. Firma
Nombre : DEISY JOHANA DIAZ DIAZ
Profesional Ambiental
Contratista de Obra
Matrícula No. : 25238-325539CND

Vo. Bo. Firma
Nombre : LUZ AMELIA MESA MESA
Profesional Ambiental
Interventoría: CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA
Matrícula No. : 68238197391STD

Original: Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Subdirección de Sostenibilidad, Unidad Ejecutora, Dirección Territorial, Contratista e Interventor.

PREACTA DE INVERSION SOCIAL

(MASPS-MN1-IN-1-FR-6)

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	44	FECHA	31	01	2025
						(Día / Mes / Año)	

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	Subdirección Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente	OBJETO DEL CONTRATO	Contrato 879 de 2022: Mejoramiento, mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible del corredor Ruta de Los Libertadores (Belén – Socha – Sácama - La Cabuya - Paz de Ariporo) en los departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "Vías para la Legalidad y la Reactivación Visión 2030" – Módulo 4.	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	978/2021
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Boyacá y Casanare			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	1038/2021

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

	NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No.	3									INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
							FECHA	25	JUNIO	2024										
	PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL($)	EMB	ÍTEM	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	
1	Información y Divulgación	Piezas de comunicación -volantes	UND	30.000	$ 190	$ 5.700.000	X		$ 5.869.575	1000	$ 158.000	2,5%	$ 4.701	$ 162.701	11.200	$ 1.571.244	$ 4.298.331	FICHA 1. Volantes 1000, unidades con un valor por unidad de $158, para un total de $158.000.
		Piezas de comunicación -Afiches	UND	1.000	$ 4.500	$ 4.500.000	X		$ 4.633.875			2,5%	$ -	$ -	0,00	$ -	$ 4.633.875	
		Piezas de comunicación (plegables, folletos, otros)	UND	1.000	$ 4.500	$ 4.500.000	X		$ 4.633.875	1000	$ 130.000	2,5%	$ 3.867,50	$ 133.867,50	1.000	$ 133.867,50	$ 4.500.008	FICHA 2. Tarjetas de información Ubicación (SAU Casanare y Boyacá) y atención virtual. 1000 unidades con un valor por unidad de $130 y un valor total de $130.000.
		Cartillas de Cierre	UND	10.000	$ 20.000	$ 200.000.000	X		$ 205.950.000	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0,00	$ -	$ 205.950.000	
		Cuñas radiales	UND	8.200	$ 10.000	$ 82.000.000	X		$ 84.439.500	0		2,5%	$ -	$ -	449	$ 4.318.772	$ 80.120.729	
		Horas de perifoneo	UND	400	$ 25.000	$ 10.000.000	X		$ 10.297.500	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	14	$ 360.413	$ 9.937.088	
		Pasacalles - Pendones	UND	500	$ 184.000	$ 92.000.000	X		$ 94.737.000	0		2,5%	$ -	$ -	25	$ 8.608.298	$ 86.128.702	
		Logística Reuniones Extraordinarias	UND	91	$ 2.500.000	$ 227.500.000	X		$ 234.268.125	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	3	$ 3.199.227	$ 231.068.898	
		Refrigerios	UND	10.000	$ 8.000	$ 80.000.000	X		$ 82.380.000	1130	$ 6.202.000	2,5%	$ 184.510	$ 6.386.510	4.295	$ 30.533.385	$ 51.846.615	FICHA 3. Refrigerios campaña cultura vial Casanare (250), unidades a un valor de $1.740 para un total de $435.000. FICHA 4. Refrigerios campaña cultura vial Boyacá (250), Costo unidad $2.908 para un Total $727.000. FICHA 5. Refrigerios Taller pedagogico de sostenibilidad Instituciones Educativas Hatocorozal (289) unidades, Costo unidad $8.000 para un Total $2.312.000 FICHA 6 Refrigerios Taller pedagogico de sostenibilidad Instituciones Educativas en Paz de Ariporo (341) unidades, costo por unidad $8.000 para unTotal $2.728.000. Total valor de refrigerios $6.202.000.
2	Cultura Vial y Participacion Comunitaria	KIT temático para estudiantes	UND	2.000	$ 63.000	$ 126.000.000	X		$ 129.748.500	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	120,00	$ 617.851	$ 129.130.649	
		KIT temático vial	UND	10	$ 2.800.000	$ 28.000.000	X		$ 28.833.000	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0,00	$ -	$ 28.833.000	
		Diseño de cartilla de Cultura vial	UND	1	$ 400.000	$ 400.000	X		$ 411.900	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0,00	$ -	$ 411.900	
		Impresión de Cartilla Cultura Vial	UND	5.000	$ 20.000	$ 100.000.000	X		$ 102.975.000	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0,00	$ -	$ 102.975.000	
		Capacitaciones y/o talleres especializados	UND	32	$ 4.000.000	$ 128.000.000	X		$ 131.808.000	6	$ 25.542.000	2,5%	$ 759.875	$ 26.301.875	10	$ 45.619.985	$ 86.188.016	FICHA 7. (6) Talleres Pedagogicos de sostenibilidad dirigidos a la población estudiantes de las Instituciones Educativas Luis Hernandez Vargas en el municipio de Hato Corozal y Juan Jose Rendon en el municipio de Paz de Ariporo, costo por taller $4.257.000, para un total de $25.542.000. *NOTA:* *El costo de los talleres esta por encima del presupuestado, debido a que la oferta comercial para Casanare es más alta al costo proyectado.*
		Mural Representativo INVIAS	UND	8	$ 2.000.000	$ 16.000.000	X		$ 16.476.000	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0,00	$ -	$ 16.476.000	
		Souvenirs (Gorras, ponchos, bayetillas, entre otros objetos segun actividad)	UND	1500	$ 30.000	$ 45.000.000	X		$ 46.338.750	500	$ 1.975.000	2,5%	$ 58.756	$ 2.033.756	841	$ 12.144.665,6	$ 34.194.084	FICHA 8. Se entregan (250) bolsas para vehículo estampada (Chigüiro y logos de entidades) para campaña vial Paz de Ariporo Casanare valor unidad $ 3.950 y un valor total de $987.500. FICHA 9. Se entregan (250) bolsas para vehículo estampada (Frailejón y logos de entidades) para campañas de Cultura Vial en el sector el Boche municipio de Socha y en la vereda de Comeza del municipio de Socotá Boyacá respectivamente, valor unidad $3.950 y un valor total de $987.500. Total de $1.975.000
3	Obras de partcipacion comuitaria	OPC- Obras de participación comunitaria	UND	1	$ 1.974.850.000	$ 1.974.850.000	X		$ 2.024.221.250	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0,00	$ -	$ 2.024.221.250	

9

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	44	FECHA	31	01	2025
						(Día / Mes / Año)	

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	Subdirección Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente	OBJETO DEL CONTRATO	Contrato 879 de 2022: Mejoramiento, mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible del corredor Ruta de Los Libertadores (Belén – Socha – Sácama - La Cabuya - Paz de Ariporo) en los departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "Vías para la Legalidad y la Reactivación Visión 2030" – Módulo 4.	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	978/2021
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Boyacá y Casanare			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	1038/2021

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No.	3			INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
						FECHA	25	JUNIO	2024									
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOPREDIAL($)	REEMB	ÍTEM	VALOR GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	
Gestión socio predial	Compensaciones sociales Factor por Unidad Mínima de Vivienda (UMV)	UND	27	$ 117.000.000	$ 3.159.000.000	x		$ 3.252.980.250	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0,00	$ -	$ 3.252.980.250	
	Compensaciones sociales Factor por Unidad Mínima Económica (UME).	UND	3	$ 19.500.000	$ 58.500.000	x		$ 60.240.375	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0,00	$ -	$ 60.240.375	
	Factor de arrendamiento y/o almacenamiento provisional (arrendamiento)	UND	15	$ 2.600.000	$ 39.000.000	x		$ 40.160.250	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0,00	$ -	$ 40.160.250	
	Compensaciones sociales Factor por Traslado (TDO)	UND	15	$ 2.600.000	$ 39.000.000	x		$ 40.160.250	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0,00	$ -	$ 40.160.250	
	factor por Hacinamiento (HTO)	UND	15	$ 3.900.000	$ 58.500.000	x		$ 60.240.375	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0,00	$ -	$ 60.240.375	

4. RESUMEN

A	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS	$ 34.007.000,00	G	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ÍTEM NO PREVISTO	$ -
B	VALOR BÁSICO PRE-ACTA	$ 34.007.000,00	H	OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA	$ 850.175
C	VALOR IVA MENSUAL	$ 161.533,25	I	VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL	$ 35.018.708
D	VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL	$ 35.018.708,25	J	VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL	$ -
E	RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR)	$ 7.602.247.793,00	K	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$ 107.107.707
F	VALOR PROVISIÓN SOCIAL INCLUIDO IVA	$ 7.709.355.500,00	L	EJECUCIÓN DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%)	1,39%

5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

6. FIRMAS

Firma

Nombre: **Aníbal Ojeda Carriazo**

Representante Legal Contratista **Apoderado**

Matrícula Profesional No.: 25202-57327-CND

Firma

Nombre: **Diana Carolina Acosta Gongora**

Profesional Social Contratista

Matrícula Profesional No.: **121187**

Firma

Nombre: **Fernando Caro Rivera**

Representante Legal Interventoría **Apoderado**

Matrícula Profesional No.: **25202 - 26432**

Juana María Quintero Avella

Profesional Social Interventoría

Matrícula Profesional No.: N/A para Comunicador Social

NOTAS:

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.
2. Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad.
3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por Ítem no Previsto.
4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente.
5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Contratista, Interventor, Subdirección Sostenibilidad.

Fecha: 2025-01-30 17:00:25
Radicado: 2025S-VBOG-005102
Destino: EDWIN JAVIER MENESES HERNANDEZ
Anexos: 0

Jairo Fernando Arguello Urrego,SUBDIRECTOR DE S
2025-01-30T17:00:29-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanee el Codigo QR Para Validarlo

Al contestar cite este radicado: 2025S-VBOG-005102
Fecha: 2025-01-30 17:00:25

SEÑOR(A):
EDWIN JAVIER MENESES HERNANDEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA
CLL 95 N 15 - 47 PISO 6
interventoriascolombia@ryu.com.co
BOGOTÁ, D.C., BOGOTA

ASUNTO: Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-009171PREACTA social 44. ruta libertadores. Boyacá y Casanare.

Respetado ingeniero Meneses:

En atención a su radicado 2025E-VUVRAZ-009171, mediante el cual radica, revisada y aprobada la preacta del componente social No. 44, en el marco de la ejecución del proyecto vial Corredor Ruta de Los Libertadores, departamentos de Boyacá y Casanare, esta dependencia se permite manifestar lo siguiente:

Las actividades ejecutadas y sus valores fueron: Piezas de comunicación -volantes $162.701, Piezas de comunicación (plegables, folletos, otros) $133.867,5, Refrigerios $6.386.510, Capacitaciones y/o talleres especializados $26.301.875, campaña de cultura vial (Souvenirs, Gorras, ponchos, bayetillas, entre otros objetos según actividad) $2.033.756.

El plan de inversión social vigente es la versión no. 3, por un valor de $7.709.355.500.

Las actividades reconocidas por interventoría se encuentran incorporadas en el documento PAGA y en el plan de inversión social vigente versión no. 3.

La interventoría revisa y aprueba los respectivos soportes, los cuales adjunta a la presente preacta social No. 44, dado su responsabilidad con el contratista de las cantidades y valores.

El valor total de la preacta 44 es de: $ 35.018.709.

INVIAS
Jairo Fernando Arguello Urrego,SUBDIRECTOR DE S
2025-01-30T17:00:29-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanee el Codigo QR Para Validarlo

Bajo lo expresado anteriormente, esta subdirección no objeta la aprobación brindada por interventoría de esta preacta social (No. 44).

Se requiere que la interventoría, continúe con la verificación y control al cumplimiento de la gestión social, garantizando la indemnidad al INVIAS.

Cordialmente,

JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO
SUBDIRECTOR DE SOSTENIBILIDAD

Proyectado por: MARTIN EMILIO RODRIGUEZ NAVARRETE
Revisado por:
Aprobado por:

Copia Interna a: GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS GODOY. (1120100), GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO (1000005), HENRY ANTONIO MELENDEZ ORTIZ (1000008)
Copia Externa a:

INVIAS

Jairo Fernando Arguello Urrego,SUBDIRECTOR DE S
2025-01-30T17:00:29-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanee el Codigo QR Para Validarlo

REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES

C.1468/RL3106/25/7.13
Belén, 28 de enero de 2025

Señores:
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVIAS
Atn.: Ing. Jairo Fernando Argüello Urrego
Sub Director de Sostenibilidad
atencionciudadano@invias.gov.co
Bogotá D.C.

Ref.: Contrato Interventoría 1038 de 2021
Corredor Ruta de Los Libertadores
Pre acta Social 44.

Respetados Señores:

En cumplimiento a las obligaciones contractuales de la Interventoría del proyecto y las establecidas en el MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA 2022 - INSTRUCTIVO PARA EL SEGUIMIENTO Y BALANCE DE LA GESTIÓN SOCIAL DEL CONTRATO DE OBRA - MASPS-MN1-IN-3 -numeral X. PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL – SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO FORMATO MASPS-MN1-IN-3-FR-6**:**

> *(…)*
> *El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades, cantidades y precios responsabilidad del Contratista, mediante la firma del formato MASPS-MN1-IN-3-FR-6 Pre-acta Mensual de Inversión Social - Seguimiento Final a la Inversión Social del Proyecto.*
>
> *Una vez revisadas y aprobadas las pre-actas por la Interventoría, ésta debe radicarlas con sus documentos soporte ante la Subdirección de Sostenibilidad para su revisión y concepto de no objeción, según su competencia, con una antelación mínima de diez (10) días a la fecha de corte del Acta de Recibo Parcial de Obra*
> *(…)*

Esta Interventoría remite la pre acta social N°44 correspondiente a las actividades ejecutadas durante el desarrollo del proyecto, desde el 1 de octubre al 30 noviembre de 2024, esta pre-acta se revisó y aprobó, teniendo en cuenta el Plan de Inversión Social en versiones 3.

A continuación, se listan los Ítems aprobados y sus novedades:

Proyecto	Actividad	Cant.	Valor Básico	Valor Otros 2.5%	19% IVA del 2.5%	Total	Observación
GESTION SOCIAL - ACTIVIDADES PAGA							
Información y Divulgación	Piezas de comunicación - volantes	1000	$ 158.000	$ 3.950	$ 751	$162.701	FICHA 1. Volantes 1000, unidades con un valor por unidad de $158, para un total de $158.000.
Información y Divulgación	Piezas de comunicación (plegables, folletos, otros)	1000	$130.000	$3.250	$617,5	$133.867,5	FICHA 2. Tarjetas de información Ubicación (SAU Casanare y Boyacá) y atención virtual. 1000 unidades con un valor por unidad de $130 y un valor total de $130.000.
Información y Divulgación	Refrigerios	1130	$6.202.000	$155.050	$29.460	$6.386.510	FICHA 3. Refrigerios campaña cultura vial Casanare (250), unidades a un valor de $1.740 para un total de $435.000. FICHA 4. Refrigerios campaña cultura vial Boyacá (250), Costo unidad $2.908 para un Total $727.000. FICHA 5. Refrigerios Taller pedagógico de sostenibilidad Instituciones Educativas Hato Corozal (289) unidades, Costo unidad $8.000 para un Total $2.312.000 FICHA 6 Refrigerios Taller pedagógico de sostenibilidad Instituciones Educativas en Paz de Ariporo (341) unidades, costo por unidad $8.000 para un Total $2.728.000. Total, valor de refrigerios $6.202.000.
Cultura Vial y Participación Comunitaria	Capacitaciones y/o talleres especializados	6	$ 25.542.000	$638.550	$121.325	$26.301.875	FICHA 7. (6) Talleres Pedagógicos de sostenibilidad dirigidos a la población estudiantes de las Instituciones Educativas Luis Hernández Vargas en el municipio de Hato Corozal y Juan José Rendon en el municipio de Paz de Ariporo, costo por taller $4.257.000, para un total de $25.542.000. NOTA: El costo de los talleres está por encima del presupuestado, debido a que la oferta comercial en Casanare es más alta al costo proyectado.

Proyecto	Actividad	Cant.	Valor Básico	Valor Otros 2.5%	19% IVA del 2.5%	Total	Observación
Cultura Vial y Participación Comunitaria	Souvenirs (Gorras, ponchos, bayetillas, entre otros objetos según actividad).	1500	$1.975.000	$ 49.375	$ 9.381	$2.033.756	FICHA 6. Entrega de 300 gorras acrílicas para niño $28.700 c/u y 20 gorras para adultos $29.000 c/u de la comunidad educativa de la Institución Técnica Jairo Albarracín Barrera de Comeza Hoyada - Municipio de Socotá.

Las actividades descritas en la pre-acta social 44, se reconocen por reembolso de gastos, los cuales están soportados a través de facturas, cuentas de cobro y registros de las actividades, soportes que van en carpeta de anexos, adjunta a esta comunicación.

Cordialmente,

CONSORCIO INTERVENTORÍAS COLOMBIA

EDWIN JAVIER MENESES HERNÁNDEZ
Director de Interventoría

Anexo: Carpeta con lo mencionado

Copia: Ing. Jaime Nilton Ramírez Gutiérrez, Gestor Técnico de Proyecto - INVIAS Bogotá
Dr. Martín Emilio Rodríguez , Gestor Social - S.S. - INVIAS Bogotá

Elaboró: JQA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL**	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	31/01/2025
	(Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO ORIENTE	2. DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CASANARE Y BOYACÁ
3. AÑO: 2025	MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	4. FECHA DE ELABORACIÓN	20/01/2025
5. LOCALIZACIÓN: RUTA:	NACIONAL 64 (SECTOR BELÉN - SÁCAMA - CRUCE RUTA 45 LA CABUYA) NACIONAL 65 (SECTOR PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA)	TRAMO:	04 (SECTOR BELÉN - SÁCAMA) 05 (SECTOR SÁCAMA - CRUCE RUTA 45 LA CABUYA) 14 (SECTOR PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA)
6. CONTRATO DE OBRA No:	978 DE 2021		
7. OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4		
8. CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES	NIT	901474028-8
9. INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA	NIT	901479577-2
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1038 DE 2021		
11. PLAZO INICIAL: 98 Meses y 7 Días	12. FECHA DE INICIO: 23/06/2021	13. FECHA DE REANUDACIÓN:	-
14. PLAZO ACUMULADO: 98 Meses y 7 Días	15. FECHA DE SUSPENSIÓN: -	16. FECHA DE VENCIMIENTO:	31/08/2029
17. TIPO DE GESTIÓN: PREDIAL	18. VR. DE LA GESTIÓN: 4.822.293.529,49	19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:	10.295.846.653,20

II. INFORMACION FINANCIERA

20. VR. INICIAL (INCLUIDO IVA):	$	322.790.128.920,00
21. VR. ANTICIPO:	$	53.059.840.972,00
22. VR. ADICIÓN No: 1	$	20.059.840.972,00
23. VR. ADICIÓN No:		
24. VR. TOTAL ADICIONES:	$	20.059.840.972,00
25. VR. TOTAL ACUMULADO:	$	342.849.969.892,00

III. INFORMACION BASE LIQUIDACIÓN

1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B) (Valor / Cantidad)								**CANTIDAD**	**V/R UNIDAD.**	**TOTAL**
1.A. ELABORACION DE INSUMOS PRE-FACTIBILIDAD	26.A.1. INFORME GENERAL DEL SECTOR RURAL -VALOR PRIMEROS 10 KM	Paz de Rio Socha Boche Socha Curital Socotá	PR 18+165,81 PR 30+213,35 PR 47+206,36 PR 47+511,61	a a a a	PR 18+295,72 PR 30+370,00 PR 47+387,79 PR 57+043,62	= = = =	0,13 Km 0,16 Km 0,18 Km 9,53 Km	0,00	$ 1.600.000,00	$ -
	26.A.2. INFORME GENERAL DEL SECTOR RURAL -VALOR KM ADICIONAL	Socotá - Chita	PR 57+043,62	a	PR 70+996,32	=	13,95 Km	0,00	$ 960.000,00	$ -
	26.A.3. INFORME GENERAL DEL SECTOR URBANO – VALOR CADA 500 MTS							0	$ 2.460.000,00	$ -
	26.A.4. PRE-DIAGNOSTICO PREDIAL EN FASE II FACTIBILIDAD POR KM	Paz de Rio Socha Boche Socha Curital Socotá Chita	18.165,81 30.213,35 47.206,36 47.511,61 66.030,46	a a a a a	18.295,72 30.370,00 47.387,79 66.030,46 70.996,32	= = = = =	0,13 Km 0,16 Km 0,18 Km 18,52 Km 4,97 Km	0,00 Km	$ 4.650.000,00	$ -
ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL	26. ELABORACIÓN FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON SOPORTES INMUEBLE							1	$ 1.394.000,00	$ 1.394.000,00
	27. ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRAFICO CON SOPORTES DEL INMUEBLE + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO VALUATORIO (RES. 2684/2015)							0	$ 2.788.000,00	$ -
	28. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA AUTORIZACION INVIAS, CON TRABAJO DE CAMPO							0	$ 1.045.000,00	$ -
	29. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (TERRENO)							0	$ 348.500,00	$ -
	30. ELABORACION DE LA FICHA PREDIAL CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y ESPECIES							0	$ 1.074.000,00	$ -
	31. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA AUTORIZACION INVIAS, SIN NECESIDAD DE REALIZAR TRABAJO DE CAMPO							0	$ 805.500,00	$ -
	32. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (MEJORA)							0	$ 268.500,00	$ -
ELABORACIÓN DE TÍTULOS	33. ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS PROPIETARIO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES (TERRENO)							11	$ 754.000,00	$ 8.294.000,00
	34. AJUSTE AL ESTUDIO DE TÍTULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACION JURÍDICA DEL INMUEBLE POSTERIORES A SU APROBACIÓN							0	$ 377.000,00	$ -
	35. ESTUDIO DE TITULOS (DIAGNÓSTICO JURÍDICO) PARA MEJORAS							0	$ 377.000,00	$ -
ACLARACIÓN DE CABIDA Y LINDEROS	36. SOLICITUD ANTE IGAC O AUTORIDAD CATASTRAL CORRESPONDIENTE PARA ACTUALIZACIÓN CABIDA Y/O LINDEROS							0	$ 320.000,00	$ -
	37. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA RESTANTE POR HECTÁREA (INCLUYE PLANO CON COORDENADAS GEOGRÁFICAS)							0	$ 217.000,00	$ -
ELABORACIÓN DE AVALUO COMERCIAL	38. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO							2	$ 1.340.000,00	$ 2.680.000,00
	39. AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO + VALORACIÓN COMPONENTES DE LA RESOLUCIÓN MINISTERIO DE TRANSPORTE 2684 DE 2015, CON LOS COMPONENTES DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE LIQUIDADO PARA PAGO.							0	$ 2.680.000,00	$ -
	40. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS SIN TERRENO, CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y ESPECIES PARA AVALÚOS CON VALORES SUPERIORES A 2 SMMLV							0	$ 860.000,00	$ -
	41. AVALÚOS ENTRE 1,5 HASTA 2 SMMLV							0	$ 430.000,00	$ -
	42. AVALÚOS ENTRE 1 HASTA 1,5 SMMLV							0	$ 640.000,00	$ -
	43. AVALÚOS ENTRE 0 HASTA 1 SMMLV							0	$ 320.000,00	$ -
1.1. ENAJENACIÓN VOLUNTARIA (Valor / Cantidad)	44. OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN							0	$ 346.500,00	$ -
	45. INSCRIPCIÓN DE OFERTA DE COMPRA							0	$ 231.000,00	$ -
	46. PERMISO DE INTERVENCIÓN VOLUNTARIO DEBIDAMENTE SUSCRITO X ENTIDAD Y EL TITULAR INSCRITO EN FOLIO MATRÍC. INMOBILIARIA							0	$ 346.500,00	$ -
	47. ELABORACIÓN, LEGALIZACIÓN PROMESA DE COMPRA							0	$ 231.000,00	$ -
	48. TRÁMITE DE PRIMER PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL VENDEDOR							0	$ 115.500,00	$ -
	49. ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIAS							0	$ 462.000,00	$ -
	50. TRÁMITE DE PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR							0	$ 231.000,00	$ -
	51. RADICACIÓN SOLICITUD ANTE IGAC O CATASTROS DESCENTRALIZADOS PARA ASIGNACIÓN N° PREDIAL NACIONAL Y/O ACTUALIZ. INFORMACIÓN CATASTRAL							0	$ 231.000,00	$ -
1.2. TRÁMITES ADICIONALES PARA INICIO DE EXPROPIACIÓN JUDICIAL (Valor / Cantidad)	52. ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN (PREVIO AGOTAMIENTO ETAPA ENAJENACIÓN VOLUNTARIA)							0	$ 321.000,00	$ -
	53. CONTESTACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA							0	$ 321.000,00	$ -
	54. NOTIFICACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA							0	$ 107.000,00	
	55. PRESENTACIÓN DEMANDA ADMITIDA CON SOLICITUD ENTREGA ANTICIPADA							0	$ 749.000,00	$ -
	56. ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL INMUEBLE POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE COMISIONE							0	$ 642.000,00	$ -
1.3. COMPRA DE MEJORAS PREVIUA AUORIZACION DE SMA (Valor / Cantidad)	57. PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS							0	$ 150.000,00	$ -
	58. DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN							0	$ 300.000,00	$ -
	59. ENTREGA PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE DOCUMENTO COMPRAVENTA							0	$ 150.000,00	$ -
	60.TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR							0	$ 150.000,00	$ -
BIENES DE USO PÚBLICO (Valor / Cantidad)	61. TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA RESTITUCIÓN							0	$ 640.000,00	$ -
SUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) = Suma casillas 26.A.1. a 61										$ 12.368.000,00
IVA										19%
VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL										**$ 14.717.920,00**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL**	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO ORIENTE	2. DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CASANARE Y BOYACÁ
3. AÑO: 2024	MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	4. FECHA DE ELABORACIÓN	20/01/2025
5. LOCALIZACIÓN: RUTA:	NACIONAL 64 (SECTOR BELÉN - SÁCAMA - CRUCE RUTA 45 LA CABUYA) NACIONAL 65 (SECTOR PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA)	TRAMO:	04 (SECTOR BELÉN - SÁCAMA) 05 (SECTOR SÁCAMA - CRUCE RUTA 45 LA CABUYA) 14 (SECTOR PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA)
6. CONTRATO DE OBRA No:	978 DE 2021		
7. OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4		
8. CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES	NIT	901474028-8
9. INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA	NIT	901479577-2
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1038 DE 2021		

11. PLAZO INICIAL:	31/08/2029	12. FECHA DE INICIO:	23/06/2021	13. FECHA DE REANUDACIÓN:	-
14. PLAZO ACUMULADO:	31/08/2029	15. FECHA DE SUSPENSIÓN:	-	16. FECHA DE VENCIMIENTO:	31/08/2029
17. TIPO DE GESTIÓN:	PREDIAL	18. VR. DE LA GESTIÓN:	4.822.293.529,49	19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:	10.295.846.653,20

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)

FICHA PREDIAL No.	Predio: **P** Mejora: **M**	**TRADENTE** (EN CASO DE TENER VARIOS PROPIETARIOS SEPARE CON / ASI: PEPITO PEREZ/PEPITA LUGO/……)	**NUM DOC TRADENTE**	**MATRÍCULA INMOBILIARIA MATRIZ**	**ESCRITURA** (E: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad) **PROMESA VENTA** (CV: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad)	**No. MATRÍCULA INMOBILIARIA A NOMBRE DE INVÍAS**	**VALOR AVALÚO TERRENO**	**PAGO(S) ACUMULADO(S) DEL TERRENO**	**VALOR TOTAL AVALÚO**	**VALOR PAGADO CON ESTA PRE-ACTA(SIN IVA)**	**OBSERVACIONES DEL PAGO DEL TERRENO**

Si la información excede las casillas dispuestas para tal fin, favor utilizar un anexo con la relación completa indicando aquí la cantidad de folios y el anexo parte integral de la pre-acta

62. TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE ACTA (A)	**$**	**-**
63. SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2)	$	-
64. OTROS	$	-
65. IVA	$	-
66. VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS	$	-

IV. VALORES LIQUIDADOS

67. VALOR TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA	$	12.368.000,00
68. IVA PRESENTE PREACTA	$	2.349.920,00
69. VALOR TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2)	**$**	**14.717.920,00**
70. VALOR GESTIÓN PREDIAL	$	14.717.920,00

V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS

71. VALOR ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES	$	191.813.500,00
72. GESTIÓN PREDIAL	$	191.813.500,00
73. DESEMBOLSOS PREDIALES	$	-
74. OTROS	$	-
75. IVA	$	36.444.565,00
76. VALOR TOTAL ACUMULADO	$	228.258.065,00
77. SALDO POR EJECUTAR	**$**	**4.594.035.464,49**

VI. FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA			FIRMA DEL INTERVENTOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	ANIBAL OJEDA CARRIAZO		NOMBRES Y APELLIDOS	FERNANDO CARO RIVERA DCV	
C.C. X C.E. __	NUMERO	92.519.730 de Sincelejo	C.C. __ C.E. __	NUMERO	19.432.302
MATRICULA PROFESIONAL	NUMERO	25202 - 57327	MATRICULA PROFESIONAL	NUMERO	25202-26432
Representante Legal [X]	Apoderado [ ]		Representante Legal [X]	Apoderado [ ]	

NOTAS

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.
4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en cero ($0) pesos.

ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Sostenibilidad

INVIAS
Jairo Fernando Arguello Urrego,SUBDIRECTOR DE S
2025-02-11T13:46:57-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escane el Codigo QR Para Validarlo

Al contestar cite este radicado: 2025S-VBOG-007606
Fecha: 2025-02-11 13:46:54

CONSORCIO INTERVENTORÍAS COLOMBIA
RECIBIDO PARA RADICACIÓN
Se recibe para estudio, no implica aceptación
RADICADO No.: Página 1 RL-3506
ANEXOS: Sin anexo

FECHA:	HORA:	RECIBIDO POR:
11-feb-25	1:50 p. m.	Laura A.

SEÑOR(A):
EDWIN JAVIER MENESES HERNANDEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA
CLL 95 N 15 - 47 PISO 6
interventoriascolombia@ryu.com.co
BOGOTÁ, D.C., BOGOTA

ASUNTO: Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-010310

Estimado ingeniero EDWIN JAVIER:

De acuerdo con el oficio con No. de radicación 2024E-VUVRAZ 010310 del 31 de enero de 2025, mediante los cuales la Interventoría allegó a la parte técnica la pre-acta No.44 del mes de Enero 2025, del contrato de Interventoría 1038-2021," CONTRATO INVIAS No." 1038 DE 2021 "INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL¨ CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"".,se informa que una vez verificada la información anexa soportes, aportada por el contratista y aprobada por la interventoría, con respecto a la pre-Acta No.44, por un valor a cobrar de $ 12.368.000,00 más IVA $ 2.349.920,00 Total $ 14.717.920,00, se manifiesta que la información allí registrada, es consistente, por lo que esta Subdirección da VISTO DE NO OBJECION, a fin de continuar con su respectivo trámite.

Hacen parte de esta comunicación los siguientes soportes:

1. PRE-ACTA_MEN_GESTIÓN_Y_ADQ_PREDIAL_ENE_2025
2. Carpeta 2 - "Soportes"
3. Carpeta 3 "Formatos de seguimiento"
Formato MASPS-MN1-IN-5-FR-8
Formato MASPS-MN1-IN-5-FR-9
Formato MASPS-MN1-IN-5-FR-10
4. Carpeta 3 "" Sábana y tira predial"
MASPS-MN1-IN-5-FR-7 SABANA DE AVALUOS
MASPS-MN1-IN-5-FR-14 SABANA PREDIAL ENERO 2025
TIRA PREDIAL ENERO 2025.

INVIAS
Jairo Fernando Arguello Urrego,SUBDIRECTOR DE S
2025-02-11T13:46:57-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanee el Codigo QR Para Validarlo

Por lo anterior, se aclara que “Los vistos de no objeción” que generan los diferentes profesionales prediales sobre los insumos, no constituyen aprobación sino la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en los apéndices y el manual de interventoría.

-**NOTA;** Las cantidades y valores consignados en la presente Pre-acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
-El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.
-Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en presente Pre-acta, no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.
-El Numero de la presente pre-acta debe coincidir con el número del acta de recibo parcial de obra correspondiente.

Cordialmente,

Cordialmente,

JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO
SUBDIRECTOR DE SOSTENIBILIDAD

Proyectado por: FRANCIS RAMÍREZ MONJE
Revisado por:
Aprobado por:
Copia Interna a: GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO (1000005), JAIME NILTON RAMIREZ GUTIERREZ (1120100)
Copia Externa a:

INVIAS

Jairo Fernando Arguello Urrego,SUBDIRECTOR DE S
2025-02-11T13:46:57-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanee el Codigo QR Para Validarlo

REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES

RESTREPO Y URIBE S.A.S
INGENIEROS CONSULTORES

interventorias colombia <interventoriascolombia@ryu.com.co>

Radicación - Remisión pre acta predial No. 44

1 mensaje

interventorias colombia <interventoriascolombia@ryu.com.co> 31 de enero de 2025, 9:16
Para: Centro de Atencion al Ciudadano <atencionciudadano@invias.gov.co>, jfarguello@invias.gov.co
Cc: jnramirez@invias.gov.co, Gustavo Gamaliel Fernandez Niño <gfernandez@invias.gov.co>, hamelendez@invias.gov.co, emeneses@interventoriascolombia.com.co, predial@interventoriascolombia.com.co

Buenos días

Señores INVIAS,

Adjunto envío comunicación C.1468/RL 3113/25/7.8 y anexo, para radicar a la Sub Dirección de Sostenibilidad.

Atentamente,

Laura Aldana
Consorcio Interventorías Colombia
interventoriascolombia@ryu.com.co
Celular: 320 831 4667
Calle 7 # 8-23
Belén-Boyacá

2 adjuntos

1468_311325_070800_INV_PREACTA_PREDIAL_44.pdf
182K

ANX_RL_3113.zip
16833K

C.1468/RL3113/25/7.8
Belén, 31 de enero de 2025

Señores:
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVIAS
Atn.: Ing. Jairo Fernando Argüello Urrego
Sub Director de Sostenibilidad
atencionciudadano@invias.gov.co
Bogotá D.C.

Ref.: Contrato Interventoría 1038 de 2021
Corredor Ruta de Los Libertadores
Remisión pre acta predial No. 44

Respetados Señores:

En cumplimiento de las obligaciones contractuales de la Interventoría del proyecto y las establecidas en el MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA 2022 - INSTRUCTIVO GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL - MASPS-MN1-IN-5 – numeral XVI. PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL FORMATO MASPS-MN1-IN-5-FR-11:

(...)

Una vez revisadas y aprobadas las pre-actas por la Interventoría, ésta debe radicarlas con sus documentos soporte ante la Subdirección de Sostenibilidad para su revisión y no objeción, según su competencia, con una antelación mínima de diez (10) días a la fecha de corte del Acta de Recibo Parcial de Obra.

(...).

Esta Interventoría remite la pre acta predial No. 44 que hace parte integral del Acta de recibo parcial de obra No. 44 correspondiente al mes de enero de 2025 para que la Subdirección de Sostenibilidad del Invias revise y conceptúe a través de los gestores a cargo. El cobro incluye los siguientes ítems:

PREDIO Y/O MEJORA	INSUMO	PR	RN	VALOR (Básico)	IVA	VALOR TOTAL
001-I-T1-MCBP	AVALÚO	K18+174,00	6404	$ 1.340.000,00	$ 254.600,00	$ 1.594.600,00
006-I-T1-MCBP	ESTUDIO DE TÍTULOS	K30+329,06	6404	$ 754.000,00	$ 143.260,00	$ 897.260,00
006A-I-T1-MCBP	ESTUDIO DE TÍTULOS	K30+354,61	6404	$ 754.000,00	$ 143.260,00	$ 897.260,00
011-ID-T1-MCBP	ESTUDIO DE TÍTULOS	K47+547,17	6404	$ 754.000,00	$ 143.260,00	$ 897.260,00
016-A-ID-T1-MCBP	ESTUDIO DE TÍTULOS	K47+929,65	6404	$ 754.000,00	$ 143.260,00	$ 897.260,00
016-ID-T1-MCBP	ESTUDIO DE TÍTULOS	K47+883,00	6404	$ 754.000,00	$ 143.260,00	$ 897.260,00
017-D-T1-MCBP	ESTUDIO DE TÍTULOS	K48+003,73	6404	$ 754.000,00	$ 143.260,00	$ 897.260,00
018-I-T1-MCBP	ESTUDIO DE TÍTULOS	K47+971,18	6404	$ 754.000,00	$ 143.260,00	$ 897.260,00
043-I-T1-MCBP	ESTUDIO DE TÍTULOS	K49+184,13	6404	$ 754.000,00	$ 143.260,00	$ 897.260,00
045-ID-T1-MCBP	ESTUDIO DE TÍTULOS	K49+326,06	6404	$ 754.000,00	$ 143.260,00	$ 897.260,00

PREDIO Y/O MEJORA	INSUMO	PR	RN	VALOR (Básico)	IVA	VALOR TOTAL
060-I-T1-MCBP	ESTUDIO DE TÍTULOS	K50+113,69	6404	$ 754.000,00	$ 143.260,00	$ 897.260,00
062-ID-T1-MCBP	AVALÚO	K50+277,56	6404	$ 1.340.000,00	$ 254.600,00	$ 1.594.600,00
179-ID-T1-MCBP	FICHA PREDIAL	K57+540,93	6404	$ 1.394.000,00	$ 264.860,00	$ 1.658.860,00
179-ID-T1-MCBP	ESTUDIO DE TÍTULOS	K57+540,93	6404	$ 754.000,00	$ 143.260,00	$ 897.260,00
TOTAL A COBRAR				**$ 12.368.000,00**	**$ 2.349.920,00**	**$ 14.717.920,00**

Hacen parte de esta comunicación los siguientes soportes:

1. PRE-ACTA_MEN_GESTIÓN_Y_ADQ_PREDIAL_ENE_2025

1.1. Control_Insumos_Prediales_ACTA_44

2. Carpeta 2 - “Soportes”
   Aprobaciones
   Avalúos aprobados
   Fichas prediales aprobadas
   Estudios de títulos aprobados

3. Carpeta 3 “Formatos de seguimiento”
   Formato MASPS-MN1-IN-5-FR-8
   Formato MASPS-MN1-IN-5-FR-9
   Formato MASPS-MN1-IN-5-FR-10

4. Carpeta 3 “”Sábana y tira predial”
   MASPS-MN1-IN-5-FR-7 SABANA DE AVALUOS
   MASPS-MN1-IN-5-FR-14 SABANA PREDIAL ENERO 2025
   TIRA PREDIAL ENERO 2025

Cordialmente,

CONSORCIO INTERVENTORÍAS COLOMBIA

EDWIN JAVIER MENESES H.
Director de Interventoría

Anexo: Lo mencionado en la comunicación
Copia: Ing. Jaime Nilton Ramírez Gutiérrez, Gestor Técnico de Proyecto - INVIAS Bogotá
Ing. Gustavo Gamaliel Fernández Niño, Supervisor de Contrato - INVIAS Boyacá
Ing. Henry Antonio Melendez Ortiz, Supervisor de Contrato - INVIAS Casanare

Elaboró: NRB

CONSORCIO
VÍAS NACIONALES

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
Artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Contrato: **978 de 2021**

Objeto: **"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN – SOCHA – SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 4."**

El suscrito Representante Legal del CONSORCIO VIAS NACIONALES con NIT 901.474.028-8, se permite certificar que se ha cumplido con los pagos de los aportes de seguridad social y parafiscales de los empleados vinculados en la ejecución del contrato de obra: 978 DE 2021, A los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación Familiar, instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio de Aprendizaje, que se encuentran vigente para el periodo del mes de enero de 2025.

Para constancia se firma a los 7 días del mes de febrero de 2025, en la ciudad de Cartagena.

Atentamente,

ANIBAL OJEDA CARRIAZO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO VIAS NACIONALES

JULIETH LISETH BERTEL PEREZ
CONTADOR
CONSORCIO VIAS NACIONALES

Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Kma Construcciones S. A. S.

7 de enero de 2025

En mi calidad de Revisor Fiscal de Kma Construcciones S. A. S., identificada con NIT. 830.094.920-5, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el mes de enero 2025. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tal obligación.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el mes de enero 2025.

3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el mes de enero 2025, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

© 2025 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las firmas colombianas que hacen parte de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Todos los derechos reservados.

A la Administración de Kma Construcciones S. A. S.

7 de enero de 2025

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.



Jaime Andres Diaz De Hoyos
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 239726-T
(Ver anexo adjunto)

CONSTRUCTORA EMMA

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
Artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Contrato: 978 de 2021

Objeto: **"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN – SOCHA – SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 4."**

El suscrito Revisor Fiscal de **CONSTRUCTORA EMMA LTDA** con NIT 806.014.108-1, se permite certificar que se ha cumplido con los pagos de los aportes de seguridad social y parafiscales de sus empleados vinculados a la ejecución del contrato de obra: 978 DE 2021, A los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación Familiar, instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio de Aprendizaje, durante el mes de Enero de 2025. Para constancia se firma a los 07 días del mes de Febrero de 2025, en la ciudad de Cartagena.

Atentamente,

ANGEL DAMIAN ARIAS HERNANDEZ
C.C. No. 73.138.202 de Cartagena
T.P. No. 73746-T

CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES PARA PERSONAS JURÍDICAS

Cartagena, D.T y C, 07 Febrero del 2025

A QUIEN INTERESE

Respetados señores:

Contrato: 978 de 2021
Objeto: "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN – SOCHA – SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 4."

El Revisor Fiscal, **RODRIGO ACOSTA BALLESTERO** certifica que la firma **CICON S.A.S.**, con NIT 890.403.235-3 se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, correspondiente al mes de Enero del 2025. La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

RODRIGO ACOSTA BALLESTERO
REVISOR FISCAL
C.C.NO. 1.128.056.973
T.P.NO. 183850-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2 6 4 C B 1 8 7 1 9 7 7 7 3 F 0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JAIME ANDRES DIAZ DE HOYOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1143367723 de CARTAGENA (BOLIVAR) Y Tarjeta Profesional No 239726-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *

Dado en BOGOTA a los 23 días del mes de Enero de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

17AAD5F0AE98D811

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JULIETH LISETH BERTEL PEREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1102830161 de SINCELEJO (SUCRE) Y Tarjeta Profesional No 222053-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *

Dado en BOGOTA a los 12 días del mes de Diciembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4BEA5CCAE5719515

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ANGEL DAMIAN ARIAS HERNANDEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 73138202 de CARTAGENA (BOLIVAR) Y Tarjeta Profesional No 73746-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *
* *
* *

Dado en BOGOTA a los 12 días del mes de Diciembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9D840CC4D97CE8AA

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **RODRIGO ACOSTA BALLESTERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1128056973 de CARTAGENA (BOLIVAR) Y Tarjeta Profesional No 183850-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *
* *
* *

Dado en BOGOTA a los 19 días del mes de Noviembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

Sandra Barrios

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830094920	5	KMA CONSTRUCCIONES S A	A - 200 O MAS COTIZANTES	BOGOTA	CALLE 93 B No. 19 - 21	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7424880	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1248998288	9481436908	E	2025/02/06	2025/02/06	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,268,042,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: BOGOTA (334 Afiliados)						**$743,181,009**	**$118,506,100**			**$750,388,709**	**$31,482,400**			**$719,079,701**	**$28,801,400**			**$750,388,709**	**$41,586,900**		**$28,751,583**	**$1,438,300**
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (307 Afiliados)						**$150,494,733**	**$23,347,000**			**$153,113,668**	**$5,654,800**			**$113,511,290**	**$4,563,700**			**$153,113,668**	**$0**		**$6,328,500**	**$317,000**
Ciudad: BELEN Depto: BOYACA (15 Afiliados)						**$6,081,097**	**$974,100**			**$6,081,097**	**$244,400**			**$5,404,006**	**$217,200**			**$6,081,097**	**$0**		**$0**	**$0**
1	CC	1049646966	AGUILAR AMAYA DIANA CAROLINA	230301	3	$403,334	$64,600	EPS005	3	$403,334	$16,200	CCF10	3	$300,000	$12,000	14-7	3	$403,334	$0	3	$0	$0
2	CC	1049646966	AGUILAR AMAYA DIANA CAROLINA	230301	2	$268,889	$43,100	EPS005	2	$268,889	$10,800	CCF10	2	$200,000	$8,000	14-7	2	$268,889	$0	2	$0	$0
3	CC	79564690	BARRETO CARDENAS JOSE LEONARDO	25-14	3	$353,406	$56,600	EPS005	3	$353,406	$14,200	CCF10	3	$351,406	$14,100	14-7	3	$353,406	$0	3	$0	$0
4	CC	79564690	BARRETO CARDENAS JOSE LEONARDO	25-14	2	$235,604	$37,700	EPS005	2	$235,604	$9,500	CCF10	2	$232,270	$9,300	14-7	2	$235,604	$0	2	$0	$0
5	CC	1010094305	BLANCO SUA ERIKA JULIETH	230301	5	$293,111	$46,900	ESSC24	5	$293,111	$11,800	CCF10	5	$242,935	$9,800	14-7	5	$293,111	$0	5	$0	$0
6	CC	74389337	BLANCO PEREZ LEONILDO	230301	3	$151,629	$24,300	EPS041	3	$151,629	$6,100	CCF10	3	$142,350	$5,700	14-7	3	$151,629	$0	3	$0	$0
7	CC	74389337	BLANCO PEREZ LEONILDO	230301	2	$101,086	$16,200	EPS041	2	$101,086	$4,100	CCF10	2	$94,900	$3,800	14-7	2	$101,086	$0	2	$0	$0
8	CC	1055312911	CASTIBLANCO SALAMANCA OSCAR LEONARDO	230301	3	$289,633	$46,400	EPS005	3	$289,633	$11,600	CCF10	3	$288,966	$11,600	14-7	3	$289,633	$0	3	$0	$0
9	CC	1055312911	CASTIBLANCO SALAMANCA OSCAR LEONARDO	230301	2	$193,089	$30,900	EPS005	2	$193,089	$7,800	CCF10	2	$191,310	$7,700	14-7	2	$193,089	$0	2	$0	$0
10	CC	1049647649	GARCIA ARIAS ANGIE LORENA	230201	3	$254,032	$40,700	EPS005	3	$254,032	$10,200	CCF10	3	$253,190	$10,200	14-7	3	$254,032	$0	3	$0	$0
11	CC	1049647649	GARCIA ARIAS ANGIE LORENA	230201	2	$169,355	$27,100	EPS005	2	$169,355	$6,800	CCF10	2	$166,016	$6,700	14-7	2	$169,355	$0	2	$0	$0
12	CC	74326892	GUERRERO HERNANDEZ YOANY	230301	3	$323,989	$51,900	EPS037	3	$323,989	$13,000	CCF10	3	$182,696	$7,400	14-7	3	$323,989	$0	3	$0	$0
13	CC	74326892	GUERRERO HERNANDEZ YOANY	230301	2	$215,993	$34,600	EPS037	2	$215,993	$8,700	CCF10	2	$121,797	$4,900	14-7	2	$215,993	$0	2	$0	$0
14	CC	1054780130	MORENO HERRERA DIEGO ARMANDO	25-14	3	$312,914	$50,100	EPS041	3	$312,914	$12,600	CCF10	3	$260,000	$10,400	14-7	3	$312,914	$0	3	$0	$0
15	CC	1054780130	MORENO HERRERA DIEGO ARMANDO	25-14	2	$208,610	$33,400	EPS041	2	$208,610	$8,400	CCF10	2	$170,667	$6,900	14-7	2	$208,610	$0	2	$0	$0
16	CC	1056554283	NOCOBE USCATEGUI JOSE MIGUEL	25-14	3	$180,000	$28,800	EPS042	3	$180,000	$7,200	CCF10	3	$180,000	$7,200	14-7	3	$180,000	$0	3	$0	$0
17	CC	1056554283	NOCOBE USCATEGUI JOSE MIGUEL	25-14	2	$120,000	$19,200	EPS042	2	$120,000	$4,800	CCF10	2	$120,000	$4,800	14-7	2	$120,000	$0	2	$0	$0
18	CC	1007391217	PALACIOS ALBA JESELL TATIANA	230301	3	$209,211	$33,500	EPS037	3	$209,211	$8,400	CCF10	3	$180,000	$7,200	14-7	3	$209,211	$0	3	$0	$0
19	CC	1007391217	PALACIOS ALBA JESELL TATIANA	230301	2	$139,474	$22,400	EPS037	2	$139,474	$5,600	CCF10	2	$118,667	$4,800	14-7	2	$139,474	$0	2	$0	$0
20	CC	1007518038	PEREZ SANABRIA LAURA CLARIBETH	230301	5	$294,279	$47,100	ESSC24	5	$294,279	$11,800	CCF10	5	$241,415	$9,700	14-7	5	$294,279	$0	5	$0	$0
21	CC	1007518038	PEREZ SANABRIA LAURA CLARIBETH	230301	1	$58,856	$9,500	ESSC24	1	$58,856	$2,400	CCF10	1	$47,450	$1,900	14-7	1	$58,856	$0	1	$0	$0
22	CC	72239504	PERNETT PEÑA NADIN JOSE	231001	3	$181,334	$29,100	EPS041	3	$181,334	$7,300	CCF10	3	$186,808	$7,500	14-7	3	$181,334	$0	3	$0	$0
23	CC	72239504	PERNETT PEÑA NADIN JOSE	231001	2	$120,889	$19,400	EPS041	2	$120,889	$4,900	CCF10	2	$124,539	$5,000	14-7	2	$120,889	$0	2	$0	$0
24	CC	74337466	TANGUA NEITA YOLMAN FERNANDO	230301	3	$186,834	$29,900	EPS037	3	$186,834	$7,500	CCF10	3	$188,031	$7,600	14-7	3	$186,834	$0	3	$0	$0
25	CC	74337466	TANGUA NEITA YOLMAN FERNANDO	230301	2	$124,556	$20,000	EPS037	2	$124,556	$5,000	CCF10	2	$125,354	$5,100	14-7	2	$124,556	$0	2	$0	$0
26	CC	3121271	TORRES GUERRERO DULTEBIR	231001	3	$142,350	$22,800	EPS037	3	$142,350	$5,700	CCF10	3	$142,350	$5,700	14-7	3	$142,350	$0	3	$0	$0
27	CC	3121271	TORRES GUERRERO DULTEBIR	231001	2	$94,900	$15,200	EPS037	2	$94,900	$3,800	CCF10	2	$94,900	$3,800	14-7	2	$94,900	$0	2	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
28	CC	3121271	TORRES GUERRERO DULTEBIR	231001	3	$142,350	$22,800	EPS037	3	$142,350	$5,700	CCF10	3	$142,350	$5,700	14-7	3	$142,350	$0	3	$0	$0
29	CC	1054252156	VELANDIA CUEVAS RAFAEL	25-14	3	$186,834	$29,900	CCFC55	3	$186,834	$7,500	CCF10	3	$188,183	$7,600	14-7	3	$186,834	$0	3	$0	$0
30	CC	1054252156	VELANDIA CUEVAS RAFAEL	25-14	2	$124,556	$20,000	CCFC55	2	$124,556	$5,000	CCF10	2	$125,456	$5,100	14-7	2	$124,556	$0	2	$0	$0
Ciudad: BOYACA Depto: BOYACA (10 Afiliados)						**$6,001,141**	**$883,200**			**$6,001,141**	**$162,800**			**$1,773,285**	**$71,500**			**$6,001,141**	**$0**		**$0**	**$0**
31	CC	7186441	AGUILAR MARTINEZ JOSE YESID	230301	3	$352,334	$56,400	ESSC24	3	$352,334	$14,100	CCF10	3	$350,000	$14,000	14-7	3	$352,334	$0	3	$0	$0
32	CC	7186441	AGUILAR MARTINEZ JOSE YESID	230301	2	$234,889	$37,600	ESSC24	2	$234,889	$9,400	CCF10	2	$228,667	$9,200	14-7	2	$234,889	$0	2	$0	$0
33	CC	74377258	AYALA HERRERA OSCAR JAVIER	25-14	2	$153,109	$24,500	MIN002	2	$153,109	$6,200	CCF10	2	$120,051	$4,900	14-7	2	$153,109	$0	2	$0	$0
34	CC	74377258	AYALA HERRERA OSCAR JAVIER	25-14	2	$153,109	$24,500	MIN002	2	$153,109	$6,200	CCF10	2	$120,051	$4,900	14-7	2	$153,109	$0	2	$0	$0
35	CC	74377258	AYALA HERRERA OSCAR JAVIER	25-14	1	$76,555	$9,200	MIN002	1	$76,555	$0	CCF10	1	$0	$0	14-7	1	$76,555	$0	1	$0	$0
36	CC	8637418	BANDA CABARCAS JOSE FRANCISCO	230301	3	$161,991	$26,000	EPS037	3	$161,991	$6,500	CCF10	3	$160,000	$6,400	14-7	3	$161,991	$0	3	$0	$0
37	CC	8637418	BANDA CABARCAS JOSE FRANCISCO	230301	2	$107,994	$17,300	EPS037	2	$107,994	$4,400	CCF10	2	$106,000	$4,300	14-7	2	$107,994	$0	2	$0	$0
38	CC	8637418	BANDA CABARCAS JOSE FRANCISCO	230301	1	$53,997	$6,500	EPS037	1	$53,997	$0	CCF10	1	$0	$0	14-7	1	$53,997	$0	1	$0	$0
39	CC	8637418	BANDA CABARCAS JOSE FRANCISCO	230301	1	$53,997	$6,500	EPS037	1	$53,997	$0	CCF10	1	$0	$0	14-7	1	$53,997	$0	1	$0	$0
40	CC	1052314148	CEPEDA CEPEDA MARIA ELENA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF10	30	$0	$0	14-7	30	$1,423,500	$0	30	$0	$0
41	CC	53176700	ESLAVA GUERRERO SONIA YIRLENY	230301	3	$190,461	$30,500	EPS041	3	$190,461	$7,700	CCF10	3	$145,613	$5,900	14-7	3	$190,461	$0	3	$0	$0
42	CC	53176700	ESLAVA GUERRERO SONIA YIRLENY	230301	1	$63,487	$10,200	EPS041	1	$63,487	$2,600	CCF10	1	$48,538	$2,000	14-7	1	$63,487	$0	1	$0	$0
43	CC	53176700	ESLAVA GUERRERO SONIA YIRLENY	230301	15	$711,750	$113,900	EPS041	15	$711,750	$28,500	CCF10	15	$0	$0	14-7	15	$711,750	$0	15	$0	$0
44	CC	1069476349	GONZALEZ POLO ELADIO DE JESUS	230301	1	$81,894	$13,200	EPS037	1	$81,894	$3,300	CCF10	1	$80,000	$3,200	14-7	1	$81,894	$0	1	$0	$0
45	CC	1069476349	GONZALEZ POLO ELADIO DE JESUS	230301	3	$245,682	$29,500	EPS037	3	$245,682	$0	CCF10	3	$0	$0	14-7	3	$245,682	$0	3	$0	$0
46	CC	1069476349	GONZALEZ POLO ELADIO DE JESUS	230301	1	$81,893	$9,900	EPS037	1	$81,893	$0	CCF10	1	$0	$0	14-7	1	$81,893	$0	1	$0	$0
47	CC	1001938388	HOYOS MONTILLA ROGER JAVIER	230301	1	$111,112	$17,800	EPS005	1	$111,112	$4,500	CCF10	1	$110,333	$4,500	14-7	1	$111,112	$0	1	$0	$0
48	CC	1001938388	HOYOS MONTILLA ROGER JAVIER	230301	4	$444,445	$53,400	EPS005	4	$444,445	$0	CCF10	4	$0	$0	14-7	4	$444,445	$0	4	$0	$0
49	CC	1001938388	HOYOS MONTILLA ROGER JAVIER	230301	1	$111,111	$13,400	EPS005	1	$111,111	$0	CCF10	1	$0	$0	14-7	1	$111,111	$0	1	$0	$0
50	CC	1024599890	MONROY HOLGUIN DALY YANIRA	230301	3	$142,350	$22,800	EPS005	3	$142,350	$5,700	CCF10	3	$142,350	$5,700	14-7	3	$142,350	$0	3	$0	$0
51	CC	1024599890	MONROY HOLGUIN DALY YANIRA	230301	2	$94,900	$15,200	EPS005	2	$94,900	$3,800	CCF10	2	$94,900	$3,800	14-7	2	$94,900	$0	2	$0	$0
52	CC	1053611594	PACHECO HOSTTOS WILDER FABIAN	230301	6	$596,957	$71,700	EPS008	6	$596,957	$0	CCF10	6	$0	$0	14-7	6	$596,957	$0	6	$0	$0
53	CC	1056553262	SANTOS ABRIL JEISSON JULIAN	230201	1	$70,725	$11,400	EPS037	1	$70,725	$2,900	CCF10	1	$66,782	$2,700	14-7	1	$70,725	$0	1	$0	$0
54	CC	1056553262	SANTOS ABRIL JEISSON JULIAN	230201	3	$212,174	$25,500	EPS037	3	$212,174	$0	CCF10	3	$0	$0	14-7	3	$212,174	$0	3	$0	$0
55	CC	1056553262	SANTOS ABRIL JEISSON JULIAN	230201	1	$70,725	$8,500	EPS037	1	$70,725	$0	CCF10	1	$0	$0	14-7	1	$70,725	$0	1	$0	$0
Ciudad: GUATEQUE Depto: BOYACA (5 Afiliados)						**$1,550,012**	**$248,400**			**$1,550,012**	**$62,500**			**$1,365,338**	**$55,000**			**$1,550,012**	**$0**		**$0**	**$0**
56	CC	7335459	BOHORQUEZ DAZA JOHN FREDY	230301	3	$163,360	$26,200	EPS037	3	$163,360	$6,600	CCF10	3	$142,391	$5,700	14-7	3	$163,360	$0	3	$0	$0
57	CC	7335459	BOHORQUEZ DAZA JOHN FREDY	230301	2	$108,907	$17,500	EPS037	2	$108,907	$4,400	CCF10	2	$94,927	$3,800	14-7	2	$108,907	$0	2	$0	$0
58	CC	1056412731	BRICEÑO ESCARRAGA FABIAN DARIO	230301	3	$221,073	$35,400	EPS037	3	$221,073	$8,900	CCF10	3	$142,545	$5,800	14-7	3	$221,073	$0	3	$0	$0
59	CC	1056412731	BRICEÑO ESCARRAGA FABIAN DARIO	230301	2	$147,382	$23,600	EPS037	2	$147,382	$5,900	CCF10	2	$95,030	$3,900	14-7	2	$147,382	$0	2	$0	$0
60	CC	4053360	CARDENAS LUIS ORLANDO	230201	3	$191,154	$30,600	CCFC55	3	$191,154	$7,700	CCF10	3	$190,528	$7,700	14-7	3	$191,154	$0	3	$0	$0
61	CC	4053360	CARDENAS LUIS ORLANDO	230201	2	$127,436	$20,400	CCFC55	2	$127,436	$5,100	CCF10	2	$125,907	$5,100	14-7	2	$127,436	$0	2	$0	$0
62	CC	4134549	MUÑOZ BARRERA ISIDORO	230301	3	$187,880	$30,100	EPS037	3	$187,880	$7,600	CCF10	3	$187,481	$7,500	14-7	3	$187,880	$0	3	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
63	CC	4134549	MUÑOZ BARRERA ISIDORO	230301	2	$125,253	$20,100	EPS037	2	$125,253	$5,100	CCF10	2	$124,988	$5,000	14-7	2	$125,253	$0	2	$0	$0
64	CC	72326310	RINCON MENDOZA JOSE DE JESUS	25-14	3	$166,540	$26,700	EPS037	3	$166,540	$6,700	CCF10	3	$156,925	$6,300	14-7	3	$166,540	$0	3	$0	$0
65	CC	72326310	RINCON MENDOZA JOSE DE JESUS	25-14	2	$111,027	$17,800	EPS037	2	$111,027	$4,500	CCF10	2	$104,616	$4,200	14-7	2	$111,027	$0	2	$0	$0
Ciudad: JENESANO Depto: BOYACA (1 Afiliados)						**$780,200**	**$124,900**			**$780,200**	**$31,300**			**$776,533**	**$31,100**			**$780,200**	**$0**		**$0**	**$0**
66	CC	1015435465	DIAZ DIAZ DEISY JOHANA	230301	3	$468,120	$74,900	EPS005	3	$468,120	$18,800	CCF10	3	$467,120	$18,700	14-7	3	$468,120	$0	3	$0	$0
67	CC	1015435465	DIAZ DIAZ DEISY JOHANA	230301	2	$312,080	$50,000	EPS005	2	$312,080	$12,500	CCF10	2	$309,413	$12,400	14-7	2	$312,080	$0	2	$0	$0
Ciudad: PAZ DE ARIPORO Depto: CASANARE (3 Afiliados)						**$2,248,546**	**$360,200**			**$2,248,546**	**$90,400**			**$474,527**	**$19,000**			**$2,248,546**	**$0**		**$0**	**$0**
68	CC	11188431	ORTIZ GIL JOSE MILTON	230301	3	$142,824	$22,900	EPS041	3	$142,824	$5,800	CCF69	3	$142,350	$5,700	14-7	3	$142,824	$0	3	$0	$0
69	CC	11188431	ORTIZ GIL JOSE MILTON	230301	2	$95,216	$15,300	EPS041	2	$95,216	$3,900	CCF69	2	$94,900	$3,800	14-7	2	$95,216	$0	2	$0	$0
70	CC	7364545	PEREZ CARO LUIS CRISTINO	230301	15	$873,967	$139,900	EPSC25	15	$873,967	$35,000	CCF69	15	$0	$0	14-7	15	$873,967	$0	15	$0	$0
71	CC	7364545	PEREZ CARO LUIS CRISTINO	230301	15	$873,967	$139,900	EPSC25	15	$873,967	$35,000	CCF69	15	$0	$0	14-7	15	$873,967	$0	15	$0	$0
72	CC	96195210	ROMERO LOZANO JOSE FERNEY	230301	3	$157,543	$25,300	EPSC25	3	$157,543	$6,400	CCF69	3	$142,366	$5,700	14-7	3	$157,543	$0	3	$0	$0
73	CC	96195210	ROMERO LOZANO JOSE FERNEY	230301	2	$105,029	$16,900	EPSC25	2	$105,029	$4,300	CCF69	2	$94,911	$3,800	14-7	2	$105,029	$0	2	$0	$0
Ciudad: SACAMA Depto: CASANARE (135 Afiliados)						**$72,424,061**	**$11,224,400**			**$72,424,061**	**$2,637,300**			**$54,308,415**	**$2,183,300**			**$72,424,061**	**$0**		**$3,084,250**	**$154,500**
74	CC	1118704335	ADAME MEDINA ADRIAN CAMILO	230301	1	$47,450	$7,600	EPSC25	1	$47,450	$1,900	CCF69	1	$47,485	$1,900	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
75	CC	1118704335	ADAME MEDINA ADRIAN CAMILO	230301	1	$47,450	$7,600	EPSC25	1	$47,450	$1,900	CCF69	1	$47,485	$1,900	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
76	CC	1118704335	ADAME MEDINA ADRIAN CAMILO	230301	3	$142,350	$22,800	EPSC25	3	$142,350	$5,700	CCF69	3	$142,456	$5,700	14-7	3	$142,350	$0	3	$0	$0
77	CC	1118563083	ADAME MEDINA BLANCA LUCIA	230301	3	$142,350	$17,100	EPSC25	3	$142,350	$0	CCF69	3	$0	$0	14-7	3	$142,350	$0	3	$0	$0
78	CC	1118563083	ADAME MEDINA BLANCA LUCIA	230301	2	$94,900	$15,200	EPSC25	2	$94,900	$3,800	CCF69	2	$94,900	$3,800	14-7	2	$94,900	$0	2	$0	$0
79	CC	1007425860	AGUIRRE TUMAY JOHON FREDY	230301	3	$142,350	$22,800	EPS037	3	$142,350	$5,700	CCF69	3	$142,350	$5,700	14-7	3	$142,350	$0	3	$0	$0
80	CC	1007425860	AGUIRRE TUMAY JOHON FREDY	230301	2	$94,900	$15,200	EPS037	2	$94,900	$3,800	CCF69	2	$94,900	$3,800	14-7	2	$94,900	$0	2	$0	$0
81	CC	1007425860	AGUIRRE TUMAY JOHON FREDY	230301	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF69	1	$47,450	$1,900	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
82	CC	1121952125	ALARCON GARCIA BRAYAM SEBASTIAN	231001	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF69	1	$0	$0	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
83	CC	1121952125	ALARCON GARCIA BRAYAM SEBASTIAN	231001	1	$62,258	$10,000	EPS037	1	$62,258	$2,500	CCF69	1	$62,203	$2,500	14-7	1	$62,258	$0	1	$0	$0
84	CC	1121952125	ALARCON GARCIA BRAYAM SEBASTIAN	231001	1	$62,258	$10,000	EPS037	1	$62,258	$2,500	CCF69	1	$62,203	$2,500	14-7	1	$62,258	$0	1	$0	$0
85	CC	1121952125	ALARCON GARCIA BRAYAM SEBASTIAN	231001	3	$186,773	$29,900	EPS037	3	$186,773	$7,500	CCF69	3	$186,610	$7,500	14-7	3	$186,773	$0	3	$0	$0
86	CC	4166413	ALFONSO REYES SERGIO HECTOR	230301	3	$360,232	$57,700	EPS037	3	$360,232	$14,500	CCF69	3	$275,596	$11,100	14-7	3	$360,232	$0	3	$0	$0
87	CC	4166413	ALFONSO REYES SERGIO HECTOR	230301	3	$360,232	$57,700	EPS037	3	$360,232	$14,500	CCF69	3	$268,596	$10,800	14-7	3	$360,232	$0	3	$0	$0
88	CC	4166413	ALFONSO REYES SERGIO HECTOR	230301	1	$120,078	$19,300	EPS037	1	$120,078	$4,900	CCF69	1	$87,199	$3,500	14-7	1	$120,078	$0	1	$0	$0
89	CC	4150433	ALGARRA PINEDA JOSE VICENTE	230301	3	$186,834	$29,900	EPS041	3	$186,834	$7,500	CCF69	3	$188,031	$7,600	14-7	3	$186,834	$0	3	$0	$0
90	CC	4150433	ALGARRA PINEDA JOSE VICENTE	230301	4	$249,112	$39,900	EPS041	4	$249,112	$10,000	CCF69	4	$250,707	$10,100	14-7	4	$249,112	$0	4	$0	$0
91	CC	8526330	ANAYA PORRAS ELKIN RAFAEL	230201	1	$80,001	$12,900	EPS037	1	$80,001	$3,300	CCF69	1	$79,556	$3,200	14-7	1	$80,001	$0	1	$0	$0
92	CC	8526330	ANAYA PORRAS ELKIN RAFAEL	230201	3	$240,001	$28,900	EPS037	3	$240,001	$0	CCF69	3	$0	$0	14-7	3	$240,001	$0	3	$0	$0
93	CC	8526330	ANAYA PORRAS ELKIN RAFAEL	230201	1	$80,001	$9,700	EPS037	1	$80,001	$0	CCF69	1	$0	$0	14-7	1	$80,001	$0	1	$0	$0
94	CC	8526330	ANAYA PORRAS ELKIN RAFAEL	230201	1	$80,001	$9,700	EPS037	1	$80,001	$0	CCF69	1	$0	$0	14-7	1	$80,001	$0	1	$0	$0
95	CC	8526330	ANAYA PORRAS ELKIN RAFAEL	230201	1	$79,998	$9,600	EPS037	1	$79,998	$0	CCF69	1	$0	$0	14-7	1	$79,998	$0	1	$0	$0
96	CC	1115950528	ANDRADE VARGAS JESUS DAVID	230301	1	$94,249	$15,100	EPS037	1	$94,249	$3,800	CCF69	1	$85,245	$3,500	14-7	1	$94,249	$0	1	$0	$0
97	CC	1115950528	ANDRADE VARGAS JESUS DAVID	230301	3	$282,747	$45,300	EPS037	3	$282,747	$11,400	CCF69	3	$253,900	$10,200	14-7	3	$282,747	$0	3	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
98	CC	1115950528	ANDRADE VARGAS JESUS DAVID	230301	1	$94,249	$15,100	EPS037	1	$94,249	$3,800	CCF69	1	$82,800	$3,400	14-7	1	$94,249	$0	1	$0	$0
99	CC	1002455303	ANGARITA CRISTANCHO DAVID BAYARDO	230301	1	$113,172	$18,200	EPS041	1	$113,172	$4,600	CCF69	1	$67,997	$2,800	14-7	1	$113,172	$0	1	$0	$0
100	CC	1002455303	ANGARITA CRISTANCHO DAVID BAYARDO	230301	3	$339,514	$54,400	EPS041	3	$339,514	$13,600	CCF69	3	$203,992	$8,200	14-7	3	$339,514	$0	3	$0	$0
101	CC	1002455303	ANGARITA CRISTANCHO DAVID BAYARDO	230301	1	$113,172	$18,200	EPS041	1	$113,172	$4,600	CCF69	1	$67,997	$2,800	14-7	1	$113,172	$0	1	$0	$0
102	CC	1115724444	ARENIS HERNANDEZ FERNEY	230301	1	$47,450	$7,600	EPS041	1	$47,450	$1,900	CCF69	1	$47,450	$1,900	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
103	CC	1115724444	ARENIS HERNANDEZ FERNEY	230301	3	$142,350	$22,800	EPS041	3	$142,350	$5,700	CCF69	3	$142,350	$5,700	14-7	3	$142,350	$0	3	$0	$0
104	CC	1115724444	ARENIS HERNANDEZ FERNEY	230301	1	$47,450	$7,600	EPS041	1	$47,450	$1,900	CCF69	1	$47,450	$1,900	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
105	CC	1046338637	AREVALO SOTO FRAY LUIS	231001	8	$898,428	$107,900	EPS002	8	$898,428	$0	CCF69	8	$0	$0	14-7	8	$898,428	$0	8	$0	$0
106	CC	1128054221	ARIAS TORRES JAVIER ENRIQUE	230301	1	$84,189	$13,500	EPS002	1	$84,189	$3,400	CCF69	1	$83,342	$3,400	14-7	1	$84,189	$0	1	$0	$0
107	CC	1128054221	ARIAS TORRES JAVIER ENRIQUE	230301	1	$84,189	$13,500	EPS002	1	$84,189	$3,400	CCF69	1	$82,786	$3,400	14-7	1	$84,189	$0	1	$0	$0
108	CC	1128054221	ARIAS TORRES JAVIER ENRIQUE	230301	3	$252,567	$40,500	EPS002	3	$252,567	$10,200	CCF69	3	$246,692	$9,900	14-7	3	$252,567	$0	3	$0	$0
109	CC	23791557	AVELLANEDA CONDE EDIT ISOLINA	230301	1	$47,450	$7,600	EPSC25	1	$47,450	$1,900	CCF69	1	$47,450	$1,900	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
110	CC	23791557	AVELLANEDA CONDE EDIT ISOLINA	230301	1	$47,450	$7,600	EPSC25	1	$47,450	$1,900	CCF69	1	$47,450	$1,900	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
111	CC	23791557	AVELLANEDA CONDE EDIT ISOLINA	230301	3	$142,350	$22,800	EPSC25	3	$142,350	$5,700	CCF69	3	$142,350	$5,700	14-7	3	$142,350	$0	3	$0	$0
112	CC	24006282	AVELLANEDA OLGA YAZMIN	230301	3	$154,587	$18,600	EPS037	3	$154,587	$0	CCF69	3	$0	$0	14-7	3	$154,587	$0	3	$0	$0
113	CC	24006282	AVELLANEDA OLGA YAZMIN	230301	4	$189,800	$30,400	EPS037	4	$189,800	$7,600	CCF69	4	$0	$0	14-7	4	$189,800	$0	4	$0	$0
114	CC	24006282	AVELLANEDA OLGA YAZMIN	230301	5	$237,250	$38,000	EPS037	5	$237,250	$9,500	CCF69	5	$0	$0	14-7	5	$237,250	$0	5	$0	$0
115	CC	24006282	AVELLANEDA OLGA YAZMIN	230301	2	$103,058	$16,500	EPS037	2	$103,058	$4,200	CCF69	2	$94,900	$3,800	14-7	2	$103,058	$0	2	$0	$0
116	CC	74770238	AVILA LAITON EDWIN ALEXIS	230201	1	$96,524	$15,500	EPSC25	1	$96,524	$3,900	CCF69	1	$66,814	$2,700	14-7	1	$96,524	$0	1	$0	$0
117	CC	74770238	AVILA LAITON EDWIN ALEXIS	230201	5	$482,616	$77,300	EPSC25	5	$482,616	$19,400	CCF69	5	$334,068	$13,400	14-7	5	$482,616	$0	5	$0	$0
118	CC	74770238	AVILA LAITON EDWIN ALEXIS	230201	3	$289,570	$34,800	EPSC25	3	$289,570	$0	CCF69	3	$0	$0	14-7	3	$289,570	$0	3	$0	$0
119	CC	13492780	BARON TORRES EDUARDO	230301	1	$122,982	$19,700	EPS005	1	$122,982	$5,000	CCF69	1	$90,000	$3,600	14-7	1	$122,982	$0	1	$0	$0
120	CC	13492780	BARON TORRES EDUARDO	230301	1	$122,982	$19,700	EPS005	1	$122,982	$5,000	CCF69	1	$89,222	$3,600	14-7	1	$122,982	$0	1	$0	$0
121	CC	13492780	BARON TORRES EDUARDO	230301	1	$122,982	$19,700	EPS005	1	$122,982	$5,000	CCF69	1	$88,444	$3,600	14-7	1	$122,982	$0	1	$0	$0
122	CC	13492780	BARON TORRES EDUARDO	230301	2	$245,964	$29,600	EPS005	2	$245,964	$0	CCF69	2	$0	$0	14-7	2	$245,964	$0	2	$0	$0
123	CC	74860739	BARRERA COBA TEATIN	230301	1	$102,691	$16,500	EPS005	1	$102,691	$4,200	CCF69	1	$66,667	$2,700	14-7	1	$102,691	$0	1	$0	$0
124	CC	74860739	BARRERA COBA TEATIN	230301	3	$308,073	$49,300	EPS005	3	$308,073	$12,400	CCF69	3	$200,000	$8,000	14-7	3	$308,073	$0	3	$0	$0
125	CC	74860739	BARRERA COBA TEATIN	230301	1	$102,691	$16,500	EPS005	1	$102,691	$4,200	CCF69	1	$66,667	$2,700	14-7	1	$102,691	$0	1	$0	$0
126	CC	74860739	BARRERA COBA TEATIN	230301	2	$205,382	$32,900	EPS005	2	$205,382	$8,300	CCF69	2	$133,334	$5,400	14-7	2	$205,382	$0	2	$0	$0
127	CC	17649031	BENAVIDEZ ORTIZ LUIS ALBERTO	230301	1	$107,756	$17,300	EPS037	1	$107,756	$4,400	CCF69	1	$90,369	$3,700	14-7	1	$107,756	$0	1	$0	$0
128	CC	17649031	BENAVIDEZ ORTIZ LUIS ALBERTO	230301	3	$323,266	$51,800	EPS037	3	$323,266	$13,000	CCF69	3	$268,775	$10,800	14-7	3	$323,266	$0	3	$0	$0
129	CC	17649031	BENAVIDEZ ORTIZ LUIS ALBERTO	230301	2	$215,511	$34,500	EPS037	2	$215,511	$8,700	CCF69	2	$174,516	$7,000	14-7	2	$215,511	$0	2	$0	$0
130	CC	17649031	BENAVIDEZ ORTIZ LUIS ALBERTO	230301	1	$107,756	$17,300	EPS037	1	$107,756	$4,400	CCF69	1	$85,703	$3,500	14-7	1	$107,756	$0	1	$0	$0
131	CC	92276349	BERTEL ORDOSGOITIA ALBERTO JOSE	230301	1	$62,278	$10,000	EPS002	1	$62,278	$2,500	CCF69	1	$62,728	$2,600	14-7	1	$62,278	$0	1	$0	$0
132	CC	92276349	BERTEL ORDOSGOITIA ALBERTO JOSE	230301	3	$186,834	$29,900	EPS002	3	$186,834	$7,500	CCF69	3	$188,183	$7,600	14-7	3	$186,834	$0	3	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
133	CC	92276349	BERTEL ORDOSGOITIA ALBERTO JOSE	230301	5	$311,389	$49,900	EPS002	5	$311,389	$12,500	CCF69	5	$313,639	$12,600	14-7	5	$311,389	$0	5	$0	$0
134	CC	92276349	BERTEL ORDOSGOITIA ALBERTO JOSE	230301	4	$249,112	$39,900	EPS002	4	$249,112	$10,000	CCF69	4	$250,911	$10,100	14-7	4	$249,112	$0	4	$0	$0
135	CC	1069470320	BOLAÑO COGOLLO JORGE ANDRES	230301	1	$66,274	$10,700	EPS041	1	$66,274	$2,700	CCF69	1	$65,000	$2,600	14-7	1	$66,274	$0	1	$0	$0
136	CC	1069470320	BOLAÑO COGOLLO JORGE ANDRES	230301	3	$198,820	$31,900	EPS041	3	$198,820	$8,000	CCF69	3	$193,833	$7,800	14-7	3	$198,820	$0	3	$0	$0
137	CC	1069470320	BOLAÑO COGOLLO JORGE ANDRES	230301	1	$66,274	$10,700	EPS041	1	$66,274	$2,700	CCF69	1	$63,444	$2,600	14-7	1	$66,274	$0	1	$0	$0
138	CC	1118146599	BOTHIA CORREA YON ALBEIRO	230301	1	$97,159	$15,600	EPS017	1	$97,159	$3,900	CCF69	1	$67,824	$2,800	14-7	1	$97,159	$0	1	$0	$0
139	CC	1118146599	BOTHIA CORREA YON ALBEIRO	230301	3	$291,476	$46,700	EPS017	3	$291,476	$11,700	CCF69	3	$203,472	$8,200	14-7	3	$291,476	$0	3	$0	$0
140	CC	1118146599	BOTHIA CORREA YON ALBEIRO	230301	1	$97,159	$15,600	EPS017	1	$97,159	$3,900	CCF69	1	$67,824	$2,800	14-7	1	$97,159	$0	1	$0	$0
141	CC	1118146046	BOTTIA RODRIGUEZ RONAL	230301	2	$100,232	$16,100	EPSC25	2	$100,232	$4,100	CCF69	2	$94,900	$3,800	14-7	2	$100,232	$0	2	$0	$0
142	CC	1118146046	BOTTIA RODRIGUEZ RONAL	230301	3	$150,348	$18,100	EPSC25	3	$150,348	$0	CCF69	3	$0	$0	14-7	3	$150,348	$0	3	$0	$0
143	CC	92694111	BUELVAS SALCEDO RICHAR	230301	1	$98,560	$15,800	EPS002	1	$98,560	$4,000	CCF69	1	$95,010	$3,900	14-7	1	$98,560	$0	1	$0	$0
144	CC	92694111	BUELVAS SALCEDO RICHAR	230301	3	$295,678	$47,400	EPS002	3	$295,678	$11,900	CCF69	3	$283,864	$11,400	14-7	3	$295,678	$0	3	$0	$0
145	CC	92694111	BUELVAS SALCEDO RICHAR	230301	3	$295,678	$47,400	EPS002	3	$295,678	$11,900	CCF69	3	$280,364	$11,300	14-7	3	$295,678	$0	3	$0	$0
146	CC	1057690525	BUENO BARRETO DIEGO ALEXANDER	230301	3	$149,004	$23,900	EPS037	3	$149,004	$6,000	CCF69	3	$159,350	$6,400	14-7	3	$149,004	$0	3	$0	$0
147	CC	1057690525	BUENO BARRETO DIEGO ALEXANDER	230301	2	$99,336	$15,900	EPS037	2	$99,336	$4,000	CCF69	2	$105,100	$4,300	14-7	2	$99,336	$0	2	$0	$0
148	CC	1116864144	BUENO HERNANDEZ YEISON	230301	1	$115,415	$18,500	EPS005	1	$115,415	$4,700	CCF69	1	$86,667	$3,500	14-7	1	$115,415	$0	1	$0	$0
149	CC	1116864144	BUENO HERNANDEZ YEISON	230301	2	$230,829	$37,000	EPS005	2	$230,829	$9,300	CCF69	2	$172,444	$6,900	14-7	2	$230,829	$0	2	$0	$0
150	CC	1116864144	BUENO HERNANDEZ YEISON	230301	1	$115,415	$13,900	EPS005	1	$115,415	$0	CCF69	1	$0	$0	14-7	1	$115,415	$0	1	$0	$0
151	CC	1116864144	BUENO HERNANDEZ YEISON	230301	1	$115,415	$18,500	EPS005	1	$115,415	$4,700	CCF69	1	$84,889	$3,400	14-7	1	$115,415	$0	1	$0	$0
152	CC	1116855707	CAMARGO SALON HENRY	25-14	3	$163,014	$19,600	EPSC25	3	$163,014	$0	CCF69	3	$0	$0	14-7	3	$163,014	$0	3	$0	$0
153	CC	1116855707	CAMARGO SALON HENRY	25-14	2	$108,676	$17,400	EPSC25	2	$108,676	$4,400	CCF69	2	$94,900	$3,800	14-7	2	$108,676	$0	2	$0	$0
154	CC	1118649687	CAMARGO SALON YIMI	230301	2	$113,831	$18,300	EPSC25	2	$113,831	$4,600	CCF69	2	$94,920	$3,800	14-7	2	$113,831	$0	2	$0	$0
155	CC	1118649687	CAMARGO SALON YIMI	230301	3	$170,746	$20,500	EPSC25	3	$170,746	$0	CCF69	3	$0	$0	14-7	3	$170,746	$0	3	$0	$0
156	CC	5889335	CAMPOS RUIZ JESUS ALBERTO	25-14	3	$372,003	$59,600	EPS037	3	$372,003	$14,900	CCF69	3	$251,395	$10,100	14-7	3	$372,003	$0	3	$0	$0
157	CC	5889335	CAMPOS RUIZ JESUS ALBERTO	25-14	5	$620,004	$99,300	EPS037	5	$620,004	$24,900	CCF69	5	$410,658	$16,500	14-7	5	$620,004	$0	5	$0	$0
158	CC	5889335	CAMPOS RUIZ JESUS ALBERTO	25-14	3	$372,003	$59,600	EPS037	3	$372,003	$14,900	CCF69	3	$238,062	$9,600	14-7	3	$372,003	$0	3	$0	$0
159	CC	5889335	CAMPOS RUIZ JESUS ALBERTO	25-14	1	$124,001	$19,900	EPS037	1	$124,001	$5,000	CCF69	1	$77,687	$3,200	14-7	1	$124,001	$0	1	$0	$0
160	CC	5889335	CAMPOS RUIZ JESUS ALBERTO	25-14	3	$372,003	$59,600	EPS037	3	$372,003	$14,900	CCF69	3	$231,395	$9,300	14-7	3	$372,003	$0	3	$0	$0
161	CC	74847409	CARDENAS MARIÑO CARLOS NORBERTO	25-14	1	$108,182	$17,400	EPS037	1	$108,182	$4,400	CCF69	1	$90,564	$3,700	14-7	1	$108,182	$0	1	$0	$0
162	CC	74847409	CARDENAS MARIÑO CARLOS NORBERTO	25-14	3	$324,544	$52,000	EPS037	3	$324,544	$13,000	CCF69	3	$269,358	$10,800	14-7	3	$324,544	$0	3	$0	$0
163	CC	74847409	CARDENAS MARIÑO CARLOS NORBERTO	25-14	3	$324,544	$52,000	EPS037	3	$324,544	$13,000	CCF69	3	$262,358	$10,500	14-7	3	$324,544	$0	3	$0	$0
164	CC	74381647	CARRILLO CALDERON JOSE ALEXANDER	230301	1	$62,278	$10,000	EPSC25	1	$62,278	$2,500	CCF69	1	$61,161	$2,500	14-7	1	$62,278	$0	1	$0	$0
165	CC	74381647	CARRILLO CALDERON JOSE ALEXANDER	230301	1	$62,278	$10,000	EPSC25	1	$62,278	$2,500	CCF69	1	$61,161	$2,500	14-7	1	$62,278	$0	1	$0	$0
166	CC	74381647	CARRILLO CALDERON JOSE ALEXANDER	230301	1	$62,278	$10,000	EPSC25	1	$62,278	$2,500	CCF69	1	$61,161	$2,500	14-7	1	$62,278	$0	1	$0	$0
167	CC	74381647	CARRILLO CALDERON JOSE ALEXANDER	230301	2	$124,556	$15,000	EPSC25	2	$124,556	$0	CCF69	2	$0	$0	14-7	2	$124,556	$0	2	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
168	CC	46457760	CARRILLO SUAREZ LEIDY MASSIEL	230301	1	$67,667	$10,900	EPSC25	1	$67,667	$2,800	CCF69	1	$70,000	$2,800	14-7	1	$67,667	$0	1	$0	$0
169	CC	46457760	CARRILLO SUAREZ LEIDY MASSIEL	230301	2	$135,334	$21,700	EPSC25	2	$135,334	$5,500	CCF69	2	$140,000	$5,600	14-7	2	$135,334	$0	2	$0	$0
170	CC	46457760	CARRILLO SUAREZ LEIDY MASSIEL	230301	1	$67,667	$10,900	EPSC25	1	$67,667	$2,800	CCF69	1	$70,000	$2,800	14-7	1	$67,667	$0	1	$0	$0
171	CC	46457760	CARRILLO SUAREZ LEIDY MASSIEL	230301	1	$67,667	$8,200	EPSC25	1	$67,667	$0	CCF69	1	$0	$0	14-7	1	$67,667	$0	1	$0	$0
172	CC	1075268	CARRILLO TELLES SIMON	230301	3	$142,350	$22,800	EPSC25	3	$142,350	$5,700	CCF69	3	$142,350	$5,700	14-7	3	$142,350	$0	3	$0	$0
173	CC	1075268	CARRILLO TELLES SIMON	230301	2	$94,900	$15,200	EPSC25	2	$94,900	$3,800	CCF69	2	$94,900	$3,800	14-7	2	$94,900	$0	2	$0	$0
174	CC	1115863426	CARVAJAL MARQUEZ GIOVANNY ALFREDO	25-14	1	$89,258	$14,300	EPSC25	1	$89,258	$3,600	CCF69	1	$66,687	$2,700	14-7	1	$89,258	$0	1	$0	$0
175	CC	1115863426	CARVAJAL MARQUEZ GIOVANNY ALFREDO	25-14	3	$267,772	$42,900	EPSC25	3	$267,772	$10,800	CCF69	3	$200,062	$8,100	14-7	3	$267,772	$0	3	$0	$0
176	CC	1115863426	CARVAJAL MARQUEZ GIOVANNY ALFREDO	25-14	5	$446,287	$71,500	EPSC25	5	$446,287	$17,900	CCF69	5	$333,437	$13,400	14-7	5	$446,287	$0	5	$0	$0
177	CC	1115863426	CARVAJAL MARQUEZ GIOVANNY ALFREDO	25-14	2	$178,515	$28,600	EPSC25	2	$178,515	$7,200	CCF69	2	$133,375	$5,400	14-7	2	$178,515	$0	2	$0	$0
178	CC	1115863426	CARVAJAL MARQUEZ GIOVANNY ALFREDO	25-14	1	$89,258	$14,300	EPSC25	1	$89,258	$3,600	CCF69	1	$66,687	$2,700	14-7	1	$89,258	$0	1	$0	$0
179	CC	1052313594	CARVAJAL SOLANO JOSE INAEL	230301	3	$189,140	$30,300	EPSC25	3	$189,140	$7,600	CCF69	3	$190,000	$7,600	14-7	3	$189,140	$0	3	$0	$0
180	CC	1052313594	CARVAJAL SOLANO JOSE INAEL	230301	2	$126,094	$20,200	EPSC25	2	$126,094	$5,100	CCF69	2	$124,000	$5,000	14-7	2	$126,094	$0	2	$0	$0
181	CC	7334813	CASTAÑEDA AREVALO OSCAR JAVIER	230301	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF69	1	$47,472	$1,900	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
182	CC	7334813	CASTAÑEDA AREVALO OSCAR JAVIER	230301	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF69	1	$47,472	$1,900	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
183	CC	7334813	CASTAÑEDA AREVALO OSCAR JAVIER	230301	3	$142,350	$22,800	EPS037	3	$142,350	$5,700	CCF69	3	$142,415	$5,700	14-7	3	$142,350	$0	3	$0	$0
184	CC	7334813	CASTAÑEDA AREVALO OSCAR JAVIER	230301	3	$142,350	$22,800	EPS037	3	$142,350	$5,700	CCF69	3	$142,415	$5,700	14-7	3	$142,350	$0	3	$0	$0
185	CC	1118146242	CERINZA BAEZ JOSE RAFAEL	230301	3	$176,249	$28,200	EPSC25	3	$176,249	$7,100	CCF69	3	$142,383	$5,700	14-7	3	$176,249	$0	3	$0	$0
186	CC	1118146242	CERINZA BAEZ JOSE RAFAEL	230301	2	$117,500	$18,800	EPSC25	2	$117,500	$4,700	CCF69	2	$94,922	$3,800	14-7	2	$117,500	$0	2	$0	$0
187	CC	1002725672	CETINA MARTINEZ PEDRO STIBEN	230301	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF69	1	$47,450	$1,900	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
188	CC	1002725672	CETINA MARTINEZ PEDRO STIBEN	230301	3	$142,350	$22,800	EPS037	3	$142,350	$5,700	CCF69	3	$142,367	$5,700	14-7	3	$142,350	$0	3	$0	$0
189	CC	1002725672	CETINA MARTINEZ PEDRO STIBEN	230301	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF69	1	$47,450	$1,900	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
190	CC	1002725672	CETINA MARTINEZ PEDRO STIBEN	230301	1	$47,450	$5,700	EPS037	1	$47,450	$0	CCF69	1	$0	$0	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
191	CC	1116913586	CHAUX GUTIERREZ YAMITH	230301	1	$97,550	$15,700	ESSC62	1	$97,550	$4,000	CCF69	1	$85,091	$3,500	14-7	1	$97,550	$0	1	$0	$0
192	CC	1116913586	CHAUX GUTIERREZ YAMITH	230301	3	$292,649	$46,900	ESSC62	3	$292,649	$11,800	CCF69	3	$253,440	$10,200	14-7	3	$292,649	$0	3	$0	$0
193	CC	1116913586	CHAUX GUTIERREZ YAMITH	230301	1	$97,550	$15,700	ESSC62	1	$97,550	$4,000	CCF69	1	$82,647	$3,400	14-7	1	$97,550	$0	1	$0	$0
194	CC	3817670	CHICO MELENDRES JOSE	25-14	2	$113,266	$18,200	EPS002	2	$113,266	$4,600	CCF69	2	$108,233	$4,400	14-7	2	$113,266	$0	2	$0	$0
195	CC	3817670	CHICO MELENDRES JOSE	25-14	3	$169,899	$27,200	EPS002	3	$169,899	$6,800	CCF69	3	$161,017	$6,500	14-7	3	$169,899	$0	3	$0	$0
196	CC	3817670	CHICO MELENDRES JOSE	25-14	3	$169,899	$27,200	EPS002	3	$169,899	$6,800	CCF69	3	$159,017	$6,400	14-7	3	$169,899	$0	3	$0	$0
197	CC	3817670	CHICO MELENDRES JOSE	25-14	1	$56,633	$9,100	EPS002	1	$56,633	$2,300	CCF69	1	$52,339	$2,100	14-7	1	$56,633	$0	1	$0	$0
198	CC	1115852898	CORDOBA GUANAY OSCAR REYNEL	230301	3	$265,228	$42,500	EPS037	3	$265,228	$10,700	CCF69	3	$203,062	$8,200	14-7	3	$265,228	$0	3	$0	$0
199	CC	1115852898	CORDOBA GUANAY OSCAR REYNEL	230301	5	$442,046	$70,800	EPS037	5	$442,046	$17,700	CCF69	5	$338,437	$13,600	14-7	5	$442,046	$0	5	$0	$0
200	CC	1115852898	CORDOBA GUANAY OSCAR REYNEL	230301	4	$353,637	$56,600	EPS037	4	$353,637	$14,200	CCF69	4	$270,750	$10,900	14-7	4	$353,637	$0	4	$0	$0
201	CC	1116555468	CORREA PEDRAZA KAROL SOFIA	230301	3	$150,000	$24,000	EPSC25	3	$150,000	$6,000	CCF69	3	$150,000	$6,000	14-7	3	$150,000	$0	3	$0	$0
202	CC	1116555468	CORREA PEDRAZA KAROL SOFIA	230301	2	$100,000	$16,000	EPSC25	2	$100,000	$4,000	CCF69	2	$100,000	$4,000	14-7	2	$100,000	$0	2	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
203	CC	1116555468	CORREA PEDRAZA KAROL SOFIA	230301	2	$100,000	$16,000	EPSC25	2	$100,000	$4,000	CCF69	2	$100,000	$4,000	14-7	2	$100,000	$0	2	$0	$0
204	CC	1116555468	CORREA PEDRAZA KAROL SOFIA	230301	6	$284,700	$45,600	EPSC25	6	$284,700	$11,400	CCF69	6	$0	$0	14-7	6	$284,700	$0	6	$0	$0
205	CC	1116555468	CORREA PEDRAZA KAROL SOFIA	230301	1	$50,000	$8,000	EPSC25	1	$50,000	$2,000	CCF69	1	$50,000	$2,000	14-7	1	$50,000	$0	1	$0	$0
206	CC	1116852272	COTRINA VALBUENA ERIKA MAYERLY	230301	3	$142,350	$22,800	EPS005	3	$142,350	$5,700	CCF69	3	$142,350	$5,700	14-7	3	$142,350	$0	3	$0	$0
207	CC	1116852272	COTRINA VALBUENA ERIKA MAYERLY	230301	2	$94,900	$15,200	EPS005	2	$94,900	$3,800	CCF69	2	$94,900	$3,800	14-7	2	$94,900	$0	2	$0	$0
208	CC	1057587987	CRUZ LONDOÑO JOHN FREDY	230301	3	$199,828	$32,000	EPS037	3	$199,828	$8,000	CCF69	3	$142,350	$5,700	14-7	3	$199,828	$0	3	$0	$0
209	CC	1057587987	CRUZ LONDOÑO JOHN FREDY	230301	2	$133,219	$21,400	EPS037	2	$133,219	$5,400	CCF69	2	$94,900	$3,800	14-7	2	$133,219	$0	2	$0	$0
210	CC	1004074735	CUBIDES SERRANO JUAN SEBASTIAN	230301	1	$110,163	$17,700	ESSC62	1	$110,163	$4,500	CCF69	1	$90,240	$3,700	14-7	1	$110,163	$0	1	$0	$0
211	CC	1004074735	CUBIDES SERRANO JUAN SEBASTIAN	230301	3	$330,488	$52,900	ESSC62	3	$330,488	$13,300	CCF69	3	$268,387	$10,800	14-7	3	$330,488	$0	3	$0	$0
212	CC	1004074735	CUBIDES SERRANO JUAN SEBASTIAN	230301	5	$550,813	$88,200	ESSC62	5	$550,813	$22,100	CCF69	5	$435,645	$17,500	14-7	5	$550,813	$0	5	$0	$0
213	CC	1004074735	CUBIDES SERRANO JUAN SEBASTIAN	230301	3	$330,488	$52,900	ESSC62	3	$330,488	$13,300	CCF69	3	$249,720	$10,000	14-7	3	$330,488	$0	3	$0	$0
214	CC	1006532233	CUY PEDRO JOSE	230301	3	$145,954	$23,400	EPS017	3	$145,954	$5,900	CCF69	3	$142,350	$5,700	14-7	3	$145,954	$0	3	$0	$0
215	CC	1006532233	CUY PEDRO JOSE	230301	2	$97,303	$15,600	EPS017	2	$97,303	$3,900	CCF69	2	$94,900	$3,800	14-7	2	$97,303	$0	2	$0	$0
216	CC	1064112889	DEL RIO TORRES MARCIAL ANDRES	230201	1	$93,889	$15,100	EPS002	1	$93,889	$3,800	CCF69	1	$93,333	$3,800	14-7	1	$93,889	$0	1	$0	$0
217	CC	1064112889	DEL RIO TORRES MARCIAL ANDRES	230201	1	$93,889	$15,100	EPS002	1	$93,889	$3,800	CCF69	1	$92,778	$3,800	14-7	1	$93,889	$0	1	$0	$0
218	CC	1064112889	DEL RIO TORRES MARCIAL ANDRES	230201	3	$281,667	$33,900	EPS002	3	$281,667	$0	CCF69	3	$0	$0	14-7	3	$281,667	$0	3	$0	$0
219	CC	7366390	DELGADILLO EDGAR YAMID	230301	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF69	1	$47,450	$1,900	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
220	CC	7366390	DELGADILLO EDGAR YAMID	230301	3	$142,350	$22,800	EPS037	3	$142,350	$5,700	CCF69	3	$142,350	$5,700	14-7	3	$142,350	$0	3	$0	$0
221	CC	7366390	DELGADILLO EDGAR YAMID	230301	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF69	1	$47,450	$1,900	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
222	CC	1101756178	DIAZ DIAZ NESTOR AUGUSTO	230301	3	$260,667	$41,800	EPS037	3	$260,667	$10,500	CCF69	3	$260,000	$10,400	14-7	3	$260,667	$0	3	$0	$0
223	CC	1101756178	DIAZ DIAZ NESTOR AUGUSTO	230301	2	$173,778	$27,900	EPS037	2	$173,778	$7,000	CCF69	2	$172,000	$6,900	14-7	2	$173,778	$0	2	$0	$0
224	CC	1047377657	ESCOBAR CHABERRA JESUS ARIEL	230301	3	$179,749	$28,800	EPS037	3	$179,749	$7,200	CCF69	3	$159,366	$6,400	14-7	3	$179,749	$0	3	$0	$0
225	CC	1047377657	ESCOBAR CHABERRA JESUS ARIEL	230301	2	$119,833	$19,200	EPS037	2	$119,833	$4,800	CCF69	2	$105,111	$4,300	14-7	2	$119,833	$0	2	$0	$0
226	CC	1029642389	ESTRADA LOPEZ JUAN DAVID	25-14	1	$47,450	$7,600	EPSC25	1	$47,450	$1,900	CCF69	1	$47,450	$1,900	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
227	CC	1029642389	ESTRADA LOPEZ JUAN DAVID	25-14	3	$142,350	$22,800	EPSC25	3	$142,350	$5,700	CCF69	3	$142,350	$5,700	14-7	3	$142,350	$0	3	$0	$0
228	CC	1029642389	ESTRADA LOPEZ JUAN DAVID	25-14	1	$47,450	$7,600	EPSC25	1	$47,450	$1,900	CCF69	1	$47,450	$1,900	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
229	CC	1029642389	ESTRADA LOPEZ JUAN DAVID	25-14	2	$94,900	$11,400	EPSC25	2	$94,900	$0	CCF69	2	$0	$0	14-7	2	$94,900	$0	2	$0	$0
230	CC	1029642389	ESTRADA LOPEZ JUAN DAVID	25-14	1	$54,788	$6,600	EPSC25	1	$54,788	$0	CCF69	1	$0	$0	14-7	1	$54,788	$0	1	$0	$0
231	CC	10820688	FUENTES ZAPA CARLOS JOSE	230301	1	$71,029	$11,400	EPS005	1	$71,029	$2,900	CCF69	1	$70,000	$2,800	14-7	1	$71,029	$0	1	$0	$0
232	CC	10820688	FUENTES ZAPA CARLOS JOSE	230301	3	$213,087	$34,100	EPS005	3	$213,087	$8,600	CCF69	3	$209,000	$8,400	14-7	3	$213,087	$0	3	$0	$0
233	CC	10820688	FUENTES ZAPA CARLOS JOSE	230301	5	$355,145	$56,900	EPS005	5	$355,145	$14,300	CCF69	5	$343,333	$13,800	14-7	5	$355,145	$0	5	$0	$0
234	CC	10820688	FUENTES ZAPA CARLOS JOSE	230301	1	$71,029	$11,400	EPS005	1	$71,029	$2,900	CCF69	1	$67,000	$2,700	14-7	1	$71,029	$0	1	$0	$0
235	CC	78767988	GALVAN MONTES LUIS FERNANDO	230301	1	$78,515	$12,600	EPSC25	1	$78,515	$3,200	CCF69	1	$73,338	$3,000	14-7	1	$78,515	$0	1	$0	$0
236	CC	78767988	GALVAN MONTES LUIS FERNANDO	230301	3	$235,544	$37,700	EPSC25	3	$235,544	$9,500	CCF69	3	$220,014	$8,900	14-7	3	$235,544	$0	3	$0	$0
237	CC	78767988	GALVAN MONTES LUIS FERNANDO	230301	1	$78,515	$12,600	EPSC25	1	$78,515	$3,200	CCF69	1	$73,338	$3,000	14-7	1	$78,515	$0	1	$0	$0
238	CC	85456665	GARCIA TORRES DAIRO ENRIQUE	231001	2	$103,884	$16,700	EPS037	2	$103,884	$4,200	CCF69	2	$94,927	$3,800	14-7	2	$103,884	$0	2	$0	$0
239	CC	85456665	GARCIA TORRES DAIRO ENRIQUE	231001	3	$155,826	$25,000	EPS037	3	$155,826	$6,300	CCF69	3	$142,390	$5,700	14-7	3	$155,826	$0	3	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
240	CC	1007403738	GARCIA BELLO JOHON JAIRO	230301	2	$101,147	$16,200	EPS037	2	$101,147	$4,100	CCF69	2	$94,933	$3,800	14-7	2	$101,147	$0	2	$0	$0
241	CC	1007403738	GARCIA BELLO JOHON JAIRO	230301	3	$151,720	$24,300	EPS037	3	$151,720	$6,100	CCF69	3	$142,399	$5,700	14-7	3	$151,720	$0	3	$0	$0
242	CC	1116868324	GIRON MURILLO JHON PARMENIO	230301	1	$92,337	$14,800	EPS037	1	$92,337	$3,700	CCF69	1	$90,000	$3,600	14-7	1	$92,337	$0	1	$0	$0
243	CC	1116868324	GIRON MURILLO JHON PARMENIO	230301	3	$277,010	$44,400	EPS037	3	$277,010	$11,100	CCF69	3	$268,333	$10,800	14-7	3	$277,010	$0	3	$0	$0
244	CC	1116868324	GIRON MURILLO JHON PARMENIO	230301	1	$92,337	$14,800	EPS037	1	$92,337	$3,700	CCF69	1	$87,778	$3,600	14-7	1	$92,337	$0	1	$0	$0
245	CC	1064108822	GOMEZ PARODY JAYER ANTONIO	230201	16	$1,226,667	$147,300	EPS002	16	$1,226,667	$0	CCF69	16	$0	$0	14-7	16	$1,226,667	$0	16	$0	$0
246	CC	8525727	GOMEZ DITA JOSE LUIS	230301	1	$117,567	$18,900	EPS002	1	$117,567	$4,800	CCF69	1	$76,721	$3,100	14-7	1	$117,567	$0	1	$0	$0
247	CC	8525727	GOMEZ DITA JOSE LUIS	230301	3	$352,700	$56,500	EPS002	3	$352,700	$14,200	CCF69	3	$229,162	$9,200	14-7	3	$352,700	$0	3	$0	$0
248	CC	8525727	GOMEZ DITA JOSE LUIS	230301	1	$117,567	$18,900	EPS002	1	$117,567	$4,800	CCF69	1	$75,387	$3,100	14-7	1	$117,567	$0	1	$0	$0
249	CC	8525727	GOMEZ DITA JOSE LUIS	230301	1	$117,567	$14,200	EPS002	1	$117,567	$0	CCF69	1	$0	$0	14-7	1	$117,567	$0	1	$0	$0
250	CC	8525727	GOMEZ DITA JOSE LUIS	230301	1	$117,566	$14,200	EPS002	1	$117,566	$0	CCF69	1	$0	$0	14-7	1	$117,566	$0	1	$0	$0
251	CC	1116870608	GOMEZ LEAL JUAN DIEGO	230301	2	$106,921	$17,200	EPS005	2	$106,921	$4,300	CCF69	2	$94,900	$3,800	14-7	2	$106,921	$0	2	$0	$0
252	CC	1116870608	GOMEZ LEAL JUAN DIEGO	230301	3	$160,381	$19,300	EPS005	3	$160,381	$0	CCF69	3	$0	$0	14-7	3	$160,381	$0	3	$0	$0
253	CC	1116782375	GRANADOS OCAÑO ARMEL JHABID	230301	2	$94,900	$15,200	EPSC25	2	$94,900	$3,800	CCF69	2	$94,900	$3,800	14-7	2	$94,900	$0	2	$0	$0
254	CC	1116782375	GRANADOS OCAÑO ARMEL JHABID	230301	3	$142,350	$22,800	EPSC25	3	$142,350	$5,700	CCF69	3	$142,350	$5,700	14-7	3	$142,350	$0	3	$0	$0
255	CC	1116780218	GUERRERO ESCOBAR OSCAR EDEN	230301	1	$70,920	$11,400	EPS037	1	$70,920	$2,900	CCF69	1	$68,333	$2,800	14-7	1	$70,920	$0	1	$0	$0
256	CC	1116780218	GUERRERO ESCOBAR OSCAR EDEN	230301	3	$212,758	$34,100	EPS037	3	$212,758	$8,600	CCF69	3	$203,833	$8,200	14-7	3	$212,758	$0	3	$0	$0
257	CC	1116780218	GUERRERO ESCOBAR OSCAR EDEN	230301	5	$354,596	$56,800	EPS037	5	$354,596	$14,200	CCF69	5	$333,889	$13,400	14-7	5	$354,596	$0	5	$0	$0
258	CC	1052313019	GUTIERREZ DAZA MARLON EDUARDO	230301	6	$284,700	$45,600	EPS041	6	$284,700	$11,400	CCF69	6	$0	$0	14-7	6	$284,700	$0	6	$0	$0
259	CC	1052313019	GUTIERREZ DAZA MARLON EDUARDO	230301	3	$142,350	$22,800	EPS041	3	$142,350	$5,700	CCF69	3	$142,350	$5,700	14-7	3	$142,350	$0	3	$0	$0
260	CC	1052313019	GUTIERREZ DAZA MARLON EDUARDO	230301	2	$94,900	$11,400	EPS041	2	$94,900	$0	CCF69	2	$0	$0	14-7	2	$94,900	$0	2	$0	$0
261	CC	1052313019	GUTIERREZ DAZA MARLON EDUARDO	230301	15	$711,750	$113,900	EPS041	15	$711,750	$28,500	CCF69	15	$0	$0	14-7	15	$711,750	$0	15	$0	$0
262	CC	1052313019	GUTIERREZ DAZA MARLON EDUARDO	230301	4	$189,800	$30,400	EPS041	4	$189,800	$7,600	CCF69	4	$1,186,250	$47,500	14-7	4	$189,800	$0	4	$0	$0
263	CC	74281877	HERNANDEZ DUEÑAS WILYAN EMILIO	230301	1	$96,270	$15,500	EPS037	1	$96,270	$3,900	CCF69	1	$85,150	$3,500	14-7	1	$96,270	$0	1	$0	$0
264	CC	74281877	HERNANDEZ DUEÑAS WILYAN EMILIO	230301	3	$288,808	$46,300	EPS037	3	$288,808	$11,600	CCF69	3	$255,451	$10,300	14-7	3	$288,808	$0	3	$0	$0
265	CC	74281877	HERNANDEZ DUEÑAS WILYAN EMILIO	230301	3	$288,808	$46,300	EPS037	3	$288,808	$11,600	CCF69	3	$255,451	$10,300	14-7	3	$288,808	$0	3	$0	$0
266	CC	1118146301	JAIMES SALON ALEXIS	230301	2	$105,734	$17,000	EPSC25	2	$105,734	$4,300	CCF69	2	$94,951	$3,800	14-7	2	$105,734	$0	2	$0	$0
267	CC	1118146301	JAIMES SALON ALEXIS	230301	3	$158,601	$19,100	EPSC25	3	$158,601	$0	CCF69	3	$0	$0	14-7	3	$158,601	$0	3	$0	$0
268	CC	18256382	JARA JARA SELSO	230301	3	$142,350	$17,100	EPS041	3	$142,350	$0	CCF69	3	$0	$0	14-7	3	$142,350	$0	3	$0	$0
269	CC	18256382	JARA JARA SELSO	230301	1	$47,450	$7,600	EPS041	1	$47,450	$1,900	CCF69	1	$47,450	$1,900	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
270	CC	18256382	JARA JARA SELSO	230301	1	$47,450	$7,600	EPS041	1	$47,450	$1,900	CCF69	1	$47,450	$1,900	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
271	CC	1006532322	LAGOS GALLO CRISTIAN JARLEY	230301	3	$142,350	$17,100	EPSC25	3	$142,350	$0	CCF69	3	$0	$0	14-7	3	$142,350	$0	3	$0	$0
272	CC	1006532322	LAGOS GALLO CRISTIAN JARLEY	230301	2	$107,249	$12,900	EPSC25	2	$107,249	$0	CCF69	2	$0	$0	14-7	2	$107,249	$0	2	$0	$0
273	CC	1118146119	LAGOS GALLO HAIDER JAMIT	25-14	3	$142,577	$17,200	EPSC25	3	$142,577	$0	CCF69	3	$0	$0	14-7	3	$142,577	$0	3	$0	$0
274	CC	1118146119	LAGOS GALLO HAIDER JAMIT	25-14	2	$95,051	$15,300	EPSC25	2	$95,051	$3,900	CCF69	2	$94,900	$3,800	14-7	2	$95,051	$0	2	$0	$0
275	CC	1118146435	LAGOS LAGOS JAVIER ALONSO	230301	3	$172,422	$27,600	EPSC25	3	$172,422	$6,900	CCF69	3	$142,432	$5,700	14-7	3	$172,422	$0	3	$0	$0
276	CC	1118146435	LAGOS LAGOS JAVIER ALONSO	230301	2	$114,948	$18,400	EPSC25	2	$114,948	$4,600	CCF69	2	$94,955	$3,800	14-7	2	$114,948	$0	2	$0	$0
277	CC	1118146038	LAGOS LAGOS KEVIN OSWALDO	230301	3	$153,180	$24,600	EPSC25	3	$153,180	$6,200	CCF69	3	$142,498	$5,700	14-7	3	$153,180	$0	3	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
278	CC	1118146038	LAGOS LAGOS KEVIN OSWALDO	230301	1	$51,060	$6,200	EPSC25	1	$51,060	$0	CCF69	1	$0	$0	14-7	1	$51,060	$0	1	$0	$0
279	CC	1118146038	LAGOS LAGOS KEVIN OSWALDO	230301	1	$51,060	$6,200	EPSC25	1	$51,060	$0	CCF69	1	$0	$0	14-7	1	$51,060	$0	1	$0	$0
280	CC	1118146038	LAGOS LAGOS KEVIN OSWALDO	230301	1	$51,060	$8,200	EPSC25	1	$51,060	$2,100	CCF69	1	$47,499	$1,900	14-7	1	$51,060	$0	1	$0	$0
281	CC	1118146038	LAGOS LAGOS KEVIN OSWALDO	230301	1	$51,060	$8,200	EPSC25	1	$51,060	$2,100	CCF69	1	$47,499	$1,900	14-7	1	$51,060	$0	1	$0	$0
282	CC	1002458432	LAYTON SALAZAR LEIDY YURANI	230301	3	$161,800	$25,900	EPS041	3	$161,800	$6,500	CCF69	3	$161,800	$6,500	14-7	3	$161,800	$0	3	$0	$0
283	CC	1002458432	LAYTON SALAZAR LEIDY YURANI	230301	2	$107,867	$17,300	EPS041	2	$107,867	$4,400	CCF69	2	$107,867	$4,400	14-7	2	$107,867	$0	2	$0	$0
284	CC	1129466	LAYTON SALAZAR PABLO EMILIO	25-14	1	$104,225	$16,700	EPS041	1	$104,225	$4,200	CCF69	1	$67,485	$2,700	14-7	1	$104,225	$0	1	$0	$0
285	CC	1129466	LAYTON SALAZAR PABLO EMILIO	25-14	3	$312,674	$50,100	EPS041	3	$312,674	$12,600	CCF69	3	$202,456	$8,100	14-7	3	$312,674	$0	3	$0	$0
286	CC	1129466	LAYTON SALAZAR PABLO EMILIO	25-14	1	$104,225	$16,700	EPS041	1	$104,225	$4,200	CCF69	1	$67,485	$2,700	14-7	1	$104,225	$0	1	$0	$0
287	CC	96193558	LEAL LIZARAZO JAVIER ANTONIO	25-14	3	$272,754	$32,800	EPS041	3	$272,754	$0	CCF69	3	$0	$0	14-7	3	$272,754	$0	3	$0	$0
288	CC	96193558	LEAL LIZARAZO JAVIER ANTONIO	25-14	1	$90,918	$14,600	EPS041	1	$90,918	$3,700	CCF69	1	$75,000	$3,000	14-7	1	$90,918	$0	1	$0	$0
289	CC	96193558	LEAL LIZARAZO JAVIER ANTONIO	25-14	1	$90,918	$14,600	EPS041	1	$90,918	$3,700	CCF69	1	$74,444	$3,000	14-7	1	$90,918	$0	1	$0	$0
290	CC	1116873892	LEAL RODRIGUEZ JHON FREDDY	230301	1	$113,332	$18,200	EPS041	1	$113,332	$4,600	CCF69	1	$90,597	$3,700	14-7	1	$113,332	$0	1	$0	$0
291	CC	1116873892	LEAL RODRIGUEZ JHON FREDDY	230301	3	$339,995	$54,400	EPS041	3	$339,995	$13,600	CCF69	3	$269,456	$10,800	14-7	3	$339,995	$0	3	$0	$0
292	CC	1116873892	LEAL RODRIGUEZ JHON FREDDY	230301	1	$113,332	$18,200	EPS041	1	$113,332	$4,600	CCF69	1	$87,485	$3,500	14-7	1	$113,332	$0	1	$0	$0
293	CC	1116870592	LEAL RODRIGUEZ OSCAR JAVIER	230301	1	$110,502	$17,700	EPS041	1	$110,502	$4,500	CCF69	1	$90,018	$3,700	14-7	1	$110,502	$0	1	$0	$0
294	CC	1116870592	LEAL RODRIGUEZ OSCAR JAVIER	230301	3	$331,504	$53,100	EPS041	3	$331,504	$13,300	CCF69	3	$267,719	$10,800	14-7	3	$331,504	$0	3	$0	$0
295	CC	1116870592	LEAL RODRIGUEZ OSCAR JAVIER	230301	1	$110,502	$17,700	EPS041	1	$110,502	$4,500	CCF69	1	$86,906	$3,500	14-7	1	$110,502	$0	1	$0	$0
296	CC	1119888525	LINARES PEÑA EDWARD DARIO	230301	1	$91,763	$14,700	EPS005	1	$91,763	$3,700	CCF69	1	$90,000	$3,600	14-7	1	$91,763	$0	1	$0	$0
297	CC	1119888525	LINARES PEÑA EDWARD DARIO	230301	1	$91,763	$14,700	EPS005	1	$91,763	$3,700	CCF69	1	$90,000	$3,600	14-7	1	$91,763	$0	1	$0	$0
298	CC	1119888525	LINARES PEÑA EDWARD DARIO	230301	2	$183,525	$29,400	EPS005	2	$183,525	$7,400	CCF69	2	$180,000	$7,200	14-7	2	$183,525	$0	2	$0	$0
299	CC	1119888525	LINARES PEÑA EDWARD DARIO	230301	1	$91,763	$11,100	EPS005	1	$91,763	$0	CCF69	1	$0	$0	14-7	1	$91,763	$0	1	$0	$0
300	CC	1119888525	LINARES PEÑA EDWARD DARIO	230301	3	$182,546	$29,300	EPS005	3	$182,546	$7,400	CCF69	3	$0	$0	14-7	3	$182,546	$0	3	$0	$0
301	CC	1116868132	LIZARAZO ESTEPA LIZETH FERNANDA	230301	3	$157,001	$25,200	EPSC25	3	$157,001	$6,300	CCF69	3	$160,000	$6,400	14-7	3	$157,001	$0	3	$0	$0
302	CC	1116868132	LIZARAZO ESTEPA LIZETH FERNANDA	230301	2	$104,667	$16,800	EPSC25	2	$104,667	$4,200	CCF69	2	$106,667	$4,300	14-7	2	$104,667	$0	2	$0	$0
303	CC	1116868132	LIZARAZO ESTEPA LIZETH FERNANDA	230301	4	$189,800	$30,400	EPSC25	4	$189,800	$7,600	CCF69	4	$0	$0	14-7	4	$189,800	$0	4	$0	$0
304	CC	1116868132	LIZARAZO ESTEPA LIZETH FERNANDA	230301	3	$142,350	$22,800	EPSC25	3	$142,350	$5,700	CCF69	3	$0	$0	14-7	3	$142,350	$0	3	$0	$0
305	CC	73576324	LORETT VELASQUEZ JUAN FRANCISCO	25-14	2	$788,667	$134,200	EPS005	2	$788,667	$98,600	CCF69	2	$1,233,700	$49,400	14-7	2	$788,667	$0	2	$1,233,700	$61,800
306	CC	73576324	LORETT VELASQUEZ JUAN FRANCISCO	25-14	3	$1,183,001	$201,300	EPS005	3	$1,183,001	$147,900	CCF69	3	$1,850,550	$74,100	14-7	3	$1,183,001	$0	3	$1,850,550	$92,700
307	CC	1098702035	LOZADA CHOGO JOSE DAVID	230301	1	$120,772	$19,400	EPS037	1	$120,772	$4,900	CCF69	1	$78,833	$3,200	14-7	1	$120,772	$0	1	$0	$0
308	CC	1098702035	LOZADA CHOGO JOSE DAVID	230301	3	$362,316	$58,000	EPS037	3	$362,316	$14,500	CCF69	3	$235,332	$9,500	14-7	3	$362,316	$0	3	$0	$0
309	CC	1098702035	LOZADA CHOGO JOSE DAVID	230301	3	$362,316	$58,000	EPS037	3	$362,316	$14,500	CCF69	3	$231,832	$9,300	14-7	3	$362,316	$0	3	$0	$0
310	CC	1098702035	LOZADA CHOGO JOSE DAVID	230301	2	$241,544	$38,700	EPS037	2	$241,544	$9,700	CCF69	2	$152,221	$6,100	14-7	2	$241,544	$0	2	$0	$0
311	CC	1098702035	LOZADA CHOGO JOSE DAVID	230301	3	$362,316	$58,000	EPS037	3	$362,316	$14,500	CCF69	3	$225,999	$9,100	14-7	3	$362,316	$0	3	$0	$0
312	CC	1064109934	MACHADO BARAHONA CALIXTO JOSE	230201	1	$93,889	$15,100	EPS037	1	$93,889	$3,800	CCF69	1	$93,333	$3,800	14-7	1	$93,889	$0	1	$0	$0
313	CC	1064109934	MACHADO BARAHONA CALIXTO JOSE	230201	3	$281,667	$33,900	EPS037	3	$281,667	$0	CCF69	3	$0	$0	14-7	3	$281,667	$0	3	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
314	CC	1064109934	MACHADO BARAHONA CALIXTO JOSE	230201	1	$93,889	$11,300	EPS037	1	$93,889	$0	CCF69	1	$0	$0	14-7	1	$93,889	$0	1	$0	$0
315	CC	1062435894	MADERA FERREIRA ARNOL JAVIER	230201	2	$95,334	$15,300	ESSC07	2	$95,334	$3,900	CCF69	2	$94,900	$3,800	14-7	2	$95,334	$0	2	$0	$0
316	CC	1062435894	MADERA FERREIRA ARNOL JAVIER	230201	3	$143,001	$17,200	ESSC07	3	$143,001	$0	CCF69	3	$0	$0	14-7	3	$143,001	$0	3	$0	$0
317	CC	1116020333	MARQUEZ ROJAS YOBANI ALEXANDER	230301	2	$99,856	$16,000	EPS041	2	$99,856	$4,000	CCF69	2	$94,900	$3,800	14-7	2	$99,856	$0	2	$0	$0
318	CC	1116020333	MARQUEZ ROJAS YOBANI ALEXANDER	230301	3	$149,783	$18,000	EPS041	3	$149,783	$0	CCF69	3	$0	$0	14-7	3	$149,783	$0	3	$0	$0
319	CC	1118146586	MARTINEZ NIETO DARWIN YUSFREDY	230301	1	$48,422	$7,800	EPSC25	1	$48,422	$2,000	CCF69	1	$47,477	$1,900	14-7	1	$48,422	$0	1	$0	$0
320	CC	1118146586	MARTINEZ NIETO DARWIN YUSFREDY	230301	3	$145,265	$23,300	EPSC25	3	$145,265	$5,900	CCF69	3	$142,430	$5,700	14-7	3	$145,265	$0	3	$0	$0
321	CC	1118146586	MARTINEZ NIETO DARWIN YUSFREDY	230301	1	$48,422	$7,800	EPSC25	1	$48,422	$2,000	CCF69	1	$47,477	$1,900	14-7	1	$48,422	$0	1	$0	$0
322	CC	1097666681	MARTINEZ GAITAN RAFAEL HORACIO	230301	1	$78,334	$12,600	EPSC25	1	$78,334	$3,200	CCF69	1	$66,667	$2,700	14-7	1	$78,334	$0	1	$0	$0
323	CC	1097666681	MARTINEZ GAITAN RAFAEL HORACIO	230301	3	$235,001	$37,700	EPSC25	3	$235,001	$9,500	CCF69	3	$200,000	$8,000	14-7	3	$235,001	$0	3	$0	$0
324	CC	1097666681	MARTINEZ GAITAN RAFAEL HORACIO	230301	1	$78,334	$12,600	EPSC25	1	$78,334	$3,200	CCF69	1	$66,667	$2,700	14-7	1	$78,334	$0	1	$0	$0
325	CC	1097666681	MARTINEZ GAITAN RAFAEL HORACIO	230301	1	$78,334	$9,500	EPSC25	1	$78,334	$0	CCF69	1	$0	$0	14-7	1	$78,334	$0	1	$0	$0
326	CC	1118146008	MARTINEZ WILMER FERNEY	230301	2	$98,631	$15,800	EPS041	2	$98,631	$4,000	CCF69	2	$94,900	$3,800	14-7	2	$98,631	$0	2	$0	$0
327	CC	1118146008	MARTINEZ WILMER FERNEY	230301	3	$147,946	$23,700	EPS041	3	$147,946	$6,000	CCF69	3	$142,350	$5,700	14-7	3	$147,946	$0	3	$0	$0
328	CC	1006532271	MENDIETA CARVAJAL JHONATAN EDUARDO	230301	1	$101,276	$16,300	EPSC25	1	$101,276	$4,100	CCF69	1	$73,368	$3,000	14-7	1	$101,276	$0	1	$0	$0
329	CC	1006532271	MENDIETA CARVAJAL JHONATAN EDUARDO	230301	3	$303,828	$48,700	EPSC25	3	$303,828	$12,200	CCF69	3	$220,104	$8,900	14-7	3	$303,828	$0	3	$0	$0
330	CC	1006532271	MENDIETA CARVAJAL JHONATAN EDUARDO	230301	1	$101,276	$16,300	EPSC25	1	$101,276	$4,100	CCF69	1	$73,368	$3,000	14-7	1	$101,276	$0	1	$0	$0
331	CC	1056554142	MERCHAN LIZARAZO JHONATAN ALEXANDER	230301	3	$142,350	$17,100	EPS037	3	$142,350	$0	CCF69	3	$0	$0	14-7	3	$142,350	$0	3	$0	$0
332	CC	1056554142	MERCHAN LIZARAZO JHONATAN ALEXANDER	230301	2	$94,900	$15,200	EPS037	2	$94,900	$3,800	CCF69	2	$94,900	$3,800	14-7	2	$94,900	$0	2	$0	$0
333	CC	1056554337	MESA MESA EDILIO	230301	3	$142,350	$17,100	ESSC24	3	$142,350	$0	CCF69	3	$0	$0	14-7	3	$142,350	$0	3	$0	$0
334	CC	1056554337	MESA MESA EDILIO	230301	2	$94,900	$15,200	ESSC24	2	$94,900	$3,800	CCF69	2	$94,900	$3,800	14-7	2	$94,900	$0	2	$0	$0
335	CC	1115948959	MINA URIBE ANGEL DAVID	230301	1	$86,889	$10,500	EPS037	1	$86,889	$0	CCF69	1	$0	$0	14-7	1	$86,889	$0	1	$0	$0
336	CC	1115948959	MINA URIBE ANGEL DAVID	230301	1	$86,889	$10,500	EPS037	1	$86,889	$0	CCF69	1	$0	$0	14-7	1	$86,889	$0	1	$0	$0
337	CC	1115948959	MINA URIBE ANGEL DAVID	230301	2	$173,778	$27,900	EPS037	2	$173,778	$7,000	CCF69	2	$172,444	$6,900	14-7	2	$173,778	$0	2	$0	$0
338	CC	1115948959	MINA URIBE ANGEL DAVID	230301	1	$86,889	$14,000	EPS037	1	$86,889	$3,500	CCF69	1	$85,778	$3,500	14-7	1	$86,889	$0	1	$0	$0
339	CC	1115948959	MINA URIBE ANGEL DAVID	230301	1	$86,889	$14,000	EPS037	1	$86,889	$3,500	CCF69	1	$85,556	$3,500	14-7	1	$86,889	$0	1	$0	$0
340	CC	96191229	MOJICA TOSCANO YECID ALBERTO	25-14	2	$105,735	$17,000	EPSC25	2	$105,735	$4,300	CCF69	2	$104,598	$4,200	14-7	2	$105,735	$0	2	$0	$0
341	CC	96191229	MOJICA TOSCANO YECID ALBERTO	25-14	3	$158,602	$25,400	EPSC25	3	$158,602	$6,400	CCF69	3	$156,897	$6,300	14-7	3	$158,602	$0	3	$0	$0
342	CC	1115865992	MONROY LOPEZ EDWIN LEONARDO	230301	1	$73,827	$11,900	EPSC25	1	$73,827	$3,000	CCF69	1	$67,539	$2,800	14-7	1	$73,827	$0	1	$0	$0
343	CC	1115865992	MONROY LOPEZ EDWIN LEONARDO	230301	3	$221,480	$35,500	EPSC25	3	$221,480	$8,900	CCF69	3	$202,616	$8,200	14-7	3	$221,480	$0	3	$0	$0
344	CC	1115865992	MONROY LOPEZ EDWIN LEONARDO	230301	1	$73,827	$11,900	EPSC25	1	$73,827	$3,000	CCF69	1	$67,539	$2,800	14-7	1	$73,827	$0	1	$0	$0
345	CC	3275830	MONTAÑEZ ALVAREZ JOSE LUIS	25-14	1	$117,352	$18,800	EPS037	1	$117,352	$4,700	CCF69	1	$116,667	$4,700	14-7	1	$117,352	$0	1	$0	$0
346	CC	3275830	MONTAÑEZ ALVAREZ JOSE LUIS	25-14	3	$352,056	$56,400	EPS037	3	$352,056	$14,100	CCF69	3	$347,667	$14,000	14-7	3	$352,056	$0	3	$0	$0
347	CC	3275830	MONTAÑEZ ALVAREZ JOSE LUIS	25-14	5	$586,759	$93,900	EPS037	5	$586,759	$23,500	CCF69	5	$567,778	$22,800	14-7	5	$586,759	$0	5	$0	$0
348	CC	1002197434	MORALES MADERA BREINER EDUARDO	230301	3	$222,391	$35,600	ESSC24	3	$222,391	$8,900	CCF69	3	$221,724	$8,900	14-7	3	$222,391	$0	3	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
349	CC	1002197434	MORALES MADERA BREINER EDUARDO	230301	2	$148,261	$23,800	ESSC24	2	$148,261	$6,000	CCF69	2	$146,483	$5,900	14-7	2	$148,261	$0	2	$0	$0
350	CC	1118553809	MORALES CALDERON JHORMAN ALEXANDER	230201	2	$102,579	$16,500	EPS041	2	$102,579	$4,200	CCF69	2	$94,900	$3,800	14-7	2	$102,579	$0	2	$0	$0
351	CC	1118146676	MURILLO NARANJO OSCAR	230301	3	$151,580	$24,300	EPS041	3	$151,580	$6,100	CCF69	3	$142,366	$5,700	14-7	3	$151,580	$0	3	$0	$0
352	CC	1118146676	MURILLO NARANJO OSCAR	230301	2	$101,054	$16,200	EPS041	2	$101,054	$4,100	CCF69	2	$94,911	$3,800	14-7	2	$101,054	$0	2	$0	$0
353	CC	1118146676	MURILLO NARANJO OSCAR	230301	5	$252,633	$40,500	EPS041	5	$252,633	$10,200	CCF69	5	$237,250	$9,500	14-7	5	$252,633	$0	5	$0	$0
354	CC	7920627	NAVARRO PELAEZ YAMIT YECIT	230201	3	$553,334	$88,600	EPS002	3	$553,334	$22,200	CCF69	3	$550,000	$22,000	14-7	3	$553,334	$0	3	$0	$0
355	CC	7920627	NAVARRO PELAEZ YAMIT YECIT	230201	3	$553,334	$88,600	EPS002	3	$553,334	$22,200	CCF69	3	$540,000	$21,600	14-7	3	$553,334	$0	3	$0	$0
356	CC	7920627	NAVARRO PELAEZ YAMIT YECIT	230201	2	$368,889	$59,100	EPS002	2	$368,889	$14,800	CCF69	2	$353,333	$14,200	14-7	2	$368,889	$0	2	$0	$0
357	CC	7920627	NAVARRO PELAEZ YAMIT YECIT	230201	1	$184,445	$29,600	EPS002	1	$184,445	$7,400	CCF69	1	$174,444	$7,000	14-7	1	$184,445	$0	1	$0	$0
358	CC	7920627	NAVARRO PELAEZ YAMIT YECIT	230201	1	$184,445	$22,200	EPS002	1	$184,445	$0	CCF69	1	$0	$0	14-7	1	$184,445	$0	1	$0	$0
359	CC	7920627	NAVARRO PELAEZ YAMIT YECIT	230201	1	$184,444	$22,200	EPS002	1	$184,444	$0	CCF69	1	$0	$0	14-7	1	$184,444	$0	1	$0	$0
360	CC	1118146049	NUÑEZ CRUZ YEINER CAMILO	230301	3	$155,181	$18,700	EPSC25	3	$155,181	$0	CCF69	3	$0	$0	14-7	3	$155,181	$0	3	$0	$0
361	CC	1118146049	NUÑEZ CRUZ YEINER CAMILO	230301	2	$103,454	$16,600	EPSC25	2	$103,454	$4,200	CCF69	2	$94,921	$3,800	14-7	2	$103,454	$0	2	$0	$0
362	CC	2758800	ORTIZ SANCHEZ MIGUEL FERNANDO	231001	1	$124,370	$19,900	EPS002	1	$124,370	$5,000	CCF69	1	$123,346	$5,000	14-7	1	$124,370	$0	1	$0	$0
363	CC	2758800	ORTIZ SANCHEZ MIGUEL FERNANDO	231001	3	$373,108	$59,700	EPS002	3	$373,108	$15,000	CCF69	3	$367,705	$14,800	14-7	3	$373,108	$0	3	$0	$0
364	CC	2758800	ORTIZ SANCHEZ MIGUEL FERNANDO	231001	1	$124,370	$19,900	EPS002	1	$124,370	$5,000	CCF69	1	$120,235	$4,900	14-7	1	$124,370	$0	1	$0	$0
365	CC	2758800	ORTIZ SANCHEZ MIGUEL FERNANDO	231001	1	$124,370	$19,900	EPS002	1	$124,370	$5,000	CCF69	1	$100,000	$4,000	14-7	1	$124,370	$0	1	$0	$0
366	CC	1115913891	ORTIZ CASTILLO YEISON	230301	3	$242,747	$38,900	EPS041	3	$242,747	$9,800	CCF69	3	$204,648	$8,200	14-7	3	$242,747	$0	3	$0	$0
367	CC	1115913891	ORTIZ CASTILLO YEISON	230301	1	$80,916	$13,000	EPS041	1	$80,916	$3,300	CCF69	1	$68,216	$2,800	14-7	1	$80,916	$0	1	$0	$0
368	CC	1115913891	ORTIZ CASTILLO YEISON	230301	5	$404,578	$64,800	EPS041	5	$404,578	$16,200	CCF69	5	$341,079	$13,700	14-7	5	$404,578	$0	5	$0	$0
369	CC	1115913891	ORTIZ CASTILLO YEISON	230301	2	$161,831	$25,900	EPS041	2	$161,831	$6,500	CCF69	2	$136,432	$5,500	14-7	2	$161,831	$0	2	$0	$0
370	CC	71481410	PAMPLONA VASQUEZ JOSE ALBERTO	230301	1	$109,682	$17,600	EPS037	1	$109,682	$4,400	CCF69	1	$106,667	$4,300	14-7	1	$109,682	$0	1	$0	$0
371	CC	71481410	PAMPLONA VASQUEZ JOSE ALBERTO	230301	3	$329,044	$52,700	EPS037	3	$329,044	$13,200	CCF69	3	$318,667	$12,800	14-7	3	$329,044	$0	3	$0	$0
372	CC	71481410	PAMPLONA VASQUEZ JOSE ALBERTO	230301	1	$109,682	$17,600	EPS037	1	$109,682	$4,400	CCF69	1	$104,889	$4,200	14-7	1	$109,682	$0	1	$0	$0
373	CC	1102881233	PARRA OROZCO EVER JOSE	230301	1	$67,333	$10,800	CCFC55	1	$67,333	$2,700	CCF69	1	$63,349	$2,600	14-7	1	$67,333	$0	1	$0	$0
374	CC	1102881233	PARRA OROZCO EVER JOSE	230301	2	$134,665	$21,600	CCFC55	2	$134,665	$5,400	CCF69	2	$125,810	$5,100	14-7	2	$134,665	$0	2	$0	$0
375	CC	1102881233	PARRA OROZCO EVER JOSE	230301	1	$67,333	$10,800	CCFC55	1	$67,333	$2,700	CCF69	1	$61,572	$2,500	14-7	1	$67,333	$0	1	$0	$0
376	CC	1102881233	PARRA OROZCO EVER JOSE	230301	1	$67,333	$8,100	CCFC55	1	$67,333	$0	CCF69	1	$0	$0	14-7	1	$67,333	$0	1	$0	$0
377	CC	1097332234	PEÑA QUIROGA EDINSON FERNEY	230301	3	$311,240	$49,800	EPS002	3	$311,240	$12,500	CCF69	3	$260,056	$10,500	14-7	3	$311,240	$0	3	$0	$0
378	CC	1097332234	PEÑA QUIROGA EDINSON FERNEY	230301	5	$518,734	$83,000	EPS002	5	$518,734	$20,800	CCF69	5	$426,760	$17,100	14-7	5	$518,734	$0	5	$0	$0
379	CC	1097332234	PEÑA QUIROGA EDINSON FERNEY	230301	1	$103,747	$16,600	EPS002	1	$103,747	$4,200	CCF69	1	$83,130	$3,400	14-7	1	$103,747	$0	1	$0	$0
380	CC	1097332234	PEÑA QUIROGA EDINSON FERNEY	230301	1	$103,747	$16,600	EPS002	1	$103,747	$4,200	CCF69	1	$82,685	$3,400	14-7	1	$103,747	$0	1	$0	$0
381	CC	1102808896	PEREZ CORREA EDER JOSE	230201	5	$1,177,778	$200,300	EPS037	5	$1,177,778	$47,200	CCF69	5	$1,166,667	$46,700	14-7	5	$1,177,778	$0	5	$0	$0
382	CC	1102808896	PEREZ CORREA EDER JOSE	230201	3	$706,667	$120,300	EPS037	3	$706,667	$28,300	CCF69	3	$666,667	$26,700	14-7	3	$706,667	$0	3	$0	$0
383	CC	1102808896	PEREZ CORREA EDER JOSE	230201	1	$235,556	$40,100	EPS037	1	$235,556	$9,500	CCF69	1	$215,556	$8,700	14-7	1	$235,556	$0	1	$0	$0
384	CC	1102808896	PEREZ CORREA EDER JOSE	230201	3	$706,667	$120,300	EPS037	3	$706,667	$28,300	CCF69	3	$640,000	$25,600	14-7	3	$706,667	$0	3	$0	$0
385	CC	4149053	PERILLA GONZALEZ OMAR RICARDO	230301	1	$95,382	$15,300	EPS037	1	$95,382	$3,900	CCF69	1	$86,667	$3,500	14-7	1	$95,382	$0	1	$0	$0

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
386	CC	4149053	PERILLA GONZALEZ OMAR RICARDO	230301	3	$286,144	$45,800	EPS037	3	$286,144	$11,500	CCF69	3	$258,667	$10,400	14-7	3	$286,144	$0	3	$0	$0
387	CC	4149053	PERILLA GONZALEZ OMAR RICARDO	230301	1	$95,382	$15,300	EPS037	1	$95,382	$3,900	CCF69	1	$84,889	$3,400	14-7	1	$95,382	$0	1	$0	$0
388	CC	1118146386	PICO MORA JENNY ALEJANDRA	230301	3	$240,000	$38,400	EPS005	3	$240,000	$9,600	CCF69	3	$240,000	$9,600	14-7	3	$240,000	$0	3	$0	$0
389	CC	1118146386	PICO MORA JENNY ALEJANDRA	230301	2	$160,000	$25,600	EPS005	2	$160,000	$6,400	CCF69	2	$160,000	$6,400	14-7	2	$160,000	$0	2	$0	$0
390	CC	1115862050	PINZON JASPE YIMIN FERNELY	230301	3	$142,824	$22,900	EPS041	3	$142,824	$5,800	CCF69	3	$142,350	$5,700	14-7	3	$142,824	$0	3	$0	$0
391	CC	1115862050	PINZON JASPE YIMIN FERNELY	230301	2	$95,216	$15,300	EPS041	2	$95,216	$3,900	CCF69	2	$94,900	$3,800	14-7	2	$95,216	$0	2	$0	$0
392	CC	13544225	POLO FIGUEROA OSCAR HUMBERTO	25-14	3	$572,334	$97,400	EPS010	3	$572,334	$22,900	CCF69	3	$570,000	$22,800	14-7	3	$572,334	$0	3	$0	$0
393	CC	13544225	POLO FIGUEROA OSCAR HUMBERTO	25-14	3	$572,334	$97,400	EPS010	3	$572,334	$22,900	CCF69	3	$563,000	$22,600	14-7	3	$572,334	$0	3	$0	$0
394	CC	1115853775	PUERTA PUERTA RONALD YORDANY	230301	3	$318,711	$51,000	EPS037	3	$318,711	$12,800	CCF69	3	$236,476	$9,500	14-7	3	$318,711	$0	3	$0	$0
395	CC	1115853775	PUERTA PUERTA RONALD YORDANY	230301	5	$531,184	$85,000	EPS037	5	$531,184	$21,300	CCF69	5	$388,293	$15,600	14-7	5	$531,184	$0	5	$0	$0
396	CC	1115853775	PUERTA PUERTA RONALD YORDANY	230301	1	$106,237	$17,000	EPS037	1	$106,237	$4,300	CCF69	1	$75,714	$3,100	14-7	1	$106,237	$0	1	$0	$0
397	CC	1048822991	QUINTANA ENCISO JAIRO HERNAN	230301	3	$229,660	$36,800	EPS037	3	$229,660	$9,200	CCF69	3	$180,627	$7,300	14-7	3	$229,660	$0	3	$0	$0
398	CC	1048822991	QUINTANA ENCISO JAIRO HERNAN	230301	2	$153,107	$24,500	EPS037	2	$153,107	$6,200	CCF69	2	$120,418	$4,900	14-7	2	$153,107	$0	2	$0	$0
399	CC	1053607166	RACHE RINCON RAFAEL ANTONIO	230201	3	$377,153	$60,400	EPS017	3	$377,153	$15,100	CCF69	3	$321,277	$12,900	14-7	3	$377,153	$0	3	$0	$0
400	CC	1053607166	RACHE RINCON RAFAEL ANTONIO	230201	2	$251,436	$40,300	EPS017	2	$251,436	$10,100	CCF69	2	$210,185	$8,500	14-7	2	$251,436	$0	2	$0	$0
401	CC	1119185844	RAMIREZ VEGA JHON JABER	230301	1	$70,790	$11,400	EPS037	1	$70,790	$2,900	CCF69	1	$70,000	$2,800	14-7	1	$70,790	$0	1	$0	$0
402	CC	1119185844	RAMIREZ VEGA JHON JABER	230301	1	$70,790	$11,400	EPS037	1	$70,790	$2,900	CCF69	1	$69,667	$2,800	14-7	1	$70,790	$0	1	$0	$0
403	CC	1119185844	RAMIREZ VEGA JHON JABER	230301	4	$283,160	$45,400	EPS037	4	$283,160	$11,400	CCF69	4	$277,333	$11,100	14-7	4	$283,160	$0	4	$0	$0
404	CC	1119185844	RAMIREZ VEGA JHON JABER	230301	2	$141,580	$17,000	EPS037	2	$141,580	$0	CCF69	2	$0	$0	14-7	2	$141,580	$0	2	$0	$0
405	CC	92532518	RANGEL SERRANO CESAR AUGUSTO	230201	1	$108,004	$17,300	EPS048	1	$108,004	$4,400	CCF69	1	$96,703	$3,900	14-7	1	$108,004	$0	1	$0	$0
406	CC	92532518	RANGEL SERRANO CESAR AUGUSTO	230201	3	$324,012	$51,900	EPS048	3	$324,012	$13,000	CCF69	3	$287,777	$11,600	14-7	3	$324,012	$0	3	$0	$0
407	CC	92532518	RANGEL SERRANO CESAR AUGUSTO	230201	1	$108,004	$17,300	EPS048	1	$108,004	$4,400	CCF69	1	$93,592	$3,800	14-7	1	$108,004	$0	1	$0	$0
408	CC	18256995	REYES CHAVITA MOISES	230301	1	$75,182	$12,100	EPSC25	1	$75,182	$3,100	CCF69	1	$66,667	$2,700	14-7	1	$75,182	$0	1	$0	$0
409	CC	18256995	REYES CHAVITA MOISES	230301	1	$75,182	$12,100	EPSC25	1	$75,182	$3,100	CCF69	1	$66,667	$2,700	14-7	1	$75,182	$0	1	$0	$0
410	CC	18256995	REYES CHAVITA MOISES	230301	3	$225,544	$27,100	EPSC25	3	$225,544	$0	CCF69	3	$0	$0	14-7	3	$225,544	$0	3	$0	$0
411	CC	1058275336	RINCON PARRA JUAN CAMILO	25-14	1	$81,945	$9,900	EPS037	1	$81,945	$0	CCF69	1	$0	$0	14-7	1	$81,945	$0	1	$0	$0
412	CC	1058275336	RINCON PARRA JUAN CAMILO	25-14	1	$81,944	$9,900	EPS037	1	$81,944	$0	CCF69	1	$0	$0	14-7	1	$81,944	$0	1	$0	$0
413	CC	1058275336	RINCON PARRA JUAN CAMILO	25-14	1	$81,945	$13,200	EPS037	1	$81,945	$3,300	CCF69	1	$81,111	$3,300	14-7	1	$81,945	$0	1	$0	$0
414	CC	1058275336	RINCON PARRA JUAN CAMILO	25-14	3	$245,834	$39,400	EPS037	3	$245,834	$9,900	CCF69	3	$242,500	$9,700	14-7	3	$245,834	$0	3	$0	$0
415	CC	1058275336	RINCON PARRA JUAN CAMILO	25-14	1	$81,945	$13,200	EPS037	1	$81,945	$3,300	CCF69	1	$80,000	$3,200	14-7	1	$81,945	$0	1	$0	$0
416	CC	1118146575	RISCANEVO LAGOS ANGEL RODRIGO	230301	3	$142,350	$22,800	EPS041	3	$142,350	$5,700	CCF69	3	$142,350	$5,700	14-7	3	$142,350	$0	3	$0	$0
417	CC	1118146575	RISCANEVO LAGOS ANGEL RODRIGO	230301	2	$94,900	$15,200	EPS041	2	$94,900	$3,800	CCF69	2	$94,900	$3,800	14-7	2	$94,900	$0	2	$0	$0
418	CC	1056553433	RISCANEVO LOPEZ DIEGO HARVEY	230301	3	$214,296	$34,300	EPSC25	3	$214,296	$8,600	CCF69	3	$179,322	$7,200	14-7	3	$214,296	$0	3	$0	$0
419	CC	1056553433	RISCANEVO LOPEZ DIEGO HARVEY	230301	2	$142,864	$22,900	EPSC25	2	$142,864	$5,800	CCF69	2	$119,548	$4,800	14-7	2	$142,864	$0	2	$0	$0
420	CC	74381291	RISCANEVO ESTUPIÑAN URY ALEXI	231001	3	$142,350	$22,800	EPSC25	3	$142,350	$5,700	CCF69	3	$142,350	$5,700	14-7	3	$142,350	$0	3	$0	$0
421	CC	74381291	RISCANEVO ESTUPIÑAN URY ALEXI	231001	2	$94,900	$15,200	EPSC25	2	$94,900	$3,800	CCF69	2	$94,900	$3,800	14-7	2	$94,900	$0	2	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
422	CC	74381291	RISCANEVO ESTUPIÑAN URY ALEXI	231001	3	$142,350	$22,800	EPSC25	3	$142,350	$5,700	CCF69	3	$0	$0	14-7	3	$142,350	$0	3	$0	$0
423	CC	7366630	RIVEROS PARADA ELKIN ALFREDO	230301	3	$221,334	$35,500	MIN001	3	$221,334	$8,900	CCF69	3	$220,000	$8,800	14-7	3	$221,334	$0	3	$0	$0
424	CC	7366630	RIVEROS PARADA ELKIN ALFREDO	230301	2	$147,556	$23,700	MIN001	2	$147,556	$6,000	CCF69	2	$144,000	$5,800	14-7	2	$147,556	$0	2	$0	$0
425	CC	1030609275	RODRIGUEZ LEON BLANCA YAZMIN	230301	1	$47,450	$5,700	EPS037	1	$47,450	$0	CCF69	1	$0	$0	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
426	CC	1030609275	RODRIGUEZ LEON BLANCA YAZMIN	230301	3	$142,350	$22,800	EPS037	3	$142,350	$5,700	CCF69	3	$142,350	$5,700	14-7	3	$142,350	$0	3	$0	$0
427	CC	1030609275	RODRIGUEZ LEON BLANCA YAZMIN	230301	5	$237,250	$38,000	EPS037	5	$237,250	$9,500	CCF69	5	$237,250	$9,500	14-7	5	$237,250	$0	5	$0	$0
428	CC	1030609275	RODRIGUEZ LEON BLANCA YAZMIN	230301	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF69	1	$47,450	$1,900	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
429	CC	1030609275	RODRIGUEZ LEON BLANCA YAZMIN	230301	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF69	1	$47,450	$1,900	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
430	CC	1030609275	RODRIGUEZ LEON BLANCA YAZMIN	230301	1	$51,566	$6,200	EPS037	1	$51,566	$0	CCF69	1	$0	$0	14-7	1	$51,566	$0	1	$0	$0
431	CC	1024574347	RODRIGUEZ NOSSA GERSON ALBEIRO	230301	3	$142,350	$22,800	EPSC25	3	$142,350	$5,700	CCF69	3	$142,382	$5,700	14-7	3	$142,350	$0	3	$0	$0
432	CC	1024574347	RODRIGUEZ NOSSA GERSON ALBEIRO	230301	2	$94,900	$15,200	EPSC25	2	$94,900	$3,800	CCF69	2	$94,921	$3,800	14-7	2	$94,900	$0	2	$0	$0
433	CC	74081286	RODRIGUEZ BOLIVAR JONATAN SAUL	230301	16	$1,280,000	$153,600	EPS017	16	$1,280,000	$0	CCF69	16	$0	$0	14-7	16	$1,280,000	$0	16	$0	$0
434	CC	86070734	RODRIGUEZ GARCIA RODRIGO ALEXANDER	230301	3	$142,350	$22,800	EPS005	3	$142,350	$5,700	CCF69	3	$142,350	$5,700	14-7	3	$142,350	$0	3	$0	$0
435	CC	86070734	RODRIGUEZ GARCIA RODRIGO ALEXANDER	230301	4	$189,800	$30,400	EPS005	4	$189,800	$7,600	CCF69	4	$189,800	$7,600	14-7	4	$189,800	$0	4	$0	$0
436	CC	86070734	RODRIGUEZ GARCIA RODRIGO ALEXANDER	230301	3	$142,350	$22,800	EPS005	3	$142,350	$5,700	CCF69	3	$142,350	$5,700	14-7	3	$142,350	$0	3	$0	$0
437	CC	1118146581	ROJAS RODRIGUEZ ELIAS OBED	230301	2	$119,574	$19,200	EPSC25	2	$119,574	$4,800	CCF69	2	$94,900	$3,800	14-7	2	$119,574	$0	2	$0	$0
438	CC	1118146581	ROJAS RODRIGUEZ ELIAS OBED	230301	3	$179,361	$28,700	EPSC25	3	$179,361	$7,200	CCF69	3	$142,361	$5,700	14-7	3	$179,361	$0	3	$0	$0
439	CC	1118540750	ROJAS SESTY JUAN MANUEL	230301	2	$309,334	$49,500	EPS037	2	$309,334	$12,400	CCF69	2	$306,667	$12,300	14-7	2	$309,334	$0	2	$0	$0
440	CC	1118540750	ROJAS SESTY JUAN MANUEL	230301	2	$309,334	$49,500	EPS037	2	$309,334	$12,400	CCF69	2	$304,889	$12,200	14-7	2	$309,334	$0	2	$0	$0
441	CC	1118540750	ROJAS SESTY JUAN MANUEL	230301	1	$154,667	$18,600	EPS037	1	$154,667	$0	CCF69	1	$0	$0	14-7	1	$154,667	$0	1	$0	$0
442	CC	1118146580	SALON CAMARGO CRISTIAN FABIAN	230301	3	$142,350	$17,100	EPSC25	3	$142,350	$0	CCF69	3	$0	$0	14-7	3	$142,350	$0	3	$0	$0
443	CC	1118146580	SALON CAMARGO CRISTIAN FABIAN	230301	2	$107,249	$12,900	EPSC25	2	$107,249	$0	CCF69	2	$0	$0	14-7	2	$107,249	$0	2	$0	$0
444	CC	1193514133	SALON ARCHILA OSCAR DAVIAN	230301	2	$116,388	$18,700	EPSC25	2	$116,388	$4,700	CCF69	2	$94,900	$3,800	14-7	2	$116,388	$0	2	$0	$0
445	CC	1193514133	SALON ARCHILA OSCAR DAVIAN	230301	3	$174,582	$21,000	EPSC25	3	$174,582	$0	CCF69	3	$0	$0	14-7	3	$174,582	$0	3	$0	$0
446	CC	1118146418	SANABRIA BOLAÑOS WILSON ARLEY	230301	3	$200,000	$24,000	EPSC25	3	$200,000	$0	CCF69	3	$0	$0	14-7	3	$200,000	$0	3	$0	$0
447	CC	1118146418	SANABRIA BOLAÑOS WILSON ARLEY	230301	2	$133,334	$16,100	EPSC25	2	$133,334	$0	CCF69	2	$0	$0	14-7	2	$133,334	$0	2	$0	$0
448	CC	74282000	SANCHEZ NIÑO FERNANDO	230301	2	$94,900	$15,200	EPS037	2	$94,900	$3,800	CCF69	2	$94,948	$3,800	14-7	2	$94,900	$0	2	$0	$0
449	CC	74282000	SANCHEZ NIÑO FERNANDO	230301	3	$142,350	$22,800	EPS037	3	$142,350	$5,700	CCF69	3	$142,423	$5,700	14-7	3	$142,350	$0	3	$0	$0
450	CC	1118648565	SILVA QUEVEDO OSCAR ALEJANDRO	230301	3	$142,350	$22,800	EPSC25	3	$142,350	$5,700	CCF69	3	$142,350	$5,700	14-7	3	$142,350	$0	3	$0	$0
451	CC	1118648565	SILVA QUEVEDO OSCAR ALEJANDRO	230301	2	$94,900	$15,200	EPSC25	2	$94,900	$3,800	CCF69	2	$94,900	$3,800	14-7	2	$94,900	$0	2	$0	$0
452	CC	1010157517	SUAREZ LEON LUIS FERLEY	230301	3	$171,624	$27,500	EPS002	3	$171,624	$6,900	CCF69	3	$159,552	$6,400	14-7	3	$171,624	$0	3	$0	$0
453	CC	1010157517	SUAREZ LEON LUIS FERLEY	230301	3	$171,624	$27,500	EPS002	3	$171,624	$6,900	CCF69	3	$157,852	$6,400	14-7	3	$171,624	$0	3	$0	$0
454	CC	1033655118	TABORDA CANO JUAN PABLO	230301	1	$103,639	$16,600	EPS037	1	$103,639	$4,200	CCF69	1	$78,498	$3,200	14-7	1	$103,639	$0	1	$0	$0
455	CC	3740350	TORREGROZA GOENAGA SIXTO	231001	1	$107,475	$17,200	EPS010	1	$107,475	$4,300	CCF69	1	$96,694	$3,900	14-7	1	$107,475	$0	1	$0	$0
456	CC	3740350	TORREGROZA GOENAGA SIXTO	231001	3	$322,424	$51,600	EPS010	3	$322,424	$12,900	CCF69	3	$287,750	$11,600	14-7	3	$322,424	$0	3	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
457	CC	3740350	TORREGROZA GOENAGA SIXTO	231001	1	$107,475	$17,200	EPS010	1	$107,475	$4,300	CCF69	1	$93,583	$3,800	14-7	1	$107,475	$0	1	$0	$0
458	CC	1002526528	TORRES POVEDA EDY HUMBERTO	230301	2	$94,900	$15,200	EPS037	2	$94,900	$3,800	CCF69	2	$94,900	$3,800	14-7	2	$94,900	$0	2	$0	$0
459	CC	1002526528	TORRES POVEDA EDY HUMBERTO	230301	3	$142,350	$22,800	EPS037	3	$142,350	$5,700	CCF69	3	$142,350	$5,700	14-7	3	$142,350	$0	3	$0	$0
460	CC	1006532308	TORRES TORRES RAFAEL ANTONIO	25-14	3	$142,350	$22,800	EPSC25	3	$142,350	$5,700	CCF69	3	$142,350	$5,700	14-7	3	$142,350	$0	3	$0	$0
461	CC	1006532308	TORRES TORRES RAFAEL ANTONIO	25-14	1	$47,450	$5,700	EPSC25	1	$47,450	$0	CCF69	1	$0	$0	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
462	CC	1006532308	TORRES TORRES RAFAEL ANTONIO	25-14	2	$94,900	$15,200	EPSC25	2	$94,900	$3,800	CCF69	2	$94,900	$3,800	14-7	2	$94,900	$0	2	$0	$0
463	CC	1054557122	VALENCIA ANGARITA LUIS EDUARDO	230301	1	$113,538	$18,200	EPS041	1	$113,538	$4,600	CCF69	1	$78,623	$3,200	14-7	1	$113,538	$0	1	$0	$0
464	CC	1054557122	VALENCIA ANGARITA LUIS EDUARDO	230301	3	$340,613	$54,500	EPS041	3	$340,613	$13,700	CCF69	3	$234,702	$9,400	14-7	3	$340,613	$0	3	$0	$0
465	CC	1054557122	VALENCIA ANGARITA LUIS EDUARDO	230301	1	$113,538	$18,200	EPS041	1	$113,538	$4,600	CCF69	1	$77,067	$3,100	14-7	1	$113,538	$0	1	$0	$0
466	CC	1014232981	VEGA VEGA OSMAR DARIO	230301	1	$87,749	$14,100	EPS037	1	$87,749	$3,600	CCF69	1	$86,667	$3,500	14-7	1	$87,749	$0	1	$0	$0
467	CC	1014232981	VEGA VEGA OSMAR DARIO	230301	3	$263,247	$42,200	EPS037	3	$263,247	$10,600	CCF69	3	$258,667	$10,400	14-7	3	$263,247	$0	3	$0	$0
468	CC	1014232981	VEGA VEGA OSMAR DARIO	230301	5	$438,745	$70,200	EPS037	5	$438,745	$17,600	CCF69	5	$424,445	$17,000	14-7	5	$438,745	$0	5	$0	$0
469	CC	1006532232	ZAMBRANO PINZON SONIA LILIANA	230301	3	$142,350	$22,800	EPSC25	3	$142,350	$5,700	CCF69	3	$142,350	$5,700	14-7	3	$142,350	$0	3	$0	$0
470	CC	1006532232	ZAMBRANO PINZON SONIA LILIANA	230301	2	$94,900	$15,200	EPSC25	2	$94,900	$3,800	CCF69	2	$94,900	$3,800	14-7	2	$94,900	$0	2	$0	$0
Ciudad: SAN LUIS DE GACENO Depto: BOYACA (2 Afiliados)						**$735,138**	**$117,700**			**$735,138**	**$29,500**			**$664,475**	**$26,900**			**$735,138**	**$0**		**$0**	**$0**
471	CC	3761183	HERRERA OLIVEROS JAIME ENRIQUE	25-14	3	$266,129	$42,600	EPS037	3	$266,129	$10,700	CCF10	3	$230,265	$9,300	14-7	3	$266,129	$0	3	$0	$0
472	CC	3761183	HERRERA OLIVEROS JAIME ENRIQUE	25-14	2	$177,419	$28,400	EPS037	2	$177,419	$7,100	CCF10	2	$151,510	$6,100	14-7	2	$177,419	$0	2	$0	$0
473	CC	1124400977	RAMIREZ MARTINEZ LUIS PEDRO	230301	3	$174,954	$28,000	EPS037	3	$174,954	$7,000	CCF10	3	$170,020	$6,900	14-7	3	$174,954	$0	3	$0	$0
474	CC	1124400977	RAMIREZ MARTINEZ LUIS PEDRO	230301	2	$116,636	$18,700	EPS037	2	$116,636	$4,700	CCF10	2	$112,680	$4,600	14-7	2	$116,636	$0	2	$0	$0
Ciudad: SANTA MARIA Depto: BOYACA (6 Afiliados)						**$1,837,781**	**$292,600**			**$2,265,119**	**$89,100**			**$2,005,977**	**$80,600**			**$2,265,119**	**$0**		**$0**	**$0**
475	CC	9141929	ALFONSO HUERTAS PABLO ELY	25-14	3	$142,350	$22,800	EPS037	3	$142,350	$5,700	CCF10	3	$142,350	$5,700	14-7	3	$142,350	$0	3	$0	$0
476	CC	9141929	ALFONSO HUERTAS PABLO ELY	25-14	2	$94,900	$15,200	EPS037	2	$94,900	$3,800	CCF10	2	$94,900	$3,800	14-7	2	$94,900	$0	2	$0	$0
477	CC	79118363	BRAVO JEREMIAS ANTONIO		0	$0	$0	EPSC25	3	$256,403	$10,300	CCF10	3	$235,062	$9,500	14-7	3	$256,403	$0	3	$0	$0
478	CC	79118363	BRAVO JEREMIAS ANTONIO		0	$0	$0	EPSC25	2	$170,935	$6,900	CCF10	2	$154,375	$6,200	14-7	2	$170,935	$0	2	$0	$0
479	CC	92450334	JULIO BATISTA LEOVALDI	230301	3	$443,362	$71,000	ESSC07	3	$443,362	$17,800	CCF10	3	$441,695	$17,700	14-7	3	$443,362	$0	3	$0	$0
480	CC	92450334	JULIO BATISTA LEOVALDI	230301	1	$147,788	$23,700	ESSC07	1	$147,788	$6,000	CCF10	1	$145,565	$5,900	14-7	1	$147,788	$0	1	$0	$0
481	CC	84038390	MONTERO GUERRA WILIAM ALFONSO	230301	3	$209,181	$33,500	EPS037	3	$209,181	$8,400	CCF10	3	$190,518	$7,700	14-7	3	$209,181	$0	3	$0	$0
482	CC	84038390	MONTERO GUERRA WILIAM ALFONSO	230301	2	$139,454	$22,400	EPS037	2	$139,454	$5,600	CCF10	2	$127,012	$5,100	14-7	2	$139,454	$0	2	$0	$0
483	CC	84038390	MONTERO GUERRA WILIAM ALFONSO	230301	2	$138,796	$22,300	EPS037	2	$138,796	$5,600	CCF10	2	$0	$0	14-7	2	$138,796	$0	2	$0	$0
484	CC	1019040180	RUIZ HUERTAS CLAUDIA MIREYA	230201	1	$47,450	$7,600	EPSC25	1	$47,450	$1,900	CCF10	1	$47,450	$1,900	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
485	CC	1019040180	RUIZ HUERTAS CLAUDIA MIREYA	230201	3	$142,350	$22,800	EPSC25	3	$142,350	$5,700	CCF10	3	$142,350	$5,700	14-7	3	$142,350	$0	3	$0	$0
486	CC	1019040180	RUIZ HUERTAS CLAUDIA MIREYA	230201	1	$47,450	$7,600	EPSC25	1	$47,450	$1,900	CCF10	1	$47,450	$1,900	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
487	CC	1019040180	RUIZ HUERTAS CLAUDIA MIREYA	230201	1	$47,450	$5,700	EPSC25	1	$47,450	$0	CCF10	1	$0	$0	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
488	CC	74325762	SALGADO SALGADO IBAN	230301	3	$142,350	$22,800	EPS037	3	$142,350	$5,700	CCF10	3	$142,350	$5,700	14-7	3	$142,350	$0	3	$0	$0
489	CC	74325762	SALGADO SALGADO IBAN	230301	2	$94,900	$15,200	EPS037	2	$94,900	$3,800	CCF10	2	$94,900	$3,800	14-7	2	$94,900	$0	2	$0	$0
Ciudad: SOCHA Depto: BOYACA (3 Afiliados)						**$2,597,192**	**$415,800**			**$2,597,192**	**$104,200**			**$729,734**	**$29,400**			**$2,597,192**	**$0**		**$0**	**$0**
490	CC	13279031	DALLOS PEREZ JESUS ALBERTO	25-14	30	$1,811,601	$289,900	EPS017	30	$1,811,601	$72,500	CCF10	30	$0	$0	14-7	30	$1,811,601	$0	30	$0	$0
491	CC	1007464490	FRANCO BRAVO HECTOR ALEJANDRO	230201	3	$211,000	$33,800	EPS037	3	$211,000	$8,500	CCF10	3	$210,000	$8,400	14-7	3	$211,000	$0	3	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
492	CC	1007464490	FRANCO BRAVO HECTOR ALEJANDRO	230201	2	$140,667	$22,600	EPS037	2	$140,667	$5,700	CCF10	2	$138,000	$5,600	14-7	2	$140,667	$0	2	$0	$0
493	CC	74352832	OVALLE PERILLA JORGE ARMANDO	230301	3	$260,354	$41,700	EPS037	3	$260,354	$10,500	CCF10	3	$230,240	$9,300	14-7	3	$260,354	$0	3	$0	$0
494	CC	74352832	OVALLE PERILLA JORGE ARMANDO	230301	2	$173,570	$27,800	EPS037	2	$173,570	$7,000	CCF10	2	$151,494	$6,100	14-7	2	$173,570	$0	2	$0	$0
Ciudad: SOCOTA Depto: BOYACA (2 Afiliados)						**$955,335**	**$150,200**			**$955,335**	**$35,500**			**$871,555**	**$35,000**			**$955,335**	**$0**		**$0**	**$0**
495	CC	1052390523	ESTUPIÑAN PARDO GUSTAVO ADOLFO	25-14	1	$74,067	$8,900	EPS005	1	$74,067	$0	CCF10	1	$0	$0	14-7	1	$74,067	$0	1	$0	$0
496	CC	1052390523	ESTUPIÑAN PARDO GUSTAVO ADOLFO	25-14	2	$148,134	$23,800	EPS005	2	$148,134	$6,000	CCF10	2	$146,222	$5,900	14-7	2	$148,134	$0	2	$0	$0
497	CC	1052390523	ESTUPIÑAN PARDO GUSTAVO ADOLFO	25-14	2	$148,134	$23,800	EPS005	2	$148,134	$6,000	CCF10	2	$145,333	$5,900	14-7	2	$148,134	$0	2	$0	$0
498	CC	1057596974	RINCON SUAREZ JULIAN DAVID	25-14	3	$351,000	$56,200	EPS005	3	$351,000	$14,100	CCF10	3	$350,000	$14,000	14-7	3	$351,000	$0	3	$0	$0
499	CC	1057596974	RINCON SUAREZ JULIAN DAVID	25-14	2	$234,000	$37,500	EPS005	2	$234,000	$9,400	CCF10	2	$230,000	$9,200	14-7	2	$234,000	$0	2	$0	$0
Ciudad: TASCO Depto: BOYACA (85 Afiliados)						**$35,173,516**	**$5,367,600**			**$35,173,516**	**$1,145,800**			**$25,335,361**	**$1,018,500**			**$35,173,516**	**$0**		**$0**	**$0**
500	CC	52335517	ACOSTA GONGORA DIANA CAROLINA	25-14	1	$168,334	$27,000	EPS017	1	$168,334	$6,800	CCF10	1	$166,667	$6,700	14-7	1	$168,334	$0	1	$0	$0
501	CC	52335517	ACOSTA GONGORA DIANA CAROLINA	25-14	2	$336,667	$53,900	EPS017	2	$336,667	$13,500	CCF10	2	$332,222	$13,300	14-7	2	$336,667	$0	2	$0	$0
502	CC	52335517	ACOSTA GONGORA DIANA CAROLINA	25-14	2	$336,667	$40,500	EPS017	2	$336,667	$0	CCF10	2	$0	$0	14-7	2	$336,667	$0	2	$0	$0
503	CC	1052397243	ALVAREZ OROZCO JESSICA MARIA	25-14	3	$150,000	$18,000	EPS037	3	$150,000	$0	CCF10	3	$0	$0	14-7	3	$150,000	$0	3	$0	$0
504	CC	1052397243	ALVAREZ OROZCO JESSICA MARIA	25-14	2	$100,000	$16,000	EPS037	2	$100,000	$4,000	CCF10	2	$100,000	$4,000	14-7	2	$100,000	$0	2	$0	$0
505	CC	1052314850	ALVAREZ GALLO JHON SEBASTIAN	230301	2	$94,900	$15,200	EPS041	2	$94,900	$3,800	CCF10	2	$94,900	$3,800	14-7	2	$94,900	$0	2	$0	$0
506	CC	1052314850	ALVAREZ GALLO JHON SEBASTIAN	230301	3	$142,350	$17,100	EPS041	3	$142,350	$0	CCF10	3	$0	$0	14-7	3	$142,350	$0	3	$0	$0
507	CC	7714581	ARIAS GUTIERREZ HOWARD	230301	2	$179,683	$28,800	EPS005	2	$179,683	$7,200	CCF10	2	$177,016	$7,100	14-7	2	$179,683	$0	2	$0	$0
508	CC	7714581	ARIAS GUTIERREZ HOWARD	230301	3	$269,524	$32,400	EPS005	3	$269,524	$0	CCF10	3	$0	$0	14-7	3	$269,524	$0	3	$0	$0
509	CC	1065130015	ARIAS PERTUZ RAFAEL HERNAN	230301	3	$186,834	$29,900	EPS002	3	$186,834	$7,500	CCF10	3	$190,959	$7,700	14-7	3	$186,834	$0	3	$0	$0
510	CC	1065130015	ARIAS PERTUZ RAFAEL HERNAN	230301	2	$124,556	$20,000	EPS002	2	$124,556	$5,000	CCF10	2	$127,306	$5,100	14-7	2	$124,556	$0	2	$0	$0
511	CC	1065130015	ARIAS PERTUZ RAFAEL HERNAN	230301	1	$62,278	$7,500	EPS002	1	$62,278	$0	CCF10	1	$0	$0	14-7	1	$62,278	$0	1	$0	$0
512	CC	1065130015	ARIAS PERTUZ RAFAEL HERNAN	230301	1	$62,278	$7,500	EPS002	1	$62,278	$0	CCF10	1	$0	$0	14-7	1	$62,278	$0	1	$0	$0
513	CC	74334881	AVILA BECERRA RUBEN ALIRIO	25-14	3	$249,370	$39,900	EPS005	3	$249,370	$10,000	CCF10	3	$235,075	$9,500	14-7	3	$249,370	$0	3	$0	$0
514	CC	74334881	AVILA BECERRA RUBEN ALIRIO	25-14	2	$166,247	$26,600	EPS005	2	$166,247	$6,700	CCF10	2	$154,383	$6,200	14-7	2	$166,247	$0	2	$0	$0
515	CC	74334881	AVILA BECERRA RUBEN ALIRIO	25-14	5	$415,616	$66,500	EPS005	5	$415,616	$16,700	CCF10	5	$333,334	$13,400	14-7	5	$415,616	$0	5	$0	$0
516	CC	1096906772	AYALA ZARAZA CARLOS ANDREY	230301	2	$174,223	$27,900	MIN001	2	$174,223	$7,000	CCF10	2	$173,333	$7,000	14-7	2	$174,223	$0	2	$0	$0
517	CC	1096906772	AYALA ZARAZA CARLOS ANDREY	230301	2	$174,223	$27,900	MIN001	2	$174,223	$7,000	CCF10	2	$171,556	$6,900	14-7	2	$174,223	$0	2	$0	$0
518	CC	1096906772	AYALA ZARAZA CARLOS ANDREY	230301	1	$87,112	$10,500	MIN001	1	$87,112	$0	CCF10	1	$0	$0	14-7	1	$87,112	$0	1	$0	$0
519	CC	1056552344	BARRERA NIÑO JHON JAIRO	230301	3	$177,482	$21,300	EPS037	3	$177,482	$0	CCF10	3	$0	$0	14-7	3	$177,482	$0	3	$0	$0
520	CC	1056552344	BARRERA NIÑO JHON JAIRO	230301	2	$118,321	$19,000	EPS037	2	$118,321	$4,800	CCF10	2	$118,321	$4,800	14-7	2	$118,321	$0	2	$0	$0
521	CC	1085328538	BASTIDAS CABRERA JEISON FERNANDO	230301	1	$65,278	$10,500	EPS037	1	$65,278	$2,700	CCF10	1	$65,000	$2,600	14-7	1	$65,278	$0	1	$0	$0
522	CC	1085328538	BASTIDAS CABRERA JEISON FERNANDO	230301	3	$195,834	$31,400	EPS037	3	$195,834	$7,900	CCF10	3	$194,167	$7,800	14-7	3	$195,834	$0	3	$0	$0
523	CC	1085328538	BASTIDAS CABRERA JEISON FERNANDO	230301	1	$65,278	$10,500	EPS037	1	$65,278	$2,700	CCF10	1	$63,889	$2,600	14-7	1	$65,278	$0	1	$0	$0
524	CC	1085328538	BASTIDAS CABRERA JEISON FERNANDO	230301	1	$65,278	$7,900	EPS037	1	$65,278	$0	CCF10	1	$0	$0	14-7	1	$65,278	$0	1	$0	$0
525	CC	9099965	BAYTER MENDOZA JOHN JAIRO	230201	3	$247,298	$39,600	EPS037	3	$247,298	$9,900	CCF10	3	$235,137	$9,500	14-7	3	$247,298	$0	3	$0	$0
526	CC	9099965	BAYTER MENDOZA JOHN JAIRO	230201	2	$164,865	$26,400	EPS037	2	$164,865	$6,600	CCF10	2	$154,424	$6,200	14-7	2	$164,865	$0	2	$0	$0

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
527	CC	91014578	BELLO CASTILLO ANTONIO	230301	3	$250,000	$30,000	EPS005	3	$250,000	$0	CCF10	3	$0	$0	14-7	3	$250,000	$0	3	$0	$0
528	CC	91014578	BELLO CASTILLO ANTONIO	230301	2	$166,667	$20,100	EPS005	2	$166,667	$0	CCF10	2	$0	$0	14-7	2	$166,667	$0	2	$0	$0
529	CC	74282731	BENITO ROMERO WILLIAM	230301	3	$301,973	$48,400	EPS017	3	$301,973	$12,100	CCF10	3	$270,415	$10,900	14-7	3	$301,973	$0	3	$0	$0
530	CC	74282731	BENITO ROMERO WILLIAM	230301	2	$201,315	$32,300	EPS017	2	$201,315	$8,100	CCF10	2	$175,610	$7,100	14-7	2	$201,315	$0	2	$0	$0
531	CC	1089844267	BOLAÑOS DELGADO JOSE DIOMEDES	230201	3	$260,559	$41,700	EPS037	3	$260,559	$10,500	CCF10	3	$235,645	$9,500	14-7	3	$260,559	$0	3	$0	$0
532	CC	1089844267	BOLAÑOS DELGADO JOSE DIOMEDES	230201	2	$173,706	$27,800	EPS037	2	$173,706	$7,000	CCF10	2	$154,764	$6,200	14-7	2	$173,706	$0	2	$0	$0
533	CC	1089844267	BOLAÑOS DELGADO JOSE DIOMEDES	230201	1	$86,853	$13,900	EPS037	1	$86,853	$3,500	CCF10	1	$66,667	$2,700	14-7	1	$86,853	$0	1	$0	$0
534	CC	9531788	BONILLA GUTIERREZ VICTOR	230301	3	$352,334	$56,400	EPS005	3	$352,334	$14,100	CCF10	3	$350,000	$14,000	14-7	3	$352,334	$0	3	$0	$0
535	CC	9531788	BONILLA GUTIERREZ VICTOR	230301	1	$117,445	$18,800	EPS005	1	$117,445	$4,700	CCF10	1	$114,333	$4,600	14-7	1	$117,445	$0	1	$0	$0
536	CC	4276546	CADENA VALERO ALIRIO	230301	1	$96,515	$15,500	EPS037	1	$96,515	$3,900	CCF10	1	$90,000	$3,600	14-7	1	$96,515	$0	1	$0	$0
537	CC	4276546	CADENA VALERO ALIRIO	230301	2	$193,030	$30,900	EPS037	2	$193,030	$7,800	CCF10	2	$178,444	$7,200	14-7	2	$193,030	$0	2	$0	$0
538	CC	4276546	CADENA VALERO ALIRIO	230301	2	$193,030	$23,200	EPS037	2	$193,030	$0	CCF10	2	$0	$0	14-7	2	$193,030	$0	2	$0	$0
539	CC	1016078216	CALDAS BERNAL JUAN DAVID	230301	3	$310,639	$49,800	EPS037	3	$310,639	$12,500	CCF10	3	$265,016	$10,700	14-7	3	$310,639	$0	3	$0	$0
540	CC	1016078216	CALDAS BERNAL JUAN DAVID	230301	2	$207,093	$33,200	EPS037	2	$207,093	$8,300	CCF10	2	$176,678	$7,100	14-7	2	$207,093	$0	2	$0	$0
541	CC	80184018	CALDAS BERNAL JUAN FRANCISCO	230201	3	$309,759	$49,600	EPS017	3	$309,759	$12,400	CCF10	3	$201,804	$8,100	14-7	3	$309,759	$0	3	$0	$0
542	CC	80184018	CALDAS BERNAL JUAN FRANCISCO	230201	2	$206,506	$33,100	EPS017	2	$206,506	$8,300	CCF10	2	$134,536	$5,400	14-7	2	$206,506	$0	2	$0	$0
543	CC	7224981	CAMARGO CARDENAS JOSE NELSON	25-14	2	$140,000	$22,400	EPS005	2	$140,000	$5,600	CCF10	2	$140,000	$5,600	14-7	2	$140,000	$0	2	$0	$0
544	CC	7224981	CAMARGO CARDENAS JOSE NELSON	25-14	3	$210,000	$25,200	EPS005	3	$210,000	$0	CCF10	3	$0	$0	14-7	3	$210,000	$0	3	$0	$0
545	CC	74321795	CANTOR MOLINA CARLOS EDEN	230301	3	$144,814	$17,400	EPS037	3	$144,814	$0	CCF10	3	$0	$0	14-7	3	$144,814	$0	3	$0	$0
546	CC	74321795	CANTOR MOLINA CARLOS EDEN	230301	2	$96,543	$15,500	EPS037	2	$96,543	$3,900	CCF10	2	$94,900	$3,800	14-7	2	$96,543	$0	2	$0	$0
547	CC	1143379606	CARDENAS MANTILLA LUIS SEBASTIAN	230301	3	$160,000	$25,600	ESSC24	3	$160,000	$6,400	CCF10	3	$160,000	$6,400	14-7	3	$160,000	$0	3	$0	$0
548	CC	1143379606	CARDENAS MANTILLA LUIS SEBASTIAN	230301	2	$106,667	$17,100	ESSC24	2	$106,667	$4,300	CCF10	2	$106,667	$4,300	14-7	2	$106,667	$0	2	$0	$0
549	CC	1052312238	CASTRO ESPINDOLA LEONEL ALONSO	230301	3	$156,920	$25,200	ESSC24	3	$156,920	$6,300	CCF10	3	$142,568	$5,800	14-7	3	$156,920	$0	3	$0	$0
550	CC	1052312238	CASTRO ESPINDOLA LEONEL ALONSO	230301	2	$104,614	$16,800	ESSC24	2	$104,614	$4,200	CCF10	2	$95,045	$3,900	14-7	2	$104,614	$0	2	$0	$0
551	CC	1054253658	CUCUNUBA BENITEZ ALEXANDER	230301	2	$129,133	$20,700	EPS037	2	$129,133	$5,200	CCF10	2	$94,988	$3,800	14-7	2	$129,133	$0	2	$0	$0
552	CC	1054253658	CUCUNUBA BENITEZ ALEXANDER	230301	3	$193,699	$23,300	EPS037	3	$193,699	$0	CCF10	3	$0	$0	14-7	3	$193,699	$0	3	$0	$0
553	CC	1056554732	CUCUNUBA BENITEZ JOHANA ANDREA	230301	3	$211,519	$33,900	ESSC24	3	$211,519	$8,500	CCF10	3	$145,897	$5,900	14-7	3	$211,519	$0	3	$0	$0
554	CC	1056554732	CUCUNUBA BENITEZ JOHANA ANDREA	230301	2	$141,013	$22,600	ESSC24	2	$141,013	$5,700	CCF10	2	$97,265	$3,900	14-7	2	$141,013	$0	2	$0	$0
555	CC	1053614292	CUERVO MARTINEZ JULIAN DAVID	230201	3	$237,009	$38,000	EPS037	3	$237,009	$9,500	CCF10	3	$235,090	$9,500	14-7	3	$237,009	$0	3	$0	$0
556	CC	1053614292	CUERVO MARTINEZ JULIAN DAVID	230201	2	$158,006	$25,300	EPS037	2	$158,006	$6,400	CCF10	2	$154,393	$6,200	14-7	2	$158,006	$0	2	$0	$0
557	CC	1056592564	DUARTE GARCIA DIEGO ARMANDO	230301	3	$285,196	$45,700	EPS037	3	$285,196	$11,500	CCF10	3	$235,780	$9,500	14-7	3	$285,196	$0	3	$0	$0
558	CC	1056592564	DUARTE GARCIA DIEGO ARMANDO	230301	2	$190,131	$30,500	EPS037	2	$190,131	$7,700	CCF10	2	$154,853	$6,200	14-7	2	$190,131	$0	2	$0	$0
559	CC	1056593117	DUARTE GARCIA EDGAR DANILO	230301	1	$53,052	$8,500	EPS037	1	$53,052	$2,200	CCF10	1	$50,797	$2,100	14-7	1	$53,052	$0	1	$0	$0
560	CC	1056593117	DUARTE GARCIA EDGAR DANILO	230301	3	$159,156	$19,100	EPS037	3	$159,156	$0	CCF10	3	$0	$0	14-7	3	$159,156	$0	3	$0	$0
561	CC	1056593117	DUARTE GARCIA EDGAR DANILO	230301	1	$53,051	$6,400	EPS037	1	$53,051	$0	CCF10	1	$0	$0	14-7	1	$53,051	$0	1	$0	$0
562	CC	74320996	ESPINDOLA LIZARAZO JAVIER	25-14	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF10	1	$47,450	$1,900	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
563	CC	74320996	ESPINDOLA LIZARAZO JAVIER	25-14	3	$142,350	$17,100	EPS037	3	$142,350	$0	CCF10	3	$0	$0	14-7	3	$142,350	$0	3	$0	$0

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
564	CC	74320996	ESPINDOLA LIZARAZO JAVIER	25-14	1	$47,450	$5,700	EPS037	1	$47,450	$0	CCF10	1	$0	$0	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
565	CC	74320996	ESPINDOLA LIZARAZO JAVIER	25-14	1	$63,915	$7,700	EPS037	1	$63,915	$0	CCF10	1	$0	$0	14-7	1	$63,915	$0	1	$0	$0
566	CC	1006531651	FANDIÑO TORRES DIEGO FERNANDO	230201	3	$337,921	$54,100	EPS037	3	$337,921	$13,600	CCF10	3	$280,000	$11,200	14-7	3	$337,921	$0	3	$0	$0
567	CC	1006531651	FANDIÑO TORRES DIEGO FERNANDO	230201	2	$225,281	$36,100	EPS037	2	$225,281	$9,100	CCF10	2	$184,000	$7,400	14-7	2	$225,281	$0	2	$0	$0
568	CC	1091663870	GALEANO ANGARITA JAIRO ANDRES	230301	3	$501,723	$80,300	EPS005	3	$501,723	$20,100	CCF10	3	$500,000	$20,000	14-7	3	$501,723	$0	3	$0	$0
569	CC	1091663870	GALEANO ANGARITA JAIRO ANDRES	230301	2	$334,482	$53,600	EPS005	2	$334,482	$13,400	CCF10	2	$330,000	$13,200	14-7	2	$334,482	$0	2	$0	$0
570	CC	6775061	GALINDO BARON LIBARDO ENRIQUE	25-14	3	$322,667	$51,700	EPS008	3	$322,667	$13,000	CCF10	3	$320,000	$12,800	14-7	3	$322,667	$0	3	$0	$0
571	CC	6775061	GALINDO BARON LIBARDO ENRIQUE	25-14	2	$215,112	$34,500	EPS008	2	$215,112	$8,700	CCF10	2	$210,667	$8,500	14-7	2	$215,112	$0	2	$0	$0
572	CC	1056592296	GONZALEZ JOYA HECTOR LENNART	230301	3	$291,790	$46,700	EPS037	3	$291,790	$11,700	CCF10	3	$270,000	$10,800	14-7	3	$291,790	$0	3	$0	$0
573	CC	1056592296	GONZALEZ JOYA HECTOR LENNART	230301	2	$194,527	$31,200	EPS037	2	$194,527	$7,800	CCF10	2	$175,333	$7,100	14-7	2	$194,527	$0	2	$0	$0
574	CC	1018416852	GUAVITA ALFONSO DAVID ALFREDO	25-14	2	$335,556	$53,700	EPS005	2	$335,556	$13,500	CCF10	2	$333,333	$13,400	14-7	2	$335,556	$0	2	$0	$0
575	CC	74281087	GUERRERO BERNAL VICTOR MANUEL	230301	3	$201,829	$32,300	EPS041	3	$201,829	$8,100	CCF10	3	$180,000	$7,200	14-7	3	$201,829	$0	3	$0	$0
576	CC	74281087	GUERRERO BERNAL VICTOR MANUEL	230301	2	$134,553	$21,600	EPS041	2	$134,553	$5,400	CCF10	2	$118,000	$4,800	14-7	2	$134,553	$0	2	$0	$0
577	CC	79185370	HERNANDEZ SIMBAQUEVA JULIO HERNAN	230301	2	$130,169	$15,700	EPS017	2	$130,169	$0	CCF10	2	$0	$0	14-7	2	$130,169	$0	2	$0	$0
578	CC	79185370	HERNANDEZ SIMBAQUEVA JULIO HERNAN	230301	1	$65,085	$10,500	EPS017	1	$65,085	$2,700	CCF10	1	$47,463	$1,900	14-7	1	$65,085	$0	1	$0	$0
579	CC	79185370	HERNANDEZ SIMBAQUEVA JULIO HERNAN	230301	2	$130,169	$20,900	EPS017	2	$130,169	$5,300	CCF10	2	$94,927	$3,800	14-7	2	$130,169	$0	2	$0	$0
580	CC	59652037	HERNANDEZ BASTIDAS NANCY YENI	230201	3	$481,000	$77,000	EPS037	3	$481,000	$19,300	CCF10	3	$480,000	$19,200	14-7	3	$481,000	$0	3	$0	$0
581	CC	59652037	HERNANDEZ BASTIDAS NANCY YENI	230201	2	$320,667	$51,400	EPS037	2	$320,667	$12,900	CCF10	2	$318,000	$12,800	14-7	2	$320,667	$0	2	$0	$0
582	CC	1057594964	HERRERA MONTAÑEZ CRISTIAN ALFREDO	230301	3	$190,667	$30,600	EPS041	3	$190,667	$7,700	CCF10	3	$190,000	$7,600	14-7	3	$190,667	$0	3	$0	$0
583	CC	1057594964	HERRERA MONTAÑEZ CRISTIAN ALFREDO	230301	2	$127,112	$20,400	EPS041	2	$127,112	$5,100	CCF10	2	$125,333	$5,100	14-7	2	$127,112	$0	2	$0	$0
584	CC	1002556915	HERRERA HERRERA YEIMER LORENZO	230301	2	$108,930	$13,100	EPS002	2	$108,930	$0	CCF10	2	$0	$0	14-7	2	$108,930	$0	2	$0	$0
585	CC	1002556915	HERRERA HERRERA YEIMER LORENZO	230301	1	$54,465	$8,800	EPS002	1	$54,465	$2,200	CCF10	1	$47,450	$1,900	14-7	1	$54,465	$0	1	$0	$0
586	CC	1002556915	HERRERA HERRERA YEIMER LORENZO	230301	2	$108,930	$17,500	EPS002	2	$108,930	$4,400	CCF10	2	$94,900	$3,800	14-7	2	$108,930	$0	2	$0	$0
587	CC	1069475704	HOYOS LAZARO LUIS FERNANDO	230301	3	$142,350	$17,100	CCFC55	3	$142,350	$0	CCF10	3	$0	$0	14-7	3	$142,350	$0	3	$0	$0
588	CC	1069475704	HOYOS LAZARO LUIS FERNANDO	230301	1	$57,303	$6,900	CCFC55	1	$57,303	$0	CCF10	1	$0	$0	14-7	1	$57,303	$0	1	$0	$0
589	CC	1069475704	HOYOS LAZARO LUIS FERNANDO	230301	1	$47,450	$7,600	CCFC55	1	$47,450	$1,900	CCF10	1	$47,450	$1,900	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
590	CC	1022955749	LAGOS AVENDAÑO YENNY FAISURY	25-14	10	$559,330	$89,500	EPS008	10	$559,330	$22,400	CCF10	10	$0	$0	14-7	10	$559,330	$0	10	$0	$0
591	CC	74372462	LARA RODRIGUEZ JAVIER ALEXANDER	25-14	3	$424,000	$67,900	EPS008	3	$424,000	$17,000	CCF10	3	$420,000	$16,800	14-7	3	$424,000	$0	3	$0	$0
592	CC	74372462	LARA RODRIGUEZ JAVIER ALEXANDER	25-14	2	$282,667	$45,300	EPS008	2	$282,667	$11,400	CCF10	2	$272,000	$10,900	14-7	2	$282,667	$0	2	$0	$0
593	CC	87572881	LEGARDA ADOLFO ILARIO	230201	1	$98,946	$15,900	EPS037	1	$98,946	$4,000	CCF10	1	$90,025	$3,700	14-7	1	$98,946	$0	1	$0	$0
594	CC	87572881	LEGARDA ADOLFO ILARIO	230201	1	$98,946	$15,900	EPS037	1	$98,946	$4,000	CCF10	1	$89,248	$3,600	14-7	1	$98,946	$0	1	$0	$0
595	CC	87572881	LEGARDA ADOLFO ILARIO	230201	3	$296,837	$35,700	EPS037	3	$296,837	$0	CCF10	3	$0	$0	14-7	3	$296,837	$0	3	$0	$0
596	CC	87572881	LEGARDA ADOLFO ILARIO	230201	1	$98,945	$11,900	EPS037	1	$98,945	$0	CCF10	1	$0	$0	14-7	1	$98,945	$0	1	$0	$0
597	CC	98387299	MADROÑERO MARTINEZ WILLIAM HERNAN	230301	3	$349,684	$56,000	EPS037	3	$349,684	$14,000	CCF10	3	$291,311	$11,700	14-7	3	$349,684	$0	3	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
598	CC	98387299	MADROÑERO MARTINEZ WILLIAM HERNAN	230301	2	$233,123	$37,300	EPS037	2	$233,123	$9,400	CCF10	2	$189,541	$7,600	14-7	2	$233,123	$0	2	$0	$0
599	CC	1002557033	MENDIVELSO DURAN EMERSON YESITH	25-14	4	$189,800	$22,800	EPS037	4	$189,800	$0	CCF10	4	$0	$0	14-7	4	$189,800	$0	4	$0	$0
600	CC	1000269978	MENDIVELSO NIÑO MARIA LORENA	230201	1	$68,057	$8,200	ESSC24	1	$68,057	$0	CCF10	1	$0	$0	14-7	1	$68,057	$0	1	$0	$0
601	CC	1000269978	MENDIVELSO NIÑO MARIA LORENA	230201	2	$136,113	$21,800	ESSC24	2	$136,113	$5,500	CCF10	2	$96,331	$3,900	14-7	2	$136,113	$0	2	$0	$0
602	CC	1000269978	MENDIVELSO NIÑO MARIA LORENA	230201	2	$136,113	$21,800	ESSC24	2	$136,113	$5,500	CCF10	2	$96,331	$3,900	14-7	2	$136,113	$0	2	$0	$0
603	CC	74320706	MENDIVELSO TORRES SAUL	25-14	2	$100,415	$12,100	ESSC24	2	$100,415	$0	CCF10	2	$0	$0	14-7	2	$100,415	$0	2	$0	$0
604	CC	74320706	MENDIVELSO TORRES SAUL	25-14	1	$50,208	$8,100	ESSC24	1	$50,208	$2,100	CCF10	1	$47,450	$1,900	14-7	1	$50,208	$0	1	$0	$0
605	CC	74320706	MENDIVELSO TORRES SAUL	25-14	2	$100,415	$16,100	ESSC24	2	$100,415	$4,100	CCF10	2	$94,900	$3,800	14-7	2	$100,415	$0	2	$0	$0
606	CC	1024533844	MONTOYA MOLINA LEIDY	230301	5	$325,904	$52,200	EPS037	5	$325,904	$13,100	CCF10	5	$243,419	$9,800	14-7	5	$325,904	$0	5	$0	$0
607	CC	1057597824	MORENO AMAYA NESTOR HERNAN	230301	3	$186,834	$29,900	EPS037	3	$186,834	$7,500	CCF10	3	$188,183	$7,600	14-7	3	$186,834	$0	3	$0	$0
608	CC	1057597824	MORENO AMAYA NESTOR HERNAN	230301	2	$124,556	$20,000	EPS037	2	$124,556	$5,000	CCF10	2	$125,456	$5,100	14-7	2	$124,556	$0	2	$0	$0
609	CC	74085152	MURILLO PEREZ OSCAR LEONARDO	231001	3	$255,827	$41,000	EPS002	3	$255,827	$10,300	CCF10	3	$255,000	$10,200	14-7	3	$255,827	$0	3	$0	$0
610	CC	74085152	MURILLO PEREZ OSCAR LEONARDO	231001	2	$170,551	$27,300	EPS002	2	$170,551	$6,900	CCF10	2	$170,000	$6,800	14-7	2	$170,551	$0	2	$0	$0
611	CC	1002395369	NAVARRO CORTES KEVIN STEVEN	230301	3	$174,872	$28,000	EPS041	3	$174,872	$7,000	CCF10	3	$184,350	$7,400	14-7	3	$174,872	$0	3	$0	$0
612	CC	1002395369	NAVARRO CORTES KEVIN STEVEN	230301	2	$116,582	$18,700	EPS041	2	$116,582	$4,700	CCF10	2	$118,233	$4,800	14-7	2	$116,582	$0	2	$0	$0
613	CC	74321803	NIÑO MENDIVELSO ANYILO	25-14	1	$50,132	$8,100	EPS037	1	$50,132	$2,100	CCF10	1	$47,450	$1,900	14-7	1	$50,132	$0	1	$0	$0
614	CC	74321803	NIÑO MENDIVELSO ANYILO	25-14	2	$100,264	$16,100	EPS037	2	$100,264	$4,100	CCF10	2	$94,900	$3,800	14-7	2	$100,264	$0	2	$0	$0
615	CC	74321803	NIÑO MENDIVELSO ANYILO	25-14	2	$100,264	$12,100	EPS037	2	$100,264	$0	CCF10	2	$0	$0	14-7	2	$100,264	$0	2	$0	$0
616	CC	9375309	NIÑO ALBARRACIN LUIS	25-14	1	$56,413	$9,100	EPS037	1	$56,413	$2,300	CCF10	1	$47,450	$1,900	14-7	1	$56,413	$0	1	$0	$0
617	CC	9375309	NIÑO ALBARRACIN LUIS	25-14	2	$112,826	$18,100	EPS037	2	$112,826	$4,600	CCF10	2	$94,900	$3,800	14-7	2	$112,826	$0	2	$0	$0
618	CC	9375309	NIÑO ALBARRACIN LUIS	25-14	2	$112,826	$13,600	EPS037	2	$112,826	$0	CCF10	2	$0	$0	14-7	2	$112,826	$0	2	$0	$0
619	CC	1063286499	NORIEGA MARTINEZ LUIS CARLOS	230201	3	$270,000	$32,400	EPS005	3	$270,000	$0	CCF10	3	$0	$0	14-7	3	$270,000	$0	3	$0	$0
620	CC	1063286499	NORIEGA MARTINEZ LUIS CARLOS	230201	2	$180,000	$21,600	EPS005	2	$180,000	$0	CCF10	2	$0	$0	14-7	2	$180,000	$0	2	$0	$0
621	CC	74379161	OCHOA DELGADO MICHAEL LEONARDO	230201	3	$501,667	$80,300	EPS005	3	$501,667	$20,100	CCF10	3	$500,000	$20,000	14-7	3	$501,667	$0	3	$0	$0
622	CC	74379161	OCHOA DELGADO MICHAEL LEONARDO	230201	2	$334,445	$53,600	EPS005	2	$334,445	$13,400	CCF10	2	$330,000	$13,200	14-7	2	$334,445	$0	2	$0	$0
623	CC	9590254	PACHON CARREÑO YESID ALEXANDER	231001	3	$150,492	$24,100	EPS037	3	$150,492	$6,100	CCF10	3	$142,391	$5,700	14-7	3	$150,492	$0	3	$0	$0
624	CC	9590254	PACHON CARREÑO YESID ALEXANDER	231001	2	$100,328	$16,100	EPS037	2	$100,328	$4,100	CCF10	2	$94,928	$3,800	14-7	2	$100,328	$0	2	$0	$0
625	CC	7174208	PARRA CAMACHO MIGUEL ANGEL	25-14	3	$551,667	$88,300	EPS005	3	$551,667	$22,100	CCF10	3	$550,000	$22,000	14-7	3	$551,667	$0	3	$0	$0
626	CC	7174208	PARRA CAMACHO MIGUEL ANGEL	25-14	2	$367,778	$58,900	EPS005	2	$367,778	$14,800	CCF10	2	$363,333	$14,600	14-7	2	$367,778	$0	2	$0	$0
627	CC	1007517995	PEREZ ZAMBRANO DIEGO ALEXIS	230201	1	$59,723	$9,600	EPS005	1	$59,723	$2,400	CCF10	1	$47,484	$1,900	14-7	1	$59,723	$0	1	$0	$0
628	CC	1007517995	PEREZ ZAMBRANO DIEGO ALEXIS	230201	2	$119,446	$19,200	EPS005	2	$119,446	$4,800	CCF10	2	$94,967	$3,800	14-7	2	$119,446	$0	2	$0	$0
629	CC	1007517995	PEREZ ZAMBRANO DIEGO ALEXIS	230201	2	$119,446	$14,400	EPS005	2	$119,446	$0	CCF10	2	$0	$0	14-7	2	$119,446	$0	2	$0	$0
630	CC	1053609037	PEREZ CIPAGAUTA IVAN ARLEY	230301	2	$174,302	$27,900	EPS005	2	$174,302	$7,000	CCF10	2	$173,333	$7,000	14-7	2	$174,302	$0	2	$0	$0
631	CC	1053609037	PEREZ CIPAGAUTA IVAN ARLEY	230301	2	$174,302	$27,900	EPS005	2	$174,302	$7,000	CCF10	2	$171,556	$6,900	14-7	2	$174,302	$0	2	$0	$0
632	CC	1053609037	PEREZ CIPAGAUTA IVAN ARLEY	230301	1	$87,151	$10,500	EPS005	1	$87,151	$0	CCF10	1	$0	$0	14-7	1	$87,151	$0	1	$0	$0
633	CC	1029640977	QUIQUIVA QUINTERO YEFERSON ESTIBEN	230301	1	$48,975	$7,900	EPS037	1	$48,975	$2,000	CCF10	1	$47,450	$1,900	14-7	1	$48,975	$0	1	$0	$0
634	CC	1029640977	QUIQUIVA QUINTERO YEFERSON ESTIBEN	230301	2	$97,950	$15,700	EPS037	2	$97,950	$4,000	CCF10	2	$94,900	$3,800	14-7	2	$97,950	$0	2	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
635	CC	1029640977	QUIQUIVA QUINTERO YEFERSON ESTIBEN	230301	2	$97,950	$11,800	EPS037	2	$97,950	$0	CCF10	2	$0	$0	14-7	2	$97,950	$0	2	$0	$0
636	CC	1064113198	RAMIREZ RIVERA JUAN DE DIOS	230301	3	$188,728	$30,200	EPS037	3	$188,728	$7,600	CCF10	3	$184,423	$7,400	14-7	3	$188,728	$0	3	$0	$0
637	CC	1064113198	RAMIREZ RIVERA JUAN DE DIOS	230301	2	$125,819	$20,200	EPS037	2	$125,819	$5,100	CCF10	2	$120,149	$4,900	14-7	2	$125,819	$0	2	$0	$0
638	CC	1124362431	RAMIREZ MARTINEZ VICTOR ALFONSO	25-14	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF10	1	$47,450	$1,900	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
639	CC	1124362431	RAMIREZ MARTINEZ VICTOR ALFONSO	25-14	3	$142,350	$22,800	EPS037	3	$142,350	$5,700	CCF10	3	$142,350	$5,700	14-7	3	$142,350	$0	3	$0	$0
640	CC	1124362431	RAMIREZ MARTINEZ VICTOR ALFONSO	25-14	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF10	1	$47,450	$1,900	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
641	CC	1124362431	RAMIREZ MARTINEZ VICTOR ALFONSO	25-14	1	$47,450	$5,700	EPS037	1	$47,450	$0	CCF10	1	$0	$0	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
642	CC	1002557008	RAVELO RAVELO GLORIA LORENA	230301	3	$142,350	$22,800	EPS041	3	$142,350	$5,700	CCF10	3	$142,350	$5,700	14-7	3	$142,350	$0	3	$0	$0
643	CC	1002557008	RAVELO RAVELO GLORIA LORENA	230301	2	$94,900	$15,200	EPS041	2	$94,900	$3,800	CCF10	2	$94,900	$3,800	14-7	2	$94,900	$0	2	$0	$0
644	CC	1002557003	RAVELO FERNANDEZ LAURA LISETH	230301	3	$170,195	$27,300	EPS037	3	$170,195	$6,900	CCF10	3	$145,195	$5,900	14-7	3	$170,195	$0	3	$0	$0
645	CC	1002557003	RAVELO FERNANDEZ LAURA LISETH	230301	1	$56,732	$9,100	EPS037	1	$56,732	$2,300	CCF10	1	$48,398	$2,000	14-7	1	$56,732	$0	1	$0	$0
646	CC	74181219	RINCON LEON CESAR AUGUSTO	25-14	3	$355,885	$57,000	EPS005	3	$355,885	$14,300	CCF10	3	$270,041	$10,900	14-7	3	$355,885	$0	3	$0	$0
647	CC	74181219	RINCON LEON CESAR AUGUSTO	25-14	2	$237,257	$38,000	EPS005	2	$237,257	$9,500	CCF10	2	$176,694	$7,100	14-7	2	$237,257	$0	2	$0	$0
648	CC	1052312422	RINCON PEÑARANDA WILFRAN SAURYTH	230301	3	$143,107	$22,900	EPS041	3	$143,107	$5,800	CCF10	3	$142,350	$5,700	14-7	3	$143,107	$0	3	$0	$0
649	CC	1052312422	RINCON PEÑARANDA WILFRAN SAURYTH	230301	2	$95,405	$15,300	EPS041	2	$95,405	$3,900	CCF10	2	$94,900	$3,800	14-7	2	$95,405	$0	2	$0	$0
650	CC	1001056873	ROJAS CASTAÑEDA KAROLL DAYAN	230201	3	$157,160	$25,200	EPS037	3	$157,160	$6,300	CCF10	3	$162,641	$6,600	14-7	3	$157,160	$0	3	$0	$0
651	CC	1001056873	ROJAS CASTAÑEDA KAROLL DAYAN	230201	2	$104,774	$16,800	EPS037	2	$104,774	$4,200	CCF10	2	$107,094	$4,300	14-7	2	$104,774	$0	2	$0	$0
652	CC	1001056873	ROJAS CASTAÑEDA KAROLL DAYAN	230201	1	$52,387	$6,300	EPS037	1	$52,387	$0	CCF10	1	$0	$0	14-7	1	$52,387	$0	1	$0	$0
653	CC	1001056873	ROJAS CASTAÑEDA KAROLL DAYAN	230201	1	$52,387	$6,300	EPS037	1	$52,387	$0	CCF10	1	$0	$0	14-7	1	$52,387	$0	1	$0	$0
654	CC	1056592563	ROJAS TORRES RAUL ANTONIO	230301	3	$260,506	$41,700	EPS037	3	$260,506	$10,500	CCF10	3	$235,190	$9,500	14-7	3	$260,506	$0	3	$0	$0
655	CC	1056592563	ROJAS TORRES RAUL ANTONIO	230301	2	$173,671	$27,800	EPS037	2	$173,671	$7,000	CCF10	2	$154,460	$6,200	14-7	2	$173,671	$0	2	$0	$0
656	CC	1053665202	ROJAS ARAQUE YEFERSON	25-14	2	$116,257	$18,700	EPS037	2	$116,257	$4,700	CCF10	2	$95,487	$3,900	14-7	2	$116,257	$0	2	$0	$0
657	CC	1053665202	ROJAS ARAQUE YEFERSON	25-14	1	$58,129	$7,000	EPS037	1	$58,129	$0	CCF10	1	$0	$0	14-7	1	$58,129	$0	1	$0	$0
658	CC	1053665202	ROJAS ARAQUE YEFERSON	25-14	1	$58,129	$7,000	EPS037	1	$58,129	$0	CCF10	1	$0	$0	14-7	1	$58,129	$0	1	$0	$0
659	CC	1053665202	ROJAS ARAQUE YEFERSON	25-14	3	$174,384	$21,000	EPS037	3	$174,384	$0	CCF10	3	$0	$0	14-7	3	$174,384	$0	3	$0	$0
660	CC	1054253571	ROMERO CANTOR LEYDY	230301	5	$337,916	$54,100	EPS041	5	$337,916	$13,600	CCF10	5	$244,037	$9,800	14-7	5	$337,916	$0	5	$0	$0
661	CC	1054253571	ROMERO CANTOR LEYDY	230301	1	$67,584	$10,900	EPS041	1	$67,584	$2,800	CCF10	1	$47,450	$1,900	14-7	1	$67,584	$0	1	$0	$0
662	CC	1054254079	ROMERO CANTOR LIRLEY	230301	3	$215,427	$34,500	ESSC24	3	$215,427	$8,700	CCF10	3	$146,435	$5,900	14-7	3	$215,427	$0	3	$0	$0
663	CC	1054254079	ROMERO CANTOR LIRLEY	230301	2	$143,618	$23,000	ESSC24	2	$143,618	$5,800	CCF10	2	$97,623	$4,000	14-7	2	$143,618	$0	2	$0	$0
664	CC	91072221	SANCHEZ PEÑALOZA GERARDO	230301	3	$273,431	$43,800	EPS041	3	$273,431	$11,000	CCF10	3	$237,133	$9,500	14-7	3	$273,431	$0	3	$0	$0
665	CC	91072221	SANCHEZ PEÑALOZA GERARDO	230301	2	$182,287	$29,200	EPS041	2	$182,287	$7,300	CCF10	2	$155,756	$6,300	14-7	2	$182,287	$0	2	$0	$0
666	CC	1104406359	SARMIENTO DE HOYOS DANIEL DAVID	230301	1	$47,450	$7,600	ESSC24	1	$47,450	$1,900	CCF10	1	$47,450	$1,900	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
667	CC	1104406359	SARMIENTO DE HOYOS DANIEL DAVID	230301	2	$94,900	$15,200	ESSC24	2	$94,900	$3,800	CCF10	2	$94,900	$3,800	14-7	2	$94,900	$0	2	$0	$0
668	CC	1104406359	SARMIENTO DE HOYOS DANIEL DAVID	230301	2	$94,900	$11,400	ESSC24	2	$94,900	$0	CCF10	2	$0	$0	14-7	2	$94,900	$0	2	$0	$0
669	CC	1104406359	SARMIENTO DE HOYOS DANIEL DAVID	230301	1	$47,450	$5,700	ESSC24	1	$47,450	$0	CCF10	1	$0	$0	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
670	CC	1104406359	SARMIENTO DE HOYOS DANIEL DAVID	230301	1	$53,699	$6,500	ESSC24	1	$53,699	$0	CCF10	1	$0	$0	14-7	1	$53,699	$0	1	$0	$0
671	CC	5989325	SEPULVEDA ESQUIVEL JORGE ELIECER	25-14	3	$326,474	$52,300	EPS037	3	$326,474	$13,100	CCF10	3	$272,160	$10,900	14-7	3	$326,474	$0	3	$0	$0
672	CC	5989325	SEPULVEDA ESQUIVEL JORGE ELIECER	25-14	2	$217,650	$34,900	EPS037	2	$217,650	$8,800	CCF10	2	$176,773	$7,100	14-7	2	$217,650	$0	2	$0	$0
673	CC	1052314080	SILVA RINCON JHON EDISON	230301	3	$237,808	$38,100	EPS037	3	$237,808	$9,600	CCF10	3	$200,052	$8,100	14-7	3	$237,808	$0	3	$0	$0
674	CC	1052314080	SILVA RINCON JHON EDISON	230301	2	$158,539	$25,400	EPS037	2	$158,539	$6,400	CCF10	2	$133,368	$5,400	14-7	2	$158,539	$0	2	$0	$0
675	CC	1057606883	SOSSA PIRAGAUTA EDWARD ANDRES	230301	1	$60,982	$9,800	EPS037	1	$60,982	$2,500	CCF10	1	$47,450	$1,900	14-7	1	$60,982	$0	1	$0	$0
676	CC	1057606883	SOSSA PIRAGAUTA EDWARD ANDRES	230301	3	$182,944	$29,300	EPS037	3	$182,944	$7,400	CCF10	3	$182,350	$7,300	14-7	3	$182,944	$0	3	$0	$0
677	CC	1057606883	SOSSA PIRAGAUTA EDWARD ANDRES	230301	2	$121,963	$19,600	EPS037	2	$121,963	$4,900	CCF10	2	$118,900	$4,800	14-7	2	$121,963	$0	2	$0	$0
678	CC	74328817	SUAREZ GARZON NELSON ENRIQUE	230201	2	$267,966	$42,900	EPS041	2	$267,966	$10,800	CCF10	2	$200,667	$8,100	14-7	2	$267,966	$0	2	$0	$0
679	CC	74328817	SUAREZ GARZON NELSON ENRIQUE	230201	3	$401,949	$48,300	EPS041	3	$401,949	$0	CCF10	3	$0	$0	14-7	3	$401,949	$0	3	$0	$0
680	CC	4219068	TORRES BARRERA FREDY ALEXANDER	230301	3	$142,350	$22,800	EPS037	3	$142,350	$5,700	CCF10	3	$142,350	$5,700	14-7	3	$142,350	$0	3	$0	$0
681	CC	4219068	TORRES BARRERA FREDY ALEXANDER	230301	2	$94,900	$15,200	EPS037	2	$94,900	$3,800	CCF10	2	$94,900	$3,800	14-7	2	$94,900	$0	2	$0	$0
682	CC	1050200309	TORRES CASTRO LUIS ANTONIO	230301	2	$146,667	$23,500	EPS037	2	$146,667	$5,900	CCF10	2	$146,667	$5,900	14-7	2	$146,667	$0	2	$0	$0
683	CC	1050200309	TORRES CASTRO LUIS ANTONIO	230301	3	$220,000	$26,400	EPS037	3	$220,000	$0	CCF10	3	$0	$0	14-7	3	$220,000	$0	3	$0	$0
684	CC	74302396	TORRES TOBOS WILSON ENRIQUE	25-14	3	$258,177	$41,400	EPS037	3	$258,177	$10,400	CCF10	3	$230,046	$9,300	14-7	3	$258,177	$0	3	$0	$0
685	CC	74302396	TORRES TOBOS WILSON ENRIQUE	25-14	2	$172,118	$27,600	EPS037	2	$172,118	$6,900	CCF10	2	$150,030	$6,100	14-7	2	$172,118	$0	2	$0	$0
686	CC	1002556768	TRIANA GALVIS DANNY YESITH	230301	3	$158,006	$25,300	EPS037	3	$158,006	$6,400	CCF10	3	$142,415	$5,700	14-7	3	$158,006	$0	3	$0	$0
687	CC	1002556768	TRIANA GALVIS DANNY YESITH	230301	2	$105,337	$16,900	EPS037	2	$105,337	$4,300	CCF10	2	$94,944	$3,800	14-7	2	$105,337	$0	2	$0	$0
688	CC	1069502664	TRUJILLO MACEA LUIS ANGEL	230301	2	$94,900	$15,200	EPS037	2	$94,900	$3,800	CCF10	2	$94,900	$3,800	14-7	2	$94,900	$0	2	$0	$0
689	CC	1069502664	TRUJILLO MACEA LUIS ANGEL	230301	2	$94,900	$15,200	EPS037	2	$94,900	$3,800	CCF10	2	$94,900	$3,800	14-7	2	$94,900	$0	2	$0	$0
690	CC	1069502664	TRUJILLO MACEA LUIS ANGEL	230301	1	$47,450	$5,700	EPS037	1	$47,450	$0	CCF10	1	$0	$0	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
691	CC	1007518017	TUNAROZA CANTOR ERICK FERLEY	230301	3	$165,588	$26,500	EPS037	3	$165,588	$6,700	CCF10	3	$142,432	$5,700	14-7	3	$165,588	$0	3	$0	$0
692	CC	1007518017	TUNAROZA CANTOR ERICK FERLEY	230301	2	$110,392	$17,700	EPS037	2	$110,392	$4,500	CCF10	2	$94,955	$3,800	14-7	2	$110,392	$0	2	$0	$0
693	CC	1065905574	URQUIJO SERVERA JEISON	230301	3	$288,946	$46,300	EPS017	3	$288,946	$11,600	CCF10	3	$270,000	$10,800	14-7	3	$288,946	$0	3	$0	$0
694	CC	1065905574	URQUIJO SERVERA JEISON	230301	2	$192,631	$30,900	EPS017	2	$192,631	$7,800	CCF10	2	$175,333	$7,100	14-7	2	$192,631	$0	2	$0	$0
695	CC	1056554955	UYABAN NIÑO DANIA YAZMIN	230301	3	$216,134	$34,600	ESSC24	3	$216,134	$8,700	CCF10	3	$145,823	$5,900	14-7	3	$216,134	$0	3	$0	$0
696	CC	1056554955	UYABAN NIÑO DANIA YAZMIN	230301	2	$144,089	$23,100	ESSC24	2	$144,089	$5,800	CCF10	2	$97,215	$3,900	14-7	2	$144,089	$0	2	$0	$0
697	CC	1057579437	VARGAS CHARRIA JEISSON ANDRES	230301	2	$161,015	$25,800	EPS037	2	$161,015	$6,500	CCF10	2	$160,000	$6,400	14-7	2	$161,015	$0	2	$0	$0
698	CC	1057579437	VARGAS CHARRIA JEISSON ANDRES	230301	2	$161,015	$25,800	EPS037	2	$161,015	$6,500	CCF10	2	$160,000	$6,400	14-7	2	$161,015	$0	2	$0	$0
699	CC	1057579437	VARGAS CHARRIA JEISSON ANDRES	230301	1	$80,508	$9,700	EPS037	1	$80,508	$0	CCF10	1	$0	$0	14-7	1	$80,508	$0	1	$0	$0
700	CC	7181923	VILLABONA JUEZ HOLMANT ALEJANDRO	230301	3	$271,790	$43,500	EPS005	3	$271,790	$10,900	CCF10	3	$250,073	$10,100	14-7	3	$271,790	$0	3	$0	$0
701	CC	7181923	VILLABONA JUEZ HOLMANT ALEJANDRO	230301	2	$181,193	$29,000	EPS005	2	$181,193	$7,300	CCF10	2	$163,382	$6,600	14-7	2	$181,193	$0	2	$0	$0
702	CC	7181923	VILLABONA JUEZ HOLMANT ALEJANDRO	230301	1	$90,597	$10,900	EPS005	1	$90,597	$0	CCF10	1	$0	$0	14-7	1	$90,597	$0	1	$0	$0
703	CC	7181923	VILLABONA JUEZ HOLMANT ALEJANDRO	230301	1	$90,596	$10,900	EPS005	1	$90,596	$0	CCF10	1	$0	$0	14-7	1	$90,596	$0	1	$0	$0
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (38 Afiliados)						**$18,820,885**	**$2,981,400**			**$21,012,482**	**$970,300**			**$18,518,367**	**$744,700**			**$21,012,482**	**$0**		**$3,244,250**	**$162,500**

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
704	CC	1007343159	ALFONSO VERDUGO YOAN FERNANDO	230301	3	$211,667	$33,900	EPS005	3	$211,667	$8,500	CCF10	3	$190,000	$7,600	14-7	3	$211,667	$0	3	$0	$0
705	CC	1007343159	ALFONSO VERDUGO YOAN FERNANDO	230301	2	$141,112	$22,600	EPS005	2	$141,112	$5,700	CCF10	2	$126,667	$5,100	14-7	2	$141,112	$0	2	$0	$0
706	CC	1065135481	ALTAMAR PACHECO SINIVALDO ANTONIO	230301	3	$314,653	$50,400	EPS037	3	$314,653	$12,600	CCF10	3	$270,794	$10,900	14-7	3	$314,653	$0	3	$0	$0
707	CC	1065135481	ALTAMAR PACHECO SINIVALDO ANTONIO	230301	2	$209,769	$33,600	EPS037	2	$209,769	$8,400	CCF10	2	$175,862	$7,100	14-7	2	$209,769	$0	2	$0	$0
708	CC	1033367410	CALAO BONOLIS CARLOS MARIO	25-14	3	$201,508	$32,300	EPS037	3	$201,508	$8,100	CCF10	3	$200,020	$8,100	14-7	3	$201,508	$0	3	$0	$0
709	CC	1033367410	CALAO BONOLIS CARLOS MARIO	25-14	2	$134,339	$21,500	EPS037	2	$134,339	$5,400	CCF10	2	$130,680	$5,300	14-7	2	$134,339	$0	2	$0	$0
710	CC	1033367410	CALAO BONOLIS CARLOS MARIO	25-14	1	$67,170	$8,100	EPS037	1	$67,170	$0	CCF10	1	$0	$0	14-7	1	$67,170	$0	1	$0	$0
711	CC	1033367410	CALAO BONOLIS CARLOS MARIO	25-14	1	$67,169	$8,100	EPS037	1	$67,169	$0	CCF10	1	$0	$0	14-7	1	$67,169	$0	1	$0	$0
712	CC	1117491197	CAMACHO ORTIZ MIGUEL ANGEL	230301	3	$142,350	$22,800	EPS037	3	$142,350	$5,700	CCF10	3	$142,350	$5,700	14-7	3	$142,350	$0	3	$0	$0
713	CC	1117491197	CAMACHO ORTIZ MIGUEL ANGEL	230301	2	$94,900	$15,200	EPS037	2	$94,900	$3,800	CCF10	2	$94,900	$3,800	14-7	2	$94,900	$0	2	$0	$0
714	CC	1117491197	CAMACHO ORTIZ MIGUEL ANGEL	230301	1	$47,450	$5,700	EPS037	1	$47,450	$0	CCF10	1	$0	$0	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
715	CC	1117491197	CAMACHO ORTIZ MIGUEL ANGEL	230301	1	$47,450	$5,700	EPS037	1	$47,450	$0	CCF10	1	$0	$0	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
716	CC	1117491197	CAMACHO ORTIZ MIGUEL ANGEL	230301	1	$47,450	$5,700	EPS037	1	$47,450	$0	CCF10	1	$0	$0	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
717	CC	1117491197	CAMACHO ORTIZ MIGUEL ANGEL	230301	1	$59,729	$7,200	EPS037	1	$59,729	$0	CCF10	1	$0	$0	14-7	1	$59,729	$0	1	$0	$0
718	CC	88153951	CAÑAS PARADA MIGUEL ANTONIO	230301	3	$270,618	$43,300	EPS041	3	$270,618	$10,900	CCF10	3	$255,099	$10,300	14-7	3	$270,618	$0	3	$0	$0
719	CC	88153951	CAÑAS PARADA MIGUEL ANTONIO	230301	2	$180,412	$28,900	EPS041	2	$180,412	$7,300	CCF10	2	$166,400	$6,700	14-7	2	$180,412	$0	2	$0	$0
720	CC	88153951	CAÑAS PARADA MIGUEL ANTONIO	230301	3	$178,706	$28,600	EPS041	3	$178,706	$7,200	CCF10	3	$0	$0	14-7	3	$178,706	$0	3	$0	$0
721	CC	1007412294	CANCHILA JULIO JUAN CAMILO	230301	3	$148,297	$23,800	EPS048	3	$148,297	$6,000	CCF10	3	$159,350	$6,400	14-7	3	$148,297	$0	3	$0	$0
722	CC	1007412294	CANCHILA JULIO JUAN CAMILO	230301	2	$98,865	$15,900	EPS048	2	$98,865	$4,000	CCF10	2	$105,100	$4,300	14-7	2	$98,865	$0	2	$0	$0
723	CC	1052380461	CORREDOR CRUZ ANDRES CAMILO	230301	3	$289,633	$46,400	EPS037	3	$289,633	$11,600	CCF10	3	$288,966	$11,600	14-7	3	$289,633	$0	3	$0	$0
724	CC	1052380461	CORREDOR CRUZ ANDRES CAMILO	230301	2	$193,089	$30,900	EPS037	2	$193,089	$7,800	CCF10	2	$191,310	$7,700	14-7	2	$193,089	$0	2	$0	$0
725	CC	73203716	GARCIA FERNANDEZ LUIS EMIRO	230301	3	$229,366	$36,700	EPS002	3	$229,366	$9,200	CCF10	3	$220,000	$8,800	14-7	3	$229,366	$0	3	$0	$0
726	CC	73203716	GARCIA FERNANDEZ LUIS EMIRO	230301	2	$152,911	$24,500	EPS002	2	$152,911	$6,200	CCF10	2	$143,333	$5,800	14-7	2	$152,911	$0	2	$0	$0
727	CC	78756301	GUZMAN MESQUIDA LUIS MIGUEL	230301	3	$150,647	$24,200	EPS037	3	$150,647	$6,100	CCF10	3	$160,931	$6,500	14-7	3	$150,647	$0	3	$0	$0
728	CC	78756301	GUZMAN MESQUIDA LUIS MIGUEL	230301	1	$50,216	$8,100	EPS037	1	$50,216	$2,100	CCF10	1	$53,077	$2,200	14-7	1	$50,216	$0	1	$0	$0
729	CC	9287568	HERNANDEZ HERRERA ALEJANDRO RAFAEL	230301	3	$270,899	$43,400	ESSC07	3	$270,899	$10,900	CCF10	3	$260,000	$10,400	14-7	3	$270,899	$0	3	$0	$0
730	CC	9287568	HERNANDEZ HERRERA ALEJANDRO RAFAEL	230301	2	$180,600	$28,900	ESSC07	2	$180,600	$7,300	CCF10	2	$173,333	$7,000	14-7	2	$180,600	$0	2	$0	$0
731	CC	1117837579	IMBUS VILLARREAL LUIS FERNANDO	230301	3	$142,350	$22,800	ESSC62	3	$142,350	$5,700	CCF10	3	$152,350	$6,100	14-7	3	$142,350	$0	3	$0	$0
732	CC	1117837579	IMBUS VILLARREAL LUIS FERNANDO	230301	2	$94,900	$15,200	ESSC62	2	$94,900	$3,800	CCF10	2	$100,900	$4,100	14-7	2	$94,900	$0	2	$0	$0
733	CC	1117837579	IMBUS VILLARREAL LUIS FERNANDO	230301	1	$47,450	$5,700	ESSC62	1	$47,450	$0	CCF10	1	$0	$0	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
734	CC	1117837579	IMBUS VILLARREAL LUIS FERNANDO	230301	1	$47,450	$5,700	ESSC62	1	$47,450	$0	CCF10	1	$0	$0	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
735	CC	1117837579	IMBUS VILLARREAL LUIS FERNANDO	230301	2	$94,900	$11,400	ESSC62	2	$94,900	$0	CCF10	2	$0	$0	14-7	2	$94,900	$0	2	$0	$0
736	CC	1117837579	IMBUS VILLARREAL LUIS FERNANDO	230301	1	$47,450	$5,700	ESSC62	1	$47,450	$0	CCF10	1	$0	$0	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
737	CC	1117837579	IMBUS VILLARREAL LUIS FERNANDO	230301	2	$98,196	$11,800	ESSC62	2	$98,196	$0	CCF10	2	$0	$0	14-7	2	$98,196	$0	2	$0	$0
738	CC	8045624	JIMENEZ ZABALA FRANCISCO DANIEL	230301	3	$158,210	$25,400	EPS042	3	$158,210	$6,400	CCF10	3	$159,350	$6,400	14-7	3	$158,210	$0	3	$0	$0
739	CC	8045624	JIMENEZ ZABALA FRANCISCO DANIEL	230301	2	$105,473	$16,900	EPS042	2	$105,473	$4,300	CCF10	2	$105,100	$4,300	14-7	2	$105,473	$0	2	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
740	CC	8045624	JIMENEZ ZABALA FRANCISCO DANIEL	230301	1	$52,737	$6,400	EPS042	1	$52,737	$0	CCF10	1	$0	$0	14-7	1	$52,737	$0	1	$0	$0
741	CC	8045624	JIMENEZ ZABALA FRANCISCO DANIEL	230301	1	$52,736	$6,400	EPS042	1	$52,736	$0	CCF10	1	$0	$0	14-7	1	$52,736	$0	1	$0	$0
742	CC	1002275561	MERCADO DITA CARLOS ALFREDO	231001	3	$205,819	$33,000	ESSC07	3	$205,819	$8,300	CCF10	3	$159,770	$6,400	14-7	3	$205,819	$0	3	$0	$0
743	CC	1002275561	MERCADO DITA CARLOS ALFREDO	231001	2	$137,213	$22,000	ESSC07	2	$137,213	$5,500	CCF10	2	$105,380	$4,300	14-7	2	$137,213	$0	2	$0	$0
744	CC	1002275561	MERCADO DITA CARLOS ALFREDO	231001	1	$68,607	$8,300	ESSC07	1	$68,607	$0	CCF10	1	$0	$0	14-7	1	$68,607	$0	1	$0	$0
745	CC	1002275561	MERCADO DITA CARLOS ALFREDO	231001	1	$68,606	$8,300	ESSC07	1	$68,606	$0	CCF10	1	$0	$0	14-7	1	$68,606	$0	1	$0	$0
746	CC	73316802	OCHOA RODRIGUEZ JAVIER ALFONSO	25-14	3	$204,678	$32,800	EPS048	3	$204,678	$8,200	CCF10	3	$147,213	$5,900	14-7	3	$204,678	$0	3	$0	$0
747	CC	73316802	OCHOA RODRIGUEZ JAVIER ALFONSO	25-14	2	$136,452	$21,900	EPS048	2	$136,452	$5,500	CCF10	2	$98,142	$4,000	14-7	2	$136,452	$0	2	$0	$0
748	CC	1010106546	OLARTE OSORIO JAMES JULIAN	230301	3	$145,031	$23,300	ESSC62	3	$145,031	$5,900	CCF10	3	$152,350	$6,100	14-7	3	$145,031	$0	3	$0	$0
749	CC	1010106546	OLARTE OSORIO JAMES JULIAN	230301	2	$96,687	$15,500	ESSC62	2	$96,687	$3,900	CCF10	2	$100,900	$4,100	14-7	2	$96,687	$0	2	$0	$0
750	CC	1010106546	OLARTE OSORIO JAMES JULIAN	230301	1	$48,344	$5,900	ESSC62	1	$48,344	$0	CCF10	1	$0	$0	14-7	1	$48,344	$0	1	$0	$0
751	CC	1010106546	OLARTE OSORIO JAMES JULIAN	230301	1	$48,344	$5,900	ESSC62	1	$48,344	$0	CCF10	1	$0	$0	14-7	1	$48,344	$0	1	$0	$0
752	CC	1010106546	OLARTE OSORIO JAMES JULIAN	230301	1	$48,344	$5,900	ESSC62	1	$48,344	$0	CCF10	1	$0	$0	14-7	1	$48,344	$0	1	$0	$0
753	CC	1010106546	OLARTE OSORIO JAMES JULIAN	230301	1	$48,344	$5,900	ESSC62	1	$48,344	$0	CCF10	1	$0	$0	14-7	1	$48,344	$0	1	$0	$0
754	CC	1010106546	OLARTE OSORIO JAMES JULIAN	230301	2	$96,685	$11,700	ESSC62	2	$96,685	$0	CCF10	2	$0	$0	14-7	2	$96,685	$0	2	$0	$0
755	CC	80735994	ORJUELA BARBOSA WILLIAM ANDRES	230201	3	$1,286,334	$218,900	EPS005	3	$1,286,334	$160,800	CCF10	3	$1,950,550	$78,100	14-7	3	$1,286,334	$0	3	$1,950,550	$97,700
756	CC	80735994	ORJUELA BARBOSA WILLIAM ANDRES	230201	2	$857,556	$145,900	EPS005	2	$857,556	$107,200	CCF10	2	$1,293,700	$51,800	14-7	2	$857,556	$0	2	$1,293,700	$64,800
757	CC	77166787	PACHECO OLIVARES MANUEL SALVADOR	230301	3	$318,522	$51,000	EPS002	3	$318,522	$12,800	CCF10	3	$270,701	$10,900	14-7	3	$318,522	$0	3	$0	$0
758	CC	77166787	PACHECO OLIVARES MANUEL SALVADOR	230301	2	$212,348	$34,000	EPS002	2	$212,348	$8,500	CCF10	2	$175,801	$7,100	14-7	2	$212,348	$0	2	$0	$0
759	CC	1117534216	PAREJA RUBIANO JAIME ANDRES	230201	3	$142,350	$22,800	EPS005	3	$142,350	$5,700	CCF10	3	$152,350	$6,100	14-7	3	$142,350	$0	3	$0	$0
760	CC	1117534216	PAREJA RUBIANO JAIME ANDRES	230201	2	$94,900	$15,200	EPS005	2	$94,900	$3,800	CCF10	2	$100,900	$4,100	14-7	2	$94,900	$0	2	$0	$0
761	CC	1117534216	PAREJA RUBIANO JAIME ANDRES	230201	1	$47,450	$7,600	EPS005	1	$47,450	$1,900	CCF10	1	$47,450	$1,900	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
762	CC	1045227390	PARRA PADILLA ELIO	230301	3	$355,010	$56,900	EPS041	3	$355,010	$14,300	CCF10	3	$290,565	$11,700	14-7	3	$355,010	$0	3	$0	$0
763	CC	1045227390	PARRA PADILLA ELIO	230301	2	$236,674	$37,900	EPS041	2	$236,674	$9,500	CCF10	2	$189,043	$7,600	14-7	2	$236,674	$0	2	$0	$0
764	CC	78545043	PARRA ESQUIVEL OSCAR MIGUEL	230201	3	$293,130	$47,000	EPS037	3	$293,130	$11,800	CCF10	3	$230,347	$9,300	14-7	3	$293,130	$0	3	$0	$0
765	CC	78545043	PARRA ESQUIVEL OSCAR MIGUEL	230201	2	$195,420	$31,300	EPS037	2	$195,420	$7,900	CCF10	2	$152,365	$6,100	14-7	2	$195,420	$0	2	$0	$0
766	CC	1102850269	PATERNINA GARRIDO MISAEL DE JESUS	25-14	3	$399,454	$64,000	ESSC07	3	$399,454	$16,000	CCF10	3	$331,000	$13,300	14-7	3	$399,454	$0	3	$0	$0
767	CC	1102850269	PATERNINA GARRIDO MISAEL DE JESUS	25-14	2	$266,303	$42,700	ESSC07	2	$266,303	$10,700	CCF10	2	$216,000	$8,700	14-7	2	$266,303	$0	2	$0	$0
768	CC	16468300	PEREA PALACIOS ELIUMEN		0	$0	$0	EPS037	3	$438,319	$17,600	CCF10	3	$400,040	$16,100	14-7	3	$438,319	$0	3	$0	$0
769	CC	16468300	PEREA PALACIOS ELIUMEN		0	$0	$0	EPS037	5	$730,532	$29,300	CCF10	5	$626,733	$25,100	14-7	5	$730,532	$0	5	$0	$0
770	CC	16468300	PEREA PALACIOS ELIUMEN		0	$0	$0	EPS037	1	$146,107	$5,900	CCF10	1	$120,013	$4,900	14-7	1	$146,107	$0	1	$0	$0
771	CC	16468300	PEREA PALACIOS ELIUMEN		0	$0	$0	EPS037	5	$730,532	$29,300	CCF10	5	$626,733	$25,100	14-7	5	$730,532	$0	5	$0	$0
772	CC	16468300	PEREA PALACIOS ELIUMEN		0	$0	$0	EPS037	1	$146,107	$5,900	CCF10	1	$120,902	$4,900	14-7	1	$146,107	$0	1	$0	$0
773	CC	78763814	PEREZ CARMONA GABRIEL GERMAN	25-14	3	$153,281	$24,600	CCFC55	3	$153,281	$6,200	CCF10	3	$162,366	$6,500	14-7	3	$153,281	$0	3	$0	$0
774	CC	78763814	PEREZ CARMONA GABRIEL GERMAN	25-14	2	$102,188	$16,400	CCFC55	2	$102,188	$4,100	CCF10	2	$106,911	$4,300	14-7	2	$102,188	$0	2	$0	$0
775	CC	98650543	RAMOS HOYOS KILES ALFONSO	230301	3	$212,343	$34,000	ESSC24	3	$212,343	$8,500	CCF10	3	$157,546	$6,400	14-7	3	$212,343	$0	3	$0	$0
776	CC	98650543	RAMOS HOYOS KILES ALFONSO	230301	2	$141,562	$22,700	ESSC24	2	$141,562	$5,700	CCF10	2	$104,031	$4,200	14-7	2	$141,562	$0	2	$0	$0

777	CC	14324117	RODRIGUEZ ENCISO JAVIER ALEXANDER	230301	3	$147,596	$23,700	EPS037	3	$147,596	$6,000	CCF10	3	$159,350	$6,400	14-7	3	$147,596	$0	3	$0	$0
778	CC	14324117	RODRIGUEZ ENCISO JAVIER ALEXANDER	230301	2	$98,397	$15,800	EPS037	2	$98,397	$4,000	CCF10	2	$105,100	$4,300	14-7	2	$98,397	$0	2	$0	$0
779	CC	14324117	RODRIGUEZ ENCISO JAVIER ALEXANDER	230301	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF10	1	$0	$0	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
780	CC	14324117	RODRIGUEZ ENCISO JAVIER ALEXANDER	230301	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF10	1	$0	$0	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
781	CC	59818773	RODRIGUEZ MARTINEZ LOURDES VIVIANA	230201	3	$322,334	$51,600	EPS037	3	$322,334	$12,900	CCF10	3	$320,000	$12,800	14-7	3	$322,334	$0	3	$0	$0
782	CC	59818773	RODRIGUEZ MARTINEZ LOURDES VIVIANA	230201	5	$537,223	$86,000	EPS037	5	$537,223	$21,500	CCF10	5	$521,667	$20,900	14-7	5	$537,223	$0	5	$0	$0
783	CC	59818773	RODRIGUEZ MARTINEZ LOURDES VIVIANA	230201	3	$322,334	$51,600	EPS037	3	$322,334	$12,900	CCF10	3	$301,333	$12,100	14-7	3	$322,334	$0	3	$0	$0
784	CC	80396761	SANDOVAL BOLIVAR HUMBERTO	230301	3	$218,304	$35,000	EPS017	3	$218,304	$8,800	CCF10	3	$159,586	$6,400	14-7	3	$218,304	$0	3	$0	$0
785	CC	80396761	SANDOVAL BOLIVAR HUMBERTO	230301	2	$145,536	$23,300	EPS017	2	$145,536	$5,900	CCF10	2	$105,258	$4,300	14-7	2	$145,536	$0	2	$0	$0
786	CC	17293182	SERNA RESTREPO HEBER	230301	3	$211,000	$33,800	EPS010	3	$211,000	$8,500	CCF10	3	$210,000	$8,400	14-7	3	$211,000	$0	3	$0	$0
787	CC	17293182	SERNA RESTREPO HEBER	230301	2	$140,667	$22,600	EPS010	2	$140,667	$5,700	CCF10	2	$138,000	$5,600	14-7	2	$140,667	$0	2	$0	$0
788	CC	1090538980	SOLANO CASTELLANOS EDUARD NICASIO	230301	3	$190,322	$30,500	EPS037	3	$190,322	$7,700	CCF10	3	$142,473	$5,700	14-7	3	$190,322	$0	3	$0	$0
789	CC	1090538980	SOLANO CASTELLANOS EDUARD NICASIO	230301	2	$126,882	$20,400	EPS037	2	$126,882	$5,100	CCF10	2	$94,982	$3,800	14-7	2	$126,882	$0	2	$0	$0
790	CC	1054255010	SOTO DURAN HECTOR JAVIER	25-14	3	$220,002	$35,300	EPS008	3	$220,002	$8,900	CCF10	3	$220,000	$8,800	14-7	3	$220,002	$0	3	$0	$0
791	CC	1054255010	SOTO DURAN HECTOR JAVIER	25-14	2	$146,667	$23,500	EPS008	2	$146,667	$5,900	CCF10	2	$146,667	$5,900	14-7	2	$146,667	$0	2	$0	$0
792	CC	1104425070	TAPIA NAVARRO WILMER ANTONIO	230301	3	$149,004	$23,900	ESSC24	3	$149,004	$6,000	CCF10	3	$159,350	$6,400	14-7	3	$149,004	$0	3	$0	$0
793	CC	1104425070	TAPIA NAVARRO WILMER ANTONIO	230301	2	$99,336	$15,900	ESSC24	2	$99,336	$4,000	CCF10	2	$105,100	$4,300	14-7	2	$99,336	$0	2	$0	$0
794	CC	1030529179	TOLOZA BACCA EDWIN FABIAN	230301	3	$301,208	$48,200	EPS037	3	$301,208	$12,100	CCF10	3	$271,492	$10,900	14-7	3	$301,208	$0	3	$0	$0
795	CC	1030529179	TOLOZA BACCA EDWIN FABIAN	230301	2	$200,805	$32,200	EPS037	2	$200,805	$8,100	CCF10	2	$176,328	$7,100	14-7	2	$200,805	$0	2	$0	$0
796	CC	1018412875	TORRES VASQUEZ HENRY OCTAVIO	230301	3	$222,391	$35,600	EPS008	3	$222,391	$8,900	CCF10	3	$221,724	$8,900	14-7	3	$222,391	$0	3	$0	$0
797	CC	1018412875	TORRES VASQUEZ HENRY OCTAVIO	230301	2	$148,261	$23,800	EPS008	2	$148,261	$6,000	CCF10	2	$146,483	$5,900	14-7	2	$148,261	$0	2	$0	$0
798	CC	1115944440	VARGAS BETANCOURT YUBERNEY	230301	3	$265,425	$42,500	EPS005	3	$265,425	$10,700	CCF10	3	$255,248	$10,300	14-7	3	$265,425	$0	3	$0	$0
799	CC	1115944440	VARGAS BETANCOURT YUBERNEY	230301	2	$176,950	$28,400	EPS005	2	$176,950	$7,100	CCF10	2	$166,499	$6,700	14-7	2	$176,950	$0	2	$0	$0
800	CC	1115944440	VARGAS BETANCOURT YUBERNEY	230301	1	$88,475	$14,200	EPS005	1	$88,475	$3,600	CCF10	1	$81,416	$3,300	14-7	1	$88,475	$0	1	$0	$0
801	CC	1045227408	VENTURA FRANCO LUIS ANGEL	230301	3	$306,754	$49,100	ESSC24	3	$306,754	$12,300	CCF10	3	$270,050	$10,900	14-7	3	$306,754	$0	3	$0	$0
802	CC	1045227408	VENTURA FRANCO LUIS ANGEL	230301	3	$202,692	$32,500	ESSC24	3	$202,692	$8,200	CCF10	3	$0	$0	14-7	3	$202,692	$0	3	$0	$0
803	CC	1045227408	VENTURA FRANCO LUIS ANGEL	230301	1	$102,252	$12,300	ESSC24	1	$102,252	$0	CCF10	1	$0	$0	14-7	1	$102,252	$0	1	$0	$0
804	CC	1045227408	VENTURA FRANCO LUIS ANGEL	230301	1	$102,251	$12,300	ESSC24	1	$102,251	$0	CCF10	1	$0	$0	14-7	1	$102,251	$0	1	$0	$0
805	CC	1045227408	VENTURA FRANCO LUIS ANGEL	230301	2	$204,503	$32,800	ESSC24	2	$204,503	$8,200	CCF10	2	$167,589	$6,800	14-7	2	$204,503	$0	2	$0	$0
806	CC	1038104784	VERGARA LOPEZ CARLOS ANDRES	230301	3	$370,541	$59,300	ESSC24	3	$370,541	$14,900	CCF10	3	$321,911	$12,900	14-7	3	$370,541	$0	3	$0	$0
807	CC	1038104784	VERGARA LOPEZ CARLOS ANDRES	230301	1	$123,514	$19,800	ESSC24	1	$123,514	$5,000	CCF10	1	$105,304	$4,300	14-7	1	$123,514	$0	1	$0	$0
808	CC	1048848912	VIVAS ROMERO CRISTIAN ALEJANDRO	230201	3	$344,094	$55,100	EPS037	3	$344,094	$13,800	CCF10	3	$271,368	$10,900	14-7	3	$344,094	$0	3	$0	$0
809	CC	1048848912	VIVAS ROMERO CRISTIAN ALEJANDRO	230201	2	$229,396	$36,800	EPS037	2	$229,396	$9,200	CCF10	2	$176,245	$7,100	14-7	2	$229,396	$0	2	$0	$0
810	CC	74373162	VIVAS HOLGUIN JULIO ERNESTO	230201	3	$282,038	$45,200	EPS017	3	$282,038	$11,300	CCF10	3	$231,302	$9,300	14-7	3	$282,038	$0	3	$0	$0
811	CC	74373162	VIVAS HOLGUIN JULIO ERNESTO	230201	2	$188,025	$30,100	EPS017	2	$188,025	$7,600	CCF10	2	$150,868	$6,100	14-7	2	$188,025	$0	2	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (2 Afiliados)						**$1,289,829**	**$206,500**			**$1,289,829**	**$51,700**			**$1,283,717**	**$51,500**			**$1,289,829**	**$0**		**$0**	**$0**
812	CC	79687057	GONZALEZ CONTRERAS OMAR RICARDO	230301	2	$364,092	$58,300	MIN001	2	$364,092	$14,600	CCF69	2	$362,980	$14,600	14-7	2	$364,092	$0	2	$0	$0
813	CC	79687057	GONZALEZ CONTRERAS OMAR RICARDO	230301	3	$546,137	$87,400	MIN001	3	$546,137	$21,900	CCF69	3	$541,137	$21,700	14-7	3	$546,137	$0	3	$0	$0
814	CC	3672454	OCHOA VASQUEZ ALIRIO DE JESUS	230301	5	$237,250	$38,000	ESSC24	5	$237,250	$9,500	CCF69	5	$237,250	$9,500	14-7	5	$237,250	$0	5	$0	$0
815	CC	3672454	OCHOA VASQUEZ ALIRIO DE JESUS	230301	3	$142,350	$22,800	ESSC24	3	$142,350	$5,700	CCF69	3	$142,350	$5,700	14-7	3	$142,350	$0	3	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (330 Afiliados)						**$592,686,276**	**$95,159,100**			**$597,275,041**	**$25,827,600**			**$605,568,411**	**$24,237,700**			**$597,275,041**	**$41,586,900**		**$22,423,083**	**$1,121,300**
Ciudad: BELEN Depto: BOYACA (15 Afiliados)						**$29,875,405**	**$4,780,800**			**$29,875,405**	**$1,195,700**			**$29,875,411**	**$1,195,700**			**$29,875,405**	**$2,080,000**		**$0**	**$0**
816	CC	1049646966	AGUILAR AMAYA DIANA CAROLINA	230301	25	$3,333,333	$533,400	EPS005	25	$3,333,333	$133,400	CCF10	25	$3,333,333	$133,400	14-7	25	$3,333,333	$232,000	25	$0	$0
817	CC	79564690	BARRETO CARDENAS JOSE LEONARDO	25-14	25	$2,928,380	$468,600	EPS005	25	$2,928,380	$117,200	CCF10	25	$2,928,380	$117,200	14-7	25	$2,928,380	$203,900	25	$0	$0
818	CC	1010094305	BLANCO SUA ERIKA JULIETH	230301	25	$1,885,158	$301,700	ESSC24	25	$1,885,158	$75,500	CCF10	25	$1,885,158	$75,500	14-7	25	$1,885,158	$131,300	25	$0	$0
819	CC	74389337	BLANCO PEREZ LEONILDO	230301	25	$1,252,010	$200,400	EPS041	25	$1,252,010	$50,100	CCF10	25	$1,252,010	$50,100	14-7	25	$1,252,010	$87,200	25	$0	$0
820	CC	1055312911	CASTIBLANCO SALAMANCA OSCAR LEONARDO	230301	25	$2,408,046	$385,300	EPS005	25	$2,408,046	$96,400	CCF10	25	$2,408,047	$96,400	14-7	25	$2,408,046	$167,600	25	$0	$0
821	CC	1049647649	GARCIA ARIAS ANGIE LORENA	230201	25	$2,109,919	$337,600	EPS005	25	$2,109,919	$84,400	CCF10	25	$2,109,920	$84,400	14-7	25	$2,109,919	$146,900	25	$0	$0
822	CC	74326892	GUERRERO HERNANDEZ YOANY	230301	25	$2,636,543	$421,900	EPS037	25	$2,636,543	$105,500	CCF10	25	$2,636,544	$105,500	14-7	25	$2,636,543	$183,600	25	$0	$0
823	CC	1054780130	MORENO HERRERA DIEGO ARMANDO	25-14	25	$2,405,796	$385,000	EPS041	25	$2,405,796	$96,300	CCF10	25	$2,405,796	$96,300	14-7	25	$2,405,796	$167,500	25	$0	$0
824	CC	1056554283	NOCOBE USCATEGUI JOSE MIGUEL	25-14	25	$1,500,000	$240,000	EPS042	25	$1,500,000	$60,000	CCF10	25	$1,500,000	$60,000	14-7	25	$1,500,000	$104,400	25	$0	$0
825	CC	1007391217	PALACIOS ALBA JESELL TATIANA	230301	25	$1,713,043	$274,100	EPS037	25	$1,713,043	$68,600	CCF10	25	$1,713,044	$68,600	14-7	25	$1,713,043	$119,300	25	$0	$0
826	CC	1007518038	PEREZ SANABRIA LAURA CLARIBETH	230301	24	$1,725,530	$276,100	ESSC24	24	$1,725,530	$69,100	CCF10	24	$1,725,530	$69,100	14-7	24	$1,725,530	$120,100	24	$0	$0
827	CC	72239504	PERNETT PEÑA NADIN JOSE	231001	25	$1,644,583	$263,200	EPS041	25	$1,644,583	$65,800	CCF10	25	$1,644,583	$65,800	14-7	25	$1,644,583	$114,500	25	$0	$0
828	CC	74337466	TANGUA NEITA YOLMAN FERNANDO	230301	25	$1,644,582	$263,200	EPS037	25	$1,644,582	$65,800	CCF10	25	$1,644,583	$65,800	14-7	25	$1,644,582	$114,500	25	$0	$0
829	CC	3121271	TORRES GUERRERO DULTEBIR	231001	22	$1,043,900	$167,100	EPS037	22	$1,043,900	$41,800	CCF10	22	$1,043,900	$41,800	14-7	22	$1,043,900	$72,700	22	$0	$0
830	CC	1054252156	VELANDIA CUEVAS RAFAEL	25-14	25	$1,644,582	$263,200	CCFC55	25	$1,644,582	$65,800	CCF10	25	$1,644,583	$65,800	14-7	25	$1,644,582	$114,500	25	$0	$0
Ciudad: BOYACA Depto: BOYACA (10 Afiliados)						**$14,955,478**	**$2,393,400**			**$14,955,478**	**$598,900**			**$15,561,837**	**$623,100**			**$14,955,478**	**$1,041,300**		**$0**	**$0**
831	CC	7186441	AGUILAR MARTINEZ JOSE YESID	230301	25	$2,916,666	$466,700	ESSC24	25	$2,916,666	$116,700	CCF10	25	$2,916,666	$116,700	14-7	25	$2,916,666	$203,000	25	$0	$0
832	CC	74377258	AYALA HERRERA OSCAR JAVIER	25-14	25	$1,903,044	$304,500	MIN002	25	$1,903,044	$76,200	CCF10	25	$1,903,044	$76,200	14-7	25	$1,903,044	$132,500	25	$0	$0
833	CC	8637418	BANDA CABARCAS JOSE FRANCISCO	230301	23	$1,340,797	$214,600	EPS037	23	$1,340,797	$53,700	CCF10	23	$1,340,797	$53,700	14-7	23	$1,340,797	$93,400	23	$0	$0
834	CC	53176700	ESLAVA GUERRERO SONIA YIRLENY	230301	11	$1,410,399	$225,700	EPS041	11	$1,410,399	$56,500	CCF10	11	$1,410,400	$56,500	14-7	11	$1,410,399	$98,200	11	$0	$0
835	CC	1069476349	GONZALEZ POLO ELADIO DE JESUS	230301	25	$2,353,261	$376,600	EPS037	25	$2,353,261	$94,200	CCF10	25	$2,353,261	$94,200	14-7	25	$2,353,261	$163,800	25	$0	$0
836	CC	1054252641	GOYENECHE GOYENECHE HECTOR EDUARDO	25-14	18	$854,100	$136,700	ESSC24	18	$854,100	$34,200	CCF10	18	$854,100	$34,200	14-7	18	$854,100	$59,500	18	$0	$0
837	CC	1001938388	HOYOS MONTILLA ROGER JAVIER	230301	1	$480,556	$76,900	EPS005	1	$480,556	$19,300	CCF10	1	$547,655	$22,000	14-7	1	$480,556	$33,500	1	$0	$0
838	CC	1024599890	MONROY HOLGUIN DALY YANIRA	230301	25	$1,232,668	$197,300	EPS005	25	$1,232,668	$49,400	CCF10	25	$1,232,668	$49,400	14-7	25	$1,232,668	$85,800	25	$0	$0
839	CC	1053611594	PACHECO HOSTTOS WILDER FABIAN	230301	1	$463,189	$74,200	EPS008	1	$463,189	$18,600	CCF10	1	$1,002,448	$40,100	14-7	1	$463,189	$32,300	1	$0	$0
840	CC	1056553262	SANTOS ABRIL JEISSON JULIAN	230201	25	$2,000,798	$320,200	EPS037	25	$2,000,798	$80,100	CCF10	25	$2,000,798	$80,100	14-7	25	$2,000,798	$139,300	25	$0	$0
Ciudad: GUATEQUE Depto: BOYACA (5 Afiliados)						**$7,941,419**	**$1,270,900**			**$7,941,419**	**$317,900**			**$7,941,421**	**$317,900**			**$7,941,419**	**$553,100**		**$0**	**$0**
841	CC	7335459	BOHORQUEZ DAZA JOHN FREDY	230301	25	$1,573,379	$251,800	EPS037	25	$1,573,379	$63,000	CCF10	25	$1,573,380	$63,000	14-7	25	$1,573,379	$109,600	25	$0	$0
842	CC	1056412731	BRICEÑO ESCARRAGA FABIAN DARIO	230301	25	$1,743,272	$279,000	EPS037	25	$1,743,272	$69,800	CCF10	25	$1,743,272	$69,800	14-7	25	$1,743,272	$121,400	25	$0	$0

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
843	CC	4053360	CARDENAS LUIS ORLANDO	230201	25	$1,587,732	$254,100	CCFC55	25	$1,587,732	$63,600	CCF10	25	$1,587,732	$63,600	14-7	25	$1,587,732	$110,600	25	$0	$0
844	CC	4134549	MUÑOZ BARRERA ISIDORO	230301	25	$1,627,240	$260,400	EPS037	25	$1,627,240	$65,100	CCF10	25	$1,627,241	$65,100	14-7	25	$1,627,240	$113,300	25	$0	$0
845	CC	72326310	RINCON MENDOZA JOSE DE JESUS	25-14	25	$1,409,796	$225,600	EPS037	25	$1,409,796	$56,400	CCF10	25	$1,409,796	$56,400	14-7	25	$1,409,796	$98,200	25	$0	$0
Ciudad: JENESANO Depto: BOYACA (1 Afiliados)						**$3,892,667**	**$622,900**			**$3,892,667**	**$155,800**			**$3,892,667**	**$155,800**			**$3,892,667**	**$271,000**		**$0**	**$0**
846	CC	1015435465	DIAZ DIAZ DEISY JOHANA	230301	25	$3,892,667	$622,900	EPS005	25	$3,892,667	$155,800	CCF10	25	$3,892,667	$155,800	14-7	25	$3,892,667	$271,000	25	$0	$0
Ciudad: PAZ DE ARIPORO Depto: CASANARE (4 Afiliados)						**$5,103,980**	**$816,700**			**$5,103,980**	**$204,300**			**$5,398,123**	**$216,100**			**$5,103,980**	**$355,400**		**$0**	**$0**
847	CC	11188431	ORTIZ GIL JOSE MILTON	230301	25	$1,186,250	$189,800	EPS041	25	$1,186,250	$47,500	CCF69	25	$1,186,250	$47,500	14-7	25	$1,186,250	$82,600	25	$0	$0
848	CC	1115856235	RIAÑO FUENTES NELCY YUDI	230301	30	$2,363,629	$378,200	EPSC25	30	$2,363,629	$94,600	CCF69	30	$2,363,629	$94,600	14-7	30	$2,363,629	$164,600	30	$0	$0
849	CC	96195210	ROMERO LOZANO JOSE FERNEY	230301	25	$1,484,101	$237,500	EPSC25	25	$1,484,101	$59,400	CCF69	25	$1,484,102	$59,400	14-7	25	$1,484,101	$103,300	25	$0	$0
850	CC	1116550600	YANTEN CUESTA DIEGO FERNANDO	230301	1	$70,000	$11,200	EPS005	1	$70,000	$2,800	CCF69	1	$364,142	$14,600	14-7	1	$70,000	$4,900	1	$0	$0
Ciudad: SACAMA Depto: CASANARE (148 Afiliados)						**$245,675,883**	**$39,512,100**			**$245,675,883**	**$10,767,100**			**$249,620,186**	**$9,991,500**			**$245,675,883**	**$17,106,800**		**$10,794,875**	**$539,800**
851	CC	1118704335	ADAME MEDINA ADRIAN CAMILO	230301	25	$1,186,250	$189,800	EPSC25	25	$1,186,250	$47,500	CCF69	25	$1,186,250	$47,500	14-7	25	$1,186,250	$82,600	25	$0	$0
852	CC	1118563083	ADAME MEDINA BLANCA LUCIA	230301	25	$1,224,932	$196,000	EPSC25	25	$1,224,932	$49,000	CCF69	25	$1,224,932	$49,000	14-7	25	$1,224,932	$85,300	25	$0	$0
853	CC	1118146113	ADAME VELASCO JUAN GABRIEL	230301	4	$239,081	$38,300	EPS037	4	$239,081	$9,600	CCF69	4	$239,081	$9,600	14-7	4	$239,081	$16,700	4	$0	$0
854	CC	1007425860	AGUIRRE TUMAY JOHON FREDY	230301	24	$1,138,800	$182,300	EPS037	24	$1,138,800	$45,600	CCF69	24	$1,138,800	$45,600	14-7	24	$1,138,800	$79,300	24	$0	$0
855	CC	1121952125	ALARCON GARCIA BRAYAM SEBASTIAN	231001	24	$1,578,799	$252,700	EPS037	24	$1,578,799	$63,200	CCF69	24	$1,578,800	$63,200	14-7	24	$1,578,799	$109,900	24	$0	$0
856	CC	4166413	ALFONSO REYES SERGIO HECTOR	230301	23	$2,205,652	$353,000	EPS037	23	$2,205,652	$88,300	CCF69	23	$2,205,652	$88,300	14-7	23	$2,205,652	$153,600	23	$0	$0
857	CC	4150433	ALGARRA PINEDA JOSE VICENTE	230301	23	$1,513,016	$242,100	EPS041	23	$1,513,016	$60,600	CCF69	23	$1,513,017	$60,600	14-7	23	$1,513,016	$105,400	23	$0	$0
858	CC	8526330	ANAYA PORRAS ELKIN RAFAEL	230201	23	$2,046,522	$327,500	EPS037	23	$2,046,522	$81,900	CCF69	23	$2,046,522	$81,900	14-7	23	$2,046,522	$142,500	23	$0	$0
859	CC	1115950528	ANDRADE VARGAS JESUS DAVID	230301	25	$2,550,434	$408,100	EPS037	25	$2,550,434	$102,100	CCF69	25	$2,550,434	$102,100	14-7	25	$2,550,434	$177,600	25	$0	$0
860	CC	1002455303	ANGARITA CRISTANCHO DAVID BAYARDO	230301	25	$2,008,622	$321,400	EPS041	25	$2,008,622	$80,400	CCF69	25	$2,008,624	$80,400	14-7	25	$2,008,622	$139,900	25	$0	$0
861	CC	1115724444	ARENIS HERNANDEZ FERNEY	230301	25	$1,313,128	$210,200	EPS041	25	$1,313,128	$52,600	CCF69	25	$1,313,128	$52,600	14-7	25	$1,313,128	$91,400	25	$0	$0
862	CC	1046338637	AREVALO SOTO FRAY LUIS	231001	2	$738,412	$118,200	EPS002	2	$738,412	$29,600	CCF69	2	$1,486,827	$59,500	14-7	2	$738,412	$51,400	2	$0	$0
863	CC	1128054221	ARIAS TORRES JAVIER ENRIQUE	230301	25	$2,083,334	$333,400	EPS002	25	$2,083,334	$83,400	CCF69	25	$2,083,334	$83,400	14-7	25	$2,083,334	$145,100	25	$0	$0
864	CC	23791557	AVELLANEDA CONDE EDIT ISOLINA	230301	25	$1,186,250	$189,800	EPSC25	25	$1,186,250	$47,500	CCF69	25	$1,186,250	$47,500	14-7	25	$1,186,250	$82,600	25	$0	$0
865	CC	24006282	AVELLANEDA OLGA YAZMIN	230301	16	$861,321	$137,900	EPS037	16	$861,321	$34,500	CCF69	16	$1,186,250	$47,500	14-7	16	$861,321	$60,000	16	$0	$0
866	CC	74770238	AVILA LAITON EDWIN ALEXIS	230201	21	$1,432,608	$229,300	EPSC25	21	$1,432,608	$57,400	CCF69	21	$1,432,609	$57,400	14-7	21	$1,432,608	$99,800	21	$0	$0
867	CC	13492780	BARON TORRES EDUARDO	230301	25	$2,418,261	$387,000	EPS005	25	$2,418,261	$96,800	CCF69	25	$2,418,261	$96,800	14-7	25	$2,418,261	$168,400	25	$0	$0
868	CC	74860739	BARRERA COBA TEATIN	230301	23	$1,737,462	$278,000	EPS005	23	$1,737,462	$69,500	CCF69	23	$1,737,463	$69,500	14-7	23	$1,737,462	$121,000	23	$0	$0
869	CC	17649031	BENAVIDEZ ORTIZ LUIS ALBERTO	230301	23	$2,498,910	$399,900	EPS037	23	$2,498,910	$100,000	CCF69	23	$2,498,913	$100,000	14-7	23	$2,498,910	$174,000	23	$0	$0
870	CC	92276349	BERTEL ORDOSGOITIA ALBERTO JOSE	230301	17	$1,118,316	$179,000	EPS002	17	$1,118,316	$44,800	CCF69	17	$1,118,317	$44,800	14-7	17	$1,118,316	$77,900	17	$0	$0
871	CC	1069470320	BOLAÑO COGOLLO JORGE ANDRES	230301	25	$1,651,085	$264,200	EPS041	25	$1,651,085	$66,100	CCF69	25	$1,651,087	$66,100	14-7	25	$1,651,085	$115,000	25	$0	$0
872	CC	1118146599	BOTHIA CORREA YON ALBEIRO	230301	25	$2,114,927	$338,400	EPS017	25	$2,114,927	$84,600	CCF69	25	$2,114,928	$84,600	14-7	25	$2,114,927	$147,200	25	$0	$0
873	CC	1118146046	BOTTIA RODRIGUEZ RONAL	230301	25	$1,186,250	$189,800	EPSC25	25	$1,186,250	$47,500	CCF69	25	$1,186,250	$47,500	14-7	25	$1,186,250	$82,600	25	$0	$0
874	CC	92694111	BUELVAS SALCEDO RICHAR	230301	23	$2,415,977	$386,600	EPS002	23	$2,415,977	$96,700	CCF69	23	$2,415,978	$96,700	14-7	23	$2,415,977	$168,200	23	$0	$0
875	CC	1057690525	BUENO BARRETO DIEGO ALEXANDER	230301	25	$1,327,916	$212,500	EPS037	25	$1,327,916	$53,200	CCF69	25	$1,327,917	$53,200	14-7	25	$1,327,916	$92,500	25	$0	$0
876	CC	1116864144	BUENO HERNANDEZ YEISON	230301	25	$2,698,491	$431,800	EPS005	25	$2,698,491	$108,000	CCF69	25	$2,698,492	$108,000	14-7	25	$2,698,491	$187,900	25	$0	$0

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
877	CC	1116855707	CAMARGO SALON HENRY	25-14	25	$1,378,113	$220,500	EPSC25	25	$1,378,113	$55,200	CCF69	25	$1,378,113	$55,200	14-7	25	$1,378,113	$96,000	25	$0	$0
878	CC	1118649687	CAMARGO SALON YIMI	230301	25	$1,519,999	$243,200	EPSC25	25	$1,519,999	$60,800	CCF69	25	$1,519,999	$60,800	14-7	25	$1,519,999	$105,800	25	$0	$0
879	CC	5889335	CAMPOS RUIZ JESUS ALBERTO	25-14	15	$1,507,824	$241,300	EPS037	15	$1,507,824	$60,400	CCF69	15	$1,507,826	$60,400	14-7	15	$1,507,824	$105,000	15	$0	$0
880	CC	74847409	CARDENAS MARIÑO CARLOS NORBERTO	25-14	23	$2,522,608	$403,700	EPS037	23	$2,522,608	$101,000	CCF69	23	$2,522,609	$101,000	14-7	23	$2,522,608	$175,600	23	$0	$0
881	CC	1116040584	CARREÑO BOTHIA ROLFER GIOVANNY	25-14	18	$854,100	$136,700	EPSC25	18	$854,100	$34,200	CCF69	18	$854,100	$34,200	14-7	18	$854,100	$59,500	18	$0	$0
882	CC	74381647	CARRILLO CALDERON JOSE ALEXANDER	230301	25	$1,644,583	$263,200	EPSC25	25	$1,644,583	$65,800	CCF69	25	$1,644,583	$65,800	14-7	25	$1,644,583	$114,500	25	$0	$0
883	CC	46457760	CARRILLO SUAREZ LEIDY MASSIEL	230301	25	$1,750,000	$280,000	EPSC25	25	$1,750,000	$70,000	CCF69	25	$1,750,000	$70,000	14-7	25	$1,750,000	$121,800	25	$0	$0
884	CC	1075268	CARRILLO TELLES SIMON	230301	25	$1,186,250	$189,800	EPSC25	25	$1,186,250	$47,500	CCF69	25	$1,186,250	$47,500	14-7	25	$1,186,250	$82,600	25	$0	$0
885	CC	1115863426	CARVAJAL MARQUEZ GIOVANNY ALFREDO	25-14	18	$1,352,171	$216,400	EPSC25	18	$1,352,171	$54,100	CCF69	18	$1,352,174	$54,100	14-7	18	$1,352,171	$94,200	18	$0	$0
886	CC	1052313594	CARVAJAL SOLANO JOSE INAEL	230301	25	$1,624,094	$259,900	EPSC25	25	$1,624,094	$65,000	CCF69	25	$1,624,094	$65,000	14-7	25	$1,624,094	$113,100	25	$0	$0
887	CC	7334813	CASTAÑEDA AREVALO OSCAR JAVIER	230301	22	$1,345,930	$215,400	EPS037	22	$1,345,930	$53,900	CCF69	22	$1,345,930	$53,900	14-7	22	$1,345,930	$93,700	22	$0	$0
888	CC	1118146242	CERINZA BAEZ JOSE RAFAEL	230301	25	$1,469,403	$235,200	EPSC25	25	$1,469,403	$58,800	CCF69	25	$1,469,403	$58,800	14-7	25	$1,469,403	$102,300	25	$0	$0
889	CC	1002725672	CETINA MARTINEZ PEDRO STIBEN	230301	1	$273,353	$43,800	EPS037	1	$273,353	$11,000	CCF69	1	$687,399	$27,500	14-7	1	$273,353	$19,100	1	$0	$0
890	CC	1116913586	CHAUX GUTIERREZ YAMITH	230301	25	$2,407,390	$385,200	ESSC62	25	$2,407,390	$96,300	CCF69	25	$2,407,391	$96,300	14-7	25	$2,407,390	$167,600	25	$0	$0
891	CC	3817670	CHICO MELENDRES JOSE	25-14	21	$1,366,994	$218,800	EPS002	21	$1,366,994	$54,700	CCF69	21	$1,366,995	$54,700	14-7	21	$1,366,994	$95,200	21	$0	$0
892	CC	1115853209	CORDERO SILVA NOHORA	230301	30	$2,027,250	$324,400	EPSC25	30	$2,027,250	$81,100	CCF69	30	$2,027,250	$81,100	14-7	30	$2,027,250	$141,100	30	$0	$0
893	CC	1115852898	CORDOBA GUANAY OSCAR REYNEL	230301	18	$1,401,303	$224,300	EPS037	18	$1,401,303	$56,100	CCF69	18	$1,401,304	$56,100	14-7	18	$1,401,303	$97,600	18	$0	$0
894	CC	1116555468	CORREA PEDRAZA KAROL SOFIA	230301	16	$800,000	$128,000	EPSC25	16	$800,000	$32,000	CCF69	16	$800,000	$32,000	14-7	16	$800,000	$55,700	16	$0	$0
895	CC	1116852272	COTRINA VALBUENA ERIKA MAYERLY	230301	25	$1,240,405	$198,500	EPS005	25	$1,240,405	$49,700	CCF69	25	$1,240,405	$49,700	14-7	25	$1,240,405	$86,400	25	$0	$0
896	CC	1057587987	CRUZ LONDOÑO JOHN FREDY	230301	25	$1,255,878	$201,000	EPS037	25	$1,255,878	$50,300	CCF69	25	$1,255,878	$50,300	14-7	25	$1,255,878	$87,500	25	$0	$0
897	CC	1004074735	CUBIDES SERRANO JUAN SEBASTIAN	230301	18	$2,306,956	$369,200	ESSC62	18	$2,306,956	$92,300	CCF69	18	$2,306,957	$92,300	14-7	18	$2,306,956	$160,600	18	$0	$0
898	CC	1006532233	CUY PEDRO JOSE	230301	25	$1,205,590	$192,900	EPS017	25	$1,205,590	$48,300	CCF69	25	$1,205,591	$48,300	14-7	25	$1,205,590	$84,000	25	$0	$0
899	CC	1064112889	DEL RIO TORRES MARCIAL ANDRES	230201	25	$2,370,834	$379,400	EPS002	25	$2,370,834	$94,900	CCF69	25	$2,370,834	$94,900	14-7	25	$2,370,834	$165,100	25	$0	$0
900	CC	7366390	DELGADILLO EDGAR YAMID	230301	7	$332,150	$53,200	EPS037	7	$332,150	$13,300	CCF69	7	$417,709	$16,800	14-7	7	$332,150	$23,200	7	$0	$0
901	CC	1101756178	DIAZ DIAZ NESTOR AUGUSTO	230301	25	$2,166,667	$346,700	EPS037	25	$2,166,667	$86,700	CCF69	25	$2,166,667	$86,700	14-7	25	$2,166,667	$150,900	25	$0	$0
902	CC	1047377657	ESCOBAR CHABERRA JESUS ARIEL	230301	25	$1,850,434	$296,100	EPS037	25	$1,850,434	$74,100	CCF69	25	$1,850,434	$74,100	14-7	25	$1,850,434	$128,800	25	$0	$0
903	CC	1029642389	ESTRADA LOPEZ JUAN DAVID	25-14	1	$47,450	$7,600	EPSC25	1	$47,450	$1,900	CCF69	1	$78,215	$3,200	14-7	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
904	CC	10820688	FUENTES ZAPA CARLOS JOSE	230301	20	$1,400,000	$224,000	EPS005	20	$1,400,000	$56,000	CCF69	20	$1,400,000	$56,000	14-7	20	$1,400,000	$97,500	20	$0	$0
905	CC	78767988	GALVAN MONTES LUIS FERNANDO	230301	25	$1,833,332	$293,400	EPSC25	25	$1,833,332	$73,400	CCF69	25	$1,833,334	$73,400	14-7	25	$1,833,332	$127,600	25	$0	$0
906	CC	85456665	GARCIA TORRES DAIRO ENRIQUE	231001	25	$1,447,741	$231,700	EPS037	25	$1,447,741	$58,000	CCF69	25	$1,447,741	$58,000	14-7	25	$1,447,741	$100,800	25	$0	$0
907	CC	1007403738	GARCIA BELLO JOHON JAIRO	230301	10	$1,186,249	$189,800	EPS037	10	$1,186,249	$47,500	CCF69	10	$1,607,976	$64,400	14-7	10	$1,186,249	$82,600	10	$0	$0
908	CC	1077470806	GARCIA MENA ORLENIS FAENNY	25-14	1	$76,200	$12,200	EPS005	1	$76,200	$3,100	CCF69	1	$1,632,204	$65,300	14-7	1	$76,200	$5,400	1	$0	$0
909	CC	1116862823	GIRON MURILLO DANIEL	230201	4	$253,334	$40,600	ESSC24	4	$253,334	$10,200	CCF69	4	$253,334	$10,200	14-7	4	$253,334	$17,700	4	$0	$0
910	CC	1116868324	GIRON MURILLO JHON PARMENIO	230301	25	$2,261,957	$362,000	EPS037	25	$2,261,957	$90,500	CCF69	25	$2,261,957	$90,500	14-7	25	$2,261,957	$157,500	25	$0	$0
911	CC	1064108822	GOMEZ PARODY JAYER ANTONIO	230201	2	$153,334	$24,600	EPS002	2	$153,334	$6,200	CCF69	2	$159,466	$6,400	14-7	2	$153,334	$10,700	2	$0	$0
912	CC	8525727	GOMEZ DITA JOSE LUIS	230301	23	$2,331,810	$373,100	EPS002	23	$2,331,810	$93,300	CCF69	23	$2,331,811	$93,300	14-7	23	$2,331,810	$162,300	23	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
913	CC	1116870608	GOMEZ LEAL JUAN DIEGO	230301	25	$1,186,250	$189,800	EPS005	25	$1,186,250	$47,500	CCF69	25	$1,186,250	$47,500	14-7	25	$1,186,250	$82,600	25	$0	$0
914	CC	1116782375	GRANADOS OCAÑO ARMEL JHABID	230301	25	$1,209,459	$193,600	EPSC25	25	$1,209,459	$48,400	CCF69	25	$1,209,459	$48,400	14-7	25	$1,209,459	$84,200	25	$0	$0
915	CC	1118545041	GUERRERO MORA JOAN JAVIER	230301	4	$189,800	$30,400	EPS037	4	$189,800	$7,600	CCF69	4	$189,800	$7,600	14-7	4	$189,800	$13,300	4	$0	$0
916	CC	1116780218	GUERRERO ESCOBAR OSCAR EDEN	230301	21	$1,676,139	$268,200	EPS037	21	$1,676,139	$67,100	CCF69	21	$1,676,141	$67,100	14-7	21	$1,676,139	$116,700	21	$0	$0
917	CC	74281877	HERNANDEZ DUEÑAS WILYAN EMILIO	230301	23	$2,574,420	$412,000	EPS037	23	$2,574,420	$103,000	CCF69	23	$2,574,420	$103,000	14-7	23	$2,574,420	$179,200	23	$0	$0
918	CC	1118146301	JAIMES SALON ALEXIS	230301	25	$1,436,136	$229,800	EPSC25	25	$1,436,136	$57,500	CCF69	25	$1,436,136	$57,500	14-7	25	$1,436,136	$100,000	25	$0	$0
919	CC	18256382	JARA JARA SELSO	230301	7	$437,365	$70,000	EPS041	7	$437,365	$17,500	CCF69	7	$487,819	$19,600	14-7	7	$437,365	$30,500	7	$0	$0
920	CC	1006532322	LAGOS GALLO CRISTIAN JARLEY	230301	25	$1,193,986	$191,100	EPSC25	25	$1,193,986	$47,800	CCF69	25	$1,193,986	$47,800	14-7	25	$1,193,986	$83,200	25	$0	$0
921	CC	1118146119	LAGOS GALLO HAIDER JAMIT	25-14	25	$1,213,327	$194,200	EPSC25	25	$1,213,327	$48,600	CCF69	25	$1,213,327	$48,600	14-7	25	$1,213,327	$84,500	25	$0	$0
922	CC	1118146435	LAGOS LAGOS JAVIER ALONSO	230301	25	$1,263,614	$202,200	EPSC25	25	$1,263,614	$50,600	CCF69	25	$1,263,614	$50,600	14-7	25	$1,263,614	$88,000	25	$0	$0
923	CC	1118146038	LAGOS LAGOS KEVIN OSWALDO	230301	23	$1,168,714	$187,000	EPSC25	23	$1,168,714	$46,800	CCF69	23	$1,168,714	$46,800	14-7	23	$1,168,714	$81,400	23	$0	$0
924	CC	1002458432	LAYTON SALAZAR LEIDY YURANI	230301	25	$1,348,332	$215,800	EPS041	25	$1,348,332	$54,000	CCF69	25	$1,348,334	$54,000	14-7	25	$1,348,332	$93,900	25	$0	$0
925	CC	1129466	LAYTON SALAZAR PABLO EMILIO	25-14	25	$2,533,624	$405,400	EPS041	25	$2,533,624	$101,400	CCF69	25	$2,533,624	$101,400	14-7	25	$2,533,624	$176,400	25	$0	$0
926	CC	96193558	LEAL LIZARAZO JAVIER ANTONIO	25-14	25	$2,400,906	$384,200	EPS041	25	$2,400,906	$96,100	CCF69	25	$2,400,906	$96,100	14-7	25	$2,400,906	$167,200	25	$0	$0
927	CC	1116873892	LEAL RODRIGUEZ JHON FREDDY	230301	25	$2,500,869	$400,200	EPS041	25	$2,500,869	$100,100	CCF69	25	$2,500,869	$100,100	14-7	25	$2,500,869	$174,100	25	$0	$0
928	CC	1116870592	LEAL RODRIGUEZ OSCAR JAVIER	230301	25	$2,402,172	$384,400	EPS041	25	$2,402,172	$96,100	CCF69	25	$2,402,174	$96,100	14-7	25	$2,402,172	$167,200	25	$0	$0
929	CC	1119888525	LINARES PEÑA EDWARD DARIO	230301	22	$2,503,405	$400,600	EPS005	22	$2,503,405	$100,200	CCF69	22	$2,503,406	$100,200	14-7	22	$2,503,405	$174,300	22	$0	$0
930	CC	1116868132	LIZARAZO ESTEPA LIZETH FERNANDA	230301	18	$960,000	$153,600	EPSC25	18	$960,000	$38,400	CCF69	18	$960,000	$38,400	14-7	18	$960,000	$66,900	18	$0	$0
931	CC	73576324	LORETT VELASQUEZ JUAN FRANCISCO	25-14	25	$10,982,182	$1,867,200	EPS005	25	$10,982,182	$1,372,800	CCF69	25	$10,794,875	$431,800	14-7	25	$10,982,182	$764,400	25	$10,794,875	$539,800
932	CC	1098702035	LOZADA CHOGO JOSE DAVID	230301	18	$1,499,129	$239,900	EPS037	18	$1,499,129	$60,000	CCF69	18	$1,499,131	$60,000	14-7	18	$1,499,129	$104,400	18	$0	$0
933	CC	1064109934	MACHADO BARAHONA CALIXTO JOSE	230201	25	$2,333,334	$373,400	EPS037	25	$2,333,334	$93,400	CCF69	25	$2,333,334	$93,400	14-7	25	$2,333,334	$162,500	25	$0	$0
934	CC	1062435894	MADERA FERREIRA ARNOL JAVIER	230201	25	$1,197,855	$191,700	ESSC07	25	$1,197,855	$48,000	CCF69	25	$1,197,855	$48,000	14-7	25	$1,197,855	$83,400	25	$0	$0
935	CC	1116020333	MARQUEZ ROJAS YOBANI ALEXANDER	230301	25	$1,279,087	$204,700	EPS041	25	$1,279,087	$51,200	CCF69	25	$1,279,087	$51,200	14-7	25	$1,279,087	$89,100	25	$0	$0
936	CC	1118146586	MARTINEZ NIETO DARWIN YUSFREDY	230301	25	$1,319,624	$211,200	EPSC25	25	$1,319,624	$52,800	CCF69	25	$1,319,625	$52,800	14-7	25	$1,319,624	$91,900	25	$0	$0
937	CC	1097666681	MARTINEZ GAITAN RAFAEL HORACIO	230301	1	$284,056	$45,500	EPSC25	1	$284,056	$11,400	CCF69	1	$385,858	$15,500	14-7	1	$284,056	$19,800	1	$0	$0
938	CC	1118146008	MARTINEZ WILMER FERNEY	230301	25	$1,209,459	$193,600	EPS041	25	$1,209,459	$48,400	CCF69	25	$1,209,459	$48,400	14-7	25	$1,209,459	$84,200	25	$0	$0
939	CC	1006532271	MENDIETA CARVAJAL JHONATAN EDUARDO	230301	25	$1,845,289	$295,300	EPSC25	25	$1,845,289	$73,900	CCF69	25	$1,845,290	$73,900	14-7	25	$1,845,289	$128,500	25	$0	$0
940	CC	1056554142	MERCHAN LIZARAZO JHONATAN ALEXANDER	230301	25	$1,186,250	$189,800	EPS037	25	$1,186,250	$47,500	CCF69	25	$1,186,250	$47,500	14-7	25	$1,186,250	$82,600	25	$0	$0
941	CC	1056554337	MESA MESA EDILIO	230301	25	$1,186,250	$189,800	ESSC24	25	$1,186,250	$47,500	CCF69	25	$1,186,250	$47,500	14-7	25	$1,186,250	$82,600	25	$0	$0
942	CC	1115948959	MINA URIBE ANGEL DAVID	230301	24	$2,080,000	$332,800	EPS037	24	$2,080,000	$83,200	CCF69	24	$2,080,000	$83,200	14-7	24	$2,080,000	$144,800	24	$0	$0
943	CC	96191229	MOJICA TOSCANO YECID ALBERTO	25-14	25	$1,307,472	$209,200	EPSC25	25	$1,307,472	$52,300	CCF69	25	$1,307,472	$52,300	14-7	25	$1,307,472	$91,100	25	$0	$0
944	CC	1115865992	MONROY LOPEZ EDWIN LEONARDO	230301	25	$1,666,667	$266,700	EPSC25	25	$1,666,667	$66,700	CCF69	25	$1,666,667	$66,700	14-7	25	$1,666,667	$116,100	25	$0	$0
945	CC	3275830	MONTAÑEZ ALVAREZ JOSE LUIS	25-14	21	$2,450,000	$392,000	EPS037	21	$2,450,000	$98,000	CCF69	21	$2,450,000	$98,000	14-7	21	$2,450,000	$170,600	21	$0	$0
946	CC	1002197434	MORALES MADERA BREINER EDUARDO	230301	25	$1,847,702	$295,700	ESSC24	25	$1,847,702	$74,000	CCF69	25	$1,847,702	$74,000	14-7	25	$1,847,702	$128,700	25	$0	$0
947	CC	1118553809	MORALES CALDERON JHORMAN ALEXANDER	230201	1	$78,396	$12,600	EPS041	1	$78,396	$3,200	CCF69	1	$202,430	$8,100	14-7	1	$78,396	$5,500	1	$0	$0
948	CC	1118146676	MURILLO NARANJO OSCAR	230301	20	$995,417	$159,300	EPS041	20	$995,417	$39,900	CCF69	20	$995,418	$39,900	14-7	20	$995,417	$69,300	20	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
949	CC	7920627	NAVARRO PELAEZ YAMIT YECIT	230201	19	$3,483,332	$557,400	EPS002	19	$3,483,332	$139,400	CCF69	19	$3,483,333	$139,400	14-7	19	$3,483,332	$242,500	19	$0	$0
950	CC	1118146049	NUÑEZ CRUZ YEINER CAMILO	230301	25	$1,350,571	$216,100	EPSC25	25	$1,350,571	$54,100	CCF69	25	$1,350,571	$54,100	14-7	25	$1,350,571	$94,000	25	$0	$0
951	CC	2758800	ORTIZ SANCHEZ MIGUEL FERNANDO	231001	24	$3,097,460	$495,600	EPS002	24	$3,097,460	$123,900	CCF69	24	$3,097,463	$123,900	14-7	24	$3,097,460	$215,600	24	$0	$0
952	CC	1115913891	ORTIZ CASTILLO YEISON	230301	19	$1,659,273	$265,500	EPS041	19	$1,659,273	$66,400	CCF69	19	$1,659,275	$66,400	14-7	19	$1,659,273	$115,500	19	$0	$0
953	CC	71481410	PAMPLONA VASQUEZ JOSE ALBERTO	230301	25	$2,666,664	$426,700	EPS037	25	$2,666,664	$106,700	CCF69	25	$2,666,666	$106,700	14-7	25	$2,666,664	$185,600	25	$0	$0
954	CC	1102881233	PARRA OROZCO EVER JOSE	230301	25	$1,687,516	$270,100	CCFC55	25	$1,687,516	$67,600	CCF69	25	$1,687,518	$67,600	14-7	25	$1,687,516	$117,500	25	$0	$0
955	CC	1116858058	PATIÑO PERAZA DIANA ZULAY	230301	30	$2,363,629	$378,200	EPSC25	30	$2,363,629	$94,600	CCF69	30	$2,363,629	$94,600	14-7	30	$2,363,629	$164,600	30	$0	$0
956	CC	1097332234	PEÑA QUIROGA EDINSON FERNEY	230301	20	$2,054,485	$328,800	EPS002	20	$2,054,485	$82,200	CCF69	20	$2,054,486	$82,200	14-7	20	$2,054,485	$143,000	20	$0	$0
957	CC	1102808896	PEREZ CORREA EDER JOSE	230201	18	$4,199,999	$714,000	EPS037	18	$4,199,999	$168,000	CCF69	18	$4,200,000	$168,000	14-7	18	$4,199,999	$292,400	18	$0	$0
958	CC	4149053	PERILLA GONZALEZ OMAR RICARDO	230301	25	$2,226,447	$356,300	EPS037	25	$2,226,447	$89,100	CCF69	25	$2,226,449	$89,100	14-7	25	$2,226,447	$155,000	25	$0	$0
959	CC	1118146386	PICO MORA JENNY ALEJANDRA	230301	25	$2,000,000	$320,000	EPS005	25	$2,000,000	$80,000	CCF69	25	$2,000,000	$80,000	14-7	25	$2,000,000	$139,200	25	$0	$0
960	CC	1115862050	PINZON JASPE YIMIN FERNELY	230301	7	$332,150	$53,200	EPS041	7	$332,150	$13,300	CCF69	7	$412,625	$16,600	14-7	7	$332,150	$23,200	7	$0	$0
961	CC	13544225	POLO FIGUEROA OSCAR HUMBERTO	25-14	24	$4,559,999	$775,200	EPS010	24	$4,559,999	$182,400	CCF69	24	$4,560,000	$182,400	14-7	24	$4,559,999	$317,400	24	$0	$0
962	CC	1115853775	PUERTA PUERTA RONALD YORDANY	230301	21	$1,820,869	$291,400	EPS037	21	$1,820,869	$72,900	CCF69	21	$1,820,870	$72,900	14-7	21	$1,820,869	$126,800	21	$0	$0
963	CC	1048822991	QUINTANA ENCISO JAIRO HERNAN	230301	25	$1,788,587	$286,200	EPS037	25	$1,788,587	$71,600	CCF69	25	$1,788,587	$71,600	14-7	25	$1,788,587	$124,500	25	$0	$0
964	CC	1053607166	RACHE RINCON RAFAEL ANTONIO	230201	25	$3,461,404	$553,900	EPS017	25	$3,461,404	$138,500	CCF69	25	$3,461,405	$138,500	14-7	25	$3,461,404	$241,000	25	$0	$0
965	CC	1119185844	RAMIREZ VEGA JHON JABER	230301	22	$1,579,130	$252,700	EPS037	22	$1,579,130	$63,200	CCF69	22	$1,579,130	$63,200	14-7	22	$1,579,130	$110,000	22	$0	$0
966	CC	92532518	RANGEL SERRANO CESAR AUGUSTO	230201	25	$2,654,123	$424,700	EPS048	25	$2,654,123	$106,200	CCF69	25	$2,654,123	$106,200	14-7	25	$2,654,123	$184,800	25	$0	$0
967	CC	18256995	REYES CHAVITA MOISES	230301	25	$1,835,796	$293,800	EPSC25	25	$1,835,796	$73,500	CCF69	25	$1,835,797	$73,500	14-7	25	$1,835,796	$127,800	25	$0	$0
968	CC	1058275336	RINCON PARRA JUAN CAMILO	25-14	23	$1,878,333	$300,600	EPS037	23	$1,878,333	$75,200	CCF69	23	$1,878,334	$75,200	14-7	23	$1,878,333	$130,800	23	$0	$0
969	CC	1118146575	RISCANEVO LAGOS ANGEL RODRIGO	230301	25	$1,186,250	$189,800	EPS041	25	$1,186,250	$47,500	CCF69	25	$1,186,250	$47,500	14-7	25	$1,186,250	$82,600	25	$0	$0
970	CC	1056553433	RISCANEVO LOPEZ DIEGO HARVEY	230301	25	$1,572,213	$251,600	EPSC25	25	$1,572,213	$62,900	CCF69	25	$1,572,214	$62,900	14-7	25	$1,572,213	$109,500	25	$0	$0
971	CC	74381291	RISCANEVO ESTUPIÑAN URY ALEXI	231001	22	$1,055,505	$168,900	EPSC25	22	$1,055,505	$42,300	CCF69	22	$1,186,250	$47,500	14-7	22	$1,055,505	$73,500	22	$0	$0
972	CC	1006532365	RISCANEVO LAGOS WILSON MANUEL	230301	10	$474,500	$76,000	EPS037	10	$474,500	$19,000	CCF69	10	$474,500	$19,000	14-7	10	$474,500	$33,100	10	$0	$0
973	CC	7366630	RIVEROS PARADA ELKIN ALFREDO	230301	25	$1,833,332	$293,400	MIN001	25	$1,833,332	$73,400	CCF69	25	$1,833,333	$73,400	14-7	25	$1,833,332	$127,600	25	$0	$0
974	CC	1030609275	RODRIGUEZ LEON BLANCA YAZMIN	230301	18	$854,100	$136,700	EPS037	18	$854,100	$34,200	CCF69	18	$854,100	$34,200	14-7	18	$854,100	$59,500	18	$0	$0
975	CC	1024574347	RODRIGUEZ NOSSA GERSON ALBEIRO	230301	25	$1,201,723	$192,300	EPSC25	25	$1,201,723	$48,100	CCF69	25	$1,201,723	$48,100	14-7	25	$1,201,723	$83,700	25	$0	$0
976	CC	74081286	RODRIGUEZ BOLIVAR JONATAN SAUL	230301	2	$166,667	$26,700	EPS017	2	$166,667	$6,700	CCF69	2	$173,097	$7,000	14-7	2	$166,667	$11,700	2	$0	$0
977	CC	86070734	RODRIGUEZ GARCIA RODRIGO ALEXANDER	230301	20	$949,000	$151,900	EPS005	20	$949,000	$38,000	CCF69	20	$949,000	$38,000	14-7	20	$949,000	$66,100	20	$0	$0
978	CC	1118146581	ROJAS RODRIGUEZ ELIAS OBED	230301	25	$1,193,986	$191,100	EPSC25	25	$1,193,986	$47,800	CCF69	25	$1,193,986	$47,800	14-7	25	$1,193,986	$83,200	25	$0	$0
979	CC	1118540750	ROJAS SESTY JUAN MANUEL	230301	25	$3,833,332	$613,400	EPS037	25	$3,833,332	$153,400	CCF69	25	$3,833,333	$153,400	14-7	25	$3,833,332	$266,800	25	$0	$0
980	CC	1006414261	ROMERO PEREZ JEISON ADIEL	230301	30	$2,151,650	$344,300	EPSC25	30	$2,151,650	$86,100	CCF69	30	$2,151,650	$86,100	14-7	30	$2,151,650	$149,800	30	$0	$0
981	CC	1007491953	ROMERO PEREZ NARLY YULIANA	230201	30	$2,167,743	$346,900	EPSC25	30	$2,167,743	$86,800	CCF69	30	$2,167,743	$86,800	14-7	30	$2,167,743	$150,900	30	$0	$0
982	CC	1118146580	SALON CAMARGO CRISTIAN FABIAN	230301	25	$1,186,250	$189,800	EPSC25	25	$1,186,250	$47,500	CCF69	25	$1,186,250	$47,500	14-7	25	$1,186,250	$82,600	25	$0	$0
983	CC	1193514133	SALON ARCHILA OSCAR DAVIAN	230301	25	$1,328,601	$212,600	EPSC25	25	$1,328,601	$53,200	CCF69	25	$1,328,601	$53,200	14-7	25	$1,328,601	$92,500	25	$0	$0
984	CC	1006559498	SALON CACERES SIRCIRO ANDRES	230301	18	$854,100	$136,700	EPSC25	18	$854,100	$34,200	CCF69	18	$854,100	$34,200	14-7	18	$854,100	$59,500	18	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
985	CC	1118146418	SANABRIA BOLAÑOS WILSON ARLEY	230301	25	$1,811,667	$289,900	EPSC25	25	$1,811,667	$72,500	CCF69	25	$1,811,667	$72,500	14-7	25	$1,811,667	$126,100	25	$0	$0
986	CC	74282000	SANCHEZ NIÑO FERNANDO	230301	25	$1,186,250	$189,800	EPS037	25	$1,186,250	$47,500	CCF69	25	$1,186,250	$47,500	14-7	25	$1,186,250	$82,600	25	$0	$0
987	CC	1118648565	SILVA QUEVEDO OSCAR ALEJANDRO	230301	25	$1,209,459	$193,600	EPSC25	25	$1,209,459	$48,400	CCF69	25	$1,209,459	$48,400	14-7	25	$1,209,459	$84,200	25	$0	$0
988	CC	1010157517	SUAREZ LEON LUIS FERLEY	230301	24	$1,414,055	$226,300	EPS002	24	$1,414,055	$56,600	CCF69	24	$1,414,055	$56,600	14-7	24	$1,414,055	$98,500	24	$0	$0
989	CC	1033655118	TABORDA CANO JUAN PABLO	230301	29	$2,789,276	$446,300	EPS037	29	$2,789,276	$111,600	CCF69	29	$2,789,276	$111,600	14-7	29	$2,789,276	$194,200	29	$0	$0
990	CC	3740350	TORREGROZA GOENAGA SIXTO	231001	25	$2,720,600	$435,300	EPS010	25	$2,720,600	$108,900	CCF69	25	$2,720,600	$108,900	14-7	25	$2,720,600	$189,400	25	$0	$0
991	CC	1002526528	TORRES POVEDA EDY HUMBERTO	230301	25	$1,320,864	$211,400	EPS037	25	$1,320,864	$52,900	CCF69	25	$1,320,864	$52,900	14-7	25	$1,320,864	$92,000	25	$0	$0
992	CC	1006532308	TORRES TORRES RAFAEL ANTONIO	25-14	9	$427,050	$68,400	EPSC25	9	$427,050	$17,100	CCF69	9	$477,077	$19,100	14-7	9	$427,050	$29,800	9	$0	$0
993	CC	1054252878	TRUJILLO FIERRO MARCOS LEONARDO	230301	10	$474,500	$76,000	EPS017	10	$474,500	$19,000	CCF69	10	$474,500	$19,000	14-7	10	$474,500	$33,100	10	$0	$0
994	CC	1054557122	VALENCIA ANGARITA LUIS EDUARDO	230301	25	$2,272,681	$363,700	EPS041	25	$2,272,681	$91,000	CCF69	25	$2,272,682	$91,000	14-7	25	$2,272,681	$158,200	25	$0	$0
995	CC	1014232981	VEGA VEGA OSMAR DARIO	230301	21	$1,819,999	$291,200	EPS037	21	$1,819,999	$72,800	CCF69	21	$1,820,000	$72,800	14-7	21	$1,819,999	$126,700	21	$0	$0
996	CC	1115865975	VELANDIA PARRA BRAYAN JAIR	230301	30	$2,286,884	$366,000	EPS037	30	$2,286,884	$91,500	CCF69	30	$2,286,884	$91,500	14-7	30	$2,286,884	$159,200	30	$0	$0
997	CC	1006532418	VELANDIA BARON JHAN CARLOS	230301	10	$474,500	$76,000	EPS005	10	$474,500	$19,000	CCF69	10	$474,500	$19,000	14-7	10	$474,500	$33,100	10	$0	$0
998	CC	1006532232	ZAMBRANO PINZON SONIA LILIANA	230301	25	$1,186,250	$189,800	EPSC25	25	$1,186,250	$47,500	CCF69	25	$1,186,250	$47,500	14-7	25	$1,186,250	$82,600	25	$0	$0
Ciudad: SAN LUIS DE GACENO Depto: BOYACA (2 Afiliados)						**$4,163,114**	**$666,200**			**$4,163,114**	**$166,600**			**$4,163,115**	**$166,600**			**$4,163,114**	**$289,800**		**$0**	**$0**
999	CC	3761183	HERRERA OLIVEROS JAIME ENRIQUE	25-14	25	$2,598,622	$415,800	EPS037	25	$2,598,622	$104,000	CCF10	25	$2,598,623	$104,000	14-7	25	$2,598,622	$180,900	25	$0	$0
1000	CC	1124400977	RAMIREZ MARTINEZ LUIS PEDRO	230301	25	$1,564,492	$250,400	EPS037	25	$1,564,492	$62,600	CCF10	25	$1,564,492	$62,600	14-7	25	$1,564,492	$108,900	25	$0	$0
Ciudad: SANTA MARIA Depto: BOYACA (6 Afiliados)						**$7,883,282**	**$1,261,500**			**$10,014,658**	**$400,900**			**$11,613,272**	**$464,900**			**$10,014,658**	**$697,400**		**$0**	**$0**
1001	CC	9141929	ALFONSO HUERTAS PABLO ELY	25-14	25	$1,213,327	$194,200	EPS037	25	$1,213,327	$48,600	CCF10	25	$1,213,327	$48,600	14-7	25	$1,213,327	$84,500	25	$0	$0
1002	CC	79118363	BRAVO JEREMIAS ANTONIO		0	$0	$0	EPSC25	25	$2,131,376	$85,300	CCF10	25	$2,131,377	$85,300	14-7	25	$2,131,376	$148,400	25	$0	$0
1003	CC	92450334	JULIO BATISTA LEOVALDI	230301	26	$3,828,018	$612,500	ESSC07	26	$3,828,018	$153,200	CCF10	26	$3,828,019	$153,200	14-7	26	$3,828,018	$266,500	26	$0	$0
1004	CC	84038390	MONTERO GUERRA WILIAM ALFONSO	230301	23	$1,608,237	$257,400	EPS037	23	$1,608,237	$64,400	CCF10	23	$1,608,237	$64,400	14-7	23	$1,608,237	$112,000	23	$0	$0
1005	CC	1019040180	RUIZ HUERTAS CLAUDIA MIREYA	230201	1	$47,450	$7,600	EPSC25	1	$47,450	$1,900	CCF10	1	$1,646,062	$65,900	14-7	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
1006	CC	74325762	SALGADO SALGADO IBAN	230301	25	$1,186,250	$189,800	EPS037	25	$1,186,250	$47,500	CCF10	25	$1,186,250	$47,500	14-7	25	$1,186,250	$82,600	25	$0	$0
Ciudad: SOCHA Depto: BOYACA (2 Afiliados)						**$4,138,840**	**$662,300**			**$4,138,840**	**$165,600**			**$4,138,841**	**$165,600**			**$4,138,840**	**$288,100**		**$0**	**$0**
1007	CC	1007464490	FRANCO BRAVO HECTOR ALEJANDRO	230201	25	$1,750,000	$280,000	EPS037	25	$1,750,000	$70,000	CCF10	25	$1,750,000	$70,000	14-7	25	$1,750,000	$121,800	25	$0	$0
1008	CC	74352832	OVALLE PERILLA JORGE ARMANDO	230301	25	$2,388,840	$382,300	EPS037	25	$2,388,840	$95,600	CCF10	25	$2,388,841	$95,600	14-7	25	$2,388,840	$166,300	25	$0	$0
Ciudad: SOCOTA Depto: BOYACA (2 Afiliados)						**$4,750,000**	**$760,100**			**$4,750,000**	**$190,100**			**$4,750,001**	**$190,100**			**$4,750,000**	**$330,700**		**$0**	**$0**
1009	CC	1052390523	ESTUPIÑAN PARDO GUSTAVO ADOLFO	25-14	25	$1,833,333	$293,400	EPS005	25	$1,833,333	$73,400	CCF10	25	$1,833,334	$73,400	14-7	25	$1,833,333	$127,600	25	$0	$0
1010	CC	1057596974	RINCON SUAREZ JULIAN DAVID	25-14	25	$2,916,667	$466,700	EPS005	25	$2,916,667	$116,700	CCF10	25	$2,916,667	$116,700	14-7	25	$2,916,667	$203,100	25	$0	$0
Ciudad: TASCO Depto: BOYACA (95 Afiliados)						**$174,111,164**	**$27,862,600**			**$174,111,164**	**$6,968,600**			**$175,961,084**	**$7,042,700**			**$174,111,164**	**$12,122,900**		**$0**	**$0**
1011	CC	52335517	ACOSTA GONGORA DIANA CAROLINA	25-14	25	$4,166,667	$666,700	EPS017	25	$4,166,667	$166,700	CCF10	25	$4,166,667	$166,700	14-7	25	$4,166,667	$290,100	25	$0	$0
1012	CC	1052397243	ALVAREZ OROZCO JESSICA MARIA	25-14	25	$1,250,000	$200,000	EPS037	25	$1,250,000	$50,000	CCF10	25	$1,250,000	$50,000	14-7	25	$1,250,000	$87,000	25	$0	$0
1013	CC	1052314850	ALVAREZ GALLO JHON SEBASTIAN	230301	25	$1,240,405	$198,500	EPS041	25	$1,240,405	$49,700	CCF10	25	$1,240,405	$49,700	14-7	25	$1,240,405	$86,400	25	$0	$0
1014	CC	1007987359	ARCILA LOZADA OSCAR ANDRES	230301	10	$474,500	$76,000	EPS037	10	$474,500	$19,000	CCF10	10	$474,500	$19,000	14-7	10	$474,500	$33,100	10	$0	$0
1015	CC	1050604333	ARIAS FABIAN ESTIVEN	25-14	11	$521,950	$83,600	EPS037	11	$521,950	$20,900	CCF10	11	$521,950	$20,900	14-7	11	$521,950	$36,400	11	$0	$0
1016	CC	7714581	ARIAS GUTIERREZ HOWARD	230301	25	$2,234,921	$357,600	EPS005	25	$2,234,921	$89,400	CCF10	25	$2,234,921	$89,400	14-7	25	$2,234,921	$155,600	25	$0	$0
1017	CC	1065130015	ARIAS PERTUZ RAFAEL HERNAN	230301	23	$1,513,016	$242,100	EPS002	23	$1,513,016	$60,600	CCF10	23	$1,513,017	$60,600	14-7	23	$1,513,016	$105,400	23	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1018	CC	74334881	AVILA BECERRA RUBEN ALIRIO	25-14	20	$1,878,042	$300,500	EPS005	20	$1,878,042	$75,200	CCF10	20	$1,878,043	$75,200	14-7	20	$1,878,042	$130,800	20	$0	$0
1019	CC	1096906772	AYALA ZARAZA CARLOS ANDREY	230301	25	$2,178,622	$348,600	MIN001	25	$2,178,622	$87,200	CCF10	25	$2,178,623	$87,200	14-7	25	$2,178,622	$151,700	25	$0	$0
1020	CC	1056552344	BARRERA NIÑO JHON JAIRO	230301	25	$1,479,012	$236,700	EPS037	25	$1,479,012	$59,200	CCF10	25	$1,479,012	$59,200	14-7	25	$1,479,012	$103,000	25	$0	$0
1021	CC	1085328538	BASTIDAS CABRERA JEISON FERNANDO	230301	1	$64,999	$10,400	EPS037	1	$64,999	$2,600	CCF10	1	$686,610	$27,500	14-7	1	$64,999	$4,600	1	$0	$0
1022	CC	9099965	BAYTER MENDOZA JOHN JAIRO	230201	25	$2,319,855	$371,200	EPS037	25	$2,319,855	$92,800	CCF10	25	$2,319,856	$92,800	14-7	25	$2,319,855	$161,500	25	$0	$0
1023	CC	91014578	BELLO CASTILLO ANTONIO	230301	25	$2,083,334	$333,400	EPS005	25	$2,083,334	$83,400	CCF10	25	$2,083,334	$83,400	14-7	25	$2,083,334	$145,100	25	$0	$0
1024	CC	74282731	BENITO ROMERO WILLIAM	230301	25	$2,735,868	$437,800	EPS017	25	$2,735,868	$109,500	CCF10	25	$2,735,869	$109,500	14-7	25	$2,735,868	$190,500	25	$0	$0
1025	CC	1089844267	BOLAÑOS DELGADO JOSE DIOMEDES	230201	24	$2,436,448	$389,900	EPS037	24	$2,436,448	$97,500	CCF10	24	$2,436,449	$97,500	14-7	24	$2,436,448	$169,600	24	$0	$0
1026	CC	9531788	BONILLA GUTIERREZ VICTOR	230301	26	$3,033,333	$485,400	EPS005	26	$3,033,333	$121,400	CCF10	26	$3,033,334	$121,400	14-7	26	$3,033,333	$211,200	26	$0	$0
1027	CC	4276546	CADENA VALERO ALIRIO	230301	25	$2,505,434	$400,900	EPS037	25	$2,505,434	$100,300	CCF10	25	$2,505,435	$100,300	14-7	25	$2,505,434	$174,400	25	$0	$0
1028	CC	1016078216	CALDAS BERNAL JUAN DAVID	230301	25	$2,770,217	$443,300	EPS037	25	$2,770,217	$110,900	CCF10	25	$2,770,218	$110,900	14-7	25	$2,770,217	$192,900	25	$0	$0
1029	CC	80184018	CALDAS BERNAL JUAN FRANCISCO	230201	25	$2,806,739	$449,100	EPS017	25	$2,806,739	$112,300	CCF10	25	$2,806,739	$112,300	14-7	25	$2,806,739	$195,400	25	$0	$0
1030	CC	7224981	CAMARGO CARDENAS JOSE NELSON	25-14	25	$1,750,000	$280,000	EPS005	25	$1,750,000	$70,000	CCF10	25	$1,750,000	$70,000	14-7	25	$1,750,000	$121,800	25	$0	$0
1031	CC	74321795	CANTOR MOLINA CARLOS EDEN	230301	25	$1,328,601	$212,600	EPS037	25	$1,328,601	$53,200	CCF10	25	$1,328,601	$53,200	14-7	25	$1,328,601	$92,500	25	$0	$0
1032	CC	74083396	CARDENAS PEREZ JOSE ANGEL	230201	4	$386,666	$61,900	EPS017	4	$386,666	$15,500	CCF10	4	$386,666	$15,500	14-7	4	$386,666	$27,000	4	$0	$0
1033	CC	1143379606	CARDENAS MANTILLA LUIS SEBASTIAN	230301	24	$1,280,000	$204,800	ESSC24	24	$1,280,000	$51,200	CCF10	24	$1,931,200	$77,300	14-7	24	$1,280,000	$89,100	24	$0	$0
1034	CC	1052312238	CASTRO ESPINDOLA LEONEL ALONSO	230301	25	$1,386,003	$221,800	ESSC24	25	$1,386,003	$55,500	CCF10	25	$1,386,004	$55,500	14-7	25	$1,386,003	$96,500	25	$0	$0
1035	CC	1054253658	CUCUNUBA BENITEZ ALEXANDER	230301	25	$1,507,157	$241,200	EPS037	25	$1,507,157	$60,300	CCF10	25	$1,507,157	$60,300	14-7	25	$1,507,157	$104,900	25	$0	$0
1036	CC	1056554732	CUCUNUBA BENITEZ JOHANA ANDREA	230301	25	$1,823,266	$291,800	ESSC24	25	$1,823,266	$73,000	CCF10	25	$1,823,267	$73,000	14-7	25	$1,823,266	$126,900	25	$0	$0
1037	CC	1053614292	CUERVO MARTINEZ JULIAN DAVID	230201	25	$2,088,768	$334,300	EPS037	25	$2,088,768	$83,600	CCF10	25	$2,088,769	$83,600	14-7	25	$2,088,768	$145,400	25	$0	$0
1038	CC	1056592564	DUARTE GARCIA DIEGO ARMANDO	230301	25	$2,676,379	$428,300	EPS037	25	$2,676,379	$107,100	CCF10	25	$2,676,380	$107,100	14-7	25	$2,676,379	$186,300	25	$0	$0
1039	CC	1056593117	DUARTE GARCIA EDGAR DANILO	230301	25	$1,812,060	$290,000	EPS037	25	$1,812,060	$72,500	CCF10	25	$1,812,060	$72,500	14-7	25	$1,812,060	$126,200	25	$0	$0
1040	CC	74320996	ESPINDOLA LIZARAZO JAVIER	25-14	1	$155,760	$25,000	EPS037	1	$155,760	$6,300	CCF10	1	$199,422	$8,000	14-7	1	$155,760	$10,900	1	$0	$0
1041	CC	1056555109	ESTEPA MENDIVELSO LINA MARILY	25-14	11	$521,950	$83,600	ESSC24	11	$521,950	$20,900	CCF10	11	$521,950	$20,900	14-7	11	$521,950	$36,400	11	$0	$0
1042	CC	1006531651	FANDIÑO TORRES DIEGO FERNANDO	230201	25	$3,010,289	$481,700	EPS037	25	$3,010,289	$120,500	CCF10	25	$3,010,290	$120,500	14-7	25	$3,010,289	$209,600	25	$0	$0
1043	CC	1091663870	GALEANO ANGARITA JAIRO ANDRES	230301	25	$4,166,666	$666,700	EPS005	25	$4,166,666	$166,700	CCF10	25	$4,166,667	$166,700	14-7	25	$4,166,666	$290,000	25	$0	$0
1044	CC	6775061	GALINDO BARON LIBARDO ENRIQUE	25-14	25	$2,666,665	$426,700	EPS008	25	$2,666,665	$106,700	CCF10	25	$2,666,666	$106,700	14-7	25	$2,666,665	$185,600	25	$0	$0
1045	CC	1056592296	GONZALEZ JOYA HECTOR LENNART	230301	25	$2,734,131	$437,500	EPS037	25	$2,734,131	$109,400	CCF10	25	$2,734,131	$109,400	14-7	25	$2,734,131	$190,300	25	$0	$0
1046	CC	1018416852	GUAVITA ALFONSO DAVID ALFREDO	25-14	28	$4,666,666	$746,700	EPS005	28	$4,666,666	$186,700	CCF10	28	$4,666,666	$186,700	14-7	28	$4,666,666	$324,800	28	$0	$0
1047	CC	74281087	GUERRERO BERNAL VICTOR MANUEL	230301	25	$1,662,880	$266,100	EPS041	25	$1,662,880	$66,600	CCF10	25	$1,662,880	$66,600	14-7	25	$1,662,880	$115,800	25	$0	$0
1048	CC	1052312107	HERNANDEZ FERNANDEZ ERIKA LISETH	25-14	11	$521,950	$83,600	EPS037	11	$521,950	$20,900	CCF10	11	$521,950	$20,900	14-7	11	$521,950	$36,400	11	$0	$0
1049	CC	79185370	HERNANDEZ SIMBAQUEVA JULIO HERNAN	230301	25	$1,890,263	$302,500	EPS017	25	$1,890,263	$75,700	CCF10	25	$1,890,264	$75,700	14-7	25	$1,890,263	$131,600	25	$0	$0
1050	CC	59652037	HERNANDEZ BASTIDAS NANCY YENI	230201	25	$4,000,000	$640,000	EPS037	25	$4,000,000	$160,000	CCF10	25	$4,000,000	$160,000	14-7	25	$4,000,000	$278,400	25	$0	$0
1051	CC	1057594964	HERRERA MONTAÑEZ CRISTIAN ALFREDO	230301	25	$1,583,333	$253,400	EPS041	25	$1,583,333	$63,400	CCF10	25	$1,583,334	$63,400	14-7	25	$1,583,333	$110,200	25	$0	$0
1052	CC	1007517928	HERRERA HERRERA HEDISON FERNANDO	25-14	11	$521,950	$83,600	EPS037	11	$521,950	$20,900	CCF10	11	$521,950	$20,900	14-7	11	$521,950	$36,400	11	$0	$0
1053	CC	1002556915	HERRERA HERRERA YEIMER LORENZO	230301	25	$1,572,297	$251,600	EPS002	25	$1,572,297	$62,900	CCF10	25	$1,572,297	$62,900	14-7	25	$1,572,297	$109,500	25	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1054	CC	1069475704	HOYOS LAZARO LUIS FERNANDO	230301	25	$1,217,196	$194,800	CCFC55	25	$1,217,196	$48,700	CCF10	25	$1,217,196	$48,700	14-7	25	$1,217,196	$84,800	25	$0	$0
1055	CC	1022955749	LAGOS AVENDAÑO YENNY FAISURY	25-14	20	$1,600,716	$256,200	EPS008	20	$1,600,716	$64,100	CCF10	20	$1,600,716	$64,100	14-7	20	$1,600,716	$111,500	20	$0	$0
1056	CC	74372462	LARA RODRIGUEZ JAVIER ALEXANDER	25-14	25	$3,500,000	$560,000	EPS008	25	$3,500,000	$140,000	CCF10	25	$3,500,000	$140,000	14-7	25	$3,500,000	$243,600	25	$0	$0
1057	CC	87572881	LEGARDA ADOLFO ILARIO	230201	1	$546,956	$87,600	EPS037	1	$546,956	$21,900	CCF10	1	$730,364	$29,300	14-7	1	$546,956	$38,100	1	$0	$0
1058	CC	74326641	LEON LEON CESAR AUGUSTO	25-14	11	$723,617	$115,800	ESSC24	11	$723,617	$29,000	CCF10	11	$723,617	$29,000	14-7	11	$723,617	$50,400	11	$0	$0
1059	CC	98387299	MADROÑERO MARTINEZ WILLIAM HERNAN	230301	25	$3,206,754	$513,100	EPS037	25	$3,206,754	$128,300	CCF10	25	$3,206,754	$128,300	14-7	25	$3,206,754	$223,200	25	$0	$0
1060	CC	1002557033	MENDIVELSO DURAN EMERSON YESITH	25-14	7	$332,150	$53,200	EPS037	7	$332,150	$13,300	CCF10	7	$332,150	$13,300	14-7	7	$332,150	$23,200	7	$0	$0
1061	CC	1000269978	MENDIVELSO NIÑO MARIA LORENA	230201	25	$1,909,140	$305,500	ESSC24	25	$1,909,140	$76,400	CCF10	25	$1,909,141	$76,400	14-7	25	$1,909,140	$132,900	25	$0	$0
1062	CC	74320706	MENDIVELSO TORRES SAUL	25-14	25	$1,501,895	$240,400	ESSC24	25	$1,501,895	$60,100	CCF10	25	$1,501,896	$60,100	14-7	25	$1,501,895	$104,600	25	$0	$0
1063	CC	4272433	MONTOYA JOSE JOAQUIN	230201	10	$474,500	$76,000	ESSC62	10	$474,500	$19,000	CCF10	10	$474,500	$19,000	14-7	10	$474,500	$33,100	10	$0	$0
1064	CC	1024533844	MONTOYA MOLINA LEIDY	230301	25	$1,808,876	$289,500	EPS037	25	$1,808,876	$72,400	CCF10	25	$1,808,876	$72,400	14-7	25	$1,808,876	$125,900	25	$0	$0
1065	CC	1057597824	MORENO AMAYA NESTOR HERNAN	230301	25	$1,644,582	$263,200	EPS037	25	$1,644,582	$65,800	CCF10	25	$1,644,583	$65,800	14-7	25	$1,644,582	$114,500	25	$0	$0
1066	CC	74085152	MURILLO PEREZ OSCAR LEONARDO	231001	25	$2,183,333	$349,400	EPS002	25	$2,183,333	$87,400	CCF10	25	$2,183,333	$87,400	14-7	25	$2,183,333	$152,000	25	$0	$0
1067	CC	1002395369	NAVARRO CORTES KEVIN STEVEN	230301	25	$1,586,537	$253,900	EPS041	25	$1,586,537	$63,500	CCF10	25	$1,586,537	$63,500	14-7	25	$1,586,537	$110,500	25	$0	$0
1068	CC	74321803	NIÑO MENDIVELSO ANYILO	25-14	25	$1,209,458	$193,600	EPS037	25	$1,209,458	$48,400	CCF10	25	$1,209,459	$48,400	14-7	25	$1,209,458	$84,200	25	$0	$0
1069	CC	9375309	NIÑO ALBARRACIN LUIS	25-14	25	$1,484,101	$237,500	EPS037	25	$1,484,101	$59,400	CCF10	25	$1,484,102	$59,400	14-7	25	$1,484,101	$103,300	25	$0	$0
1070	CC	1063286499	NORIEGA MARTINEZ LUIS CARLOS	230201	25	$2,250,000	$360,000	EPS005	25	$2,250,000	$90,000	CCF10	25	$2,250,000	$90,000	14-7	25	$2,250,000	$156,600	25	$0	$0
1071	CC	74379161	OCHOA DELGADO MICHAEL LEONARDO	230201	25	$4,166,667	$666,700	EPS005	25	$4,166,667	$166,700	CCF10	25	$4,166,667	$166,700	14-7	25	$4,166,667	$290,100	25	$0	$0
1072	CC	1093754624	PABON GONZALEZ YESSICA PAOLA	230301	11	$521,950	$83,600	EPS037	11	$521,950	$20,900	CCF10	11	$521,950	$20,900	14-7	11	$521,950	$36,400	11	$0	$0
1073	CC	9590254	PACHON CARREÑO YESID ALEXANDER	231001	25	$1,313,128	$210,200	EPS037	25	$1,313,128	$52,600	CCF10	25	$1,313,128	$52,600	14-7	25	$1,313,128	$91,400	25	$0	$0
1074	CC	7174208	PARRA CAMACHO MIGUEL ANGEL	25-14	25	$4,583,334	$733,400	EPS005	25	$4,583,334	$183,400	CCF10	25	$4,583,334	$183,400	14-7	25	$4,583,334	$319,100	25	$0	$0
1075	CC	1007517995	PEREZ ZAMBRANO DIEGO ALEXIS	230201	25	$1,232,667	$197,300	EPS005	25	$1,232,667	$49,400	CCF10	25	$1,232,668	$49,400	14-7	25	$1,232,667	$85,800	25	$0	$0
1076	CC	1053609037	PEREZ CIPAGAUTA IVAN ARLEY	230301	25	$2,226,449	$356,300	EPS005	25	$2,226,449	$89,100	CCF10	25	$2,226,449	$89,100	14-7	25	$2,226,449	$155,000	25	$0	$0
1077	CC	1029640977	QUIQUIVA QUINTERO YEFERSON ESTIBEN	230301	25	$1,336,337	$213,900	EPS037	25	$1,336,337	$53,500	CCF10	25	$1,336,337	$53,500	14-7	25	$1,336,337	$93,100	25	$0	$0
1078	CC	1064113198	RAMIREZ RIVERA JUAN DE DIOS	230301	25	$1,605,877	$257,000	EPS037	25	$1,605,877	$64,300	CCF10	25	$1,605,878	$64,300	14-7	25	$1,605,877	$111,800	25	$0	$0
1079	CC	1124362431	RAMIREZ MARTINEZ VICTOR ALFONSO	25-14	1	$93,868	$15,100	EPS037	1	$93,868	$3,800	CCF10	1	$443,873	$17,800	14-7	1	$93,868	$6,600	1	$0	$0
1080	CC	1002557008	RAVELO RAVELO GLORIA LORENA	230301	25	$1,240,405	$198,500	EPS041	25	$1,240,405	$49,700	CCF10	25	$1,240,405	$49,700	14-7	25	$1,240,405	$86,400	25	$0	$0
1081	CC	1002557003	RAVELO FERNANDEZ LAURA LISETH	230301	26	$2,093,526	$335,000	EPS037	26	$2,093,526	$83,800	CCF10	26	$2,093,526	$83,800	14-7	26	$2,093,526	$145,800	26	$0	$0
1082	CC	74181219	RINCON LEON CESAR AUGUSTO	25-14	25	$2,357,608	$377,300	EPS005	25	$2,357,608	$94,400	CCF10	25	$2,357,609	$94,400	14-7	25	$2,357,608	$164,100	25	$0	$0
1083	CC	1052312422	RINCON PEÑARANDA WILFRAN SAURYTH	230301	25	$1,283,418	$205,400	EPS041	25	$1,283,418	$51,400	CCF10	25	$1,283,419	$51,400	14-7	25	$1,283,418	$89,400	25	$0	$0
1084	CC	1001056873	ROJAS CASTAÑEDA KAROLL DAYAN	230201	23	$1,322,046	$211,600	EPS037	23	$1,322,046	$52,900	CCF10	23	$1,322,047	$52,900	14-7	23	$1,322,046	$92,100	23	$0	$0
1085	CC	1056592563	ROJAS TORRES RAUL ANTONIO	230301	25	$2,425,292	$388,100	EPS037	25	$2,425,292	$97,100	CCF10	25	$2,425,292	$97,100	14-7	25	$2,425,292	$168,900	25	$0	$0
1086	CC	1053665202	ROJAS ARAQUE YEFERSON	25-14	23	$1,348,818	$215,900	EPS037	23	$1,348,818	$54,000	CCF10	23	$1,348,818	$54,000	14-7	23	$1,348,818	$93,900	23	$0	$0
1087	CC	1054253571	ROMERO CANTOR LEYDY	230301	24	$1,645,378	$263,300	EPS041	24	$1,645,378	$65,900	CCF10	24	$1,645,379	$65,900	14-7	24	$1,645,378	$114,600	24	$0	$0
1088	CC	1054254079	ROMERO CANTOR LIRLEY	230301	25	$1,526,653	$244,300	ESSC24	25	$1,526,653	$61,100	CCF10	25	$1,526,653	$61,100	14-7	25	$1,526,653	$106,300	25	$0	$0
1089	CC	91072221	SANCHEZ PEÑALOZA GERARDO	230301	25	$2,641,161	$422,600	EPS041	25	$2,641,161	$105,700	CCF10	25	$2,641,161	$105,700	14-7	25	$2,641,161	$183,900	25	$0	$0

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1090	CC	1104406359	SARMIENTO DE HOYOS DANIEL DAVID	230301	23	$1,199,660	$192,000	ESSC24	23	$1,199,660	$48,000	CCF10	23	$1,199,660	$48,000	14-7	23	$1,199,660	$83,500	23	$0	$0
1091	CC	5989325	SEPULVEDA ESQUIVEL JORGE ELIECER	25-14	25	$2,793,695	$447,000	EPS037	25	$2,793,695	$111,800	CCF10	25	$2,793,695	$111,800	14-7	25	$2,793,695	$194,500	25	$0	$0
1092	CC	1052314080	SILVA RINCON JHON EDISON	230301	25	$2,003,406	$320,600	EPS037	25	$2,003,406	$80,200	CCF10	25	$2,003,406	$80,200	14-7	25	$2,003,406	$139,500	25	$0	$0
1093	CC	1057606883	SOSSA PIRAGAUTA EDWARD ANDRES	230301	24	$1,522,419	$243,600	EPS037	24	$1,522,419	$60,900	CCF10	24	$1,522,420	$60,900	14-7	24	$1,522,419	$106,000	24	$0	$0
1094	CC	74328817	SUAREZ GARZON NELSON ENRIQUE	230201	25	$3,367,931	$538,900	EPS041	25	$3,367,931	$134,800	CCF10	25	$3,367,931	$134,800	14-7	25	$3,367,931	$234,500	25	$0	$0
1095	CC	4219068	TORRES BARRERA FREDY ALEXANDER	230301	25	$1,202,806	$192,500	EPS037	25	$1,202,806	$48,200	CCF10	25	$1,202,806	$48,200	14-7	25	$1,202,806	$83,800	25	$0	$0
1096	CC	1050200309	TORRES CASTRO LUIS ANTONIO	230301	25	$1,899,094	$303,900	EPS037	25	$1,899,094	$76,000	CCF10	25	$1,899,094	$76,000	14-7	25	$1,899,094	$132,200	25	$0	$0
1097	CC	74302396	TORRES TOBOS WILSON ENRIQUE	25-14	25	$2,066,145	$330,600	EPS037	25	$2,066,145	$82,700	CCF10	25	$2,066,145	$82,700	14-7	25	$2,066,145	$143,900	25	$0	$0
1098	CC	1002556768	TRIANA GALVIS DANNY YESITH	230301	25	$1,562,548	$250,100	EPS037	25	$1,562,548	$62,600	CCF10	25	$1,562,549	$62,600	14-7	25	$1,562,548	$108,800	25	$0	$0
1099	CC	1069502664	TRUJILLO MACEA LUIS ANGEL	230301	25	$1,224,932	$196,000	EPS037	25	$1,224,932	$49,000	CCF10	25	$1,224,932	$49,000	14-7	25	$1,224,932	$85,300	25	$0	$0
1100	CC	1007518017	TUNAROZA CANTOR ERICK FERLEY	230301	25	$1,368,828	$219,100	EPS037	25	$1,368,828	$54,800	CCF10	25	$1,368,829	$54,800	14-7	25	$1,368,828	$95,300	25	$0	$0
1101	CC	1065905574	URQUIJO SERVERA JEISON	230301	25	$2,506,957	$401,200	EPS017	25	$2,506,957	$100,300	CCF10	25	$2,506,957	$100,300	14-7	25	$2,506,957	$174,500	25	$0	$0
1102	CC	1056554955	UYABAN NIÑO DANIA YAZMIN	230301	25	$1,526,652	$244,300	ESSC24	25	$1,526,652	$61,100	CCF10	25	$1,526,653	$61,100	14-7	25	$1,526,652	$106,300	25	$0	$0
1103	CC	1057579437	VARGAS CHARRIA JEISSON ANDRES	230301	25	$2,026,086	$324,200	EPS037	25	$2,026,086	$81,100	CCF10	25	$2,026,087	$81,100	14-7	25	$2,026,086	$141,100	25	$0	$0
1104	CC	7181923	VILLABONA JUEZ HOLMANT ALEJANDRO	230301	23	$1,981,883	$317,200	EPS005	23	$1,981,883	$79,300	CCF10	23	$1,981,883	$79,300	14-7	23	$1,981,883	$138,000	23	$0	$0
1105	CC	1024592489	VILLEGAS MEDINA ANDRES FELIPE	230301	4	$306,667	$49,100	EPS008	4	$306,667	$12,300	CCF10	4	$306,667	$12,300	14-7	4	$306,667	$21,400	4	$0	$0
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (38 Afiliados)						**$84,590,684**	**$13,652,800**			**$87,048,073**	**$4,471,900**			**$87,048,093**	**$3,483,500**			**$87,048,073**	**$6,060,300**		**$11,628,208**	**$581,500**
1106	CC	1007343159	ALFONSO VERDUGO YOAN FERNANDO	230301	25	$1,614,310	$258,300	EPS005	25	$1,614,310	$64,600	CCF10	25	$1,614,311	$64,600	14-7	25	$1,614,310	$112,400	25	$0	$0
1107	CC	1065135481	ALTAMAR PACHECO SINIVALDO ANTONIO	230301	25	$2,746,304	$439,500	EPS037	25	$2,746,304	$109,900	CCF10	25	$2,746,304	$109,900	14-7	25	$2,746,304	$191,200	25	$0	$0
1108	CC	1033367410	CALAO BONOLIS CARLOS MARIO	25-14	23	$1,550,724	$248,200	EPS037	23	$1,550,724	$62,100	CCF10	23	$1,550,725	$62,100	14-7	23	$1,550,724	$108,000	23	$0	$0
1109	CC	1117491197	CAMACHO ORTIZ MIGUEL ANGEL	230301	21	$1,119,613	$179,200	EPS037	21	$1,119,613	$44,800	CCF10	21	$1,119,613	$44,800	14-7	21	$1,119,613	$78,000	21	$0	$0
1110	CC	88153951	CAÑAS PARADA MIGUEL ANTONIO	230301	22	$2,018,913	$323,100	EPS041	22	$2,018,913	$80,800	CCF10	22	$2,018,913	$80,800	14-7	22	$2,018,913	$140,600	22	$0	$0
1111	CC	1007412294	CANCHILA JULIO JUAN CAMILO	230301	25	$1,451,700	$232,300	EPS048	25	$1,451,700	$58,100	CCF10	25	$1,451,700	$58,100	14-7	25	$1,451,700	$101,100	25	$0	$0
1112	CC	1052380461	CORREDOR CRUZ ANDRES CAMILO	230301	25	$2,408,046	$385,300	EPS037	25	$2,408,046	$96,400	CCF10	25	$2,408,047	$96,400	14-7	25	$2,408,046	$167,600	25	$0	$0
1113	CC	73203716	GARCIA FERNANDEZ LUIS EMIRO	230301	25	$1,999,638	$320,000	EPS002	25	$1,999,638	$80,000	CCF10	25	$1,999,638	$80,000	14-7	25	$1,999,638	$139,200	25	$0	$0
1114	CC	78756301	GUZMAN MESQUIDA LUIS MIGUEL	230301	26	$2,544,125	$407,100	EPS037	26	$2,544,125	$101,800	CCF10	26	$2,544,126	$101,800	14-7	26	$2,544,125	$177,100	26	$0	$0
1115	CC	9287568	HERNANDEZ HERRERA ALEJANDRO RAFAEL	230301	25	$2,669,506	$427,200	ESSC07	25	$2,669,506	$106,800	CCF10	25	$2,669,507	$106,800	14-7	25	$2,669,506	$185,800	25	$0	$0
1116	CC	1117837579	IMBUS VILLARREAL LUIS FERNANDO	230301	18	$921,836	$147,500	ESSC62	18	$921,836	$36,900	CCF10	18	$921,836	$36,900	14-7	18	$921,836	$64,200	18	$0	$0
1117	CC	8045624	JIMENEZ ZABALA FRANCISCO DANIEL	230301	23	$1,442,171	$230,800	EPS042	23	$1,442,171	$57,700	CCF10	23	$1,442,171	$57,700	14-7	23	$1,442,171	$100,400	23	$0	$0
1118	CC	1002275561	MERCADO DITA CARLOS ALFREDO	231001	23	$1,489,052	$238,300	ESSC07	23	$1,489,052	$59,600	CCF10	23	$1,489,053	$59,600	14-7	23	$1,489,052	$103,700	23	$0	$0
1119	CC	73316802	OCHOA RODRIGUEZ JAVIER ALFONSO	25-14	25	$1,955,792	$313,000	EPS048	25	$1,955,792	$78,300	CCF10	25	$1,955,792	$78,300	14-7	25	$1,955,792	$136,200	25	$0	$0
1120	CC	1010106546	OLARTE OSORIO JAMES JULIAN	230301	19	$1,006,660	$161,100	ESSC62	19	$1,006,660	$40,300	CCF10	19	$1,006,660	$40,300	14-7	19	$1,006,660	$70,100	19	$0	$0
1121	CC	80735994	ORJUELA BARBOSA WILLIAM ANDRES	230201	25	$11,628,207	$1,977,000	EPS005	25	$11,628,207	$1,453,600	CCF10	25	$11,628,208	$465,200	14-7	25	$11,628,207	$809,400	25	$11,628,208	$581,500
1122	CC	77166787	PACHECO OLIVARES MANUEL SALVADOR	230301	25	$2,996,521	$479,500	EPS002	25	$2,996,521	$119,900	CCF10	25	$2,996,521	$119,900	14-7	25	$2,996,521	$208,600	25	$0	$0
1123	CC	1117534216	PAREJA RUBIANO JAIME ANDRES	230201	24	$1,249,210	$199,900	EPS005	24	$1,249,210	$50,000	CCF10	24	$1,249,210	$50,000	14-7	24	$1,249,210	$87,000	24	$0	$0
1124	CC	1045227390	PARRA PADILLA ELIO	230301	25	$3,113,969	$498,300	EPS041	25	$3,113,969	$124,600	CCF10	25	$3,113,970	$124,600	14-7	25	$3,113,969	$216,800	25	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1125	CC	78545043	PARRA ESQUIVEL OSCAR MIGUEL	230201	25	$1,919,559	$307,200	EPS037	25	$1,919,559	$76,800	CCF10	25	$1,919,559	$76,800	14-7	25	$1,919,559	$133,700	25	$0	$0
1126	CC	1102850269	PATERNINA GARRIDO MISAEL DE JESUS	25-14	25	$2,758,332	$441,400	ESSC07	25	$2,758,332	$110,400	CCF10	25	$2,758,333	$110,400	14-7	25	$2,758,332	$192,000	25	$0	$0
1127	CC	16468300	PEREA PALACIOS ELIUMEN		0	$0	$0	EPS037	15	$2,457,389	$98,300	CCF10	15	$2,457,391	$98,300	14-7	15	$2,457,389	$171,100	15	$0	$0
1128	CC	78763814	PEREZ CARMONA GABRIEL GERMAN	25-14	25	$1,391,599	$222,700	CCFC55	25	$1,391,599	$55,700	CCF10	25	$1,391,599	$55,700	14-7	25	$1,391,599	$96,900	25	$0	$0
1129	CC	98650543	RAMOS HOYOS KILES ALFONSO	230301	25	$1,534,058	$245,500	ESSC24	25	$1,534,058	$61,400	CCF10	25	$1,534,059	$61,400	14-7	25	$1,534,058	$106,800	25	$0	$0
1130	CC	14324117	RODRIGUEZ ENCISO JAVIER ALEXANDER	230301	23	$1,229,419	$196,800	EPS037	23	$1,229,419	$49,200	CCF10	23	$1,229,419	$49,200	14-7	23	$1,229,419	$85,600	23	$0	$0
1131	CC	59818773	RODRIGUEZ MARTINEZ LOURDES VIVIANA	230201	19	$2,026,665	$324,300	EPS037	19	$2,026,665	$81,100	CCF10	19	$2,026,666	$81,100	14-7	19	$2,026,665	$141,100	19	$0	$0
1132	CC	80396761	SANDOVAL BOLIVAR HUMBERTO	230301	25	$1,810,824	$289,800	EPS017	25	$1,810,824	$72,500	CCF10	25	$1,810,825	$72,500	14-7	25	$1,810,824	$126,100	25	$0	$0
1133	CC	17293182	SERNA RESTREPO HEBER	230301	25	$1,862,500	$298,000	EPS010	25	$1,862,500	$74,500	CCF10	25	$1,862,500	$74,500	14-7	25	$1,862,500	$129,700	25	$0	$0
1134	CC	1090538980	SOLANO CASTELLANOS EDUARD NICASIO	230301	25	$1,601,850	$256,300	EPS037	25	$1,601,850	$64,100	CCF10	25	$1,601,850	$64,100	14-7	25	$1,601,850	$111,500	25	$0	$0
1135	CC	1054255010	SOTO DURAN HECTOR JAVIER	25-14	25	$1,833,332	$293,400	EPS008	25	$1,833,332	$73,400	CCF10	25	$1,833,334	$73,400	14-7	25	$1,833,332	$127,600	25	$0	$0
1136	CC	1104425070	TAPIA NAVARRO WILMER ANTONIO	230301	25	$1,436,226	$229,800	ESSC24	25	$1,436,226	$57,500	CCF10	25	$1,436,227	$57,500	14-7	25	$1,436,226	$100,000	25	$0	$0
1137	CC	1030529179	TOLOZA BACCA EDWIN FABIAN	230301	25	$2,849,129	$455,900	EPS037	25	$2,849,129	$114,000	CCF10	25	$2,849,130	$114,000	14-7	25	$2,849,129	$198,300	25	$0	$0
1138	CC	1018412875	TORRES VASQUEZ HENRY OCTAVIO	230301	25	$1,847,702	$295,700	EPS008	25	$1,847,702	$74,000	CCF10	25	$1,847,702	$74,000	14-7	25	$1,847,702	$128,700	25	$0	$0
1139	CC	1115944440	VARGAS BETANCOURT YUBERNEY	230301	24	$2,315,651	$370,600	EPS005	24	$2,315,651	$92,700	CCF10	24	$2,315,652	$92,700	14-7	24	$2,315,651	$161,200	24	$0	$0
1140	CC	1045227408	VENTURA FRANCO LUIS ANGEL	230301	20	$2,431,738	$389,100	ESSC24	20	$2,431,738	$97,300	CCF10	20	$2,431,739	$97,300	14-7	20	$2,431,738	$169,300	20	$0	$0
1141	CC	1038104784	VERGARA LOPEZ CARLOS ANDRES	230301	26	$4,178,918	$668,700	ESSC24	26	$4,178,918	$167,200	CCF10	26	$4,178,918	$167,200	14-7	26	$4,178,918	$290,900	26	$0	$0
1142	CC	1048848912	VIVAS ROMERO CRISTIAN ALEJANDRO	230201	25	$2,933,696	$469,400	EPS037	25	$2,933,696	$117,400	CCF10	25	$2,933,696	$117,400	14-7	25	$2,933,696	$204,200	25	$0	$0
1143	CC	74373162	VIVAS HOLGUIN JULIO ERNESTO	230201	25	$2,703,189	$432,600	EPS017	25	$2,703,189	$108,200	CCF10	25	$2,703,189	$108,200	14-7	25	$2,703,189	$188,200	25	$0	$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (2 Afiliados)						**$5,604,360**	**$896,800**			**$5,604,360**	**$224,200**			**$5,604,360**	**$224,200**			**$5,604,360**	**$390,100**		**$0**	**$0**
1144	CC	79687057	GONZALEZ CONTRERAS OMAR RICARDO	230301	25	$4,537,251	$726,000	MIN001	25	$4,537,251	$181,500	CCF69	25	$4,537,251	$181,500	14-7	25	$4,537,251	$315,800	25	$0	$0
1145	CC	3672454	OCHOA VASQUEZ ALIRIO DE JESUS	230301	22	$1,067,109	$170,800	ESSC24	22	$1,067,109	$42,700	CCF69	22	$1,067,109	$42,700	14-7	22	$1,067,109	$74,300	22	$0	$0
Total			**Afiliados(334)**			**$743,181,009**	**$118,506,100**			**$750,388,709**	**$31,482,400**			**$719,079,701**	**$28,801,400**			**$750,388,709**	**$41,586,900**		**$28,751,583**	**$1,438,300**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830094920	5	KMA CONSTRUCCIONES S A	A - 200 O MAS COTIZANTES	BOGOTA	CALLE 93 B No. 19 - 21	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7424880	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1248998288	9481436908	E	2025/02/06	2025/02/06	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,268,042,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				332	$118,506,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	11	$3,693,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	58	$22,144,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	224	$74,781,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	39	$17,886,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				330	$41,586,900
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	330	$41,586,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				331	$28,801,400
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	176	$16,115,800
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	155	$12,685,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 16)				334	$31,482,400
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	5	$377,100
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	5	$349,700
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	51	$3,246,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	7	$591,300
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	2	$140,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	22	$1,633,100
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	3	$288,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$447,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	14	$1,307,000
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	3	$407,500
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$88,600
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	5	$564,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	120	$10,253,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	36	$2,883,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	17	$1,670,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	40	$7,232,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$863,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$863,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$575,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$575,300
TOTAL				**334**	**$221,815,100**

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14867501555

(415)7707212489984(8020) 000001486750155 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 4 0 2 8	8	Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO VIAS NACIONALES

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

41. Dirección principal
BRR EL CABRERO CR 2 41 612

42. Correo electrónico licitaciones@kma.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 5 6 9 3 9 2 5 5	3 1 2 4 4 7 8 0 5 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
4 2 1 0	2 0 2 1 0 2 0 8	4 2 9 0	2 0 2 1 0 2 0 8			

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos
	0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	2	5	5																	

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 4 61. Fecha 2022 - 10 - 10 / 15 : 03: 57

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PEREZ PEREZ LUCETH VIVIANA

985. Cargo Gestor I

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14867501555

(415)7707212489984(8020) **000001486750155 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 4 0 2 8	8	Impuestos de Cartagena	6

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 1 0 2 0 8	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 3	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 1 0 2 0 8	
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14867501555

(415)7707212489984(8020) **000001486750155 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 4 0 2 8	8	Impuestos de Cartagena	6

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 1 0 2 0 8		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadaní 1 3	8 0 0 8 3 4 5 1		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
AMIN	AVENDAÑO	MENZEL	RAFAEL
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 1 0 2 0 8		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadan 1 3	9 2 5 1 9 7 3 0		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
OJEDA	CARRIAZO	ANIBAL	ENRIQUE
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 1 0 2 0 8		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadan 1 3	9 0 7 6 3 0 4		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
AMIN	BAJAIRE	MENZEL	RAFAEL
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 1 0 2 0 8		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadan 1 3	9 0 8 2 1 1 1		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
AMIN	BAJAIRE	EFRAIN	FERNANDO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14867501555

(415)7707212489984(8020) **000001486750155 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 4 0 2 8	8	Impuestos de Cartagena	6

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 3 0 0 9 4 9 2 0	5	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: KMA CONSTRUCCIONES S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	9 0	2 0 2 1 0 2 0 8	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 9 0 4 0 3 2 3 5	3	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CICON SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5	2 0 2 1 0 2 0 8	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 0 6 0 1 4 1 0 8	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CONSTRUCTORA EMMA LTDA

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5	2 0 2 1 0 2 0 8	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14901778908

(415)7707212489984(8020) 000001490177890 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 9 4 9 2 0	5	Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
KMA CONSTRUCCIONES S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

41. Dirección principal
BRR EL CABRERO CR 2 41 612

42. Correo electrónico correspondencia@kma.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 9 3 9 2 5 5	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 0 1 1 1 2 1	4 5 1 1	2 0 0 1 1 1 2 1		4 2 2 0	4 2 1 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	8	9	1 0	1 3	1 4	1 8	1 9	2 6	4 2	4 8	5 2	5 5											

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
13- Gran contribuyente
14- Informante de exogena
18- Precios de transferencia
19- Productor de bienes y/o servicios exen
26- Declaración individual precios de tran
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 03 - 09 / 14 : 48: 07

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ROJAS MENDEZ HERNAN ALONSO
985. Cargo Apoderado General Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14901778908

(415)7707212489984(8020) **000001490177890 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 9 4 9 2 0	5	Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	2 9 8 6	0 0 5
73. Fecha	2 0 0 1 1 1 0 9	2 0 2 0 1 1 2 7
74. Número de notaría	2 5	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 1 1 1 2 1	2 0 2 0 1 2 0 1
77. No. Matrícula mercantil	1 1 4 1 1 3 2	0 9 3 3 2 5 6 8 1 2
78. Departamento	1 1	1 3
79. Ciudad/Municipio	4	9

Vigencia

80. Desde	2 0 0 1 1 1 0 9
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	2 0	2 0 0 9 1 2 2 3	9 0 0 1 2 2 2 7 0	0
2	8 0	2 0 1 6 0 6 0 1		
3	2 1	2 0 1 7 1 0 2 0		
4	2 3	2 0 1 8 0 8 1 4	9 0 0 4 7 0 3 1 4	8
5	1 0 6	2 0 2 2 1 2 2 2		

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
1	KMA CONCESIONES S.A.S		

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14901778908

(415)7707212489984(8020) **000001490177890 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 0 9 4 9 2 0	5	Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 2 0 3 0 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	8 0 0 8 3 4 5 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
AMIN	AVENDAÑO	MENZEL	RAFAEL

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 2 0 3 0 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	5 2 3 8 6 3 0 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
AMIN	AVENDAÑO	KARINA	EUGENIA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 2 0 3 0 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	9 2 5 1 9 7 3 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
OJEDA	CARRIAZO	ANIBAL	ENRIQUE

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
APOD. GENERAL 0 7	2 0 1 6 0 6 0 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 9 5 3 1 3 5 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ROJAS	MENDEZ	HERNAN	ALONSO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14901778908

(415)7707212489984(8020) **000001490177890 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 9 4 9 2 0	5	Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	119. Razón social	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
1	Cédula de Ciudada 1 3	8 0 0 8 3 4 5 1		COLOMBIA 1 6 9	AMIN	AVENDAÑO	MENZEL	RAFAEL				2 0 2 1 0 9 0 8	
2	Cédula de Ciudada 1 3	9 2 5 1 9 7 3 0		COLOMBIA 1 6 9	OJEDA	CARRIAZO	ANIBAL	ENRIQUE				2 0 2 1 0 9 0 8	
3	Cédula de Ciudada 1 3	7 9 7 7 8 7 4 9		COLOMBIA 1 6 9	RIVEROS	BARRAGAN	JUAN	DAVID				2 0 1 8 0 3 2 3	2 0 2 1 0 9 0 8
4	Cédula de Ciudadan 1 3	7 9 1 4 6 4 9 9		COLOMBIA 1 6 9	HENAO	RIVEROS	BERNARDO					2 0 2 1 0 9 0 8	
5	Cédula de Extranjer 2 2	3 3 5 8 8 2		COLOMBIA 1 6 9	CAMACHO		SERGIO	ALEJANDRO				2 0 1 8 0 3 2 3	2 0 2 1 0 9 0 8

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14901778908

(415)7707212489984(8020) **000001490177890 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 9 4 9 2 0	5	Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	5 2 3 8 6 3 0 3		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
AMIN	AVENDAÑO	KARINA	EUGENIA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 1 0 9 0 8	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 7 0 9 3 4 3 1		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
RIVEROS	RODRIGUEZ	GUSTAVO	HUMBERTO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 8 0 3 2 3	2 0 2 1 0 9 0 8

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	8 0 1 0 8 7 1 2		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
FLOREZ	ESPITIA	FABIAN	MAURICIO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 1 0 9 0 8	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	7 4 1 8 9 7 9 6		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
GONZALEZ	ACOSTA	DIEGO	ALONSO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 1 0 9 0 8	

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	9 2 3 7 1 8 9		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
MORENO	TATIS	LUIS	ALEJANDRO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 1 0 9 0 8	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14901778908

(415)7707212489984(8020) **000001490177890 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 3 0 0 9 4 9 2 0	5	Operativa de Grandes Contribuyentes	3 1	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	119. Razón social	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
1	Cédula de Ciudada 1 3	9 0 7 6 3 0 4		COLOMBIA 1 6 9	AMIN	BAJAIRE	MENZEL	RAFAEL				2 0 1 2 0 3 0 7	2 0 1 8 1 1 0 7
2	Cédula de Ciudada 1 3	7 9 7 3 3 5 3 4		COLOMBIA 1 6 9	QUIÑONES	GUZMAN	JUAN	CARLOS				2 0 1 3 0 3 2 6	2 0 1 5 0 1 0 7
3	Cédula de Ciudada 1 3	8 0 1 9 6 1 9 7		COLOMBIA 1 6 9	AMIN	AVENDAÑO	CESAR	AUGUSTO				2 0 1 2 0 2 1 6	2 0 1 8 1 1 0 7
4	Cédula de Ciudadan 1 3	8 0 2 3 3 9 3 2		COLOMBIA 1 6 9	MARIÑO	MALDONADO	JUAN	MANUEL				2 0 1 4 0 3 2 5	2 0 1 8 1 1 0 7
5	Cédula de Ciudadan 1 3	8 0 0 9 0 3 5 2		COLOMBIA 1 6 9	CASTRO	MUÑOZ	MIGUEL	IGNACIO				2 0 2 1 0 9 0 8	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14901778908

(415)7707212489984(8020) **000001490177890 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 9 4 9 2 0	5	Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 9 5 3 1 3 5 1		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
ROJAS	MENDEZ	HERNAN	ALONSO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 1 0 9 0 8	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14901778908

(415)7707212489984(8020) **000001490177890 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 9 4 9 2 0	5	Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	8 6 9 3 0 8 7		6 2 4 3 5 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
SOCARRAS	BENITEZ	GABRIEL	EDUARDO

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada
8 9 0 4 0 3 6 3 9	5	ANAYA & ANAYA LIMITADA

135. Fecha de nombramiento: 2 0 1 8 0 5 2 9

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 1 6 5 6 0 7		1 8 1 9 6 0 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
ZUÑIGA	HAWKINS	GABRIEL	ESTEBAN

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada
8 9 0 4 0 3 6 3 9	5	ANAYA & ANAYA S.A.S.

147. Fecha de nombramiento: 2 0 2 3 0 2 2 7

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento:

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Estado de la Empresa o Persona

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14901778908

(415)7707212489984(8020) **000001490177890 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
		Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1	

Estado y beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	2 0	2 0 0 9 1 2 2 3	8 0 0 1 4 7 6 5 6	- 5
2		AAAA MM DD		-
3		AAAA MM DD		-
4		AAAA MM DD		-
5		AAAA MM DD		-
6		AAAA MM DD		-
7		AAAA MM DD		-
8		AAAA MM DD		-
9		AAAA MM DD		-
10		AAAA MM DD		-
11		AAAA MM DD		-
12		AAAA MM DD		-
13		AAAA MM DD		-
14		AAAA MM DD		-
15		AAAA MM DD		-
16		AAAA MM DD		-
17		AAAA MM DD		-
18		AAAA MM DD		-
19		AAAA MM DD		-
20		AAAA MM DD		-
21		AAAA MM DD		-
22		AAAA MM DD		-

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141007656772

(415)7707212489984(8020) 000014100765677 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 4 0 3 2 3 5	3	Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CICON SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
CICON S.A / CONSORCIO VIAS DEL CABRERO	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

41. Dirección principal
BRR EL POZON TV 54 96 670 SEC DOÑA MANUELA

42. Correo electrónico avelezimptos@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 5 3 7 0 8 2	6 5 3 8 3 0 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	1 9 7 9 0 1 1 0	4 3 9 0	1 9 7 9 0 1 1 0		4 2 2 0	4 2 1 0		2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	8	9	1 0	1 4	4 2	4 8	5 2	5 5	5 9														

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales
59 - Autorretención especial renta

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
2	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 04 - 09 / 08 : 44: 03

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre AMIN BAJAIRE MENZEL RAFAEL
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141007656772

(415)7707212489984(8020) 000014100765677 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 4 0 3 2 3 5	3	Impuestos de Cartagena	6

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	6	1
73. Fecha	1 9 7 9 0 1 1 0	2 0 1 4 0 3 2 5
74. Número de notaría	1	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 7 9 0 2 0 9	2 0 1 4 0 6 1 8
77. No. Matrícula mercantil	0 9 1 5 1 0 1 1 2	0 9 0 1 5 1 0 1 1 2
78. Departamento	1 3	1 3
79. Ciudad/Municipio	9	9

Vigencia

80. Desde	1 9 7 9 0 2 0 9
81. Hasta	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141007656772

(415)7707212489984(8020) 000014100765677 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 4 0 3 2 3 5	3	Impuestos de Cartagena	6

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 4 0 3 2 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	9 0 7 6 3 0 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
AMIN	BAJAIRE	MENZEL	RAFAEL

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 7 0 7 3 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	8 0 1 9 6 1 9 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
AMIN	AVENDAÑO	CESAR	AUGUSTO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 7 0 7 3 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	8 0 7 1 5 8 4 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ESPINOSA	BOWERS	JUAN	MANUEL

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141007656772

(415)7707212489984(8020) 000014100765677 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 4 0 3 2 3 5	3	Impuestos de Cartagena	6

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 2 8 0 5 6 9 7 3		1 8 3 8 5 0 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
ACOSTA	BALLESTERO	RODRIGO	

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento: 2 0 2 2 1 0 2 5

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	4 5 5 1 3 3 0 4		9 6 4 3 9 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
ESTRADA	HERNANDEZ	BLEIDIS	DEL SOCORRO

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento: 2 0 1 8 0 1 2 7

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 3 4 3 0 3 5 1		1 3 4 9 4 6 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
CATALAN	TORRES	LUIS	ALBERTO

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2 0 1 5 0 2 0 2

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141007656772

(415)7707212489984(8020) 000014100765677 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 4 0 3 2 3 5		Impuestos de Cartagena 6	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Oficina 0 8	Construcción de otras obras de ingeniería civil 4 2 9 0	

162. Nombre del establecimiento: CICON S.A

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1	

165. Dirección: BRR POZON TV 54 96 670 SEC DOÑA MANUELA

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
0 9 0 1 5 1 0 1 1 2	1 9 7 9 0 2 0 9	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	
6 5 3 7 0 8 2		

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 4 2 1 0	

162. Nombre del establecimiento: CONSORCIO VIAS DEL CABRERO

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1	

165. Dirección: BRR EL POZON TV 54 96 670 SEC DOÑA MANUELA

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
0 9 2 2 5 1 6 5 0 2	2 0 1 6 1 2 2 2	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	
6 5 3 7 0 8 2		

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141004066211

(415)7707212489984(8020) 000014100406621 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 6 0 1 4 1 0 8	1	Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSTRUCTORA EMMA LTDA

36. Nombre comercial	37. Sigla
CONSTRUCTORA EMMA LTDA	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

41. Dirección principal
CL 25 N 24 A 16 ED TWINS BAY PISO 9

42. Correo electrónico financiera@cemma.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 5 6 4 2 4 5 0 5	6 0 5 6 4 2 4 5 0 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
4 2 9 0	2 0 0 3 0 5 0 5	4 3 9 0	2 0 0 3 0 5 0 5			

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos
	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	1	0	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5											

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código	2 2	2 3																		

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
2	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 04 - 04 / 09 : 20: 34

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre AMIN BAJAIRE EFRAIN FERNANDO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141004066211

(415)7707212489984(8020) **000014100406621 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 6 0 1 4 1 0 8	1	Impuestos de Cartagena 6	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 0	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 5
72. Número	6 5 6	9 3 9
73. Fecha	2 0 0 3 0 5 0 5	2 0 1 0 0 5 1 1
74. Número de notaría	5	5
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 3 0 6 0 5	2 0 1 0 0 6 0 1
77. No. Matrícula mercantil	0 9 1 8 1 7 8 2 0 3	0 9 1 8 1 7 8 2 0 3
78. Departamento	1 3	1 3
79. Ciudad/Municipio	9	9

Vigencia

80. Desde	2 0 0 3 0 5 0 5
81. Hasta	2 1 0 0 0 5 0 5

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 1 2 3 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141004066211

(415)7707212489984(8020) **000014100406621 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 6 0 1 4 1 0 8	1	Impuestos de Cartagena	6

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 0 0 4 0 6		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadaní 1 3	9 0 8 2 1 1 1		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
AMIN	BAJAIRE	EFRAIN	FERNANDO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 0 0 4 0 6		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadan 1 3	3 3 1 4 7 6 8 2		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
DIAZ	BALLESTAS	MARGARITA	SOFIA
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 0 0 4 0 6		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadan 1 3	7 9 2 0 6 6 4		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
AMIN	DIAZ	EFRAIN	FERNANDO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 0 0 4 0 6		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 4 7 4 3 0 7 9 0		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
AMIN	DIAZ	SALOMON	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141004066211

(415)7707212489984(8020) **000014100406621 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 6 0 1 4 1 0 8	1	Impuestos de Cartagena 6	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	2 2 8 0 1 3 7 2		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
AMIN	DIAZ	MARIA	MARGARITA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
125,000,000	2 5	2 0 0 3 0 5 0 5	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	4 5 5 5 5 9 4 0		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
AMIN	DIAZ	MELISSA	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
125,000,000	2 5	2 0 1 0 0 4 0 6	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 9 2 0 6 6 4		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
AMIN	DIAZ	EFRAIN	FERNANDO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
125,000,000	2 5	2 0 1 0 0 4 0 6	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 4 7 4 3 0 7 9 0		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
AMIN	DIAZ	SALOMON	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
125,000,000	2 5	2 0 1 0 0 4 0 6	

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	3 3 1 4 7 6 8 2		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
DIAZ	BALLESTA	MARGARITA	SOFIA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 0 0 4 0 6	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141004066211

(415)7707212489984(8020) **000014100406621 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 6 0 1 4 1 0 8	1	Impuestos de Cartagena	6

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 3 1 0 9 4 7 5		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
YAMAL	BAJAIRE	FARID	TADEO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 0 0 4 0 6	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141004066211

(415)7707212489984(8020) **000014100406621 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
		Impuestos de Cartagena 6	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 3 1 3 8 2 0 2		7 3 7 4 6 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
ARIAS	HERNANDEZ	ANGEL	DAMIAN

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento: 2 0 1 0 0 4 0 6

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento:

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 9 3 7 2 1 8		1 6 9 1 6 6 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
ZAMBRANO	MARTINEZ	JESUS	MARIA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2 0 1 5 0 1 0 1

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141004066211

(415)7707212489984(8020) **000014100406621 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 6 0 1 4 1 0 8		Impuestos de Cartagena 6	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Construcción de otras obras de ingeniería civil 4 2 9 0

162. Nombre del establecimiento: CONSTRUCTORA EMMA LTDA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

165. Dirección: BRR MANGA CL 25 16 A 24 ED TWINS BAY P 9

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 9 1 8 1 7 8 3 0 2	2 0 0 3 0 6 0 5
168. Teléfono: 6 4 2 4 5 0 5	169. Fecha de cierre

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA VIAL

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4

PREACTA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
ene-25

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN	UND	ACUMULADO ACTA ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO
		GRAL.	PART.			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
EXPLANACIONES								
1	200.1	200-13		Desmonte y limpieza en bosque	Ha			
2	200.2	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha			
3	201.7	201-13		Demolición de Estructuras	m3	916.00	0.00	916.00
4	201.15	201.13		Remoción de alcantarillas	m	342.00	0.00	342.00
5	201.16	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	159.00	0.00	159.00
6	210.1.2	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	0.00		
7	210.2.1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	20,901.00	672.00	21,573.00
8	210.2.2	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	78,480.00	2,672.00	81,152.00
9	211.1	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	20,235.00	0.00	20,235.00
10	220.1	220.1		Terraplenes	m3	0.00	0.00	0.00
11	221.1	221-13		Pedraplen compacto	m3	123.00	0.00	123.00
12	231.1	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	0.00		
Subtotal								
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS								
13	310.1	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	1,578,923.00	0.00	1,578,923.00
14	311.1	311-13		Afirmado	m3	51,419.70	104.00	51,523.70
15	320.1	320-13		Subbase Granular clase A	m3	1,062.50	613.30	1,675.80
16	330.1	330-13		Base granular clase A	m3	34,029.60	252.10	34,281.70
17	330.4	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	390.00	0.00	390.00
18	340.1	340-13		Base estabilizada con emulsión tipo BEE-38	m3	0.00		
Subtotal								
PAVIMENTOS ASFALTICOS								
19	411.2	411-13		Emulsión asfáltica de rotura lenta CRL-1 ARD	Lt	0.00		
20	420.2	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	18,474.00	1,165.00	19,639.00
21	421.1	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	423,503.00	2,633.00	426,136.00
22	450.2P		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	36,269.90	247.30	36,517.20
23	450.9P		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	256.50	0.00	256.50
24	460.1P		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	23,724.10	0.00	23,724.10
25	465.1	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	9.20	0.00	9.20
26	466.1	466-13		Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo	m	0.00		
Subtotal								
ESTRUCTURAS Y DRENAJES								
27	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	19,969.50	629.90	20,599.40
28	600.2.1	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	431.10	0.00	431.10
29	610.1	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	104.20	0.00	104.20
30	610.2	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	2,979.80	170.00	3,149.80
31	621.1.2P		621.1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 MPA de diámetro 1.5 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m	129.60	0.00	129.60
32	630.3	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	1,230.80	48.40	1,279.20
33	630.4	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	152.60	0.00	152.60
34	630.6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	206.90	14.00	220.90
35	630.7	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo	m3	222.80	19.60	242.40
36	630P		630P	Suministro e instalacion de bolsacretos	m3	356.80	0.00	356.80
37	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	355,173.20	28,403.00	383,576.20
38	661.1	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	481.00	48.00	529.00
39	663.3P		663.3P	Tuberia para filtro PVC perforada diametro 100 mm	m	19,308.00	10.00	19,318.00
40	671.1	671-13		Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	m3	0.00	0.00	0.00
41	671.1.1P		671.1.1P	Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo (concreto f´c 17,5 mpa)	m3	1,765.80	0.00	1,765.80
42	673.1	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	62,233.20	1,106.30	63,339.50
43	673.2	673-13		Material granular drenante	m3	11,996.40	6.30	12,002.70
44	673.3	673-13		Material de cobertura tipo SBG	m3	1,013.40	0.00	1,013.40
45	681.1	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	604.00	0.00	604.00
Subtotal								

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA VIAL

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4

PREACTA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
ene-25

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN	UND	ACUMULADO ACTA ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO
		GRAL.	PART.			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD								
46	1P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	406,588.20	0.00	406,588.20
47	2P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	0.00	0.00	0.00
48	4P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	0.00	0.00	0.00
49	5P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	60.00	0.00	60.00
50	6P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	0.00	0.00	0.00
51	720.1	730-13		Poste de referencia	u	0.00	0.00	0.00
52	730.1	730-13		Defensa metalica	m	0.00	0.00	0.00
53	730.2	730-13		Sección final	u	0.00	0.00	0.00
54	740.1	740-13		Captafaros	u	0.00	0.00	0.00
Subtotal								
OBRAS VARIAS								
55	800-13	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	0.00	0.00	0.00
56	801.6P		801.6P	Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 ó 900 mm	m	0.00	0.00	0.00
57	810-13	810-13		Protección de Taludes con Hidrosiembra Controlada.	m2	0.00	0.00	0.00
Subtotal								
TRANSPORTES								
58	900.1	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	218,165.00	0.00	218,165.00
59	900.2	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	383,626.00	42,452.00	426,078.00
60	900.3	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	152,359.70	0.00	152,359.70
Subtotal								
ITEMS NO PREVISTOS								
61	NP1		NP1	Zanja de Coronación flexible sección trapezoidal excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m	140.00	0.00	140.00
62	NP2		NP2	Disipador de energía en concreto de 21 Mpa, Incluye Conformación, No incluye refuerzo.	m	0.00	0.00	0.00
63	NP3		NP3	Concreto Ciclopeo para proteccion de estribos, con roca de sitio (Incluye Concreto 21 Mpa)	m3	23.30	0.00	23.30
64	NP4		NP4	Suministro e Instalación de Malla Electrosoldada.	m2	0.00	0.00	0.00
65	NP5		NP5	Perfilado de talud para sitio Critico PR 30+300 Ruta 6404	m2	397.00	0.00	397.00
66	NP6		NP6	Suministro e Instalación de Camisa para Pilote de 1.5m de Diametro (No Recuperable)	m	21.50	0.00	21.50
67	NP7		NP7	Pilote de concreto Tremie Clase 28 Mpa con Piloteadora Diametro 1.5m.	m	113.90	0.00	113.90
68	NP8		NP8	Suministro y manejo de Bentonita.	kg	0.00	0.00	0.00
69	NP9		NP9	Concreto lanzado de 28 Mpa, para sitio critico sector PR30+300 ruta 6404	m3	62.00	0.00	62.00
70	NP10		NP10	Mejoramiento de subrasante con rajon incluye sello con material de afirmado	m3	8,952.60	16.80	8,969.40
71	NP11		NP11	New jersey, no incluye acero	m	0.00	0.00	0.00
72	NP12		NP12	Tala de arboles clase 1 - H: 1 a 5 metros	u	0.00	0.00	0.00
73	NP13		NP13	Tala de alboles clase 2 - H: 5.1 a 10 metros	u	0.00	0.00	0.00
74	NP14		NP14	Tala de arboles clase 3 - H: 10.1 a 20 metros	u	0.00	0.00	0.00
75	NP15		NP15	Tala de arboles clase 4 - H:20.1 a 30 metros	u	0.00	0.00	0.00
76	NP16		NP16	Suministro e instalación de cinta PVC tipo V-15 o similar	m	123.00	182.00	305.00
77	NP17		NP17	Suministro e instalación de Geomalla triaxial 30*30 o similar	m2	6,510.80	440.00	6,950.80
78	NP18		NP18	Suministro e instalación de Geotextil NT4000 o similar	m2	1,446.40	400.00	1,846.40
79	NP19		NP19	Retiro y disposición final de residuos de contrucción y demolición de la estructura puente Ramon Bazurto en el rio Ariporo	m3	588.00	0.00	588.00
80	NP20		NP20	Control vial - turno duirno y nocturno de Lunes a Sabado (No incluye disposición de señalización)	día	1,248.00	50.00	1,298.00
81	NP21		NP21	Control vial - turno duirno y nocturno de Dominicales y Festivos (No incluye disposición de señalización)	día	285.00	1.00	286.00

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA VIAL

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4

PREACTA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
ene-25

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN	UND	ACUMULADO ACTA ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO
		GRAL.	PART.			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
82	NP22		NP22	Transporte de estructura metálica desde acopio Bogotá	kg	80,619.00	0.00	80,619.00
83	NP23		NP23	Montaje de estructura metálica para puente provisional en sector el Boche	kg	90,904.30	0.00	90,904.30
84	NP24		NP24	Suministro e instalación de saco suelo para plataforma de acceso de puente metálico	u	77.00	0.00	77.00
85	NP25		NP25	Construcción de dados para cimentación provisional de puente metálico en el sector el Boche	u	4.00	0.00	4.00
86	NP26		NP26	Pavimento rígido en concreto Hidráulico MR42. No incluye acero de refuerzo	m3	193.80	0.00	193.80
87	NP27		NP27	Pilote excavado in situ f´c=28 Mpa tipo tremie con Ø =1,2 m para puente El Boche incluye excavación en suelo duro	m	355.50	53.00	408.50
88	NP28		NP28	Suministro e instalación de camisa para pilote de 1,2 m de diámetro (No recuperable) para puente Boche PR 30+300	m	109.00	19.00	128.00
89	NP29		NP29	Corte de pavimento para cuneta	m	3,314.00	1,568.50	4,882.50
90	NP30		NP30	Fabricación y suministro de cordones de refuerzo L=6,10 m (referencia AB621 acero dureza 65) para complemento de Puente Acrow tipología TSR3 suministrado por INVIAS	kg	2,800.00	0.00	2,800.00
91	NP31		NP31	Fabricación y suministro de apoyos cojinete (referencia AB587 acero dureza 65) para complemento de Puente Acrow tipología TSR3 suministrado por INVIAS para sector Boche Km 30+300 ruta 6404	kg	348.00	0.00	348.00
92	NP32		NP32	Fabricación y suministro de pernos T de piso (Ø=9mm L=73mm) (referencia AB546 acero dureza 65) para complemento de Puente Acrow tipología TSR3 suministrado por INVIAS	u	70.00	0.00	70.00
93	NP33		NP33	Geotextil tejido TR3000 o similar, no incluye elementos de fijación	m2	0.00	0.00	0.00
94	NP34		NP34	Dren horizontal de longitud hasta 25 metros, para el sector PR30+300 El Boche de la ruta 6404	m	0.00	0.00	0.00
95	NP35		NP35	Suministro e instalación de Geocontenedor por volteo impregnado de 4,5*2,5*1,3 m. Incluye material de relleno y transporte de material. No incluye conformación de accesos, terraplenes o llenos provisionales.	u	482.00	-2.00	480.00
96	NP36		NP36	Conformación de Jarillón con material de sitio para atención de emergencia. No incluye suministro de material granular	m3	13,354.00	2,590.00	15,944.00
97	NP37		NP37	Excavación y cargue de material de rio para atención de emergencia.	m3	14,114.00	0.00	14,114.00
98	NP 38.P		NP 38.P	Suministro e Instalacion de canastillas pasajuntas para pavimento Rigido Ø=1-1/4".	u	53.00	0.00	53.00
99	NP 39.P		NP 39.P	Pilote pre excavado in situ tipo caisson Ø =1,5 m, f'c=28 Mpa. No incluye acero de refuerzo	m	267.00	60.00	327.00
100	NP 40.P		NP 40.P	Suministro e instalación de geodren planar H=0,5 m	m2	0.00	0.00	0.00
101	NP 41.P		NP 41.P	Suministro e instalación de bolsacreto de 1,20*2,4*0,35 m. (concreto bombeable) - Sector El Boche	m3	96.80	26.80	123.60
102	NP 42.P		NP 42.P	Llaves de protección en concreto de 28 Mpa para protección de cauce con concreto bombeable- Sector El Boche (no incluye acero de refuerzo)	m3	0.00	0.00	0.00
103	NP 43.P		NP 43.P	Cuneta en concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo ni acero de refuerzo (concreto f´c 21 Mpa)	m3	322.90	218.10	541.00
				PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)				
				PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)				
				VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)				
				VALOR IVA (OBRA) (E)				
				VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D+E)				
				REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)	GL			
				IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)				
				TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H				
				GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) (J)	GL			
				PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	GL			

FIRMA:
NOMBRE: MIGUEL ANGEL PARRA
INGENIERO RESIDENTE BOYACÁ
Matrícula No.: 15332-105569 BYC

FIRMA:
NOMBRE: DIEGO FERNANDO RUANO FONSECA
INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA BOYACÁ
Matrícula No.: 01112-10613 CPITVC

FIRMA:
NOMBRE:OSCAR HUMBERTO POLO FIGUEROA
INGENIERO RESIDENTE CASANARE
Matrícula No.: 68202-109543 STD

FIRMA:
NOMBRE: WILLIAM DARIO MORENO RICAURTE
INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA CASANARE
Matrícula No.: 25202-192289 CND

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA	Cód: F-EO-009
		Versión: 001
	CONTRATO 0978 DE 2021	Fecha: 02/01/2020
		Pág: 1 de 1

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	31	**MM**	1	**AA**	2,025	**PERIODO:**	1 de enero de 2025		31 de enero de 2025		
CONTRATO:	0978 DE 2021						**OBJETO CONTRATO:**	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4				
CONTRATANTE:	INVIAS				**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA	**ACUMULADO ANTERIOR:**		**PRESENTE ACTA:**		**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES							20,901.00		672.00		21,573.00
ITEM:	210.2.1	GRUPO DE AJUSTE	11601	ESPECIF. GENERAL	210-13	ESPECIF. PARTICULAR	Excavación en roca de la explanación y canales	**UNID:**	m3		**UBICACIÓN:**	**RUTA 6404**

ESQUEMA

LOCALIZACIÓN				LONGITUD	AREA	MARGEN	DESCRIPCIÓN	VOLUMEN
-	PR57+555	PR57+670	SOCOTA	40.00	15.00	IZQ	EXPLANACIÓN EN ROCA (ACTA 43)	- 600.00
-	PR57+555	PR57+670	SOCOTA	115.00	5.53	IZQ	EXPLANACIÓN EN ROCA	635.93
-	PR30+300	PR30+300	SOCHA	42.00	15.14	DER - IZQ	EXPLANACIÓN EN ROCA OBRAS DE MITIGACIÓN	635.72
-	-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-	-		-	-
								-
				Subtotal				**672.00**
				TOTAL				**672.00**

RESIDENTE DE OBRA

FIRMA:

NOMBRE: MIGUEL ANGEL PARRA
CONSORCIO VIAS NACIONALES

INTERVENTORIA

FIRMA:

NOMBRE: DIEGO FERNANDO RUANO FONSECA
CONSORCIO NTERVENTORIAS COLOMBIA

Consorcio Vías Nacionales	Excavación en roca de la explanación y canales	ITEM 210.2.1

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vías para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

1	DATOS DE ELABORCIÓN DE REGISTRO

FECHA DE ELABORACIÓN:	30/01/2025		
RUTA 64-04	EXCAVACION EN ROCA	PR 57+555 A 57+670	MARGEN : DERECHA

CANTIDADES CORTE EN ROCA

Abscisa	Área de Corte	Área Promedio	Volumen de Corte	Vol. Corte acumul.
PR 57+555.00	4.72			0.00
PR 57+560.00	7.52	6.12	30.60	30.60
PR 57+570.00	14.57	11.05	110.45	141.05
PR 57+580.00	17.64	16.11	161.05	302.10
PR 57+590.00	6.55	12.10	120.95	423.05
PR 57+600.00	0.06	3.31	33.05	456.10
PR 57+610.00	0.94	0.50	5.00	461.10
PR 57+620.00	4.6	2.75	27.45	488.55
PR 57+630.00	1.2	2.87	28.66	517.21
PR 57+640.00	2.9	2.04	20.41	537.62
PR 57+650.00	7.0	4.96	49.60	587.22
PR 57+660.00	1.4	4.19	41.91	629.13
PR 57+670.00	0.0	0.68	6.81	635.93
		PAGO ACTA 44		635.93

REVISADO POR CONTRATISTA		APROBADO POR INTERVENTORÍA
	INGENIERO RESIDENTE	INGENIERO RESIDENTE
NOMBRES:	MIGUEL ANGEL PARRA	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA:		

Consorcio Vías Nacionales	Excavación en roca de la explanación y canales	ITEM 210.2.1

PROYECTO:	CONTRATO No. 0378-2021 "Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental Sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vías para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

1	DATOS DE ELABORCIÓN DE REGISTRO

FECHA DE ELABORACIÓN:	30/01/2025		
RUTA 64-04	EXCAVACION EN ROCA	PR 0+218 A 0+260	MARGEN : DERECHA / IZQUIERDA

CANTIDADES CORTE EN ROCA BOCHE

Abscisa	Área de Corte	Área Promedio	Volumen de Corte	Vol. Corte acumul.
PR 0+218.00	1.159			0.00
PR 0+220.00	14.841	8.00	16.00	16.00
PR 0+230.00	13.606	14.22	142.24	158.24
PR 0+240.00	14.332	13.97	139.69	297.93
PR 0+250.00	19.387	16.86	168.60	466.52
PR 0+260.00	14.452	16.92	169.20	635.72
		PAGO ACTA 44		635.72

REVISADO POR CONTRATISTA		APROBADO POR INTERVENTORÍA
	INGENIERO RESIDENTE	INGENIERO RESIDENTE
NOMBRES:	MIGUEL ANGEL PARRA	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA:		

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA	Cód: F-EO-009
		Versión: 001
	CONTRATO 0978 DE 2021	Fecha: 02/01/2020
		Pág: 1 de 1

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	31	**MM**	1	**AA**	2,025	**PERIODO:**	1 de enero de 2025		31 de enero de 2025			
CONTRATO:	0978 DE 2021						**OBJETO CONTRATO:**	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4					
CONTRATANTE:	INVIAS				**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA			**ACUMULADO ANTERIOR:**		**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES									78,480.00		2,672.00	81,152.00
ITEM:	210.2.2	GRUPO DE AJUSTE	11601	ESPECIF. GENERAL	210-13	ESPECIF. PARTICULAR		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales		**UNID:**	m3	**UBICACIÓN:**	**RUTA 6404 Y 6405**

ESQUEMA	LOCALIZACIÓN				LONGITUD	MARGEN	AREA	DESCRIPCIÓN	VOLUMEN
	-	PR20+880	PR20+940	SACAMA	60.00	DER	2.67	EXPLANACIÓN (ACTA 43)	- 160.40
	-	PR21+160	PR21+250	SACAMA	90.00	DER	0.63	EXPLANACIÓN (ACTA 43)	- 57.12
	-	PR21+410	PR21+460	SACAMA	50.00	DER	2.30	EXPLANACIÓN (ACTA 43)	- 114.86
	-	PR21+900	PR22+070	SACAMA	170.00	DER	0.59	EXPLANACIÓN (ACTA 43)	- 100.63
	-	PR30+300	PR30+300	SOCHA	42.00	DER - IZQ	32.38	EXPLANACIÓN	1,360.02
	-	PR50+580	PR50+760	SOCOTA	180.00	DER	3.41	EXPLANACIÓN	613.82
	-	PR60+682	PR60+689	SOCOTA	6.53	DER	2.57	MEJORAMIENTO SUBRASANTE	16.81
	-	PR20+880	PR20+940	SACAMA	60.00	DER	5.03	EXPLANACIÓN	301.80
	-	PR21+150	PR21+250	SACAMA	100.00	DER	0.93	EXPLANACIÓN	93.05
	-	PR21+140	PR21+440	SACAMA	300.00	DER	0.19	EXPLANACIÓN	57.85
	-	PR21+850	PR22+070	SACAMA	220.00	DER	1.25	EXPLANACIÓN	274.55
	-	PR21+420	PR21+500	SACAMA	80.00	IZQ	2.45	MEJORAMIENTO SUBRASANTE	195.85
	-	PR21+500	PR21+590	SACAMA	90.00	IZQ	0.89	MEJORAMIENTO SUBRASANTE	80.30
	-	PR21+600	PR21+690	SACAMA	90.00	DER	1.23	MEJORAMIENTO SUBRASANTE	110.70
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-
								Subtotal	**2,672.00**
								TOTAL	**2,672.00**

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA	INTERVENTORIA	INTERVENTORIA
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: MIGUEL ANGEL PARRA CONSORCIO VIAS NACIONALES	NOMBRE: OSCAR HUMBERTO POLO CONSORCIO VÍAS NACIONALES	NOMBRE: DIEGO FERNANDO RUANO FONSECA CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA	NOMBRE: WILLIAM DARIO MORENO CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA

Consorcio Vías Nacionales	Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	ITEM 210.2.2

PROYECTO:	CONTRATO No. 0370-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

1	DATOS DE ELABORCIÓN DE REGISTRO

FECHA DE ELABORACIÓN:	30/01/2025		
RUTA 64-04	CORTE TALUD	PR 0+218 A 0+260	MARGEN : DERECHA / IZQUIERDA

CANTIDADES CORTE TALUD BOCHE				
Abscisa	Área de Corte	Área Promedio	Volumen de Corte	Vol. Corte acumul.
PR 0+218.00	11.501			0.00
PR 0+220.00	15.379	13.44	26.88	26.88
PR 0+230.00	46.524	30.95	309.52	336.40
PR 0+240.00	41.058	43.79	437.91	774.31
PR 0+250.00	25.373	33.22	332.16	1106.46
PR 0+260.00	25.338	25.36	253.56	1360.02
			PAGO ACTA 44	1360.02

REVISADO POR CONTRATISTA		APROBADO POR INTERVENTORÍA
	INGENIERO RESIDENTE	INGENIERO RESIDENTE
NOMBRES:	MIGUEL ANGEL PARRA	DIEGO JUANO FONSECA
FIRMA:		

Consorcio Vías Nacionales	Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	ITEM 210.2.2
PROYECTO:	CONTRATO No. 0970-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vías para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"	

1	DATOS DE ELABORCIÓN DE REGISTRO

FECHA DE ELABORACIÓN:	30/01/2025		
RUTA 64-04	CORTE TALUD	PR 50+580 A 50+760	MARGEN : DERECHA

CANTIDADES CORTE TALUD

Abscisa	Área de Corte	Área Promedio	Volumen de Corte	Vol. Corte acumul.
PR 50+580.00	1.3			0.00
PR 50+590.00	2.59	1.95	19.45	19.45
PR 50+600.00	2.26	2.43	24.25	43.70
PR 50+610.00	1.4	1.83	18.30	62.00
PR 50+620.00	0.81	1.11	11.05	73.05
PR 50+630.00	0.88	0.85	8.45	81.50
PR 50+640.00	2.28	1.58	15.80	97.30
PR 50+650.00	2.5	2.38	23.75	121.05
PR 50+660.00	3.5	3.00	30.00	151.05
PR 50+670.00	5.7	4.62	46.15	197.20
PR 50+680.00	9.0	7.36	73.60	270.80
PR 50+690.00	10.1	9.55	95.45	366.25
PR 50+700.00	4.5	7.28	72.80	439.05
PR 50+710.00	4.13	4.31	43.10	482.15
PR 50+720.00	3.30	3.72	37.15	519.30
PR 50+730.00	2.10	2.70	27.00	546.30
PR 50+740.00	2.91	2.51	25.05	571.35
PR 50+750.00	1.83	2.37	23.70	595.05
PR 50+760.00	0.95	1.39	13.90	608.95
PR 50+770.00	0.02	0.49	4.87	613.82
		PAGO ACTA 44		613.82

REVISADO POR CONTRATISTA		APROBADO POR INTERVENTORÍA
	INGENIERO RESIDENTE	INGENIERO RESIDENTE
NOMBRES:	MIGUEL ANGEL PARRA	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA:		

Consorcio Vías Nacionales	Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	ITEM 210.2.2

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

1	DATOS DE ELABORCIÓN DE REGISTRO

FECHA DE ELABORACIÓN:	30/12/2024		
RUTA 64-04	EXCAVACION	60+682.47 A 60+689	MARGEN : DERECHA

CANTIDADES CORTE CAJEO MEJORAMIENTO SUB RASANTE CAJA

Abscisa	Área de Corte	Área Promedio	Volumen de Corte	Vol. Corte acumul.
PR 60+682.47	0.729	0.36		
PR 60+683.00	1.345	1.04	0.55	0.55
PR 60+684.00	1.569	1.46	1.46	2.00
PR 60+685.00	3.09	2.33	2.33	4.33
PR 60+686.00	3.34	3.22	3.22	7.55
PR 60+687.00	3.45	3.39	3.39	10.94
PR 60+688.00	3.5	3.50	3.50	14.44
PR 60+689.00	1.20	2.37	2.37	16.81
		VOLUMEN TOTAL EXCAVACION		16.81

REVISADO POR CONTRATISTA		APROBADO POR INTERVENTORÍA
	INGENIERO RESIDENTE	INGENIERO RESIDENTE
NOMBRES:	MIGUEL ANGEL PARRA	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA:		

Consorcio Vías Nacionales

CONTROL Y REGISTRO EXCAVACIONES EN MATERIAL COMUN DE MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vías para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

1	DATOS DE ELABORCIÓN DE REGISTRO

FECHA DE ELABORACIÓN:	30/12/2024		
RUTA 64-05	EXCAVACION	PR 20+880 al PR 20+940	MARGEN : DERECHO

CANTIDADES EXCAVACION EXPLANACION

Abscisa	Área de EXCAVACION	Área Promedio	Volumen de Explanacion	Vol. Explanacion acumul.
		CORTE TALUD		
PR 20+880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PR 20+890.00	3.02	1.51	15.10	15.10
PR 20+900.00	6.58	4.80	48.00	63.10
PR 20+910.00	6.96	6.77	67.70	130.80
PR 20+920.00	10.52	8.74	87.40	218.20
PR 20+930.00	3.03	6.78	67.75	285.95
PR 20+940.00	0.14	1.59	15.85	301.80
		VOLUMEN TOTAL EXPLANACION		301.80

REVISADO POR CONTRATISTA			APROBADO POR INTERVENTORÍA	
TOPOGRAFÍA		INGENIERO RESIDENTE	VoBo	INGENIERO RESIDENTE
NOMBRES:	NESTOR DIAZ	OSCAR POLO	HEDI MORALES	WILLIAM DARIO MORENO RICAURTE
FIRMA:				

OBSERVACION

Consorcio Vías Nacionales

CONTROL Y REGISTRO EXCAVACIONES EN MATERIAL COMUN DE MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vías para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

1	DATOS DE ELABORCIÓN DE REGISTRO

FECHA DE ELABORACIÓN:	30/12/2024		
RUTA 64-05	EXCAVACION	PR 21+150 al PR 21+250	MARGEN : DERECHO

CANTIDADES EXCAVACION EXPLANACION

Abscisa	Área de EXCAVACION	Área Promedio	Volumen de Explanacion	Vol. Explanacion acumul.
CORTE TALUD				
PR 21+160.00	1.43	0.72	7.15	0.00
PR 21+170.00	0.35	0.89	8.90	8.90
PR 21+180.00	0.24	0.30	2.95	11.85
PR 21+190.00	0.80	0.52	5.20	17.05
PR 21+200.00	1.64	1.22	12.20	29.25
PR 21+210.00	2.08	1.86	18.60	47.85
PR 21+220.00	2.13	2.11	21.05	68.90
PR 21+230.00	0.88	1.51	15.05	83.95
PR 21+240.00	0.47	0.68	6.75	90.70
PR 21+250.00	0.00	0.24	2.35	93.05
		VOLUMEN TOTAL EXPLANACION		93.05

REVISADO POR CONTRATISTA			APROBADO POR INTERVENTORÍA	
TOPOGRAFÍA		INGENIERO RESIDENTE	VoBo	INGENIERO RESIDENTE
NOMBRES:	NESTOR DIAZ	OSCAR POLO	HEDI MORALES	WILLIAM DARIO MORENO RICAURTE
FIRMA:	Nestor A Diaz	OPolo		

OBSERVACION

Consorcio Vías Nacionales

CONTROL Y REGISTRO EXCAVACIONES EN MATERIAL COMUN DE MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vías para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

1	DATOS DE ELABORCIÓN DE REGISTRO

FECHA DE ELABORACIÓN:	30/12/2024		
RUTA 64-05	EXCAVACION	PR 21+410 al PR 21+440	MARGEN : DERECHO

CANTIDADES EXCAVACION EXPLANACION

Abscisa	Área de EXCAVACION	Área Promedio	Volumen de Explanacion	Vol. Explanacion acumul.
		CORTE TALUD		
PR 21+410.00	1.02	0.51	0.00	0.00
PR 21+420.00	1.90	1.46	14.60	14.60
PR 21+430.00	3.36	2.63	26.30	40.90
PR 21+440.00	0.03	1.70	16.95	57.85
		VOLUMEN TOTAL EXPLANACION		57.85

REVISADO POR CONTRATISTA			APROBADO POR INTERVENTORÍA	
TOPOGRAFÍA		INGENIERO RESIDENTE	VoBo	INGENIERO RESIDENTE
NOMBRES:	NESTOR DIAZ	OSCAR POLO	HEDI MORALES	WILLIAM DARIO MORENO RICAURTE
FIRMA:				

OBSERVACION

Consorcio Vías Nacionales

CONTROL Y REGISTRO EXCAVACIONES EN MATERIAL COMUN DE MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vías para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

1 DATOS DE ELABORCIÓN DE REGISTRO

FECHA DE ELABORACIÓN:	30/12/2024		
RUTA 64-05	EXCAVACION	PR 21+850 al PR 22+070	MARGEN : DERECHO

CANTIDADES EXCAVACION EXPLANACION

Abscisa	Área de EXCAVACION	Área Promedio	Volumen de Explanacion	Vol. Explanacion acumul.
		CORTE TALUD		
PR 21+900.00	1.55	0.78	0.00	0.00
PR 21+910.00	1.01	1.28	12.80	12.80
PR 21+920.00	0.15	0.58	5.80	18.60
PR 21+930.00	0.39	0.27	2.70	21.30
PR 21+940.00	1.45	0.92	9.20	30.50
PR 21+950.00	2.66	2.06	20.55	51.05
PR 21+960.00	2.00	2.33	23.30	74.35
PR 21+970.00	1.07	1.54	15.35	89.70
PR 21+980.00	1.27	1.17	11.70	101.40
PR 21+990.00	1.09	1.18	11.80	113.20
PR 22+000.00	0.28	0.69	6.85	120.05
PR 22+010.00	1.97	1.13	11.25	131.30
PR 22+020.00	3.71	2.84	28.40	159.70
PR 22+030.00	3.75	3.73	37.30	197.00
PR 22+040.00	2.28	3.02	30.15	227.15
PR 22+050.00	2.48	2.38	23.80	250.95
PR 22+060.00	1.07	1.78	17.75	268.70
PR 22+070.00	0.00	0.54	5.35	274.55
		VOLUMEN TOTAL EXPLANACION		274.55

REVISADO POR CONTRATISTA			APROBADO POR INTERVENTORÍA	
TOPOGRAFÍA		INGENIERO RESIDENTE	VoBo	INGENIERO RESIDENTE
NOMBRES:	NESTOR DIAZ	OSCAR POLO	HEDI MORALES	WILLIAM DARIO MORENO RICAURTE
FIRMA:				

OBSERVACION

Consorcio Vías Nacionales

CONTROL Y REGISTRO EXCAVACIONES EN MATERIAL COMUN DE MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vías para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

1 DATOS DE ELABORCIÓN DE REGISTRO

FECHA DE ELABORACIÓN:	25/01/2025		
RUTA 64-05	EXCAVACION	PR 21+420 al PR 21+500	MARGEN : IZQUIERDO

CANTIDADES EXCAVACION EXPLANACION

Abscisa	Área de EXCAVACION	Área Promedio	Volumen de Explanacion	Vol. Explanacion acumul.
CAJEO PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE				
PR 21+420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PR 21+430.00	1.84	0.92	9.20	9.20
PR 21+440.00	2.41	2.13	21.25	30.45
PR 21+450.00	2.25	2.33	23.30	53.75
PR 21+460.00	2.72	2.49	24.85	78.60
PR 21+470.00	4.34	3.53	35.30	113.90
PR 21+480.00	2.82	3.58	35.80	149.70
PR 21+490.00	2.32	2.57	25.70	175.40
PR 21+500.00	1.77	2.05	20.45	195.85
			VOLUMEN TOTAL EXPLANACION	195.85

REVISADO POR CONTRATISTA		APROBADO POR INTERVENTORÍA	
TOPOGRAFÍA	INGENIERO RESIDENTE	VoBo	INGENIERO RESIDENTE
NOMBRES: NESTOR DIAZ	OSCAR POLO	HEDI MORALES	WILLIAM DARIO MORENO RICAURTE
FIRMA:			

OBSERVACION: AREA DE CALCULO TOMADA DE LAS SECCIONES TRANSVERSALES REALIZADAS EN PROGRAMA DE DISEÑO CAD

Consorcio Vías Nacionales

CONTROL Y REGISTRO EXCAVACIONES EN MATERIAL COMUN DE MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vías para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

1	DATOS DE ELABORCIÓN DE REGISTRO

FECHA DE ELABORACIÓN:	25/01/2025		
RUTA 64-05	EXCAVACION	PR 21+500 al PR 21+590	MARGEN : IZQUIERDO

CANTIDADES EXCAVACION EXPLANACION

Abscisa	Área de EXCAVACION	Área Promedio	Volumen de Explanacion	Vol. Explanacion acumul.
CAJEO PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE				
PR 21+500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PR 21+510.00	0.50	0.25	2.50	2.50
PR 21+520.00	1.03	0.77	7.65	10.15
PR 21+530.00	1.64	1.34	13.35	23.50
PR 21+540.00	1.51	1.58	15.75	39.25
PR 21+550.00	1.16	1.34	13.35	52.60
PR 21+560.00	0.69	0.93	9.25	61.85
PR 21+570.00	0.90	0.80	7.95	69.80
PR 21+580.00	0.50	0.70	7.00	76.80
PR 21+590.00	0.20	0.35	3.50	80.30
		VOLUMEN TOTAL EXPLANACION		80.30

REVISADO POR CONTRATISTA			APROBADO POR INTERVENTORÍA	
TOPOGRAFÍA		INGENIERO RESIDENTE	VoBo	INGENIERO RESIDENTE
NOMBRES:	NESTOR DIAZ	OSCAR POLO	HEDI MORALES	WILLIAM DARIO MORENO RICAURTE
FIRMA:				

OBSERVACION: AREA DE CALCULO TOMADA DE LAS SECCIONES TRANSVERSALES REALIZADAS EN PROGRAMA DE DISEÑO CAD

Consorcio Vías Nacionales

CONTROL Y REGISTRO EXCAVACIONES EN MATERIAL COMUN DE MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vías para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

1 DATOS DE ELABORCIÓN DE REGISTRO

FECHA DE ELABORACIÓN:	25/01/2025		
RUTA 64-05	EXCAVACION	PR 21+600 al PR 21+690	MARGEN : DERECHO

CANTIDADES EXCAVACION EXPLANACION

Abscisa	Área de EXCAVACION	Área Promedio	Volumen de Explanacion	Vol. Explanacion acumul.
CAJEO PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE				
PR 21+600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PR 21+610.00	1.38	0.69	6.90	6.90
PR 21+620.00	1.83	1.61	16.05	22.95
PR 21+630.00	1.47	1.65	16.50	39.45
PR 21+640.00	1.64	1.56	15.55	55.00
PR 21+650.00	1.45	1.55	15.45	70.45
PR 21+660.00	1.23	1.34	13.40	83.85
PR 21+670.00	1.02	1.13	11.25	95.10
PR 21+680.00	1.05	1.04	10.35	105.45
PR 21+690.00	0.00	0.53	5.25	110.70
		VOLUMEN TOTAL EXPLANACION		110.70

REVISADO POR CONTRATISTA			APROBADO POR INTERVENTORÍA	
TOPOGRAFÍA		INGENIERO RESIDENTE	VoBo	INGENIERO RESIDENTE
NOMBRES:	NESTOR DIAZ	OSCAR POLO	HEDI MORALES	WILLIAM DARIO MORENO RICAURTE
FIRMA:				

OBSERVACION: AREA DE CALCULO TOMADA DE LAS SECCIONES TRANSVERSALES REALIZADAS EN PROGRAMA DE DISEÑO CAD

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA	Cód: F-EO-009
		Versión: 001
	CONTRATO 0978 DE 2021	Fecha: 02/01/2020
		Pág: 1 de 1

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	31	**MM**	1	**AA**	2,025	**PERIODO:**	1 de enero de 2025		31 de enero de 2025			
CONTRATO:	0978 DE 2021						**OBJETO CONTRATO:**	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4					
CONTRATANTE:	INVIAS				**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA			**ACUMULADO ANTERIOR:**		**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES									51,419.70		104.00	51,523.70
ITEM:	311.10	GRUPO DE AJUSTE	11602	ESPECIF. GENERAL	311-13	ESPECIF. PARTICULAR		Afirmado		**UNID:**	m3	**UBICACIÓN:**	**RUTA 6404**

ESQUEMA

LOCALIZACIÓN									
FECHA	**ABSCISA INICIO**	**ABSCISA FIN**	**MUNICIPIO**	**LONGITUD**	**ANCHO**	**AREA**	**ESPESOR**	**DESCRIPCIÓN**	**VOLUMEN TOTAL**
-	PR30+300	PR30+300	SOCHA	30.96	-	-	-	OBRAS DE MITIGACIÓN	103.97
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-
								Subtotal	**104.00**
								TOTAL	**104.00**

RESIDENTE DE OBRA

FIRMA:

NOMBRE: MIGUEL ANGEL PARRA
CONSORCIO VIAS NACIONALES

INTERVENTORIA

FIRMA:

NOMBRE: DIEGO FERNANDO RUANO FONSECA
CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA

Consorcio Vías Nacionales	(AFIRMADO)	ITEM 311.1

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

60+001	DATOS DE ELABORCIÓN DE REGISTRO

FECHA DE ELABORACIÓN:	30/01/2025		
RUTA 64-04	AFIRMADO OBRA MITIGACION	0+284.58 A 0+315.54	MARGEN :IZQUIERDA-DERECHA

Abscisa	Área de LLENO	Área Promedio	Volumen de lleno	Vol. lleno acumul.
PR 0+284.58	8.23			
PR 0+287.57	11.04	9.63	28.80	28.80
PR 0+292.56	13.77	12.41	61.90	90.71
PR 0+297.57	15.27	14.52	72.76	163.46
PR 0+302.57	13.26	14.26	71.32	234.78
PR 0+307.60	9.34	11.30	56.83	291.61
PR 0+312.58	6.45	7.90	39.32	330.93
PR 0+315.54	5.74	6.10	18.04	348.97
		VOLUMEN TOTAL LLENO AFIRMADO		348.97
		PAGO PARCIAL ACTA # 41		245.00
		PAGO PARCIAL ACTA # 44		103.97

REVISADO POR CONTRATISTA		APROBADO POR INTERVENTORÍA
	INGENIERO RESIDENTE	INGENIERO RESIDENTE
NOMBRES:	MIGUEL ANGEL PARRA	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA:		

OBSERVACION

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA	Cód: F-EO-009
		Versión: 001
	CONTRATO 0978 DE 2021	Fecha: 02/01/2020
		Pág: 1 de 1

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	31	**MM**	1	**AA**	2,025	**PERIODO:**	1 de enero de 2025		31 de enero de 2025			
CONTRATO:	0978 DE 2021						**OBJETO CONTRATO:**	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4					
CONTRATANTE:	INVIAS				**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA		**ACUMULADO ANTERIOR:**		**PRESENTE ACTA:**		**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES								1,062.50		613.30		1,675.80
ITEM:	320.1	GRUPO DE AJUSTE	11602	ESPECIF. GENERAL	330-13	ESPECIF. PARTICULAR		Subbase Granular clase A	**UNID:**	m3		**UBICACIÓN:**	**RUTA 6404**

ESQUEMA	**LOCALIZACIÓN**				**LONGITUD**	**AREA**	**DESCRIPCIÓN**	**VOLUMEN**
	-	PR57+170	PR57+300	SOCOTA	130.00	2.24	SUBBASE GRANULAR SUBRASANTE	291.81
	-	PR60+990	PR61+030	SOCOTA	40.00	2.68	SUBBASE GRANULAR SUBRASANTE	107.35
	-	PR61+330	PR61+490	SOCOTA	160.00	1.34	SUBBASE GRANULAR SUBRASANTE	214.15
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
							Subtotal	**613.30**
							TOTAL	**613.30**

RESIDENTE DE OBRA

FIRMA:

NOMBRE: MIGUEL ANGEL NARRA
CONSORCIO VIAS NACIONALES

INTERVENTORIA

FIRMA:

NOMBRE: DIEGO FERNANDO RUANO FONSECA
CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA

Consorcio Vías Nacionales	SUB BASE	ITEM 320.1

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: **Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"**

60+001	DATOS DE ELABORCIÓN DE REGISTRO

FECHA DE ELABORACIÓN:	30/01/2025		
RUTA 64-04	SUB BASE	PR 57+170 A 57+300	MARGEN :IZQUIERDA/DERECHA

CONTROL Y REGISTRO DE MEJORAMIENTO A SUB RASANTE

Abscisa	Área de LLENO	Área Promedio	Volumen de lleno	Vol. lleno acumul.
PR 57+170.00	4.012			
PR 57+180.00	5.132	4.57	45.72	45.72
PR 57+190.00	3.912	4.52	45.22	90.94
PR 57+200.00	2.312	3.11	31.12	122.06
PR 57+210.00	1.532	1.92	19.22	141.28
PR 57+220.00	1.672	1.60	16.02	157.30
PR 57+230.00	2.792	2.23	22.32	179.62
PR 57+240.00	2.082	2.44	24.37	203.99
PR 57+250.00	1.152	1.62	16.17	220.16
PR 57+260.00	0.682	0.92	9.17	229.33
PR 57+270.00	1.252	0.97	9.67	239.00
PR 57+280.00	2.262	1.76	17.57	256.57
PR 57+290.00	2.032	2.15	21.47	278.04
PR 57+300.00	0.722	1.38	13.77	291.81
		VOLUMEN LLENO AFIRMADO		**291.81**

	REVISADO POR CONTRATISTA	APROBADO POR INTERVENTORÍA
	INGENIERO RESIDENTE	INGENIERO RESIDENTE
NOMBRES:	MIGUEL ANGEL PARRA	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA:		

OBSERVACION

Consorcio Vías Nacionales	SUB BASE	ITEM 320.1

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

60+001	DATOS DE ELABORCIÓN DE REGISTRO

FECHA DE ELABORACIÓN:	30/01/2025		
RUTA 64-04	SUB BASE	PR 60+990 A 61+030	MARGEN :IZQUIERDA/DERECHA

CONTROL Y REGISTRO DE MEJORAMIENTO A SUB RASANTE

Abscisa	Área de LLENO	Área Promedio	Volumen de lleno	Vol. lleno acumul.
PR 60+990.00	0.63			
PR 61+000.00	1.67	1.15	11.5	11.50
PR 61+010.00	2.62	2.15	21.45	32.95
PR 61+020.00	4.08	3.35	33.5	66.45
PR 61+030.00	4.1	4.09	40.9	107.35
		VOLUMEN LLENO SUB BASE		107.35

	REVISADO POR CONTRATISTA	APROBADO POR INTERVENTORÍA
	INGENIERO RESIDENTE	INGENIERO RESIDENTE
NOMBRES:	MIGUEL ANGEL PARRA	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA:		

OBSERVACION

Consorcio Vías Nacionales	Subbase Granular clase A	ITEM 320.1

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

DATOS DE ELABORCIÓN DE REGISTRO

FECHA DE ELABORACIÓN:	30/11/2024		
RUTA 64-04	BASE (SUB RASANTE)	PR 61+330 a 61+490	MARGEN : DERECHA-IZQUIERDA

CONTROL Y REGISTRO DE MEJORAMIENTO DE A RASANTE

Abscisa	Área de LLENO	Área Promedio	Volumen de lleno	Vol. lleno acumul.
PR 61+330.00	1.77	0.89		
PR 61+340.00	1.79	1.78	17.8	17.80
PR 61+350.00	0.93	1.36	13.6	31.40
PR 61+360.00	1.73	1.33	13.3	44.70
PR 61+370.00	0.75	1.24	12.4	57.10
PR 61+380.00	0.41	0.58	5.8	62.90
PR 61+390.00	0.2	0.31	3.05	65.95
PR 61+400.00	0.07	0.14	1.35	67.30
PR 61+410.00	0.01	0.04	0.4	67.70
PR 61+420.00	0.34	0.18	1.75	69.45
PR 61+430.00	0.17	0.26	2.55	72.00
PR 61+440.00	1.7	0.94	9.35	81.35
PR 61+450.00	4.08	2.89	28.9	110.25
PR 61+460.00	2.6	3.34	33.4	143.65
PR 61+470.00	2.2	2.40	24	167.65
PR 61+480.00	2.4	2.30	23	190.65
PR 61+490.00	2.3	2.35	23.5	214.15
		VOLUMEN TOTAL BASE		214.15

REVISADO POR CONTRATISTA		APROBADO POR INTERVENTORÍA
	INGENIERO RESIDENTE	INGENIERO RESIDENTE
NOMBRES:	MIGUEL ANGEL PARRA	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA:		
OBSERVACION		

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA	Cód: F-EO-009
		Versión: 001
	CONTRATO 0978 DE 2021	Fecha: 02/01/2020
		Pág: 1 de 1

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	31	**MM**	1	**AA**	2,025	**PERIODO:**	1 de enero de 2025		31 de enero de 2025			
CONTRATO:	0978 DE 2021						**OBJETO CONTRATO:**	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4					
CONTRATANTE:	INVIAS				**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA			**ACUMULADO ANTERIOR:**		**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES									34,029.60		252.10	34,281.70
ITEM:	330.10	GRUPO DE AJUSTE	11602	ESPECIF. GENERAL	330-13	ESPECIF. PARTICULAR		Base granular clase A		**UNID:**	m3	**UBICACIÓN:**	**RUTA 6404**

ESQUEMA

LOCALIZACIÓN				LONGITUD	AREA	DESCRIPCIÓN	VOLUMEN
-	PR60+300	PR60+430	SOCOTA	130.00	1.95	BASE GRANULAR RASANTE (ACTA 43)	- 253.50
-	PR60+480	PR60+580	SOCOTA	100.00	1.95	BASE GRANULAR RASANTE (ACTA 43)	- 195.00
-	PR60+660	PR60+690	SOCOTA	30.00	1.95	BASE GRANULAR RASANTE (ACTA 43)	- 58.50
-	PR60+770	PR60+798	SOCOTA	28.00	1.95	BASE GRANULAR RASANTE (ACTA 43)	- 54.60
-	PR60+990	PR61+010	SOCOTA	20.00	1.95	BASE GRANULAR RASANTE (ACTA 43)	- 39.00
-	PR61+330	PR61+480	SOCOTA	150.00	1.95	BASE GRANULAR RASANTE (ACTA 43)	- 292.50
-	PR57+170	PR57+300	SOCOTA	130.00	0.94	BASE GRANULAR RASANTE	122.45
-	PR59+770	PR59+880	SOCOTA	110.00	2.05	BASE GRANULAR RASANTE	224.98
-	PR59+990	PR60+100	SOCOTA	110.00	2.11	BASE GRANULAR RASANTE	232.07
-	PR60+990	PR61+030	SOCOTA	40.00	2.78	BASE GRANULAR RASANTE	111.00
-	PR61+330	PR61+490	SOCOTA	160.00	0.78	BASE GRANULAR SUBRASANTE	125.59
-	PR61+330	PR61+490	SOCOTA	160.00	2.06	BASE GRANULAR RASANTE	329.15
-	-	-	-	-	-	-	-
							-
						Subtotal	**252.10**
						TOTAL	**252.10**

RESIDENTE DE OBRA

FIRMA:

NOMBRE: MIGUEL ANGEL PARRA
CONSORCIO VIAS NACIONALES

INTERVENTORIA

FIRMA:

NOMBRE: DIEGO FERNANDO RUANO FONSECA
CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA

Consorcio Vías Nacionales	Base granular clase A	ITEM 330.1

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

DATOS DE ELABORCIÓN DE REGISTRO

FECHA DE ELABORACIÓN:	30/01/2025		
RUTA 64-04	BASE (RASANTE)	PR 57+170 A 57+300	MARGEN : DERECHA-IZQUIERDA

CONTROL Y REGISTRO DE MEJORAMIENTO DE A RASANTE

Abscisa	Área de LLENO	Área Promedio	Volumen de lleno	Vol. lleno acumul.
PR 57+170.00	1.01	0.51		
PR 57+180.00	1.02	1.02	10.15	10.15
PR 57+190.00	1.01	1.02	10.15	20.30
PR 57+200.00	0.92	0.97	9.65	29.95
PR 57+210.00	0.89	0.91	9.05	39.00
PR 57+220.00	0.91	0.90	9.00	48.00
PR 57+230.00	0.94	0.93	9.25	57.25
PR 57+240.00	0.94	0.94	9.40	66.65
PR 57+250.00	0.93	0.94	9.35	76.00
PR 57+260.00	0.91	0.92	9.20	85.20
PR 57+270.00	0.91	0.91	9.10	94.30
PR 57+280.00	0.94	0.93	9.25	103.55
PR 57+290.00	0.95	0.95	9.45	113.00
PR 57+300.00	0.94	0.95	9.45	122.45

VOLUMEN TOTAL BASE	122.45

	REVISADO POR CONTRATISTA	APROBADO POR INTERVENTORÍA
	INGENIERO RESIDENTE	INGENIERO RESIDENTE
NOMBRES:	MIGUEL ANGEL PARRA	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA:		

OBSERVACION

Consorcio Vías Nacionales	Base granular clase A	ITEM 330.1

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

DATOS DE ELABORCIÓN DE REGISTRO

FECHA DE ELABORACIÓN:	30/01/2025		
RUTA 64-04	BASE (RASANTE)	PR 59++770 A 59+880	MARGEN : DERECHA-IZQUIERDA

CONTROL Y REGISTRO DE MEJORAMIENTO DE A RASANTE

Abscisa	Área de LLENO	Área Promedio	Volumen de lleno	Vol. lleno acumul.
PR 59+770.00	2.09	1.05		
PR 59+780.00	2.10	2.10	20.98	20.98
PR 59+790.00	2.10	2.10	21.03	42.01
PR 59+800.00	2.10	2.10	21.03	63.03
PR 59+810.00	2.10	2.10	21.03	84.06
PR 59+820.00	2.10	2.10	21.03	105.08
PR 59+830.00	2.06	2.08	20.80	125.88
PR 59+840.00	2.00	2.03	20.30	146.18
PR 59+850.00	1.96	1.98	19.84	166.03
PR 59+860.00	1.97	1.96	19.65	185.68
PR 59+870.00	1.97	1.97	19.65	205.33
PR 59+880.00	1.97	1.97	19.65	224.98

VOLUMEN TOTAL BASE	224,98

REVISADO POR CONTRATISTA		APROBADO POR INTERVENTORÍA
	INGENIERO RESIDENTE	INGENIERO RESIDENTE
NOMBRES:	MIGUEL ANGEL PARRA	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA:		

OBSERVACION

Consorcio Vías Nacionales	Base granular clase A	ITEM 330.1

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Arlporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vías para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

DATOS DE ELABORCIÓN DE REGISTRO

FECHA DE ELABORACIÓN:	30/01/2025		
RUTA 64-04	BASE (RASANTE)	PR 59+990 A 60+050	MARGEN : DERECHA-IZQUIERDA

CONTROL Y REGISTRO DE MEJORAMIENTO DE A RASANTE

Abscisa	Area de LLENO	Area Promedio	Volumen de lleno	Vol. lleno acumul.
PR 59+990.00	2.03	1.01		
PR 60+000.00	2.03	2.03	20.27	20.27
PR 60+010.00	2.02	2.03	20.26	40.54
PR 60+020.00	1.98	2.00	20.03	60.57
PR 60+030.00	1.96	1.97	19.71	80.28
PR 60+040.00	1.96	1.96	19.63	99.91
PR 60+050.00	2.14	2.05	20.55	120.46
PR 60+060.00	2.38	2.26	22.61	143.07
PR 60+070.00	2.38	2.38	23.77	166.85
PR 60+080.00	2.33	2.35	23.55	190.39
PR 60+090.00	2.02	2.18	21.75	212.15
PR 60+100.00	1.96	1.99	19.92	232.07

VOLUMEN TOTAL BASE	232.07

REVISADO POR CONTRATISTA		APROBADO POR INTERVENTORÍA
	INGENIERO RESIDENTE	INGENIERO RESIDENTE
NOMBRES:	MIGUEL ANGEL PARRA	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA:		

OBSERVACION

Consorcio Vías Nacionales	Base granular clase A	ITEM 330.1

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vías para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

DATOS DE ELABORCIÓN DE REGISTRO

FECHA DE ELABORACIÓN:	30/01/2025		
RUTA 64-04	BASE (RASANTE)	PR 60+990 A 61+030	MARGEN : DERECHA-IZQUIERDA

CONTROL Y REGISTRO DE MEJORAMIENTO DE A RASANTE

Abscisa	Área de LLENO	Área Promedio	Volumen de lleno	Vol. lleno acumul.
PR 60+990.00	2.77	1.39		
PR 61+000.00	2.77	2.77	27.75	27.75
PR 61+010.00	2.77	2.77	27.75	55.50
PR 61+020.00	2.77	2.77	27.75	83.25
PR 61+030.00	2.77	2.77	27.75	111.00

VOLUMEN TOTAL BASE	111.00

REVISADO POR CONTRATISTA		APROBADO POR INTERVENTORÍA
	INGENIERO RESIDENTE	INGENIERO RESIDENTE
NOMBRES:	MIGUEL ANGEL PARRA	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA:		

OBSERVACION

Consorcio Vías Nacionales	Base granular clase A	ITEM 330.1

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

DATOS DE ELABORCIÓN DE REGISTRO

FECHA DE ELABORACIÓN:	30/11/2024		
RUTA 64-04	BASE (SUB RASANTE)	PR 61+330 A 61+490	MARGEN : DERECHA-IZQUIERDA

CONTROL Y REGISTRO DE MEJORAMIENTO DE A RASANTE

Abscisa	Área de LLENO	Área Promedio	Volumen de lleno	Vol. lleno acumul.
PR 61+330.00	0.704	0.35		
PR 61+340.00	0.84	0.77	7.72	7.72
PR 61+350.00	0.97	0.91	9.05	16.77
PR 61+360.00	0.94	0.96	9.55	26.32
PR 61+370.00	0.76	0.85	8.5	34.82
PR 61+380.00	0.68	0.72	7.2	42.02
PR 61+390.00	0.714	0.70	6.97	48.99
PR 61+400.00	0.42	0.57	5.67	54.66
PR 61+410.00	0.47	0.45	4.45	59.11
PR 61+420.00	0.412	0.44	4.41	63.52
PR 61+430.00	0.888	0.65	6.5	70.02
PR 61+440.00	0.913	0.90	9.005	79.03
PR 61+450.00	0.95	0.93	9.315	88.34
PR 61+460.00	0.95	0.95	9.5	97.84
PR 61+470.00	0.95	0.95	9.5	107.34
PR 61+480.00	0.91	0.93	9.3	116.64
PR 61+490.00	0.88	0.90	8.95	125.59
		VOLUMEN TOTAL BASE		125.59

REVISADO POR CONTRATISTA		APROBADO POR INTERVENTORÍA
	INGENIERO RESIDENTE	INGENIERO RESIDENTE
NOMBRES:	MIGUEL ANGEL PARRA	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA:		

OBSERVACION

Consorcio Vías Nacionales	Base granular clase A	ITEM 330.1

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

DATOS DE ELABORCIÓN DE REGISTRO

FECHA DE ELABORACIÓN:	30/11/2024		
RUTA 64-04	BASE (RASANTE)	PR 61+330 A 61+490	MARGEN : DERECHA-IZQUIERDA

CONTROL Y REGISTRO DE MEJORAMIENTO DE A RASANTE

Abscisa	Área de LLENO	Área Promedio	Volumen de lleno	Vol. lleno acumul.
PR 61+330.00	2.11	1.06		
PR 61+340.00	2.18	2.15	21.45	21.45
PR 61+350.00	2.18	2.18	21.8	43.25
PR 61+360.00	2.17	2.18	21.75	65.00
PR 61+370.00	2.05	2.11	21.1	86.10
PR 61+380.00	1.97	2.01	20.1	106.20
PR 61+390.00	1.96	1.97	19.65	125.85
PR 61+400.00	1.97	1.97	19.65	145.50
PR 61+410.00	1.97	1.97	19.7	165.20
PR 61+420.00	1.97	1.97	19.7	184.90
PR 61+430.00	1.99	1.98	19.8	204.70
PR 61+440.00	2.08	2.04	20.35	225.05
PR 61+450.00	2.13	2.11	21.05	246.10
PR 61+460.00	2.13	2.13	21.3	267.40
PR 61+470.00	2.11	2.12	21.2	288.60
PR 61+480.00	2.02	2.07	20.65	309.25
PR 61+490.00	1.96	1.99	19.9	329.15
		VOLUMEN TOTAL BASE		329.15

REVISADO POR CONTRATISTA		APROBADO POR INTERVENTORÍA
	INGENIERO RESIDENTE	INGENIERO RESIDENTE
NOMBRES:	MIGUEL ANGEL PARRA	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA:		

OBSERVACION

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA	Cód: F-EO-009
		Versión: 001
	CONTRATO 0978 DE 2021	Fecha: 02/01/2020
		Pág: 1 de 1

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	31	**MM**	1	**AA**	2,025	**PERIODO:**	1 de enero de 2025		31 de enero de 2025			
CONTRATO:	0978 DE 2021						**OBJETO CONTRATO:**	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4					
CONTRATANTE:	INVIAS				**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA			**ACUMULADO ANTERIOR:**		**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES									18,474.00		1,165.00	19,639.00
ITEM:	420.2	GRUPO DE AJUSTE	11603	ESPECIF. GENERAL	421-13	ESPECIF. PARTICULAR		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1		**UNID:**	M2	**UBICACIÓN:**	**RUTA 6404**

ESQUEMA

LOCALIZACIÓN				MUNICIPIO	AREA POR TOPOGRFIA	PARCHE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
FECHA	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN	CARRIL					
-	PR59+760	PR59+885	CARRIL IZQ - DER	SOCOTA	912.50	JORNADA 1	RIEGO DE IMPRIMACIÓN (ACTA 43)	-912.50
-	PR59+990	PR60+100	CARRIL IZQ - DER	SOCOTA	803.00	JORNADA 2	RIEGO DE IMPRIMACIÓN (ACTA 43)	-803.00
-	PR60+300	PR60+430	CARRIL IZQ - DER	SOCOTA	949.00	JORNADA 3	RIEGO DE IMPRIMACIÓN (ACTA 43)	-949.00
-	PR60+480	PR60+580	CARRIL IZQ - DER	SOCOTA	730.00	JORNADA 4	RIEGO DE IMPRIMACIÓN (ACTA 43)	-730.00
-	PR60+660	PR60+690	CARRIL IZQ - DER	SOCOTA	219.00	JORNADA 4	RIEGO DE IMPRIMACIÓN (ACTA 43)	-219.00
-	PR60+770	PR60+798	CARRIL IZQ - DER	SOCOTA	204.40	JORNADA 4	RIEGO DE IMPRIMACIÓN (ACTA 43)	-204.40
-	PR60+990	PR61+010	CARRIL IZQ - DER	SOCOTA	146.00	JORNADA 4	RIEGO DE IMPRIMACIÓN (ACTA 43)	-146.00
-	PR59+760	PR59+825	CARRIL IZQ	SOCOTA	237.25	JORNADA 1	RIEGO DE IMPRIMACIÓN	237.25
-	PR60+485	PR60+600	CARRIL IZQ - DER	SOCOTA	869.40	JORNADA 2	RIEGO DE IMPRIMACIÓN	869.40
-	PR60+770	PR60+810	CARRIL IZQ - DER	SOCOTA	300.80	JORNADA 3	RIEGO DE IMPRIMACIÓN	300.80
-	PR60+980	PR61+030	CARRIL IZQ - DER	SOCOTA	365.00	JORNADA 4	RIEGO DE IMPRIMACIÓN	365.00
-	PR61+230	PR61+250	CARRIL IZQ - DER	SOCOTA	160.60	JORNADA 5	RIEGO DE IMPRIMACIÓN	160.60
-	PR61+345	PR61+500	CARRIL IZQ - DER	SOCOTA	1,176.45	JORNADA 6	RIEGO DE IMPRIMACIÓN	1176.45
-	PR57+835	PR57+860	CARRIL IZQ - DER	SOCOTA	207.25	JORNADA 1	RIEGO DE IMPRIMACIÓN	207.25
-	PR59+760	PR59+825	CARRIL DER	SOCOTA	270.66	JORNADA 2	RIEGO DE IMPRIMACIÓN	270.66
-	PR59+825	PR59+890	CARRIL IZQ - DER	SOCOTA	480.55	JORNADA 3	RIEGO DE IMPRIMACIÓN	480.55
-	PR59+990	PR60+100	CARRIL IZQ - DER	SOCOTA	863.94	JORNADA 4	RIEGO DE IMPRIMACIÓN	863.94
-	PR61+320	PR61+345	CARRIL IZQ - DER	SOCOTA	197.33	JORNADA 5	RIEGO DE IMPRIMACIÓN	197.33
-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Subtotal					**1,165.00**
			TOTAL					**1,165.00**

RESIDENTE DE OBRA

FIRMA:

NOMBRE: MIGUEL ANGEL PARRA
CONSORCIO VIAS NACIONALES

INTERVENTORIA

FIRMA:

NOMBRE: DIEGO FERNANDO RUANO FONSECA
CONSORCIO NTERVENTORIAS COLOMBIA

Consorcio Vías Nacionales	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	ITEM 420.2

PROYECTO:	CONTRATO No. 0976-2021: "Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental Sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

1	DATOS DE ELABORCIÓN DE REGISTRO

FECHA DE ELABORACIÓN:	30/11/2024		
RUTA 64-04	CRL-1 (1 CAPA)		MARGEN : IZQUIERDA-DERECHA

CONTROL Y REGISTRO DE RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRL-1

Abscisa INICIAL	Ábscisa FINAL	longitud	ancho	AREA
PR 59+760.00	PR 59+825.00	65.00	3.65	237.25
PR 60+485.00	PR 60+600.00	115.00	7.56	869.40
PR 60+770.00	PR 60+810.00	40.00	7.52	300.80
PR 60+980.00	PR 61+030.00	50.00	7.30	365.00
PR 61+230.00	PR 61+250.00	20.00	8.03	160.60
PR 61+345.00	PR 61+500.00	155.00	7.59	1176.45
		AREA TOTAL		3109.50

REVISADO POR CONTRATISTA		APROBADO POR INTERVENTORÍA
	INGENIERO RESIDENTE	INGENIERO RESIDENTE
NOMBRES:	MIGUEL ANGEL PARRA	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA:		

OBSERVACION

Consorcio Vías Nacionales	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	ITEM 420.2

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

1	DATOS DE ELABORCIÓN DE REGISTRO

FECHA DE ELABORACIÓN:	30/01/2025		
RUTA 64-04	CRL-1 (1 CAPA)		MARGEN : IZQUIERDA-DERECHA

CONTROL Y REGISTRO DE RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRL-1

Abscisa INICIAL	Ábscisa FINAL	longitud	ancho	AREA
PR 57+835.00	PR 57+860.00	25.00	8.29	207.25
PR 59+760.00	PR 59+825.00	65.00	4.16	270.66
PR 59+825.00	PR 59+890.00	65.00	7.39	480.55
PR 59+990.00	PR 60+100.00	110.00	7.85	863.94
PR 61+320.00	PR 61+345.00	25.00	7.89	197.33
		AREA TOTAL		2019.72

REVISADO POR CONTRATISTA		APROBADO POR INTERVENTORÍA
	INGENIERO RESIDENTE	INGENIERO RESIDENTE
NOMBRES:	MIGUEL ANGEL PARRA	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA:		

OBSERVACION

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA	Cód: F-EO-009
		Versión: 001
	CONTRATO 0978 DE 2021	Fecha: 02/01/2020
		Pág: 1 de 1

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	31	**MM**	1	**AA**	2,025	**PERIODO:**	1 de enero de 2025		31 de enero de 2025					
CONTRATO:	0978 DE 2021						**OBJETO CONTRATO:**	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4							
CONTRATANTE:	INVIAS				**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA			**ACUMULADO ANTERIOR:**		**PRESENTE ACTA:**		**ACUMULADO TOTAL:**	
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES									423,503.00		2,633.00		426,136.00	
ITEM:	421.1	GRUPO DE AJUSTE	11603	ESPECIF. GENERAL	421-13	ESPECIF. PARTICULAR		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1		**UNID:**	m2		**UBICACIÓN:**	**RUTA 6404**	

ESQUEMA	LOCALIZACIÓN				MUNICIPIO	AREA POR TOPOGRFIA	PARCHE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
	FECHA	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN	CARRIL					
	-	PR59+770	PR60+090	CARRIL IZQ - DER	SOCOTA	2,336.00	JORNADA 1	RIEGO DE LIGA (ACTA 43)	- 2,336.00
	-	PR60+460	PR61+030	CARRIL IZQ - DER	SOCOTA	4,161.00	JORNADA 2	RIEGO DE LIGA (ACTA 43)	- 4,161.00
	-	PR60+500	PR60+565	CARRIL DER	SOCOTA	243.10	JORNADA 1	RIEGO DE LIGA	243.10
	-	PR60+565	PR61+030	CARRIL IZQ - DER	SOCOTA	3,614.45	JORNADA 2	RIEGO DE LIGA	3,614.45
	-	PR61+230	PR61+345	CARRIL IZQ	SOCOTA	441.60	JORNADA 3	RIEGO DE LIGA	441.60
	-	PR61+345	PR61+500	CARRIL IZQ - DER	SOCOTA	1,176.45	JORNADA 4	RIEGO DE LIGA	1,176.45
	-	PR57+760	PR57+920	CARRIL DER	SOCOTA	584.00	JORNADA 1	RIEGO DE LIGA	584.00
	-	PR57+805	PR57+920	CARRIL IZQ	SOCOTA	479.55	JORNADA 2	RIEGO DE LIGA	479.55
	-	PR59+760	PR60+100	CARRIL IZQ - DER	SOCOTA	2,591.14	JORNADA 3	RIEGO DE LIGA	2,591.14
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Subtotal				**2,633.00**
					TOTAL				**2,633.00**

RESIDENTE DE OBRA

FIRMA:

NOMBRE: MIGUEL ANGEL PARRA
CONSORCIO VIAS NACIONALES

INTERVENTORIA

FIRMA:

NOMBRE: DIEGO FERNANDO RUANO FONSECA
CONSORCIO NTERVENTORIAS COLOMBIA

Consorcio Vías Nacionales	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	ITEM 421.1

PROYECTO:	CONTRATO No. 0576-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

1	DATOS DE ELABORCIÓN DE REGISTRO

FECHA DE ELABORACIÓN:	30/11/2024		
RUTA 64-04	CRR-1	2 CAPA	MARGEN : IZQUIERDA-DERECHA

CONTROL Y REGISTRO DE RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1

Abscisa INICIAL	Ábscisa FINAL	longitud	ancho	AREA
PR 60+500.00	PR 60+565.00	65.00	3.74	243.10
PR 60+565.00	PR 61+030.00	465.00	7.77	3614.45
PR 61+230.00	PR 61+345.00	115.00	3.84	441.60
PR 61+345.00	PR 61+500.00	155.00	7.59	1176.45
		AREA TOTAL		5475.60

	REVISADO POR CONTRATISTA	APROBADO POR INTERVENTORÍA
	INGENIERO RESIDENTE	INGENIERO RESIDENTE
NOMBRES:	MIGUEL ANGEL PARRA	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA:		

OBSERVACION

Consorcio Vías Nacionales	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	ITEM 421.1

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

1	DATOS DE ELABORCIÓN DE REGISTRO

FECHA DE ELABORACIÓN:	30/01/2025		
RUTA 64-04	CRR-1	2 CAPA	MARGEN : IZQUIERDA-DERECHA

CONTROL Y REGISTRO DE RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1

Abscisa INICIAL	Ábscisa FINAL	longitud	ancho	AREA
PR 57+760.00	PR 57+920.00	160.00	3.65	584.00
PR 57+805.00	PR 57+920.00	115.00	4.17	479.55
PR 59+760.00	PR 60+100.00	340.00	7.621	2591.14
		AREA TOTAL		3654.69

REVISADO POR CONTRATISTA		APROBADO POR INTERVENTORÍA
	INGENIERO RESIDENTE	INGENIERO RESIDENTE
NOMBRES:	MIGUEL ANGEL PARRA	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA:		

OBSERVACION

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA	Cód: F-EO-009
		Versión: 001
	CONTRATO 0978 DE 2021	Fecha: 02/01/2020
		Pág: 1 de 1

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	31	**MM**	1	**AA**	2,025	**PERIODO:**	1 de enero de 2025		31 de enero de 2025	
CONTRATO:	0978 DE 2021						**OBJETO CONTRATO:**	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4			
CONTRATANTE:	INVIAS				**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA		**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES								36,269.90	247.30	36,517.20
ITEM:	450.2P	GRUPO DE AJUSTE	11603	ESPECIF. GENERAL		ESPECIF. PARTICULAR	450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	**UNID:**	m3	**UBICACIÓN:** RUTA 6404 Y 6405

ESQUEMA

LOCALIZACIÓN				MUNICIPIO	AREA POR TOPOGRFIA	ESPESOR	PARCHE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
FECHA	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN	CARRIL						
-	PR59+760	PR59+885	CARRIL IZQ - DER	SOCOTA	912.50	0.065	JORNADA 1	MDC-19 (ACTA 43)	- 59.31
-	PR59+990	PR60+100	CARRIL IZQ - DER	SOCOTA	803.00	0.065	JORNADA 2	MDC-19 (ACTA 43)	- 52.20
-	PR60+300	PR60+430	CARRIL IZQ - DER	SOCOTA	949.00	0.065	JORNADA 3	MDC-19 (ACTA 43)	- 61.69
-	PR60+480	PR60+580	CARRIL IZQ - DER	SOCOTA	730.00	0.065	JORNADA 4	MDC-19 (ACTA 43)	- 47.45
-	PR60+660	PR60+690	CARRIL IZQ - DER	SOCOTA	219.00	0.065	JORNADA 5	MDC-19 (ACTA 43)	- 14.24
-	PR60+770	PR60+798	CARRIL IZQ - DER	SOCOTA	204.40	0.065	JORNADA 6	MDC-19 (ACTA 43)	- 13.29
-	PR60+990	PR61+010	CARRIL IZQ - DER	SOCOTA	146.00	0.065	JORNADA 7	MDC-19 (ACTA 43)	- 9.49
-	PR59+770	PR60+090	CARRIL IZQ - DER	SOCOTA	2,336.00	0.065	JORNADA 8	MDC-19 (ACTA 43)	- 151.84
-	PR60+460	PR61+030	CARRIL IZQ - DER	SOCOTA	4,161.00	0.065	JORNADA 9	MDC-19 (ACTA 43)	- 270.47
-	PR59+760	PR59+825	CARRIL IZQ	SOCOTA	237.29	0.07	JORNADA 1	PRIMERA CAPA	16.61
-	PR60+485	PR60+600	CARRIL IZQ - DER	SOCOTA	881.57	0.07	JORNADA 2	PRIMERA CAPA	61.71
-	PR60+500	PR60+565	CARRIL DER	SOCOTA	481.83	0.06	JORNADA 3	SEGUNDA CAPA	28.91
-	PR60+565	PR61+030	CARRIL IZQ - DER	SOCOTA	3,642.83	0.06	JORNADA 4	SEGUNDA CAPA	218.57
-	PR60+770	PR60+810	CARRIL IZQ - DER	SOCOTA	305.43	0.07	JORNADA 5	PRIMERA CAPA	21.38
-	PR60+980	PR61+030	CARRIL IZQ - DER	SOCOTA	372.14	0.07	JORNADA 6	PRIMERA CAPA	26.05
-	PR61+230	PR61+250	CARRIL IZQ - DER	SOCOTA	160.71	0.07	JORNADA 7	PRIMERA CAPA	11.25
-	PR61+230	PR61+345	CARRIL IZQ	SOCOTA	440.17	0.06	JORNADA 8	SEGUNDA CAPA	26.41
-	PR61+345	PR61+500	CARRIL IZQ - DER	SOCOTA	1,200.00	0.07	JORNADA 9	PRIMERA CAPA	84.00
-	PR61+345	PR61+500	CARRIL IZQ - DER	SOCOTA	1,185.67	0.06	JORNADA 10	SEGUNDA CAPA	71.14
-	PR57+760	PR57+920	CARRIL DER	SOCOTA	584.00	0.06	JORNADA 1	SEGUNDA CAPA	35.04
-	PR57+805	PR57+920	CARRIL IZQ	SOCOTA	484.50	0.06	JORNADA 2	SEGUNDA CAPA	29.07
-	PR57+835	PR57+860	CARRIL IZQ - DER	SOCOTA	207.57	0.07	JORNADA 3	PRIMERA CAPA	14.53
-	PR59+760	PR59+825	CARRIL DER	SOCOTA	271.29	0.07	JORNADA 4	PRIMERA CAPA	18.99
-	PR59+760	PR60+100	CARRIL IZQ - DER	SOCOTA	2,592.83	0.06	JORNADA 5	SEGUNDA CAPA	155.57
-	PR59+825	PR59+890	CARRIL IZQ - DER	SOCOTA	480.00	0.07	JORNADA 6	PRIMERA CAPA	33.60
-	PR59+990	PR60+100	CARRIL IZQ - DER	SOCOTA	866.71	0.07	JORNADA 6	PRIMERA CAPA	60.67
-	PR61+320	PR61+345	CARRIL IZQ - DER	SOCOTA	196.57	0.07	JORNADA 7	PRIMERA CAPA	13.76
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-
								Subtotal	**247.30**
								TOTAL	**247.30**

RESIDENTE DE OBRA

FIRMA:

NOMBRE: MIGUEL ANGEL PARRA
CONSORCIO VIAS NACIONALES

INTERVENTORIA

FIRMA:

NOMBRE: DIEGO FERNANDO RUANO FONSECA
CONSORCIO NTERVENTORIAS COLOMBIA

Consorcio Vías Nacionales	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	ITEM 450.2P

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

1	DATOS DE ELABORCIÓN DE REGISTRO

FECHA DE ELABORACIÓN:	30/11/2024		
RUTA 64-04	ASFALTO MDC - 19 (1 CAPA ESPESOR 7 CM)	PR 59+760 A 59+825	MARGEN : IZQUIERDA

CONTROL Y REGISTRO DE ASFALTO

Abscisa	Área de LLENO	Área Promedio	Volumen de lleno	Vol. lleno acumul.
K59 + 760.00	0.256	0.13		
K59 + 770.00	0.256	0.26	2.56	2.56
K59 + 780.00	0.256	0.26	2.56	5.11
K59 + 790.00	0.256	0.26	2.56	7.67
K59 + 800.00	0.256	0.26	2.56	10.22
K59 + 810.00	0.256	0.26	2.56	12.78
K59 + 820.00	0.256	0.26	2.56	15.33
K59 + 825.00	0.256	0.26	1.28	16.61
		VOLUMEN TOTAL ASFALTO		16.61

REVISADO POR CONTRATISTA		APROBADO POR INTERVENTORÍA
	INGENIERO RESIDENTE	INGENIERO RESIDENTE
NOMBRES:	MIGUEL ANGEL PARRA	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA:		

OBSERVACION

Consorcio Vías Nacionales

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19

ITEM 450.2P

PROYECTO: CONTRATO No. 0970-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

1 DATOS DE ELABORCIÓN DE REGISTRO

FECHA DE ELABORACIÓN:	30/11/2024		
RUTA 64-04	ASFALTO MDC - 19 (1 CAPA ESPESOR 7 CM)	60+485 a 60+600	MARGEN : IZQUIERDA /DERECHA

CONTROL Y REGISTRO DE ASFALTO

Abscisa	Área de LLENO	Área Promedio	Volumen de lleno	Vol. lleno acumul.
K60 + 485.00	0.664	0.33		
K60 + 490.00	0.636	0.65	3.25	3.25
K60 + 500.00	0.578	0.61	6.07	9.32
K60 + 510.00	0.521	0.55	5.50	14.82
K60 + 520.00	0.521	0.52	5.21	20.03
K60 + 530.00	0.521	0.52	5.21	25.24
K60 + 540.00	0.521	0.52	5.21	30.45
K60 + 550.00	0.521	0.52	5.21	35.66
K60 + 560.00	0.521	0.52	5.21	40.87
K60 + 570.00	0.521	0.52	5.21	46.08
K60 + 580.00	0.521	0.52	5.21	51.29
K60 + 590.00	0.521	0.52	5.21	56.50
K60 + 600.00	0.521	0.52	5.21	61.71
		VOLUMEN TOTAL ASFALTO		61.71

	REVISADO POR CONTRATISTA	APROBADO POR INTERVENTORÍA
	INGENIERO RESIDENTE	INGENIERO RESIDENTE
NOMBRES:	MIGUEL ANGEL PARRA	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA:		

OBSERVACION

Consorcio Vías Nacionales	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	ITEM 450.2P

PROYECTO:	CONTRATO No. 0978-2021: "Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

1	DATOS DE ELABORCIÓN DE REGISTRO

FECHA DE ELABORACIÓN:	30/11/2024		
RUTA 64-04	ASFALTO MDC - 19 (2 CAPA ESPESOR 6 CM)	PR 60+500 A 60+565	MARGEN : DERECHA

CONTROL Y REGISTRO DE ASFALTO

Abscisa	Área de LLENO	Área Promedio	Volumen de lleno	Vol. lleno acumul.
K60 + 500.00	0.490	0.25		
K60 + 510.00	0.441	0.47	4.66	4.66
K60 + 520.00	0.441	0.44	4.41	9.07
K60 + 530.00	0.441	0.44	4.41	13.48
K60 + 540.00	0.441	0.44	4.41	17.89
K60 + 550.00	0.441	0.44	4.41	22.30
K60 + 560.00	0.441	0.44	4.41	26.71
K60 + 565.00	0.441	0.44	2.21	28.91
		VOLUMEN TOTAL ASFALTO		28.91

	REVISADO POR CONTRATISTA	APROBADO POR INTERVENTORÍA
	INGENIERO RESIDENTE	INGENIERO RESIDENTE
NOMBRES:	MIGUEL ANGEL PARRA	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA:		
OBSERVACION		

Consorcio Vías Nacionales	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	ITEM 450.2P

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

1	DATOS DE ELABORCIÓN DE REGISTRO

FECHA DE ELABORACIÓN:	30/11/2024		
RUTA 64-04	ASFALTO MDC - 19 (2 CAPA ESPESOR 6 CM)	PR 60+565 A 61+030	MARGEN : IZQUIERDA/ DERECHA

CONTROL Y REGISTRO DE ASFALTO

Abscisa	Área de LLENO	Área Promedio	Volumen de lleno	Vol. lleno acumul.
K60 + 565.00	0.441	0.22		
K60 + 570.00	0.441	0.44	2.21	2.21
K60 + 580.00	0.441	0.44	4.41	6.61
K60 + 590.00	0.441	0.44	4.41	11.02
K60 + 600.00	0.441	0.44	4.41	15.44
K60 + 610.00	0.467	0.45	4.54	19.98
K60 + 620.00	0.502	0.48	4.84	24.83
K60 + 630.00	0.504	0.50	5.03	29.85
K60 + 640.00	0.504	0.50	5.04	34.89
K60 + 650.00	0.504	0.50	5.04	39.93
K60 + 660.00	0.499	0.50	5.01	44.95
K60 + 670.00	0.475	0.49	4.87	49.81
K60 + 680.00	0.441	0.46	4.58	54.39
K60 + 690.00	0.441	0.44	4.41	58.80
K60 + 700.00	0.441	0.44	4.41	63.21
K60 + 710.00	0.441	0.44	4.41	67.62
K60 + 720.00	0.441	0.44	4.41	72.03
K60 + 730.00	0.441	0.44	4.41	76.44
K60 + 740.00	0.441	0.44	4.41	80.85
K60 + 750.00	0.441	0.44	4.41	85.26
K60 + 760.00	0.441	0.44	4.41	89.67
K60 + 770.00	0.441	0.44	4.41	94.08
K60 + 780.00	0.441	0.44	4.41	98.49
K60 + 790.00	0.441	0.44	4.41	102.90
K60 + 800.00	0.453	0.45	4.47	107.37
K60 + 810.00	0.510	0.48	4.82	112.19
K60 + 820.00	0.564	0.54	5.37	117.56
K60 + 830.00	0.570	0.57	5.67	123.23
K60 + 840.00	0.570	0.57	5.70	128.93
K60 + 850.00	0.570	0.57	5.70	134.63
K60 + 860.00	0.558	0.56	5.64	140.27
K60 + 870.00	0.497	0.53	5.27	145.54
K60 + 880.00	0.446	0.47	4.72	150.25
K60 + 890.00	0.441	0.44	4.44	154.69
K60 + 900.00	0.445	0.44	4.43	159.12
K60 + 910.00	0.463	0.45	4.54	163.67
K60 + 920.00	0.480	0.47	4.72	168.38
K60 + 930.00	0.480	0.48	4.80	173.18

Consorcio Vías Nacionales	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	ITEM 450.2P

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

1	DATOS DE ELABORCIÓN DE REGISTRO

FECHA DE ELABORACIÓN:	30/11/2024		
RUTA 64-04	ASFALTO MDC - 19 (2 CAPA ESPESOR 6 CM)	PR 60+565 A 61+030	MARGEN : IZQUIERDA/ DERECHA

K60 + 940.00	0.480	0.48	4.80	177.98
K60 + 950.00	0.480	0.48	4.80	182.78
K60 + 960.00	0.465	0.47	4.73	187.51
K60 + 970.00	0.447	0.46	4.56	192.07
K60 + 980.00	0.441	0.44	4.44	196.52
K60 + 990.00	0.441	0.44	4.41	200.93
K61 + 000.00	0.441	0.44	4.41	205.34
K61 + 010.00	0.441	0.44	4.41	209.75
K61 + 020.00	0.441	0.44	4.41	214.16
K61 + 030.00	0.44	0.44	4.41	218.57
		VOLUMEN TOTAL ASFALTO		218.57

REVISADO POR CONTRATISTA		APROBADO POR INTERVENTORÍA
	INGENIERO RESIDENTE	INGENIERO RESIDENTE
NOMBRES:	MIGUEL ANGEL PARRA	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA:		

OBSERVACION

Consorcio Vías Nacionales	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	ITEM 450.2P

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vías para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

1	DATOS DE ELABORCIÓN DE REGISTRO		
FECHA DE ELABORACIÓN:	30/11/2024		
RUTA 64-04	ASFALTO MDC - 19 (1 CAPA ESPESOR 7 CM)	PR 60+770 60+810	MARGEN : IZQUIERDA /DERECHA

CONTROL Y REGISTRO DE ASFALTO

Abscisa	Área de LLENO	Área Promedio	Volumen de lleno	Vol. lleno acumul.
K60 + 770.00	0.521	0.26		
K60 + 780.00	0.521	0.52	5.21	5.21
K60 + 790.00	0.521	0.52	5.21	10.42
K60 + 800.00	0.535	0.53	5.28	15.70
K60 + 810.00	0.601	0.57	5.68	21.38
		VOLUMEN TOTAL ASFALTO		21.38

	REVISADO POR CONTRATISTA	APROBADO POR INTERVENTORÍA
	INGENIERO RESIDENTE	INGENIERO RESIDENTE
NOMBRES:	MIGUEL ANGEL PARRA	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA:		

OBSERVACION

Consorcio Vías Nacionales	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	ITEM 450.2P

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vías para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

1	DATOS DE ELABORCIÓN DE REGISTRO

FECHA DE ELABORACIÓN:	30/11/2024		
RUTA 64-04	ASFALTO MDC - 19 (1 CAPA ESPESOR 7 CM)	PR 60+980 A 61+030	MARGEN : IZQUIERDA /DERECHA

CONTROL Y REGISTRO DE ASFALTO

Abscisa	Área de LLENO	Área Promedio	Volumen de lleno	Vol. lleno acumul.
K60 + 980.00	0.521	0.26		
K60 + 990.00	0.521	0.52	5.21	5.21
K61 + 000.00	0.521	0.52	5.21	10.42
K61 + 010.00	0.521	0.52	5.21	15.63
K61 + 020.00	0.521	0.52	5.21	20.84
K61 + 030.00	0.521	0.52	5.21	26.05
		VOLUMEN TOTAL ASFALTO		26.05

REVISADO POR CONTRATISTA		APROBADO POR INTERVENTORÍA
	INGENIERO RESIDENTE	INGENIERO RESIDENTE
NOMBRES:	MIGUEL ANGEL PARRA	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA:		

OBSERVACION

Consorcio Vías Nacionales	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	ITEM 450.2P
PROYECTO:	CONTRATO No. 0370-2021: "Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental Sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vías para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"	

1	DATOS DE ELABORCIÓN DE REGISTRO

FECHA DE ELABORACIÓN:	30/11/2024		
RUTA 64-04	ASFALTO MDC - 19 (1 CAPA ESPESOR 7 CM)	PR 61+230 A 61+250	MARGEN : IZQUIERDA / DERECHA

CONTROL Y REGISTRO DE ASFALTO

Abscisa	Área de LLENO	Área Promedio	Volumen de lleno	Vol. lleno acumul.
K61 + 230.00	0.578	0.29		
K61 + 240.00	0.563	0.57	5.70	5.70
K61 + 250.00	0.547	0.55	5.55	11.25

VOLUMEN TOTAL ASFALTO	11.25

REVISADO POR CONTRATISTA		APROBADO POR INTERVENTORÍA
	INGENIERO RESIDENTE	INGENIERO RESIDENTE
NOMBRES:	MIGUEL ANGEL PARRA	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA:		

OBSERVACION

Consorcio Vías Nacionales	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	ITEM 450.2P
PROYECTO:	CONTRATO No. 0970-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental Sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4	

1	DATOS DE ELABORCIÓN DE REGISTRO

FECHA DE ELABORACIÓN:	30/11/2024		
RUTA 64-04	ASFALTO MDC - 19 (2 CAPA ESPESOR 6 CM)	PR 61+230 A 61+345	MARGEN : IZQUIERDA

CONTROL Y REGISTRO DE ASFALTO

Abscisa	Área de LLENO	Área Promedio	Volumen de lleno	Vol. lleno acumul.
K61 + 230.00	0.276	0.14		
K61 + 240.00	0.263	0.27	2.70	2.70
K61 + 250.00	0.249	0.26	2.56	5.26
K61 + 260.00	0.236	0.24	2.43	7.69
K61 + 270.00	0.222	0.23	2.29	9.97
K61 + 280.00	0.219	0.22	2.20	12.18
K61 + 290.00	0.219	0.22	2.19	14.37
K61 + 300.00	0.219	0.22	2.19	16.56
K61 + 310.00	0.219	0.22	2.19	18.75
K61 + 320.00	0.219	0.22	2.19	20.94
K61 + 330.00	0.219	0.22	2.19	23.13
K61 + 340.00	0.219	0.22	2.19	25.32
K61 + 345.00	0.219	0.22	1.10	26.41
		VOLUMEN TOTAL ASFALTO		26.41

REVISADO POR CONTRATISTA		APROBADO POR INTERVENTORÍA
	INGENIERO RESIDENTE	INGENIERO RESIDENTE
NOMBRES:	MIGUEL ANGEL PARRA	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA:		

OBSERVACION

Consorcio Vías Nacionales	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	ITEM 450.2P

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

1	DATOS DE ELABORCIÓN DE REGISTRO

FECHA DE ELABORACIÓN:	30/11/2024		
RUTA 64-04	ASFALTO MDC - 19 (1 CAPA ESPESOR 7 CM)	PR 61+345 A 61+500	MARGEN : IZQUIERDA/ DERECHA

CONTROL Y REGISTRO DE ASFALTO

Abscisa	Área de LLENO	Área Promedio	Volumen de lleno	Vol. lleno acumul.
K61 + 345.00	0.581	0.29		
K61 + 350.00	0.581	0.58	2.90	2.90
K61 + 360.00	0.576	0.58	5.78	8.69
K61 + 370.00	0.546	0.56	5.61	14.29
K61 + 380.00	0.521	0.53	5.33	19.63
K61 + 390.00	0.521	0.52	5.21	24.84
K61 + 400.00	0.521	0.52	5.21	30.05
K61 + 410.00	0.521	0.52	5.21	35.26
K61 + 420.00	0.521	0.52	5.21	40.47
K61 + 430.00	0.529	0.52	5.25	45.71
K61 + 440.00	0.552	0.54	5.40	51.12
K61 + 450.00	0.567	0.56	5.59	56.71
K61 + 460.00	0.567	0.57	5.67	62.38
K61 + 470.00	0.561	0.56	5.64	68.01
K61 + 480.00	0.536	0.55	5.49	73.50
K61 + 490.00	0.521	0.53	5.29	78.79
K61 + 500.00	0.521	0.52	5.21	84.00
		VOLUMEN TOTAL ASFALTO		84.00

REVISADO POR CONTRATISTA		APROBADO POR INTERVENTORÍA
	INGENIERO RESIDENTE	INGENIERO RESIDENTE
NOMBRES:	MIGUEL ANGEL PARRA	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA:		

OBSERVACION

Consorcio Vías Nacionales	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	ITEM 450.2P

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

1	DATOS DE ELABORCIÓN DE REGISTRO

FECHA DE ELABORACIÓN:	30/11/2024		
RUTA 64-04	ASFALTO MDC - 19 (2 CAPA ESPESOR 6 CM)	PR 61+345 A 61+500	MARGEN : IZQUIERDA/ DERECHA

CONTROL Y REGISTRO DE ASFALTO

Abscisa	Área de LLENO	Área Promedio	Volumen de lleno	Vol. lleno acumul.
K61 + 345.00	0.492	0.25		
K61 + 350.00	0.492	0.49	2.46	2.46
K61 + 360.00	0.488	0.49	4.90	7.36
K61 + 370.00	0.462	0.48	4.75	12.11
K61 + 380.00	0.441	0.45	4.52	16.63
K61 + 390.00	0.441	0.44	4.41	21.04
K61 + 400.00	0.441	0.44	4.41	25.45
K61 + 410.00	0.441	0.44	4.41	29.86
K61 + 420.00	0.441	0.44	4.41	34.27
K61 + 430.00	0.448	0.44	4.44	38.71
K61 + 440.00	0.468	0.46	4.58	43.29
K61 + 450.00	0.480	0.47	4.74	48.03
K61 + 460.00	0.480	0.48	4.80	52.83
K61 + 470.00	0.475	0.48	4.78	57.60
K61 + 480.00	0.454	0.46	4.65	62.25
K61 + 490.00	0.441	0.45	4.48	66.72
K61 + 500.00	0.441	0.44	4.41	71.14
		VOLUMEN TOTAL ASFALTO		71.14

REVISADO POR CONTRATISTA		APROBADO POR INTERVENTORÍA
	INGENIERO RESIDENTE	INGENIERO RESIDENTE
NOMBRES:	MIGUEL ANGEL PARRA	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA:		

OBSERVACION

Consorcio Vías Nacionales	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	ITEM 450.2P

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

1	DATOS DE ELABORCIÓN DE REGISTRO

FECHA DE ELABORACIÓN:	30/01/2025		
RUTA 64-04	ASFALTO MDC - 19 (2 CAPA ESPESOR 6 CM)	57+760 A 57+920	MARGEN : DERECHA

CONTROL Y REGISTRO DE ASFALTO

Abscisa	Área de LLENO	Área Promedio	Volumen de lleno	Vol. lleno acumul.
K57 + 760.00	0.219	0.11		
K57 + 770.00	0.219	0.22	2.19	2.19
K57 + 780.00	0.219	0.22	2.19	4.38
K57 + 790.00	0.219	0.22	2.19	6.57
K57 + 800.00	0.219	0.22	2.19	8.76
K57 + 810.00	0.219	0.22	2.19	10.95
K57 + 820.00	0.219	0.22	2.19	13.14
K57 + 830.00	0.219	0.22	2.19	15.33
K57 + 840.00	0.219	0.22	2.19	17.52
K57 + 850.00	0.219	0.22	2.19	19.71
K57 + 860.00	0.219	0.22	2.19	21.90
K57 + 870.00	0.219	0.22	2.19	24.09
K57 + 880.00	0.219	0.22	2.19	26.28
K57 + 890.00	0.219	0.22	2.19	28.47
K57 + 900.00	0.219	0.22	2.19	30.66
K57 + 910.00	0.219	0.22	2.19	32.85
K57 + 920.00	0.219	0.22	2.19	35.04

VOLUMEN TOTAL ASFALTO	35.04

REVISADO POR CONTRATISTA		APROBADO POR INTERVENTORÍA
INGENIERO RESIDENTE		INGENIERO RESIDENTE
NOMBRES:	MIGUEL ANGEL PARRA	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA:		
OBSERVACION		

Consorcio Vías Nacionales	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	ITEM 450.2P

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vías para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

1	DATOS DE ELABORCIÓN DE REGISTRO

FECHA DE ELABORACIÓN:	30/01/2025		
RUTA 64-04	ASFALTO MDC - 19 (2 CAPA ESPESOR 6 CM)	PR 57+805 A 57+920	MARGEN : IZQUIERDA

CONTROL Y REGISTRO DE ASFALTO

Abscisa	Área de LLENO	Área Promedio	Volumen de lleno	Vol. lleno acumul.
K57 + 805.00	0.219	0.11		
K57 + 810.00	0.219	0.22	1.09	1.09
K57 + 820.00	0.219	0.22	2.19	3.28
K57 + 830.00	0.224	0.22	2.22	5.50
K57 + 840.00	0.273	0.25	2.49	7.99
K57 + 850.00	0.288	0.28	2.80	10.79
K57 + 860.00	0.288	0.29	2.88	13.67
K57 + 870.00	0.288	0.29	2.88	16.55
K57 + 880.00	0.288	0.29	2.88	19.43
K57 + 890.00	0.257	0.27	2.73	22.16
K57 + 900.00	0.219	0.24	2.38	24.54
K57 + 910.00	0.219	0.22	2.19	26.73
K57 + 920.00	0.250	0.23	2.34	29.07

VOLUMEN TOTAL ASFALTO	29.07

REVISADO POR CONTRATISTA		APROBADO POR INTERVENTORÍA
INGENIERO RESIDENTE		INGENIERO RESIDENTE
NOMBRES:	MIGUEL ANGEL PARRA	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA:		

OBSERVACION

Consorcio Vías Nacionales	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	ITEM 450.2P

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vías para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

1	DATOS DE ELABORCIÓN DE REGISTRO

FECHA DE ELABORACIÓN:	30/01/2025		
RUTA 64-04	ASFALTO MDC - 19 (1 CAPA ESPESOR 7 CM)	PR 57+835 A 57+860	MARGEN : IZQUIERDA / DERECHA

CONTROL Y REGISTRO DE ASFALTO

Abscisa	Área de LLENO	Área Promedio	Volumen de lleno	Vol. lleno acumul.
K57 + 835.00	0.542	0.27		
K57 + 840.00	0.574	0.56	2.79	2.79
K57 + 850.00	0.591	0.58	5.83	8.62
K57 + 860.00	0.591	0.59	5.91	14.53

VOLUMEN TOTAL ASFALTO	14.53

REVISADO POR CONTRATISTA		APROBADO POR INTERVENTORÍA
INGENIERO RESIDENTE		INGENIERO RESIDENTE
NOMBRES:	MIGUEL ANGEL PARRA	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA:		
OBSERVACION		

Consorcio Vías Nacionales	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	ITEM 450.2P

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

1	DATOS DE ELABORCIÓN DE REGISTRO

FECHA DE ELABORACIÓN:	30/01/2025		
RUTA 64-04	ASFALTO MDC - 19 (1 CAPA ESPESOR 7 CM)	PR 59+760 a 59+825	MARGEN : DERECHA

CONTROL Y REGISTRO DE ASFALTO

Abscisa	Área de LLENO	Área Promedio	Volumen de lleno	Vol. lleno acumul.
K59 + 760.00	0.277	0.14		
K59 + 770.00	0.292	0.28	2.84	2.84
K59 + 780.00	0.294	0.29	2.93	5.77
K59 + 790.00	0.294	0.29	2.94	8.71
K59 + 800.00	0.294	0.29	2.94	11.65
K59 + 810.00	0.294	0.29	2.94	14.59
K59 + 820.00	0.294	0.29	2.94	17.53
K59 + 825.00	0.289	0.29	1.46	18.99

VOLUMEN TOTAL ASFALTO	18.99

REVISADO POR CONTRATISTA		APROBADO POR INTERVENTORÍA
INGENIERO RESIDENTE		INGENIERO RESIDENTE
NOMBRES:	MIGUEL ANGEL PARRA	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA:		

OBSERVACION

Consorcio Vías Nacionales	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	ITEM 450.2P

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vías para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

1	DATOS DE ELABORCIÓN DE REGISTRO

FECHA DE ELABORACIÓN:	30/01/2026		
RUTA 64-04	ASFALTO MDC - 19 (2 CAPA ESPESOR 6 CM)	PR 59+760 A 60+100	MARGEN : IZQUIERDA/DERECHA

CONTROL Y REGISTRO DE ASFALTO

Abscisa	Área de LLENO	Área Promedio	Volumen de lleno	Vol. lleno acumul.
K59 + 760.00	0.456	0.23		
K59 + 770.00	0.469	0.46	4.63	4.63
K59 + 780.00	0.471	0.47	4.70	9.33
K59 + 790.00	0.471	0.47	4.71	14.04
K59 + 800.00	0.471	0.47	4.71	18.75
K59 + 810.00	0.471	0.47	4.71	23.46
K59 + 820.00	0.471	0.47	4.71	28.17
K59 + 830.00	0.460	0.47	4.66	32.82
K59 + 840.00	0.447	0.45	4.54	37.36
K59 + 850.00	0.438	0.44	4.43	41.78
K59 + 860.00	0.438	0.44	4.38	46.16
K59 + 870.00	0.438	0.44	4.38	50.54
K59 + 880.00	0.438	0.44	4.38	54.92
K59 + 890.00	0.438	0.44	4.38	59.30
K59 + 900.00	0.438	0.44	4.38	63.68
K59 + 910.00	0.438	0.44	4.38	68.06
K59 + 920.00	0.438	0.44	4.38	72.44
K59 + 930.00	0.438	0.44	4.38	76.82
K59 + 940.00	0.438	0.44	4.38	81.20
K59 + 950.00	0.438	0.44	4.38	85.58
K59 + 960.00	0.445	0.44	4.41	90.00
K59 + 970.00	0.456	0.45	4.50	94.50
K59 + 980.00	0.453	0.45	4.55	99.04
K59 + 990.00	0.453	0.45	4.53	103.57
K60 + 000.00	0.453	0.45	4.53	108.10
K60 + 010.00	0.452	0.45	4.53	112.63
K60 + 020.00	0.442	0.45	4.47	117.10
K60 + 030.00	0.437	0.44	4.40	121.50
K60 + 040.00	0.438	0.44	4.38	125.87
K60 + 050.00	0.481	0.46	4.60	130.47
K60 + 060.00	0.537	0.51	5.09	135.56
K60 + 070.00	0.537	0.54	5.37	140.93
K60 + 080.00	0.526	0.53	5.32	146.25
K60 + 090.00	0.451	0.49	4.89	151.13
K60 + 100.00	0.438	0.44	4.44	155.57

VOLUMEN TOTAL ASFALTO	155.57

REVISADO POR CONTRATISTA		APROBADO POR INTERVENTORÍA
INGENIERO RESIDENTE		INGENIERO RESIDENTE
NOMBRES:	MIGUEL ANGEL PARRA	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA:		
OBSERVACION		

Consorcio Vías Nacionales	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	ITEM 450.2P

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vías para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

1	DATOS DE ELABORCIÓN DE REGISTRO

FECHA DE ELABORACIÓN:	30/01/2025		
RUTA 64-04	ASFALTO MDC - 19 (1 CAPA ESPESOR 7 CM)	PR 59+825 A 59+890	MARGEN : DERECHA/IZQUIERDA

CONTROL Y REGISTRO DE ASFALTO

Abscisa	Área de LLENO	Área Promedio	Volumen de lleno	Vol. lleno acumul.
K59 + 825.00	0.544	0.27		
K59 + 830.00	0.537	0.54	2.70	2.70
K59 + 840.00	0.522	0.53	5.29	7.99
K59 + 850.00	0.511	0.52	5.16	13.16
K59 + 860.00	0.511	0.51	5.11	18.27
K59 + 870.00	0.511	0.51	5.11	23.38
K59 + 880.00	0.511	0.51	5.11	28.49
K59 + 890.00	0.511	0.51	5.11	33.60

VOLUMEN TOTAL ASFALTO	33.60

REVISADO POR CONTRATISTA		APROBADO POR INTERVENTORÍA
INGENIERO RESIDENTE		INGENIERO RESIDENTE
NOMBRES:	MIGUEL ANGEL PARRA	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA:		

OBSERVACION

Consorcio Vías Nacionales	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	ITEM 450.2P

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vías para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

1	DATOS DE ELABORCIÓN DE REGISTRO

FECHA DE ELABORACIÓN:	30/01/2025		
RUTA 64-04	ASFALTO MDC - 19 (1 CAPA ESPESOR 7 CM)	PR 59+990 A 60+100	MARGEN : DERECHA/IZQUIERDA

CONTROL Y REGISTRO DE ASFALTO

Abscisa	Área de LLENO	Área Promedio	Volumen de lleno	Vol. lleno acumul.
K59 + 990.00	0.529	0.26		
K60 + 000.00	0.528	0.53	5.28	5.28
K60 + 010.00	0.528	0.53	5.28	10.57
K60 + 020.00	0.516	0.52	5.22	15.78
K60 + 030.00	0.510	0.51	5.13	20.91
K60 + 040.00	0.511	0.51	5.10	26.01
K60 + 050.00	0.561	0.54	5.36	31.38
K60 + 060.00	0.626	0.59	5.94	37.32
K60 + 070.00	0.626	0.63	6.26	43.58
K60 + 080.00	0.614	0.62	6.20	49.78
K60 + 090.00	0.526	0.57	5.70	55.48
K60 + 100.00	0.511	0.52	5.19	60.67

VOLUMEN TOTAL ASFALTO	60.67

REVISADO POR CONTRATISTA		APROBADO POR INTERVENTORÍA
INGENIERO RESIDENTE		INGENIERO RESIDENTE
NOMBRES:	MIGUEL ANGEL PARRA	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA:		

OBSERVACION

Consorcio Vías Nacionales	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	ITEM 450.2P

PROYECTO:	CONTRATO No. 0510-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental Sostenible del Corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vías para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

1	DATOS DE ELABORCIÓN DE REGISTRO

FECHA DE ELABORACIÓN:	30/01/2025		
RUTA 64-04	ASFALTO MDC - 19 (1 CAPA ESPESOR 7 CM)	PR 61+320 A 61+345	MARGEN : IZQUIERDA / DERECHA

CONTROL Y REGISTRO DE ASFALTO

Abscisa	Área de LLENO	Área Promedio	Volumen de lleno	Vol. lleno acumul.
K61 + 320.00	0.517	0.26		
K61 + 330.00	0.552	0.53	5.35	5.35
K61 + 345.00	0.571	0.56	8.42	13.76

VOLUMEN TOTAL ASFALTO	13.76

REVISADO POR CONTRATISTA		APROBADO POR INTERVENTORÍA
INGENIERO RESIDENTE		INGENIERO RESIDENTE
NOMBRES:	MIGUEL ANGEL PARRA	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA:		

OBSERVACION

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA	Cód: F-EO-009
		Versión: 001
	CONTRATO 0978 DE 2021	Fecha: 02/01/2020
		Pág: 1 de 1

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	31	**MM**	1	**AA**	2,025	**PERIODO:**	1 de enero de 2025		31 de enero de 2025	
CONTRATO:	0978 DE 2021						**OBJETO CONTRATO:**	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4			
CONTRATANTE:	INVIAS				**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA		**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES								19,969.50	629.90	20,599.40
ITEM:	600.1.1	GRUPO DE AJUSTE	11601	ESPECIF. GENERAL	600-13	ESPECIF. PARTICULAR		Excavaciones varias sin clasificar	**UNID:**	m3	**UBICACIÓN:** RUTA 6404 Y 6405

ESQUEMA

LOCALIZACIÓN				MARGEN	DESCRIPCIÓN	LONGITUD	ANCHO	ALTO	VOLUMEN
-	PR54+451	PR54+474	SOCOTA	DER	EXCAVACIÓN MURO (ACTA 43)	-	-	-	- 180.36
-	PR54+447	PR54+451	SOCOTA	DER	EXCAVACIÓN MURO	-	-	-	22.85
-	PR54+584	PR54+605	SOCOTA	DER	EXCAVACIÓN MURO	-	-	-	104.10
-	PR59+483	PR54+504	SOCOTA	DER	EXCAVACIÓN MURO	-	-	-	122.18
-	PR57+130	PR57+130	SOCOTA	DER	EXCAVACIÓN ALCANTARILLA	-	-	-	51.52
-	PR57+225	PR57+225	SOCOTA	DER - IZQ	EXCAVACIÓN ALCANTARILLA	-	-	-	162.92
-	PR60+082	PR60+082	SOCOTA	IZQ	EXCAVACIÓN ALCANTARILLA	-	-	-	119.46
-	PR60+200	PR60+200	SOCOTA	IZQ	EXCAVACIÓN ALCANTARILLA	-	-	-	50.73
-	PR60+200	PR60+200	SOCOTA	DER	EXCAVACIÓN ALCANTARILLA	-	-	-	11.69
-	PR60+365	PR60+365	SOCOTA	DER	EXCAVACIÓN ALCANTARILLA	-	-	-	122.01
-	PR60+785	PR60+785	SOCOTA	DER	EXCAVACIÓN ALCANTARILLA	-	-	-	34.77
-	PR59+840	PR59+850	SOCOTA	IZQ	EXCAVACIÓN FILTRO	10.00	0.80	1.00	8.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-
					Subtotal				**629.90**
					TOTAL				**629.90**

RESIDENTE DE OBRA

FIRMA:

NOMBRE: MIGUEL ANGEL PARRA
CONSORCIO VIAS NACIONALES

INTERVENTORIA

FIRMA:

NOMBRE: DIEGO FERNANDO RUANO FONSECA
CONSORCIO NTERVENTORIAS COLOMBIA

Consorcio Vías Nacionales	Excavaciones varias sin clasificar	ITEM 600.1.1

PROYECTO:	CONTRATO No. 0370-2021: Mejoramiento, Mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental Sostenible del Corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vías para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

1	DATOS DE ELABORCIÓN DE REGISTRO

FECHA DE ELABORACIÓN:	30/12/2024		
RUTA 64-04	EXCAVACION	PR 54+447	MARGEN : DERECHA

EXCAVACIÓN MURO

Abscisa	Área de Excavación	Área Promedio	Volumen de Excavación	Vol. Excavación acumul.
PR 54+447.21	6.7			
PR 54+448.00	4.74	5.72	4.52	4.52
PR 54+450.00	6.18	5.46	10.92	15.44
PR 54+451.38	4.6	5.39	7.41	22.85
		VOLUMEN TOTAL EXCAVACION		22.85

REVISADO POR CONTRATISTA		APROBADO POR INTERVENTORÍA
INGENIERO RESIDENTE		INGENIERO RESIDENTE
NOMBRES:	MIGUEL ANGEL PARRA	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA:		

Consorcio Vías Nacionales	Excavaciones varias sin clasificar	ITEM 600.1.1

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

1	DATOS DE ELABORCIÓN DE REGISTRO

FECHA DE ELABORACIÓN:	30/12/2024		
RUTA 64-04	EXCAVACION	54+600	MARGEN : DERECHA

EXCAVACIÓN MURO				
Abscisa	Área de Excavación	Área Promedio	Volumen de Excavación	Vol. Excavación acumul.
PR 54+584.07	1.19			
PR 54+585.52	4.91	3.05	4.42	4.42
PR 54+591.38	5.7	5.31	31.10	35.52
PR 54+591.71	5.6	5.65	1.83	37.35
PR 54+597.76	5.22	5.41	32.75	70.09
PR 54+598.19	4.62	4.92	2.12	72.21
PR 54+600.00	4.8	4.71	8.53	80.74
PR 54+604.06	5.6	5.19	21.03	101.77
PR 54+604.70	1.70	3.64	2.33	104.10
		VOLUMEN TOTAL EXCAVACION	104.10	104.84

REVISADO POR CONTRATISTA		APROBADO POR INTERVENTORÍA
INGENIERO RESIDENTE		INGENIERO RESIDENTE
NOMBRES:	MIGUEL ANGEL PARRA	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA:		

Consorcio Vías Nacionales	Excavaciones varias sin clasificar	ITEM 600.1.1

PROYECTO:	CONTRATO No. 0370-2021: Mejoramiento, Mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental Sostenible del Corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

1	DATOS DE ELABORCIÓN DE REGISTRO

FECHA DE ELABORACIÓN:	30/12/2024		
RUTA 64-04	EXCAVACION	PR 59+483	MARGEN : DERECHA

EXCAVACIÓN MURO

Abscisa	Área de Excavación	Área Promedio	Volumen de Excavación	Vol. Excavación acumul.
PR 54+483.34	0.56			
PR 54+485.00	6.51	3.54	5.87	5.87
PR 54+490.00	5.43	5.97	29.85	35.72
PR 54+495.00	5.03	5.23	26.15	61.87
PR 54+500.00	9.99	7.51	37.55	99.42
PR 54+503.95	1.53	5.76	22.76	122.18
		VOLUMEN TOTAL EXCAVACION		122.18

REVISADO POR CONTRATISTA		APROBADO POR INTERVENTORÍA
INGENIERO RESIDENTE		INGENIERO RESIDENTE
NOMBRES:	MIGUEL ANGEL PARRA	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA:		

Consorcio Vías Nacionales	Excavaciones varias sin clasificar	ITEM 600.1.1

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vías para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

1	DATOS DE ELABORCIÓN DE REGISTRO			
	FECHA DE ELABORACIÓN:	30/12/2024		
	RUTA 64-04	EXCAVACION	57+130	MARGEN : DERECHA

EXCAVACIÓN ALCANTARILLA				
Abscisa	**Área de Excavación**	**Área Promedio**	**Volumen de Excavación**	**Vol. Excavación acumul.**
PR 57+131.63	0.79			
PR 57+132.00	0.65	0.72	0.26	0.26
PR 57+133.00	4.39	2.52	2.52	2.78
PR 57+134.00	17.91	11.15	11.15	13.93
PR 57+135.00	18.39	18.15	18.15	32.08
PR 57+136.00	8.7	13.55	13.55	45.63
PR 57+137.00	3.08	5.89	5.89	51.52
		VOLUMEN TOTAL EXCAVACION		**51.52**

REVISADO POR CONTRATISTA		APROBADO POR INTERVENTORÍA
INGENIERO RESIDENTE		INGENIERO RESIDENTE
NOMBRES:	MIGUEL ANGEL PARRA	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA:		

Consorcio Vías Nacionales	Excavaciones varias sin clasificar	ITEM 600.1.1

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

1	DATOS DE ELABORCIÓN DE REGISTRO

FECHA DE ELABORACIÓN:	30/12/2024		
RUTA 64-04	EXCAVACION	57+225	MARGEN : DERECHA - IZQUIERDA

EXCAVACIÓN ALCANTARILLA

Abscisa	Área de Excavación	Área Promedio	Volumen de Excavación	Vol. Excavación acumul.
PR 57+222.00	1.59			
PR 57+223.00	6.39	3.99	3.99	3.99
PR 57+224.00	9.69	8.04	8.04	12.03
PR 57+225.00	37.75	23.72	23.72	35.75
PR 57+226.00	39.39	38.57	38.57	74.32
PR 57+227.00	31.89	35.64	35.64	109.96
PR 57+228.00	23.73	27.81	27.81	137.77
PR 57+229.00	13.0	18.35	18.35	156.12
PR 57+229.73	5.69	9.33	6.81	162.92
		VOLUMEN TOTAL EXCAVACION		162.92

REVISADO POR CONTRATISTA		APROBADO POR INTERVENTORÍA
INGENIERO RESIDENTE		INGENIERO RESIDENTE
NOMBRES:	MIGUEL ANGEL PARRA	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA:		

Consorcio Vías Nacionales	Excavaciones varias sin clasificar	ITEM 600.1.1

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Arlporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

1	DATOS DE ELABORCIÓN DE REGISTRO

FECHA DE ELABORACIÓN:	30/12/2024		
RUTA 64-04	EXCAVACION	60+082	MARGEN : IZQUIERDA

EXCAVACIÓN ALCANTARILLA

Abscisa	Área de Excavación	Área Promedio	Volumen de Excavación	Vol. Excavación acumul.
PR 60+079.09	2.88	1.44		
PR 60+080.00	6.45	4.67	4.26	4.26
PR 60+081.00	21.63	14.04	14.04	18.30
PR 60+082.00	25.46	23.55	23.55	41.85
PR 60+083.00	25.17	25.32	25.32	67.16
PR 60+084.00	20.74	22.96	22.96	90.12
PR 60+085.00	15.8	18.25	18.25	108.37
PR 60+086.00	3.99	9.88	9.88	118.24
PR 60+086.44	1.58	2.79	1.21	119.46
		VOLUMEN TOTAL EXCAVACION		119.46

REVISADO POR CONTRATISTA		APROBADO POR INTERVENTORÍA
INGENIERO RESIDENTE		INGENIERO RESIDENTE
NOMBRES:	MIGUEL ANGEL PARRA	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA:		

Consorcio Vías Nacionales	Excavaciones varias sin clasificar	ITEM 600.1.1

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

1	DATOS DE ELABORCIÓN DE REGISTRO

FECHA DE ELABORACIÓN:	30/12/2024		
RUTA 64-04	EXCAVACION	60+200	MARGEN : IZQUIERDA

EXCAVACIÓN ALCANTARILLA

Abscisa	Área de Excavación	Área Promedio	Volumen de Excavación	Vol. Excavación acumul.
PR 60+202.34	0	0.00		
PR 60+204.00	2.04	1.02	1.70	1.70
PR 60+206.24	17.46	9.75	21.83	23.53
PR 60+208.00	9.6	13.53	23.83	47.35
PR 60+208.46	5.23	7.42	3.37	50.73
		VOLUMEN TOTAL EXCAVACION		50.73

REVISADO POR CONTRATISTA		APROBADO POR INTERVENTORÍA
INGENIERO RESIDENTE		INGENIERO RESIDENTE
NOMBRES:	MIGUEL ANGEL PARRA	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA:		

Consorcio Vías Nacionales	Excavaciones varias sin clasificar	ITEM 600.1.1

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

1	DATOS DE ELABORCIÓN DE REGISTRO

FECHA DE ELABORACIÓN:	30/12/2024		
RUTA 64-04	EXCAVACION	60+200	MARGEN : DERECHA

EXCAVACIÓN ALCANTARILLA

Abscisa	Área de Excavación	Área Promedio	Volumen de Excavación	Vol. Excavación acumul.
PR 60+199.00	0.94	0.47		
PR 60+200.00	6.05	3.50	3.50	3.50
PR 60+200.30	9.32	7.69	2.30	5.79
PR 60+201.32	2.26	5.79	5.89	11.69
		VOLUMEN TOTAL EXCAVACION		11.69

REVISADO POR CONTRATISTA		APROBADO POR INTERVENTORÍA
INGENIERO RESIDENTE		INGENIERO RESIDENTE
NOMBRES:	MIGUEL ANGEL PARRA	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA:		

Consorcio Vías Nacionales	Excavaciones varias sin clasificar	ITEM 600.1.1

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

1	DATOS DE ELABORCIÓN DE REGISTRO

FECHA DE ELABORACIÓN:	30/12/2024		
RUTA 64-04	EXCAVACION	60+365	MARGEN : DERECHA

EXCAVACIÓN ALCANTARILLA				
Abscisa	Área de Excavación	Área Promedio	Volumen de Excavación	Vol. Excavación acumul.
PR 60+361.00	0	0.00		
PR 60+362.00	0.63	0.32	0.32	0.32
PR 60+363.00	2.21	1.42	1.42	1.74
PR 60+364.00	9.36	5.79	5.79	7.52
PR 60+365.00	11	10.18	10.18	17.70
PR 60+366.00	12.8	11.90	11.90	29.60
PR 60+367.00	19.6	16.22	16.22	45.82
PR 60+368.00	22.70	21.17	21.17	66.98
PR 60+369.00	23.80	23.25	23.25	90.23
PR 60+370.00	15.56	19.68	19.68	109.91
PR 60+370.99	8.83	12.20	12.10	122.01
		VOLUMEN TOTAL EXCAVACION		122.01

REVISADO POR CONTRATISTA		APROBADO POR INTERVENTORÍA
INGENIERO RESIDENTE		INGENIERO RESIDENTE
NOMBRES:	MIGUEL ANGEL PARRA	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA:		

Consorcio Vías Nacionales	Excavaciones varias sin clasificar	ITEM 600.1.1

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

1	DATOS DE ELABORCIÓN DE REGISTRO

FECHA DE ELABORACIÓN:	30/12/2024		
RUTA 64-04	EXCAVACION	60+785	MARGEN : DERECHA

EXCAVACIÓN ALCANTARILLA

Abscisa	Área de Excavación	Área Promedio	Volumen de Excavación	Vol. Excavación acumul.
PR 60+781.39	0.22	0.11		
PR 60+782.00	2.49	1.36	0.82	0.82
PR 60+783.00	5.76	4.13	4.13	4.95
PR 60+784.00	3.80	4.78	4.78	9.73
PR 60+785.00	3.87	3.84	3.84	13.57
PR 60+786.00	4.41	4.14	4.14	17.71
PR 60+787.00	8.1	6.25	6.25	23.96
PR 60+788.00	6.38	7.24	7.24	31.19
PR 60+789.00	0.75	3.57	3.57	34.76
PR 60+789.03	0.54	0.65	0.02	34.77
		VOLUMEN TOTAL EXCAVACION		34.77

REVISADO POR CONTRATISTA		APROBADO POR INTERVENTORÍA
INGENIERO RESIDENTE		INGENIERO RESIDENTE
NOMBRES:	MIGUEL ANGEL PARRA	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA:		

FECHA DE ELABORACION	30/01/2025

ACTIVIDAD DE FILTRO

ACTIVIDAD	ITEM	ABSCISA INICIO	ABSCISA FINAL	MARGEN	LONGITUD	ANCHO	ALTO	ÁREA (m2)	VOLUMEN (m3)
Excavaciones varias sin clasificar	600.1.1	PR 59+840.00	PR 59+850.00	IZQUIERDA	10.00	0.8	1	0.8	8.00
Material granular drenante	673.2	PR 59+840.00	PR 59+850.00	IZQUIERDA	10.00	0.8	0.8	0.64	6.40
Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm	663.3P	PR 59+840.00	PR 59+850.00	IZQUIERDA	10.00	----------	----------	----------	----------
Geotextil Tipo II no tejido	673.1	PR 59+840.00	PR 59+850.00	IZQUIERDA	10.00	3.2	----------	32.00	----------
Excavaciones varias en roca en seco	600.2.1	PR 59+840.00	PR 59+850.00	IZQUIERDA	_____	----------	----------	----------	____

CONTRATISTAS		INTERVENTORIA
INGENIERO RESIDENTE		INGENIERO RESIDENTE
NOMBRE	MIGUEL ANGEL PARRA	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA		

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA	Cód: F-EO-009
		Versión: 001
	CONTRATO 0978 DE 2021	Fecha: 02/01/2020
		Pág: 1 de 1

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	31	**MM**	1	**AA**	2,025	**PERIODO:**	1 de enero de 2025		31 de enero de 2025					
CONTRATO:	0978 DE 2021						**OBJETO CONTRATO:**	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4							
CONTRATANTE:	INVIAS				**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA				**ACUMULADO ANTERIOR:**		**PRESENTE ACTA:**		**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES										2979.80		170.00		3,149.80
ITEM:	610.2	GRUPO DE AJUSTE	11604	ESPECIF. GENERAL	610-13	ESPECIF. PARTICULAR		Relleno para Estructuras con Recebo			**UNID:**	m3		**UBICACIÓN:**	**RUTAS 6404**

ESQUEMA	**LOCALIZACIÓN**				**MARGEN**	**DESCRIPCIÓN**	**VOLUMEN POR VIAJE**	**VOLUMEN TOTAL**
	-	PR54+450	PR54+480	SOCOTA	DER	LLENO MURO (ACTA 43)	138	- 138.00
	-	PR54+483	PR54+504	SOCOTA	DER	LLENO MURO	124.18	124.18
	-	PR54+585	PR54+605	SOCOTA	DER	LLENO MURO	41.63	41.63
	-	PR58+140	PR58+140	SOCOTA	DER	LLENO ALCANTARILLA	22.50	22.50
	-	PR58+200	PR58+200	SOCOTA	DER	LLENO ALCANTARILLA	17.11	17.11
	-	PR58+298	PR58+298	SOCOTA	DER	LLENO ALCANTARILLA	54.00	54.00
	-	PR58+782	PR58+782	SOCOTA	DER	LLENO ALCANTARILLA	25.18	25.18
	-	PR58+870	PR58+870	SOCOTA	DER	LLENO ALCANTARILLA	23.36	23.36
	-	-	-	-	-	-	-	-
						Subtotal		**170.00**
						TOTAL		**170.00**

RESIDENTE DE OBRA

FIRMA:

NOMBRE: MIGUEL ANGEL PARRA
CONSORCIO VIAS NACIONALES

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

FIRMA:

NOMBRE: DIEGO FERNANDO RUANO FONSECA
CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA

Consorcio Vías Nacionales	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	ITEM 610.2

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

DATOS DE ELABORCIÓN DE REGISTRO

FECHA DE ELABORACIÓN:	30/11/2024		
RUTA 64-04	LLENO MURO	PR 54+483.34 A 54+503.96	MARGEN : DERECHA

CONTROL Y REGISTRO DE MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE (LLENO MURO)

Abscisa	Área de LLENO	Área Promedio	Volumen de lleno	Vol. lleno acumul.
PR 54+483.34	2.9	1.45		
PR 54+484.15	6.1	4.50	3.65	3.65
PR 54+490.00	7.6	6.85	40.07	43.72
PR 54+495.00	5.8	6.70	33.50	77.22
PR 54+501.83	5.62	5.71	39.00	116.22
PR 54+503.96	1.86	3.74	7.97	124.18

VOLUMEN TOTAL LLENO	124.18

REVISADO POR CONTRATISTA		APROBADO POR INTERVENTORÍA
	INGENIERO RESIDENTE	INGENIERO RESIDENTE
NOMBRES:	MIGUEL ANGEL PARRA	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA:		

OBSERVACION

Consorcio Vías Nacionales	Relleno para estructuras con recebo	ITEM 610.2

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

60+001	DATOS DE ELABORCIÓN DE REGISTRO

FECHA DE ELABORACIÓN:	30/01/2025		
RUTA 64-04	RECEBO	PR 54+585.4 A 54+604.06	MARGEN :DERECHA

MURO				
Abscisa	Área de LLENO	Área Promedio	Volumen de lleno	Vol. lleno acumul.
PR 54+585,00	1,112	0,56		
PR 54+585,39	1,993	1,55	0,61	0,61
PR 54+591,39	2,313	2,15	12,92	13,52
PR 54+591,71	2,403	2,36	0,75	14,28
PR 54+597,76	2,252	2,33	14,08	28,36
PR 54+598,19	1,815	2,03	0,87	29,23
PR 54+600,00	1,862	1,84	3,33	32,56
PR 54+604,06	2,226	2,04	8,30	40,86
PR 54+604,70	0,189	1,21	0,77	41,63
		VOLUMEN LLENO		41,63

REVISADO POR CONTRATISTA		APROBADO POR INTERVENTORÍA
	INGENIERO RESIDENTE	INGENIERO RESIDENTE
NOMBRES:	MIGUEL ANGEL PARRA	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA:		
OBSERVACION		

Consorcio Vías Nacionales	Relleno para estructuras con recebo	ITEM 610.2

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

60+001	DATOS DE ELABORCIÓN DE REGISTRO

FECHA DE ELABORACIÓN:	30/01/2025		
RUTA 64-04	RECEBO	PR 58+140	MARGEN :DERECHA

Abscisa	Área de LLENO	Área Promedio	Volumen de lleno	Vol. lleno acumul.
PR 58+132,11	2,1			
PR 58+133,00	2,6	2,35	2,09	2,09
PR 58+134,00	2,5	2,55	2,55	4,64
PR 58+135,00	2,4	2,45	2,45	7,09
PR 58+136,00	1,7	2,05	2,05	9,14
PR 58+137,00	1,7	1,70	1,70	10,84
PR 58+138,00	2,11	1,91	1,91	12,74
PR 58+139,00	3,5	2,81	2,81	15,55
PR 58+140,00	2,3	2,90	2,90	18,45
PR 58+141,00	2,5	2,40	2,40	20,85
PR 58+142,00	0,8	1,65	1,65	22,50
		VOLUMEN LLENO		22,50

REVISADO POR CONTRATISTA		APROBADO POR INTERVENTORÍA
	INGENIERO RESIDENTE	INGENIERO RESIDENTE
NOMBRES:	MIGUEL ANGEL PARRA	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA:		
OBSERVACION		

Consorcio Vías Nacionales	Relleno para estructuras con recebo	ITEM 610.2

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

60+001	DATOS DE ELABORCIÓN DE REGISTRO

FECHA DE ELABORACIÓN:	30/01/2025		
RUTA 64-04	RECEBO	PR 58+200	MARGEN :DERECHA

Abscisa	Área de LLENO	Área Promedio	Volumen de lleno	Vol. lleno acumul.
PR 58+197,27	0			
PR 58+198,00	3,47	1,74	1,27	1,27
PR 58+199,00	4,46	3,97	3,97	5,23
PR 58+200,00	2,79	3,63	3,63	8,86
PR 58+201,00	2,69	2,74	2,74	11,60
PR 58+202,00	2,7	2,70	2,70	14,29
PR 58+203,00	0,89	1,80	1,80	16,09
PR 58+204,00	0,92	0,91	0,91	16,99
PR 58+204,15	0,69	0,81	0,12	17,11
		VOLUMEN LLENO		17,11

REVISADO POR CONTRATISTA		APROBADO POR INTERVENTORÍA
	INGENIERO RESIDENTE	INGENIERO RESIDENTE
NOMBRES:	MIGUEL ANGEL PARRA	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA:		
OBSERVACION		

Consorcio Vías Nacionales	Relleno para estructuras con recebo	ITEM 610.2

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vías para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

60+001	DATOS DE ELABORCIÓN DE REGISTRO

FECHA DE ELABORACIÓN:	30/01/2025		
RUTA 64-04	RECEBO	PR 58+298	MARGEN :DERECHA

Abscisa	Área de LLENO	Área Promedio	Volumen de lleno	Vol. lleno acumul.
PR 58+292,39	0,04			
PR 58+293,00	0,99	0,52	0,31	0,31
PR 58+294,00	6,18	3,59	3,59	3,90
PR 58+295,00	6,32	6,25	6,25	10,15
PR 58+296,00	5,05	5,69	5,69	15,83
PR 58+297,00	5,76	5,41	5,41	21,24
PR 58+298,00	6,51	6,14	6,14	27,37
PR 58+299,00	8,8	7,66	7,66	35,03
PR 58+300,00	10,49	9,65	9,65	44,67
PR 58+301,00	8,17	9,33	9,33	54,00
		VOLUMEN LLENO		54,00

REVISADO POR CONTRATISTA		APROBADO POR INTERVENTORÍA
	INGENIERO RESIDENTE	INGENIERO RESIDENTE
NOMBRES:	MIGUEL ANGEL PARRA	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA:		

OBSERVACION

Consorcio Vías Nacionales	Relleno para estructuras con recebo	ITEM 610.2

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

60+001	DATOS DE ELABORCIÓN DE REGISTRO

FECHA DE ELABORACIÓN:	30/01/2025		
RUTA 64-04	RECEBO	PR 58+782	MARGEN :DERECHA

Abscisa	Área de LLENO	Área Promedio	Volumen de lleno	Vol. lleno acumul.
PR 58+779,34	2,92			
PR 58+780,00	3,81	3,37	2,21	2,21
PR 58+781,00	4,62	4,22	4,22	6,43
PR 58+782,00	5	4,81	4,81	11,24
PR 58+783,00	6,79	5,90	5,90	17,13
PR 58+784,00	5,3	6,05	6,05	23,18
PR 58+784,66	0,82	3,06	2,00	25,18
		VOLUMEN LLENO		25,18

REVISADO POR CONTRATISTA		APROBADO POR INTERVENTORÍA
	INGENIERO RESIDENTE	INGENIERO RESIDENTE
NOMBRES:	MIGUEL ANGEL PARRA	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA:		

OBSERVACION

Consorcio Vías Nacionales	Relleno para estructuras con recebo	ITEM 610.2
PROYECTO:	CONTRATO No: 0976-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"	

60+001	DATOS DE ELABORCIÓN DE REGISTRO			
	FECHA DE ELABORACIÓN:	30/01/2025		
	RUTA 64-04	RECEBO	PR 58+870	MARGEN :DERECHA

Abscisa	Área de LLENO	Área Promedio	Volumen de lleno	Vol. lleno acumul.
PR 58+868,95	9,4			
PR 58+869,00	7,5	8,45	0,43	0,43
PR 58+870,00	9,5	8,50	8,50	8,93
PR 58+871,00	7,6	8,55	8,55	17,48
PR 58+872,00	4,7	6,15	6,15	23,63
PR 58+872,70	3,1	3,90	2,73	26,36
		VOLUMEN LLENO		26,36

REVISADO POR CONTRATISTA		APROBADO POR INTERVENTORÍA
	INGENIERO RESIDENTE	INGENIERO RESIDENTE
NOMBRES:	MIGUEL ANGEL PARRA	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA:		
OBSERVACION		

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA	Cód: F-EO-009
		Versión: 001
	CONTRATO 0978 DE 2021	Fecha: 02/01/2020
		Pág: 1 de 1

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	31	**MM**	1	**AA**	2,025	**PERIODO:**	1 de enero de 2025		31 de enero de 2025			
CONTRATO:	0978 DE 2021						**OBJETO CONTRATO:**	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4					
CONTRATANTE:	INVIAS				**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA			**ACUMULADO ANTERIOR:**		**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES									1,230.80		48.40	1,279.20
ITEM:	630.30	GRUPO DE AJUSTE	11604	ESPECIF. GENERAL	630-13	ESPECIF. PARTICULAR		Concreto clase 28 MPA		**UNID:**	m3	**UBICACIÓN:**	**RUTA 6404**

ESQUEMA

LOCALIZACIÓN				LARGO	ANCHO	ESPESOR	MARGEN	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
MODULO 1	PR54+468	PR54+474	SOCOTA	6.00	3.00	0.35	DER	ZARPA (ACTA 43)	- 6.30
MODULO 1	PR54+468	PR54+474	SOCOTA	6.00	0.50	0.25	DER	DENTELLON (ACTA 43)	- 0.75
MODULO 2	PR54+468	PR54+474	SOCOTA	6.00	3.00	0.35	DER	ZARPA (ACTA 43)	- 6.30
MODULO 2	PR54+468	PR54+474	SOCOTA	6.00	0.50	0.25	DER	DENTELLON (ACTA 43)	- 0.75
MODULO 3	PR54+468	PR54+474	SOCOTA	6.00	3.00	0.35	DER	ZARPA (ACTA 43)	- 6.30
MODULO 3	PR54+468	PR54+474	SOCOTA	6.00	0.50	0.25	DER	DENTELLON (ACTA 43)	- 0.75
MODULO 1	PR54+468	PR54+474	SOCOTA	6.00	2.80	0.25	DER	VASTAGO (ACTA 43)	- 4.20
MODULO 2	PR54+468	PR54+474	SOCOTA	6.00	2.80	0.25	DER	VASTAGO (ACTA 43)	- 4.20
MODULO 3	PR54+468	PR54+474	SOCOTA	6.00	2.80	0.25	DER	VASTAGO (ACTA 43)	- 4.20
MODULO 4	PR54+468	PR54+474	SOCOTA	6.00	2.80	0.25	DER	VASTAGO (ACTA 43)	- 4.20
MODULO 5	PR54+468	PR54+474	SOCOTA	6.00	2.80	0.25	DER	VASTAGO (ACTA 43)	- 4.20
MODULO 1	PR54+486	PR54+508	SOCOTA	6.00	3.00	0.35	DER	ZARPA (ACTA 43)	- 6.30
MODULO 1	PR54+486	PR54+508	SOCOTA	6.00	0.50	0.25	DER	DENTELLON (ACTA 43)	- 0.75
MODULO 2	PR54+486	PR54+508	SOCOTA	6.00	3.00	0.35	DER	ZARPA (ACTA 43)	- 6.30
MODULO 2	PR54+486	PR54+508	SOCOTA	6.00	0.50	0.25	DER	DENTELLON (ACTA 43)	- 0.75
MODULO 3	PR54+486	PR54+508	SOCOTA	6.00	3.00	0.35	DER	ZARPA (ACTA 43)	- 6.30
MODULO 3	PR54+486	PR54+508	SOCOTA	6.00	0.50	0.25	DER	DENTELLON (ACTA 43)	- 0.75
MODULO 1	PR54+486	PR54+508	SOCOTA	6.00	2.80	0.25	DER	VASTAGO (ACTA 43)	- 4.20
MODULO 2	PR54+486	PR54+508	SOCOTA	6.00	2.80	0.25	DER	VASTAGO (ACTA 43)	- 4.20
MODULO 3	PR54+486	PR54+508	SOCOTA	6.00	2.80	0.25	DER	VASTAGO (ACTA 43)	- 4.20
MODULO 1	PR54+595	PR54+613	SOCOTA	6.00	1.95	0.25	DER	ZARPA (ACTA 43)	- 2.93
MODULO 1	PR54+595	PR54+613	SOCOTA	6.00	0.40	0.25	DER	DENTELLON (ACTA 43)	- 0.60
MODULO 2	PR54+595	PR54+613	SOCOTA	6.00	1.95	0.25	DER	ZARPA (ACTA 43)	- 2.93
MODULO 2	PR54+595	PR54+613	SOCOTA	6.00	0.40	0.25	DER	DENTELLON (ACTA 43)	- 0.60
MODULO 3	PR54+595	PR54+613	SOCOTA	6.00	1.95	0.25	DER	ZARPA (ACTA 43)	- 2.93
MODULO 3	PR54+595	PR54+613	SOCOTA	6.00	0.40	0.25	DER	DENTELLON (ACTA 43)	- 0.60
MODULO 1	PR54+595	PR54+613	SOCOTA	6.00	2.00	0.25	DER	VASTAGO (ACTA 43)	- 3.00
MODULO 2	PR54+595	PR54+613	SOCOTA	6.00	2.00	0.25	DER	VASTAGO (ACTA 43)	- 3.00
MODULO 3	PR54+595	PR54+613	SOCOTA	6.00	2.00	0.25	DER	VASTAGO (ACTA 43)	- 3.00
MODULO 1	PR54+468	PR54+474	SOCOTA	6.00	3.30	0.35	DER	ZARPA	6.93
MODULO 1	PR54+468	PR54+474	SOCOTA	6.00	0.50	0.25	DER	DENTELLON	0.75
MODULO 1	PR54+468	PR54+474	SOCOTA	6.00	2.60	0.25	DER	VASTAGO	3.66
MODULO 2	PR54+468	PR54+474	SOCOTA	6.00	3.00	0.35	DER	ZARPA	6.30
MODULO 2	PR54+468	PR54+474	SOCOTA	6.00	0.50	0.25	DER	DENTELLON	0.75
MODULO 2	PR54+468	PR54+474	SOCOTA	6.00	2.88	0.25	DER	VASTAGO	4.32
MODULO 3	PR54+468	PR54+474	SOCOTA	6.00	3.00	0.35	DER	ZARPA	6.30
MODULO 3	PR54+468	PR54+474	SOCOTA	6.00	0.50	0.25	DER	DENTELLON	0.75

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA	Cód: F-EO-009
		Versión: 001
	CONTRATO 0978 DE 2021	Fecha: 02/01/2020
		Pág: 1 de 1

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	31	**MM**	1	**AA**	2,025	**PERIODO:**	1 de enero de 2025		31 de enero de 2025			
CONTRATO:	0978 DE 2021						**OBJETO CONTRATO:**	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4					
CONTRATANTE:	INVIAS				**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA			**ACUMULADO ANTERIOR:**		**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES									1,230.80		48.40	1,279.20
ITEM:	630.30	GRUPO DE AJUSTE	11604	ESPECIF. GENERAL	630-13	ESPECIF. PARTICULAR		Concreto clase 28 MPA		**UNID:**	m3	**UBICACIÓN:**	**RUTA 6404**

ESQUEMA

LOCALIZACIÓN				LARGO	ANCHO	ESPESOR	MARGEN	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
MODULO 3	PR54+468	PR54+474	SOCOTA	6.00	2.80	0.25	DER	VASTAGO	4.20
MODULO 4	PR54+468	PR54+474	SOCOTA	6.00	2.80	0.25	DER	VASTAGO	4.20
MODULO 5	PR54+468	PR54+474	SOCOTA	6.00	2.80	0.25	DER	VASTAGO	4.20
MODULO 1	PR54+486	PR54+508	SOCOTA	6.00	3.00	0.35	DER	ZARPA	6.30
MODULO 1	PR54+486	PR54+508	SOCOTA	6.00	0.50	0.25	DER	DENTELLON	0.75
MODULO 1	PR54+486	PR54+508	SOCOTA	6.00	2.90	0.25	DER	VASTAGO	4.35
MODULO 2	PR54+486	PR54+508	SOCOTA	6.00	3.00	0.35	DER	ZARPA	6.30
MODULO 2	PR54+486	PR54+508	SOCOTA	6.00	0.50	0.25	DER	DENTELLON	0.75
MODULO 2	PR54+486	PR54+508	SOCOTA	6.00	2.80	0.25	DER	VASTAGO	4.20
MODULO 3	PR54+486	PR54+508	SOCOTA	6.00	3.00	0.35	DER	ZARPA	6.30
MODULO 3	PR54+486	PR54+508	SOCOTA	6.00	0.50	0.25	DER	DENTELLON	0.75
MODULO 3	PR54+486	PR54+508	SOCOTA	6.00	2.80	0.25	DER	VASTAGO	4.20
MODULO 4	PR54+486	PR54+508	SOCOTA	4.20	4.00	0.35	DER	ZARPA	5.88
MODULO 4	PR54+486	PR54+508	SOCOTA	4.20	0.50	0.25	DER	DENTELLON	0.53
MODULO 4	PR54+486	PR54+508	SOCOTA	4.20	3.00	0.25	DER	VASTAGO	3.15
MODULO 1	PR54+595	PR54+613	SOCOTA	6.00	1.95	0.25	DER	ZARPA	2.93
MODULO 1	PR54+595	PR54+613	SOCOTA	6.00	0.40	0.25	DER	DENTELLON	0.60
MODULO 1	PR54+595	PR54+613	SOCOTA	6.00	2.20	0.25	DER	VASTAGO	3.30
MODULO 2	PR54+595	PR54+613	SOCOTA	6.00	1.95	0.25	DER	ZARPA	2.93
MODULO 2	PR54+595	PR54+613	SOCOTA	6.00	0.40	0.25	DER	DENTELLON	0.60
MODULO 3	PR54+595	PR54+613	SOCOTA	6.00	1.95	0.25	DER	ZARPA	2.93
MODULO 3	PR54+595	PR54+613	SOCOTA	6.00	0.40	0.25	DER	DENTELLON	0.60
MODULO 3	PR54+595	PR54+613	SOCOTA	6.00	2.25	0.25	DER	VASTAGO	3.38
ODT	PR59+849	PR59+849	SOCOTA	-	-	-	IZQ	DESCOLE	5.23
ODT	PR60+083	PR60+083	SOCOTA	-	-	-	IZQ	DESCOLE	4.76
ODT	PR60+369	PR60+369	SOCOTA	-	-	-	DER	DESCOLE	16.66
ODT	PR60+786	PR60+786	SOCOTA	-	-	-	DER	DESCOLE	4.74
ODT	PR50+565	PR50+565	SOCOTA	-	-	-	DER	ENCOLE	2.85
-	PR54+452	PR54+452	SOCOTA	-	-	-	DER	POCETA AGUAS NEGRAS	0.35
-	PR54+452	PR54+452	SOCOTA	-	-	-	DER	POCETA AGUAS NEGRAS	0.08
-	PR54+462	PR54+462	SOCOTA	-	-	-	DER	POCETA AGUAS NEGRAS	0.67
ODT	PR60+083	PR60+083	SOCOTA	-	-	-	DER	DESCOLE	5.47
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-
								Subtotal	**48.40**
								TOTAL	**48.40**

RESIDENTE DE OBRA

FIRMA:

NOMBRE: MIGUEL ANGEL PARRA
CONSORCIO VIAS NACIONALES

INTERVENTORIA

FIRMA:

NOMBRE: DIEGO FERNANDO RUANO FONSECA
CONSORCIO NTERVENTORIAS COLOMBIA

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL Y ACEPTACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	Codigo: INV978-F-EC-014 Fecha: 17/11/2022 Version: 02 Hoja: ___ de ___

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

ODT	54+468/474	MARGEN	DERECHA	FECHA DE ELABORACION	27/12/2024

	OPERACIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES					FECHA DE EJECUCIÓN	FIRMA INTERVENTORÍA
1	SOLADOS EN CONCRETO									
1.1	Concreto clase 14 Mpa (Item 630.7)			ANCHO (m)	ESPESOR	LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	SOLADO MODULO 0			2.75	0.17	6.00	2.81			
	SOLADO MODULO 1			2.75	0.10	6.00	1.65			
				TOTAL CONCRETO			4.46			
2	TUBERIA									
2.1	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III de 900mm de diámetro interior (Item 661.7)			CANT	LONG (m)		LONGTUD (M)	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	TUBERIA									
				TOTAL TUBERIA (M)						
3	ACEROS DE REFUERZO									
3.1	Acero de refuerzo fy= 420 Mpa (Item 640.1)			CANT	LONG (m)	Kg/m	Peso (Kg)	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	ZARPA MODULO 1			30.00	3.30	0.994	98.41			
	ZARPA MODULO 1			16.00	6.00	0.994	95.42			
	ZARPA MODULO 1			48.00	3.40	1.552	253.29			
	ZARPA MODULO 1			16.00	6.00	0.994	95.42			
	DENTELLON MODULO1			6.00	6.00	0.994	35.78	MODULO 1		
	VASTAGO MODULO 1			48.00	4.00	2.235	429.12			
	VASTAGO MODULO 1			30.00	3.80	0.994	113.32			
	CORREAS MODULO 1			20.00	6.00	0.994	119.28			
	DESCUENTO TUBERIA MODULO 1			-18.00	1.00	0.994	-17.89			
	ZARPA MODULO 2			30.00	3.30	0.994	98.41			
	ZARPA MODULO 2			16.00	6.00	0.994	95.42			
	ZARPA MODULO 2			48.00	3.40	1.552	253.29			
	ZARPA MODULO 2			16.00	6.00	0.994	95.42	MUDULO 2		
	DENTELLON MODULO 2			6.00	6.00	0.994	35.78			
	VASTAGO MODULO 2			50.00	4.20	2.235	469.35			
	VASTAGO MODULO 2			30.00	4.00	0.994	119.28			
	CORREAS MODULO 2			24.00	6.00	0.994	143.14			
	CORREAS MODULO 3			31.00	6.00	0.994	184.88	MODULO 3		
	CORREAS MODULO 4			29.00	6.00	0.994	172.96	MODULO 4		
	ZARPA MODULO 5			30.00	3.25	0.994	96.92			
	ZARPA MODULO 5			16.00	6.00	0.994	95.42			
	ZARPA MODULO 5			48.00	3.30	1.552	245.84			
	ZARPA MODULO 5			16.00	6.00	0.994	95.42	MODULO 5		
	DENTELLON MODULO 5			6.00	6.00	0.994	35.78			
	VASTAGO MODULO 5			50.00	4.20	2.235	469.35			
	VASTAGO MODULO 5			30.00	4.00	0.994	119.28			
	CORREAS MODULO 5			23.00	6.00	0.994	137.17			
				TOTAL ACERO (Kg)			4185.26			

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL Y ACEPTACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	Codigo: INV978-F-EO-014
		Fecha: 17/11/2022
		Version: 02
		Hoja: ___ de ___

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

ODT	54+468/474	MARGEN	DERECHA	FECHA DE ELABORACION	27/12/2024

	OPERACIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES					FECHA DE EJECUCIÓN	FIRMA INTERVENTORÍA
5	ESTRUCTURA EN CONCRETO									
5.1	**Concreto clase 28 Mpa (Item 630.3)**			ANCHO	ESPESOR	LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	ZARPA MODULO1			3.30	0.35	6.00	6.93	*MODULO 1 TRAMO 1*		
	DENTELLON MODULO 1			0.50	0.25	6.00	0.75			
	VASTAGO MODULO 1			2.60	0.25	6.00	3.90			
	DESCUENTO TUBERIA MODULO 1						-0.24			
	ZARPA MODULO 2			3.00	0.35	6.00	6.30	*MODULO 2 TRAMO 2*		
	DENTELLON MODULO 2			0.50	0.25	6.00	0.75			
	VASTAGO MODULO 2			2.88	0.25	6.00	4.32			
	ZARPA MODULO 3			3.00	0.35	6.00	6.30	*MODULO 3 TRAMO 2*		
	DENTELLON MODULO 3			0.50	0.25	6.00	0.75			
	VASTAGO MODULO 3			2.80	0.25	6.00	4.20			
	VASTAGO MODULO 4			2.80	0.25	6.00	4.20	*MODULO 5 TRAMO 1*		
	VASTAGO MODULO 5			2.80	0.25	6.00	4.20			
				TOTAL CONCRETO			42.36			

	REVISADO POR CONTRATISTA	APROBADO POR INTERVENTORIA
	RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRES	MIGUEL PARRA	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA		

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL Y ACEPTACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	Codigo: INV978-F-EO-014
		Fecha: 17/11/2022
		Version: 02
		Hoja: ___ de ___

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vías para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"								
ODT	54+486/508						MARGEN	DERECHA	FECHA DE ELABORACION: 27/12/2024

	OPERACIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES					FECHA DE EJECUCIÓN	FIRMA INTERVENTORÍA
1	SOLADOS EN CONCRETO									
1.1	Concreto clase 14 Mpa (Item 630.7)		CANT.	ANCHO (m)	ESPESOR	LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	SOLADO MODULO 1,2,3		3	2.75	0.10	6.00	4.95			
	SOLADO MODULO 4			2.75	0.10	4.00	1.10			
				TOTAL CONCRETO			6.05			
2	TUBERIA									
2.1	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior (Item 661.7)			CANT	LONG (m)		LONGTUD (M)	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	TUBERIA									
				TOTAL TUBERIA (M)						
3	ACEROS DE REFUERZO									
3.1	Acero de refuerzo fy= 420 Mpa (Item 640.1)			CANT	LONG (m)	Kg/m	Peso (Kg)	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	ZARPA MODULO 1			48.00	3.30	1.552	245.84			
	ZARPA MODULO 1			16.00	6.00	0.994	95.42			
	ZARPA MODULO 1			16.00	6.00	0.994	95.42			
	ZARPA MODULO 1			30.00	3.25	0.994	96.92	MODULO 1 TRAMO2		
	DENTELLON MODULO1			6.00	6.00	0.994	35.78			
	VASTAGO MODULO 1			50.00	4.20	2.235	469.35			
	VASTAGO MODULO 1			30.00	4.00	0.994	119.28			
	CORREAS MODULO 1			24.00	6.00	0.994	143.14			
	ZARPA MODULO 2			48.00	3.30	1.552	245.84			
	ZARPA MODULO 2			16.00	6.00	0.994	95.42			
	ZARPA MODULO 2			16.00	6.00	0.994	95.42			
	ZARPA MODULO 2			30.00	3.25	0.994	96.92	MODULO 2 TRAMO 2		
	DENTELLON MODULO 2			6.00	6.00	0.994	35.78			
	VASTAGO MODULO 2			50.00	4.20	2.235	469.35			
	VASTAGO MODULO 2			30.00	4.00	0.994	119.28			
	CORREAS MODULO 2			28.00	6.00	0.994	166.99			
	ZARPA MODULO 3			48.00	3.30	1.552	245.84			
	ZARPA MODULO 3			16.00	6.00	0.994	95.42			
	ZARPA MODULO 3			16.00	6.00	0.994	95.42			
	ZARPA MODULO 3			30.00	3.25	0.994	96.92	MODULO 3 TRAMO 2		
	DENTELLON MODULO 3			6.00	6.00	0.994	35.78			
	VASTAGO MODULO 3			48.00	4.20	2.235	450.58			
	VASTAGO MODULO 3			30.00	4.00	0.994	119.28			
	CORREAS MODULO 3			24.00	6.00	0.994	143.14			
	ZARPA MODULO 4			21.00	4.00	0.994	83.50			
	ZARPA MODULO 4			21.00	4.00	0.994	83.50			
	ZARPA MODULO 4			32.00	3.40	1.552	168.86			
	ZARPA MODULO 4			21.00	3.30	0.994	68.88	MODULO 4 TRAMO 2		
	DENTELLON MODULO 4			30.00	4.20	2.235	281.61			
	VASTAGO MODULO 4			21.00	4.00	0.994	83.50			
	CORREAS MODULO 3			6.00	4.00	0.994	23.86			
	CORREAS MODULO 3			30.00	4.00	0.994	119.28			
				TOTAL ACERO (Kg)			4821.51			

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL Y ACEPTACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	Codigo: INV978-F-EO-014 Fecha: 17/11/2022 Version: 02 Hoja: ___ de ___

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

ODT	54+486/508	MARGEN	DERECHA	FECHA DE ELABORACION	27/12/2024

	OPERACIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES					FECHA DE EJECUCIÓN	FIRMA INTERVENTORÍA
4	**ESTRUCTURA EN CONCRETO**									
4.1	**Concreto clase 28 Mpa (Item 630.3)**			ANCHO , ALTO	ESPESOR	LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	ZARPA MODULO1			3.00	0.35	6.00	6.30	MODULO 1 TRAMO 2		
	DENTELLON MODULO 1			0.50	0.25	6.00	0.75			
	VASTAGO MODULO 1			2.90	0.25	6.00	4.35			
	ZARPA MODULO 2			3.00	0.35	6.00	6.30	MODULO 2 TRAMO 2		
	DENTELLON MODULO 2			0.50	0.25	6.00	0.75			
	VASTAGO MODULO 2			2.80	0.25	6.00	4.20			
	ZARPA MODULO 3			3.00	0.35	6.00	6.30	MODULO 3TRAMO 2		
	DENTELLON MODULO 3			0.50	0.25	6.00	0.75			
	VASTAGO MODULO 3			2.80	0.25	6.00	4.20			
	ZARPA MODULO 4			4.00	0.35	4.20	5.88	MODULO 4TRAMO 3		
	DENTELLON MODULO 4			0.50	0.25	4.20	0.53			
	VASTAGO MODULO 4			3.00	0.25	4.20	3.15			
				TOTAL CONCRETO			43.46			

	REVISADO POR CONTRATISTA	APROBADO POR INTERVENTORIA
	RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRES	MIGUEL PARRA	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA		

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL Y ACEPTACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	Codigo: INV978-F-EO-014
		Fecha: 17/11/2022
		Version: 02
		Hoja: ___ de ___

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

ODT	54+595/613	MARGEN	DERECHA	FECHA DE ELABORACION	27/12/2024

	OPERACIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES					FECHA DE EJECUCIÓN	FIRMA INTERVENTORÍA
1	SOLADOS EN CONCRETO									
1.1	Concreto clase 14 Mpa (Item 630.7)		CANT.	ANCHO (m)	ESPESOR	LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	SOLADO MODULO 1,2,3		3	1.70	0.10	6.00	3.06			
				TOTAL CONCRETO			3.06			
2	TUBERIA									
2.1	Tuberia de Concreto Reforzado CLASE III de 900mm de diámetro interior (Item 661.7)			CANT	LONG (m)		LONGTUD (M)	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	TUBERIA									
				TOTAL TUBERIA (M)						
3	ACEROS DE REFUERZO									
3.1	Acero de refuerzo fy= 420 Mpa (Item 640.1)			CANT	LONG (m)	Kg/m	Peso (Kg)	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	ZARPA MODULO 1			41.00	2.10	0.994	85.58			
	ZARPA MODULO 1			41.00	2.10	0.560	48.22			
	ZARPA MODULO 1			13.00	6.00	0.560	43.68			
	ZARPA MODULO 1			13.00	6.00	0.560	43.68	MODULO 1 TRAMO 4		
	DENTELLON MODULO1			6.00	6.00	0.560	20.16			
	VASTAGO MODULO 1			40.00	2.90	0.994	115.30			
	VASTAGO MODULO 1			40.00	2.80	0.560	62.72			
	CORREAS MODULO 1			24.00	6.00	0.560	80.64			
	ZARPA MODULO 2			41.00	2.10	0.994	85.58			
	ZARPA MODULO 2			41.00	2.10	0.560	48.22			
	ZARPA MODULO 2			13.00	6.00	0.560	43.68			
	ZARPA MODULO 2			13.00	6.00	0.560	43.68	MODULO 2 TRAMO 4		
	DENTELLON MODULO 2			6.00	6.00	0.560	20.16			
	VASTAGO MODULO 2			40.00	2.90	0.994	115.30			
	VASTAGO MODULO 2			40.00	2.80	0.560	62.72			
	CORREAS MODULO 2			24.00	6.00	0.560	80.64			
	ZARPA MODULO 3			41.00	2.10	0.995	85.67			
	ZARPA MODULO 3			41.00	2.10	0.560	48.22			
	ZARPA MODULO 3			13.00	6.00	0.560	43.68			
	ZARPA MODULO 3			13.00	6.00	0.560	43.68	MODULO 23TRAMO 4		
	DENTELLON MODULO 3			6.00	6.00	0.560	20.16			
	VASTAGO MODULO 3			40.00	2.90	0.994	115.30			
	VASTAGO MODULO 3			40.00	2.80	0.560	62.72			
	CORREAS MODULO 3			24.00	6.00	0.560	80.64			
				TOTAL ACERO (Kg)			1500.04			
4	ESTRUCTURA EN CONCRETO									
4.1	Concreto clase 28 Mpa (Item 630.3)			ANCHO , ALTO	ESPESOR	LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	ZARPA MODULO1			1.95	0.25	6.00	2.93			
	DENTELLON MODULO 1			0.40	0.25	6.00	0.60	MODULO 1 TRAMO 4		
	VASTAGO MODULO 1			2.20	0.25	6.00	3.30			
	ZARPA MODULO 2			1.95	0.25	6.00	2.93	MODULO 2 TRAMO 4		
	DENTELLON MODULO 2			0.40	0.25	6.00	0.60			
	ZARPA MODULO 3			1.95	0.25	6.00	2.93			
	DENTELLON MODULO 3			0.40	0.25	6.00	0.60	MODULO 3 TRAMO 4		
	VASTAGO MODULO 3			2.25	0.25	6.00	3.38			
				TOTAL CONCRETO			17.25			

	REVISADO POR CONTRATISTA	APROBADO POR INTERVENTORIA
	RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRES	MIGUEL PARRA	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA		

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL Y ACEPTACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	Codigo: INV978-F-EO-014 Fecha: 17/11/2022 Version: 02 Hoja: ___ de ___

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

ODT	59+849	MARGEN	IZQUIERDA	FECHA DE ELABORACION	17/12/2024

	OPERACIÓN	NO	OBSERVACIONES					FECHA DE EJECUCIÓN	FIRMA INTERVENTORÍA
1	SOLADOS EN CONCRETO								
1.1	Concreto clase 14 Mpa (Item 630.6)		ANCHO (m)	ESPESOR	LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	SOLADO		3.56	0.10	1.45	0.52			
			TOTAL CONCRETO			0.52			
2	ACEROS DE REFUERZO								
2.1	Acero de refuerzo fy= 420 Mpa (Item 640.1)		CANT	LONG (m)	Kg/m	Peso (Kg)	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	POSICIÓN 1		8.00	5.70	0.994	45.33			
	POSICIÓN 2		24.00	0.90	0.994	21.47			
	POSICIÓN 3		22.00	2.80	0.994	61.23			
	POSICIÓN 4		8.00	8.79	0.994	69.90			
	POSICIÓN 5		8.00	3.55	0.994	28.23			
	POSICIÓN 5		8.00	3.10	0.994	24.65			
	POSICIÓN 6		6.00	2.25	0.994	13.42			
	POSICIÓN 7		6.00	1.85	0.994	11.03			
	POSICIÓN 8		10.00	8.10	0.994	80.51			
	POSICIÓN 9		10.00	2.30	0.994	22.86			
	POSICIÓN 10		10.00	3.1	0.994	30.81			
	POSICIÓN 11		4.00	2.3	0.994	9.14			
	POSICIÓN 12		2.00	3.1	0.994	6.16			
	POSICIÓN 13		10.00	2.10	0.994	20.87			
	POSICIÓN 14		14.00	2.22	0.994	30.89			
	POSICIÓN 15		2.00	4.10	0.560	4.59			
	POSICIÓN 16		4.00	1.60	0.560	3.58			
	POSICIÓN 7		2.00	1.60	1.552	4.97			
	POSICIÓN 8		9.00	1.60	0.560	8.06			
			TOTAL ACERO (Kg)			497.73			
3	ESTRUCTURA EN CONCRETO								
3.1	Concreto clase 28 Mpa (Item 630.3)		ALTO (m), ANCHO (m)	ESPESOR	LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	LOSA		1.45	0.25	3.56	1.29			
	DENTELLÓN		0.35	0.25	5.35	0.47			
	ALETA MI		2.43	0.25	1.95	1.18			
	CABEZOTE		1.27	0.25	2.55	0.81			
	ALETA MD		2.33	0.25	2.74	1.59			
	GUARDARUEDAS		1.65	0.23	0.35	0.13			
	DESCUENTO TUBERIA					-0.24			
			TOTAL CONCRETO			5.23			

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL Y ACEPTACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	Codigo: INV978-F-EO-014
		Fecha: 17/11/2022
		Version: 02
		Hoja: ___ de ___

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vías para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"					
ODT	59+849	MARGEN	IZQUIERDA	FECHA DE ELABORACION	17/12/2024	

	OPERACIÓN	NO	OBSERVACIONES	FECHA DE EJECUCIÓN	FIRMA INTERVENTORÍA
3	ESQUEMAS				

ALETA MI



ESPESOR ALETA MI 0.25

CABEZOTE 1.65 long guar.

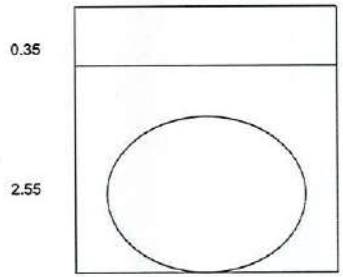

ESP 0.23

AREA TUB 0.95

DESC 0.22

ESPESOR CABEZOTE 0.25

LOSA



ESPESOR LOSA 0.25

ALETA MD



ESPESOR ALETA MD 0.25

DENTELLÓN



ESPESOR DENTELLÓN 0.25

	REVISADO POR CONTRATISTA	APROBADO POR INTERVENTORIA
	RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRES	MIGUEL PARRA	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA		

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL Y ACEPTACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	Codigo: INV978-F-EO-014 Fecha: 17/11/2022 Version: 02 Hoja: ___ de ___

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vías para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

ODT	60+083	MARGEN	IZQUIERDA	FECHA DE ELABORACION	17/12/2024

	OPERACIÓN	NO	OBSERVACIONES	FECHA DE EJECUCIÓN	FIRMA INTERVENTORÍA
1	**SOLADOS EN CONCRETO**				
1.1	**Concreto clase 14 Mpa (Item 630.6)**		ANCHO (m) / ESPESOR / LARGO (m) / m3 de concreto / DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	SOLADO ALETA		2.10 / 0.10 / 4.70 / 0.99		
	SOLADO TUBERIA		1.60 / 0.10 / 5.80 / 0.93		
			TOTAL CONCRETO / 1.92		
1.2	**Concreto clase 14 Mpa Ciclópeo (Item 630.7)**		AREA (m) / LARGO (m) / m3 de concreto / DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	ATRAQUE (CICLOPEO)		0.27 / 5.80 / 1.59		
			TOTAL CONCRETO / 1.59		
2	**TUBERIA**				
2.1	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior (Item 661.7)		CANT / LONG (m) / LONGTUD (M) / DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	TUBERIA		6.00 / 1.00 / 6.00		
			TOTAL TUBERIA (M) / 6.00		
2	**ACEROS DE REFUERZO**				
2.1	**Acero de refuerzo fy= 420 Mpa (Item 640.1)**		CANT / LONG (m) / Kg/m / Peso (Kg) / DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	POSICIÓN 1		8.00 / 4.45 / 0.994 / 35.39		
	POSICIÓN 2		23.00 / 0.90 / 0.994 / 20.58		
	POSICIÓN 3		9.00 / 2.55 / 0.994 / 22.81		
	POSICIÓN 4		12.00 / 3.26 / 0.994 / 38.89		
	POSICIÓN 5		7.00 / 4.08 / 0.994 / 28.35		
	POSICIÓN 5		4.00 / 5.00 / 0.994 / 19.88		
	POSICIÓN 6		7.00 / 4.00 / 0.994 / 27.83		
	POSICIÓN 7		4.00 / 4.00 / 0.994 / 15.90		
	POSICIÓN 8		4.00 / 3.20 / 0.994 / 12.72		
	POSICIÓN 9		10.00 / 5.00 / 0.994 / 49.70		
	POSICIÓN 10		8.00 / 10.00 / 0.994 / 79.52		
	POSICIÓN 11		8.00 / 2.76 / 0.994 / 21.95		
	POSICIÓN 12		8.00 / 2.25 / 0.994 / 17.89		
	POSICIÓN 13		6.00 / 5.00 / 0.994 / 29.82		
	POSICIÓN 14		2.00 / 5.40 / 0.994 / 10.74		
	POSICIÓN 15		2.00 / 1.60 / 0.994 / 3.18		
	POSICIÓN 16		2.00 / 3.00 / 0.994 / 5.96		
	POSICIÓN 12		2.00 / 3.80 / 0.994 / 7.55		
	POSICIÓN 13		2.00 / 3.30 / 0.994 / 6.56		
	POSICIÓN 14		2.00 / 2.77 / 0.994 / 5.51		
	POSICIÓN 15		8.00 / 1.82 / 0.994 / 14.47		
	POSICIÓN 16		2.00 / 1.70 / 0.994 / 3.38		
	POSICIÓN 14		4.00 / 1.60 / 0.560 / 3.58		
	POSICIÓN 15		2.00 / 1.60 / 1.552 / 4.97		
	POSICIÓN 16		7.00 / 1.60 / 0.560 / 6.27		
	POSICIÓN 17		2.00 / 4.10 / 0.560 / 4.59		
			TOTAL ACERO (Kg) / 498.00		

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL Y ACEPTACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	Codigo: INV978-F-EO-014
		Fecha: 17/11/2022
		Version: 02
		Hoja: ___ de ___

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vías para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"				
ODT	60+083	MARGEN	IZQUIERDA	FECHA DE ELABORACION	17/12/2024

	OPERACIÓN	NO	OBSERVACIONES					FECHA DE EJECUCIÓN	FIRMA INTERVENTORÍA
3	ESTRUCTURA EN CONCRETO								
3.1	Concreto clase 28 Mpa (Item 630.3)		ALTO (m). ANCHO (m)	ESPESOR	LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	LOSA		1.45	0.25	3.40	1.23			
	DENTELLÓN		0.35	0.25	4.70	0.41			
	ALETA MI		2.19	0.25	1.90	1.04			
	CABEZOTE		1.70	0.25	2.69	1.14			
	ALETA MD		2.19	0.25	1.90	1.04			
	GUARDARUEDAS		1.70	0.23	0.37	0.14			
	DESCUENTO TUBERIA					-0.24			
			TOTAL CONCRETO			4.76			
3	ESQUEMAS								

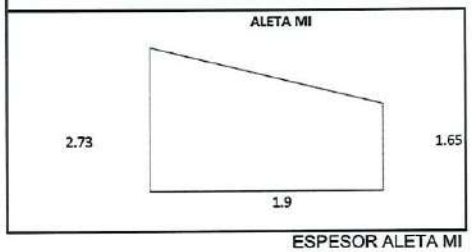

ESPESOR ALETA MI 0.25

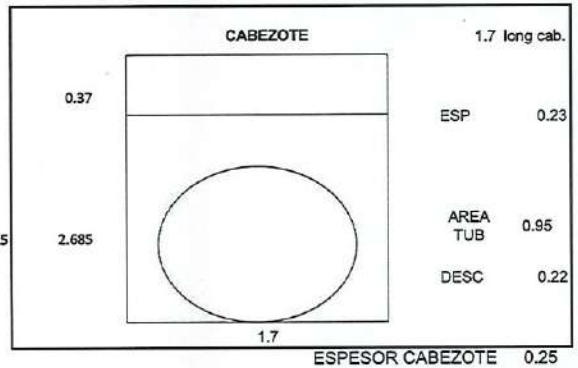

ESPESOR CABEZOTE 0.25

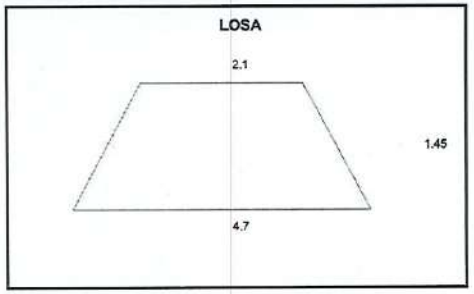

ESPESOR LOSA 0.25



ESPESOR ALETA MD 0.25



ESPESOR DENTELLÓN 0.25

	REVISADO POR CONTRATISTA	APROBADO POR INTERVENTORIA
	RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRES	MIGUEL PARRA	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA		

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL Y ACEPTACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	Codigo: INV978-F-EO-014 Fecha: 17/11/2022 Version: 02 Hoja: ___ de ___

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vías para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

ODT	60+369	MARGEN	DERECHA	FECHA DE ELABORACION	26/12/2024

	OPERACIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES					FECHA DE EJECUCIÓN	FIRMA INTERVENTORÍA
1	**SOLADOS EN CONCRETO**									
1.1	**Concreto clase 14 Mpa (Item 630.7)**			ANCHO (m)	ESPESOR	LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	SOLADO MODULO			2.95	0.10	7.20	2.12			
	DESCUENTO SOLADO			-1.80	0.10	1.60	-0.29			
				TOTAL CONCRETO			1.84			
2	**TUBERIA**									
2.1	**Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior (Item 661.7)**			CANT	LONG (m)		LONGTUD (M)	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	TUBERIA									
				TOTAL TUBERIA (M)						
3	**ACEROS DE REFUERZO**									
3.1	**Acero de refuerzo fy= 420 Mpa (Item 640.1)**			CANT	LONG (m)	Kg/m	Peso (Kg)	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	ZARPA			50.00	3.70	2.235	413.48			
	ZARPA			16.00	1.30	0.994	20.68			
	ZARPA			16.00	1.30	2.235	46.49			
	ZARPA			12.00	7.20	0.994	85.88			
	ZARPA			20.00	3.30	0.994	65.60			
	ZARPA			20.00	2.00	0.994	39.76			
	DENTELLON			6.00	7.20	0.994	42.94			
	VASTAGO			54.00	5.10	2.235	615.52			
	VASTAGO			38.00	4.90	0.994	185.08			
	CORREAS			8.00	3.60	0.994	28.63			
	CORREAS			8.00	2.30	0.994	18.29			
	CORREAS			24.00	7.20	0.994	171.76			
	ESPIRALES			2.00	4.10	0.560	4.59			
				TOTAL ACERO (Kg)			1738.70			
4	**ESTRUCTURA EN CONCRETO**									
4.1	**Concreto clase 28 Mpa (Item 630.3)**			ANCHO	ESPESOR	LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	ZARPA			2.95	0.40	7.20	8.50			
	DESCUENTO ZARPA			1.60	0.40	-1.80	-1.15			
	DENTELLON			0.75	0.35	7.20	1.89			
	VASTAGO			3.55	0.30	7.20	7.67			
	DESCUENTO TUBERIA						-0.24			
				TOTAL CONCRETO			16.66			

REVISADO POR CONTRATISTA		APROBADO POR INTERVENTORIA
	RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRES	MIGUEL PARRA	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA		

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL Y ACEPTACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	Codigo: INV978-F-EO-014 Fecha: 17/11/2022 Version: 02 Hoja: ___ de ___

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

ODT	60+786	MARGEN	DERECHA	FECHA DE ELABORACION	17/12/2024

	OPERACIÓN	NO	OBSERVACIONES					FECHA DE EJECUCIÓN	FIRMA INTERVENTORÍA
1	**SOLADOS EN CONCRETO**								
1.1	**Concreto clase 14 Mpa (Item 630.6)**		ANCHO (m)	ESPESOR	LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	SOLADO		3.35	0.10	1.60	0.54			
			TOTAL CONCRETO			0.54			
2	**ACEROS DE REFUERZO**								
2.1	**Acero de refuerzo fy= 420 Mpa (Item 640.1)**		CANT	LONG (m)	Kg/m	Peso (Kg)	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	POSICIÓN 1		7.00	1.67	0.994	11.62			
	POSICIÓN 2		9.00	2.50	0.994	22.37			
	POSICIÓN 3		7.00	1.65	0.994	11.48			
	POSICIÓN 4		7.00	1.27	0.994	8.84			
	POSICIÓN 5		9.00	2.00	0.994	17.89			
	POSICIÓN 5		6.00	1.25	0.994	7.46			
	POSICIÓN 6		11.00	2.55	0.994	27.88			
	POSICIÓN 7		10.00	3.77	0.994	37.47			
	POSICIÓN 8		10.00	3.85	0.994	38.27			
	POSICIÓN 9		10.00	3.85	0.994	38.27			
	POSICIÓN 10		11.00	2.55	0.994	27.88			
	POSICIÓN 11		4.00	2.95	0.994	11.73			
	POSICIÓN 12		8.00	1.8	0.994	14.31			
	POSICIÓN 13		12.00	1.62	0.994	19.32			
	POSICIÓN 14		10.00	0.65	0.994	6.46			
	POSICIÓN 15		10.00	0.65	0.994	6.46			
	POSICIÓN 16		2.00	4.10	0.560	4.59			
	POSICIÓN 7		4.00	2.45	0.994	9.74			
	POSICIÓN 8		7.00	2.45	0.994	17.05			
	POSICIÓN 9		7.00	2.45	0.994	17.05			
	POSICIÓN 10		2.00	1.8	0.994	3.58			
	POSICIÓN 11		6.00	2.4	0.994	14.31			
	POSICIÓN 12		4.00	2.4	0.994	9.54			
	POSICIÓN 13		7.00	2.40	0.994	16.70			
	POSICIÓN 14		7.00	2.40	0.994	16.70			
	POSICIÓN 15		2.00	1.80	0.994	3.58			
	POSICIÓN 16		6.00	2.40	0.994	14.31			
	POSICIÓN 15		8.00	5.00	0.994	39.76			
	POSICIÓN 16		22.00	0.90	0.994	19.68			
	POSICIÓN 16		2.00	1.60	1.552	4.97			
	POSICIÓN 15		6.00	1.60	0.560	5.38			
	POSICIÓN 16		8.00	1.60	0.560	7.17			
			TOTAL ACERO (Kg)			511.82			

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL Y ACEPTACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	Codigo: INV978-F-EO-014 Fecha: 17/11/2022 Version: 02 Hoja: ___ de ___

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Arlporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

ODT	60+786	MARGEN	DERECHA	FECHA DE ELABORACION	17/12/2024

	OPERACIÓN	NO	OBSERVACIONES					FECHA DE EJECUCIÓN	FIRMA INTERVENTORÍA
3	ESTRUCTURA EN CONCRETO								
3.1	Concreto clase 28 Mpa (item 630.3)		ALTO (m), ANCHO (m)	ESPESOR	LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	LOSA		1.60	0.25	3.35	1.34			
	DENTELLÓN		0.35	0.20	4.75	0.33			
	ALETA MI		1.90	0.25	2.15	1.02			
	CABEZOTE		1.95	0.25	2.25	1.10			
	ALETA MD		1.95	0.25	2.10	1.02			
	GUARDARUEDAS		1.75	0.23	0.43	0.17			
	DESCUENTO TUBERIA					-0.24			
			TOTAL CONCRETO			4.74			
3	ESQUEMAS								

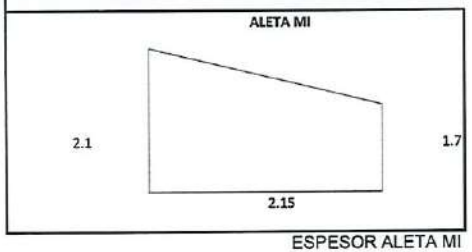

ESPESOR ALETA MI 0.25

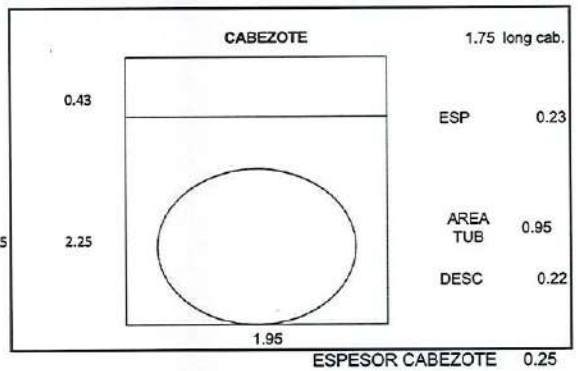

ESPESOR CABEZOTE 0.25

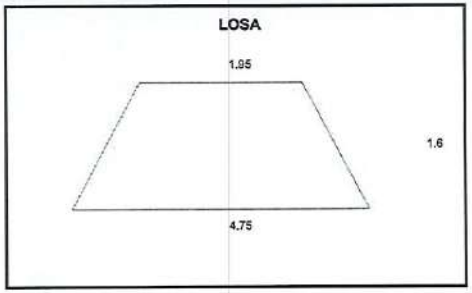

ESPESOR LOSA 0.25



ESPESOR ALETA MD 0.25



ESPESOR DENTELLÓN 0.20

	REVISADO POR CONTRATISTA	APROBADO POR INTERVENTORIA
	RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRES	MIGUEL PARRA	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA		

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL Y ACEPTACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	Codigo: INV978-F-EO-014
		Fecha: 17/11/2022
		Version: 02
		Hoja: de

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"							
ODT	50+565			MARGEN	DERECHA		FECHA DE ELABORACION	24/01/2025

	OPERACIÓN	NO	OBSERVACIONES					FECHA DE EJECUCIÓN	FIRMA INTERVENTORÍA
1	**SOLADOS EN CONCRETO**								
1.1	**Concreto clase 14 Mpa (Item 630.7)**		ANCHO (m)	ESPESOR	LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	SOLADO CAJA		1.70	0.10	1.50	0.26			
	SOLADO TUBERIA		1.60	0.75	0.10	0.12			
			TOTAL CONCRETO			0.38			
1.2	**Concreto clase 14 Mpa Ciclópeo (Item 630.7)**		AREA (m)		LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	ATRAQUE (CICLOPEO)		0.27		0.75	0.21			
			TOTAL CONCRETO			0.21			
2	**TUBERIA**								
2.1	**Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior (Item 661.7)**		CANT	LONG (m)		LONGTUD (M)	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	TUBERIA		1.00	1.00		1.00			
			TOTAL TUBERIA (M)			1.00			
2	**ACEROS DE REFUERZO**								
2.1	**Acero de refuerzo fy= 420 Mpa (Item 640.1)**		CANT	LONG (m)	Kg/m	Peso (Kg)	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	POSICIÓN 1		8.00	2.34	0.994	18.61			
	POSICIÓN 2		7.00	2.05	0.994	14.26			
	POSICIÓN 3		10.00	1.80	0.994	17.89			
	POSICIÓN 4		7.00	1.80	0.994	12.52			
	POSICIÓN 5		8	2.43	0.994	19.32			
	POSICIÓN 5		2	2.20	0.994	4.37			
	POSICIÓN 6		10.00	1.30	0.994	12.92			
	POSICIÓN 7		2.00	4.10	0.560	4.59			
	POSICIÓN 8		4.00	1.73	0.994	6.88			
	POSICIÓN 9		4.00	1.73	0.994	6.88			
	POSICIÓN 10		4	2.03	0.994	8.07			
	POSICIÓN 11		4	1.83	0.994	7.28			
	POSICIÓN 12		4	1.83	0.994	7.28			
	POSICIÓN 13		4.00	1.73	0.994	6.88			
	POSICIÓN 14		4.00	2.03	0.560	4.55			
	POSICIÓN 15		4.00	1.73	0.994	6.88			
	POSICIÓN 16		4.00	2.54	0.994	10.10			
	POSICIÓN 17		5	2.03	0.994	10.09			
	POSICIÓN 18		5.00	1.83	0.994	9.10			
	POSICIÓN 19		5.00	2.03	0.994	10.09			
	POSICIÓN 20		4.00	2.54	0.994	10.10			
	POSICIÓN 21		11.00	2.03	0.994	22.20			
	POSICIÓN 22		7.00	2.40	0.994	16.70			
	POSICIÓN 23		11.00	4.03	0.994	44.06			
	POSICIÓN 24		2.00	1.60	1.550	4.96			
	POSICIÓN 25		4.00	1.60	0.994	6.36			
	POSICIÓN 26		9.00	1.60	0.560	8.06			
			TOTAL ACERO (Kg)			311.00			

Consorcio Vías Nacionales

CONTROL Y ACEPTACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

Codigo: INV978-F-EO-014
Fecha: 17/11/2022
Version: 02
Hoja: ___ de ___

PROYECTO: CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vías para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

ODT	50+565	MARGEN	DERECHA	FECHA DE ELABORACION	24/01/2025

	OPERACIÓN	NO	OBSERVACIONES					FECHA DE EJECUCIÓN	FIRMA INTERVENTORÍA
3	ESTRUCTURA EN CONCRETO								
3.1	Concreto clase 28 Mpa (Item 630.3)		ALTO (m), ANCHO (m)	ESPESOR	LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	MURO ESPALDAR		1.8	0.25	1.5	0.68			
	MURO LATERAL		1.6	0.25	1.25	0.5			
	GUARDARRUEDA		0.3	0.23	1.5	0.1			
	MURO CABEZOTE		1.8	0.25	1.5	0.68			
	MURO LATERAL		1.8	0.25	1.2	0.54			
	PLACA PISO		1.5	0.25	1.7	0.64			
	(-) ENTRADA CANAL					-0.05			
	(-) VOLUMEN TUBO					-0.24			
			TOTAL CONCRETO			2.85			
3	ESQUEMAS								

MURO LATERAL



CABEZOTE

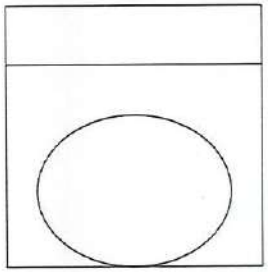

ESPESOR CABEZOTE 0.25

LOSA



ESPESOR LOSA 0.25

MURO POSTERIOR



GUARDARRUEDA

	REVISADO POR CONTRATISTA	APROBADO POR INTERVENTORIA
	RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRES	MIGUEL ANGEL PARRA CAMACHO	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA		

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL Y ACEPTACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	Codigo: INV978-F-EO-014 Fecha: 17/11/2022 Version: 02 Hoja: ___ de ___

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

ODT	54+452	MARGEN	DERECHA	FECHA DE ELABORACION	24/01/2025

	OPERACIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES					FECHA DE EJECUCIÓN	FIRMA INTERVENTORÍA
1	SOLADOS EN CONCRETO									
1.1	Concreto clase 14 Mpa (Item 630.5)			ANCHO (m)	ESPESOR	LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	SOLADO DE LA POCETA									
3	ACEROS DE REFUERZO									
3.3	Acero de refuerzo fy= 420 Mpa (Item 640.1)			CANT	LONG (m)	Kg/m	Peso (Kg)	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	POSICIÓN 1			3.00	2.60	0.995	7.76			
	POSICIÓN 2			3.00	1.50	0.995	4.48			
	POSICIÓN 3			5.00	1.80	0.995	8.96			
				TOTAL ACERO (Kg)			21.19			
4	ESTRUCTURA EN CONCRETO									
4.1	Concreto clase 28 Mpa (Item 630.3)			ANCHO	ESPESOR	LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	CARA 1			0.80	0.15	0.60	0.07			
	CARA 2			1.10	0.15	0.60	0.10			
	CARA 3			1.10	0.15	0.60	0.10			
	CARA 4			1.10	0.15	0.50	0.08			
				TOTAL CONCRETO			0.35			
5	ESQUEMAS									

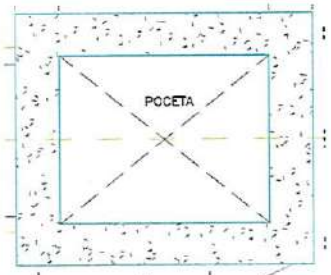

REVISADO POR CONTRATISTA		APROBADO POR INTERVENTORIA
RESIDENTE DE OBRA		RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRES	MIGUEL ANGEL PARRA CAMACHO	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA		

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL Y ACEPTACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	Codigo: INV978-F-EO-014
		Fecha: 17/11/2022
		Version: 02
		Hoja: ___ de ___

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

ODT	547452	MARGEN	DERECHA	FECHA DE ELABORACION	24/01/2025

	OPERACIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES					FECHA DE EJECUCIÓN	FIRMA INTERVENTORÍA
1	SOLADOS EN CONCRETO									
1.1	Concreto clase 14 Mpa (Item 630.6)			ANCHO (m)	ESPESOR	LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	SOLADO DE LA POCETA									
				TOTAL CONCRETO						
3	ACEROS DE REFUERZO									
3.3	Acero de refuerzo fy= 420 Mpa (Item 640.1)			CANT	LONG (m)	Kg/m	Peso (Kg)	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	POSICIÓN 1			3.00	0.80	0.995	2.39			
	POSICIÓN 2			4.00	0.25	0.995	1.00			
				TOTAL ACERO (Kg)			3.38			
4	ESTRUCTURA EN CONCRETO									
4.1	Concreto clase 28 Mpa (Item 630.3)			ANCHO	ESPESOR	LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	CARA 1			0.35	0.15	0.80	0.04	POCETA AGUAS NEGRAS		
	CARA 2			0.35	0.15	0.80	0.04			
				TOTAL CONCRETO			0.08			
5	ESQUEMAS									

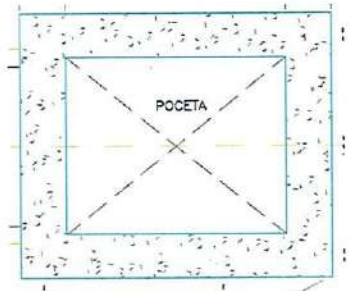

REVISADO POR CONTRATISTA		APROBADO POR INTERVENTORIA
RESIDENTE DE OBRA		RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRES	MIGUEL ANGEL PARRA CAMACHO	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA		

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL Y ACEPTACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	Codigo: INV978-F-EO-014
		Fecha: 17/11/2022
		Versión: 02
		Hoja: ___ de ___

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

ODT	54+462	MARGEN	DERECHA	FECHA DE ELABORACION	24/01/2025

	OPERACIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES					FECHA DE EJECUCIÓN	FIRMA INTERVENTORÍA
1	SOLADOS EN CONCRETO									
1.1	Concreto clase 14 Mpa (Item 630.5)			ANCHO (m)	ESPESOR	LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	SOLADO DE LA POCETA									
				TOTAL CONCRETO						
3	ACEROS DE REFUERZO									
3.3	Acero de refuerzo fy= 420 Mpa (Item 640.1)			CANT	LONG (m)	Kg/m	Peso (Kg)	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	POSICIÓN 1			6.00	2.20	0.994	13.12			
	POSICIÓN 2			5.00	2.20	0.994	10.93			
	POSICIÓN 3			4.00	4.20	0.994	16.70			
				TOTAL ACERO (Kg)			40.75			
4	ESTRUCTURA EN CONCRETO									
4.1	Concreto clase 28 Mpa (Item 630.3)			ANCHO	ESPESOR	LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	CARA 1			1.30	0.15	0.60	0.12	POCETA AGUAS NEGRAS		
	CARA 2			1.30	0.15	0.60	0.12			
	CARA 3			1.00	0.15	0.60	0.09			
	CARA 4			1.00	0.15	0.60	0.09			
	PLACA PISO			1.30	1.30	0.15	0.25			
				TOTAL CONCRETO			0.67			
5	ESQUEMAS									

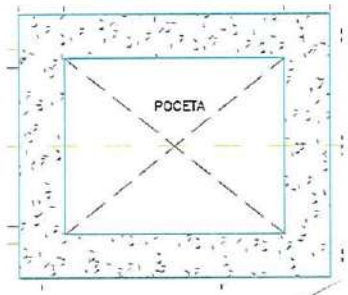

REVISADO POR CONTRATISTA	APROBADO POR INTERVENTORIA
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRES: MIGUEL ANGEL PARRA CAMACHO	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA:	

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL Y ACEPTACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	Codigo: INV978-F-EO-014
		Fecha: 17/11/2022
		Version: 02
		Hoja: ___ de ___

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

ODT	60+083	MARGEN	DERECHA	FECHA DE ELABORACION	24/01/2025

	OPERACIÓN	NO	OBSERVACIONES					FECHA DE EJECUCIÓN	FIRMA INTERVENTORÍA
1	**SOLADOS EN CONCRETO**								
1.1	**Concreto clase 14 Mpa (Item 630.6)**		ANCHO (m)	ESPESOR	LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
			TOTAL CONCRETO						
1.2	**Concreto clase 14 Mpa Ciclópeo (Item 630.7)**		AREA (m)		LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
			TOTAL CONCRETO						
2	**TUBERIA**								
2.1	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior (Item 661.1)		CANT	LONG (m)		LONGTUD (M)	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
			TOTAL TUBERIA (M)						
2	**ACEROS DE REFUERZO**								
2.1	**Acero de refuerzo fy= 420 Mpa (Item 640.1)**		CANT	LONG (m)	Kg/m	Peso (Kg)	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
			TOTAL ACERO (Kg)						
3	**ESTRUCTURA EN CONCRETO**								
3.1	**Concreto clase 28 Mpa (Item 630.3)**		ALTO (m), ANCHO (m)	ESPESOR	LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	LOSA		1.93	0.25	3.55	1.71			
	DENTELLÓN		0.35	0.25	5.10	0.45			
	ALETA MI		2.20	0.25	2.30	1.27			
	CABEZOTE		1.60	0.25	2.40	0.96			
	ALETA MD		1.98	0.25	2.45	1.21			
	GUARDARUEDAS		1.60	0.23	0.32	0.12			
	DESCUENTO TUBERIA					-0.24			
			TOTAL CONCRETO			5.47			

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL Y ACEPTACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	Codigo: INV978-F-EO-014
		Fecha: 17/11/2022
		Version: 02
		Hoja: de

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vías para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"				
ODT	60+083	MARGEN	DERECHA	FECHA DE ELABORACION	24/01/2025

	OPERACIÓN	NO	OBSERVACIONES	FECHA DE EJECUCIÓN	FIRMA INTERVENTORÍA
3	ESQUEMAS				

ALETA MI



ESPESOR ALETA MI 0.25

ALETA MD



ESPESOR ALETA MD 0.25

CABEZOTE 1.6 long cab.

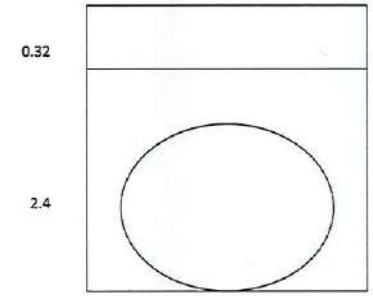

ESP 0.23

AREA TUB 0.95

DESC 0.22

ESPESOR CABEZOTE 0.25

DENTELLÓN



ESPESOR DENTELLÓN 0.25

LOSA



ESPESOR LOSA 0.25

	REVISADO POR CONTRATISTA	APROBADO POR INTERVENTORIA
	RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRES	MIGUEL ANGEL BARRA CAMACHO	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA		

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA	Cód: F-EO-009
		Versión: 001
	CONTRATO 0978 DE 2021	Fecha: 02/01/2020
		Pág: 1 de 1

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	31	**MM**	1	**AA**	2,025	**PERIODO:**	1 de enero de 2025		31 de enero de 2025			
CONTRATO:	0978 DE 2021						**OBJETO CONTRATO:**	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4					
CONTRATANTE:	INVIAS				**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA			**ACUMULADO ANTERIOR:**		**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES									206.90		14.00	220.90
ITEM:	630.6	GRUPO DE AJUSTE	11604	ESPECIF. GENERAL	630-13	ESPECIF. PARTICULAR		Concreto clase 14 MPA		**UNID:**	m3	**UBICACIÓN:**	**RUTA 6404 Y 6405**

ESQUEMA

LOCALIZACIÓN				LARGO	ANCHO	ESPESOR	MARGEN	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
MODULO 1	PR54+468	PR54+474	SOCOTA	6.00	2.75	0.15	DER	SOLADO DE LIMPIEZA MURO (ACTA 43)	- 2.48
MODULO 2	PR54+468	PR54+474	SOCOTA	6.00	2.75	0.15	DER	SOLADO DE LIMPIEZA MURO (ACTA 43)	- 2.48
MODULO 1	PR54+486	PR54+508	SOCOTA	6.00	2.75	0.10	DER	SOLADO DE LIMPIEZA MURO (ACTA 43)	- 1.65
MODULO 2	PR54+486	PR54+508	SOCOTA	6.00	2.75	0.10	DER	SOLADO DE LIMPIEZA MURO (ACTA 43)	- 1.65
MODULO 3	PR54+486	PR54+508	SOCOTA	6.00	2.75	0.10	DER	SOLADO DE LIMPIEZA MURO (ACTA 43)	- 1.65
MODULO 1	PR54+595	PR54+613	SOCOTA	6.00	1.70	0.10	DER	SOLADO DE LIMPIEZA MURO (ACTA 43)	- 1.02
MODULO 2	PR54+595	PR54+613	SOCOTA	6.00	1.70	0.10	DER	SOLADO DE LIMPIEZA MURO (ACTA 43)	- 1.02
MODULO 3	PR54+595	PR54+613	SOCOTA	6.00	1.70	0.10	DER	SOLADO DE LIMPIEZA MURO (ACTA 43)	- 1.02
MODULO 1	PR54+468	PR54+474	SOCOTA	6.00	2.75	0.17	DER	SOLADO DE LIMPIEZA MURO	2.81
MODULO 2	PR54+468	PR54+474	SOCOTA	6.00	2.75	0.10	DER	SOLADO DE LIMPIEZA MURO	1.65
MODULO 1	PR54+486	PR54+508	SOCOTA	6.00	2.75	0.10	DER	SOLADO DE LIMPIEZA MURO	1.65
MODULO 2	PR54+486	PR54+508	SOCOTA	6.00	2.75	0.10	DER	SOLADO DE LIMPIEZA MURO	1.65
MODULO 3	PR54+486	PR54+508	SOCOTA	6.00	2.75	0.10	DER	SOLADO DE LIMPIEZA MURO	1.65
MODULO 4	PR54+486	PR54+508	SOCOTA	4.00	2.75	0.10	DER	SOLADO DE LIMPIEZA MURO	1.10
MODULO 1	PR54+595	PR54+613	SOCOTA	6.00	1.70	0.10	DER	SOLADO DE LIMPIEZA MURO	1.02
MODULO 2	PR54+595	PR54+613	SOCOTA	6.00	1.70	0.10	DER	SOLADO DE LIMPIEZA MURO	1.02
MODULO 3	PR54+595	PR54+613	SOCOTA	6.00	1.70	0.10	DER	SOLADO DE LIMPIEZA MURO	1.02
ODT	PR57+140	PR57+140	SOCOTA	5.70	1.60	0.20	IZQ	SOLADO DE LIMPIEZA TUBERIA	1.82
ODT	PR57+226	PR57+226	SOCOTA	4.80	1.50	0.20	DER	SOLADO DE LIMPIEZA TUBERIA	1.44
ODT	PR59+849	PR59+849	SOCOTA	1.45	3.56	0.10	IZQ	SOLADO DE LIMPIEZA TUBERIA	0.52
ODT	PR60+083	PR60+083	SOCOTA	4.70	2.10	0.10	DER	SOLADO ALETA	0.99
ODT	PR60+083	PR60+083	SOCOTA	4.70	2.10	0.10	IZQ	SOLADO ALETA	0.99
ODT	PR60+083	PR60+083	SOCOTA	5.80	1.60	0.10	IZQ	SOLADO DE LIMPIEZA TUBERIA	0.93
ODT	PR60+369	PR60+369	SOCOTA	7.20	2.95	0.10	DER	SOLADO TUBERIA	1.84
ODT	PR60+786	PR60+786	SOCOTA	1.60	3.35	0.10	DER	SOLADO DE LIMPIEZA TUBERIA	0.54
ODT	PR50+565	PR50+565	SOCOTA	1.50	1.70	0.10	DER	SOLADO CAJA	0.26
ODT	PR50+565	PR50+565	SOCOTA	0.10	1.60	0.75	DER	SOLADO TUBERIA	0.12
ODT	PR54+452	PR54+452	SOCOTA	4.60	1.50	0.10	DER	SOLADO DE LIMPIEZA TUBERIA	0.69
ODT	PR60+369	PR60+369	SOCOTA	4.80	1.60	0.10	IZQ	SOLADO DE LIMPIEZA TUBERIA	0.77
ODT	PR72+360	PR72+360	HATO COROZAL	10.00	2.50	0.10	DER	SOLADO TUBERIA	2.50
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-
								Subtotal	**14.00**
								TOTAL	**14.00**

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA	INTERVENTORIA	INTERVENTORIA
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: MIGUEL ANGEL PARRA CONSORCIO VIAS NACIONALES	NOMBRE: OSCAR HUMBERTO POLO CONSORCIO VIAS NACIONALES	NOMBRE: DIEGO FERNANDO RUANO FONSECA CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA	NOMBRE: WILLIAM DARIO MORENO CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL Y ACEPTACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	Codigo: INV978-F-EO-014 Fecha: 17/11/2022 Version: 02 Hoja: ___ de ___

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

ODT	54+468/474	MARGEN	DERECHA	FECHA DE ELABORACION	27/12/2024

	OPERACIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES					FECHA DE EJECUCIÓN	FIRMA INTERVENTORÍA
1	SOLADOS EN CONCRETO									
1.1	Concreto clase 14 Mpa (Item 630.7)			ANCHO (m)	ESPESOR	LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	SOLADO MODULO 0			2.75	0.17	6.00	2.81			
	SOLADO MODULO 1			2.75	0.10	6.00	1.65			
				TOTAL CONCRETO			4.46			
2	TUBERIA									
2.1	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III de 900mm de diámetro interior (Item 661.7)			CANT	LONG (m)		LONGTUD (M)	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	TUBERIA									
				TOTAL TUBERIA (M)						
3	ACEROS DE REFUERZO									
3.1	Acero de refuerzo fy= 420 Mpa (Item 640.1)			CANT	LONG (m)	Kg/m	Peso (Kg)	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	ZARPA MODULO 1			30.00	3.30	0.994	98.41			
	ZARPA MODULO 1			16.00	6.00	0.994	95.42			
	ZARPA MODULO 1			48.00	3.40	1.552	253.29			
	ZARPA MODULO 1			16.00	6.00	0.994	95.42			
	DENTELLON MODULO1			6.00	6.00	0.994	35.78	*MODULO 1*		
	VASTAGO MODULO 1			48.00	4.00	2.235	429.12			
	VASTAGO MODULO 1			30.00	3.80	0.994	113.32			
	CORREAS MODULO 1			20.00	6.00	0.994	119.28			
	DESCUENTO TUBERIA MODULO 1			-18.00	1.00	0.994	-17.89			
	ZARPA MODULO 2			30.00	3.30	0.994	98.41			
	ZARPA MODULO 2			16.00	6.00	0.994	95.42			
	ZARPA MODULO 2			48.00	3.40	1.552	253.29			
	ZARPA MODULO 2			16.00	6.00	0.994	95.42	*MUDULO 2*		
	DENTELLON MODULO 2			6.00	6.00	0.994	35.78			
	VASTAGO MODULO 2			50.00	4.20	2.235	469.35			
	VASTAGO MODULO 2			30.00	4.00	0.994	119.28			
	CORREAS MODULO 2			24.00	6.00	0.994	143.14			
	CORREAS MODULO 3			31.00	6.00	0.994	184.88	*MODULO 3*		
	CORREAS MODULO 4			29.00	6.00	0.994	172.96	*MODULO 4*		
	ZARPA MODULO 5			30.00	3.25	0.994	96.92			
	ZARPA MODULO 5			16.00	6.00	0.994	95.42			
	ZARPA MODULO 5			48.00	3.30	1.552	245.84			
	ZARPA MODULO 5			16.00	6.00	0.994	95.42	*MODULO 5*		
	DENTELLON MODULO 5			6.00	6.00	0.994	35.78			
	VASTAGO MODULO 5			50.00	4.20	2.235	469.35			
	VASTAGO MODULO 5			30.00	4.00	0.994	119.28			
	CORREAS MODULO 5			23.00	6.00	0.994	137.17			
				TOTAL ACERO (Kg)			4185.26			

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL Y ACEPTACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	Codigo: INV978-F-EO-014 Fecha: 17/11/2022 Version: 02 Hoja: ___ de ___

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

ODT	54+468/474	MARGEN	DERECHA	FECHA DE ELABORACION	27/12/2024

	OPERACIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES					FECHA DE EJECUCIÓN	FIRMA INTERVENTORÍA
5	ESTRUCTURA EN CONCRETO									
5.1	Concreto clase 28 Mpa (Item 630.3)			ANCHO	ESPESOR	LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	ZARPA MODULO1			3.30	0.35	6.00	6.93	*MODULO 1 TRAMO 1*		
	DENTELLON MODULO 1			0.50	0.25	6.00	0.75			
	VASTAGO MODULO 1			2.60	0.25	6.00	3.90			
	DESCUENTO TUBERIA MODULO 1						-0.24			
	ZARPA MODULO 2			3.00	0.35	6.00	6.30	*MODULO 2 TRAMO 2*		
	DENTELLON MODULO 2			0.50	0.25	6.00	0.75			
	VASTAGO MODULO 2			2.88	0.25	6.00	4.32			
	ZARPA MODULO 3			3.00	0.35	6.00	6.30	*MODULO 3 TRAMO 2*		
	DENTELLON MODULO 3			0.50	0.25	6.00	0.75			
	VASTAGO MODULO 3			2.80	0.25	6.00	4.20			
	VASTAGO MODULO 4			2.80	0.25	6.00	4.20			
	VASTAGO MODULO 5			2.80	0.25	6.00	4.20	*MODULO 5 TRAMO 1*		
				TOTAL CONCRETO			42.36			

REVISADO POR CONTRATISTA		APROBADO POR INTERVENTORIA
	RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRES	MIGUEL PARRA	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA		

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL Y ACEPTACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	Codigo: INV978-F-EC-014
		Fecha: 17/11/2022
		Versión: 02
		Hoja: ___ de ___

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"								
ODT	54+486/508			MARGEN	DERECHA		FECHA DE ELABORACION	27/12/2024	
	OPERACIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES				FECHA DE EJECUCIÓN	FIRMA INTERVENTORÍA
1	SOLADOS EN CONCRETO								
1.1	Concreto clase 14 Mpa (Item 630.7)		CANT.	ANCHO (m)	ESPESOR	LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES	
	SOLADO MODULO 1,2,3		3	2.75	0.10	6.00	4.95		
	SOLADO MODULO 4			2.75	0.10	4.00	1.10		
				TOTAL CONCRETO			6.05		
2	TUBERIA								
2.1	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior (Item 661.7)			CANT	LONG (m)		LONGTUD (M)	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES	
	TUBERIA								
				TOTAL TUBERIA (M)					
3	ACEROS DE REFUERZO								
3.1	Acero de refuerzo fy= 420 Mpa (Item 640.1)			CANT	LONG (m)	Kg/m	Peso (Kg)	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES	
	ZARPA MODULO 1			48.00	3.30	1.552	245.84		
	ZARPA MODULO 1			16.00	6.00	0.994	95.42		
	ZARPA MODULO 1			16.00	6.00	0.994	95.42		
	ZARPA MODULO 1			30.00	3.25	0.994	96.92	MODULO 1 TRAMO2	
	DENTELLON MODULO1			6.00	6.00	0.994	35.78		
	VASTAGO MODULO 1			50.00	4.20	2.235	469.35		
	VASTAGO MODULO 1			30.00	4.00	0.994	119.28		
	CORREAS MODULO 1			24.00	6.00	0.994	143.14		
	ZARPA MODULO 2			48.00	3.30	1.552	245.84		
	ZARPA MODULO 2			16.00	6.00	0.994	95.42		
	ZARPA MODULO 2			16.00	6.00	0.994	95.42		
	ZARPA MODULO 2			30.00	3.25	0.994	96.92	MODULO 2 TRAMO 2	
	DENTELLON MODULO 2			6.00	6.00	0.994	35.78		
	VASTAGO MODULO 2			50.00	4.20	2.235	469.35		
	VASTAGO MODULO 2			30.00	4.00	0.994	119.28		
	CORREAS MODULO 2			28.00	6.00	0.994	166.99		
	ZARPA MODULO 3			48.00	3.30	1.552	245.84		
	ZARPA MODULO 3			16.00	6.00	0.994	95.42		
	ZARPA MODULO 3			16.00	6.00	0.994	95.42		
	ZARPA MODULO 3			30.00	3.25	0.994	96.92	MODULO 3 TRAMO 2	
	DENTELLON MODULO 3			6.00	6.00	0.994	35.78		
	VASTAGO MODULO 3			48.00	4.20	2.235	450.58		
	VASTAGO MODULO 3			30.00	4.00	0.994	119.28		
	CORREAS MODULO 3			24.00	6.00	0.994	143.14		
	ZARPA MODULO 4			21.00	4.00	0.994	83.50		
	ZARPA MODULO 4			21.00	4.00	0.994	83.50		
	ZARPA MODULO 4			32.00	3.40	1.552	168.86		
	ZARPA MODULO 4			21.00	3.30	0.994	68.88	MODULO 4 TRAMO 2	
	DENTELLON MODULO 4			30.00	4.20	2.235	281.61		
	VASTAGO MODULO 4			21.00	4.00	0.994	83.50		
	CORREAS MODULO 3			6.00	4.00	0.994	23.86		
	CORREAS MODULO 3			30.00	4.00	0.994	119.28		
				TOTAL ACERO (Kg)			4821.51		

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL Y ACEPTACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	Codigo: INV978-F-EO-014
		Fecha: 17/11/2022
		Version: 02
		Hoja: ___ de ___

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

ODT	54+486/508	MARGEN	DERECHA	FECHA DE ELABORACION	27/12/2024

	OPERACIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES					FECHA DE EJECUCIÓN	FIRMA INTERVENTORÍA
4	ESTRUCTURA EN CONCRETO									
4.1	Concreto clase 28 Mpa (Item 630.3)			ANCHO . ALTO	ESPESOR	LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	ZARPA MODULO1			3.00	0.35	6.00	6.30			
	DENTELLON MODULO 1			0.50	0.25	6.00	0.75	MODULO 1 TRAMO 2		
	VASTAGO MODULO 1			2.90	0.25	6.00	4.35			
	ZARPA MODULO 2			3.00	0.35	6.00	6.30			
	DENTELLON MODULO 2			0.50	0.25	6.00	0.75	MODULO 2 TRAMO 2		
	VASTAGO MODULO 2			2.80	0.25	6.00	4.20			
	ZARPA MODULO 3			3.00	0.35	6.00	6.30			
	DENTELLON MODULO 3			0.50	0.25	6.00	0.75	MODULO 3TRAMO 2		
	VASTAGO MODULO 3			2.80	0.25	6.00	4.20			
	ZARPA MODULO 4			4.00	0.35	4.20	5.88			
	DENTELLON MODULO 4			0.50	0.25	4.20	0.53	MODULO 4TRAMO 3		
	VASTAGO MODULO 4			3.00	0.25	4.20	3.15			
				TOTAL CONCRETO			43.46			

	REVISADO POR CONTRATISTA	APROBADO POR INTERVENTORIA
	RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRES	MIGUEL PARRA	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA		

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL Y ACEPTACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	Codigo: INV978-F-EO-014
		Fecha: 17/11/2022
		Version: 02
		Hoja: ___ de ___

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vías para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

ODT	54+595/613	MARGEN	DERECHA	FECHA DE ELABORACION	27/12/2024

	OPERACIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES					FECHA DE EJECUCIÓN	FIRMA INTERVENTORÍA
1	SOLADOS EN CONCRETO									
1.1	Concreto clase 14 Mpa (Item 630.7)		CANT.	ANCHO (m)	ESPESOR	LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	SOLADO MODULO 1,2,3		3	1.70	0.10	6.00	3.06			
				TOTAL CONCRETO			3.06			
2	TUBERIA									
2.1	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior (Item 661.7)			CANT	LONG (m)		LONGTUD (M)	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	TUBERIA									
				TOTAL TUBERIA (M)						
3	ACEROS DE REFUERZO									
3.1	Acero de refuerzo fy= 420 Mpa (Item 640.1)			CANT	LONG (m)	Kg/m	Peso (Kg)	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	ZARPA MODULO 1			41.00	2.10	0.994	85.58			
	ZARPA MODULO 1			41.00	2.10	0.560	48.22			
	ZARPA MODULO 1			13.00	6.00	0.560	43.68			
	ZARPA MODULO 1			13.00	6.00	0.560	43.68	MODULO 1 TRAMO 4		
	DENTELLON MODULO1			6.00	6.00	0.560	20.16			
	VASTAGO MODULO 1			40.00	2.90	0.994	115.30			
	VASTAGO MODULO 1			40.00	2.80	0.560	62.72			
	CORREAS MODULO 1			24.00	6.00	0.560	80.64			
	ZARPA MODULO 2			41.00	2.10	0.994	85.58			
	ZARPA MODULO 2			41.00	2.10	0.560	48.22			
	ZARPA MODULO 2			13.00	6.00	0.560	43.68			
	ZARPA MODULO 2			13.00	6.00	0.560	43.68	MODULO 2 TRAMO 4		
	DENTELLON MODULO 2			6.00	6.00	0.560	20.16			
	VASTAGO MODULO 2			40.00	2.90	0.994	115.30			
	VASTAGO MODULO 2			40.00	2.80	0.560	62.72			
	CORREAS MODULO 2			24.00	6.00	0.560	80.64			
	ZARPA MODULO 3			41.00	2.10	0.995	85.67			
	ZARPA MODULO 3			41.00	2.10	0.560	48.22			
	ZARPA MODULO 3			13.00	6.00	0.560	43.68			
	ZARPA MODULO 3			13.00	6.00	0.560	43.68	MODULO 23TRAMO 4		
	DENTELLON MODULO 3			6.00	6.00	0.560	20.16			
	VASTAGO MODULO 3			40.00	2.90	0.994	115.30			
	VASTAGO MODULO 3			40.00	2.80	0.560	62.72			
	CORREAS MODULO 3			24.00	6.00	0.560	80.64			
				TOTAL ACERO (Kg)			1500.04			
4	ESTRUCTURA EN CONCRETO									
4.1	Concreto clase 28 Mpa (Item 630.3)			ANCHO . ALTO	ESPESOR	LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	ZARPA MODULO1			1.95	0.25	6.00	2.93			
	DENTELLON MODULO 1			0.40	0.25	6.00	0.60	MODULO 1 TRAMO 4		
	VASTAGO MODULO 1			2.20	0.25	6.00	3.30			
	ZARPA MODULO 2			1.95	0.25	6.00	2.93	MODULO 2 TRAMO 4		
	DENTELLON MODULO 2			0.40	0.25	6.00	0.60			
	ZARPA MODULO 3			1.95	0.25	6.00	2.93	MODULO 3 TRAMO 4		
	DENTELLON MODULO 3			0.40	0.25	6.00	0.60			
	VASTAGO MODULO 3			2.25	0.25	6.00	3.38			
				TOTAL CONCRETO			17.25			

REVISADO POR CONTRATISTA		APROBADO POR INTERVENTORIA
	RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRES	MIGUEL PARRA	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA		

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL Y ACEPTACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	Codigo: INV978-F-EO-014 Fecha: 17/11/2022 Version: 02 Hoja: ___ de ___
PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vías para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"	

ODT	57+140	**MARGEN**	IZQUIERDA	**FECHA DE ELABORACION**	17/12/2024

	OPERACIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES					FECHA DE EJECUCIÓN	FIRMA INTERVENTORÍA
1	**SOLADOS EN CONCRETO**									
2.1	**Concreto clase 14 Mpa (Item 630.7)**			ANCHO (m)	ESPESOR	LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	SOLADO TUBERIA			1.60	0.20	5.70	1.82			
				TOTAL CONCRETO			1.82			
2.2	**Concreto clase 14 Mpa Ciclópeo (Item 630.7)**			AREA (m)		LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	ATRAQUE (CICLOPEO)			0.27		5.70	1.56			
				TOTAL CONCRETO			1.56			
2	**TUBERIA**									
2.1	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior (Item 661.7)			CANT	LONG (m)		LONGTUD (M)	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	TUBERIA			6.00	1.00		6.00			
				TOTAL TUBERIA (M)			6.00			
3	**ACEROS DE REFUERZO**									
3.3	**Acero de refuerzo fy= 420 Mpa (Item 640.1)**			CANT	LONG (m)	Kg/m	Peso (Kg)	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
				TOTAL ACERO (Kg)						
4	**ESTRUCTURA EN CONCRETO**									
4.1	**Concreto clase 28 Mpa (Item 630.3)**			ANCHO	ESPESOR	LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
				TOTAL CONCRETO						

REVISADO POR CONTRATISTA	APROBADO POR INTERVENTORIA
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
MIGUEL PARRA	DIEGO FERNANDO FONSECA

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL Y ACEPTACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	Codigo: INV978-F-EO-014 Fecha: 17/11/2022 Version: 02 Hoja: ___ de ___

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vías para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

ODT	57+226	MARGEN	DERECHA	FECHA DE ELABORACION	17/12/2024

	OPERACIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES					FECHA DE EJECUCIÓN	FIRMA INTERVENTORÍA
1	**SOLADOS EN CONCRETO**									
1.1	**Concreto clase 14 Mpa (Item 630.7)**			ANCHO (m)	ESPESOR	LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	SOLADO TUBERIA			1.50	0.20	4.80	1.44			
				TOTAL CONCRETO			1.44			
1.2	**Concreto clase 14 Mpa Ciclópeo (Item 630.7)**			AREA (m)		LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	ATRAQUE (CICLOPEO)			0.27		4.80	1.32			
				TOTAL CONCRETO			1.32			
2	**TUBERIA**									
2.1	**Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior (Item 661.7)**			CANT	LONG (m)		LONGTUD (M)	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	TUBERIA			5.00	1.00		5.00			
				TOTAL TUBERIA (M)			5.00			
3	**ACEROS DE REFUERZO**									
3.3	**Acero de refuerzo fy= 420 Mpa (Item 640.1)**			CANT	LONG (m)	Kg/m	Peso (Kg)	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
				TOTAL ACERO (Kg)						
4	**ESTRUCTURA EN CONCRETO**									
4.1	**Concreto clase 28 Mpa (Item 630.3)**			ANCHO	ESPESOR	LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
				TOTAL CONCRETO						

	REVISADO POR CONTRATISTA	APROBADO POR INTERVENTORIA
	RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRES	MIGUEL PARRA	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA		

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL Y ACEPTACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	Codigo: INV978-F-EO-014
		Fecha: 17/11/2022
		Version: 02
		Hoja: ___ de ___

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

ODT	59+849	MARGEN	IZQUIERDA	FECHA DE ELABORACION	17/12/2024

	OPERACIÓN	NO	OBSERVACIONES	FECHA DE EJECUCIÓN	FIRMA INTERVENTORÍA
1	SOLADOS EN CONCRETO				

1.1	Concreto clase 14 Mpa (Item 630.6)		ANCHO (m)	ESPESOR	LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	SOLADO		3.56	0.10	1.45	0.52			
			TOTAL CONCRETO			0.52			

2	ACEROS DE REFUERZO								
2.1	Acero de refuerzo fy= 420 Mpa (Item 640.1)		CANT	LONG (m)	Kg/m	Peso (Kg)	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	POSICIÓN 1		8.00	5.70	0.994	45.33			
	POSICIÓN 2		24.00	0.90	0.994	21.47			
	POSICIÓN 3		22.00	2.80	0.994	61.23			
	POSICIÓN 4		8.00	8.79	0.994	69.90			
	POSICIÓN 5		8.00	3.55	0.994	28.23			
	POSICIÓN 5		8.00	3.10	0.994	24.65			
	POSICIÓN 6		6.00	2.25	0.994	13.42			
	POSICIÓN 7		6.00	1.85	0.994	11.03			
	POSICIÓN 8		10.00	8.10	0.994	80.51			
	POSICIÓN 9		10.00	2.30	0.994	22.86			
	POSICIÓN 10		10.00	3.1	0.994	30.81			
	POSICIÓN 11		4.00	2.3	0.994	9.14			
	POSICIÓN 12		2.00	3.1	0.994	6.16			
	POSICIÓN 13		10.00	2.10	0.994	20.87			
	POSICIÓN 14		14.00	2.22	0.994	30.89			
	POSICIÓN 15		2.00	4.10	0.560	4.59			
	POSICIÓN 16		4.00	1.60	0.560	3.58			
	POSICIÓN 7		2.00	1.60	1.552	4.97			
	POSICIÓN 8		9.00	1.60	0.560	8.06			
			TOTAL ACERO (Kg)			497.73			

3	ESTRUCTURA EN CONCRETO								
3.1	Concreto clase 28 Mpa (Item 630.3)		ALTO (m), ANCHO (m)	ESPESOR	LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	LOSA		1.45	0.25	3.56	1.29			
	DENTELLÓN		0.35	0.25	5.35	0.47			
	ALETA MI		2.43	0.25	1.95	1.18			
	CABEZOTE		1.27	0.25	2.55	0.81			
	ALETA MD		2.33	0.25	2.74	1.59			
	GUARDARUEDAS		1.65	0.23	0.35	0.13			
	DESCUENTO TUBERIA					-0.24			
			TOTAL CONCRETO			5.23			

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL Y ACEPTACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	Codigo: INV978-F-EO-014
		Fecha: 17/11/2022
		Version: 02
		Hoja: ___ de ___

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vías para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"				
ODT	59+849	MARGEN	IZQUIERDA	FECHA DE ELABORACION	17/12/2024

	OPERACIÓN	NO	OBSERVACIONES	FECHA DE EJECUCIÓN	FIRMA INTERVENTORÍA
3	ESQUEMAS				

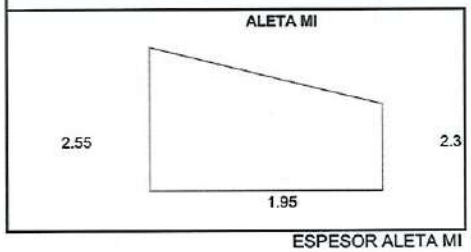

ESPESOR ALETA MI 0.25

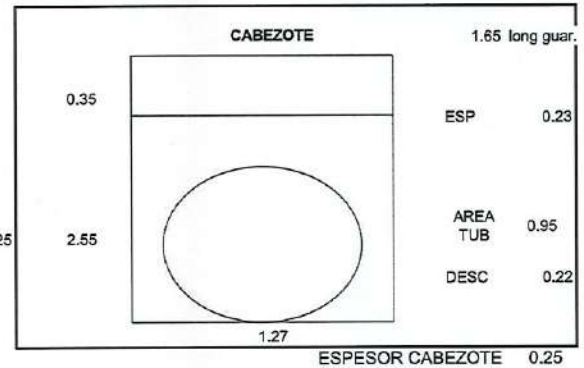

ESPESOR CABEZOTE 0.25

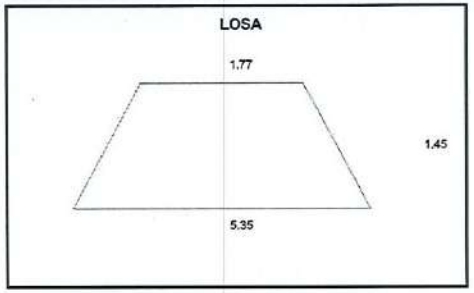

ESPESOR LOSA 0.25



ESPESOR ALETA MD 0.25



ESPESOR DENTELLÓN 0.25

REVISADO POR CONTRATISTA		APROBADO POR INTERVENTORIA
	RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRES	MIGUEL PARRA	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA		

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL Y ACEPTACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	Codigo: INV978-F-EO-014 Fecha: 17/11/2022 Version: 02 Hoja: ___ de ___

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

ODT	60+083	MARGEN	DERECHA	FECHA DE ELABORACION	17/12/2024

	OPERACIÓN	NO	OBSERVACIONES					FECHA DE EJECUCIÓN	FIRMA INTERVENTORÍA
1	**SOLADOS EN CONCRETO**								
1.1	**Concreto clase 14 Mpa (Item 630.7)**		ANCHO (m)	ESPESOR	LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	SOLADO ALETA		2.10	0.10	4.70	0.99			
			TOTAL CONCRETO			0.99			
1.2	**Concreto clase 14 Mpa Ciclópeo (Item 630.7)**		AREA (m)		LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	ATRAQUE (CICLOPEO)								
			TOTAL CONCRETO			0.00			
2	**TUBERIA**								
2.1	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior (Item 661.7)		CANT	LONG (m)		LONGTUD (M)	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	TUBERIA								
			TOTAL TUBERIA (M)			0.00			
3	**ACEROS DE REFUERZO**								
3.1	**Acero de refuerzo fy= 420 Mpa (Item 640.1)**		CANT	LONG (m)	Kg/m	Peso (Kg)	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	POSICIÓN 1		7.00	1.85	0.994	12.87			
	POSICIÓN 2		9.00	2.85	0.994	25.50			
	POSICIÓN 3		7.00	1.91	0.994	13.29			
	POSICIÓN 4		11.00	2.81	0.994	30.72			
	POSICIÓN 5		7	3.47	0.994	24.14			
	POSICIÓN 5		7	4.37	0.994	30.41			
	POSICIÓN 6		7.00	4.37	0.994	30.41			
	POSICIÓN 7		11.00	2.81	0.994	30.72			
	POSICIÓN 8		7.00	1.45	0.994	10.09			
	POSICIÓN 9		9.00	2.45	0.994	21.92			
	POSICIÓN 10		7	1.51	0.994	10.51			
	POSICIÓN 11		4	3.11	0.994	12.37			
	POSICIÓN 12		10	2	0.994	19.88			
	POSICIÓN 13		12.00	1.60	0.994	19.08			
	POSICIÓN 14		2.00	4.10	0.560	4.59			
	POSICIÓN 15		4.00	2.90	0.994	11.53			
	POSICIÓN 16		4.00	2.90	0.994	11.53			
	POSICIÓN 12		4	2.9	0.994	11.53			
	POSICIÓN 13		10.00	2.70	0.994	26.84			
	POSICIÓN 14		2.00	1.15	0.994	2.29			
	POSICIÓN 15		4.00	2.90	0.994	11.53			
	POSICIÓN 16		4.00	2.90	0.994	11.53			
	POSICIÓN 14		4.00	2.90	0.994	11.53			
	POSICIÓN 15		10.00	2.70	0.994	26.84			
	POSICIÓN 16		2.00	0.60	0.994	1.19			
	POSICIÓN 16		8.00	4.85	0.994	38.57			
	POSICIÓN 16		24.00	0.90	0.994	21.47			
	POSICIÓN 16		8.00	1.60	0.560	7.17			
	POSICIÓN 16		4.00	1.60	0.994	6.36			
	POSICIÓN 16		2.00	1.60	1.552	4.97			
			TOTAL ACERO (Kg)			501.37			

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL Y ACEPTACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	Codigo: INV978-F-EO-014
		Fecha: 17/11/2022
		Version: 02
		Hoja: ___ de ___

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"					
ODT	60+083	MARGEN	DERECHA	FECHA DE ELABORACION	17/12/2024	

	OPERACIÓN	NO	OBSERVACIONES					FECHA DE EJECUCIÓN	FIRMA INTERVENTORÍA
3	ESTRUCTURA EN CONCRETO								
3.1	Concreto clase 28 Mpa (Item 630.3)		ALTO (m), ANCHO (m)	ESPESOR	LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
			TOTAL CONCRETO						
3	ESQUEMAS								

ALETA MI



ESPESOR ALETA MI 0.25

CABEZOTE

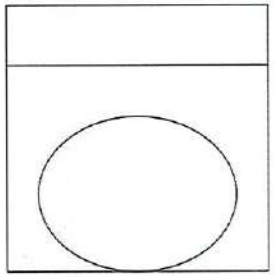

long cab.

ESP 0.23

AREA TUB 0.95

DESC 0.22

ESPESOR CABEZOTE 0.25

LOSA

ESPESOR LOSA 0.25

ALETA MD



ESPESOR ALETA MD 0.25

DENTELLON



ESPESOR DENTELLÓN 0.20

REVISADO POR CONTRATISTA		APROBADO POR INTERVENTORIA
	RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRES	MIGUEL PARRA	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA		

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL Y ACEPTACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	Codigo: INV978-F-EO-014
		Fecha: 17/11/2022
		Version: 02
		Hoja: ___ de ___

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"							
ODT	60+083			MARGEN	IZQUIERDA		FECHA DE ELABORACION	17/12/2024

	OPERACIÓN	NO	OBSERVACIONES					FECHA DE EJECUCIÓN	FIRMA INTERVENTORÍA
1	**SOLADOS EN CONCRETO**								
1.1	**Concreto clase 14 Mpa (Item 630.6)**		ANCHO (m)	ESPESOR	LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	SOLADO ALETA		2.10	0.10	4.70	0.99			
	SOLADO TUBERIA		1.60	0.10	5.80	0.93			
			TOTAL CONCRETO			1.92			
1.2	**Concreto clase 14 Mpa Ciclópeo (Item 630.7)**		AREA (m)		LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	ATRAQUE (CICLOPEO)		0.27		5.80	1.59			
			TOTAL CONCRETO			1.59			
2	**TUBERIA**								
2.1	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior (Item 661.7)		CANT	LONG (m)		LONGTUD (M)	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	TUBERIA		6.00	1.00		6.00			
			TOTAL TUBERIA (M)			6.00			
2	**ACEROS DE REFUERZO**								
2.1	**Acero de refuerzo fy= 420 Mpa (Item 640.1)**		CANT	LONG (m)	Kp/m	Peso (Kg)	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	POSICIÓN 1		8.00	4.45	0.994	35.39			
	POSICIÓN 2		23.00	0.90	0.994	20.58			
	POSICIÓN 3		9.00	2.55	0.994	22.81			
	POSICIÓN 4		12.00	3.26	0.994	38.89			
	POSICIÓN 5		7.00	4.08	0.994	28.35			
	POSICIÓN 5		4.00	5.00	0.994	19.88			
	POSICIÓN 6		7.00	4.00	0.994	27.83			
	POSICIÓN 7		4.00	4.00	0.994	15.90			
	POSICIÓN 8		4.00	3.20	0.994	12.72			
	POSICIÓN 9		10.00	5.00	0.994	49.70			
	POSICIÓN 10		8.00	10.00	0.994	79.52			
	POSICIÓN 11		8.00	2.76	0.994	21.95			
	POSICIÓN 12		8.00	2.25	0.994	17.89			
	POSICIÓN 13		6.00	5.00	0.994	29.82			
	POSICIÓN 14		2.00	5.40	0.994	10.74			
	POSICIÓN 15		2.00	1.60	0.994	3.18			
	POSICIÓN 16		2.00	3.00	0.994	5.96			
	POSICIÓN 12		2.00	3.80	0.994	7.55			
	POSICIÓN 13		2.00	3.30	0.994	6.56			
	POSICIÓN 14		2.00	2.77	0.994	5.51			
	POSICIÓN 15		8.00	1.82	0.994	14.47			
	POSICIÓN 16		2.00	1.70	0.994	3.38			
	POSICIÓN 14		4.00	1.60	0.560	3.58			
	POSICIÓN 15		2.00	1.60	1.552	4.97			
	POSICIÓN 16		7.00	1.60	0.560	6.27			
	POSICIÓN 17		2.00	4.10	0.560	4.59			
			TOTAL ACERO (Kg)			498.00			

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL Y ACEPTACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	Codigo: INV978-F-EO-014
		Fecha: 17/11/2022
		Version: 02
		Hoja: de

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

ODT	60+083	MARGEN	IZQUIERDA	FECHA DE ELABORACION	17/12/2024

	OPERACIÓN	NO	OBSERVACIONES					FECHA DE EJECUCIÓN	FIRMA INTERVENTORÍA
3	ESTRUCTURA EN CONCRETO								
3.1	**Concreto clase 28 Mpa (Item 630.3)**		ALTO (m), ANCHO (m)	ESPESOR	LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	LOSA		1.45	0.25	3.40	1.23			
	DENTELLÓN		0.35	0.25	4.70	0.41			
	ALETA MI		2.19	0.25	1.90	1.04			
	CABEZOTE		1.70	0.25	2.69	1.14			
	ALETA MD		2.19	0.25	1.90	1.04			
	GUARDARUEDAS		1.70	0.23	0.37	0.14			
	DESCUENTO TUBERIA					-0.24			
			TOTAL CONCRETO			4.76			
3	ESQUEMAS								



ESPESOR ALETA MI 0.25

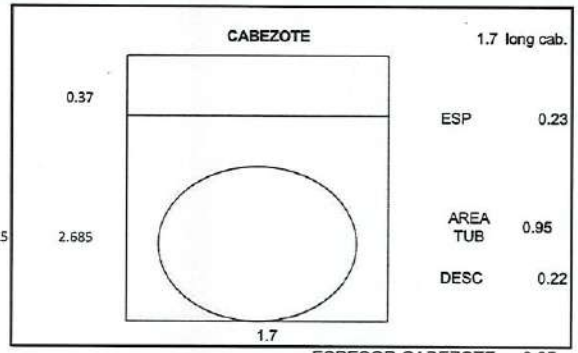

ESPESOR CABEZOTE 0.25

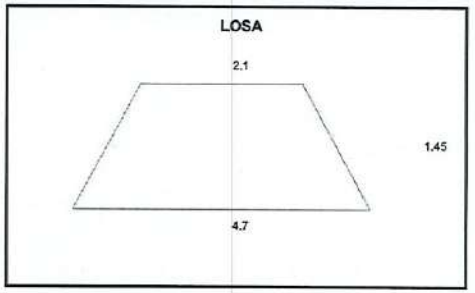

ESPESOR LOSA 0.25



ESPESOR ALETA MD 0.25



ESPESOR DENTELLÓN 0.25

	REVISADO POR CONTRATISTA	APROBADO POR INTERVENTORIA
	RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRES	MIGUEL PARRA	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA		

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL Y ACEPTACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	Codigo: INV978-F-EO-014 Fecha: 17/11/2022 Version: 02 Hoja: de

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vías para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

ODT	60+369	MARGEN	DERECHA	FECHA DE ELABORACION	26/12/2024

	OPERACIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES					FECHA DE EJECUCIÓN	FIRMA INTERVENTORÍA
1	SOLADOS EN CONCRETO									
1.1	**Concreto clase 14 Mpa (Item 630.7)**			ANCHO (m)	ESPESOR	LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	SOLADO MODULO			2.95	0.10	7.20	2.12			
	DESCUENTO SOLADO			-1.80	0.10	1.60	-0.29			
				TOTAL CONCRETO			1.84			
2	TUBERIA									
2.1	**Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior (Item 661.7)**			CANT	LONG (m)		LONGTUD (M)	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	TUBERIA									
				TOTAL TUBERIA (M)						
3	ACEROS DE REFUERZO									
3.1	**Acero de refuerzo fy= 420 Mpa (Item 640.1)**			CANT	LONG (m)	Kg/m	Peso (Kg)	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	ZARPA			50.00	3.70	2.235	413.48			
	ZARPA			16.00	1.30	0.994	20.68			
	ZARPA			16.00	1.30	2.235	46.49			
	ZARPA			12.00	7.20	0.994	85.88			
	ZARPA			20.00	3.30	0.994	65.60			
	ZARPA			20.00	2.00	0.994	39.76			
	DENTELLON			6.00	7.20	0.994	42.94			
	VASTAGO			54.00	5.10	2.235	615.52			
	VASTAGO			38.00	4.90	0.994	185.08			
	CORREAS			8.00	3.60	0.994	28.63			
	CORREAS			8.00	2.30	0.994	18.29			
	CORREAS			24.00	7.20	0.994	171.76			
	ESPIRALES			2.00	4.10	0.560	4.59			
				TOTAL ACERO (Kg)			1738.70			
4	ESTRUCTURA EN CONCRETO									
4.1	**Concreto clase 28 Mpa (Item 630.3)**			ANCHO	ESPESOR	LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	ZARPA			2.95	0.40	7.20	8.50			
	DESCUENTO ZARPA			1.60	0.40	-1.80	-1.15			
	DENTELLON			0.75	0.35	7.20	1.89			
	VASTAGO			3.55	0.30	7.20	7.67			
	DESCUENTO TUBERIA						-0.24			
				TOTAL CONCRETO			16.66			

	REVISADO POR CONTRATISTA	APROBADO POR INTERVENTORIA
	RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRES	MIGUEL PARRA	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA		

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL Y ACEPTACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	Codigo: INV978-F-EO-014 Fecha: 17/11/2022 Version: 02 Hoja: ___ de ___

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

ODT	60+786	MARGEN	DERECHA	FECHA DE ELABORACION	17/12/2024

	OPERACIÓN	NO	OBSERVACIONES					FECHA DE EJECUCIÓN	FIRMA INTERVENTORÍA
1	SOLADOS EN CONCRETO								
1.1	**Concreto clase 14 Mpa (Item 630.6)**		ANCHO (m)	ESPESOR	LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	SOLADO		3.35	0.10	1.60	0.54			
			TOTAL CONCRETO			0.54			
2	ACEROS DE REFUERZO								
2.1	**Acero de refuerzo fy= 420 Mpa (Item 640.1)**		CANT	LONG (m)	Kg/m	Peso (Kg)	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	POSICIÓN 1		7.00	1.67	0.994	11.62			
	POSICIÓN 2		9.00	2.50	0.994	22.37			
	POSICIÓN 3		7.00	1.65	0.994	11.48			
	POSICIÓN 4		7.00	1.27	0.994	8.84			
	POSICIÓN 5		9.00	2.00	0.994	17.89			
	POSICIÓN 5		6.00	1.25	0.994	7.46			
	POSICIÓN 6		11.00	2.55	0.994	27.88			
	POSICIÓN 7		10.00	3.77	0.994	37.47			
	POSICIÓN 8		10.00	3.85	0.994	38.27			
	POSICIÓN 9		10.00	3.85	0.994	38.27			
	POSICIÓN 10		11.00	2.55	0.994	27.88			
	POSICIÓN 11		4.00	2.95	0.994	11.73			
	POSICIÓN 12		8.00	1.8	0.994	14.31			
	POSICIÓN 13		12.00	1.62	0.994	19.32			
	POSICIÓN 14		10.00	0.65	0.994	6.46			
	POSICIÓN 15		10.00	0.65	0.994	6.46			
	POSICIÓN 16		2.00	4.10	0.560	4.59			
	POSICIÓN 7		4.00	2.45	0.994	9.74			
	POSICIÓN 8		7.00	2.45	0.994	17.05			
	POSICIÓN 9		7.00	2.45	0.994	17.05			
	POSICIÓN 10		2.00	1.8	0.994	3.58			
	POSICIÓN 11		6.00	2.4	0.994	14.31			
	POSICIÓN 12		4.00	2.4	0.994	9.54			
	POSICIÓN 13		7.00	2.40	0.994	16.70			
	POSICIÓN 14		7.00	2.40	0.994	16.70			
	POSICIÓN 15		2.00	1.80	0.994	3.58			
	POSICIÓN 16		6.00	2.40	0.994	14.31			
	POSICIÓN 15		8.00	5.00	0.994	39.76			
	POSICIÓN 16		22.00	0.90	0.994	19.68			
	POSICIÓN 16		2.00	1.60	1.552	4.97			
	POSICIÓN 15		6.00	1.60	0.560	5.38			
	POSICIÓN 16		8.00	1.60	0.560	7.17			
			TOTAL ACERO (Kg)			511.82			

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL Y ACEPTACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	Codigo: INV978-F-EO-014 Fecha: 17/11/2022 Version: 02 Hoja: ___ de ___

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

ODT	60+786	MARGEN	DERECHA	FECHA DE ELABORACION	17/12/2024

	OPERACIÓN	NO	OBSERVACIONES					FECHA DE EJECUCIÓN	FIRMA INTERVENTORÍA
3	ESTRUCTURA EN CONCRETO								
3.1	**Concreto clase 28 Mpa (Item 630.3)**		ALTO (m), ANCHO (m)	ESPESOR	LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	LOSA		1.60	0.25	3.35	1.34			
	DENTELLÓN		0.35	0.20	4.75	0.33			
	ALETA MI		1.90	0.25	2.15	1.02			
	CABEZOTE		1.95	0.25	2.25	1.10			
	ALETA MD		1.95	0.25	2.10	1.02			
	GUARDARUEDAS		1.75	0.23	0.43	0.17			
	DESCUENTO TUBERIA					-0.24			
			TOTAL CONCRETO			4.74			
3	ESQUEMAS								

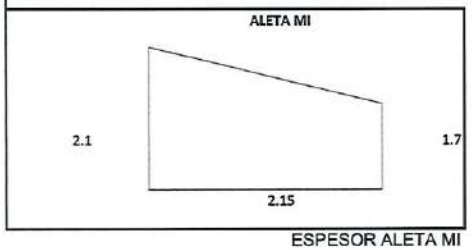

ESPESOR ALETA MI 0.25

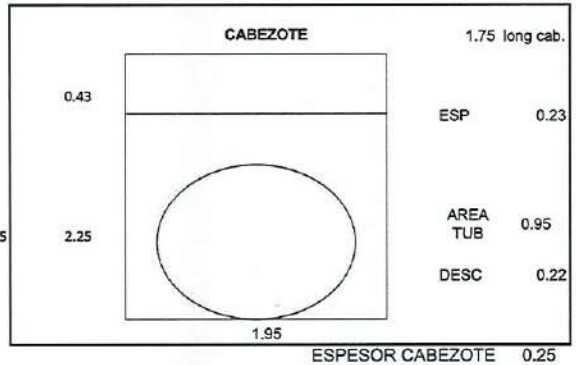

ESPESOR CABEZOTE 0.25

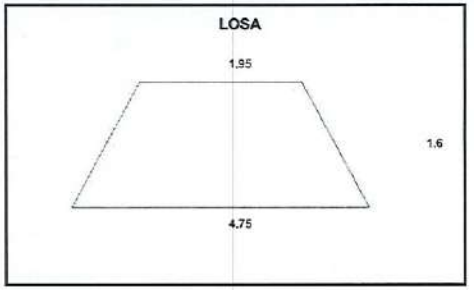

ESPESOR LOSA 0.25



ESPESOR ALETA MD 0.25



ESPESOR DENTELLÓN 0.20

	REVISADO POR CONTRATISTA	APROBADO POR INTERVENTORIA
	RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRES	MIGUEL PARRA	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA		

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL Y ACEPTACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	Codigo: INV978-F-EO-014 Fecha: 17/11/2022 Version: 02 Hoja: de

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vías para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

ODT	50+565	MARGEN	DERECHA	FECHA DE ELABORACION	24/01/2025

	OPERACIÓN	NO	OBSERVACIONES					FECHA DE EJECUCIÓN	FIRMA INTERVENTORÍA
1	SOLADOS EN CONCRETO								
1.1	Concreto clase 14 Mpa (Item 630.7)		ANCHO (m)	ESPESOR	LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	SOLADO CAJA		1.70	0.10	1.50	0.26			
	SOLADO TUBERIA		1.60	0.75	0.10	0.12			
			TOTAL CONCRETO			0.38			
1.2	Concreto clase 14 Mpa Ciclópeo (Item 630.7)		AREA (m)		LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	ATRAQUE (CICLOPEO)		0.27		0.75	0.21			
			TOTAL CONCRETO			0.21			
2	TUBERIA								
2.1	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior (Item 661.7)		CANT	LONG (m)		LONGTUD (M)	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	TUBERIA		1.00	1.00		1.00			
			TOTAL TUBERIA (M)			1.00			
2	ACEROS DE REFUERZO								
2.1	Acero de refuerzo fy= 420 Mpa (Item 640.1)		CANT	LONG (m)	Kg/m	Peso (Kg)	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	POSICIÓN 1		8.00	2.34	0.994	18.61			
	POSICIÓN 2		7.00	2.05	0.994	14.26			
	POSICIÓN 3		10.00	1.80	0.994	17.89			
	POSICIÓN 4		7.00	1.80	0.994	12.52			
	POSICIÓN 5		8	2.43	0.994	19.32			
	POSICIÓN 5		2	2.20	0.994	4.37			
	POSICIÓN 6		10.00	1.30	0.994	12.92			
	POSICIÓN 7		2.00	4.10	0.560	4.59			
	POSICIÓN 8		4.00	1.73	0.994	6.88			
	POSICIÓN 9		4.00	1.73	0.994	6.88			
	POSICIÓN 10		4	2.03	0.994	8.07			
	POSICIÓN 11		4	1.83	0.994	7.28			
	POSICIÓN 12		4	1.83	0.994	7.28			
	POSICIÓN 13		4.00	1.73	0.994	6.88			
	POSICIÓN 14		4.00	2.03	0.560	4.55			
	POSICIÓN 15		4.00	1.73	0.994	6.88			
	POSICIÓN 16		4.00	2.54	0.994	10.10			
	POSICIÓN 17		5	2.03	0.994	10.09			
	POSICIÓN 18		5.00	1.83	0.994	9.10			
	POSICIÓN 19		5.00	2.03	0.994	10.09			
	POSICIÓN 20		4.00	2.54	0.994	10.10			
	POSICIÓN 21		11.00	2.03	0.994	22.20			
	POSICIÓN 22		7.00	2.40	0.994	16.70			
	POSICIÓN 23		11.00	4.03	0.994	44.06			
	POSICIÓN 24		2.00	1.60	1.550	4.96			
	POSICIÓN 25		4.00	1.60	0.994	6.36			
	POSICIÓN 26		9.00	1.60	0.560	8.06			
			TOTAL ACERO (Kg)			311.00			

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL Y ACEPTACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	Codigo: INV978-F-EC-014 Fecha: 17/11/2022 Version: 02 Hoja: ___ de ___

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vías para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

ODT	50+565	MARGEN	DERECHA	FECHA DE ELABORACION	24/01/2025

	OPERACIÓN	NO	OBSERVACIONES					FECHA DE EJECUCIÓN	FIRMA INTERVENTORÍA
3	ESTRUCTURA EN CONCRETO								
3.1	Concreto clase 28 Mpa (Item 630.3)		ALTO (m), ANCHO (m)	ESPESOR	LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	MURO ESPALDAR		1.8	0.25	1.5	0.68			
	MURO LATERAL		1.6	0.25	1.25	0.5			
	GUARDARRUEDA		0.3	0.23	1.5	0.1			
	MURO CABEZOTE		1.8	0.25	1.5	0.68			
	MURO LATERAL		1.8	0.25	1.2	0.54			
	PLACA PISO		1.5	0.25	1.7	0.64			
	(-) ENTRADA CANAL					-0.05			
	(-) VOLUMEN TUBO					-0.24			
			TOTAL CONCRETO			2.85			
3	ESQUEMAS								

MURO LATERAL



MURO POSTERIOR



CABEZOTE

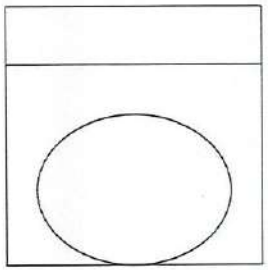

ESPESOR CABEZOTE 0.25

GUARDARRUEDA



LOSA



ESPESOR LOSA 0.25

	REVISADO POR CONTRATISTA	APROBADO POR INTERVENTORIA
	RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRES	MIGUEL ANGEL PARRA CAMACHO	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA		

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL Y ACEPTACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	Codigo: INV978-F-EO-014 Fecha: 17/11/2022 Version: 02 Hoja: ___ de ___

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

ODT	54+452	MARGEN	DERECHA	FECHA DE ELABORACION	24/01/2025

	OPERACIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES					FECHA DE EJECUCIÓN	FIRMA INTERVENTORÍA
1	SOLADOS EN CONCRETO									
2.1	Concreto clase 14 Mpa (Item 630.7)			ANCHO (m)	ESPESOR	LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	SOLADO TUBERIA			1.50	0.10	4.60	0.69			
				TOTAL CONCRETO			0.69			
2.2	Concreto clase 14 Mpa Ciclópeo (Item 630.7)			AREA (m)		LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	ATRAQUE (CICLOPEO)			0.29		4.60	1.31			
				TOTAL CONCRETO			1.31			
2	TUBERIA									
2.1	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior (Item 661.7)			CANT	LONG (m)		LONGTUD (M)	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	TUBERIA			5.00	1.00		5.00			
				TOTAL TUBERIA (M)			5.00			
3	ACEROS DE REFUERZO									
3.3	Acero de refuerzo fy= 420 Mpa (Item 640.1)			CANT	LONG (m)	Kg/m	Peso (Kg)	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
				TOTAL ACERO (Kg)						
4	ESTRUCTURA EN CONCRETO									
4.1	Concreto clase 28 Mpa (Item 630.3)			ANCHO	ESPESOR	LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
				TOTAL CONCRETO						

REVISADO POR CONTRATISTA		APROBADO POR INTERVENTORIA
RESIDENTE DE OBRA		RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRES	MIGUEL ANGEL PARRA CAMACHO	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA		

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL Y ACEPTACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	Codigo: INVS78-F-EO-014 Fecha: 17/11/2022 Version: 02 Hoja: ___ de ___

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

ODT	60+369	MARGEN	IZQUIERDA	FECHA DE ELABORACION	24/01/2025

	OPERACIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES	FECHA DE EJECUCIÓN	FIRMA INTERVENTORÍA
1	SOLADOS EN CONCRETO					
1.1	Concreto clase 14 Mpa (Item 630.6)			ANCHO (m) / ESPESOR / LARGO (m) / m3 de concreto / DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	SOLADO TUBERIA			1.60 / 0.10 / 4.80 / 0.77		
				TOTAL CONCRETO 0.77		
1.2	Concreto clase 14 Mpa Ciclópeo (Item 630.7)			AREA (M2) / LARGO (m) / m3 de concreto / DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	ATRAQUE (CICLOPEO)			0.27 / 4.80 / 1.32		
				TOTAL CONCRETO 1.32		
2	TUBERIA					
2.1	Tuberia de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior (Item 661.1)			CANT / LONG (m) / LONGTUD (M) / DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	TUBERIA			5.00 / 1.00 / 5.00		
				TOTAL TUBERIA (M) 5.00		
3	ACEROS DE REFUERZO					
3.3	Acero de refuerzo fy= 420 Mpa (Item 640.1)			CANT / LONG (m) / Kg/m / Peso (Kg) / DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	POSICIÓN 1			9.00 / 3.90 / 0.994 / 34.89		
	POSICIÓN 2			8.00 / 2.95 / 0.994 / 23.46		
	POSICIÓN 3			8.00 / 1.20 / 0.994 / 9.54		
	POSICIÓN 4			8.00 / 3.25 / 0.994 / 25.84		
	POSICIÓN 5			9 / 3.90 / 0.994 / 34.89		
	POSICIÓN 5			2 / 3.25 / 0.994 / 6.46		
	POSICIÓN 6			10.00 / 2.30 / 0.994 / 22.86		
	POSICIÓN 8			10.00 / 1.62 / 0.994 / 16.10		
	POSICIÓN 9			10.00 / 1.62 / 0.994 / 16.10		
	POSICIÓN 10			10.00 / 1.40 / 0.994 / 13.92		
	POSICIÓN 11			10.00 / 1.40 / 0.994 / 13.92		
	POSICIÓN 12			10.00 / 1.40 / 0.994 / 13.92		
	POSICIÓN 13			10 / 1.62 / 0.994 / 16.10		
	POSICIÓN 14			5.00 / 2.51 / 0.994 / 12.47		
	POSICIÓN 15			5.00 / 1.60 / 0.994 / 7.95		
	POSICIÓN 16			5.00 / 1.20 / 0.994 / 5.96		
	POSICIÓN 17			5.00 / 1.60 / 0.994 / 7.95		
	POSICIÓN 18			5.00 / 2.51 / 0.994 / 12.47		
	POSICIÓN 19			7.00 / 1.49 / 0.994 / 10.37		
	POSICIÓN 20			7.00 / 3.25 / 0.994 / 22.61		
	POSICIÓN 21			9.00 / 4.95 / 0.994 / 44.28		
	POSICIÓN 22			4 / 1.6 / 0.560 / 3.58		
	POSICIÓN 23			2.00 / 1.60 / 1.550 / 4.96		
	POSICIÓN 24			2.00 / 4.10 / 0.560 / 4.59		
	POSICIÓN 25			9.00 / 1.60 / 0.560 / 8.06		
				9.00 / 1.40 / 0.994 / 12.52		
				10.00 / 1.62 / 0.994 / 16.10		
				TOTAL ACERO (Kg) 421.87		

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL Y ACEPTACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	Codigo: INV978-F-EO-014 Fecha: 17/11/2022 Version: 02 Hoja: ___ de ___

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

ODT	60+369	MARGEN	IZQUIERDA	FECHA DE ELABORACION	24/01/2025

	OPERACIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES					FECHA DE EJECUCIÓN	FIRMA INTERVENTORÍA
4	ESTRUCTURA EN CONCRETO									
4.1	Concreto clase 28 Mpa (Item 630.3)			ANCHO	ESPESOR	LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
				TOTAL CONCRETO						
5	ESQUEMAS									

CARA IZQ.



L 0.00
A 0.00
E 0.00

CONTRAPISO



L 0.00
A 0.00
E 0.00

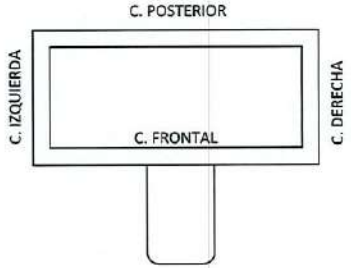

CARA DER.



L 0
A 0.00
E 0.00

GUARDA RUEDA

CARA POST.



L 0.00
A 0.00
E 0.00

0 0

L 1.5 E 0.225

DESCUENTO TUBERÍA 32"



L 0.25
AREA -0.95

DESC -0.24

CARA FRONTAL

L 0.00
A 0.00
E 0.00

	REVISADO POR CONTRATISTA	APROBADO POR INTERVENTORIA
	RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRES	MIGUEL ANGEL PARRA CAMACHO	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA		

Consorcio Vías Nacionales	CONCRETO CLASE 14 MPA	

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

1	DATOS DE ELABORCIÓN DE REGISTRO

FECHA DE ELABORACIÓN:	25/01/2025		
RUTA 65-14	ALCANTARILLA EMERGENCIA PR72	PR 72+360	SÁCAMA

SOLADO PARA TUBERIA ALCANTARILLA (14 Mpa)

	LARGO	*ALTO*	*ANCHO*	*VOLUMEN*
PR 72+360	10.00	0.10	2.50	2.50
UNIDADES				**2.50**

REVISADO POR CONTRATISTA			APROBADO POR INTERVENTORÍA	
TOPOGRAFÍA		INGENIERO RESIDENTE	VoBo	INGENIERO RESIDENTE
NOMBRES:	NESTOR DIAZ	OSCAR POLO	HEDI MORALES	WILLIAM DARIO MORENO RICAURTE
FIRMA:				

OBSERVACION:



Consorcio Vías Nacionales	CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA	Cód: F-EO-009
		Versión: 001
	CONTRATO 0978 DE 2021	Fecha: 02/01/2020
		Pág: 1 de 1

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	31	**MM**	1	**AA**	2,025	**PERIODO:**	1 de enero de 2025		31 de enero de 2025					
CONTRATO:	0978 DE 2021						**OBJETO CONTRATO:**	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4							
CONTRATANTE:	INVIAS				**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA			**ACUMULADO ANTERIOR:**		**PRESENTE ACTA:**		**ACUMULADO TOTAL:**	
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES									222.80		19.60		242.40	
ITEM:	630.7	GRUPO DE AJUSTE	11604	ESPECIF. GENERAL	630-13	ESPECIF. PARTICULAR		Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo		**UNID:**	m3		**UBICACIÓN:**	**RUTA 6404**	

ESQUEMA	LOCALIZACIÓN				LARGO	ANCHO	ESPESOR	MARGEN	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
	ODT	PR49+930	PR49+930	SOCOTA	18.00	0.70	0.70	DER	BORDILLO (ACTA 43)	- 8.82
	ODT	PR49+921	PR49+941	SOCOTA	20.10	1.50	0.70	IZQ	BORDILLO	21.11
	ODT	PR57+140	PR57+140	SOCOTA	5.70	1.37	0.20	IZQ	ATRAQUE TUBERIA	1.56
	ODT	PR57+226	PR57+226	SOCOTA	4.80	1.38	0.20	DER	ATRAQUE TUBERIA	1.32
	ODT	PR60+083	PR60+083	SOCOTA	5.80	1.37	0.20	IZQ	ATRAQUE TUBERIA	1.59
	ODT	PR50+565	PR50+565	SOCOTA	0.75	1.40	0.20	DER	ATRAQUE TUBERIA	0.21
	ODT	PR54+452	PR54+452	SOCOTA	4.60	1.42	0.20	DER	ATRAQUE TUBERIA	1.31
	ODT	PR60+369	PR60+369	SOCOTA	4.80	1.38	0.20	IZQ	ATRAQUE TUBERIA	1.32
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
										-
									Subtotal	**19.60**
									TOTAL	**19.60**

RESIDENTE DE OBRA

FIRMA:

NOMBRE: MIGUEL ANGEL HERRA
CONSORCIO VIAS NACIONALES

INTERVENTORIA

FIRMA:

NOMBRE: DIEGO FERNANDO RUANO FONSECA
CONSORCIO NTERVENTORIAS COLOMBIA

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL Y ACEPTACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	Codigo: INV978-F-EO-014 Fecha: 17/11/2022 Version: 02 Hoja: ___ de ___

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vías para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

ODT	49+921-941	MARGEN	IZQUIERDA	FECHA DE ELABORACION	17/12/2024

	OPERACIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES					FECHA DE EJECUCIÓN	FIRMA INTERVENTORÍA
1	SOLADOS EN CONCRETO									
1.1	Concreto clase 14 Mpa Ciclópeo (Item 630.7)			LONG(M)	ALTURA(M)	ANCHO(M)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	BORDILLO (CICLOPEO)			20.10	1.50	0.70	21.11			
				TOTAL CONCRETO			21.11			
2	TUBERIA									
2.1	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior (Item 661.7)			CANT	LONG (m)		LONGTUD (M)	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
				TOTAL TUBERIA (M)						
3	ACEROS DE REFUERZO									
3.3	Acero de refuerzo fy= 420 Mpa (Item 640.1)			CANT	LONG (m)	Kg/m	Peso (Kg)	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
				TOTAL ACERO (Kg)						
4	ESTRUCTURA EN CONCRETO									
4.1	Concreto clase 28 Mpa (Item 630.3)			ANCHO	ESPESOR	LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
				TOTAL CONCRETO						

	REVISADO POR CONTRATISTA	APROBADO POR INTERVENTORIA
	RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRES	MIGUEL PARRA	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA		

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL Y ACEPTACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	Codigo: INV978-F-EO-014 Fecha: 17/11/2022 Version: 02 Hoja: ___ de ___
PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"	

ODT	57+140	**MARGEN**	IZQUIERDA	**FECHA DE ELABORACION**	17/12/2024

	OPERACIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES					FECHA DE EJECUCIÓN	FIRMA INTERVENTORÍA
1	**SOLADOS EN CONCRETO**									
2.1	**Concreto clase 14 Mpa (Item 630.7)**			ANCHO (m)	ESPESOR	LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	SOLADO TUBERIA			1.60	0.20	5.70	1.82			
				TOTAL CONCRETO			1.82			
2.2	**Concreto clase 14 Mpa Ciclópeo (Item 630.7)**			AREA (m)		LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	ATRAQUE (CICLOPEO)			0.27		5.70	1.56			
				TOTAL CONCRETO			1.56			
2	**TUBERIA**									
2.1	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior (Item 661.7)			CANT	LONG (m)		LONGTUD (M)	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	TUBERIA			6.00	1.00		6.00			
				TOTAL TUBERIA (M)			6.00			
3	**ACEROS DE REFUERZO**									
3.3	**Acero de refuerzo fy= 420 Mpa (Item 640.1)**			CANT	LONG (m)	Kg/m	Peso (Kg)	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
				TOTAL ACERO (Kg)						
4	**ESTRUCTURA EN CONCRETO**									
4.1	**Concreto clase 28 Mpa (Item 630.3)**			ANCHO	ESPESOR	LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
				TOTAL CONCRETO						

REVISADO POR CONTRATISTA	**APROBADO POR INTERVENTORIA**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
MIGUEL PARRA	DIEGO RUANO FONSECA

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL Y ACEPTACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	Codigo: INV978-F-EO-014 Fecha: 17/11/2022 Version: 02 Hoja: ___ de ___

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

ODT	57+226	MARGEN	DERECHA	FECHA DE ELABORACION	17/12/2024

	OPERACIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES					FECHA DE EJECUCIÓN	FIRMA INTERVENTORÍA
1	SOLADOS EN CONCRETO									
1.1	Concreto clase 14 Mpa (Item 630.7)			ANCHO (m)	ESPESOR	LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	SOLADO TUBERIA			1.50	0.20	4.80	1.44			
				TOTAL CONCRETO			1.44			
1.2	Concreto clase 14 Mpa Ciclópeo (Item 630.7)			AREA (m)		LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	ATRAQUE (CICLOPEO)			0.27		4.80	1.32			
				TOTAL CONCRETO			1.32			
2	TUBERIA									
2.1	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior (Item 661.7)			CANT	LONG (m)		LONGTUD (M)	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	TUBERIA			5.00	1.00		5.00			
				TOTAL TUBERIA (M)			5.00			
3	ACEROS DE REFUERZO									
3.3	Acero de refuerzo fy= 420 Mpa (Item 640.1)			CANT	LONG (m)	Kg/m	Peso (Kg)	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
				TOTAL ACERO (Kg)						
4	ESTRUCTURA EN CONCRETO									
4.1	Concreto clase 28 Mpa (Item 630.3)			ANCHO	ESPESOR	LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
				TOTAL CONCRETO						

	REVISADO POR CONTRATISTA	APROBADO POR INTERVENTORIA
	RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRES	MIGUEL PARRA	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA		

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL Y ACEPTACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	Codigo: INV978-F-EO-014 Fecha: 17/11/2022 Version: 02 Hoja: ___ de ___

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

ODT	60+083	MARGEN	IZQUIERDA	FECHA DE ELABORACION	17/12/2024

	OPERACIÓN	NO	OBSERVACIONES					FECHA DE EJECUCIÓN	FIRMA INTERVENTORÍA
1	**SOLADOS EN CONCRETO**								
1.1	**Concreto clase 14 Mpa (Item 630.5)**		ANCHO (m)	ESPESOR	LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	SOLADO ALETA		2.10	0.10	4.70	0.99			
	SOLADO TUBERIA		1.60	0.10	5.80	0.93			
			TOTAL CONCRETO			1.92			
1.2	**Concreto clase 14 Mpa Ciclópeo (Item 630.7)**		AREA (m)		LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	ATRAQUE (CICLOPEO)		0.27		5.80	1.59			
			TOTAL CONCRETO			1.59			
2	**TUBERIA**								
2.1	Tuberia de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior (Item 661.7)		CANT	LONG (m)		LONGTUD (M)	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	TUBERIA		6.00	1.00		6.00			
			TOTAL TUBERIA (M)			6.00			
2	**ACEROS DE REFUERZO**								
2.1	**Acero de refuerzo fy= 420 Mpa (Item 640.1)**		CANT	LONG (m)	Kg/m	Peso (Kg)	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	POSICIÓN 1		8.00	4.45	0.994	35.39			
	POSICIÓN 2		23.00	0.90	0.994	20.58			
	POSICIÓN 3		9.00	2.55	0.994	22.81			
	POSICIÓN 4		12.00	3.26	0.994	38.89			
	POSICIÓN 5		7.00	4.08	0.994	28.35			
	POSICIÓN 5		4.00	5.00	0.994	19.88			
	POSICIÓN 6		7.00	4.00	0.994	27.83			
	POSICIÓN 7		4.00	4.00	0.994	15.90			
	POSICIÓN 8		4.00	3.20	0.994	12.72			
	POSICIÓN 9		10.00	5.00	0.994	49.70			
	POSICIÓN 10		8.00	10.00	0.994	79.52			
	POSICIÓN 11		8.00	2.76	0.994	21.95			
	POSICIÓN 12		8.00	2.25	0.994	17.89			
	POSICIÓN 13		6.00	5.00	0.994	29.82			
	POSICIÓN 14		2.00	5.40	0.994	10.74			
	POSICIÓN 15		2.00	1.60	0.994	3.18			
	POSICIÓN 16		2.00	3.00	0.994	5.96			
	POSICIÓN 12		2.00	3.80	0.994	7.55			
	POSICIÓN 13		2.00	3.30	0.994	6.56			
	POSICIÓN 14		2.00	2.77	0.994	5.51			
	POSICIÓN 15		8.00	1.82	0.994	14.47			
	POSICIÓN 16		2.00	1.70	0.994	3.38			
	POSICIÓN 14		4.00	1.60	0.560	3.58			
	POSICIÓN 15		2.00	1.60	1.552	4.97			
	POSICIÓN 16		7.00	1.60	0.560	6.27			
	POSICIÓN 17		2.00	4.10	0.560	4.59			
			TOTAL ACERO (Kg)			498.00			

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL Y ACEPTACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	Codigo: INV978-F-EO-014
		Fecha: 17/11/2022
		Version: 02
		Hoja: ___ de ___

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Arlporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

ODT	60+083	MARGEN	IZQUIERDA	FECHA DE ELABORACION	17/12/2024

	OPERACIÓN	NO	OBSERVACIONES	FECHA DE EJECUCIÓN	FIRMA INTERVENTORÍA

			ALTO (m), ANCHO (m)	ESPESOR	LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
3	ESTRUCTURA EN CONCRETO								
3.1	**Concreto clase 28 Mpa (Item 630.3)**								
	LOSA		1.45	0.25	3.40	1.23			
	DENTELLÓN		0.35	0.25	4.70	0.41			
	ALETA MI		2.19	0.25	1.90	1.04			
	CABEZOTE		1.70	0.25	2.69	1.14			
	ALETA MD		2.19	0.25	1.90	1.04			
	GUARDARUEDAS		1.70	0.23	0.37	0.14			
	DESCUENTO TUBERIA					-0.24			
			TOTAL CONCRETO			4.76			
3	ESQUEMAS								

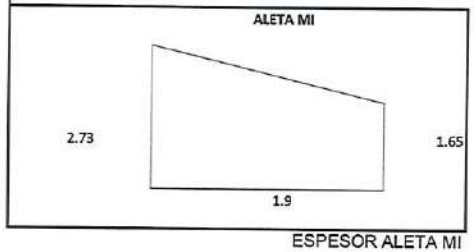

ESPESOR ALETA MI 0.25

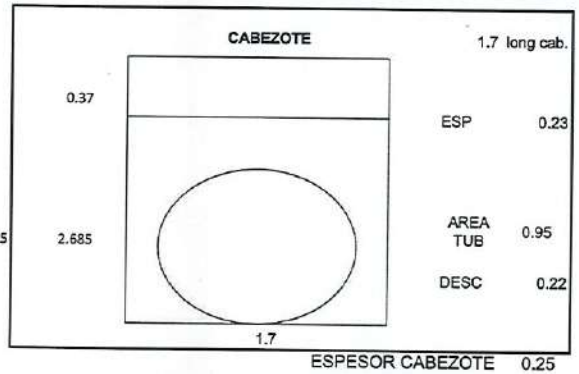

ESPESOR CABEZOTE 0.25

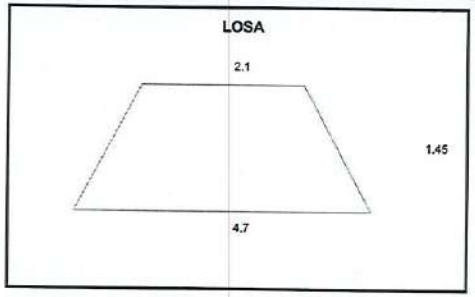

ESPESOR LOSA 0.25



ESPESOR ALETA MD 0.25



ESPESOR DENTELLÓN 0.25

REVISADO POR CONTRATISTA		APROBADO POR INTERVENTORIA
	RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRES	MIGUEL PARRA	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA		

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL Y ACEPTACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	Codigo: INV978-F-EO-014 Fecha: 17/11/2022 Version: 02 Hoja: ___ de ___

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vías para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

ODT	50+565	MARGEN	DERECHA	FECHA DE ELABORACION	24/01/2025

	OPERACIÓN	NO	OBSERVACIONES					FECHA DE EJECUCIÓN	FIRMA INTERVENTORÍA
1	SOLADOS EN CONCRETO								
1.1	Concreto clase 14 Mpa (Item 630.7)		ANCHO (m)	ESPESOR	LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	SOLADO CAJA		1.70	0.10	1.50	0.26			
	SOLADO TUBERIA		1.60	0.75	0.10	0.12			
			TOTAL CONCRETO			0.38			
1.2	Concreto clase 14 Mpa Ciclópeo (Item 630.7)		AREA (m)		LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	ATRAQUE (CICLOPEO)		0.27		0.75	0.21			
			TOTAL CONCRETO			0.21			
2	TUBERIA								
2.1	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior (Item 661.7)		CANT	LONG (m)		LONGTUD (M)	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	TUBERIA		1.00	1.00		1.00			
			TOTAL TUBERIA (M)			1.00			
2	ACEROS DE REFUERZO								
2.1	Acero de refuerzo fy= 420 Mpa (Item 640.1)		CANT	LONG (m)	Kg/m	Peso (Kg)	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	POSICIÓN 1		8.00	2.34	0.994	18.61			
	POSICIÓN 2		7.00	2.05	0.994	14.26			
	POSICIÓN 3		10.00	1.80	0.994	17.89			
	POSICIÓN 4		7.00	1.80	0.994	12.52			
	POSICIÓN 5		8	2.43	0.994	19.32			
	POSICIÓN 5		2	2.20	0.994	4.37			
	POSICIÓN 6		10.00	1.30	0.994	12.92			
	POSICIÓN 7		2.00	4.10	0.560	4.59			
	POSICIÓN 8		4.00	1.73	0.994	6.88			
	POSICIÓN 9		4.00	1.73	0.994	6.88			
	POSICIÓN 10		4	2.03	0.994	8.07			
	POSICIÓN 11		4	1.83	0.994	7.28			
	POSICIÓN 12		4	1.83	0.994	7.28			
	POSICIÓN 13		4.00	1.73	0.994	6.88			
	POSICIÓN 14		4.00	2.03	0.560	4.55			
	POSICIÓN 15		4.00	1.73	0.994	6.88			
	POSICIÓN 16		4.00	2.54	0.994	10.10			
	POSICIÓN 17		5	2.03	0.994	10.09			
	POSICIÓN 18		5.00	1.83	0.994	9.10			
	POSICIÓN 19		5.00	2.03	0.994	10.09			
	POSICIÓN 20		4.00	2.54	0.994	10.10			
	POSICIÓN 21		11.00	2.03	0.994	22.20			
	POSICIÓN 22		7.00	2.40	0.994	16.70			
	POSICIÓN 23		11.00	4.03	0.994	44.06			
	POSICIÓN 24		2.00	1.60	1.550	4.96			
	POSICIÓN 25		4.00	1.60	0.994	6.36			
	POSICIÓN 26		9.00	1.60	0.560	8.06			
			TOTAL ACERO (Kg)			311.00			

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL Y ACEPTACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	Codigo: INV978-F-EO-014 Fecha: 17/11/2022 Version: 02 Hoja: ___ de ___

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

ODT	50+565	MARGEN	DERECHA	FECHA DE ELABORACION	24/01/2025

	OPERACIÓN	NO	OBSERVACIONES					FECHA DE EJECUCIÓN	FIRMA INTERVENTORÍA
3	ESTRUCTURA EN CONCRETO								
3.1	Concreto clase 28 Mpa (Item 630.3)		ALTO (m), ANCHO (m)	ESPESOR	LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	MURO ESPALDAR		1.8	0.25	1.5	0.68			
	MURO LATERAL		1.6	0.25	1.25	0.5			
	GUARDARRUEDA		0.3	0.23	1.5	0.1			
	MURO CABEZOTE		1.8	0.25	1.5	0.68			
	MURO LATERAL		1.8	0.25	1.2	0.54			
	PLACA PISO		1.5	0.25	1.7	0.64			
	(-) ENTRADA CANAL					-0.05			
	(-) VOLUMEN TUBO					-0.24			
			TOTAL CONCRETO			2.85			
3	ESQUEMAS								

MURO LATERAL



CABEZOTE

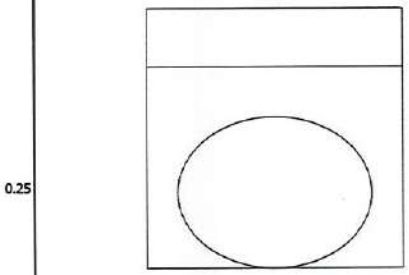

ESPESOR CABEZOTE 0.25

LOSA



ESPESOR LOSA 0.25

MURO POSTERIOR



GUARDARRUEDA



REVISADO POR CONTRATISTA		APROBADO POR INTERVENTORIA
RESIDENTE DE OBRA		RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRES	MIGUEL ANGEL PARRA CAMACHO	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA		

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL Y ACEPTACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	Codigo: INV978-F-EO-014 Fecha: 17/11/2022 Version: 02 Hoja: ___ de ___

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vías para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

ODT	54+452	MARGEN	DERECHA	FECHA DE ELABORACION	24/01/2025

	OPERACIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES					FECHA DE EJECUCIÓN	FIRMA INTERVENTORÍA
1	**SOLADOS EN CONCRETO**									
2.1	**Concreto clase 14 Mpa (Item 630.7)**			ANCHO (m)	ESPESOR	LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	SOLADO TUBERIA			1.50	0.10	4.60	0.69			
				TOTAL CONCRETO			0.69			
2.2	**Concreto clase 14 Mpa Ciclópeo (Item 630.7)**			AREA (m)		LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	ATRAQUE (CICLOPEO)			0.29		4.60	1.31			
				TOTAL CONCRETO			1.31			
2	TUBERIA									
2.1	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior (Item 661.7)			CANT	LONG (m)		LONGTUD (M)	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	TUBERIA			5.00	1.00		5.00			
				TOTAL TUBERIA (M)			5.00			
3	ACEROS DE REFUERZO									
3.3	**Acero de refuerzo fy= 420 Mpa (Item 640.1)**			CANT	LONG (m)	Kg/m	Peso (Kg)	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
				TOTAL ACERO (Kg)						
4	ESTRUCTURA EN CONCRETO									
4.1	**Concreto clase 28 Mpa (Item 630.3)**			ANCHO	ESPESOR	LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
				TOTAL CONCRETO						

REVISADO POR CONTRATISTA		APROBADO POR INTERVENTORIA
RESIDENTE DE OBRA		RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRES	MIGUEL ANGEL PARRA CAMACHO	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA		

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL Y ACEPTACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	Codigo: INV978-F-EO-014 Fecha: 17/11/2022 Version: 02 Hoja: ___ de ___

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

ODT	60+369	MARGEN	IZQUIERDA	FECHA DE ELABORACION	24/01/2025

	OPERACIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES					FECHA DE EJECUCIÓN	FIRMA INTERVENTORÍA
1	SOLADOS EN CONCRETO									
1.1	Concreto clase 14 Mpa (Item 630.6)			ANCHO (m)	ESPESOR	LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	SOLADO TUBERIA			1.60	0.10	4.80	0.77			
				TOTAL CONCRETO			0.77			
1.2	Concreto clase 14 Mpa Ciclópeo (Item 630.7)			AREA (M2)		LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	ATRAQUE (CICLOPEO)			0.27		4.80	1.32			
				TOTAL CONCRETO			1.32			
2	TUBERIA									
2.1	Tuberia de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior (Item 661.1)			CANT	LONG (m)		LONGTUD (M)	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	TUBERIA			5.00	1.00		5.00			
				TOTAL TUBERIA (M)			5.00			
3	ACEROS DE REFUERZO									
3.3	Acero de refuerzo fy= 420 Mpa (Item 640.1)			CANT	LONG (m)	Kg/m	Peso (Kg)	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	POSICIÓN 1			9.00	3.90	0.994	34.89			
	POSICIÓN 2			8.00	2.95	0.994	23.46			
	POSICIÓN 3			8.00	1.20	0.994	9.54			
	POSICIÓN 4			8.00	3.25	0.994	25.84			
	POSICIÓN 5			9	3.90	0.994	34.89			
	POSICIÓN 5			2	3.25	0.994	6.46			
	POSICIÓN 6			10.00	2.30	0.994	22.86			
	POSICIÓN 8			10.00	1.62	0.994	16.10			
	POSICIÓN 9			10.00	1.62	0.994	16.10			
	POSICIÓN 10			10.00	1.40	0.994	13.92			
	POSICIÓN 11			10.00	1.40	0.994	13.92			
	POSICIÓN 12			10.00	1.40	0.994	13.92			
	POSICIÓN 13			10	1.62	0.994	16.10			
	POSICIÓN 14			5.00	2.51	0.994	12.47			
	POSICIÓN 15			5.00	1.60	0.994	7.95			
	POSICIÓN 16			5.00	1.20	0.994	5.96			
	POSICIÓN 17			5.00	1.60	0.994	7.95			
	POSICIÓN 18			5.00	2.51	0.994	12.47			
	POSICIÓN 19			7.00	1.49	0.994	10.37			
	POSICIÓN 20			7.00	3.25	0.994	22.61			
	POSICIÓN 21			9.00	4.95	0.994	44.28			
	POSICIÓN 22			4	1.6	0.560	3.58			
	POSICIÓN 23			2.00	1.60	1.550	4.96			
	POSICIÓN 24			2.00	4.10	0.560	4.59			
	POSICIÓN 25			9.00	1.60	0.560	8.06			
				9.00	1.40	0.994	12.52			
				10.00	1.62	0.994	16.10			
				TOTAL ACERO (Kg)			421.87			

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL Y ACEPTACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	Codigo: INV978-F-EO-014 Fecha: 17/11/2022 Version: 02 Hoja: ___ de ___

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

ODT	60+369	MARGEN	IZQUIERDA	FECHA DE ELABORACION	24/01/2025

	OPERACIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES					FECHA DE EJECUCIÓN	FIRMA INTERVENTORÍA
4	ESTRUCTURA EN CONCRETO									
4.1	Concreto clase 28 Mpa (Item 630.3)			ANCHO	ESPESOR	LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
				TOTAL CONCRETO						
5	ESQUEMAS									

CARA IZQ.



L 0.00
A 0.00
E 0.00

CONTRAPISO



L 0.00
A 0.00
E 0.00

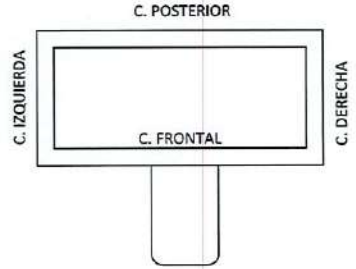

CARA DER.



L 0
A 0.00
E 0.00

GUARDA RUEDA

CARA POST.



L 0.00
A 0.00
E 0.00

0 0

L 1.5 E 0.225

DESCUENTO TUBERÍA 32"



L 0.25
AREA -0.95

DESC -0.24

CARA FRONTAL



L 0.00
A 0.00
E 0.00

	REVISADO POR CONTRATISTA	APROBADO POR INTERVENTORIA
	RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRES	MIGUEL ANGEL PARRA CAMACHO	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA		

Consorcio Vías Nacionales

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO 0978 DE 2021

Cód: F-EO-009
Versión: 001
Fecha: 02/01/2020
Pág: 1 de 1

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	31	**MM**	1	**AA**	2,025	**PERIODO:**	1 de enero de 2025		31 de enero de 2025	
CONTRATO:	0978 DE 2021						**OBJETO CONTRATO:**	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4			
CONTRATANTE:	INVIAS				**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA		**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES								355,173.20	28,403.00	383,576.20

ITEM:	640.1	GRUPO DE AJUSTE	11606	ESPECIF. GENERAL	640-13	ESPECIF. PARTICULAR		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	**UNID:**	Kg	**UBICACIÓN:**	**RUTA 6404 Y 6405**

ESQUEMA

LOCALIZACIÓN				DIAMETRO	LONGITUD	MARGEN	PESO TOTAL	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
PILOTE 1A	PR30+300	PR30+300	SOCHA	-	-	IZQ	4,694.77	PILOTE 1 PROTECCION (ACTA 43)	- 4,694.77
PILOTE 3A	PR30+300	PR30+300	SOCHA	-	-	IZQ	4,694.77	PILOTE 3 PROTECCION (ACTA 43)	- 4,694.77
PILOTE 5A	PR30+300	PR30+300	SOCHA	-	-	IZQ	4,694.77	PILOTE 5 PROTECCION (ACTA 43)	- 4,694.77
MODULO 1	PR54+468	PR54+474	SOCOTA	-	-	DER	1,122.37	ZARPA - DENTELLON - VASTAGO (ACTA 43)	- 1,122.37
MODULO 2	PR54+468	PR54+474	SOCOTA	-	-	DER	1,122.37	ZARPA - DENTELLON - VASTAGO (ACTA 43)	- 1,122.37
MODULO 5	PR54+468	PR54+474	SOCOTA	-	-	DER	1,122.37	ZARPA - DENTELLON - VASTAGO (ACTA 43)	- 1,122.37
MODULO 1	PR54+486	PR54+508	SOCOTA	-	-	IZQ	1,122.37	ZARPA - DENTELLON - VASTAGO (ACTA 43)	- 1,122.37
MODULO 2	PR54+486	PR54+508	SOCOTA	-	-	DER	1,122.37	ZARPA - DENTELLON - VASTAGO (ACTA 43)	- 1,122.37
MODULO 3	PR54+486	PR54+508	SOCOTA	-	-	DER	1,122.37	ZARPA - DENTELLON - VASTAGO (ACTA 43)	- 1,122.37
MODULO 1	PR54+595	PR54+613	SOCOTA	-	-	DER	564.00	VASTAGO (ACTA 43)	- 564.00
MODULO 2	PR54+595	PR54+613	SOCOTA	-	-	DER	564.00	VASTAGO (ACTA 43)	- 564.00
MODULO 3	PR54+595	PR54+613	SOCOTA	-	-	DER	564.00	VASTAGO (ACTA 43)	- 564.00
ANCLAJES	PR30+300	PR30+300	SOCHA	-	-	DER	79.52	ANCLAJES BOLSACRETOS	79.52
ANCLAJES	PR30+300	PR30+300	SOCHA	-	-	DER	25.65	ANCLAJES BOLSACRETOS	25.65
PILOTE 1A	PR30+300	PR30+300	SOCHA	-	-	IZQ	4,694.76	PILOTE 1 PROTECCION	4,694.76
PILOTE 8A	PR30+300	PR30+300	SOCHA	-	-	IZQ	4,694.76	PILOTE 8 PROTECCION	4,694.76
PILOTE 2A	PR30+300	PR30+300	SOCHA	-	-	IZQ	4,542.28	PILOTE 2 PROTECCION	4,542.28
PILOTE 5A	PR30+300	PR30+300	SOCHA	-	-	IZQ	4,542.28	PILOTE 5 PROTECCION	4,542.28
PILOTE 7A	PR30+300	PR30+300	SOCHA	-	-	IZQ	4,542.28	PILOTE 7 PROTECCION	4,542.28
MODULO 1	PR54+468	PR54+474	SOCOTA	-	-	DER	1,222.15	ZARPA - DENTELLON - VASTAGO - CORREAS	1,222.15
MODULO 2	PR54+468	PR54+474	SOCOTA	-	-	DER	1,310.09	ZARPA - DENTELLON - VASTAGO - CORREAS	1,310.09
MODULO 3	PR54+468	PR54+474	SOCOTA	-	-	DER	184.88	CORREAS	184.88
MODULO 4	PR54+468	PR54+474	SOCOTA	-	-	DER	172.96	CORREAS	172.96
MODULO 5	PR54+468	PR54+474	SOCOTA	-	-	DER	1,295.18	ZARPA - DENTELLON - VASTAGO - CORREAS	1,295.18
MODULO 1	PR54+486	PR54+508	SOCOTA	-	-	DER	1,301.15	ZARPA - DENTELLON - VASTAGO - CORREAS	1,301.15
MODULO 2	PR54+486	PR54+508	SOCOTA	-	-	DER	1,325.00	ZARPA - DENTELLON - VASTAGO - CORREAS	1,325.00
MODULO 3	PR54+486	PR54+508	SOCOTA	-	-	DER	1,282.38	ZARPA - DENTELLON - VASTAGO - CORREAS	1,282.38
MODULO 4	PR54+486	PR54+508	SOCOTA	-	-	DER	912.99	ZARPA - DENTELLON - VASTAGO - CORREAS	912.99
MODULO 1	PR54+595	PR54+613	SOCOTA	-	-	DER	499.98	ZARPA - DENTELLON - VASTAGO - CORREAS	499.98
MODULO 2	PR54+595	PR54+613	SOCOTA	-	-	DER	499.98	ZARPA - DENTELLON - VASTAGO - CORREAS	499.98
MODULO 3	PR54+595	PR54+613	SOCOTA	-	-	DER	500.07	ZARPA - DENTELLON - VASTAGO - CORREAS	500.07
ODT	PR59+849	PR59+849	SOCOTA	-	-	IZQ	497.73	DESCOLE	497.73
ODT	PR60+083	PR60+083	SOCOTA	-	-	DER	501.37	DESCOLE	501.37
ODT	PR60+083	PR60+083	SOCOTA			IZQ	498.00	DESCOLE	498.00
ODT	PR60+369	PR60+369	SOCOTA	-	-	DER	1738.70	DESCOLE	1,738.70
ODT	PR60+786	PR60+786	SOCOTA	-	-	DER	511.82	DESCOLE	511.82
ODT	PR49+335	PR49+335	SOCOTA	-	-	DER	642.13	DESCOLE	642.13
ODT	PR50+565	PR50+565	SOCOTA	-	-	DER	311.00	ENCOLE	311.00
-	PR54+452	PR54+452	SOCOTA	-	-	DER	21.19	POCETA AGUAS NEGRAS	21.19
-	PR54+452	PR54+452	SOCOTA	-	-	DER	3.38	POCETA AGUAS NEGRAS	3.38
-	PR54+462	PR54+462	SOCOTA	-	-	DER	40.75	POCETA AGUAS NEGRAS	40.75
ODT	PR60+369	PR60+369	SOCOTA	-	-	IZQ	421.87	ENCOLE	421.87
CAISSON 1	PR16+200	PR16+200	SACAMA	-	-	DER	2419.45	NUCLEO	2,419.45
CAISSON 2	PR16+200	PR16+200	SACAMA	-	-	DER	2419.45	NUCLEO	2,419.45
CAISSON 3	PR16+200	PR16+200	SACAMA	-	-	DER	2419.45	NUCLEO	2,419.45
CAISSON 4	PR16+200	PR16+200	SACAMA	-	-	DER	2419.45	NUCLEO	2,419.45
CAISSON 10	PR16+200	PR16+200	SACAMA	-	-	DER	2419.45	NUCLEO	2,419.45
									-
							Subtotal		**28,403.00**
							TOTAL		**28,403.00**

RESIDENTE DE OBRA	**RESIDENTE DE OBRA**	**INTERVENTORIA**	**INTERVENTORIA**
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: MIGUEL ANGEL PARRA CONSORCIO VIAS NACIONALES	NOMBRE: OSCAR HUMBERTO POLO CONSORCIO VIAS NACIONALES	NOMBRE: DIEGO FERNANDO RUANO FONSECA CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA	NOMBRE: WILLIAM DARIO MORENO CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL Y ACEPTACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	Codigo: INV978-F-EO-014
		Fecha: 17/11/2022
		Version: 02
		Hoja: ___ de ___

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

UBICACIÓN	K30+ CAUCE QUEBRADA EL BOCHE OBRAS DE MITIGACION	RUTA	6404	FECHA DE ELABORACION	27/12/2024

	OPERACIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES						FECHA DE EJECUCIÓN	FIRMA INTERVENTORÍA
1	PRELIMINARES										
1.1	Geotextil Tipo II no tejido (Item 673.1)			CANT	LONG (m)	ALTO	AREA (M2)	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES			
				TOTAL M2			0.00				
2	ACEROS DE REFUERZO										
2.1	Acero de refuerzo fy= 420 Mpa (Item 640.1)			CANT	LONG (m)	Kg/m	Peso (Kg)	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES			
	ANCLAJES 1ER NIVEL MD			40	0.5	0.994	19.88				
	ANCLAJES NIVEL NIVELES SUPERIORES MD			200	0.3	0.994	59.64				
				TOTAL ACERO			79.52				
2	ESTRUCTURA EN CONCRETO	MD	MI								
2.1	Suministro e instalación de bolsacreto de 1,20*2,4*0,35 m. (concreto bombeable) - Sector El Boche (Item NP41.P)			CANT	ANCHO (m)	ESPESOR (M)	LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	BOLSACRETO	X		100.00	1.20	0.300	2.40	86.40	0.864		
				TOTAL VOLUMEN BOLSACRETOS				86.40			

REVISADO POR CONTRATISTA		APROBADO POR INTERVENTORIA
RESIDENTE DE OBRA		RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRES	MIGUEL ANGEL PARRA C.	
FIRMA		

Consorcio Vías Nacionales

CONTROL Y ACEPTACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

Codigo: INV978-F-EO-014
Fecha: 17/11/2022
Version: 02
Hoja: ___ de ___

PROYECTO: CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

UBICACIÓN: K30+ CAUCE QUEBRADA EL BOCHE OBRAS DE MITIGACION | **RUTA:** 6404 | **FECHA DE ELABORACION:** 25/01/2025

	OPERACIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES						FECHA DE EJECUCIÓN	FIRMA INTERVENTORÍA
1	PRELIMINARES										
1.1	Geotextil Tipo II no tejido (Item 673.1)			CANT	LONG (m)	ALTO	AREA (M2)	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES			
	GEOTEXTIL NT2500 MD				48.00	9.60	460.80				
	GEOTEXTIL NT2500 MI				34.00	9.60	326.40				
	GEOTEXTIL NT2500 SEPARACION PISO				29.00	9.90	287.10				
				TOTAL M2			787.20				
2	ACEROS DE REFUERZO										
2.1	Acero de refuerzo fy= 420 Mpa (Item 640.1)			CANT	LONG (m)	Kg/m	Peso (Kg)	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES			
	ANCLAJES 1ER NIVEL MD			0	0.5	0.994	0.00				
	ANCLAJES NIVEL NIVELES SUPERIORES MD			86	0.3	0.994	25.65				
				TOTAL ACERO			25.65				
2	ESTRUCTURA EN CONCRETO	MD	MI								
2.1	Suministro e instalación de bolsacreto de 1,20*2,4*0,35 m. (concreto bombeable) - Sector El Boche (Item NP41.P)			CANT	ANCHO (m)	ESPESOR (M)	LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	BOLSACRETO	X		43.00	1.20	0.300	2.40	37.15	0.864		
				TOTAL VOLUMEN BOLSACRETOS				37.15			

	REVISADO POR CONTRATISTA	APROBADO POR INTERVENTORIA
	RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRES	MIGUEL ANGEL PARRA C.	
FIRMA		

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL Y ACEPTACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	Codigo: INV978-F-EC-014 Fecha: 17/11/2022 Version: 02 Hoja: ___ de ___

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

PILOTAJE	PILOTE 1A PR 30+300	MARGEN	IZQUIERDA	FECHA DE ELABORACION	12/12/2024

	OPERACIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES					FECHA DE EJECUCIÓN	FIRMA INTERVENTORÍA
1	CAMISA									
2.1	Suministro e instalación de camisa para pilote de 1,2 m de diámetro (No recuperable) para puente Boche PR 30+300 (Item NP 28)			ANCHO (m)	ESPESOR	LARGO (m)	m	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	Camisa			-	-	10.00	10.00			
				-	-					
				TOTAL m			10.00			
3	ACEROS DE REFUERZO									
3.3	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. (Item 540.1)			CANT	LONG (m)	Kg/m	Peso (Kg)	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	P1			13.00	9.00	6.40	749.27	*Varilla No. 10*		
	P2			13.00	12.00	6.40	998.40	*Varilla No. 8*		
	P3			13.00	10.55	6.40	877.76	*Varilla No. 8*		
	P4			272.00	4.45	1.55	1879.02	*Varilla No. 5*		
	P5			44	4.35	0.99	190.31	*Varilla No. 4*		
				TOTAL ACERO (Kg)			4694.76			
4	ESTRUCTURA EN CONCRETO									
4.1	Pilote excavado in situ f'c=28 Mpa tipo tremie con Ø =1,2 m para puente El Boche incluye excavación en suelo duro (Item NP 27)			ANCHO	ESPESOR	LARGO (m)	m	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	Pilote 1A (DE PROTECCION ESTRIBO 1)			-	-	26.50	26.50			
				TOTAL CONCRETO			26.50			

REVISADO POR CONTRATISTA
RESIDENTE DE OBRA
MIGUEL ANGEL BARRA CAMACHO

APROBADO POR INTERVENTORIA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
DIEGO JUAN FONSECA

NOMBRES	
FIRMA	

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL Y ACEPTACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	Codigo: INV978-F-EO-014 Fecha: 17/11/2022 Version: 02 Hoja: ___ de ___

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vías para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

PILOTAJE	PILOTE 8A PR 30+300	MARGEN	IZQUIERDA	FECHA DE ELABORACION	12/12/2024

	OPERACIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES					FECHA DE EJECUCIÓN	FIRMA INTERVENTORÍA
1	CAMISA									
2.1	**Suministro e instalación de camisa para pilote de 1,2 m de diámetro (No recuperable) para puente Boche PR 30+300 (Item NP 28)**			ANCHO (m)	ESPESOR	LARGO (m)	m	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	Camisa			-	-	10.00	10.00			
				-	-					
				TOTAL m			10.00			
3	ACEROS DE REFUERZO									
3.3	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. (Item 640.1)			CANT	LONG (m)	Kg/m	Peso (Kg)	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	P1			13.00	9.00	6.40	749.27	*Varilla No. 10*		
	P2			13.00	12.00	6.40	998.40	*Varilla No. 8*		
	P3			13.00	10.55	6.40	877.76	*Varilla No. 8*		
	P4			272.00	4.45	1.55	1879.02	*Varilla No. 5*		
	P5			44	4.35	0.99	190.31	*Varilla No. 4*		
				TOTAL ACERO (Kg)			4694.76			
4	ESTRUCTURA EN CONCRETO									
4.1	**Pilote excavado in situ f'c=28 Mpa tipo tremie con Ø =1,2 m para puente El Boche incluye excavación en suelo duro (Item NP 27)**			ANCHO	ESPESOR	LARGO (m)	m	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	Pilote 8A (DE PROTECCION ESTRIBO 1)			-	-	26.50	26.50			
				TOTAL CONCRETO			26.50			

REVISADO POR CONTRATISTA	APROBADO POR INTERVENTORIA
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRES: MIGUEL ANGEL PARRA CAMACHO	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA:	

Consorcio Vías Nacionales

CONTROL Y ACEPTACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

Codigo: INV978-F-EO-014
Fecha: 17/11/2022
Version: 02
Hoja: ___ de ___

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"				
PILOTAJE	PILOTE 2A PR 30+300	MARGEN	IZQUIERDA	FECHA DE ELABORACION	25/01/2025

	OPERACIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES					FECHA DE EJECUCIÓN	FIRMA INTERVENTORÍA
1	**CAMISA**									
2.1	**Suministro e instalación de camisa para pilote de 1,2 m de diámetro (No recuperable) para puente Boche PR 30+300 (Item NP 28)**			ANCHO (m)	ESPESOR	LARGO (m)	m	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	Camisa			-	-	9.00	9.00			
				-	-					
				TOTAL m			9.00			
3	**ACEROS DE REFUERZO**									
3.3	**Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. (Item 640.1)**			CANT	LONG (m)	Kg/m	Peso (Kg)	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	P1			13.00	9.00	6.404	749.27	*Varilla No. 10*		
	P2			13.00	12.00	6.400	998.40	*Varilla No. 8*		
	P3			13.00	10.55	6.400	877.76	*Varilla No. 8*		
	P4			250.00	4.45	1.552	1726.60	*Varilla No. 5*		
	P5			44	4.35	0.994	190.25	*Varilla No. 4*		
				TOTAL ACERO (Kg)			4542.28			
4	**ESTRUCTURA EN CONCRETO**									
4.1	**Pilote excavado in situ f'c=28 Mpa tipo tremie con Ø =1,2 m para puente El Boche incluye excavación en suelo duro (Item NP 27)**			ANCHO	ESPESOR	LARGO (m)	m	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	Pilote 2A (DE PROTECCION ESTRIBO 1)			-	-	26.50	26.50			
				TOTAL CONCRETO			26.50			

REVISADO POR CONTRATISTA	APROBADO POR INTERVENTORIA
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRES: MIGUEL ANGEL PARRA CAMACHO	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA	

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL Y ACEPTACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	Codigo: INV978-F-EO-014 Fecha: 17/11/2022 Version: 02 Hoja: ___ de ___

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

PILOTAJE	PILOTE 5A PR 30+300	MARGEN	IZQUIERDA	FECHA DE ELABORACION	25/01/2025

	OPERACIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES					FECHA DE EJECUCIÓN	FIRMA INTERVENTORÍA
1	**CAMISA**									
2.1	**Suministro e instalación de camisa para pilote de 1,2 m de diámetro (No recuperable) para puente Boche PR 30+300 (Item NP 28)**			ANCHO (m)	ESPESOR	LARGO (m)	m	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	Camisa			-	-	10.00	10.00			
				-	-					
				TOTAL m			10.00			
3	**ACEROS DE REFUERZO**									
3.3	**Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. (Item 648.1)**			CANT	LONG (m)	Kg/m	Peso (Kg)	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	P1			13.00	9.00	6.404	749.27	*Varilla No. 10*		
	P2			13.00	12.00	6.400	998.40	*Varilla No. 8*		
	P3			13.00	10.55	6.400	877.76	*Varilla No. 8*		
	P4			250.00	4.45	1.552	1726.60	*Varilla No. 5*		
	P5			44	4.35	0.994	190.25	*Varilla No. 4*		
				TOTAL ACERO (Kg)			4542.28			
4	**ESTRUCTURA EN CONCRETO**									
4.1	**Pilote excavado in situ f'c=28 Mpa tipo tremie con Ø =1,2 m para puente El Boche incluye excavación en suelo duro (Item NP 27)**			ANCHO	ESPESOR	LARGO (m)	m	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	Pilote 5A (DE PROTECCION ESTRIBO 1)			-	-	26.50	26.50			
				TOTAL CONCRETO			26.50			

REVISADO POR CONTRATISTA	APROBADO POR INTERVENTORIA
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRES: MIGUEL ANGEL PARRA CAMACHO	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA:	

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL Y ACEPTACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	Codigo: INV978-F-EO-014 Fecha: 17/11/2022 Version: 02 Hoja: ___ de ___

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vías para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

PILOTAJE	PILOTE 7A PR 30+300	MARGEN	IZQUIERDA	FECHA DE ELABORACION	25/01/2025

	OPERACIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES					FECHA DE EJECUCIÓN	FIRMA INTERVENTORÍA
1	CAMISA									
2.1	Suministro e instalación de camisa para pilote de 1,2 m de diámetro (No recuperable) para puente Boche PR 30+300 (Item NP 28)			ANCHO (m)	ESPESOR	LARGO (m)	m	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	Camisa			-	-	10.00	10.00			
				-	-					
				TOTAL m			10.00			
3	ACEROS DE REFUERZO									
3.3	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. (Item 640.1)			CANT	LONG (m)	Kg/m	Peso (Kg)	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	P1			13.00	9.00	6.404	749.27	*Varilla No. 10*		
	P2			13.00	12.00	6.400	998.40	*Varilla No. 8*		
	P3			13.00	10.55	6.400	877.76	*Varilla No. 8*		
	P4			250.00	4.45	1.552	1726.60	*Varilla No. 5*		
	P5			44	4.35	0.994	190.25	*Varilla No. 4*		
				TOTAL ACERO (Kg)			4542.28			
4	ESTRUCTURA EN CONCRETO									
4.1	Pilote excavado in situ f'c=28 Mpa tipo tremie con Ø =1,2 m para puente El Boche incluye excavación en suelo duro (Item NP 27)			ANCHO	ESPESOR	LARGO (m)	m	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	Pilote 7A (DE PROTECCION ESTRIBO 1)			-	-	26.50	26.50			
				TOTAL CONCRETO			26.50			

REVISADO POR CONTRATISTA	APROBADO POR INTERVENTORIA
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRES: MIGUEL ANGEL BARRA CAMACHO	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA:	

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL Y ACEPTACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	Codigo: INV978-F-EO-014 Fecha: 17/11/2022 Version: 02 Hoja: ___ de ___

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

ODT	54+468/474	MARGEN	DERECHA	FECHA DE ELABORACION	27/12/2024

	OPERACIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES					FECHA DE EJECUCIÓN	FIRMA INTERVENTORÍA
1	SOLADOS EN CONCRETO									
1.1	Concreto clase 14 Mpa (Item 630.7)			ANCHO (m)	ESPESOR	LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	SOLADO MODULO 0			2.75	0.17	6.00	2.81			
	SOLADO MODULO 1			2.75	0.10	6.00	1.65			
				TOTAL CONCRETO			4.46			
2	TUBERIA									
2.1	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior (Item 661.7)			CANT	LONG (m)		LONGTUD (M)	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	TUBERIA									
				TOTAL TUBERIA (M)						
3	ACEROS DE REFUERZO									
3.1	Acero de refuerzo fy= 420 Mpa (Item 640.1)			CANT	LONG (m)	Kg/m	Peso (Kg)	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	ZARPA MODULO 1			30.00	3.30	0.994	98.41			
	ZARPA MODULO 1			16.00	6.00	0.994	95.42			
	ZARPA MODULO 1			48.00	3.40	1.552	253.29			
	ZARPA MODULO 1			16.00	6.00	0.994	95.42			
	DENTELLON MODULO1			6.00	6.00	0.994	35.78	*MODULO 1*		
	VASTAGO MODULO 1			48.00	4.00	2.235	429.12			
	VASTAGO MODULO 1			30.00	3.80	0.994	113.32			
	CORREAS MODULO 1			20.00	6.00	0.994	119.28			
	DESCUENTO TUBERIA MODULO 1			-18.00	1.00	0.994	-17.89			
	ZARPA MODULO 2			30.00	3.30	0.994	98.41			
	ZARPA MODULO 2			16.00	6.00	0.994	95.42			
	ZARPA MODULO 2			48.00	3.40	1.552	253.29			
	ZARPA MODULO 2			16.00	6.00	0.994	95.42	*MUDULO 2*		
	DENTELLON MODULO 2			6.00	6.00	0.994	35.78			
	VASTAGO MODULO 2			50.00	4.20	2.235	469.35			
	VASTAGO MODULO 2			30.00	4.00	0.994	119.28			
	CORREAS MODULO 2			24.00	6.00	0.994	143.14			
	CORREAS MODULO 3			31.00	6.00	0.994	184.88	*MODULO 3*		
	CORREAS MODULO 4			29.00	6.00	0.994	172.96	*MODULO 4*		
	ZARPA MODULO 5			30.00	3.25	0.994	96.92			
	ZARPA MODULO 5			16.00	6.00	0.994	95.42			
	ZARPA MODULO 5			48.00	3.30	1.552	245.84			
	ZARPA MODULO 5			16.00	6.00	0.994	95.42	*MODULO 5*		
	DENTELLON MODULO 5			6.00	6.00	0.994	35.78			
	VASTAGO MODULO 5			50.00	4.20	2.235	469.35			
	VASTAGO MODULO 5			30.00	4.00	0.994	119.28			
	CORREAS MODULO 5			23.00	6.00	0.994	137.17			
				TOTAL ACERO (Kg)			4185.26			

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL Y ACEPTACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	Codigo: INV978-F-EO-014
		Fecha: 17/11/2022
		Version: 02
		Hoja: de

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"			FECHA DE ELABORACION	27/12/2024
ODT	54+468/474	MARGEN	DERECHA	FECHA DE EJECUCIÓN	FIRMA INTERVENTORÍA

	OPERACIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES					
				ANCHO	ESPESOR	LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES	
5	**ESTRUCTURA EN CONCRETO**								
5.1	**Concreto clase 28 Mpa (Item 630.3)**								
	ZARPA MODULO1			3.30	0.35	6.00	6.93	*MODULO 1 TRAMO 1*	
	DENTELLON MODULO 1			0.50	0.25	6.00	0.75		
	VASTAGO MODULO 1			2.60	0.25	6.00	3.90		
	DESCUENTO TUBERIA MODULO 1						-0.24		
	ZARPA MODULO 2			3.00	0.35	6.00	6.30	*MODULO 2 TRAMO 2*	
	DENTELLON MODULO 2			0.50	0.25	6.00	0.75		
	VASTAGO MODULO 2			2.88	0.25	6.00	4.32		
	ZARPA MODULO 3			3.00	0.35	6.00	6.30	*MODULO 3 TRAMO 2*	
	DENTELLON MODULO 3			0.50	0.25	6.00	0.75		
	VASTAGO MODULO 3			2.80	0.25	6.00	4.20		
	VASTAGO MODULO 4			2.80	0.25	6.00	4.20	*MODULO 5 TRAMO 1*	
	VASTAGO MODULO 5			2.80	0.25	6.00	4.20		
				TOTAL CONCRETO			42.36		

	REVISADO POR CONTRATISTA	APROBADO POR INTERVENTORIA
	RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRES	MIGUEL PARRA	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA		

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL Y ACEPTACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	Codigo: INV978-F-EO-014
		Fecha: 17/11/2022
		Version: 02
		Hoja: ___ de ___

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"									FECHA DE ELABORACION	27/12/2024
ODT	54+486/508						MARGEN	DERECHA		FECHA DE EJECUCIÓN	FIRMA INTERVENTORÍA

	OPERACIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES								
1	SOLADOS EN CONCRETO											
1.1	Concreto clase 14 Mpa (Item 630.7)			CANT.	ANCHO (m)	ESPESOR	LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES			
	SOLADO MODULO 1.2.3			3	2.75	0.10	6.00	4.95				
	SOLADO MODULO 4				2.75	0.10	4.00	1.10				
					TOTAL CONCRETO			6.05				
2	TUBERIA											
2.1	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior (Item 661.7)			CANT	LONG (m)			LONGTUD (M)	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES			
	TUBERIA											
					TOTAL TUBERIA (M)							
3	ACEROS DE REFUERZO											
3.1	Acero de refuerzo fy= 420 Mpa (Item 640.1)			CANT	LONG (m)	Kg/m		Peso (Kg)	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES			
	ZARPA MODULO 1			48.00	3.30	1.552		245.84				
	ZARPA MODULO 1			16.00	6.00	0.994		95.42				
	ZARPA MODULO 1			16.00	6.00	0.994		95.42				
	ZARPA MODULO 1			30.00	3.25	0.994		96.92	MODULO 1 TRAMO2			
	DENTELLON MODULO1			6.00	6.00	0.994		35.78				
	VASTAGO MODULO 1			50.00	4.20	2.235		469.35				
	VASTAGO MODULO 1			30.00	4.00	0.994		119.28				
	CORREAS MODULO 1			24.00	6.00	0.994		143.14				
	ZARPA MODULO 2			48.00	3.30	1.552		245.84				
	ZARPA MODULO 2			16.00	6.00	0.994		95.42				
	ZARPA MODULO 2			16.00	6.00	0.994		95.42				
	ZARPA MODULO 2			30.00	3.25	0.994		96.92	MODULO 2 TRAMO 2			
	DENTELLON MODULO 2			6.00	6.00	0.994		35.78				
	VASTAGO MODULO 2			50.00	4.20	2.235		469.35				
	VASTAGO MODULO 2			30.00	4.00	0.994		119.28				
	CORREAS MODULO 2			28.00	6.00	0.994		166.99				
	ZARPA MODULO 3			48.00	3.30	1.552		245.84				
	ZARPA MODULO 3			16.00	6.00	0.994		95.42				
	ZARPA MODULO 3			16.00	6.00	0.994		95.42				
	ZARPA MODULO 3			30.00	3.25	0.994		96.92	MODULO 3 TRAMO 2			
	DENTELLON MODULO 3			6.00	6.00	0.994		35.78				
	VASTAGO MODULO 3			48.00	4.20	2.235		450.58				
	VASTAGO MODULO 3			30.00	4.00	0.994		119.28				
	CORREAS MODULO 3			24.00	6.00	0.994		143.14				
	ZARPA MODULO 4			21.00	4.00	0.994		83.50				
	ZARPA MODULO 4			21.00	4.00	0.994		83.50				
	ZARPA MODULO 4			32.00	3.40	1.552		168.86				
	ZARPA MODULO 4			21.00	3.30	0.994		68.88	MODULO 4 TRAMO 2			
	DENTELLON MODULO 4			30.00	4.20	2.235		281.61				
	VASTAGO MODULO 4			21.00	4.00	0.994		83.50				
	CORREAS MODULO 3			6.00	4.00	0.994		23.86				
	CORREAS MODULO 3			30.00	4.00	0.994		119.28				
				TOTAL ACERO (Kg)				4821.51				

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL Y ACEPTACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	Codigo: INV978-F-EO-014
		Fecha: 17/11/2022
		Version: 02
		Hoja: de

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vías para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"								
ODT	54+486/508			MARGEN	DERECHA			FECHA DE ELABORACION	27/12/2024
	OPERACIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES				FECHA DE EJECUCIÓN	FIRMA INTERVENTORÍA
4	ESTRUCTURA EN CONCRETO								
4.1	Concreto clase 28 Mpa (Item 630.3)			ANCHO , ALTO	ESPESOR	LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES	
	ZARPA MODULO1			3.00	0.35	6.00	6.30	MODULO 1 TRAMO 2	
	DENTELLON MODULO 1			0.50	0.25	6.00	0.75		
	VASTAGO MODULO 1			2.90	0.25	6.00	4.35		
	ZARPA MODULO 2			3.00	0.35	6.00	6.30	MODULO 2 TRAMO 2	
	DENTELLON MODULO 2			0.50	0.25	6.00	0.75		
	VASTAGO MODULO 2			2.80	0.25	6.00	4.20		
	ZARPA MODULO 3			3.00	0.35	6.00	6.30	MODULO 3TRAMO 2	
	DENTELLON MODULO 3			0.50	0.25	6.00	0.75		
	VASTAGO MODULO 3			2.80	0.25	6.00	4.20		
	ZARPA MODULO 4			4.00	0.35	4.20	5.88	MODULO 4TRAMO 3	
	DENTELLON MODULO 4			0.50	0.25	4.20	0.53		
	VASTAGO MODULO 4			3.00	0.25	4.20	3.15		
				TOTAL CONCRETO			43.46		

	REVISADO POR CONTRATISTA	APROBADO POR INTERVENTORIA
	RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRES	MIGUEL PARRA	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA		

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL Y ACEPTACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	Codigo: INV978-F-EO-014
		Fecha: 17/11/2022
		Version: 02
		Hoja: ___ de ___

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vías para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"								
ODT	54+595/613				MARGEN	DERECHA	FECHA DE ELABORACION	27/12/2024	

	OPERACIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES					FECHA DE EJECUCIÓN	FIRMA INTERVENTORÍA
1	SOLADOS EN CONCRETO									
1.1	Concreto clase 14 Mpa (Item 630.7)		CANT.	ANCHO (m)	ESPESOR	LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	SOLADO MODULO 1,2,3		3	1.70	0.10	6.00	3.06			
				TOTAL CONCRETO			3.06			
2	TUBERIA									
2.1	Tuberia de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior (Item 661.7)			CANT	LONG (m)		LONGTUD (M)	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	TUBERIA									
				TOTAL TUBERIA (M)						
3	ACEROS DE REFUERZO									
3.1	Acero de refuerzo fy= 420 Mpa (Item 640.1)			CANT	LONG (m)	Kg/m	Peso (Kg)	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	ZARPA MODULO 1			41.00	2.10	0.994	85.58			
	ZARPA MODULO 1			41.00	2.10	0.560	48.22			
	ZARPA MODULO 1			13.00	6.00	0.560	43.68			
	ZARPA MODULO 1			13.00	6.00	0.560	43.68	*MODULO 1 TRAMO 4*		
	DENTELLON MODULO1			6.00	6.00	0.560	20.16			
	VASTAGO MODULO 1			40.00	2.90	0.994	115.30			
	VASTAGO MODULO 1			40.00	2.80	0.560	62.72			
	CORREAS MODULO 1			24.00	6.00	0.560	80.64			
	ZARPA MODULO 2			41.00	2.10	0.994	85.58			
	ZARPA MODULO 2			41.00	2.10	0.560	48.22			
	ZARPA MODULO 2			13.00	6.00	0.560	43.68			
	ZARPA MODULO 2			13.00	6.00	0.560	43.68	*MODULO 2 TRAMO 4*		
	DENTELLON MODULO 2			6.00	6.00	0.560	20.16			
	VASTAGO MODULO 2			40.00	2.90	0.994	115.30			
	VASTAGO MODULO 2			40.00	2.80	0.560	62.72			
	CORREAS MODULO 2			24.00	6.00	0.560	80.64			
	ZARPA MODULO 3			41.00	2.10	0.995	85.67			
	ZARPA MODULO 3			41.00	2.10	0.560	48.22			
	ZARPA MODULO 3			13.00	6.00	0.560	43.68			
	ZARPA MODULO 3			13.00	6.00	0.560	43.68	*MODULO 23TRAMO 4*		
	DENTELLON MODULO 3			6.00	6.00	0.560	20.16			
	VASTAGO MODULO 3			40.00	2.90	0.994	115.30			
	VASTAGO MODULO 3			40.00	2.80	0.560	62.72			
	CORREAS MODULO 3			24.00	6.00	0.560	80.64			
				TOTAL ACERO (Kg)			1500.04			
4	ESTRUCTURA EN CONCRETO									
4.1	Concreto clase 28 Mpa (Item 630.3)			ANCHO . ALTO	ESPESOR	LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	ZARPA MODULO1			1.95	0.25	6.00	2.93			
	DENTELLON MODULO 1			0.40	0.25	6.00	0.60	*MODULO 1 TRAMO 4*		
	VASTAGO MODULO 1			2.20	0.25	6.00	3.30			
	ZARPA MODULO 2			1.95	0.25	6.00	2.93	*MODULO 2 TRAMO 4*		
	DENTELLON MODULO 2			0.40	0.25	6.00	0.60			
	ZARPA MODULO 3			1.95	0.25	6.00	2.93	*MODULO 3 TRAMO 4*		
	DENTELLON MODULO 3			0.40	0.25	6.00	0.60			
	VASTAGO MODULO 3			2.25	0.25	6.00	3.38			
				TOTAL CONCRETO			17.25			

	REVISADO POR CONTRATISTA	APROBADO POR INTERVENTORIA
	RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRES	MIGUEL PARRA	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA		

Consorcio Vías Nacionales

CONTROL Y ACEPTACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

Codigo: INV978-F-EC-014
Fecha: 17/11/2022
Version: 02
Hoja: ___ de ___

PROYECTO: CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vías para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

ODT | 59+849 | **MARGEN** | IZQUIERDA | **FECHA DE ELABORACION** | 17/12/2024

	OPERACIÓN	NO	OBSERVACIONES					FECHA DE EJECUCIÓN	FIRMA INTERVENTORÍA
1	**SOLADOS EN CONCRETO**		ANCHO (m)	ESPESOR	LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
1.1	**Concreto clase 14 Mpa (Item 630.6)**		3.56	0.10	1.45	0.52			
	SOLADO		TOTAL CONCRETO			0.52			
2	**ACEROS DE REFUERZO**		CANT	LONG (m)	Kg/m	Peso (Kg)	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
2.1	**Acero de refuerzo fy= 420 Mpa (Item 640.1)**		8.00	5.70	0.994	45.33			
	POSICIÓN 1		24.00	0.90	0.994	21.47			
	POSICIÓN 2		22.00	2.80	0.994	61.23			
	POSICIÓN 3		8.00	8.79	0.994	69.90			
	POSICIÓN 4		8.00	3.55	0.994	28.23			
	POSICIÓN 5		8.00	3.10	0.994	24.65			
	POSICIÓN 5		6.00	2.25	0.994	13.42			
	POSICIÓN 6		6.00	1.85	0.994	11.03			
	POSICIÓN 7		10.00	8.10	0.994	80.51			
	POSICIÓN 8		10.00	2.30	0.994	22.86			
	POSICIÓN 9		10.00	3.1	0.994	30.81			
	POSICIÓN 10		4.00	2.3	0.994	9.14			
	POSICIÓN 11		2.00	3.1	0.994	6.16			
	POSICIÓN 12		10.00	2.10	0.994	20.87			
	POSICIÓN 13		14.00	2.22	0.994	30.89			
	POSICIÓN 14		2.00	4.10	0.560	4.59			
	POSICIÓN 15		4.00	1.60	0.560	3.58			
	POSICIÓN 16		2.00	1.60	1.552	4.97			
	POSICIÓN 7		9.00	1.60	0.560	8.06			
	POSICIÓN 8		TOTAL ACERO (Kg)			497.73			
3	**ESTRUCTURA EN CONCRETO**		ALTO (m). ANCHO (m)	ESPESOR	LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
3.1	**Concreto clase 28 Mpa (Item 630.3)**		1.45	0.25	3.56	1.29			
	LOSA		0.35	0.25	5.35	0.47			
	DENTELLÓN		2.43	0.25	1.95	1.18			
	ALETA MI		1.27	0.25	2.55	0.81			
	CABEZOTE		2.33	0.25	2.74	1.59			
	ALETA MD		1.65	0.23	0.35	0.13			
	GUARDARUEDAS					-0.24			
	DESCUENTO TUBERIA		TOTAL CONCRETO			5.23			

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL Y ACEPTACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	Codigo: INV978-F-EO-014
		Fecha: 17/11/2022
		Version: 02
		Hoja: ___ de ___

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vías para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"				
ODT	59+849	MARGEN	IZQUIERDA	FECHA DE ELABORACION	17/12/2024

	OPERACIÓN	NO	OBSERVACIONES	FECHA DE EJECUCIÓN	FIRMA INTERVENTORÍA
3	ESQUEMAS				

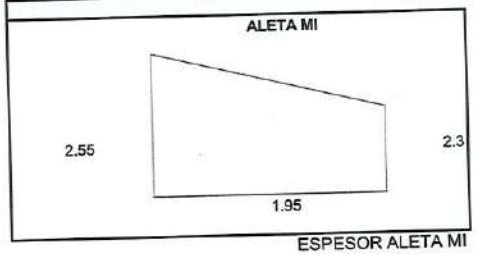

ESPESOR ALETA MI 0.25

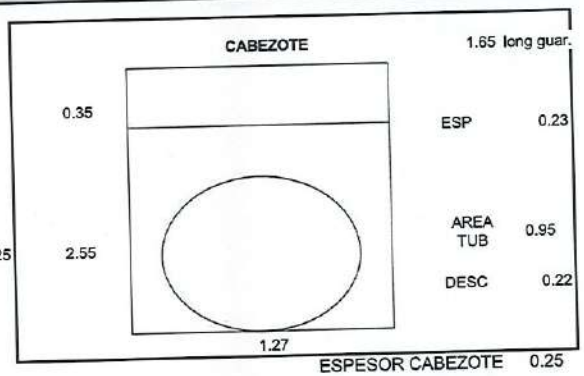

ESPESOR CABEZOTE 0.25

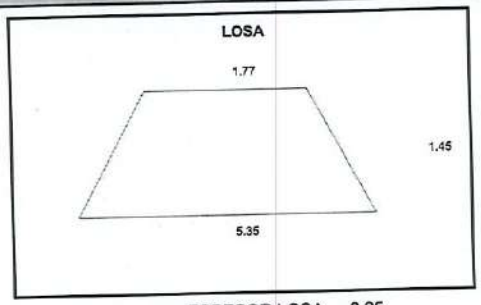

ESPESOR LOSA 0.25



ESPESOR ALETA MD 0.25



ESPESOR DENTELLÓN 0.25

	REVISADO POR CONTRATISTA	APROBADO POR INTERVENTORIA
	RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRES	MIGUEL PARRA	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA		

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL Y ACEPTACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	Codigo: INV978-F-EO-014
		Fecha: 17/11/2022
		Version: 02
		Hoja: ___ de ___

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vías para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"							
ODT	60+083			MARGEN	DERECHA		FECHA DE ELABORACION	17/12/2024

	OPERACIÓN	NO	OBSERVACIONES					FECHA DE EJECUCIÓN	FIRMA INTERVENTORÍA
1	SOLADOS EN CONCRETO								
1.1	Concreto clase 14 Mpa (Item 630.7)		ANCHO (m)	ESPESOR	LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	SOLADO ALETA		2.10	0.10	4.70	0.99			
			TOTAL CONCRETO			0.99			
1.2	Concreto clase 14 Mpa Ciclópeo (Item 630.7)		AREA (m)		LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	ATRAQUE (CICLOPEO)								
			TOTAL CONCRETO			0.00			
2	TUBERIA								
2.1	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior (Item 661.7)		CANT	LONG (m)		LONGTUD (M)	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	TUBERIA								
			TOTAL TUBERIA (M)			0.00			
3	ACEROS DE REFUERZO								
3.1	Acero de refuerzo fy= 420 Mpa (Item 640.1)		CANT	LONG (m)	Kg/m	Peso (Kg)	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	POSICIÓN 1		7.00	1.85	0.994	12.87			
	POSICIÓN 2		9.00	2.85	0.994	25.50			
	POSICIÓN 3		7.00	1.91	0.994	13.29			
	POSICIÓN 4		11.00	2.81	0.994	30.72			
	POSICIÓN 5		7	3.47	0.994	24.14			
	POSICIÓN 5		7	4.37	0.994	30.41			
	POSICIÓN 6		7.00	4.37	0.994	30.41			
	POSICIÓN 7		11.00	2.81	0.994	30.72			
	POSICIÓN 8		7.00	1.45	0.994	10.09			
	POSICIÓN 9		9.00	2.45	0.994	21.92			
	POSICIÓN 10		7	1.51	0.994	10.51			
	POSICIÓN 11		4	3.11	0.994	12.37			
	POSICIÓN 12		10	2	0.994	19.88			
	POSICIÓN 13		12.00	1.60	0.994	19.08			
	POSICIÓN 14		2.00	4.10	0.560	4.59			
	POSICIÓN 15		4.00	2.90	0.994	11.53			
	POSICIÓN 16		4.00	2.90	0.994	11.53			
	POSICIÓN 12		4	2.9	0.994	11.53			
	POSICIÓN 13		10.00	2.70	0.994	26.84			
	POSICIÓN 14		2.00	1.15	0.994	2.29			
	POSICIÓN 15		4.00	2.90	0.994	11.53			
	POSICIÓN 16		4.00	2.90	0.994	11.53			
	POSICIÓN 14		4.00	2.90	0.994	11.53			
	POSICIÓN 15		10.00	2.70	0.994	26.84			
	POSICIÓN 16		2.00	0.60	0.994	1.19			
	POSICIÓN 16		8.00	4.85	0.994	38.57			
	POSICIÓN 16		24.00	0.90	0.994	21.47			
	POSICIÓN 16		8.00	1.60	0.560	7.17			
	POSICIÓN 16		4.00	1.60	0.994	6.36			
	POSICIÓN 16		2.00	1.60	1.552	4.97			
			TOTAL ACERO (Kg)			501.37			

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL Y ACEPTACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	Codigo: INV978-F-EO-014
		Fecha: 17/11/2022
		Version: 02
		Hoja: ___ de ___

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"			FECHA DE ELABORACION	17/12/2024
ODT	60+083	MARGEN	DERECHA	FECHA DE EJECUCIÓN	FIRMA INTERVENTORÍA

	OPERACIÓN	NO	OBSERVACIONES						
3	ESTRUCTURA EN CONCRETO		ALTO (m), ANCHO (m)	ESPESOR	LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
3.1	Concreto clase 28 Mpa (Item 630.3)		TOTAL CONCRETO						
3	ESQUEMAS								

ALETA MI



ESPESOR ALETA MI 0.25

CABEZOTE

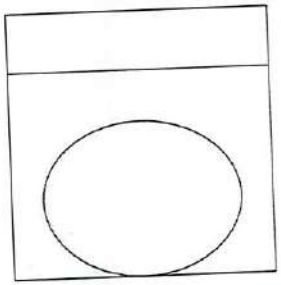

long cab.

ESP 0.23

AREA TUB 0.95

DESC 0.22

ESPESOR CABEZOTE 0.25

LOSA



ESPESOR LOSA 0.25

ALETA MD



ESPESOR ALETA MD 0.25

DENTELLON

ESPESOR DENTELLÓN 0.20

REVISADO POR CONTRATISTA		APROBADO POR INTERVENTORIA
	RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRES	MIGUEL PARRA	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA		

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL Y ACEPTACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	Codigo: INV978-F-EO-014
		Fecha: 17/11/2022
		Version: 02
		Hoja: ___ de ___

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"				FECHA DE ELABORACION	17/12/2024
ODT	60+083	MARGEN	IZQUIERDA		FECHA DE EJECUCIÓN	FIRMA INTERVENTORÍA

	OPERACIÓN	NO	OBSERVACIONES					
1	**SOLADOS EN CONCRETO**							
1.1	**Concreto clase 14 Mpa (Item 630.6)**		ANCHO (m)	ESPESOR	LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES	
	SOLADO ALETA		2.10	0.10	4.70	0.99		
	SOLADO TUBERIA		1.60	0.10	5.80	0.93		
			TOTAL CONCRETO			1.92		
1.2	**Concreto clase 14 Mpa Ciclópeo (Item 630.7)**		AREA (m)		LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES	
	ATRAQUE (CICLOPEO)		0.27		5.80	1.59		
			TOTAL CONCRETO			1.59		
2	**TUBERIA**							
2.1	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior (Item 661.7)		CANT	LONG (m)		LONGTUD (M)	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES	
	TUBERIA		6.00	1.00		6.00		
			TOTAL TUBERIA (M)			6.00		
2	**ACEROS DE REFUERZO**							
2.1	**Acero de refuerzo fy= 420 Mpa (Item 640.1)**		CANT	LONG (m)	Kg/m	Peso (Kg)	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES	
	POSICIÓN 1		8.00	4.45	0.994	35.39		
	POSICIÓN 2		23.00	0.90	0.994	20.58		
	POSICIÓN 3		9.00	2.55	0.994	22.81		
	POSICIÓN 4		12.00	3.26	0.994	38.89		
	POSICIÓN 5		7.00	4.08	0.994	28.35		
	POSICIÓN 5		4.00	5.00	0.994	19.88		
	POSICIÓN 6		7.00	4.00	0.994	27.83		
	POSICIÓN 7		4.00	4.00	0.994	15.90		
	POSICIÓN 8		4.00	3.20	0.994	12.72		
	POSICIÓN 9		10.00	5.00	0.994	49.70		
	POSICIÓN 10		8.00	10.00	0.994	79.52		
	POSICIÓN 11		8.00	2.76	0.994	21.95		
	POSICIÓN 12		8.00	2.25	0.994	17.89		
	POSICIÓN 13		6.00	5.00	0.994	29.82		
	POSICIÓN 14		2.00	5.40	0.994	10.74		
	POSICIÓN 15		2.00	1.60	0.994	3.18		
	POSICIÓN 16		2.00	3.00	0.994	5.96		
	POSICIÓN 12		2.00	3.80	0.994	7.55		
	POSICIÓN 13		2.00	3.30	0.994	6.56		
	POSICIÓN 14		2.00	2.77	0.994	5.51		
	POSICIÓN 15		8.00	1.82	0.994	14.47		
	POSICIÓN 16		2.00	1.70	0.994	3.38		
	POSICIÓN 14		4.00	1.60	0.560	3.58		
	POSICIÓN 15		2.00	1.60	1.552	4.97		
	POSICIÓN 16		7.00	1.60	0.560	6.27		
	POSICIÓN 17		2.00	4.10	0.560	4.59		
			TOTAL ACERO (Kg)			498.00		

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL Y ACEPTACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	Codigo: INV978-F-EO-014 Fecha: 17/11/2022 Version: 02 Hoja: ___ de ___

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

ODT	60+083	MARGEN	IZQUIERDA	FECHA DE ELABORACION	17/12/2024

	OPERACIÓN	NO	OBSERVACIONES					FECHA DE EJECUCIÓN	FIRMA INTERVENTORÍA
3	ESTRUCTURA EN CONCRETO								
3.1	**Concreto clase 28 Mpa (Item 630.3)**		ALTO (m), ANCHO (m)	ESPESOR	LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	LOSA		1.45	0.25	3.40	1.23			
	DENTELLÓN		0.35	0.25	4.70	0.41			
	ALETA MI		2.19	0.25	1.90	1.04			
	CABEZOTE		1.70	0.25	2.69	1.14			
	ALETA MD		2.19	0.25	1.90	1.04			
	GUARDARUEDAS		1.70	0.23	0.37	0.14			
	DESCUENTO TUBERIA					-0.24			
			TOTAL CONCRETO			4.76			
3	ESQUEMAS								

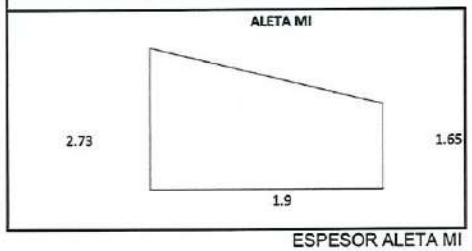

ESPESOR ALETA MI 0.25

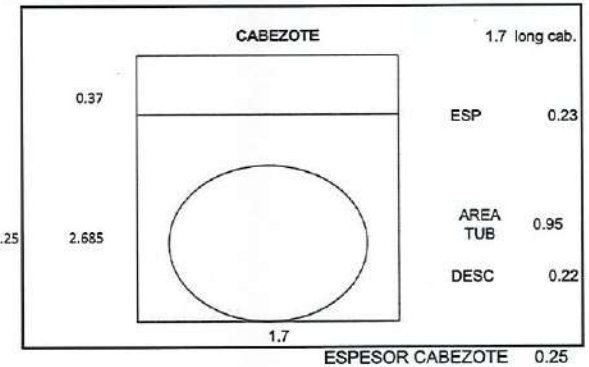

ESPESOR CABEZOTE 0.25

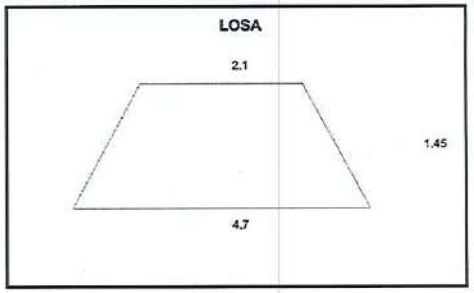

ESPESOR LOSA 0.25



ESPESOR ALETA MD 0.25



ESPESOR DENTELLÓN 0.25

	REVISADO POR CONTRATISTA	APROBADO POR INTERVENTORIA
	RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRES	MIGUEL PARRA	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA		

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL Y ACEPTACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	Codigo: INV978-F-EO-014
		Fecha: 17/11/2022
		Version: 02
		Hoja: ___ de ___

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vías para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

ODT	60+369	MARGEN	DERECHA	FECHA DE ELABORACION	26/12/2024

	OPERACIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES					FECHA DE EJECUCIÓN	FIRMA INTERVENTORÍA
1	SOLADOS EN CONCRETO									
1.1	**Concreto clase 14 Mpa (Item 630.7)**			ANCHO (m)	ESPESOR	LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	SOLADO MODULO			2.95	0.10	7.20	2.12			
	DESCUENTO SOLADO			-1.80	0.10	1.60	-0.29			
				TOTAL CONCRETO			1.84			
2	TUBERIA									
2.1	**Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior (Item 661.7)**			CANT	LONG (m)		LONGTUD (M)	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	TUBERIA									
				TOTAL TUBERIA (M)						
3	ACEROS DE REFUERZO									
3.1	**Acero de refuerzo fy= 420 Mpa (Item 640.1)**			CANT	LONG (m)	Kg/m	Peso (Kg)	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	ZARPA			50.00	3.70	2.235	413.48			
	ZARPA			16.00	1.30	0.994	20.68			
	ZARPA			16.00	1.30	2.235	46.49			
	ZARPA			12.00	7.20	0.994	85.88			
	ZARPA			20.00	3.30	0.994	65.60			
	ZARPA			20.00	2.00	0.994	39.76			
	DENTELLON			6.00	7.20	0.994	42.94			
	VASTAGO			54.00	5.10	2.235	615.52			
	VASTAGO			38.00	4.90	0.994	185.08			
	CORREAS			8.00	3.60	0.994	28.63			
	CORREAS			8.00	2.30	0.994	18.29			
	CORREAS			24.00	7.20	0.994	171.76			
	ESPIRALES			2.00	4.10	0.560	4.59			
				TOTAL ACERO (Kg)			1738.70			
4	ESTRUCTURA EN CONCRETO									
4.1	**Concreto clase 28 Mpa (Item 630.3)**			ANCHO	ESPESOR	LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	ZARPA			2.95	0.40	7.20	8.50			
	DESCUENTO ZARPA			1.60	0.40	-1.80	-1.15			
	DENTELLON			0.75	0.35	7.20	1.89			
	VASTAGO			3.55	0.30	7.20	7.67			
	DESCUENTO TUBERIA						-0.24			
				TOTAL CONCRETO			16.66			

REVISADO POR CONTRATISTA		APROBADO POR INTERVENTORIA
	RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRES	MIGUEL PARRA	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA		

Consorcio Vías Nacionales

CONTROL Y ACEPTACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

Codigo: INV978-F-EO-014	
Fecha: 17/11/2022	
Version: 02	
Hoja: ___ de ___	

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"			**FECHA DE ELABORACION**	17/12/2024
ODT	60+786	**MARGEN**	DERECHA	**FECHA DE EJECUCIÓN**	**FIRMA INTERVENTORÍA**

	OPERACIÓN	NO	OBSERVACIONES
1	**SOLADOS EN CONCRETO**		
1.1	**Concreto clase 14 Mpa (Item 630.6)**		
	SOLADO		
2	**ACEROS DE REFUERZO**		
2.1	**Acero de refuerzo fy= 420 Mpa (Item 640.1)**		
	POSICIÓN 1		
	POSICIÓN 2		
	POSICIÓN 3		
	POSICIÓN 4		
	POSICIÓN 5		
	POSICIÓN 5		
	POSICIÓN 6		
	POSICIÓN 7		
	POSICIÓN 8		
	POSICIÓN 9		
	POSICIÓN 10		
	POSICIÓN 11		
	POSICIÓN 12		
	POSICIÓN 13		
	POSICIÓN 14		
	POSICIÓN 15		
	POSICIÓN 16		
	POSICIÓN 7		
	POSICIÓN 8		
	POSICIÓN 9		
	POSICIÓN 10		
	POSICIÓN 11		
	POSICIÓN 12		
	POSICIÓN 13		
	POSICIÓN 14		
	POSICIÓN 15		
	POSICIÓN 16		
	POSICIÓN 15		
	POSICIÓN 16		
	POSICIÓN 16		
	POSICIÓN 15		
	POSICIÓN 16		

ANCHO (m)	ESPESOR	LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES
3.35	0.10	1.60	0.54	
TOTAL CONCRETO			0.54	

CANT	LONG (m)	Kg/m	Peso (Kg)	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES
7.00	1.67	0.994	11.62	
9.00	2.50	0.994	22.37	
7.00	1.65	0.994	11.48	
7.00	1.27	0.994	8.84	
9.00	2.00	0.994	17.89	
6.00	1.25	0.994	7.46	
11.00	2.55	0.994	27.88	
10.00	3.77	0.994	37.47	
10.00	3.85	0.994	38.27	
10.00	3.85	0.994	38.27	
11.00	2.55	0.994	27.88	
4.00	2.95	0.994	11.73	
8.00	1.8	0.994	14.31	
12.00	1.62	0.994	19.32	
10.00	0.65	0.994	6.46	
10.00	0.65	0.994	6.46	
2.00	4.10	0.560	4.59	
4.00	2.45	0.994	9.74	
7.00	2.45	0.994	17.05	
7.00	2.45	0.994	17.05	
2.00	1.8	0.994	3.58	
6.00	2.4	0.994	14.31	
4.00	2.4	0.994	9.54	
7.00	2.40	0.994	16.70	
7.00	2.40	0.994	16.70	
2.00	1.80	0.994	3.58	
6.00	2.40	0.994	14.31	
8.00	5.00	0.994	39.76	
22.00	0.90	0.994	19.68	
2.00	1.60	1.552	4.97	
6.00	1.60	0.560	5.38	
8.00	1.60	0.560	7.17	
TOTAL ACERO (Kg)			511.82	

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL Y ACEPTACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	Codigo: INV978-F-EO-014 Fecha: 17/11/2022 Version: 02 Hoja: ___ de ___

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"						
ODT	60+786	MARGEN	DERECHA	FECHA DE ELABORACION	17/12/2024		

	OPERACIÓN	NO	OBSERVACIONES					FECHA DE EJECUCIÓN	FIRMA INTERVENTORÍA
3	ESTRUCTURA EN CONCRETO								
3.1	**Concreto clase 28 Mpa (Item 630.3)**		ALTO (m), ANCHO (m)	ESPESOR	LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	LOSA		1.60	0.25	3.35	1.34			
	DENTELLÓN		0.35	0.20	4.75	0.33			
	ALETA MI		1.90	0.25	2.15	1.02			
	CABEZOTE		1.95	0.25	2.25	1.10			
	ALETA MD		1.95	0.25	2.10	1.02			
	GUARDARUEDAS		1.75	0.23	0.43	0.17			
	DESCUENTO TUBERIA					-0.24			
			TOTAL CONCRETO			4.74			
3	ESQUEMAS								

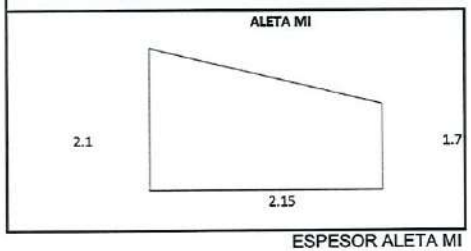

ESPESOR ALETA MI 0.25

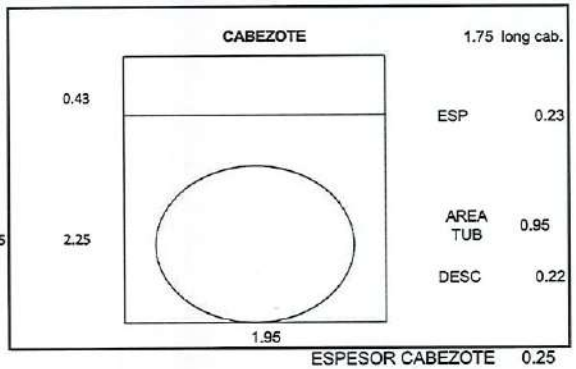

ESPESOR CABEZOTE 0.25

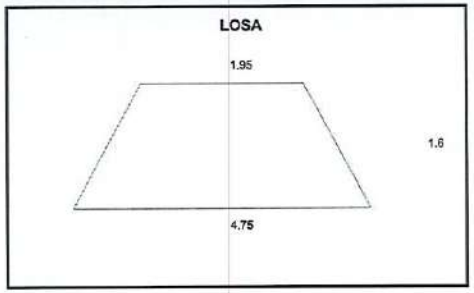

ESPESOR LOSA 0.25



ESPESOR ALETA MD 0.25



ESPESOR DENTELLÓN 0.20

	REVISADO POR CONTRATISTA	APROBADO POR INTERVENTORIA
	RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRES	MIGUEL PARRA	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA		

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL Y ACEPTACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	Codigo: INV978-F-EO-014
		Fecha: 17/11/2022
		Version: 02
		Hoja: ___ de ___

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"				
ODT	49+335	MARGEN	DERECHA	FECHA DE ELABORACION	24/01/2025

	OPERACIÓN	NO	OBSERVACIONES					FECHA DE EJECUCIÓN	FIRMA INTERVENTORÍA
1	SOLADOS EN CONCRETO								
1.1	Concreto clase 14 Mpa (Item 630.6)		ANCHO (m)	ESPESOR	LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
			TOTAL CONCRETO						
1.2	Concreto clase 14 Mpa Ciclópeo (Item 630.7)		AREA (m)		LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
			TOTAL CONCRETO						
2	TUBERIA								
2.1	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior (Item 661.7)		CANT	LONG (m)		LONGTUD (M)	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
			TOTAL TUBERIA (M)						
2	ACEROS DE REFUERZO								
2.1	Acero de refuerzo fy= 420 Mpa (Item 640.1)		CANT	LONG (m)	Kg/m	Peso (Kg)	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	POSICIÓN 1		4.00	2.80	0.995	11.14			
	POSICIÓN 2		4.00	2.80	0.995	11.14			
	POSICIÓN 3		4.00	2.80	0.995	11.14			
	POSICIÓN 4		8.00	2.80	0.995	22.29			
	POSICIÓN 5		4	1.75	0.995	6.97			
	POSICIÓN 5		4	4.20	0.995	16.72			
	POSICIÓN 6		4.00	4.20	0.995	16.72			
	POSICIÓN 7		4.00	4.20	0.995	16.72			
	POSICIÓN 8		8.00	4.20	0.995	33.43			
	POSICIÓN 9		4.00	2.00	0.995	7.96			
	POSICIÓN 10		8	4.85	0.995	38.61			
	POSICIÓN 11		24	0.9	0.995	21.49			
	POSICIÓN 12		10	1.75	0.995	17.41			
	POSICIÓN 13		11.00	2.45	0.995	26.82			
	POSICIÓN 14		8.00	1.97	0.995	15.68			
	POSICIÓN 15		10.00	1.35	0.995	13.43			
	POSICIÓN 16		11.00	2.05	0.995	22.44			
	POSICIÓN 12		8	1.37	0.995	10.91			
	POSICIÓN 13		19.00	2.65	0.995	50.10			
	POSICIÓN 14		9.00	3.70	0.995	33.13			
	POSICIÓN 15		9.00	4.63	0.995	41.46			
	POSICIÓN 16		9.00	4.63	0.995	41.46			
	POSICIÓN 15		16.00	2.70	0.995	42.98			
	POSICIÓN 16		12.00	3.00	0.995	35.82			
	POSICIÓN 15		10.00	1.90	0.995	18.91			
	POSICIÓN 16		16.00	2.30	0.995	36.62			
	POSICIÓN 15		2.00	4.40	0.560	4.93			
	POSICIÓN 14		4.00	1.60	0.560	3.58			
	POSICIÓN 15		2.00	1.60	1.550	4.96			
	POSICIÓN 16		8.00	1.60	0.560	7.17			
			TOTAL ACERO (Kg)			642.13			

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL Y ACEPTACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	Codigo: INV978-F-EO-014 Fecha: 17/11/2022 Version: 02 Hoja: ___ de ___

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"					
ODT	49+335	MARGEN	DERECHA	FECHA DE ELABORACION	24/01/2025	

	OPERACIÓN	NO	OBSERVACIONES					FECHA DE EJECUCIÓN	FIRMA INTERVENTORÍA
3	ESTRUCTURA EN CONCRETO								
3.1	Concreto clase 28 Mpa (Item 630.3)		ALTO (m), ANCHO (m)	ESPESOR	LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
			TOTAL CONCRETO						
3	ESQUEMAS								

ALETA MI



ESPESOR ALETA MI

ALETA MD



ESPESOR ALETA MD

CABEZOTE long cab.

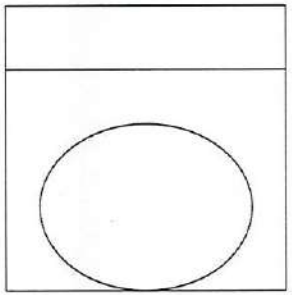

ESP

AREA TUB

DESC 0.00

1.7

ESPESOR CABEZOTE 0.25

DENTELLÓN

ESPESOR DENTELLÓN

LOSA



ESPESOR LOSA 0.25

REVISADO POR CONTRATISTA		APROBADO POR INTERVENTORIA
RESIDENTE DE OBRA		RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRES	MIGUEL ANGEL PARRA CAMACHO	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA		

Consorcio Vías Nacionales

CONTROL Y ACEPTACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

Codigo: INV978-F-EO-014
Fecha: 17/11/2022
Version: 02
Hoja: ___ de ___

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"							
ODT	50+565			MARGEN	DERECHA		FECHA DE ELABORACION	24/01/2025

	OPERACIÓN	NO	OBSERVACIONES					FECHA DE EJECUCIÓN	FIRMA INTERVENTORÍA
1	**SOLADOS EN CONCRETO**								
1.1	**Concreto clase 14 Mpa (Item 630.7)**		ANCHO (m)	ESPESOR	LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	SOLADO CAJA		1.70	0.10	1.50	0.26			
	SOLADO TUBERIA		1.60	0.75	0.10	0.12			
			TOTAL CONCRETO			0.38			
1.2	**Concreto clase 14 Mpa Ciclópeo (Item 630.7)**		AREA (m)		LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	ATRAQUE (CICLOPEO)		0.27		0.75	0.21			
			TOTAL CONCRETO			0.21			
2	**TUBERIA**								
2.1	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior (Item 661.7)		CANT	LONG (m)		LONGTUD (M)	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	TUBERIA		1.00	1.00		1.00			
			TOTAL TUBERIA (M)			1.00			
2	**ACEROS DE REFUERZO**								
2.1	**Acero de refuerzo fy= 420 Mpa (Item 640.1)**		CANT	LONG (m)	Kg/m	Peso (Kg)	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	POSICIÓN 1		8.00	2.34	0.994	18.51			
	POSICIÓN 2		7.00	2.05	0.994	14.26			
	POSICIÓN 3		10.00	1.80	0.994	17.89			
	POSICIÓN 4		7.00	1.80	0.994	12.52			
	POSICIÓN 5		8	2.43	0.994	19.32			
	POSICIÓN 5		2	2.20	0.994	4.37			
	POSICIÓN 6		10.00	1.30	0.994	12.92			
	POSICIÓN 7		2.00	4.10	0.560	4.59			
	POSICIÓN 8		4.00	1.73	0.994	6.88			
	POSICIÓN 9		4.00	1.73	0.994	6.88			
	POSICIÓN 10		4	2.03	0.994	8.07			
	POSICIÓN 11		4	1.83	0.994	7.28			
	POSICIÓN 12		4	1.83	0.994	7.28			
	POSICIÓN 13		4.00	1.73	0.994	6.88			
	POSICIÓN 14		4.00	2.03	0.560	4.55			
	POSICIÓN 15		4.00	1.73	0.994	6.88			
	POSICIÓN 16		4.00	2.54	0.994	10.10			
	POSICIÓN 17		5	2.03	0.994	10.09			
	POSICIÓN 18		5.00	1.83	0.994	9.10			
	POSICIÓN 19		5.00	2.03	0.994	10.09			
	POSICIÓN 20		4.00	2.54	0.994	10.10			
	POSICIÓN 21		11.00	2.03	0.994	22.20			
	POSICIÓN 22		7.00	2.40	0.994	16.70			
	POSICIÓN 23		11.00	4.03	0.994	44.06			
	POSICIÓN 24		2.00	1.60	1.550	4.96			
	POSICIÓN 25		4.00	1.60	0.994	6.36			
	POSICIÓN 26		9.00	1.60	0.560	8.06			
			TOTAL ACERO (Kg)			311.00			

Consorcio Vías Nacionales

CONTROL Y ACEPTACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

Codigo:	INV978-F-EO-014
Fecha:	17/11/2022
Version:	02
Hoja:	___ de ___

PROYECTO: CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

ODT	50+565	**MARGEN**	DERECHA	**FECHA DE ELABORACION**	24/01/2025

	OPERACIÓN	NO	OBSERVACIONES					FECHA DE EJECUCIÓN	FIRMA INTERVENTORÍA
3	ESTRUCTURA EN CONCRETO		ALTO (m), ANCHO (m)	ESPESOR	LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
3.1	Concreto clase 28 Mpa (Item 630.3)		1.8	0.25	1.5	0.68			
	MURO ESPALDAR		1.6	0.25	1.25	0.5			
	MURO LATERAL		0.3	0.23	1.5	0.1			
	GUARDARRUEDA		1.8	0.25	1.5	0.68			
	MURO CABEZOTE		1.8	0.25	1.2	0.54			
	MURO LATERAL		1.5	0.25	1.7	0.64			
	PLACA PISO					-0.05			
	(-) ENTRADA CANAL					-0.24			
	(-) VOLUMEN TUBO		TOTAL CONCRETO			2.85			
3	ESQUEMAS								

MURO LATERAL



CABEZOTE

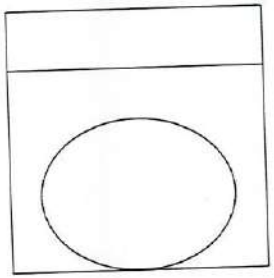

ESPESOR CABEZOTE 0.25

LOSA



ESPESOR LOSA 0.25

MURO POSTERIOR



GUARDARRUEDA



REVISADO POR CONTRATISTA	APROBADO POR INTERVENTORIA
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
MIGUEL ANGEL PARRA CAMACHO	DIEGO RUANO FONSECA
NOMBRES	
FIRMA	

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL Y ACEPTACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	Codigo: INV978-F-EO-014
		Fecha: 17/11/2022
		Version: 02
		Hoja: ___ de ___

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"				FECHA DE ELABORACION	24/01/2025
ODT	54+452		MARGEN	DERECHA	FECHA DE EJECUCIÓN	FIRMA INTERVENTORÍA

	OPERACIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES					
1	SOLADOS EN CONCRETO								
1.1	Concreto clase 14 Mpa (Item 630.6)			ANCHO (m)	ESPESOR	LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES	
	SOLADO DE LA POCETA								
3	ACEROS DE REFUERZO								
3.3	Acero de refuerzo fy= 420 Mpa (Item 640.1)			CANT	LONG (m)	Kg/m	Peso (Kg)	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES	
	POSICIÓN 1			3.00	2.60	0.995	7.76		
	POSICIÓN 2			3.00	1.50	0.995	4.48		
	POSICIÓN 3			5.00	1.80	0.995	8.96		
				TOTAL ACERO (Kg)			21.19		
4	ESTRUCTURA EN CONCRETO								
4.1	Concreto clase 28 Mpa (Item 630.3)			ANCHO	ESPESOR	LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES	
	CARA 1			0.80	0.15	0.60	0.07		
	CARA 2			1.10	0.15	0.60	0.10		
	CARA 3			1.10	0.15	0.60	0.10		
	CARA 4			1.10	0.15	0.50	0.08		
				TOTAL CONCRETO			0.35		
5	ESQUEMAS								

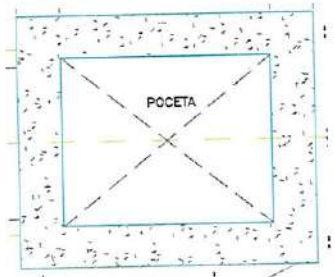

REVISADO POR CONTRATISTA	APROBADO POR INTERVENTORIA
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRES: MIGUEL ANGEL PARRA CAMACHO	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA:	

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL Y ACEPTACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	Codigo: INV978-F-EO-014
		Fecha: 17/11/2022
		Version: 02
		Hoja: ___ de ___

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"								
ODT	54+452			MARGEN	DERECHA		FECHA DE ELABORACION	24/01/2025	

	OPERACIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES					FECHA DE EJECUCIÓN	FIRMA INTERVENTORÍA
1	SOLADOS EN CONCRETO									
1.1	Concreto clase 14 Mpa (Item 630.6)			ANCHO (m)	ESPESOR	LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	SOLADO DE LA POCETA									
				TOTAL CONCRETO						
3	ACEROS DE REFUERZO									
3.3	Acero de refuerzo fy= 420 Mpa (Item 640.1)			CANT	LONG (m)	Kg/m	Peso (Kg)	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	POSICIÓN 1			3.00	0.80	0.995	2.39			
	POSICIÓN 2			4.00	0.25	0.995	1.00			
				TOTAL ACERO (Kg)			3.38			
4	ESTRUCTURA EN CONCRETO									
4.1	Concreto clase 28 Mpa (Item 630.3)			ANCHO	ESPESOR	LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	CARA 1			0.35	0.15	0.80	0.04	POCETA AGUAS NEGRAS		
	CARA 2			0.35	0.15	0.80	0.04			
				TOTAL CONCRETO			0.08			
5	ESQUEMAS									

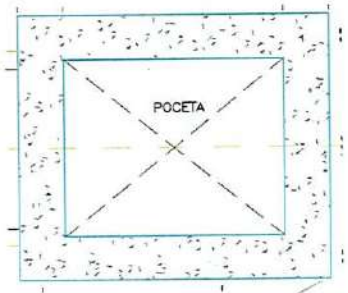

REVISADO POR CONTRATISTA		APROBADO POR INTERVENTORIA
RESIDENTE DE OBRA		RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRES	MIGUEL ANGEL PARRA CAMACHO	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA		

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL Y ACEPTACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	Codigo: INV978-F-EO-014 Fecha: 17/11/2022 Version: 02 Hoja: ___ de ___

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

ODT	54+462	MARGEN	DERECHA	FECHA DE ELABORACION	24/01/2025

	OPERACIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES					FECHA DE EJECUCIÓN	FIRMA INTERVENTORÍA
1	SOLADOS EN CONCRETO									
1.1	Concreto clase 14 Mpa (Item 630.6)			ANCHO (m)	ESPESOR	LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	SOLADO DE LA POCETA									
				TOTAL CONCRETO						
3	ACEROS DE REFUERZO									
3.3	Acero de refuerzo fy= 420 Mpa (Item 640.1)			CANT	LONG (m)	Kg/m	Peso (Kg)	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	POSICIÓN 1			6.00	2.20	0.994	13.12			
	POSICIÓN 2			5.00	2.20	0.994	10.93			
	POSICIÓN 3			4.00	4.20	0.994	16.70			
				TOTAL ACERO (Kg)			40.75			
4	ESTRUCTURA EN CONCRETO									
4.1	Concreto clase 28 Mpa (Item 630.3)			ANCHO	ESPESOR	LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	CARA 1			1.30	0.15	0.60	0.12	POCETA AGUAS NEGRAS		
	CARA 2			1.30	0.15	0.60	0.12			
	CARA 3			1.00	0.15	0.60	0.09			
	CARA 4			1.00	0.15	0.60	0.09			
	PLACA PISO			1.30	1.30	0.15	0.25			
				TOTAL CONCRETO			0.67			
5	ESQUEMAS									

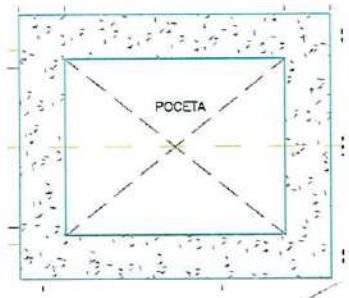

REVISADO POR CONTRATISTA		APROBADO POR INTERVENTORIA
RESIDENTE DE OBRA		RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRES	MIGUEL ANGEL PARRA CAMACHO	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA		

Consorcio Vías Nacionales

CONTROL Y ACEPTACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

Codigo:	INV978-F-EO-014
Fecha:	17/11/2022
Version:	02
Hoja:	de

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"							**FECHA DE ELABORACION**	24/01/2025
ODT	60+369			**MARGEN**	IZQUIERDA			**FECHA DE EJECUCIÓN**	**FIRMA INTERVENTORÍA**

	OPERACIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES					
1	**SOLADOS EN CONCRETO**								
1.1	**Concreto clase 14 Mpa (Item 630.6)**			ANCHO (m)	ESPESOR	LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES	
	SOLADO TUBERIA			1.60	0.10	4.80	0.77		
				TOTAL CONCRETO			0.77		
1.2	**Concreto clase 14 Mpa Ciclópeo (Item 630.7)**			AREA (M2)		LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES	
	ATRAQUE (CICLOPEO)			0.27		4.80	1.32		
				TOTAL CONCRETO			1.32		
2	**TUBERIA**								
2.1	**Tuberia de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior (Item 661.1)**			CANT	LONG (m)		LONGTUD (M)	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES	
	TUBERIA			5.00	1.00		5.00		
				TOTAL TUBERIA (M)			5.00		
3	**ACEROS DE REFUERZO**								
3.3	**Acero de refuerzo fy= 420 Mpa (Item 640.1)**			CANT	LONG (m)	Kg/m	Peso (Kg)	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES	
	POSICIÓN 1			9.00	3.90	0.994	34.89		
	POSICIÓN 2			8.00	2.95	0.994	23.46		
	POSICIÓN 3			8.00	1.20	0.994	9.54		
	POSICIÓN 4			8.00	3.25	0.994	25.84		
	POSICIÓN 5			9	3.90	0.994	34.89		
	POSICIÓN 5			2	3.25	0.994	6.46		
	POSICIÓN 6			10.00	2.30	0.994	22.86		
	POSICIÓN 8			10.00	1.62	0.994	16.10		
	POSICIÓN 9			10.00	1.62	0.994	16.10		
	POSICIÓN 10			10.00	1.40	0.994	13.92		
	POSICIÓN 11			10.00	1.40	0.994	13.92		
	POSICIÓN 12			10.00	1.40	0.994	13.92		
	POSICIÓN 13			10	1.62	0.994	16.10		
	POSICIÓN 14			5.00	2.51	0.994	12.47		
	POSICIÓN 15			5.00	1.60	0.994	7.95		
	POSICIÓN 16			5.00	1.20	0.994	5.96		
	POSICIÓN 17			5.00	1.60	0.994	7.95		
	POSICIÓN 18			5.00	2.51	0.994	12.47		
	POSICIÓN 19			7.00	1.49	0.994	10.37		
	POSICIÓN 20			7.00	3.25	0.994	22.61		
	POSICIÓN 21			9.00	4.95	0.994	44.28		
	POSICIÓN 22			4	1.6	0.560	3.58		
	POSICIÓN 23			2.00	1.60	1.550	4.96		
	POSICIÓN 24			2.00	4.10	0.560	4.59		
	POSICIÓN 25			9.00	1.60	0.560	8.06		
				9.00	1.40	0.994	12.52		
				10.00	1.62	0.994	16.10		
				TOTAL ACERO (Kg)			421.87		

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL Y ACEPTACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	Codigo: INV978-F-EO-014
		Fecha: 17/11/2022
		Version: 02
		Hoja: ___de___

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"								FECHA DE ELABORACION	24/01/2025
ODT	60+369				MARGEN	IZQUIERDA			FECHA DE EJECUCIÓN	FIRMA INTERVENTORÍA
	OPERACIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES						
4	ESTRUCTURA EN CONCRETO									
4.1	Concreto clase 28 Mpa (Item 630.3)			ANCHO	ESPESOR	LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
				TOTAL CONCRETO						
5	ESQUEMAS									

CARA IZQ.



L 0.00
A 0.00
E 0.00

CONTRAPISO

L 0.00
A 0.00
E 0.00

C. POSTERIOR



CARA DER.



L 0
A 0.00
E 0.00

GUARDA RUEDA



CARA POST.



L 0.00
A 0.00
E 0.00

DESCUENTO TUBERÍA 32"

0



L 0.25
AREA -0.95

DESC

-0.24

CARA FRONTAL

L 0.00
A 0.00
E 0.00

REVISADO POR CONTRATISTA	APROBADO POR INTERVENTORIA
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRES: MIGUEL ANGEL PARRA CAMACHO	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA:	

Obra: CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

Consecutivo: 4

Actividad: MURO CIMENTACION PROFUNDA - CAISSON

Ubicación: MURO PR 16

Parte c: Cantidades ejecutadas

UBICACIÓN: **PILOTE 1**

Ver plano No 02 DE 11 Ver esquema adjunto Caisson Tipo 2 y 3 FECHA DE FUNDIDA

CANTIDADES EJECUTADAS										
ITEM A COBRAR ACERO DE REFUERZO	**TIPO/UBICACIÓN**	**No / DIAMETRO**	**PESO**	**LONGITUD**	**No PIEZAS POR ESTRUCTURA**	**CANTIDAD DE ESTRUCTURAS**	**TOTAL PIEZAS**	**TOTAL KG**	**ELEMENTO**	**OBSERVACIONES**
401 C	ANILLOS NUCLEO CAISSON	4 = 1/2"	0.994	4.47	34	1	34.0	151.1		
501 C	ANILLOS NUCLEO CAISSON	5 = 5/8"	1.56	4.97	102	1	102.0	790.8		
801 C	BARRA CUERPO CAISSON	8 = 1"	3.973	9	28	1	28.0	1001.2		
802 C	BARRA CUERPO CAISSON	8 = 1"	3.973	5.45	22	1	22.00	476.36		
		TOTAL KG						**2419.45**		
CONCRETO 28 Mpa		**UNID**	**CANT**	**ANILLOS**	**PROFUNDIDAD**	**TOTAL (M)**				
PILOTE 1		**M**	**1**	**0**	**12**	**12**				

Nombre NESTOR DIAZ **Cargo** TOPOGRAFIA

Nombre OSCAR POLO **Cargo** RESIDENTE DE OBRA

Nombre HADI MORALES VoBo

Nombre WILLIAM DARIO MORENO RICAURTE **Cargo** INGENIERO RESIDENTE

Obra: CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

Consecutivo: 5

Actividad: MURO CIMENTACION PROFUNDA - CAISSON

Ubicación: MURO PR 16

Parte c: Cantidades ejecutadas

UBICACIÓN: **PILOTE 2**

Ver plano No 02 DE 11

Ver esquema adjunto Caisson Tipo 2 y 3

CANTIDADES EJECUTADAS										
ITEM A COBRAR ACERO DE REFUERZO	**TIPO/UBICACIÓN**	**No / DIAMETRO**	**PESO**	**LONGITUD**	**No PIEZAS POR ESTRUCTURA**	**CANTIDAD DE ESTRUCTURAS**	**TOTAL PIEZAS**	**TOTAL KG**	**ELEMENTO**	**OBSERVACIONES**
401 C	ANILLOS NUCLEO CAISSON	4 = 1/2"	0.994	4.47	34	1	34.0	151.1		
501 C	ANILLOS NUCLEO CAISSON	5 = 5/8"	1.56	4.97	102	1	102.0	790.8		
801 C	BARRA CUERPO CAISSON	8 = 1"	3.973	9	28	1	28.0	1001.2		
802 C	BARRA CUERPO CAISSON	8 = 1"	3.973	5.45	22	1	22.00	476.36		
		TOTAL KG						**2419.45**		
CONCRETO 28 Mpa		**UNID**	**CANT**	**ANILLOS**	**PROFUNDIDAD**	**TOTAL (M)**				
PILOTE 2		**M**	**1**	**0**	**12**	**12**				

Nombre NESTOR DIAZ
Cargo TOPOGRAFIA

Nombre OSCAR POLO
Cargo RESIDENTE DE OBRA

Nombre HADI MORALES
VoBo

Nombre WILLIAM DARIO MORENO RICAURTE
Cargo INGENIERO RESIDENTE

Obra: CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

Consecutivo: 6

Actividad: MURO CIMENTACION PROFUNDA - CAISSON

Ubicación: MURO PR 16

Parte c: Cantidades ejecutadas

UBICACIÓN: **PILOTE 3**

Ver plano No 02 DE 11

Ver esquema adjunto Caisson Tipo 2 y 3

CANTIDADES EJECUTADAS										
ITEM A COBRAR ACERO DE REFUERZO	**TIPO/UBICACIÓN**	**No / DIAMETRO**	**PESO**	**LONGITUD**	**No PIEZAS POR ESTRUCTURA**	**CANTIDAD DE ESTRUCTURAS**	**TOTAL PIEZAS**	**TOTAL KG**	**ELEMENTO**	**OBSERVACIONES**
401 C	ANILLOS NUCLEO CAISSON	4 = 1/2"	0.994	4.47	34	1	34.0	151.1		
501 C	ANILLOS NUCLEO CAISSON	5 = 5/8"	1.56	4.97	102	1	102.0	790.8		
801 C	BARRA CUERPO CAISSON	8 = 1"	3.973	9	28	1	28.0	1001.2		
802 C	BARRA CUERPO CAISSON	8 = 1"	3.973	5.45	22	1	22.00	476.36		
		TOTAL KG						**2419.45**		
CONCRETO 28 Mpa		**UNID**	**CANT**	**ANILLOS**	**PROFUNDIDAD**	**TOTAL (M)**				
PILOTE 3		**M**	**1**	**0**	**12**	**12**				

Nombre	NESTOR DIAZ	**Nombre**	OSCAR POLO	**Nombre**	HADI MORALES	**Nombre**	WILLIAM DARIO MORENO RICAURTE
Cargo	TOPOGRAFIA	**Cargo**	RESIDENTE DE OBRA		VoBo	**Cargo**	INGENIERO RESIDENTE

Obra: CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

Consecutivo: 7

Actividad: MURO CIMENTACION PROFUNDA - CAISSON

Ubicación: MURO PR 16

Parte c: Cantidades ejecutadas

UBICACIÓN: **PILOTE 4**

Ver plano No 02 DE 11 Ver esquema adjunto Caisson Tipo 2 y 3

CANTIDADES EJECUTADAS										
ITEM A COBRAR ACERO DE REFUERZO	**TIPO/UBICACIÓN**	**No / DIAMETRO**	**PESO**	**LONGITUD**	**No PIEZAS POR ESTRUCTURA**	**CANTIDAD DE ESTRUCTURAS**	**TOTAL PIEZAS**	**TOTAL KG**	**ELEMENTO**	**OBSERVACIONES**
401 C	ANILLOS NUCLEO CAISSON	4 = 1/2"	0.994	4.47	34	1	34.0	151.1		
501 C	ANILLOS NUCLEO CAISSON	5 = 5/8"	1.56	4.97	102	1	102.0	790.8		
801 C	BARRA CUERPO CAISSON	8 = 1"	3.973	9	28	1	28.0	1001.2		
802 C	BARRA CUERPO CAISSON	8 = 1"	3.973	5.45	22	1	22.00	476.36		
		TOTAL KG						**2419.45**		
		UNID	**CANT**	**ANILLOS**	**PROFUNDIDAD**	**TOTAL (M)**				
CONCRETO 28 Mpa										
4		**M**	**1**	**0**	**12**	**12**				

Nombre	NESTOR DIAZ	**Nombre**	OSCAR POLO	**Nombre**	HADI MORALES	**Nombre**	WILLIAM DARIO MORENO RICAURTE
Cargo	TOPOGRAFIA	**Cargo**	RESIDENTE DE OBRA		VoBo	**Cargo**	INGENIERO RESIDENTE

Obra: CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

Consecutivo: 8

Actividad: MURO CIMENTACION PROFUNDA - CAISSON

Ubicación: MURO PR 16

Parte c: Cantidades ejecutadas

UBICACIÓN: **PILOTE 10**

Ver plano No 02 DE 11 Ver esquema adjunto Caisson Tipo 2 y 3

CANTIDADES EJECUTADAS										
ITEM A COBRAR ACERO DE REFUERZO	**TIPO/UBICACIÓN**	**No / DIAMETRO**	**PESO**	**LONGITUD**	**No PIEZAS POR ESTRUCTURA**	**CANTIDAD DE ESTRUCTURAS**	**TOTAL PIEZAS**	**TOTAL KG**	**ELEMENTO**	**OBSERVACIONES**
401 C	ANILLOS NUCLEO CAISSON	4 = 1/2"	0.994	4.47	34	1	34.0	151.1		
501 C	ANILLOS NUCLEO CAISSON	5 = 5/8"	1.56	4.97	102	1	102.0	790.8		
801 C	BARRA CUERPO CAISSON	8 = 1"	3.973	9	28	1	28.0	1001.2		
802 C	BARRA CUERPO CAISSON	8 = 1"	3.973	5.45	22	1	22.00	476.36		
		TOTAL KG						**2419.45**		
CONCRETO 28 Mpa		**UNID**	**CANT**	**ANILLOS**	**PROFUNDIDAD**	**TOTAL (M)**				
PILOTE 10		**M**	**1**	**0**	**12**	**12**				

Nombre	NESTOR DIAZ	**Nombre**	OSCAR POLO	**Nombre**	HADI MORALES	**Nombre**	WILLIAM DARIO MORENO RICAURTE
Cargo	TOPOGRAFIA	**Cargo**	RESIDENTE DE OBRA		VoBo	**Cargo**	INGENIERO RESIDENTE

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA	Cód: F-EO-009
		Versión: 001
	CONTRATO 0978 DE 2021	Fecha: 02/01/2020
		Pág: 1 de 1

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	31	**MM**	1	**AA**	2,025	**PERIODO:**	1 de enero de 2025		31 de enero de 2025			
CONTRATO:	0978 de 2021						**OBJETO CONTRATO:**	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4					
CONTRATANTE:	INVIAS				**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA			**ACUMULADO ANTERIOR:**		**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS NACIONALES									481.00		48.00	529.00
ITEM:	661.1	GRUPO DE AJUSTE	11604	ESPECIF. GENERAL	661.13	ESPECIF. PARTICULAR		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior		**UNID:**	m	**UBICACIÓN:**	**RUTA 6404 Y 6405**

ESQUEMA

LOCALIZACIÓN				UNIDAD	LONGITUD	DIAMETRO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
PR57+140	PR57+140	IZQ	SOCOTA	6.00	1.00	-	TUBERIA CONCRETO 36"	6.00
PR57+226	PR57+226	DER	SOCOTA	5.00	1.00	-	TUBERIA CONCRETO 36"	5.00
PR60+083	PR60+083	IZQ	SOCOTA	6.00	1.00	-	TUBERIA CONCRETO 36"	6.00
PR50+565	PR50+565	DER	SOCOTA	1.00	1.00	-	TUBERIA CONCRETO 36"	1.00
PR54+452	PR54+452	DER	SOCOTA	5.00	1.00	-	TUBERIA CONCRETO 36"	5.00
PR60+369	PR60+369	IZQ	SOCOTA	5.00	1.00	-	TUBERIA CONCRETO 36"	5.00
PR72+360	PR72+360	DER	HATO COROZAL	20.00	1.00	-	TUBERIA CONCRETO 36"	20.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Subtotal					**48.00**
			TOTAL					**48.00**

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA	INTERVENTORIA	INTERVENTORIA
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: MIGUEL ANGEL PARRA CONSORCIO VIAS NACIONALES	NOMBRE: OSCAR HUMBERTO POLO CONSORCIO VÍAS NACIONALES	NOMBRE: DIEGO FERNANDO RUANO FONSECA CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA	NOMBRE: WILLIAM DARIO MORENO CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL Y ACEPTACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	Codigo: INV978-F-EO-014 Fecha: 17/11/2022 Version: 02 Hoja: ___ de ___
PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vías para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"	

QDT	57+140	**MARGEN**	IZQUIERDA	**FECHA DE ELABORACION**	17/12/2024

OPERACIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES					FECHA DE EJECUCIÓN	FIRMA INTERVENTORÍA
SOLADOS EN CONCRETO									
Concreto clase 14 Mpa (Item 630.7)			ANCHO (m)	ESPESOR	LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
SOLADO TUBERÍA			1.60	0.20	5.70	1.82			
			TOTAL CONCRETO			1.82			
Concreto clase 14 Mpa Ciclópeo (Item 630.7)			AREA (m)		LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
ATRAQUE (CICLOPEO)			0.27		5.70	1.56			
			TOTAL CONCRETO			1.56			
TUBERIA									
Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior (Item 661.7)			CANT	LONG (m)		LONGTUD (M)	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
TUBERIA			6.00	1.00		6.00			
			TOTAL TUBERIA (M)			6.00			
ACEROS DE REFUERZO									
Acero de refuerzo fy= 420 Mpa (Item 640.1)			CANT	LONG (m)	Kg/m	Peso (Kg)	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
			TOTAL ACERO (Kg)						
ESTRUCTURA EN CONCRETO									
Concreto clase 28 Mpa (Item 630.3)			ANCHO	ESPESOR	LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
			TOTAL CONCRETO						

REVISADO POR CONTRATISTA	APROBADO POR INTERVENTORIA
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
MIGUEL PARRA	DIEGO RIVANO FONSECA

Consorcio Vías Nacionales

CONTROL Y ACEPTACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

Codigo: INV976-F-EO-014
Fecha: 17/11/2022
Version: 02
Hoja: ___ de ___

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"								
ODT	57+226				MARGEN	DERECHA		FECHA DE ELABORACION	17/12/2024
	OPERACIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES				FECHA DE EJECUCIÓN	FIRMA INTERVENTORÍA
1	SOLADOS EN CONCRETO								
1.1	Concreto clase 14 Mpa (Item 630.7)			ANCHO (m)	ESPESOR	LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES	
	SOLADO TUBERIA			1.50	0.20	4.80	1.44		
				TOTAL CONCRETO			1.44		
1.2	Concreto clase 14 Mpa Ciclópeo (Item 630.7)			AREA (m)		LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES	
	ATRAQUE (CICLOPEO)			0.27		4.80	1.32		
				TOTAL CONCRETO			1.32		
2	TUBERIA								
2.1	Tuberia de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior (Item 661.7)			CANT	LONG (m)		LONGITUD (M)	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES	
	TUBERIA			5.00	1.00		5.00		
				TOTAL TUBERIA (M)			5.00		
3	ACEROS DE REFUERZO								
3.3	Acero de refuerzo fy= 420 Mpa (Item 640.1)			CANT	LONG (m)	Kg/m	Peso (Kg)	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES	
				TOTAL ACERO (Kg)					
4	ESTRUCTURA EN CONCRETO								
4.1	Concreto clase 28 Mpa (Item 630.3)			ANCHO	ESPESOR	LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES	
				TOTAL CONCRETO					

	REVISADO POR CONTRATISTA	APROBADO POR INTERVENTORIA
	RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRES	MIGUEL PARRA	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA		

Consorcio Vías Nacionales

CONTROL Y ACEPTACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

Codigo: INV978-F-EO-014
Fecha: 17/11/2022
Version: 02
Hoja: ___ de ___

PROYECTO: CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Caburya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vías para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

ODT: 60+083 | **MARGEN:** IZQUIERDA | **FECHA DE ELABORACION:** 17/12/2024

	OPERACIÓN	NO	OBSERVACIONES	FECHA DE EJECUCION	FIRMA INTERVENTORÍA
1	SOLADOS EN CONCRETO				
1.1	Concreto clase 14 Mpa (Item 630.6)		ANCHO (m) / ESPESOR / LARGO (m) / m3 de concreto / DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	SOLADO ALETA		2.10 / 0.10 / 4.70 / 0.99		
	SOLADO TUBERIA		1.60 / 0.10 / 5.80 / 0.93		
			TOTAL CONCRETO: 1.92		
1.2	Concreto clase 14 Mpa Ciclópeo (Item 630.7)		AREA (m) / LARGO (m) / m3 de concreto / DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	ATRAQUE (CICLOPEO)		0.27 / 5.80 / 1.59		
			TOTAL CONCRETO: 1.59		
2	TUBERIA				
2.1	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 600mm de diámetro interior (Item 661.7)		CANT / LONG (m) / LONGTUD (M) / DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	TUBERIA		6.00 / 1.00 / 6.00		
			TOTAL TUBERIA (M): 6.00		
3	ACEROS DE REFUERZO				
2.1	Acero de refuerzo fya 420 Mpa (Item 640.1)		CANT / LONG (m) / Kg/m / Peso (Kg) / DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	POSICIÓN 1		8.00 / 4.45 / 0.994 / 35.39		
	POSICIÓN 2		23.00 / 0.90 / 0.994 / 20.58		
	POSICIÓN 3		9.00 / 2.55 / 0.994 / 22.81		
	POSICIÓN 4		12.00 / 3.26 / 0.994 / 38.89		
	POSICIÓN 5		7.00 / 4.08 / 0.994 / 28.35		
	POSICIÓN 5		4.00 / 5.00 / 0.994 / 19.88		
	POSICIÓN 6		7.00 / 4.00 / 0.994 / 27.83		
	POSICIÓN 7		4.00 / 4.00 / 0.994 / 15.90		
	POSICIÓN 8		4.00 / 3.20 / 0.994 / 12.72		
	POSICIÓN 9		10.00 / 5.00 / 0.994 / 49.70		
	POSICIÓN 10		8.00 / 10.00 / 0.994 / 79.52		
	POSICIÓN 11		8.00 / 2.76 / 0.994 / 21.95		
	POSICIÓN 12		8.00 / 2.25 / 0.994 / 17.89		
	POSICIÓN 13		6.00 / 5.00 / 0.994 / 29.82		
	POSICIÓN 14		2.00 / 5.40 / 0.994 / 10.74		
	POSICIÓN 15		2.00 / 1.60 / 0.994 / 3.18		
	POSICIÓN 16		2.00 / 3.00 / 0.994 / 5.96		
	POSICIÓN 12		2.00 / 3.80 / 0.994 / 7.55		
	POSICIÓN 13		2.00 / 3.30 / 0.994 / 6.56		
	POSICIÓN 14		2.00 / 2.77 / 0.994 / 5.51		
	POSICIÓN 15		8.00 / 1.82 / 0.994 / 14.47		
	POSICIÓN 16		2.00 / 1.70 / 0.994 / 3.38		
	POSICIÓN 14		4.00 / 1.60 / 0.560 / 3.58		
	POSICIÓN 15		2.00 / 1.80 / 1.552 / 4.97		
	POSICIÓN 16		7.00 / 1.60 / 0.560 / 6.27		
	POSICIÓN 17		2.00 / 4.10 / 0.560 / 4.59		
			TOTAL ACERO (Kg): 498.00		

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL Y ACEPTACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	Codigo: INV978-F-EO-014 Fecha: 17/11/2022 Version: 02 Hoja de

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vías para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

ODT	60+083	MARGEN	IZQUIERDA	FECHA DE ELABORACION	17/12/2024

	OPERACIÓN	NO	OBSERVACIONES					FECHA DE EJECUCIÓN	FIRMA INTERVENTORIA
2	ESTRUCTURA EN CONCRETO								
3.1	Concreto clase 28 Mpa (Item 630.3)		ALTO (m), ANCHO (m)	ESPESOR	LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	LOSA		1.45	0.25	3.40	1.23			
	DENTELLÓN		0.35	0.25	4.70	0.41			
	ALETA MI		2.19	0.25	1.90	1.04			
	CABEZOTE		1.70	0.25	2.69	1.14			
	ALETA MD		2.19	0.25	1.90	1.04			
	GUARDARUEDAS		1.70	0.23	0.37	0.14			
	DESCUENTO TUBERIA					-0.24			
			TOTAL CONCRETO			4.76			
3	ESCUELAS								

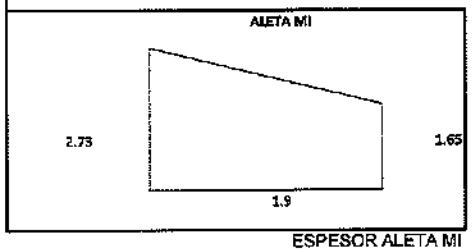

ESPESOR ALETA MI 0.25

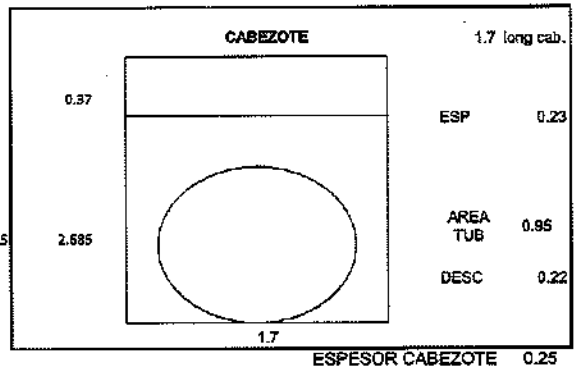

ESPESOR CABEZOTE 0.25

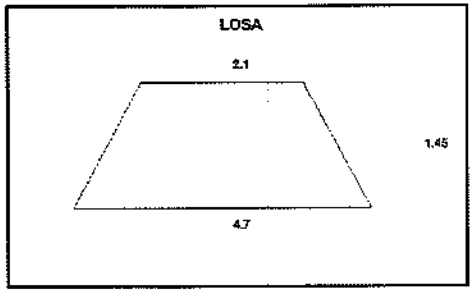

ESPESOR LOSA 0.25



ESPESOR ALETA MD 0.25



ESPESOR DENTELLÓN 0.25

	REVISADO POR CONTRATISTA	APROBADO POR INTERVENTORIA
	RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRES	MIGUEL PARRA	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA		

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL Y ACEPTACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	Codigo: INV978-F-EO-014
		Fecha: 17/11/2022
		Version: 02
		Hoja: de

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Aripore) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vías para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"										
ODT	50+565			MARGEN	DERECHA				FECHA DE ELABORACION	24/01/2025	
	OPERACIÓN	NO	OBSERVACIONES						FECHA DE EJECUCIÓN	FIRMA INTERVENTORÍA	
1	SOLADOS EN CONCRETO										
1.1	Concreto clase 14 Mpa (Item 634.7)		ANCHO (m)	ESPESOR	LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES				
	SOLADO CAJA		1.70	0.10	1.50	0.26					
	SOLADO TUBERIA		1.60	0.75	0.10	0.12					
			TOTAL CONCRETO			0.38					
1.2	Concreto clase 14 Mpa Ciclópeo (Item 630.7)		AREA (m)		LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES				
	ATRAQUE (CICLOPEO)		0.27		0.75	0.21					
			TOTAL CONCRETO			0.21					
2	TUBERIA										
2.1	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior (Item 661.7)		CANT	LONG (m)		LONGITUD (M)	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES				
	TUBERIA		1.00	1.00		1.00					
			TOTAL TUBERIA (M)			1.00					
3	ACEROS DE REFUERZO										
3.1	Acero de refuerzo fy= 420 Mpa (Item 640.1)		CANT	LONG (m)	Kg/m	Peso (Kg)	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES				
	POSICIÓN 1		8.00	2.34	0.994	18.61					
	POSICIÓN 2		7.00	2.05	0.994	14.26					
	POSICIÓN 3		10.00	1.80	0.994	17.89					
	POSICIÓN 4		7.00	1.80	0.994	12.52					
	POSICIÓN 5		8	2.43	0.994	19.32					
	POSICIÓN 5		2	2.20	0.994	4.37					
	POSICIÓN 6		10.00	1.30	0.994	12.92					
	POSICIÓN 7		2.00	4.10	0.560	4.59					
	POSICIÓN 8		4.00	1.73	0.994	6.88					
	POSICIÓN 9		4.00	1.73	0.994	6.88					
	POSICIÓN 10		4	2.03	0.994	8.07					
	POSICIÓN 11		4	1.83	0.994	7.28					
	POSICIÓN 12		4	1.83	0.994	7.28					
	POSICIÓN 13		4.00	1.73	0.994	6.88					
	POSICIÓN 14		4.00	2.03	0.560	4.55					
	POSICIÓN 15		4.00	1.73	0.994	6.86					
	POSICIÓN 16		4.00	2.54	0.994	10.10					
	POSICIÓN 17		5	2.03	0.994	10.09					
	POSICIÓN 18		5.00	1.83	0.994	9.10					
	POSICIÓN 19		5.00	2.03	0.994	10.09					
	POSICIÓN 20		4.00	2.54	0.994	10.10					
	POSICIÓN 21		11.00	2.03	0.994	22.20					
	POSICIÓN 22		7.00	2.40	0.994	16.70					
	POSICIÓN 23		11.00	4.03	0.994	44.06					
	POSICIÓN 24		2.00	1.60	1.550	4.96					
	POSICIÓN 25		4.00	1.60	0.994	6.36					
	POSICIÓN 26		9.00	1.60	0.560	8.06					
			TOTAL ACERO (Kg)			311.00					

Consorcio Vías Nacionales

CONTROL Y ACEPTACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

Codigo:	INV978-F-EO-014
Fecha:	17/11/2022
Version:	02
Hoja:	de

PROYECTO: CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vías para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

ODT | 50+565 | **MARGEN** | DERECHA | **FECHA DE ELABORACION** | 24/01/2025

	OPERACION	NO.	OBSERVACIONES					FECHA DE EJECUCIÓN	FIRMA INTERVENTORIA
3	ESTRUCTURA EN CONCRETO								
3.1	Concreto clase 28 Mpa (Item 530.3)		ALTO (m), ANCHO (m)	ESPESOR	LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	MURO ESPALDAR		1.8	0.25	1.5	0.68			
	MURO LATERAL		1.8	0.26	1.25	0.5			
	GUARDARRUEDA		0.3	0.23	1.5	0.1			
	MURO CABEZOTE		1.8	0.25	1.5	0.68			
	MURO LATERAL		1.8	0.26	1.2	0.54			
	PLACA PISO		1.5	0.25	1.7	0.64			
	(-) ENTRADA CANAL					-0.05			
	(-) VOLUMEN TUBO					-0.24			
			TOTAL CONCRETO			2.85			
5	ESQUEMAS								

MURO LATERAL



CABEZOTE

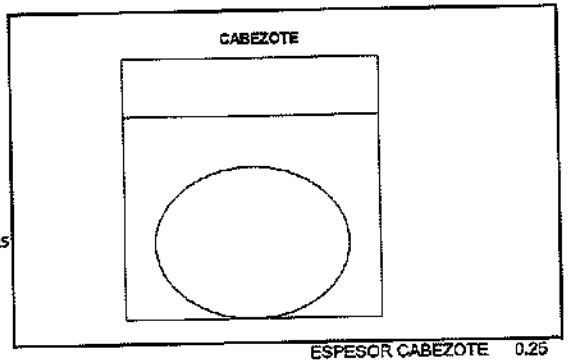

ESPESOR CABEZOTE 0.25

LOSA

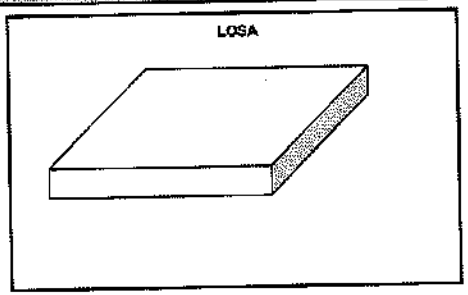

ESPESOR LOSA 0.25

MURO POSTERIOR



GUARDARRUEDA

REVISADO POR CONTRATISTA	APROBADO POR INTERVENTORIA
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRES: MIGUEL ANGEL PARRA CAMACHO	DIEGO JUANO FONSECA
FIRMA	

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL Y ACEPTACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	Codigo: INV978-F-EO-014 Fecha: 17/11/2022 Version: 02 Hoja: ___ de ___

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vías para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"				
ODT	54+452	MARGEN	DERECHA	FECHA DE ELABORACION	24/01/2025

	OPERACIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES					FECHA DE EJECUCION	FIRMA INTERVENTORIA
1	SOLADOS EN CONCRETO									
2.1	Concreto clase 14 Mpa (Item 630.7)			ANCHO (m)	ESPESOR	LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	SOLADO TUBERIA			1.50	0.10	4.60	0.69			
				TOTAL CONCRETO			0.69			
2.2	Concreto clase 14 Mpa Ciclópeo (Item 630.7)			AREA (m)		LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	ATRAQUE (CICLOPEO)			0.29		4.60	1.31			
				TOTAL CONCRETO			1.31			
2	TUBERIA									
2.1	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior (Item 661.7)			CANT	LONG (m)		LONGTUD (M)	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	TUBERIA			5.00	1.00		5.00			
				TOTAL TUBERIA (M)			5.00			
3	ACEROS DE REFUERZO									
3.3	Acero de refuerzo fy= 420 Mpa (Item 640.1)			CANT	LONG (m)	Kg/m	Peso (Kg)	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
				TOTAL ACERO (Kg)						
4	ESTRUCTURA EN CONCRETO									
4.1	Concreto clase 28 Mpa (Item 630.3)			ANCHO	ESPESOR	LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
				TOTAL CONCRETO						

	REVISADO POR CONTRATISTA	APROBADO POR INTERVENTORIA
	RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRES	MIGUEL ANGEL PARRA CAMACHO	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA		

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL Y ACEPTACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	Codigo: INV978-F-EO-014 Fecha: 17/11/2022 Version: 02 Hoja: ___ de ___

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

ODT	60+369	MARGEN	IZQUIERDA	FECHA DE ELABORACION	24/01/2025

	OPERACIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES					FECHA DE EJECUCIÓN	FIRMA INTERVENTORÍA
1	SOLADOS EN CONCRETO									
1.1	Concreto clase 14 Mpa (Item 630.6)			ANCHO (m)	ESPESOR	LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	SOLADO TUBERIA			1.60	0.10	4.80	0.77			
				TOTAL CONCRETO			0.77			
1.2	Concreto clase 14 Mpa Ciclópeo (Item 630.7)			AREA (M2)		LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	ATRAQUE (CICLOPEO)			0.27		4.80	1.32			
				TOTAL CONCRETO			1.32			
2	TUBERIA									
2.1	Tubería de Concreto Reforzado CLASE II, de 900mm de diámetro interior (Item 661.1)			CANT	LONG (m)		LONGITUD (M)	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	TUBERIA			5.00	1.00		5.00			
				TOTAL TUBERIA (M)			5.00			
3	ACEROS DE REFUERZO									
3.3	Acero de refuerzo fyk 420 Mpa (Item 640.1)			CANT	LONG (m)	Kg/m	Peso (Kg)	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	POSICIÓN 1			9.00	3.90	0.994	34.89			
	POSICIÓN 2			8.00	2.95	0.994	23.46			
	POSICIÓN 3			8.00	1.20	0.994	9.54			
	POSICIÓN 4			8.00	3.25	0.994	25.84			
	POSICIÓN 5			9	3.90	0.994	34.89			
	POSICIÓN 5			2	3.25	0.994	6.46			
	POSICIÓN 6			10.00	2.30	0.994	22.86			
	POSICIÓN 8			10.00	1.62	0.994	16.10			
	POSICIÓN 9			10.00	1.62	0.994	16.10			
	POSICIÓN 10			10.00	1.40	0.994	13.92			
	POSICIÓN 11			10.00	1.40	0.994	13.92			
	POSICIÓN 12			10.00	1.40	0.994	13.92			
	POSICIÓN 13			10	1.62	0.994	16.10			
	POSICIÓN 14			5.00	2.51	0.994	12.47			
	POSICIÓN 15			5.00	1.60	0.994	7.95			
	POSICIÓN 16			5.00	1.20	0.994	5.96			
	POSICIÓN 17			5.00	1.60	0.994	7.95			
	POSICIÓN 18			5.00	2.51	0.994	12.47			
	POSICIÓN 19			7.00	1.49	0.994	10.37			
	POSICIÓN 20			7.00	3.25	0.994	22.61			
	POSICIÓN 21			9.00	4.95	0.994	44.28			
	POSICIÓN 22			4	1.8	0.560	3.96			
	POSICIÓN 23			2.00	1.60	1.550	4.96			
	POSICIÓN 24			2.00	4.10	0.550	4.59			
	POSICIÓN 25			9.00	1.60	0.560	8.06			
				9.00	1.40	0.994	12.52			
				10.00	1.62	0.994	16.10			
				TOTAL ACERO (Kg)			421.87			

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL Y ACEPTACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	Codigo: INV978-F-SO-014 Fecha: 17/11/2022 Version: 02 Hoja: ___ de ___

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vías para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"							
ODT	60+369			MARGEN	IZQUIERDA		FECHA DE ELABORACION	24/01/2025
	OPERACION	EI	NO	OBSERVACIONES			FECHA DE EJECUCION	FIRMA INTERVENTORIA
4	ESTRUCTURA EN CONCRETO							
4.1	Concreto clase 28 Mpa (Item 630.3)			ANCHO / ESPESOR / LARGO (m) / m3 de concreto		DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
				TOTAL CONCRETO				
5	ESQUEMAS							

CARA IZQ.



L 0.00
A 0.00
E 0.00

CONTRAPISO



L 0.00
A 0.00
E 0.00

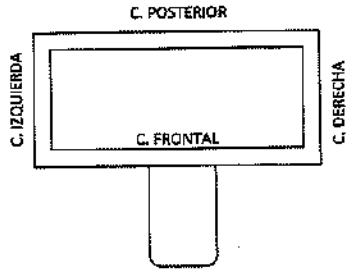

CARA DER.



L 0
A 0.00
E 0.00

GUARDA RUEDA

CARA POST.



L 0.00
A 0.00
E 0.00

0 0



L 1.5 E 0.225

DESCUENTO TUBERÍA 32"

CARA FRONTAL

L 0.00
A 0.00
E 0.00

L 0.25
AREA -0.95

DESC -0.24

REVISADO POR CONTRATISTA	APROBADO POR INTERVENTORIA
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: JHODEL ANGEL PARRA CAMACHO	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA	

Consorcio Vías Nacionales	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO CLASE III	

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vías para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

1	DATOS DE ELABORCIÓN DE REGISTRO

FECHA DE ELABORACIÓN:	25/01/2025		
RUTA 65-14	ALCANTARILLA EMERGENCIA PR72	PR 72+360	SÁCAMA

ABSCISA	ELEMENTO	UNIDADES
PR 72+360	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	20.00
UNIDADES		20.00

REVISADO POR CONTRATISTA			APROBADO POR INTERVENTORÍA	
TOPOGRAFÍA		INGENIERO RESIDENTE	VoBo	INGENIERO RESIDENTE
NOMBRES:	NESTOR DIAZ	OSCAR POLO	HEDI MORALES	WILLIAM DARIO MORENO RICAURTE
FIRMA:				

OBSERVACION:

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA	Cód: F-EO-009
		Versión: 001
	CONTRATO 0978 DE 2021	Fecha: 02/01/2020
		Pág: 1 de 1

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	31	**MM**	1	**AA**	2,025	**PERIODO:**	1 de enero de 2025	31 de enero de 2025		
CONTRATO:	0978 DE 2021						**OBJETO CONTRATO:**	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4			
CONTRATANTE:	INVIAS				**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA		**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES								19,308.00	10.00	19,318.00
ITEM:	663.3P	GRUPO DE AJUSTE	11604	ESPECIF. GENERAL		ESPECIF. PARTICULAR	663.3P	Tuberia para filtro PVC perforada diametro 100 mm	**UNID:**	m	**UBICACIÓN:** **RUTA 6404**

ESQUEMA

LOCALIZACIÓN				LARGO	ANCHO	AREA	MARGEN	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
-	PR59+840	PR59+850	SOCOTA	10.00	-	-	IZQ	TUBERIA PVC PERFORADA Ø 100mm	10.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-
								Subtotal	**10.00**
								TOTAL	**10.00**

RESIDENTE DE OBRA

FIRMA:

NOMBRE: MIGUEL ANGEL PARRA
CONSORCIO VIAS NACIONALES

INTERVENTORIA

FIRMA:

NOMBRE: DIEGO FERNANDO RUANO FONSECA
CONSORCIO NTERVENTORIAS COLOMBIA

FECHA DE ELABORACION	30/01/2025

ACTIVIDAD DE FILTRO

ACTIVIDAD	ITEM	ABSCISA INICIO	ABSCISA FINAL	MARGEN	LONGITUD	ANCHO	ALTO	ÁREA (m2)	VOLUMEN (m3)
Excavaciones varias sin clasificar	600.1.1	PR 59+840.00	PR 59+850.00	IZQUIERDA	10.00	0.8	1	0.8	8.00
Material granular drenante	673.2	PR 59+840.00	PR 59+850.00	IZQUIERDA	10.00	0.8	0.8	0.64	6.40
Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm	663.3P	PR 59+840.00	PR 59+850.00	IZQUIERDA	10.00	----------	----------	----------	----------
Geotextil Tipo II no tejido	673.1	PR 59+840.00	PR 59+850.00	IZQUIERDA	10.00	3.2	----------	32.00	----------
Excavaciones varias en roca en seco	600.2.1	PR 59+840.00	PR 59+850.00	IZQUIERDA	_____	----------	----------	----------	____

CONTRATISTAS		INTERVENTORIA
INGENIERO RESIDENTE		INGENIERO RESIDENTE
NOMBRE	MIGUEL ANGEL PARRA	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA		

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA	Cód: F-EO-009
		Versión: 001
	CONTRATO 0978 DE 2021	Fecha: 02/01/2020
		Pág: 1 de 1

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	31	**MM**	1	**AA**	2,025	**PERIODO:**	1 de enero de 2025		31 de enero de 2025	
CONTRATO:	0978 DE 2021						**OBJETO CONTRATO:**	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4			
CONTRATANTE:	INVIAS				**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA		**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES								63,877.40	1,106.30	64,983.70
ITEM:	673.1	GRUPO DE AJUSTE	11604	ESPECIF. GENERAL	673-13	ESPECIF. PARTICULAR		Geotextil Tipo II no tejido	**UNID:**	m2	**UBICACIÓN:** RUTA 6404

ESQUEMA

	LOCALIZACIÓN			LONGITUD	ANCHO	AREA	MARGEN	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
-	PR30+300	PR30+300	SOCHA	48.00	9.60	460.80	DER	BOLSACRETO	460.80
-	PR30+300	PR30+300	SOCHA	34.00	9.60	326.40	IZQ	BOLSACRETO	326.40
-	PR30+300	PR30+300	SOCHA	29.00	9.90	287.10	-	BOLSACRETO SEPARACIÓN PISO	287.10
-	PR59+840	PR59+850	SOCOTA	10.00	3.20	32.00	IZQ	FILTRO	32.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-
								Subtotal	1,106.30
								TOTAL	1,106.30

RESIDENTE DE OBRA

FIRMA:

NOMBRE: MIGUEL ANGEL BARRA
CONSORCIO VIAS NACIONALES

INTERVENTORIA

FIRMA:

NOMBRE: DIEGO FERNANDO RUANO FONSECA
CONSORCIO NTERVENTORIAS COLOMBIA

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL Y ACEPTACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	Codigo: INV978-F-EO-014
		Fecha: 17/11/2022
		Version: 02
		Hoja: ___ de ___

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"				
UBICACIÓN	K30+ CAUCE QUEBRADA EL BOCHE OBRAS DE MITIGACION	**RUTA**	6404	**FECHA DE ELABORACION**	25/01/2025

	OPERACIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES						FECHA DE EJECUCIÓN	FIRMA INTERVENTORÍA
1	**PRELIMINARES**										
1.1	**Geotextil Tipo II no tejido (Item 673.1)**			CANT	LONG (m)	ALTO	AREA (M2)	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES			
	GEOTEXTIL NT2500 MD				48.00	9.60	460.80				
	GEOTEXTIL NT2500 MI				34.00	9.60	326.40				
	GEOTEXTIL NT2500 SEPARACION PISO				29.00	9.90	287.10				
				TOTAL M2			787.20				
2	**ACEROS DE REFUERZO**										
2.1	**Acero de refuerzo fy= 420 Mpa (Item 640.1)**			CANT	LONG (m)	Kg/m	Peso (Kg)	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES			
	ANCLAJES 1ER NIVEL MD			0	0.5	0.994	0.00				
	ANCLAJES NIVEL NIVELES SUPERIORES MD			86	0.3	0.994	25.65				
				TOTAL ACERO			25.65				
2	**ESTRUCTURA EN CONCRETO**	MD	MI								
2.1	**Suministro e instalación de bolsacreto de 1,20*2,4*0,35 m. (concreto bombeable) - Sector El Boche (Item NP41.P)**			CANT	ANCHO (m)	ESPESOR (M)	LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	BOLSACRETO	X		43.00	1.20	0.300	2.40	37.15	*0.864*		
				TOTAL VOLUMEN BOLSACRETOS				37.15			

REVISADO POR CONTRATISTA		APROBADO POR INTERVENTORIA
	RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRES	MIGUEL ANGEL PARRA C.	
FIRMA		

FECHA DE ELABORACION	30/01/2025

ACTIVIDAD DE FILTRO

ACTIVIDAD	ITEM	ABSCISA INICIO	ABSCISA FINAL	MARGEN	LONGITUD	ANCHO	ALTO	ÁREA (m2)	VOLUMEN (m3)
Excavaciones varias sin clasificar	600.1.1	PR 59+840.00	PR 59+850.00	IZQUIERDA	10.00	0.8	1	0.8	8.00
Material granular drenante	673.2	PR 59+840.00	PR 59+850.00	IZQUIERDA	10.00	0.8	0.8	0.64	6.40
Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm	663.3P	PR 59+840.00	PR 59+850.00	IZQUIERDA	10.00	----------	----------	----------	----------
Geotextil Tipo II no tejido	673.1	PR 59+840.00	PR 59+850.00	IZQUIERDA	10.00	3.2	----------	32.00	----------
Excavaciones varias en roca en seco	600.2.1	PR 59+840.00	PR 59+850.00	IZQUIERDA	_____	----------	----------	----------	____

CONTRATISTAS		INTERVENTORIA
INGENIERO RESIDENTE		INGENIERO RESIDENTE
NOMBRE	MIGUEL ANGEL PARRA	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA		

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA	Cód: F-EO-009
		Versión: 001
	CONTRATO 0978 DE 2021	Fecha: 02/01/2020
		Pág: 1 de 1

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	31	**MM**	1	**AA**	2,025	**PERIODO:**	1 de enero de 2025		31 de enero de 2025		
CONTRATO:	0978 DE 2021						**OBJETO CONTRATO:**	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4				
CONTRATANTE:	INVIAS				**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA			**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES									11,996.40	6.30	12,002.70
ITEM:	673.2	GRUPO DE AJUSTE	11604	ESPECIF. GENERAL	673-13	ESPECIF. PARTICULAR		Material granular drenante		**UNID:**	m3	**UBICACIÓN:** **RUTA 6404**

ESQUEMA	LOCALIZACIÓN		MARGEN	MUNICIPIO	LONGITUD	ANCHO	ALTO	VOL MANGUERA	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
	-	PR59+840	PR59+850	IZQ	SOCOTA	10.00	0.80	0.80	0.08	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	6.32
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
											-
									Subtotal		6.30
									TOTAL		6.30

RESIDENTE DE OBRA

FIRMA:

NOMBRE: MIGUEL ANGEL TORRA
CONSORCIO VIAS NACIONALES

INTERVENTORIA

FIRMA:

NOMBRE: DIEGO FERNANDO RUANO FONSECA
CONSORCIO NTERVENTORIAS COLOMBIA

FECHA DE ELABORACION	30/01/2025

ACTIVIDAD DE FILTRO

ACTIVIDAD	ITEM	ABSCISA INICIO	ABSCISA FINAL	MARGEN	LONGITUD	ANCHO	ALTO	ÁREA (m2)	VOLUMEN (m3)
Excavaciones varias sin clasificar	600.1.1	PR 59+840.00	PR 59+850.00	IZQUIERDA	10.00	0.8	1	0.8	8.00
Material granular drenante	673.2	PR 59+840.00	PR 59+850.00	IZQUIERDA	10.00	0.8	0.8	0.64	6.40
Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm	663.3P	PR 59+840.00	PR 59+850.00	IZQUIERDA	10.00	----------	----------	----------	----------
Geotextil Tipo II no tejido	673.1	PR 59+840.00	PR 59+850.00	IZQUIERDA	10.00	3.2	----------	32.00	----------
Excavaciones varias en roca en seco	600.2.1	PR 59+840.00	PR 59+850.00	IZQUIERDA	_____	----------	----------	----------	____

CONTRATISTAS		INTERVENTORIA
INGENIERO RESIDENTE		INGENIERO RESIDENTE
NOMBRE	MIGUEL ANGEL PARRA	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA		

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA	Cód: F-EO-009
		Versión: 001
	CONTRATO 0978 DE 2021	Fecha: 02/01/2020
		Pág: 1 de 1

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	31	**MM**	1	**AA**	2,025	**PERIODO:**	1 de enero de 2025		31 de enero de 2025				
CONTRATO:	0978 DE 2021						**OBJETO CONTRATO:**	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4						
CONTRATANTE:	INVIAS				**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA			**ACUMULADO ANTERIOR:**		**PRESENTE ACTA:**		**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES									383,626.00		42,452.00		426,078.00
ITEM:	900.2	GRUPO DE AJUSTE	11608	ESPECIF. GENERAL	900-13	ESPECIF. PARTICULAR		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)		**UNID:**	m3-Km		**UBICACIÓN:**	**RUTA 6404 Y 6405**

ESQUEMA	**LOCALIZACIÓN**			**PR ACOPIO**	**LONG**	**LONG ACARREO LIBRE KM**	**LONG REAL**	**VOL EJECUTADO**	**MUNICIPIO**	**MEDIDA TOTAL**
	PR INICIAL	**PR FINAL**	**CENTROIDE**							
	PR57+555	PR57+670	PR57+613	PR49+500	8.11	0.10	8.01	600.00	SOCOTA	- 4,807.50
	PR20+880	PR20+940	PR20+910	PR26+300	5.39	0.10	5.29	160.40	SACAMA	- 848.52
	PR21+160	PR21+250	PR21+205	PR26+300	5.10	0.10	5.00	57.12	SACAMA	- 285.31
	PR21+410	PR21+460	PR21+435	PR26+300	4.87	0.10	4.77	114.86	SACAMA	- 547.31
	PR21+900	PR22+070	PR21+985	PR26+300	4.32	0.10	4.22	100.63	SACAMA	- 424.16
	PR57+555	PR57+670	PR57+613	PR49+500	8.11	0.10	8.01	635.93	SOCOTA	5,095.39
	PR30+300	PR30+300	PR30+300	PR49+500	19.20	0.10	19.10	635.72	SOCHA	12,142.25
	PR30+300	PR30+300	PR30+300	PR49+500	19.20	0.10	19.10	1360.02	SOCHA	25,976.38
	PR50+580	PR50+760	PR50+670	PR49+500	1.17	0.10	1.07	613.82	SOCOTA	656.79
	PR60+682	PR60+689	PR60+686	PR49+500	11.19	0.10	11.09	16.81	SOCOTA	186.35
	PR20+880	PR20+940	PR20+910	PR26+300	5.39	0.10	5.29	301.80	SACAMA	1,596.52
	PR21+160	PR21+250	PR21+205	PR26+300	5.10	0.10	5.00	93.05	SACAMA	464.78
	PR21+410	PR21+440	PR21+425	PR26+300	4.88	0.10	4.78	57.85	SACAMA	276.23
	PR21+850	PR22+070	PR21+960	PR26+300	4.34	0.10	4.24	274.55	SACAMA	1,164.09
	PR21+420	PR21+500	PR21+460	PR26+300	4.84	0.10	4.74	195.85	SACAMA	928.33
	PR21+500	PR21+590	PR21+545	PR26+300	4.76	0.10	4.66	80.30	SACAMA	373.80
	PR21+600	PR21+690	PR21+645	PR26+300	4.66	0.10	4.56	110.70	SACAMA	504.24
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
										-
					Subtotal					**42,452.00**
					TOTAL					**42,452.00**

RESIDENTE DE OBRA	**RESIDENTE DE OBRA**	**INTERVENTORIA**	**INTERVENTORIA**
FIRMA:	FIRMA: OHPOLO	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: MIGUEL ANGEL BARRA CONSORCIO VIAS NACIONALES	NOMBRE: OSCAR HUMBERTO POLO CONSORCIO VÍAS NACIONALES	NOMBRE: DIEGO FERNANDO RUANO FONSECA CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA	NOMBRE: WILLIAM DARIO MORENO CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA

Consorcio Vías Nacionales	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN – SOCHA – SÁCAMA – LA CABUYA – PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 4".DEPARTAMENTO DE BOYACÁ; MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA SOCOTA-ALTO DE SAGRA CODIGO 64BY01 DEPARTAMENTO DE BOYACA; MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA ENTRE LOS MUNICIPIOS DE PAZ DE RÍO Y TASCO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA"				**FECHA: 25/01/2025**
					CUADRO DE CALCULOS:
CONTRATO No.	978	**TRAMO:**		**RUTA 6404**	
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS NACIONALES		**INTERVENTOR**	CONSORCIO INTERVENTORÍAS COLOMBIA	

TRANSPORTE PROVENIENTE DE EXPLANACIONES

LOCALIZACIÓN				CENTROIDE	ACOPIO	LONGITUD	LONGITUD LIBRE	VOLUMEN	M3-KM
PR DEL	PR57+555	AL	PR57+670	PR57+613	PR49+500	8.11	8.01	653.93	5239.61
PR DEL	PR30+300	AL	PR30+300	PR30+300	PR49+500	19.20	19.10	635.72	12142.25
PR DEL	PR30+300	AL	PR30+300	PR30+300	PR49+500	19.20	19.10	1360.02	25976.38
PR DEL	PR50+580	AL	PR50+760	PR50+670	PR49+500	1.17	1.07	613.82	656.79
PR DEL	PR60+682	AL	PR60+689	PR60+686	PR49+500	11.19	11.09	16.81	186.35
					TOTAL				**44201.38**

CONTRATISTAS		INTERVENTORIA
	INGENIERO RESIDENTE	**INGENIERO RESIDENTE**
NOMBRES:	MIGUEL PARRA	DIEGO RUANO
FIRMA:		

Consorcio Vías Nacionales

CONTROL Y REGISTRO DE TRANSPORTE MATERIALES

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vías para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

1	DATOS DE ELABORCIÓN DE REGISTRO

FECHA DE ELABORACIÓN:	30/12/2024		
RUTA 64-05	TRANSPORTE	PR 20+880 A PR 22+070	MARGEN : DERECHO E IZQUIERDO

TRANSPORTE EXPLANACIONES

Abscisa	Longitud TRANSPORTE	Volumen TRANSPORTE	Volumen KM	Vol. TRANS acumul.
		ACOPIO PR 26+300		
PR 20+880.00				0.00
PR 20+940.00	5.29	301.80	1596.52	1596.52
PR 21+160.00				
PR 21+250.00	5.00	93.05	464.78	2061.31
PR 21+410.00				
PR 21+440.00	4.78	57.85	276.23	2337.54
PR 21+850.00				
PR 22+070.00	4.24	274.55	1164.09	3501.63
		VOLUMEN TOTAL EXCAVACION		3501.63

REVISADO POR CONTRATISTA			APROBADO POR INTERVENTORÍA	
TOPOGRAFÍA		INGENIERO RESIDENTE	VoBo	INGENIERO RESIDENTE
NOMBRES:	NESTOR DIAZ	OSCAR POLO	HEDI MORALES	WILLIAM DARIO MORENO RICAURTE
FIRMA:	Nestor A Diaz	OHPolo		

OBSERVACION

Consorcio Vías Nacionales

CONTROL Y REGISTRO DE TRANSPORTE MATERIALES

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vías para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

1	DATOS DE ELABORCIÓN DE REGISTRO

FECHA DE ELABORACIÓN:	25/01/2025			
RUTA 64-05	TRANSPORTE	PR 21+420 al PR 21+690	MARGEN	DERECHO

TRANSPORTE EXCAVACIONES DE MEJORAMIENTO SUBRASANTE

Abscisa Inicial	Abscisa Final	CENTROIDE	ACOPIO	LONGITUD KM	LONGITUD LIBRE	VOLUMEN	M3/ KM
PR 21+420.00	PR 21+500.00	PR 21+460.00	PR 26+300.00	4.84	4.74	195.85	928.33
PR 21+500.00	PR 21+590.00	PR 21+545.00	PR 26+300.00	4.76	4.66	80.3	373.80
PR 21+600.00	PR 21+690.00	PR 21+645.00	PR 26+300.00	4.66	4.56	110.7	504.24
				VOLUMEN TOTAL TRANSPORTE EXCAVACION M3/KM			1806.36

REVISADO POR CONTRATISTA			APROBADO POR INTERVENTORÍA	
	TOPOGRAFÍA	INGENIERO RESIDENTE	VoBo	INGENIERO RESIDENTE
NOMBRES:	NESTOR DIAZ	OSCAR POLO	HEDI MORALES	WILLIAM DARIO MORENO RICAURTE
FIRMA:				
OBSERVACION				

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA	Cód: F-EO-009
		Versión: 001
	CONTRATO 0978 DE 2021	Fecha: 02/01/2020
		Pág: 1 de 1

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	31	**MM**	1	**AA**	2,025	**PERIODO:**	1 de enero de 2025	31 de enero de 2025		
CONTRATO:	0978 DE 2021						**OBJETO CONTRATO:**	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4			
CONTRATANTE:	INVIAS				**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA	**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**	
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES							8,952.60	16.80	8,969.40	

ITEM:	NP10	GRUPO DE AJUSTE	11606	ESPECIF. GENERAL		ESPECIF. PARTICULAR	NP10	Mejoramiento de subrasante con rajon incluye sello con material de afirmado	**UNID:**	m3	**UBICACIÓN:**	**RUTA 6404**

ESQUEMA

LOCALIZACIÓN				**LONGITUD**	**AREA**	**MARGEN**	**DESCRIPCIÓN**	**VOLUMEN**
-	PR60+682	PR60+689	SOCOTA	6.53	2.57	IZQ	MEJORAMIENTO SUBRASANTE	16.81
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
								-
							Subtotal	**16.80**
							TOTAL	**16.80**

RESIDENTE DE OBRA

FIRMA:

NOMBRE: MIGUEL ANGEL PARRA
CONSORCIO VIAS NACIONALES

INTERVENTORIA

FIRMA:

NOMBRE: DIEGO FERNANDO RUANO FONSECA
CONSORCIO NTERVENTORIAS COLOMBIA

Consorcio Vías Nacionales	Mejoramiento de subrasante con rajón incluye sello con material de afirmado	ITEM NP.10

PROYECTO:	CONTRATO No. 0370-2021: "Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental Sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vías para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

1	DATOS DE ELABORCIÓN DE REGISTRO

FECHA DE ELABORACIÓN:	30/11/2024		
RUTA 64-04	RAJON	PR 60+682.47 A 60+689	MARGEN : IZQUIERDA

CONTROL Y REGISTRO DE LLENO RAJON MEJORAMIENTO

Abscisa	Área de RAJON	Área Promedio	Volumen de RAJON	Vol. RAJON acumul.
PR 60+682.47	0.729	0.36		
PR 60+683.00	1.345	1.04	0.55	0.55
PR 60+684.00	1.569	1.46	1.46	2.00
PR 60+685.00	3.094	2.33	2.33	4.33
PR 60+686.00	3.338	3.22	3.22	7.55
PR 60+687.00	3.447	3.39	3.39	10.94
PR 60+688.00	3.546	3.50	3.50	14.44
PR 60+689.00	1.2	2.37	2.37	16.81
		VOLUMEN TOTAL RAJON		16.81

REVISADO POR CONTRATISTA		APROBADO POR INTERVENTORÍA
INGENIERO RESIDENTE		INGENIERO RESIDENTE
NOMBRES:	MIGUEL ANGEL PARRA	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA:		

OBSERVACION

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA	Cód: F-EO-009
		Versión: 001
	CONTRATO 0978 DE 2021	Fecha: 02/01/2020
		Pág: 1 de 1

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	31	**MM**	1	**AA**	2,025	**PERIODO:**	1 de enero de 2025	31 de enero de 2025		
CONTRATO:	0978 DE 2021						**OBJETO CONTRATO:**	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4			
CONTRATANTE:	INVIAS				**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA	**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**	
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES							123.00	182.00	305.00	
ITEM:	NP16	GRUPO DE AJUSTE	11606	ESPECIF. GENERAL		ESPECIF. PARTICULAR	Suministro e instalación de cinta PVC tipo V-15 o similar	**UNID:**	M	**UBICACIÓN:**	**RUTA 6404**

ESQUEMA

	LOCALIZACIÓN			LONGITUD	MARGEN	DESCRIPCION	VOLUMEN
ODT	PR57+227	PR57+232	SOCOTA	4.70	IZQ - DER	CINTA PVC	4.70
ODT	PR57+849	PR57+849	SOCOTA	4.70	IZQ - DER	CINTA PVC	4.70
ODT	PR58+137	PR58+137	SOCOTA	4.70	IZQ - DER	CINTA PVC	4.70
ODT	PR58+199	PR58+199	SOCOTA	4.70	IZQ - DER	CINTA PVC	4.70
ODT	PR58+297	PR58+297	SOCOTA	4.70	IZQ - DER	CINTA PVC	4.70
ODT	PR58+438	PR58+438	SOCOTA	4.70	IZQ - DER	CINTA PVC	4.70
ODT	PR58+493	PR58+493	SOCOTA	4.70	IZQ - DER	CINTA PVC	4.70
ODT	PR58+563	PR58+563	SOCOTA	4.70	IZQ - DER	CINTA PVC	4.70
ODT	PR58+689	PR58+689	SOCOTA	4.70	IZQ - DER	CINTA PVC	4.70
ODT	PR58+783	PR58+783	SOCOTA	4.70	IZQ - DER	CINTA PVC	4.70
ODT	PR58+868	PR58+868	SOCOTA	4.70	IZQ - DER	CINTA PVC	4.70
ODT	PR58+974	PR58+974	SOCOTA	4.70	IZQ - DER	CINTA PVC	4.70
ODT	PR59+117	PR59+117	SOCOTA	4.70	IZQ - DER	CINTA PVC	4.70
ODT	PR59+209	PR59+209	SOCOTA	4.70	IZQ - DER	CINTA PVC	4.70
ODT	PR59+456	PR59+456	SOCOTA	4.70	IZQ - DER	CINTA PVC	4.70
ODT	PR59+600	PR59+600	SOCOTA	4.70	IZQ - DER	CINTA PVC	4.70
ODT	PR59+653	PR59+653	SOCOTA	4.70	IZQ - DER	CINTA PVC	4.70
ODT	PR59+727	PR59+727	SOCOTA	4.70	IZQ - DER	CINTA PVC	4.70
ODT	PR59+925	PR59+925	SOCOTA	4.70	IZQ - DER	CINTA PVC	4.70
ODT	PR60+001	PR60+001	SOCOTA	4.70	IZQ - DER	CINTA PVC	4.70
ODT	PR60+200	PR60+200	SOCOTA	4.70	IZQ - DER	CINTA PVC	4.70
ODT	PR60+307	PR60+307	SOCOTA	4.70	IZQ - DER	CINTA PVC	4.70
ODT	PR60+575	PR60+575	SOCOTA	4.70	IZQ - DER	CINTA PVC	4.70
ODT	PR60+682	PR60+682	SOCOTA	4.70	IZQ - DER	CINTA PVC	4.70
ODT	PR60+925	PR60+925	SOCOTA	4.70	IZQ - DER	CINTA PVC	4.70
ODT	PR61+500	PR61+500	SOCOTA	4.70	IZQ - DER	CINTA PVC	4.70
ODT	PR61+601	PR61+601	SOCOTA	4.70	IZQ - DER	CINTA PVC	4.70
ODT	PR61+682	PR61+682	SOCOTA	4.70	IZQ - DER	CINTA PVC	4.70
ODT	PR61+796	PR61+796	SOCOTA	4.70	IZQ - DER	CINTA PVC	4.70
ODT	PR61+841	PR61+841	SOCOTA	4.70	IZQ - DER	CINTA PVC	4.70
ODT	PR61+896	PR61+896	SOCOTA	4.70	IZQ - DER	CINTA PVC	4.70
ODT	PR62+061	PR62+061	SOCOTA	4.70	IZQ - DER	CINTA PVC	4.70
ODT	PR61+003	PR61+003	SOCOTA	4.70	IZQ - DER	CINTA PVC	4.70
ODT	PR61+113	PR61+113	SOCOTA	4.70	IZQ - DER	CINTA PVC	4.70
ODT	PR61+241	PR61+241	SOCOTA	4.70	IZQ	CINTA PVC	4.70
ODT	PR61+241	PR61+241	SOCOTA	3.45	DER	CINTA PVC	3.45
ODT	PR61+355	PR61+355	SOCOTA	4.70	IZQ - DER	CINTA PVC	4.70
ODT	PR61+370	PR61+370	SOCOTA	4.70	IZQ - DER	CINTA PVC	4.70
ODT	PR61+436	PR61+436	SOCOTA	4.70	IZQ - DER	CINTA PVC	4.70
-	-	-	-	-	-	-	-
					Subtotal		**182.00**
					TOTAL		**182.00**

RESIDENTE DE OBRA

FIRMA:

NOMBRE: MIGUEL ANGEL BARRA
CONSORCIO VIAS NACIONALES

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

FIRMA:

NOMBRE: DIEGO FERNANDO RUANO
CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL Y ACEPTACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	Codigo: INV978-F-EO-014 Fecha: 17/11/2022 Version: 02 Hoja: ___ de ___

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

ODT	58-57	MARGEN	IZ-DER	FECHA DE ELABORACION	24/01/2025

	OPERACIÓN	NO	OBSERVACIONES			FECHA DE EJECUCIÓN	FIRMA INTERVENTORÍA
1	SUINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA PVC TIPO V-15 O SIMILAR						
1.1	CINTA PVC		LONGITUD CINTA PVC	ML	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	OBRA 57+227		4.70	4.70			
	OBRA 57+849		4.70	4.70			
			TOTAL CINTA (ML)	9.40			
3	ESQUEMAS						

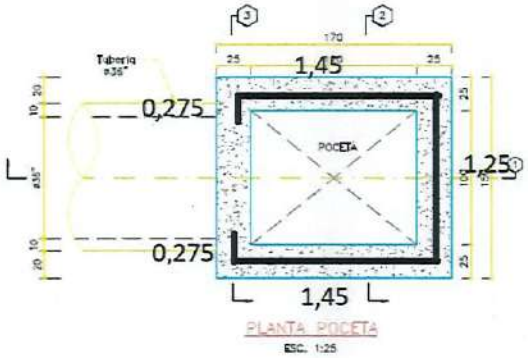

	REVISADO POR CONTRATISTA	APROBADO POR INTERVENTORIA
	RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRES	MIGUEL ANGEL PARRA CAMACHO	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA		

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL Y ACEPTACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	Codigo: INV978-F-EO-014
		Fecha: 17/11/2022
		Version: 02
		Hoja: ___ de ___

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vías para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"					
ODT	58-59	MARGEN	IZ-DER	FECHA DE ELABORACION	24/01/2025	

	OPERACIÓN	NO	OBSERVACIONES			FECHA DE EJECUCIÓN	FIRMA INTERVENTORÍA
1	SUINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA PVC TIPO V-15 O SIMILAR						
1.1	CINTA PVC		LONGITUD CINTA PVC	ML	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	OBRA 58+137		4.70	4.70			
	OBRA 58+199		4.70	4.70			
	OBRA 58+297		4.70	4.70			
	OBRA 58+438		4.70	4.70			
	OBRA 58+493		4.70	4.70			
	OBRA 58+563		4.70	4.70			
	OBRA 58+689		4.70	4.70			
	OBRA 58+783		4.70	4.70			
	OBRA 58+868		4.70	4.70			
	OBRA 58+974		4.70	4.70			
			TOTAL CINTA (ML)	47.00			
3	ESQUEMAS						

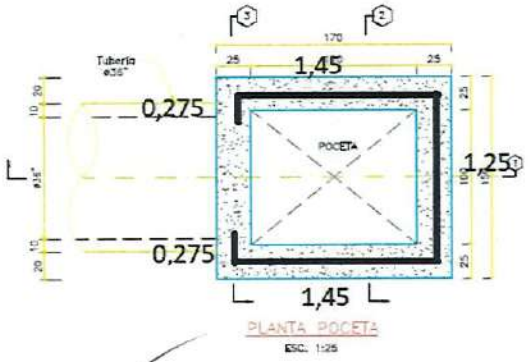

REVISADO POR CONTRATISTA		APROBADO POR INTERVENTORIA
RESIDENTE DE OBRA		RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRES	MIGUEL ANGEL PARRA CAMACHO	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA		

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL Y ACEPTACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	Codigo: INV978-F-EO-014
		Fecha: 17/11/2022
		Version: 02
		Hoja: ___ de ___

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

ODT	59-60	MARGEN	IZ-DER	FECHA DE ELABORACION	24/01/2025

	OPERACIÓN	NO	OBSERVACIONES			FECHA DE EJECUCIÓN	FIRMA INTERVENTORÍA
1	SUINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA PVC TIPO V-15 O SIMILAR						
1.1	CINTA PVC		LONGITUD CINTA PVC	ML	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	OBRA 59+117		4.70	4.70			
	OBRA 59+209		4.70	4.70			
	OBRA 59+456		4.70	4.70			
	OBRA 59+600		4.70	4.70			
	OBRA 59+653		4.70	4.70			
	OBRA 59+727		4.70	4.70			
	OBRA 59+925		4.70	4.70			
	OBRA 60+001		4.70	4.70			
			TOTAL CINTA (ML)	37.60			
3	ESQUEMAS						

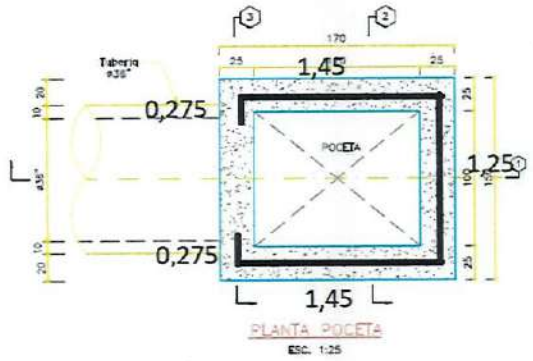

REVISADO POR CONTRATISTA		APROBADO POR INTERVENTORIA
RESIDENTE DE OBRA		RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRES	MIGUEL ANGEL PARRA CAMACHO	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA		

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL Y ACEPTACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	Codigo: INV978-F-EO-014 Fecha: 17/11/2022 Version: 02 Hoja: ___ de ___

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vías para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

ODT	61-60	MARGEN	IZ-DER	FECHA DE ELABORACION	24/01/2025

	OPERACIÓN	NO	OBSERVACIONES			FECHA DE EJECUCIÓN	FIRMA INTERVENTORÍA
1	SUINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA PVC TIPO V-15 O SIMILAR						
1.1	CINTA PVC		LONGITUD CINTA PVC	ML	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	OBRA 60+200		4.70	4.70			
	OBRA 60+307		4.70	4.70			
	OBRA 60+575		4.70	4.70			
	OBRA 60+682		4.70	4.70			
	OBRA 60+925		4.70	4.70			
			TOTAL CINTA (ML)	23.50			
3	ESQUEMAS						

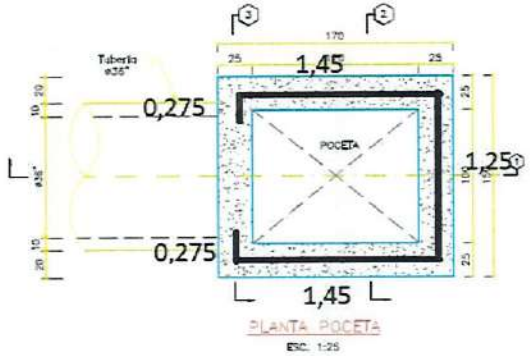

PLANTA POCETA
ESC. 1:25

REVISADO POR CONTRATISTA		APROBADO POR INTERVENTORIA
RESIDENTE DE OBRA		RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRES	MIGUEL ANGEL PARRA CAMACHO	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA		

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL Y ACEPTACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	Codigo: INV978-F-EO-014 Fecha: 17/11/2022 Version: 02 Hoja: ___ de ___

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vías para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

ODT	61-62	MARGEN	IZ-DER	FECHA DE ELABORACION	24/01/2025

	OPERACIÓN	NO	OBSERVACIONES			FECHA DE EJECUCIÓN	FIRMA INTERVENTORÍA
1	SUINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA PVC TIPO V-15 O SIMILAR						
1.1	CINTA PVC		LONGITUD CINTA PVC	ML	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	OBRA 61+500		4.70	4.70			
	OBRA 61+601		4.70	4.70			
	OBRA 61+682		4.70	4.70			
	OBRA 61+796		4.70	4.70			
	OBRA 61+841		4.70	4.70			
	OBRA 61+896		4.70	4.70			
	OBRA 62+061		4.70	4.70			
	OBRA 61+003		4.70	4.70			
	OBRA 61+113		4.70	4.70			
	OBRA 61+241 MI		4.70	4.70			
	OBRA 61+241 MD		3.45	3.45			
	OBRA 61+355		4.70	4.70			
	OBRA 61+370		4.70	4.70			
	OBRA 61+436		4.70	4.70			
			TOTAL CINTA (ML)	64.55			
3	ESQUEMAS						

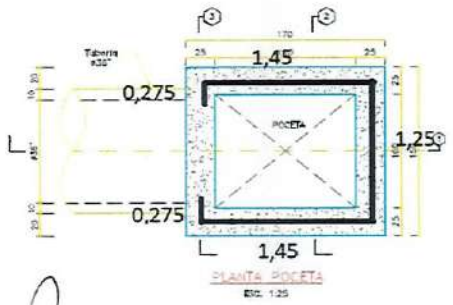

PLANTA POCETA

ESC. 1:25

REVISADO POR CONTRATISTA		APROBADO POR INTERVENTORIA
RESIDENTE DE OBRA		RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRES	MIGUEL ANGEL PARGA CAMACHO	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA		

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA	Cód: F-EO-009
		Versión: 001
	CONTRATO 0978 DE 2021	Fecha: 02/01/2020
		Pág: 1 de 1

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	31	**MM**	1	**AA**	2,025	**PERIODO:**	1 de enero de 2025		31 de enero de 2025			
CONTRATO:	0978 DE 2021						**OBJETO CONTRATO:**	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4					
CONTRATANTE:	INVIAS				**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA			**ACUMULADO ANTERIOR:**		**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES									6,510.80		440.00	6,950.80
ITEM:	NP 17	GRUPO DE AJUSTE	11602	ESPECIF. GENERAL		ESPECIF. PARTICULAR	NP 17	Suministro e instalación de Geomalla triaxial 30*30 o similar		**UNID:**	m2	**UBICACIÓN:**	**RUTA 6404**

ESQUEMA

	LOCALIZACIÓN			LONGITUD	ANCHO	AREA	MARGEN	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
-	PR57+180	PR57+300	SOCOTA	120.00	2.00	240.00	IZQ	GEOMALLA	240.00
-	PR60+000	PR60+100	SOCOTA	100.00	2.00	200.00	IZQ	GEOMALLA	200.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-
								Subtotal	**440.00**
								TOTAL	**440.00**

RESIDENTE DE OBRA

FIRMA:

NOMBRE: MIGUEL ANGEL TARRA
CONSORCIO VIAS NACIONALES

INTERVENTORIA

FIRMA:

NOMBRE: DIEGO FERNANDO RUANO FONSECA
CONSORCIO NTERVENTORIAS COLOMBIA

Consorcio Vías Nacionales	Suministro e instalación de Geomalla triaxial 30*30 o similar	ITEM NP 17

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

1	DATOS DE ELABORCIÓN DE REGISTRO

FECHA DE ELABORACIÓN:	30/011/2024		
RUTA 64-04	GEOMALLA		MARGEN : IZQUIERDA

Abscisa INICIAL	Ábscisa FINAL	longitud	ancho	AREA
PR 57+180.00	PR 57+300.00	120.00	2.00	240.00
		AREA TOTAL		240.00

REVISADO POR CONTRATISTA		APROBADO POR INTERVENTORÍA
INGENIERO RESIDENTE		INGENIERO RESIDENTE
NOMBRES:	MIGUEL ANGEL PARRA	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA:		

OBSERVACION

Consorcio Vías Nacionales	Suministro e instalación de Geomalla triaxial 30*30 o similar	ITEM NP 17

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

1	DATOS DE ELABORCIÓN DE REGISTRO

FECHA DE ELABORACIÓN:	30/01/2025		
RUTA 64-04	GEOMALLA		MARGEN : IZQUIERDA

Abscisa INICIAL	Ábscisa FINAL	longitud	ancho	AREA
PR 60+000.00	PR 60+100.00	100.00	2.00	200.00
		AREA TOTAL		200.00

REVISADO POR CONTRATISTA		APROBADO POR INTERVENTORÍA
INGENIERO RESIDENTE		INGENIERO RESIDENTE
NOMBRES:	MIGUEL ANGEL PARRA	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA:		

OBSERVACION

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA	Cód: F-EO-009
		Versión: 001
	CONTRATO 0978 DE 2021	Fecha: 02/01/2020
		Pág: 1 de 1

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	31	**MM**	1	**AA**	2,025	**PERIODO:**	1 de enero de 2025		31 de enero de 2025	
CONTRATO:	0978 DE 2021						**OBJETO CONTRATO:**	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4			
CONTRATANTE:	INVIAS				**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA		**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES								1,446.40	400.00	1,846.40
ITEM:	NP 18	GRUPO DE AJUSTE	11602	ESPECIF. GENERAL		ESPECIF. PARTICULAR	Suministro e instalación de Geotextil NT4000 o similar		**UNID:**	M2	**UBICACIÓN:** **RUTA 6405**

ESQUEMA

LOCALIZACIÓN				LONGITUD	ANCHO	AREA	MARGEN	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
-	PR21+425	PR21+495	SACAMA	70.00	3.20	224.00	IZQ	GEOTEXTIL NT4000	224.00
-	PR21+625	PR21+680	SACAMA	55.00	3.20	176.00	DER	GEOTEXTIL NT4000	176.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-
								Subtotal	**400.00**
								TOTAL	**400.00**

RESIDENTE DE OBRA

FIRMA: OHPOLO

NOMBRE: OSCAR HUMBERTO POLO
CONSORCIO VÍAS NACIONALES

INTERVENTORIA

FIRMA:

NOMBRE: WILLIAM DARIO MORENO
CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA

Consorcio Vías Nacionales

CONTROL Y REGISTRO DE MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vías para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

1 DATOS DE ELABORCIÓN DE REGISTRO

FECHA DE ELABORACIÓN:	25/01/2025		
RUTA 64-05	GEOTEXTIL	PR 21+425 al PR 21+495	MARGEN : IZQUIERDO

GEOTEXTIL				
Abscisa	Área de GEOTEXTIL	Área Promedio	Area de GEOTEXTIL	Area. Geotextil acumul.
CAJEO PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE				
PR 21+425.00	3.20	1.60	0.00	0.00
PR 21+435.00	3.20	3.20	32.00	32.00
PR 21+445.00	3.20	3.20	32.00	64.00
PR 21+455.00	3.20	3.20	32.00	96.00
PR 21+465.00	3.20	3.20	32.00	128.00
PR 21+475.00	3.20	3.20	32.00	160.00
PR 21+485.00	3.20	3.20	32.00	192.00
PR 21+495.00	3.20	3.20	32.00	224.00
		AREA TOTAL GEOTEXTIL		224.00

REVISADO POR CONTRATISTA			APROBADO POR INTERVENTORÍA	
TOPOGRAFÍA		INGENIERO RESIDENTE	VoBo	INGENIERO RESIDENTE
NOMBRES:	NESTOR DIAZ	OSCAR POLO	HEDI MORALES	WILLIAM DARIO MORENO RICAURTE
FIRMA:				

OBSERVACION

Consorcio Vías Nacionales

CONTROL Y REGISTRO DE MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vías para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

1 DATOS DE ELABORCIÓN DE REGISTRO

FECHA DE ELABORACIÓN:	25/01/2025		
RUTA 64-05	GEOTEXTIL	PR 21+625 al PR 21+680	MARGEN : DERECHO

GEOTEXTIL

Abscisa	Área de GEOTEXTIL	Área Promedio	Area de GEOTEXTIL	Area. Geotextil acumul.
CAJEO PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE				
PR 21+625.00	3.20	1.60	0.00	0.00
PR 21+630.00	3.20	3.20	16.00	16.00
PR 21+640.00	3.20	3.20	32.00	48.00
PR 21+650.00	3.20	3.20	32.00	80.00
PR 21+660.00	3.20	3.20	32.00	112.00
PR 21+670.00	3.20	3.20	32.00	144.00
PR 21+680.00	3.20	3.20	32.00	176.00
		AREA TOTAL GEOTEXTIL		176.00

REVISADO POR CONTRATISTA			APROBADO POR INTERVENTORÍA	
TOPOGRAFÍA		INGENIERO RESIDENTE	VoBo	INGENIERO RESIDENTE
NOMBRES:	NESTOR DIAZ	OSCAR POLO	HEDI MORALES	WILLIAM DARIO MORENO RICAURTE
FIRMA:				

OBSERVACION

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA	Cód: F-EO-009
		Versión: 001
	CONTRATO 0978 DE 2021	Fecha: 02/01/2020
		Pág: 1 de 1

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	31	**MM**	1	**AA**	2,025	**PERIODO:**	1 de enero de 2025		31 de enero de 2025			
CONTRATO:	0978 DE 2021						**OBJETO CONTRATO:**	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4					
CONTRATANTE:	INVIAS				**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA			**ACUMULADO ANTERIOR:**		**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES									1,248.00		50.00	1,298.00
ITEM:	NP20	GRUPO DE AJUSTE	11607	ESPECIF. GENERAL		ESPECIF. PARTICULAR	NP20	Control vial - turno duirno y nocturno de Lunes a Sabado (No incluye disposición de señalización)		**UNID:**	día	**UBICACIÓN:**	**RUTA 6404 Y 6514**

ESQUEMA	LOCALIZACIÓN			MUNICIPIO	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	-	PR30+300	PR30+300	SOCHA	PUENTE BOCHE	CONTROL VIAL	25.00	25.00
	-	PR3+500	PR3+500	PAZ DE ARIPORO	ROMAN BAZURTO	CONTROL VIAL	25.00	25.00
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
						Subtotal		50.00
						TOTAL		50.00

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA	INTERVENTORIA	INTERVENTORIA
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: MIGUEL ANGEL PARRA CONSORCIO VIAS NACIONALES	NOMBRE: OSCAR HUMBERTO POLO CONSORCIO VÍAS NACIONALES	NOMBRE: DIEGO FERNANDO RUANO FONSECA CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA	NOMBRE: WILLIAM DARIO MORENO CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA

Puente Ramon Bazurto Pr3+500 Ruta 6514, Paz de Ariporo

2025

ene-25		
miércoles	1	1
jueves	2	0
viernes	3	0
sábado	4	0
domingo	5	1
lunes	6	1
martes	7	0
miércoles	8	0
jueves	9	0
viernes	10	0
sábado	11	0
domingo	12	1
lunes	13	0
martes	14	0
miércoles	15	0
jueves	16	0
viernes	17	0
sábado	18	0
domingo	19	1
lunes	20	0
martes	21	0
miércoles	22	0
jueves	23	0
viernes	24	0
sábado	25	0
domingo	26	1
lunes	27	0
martes	28	0
miércoles	29	0
jueves	30	0
viernes	31	0

feb-25		
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0

mar-25		
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0

abr-25		
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0

may-25		
		1
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		1
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0

jun-25		
		0
		0
		1
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		1
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0

jul-25		
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0

enero-25	
Dominical y festivo	6
Lunes a Sábado	25

febrero-25	
Dominical y festivo	0
Lunes a Sábado	28

marzo-25	
Dominical y festivo	0
Lunes a Sábado	31

abril-25	
Dominical y festivo	0
Lunes a Sábado	30

mayo-25	
Dominical y festivo	2
Lunes a Sábado	29

junio-25	
Dominical y festivo	2
Lunes a Sábado	28

julio-25	
Dominical y festivo	0
Lunes a Sábado	31

FIRMA:
NOMBRE: OSCAR HUMBERTO POLO FIGUEROA
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

FIRMA:
WILLIAM DARIO MORENO RICAURTE
INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Puente El Boche Pr30+300 Ruta 6404, Socha

2025

ene-25		
miércoles	1	1
jueves	2	0
viernes	3	0
sábado	4	0
domingo	5	1
lunes	6	1
martes	7	0
miércoles	8	0
jueves	9	0
viernes	10	0
sábado	11	0
domingo	12	1
lunes	13	0
martes	14	0
miércoles	15	0
jueves	16	0
viernes	17	0
sábado	18	0
domingo	19	1
lunes	20	0
martes	21	0
miércoles	22	0
jueves	23	0
viernes	24	0
sábado	25	0
domingo	26	1
lunes	27	0
martes	28	0
miércoles	29	0
jueves	30	0
viernes	31	0

feb-25		
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0

mar-25		
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0

abr-25		
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0

may-25		
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0

jun-25		
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0

jul-25		
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0

enero-25	
Dominical y festivo	6
Lunes a Sábado	25

febrero-25	
Dominical y festivo	0
Lunes a Sábado	28

marzo-25	
Dominical y festivo	0
Lunes a Sábado	31

abril-25	
Dominical y festivo	0
Lunes a Sábado	30

mayo-25	
Dominical y festivo	0
Lunes a Sábado	31

junio-25	
Dominical y festivo	0
Lunes a Sábado	30

julio-25	
Dominical y festivo	0
Lunes a Sábado	31

FIRMA:
NOMBRE: MIGUEL ANGEL PARRA CAMACHO
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

FIRMA:
DIEGO FERNANDO RUANO FONSECA
INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA	Cód: F-EO-009
		Versión: 001
	CONTRATO 0978 DE 2021	Fecha: 02/01/2020
		Pág: 1 de 1

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	31	**MM**	1	**AA**	2,025	**PERIODO:**	1 de enero de 2025		31 de enero de 2025		
CONTRATO:	0978 DE 2021						**OBJETO CONTRATO:**	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4				
CONTRATANTE:	INVIAS				**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA		**ACUMULADO ANTERIOR:**		**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES								285.00		1.00	286.00
ITEM:	NP21	GRUPO DE AJUSTE	11607	ESPECIF. GENERAL		ESPECIF. PARTICULAR	NP21	Control vial - turno duirno y nocturno de Dominicales y Festivos (No incluye disposición de señalización)	**UNID:**	día	**UBICACIÓN:**	**RUTA 6404 Y 6514**

ESQUEMA	LOCALIZACIÓN			MUNICIPIO	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	-	PR30+300	PR30+300	SOCHA	PUENTE BOCHE	CONTROL VIAL	1.00	1.00
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
								-
					Subtotal			1.00
					TOTAL			1.00

RESIDENTE DE OBRA

FIRMA:

NOMBRE: MIGUEL ANGEL PARRA
CONSORCIO VIAS NACIONALES

INTERVENTORIA

FIRMA:

NOMBRE: DIEGO FERNANDO RUANO FONSECA
CONSORCIO NTERVENTORIAS COLOMBIA

Puente Ramon Bazurto Pr3+500 Ruta 6514, Paz de Ariporo

2025

ene-25		
miércoles	1	1
jueves	2	0
viernes	3	0
sábado	4	0
domingo	5	1
lunes	6	1
martes	7	0
miércoles	8	0
jueves	9	0
viernes	10	0
sábado	11	0
domingo	12	1
lunes	13	0
martes	14	0
miércoles	15	0
jueves	16	0
viernes	17	0
sábado	18	0
domingo	19	1
lunes	20	0
martes	21	0
miércoles	22	0
jueves	23	0
viernes	24	0
sábado	25	0
domingo	26	1
lunes	27	0
martes	28	0
miércoles	29	0
jueves	30	0
viernes	31	0

feb-25		
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0

mar-25		
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0

abr-25		
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0

may-25		
		1
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		1
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0

jun-25		
		0
		0
		1
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		1
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0

jul-25		
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0

enero-25	
Dominical y festivo	6
Lunes a Sábado	25

febrero-25	
Dominical y festivo	0
Lunes a Sábado	28

marzo-25	
Dominical y festivo	0
Lunes a Sábado	31

abril-25	
Dominical y festivo	0
Lunes a Sábado	30

mayo-25	
Dominical y festivo	2
Lunes a Sábado	29

junio-25	
Dominical y festivo	2
Lunes a Sábado	28

julio-25	
Dominical y festivo	0
Lunes a Sábado	31

OHPOLO

FIRMA:
NOMBRE: OSCAR HUMBERTO POLO FIGUEROA
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

FIRMA:
WILLIAM DARIO MORENO RICAURTE
INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Puente El Boche Pr30+300 Ruta 6404, Socha

2025

ene-25		
miércoles	1	1
jueves	2	0
viernes	3	0
sábado	4	0
domingo	5	1
lunes	6	1
martes	7	0
miércoles	8	0
jueves	9	0
viernes	10	0
sábado	11	0
domingo	12	1
lunes	13	0
martes	14	0
miércoles	15	0
jueves	16	0
viernes	17	0
sábado	18	0
domingo	19	1
lunes	20	0
martes	21	0
miércoles	22	0
jueves	23	0
viernes	24	0
sábado	25	0
domingo	26	1
lunes	27	0
martes	28	0
miércoles	29	0
jueves	30	0
viernes	31	0

feb-25		
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0

mar-25		
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0

abr-25		
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0

may-25		
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0

jun-25		
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0

jul-25		
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0

enero-25	
Dominical y festivo	6
Lunes a Sábado	25

febrero-25	
Dominical y festivo	0
Lunes a Sábado	28

marzo-25	
Dominical y festivo	0
Lunes a Sábado	31

abril-25	
Dominical y festivo	0
Lunes a Sábado	30

mayo-25	
Dominical y festivo	0
Lunes a Sábado	31

junio-25	
Dominical y festivo	0
Lunes a Sábado	30

julio-25	
Dominical y festivo	0
Lunes a Sábado	31

FIRMA:
NOMBRE: MIGUEL ANGEL PARRA CAMACHO
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

FIRMA:
DIEGO FERNANDO RUANO FONSECA
INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA	Cód: F-EO-009
		Versión: 001
	CONTRATO 0978 DE 2021	Fecha: 02/01/2020
		Pág: 1 de 1

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	31	**MM**	1	**AA**	2,025	**PERIODO:**	1 de enero de 2025		31 de enero de 2025			
CONTRATO:	0978 de 2021						**OBJETO CONTRATO:**	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4					
CONTRATANTE:	INVIAS				**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA			**ACUMULADO ANTERIOR:**		**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS NACIONALES									355.50		53.00	408.50
ITEM:	NP27	GRUPO DE AJUSTE	14102	ESPECIF. GENERAL		ESPECIF. PARTICULAR	NP27	Pilote excavado in situ f´c=28 Mpa tipo tremie con Ø =1,2 m para puente El Boche incluye excavación en suelo duro		**UNID:**	m	**UBICACIÓN:**	**RUTA 6404**

ESQUEMA

LOCALIZACIÓN				UNIDAD	LONGITUD DE DISEÑO	DIAMETRO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
PILOTE 3A	PR30+300	PR30+300	SOCHA	1.00	26.50	1.30	PILOTE DE CONCRETO (ACTA 43)	- 26.50
PILOTE 8A	PR30+300	PR30+300	SOCHA	1.00	26.50	1.30	PILOTE DE CONCRETO	26.50
PILOTE 2A	PR30+300	PR30+300	SOCHA	1.00	26.50	1.30	PILOTE DE CONCRETO	26.50
PILOTE 7A	PR30+300	PR30+300	SOCHA	1.00	26.50	1.30	PILOTE DE CONCRETO	26.50
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Subtotal		**53.00**
						TOTAL		**53.00**

RESIDENTE DE OBRA

FIRMA:

NOMBRE: MIGUEL ANGEL PARRA
CONSORCIO VIAS NACIONALES

RESIDENTE DEINTERVENTORIA

FIRMA:

NOMBRE: DIEGO FERNANDO RUANO FONSECA
CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL Y ACEPTACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	Codigo: INV978-F-EO-014 Fecha: 17/11/2022 Version: 02 Hoja: ___ de ___

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vías para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

PILOTAJE	PILOTE 8A PR 30+300	MARGEN	IZQUIERDA	FECHA DE ELABORACION	12/12/2024

	OPERACIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES					FECHA DE EJECUCIÓN	FIRMA INTERVENTORÍA
1	CAMISA									
2.1	Suministro e instalación de camisa para pilote de 1,2 m de diámetro (No recuperable) para puente Boche PR 30+300 (Item NP 28)			ANCHO (m)	ESPESOR	LARGO (m)	m	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	Camisa			-	-	10.00	10.00			
				-	-					
				TOTAL m			10.00			
3	ACEROS DE REFUERZO									
3.3	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. (Item 640.1)			CANT	LONG (m)	Kg/m	Peso (Kg)	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	P1			13.00	9.00	6.40	749.27	*Varilla No. 10*		
	P2			13.00	12.00	6.40	998.40	*Varilla No. 8*		
	P3			13.00	10.55	6.40	877.76	*Varilla No. 8*		
	P4			272.00	4.45	1.55	1879.02	*Varilla No. 5*		
	P5			44	4.35	0.99	190.31	*Varilla No. 4*		
				TOTAL ACERO (Kg)			4694.76			
4	ESTRUCTURA EN CONCRETO									
4.1	Pilote excavado in situ f'c=28 Mpa tipo tremie con Ø =1,2 m para puente El Boche incluye excavación en suelo duro (Item NP 27)			ANCHO	ESPESOR	LARGO (m)	m	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	Pilote 8A (DE PROTECCION ESTRIBO 1)			-	-	26.50	26.50			
				TOTAL CONCRETO			26.50			

REVISADO POR CONTRATISTA	APROBADO POR INTERVENTORIA
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRES: MIGUEL ANGEL PARRA CAMACHO	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA:	

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL Y ACEPTACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	Codigo: INV978-F-EO-014 Fecha: 17/11/2022 Version: 02 Hoja: ___ de ___

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belén-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

PILOTAJE	PILOTE 2A PR 30+300	MARGEN	IZQUIERDA	FECHA DE ELABORACION	25/01/2025

	OPERACIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES					FECHA DE EJECUCIÓN	FIRMA INTERVENTORÍA
1	**CAMISA**									
2.1	**Suministro e instalación de camisa para pilote de 1,2 m de diámetro (No recuperable) para puente Boche PR 30+300 (Item NP 28)**			ANCHO (m)	ESPESOR	LARGO (m)	m	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	Camisa			-	-	9.00	9.00			
				-	-					
					TOTAL m		9.00			
3	**ACEROS DE REFUERZO**									
3.3	**Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. (Item 640.1)**			CANT	LONG (m)	Kg/m	Peso (Kg)	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	P1			13.00	9.00	6.404	749.27	*Varilla No. 10*		
	P2			13.00	12.00	6.400	998.40	*Varilla No. 8*		
	P3			13.00	10.55	6.400	877.76	*Varilla No. 8*		
	P4			250.00	4.45	1.552	1726.60	*Varilla No. 5*		
	P5			44	4.35	0.994	190.25	*Varilla No. 4*		
					TOTAL ACERO (Kg)		4542.28			
4	**ESTRUCTURA EN CONCRETO**									
4.1	**Pilote excavado in situ f'c=28 Mpa tipo tremie con Ø =1,2 m para puente El Boche Incluye excavación en suelo duro (Item NP 27)**			ANCHO	ESPESOR	LARGO (m)	m	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	Pilote 2A (DE PROTECCION ESTRIBO 1)			-	-	26.50	26.50			
					TOTAL CONCRETO		26.50			

REVISADO POR CONTRATISTA	APROBADO POR INTERVENTORIA
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRES: MIGUEL ANGEL PARRA CAMACHO	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA:	

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL Y ACEPTACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	Codigo: INV978-F-EO-014
		Fecha: 17/11/2022
		Version: 02
		Hoja: ___ de ___

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vías para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

PILOTAJE	PILOTE 7A PR 30+300	MARGEN	IZQUIERDA	FECHA DE ELABORACION	25/01/2025

	OPERACIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES					FECHA DE EJECUCIÓN	FIRMA INTERVENTORÍA
1	**CAMISA**									
2.1	**Suministro e instalación de camisa para pilote de 1,2 m de diámetro (No recuperable) para puente Boche PR 30+300 (Item NP 28)**			ANCHO (m)	ESPESOR	LARGO (m)	m	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	Camisa			-	-	10.00	10.00			
				-	-					
				TOTAL m			10.00			
3	**ACEROS DE REFUERZO**									
3.3	**Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. (Item 640.1)**			CANT	LONG (m)	Kg/m	Peso (Kg)	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	P1			13.00	9.00	6.404	749.27	*Varilla No. 10*		
	P2			13.00	12.00	6.400	998.40	*Varilla No. 8*		
	P3			13.00	10.55	6.400	877.76	*Varilla No. 8*		
	P4			250.00	4.45	1.552	1726.60	*Varilla No. 5*		
	P5			44	4.35	0.994	190.25	*Varilla No. 4*		
				TOTAL ACERO (Kg)			4542.28			
4	**ESTRUCTURA EN CONCRETO**									
4.1	**Pilote excavado in situ f'c=28 Mpa tipo tremie con Ø =1,2 m para puente El Boche incluye excavación en suelo duro (Item NP 27)**			ANCHO	ESPESOR	LARGO (m)	m	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	Pilote 7A (DE PROTECCION ESTRIBO 1)			-	-	26.50	26.50			
				TOTAL CONCRETO			26.50			

REVISADO POR CONTRATISTA		APROBADO POR INTERVENTORIA
RESIDENTE DE OBRA		RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRES	MIGUEL ANGEL BARRA CAMACHO	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA		

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA	Cód: F-EO-009
		Versión: 001
	CONTRATO 0978 DE 2021	Fecha: 02/01/2020
		Pág: 1 de 1

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	31	**MM**	1	**AA**	2,025	**PERIODO:**	1 de enero de 2025		31 de enero de 2025			
CONTRATO:	0978 de 2021						**OBJETO CONTRATO:**	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4					
CONTRATANTE:	INVIAS				**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA		**ACUMULADO ANTERIOR:**		**PRESENTE ACTA:**		**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS NACIONALES								109.00		19.00		128.00
ITEM:	NP28	GRUPO DE AJUSTE	14102	ESPECIF. GENERAL		ESPECIF. PARTICULAR	NP28	Suministro e instalación de camisa para pilote de 1,2 m de diámetro (No recuperable) para puente Boche PR 30+300	**UNID:**		m	**UBICACIÓN:**	**RUTA 6404**

ESQUEMA

LOCALIZACIÓN				DIAMETRO	LONGITUD	SECCIÓN	PESO TOTAL	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
PILOTE 3A	PR30+300	PR30+300	SOCHA	1.20	10.00	-	-	CAMISA PARA PILOTE (ACTA 43)	- 10.00
PILOTE 8A	PR30+300	PR30+300	SOCHA	1.20	10.00	-	-	CAMISA PARA PILOTE	10.00
PILOTE 2A	PR30+300	PR30+300	SOCHA	1.20	9.00			CAMISA PARA PILOTE	9.00
PILOTE 7A	PR30+300	PR30+300	SOCHA	1.20	10.00	-	-	CAMISA PARA PILOTE	10.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Subtotal				**19.00**
					TOTAL				**19.00**

RESIDENTE DE OBRA

FIRMA:

NOMBRE: MIGUEL ANGEL PARRA
CONSORCIO VIAS NACIONALES

RESIDENTE DEINTERVENTORIA

FIRMA:

NOMBRE: DIEGO FERNANDO RUANO FONSECA
CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL Y ACEPTACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	Codigo: INV978-F-EO-014 Fecha: 17/11/2022 Version: 02 Hoja: ___ de ___

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vías para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

PILOTAJE	PILOTE 8A PR 30+300	MARGEN	IZQUIERDA	FECHA DE ELABORACION	12/12/2024

	OPERACIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES					FECHA DE EJECUCIÓN	FIRMA INTERVENTORÍA
1	CAMISA									
2.1	Suministro e instalación de camisa para pilote de 1,2 m de diámetro (No recuperable) para puente Boche PR 30+300 (Item NP 28)			ANCHO (m)	ESPESOR	LARGO (m)	m	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	Camisa			-	-	10.00	10.00			
				-	-					
				TOTAL m			10.00			
3	ACEROS DE REFUERZO									
3.3	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. (Item 640.1)			CANT	LONG (m)	Kg/m	Peso (Kg)	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	P1			13.00	9.00	6.40	749.27	*Varilla No. 10*		
	P2			13.00	12.00	6.40	998.40	*Varilla No. 8*		
	P3			13.00	10.55	6.40	877.76	*Varilla No. 8*		
	P4			272.00	4.45	1.55	1879.02	*Varilla No. 5*		
	P5			44	4.35	0.99	190.31	*Varilla No. 4*		
				TOTAL ACERO (Kg)			4694.76			
4	ESTRUCTURA EN CONCRETO									
4.1	Pilote excavado in situ f'c=28 Mpa tipo tremie con Ø =1,2 m para puente El Boche incluye excavación en suelo duro (Item NP 27)			ANCHO	ESPESOR	LARGO (m)	m	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	Pilote 8A (DE PROTECCION ESTRIBO 1)			-	-	26.50	26.50			
				TOTAL CONCRETO			26.50			

REVISADO POR CONTRATISTA	APROBADO POR INTERVENTORIA
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRES: MIGUEL ANGEL PARRA CAMACHO	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA:	

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL Y ACEPTACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	Codigo: INV978-F-EO-014 Fecha: 17/11/2022 Version: 02 Hoja: ___ de ___

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belén-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

PILOTAJE	PILOTE 2A PR 30+300	MARGEN	IZQUIERDA	FECHA DE ELABORACION	25/01/2025

	OPERACIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES					FECHA DE EJECUCIÓN	FIRMA INTERVENTORÍA
1	**CAMISA**									
2.1	**Suministro e instalación de camisa para pilote de 1,2 m de diámetro (No recuperable) para puente Boche PR 30+300 (Item NP 28)**			ANCHO (m)	ESPESOR	LARGO (m)	m	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	Camisa			-	-	9.00	9.00			
				-	-					
					TOTAL m		9.00			
3	**ACEROS DE REFUERZO**									
3.3	**Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. (Item 640.1)**			CANT	LONG (m)	Kg/m	Peso (Kg)	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	P1			13.00	9.00	6.404	749.27	*Varilla No. 10*		
	P2			13.00	12.00	6.400	998.40	*Varilla No. 8*		
	P3			13.00	10.55	6.400	877.76	*Varilla No. 8*		
	P4			250.00	4.45	1.552	1726.60	*Varilla No. 5*		
	P5			44	4.35	0.994	190.25	*Varilla No. 4*		
					TOTAL ACERO (Kg)		4542.28			
4	**ESTRUCTURA EN CONCRETO**									
4.1	**Pilote excavado in situ f'c=28 Mpa tipo tremie con Ø =1,2 m para puente El Boche Incluye excavación en suelo duro (Item NP 27)**			ANCHO	ESPESOR	LARGO (m)	m	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	Pilote 2A (DE PROTECCION ESTRIBO 1)			-	-	26.50	26.50			
					TOTAL CONCRETO		26.50			

REVISADO POR CONTRATISTA	APROBADO POR INTERVENTORIA
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRES: MIGUEL ANGEL PARRA CAMACHO	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA:	

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL Y ACEPTACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	Codigo: INV978-F-EO-014
		Fecha: 17/11/2022
		Version: 02
		Hoja: ___ de ___

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vías para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

PILOTAJE	PILOTE 7A PR 30+300	MARGEN	IZQUIERDA	FECHA DE ELABORACION	25/01/2025

	OPERACIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES					FECHA DE EJECUCIÓN	FIRMA INTERVENTORÍA
1	**CAMISA**									
2.1	**Suministro e instalación de camisa para pilote de 1,2 m de diámetro (No recuperable) para puente Boche PR 30+300 (Item NP 28)**			ANCHO (m)	ESPESOR	LARGO (m)	m	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	Camisa			-	-	10.00	10.00			
				-	-					
				TOTAL m			10.00			
3	**ACEROS DE REFUERZO**									
3.3	**Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. (Item 640.1)**			CANT	LONG (m)	Kg/m	Peso (Kg)	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	P1			13.00	9.00	6.404	749.27	*Varilla No. 10*		
	P2			13.00	12.00	6.400	998.40	*Varilla No. 8*		
	P3			13.00	10.55	6.400	877.76	*Varilla No. 8*		
	P4			250.00	4.45	1.552	1726.60	*Varilla No. 5*		
	P5			44	4.35	0.994	190.25	*Varilla No. 4*		
				TOTAL ACERO (Kg)			4542.28			
4	**ESTRUCTURA EN CONCRETO**									
4.1	**Pilote excavado in situ f'c=28 Mpa tipo tremie con Ø =1,2 m para puente El Boche incluye excavación en suelo duro (Item NP 27)**			ANCHO	ESPESOR	LARGO (m)	m	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	Pilote 7A (DE PROTECCION ESTRIBO 1)			-	-	26.50	26.50			
				TOTAL CONCRETO			26.50			

REVISADO POR CONTRATISTA		APROBADO POR INTERVENTORIA
RESIDENTE DE OBRA		RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRES	MIGUEL ANGEL BARRA CAMACHO	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA		

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA	Cód: F-EO-009
		Versión: 001
	CONTRATO 0978 DE 2021	Fecha: 02/01/2020
		Pág: 1 de 1

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	31	**MM**	1	**AA**	2,025	**PERIODO:**	1 de enero de 2025		31 de enero de 2025					
CONTRATO:	0978 DE 2021						**OBJETO CONTRATO:**	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4							
CONTRATANTE:	INVIAS				**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA				**ACUMULADO ANTERIOR:**		**PRESENTE ACTA:**		**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES										3,314.00		1,568.50		4,882.50
ITEM:	NP29	GRUPO DE AJUSTE	11604	ESPECIF. GENERAL		ESPECIF. PARTICULAR	NP29	Corte de pavimento para cuneta			**UNID:**	m		**UBICACIÓN:**	**RUTA 6404**

ESQUEMA	LOCALIZACIÓN				COSTADO	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
	-	PR57+940	PR58+297	SOCOTA	DER	357.00	-	-	CORTE DE PAVIMENTO (ACTA 43)	- 357.00
	-	PR58+495	PR58+563	SOCOTA	DER	68.00	-	-	CORTE DE PAVIMENTO (ACTA 43)	- 68.00
	-	PR58+650	PR58+868	SOCOTA	DER	218.00	-	-	CORTE DE PAVIMENTO (ACTA 43)	- 218.00
	-	PR59+456	PR59+720	SOCOTA	DER	264.00	-	-	CORTE DE PAVIMENTO (ACTA 43)	- 264.00
	-	PR61+085	PR61+230	SOCOTA	DER	145.00	-	-	CORTE DE PAVIMENTO (ACTA 43)	- 145.00
	-	PR61+500	PR61+601	SOCOTA	DER	101.00	-	-	CORTE DE PAVIMENTO (ACTA 43)	- 101.00
	-	PR61+746	PR61+896	SOCOTA	DER	150.00	-	-	CORTE DE PAVIMENTO (ACTA 43)	- 150.00
	-	PR57+950	PR58+593	SOCOTA	IZQ	643.00	-	-	CORTE DE PAVIMENTO (ACTA 43)	- 643.00
	-	PR58+654	PR59+010	SOCOTA	IZQ	356.00	-	-	CORTE DE PAVIMENTO (ACTA 43)	- 356.00
	-	PR59+370	PR59+510	SOCOTA	IZQ	140.00	-	-	CORTE DE PAVIMENTO (ACTA 43)	- 140.00
	-	PR59+531	PR59+748	SOCOTA	IZQ	217.00	-	-	CORTE DE PAVIMENTO (ACTA 43)	- 217.00
	-	PR61+085	PR61+220	SOCOTA	IZQ	135.00	-	-	CORTE DE PAVIMENTO (ACTA 43)	- 135.00
	-	PR61+500	PR62+020	SOCOTA	IZQ	520.00	-	-	CORTE DE PAVIMENTO (ACTA 43)	- 520.00
	-	PR57+940	PR58+610	SOCOTA	IZQ	635.54	-	-	CORTE DE PAVIMENTO	635.54
	-	PR58+670	PR59+030	SOCOTA	IZQ	360.80	-	-	CORTE DE PAVIMENTO	360.80
	-	PR59+340	PR59+510	SOCOTA	IZQ	135.70	-	-	CORTE DE PAVIMENTO	135.70
	-	PR59+510	PR59+740	SOCOTA	IZQ	214.70	-	-	CORTE DE PAVIMENTO	214.70
	-	PR59+450	PR59+740	SOCOTA	DER	254.30	-	-	CORTE DE PAVIMENTO	254.30
	-	PR60+090	PR60+330	SOCOTA	IZQ	161.10	-	-	CORTE DE PAVIMENTO	161.10
	-	PR60+090	PR60+330	SOCOTA	DER	187.00	-	-	CORTE DE PAVIMENTO	187.00
	-	PR58+650	PR58+870	SOCOTA	DER	223.06	-	-	CORTE DE PAVIMENTO	223.06
	-	PR58+490	PR58+600	SOCOTA	DER	72.95	-	-	CORTE DE PAVIMENTO	72.95
	-	PR61+000	PR61+250	SOCOTA	DER	172.60	-	-	CORTE DE PAVIMENTO	172.60
	-	PR61+000	PR61+250	SOCOTA	IZQ	144.90	-	-	CORTE DE PAVIMENTO	144.90
	-	PR61+460	PR61+610	SOCOTA	DER	113.10	-	-	CORTE DE PAVIMENTO	113.10
	-	PR61+780	PR61+900	SOCOTA	DER	98.20	-	-	CORTE DE PAVIMENTO	98.20
	-	PR61+460	PR62+020	SOCOTA	IZQ	522.70	-	-	CORTE DE PAVIMENTO	522.70
	-	PR57+960	PR58+360	SOCOTA	DER	385.13	-	-	CORTE DE PAVIMENTO	385.13
	-	PR49+910	PR50+010	SOCOTA	IZQ	101.61	-	-	CORTE DE PAVIMENTO	101.61
	-	PR49+665	PR50+015	SOCOTA	DER	344.24	-	-	CORTE DE PAVIMENTO	344.24
	-	PR49+215	PR49+325	SOCOTA	IZQ	104.54	-	-	CORTE DE PAVIMENTO	104.54
	-	PR49+201	PR49+325	SOCOTA	DER	109.30	-	-	CORTE DE PAVIMENTO	109.30
	-	PR47+510	PR47+602	SOCOTA	IZQ	91.50	-	-	CORTE DE PAVIMENTO	91.50
	-	PR47+510	PR47+765	SOCOTA	DER	255.32	-	-	CORTE DE PAVIMENTO	255.32
	-	PR47+770	PR47+880	SOCOTA	IZQ	119.30	-	-	CORTE DE PAVIMENTO	119.30
	-	PR47+805	PR47+880	SOCOTA	DER	74.90	-	-	CORTE DE PAVIMENTO	74.90
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									Subtotal	1,568.49
									TOTAL	1,568.50

RESIDENTE DE OBRA

FIRMA:

NOMBRE: MIGUEL ANGEL PARRA
CONSORCIO VIAS NACIONALES

RESIDENTE DEINTERVENTORIA

FIRMA:

NOMBRE: DIEGO FERNANDO RUANO FONSECA
CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL Y ACEPTACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	Codigo: INV978-F-EO-014 Fecha: 17/11/2022 Version: 02 Hoja: ___ de ___

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

ODT	(57+000- 62+000) - (47+000-51+000)	MARGEN	IZQUIERDA	FECHA DE ELABORACION	17/12/2024

	OPERACIÓN	IZQ	DER	OBSERVACIONES			FECHA DE EJECUCIÓN	FIRMA INTERVENTORÍA
1	CORTE CORTE DE PAVIMENTO PARA CONSTRUCCION DE CUNETAS							
1.1	CORTE DE PAVIMENTO (Item NP29)			LONGITUD (M)	TOTAL	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	CORTE PR 57+940 A PR 58+610	X		635.54	635.54			
	CORTE PR 58+670 A PR 59+030	X		360.80	360.80			
	CORTE PR 59+340 A PR 59+510	X		135.70	135.70			
	CORTE PR 59+510 A PR 59+740	X		214.70	214.70			
	CORTE PR 59+450 A PR 59+740		X	254.30	254.30			
	CORTE PR 60+090 A PR 60+330	X		161.10	161.10			
	CORTE PR 60+090 A PR 60+330		X	187.00	187.00			
	CORTE PR 58+650 A PR 58+870		X	223.06	223.06			
	CORTE PR 58+490 A PR 58+600		X	72.95	72.95			
	CORTE PR 61+000 A PR 61+250		X	172.60	172.60			
	CORTE PR 61+000 A PR 61+250	X		144.90	144.90			
	CORTE PR 61+460 A PR 61+610		X	113.10	113.10			
	CORTE PR 61+780 A PR 61+900		X	98.20	98.20			
	CORTE PR 61+460 A PR 62+020	X		522.70	522.70			
	CORTE PR 57+960 A PR 58+360		X	385.13	385.13			
	CORTE PR 49+910 A PR 50+010	X		101.61	101.61			
	CORTE PR 49+665 A PR 50+015		X	344.24	344.24			
	CORTE PR 49+215 A PR 49+325	X		104.54	104.54			
	CORTE PR 49+201 A PR 49+325		X	109.30	109.30			
	CORTE PR 47+510 A PR 47+602	X		91.50	91.50			
	CORTE PR 47+510 A PR 47+765		X	255.32	255.32			
	CORTE PR 47+770 A PR 47+880	X		119.30	119.30			
	CORTE PR 47+805 A PR 47+880		X	74.90	74.90			
				TOTAL CORTE (M)	4882.49			

	REVISADO POR CONTRATISTA	APROBADO POR INTERVENTORIA
	RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRES	MIGUEL PARRA	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA		

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA	Cód: F-EO-009
		Versión: 001
	CONTRATO 0978 DE 2021	Fecha: 02/01/2020
		Pág: 1 de 1

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	DIA	31	MM	1	AA	2.025	PERIODO:	1 de enero de 2025	31 de enero de 2025
CONTRATO:	0978 DE 2021						OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4

CONTRATANTE:	INVIAS	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA	ACUMULADO ANTERIOR:	PRESENTE ACTA:	ACUMULADO TOTAL:
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES			482,00	-2,00	480,00

ITEM:	NP35	GRUPO DE AJUSTE	11606	ESPECIF. GENERAL		ESPECIF. PARTICULAR	NP35	Suministro e instalación de Geocontenedor por volteo impregnado de 4,5*2,5*1,3 m. Incluye material de relleno y transporte de material. No incluye conformación de accesos, terraplenes o llenos provisionales.	UNID:	u	UBICACIÓN:	RUTA 6514

ESQUEMA

LOCALIZACIÓN			MARGEN	MUNICIPIO	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
-	PR72+000	PR72+000	IZQUIERDA	HATO COROZAL	4,50	2,50	1,30	30,00	GEOCONTENEDORES	- 30,00
-	PR3+500	PR3+500	DERECHA	PAZ DE ARIPORO	4,50	2,50	1,30	9,00	GEOCONTENEDORES	- 9,00
-	PR72+000	PR72+000	IZQUIERDA	HATO COROZAL	4,50	2,50	1,30	28,00	GEOCONTENEDORES	28,00
-	PR72+000	PR72+000	IZQUIERDA	HATO COROZAL	4,50	2,50	1,30	9,00	GEOCONTENEDORES	9,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
										-
Subtotal										-2,00
TOTAL										-2,00

RESIDENTE DE OBRA

FIRMA: OHPOLO

NOMBRE: OSCAR HUMBERTO POLO
CONSORCIO VIAS NACIONALES

INTERVENTORIA

FIRMA:

NOMBRE: WILLIAM MARIO MORENO
CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA

Consorcio Vías Nacionales	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOCONTENEDORES	

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

1	DATOS DE ELABORCIÓN DE REGISTRO

FECHA DE ELABORACIÓN:	30/12/2024		
RUTA 65-14	GEOCONTENEDORES NP-35	PR-72	SÁCAMA

ABSCISA	ELEMENTO	UNIDADES
PR 72+000	GEOCONTENEDOR IMPREGNADO	28.00
UNIDADES		28.00

REVISADO POR CONTRATISTA			APROBADO POR INTERVENTORÍA	
	TOPOGRAFÍA	INGENIERO RESIDENTE	VoBo	INGENIERO RESIDENTE
NOMBRES:	NESTOR DIAZ	OSCAR POLO	HEDI MORALES	WILLIAM DARIO MORENO RICAURTE
FIRMA:	Nestor A Diaz	OPolo		

OBSERVACION:

Consorcio Vías Nacionales	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOCONTENEDORES	

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

1	DATOS DE ELABORCIÓN DE REGISTRO

FECHA DE ELABORACIÓN:	25/01/2025		
RUTA 65-14	GEOCONTENEDORES NP-35	PR-72	SÁCAMA

ABSCISA	ELEMENTO	UNIDADES
PR 72+000	GEOCONTENEDOR IMPREGNADO	9.00
UNIDADES		9.00

REVISADO POR CONTRATISTA			APROBADO POR INTERVENTORÍA	
	TOPOGRAFÍA	INGENIERO RESIDENTE	VoBo	INGENIERO RESIDENTE
NOMBRES:	NESTOR DIAZ	OSCAR POLO	HEDI MORALES	WILLIAM DARIO MORENO RICAURTE
FIRMA:	Nestor A Diaz	OHPOLO		

OBSERVACION:

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA	Cód: F-EO-009
		Versión: 001
	CONTRATO 0978 DE 2021	Fecha: 02/01/2020
		Pág: 1 de 1

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	31	**MM**	1	**AA**	2,025	**PERIODO:**	1 de enero de 2025		31 de enero de 2025			
CONTRATO:	0978 DE 2021						**OBJETO CONTRATO:**	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4					
CONTRATANTE:	INVIAS				**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA			**ACUMULADO ANTERIOR:**		**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES									13,354.00		2,590.00	15,944.00
ITEM:	NP36	GRUPO DE AJUSTE	11606	ESPECIF. GENERAL		ESPECIF. PARTICULAR	NP36	Conformación de Jarillón con material de sitio para atención de emergencia. No incluye suministro de material granular		**UNID:**	m3	**UBICACIÓN:**	**RUTA 6405 Y 6514**

ESQUEMA

	LOCALIZACIÓN			LONGITUD	AREA	DESCRIPCIÓN	VOLUMEN
-	PR12+800	PR12+800	SACAMA	170.00	7.85	EXCAVACIÓN PUENTE AGUA BLANCA	1,335.10
-	PR26+500	PR26+500	SACAMA	150.00	8.37	CONFORMACIÓN PUENTE LA CASIRVA	1,255.20
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
							-
						Subtotal	**2,590.00**
						TOTAL	**2,590.00**

RESIDENTE DE OBRA

FIRMA: OHPOLO

NOMBRE: OSCAR HUMBERTO POLO
CONSORCIO VIAS NACIONALES

INTERVENTORIA

FIRMA:

NOMBRE: WILLIAM DARIO MORENO
CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA

Consorcio Vías Nacionales

CONTROL Y REGISTRO DE CONFORMACION DE JARILLON PARA ATENCION DE EMERGENCIAS

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vías para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

1	DATOS DE ELABORCIÓN DE REGISTRO

FECHA DE ELABORACIÓN:	25/01/2025		
RUTA 64-05	CONFORMACION JARILLON	PR 00+010 al PR 00+180	PR 12+800 - PUENTE AGUA BLANCA

Abscisa	Área de LLENO	Área Promedio	Volumen de lleno	Vol. lleno acumul.
PR 00+000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PR 00+010.00	6.96	3.48	34.80	34.80
PR 00+020.00	7.20	7.08	70.80	105.60
PR 00+030.00	7.73	7.47	74.65	180.25
PR 00+040.00	9.23	8.48	84.80	265.05
PR 00+050.00	8.02	8.63	86.25	351.30
PR 00+060.00	6.08	7.05	70.50	421.80
PR 00+070.00	6.19	6.14	61.35	483.15
PR 00+080.00	3.01	4.60	46.00	529.15
PR 00+090.00	0.00	1.51	15.05	544.20
PR 00+100.00	9.35	4.68	46.75	590.95
PR 00+110.00	12.28	10.82	108.15	699.10
PR 00+120.00	16.46	14.37	143.70	842.80
PR 00+130.00	11.71	14.09	140.85	983.65
PR 00+140.00	6.80	9.26	92.55	1076.20
PR 00+150.00	11.21	9.01	90.05	1166.25
PR 00+160.00	6.03	8.62	86.20	1252.45
PR 00+170.00	5.25	5.64	56.40	1308.85
PR 00+180.00	0.00	2.63	26.25	1335.10
		VOLUMEN TOTAL CONFORMACION JARILLON		1335.10

REVISADO POR CONTRATISTA			APROBADO POR INTERVENTORÍA	
TOPOGRAFÍA		INGENIERO RESIDENTE	VoBo	INGENIERO RESIDENTE
NOMBRES:	NESTOR DIAZ	OSCAR POLO	HEDI MORALES	WILLIAM DARIO MORENO RICAURTE
FIRMA:	Nestor A Diaz	OPolo		

OBSERVACION: ACTIVIDAD REALIZADA PARA ATENCION DE EMERGENCIA

Consorcio Vías Nacionales

CONTROL Y REGISTRO DE CONFORMACION DE JARILLON PARA ATENCION DE EMERGENCIAS

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vías para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

1 DATOS DE ELABORCIÓN DE REGISTRO

FECHA DE ELABORACIÓN:	25/01/2025		
RUTA 64-05	CONFORMACION JARILLON	PR 00+000 al PR 00+150	PR 26+500 - PUENTE LA CASIRVA

Abscisa	Área de LLENO	Área Promedio	Volumen de lleno	Vol. lleno acumul.
PR 00+000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PR 00+010.00	5.16	2.58	25.80	25.80
PR 00+020.00	11.91	8.54	85.35	111.15
PR 00+030.00	8.48	10.20	101.95	213.10
PR 00+040.00	14.30	11.39	113.90	327.00
PR 00+050.00	7.02	10.66	106.60	433.60
PR 00+060.00	10.02	8.52	85.20	518.80
PR 00+070.00	9.24	9.63	96.30	615.10
PR 00+080.00	9.69	9.47	94.65	709.75
PR 00+090.00	10.03	9.86	98.60	808.35
PR 00+100.00	9.10	9.57	95.65	904.00
PR 00+110.00	7.94	8.52	85.20	989.20
PR 00+120.00	6.46	7.20	72.00	1061.20
PR 00+130.00	11.01	8.74	87.35	1148.55
PR 00+140.00	5.16	8.09	80.85	1229.40
PR 00+150.00	0.00	2.58	25.80	1255.20
		VOLUMEN TOTAL CONFORMACION JARILLON		1255.20

REVISADO POR CONTRATISTA			APROBADO POR INTERVENTORÍA	
TOPOGRAFÍA		INGENIERO RESIDENTE	VoBo	INGENIERO RESIDENTE
NOMBRES:	NESTOR DIAZ	OSCAR POLO	HEDI MORALES	WILLIAM DARIO MORENO RICAURTE
FIRMA:	Nestor A Diaz	OPolo		

OBSERVACION ACTIVIDAD REALIZADA PARA ATENCION DE EMERGENCIA

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA	Cód: F-EO-009
		Versión: 001
	CONTRATO 0978 DE 2021	Fecha: 02/01/2020
		Pág: 1 de 1

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	31	**MM**	1	**AA**	2,025	**PERIODO:**	1 de enero de 2025	31 de enero de 2025	
CONTRATO:	0978 DE 2021						**OBJETO CONTRATO:**	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4		
CONTRATANTE:	INVIAS				**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA	**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES							267.00	60.00	327.00

ITEM:	NP 39.P	GRUPO DE AJUSTE	14101	ESPECIF. GENERAL		ESPECIF. PARTICULAR	NP 39.P	Pilote pre excavado in situ tipo caisson Ø =1,3 m, f'c=28 Mpa. No incluye acero de refuerzo	**UNID:**	m	**UBICACIÓN:**	**RUTA 6405**

ESQUEMA

LOCALIZACIÓN				**UNIDAD**	**LONGITUD**	**DIAMETRO**	**DESCRIPCIÓN**	**MEDIDA TOTAL**
CAISSON 1	PR16+200	PR16+200	SACAMA	1.00	12.00	1.30	PILOTE TIPO CAISSON	12.00
CAISSON 2	PR16+200	PR16+200	SACAMA	1.00	12.00	1.30	PILOTE TIPO CAISSON	12.00
CAISSON 3	PR16+200	PR16+200	SACAMA	1.00	12.00	1.30	PILOTE TIPO CAISSON	12.00
CAISSON 4	PR16+200	PR16+200	SACAMA	1.00	12.00	1.30	PILOTE TIPO CAISSON	12.00
CAISSON 10	PR16+200	PR16+200	SACAMA	1.00	12.00	1.30	PILOTE TIPO CAISSON	12.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
								-
				Subtotal				**60.00**
				TOTAL				**60.00**

RESIDENTE DE OBRA

FIRMA:

NOMBRE: OSCAR HUMBERTO POLO
CONSORCIO VIAS NACIONALES

INTERVENTORIA

FIRMA:

NOMBRE: WILLIAM DARIO MORENO
CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA

Obra: CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

Consecutivo: 4

Actividad: MURO CIMENTACION PROFUNDA - CAISSON

Ubicación: MURO PR 16

Parte c: Cantidades ejecutadas

UBICACIÓN: **PILOTE 1**

Ver plano No 02 DE 11 Ver esquema adjunto Caisson Tipo 2 y 3 FECHA DE FUNDIDA

CANTIDADES EJECUTADAS										
ITEM A COBRAR ACERO DE REFUERZO	**TIPO/UBICACIÓN**	**No / DIAMETRO**	**PESO**	**LONGITUD**	**No PIEZAS POR ESTRUCTURA**	**CANTIDAD DE ESTRUCTURAS**	**TOTAL PIEZAS**	**TOTAL KG**	**ELEMENTO**	**OBSERVACIONES**
401 C	ANILLOS NUCLEO CAISSON	4 = 1/2"	0.994	4.47	34	1	34.0	151.1		
501 C	ANILLOS NUCLEO CAISSON	5 = 5/8"	1.56	4.97	102	1	102.0	790.8		
801 C	BARRA CUERPO CAISSON	8 = 1"	3.973	9	28	1	28.0	1001.2		
802 C	BARRA CUERPO CAISSON	8 = 1"	3.973	5.45	22	1	22.00	476.36		
		TOTAL KG						**2419.45**		
CONCRETO 28 Mpa		**UNID**	**CANT**	**ANILLOS**	**PROFUNDIDAD**	**TOTAL (M)**				
PILOTE 1		**M**	**1**	**0**	**12**	**12**				

Nombre NESTOR DIAZ **Cargo** TOPOGRAFIA

Nombre OSCAR POLO **Cargo** RESIDENTE DE OBRA

Nombre HADI MORALES VoBo

Nombre WILLIAM DARIO MORENO RICAURTE **Cargo** INGENIERO RESIDENTE

Obra: CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

Consecutivo: 5

Actividad: MURO CIMENTACION PROFUNDA - CAISSON

Ubicación: MURO PR 16

Parte c: Cantidades ejecutadas

UBICACIÓN: **PILOTE 2**

Ver plano No 02 DE 11

Ver esquema adjunto Caisson Tipo 2 y 3

CANTIDADES EJECUTADAS										
ITEM A COBRAR ACERO DE REFUERZO	**TIPO/UBICACIÓN**	**No / DIAMETRO**	**PESO**	**LONGITUD**	**No PIEZAS POR ESTRUCTURA**	**CANTIDAD DE ESTRUCTURAS**	**TOTAL PIEZAS**	**TOTAL KG**	**ELEMENTO**	**OBSERVACIONES**
401 C	ANILLOS NUCLEO CAISSON	4 = 1/2"	0.994	4.47	34	1	34.0	151.1		
501 C	ANILLOS NUCLEO CAISSON	5 = 5/8"	1.56	4.97	102	1	102.0	790.8		
801 C	BARRA CUERPO CAISSON	8 = 1"	3.973	9	28	1	28.0	1001.2		
802 C	BARRA CUERPO CAISSON	8 = 1"	3.973	5.45	22	1	22.00	476.36		
		TOTAL KG						**2419.45**		
CONCRETO 28 Mpa		**UNID**	**CANT**	**ANILLOS**	**PROFUNDIDAD**	**TOTAL (M)**				
PILOTE 2		**M**	**1**	**0**	**12**	**12**				

Nombre NESTOR DIAZ
Cargo TOPOGRAFIA

Nombre OSCAR POLO
Cargo RESIDENTE DE OBRA

Nombre HADI MORALES
VoBo

Nombre WILLIAM DARIO MORENO RICAURTE
Cargo INGENIERO RESIDENTE

Obra: CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

Consecutivo: 6

Actividad: MURO CIMENTACION PROFUNDA - CAISSON

Ubicación: MURO PR 16

Parte c: Cantidades ejecutadas

UBICACIÓN: **PILOTE 3**

Ver plano No 02 DE 11

Ver esquema adjunto Caisson Tipo 2 y 3

CANTIDADES EJECUTADAS										
ITEM A COBRAR ACERO DE REFUERZO	**TIPO/UBICACIÓN**	**No / DIAMETRO**	**PESO**	**LONGITUD**	**No PIEZAS POR ESTRUCTURA**	**CANTIDAD DE ESTRUCTURAS**	**TOTAL PIEZAS**	**TOTAL KG**	**ELEMENTO**	**OBSERVACIONES**
401 C	ANILLOS NUCLEO CAISSON	4 = 1/2"	0.994	4.47	34	1	34.0	151.1		
501 C	ANILLOS NUCLEO CAISSON	5 = 5/8"	1.56	4.97	102	1	102.0	790.8		
801 C	BARRA CUERPO CAISSON	8 = 1"	3.973	9	28	1	28.0	1001.2		
802 C	BARRA CUERPO CAISSON	8 = 1"	3.973	5.45	22	1	22.00	476.36		
		TOTAL KG						**2419.45**		
CONCRETO 28 Mpa		**UNID**	**CANT**	**ANILLOS**	**PROFUNDIDAD**	**TOTAL (M)**				
PILOTE 3		**M**	**1**	**0**	**12**	**12**				

Nombre	NESTOR DIAZ	**Nombre**	OSCAR POLO	**Nombre**	HADI MORALES	**Nombre**	WILLIAM DARIO MORENO RICAURTE
Cargo	TOPOGRAFIA	**Cargo**	RESIDENTE DE OBRA		VoBo	**Cargo**	INGENIERO RESIDENTE

Obra: CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

Consecutivo: 7

Actividad: MURO CIMENTACION PROFUNDA - CAISSON

Ubicación: MURO PR 16

Parte c: Cantidades ejecutadas

UBICACIÓN: **PILOTE 4**

Ver plano No 02 DE 11 Ver esquema adjunto Caisson Tipo 2 y 3

CANTIDADES EJECUTADAS										
ITEM A COBRAR ACERO DE REFUERZO	**TIPO/UBICACIÓN**	**No / DIAMETRO**	**PESO**	**LONGITUD**	**No PIEZAS POR ESTRUCTURA**	**CANTIDAD DE ESTRUCTURAS**	**TOTAL PIEZAS**	**TOTAL KG**	**ELEMENTO**	**OBSERVACIONES**
401 C	ANILLOS NUCLEO CAISSON	4 = 1/2"	0.994	4.47	34	1	34.0	151.1		
501 C	ANILLOS NUCLEO CAISSON	5 = 5/8"	1.56	4.97	102	1	102.0	790.8		
801 C	BARRA CUERPO CAISSON	8 = 1"	3.973	9	28	1	28.0	1001.2		
802 C	BARRA CUERPO CAISSON	8 = 1"	3.973	5.45	22	1	22.00	476.36		
		TOTAL KG						**2419.45**		
		UNID	**CANT**	**ANILLOS**	**PROFUNDIDAD**	**TOTAL (M)**				
CONCRETO 28 Mpa										
4		**M**	**1**	**0**	**12**	**12**				

Nombre	NESTOR DIAZ	**Nombre**	OSCAR POLO	**Nombre**	HADI MORALES	**Nombre**	WILLIAM DARIO MORENO RICAURTE
Cargo	TOPOGRAFIA	**Cargo**	RESIDENTE DE OBRA		VoBo	**Cargo**	INGENIERO RESIDENTE

Obra: CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

Consecutivo: 8

Actividad: MURO CIMENTACION PROFUNDA - CAISSON

Ubicación: MURO PR 16

Parte c: Cantidades ejecutadas

UBICACIÓN: **PILOTE 10**

Ver plano No 02 DE 11 Ver esquema adjunto Caisson Tipo 2 y 3

CANTIDADES EJECUTADAS										
ITEM A COBRAR ACERO DE REFUERZO	**TIPO/UBICACIÓN**	**No / DIAMETRO**	**PESO**	**LONGITUD**	**No PIEZAS POR ESTRUCTURA**	**CANTIDAD DE ESTRUCTURAS**	**TOTAL PIEZAS**	**TOTAL KG**	**ELEMENTO**	**OBSERVACIONES**
401 C	ANILLOS NUCLEO CAISSON	4 = 1/2"	0.994	4.47	34	1	34.0	151.1		
501 C	ANILLOS NUCLEO CAISSON	5 = 5/8"	1.56	4.97	102	1	102.0	790.8		
801 C	BARRA CUERPO CAISSON	8 = 1"	3.973	9	28	1	28.0	1001.2		
802 C	BARRA CUERPO CAISSON	8 = 1"	3.973	5.45	22	1	22.00	476.36		
		TOTAL KG						**2419.45**		
CONCRETO 28 Mpa		**UNID**	**CANT**	**ANILLOS**	**PROFUNDIDAD**	**TOTAL (M)**				
PILOTE 10		**M**	**1**	**0**	**12**	**12**				

Nombre	NESTOR DIAZ	**Nombre**	OSCAR POLO	**Nombre**	HADI MORALES	**Nombre**	WILLIAM DARIO MORENO RICAURTE
Cargo	TOPOGRAFIA	**Cargo**	RESIDENTE DE OBRA		VoBo	**Cargo**	INGENIERO RESIDENTE

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA	Cód: F-EO-009
		Versión: 001
	CONTRATO 0978 DE 2021	Fecha: 02/01/2020
		Pág: 1 de 1

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	31	**MM**	1	**AA**	2,025	**PERIODO:**	1 de enero de 2025	31 de enero de 2025
CONTRATO:	0978 DE 2021						**OBJETO CONTRATO:**	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4	
CONTRATANTE:	INVIAS				**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA	**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES							96.80	26.80	123.60
ITEM:	NP 41.P	GRUPO DE AJUSTE	11606	ESPECIF. GENERAL		ESPECIF. PARTICULAR	NP 41.P	Suministro e instalación de bolsacreto de 1,20*2,4*0,35 m. (concreto bombeable) - Sector El Boche	**UNID:** m3	**UBICACIÓN:** RUTA 6404

ESQUEMA

LOCALIZACIÓN			MARGEN	MUNICIPIO	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
-	PR30+300	PR30+300	DERECHA	SOCHA	2.40	1.20	0.30	112.00	BOLSACRETOS (ACTA 43)	- 96.77
-	PR30+300	PR30+300	DERECHA	SOCHA	2.40	1.20	0.30	100.00	BOLSACRETOS	86.40
-	PR30+300	PR30+300	DERECHA	SOCHA	2.40	1.20	0.30	43.00	BOLSACRETOS	37.15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
										-
									Subtotal	**26.80**
									TOTAL	**26.80**

RESIDENTE DE OBRA

FIRMA:

NOMBRE: MIGUEL ANGEL PARRA
CONSORCIO VIAS NACIONALES

INTERVENTORIA

FIRMA:

NOMBRE: DIEGO FERNANDO RUANO FONSECA
CONSORCIO NTERVENTORIAS COLOMBIA

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL Y ACEPTACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	Codigo: INV978-F-EO-014 Fecha: 17/11/2022 Version: 02 Hoja: ___ de ___

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

UBICACIÓN	K30+ CAUCE QUEBRADA EL BOCHE OBRAS DE MITIGACION	RUTA	6404	FECHA DE ELABORACION	27/12/2024

	OPERACIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES						FECHA DE EJECUCIÓN	FIRMA INTERVENTORÍA
1	PRELIMINARES										
1.1	**Geotextil Tipo II no tejido (Item 673.1)**			CANT	LONG (m)	ALTO	AREA (M2)	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES			
				TOTAL M2			0.00				
2	ACEROS DE REFUERZO										
2.1	**Acero de refuerzo fy= 420 Mpa (Item 640.1)**			CANT	LONG (m)	Kg/m	Peso (Kg)	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES			
	ANCLAJES 1ER NIVEL MD			40	0.5	0.994	19.88				
	ANCLAJES NIVEL NIVELES SUPERIORES MD			200	0.3	0.994	59.64				
				TOTAL ACERO			79.52				
2	ESTRUCTURA EN CONCRETO	MD	MI								
2.1	**Suministro e instalación de bolsacreto de 1,20*2,4*0,35 m. (concreto bombeable) - Sector El Boche (Item NP41.P)**			CANT	ANCHO (m)	ESPESOR (M)	LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	BOLSACRETO	X		100.00	1.20	0.300	2.40	86.40	0.864		
				TOTAL VOLUMEN BOLSACRETOS				86.40			

	REVISADO POR CONTRATISTA	APROBADO POR INTERVENTORIA
	RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRES	MIGUEL ANGEL PARRA C.	
FIRMA		

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL Y ACEPTACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	Codigo: INV978-F-EO-014
		Fecha: 17/11/2022
		Version: 02
		Hoja: ___ de ___

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vías para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

UBICACIÓN	K30+ CAUCE QUEBRADA EL BOCHE OBRAS DE MITIGACION	RUTA	6404	FECHA DE ELABORACION	25/01/2025

	OPERACIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES						FECHA DE EJECUCIÓN	FIRMA INTERVENTORÍA
1	**PRELIMINARES**										
1.1	**Geotextil Tipo II no tejido (Item 673.1)**			CANT	LONG (m)	ALTO	AREA (M2)	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES			
	GEOTEXTIL NT2500 MD				48.00	9.60	460.80				
	GEOTEXTIL NT2500 MI				34.00	9.60	326.40				
	GEOTEXTIL NT2500 SEPARACION PISO				29.00	9.90	287.10				
				TOTAL M2			787.20				
2	**ACEROS DE REFUERZO**										
2.1	**Acero de refuerzo fy= 420 Mpa (Item 640.1)**			CANT	LONG (m)	Kg/m	Peso (Kg)	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES			
	ANCLAJES 1ER NIVEL MD			0	0.5	0.994	0.00				
	ANCLAJES NIVEL NIVELES SUPERIORES MD			86	0.3	0.994	25.65				
				TOTAL ACERO			25.65				
2	**ESTRUCTURA EN CONCRETO**	MD	MI								
2.1	**Suministro e instalación de bolsacreto de 1,20*2,4*0,35 m. (concreto bombeable) - Sector El Boche (Item NP41.P)**			CANT	ANCHO (m)	ESPESOR (M)	LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	BOLSACRETO	X		43.00	1.20	0.300	2.40	37.15	*0.864*		
				TOTAL VOLUMEN BOLSACRETOS				37.15			

REVISADO POR CONTRATISTA		APROBADO POR INTERVENTORIA
	RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRES	MIGUEL ANGEL PARRA C.	
FIRMA		

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA	Cód: F-EO-009
		Versión: 001
	CONTRATO 0978 DE 2021	Fecha: 02/01/2020
		Pág: 1 de 1

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	31	**MM**	1	**AA**	2,025	**PERIODO:**	1 de enero de 2025		31 de enero de 2025			
CONTRATO:	0978 DE 2021						**OBJETO CONTRATO:**	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4					
CONTRATANTE:	INVIAS				**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA			**ACUMULADO ANTERIOR:**		**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES									322.90		218.10	541.00
ITEM:	NP 43.P	GRUPO DE AJUSTE	11604	ESPECIF. GENERAL		ESPECIF. PARTICULAR	NP 43.P	Cuneta en concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo ni acero de refuerzo (concreto f´c 21 Mpa)		**UNID:**	m3	**UBICACIÓN:**	RUTA 6404 Y 6405

ESQUEMA

	LOCALIZACIÓN			LARGO	AREA	MARGEN	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
-	PR60+100	PR60+300	SOCOTA	200.00	0.20	DER	CUNETA (ACTA 43)	- 40.00
-	PR60+460	PR60+700	SOCOTA	240.00	0.20	IZQ	CUNETA (ACTA 43)	- 48.00
-	PR49+932	PR50+059	SOCOTA	40.28	0.25	DER	CUNETA	10.07
-	PR49+930	PR49+750	SOCOTA	38.84	0.25	IZQ	CUNETA	9.71
-	PR49+930	PR50+050	SOCOTA	50.00	0.25	IZQ	CUNETA	12.50
-	PR50+050	PR49+750	SOCOTA	22.20	0.25	DER	CUNETA	5.55
-	PR49+910	PR50+010	SOCOTA	12.12	0.25	IZQ	CUNETA	3.03
-	PR49+995	PR49+995	SOCOTA	16.83	0.20	IZQ	ACCESO CUNETA	3.37
-	PR49+910	PR49+910	SOCOTA	2.00	0.24	IZQ	CUNETA	0.48
-	PR60+200	PR60+200	SOCOTA	18.30	0.20	IZQ	CUNETA	3.66
-	PR60+278	PR60+086	SOCOTA	142.98	0.25	IZQ	CUNETA	35.75
-	PR60+200	PR60+080	SOCOTA	88.38	0.25	DER	CUNETA	22.10
-	PR60+278	PR60+200	SOCOTA	84.12	0.25	DER	CUNETA	21.03
-	PR60+307	PR60+307	SOCOTA	9.44	0.20	DER	CUNETA	1.89
-	PR60+976	PR60+999	SOCOTA	23.14	0.25	IZQ	CUNETA	5.79
-	PR61+008	PR61+075	SOCOTA	66.41	0.25	IZQ	CUNETA	16.60
-	PR59+293	PR59+325	SOCOTA	32.10	0.25	IZQ	CUNETA	8.03
-	PR22+818	PR23+934	SACAMA	366.60	0.25	DER	CUNETA	92.51
-	PR22+553	PR23+008	SACAMA	218.12	0.25	DER	CUNETA	54.09
					Subtotal			218.10
					TOTAL			218.10

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA	INTERVENTORIA	INTERVENTORIA
FIRMA:	FIRMA: OHPOLO	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: MIGUEL ANGEL PARRA CONSORCIO VIAS NACIONALES	NOMBRE: OSCAR HUMBERTO POLO CONSORCIO VÍAS NACIONALES	NOMBRE: DIEGO FERNANDO RUANO FONSECA CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA	NOMBRE: WILLIAM DARIO MORENO CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL Y ACEPTACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	Codigo: INV978-F-EO-014 Fecha: 17/11/2022 Version: 02 Hoja: ___ de ___

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

UBICACIÓN	PR 49 A PR 50 MD	RUTA	6404	FECHA DE ELABORACION	17/12/2024

	OPERACIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES					FECHA DE EJECUCIÓN	FIRMA INTERVENTORÍA
1	PRELIMINARES									
1.1	RELLENO			ANCHO	LARGO	ALTO	m3 de excavación	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	RELLENO EN RECEBO									
4	ACEROS DE REFUERZO									
4.1	DIMENSIONES GEOMETRICAS ACERO REFUERZO			CANT	LONG (m)	Kg/m	Peso (Kg)	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
				TOTAL ACERO						
2	ESTRUCTURA EN CONCRETO	MD	MI							
2.1	Cuneta en concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo ni acero de refuerzo (concreto f'c 21 Mpa) (Item NP 43.P)			AREA LATERAL Y/O AREA SUPERFICIAL (m2)	ESPESOR (M)	LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	CUNETA DEL PR 49+932 AL PR 50+059	X		0.25		40.28	10.07			
	CUNETA DEL PR 49+930 AL PR 49+750		X	0.25		38.84	9.71			
	CUNETA DEL PR 49+930 AL PR 50+050		X	0.25		50.00	12.50			
	CUNETA DEL PR 50+050 AL PR 49+750	X		0.25		22.20	5.55			
	CUNETA DEL PR 49+910 AL PR 50+010		X	0.25		12.12	3.03			
	CUNETA DEL PR 49+995 ACCESO		X	16.83	0.20		3.37			
	CUNETA DEL PR 49+910 IRREGULAR		X	0.24		2.00	0.48			
				TOTAL CONCRETO			44.71			
3	ESQUEMAS									

DETALLE CUNETA TRIANGULAR

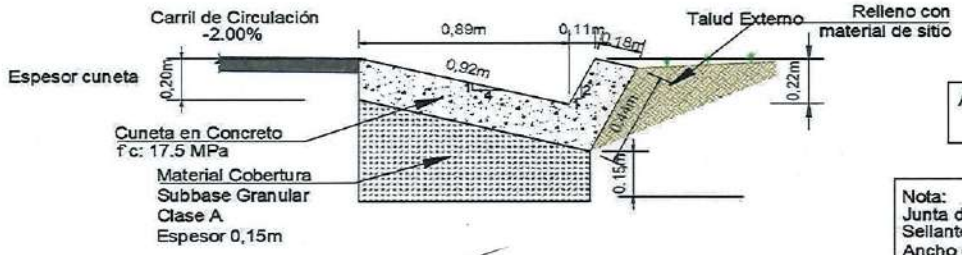

Área Concreto metro:
0.248 m2

Nota:
Junta de dilatación
Sellante de juntas Tipo 60-70 ART. 671-13
Ancho de 1.00m y junta transversal cada 1.30m

	REVISADO POR CONTRATISTA	APROBADO POR INTERVENTORIA
	RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRES	MIGUEL PARRA	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA		

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL Y ACEPTACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	Codigo: INV978-F-EO-014
		Fecha: 17/11/2022
		Version: 02
		Hoja: ___ de ___

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"				
UBICACIÓN	PR 59 A PR60 MI	RUTA	6404	FECHA DE ELABORACION	25/12/2024

	OPERACIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES					FECHA DE EJECUCIÓN	FIRMA INTERVENTORÍA
1	PRELIMINARES									
1.1	RELLENO			ANCHO	LARGO	ALTO	m3 de excavación	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	RELLENO EN RECEBO									
2	ACEROS DE REFUERZO									
2.1	Acero de refuerzo fy= 420 Mpa (Item 640.1)			CANT	LONG (m)	Kg/m	Peso (Kg)	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
				TOTAL ACERO						
3	ESTRUCTURA EN CONCRETO	MD	MI							
3.1	Cuneta en concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo ni acero de refuerzo (concreto f´c 21 Mpa) (Item NP 43.P)			AREA LATERAL Y/O AREA SUPERFICIAL(m2)	ESPESOR (M)	LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	CUNETA DEL PR 60+200 EMPALME		X	18.30	0.20		3.66			
	CUNETA DEL PR 60+278 A PR 60+086		X	0.25		142.98	35.75			
	CUNETA DEL PR 60+200 A 60+080	X		0.25		88.38	22.10			
	CUNETA DEL PR 60+278A 60+200	X		0.25		84.12	21.03			
	CUNETA DEL PR 60+307	X		9.44	0.20		1.89			
				TOTAL CONCRETO			84.42			
3	ESQUEMAS									

0

DETALLE CUNETA TRIANGULAR

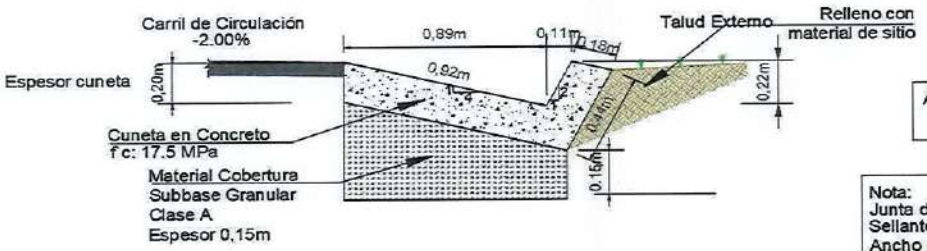

Área Concreto metro:
0.248 m2

Nota:
Junta de dilatación
Sellante de juntas Tipo 60-70 ART. 671-13
Ancho de 1.00m y junta transversal cada 1.30m

	REVISADO POR CONTRATISTA	APROBADO POR INTERVENTORIA
	RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRES	MIGUEL PARRA	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA		

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL Y ACEPTACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	Codigo: INV978-F-EO-014
		Fecha: 17/11/2022
		Version: 02
		Hoja: ___ de ___

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

UBICACIÓN	PR 59 A PR61 MI	RUTA	6404	FECHA DE ELABORACION	25/01/2025

	OPERACIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES					FECHA DE EJECUCIÓN	FIRMA INTERVENTORÍA
1	**PRELIMINARES**									
1.1	RELLENO			ANCHO	LARGO	ALTO	m3 de excavación	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	RELLENO EN RECEBO									
2	**ACEROS DE REFUERZO**									
2.1	**Acero de refuerzo fy= 420 Mpa (Item 640.1)**			CANT	LONG (m)	Kg/m	Peso (Kg)	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
				TOTAL ACERO						
3	**ESTRUCTURA EN CONCRETO**	MD	MI							
3.1	**Cuneta en concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo ni acero de refuerzo (concreto f'c 21 Mpa) (Item NP 43.P)**			AREA LATERAL Y/O AREA SUPERFICIAL(m2)	ESPESOR (M)	LARGO (m)	m3 de concreto	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES		
	CUNETA DEL PR 60+975.9 A PR60+999		X	0.25	0.20	23.14	5.79			
	CUNETA DEL PR 61+008.1 A PR61+074.5		X	0.25	0.20	66.41	16.60			
	CUNETA DEL PR 59+292.9 A PR59+325		X	0.25	0.20	32.10	8.03			
				TOTAL CONCRETO			30.41			
3	**ESQUEMAS**									

0

DETALLE CUNETA TRIANGULAR

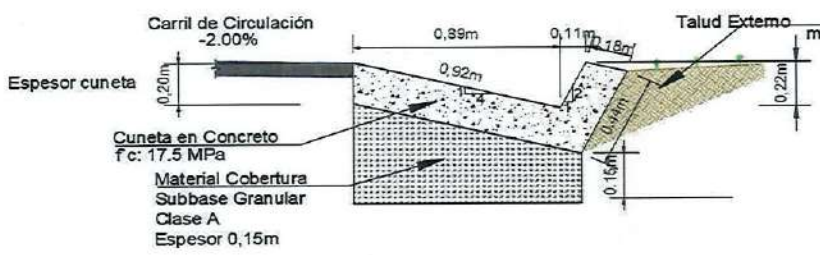

Área Concreto metro:
0.248 m2

Nota:
Junta de dilatación
Sellante de juntas Tipo 60-70 ART. 671-13
Ancho de 1.00m y junta transversal cada 1.30m

	REVISADO POR CONTRATISTA	APROBADO POR INTERVENTORIA
	RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRES	MIGUEL PARRA	DIEGO RUANO FONSECA
FIRMA		

Consorcio Vías Nacionales

CONTROL Y REGISTRO DE CUNETAS

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

1	DATOS DE ELABORCIÓN DE REGISTRO

FECHA DE ELABORACIÓN:	30/12/2024		
RUTA 64-05	CONCRETO CUNETAS	PR 22+817,9 al PR 23+933,7	MARGEN : DERECHO

Abscisa	Longitud CUNETA	Áncho Promedio	Volumen de lleno	Vol. lleno acumul.
PR 22+817.90				0.00
PR 22+905.30	87.40	1.24	21.74	21.74
PR 23+404.40				
PR 23+408.00	3.60	0.71	0.51	22.25
PR 23+408.00				
PR 23+411.20	3.20	1.70	1.09	23.34
PR 23+411.20				
PR 23+432.00	20.80	1.24	5.17	28.51
PR 23+554.88				
PR 23+623.28	68.40	1.24	17.01	45.52
PR 23+623.28				
PR 23+630.68	7.40	2.92	4.31	49.83
PR 23+757.90				
PR 23+761.50	3.60	1.45	1.04	50.88
PR 23+761.50				
PR 23+765.20	3.70	3.33	2.46	53.34
PR 23+765.20				
PR 23+914.50	149.30	1.24	37.13	90.47
PR 23+914.50				
PR 23+916.40	1.90	1.15	0.44	90.91
PR 23+916.40				
PR 23+933.70	17.30	1.24	4.30	95.21
		VOLUMEN CONCRETO		95.21

REVISADO POR CONTRATISTA			APROBADO POR INTERVENTORÍA	
TOPOGRAFÍA		INGENIERO RESIDENTE	VoBo	INGENIERO RESIDENTE
NOMBRES:	NESTOR DIAZ	OSCAR POLO	HEDI MORALES	WILLIAM DARIO MORENO RICAURTE
FIRMA:	Nestor A Diaz	OPolo		

OBSERVACION

CONTROL Y REGISTRO DE CUNETAS

Consorcio Vías Nacionales

PROYECTO:	CONTRATO No: 0978-2021: Mejoramiento, mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Ruta de los Libertadores (Belen-Socha-Sácama-la Cabuya-Paz de Ariporo) en los Departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación, mediante el programa de obra pública "Vias para la legalidad y la reactivación Visión 2030" módulo 4"

1	DATOS DE ELABORCIÓN DE REGISTRO

FECHA DE ELABORACIÓN:	25/01/2025		
RUTA 64-05	CONCRETO CUNETAS	PR 22+552,8 al PR 23+007,9	MARGEN : DERECHO

Abscisa Inicial	Abscisa Final	Longitud CUNETA	Áncho Promedio	AREA CUNETA	Volumen de CUNETA	Vol. CUNETA acumul.
PR 22+552.80	PR 22+617.90	65.10	1.24	0.25	16.19	16.19
PR 22+617.90	PR 22+620.10	2.20	1.61	0.32	0.71	16.90
PR 22+620.10	PR 22+621.92	1.82	0.38	0.08	0.14	17.03
PR 22+621.92	PR 22+683.02	61.10	1.24	0.25	15.20	32.23
PR 22+920.00	PR 23+007.90	87.90	1.24	0.25	21.86	54.09
			VOLUMEN CONCRETO CUNETAS			54.09

REVISADO POR CONTRATISTA			APROBADO POR INTERVENTORÍA	
	TOPOGRAFÍA	INGENIERO RESIDENTE	VoBo	INGENIERO RESIDENTE
NOMBRES:	NESTOR DIAZ	OSCAR POLO	HEDI MORALES	WILLIAM DARIO MORENO
FIRMA:	Nestor A Diaz	OHPOLO		

OBSERVACION CONCRETO DE 21 MPA
