Interior

Al contestar cite Radicado 2025-3-003122-022969 Id: 590524
Folios: 1 Fecha: 11-08-2025 16:36:23
Anexos: 1 Documentos electrónicos,
Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL

MEMORANDO

Bogotá, D.C.

PARA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL

DE: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

ASUNTO: REMISIÓN DE INFORME DE SUPERVISIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR JUNIO.

REF.: CONVENIO NO. 1909 DE 2022 MUNICIPIO DE EL CANTÓN DE SAN PABLO – CHOCÓ

Cordial saludo,

De manera respetuosa me permito remitir para su conocimiento y archivo en expediente, el informe del asunto bajo las siguientes características:

CONVENIO	CONVENIDO	MES INFORMADO	NÚMERO DE FOLIOS
1909 DE 2022	MUNICIPIO DE EL CANTÓN DE SAN PABLO	JULIO/2025	134

Atentamente,

Manuel Antonio Linares Donato
Profesional Especializado
Supervisor Convenio

Elaboró: Lina Rodríguez Contratista/Profesional de apoyo a la Supervisión SPSCC

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No. **1909-2022** MUNICIPIO DE **CANTÓN DE SAN PABLO-CHOCO**
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE **JULIO DE 2025**

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	*"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE CANTÓN DE SAN PABLO – DEPARTAMENTO DE CHOCO"*		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	BARRIO LAS BRISAS - POBLACIÓN DE MANAGRU		
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE EL CANTÓN DE SAN PABLO, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$ 3.931.858.630,00
	ADICIÓN MIN – FONSECON		$ 1.103.560.995,48
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		$ 693.857.405,00
	ADICIÓN ENTIDADES PUBLICAS		$ 205.304.425,00
	TOTAL APORTES DEL CONVENIO		$ 5.934.581.455,48
FECHA SUSCRIPCIÓN	07/08/2022		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONVENIO/ CONTRATO	24/03/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONVENIO/ CONTRATO	30/08/2025		
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	Manuel Antonio Linares	DESDE: 26/08/2024	
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	Manuel A. Linares D.	21/12/2022	28/01/2024
	Julian Felipe Valencia Marín	29/01/2024	17/07/2024
	Edgar Ricardo González Patiño	18/07/2024	29/07/2024
	Angela Jaramillo Gómez	30/07/2024	12/08/2024
	Sergio Sanjuan Santiago	13/08/2024	25/08/2024
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	Oscar Javier Cuadros	21/12/2022	31/12/2022
	Gonzalo Flórez Peña	27/01/2023	14/02/2024
	Julian Camilo Hernández C.	15/02/2024	24/09/2024
	Julian Camilo Hernández C.	09/10/2024	31/12/2024
	Julian Camilo Hernández C.	26/02/2025	05/03/2025
	Lina María Rodríguez Raguá	06/03/2025	Actual
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MININTERIOR	21324	16/01/2024	31/12/2024
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	13424	16/01/2024	31/12/2024
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	N/A	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No. 128	23/03/2022	31/12/2022
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 3002240	16/12/2022	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	16/12/2022		
	PRIMERA MODIFICACIÓN		FECHA: 29/02/2024

FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRÓRROGA	FECHA: 04/07/2024 (HASTA EL 31/12/2024)
	PRIMERA ADICIÓN	FECHA: 04/07/2024
	SEGUNDA PRÓRROGA	FECHA: 27/12/2024 (HASTA EL 30/08/2025)
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA SUSPENSIÓN	FECHA: 29/02/2024
	PRIMERA REANUDACIÓN	FECHA: 17/06/2024
		FECHA: DD/MM/AAAA
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	PRIMERA REANUDACIÓN: 09/01/2025	
	PRIMERA PRÓRROGA Y ADICIÓN: 01/07/2025	
	FECHA: DD/MM/AAAA	
VALOR DE ESTUDIOS, DISEÑOS, OBRA	$ 4.160.457.625,00	
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS, DISEÑOS, OBRA	$ 465.033.732,00	
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	**N/A**	
VALOR ADICIONAL DE OBRA	$ 1.165.289.991,34	
VALOR ADICIONAL DE INTERVENTORÍA	$ 143.675.429,14	

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	A. Suscripción del acta de inicio. B. designación del supervisor del convenio por parte del municipio C. Aprobación del cronograma de ejecución del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO. D. Aprobación del componente de estudios y diseños por parte del interventor del contrato y del supervisor del municipio.	NO APLICA	15/06/2023	$ 1.965.929.315
SEGUNDO DESEMBOLSO – PRIMERA ADICIÓN	A. Certificación del supervisor designado por el Departamento y/o Municipio que acredite el inicio de las actividades de obra, B. Ampliación de cobertura y vigencia de la garantía única constituida para avalar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del convenio de conformidad con la presente adición y prorroga y aprobación por parte del área de Gestión Contractual del Ministerio del Interior de la misma. C. Cronograma actualizado del convenio. D. Entrega de otrosí modificatorio de los contratos estudios diseños y obra e interventoría si aplica y sus correspondientes registros presupuestales	NO APLICA	20/03/2025	$ 1.103.560.995,48
TERCER DESEMBOLSO	A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 70% de ejecución del proyecto de acuerdo al cronograma y los productos determinados en los estudios y diseños. B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de avance del proyecto avalada por el interventor.	70%	DD/MM/AAAA	$ 1.572.743.452,00
ÚLTIMO DESEMBOLSO	A. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el cumplimiento del 100% de ejecución del proyecto de acuerdo al cronograma y los productos determinados en los estudios y diseños, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de ejecución del proyecto avalada por el interventor. B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP C. Entrega al Ministerio del Interior de "acta de recibo y entrega	100%	DD/MM/AAAA	$ 393.185.863,00

	de bienes proyectos FONSECON" (Anexo 26), debidamente diligenciado.			
TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$ 3.069.490.310,35
TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 2.553.137.670,35

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: **LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS**

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
3002240	Cumplimiento	$ 593.458.146,00	19/07/2024	01/07/2025

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

➢ ***Contrato de Ejecución de Estudios, Diseños, Obra.***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato 001-LP-OP	*AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE CANTÓN DE SAN PABLO – DEPARTAMENTO DE CHOCO.*		$ 4.160.457.625,00
Link de consulta	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-1-227674&g-recaptcha-response=03AFcWeA7L-mW4VbyJW13GcqpK6iMH1mF8PLmecLMmeriXcuYSZB8l22nM7SboWDOGM47tJWz9VJpgH6wulatGYv38oAIlwm5ErkIsPUQz7dYbCQFduNr7p_69Jwjv8ku7BdZCACFPIlSj9t4J1jeaYTezeUDaCt8QU6wASFQvh49NtKaJYaF3h37c8usqwF-xFZxPqITNHqSKi2HDyvq1m0tVywPhIcfCyF0fV3xDxwfEwz9SCp59ddmvNwwnelXHe2S5PoEHzFXJ9LAVsSMbqK9HooZ1J0qEAoi26KxymqWckJTw01zhk0uQLf1ti7Gtb1MyBRXojz8BqkGiAEZtkqpZ_B609bsNYIQYNCBtAsl2SXHSJi3Wcw06mOq9v53jt8Q110mPab4BjwH86fToCmb6A7uJwi9PhwMLOI534kxWMYP5Pj27vG4MwtyoPdP1A_swiTMTMt-YGwtPQQjkreKiP7-2LBLmjrzdWWU0vMFzqhf8DRhYdPWqEsl8Mmy94MZF2X5NjFEtlqeRoqzp9Oh750liFUL1hTeKGfekXmVUEyGy-7WzL4LqulkkP-6iB0DHOmGGwAjHICIlUi8K7oJn4HrskhW1rZoXALEqzHPjD2u_zETW0v4GwSG-e1CjQp89C1yADB9TqISSByHaNxVTtL33SGFjBcKupNQ-elX512LN_qBxbxfrWqQBE5uiuof1E_FK2ECOWqSjQJpY0sn93DvvdQovv4jxDayoTq-rEc9aJ57l0NV-hOUh9yUfdJ-qEQ4tV6EYivtQlM7fRNhC2R-wHtAMHSyA5YKD1mGXDlzjQ3LOiZX5V-ZsylxRA5BMcRvn_YpMV7LhGcLccoNRaANeaChthsxfqNJNqEYTb1WWESYNec	
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	15/07/2024		$ 1.165.289.991,34
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	YEISON ALBORNOZ RIVAS		
Fecha de Acta de inicio del contrato	08/03/2023		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRIMERA SUSPENSIÓN	07/11/2023	
	PRIMERA REANUDACIÓN	04/12/2023	
	PRIMERA MODIFICACIÓN	06/12/2023	
	SEGUNDA SUSPENSIÓN	22/12/2023	
	SEGUNDA REANUDACIÓN	08/07/2024	
	PRIMERA PRÓRROGA	15/07/2024	
	SEGUNDA PRÓRROGA	11/12/2024	
	TERCERA PRÓRROGA	31/12/2025	
Fecha de terminación del contrato	30/07/2025 (No se cuenta con información actualizada a la fecha de informe)		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 5.325.747.616,34
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO**		
PÓLIZA No.	17-40-101027222		
FECHA DE LA PÓLIZA	30/11/2025		

➢ ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios, Diseños, Obra.***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato 001-I-CM	*INTERVENTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE LA POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE EL CANTÓN DE SAN PABLO DEPARTAMENTO CHOCO".*		$ 465.033.732,00
Link de consulta	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-15-13478620&g-recaptcha-response=03AFcWeA67N9C5Lk-8rF1o0e6ZXBSutBt8_CrLIKlZwRrjPjh-Qzxx4C68TixOuKU5ybz5xU8NMQTJCWIA8kKNkzQ4XtS5OgNwfnP0Eto_1JAMXMqH2jE1NGHVo0V2hMhst0Uj1QS61BR1G0aHI2oDhxv9RnHVJ9qWtc_kND_d6eTH_eM9rjN78wBLn4NWp6JiLWm-P8rXE5h5ZNWOSTBOZcPdhDQpbuSp_F7pzWheXTk19ZuQRR64jCLo0z_N8Wr_UzpQlLhqTNT_86OvjwbhJD701K1XGDzfPV54xID3eH-mFZ9oyZ30kaP2zW5Gt7qSHdqthm3GZOYEcqzlUu0kmL4ighMPaKVWhq14fzqMZqTfQHvZdNXEQDHfTwqMNDBfFXwlWw5UzhmZzAivP3Tw8nlpNQnWumSD7zNtwiDMzEL64sce1n9KHOI4UQFJSG_sj6E2qHbOWFkWj_ziZ04QYqOSssn6PPeYbsSUHEdnL5lqyg8zKWV6kWwH7T-Cqlr1uZRhNHB6ak14LjnuducLqVYHoq8aGrNdBOfByhoXSELbhRE2sxU7RFQ1cRUL2pufraGcOs8qynh9zTbwO4FUpvXM7B63cKaBzW9v-nyiESJlcudMi6L--mU1XrxiCwALPAmOleLoX73musD55KYGYUBEemKD-eyE_Tl3Aa3mGRYhWJRidnYTDAyTZ76wmXi8XxOXl3QLEFn7TC1oYsC9eYsw9AYNCMCqwSeDB-9OtBf74A98V7qlKCXBkOwFoie5y2GKukExcG72GVd2tl5sC5dddK2AZJk8yCcqYj5squ3eF38E1ZZUJjLv90Lvr25Ky13PPlBefg9hqmBbLzLhXN4YvYcicAlgyt14u3fk0R5ghRR1m4s	
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	15/07/2024		$ 143.675.429,14
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	YORK STIVENSON PEREA AYALA		
Fecha de Acta de inicio del contrato	08/03/2023		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRIMERA SUSPENSIÓN	07/11/2023	
	PRIMERA REANUDACIÓN	04/12/2023	
	PRIMERA MODIFICACIÓN	06/12/2023	
	SEGUNDA SUSPENSIÓN	22/12/2023	
	SEGUNDA REANUDACIÓN	08/07/2024	
	PRIMERA PRÓRROGA	15/07/2024	
	SEGUNDA PRÓRROGA	11/12/2024	
	TERCERA PRÓRROGA	31/12/2025	
Fecha de terminación del contrato	30/07/2025 (No se cuenta con información actualizada a la fecha de informe)		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 608.833.839,14
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO**		
PÓLIZA No.	17-44-101208799		
FECHA DE LA PÓLIZA	30/11/2025		

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: MAYO 2025	SI	NO
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	No. 51 del 21 al 23 de junio de 2025.	
INFORME FINANCIERO	Mayo de 2025	
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	$ 317.141.508,62 con corte al 30 de junio de 2025	
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	Con un avance del 62,25% del proyecto. Avance en placa de piso, armado de acero, instalaciones hidrosanitarias y muro de cerramiento.	
OTROS		

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**100%**

% EJECUTADO DE OBRA	62,25%

PERIODO: Julio de 2025
PORCENTAJE EJECUCIÓN: 62,25%
VIGENCIA: 30/08/2025

COMPONENTE TÉCNICO

Según el informe mensual de supervisión de la entidad territorial, enviado por medio de correo electrónico el día 11 de julio de 2025, con corte al 30 de junio de 2025, se reporta un porcentaje de avance del 62,25%, de un programado del 100%. Se continuó con la implementación del plan de contingencia, teniendo en cuenta que en los informes semanales de interventoría se reporta una disminución del avance y los rendimientos por culpa del fuerte invierno en la zona, a continuación, encontrará la consolidación de los informes semanales de interventoría remitidos por el Municipio de El Cantón de San Pablo:

- De acuerdo con el informe semanal de interventoría No. 51 correspondiente al período del 23 al 29 de junio de 2025, se contó con un porcentaje de avance del 62,25% y programado del 98,02%, sigue sin verse reflejado un avance según las exigencias del plan de contingencia, se realizaron actividades como: la pega de bloques, figuración de acero de refuerzo, fundida de columnetas y piso, elaboración de los bloques de concreto, demolición, excavación, formaleteada y fundida de muro ciclópeo y viga de cimentación del muro de cerramiento perimetra, pega de bloques para el cerramiento, Suministros e instalaciones hidrosanitarios (puntos sanitarios de 2" y 4", instalación de red sanitaria de 4", red de aguas lluvias). La interventoría reporta “debido al fuerte invierno reinante en la región ha sido imposible mejorar el rendimiento”.

A la fecha, de acuerdo con el cronograma de obra se evidencia un atraso del 35,77% y, frente al cronograma del convenio un atraso del 39%, se deben adelantar por parte del Municipio de El Cantón de San Pablo todas las acciones necesarias que permitan dar cumplimiento al cronograma de obra y del convenio.

Por parte del Municipio de El Cantón de San Pablo, el cual manifestó por medio de correo electrónico enviado el 21 de julio de 2025, no ha sido posible la entrega de los informes No. 52 y 53 debido a una calamidad familiar del residente de interventoría.

COMPONENTE ADMINISTRATIVO:

- El 01 de julio de 2025, se envía oficio por parte del Ministerio del Interior al Municipio de El Cantón de San Pablo bajo Radicado 2025-2-003122-025057 Id: 566888, cuyo asunto es: “Alerta de presunto incumplimiento del convenio 1909 de 2022, Municipio El Cantón de San Pablo – Chocó, alerta vencimiento plazo de ejecución”.

- El 02 de julio de 2025, se realiza reunión virtual convocada por el Ministerio del Interior al Municipio de El Cantón de San Pablo, con el fin de realizar un apoyo técnico y jurídico a la formulación de la solicitud de prórroga No. 03 del convenio.

- El 09 de julio de 2025, se realiza reunión virtual convocada por el Ministerio del Interior al Municipio de El Cantón de San Pablo, con el fin de realizar seguimiento técnico a la ejecución del convenio, ya que a esta supervisión le preocupa el poco avance reportado en los informes semanales, así mismo continuar apoyando en la formulación y rápida entrega de la solicitud de prórroga No. 03.

- El 07 de julio de 2025, se envía oficio por parte del Ministerio del Interior al Municipio de El Cantón de San Pablo bajo Radicado 2025-2-003122-025900 Id: 570167, cuyo asunto es: “Alerta de presunto incumplimiento del convenio 1909 de 2022, Municipio El Cantón de San Pablo – Chocó, alerta vencimiento plazo de ejecución”.

- El 11 de julio de 2025, teniendo en cuenta la notificación por parte del anterior apoyo a la supervisión por parte del ministerio, el municipio remite la siguiente información por medio de correo electrónico:
  1. INFORME DE SUPERVISIÓN JUNIO
  2. INFORME FINANCIERO JUNIO
  3. INFORME INTERVENTORÍA JUNIO
  4. INFORME OBRA JUNIO
  5. INFORME AMBIENTAL JUNIO
  6. INFORME SOCIAL JUNIO
  7. INFORME SST JUNIO
  8. INFORMES SEMANALES 47, 48, 49 Y 50.

- El 14 de julio de 2025, se recibe correo electrónico por parte del Municipio de El Cantón de San Pablo al Ministerio del Interior, donde remite la solicitud de prórroga No. 03 la cual es revisada y devuelta con observaciones.

- El 21 de julio de 2025, se remite por medio de correo electrónico por parte de esta supervisión al Municipio, la solicitud de: "Cumplimiento a las obligaciones contractuales del convenio 1909 de 2022." Con el fin de recibir informes actualizados del proyecto.

- El 21 de julio se recibe correo electrónico por parte del Municipio de El Cantón de San Pablo al Ministerio del interior, donde remiten los informes No. 50 y 51 y se informa de la no remisión de los informes 52 y 53.

- El 25 de julio de 2025, posterior a la revisión de las observaciones, se recibe correo electrónico por parte del Municipio de El Cantón de San Pablo al Ministerio del Interior, con la solicitud de prórroga y sus respectivos anexos, la cual se revisa desde la parte técnica y jurídica y se realizan observaciones.

- El 29 de julio de 2025, posterior a la revisión de las observaciones, se recibe correo electrónico por parte del Municipio de El Cantón de San Pablo al Ministerio del Interior, con la solicitud de prórroga y sus respectivos anexos, la cual se revisa y se trabaja el anexo 17 para su posterior revisión.

COMPONENTE FINANCIERO.

- Por parte del Municipio de El Cantón de San Pablo, se remitió el informe financiero con corte al 30 de junio de 2025, el cual refleja un saldo disponible de $ 317.141.508,62.
- De igual manera se presenta el estado financiero del convenio y los contratos derivados con corte al mes de junio de 2025:

ESTADO FINANCIERO
CONVENIO No. 1909 DE 2022 - MUNICIPIO DE EL CANTÓN DE SAN PABLO - CHOCÓ
CONVENIO SUSCRITO ENTRE MUNICIPIO DE EL CANTÓN DE SAN PABLO - CHOCÓ Y EL MINISTERIO DEL INTERIOR
No. CUENTA: 979123817 / BANCO DE BOGOTÁ
RECURSOS APORTADOS

VALOR CONVENIO	$ 5.934.581.455,48	APORTES MINISTERIO	$	3.931.858.630,00
		APORTES MUNICIPIO	$	693.857.405,00
		APORTES MINISTERIO	$	1.103.560.995,48
		APORTES MUNICIPIO	$	205.304.425,00

	CONCEPTO	No. ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	APORTANTE	VALOR	TOTAL
DESEMBOLSOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR A LA CUENTA DEL CONVENIO						
Primer desembolso	A. Suscripción del acta de inicio. B. Designación del supervisor del convenio por parte del municipio. C. Aprobación del cronograma de ejecución del convenio porparte del supervisor del Ministerio. D. Reunión de socialización del proyecto con las especificaciones técnicas del proyecto.	179700323	15/06/2023	Ministerio del Interior	$ 1.965.929.315,00	
Segundo desembolso	A. Certificación del supervisor designado por el Departamento y/o Municipio que acredite el inicio de las actividades de obra B. Ampliación de cobertura y vigencia de la garantía única constituida para avalar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del convenio de conformidad con la presente adición y prorroga y aprobación por parte del área de Gestión Contractual del Ministerio del Interior de la misma. C. Cronograma actualizado del convenio. D. Entrega de otrosí modificatorio de los contratos estudios diseños y obra e interventoría si aplica y sus correspondientes registros presupuestales.	74147525	20/03/2025	Ministerio del Interior	$ 1.103.560.995	
TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS					**$ 3.069.490.310,48**	60,96%
DESEMBOLSOS DEL MUNICIPIO A LA CUENTA DEL CONVENIO						
Primer desembolso	ofinanciacion	N/A	15/03/2023	Municipio	$ 505.000.000,00	
Segundo desembolso	ofinanciacion	N/A	16/04/2023	Municipio	$ 188.897.405,00	
Tercer desembolso	ofinanciacion	N/A	17/05/2023	Municipio	$ 2.000.000,00	
Quarto desembolso	ofinanciacion	N/A	31/07/2023	Municipio	$ 103.757,14	
Quinto desembolso	ofinanciacion	N/A	23/12/2024	Municipio	$ 100.200.000,00	
Sexto desembolso	ofinanciacion	N/A	18/06/2025	Municipio	$ 3.820.335,00	
TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS					**$ 800.021.497,14**	88,97%
TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA DEL CONVENIO						**$ 3.869.511.807,62**

PAGOS REALIZADOS POR EL MUNICIPIO A CONTRATOS DERIVADOS

	VALOR CONTRATADO			
	DEL CONTRATISTA	VALOR CONTRATADO	VALOR ADICIÓN	VALOR TOTAL CONTRATADO
	ALBORNOZ RIVAS	$ 4.160.557.625,00	$ 1.165.289.991,34	$ 5.325.847.616,34
	ENSON PEREA AYALA	$ 465.003.732,00	$ 143.800.107,14	$ 608.803.839,14

	CONCEPTO	No. ORDEN DE PAGO	No.COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACIÓN DE RECURSOS	VALOR	TOTAL
PAGOS DEL MUNICIPIO AL CONTRATO DE OBRA							
	ta parcial No.1 (Anticipo)	162	165	23/03/2023	Municipio	$ 500.000.000,00	
	ta parcial No.1 (Anticipo)	327	309	3/05/2023	Municipio	$ 192.857.405,00	
	ta parcial No.1 (Anticipo)	464	466	29/06/2023	Ministerio del Interior	$ 970.325.645,00	
	ta parcial No.1 (Anticipo)	544	544	15/08/2024	Ministerio del Interior	$ 436.884.558,34	
	ta parcial No. 2	644	660	16/09/2024	Ministerio del Interior	$ 375.395.133,00	
Sexto Pago	cial Acta parcial No. 3	1034	1020	23/12/2024	Municipio	$ 100.200.000,00	
Séptimo Pago	al acta parcial No. 3	169	262	2/04/2025	Ministerio del Interior	$ 220.690.747,00	
Octavo Pago	al acta parcia No. 4	261	255	12/05/2025	Ministerio del Interior	$ 382.033.486,00	
Noveno Pago	cta parcial No .05	342	330	10/06/2025	Ministerio del Interior	$ 219.929.909,00	
TOTAL RECURSOS PAGADOS AL CONTRATO DE OBRA						**$ 3.398.316.883,34**	63,81%
PAGOS DEL MUNICIPIO AL CONTRATO DE INTERVENTORIA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA							
	ta parcial No.1 idios y diseños)	579	607	11/08/2023	Ministerio del Interior	$ 116.258.433,01	
Segundo pago	ta Parcial No. 1	516	661	16/09/2024	Ministerio del Interior	$ 51.549.668	
TOTAL RECURSOS PAGADOS AL CONTRATO DE INTERVENTORIA						**$ 167.808.101,01**	27,56%
TOTAL RECURSOS PAGADOS A LOS CONTRATOS DERIVADOS							**$ 3.566.124.984,35**

TOTAL RECURSOS PENDIENTES POR PAGAR A JUNIO 2025	**$ 303.386.823,27**
SALDO EN LA CUENTA A 30 DE JUNIO DE 2025	**$ 317.141.508,62**

NOTA:
- La diferencia entre el total de recursos por pagar y el saldo en cuenta corresponde a las estampillas, rendimientos financieros generados y 4x1000 el cual el Municipio manifiesta devolverlos al final del convenio.
- Ultimo extracto a junio 2025

COMPONENTE JURÍDICO.

- El convenio interadministrativo 1909 de 2022, se encuentra vigente con un plazo de ejecución hasta el treinta (30) de agosto de 2025.

ANEXOS

Anexo encontrará correos electrónicos, oficios, informes y documentos que fueron remitidos y recibidos durante el mes de julio de 2025.

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:

Al cierre del mes de julio de 2025, el Municipio reportó un avance físico acumulado del 62,25%, frente a un programado del 100%, reflejando un atraso del 35,77% respecto al cronograma de obra y del 39% frente al cronograma del convenio. Este atraso continúa siendo consecuencia de las condiciones climáticas adversas que han afectado los rendimientos, según lo reportado en el informe de interventoría No. 51. Durante este período se ejecutaron actividades como la pega de bloques, fundida de estructuras, construcción de muro ciclópeo y la instalación de redes hidrosanitarias, aunque sin lograr el ritmo esperado según el plan de contingencia.

Desde el componente administrativo, el Ministerio del Interior emitió alertas al municipio por posible incumplimiento y vencimiento del plazo contractual, y sostuvo reuniones los días 2 y 9 de julio para apoyar técnicamente la formulación de la solicitud de prórroga No. 03. El municipio remitió los informes técnicos y financieros de junio, así como versiones sucesivas de la solicitud de prórroga, que fueron devueltas con observaciones. También se informó la no entrega de los informes 52 y 53 por motivos personales del residente de interventoría. Ante el atraso sostenido, esta supervisión insiste al Municipio en la necesidad de adoptar acciones urgentes que permitan cumplir con los tiempos establecidos y garantizar la ejecución dentro de la vigencia fiscal.

Todo lo anteriormente mencionado queda plasmado en los anexos del presente informe.

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

08/03/2023	20/11/2024	21/11/2024	18/06/2025	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

MANUEL ANTONIO LINARES DONATO Supervisor Convenio No. 1909 de 2022	**LINA MARÍA RODRÍGUEZ RAGUÁ** Apoyo a la supervisión del Convenio No. 1909-22

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON/SIES
1909 de 2022 No.21_, MUNICIPIO: CANTON DE PABLO- DEPARTAMENTO: CHOCÓ
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES: 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO CONSTRUCCION ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO – DEPARTAMENTO DE CHOCÓ.		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	MANAGRÚ- BARRIO LAS BRISAS		
BENEFICIARIO:	CANTON DE SAN PABLO-CHOCÓ		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$ 5.035.419.625,48
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		899.161.830
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO		$ 5.934.581.455,48
FECHA SUSCRIPCIÓN	07/08/2022		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	31/08/2025		
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	NESTOR MOSQUERA ANDRADES		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	YIVIOLA RAMIREZ MORERNO	16/12/2022	01/01/2024
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	NOMBRE	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	No. 2-2022-030809	19/07/2022	DD/MM/AAAA
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	No.	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No. 128	23/03/2022	30/12/2022
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	**No. 3002240**	09/08/2022 24/09/2024	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	16/12/2022		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	**PRIMERA PRORROGA**		**FECHA: 04/07/2024**
	PRIMERA ADICIÓN		**FECHA: 04/07/2024**
	SEGUNDA PRORROGA		**FECHA: 27/12/2024**
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	**PRIMERA SUSPENSIÓN**		**FECHA: 29/02/2024**
	PRIMERA REANUDACIÓN		**FECHA: 17/06/2024**
	REINICIO		FECHA: DD/MM/AAAA
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	**FECHA: 24/09/2024: suscripción del convenio**		
	FECHA: 24/09/2024: Acta de reanudación No 1		
	FECHA: 01/07/2025: Primera adición y prorroga		
	FECHA: 01/03/2026: Segunda prorroga		
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 216.526.237,00		
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 156.524.576		
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)			
VALOR DE OBRA	$ 3.943.931.388,00		

VALOR ADICIONAL DE OBRA	$ 1.165.289.991,34
VALOR INTERVENTORÍA	$ 465.035.732,00
VALOR ADICIONAL DE INTERVENTORIA	$ 143.800.107,14

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	Previo cumplimiento de los requisitos de ejecución y la entrega de los siguientes productos: A. Suscripción del acta de inicio B. Designación del supervisor del convenio por parte del municipio. C. Aprobación del cronograma de ejecución del convenio por parte del supervisor del ministerio. D. Reunión de socialización del proyecto con las especificaciones técnicas del proyecto.	NO APLICA	15/06/2023	$ 1.965.929.315
SEGUNDO DESEMBOLSO	SEGUNDO DESEMBOLSO - PRIMERA ADICIÓN: Por la suma de MIL CIENTO TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE ($1.103.560.995,48), previo cumplimiento de ejecución y la entrega de los siguientes productos: A. Certificación del supervisor designado por el Departamento y/o Municipio que acredite el inicio de las actividades de obra, B. Ampliación de cobertura y vigencia de la garantía única constituida para avalar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del convenio de conformidad con la presente adición y prorroga y aprobación por parte del área de Gestión Contractual del Ministerio del Interior de la misma. C. Cronograma actualizado del convenio. D. Entrega de otrosí modificatorio de los contratos estudios diseños y obra e interventoría si aplica y sus correspondientes registros presupuestales.	NO APLICA	20/03/2025	$1.103.560.995,48
TERCER DESEMBOLSO	UN TERCER DESEMBOLSO en la vigencia 2024 equivalente a la suma de MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($1.572.743.452,00), contra entrega de los siguientes productos: A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 70% de ejecución del proyecto de acuerdo al cronograma y los productos determinados en los estudios y diseños. B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de avance del proyecto avalada por el interventor.	70 %	DD/MM/AAAA	$1.572.743.452,00
ÚLTIMO DESEMBOLSO	UN ÚLTIMO DESEMBOLSO en la vigencia 2024 equivalente a la suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($393.185.863), contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el cumplimiento del 100% de ejecución del proyecto de acuerdo al cronograma y los productos determinados en los estudios y diseños, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de ejecución del proyecto avalada por el interventor. B. Entrega al Ministerio del Interior de "acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" (Anexo 26), debidamente diligenciado.	100%	DD/MM/AAAA	$ 393.185.863
TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$ 1.965.929.315
TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				**$ 1,950,413,437.35**

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: PREVISORA SEGUROS

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
3002240 (4)	Cumplimiento	$593.458.146,00	02/01/2025	01/3/2026

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de Ejecución de Estudios y Diseños; obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. LP-001-2023	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO- DEPARTAMENTO DE CHOCÓ.		$ 4.160.457.625,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	**15/07/2024**		$ 1.165.289.991,34
Nombre contratista	YEISON ALBORNOZ RIVAS		
Fecha de Acta de inicio del contrato	8/MARZO/2023		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRIMERA SUSPENSIÓN	07/11/2023	
	PRIMER REANUDACIÓN	04/12/2023	
	PRIMERA MODIFICACIÓN	06/12/2023	
	SEGUNDA SUSPENSIÓN	22/12/2023	
	SEGUNDA REANUDACIÓN	08/07/2024	
	PRIMERA PRÓRROGA	15/07/2024	
	PRIMERA ADICIÓN	15/07/2024	
	SEGUNDA PRORROGA	11/12/2024	
	TRCERA PRORROGA	31/12/2024	
Fecha de terminación del contrato	**30/07/2025**		
VALOR TOTAL CONTRATADO:	$ 5.325.747.616,34		
COMPAÑÍA ASEGURADORA			**SEGUROS DEL ESTADO S. A**
PÓLIZA No.	17-44-101208889 - CUMPLIMIENTO		
FECHA DE LA PÓLIZA	15/12/2029		
PÓLIZA No.	17-40-101027222 - RC		
FECHA DE LA PÓLIZA	31/10/2025		

- ***Contrato de ejecución de Interventoría Estudios y Diseños, obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. CM-001-2023	INTERVENTORIA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION ESTACION DE LA POLICIA EN EL MUNICIPIO DE EL CANTON DE SAN PABLO DEPARTAMENTO CHOCO"		$ 465.033.732,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	04/07/2024		$ 143.800.107,14
Nombre contratista	YORK STIVENSON PEREA AYALA		
Fecha de Acta de inicio del contrato	8/MARZO/2023		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRIMERA SUSPENSIÓN	07/11/2023	
	PRIMER REANUDACIÓN	04/12/2023	
	PRIMERA MODIFICACIÓN	06/12/2023	
	SEGUNDA SUSPENSIÓN	22/12/2023	
	SEGUNDA REANUDACIÓN	08/07/2024	
	PRIMERA PRÓRROGA	15/07/2024	
	PRIMERA ADICIÓN	15/07/2024	
	SEGUNDA PRORROGA	11/12/2024	
	TERCERA PRORROGA	31/12/2024	
Fecha de terminación del contrato	**30/07/2024**		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			**$ 5,934,551,455.48**
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO**		
PÓLIZA No.	**17-44-101208799**		
FECHA DE LA PÓLIZA	**31/07/2028**		

5. RESUMEN DE PAGOS REALIZADOS A LA FECHA

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE ORDEN DE PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR	AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO	VALOR DEL PAGO
001-LP-OP	PAGO PARCIAL ANTICIPO	162	165	23/03/2023	$ 0.00	$ 500,000,000.00	$ 500,000,000.00
001-LP-OP	PAGO PARCIAL ANTICIPO	327	309	03/05/2023	$ 0.00	$ 192,857,405.00	$ 192,857,405.00
001-LP-OP	PAGO PARCIAL ANTICIPO	464	466	27/06/2023	$ 970,325,645.00	$ 0.00	$ 970,325,645.00
001-I-CM	PAGO ACTA INTERVENTORIA, ESTUDIOS Y DISEÑO	579	607	11/08/2023	$ 116,258,433.01	$ 0.00	$ 116,258,433.01
001-LP-OP	PAGO ACTA PARCIAL DE OBRA N 1	544	544	15/08/2024	$ 436,884,558.34	$ 0.00	$ 436,884,558.34
001-LP-OP	PAGO ACTA PARCIAL DE OBRA N 2	644	660	12/09/2024	$ 375,395,133.00	$ 0.00	$ 375,395,133.00
001-I-CM	PAGO ACTA DE COSTOS INTERVENTORIA N 1	516	661	12/09/2024	$ 51,549,668.00	$ 0.00	$ 51,549,668.00
001-LP-OP	PAGO ABONO1 ACTA PARCIAL DE OBRA N 3	1034	1020	23/12/2024		$ 100,200,000.00	$ 100,200,000.00
001-LP-OP	PAGO FINAL ACTA PARCIAL DE OBRA N 3	169		02/04/2025	$ 220,690,747.00		$ 220,690,747.00
001-LP-OP	PAGO ACTA PARCIAL DE OBRA N 4	261	255	12/05/2025	$ 382,033,486.00		$ 382,033,486.00
001-LP-OP	PAGO ACTA PARCIAL DE OBRA N 5	342	330	10/06/2025	$ 219,929,909.00		$ 219,929,909.00
VALOR TOTAL PAGADO (2)					**$ 2,553,137,670.35**	**$ 793,057,405.00**	**$ 3,566,124,984.35**

6. RESUMEN DE MANEJO DEL ANTICIPO DE OBRA

MANEJO ANTICIPO DE OBRA		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	4,160,457,625.00
VALOR ADICION	$	1,165,289,991.34
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$	5,325,747,616.34
VALOR ANTICIPO OTORGADO	$	1,664,183,050.00
PROCENTAJE INIAL DE ANTCIPO	$	0.40
PORCENTAJE FINAL DE ANTICIPO	$	0.31
VALOR AMORTIZDO ACTA No 1	$	198,390,766.70
VALOR AMORTIZDO ACTA No 2	$	170,458,209.17
VALOR AMORTIZDO ACTA No 3	$	227,129,831.50
VALOR AMORTIZDO ACTA No 3	$	220,690,747.00
VALOR AMORTIZDO ACTA No 4	$	173,482,707.94
VALOR AMORTIZDO ACTA No 5	$	99,870,921.12
VALOR POR AMORTIZAR	$	574,159,866.57

7. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: MAYO 2025	SI	NO
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA: No 147 del 25 de mayo al 01 de junio de 2025	X	
INFORME FINANCIERO: MAYO 2025	X	
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA: $ 564,847,698.62	X	
➢ PISO EN CONCRETO 2500 PSI PREMEZCLADO (E=10CM), ENDURECIDO Y ESMALTADO (SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE CURADO, CORTE Y SELLADO DE JUNTAS). en este periodo se ejecutaron 182,40 kg equivalentes al 24,00% para un total ejecutado del 24,00% de esta actividad. ➢ VIGAS Y PLACAS AÉREAS EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI (28 MPA) GRAVA COMUN (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO EN MADERA, COLOCACION, ANDAMIO, CERCHAS, PARALES Y CURADO. NO INCLUYE REFUERZO). en este periodo se ejecutaron 147,03 M3 equivalentes al 60,00% para un total ejecutado acumulado del 60,00% de esta actividad. ➢ VIGAS Y PLACAS AÉREAS EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI (28 MPA) GRAVA COMUN (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO EN MADERA, COLOCACION, ANDAMIO, CERCHAS, PARALES Y CURADO. NO INCLUYE REFUERZO). en este periodo se ejecutaron 9, 9 M3 equivalentes al 42% de esta actividad. ➢ RED DE SUMINISTRO PVC PRESION 1/2" RDE 11 (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN); en este periodo se ejecutaron 90,30 Ml equivalentes al 70,00% para un total ejecutado acumulado del 100,00% de esta actividad. ➢ CONEXIÓN ACOMETIDA HIDRÁULICA PVC PRESIÓN 1" HASTA 5M (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN): en este periodo se ejecutaron el restante de esta actividad 40,00%, para un total ejecutado del 100,00% de esta actividad. ➢ PUNTO HIDRÁULICO PVC 1/2" RDE 11 HASTA 3 M (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN), en este periodo se ejecutaron 46,9,00 Un equivalente al 70,00%, para un total ejecutado del 100,00% de esta actividad. ➢ RED DE SUMINISTRO PVC PRESION 3/4" RDE 11 (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN): en este periodo se ejecutó el resto de esta actividad, para un total ejecutado del 100,00% de esta actividad.		

➢ RED DE SUMINISTRO PVC PRESION 1/2" RDE 11 (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN): en este periodo se ejecutó el resto de esta actividad, para un total ejecutado del 100,00% de esta actividad. ➢ REGISTRO DE BOLA DE 1/2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN): en este periodo se ejecutó el resto de esta actividad, para un total ejecutado del 100,00% de esta actividad. ➢ RED DE SUMINISTRO PVC PRESION 2" (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN): en este periodo se ejecutó el resto de esta actividad, para un total ejecutado del 100,00% de esta actividad. ➢ RED DE SUMINISTRO PVC PRESION 1" (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN): en este periodo se ejecutó el resto de esta actividad, para un total ejecutado del 100,00% de esta actividad. ➢ BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC 4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS), en este periodo se ejecutaron 7,02 Ml equivalente al 70,00% para un total ejecutado del 100,00% de esta actividad. ➢ RED SANITARIA PVC 4" (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN), en este periodo se ejecutaron el resto de esta actividad para un total ejecutado del 100,00% de esta actividad. ➢ PUNTO SANITARIO PVC 4" HASTA 3 M (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN), en este periodo se ejecutaron el resto de esta actividad para un total ejecutado del 100,00% de esta actividad. ➢ PUNTO SANITARIO PVC 2" HASTA 3 M (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN), en este periodo se ejecutó el resto de esta actividad para un total ejecutado del 100,00% de esta actividad. ➢ MURO DE CERRAMIENTO DE ALTURA TOTAL DE 2.40 M, CON CIMENTACIÓN CICLÓPEA Y VIGA DE AMARRE Y COLUMNETAS. INCLUYE TODOS LOS REFUERZOS EN HIERRO NECESARIOS. en este periodo se ejecutaron 12,30 M2 equivalente al 2,00% para un total ejecutado del 96,00% de esta actividad. ➢		

8. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
SE REALIZARON LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**98,02%**
% EJECUTADO DE OBRA	**62,25%**

PERIODO: JUNIO 2025
VIGENCIA DE LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL CONVENIO 1909: 31/12/2024
AVANCE DE OBRA: 62,25%

Componente técnico:
Para el periodo reportado se continua con el desarrollo de las actividades en obra las cuales se listaron en el numeral anterior y se evidencian en el registro fotográfico anexo.
Componente administrativo: Se avanza con la ejecución del convenio 1909 de 2022 y sus contratos derivados, aplicando el plan de contingencia aprobado
Componente financiero: El día 11 de junio de 2025 se realizó el pago correspondiente al acta parcial No 5 por un valor de $ 183,641,475.00. se registra una amortización del anticipo por un valor de $ 99,870,921.12, quedando un valor total por amortizar de $ 574,159,866.57

Componente Jurídico: Mediante resolución 0351 del 05 de junio de 2025 se ordena el pago del acta parcial No 5 para el contrato de obra **No. LP-001-2023,** por un valor de $ 183,641,475.00
JUSTIFICACIÓN DE AVANCE: Para el periodo de corte se registra un avance de del **62,25 %** el cual se justifica con las actividades relacionadas en el numeral anterior y se anexan los informes semanales de interventoría los informes mensuales de obra e interventoría correspondiente.

9. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

15/03/2023	17/03/2023	15/07/2024	25/07/2024	21/11/2024	24/04/2025
22/05/2025	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

10. SUPERVISOR

NESTOR MOSQUERA ANDRADES
Supervisor convenio 1909 de 2022 Municipio El Cantón Del San Pablo-Chocó

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1909 DE 2022

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO-DEPARTAMENTO DEL CHOCÒ.

INFORME FINANCIERO DEL MES DE JUNIO 2025
MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO

PROYECTO (S):	**AUNAR ESFUERZO TÈCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONTRUCCION ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO-DEPARTAMENTO DEL CHOCÒ.**

CUENTA (AHORROS) No.: 979123817		**DEL BANCO: DE BOGOTA**	
VALOR CONVENIO			**$ 5,934,581,455.48**
VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR			**$ 5,035,419,625.48**
VALOR APORTE DEPARTAMENTO			**$ 0.00**
VALOR APORTE MUNICIPIO			**$ 899,161,830.00**

VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	**GIROS MINISTERIO**		
	FECHA DE GIRO	**GIROS**	**VALOR DE GIROS**
	15/06/2023	GIRO 1	$ 1,965,929,315.00
		GIRO 2	$ 0.00
		GIRO 3	$ 0.00
	31/03/2025	GIRO 4	$1,103,560,996.48
	TOTAL GIRO MINISTERIO		**$ 3,069,490,311.48**
	GIROS MUNICIPIO		
	15/03/2023	GIRO 1	$ 505,000,000.00
	16/04/2023	GIRO 2	$ 188,897,405.00
	17/05/2023	GIRO 3	$ 2,000,000.00
	31/07/2023	GIRO 4	$103,757.14
	23/12/2024	GIRO 5	$100,200,000.00
	18/06/2025	GIRO 6	$3,820,335.00
	TOTAL GIRO MUNICIPIO		**$ 800,021,497.14**

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA 979123817 A LA FECHA	**$ 3,869,511,808.62**

CONTRATO No.	**NOMBRE CONTRATISTA**	**VALOR CONTRATO**	**VALOR ADICION (SI APLICA)**	**TOTAL CONTRATADO**
001-LP-OP	YEISON ALBORNOZ RIVAS	$ 4,160,457,625.00	$ 1,165,289,991.34	$5,325,747,616.34
001-I-CM	YORK STIVENSON PEREA AYALA	$ 465,003,732.00	$ 143,800,107.14	$608,803,839.14
	TOTAL CONTRATADO			**$ 5,934,551,455.48**

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	**OBJETO DEL PAGO**	**No. DE ORDEN DE PAGO**	**No. DE COMPROBANTE DE EGRESO**	**FECHA DE PAGO**	**AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR**	**AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO**	**VALOR DEL PAGO**
001-LP-OP	PAGO PARCIAL ANTICIPO	162	165	23/03/2023	$ 0.00	$ 500,000,000.00	$ 500,000,000.00
001-LP-OP	PAGO PARCIAL ANTICIPO	327	309	03/05/2023	$ 0.00	$ 192,857,405.00	$ 192,857,405.00
001-LP-OP	PAGO PARCIAL ANTICIPO	464	466	27/06/2023	$ 970,325,645.00	$ 0.00	$ 970,325,645.00
001-I-CM	PAGO ACTA INTERVENTORIA, ESTUDIOS Y DISEÑO	579	607	11/08/2023	$ 116,258,433.01	$ 0.00	$ 116,258,433.01
001-LP-OP	PAGO ACTA PARCIAL DE OBRA N 1	544	544	15/08/2024	$ 436,884,558.34	$ 0.00	$ 436,884,558.34
001-LP-OP	PAGO ACTA PARCIAL DE OBRA N 2	644	660	12/09/2024	$ 375,395,133.00	$ 0.00	$ 375,395,133.00
001-I-CM	PAGO ACTA DE COSTOS INTERVENTORIA N 1	516	661	12/09/2024	$ 51,549,668.00	$ 0.00	$ 51,549,668.00
001-LP-OP	PAGO ABONO1 ACTA PARCIAL DE OBRA N 3	1034	1020	23/12/2024		$ 100,200,000.00	$ 100,200,000.00
001-LP-OP	PAGO FINAL ACTA PARCIAL DE OBRA N 3	169		02/04/2025	$ 220,690,747.00		$ 220,690,747.00
001-LP-OP	PAGO ACTA PARCIAL DE OBRA N 4	261	255	12/05/2025	$ 382,033,486.00		$ 382,033,486.00
001-LP-OP	PAGO ACTA PARCIAL DE OBRA N 5	342	330	10/06/2025	$ 219,929,909.00		$ 219,929,909.00
	VALOR TOTAL PAGADO (2)				**$ 2,553,137,670.35**	**$ 793,057,405.00**	**$ 3,566,124,984.35**

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	**VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS**
31/03/2023	$ 14,753.00
30/04/2023	$ 2,770.00
31/05/2023	$ 1,082.00
30/06/2023	$ 225,066.00
31/07/2023	$ 123,937.00
31/08/2023	$ 116,235.00
31/09/2023	$ 111,369.00
31/10/2024	$ 110,795.00
31/11/2023	$ 110,809.00
31/12/2023	$ 110,823.00
31/01/2024	$ 110,837.00
29/02/2024	$ 110,850.00
31/03/2024	$ 110,864.00
30/04/2024	$ 110,878.00
31/05/2024	$ 110,892.00
30/06/2024	$ 110,906.00
31/07/2024	$ 76,457.00
31/08/2024	$ 56,706.00
30/09/2024	$ 21,178.00
31/10/2024	$ 8,264.00
30/11/2024	$ 3,332.00
31/12/2024	$ 482.00
31/01/2025	$ 34.00
28/02/2025	$ 26.00
31/03/2025	$ 16,924.00
30/04/2025	$ 37,186.00
31/05/2025	$ 29,317.00
301/06/2025	$ 9,719.00
TOTAL (3)	**$ 1,852,491.00**

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. ----------

FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	**VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS**	**No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS**
NO	NO	NO
TOTAL (4)	**$ 0.00**	

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)			**$ 3,869,511,808.62**
TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)			**$ 3,566,124,984.35**
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)			**$ 1,852,491.00**
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)			**$ 0.00**
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)			**$ 1,852,491.00**
ESCUENTOS BANCARIO	**GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO**	**23/03/2023**	**$ 2,000,000.00**
	TOTAL IVA	**24/03/2023**	**$ 1,349.00**
	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	**24/03/2023**	**$ 33.00**
	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	**03/05/2023**	**$ 771,430.00**
	TOTAL IVA	**04/05/2023**	**$ 1,349.00**
	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	**04/05/2023**	**$ 33.00**
	TOTAL IVA	**29/06/2023**	**$ 11,611.00**
	TOTAL 4X1000 GMF	**29/06/2023**	**$ 3,881,587.00**
	TOTAL IVA	**11/08/2023**	**$ 1,349.00**
	TOTAL 4X1000 GMF	**31/08/2023**	**$ 369,735.00**
	TOTAL IVA	**12/09/2023**	**$ 733.00**
	TOTAL 4X1000 GMF	**12/09/2023**	**$ 51,172.00**
	TOTAL IVA	**14/08/2024**	**$ 1,469.00**
	TOTAL 4X1000 GMF	**14/08/2024**	**$ 1,459,231.00**
	IVA	**12/09/2024**	**$ 2,267.00**
	TOTAL 4X1000 GMF	**12/09/2024**	**$ 1,288,828.00**
	IVA	**13/11/2024**	**$ 6,752.00**
	TOTAL 4X1000 GMF	**13/11/2024**	**$ 769,692.00**
	IVA	**24/12/2024**	**$ 3,104.00**
	TOTAL 4X1000 GMF	**24/12/2024**	**$ 400,878.00**
	IVA	**13/01/2025**	**$ 844.00**
	TOTAL 4X1000 GMF	**13/01/2025**	**$ 9,621.00**
	DEDUCCIONES MUNICIPIO	**31/01/2025**	**$ 3,856,005.65**
	CARGO DISPERCIÒN	**13/01/2025**	**$ 2,404,440.00**
	IVA	**02/04/2025**	**$ 7,460.00**
	TOTAL 4X1000 GMF	**14/05/2025**	**$ 1,276,031.00**
	IVA	**14/05/2025**	**$ 1,552.00**
	TOTAL 4X1000 GMF	**02/04/2025**	**$ 883,021.00**
	IVA	**18/06/2025**	**$ 8,304.00**
	TOTAL 4X1000 GMF	**18/06/2025**	**$ 986,915.00**
	TOTAL DESCUENTOS		**$ 18,456,795.65**
SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5)			**$ 305,239,315.27**
SALDO A FAVOR DEL MINISTERIO DEL INTERIOR X DEVOLVER (INFORME FINAL)			**$ 17,461,576.65**
SALDO EN CUENTA APLICANDO DESCUENTOS BANCARIOS			**$ 286,782,519.62**

FIRMA

Felipe Hinestroza Trellez

FELIPE HINESTROZA TRELLEZ
Tesorero General
Secretario de hacienda

* SE ADJUNTAN COPIAS DE: EXTRACTOS BANCARIOS, COPIA COMPROBANTE DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y CONSIGNACION DE LOS RECURSOS SOBRANTES.

RESOLUCIÓN No. 0351 DE 2025
(05 DE JUNIO)

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL PAGO DEL ACTA PARCIAL #5 DEL CONTRATO DE OBRA No. 001-LP-OP DE 2023

EL SUSCRITO ALCALDE DEL MUNICIPIO EL CANTÓN DE SAN PABLO - CHOCO, en uso de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias, en especial las conferidas por la Ley 80 de 1993 y 1150 de 2007, el Decreto único reglamentario 1082 de 2015, y demás normas reglamentarias y

CONSIDERANDO:

Que, la Administración Municipal El Cantón de San Pablo - Chocó, con fecha 23 de febrero de 2023, suscribió con **YEISON ALBORNOZ RIVAS,** mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 11708479 expedida en Istmina, el **CONTRATO DE OBRA No. 001-LP-OP DE 2023**, el cual tiene por objeto **"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE CANTÓN DE SAN PABLO – DEPARTAMENTO DE CHOCO"**

Que, la cuantía de dicho contrato estatal, asciende a la suma de **CUATRO MIL CIENTO SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($4.160.457.625) MCTE.**

Que mediante anticipo del 40% se ordenó el pago al contratista por la suma de **MIL SIENTO SESENTA Y TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL CINCUENTA PESOS (1.663.183.050) MCTE.**

Que con fecha 15 de julio de 2024, se suscribió el otrosí #1 al contrato, mediante el cual se adiciono el valor en la suma de **MIL CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ($1.165.289.991,34) MTE,** para un valor total de **CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ($5.325.747.616,34) M/CTE.**

Que, mediante resolución No. 0432 del 08 de agosto de 2024, se ordenó el pago de acta parcial #1 por valor de **CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO**

PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ($436.884.558,34) MCTE. Que, mediante resolución No. 0515 del 12 de septiembre de 2024, se ordenó el pago de acta parcial #2 por valor de **TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS ($ 375.395.133) MCTE.**

Que, mediante certificados de disponibilidad presupuestal **Nro. 01 del 12 de enero de 2023 y No. 317 de 09 de julio de 2024,** expedidos por el jefe de Presupuesto Municipal, se registra que, dentro del presupuesto de rentas y gastos, existe una partida presupuestal disponible libre de afectaciones para amparar los compromisos ocasionados por el precitado Contrato.

Que mediante resolución No. 0136 del 28 marzo de 2025 se ordenó el pago al señor **YEISON ALBORNOZ RIVAS,** mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 11708479 expedida en Istmina, por concepto de pago final del acta parcial #3 correspondiente al **CONTRATO DE OBRA No. 001-LP-OP DE 2023**, cuyo objeto es **"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE CANTÓN DE SAN PABLO – DEPARTAMENTO DE CHOCO"**

Que, mediante resolución 0260 del 05 de junio de 2025, se ordenó el pago al señor **YEISON ALBORNOZ RIVAS,** mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 11708479 expedida en Istmina, en calidad de **CONTRATISTA,** por concepto de pago del acta de parcial #4 correspondiente al **CONTRATO DE OBRA No. 001-LP-OP DE 2023**, la cual asciende a la suma de **TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS CON TRES CENTAVOS ($ 382.033.486,3) MCTE.**

Que, con fecha 05 del mes de junio de 2025, se suscribió entre los señores **YEISON ALBORNOZ RIVAS,** mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 11708479 expedida en Istmina, en calidad de **CONTRATISTA, YORK STIVENSON PEREA AYALA**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 9.732.848 expedida en Armenia, en calidad de **INTERVENTOR** y **NESTOR MOSQUERA ANDRADES,** Secretario de Planeación, en calidad de **SUPERVISOR**, el acta de recibo parcial # 5 del **CONTRATO DE OBRA No. 001-LP-OP DE 2023**, la cual asciende a la suma de **TRESCIENTOS DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS CON DIECISÉIS CENTAVOS ($ 319,800,830.16) MCTE,** de los cuales después de amortizar el anticipo del 31%, queda un saldo a pagar al contratista por la suma de **DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS ($ 219.929.909,0) MCTE.**

Qué, En mérito a lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar pagar al señor **YEISON ALBORNOZ RIVAS,** mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 11708479 expedida en Istmina, por concepto de pago de acta parcial # 5 correspondiente al **CONTRATO DE OBRA No. 001-LP-OP DE 2023**, cuyo objeto es **"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE CANTÓN DE SAN PABLO – DEPARTAMENTO DE CHOCO"** la suma de **DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS ($ 219.929.909,0) MCTE.** de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada a los 05 días del mes de junio de 2025

HENRY RAMIREZ PALACIOS
Alcalde Municipal El Cantón de San Pablo

YEISON ALBORNOZ RIVAS
NIT 11.708.479-4
carrera 36b # 31- 39
Tel: 3117653636
Pereira - Colombia
contabilidad.yeial@gmail.com

No. YA 88

Señores	MUNICIPIO EL CANTON DEL SAN PABLO		
NIT	800.239.414-5	**Teléfono**	3113618327
Dirección	CRA 5TA # 2 01	**Ciudad**	El Cantón Del San Pablo - Colombia

Fecha y hora comprobante	Fecha de Vencimiento
2025-06-05	2025-06-05

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	ACTA DE RECIBO PARCIAL 5 -AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO – DEPARTAMENTO DE CHOCÓ	1.00	246,588,657.71	0 %	0.00	246,588,657.71
2	ADMINISTRACION	1.00	58,416,852.98	0 %	0.00	58,416,852.98
3	IMPREVISTOS	1.00	2,465,886.58	0 %	0.00	2,465,886.58
4	UTILIDAD	1.00	12,329,432.89	0 %	0.00	12,329,432.89

Total items: 4

Total Bruto	319,800,830.16
Total a Pagar	319,800,830.16

Valor en Letras:
Trescientos diecinueve millones ochocientos mil ochocientos treinta pesos m/cte con dieciseis cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-05 por $ 319,800,830.16

Observaciones:
ACTA DE RECIBO PARCIAL 5 -"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO – DEPARTAMENTO DE CHOCÓ" VALOR TOTAL DEL ACTA =$ 319.800.830,16 CORRESPONDIENTE AL 6.00%; AMORTIZACIÓN AL ANTICIPO =$99.870.921,12 VALOR NEO A PAGAR =$ 219.929.909,0

Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CHOCO
MUNICIPIO DE EL CANTON DEL SAN PABLO
NIT 800239414-5
ORDEN DE PAGO

Nro. OP:	Fecha:	Vigencia:	Tipo de presupuesto:
342	10 de Junio de 2025	2025	PRESUPUESTO ENTIDAD
Disponibilidad:	**Compromiso:**	**Estado:**	**Valor total:**
317	425	APROBADO	219.929.909,00
Tercero:		**Concepto de pago:**	
11708479 - YEISON ALBORNOZ RIVAS		Contratos de Obra	

Descripción:

RESOLUCION NUMERO 0351 DE EL 5 DE JUNIO DE EL 2025 PRIMERA MODIFICACION Y PRIMERA ADICION Y PRORROGA AL COVENIO INTERADMINISTRATIVO NUMERO 1909 DEL 2022 CELEBRADO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DE INTERIOR -FONDO NACIONAL DE SEGURIDA Y CONVIVENCIA CIUDADANA -FONSECON CON EL MUNICIPIO DE EL CANTON DE SAN PABLO CHOCO

RUBROS DE EGRESO

Código	Resumido	Rubro de egreso	Valor
2.3.45.05.2.01.01.001.02.14.01	1401	Estudios, Diseños y Construcción de la Estación De Policía - convenio numero 1909 ministerio de interior -FONSECON **Fuente:** 1.2.3.3.04 - OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL. **MGA:** 0 - No aplica. **CPC:** 0 - No aplica. **Sector:** 0 - NO APLICA.	219.929.909,00

Total 219.929.909,00

DEDUCCIONES

Código	Deducción	Porc.	Valor
01	Estampilla Universidad Tecnológica del Chocó	1,50	3.298.949,00
02	Estampilla Proadulto Mayor	4,00	8.797.196,00
03	Tasa Deporte y Recreación	2,00	4.398.598,00
04	Estampilla Procultura	1,00	2.199.299,00
15	Retención en la Fuente por Contratos de Construcción	2,00	4.398.598,00
16	Contribución Especial de Obra Pública	5,00	10.996.495,00
17	Impuesto de Industria y Comercio (Contratos de Obra)	1,00	2.199.299,00
		Total	**36.288.434,00**

IMPUTACIÓN CONTABLE

Código	Cuenta contable		Débito	Crédito
511190	Otros gastos generales		219.929.909,00	0,00
240101	Bienes y servicios		0,00	183.641.475,00
240101	Bienes y servicios		0,00	18.694.042,00
243626	Contratos de construcción		0,00	4.398.598,00
244004	Impuesto de industria y comercio		0,00	2.199.299,00
244023	Contribuciones		0,00	10.996.495,00
		Total	**219.929.909,00**	**219.929.909,00**

TOTAL OBLIGACIÓN	TOTAL DEDUCCIONES	TOTAL IVA	NETO A PAGAR
219.929.909,00	36.288.434,00	0,00	183.641.475,00

Son: DOSCIENTOS DIECINUEVEMILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS

Alcalde

Secretario de Hacienda

Elaboró: ARLENE GISSELLE SANCHEZ MOSQUERA.
Aprobó: ARLENE GISSELLE SANCHEZ MOSQUERA.
Imprimé: ARLENE GISSELLE SANCHEZ MOSQUERA.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CHOCO
MUNICIPIO DE EL CANTON DEL SAN PABLO
NIT 800239414-5
COMPROBANTE DE EGRESO

Consecutivo:	Fecha:	Vigencia:	Tipo de presupuesto:
330	10 de Junio de 2025	2025	PRESUPUESTO ENTIDAD
Estado:	**Valor total:**	**Valor neto:**	
APROBADO	219.929.909,00	183.641.475,00	

Tercero:
11708479 - YEISON ALBORNOZ RIVAS

Descripción:
RESOLUCION NUMERO 0351 DE EL 5 DE JUNIO DE EL 2025 PRIMERA MODIFICACION Y PRIMERA ADICION Y PRORROGA AL COVENIO INTERADMINISTRATIVO NUMERO 1909 DEL 2022 CELEBRADO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DE INTERIOR -FONDO NACIONAL DE SEGURIDA Y CONVIVENCIA CIUDADANA -FONSECON CON EL MUNICIPIO DE EL CANTON DE SAN PABLO CHOCO

RUBROS DE EGRESO

CDP	RP	OP	Código	Resumido	Rubro de egreso	Valor
317	425	342	2.3.45.05.2.01.01.001.02.14.01	1401	Estudios, Diseños y Construcción de la Estación De Policía - convenio numero 1909 ministerio de interior -FONSECON **Fuente:** 1.2.3.3.04 - OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL. **MGA:** 0 - No aplica. **CPC:** 0 - No aplica. **Sector:** 0 - NO APLICA.	219.929.909,00
					Total	**219.929.909,00**

CUENTAS BANCARIAS

Código	Cuenta bancaria	Banco	Tipo cuenta	Nro. cuenta	Forma pago	Nro. transacción	Valor
52	CTA N° 979123817 CONTRUCCION COMANDO DE POLICIA	BANCO DE BOGOTÁ	CUENTA DE AHORROS	979123817	TRANSFERENCIA		183.641.475,00
						Total	**183.641.475,00**

Son: CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS

Secretario de Hacienda

Beneficiario

Elaboró: ARLENE GISSELLE SANCHEZ MOSQUERA.
Aprobó: ARLENE GISSELLE SANCHEZ MOSQUERA.
Imprimé: ARLENE GISSELLE SANCHEZ MOSQUERA.

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: **MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PAB**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **8002394145**
Generado por: **FELIPE HINESTROZA**

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	09433972	**Fecha de Emisión**	2025/06/11

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CONSTRUCCION COMANDO	**No. Producto**	*****3817
Fecha de Pago	2025/06/11		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	9015633499
Beneficiario	CONSULTORIA INGENIERIA DIC Y CONSTRUC
Valor a Pagar	$183,641,475.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	72300002777
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	
Información Adicional	
Estado	En Proceso

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

Banco de Bogotá

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2025062806AH0014485528

Comprar lo que quieres **sin importar el valor, otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.**



21741 1-2

ESTUDIO DISENOS Y CONTRUCCION DE LA ESTA
CR 5 2-1
MANAGRU,CHOCO
Entrega: EM Oficina: 2037 Gerencia Oficial 2 - Quibdó
21741

FECHA EXTRACTO **Junio - Junio 2025**
Desde: Junio 01 Hasta: Junio 30
Cuenta Número: 979123817
Tipo de Cuenta: Superdía Oficial
Cod. Origen: 2037
ZZ-INDIVIDUAL

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**564,847,698.62**
Total 000001 Abonos:	3,820,335.00
Total 000018 Cargos:	-250,541,025.00
Total IVA:	-8,304.00
Total 4x1000 GMF:	-986,915.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	9,719.00
Saldo Final:	**317,141,508.62**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
11/06	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	QUIBDO	GCIA OFICIAL 203	000000	-183,641,475.00	381,206,223.62
11/06	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	QUIBDO	GCIA OFICIAL 203	000000	-8,170.00	381,198,053.62
11/06	GT08	Cargo IVA	QUIBDO	GCIA OFICIAL 203		-1,552.00	381,196,501.62
11/06	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	QUIBDO	GCIA OFICIAL 203		-734,605.00	380,461,896.62
13/06	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	QUIBDO	GCIA OFICIAL 203	000000	-7,640,670.00	372,821,226.62
13/06	0848	Comision disfon proveedores interno	QUIBDO	GCIA OFICIAL 203	000000	-4,440.00	372,816,786.62
13/06	GT08	Cargo IVA	QUIBDO	GCIA OFICIAL 203		-844.00	372,815,942.62
13/06	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	QUIBDO	GCIA OFICIAL 203		-30,584.00	372,785,358.62
18/06	GT10	Abono ajuste Gravamen Mov. Financieros	QUIBDO	GCIA OFICIAL 203		15,281.00	372,800,639.62
18/06	0161	Abono devolucion dispersion pago de proveedores -otros	QUIBDO	GCIA OFICIAL 203	000000	3,820,335.00	376,620,974.62
18/06	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	QUIBDO	GCIA OFICIAL 203	000000	-3,820,335.00	372,800,639.62
18/06	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	QUIBDO	GCIA OFICIAL 203	000000	-3,820,335.00	368,980,304.62
18/06	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	QUIBDO	GCIA OFICIAL 203	000000	-3,820,335.00	365,159,969.62
18/06	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	QUIBDO	GCIA OFICIAL 203	000000	-5,730,502.00	359,429,467.62
18/06	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	QUIBDO	GCIA OFICIAL 203	000000	-7,640,670.00	351,788,797.62
18/06	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	QUIBDO	GCIA OFICIAL 203	000000	-15,281,339.00	336,507,458.62
18/06	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	QUIBDO	GCIA OFICIAL 203	000000	-19,101,674.00	317,405,784.62
18/06	0848	Comision disfon proveedores interno	QUIBDO	GCIA OFICIAL 203	000000	-4,440.00	317,401,344.62
18/06	GT08	Cargo IVA	QUIBDO	GCIA OFICIAL 203		-844.00	317,400,500.62
18/06	0848	Comision disfon proveedores interno	QUIBDO	GCIA OFICIAL 203	000000	-4,440.00	317,396,060.62
18/06	GT08	Cargo IVA	QUIBDO	GCIA OFICIAL 203		-844.00	317,395,216.62
18/06	0848	Comision disfon proveedores interno	QUIBDO	GCIA OFICIAL 203	000000	-4,440.00	317,390,776.62
18/06	GT08	Cargo IVA	QUIBDO	GCIA OFICIAL 203		-844.00	317,389,932.62
18/06	0848	Comision disfon proveedores interno	QUIBDO	GCIA OFICIAL 203	000000	-4,440.00	317,385,492.62
18/06	GT08	Cargo IVA	QUIBDO	GCIA OFICIAL 203		-844.00	317,384,648.62
18/06	0848	Comision disfon proveedores interno	QUIBDO	GCIA OFICIAL 203	000000	-4,440.00	317,380,208.62
18/06	GT08	Cargo IVA	QUIBDO	GCIA OFICIAL 203		-844.00	317,379,364.62
18/06	0848	Comision disfon proveedores interno	QUIBDO	GCIA OFICIAL 203	000000	-4,440.00	317,374,924.62
18/06	GT08	Cargo IVA	QUIBDO	GCIA OFICIAL 203		-844.00	317,374,080.62
18/06	0848	Comision disfon proveedores interno	QUIBDO	GCIA OFICIAL 203	000000	-4,440.00	317,369,640.62
18/06	GT08	Cargo IVA	QUIBDO	GCIA OFICIAL 203		-844.00	317,368,796.62
18/06	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	QUIBDO	GCIA OFICIAL 203		-237,007.00	317,131,789.62
30/06	GT01	Intereses ganados	QUIBDO	GCIA OFICIAL 203		9,719.00	317,141,508.62
		--------- FIN MOVIMIENTOS ---------					

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 001-l-CM de 2023

INTERVENTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE LA PLICIA EN EL MUNICIPIO DE EL CANTON DE SAN PABLO DEPARTAMENTO CHOCO"

INTERVENTORÍA: YORK STIVENSON PEREA AYALA

INFORME TÉCNICO DE INTERVENTORIA No. 12

PERIODO DE COBERTURA: DEL 1 Al 30 DE JUNIO DE 2025

TABLA DE CONTENIDO

1.INTRODUCCIÓN 4
2.OBJETIVOS 5
2.1 GENERAL 5
2.2 ESPECÍFICOS 5
3.ANTECEDENTES 6
4.ALCANCE DE LA INTERVENTORÍA 7
5.ASPECTOS LEGALES Y FINANCIEROS DEL CONTRATO 7
5.1.CONTRATO DE INTERVENTORÍA 7
Aspectos Legales: 7
Garantías: 8
5.2.CONTRATO DE OBRA 8
Aspectos Legales 8
Garantías: 9
6.DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 10
6.1.INFORMACIÓN GENERAL 10
6.2.LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO 10
6.3.ACTIVIDADES PRELIMINARES DEL PROYECTO 11
6.4.DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 11
6.AVANCE DEL CONTRATO 12
6.1.ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO 12
6.2.RELACIÓN DE PERSONAL 12
6.3.AVANCES DEL CONTRATO 13
6.4.Gestión Plan de Calidad 14
6.5.CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. 15
7.INFORMACIÓN DE PAGOS Y/O ANTICIPOS AL CONTRATISTA Y A INTERVENTORÍA. 15
7.1 CONTRATISTA 15
8.RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 15
8.1 RECOMENDACIONES 15
8.2 CONCLUSIONES 15
ANEXO 1. INFORMES SEMANALES 16

TABLA DE TABLAS

Tabla 1. Características legales del contrato de interventoría 8
Tabla 2. Características legales del contrato de interventoría 8
Tabla 3. Pólizas para el contrato de interventoría 8
Tabla 4. Características legales del contrato de obra 9
Tabla 5. Características legales del contrato de obra 9
Tabla 6. Pólizas para el contrato de obra 9
Tabla 7. Resumen del personal de interventoría 12
Tabla 8. Resumen personal de contratista 13
Tabla 9.Resumen avance del contrato 13
Tabla 10. Datos curva "S" 13
Tabla 11. Estado actual económico del contrato de obra 15

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Localización proyecto 10
Ilustración 2. Socialización del proyecto. 11
Ilustración 3. Toma de puntos para levantamiento topográfico 12
Ilustración 4. Curva "S" % 14

CONSTRUCTORES
&
CONSULTORES

1. INTRODUCCIÓN

El Municipio de Cantón de San Pablo, celebró el Contrato de interventoría No. 001-l-CM de 2023, cuyo objeto es la "INTERVENTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE LA PLICIA EN EL MUNICIPIO DE EL CANTON DE SAN PALO DEPARTAMENTO CHOCO" y el Contrato de obra No. 001-LP-OP-2023, cuyo objeto es la "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO – DEPARTAMENTO DE CHOCO".

El acta de Iniciación del Contrato de obra fue suscrita el día 26 de febrero de 2023, entre EL CONTRATANTE y YEISON ALBORNOZ RIVAS. Dando inicio oficialmente a las actividades de consultoría, obra e interventoría.

El presente informe técnico tiene como propósito presentar el estado de las obras objeto de este Contrato, en cumplimiento de las especificaciones técnicas y procedimientos para el desarrollo de proyectos, donde se tienen en cuenta todos los aspectos de impacto técnico, ambiental, urbano, de seguridad industrial y salud ocupacional. El presente informe cubre el periodo correspondido entre el 9 de mayo y el 6 de junio del año 2023.

CONSTRUCTORES
&
CONSULTORES

2. OBJETIVOS

2.1 GENERAL

Hacer el seguimiento y control de cada una de las actividades especificadas en el contrato de obra para así buscar cambios y sugerencias que puedan mejorar la ejecución de este proyecto ubicado en el municipio de Cantón de San Pablo en su cabecera municipal Managrú.

2.2 ESPECÍFICOS

- Verificar cantidades de obra ejecutada.
- Comparar en términos porcentuales las cantidades de obra ejecutada vs las cantidades de obra programadas.
- Comparar en términos monetarios las cantidades de obra ejecutada vs las cantidades de obra programadas.
- Evidenciar de manera explícita el avance físico de la obra.
- Buscar rutas de mejora para la ejecución del proyecto.
- Mostrar atrasos y/o adelantos en el contrato de obra

CONSTRUCTORES
&
CONSULTORES

3. ANTECEDENTES

CONTRATISTA	YEISON ALBORNOZ RIVAS
NIT	11.708.479 de Istmina
CONTRATO	001-LP-OP-2023
REPRESENTANTE LEGAL	YEISON ALBORNOZ RIVAS
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO – DEPARTAMENTO DE CHOCO.
VALOR CONTRATO DE OBRA	$ 4.160.457.625,00
VALOR ADICION No. 1	$ 1.165.289.991,34
NUEVO VALOR CONTRATO DE OBRA	$ 5.325.747.616,34
PLAZO DE EJECUCIÓN	Nueve (9) meses
NUEVO PLAZO DE EJECUCIÓN	Veinte (20) meses
FECHA DE INICIACIÓN	28 de febrero de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	28 de noviembre de 2023
NUEVA FECHE DE TERMINACION	30 de julio de 2025
ACTA DE SUSPENSION No. 1	07 de noviembre de 2023
ACTA DE REINICIO No. 1	04 de diciembre de 2023
ACTA DE SUSPENSION No. 2	22 de diciembre de 2023
ACTA DE REINICIO No. 2	08 de julio de 2024
OTROSI No. 1	06 de diciembre de 2023 (modificación de pólizas)
OTROSI No. 2	15 de julio de 2024 (adicción y prorroga)
OTROSI No. 3	11 de diciembre de 2024 (prorroga)
OTROSI No. 4	31 de diciembre de 2024 (prorroga)
INTERVENTOR	YORK STIVENSON PEREA AYALA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA	001-I-CM de 2023

ACTA DE SERVICIO	01
NIT O DOC. IDENTIDAD	9732848
OBJETO	INTERVENTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION ESTACION DE LA POLICIA EN EL MUNICIPIO DE EL CANTON DE SAN PABLO DEPARTAMENTO CHOCO"
VALOR CONTRATO DE INTERVENTORIA	$ 465.033732,00
VALOR ADICION No. 1	$ 143.800.107,14
NUEVO VALOR CONTRATO DE INTERVENTORIA	$ 608.833.839,14
PLAZO DE EJECUCIÓN	Nueve (9) meses
NUEVO PLAZO DE EJECUCIÓN	Veinte (20) meses
FECHA DE INICIACIÓN	28 de febrero de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	28 de noviembre de 2023
NUEVA FECHE DE TERMINACION	30 de julio de 2025
ACTA DE SUSPENSION No. 1	07 de noviembre de 2023
ACTA DE REINICIO No. 1	04 de diciembre de 2023
ACTA DE SUSPENSION No. 2	22 de diciembre de 2023
ACTA DE REINICIO No. 2	08 de junio de 2024
OTROSI No. 1	06 de diciembre de 2023 (modificación de pólizas)
OTROSI No. 2	15 de julio de 2024 (adicción y prorroga)
OTROSI No. 3	31 de diciembre de 2025 (prorroga)
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1	20 de abril de 2022
ACTA DE REINICIO No. 1	01 de julio de 2022
ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO
SUPERVISOR	ING. NESTOR MOSQUERA

4. ALCANCE DE LA INTERVENTORÍA

El alcance definido para la Interventoría es realizar las actividades de INTERVENTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION ESTACION DE LA POLICIA EN EL MUNICIPIO DE EL CANTON DE SAN PABLO DEPARTAMENTO CHOCO".

En particular, las actividades sobre las cuales se realizará dicha Interventoría se enmarcan en las siguientes actividades principales:

- ✓ Estudios y diseños
- ✓ Realizar obras preliminares
- ✓ Construir la Cimentación
- ✓ Construir las Superestructuras en concreto y estructuras metálicas
- ✓ Redes Sanitarias
- ✓ Redes Hidráulica.
- ✓ Instalar las redes eléctricas y afines
- ✓ Mobiliario y Urbanismo
- ✓ Acabados

5. ASPECTOS LEGALES Y FINANCIEROS DEL CONTRATO

5.1. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Aspectos Legales:

El Contrato de Interventoría, cuenta con las siguientes característicaslegales

INTERVENTOR	YORK STIVENSON PEREA AYALA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA	001-l-CM de 2023
ACTA DE SERVICIO	01
NIT O DOC. IDENTIDAD	9732848
OBJETO	INTERVENTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION ESTACION DE LA POLICIA EN EL MUNICIPIO DE EL CANTON DE SAN PABLO DEPARTAMENTO CHOCO"
VALOR CONTRATO DE INTERVENTORIA	$ 465.033732,00
VALOR ADICION No. 1	$ 143.800.107,14
NUEVO VALOR CONTRATO DE INTERVENTORIA	$ 608.833.839,14
PLAZO DE EJECUCIÓN	Nueve (9) meses
NUEVO PLAZO DE EJECUCIÓN	Veinte (20) meses

FECHA DE INICIACIÓN	28 de febrero de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	28 de noviembre de 2023
NUEVA FECHE DE TERMINACION	30 de julio de 2025
ACTA DE SUSPENSION No. 1	07 de noviembre de 2023
ACTA DE REINICIO No. 1	04 de diciembre de 2023
ACTA DE SUSPENSION No. 2	22 de diciembre de 2023
ACTA DE REINICIO No. 2	08 de junio de 2024
OTROSI No. 1	06 de diciembre de 2023 (modificación de pólizas)
OTROSI No. 2	15 de julio de 2024 (adicción y prorroga)
OTROSI No. 3	31 de diciembre de 2024 (prorroga)
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1	20 de abril de 2022
ACTA DE REINICIO No. 1	01 de julio de 2022
ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO
SUPERVISOR	ING. NESTOR MOSQUERA

Tabla 1. Características legales del contrato de interventoría

Garantías:
El contrato de Interventoría se encuentra amparado por la aseguradora Seguros del Estado S.A. con las siguientes pólizas:

Amparo	Número	Valor Asegurado	Vigencia
Cumplimiento	17-44-101208799	$ 60.883.383,91	28/02/2023 a 30/11/2025

Tabla 2. Características legales del contrato de interventoría

Pago de salarios Prestaciones sociales Imdennizaciones	17-44-101208799	$ 60.883.383,91	28/02/2023 a 31/07/2028
Calidad del servicio	17-44-101208799	$ 60.883.383,91	28/02/2023 a 31/12/2025

Tabla 3. Pólizas para el contrato de interventoría

5.2. CONTRATO DE OBRA

Aspectos Legales

El Contrato de Obra, cuenta con las siguientes características legales

CONTRATISTA	YEISON ALBORNOZ RIVAS
NIT	11.708.479 de Istmina
CONTRATO	001-LP-OP-2023
REPRESENTANTE LEGAL	YEISON ALBORNOZ RIVAS
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO – DEPARTAMENTO DE CHOCO.
VALOR CONTRATO DE OBRA	$ 4.160.457.625,00
VALOR ADICION No. 1	$ 1.165.289.991,34
NUEVO VALOR CONTRATO DE OBRA	$ 5.325.747.616,34
PLAZO DE EJECUCIÓN	Nueve (9) meses
NUEVO PLAZO DE EJECUCIÓN	Veinte (20) meses
FECHA DE INICIACIÓN	28 de febrero de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	28 de noviembre de 2023
NUEVA FECHE DE TERMINACION	30 de julio de 2025
ACTA DE SUSPENSION No. 1	07 de noviembre de 2023
ACTA DE REINICIO No. 1	04 de diciembre de 2023
ACTA DE SUSPENSION No. 2	22 de diciembre de 2023
ACTA DE REINICIO No. 2	08 de julio de 2024
OTROSI No. 1	06 de diciembre de 2023 (modificación de pólizas)
OTROSI No. 2	15 de julio de 2024 (adicción y prorroga)

OTROSI No. 3	11 de diciembre de 2024 (prorroga)
OTROSI No. 4	31 de diciembre de 2024 (prorroga)

Tabla 4. Características legales del contrato de obra

Garantías:

El contrato de contratista se encuentra amparado por la aseguradora Seguros del Estado S.A con las siguientes pólizas:

Amparo	Número	Valor Asegurado	Vigencia
Predios Labores Operaciones	17-40-101027222	$ 232.000.000,00	08/03/2023 a 31/10/2025

Tabla 5. Características legales del contrato de obra

Pago de salarios Prestaciones sociales Imdennizaciones	17-44-101208889	$ 532.574.761,63	08/03/2023 a 30/07/2028
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	17-44-101208889	$ 1.664.183.050,00	08/03/2023 a 30/07/2025
Cumplimiento del contrato	17-44-101208889	$ 532.574.761,63	08/03/2023 a 30/11/2025
Estabilidad de la obra	17-44-101208889	$ 532.574.761,63	Cinco (5) años, 0 meses y 0 dias

Tabla 6. Pólizas para el contrato de obra

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

6.1. INFORMACIÓN GENERAL

Este proyecto se encuentra ubicado en Managrú en el municipio del Cantón del San Pablo, y se da porque se considera que el municipio requiere contratar la ejecución del proyecto AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION ESTACION DE POLICIA EN EL

MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO – DEPARTAMENTO DE CHOCO".

6.2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO

El Cantón de San Pablo se encuentra ubicado en la parte noroccidental del departamento del Chocó de la República de Colombia, con una extensión de 386 km^2 y una densidad poblacional de 16,39 habitantes por km^2, Por su planicie y selva, la geografía del cantón San Pablo es muy atractiva para el ecoturismo, destacando zonas como Taridó, La Victoria, Chagarapá y Puerto Pervel, entre otras, su municipio es Managrú, se encuentra ubicado en los 5º 20' 20" N de latitud. y 76º 43'53" O, con una altura de 57 m sobre el nivel del mar, una temperatura promedio de 270C.

El proyecto se encuentra en el municipio Managrú.



Ilustración 1. Localización proyecto

6.3. ACTIVIDADES PRELIMINARES DEL PROYECTO

El día 8 de marzo de 2023 en las instalaciones de la Alcaldía Municipal se levantó el acta de inicio del contrato de obras, adjunto a esta el contratista constructor presentó el cronograma de ejecución de la consultoría.

En estas actividades previas del contrato se realizaron reuniones de socialización con la comunidad, donde se les dio a conocer la magnitud, inversión e importancia del proyecto.



Ilustración 2. Socialización del proyecto.

Los documentos presentados por el Constructor del proyecto fueron revisados por la interventoría, requisito indispensable para darle valides al acta de inicio.

Por medio de correo electrónico, canal de comunicación válido se informó al contratista constructor de los detalles faltantes pero subsanables de la documentación presentada, los cuales fueron entregados a cabalidad, por ende, la interventoría dio el aval para la firma del acta de inicio.

6.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

En el caso del municipio de Cantón del San Pablo, principalmente en su cabecera municipal Managrú, se presenta que las instalaciones de la policía nacional se encuentran en precarias condiciones, generando inconformismo en cuanto a la protección y seguridad no tienen donde ubicarse de forma satisfactoria para atender los eventos que allí se presenten, obligando así a la ejecución de un proyecto que mantenga el confort y buen desarrollo de los usuarios de dicha edificación.

7. AVANCE DEL CONTRATO

7.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO

3. CIMENTACIÓN

- PISO EN CONCRETO 2500 PSI PREMEZCLADO (E=10CM), ENDURECIDO Y ESMALTADO (SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE CURADO, CORTE Y SELLADO DE JUNTAS). en este periodo se ejecutaron 182,40 kg equivalentes al 24,00% para un total ejecutado del 24,00% de esta actividad.

ESTRUCTURA

- VIGAS Y PLACAS AÉREAS EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI (28 MPA) GRAVA COMUN (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO EN MADERA, COLOCACION, ANDAMIO, CERCHAS, PARALES Y CURADO. NO INCLUYE REFUERZO);. en este periodo se ejecutaron 9, 9 M3 equivalentes al 42% de esta actividad.






9. INSTALACIONES HIDRAULICAS

- CONEXIÓN ACOMETIDA HIDRÁULICA PVC PRESIÓN 1" HASTA 5M (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN): en este periodo se ejecutaron el restante de esta actividad 40,00%, para un total ejecutado del 100,00% de esta actividad.




- PUNTO HIDRÁULICO PVC 1/2" RDE 11 HASTA 3 M (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN), en este periodo se ejecutaron 46,9,00 Un equivalente al 70,00%, para un total ejecutado del 100,00% de esta actividad.




- RED DE SUMINISTRO PVC PRESION 3/4" RDE 11 (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN): en este periodo se ejecuto el resto de esta actividad, para un total ejecutado del 100,00% de esta actividad.




- RED DE SUMINISTRO PVC PRESION 1/2" RDE 11 (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN): en este periodo se ejecutó el resto de esta actividad, para un total ejecutado del 100,00% de esta actividad.




- REGISTRO DE BOLA DE 1/2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN): en este periodo se ejecuto el resto de esta actividad, para un total ejecutado del 100,00% de esta actividad.




- RED DE SUMINISTRO PVC PRESION 2" (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN): en este periodo se ejecuto el resto de esta actividad, para un total ejecutado del 100,00% de esta actividad.




- RED DE SUMINISTRO PVC PRESION 1" (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN): en este periodo se ejecuto el resto de esta actividad, para un total ejecutado del 100,00% de esta actividad.




10. INSTALACIONES RED DE AGUAS LLUVIA

- BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC 4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS), en este periodo se ejecutaron 7,02 Ml equivalente al 70,00% para un total ejecutado del 100,00% de esta actividad.




11.INSTALACIONES SANITARIAS

- RED SANITARIA PVC 4" (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN), en este periodo se ejecutaron el resto de esta actividad para un total ejecutado del 100,00% de esta actividad.

- PUNTO SANITARIO PVC 4" HASTA 3 M (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN), en este periodo se ejecutaron el resto de esta actividad para un total ejecutado del 100,00% de esta actividad.




- PUNTO SANITARIO PVC 2" HASTA 3 M (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN), en este periodo se ejecuto el resto de esta actividad para un total ejecutado del 100,00% de esta actividad.




18. ARQUITECTURA

- MURO DE CERRAMIENTO DE ALTURA TOTAL DE 2.40 M, CON CIMENTACIÓN CICLÓPEA Y VIGA DE AMARRE Y COLUMNETAS. INCLUYE TODOS LOS REFUERZOS EN HIERRO NECESARIOS. en este periodo se ejecutaron 12,30 M2 equivalente al 2,00% para un total ejecutado del 96,00% de esta actividad.









RELACIÓN DE PERSONAL

En la siguiente tabla se relaciona el personal que se encuentra en el contrato de interventoría y contratista, cumpliendo con los términos de este y el cual ha participado en el presente periodo:

PERSONAL
Director de Interventoría
Residente de Interventoría
Trabajadora social
Ing. Ambiental – SISO
Topografo

Tabla 7. Resumen del personal de interventoría

PERSONAL
Director de Obra
Residente de Obra 1
Topógrafo
Ing. Ambiental – SISO
Trabajadora social
Almacenista
Jefe de Personal
Maestro de Obra
Oficiales
Ayudantes
Conductores

Tabla 8. Resumen personal de contratista

. AVANCES DEL CONTRATO

De acuerdo con el avance de consultoría y flujo de caja se tienen los siguientes datos:

AVANCE	FÍSICO	TIEMPO
Programado	98,02%	555 días
Ejecutado	62,25%	555 días

Tabla 9. Resumen avance del contrato

La curva "S" del proyecto va de la siguiente manera: **CURVA "S"**				
SEMANA	**$ PROGRAMADO**	**% PROGRAMADO**	**$ EJECUTADO**	**% EJECUTADO**
SE REINICIA CON LA REPROGRAMACION DESDE EL 01 DE ENERO HASTA EL 30 DE JULIO				
27	2.048.232.257,57	38,46%	1.965.464.798,94	36,90%
28	2.112.631.436,34	39,67%	1.979.125.305,13	37,16%
29	2.177.088.469,73	40,88%	1.996.720.708,16	37,49%
30	2.233.185.785,00	41,93%	2.026.821.217,60	38,06%
31	2.366.762.241,00	44,44%	2.041.871.472,32	38,34%
32	2.498.840.782,00	46,92%	2.049.396.599,68	38,48%
33	2.555.293.707,00	47,98%	2.049.396.599,68	38,48%
34	2.591.508.791,00	48,66%	2.049.396.599,68	38,48%
35	2.626.397.714,93	49,32%	2.049.396.599,68	38,48%
36	2.672.952.207,15	50,19%	2.049.396.599,68	38,48%
37	2.685.409.953,28	50,42%	2.051.233.372,74	38,52%
38	2.904.827.218,73	54,54%	2.082.338.730,02	39,10'%
39	3.113.194.724,14	58,46%	2.156.303.799,50	40,49%
40	3.328.502.883,90	62,50%	2.226.650.253,28	41,81%
41	3.539.151.319,58	66,45%	2.298.370.934,13	43,16%
42	3.952.464.935,00	74,21%	2.401.195.872,30	45,09%
43	4.412.304.740,53	82,85%	2.532.024.505,25	47,54%
44	3.844.866.845,94	72,19%	2.662.185.264,30	49,99%
45	4.710.660.663,65	88,45%	2.804.321.544,29	52,66%
46	4.811.613.167,79	90,35%	2.894.081.932,65	54,34%
47	4.780.048.096,99	89,75%	3.029.641.559,08	56,89%
48	4.938.754.710,73	92,73%	3.143.691.750,74	59,03%
49	4.995.501.374,69	93,80%	3.226.623.813,64	60,69%
50	5.097.858.484,56	95,72%	3.278.970.433,07	61,57%
51	5.220.328.079,97	98,02%	3.315.151.672,09	62,25%

Tabla 10. Datos curva "S"



Ilustración 4. Curva "S" %

. Gestión Plan de Calidad

❖ Identificación y trazabilidad

Se cuenta con una programación general avalada por el Municipio de Cantón del San Pablo y controlada por los ingenieros directores y residentes.

❖ Informe

Durante el desarrollo del proyecto se están llevando a cabo los informes mensuales y semanales que evidencian la gestión realizada en las aéreas técnicas.

❖ Gestión de recursos

Para el desarrollo del proyecto se dispone de 1 computador y 1 impresora, dispuesto con software que consta del paquete de Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), AutoCAD versión 2014 y Project, así como equipo menor de oficina y papelería.
Para la parte operativa se cuenta con herramientas menores varias, 1 Vehículo, para el desarrollo de las actividades de interventoría.

❖ Control de procesos y equipos

La bitácora de obra se llevará diariamente y se estará firmando en conjunto con el contratista.

❖ Certificados de seguridad social y parafiscales

En él se encuentran los certificados de la seguridad social y los parafiscales de los consorciados, como también las afiliaciones y pagos del personal.

. CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.

Después de iniciar las actividades en obra esta interventoría tiene por prioridad estar pendiente de los EPP como lo son el casco, las botas de seguridad industrial, las gafas que se utilizan para evitar accidentes en los ojos, guantes y los cuidados que debe manejar el trabajador para su seguridad integral, se informa a el contratista que debe renovar o dotar de nuevos EPP ya que los que se tienen están muy deteriorados y no cumplen a cabalidad con la necesidad de los obreros en las actividades que se están ejecutando.

12. INFORMACIÓN DE PAGOS Y/O ANTICIPOS AL CONTRATISTA Y A INTERVENTORÍA.

9.1 CONTRATISTA

NUEVO VALOR DEL CONTRATO	$	5.325.747.616,34
ANTICIPO	$	1.664.183.050,00

Tabla 11. Estado actual económico del contrato de obra

13. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

10.1 RECOMENDACIONES

- Este mes se continuo con las mismas actividades del mes pasado, se mejoró el rendimiento pese al fuerte invierno reinante en la región, se reitera al contratista hacer otro plan de contingencia que garantice la ejecución de la obra en los tiempos programados para evitar entrar en un posible incumplimiento contractual, ya que con este rendimiento actual se observa que es imposible cumplir a cabalidad con la entrega de la obra en la fecha estipulada.

10.2 CONCLUSIONES

- Se concluye que hasta la fecha de este informe se ha ejecutado el 62,25 de las labores programadas lo que nos sigue indicando que pese a mejorar el rendimiento el retraso todavía es muy grande y a este paso se sugiere al contratista solicitar otra prorroga presentando un nuevo plan de contingencia y la nueva reprogramación que garantice la conclusión de las obras en este nuevo plazo solicitado.

- En términos económicos hasta la fecha se han ejecutado $ $ 3.315.151.672,09 lo cual corresponde al 62,25%, se concluye que hasta la fecha tenemos un retraso de 35,77% en la ejecución del contrato lo cual nos muestra que se sigue aumentando el retraso.

FIRMA:



YORK STIVENSON PEREA AYALA

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

CONSTRUCTORES & CONSULTORES

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION

NORMA TÉCNICA COLOMBIANA
NTC 4026 Y NTC 4076 PARA BLOQUES Y
LADRILLOS DE CONCRETO, PARA MAMPOSTERÍA
ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL


Proyecto: AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO DEPARTAMENTO DEL CHOCO	Referencia:		A&A **Laboratorio de suelos y Concretos** **Constructora A&A Ingenieros S.A.S.**
Localizacion: nicipio de Canton de San Pablo - Choco			
Fecha de elaboracion:	Abril 06 de 2025		
Fecha de ensayo:	Mayo 06 de 2025		
Tipo de material	Bloque hueco de concreto		
Modo de fabricacion	Mecanica		

PRUEBA A LA COMPRESION


Muestra numero	1	2	3	OBSERVACIONES
Largo (L), cm	39.00			±2 mm
Ancho (A), cm	12.00			±2 mm
Alto (h), cm	19.50			±2 mm
(a), cm	2.00			≥ 2 mm
(b), cm	2.00			≥ 2 mm
(c), cm	2.00			≥ 2 mm
(d), cm	2.00			≥ 2 mm
(e), cm	2.00			≥ 2 mm
Area bruta en cm^2	452.00			
Area neta en cm^2	207.90			
Area neta (%)	46.0%			75%<Aneta<50%
Volumen en cm^3	4054.05			
Volumen en m^3	0.00405405			
Peso en Kg	11.72			
Peso unitario en Kg/m^3	2890.15			
Carga en Kg	11176.50			
Resitencia a la compresion en Kg/cm^2	53.76			
Resistencia a la compresion en Mpa	5.48			
Resistencia a la compresión a los 28 d (Rc) establecidos para **MAMPOSTERIA NO ESTRUCTURAL**, evaluada sobre el área neta promedia (Anp) Mínimo, Mpa	5.00	Cumple		
Resistencia a la compresión a los 28 d (Rc) establecidos para **MAMPOSTERIA NO ESTRUCTURAL**, evaluada sobre el área neta promedia (Anp) Mínimo, Mpa	Clase Alta 11.00			
	Clase baja 7.00			



Firma del responsable:
ROGELIO ATEHORTUA ARENAS
Ingeniero civil Esp. M.P. 6320253216 QND



Vista en plata



Vista lateral

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION

NORMA TÉCNICA COLOMBIANA
NTC 4026 Y NTC 4076 PARA BLOQUES Y
LADRILLOS DE CONCRETO, PARA MAMPOSTERÍA
ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL


Proyecto: AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO DEPARTAMENTO DEL CHOCO	Referencia:		A&A
Localizacion: nicipio de Canton de San Pablo - Choco			
Fecha de elaboracion:	Abril 06 de 2025		**Laboratorio de suelos y Concretos Constructora A&A Ingenieros S.A.S.**
Fecha de ensayo:	Mayo 06 de 2025		
Tipo de material	Bloque macizo de concreto		
Modo de fabricacion	Mecanica		

PRUEBA A LA COMPRESION


Muestra numero	1	2	3	OBSERVACIONES
Largo (L), cm	39.00	39.00		±2 mm
Ancho (A), cm	19.00	19.00		±2 mm
Alto (h), cm	20.00	20.00		±2 mm
(a), cm				≥ 2 mm
(b), cm				≥ 2 mm
(c), cm				≥ 2 mm
(d), cm	3.00	3.00		≥ 2.5 mm
(e), cm	3.00	3.00		≥ 2.5 mm
Area bruta en cm^2	715.00	715.00		
Area neta en cm^2	715.00	715.00		
Area neta (%)	100.0%	100.0%		75%<Aneta<50%
Volumen en cm^3	14300.00	14300.00		
Volumen en m^3	0.01430000	0.01430000		
Peso en Kg	27.55	26.87		
Peso unitario en Kg/m^3	1926.55	1879.36		
Carga en Kg	43752.70	42156.87		
Resitencia a la compresion en Kg/cm^2	61.19	58.96		
Resistencia a la compresion en Mpa	6.24	6.01		Promedio = 6.13
Resistencia a la compresión a los 28 d (Rc) establecidos para **MAMPOSTERIA NO ESTRUCTURAL**, evaluada sobre el área neta promedia (Anp) Mínimo, Mpa	5.00	Cumple		
Resistencia a la compresión a los 28 d (Rc) establecidos para **MAMPOSTERIA NO ESTRUCTURAL**, evaluada sobre el área neta promedia (Anp) Mínimo, Mpa	Clase Alta 11.00			
	Clase baja 7.00			



Firma del responsable:
ROGELIO ATEHORTUA ARENAS
Ingeniero civil Esp. M.P. 6320253216 QND



Vista en plata



Vista lateral

ANEXO 1. INFORMES SEMANALES

CONSTRUCTORES
&
CONSULTORES

ANEXO 2. INFORME DE OBRA

CONSTRUCTORES
&
CONSULTORES

ANEXO 3. ACTAS DE COMITE

CONSTRUCTORES
&
CONSULTORES

ANEXO 4. INFORME AMBIENTAL

CONSTRUCTORES
&
CONSULTORES

ANEXO 5. INFORME SOCIAL

CONSTRUCTORES
&
CONSULTORES

ANEXO 6. INFORME SSP

CONSTRUCTORES
&
CONSULTORES

ANEXO 5. BITACORA DE OBRA

CONSTRUCTORES
&
CONSULTORES

CONTRATO DE OBRA N°: 001-LP-OP-2023

OBJETO: “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO – DEPARTAMENTO DE CHOCÓ”

PROFESIONAL SOCIAL
DEICY ALBORNOZ MURILLO
TP: 287233507-1

INFORME MENSUAL SOCIAL N°: 12

PERIODO DE COBERTURA:
DEL 02 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO

2025

Yeison Albornoz Rivas
+57 311 765 3636
yeial138@gmail.com

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3

2. OBJETIVOS 4

2.1. Objetivo General 4

2.2. Objetivos Específicos 4

2. Resumen 5

4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 6

4.1. Reunión con los Trabajadores que Laboran en la Obra 6

4.2. Visita de funcionarios del Ministerio del Interior a la Obra 8

5. IMÁGENES FOTOGRÁFICAS 10

Yeison Albornoz Rivas
+57 311 765 3636
yeial138@gmail.com

1. INTRODUCCIÓN

La seguridad pública es un pilar fundamental para el desarrollo de cualquier comunidad, y la construcción de una nueva estación de policía representa un paso significativo hacia la mejora de la seguridad y el bienestar de los ciudadanos. Este proyecto no solo se enfoca en la edificación de un espacio físico, sino en la creación de un entorno que permita a las fuerzas del orden operar de manera más eficiente y efectiva.

En resumen, la nueva estación de policía no solo fortalecerá la capacidad de respuesta ante incidentes y el mantenimiento del orden público, sino que también servirá como un símbolo del compromiso de la comunidad con la seguridad y la justicia. El objetivo principal de la construcción del proyecto **"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO – DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ,** es proporcionar un centro moderno y bien equipado que facilite la respuesta rápida ante emergencias, la investigación de delitos y la implementación de estrategias para la prevención del crimen.

Yeison Albornoz Rivas
+57 311 765 3636
yeial138@gmail.com
ARQUITECTO

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

Desarrollar y construir una estación de policía moderna y funcional que mejore la capacidad operativa de las fuerzas del orden, garantice un entorno seguro para el personal y facilite una respuesta efectiva a las necesidades de seguridad de la comunidad.

2.2. Objetivos Específicos

- Facilitar la integración con la comunidad
- Garantizar el cumplimiento normativo y la seguridad durante la construcción
- Fortalecer la capacidad institucional y la atención a la comunidad
- Promover la sostenibilidad ambiental y social del proyecto

Yeison Albornoz Rivas
+57 311 765 3636
yeial138@gmail.com
ARQUITECTO

2. Resumen

Durante el período del 02 al 30 de junio de 2025, las actividades principales en la obra incluyeron el vaciado de losa, la elaboración de bloques, el vaciado de viguetas, el figurado de acero para losa y la continuación de la construcción del muro de cerramiento.

Estas tareas, esenciales para el avance estructural, demandaron un esfuerzo coordinado del equipo de trabajo. En paralelo, se implementaron acciones sociales estratégicas orientadas a promover un entorno laboral seguro, eficiente y enriquecedor, reconociendo que el capital humano es el fundamento de cualquier obra de esta magnitud.

Desde la perspectiva del trabajo social, este mes se caracterizó por un enfoque integral que combinó sensibilización, capacitación técnica, acompañamiento en seguridad y coordinación operativa. Estas intervenciones no solo respondieron a las necesidades inmediatas de la construcción, sino que también abordaron aspectos más profundos, como la autoestima de los trabajadores, su sentido de pertenencia y su capacidad para contribuir al bienestar colectivo.

El objetivo de este informe es presentar un análisis exhaustivo de las acciones sociales ejecutadas, destacando su impacto en la seguridad laboral, la calidad del proceso constructivo y la dinámica de equipo, mientras se ofrecen recomendaciones para consolidar estos avances en las etapas futuras.

Yeison Albornoz Rivas
+57 311 765 3636
yeial138@gmail.com

4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

4.1. Reunión con los Trabajadores que Laboran en la Obra

El motivo de esta charla fue abordar una situación que, lamentablemente, se presentó en la obra y que puso en riesgo no solo la seguridad individual de cada uno de nosotros, sino también la de todo el equipo de trabajo. Que se debía tener muy claro que el alicoramiento en el entorno laboral está totalmente prohibido y es una falta grave, ya que afecta directamente el desempeño, la atención, la toma de decisiones, y, sobre todo, pone en peligro la vida de todos**.** Trabajamos en un sector que implica riesgos elevados, como manejo de maquinaria, trabajos en alturas, manipulación de materiales pesados. Bajo el efecto del alcohol, cualquier tarea se convierte en un riesgo inminente. De igual forma se les explicó que, abandonar la obra sin justificación o bajo los efectos del licor es una falta disciplinaria que puede acarrear sanciones graves, incluyendo la desvinculación del proyecto. Esto no solo representa una pérdida para la empresa, sino también para el propio trabajador y su familia.

En este orden de ideas se les dio a conocer, que estábamos en la obra no solo para cumplir un horario o por recibir un salario; que estábamos laborando en esta, porque somos constructores de proyectos, de sueños, de futuro, seguridad y bienestar y que por esa razón se le invitaba a la reflexión y al compromiso.

Para finalizar se les manifestó que la disciplina y la responsabilidad son claves para avanzar y que el autocuidado por uno mismo; que estar sobrios, alertas y comprometidos era la mejor manera de proteger nuestra vida, la de nuestros compañeros y el desarrollo exitoso de esta obra.

Durante la charla, también se tocaron temas relacionados con las consecuencias que este acto de indisciplina trae para los trabajadores, entre las cuales se encuentran:

- Alto riesgo de accidentes laborales
- Pérdida de productividad y retrasos en la obra
- Ambiente laboral tenso o conflictivo
- Costos adicionales por sanciones, reemplazos o accidentes
- Mala imagen para la empresa
- Sanciones para maestros y funcionarios de la obra

También se les brindaron posibles soluciones para evitar que sucedan situaciones como estas.

- Implementar campañas de sensibilización y prevención
- Establecer canales de comunicación efectivos
- Establecer espacios de escuchas

Finalizada las explicaciones de los temas antes mencionados, se les brindó el espacio a los trabajadores para que hicieran sus puntos de vistas frente a lo sucedido y ellos manifestaron los siguiente:

- Que reconocían que se habían equivocado
- Que fue un error no haber concertado el tema con los responsables de la obra, para establecer acuerdos, teniendo en cuenta que el día anterior era la celebración del día del padre.
- Que, en adelante esta situación, no se volvería a presentar

Yeison Albornoz Rivas
+57 311 765 3636
yeial138@gmail.com
ARQUITECTO

4.2. Visita de funcionarios del Ministerio del Interior a la Obra

Esta visita de inspección fue realizada por señora LINA RODRIGUEZ, representante del ministerio interior y tuvo como objetivo garantizar el buen desarrollo del proyecto en términos de seguridad, calidad, tiempo y cumplimiento de la normativa. Durante la inspección, los temas tratados fueron:

- Comparar el estado actual de la obra, con el cronograma establecido.
- Verificar que los tiempos y actividades planeadas se estén cumpliendo.
- Comprobar que los materiales usados cumplan con las especificaciones técnicas.
- Verificar que los procesos constructivos sigan las normas establecidas.
- Detectar errores, fallas estructurales o incumplimientos.
- Prevenir riesgos antes de que generen impactos mayores en el proyecto.
- Verificar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).
- Asegurarse de que se implementen las medidas de prevención de accidentes.
- Revisar documentación como permisos, actas de avance, seguros, licencias, etc.
- Controlar el manejo de residuos, ruido, agua y emisiones.

En este orden de ideas, otros temas tratados en la reunión fueron:

- La distribución de los bloques, instalaciones y de las habitaciones del edificio, teniendo en cuenta los géneros femeninos y masculinos
- Almacenamiento del agua
- Solicitar la instalación de antenas de seguridad, teniendo en cuenta que hace 15 días, había salido una orden de instalación de mallas de protección

(Mallas Pajareras) en las estaciones de policías o militares, para evitar ataque con drones

- Finalmente, la encargada de la visita dio a conocer que la obra en la actualidad tiene un avance del 60. 59%, cuando debiera de ir en un 95.34%, manifestando que esta tiene un 30% aproximadamente de atraso.

Al exponer todos estos temas, los responsables de la obra manifestaron que el proyecto viene cumpliendo con unos parámetros establecidos por el ministerio del interior y que, si este autorizaba, se podían anexar los aspectos expuestos durante la visita. Teniendo en cuenta lo anterior la señora LINA manifestó que, para adicionar los detalles expuestos, se debía consultar con el ministerio y que para ello sería bueno establecer una mesa de trabajo. Concluido el recorrido por la obra, los asistentes a esta visita tuvieron a bien reunirse en el despacho de la alcaldía, para la elaboración final del acta de visita.

De igual forma, se les explicó que una obra limpia es una obra segura, eficiente y de calidad y que **c**ada trabajador es responsable de mantener el orden en su área y de promover una cultura de limpieza que beneficie a todos.

Cordialmente,

Deicy Albornoz Murillo

DEICY ALBORNOZ MURILLO
Trabajadora Social de Obra
TP: 287233507-1

Yeison Albornoz Rivas
+57 311 765 3636
yeial138@gmail.com
ARQUITECTO

5. IMÁGENES FOTOGRÁFICAS

- **Reunión con los Trabajadores que Laboran en la Obra, Sobre Temas Relacionados con el Abandono de Obra por Alicoramiento.**



- **Imagen Fotográfica de la Visita Realizada por funcionaria del Ministerio del Interior a la Obra**



Yeison Albornoz Rivas
+57 311 765 3636
yeial138@gmail.com
ARQUITECTO

Lugar:	Fecha:	Hora Inicio: 10:30 am
Obra donde se desarrolla el proyecto “Aunar Esfuerzos Técnicos, Administrativos y Financieros entre las Partes Para Llevar a Cabo los Estudios, Diseño y Construcción de estación de Policía en el Municipio de Cantón de San Pablo – Departamento de Chocó”	18/06/2025	Hora Final: 12:12 pm
Dirigido a: funcionarios de la obra	**Realizada por funcionaria del Ministerio del Interior:** Lina Rodríguez	

Objetivo:

Garantizar el buen desarrollo del proyecto en términos de seguridad, calidad, tiempo y cumplimiento de la normativa.

Durante la inspección.

Temas: Garantizar del buen desarrollo del proyecto

NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	FIRMA
Nestor Mosquera. A	S. planeación	3104357956	
Jordy Copete Gomez	Residente Obra	3147432389	
Yeison Albornoz	Contratista	3117653636	
Lina Rodriguez Reyes	Apoyo la gestión.	3163406879	
Freidy Albornoz Rivas	Director obra	3213809390	
FE Sebastian Mosquera	ote Estación	3114959667	
Jefferson Palacios mosq.	Sob de esroca	3205132690	
Yeimer Jumes Renteria	Conductor	3218425160	
Alexander Salazar G.	Policia Subir	3116090412	
JAIL DE JESUS MOSQUERA M.	RESIDENTE INTERVENT	3106978479	
YERK Arvelaez Leal	Interventor.	3109365732	
Deicy Albornoz Murillo	Trabajadora S.	3216633889	
Yovirlan Asprilla M	Ing. Ambiental	3128681468	

Firma del Capacitador:	Nombre y Cargo del Capacitador:
Deicy Albornoz Murillo	Deicy Albornoz Murillo Trabajadora Social

Yeison Albornoz Rivas
+57 311 765 3636
yeial138@gmail.com
ARQUITECTO

CONTRATO DE OBRA N°: 001-LP-OP-2023

OBJETO: “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO – DEPARTAMENTO DE CHOCÓ”.

PROFESIONAL SG-SST
YUBELYS ALBORNOZ RIVAS
T.P: LPSST2252-22

INFORME N°: 12
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
(BIOSEGURIDAD)

PERIODO DE COBERTURA:
02 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO
2025

Yeison Albornoz Rivas
+57 311 765 3636
yeial138@gmail.com

CONTENIDO

1.INTRODUCCIÓN 3

2. OBJETIVOS 4

2.1 Objetivo General 4

2.2 Objetivos Específicos 4

3. ACTIVIDADES EN SST 5

3.1 Revisión de afiliaciones y pagos al sistema general de seguridad social: 5

3.2 Entrega de EPP, Supervisión del Uso de EPP y Control de Cumplimiento: .. 9

3.3 Reporte de Actos y Condiciones subestándares: 10

3.4 Capacitación y Sensibilización de los Trabajadores: 11

3.5 Pausas Activas y Control del Estrés Físico 13

3.6 Indicadores mínimos de SST según la resolución 312 de 2019 13

3.6.1. Ausentismo laboral 13

3.6.2. Incidencia por enfermedad laboral 14

3.6.3. Frecuencia de Accidentalidad 15

Yeison Albornoz Rivas
+57 311 765 3636
yeial138@gmail.com
ARQUITECTO

1.INTRODUCCIÓN

Las obras de infraestructura generan grandes impactos al ambiente y a la población; por ello, todas las personas vinculadas de manera directa o indirecta a la construcción están expuestos a riesgos están relacionadas a los efectos nocivos de la contaminación ambiental que se generan como consecuencia de las actividades de la obra tales como lesiones, incidentes, accidentes y/o enfermedades laborales que, en ocasiones, representando un alto nivel de influencia en un proyecto constructivo.

Por lo anterior, es necesario adoptar medidas que ayuden a proteger la calidad de vida, la salud física y mental, el desarrollo personal y social de los trabajadores, promovidas a través del plan de salud y seguridad en el trabajo implementado durante toda la etapa constructiva del proyecto que cumpla con las disposiciones legales que promuevan las buenas prácticas en obra y generen conciencia en el personal a cerca del autocuidado.

Este informe se realiza con el fin de dar a conocer a las partes interesadas como se está realizando la implementación y control del plan de salud y seguridad en el trabajo en el proyecto "**AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO – DEPARTAMENTO DE CHOCÓ**".

Yeison Albornoz Rivas
+57 311 765 3636
yeial138@gmail.com
ARQUITECTO

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Desarrollar un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo (SST) con el fin de promover, mantener y mejorar las condiciones de salud y trabajo en el proyecto "**AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO – DEPARTAMENTO DE CHOCÓ**", y de preservar un estado de salud, bienestar físico, mental y social de los trabajadores, la prevención de accidentes y enfermedades laborales factibles de intervención, dando cumplimiento a la normatividad vigente.

2.2 Objetivos Específicos

- Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales que en materia de seguridad y salud en el trabajo apliquen a la empresa.

- Implementar un plan de prevención, respuesta y recuperación ante emergencias. (Plan de Contingencia).

- Divulgar y sensibilizar las normas en seguridad y salud en el trabajo, para facilitar el control de los factores de riesgo y prevenir la aparición de Accidentes, Incidentes y Enfermedades de origen laboral.

- Identificar factores de riesgos a los que se encuentran expuestos el equipo de trabajo

3. ACTIVIDADES EN SST

Durante el mes de junio de 2025, las actividades de SST se enfocaron en garantizar la seguridad y el bienestar teniendo en cuenta lo programado para el periodo en el cronograma de actividades. A continuación, se detallan las acciones implementadas:

3.1 Revisión de afiliaciones y pagos al sistema general de seguridad social:

Mes a mes se debe realizar la respectiva revisión al Sistema de Riesgos Laborales con el fin de retirar del sistema a los trabajadores que no siguen laborando en la empresa y afiliar a los trabajadores que hayan ingresado. Igualmente se realiza el respectivo pago de la SST.

3.1.1 Registro de Afiliación a la ARL- SURA

ARL | sura

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
ARL SURA S.A.
TRABAJADORES EN COBERTURA

Contrato	094281644	Documento	C11708479
Empresa	YEISON ALBORNOZ RIVAS		

Documento	Nombre trabajador	Sexo	Centro trabajo	Sucursal	Tarifa	Ciudad	Inicio Vigencia	Tipo afiliado	Tipo de cotizante
C1111800600	ARROYO GRANADA ANDRES JAVIER	M	0000000023 - ESTACION DE POLICIA	1 - SEDE PRINCIPAL	6.96	MANAGRU	01-05-2025	IND	59 - INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES
C1006169712	PALACIOS SINISTERRA BRAYAN FELIPE	F	0000000023 - ESTACION DE POLICIA	1 - SEDE PRINCIPAL	6.96	MANAGRU	05-06-2025	IND	59 - INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES
C11936140	CETRE RIVAS CLEMENTE	M	0000000023 - ESTACION DE POLICIA	1 - SEDE PRINCIPAL	6.96	MANAGRU	14-02-2025	IND	59 - INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES
C1000993385	PALACIOS CRISTIAN DAVID	M	0000000023 - ESTACION DE POLICIA	1 - SEDE PRINCIPAL	6.96	MANAGRU	20-05-2025	IND	59 - INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES
C94442444	GONZALEZ TORRES DEYBI MAURICIO	M	0000000023 - ESTACION DE POLICIA	1 - SEDE PRINCIPAL	6.96	MANAGRU	14-02-2025	IND	59 - INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES

C94442444	GONZALEZ TORRES DEYBI MAURICIO	M	0000000023 - ESTACION DE POLICIA	1 - SEDE PRINCIPAL	6.96	MANAGRU	14-02-2025	IND	59 - INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES
C1004039011	MURILLO MURILLO DUVER ARLEY	M	0000000023 - ESTACION DE POLICIA	1 - SEDE PRINCIPAL	6.96	MANAGRU	05-06-2025	IND	59 - INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES
C1053793900	ALBORNOZ RIVAS FREIDER	M	0000000023 - ESTACION DE POLICIA	1 - SEDE PRINCIPAL	6.96	MANAGRU	14-02-2025	IND	59 - INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES
C1077476592	HURTADO HURTADO GEIVER	M	0000000023 - ESTACION DE POLICIA	1 - SEDE PRINCIPAL	6.96	MANAGRU	20-05-2025	IND	59 - INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES
C11805685	MURILLO MURILLO ISAURO ANTONO	M	0000000023 - ESTACION DE POLICIA	1 - SEDE PRINCIPAL	6.96	MANAGRU	01-05-2025	IND	59 - INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES
C8112528	FLORES MURILLO JEILER	M	0000000023 - ESTACION DE POLICIA	1 - SEDE PRINCIPAL	6.96	MANAGRU	01-05-2025	IND	59 - INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES
C1128724165	MOSQUERA RENTERIA JHON EDINSON	M	0000000023 - ESTACION DE POLICIA	1 - SEDE PRINCIPAL	6.96	MANAGRU	01-05-2025	IND	59 - INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES
C1077648969	MURILLO MURILLO JUAN DAVID	M	0000000023 - ESTACION DE POLICIA	1 - SEDE PRINCIPAL	6.96	MANAGRU	25-06-2025	IND	59 - INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES
C11635132	PALACIOS PALACIOS JUAN EULOGIO	M	0000000023 - ESTACION DE POLICIA	1 - SEDE PRINCIPAL	6.96	MANAGRU	26-04-2025	IND	59 - INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES
C1078856472	MOSQUERA MARTINEZ LEIDYS	F	0000000023 - ESTACION DE POLICIA	1 - SEDE PRINCIPAL	6.96	MANAGRU	20-05-2025	IND	59 - INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES
C1078856269	RENGIFO VIVAS LEWIS ARLEY	M	0000000023 - ESTACION DE POLICIA	1 - SEDE PRINCIPAL	6.96	MANAGRU	26-04-2025	IND	59 - INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES
C1078856497	MARTINEZ QUINTO LUZ ADRIANA	M	0000000023 - ESTACION DE POLICIA	1 - SEDE PRINCIPAL	6.96	MANAGRU	20-05-2025	IND	59 - INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES
C1067933187	TORRES MARTINEZ MARIA CAMILA	F	0000000023 - ESTACION DE POLICIA	1 - SEDE PRINCIPAL	6.96	MANAGRU	14-02-2025	IND	59 - INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES
C1010053024	COPETE PALACIOS MARTHA CECILIA	F	0000000023 - ESTACION DE POLICIA	1 - SEDE PRINCIPAL	6.96	MANAGRU	01-05-2025	IND	59 - INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES
C1007601705	BONILLA GAMBOA NOLBER	M	0000000023 - ESTACION DE POLICIA	1 - SEDE PRINCIPAL	6.96	MANAGRU	20-05-2025	IND	59 - INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES
C70413126	HURTADO HINESTROZA ROLANDO ANTONIO	M	0000000023 - ESTACION DE POLICIA	1 - SEDE PRINCIPAL	6.96	MANAGRU	20-05-2025	IND	59 - INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES

Yeison Albornoz Rivas
+57 311 765 3636
yeial138@gmail.com
ARQUITECTO

C1007601705	BONILLA GAMBOA NOLBER	M	0000000023 - ESTACION DE POLICIA	1 - SEDE PRINCIPAL	6.96	MANAGRU	20-05-2025	IND	59 - INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES
C70413126	HURTADO HINESTROZA ROLANDO ANTONIO	M	0000000023 - ESTACION DE POLICIA	1 - SEDE PRINCIPAL	6.96	MANAGRU	20-05-2025	IND	59 - INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES
C11705349	MOSQUERA DIAZ WILSON	M	0000000023 - ESTACION DE POLICIA	1 - SEDE PRINCIPAL	6.96	MANAGRU	01-04-2025	IND	59 - INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES
C1020468439	MOSQUERA IBARGUEN YEIMAR ANDRES	M	0000000023 - ESTACION DE POLICIA	1 - SEDE PRINCIPAL	6.96	MANAGRU	07-05-2025	IND	59 - INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES
C1128724563	PEREA RODRIGUEZ YEISON YAIR	M	0000000023 - ESTACION DE POLICIA	1 - SEDE PRINCIPAL	6.96	MANAGRU	01-05-2025	IND	59 - INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES
C1078856375	HURTADO MARTINEZ YOLANDA DEL CARMEN	F	0000000023 - ESTACION DE POLICIA	1 - SEDE PRINCIPAL	6.96	MANAGRU	20-05-2025	IND	59 - INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES
C1053775082	ALBORNOZ RIVAS YUBELYS	F	0000000023 - ESTACION DE POLICIA	1 - SEDE PRINCIPAL	6.96	MANAGRU	14-02-2025	IND	59 - INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

3.1.2 Pago de Planilla de Seguridad Social (Mayo)

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 11708479		ALBORNOZ RIVAS YEISON	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRA	CALLE 30 #3 - 36	EL CANTON DEL SAN PABLO-CHOCO	3111111	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05	1542620417	9487327199	Y	2025/06/19	2025/06/10	BANCOLOMBIA	0	$2,213,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | NOVEDADES | | | | | | | |


| | | |

3.2 Entrega de EPP, Supervisión del Uso de EPP y Control de Cumplimiento:

Se entregó EPP al personal nuevo que ingresó a la obra y se les cambió los EPP deteriorados a los empleados que los tenían dañados. La supervisión del uso adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP) se realiza de manera constante, dado el incremento en las actividades de manipulación de herramientas y materiales.

Esta supervisión se realizó diariamente, lideradas por el SISO, para verificar el estado y uso correcto de los EPP.

Durante la supervisión se observó que algunos trabajadores tenían los chalecos y guantes desgastados, por ello se hizo entrega de reposición de estos EPP.

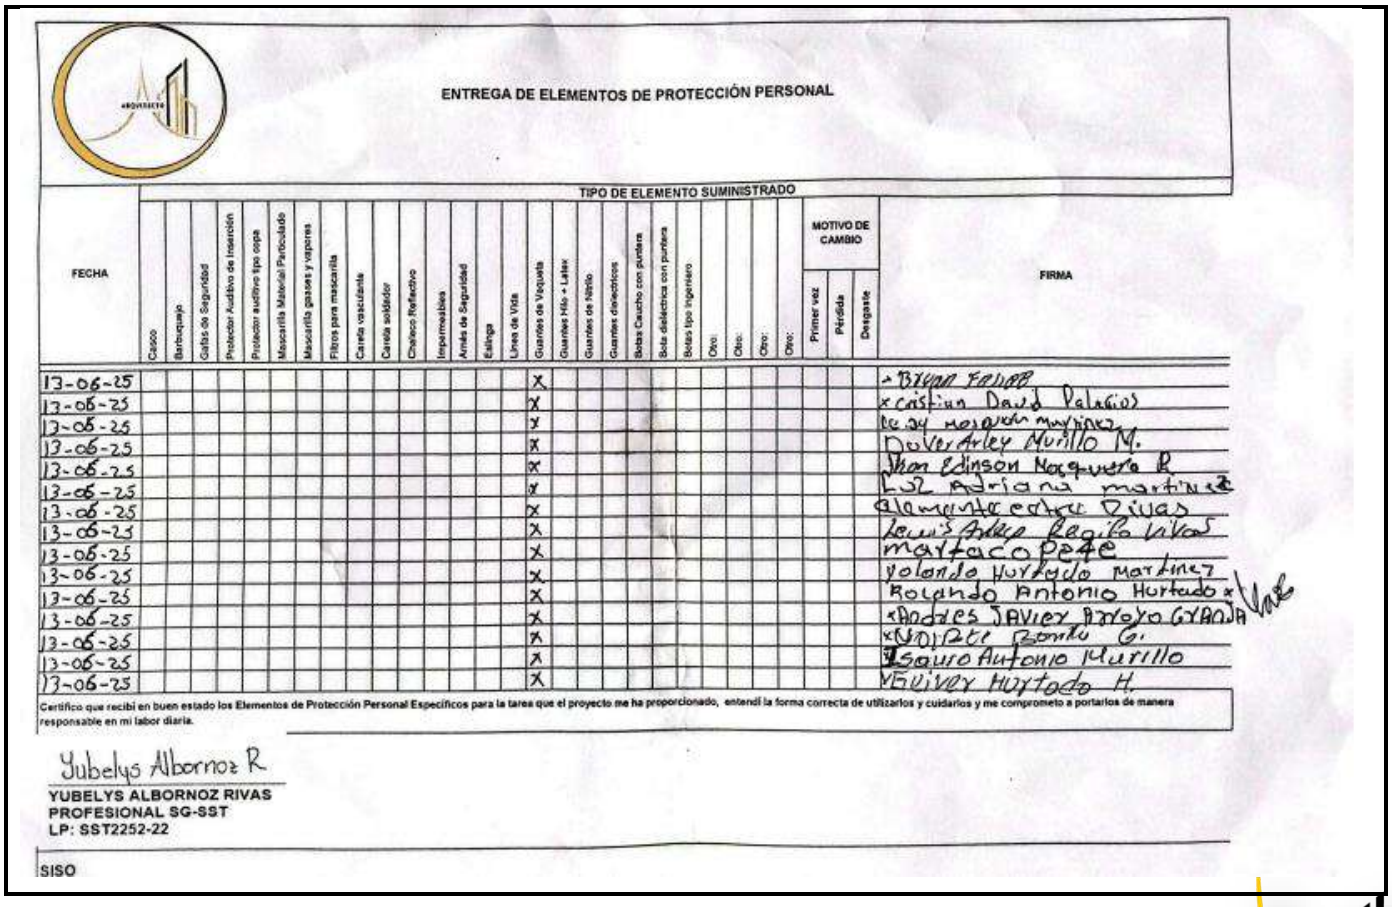

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

FECHA	TIPO DE ELEMENTO SUMINISTRADO: Casco	Barbuquejo	Gafas de Seguridad	Protector Auditivo de Inserción	Protector auditivo tipo copa	Mascarilla Material Particulado	Mascarilla gases y vapores	Filtros para mascarilla	Careta vaporizante	Careta soldador	Chaleco Reflectivo	Impermeables	Arnés de Seguridad	Eslinga	Línea de Vida	Guantes de Vaqueta	Guantes Hilo + Latex	Guantes de Nitrilo	Guantes dieléctricos	Botas Caucho con puntera	Bota dieléctrica con puntera	Botas tipo ingeniero	Otro:	Otro:	Otro:	Otro:	MOTIVO DE CAMBIO: Primer vez	Pérdida	Desgaste	FIRMA
13-06-25																X														Brayan Fabian
13-06-25																X														Cristian David Palacios
13-06-25																X														Jeison Mosquera Mayorga
13-06-25																X														Dover Arley Murillo M.
13-06-25																X														Jhon Edinson Mosquera R.
13-06-25																X														Luz Adriana martinez
13-06-25																X														Clemente Cortes Rivas
13-06-25																X														Luis Adolfo Regino Rivas
13-06-25																X														martacope4e
13-06-25																X														Yolanda Hurtado Martinez
13-06-25																X														Rolando Antonio Hurtado
13-06-25																X														Andres Javier Arroyo Granada
13-06-25																X														Didier Bonilla G.
13-06-25																X														Isauro Antonio Murillo
13-06-25																X														Yeiver Hurtado H.


Certifico que recibí en buen estado los Elementos de Protección Personal Específicos para la tarea que el proyecto me ha proporcionado, entendí la forma correcta de utilizarlos y cuidarlos y me comprometo a portarlos de manera responsable en mi labor diaria.

Yubelys Albornoz R.

YUBELYS ALBORNOZ RIVAS
PROFESIONAL SG-SST
LP: SST2252-22

SISO

Yeison Albornoz Rivas
+57 311 765 3636
yeial138@gmail.com
ARQUITECTO

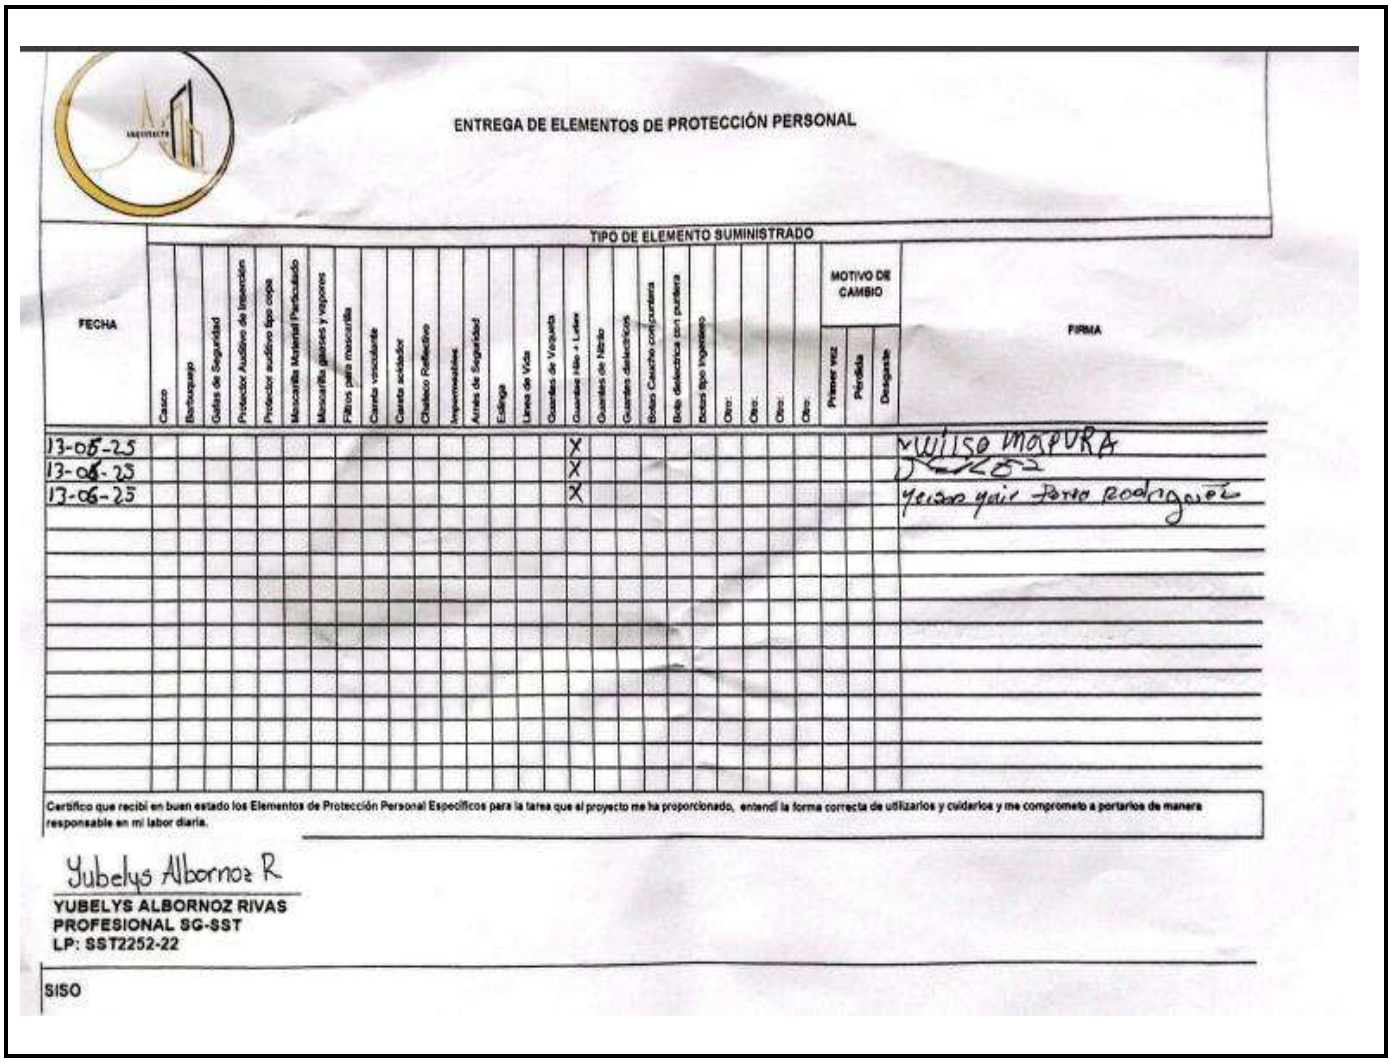

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

FECHA	TIPO DE ELEMENTO SUMINISTRADO																														MOTIVO DE CAMBIO			FIRMA
	Casco	Barbuquejo	Gafas de Seguridad	Protector Auditivo de Inserción	Protector auditivo tipo copa	Mascarilla Material Particulado	Mascarilla gases y vapores	Pitos para mascarilla	Careta vinculante	Careta soldador	Chaleco Reflectivo	Impermeables	Arnés de Seguridad	Eslinga	Línea de Vida	Guantes de Vaqueta	Guantes Nbr + Latex	Guantes de Nitrilo	Guantes dieléctricos	Botas Caucho con puntera	Bota dieléctrica con puntera	Botas tipo Ingeniero	Otro:	Otro:	Otro:	Otro:	Primer vez	Pérdida	Desgaste	
13-06-25																	X														MUISO MAPURA
13-06-25																	X														
13-06-25																	X														Yeison yair Parra Rodriguez

Certifico que recibí en buen estado los Elementos de Protección Personal Específicos para la tarea que el proyecto me ha proporcionado, entendí la forma correcta de utilizarlos y cuidarlos y me comprometo a portarlos de manera responsable en mi labor diaria.

Yubelys Albornoz R.

YUBELYS ALBORNOZ RIVAS
PROFESIONAL SG-SST
LP: SST2252-22

SISO

3.3 Reporte de Actos y Condiciones subestándares: El reporte de actos y condiciones subestándares es esencial para la prevención de accidentes en el trabajo. Teniendo en cuenta las condiciones climáticas del lugar donde se desarrolla la obra (Managrú, Cantón del San Pablo- Chocó), los trabajadores siguen manifestando que por el calor se les hace incomodo utilizar los EPP, especialmente el casco y el chaleco. Teniendo en cuenta esto, se sigue charlas de sensibilización sobre el uso obligatorio de estos.

3.4 Capacitación y Sensibilización de los Trabajadores: La capacitación y sensibilización del equipo fue una prioridad para fortalecer la cultura de seguridad en la obra. Dado a que se siguen realizando trabajos en altura y traslado de cargas, en el mes de junio se realizaron charlas de sensibilización a los trabajadores que realizan dichas actividades. Igualmente, se les realizó charlas sobre el uso adecuado de los EPP, y la importancia de las pausas activas.

Nombre Capacitador:	YUBELYS ALBORNOZ RIVAS
Temas a tratar	*Procedimiento seguro en manejo y traslado de cargas, *Capacitación en higiene postural: pausas activas * Capacitación en procedimiento seguro y riesgos asociados a trabajo en alturas
Objeto de la capacitación:	Reducir el riesgo de lesiones musculoesqueléticas, como dolores de espalda, lesiones de hombro o muñeca, que pueden ocurrir al manipular cargas de forma incorrecta.
Departamento:	CHOCÓ
Fecha:	06/06/2025

ASISTENTES

NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	FIRMA
I. Antonio Murillo	11805685	Oficial	
Jeison Sanchez	79 72779	Fontanero	
Yeison yon Pena Enriquez	1128724563	oficial	
Dector Yair Palacios Ar	1010092995	Ayudante	Dieter
yolanda Hurtado	1078856379	Ayudante	yolanda
Leyfer Giver Hurtado c.	1004038111	Ayudante	Leyfer
leidy [illegible]	1.078564172	ayudante	leidy
Luz Adriana [illegible]	1078856997	ayudante	adriana
Geiver Hurtado H.	1077476592	ayudante	Geiver
Andres Javier Arroyo	1111800600	ayudante	Andres
Cristian David Palacios P.	1004993385	Ayudante	Cristian D. Palacios
Francisco [illegible]	1124[illegible]	Ayudante	Francisco [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Clemente Cotes	11936140	Ayudante	Clemente Cotes
Jhon Edinson H R	1128784165	oficial	Jhon Edinson

Yubelys Albornoz R.

YUBELYS ALBORNOZ RIVAS
PROFESIONAL EN SG-SST
LP: SST2252-22









Yeison Albornoz Rivas
+57 311 765 3636
yeial138@gmail.com

3.5 Pausas Activas y Control del Estrés Físico

Dadas las actividades que se realizan en la obra, se realizaron de pausas activas para mitigar el estrés físico y prevenir lesiones musculoesqueléticas. Las pausas fueron dirigidas por el SISO encargado, con una duración de 5minitos, cada tres horas e incluyeron ejercicios de estiramiento enfocados en la espalda, los brazos y las piernas, áreas particularmente afectadas por las posturas repetitivas y el esfuerzo continuo.

3.6 Indicadores mínimos de SST según la resolución 312 de 2019

Es fundamental para garantizar la protección de los trabajadores y mejorar las condiciones laborales en la empresa. Estos indicadores son esenciales para evaluar el desempeño en materia de seguridad y salud laboral.

A continuación, se describen los principales indicadores mínimos medidos:

3.6.1. Ausentismo laboral

Se refiere a la inasistencia de un empleado a su puesto de trabajo durante las horas programadas.

Para el cálculo de la estadística de ausentismo laboral se tuvo en cuenta los INDICADORES DEL SG – SST, se utilizó la siguiente Formula:

$$\text{Ausentismo por causa médica} = \frac{\#\text{ de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes}}{\#\text{ de días programados de trabajo en el mes}} \times 100$$

A continuación, se detalla los indicadores para el cálculo de la estadística de ausentismo por causa médica en la obra.

Yeison Albornoz Rivas
+57 311 765 3636
yeial138@gmail.com

- Total, de días de ausencia por incapacidad laboral o común al mes= 0
- Número de días programados en el mes: 25

Ausentismo por causa médica= 0 / 25 * 100= 0
En el mes de junio se perdió 0 de días programados por incapacidad médica.

3.6.2. Incidencia por enfermedad laboral

Estos indicadores miden la cantidad de casos de enfermedades laborales en un período específico.

Para el cálculo de la estadística de Incidencia por enfermedad laboral se tuvo en cuenta los INDICADORES DEL SG – SST, se utilizó la siguiente Formula:

$$\text{Incidencia de enfermedad laboral} = \frac{\#\text{ de casos nuevos de EL en periodo Z}}{\text{Promedio de trabajadores en periodo Z}} \times 100.000$$

A continuación, se detalla los indicadores para el cálculo de la estadística de Incidencia por enfermedad laboral en la obra.

- ✓ Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo= 0
- ✓ Promedio Total de trabajadores en el periodo = 25

Incidencia de enfermedad laboral= 0 / 25 * 100.000 = 0

Esto significa que no hay nuevos casos de enfermedad laboral reportados en ese mes, lo que indica una incidencia de 0 por cada 100,000 trabajadores. Este resultado es positivo, ya que sugiere que no se han presentado enfermedades laborales en la empresa durante ese periodo.

Yeison Albornoz Rivas
+57 311 765 3636
yeial138@gmail.com
ARQUITECTO

3.6.3. Frecuencia de Accidentalidad

Permite calcular la cantidad de veces que ocurre un accidente de trabajo en el mes en una empresa.

Para el cálculo de la estadística de frecuencia de accidentalidad se tuvo en cuenta los INDICADORES DEL SG – SST, se utilizó la siguiente Formula:

$$\text{Frecuencia de accidentalidad} = \frac{\#\text{ de accidentes de trabajo en el mes}}{\#\text{ de trabajadores en el mes}} \times 100$$

A continuación, se detalla los indicadores para el cálculo de la estadística de Incidencia por enfermedad laboral en la obra.

+Número de accidentes de trabajo en el mes= 0

+Número de trabajadores al mes = 25

IF= (0/25) * 100= 0

Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes de junio se presentaron 0 Accidentes de Trabajo.

Yubelys Albornoz R

YUBELYS ALBORNOZ RIVAS
PROFESIONAL SG-SST
LP: SST2252-22

Yeison Albornoz Rivas
+57 311 765 3636
yeial138@gmail.com
ARQUITECTO

CONTRATO DE OBRA N° 001-LP-PO-2023

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE CANTÓN DE SAN PABLO - DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ”

REALIZÓ: FREIDER ALBORNOZ RIVAS
INGENIERO CIVIL
M. P. 17202–227438 CLD

CARGO: RESIDENTE DE OBRA

INFORME TÉCNICO MENSUAL N°: 12

PERIODO DE COBERTURA:
DEL 02 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO

2025

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. OBJETIVOS 4
2.1. OBJETIVO GENERAL 4
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 4
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 5
4. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 6
4.1. LOCALIZACIÓN GENERAL 6
4.2. LOCALIZACIÓN DETALLADA 7
5. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 8
6. ACTIVIDADES EJECUTADAS 9
7. CONCLUSIÓN 14

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1. Tomada del Contrato de obra 8
Tabla 2. Actividades Realizadas 13

LISTADO DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Figura N° 2: localización general de Estación de Policía 6
Ilustración 2. Figura N° 3: localización detallada de Estación de Policía 7

Yeison Albornoz Rivas
+57 311 765 3636
yeial138@gmail.com

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como objetivo proporcionar una descripción técnica detallada de las actividades ejecutadas bajo el **CONTRATO DE OBRA No. MCS-SP-LP-001-2023**, cuyo objeto es la "**AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE CANTÓN DE SAN PABLO – DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ**". Esta infraestructura está destinada a fortalecer la seguridad y el orden público en la región, mejorar la respuesta ante emergencias, proporcionar un centro de operaciones moderno y eficiente para las fuerzas policiales, además de promover la confianza y colaboración entre la comunidad y las autoridades. En el marco de este informe, se detalla el progreso de las actividades desarrolladas durante el periodo de junio, abarcando aspectos críticos de la ejecución del proyecto, así como el análisis de la inversión financiera realizada hasta la fecha.

Para proporcionar una visión exhaustiva, este informe se estructura en varias secciones técnicas que describen el desarrollo del proyecto en detalle. Cada sección aborda aspectos específicos de la construcción, incluyendo las metodologías empleadas, las fases completadas y los hitos alcanzados. La información contenida en este informe está orientada a brindar una comprensión clara y precisa del estado actual del proyecto, ofreciendo una base sólida para la toma de decisiones informadas por parte de las partes interesadas.

Yeison Albornoz Rivas
+57 311 765 3636
yeial138@gmail.com
ARQUITECTO

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

Documentar y analizar el progreso mensual del proyecto "**AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE CANTÓN DE SAN PABLO – DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ**", proporcionando una visión clara y detallada del estado del proyecto, los avances logrados, los desafíos enfrentados y las acciones correctivas implementadas.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Registrar el progreso de las actividades planificadas para el mes en curso.
- Comparar el avance real con el cronograma establecido para identificar posibles desviaciones.
- Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y normas de construcción.
- Proporcionar recomendaciones y observaciones pertinentes para mejorar la gestión del proyecto.
- Elaborar un informe detallado y claro que pueda ser comprendido por todos los involucrados en el proyecto, incluyendo autoridades municipales, contratistas, y la comunidad.

Yeison Albornoz Rivas
+57 311 765 3636
yeial138@gmail.com

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto "**AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE CANTÓN DE SAN PABLO**" constituye una intervención fundamental para elevar los estándares de seguridad y promover el desarrollo socioeconómico en el municipio. La actual carencia de una infraestructura de seguridad adecuada ha limitado gravemente la capacidad de las fuerzas de policía para responder de manera eficiente a emergencias y delitos, lo que ha generado una sensación de inseguridad entre los residentes y ha comprometido la efectividad de las operaciones policiales. Este proyecto tiene como objetivo abordar estas deficiencias mediante la construcción de una estación de policía moderna y bien equipada que permita una respuesta rápida y eficaz a las necesidades de seguridad del municipio. El desarrollo de la nueva estación de policía no solo representará una mejora tangible en la infraestructura de seguridad, sino que también servirá como un catalizador para fortalecer la relación entre la comunidad y las autoridades. La implementación de esta infraestructura permitirá a la policía operar desde un espacio adecuado, facilitando un mejor desempeño en sus funciones y promoviendo una mayor proximidad con la población. Este enfoque contribuirá a construir una mayor confianza entre los residentes y las fuerzas de seguridad, alentando una cooperación más estrecha y eficaz en la resolución de problemas locales y en la prevención del delito.

Yeison Albornoz Rivas
+57 311 765 3636
yeial138@gmail.com

4. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

El Cantón del San Pablo es un municipio que se sitúa en una zona de selva tropical húmeda, con una topografía predominantemente montañosa y cubierta de vegetación densa. Limita al Norte con Río Quito y Baudó, al Oriente con Cértegui y Unión Panamericana al Sur con Istmina y al Occidente con Alto Baudó y Medio Baudó.

4.1. LOCALIZACIÓN GENERAL

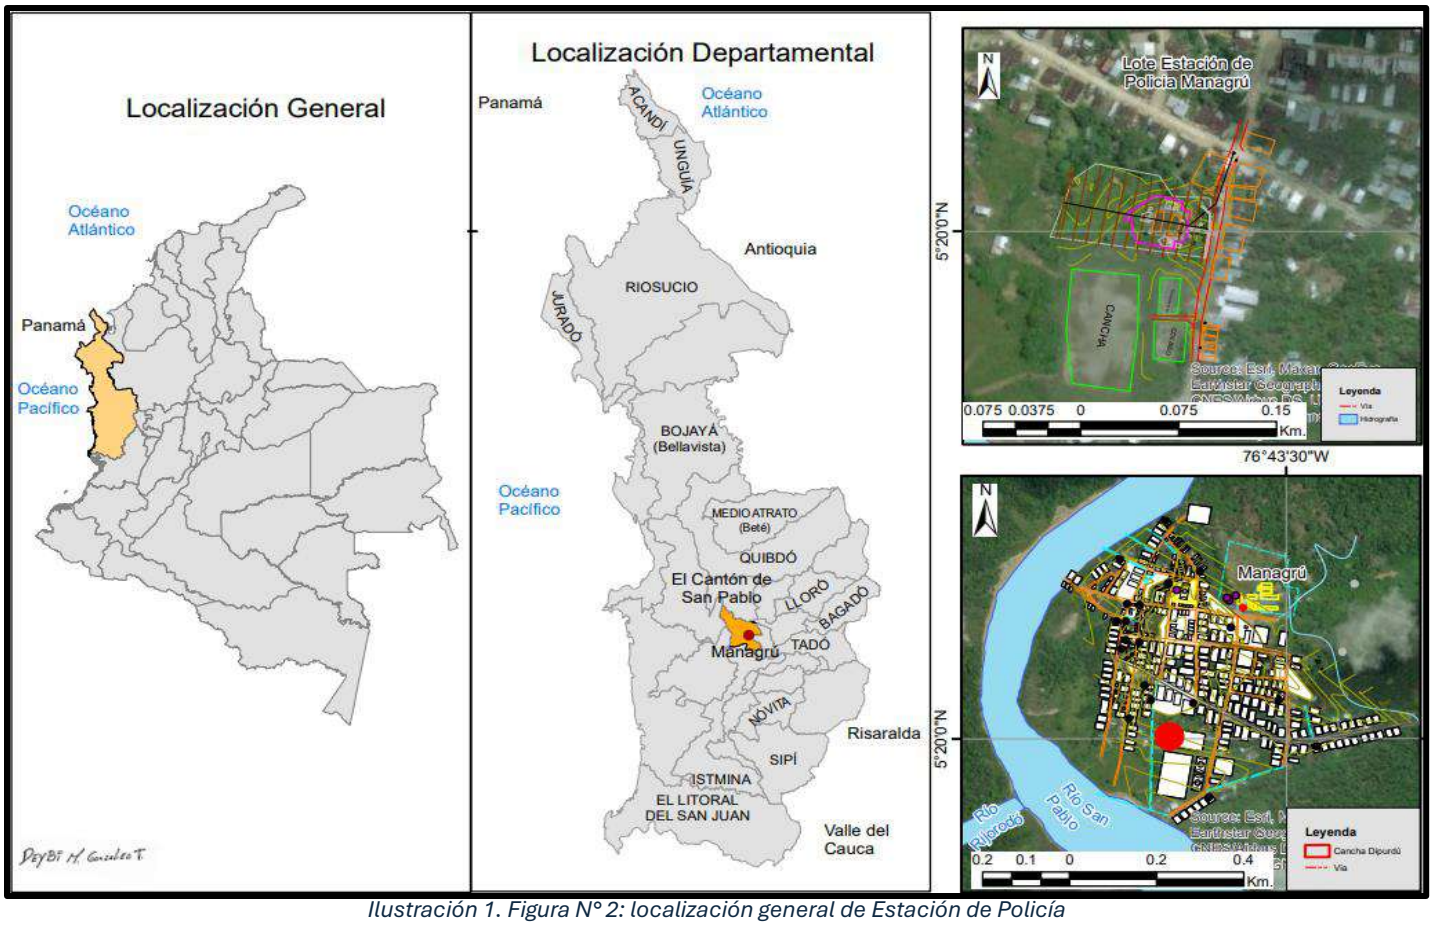


Ilustración 1. Figura N° 2: localización general de Estación de Policía

Yeison Albornoz Rivas
+57 311 765 3636
yeial138@gmail.com

4.2. LOCALIZACIÓN DETALLADA

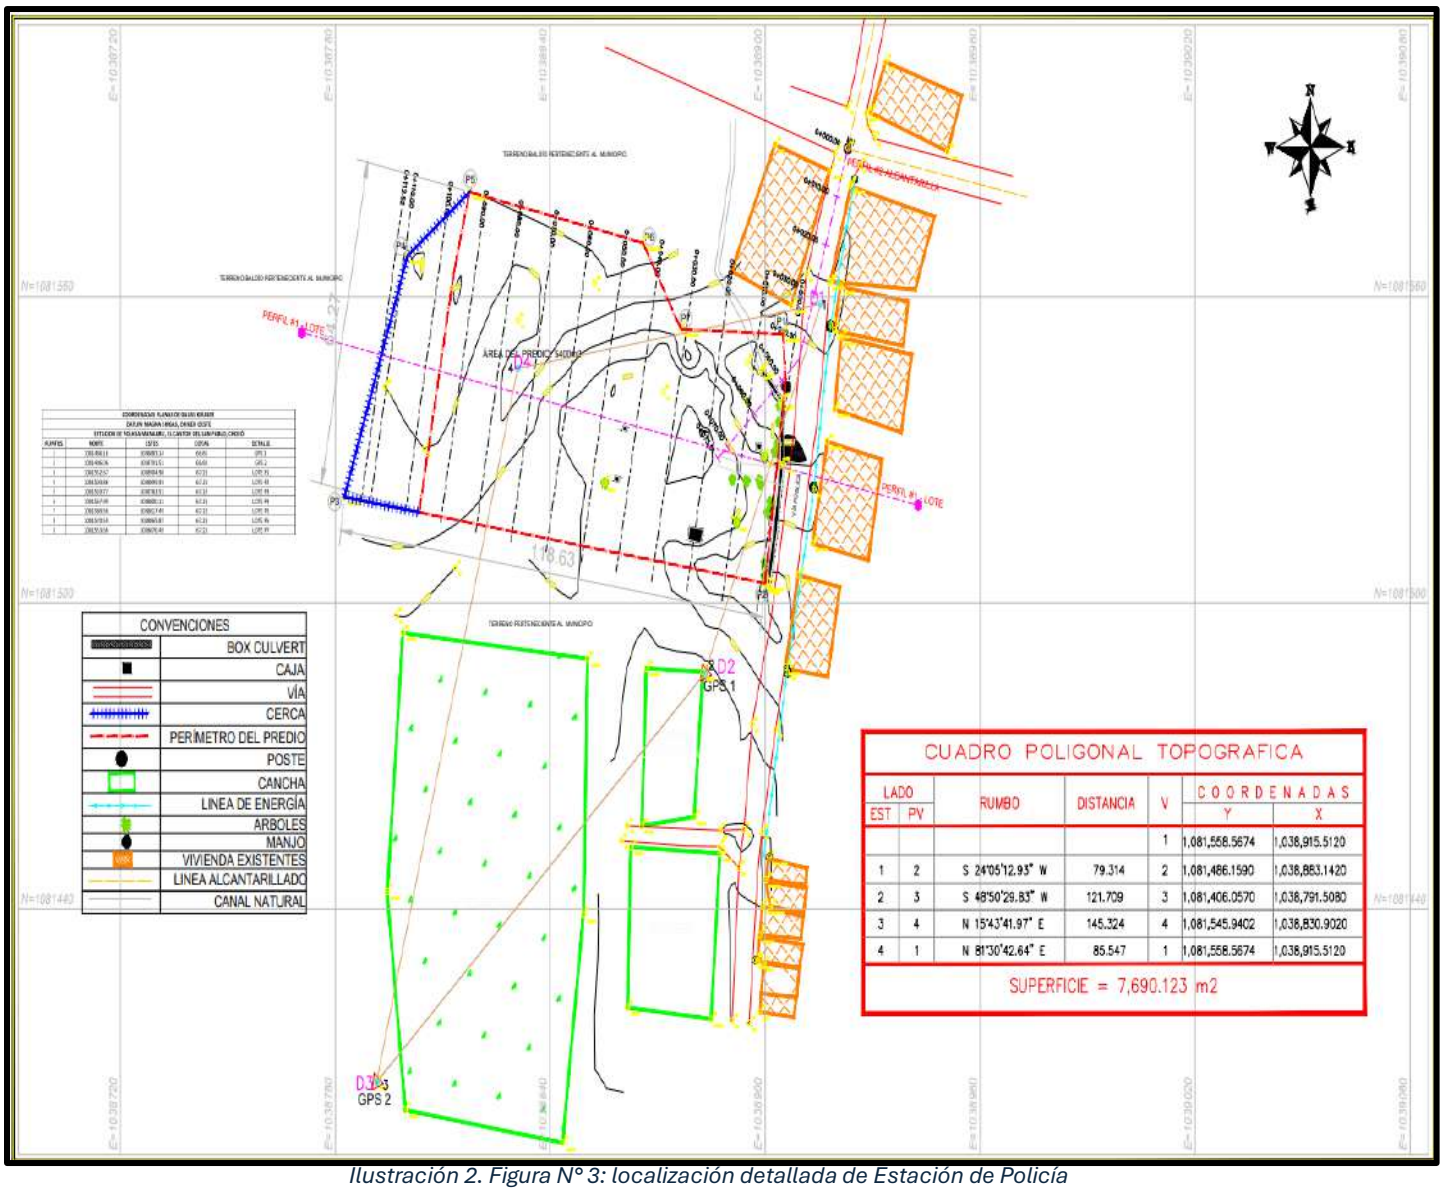


Ilustración 2. Figura N° 3: localización detallada de Estación de Policía

Yeison Albornoz Rivas
+57 311 765 3636
yeial138@gmail.com

5. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

1. CONTRATO NO.	MCS-SP-LP-001-2023
2. CONTRATISTA	YEISON ALBORNOZ RIVAS
3. NIT O DOC. IDENTIDAD	CC: 11.708.479 de Istmina
4. OBJETO DEL CONTRATO	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE CANTÓN DE SAN PABLO – DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ".
5. PLAZO DE EJECUCIÓN	Nueve (9) meses
6. NUEVO PLAZO DE EJECUCIÓN	Veinte (20) meses
7. FECHA DE INICIACIÓN	28 de febrero de 2023
8. FECHA DE TERMINACIÓN	28 de noviembre de 2023
9. NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	30 de julio de 2025
10. ACTA DE REINICIO No. 2	08 de julio de 2024
11. OTROSI No. 4	31 de diciembre de 2024 (prorroga)
12. VALOR	CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS PESOS ($5.325.747.616=) M/CTE.
13. FECHA DE INICIACIÓN	28 DE FEBRERO DE 2023
14. FECHA DE TERMIACIÓN	30 DE JULIO DE 2025

Tabla 1. Tomada del Contrato de obra

Yeison Albornoz Rivas
+57 311 765 3636
yeial138@gmail.com

6. ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEMS	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN
	FABRICACIÓN Y ACOPIO DE BLOQUES DE CONCRETO	En este mes de junio, se continuo con la fabricación de bloques de concreto con estrictos controles de calidad. Así mismo, se organizó su acopio en el sitio de obra, garantizando la disponibilidad inmediata para las actividades de mampostería.









Yeison Albornoz Rivas
+57 311 765 3636
yeial138@gmail.com

	SUMINISTRO, CORTE, DOBLADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO (FY = 60,000 PSI) PARA VIGAS AÉREAS DEL BLOQUE ADMINISTRATIVO Y ENCOFRADO DEL BLOQUE DE ALOJAMIENTO SUR	Así mismo, se continuó con el suministro y figuración del acero de refuerzo para las vigas aéreas del bloque administrativo. De acuerdo con los planos, se completó el encofrado del bloque de alojamiento sur, asegurando la estabilidad estructural.









Yeison Albornoz Rivas
+57 311 765 3636
yeial138@gmail.com

	ENCOFRADO DE COLUMNAS PARA EL MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL	Se realizó el montaje del encofrado para las columnas del muro perimetral. Por consiguiente, se garantizó la precisión geométrica, lo que permitió avanzar con el vaciado de concreto al finalizar la semana.





	VACIADO DE CONCRETO PARA COLUMNAS DEL MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL	En este mes, se llevó a cabo el vaciado de concreto para las columnas del muro perimetral. Así mismo, se implementaron procesos de curado adecuados, asegurando la resistencia requerida del material.





Yeison Albornoz Rivas
+57 311 765 3636
yeial138@gmail.com

	MAMPOSTERÍA DE BLOQUES DE CONCRETO PARA EL MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL	Al finalizar el encofrado y vaciado, se continuó con la pega de bloques de concreto para el muro perimetral. De acuerdo con las especificaciones, se logró un avance significativo en la construcción de este cerramiento.









Yeison Albornoz Rivas
+57 311 765 3636
yeial138@gmail.com
ARQUITECTO

	ENCOFRADO PARA EL VACIADO DE VIGAS AÉREAS Y LOSAS DEL BLOQUE DE ALOJAMIENTO SUR	Igualmente, en este mes se realizó el montaje del encofrado y la colocación de madera para las vigas aéreas y losas del bloque de alojamiento sur. Por consiguiente, se aseguró la capacidad del sistema para soportar el concreto.






Tabla 2. Actividades Realizadas

Revisado y avalado por,

YEISON ALBORNOZ RIVAS
CONTRATISTA DE OBRA
MP- A17292009-11708479

Yeison Albornoz Rivas
+57 311 765 3636
yeial138@gmail.com

7. CONCLUSIÓN

Durante este periodo, se ha logrado cumplir con el porcentaje de **62,25%**, lo cual refleja un avance significativo y eficiente en su desarrollo. Las actividades programadas se han completado con éxito, evidenciando una planificación estratégica y una ejecución eficaz por parte del equipo de trabajo. Este progreso asegura no solo la estabilidad de la infraestructura, sino también su durabilidad a largo plazo. El equipo ha implementado medidas de seguridad rigurosas, las cuales han sido clave para minimizar los riesgos laborales y proteger la integridad del personal involucrado. Estas medidas incluyen protocolos de seguridad detallados y controles estrictos, que han contribuido a un ambiente de trabajo seguro y organizado. Además, la coordinación efectiva entre los diferentes equipos de trabajo y una gestión adecuada de los recursos han jugado un papel fundamental en el logro de estos hitos. La comunicación fluida y la colaboración entre las distintas áreas han optimizado el uso de los recursos y han permitido una ejecución más eficiente de las tareas. El progreso alcanzado hasta la fecha no solo reafirma la viabilidad del proyecto, sino que también fortalece la confianza en la capacidad del equipo para afrontar y superar los retos que se presenten en las etapas futuras. La capacidad del equipo para cumplir con los objetivos establecidos y adaptar las estrategias según sea necesario subraya el compromiso con la excelencia y la continuidad exitosa del proyecto.

Yeison Albornoz Rivas
+57 311 765 3636
yeial138@gmail.com

CONTRATO DE OBRA N° 001 - LP-OP-2023

OBJETO: “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE CANTÓN DE SAN PABLO – DEPARTAMENTO DE CHOCÓ”

INGENIERO AMBIENTAL
YOVIRLON ASPRILLA ALBORNOZ
MAT 011021-0584595 ANT

INFORME AMBIENTAL MENSUAL N°: 12

PERIODO DE COBERTURA
02 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO
2025

Yeison Albornoz Rivas
+57 311 765 3636
yeial138@gmail.com
ARQUITECTO

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3

2. OBJETIVOS 4

2.1 Objetivo General 4

2.2 Objetivos Específicos 4

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 5

4. PROGRAMAS AMBIENTALES 6

4.1 Medio Abiótico 6

4.1.1 Conservación del Recurso Suelo 6

4.1.2 Gestión de Recursos Hídricos 7

4.1.3 Calidad del Aire y Control de Emisiones 7

4.2 Medio Biótico 8

4.2.1 Manejo de la Cobertura Vegetal 8

4.3 Gestión Social 8

4.3.1 Participación Comunitaria y Empleo Local 8

5. Conclusiones 9

6. REGISTROS FOTOGRÁFICOS 10

7. CAPACITACIONES AMBIENTALES 13

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 15

9. ANEXOS - LISTADOS DE ASISTENCIA 16

Yeison Albornoz Rivas
+57 311 765 3636
yeial138@gmail.com
ARQUITECTO

1. INTRODUCCIÓN

La implementación de proyectos de infraestructura, particularmente en zonas ambientalmente sensibles como el municipio de Cantón de San Pablo en el Departamento del Chocó, requiere una planificación integral que considere tanto los beneficios sociales y económicos como los posibles impactos ambientales. En este contexto, el proyecto de construcción de la estación de policía constituye una obra crítica para mejorar la seguridad pública y fortalecer la gobernanza en esta región del Chocó, una de las más necesitadas en términos de infraestructura institucional.

No obstante, la ejecución de proyectos de esta magnitud en una zona de alta biodiversidad y vulnerabilidad social conlleva retos significativos en términos ambientales. El entorno del Chocó es un ecosistema altamente sensible, caracterizado por su riqueza biológica, su alta pluviosidad y la presencia de numerosas comunidades rurales que dependen del equilibrio ambiental para sus actividades cotidianas. Por lo tanto, cualquier intervención que no esté adecuadamente planificada y monitoreada podría desencadenar efectos adversos irreversibles.

Este informe presenta un análisis detallado de las acciones ambientales realizadas durante el mes de enero de 2025, dentro del marco del Plan de Manejo Ambiental (PMA), enfocándose en los programas abióticos, bióticos y sociales que han sido ejecutados hasta la fecha. La base del enfoque adoptado sigue los principios de la gestión ambiental sostenible, con el objetivo de asegurar que los impactos negativos se minimicen, mientras que los beneficios sociales del proyecto se maximicen para la comunidad local.

Yeison Albornoz Rivas
+57 311 765 3636
yeial138@gmail.com
ARQUITECTO

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Asegurar que la ejecución de las obras de construcción de la estación de policía en el municipio de Cantón de San Pablo se desarrolle bajo los más estrictos lineamientos ambientales, cumpliendo con la normatividad colombiana e internacional, y aplicando estrategias de mitigación, control y compensación ambiental que garanticen la sostenibilidad a largo plazo del proyecto y el bienestar de las comunidades afectadas.

2.2 Objetivos Específicos

- Implementar medidas de prevención y mitigación para evitar la contaminación de los recursos hídricos y minimizar la alteración del suelo durante la ejecución de las obras.

- Establecer un sistema eficiente de manejo de residuos sólidos y peligrosos, acorde con las normativas ambientales nacionales, que permita una correcta disposición final y minimice la generación de residuos en la obra.

- Fomentar la participación de la comunidad en los procesos de educación ambiental, empleo local y seguimiento de las actividades del proyecto, asegurando su involucramiento activo y la maximización de beneficios socioeconómicos.

- Monitorear y controlar las emisiones de contaminantes al aire y las fuentes de ruido generadas por la maquinaria y las actividades constructivas, con el fin de reducir los efectos sobre la calidad de vida de la población y los ecosistemas.

Yeison Albornoz Rivas
+57 311 765 3636
yeial138@gmail.com
ARQUITECTO

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto de construcción de la estación de policía en Cantón de San Pablo es una intervención de infraestructura pública esencial para la mejora de las condiciones de seguridad y la presencia del Estado en esta región del Chocó. La obra incluye la edificación de áreas operativas para la policía, dormitorios, oficinas administrativas, espacios de formación y áreas comunes para el personal, en una infraestructura moderna y funcional que permitirá optimizar la labor de las fuerzas de seguridad.

El diseño del proyecto contempla una serie de medidas de sostenibilidad y eficiencia energética, como el uso de sistemas de captación de aguas pluviales y la incorporación de tecnologías de bajo consumo energético. Además, se ha prestado especial atención a la reducción del impacto visual y paisajístico, buscando integrar la estación de policía al entorno natural, sin alterar de forma significativa la estética de la región.

Yeison Albornoz Rivas
+57 311 765 3636
yeial138@gmail.com
ARQUITECTO

4. PROGRAMAS AMBIENTALES

Las actividades comprendida el mes de junio incluyen el vaciado de losa, la elaboración de bloques, el vaciado de viguetas y el figurado de acero para losa, todas ejecutadas con un enfoque en la sostenibilidad ambiental y social, alineadas con el Plan de Manejo Ambiental (PMA).

4.1 Medio Abiótico

4.1.1 Conservación del Recurso Suelo

Las actividades de vaciado de losa, elaboración de bloques y figurado de acero implicaron movimientos intensivos de materiales (cemento, arena, grava) y el uso de maquinaria, lo que podría causar compactación, erosión o pérdida de la capa fértil del suelo, especialmente en el contexto del Chocó, donde los suelos son húmedos y vulnerables a la degradación.

Acciones Implementadas: Se delimitaron áreas para el acopio de materiales, evitando la dispersión de partículas por viento o lluvia. Esto preservó la estructura del suelo.

Reducción de Compactación: Se instalaron plataformas de madera reciclada en zonas de trabajo, rotadas cada 10 días para permitir la recuperación del suelo.

Manejo de Residuos: Se recolectaron diariamente restos de concreto y bloques defectuosos, trasladándolos a sitios de disposición autorizados, previniendo obstrucción de drenajes. Estas medidas protegieron la estabilidad del suelo, garantizando la sostenibilidad del entorno y la viabilidad de la obra.

4.1.2 Gestión de Recursos Hídricos

El vaciado de losa y viguetas, junto con la elaboración de bloques, requirió agua para mezclas y curado, generando aguas residuales por lavado de herramientas. En el Chocó, la alta pluviosidad y la abundancia de cuerpos de agua superficiales hacen crítico evitar la contaminación hídrica.

Acciones Implementadas: Se implementaron sistemas de riego controlado, reduciendo el consumo de agua. Además, el agua de lavado se reutilizó para humectar áreas de trabajo. Estas acciones aseguraron un uso responsable del agua, protegiendo las fuentes hídricas esenciales para la comunidad y la biodiversidad.

4.1.3 Calidad del Aire y Control de Emisiones

La manipulación de materiales secos y el uso de mezcladoras generaron polvo, potencialmente dañino para la vegetación y la salud en un entorno húmedo como el Chocó.

Acciones Implementadas: Las mezcladoras se revisaron semanalmente, asegurando el correcto funcionamiento de los filtros de escape para minimizar emisiones de partículas.

Control de Polvo: Se humedecieron las áreas de trabajo para reducir la dispersión de polvo, protegiendo la vegetación y la salud de trabajadores y vecinos. Estas medidas mantuvieron la calidad del aire, cumpliendo con la normativa ambiental y las expectativas comunitarias.

4.2 Medio Biótico

4.2.1 Manejo de la Cobertura Vegetal

La alta biodiversidad del Chocó requiere proteger la vegetación nativa, que regula el agua y sustenta la fauna. Las actividades de construcción podrían generar impactos indirectos en áreas cercanas.

Acciones Implementadas: Se prohibió el almacenamiento de materiales a menos de 5 metros de la vegetación, evitando compactación de raíces y contaminación por polvo.

Limpieza Diaria: Se retiraron residuos para prevenir efectos negativos en el crecimiento de plantas cercanas. Estas acciones minimizaron los impactos en la vegetación, preservando el ecosistema local.

4.3 Gestión Social

4.3.1 Participación Comunitaria y Empleo Local

La construcción de la estación de policía busca no solo un propósito funcional, sino también un impacto social positivo en una región históricamente marginada, promoviendo empleo y empoderamiento comunitario. En este sentido se realizaron tres talleres (3, 17 y 30 de junio) para los trabajadores, con duraciones de 8 y 6 minutos, enfocados en la fabricación de bloques (15 y 20 cm), vaciado de viguetas y losas. Las sesiones incluyeron prácticas y charlas de seguridad.

5. Conclusiones

Entre el 2 y el 30 de junio de 2025, las actividades de vaciado de losa, elaboración de bloques, vaciado de viguetas y figurado de acero se ejecutaron con un enfoque ambiental y socialmente responsable. Las medidas de mitigación protegieron el suelo, el agua y el aire, mientras que las acciones sociales promovieron la participación comunitaria. El cumplimiento del PMA garantiza un avance sostenible del proyecto, alineado con los objetivos de seguridad y desarrollo para Cantón de San Pablo.

Yovirlon Asprilla Albornoz

YOVIRLON ASPRILLA ALBORNOZ
INGENIERO AMBIENTAL
MAT 011021-0584595 ANT

Yeison Albornoz Rivas
+57 311 765 3636
yeial138@gmail.com
ARQUITECTO

6. REGISTROS FOTOGRÁFICOS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE CANTÓN DE SAN PABLO – DEPARTAMENTO DE CHOCÓ."
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	MUNICIPIO CANTÓN DE SAN PABLO (MANAGRÚ)
CONTRATISTA:	YEISON ALBORNOZ RIVAS
CONTRATO DE OBRA:	N° 001-LP-OP-2023



Manejo de residuos sólidos generados dentro de la obra

Yeison Albornoz Rivas
+57 311 765 3636
yeial138@gmail.com
ARQUITECTO

NOMBRE DEL PROYECTO:	“AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE CANTÓN DE SAN PABLO – DEPARTAMENTO DE CHOCÓ.”
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	MUNICIPIO CANTÓN DE SAN PABLO (MANAGRÚ)
CONTRATISTA:	YEISON ALBORNOZ RIVAS
CONTRATO DE OBRA:	N° 001-LP-OP-2023



instalación de bloques para muros interiores, vigas, y baseo de loza con personal de obra

Yeison Albornoz Rivas
+57 311 765 3636
yeial138@gmail.com

NOMBRE DEL PROYECTO:	“AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE CANTÓN DE SAN PABLO – DEPARTAMENTO DE CHOCÓ.”
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	MUNICIPIO CANTÓN DE SAN PABLO (MANAGRÚ)
CONTRATISTA:	YEISON ALBORNOZ RIVAS
CONTRATO DE OBRA:	N° 001-LP-OP-2023



Área de acopio de materiales y la importancia de ahorro de energía al usar maquinaria

Yeison Albornoz Rivas
+57 311 765 3636
yeial138@gmail.com
ARQUITECTO

7. CAPACITACIONES AMBIENTALES

Durante junio, se ejecutaron las siguientes capacitaciones conforme al cronograma establecido:

TEMA	FECHA	TIEMPO
Capacitación en técnicas para controlar emisiones de polvo y ruido en áreas de trabajo	03/06/2025	8
Alcoholemia y sustancias psicoactivas	17/06/2025	6
Manejo de residuos sólidos convencionales (aprovechables y no aprovechables)	30/06/2025	5





Atentamente,

Yeison Albornoz Rivas
+57 311 765 3636
yeial138@gmail.com

Yovirlon Asprilla Albornoz

YOVIRLON ASPRILLA ALBORNOZ
INGENIERO AMBIENTAL
MAT 011021-0584595 ANT

Yeison Albornoz Rivas
+57 311 765 3636
yeial138@gmail.com
ARQUITECTO

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CAPACITACIÓN EN MEDIO AMBIENTE DEL PROYECTO "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO – DEPARTAMENTO DE CHOCO."

TEMA DE CAPACITACIÓN	FECHA PERIOCIDAD	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12
		1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
ELEMENTOS BASICOS LEGALES													
Inducción al personal residente de obra	Al inicio de la obra												
Divulgación de medidas de manejo ambiental	Al inicio de la obra												
Conformación del grupo de Gestión Ambiental	Máx. 10 días a partir del acta de												
Manejo de residuos sólidos convencionales (aprovechables y no aprovechables)	Mensual												
Manejo de la generación de ruido y emisiones por la maquinaria	Durante la ejecución de la obra												
Manejo y disposición final de aguas generadas por lavado de herramientas	Durante la ejecución de la obra												
Manejo de materiales de obra	Durante la ejecución de la obra												
IMPORTANCIA SOBRE EL AHORRO DE ENERGIA AL USAR LA MAQUINARIA	Durante la ejecución de la obra												
manejo del material particulado y olores por el uso de maquinarias	durante la ejecución de la obra												
uso y ahorro eficiente de agua(la importancia de recoleccion de aguas lluvias en obras civiles)	durante la ejecución de la obra												
uso de material petreo e importancia sobre los recursos naturales	Durante la ejecución de la obra												

Cronograma de actividades

Yeison Albornoz Rivas
+57 311 765 3636
yeial138@gmail.com
ARQUITECTO

9. ANEXOS - LISTADOS DE ASISTENCIA



Nombre del Proyecto:	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO – DEPARTAMENTO DE CHOCO.
Nombre Capacitador:	YOVIRLON ASPRILLA ALBORNOZ
Tema:	Alcoholemia y sustancias psicoactivas
Objetivo	Capacitar a los empleados sobre los riesgos y consecuencias del consumo de alcohol y drogas en la seguridad laboral y la calidad del trabajo
Departamento:	CHOCO
Fecha:	03/06/2025

ASISTENCIA CAPACITACIONES

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA

Yovirlon Asprilla Albornoz
Ingeniero ambiental
TP 015021-0584505 ANT

Yeison Albornoz Rivas
+57 311 765 3636
yeial138@gmail.com
ARQUITECTO



Nombre del Proyecto:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO – DEPARTAMENTO DE CHOCO.
Nombre Capacitador:	YOVIRLON ASPRILLA ALBORNOZ
Tema:	Capacitación en técnicas para controlar emisiones de polvo y ruido en áreas de trabajo
Objetivo	Capacitar al personal en la identificación de fuentes generadoras de polvo y ruido en los lugares de trabajo, así como en la aplicación de técnicas de control y mitigación efectivas, con el fin de proteger la salud de los trabajadores.
Departamento:	CHOCO
Fecha:	17/06/2025

ASISTENCIA CAPACITACIONES

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA

Yovirlon Asprilla Albornoz
Ingeniero ambiental
TP 011021-0584566 ANT

Yeison Albornoz Rivas
+57 311 765 3636
yeial138@gmail.com
ARQUITECTO



Nombre del Proyecto:	ALINAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO – DEPARTAMENTO DE CHOCO.
Nombre Capacitador:	YOVIRLON ASPRILLA ALBORNOZ
Tema:	Manejo de residuos sólidos convencionales (aprovechables y no aprovechables)
Objetivo	Establecer un sistema integral para el manejo adecuado de residuos sólidos convencionales, promoviendo la separación en la fuente, el aprovechamiento de materiales reciclables y la disposición final segura de los no aprovechables, con el fin de minimizar el impacto ambiental y fomentar una cultura de sostenibilidad.
Departamento:	CHOCO
Fecha:	30/06/2025

ASISTENCIA CAPACITACIONES

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
[illegible]	[illegible]	Ayudante	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Ayudante	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Ayudante	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Ayudante	[illegible]
[illegible]	[illegible]	oficial	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Ayudante	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Maestro	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Ayudante	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Ayudante	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Ayudante	[illegible]
Rosendo Hurtado		Ayudante	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Ayudante	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Oficial	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Ayudante	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Ayudante	[illegible]

Yovirlon Asprilla Albornoz
Ingeniero ambiental
TP.011021-0584595 ANT

Yeison Albornoz Rivas
+57 311 765 3636
yeial138@gmail.com
ARQUITECTO

	INFORME DE INTERVENTORIA **YORK STIVENSON PEREA AYALA** **INFORME INTERVENTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE LA PLICIA EN EL MUNICIPIO DE EL CANTON DE SAN PALO DEPARTAMENTO CHOCO"**		
MINISTERIO DEL INTERIOR		CANTÓN DE SAN PABLO	YORK STIVENSON PEREA AYALA
Versión: 01			

INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No:	**5¶**	**MES:JUNIO**			**FECHA DE INFORME**		
CONTRATO No	001-I-CM de 2023	**OBJETO:**	INFORME INTERVENTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE LA PLICIA EN EL MUNICIPIO DE EL CANTON DE SAN PABLO DEPARTAMENTO CHOCO"	**DEL**	**23-jun-25**	**AL**	**29-jun-25**
INTERVENTOR:**YORK STIVENSON PEREA AYALA**		**DIRECTOR DE INTERVENTORIA ING. KATHERINE HINESTROZA**			**DIRECTOR DE OBRA: ARQ YEISON ALBORNOZ RIVAS**		


1. LOCALIZACION DEL PROYECTO

MANAGRÚ - MUNICIPIO CANTÓN DE SAN PABLO - CHOCÓ

2. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO DE OBRA

FECHA DEL CONTRATO:	miércoles, 8 de marzo de 2023			**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:**	$ 4.160.457.625,00		
FECHA DE INICIACIÓN:	miércoles, 8 de marzo de 2023			**VALOR ADICIONAL AL CONTRATO:**	$ 1.165.289.991,34		
PLAZO	VEINTE (20) MESES			**FECHA DE TERMINACION:**	viernes, 8 de diciembre de 2023		
PRORROGAS Nº 1,2,3,4:	Cuatro (11) meses y seis (6) dias			**NUEVA FECHA DE TERMINACION:**	Miercoles, 30 de julio de 2025		
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 5.325.747.616,34			**VALOR DEL ANTICIPO:**	$ 1.664.183.050,00		
CONTRATISTA:	YEISON ALBORNOZ RIVAS			**REPRESENTANTE LEGAL:**	YEISON ALBORNOZ RIVAS		
PLAZO TRANSCURRIDO:	844 DÍAS			**PLAZO RESTANTE:**	166 DIAS		
EJECUCION DEL CONTRATO SEMANA:	0,68%	**AVANCE FISICO PORCENTUAL ACUMULADO:**	62,25%	**PROGRAM. SEMANA**	2,30%	**PROGRAM. ACUMULADO**	98,02%
AVANCE FINANCIERO SEMANA:	$ 36.181.239,02	**AVANCE FINANCIERO ACUMULADO:**	$ 3.315.151.672,09	**PROGRAM FINANC SEMANA**	$ 122.469.595,40	**PROGRAMADO CONTRATO TOTAL:**	$ 5.220.328.079,97

3. REPRESENTACION GRAFICA DE LOS AVANCES DEL CONVENIO

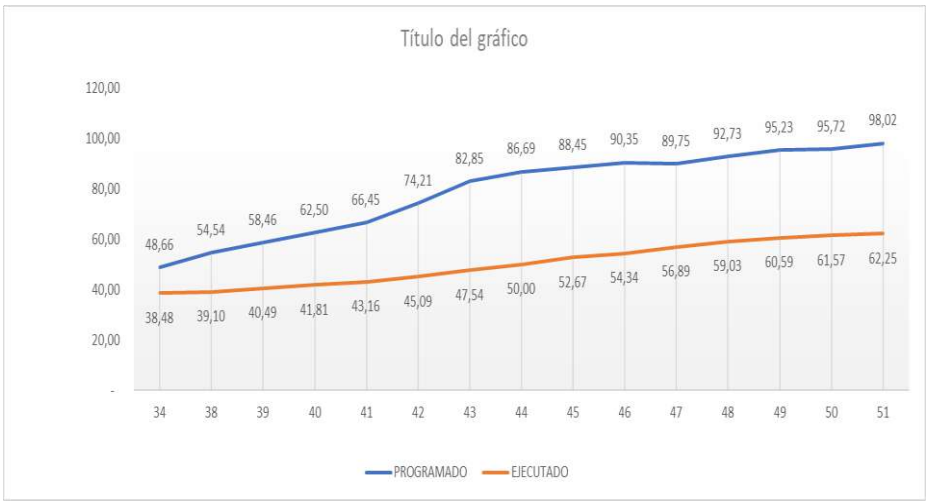

4. RESUMEN DE AVANCE DE OBRA

		CONTRATO INICIAL		
ITEM	**DESCRIPCION**	**SEMANA ACTUAL**	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO – DEPARTAMENTO DE CHOCO.			
1	REPLANTEO GENERAL	$ -	$ 8.749.820,88	$ 8.749.820,88
2	DESCAPOTE A MANO EN MATERIAL COMUN (E=0,2M. INCLUYE CARGUE)	$ -	$ 24.854.104,80	$ 24.854.104,80
3	TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE (NO INCLUYE DERECHO DE BOTADERO)	$ -	$ 53.056.768,88	$ 53.056.768,88
4	RELLENO EN RECEBO B200 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN. NO INCLUYE TRANSPORTE)	$ -	$ -	$ -
5	TRANSPORTE DE MATERIAL DE CANTERA AL SITIO DE OBRA	$ -	$ 205.304.425,00	$ 205.304.425,00
6	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	$ -	$ 106.842.473,29	$ 106.842.473,29
7	TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE (NO INCLUYE DERECHO DE BOTADERO)	$ -	$ -	$ -
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIMIENTO CICLÓPEO 60% PIEDRA Y 40% CONCRETO DE 3500 PSI	$ -	$ 20.939.682,26	$ 20.939.682,26
9	ZAPATA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI (28MPA), GRAVA COMÚN (INCLUYE BOMBEO, SUMIN., FORMALETEO EN MADERA, COLOCACIÓN Y CURADO. NO INCL. REFUERZO)	$ -	$ 31.779.286,76	$ 31.779.286,76
10	ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO POR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (GBI) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	$ -	$ -	$ -
11	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (21MPA) GRAVA COMUN (INCLUYE SUMIN., FORMALETEO EN MADERA, COLOCACIÓN Y CURADO. NO INCL. REFUERZO)	$ -	$ -	$ -
12	MURO EN LADRILLO TOLETE MACIZO RECOCIDO	$ -	$ 85.229.821,75	$ 85.229.821,75
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN POLITELENO CALIBRE 6	$ -	$ 50.868.480,00	$ 50.868.480,00
14	PISO EN CONCRETO 2500 PSI PREMEZCLADO E=10CM), ENDURECIDO Y ESMALTADO (SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE CURADO, CORTE Y SELLADO DE JUNTAS)	$ -	$ 66.092.449,21	$ 66.092.449,21
15	ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO POR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (GBI) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	$ -	$ -	$ -
16	COLUMNA EN CONCRETO DE 4000 PSI, (28 MPA) PREMEZCLADO, GRAVA COMÚN (INCLUYE SUMINISTRO, BOMBEO FORMALETEO EN MADERA, COLOCACIÓN Y CURADO, NO INCLUYE REFUERZO)	$ -	$ 4.400.917,92	$ 4.400.917,92
17	VIGAS Y PLACAS AÉREAS EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI (28 MPA) GRAVA COMUN (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO EN MADERA, COLOCACION, ANDAMIO, CERCHAS, PANALES Y CURADO. NO INCLUYE REFUERZO)	$ -	$ 278.711.435,77	$ 278.711.435,77
18	BORDILLO EN CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI. FUNDIDO EN SITIO, A LA VISTA, DE 10CM X 25CM. REFUERZO SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL, SIMILAR O EQUIVALENTE. (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO E INSTALACIÓN).	$ 3.402.133,58	$ 13.968.534,32	$ 17.460.667,90
19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DUCTO AIRE ACONDICIONADO DE 700X50H, SEGÚN DETALLE INDICADO EN PLANOS ESTRUCTURALES (INCLUYE ELEMENTOS NECESARIOS, CONCRETO Y MAMPOSTERÍA)	$ 6.750.997,39	$ -	$ 6.750.997,39
20	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	$ -	$ -	$ -
21	TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE (NO INCLUYE DERECHO DE BOTADERO)	$ -	$ 31.779.286,76	$ 31.779.286,76

22	CONCRETO DE FC=4000 PSI GRAVA COMÚN ADICIONANDO MICROFIBRA DE POLIPROPILENO PARA CONCRETO Y MORTERO, PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. CONCRETO PREMEZCLADO SEGÚN LA ESPECIFICACIÓN PARTICULAR DEL DISEÑO. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS.	$ 2.154.553,46	$ 17.236.427,66	$ 19.390.981,12
23	ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G60) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	$ -	$ 11.279.580,33	$ 11.279.580,33
24	DESCAPOTE A MANO EN MATERIAL COMUN (E=0.2M. INCLUYE CARGUE)	$ -	$ -	$ -
25	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE.	$ -	$ -	$ -
26	TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE (NO INCLUYE DERECHO DE BOTADERO)	$ -	$ -	$ -
27	ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G60) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	$ -	$ -	$ -
28	VIGAS Y PLACAS AÉREAS EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI (28 MPA) GRAVA COMUN CON FIBRAS POLIMÉRICAS (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO EN MADERA, COLOCACION, ANDAMIO, CERCHAS, PARALES Y CURADO. NO INCLUYE REFUERZO)	$ 767.333,32	$ 32.244.014,32	$ 33.011.347,65
29	PANTALLAS EN CONCRETO 4000 PSI PREMEZCLADO, GRAVA COMUN. (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, BOMBEO, COLOCACION Y CURADO. NO INCL. REFUERZO)	$ 9.236.111,20	$ 50.520.102,52	$ 59.756.213,72
30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESCALERA TIPO GATO (INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE)	$ -	$ -	$ -
31	ACERO DE REFUERZO PARA ESCALERA FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G60) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	$ -	$ -	$ -
32	COLUMNETA Y VIGA CINTA EN CONCRETO DE 3000 PSI. 21 MPA) PREMEZCLADO PARA CONFINAMIENTO DE MURO. GRAVA COMÚN (INCLUYE SUMINISTRO, BOMBEO FORMALETEO EN MADERA, COLOCACIÓN Y CURADO, NO INCLUYE REFUERZO).	$ 5.407.119,97	$ 8.245.679,55	$ 13.742.799,52
33	CONEXIÓN ACOMETIDA HIDRÁULICA PVC PRESIÓN 1" HASTA 5M (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -	$ -	$ -
34	PUNTO HIDRÁULICO PVC 1/2" RDE 11 HASTA 3 M (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -	$ -	$ -
35	RED DE SUMINISTRO PVC PRESION 3/4" RDE 11 (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -	$ -	$ -
36	RED DE SUMINISTRO PVC PRESION 1/2" RDE 11 (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -	$ -	$ -
37	REGISTRO DE BOLA DE 1/2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -	$ -	$ -
38	RED DE SUMINISTRO PVC PRESION 2" (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -	$ -	$ -
39	RED DE SUMINISTRO PVC PRESION 1" (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -	$ 1.085.657,87	$ 1.085.657,87
40	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC 4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS)	$ -	$ 20.382.606,37	$ 20.382.606,37
41	RED DE AGUAS LLUVIAS PVC 4" (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -	$ 4.832.065,24	$ 4.832.065,24
42	RED DE AGUAS LLUVIAS PVC 6" (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -	$ 33.714.084,82	$ 33.714.084,82
43	SIFON 2" INCLUYE REJILLA Y SOSCO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -	$ 1.343.351,95	$ 1.343.351,95
44	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEXIÓN RED ALCANTARILLADO ALL 6"	$ -	$ 2.700.624,90	$ 2.700.624,90
45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED AGUAS LLUVIAS 4 " DESCOLGADA. INCLUYE ACCESORIOS Y SISTEMA DE FIJACION PARA GARANTIZAR LAS CONDICIONES DE RIGIDEZ DE LA TUBERIA AL IGUAL QUE LOS ACCESORIOS QUE SE REQUIERAN PARA SU INSTALACIÓN. SOPORTE TIPO TRAPECIO CON DISTANCIADORES DE APOYO DE 1.40 A 1.80 METROS	$ -	$ 5.673.534,70	$ 5.673.534,70
46	RED SANITARIA PVC 4" (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -	$ 2.483.389,56	$ 2.483.389,56
47	RED SANITARIA PVC 6" (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -	$ 1.878.751,90	$ 1.878.751,90
48	PUNTO SANITARIO PVC 4" HASTA 3 M (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACION)	$ -	$ 7.981.649,28	$ 7.981.649,28
49	PUNTO SANITARIO PVC 2" HASTA 3 M (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ -	$ -	$ -
50	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.60 .6M (H=1M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE EXCAVACION BASE EN RECEBO COMUN MARCO TAPA EN ANGULO)	$ -	$ -	$ -
51	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.580 .58M (H=1M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE EXCAVACION BASE EN RECEBO COMUN MARCO TAPA EN ANGULO)	$ -	$ 298.420,58	$ 298.420,58
52	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.400 .4M (H=1M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE EXCAVACION BASE EN RECEBO COMUN MARCO TAPA EN ANGULO)	$ -	$ -	$ -
53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXIÓN RED ALCANTARILLADO ALL 6"	$ -	$ 8.621.074,28	$ 8.621.074,28
54	MURO DE CERRAMIENTO DE ALTURA TOTAL DE 2.40 M, CON CIMENTACIÓN CICLÓPEA Y VIGA DE AMARRE Y COLUMNETAS. INCLUYE TODOS LOS REFUERZOS EN HIERRO NECESARIOS.	$ -	$ 26.133.623,02	$ 26.133.623,02
55	MURO INTERNO DE ESPESOR 15 CM BLOQUE NO 5 O SIMILAR	$ -	$ 10.980.874,59	$ 10.980.874,59
56	MURO EXTERIO ESPESOR 20 CM BLOQUE ESTRUCTURAL	$ -	$ 1.025.919,16	$ 1.025.919,16

AVANCE EJECUTADO	**62,25%**	SUBTOTAL	**$ 27.898.249,92**	**$ 690.727.226,21**	**$ 708.231.148,83**
		A.I.U	**$ 8.282.990,10**	**$ 246.106.113,90**	**$ 252.542.758,36**
		VALOR TOTAL	**$ 36.181.239,02**	**$ 936.833.349,11**	**$ 960.573.907,29**
AVANCE PROGRAMADO	**98,02%**				
PORCENTAJE EJECUTADO Vs. PROGRAMADO	**-35,77%**				

5. RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	% CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA	VR_UNITARIO	VR/PARCIAL EJECUTADO	VR/PARCIAL ACUMULADO
REPLANTEO GENERAL	M2	0,00	0	753,84	$ 11.607,00	$ -	$ 8.749.820,88
DESCAPOTE A MANO EN MATERIAL COMUN (E=0.2M. INCLUYE CARGUE)	M2	0,00	0	753,84	$ 32.970,00	$ -	$ 24.854.104,80
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE (NO INCLUYE DERECHO DE BOTADERO)	M3/KM	0,00	0	10.105,84	$ 2.707,00	$ -	$ 53.056.766,88
RELLENO EN RECEBO 6000 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN. NO INCLUYE TRANSPORTE)	M3	0,00	0	1.284,57	$ 159.824,00	$ -	$ 205.304.425,00
TRANSPORTE DE MATERIAL DE CANTERA AL SITIO DE OBRA	M3/KM	0,00	0	39.398,71	$ 2.199,00	$ -	$ 106.842.473,29
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE.	M3	0,00	0	496,66	$ 62.561,00	$ -	$ 20.939.682,26
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE (NO INCLUYE DERECHO DE BOTADERO)	M3/KM	0,00	0	12.913,16	$ 2.161,00	$ -	$ 31.779.286,76
DISPOSICIÓN FINAL O DERECHO DE BOTADERO EN SITIO CERTIFICADO	M3	0,00	0	0,00	$ 4.027,00	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIMIENTO CICLÓPEO 60% PIEDRA Y 40% CONCRETO DE 3500 PSI	M3	0,00	0	184,61	$ 461.675,00	$ -	$ 85.229.821,75
ZAPATA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI (28MPA), GRAVA COMÚN (INCLUYE BOMBEO, SUMIN., FORMALETEO EN MADERA, COLOCACIÓN Y CURADO. NO INCL. REFUERZO).	M3	0,00	0	51,20	$ 993.525,00	$ -	$ 50.868.480,00
VIGA DE AMARRE EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (21MPA) GRAVA COMUN (INCLUYE SUMIN., FORMALETEO EN MADERA, COLOCACIÓN Y CURADO. NO INCL. REFUERZO)	M3	0,00	0	37,14	$ 824.273,00	$ -	$ 30.943.133,38
MURO EN LADRILLO TOLETE MACIZO RECOCIDO	M2	0,00	0	0,00	$ 95.000,00	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN POLIETILENO CAL.BWE 6	M2	0,00	0	753,84	$ 5.888,00	$ -	$ 4.460.917,92
PISO EN CONCRETO 2500 PSI PREMEZCLADO (E=10CM), ENDURECIDO Y ESMALTADO (SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE CURADO, CORTE Y SELLADO DE JUNTAS).	M2	0,00	0	91,20	$ 111.440,00	$ -	$ 10.163.328,00
ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G60) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	KG	0,00	0	37.804,23	$ 8.654,00	$ -	$ 327.157.806,42
COLUMNA EN CONCRETO DE 4000 PSI, (28 MPA) PREMEZCLADO, GRAVA COMUN (INCLUYE SUMINISTRO, BOMBEO FORMALETEO EN MADERA, COLOCACIÓN Y CURADO, NO INCLUYE REFUERZO)	M3	0,00	0	75,64	$ 958.993,00	$ -	$ 72.538.230,52
VIGAS Y PLACAS AÉREAS EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI (28 MPA) GRAVA COMUN (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO EN MADERA, COLOCACIÓN, ANDAMIO, CERCHAS, PARALES Y CURADO. NO INCLUYE REFUERZO)	M3	0,00	0	160,79	$ 936.553,00	$ -	$ 150.429.437,98
BORDILLO EN CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI, FUNDIDO EN SITIO, A LA VISTA, DE 10CM X 25CM. REFUERZO SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL, SIMILAR O EQUIVALENTE. (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO E INSTALACIÓN).	ML	64,58	20	184,74	$ 43.728,00	$ 2.692.770,24	$ 8.078.125,31
ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G60) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	KG	0,00	0	1.303,40	$ 8.654,00	$ -	$ 11.279.580,33
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA DUCTO AISE ACONDICIONADO DE 70X70CM; SEGÚN DETALLE INDICADO EN PLANOS ESTRUCTURALES (INCLUYE ELEMENTOS NECESARIOS, CONCRETO Y MAMPOSTERIA)	UN	0,80	10	89,74	$ 680.686,00	$ 520.549,80	$ 58.392.561,64
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	0,00	0	88,94	$ 207.241,00	$ -	$ 18.432.014,54
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE (NO INCLUYE DERECHO DE BOTADERO)	M3/KM	0,00	0	2.312,44	$ 17.853,00	$ -	$ 41.283.991,32
CONCRETO DE FC=4000 PSI GRAVA COMÚN ADICIONANDO MICROFIBRA DE POLIPROPILENO PARA CONCRETO Y MORTERO, PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. CONCRETO PREMEZCLADO SEGÚN LA ESPECIFICACIÓN PARTICULAR DEL DISEÑO. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS.	M3	1,98	10	11,89	$ 838.199,00	$ 1.659.634,02	$ 9.962.833,31
ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G60) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	KG	0,00	0	0,00	$ 8.654,00	$ -	$ -
DESCAPOTE A MANO EN MATERIAL COMUN (E=0.2M. INCLUYE CARGUE)	M2	0,00	0	0,00	$ 6.796,00	$ -	$ -
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE.	M3	0,00	0	0,00	$ 62.561,00	$ -	$ -
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE (NO INCLUYE DERECHO DE BOTADERO)	M3/KM	0,00	0	0,00	$ 2.461,00	$ -	$ -
ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G60) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	KG	0,00	0	0,00	$ 8.654,00	$ -	$ -
VIGAS Y PLACAS AÉREAS EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI (28 MPA) GRAVA COMUN CON FIBRAS POLIMÉRICAS (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO EN MADERA, COLOCACION, ANDAMIO, CERCHAS, PARALES Y CURADO. NO INCLUYE REFUERZO)	M3	1,22	10	7,30	$ 973.137,00	$ 1.187.227,14	$ 7.107.792,65
PANTALLAS EN CONCRETO 4000 PSI PREMEZCLADO, GRAVA COMUN. (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, BOMBEO, COLOCACIÓN Y CURADO. NO INCL. REFUERZO).	M3	6,92	20	10,38	$ 1.029.145,00	$ 7.121.683,40	$ 10.682.525,10
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESCALERA TIPO GATO (INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE)	ML	0,00	0	0,00	$ 396.681,00	$ -	$ -
ACERO DE REFUERZO PARA ESCALERA FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G60) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	KG	0,00	0	125,45	$ 8.654,00	$ -	$ 1.085.657,87
COLUMNETA Y VIGA CINTA EN CONCRETO DE 3000 PSI. (21 MPA) PREMEZCLADO PARA CONFINAMIENTO DE MURO. GRAVA COMÚN (INCLUYE SUMINISTRO, BOMBEO FORMALETEO EN MADERA, COLOCACIÓN Y CURADO, NO INCLUYE REFUERZO).	M3	4,73	20	34,08	$ 896.502,00	$ 4.240.454,46	$ 30.551.537,67
CONEXIÓN ACOMETIDA HIDRÁULICA PVC PRESIÓN 1" HASTA 5M (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	0,00	0	0,00	$ 84.619,00	$ -	$ -
PUNTO HIDRÁULICO PVC 1/2" RDE 11 HASTA 3 M (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	0,00	0	72,70	$ 140.496,00	$ -	$ 10.214.551,20
RED DE SUMINISTRO PVC PRESION 3/4" RDE 11 (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	0,00	0	11,03	$ 19.753,00	$ -	$ 217.915,10
RED DE SUMINISTRO PVC PRESION 1/2" RDE 11 (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	0,00	0	141,90	$ 18.050,00	$ -	$ 2.561.295,00
REGISTRO DE BOLA DE 1/2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	0,00	0	18,70	$ 71.667,00	$ -	$ 1.340.172,90
RED DE SUMINISTRO PVC PRESION 2" (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	0,00	0	81,46	$ 30.486,00	$ -	$ 2.483.389,56
RED DE SUMINISTRO PVC PRESION 1" (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	0,00	0	80,33	$ 22.018,00	$ -	$ 1.878.751,00
BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC 4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS)	ML	0,00	0	68,31	$ 111.976,00	$ -	$ 7.649.080,56
RED DE AGUAS LLUVIAS PVC 4" (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	0,00	0	263,14	$ 39.471,00	$ -	$ 10.649.198,94
RED DE AGUAS LLUVIAS PVC 6" (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	0,00	0	443,75	$ 109.674,00	$ -	$ 70.469.512,50
SIFON 2" INCLUYE REJILLA Y SOSCO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	0,00	0	42,00	$ 86.779,00	$ -	$ 3.644.718,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXIÓN RED ALCANTARILLADO ALL 6"	UN	0,00	0	0,10	$ 107.433,00	$ -	$ 10.743,30
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED AGUAS LLUVIAS 4 " DESCOLGADA. INCLUYE ACCESORIOS Y SISTEMA DE FIJACION PARA GARANTIZAR LAS CONDICIONES DE RIGIDEZ DE LA TUBERIA AL IGUAL QUE LOS ACCESORIOS QUE SE REQUIERAN PARA SU INSTALACIÓN. SOPORTE TIPO TRAPECIO CON DISTANCIADORES DE APOYO DE 1.40 A 1.80 METROS	ML	0,00	0	541,40	$ 41.845,00	$ -	$ 22.653.050,38
RED SANITARIA PVC 4" (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	0,00	0	334,72	$ 67.131,00	$ -	$ 22.467.680,83
RED SANITARIA PVC 6" (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	0,00	0	33,15	$ 106.294,00	$ -	$ 3.523.646,10
PUNTO SANITARIO PVC 4" HASTA 3 M (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	0,00	0	7,80	$ 123.130,00	$ -	$ 960.414,00
PUNTO SANITARIO PVC 2" HASTA 3 M (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	0,00	0	37,95	$ 102.414,00	$ -	$ 3.886.611,30
CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.60 .6M (H=1M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE EXCAVACION BASE EN RECEBO COMUN MARCO TAPA EN ANGULO)	UN	0,00	0	10,50	$ 875.518,00	$ -	$ 9.192.939,00
CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.580 .58M (H=1M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE EXCAVACION BASE EN RECEBO COMUN MARCO TAPA EN ANGULO)	UN	0,00	0	10,30	$ 767.010,00	$ -	$ 7.900.203,00
CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.400 .4M (H=1M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE EXCAVACION BASE EN RECEBO COMUN MARCO TAPA EN ANGULO)	UN	0,00	0	33,20	$ 660.707,00	$ -	$ 21.934.559,40
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXIÓN RED ALCANTARILLADO ALL 6"	UN	0,00	0	1,00	$ 79.630,00	$ -	$ 79.630,00
MURO INTERNO DE ESPESOR 15 CM BLOQUE NO 5 O SIMILAR	M²	0,00	0	98.765,00	$ 98.765,00	$ -	$ 9.758.476.225,00
MURO EXTERIO ESPESOR 20 CM BLOQUE ESTRUCTURAL	M²	0,00	0	105.713,00	$ 105.713,00	$ -	$ 11.175.238.369,00
MURO DE CERRAMIENTO DE ALTURA TOTAL DE 2.40 M, CON CIMENTACIÓN CICLÓPEA Y VIGA DE AMARRE Y COLUMNETAS. INCLUYE TODOS LOS REFUERZOS EN HIERRO NECESARIOS.	M²	0,00	0	417.966,00	$ 417.966,00	$ -	$ 174.687.217.956,00

SUB TOTAL SEMANA		$ -	$ 196.812.349.333,89
	AIU	-	$ 58.433.586.517,23
	TOTAL	**$ 36.181.239,02**	**$ 255.245.935.851,12**
	SEMANA 152	**0,68%**	**62,25%**

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA PROXIMA SEMANA

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	% CANTIDAD PROGRAMADA	OBSERVACION
BORDILLO EN CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI, FUNDIDO EN SITIO, A LA VISTA, DE 10CM X 25CM. REFUERZO SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL, SIMILAR O EQUIVALENTE. (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO E INSTALACIÓN).	ML	24,64	8	
VIGAS Y PLACAS AÉREAS EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI (28 MPA) GRAVA COMUN (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO EN MADERA, COLOCACION, ANDAMIO, CERCHAS, PARALES Y CURADO, NO INCLUYE REFUERZO)	M3	7,30	6	
PANTALLAS EN CONCRETO 4000 PSI PREMEZCLADO, GRAVA COMÚN. (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, BOMBEO, COLOCACIÓN Y CURADO. NO INCL. REFUERZO).	M3	20,76	6	
COLUMNETA Y VIGA-CINTA EN CONCRETO DE 3000 PSI, (21 MPA) PREMEZCLADO PARA CONFINAMIENTO DE MURO, GRAVA COMÚN (INCLUYE SUMINISTRO, BOMBEO FORMALETEO EN MADERA, COLOCACIÓN Y CURADO, NO INCLUYE REFUERZO).	ML	7,10	3	
TUBERIA PE-AL-PE D=16MM CUMPLIMIENTEO DE LA NORMA NTC 2505	ML	62,00	100	
TUBERÍA ACERO AL CARBON C/C SCH 40 1 1/2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) (NO INCLUYE ACCESORIOS)	ML	25,00	100	
TUBERÍA ACERO AL CARBON C/C SCH 40 4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) (NO INCLUYE ACCESORIOS)	ML	25,00	100	
TUBERÍA PVC-C 900 DE 4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) (NO INCLUYE ACCESORIOS)	ML	25,00	100	
ACCESORIO RANURADO D= 1-1/2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	25,00	100	
ACCESORIO RANURADO D= 4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	25,00	100	
UNIÓN RANURADA D= 1-1/2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	25,00	100	
UNIÓN RANURADA D= 4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	25,00	100	
ACCESORIOS PVC-C 900 D= 4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	25,00	100	
NIPLE PASAMURO X70 CM ACERO CARBON SCH40 D= 4"	UN	25,00	100	
NIPLE PASAMURO X70 CM ACERO CARBON SCH40 D= 1.1/2"	UN	25,00	100	

7. ASPECTO JURIDICO CONTRACTUAL

ACTA PARCIAL

CONCEPTO	VIGENTE	DESDE	HASTA	VALOR	OBSERVACIONES
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SI	8-mar-23	30-nov-25	$ 532.574.761,83	PÓLIZA SEGUROS DEL ESTADO S.A. No PÓLIZA 17-44-101208889
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION	SI	8-mar-23	30-jul-25	$ 1.664.183.050,00	PÓLIZA SEGUROS DEL ESTADO S.A. No PÓLIZA 17-44-101208889
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	SI	8-mar-23	30-jul-28	$ 532.574.761,83	PÓLIZA SEGUROS DEL ESTADO S.A. No PÓLIZA 17-44-101208889
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI	5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS		$ 532.574.761,83	PÓLIZA SEGUROS DEL ESTADO S.A. No PÓLIZA 17-44-101208889
PREDIOS LABORALES Y OPERACIONALES	SI	8-mar-23	31-oct-25	$ 232.000.000,00	PÓLIZA SEGUROS DEL ESTADO S.A. No PÓLIZA 17-40-101027222

ACTAS REALIZADAS			CONTRATOS ADICIONALES			PRORROGAS		
CONCEPTO	FECHA	OBSERVACION	Nº	VALOR	CAUSA	Nº	TIEMPO	CAUSAL
ACTA No. 1	8/08/2024		1	$35.273.323,09	AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	1	4 MESES 0 DIAS	AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS
ACTA No. 2			2	$43.852.242,50				
ACTA No. 3			3	$231.997.167,23				
ACTA No. 4			4	$53.316.194,27				

8. PERSONAL EN OBRA

PERSONAL DE OBRA	CANTIDAD	PERSONAL INTERVENTORIA	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1
RESIDENTE DE OBRA	1	INGENIERO CIVIL RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1
INGENIERO AMBIENTAL - SSO	1	INGENIERO AMBIENTAL - SSO	1
TRABAJADORA SOCIAL	1	TRABAJADORA SOCIAL	1
TOPOGRAFO	1		
ALMACENISTA	1		
JEFE DE PERSONAL	1		
MAESTRO DE OBRA	1		
OFICIALES	6		
AYUDANTES	16		

9. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA

Esta semana se continuo con las mismas actividades de la semana pasada, devido al fuerte invierno reinante en la region ha sido imposible mejorar el rendimiento, se le recomienda al contratista solicitar lo mas pronto posible la prorroga del contrato para evitar entrar en un posible incumplimiento contractual, ya que con este rendimiento actual le es imposible cumplir con los tiempos de entrega.

OBSERVACIONES

Esta semana se observa que sigue callendo el rendimiento en las labores ejecutadas, esto se debe al fuerte invierno reinante en todo el departameto del choco. pese a que el contralista aumento el personal en obra, se requiere mejorar mucho mas, hay que abrir todos los frentes de trabajo que se puedan ejecutar y trabajar doble jornada si el invieno lo permite, y seguir con las actividades que se estan ejecutando como son: figuracion de acero de refuerzo fy=60.000 PSI para vigas aereas y losa, fundida de columnetas, elaboracion de los bloques de concreto, formaleteada y fundida de columnas del muro de cerramiento perimetra, pega de bloques para el cerrmiento.

CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Después de iniciar las actividades en obra esta interventoria tiene por prioridad estar pendiente de los EPP como lo son el casco, las botas de seguridanfd industrial, las gafas que se utilizan para evitar accidentes en los ojos, guantes y los cuidados que debe manejar el trabajador para su seguridad integral, se le reitera al contratista renovar la dotacion de guantes, gafas y chalecos que se encuentran en mal estado y algunos obreros ya no los tienen.

Elaborado por:

YORK STIVENSON PEREA AYALA
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
NIT.: 9.732.848 - 2

FIRMA
SUPERVISOR MUNICIPIO O GOBERNACION

10. REGISTRO FOTOGRÁFICO




FABRICACION Y ARRUME DE LOS BLOQUES DE CONCRETO




SUMINISTRO, FIGURACION Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI DE VIGAS AEREAS DEL BLOQUE ADMINISTRATIVO Y FORMALETEADA DEL BLOQUE ALOAMIENTO SUR




FORMALETEADA DE COLUMNAS PARA MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL




FUNDIDA DE COLUMNAS DE MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL

 	 
PEGA DE BLOQUES DE CONCRETO PARA MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL	FORMALETEADA Y TENDIDA DE MADERA PARA FUNDIR VIGAS AEREAS Y LOSAS - BLOQUE ALOJAMIENTO SUR

ACTA No.	JULIO DE 2025
FECHA	09-07-2025
CIUDAD	BOGOTA D.C.
No. CONTRATO y/o CONVENIO	1909 de 2022 Municipio El Cantón de San Pablo – Chocó.
OBJETO:	*"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE CANTÓN DE SAN PABLO – DEPARTAMENTO DE CHOCO"*
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA EJECUCION %	61,57% según informe de interventoría semana No. 50 con corte al 22 de junio de 2025.
MOTIVO:	Reunión de seguimiento y control al convenio 1909 de 2022.

PARTES

Ministerio del Interior	**Contratista/Convenido**
Nombre: Lina María Rodríguez Raguá C.C.:1.090.495.654 Cargo: Apoyo a la supervisión del convenio	Nombre: Nestor Mosquera C.C./ NIT: 1.077.433.520 Cargo: Secretario de Planeación
Nombre: Astrid Carolina Moreno C.C.:1.090.403.801 Cargo: Apoyo jurídico del convenio	Nombre: York Stivenson Perea Ayala C.C./ NIT: 9.732.848 Cargo: Contratista Interventoría
Nombre: C.C.: Cargo:	Nombre: Freider Albornoz C.C./ NIT: 1.053.793.900 Cargo: Residente - Contratista de Obra
Nombre: C.C.: Cargo:	Nombre: Jail Mosquera C.C./ NIT: Cargo: Residente de Interventoría

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

En cumplimiento de la citación virtual convocada por la supervisión del Ministerio del Interior, siendo las 11:02 del 09 de julio de 2025, se inició la reunión técnica de seguimiento del Convenio No. 1909 de 2022, suscrito entre el Ministerio del Interior y el Municipio del Cantón de San Pablo, con el objeto de realizar una revisión del avance en la ejecución del proyecto y abordar aspectos administrativos pendientes. La reunión fue guiada por la ingeniera Lina María Rodríguez Ragua, apoyo a la supervisión del Ministerio del Interior, quien inició la presentación y dio paso a los asistentes: el ingeniero Néstor Mosquera se identificó como secretario de Planeación y supervisor del convenio por parte del municipio. Posteriormente, intervinieron Freider Rivera, contratista de obra; York Perea, contratista de interventoría; Jail Mosquera, residente de interventoría; y Yeimar Mosquera, auxiliar residente de obra.

Acto seguido, la ingeniera Lina Rodríguez expresó la principal preocupación de la supervisión del Ministerio, relacionada con el bajo porcentaje de avance del proyecto. Señaló que, de acuerdo con el último informe de ejecución, se evidenció un avance de tan solo el 0,98% en una semana, lo cual es inferior a lo esperado según el cronograma de obra. Se explicó que el seguimiento venía en la semana 46 y que, sin justificación adecuada, se había reportado la semana 150, lo que genera incongruencias frente a la línea base del cronograma aprobado. En consecuencia, se solicitó corregir los informes semanales desde la semana 46 en adelante, ajustándolos a la numeración real que refleje la secuencia de ejecución.

El ingeniero Néstor Mosquera indicó que ya se había dialogado con el ingeniero Jail Mosquera sobre la necesidad de corregir los informes, y que este último se encontraba adelantando el respectivo ajuste. A su vez, el ingeniero Yeimar

Mosquera informó que dichas correcciones ya habían sido realizadas, y que serían entregadas al ingeniero Néstor en el transcurso del día.

La reunión avanzó con la revisión de un plan de contingencia compartido previamente por el municipio, el cual fue proyectado en pantalla durante la sesión. Se verificó la ejecución de las actividades que se encuentran allí consignadas, teniendo en cuenta que se proyectaba su terminación al 31 de julio de 2025 y solo vamos en un 61,57%. El ingeniero Néstor Mosquera, supervisor por parte del Municipio, reconoció la situación de bajo rendimiento en la ejecución del proyecto, explicando que se han presentado dificultades logísticas en el transporte de materiales, especialmente con el traslado del acero hacia la zona de obra. Indicó que la contratista ha tenido problemas para movilizar el acero desde la cabecera municipal hasta el punto de intervención, lo cual ha generado retrasos significativos y ha impedido avanzar conforme a lo establecido en el plan de contingencia.

Posteriormente, se abordó el componente de justificación para la solicitud de prórroga, ante la posible ampliación del plazo de ejecución. La ingeniera Lina Rodríguez reiteró que dicha justificación debe estar debidamente soportada y estructurada, identificando de forma precisa los eventos que han generado retrasos, tales como bloqueos de vías o problemas en la cadena de suministros. Asimismo, solicitó que se indique claramente si los 25 días solicitados corresponden a días calendario o hábiles, y se relacione cómo las actividades no ejecutadas han impactado el cronograma vigente.

La ingeniera Lina Rodríguez solicitó al municipio exponer con claridad las causas que sustentan la necesidad de solicitar una prórroga en el plazo de ejecución. Indicó que, para efectos de análisis técnico-jurídico, es indispensable que la justificación detalle las afectaciones que ha sufrido el proyecto, particularmente las relacionadas con los cierres viales nacionales y urbanos, las cuales han impedido la llegada oportuna de materiales, equipos y maquinaria. Señaló que dicha justificación debe precisar el tipo de insumos afectados (acero, cemento, componentes eléctricos, madera, entre otros), las rutas que han presentado obstrucciones, los días concretos de afectación, así como el impacto real en el cronograma de obra. Añadió que el documento debe incluir un análisis que relacione estas afectaciones con las actividades reprogramadas, con el fin de estructurar un sustento claro y verificable, que permita al Ministerio realizar una valoración objetiva de la solicitud.

En este mismo sentido, Lina Rodríguez consultó si los 25 días solicitados como prórroga correspondían a días calendario, incluyendo fines de semana y festivos, o si eran días hábiles. El ingeniero Néstor Mosquera, secretario de Planeación y supervisor del convenio por parte del municipio, confirmó que se trataba de días calendario y explicó que el cálculo se hizo teniendo en cuenta la acumulación de jornadas no ejecutadas debido a los bloqueos en las vías de acceso al municipio. Señaló además que la solicitud formal se encontraba en elaboración, y que el municipio tenía previsto radicarla entre el día de la reunión y el lunes siguiente. Reconoció la importancia de cumplir con el plazo contractual para la presentación de prórrogas, establecido en mínimo 20 días hábiles antes de la fecha de terminación del convenio, y manifestó su disposición a ajustarse a dicho requisito.

La Dra. Carolina Moreno, asesora jurídica del Ministerio del Interior, intervino para reiterar la importancia de que el Municipio tenga claridad sobre las implicaciones de una eventual solicitud de prórroga. Señaló que, al extender el plazo hasta noviembre de 2025, muy probablemente el proyecto no podrá ser incluido en el PAC del presente año, lo que implicaría que el último desembolso se convertiría en un pasivo exigible y se vería sometido a un proceso administrativo más complejo, dependiente del Ministerio de Hacienda y otras instancias.

La funcionaria recalcó que si bien los tiempos de ejecución son responsabilidad del municipio y del contratista, el Ministerio debe advertir los riesgos jurídicos y administrativos que conlleva la falta de cumplimiento del cronograma vigente. Indicó que si el contratista no logra alcanzar los hitos comprometidos en el plazo establecido, el Municipio podría estar incurriendo en un presunto incumplimiento. Igualmente, llamó la atención sobre el bajo porcentaje de ejecución registrado hasta la

fecha, manifestando que esto podría configurar el incumplimiento de al menos dos ítems críticos: el cronograma y el plan de contingencia, lo cual ya fue notificado mediante oficio a la entidad territorial.

Finalmente, solicitó que, en caso de reprogramar actividades, el cronograma sea específico, detallado y sustentado técnicamente, incluyendo el tiempo de duración de cada actividad. Enfatizó la necesidad de que el Municipio y el contratista elaboren un plan de contingencia realista y riguroso, con el acompañamiento de la interventoría, a fin de garantizar la culminación del proyecto dentro de los plazos que permitan realizar el último desembolso en el presente año fiscal.

Posteriormente, el apoyo a la supervisión del convenio abordó el tema del informe mensual correspondiente al mes de julio, se recordó que, de acuerdo con las obligaciones contractuales, el informe debe ser remitido dentro de los primeros cinco días del mes siguiente. El ingeniero Mosquera informó que el equipo técnico se encuentra en la fase final de consolidación del documento y se comprometió a enviarlo a más tardar el viernes 11 de julio.

Asimismo, agradeció la disposición del Ministerio para brindar acompañamiento técnico en la estructuración de la prórroga y manifestó su interés en realizar una reunión adicional, si así se requiere, para garantizar que la documentación esté completa y debidamente soportada.

Finalmente, el apoyo a la supervisión propone enviar al municipio un ejemplo de cronograma ajustado que evidencie afectaciones por causas externas, así como un formato modelo del certificado de supervisión, con el fin de facilitar la adecuada estructuración de la solicitud. Reiteró que el Ministerio mantiene su disposición de brindar asesoría técnica adicional si el municipio considera necesario solicitar una nueva reunión entre ese mismo día o el día siguiente.


Con estos compromisos establecidos, se dio por finalizada la reunión, reiterando la importancia de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y de avanzar con la gestión oportuna y documentada de cualquier modificación al plazo de ejecución.

Siendo las 12:16 m. del 09 de julio de 2025, se dio por finalizada la reunión correspondiente al convenio 1909 de 2022.

COMPROMISOS

RESPONSABLE	ACCIONES	FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO
Municipio El Cantón de San Pablo	Solicitud de prórroga	11/07/2025
Municipio El Cantón de San Pablo	Informe mensual de supervisión de la entidad territorial	Inmediato

Listado de asistentes

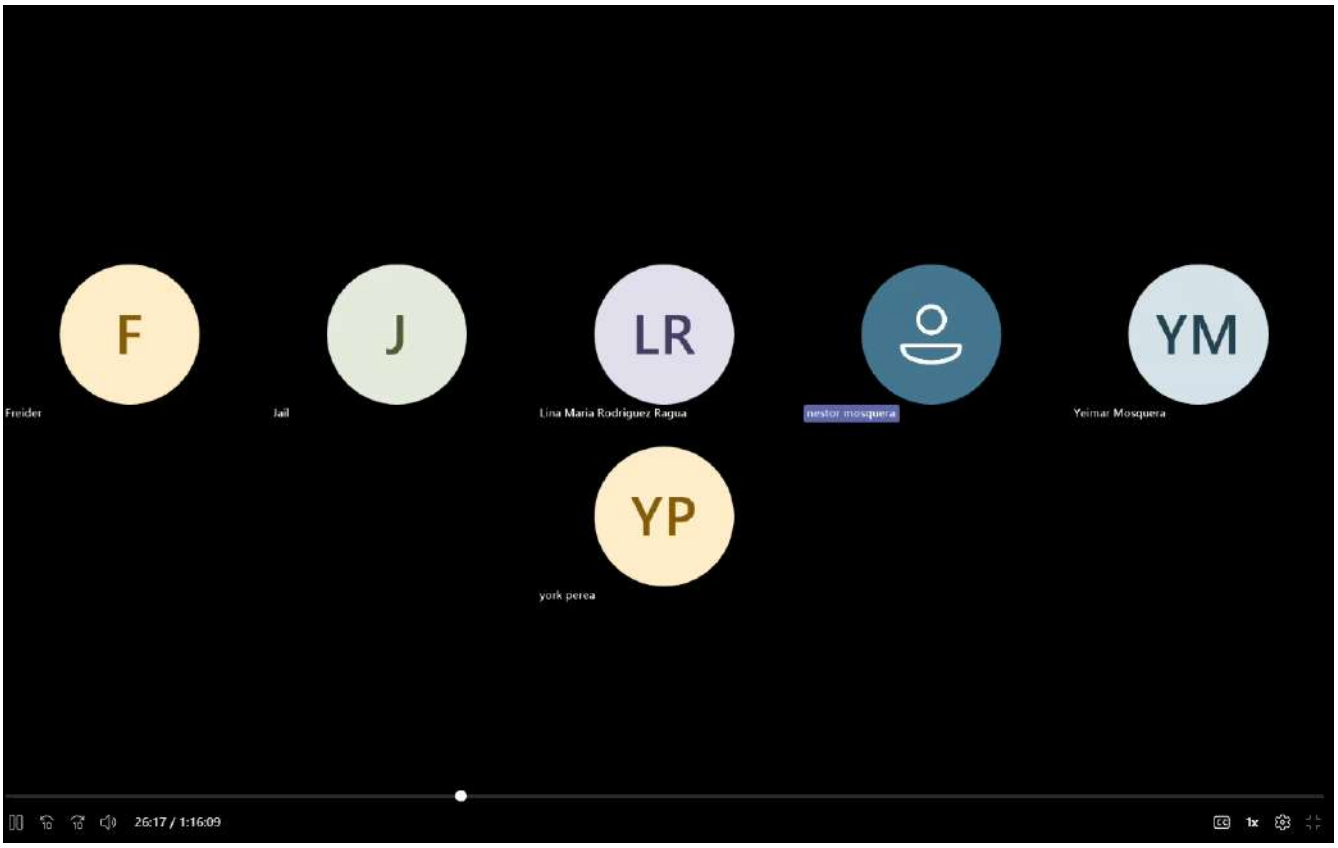

ACTA No.	JULIO DE 2025
FECHA	02-07-2025
CIUDAD	BOGOTA D.C.
No. CONTRATO y/o CONVENIO	1909 de 2022 Municipio El Cantón de San Pablo – Chocó.
OBJETO:	*"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE CANTÓN DE SAN PABLO – DEPARTAMENTO DE CHOCO"*
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA EJECUCION %	61,57% según informe de interventoría semana No. 50 con corte al 22 de junio de 2025.
MOTIVO:	Reunión de seguimiento y control al convenio 1909 de 2022.

PARTES

Ministerio del Interior	**Contratista/Convenido**
Nombre: Arq. Manuel Linares Donato C.C.: 71.796.795 Cargo: Supervisor del convenio	Nombre: Nestor Mosquera C.C./ NIT: 1.077.433.520 Cargo: Secretario de Planeación
Nombre: Astrid Carolina Moreno C.C.:1.090.403.801 Cargo: Apoyo jurídico del convenio	Nombre: C.C.: Cargo:
Nombre: Lina María Rodríguez Raguá C.C.:1.090.495.654 Cargo: Apoyo a la supervisión del convenio	Nombre: C.C.: Cargo:
Nombre: C.C.: Cargo:	Nombre: C.C.: Cargo:

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

En el marco del proceso de supervisión del Convenio No. 1909 de 2022, celebrado entre el Ministerio del Interior y el Municipio de El Cantón de San Pablo, se llevó a cabo una reunión virtual de carácter técnico y jurídico con el propósito de brindar acompañamiento al municipio en la estructuración de una posible solicitud de prórroga.

Teniendo en cuenta que la vigencia actual del convenio se encuentra próxima a vencer, con fecha de finalización prevista para el 30 de agosto de 2025, lo cual hace necesario adelantar las gestiones requeridas para una eventual ampliación del plazo contractual. Se inicia la presentación de los asistentes por parte del Municipio del Cantón de San Pablo, Chocó, participaron: el ingeniero Néstor Mosquera, supervisor del convenio; En representación del Ministerio del Interior, asistió el Arquitecto Manuel Antonio Linares Donato, supervisor del convenio, la ingeniera Lina María Rodríguez Raguá, apoyo a la supervisión y la doctora Carolina Moreno, apoyo jurídico del convenio.

La reunión fue aperturada por la ingeniera Lina María Rodríguez Ragua, apoyo técnico a la supervisión del Ministerio, quien explicó que el objetivo central era revisar los argumentos técnicos y jurídicos que justificarían una prórroga en la ejecución del convenio. Señaló que este acompañamiento busca asegurar que la solicitud se elabore conforme a la normativa vigente y cuente con los elementos suficientes para su trámite ante la Secretaría General del Ministerio. De igual forma, reiteró que la justificación debe tener soporte en hechos verificables y documentación debidamente estructurada, de manera que sea posible evaluar objetivamente la procedencia de la ampliación del plazo contractual.

Por parte del municipio, el secretario de planeación, Néstor Mosquera, indicó que actualmente no se convocó al contratista a la reunión, dado que los documentos preliminares ya habían sido enviados para análisis del equipo del Ministerio. No obstante, aclaró que se han sostenido reuniones técnicas internas con el contratista y la interventoría, quienes han manifestado su disposición para contribuir con los soportes necesarios que respalden la solicitud de ampliación. El funcionario mencionó como causales principales del atraso del proyecto el orden público, concretamente cierres viales y paros armados ocurridos en la zona, así como condiciones climáticas adversas que han generado interrupciones en las actividades de obra, especialmente por acumulación de lluvias durante periodos críticos.

Ante estas manifestaciones, el Arquitecto Manuel Antonio Linares Donato, supervisor del Ministerio del Interior, intervino señalando que, si bien es comprensible la complejidad del contexto territorial, es indispensable que las causas relacionadas estén debidamente documentadas. Indicó que es necesario contar con soportes como registros fotográficos, comunicaciones oficiales, reportes de prensa o cualquier otro medio verificable que acredite que dichos eventos efectivamente ocurrieron en fechas que coincidan con el atraso reportado. Expresó además que deben explicarse claramente los efectos que estas situaciones tuvieron sobre la ejecución del proyecto, como por ejemplo la imposibilidad de transporte de materiales, la inasistencia de personal o la suspensión de actividades críticas.

En complemento, el arquitecto reiteró que, tratándose del departamento del Chocó, es esperable una alta pluviosidad; sin embargo, para que los argumentos relacionados con el clima sean considerados como válidos, debe demostrarse que se trató de fenómenos extraordinarios o atípicos, es decir, que superaron los niveles promedio de precipitación. Para tal efecto, se sugirió utilizar datos oficiales emitidos por el IDEAM, y acompañarlos de un análisis que evidencie su impacto en la programación de obra. Asimismo, enfatizó que, si se van a presentar múltiples causales, cada una debe relacionarse directamente con actividades específicas afectadas, señalando con claridad las fechas y la cantidad de días de retraso atribuibles a cada situación.

El apoyo jurídico del Ministerio, doctora Carolina Moreno, precisó que la Secretaría General del Ministerio exige que toda solicitud de prórroga contenga una argumentación clara, coherente y debidamente sustentada, en la que se describan de manera detallada los hechos que impidieron la ejecución dentro del plazo inicial del convenio. Agregó que el oficio principal debe incluir un resumen de las actividades pendientes, un cronograma ajustado con fechas proyectadas realistas, el pronunciamiento de la supervisión municipal e interventoría, y toda la evidencia que soporte las dificultades mencionadas. También se recomendó que el municipio adjunte enlaces o reportes de prensa, si los hay, sobre paros o alteraciones del orden público, con el fin de robustecer la argumentación.

Uno de los aspectos clave abordados fue el término de la prórroga a solicitar. En ese sentido, el Ministerio propuso que el plazo de ampliación no exceda tres meses, es decir, que la nueva fecha de finalización del convenio sea el 31 de octubre, dejando el mes de noviembre exclusivamente para el proceso de entrega a satisfacción. Esta recomendación se fundamenta en la necesidad de mitigar riesgos asociados a retrasos en el flujo de recursos, incumplimientos contractuales o eventuales sanciones administrativas. El secretario de planeación expresó su conformidad con este criterio, e indicó que tanto el contratista como la interventoría consideran viable finalizar el proyecto en ese nuevo plazo, siempre y cuando se apruebe la extensión en tiempo oportuno.

Otro de los puntos tratados fue la adquisición e instalación de equipos especiales, tales como plantas eléctricas, bombas contra incendio y sistemas complementarios que forman parte de los elementos críticos del proyecto. El supervisor del Ministerio manifestó su preocupación respecto a estos componentes, ya que su demora podría afectar directamente la entrega y puesta en funcionamiento de la infraestructura. Por tanto, solicitó al municipio verificar si dichos equipos ya fueron adquiridos, si se encuentran en proceso de nacionalización, transporte o si aún están pendientes de compra. El arquitecto municipal indicó que ya se solicitó a la contratista y a la interventoría la certificación del estado actual de estos equipos, la cual será incluida en el documento de prórroga.

Finalmente, se establecieron compromisos concretos. El municipio deberá estructurar el documento de solicitud de prórroga conforme a las indicaciones dadas, incorporando tanto la justificación técnica como la jurídica, y asegurando que se encuentre respaldado con cronogramas actualizados, evidencias documentales, análisis climáticos y pruebas del contexto de orden público. Se acordó que el ingeniero Néstor Mosquera emitirá su concepto técnico antes del 18 de julio, de modo que la solicitud pueda ser radicada ante el área de gestión contractual del Ministerio antes del cierre del mes. Por su parte, el Ministerio reiteró su disposición para continuar brindando acompañamiento en este proceso y revisar el documento antes de su radicación oficial, con el fin de asegurar su solidez y coherencia.


Con lo anterior, se dio por concluida la reunión, reafirmando la importancia de que todos los actores involucrados actúen con diligencia y articulación, de manera que la ejecución del proyecto pueda culminar de forma exitosa y conforme a los principios de eficiencia, legalidad y transparencia que rigen la gestión pública.

Siendo las 4:55 pm. del 02 de julio de 2025, se dio por finalizada la reunión correspondiente al convenio 1909 de 2022.

COMPROMISOS

RESPONSABLE	ACCIONES	FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO
Municipio El Cantón de San Pablo	Solicitud de prórroga	18/07/2025

Listado de asistentes

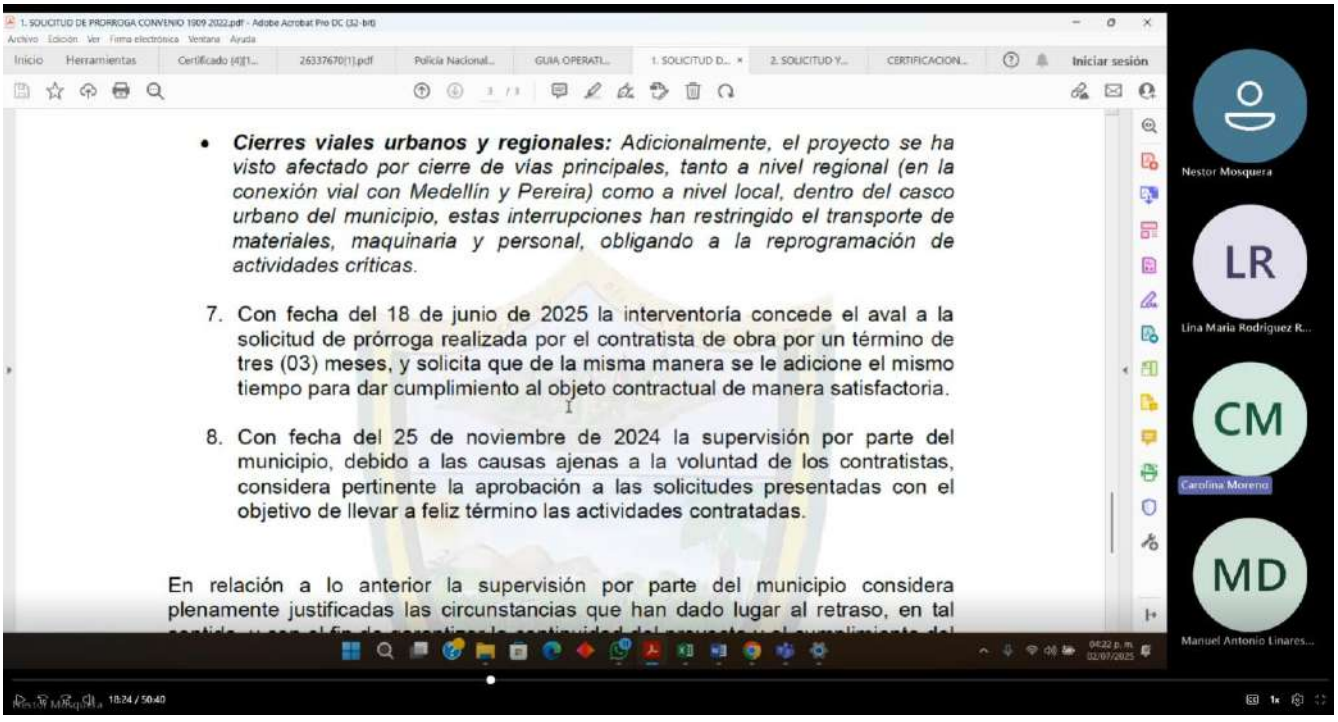

Interior

Al contestar cite Radicado 2025-2-003122-025900 Id: 570167
Folios: 3 Fecha: 07-07-2025 15:08:40
Anexos: 1 Documentos electrónicos,
Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: ALCALDIA@ELCANTONDESANPABLO-CHOCO.GOV.CO y Otros...

Bogotá D.C.
Doctor
HENRY RAMIREZ PALACIOS
Alcalde
Municipio El Cantón de San Pablo – Chocó

Ingeniero
Néstor Mosquera Andrades
Supervisor del Convenio
Municipio de El Cantón de San Pablo - Chocó

Ref.: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO y CONSTRUCCION ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO – DEPARTAMENTO DE CHOCO"

Asunto: Alerta de presunto incumplimiento del convenio 1909 de 2022, Municipio El Cantón de San Pablo – Chocó.

Cordial saludo,

En atención al convenio de la referencia, suscrito entre La Nación - Ministerio del Interior - FONSECON y el Municipio EL CANTÓN DE SAN PABLO cuyo objeto es "***AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO y CONSTRUCCION ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO – DEPARTAMENTO DE CHOCO"*,** cuyo plazo de ejecución finaliza el 30 de agosto de 2025.

En ese sentido, la supervisión por parte del Ministerio del Interior solicita de la manera más atenta y respetuosa el cumplimiento de las obligaciones contractuales, descritas en el anexo de condiciones del convenio en referencia.

(...)" CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: En virtud del presente convenio, EL MUNICIPIO tiene las siguientes obligaciones: I. ESPECÍFICAS: 1. 6) Dar estricto cumplimiento al cronograma aprobado por el supervisor del MINISTERIO DEL INTERIOR." (…)

- De conformidad con la obligación contractual señalada, el Municipio se encontraría en presunto incumplimiento del cronograma de ejecución, toda vez que, a la fecha de elaboración del presente documento, el avance programado debería corresponder al 95,72%, mientras que el avance real reportado en el Informe Semanal de Interventoría No. 50, con corte al 22 de junio de 2025, es de apenas el 61,57%, representando un atraso del 34,15% y reportando un aumento semanal sólo del

Al contestar cite Radicado 2025-2-003122-025900 Id: 570167
Folios: 3 Fecha: 07-07-2025 15:08:40
Anexos: 1 Documentos electrónicos,
Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: ALCALDIA@ELCANTONDESANPABLO-CHOCO.GOV.CO y Otros...

0,98%, porcentaje que preocupa a esta supervisión, si se presentó un plan de contingencia que al parecer no estaría dando efecto positivo al cronograma.

Este atraso compromete de manera significativa el desarrollo del proyecto, pone en riesgo el cumplimiento de los plazos contractuales establecidos y genera afectaciones sustanciales en la planificación y ejecución de las actividades previstas.

"34) Solicitar al MINISTERIO las modificaciones que se requieran del convenio, con una antelación no menor a veinte (20) días hábiles, indicando detalladamente los motivos de hecho y de derecho que le sirven de fundamento a la solicitud, a la cual deberán anexarse los respectivos soportes emitidos por el contratista y el interventor, así como el nuevo cronograma de ejecución del convenio, para aprobación del supervisor del MINISTERIO.".

- La fecha de terminación del convenio está prevista para el **30 de agosto de 2025**, solicito amablemente que el Municipio **establezca e implemente acciones de forma inmediata** que impacten positivamente en el cumplimiento del cronograma, teniendo en cuenta que según el informe Semanal de Interventoría No. 50, con corte al 22 de junio de 2025, se puede observar un atraso del 34,15%. En consecuencia, y dado el avance actual del proyecto, **ya debería haberse radicado ante esta Subdirección una solicitud formal o una propuesta que permita ponerse al día con las obligaciones contractuales**, en aras de garantizar el cumplimiento del objeto del convenio y evitar un posible detrimento al patrimonio público.

36) Elaborar, publicar en plataforma SECOP II y presentar al MINISTERIO-FONSECON, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, iniciando en el mes siguiente a la fecha de legalización del convenio, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, suscrito por el supervisor del MUNICIPIO. En el informe se deberán indicar los porcentajes de avance y ejecución, conforme a lo establecido en el cronograma de convenio previamente presentado, adjuntando: a) Los informes de ejecución tanto del contrato de estudios, diseño y obra como el de interventoría. b) Soportes de cada uno de los pagos realizados por parte del MUNICIPIO, discriminados por contrato y fuente de financiación, anexando las respectivas órdenes de pago, cuando corresponda los comprobantes de egreso y copia de los extractos de la cuenta bancaria registrada ante el MINISTERIO, donde se depositan dichos recursos. c) Certificación en la que conste el cumplimiento de las obligaciones de dichos contratistas frente al Sistema de Seguridad Social en los contratos derivados, de acuerdo con lo exigido en la legislación vigente para el efecto.

- Teniendo en cuenta la cláusula anterior y en virtud de realizar el correcto seguimiento a las actividades realizadas durante el periodo de tiempo de junio de 2025, me permito solicitar el informe mensual de supervisión, informe financiero diligenciado en su totalidad, informe mensual de interventoría para el periodo de junio de 2025, informe semanales corregidos según las semanas de ejecución reportadas. Esto es necesario que sea allegado **en un tiempo no mayor a un (1) día hábil.**

Por lo anterior, esta supervisión solicita que se adopten de manera inmediata las medidas correctivas y, de ser procedente, las acciones sancionatorias correspondientes, con el fin de garantizar la ejecución efectiva del convenio y prevenir mayores perjuicios a su desarrollo.

Interior

Al contestar cite Radicado 2025-2-003122-025900 Id: 570167
Folios: 3 Fecha: 07-07-2025 15:08:40
Anexos: 1 Documentos electrónicos,
Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: ALCALDIA@ELCANTONDESANPABLO-CHOCO.GOV.CO y Otros...

Cordialmente;

Manuel Antonio Linares Donato
Profesional Especializado
Supervisor del Convenio No. 1909 de 2022.

Proyectó: Ing. Lina M. Rodríguez / Apoyo técnico a la supervisión SPS -
Revisó: Abog Astrid Carolina Moreno - Contratista/Profesional de apoyo jurídico SPS

C.C. Previsora Seguros Póliza No. 3002240 expedida el 02 de enero de 2025.

Interior

Al contestar cite Radicado 2025-2-003122-025057 Id: 566888
Folios: 2 Fecha: 02-07-2025 09:32:47
Anexos: 1 Documentos electrónicos,
Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: NESTOR MOSQUERA y Otros...

Bogotá D.C.

Doctor
HENRY RAMIREZ PALACIOS
Alcalde
Municipio El Cantón de San Pablo - Chocó

Ref.: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO y CONSTRUCCION ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO – DEPARTAMENTO DE CHOCO"

Asunto: Alerta de presunto incumplimiento del convenio 1909 de 2022, Municipio El Cantón de San Pablo – Chocó.

Cordial saludo,

En atención al convenio de la referencia, suscrito entre La Nación - Ministerio del Interior - FONSECON y el Municipio EL CANTÓN DE SAN PABLO cuyo objeto es "***AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO y CONSTRUCCION ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO – DEPARTAMENTO DE CHOCO"*,** cuyo plazo de ejecución finaliza el 30 de agosto de 2025.

En ese sentido, la supervisión por parte del Ministerio del Interior solicita de la manera más atenta y respetuosa el cumplimiento de las obligaciones contractuales, descritas en el anexo de condiciones del convenio en referencia.

(...)" CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: En virtud del presente convenio, EL MUNICIPIO tiene las siguientes obligaciones: I. ESPECÍFICAS: 1. 6) Dar estricto cumplimiento al cronograma aprobado por el supervisor del MINISTERIO DEL INTERIOR." (...)

- De conformidad con la obligación contractual señalada, el Municipio se encontraría en presunto incumplimiento del cronograma de ejecución, toda vez que, a la fecha de elaboración del presente documento, el avance programado debería corresponder al 95,25%, mientras que el avance real reportado en el Informe Semanal de Interventoría No. 150, con corte al 15 de junio de 2025, es de apenas el 60,59%, representando un atraso del 34,66%.

  Este atraso compromete de manera significativa el desarrollo del proyecto, pone en riesgo el cumplimiento de los plazos contractuales establecidos y genera afectaciones sustanciales en la planificación y ejecución de las actividades previstas.

"CLAUSULA SEGUNDA: 34) Solicitar al MINISTERIO las modificaciones que se requieran del convenio, con una antelación no menor a veinte (20) días hábiles, indicando detalladamente los motivos de hecho y de derecho que le sirven de fundamento a la solicitud, a la cual deberán anexarse los respectivos soportes emitidos por el

Al contestar cite Radicado 2025-2-003122-025057 Id: 566888
Folios: 2 Fecha: 02-07-2025 09:32:47
Anexos: 1 Documentos electrónicos,
Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: NESTOR MOSQUERA y Otros...

contratista y el interventor, así como el nuevo cronograma de ejecución del convenio, para aprobación del supervisor del MINISTERIO.".

- La fecha de terminación del convenio está prevista para el **30 de agosto de 2025**, solicito amablemente que el Municipio **establezca e implemente acciones de forma inmediata** que impacten positivamente en el cumplimiento del cronograma, teniendo en cuenta que según el informe Semanal de Interventoría No. 150, con corte al 15 de junio de 2025, se puede observar un atraso del 34,66%. En consecuencia, y dado el avance actual del proyecto, **ya debería haberse radicado ante esta Subdirección una solicitud formal o una propuesta que permita ponerse al día con las obligaciones contractuales**, en aras de garantizar el cumplimiento del objeto del convenio y evitar un posible detrimento al patrimonio público.

Por lo anterior, esta supervisión solicita que se adopten de manera inmediata las medidas correctivas y, de ser procedente, las acciones sancionatorias correspondientes, con el fin de garantizar la ejecución efectiva del convenio y prevenir mayores perjuicios a su desarrollo.

Cordialmente;

Manuel Antonio Linares Donato
Profesional Especializado
Supervisor del Convenio No. 1909 de 2022.

Proyectó: Ing. Lina M. Rodríguez / Apoyo técnico a la supervisión SPS -
Revisó: Abog Astrid Carolina Moreno - Contratista/Profesional de apoyo jurídico SPS

C.C. Previsora Seguros Póliza No. 3002240 expedida el 02 de enero de 2025.
Secretaria General - Ministerio del Interior

Outlook

REMISIÓN DE INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO 1909 DE 2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025

Desde planeacion planeacion <planeacion@elcantondesanpablo-choco.gov.co>
Fecha Vie 11/07/2025 15:37
Para Lina Maria Rodriguez Ragua <lina.rodriguez@mininterior.gov.co>

11 archivos adjuntos (16 MB)

13. Informe-mensual-de-supervision_junio- 2025.pdf; 18. INFORMES FINANCIERO JUNIO 2025.pdf; INFORM~1.PDF; INFORME TÉCNICO #12.pdf; INFORME SOCIAL #12.pdf; INFORME AMBIENTAL #12.pdf; INFORME SST #12.pdf; INFORME INTERVENTORIA SEMANA 49 - JUNIO - ESTACION- MANAGRU.pdf; INFORME INTERVENTORIA SEMANA 50 - JUNIO - ESTACION- MANAGRU.pdf; INFORME INTERVENTORIA SEMANA 47 - JUNIO - ESTACION- MANAGRU.pdf; INFORME INTERVENTORIA SEMANA 48 - JUNIO - ESTACION- MANAGRU.pdf;

Cordial saludo

Por medio del presente y en cumplimiento del convenio del asunto se anexa la siguiente información:
1. INFORME DE SUPERVISIÓN JUNIO
2. INFORME FINANCIERO JUNIO
3. INFORME INTERVENTORÍA JUNIO
4. INFORME OBRA JUNIO
5. INFORME AMBIENTAL OBRA
6. INFORME SOCIAL OBRA
7. INFORME SST OBRA
8. INFORMES SEMANALES 47,48, 49 Y 50

Outlook

SOLICITUD DE DE PRORROGA No 3 AL CONVENIO 1909 DE 2022

Desde planeacion planeacion <planeacion@elcantondesanpablo-choco.gov.co>

Fecha Lun 14/07/2025 15:00

Para Lina Maria Rodriguez Ragua <lina.rodriguez@mininterior.gov.co>; Manuel Antonio Linares Donato <manuel.linares@mininterior.gov.co>

22 archivos adjuntos (13 MB)

1. SOLICITUD DE PRORROGA CONVENIO 1909 2022.pdf; 2.3 datos pluviometricos La vuelta.pdf; 2.5 datos pluviometricos de Quibdo,.pdf; 2.4 datos pluviometricos de Certegui.pdf; 2.7 CERTIFICACION COMERCIAL.pdf; 2.9 INFORME_PROYECTO AUNAR.pdf; 2.6 datos pluviometricos de Quibdo, La vuelta y Certegui TOTALES.pdf; 2.8 CARTA YEISON ALBORNOZ.pdf; 2.1 AVAL PRORROGA DE INTERVENTORIA POLICIA CANTON DEL SAN PABLO # 2.pdf; 2.2 DESESTIMIENTO INTERVENTORIA CANTÓN # 2.pdf; 2. SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN JURÍDICA Y TÉCNICA PARA LA PRÓRROGA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 001-L.pdf; 4. cronorama solicitud prorroga.pdf; 3. APROBACION SOLICITUD DE PRORROGA.pdf; 3. REPROGRAMACION GENERAL HASTA EL 31 DE OCTUBRE 2025 SB17 05-2025.pdf; 8. antecedentente procuraduria.pdf; 9. Consulta RNMC.pdf; 5. RUT MUNICIPIO CANTON DEL SAN PABLO.pdf; 11 Policía Nacional de Colombia.pdf; 10 Certificado_REDAM.pdf; 6. ACTA DE POSESION.pdf; 7 FACULTADES ALCALDE.pdf; 12. CERTIFICACION CIERRE VIAL.pdf;

Se adjunta al presente la documentación pertinente para la solicitud de la tercera prórroga al Convenio interadministrativo celebrado entre el Ministerio del Interior y el Municipio de El Cantón Del San Pablo, Chocó, para su revisión y respectivo trámite.

Cordialmente.

NESTOR MOSQUERA ANDRADES
Secretario de planeacion municipio El Cantón Del San Pablo

Outlook

SOLICITUD DE DE PRORROGA No 3 AL CONVENIO 1909 DE 2022

Desde planeacion planeacion <planeacion@elcantondesanpablo-choco.gov.co>
Fecha Vie 25/07/2025 12:18
Para Lina Maria Rodriguez Ragua <lina.rodriguez@mininterior.gov.co>

6 archivos adjuntos (5 MB)

4._SOLICITUD_DE_PRORROGA_CONVENIO_1909_2022[2].pdf; 12. CERTIFICACION CIERRE VIAL.pdf; Cronorama Adicion Cuartel de Policia 2 - julio 22 ok.pdf; CUADRO RESUMEN TIEMPO PERDIDO - ESTACION DE POLICIA OK.pdf; LINEA DE TIEMPO ok.pdf; PROGRACION POLICIA MANAGRU - ACTIVIDADES FALTANTES 1.pdf;

Se adjunta al presente la documentación pertinente para la solicitud de la tercera prórroga al Convenio interadministrativo celebrado entre el Ministerio del Interior y el Municipio de El Cantón Del San Pablo Chocó, atendiendo las observaciones realizadas, lo anterior para su revisión y respectivo trámite.

Cordialmente.

NESTOR MOSQUERA ANDRADES
Secretario de planeacion municipio El Cantón Del San Pablo

Outlook

SOLICITUD DE DE PRORROGA No 3 AL CONVENIO 1909 DE 2022

Desde planeacion planeacion <planeacion@elcantondesanpablo-choco.gov.co>
Fecha Mar 29/07/2025 11:11
Para Lina Maria Rodriguez Ragua <lina.rodriguez@mininterior.gov.co>

1 archivo adjunto (6 MB)
SOLICITUD PRORROGA COMP.pdf;

Cordial saludo.

Se adjunta al presente la documentación pertinente para la solicitud de la tercera prórroga al Convenio interadministrativo celebrado entre el Ministerio del Interior y el Municipio de El Cantón Del San Pablo Chocó, atendiendo las observaciones realizadas, lo anterior para su revisión y respectivo trámite.

Atentamente.

NESTOR MOSQUERA ANDRADES
Secretario de planeacion municipio El Cantón Del San Pablo
