CONTINUACIÓN INFORME FINAL DE INTERVENTORIA

PROGRAMA N°6: OPERACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS	- Durante la llegada y retiro de material no habrá alteración del tránsito peatonal y vehicular. - No se han presentado conflictos en las comunidades aledañas al proyecto. - No se ha alterado la calidad del aire por emisión de gases contaminantes.	CUMPLE	

El CONSORCIO PERSONERIA 2023 a través de la implementación y el seguimiento realizado al sistema de Seguridad y Salud en el trabajo, basado en la prevención de riesgos, presentó una respuesta para la mitigación de la accidentalidad en obra, mediante la evaluación de los riesgos asociados a la labor, capacitación permanente al personal y la ejecución de inspecciones relacionadas con la ejecución de los trabajos; en todo el periodo de ejecución de la obra no se presentaron accidentes ni incidentes, en materia de seguridad ocupacional.

Se elaboraron recomendaciones para la cumplir las políticas en materia de gestión de riesgos laborales, como las siguientes:

- Se adoptaron medidas que tendían a la rotación de los trabajadores frente a exigencias físicas constantes y repetitivas.
- Se activaron de manera permanente los principios generales de prevención para que estos incluyeran como objetivos primordiales: Identificar peligros, combatir los riesgos en su origen,

evitar las condiciones inseguras, dotar al personal de Elementos de Protección Personal y realizar seguimiento y control de estos.

- Se realizó la conformación de la brigada de emergencia con el objetivo de fomentar hábitos de respuesta que ayudaran a mitigar riesgos presentados por eventos adversos.

En conclusión, en el periodo de la realización de la obra se realizaron actividades tendientes a garantizar a través de supervisión de esta interventoría el trabajo seguro con las medidas aplicadas del PGIO "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA", se realizaron labores de seguimiento, referentes a las normas, durante el periodo del presente informe.

9. CONCLUSIONES

El proyecto de "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA" se llevó a cabo satisfactoriamente, logrando la ejecución del 100% de las actividades programadas. Durante la ejecución del contrato, la interventoría realizó un

seguimiento continuo a las actividades desarrolladas por el contratista, asegurando el cumplimiento de las buenas prácticas de ingeniería en cada fase de la obra.

En el componente del plan de gestión integral (calidad, ambiente y SST), se implementaron medidas para mejorar las condiciones de trabajo, lo que permitió que durante el período de ejecución del proyecto no se presentaran accidentes ni enfermedades laborales. Adicionalmente, el personal de obra fue dotado con los elementos de protección personal (EPPs) necesarios, tales como tapabocas, guantes, gafas y caretas, garantizando así un entorno de trabajo seguro.

El contratista CONSORCIO PERSONERÍA 2023, representado legalmente por Jesús David Pizarro Fernández, bajo la supervisión de la interventoría, llevó a cabo un estricto control sobre el sistema de gestión integral de la obra (Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión Ambiental). Este enfoque basado en la prevención de riesgos, la dotación adecuada de personal y la supervisión constante permitió que cada actividad se ejecutara de manera eficiente, segura y amigable con el medio ambiente.

JANINI JOHANA ORTEGA OCHOA
REP. LEGAL DE INTERVENTORÍA
MANYEI INGENIERIA S.A.S.

ANEXOS

ANEXO 1. ACTA NUMÉRICA.

ANEXO 2. COMITÉS.

ANEXO 3. PROGRAMACIÓN.

ANEXO 4. BITÁCORA.

ANEXO 5. PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL.

ANEXO 6. INFORME FINAL PGIO OBRA.

ANEXO 7. ENTREGA DE INFORME FINAL.

ANEXO 8. FOTOGRAFÍAS DEL ESTADO ANTES Y DESPUÉS DE LA OBRA.

ANEXO 9. CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO (ENSAYOS).

ANEXO 1. ACTA NUMÉRICA.

	CONTRATO N° CMC-SIM-056-2023	VALOR DEL ACTA	ACTA PARCIAL N° 1
	OBJETO: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA A ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"	FECHA DE AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA: 23/12/2024	VALOR PRESENTE ACTA:
		% DE AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA - ACUMULADO : 100,00%	$86.683.459,00
	CONTRATISTA MANYEI INGENIERÍA S.A.S	VALOR CONTRACTUAL INTERVENTORIA: $ 86.683.459,00	PERIODO DE COBRO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	REPRESENTANTE LEGAL: JANINI JOHANA ORTEGA OCHOA	VALOR TOTAL EJECUCION INTERVENTORIA AL CORTE: $ 86.683.459,00	9/11/2023 - 07/12/2023 01/04/2024 -29/06/2024 20/12/2024-23/12/2024
CÓDIGO: SI-SUP-043	FECHA DE INICIO: 09/11/2023	VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES INTERVENTORIA: $ -	
ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA N°1	FECHA DE SUSPENSION N°1: 07/12/2023 FECHA DE REINICIO N°1: 04/01/2024 FECHA DE SUSPENSION N°2: 29/06/2024 FECHA DE REINICIO N°2: 20/12/2024 FECHA FINALIZACIÓN: 23/12/2024	VALOR PRESENTE ACTA No. 1 DE INTERVENTORIA: $ 86.683.459,00	FECHA PRESENTE ACTA: 22/02/2025

CONDICIONES ORIGINALES	CONDICIONES ACTUALIZADAS ADICIONAL	ACTA ANTERIORES	PRESENTE ACTA N°1 27/05/2024	ACUMULADO

CANT. (1)	CARGO / OFICIO	COSTOS DE PERSONAL	DEDICACION H-MES	PARTIC (h-mes)	VALOR PARCIAL	CANT	PARTIC (h-mes)	VALOR	% AVANCE	VALOR	% AVANCE	VALOR	% AVANCE OBRA	VALOR
	PERSONAL PROFESIONAL				$27.789.999,75			$0,00		$0,00		$27.789.000,00		$27.789.000,00
1	Director de Consultoria	$ 6.000.000,00	100%	1,67	$10.020.000,00			$0,00			100,00%	$10.020.000,00	100,00%	$10.020.000,00
2	Ingeniero residente de interventoria	$ 3.000.000,00	100%	1,67	$10.020.000,00			$0,00			100,00%	$10.020.000,00	100,00%	$10.020.000,00
1	Contador	$ 2.800.000,00	83%	1,38	$3.874.499,87			$0,00			100,00%	$3.874.500,00	100,00%	$3.874.500,00
1	Abogado	$ 2.800.000,00	83%	1,38	$3.874.499,87			$0,00			100,00%	$3.874.500,00	100,00%	$3.874.500,00
	PERSONAL TÉCNICO				$2.171.000,00			$0,00		$0,00		$2.171.000,00		$2.171.000,00
1	Secretaria	$ 1.300.000,00	100%	1,67	$2.171.000,00			$0,00			100,00%	$2.171.000,00	100,00%	$2.171.000,00
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL				$29.959.999,75			$0,00		$0,00		$29.960.000,00		$29.960.000,00
	FACTOR MULTIPLICADOR				2,16			2,16		2,16		2,16		2,16
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL				$64.713.599,46			$0,00		$0,00		$64.713.600,00		$64.713.600,00

CANT.	CONCEPTO	VALOR MENSUAL	DEDICACION H-MES	PARTIC (e-mes)	VALOR PARCIAL	CANT		VALOR	% AVANCE	VALOR	% AVANCE	VALOR	% AVANCE DE OBRA	VALOR
3	COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS													
2	Impresión de informes	$ 400.000,00	100%	2,00	$800.000,00			$0,00	0,00%		100,00%	$800.000,00	100,00%	$800.000,00
2	Edicion e impresión de planos	$ 400.000,00	100%	2,00	$800.000,00			$0,00	0,00%		100,00%	$800.000,00	100,00%	$800.000,00
2	Oficina	$ 1.600.000,00	100%	2,00	$3.200.000,00			$0,00	0,00%		100,00%	$3.200.000,00	100,00%	$3.200.000,00
	TOTAL EQUIPOS				$4.800.000,00			$0,00		$0,00		$4.800.000,00		$4.800.000,00

203

Alcaldía de Montería
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA DE COMITE
Contrato N°: CMC-SIM-056-2023
Fecha: 27 noviembre de 2023

Alcaldía de MONTERÍA

DESARROLLO DEL COMITÉ

1. Presentación de los participantes

Secretaria de Infraestructura- Alcaldía de Montería	IRIS SPATH CAMAÑO
Apoyo a la supervisión	EFRAIN MORALES PINILLOS
Representante Legal MANYEI INGENIERÍA S.A.S	JANINI JOHANA ORTEGA OCHOA
Representante Legal CONSORCIO PERSONERÍA 2023	JESÚS DAVID PIZARRO FERNÁNDEZ

2. Revisión de compromisos del comité anterior

Descripción del compromiso	Responsable	Estado
NA	NA	NA

3. Desarrollo del comité

- **Intervención del contratista de obra**

Como es de su conocimiento, mediante el oficio No. 03 de fecha 24 de noviembre de 2024 se solicitó la suspensión del contrato de obra No. LP-SIM-010-2023, en razón a la necesidad de mantenimiento y adecuación del inmueble ubicado en la carrera 5 entre calles 23 y 26 Chuchurubí, donde funcionaría temporalmente la Personería Municipal de Montería, toda vez que, pese al inicio de las actividades preliminares paralelamente desde la Administración Municipal se hacían las labores correspondientes de adecuación del inmueble inicialmente arrendado para que funcionara temporalmente la Personería Municipal, sin embargo, se vio la necesidad por parte del Municipio de Montería de arrendar otro inmueble y hacer las adecuaciones respectivas en el mismo para que, contara con los mínimos que le permitieran a la Personería prestar sus servicios.

Teniendo en cuenta la imposibilidad de intervención del inmueble ubicado en la calle 31 No. 6-09, se afectó el cumplimiento de la programación inicialmente propuesta.

En este sentido, es importante resaltar que, desde el inicio de la ejecución de este contrato, se dispusieron todos los esfuerzos para realizar las adecuaciones necesarias para el óptimo funcionamiento de la entidad estatal, en el primer lugar, se ha coadyubado en la realizaron de las adecuaciones pertinentes.

2015

	CONTRATO Nº CMC-SIM-056-2023	VALOR DEL ACTA	ACTA PARCIAL Nº 1
	OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA A ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"	FECHA DE AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA: 23/12/2024	VALOR PRESENTE ACTA: $86.683.459,00
	CONTRATISTA MANYEI INGENIERÍA S.A.S	% DE AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA - ACUMULADO: 100,00%	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	REPRESENTANTE LEGAL: JANINI JOHANA ORTEGA OCHOA	VALOR CONTRACTUAL INTERVENTORIA: $ 86.683.459,00	PERIODO DE COBRO: 9/11/2023 - 07/12/2023; 01/04/2024 -20/06/2024; 20/12/2024-23/12/2024
CÓDIGO: SI-SUP-043	FECHA DE INICIO: 09/11/2023	VALOR TOTAL EJECUCION INTERVENTORIA AL CORTE: $ 86.683.459,00	
ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA Nº1	FECHA DE SUSPENSION Nº1: 07/12/2023 FECHA DE REINICIO Nº1: 04/01/2024 FECHA DE SUSPENSION Nº2: 20/06/2024 FECHA DE REINICIO Nº2: 20/12/2024 FECHA FINALIZACIÓN: 23/12/2024	VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES INTERVENTORIA: $ -	FECHA PRESENTE ACTA: 22/02/2025
		VALOR PRESENTE ACTA No. 1 DE INTERVENTORIA: $ 86.683.459,00	

	CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS ADICIONAL		ACTA ANTERIORES		PRESENTE ACTA Nº1 27/05/2024		ACUMULADO	
4	COSTOS ENSAYOS	COSTO UNITARIOS										
			UND		$0,00		$0,00	$0,00		$0,00		$0,00
	OTROS COSTOS (CEN)				$0,00		$0,00	$0,00		$0,00		$0,00
	SUBTOTAL CP+CE+CN				$69.513.599,40		$0,00	$0,00		$69.513.600,00		$69.513.600,00
5	COSTOS IMPUESTOS Y LEGALIZACIONES											
	Impuestos INDUCOM 1%			1,0%	$695.135,99		$0,00	$0,00	1,0%	$695.136,00	1,0%	$695.136,00
	Impuestos PROUNIVERSIDAD 2%			2,0%	$1.390.271,98		$0,00	$0,00	2,0%	$1.390.272,00	2,0%	$1.390.272,00
	Impuestos PROCULTURA 1%			1,0%	$695.135,99		$0,00	$0,00	1,0%	$695.136,00	1,0%	$695.136,00
	Impuestos PRO ADULTO MAYOR 3% (si el valor supera 3.858 UVT $139.785.690)			3,0%	NO APLICA		$0,00	$0,00	3,0%	NO APLICA	3,0%	NO APLICA
	Impuestos PRODEPORTE 1%			1,0%	$695.135,99		$0,00	$0,00	1,0%	$695.136,00	1,0%	$695.136,00
	POLIZAS			0,7%	$486.595,20		$0,00	$0,00	0,7%	$486.595,20	0,7%	$486.595,20
6	COSTOS DE LEGALIZACION + CP + CE + CN				$73.475.874,62		$0,00	$0,00		$73.475.875,20		$73.475.875,20
	IVA			19,0%	$13.207.583,90	19,0%	$0,00	19,00%	$0,00	$13.207.584,00	19,00%	$13.207.584,00
	VALOR TOTAL				$86.683.459,00		$0,00		$0,00	$86.683.459,00		$86.683.459,00

SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 219.837,20
NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	$86.683.459,00

Redondeado al peso

Con la suscripción de la presente acta el Supervisor del contrato de interventoría manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Consorcio

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de recibo, los que en ella intervinieron.

NOTA 1: Debido a que el costo de las polizas ofertado es de $ 486.595,20 y realmente se pagaron $ 266.758,00 queda un saldo de 219.837,20

TOTAL NETO A PAGAR: $ 86.463.621,80

SON: Ochenta y seis millones seiscientos ochenta y tres mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos . M/CTE., COL

IRIS M. SPATH CAMAÑO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE MONTERIA

Vo.Bo:
Efrain Morales - Apoyo a la Supervisión
Luz Estela Serpa C. - Apoyo a la Supervisión

MANYEI INGENIERÍA S.A.S
JANINI JOHANA ORTEGA OCHOA
CONTRATISTA

ANEXO 2. COMITÉS.

Alcaldía de Montería
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA DE COMITE
Contrato N°: CMC-SIM-056-2023
Fecha: 27 noviembre de 2023

Alcaldía de MONTERÍA

ACTA DE COMITÉ No. 1

CONTRATO No:	CMC-SIM-056-2023
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATISTA:	MANYEI INGENIERÍA S.A.S, NIT: 900065778-5 Representada legalmente por JANINI JOHANA ORTEGA OCHOA identificada con cedula de ciudadanía N° 55.227.016 Barranquilla
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA A ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA.
VALOR:	OCHENTA Y SEIS MILLONES SEICIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($86.683.459,00).
PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN MODIFICATORIO NO. 1:	UN (1) MES Y VEINTE (20) DÍAS
FECHA DE INICIO:	9 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA PRESENTE ACTA:	27 DE NOVIEMBRE DE 2023

En la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Montería, Departamento de Córdoba, a los Veintisiete (27) días del mes de noviembre del año 2023, y estando vigente el Contrato de Interventoría identificado en el encabezamiento de la presente Acta, se reunieron: La Secretaria de Infraestructura Municipal **IRIS SPATH CAMAÑO**, el contratista de obra **CONSORCIO PERSONERIA 2023,** representado por JESÚS DAVID PIZARRO FERNÁNDEZ, la firma interventora **MANYEI INGENIERIA S.A.S.,** representada legalmente por JANINI JOHANA ORTEGA OCHOA, con el propósito de adelantar el comité No. 1 del contrato de obra **LP-SIM-010-2023** , tal como se presenta a continuación:

TEMAS A TRATAR

1. Presentación de los participantes
2. Revisión de compromisos del comité anterior
3. Desarrollo del comité
4. Consideraciones
5. Compromisos

Por estas razones, es indispensable suspender el contrato de obra, toda vez que, pese a que se ha avanzado en tareas preliminares que, lamentablemente, no ha logrado concluir por las razones expuestas las siguientes actividades, que incluyen:

- "1.11 DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL Y ENTRAMADO INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS"
- "1.08. DESMONTE DE CUBIERTA"
- "1.12. DESMONTE DE AIRES ACONDICIONADO INCLUYE DESMONTE DE CONDENSADOR"
- "1.13. DESMONTE Y RETIRO INSTALACIONES ELECTRICAS EXISTENTES"

Cabe destacar que estas actividades, específicamente las numeradas 1.11, 1.12, 1.13 y 1.08, son predecesoras de las siguientes tareas críticas:

- 8.01. "S/I CUBIERTA ACANALADA UPVC DE 11,80X0,94 M E=2,5 MM COLOR BLANCO, INCLUYE ACCESORIOS"
- 8.02. ESTRUCTURA METÁLICA PERFILES C 220x80x2 MM, PINTADA CON BASE ANTICORROSIVA Y ACABADO ESMALTE
- 8.03. "VIGAS DE CONFINAMIENTO (CULATA) DE 0,12X0,20 M, INCLUYE ACERO DE REFUERZO".

Estas actividades críticas, a su vez, impactan directamente en los capítulos correspondientes a las "Instalaciones Eléctricas", así como en los subcapítulos detallados a continuación:

- "9.00 RETIRO DE INSTALACION ANTIGUA"
- "10.00 ACOMETIDA SUBTERRANEA DE BAJA TENSIÓN"
- "11.00 ALIMENTADORES, TABLERO GENERAL Y DE DISTRIBUCIÓN"
- "12.00 INSTALACIÓN ELECTRICA DE SERVICIOS GENERALES"
- "13.00 RED DE VOZ, DATOS Y VIDEO"

La interrupción en la ejecución de las actividades preliminares mencionadas ha generado un efecto cascada, afectando negativamente la progresión de las tareas posteriores y, consecuentemente, demorando el avance general del proyecto.

En consideración de lo expuesto, la suspensión pretendida persigue el cabal cumplimiento del objeto contractual y sin ella se verían frustradas los cometidos perseguidos por la Entidad Estatal, de manera que, en cumplimiento del principio de eficacia, esta se hace necesaria.

Intervención del Interventor

Como Interventoría se ha evaluado detenidamente los hechos expuestos por el Contratista CONSORCIO PERSONERIA 2023. En consonancia con la información proporcionada y después de un análisis riguroso, esta Interventoría, representada por JANINI JOHANA ORTEGA OCHOA, considera viable suspender de manera temporal los contratos LP-SIM-010-2023 "y" CMC-SIM-

056-2023 hasta que se resuelvan las contingencias mencionadas y se retome la normalidad en el desarrollo del proyecto.

MANYEI INGENIERÍA S.A.S se compromete a colaborar estrechamente con su equipo para coordinar los ajustes necesarios en el cronograma, considerando las fechas estimadas de reanudación de las actividades.

Intervención por parte del Municipio de Montería

De acuerdo con lo solicitado por el contratista de obra y la firma interventora, se procederá con la suscripción de acta de suspensión temporal del contrato de obra No. LP-SIM-010- 2023 y el contrato de interventoría No CMC-SIM-056-2023.

4. **Compromisos:**

Descripción del compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
Acta de suspensión temporal del contrato de obra No. LP-SIM-010- 2023 y el contrato de interventoría No CMC-SIM-056-2023	Contratista de obra / Interventoría / Municipio de Montería	Lo más pronto posible.

Alcaldía de Montería
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA DE COMITE
Contrato N°: CMC-SIM-056-2023
Fecha: 27 noviembre de 2023

Alcaldía de MONTERÍA

Para constancia se firma en la ciudad de Montería a los veintisiete (27) días del mes de noviembre de 2023.

JANNI JOHANA ORTEGA OCHOA
Rep. Legal de MANYEI INGENIERÍA S.A.S
Contratista de Interventoría

JESÚS DAVID PIZARRO FERNÁNDEZ
Rep. Legal de CONSORCIO PERSONERIA 2023
Contratista de obra

IRIS SPATH CAMAÑO
Secretaria de Infraestructura
Municipio de Montería

EFRIAN MORALES PINILLOS
APOYO A LA SUPERVISIÓN
SIM

2021

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
	ACTA DE COMITÉ		
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN	
LP-SIM-010-2023	01	02/02/2024	

ACTA DE COMITÉ No. 02

CONTRATO No.	LP-SIM-010-2023
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATISTA	CONSORCIO PERSONERIA 2023
OBJETO DEL CONTRATO	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"
VALOR	MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($1.454.477.568,00,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN	CINCO (5) MESES
FECHA DE INICIO	NUEVE (9) DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	SIETE (7) DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA FINAL	VEINTIDOS (22) DIAS DESPUÉS DE SU REINICIO
INTERVENTORÍA:	MANYEI INGENIERIA S.A.S.
INTERVENTORÍA No.	CMC-SIM-056-2023
TEMA PRINCIPAL A TRATAR:	SEGUIMIENTO A LA SUPENSIÓN

En la ciudad de Montería a los diez (10) días del mes febrero del año 2024, en la oficina de la Secretaría de Infraestructura se reunieron los suscritos, a saber: por el contratista de obra **CONSORCIO PERSONERIA 2023,** representado por **JESÚS DAVID PIZARRO FERNÁNDEZ**, la firma interventora **MANYEI INGENIERIA S.A.S.**, representada legalmente por JANINI JOHANA ORTEGA OCHOA, la Secretaria de Infraestructura **IRIS SPATH CAMAÑO** y el profesional apoyo a la supervisión designado por la Secretaría de Infraestructura **EFRAIN ALEJANDRO MORALES PINILLOS**, con el fin de celebrar comité No. 2, teniendo en cuenta el siguiente orden:

1. INTERVENCIÓN DE LAS PARTES- Tema clave
2. COMPROMISOS

DESARROLLO DEL COMITÉ

1. **INTERVENCIÓN DE LAS PARTES**- Tema clave

Teniendo en consideración que la suspensión No. 1 del Contrato de Obra Pública No. LP-SIM-010-2023 fue suspendido el pasado siete (7) de diciembre de 2023, en razón a la necesidad de mantenimiento y adecuación del inmueble ubicado en la carrera 5 entre calles 23 y 26 Chuchurubí, donde funcionaría temporalmente la Personería Municipal de Montería, en seguimiento a la superación de esas causas, nos permitimos informar que:

Conforme ha sido informado por la Secretaría General y el seguimiento que realiza el contratista y la interventoría, de acuerdo con el traslado de la entidad al inmueble ubicado en la carrera 5 entre calles 23 y 26 Chuchurubí, se continua con la adecuación del mismo, que conlleva realizar la desinstalación, traslado e instalación de los equipos, incluyendo instalaciones de redes eléctricas, voz y datos, redes para aire acondicionado, ubicación de archivos y sistemas de vigilancia.

2022

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
	ACTA DE COMITÉ		
CÓDIGO		VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
LP-SIM-010-2023		01	02/02/2024

Todas estas adaptaciones esenciales para garantizar que esta entidad pueda ofrecer un servicio eficiente mientras se realiza el mantenimiento en la sede original ubicada en la calle 31 No. 6-09, conforme a las disposiciones contractuales.

Por tanto, persiste la imposibilidad de intervención del inmueble ubicado en la calle 31 No. 6-09.

Para constancia de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron:

JANINI JOHANA ORTEGA OCHOA
Rep. Legal de MANYEI INGENIERÍA S.A.S
Contratista de Interventoría

JESÚS DAVID PIZARRO FERNÁNDEZ
Rep. Legal de CONSORCIO PERSONERIA 2023
Contratista de obra

IRIS SPATH CAMAÑO
Secretaria de Infraestructura
Municipio de Montería

EFRIAN MORALES PINILLOS
APOYO A LA SUPERVISIÓN
SIM

2023

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE COMITÉ	
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
LP-SIM-010-2023	01	02/02/2024

ACTA DE COMITÉ No. 03

CONTRATO No.	LP-SIM-010-2023
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATISTA	CONSORCIO PERSONERIA 2023
OBJETO DEL CONTRATO	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"
VALOR	MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($1.454.477.568,00,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN	CINCO (5) MESES
FECHA DE INICIO	NUEVE (9) DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	SIETE (7) DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA FINAL	VEINTIDOS (22) DIAS DESPUÉS DE SU REINICIO
INTERVENTORÍA:	MANYEI INGENIERIA S.A.S.
INTERVENTORÍA No.	CMC-SIM-056-2023
TEMA PRINCIPAL A TRATAR:	SOLICITUD DE REINICIO Y PRÓRROGA

En la ciudad de Montería a los veintinueve (29) días del mes marzo del año 2024, en la oficina de la Secretaría de Infraestructura se reunieron los suscritos, a saber: por el contratista de obra **CONSORCIO PERSONERIA 2023,** representado por **JESÚS DAVID PIZARRO FERNÁNDEZ**, la firma interventora **MANYEI INGENIERIA S.A.S.**, representada legalmente por JANINI JOHANA ORTEGA OCHOA, la Secretaria de Infraestructura **IRIS SPATH CAMAÑO** y el profesional apoyo a la supervisión designado por la Secretaría de Infraestructura **EFRAIN ALEJANDRO MORALES PINILLOS**, con el fin de celebrar comité No. 3, teniendo en cuenta el siguiente orden:

1. INTERVENCIÓN DE LAS PARTES- Tema clave
2. COMPROMISOS

DESARROLLO DEL COMITÉ

2024

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE COMITÉ	
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
LP-SIM-010-2023	**01**	**02/02/2024**

1. **INTERVENCIÓN DE LAS PARTES-** Tema clave

Intervención por parte del contratista de obra

Como es de su conocimiento, las causas que fundamentaron mantener la suspensión del contrato de obra en referencia se encuentran superadas. Lo anterior, fue puesto en conocimiento mediante oficio No. OF-001-2024 de fecha 21 de marzo del 2024 donde solicitó a la firma interventora MANYEI INGENIERÍA S.A.S., el reinicio de la ejecución del contrato No. LP-SIM-010-2023 a partir del primero (1) de abril del 2024, toda vez, que durante la semana mayor muchas empresas de suministro de materiales y transporte paralizan sus labores hasta la fecha mencionada.

Así mismo, se solicitó prórroga No. 1 del contrato de la referencia por un término de DOS (2) MESES. Al respecto, nos permitimos rememorar que, pese a las actividades preliminares con las que se dio inicio al Contrato de Obra en referencia, paralelamente desde la Administración Municipal se hacían las labores correspondientes de adecuación del inmueble inicialmente arrendado para que funcionara temporalmente la Personería Municipal, sin embargo, conoce de primera mano la interventoría que, se vio la necesidad por parte del Municipio de Montería de arrendar otro inmueble y hacer las adecuaciones respectivas en el mismo para que, contara con los mínimos que le permitieran a la Personería prestar sus servicios.

A la fecha, debidamente adecuado el inmueble ubicado en la carrera 5 entre calles 23 y 26 del barrio Chuchurubí de la ciudad, la Personería se encuentra funcionando temporalmente en el mismo, mientras se reinician las actividades en el bien objeto de intervención según el Contrato de Obra No. LP-SIM-010-2023.

Ahora bien, ha quedado demostrado que, en el proceso de adecuación del inmueble donde finalmente sería reubicado el personal de la Personería para prestar sus servicios de manera temporal, teniendo en cuenta la imposibilidad de intervención del inmueble ubicado en la calle 31 No. 6-09, se afectó el cumplimiento de la programación inicialmente propuesta, toda vez, que hubo un atraso en las actividades preliminares que solo se pudieron ejecutar en un 68,95% e influyó en actividades sucesoras que seguidamente describimos de manera detallada.

Retraso en actividades preliminares:

ITEM	ACTIVIDAD AFECTADA	DÍAS GENERADOS DE ATRASO
	OBRAS PRELIMINARES	
1,01	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE PISO Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.05MTS/0.08MTS INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	1
1,02	DEMOLICIÓN DE ZOCALOS INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	1
1,03	REMOCION DE ENCHAPE PARED INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	1

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE COMITÉ	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
LP-SIM-010-2023	01	02/02/2024

1,04	DEMOLICIÓN BORDILLOS	1
1,05	DEMOLICIÓN DE MUROS E= 0.15MTS/0.20MTS INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL	1
1,06	DESMONTE DE PUERTA Y MARCO	1
1,07	DESMONTE DE VENTANAS, MARCO EN ALUMINIO Y/O MADERA	1
1.08	DESMONTE DE CUBIERTA	1
1.11	DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL Y ENTRAMADO INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	1
1.12.	DESMONTE DE AIRES ACONDICIONADO INCLUYE DESMONTE DE CONDENSADOR	1
1.13.	DESMONTE Y RETIRO INSTALACIONES ELECTRICAS EXISTENTES	1
TOTAL		11

En consonancia con ello, al ser estas actividades predecesoras las actividades críticas se vieron afectadas, como se muestra en el siguiente cuadro:

ITEM	ACTIVIDAD AFECTADA	DÍAS GENERADOS DE ATRASO
2.01	EXCAVACIONES Y CIMIENTOS	2
2.02	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	2
2.03	EXCAVACIÓN MANUAL	2
2.04	VIGA DE CIMENTACION DE 0.25 MTS X 0.30 MTS DE 21 MPA	3
2.05	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	3
2.06	ACERO DE REFUERZO Fy = 4,2 Mpa PARA CIMIENTOS	3
TOTAL		15

Estas actividades críticas, a su vez, impactan directamente la ejecución de las obras contempladas en los capítulos correspondientes a las "MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO, PISOS, ENCHAPES Y ACABADOS, APARATOS SANITARIOS, CARPINTERIA METALICA, INSTALACIONES ELECTRICAS Y SUMINISTROS DE EQUIPOS, los cuales, se prevé su ejecución simultáneamente en 56 días.

El retraso en las actividades mencionadas afectó directamente la secuencia cronológica del proyecto. Estas tareas, originalmente planificadas para ser ejecutadas hasta el último día de la obra conforme a la programación inicial, son fundamentales para la culminación exitosa del proyecto. El retraso en estas actividades no solo impacta en la finalización del proyecto en su totalidad, sino que también genera un efecto dominó en otras actividades posteriores, comprometiendo la integridad y funcionalidad del sistema eléctrico y de comunicaciones en las instalaciones objeto del contrato.

En consecuencia, de conformidad con la reprogramación y plan de trabajo adjunto que, soportan la Prórroga No. 1, respetuosamente requerimos se avale prórroga por un término de

2026

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE COMITÉ	
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
LP-SIM-010-2023	**01**	**02/02/2024**

DOS (2) MESES para la culminación de trabajos de ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA, atendiendo el retraso al que nos vimos sometidos y el procedimiento constructivo de las actividades contratadas.

Contamos con toda la logística para reiniciar la obra, pero son factores ajenos los que hoy nos obligan a solicitar esta prórroga y esperamos que tanto la Interventoría como la Entidad avale nuestra solicitud.

Intervención de la interventoría

Ante el requerimiento de aval de prórroga No. 1 al contrato No. LP-SPM-010-2023, mediante oficio No. OFC-018-2024-INT-MANYEI adiado de fecha 26 de marzo de 2024, ésta interventoría remitió al Municipio de Montería *"Viabilidad de reinicio y prórroga al contrato de obra LP-SIM-010-2023 y por consiguiente al contrato de interventoría CMC-SIM-056-2023"*, en el cual, una vez validada la justificación de prórroga del contrato de obra LP-SIM-010-2023, esta interventoría avala la prórroga del plazo contractual por un término de DOS (02) MESES según la reprogramación y plan de trabajo aportado por el contratista, toda vez que, esta extensión en el plazo es una medida necesaria para asegurar el éxito del proyecto y que, técnica y contractualmente es necesaria y viable la presente prórroga para la continuidad de las obras del proyecto y garantizar que la finalidad de su contratación sea satisfecha íntegramente, siendo oportuno desde el punto de vista jurídico porque busca cumplir los fines esenciales del Estado y de acuerdo con las disposiciones normativas contempladas en el artículo 3° de la Ley 80 de 1993.

Intervención del Municipio

En razón a lo expuesto por parte del contratista de obra y debidamente avalado por parte de la interventoría, se considera pertinente el alistamiento logístico y operativo del contratista de obra para un óptimo reinicio el primero (1°) de abril de 2025.

Por otra parte, se realizarán las recomendaciones pertinentes al señor Alcalde, en razón a la necesidad sustentada por DOS (2) MESES.

COMPROMISOS:

- Suscripción de acta de reinicio del contrato de obra LP-SIM-010-2023 y por consiguiente al contrato de interventoría CMC-SIM-056-2023, el 1/04/2025 – Todos.

- Recomendación de prórroga al señor Alcalde – SIM

2024

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
	ACTA DE COMITÉ		
CÓDIGO		VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
LP-SIM-010-2023		01	02/02/2024

Para constancia se firma por los intervinientes.

JANINI JOHANA ORTEGA OCHOA
Rep. Legal de MANYEI INGENIERÍA S.A.S
Contratista de Interventoría

JESÚS DAVID PIZARRO FERNÁNDEZ
Rep. Legal de CONSORCIO PERSONERIA 2023
Contratista de obra

IRIS SPATH CAMAÑO
Secretaria de Infraestructura
Municipio de Montería

EFRIAN MORALES PINILLOS
APOYO A LA SUPERVISIÓN
SIM

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

2028

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE COMITÉ	
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
LP-SIM-010-2023	01	10/04/2024

ACTA DE COMITÉ No. 4

CONTRATO No.	LP-SIM-010-2023
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATISTA	CONSORCIO PERSONERIA 2023
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA
VALOR	MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($1.454.477.568,00,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	UN (1) MES Y VEINTE (20) DÍAS
FECHA DE INICIO	NUEVE (9) DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	SIETE (7) DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO No. 1	PRIMERO (1°) DE ABRIL DE 2024
FECHA FINAL INICIAL	VEINTIDOS (22) DE ABRIL DE 2024
INTERVENTORÍA:	MANYEI INGENIERIA S.A.S.
INTERVENTORÍA No.	CMC-SIM-056-2023
TEMA PRINCIPAL A TRATAR:	SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN - RESOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO CON PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA.

En la ciudad de Montería a los diez (10) días del mes abril del año 2024, se reunieron en las instalaciones de la Secretaria de Infraestructura, los suscritos a saber: el contratista de obra **CONSORCIO PERSONERIA 2023**, representado por JESÚS DAVID PIZARRO FERNÁNDEZ, el interventor **MANYEI INGENIERÍA S.A.S.**, representado legalmente por JANINI JOHANA ORTEGA OCHOA, la Secretaría de Infraestructura **IRIS SPATH CAMAÑO**, el profesional apoyo a la supervisión designado por parte de la Secretaría de Infraestructura **EFRAIN ALEJANDRO MORALES PINILLOS** y el Personero Municipal de Montería **LUIS DEGIOVANNI,** con el fin de celebrar comité No. 4, teniendo en cuenta el siguiente orden:

1. REVISIÓN DE COMPROMISOS
2. INTERVENCIÓN DE LAS PARTES- Tema clave
2.1. Intervención por parte del contratista.
2.2. Intervención por parte del Municipio.
3. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO.
4. COMPROMISOS.

DESARROLLO DEL COMITÉ

1. **REVISIÓN DE COMPROMISOS.**

En fecha 1° de abril de 2024, se suscribieron las actas de reinicio del contrato de obra

2. **INTERVENCIÓN DE LAS PARTES**- Tema clave

Intervención de la interventoría:
Por parte de la interventoría, se expone sucintamente el avance en la ejecución, conforme a la reprogramación del reinicio.

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE COMITÉ	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
LP-SIM-010-2023	01	10/04/2024

Intervención de la Secretaría de Infraestructura:

Se manifiesta que, con ocasión del reciente nombramiento como Personero Municipal de Montería, el doctor **LUIS DEGIOVANNI** ha estado interesado en conocer los diseños del proyecto que se adelanta en la sede de la Personería y, en ese sentido, el objetivo del presente comité es resocializar los diseños del proyecto "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA", con el fin de resolver las dudas que surjan por parte del Personería Municipal.

Intervención del contratista de obra:

Por parte del contratista de obra se presentan las generalidades del contrato de obra, incluyendo información contractual relevante y la localización del proyecto, detallando las actividades a intervenir en las distintas áreas designadas, así como los planos de levantamiento correspondientes, mediante una presentación detallada sobre la distribución de los espacios para el funcionamiento de la Personería Municipal.

Intervención del Personero Municipal:

Por parte de la Personería Municipal, se solicita tener en consideración que el número de puestos de trabajo, capacidad instalada actual, es mayor que la contemplada en el diseño, por lo cual, solicita optimizar el espacio con muros divisorios u otros que consideren pertinente de modo que, queden más puestos de trabajo disponibles.

Frente a lo anterior, por parte de la Secretaría de Infraestructura advierte la necesidad de realizar una visita en el lugar de la obra, con el fin de que la Personería exponga su propuesta de optimización.

3. **REGISTRO FOTOGRÁFICO DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO.**



2030

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE COMITÉ	
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
LP-SIM-010-2023	01	10/04/2024

4. **COMPROMISOS.**

- Realizar visita en el lugar de la obra – Personería y Secretaría de Infraestructura.

Para constancia de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron:

Firmado digitalmente por IRIS SPATH CAMAÑO

IRIS SPATH CAMAÑO
Secretaria de Infraestructura.

EFRAIN ALEJANDRO MORALES PINILLOS
Apoyo a la Supervisión Designado

JANINI JOHANA ORTEGA OCHOA
Contratista de Interventoria.

JESÚS DAVID PIZARRO FERNÁNDEZ
Contratista de obra

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE COMITÉ	
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
LP-SIM-010-2023	**01**	**10/04/2024**

ACTA DE COMITÉ No. 5

CONTRATO No.	LP-SIM-010-2023
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATISTA	CONSORCIO PERSONERIA 2023
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA
VALOR	MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($1.454.477.568,00,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN CON PRÓRROGA NO. 1	TRES (03) MESES Y VEINTE (20) DÍAS
FECHA DE INICIO	NUEVE (9) DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	SIETE (7) DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO No. 1	PRIMERO (1°) DE ABRIL DE 2024
FECHA FINAL SEGÚN PRÓRROGA NO. 1	VEINTIDOS (22) DE JUNIO DE 2024
INTERVENTORÍA:	MANYEI INGENIERIA S.A.S.
INTERVENTORÍA No.	CMC-SIM-056-2023
TEMA PRINCIPAL A TRATAR:	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE OBRA – PROPUESTA DE PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA.

En la ciudad de Montería a los veinte (20) días del mes abril del año 2024 los suscritos a saber: interventor **MANYEI INGENIERÍA S.A.S**, representado legalmente por JANINI J. ORTEGA OCHOA, el contratista **CONSORCIO PERSONERIA 2023**, representado por **JESÚS DAVID PIZARRO FERNÁNDEZ**, la secretaria de Infraestructura **IRIS SPATH CAMAÑO** y el apoyo a la supervisión designado por parte de la Secretaría de Infraestructura **EFRAIN ALEJANDRO MORALES PINILLOS**, y el Personero Municipal de Montería **LUIS DEGIOVANNI,** con el fin de celebrar comité No. 5, teniendo en cuenta el siguiente orden:

1. REVISIÓN DE COMPROMISOS
2. INTERVENCIÓN DE LAS PARTES- Tema clave

2.1. Intervención por parte de personería.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
	ACTA DE COMITÉ		
CÓDIGO		VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
LP-SIM-010-2023		01	10/04/2024

2.2. Intervención por parte del Municipio.
3. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO.
4. COMPROMISOS.

DESARROLLO DEL COMITÉ

1. **REVISIÓN DE COMPROMISOS.**

La visita realizada se describe en la presente acta de comité.

2. **INTERVENCIÓN DE LAS PARTES**- Tema clave

a. **Intervención por parte de personería.**

Conforme a lo manifestado en el comité No. 4 de fecha 10 de abril de 2024, por parte de la Personería de Montería, se reitera la necesidad de realizar una redistribución de los puestos de trabajo y aumentar la capacidad de puestos de trabajo optimizando el espacio, así las cosas, recomienda diversos ajustes que permitirían optimizar el espacio de la obra, donde actualmente funciona la Personería de Montería, precisamente sugiere:

- La reubicación de la recepción y el despacho del personero en el área actualmente ocupada en el diseño por las oficinas de tesorería y participación ciudadana.
- Quitar el muro divisorio de las oficinas de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva, para convertirlas en un espacio único.
- Se solicita obviar el muro que dividiría las oficinas de sala de audiencias y talento humano, con el propósito de destinar este espacio al archivo de la Personería.

En cuanto al primer piso, se solicitó mantener la oficina de depósito en su estado original, y sellar las puertas que conectan con el hall de espera mediante mampostería. También se pide no levantar un muro divisorio entre la oficina de derechos humanos e interés público, con el fin de unificarlas en un solo espacio amplio.

Además, solicita puntos eléctricos conforme a la nueva distribución de los puntos de trabajo de los siguientes despachos ubicados en la primera planta: Interés Público, Derechos Humanos, Depósito y Archivos. En cuanto a la segunda planta, en los despachos de Participación Ciudadana, Técnico Administrativo Financiero, Contabilidad, Presupuesto, Tesorería, Responsabilidad Fiscal, Técnico Administrativo de Responsabilidad Fiscal, Jurisdicción Coactiva, Técnico Administrativo de Sistemas, Sala de Audiencias y Talento Humano.

b. Intervención por parte del contratista.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE COMITÉ	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
LP-SIM-010-2023	01	10/04/2024

En respuesta a la solicitud de reasignación de la recepción y el despacho del personero, se manifiesta que no es procedente, por el avance actual en obra y por el espacio necesario de los mismos. Esto se debe a que implicaría costos adicionales en el contrato de la obra, lo cual podría afectar el presupuesto establecido.

Por otra parte, se considera viable dejar las oficinas de tesorería y participación ciudadana como un espacio único, lo cual no conlleva costos adicionales y resulta viable dentro del presupuesto.

En cuanto a las demás solicitudes, se consideran viables, necesitando así un cambio en el gabinete eléctrico para responder a las necesidades en cuando a su capacidad instalada. Esto implica ajustes en redes eléctricas, puntos de aire acondicionado y más puntos de conexión eléctrica o tomacorrientes.

c. Intervención por parte de la interventoría.

Por parte de la firma interventora, se consideran viables los ajustes propuestos por el Personero, excepto la reasignación de la recepción y el despacho del personero, por el avance actual en obra y por el espacio necesario de los mismos. Esto se debe a que implicaría costos adicionales en el contrato de la obra, lo cual podría afectar el presupuesto establecido.

Así mismo, concuerda con el contratista de obra en la necesidad de cambio en el gabinete eléctrico para responder a las necesidades en cuando a su capacidad instalada y que esto implica ajustes en redes eléctricas, puntos de aire acondicionado y más puntos de conexión eléctrica o tomacorrientes.

d. Intervención por parte del Municipio.

En mérito de lo expuesto por la Personería, el contratista de obra y la interventoría, se manifiesta adelantar los tramites conforme a lo expuesto.

e. Intervención por parte de la interventoría.

En línea con todo lo expuesto, se hace necesario realizar balance de obra, en el entendido que, se presentan mayores y menores cantidades obra, así como, ítems no previstos, no solo por lo expuesto en el presente comité sino también con ocasión de la ejecución en general de la adecuación y mantenimiento. Por tanto, entre contratista de obra e interventoría se comprometen a presentar el balance de obra con todos sus documentos soporte, para revisión del equipo de profesionales de la Secretaría de Infraestructura.

3. **REGISTRO FOTOGRÁFICO DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO. NA**

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
	ACTA DE COMITÉ		
CÓDIGO		VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
LP-SIM-010-2023		01	10/04/2024

4. **COMPROMISOS.**

- Adelantar las redistribuciones y demás propuestos (Contratista de obra – interventoría – Municipio de Montería).
- Presentar balance de obra y APUs ítems no previstos (Contratista de obra – interventoría).

Para constancia de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron:

Firmado digitalmente por IRIS SPATH CAMAÑO

IRIS SPATH CAMAÑO
Secretaria de Infraestructura.

EFRAIN ALEJANDRO MORALES PINILLOS
Apoyo a la Supervisión Designado

JANINI JOHANA ORTEGA OCHOA
Contratista de Interventoría

JESUS DAVID PIZARRO FERNÁNDEZ
Contratista de obra

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE COMITÉ	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
LP-SIM-010-2023	01	10/04/2024

ACTA DE COMITÉ No. 6

CONTRATO No.	LP-SIM-010-2023
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATISTA	CONSORCIO PERSONERIA 2023
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA
VALOR	MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($1.454.477.568,00,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN CON PRÓRROGA NO. 1	TRES (03) MESES Y VEINTE (20) DÍAS
FECHA DE INICIO	NUEVE (9) DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	SIETE (7) DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO No. 1	PRIMERO (1°) DE ABRIL DE 2024
FECHA FINAL SEGÚN PRÓRROGA NO. 1	VEINTIDOS (22) DE JUNIO DE 2024
INTERVENTORÍA:	MANYEI INGENIERIA S.A.S.
INTERVENTORÍA No.	CMC-SIM-056-2023
TEMA PRINCIPAL A TRATAR:	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE OBRA

En la ciudad de Montería a los veinte (20) días del mes mayo del año 2024 los suscritos a saber: interventor **MANYEI INGENIERÍA S.A.S**, representado legalmente por JANINI J. ORTEGA OCHOA, el contratista **CONSORCIO PERSONERIA 2023**, representado por **JESÚS DAVID PIZARRO FERNÁNDEZ**, la secretaria de Infraestructura **IRIS SPATH CAMAÑO** y el apoyo a la supervisión designado por parte de la Secretaría de Infraestructura **EFRAIN ALEJANDRO MORALES PINILLOS**, con el fin de celebrar comité No. 6, teniendo en cuenta el siguiente orden:

1. REVISIÓN DE COMPROMISOS
2. INTERVENCIÓN DE LAS PARTES- Tema clave
2.1. Intervención por parte de personería.
2.2. Intervención por parte del Municipio.
3. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO.
4. COMPROMISOS.

DESARROLLO DEL COMITÉ

a. Intervención por parte de la interventoría.

En línea con los compromisos adquiridos en el comité anterior, se presentó a la Secretaría de Infraestructura balance de obra No. 1 con todos sus documentos soporte, en razón mayores y menores cantidades obra, así como, ítems no previstos, con ocasión de la ejecución en general de la adecuación y mantenimiento.

b. Intervención por parte de la Secretaría de Infraestructura:

La entidad, manifiesta que, por parte del equipo de profesionales se revisó el proyecto de balance No. 1, con los soportes correspondientes, encontrándolo ajustado. Por tanto, se

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE COMITÉ	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
LP-SIM-010-2023	01	10/04/2024

procede a la suscripción de la respectiva acta de mayores y menores cantidades, acta de pactación de precios e ítems no previstos y el acta de justificación de imprevistos No. 1.

1. **COMPROMISOS.**

- Reprogramación de obra conforme al balance de obra No. 1 de fecha 20 de mayo de 2024 (Contratista de obra – interventoría).

Para constancia de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron:

Firmado digitalmente por IRIS SPATH CAMAÑO

IRIS SPATH CAMAÑO
Secretaria de Infraestructura.

EFRAIN ALEJANDRO MORALES PINILLOS
Apoyo a la Supervisión Designado

JANINI JOHANA ORTEGA OCHOA
Contratista de Interventoría

JESÚS DAVID PIZARRO FERNÁNDEZ
Contratista de obra

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE COMITÉ	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
LP-SIM-010-2023	01	10/04/2024

ACTA DE COMITÉ No. 7

CONTRATO No.	LP-SIM-010-2023
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATISTA	CONSORCIO PERSONERIA 2023
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA
VALOR	MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($1.454.477.568,00,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN CON PRÓRROGA NO. 1	TRES (03) MESES Y VEINTE (20) DÍAS
FECHA DE INICIO	NUEVE (9) DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	SIETE (7) DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO No. 1	PRIMERO (1°) DE ABRIL DE 2024
FECHA FINAL SEGÚN PRÓRROGA NO. 1	VEINTIDOS (22) DE JUNIO DE 2024
INTERVENTORÍA:	MANYEI INGENIERIA S.A.S.
INTERVENTORÍA No.	CMC-SIM-056-2023
TEMA PRINCIPAL A TRATAR:	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE OBRA

En la ciudad de Montería a los diez (10) días del mes junio del año 2024 los suscritos a saber: interventor **MANYEI INGENIERÍA S.A.S**, representado legalmente por JANINI J. ORTEGA OCHOA, el contratista **CONSORCIO PERSONERIA 2023,** representado por **JESÚS DAVID PIZARRO FERNÁNDEZ**, la secretaria de Infraestructura **IRIS SPATH CAMAÑO** y el apoyo a la supervisión designado por parte de la Secretaría de Infraestructura **EFRAIN ALEJANDRO MORALES PINILLOS**, con el fin de celebrar comité No. 7, teniendo en cuenta el siguiente orden:

1. REVISIÓN DE COMPROMISOS
2. INTERVENCIÓN DE LAS PARTES- Tema clave
2.1. Intervención por parte de personería.
2.2. Intervención por parte del Municipio.
3. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO.
4. COMPROMISOS.

DESARROLLO DEL COMITÉ

a. Intervención por parte de la interventoría.

Por parte de la interventoría se informa que se tiene un avance significativo en el avance de las obras, de la mano del cronograma de ejecución.

En ese sentido, se informa que, se han presentado mayores y menores cantidades de obra, así como, ítems no previstos, con ocasión de la ejecución en general de la adecuación y mantenimiento. Por tanto, entre contratista de obra e interventoría presentaron a la entidad proyecto de balance de obra No. 2 con todos sus documentos soporte, para revisión del equipo de profesionales de la Secretaría de Infraestructura.

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
	ACTA DE COMITÉ		
CÓDIGO		VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
LP-SIM-010-2023		01	10/04/2024

b. Intervención por parte de la Secretaría de Infraestructura:

La entidad, manifiesta que, por parte del equipo de profesionales se revisó el proyecto de balance No. 2, con los soportes correspondientes, encontrándolo ajustado. Por tanto, se procede a la suscripción de la respectiva acta de mayores y menores cantidades, acta de pactación de precios e ítems no previstos y el acta de justificación de imprevistos No. 2.

1. **COMPROMISOS.**

- Reprogramación de obra conforme al balance de obra No. 2 de fecha 10 de junio de 2024 (Contratista de obra – interventoría).

Para constancia de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron:

Firmado digitalmente por IRIS SPATH CAMAÑO

IRIS SPATH CAMAÑO
Secretaria de Infraestructura.

EFRAIN ALEJANDRO MORALES PINILLOS
Apoyo a la Supervisión Designado

JANINI JOHANA ORTEGA OCHOA
Contratista de Interventoría

JESUS DAVID PIZARRO FERNÁNDEZ
Contratista de obra

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE COMITÉ	
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
LP-SIM-010-2023	01	10/04/2024

ACTA DE COMITÉ No. 8

CONTRATO No.	LP-SIM-010-2023
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATISTA	CONSORCIO PERSONERIA 2023
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA
VALOR	MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($1.454.477.568,00,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN CON PRÓRROGA NO. 1	TRES (03) MESES Y VEINTE (20) DÍAS
FECHA DE INICIO	NUEVE (9) DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	SIETE (7) DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO No. 1	PRIMERO (1°) DE ABRIL DE 2024
FECHA FINAL SEGÚN PRÓRROGA NO. 1	VEINTIDOS (22) DE JUNIO DE 2024
INTERVENTORÍA:	MANYEI INGENIERIA S.A.S.
INTERVENTORÍA No.	CMC-SIM-056-2023
TEMA PRINCIPAL A TRATAR:	SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE OBRA

En la ciudad de Montería a los diecinueve (19) días del mes junio del año 2024 los suscritos a saber: interventor **MANYEI INGENIERÍA S.A.S**, representado legalmente por JANINI J. ORTEGA OCHOA, el contratista **CONSORCIO PERSONERIA 2023**, representado por **JESÚS DAVID PIZARRO FERNÁNDEZ**, la secretaria de Infraestructura **IRIS SPATH CAMAÑO** y el apoyo a la supervisión designado por parte de la Secretaría de Infraestructura **EFRAIN ALEJANDRO MORALES PINILLOS**, con el fin de celebrar comité No. 8, teniendo en cuenta el siguiente orden:

1. REVISIÓN DE COMPROMISOS
2. INTERVENCIÓN DE LAS PARTES- Tema clave

2.1. Intervención por parte de personería.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE COMITÉ	
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
LP-SIM-010-2023	**01**	**10/04/2024**

2.2. Intervención por parte del Municipio.
3. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO.
4. COMPROMISOS.

DESARROLLO DEL COMITÉ

a. Intervención por parte del contratista de obra

Se expone que, mediante oficio No. 04 de fecha 19 de junio de 2024, el contratista de obra CONSORCIO PERSONERIA 2023, solicitó a la firma interventora MANYEI INGENIERÍA S.A.S., la suspensión temporal del contrato de la referencia, en razón a las dificultades que ha tenido el proveedor con la fabricación y entrega del tablero general necesario para la ejecución de las actividades relacionadas con el capítulo: "11 ALIMENTADORES, TABLERO GENERAL Y DE DISTRIBUCIÓN".

Por parte del contratista, se manifiesta que, en principio, la empresa SERTELEC ING S.A.S. mediante comunicación de fecha 29 de abril de 2024, estipuló que el plazo de fabricación y entrega del tablero general era de 30 días hábiles. No obstante, en vista de que no se había realizado la entrega dentro del tiempo estipulado, mediante comunicación de fecha 14 de junio de 2024 se le solicitó al proveedor información sobre la entrega, en consideración al cronograma y la programación; en respuesta, la empresa mediante comunicación de fecha 17 de junio de 2024 informó que presentaba escasez de algunos materiales necesarios para la fabricación del tablero general, por lo cual, indicó que el plazo de entrega será de 15 días hábiles adicionales a partir del 17 de junio de 2024.

b. Intervención por parte de la interventoría.

Por parte de la firma interventora se manifiesta haber recibido y revisado de manera detallada la solicitud de suspensión presentada por el contratista con todos sus documentos soporte, encontrándola justificada.

De ahí que, mediante comunicación No. OFC-027-2024-INT-MANYEI fecha 19 de junio de 2024, de manera formal, emitió concepto de favorabilidad a la suspensión del contrato de obra No. LP-SIM-010-2023, conforme a las consideraciones y soportes presentados por el contratista de obra.

En razón a lo anterior, solicita a la entidad proceder con la suspensión del contrato de obra y del contrato de interventoría No. CMC-SIM-056-2023.

c. Intervención por parte de la Secretaría de Infraestructura:

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

2091

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
	ACTA DE COMITÉ		
CÓDIGO		**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
LP-SIM-010-2023		**01**	**10/04/2024**

La entidad, manifiesta que, a la luz de las causas expuestas por el contratista de obra y avaladas por la firma interventora, se procederá a suscribir acta de suspensión del contrato de obra No. LP-SIM-010-2023.

No obstante, se exhorta al contratista de obra y la interventoría a realizar seguimiento constante a la superación de esta causa, con el fin de culminar el contrato de obra de manera exitosa, lo más pronto posible.

1. **COMPROMISOS.**

- Suscribir acta de suspensión del contrato de obra No. LP-SIM-010-2023 con fecha 20/06/2024 (Contratista de obra – interventoría – Secretaría de Infraestructura).
- Suscribir acta de suspensión del contrato de interventoría No. CMC-SIM-056-2023 con fecha 20/06/2024 (Contratista de interventoría – Secretaría de Infraestructura).

Para constancia de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron:

Firmado digitalmente por IRIS SPATH CAMAÑO

IRIS SPATH CAMAÑO
Secretaria de Infraestructura.

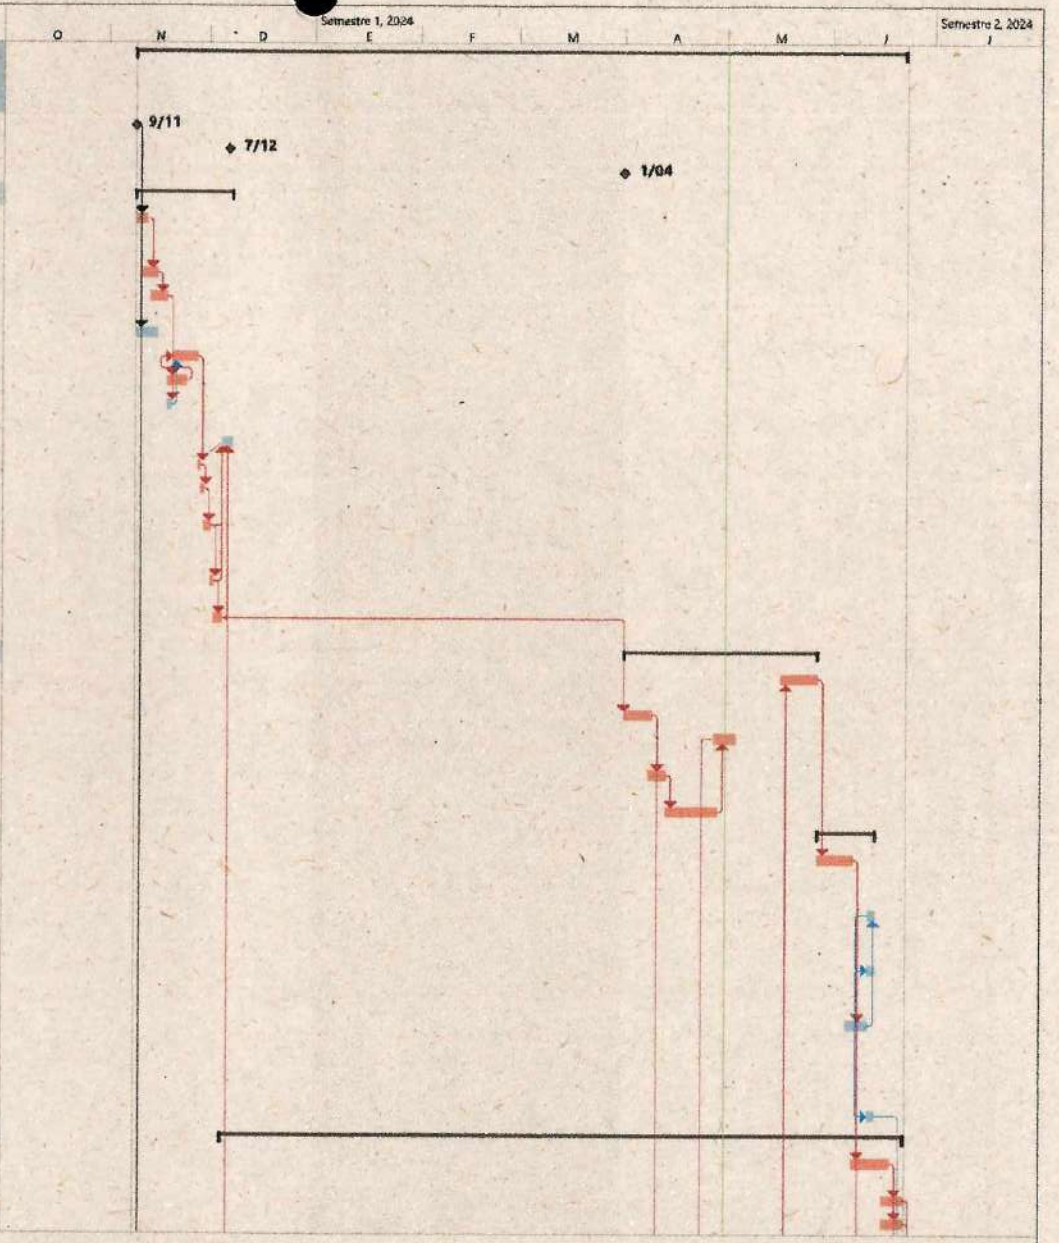
EFRAIN ALEJANDRO MORALES PINILLOS
Apoyo a la Supervisión Designado

JANINI JOHANA ORTEGA OCHOA
Contratista de Interventoría

JESUS DAVID PIZARRO FERNÁNDEZ
Contratista de obra

ANEXO 3. PROGRAMACIÓN.

Id	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
1	**ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA**	**$ 1,454,477,566**	**104 días**	**jue 9/11/23**	**sáb 22/06/24**
2	Inicio de obra	$ 0	0 días	jue 9/11/23	jue 9/11/23
3	suspension	$ 0	0 días	jue 7/12/23	jue 7/12/23
4	reinicio	$ 0	0 días	lun 1/04/24	lun 1/04/24
5	**OBRAS PRELIMINARES**	**$ 86,783,261**	**27 días**	**jue 9/11/23**	**jue 7/12/23**
6	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE PISO Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.05MTS/0.08MTS INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	$ 19,489,833	3 días	jue 9/11/23	dom 12/11/23
7	DEMOLICIÓN DE ZOCALOS INCLUYE RETIRO DE E	$ 4,777,405	4 días	sáb 11/11/23	mié 15/11/23
8	REMOCION DE ENCHAPE PARED INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	$ 1,744,544	5 días	lun 13/11/23	sáb 18/11/23
9	DEMOLICIÓN BORDILLOS	$ 566,098	6 días	jue 9/11/23	mié 15/11/23
10	DEMOLICIÓN DE MUROS E= 0.15MTS/0.20MTS INC	$ 4,339,632	7 días	lun 20/11/23	lun 27/11/23
11	DESMONTE DE PUERTA Y MARCO	$ 2,608,560	5 días	sáb 18/11/23	jue 23/11/23
12	DESMONTE DE VENTANAS, MARCO EN ALUMINIO Y/O MADERA	$ 2,608,373	1 día	sáb 18/11/23	dom 19/11/23
13	DESMONTE DE CUBIERTA	$ 10,980,357	3 días	mar 5/12/23	jue 7/12/23
14	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	$ 326,360	1 día	lun 27/11/23	mar 28/11/23
15	DESMONTE DE TUBERIA HIDRO-SANITARIA INCLUYE DEMOLICION Y EXCAVACION	$ 265,843	1 día	mar 28/11/23	mié 29/11/23
16	DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL Y ENTRAMADO INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	$ 3,959,447	2 días	mié 29/11/23	vie 1/12/23
17	DESMONTE DE AIRES ACONDICIONADO INCLUYE DESMONTE DE CONDENSADOR	$ 2,149,210	1 día	vie 1/12/23	sáb 2/12/23
18	DESMONTE Y RETIRO INSTALACIONES ELECTRICAS EXISTENTES	$ 2,904,000	2 días	sáb 2/12/23	lun 4/12/23
19	**EXCAVACIONES Y CIMIENTOS**	**$ 8,260,366**	**53 días**	**lun 1/04/24**	**lun 27/05/24**
20	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	$ 4,517,594	10 días	vie 17/05/24	lun 27/05/24
21	EXCAVACIÓN MANUAL	$ 653,317	8 días	lun 1/04/24	mar 9/04/24
22	VIGA DE CIMENTACION DE 0.25 MTS X 0.30 MTS DE 21 MPA	$ 1,868,769	6 días	sáb 27/04/24	vie 3/05/24
23	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	$ 102,222	5 días	lun 8/04/24	sáb 13/04/24
24	ACERO DE REFUERZO Fy = 4,2 Mpa PARA CIMIEN	$ 1,378,464	14 días	sáb 13/04/24	dom 28/04/24
25	**MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO**	**$ 38,022,651**	**16 días**	**mar 28/03/24**	**jue 13/06/24**
26	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE ARENA - CEMENTO DE 0.10MTS X 0.20MTS X 0.40MTS CON PEGA DE MORTERO 1:4	$ 7,820,735	10 días	mar 28/05/24	vie 7/06/24
27	COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO 0.10MTS X 0.20MTS EN CONCRETO DE 21 MPA,CON 4 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 1/4 @0.15m	$ 6,263,569	2 días	mié 12/06/24	jue 13/06/24
28	VIGA DINTEL DE 0.10m x 0.20m EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 4 VARILLAS DE 3/8 YESTRIBOS 1/4 @0.15m	$ 3,548,439	2 días	mié 12/06/24	jue 13/06/24
29	ANCLAJE EN ACERO DE 1/2" EN ELEMENTOS DE CONCRETO REFORZADO (INCLUYE PERFORACION CON TALADRO Y EPOXICO PARA FIJAR ACERO EN CONCRETO ENDURECIDO	$ 1,681,015	6 días	mié 5/06/24	mar 11/06/24
30	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:4	$ 10,708,294	2 días	mié 12/06/24	jue 13/06/24
31	**PISOS, ENCHAPES Y ACABADOS**	**$ 459,109,617**	**80 días**	**mar 5/12/23**	**sáb 22/06/24**
32	PLANTILLA EN CONCRETO 21 MPA, E= 0.08MT, .INCLUYE REF. MALLA ELECTROSOLDADA	$ 32,198,050	10 días	vie 7/06/24	mar 18/06/24
33	PLANTILLA DE NIVELACION EN MORTERO 1:4 IMP	$ 16,886,071	6 días	dom 16/06/24	sáb 22/06/24
34	PISO EN PORCELANATO 0.60X0.60 COLOR COLOF	$ 119,504,550	6 días	dom 16/06/24	sáb 22/06/24

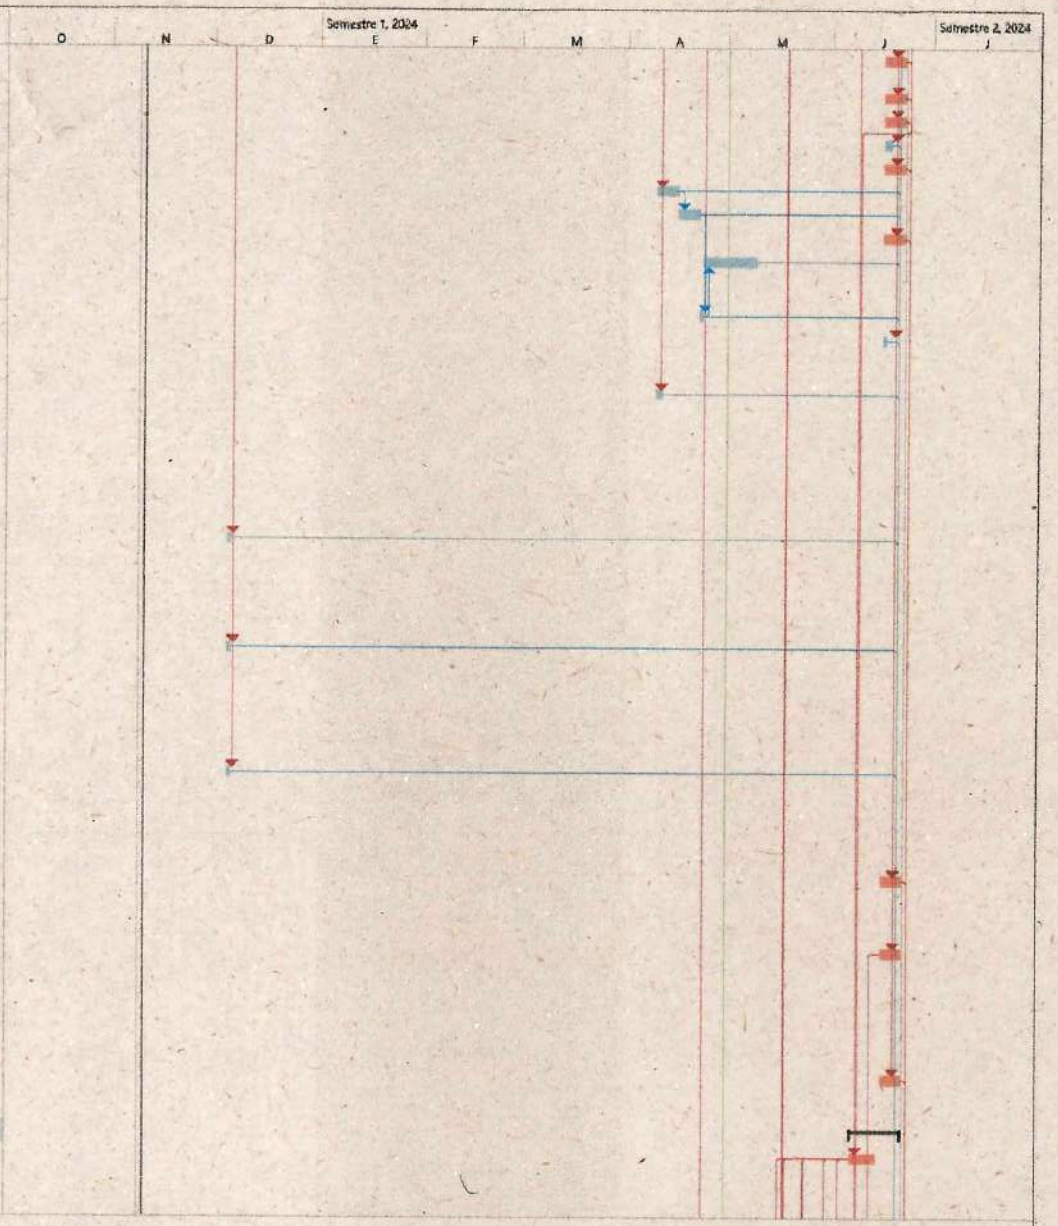


Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

2093

2024

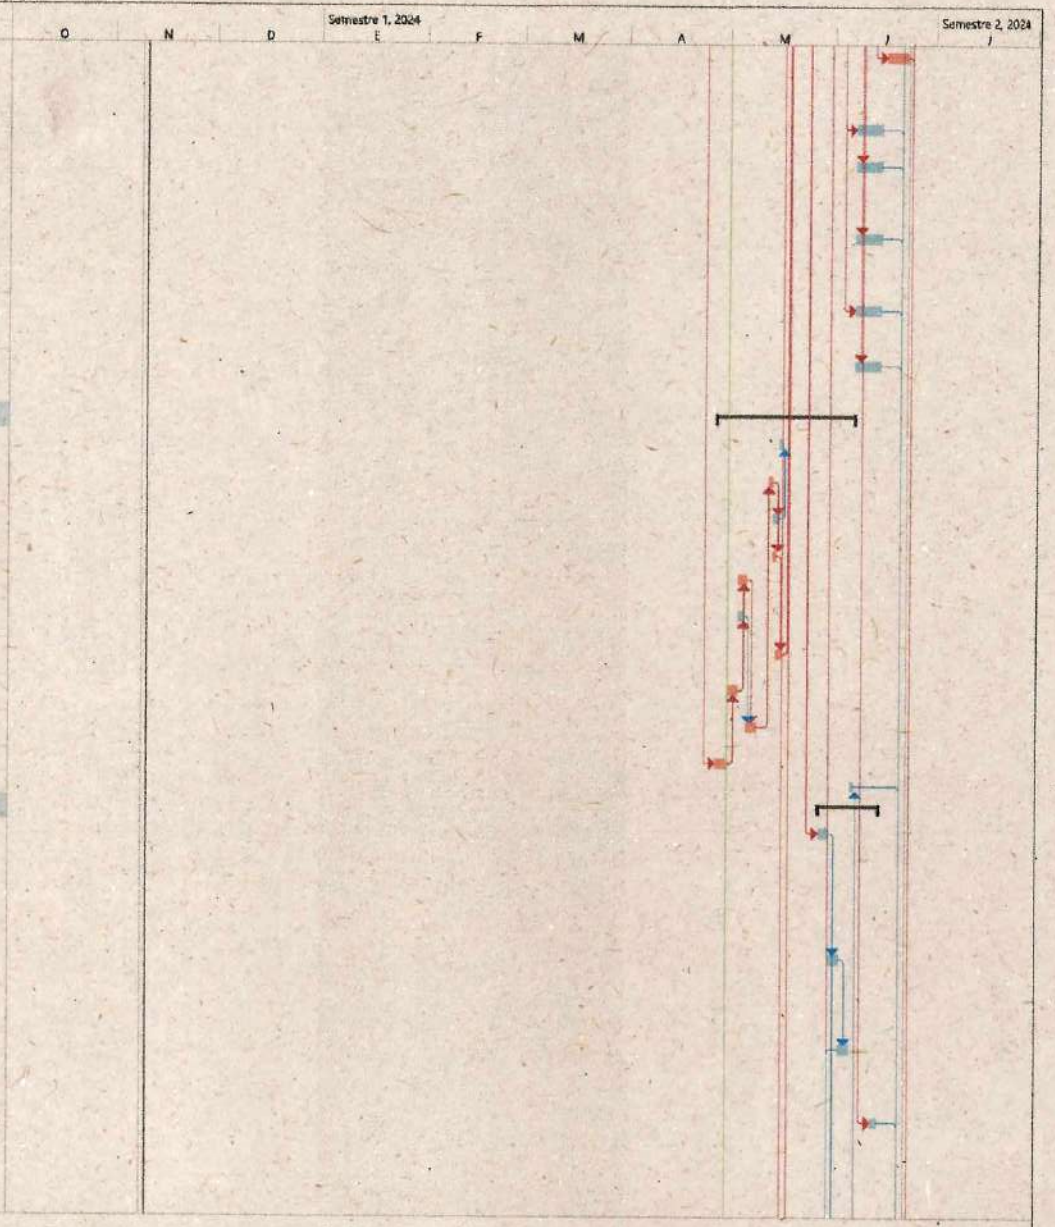
Id	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
35	GUARDAESCOBA EN PORCELANATO 0.10X0.60 COLOR GRIS MATE	$ 32,156,917	6 días	dom 16/06/24	sáb 22/06/24
36	GRANITO PULIDO EN L PARA REMATE DE PISO	$ 1,196,137	6 días	dom 16/06/24	sáb 22/06/24
37	ENCHAPE DE PARED COLOR BLANCO	$ 22,552,624	6 días	dom 16/06/24	sáb 22/06/24
38	REPARACIÓN DE GRIETAS EXISTENTES	$ 3,524,902	2 días	dom 16/06/24	mar 18/06/24
39	ESTUCO PLASTICO PARA EXTERIORES	$ 4,489,968	6 días	dom 16/06/24	sáb 22/06/24
40	ESTUCO PLASTICO PARA INTERIORES	$ 46,213,884	6 días	mar 9/04/24	lun 15/04/24
41	PINTURA PARA EXTERIORES (A 3 MANOS)	$ 6,598,338	6 días	mar 16/04/24	lun 22/04/24
42	PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS INTERI(	$ 35,642,152	6 días	dom 16/06/24	sáb 22/06/24
43	S/I CIELO RASO DRYWALL INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y PINTURA A 3 MANOS	$ 56,579,160	15 días	mar 23/04/24	jue 9/05/24
44	CIELO RASO EN SUPERBOARD	$ 12,417,817	1 día	lun 22/04/24	mar 23/04/24
45	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	$ 5,280,826	1 día	dom 16/06/24	lun 17/06/24
46	ACABADO DE PISO CON ADOQUÍN PREFABRICADO EN CONCRETO TRÁFICO LIVIANO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR GRIS. INCLUYE ARENA H.=5 CM, JUNTAS SELLADAS CON ARENA, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	$ 30,722,116	2 días	mar 9/04/24	jue 11/04/24
47	S/I ADOQUIN ALERTA TACTIL PREFABRICADA. EN CONCRETO DE 0.20M X 0.20M X0.06M COLOR AMARIL LO TEXTURA TIPO TOPEROL. INCLUYE ARENA H=5CM, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE 0.30M Y JUNTAS SELLADAS CON ARENA.	$ 533,256	1 día	mar 5/12/23	mar 5/12/23
48	S/I FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN PREFABRICADO EN CONCRETO DE 0.20mX0.10m X0.06m COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MATERIAL SELECCIONADO DE 0.30M Y JUNTAS SELLADAS CON ARENA.	$ 1,957,143	1 día	mar 5/12/23	mar 5/12/23
49	S/I DE ADOQUIN GUÍA PREFABRICADA EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO. TEXTURA TIPO ACANALADA (2 HILERAS). CON MORTERO 1:4. INCLUYE RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE 0.30M Y JUNTAS SELLADAS CON ARENA.	$ 3,828,325	1 día	mar 5/12/23	mar 5/12/23
50	S/I BOLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO M63 - IDU EMPOTRADOS EN CONCRETO; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	$ 516,404	6 días	dom 16/06/24	sáb 22/06/24
51	S/I CONCRETO DE 21 MPA PSI ANCHO:0.60M e=0.07M PARA MESON LAVAMANOS CON ACABADO EN MARMOL. INCLUYE: FALDÓN PERIMETRAL, SALPICADERO DE 20CM, PERFORACION PARA POCETAS, MUROS DE APOYO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO ACABADO E INSTALACION	$ 20,297,614	6 días	dom 16/06/24	sáb 22/06/24
52	S/I DE PISO EN BALDOSA GRANITO PULIDO BLANCO HUILA O SIMILAR (HUELLA CONTRA HUELLA) INCLUYE PIRLAN EN ALUMINIO	$ 6,013,367	6 días	dom 16/06/24	sáb 22/06/24
53	**APARATOS SANITARIOS**	**$ 48,158,289**	**14 días**	**vie 7/06/24**	**sáb 22/06/24**
54	S/I DE TAZA PORCELANA SANITARIA PARA FLUXOMETRO DE ENTRADA SUPERIOR DE USO INSTITUCIONAL INCLUYE ASIENTO, FLUXOMETRO Y ACCESORIOS	$ 28,577,512	7 días	vie 7/06/24	vie 14/06/24



Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

2095

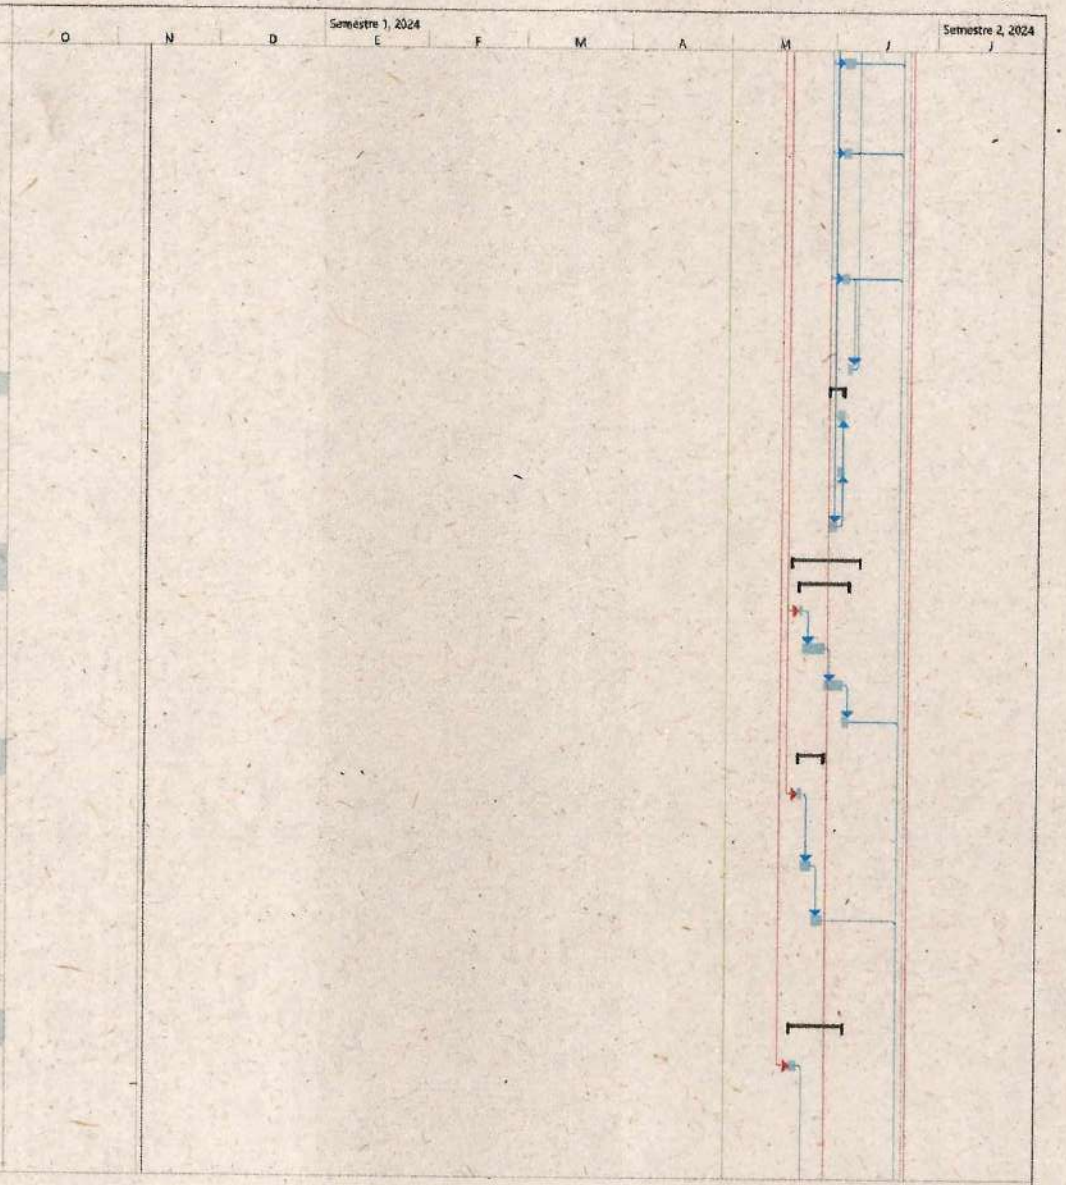
Id	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
55	S/I LAVAMANOS DE INCRUSTAR INCLUYE GRIFERIA CON SENSOR ELECTRONICO Y ACCESORIOS DE DESAGUES Y TODO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	$ 4,953,172	6 días	dom 16/06/24	sáb 22/06/24
56	S/I LAVAMANOS TIPO PEDESTAL INCLUYE ABASTOS DESAGUES Y GRIFERIA	$ 4,043,728	7 días	vie 7/06/24	vie 14/06/24
57	S/I DE TAZA ORINAL SANITARIO PARA FLUXÓMETRO DE ENTRADA SUPERIOR DE USO INSTITUCIONAL INCLUYE VALVULA Y ACCESORIOS	$ 7,720,040	7 días	vie 7/06/24	vie 14/06/24
58	S/I DE LAVAPLATOS PARA EMPOTRAR (1 POCETA) EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	$ 1,351,780	7 días	vie 7/06/24	vie 14/06/24
59	S/I DE GRIFERIA PARA LAVAPLATOS MONOCONTROL, INCLUYE SIFON DE DESGUE Y MANGUERA DE CONEXIÓN	$ 599,737	7 días	vie 7/06/24	vie 14/06/24
60	S/I DE LAVATRAPEROS DE 0.50M X 0.50M. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	$ 912,321	7 días	vie 7/06/24	vie 14/06/24
61	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**$ 15,933,258**	**38 días**	**sáb 27/04/24**	**vie 7/06/24**
62	PUNTO HIDRAULICO DE 1/2", INCLUYE ENCAJUELADA Y RELLENOS	$ 1,189,717	1 día	jue 16/05/24	jue 16/05/24
63	S/I TUBERIA DE PRESION 1" INCLUYE ENCAJUELADA Y RELLENOS	$ 463,570	1 día	lun 13/05/24	lun 13/05/24
64	S/I TUBERIA DE PRESION 3/4" INCLUYE ENCAJUELADA Y RELLENOS	$ 1,412,710	2 días	mar 14/05/24	mié 15/05/24
65	S/I LLAVE DE CONTROL 3/4"	$ 797,829	1 día	mar 14/05/24	mar 14/05/24
66	PUNTO SANITARIOS DE 2" INCLUYE ENCAJUELADA Y RELLENO	$ 1,154,834	2 días	sáb 4/05/24	lun 6/05/24
67	PUNTO SANITARIOS DE 4" INCLUYE ENCAJUELADA Y RELLENO	$ 645,448	1 día	sáb 4/05/24	dom 5/05/24
68	S/I TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 1000 LTS INCLUYE ACCESORIOS	$ 1,116,548	2 días	mié 15/05/24	jue 16/05/24
69	S/I TUBERIA SANITARIA 4" INCLUYE ENCAJUELADA Y RELLENO	$ 1,719,873	3 días	mié 1/05/24	vie 3/05/24
70	S/I TUBERIA SANITARIA 6" INCLUYE ENCAJUELADA Y RELLENO	$ 546,912	3 días	lun 6/05/24	jue 9/05/24
71	CAJA DE REGISTRO PREFABRICADA	$ 1,744,245	3 días	sáb 27/04/24	mar 30/04/24
72	S/I DE BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS	$ 4,241,572	1 día	jue 6/06/24	vie 7/06/24
73	**CARPINTERIA METÁLICA**	**$ 212,975,138**	**17 días**	**mar 28/05/24**	**vie 14/06/24**
74	S/I DE PUERTA METÁLICA DIMENSIONES 1.60M ANCHO X 2.10 M ALTO. UNA HOJA BATIENTE EN LAMINA CAL 20 ACABADO SEGÚN DISEÑO EN UNA SOLA CARA, INCLUYE MARCO METÁLICO, BISAGRAS, CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO PALANCA, ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA COLOR GRIS BA	$ 38,625,076	3 días	mar 28/05/24	jue 30/05/24
75	S/I VENTANA ALUMINIO PERFILERIA CON VIDRIO CRUDO INCOLORO DE 5MM, CON SUS RODAJAS, SEGUROS, EMPAQUE Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU BUEN USO Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN DISEÑOS	$ 48,915,897	3 días	vie 31/05/24	lun 3/06/24
76	S/I DE VENTANAS PROTECTORAS EN TUBO 1/2 X 1/2 CAL 18 Y TUBO DE 3/4X3/4 CAL 18. INCLUYE PINTURA BASE Y ESMALTE COLOR A ELECCION.	$ 22,947,210	3 días	lun 3/06/24	jue 6/06/24
77	S/I DIVISIONES SANITARIA, EN ACERO INOXIDABLE CAL 20, ENTAMBORADO DE 1" CON RELLENO EN LAMINA DE PIESTIRENO Y ESPUMA POLIURETANO, TABIQUES, SEPARADORES, PUERTAS DE 0.60X1.60M Y COMPLEMENTOS PARA ENSAMBLAR EN SITIO	$ 18,221,280	2 días	jue 13/06/24	vie 14/06/24



Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

2096

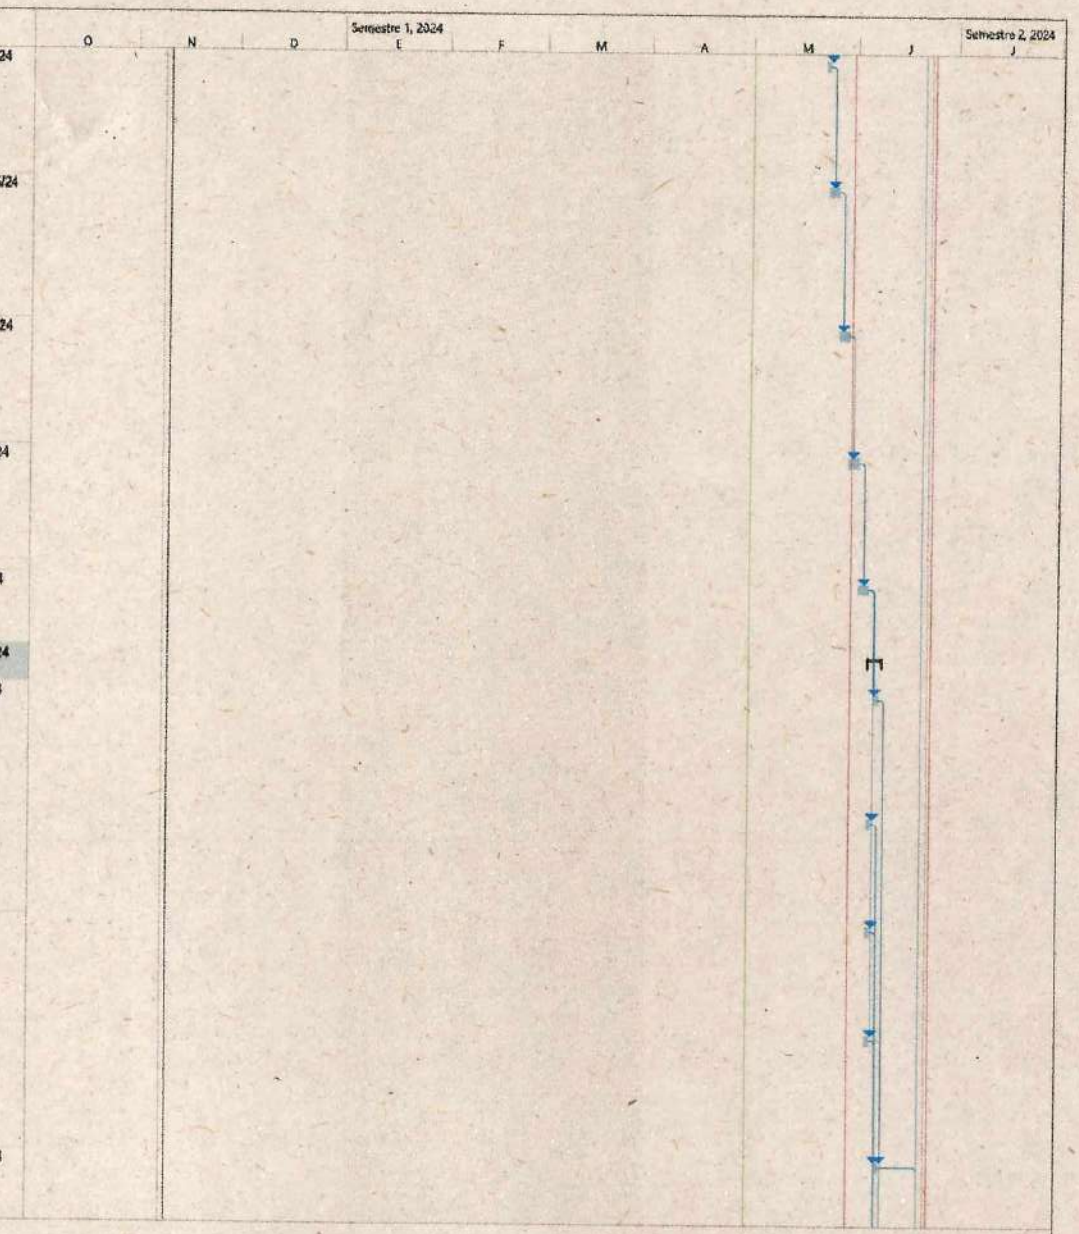
Id	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
78	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN EN VIDRIO DE SEGURIDAD TEMPLADO 10 MM INCLUYE SOPORTE EN ACERO INOXIDABLE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	$ 44,976,724	3 días	lun 3/06/24	jue 6/06/24
79	S/I DE PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO DIMENSIONES DE VANO ENTRE 1,70 - 2,00 M ANCHO X 2.10 M ALTO. CONFORMADA POR DOS HOJAS BATIENTES EN VIDRIO TEMPLADO CON APERTURA 180°, INCLUYE BISAGRA DE PISO, CERRADURA DE SEGURIDAD, TIRADERA EN ACERO INOXIDABLE, MARCO EN	$ 24,456,736	2 días	lun 3/06/24	mié 5/06/24
80	S/I MESON CON ACABADO EN ACERO INOXIDABLE CAL 18 INCLUYE POCETA. INCLUYE LOSA EN CONCRETO PARA SOPORTE INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	$ 11,182,412	2 días	lun 3/06/24	mié 5/06/24
81	S/I CANALETAS DE AGUAS LLUVIAS	$ 3,449,800	1 día	mié 5/06/24	jue 6/06/24
82	**CUBIERTA**	**$ 141,774,376**	**4 días**	**vie 31/05/24**	**mar 4/06/24**
83	S/I CUBIERTA ACANALADA UPVC DE 11,80X0,94 M E=2,5 MM COLOR BLANCO. INCLUYE ACCESORIOS	$ 68,794,103	2 días	dom 2/06/24	mar 4/06/24
84	ESTRUCTURA METÁLICA PERFILES C 220x80x2 MM. PINTADA CON BASE ANTICORROSIVA Y ACABADO ESMALTE	$ 46,707,093	2 días	dom 2/06/24	mar 4/06/24
85	VIGAS DE CONFINAMIENTO (CULATA) DE 0,12X0,20 M, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	$ 6,273,175	2 días	vie 31/05/24	dom 2/06/24
86	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**$ 158,741,823**	**16 días**	**lun 20/05/24**	**dom 9/06/24**
87	**RETIRO DE INSTALACION ANTIGUA**	**$ 5,098,158**	**14 días**	**mié 22/05/24**	**jue 6/06/24**
88	RETIRO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT USADO	$ 2,896,629	1 día	mié 22/05/24	jue 23/05/24
89	RETIRO DE GABINETE GENERAL ELECTRICO ANTIGUO	$ 448,264	6 días	jue 23/05/24	mié 29/05/24
90	RETIRO DE INSTALACIONES ELECTRICAS ANTIGUAS, CABLEADO Y DUCTERIA	$ 1,496,761	5 días	jue 30/05/24	mar 4/06/24
91	RETIRO DE APARATOS ELECTRICOS TOMAS, INTERRUPTORES, LAMPARAS ETC.	$ 1,156,514	2 días	mar 4/06/24	jue 6/06/24
92	**ACOMETIDA SUBTERRANEA DE BAJA TENSIÓN**	**$ 24,184,183**	**7 días**	**mié 22/05/24**	**mié 29/05/24**
93	SUMINISTRO DE ACOMETIDA DE BAJA TENSION EN BAJANTE DE TUBERIA IMC DE 4" SOBRE POSTE, INCLUYE CONDUCTORES Y CAPACETE ROSCADO	$ 11,322,263	1 día	mié 22/05/24	jue 23/05/24
94	CONSTRUCCION DE CAJA DE REGISTRO DE BAJA TENSION EN CONCRETO CON TAPA FUNDIDA DE de 60x60x70	$ 1,082,983	3 días	jue 23/05/24	dom 26/05/24
95	ACOMETIDA SUBTERRANEA DE BAJA TENSIÓN DESDE CAJA DE REGISTRO HASTA TRANSFERENCIA Y PLANTA GENERADORA DIESEL HASTA GABINETE ELECTRICO GENERAL 3X4/0 AWG THHN-THWN-2 EN DUCTO PVC 4" + 2"	$ 11,778,937	3 días	lun 27/05/24	mié 29/05/24
96	**ALIMENTADORES, TABLERO GENERAL Y DE DISTRIBUCIÓN**	**$ 23,448,807**	**15 días**	**lun 20/05/24**	**mié 5/06/24**
97	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR TRIFASICO 220/120V ENTRE EL TABLERO GENERAL Y TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN TD 1 Y 2 UBICADO EN PRIMER Y SEGUNDO PISO, CALIBRE 4X4 AWG + 1X6 AWG (TIERRA) THHN-THWN-2 AISL. 600V E	$ 3,106,563	2 días	lun 20/05/24	mié 22/05/24



Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

2097

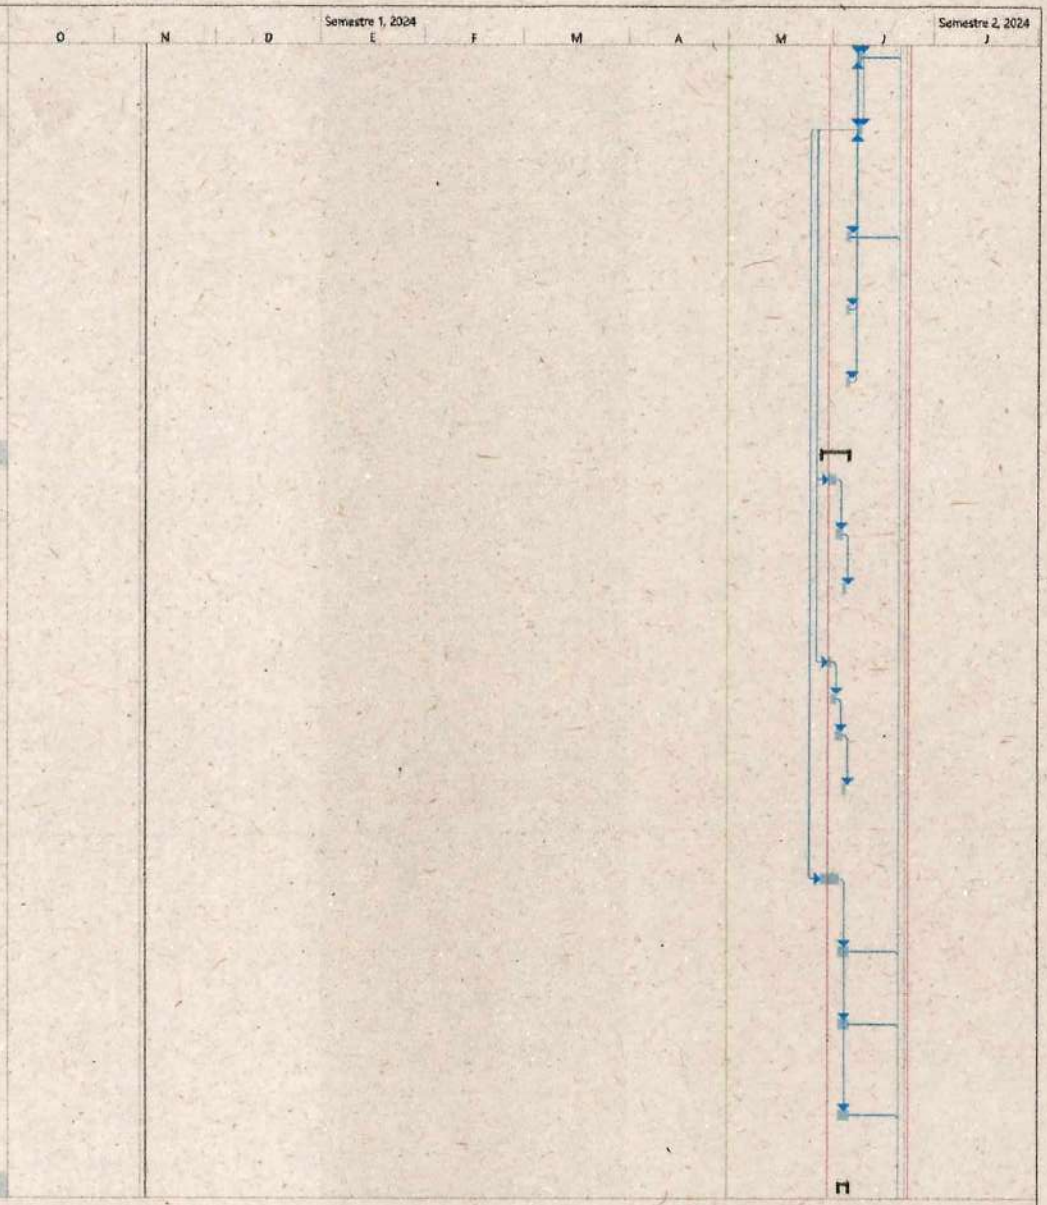
Id	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
98	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR TRIFASICO 220/120V ENTRE UPS DE 10KVA Y TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN REGULADO TDR 1 , 2 UBICADO EN PRIMER Y SEGUNDO PISO, CALIBRE 4X6 AWG + 1X10 AWG (TIERRA) THHN-THWN-2 AISL. 600V	$ 2,339,114	1 día	mié 22/05/24	jue 23/05/24
99	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE GENERAL SEGÚN DISEÑO, TRIFASICO DE 8 CIRCUITOS, 208/120V FASE-FASE, FASE-NEUTRO, CON PUERTA Y CERRADURA, INCLUYE TOTALIZADORES DE TABLEROS ELECTRICOS DE DISTRIBUCIÓN, TOTALIZADOR GENERAL Y ACCESORIOS.	$ 11,455,363	3 días	jue 23/05/24	dom 26/05/24
100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELECTRICO TRIFASICO CON CERTIFIACACIÓN RETIE DE 24 CIRCUITOS, 208/120V FASE-FASE, FASE-NEUTRO Y TIERRA CON PUERTA Y CERRADURA. INCLUYE ACCESORIOS PARA PRIMER Y SEGUNDO PISO	$ 3,949,115	3 días	lun 27/05/24	mié 29/05/24
101	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELECTRICO TRIFASICO PARA CIRCUITOS REGULADOS CON CERTIFIACACIÓN RETIE DE 12 CIRCUITOS, 208/120V FASE-FASE, FASE-NEUTRO Y TIERRA CON PUERTA Y CERRADURA, INCLUYE ACCESORIOS. PARA PRIMER Y SEGUNDO PISO	$ 1,946,166	3 días	jue 30/05/24	dom 2/06/24
102	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA CON BARILLA DE COOPER WELD 5/8" x 2,4mt Y CONDUCTOR DE PUESTA ATIERRA DE COBRE # 6 AWG THHN-THWN-2	$ 652,557	3 días	dom 2/06/24	mié 5/06/24
103	**INSTALACIÓN ELECTRICA DE SERVICIOS GENERALES**	$ 115,109,784	4 días	mié 5/06/24	dom 9/06/24
104	SALIDA ELECTRICA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA INSTALADO EN CANALETA METALICA PARA PUESTO DE TRABAJO DE 120V, CERTIFICADO EN CABLE DE COBRE #12 AWG THHN-THWN-2 Y TUBERIA EMT 3/4"	$ 18,535,930	1 día	vie 7/06/24	sáb 8/06/24
105	SALIDA ELECTRICA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA DE120V, CERTIFICADO EN CABLE DE COBRE #12 AWG THHN-THWN-2 Y TUBERIA EMT SOBRE PARED EN CAJA RAWELT 2X4	$ 4,711,275	1 día	mié 5/06/24	jue 6/06/24
106	SALIDA ELECTRICA PARA TOMACORRIENTE DOBLE TIPO GFCI CON POLO A TIERRA DE 120V, CERTIFICADO EN CABLE DE COBRE #12 AWG THHN-THWN-2 EN TUBERIA EMT 1/2" SOBRE PARED EN CAJA RAWELT 2X4	$ 2,860,834	1 día	mié 5/06/24	jue 6/06/24
107	SALIDA ELECTRICA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA REGULADO INSTALADO EN CANALETA METALICA PARA PUESTO DE TRABAJO DE 120V, CERTIFICADO EN CABLE DE COBRE #12 AWG THHN-THWN-2 Y TUBERIA EMT 3/4"	$ 21,448,093	1 día	mié 5/06/24	jue 6/06/24
108	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA PANEL LED 60X60 DE 45W PARA EMPOTRAR, 110V, EN TUBERIA EMT DE 1/2" Y CABLE #14 AWG THHN-THWN-2	$ 34,578,369	1 día	sáb 8/06/24	dom 9/06/24



Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

2019

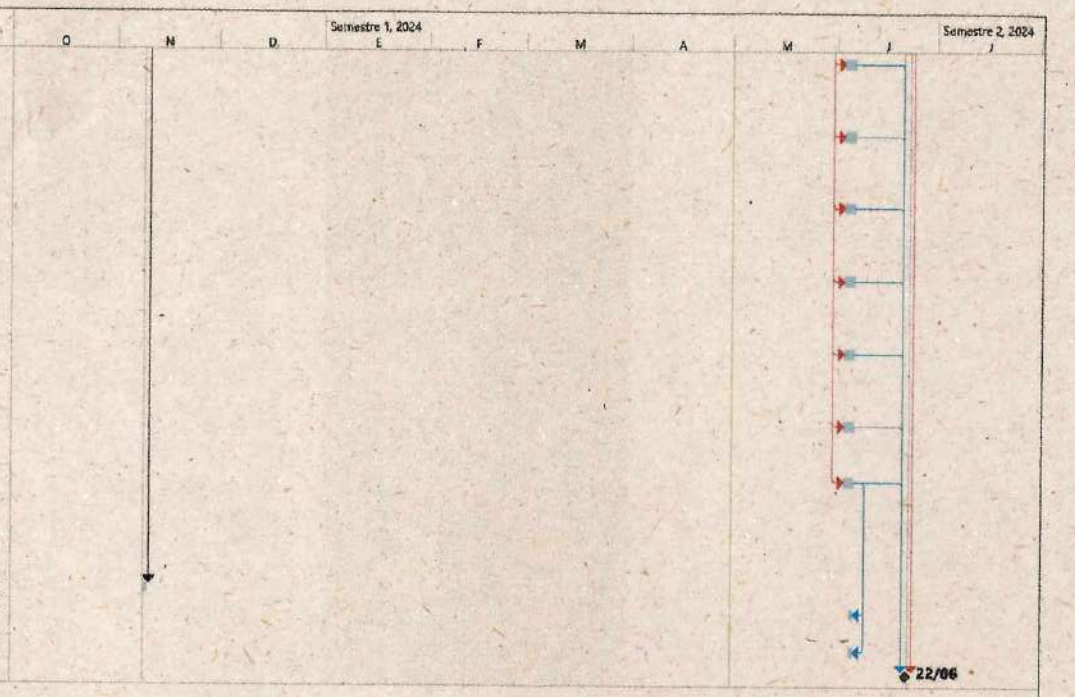
Id	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
109	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA LED REDONDA PARA EMPOTRAR DE 15W. EN TUBERIA EMT DE 1/2" Y CABLE #14 AWG THHN-THWN-2.	$ 13,687,605	1 día	sáb 8/06/24	dom 9/06/24
110	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIAS DE EMERGENCIA PARA ZONAS DE PANICO Y RUTA DE EVACUACION (UBICACIÓN SOBRE TECHO) EN TUBERIA EMT 1/2" Y CABLE LIBRE DE ALOGENOS #14 AWG.	$ 6,633,230	1 día	sáb 8/06/24	dom 9/06/24
111	SALIDA ELECTRICA PARA INTERRUPTOR SENCILLO (INCLUYE ACCESORIOS) EN TUBERIA EMT 1/2" Y CAJA RAWELT SOBRE PARED.	$ 11,192,460	1 día	mié 5/06/24	jue 6/06/24
112	SALIDA ELECTRICA PARA INTERRUPTOR DOBLE (INCLUYE ACCESORIOS) EN TUBERIA EMT 1/2" Y CAJA RAWELT SOBRE PARED.	$ 725,401	1 día	mié 5/06/24	jue 6/06/24
113	SALIDA ELECTRICA PARA INTERRUPTOR CONMUTABLE (INCLUYE ACCESORIOS) EN TUBERIA EMT 1/2" Y CAJA RAWELT SOBRE PARED.	$ 736,489	1 día	mié 5/06/24	jue 6/06/24
114	**RED DE VOZ, DATOS Y VIDEO.**	**$ 164,835,136**	**8 días**	**mié 29/05/24**	**jue 6/06/24**
115	SALIDA DE RED DE VOZ Y DATOS INSTALADA EN CANALETA METALICA PARA PUESTO DE TRABAJO, EN CABLE UTP CATEGORIA 6A	$ 45,577,409	2 días	vie 31/05/24	dom 2/06/24
116	SALIDA DE RED DE DATOS INSTALADA EN CANALETA METALICA, EN CABLE UTP CATEGORIA 6A	$ 11,024,561	2 días	dom 2/06/24	mar 4/06/24
117	RACK PRINCIPAL CERRADO METALICO DE COMUNICACIONES, INCLUYE ACCESORIOS DE ORGANIZACIÓN, PATCH PANEL Y PACTCH CORD, MULTITOMA .	$ 5,670,866	1 día	mar 4/06/24	mié 5/06/24
118	PLANTA TELEFONICA PBX VOIP PARA RED DE TELEFONIA IP INTERNA Y EXTERNA.	$ 5,207,573	1 día	vie 31/05/24	vie 31/05/24
119	SWITCH PARA COMUNICACIONES 24 PUERTOS	$ 6,256,254	1 día	sáb 1/06/24	dom 2/06/24
120	CANALETA METALICA CON DIVISION PARA CABLEADO DE DATOS Y ELECTRICO, PARA PUESTOS DE TRABAJO.	$ 36,326,605	2 días	dom 2/06/24	mar 4/06/24
121	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA PORTA CABLE, PARA CABLES DE DATOS INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION, SOPORTE Y DE MAS PARA SU CORECTA INSTALACIÓN	$ 11,975,766	1 día	mar 4/06/24	mié 5/06/24
122	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA DE CCTV IP DOMO PARA INTERIOR SEMIMETALICO 1/3 CMOS 4MP@20FPS LENTE 2,8MM IP67 120DB IR 30M POE	$ 19,892,400	5 días	mié 29/05/24	lun 3/06/24
123	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA DE CCTV IP BALA PARA EXTERIOR SEMIMETALICO 1/3 CMOS 4MP@20FPS LENTE 2,8MM IP67 120DB IR 30M POE	$ 2,190,368	3 días	lun 3/06/24	jue 6/06/24
124	RACK CERRADO DE PARED METALICO PARA CCTV, INCLUYE ACCESORIOS DE ORGANIZACIÓN, PATCH PANEL Y PACTCH CORD, MULTITOMA, SWCHE POE, BANDEJA ORGANIZADORA.	$ 8,610,265	3 días	lun 3/06/24	jue 6/06/24
125	NVR GRABADOR DE VIDEO 4K DE 16 CANALES PUERTOS POE CON CONECTOR HDMI Y RESOLUCION 8MP/6MP/4MP INCLUYE DISCO DURO DE 6TB.	$ 12,102,972	3 días	lun 3/06/24	jue 6/06/24
126	**CLIMATIZACIÓN DE OFICINAS**	**$ 138,703,525**	**3 días**	**lun 3/06/24**	**jue 6/06/24**



Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

2099

Id	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
127	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 9000 BTU A 220V-R410A, INCLUYE INSTALACIÓN, MONTAJE, TRANSPORTE Y ACCESORIOS.	$ 16.662,666	3 días	lun 3/06/24	jue 6/06/24
128	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 12000 BTU A 220V-R410A, INCLUYE INSTALACIÓN, MONTAJE, TRANSPORTE Y ACCESORIOS.	$ 43,373,986	3 días	lun 3/06/24	jue 6/06/24
129	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 18000 BTU A 220V-R410A, INCLUYE INSTALACIÓN, MONTAJE, TRANSPORTE Y ACCESORIOS.	$ 16.786,797	3 días	lun 3/06/24	jue 6/06/24
130	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 24000 BTU A 220V-R410A, INCLUYE INSTALACIÓN, MONTAJE, TRANSPORTE Y ACCESORIOS.	$ 13,996,000	3 días	lun 3/06/24	jue 6/06/24
131	SUMINISTROS E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE DE 1/2" Y 1/4" PARA AIRE ACONDICIONADO INCLUYE ACCESORIOS DE SUJECIÓN.	$ 35,258,446	3 días	lun 3/06/24	jue 6/06/24
132	SUMINISTROS E INSTALACIÓN DE TUBERIA PARA DESAGUE DE AIRE ACONDICIONADO EN TUBERIA PVC DE 1/2"	$ 11.154,845	3 días	lun 3/06/24	jue 6/06/24
133	SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA PARA AIRE ACONDICIONADO DE 220V, CERTIFICADO EN CABLE DE COBRE #10 AWG THHN-THWN-2 EN TUBERIA EMT DE 1/2" INSTALADO A 2,5 MTRS DE ALTURA EN CAJA RAWELT 2X4.	$ 7,870,785	3 días	lun 3/06/24	jue 6/06/24
134	PGIO	$ 11.144,617	1 día	jue 9/11/23	jue 9/11/23
135	LEGALIZACION Y TRAMITES ANTE EL OPERADOR DE RED	$ 3,176,720	1 día	mié 5/06/24	jue 6/06/24
136	RETIE	$ 3,750,000	1 día	mié 5/06/24	jue 6/06/24
137	Fin de obra	$ 0	0 días	sáb 22/06/24	sáb 22/06/24



Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso	

2050

	SEMANA 1		SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SUSPENCION SEMANA S-29	SEMANA 20	SEMANA 21	SEMANA 22	SEMANA 23	SEMANA 24	SEMANA 25	SEMANA 26	SEMANA 27	SEMANA 28	SEMANA 29	SEMANA 30	SEMANA 31	SEMANA 32	
	2.75%	2.81%	2.73%	3.02%	5.11%	5.11%	5.11%	5.14%	8.92%	10.01%	13.09%	15.39%	18.29%	18.87%	16.16%	34.94%	73.03%	82.55%	101.00%	
DE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ICHAPEMBO Y PLANTILLA DE CONCRETO E= LUYE RETIRO DE ESCOMBROS	$ 10,469,833.03	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10,469,833.03
ICALOS INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	$ 1,791,526.97	$ 2,985,877.95	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,777,404.72
SHAPE PARED INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	$ -	$ 1,744,543.44	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,744,543.44
ILLOS	$ 330,233.74	$ 205,474.30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 535,708.04
JADA EN EL 15M15S 20MTS INCLUYE RETIRO DEL	$ -	$ -	$ 4,020,539.20	$ 909,973.71	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,930,512.91
TA Y MARCO	$ -	$ 921,712.09	$ 2,666,846.19	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,588,558.28
ITANAS, MARCO EN ALUMINIO Y/O MADERA	$ -	$ 2,888,972.66	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,888,972.66
BERTA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10,980,366.84	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10,980,366.84
OS SANITARIOS	$ -	$ -	$ -	$ 320,360.04	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 320,360.04
RSA HIDRO-SANITARIA INCLUYE DEMOLICION Y	$ -	$ -	$ -	$ 285,843.36	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 285,843.36
LO BASE GIL DRYWALL Y ENTRANDO INCLUYE ROS	$ -	$ -	$ -	$ 3,958,448.92	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,958,448.92
ES ACONDICIONADO INCLUYE DESMONTERE	$ -	$ -	$ -	$ 2,148,210.24	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,148,210.24
TO INSTALACIONES ELECTRICAS EXISTENTES	$ -	$ -	$ -	$ 1,457,660.08	$ 1,460,009.08	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,904,969.08
IENTOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
RIAL SELECCIONADO COMPACTADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 530,814.93	$ 22,426.91	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,120,296.56	$ 2,939,496.36	$ 451,789.64	$ -	$ -	$ -	$ 4,847,824.40
ION DE 0.35 MPA Y 7.30 MPS DE 21 MPA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 260,206.96	$ 1,340,640.40	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 552,316.84
O E MATERIAL SOBRANTE CON ACARREO LIBRE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 82,227.13	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,068,768.46
420 Fy = 4.2 Mpa PARA CIMIENTOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 98,481.71	$ 840,801.20	$ 840,801.20	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,780,084.11
IMIENTOS DE CONFINAMIENTO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
EN BLOQUE DE ARENA - CEMENTO DE 0.10MTS X ON PEGA DE MORTERO 1:4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,301,434.07	$ 3,519,399.81	$ -	$ -	$ 7,820,734.88
CONFINAMIENTO 0.15MTS X 0.30MTS EN CONCRETO RILLAS DE 35 Y ESTRIBOS 1H @0.15m	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6,263,588.06	$ -	$ 6,263,588.06
10m x 0.30m EN CONCRETO DE 21 MPA (300 Kgf/cm2) CON ESTRIBOS 1H @0.15m	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,548,438.52	$ -	$ 3,548,438.52
O DE 10" EN ELEMENTOS DE CONCRETO N PERFORACION CON MADRO Y EPOXICO PARA NCRETO ENDURECIDO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,139,676.48	$ 368,338.24	$ -	$ 1,681,014.72
BLUADO 1:4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ACABADOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10,706,294.06	$ -	$ 10,706,294.06
ICRETO 21 MPA, E= 0.10MT. INCLUYE REF. MALLA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6,439,569.67	$ 20,808,792.46	$ 4,888,707.85	$ 32,196,049.98
LACION EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO CM	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,407,172.56	$ 15,476,906.38	$ 16,885,079.06
MATO 6 MM AC. COLOR COLOR GRIS MATE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9,958,732.58	$ 109,546,057.38	$ 119,504,889.96
M PORCELANATO 0.1000 m COLOR GRIS MATE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,679,660.79	$ 29,476,887.80	$ 32,156,918.79
NEL PARA REMATE DE RSC	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 98,594.77	$ 1,084,541.47	$ 1,183,137.24
O COLOR BLANCO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,678,365.31	$ 18,473,018.41	$ 20,151,383.72
RETAS EXISTENTES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 811,228.40	$ 8,924,871.36	$ 9,736,099.76
PARA SUBESTACIONES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 374,164.81	$ 4,116,813.11	$ 4,490,977.92
ERCHES DE 3 MANOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6,046,478.61	$ 540,691.97	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 46,213,893.76
TIPO I PARA MUROS INTERIORES (A 3 MANOS)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9,696,328.12
VIVAL INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 14,659,720.59	$ 24,617,926.57	$ 13,251,884.95	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,676,170.30	$ 37,671,872.30	$ 76,582,151.66
INGRECARO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12,457,816.84	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 35,679,184.00
AS PREFABRICADAS DE CONCRETO, INCLUYE LA SUPERFICIE DE ARGYO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12,457,816.84
CON ADOQUIN PREFABRICADO EN CONCRETO 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR GRIS, INCLUYE TAS DE LADAS COMARENA, RELLENO CON NADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 22,720,113.60	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 22,720,113.60
TACTIL PREFABRICADA, EN CONCRETO DE 0.30M 30 AMARILLO TEXTURA TIPO TOPERA, INCLUYE ENDO CON MATERIAL SELECCIONADO DE 0.30M Y CH ARENA.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 533,264.92	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 533,264.92
CADORA PARA 1.00TADOS VISUALES CON MODULIN CONCRETO DE 0.20MTS. 30m 30.00m COLOR. SEBER EN MORTERO, ARREGLADO SEGUN DISEÑO. SELECCIONADO DE 0.30M Y LIMPIAR DE LADAS SOBR	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,957,142.56	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,957,142.56
A PREFABRICADA EN CONCRETO DE 0.2m X 0.20m LLO, TEXTURA TIPO ACANALADA (2 HILERAS) CON VE ELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LADAS CON ARENA.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,828,324.72	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,828,324.72
O EN HIERRO TIPO HEY - DU EMPOTRADOS EN E TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 43,290.36	$ 470,173.00	$ -	$ 513,463.50
21 MPA PU ANCHOS 80x1m5 STAFARIA MISION AMADO EN MARMOL INCLUYE PULIDO PERIMETRAL GM, PERFORACION PARA POCETAS, MUROS DE SOBRANTE PARA SU CORRECTO ACABADO E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,991,467.86	$ 18,666,145.60	$ -	$ 20,297,613.60
OSA GRANITO PULIDO BLANCO MERLA O SIMILAR JELAS INCLUYE PIRLAN ENALUMINIO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 581,115.61	$ 6,512,363.61	$ -	$ 6,813,366.92
TOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

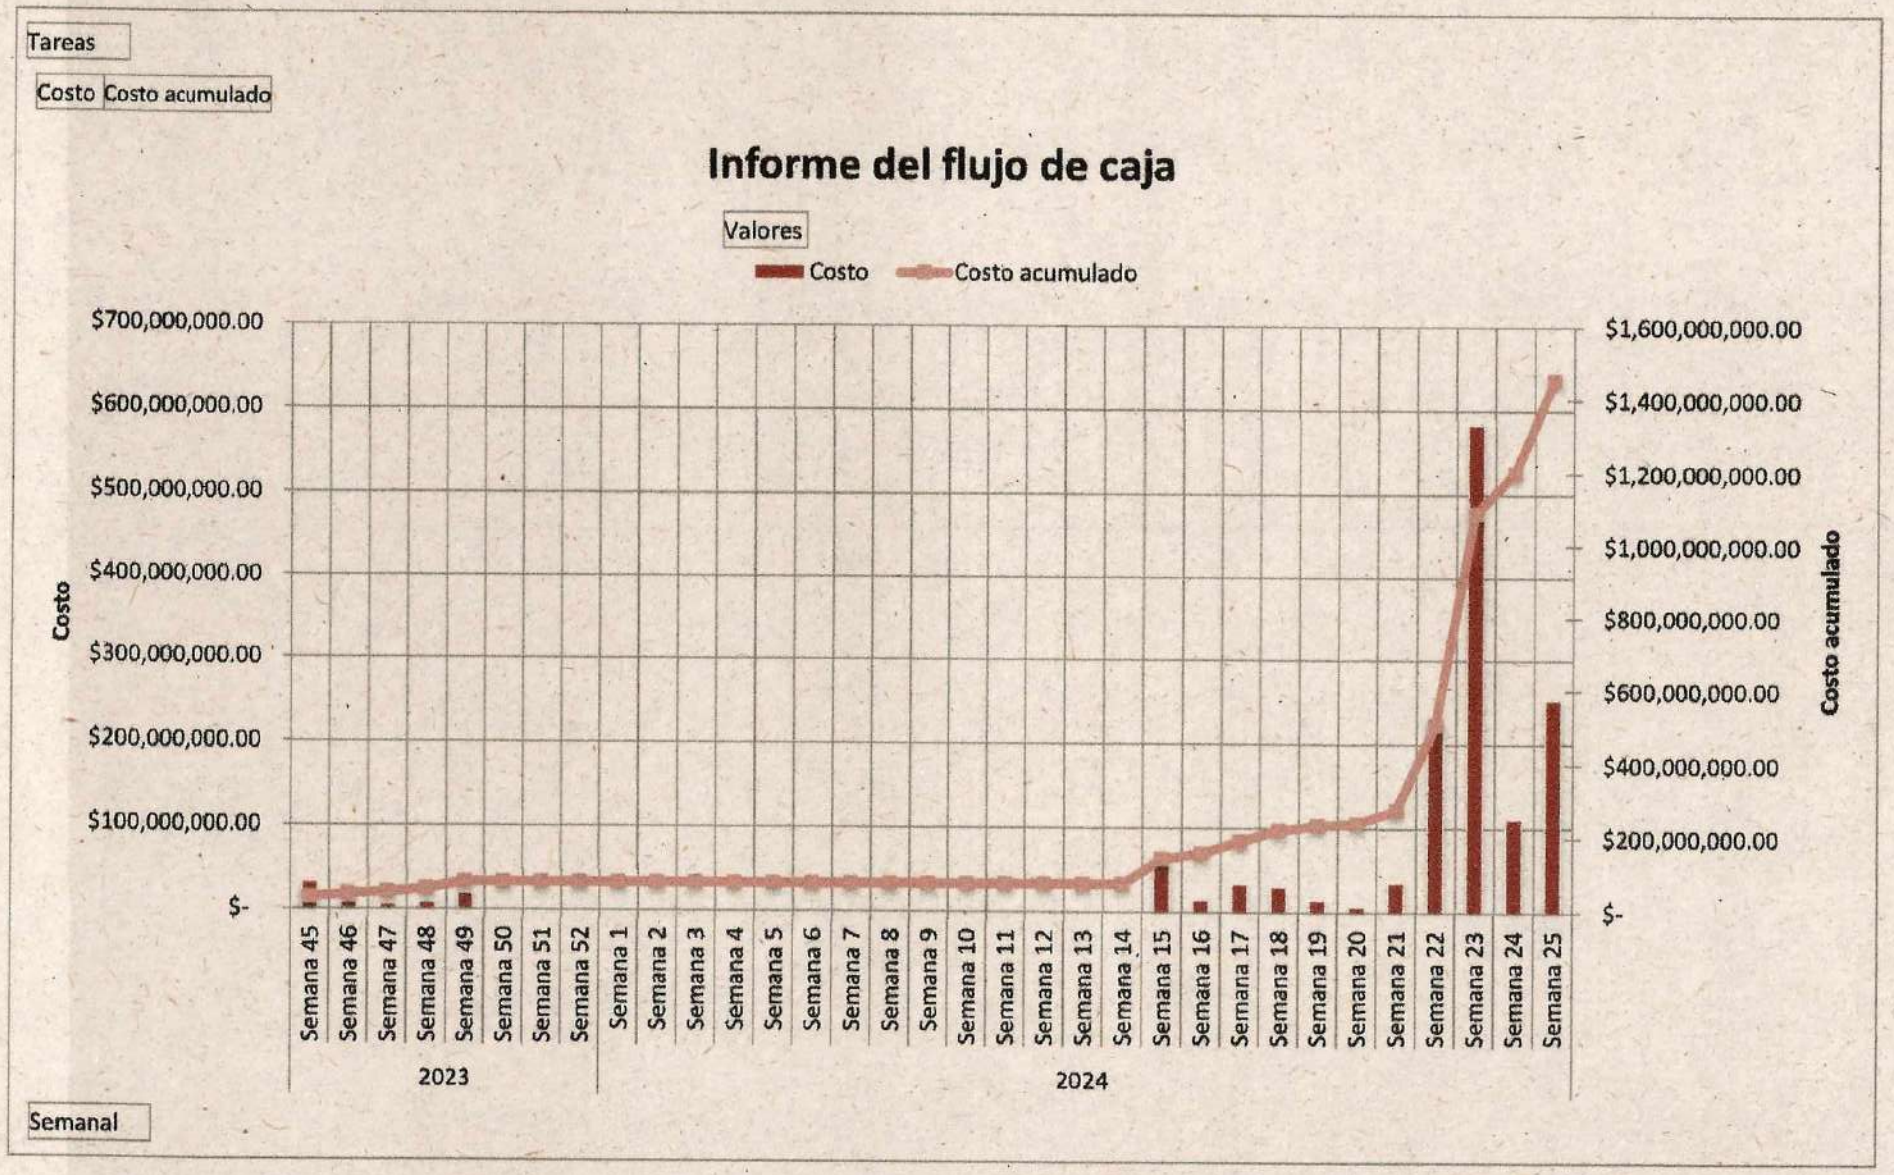
	SEMANA 1		SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SUSPENSIÓN SEMANA 5-28	SEMANA 29	SEMANA 21	SEMANA 22	SEMANA 23	SEMANA 24	SEMANA 25	SEMANA 26	SEMANA 27	SEMANA 28	SEMANA 29	SEMANA 30	SEMANA 31	SEMANA 32	
	2.75%	2.81%	3.23%	3.83%	5.15%	5.51%	5.11%	5.14%	5.92%	10.91%	13.28%	15.26%	16.28%	16.87%	16.16%	34.94%	76.83%	92.85%	100.00%	
LAMA SANITARIA PARA FLUXOMETRO DE ENTRADA RESTITUCIONAL INCLUYE ASIENTO, FLUXÓMETRO Y	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5,679,386.05	$ 14,884,222.83	$ -	$ 20,577,511.98
INODORETTA INCLUYE CERRAR CON EMBOR SHUROS DE ESBALQUE Y TODO PARA SU ANARIO.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 412,764.39	$ 4,540,407.63	$ 4,953,172.08
O PEDESTAL INCLUYE ASIENTOS ESBALQUES Y	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,155,350.74	$ 2,888,376.86	$ -	$ 4,043,727.60
. SANITARIO PARA FLUXOMETRO DE ENTRADA RESTITUCIONAL INCLUYE VALVULA Y ACCESORIOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,205,705.66	$ 5,514,214.14	$ -	$ 7,720,639.80
PARA EMPOTRAR (T POCETA) EN ACERO E TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 394,220.95	$ 986,957.37	$ -	$ 1,381,760.32
RA LAVABLATOS MONDCONTROL, INCLUYE SIFON JERA DE CONEXION	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 171,359.35	$ 428,385.37	$ -	$ 599,736.72
TOS DE 0.50M X 0.50M, INCLUYE TODO LO CORRECTA INSTALACION	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 280,869.04	$ 691,687.60	$ -	$ 972,319.64
REGISTROS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
O DE 15", INCLUYE ENCAJILLADA Y RELLENOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,189,717.32	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,189,717.32
SION 1" INCLUYE ENCAJILLADA Y RELLENO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 493,599.48	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 493,599.48
SION 3/4" INCLUYE ENCAJILLADA Y RELLENOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,412,710.20	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,412,710.20
RO 3/4"	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 787,629.12	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 787,629.12
3 DE 2" INCLUYE ENCAJILLADA Y RELLENO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 866,128.26	$ 288,708.42	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,154,833.68
3 DE 4" INCLUYE ENCAJILLADA Y RELLENO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 648,446.32	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 648,446.32
NAMIENTO DE AGUA DE 1"HG LTS INCLUYE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,116,548.40	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,116,548.40
RIA 4" INCLUYE ENCAJILLADA Y RELLENO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,719,972.86	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,719,972.86
RIA 6" INCLUYE ENCAJILLADA Y RELLENO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 946,911.84	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 946,911.84
Y PREFABRICADA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 391,468.52	$ 1,166,830.24	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,741,240.39
AGUAS LLUVIAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ICA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,241,571.84	$ -	$ -	$ 4,241,571.84
ALUGA DIMENSIONES 1.00MANCHO X 2.10 M ALTO ON LAMINA CAL 20 ACABADO BISON DISEÑO EN ALIVE MARCO METALICO, BISAGRAS, CERRADURA DE AMINA, ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 36,575,075.52	$ -	$ -	$ -	$ 36,575,075.52
NO PERFILERIA CON VIDRIO CRUDO INCOLORO DE JAS, SEGUROS, EMPAQUE Y DEMAS ACCESORIOS Y FUNCIONAMIENTO SEGUN DISEÑOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 40,763,247.69	$ 3,152,649.66	$ -	$ -	$ 43,915,897.35
INYECTORIA EN TUBO 50.8 X 1/2 CAL 16 Y TUBO DE 1/2 PINTURA BASE Y ESMALTE COLOR A ELECCION.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 22,847,219.00	$ -	$ -	$ 22,847,219.00
TERIA EN ACERO INOXIDABLE CAL 20 "CON RELLENO EN LAMINA DE PESTIRENO Y ROL, TANQUES, ENFRIADORES, PUERTAS DE EMENTOS PARA ENSAMBLAR EN SITIO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 18,221,280.00	$ -	$ 18,221,280.00
TALACION DE DIVISION EN VIDRIO DE SEGURIDAD CLUYE SOPORTE EN ACERO INOXIDABLE Y TODO LO CORRECTA INSTALACION	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 44,976,734.32	$ -	$ -	$ 44,976,734.32
VIDRIO TEMPLADO DIMENSIONES DE VANO ENTRE 2.10 MALTO, CONFORMADA POR DOS HOJAS D TEMPLADO CON APERTURA 180°, INCLUYE TRADURA DE SEGURIDAD, TIRADERA EN ACERO EN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 24,456,735.60	$ -	$ -	$ 24,456,735.60
NSADO EN ACERO INOXIDABLE CAL 18 INCLUYE SA EN CONCRETO PARA SOPORTE INCLUYE TODO SU CORRECTA INSTALACION.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11,182,411.68	$ -	$ -	$ 11,182,411.68
AGUAS LLUVIAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,449,800.20	$ -	$ -	$ 3,449,800.20
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PLACA UPVC DE 1.19X0.94 M EN LS VM COLOR CESORIOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 22,198,525.60	$ 46,595,677.40	$ -	$ -	$ 68,794,183.20
LICA PERFILES C 22X30X2.5M, PINTADA CON BASE CARÑO ESMALTE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11,676,773.12	$ 35,030,319.36	$ -	$ -	$ 46,707,092.52
MIENTO (CULATA) DE 0.12X0.20 M, INCLUYE ACERO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6,773,174.60	$ -	$ -	$ -	$ 6,773,174.60
CTRICAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ACION ANTIGUA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ICIONADO TIPO MINI SPLIT HSAO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TE GENERAL ELECTRICO ANTIGUO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,599,620.12	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,599,620.12
LACIONES ELECTRICAS ANTIGUAS, CABLEADO Y	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 224,126.76	$ -	$ 224,126.76	$ -	$ -	$ -	$ 448,253.52
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,047,732.64	$ -	$ 449,028.36	$ -	$ -	$ -	$ 1,496,761.20
NTOS ELECTRICOS TOMAS, INTERRUPTORES.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,156,814.64	$ -	$ -	$ 1,156,814.64
DRANDA DE BAJA TENSION	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
NOMETIDA DE BAJA TENSION EMBAJANTE DE OBRE POSTE, INCLUYE CONDUCTORES Y CAPACITE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11,322,263.84	$ -	$ -	$ -	$ 11,322,263.84
DE CAJA DE REGISTRO DE BAJA TENSION EN Y FUNDIDA DE 60 cm x 60 cm	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,069,963.44	$ -	$ -	$ -	$ 1,069,963.44
TERMINACION DE BAJA TENSION DESDE CAJA DE INTERFERENCIA Y PLANTA GENERADORA DIESEL ELECTRICO GENERAL EXAG AWG THW-THWN-2 EN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11,776,936.64	$ -	$ -	$ -	$ 11,776,936.64
TABLERO GENERAL Y DE DISTRIBUCIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

2021

	SEMANA 1		SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SUSPENSIÓN SEMANA S-20	SEMANA 20	SEMANA 21	SEMANA 22	SEMANA 23	SEMANA 24	SEMANA 25	SEMANA 26	SEMANA 27	SEMANA 28	SEMANA 29	SEMANA 30	SEMANA 31	SEMANA 32	
	2.73%	2.81%	5.23%	3.82%	5.11%	5.11%	5.11%	5.14%	6.02%	10.93%	13.79%	12.26%	10.28%	10.57%	10.18%	24.04%	75.03%		82.85%	100.00%	
«STALACION DE ALIMENTADOR TRIFASICO 3#8 1/0 GENERAL Y TABLEROS DE DISTRIBUCION TD-1 Y 2 R Y SEGUNDO PISO, CALIBRE 474 KCMIL + 1#6 AWG 1#2 ABS, 600V E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,186,583.04	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,186,583.04
«STALACION DE ALIMENTADOR TRIFASICO 4#3 1/0 ON Y TABLEROS DE DISTRIBUCION REGULADO TOR 1, ER Y SEGUNDO PISO, CALIBRE 4#3 KCMIL + 1#2/0 AWG 1#2 ABS, 600V	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,328,112.92	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,328,112.92
«STALACIÓN DE GABINETE GENERAL SEGÚN DIBUJO, ILUTOS, 3#4/1#2/0 FASE/FASE, FASE/NEUTRO, CON JAS, INCLUYE TOTALIZADORES DE TABLEROS TRIBUCIÓN, TOTALIZADOR GENERAL Y ACCESORIOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11,465,382.80	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11,465,382.80
«STALACION EN TABLERO ELECTRICO TRIFASICO 3N RETIE DE 24 CIRCUITOS, 3#6/1#8/1#10 FASE-FASE, TIERA CON PUERTA Y CERRADURA, INCLUYE PRIMER Y SEGUNDO PISO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,949,118.26	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,949,118.26
«STALACIÓN DE TABLERO ELECTRICO TRIFASICO REGULADOR CON CERTIFICADO RETIE DE 12 Y FASE-FASE, FASE-NEUTRO Y TIERRA CON PUERTA Y VE ACCESORIOS, PARA PRIMER Y SEGUNDO PISO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,946,186.76	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,946,186.76
STA A TIERRA CON BARRA DE COBRE WELD BY 1 E DE PUESTA A TIERRA DE COBRE 2 N AWG THW-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 158,758.42	$ 643,797.10	$ -	$ -	$ -	$ 802,555.52
CTRICA DE SERVICIOS GENERALES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A RIA CANALERIA METALICA PARA PUESTO DE TRABAJO 3#2 6#8 CABLE DE COBRE #12 AWG THW-THWN-2 Y	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 16,835,929.72	$ -	$ -	$ 16,835,929.72
CA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A RTIPICADO EN CABLE DE COBRE #12 AWG THW-ENT SOBRE PARED EN CAJA RAWELT 2X4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,711,276.38	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,711,276.38
CA PARA TOMACORRIENTE DOBLE TIPO GFCI CON XNV, CERTIFICADO EN CABLE DE COBRE #12 AWG ABERIA EMT 1/2" SOBRE PARED EN CAJA RAWELT 2X4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,850,693.68	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,850,693.68
CA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A INSTALADO EN CANALETA METALICA PARA PUESTO V, CERTIFICADO EN CABLE DE COBRE #12 AWG THW-ENT 2#4"	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 21,448,080.80	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 21,448,080.80
«STALACIÓN DE LAMPARA RAWELED RONDA DE 40W 120V, EN TUBERIA EMT DE 1/2" Y CABLE #14 AWG THW	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 34,578,368.88	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 34,578,368.88
«STALACIÓN DE LAMPARA LED REDONDA PARA EN TUBERIA EMT DE 1/2" Y CABLE #14 AWG THW-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 13,667,665.36	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 13,667,665.36
«STALACION DE SALIDA PARA LUMINARIAS DE ZONAS DE PANICO Y RUTA DE EVACUACION TECHO EN TUBERIA EMT 1/2" Y CABLE LIBRE DE 3	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8,833,229.68	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8,833,229.68
CA PARA INTERRUPTOR SENCILLO INCLUYE ABERIA EMT 1/2" Y CAJA RAWELT SOBRE PARED	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11,192,459.52	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11,192,459.52
CA PARA INTERRUPTOR DOBLE INCLUYE ABERIA EMT 1/2" Y CAJA RAWELT SOBRE PARED	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 725,460.72	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 725,460.72
CA PARA INTERRUPTOR CONMUTABLE INCLUYE ABERIA EMT 1/2" Y CAJA RAWELT SOBRE PARED	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 725,460.72	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 725,460.72
Y VIDEO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
1 VOZ Y DATOS INSTALADA EN CANALETA METALICA TRABAJO, EN CABLE UTP CATEGORIA 6A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 46,577,488.80	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 46,577,488.80
1 DATOS INSTALADA EN CANALETA METALICA, EN NEA 6A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,798,140.20	$ 8,280,420.60	$ -	$ -	$ -	$ 11,024,560.80
1 BRIADO METALICO DE COMUNICACIONES, INCLUYE ORGANIZADOR, PATCH PANEL Y PACTCH CORD,	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5,670,885.88	$ -	$ -	$ -	$ 5,670,885.88
CA PBX VOIP PARA RED DE RESPONSIVA INTERNA Y	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,207,673.24	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,207,673.24
«UNICACIONES 24 PUERTOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6,266,253.52	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6,266,253.52
IA CON DIVISOR PARA CABLEADO DE DATOS Y UESTOS DE TRABAJO.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9,091,791.71	$ 27,946,163.63	$ -	$ -	$ -	$ 36,376,865.34
ITALACION DE BANDEJA PORTA CABLE, PARA CABLES ACCESORIOS DE FIJACION, SOPORTE Y 2# 6AWG PARA LACION	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11,978,366.60	$ -	$ -	$ -	$ 11,978,366.60
ITALACION DE CAMARA DE CCTV IP DOME PARA NTERIOR 1/3 CMOS 4MP@25FPS LENTE 2.8MM IR 30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 17,893,150.39	$ 1,069,249.60	$ -	$ -	$ -	$ 18,962,400.00
ITALACION DE CAMARA DE CCTV IP BALA PARA AMBOS 1/3 CMOS 4MP@25FPS LENTE 2.8MM IR30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,190,366.76	$ -	$ -	$ -	$ 2,190,366.76
E PARES METALICO PARA CCTV, INCLUYE RGANIZADOR, PATCH PANEL Y PACTCH CORD, E POE, BANDEJA ORGANIZADORA.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8,610,284.96	$ -	$ -	$ -	$ 8,610,284.96
E VIDEO 4K DE 16 CANALES PUERTOS POE CON RESOLUCION 8MP@30FPS INCLUYE DISCO DURO DE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12,182,871.76	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12,182,871.76
ORIENTE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

2052

	SEMANA 1		SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SUSPENSIÓN SEMANA 5-20	SEMANA 20	SEMANA 21	SEMANA 22	SEMANA 23	SEMANA 24	SEMANA 25	SEMANA 26	SEMANA 27	SEMANA 28	SEMANA 29	SEMANA 30	SEMANA 31	SEMANA 32	
	2.25%	2.81%	3.23%	3.89%	5.11%	5.11%	5.11%	5.14%	5.02%	10.01%	10.23%	15.26%	10.28%	10.67%	10.16%	34.94%	75.83%	87.35%	100.00%	
TALACION DE A/C ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT AMINA, INCLUYE INSTALACIÓN, MONTAJE, SEORIOS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 16,640,490.84	$ -	$ -	$ 16,640,490.84
TALACIÓN DE A/C ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT A-R410A, INCLUYE INSTALACIÓN, MONTAJE, SEORIOS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 43,373,969.60	$ -	$ -	$ 43,373,969.60
TALACION DE A/C ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT A-R410A, INCLUYE INSTALACIÓN, MONTAJE, SEORIOS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10,788,797.12	$ -	$ -	$ 10,788,797.12
TALACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT A-R410A, INCLUYE INSTALACIÓN, MONTAJE, SEORIOS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12,580,664.62	$ -	$ -	$ 12,580,664.62
STALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE DE 5/8" Y 1/4" ONADO INCLUYE ACCESORIOS DE SUJECION.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 35,258,446.08	$ -	$ -	$ 35,258,446.08
STALACIÓN DE TUBERIA PARA DESAGUE DE AIRE Y TUBERIA PVC DE 1/2"	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11,154,844.80	$ -	$ -	$ 11,154,844.80
A PARA TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA PARA 10 DE 220V, CERTIFICADO EN CABLE DE COBRE #10 EN TUBERIA EMT DE 1/2" INSTALADO A 2.5 METROS DE AMEJT 234.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7,870,755.12	$ -	$ -	$ 7,870,755.12
	$ 11,144,817.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11,144,817.00
AMITES ANTE EL OPERADOR DE RED	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,176,726.09	$ -	$ -	$ 3,176,726.09
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,756,804.00	$ -	$ -	$ 3,756,804.00
	$ 22,796,498.51	$ 8,156,986.46	$ 8,318,908.48	$ 8,475,834.27	$ 10,737,079.18	$ -	$ -	$ 830,819.60	$ 69,156,658.16	$ 14,990,781.77	$ 68,319,342.75	$ 30,357,193.18	$ 14,937,424.95	$ 8,109,771.12	$ 88,389,456.96	$ 193,377,134.39	$ 363,110,289.43	$ 110,919,217.27	$ 252,365,358.76	$ 1,454,477,568
	$ 33,796,498.51	$ 48,913,380.97	$ 57,020,807.45	$ 65,506,721.72	$ 76,256,800.86	$ 76,256,800.86	$ 76,256,800.86	$ 74,797,020.41	$ 144,340,488.56	$ 188,726,270.73	$ 182,952,321.48	$ 232,364,774.66	$ 236,342,198.64	$ 242,461,071.76	$ 277,815,670.04	$ 506,142,804.37	$ 1,681,235,803.68	$ 1,392,172,211.07	$ 1,454,477,568	


Tareas
Costo
Costo acumulado
Informe del flujo de caja
Valores
Costo
Costo acumulado
$700,000,000.00
$600,000,000.00
$500,000,000.00
$400,000,000.00
$300,000,000.00
$200,000,000.00
$100,000,000.00
$-
$1,600,000,000.00
$1,400,000,000.00
$1,200,000,000.00
$1,000,000,000.00
$800,000,000.00
$600,000,000.00
$400,000,000.00
$200,000,000.00
$-
Costo
Costo acumulado
Semana 45
Semana 46
Semana 47
Semana 48
Semana 49
Semana 50
Semana 51
Semana 52
Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4
Semana 5
Semana 6
Semana 7
Semana 8
Semana 9
Semana 10
Semana 11
Semana 12
Semana 13
Semana 14
Semana 15
Semana 16
Semana 17
Semana 18
Semana 19
Semana 20
Semana 21
Semana 22
Semana 23
Semana 24
Semana 25
2023
2024
Semanal

ANEXO 4. BITÁCORA.

2056

OBRA	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-010-2023

ESTADO DEL TIEMPO: día soleado

FECHA	NOTA	FOTOGRAFIA
9-Noviembre-2023		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADS

jornada laboral diurna de 7:00 am/5:00pm

Personal en obra: Residente de obra 1 , Residente de interventoría 2 , Director de obra 1, Director de interventoría 1, Almacenista 1 , Ayudantes 3 , Maestro de obra 1 .

Actividades realizadas:
- Recorrido de obra
- Orden y aseo general de obra

Erika Segundo
Residente de Obra

Mery Stefany Doria Lozano
Residente de interventoría

2057

OBRA	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-010-2023

ESTADO DEL TIEMPO: día soleado

FECHA	NOTA	FOTOGRAFIA
10-Noviembre-2023		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADS

jornada laboral diurna de 7:00 am/5:00pm

Personal en obra: Residente de obra 1 , Residente de interventoría 2 , Director de obra 1, Director de interventoría 1, Almacenista 1 , Ayudantes 4 , Maestro de obra 1 .

Actividades realizadas:

- Cerramiento y señalización de obra .
- Demolición plantilla de concreto de anden .

Edixa Segundo

Residente de Obra

Mery Stefany Doria Lozano

Residente de interventoría

OBRA	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-010-2023

ESTADO DEL TIEMPO: día soleado

FECHA	NOTA	FOTOGRAFIA
11-Noviembre-2023		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADS

jornada laboral diurna de 7:00 am/12:00pm

Personal en obra: Residente de obra 1 , Residente de interventoría 2 , Director de obra 1, Director de interventoría 1, Almacenista 1 , Ayudantes 4 , Maestro de obra 1 .

Actividades realizadas:
- Demolición de bordillos .
- Demolición plantilla de concreto de anden .

Erika Segundo
Residente de Obra

Mary Stefany Doria Lozano
Residente de interventoría

OBRA	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-010-2023

ESTADO DEL TIEMPO: día soleado

FECHA	NOTA	FOTOGRAFIA
13-Noviembre-2023	El día 13 de noviembre de 2023 es un día festivo, lo que resultó en la no realización de actividades laborales regulares.	

DESCRIPCION DE ACTIVIDADS

jornada laboral diurna de 7:00 am/12:00pm

Personal en obra: Residente de obra 1 , Residente de interventoría 2 , Director de obra 1, Director de interventoría 1, Almacenista 1 , Ayudantes 4 , Maestro de obra 1 .

Erika Segundo

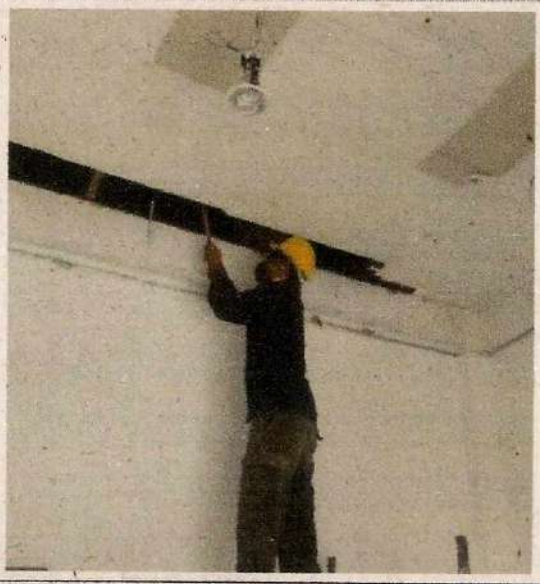
Residente de Obra

Mery Stefany Doria Tazano

Residente de interventoría

OBRA	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-010-2023

ESTADO DEL TIEMPO: día soleado

FECHA	NOTA	FOTOGRAFIA
14-Noviembre-2023		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADS

jornada laboral diurna de 7:00 am/5:00pm

Personal en obra: Residente de obra 1 , Residente de interventoría 2 , Director de obra 1, Director de interventoría 1, Almacenista 1 , Ayudantes 4 , Maestro de obra 1 .

Actividades realizadas:

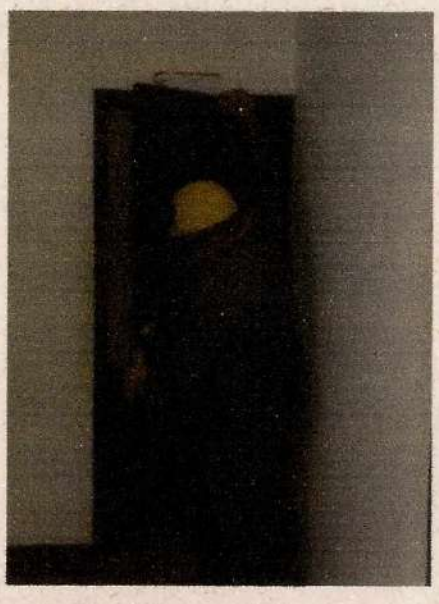
- Desmonte de cielo raso en drywall y entramado.
- Retiro de material escombro .
- Demolición plantilla de concreto de anden .

Erika Segundo
Residente de Obra

Mary Stefany Doria Lozano
Residente de interventoría

OBRA	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-010-2023

ESTADO DEL TIEMPO: día soleado

FECHA	NOTA	FOTOGRAFIA
15-Noviembre-2023		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADS

jornada laboral diurna de 7:00 am/5:00pm

Personal en obra: Residente de obra 1 , Residente de interventoría 2 , Director de obra 1, Director de interventoría 1, Almacenista 1 , Ayudantes 5 , Maestro de obra 1 .

Actividades realizadas:

- Desmonte de cielo raso en drywall y entramado.
- Retiro de material escombro .
- Demolición de bordillo.
- Desmonte de puertas y marcos.

Erika Segundo

Residente de Obra

Residente de interventoría

2062

OBRA	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-010-2023

ESTADO DEL TIEMPO: día soleado

FECHA	NOTA	FOTOGRAFIA
16-Noviembre-2023		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADS

jornada laboral diurna de 7:00 am/5:00pm

Personal en obra: Residente de obra 1 , Residente de interventoría 2 , Director de obra 1, Director de interventoría 1, Almacenista 1 , Ayudantes 5 , Maestro de obra 1 .

Actividades realizadas:

- Desmonte de cielo raso en drywall y entramado.
- Retiro de material escombro .
- Demolición de bordillo.
- Desmonte de puertas y marcos.

Erika Segundo

Residente de Obra

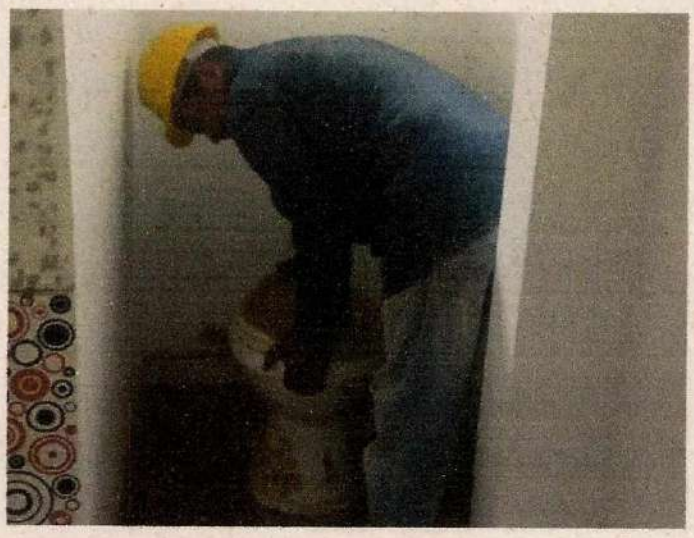
Mery Stefany Doria Lozano

Residente de interventoría

2063

OBRA	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-010-2023

ESTADO DEL TIEMPO: día soleado

FECHA	NOTA	FOTOGRAFIA
17-Noviembre-2023		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADS

jornada laboral diurna de 7:00 am/5:00pm

Personal en obra: Residente de obra 1 , Residente de interventoría 2 , Director de obra 1, Director de interventoría 1, Almacenista 1 , Ayudantes 4 , Maestro de obra 1 .

Actividades realizadas:

- Desmonte de cielo raso en drywall y entramado.
- Desmonte de aparatos sanitarios.
- Demolición plantilla de concreto anden.
- Desmonte de puertas y marcos.

Erika Segundo

Residente de Obra

Mary Stefany Doria Lozano

Residente de interventoría

2069

OBRA	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-010-2023

ESTADO DEL TIEMPO: día soleado

FECHA	NOTA	FOTOGRAFIA
18-Noviembre-2023		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADS

jornada laboral diurna de 7:00 am/12:00pm

Personal en obra: Residente de obra 1 , Residente de interventoría 2 , Director de obra 1, Director de interventoría 1, Almacenista 1 , Ayudantes 6 , Maestro de obra 1 .

Actividades realizadas:

- Excavación manual para instalación de bordillo.

Residente de Obra

Residente de interventoría

2065

OBRA	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-010-2023

ESTADO DEL TIEMPO: día soleado

FECHA	NOTA	FOTOGRAFIA
20-Noviembre-2023		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADS

jornada laboral diurna de 7:00 am/5:00pm

Personal en obra: Residente de obra 1 , Residente de interventoría 2 , Director de obra 1, Director de interventoría 1, Almacenista 1 , Ayudantes 4 , Maestro de obra 1 .

Actividades realizadas:
- Demolición de zócalos
- Desmonte de puertas y marcos .
-Retiro de material escombro.

Erika Segundo
Residente de Obra

Mery Stefany Doria Lozano
Residente de interventoría

2066

OBRA	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-010-2023

ESTADO DEL TIEMPO: día soleado

FECHA	NOTA	FOTOGRAFIA
21-Noviembre-2023		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADS

jornada laboral diurna de 7:00 am/5:00pm

Personal en obra: Residente de obra 1 , Residente de interventoría 2 , Director de obra 1, Director de interventoría 1, Almacenista 1 , Ayudantes 4 , Maestro de obra 1 .

Actividades realizadas:

- Demolición de zócalos.
- Retiro de material escombro.
- Desmonte de aires acondicionado.
- Desmonte de ventanas y marcos .

Erika Segundo

Residente de Obra

Mery Stefany Doria Lozano

Residente de interventoría

2067

OBRA	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-010-2023

ESTADO DEL TIEMPO: día soleado

FECHA	NOTA	FOTOGRAFIA
22-Noviembre-2023		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADS

jornada laboral diurna de 7:00 am/5:00pm

Personal en obra: Residente de obra 1 , Residente de interventoría 2 , Director de obra 1, Director de interventoría 1, Almacenista 1 , Ayudantes 4 , Maestro de obra 1 .

Actividades realizadas:
- Demolición de zócalos .
- Retiro de material escombro.
- Retiro instalaciones eléctricas.

Erika Segundo
Residente de Obra

Mary Stefany Doria Lozano
Residente de interventoría

OBRA	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-010-2023

ESTADO DEL TIEMPO: día soleado

FECHA	NOTA	FOTOGRAFIA
23-Noviembre-2023		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADS

jornada laboral diurna de 7:00 am/5:00pm

Personal en obra: Residente de obra 1 , Residente de interventoría 2 , Director de obra 1, Director de interventoría 1, Almacenista 1 , Ayudantes 5 , Maestro de obra 1 .

Actividades realizadas:
- Demolición de zócalos .
- Instalación de bordillo.
- Desmonte de ventanas y marcos.

Erika Segundo
Residente de Obra

Mery Stefany Doria Lozano
Residente de interventoría

2069

OBRA	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-010-2023

ESTADO DEL TIEMPO: día soleado

FECHA	NOTA	FOTOGRAFIA
24-Noviembre-2023		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADS

jornada laboral diurna de 7:00 am/5:00pm

Personal en obra: Residente de obra 1 , Residente de interventoría 2 , Director de obra 1, Director de interventoría 1, Almacenista 1 , Ayudantes 5 , Maestro de obra 1 .

Actividades realizadas:
- Instalación de bordillo.
- Desmonte de ventanas y marcos.
- Remoción de enchape pared.

Erika Segundo
Residente de Obra

Mary Stefany Doria Lozano
Residente de interventoría

2070

OBRA	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-010-2023

ESTADO DEL TIEMPO: día soleado

FECHA	NOTA	FOTOGRAFIA
25-Noviembre-2023		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADS

jornada laboral diurna de 7:00 am/12:00pm

Personal en obra: Residente de obra 1 , Residente de interventoría 2 , Director de obra 1, Director de interventoría 1, Almacenista 1 , Ayudantes 5 , Maestro de obra 1 .

Actividades realizadas:
- Conformación de anden.
- Remoción de enchape pared.

Erika Segundo
Residente de Obra

Mery Stefany Doria Tejano
Residente de interventoría

OBRA	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-010-2023

ESTADO DEL TIEMPO: día soleado

FECHA	NOTA	FOTOGRAFIA
27-Noviembre-2023		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADS

jornada laboral diurna de 7:00 am/5:00pm

Personal en obra: Residente de obra 1 , Residente de interventoría 2 , Director de obra 1, Director de interventoría 1, Almacenista 1 , Ayudantes 5 , Maestro de obra 1 .

Actividades realizadas:
- Remoción de enchape pared.
- Demolición de Zócalos .

Erika Segundo
Residente de Obra

Mery Stefany Doria Tezano
Residente de interventoría

2072

OBRA	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-010-2023

ESTADO DEL TIEMPO: día soleado

FECHA	NOTA	FOTOGRAFIA
28-Noviembre-2023		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADS

jornada laboral diurna de 7:00 am/5:00pm

Personal en obra: Residente de obra 1 , Residente de interventoría 2 , Director de obra 1, Director de interventoría 1, Almacenista 1 , Ayudantes 5 , Maestro de obra 1 .

Actividades realizadas:
- Remoción de enchape pared.
- Demolición de Zócalos .

Erika Segura
Residente de Obra

Mery Stefany Doria Lozano
Residente de interventoría

2073

OBRA	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-010-2023

ESTADO DEL TIEMPO: día soleado

FECHA	NOTA	FOTOGRAFIA
29-Noviembre-2023		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADS

jornada laboral diurna de 7:00 am/5:00pm

Personal en obra: Residente de obra 1 , Residente de interventoría 2 , Director de obra 1, Director de interventoría 1, Almacenista 1 , Ayudantes 5 , Maestro de obra 1 .

Actividades realizadas:
- Remoción de enchape pared.
- Demolición de Zócalos .

Erika Segundo
Residente de Obra

Mary Stefany Doria Lozano
Residente de interventoría

2079

OBRA	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-010-2023

ESTADO DEL TIEMPO: día soleado

FECHA	NOTA	FOTOGRAFIA
30-Noviembre-2023		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADS

jornada laboral diurna de 7:00 am/5:00pm

Personal en obra: Residente de obra 1 , Residente de interventoría 2 , Director de obra 1, Director de interventoría 1, Almacenista 1 , Ayudantes 5 , Maestro de obra 1 .

Actividades realizadas:
- Conformación de anden.

Erika Segundo
Residente de Obra

Mary Stefany Doria Lozano
Residente de interventoría

OBRA	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-010-2023

ESTADO DEL TIEMPO: día soleado

FECHA	NOTA	FOTOGRAFIA
01-Diciembre-2023		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADS

jornada laboral diurna de 7:00 am/5:00pm

Personal en obra: Residente de obra 1 , Residente de interventoría 2 , Director de obra 1, Director de interventoría 1, Almacenista 1 , Ayudantes 5 , Maestro de obra 1 .

Actividades realizadas:
- Conformación de anden.

Erika Segundo
Residente de Obra

Mery Stefany Doria Lozano
Residente de interventoría

2076

OBRA	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-010-2023

ESTADO DEL TIEMPO: día soleado

FECHA	NOTA	FOTOGRAFIA
02-Diciembre-2023		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADS

jornada laboral diurna de 7:00 am/12:00pm

Personal en obra: Residente de obra 1 , Residente de interventoría 2 , Director de obra 1, Director de interventoría 1, Almacenista 1 , Ayudantes 5 , Maestro de obra 1 .

Actividades realizadas:
- Conformación de anden.

Residente de Obra

Residente de interventoría

2077

OBRA	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-010-2023

ESTADO DEL TIEMPO: día soleado

FECHA	NOTA	FOTOGRAFIA
04-Diciembre-2023		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADS

jornada laboral diurna de 7:00 am/12:00pm

Personal en obra: Residente de obra 1 , Residente de interventoría 2 , Director de obra 1, Director de interventoría 1, Almacenista 1 , Ayudantes 5 , Maestro de obra 1 .

Actividades realizadas:
- Conformación de anden.

Erika Siguenza
Residente de Obra

Mery Stefany Doria Lozano
Residente de interventoría

2078

OBRA	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-010-2023

ESTADO DEL TIEMPO: día soleado

FECHA	NOTA	FOTOGRAFIA
04-Diciembre-2023		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADS

jornada laboral diurna de 7:00 am/12:00pm

Personal en obra: Residente de obra 1 , Residente de interventoría 2 , Director de obra 1, Director de interventoría 1, Almacenista 1 , Ayudantes 5 , Maestro de obra 1 .

Actividades realizadas:
- Conformación de anden.

Residente de Obra

Residente de interventoría

OBRA	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-010-2023

ESTADO DEL TIEMPO: día soleado

FECHA	NOTA	FOTOGRAFIA
05-Diciembre-2023		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADS

jornada laboral diurna de 7:00 am/12:00pm .

Personal en obra: Residente de obra 1 , Residente de interventoría 2 , Director de obra 1, Director de interventoría 1, Almacenista 1 , Ayudantes 5 , Maestro de obra 1 .

Actividades realizadas:
- Conformación de anden.

Erika Segundo
Residente de Obra

Mery Stefany Doria Lozano
Residente de interventoría

OBRA	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-010-2023

ESTADO DEL TIEMPO: día soleado

FECHA	NOTA	FOTOGRAFIA
06-Diciembre-2023		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADS

jornada laboral diurna de 7:00 am/12:00pm

Personal en obra: Residente de obra 1 , Residente de interventoría 2 , Director de obra 1, Director de interventoría 1, Almacenista 1 , Ayudantes 5 , Maestro de obra 1 .

Actividades realizadas:
- Conformación de anden.

Erika Segundo
Residente de Obra

Mery Stefany Doria Lozano
Residente de interventoría

OBRA	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-010-2023

ESTADO DEL TIEMPO: día soleado

FECHA	NOTA	FOTOGRAFIA
07-Diciembre-2023	El día 7 de diciembre se procedió a suspender el contrato de obra y de interventoría, lo que implicó la interrupción temporal de las actividades relacionadas con dichos contratos.	

DESCRIPCION DE ACTIVIDADS

jornada laboral diurna de 7:00 am/12:00pm

Personal en obra:

Actividades realizadas:

Erika Segundo

Residente de Obra

Mary Stefany Doria Lozano

Residente de interventoría

OBRA	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-010-2023

ESTADO DEL TIEMPO: día soleado

FECHA	NOTA	FOTOGRAFIA
08-Diciembre-2023	El día 7 de diciembre se procedió a suspender el contrato de obra y de interventoría, lo que implicó la interrupción temporal de las actividades relacionadas con dichos contratos.	

DESCRIPCION DE ACTIVIDADS

jornada laboral diurna de 7:00 am/12:00pm

Personal en obra:

Actividades realizadas:

Erika Segundo
Residente de Obra

Mery Stefany Doria Lozano
Residente de interventoría

2023

OBRA	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-010-2023

ESTADO DEL TIEMPO: día soleado

FECHA	NOTA	FOTOGRAFIA
09-Diciembre-2023	El día 7 de diciembre se procedió a suspender el contrato de obra y de interventoría, lo que implicó la interrupción temporal de las actividades relacionadas con dichos contratos.	

DESCRIPCION DE ACTIVIDADS

jornada laboral diurna de 7:00 am/12:00pm

Personal en obra:

Actividades realizadas:

Erika Segundo
Residente de Obra

Mery Stefany Doria Lozano
Residente de interventoría

OBRA	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-010-2023

ESTADO DEL TIEMPO: día soleado

FECHA	NOTA	FOTOGRAFIA
01-Abril-2024		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADS

jornada laboral diurna de 7:00 am/12:00pm

Personal en obra: Residente de obra 1 , Residente de interventoría 2 , Director de obra 1, Director de interventoría 1, Almacenista 1 , Ayudantes 4 , Maestro de obra 1 .

Actividades realizadas:

- DESMONTE DE PUERTA Y MARCO, DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL Y ENTRAMADO INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS , DESMONTE DE CUBIERTA.

Erika Segundo

Residente de Obra

Mery Stefany Doria Lozano

Residente de interventoría

OBRA	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-010-2023

ESTADO DEL TIEMPO: día soleado

FECHA	NOTA	FOTOGRAFIA
02-Abril-2024		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADS

jornada laboral diurna de 7:00 am/12:00pm

Personal en obra: Residente de obra 1 , Residente de interventoría 2 , Director de obra 1, Director de interventoría 1, Almacenista 1 , Ayudantes 4 , Maestro de obra 1 .

Actividades realizadas:
- DESMONTE DE PUERTA Y MARCO, DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL Y ENTRAMADO INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS , DESMONTE DE CUBIERTA.

Erika Segundo
Residente de Obra

Mery Stefany Doria Lozano
Residente de interventoría

2086

OBRA	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-010-2023

ESTADO DEL TIEMPO: día soleado

FECHA	NOTA	FOTOGRAFIA
03-Abril-2024		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADS

jornada laboral diurna de 7:00 am/12:00pm

Personal en obra: Residente de obra 1 , Residente de interventoría 2 , Director de obra 1, Director de interventoría 1, Almacenista 1 , Ayudantes 5 , Maestro de obra 1.

Actividades realizadas:

- DESMONTE DE PUERTA Y MARCO, DESMONTE DE CUBIERTA , DESMONTE APARATOS SANITARIOS.

Erika Segundo

Residente de Obra

Residente de interventoría

OBRA	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-010-2023

ESTADO DEL TIEMPO: día soleado

FECHA	NOTA	FOTOGRAFIA
04-Abril-2024		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADS

jornada laboral diurna de 7:00 am/12:00pm

Personal en obra: Residente de obra 1 , Residente de interventoría 2 , Director de obra 1, Director de interventoría 1, Almacenista 1 , Ayudantes 5 , Maestro de obra 1 .

Actividades realizadas:

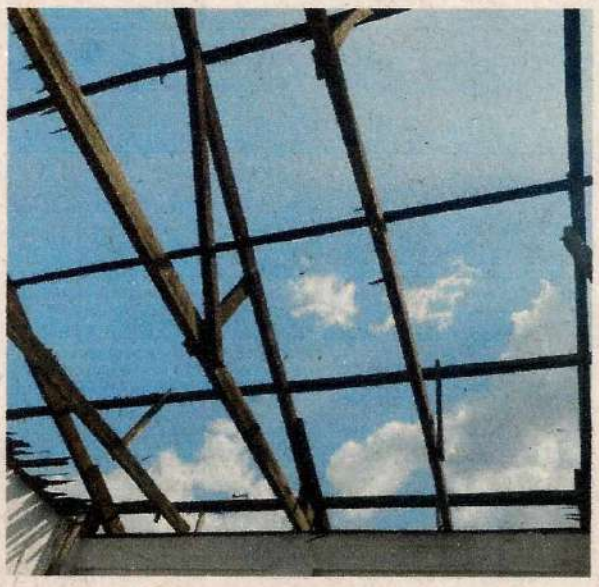
- DESMONTE DE CUBIERTA , DESMONTE APARATOS SANITARIOS .

Elika Siguenza
Residente de Obra

Mery Stefany Doria Lozano
Residente de interventoría

OBRA	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-010-2023

ESTADO DEL TIEMPO: día soleado

FECHA	NOTA	FOTOGRAFIA
05-Abril-2024		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADS

jornada laboral diurna de 7:00 am/12:00pm

Personal en obra: Residente de obra 1 , Residente de interventoría 2 , Director de obra 1, Director de interventoría 1, Almacenista 1 , Ayudantes 5 , Maestro de obra 1 .

Actividades realizadas:
- DESMONTE DE CUBIERTA , DESMONTE APARATOS SANITARIOS .

Erika Segundo
Residente de Obra

Mery Stefany Doria Lozano
Residente de interventoría

OBRA	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-010-2023

ESTADO DEL TIEMPO: día soleado

FECHA	NOTA	FOTOGRAFIA
06-Abril-2024		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADS

jornada laboral diurna de 7:00 am/12:00pm

Personal en obra: Residente de obra 1 , Residente de interventoría 2 , Director de obra 1, Director de interventoría 1, Almacenista 1 , Ayudantes 5 , Maestro de obra 1 .

Actividades realizadas:
- DESMONTE DE CUBIERTA .

Erika Segundo
Residente de Obra

Mery Stefany Doria Lozano
Residente de interventoría

2090

OBRA	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-010-2023

ESTADO DEL TIEMPO: día soleado

FECHA	NOTA	FOTOGRAFIA
08-Abril-2024		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADS

jornada laboral diurna de 7:00 am/12:00pm

Personal en obra: Residente de obra 1 , Residente de interventoría 2 , Director de obra 1, Director de interventoría 1, Almacenista 1 , Ayudantes 5 , Maestro de obra 1 .

Actividades realizadas:

- DESMONTE DE CUBIERTA, BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLÚYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO

Erika Izquierdo
Residente de Obra

Residente de interventoría

2091

OBRA	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-010-2023

ESTADO DEL TIEMPO: día soleado

FECHA	NOTA	FOTOGRAFIA
09-Abril-2024		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADS

jornada laboral diurna de 7:00 am/12:00pm

Personal en obra: Residente de obra 1 , Residente de interventoría 2 , Director de obra 1, Director de interventoría 1, Almacenista 1 , Ayudantes 5 , Maestro de obra 1 .

Actividades realizadas:
- DESMONTE DE PUERTA Y MARCO
-DESMONTE DE VENTANAS, MARCO EN ALUMINIO Y/O MADERA

Residente de Obra

Residente de interventoría

2092

OBRA	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-010-2023

ESTADO DEL TIEMPO: día soleado

FECHA	NOTA	FOTOGRAFIA
10-Abril-2024		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADS

jornada laboral diurna de 7:00 am/12:00pm

Personal en obra: Residente de obra 1 ; Residente de interventoría 2 , Director de obra 1, Director de interventoría 1, Almacenista 1 , Ayudantes 5 , Maestro de obra 1 .

Actividades realizadas:

- DESMONTE DE TUBERIA HIDRO-SANITARIA INCLUYE DEMOLICION Y EXCAVACION.

Erika Segundo
Residente de Obra

Mery Stefany Doria Lozano
Residente de interventoría

2093

OBRA	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-010-2023

ESTADO DEL TIEMPO: día soleado

FECHA	NOTA	FOTOGRAFIA
11-Abril-2024		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADS

jornada laboral diurna de 7:00 am/12:00pm

Personal en obra: Residente de obra 1, Residente de interventoría 2 , Director de obra 1, Director de interventoría 1, Almacenista 1 , Ayudantes 9 , Maestro de obra 1 .

Actividades realizadas:

- DESMONTE DE TUBERIA HIDRO-SANITARIA INCLUYE DEMOLICION Y EXCAVACION
- DESMONTE DE PILARES DE MADERA

Erika Segundo

Residente de Obra

Mary Stefany Doria Lozano

Residente de interventoría

2094

OBRA	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-010-2023

ESTADO DEL TIEMPO: día soleado

FECHA	NOTA	FOTOGRAFIA
12-Abril-2024		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADS

jornada laboral diurna de 7:00 am/12:00pm

Personal en obra: Residente de obra 1 , Residente de interventoría 2 , Director de obra 1, Director de interventoría 1, Almacenista 1 , Ayudantes 9 , Maestro de obra 1 .

Actividades realizadas:
- DESMONTE DE PILARES DE MADERA DE CUBIERTA
- EXCAVACIÓN MANUAL

Elixa Siguadu
Residente de Obra

Mery Stefany Doria Lozano
Residente de interventoría

2095

OBRA	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-010-2023

ESTADO DEL TIEMPO: día soleado

FECHA	NOTA	FOTOGRAFIA
13-Abril-2024		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADS

jornada laboral diurna de 7:00 am/12:00pm

Personal en obra: Residente de obra 1 , Residente de interventoría 2 , Director de obra 1, Director de interventoría 1, Almacenista 1 , Ayudantes 9, Maestro de obra 1 .

Actividades realizadas:

- REMOCION DE ENCHAPE PARED INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS

Residente de Obra

Residente de interventoría

2096

OBRA	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-010-2023

ESTADO DEL TIEMPO: día soleado

FECHA	NOTA	FOTOGRAFIA
15-Abril-2024		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADS

jornada laboral diurna de 7:00 am/12:00pm

Personal en obra: Residente de obra 1 , Residente de interventoría 2 , Director de obra 1, Director de interventoría 1, Almacenista 1 , Ayudantes 9 , Maestro de obra 1 .

Actividades realizadas:

- REMOCION DE ENCHAPE PARED INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS, EXCAVACIÓN MANUAL.

Erika Segundo

Residente de Obra

Mery Stefany Doria Lozano

Residente de interventoría

2097

OBRA	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-010-2023

ESTADO DEL TIEMPO: día soleado

FECHA	NOTA	FOTOGRAFIA
16-Abril-2024		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADS

jornada laboral diurna de 7:00 am/12:00pm

Personal en obra: Residente de obra 1 , Residente de interventoría 2 , Director de obra 1, Director de interventoría 1, Almacenista 1 , Ayudantes 9 , Maestro de obra 1 .

Actividades realizadas:

- DESMONTE DE TUBERIA HIDRO-SANITARIA INCLUYE DEMOLICION Y EXCAVACION
- EMPALME

Erika Segundo
Residente de Obra

Mery Stefany Doria Lozano
Residente de interventoría

2098

OBRA	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-010-2023

ESTADO DEL TIEMPO: día soleado

FECHA	NOTA	FOTOGRAFIA
17-Abril-2024		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADS

jornada laboral diurna de 7:00 am/12:00pm

Personal en obra: Residente de obra 1 , Residente de interventoría 2 , Director de obra 1, Director de interventoría 1, Almacenista 1 , Ayudantes 9 , Maestro de obra 1 .

Actividades realizadas:
- DEMOLICIÓN DE ZOCALOS INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS

Erika Segundo
Residente de Obra

Mary Stefany Doria Lozano
Residente de interventoría

2099

OBRA	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-010-2023

ESTADO DEL TIEMPO: día soleado

FECHA	NOTA	FOTOGRAFIA
18-Abril-2024		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADS

jornada laboral diurna de 7:00 am/12:00pm

Personal en obra: Residente de obra 1 , Residente de interventoría 2 , Director de obra 1, Director de interventoría 1, Almacenista 1 , Ayudantes 9 , Maestro de obra 1 .

Actividades realizadas:
- EMPALME, LEVANTAMIENDO DE TABIQUE

Erika Segundo
Residente de Obra

Mery Stefany Doria Lozano
Residente de interventoría

2100

OBRA	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-010-2023

ESTADO DEL TIEMPO: día soleado

FECHA	NOTA	FOTOGRAFIA
19-Abril-2024		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADS

jornada laboral diurna de 7:00 am/12:00pm

Personal en obra: Residente de obra 1 , Residente de interventoría 2 , Director de obra 1, Director de interventoría 1, Almacenista 1 , Ayudantes 9 , Maestro de obra 1 .

Actividades realizadas:

- LEVANTAMIENTO DE TABIQUE, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO

Erika Segundo

Residente de Obra

Residente de interventoría

2101

OBRA	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-010-2023

ESTADO DEL TIEMPO: día soleado

FECHA	NOTA	FOTOGRAFIA
20-Abril-2024		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADS

jornada laboral diurna de 7:00 am/12:00pm

Personal en obra: Residente de obra 1 , Residente de interventoría 2 , Director de obra 1, Director de interventoría 1, Almacenista 1 , Ayudantes 9 , Maestro de obra 1 .

Actividades realizadas:
- RETIRO DE MATERIAL

Erika Segundo
Residente de Obra

Mery Stefany Doria Lozano
Residente de interventoría

2102

OBRA	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-010-2023

ESTADO DEL TIEMPO: día soleado

FECHA	NOTA	FOTOGRAFIA
22-Abril-2024		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADS

jornada laboral diurna de 7:00 am/12:00pm

Personal en obra: Residente de obra 1 , Residente de interventoría 2 , Director de obra 1, Director de interventoría 1, Almacenista 1 , Ayudantes 9 , Maestro de obra 1 .

Actividades realizadas:
- RETIRO DE MATERIAL

Erika Segundo
Residente de Obra

Mery Stefany Doria Lozano
Residente de interventoría

2103

OBRA	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-010-2023

ESTADO DEL TIEMPO: día soleado

FECHA	NOTA	FOTOGRAFIA
23-Abril-2024		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADS

jornada laboral diurna de 7:00 am/12:00pm

Personal en obra: Residente de obra 1 , Residente de interventoría 2 , Director de obra 1, Director de interventoría 1, Almacenista 1 , Ayudantes 9 , Maestro de obra 1 .

Actividades realizadas:
- RETIRO DE MATERIAL

Erika Segundo
Residente de Obra

Mery Stefany Doria Lozano
Residente de interventoría

OBRA	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-010-2023

ESTADO DEL TIEMPO: día soleado

FECHA	NOTA	FOTOGRAFIA
24-Abril-2024		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADS

jornada laboral diurna de 7:00 am/12:00pm

Personal en obra: Residente de obra 1 , Residente de interventoría 2 , Director de obra 1, Director de interventoría 1, Almacenista 1 , Ayudantes 9 , Maestro de obra 1 .

Actividades realizadas:

- RETIRO DE INSTALACIONES ELECTRICAS ANTIGUAS, CABLEADO Y DUCTERIA.

Elika Segundo
Residente de Obra

Mery Stefany Doria Lozano
Residente de interventoría

OBRA	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-010-2023

ESTADO DEL TIEMPO: día soleado

FECHA	NOTA	FOTOGRAFIA
25-Abril-2024		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADS

jornada laboral diurna de 7:00 am/12:00pm

Personal en obra: Residente de obra 1 , Residente de interventoría 2 , Director de obra 1, Director de interventoría 1, Almacenista 1 , Ayudantes 9 , Maestro de obra 1 .

Actividades realizadas:

- DESMONTE DE TUBERIA HIDRO-SANITARIA INCLUYE DEMOLICION Y EXCAVACION PLANTILLA DE NIVELACION EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO ESPESOR MAXIMO 5 CM

Elixa Siguenza

Residente de Obra

Mery Stefany Doria Lozano

Residente de interventoría

2106

OBRA	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-010-2023

ESTADO DEL TIEMPO: día soleado

FECHA	NOTA	FOTOGRAFIA
26-Abril-2024		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADS

jornada laboral diurna de 7:00 am/12:00pm

Personal en obra: Residente de obra 1 , Residente de interventoría 2 , Director de obra 1, Director de interventoría 1, Almacenista 1 , Ayudantes 9 , Maestro de obra 1 .

Actividades realizadas:

- VIGA DINTEL DE 0.10m x 0.20m EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 4 VARILLAS DE 3/8 YESTRIBOS 1/4 @0.15m

PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:4

Erika Segundo

Residente de Obra

Mery Stefany Doria Lozano

Residente de interventoría

OBRA	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-010-2023

ESTADO DEL TIEMPO: día soleado

FECHA	NOTA	FOTOGRAFIA
27-Abril-2024		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADS

jornada laboral diurna de 7:00 am/12:00pm

Personal en obra: Residente de obra 1 , Residente de interventoría 2 , Director de obra 1, Director de interventoría 1, Almacenista 1 , Ayudantes 9 , Maestro de obra 1 .

Actividades realizadas:

- ANCLAJE EN ACERO DE 1/2" EN ELEMENTOS DE CONCRETO REFORZADO (INCLUYE PERFORACION CON TALADRO Y EPOXICO PARA FIJAR ACERO EN CONCRETO ENDURECIDO
COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO 0.10MTS X 0.20MTS EN CONCRETO DE 21 MPA.CON 4 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 1/4 @0.15m

Erika Segundo
Residente de Obra

Mery Stefany Doria Lozano
Residente de interventoría

OBRA	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-010-2023

ESTADO DEL TIEMPO: día soleado

FECHA	NOTA	FOTOGRAFIA
28-Abril-2024		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADS

jornada laboral diurna de 7:00 am/12:00pm

Personal en obra: Residente de obra 1 , Residente de interventoría 2 , Director de obra 1, Director de interventoría 1, Almacenista 1 , Ayudantes 9 , Maestro de obra 1 .

Actividades realizadas:

- ANCLAJE EN ACERO DE 1/2" EN ELEMENTOS DE CONCRETO REFORZADO (INCLUYE PERFORACION CON TALADRO Y EPOXICO PARA FIJAR ACERO EN CONCRETO ENDURECIDO
COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO 0.10MTS X 0.20MTS EN CONCRETO DE 21 MPA.CON 4 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 1/4 @0.15m

Residente de Obra

Residente de interventoría

2109

OBRA	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-010-2023

ESTADO DEL TIEMPO: día soleado

FECHA	NOTA	FOTOGRAFIA
29-Abril-2024		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADS

jornada laboral diurna de 7:00 am/12:00pm

Personal en obra: Residente de obra 1 , Residente de interventoría 2 , Director de obra 1, Director de interventoría 1, Almacenista 1 , Ayudantes 9 , Maestro de obra 1 .

Actividades realizadas:

- VIGA DINTEL DE 0.10m x 0.20m EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 4 VARILLAS DE 3/8 YESTRIBOS 1/4 @0.15m

Erika Siguenza

Residente de Obra

Mery Stefany Doria Lozano

Residente de interventoría

OBRA	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-010-2023

ESTADO DEL TIEMPO: día soleado

FECHA	NOTA	FOTOGRAFIA
30-Abril-2024		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADS

jornada laboral diurna de 7:00 am/12:00pm

Personal en obra: Residente de obra 1 , Residente de interventoría 2 , Director de obra 1, Director de interventoría 1, Almacenista 1 , Ayudantes 9 , Maestro de obra 1 .

Actividades realizadas:

- PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:4

Erika Segundo
Residente de Obra

Mery Stefany Doria Lozano
Residente de interventoría

OBRA	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-010-2023

ESTADO DEL TIEMPO: día soleado

FECHA	NOTA	FOTOGRAFIA
01-Mayo-2024		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADS

jornada laboral diurna de 7:00 am/12:00pm

Personal en obra: Residente de obra 1 , Residente de interventoría 2 , Director de obra 1, Director de interventoría 1, Almacenista 1 , Ayudantes 9 , Maestro de obra 1 .

Actividades realizadas:

- PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:4

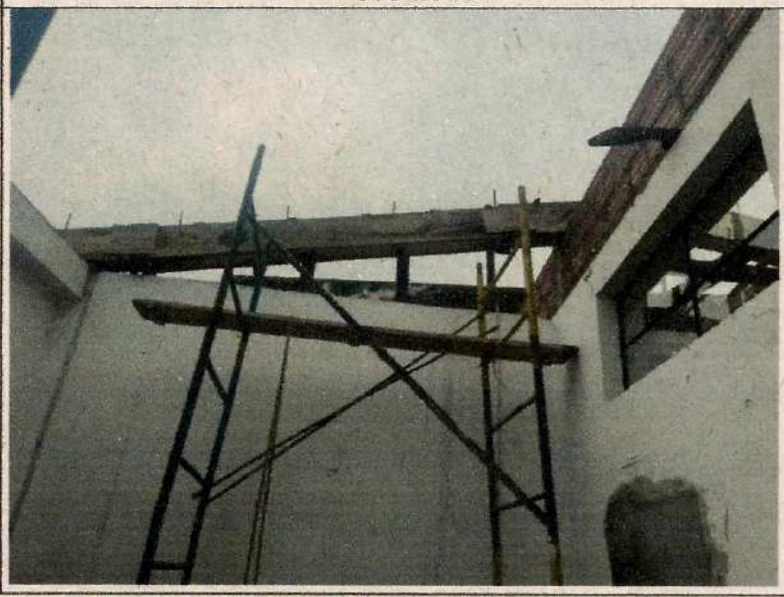
Erika Siguenza
Residente de Obra

Mery Stefany Doria Lozano
Residente de interventoría

2112

OBRA	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-010-2023

ESTADO DEL TIEMPO: día soleado

FECHA	NOTA	FOTOGRAFIA
02-Mayo-2024		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADS

jornada laboral diurna de 7:00 am/12:00pm

Personal en obra: Residente de obra 1 , Residente de interventoría 2 , Director de obra 1, Director de interventoría 1, Almacenista 1 , Ayudantes 9 , Maestro de obra 1 .

Actividades realizadas:

- VIGA DINTEL DE 0.10m x 0.20m EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 4 VARILLAS DE 3/8 YESTRIBOS 1/4 @0.15m

PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:4

Elika Siguenza

Residente de Obra

Mery Stefany Doria Lozano

Residente de interventoría

OBRA	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-010-2023

ESTADO DEL TIEMPO: día soleado

FECHA	NOTA	FOTOGRAFIA
03-Mayo-2024		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADS

jornada laboral diurna de 7:00 am/12:00pm

Personal en obra: Residente de obra 1 , Residente de interventoría 2 , Director de obra 1, Director de interventoría 1, Almacenista 1 , Ayudantes 9 , Maestro de obra 1 .

Actividades realizadas:

- PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:4

VIGA DINTEL DE 0.10m x 0.20m EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 4 VARILLAS DE 3/8 YESTRIBOS 1/4 @0.15m

Erika Segundo

Residente de Obra

Mery Stefany Doria Lozano

Residente de interventoría

OBRA	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-010-2023

ESTADO DEL TIEMPO: día soleado

FECHA	NOTA	FOTOGRAFIA
04-Mayo-2024		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADS

jornada laboral diurna de 7:00 am/12:00pm

Personal en obra: Residente de obra 1 , Residente de interventoría 2 , Director de obra 1, Director de interventoría 1, Almacenista 1 , Ayudantes 9 , Maestro de obra 1 .

Actividades realizadas:

- VIGA DINTEL DE 0.10m x 0.20m EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 4 VARILLAS DE 3/8 YESTRIBOS 1/4 @0.15m

RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO

Elika Segundo

Residente de Obra

Residente de interventoría

OBRA	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-010-2023

ESTADO DEL TIEMPO: día soleado

FECHA	NOTA	FOTOGRAFIA
05-Mayo-2024		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADS

jornada laboral diurna de 7:00 am/12:00pm

Personal en obra: Residente de obra 1 , Residente de interventoría 2 , Director de obra 1, Director de interventoría 1, Almacenista 1 , Ayudantes 9 , Maestro de obra 1 .

Actividades realizadas:

- VIGA DINTEL DE 0.10m x 0.20m EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 4 VARILLAS DE 3/8 YESTRIBOS 1/4 @0.15m

RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO

Erika Segundo

Residente de Obra

Mery Stefany Doria Lozano

Residente de interventoría

OBRA	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-010-2023

ESTADO DEL TIEMPO: día soleado

FECHA	NOTA	FOTOGRAFIA
06-Mayo-2024		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADS

jornada laboral diurna de 7:00 am/12:00pm

Personal en obra: Residente de obra 1 , Residente de interventoría 2 , Director de obra 1, Director de interventoría 1, Almacenista 1 , Ayudantes 9 , Maestro de obra 1 .

Actividades realizadas:

- VIGA DINTEL DE 0.10m x 0.20m EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 4 VARILLAS DE 3/8 YESTRIBOS 1/4 @0.15m

RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO

Erika Segundo

Residente de Obra

Mary Stefany Doria Lozano

Residente de interventoría

OBRA	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-010-2023

ESTADO DEL TIEMPO: día soleado

FECHA	NOTA	FOTOGRAFIA
07-Mayol-2024		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADS

jornada laboral diurna de 7:00 am/12:00pm

Personal en obra: Residente de obra 1 , Residente de interventoría 2 , Director de obra 1, Director de interventoría 1, Almacenista 1 , Ayudantes 9 , Maestro de obra 1 .

Actividades realizadas:

- S/I TUBERIA SANITARIA 6" INCLUYE ENCAJUELADA Y RELLENO
- S/I TUBERIA DE PRESION 3/4" INCLUYE ENCAJUELADA Y RELLENOS

Erika Segundo
Residente de Obra

Mery Stefany Doria Lozano
Residente de interventoría

OBRA	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-010-2023

ESTADO DEL TIEMPO: día soleado

FECHA	NOTA	FOTOGRAFIA
08-Mayo-2024		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADS

jornada laboral diurna de 7:00 am/12:00pm

Personal en obra: Residente de obra 1 , Residente de interventoría 2 , Director de obra 1, Director de interventoría 1, Almacenista 1 , Ayudantes 9 , Maestro de obra 1 .

Actividades realizadas:

- PUNTO SANITARIOS DE 4" INCLUYE ENCAJUELADA Y RELLENO
- S/I TUBERIA DE PRESION 3/4" INCLUYE ENCAJUELADA Y RELLENOS

Erika Segundo

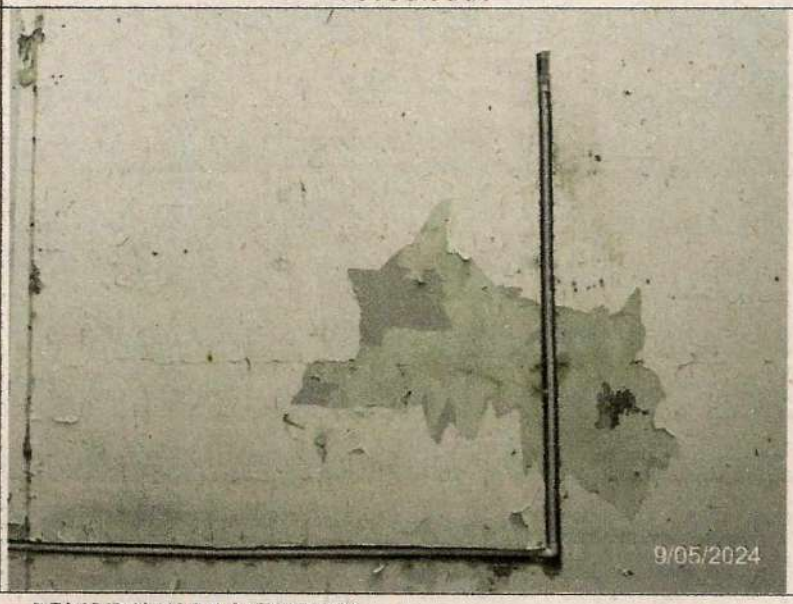
Residente de Obra

Mery Stefany Doria Lozano

Residente de interventoría

OBRA	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-010-2023

ESTADO DEL TIEMPO: día soleado

FECHA	NOTA	FOTOGRAFIA
09-Mayo-2024		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADS

jornada laboral diurna de 7:00 am/12:00pm

Personal en obra: Residente de obra 1 , Residente de interventoría 2 , Director de obra 1, Director de interventoría 1, Almacenista 1 , Ayudantes 9 , Maestro de obra 1 .

Actividades realizadas:

- S/I TUBERIA DE PRESION 3/4" INCLUYE ENCAJUELADA Y RELLENOS

Residente de Obra

Residente de interventoría

OBRA	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-010-2023

ESTADO DEL TIEMPO: día soleado

FECHA	NOTA	FOTOGRAFIA
10-Mayo-2024		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADS

jornada laboral diurna de 7:00 am/12:00pm

Personal en obra: Residente de obra 1 , Residente de interventoría 2 , Director de obra 1, Director de interventoría 1, Almacenista 1 , Ayudantes 9 , Maestro de obra 1 .

Actividades realizadas:

- CAJA DE REGISTRO PREFABRICADA

Residente de Obra

Residente de interventoría

OBRA	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-010-2023

ESTADO DEL TIEMPO: día soleado

FECHA	NOTA	FOTOGRAFIA
11-Mayo-2024		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADS

jornada laboral diurna de 7:00 am/12:00pm

Personal en obra: Residente de obra 1 , Residente de interventoría 2 , Director de obra 1, Director de interventoría 1, Almacenista 1 , Ayudantes 9 , Maestro de obra 1 .

Actividades realizadas:

- LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE ARENA - CEMENTO DE 0.10MTS X 0.20MTS X 0.40MTS CON PEGA DE MORTERO 1:4

Erika Segundo

Residente de Obra

Mary Stefany Doria Lozano

Residente de interventoría

OBRA	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-010-2023

ESTADO DEL TIEMPO: día soleado

FECHA	NOTA	FOTOGRAFIA
12-Mayo-2024		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADS

jornada laboral diurna de 7:00 am/12:00pm

Personal en obra: Residente de obra 1 , Residente de interventoría 2 , Director de obra 1, Director de interventoría 1, Almacenista 1 , Ayudantes 9 , Maestro de obra 1 .

Actividades realizadas:

- PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:4

Erika Segundo
Residente de Obra

Mary Stefany Doria Lozano
Residente de interventoría

OBRA	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-010-2023

ESTADO DEL TIEMPO: día soleado

FECHA	NOTA	FOTOGRAFIA
13-Mayo-2024		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADS

jornada laboral diurna de 7:00 am/12:00pm

Personal en obra: Residente de obra 1 , Residente de interventoría 2 , Director de obra 1, Director de interventoría 1, Almacenista 1 , Ayudantes 9 , Maestro de obra 1 .

Actividades realizadas:

- LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE ARENA - CEMENTO DE 0.10MTS X 0.20MTS X 0.40MTS CON PEGA DE MORTERO 1:4

Erika Segundo
Residente de Obra

Mery Stefany Doria Lozano
Residente de interventoría

OBRA	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-010-2023

ESTADO DEL TIEMPO: día soleado

FECHA	NOTA	FOTOGRAFIA
14-Mayo-2024		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADS

jornada laboral diurna de 7:00 am/12:00pm

Personal en obra: Residente de obra 1 , Residente de interventoría 2 , Director de obra 1, Director de interventoría 1, Almacenista 1 , Ayudantes 9 , Maestro de obra 1 .

Actividades realizadas:

- PLANTILLA EN CONCRETO 21 MPA, E= 0.08MT, .INCLUYE REF. MALLA ELECTROSOLDADA

Erika Segundo
Residente de Obra

Mary Stefany Doria Lozano
Residente de interventoría

OBRA	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-010-2023

ESTADO DEL TIEMPO: día soleado

FECHA	NOTA	FOTOGRAFIA
15-Mayo-2024		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADS

jornada laboral diurna de 7:00 am/12:00pm

Personal en obra: Residente de obra 1 , Residente de interventoría 2 , Director de obra 1, Director de interventoría 1, Almacenista 1 , Ayudantes 9 , Maestro de obra 1 .

Actividades realizadas:

- S/I TUBERIA DE PRESION 3/4" INCLUYE ENCAJUELADA Y RELLENOS
-PUNTO SANITARIOS DE 2" INCLUYE ENCAJUELADA Y RELLENO

Erika Segundo

Residente de Obra

Residente de interventoría

2126

OBRA	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-010-2023

ESTADO DEL TIEMPO: día soleado

FECHA	NOTA	FOTOGRAFIA
16-Mayo-2024		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADS

jornada laboral diurna de 7:00 am/12:00pm

Personal en obra: Residente de obra 1 , Residente de interventoría 2 , Director de obra 1, Director de interventoría 1, Almacenista 1 , Ayudantes 9 , Maestro de obra 1 .

Actividades realizadas:

- S/I TUBERIA DE PRESION 3/4" INCLUYE ENCAJUELADA Y RELLENOS
-PUNTO SANITARIOS DE 2" INCLUYE ENCAJUELADA Y RELLENO

Erika Segundo
Residente de Obra

Mery Stefany Doria Lozano
Residente de interventoría

2127

OBRA	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-010-2023

ESTADO DEL TIEMPO: día soleado

FECHA	NOTA	FOTOGRAFIA
17-Mayo-2024		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADS

jornada laboral diurna de 7:00 am/12:00pm

Personal en obra: Residente de obra 1 , Residente de interventoría 2 , Director de obra 1, Director de interventoría 1, Almacenista 1 , Ayudantes 9 , Maestro de obra 1 .

Actividades realizadas:

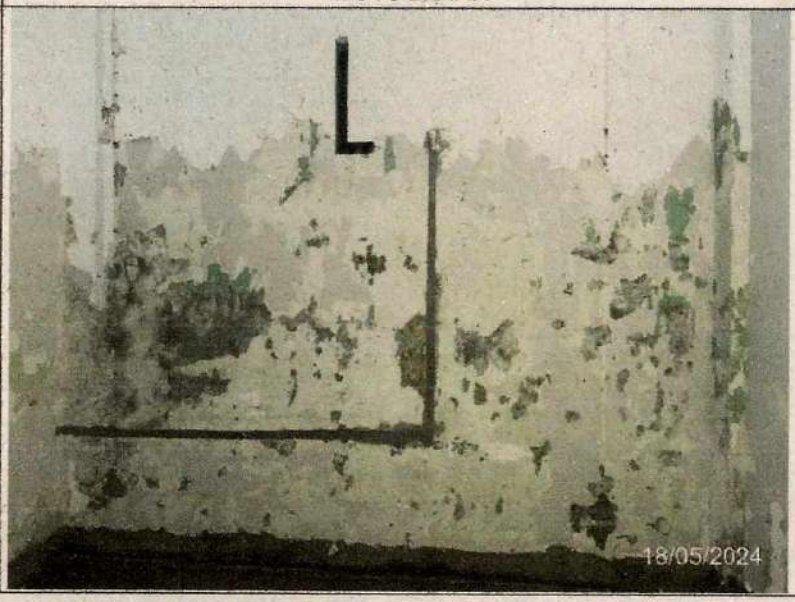
- PUNTO SANITARIOS DE 2" INCLUYE ENCAJUELADA Y RELLENO

Residente de Obra

Residente de interventoría

OBRA	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-010-2023

ESTADO DEL TIEMPO: día soleado

FECHA	NOTA	FOTOGRAFIA
18-Mayo-2024		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADS

jornada laboral diurna de 7:00 am/12:00pm

Personal en obra: Residente de obra 1 , Residente de interventoría 2 , Director de obra 1, Director de interventoría 1, Almacenista 1 , Ayudantes 9 , Maestro de obra 1 .

Actividades realizadas:

- S/I TUBERIA DE PRESION 3/4" INCLUYE ENCAJUELADA Y RELLENOS

Erika Segundo
Residente de Obra

Mery Stefany Doria Lozano
Residente de interventoría

OBRA	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-010-2023

ESTADO DEL TIEMPO: día soleado

FECHA	NOTA	FOTOGRAFIA
19-Mayo-2024		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADS

jornada laboral diurna de 7:00 am/12:00pm

Personal en obra: Residente de obra 1 , Residente de interventoría 2 , Director de obra 1, Director de interventoría 1, Almacenista 1 , Ayudantes 9 , Maestro de obra 1 .

Actividades realizadas:

- DEMOLICIÓN DE MUROS E= 0.15MTS/0.20MTS INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL.

Erika Segundo
Residente de Obra

Mary Stefany Doria Lozano
Residente de interventoría

2130

OBRA	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-010-2023

ESTADO DEL TIEMPO: día soleado

FECHA	NOTA	FOTOGRAFIA
20-Mayo-2024		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADS

jornada laboral diurna de 7:00 am/12:00pm

Personal en obra: Residente de obra 1 , Residente de interventoría 2 , Director de obra 1, Director de interventoría 1, Almacenista 1 , Ayudantes 9 , Maestro de obra 1 .

Actividades realizadas:

- DEMOLICIÓN DE MUROS E= 0.15MTS/0.20MTS INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL

Erika Segundo
Residente de Obra

Mery Stefany Doria Lozano
Residente de interventoría

2151

OBRA	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-010-2023

ESTADO DEL TIEMPO: día soleado

FECHA	NOTA	FOTOGRAFIA
21-Mayo-2024		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADS

jornada laboral diurna de 7:00 am/12:00pm

Personal en obra: Residente de obra 1 , Residente de interventoría 2 , Director de obra 1, Director de interventoría 1, Almacenista 1 , Ayudantes 9 , Maestro de obra 1 .

Actividades realizadas:

- DESMONTE DE PUERTA Y MARCO

DEMOLICIÓN DE MUROS E= 0.15MTS/0.20MTS INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL

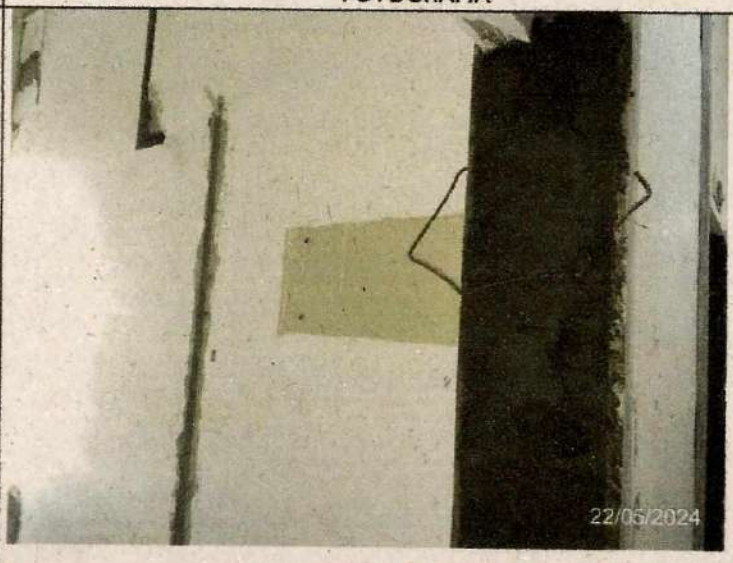
Erika Segundo
Residente de Obra

Mary Stefany Doria Lozano
Residente de interventoría

2132

OBRA	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-010-2023

ESTADO DEL TIEMPO: día soleado

FECHA	NOTA	FOTOGRAFIA
22-Mayo-2024		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADS

jornada laboral diurna de 7:00 am/12:00pm

Personal en obra: Residente de obra 1 , Residente de interventoría 2 , Director de obra 1, Director de interventoría 1, Almacenista 1 , Ayudantes 9 , Maestro de obra 1 .

Actividades realizadas:

- PUNTO HIDRAULICO DE 1/2", INCLUYE ENCAJUELADA Y RELLENOS
- PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:4

Erika Segundo

Residente de Obra

Residente de interventoría

2133

OBRA	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-010-2023

ESTADO DEL TIEMPO: día soleado

FECHA	NOTA	FOTOGRAFIA
23-Mayo-2024		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADS

jornada laboral diurna de 7:00 am/12:00pm

Personal en obra: Residente de obra 1 , Residente de interventoría 2 , Director de obra 1, Director de interventoría 1, Almacenista 1 , Ayudantes 9 , Maestro de obra 1 .

Actividades realizadas:

- PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:4

DESMONTE DE VENTANAS, MARCO EN ALUMINIO Y/O MADERA

Erika Segundo
Residente de Obra

Mery Stefany Doria Lozano
Residente de interventoría

OBRA	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-010-2023

ESTADO DEL TIEMPO: día soleado

FECHA	NOTA	FOTOGRAFIA
24-Mayo-2024		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADS

jornada laboral diurna de 7:00 am/12:00pm

Personal en obra: Residente de obra 1 , Residente de interventoría 2 , Director de obra 1, Director de interventoría 1, Almacenista 1 , Ayudantes 9 , Maestro de obra 1 .

Actividades realizadas:

- RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO

Erika Segura

Residente de Obra

Mery Stefany Doria Lozano

Residente de interventoría

2135

OBRA	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-010-2023

ESTADO DEL TIEMPO: día soleado

FECHA	NOTA	FOTOGRAFIA
25-Mayo-2024		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADS

jornada laboral diurna de 7:00 am/12:00pm

Personal en obra: Residente de obra 1 , Residente de interventoría 2 , Director de obra 1, Director de interventoría 1, Almacenista 1 , Ayudantes 9 , Maestro de obra 1 .

Actividades realizadas:

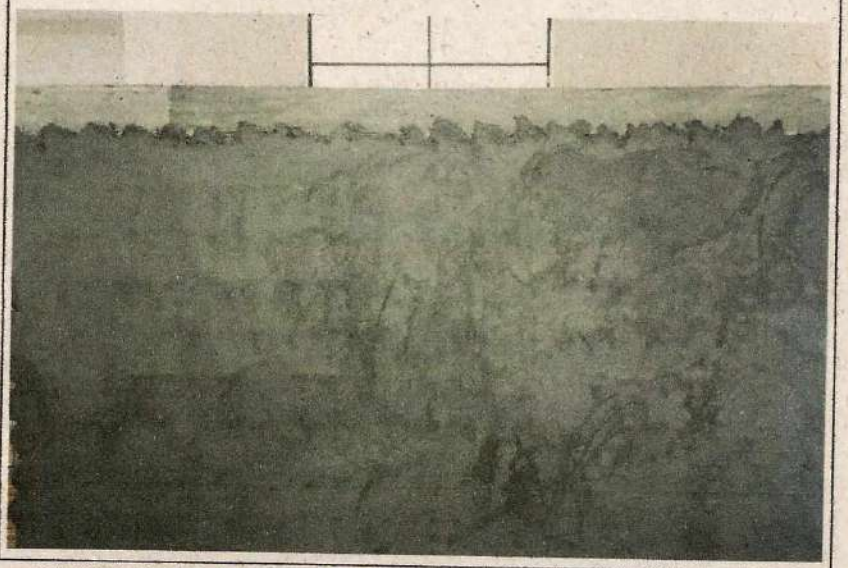
- PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:4
- LEVANTE DE MUROS
- ESTUCO EXTERIOR

Erika Segundo
Residente de Obra

Mary Stefany Doria Lozano
Residente de interventoría

OBRA	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-010-2023

ESTADO DEL TIEMPO: día soleado

FECHA	NOTA	FOTOGRAFIA
26-Mayo-2024		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADS

jornada laboral diurna de 7:00 am/12:00pm

Personal en obra: Residente de obra 1 , Residente de interventoría 2 , Director de obra 1, Director de interventoría 1, Almacenista 1 , Ayudantes 9 , Maestro de obra 1 .

Actividades realizadas:

- PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:4
- LEVANTE DE MUROS
- ESTUCO EXTERIOR

Residente de Obra

Residente de interventoría

2137

OBRA	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-010-2023

ESTADO DEL TIEMPO: día soleado

FECHA	NOTA	FOTOGRAFIA
27-Mayo-2024		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADS

jornada laboral diurna de 7:00 am/12:00pm

Personal en obra: Residente de obra 1 , Residente de interventoría 2 , Director de obra 1, Director de interventoría 1, Almacenista 1 , Ayudantes 9 , Maestro de obra 1 .

Actividades realizadas:

- DEMOLICIÓN DE MUROS E= 0.15MTS/0.20MTS INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL
ANCLAJE EN ACERO DE 1/2" EN ELEMENTOS DE CONCRETO REFORZADO (INCLUYE PERFORACION CON TALADRO Y EPOXICO PARA FIJAR ACERO EN CONCRETO ENDURECIDO
PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:4
- LEVANTE DE MUROS
- ESTUCO EXTERIOR

Erika Segundo
Residente de Obra

Mery Stefany Doria Lozano
Residente de interventoría

OBRA	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-010-2023

ESTADO DEL TIEMPO: día soleado

FECHA	NOTA	FOTOGRAFIA
28-Mayo-2024		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADS

jornada laboral diurna de 7:00 am/12:00pm

Personal en obra: Residente de obra 1 , Residente de interventoría 2 , Director de obra 1, Director de interventoría 1, Almacenista 1 , Ayudantes 9 , Maestro de obra 1 .

Actividades realizadas:

- DEMOLICIÓN DE MUROS E= 0.15MTS/0.20MTS INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL
- PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:4
- LEVANTE DE MUROS
- ESTUCO EXTERIOR
- ENCHAPE DE BAÑOS
- INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN COCINETA
- PLANTILLA EN CONCRETO 21 MPA
- PLANTILLA DE NIVELACIÓN

Erika Segundo
Residente de Obra

Mery Stefany Doria Lozano
Residente de interventoría

OBRA	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-010-2023

ESTADO DEL TIEMPO: día soleado

FECHA	NOTA	FOTOGRAFIA
29-Mayo-2024		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADS

jornada laboral diurna de 7:00 am/12:00pm

Personal en obra: Residente de obra 1 , Residente de interventoría 2 , Director de obra 1, Director de interventoría 1, Almacenista 1 , Ayudantes 9 , Maestro de obra 1 .

Actividades realizadas:

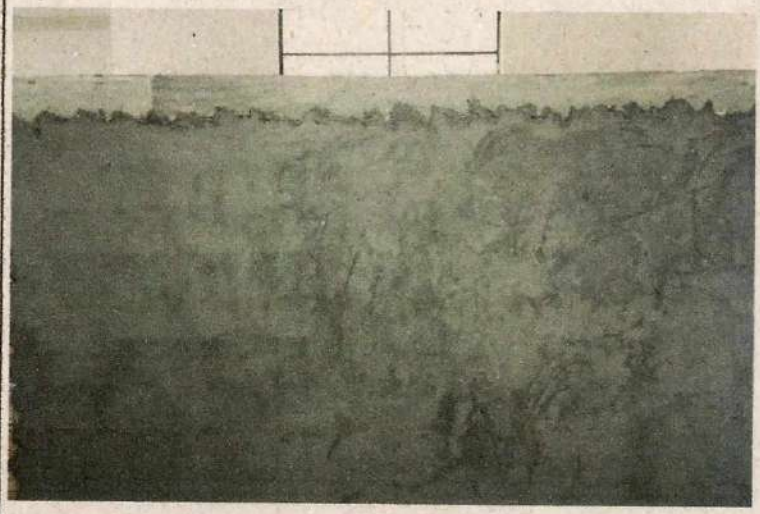
- COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO 0.10MTS X 0.20MTS EN CONCRETO DE 21 MPA.CON 4 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 1/4 @0.15m
- ANCLAJE EN ACERO DE 1/2" EN ELEMENTOS DE CONCRETO REFORZADO (INCLUYE PERFORACION CON TALADRO Y EPOXICO PARA FIJAR ACERO EN CONCRETO ENDURECIDO
- GRANITO PULIDO EN L
- ENCHAPE DE PAREDES
- REPARACIÓN DE GRIETAS

Erika Segundo
Residente de Obra

Mery Stefany Doria Lozano
Residente de interventoría

OBRA	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-010-2023

ESTADO DEL TIEMPO: día soleado

FECHA	NOTA	FOTOGRAFIA
30-Mayo-2024		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADS

jornada laboral diurna de 7:00 am/12:00pm

Personal en obra: Residente de obra 1 , Residente de interventoría 2 , Director de obra 1, Director de interventoría 1, Almacenista 1 , Ayudantes 9 , Maestro de obra 1 .

Actividades realizadas:

- PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:4
-ESTUCO INTERIOR
- CIELORASO EN DRYWALL

Erika Segundo
Residente de Obra

Mery Stefany Doria Lozano
Residente de interventoría

OBRA	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-010-2023

ESTADO DEL TIEMPO: día soleado

FECHA	NOTA	FOTOGRAFIA
31-Mayo-2024		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADS

jornada laboral diurna de 7:00 am/12:00pm

Personal en obra: Residente de obra 1 , Residente de interventoría 2 , Director de obra 1, Director de interventoría 1, Almacenista 1 , Ayudantes 9, Maestro de obra 1 .

Actividades realizadas:

- PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:4
- CIELORASO EN SUPERBOARD
- INSTALACIÓN DE ADOQUIN EN ANDEN

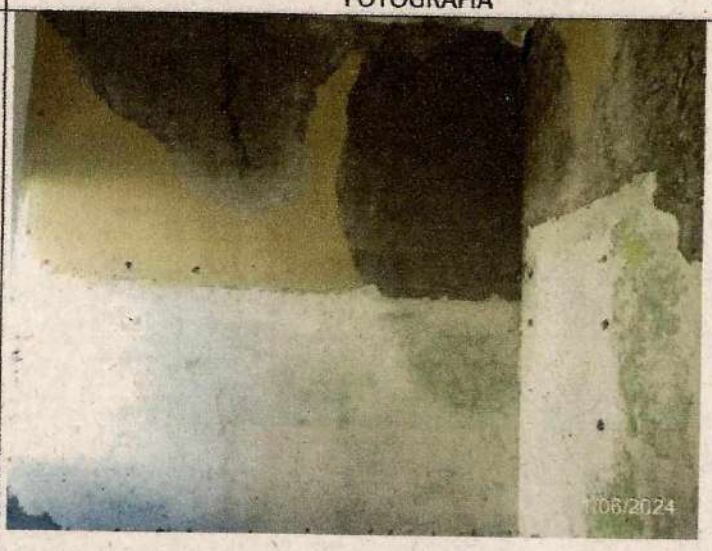
Erika Segundo
Residente de Obra

Mery Stefany Doria Lozano
Residente de interventoría

2142

OBRA	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-010-2023

ESTADO DEL TIEMPO: día soleado

FECHA	NOTA	FOTOGRAFIA
01-Junio-2024		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADS

jornada laboral diurna de 7:00 am/12:00pm

Personal en obra: Residente de obra 1 , Residente de interventoría 2 , Director de obra 1, Director de interventoría 1, Almacenista 1 , Ayudantes 9 , Maestro de obra 1 .

Actividades realizadas:

- REPARACIÓN DE GRIETAS EXISTENTES
PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:4

Erika Segundo
Residente de Obra

Mery Stefany Doria Lozano
Residente de interventoría

2193

OBRA	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-010-2023

ESTADO DEL TIEMPO: dia soleado

FECHA	NOTA	FOTOGRAFIA
04-Junio-2024		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADS

jornada laboral diurna de 7:00 am/12:00pm

Personal en obra: Residente de obra 1 , Residente de interventoría 2 , Director de obra 1, Director de interventoría 1, Almacenista 1 , Ayudantes 9 , Maestro de obra 1 .

Actividades realizadas:

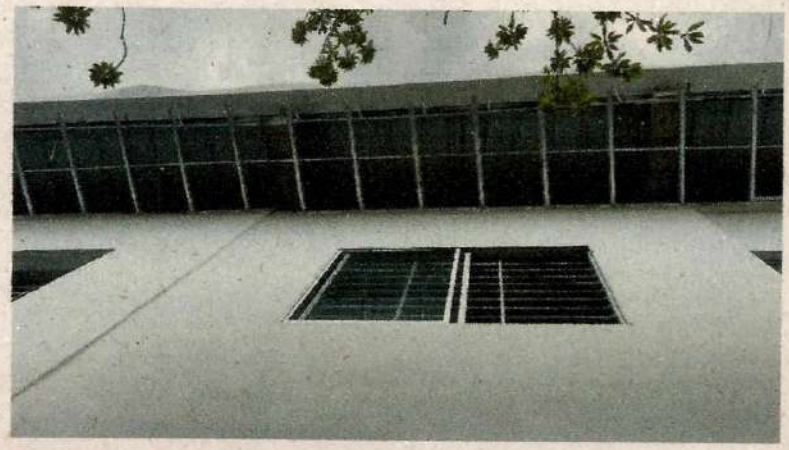
- PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:4
- INSTALACIÓN DE PUERTAS EN VIDRIO
- INSTALACIÓN DE DIVISIONES EN VIDRIO

Residente de Obra

Residente de interventoría

OBRA	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-010-2023

ESTADO DEL TIEMPO: día soleado

FECHA	NOTA	FOTOGRAFIA
05-Junio-2024		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADS

jornada laboral diurna de 7:00 am/12:00pm

Personal en obra: Residente de obra 1 , Residente de interventoría 2 , Director de obra 1, Director de interventoría 1, Almacenista 1 , Ayudantes 9 , Maestro de obra 1 .

Actividades realizadas:

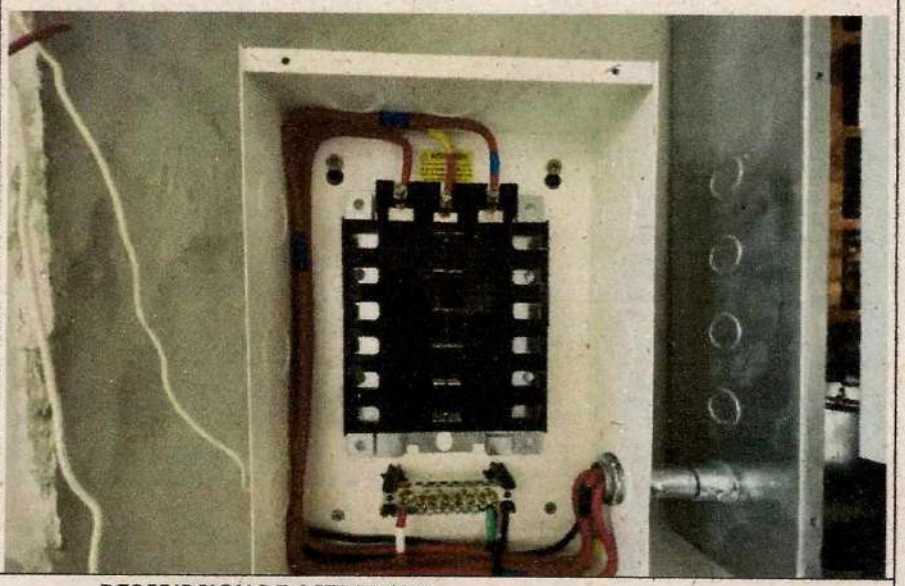
- ESTUCO EXTERIOR
- ESTUCO INTERIOR
- ACOMETIDA SUBTERRANEA DE BAJA TENSION
- INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR TRIFASICO
- INSTALACIÓN DE GABINETE GENERAL
- INSTALACIÓN DE TABLERO ELECTRICO

Erika Segundo
Residente de Obra

Mery Stefany Doria Lozano
Residente de interventoría

OBRA	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-010-2023

ESTADO DEL TIEMPO: día soleado

FECHA	NOTA	FOTOGRAFIA
06-Junio-2024		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADS

jornada laboral diurna de 7:00 am/12:00pm

Personal en obra: Residente de obra 1 , Residente de interventoría 2 , Director de obra 1, Director de interventoría 1, Almacenista 1 , Ayudantes 9 , Maestro de obra 1 .

Actividades realizadas:

- INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
- INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES
- INSTALACIÓN DE LUCES LED
- SALIDA DE RED DE VOZ Y DATOS
- INSTALACIÓN DE RACK
- INSTALACIÓN DE PUERTAS DE ALUMINIO

Erika Segundo
Residente de Obra

Mery Stefany Doria Lozano
Residente de interventoría

2196

OBRA	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-010-2023

ESTADO DEL TIEMPO: día soleado

FECHA	NOTA	FOTOGRAFIA
07-Junio-2024		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADS

jornada laboral diurna de 7:00 am/12:00pm

Personal en obra: Residente de obra 1 , Residente de interventoría 2 , Director de obra 1, Director de interventoría 1, Almacenista 1 , Ayudantes 9 , Maestro de obra 1 .

Actividades realizadas:

- INSTALACIÓN DE CABLEADO DE DATOS
- INSTALACIÓN DE BANDEJA
- INSTALACIÓN DE CAMARAS
- INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS
- INSTALACIÓN DE BARANDAS

Erika Segundo

Residente de Obra

Mery Stefany Doria Lozano

Residente de interventoría

OBRA	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-010-2023

ESTADO DEL TIEMPO: día soleado

FECHA	NOTA	FOTOGRAFIA
08-Junio-2024		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADS

jornada laboral diurna de 7:00 am/12:00pm

Personal en obra: Residente de obra 1 , Residente de interventoría 2 , Director de obra 1, Director de interventoría 1, Almacenista 1 , Ayudantes 9 , Maestro de obra 1 .

Actividades realizadas:

- ENCHAPE DE BAÑOS
- INSTALACIÓN DE PUERTAS
- INTALACIONES SANITARIAS

Erika Segundo

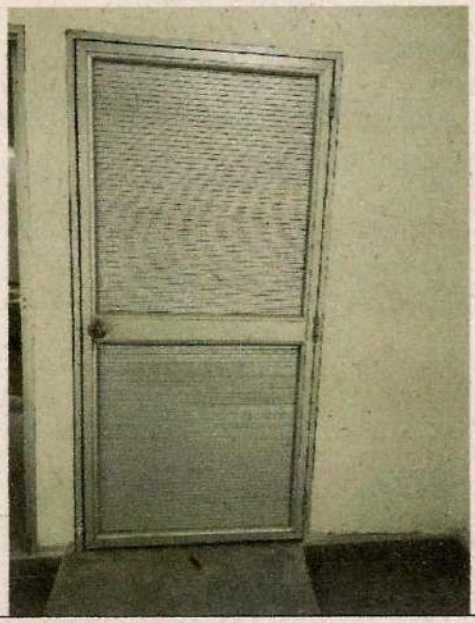
Residente de Obra

Mery Stefany Doria Lozano

Residente de interventoría

OBRA	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-010-2023

ESTADO DEL TIEMPO: día soleado

FECHA	NOTA	FOTOGRAFIA
09-Junio-2024		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADS

jornada laboral diurna de 7:00 am/12:00pm

Personal en obra: Residente de obra 1 , Residente de interventoría 2 , Director de obra 1, Director de interventoría 1, Almacenista 1 , Ayudantes 9 , Maestro de obra 1 .

Actividades realizadas:

- ENCHAPE DE BAÑOS
- INSTALACIÓN DE PUERTAS
- INTALACIONES SANITARIAS
- INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS

Erika Segundo
Residente de Obra

Mery Stefany Doria Lozano
Residente de interventoría

OBRA	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-010-2023

ESTADO DEL TIEMPO: día soleado

FECHA	NOTA	FOTOGRAFIA
10-Junio-2024		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADS

jornada laboral diurna de 7:00 am/12:00pm

Personal en obra: Residente de obra 1, Residente de interventoría 2, Director de obra 1, Director de interventoría 1, Almacenista 1, Ayudantes 9, Maestro de obra 1.

Actividades realizadas:
- ENCHAPE DE PARED
- PINTURA EN VINILO
- CIELO RASO DRYWALL
- ACABADO DE PISO

Erika Segundo
Residente de Obra

Mary Stefany Doria Lozano
Residente de interventoría

2150

OBRA	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-010-2023

ESTADO DEL TIEMPO: día soleado

FECHA	NOTA	FOTOGRAFIA
11-Junio-2024		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADS

jornada laboral diurna de 7:00 am/12:00pm

Personal en obra: Residente de obra 1, Residente de interventoría 2, Director de obra 1, Director de interventoría 1, Almacenista 1, Ayudantes 9, Maestro de obra 1.

Actividades realizadas:

- ENCHAPE DE PARED
- CONCRETO 21 MPA
- PISO EN BALDOSA GRANITO
- PUNTO HIDRAULICO

Erika Segundo

Residente de Obra

Mery Stefany Doria Lozano

Residente de interventoría

2151

OBRA	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-010-2023

ESTADO DEL TIEMPO: día soleado

FECHA	NOTA	FOTOGRAFIA
12-Junio-2024		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADS

jornada laboral diurna de 7:00 am/12:00pm

Personal en obra: Residente de obra 1, Residente de interventoría 2, Director de obra 1, Director de interventoría 1, Almacenista 1, Ayudantes 9, Maestro de obra 1.

Actividades realizadas:
- LLAVE DE CONTROL
- PUNTO SANITARIO
- VENTANA ALUMINIO
- VENTANAS PROTECTORAS

Erika Segundo

Residente de Obra

Mery Stefany Doria Lozano

Residente de interventoría

2152

OBRA	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-010-2023

ESTADO DEL TIEMPO: día soleado

FECHA	NOTA	FOTOGRAFIA
13-Junio-2024		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADS

jornada laboral diurna de 7:00 am/12:00pm

Personal en obra: Residente de obra 1, Residente de interventoría 2, Director de obra 1, Director de interventoría 1, Almacenista 1, Ayudantes 9, Maestro de obra 1.

Actividades realizadas:

- INSTALACIÓN DE DIVISIÓN EN VIDRIO DE SEGURIDAD
- MESON CON ACABADO EN ACERO INOXIDABLE
- SALIDA ELECTRICA PARA TOMACORRIENTE

Elika Segundo
Residente de Obra

Mery Stefany Doria Lozano
Residente de interventoría

OBRA	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-010-2023

ESTADO DEL TIEMPO: día soleado

FECHA	NOTA	FOTOGRAFIA
14-Junio-2024		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADS

jornada laboral diurna de 7:00 am/12:00pm

Personal en obra: Residente de obra 1, Residente de interventoría 2, Director de obra 1, Director de interventoría 1, Almacenista 1, Ayudantes 9, Maestro de obra 1.

Actividades realizadas:

- SALIDA ELECTRICA PARA INTERRUPTOR
- INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE

Erika Segundo

Residente de Obra

Mery Stefany Doria Lozano

Residente de interventoría

2154

OBRA	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-010-2023

ESTADO DEL TIEMPO: día soleado

FECHA	NOTA	FOTOGRAFIA
15-Junio-2024		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADS

jornada laboral diurna de 7:00 am/12:00pm

Personal en obra: Residente de obra 1, Residente de interventoría 2, Director de obra 1, Director de interventoría 1, Almacenista 1, Ayudantes 9, Maestro de obra 1.

Actividades realizadas:

- INSTLACION DE TUBERÍA PARA DESAGUE DE AIRE
- LEVANTE DE MURO EN ADOBE

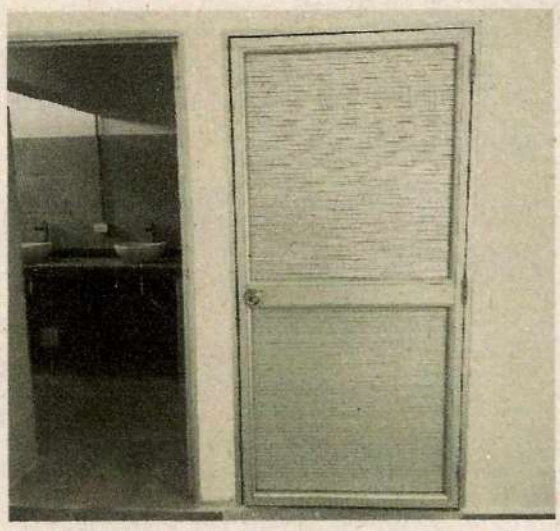
Erika Segundo
Residente de Obra

Mery Stefany Doria Lozano
Residente de interventoría

2155

OBRA	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-010-2023

ESTADO DEL TIEMPO: día soleado

FECHA	NOTA	FOTOGRAFIA
16-Junio-2024		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADS

jornada laboral diurna de 7:00 am/12:00pm

Personal en obra: Residente de obra 1, Residente de interventoría 2, Director de obra 1, Director de interventoría 1, Almacenista 1, Ayudantes 9, Maestro de obra 1.

Actividades realizadas:
- INSTALACIÓN DE PUERTAS EN ALUMINIO
- CONCRETO 21 MPA

Erika Segundo
Residente de Obra

Mery Stefany Doria Lozano
Residente de interventoría

OBRA	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-010-2023

ESTADO DEL TIEMPO: día soleado

FECHA	NOTA	FOTOGRAFIA
17-Junio-2024		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADS

jornada laboral diurna de 7:00 am/12:00pm

Personal en obra: Residente de obra 1, Residente de interventoría 2, Director de obra 1, Director de interventoría 1, Almacenista 1, Ayudantes 9, Maestro de obra 1.

Actividades realizadas:

- INSTALACIÓN DE LAVAMANOS TIPO PEDESTAL

Erika Segundo
Residente de Obra

Mery Stefany Doria Lozano
Residente de interventoría

2157

OBRA	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-010-2023

ESTADO DEL TIEMPO: día soleado

FECHA	NOTA	FOTOGRAFIA
18-Junio-2024		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADS

jornada laboral diurna de 7:00 am/12:00pm

Personal en obra: Residente de obra 1, Residente de interventoría 2, Director de obra 1, Director de interventoría 1, Almacenista 1, Ayudantes 9, Maestro de obra 1.

Actividades realizadas:

- INSTALACIÓN DE TAZA SANITARIA
- INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE INCRUSTAR

Erika Segundo

Residente de Obra

Mery Stefany Doria Lozano

Residente de interventoría

OBRA	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-010-2023

ESTADO DEL TIEMPO: día soleado

FECHA	NOTA	FOTOGRAFIA
19-Junio-2024		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADS

jornada laboral diurna de 7:00 am/12:00pm

Personal en obra: Residente de obra 1, Residente de interventoría 2, Director de obra 1, Director de interventoría 1, Almacenista 1, Ayudantes 9, Maestro de obra 1.

Actividades realizadas:

- ESTUCO PLASTICO PARA INTERIORES

Erika Segundo
Residente de Obra

Mery Stefany Doria Lozano
Residente de interventoría

2159

OBRA	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-010-2023

ESTADO DEL TIEMPO: día soleado

FECHA	NOTA	FOTOGRAFIA
20-Junio-2024		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADS

jornada laboral diurna de 7:00 am/12:00pm

Personal en obra: Residente de obra 1, Residente de interventoría 2, Director de obra 1, Director de interventoría 1, Almacenista 1, Ayudantes 9, Maestro de obra 1.

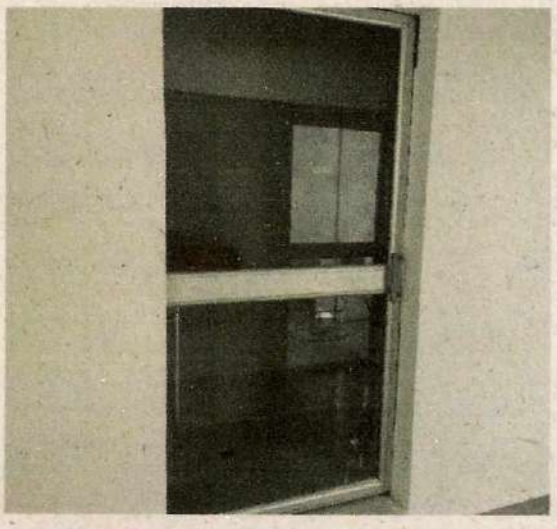
Actividades realizadas:
- SALIDA DE RED DE DATOS
-INSTALACIÓN DE LAVATRAPEROS

Erika Segundo
Residente de Obra

Mery Stefany Doria Lozano
Residente de interventoría

OBRA	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-010-2023

ESTADO DEL TIEMPO: día soleado

FECHA	NOTA	FOTOGRAFIA
20-Diciembre-2024		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADS

jornada laboral diurna de 7:00 am/12:00pm

Personal en obra: Residente de obra 1, Residente de interventoría 2, Director de obra 1, Director de interventoría 1, Almacenista 1, Ayudantes 9, Maestro de obra 1.

Actividades realizadas:
-LEVANTE DE MURO EN ADOBE
-INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO

Residente de Obra

Residente de interventoría

OBRA	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-010-2023

ESTADO DEL TIEMPO: día soleado

FECHA	NOTA	FOTOGRAFIA
21-Diciembre-2024		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADS

jornada laboral diurna de 7:00 am/12:00pm

Personal en obra: Residente de obra 1, Residente de interventoría 2, Director de obra 1, Director de interventoría 1, Almacenista 1, Ayudantes 9, Maestro de obra 1.

Actividades realizadas:
-INSTALACIÓN DE GAVINETE

Erika Segundo
Residente de Obra

Mary Stefany Doria Lozano
Residente de interventoría

OBRA	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-010-2023

ESTADO DEL TIEMPO: día soleado

FECHA	NOTA	FOTOGRAFIA
22-Diciembre-2024		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADS

jornada laboral diurna de 7:00 am/12:00pm

Personal en obra: Residente de obra 1, Residente de interventoría 2, Director de obra 1, Director de interventoría 1, Almacenista 1, Ayudantes 9, Maestro de obra 1.

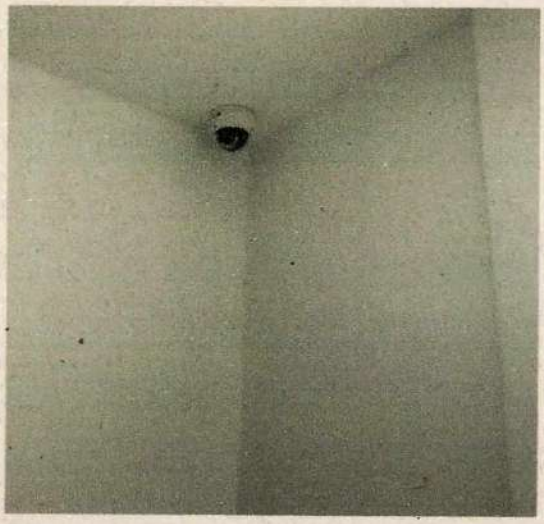
Actividades realizadas:
-INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO

Erika Segundo
Residente de Obra

Mery Stefany Doria Tejano
Residente de interventoría

OBRA	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA"CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-010-2023

ESTADO DEL TIEMPO: día soleado

FECHA	NOTA	FOTOGRAFIA
Finalización de actividades		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADS

jornada laboral diurna de 7:00 am/12:00pm

Personal en obra: Residente de obra 1, Residente de interventoría 2, Director de obra 1, Director de interventoría 1, Almacenista 1, Ayudantes 9, Maestro de obra 1.

Actividades realizadas:
-INSTALACIÓN DE CÁMARA DE CCTV
INSTALCIÓN DE LAVAPLATOS PARA EMPOTRAR

Residente de Obra

Residente de interventoría

ANEXO 5. PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL.

SOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 28314884
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2023-12-18

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	MANYEI INGENIERIA SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900065778	D.V.	5	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 3 11 07	DEPARTAMENTO	CORDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	MANYEIINGSAS@GMAIL.COM	TELÉFONO	7642638
FAX	7642638	SUCURSAL	1	NOMBRE SUCURSAL	MANYEI
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	55227016	PRIMER APELLIDO	ORTEGA	SEGUNDO APELLIDO	OCHOA
PRIMER NOMBRE	JANINI	SEGUNDO NOMBRE	JOHANA		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2023	Mes: 11	Año: 2023	Mes: 12	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
9		$25.140.534		28314884

SOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 30838925
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-09-02

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	MANYEI INGENIERIA SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900065778	D.V.	5	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 3 11 07	DEPARTAMENTO	PUTUMAYO	MUNICIPIO	MOCOA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	MANYEIINGSAS@GMAIL.COM	TELÉFONO	7642638
FAX	7642638	SUCURSAL	1	NOMBRE SUCURSAL	MANYEI
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	55227016	PRIMER APELLIDO	ORTEGA	SEGUNDO APELLIDO	OCHOA
PRIMER NOMBRE	JANINI	SEGUNDO NOMBRE	JOHANA		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2023	Mes: 11	Año: 2023	Mes: 12	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
2		$1.701.334		30838925

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1102845741	01	No	No	No	23	1	1711001	Fijo	GUERRA PEREIRA ERIC JOSE	$1.160.000
CC-55227016	01	No	No	No	23	1	5711001	Fijo	ORTEGA OCHOA JANINI JOHANA	$1.160.000

NOVEDADES																																
entificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
- 1102845741	X	2023-11-09																											0		
- 55227016	X	2023-11-09																											0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
entificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
- 1102845741	PROTECCION	22	$850.667	0.1600000	$136.200	$0	$0	$136.200	$0	$0	$0
- 55227016	COLPENSIONES	22	$850.667	0.1600000	$136.200	$0	$0	$136.200	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
tificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
1102845741	SALUD TOTAL	22	$850.667	0.0400000	$34.100	$0	0	$0	0	$0	22	$850.667	2	0.0052200	$4.500
- 55227016	SANITAS	22	$850.667	0.0400000	$34.100	$0	0	$0	0	$0	22	$850.667	2	0.0052200	$4.500

APORTES PARAFISCALES													
tificación	CCF	Dias Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
1102845741	COMFACOR	22	$850.667	0.0400000	$34.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
-55227016	COMFACOR	22	$850.667	0.0400000	$34.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 11

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

NISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
TECCION	1	$136.200	$0	$0	$0	$0	257	$29.100	$0	$0	$165.300
ENSIONES	1	$136.200	$0	$0	$0	$0	257	$29.100	$0	$0	$165.300

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

NISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NITAS	1	$34.100	$0	0	$0	0	$0	$34.100	257	$7.300	$0	$41.400	$0	0	$0	$0	$41.400	$0	$0	$41.400
ALUD OTAL	1	$34.100	$0	0	$0	0	$0	$34.100	257	$7.300	$0	$41.400	$0	0	$0	$0	$41.400	$0	$0	$41.400

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

NISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ITIVA	2	$9.000	0	$0	$0	$9.000	257	$2.000	$11.000	0	$0	$110	$11.000

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFACOR	2	$68.200	257	$14.600	$82.800
SENA	0	$0	257	$0	$0
ICBF	0	$0	257	$0	$0
ESAP	0	$0	257	$0	$0
MinEdu	0	$0	257	$0	$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	2	$82.800

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
PENSIONES	2	$330.600
RIESGOS PROFESIONALES	1	$11.000
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$82.800
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$507.200

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO

Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-18125040	01	No	No	No	23	1	1711001	Fijo	BERMEO CORAL JAIRO OSVALDO	$1.413.600
CC-1006662627	01	No	No	No	23	1	5711001	Fijo	CORDOBA CERON AURA ISABEL	$1.160.000
CC-1003092390	01	No	No	No	23	1	5711001	Fijo	DURANGO ACOSTA MAIRA ALEXANDRA	$2.900.000
CC-1007412868	01	No	No	No	23	1	1711001	Fijo	DORIA LOZANO MERY STEFANY	$3.000.000
CC-12991287	01	No	No	No	23	1	5711001	Fijo	INSUASTY PORTILLA WILLIAM RENE	$4.200.000
CC-1003717889	01	No	No	No	23	1	1711001	Fijo	JIMENEZ HERNANDEZ ANA LUISA DE JESUS	$6.000.000
CC-1003248908	01	No	No	No	23	1	5711001	Fijo	DORIA LOZANO JESUS MANUEL	$1.356.000
CC-13070967	01	No	No	No	23	1	5711001	Fijo	VALENCIA TUPAZ WILLIAM DARIO	$6.600.000
CC-1124856115	01	No	No	No	23	1	5711001	Fijo	VALLEJO MUÑOZ JHON STIVENT	$1.413.600

NOVEDADES

entificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
: - 18125040	X	2023-11-01																											0		
- 1006662627																													0		
- 1003092390																													0		
- 1007412868	X	2023-11-09																											0		
: - 12991287																													0		
- 1003717889	X	2023-11-09																											0		
- 1003248908	X	2023-11-09																											0		
: - 13070967																													0		
- 1124856115																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

antificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
- 18125040	PORVENIR	30	$1.413.600	0.1600000	$226.200	$0	$0	$226.200	$0	$0	$0
- 1006662627	COLPENSIONES	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
- 1003092390	PROTECCION	30	$2.900.000	0.1600000	$464.000	$0	$0	$464.000	$0	$0	$0
- 1007412868	COLPENSIONES	22	$2.200.000	0.1600000	$352.000	$0	$0	$352.000	$0	$0	$0
- 12991287	COLPENSIONES	30	$4.200.000	0.1600000	$672.000	$0	$0	$672.000	$0	$0	$0
- 1003717889	PORVENIR	22	$4.400.000	0.1600000	$704.000	$0	$0	$704.000	$0	$0	$0
- 1003248908	COLPENSIONES	22	$853.334	0.1600000	$152.600	$0	$0	$152.600	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

entificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
: - 13070967	COLPENSIONES	30	$6.600.000	0.1600000	$1.056.000	$0	$0	$1.056.000	$33.000	$33.000	$0
- 1124856115	PORVENIR	30	$1.413.600	0.1600000	$226.200	$0	$0	$226.200	$0	$0	$0

		SISTEMA GENERAL DE SALUD									SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
tificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
- 18125040	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.413.600	0.0400000	$56.600	$0	0	$0	0	$0	30	$1.413.600	1	0.0696000	$98.400
1006662627	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	1	0.0696000	$80.800
1003092390	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$2.900.000	0.0400000	$116.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2.900.000	1	0.0696000	$201.900
1007412868	EPS SURA	22	$2.200.000	0.0400000	$88.000	$0	0	$0	0	$0	22	$2.200.000	2	0.0052200	$11.500
- 12991287	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$4.200.000	0.0400000	$168.000	$0	0	$0	0	$0	30	$4.200.000	1	0.0696000	$292.400
1003717889	EPS CAJACOPI	22	$4.400.000	0.0400000	$176.000	$0	0	$0	0	$0	22	$4.400.000	2	0.0052200	$23.000
1003248909	EPS SURA	22	$953.334	0.0400000	$38.200	$0	0	$0	0	$0	22	$953.334	1	0.0696000	$66.400
- 13070967	SANITAS	30	$6.600.000	0.0400000	$264.000	$0	0	$0	0	$0	30	$6.600.000	1	0.0696000	$459.400
1124856115	EPS-S EMSSANAR	30	$1.413.600	0.0400000	$56.600	$0	0	$0	0	$0	30	$1.413.600	1	0.0696000	$98.400

APORTES PARAFISCALES

tificación	CCF	Dias Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
-18125040	COMFACOR	30	$1.413.600	0.0400000	$56.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
1006662627	COMFACOR	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
1003092390	COMFACOR	30	$2.900.000	0.0400000	$116.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
1007412868	COMFACOR	22	$2.200.000	0.0400000	$88.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

2171

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
NISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ITIVA	9	$1.332.200	0	$0	$0	$1.332.200	0	$0	$1.332.200	0	$0	$0	$1.332.200

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFACOR	9	$1.009.800	0	$0	$1.009.800
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	$1.009.800
PENSIONES	3	$4.104.600
RIESGOS PROFESIONALES	1	$1.332.200
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$1.009.800
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$7.456.400

2172

SOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 28715871
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-01-09

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	MANYEI INGENIERIA SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900065778	D.V.	5	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 3 11 07	DEPARTAMENTO	CORDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	MANYEIINGSAS@GMAIL.COM	TELÉFONO	7642638
FAX	7642638	SUCURSAL	1	NOMBRE SUCURSAL	MANYEI
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	55227016	PRIMER APELLIDO	ORTEGA	SEGUNDO APELLIDO	OCHOA
PRIMER NOMBRE	JANINI	SEGUNDO NOMBRE	JOHANA		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2023	Mes: 12	Año: 2024	Mes: 01	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
9		$28.087.200		28715871

2173

APORTES PARAFISCALES

tificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
-12991287	COMFACOR	30	$4.200.000	0.0400000	$168.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
1003717889	COMFACOR	22	$4.400.000	0.0400000	$176.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
1003248908	COMFACOR	22	$953.334	0.0400000	$38.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
-13070967	COMFACOR	30	$6.600.000	0.0400000	$264.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
1124856115	COMFACOR	30	$1.413.600	0.0400000	$56.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 11

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

NISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
RVENIR	3	$1.156.400	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.156.400
ENSIONES	5	$2.418.200	$0	$0	$33.000	$33.000	0	$0	$0	$0	$2.484.200
TECCION	1	$464.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$464.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

NISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
UEVA P.S. .A.	4	$387.000	$0	0	$0	0	$0	$387.000	0	$0	$0	$387.000	$0	0	$0	$0	$387.000	$0	$0	$387.000
NITAS	1	$264.000	$0	0	$0	0	$0	$264.000	0	$0	$0	$264.000	$0	0	$0	$0	$264.000	$0	$0	$264.000
PS-S SANAR	1	$56.600	$0	0	$0	0	$0	$56.600	0	$0	$0	$56.600	$0	0	$0	$0	$56.600	$0	$0	$56.600
PS ACOPI	1	$176.000	$0	0	$0	0	$0	$176.000	0	$0	$0	$176.600	$0	0	$0	$0	$176.000	$0	$0	$176.000
S SURA	2	$126.200	$0	0	$0	0	$0	$126.200	0	$0	$0	$126.200	$0	0	$0	$0	$126.200	$0	$0	$126.200

214

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-18125040	01	No	No	No	23	1	1711001	Fijo	BERMEO CORAL JAIRO OSVALDO	$1.413.600
CC-1006662627	01	No	No	No	23	1	5711001	Fijo	CORDOBA CERON AURA ISABEL	$1.160.000
CC-1003092390	01	No	No	No	23	1	5711001	Fijo	DURANGO ACOSTA MAIRA ALEXANDRA	$3.000.000
CC-1007412868	01	No	No	No	23	1	1711001	Fijo	DORIA LOZANO MERY STEFANY	$3.000.000
CC-12991287	01	No	No	No	23	1	5711001	Fijo	INSUASTY PORTILLA WILLIAM RENE	$4.200.000
CC-1003717889	01	No	No	No	23	1	1711001	Fijo	JIMENEZ HERNANDEZ ANA LUISA DE JESUS	$6.000.000
CC-1003248908	01	No	No	No	23	1	5711001	Fijo	DORIA LOZANO JESUS MANUEL	$1.300.000
CC-13070967	01	No	No	No	23	1	5711001	Fijo	VALENCIA TUPAZ WILLIAM DARIO	$6.600.000
CC-1124856115	01	No	No	No	23	1	5711001	Fijo	VALLEJO MUÑOZ JHON STIVENT	$1.413.600

NOVEDADES																																
entificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
: - 18125040																													0		
- 1006662627																													0		
- 1003092390																													0		
- 1007412868																													0		
: - 12991287																													0		
- 1003717889																													0		
- 1003248908																													0		
: - 13070967																													0		
- 1124856115																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
entificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
: - 18125040	PORVENIR	30	$1.413.600	0.1600000	$226.200	$0	$0	$226.200	$0	$0	$0
- 1006662627	COLPENSIONES	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
- 1003092390	PROTECCION	30	$3.000.000	0.1600000	$480.000	$0	$0	$480.000	$0	$0	$0
- 1007412868	COLPENSIONES	30	$3.000.000	0.1600000	$480.000	$0	$0	$480.000	$0	$0	$0
: - 12991287	COLPENSIONES	30	$4.200.000	0.1600000	$672.000	$0	$0	$672.000	$0	$0	$0
- 1003717889	PORVENIR	30	$6.000.000	0.1600000	$960.000	$0	$0	$960.000	$30.000	$30.000	$0
- 1003248908	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
entificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
: - 13070967	COLPENSIONES	30	$6.600.000	0.1600000	$1.056.000	$0	$0	$1.056.000	$33.000	$33.000	$0
- 1124856115	PORVENIR	30	$1.413.600	0.1600000	$226.200	$0	$0	$226.200	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
atificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
- 18125040	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.413.600	0.0400000	$56.600	$0	0	$0	0	$0	30	$1.413.600	1	0.0696000	$98.400
1006662627	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	1	0.0696000	$80.800
1003092390	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$3.000.000	0.0400000	$120.000	$0	0	$0	0	$0	30	$3.000.000	2	0.0052200	$15.700
1007412868	EPS SURA	30	$3.000.000	0.0400000	$120.000	$0	0	$0	0	$0	30	$3.000.000	2	0.0052200	$15.700
- 12991287	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$4.200.000	0.0400000	$168.000	$0	0	$0	0	$0	30	$4.200.000	1	0.0696000	$292.400
1003717889	EPS CAJACOPI	30	$6.000.000	0.0400000	$240.000	$0	0	$0	0	$0	30	$6.000.000	2	0.0052200	$31.400
1003248908	EPS SURA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0696000	$90.500
- 13070967	SANITAS	30	$6.600.000	0.0400000	$264.000	$0	0	$0	0	$0	30	$6.600.000	1	0.0696000	$459.400
1124856115	EPS-S EMSSANAR	30	$1.413.600	0.0400000	$56.600	$0	0	$0	0	$0	30	$1.413.600	1	0.0696000	$98.400

APORTES PARAFISCALES													
tificación	CCF	Dias Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
-18125040	COMFACOR	30	$1.413.600	0.0400000	$56.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
1006662627	COMFACOR	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
1003092390	COMFACOR	30	$3.000.000	0.0400000	$120.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
1007412868	COMFACOR	30	$3.000.000	0.0400000	$120.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES

tificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
-12991287	COMFACOR	30	$4.200.000	0.0400000	$168.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
1003717889	COMFACOR	30	$6.000.000	0.0400000	$240.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
1003248908	COMFACOR	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
-13070967	COMFACOR	30	$6.600.000	0.0400000	$264.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
1124856115	COMFACOR	30	$1.413.600	0.0400000	$56.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 12

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

NISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
RVENIR	3	$1.412.400	$0	$0	$30.000	$30.000	0	$0	$0	$0	$1.472.400
ENSIONES	5	$2.601.600	$0	$0	$33.000	$33.000	0	$0	$0	$0	$2.667.600
TECCION	1	$480.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$480.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

NISTRA ORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
UEVA P.S. .A.	4	$391.000	$0	0	$0	0	$0	$391.000	0	$0	$0	$391.000	$0	0	$0	$0	$391.000	$0	$0	$391.000
NITAS	1	$264.000	$0	0	$0	0	$0	$264.000	0	$0	$0	$264.000	$0	0	$0	$0	$264.000	$0	$0	$264.000
PS-S SANAR	1	$56.600	$0	0	$0	0	$0	$56.600	0	$0	$0	$56.600	$0	0	$0	$0	$56.600	$0	$0	$56.600
PS ACOPI	1	$240.000	$0	0	$0	0	$0	$240.000	0	$0	$0	$240.600	$0	0	$0	$0	$240.000	$0	$0	$240.000
S SURA	2	$172.000	$0	0	$0	0	$0	$126.200	0	$0	$0	$126.200	$0	0	$0	$0	$126.200	$0	$0	$126.200

2127

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
NISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ITIVA	9	$1.182.700	0	$0	$0	$1.182.700	0	$0	$1.182.700	0	$0	$0	$1.182.700

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFACOR	9	$1.123.600	0	$0	$1.123.600
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	5	$1.123.600
PENSIONES	3	$4.620.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	$1.182.700
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$1.123.600
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$8.049.900

SOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 30839765
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-09-02

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	MANYEI INGENIERIA SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900065778	D.V.	5	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 3 11 07	DEPARTAMENTO	PUTUMAYO	MUNICIPIO	MOCOA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	MANYEIINGSAS@GMAIL.COM	TELÉFONO	7642638
FAX	7642638	SUCURSAL	1	NOMBRE SUCURSAL	MANYEI
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	55227016	PRIMER APELLIDO	ORTEGA	SEGUNDO APELLIDO	OCHOA
PRIMER NOMBRE	JANINI	SEGUNDO NOMBRE	JOHANA		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2023	Mes: 12	Año: 2024	Mes: 01	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
2		$541.334		30839765

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1102845741	01	No	No	No	23	1	1711001	Fijo	GUERRA PEREIRA ERIC JOSE	$1.160.000
CC-55227016	01	No	No	No	23	1	5711001	Fijo	ORTEGA OCHOA JANINI JOHANA	$1.160.000

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
- 1102845741			X	2023-12-07																									0		
C - 55227016			X	2023-12-07																									0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
entificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
- 1102845741	PROTECCION	7	$270.667	0.1600000	$43.400	$0	$0	$43.400	$0	$0	$0
: - 55227016	COLPENSIONES	7	$270.667	0.1600000	$43.400	$0	$0	$43.400	$0	$0	$0

	SISTEMA GENERAL DE SALUD										SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
ntificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
1102845741	SALUD TOTAL	7	$270.667	0.0400000	$10.900	$0	0	$0	0	$0	7	$270.667	2	0.0052200	$1.500
- 55227016	SANITAS	7	$270.667	0.0400000	$10.900	$0	0	$0	0	$0	7	$270.667	2	0.0052200	$1.500

APORTES PARAFISCALES														
tificación	CCF	Dias Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
1102845741	COMFACOR	7	$270.667	0.0400000	$10.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
-55227016	COMFACOR	7	$270.667	0.0400000	$10.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

2180

TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 12

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

NISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
ENSIONES	1	$43.400	$0	$0	$0	$0	227	$8.100	$0	$0	$51.500
TECCION	1	$43.400	$0	$0	$0	$0	227	$8.100	$0	$0	$51.500

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

NISTRA ORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NITAS	1	$10.900	$0	0	$0	0	$0	$10.900	227	$2.100	$0	$13.000	$0	0	$0	$0	$13.000	$0	$0	$13.000
ALUD OTAL	1	$10.900	$0	0	$0	0	$0	$10.900	227	$2.100	$0	$13.000	$0	0	$0	$0	$13.000	$0	$0	$13.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

NISTRA ORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ITIVA	2	$3.000	0	$0	$0	$3.000	227	$600	$3.600	0	$0	$36	$3.600

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFACOR	2	$21.800	227	$4.100	$25.900
SENA	0	$0	227	$0	$0
ICBF	0	$0	227	$0	$0
ESAP	0	$0	227	$0	$0
MinEdu	0	$0	227	$0	$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	2	$26.000

2191

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
PENSIONES	2	$103.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	$3.600
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$25.900
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$158.500

2182

SOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 29753810
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-05-03

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	MANYEI INGENIERIA SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900065778	D.V.	5	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 3 11 07	DEPARTAMENTO	PUTUMAYO	MUNICIPIO	MOCOA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	MANYEIINGSAS@GMAIL.COM	TELÉFONO	7642638
FAX	7642638	SUCURSAL	1	NOMBRE SUCURSAL	MANYEI
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	55227016	PRIMER APELLIDO	ORTEGA	SEGUNDO APELLIDO	OCHOA
PRIMER NOMBRE	JANINI	SEGUNDO NOMBRE	JOHANA		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 04	Año: 2024	Mes: 05	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
3		$10.300.000		29753810

2103

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO

Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Extranjero obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario
										Salario Básico
CC-1003248908	01	No	No	No	23	1	3711001	Fijo	DORIA LOZANO JESUS MANUEL	$1.300.000
CC-1007412868	01	No	No	No	23	1	5711001	Variable	DORIA LOZANO MERY STEFANY	$3.000.000
CC-1003717889	01	No	No	No	23	1	5711001	Variable	JIMENEZ HERNANDEZ ANA LUISA DE JESUS	$6.000.000

NOVEDADES

Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
- 1003248908	X	2024-04-01																											0		
- 1007412868	X	2024-04-01																											0		
- 1003717889	X	2024-04-01																											0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

entificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
- 1003248908	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
- 1007412868	COLPENSIONES	30	$3.000.000	0.1600000	$480.000	$0	$0	$480.000	$0	$0	$0
- 1003717889	PORVENIR	30	$6.000.000	0.1600000	$960.000	$0	$0	$960.000	$30.000	$30.000	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD / SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES

ntificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
· 1003248908	EPS SURA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0696000	$90.500
· 1007412868	EPS SURA	30	$3.000.000	0.0400000	$120.000	$0	0	$0	0	$0	30	$3.000.000	2	0.0052200	$15.700
· 1003717889	SALUD TOTAL	30	$6.000.000	0.0400000	$240.000	$0	0	$0	0	$0	30	$6.000.000	2	0.0052200	$31.400

2184

APORTES PARAFISCALES

tificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
1003248908	COMFACOR	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
1007412868	COMFACOR	30	$3.000.000	0.0400000	$120.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
1003717889	COMFACOR	30	$6.000.000	0.0400000	$240.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 04

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

NISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
ENSIONES	2	$688.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$688.000
RVENIR	1	$960.000	$0	$0	$30.000	$30.000	0	$0	$0	$0	$1.020.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

NISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
ALUD OTAL	1	$240.000	$0	0	$0	0	$0	$240.000	0	$0	$0	$240.000	$0	0	$0	$0	$240.000	$0	$0	$240.000
SURA	2	$172.000	$0	0	$0	0	$0	$172.000	0	$0	$0	$172.000	$0	0	$0	$0	$172.000	$0	$0	$172.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

NISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ITIVA	3	$137.600	0	$0	$0	$137.600	0	$0	$137.600	0	$0	$0	$137.600

2185

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFACOR	3	$412.000	0	$0	$412.000
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	2	$412.000
PENSIONES	2	$1.708.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	$137.600
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$412.000
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$2.669.600

2186

SOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 30849595
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-09-02

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	MANYEI INGENIERIA SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900065778	D.V.	5	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 3 11 07	DEPARTAMENTO	PUTUMAYO	MUNICIPIO	MOCOA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	MANYEIINGSAS@GMAIL.COM	TELÉFONO	7642638
FAX	7642638	SUCURSAL	1	NOMBRE SUCURSAL	MANYEI
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	55227016	PRIMER APELLIDO	ORTEGA	SEGUNDO APELLIDO	OCHOA
PRIMER NOMBRE	JANINI	SEGUNDO NOMBRE	JOHANA		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 04	Año: 2024	Mes: 05	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
3		$5.600.000		30849595

2164

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1003092390	01	No	No	No	23	1	5711001	Fijo	DURANGO ACOSTA MAIRA ALEXANDRA	$3.000.000
CC-1102845741	01	No	No	No	23	1	1711001	Fijo	GUERRA PEREIRA ERIC JOSE	$1.300.000
CC-55227016	01	No	No	No	23	1	5711001	Fijo	ORTEGA OCHOA JANINI JOHANA	$1.300.000

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
- 1003092390	X	2024-04-01																											0		
- 1102845741	X	2024-04-01																											0		
- 55227016	X	2024-04-01																											0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
entificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
- 1003092390	PROTECCION	30	$3.000.000	0.1600000	$480.000	$0	$0	$480.000	$0	$0	$0
- 1102845741	PROTECCION	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
- 55227016	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
ntificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
1003092390	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$3.000.000	0.0400000	$120.000	$0	0	$0	0	$0	30	$3.000.000	2	0.0052200	$15.700
1102845741	SALUD TOTAL	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	2	0.0052200	$6.800
- 55227016	SANITAS	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	2	0.0052200	$6.800

2186

APORTES PARAFISCALES

tificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
1003092390	COMFACOR	30	$3.000.000	0.0400000	$120.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
1102845741	COMFACOR	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
-55227016	COMFACOR	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 04

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

NISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
TECCION	2	$688.000	$0	$0	$0	$0	104	$54.700	$0	$0	$742.700
ENSIONES	1	$208.000	$0	$0	$0	$0	104	$16.600	$0	$0	$224.600

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

NISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
JEVA P.S. .A.	1	$120.000	$0	0	$0	0	$0	$120.000	104	$9.600	$0	$129.600	$0	0	$0	$0	$129.600	$0	$0	$129.600
ALUD OTAL	1	$52.000	$0	0	$0	0	$0	$52.000	104	$4.200	$0	$56.200	$0	0	$0	$0	$56.200	$0	$0	$56.200
NITAS	1	$52.000	$0	0	$0	0	$0	$52.000	104	$4.200	$0	$56.200	$0	0	$0	$0	$56.200	$0	$0	$56.200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

NISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ITIVA	3	$29.300	0	$0	$0	$29.300	104	$2.400	$31.700	0	$0	$0	$31.700

2189

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFACOR	3	$224.000	104	$17.900	$241.900
SENA	0	$0	104	$0	$0
ICBF	0	$0	104	$0	$0
ESAP	0	$0	104	$0	$0
MinEdu	0	$0	104	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	$242.000
PENSIONES	2	$967.300
RIESGOS PROFESIONALES	1	$31.700
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$241.900
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$1.482.900

2190

SOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 30125657
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-06-11

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	MANYEI INGENIERIA SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900065778	D.V.	5	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 3 11 07	DEPARTAMENTO	PUTUMAYO	MUNICIPIO	MOCOA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	MANYEIINGSAS@GMAIL.COM	TELÉFONO	7642638
FAX	7642638	SUCURSAL	1	NOMBRE SUCURSAL	MANYEI
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	55227016	PRIMER APELLIDO	ORTEGA	SEGUNDO APELLIDO	OCHOA
PRIMER NOMBRE	JANINI	SEGUNDO NOMBRE	JOHANA		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 05	Año: 2024	Mes: 06	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
4		$11.600.000		30125657

2191

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO

Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario
										Salario Básico
CC-1003248908	01	No	No	No	23	1	3711001	Fijo	DORIA LOZANO JESUS MANUEL	$1.300.000
CC-1007412868	01	No	No	No	23	1	5711001	Variable	DORIA LOZANO MERY STEFANY	$3.000.000
CC-22669148	01	No	No	No	8	1	1711001	Fijo	ESTRADA RINCON LUZ AIDA	$1.300.000
CC-1003717889	01	No	No	No	23	1	5711001	Variable	JIMENEZ HERNANDEZ ANA LUISA DE JESUS	$6.000.000

NOVEDADES

Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
- 1003248908																													0		
- 1007412868																													0		
- 22669148																													0		
- 1003717889																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

entificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
- 1003248908	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
- 1007412868	COLPENSIONES	30	$3.000.000	0.1600000	$480.000	$0	$0	$480.000	$0	$0	$0
- 22669148	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
- 1003717889	PORVENIR	30	$6.000.000	0.1600000	$960.000	$0	$0	$960.000	$30.000	$30.000	$0

	SISTEMA GENERAL DE SALUD										SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
ntificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
1003248908	EPS SURA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0696000	$90.500
1007412868	EPS SURA	30	$3.000.000	0.0400000	$120.000	$0	0	$0	0	$0	30	$3.000.000	2	0.0052200	$15.700
- 22669148	SANITAS	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	2	0.0052200	$6.800
1003717889	SALUD TOTAL	30	$6.000.000	0.0400000	$240.000	$0	0	$0	0	$0	30	$6.000.000	2	0.0052200	$31.400

2192

APORTES PARAFISCALES

tificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
1003248908	COMFACOR	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
1007412868	COMFACOR	30	$3.000.000	0.0400000	$120.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
-22669148	COMBARRANQUILLA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
1003717889	COMFACOR	30	$6.000.000	0.0400000	$240.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 05

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

NISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
ENSIONES	3	$896.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$896.000
RVENIR	1	$960.000	$0	$0	$30.000	$30.000	0	$0	$0	$0	$1.020.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

NISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SURA	2	$172.000	$0	0	$0	0	$0	$172.000	0	$0	$0	$172.000	$0	0	$0	$0	$172.000	$0	$0	$172.000
ALUD OTAL	1	$240.000	$0	0	$0	0	$0	$240.000	0	$0	$0	$240.000	$0	0	$0	$0	$240.000	$0	$0	$240.000
NITAS	1	$52.000	$0	0	$0	0	$0	$52.000	0	$0	$0	$52.000	$0	0	$0	$0	$52.000	$0	$0	$52.000

2193

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
NISTRA ORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ITIVA	4	$144.400	0	$0	$0	$144.400	0	$0	$144.400	0	$0	$0	$144.400

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMBARRANQUILLA	1	$52.000	0	$0	$52.000
COMFACOR	3	$412.000	0	$0	$412.000
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	$464.000
PENSIONES	2	$1.916.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	$144.400
CAJAS DE COMPENSACIÓN	2	$464.000
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$2.988.400

SOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 30850134
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-09-02

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	MANYEI INGENIERIA SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900065778	D.V.	5	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 3 11 07	DEPARTAMENTO	PUTUMAYO	MUNICIPIO	MOCOA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	MANYEIINGSAS@GMAIL.COM	TELÉFONO	7642638
FAX	7642638	SUCURSAL	1	NOMBRE SUCURSAL	MANYEI
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	55227016	PRIMER APELLIDO	ORTEGA	SEGUNDO APELLIDO	OCHOA
PRIMER NOMBRE	JANINI	SEGUNDO NOMBRE	JOHANA		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 05	Año: 2024	Mes: 06	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
3		$5.600.000		30850134

2195

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1003092390	01	No	No	No	23	1	5711001	Fijo	DURANGO ACOSTA MAIRA ALEXANDRA	$3.000.000
CC-1102845741	01	No	No	No	23	1	1711001	Fijo	GUERRA PEREIRA ERIC JOSE	$1.300.000
CC-55227016	01	No	No	No	23	1	5711001	Fijo	ORTEGA OCHOA JANINI JOHANA	$1.300.000

NOVEDADES																																		
lentificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
- 1003092390			X	2024-05-31																									0		
- 1102845741			X	2024-05-31																									0		
C - 55227016			X	2024-05-31																									0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
entificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
- 1003092390	PROTECCION	30	$3.000.000	0.1600000	$480.000	$0	$0	$480.000	$0	$0	$0
- 1102845741	PROTECCION	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
- 55227016	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
ntificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
1003092390	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$3.000.000	0.0400000	$120.000	$0	0	$0	0	$0	30	$3.000.000	2	0.0052200	$15.700
1102845741	SALUD TOTAL	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	2	0.0052200	$6.800
- 55227016	SANITAS	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	2	0.0052200	$6.800

APORTES PARAFISCALES

tificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
1003092390	COMFACOR	30	$3.000.000	0.0400000	$120.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
1102845741	COMFACOR	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
-55227016	COMFACOR	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 05

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

NISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
ENSIONES	1	$208.000	$0	$0	$0	$0	73	$11.500	$0	$0	$219.500
TECCION	2	$688.000	$0	$0	$0	$0	73	$37.800	$0	$0	$725.800

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

NISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
ALUD OTAL	1	$52.000	$0	0	$0	0	$0	$52.000	73	$2.900	$0	$54.900	$0	0	$0	$0	$54.900	$0	$0	$54.900
NITAS	1	$52.000	$0	0	$0	0	$0	$52.000	73	$2.900	$0	$54.900	$0	0	$0	$0	$54.900	$0	$0	$54.900
UEVA P.S. .A.	1	$120.000	$0	0	$0	0	$0	$120.000	73	$6.600	$0	$126.600	$0	0	$0	$0	$126.600	$0	$0	$126.600

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

NISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ITIVA	3	$29.300	0	$0	$0	$29.300	73	$1.700	$31.000	0	$0	$0	$31.000

2197

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFACOR	3	$224.000	73	$12.300	$236.300
SENA	0	$0	73	$0	$0
ICBF	0	$0	73	$0	$0
ESAP	0	$0	73	$0	$0
MinEdu	0	$0	73	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	$236.400
PENSIONES	2	$945.300
RIESGOS PROFESIONALES	1	$31.000
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$236.300
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$1.449.000

2198

SOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 30357777
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-07-05

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	MANYEI INGENIERIA SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900065778	D.V.	5	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 3 11 07	DEPARTAMENTO	PUTUMAYO	MUNICIPIO	MOCOA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	MANYEIINGSAS@GMAIL.COM	TELÉFONO	7642638
FAX	7642638	SUCURSAL	1	NOMBRE SUCURSAL	MANYEI
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	55227016	PRIMER APELLIDO	ORTEGA	SEGUNDO APELLIDO	OCHOA
PRIMER NOMBRE	JANINI	SEGUNDO NOMBRE	JOHANA		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 06	Año: 2024	Mes: 07	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
4		$11.600.000		30357777

2199

SOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 32687929
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-03-03

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	MANYEI INGENIERIA SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900065778	D.V.	5	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 3 11 07	DEPARTAMENTO	PUTUMAYO	MUNICIPIO	MOCOA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	MANYEIINGSAS@GMAIL.COM	TELÉFONO	7642638
FAX	7642638	SUCURSAL	1	NOMBRE SUCURSAL	MANYEI
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	55227016	PRIMER APELLIDO	ORTEGA	SEGUNDO APELLIDO	OCHOA
PRIMER NOMBRE	JANINI	SEGUNDO NOMBRE	JOHANA		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 06	Año: 2024	Mes: 07	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
3		$3.546.668		32687929

2200

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1003092390	01	No	No	No	23	1	5711001	Fijo	DURANGO ACOSTA MAIRA ALEXANDRA	$3.000.000
CC-1102845741	01	No	No	No	23	1	1711001	Fijo	GUERRA PEREIRA ERIC JOSE	$1.300.000
CC-55227016	01	No	No	No	23	1	5711001	Fijo	ORTEGA OCHOA JANINI JOHANA	$1.300.000

NOVEDADES																																
dentificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
- 1003092390	X	2024-06-01	X	2024-06-19																									0		
- 1102845741	X	2024-06-01	X	2024-06-19																									0		
C - 55227016	X	2024-06-01	X	2024-06-19																									0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
entificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
- 1003092390	PROTECCION	19	$1.900.000	0.1600000	$304.000	$0	$0	$304.000	$0	$0	$0
- 1102845741	PROTECCION	19	$ 823.334	0.1600000	$131.800	$0	$0	$131.800	$0	$0	$0
- 55227016	COLPENSIONES	19	$ 823.334	0.1600000	$131.800	$0	$0	$131.800	$0	$0	$0

	SISTEMA GENERAL DE SALUD										SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
ntificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
1003092390	NUEVA E.P.S. S.A.	19	$1.900.000	0.0400000	$ 76.000	$0	0	$0	0	$0	19	$1.900.000	2	0.0052200	$10.000
1102845741	SALUD TOTAL	19	$ 823.334	0.0400000	$ 33.000	$0	0	$0	0	$0	19	$ 823.334	2	0.0052200	$4.300
- 55227016	SANITAS	19	$ 823.334	0.0400000	$ 33.000	$0	0	$0	0	$0	19	$ 823.334	2	0.0052200	$4.300

2201

APORTES PARAFISCALES

tificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
1003092390	COMFACOR	19	$1.900.000	0.0400000	$ 76.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
1102845741	COMFACOR	19	$ 823.334	0.0400000	$ 33.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
-55227016	COMFACOR	19	$ 823.334	0.0400000	$ 33.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 06

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

NISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
ENSIONES	1	$131.800	$0	$0	$0	$0	228	$21.000	$0	$0	$152.800
TECCION	2	$435.800	$0	$0	$0	$0	228	$69.300	$0	$0	$505.100

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

NISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESCLMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTE S COT	SUBTOT AL APORTE S	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
ALUD OTAL	1	$33.000	$0	0	$0	0	$0	$33.000	228	$5.300	$0	$38.300	$0	0	$0	$0	$38.300	$0	$0	$38.300
NITAS	1	$33.000	$0	0	$0	0	$0	$33.000	228	$5.300	$0	$38.300	$0	0	$0	$0	$38.300	$0	$0	$38.300
JEVA P.S. .A.	1	$76.000	$0	0	$0	0	$0	$76.000	228	$12.100	$0	$88.100	$0	0	$0	$0	$88.100	$0	$0	$88.100

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

NISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ITIVA	3	$18.600	0	$0	$0	$18.600	228	$3.000	$21.600	0	$0	$0	$21.600

2202

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFACOR	3	$142.000	228	$22.600	$164.600
SENA	0	$0	228	$0	$0
ICBF	0	$0	228	$0	$0
ESAP	0	$0	228	$0	$0
MinEdu	0	$0	228	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	$164.700
PENSIONES	2	$657.900
RIESGOS PROFESIONALES	1	$21.600
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$164.600
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$1.008.800

2203

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO

Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario
										Salario Básico
CC-1003248908	01	No	No	No	23	1	3711001	Fijo	DORIA LOZANO JESUS MANUEL	$1.300.000
CC-1007412868	01	No	No	No	23	1	5711001	Variable	DORIA LOZANO MERY STEFANY	$3.000.000
CC-22669148	01	No	No	No	8	1	1711001	Fijo	ESTRADA RINCON LUZ AIDA	$1.300.000
CC-1003717889	01	No	No	No	23	1	5711001	Variable	JIMENEZ HERNANDEZ ANA LUISA DE JESUS	$6.000.000

NOVEDADES

entificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
- 1003248908			X	2024-06-30																									0		
- 1007412868			X	2024-06-30																									0		
- 22669148																													0		
- 1003717889			X	2024-06-30																									0		
																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

entificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
- 1003248908	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
- 1007412868	COLPENSIONES	30	$3.000.000	0.1600000	$480.000	$0	$0	$480.000	$0	$0	$0
- 22669148	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
- 1003717889	PORVENIR	30	$6.000.000	0.1600000	$960.000	$0	$0	$960.000	$30.000	$30.000	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD / SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES

tificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
1003248908	EPS SURA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0696000	$90.500
1007412868	EPS SURA	30	$3.000.000	0.0400000	$120.000	$0	0	$0	0	$0	30	$3.000.000	2	0.0052200	$15.700
- 22669148	SANITAS	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	2	0.0052200	$6.800
1003717889	SALUD TOTAL	30	$6.000.000	0.0400000	$240.000	$0	0	$0	0	$0	30	$6.000.000	2	0.0052200	$31.400

2204

APORTES PARAFISCALES

tificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
1003248908	COMFACOR	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
1007412868	COMFACOR	30	$3.000.000	0.0400000	$120.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
-22669148	COMBARRANQUILLA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
1003717889	COMFACOR	30	$6.000.000	0.0400000	$240.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 06

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

NISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
RVENIR	1	$960.000	$0	$0	$30.000	$30.000	0	$0	$0	$0	$1.020.000
ENSIONES	3	$896.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$896.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

NISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NITAS	1	$52.000	$0	0	$0	0	$0	$52.000	0	$0	$0	$52.000	$0	0	$0	$0	$52.000	$0	$0	$52.000
ALUD OTAL	1	$240.000	$0	0	$0	0	$0	$240.000	0	$0	$0	$240.000	$0	0	$0	$0	$240.000	$0	$0	$240.000
SURA	2	$172.000	$0	0	$0	0	$0	$172.000	0	$0	$0	$172.000	$0	0	$0	$0	$172.000	$0	$0	$172.000

220

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
NISTRA ORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUID ACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONA LES	TOTAL PAGAR
ITIVA	4	$144.400	0	$0	$0	$144.400	0	$0	$144.400	0	$0	$0	$144.400

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFACOR	3	$412.000	0	$0	$412.000
COMBARRANQUILLA	1	$52.000	0	$0	$52.000
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	$464.000
PENSIONES	2	$1.916.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	$144.400
CAJAS DE COMPENSACIÓN	2	$464.000
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$2.988.400

2206

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 32437110
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-02-05

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	MANYEI INGENIERIA SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900065778	D.V.	5	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 3 11 07	DEPARTAMENTO	PUTUMAYO	MUNICIPIO	MOCOA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	MANYEIINGSAS@GMAIL.COM	TELÉFONO	7642638
FAX	7642638	SUCURSAL	1	NOMBRE SUCURSAL	MANYEI
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	55227016	PRIMER APELLIDO	ORTEGA	SEGUNDO APELLIDO	OCHOA
PRIMER NOMBRE	JANINI	SEGUNDO NOMBRE	JOHANA		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 12	Año: 2025	Mes: 01	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
6		$2.120.002		32437110

1 2025-02-05 13:02:53 ASOPAGOS SA -

207
