REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTOARAUCA

FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

REGISTRADURIA MUNICIPAL DE SARAVENA –ARAUCA



INFORME DE INTERVENTORIA PARA RECIBO A SASTIFACCION DEL DE OBRA
INFORME DE INTERVENTORIA
(PERIODO DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 31DE DICIEMBRE DE 2024)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 040 DE 2024

OBJETO: Interventoría técnica, administrativa, legal y financiera a las obras de "adecuación y mantenimiento de la sede de la Registraduría **Municipal de Saravena - Arauca**",

Interventoría: CONSORCIO AGK

CONTRATO DE OBRA No 039 DE 2024

OBJETO: Contratar bajo el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste "la adecuación y mantenimiento de la sede de la Registraduría Municipal de Saravena - Arauca", de conformidad con las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el proceso de SAMC No. 015 de 2024 - FRR y la PROPUESTA presentada por el **CONTRATISTA,** las cuales forman parte integral del contrato.

Contratista: MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS S.A.S

1. INTRODUCCION

El presente informe resume las actividades ejecutadas en el periodo comprendido entre el 13 de noviembre de 2024 y el 13 de diciembre de 2024 inherentes al contrato de obra No 039 de 2024 suscrito entre el FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL y la firma MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS S.A.S el cual tiene por objeto "Contratar bajo el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste "la adecuación y mantenimiento de la sede de la Registraduría Municipal de Saravena - Arauca", de conformidad con las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el proceso de SAMC No. 015 de 2024 - FRR y la PROPUESTA presentada por el **CONTRATISTA,** las cuales forman parte integral del contrato.

Hace parte también del presente informe, el resumen de las actividades realizadas por la interventoría a cargo de CONSORCIO AGK, en la ejecución del contrato celebrando mediante carta de aceptación electrónica No 040 - 2024 suscrito con FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL.

2. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

2.1 INFORMACIÓN PRELIMINAR DEL PROYECTO

La Registraduría Nacional del Estado Civil cuenta con un inmueble de su propiedad ubicado en la Carrera 16 # 28-45 en el municipio deSaravena– Arauca; inmueble de tres (3) plantas que en la actualidad se encuentra deteriorada por el uso continuo y requiere conurgencia actividades de mantenimiento que conserven su infraestructura física, proporcionen áreas de trabajo adecuadas para funcionarios y mejoren las condiciones al ciudadano mediantela adecuación de zonas para atención al colombiano que hace uso de los servicios ofrecidos por la Registraduría de este Municipio.
En razón a lo anterior, se considera prioritario intervenir con actividades de obra civil las instalaciones donde funciona la sede dela Registraduría Municipal de Saravena – Arauca, por cuanto, la misma en la actualidad presenta problemas de deterioro, también presenta problemas de cubierta, filtraciones, red hidrosanitaria en mal estado, carpintería metálica, mobiliario, resane y pintura de muros.

2.2 FIRMAS QUE INTERVIENEN EN EL PROYECTO

La ejecución del contrato de obra la realiza la firma MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS, la interventoría técnica, administrativa, legal y financiera a las obras de “adecuación y mantenimiento de la sede de la Registraduría Municipal de Saravena - Arauca”, está a cargo de Consorcio AGK.

2.3 LOCALIZACION

El proyecto objeto de estudio se encuentra localizado en el municipio de Saravena-Arauca, ubicado en la Carrera 16 # 28-45 cabecera municipal.

2.4 CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO.

El proyecto obras de mejoramiento y mantenimiento en la sede de la Registraduría Municipal de Saravena – Arauca consiste en el mejoramiento de su infraestructura física como son:

Actividades preliminares

- Concretos, morteros y pañetes

- Rellenos
- Mampostería
- Cubiertas
- Estructura en concreto
- Red sanitaria
- Instalaciones eléctricas
- Instalaciones hidráulicas y sanitarias
- Aparatos sanitarios
- pisos
- Carpintería en madera
- Carpintería metálica
- Pintura
- Fachadas

2.5 ALCANCE DEL PROYECTO.

Mediante la ejecución del proyecto se busca Todo lo anterior con el fin de brindar un mejor ambiente a los funcionarios y atención al público.

3.1 ESTADO INICIAL DE LAS OBRAS.

Las Instalaciones donde funciona la sede de la Registraduría municipal de Saravena– Arauca en la actualidad presenta problemas de humedades en los muros interiores y exterior, carece de un espacio para reuniones, iluminación deficiente debido a lámparas en mal estado.

3.CONTRATO DE OBRAS

3.2 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.:	039 de 2024
OBJETO:	Contratar bajo el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste "la adecuación y mantenimiento de la sede de la Registraduría Municipal de Saravena - Arauca", de conformidad con las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el proceso de SAMC No. 015 de 2024 - FRR y la PROPUESTA presentada por el **CONTRATISTA,** las cuales forman parte

	integral del contrato.
CONTRATISTA:	MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS S.A.S
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2024
FECHA DE INICIACION:	13 -11-2024
PRORROGA No 1	N/A
FECHA DE SUSPENSION No 1	N/A
FECHA DE REINICIO No 1	N/A
FECHA DE SUSPENSION No 2	N/A
FECHA DE REINICIO No 2	N/A
PRORROGA No 2	N/A
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 243.440.311
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 243.440.311

De acuerdo al balance de obra y las cantidades ejecutadas correspondiente al primer corte del 50% se tiene estipulado el valor del contrato por la suma de $ 243.440.311 a la fecha de finalización que corresponde al treinta y uno (31) de diciembrel de 2024.

3.3 ASPECTOS JURIDICOS

ACTAS ELABORADAS:

ACTAS	FECHA
ACTAS DE INICIO	Trece (13) de noviembre de 2024
ACTAS DE CAMBIO DE ESPECIFICACIONES	N/A
ACTAS DE TERMINACION DEL CONTRATO	N/A
ACTAS DE ENTREGA Y RECIBO PARCIAL DEL OBJETO CONTRACTUAL CORRESPONDIENTE AL 100% DE EJECUCION.	TREINTA Y UN DIAS (31) DE DICIEMBRE DE 2024.
ACTA DE COMPROMISO	N/A

LEGALIZACION DEL CONTRATO	FECHA
CONTRATO No 039 DE 2024 FRR	24 DE OCTUBRE DE 2024

CATORIOS, ACLARACIONES YMODIFICACIONES	FECHA
OTRO SI MODIFICATORIO	N/A

POLIZAS INICIALES					
ASEGURADORA	AMPAROS	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENT	VALOR ASEGURAD	ESTADO

			O	O	
Mundial de seguros CUMPLIMIENTO COQ-100004234	Cumplimiento	24-10-2024	30-06-2025	$ 48.688.062,20	Vigente
	Prestaciones sociales	24-10-2024	31-12-2027	$ 12.172.015,55	Vigente
	Estabilidad de obra	24-10-2024	03-05-2025	$ 48.688.062,20	Vigente
	Correcto funcionamiento	06-09-2024	06-01-2028	$ 48.688.062,20	Vigente
Mundial de seguros RCE COQ-100001067	Amparo básico - predios, labores y operaciones	24-10-2024	03-05-2025	$ 260.000.000	Vigente
	Patronal	24-10-2024	03-05-2025	$ 260.000.000	Vigente
	Contratista y subcontratistas	24-10-2024	03-02025	$ 260.000.000	Vigente
	Vehículos propios y no propios	24-10-2024	03-02025	$ 260.000.000	Vigente

3.4 DESARROLLO DEL CONTRATO

3.4.1 Comentarios Generales

Se suscribió el acta de inicio el día trece (13) de noviembre de 2024 dándose inicio formal a la entrega de requisitos y procedimientos para el desarrollo de los contratos.

Se realiza reunión en la sede de la Registraduría municipal de Saravena- Arauca para hacer el reconocimiento de la infraestructura física y las explicaciones para el desarrollo de las actividades del contrato de obra.

3.4.2 Resumen de las actividades ejecutadas por el contratista durante el periodo

Durante este periodo se ejecutaron actividades como preliminares, mampostería, estructuras en concreto, cubierta, cielo raso, instalaciones eléctricas, carpintería metálica, pañetes, pintura, rellenos, pisos, Se detalla a continuación el cuadro de ejecución y el porcentaje de avance de cada actividad.

ÍTEM	ACTIVIDAD	UN	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				
1.1.1	DESMONTE APARATOS SANITARIOS, INCLUYE CARGUE Y RETIRO	un	3.00	5,879	17,637
1.1.2	DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS EN TODO TIPO DE MATERIAL Y POSTERIOR REINSTALACIÓN SI SE REQUIERE	un	6.00	8,819	52,914
1.1.3	DEMOLICIÓN MUROS 0.15-0.25 M, INCLUYE CARGUE Y RETIRO	m²	5.00	14,698	73,490
1.1.4	DEMOLICIÓN DE PLACA MACIZA	un	1.00	62,430	62,430
1.1.5	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PISOS, INCLUYE CARGUE Y RETIRO	m²	10.00	11,326	113,260
1.1.6	DESMONTE Y RETIRO DE FLANCHES, CANALES Y BAJANTES. INCLUYE CARGUE Y RETIRO	m	21.00	7,769	163,149

1.1.7	DEMOLICIÓN DE PAÑETES, INCLUYE CARGUE Y RETIRO	m²	20.00	7,582	151,640
1.1.8	DESMONTE DE MANTO IMPERMEABILIZANTE INCLUYE CARGUE Y RETIRO.	m²	135.00	15,461	2,087,235
1.1.9	LIMPIEZA DE CANALES,BAJANTES Y SIFONES INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES	ml	28.00	7,359	206,052
1.1.10	DESMONTE , LIMPIEZA, TRASLADO Y REUBICACIÓN DE CONDENSADORAS Y AIRES ACONDICIONADOS INCLUYE MATERIALES Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN.	un	1.00	332,337	332,337
1.1.11	DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA.(INCLUYE ESTRUCTURA, CABALLETE , CARGUE Y RETIRO)	m²	25.00	27,226	680,650
1.1.12	DESMONTE DE LÁMPARAS INCRUSTADAS Y/O SOBREPUESTAS, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL	un	8.00	11,373	90,984
1.1.13	EXCAVACIÓN MANUAL	m³	0.50	170,359	85,180
3 MAMPOSTERÍA					
3.1	ALFAJIA EN CONCRETO 0.20	m	30.00	63,426	1,902,780
3.2	MUROS SUPERBOARD DOBLE CARA E/12.ESPESOR 8mm, INCLUYE MASILLA CON SUPERMASTICK, PINTURA VINILO 3 MANOS, ACCESORIOS Y SOPORTES.	m²	2.00	117,965	235,930
3.3	MURO EN BLOQUE NO. 5	m²	3.00	34,450	103,350
4.1	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**				
4.1.1	PLACA DE CONTRA PISO	m²	20.00	133,310	2,666,200
4.1.2	PASAPLACA CON ROTO MARTILLO PARA BAJANTES DE 4" EN PLACA DE CONCRETO DE 25 A 30 CMS. INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS.	un	8.00	754,003	6,032,024
5.1	**CUBIERTAS**				
5.1.1	TEJA EN POLICARBONATO ALVEOLAR GRIS DE 8 mm.	m²	5.00	86,829	434,145
5.1.2	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 28 D/0.25 a 0.50 SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EPOXICO IGUAL O SIMILAR A SIKAFLEX 1A.	ml	25.00	35,628	890,700
5.1.3	MANTO IMPERMEABILIZANTE CON FOIL DE ALUMINIO DE 3mm SUPERIOR O IGUAL AL MANTO ZATAL 600X1 DE FIBERGLASS PARA PLACA DE VIGA CANAL INCLUYE RESANE DE FISURAS CON SIKA GRAAUT, PLACO K86 E IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA	m²	100.00	52,659	5,265,900
5.1.4	BAJANTES DE 4"	ml	50.00	49,078	2,453,900
5.1.5	REJILLA 5X3 TRAGANTE CÚPULA PLÁSTICA	un	4.00	20,168	80,672
5.1.6	TEJA TERMOACÚSTICA TRAPEZOIDAL	m²	50.00	73,950	3,697,500
5.1.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 22 D=1,00 m, INCLUYE ANDAMIO Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PINTURA WASPRIMER Y DOS MANOS DE ESMALTE PARA EXTERIORES.	ml	4.49	152,544	684,923
5.1.8	PERGOLA ENTRADA PRINCIPAL EN ALUMINIO NEGRO Y POLICARBONATO ALVEOLAR GRIS, CON ESTRUCTURA METÁLICA.	m²	8.00	631,867	5,054,936
5.1.9	MARQUESINA ENTRADA PRINCIPAL	m²	5.00	645,909	3,229,545
7.1	**ENCHAPES Y ACCESORIOS**				
7.1.1	TAPAS REGISTRO PLASTICA 20X20	un	1.00	13,047	13,047
7.1.2	ESPEJO DECORATIVO CIRCULAR 60 CM DE 4 mm DE ESPESOR., INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y MARCO EN MADERA O METAL.	un	3.00	163,817	491,451
7.1.3	CERÁMICA FORMATO 33CM X 60CM PARA BAÑOS Y COCINETA.	m²	30.00	58,474	1,754,220
7.1.4	CERRADURA PARA PUERTA DE OFICINAS IGUAL O SUPERIOR A YALE.	un	3.00	47,071	141,213
8.1	**RED SANITARIA**				
8.1.1	TUBERÍA DESAGUE PVC SANITARIA 4", INCLUYE ACCESORIOS.	ml	5.00	42,741	213,705
8.1.2	CAJAS INSPECCIÓN 60 X 60 X 60 cm.	un	2.00	390,324	780,648
8.1.3	CAJAS INSPECCIÓN 80 X 80 X 80 cm.	un	1.00	563,621	563,621

8.1.4	PUNTO SANITARIO PVC DE 4". INCLUYE ACCESORIOS.	un	1.00	102,165	102,165
8.1.5	TUBERÍA DESAGUE PVC SANITARIA 3", INCLUYE ACCESORIOS.	m	3.00	28,043	84,129
8.1.6	PUNTO SANITARIO PVC DE 3". INCLUYE ACCESORIOS.	un	1.00	88,605	88,605
8.1.7	RED SANITARIA COLECTORA DE 6"	m	4.00	69,011	276,044
8.1.8	RED SANITARIA COLECTORA DE 8"	m	4.00	121,883	487,532
9.1	**RED ELÉCTRICA**				
9.1.1	LUMINARIAS. LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 60X60 + MARCO DE SOBREPONER LUZ BLANCA 6500°K, 48W MULTIVOLTAJE.	un	10.00	107,526	1,075,260
9.1.2	SALIDA ELÉCTRICA PARA ILUMINACIÓN,	un	7.00	30,537	213,759
9.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO DE RED ELÉCTRICA THWN (3#12) AWG TENDIDO EN TUBERÍA DIFERENTES DIÁMETROS	m	200.00	5,279	1,055,800
9.1.4	REPARACIONES DE PUNTOS ELÉCTRICOS EXISTENTES. (INCLUYE CAMBIOS DE TOMAS, INTERRUPTORES, PLAFONES, CABLEADO)	un	10.00	20,006	200,060
9.1.5	LED DECO PISO 3W. 100-240V. Igual o superior a Sylvania.Cod: P28392-36.Luminarias de Piso.	un	2.00	86,477	172,954
9.1.6	LED REFLECTOR JETA 100W DL. Igual o superior a Sylvania.Cod: P24200-36.Luminarias Exteriores	un	2.00	309,902	619,804
9.1.7	LUMINARIA TIPO PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR O SOBREPONER + LUZ BLANCA 6500°K, 18W	un	6.00	28,484	170,904
9.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO DE RED ELÉCTRICA THWN (3#10) AWG TENDIDO EN TUBERÍA DIFERENTES DIÁMETROS	m	100.00	5,825	582,500
9.1.9	DIAGNÓSTICO Y GENERACIÓN DE CONEXIÓN DE TODO EL EDIFICIO A LA RED ADICIONAL DISEÑADA PARA LA PLANTA ELÉCTRICA. INCLUYE ACCESORIOS Y TODO LO REQUERIDO.	glb	1.00	1,404,150	1,404,150
9.1.10	FAROL ENTRADA PRINCIPAL	un	1.00	514,872	514,872
9.1.11	TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4 INCRUSTADA, INCLUYE REGATA, RESANE Y TUBERÍA.	m	60.00	17,708	1,062,480
10.1	**CARPINTERÍA EN MADERA**				
10.1.1	HOJA PARA PUERTA EN MADERA DE DIFERENTE ANCHOS, INCLUYE CERRADURA, MARCO Y ACABADOS SEMILUSTRE.	un	6.00	327,635	1,965,810
10.1.2	MUEBLES COCINA SUPERIOR E INFERIOR	un	1.00	1,253,427	1,253,427
10.1.3	ADAPTACIÓN PARA ALMACENAMIENTO EN FACHADA Y PARTE POSTERIOR EN LOS DOS PISOS Y MUEBLE PARA DEPÓSITO	glb	1.00	842,490	842,490
11.1	**CARPINTERÍA METÁLICA**				
11.1.1	ARCHIVADORES RODANTES	un	3.00	1,076,702	3,230,106
11.1.2	MANTENIMIENTO VENTANAS EXISTENTES (Incluye cambio de los elementos necesarios para su correcto funcionamiento)	un	10.00	48,958	489,580
11.1.3	VENTANA EN ALUMINIO FIJAS O CORREDIZAS CORREDIZA (Incluye vidrio 5 MM), ACABADO NEGRO.	m²	40.00	225,160	9,006,400
11.1.4	REJA ARQUITECTONICA PARA FACHADA, PARA ANTEJARDÍN	m²	18.00	219,983	3,959,694
11.1.5	REJA ARQUITECTONICA PARA PUERTAS Y VENTANAS	m²	15.00	173,178	2,597,670
11.1.6	PUERTA METALICA DE DOS HOJAS PARA SALA DE ESPERA SEGUNDO PISO (Incluye marco, anclajes, cerradura de seguridad de manija, anticorrosivo , vidrios tipo espejo y pintura)incluye mamparas laterales y superior	un	1.00	1,170,125	1,170,125
11.1.7	PUERTA METALICA DE DOS HOJAS PARA SALA DE JUNTAS (Incluye marco, anclajes, cerradura de seguridad de manija, anticorrosivo , vidrios tipo espejo y pintura)	un	1.00	889,444	889,444
11.1.8	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE DOS HOJAS METÁLICA PARA PATIO. INCLUYE INSTALACIÓN DE CHAPA Y VIDRIOS.	un	1.00	374,440	374,440
11.1.9	KIT ASTA BANDERAS EN ALUMINIO, PARA DOS BANDERAS INCLUYE SOPORTES, REMATES SUPERIORES DORADOS,	un	1.00	795,685	795,685

	BANDERAS DE COLOMBIA Y REGISTRADURÍA NACIONAL, 4 MOSQUETONES CADA BANDERA, DOS JUEGOS DE TORNILLOS, DOS CUERDAS DE SEGURIDAD, DOS LÁMINAS EN PVC, COLOR A DEFINIR E INSTALACIÓN.				
11.1.10	MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN PUERTA PRINCIPAL EN VIDRIO TEMPLADO DE SEGURIDAD 10 MM, INCLUYE TODO EL SISTEMA SOPORTE EN ACERO INOXIDABLE, MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE, BISAGRA HIDRÁULICA, PIVOTE, ZÓCALO Y CHAPAS EN EL CENTRO Y ZÓCALO, TAMBIEN INCLUYE EL FROZEN (PELICULA PARA VIDRIO), EL DISEÑO DE ESTE LO DETERMINA LA SUPERVISIÓN. DEBE QUEDAR NIVELADA Y FUNCIONANDO EN OPTIMAS CONDICIONES	un	1.00	2,106,225	2,106,225
11.1.11	PUERTA DE SEGURIDAD PARA INGRESO AUXILIAR	un	1.00	1,404,150	1,404,150
11.1.12	BARANDA EN ACERO INOXIDABLE PARA ESCALERAS. INCLUYE INSTALACIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS.	m	10.00	267,069	2,670,690
12.1	**PINTURA**				
12.1.1	ESTUCO PLÁSTICO, SOBRE MUROS INTERIORES	m²	50.00	35,550	1,777,500
12.1.2	ESTUCO EXTERIORES PLÁSTICO	m²	40.00	35,550	1,422,000
12.1.3	RESANE, LIJADA Y PINTURA 3 MANOS SOBRE MUROS INTERIORES, CON VINILO IGUAL O SUPERIOR A VINILTEX TIPO 1.	m²	1030.00	18,841	19,406,230
12.1.4	RESANE, LIJADA Y PINTURA 3 MANOS SOBRE MUROS EXTERIORES, CON VINILO IGUAL O SUPERIOR AL TIPO KORAZA IMPERMEABLE	m²	160.00	20,975	3,356,000
12.1.5	PINTURA BITUMINOSA	m²	1.00	22,296	22,296
12.1.6	RESANE, LIJADA Y ESMALTE IGUAL O SUPERIOR A PINTUCO 3 MANOS PARA ORNAMENTACIÓN METÁLICA, INCLUYE MARCOS, PUERTAS, VENTANAS Y REJAS.	m²	30.00	18,364	550,920
12.1.7	RESANE, LIJADA Y BARNIZ O LACA IGUAL O SUPERIOR A PINTUCO PARA CARPINTERÍA EN MADERA, INCLUYE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS.	m²	30.00	14,179	425,370
12.1.8	RESANE, LIJADA Y PINTURA 3 MANOS BAJO PLACA, CON VINILO IGUAL O SUPERIOR A VINILTEX TIPO 2.	m²	320.00	14,179	4,537,280
12.1.9	GRANIPLAST PARA EXTERIORES	m²	15.00	29,692	445,380
13.1	**CONCRETO - MORTEROS Y PAÑETES**				
13.1.1	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3	m²	60.00	33,112	1,986,720
13.1.2	PAÑETE LISO MUROS 1:3 DE 1.5 A 2 CMS.,INCLUYE DILATACIONES	m²	30.00	23,519	705,570
13.1.3	MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	m³	0.05	651,871	32,594
15.1	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**				
15.1.1	RELLENO EN RECEBO COMÚN	m³	1.50	113,176	169,764
15.1.2	RELLENO EN RECEBO B-600	m³	1.50	126,630	189,945
16.1	**SUBCAPITULO ADICIONALES**				
16.1.1	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 24000 BTU, IGUAL O SUPERIOR A LG TECNOLOGÍA INVERTER, INCLUYE INSTALACIÓN Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN	un	2.00	3,660,257	7,320,514
16.1.2	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 12000 BTU, IGUAL O SUPERIOR A LG TECNOLOGÍA INVERTER, INCLUYE INSTALACIÓN Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN	un	2.00	1,460,316	2,920,632
16.1.3	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 9000 BTU, IGUAL O SUPERIOR A LG TECNOLOGÍA INVERTER, INCLUYE INSTALACIÓN Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN	un	2.00	1,123,320	2,246,640
16.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL JAPONÉS.	m²	40.00	159,137	6,365,480
16.1.5	PUESTO DE TRABAJO PARA SEIS FUNCIONARIOS EN FORMA "LINEAL" CON ESTRUCTURA METÁLICA Y SUPERFICIE EN	un	1.00	3,788,864	3,788,864

	TÁBLEX Y FÓRMICA.				
16.1.6	SUMINISTRO Y ADECUACION ARBORIZACION PARA JARDINERA (Incluye retiro y suministro de tierra y siembra de prado, plantas y materas)	glb	1.00	331,532	331,532
16.1.7	SILLA CON RUEDAS Y BRAZOS GIRATORIA PARA FUNCIONARIOS	un	6.00	438,445	2,630,670
16.1.8	ESTUCO VENECIANO	m²	10.00	23,797	237,970
16.1.9	SUPERFICIE DE TRABAJO EN AGLOMERADO DE 30mm, INCLUYE FORMICA f8, BALANCE INFERIOR f6, CANTO TERMOFUNDIDO, PASACABLES Y ELEMENTOS DE SOPORTE PARA DAR ESTABILIDAD Y RIGIDEZ MODULAR A LOS PUESTOS DE TRABAJO, EN EL MESÓN DE ATENCIÓN.	m²	5.00	644,972	3,224,860
16.1.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISO DE 3.0 X 0.7 M, EN LONA FLEXIBLE CON PERFILES EN ALUMINIO, SEGÚN NORMA DEL DNP, PARA COLOCAR EN LA FACHADA	un	1.00	702,861	702,861
16.1.11	BIBLIOTECA	un	1.00	698,100	698,100
16.1.12	SILLA TIPO GERENCIAL	un	1.00	885,320	885,320
16.1.13	TABLEROS PARA OFICINA DE 80X120 CM, EN VIDRIO	un	2.00	280,830	561,660
16.1.14	CARTELERA EN CORCHO DE 60X100 CM	un	1.00	111,395	111,395
16.1.15	AVISOS PARA SEÑALIZACIÓN DE 11X30 CM EN ACRÍLICO	un	25.00	12,637	315,925
16.1.16	CAMILLA PRIMEROS AUXILIOS	un	1.00	156,235	156,235
16.1.17	ATRIL ACRÍLICO CON ESTANTE	un	1.00	561,660	561,660
16.1.18	SILLA INTERLOCUTORA COLOR NEGRO	un	2.00	375,301	750,602
16.1.19	ESCRITORIO GERENCIAL	un	1.00	2,031,440	2,031,440
16.1.20	MESA DE REUNIONES 2.36 x 1.10m, PARA 8 PUESTOS	un	1.00	2,537,178	2,537,178
16.1.21	SILLA GIRATORIA PARA MESA DE REUNIONES CON RUEDAS Y BRAZOS	un	8.00	294,946	2,359,568
16.1.22	MESA ALTA TIPO BANCARIA PARA ÁREA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	un	1.00	421,245	421,245
16.1.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TV DE 60" TIPO SMART IGUAL O SUPERIOR A SAMSUNG	un	1.00	2,106,225	2,106,225
16.1.24	EXTRACTOR EÓLICO DE TURBINA CON ASPA DE SUCCIÓN.	un	1.00	1,123,320	1,123,320
21.1	**RED HIDRÁULICA**				
21.1.1	TUBERÍA PVC PRESIÓN 1/2" INCRUSTADA INCLUYE ACCESORIOS, REGATA Y RESANE.	ml	10.00	10,782	107,820
21.1.2	TUBERÍA PVC PRESIÓN 3/4" INCRUSTADA	m	4.00	14,311	57,244
21.1.3	CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PLÁSTICO, TUBERÍA PVC, ENTRADA 1/2" Y SALIDA 1", INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS DE CONEXIÓN.	un	1.00	718,423	718,423
21.1.4	REJILLAS SOSCO 3X2	un	2.00	7,539	15,078
21.1.5	REGISTRO 1/2" PASO DIRECTO IGUAL O SIMILAR A RED WHITE. INCLUYE ACCESORIOS.	un	1.00	66,430	66,430
21.1.6	PUNTOS DE AGUA FRÍA 1/2" INCRUSTADO. INCLUYE ACCESORIOS, REGATA Y RESANE.	un	3.00	31,837	95,511
21.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE	un	1.00	300,006	300,006
25.1	**APARATOS SANITARIOS**				
25.1.1	COMBO SANITARIO ASMART , INCLUYE MUEBLE BÁSICO CASCADE, GRIFERÍA DE ENTRADA, SALIDA Y ACOPLE, 2 GANCHOS, JABONERA Y PORTA ROLLO.	un	1.00	1,156,428	1,156,428

25.1.2	COMBO ALUVIA	un	1.00	587,516	587,516
25.1.3	REINSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS	un	2.00	24,386	48,772
27.1	**PISOS**				
27.1.1	ALISTADO PISOS e = 0.04 m	m²	110.00	23,510	2,586,100
27.1.2	PISO TABLETA EN GRES TIPO CÚCUTA PARA LAS TERRAZAS	m²	110.00	47,804	5,258,440
27.1.3	ADECUACIÓN RAMPA DE ACCESO A PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA.	m²	1.50	206,505	309,758
27.1.4	DILATACIÓN CON DISCO DE PULIDORA SOBRE GUARDAESCOBAS	ml	25.00	6,768	169,200
27.1.5	MANTENIMIENTO PISO EN GRANITO DE MARMOL INCLUYE (RESTAURACIÓN DE GRIETAS Y DAÑOS EN LA SUPERFICIE, DESMANCHAR, PULIDA , CRISTALIZADA, SELLADO Y BRILLADO).	m²	285.00	37,444	10,671,540
27.1.6	BALDOSA EN GRANITO DE MARMOL IGUAL O SIMILAR AL EXISTENTE.	m²	30.00	65,527	1,965,810
27.1.7	PISO EN PORCELANATO	m²	20.00	88,090	1,761,800
9999.1	**SUBCAPITULOS ADICIONALES**				
9999.1.1	PUNTO CERTIFICADO DE VOZ, DATOS, C. REG. Y C. NOR, INCLUYE TROQUEL DE 3 ORIF., JACK, RJ 45, PATCH CORD 3 M, LIBRO ETIQUET, F. PLATE, W. PLATE, TOMAS NAR. Y BEIGE, IDENTIF EN PUESTO DE TRABAJO, TABLEROS Y RACK CON ANILLOS DEXON Y CABLEADO.	un	2.00	117,360	234,720
9999.1.2	CABLE UTP CAT 6 TENDIDO	ml	7.00	7,803	54,621
9999.1.3	CABLE TRENZADO CORRIENTE REGULADA (3#12) TENDIDO EN CANALETA	ml	7.00	12,226	85,582
9999.1.4	CABLE PARA CORRIENTE NORMAL TENDIDO EN CANALETA 3 # 12	ml	7.00	12,367	86,569
9999.1.5	REUBICACIÓN DE PUNTOS DE VOZ, DATOS, CORRIENTE REGULADA Y CORRIENTE NORMAL, INCLUYE DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE MATERIALES, GARANTIZANDO EL FUNCIONAMIENTO DEL PUNTO REUBICADO.	un	1.00	77,034	77,034
9999.1.6	CANALETA METÁLICA 10X5 CON DIVISIÓN Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN .	ml	10.00	71,881	718,810
19.1	**HONORARIOS**				
19.1.1	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL ENTREGA DE OBRA, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES.	glb	1.00	283,837	283,837
COSTO DIRECTO					**188,508,836**
% Total Oficial del A.I.U. (27%)		ADMINISTRACIÓN		19.00%	35,816,679
		IMPREVISTOS		2.00%	3,770,177
		UTILIDAD		6.00%	11,310,530
Costo Directo Incluido A.I.U.					
I.V.A. (SOBRE LA UTILIDAD 19%)				19.00%	2,149,001
TRANSPORTE				1.00%	1,885,088.36
Valor Total del Presupuesto (Incluido A.I.U. e I.V.A. sobre la utilidad)					**243,440,311.36**

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.

CARGO	CANTIDAD	AFILIACION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
Residente de obra	1	si
Oficiales de construcción	3	si
Ayudante de construcción	7	si

4. CONTRATO DE INTERVENTORIA

4.1 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.:	040 DE 2024
OBJETO:	Interventoría técnica, administrativa, legal y financiera a las obras de "adecuación y mantenimiento de la sede de la Registraduría **Municipal de Saravena - Arauca**", de conformidad con las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el proceso de Mínima cuantía de la invitación pública No. 16 de 2024 y la **Propuesta** presentada por el **CONTRATISTA,** las cuales forman parte integral del contrato.
CONTRATISTA:	CONSORCIO AGK
FECHA DE INICIO:	13-11-2024
PRORROGA No 1	N/A
FECHA DE SUSPENSION No 1	N/A
FECHA DE REINICIO No 1	N/A
FECHA DE SUSPENSION No 2	N/A
FECHA DE REINICIO No 2	N/A
PRORROGA No 2	N/A
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$13.111.021
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$13.111.021

4.2 ASPECTOS JURIDICOS

ACTAS ELABORADAS:

ACTAS	FECHA
ACTAS DE INICIO	13 DE NOVIEMBRE DE 2024
ACTAS DE CAMBIO DE ESPECIFICACIONES	N/A
ACTAS DE TERMINACION DEL CONTRATO	N/A
ACTAS DE ENTREGA Y RECIBO PARCIAL DEL OBJETO CONTRACTUAL CORRESPONDIENTE AL 100% DE EJECUCION.	31 DE DICIEMBRE DE 2024

LEGALIZACION DEL CONTRATO	FECHA
CONTRATO No 040 DE 2024	24 DE OCTUBRE DE 2024

TORIOS, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES	FECHA
OTRO SI MODIFICATORIO	

POLIZAS INICIALES					
ASEGURADORA	AMPAROS	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	ESTADO
SEGUROS DEL ESTADO 14-44-10222348	Cumplimiento	13-11-2024	20-07-2025	$ 1.311.102,10	Vigente
	Pago salarios prestaciones	13-11-2024	20-01-2028	$ 655.551,05	Vigente
	Calidad del servicio	13-11-2024	20-07-2025	$ 1.311.102,10	Vigente

4.3 COMENTARIOS GENERALES

El contrato de interventoría se inició el día trece (13) de noviembre de 2024 a partir de la fecha de inicio del contrato de interventoría se ha realizado el seguimiento, control y vigilancia de las obras para la ejecución del proyecto.
La fecha de terminación del proyecto está prevista para el día 31 de diciembre de 2024.

4.4 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORIA.

Durante el periodo comprendido del 13 de noviembre de 2024 al 31 de diciembre de 2024 para la supervisión de las actividades de ejecución de las obras la interventoría a dispuesto de personal profesional y técnico necesario para controlar la ejecución del mismo realizando el seguimiento al proceso constructivo, materiales de obra, señalización de obra, afiliaciones del personal a seguridad social.
Se realizó en conjunto con el residente de obra e interventoría el balance de obra para determinar el alcance real del proyecto.

CONCLUSIONES

Durante el período de ejecución correspondiente al presente informe, se alcanzó un avance físico del 100%, cumpliendo con las especificaciones técnicas, normativas y plazos establecidos en el cronograma.

Se llevaron a cabo actividades administrativas, operativas, financieras y ambientales en cumplimento a las disposiciones contractuales

OLGA CAROLINA RICO TRASLAVIÑA
R/L Consorcio AGK
Interventoria

CONSORCIO AGK
Nit: 901.877.590-6

REGISTRO FOTOGRÁFICO







Dirección: Calle 60ª # 3D-45
Correo electrónico: consorciodsa2023@gmail.comTeléfono: 3153184473
Ciudad: Bogotá D.C

CONSORCIO AGK
Nit: 901.877.590-6





Dirección: Calle 60ª # 3D-45
Correo electrónico: consorciodsa2023@gmail.comTeléfono: 3153184473
Ciudad: Bogotá D.C

CONSORCIO AGK
Nit: 901.877.590-6











Dirección: Calle 60ª # 3D-45
Correo electrónico: consorciodsa2023@gmail.comTeléfono: 3153184473
Ciudad: Bogotá D.C

CONSORCIO AGK
Nit: 901.877.590-6















Dirección: Calle 60ª # 3D-45
Correo electrónico: consorciodsa2023@gmail.comTeléfono: 3153184473
Ciudad: Bogotá D.C

CONSORCIO AGK
Nit: 901.877.590-6





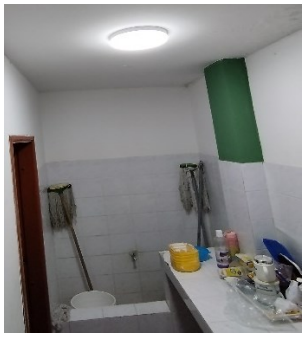

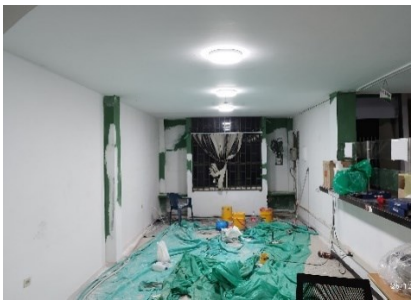








Dirección: Calle 60ª # 3D-45
Correo electrónico: consorciodsa2023@gmail.comTeléfono: 3153184473
Ciudad: Bogotá D.C

CONSORCIO AGK
Nit: 901.877.590-6





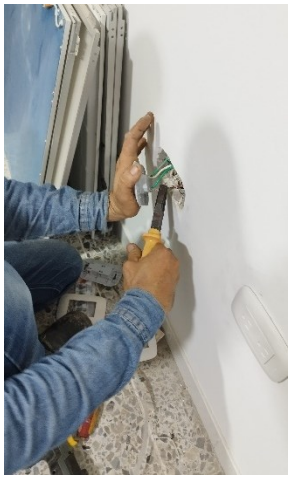





Dirección: Calle 60ª # 3D-45
Correo electrónico: consorciodsa2023@gmail.comTeléfono: 3153184473
Ciudad: Bogotá D.C


CONSORCIO AGK
Nit: 901.877.590-6











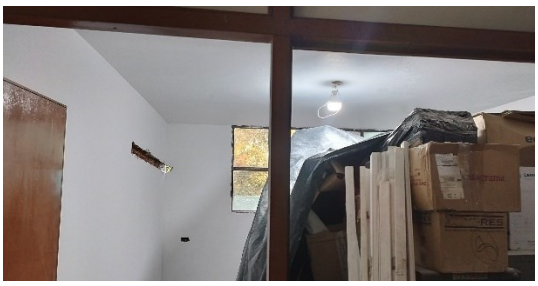

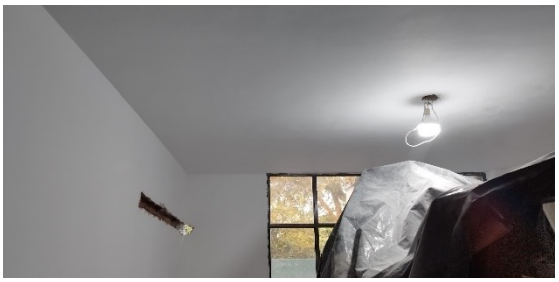

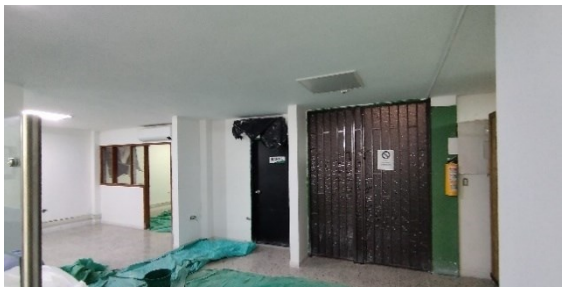

Dirección: Calle 60ª # 3D-45
Correo electrónico: consorciodsa2023@gmail.comTeléfono: 3153184473
Ciudad: Bogotá D.C

CONSORCIO AGK
Nit: 901.877.590-6















Dirección: Calle 60ª # 3D-45
Correo electrónico: consorciodsa2023@gmail.comTeléfono: 3153184473
Ciudad: Bogotá D.C

NP - ITEM NO PREVISTOS

NP2. DESMONTE Y REUBICACION DE ACOMETIDA PRINCIPAL DE RED ELECTRICA. INCLUYE DUCTOS, CABLE, CAJA PARA CONTADOR, REGATAS, RESANES Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA CORRECTA REUBICACION

Se realiza el desmonte de la caja del contador y el contador existente, los cuales se encuentran en mal estado y deben también deben ser reubicados por recomendación del prestador del servicio, ENELAR ESP.

Se realizan las regatas en muros, demolición de pisos y excavación para instalación de tuberías de la acometida y la puesta a tierra, se reubica la transferencia para la planta eléctrica, se reubica la caja nueva del contador en la reja exterior, y se reinstala el cableado eléctrico garantizando asi el fluido eléctrico en el edificio. Se realiza sub-acometida para taleros de aires acondicionados y para tablero de transferencia.







NP3. INSTALACION DE TABLERO PARA AIRES ACONDICIONADOS. INCLUYE BREAKER, PROTECCIONES, CABLE, DUCTOS, TABLERO, CAJA, REGATA, RESANE Y TODOS LOS ACCESORIO NECESARIOS PARA CORRECTA INSTALACION

Se realizan las regatas en muros para instalación de tuberías de la acometida, se instala caja y tablero nueva y cableado para instalación de breakes y protecciones solo para los 9 puntos de aires acondicionados de todo el edificio.

CONSORCIO AGK
Nit: 901.877.590-6





Dirección: Calle 60ª # 3D-45
Correo electrónico: consorciodsa2023@gmail.comTeléfono: 3153184473
Ciudad: Bogotá D.C

CONSORCIO AGK

NIT 901877590-6
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764085349200
Fecha 13/12/2024 - 13/12/2026
Autorización de Facturación Electrónica del CAGK1 al CAGK100
Email: grupoempresarialkatios@gmail.com
Teléfono: 3153184473

Departamento	Fecha		
Bogotá	30	12	2024

FACTURA DE VENTA NACIONAL

N° CAGK2

Cliente:	FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA	**NIT:**	899999737	**Fecha de firmado:**	
Dirección:	AV 56 51 50	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	2200815
Email:	schacon@registraduria.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Transferencia Débito
Vencimiento:	Diciembre 31 del 2024	**Hora emisión:**	17:44:53-05:00	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	31/12/2024				

Total de Lineas: 1

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	001	1,00	Interventoría técnica, administrativa, legal y financiera a las obras de ?adecuación y mantenimiento de la sede de la Registraduría Municipal de Sarav PAGO 40%	94	IVA	19%	837342.52	$4.407.065,88	$4.407.065,88

Notas:

SON: (cinco millones doscientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos ocho pesos cuarenta centavos)
CUFE:

Subtotal:	$4.407.065,88
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$837.342,52
Total:	$5.244.408,40

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$4.407.065,88	19,00%	$837.342,52

Firma Digital:

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901877590-6	CONSORCIO AGK	CALLE 27 # 17-39	3153184473	consorcioagk@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	A – Más de 200 cot		ARAUCA	SARAVENA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-11	E		82627370	$346.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	97.500	0		0		0	0	0	0	97.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	124.800	0	0	0	0	0	0		124.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	54.300				54.300	0	0	54.300			543	54.300	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF67	Comfiar - Arauca	800219488-4	31.200	0	0	31.200	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
15.600	0	0	15.600	1
ICBF				
23.400	0	0	23.400	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	97.500	97.500
Pensión	1	124.800	124.800
Riesgos Laborales	1	54.300	54.300
CCF	1	31.200	31.200
ESAP	0	0	0
ICBF	1	23.400	23.400
MEN	0	0	0
SENA	1	15.600	15.600
TOTALES	6	346.800	346.800

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901877590-6	CONSORCIO AGK		CALLE 27 # 17-39	3153184473	consorcioagk@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	A – Más de 200 cot			ARAUCA	SARAVENA	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-11	E		82627370	$346.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Economiado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	80807980	DOMINGUEZ CASTIBLANCO WILSON ANDRES	1	0			N	X																230301	780.000	124.800	0	0	0	0	EPS017	780.000	97.500	14-11	780.000	5	54.300	CCF67	780.000	31.200	780.000	15.600	23.400	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información
