

Id	Modo de tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	Sucesoras
1		**MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL**	**66 días**	**lun 25/08/25**	**lun 24/11/25**	**$1.363.937.559,24**		
2		Firma acta de inicio	0 días	lun 25/08/25	lun 25/08/25	$0,00		7FC+8 días;57FC+
3		Reunión presentación requisitos entidad	1 día	lun 25/08/25	lun 25/08/25	$0,00	2CC	4
4		Presentación documentación contractual	12 días	mar 26/08/25	mié 10/09/25	$0,00	3	5
5		Aprobación documentación de inicio	0 días	mié 10/09/25	mié 10/09/25	$0,00	4	11;75;143;181;27
6		**UBATE**	**47 días**	**jue 4/09/25**	**vie 7/11/25**	**$45.992.146,75**		
7		VISITA INICIAL	1 día	jue 4/09/25	jue 4/09/25	$0,00	2FC+8 días	8
8		APROBACIÓN PERSONAL	3 días	vie 5/09/25	mar 9/09/25	$0,00	7	9
9		APROBACIÓN PRESUPUESTO INTERVENTORIA Y ENTIDAD	3 días	mié 10/09/25	vie 12/09/25	$0,00	8	11FC+6 días
10		**PRELIMINARES**	**33 días**	**mar 23/09/25**	**jue 6/11/25**	**$4.136.581,97**		
11		DESMONTE DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	2 días	mar 23/09/25	mié 24/09/25	$154.996,56	9FC+6 días;5	13;55;45
12		DESMONTE DE CUBIERTA	1 día	lun 29/09/25	lun 29/09/25	$353.049,49	13	23;55;45
13		RECORRIDO DE CUBIERTA TEJA ONDULADA	2 días	jue 25/09/25	vie 26/09/25	$2.912.417,02	11	12;42CC;55;45
14		GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL	1 día	jue 6/11/25	jue 6/11/25	$716.118,90	45	55
15		**CARPINTERÍA METÁLICA**	**4 días**	**lun 27/10/25**	**jue 30/10/25**	**$3.262.663,23**		
16		PELÍCULA ANTIREFLEJO DE SEGURIDAD 4 MICRAS	1 día	lun 27/10/25	lun 27/10/25	$1.791.063,42	52	17CC;55;45
17		MARCO METÁLICO PARA PUERTA DE 0,76-1,10M	2 días	lun 27/10/25	mar 28/10/25	$356.899,38	16CC	18;55;45
18		PUERTA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 16	2 días	mié 29/10/25	jue 30/10/25	$1.114.700,43	17	55;45
19		**CONCRETOS Y MORTEROS**	**4 días**	**lun 6/10/25**	**jue 9/10/25**	**$4.241.868,98**		
20		PAÑETE LISO BAJA PLACA 1:4 E=2CM. Incluye Filos y Dilataciones	3 días	lun 6/10/25	mié 8/10/25	$1.835.587,08	39;40	26;55;45
21		PAÑETE MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO E=3CM. Incluye Filos y Dilataciones	4 días	lun 6/10/25	jue 9/10/25	$2.406.281,90	39;40	26;55;45
22		**CUBIERTAS**	**2 días**	**mar 30/09/25**	**mié 1/10/25**	**$1.163.205,29**		
23		TEJA TRASLÚCIDA ONDULADA	2 días	mar 30/09/25	mié 1/10/25	$1.163.205,29	12	37;55;45
24		**FACHADAS Y REVESTIMIENTOS**	**4 días**	**vie 10/10/25**	**mié 15/10/25**	**$1.988.012,37**		
25		PINTURA PREMIUM DE MAXIMA RESISTENCIA Y DURABILIDAD PARA SUPERFICIES EXTERIORES EXPUESTAS A LA INTEMPERIE [3 MANOS]	2 días	mar 14/10/25	mié 15/10/25	$798.807,53	26	55;45
26		LAVADO FACHADA	2 días	vie 10/10/25	lun 13/10/25	$1.189.204,84	20;21	25;28;55;45
27		**PINTURAS**	**7 días**	**mar 14/10/25**	**mié 22/10/25**	**$17.881.383,88**		
28		VINILO TIPO 1, 3 MANOS. Alta Calidad, Pintura Premium base agua, máxima lavabilidad y durabilidad	7 días	mar 14/10/25	mié 22/10/25	$17.881.383,88	26	32;50;51;52;55;4
29		**RED ELÉCTRICA**	**7 días**	**jue 23/10/25**	**vie 31/10/25**	**$5.085.465,34**		
30		LUMINARIA LED 60X60CM DE SOBREPONER/DESCOLGADA	3 días	mar 28/10/25	jue 30/10/25	$1.387.855,65	32	31CC;55;45
31		INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X15A	1 día	mar 28/10/25	mar 28/10/25	$88.253,13	30CC	55;45
32		CANALETA PLASTICA 100X45MM	3 días	jue 23/10/25	lun 27/10/25	$1.278.454,86	28	35;30;34CC;55;45
33		TAPA TOMA CORRIENTE DOBLE	1 día	vie 31/10/25	vie 31/10/25	$42.411,32	35	53CC;55;45
34		BALANCEO DE CARGAS TABLERO ELÉCTRICO	1 día	jue 23/10/25	jue 23/10/25	$317.584,55	32CC	55;45
35		PUNTO DE CABLEADO ESTRUCTURADO. Promedio 20 ml Cable UTP Cat 6A. Incluye punto de eléctrico red normal y regulada.	3 días	mar 28/10/25	jue 30/10/25	$1.970.905,83	32	33;55;45
36		**RED HIDRÁULICA**	**2 días**	**jue 2/10/25**	**vie 3/10/25**	**$347.634,14**		
37		TUBERÍA PVCP 1/2"	1 día	jue 2/10/25	jue 2/10/25	$188.294,34	23	38;39;40;43CC;55
38		VÁLVULA DE REGISTRO 1/2"	1 día	vie 3/10/25	vie 3/10/25	$32.836,30	37	55;45
39		PUNTO DE AGUA FRÍA INODORO. Promedio 3 ml	1 día	vie 3/10/25	vie 3/10/25	$63.251,75	37	20;21;55;45
40		PUNTO DE AGUA FRÍA ORINAL/LAVAMANOS. Promedio 3 ml	1 día	vie 3/10/25	vie 3/10/25	$63.251,75	37	20;21;55;45
41		**RED SANITARIA**	**8 días**	**jue 25/09/25**	**lun 6/10/25**	**$2.175.716,47**		
42		SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS	2 días	jue 25/09/25	vie 26/09/25	$866.708,48	13CC	55;45
43		SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA	3 días	jue 2/10/25	lun 6/10/25	$1.309.007,99	37CC	55;45
44		**ASEO-SEÑALIZACIÓN**	**4 días**	**mar 4/11/25**	**vie 7/11/25**	**$2.764.322,24**		
45		ASEO GENERAL DE OBRA	2 días	mar 4/11/25	mié 5/11/25	$739.927,07	11;12;13;16;17;18;20;2	46;14;55
46		CINTA ANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA	1 día	jue 6/11/25	jue 6/11/25	$354.152,19	45	55;47CC;48CC
47		PLACA DE SEÑALIZACIÓN ACRILICO 21 X 30CM. Diseño SNR. Incluye elementos de instalación.	2 días	jue 6/11/25	vie 7/11/25	$575.973,77	46CC	55
48		PLACA DE SEÑALIZACIÓN BRAILE E IDIOMA DE SEÑAS 50X30	2 días	jue 6/11/25	vie 7/11/25	$1.094.269,21	46CC	55
49		**ADICIONALES**	**8 días**	**jue 23/10/25**	**lun 3/11/25**	**$2.945.292,84**		
50		MANTENIMIENTO REJA METALICA	2 días	jue 23/10/25	vie 24/10/25	$628.285,18	28	55;45
51		DESMONTE, TRASLADO Y REINSTALACION ESCRITORIO MODULAR (Incluye Silla y división respectiva)	1 día	jue 23/10/25	jue 23/10/25	$145.876,64	28	54CC;55;45
52		SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO TRANSPARENTE DE 4MM	2 días	jue 23/10/25	vie 24/10/25	$293.045,93	28	16;55;45
53		DESMONTE Y REINSTALACION DE CANALETA DE RED REGULADA Y LOGICA	2 días	vie 31/10/25	lun 3/11/25	$210.868,49	33CC	55;45

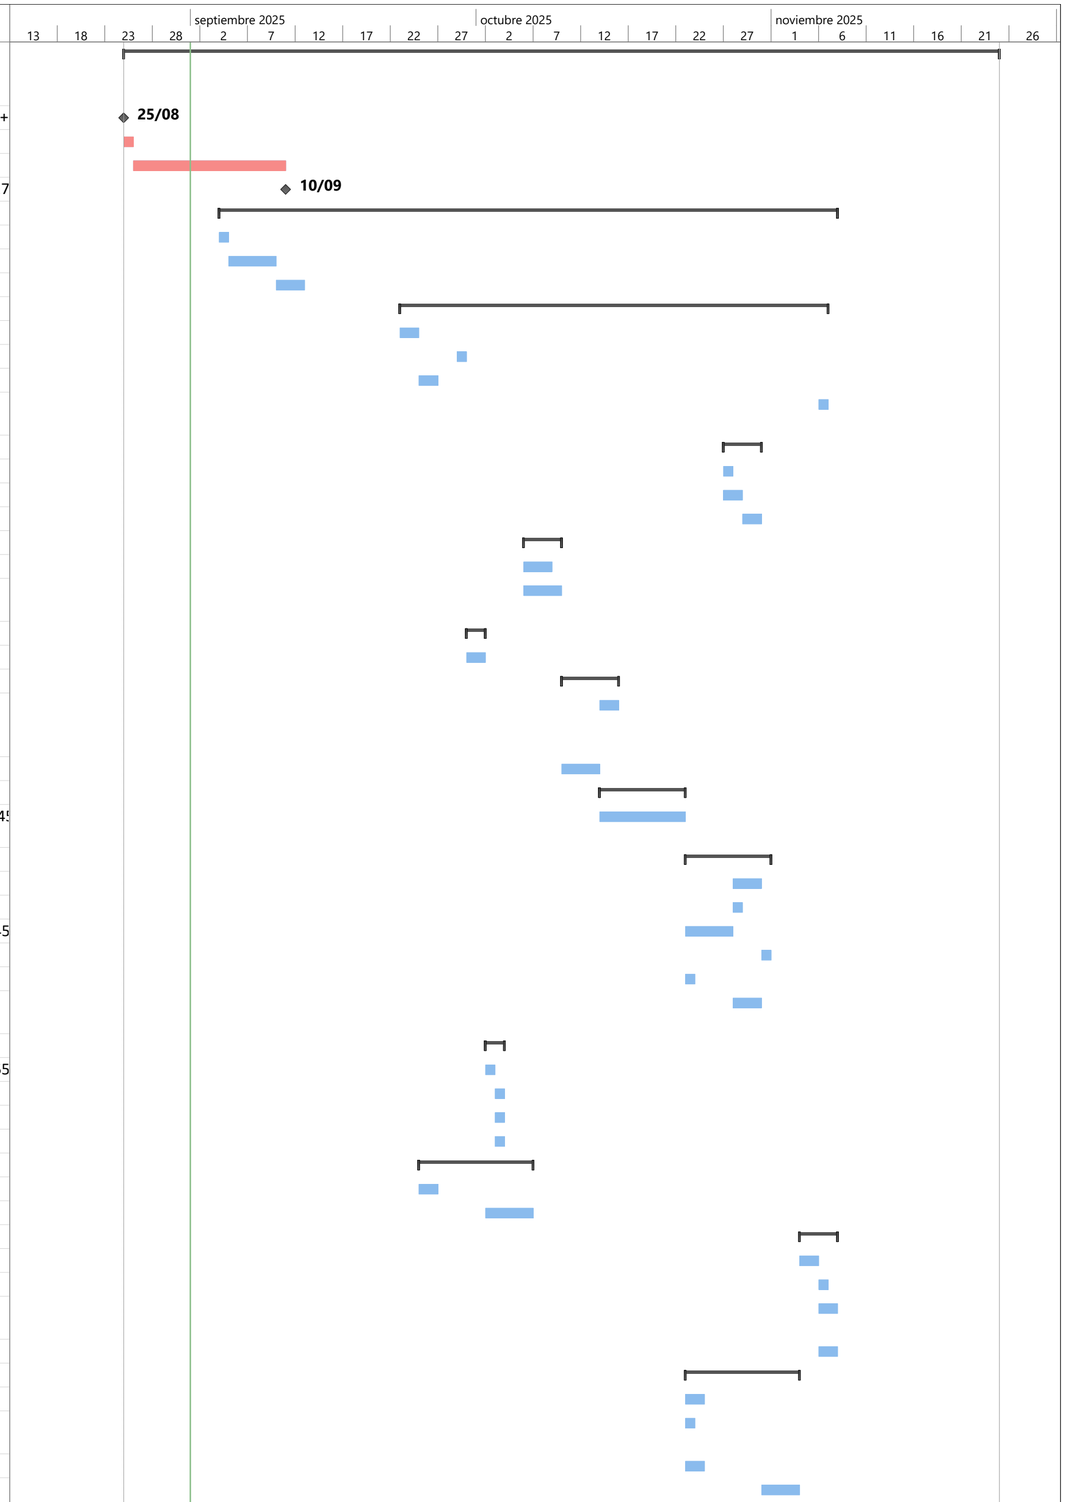

Project: PROGRAMACION NOT
Date: lun 1/09/25

División crítica
Task
Split
Milestone
Summary
Project Summary
Inactive Task
Inactive Milestone
Inactive Summary
Manual Task
Duration-only
Manual Summary Rollup
Manual Summary
Start-only
Finish-only
External Tasks
External Milestone
Deadline
Progress
Manual Progress
Tareas críticas


Id	Modo de tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	Sucesoras
54		MANTENIMIENTO MODULO GENERAL Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ARCHIVO RODANTE, INCLUYE HERRAJES,ANCLAJES, TENSORES, CADENAS, CHAPAS, TORNILLERÍA Y DEMAS ELEMENTOS QUE GARANTICEN EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	3 días	jue 23/10/25	lun 27/10/25	$1.667.216,60	51CC	55;45
55		RECIBO A SATISFACCIÓN INTERVENCIÓN SEDE	0 días	vie 7/11/25	vie 7/11/25	$0,00	11;12;13;14;16;17;18;2	833
56		**CHOCONTA**	**58 días**	**jue 4/09/25**	**lun 24/11/25**	**$170.513.946,21**		
57		VISITA INICIAL	1 día	jue 4/09/25	jue 4/09/25	$0,00	2FC+8 días	58
58		APROBACIÓN PERSONAL	2 días	vie 5/09/25	lun 8/09/25	$0,00	57	59
59		APROBACIÓN PRESUPUESTO INTERVENTORIA Y ENTIDAD	2 días	mar 9/09/25	mié 10/09/25	$0,00	58	75
60		**PRELIMINARES**	**53 días**	**jue 11/09/25**	**lun 24/11/25**	**$17.553.402,08**		
61		DESMONTE DE CIELORRASO	2 días	jue 25/09/25	vie 26/09/25	$136.455,87	63	62;117;123
62		DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS	2 días	lun 29/09/25	mar 30/09/25	$172.713,73	61	68;112;117;123
63		DESMONTE DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	2 días	mar 23/09/25	mié 24/09/25	$258.328,02	64	61;117;123
64		DESMONTE DE PUERTA EN MADERA	2 días	vie 19/09/25	lun 22/09/25	$155.212,00	65	63;117;123
65		DESMONTE DE MÓDULO DE ARCHIVO RODANTE	2 días	mié 17/09/25	jue 18/09/25	$434.639,24	72	64;117;122;123
66		DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO	3 días	jue 2/10/25	lun 6/10/25	$4.312.028,88	67CC	73CC;117;123
67		DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO (E=3-6CM)	4 días	jue 2/10/25	mar 7/10/25	$5.381.342,60	68	66CC;97;98;114C
68		DEMOLICIÓN DE MESÓN COCINA (E=6-12CM)	1 día	mié 1/10/25	mié 1/10/25	$77.470,87	62	67;117;123
69		INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS	10 días	lun 3/11/25	vie 14/11/25	$187.526,91	105	108;82CC;117;12
70		INSTALACIÓN DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	9 días	mié 5/11/25	lun 17/11/25	$87.418,14	101CC	117;123
71		INSTALACIÓN DE MÓDULO DE ARCHIVO RODANTE	2 días	mar 21/10/25	mié 22/10/25	$574.127,86	94;95	117;123
72		PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA	2 días	lun 15/09/25	mar 16/09/25	$1.019.961,11	75	65;117;123
73		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE MURO	8 días	jue 2/10/25	lun 13/10/25	$892.329,41	66CC	87;103;117;123
74		GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL	4 días	mié 19/11/25	lun 24/11/25	$1.432.237,81	117	123
75		CERRAMIENTO EN LONA VERDE H=2.10 M	2 días	jue 11/09/25	vie 12/09/25	$2.431.609,63	59;5	72;117;123
76		**CARPINTERÍA EN MADERA**	**16 días**	**mar 21/10/25**	**mar 11/11/25**	**$8.342.754,01**		
77		MUEBLE SUPERIOR COCINA 180X80X33,8CM	6 días	mar 4/11/25	mar 11/11/25	$719.791,60	111	117;123
78		MUEBLE BAJO MESÓN COCINA	6 días	mar 4/11/25	mar 11/11/25	$1.855.009,94	111	117;123
79		HOJA PUERTA EN MADERA 51CM-75CM. INCLUYE CERRADURA	10 días	mar 21/10/25	lun 3/11/25	$2.025.612,60	94;95	117;123
80		HOJA PUERTA EN MADERA 76CM-110CM. INCLUYE CERRADURA	10 días	mar 21/10/25	lun 3/11/25	$3.742.339,87	94;95	117;123
81		**CARPINTERÍA METÁLICA**	**10 días**	**lun 3/11/25**	**vie 14/11/25**	**$1.325.872,32**		
82		ESPEJO BISELADO 5MM	10 días	lun 3/11/25	vie 14/11/25	$1.325.872,32	69CC	117;123
83		**CIELORRASOS**	**6 días**	**mar 28/10/25**	**mar 4/11/25**	**$1.965.128,43**		
84		CIELORRASO EN FIBRA MINERAL 60CMX60CM	6 días	mar 28/10/25	mar 4/11/25	$1.965.128,43	86	101;102;117;123
85		**ENCHAPE MUROS**	**10 días**	**mar 14/10/25**	**lun 27/10/25**	**$10.144.520,65**		
86		ESTUCO PLASTICO INTERIOR	6 días	lun 20/10/25	lun 27/10/25	$2.477.767,59	87	84;92;117;123
87		RESANE	4 días	mar 14/10/25	vie 17/10/25	$1.174.885,01	73	88;86;117;123
88		CERÁMICA FORMATO 25X35CM	5 días	lun 20/10/25	vie 24/10/25	$6.491.868,05	87	111;117;123
89		**IMPERMEABILIZACIÓN**	**12 días**	**lun 13/10/25**	**mar 28/10/25**	**$30.303.288,85**		
90		BICAPA MANTO 6,2MM ASFÁLTICO FOIL DE ALUMINIO REFUERZO POLIETILENO	12 días	lun 13/10/25	mar 28/10/25	$30.303.288,85	98	117;123
91		**PINTURAS**	**14 días**	**mar 28/10/25**	**vie 14/11/25**	**$28.153.684,11**		
92		PINTURA ACRILICA TIPO 1 BASE AGUA CON ACCION ANTIBACTERIAL, PREVIENE LA PROLIFERACION DE BACTERIAS, NO INFLAMABLE.	14 días	mar 28/10/25	vie 14/11/25	$28.153.684,11	86	117;123
93		**PISOS**	**9 días**	**mié 8/10/25**	**lun 20/10/25**	**$58.482.536,55**		
94		PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE	1 día	mar 14/10/25	mar 14/10/25	$1.198.616,69	96	95CC;99CC;117;7
95		PISO CERÁMICO DURO PISO	5 días	mar 14/10/25	lun 20/10/25	$28.545.120,38	94CC	117;79;80;71;123
96		POYO COCINA 55X10CM	1 día	lun 13/10/25	lun 13/10/25	$224.621,04	98	94;117;123
97		ALISTADO DE PISO 4CM	2 días	mié 8/10/25	jue 9/10/25	$11.583.365,75	67	117;123
98		ALISTADO DE PISO 4CM IMPERMEABILIZADO	3 días	mié 8/10/25	vie 10/10/25	$14.038.634,39	67	90;96;117;123
99		GUARDAESCOBA CERÁMICA 33,8X10CM. Incluye Wing	5 días	mar 14/10/25	lun 20/10/25	$2.892.178,30	94CC	117;123
100		**RED ELÉCTRICA**	**23 días**	**mar 14/10/25**	**jue 13/11/25**	**$5.251.161,30**		
101		LUMINARIA LED 60X60CM PARA TECHO MODULAR	7 días	mié 5/11/25	jue 13/11/25	$2.144.593,51	84	70CC;117;123
102		LUMINARIA LED TIPO TORTUGA PARA INTERPERIE DE SOBREPONER	7 días	mié 5/11/25	jue 13/11/25	$518.312,01	84	117;123
103		SALIDA TOMA CORRIENTE GFCI EN MURO PVC	7 días	mar 14/10/25	mié 22/10/25	$1.200.123,50	73	104CC;105;117;1
104		BALANCEO DE CARGAS TABLERO ELÉCTRICO	7 días	mar 14/10/25	mié 22/10/25	$317.584,55	103CC	117;123
105		SUMINISTRO E INSTALACION EXTRACTOR BAÑO EXTRA SILENC BAJO CONSUMO SILENT100	7 días	jue 23/10/25	vie 31/10/25	$1.070.547,73	103	107;69;117;123
106		**RED HIDRÁULICA**	**34 días**	**mié 1/10/25**	**lun 17/11/25**	**$4.008.309,05**		
107		CAMBIO DE ARBOL Y FLOTADOR POR SISTEMA AHORRADOR	1 día	lun 3/11/25	lun 3/11/25	$606.067,97	105	117;123
108		JUEGO DE INCRUSTACIONES PARA BAÑO	1 día	lun 17/11/25	lun 17/11/25	$377.464,46	69	117;123
109		LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE	1 día	mar 4/11/25	mar 4/11/25	$520.332,57	111	117;123

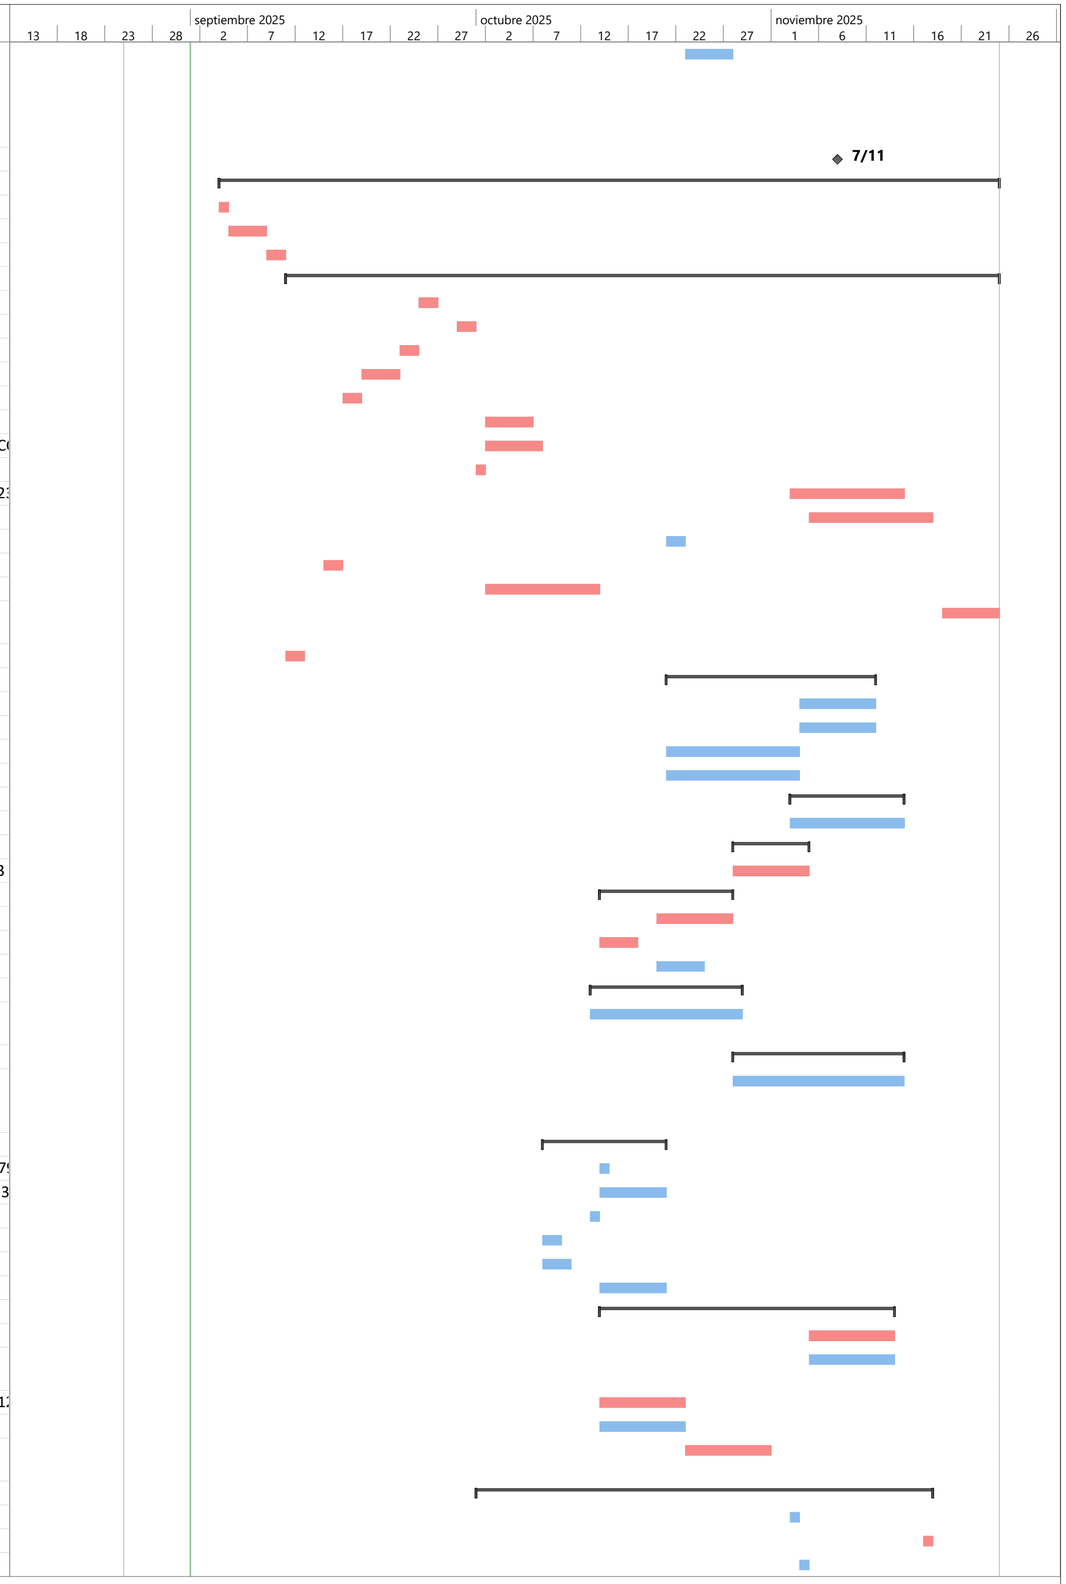

Project: PROGRAMACION NOT
Date: lun 1/09/25

División crítica · Milestone · Inactive Task · Manual Task · Manual Summary · External Tasks · Progress
Task · Summary · Inactive Milestone · Duration-only · Start-only · External Milestone · Manual Progress
Split · Project Summary · Inactive Summary · Manual Summary Rollup · Finish-only · Deadline · Tareas críticas

Id	Modo de tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	Sucesoras
110		LIMPIEZA DE TANQUE DE AGUA POTABLE	1 día	mié 1/10/25	mié 1/10/25	$192.026,95	112CC	117;123
111		MESON EN ACERO INOXIDABLE	6 días	lun 27/10/25	lun 3/11/25	$1.369.061,27	88	109;77;78;117;12
112		PRUEBA HIDROSTÁTICA	2 días	mié 1/10/25	jue 2/10/25	$943.355,83	62	115CC;117;123;1
113		**RED SANITARIA**	**3 días**	**mié 1/10/25**	**vie 3/10/25**	**$2.293.065,64**		
114		SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS	2 días	jue 2/10/25	vie 3/10/25	$722.257,07	67CC	117;123
115		SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA	2 días	mié 1/10/25	jue 2/10/25	$1.570.808,57	112CC	117;123
116		**ASEO-SEÑALIZACIÓN**	**3 días**	**mar 18/11/25**	**jue 20/11/25**	**$2.232.909,11**		
117		ASEO GENERAL DE OBRA	1 día	mar 18/11/25	mar 18/11/25	$732.602,07	61;62;63;64;65;66;67;6	74;118;123
118		CINTA ANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA	1 día	mié 19/11/25	mié 19/11/25	$118.050,31	117	119;123
119		PLACA DE SEÑALIZACIÓN ACRILICO 21 X 30CM. Diseño SNR. Incluye elementos de instalación.	1 día	jue 20/11/25	jue 20/11/25	$287.987,52	118	120CC;123
120		PLACA DE SEÑALIZACIÓN BRAILE E IDIOMA DE SEÑAS 50X30. Certificado	1 día	jue 20/11/25	jue 20/11/25	$1.094.269,21	119CC	123
121		**OTROS (Actividades Complementarias)**	**10 días**	**vie 19/09/25**	**jue 2/10/25**	**$457.314,11**		
122		TRASLADO CAJAS DE DOCUMENTACION en tamaños 31 cm x 41cm x 27,5cm h y 35cm x 47,5 x 27 h, o tamaños similares	10 días	vie 19/09/25	jue 2/10/25	$457.314,11	65	123
123		FIN ACTIVIDADES FRENTE	0 días	lun 24/11/25	lun 24/11/25	$0,00	61;62;63;64;65;66;67;6	833
124		**CONCEPCIÓN**	**53 días**	**jue 11/09/25**	**lun 24/11/25**	**$40.659.734,82**		
125		VISITA INICIAL	1 día	jue 11/09/25	jue 11/09/25	$0,00	2FC+13 días	126
126		APROBACIÓN PERSONAL	3 días	vie 12/09/25	mar 16/09/25	$0,00	125	127
127		APROBACIÓN PRESUPUESTO INTERVENTORIA Y ENTIDAD	3 días	mié 17/09/25	vie 19/09/25	$0,00	126	143FC+18 días
128		**CARPINTERÍA METÁLICA**	**1 día**	**lun 20/10/25**	**lun 20/10/25**	**$270.646,42**		
129		REJILLA DE PISO 30CM	1 día	lun 20/10/25	lun 20/10/25	$270.646,42	146	156
130		**ENCHAPE MUROS**	**3 días**	**mar 4/11/25**	**jue 6/11/25**	**$774.453,76**		
131		ESTUCO EXTERIOR	1 día	mié 5/11/25	mié 5/11/25	$260.523,23	133	156;136;137
132		ESTUCO PLASTICO INTERIOR	2 días	mié 5/11/25	jue 6/11/25	$396.442,41	133	156;139
133		RESANE	1 día	mar 4/11/25	mar 4/11/25	$117.488,12	135	156;131;132
134		**FACHADAS Y REVESTIMIENTOS**	**13 días**	**jue 23/10/25**	**lun 10/11/25**	**$14.545.460,45**		
135		LAVADO DE FACHADA E HIDRÓFUGO	8 días	jue 23/10/25	lun 3/11/25	$9.630.815,76	154	156;133
136		PINTURA PREMIUM DE MAXIMA RESISTENCIA Y DURABILIDAD PARA SUPERFICIES EXTERIORES EXPUESTAS A LA INTEMPERIE [3 MANOS]	2 días	jue 6/11/25	vie 7/11/25	$1.997.020,11	131	156
137		PINTURA PREMIUM DE MAXIMA RESISTENCIA Y DURABILIDAD PARA SUPERFICIES EXTERIORES EXPUESTAS A LA INTEMPERIE [2 MANOS]	3 días	jue 6/11/25	lun 10/11/25	$2.917.624,58	131	156
138		**PINTURAS**	**9 días**	**vie 7/11/25**	**mié 19/11/25**	**$13.341.752,21**		
139		VINILO TIPO 1, 3 MANOS. Alta Calidad, Pintura Premium base agua, máxima lavabilidad y durabilidad	9 días	vie 7/11/25	mié 19/11/25	$13.341.752,21	132	156;155;141
140		**RED ELÉCTRICA**	**2 días**	**jue 20/11/25**	**vie 21/11/25**	**$5.999.758,28**		
141		LUMINARIA LED 120X30CM PARA TECHO MODULAR	2 días	jue 20/11/25	vie 21/11/25	$5.999.758,28	139	156;149
142		**RED HIDRÁULICA**	**2 días**	**jue 16/10/25**	**vie 17/10/25**	**$192.026,95**		
143		LIMPIEZA DE TANQUE DE AGUA POTABLE	2 días	jue 16/10/25	vie 17/10/25	$192.026,95	127FC+18 días;5	156;154;146CC
144		**RED SANITARIA**	**6 días**	**jue 16/10/25**	**jue 23/10/25**	**$2.858.072,30**		
145		SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 3"	2 días	mié 22/10/25	jue 23/10/25	$294.125,68	146;147	156
146		SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS	2 días	jue 16/10/25	vie 17/10/25	$1.516.740,48	143CC	156;129;145;147
147		SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA	2 días	lun 20/10/25	mar 21/10/25	$1.047.206,14	146	156;145
148		**ASEO-SEÑALIZACIÓN**	**1 día**	**lun 24/11/25**	**lun 24/11/25**	**$2.000.117,88**		
149		ASEO GENERAL DE OBRA	1 día	lun 24/11/25	lun 24/11/25	$384.616,09	141	150CC;151CC;152
150		CINTA ANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA	1 día	lun 24/11/25	lun 24/11/25	$118.050,31	149CC	156
151		PLACA DE SEÑALIZACIÓN ACRILICO 21 X 30CM. Diseño SNR. Incluye elementos de instalación.	1 día	lun 24/11/25	lun 24/11/25	$403.182,27	149CC	156
152		PLACA DE SEÑALIZACIÓN BRAILE E IDIOMA DE SEÑAS 50X30. Certificado	1 día	lun 24/11/25	lun 24/11/25	$1.094.269,21	149CC	156
153		**OTROS (Actividades Complementarias)**	**24 días**	**lun 20/10/25**	**jue 20/11/25**	**$677.446,57**		
154		DESMONTE DE ESTANTE DE ARCHIVO RODANTE O FIJO INCLUIDA PUERTAS Y ESTRUCTURA EXISTENTE, UBICANDOLO EN EL LUGAR DESTINADO POR LA ORIP	3 días	lun 20/10/25	mié 22/10/25	$593.049,71	143	156;135
155		SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO TRANSPARENTE DE 4MM	1 día	jue 20/11/25	jue 20/11/25	$84.396,86	139	156
156		RECIBO A SATISFACCIÓN INTERVENCIÓN SEDE	0 días	lun 24/11/25	lun 24/11/25	$0,00	129;131;132;133;135;1	833
157		**EL COCUY**	**60 días**	**mar 2/09/25**	**lun 24/11/25**	**$177.300.226,76**		
158		VISITA INICIAL	1 día	mar 2/09/25	mar 2/09/25	$0,00	2FC+6 días	159FC+1 día
159		APROBACIÓN PERSONAL	3 días	jue 4/09/25	lun 8/09/25	$0,00	158FC+1 día	160
160		APROBACIÓN PRESUPUESTO INTERVENTORIA Y ENTIDAD	3 días	mar 9/09/25	jue 11/09/25	$0,00	159	181FC+12 días
161		**PRELIMINARES**	**39 días**	**mar 30/09/25**	**vie 21/11/25**	**$20.116.448,69**		
162		DESMONTE DE CIELORRASO	2 días	mar 7/10/25	mié 8/10/25	$454.852,47	164	167;248;238
163		DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS	1 día	vie 3/10/25	vie 3/10/25	$115.142,49	170	164;248;238
164		DESMONTE DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	1 día	lun 6/10/25	lun 6/10/25	$129.164,01	163	162;248;238

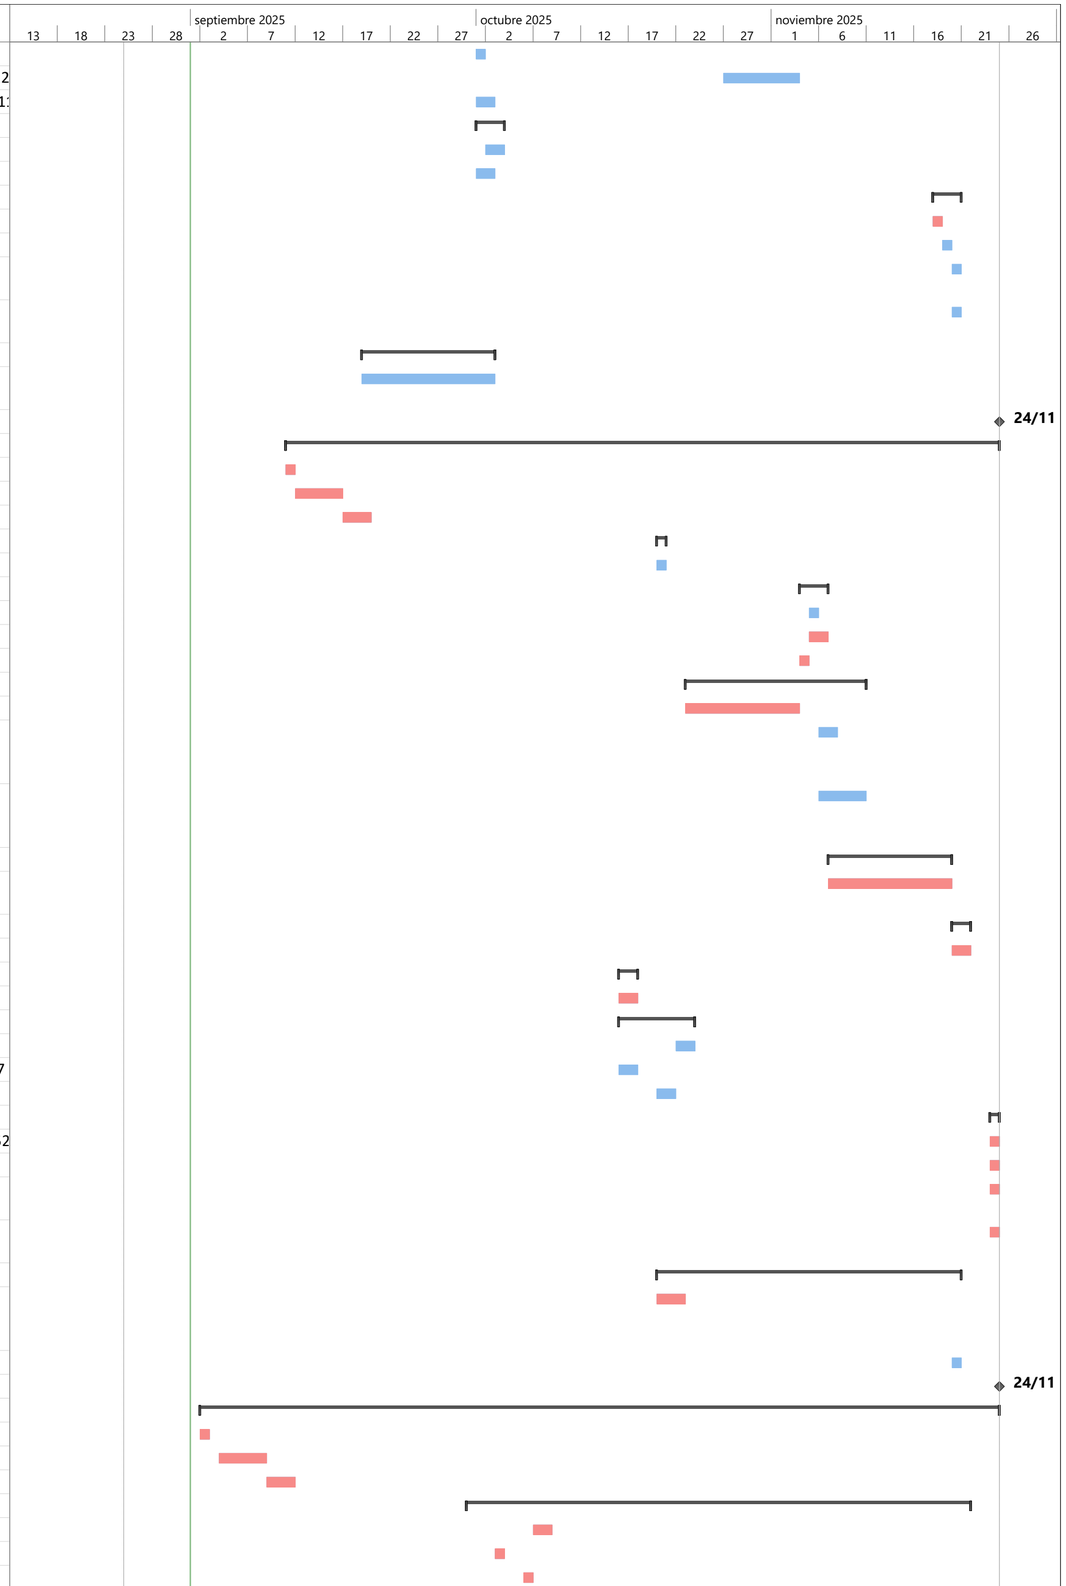


Project: PROGRAMACION NOT
Date: lun 1/09/25

División crítica · Task · Split · Milestone · Summary · Project Summary · Inactive Task · Inactive Milestone · Inactive Summary · Manual Task · Duration-only · Manual Summary Rollup · Manual Summary · Start-only · Finish-only · External Tasks · External Milestone · Deadline · Progress · Manual Progress · Tareas críticas

Id	Modo de tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	Sucesoras
165		DESMONTE DE CUBIERTA MIXTA EN TEJA DE BARRO Y ONDULADA	3 días	lun 20/10/25	mié 22/10/25	$9.479.556,92	171CC+1 día	172;248;238;201
166		DESMONTE VENTANA METÁLICA	3 días	mar 14/10/25	jue 16/10/25	$490.571,09	168	171;248;238
167		DESMONTE DE PUERTA EN MADERA	2 días	jue 9/10/25	vie 10/10/25	$135.810,82	162	168;248;238
168		DESMONTE DE VIDRIO	1 día	lun 13/10/25	lun 13/10/25	$33.927,53	167	166;248;238
169		DESMONTE DE PUESTO DE TRABAJO	1 día	mié 1/10/25	mié 1/10/25	$279.410,67	181	170;248;238
170		DESMONTE DE MÓDULO DE ARCHIVO RODANTE	1 día	jue 2/10/25	jue 2/10/25	$496.729,65	169	163;248;238
171		DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS	2 días	vie 17/10/25	lun 20/10/25	$508.230,89	166	165CC+1 día;248;
172		DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO	2 días	jue 23/10/25	vie 24/10/25	$165.847,66	165	173;179CC;248;2
173		DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO (E=3-6CM)	2 días	lun 27/10/25	mar 28/10/25	$206.975,25	172	217;218;248;238;
174		DEMOLICIÓN DE PAÑETE MURO (E=1-3CM)	3 días	vie 24/10/25	mar 28/10/25	$583.891,55	173FF	248;238;225
175		INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS	1 día	mar 18/11/25	mar 18/11/25	$125.018,36	233	248;238
176		INSTALACIÓN DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	3 días	lun 17/11/25	mié 19/11/25	$58.278,76	220;221CC	248;238
177		INSTALACIÓN DE MÓDULO DE ARCHIVO RODANTE	3 días	lun 17/11/25	mié 19/11/25	$656.145,94	220;221	248;238
178		PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA	1 día	mar 30/09/25	mar 30/09/25	$1.019.961,11	181CC	248;238
179		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE MURO	2 días	jue 23/10/25	vie 24/10/25	$596.968,45	172CC	248;238
180		GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL	1 día	vie 21/11/25	vie 21/11/25	$2.148.355,44	238	248
181		CERRAMIENTO EN LONA VERDE H=2.10 M	1 día	mar 30/09/25	mar 30/09/25	$2.431.609,63	160FC+12 días;5	169;248;238;178(
182		**CARPINTERÍA EN MADERA**	**3 días**	**lun 17/11/25**	**mié 19/11/25**	**$6.098.699,33**		
183		PASAMANOS EN VARA 8CM CONTRAPARED	1 día	lun 17/11/25	lun 17/11/25	$286.159,46	220;221	248;238
184		MUEBLE SUPERIOR COCINA 180X80X33,8CM	1 día	lun 17/11/25	lun 17/11/25	$719.791,60	220;221	248;238;185
185		HOJA PUERTA EN MADERA 51CM-75CM. INCLUYE CERRADURA	1 día	mar 18/11/25	mar 18/11/25	$1.350.408,40	184	248;238;186CC
186		HOJA PUERTA EN MADERA 76CM-110CM. INCLUYE CERRADURA	2 días	mar 18/11/25	mié 19/11/25	$3.742.339,87	185CC	248;238;188FF
187		**CARPINTERÍA METÁLICA**	**2 días**	**mar 18/11/25**	**mié 19/11/25**	**$8.352.420,82**		
188		VENTANA EN LÁMINA PERSIANA FIJA CAL. 20	2 días	mar 18/11/25	mié 19/11/25	$7.910.462,95	186FF	248;238;189CC;24
189		ESPEJO BISELADO 5MM	1 día	mar 18/11/25	mar 18/11/25	$441.957,87	188CC	248;238
190		**CIELORRASOS**	**4 días**	**jue 6/11/25**	**mar 11/11/25**	**$12.130.154,24**		
191		CIELORRASO EN FIBRA MINERAL 60CMX60CM	3 días	vie 7/11/25	mar 11/11/25	$6.550.428,54	214FF	248;238;192FF;22
192		MANTENIMIENTO DE CIELORRASO EN FIBRA MINERAL	4 días	jue 6/11/25	mar 11/11/25	$5.579.725,70	191FF	248;238;227;228;
193		**CONCRETOS Y MORTEROS**	**4 días**	**mar 4/11/25**	**vie 7/11/25**	**$2.887.539,30**		
194		PAÑETE MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO E=3CM. Incluye Filos y Dilataciones	4 días	mar 4/11/25	vie 7/11/25	$2.887.539,30	226	248;238;208FF+1 día
195		**CUBIERTAS**	**12 días**	**jue 23/10/25**	**vie 7/11/25**	**$56.530.142,07**		
196		TEJA DE FIBROCEMENTO P7 NO.8	3 días	lun 27/10/25	mié 29/10/25	$1.904.396,96	200CC	248;238;199
197		TEJA TRASLÚCIDA ONDULADA	3 días	lun 27/10/25	mié 29/10/25	$727.003,15	200CC	248;238;199
198		CABALLETE TEJA DE BARRA NATURAL	3 días	jue 30/10/25	lun 3/11/25	$660.416,52	199CC	248;238;202
199		LIMATESA TEJA DE BARRO NATURAL	2 días	jue 30/10/25	vie 31/10/25	$889.891,99	196;197	248;238;198CC;2(
200		TEJA DE BARRO NATURAL	3 días	lun 27/10/25	mié 29/10/25	$38.603.663,41	201FF	248;238;196CC;1
201		ESTRUCTURA EN MADERA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO	5 días	jue 23/10/25	mié 29/10/25	$8.311.311,07	165	248;238;200FF
202		BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC 6"	2 días	mar 4/11/25	mié 5/11/25	$1.299.964,56	198;199	248;238;203CC
203		CANAL EN LÁMINA CAL 22 Desarrollo 90 cm	2 días	mar 4/11/25	mié 5/11/25	$2.613.635,77	202CC	248;238;204
204		FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22	2 días	jue 6/11/25	vie 7/11/25	$1.519.858,64	203	248;238
205		**ENCHAPE MUROS**	**4 días**	**mié 5/11/25**	**lun 10/11/25**	**$7.690.836,59**		
206		ESTUCO EXTERIOR	2 días	vie 7/11/25	lun 10/11/25	$521.046,46	208FF	248;238;214FF+1
207		ESTUCO PLASTICO INTERIOR	4 días	mié 5/11/25	lun 10/11/25	$1.651.845,06	208FF	248;238;214FF+1
208		RESANE	4 días	mié 5/11/25	lun 10/11/25	$1.174.885,01	194FF+1 día	248;238;209FF;20
209		CERÁMICA FORMATO 25X35CM	2 días	vie 7/11/25	lun 10/11/25	$4.343.060,06	208FF	248;238
210		**FACHADAS Y REVESTIMIENTOS**	**5 días**	**mié 5/11/25**	**mar 11/11/25**	**$6.390.462,81**		
211		PINTURA PREMIUM DE MAXIMA RESISTENCIA Y DURABILIDAD PARA SUPERFICIES EXTERIORES EXPUESTAS A LA INTEMPERIE [3 MANOS]	5 días	mié 5/11/25	mar 11/11/25	$6.390.462,81	214CC	248;238
212		**PINTURAS**	**5 días**	**mié 5/11/25**	**mar 11/11/25**	**$23.482.778,64**		
213		ESMALTE SOBRE MARCOS LÁMINA	3 días	mié 5/11/25	vie 7/11/25	$626.652,17	214CC	248;238
214		PINTURA ACRILICA TIPO 1 BASE AGUA CON ACCION ANTIBACTERIAL, PREVIENE LA PROLIFERACION DE BACTERIAS, NO INFLAMABLE.	5 días	mié 5/11/25	mar 11/11/25	$22.856.126,47	206FF+1 día;207FF+1 día	248;238;213CC;2
215		**PISOS**	**14 días**	**mié 29/10/25**	**lun 17/11/25**	**$14.349.748,06**		
216		DESTRONQUE PULIDA, BRILLADA Y SELLADA DE PISO EN GRANO MARMOL	12 días	vie 31/10/25	lun 17/11/25	$13.364.285,58	217;218	248;238;245CC
217		ALISTADO DE PISO 4CM	2 días	mié 29/10/25	jue 30/10/25	$445.514,56	173	248;238;216
218		ALISTADO DE PISO 4CM IMPERMEABILIZADO	2 días	mié 29/10/25	jue 30/10/25	$539.947,92	173	248;238;216
219		**RED ELÉCTRICA**	**13 días**	**mié 29/10/25**	**vie 14/11/25**	**$9.793.727,56**		
220		LUMINARIA LED 60X60CM PARA TECHO MODULAR	3 días	mié 12/11/25	vie 14/11/25	$3.002.430,65	191;192	248;238;233;176;
221		LUMINARIA LED TIPO TORTUGA PARA INTERPERIE DE SOBREPONER	2 días	mié 12/11/25	jue 13/11/25	$691.083,11	191;192	248;238;233;176(
222		SALIDA LUMINARIA EN MURO PVC	2 días	jue 30/10/25	vie 31/10/25	$655.263,78	225	248;238;226



Id	Modo de tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	Sucesoras
223		SALIDA LUMINARIA EN TECHO PVC	2 días	jue 30/10/25	vie 31/10/25	$1.506.167,29	225	248;238;226
224		SALIDA TOMA CORRIENTE GFCI EN MURO EMT	1 día	jue 30/10/25	jue 30/10/25	$589.272,48	225	248;238;226
225		BALANCEO DE CARGAS TABLERO ELÉCTRICO	1 día	mié 29/10/25	mié 29/10/25	$317.584,55	174	248;238;222;223;
226		PUNTO DE CABLEADO ESTRUCTURADO. Promedio 20 ml Cable UTP Cat 6A. Incluye punto de eléctrico red normal y regulada.	1 día	lun 3/11/25	lun 3/11/25	$1.313.936,37	222;223;224	248;238;194
227		SUMINISTRO E INSTALACION EXTRACTOR BAÑO EXTRA SILENC BAJO CONSUMO SILENT100	1 día	mié 12/11/25	mié 12/11/25	$713.698,06	191;192	248;238
228		SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA EMERGENCIA LED R.1 2 X 16W TIPO MICKEY	1 día	mié 12/11/25	mié 12/11/25	$1.004.291,27	191;192	248;238
229		**RED HIDRÁULICA**	**2 días**	**lun 17/11/25**	**mar 18/11/25**	**$1.839.871,68**		
230		CAMBIO KIT REPUESTO FLUXÓMETRO	1 día	mar 18/11/25	mar 18/11/25	$279.406,84	233	248;238;231CC
231		CAMBIO LLAVE CON FILTRO AHORRADOR	1 día	mar 18/11/25	mar 18/11/25	$425.082,06	230CC	248;238
232		LIMPIEZA DE TANQUE DE AGUA POTABLE	1 día	lun 17/11/25	lun 17/11/25	$192.026,95	233CC	248;238
233		PRUEBA HIDROSTÁTICA	1 día	lun 17/11/25	lun 17/11/25	$943.355,83	220;221	248;238;230;232(
234		**RED SANITARIA**	**3 días**	**lun 17/11/25**	**mié 19/11/25**	**$1.769.463,21**		
235		SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS	2 días	lun 17/11/25	mar 18/11/25	$722.257,07	233CC	248;238;236CC+1
236		SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA	2 días	mar 18/11/25	mié 19/11/25	$1.047.206,14	235CC+1 día	248;238
237		**ASEO-SEÑALIZACIÓN**	**3 días**	**jue 20/11/25**	**lun 24/11/25**	**$4.444.353,12**		
238		ASEO GENERAL DE OBRA	1 día	jue 20/11/25	jue 20/11/25	$1.098.901,83	162;163;164;165;166;1	239;240;241;242;
239		CINTA ANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA	2 días	vie 21/11/25	lun 24/11/25	$283.321,75	238	248
240		PLACA DE SEÑALIZACIÓN ACRILICO 21 X 30CM. Diseño SNR. Incluye elementos de instalación.	1 día	vie 21/11/25	vie 21/11/25	$979.156,04	238	248
241		PLACA DE SEÑALIZACIÓN BRAILE E IDIOMA DE SEÑAS 50X30	1 día	vie 21/11/25	vie 21/11/25	$1.094.269,21	238	248
242		SUMINISTRO DE PUNTO ECOLÓGICO. 3 PUESTOS 53LT	1 día	vie 21/11/25	vie 21/11/25	$988.704,29	238	248
243		**OTROS (Actividades Complementarias)**	**17 días**	**lun 27/10/25**	**mar 18/11/25**	**$1.423.580,64**		
244		REINSTALACION CUBIERTA EN TEJA DE BARRO	3 días	lun 27/10/25	mié 29/10/25	$374.987,52	200CC	248;238
245		MANTENIMIENTO REJA METALICA	2 días	vie 31/10/25	lun 3/11/25	$314.142,59	216CC	248;238
246		SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO TRANSPARENTE DE 4MM	1 día	mar 18/11/25	mar 18/11/25	$322.351,03	188CC	248;238
247		SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA COOPERWELD 5/8"	1 día	mié 29/10/25	mié 29/10/25	$412.099,50	225CC	248;238
248		RECIBO A SATISFACCIÓN INTERVENCIÓN SEDE	0 días	lun 24/11/25	lun 24/11/25	$0,00	162;163;164;165;166;1	833
249		**PUERTO BOYACA**	**60 días**	**mar 2/09/25**	**lun 24/11/25**	**$150.203.474,24**		
250		VISITA INICIAL	1 día	mar 2/09/25	mar 2/09/25	$0,00	2FC+6 días	251;359
251		APROBACIÓN PERSONAL	3 días	mié 3/09/25	vie 5/09/25	$0,00	250	252
252		APROBACIÓN PRESUPUESTO INTERVENTORIA Y ENTIDAD	3 días	lun 8/09/25	mié 10/09/25	$0,00	251	274FC+15 días
253		**PRELIMINARES**	**37 días**	**jue 2/10/25**	**vie 21/11/25**	**$18.344.193,65**		
254		DESMONTE AIRE ACONDICIONADO DE MAS DE 48.000 BTU.	1 día	mar 7/10/25	mar 7/10/25	$158.499,71	270	342;357
255		DESMONTE DE CIELORRASO	4 días	jue 9/10/25	mar 14/10/25	$1.364.556,13	256FF	342;257;258;260;
256		DESMONTE DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	2 días	lun 13/10/25	mar 14/10/25	$413.324,58	263	342;255FF;357
257		DESMONTE DE PUERTA METÁLICA	1 día	mié 15/10/25	mié 15/10/25	$49.672,58	255	342;259FF;357
258		DESMONTE DE PUERTA EN MADERA	2 días	mié 15/10/25	jue 16/10/25	$135.810,82	255	342;357
259		DESMONTE DE MARCO METÁLICO PARA PUERTA	2 días	mar 14/10/25	mié 15/10/25	$69.853,94	257FF	342;264;262;357
260		DESMONTE DE DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO	1 día	mié 15/10/25	mié 15/10/25	$165.563,38	255	342;357
261		DESMONTA DE MANTO EN VIGA CANAL	2 días	mié 8/10/25	jue 9/10/25	$284.755,90	271FF	342;263;357
262		DESMONTE DE MURO EN DRYWALL	1 día	jue 16/10/25	jue 16/10/25	$86.947,73	259	342;357
263		DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS	1 día	vie 10/10/25	vie 10/10/25	$82.415,82	261	342;256;312;357
264		DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO	2 días	jue 16/10/25	vie 17/10/25	$414.618,50	259	342;265;304;357
265		DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO (E=3-6CM)	2 días	lun 20/10/25	mar 21/10/25	$517.436,22	264	342;267FF;357
266		DEMOLICIÓN DE PAÑETE MURO (E=1-3CM)	3 días	lun 20/10/25	mié 22/10/25	$1.557.044,56	267CC	342;329;357
267		DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO (E=10-15CM)	2 días	lun 20/10/25	mar 21/10/25	$640.789,70	265FF	342;266CC;295;3
268		INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE MAS DE 48.000 BTU	1 día	vie 21/11/25	vie 21/11/25	$319.543,92	342FF	357
269		INSTALACIÓN DE MÓDULO DE ARCHIVO RODANTE	2 días	jue 20/11/25	vie 21/11/25	$410.091,69	342FF	357
270		PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA	3 días	jue 2/10/25	lun 6/10/25	$1.019.961,11	274CC	271CC+1 día;342;
271		RECORRIDO DE CUBIERTA TEJA ONDULADA	5 días	vie 3/10/25	jue 9/10/25	$5.460.781,76	270CC+1 día	342;261FF;339;35
272		GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL	2 días	jue 20/11/25	vie 21/11/25	$2.148.355,44	342FF	357
273		GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL RCD MADERA, INCLUYE CERTIFICACIÓN	1 día	vie 21/11/25	vie 21/11/25	$612.560,53	342FF	357
274		CERRAMIENTO EN LONA VERDE H=2.10 M	2 días	jue 2/10/25	vie 3/10/25	$2.431.609,63	252FC+15 días;5	270CC;342;347;3
275		**CARPINTERÍA EN MADERA**	**2 días**	**mar 18/11/25**	**mié 19/11/25**	**$7.112.605,14**		
276		HOJA PUERTA EN MADERA 51CM-75CM. INCLUYE CERRADURA	1 día	mar 18/11/25	mar 18/11/25	$1.350.408,40	289;290	342;357
277		HOJA PUERTA EN MADERA 76CM-110CM. INCLUYE CERRADURA	2 días	mar 18/11/25	mié 19/11/25	$3.742.339,87	289;290	342;278FF;357
278		MANTENIMIENTO PUERTA EN MADERA	2 días	mar 18/11/25	mié 19/11/25	$647.716,96	277FF	342;279FF;280CC
279		CERRADURA DE POMO PARA OFICINA	1 día	mié 19/11/25	mié 19/11/25	$321.776,09	278FF	342;357
280		MANTENIMIENTO DE MUEBLE	2 días	mar 18/11/25	mié 19/11/25	$1.050.363,82	278CC	342;357
281		**CARPINTERÍA METÁLICA**	**2 días**	**lun 17/11/25**	**mar 18/11/25**	**$11.574.094,12**		
282		MARCO METÁLICO PARA PUERTA DE 0,51-0,75M	1 día	lun 17/11/25	lun 17/11/25	$560.645,57	289FF	342;285FF;286FF;

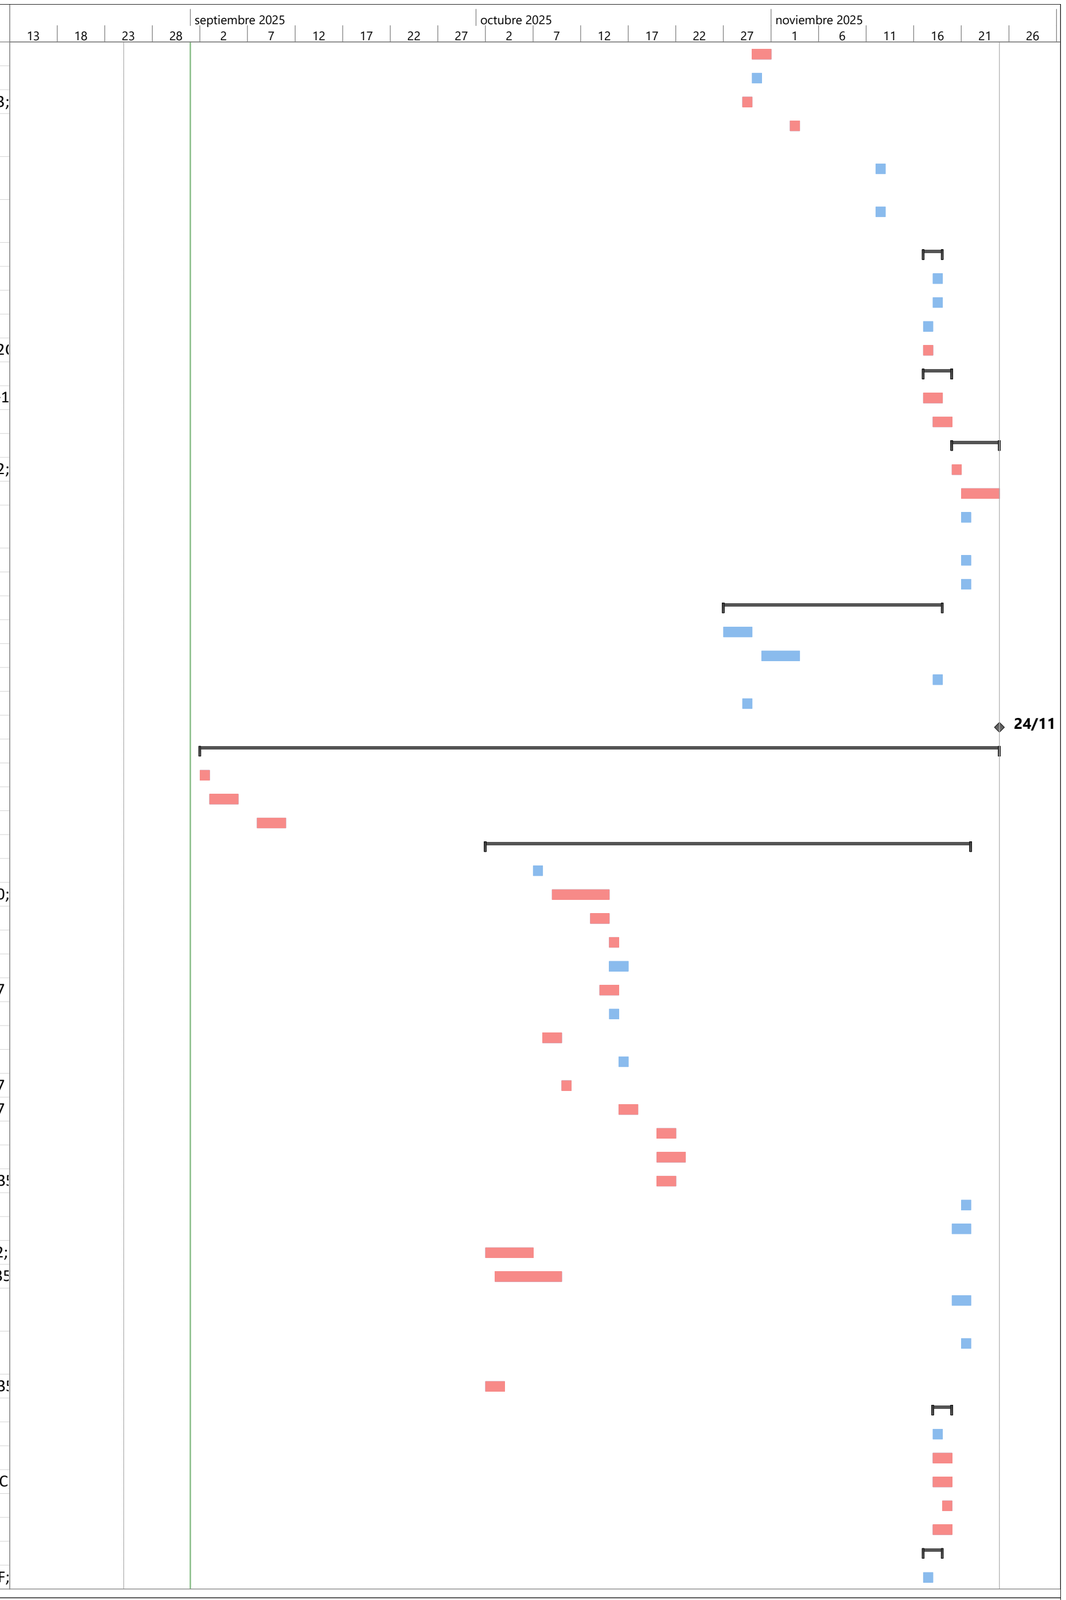

Project: PROGRAMACION NOT
Date: lun 1/09/25

División crítica · Milestone · Inactive Task · Manual Task · Manual Summary · External Tasks · Progress
Task · Summary · Inactive Milestone · Duration-only · Start-only · External Milestone · Manual Progress
Split · Project Summary · Inactive Summary · Manual Summary Rollup · Finish-only · Deadline · Tareas críticas


Id	Modo de tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	Sucesoras
283		MARCO METÁLICO PARA PUERTA DE 0,76-1,10M	1 día	lun 17/11/25	lun 17/11/25	$356.899,38	289FF	342;285FF;286FF;
284		PUERTA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 16	1 día	lun 17/11/25	lun 17/11/25	$2.340.870,64	282FF;283FF	342;357
285		REJA TIPO BANCO	1 día	lun 17/11/25	lun 17/11/25	$779.364,28	282FF;283FF	342;357
286		PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 10MM INCLUYE BISAGRA, MANIJA, CERRADURA Y PIVOTES	1 día	lun 17/11/25	lun 17/11/25	$6.652.398,52	282FF;283FF	342;287;357
287		ESPEJO BISELADO 5MM	1 día	mar 18/11/25	mar 18/11/25	$883.915,73	286	342;357
288		**CIELORRASOS**	**6 días**	**lun 10/11/25**	**lun 17/11/25**	**$24.115.065,41**		
289		CIELORRASO EN FIBRA MINERAL 60CMX60CM	6 días	lun 10/11/25	lun 17/11/25	$19.651.285,62	317CC	342;325;326;327;
290		MANTENIMIENTO DE CIELORRASO EN FIBRA MINERAL	6 días	lun 10/11/25	lun 17/11/25	$4.463.779,79	317CC	342;325;326;327;
291		**CONCRETOS Y MORTEROS**	**5 días**	**vie 24/10/25**	**jue 30/10/25**	**$3.850.051,55**		
292		PAÑETE MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO E=3CM. Incluye Filos y Dilataciones	5 días	vie 24/10/25	jue 30/10/25	$3.850.051,55	328CC	342;302FF;334CC
293		**CUBIERTAS**	**4 días**	**mié 22/10/25**	**lun 27/10/25**	**$6.273.641,42**		
294		TEJA DE FIBROCEMENTO P7 NO.5	3 días	jue 23/10/25	lun 27/10/25	$2.752.345,49	295	342;357
295		ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO	1 día	mié 22/10/25	mié 22/10/25	$286.543,17	267	342;294;298;357
296		BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC 6"	1 día	jue 23/10/25	jue 23/10/25	$649.982,28	298FF	342;297CC;357
297		FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22	3 días	jue 23/10/25	lun 27/10/25	$2.026.478,19	296CC	342;357
298		TEJA TERMO ACUSTICA UPVC E=2,2 MM	1 día	jue 23/10/25	jue 23/10/25	$558.292,29	295	342;296FF;357
299		**ENCHAPE MUROS**	**8 días**	**mié 29/10/25**	**vie 7/11/25**	**$6.327.783,45**		
300		ESTUCO EXTERIOR	3 días	lun 3/11/25	mié 5/11/25	$2.084.185,83	314CC+1 día	342;307;357
301		ESTUCO PLASTICO INTERIOR	5 días	lun 3/11/25	vie 7/11/25	$3.303.690,12	314CC+1 día	342;316;357
302		RESANE	2 días	mié 29/10/25	jue 30/10/25	$939.907,50	292FF	342;314;357
303		**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**	**3 días**	**lun 20/10/25**	**mié 22/10/25**	**$3.405.406,41**		
304		PLACA DE CONTRAPISO 3000 PSI E=10CM. Incluye acero de Refuerzo	2 días	lun 20/10/25	mar 21/10/25	$3.289.872,56	264	342;305;321;357
305		TAPA EN CONCRETO PARA CAJA DE INSPECCION 70 X 70	1 día	mié 22/10/25	mié 22/10/25	$115.533,85	304	342;357
306		**FACHADAS Y REVESTIMIENTOS**	**6 días**	**jue 6/11/25**	**jue 13/11/25**	**$10.629.705,71**		
307		LAVADO DE FACHADA E HIDRÓFUGO	3 días	jue 6/11/25	lun 10/11/25	$5.836.857,96	300	342;308;357
308		PINTURA PREMIUM DE MAXIMA RESISTENCIA Y DURABILIDAD PARA SUPERFICIES EXTERIORES EXPUESTAS A LA INTEMPERIE [3 MANOS]	3 días	mar 11/11/25	jue 13/11/25	$4.792.847,75	307	342;357
309		**IMPERMEABILIZACIÓN**	**4 días**	**lun 13/10/25**	**jue 16/10/25**	**$4.830.897,98**		
310		BICAPA MANTO 6,2MM ASFÁLTICO FOIL DE ALUMINIO REFUERZO POLIETILENO	2 días	mié 15/10/25	jue 16/10/25	$2.913.777,24	312	342;357
311		MONOCAPA MANTO ASFÁLTICO PARA VIGACANAL	2 días	mié 15/10/25	jue 16/10/25	$1.355.916,81	312	342;357
312		MORTERO DE NIVELACIÓN IMPERMEABILIZADO VIGA CANAL. 40-60 cm	2 días	lun 13/10/25	mar 14/10/25	$561.203,93	263	342;311;310;357
313		**MUROS - MAMPOSTERÍA**	**3 días**	**vie 31/10/25**	**mar 4/11/25**	**$760.810,84**		
314		MURO PANEL YESO DOBLE CARA E=12CM. Incluye terminado en pintura tipo 1 de alta calidad	3 días	vie 31/10/25	mar 4/11/25	$760.810,84	302	342;301CC+1 día;300CC+1
315		**PINTURAS**	**8 días**	**lun 10/11/25**	**mié 19/11/25**	**$25.757.533,05**		
316		ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	2 días	lun 10/11/25	mar 11/11/25	$652.879,90	301	342;317CC;357
317		PINTURA ACRILICA TIPO 1 BASE AGUA CON ACCION ANTIBACTERIAL, PREVIENE LA PROLIFERACION DE BACTERIAS, NO INFLAMABLE.	8 días	lun 10/11/25	mié 19/11/25	$20.801.614,16	316CC	342;318CC;289CC
318		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO INTUMESCENTE DE BASE ACUOSA NULLFIRE o Similar. Incluye todos los elementos necesarios para su aplicación y preparación de la superficie y elementos para trabajo en alturas. Se debe cubrir las superficies horizonta	1 día	lun 10/11/25	lun 10/11/25	$4.303.038,99	317CC	342;357
319		**PISOS**	**7 días**	**mié 22/10/25**	**jue 30/10/25**	**$5.069.458,96**		
320		PISO GRES 30,5X30,5CM	2 días	mié 29/10/25	jue 30/10/25	$2.037.821,36	323	342;357
321		ALISTADO DE PISO 4CM IMPERMEABILIZADO	2 días	mié 22/10/25	jue 23/10/25	$1.349.869,16	304	342;322;357
322		MEDIA CAÑA EN GRAVILLA LAVADA E=10CM	2 días	vie 24/10/25	lun 27/10/25	$1.297.685,22	321	342;323;357
323		SUMINISTRO RECUBRIMIENTO PARA PISO EPOXICO DE BAJO ESPESOR, DOS (2) COMPONENTES, Incluye todos los componentes para su perfecta aplicación.	1 día	mar 28/10/25	mar 28/10/25	$384.083,22	322	342;320;357
324		**RED ELÉCTRICA**	**20 días**	**jue 23/10/25**	**mié 19/11/25**	**$4.150.391,89**		
325		LUMINARIA LED 60X60CM DE SOBREPONER/DESCOLGADA	2 días	mar 18/11/25	mié 19/11/25	$2.313.091,47	289;290	342;357
326		LUMINARIA LED REDONDA 18W DE SOBREPONER/DESCOLGADA	1 día	mar 18/11/25	mar 18/11/25	$230.397,16	289;290	342;357
327		LUMINARIA LED TIPO TORTUGA PARA INTERPERIE DE SOBREPONER	2 días	mar 18/11/25	mié 19/11/25	$604.697,56	289;290	342;357
328		SALIDA LUMINARIA EN TECHO PVC	2 días	vie 24/10/25	lun 27/10/25	$684.621,15	329	342;292CC;357
329		BALANCEO DE CARGAS TABLERO ELÉCTRICO	1 día	jue 23/10/25	jue 23/10/25	$317.584,55	266	342;355CC;328;3
330		**RED HIDRÁULICA**	**6 días**	**vie 24/10/25**	**vie 31/10/25**	**$6.462.242,98**		
331		PUNTO DE AGUA FRÍA LLAVE MANGUERA. Promedio 3 ml	2 días	lun 27/10/25	mar 28/10/25	$216.236,68	334	342;332;335;357
332		CAMBIO KIT REPUESTO FLUXÓMETRO	1 día	mié 29/10/25	mié 29/10/25	$279.406,84	331	342;357
333		LIMPIEZA DE TANQUE DE AGUA POTABLE	1 día	vie 24/10/25	vie 24/10/25	$192.026,95	334CC	342;357
334		PRUEBA HIDROSTÁTICA	1 día	vie 24/10/25	vie 24/10/25	$943.355,83	292CC	342;331;333CC;3



Project: PROGRAMACION NOT
Date: lun 1/09/25

División crítica · Task · Split · Milestone · Summary · Project Summary · Inactive Task · Inactive Milestone · Inactive Summary · Manual Task · Duration-only · Manual Summary Rollup · Manual Summary · Start-only · Finish-only · External Tasks · External Milestone · Deadline · Progress · Manual Progress · Tareas críticas


Id	Modo de tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	Sucesoras
335		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESON EN GRANITO MARMOL SYLVER GREY	1 día	mié 29/10/25	mié 29/10/25	$4.326.973,36	331	342;336;357
336		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS	1 día	jue 30/10/25	jue 30/10/25	$417.117,11	335	342;337;357
337		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESAGUE PARA LAVAMANOS	1 día	vie 31/10/25	vie 31/10/25	$87.126,21	336	342;357
338		**RED SANITARIA**	**4 días**	**vie 10/10/25**	**mié 15/10/25**	**$2.455.541,45**		
339		SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS	2 días	vie 10/10/25	lun 13/10/25	$361.129,17	271	342;340;357
340		SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA	2 días	mar 14/10/25	mié 15/10/25	$2.094.412,28	339	342;357
341		**ASEO-SEÑALIZACIÓN**	**36 días**	**lun 6/10/25**	**lun 24/11/25**	**$5.642.609,04**		
342		ASEO GENERAL DE OBRA	2 días	jue 20/11/25	vie 21/11/25	$1.098.901,83	254;255;256;257;258;2	272FF;273FF;343;
343		SUMINISTRO E INSTALACION AVISO ORIP PANAFLEX DE ALTA CALIDAD PARA EXTERIORES CON PROTECCION UV CON CAJA PERIMETRAL EN ALUMINIO	1 día	lun 24/11/25	lun 24/11/25	$498.626,55	342	357
344		CINTA ANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA	1 día	lun 24/11/25	lun 24/11/25	$70.830,44	342	357
345		PLACA DE SEÑALIZACIÓN ACRILICO 21 X 30CM. Diseño SNR. Incluye elementos de instalación.	1 día	lun 24/11/25	lun 24/11/25	$575.973,77	342	357
346		PLACA DE SEÑALIZACIÓN BRAILE E IDIOMA DE SEÑAS 50X30	1 día	lun 24/11/25	lun 24/11/25	$2.188.537,14	342	357
347		PODA CESPED	1 día	lun 6/10/25	lun 6/10/25	$221.035,02	274	357
348		SUMINISTRO DE PUNTO ECOLÓGICO. 3 PUESTOS 53LT	1 día	lun 24/11/25	lun 24/11/25	$988.704,29	342	357
349		**OTROS (Actividades Complementarias)**	**23 días**	**jue 23/10/25**	**lun 24/11/25**	**$3.441.441,19**		
350		DESMONTE, TRASLADO Y REINSTALACION MUEBLES ESPECIALES (tarjeteros, Mesas (pequeñas y medianas) archivos de escritorio, tándem hasta 3 puestos, sillas)	2 días	jue 20/11/25	vie 21/11/25	$559.108,16	342FF	357;351FF
351		DESMONTE, TRASLADO Y REINSTALACION ESCRITORIO MODULAR (Incluye Silla y división respectiva)	1 día	vie 21/11/25	vie 21/11/25	$364.690,96	350FF	357;352FF
352		DESMONTE DE ESTANTE DE ARCHIVO RODANTE O FIJO INCLUIDA PUERTAS Y ESTRUCTURA EXISTENTE, UBICANDOLO EN EL LUGAR DESTINADO POR LA ORIP	2 días	jue 20/11/25	vie 21/11/25	$1.630.887,35	351FF	357;353FF
353		DESMONSTE, TRASLADO Y REINSTALACION DE APARATOS DE SOBREPONER (Extintores, relojes, dispensadores de Gel y papel, equipos de emergencia (Botiquín, Camilla), Buzón de sugerencias)	1 día	vie 21/11/25	vie 21/11/25	$264.399,90	352FF	357;354
354		TRASLADO CAJAS DE DOCUMENTACION en tamaños 31 cm x 41cm x 27,5cm h y 35cm x 47,5 x 27 h, o tamaños similares	1 día	lun 24/11/25	lun 24/11/25	$152.438,04	353	357
355		SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA COOPERWELD 5/8"	1 día	jue 23/10/25	jue 23/10/25	$412.099,50	329CC	342;357
356		RETIRO AVISO ORIP Y UBICACIÓN DONDE INDIQUE LA ENTIDAD	1 día	lun 24/11/25	lun 24/11/25	$57.817,28	342	357
357		RECIBO A SATISFACCIÓN INTERVENCIÓN SEDE	0 días	lun 24/11/25	lun 24/11/25	$0,00	254;255;256;257;258;2	833
358		**RAMIRIQUI**	**59 días**	**mié 3/09/25**	**lun 24/11/25**	**$204.250.939,45**		
359		VISITA INICIAL	1 día	mié 3/09/25	mié 3/09/25	$0,00	2FC+7 días;250	360
360		APROBACIÓN PERSONAL	3 días	jue 4/09/25	lun 8/09/25	$0,00	359	361
361		APROBACIÓN PRESUPUESTO INTERVENTORIA Y ENTIDAD	3 días	mar 9/09/25	jue 11/09/25	$0,00	360	375FC+24 días
362		**PRELIMINARES**	**28 días**	**jue 16/10/25**	**lun 24/11/25**	**$20.293.843,46**		
363		DESMONTE DE CIELORRASO	4 días	jue 23/10/25	mar 28/10/25	$1.591.981,72	364FF	454;365FF;439
364		DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS	2 días	lun 27/10/25	mar 28/10/25	$172.713,73	367FF	454;363FF;439
365		DESMONTE DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	3 días	vie 24/10/25	mar 28/10/25	$878.314,26	363FF	454;370CC;391;43
366		DESMONTE DE CUBIERTA	4 días	vie 24/10/25	mié 29/10/25	$3.530.499,98	369	454;367CC;439
367		DESMONTE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA	3 días	vie 24/10/25	mar 28/10/25	$4.074.163,94	366CC	454;364FF;439
368		DESMONTE IMPERMEABILIZACIÓN EN MANTO ASFÁLTICO	2 días	mar 21/10/25	mié 22/10/25	$310.603,75	373CC+3 días	454;369;390;439
369		DESMONTA DE MANTO EN VIGA CANAL	1 día	jue 23/10/25	jue 23/10/25	$284.755,90	368	454;366;439
370		DEMOLICIÓN DE ANDÉN EN CONCRETO (E=8-13CM)	1 día	vie 24/10/25	vie 24/10/25	$117.879,48	365CC	454;371CC;408;37
371		REGATA SOBRE MURO+RESANE	2 días	vie 24/10/25	lun 27/10/25	$480.794,65	370CC	454;439
372		INSTALACIÓN DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	4 días	lun 10/11/25	jue 13/11/25	$641.070,15	414CC	454;439
373		RECORRIDO DE CUBIERTA TEJA ONDULADA	6 días	jue 16/10/25	jue 23/10/25	$3.094.443,17	375CC	454;368CC+3 días
374		GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL	2 días	vie 21/11/25	lun 24/11/25	$2.148.355,44	439	454
375		CERRAMIENTO EN LONA VERDE H=2.10 M	3 días	jue 16/10/25	lun 20/10/25	$2.431.609,63	361FC+24 días;5	454;444;373CC;43
376		RETIRO DE PINTURA EXISTENTE SOBRE PISO	2 días	lun 27/10/25	mar 28/10/25	$536.657,66	370	454;439
377		**CARPINTERÍA EN MADERA**	**7 días**	**mar 11/11/25**	**mié 19/11/25**	**$10.726.396,74**		
378		MANTENIMIENTO BARANDAS EN MADERA	4 días	mar 11/11/25	vie 14/11/25	$712.316,18	411	454;439;379CC;44
379		MANTENIMIENTO PUERTA EN MADERA	4 días	mar 11/11/25	vie 14/11/25	$7.556.695,75	378CC	454;439;380
380		BRAZO HIDRÁULICO PARA PUERTA 150KG	1 día	lun 17/11/25	lun 17/11/25	$881.839,08	379	454;439;381
381		MANTENIMIENTO DE MUEBLE	2 días	mar 18/11/25	mié 19/11/25	$1.575.545,73	380	454;439
382		**CARPINTERÍA METÁLICA**	**1 día**	**jue 20/11/25**	**jue 20/11/25**	**$354.488,74**		
383		HERRAJES, TORNILLERÍA, LUBRICANTE Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA ARCHIVO RODANTE	1 día	jue 20/11/25	jue 20/11/25	$354.488,74	449CC	454
384		**CIELORRASOS**	**7 días**	**jue 6/11/25**	**vie 14/11/25**	**$21.401.125,83**		
385		CIELORRASO EN TABLILLA DE PVC 7 mm	7 días	jue 6/11/25	vie 14/11/25	$15.449.418,59	400	454;386FF;439
386		MANTENIMIENTO DE CIELORRASO EN FIBRA MINERAL	7 días	jue 6/11/25	vie 14/11/25	$5.951.707,24	385FF	454;439
387		**CONCRETOS Y MORTEROS**	**4 días**	**jue 30/10/25**	**mar 4/11/25**	**$3.850.051,55**		

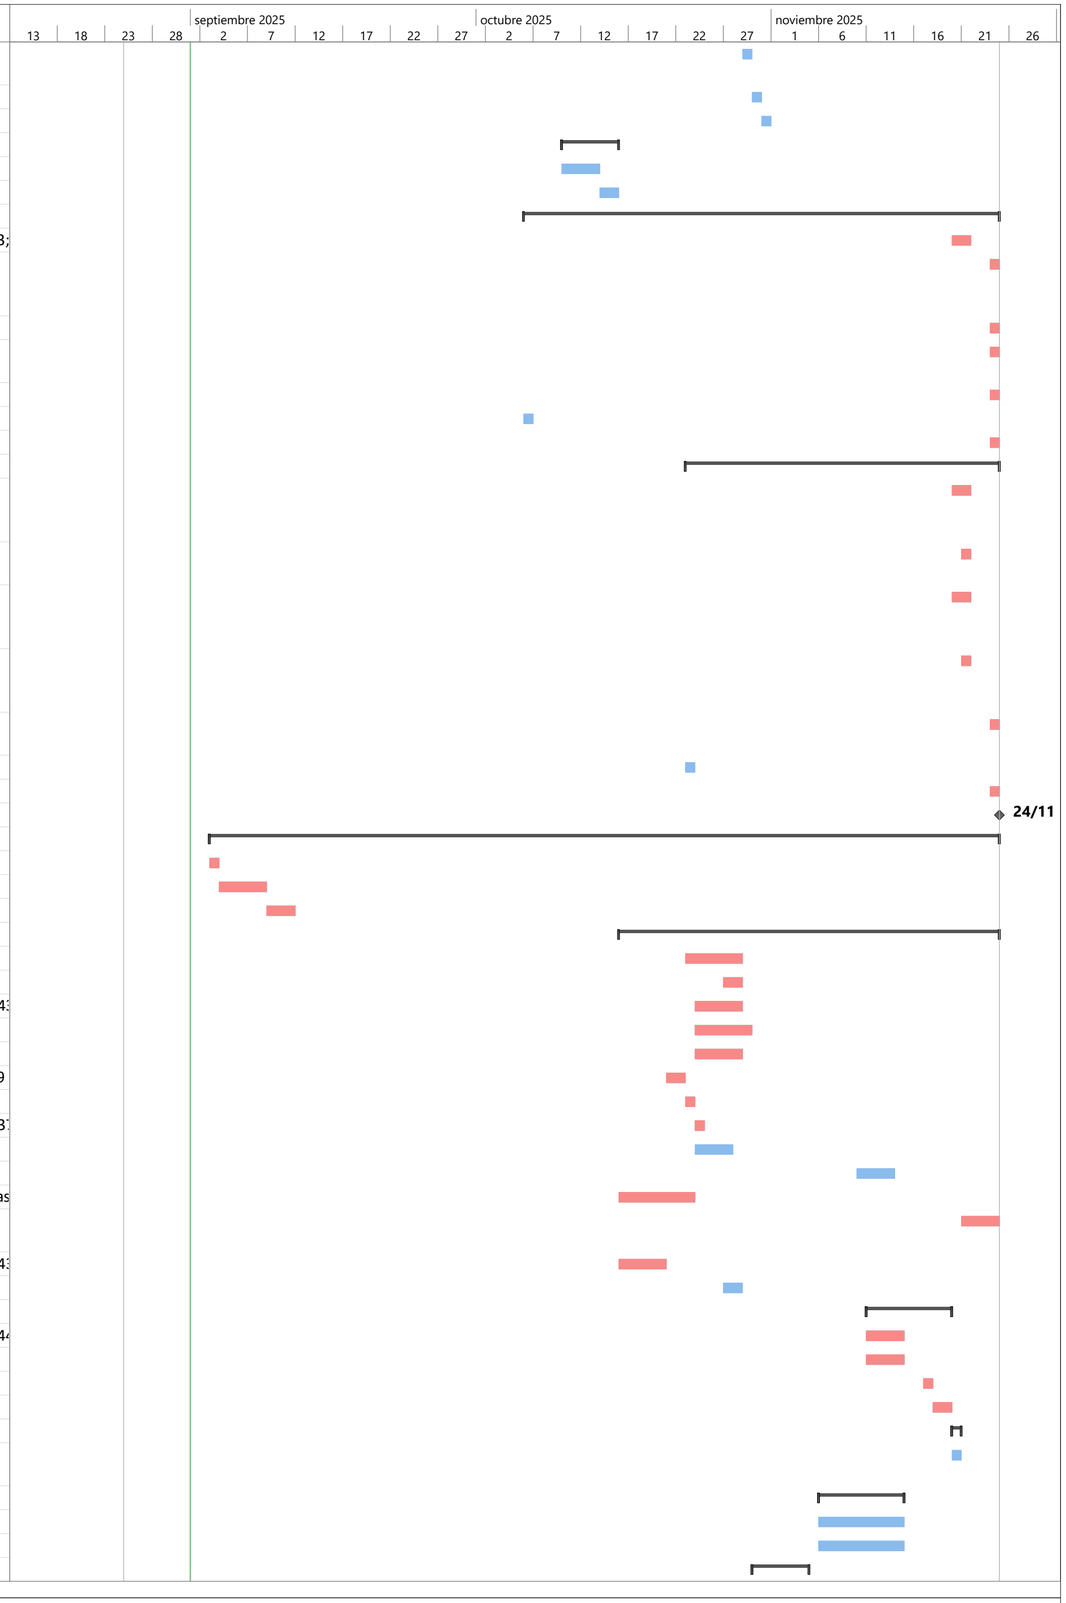

Project: PROGRAMACION NOT
Date: lun 1/09/25

División crítica
Task
Split
Milestone
Summary
Project Summary
Inactive Task
Inactive Milestone
Inactive Summary
Manual Task
Duration-only
Manual Summary Rollup
Manual Summary
Start-only
Finish-only
External Tasks
External Milestone
Deadline
Progress
Manual Progress
Tareas críticas


Id	Modo de tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	Sucesoras
388		PAÑETE MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO E=3CM. Incluye Filos y Dilataciones	4 días	jue 30/10/25	mar 4/11/25	$3.850.051,55	408	454;396;439;397
389		**CUBIERTAS**	**13 días**	**jue 23/10/25**	**lun 10/11/25**	**$29.721.141,23**		
390		AFINADOS CUBIERTAS PLANAS E=0,03M	2 días	jue 23/10/25	vie 24/10/25	$963.909,43	368	454;405;439
391		ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO	4 días	mié 29/10/25	lun 3/11/25	$9.169.378,95	365	454;393;439
392		FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22	2 días	vie 7/11/25	lun 10/11/25	$1.722.505,95	393FF	454;439
393		TEJA TERMO ACUSTICA UPVC E=2,2 MM	5 días	mar 4/11/25	lun 10/11/25	$17.865.346,90	391	454;392FF;439
394		**ENCHAPE MUROS**	**5 días**	**mié 5/11/25**	**mar 11/11/25**	**$6.511.573,91**		
395		ESTUCO EXTERIOR	5 días	mié 5/11/25	mar 11/11/25	$3.126.280,02	396CC	454;412CC+1 día;
396		RESANE	3 días	mié 5/11/25	vie 7/11/25	$1.762.326,88	388	454;395CC;439
397		CERÁMICA FORMATO 25X35CM	2 días	mié 5/11/25	jue 6/11/25	$1.622.967,01	388	454;439
398		**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**	**5 días**	**jue 30/10/25**	**mié 5/11/25**	**$4.654.159,70**		
399		COLUMNETA DE CONFINAMIENTO 12X20CM	5 días	jue 30/10/25	mié 5/11/25	$532.997,71	408	454;400CC;439
400		VIGACINTA DE AMARRE 12X20CM	5 días	jue 30/10/25	mié 5/11/25	$4.121.161,99	399CC	454;385;439
401		**FACHADAS Y REVESTIMIENTOS**	**6 días**	**mié 12/11/25**	**mié 19/11/25**	**$19.713.196,29**		
402		LAVADO DE FACHADA E HIDRÓFUGO	6 días	mié 12/11/25	mié 19/11/25	$9.728.097,03	403CC	454;439
403		PINTURA PREMIUM DE MAXIMA RESISTENCIA Y DURABILIDAD PARA SUPERFICIES EXTERIORES EXPUESTAS A LA INTEMPERIE [3 MANOS]	6 días	mié 12/11/25	mié 19/11/25	$9.985.099,26	395	454;402CC;439
404		**IMPERMEABILIZACIÓN**	**2 días**	**lun 27/10/25**	**mar 28/10/25**	**$5.530.407,51**		
405		BICAPA MANTO 6,2MM ASFÁLTICO FOIL DE ALUMINIO REFUERZO POLIETILENO	2 días	lun 27/10/25	mar 28/10/25	$3.496.532,94	390	454;406CC;439
406		MONOCAPA MANTO ASFÁLTICO PARA VIGACANAL	1 día	lun 27/10/25	lun 27/10/25	$2.033.874,57	405CC	454;439
407		**MUROS - MAMPOSTERÍA**	**3 días**	**lun 27/10/25**	**mié 29/10/25**	**$4.927.342,97**		
408		MURO LADRILLO PRENSADO LIVIANO	3 días	lun 27/10/25	mié 29/10/25	$4.927.342,97	370	454;399;388;437;
409		**PINTURAS**	**11 días**	**jue 6/11/25**	**jue 20/11/25**	**$49.484.151,61**		
410		ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LLENA	3 días	jue 6/11/25	lun 10/11/25	$2.258.359,21	412CC	454;411CC;439
411		ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	3 días	jue 6/11/25	lun 10/11/25	$2.313.286,52	410CC	454;419CC;439;3
412		PINTURA ACRILICA TIPO 1 BASE AGUA CON ACCION ANTIBACTERIAL, PREVIENE LA PROLIFERACION DE BACTERIAS, NO INFLAMABLE.	11 días	jue 6/11/25	jue 20/11/25	$44.912.505,88	395CC+1 día	454;410CC;439FF
413		**RED ELÉCTRICA**	**4 días**	**jue 6/11/25**	**mar 11/11/25**	**$7.356.019,28**		
414		LUMINARIA LED 60X60CM DE SOBREPONER/DESCOLGADA	1 día	lun 10/11/25	lun 10/11/25	$462.618,55	418	454;415CC;416CC
415		LUMINARIA LED 60X60CM PARA TECHO MODULAR	2 días	lun 10/11/25	mar 11/11/25	$1.072.296,75	414CC	454;429CC;439
416		LUMINARIA LED REDONDA 18W PARA TECHO MODULAR	1 día	lun 10/11/25	lun 10/11/25	$222.841,42	414CC	454;439
417		LUMINARIA LED TIPO TORTUGA PARA INTERPERIE DE SOBREPONER	2 días	lun 10/11/25	mar 11/11/25	$345.542,19	414CC	454;439
418		SALIDA TOMA CORRIENTE GFCI EN MURO EMT	1 día	vie 7/11/25	vie 7/11/25	$589.272,48	419	454;414;421;439
419		BALANCEO DE CARGAS TABLERO ELÉCTRICO	1 día	jue 6/11/25	jue 6/11/25	$317.584,55	411CC	454;452CC;418;4
420		PUNTO DE CABLEADO ESTRUCTURADO. Promedio 20 ml Cable UTP Cat 6A. Incluye punto de eléctrico red normal y regulada.	1 día	vie 7/11/25	vie 7/11/25	$2.627.874,01	419	454;439
421		SUMINISTRO E INSTALACION EXTRACTOR BAÑO EXTRA SILENC BAJO CONSUMO SILENT100	1 día	lun 10/11/25	lun 10/11/25	$713.698,06	418	454;439
422		SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA EMERGENCIA LED R.1 2 X 16W TIPO MICKEY	1 día	lun 10/11/25	lun 10/11/25	$1.004.291,27	414CC	454;439
423		**RED HIDRÁULICA**	**7 días**	**lun 10/11/25**	**mar 18/11/25**	**$3.663.951,14**		
424		TUBERÍA PVCP 1"	1 día	mié 12/11/25	mié 12/11/25	$113.008,47	429	454;428CC;431;4
425		TAPA REGISTRO 20X20CM	1 día	vie 14/11/25	vie 14/11/25	$32.247,34	431	454;426;427;439
426		CAMBIO KIT REPUESTO FLUXÓMETRO	2 días	lun 17/11/25	mar 18/11/25	$558.812,41	425	454;439
427		LAVAMANOS DE PEDESTAL. Incluye Grifería	2 días	lun 17/11/25	mar 18/11/25	$1.497.227,11	425	454;430CC;435CC
428		LIMPIEZA DE TANQUE DE AGUA POTABLE	2 días	mié 12/11/25	jue 13/11/25	$192.026,95	424CC	454;439
429		PRUEBA HIDROSTÁTICA	2 días	lun 10/11/25	mar 11/11/25	$943.355,83	415CC	454;424;433CC;4
430		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESAGUE PARA LAVAMANOS	1 día	lun 17/11/25	lun 17/11/25	$261.378,62	427CC	454;439
431		SUMINISTRO E INSTALACION VÁLVULA DE REGISTRO METÁLICA 1/2" ROSCADA -BOLA MANIJA	1 día	jue 13/11/25	jue 13/11/25	$65.894,41	424	454;425;439
432		**RED SANITARIA**	**6 días**	**lun 10/11/25**	**lun 17/11/25**	**$3.643.168,09**		
433		SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS	2 días	lun 10/11/25	mar 11/11/25	$1.083.386,24	429CC	454;434CC;439
434		SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA	1 día	lun 10/11/25	lun 10/11/25	$1.047.206,14	433CC	454;439
435		SANITARIO TIPO AHORRADOR	1 día	lun 17/11/25	lun 17/11/25	$1.512.575,71	427CC	454;439
436		**URBANISMO**	**4 días**	**jue 30/10/25**	**mar 4/11/25**	**$304.461,76**		
437		SARDINEL EN CONCRETO 12X40CM	4 días	jue 30/10/25	mar 4/11/25	$304.461,76	408	454;439
438		**ASEO-SEÑALIZACIÓN**	**24 días**	**mar 21/10/25**	**vie 21/11/25**	**$5.696.164,67**		
439		ASEO GENERAL DE OBRA	1 día	jue 20/11/25	jue 20/11/25	$1.098.901,83	363;364;365;366;367;3	454;374;448CC;4
440		SUMINISTRO E INSTALACION AVISO ORIP PANAFLEX DE ALTA CALIDAD PARA EXTERIORES CON PROTECCION UV CON CAJA PERIMETRAL EN ALUMINIO	1 día	jue 20/11/25	jue 20/11/25	$498.626,55	439FF	454;441CC;442CC
441		CINTA ANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA	2 días	jue 20/11/25	vie 21/11/25	$1.038.846,00	440CC	454

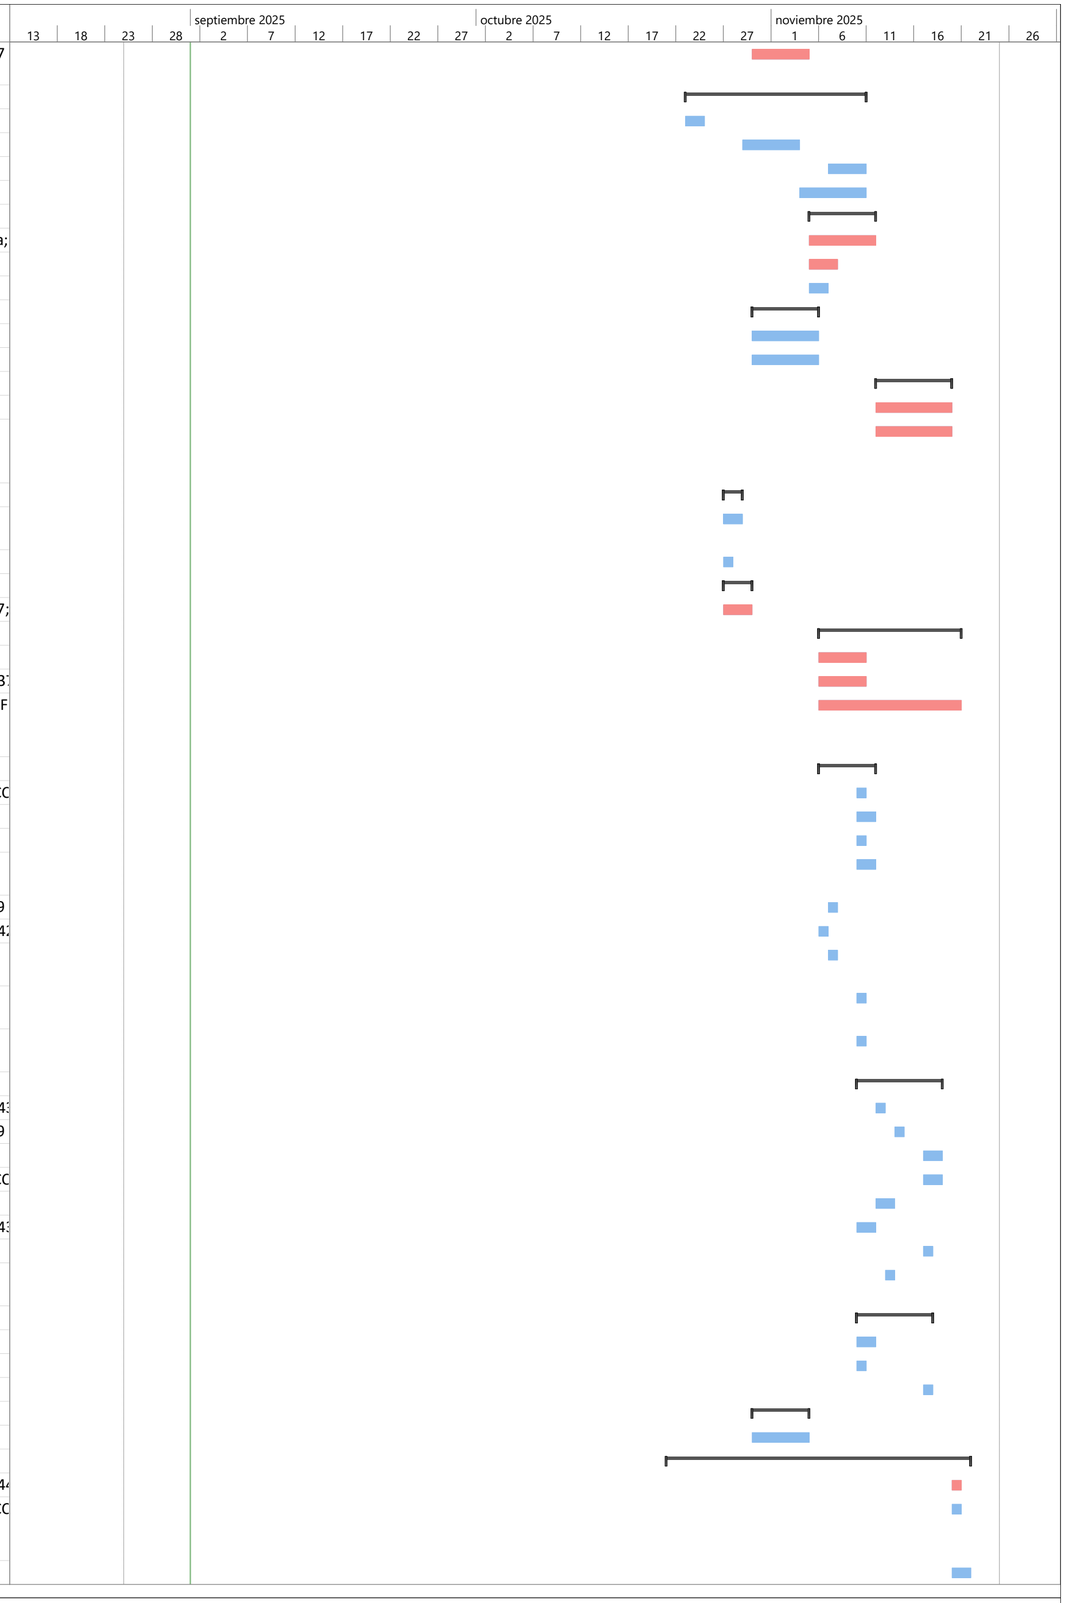

Project: PROGRAMACION NOT
Date: lun 1/09/25

División crítica
Task
Split
Milestone
Summary
Project Summary
Inactive Task
Inactive Milestone
Inactive Summary
Manual Task
Duration-only
Manual Summary Rollup
Manual Summary
Start-only
Finish-only
External Tasks
External Milestone
Deadline
Progress
Manual Progress
Tareas críticas


Id	Modo de tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	Sucesoras
442		PLACA DE SEÑALIZACIÓN ACRILICO 21 X 30CM. Diseño SNR. Incluye elementos de instalación.	1 día	jue 20/11/25	jue 20/11/25	$921.558,03	440CC	454
443		PLACA DE SEÑALIZACIÓN BRAILE E IDIOMA DE SEÑAS 50X30	1 día	jue 20/11/25	jue 20/11/25	$1.094.269,21	440CC	454
444		PODA CESPED	1 día	mar 21/10/25	mar 21/10/25	$55.258,76	375	454
445		SUMINISTRO DE PUNTO ECOLÓGICO. 3 PUESTOS 53LT	1 día	vie 21/11/25	vie 21/11/25	$988.704,29	439	454
446		**OTROS (Actividades Complementarias)**	**13 días**	**jue 6/11/25**	**lun 24/11/25**	**$6.419.294,97**		
447		MANTENIMIENTO REJA METALICA	4 días	mar 11/11/25	vie 14/11/25	$2.670.213,95	378CC	454;439
448		DESMONTE, TRASLADO Y REUBICACION ARCHIVADOR DE PISO	2 días	jue 20/11/25	vie 21/11/25	$597.846,78	439CC	454
449		DESMONTE DE ESTANTE DE ARCHIVO RODANTE O FIJO INCLUIDA PUERTAS Y ESTRUCTURA EXISTENTE, UBICANDOLO EN EL LUGAR DESTINADO POR LA ORIP	2 días	jue 20/11/25	vie 21/11/25	$2.075.673,99	439CC	454;451;383CC
450		DESMONTE, TRASLADO Y REINSTALACION DE APARATOS ELECTRICOS (Nevera, Microondas, Congelador, estufa, dispensador de agua)	1 día	vie 21/11/25	vie 21/11/25	$148.329,36	439	454
451		TRASLADO CAJAS DE DOCUMENTACION en tamaños 31 cm x 41cm x 27,5cm h y 35cm x 47,5 x 27 h, o tamaños similares	1 día	lun 24/11/25	lun 24/11/25	$457.314,11	449	454
452		SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA COOPERWELD 5/8"	1 día	jue 6/11/25	jue 6/11/25	$412.099,50	419CC	454;439
453		RETIRO AVISO ORIP Y UBICACIÓN DONDE INDIQUE LA ENTIDAD	1 día	vie 21/11/25	vie 21/11/25	$57.817,28	439	454
454		RECIBO A SATISFACCIÓN INTERVENCIÓN SEDE	0 días	lun 24/11/25	lun 24/11/25	$0,00	363;364;365;366;367;3	833
455		**FRESNO**	**58 días**	**jue 4/09/25**	**lun 24/11/25**	**$56.995.924,69**		
456		VISITA INICIAL	1 día	jue 4/09/25	jue 4/09/25	$0,00	2FC+7 días;514	457
457		APROBACIÓN PERSONAL	3 días	vie 5/09/25	mar 9/09/25	$0,00	456	458
458		APROBACIÓN PRESUPUESTO INTERVENTORIA Y ENTIDAD	3 días	mié 10/09/25	vie 12/09/25	$0,00	457	469FC+35 días
459		**PRELIMINARES**	**16 días**	**lun 3/11/25**	**lun 24/11/25**	**$7.967.714,21**		
460		DESMONTE DE CANALETA PLÁSTICA Y METÁLICA DE RED DE VOZ Y DATOS	2 días	mié 5/11/25	jue 6/11/25	$190.559,65	464	461FF;504;512
461		DESMONTE DE PUNTO DE RED DE VOZ Y DATOS	1 día	jue 6/11/25	jue 6/11/25	$114.335,54	460FF	462FF;504;512
462		DESMONTE DE CIELORRASO	2 días	mié 5/11/25	jue 6/11/25	$568.564,63	461FF	466FF;504;512
463		DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS	1 día	lun 3/11/25	lun 3/11/25	$57.571,24	470CC	464;504;512
464		DESMONTE DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	1 día	mar 4/11/25	mar 4/11/25	$129.164,01	463	460;504;512
465		DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO	1 día	vie 7/11/25	vie 7/11/25	$66.339,32	466	481;486;504;512
466		DEMOLICIÓN DE PAÑETE MURO (E=1-3CM)	1 día	jue 6/11/25	jue 6/11/25	$194.630,09	462FF	465;510;504;512
467		INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS	1 día	mar 18/11/25	mar 18/11/25	$62.508,54	497CC	504;512
468		INSTALACIÓN DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	1 día	jue 20/11/25	jue 20/11/25	$145.698,17	495CC	504;512
469		PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA	1 día	lun 3/11/25	lun 3/11/25	$101.996,75	458FC+35 días;5	470CC;504;512
470		RECORRIDO DE CUBIERTA TEJA ONDULADA	5 días	lun 3/11/25	vie 7/11/25	$5.824.832,77	469CC	463CC;504;512;48
471		GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL	1 día	lun 24/11/25	lun 24/11/25	$511.513,50	504CC	512
472		**CARPINTERÍA EN MADERA**	**2 días**	**jue 20/11/25**	**vie 21/11/25**	**$1.881.887,82**		
473		MANTENIMIENTO PUERTA EN MADERA	1 día	jue 20/11/25	jue 20/11/25	$755.669,58	479	504;512;474;476
474		CERRADURA DE POMO PARA OFICINA	1 día	vie 21/11/25	vie 21/11/25	$1.126.218,24	473	504;512
475		**CARPINTERÍA METÁLICA**	**2 días**	**jue 20/11/25**	**vie 21/11/25**	**$1.471.599,81**		
476		MARCO METÁLICO PARA PUERTA DE 0,76-1,10M	1 día	jue 20/11/25	jue 20/11/25	$356.899,38	473CC	504;512;477
477		PUERTA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 16	1 día	vie 21/11/25	vie 21/11/25	$1.114.700,43	476	504;512
478		**CIELORRASOS**	**4 días**	**vie 14/11/25**	**mié 19/11/25**	**$7.439.633,42**		
479		MANTENIMIENTO DE CIELORRASO EN FIBRA MINERAL	4 días	vie 14/11/25	mié 19/11/25	$7.439.633,42	490	504;512;473;495
480		**CONCRETOS Y MORTEROS**	**3 días**	**lun 10/11/25**	**mié 12/11/25**	**$2.406.281,90**		
481		PAÑETE MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO E=3CM. Incluye Filos y Dilataciones	3 días	lun 10/11/25	mié 12/11/25	$2.406.281,90	465	490CC;504;512
482		**CUBIERTAS**	**2 días**	**mié 12/11/25**	**jue 13/11/25**	**$4.052.955,10**		
483		FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22	2 días	mié 12/11/25	jue 13/11/25	$4.052.955,10	488	504;512
484		**FACHADAS Y REVESTIMIENTOS**	**10 días**	**lun 10/11/25**	**vie 21/11/25**	**$7.646.940,12**		
485		PINTURA PREMIUM DE MAXIMA RESISTENCIA Y DURABILIDAD PARA SUPERFICIES EXTERIORES EXPUESTAS A LA INTEMPERIE [3 MANOS]	5 días	lun 17/11/25	vie 21/11/25	$4.792.847,75	486	504;512
486		LAVADO FACHADA	5 días	lun 10/11/25	vie 14/11/25	$2.854.092,37	465	485;504;512
487		**IMPERMEABILIZACIÓN**	**2 días**	**lun 10/11/25**	**mar 11/11/25**	**$2.748.711,03**		
488		MONOCAPA MANTO 3,6MM ASFÁLTICO FOIL DE ALUMINIO REFUERZO POLIETILENO	2 días	lun 10/11/25	mar 11/11/25	$2.748.711,03	470	504;512;483
489		**PINTURAS**	**4 días**	**lun 10/11/25**	**jue 13/11/25**	**$10.803.706,98**		
490		VINILO TIPO 1, 3 MANOS. Alta Calidad, Pintura Premium base agua, máxima lavabilidad y durabilidad	4 días	lun 10/11/25	jue 13/11/25	$10.803.706,98	481CC	492;504;512;479
491		**PISOS**	**2 días**	**vie 14/11/25**	**lun 17/11/25**	**$2.814.846,38**		
492		PISO GRANITO MARMOL	2 días	vie 14/11/25	lun 17/11/25	$1.041.181,43	490	493FF;504;512;49
493		GUARDAESCOBA EN MADERA 8CM	2 días	vie 14/11/25	lun 17/11/25	$1.773.664,95	492FF	504;512
494		**RED ELÉCTRICA**	**1 día**	**jue 20/11/25**	**jue 20/11/25**	**$1.072.296,75**		
495		LUMINARIA LED 60X60CM PARA TECHO MODULAR	1 día	jue 20/11/25	jue 20/11/25	$1.072.296,75	479	504;512;468CC

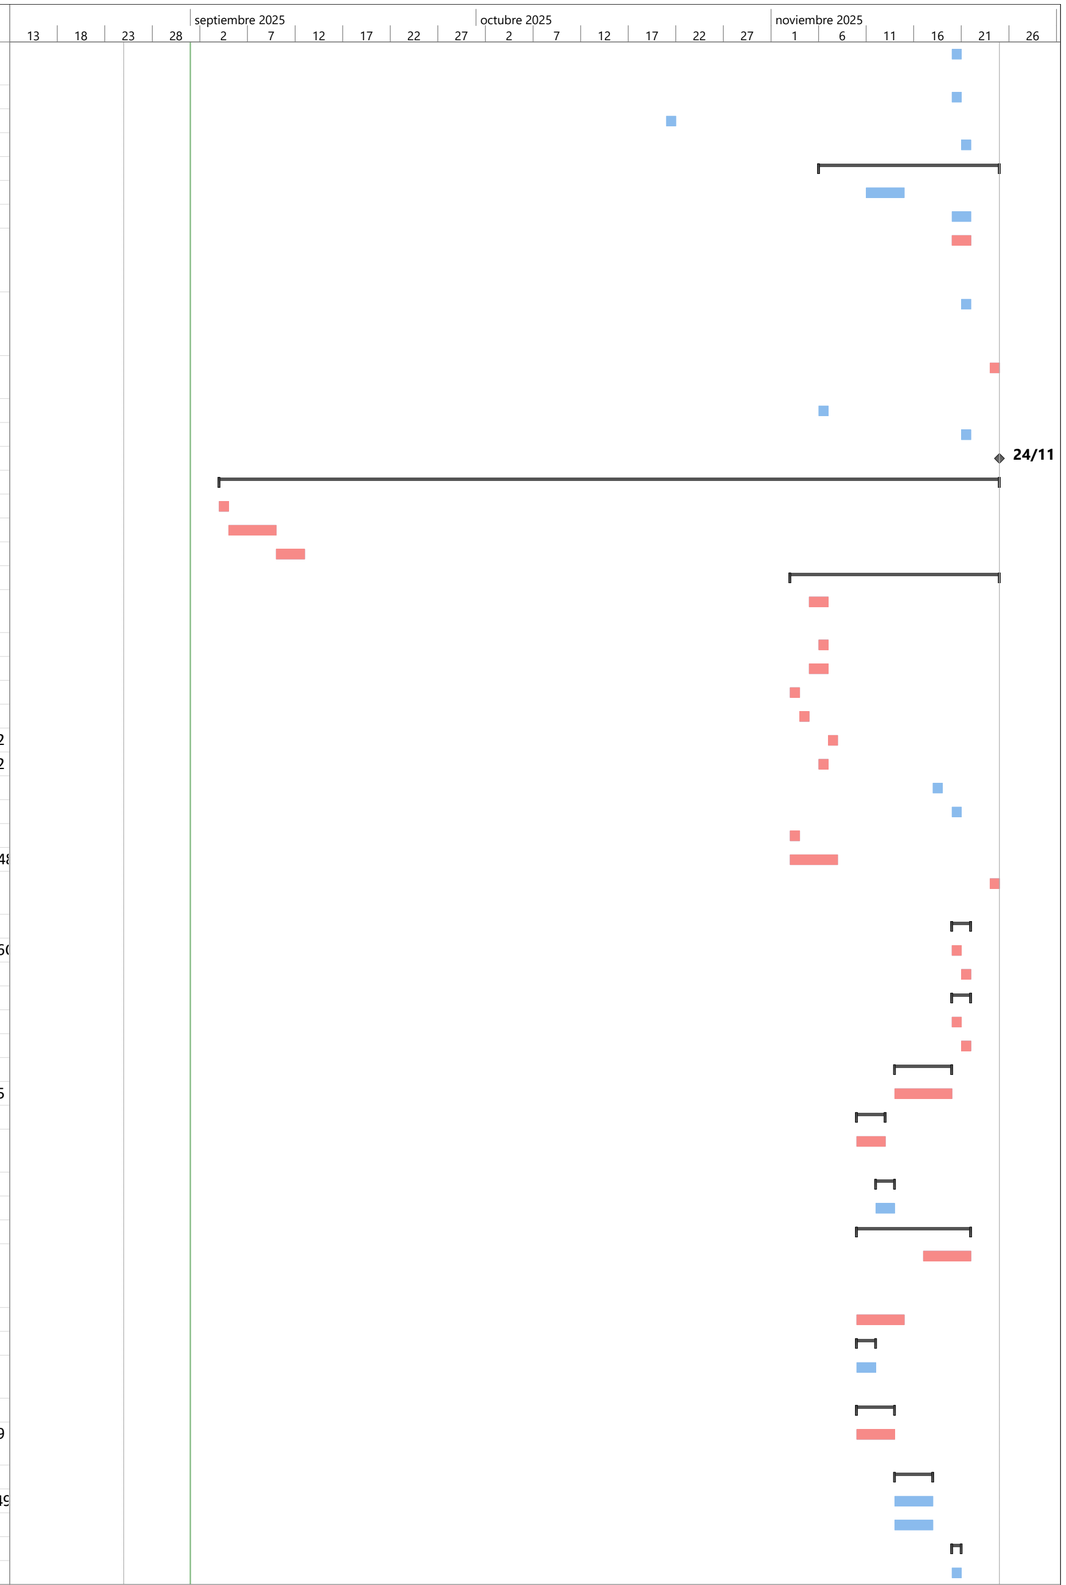

Project: PROGRAMACION NOT
Date: lun 1/09/25

División crítica · Milestone · Inactive Task · Manual Task · Manual Summary · External Tasks · Progress
Task · Summary · Inactive Milestone · Duration-only · Start-only · External Milestone · Manual Progress
Split · Project Summary · Inactive Summary · Manual Summary Rollup · Finish-only · Deadline · Tareas críticas


Id	Modo de tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	Sucesoras
496		**RED HIDRÁULICA**	**1 día**	**mar 18/11/25**	**mar 18/11/25**	**$691.102,23**		
497		LAVAMANOS DE PEDESTAL. Incluye Grifería	1 día	mar 18/11/25	mar 18/11/25	$499.075,28	492	504;512;467CC;4
498		LIMPIEZA DE TANQUE DE AGUA POTABLE	1 día	mar 18/11/25	mar 18/11/25	$192.026,95	497CC	504;512;500CC
499		**RED SANITARIA**	**3 días**	**mar 18/11/25**	**jue 20/11/25**	**$1.984.752,71**		
500		SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS	1 día	mar 18/11/25	mar 18/11/25	$433.354,24	498CC	504;512;501
501		SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA	2 días	mié 19/11/25	jue 20/11/25	$1.047.206,14	500	504;512
502		SANITARIO TIPO AHORRADOR	1 día	mar 18/11/25	mar 18/11/25	$504.192,33	492	504;512
503		**ASEO-SEÑALIZACIÓN**	**1 día**	**lun 24/11/25**	**lun 24/11/25**	**$3.453.050,80**		
504		ASEO GENERAL DE OBRA	1 día	lun 24/11/25	lun 24/11/25	$549.451,55	460;461;462;463;464;4	511CC;505CC;506
505		SUMINISTRO E INSTALACION AVISO ORIP PANAFLEX DE ALTA CALIDAD PARA EXTERIORES CON PROTECCION UV CON CAJA PERIMETRAL EN ALUMINIO	1 día	lun 24/11/25	lun 24/11/25	$997.254,38	504CC	512
506		CINTA ANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA	1 día	lun 24/11/25	lun 24/11/25	$236.101,89	504FF	512
507		PLACA DE SEÑALIZACIÓN ACRILICO 21 X 30CM. Diseño SNR. Incluye elementos de instalación.	1 día	lun 24/11/25	lun 24/11/25	$575.973,77	504FF	512
508		PLACA DE SEÑALIZACIÓN BRAILE E IDIOMA DE SEÑAS 50X30	1 día	lun 24/11/25	lun 24/11/25	$1.094.269,21	504CC	512
509		**ADICIONALES**	**12 días**	**vie 7/11/25**	**lun 24/11/25**	**$560.445,43**		
510		MANTENIMIENTO REJA METALICA	2 días	vie 7/11/25	lun 10/11/25	$502.628,15	466	504;512
511		RETIRO AVISO ORIP Y UBICACIÓN DONDE INDIQUE LA ENTIDAD	1 día	lun 24/11/25	lun 24/11/25	$57.817,28	504CC	512
512		RECIBO A SATISFACCIÓN INTERVENCIÓN SEDE	0 días	lun 24/11/25	lun 24/11/25	$0,00	460;461;462;463;464;4	833
513		**GUAMO**	**58 días**	**mié 3/09/25**	**lun 24/11/25**	**$108.384.863,32**		
514		VISITA INICIAL	0 días	mié 3/09/25	mié 3/09/25	$0,00	2FC+7 días;587FC+1 día	515;456
515		APROBACIÓN PERSONAL	3 días	jue 4/09/25	lun 8/09/25	$0,00	514	516
516		APROBACIÓN PRESUPUESTO INTERVENTORIA Y ENTIDAD	3 días	mar 9/09/25	jue 11/09/25	$0,00	515	529FC+19 días
517		**PRELIMINARES**	**33 días**	**jue 9/10/25**	**lun 24/11/25**	**$17.610.550,07**		
518		DESMONTE DE CANALETA PLÁSTICA Y METÁLICA DE RED DE VOZ Y DATOS	1 día	vie 10/10/25	vie 10/10/25	$158.799,29	519	585;520;578
519		DESMONTE DE PUNTO DE RED DE VOZ Y DATOS	1 día	jue 9/10/25	jue 9/10/25	$95.279,83	529CC	585;518;578
520		DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS	1 día	lun 13/10/25	lun 13/10/25	$57.571,24	518	585;521;578
521		DESMONTE DE CUBIERTA	4 días	mar 14/10/25	vie 17/10/25	$5.737.062,79	520	585;522CC+1 día;
522		DESMONTE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CUBIERTA (SECCIÓN VARIABLE)	4 días	mié 15/10/25	lun 20/10/25	$5.912.461,25	521CC+1 día	585;525FF;578
523		DESMONTE DE TUBERÍA SANITARIA	2 días	vie 17/10/25	lun 20/10/25	$289.690,65	526CC	585;530;578
524		DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO (E=3-6CM)	2 días	mié 15/10/25	jue 16/10/25	$413.949,23	525CC	585;526;578
525		DEMOLICIÓN DE PAÑETE MURO (E=1-3CM)	4 días	mié 15/10/25	lun 20/10/25	$1.557.044,56	522FF	585;524CC;578;5
526		DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO (E=10-15CM)	3 días	vie 17/10/25	mar 21/10/25	$512.631,50	524	585;523CC;578
527		INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS	1 día	lun 10/11/25	lun 10/11/25	$62.508,54	576CC	585;578
528		INSTALACIÓN DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	2 días	jue 13/11/25	vie 14/11/25	$291.395,06	564CC	585;578
529		PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA	2 días	jue 9/10/25	vie 10/10/25	$254.990,60	516FC+19 días;5	585;519CC;578
530		EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL HETEROGÉNEO (H<=1,5M)	2 días	mar 21/10/25	mié 22/10/25	$424.897,22	523	585;531;578
531		LLENO EN ARENA	2 días	jue 23/10/25	vie 24/10/25	$819.241,30	530	585;578
532		GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL	1 día	lun 24/11/25	lun 24/11/25	$1.023.027,01	578	585
533		**CARPINTERÍA EN MADERA**	**3 días**	**lun 17/11/25**	**mié 19/11/25**	**$3.488.578,17**		
534		MANTENIMIENTO VENTANA EN MADERA	2 días	lun 17/11/25	mar 18/11/25	$518.269,94	564	585;578;583;536;
535		MANTENIMIENTO PUERTA EN MADERA	2 días	lun 17/11/25	mar 18/11/25	$1.727.244,38	534CC	585;578;536;537;
536		CERRADURA DE POMO PARA OFICINA	1 día	mié 19/11/25	mié 19/11/25	$804.440,87	534;535	585;578
537		CERRADURA DE SEGURIDAD PARA OFICINA	1 día	mié 19/11/25	mié 19/11/25	$168.824,31	534;535	585;578;538FF
538		BRAZO HIDRÁULICO PARA PUERTA 80KG	1 día	mié 19/11/25	mié 19/11/25	$269.798,67	537FF	585;578
539		**CARPINTERÍA METÁLICA**	**2 días**	**lun 17/11/25**	**mar 18/11/25**	**$1.992.573,60**		
540		MARCO METÁLICO PARA PUERTA DE 0,76-1,10M	1 día	lun 17/11/25	lun 17/11/25	$356.899,38	535CC	585;578;541CC;54
541		MARCOS TAPAS CAJAS DE INSPECCIÓN	1 día	lun 17/11/25	lun 17/11/25	$242.298,69	540CC	585;578
542		PUERTA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 16	2 días	lun 17/11/25	mar 18/11/25	$1.393.375,53	540CC	585;578;582
543		**CONCRETOS Y MORTEROS**	**2 días**	**lun 20/10/25**	**mar 21/10/25**	**$10.155.786,06**		
544		PAÑETE LISO BAJA PLACA 1:4 E=2CM. Incluye Filos y Dilataciones	2 días	lun 20/10/25	mar 21/10/25	$2.936.939,08	555	585;578;545CC;54
545		PAÑETE MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO E=3CM. Incluye Filos y Dilataciones	2 días	lun 20/10/25	mar 21/10/25	$7.218.846,98	544CC	585;578;558
546		**CUBIERTAS**	**7 días**	**mié 22/10/25**	**jue 30/10/25**	**$39.789.980,83**		
547		LIMATESA TEJA FIBROCEMENTE	1 día	mié 29/10/25	mié 29/10/25	$613.325,41	548FF	585;578
548		TEJA DE FIBROCEMENTO P7 NO.6	6 días	mié 22/10/25	mié 29/10/25	$14.146.950,32	549CC	585;578;547FF;55
549		ESTRUCTURA EN MADERA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO	5 días	mié 22/10/25	mar 28/10/25	$18.889.344,03	544	585;578;548CC
550		BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC 4"	1 día	jue 30/10/25	jue 30/10/25	$591.554,37	551	585;578;571
551		CANAL EN LÁMINA CAL 22 Desarrollo 90 cm	2 días	mar 28/10/25	mié 29/10/25	$2.509.090,70	548FF	585;578;550
552		FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22	3 días	lun 27/10/25	mié 29/10/25	$3.039.716,00	548FF	585;578
553		**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**	**3 días**	**mié 15/10/25**	**vie 17/10/25**	**$2.747.431,13**		
554		PLACA DE CONTRAPISO 3000 PSI E=10CM. Incluye acero de Refuerzo	3 días	mié 15/10/25	vie 17/10/25	$2.631.897,28	525CC	585;578;555FF

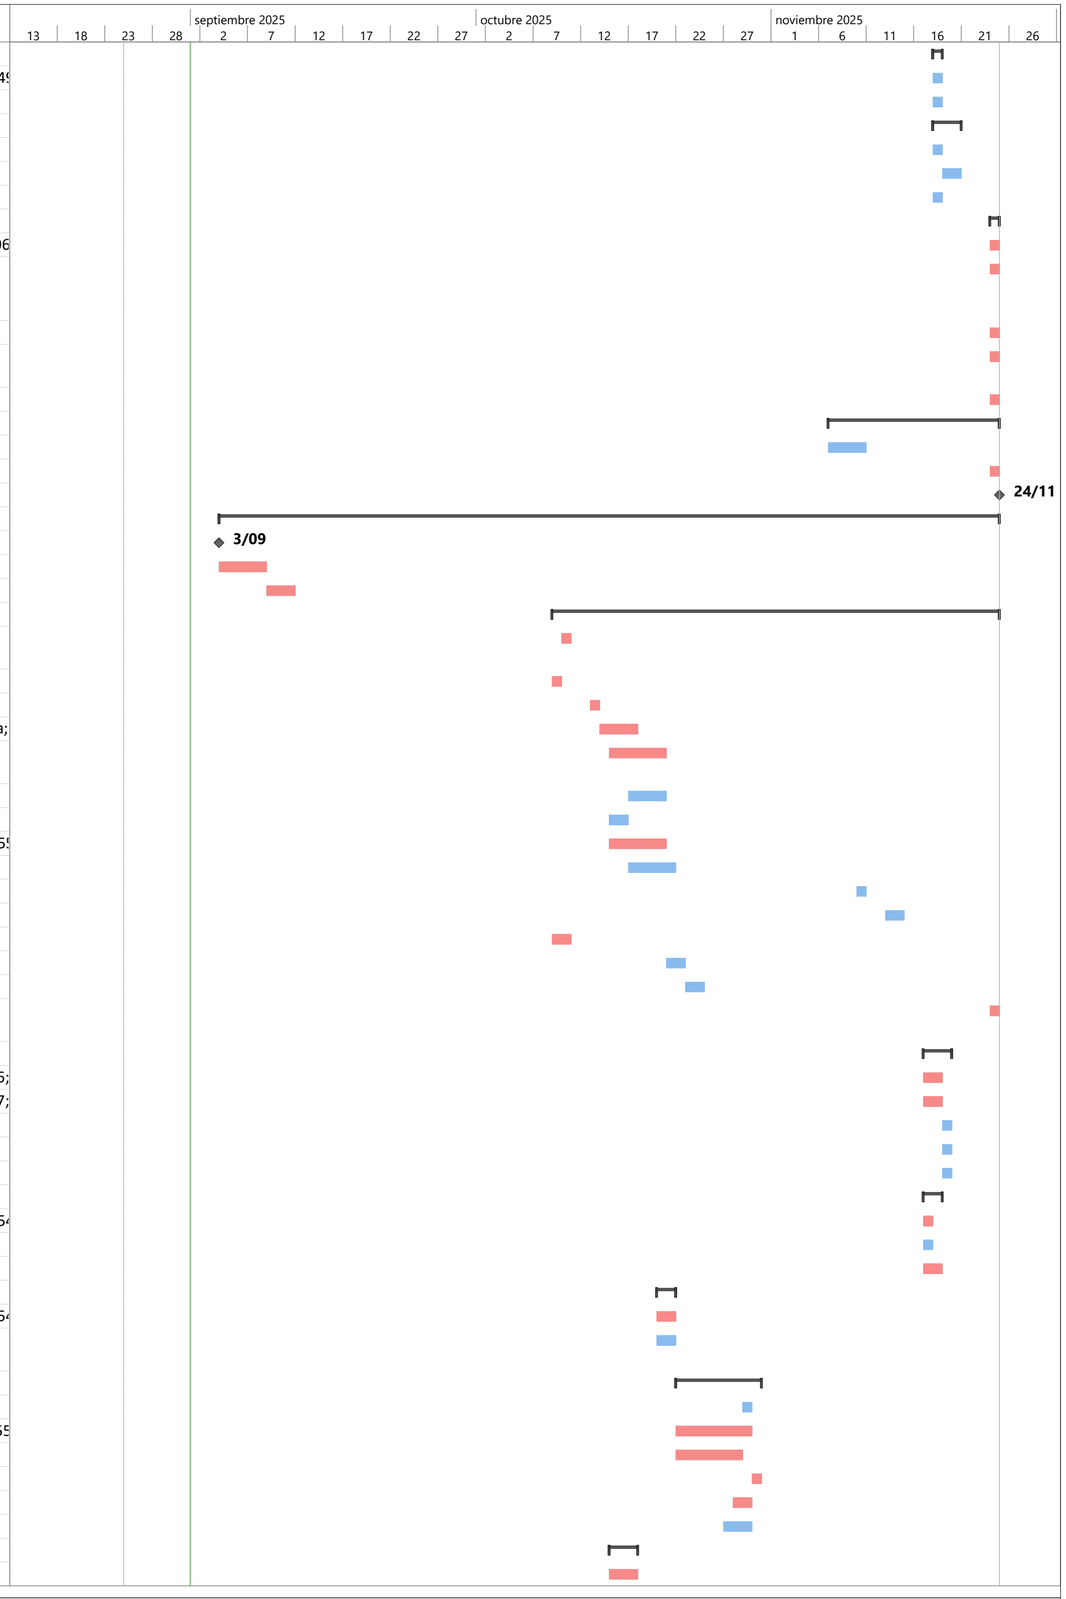

Project: PROGRAMACION NOT
Date: lun 1/09/25

División crítica
Task
Split
Milestone
Summary
Project Summary
Inactive Task
Inactive Milestone
Inactive Summary
Manual Task
Duration-only
Manual Summary Rollup
Manual Summary
Start-only
Finish-only
External Tasks
External Milestone
Deadline
Progress
Manual Progress
Tareas críticas


Id	Modo de tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	Sucesoras
555		TAPA EN CONCRETO PARA CAJA DE INSPECCION 70 X 70	1 día	vie 17/10/25	vie 17/10/25	$115.533,85	554FF	585;578;544
556		**FACHADAS Y REVESTIMIENTOS**	**2 días**	**mié 22/10/25**	**jue 23/10/25**	**$1.593.112,47**		
557		PINTURA PREMIUM DE MAXIMA RESISTENCIA Y DURABILIDAD PARA SUPERFICIES EXTERIORES EXPUESTAS A LA INTEMPERIE [3 MANOS]	2 días	mié 22/10/25	jue 23/10/25	$998.510,05	558CC	585;578;560CC
558		LAVADO FACHADA	2 días	mié 22/10/25	jue 23/10/25	$594.602,42	545	585;578;557CC
559		**PINTURAS**	**15 días**	**mié 22/10/25**	**mar 11/11/25**	**$15.019.195,26**		
560		VINILO TIPO 1, 3 MANOS. Alta Calidad, Pintura Premium base agua, máxima lavabilidad y durabilidad	15 días	mié 22/10/25	mar 11/11/25	$15.019.195,26	557CC	585;578
561		**PISOS**	**2 días**	**lun 10/11/25**	**mar 11/11/25**	**$1.630.257,59**		
562		PISO GRES 30,5X30,5CM	2 días	lun 10/11/25	mar 11/11/25	$1.630.257,59	573	585;578;567
563		**RED ELÉCTRICA**	**3 días**	**mié 12/11/25**	**vie 14/11/25**	**$5.715.887,09**		
564		LUMINARIA LED 60X60CM DE SOBREPONER/DESCOLGADA	2 días	jue 13/11/25	vie 14/11/25	$2.313.091,47	566CC	585;578;534;528(
565		CANALETA PLASTICA 100X45MM	2 días	mié 12/11/25	jue 13/11/25	$1.278.454,86	567CC	585;578;569CC
566		TAPA TOMA CORRIENTE DOBLE	1 día	jue 13/11/25	jue 13/11/25	$70.686,39	569FF	585;578;564CC
567		BALANCEO DE CARGAS TABLERO ELÉCTRICO	1 día	mié 12/11/25	mié 12/11/25	$317.584,55	562	585;578;565CC
568		PUNTO DE CABLEADO ESTRUCTURADO. Promedio 20 ml Cable UTP Cat 6A. Incluye punto de eléctrico red normal y regulada.	1 día	jue 13/11/25	jue 13/11/25	$1.313.936,37	569FF	585;578
569		SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA RED NORMAL. Promedio 5 ml	2 días	mié 12/11/25	jue 13/11/25	$422.133,45	565CC	585;578;568FF;56
570		**RED HIDRÁULICA**	**1 día**	**vie 31/10/25**	**vie 31/10/25**	**$192.026,95**		
571		LIMPIEZA DE TANQUE DE AGUA POTABLE	1 día	vie 31/10/25	vie 31/10/25	$192.026,95	550	585;578;574CC
572		**RED SANITARIA**	**7 días**	**vie 31/10/25**	**lun 10/11/25**	**$5.099.178,36**		
573		CAJA DE INSPECCIÓN 60X60CM	2 días	jue 6/11/25	vie 7/11/25	$465.461,35	575	585;578;576;562
574		SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA	2 días	vie 31/10/25	lun 3/11/25	$1.570.808,57	571CC	585;578;575
575		TUBERÍA PVCS 4"	2 días	mar 4/11/25	mié 5/11/25	$2.013.742,93	574	585;578;573
576		SANITARIO PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD.	1 día	lun 10/11/25	lun 10/11/25	$1.049.165,51	573	585;578;527CC
577		**ASEO-SEÑALIZACIÓN**	**1 día**	**vie 21/11/25**	**vie 21/11/25**	**$2.183.064,43**		
578		ASEO GENERAL DE OBRA	1 día	vie 21/11/25	vie 21/11/25	$512.821,45	518;519;520;521;522;5	585;532;579CC;58
579		PLACA DE SEÑALIZACIÓN ACRILICO 21 X 30CM. Diseño SNR. Incluye elementos de instalación.	1 día	vie 21/11/25	vie 21/11/25	$575.973,77	578CC	585
580		PLACA DE SEÑALIZACIÓN BRAILE E IDIOMA DE SEÑAS 50X30	1 día	vie 21/11/25	vie 21/11/25	$1.094.269,21	578CC	585
581		**ADICIONALES**	**7 días**	**mié 12/11/25**	**jue 20/11/25**	**$1.167.241,31**		
582		MANTENIMIENTO REJA METALICA	2 días	mié 19/11/25	jue 20/11/25	$628.285,18	542	585;578
583		SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO TRANSPARENTE DE 4MM	1 día	mié 19/11/25	mié 19/11/25	$117.219,14	534	585;578
584		DESMONTE Y REINSTALACION DE CANALETA DE RED REGULADA Y LOGICA	2 días	mié 12/11/25	jue 13/11/25	$421.736,99	569CC	585;578
585		RECIBO A SATISFACCIÓN INTERVENCIÓN SEDE	0 días	lun 24/11/25	lun 24/11/25	$0,00	518;519;520;521;522;5	833
586		**PURIFICACIÓN**	**54 días**	**mar 2/09/25**	**lun 17/11/25**	**$110.667.420,78**		
587		VISITA INICIAL	0 días	mar 2/09/25	mar 2/09/25	$0,00	2FC+7 días	588;514FC+1 día
588		APROBACIÓN PERSONAL	3 días	mié 3/09/25	vie 5/09/25	$0,00	587	589
589		APROBACIÓN PRESUPUESTO INTERVENTORIA Y ENTIDAD	3 días	lun 8/09/25	mié 10/09/25	$0,00	588	594FC+3 días
590		**PRELIMINARES**	**28 días**	**mar 16/09/25**	**jue 23/10/25**	**$15.998.495,35**		
591		DESMONTE DE CIELORRASO	5 días	mar 16/09/25	lun 22/09/25	$2.387.973,22	594CC	592CC;635;630
592		DESMONTE DE CUBIERTA	5 días	mar 16/09/25	lun 22/09/25	$4.672.176,45	591CC	634;635;630
593		DEMOLICIÓN DE PAÑETE MURO (E=1-3CM)	5 días	mar 23/09/25	lun 29/09/25	$4.281.872,21	634CC	635;630;613
594		RECORRIDO DE CUBIERTA TEJA ONDULADA	4 días	mar 16/09/25	vie 19/09/25	$2.916.056,58	589FC+3 días	591CC;635;630
595		EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL HETEROGÉNEO (H<=1,5M)	3 días	jue 16/10/25	lun 20/10/25	$509.876,66	600	596;635;630
596		LLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO	3 días	mar 21/10/25	jue 23/10/25	$1.230.540,23	595	635;630;618
597		**CARPINTERÍA METÁLICA**	**1 día**	**mié 29/10/25**	**mié 29/10/25**	**$484.596,10**		
598		MARCOS TAPAS CAJAS DE INSPECCIÓN	1 día	mié 29/10/25	mié 29/10/25	$484.596,10	618	635;630
599		**CIELORRASOS**	**8 días**	**lun 6/10/25**	**mié 15/10/25**	**$26.484.718,49**		
600		CIELORRASO EN TABLILLA DE PVC 7 mm	8 días	lun 6/10/25	mié 15/10/25	$26.484.718,49	614	635;630;595
601		**CONCRETOS Y MORTEROS**	**11 días**	**mar 30/09/25**	**mar 14/10/25**	**$10.587.642,41**		
602		PAÑETE MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO E=3CM. Incluye Filos y Dilataciones	11 días	mar 30/09/25	mar 14/10/25	$10.587.642,41	613CC	635;623
603		**CUBIERTAS**	**5 días**	**mar 30/09/25**	**lun 6/10/25**	**$2.577.919,70**		
604		BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC 4"	2 días	mar 30/09/25	mié 1/10/25	$887.330,92	634	635;630;605
605		FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22	3 días	jue 2/10/25	lun 6/10/25	$1.690.588,78	604	635;630;611
606		**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**	**2 días**	**mar 30/09/25**	**mié 1/10/25**	**$9.045.641,77**		
607		COLUMNETA DE CONFINAMIENTO 12X20CM	2 días	mar 30/09/25	mié 1/10/25	$1.026.020,24	613CC	635;630
608		VIGUETA DE CONFINAMIENTO 12X20CM	2 días	mar 30/09/25	mié 1/10/25	$4.035.427,87	613CC	635;630
609		VIGACINTA DE AMARRE 12X20CM	2 días	mar 30/09/25	mié 1/10/25	$3.984.193,66	613CC	635;630
610		**IMPERMEABILIZACIÓN**	**2 días**	**mar 7/10/25**	**mié 8/10/25**	**$1.648.794,46**		
611		MONOCAPA MANTO ASFÁLTICO PARA VIGACANAL	2 días	mar 7/10/25	mié 8/10/25	$1.648.794,46	605	635;630
612		**MUROS - MAMPOSTERÍA**	**4 días**	**mar 30/09/25**	**vie 3/10/25**	**$2.656.370,89**		
613		MURO DIVISORIO BLOQUE LISO NO.5	2 días	mar 30/09/25	mié 1/10/25	$1.914.552,02	593	635;630;607CC;6(

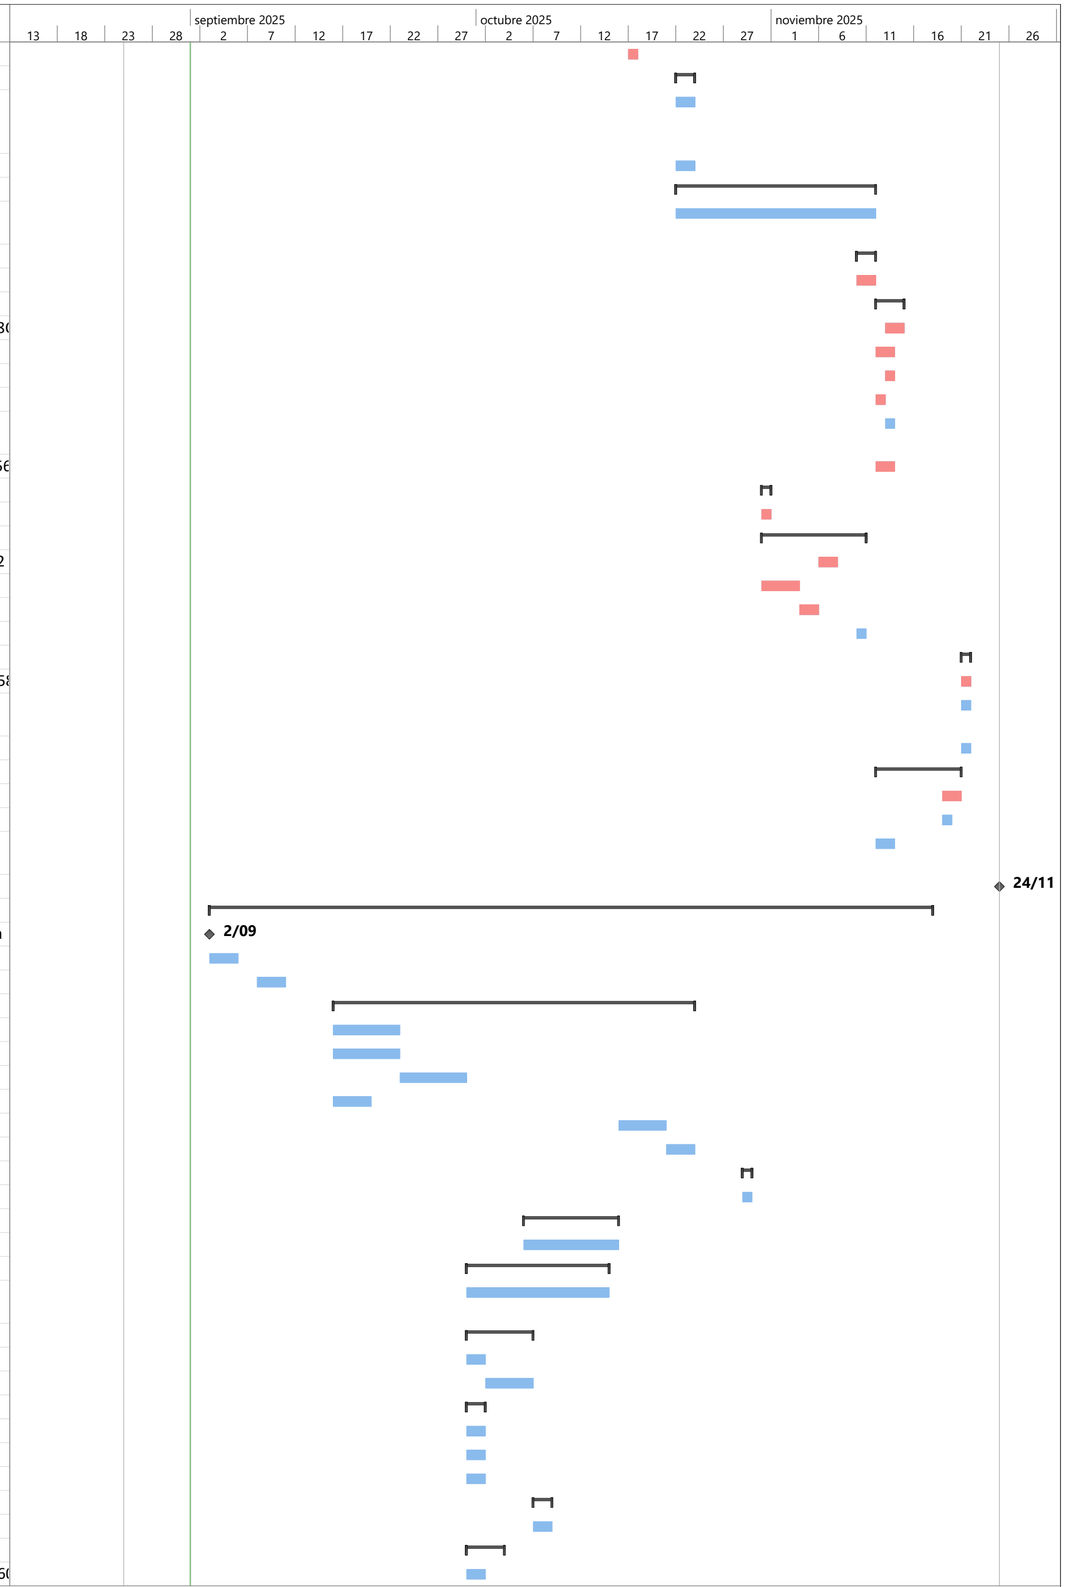

Project: PROGRAMACION NOT
Date: lun 1/09/25

División crítica · Milestone · Inactive Task · Manual Task · Manual Summary · External Tasks · Progress
Task · Summary · Inactive Milestone · Duration-only · Start-only · External Milestone · Manual Progress
Split · Project Summary · Inactive Summary · Manual Summary Rollup · Finish-only · Deadline · Tareas críticas


Id	Modo de tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	Sucesoras
614		MURO EN LAMINA DE FIBROCEMENTO 8MM E=10CM DOBLE CARA. Incluye terminado en pintura tipo 1 de alta calidad	2 días	jue 2/10/25	vie 3/10/25	$741.818,87	613	635;630;600
615		**PINTURAS**	**15 días**	**jue 23/10/25**	**mié 12/11/25**	**$19.918.626,48**		
616		VINILO TIPO 1, 3 MANOS. Alta Calidad, Pintura Premium base agua, máxima lavabilidad y durabilidad	15 días	jue 23/10/25	mié 12/11/25	$19.918.626,48	621CC	635;630
617		**PISOS**	**3 días**	**vie 24/10/25**	**mar 28/10/25**	**$3.144.088,98**		
618		PISO EN ADOQUÍN CONCRETO 8CM VEHICULAR	3 días	vie 24/10/25	mar 28/10/25	$2.068.119,53	596	635;630;628CC;5
619		PISO GRES 30,5X30,5CM	3 días	vie 24/10/25	mar 28/10/25	$1.075.969,45	618CC	635;630
620		**RED ELÉCTRICA**	**14 días**	**mié 15/10/25**	**lun 3/11/25**	**$13.467.178,50**		
621		LUMINARIA LED 60X60CM DE SOBREPONER/DESCOLGADA	8 días	jue 23/10/25	lun 3/11/25	$10.408.912,89	624	635;630;626;616
622		SALIDA TOMA CORRIENTE BIFÁSICO EN MURO PVC	3 días	jue 16/10/25	lun 20/10/25	$1.896.414,16	623	635;630;624
623		BALANCEO DE CARGAS TABLERO ELÉCTRICO	1 día	mié 15/10/25	mié 15/10/25	$317.584,55	602	635;630;622
624		SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA RED NORMAL. Promedio 5 ml	2 días	mar 21/10/25	mié 22/10/25	$844.266,90	622	635;630;621
625		**RED HIDRÁULICA**	**1 día**	**mar 4/11/25**	**mar 4/11/25**	**$192.026,95**		
626		LIMPIEZA DE TANQUE DE AGUA POTABLE	1 día	mar 4/11/25	mar 4/11/25	$192.026,95	621	635;630
627		**URBANISMO**	**2 días**	**vie 24/10/25**	**lun 27/10/25**	**$1.165.471,89**		
628		ANDEN EN CONCRETO 2500 PSI E=8CM	2 días	vie 24/10/25	lun 27/10/25	$1.165.471,89	618CC	635;630
629		**ASEO-SEÑALIZACIÓN**	**3 días**	**jue 13/11/25**	**lun 17/11/25**	**$1.310.850,07**		
630		ASEO GENERAL DE OBRA	1 día	jue 13/11/25	jue 13/11/25	$366.301,03	591;592;593;594;595;5	635;631
631		PLACA DE SEÑALIZACIÓN ACRILICO 21 X 30CM. Diseño SNR. Incluye elementos de instalación.	1 día	vie 14/11/25	vie 14/11/25	$287.987,52	630	635;632
632		PLACA DE SEÑALIZACIÓN BRAILE E IDIOMA DE SEÑAS 50X30	1 día	lun 17/11/25	lun 17/11/25	$656.561,52	631	635
633		**ADICIONALES**	**5 días**	**mar 23/09/25**	**lun 29/09/25**	**$1.984.998,74**		
634		REINSTALACION CUBIERTA EN TEJA DE BARRO	5 días	mar 23/09/25	lun 29/09/25	$1.984.998,74	592	593CC;635;630;6
635		RECIBO A SATISFACCIÓN INTERVENCIÓN SEDE	0 días	lun 17/11/25	lun 17/11/25	$0,00	591;592;593;594;595;5	833
636		**CHINACOTA**	**44 días**	**mié 10/09/25**	**mar 11/11/25**	**$26.177.823,12**		
637		VISITA INICIAL	0 días	mié 10/09/25	mié 10/09/25	$0,00	2FC+10 días;678	638
638		APROBACIÓN PERSONAL	3 días	jue 11/09/25	lun 15/09/25	$0,00	637	639
639		APROBACIÓN PRESUPUESTO INTERVENTORIA Y ENTIDAD	3 días	mar 16/09/25	jue 18/09/25	$0,00	638	643FC+13 días
640		**PRELIMINARES**	**3 días**	**mié 8/10/25**	**vie 10/10/25**	**$159.338,52**		
641		DESMONTE DE PUERTA METÁLICA	1 día	jue 9/10/25	jue 9/10/25	$49.672,58	643	676;642;666
642		DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO	1 día	vie 10/10/25	vie 10/10/25	$33.169,02	641	676;656;666
643		PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA	1 día	mié 8/10/25	mié 8/10/25	$76.496,92	639FC+13 días;5	676;641;666;662
644		**CARPINTERÍA METÁLICA**	**1 día**	**jue 6/11/25**	**jue 6/11/25**	**$895.531,71**		
645		PELÍCULA ANTIREFLEJO DE SEGURIDAD 4 MICRAS	1 día	jue 6/11/25	jue 6/11/25	$895.531,71	666	676
646		**ENCHAPE MUROS**	**1 día**	**mar 14/10/25**	**mar 14/10/25**	**$104.065,75**		
647		ESTUCO PLASTICO INTERIOR	1 día	mar 14/10/25	mar 14/10/25	$104.065,75	656	676;666;649
648		**FACHADAS Y REVESTIMIENTOS**	**2 días**	**mié 15/10/25**	**jue 16/10/25**	**$1.480.726,10**		
649		LAVADO DE FACHADA E HIDRÓFUGO	2 días	mié 15/10/25	jue 16/10/25	$1.400.845,86	647	676;666;650CC
650		PINTURA PREMIUM DE MAXIMA RESISTENCIA Y DURABILIDAD PARA SUPERFICIES EXTERIORES EXPUESTAS A LA INTEMPERIE [3 MANOS]	1 día	mié 15/10/25	mié 15/10/25	$79.880,24	649CC	676;666;654CC;6
651		**PINTURAS**	**9 días**	**mié 15/10/25**	**lun 27/10/25**	**$13.527.579,81**		
652		ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	1 día	lun 27/10/25	lun 27/10/25	$68.552,37	653CC	676;666;671
653		ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LLENA	1 día	lun 27/10/25	lun 27/10/25	$159.413,74	654	676;666;652CC;6
654		VINILO TIPO 1, 3 MANOS. Alta Calidad, Pintura Premium base agua, máxima lavabilidad y durabilidad	8 días	mié 15/10/25	vie 24/10/25	$13.299.613,70	650CC	676;666;653;671
655		**PISOS**	**1 día**	**lun 13/10/25**	**lun 13/10/25**	**$40.301,53**		
656		ALISTADO DE PISO 2CM	1 día	lun 13/10/25	lun 13/10/25	$40.301,53	642	676;666;647
657		**RED ELÉCTRICA**	**2 días**	**jue 30/10/25**	**vie 31/10/25**	**$2.868.405,82**		
658		LUMINARIA LED 60X60CM DE SOBREPONER/DESCOLGADA	2 días	jue 30/10/25	vie 31/10/25	$2.313.091,47	671	676;666;659CC
659		LUMINARIA LED REDONDA 18W DE SOBREPONER/DESCOLGADA	1 día	jue 30/10/25	jue 30/10/25	$153.598,10	658CC	676;666;660CC
660		SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA EMERGENCIA LED R.1 2 X 16W TIPO MICKEY	1 día	jue 30/10/25	jue 30/10/25	$401.716,25	659CC	676;666
661		**RED HIDRÁULICA**	**1 día**	**jue 9/10/25**	**jue 9/10/25**	**$1.461.652,55**		
662		TANQUE CONICO DE POLIETILENO DE 1000 LT	1 día	jue 9/10/25	jue 9/10/25	$1.461.652,55	643	676;666;664
663		**RED SANITARIA**	**2 días**	**vie 10/10/25**	**lun 13/10/25**	**$902.822,29**		
664		SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS	2 días	vie 10/10/25	lun 13/10/25	$902.822,29	662	676;666
665		**ASEO-SEÑALIZACIÓN**	**6 días**	**lun 3/11/25**	**lun 10/11/25**	**$3.111.665,71**		
666		ASEO GENERAL DE OBRA	3 días	lun 3/11/25	mié 5/11/25	$1.135.531,93	641;642;643;647;649;6	676;667;672;645
667		SUMINISTRO E INSTALACION AVISO ORIP PANAFLEX DE ALTA CALIDAD PARA EXTERIORES CON PROTECCION UV CON CAJA PERIMETRAL EN ALUMINIO	1 día	jue 6/11/25	jue 6/11/25	$478.682,30	666	676;668
668		PLACA DE SEÑALIZACIÓN ACRILICO 21 X 30CM. Diseño SNR. Incluye elementos de instalación.	1 día	vie 7/11/25	vie 7/11/25	$403.182,27	667	676;669
669		PLACA DE SEÑALIZACIÓN BRAILE E IDIOMA DE SEÑAS 50X30	1 día	lun 10/11/25	lun 10/11/25	$1.094.269,21	668	676
670		**OTROS (Actividades Complementarias)**	**11 días**	**mar 28/10/25**	**mar 11/11/25**	**$1.625.733,33**		

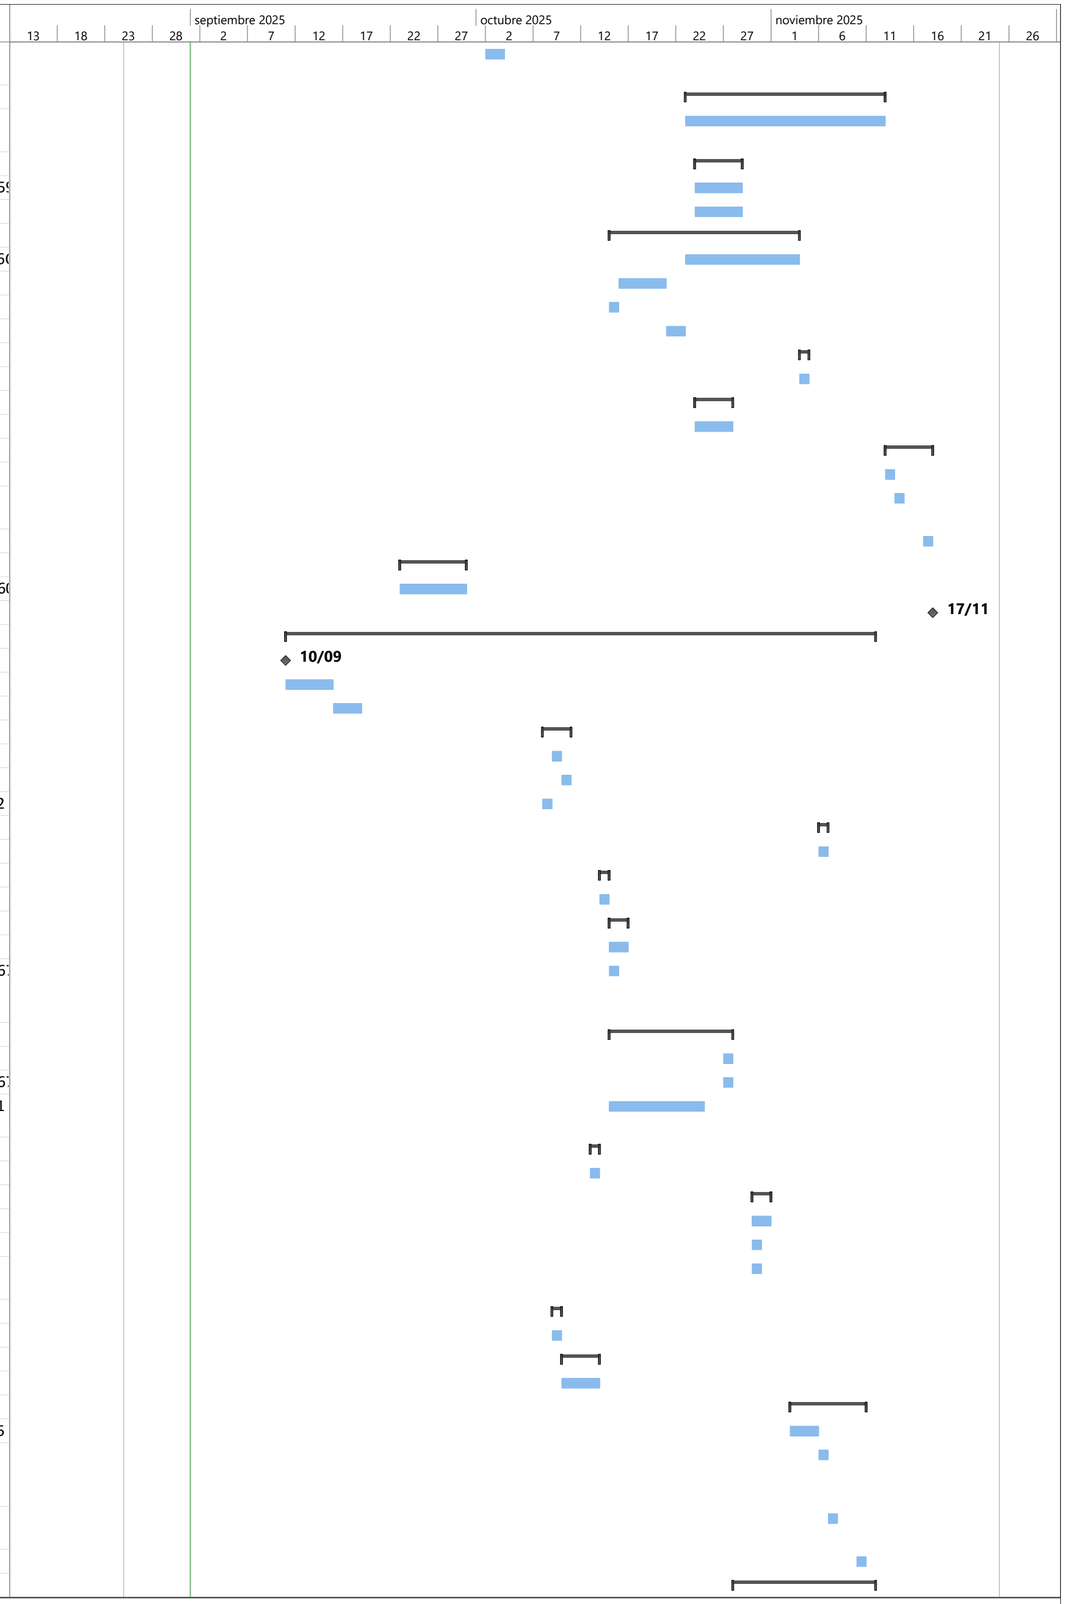

Project: PROGRAMACION NOT
Date: lun 1/09/25

División crítica · Milestone · Inactive Task · Manual Task · Manual Summary · External Tasks · Progress
Task · Summary · Inactive Milestone · Duration-only · Start-only · External Milestone · Manual Progress
Split · Project Summary · Inactive Summary · Manual Summary Rollup · Finish-only · Deadline · Tareas críticas


Id	Modo de tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	Sucesoras
671		MANTENIMIENTO REJA METALICA	2 días	mar 28/10/25	mié 29/10/25	$797.922,82	650;652;653;654	676;658
672		DESMONTE, TRASLADO Y REINSTALACION AVISO EXTERIOR INSTITUCIONAL	1 día	jue 6/11/25	jue 6/11/25	$124.577,28	666	676;673
673		DESMONTE, TRASLADO Y REINSTALACION MUEBLES ESPECIALES (tarjeteros, Mesas (pequeñas y medianas) archivos de escritorio, tándem hasta 3 puestos, sillas)	1 día	vie 7/11/25	vie 7/11/25	$335.464,90	672	676;674
674		ADECUACION DE MESON PRIORITARIO, INCLUYE DESMONETE Y REINSTALACION DE MESON EN MATERIAL EXISTENTE, CORTE EN CONCRETO, DEMOLICION MURO A LA ALTURA DE ATENCION PARA PERSONAS CON PROBLEMAS DE MOVILIDADL, RESANE DE PARED CON PINTURA, RETIRO Y DISPOSICION FINA	1 día	lun 10/11/25	lun 10/11/25	$309.951,05	673	676;675
675		RETIRO AVISO ORIP Y UBICACIÓN DONDE INDIQUE LA ENTIDAD	1 día	mar 11/11/25	mar 11/11/25	$57.817,28	674	676
676		RECIBO A SATISFACCIÓN INTERVENCIÓN SEDE	0 días	mar 11/11/25	mar 11/11/25	$0,00	641;642;643;645;647;6	833
677		**PAMPLONA**	**53 días**	**mié 10/09/25**	**lun 24/11/25**	**$41.093.657,62**		
678		VISITA INICIAL	0 días	mié 10/09/25	mié 10/09/25	$0,00	2FC+11 días;721FC+1 d	679;637
679		APROBACIÓN PERSONAL	3 días	jue 11/09/25	lun 15/09/25	$0,00	678	680
680		APROBACIÓN PRESUPUESTO INTERVENTORIA Y ENTIDAD	3 días	mar 16/09/25	jue 18/09/25	$0,00	679	689FC+30 días
681		**PRELIMINARES**	**15 días**	**vie 31/10/25**	**jue 20/11/25**	**$2.206.660,98**		
682		DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS	1 día	vie 31/10/25	vie 31/10/25	$115.142,49	689CC	683CC;719;713
683		DESMONTE DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	2 días	vie 31/10/25	lun 3/11/25	$309.993,12	682CC	684;719;713
684		DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO	1 día	mar 4/11/25	mar 4/11/25	$59.705,26	683	690;719;713
685		REGATA SOBRE MURO+RESANE	4 días	mié 5/11/25	lun 10/11/25	$600.994,27	686CC	719;713
686		DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO (E=10-15CM)	2 días	mié 5/11/25	jue 6/11/25	$384.473,31	690CC	685CC;719;713;69
687		INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS	1 día	mar 18/11/25	mar 18/11/25	$125.018,36	711	719;713
688		INSTALACIÓN DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	2 días	mié 19/11/25	jue 20/11/25	$349.675,09	708	719;713
689		PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA	2 días	vie 31/10/25	lun 3/11/25	$127.495,30	680FC+30 días;5	682CC;719;713
690		RETIRO DE PINTURA EXISTENTE SOBRE PISO	1 día	mié 5/11/25	mié 5/11/25	$134.163,78	684	686CC;719;713
691		**CARPINTERÍA EN MADERA**	**1 día**	**mar 18/11/25**	**mar 18/11/25**	**$1.647.296,57**		
692		MUEBLE SUPERIOR COCINA 180X80X33,8CM	1 día	mar 18/11/25	mar 18/11/25	$719.791,60	707CC	719;713;693CC
693		MUEBLE BAJO MESÓN COCINA	1 día	mar 18/11/25	mar 18/11/25	$927.504,97	692CC	719;713
694		**CONCRETOS Y MORTEROS**	**2 días**	**mié 5/11/25**	**jue 6/11/25**	**$550.676,63**		
695		PAÑETE LISO BAJA PLACA 1:4 E=2CM. Incluye Filos y Dilataciones	2 días	mié 5/11/25	jue 6/11/25	$550.676,63	686CC	719;713;698CC
696		**ENCHAPE MUROS**	**3 días**	**mié 5/11/25**	**vie 7/11/25**	**$1.195.724,17**		
697		ESTUCO PLASTICO INTERIOR	3 días	mié 5/11/25	vie 7/11/25	$842.441,39	699CC	719;713;703CC
698		RESANE	1 día	mié 5/11/25	mié 5/11/25	$234.977,51	695CC	719;713;699CC
699		BOQUILLA PARA CERÁMICA 2MM	2 días	mié 5/11/25	jue 6/11/25	$118.305,27	698CC	719;713;697CC
700		**FACHADAS Y REVESTIMIENTOS**	**6 días**	**mié 5/11/25**	**mié 12/11/25**	**$5.317.376,96**		
701		LAVADO DE FACHADA E HIDRÓFUGO	6 días	mié 5/11/25	mié 12/11/25	$5.317.376,96	703CC	719;713;705
702		**PINTURAS**	**11 días**	**mié 5/11/25**	**mié 19/11/25**	**$23.103.338,24**		
703		VINILO TIPO 1, 3 MANOS. Alta Calidad, Pintura Premium base agua, máxima lavabilidad y durabilidad	11 días	mié 5/11/25	mié 19/11/25	$23.103.338,24	697CC	719;713;701CC
704		**PISOS**	**1 día**	**jue 13/11/25**	**jue 13/11/25**	**$399.538,90**		
705		PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE	1 día	jue 13/11/25	jue 13/11/25	$399.538,90	701	719;713;710
706		**RED ELÉCTRICA**	**2 días**	**mar 18/11/25**	**mié 19/11/25**	**$1.772.762,38**		
707		LUMINARIA LED 60X60CM DE SOBREPONER/DESCOLGADA	2 días	mar 18/11/25	mié 19/11/25	$1.619.164,28	711	719;713;708CC;69
708		LUMINARIA LED REDONDA 18W DE SOBREPONER/DESCOLGADA	1 día	mar 18/11/25	mar 18/11/25	$153.598,10	707CC	719;713;688
709		**RED HIDRÁULICA**	**2 días**	**vie 14/11/25**	**lun 17/11/25**	**$609.144,06**		
710		LIMPIEZA DE TANQUE DE AGUA POTABLE	1 día	vie 14/11/25	vie 14/11/25	$192.026,95	705	719;713;711
711		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS	1 día	lun 17/11/25	lun 17/11/25	$417.117,11	710	719;713;687;707
712		**ASEO-SEÑALIZACIÓN**	**2 días**	**vie 21/11/25**	**lun 24/11/25**	**$2.859.153,33**		
713		ASEO GENERAL DE OBRA	1 día	vie 21/11/25	vie 21/11/25	$879.122,48	682;683;684;685;686;6	719;714
714		CINTA ANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA	1 día	lun 24/11/25	lun 24/11/25	$424.982,63	713	719;715CC
715		PLACA DE SEÑALIZACIÓN ACRILICO 21 X 30CM. Diseño SNR. Incluye elementos de instalación.	1 día	lun 24/11/25	lun 24/11/25	$460.779,01	714CC	719;716CC
716		PLACA DE SEÑALIZACIÓN BRAILE E IDIOMA DE SEÑAS 50X30	1 día	lun 24/11/25	lun 24/11/25	$1.094.269,21	715CC	719;718CC
717		**OTROS (Actividades Complementarias)**	**1 día**	**lun 24/11/25**	**lun 24/11/25**	**$1.431.985,40**		
718		DESMONTE DE ESTANTE DE ARCHIVO RODANTE O FIJO INCLUIDA PUERTAS Y ESTRUCTURA EXISTENTE, UBICANDOLO EN EL LUGAR DESTINADO POR LA ORIP	1 día	lun 24/11/25	lun 24/11/25	$1.431.985,40	716CC	719
719		RECIBO A SATISFACCIÓN INTERVENCIÓN SEDE	0 días	lun 24/11/25	lun 24/11/25	$0,00	682;683;684;685;686;6	833
720		**SALAZAR DE LAS PALMAS**	**56 días**	**lun 8/09/25**	**lun 24/11/25**	**$231.697.401,48**		
721		VISITA INICIAL	2 días	lun 8/09/25	mar 9/09/25	$0,00	2FC+10 días	722FC+3 días;678
722		APROBACIÓN PERSONAL	3 días	lun 15/09/25	mié 17/09/25	$0,00	721FC+3 días	723
723		APROBACIÓN PRESUPUESTO INTERVENTORIA Y ENTIDAD	3 días	jue 18/09/25	lun 22/09/25	$0,00	722	725;726;727;728;
724		**PRELIMINARES**	**45 días**	**mar 23/09/25**	**lun 24/11/25**	**$33.457.210,37**		
725		DESMONTE AIRE ACONDICIONADO DE MAS DE 48.000 BTU.	1 día	mar 23/09/25	mar 23/09/25	$79.250,49	723	732

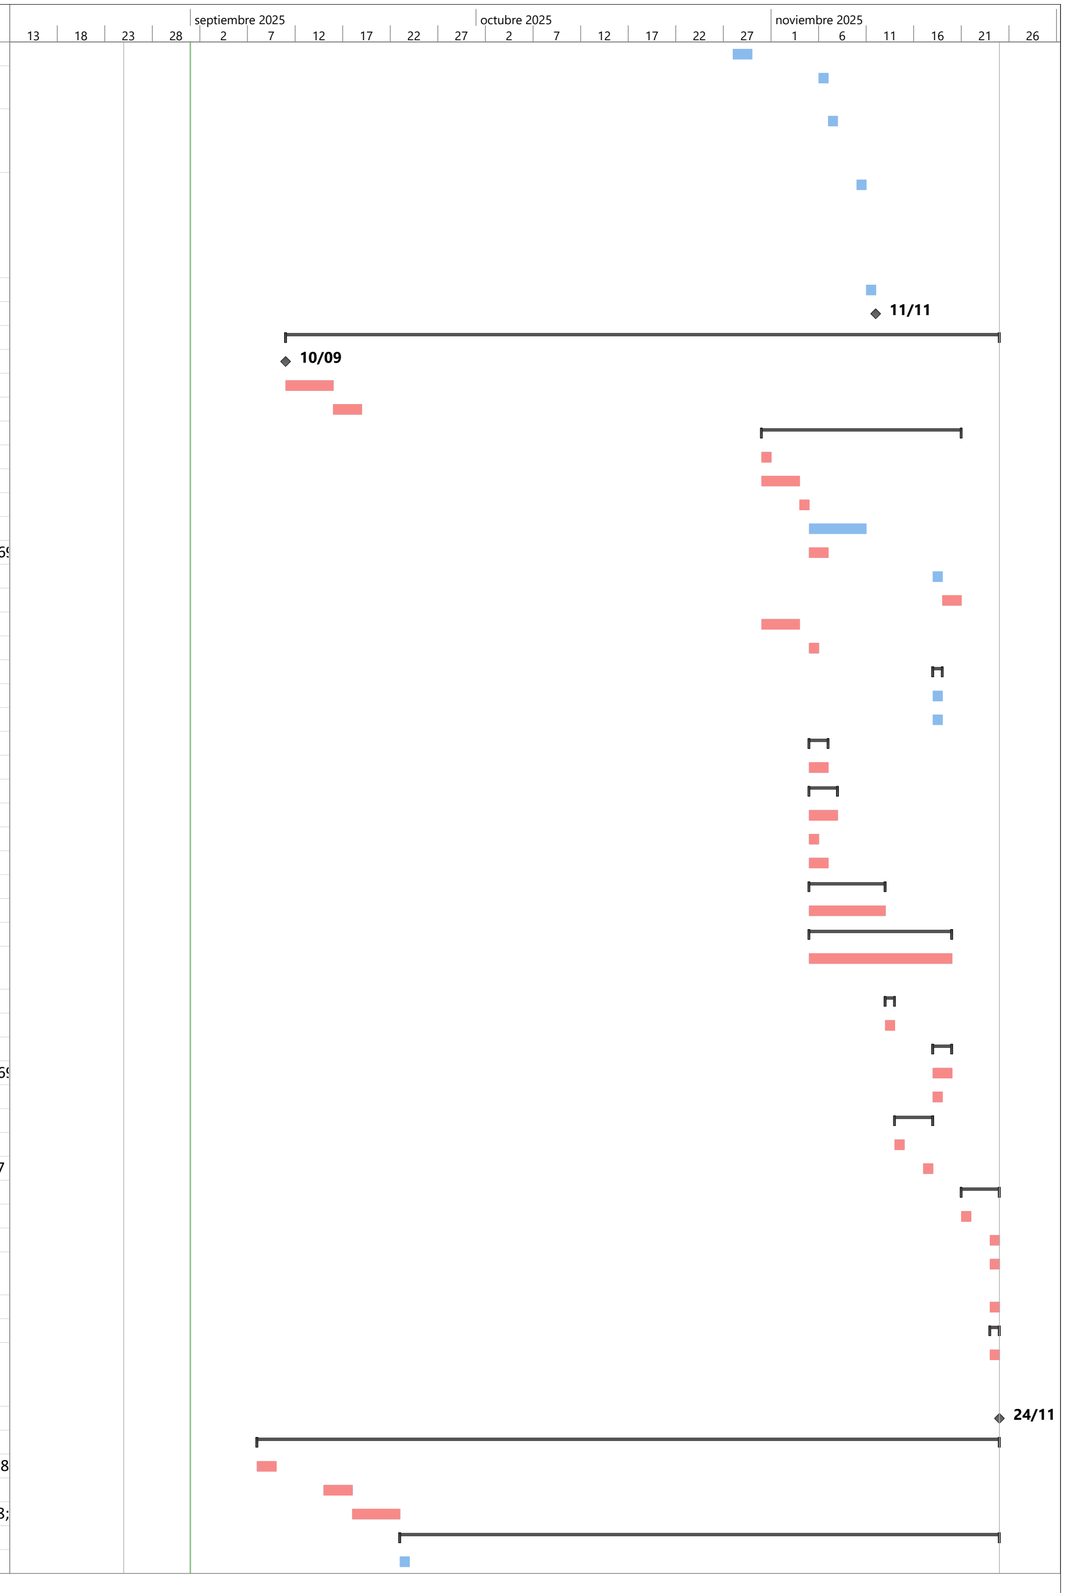

Project: PROGRAMACION NOT
Date: lun 1/09/25

División crítica · Milestone · Inactive Task · Manual Task · Manual Summary · External Tasks · Progress
Task · Summary · Inactive Milestone · Duration-only · Start-only · External Milestone · Manual Progress
Split · Project Summary · Inactive Summary · Manual Summary Rollup · Finish-only · Deadline · Tareas críticas

Id	Modo de tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	Sucesoras
726		DESMONTE DE CANALETA PLÁSTICA Y METÁLICA DE RED DE VOZ Y DATOS	1 día	mar 23/09/25	mar 23/09/25	$952.795,72	723	730
727		DESMONTE DE PUNTO DE RED DE VOZ Y DATOS	1 día	mar 23/09/25	mar 23/09/25	$95.279,83	723	731
728		DESMONTE DE CIELORRASO	4 días	mar 23/09/25	vie 26/09/25	$1.768.351,58	723	732
729		DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS	1 día	mar 23/09/25	mar 23/09/25	$172.713,73	723	733;745
730		DESMONTE AIRE ACONDICIONADO HASTA 48.000 BTU	1 día	mié 24/09/25	mié 24/09/25	$57.522,80	726	734FC-1 día
731		DESMONTE DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	1 día	mié 24/09/25	mié 24/09/25	$1.007.478,27	727	735
732		DESMONTE DE CUBIERTA	1 día	lun 29/09/25	lun 29/09/25	$641.888,58	728;725	736
733		DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA DE BARRO	3 días	mié 24/09/25	vie 26/09/25	$3.804.144,73	729	737
734		DESMONTE DE TANQUE DE ALMACENAMIETO DE AGUA POTABLE	1 día	mié 24/09/25	mié 24/09/25	$164.257,98	730FC-1 día	738
735		DESMONTE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CUBIERTA (SECCIÓN VARIABLE)	1 día	jue 25/09/25	jue 25/09/25	$3.449.239,13	731	739
736		DESMONTE VENTANA EN MADERA	1 día	mar 30/09/25	mar 30/09/25	$151.965,08	732	740
737		DESMONTE DE PUESTO DE TRABAJO	2 días	lun 29/09/25	mar 30/09/25	$349.263,33	733	741
738		DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO	2 días	jue 25/09/25	vie 26/09/25	$2.724.206,83	734	742;749FC+3 días
739		DEMOLICIÓN DE MESÓN EXTERNO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	2 días	vie 26/09/25	lun 29/09/25	$225.955,75	735	743
740		DEMOLICIÓN DE MESÓN INTERNO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	1 día	mié 1/10/25	mié 1/10/25	$234.387,28	736	744
741		DEMOLICIÓN DE POYO EN CONCRETO (A=60-80-CM)	1 día	mié 1/10/25	mié 1/10/25	$135.481,92	737	745
742		DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO (E=3-6CM)	8 días	lun 29/09/25	mié 8/10/25	$3.399.766,69	738	745;751
743		DEMOLICIÓN DE MESÓN COCINA (E=6-12CM)	1 día	mar 30/09/25	mar 30/09/25	$84.248,98	739	744
744		DEMOLICIÓN DE GUARDAESCOBA	3 días	jue 2/10/25	lun 6/10/25	$543.032,93	740;743	745
745		INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS	1 día	jue 9/10/25	jue 9/10/25	$187.526,91	729;742;744;741	746
746		INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE MAS DE 48.000 BTU	2 días	vie 10/10/25	lun 13/10/25	$159.771,96	745	747
747		INSTALACIÓN DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	5 días	mar 14/10/25	lun 20/10/25	$1.119.826,40	746	832
748		PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA	45 días	mar 23/09/25	lun 24/11/25	$837.694,03	723;5	752FF
749		EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL HETEROGÉNEO (H<=1,5M)	2 días	jue 2/10/25	vie 3/10/25	$424.897,22	738FC+3 días	750
750		LLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO	2 días	lun 6/10/25	mar 7/10/25	$328.143,72	749	
751		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE MURO	1 día	jue 9/10/25	jue 9/10/25	$231.292,06	742	772
752		GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL	2 días	vie 21/11/25	lun 24/11/25	$3.069.079,75	748FF	753FF
753		GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RCD RECUPERABLES, INCLUYE CERTIFICACIÓN	2 días	vie 21/11/25	lun 24/11/25	$1.910.208,78	752FF	754FF
754		GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RCD CHATARRA, INCLUYE CERTIFICACIÓN	2 días	vie 21/11/25	lun 24/11/25	$3.948.236,65	753FF	755FF
755		GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL RCD MADERA, INCLUYE CERTIFICACIÓN	2 días	vie 21/11/25	lun 24/11/25	$875.086,47	754FF	
756		CERRAMIENTO EN LONA VERDE H=2.10 M	2 días	mar 23/09/25	mié 24/09/25	$324.214,79	723	771
757		**CARPINTERÍA EN MADERA**	**5 días**	**mar 11/11/25**	**lun 17/11/25**	**$1.910.937,96**		
758		MUEBLE SUPERIOR COCINA 180X80X33,8CM	2 días	mar 11/11/25	mié 12/11/25	$679.594,61	798FC-3 días	759
759		MUEBLE BAJO MESÓN COCINA	3 días	jue 13/11/25	lun 17/11/25	$1.231.343,35	758	832
760		**CARPINTERÍA METÁLICA**	**8 días**	**vie 7/11/25**	**mar 18/11/25**	**$5.164.752,80**		
761		PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE	2 días	vie 7/11/25	lun 10/11/25	$625.105,83	767	762
762		VENTANA EN LÁMINA CAL. 20 BATIENTE	3 días	mar 11/11/25	jue 13/11/25	$2.771.816,78	761	763
763		ESPEJO BISELADO 5MM	3 días	vie 14/11/25	mar 18/11/25	$1.767.830,19	762	832
764		**CIELORRASOS**	**10 días**	**jue 6/11/25**	**mié 19/11/25**	**$17.160.994,40**		
765		CIELORRASO EN TABLILLA DE PVC 7 mm	10 días	jue 6/11/25	mié 19/11/25	$17.160.994,40	774;783	832
766		**CONCRETOS Y MORTEROS**	**6 días**	**jue 30/10/25**	**jue 6/11/25**	**$1.553.977,39**		
767		PAÑETE MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO E=3CM. Incluye Filos y Dilataciones	6 días	jue 30/10/25	jue 6/11/25	$1.553.977,39	792	761
768		**CUBIERTAS**	**28 días**	**lun 29/09/25**	**mié 5/11/25**	**$43.884.509,70**		
769		CABALLETE ARTICULADO TEJA FIBROCEMENTO	2 días	mar 21/10/25	mié 22/10/25	$748.139,33	770	773
770		AFINADOS CUBIERTAS PLANAS E=0,03M	2 días	vie 17/10/25	lun 20/10/25	$296.563,10	771	769
771		ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO	14 días	lun 29/09/25	jue 16/10/25	$18.219.555,18	738;756	770
772		CANAL EN LÁMINA CAL 22 Desarrollo 90 cm	4 días	mié 29/10/25	lun 3/11/25	$1.538.909,25	773;751	776
773		FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22	4 días	jue 23/10/25	mar 28/10/25	$2.896.850,44	769	772;774CC+1 día
774		TEJA TERMO ACUSTICA UPVC E=2,2 MM	9 días	vie 24/10/25	mié 5/11/25	$20.184.492,40	773CC+1 día	765;776;789
775		**ENCHAPE MUROS**	**13 días**	**jue 6/11/25**	**lun 24/11/25**	**$3.418.397,90**		
776		ESTUCO EXTERIOR	3 días	jue 6/11/25	lun 10/11/25	$560.820,22	774;772	777
777		RESANE	5 días	mar 11/11/25	lun 17/11/25	$1.174.885,01	776	778;787
778		CERÁMICA FORMATO 25X35CM	5 días	mar 18/11/25	lun 24/11/25	$1.682.692,67	777	832
779		**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**	**16 días**	**lun 29/09/25**	**lun 20/10/25**	**$13.155.619,93**		
780		COLUMNETA DE CONFINAMIENTO 12X20CM	3 días	lun 29/09/25	mié 1/10/25	$1.598.993,12	738	781FC-1 día
781		VIGUETA DE CONFINAMIENTO 12X20CM	3 días	mié 1/10/25	vie 3/10/25	$1.697.899,76	780FC-1 día	784
782		VIGACINTA DE AMARRE 12X20CM	5 días	vie 10/10/25	jue 16/10/25	$6.742.947,56	784	783
783		MARCO EN CONCRETO 2500 PSI PARA VENTANAS 8CMX15CM	2 días	vie 17/10/25	lun 20/10/25	$1.720.313,29	782	765;791
784		PLACA DE CONTRAPISO 3000 PSI E=10CM. Incluye acero de Refuerzo	4 días	lun 6/10/25	jue 9/10/25	$1.214.620,52	781	782;785CC

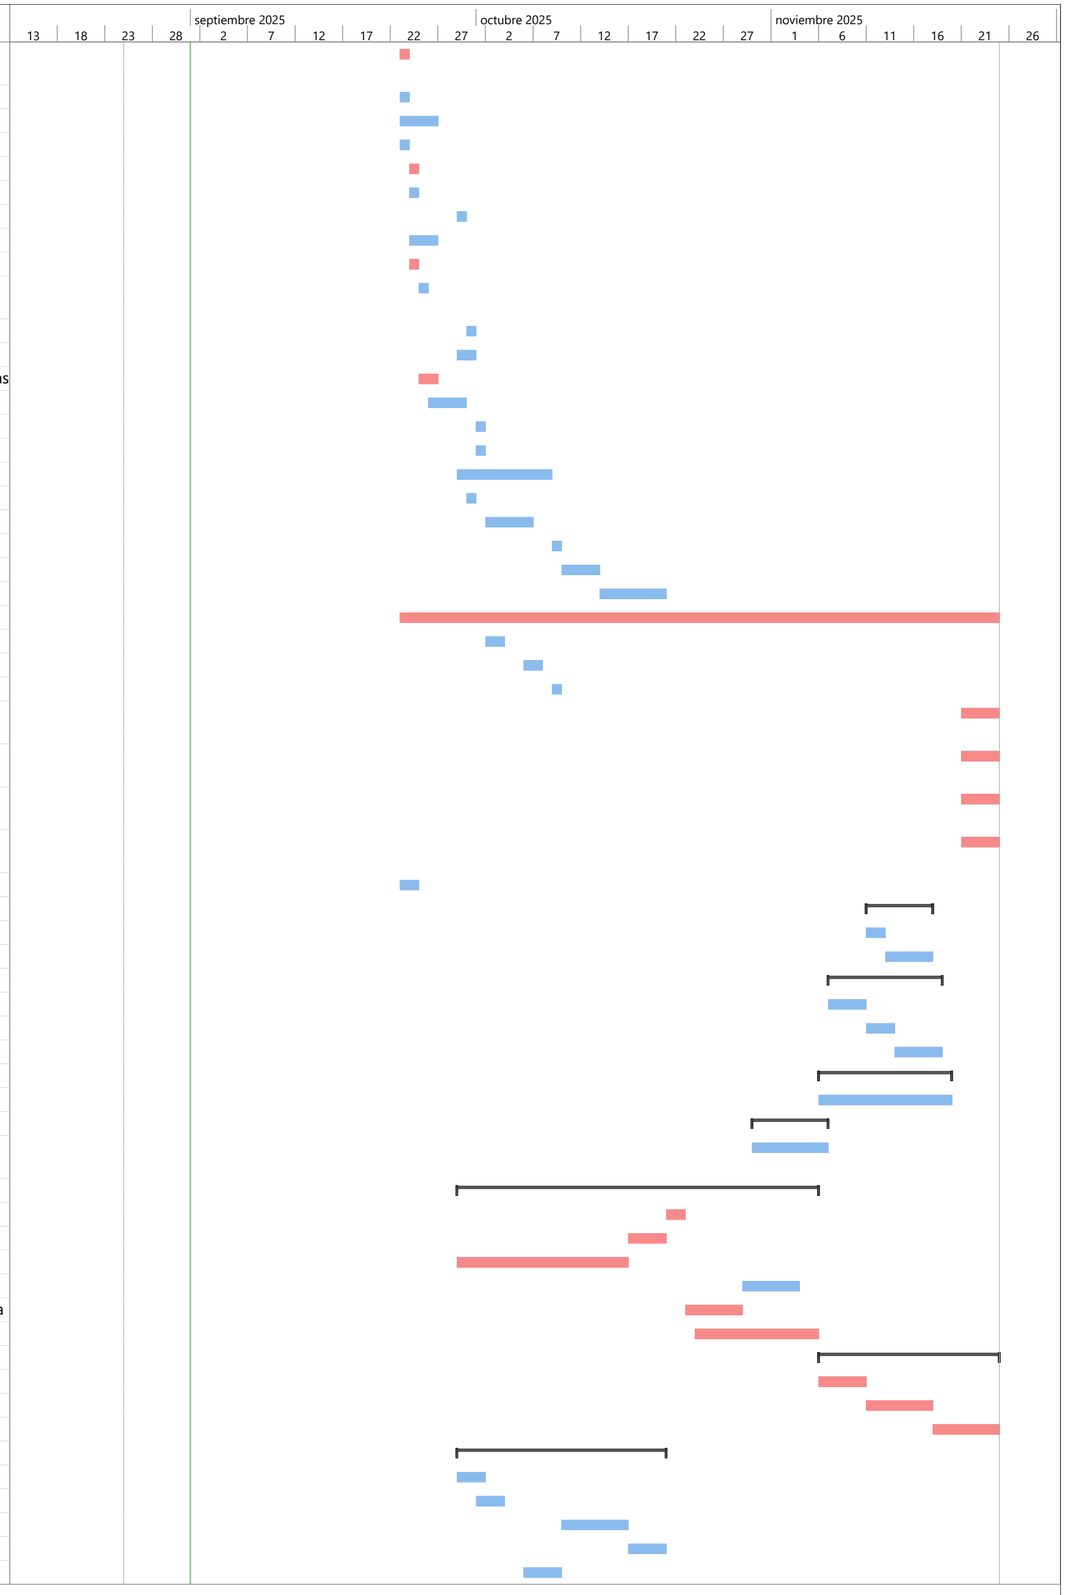


Id	Modo de tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	Sucesoras
785		MALLA ELECTROSOLDADA PARA PLACA	1 día	lun 6/10/25	lun 6/10/25	$180.845,68	784CC	
786		**FACHADAS Y REVESTIMIENTOS**	**3 días**	**mar 18/11/25**	**jue 20/11/25**	**$1.289.675,65**		
787		PINTURA PREMIUM DE MAXIMA RESISTENCIA Y DURABILIDAD PARA SUPERFICIES EXTERIORES EXPUESTAS A LA INTEMPERIE [3 MANOS]	3 días	mar 18/11/25	jue 20/11/25	$1.289.675,65	777;789	832
788		**IMPERMEABILIZACIÓN**	**3 días**	**jue 6/11/25**	**lun 10/11/25**	**$1.868.313,75**		
789		BICAPA MANTO 6,2MM ASFÁLTICO FOIL DE ALUMINIO REFUERZO POLIETILENO	3 días	jue 6/11/25	lun 10/11/25	$1.868.313,75	774	787
790		**MUROS - MAMPOSTERÍA**	**7 días**	**mar 21/10/25**	**mié 29/10/25**	**$20.190.350,10**		
791		MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO NO.5	6 días	mar 21/10/25	mar 28/10/25	$11.844.888,42	783	792CC+2 días
792		MURO EN LAMINA DE FIBROCEMENTO 8MM E=10CM DOBLE CARA. Incluye terminado en pintura tipo 1 de alta calidad	5 días	jue 23/10/25	mié 29/10/25	$8.345.461,68	791CC+2 días	767;798CC;800;8 días
793		**PINTURAS**	**21 días**	**jue 23/10/25**	**jue 20/11/25**	**$22.146.574,06**		
794		ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	3 días	vie 7/11/25	mar 11/11/25	$979.319,21	798FC-5 días	795
795		ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LLENA	3 días	mié 12/11/25	vie 14/11/25	$637.654,96	794	796CC
796		ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	4 días	mié 12/11/25	lun 17/11/25	$800.583,33	795CC	797
797		ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	3 días	mar 18/11/25	jue 20/11/25	$653.162,91	796	832
798		VINILO TIPO 1, 3 MANOS. Alta Calidad, Pintura Premium base agua, máxima lavabilidad y durabilidad	16 días	jue 23/10/25	jue 13/11/25	$19.075.853,65	792CC	758FC-3 días;794FC-5
799		**PISOS**	**16 días**	**jue 30/10/25**	**jue 20/11/25**	**$28.218.732,05**		
800		PISO CERÁMICO DURO PISO	6 días	mar 11/11/25	mar 18/11/25	$18.906.538,53	792;802FC+4 días;801	803FF+2 días
801		POYO COCINA 55X10CM	2 días	mié 5/11/25	jue 6/11/25	$157.233,83	802	800
802		ALISTADO DE PISO 4CM	4 días	jue 30/10/25	mar 4/11/25	$7.318.013,67	792	800FC+4 días;801
803		GUARDAESCOBA CERÁMICA 33,8X10CM. Incluye Wing	4 días	lun 17/11/25	jue 20/11/25	$1.836.946,02	800FF+2 días	817FC-3 días
804		**RED ELÉCTRICA**	**18 días**	**mar 28/10/25**	**jue 20/11/25**	**$30.016.528,96**		
805		TUBERÍA EMT 3/4" DESCOLGADA	3 días	mar 28/10/25	jue 30/10/25	$3.141.641,36	792CC+3 días	811CC+3 días
806		LUMINARIA LED 120X30CM DE SOBREPONER/DESCOLGADA	1 día	mié 12/11/25	mié 12/11/25	$491.872,66	810	807
807		LUMINARIA LED 60X60CM DE SOBREPONER/DESCOLGADA	1 día	jue 13/11/25	jue 13/11/25	$925.237,10	806	808
808		LUMINARIA LED 60X60CM PARA TECHO MODULAR	2 días	vie 14/11/25	lun 17/11/25	$8.363.914,41	807	809
809		LUMINARIA LED TIPO TORTUGA PARA INTERPERIE DE SOBREPONER	2 días	mar 18/11/25	mié 19/11/25	$345.542,19	808	815FC-3 días
810		INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X20A	2 días	lun 10/11/25	mar 11/11/25	$176.506,26	812FC-1 día	806;813
811		SALIDA LUMINARIA EN TECHO EMT	5 días	vie 31/10/25	jue 6/11/25	$10.710.206,78	805CC+3 días	812;825
812		SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO PVC	2 días	vie 7/11/25	lun 10/11/25	$1.862.968,51	811	810FC-1 día
813		BALANCEO DE CARGAS TABLERO ELÉCTRICO	2 días	mié 12/11/25	jue 13/11/25	$317.584,55	810	814
814		TABLERO TRIFÁSICO 12 CIRCUITOS	2 días	vie 14/11/25	lun 17/11/25	$396.212,94	813	815FC-3 días
815		PUNTO DE CABLEADO ESTRUCTURADO. Promedio 20 ml Cable UTP Cat 6A. Incluye punto de eléctrico red normal y regulada.	4 días	lun 17/11/25	jue 20/11/25	$3.284.842,20	809FC-3 días;814FC-3 días	831FC-2 días
816		**RED HIDRÁULICA**	**3 días**	**mar 18/11/25**	**jue 20/11/25**	**$192.026,95**		
817		LIMPIEZA DE TANQUE DE AGUA POTABLE	3 días	mar 18/11/25	jue 20/11/25	$192.026,95	803FC-3 días	832FC-1 día
818		**ASEO-SEÑALIZACIÓN**	**17 días**	**vie 31/10/25**	**lun 24/11/25**	**$3.610.718,06**		
819		ASEO GENERAL DE OBRA	17 días	vie 31/10/25	lun 24/11/25	$1.282.052,35	832FF	
820		SUMINISTRO E INSTALACION AVISO ORIP PANAFLEX DE ALTA CALIDAD PARA EXTERIORES CON PROTECCION UV CON CAJA PERIMETRAL EN ALUMINIO	1 día	vie 14/11/25	vie 14/11/25	$359.011,73	798	821
821		CINTA ANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA	1 día	lun 17/11/25	lun 17/11/25	$472.202,50	820	822
822		PLACA DE SEÑALIZACIÓN ACRILICO 21 X 30CM. Diseño SNR. Incluye elementos de instalación.	1 día	mar 18/11/25	mar 18/11/25	$403.182,27	821	823
823		PLACA DE SEÑALIZACIÓN BRAILE E IDIOMA DE SEÑAS 50X30	1 día	mié 19/11/25	mié 19/11/25	$1.094.269,21	822	832
824		**OTROS (Actividades Complementarias)**	**10 días**	**vie 7/11/25**	**jue 20/11/25**	**$4.458.081,45**		
825		DESMONTE, TRASLADO Y REINSTALACION AVISOS DE SEÑALIZACION	1 día	vie 7/11/25	vie 7/11/25	$253.131,94	811	826
826		DESMONTE, TRASLADO Y REINSTALACION MUEBLES ESPECIALES (tarjeteros, Mesas (pequeñas y medianas) archivos de escritorio, tándem hasta 3 puestos, sillas)	4 días	lun 10/11/25	jue 13/11/25	$2.236.435,20	825	827CC
827		DESMONTE, TRASLADO Y REINSTALACION ESCRITORIO MODULAR (Incluye Silla y división respectiva)	1 día	lun 10/11/25	lun 10/11/25	$364.690,96	826CC	828
828		DESMONTE, TRASLADO Y REINSTALACION DE APARATOS ELECTRICOS (Nevera, Microondas, Congelador, estufa, dispensador de agua)	1 día	mar 11/11/25	mar 11/11/25	$247.214,32	827	829
829		TRASLADO CAJAS DE DOCUMENTACION en tamaños 31 cm x 41cm x 27,5cm h y 35cm x 47,5 x 27 h, o tamaños similares	1 día	mié 12/11/25	mié 12/11/25	$30.488,12	828	830
830		DESMONTE TRASLADO Y REINSTALACION AIRES ACONDICIONADOS (Incluye Recarga Gas Refrigerante R-401a o el que corresponda, Punta Agua, Punto eléctrico, Tubería en cobre hasta 3 ml)	2 días	jue 13/11/25	vie 14/11/25	$647.586,93	829	832FC-1 día
831		TRASLADO DE PUNTO DE RED LOGICA,NORMAL Y REGULADA. (Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento)	2 días	mié 19/11/25	jue 20/11/25	$678.533,98	815FC-2 días	832
832		RECIBO A SATISFACCIÓN INTERVENCIÓN SEDE	0 días	lun 24/11/25	lun 24/11/25	$0,00	817FC-1 día;830FC-1 dí	833;819FF



Project: PROGRAMACION NOT
Date: lun 1/09/25

División crítica · Task · Split · Milestone · Summary · Project Summary · Inactive Task · Inactive Milestone · Inactive Summary · Manual Task · Duration-only · Manual Summary Rollup · Manual Summary · Start-only · Finish-only · External Tasks · External Milestone · Deadline · Progress · Manual Progress · Tareas críticas

Id		Modo de tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	Sucesoras
833			FIN ACTIVIDADES	0 días	lun 24/11/25	lun 24/11/25	$0,00	55;123;156;248;357;51	



CARLOS ANDRÉS GUERRA QUIÑONES
CC 1018416174 DE BOGOTÁ D.C.
R/L CONINCAG SAS
NIT 900.934.461-5

CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE
C.C. No. 79.508.558 de Bogotá D.C.
R/Legal JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC

Project: PROGRAMACION NOT
Date: lun 1/09/25

División crítica · Task · Split · Milestone · Summary · Project Summary · Inactive Task · Inactive Milestone · Inactive Summary · Manual Task · Duration-only · Manual Summary Rollup · Manual Summary · Start-only · Finish-only · External Tasks · External Milestone · Deadline · Progress · Manual Progress · Tareas críticas
