SUBDIRECCION DE OPERACIONES

CONSORCIO PROSPERAR BETHEL

FECHA	miércoles, 10 de enero de 2024	**PERIODO No.**	35	DEL	**4/01/2024**	AL	**9/01/2024**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LA INTERVENCION TECNICA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**LOCALIDADES DE SANTA FE, KENNEDY, USME Y ENGATIVA**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA - CONSORCIO PROSPERAR BETHEL		**CONTRATO DE OBRA. - CONSORCIO INGENIERIA I**	
CONTRATO No.:	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1066-2022	CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA No. 1070-2022
PLAZO INICIAL:	OCHO (8) MESES	PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	16 de noviembre de 2022	FECHA DE INICIACIÓN:	16 de noviembre de 2022
**FECHA DE SUSPENSIÓN No.1:	20 de marzo de 2023	**FECHA DE SUSPENSIÓN No.1:	20 de marzo de 2023
**FECHA DE REINICIACIÓN No. 1:	5 de mayo de 2023	**FECHA DE REINICIACIÓN No. 1:	5 de mayo de 2023
**FECHA DE SUSPENSIÓN No.2:	26 de julio de 2023	**FECHA DE SUSPENSIÓN No.2:	26 de julio de 2023
**FECHA DE REINICIACIÓN No. 2:	14 de noviembre de 2023	**FECHA DE REINICIACIÓN No. 2:	14 de noviembre de 2023
**FECHA DE SUSPENSIÓN No.3:	12 de diciembre de 2024	**FECHA DE SUSPENSIÓN No.3:	12 de diciembre de 2024
**FECHA DE REINICIACIÓN No. 3:	28 de diciembre de 2023	**FECHA DE REINICIACIÓN No. 3:	28 de diciembre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	29 abril de 2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	29 abril de 2024
PLAZO ACTUALIZADO:	Doce (12) meses y quince (15) días	PLAZO ACTUALIZADO:	Once meses (11) y quince (15) días
PLAZO TRANSCURRIDO:	419 DIAS	PLAZO TRANSCURRIDO:	419 DIAS
VALOR INICIAL :	$ 376.729.509,00	VALOR INICIAL :	$ 2.550.000.000,00
VALOR ADICION 1:	N/A	VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR ADICION 2 PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD:	N/A	ANTICIPO	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 376.729.509,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 2.550.000.000,00
VALOR PAGADO:	$ -	VALOR PAGADO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 376.729.509,00	VALOR POR PAGAR:	$ 2.550.000.000,00
SUPERVISOR:	ALBA JACQUELINE CELIS HERRERA	INTERVENTOR:	CONSORCIO PROSPERAR BETHEL

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	Suscripción del acta de inicio	16/11/2022	16/11/2022	0
1	**FASE 1 / ESTUDIOS Y DISEÑOS**			
1.1	Visita de sitio	23/11/2022	23/11/2022	0
1.2	Plan de trabajo - Contratista de obra	23/11/2022	23/11/2022	0
1.3	Plan de Gestión Social - Contratista de obra	23/11/2022	23/11/2022	0
1.4	SSTMA - Contratista de obra	23/11/2022	23/11/2022	0
1.5	Cronograma - Contratista de obra	23/11/2022	23/11/2022	0
1.6	Plan de Manejo Ambiental	30/11/2022	30/11/2022	0
2	**FASE 2 / ESTUDIOS Y DISEÑOS**			
2.1	Memoria descriptiva del proyecto	15/12/2022	15/12/2022	0
2.2	Levantamiento topográfico	18/12/2022	18/12/2022	0
2.3	Inventario Forestal y Avifauna	18/12/2022	22/12/2022	4
2.4	Geotecnia y estudio de suelos	18/12/2022	22/12/2022	4
2.5	Identificación territorial de actores territoriales	30/12/2022	30/12/2022	0
2.6	Plan de Gestión Social - Contratista de obra	23/11/2022	23/11/2022	0
2.7	Programación de obra	23/11/2022	23/11/2022	0
2.8	Componente eléctrico	16/02/2023	16/02/2023	0
Plazo del proyecto en días	419			

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO
1	ETAPA DE ESTUDIO Y DISEÑOS FASE 1 (POR PRODUCTOS)	$ 278.770.299,00	100,00%	
2	ETAPA DE CONSTRUCION	$ 2.271.229.701,00	0,00%	

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

Aval del teirrotior AAU-T17	SDHT	24/11/2023
N/A		

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

N/A

6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR:

Aspectos técnicos:

•04-01-24 Comité virtual entre consorcio y hábitat para revisión de aspectos técnicos, presupuestos, aspectos técnicos
•04-04-24 al 9-04-204 Realizacion de actividades prepeliminar
Actualizacion del programa RCD 207-2023

Aspectos administrativos:

Ejecución de Obras

FIRMA CONTRATISTA (DIRECTOR DE OBRA)
NOMBRE: JAIME HERRERA OSORIO

FIRMA RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: CINDY LORENA RODRIGUEZ

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA)
NOMBRE: MAURICIO HERNANDEZ

Informe semana 36

BOGOTÁ

SUBDIRECCION DE OPERACIONES

CP
CONSORCIO PROSPERAR BETHEL

FECHA	martes, 16 de enero de 2024	**PERIODO No.**	36	DEL	**10/01/2024**	AL	**15/01/2024**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LA INTERVENCION TECNICA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**LOCALIDADES DE SANTA FE, KENNEDY, USME Y ENGATIVA**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA - CONSORCIO PROSPERAR BETHEL		**CONTRATO DE OBRA. - CONSORCIO INGENIERIA I**	
CONTRATO No.:	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1066-2022	CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA No. 1070-2022
PLAZO INICIAL:	OCHO (8) MESES	PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	16 de noviembre de 2022	FECHA DE INICIACIÓN:	16 de noviembre de 2022
**FECHA DE SUSPENSIÓN No.1:	20 de marzo de 2023	**FECHA DE SUSPENSIÓN No.1:	20 de marzo de 2023
**FECHA DE REINICIACIÓN No. 1:	5 de mayo de 2023	**FECHA DE REINICIACIÓN No. 1:	5 de mayo de 2023
**FECHA DE SUSPENSIÓN No.2:	26 de julio de 2023	**FECHA DE SUSPENSIÓN No.2:	26 de julio de 2023
**FECHA DE REINICIACIÓN No. 2:	14 de noviembre de 2023	**FECHA DE REINICIACIÓN No. 2:	14 de noviembre de 2023
**FECHA DE SUSPENSIÓN No.3:	12 de diciembre de 2024	**FECHA DE SUSPENSIÓN No.3:	12 de diciembre de 2024
**FECHA DE REINICIACIÓN No. 3:	28 de diciembre de 2023	**FECHA DE REINICIACIÓN No. 3:	28 de diciembre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	29 abril de 2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	29 abril de 2024
PLAZO ACTUALIZADO:	Doce (12) meses y quince (15) días	PLAZO ACTUALIZADO:	Once meses (11) y quince (15) días
PLAZO TRANSCURRIDO:	425 DIAS	PLAZO TRANSCURRIDO:	425 DIAS
VALOR INICIAL :	$ 376.729.509,00	VALOR INICIAL :	$ 2.550.000.000,00
VALOR ADICION 1:	N/A	VALOR ADICIÓN(ES):	$ -
VALOR ADICION 2 PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD:	N/A	ANTICIPO	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 376.729.509,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 2.550.000.000,00
VALOR PAGADO:	$ -	VALOR PAGADO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 376.729.509,00	VALOR POR PAGAR:	$ 2.550.000.000,00
SUPERVISOR:	ALBA JACQUELINE CELIS HERRERA	INTERVENTOR:	CONSORCIO PROSPERAR BETHEL

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	Suscripción del acta de inicio	16/11/2022	16/11/2022	0
1	**FASE 1 / ESTUDIOS Y DISEÑOS**			
1.1	Visita de sitio	23/11/2022	23/11/2022	0
1.2	Plan de trabajo - Contratista de obra	23/11/2022	23/11/2022	0
1.3	Plan de Gestión Social - Contratista de obra	23/11/2022	23/11/2022	0
1.4	SSTMA - Contratista de obra	23/11/2022	23/11/2022	0
1.5	Cronograma - Contratista de obra	23/11/2022	23/11/2022	0
1.6	Plan de Manejo Ambiental	30/11/2022	30/11/2022	0
2	**FASE 2 / ESTUDIOS Y DISEÑOS**			
2.1	Memoria descriptiva del proyecto	15/12/2022	15/12/2022	0
2.2	Levantamiento topográfico	18/12/2022	18/12/2022	0
2.3	Inventario Forestal y Avifauna	18/12/2022	22/12/2022	4
2.4	Geotecnia y estudio de suelos	18/12/2022	22/12/2022	4
2.5	Identificación territorial de actores territoriales	30/12/2022	30/12/2022	0
2.6	Plan de Gestión Social - Contratista de obra	23/11/2022	23/11/2022	0
2.7	Programación de obra	23/11/2022	23/11/2022	0
2.8	Componente eléctrico	16/02/2023	16/02/2023	0
Plazo del proyecto en días	425			

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO
1	ETAPA DE ESTUDIO Y DISEÑOS FASE 1 (POR PRODUCTOS)	$ 278.770.299,00	100,00%	
2	ETAPA DE CONSTRUCION	$ 2.271.229.701,00	0,00%	

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

Aval del teirrotior AAU-T17	SDHT	24/11/2023
N/A		

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

N/A

6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR:

Aspectos técnicos:

Inicio de actividades preliminares de los territorios T20 Y T 21 (Cerramiento perimetral y proteccion de arboles)

Aspectos administrativos:

Ejecución de Obras

FIRMA CONTRATISTA (DIRECTOR DE OBRA)
NOMBRE: JAIME HERRERA OSORIO

FIRMA RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: CINDY LORENA RODRIGUEZ

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA)
NOMBRE: MAURICIO HERNANDEZ

Informe semana 37

SUBDIRECCION DE OPERACIONES

CONSORCIO PROSPERAR BETHEL

FECHA	martes, 23 de enero de 2024	**PERIODO No.**	37	DEL	**15/01/2024**	AL	**22/01/2024**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LA INTERVENCION TECNICA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**LOCALIDADES DE SANTA FE, KENNEDY, USME Y ENGATIVA**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA - CONSORCIO PROSPERAR BETHEL		**CONTRATO DE OBRA. - CONSORCIO INGENIERIA I**	
CONTRATO No.:	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1066-2022	CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA No. 1070-2022
PLAZO INICIAL:	OCHO (8) MESES	PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	16 de noviembre de 2022	FECHA DE INICIACIÓN:	16 de noviembre de 2022
**FECHA DE SUSPENSIÓN No.1:	20 de marzo de 2023	**FECHA DE SUSPENSIÓN No.1:	20 de marzo de 2023
**FECHA DE REINICIACIÓN No. 1:	5 de mayo de 2023	**FECHA DE REINICIACIÓN No. 1:	5 de mayo de 2023
**FECHA DE SUSPENSIÓN No.2:	26 de julio de 2023	**FECHA DE SUSPENSIÓN No.2:	26 de julio de 2023
**FECHA DE REINICIACIÓN No. 2:	14 de noviembre de 2023	**FECHA DE REINICIACIÓN No. 2:	14 de noviembre de 2023
**FECHA DE SUSPENSIÓN No.3:	12 de diciembre de 2024	**FECHA DE SUSPENSIÓN No.3:	12 de diciembre de 2024
**FECHA DE REINICIACIÓN No. 3:	28 de diciembre de 2023	**FECHA DE REINICIACIÓN No. 3:	28 de diciembre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	29 abril de 2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	29 abril de 2024
PLAZO ACTUALIZADO:	Doce (12) meses y quince (15) días	PLAZO ACTUALIZADO:	Once meses (11) y quince (15) días
PLAZO TRANSCURRIDO:	432 DIAS	PLAZO TRANSCURRIDO:	432 DIAS
VALOR INICIAL :	$ 376.729.509,00	VALOR INICIAL :	$ 2.550.000.000,00
VALOR ADICION 1:	N/A	VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR ADICION 2 PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD:	N/A	ANTICIPO	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 376.729.509,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 2.550.000.000,00
VALOR PAGADO:	$ -	VALOR PAGADO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 376.729.509,00	VALOR POR PAGAR:	$ 2.550.000.000,00
SUPERVISOR:	ALBA JACQUELINE CELIS HERRERA	INTERVENTOR:	CONSORCIO PROSPERAR BETHEL

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	Suscripción del acta de inicio	16/11/2022	16/11/2022	0
1	**FASE 1 / ESTUDIOS Y DISEÑOS**			
1.1	Visita de sitio	23/11/2022	23/11/2022	0
1.2	Plan de trabajo - Contratista de obra	23/11/2022	23/11/2022	0
1.3	Plan de Gestión Social - Contratista de obra	23/11/2022	23/11/2022	0
1.4	SSTMA - Contratista de obra	23/11/2022	23/11/2022	0
1.5	Cronograma - Contratista de obra	23/11/2022	23/11/2022	0
1.6	Plan de Manejo Ambiental	30/11/2022	30/11/2022	0
2	**FASE 2 / ESTUDIOS Y DISEÑOS**			
2.1	Memoria descriptiva del proyecto	15/12/2022	15/12/2022	0
2.2	Levantamiento topográfico	18/12/2022	18/12/2022	0
2.3	Inventario Forestal y Avifauna	18/12/2022	22/12/2022	4
2.4	Geotecnia y estudio de suelos	18/12/2022	22/12/2022	4
2.5	Identificación territorial de actores territoriales	30/12/2022	30/12/2022	0
2.6	Plan de Gestión Social - Contratista de obra	23/11/2022	23/11/2022	0
2.7	Programación de obra	23/11/2022	23/11/2022	0
2.8	Componente eléctrico	16/02/2023	16/02/2023	0
Plazo del proyecto en días	432			

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO
1	ETAPA DE ESTUDIO Y DISEÑOS FASE 1 (POR PRODUCTOS)	$ 278.770.299,00	100,00%	
2	ETAPA DE CONSTRUCION	$ 2.271.229.701,00	0,00%	

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

Aval del teirrotior AAU-T17	SDHT	24/11/2023
N/A		

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

N/A

6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR:

Aspectos técnicos:

OBRA: Semana del 15 de enero al 22 de enero de 2024
15-01-2024: Se realizo la instalación del campamento en una bodega ubicada en la Calle 35 b Sur No 87 C-13, en esta bodega se hace acopio de los diferentes materiales utilizados para le cerramiento.
SST: inducción de ingreso a obra, entrega de dotación y pausas activas, inspecciones de orden y aseo en los territorios T20 y T21 con los permisos de trabajo SST.
16-01-2024: se inició cerramiento en el territorio T21.
17-01-2024: Se realizo cerramiento de los individuos arbóreos en el territorio T21 para su protección y conservación.
18-01-2024: se inició cerramiento en el territorio T20.
19-01-2024: Se realizo cerramiento de los individuos arbóreos en el territorio T20 para su protección y conservación. Instalación de vallas informativas
20-01-2024: se inició con el levantamiento de adoquines del territorio T21 y retiro de juegos metálicos existentes.

Aspectos administrativos:

Ejecución de Obras

FIRMA CONTRATISTA (DIRECTOR DE OBRA)
NOMBRE: JAIME HERRERA OSORIO

FIRMA RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: CINDY LORENA RODRIGUEZ

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA)
NOMBRE: MAURICIO HERNANDEZ

Informe semana 3 AAU T17

	INFORME SEMANAL DE OBRA - ETAPA II				
	FRENTE DE OBRA: TERRITORIO AAUT-17				
Semana No.3	Fecha de informe	del:	**29 de enero de 2024**	al	**4 de febrero de 2024**

1. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA CIVIL

OBJETO:	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA **EN TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".**
CONTRATO DE OBRA No:	1070-2022
VALOR CONTRATO :	$ 2.550.000.000
CONTRATISTA	CONSORCIO INGENIERÍA I
PLAZO:	16 MESES Y TRES DIAS
FECHA DE INICIO:	16 de diciembre de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1	20 de marzo de 2023
FECHA DE REINICIACIÓN No. 1:	5 de mayo de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.2	26 de julio de 2023
FECHA DE REINICIACIÓN No. 2:	14 de noviembre de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.3	12 de diciembre de 2024
FECHA DE REINICIACIÓN No. 3:	28 de diciembre de 2023
FECHA DE REINICIO	19 de abril de 2024
PLAZO TRANSCURRIDO	415,00 DÍAS
VALOR INICIAL	$ 2.550.000.000,00
ADICIÓN	$ 0,00
VALOR ACTULIZADO	$ 2.550.000.000,00


2. SEGUIMIENTO DE OBRA CIVIL

RESUMEN DE AVACE DE EJECUCION DE OBRA:

Proyección de ejecución

SEMANA	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	ATRASO
SEMANA No.0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SEMANA No.1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SEMANA No.2	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SEMANA No.3	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,00%
SEMANA No.4	0,00%	0,50%	0,00%	0,50%	0,00%
SEMANA No.5	0,00%	0,50%	0,00%	0,50%	0,00%
SEMANA No.6	0,00%	0,50%	0,00%	0,50%	0,00%
SEMANA No.7	0,00%	0,50%	0,00%	0,50%	0,00%
SEMANA No.8	0,00%	0,50%	0,00%	0,50%	0,00%
SEMANA No.9	0,00%	0,50%	0,00%	0,50%	0,00%
SEMANA No.10	0,00%	0,50%	0,00%	0,50%	0,00%
SEMANA No.11	0,00%	0,50%	0,00%	0,50%	0,00%
SEMANA No.12	0,00%	0,50%	0,00%	0,50%	0,00%
SEMANA No.13	0,00%	0,50%	0,00%	0,50%	0,00%
SEMANA No.14	0,00%	0,50%	0,00%	0,50%	0,00%

CURVA DE AVANCE DE ACTIVIDADES EJECUTADO VS PROGRAMADO

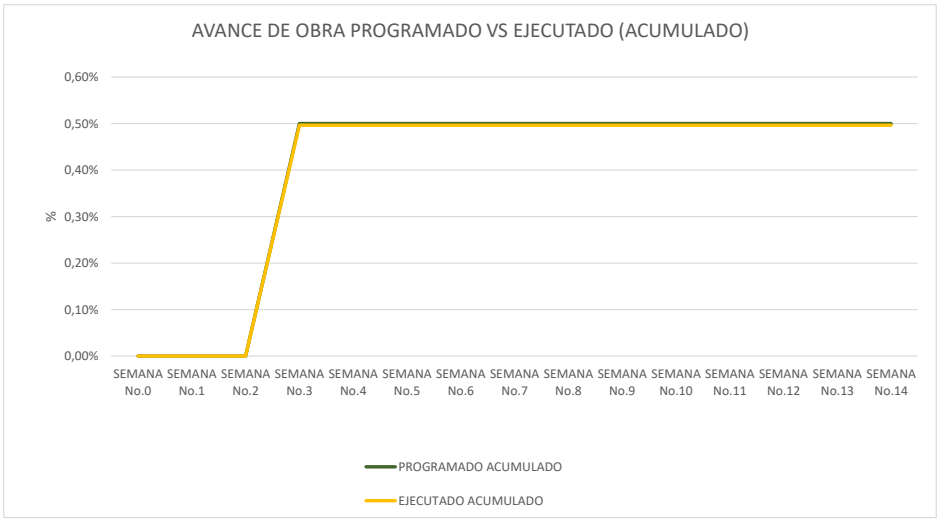

INFORME SEMANAL DE OBRA
FRENTE DE OBRA: TERRITORIO AAUT-17

SEMANA N°	**3**	**DE**	**lunes, 29 de enero de 2024**	**A**	**domingo, 4 de febrero de 2024**
FECHA INICIO :	16/12/2022	**FECHA TERMINACION:**	19/04/2024		

IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".				
INTERVENTOR	CONSORCIO PROSPERAR BETHEL	**NIT**	NIT.901.634.239-2	**CONTRATO N°**	1066-2022
CONTRATISTA	CONSORCIO INGENIERÍA I	**NIT**	NIT. 901.639.134-0	**CONTRATO N°**	1070-2022

3. REGISTRO FOTOGRAFICO



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 17
COMENTARIOS: SOCIALIZACIÓN INICIO DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 17
COMENTARIOS: SOCIALIZACIÓN INICIO DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 17
COMENTARIOS: ACTUALIZACIÓN INVENTARIO FORESTAL



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 17
COMENTARIOS: ACTUALIZACIÓN INVENTARIO FORESTAL



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 17
COMENTARIOS: CERRAMIENTO PERIMETRAL PROVISIONAL



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 17
COMENTARIOS: INSTALACIÓN VALLAS INFORMATIVAS

CONSORCIO INGENIERÍA I
Nit. 901.639.134 - 0

AVANCE INFROME SEMANALES

No. DE ORDEN	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS		SEMANA No.3		
										3
	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR	PROCENTAJE
1,00	ACTIVIDADES PRELIMINARES									
1,10	Localización y replanteo	m2	1204,00	$ 8.226,00	$ 9.904.104,00	1204,00	$ 9.904.104,00			
1,70	Cerramiento provisional de obra (Polisombra)	ml	165,45	$ 27.273,00	$ 4.512.318,00	165,45	$ 4.512.318,00	88,00	$ 2.400.024,00	53,19%
1,10	Proteccion de arbol de existente	un	9,00	$ 70.802,00	$ 637.218,00	9,00	$ 637.218,00			
1,13	Proteccion de rejillas	un		$ 16.273,00			$ -			
2,00	EXCAVACIONES Y RELLENOS									
2,10	Descapote a máquina nivel 0.00 (inc. retiro) e=-20 cm	m2	1204,00	$ 14.422,00	$ 17.364.088,00	1204,00	$ 17.364.088,00			
2,20	Nivelacion y perfilado de terreno manual	m2	1204,00	$ 2.640,00	$ 3.178.560,00	1204,00	$ 3.178.560,00			
2,30	Nivelación y Compactación de Subrasante	m2	461,00	$ 1.397,00	$ 644.017,00	461,00	$ 644.017,00			
2,90	Excavacion mecanica+retiro	m3	138,30	$ 42.384,00	$ 5.861.707,00	138,30	$ 5.861.707,00			
2,50	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	m3	69,15	$ 109.904,00	$ 7.599.862,00	69,15	$ 7.599.862,00			
2,60	Geotextil T-2400	m2	501,05	$ 11.156,00	$ 5.589.714,00	501,05	$ 5.589.714,00			
2,70	Relleno compactado Base granular	m3	69,15	$ 156.593,00	$ 10.828.406,00	69,15	$ 10.828.406,00			
3,00	CONCRETOS BASES Y ESTRUCTURAS									
3,10	Placa contrapiso 3000 psi 21mpa e=15	m3	65,21	$ 1.027.855,00	$ 67.026.425,00	65,21	$ 67.026.425,00			
3,30	Concreto 3000 psi 21mpa para muros (Contenedores de raiz)	m3	5,06	$ 870.250,00	$ 4.403.465,00	5,06	$ 4.403.465,00			
4,00	ACERO DE REFUERZO									
4,10	Malla Electrosoldada d=5mm@0.15 (area 6x2.35)	kg	1392,60	$ 6.619,00	$ 9.217.619,00	1392,60	$ 9.217.619,00			
4,20	Refuerzo acero fy=60000psi muro	kg	43,00	$ 5.726,00	$ 246.218,00	43,00	$ 246.218,00			
5,00	REDES HIDROSANITARIAS									
5,10	Descapote a máquina nivel 0.00 (inc. retiro) e=-1,40m	m3	160,64	$ 50.223,00	$ 8.067.823,00	160,64	$ 8.067.823,00			
5,20	Concreto limpieza (alistado de terreno) e=0,05enObra	m3	1,33	$ 29.530,00	$ 39.275,00	1,33	$ 39.275,00			
5,30	Talues perimetrales en concreto fc 21 3000 psi .15	m3	13,98	$ 570.017,00	$ 7.968.838,00	13,98	$ 7.968.838,00			
5,40	Cañuela en concreto	ml	13,90	$ 98.766,00	$ 1.372.847,00	13,90	$ 1.372.847,00			
5,50	Geotextil (NORMA) NS-088	m2	89,91	$ 11.156,00	$ 1.003.036,00	89,91	$ 1.003.036,00			
5,60	Capa drenaje (agregado Grueso)	m3	24,27	$ 147.396,00	$ 3.577.301,00	24,27	$ 3.577.301,00			
5,70	Capa filtrante (agregado Fino)	m3	4,05	$ 191.071,00	$ 773.838,00	4,05	$ 773.838,00			
5,80	Tuberia perforada PVC DE 4 PUL	ml	55,71	$ 50.832,00	$ 2.831.851,00	55,71	$ 2.831.851,00			
5,90	Tuberia de limpieza PVC 4 PUL	ml	18,00	$ 50.832,00	$ 914.976,00	18,00	$ 914.976,00			
5,10	Tuberia de salida PVC 6 PUL	ml	5,60	$ 80.411,00	$ 450.302,00	5,60	$ 450.302,00			
5,11	Sustrato (TIERRA NEGRA+ ARENA)	m3	36,41	$ 170.501,00	$ 6.207.941,00	36,41	$ 6.207.941,00			
5,12	Piedra bola	m2	7,38	$ 41.714,00	$ 307.849,00	7,38	$ 307.849,00			
5,13	Malla Electro soldada d=5mm@0.15	kg	44,09	$ 6.619,00	$ 291.832,00	44,09	$ 291.832,00			
5,14	Refuerzo acero fy=60000psi	kg	1654,00	$ 5.726,00	$ 9.470.804,00	1654,00	$ 9.470.804,00			
5,15	Reja sumidero	un	22,00	$ 292.310,00	$ 6.430.820,00	22,00	$ 6.430.820,00			
5,16	Nivelacion y perfilado de terreno manual	m2	80,91	$ 2.640,00	$ 213.602,00	80,91	$ 213.602,00			
5,17	Nivelación y Compactación de Subrasante	m2	80,91	$ 1.397,00	$ 113.031,00	80,91	$ 113.031,00			
5,18	Cerramiento reja pequeña	ml	44,00	$ 47.880,00	$ 2.106.720,00	44,00	$ 2.106.720,00			
5,19	Caja de inspeccion .60x.60 h=1.0 **	un	2,00	$ 545.257,00	$ 1.090.514,00	2,00	$ 1.090.514,00			
6,00	PINTURA PISO									
6,10	Pintura a color espacio de GYM Biosaludable	m3	45,74	$ 34.389,00	$ 1.572.953,00	45,74	$ 1.572.953,00			
7,00	ADOQUIN, TABLETA, Y BORDILLOS									
7,30	Tableta podotactil alerta 20*20 cm. Prefabricado en concreto color amarillo (A57)	ml	45,87	$ 86.499,00	$ 3.967.709,00	45,87	$ 3.967.709,00			
7,40	Tableta podotactil Guia 20*20 cm. Prefabricado en concreto, color amarillo (A58)	ml	109,34	$ 86.499,00	$ 9.457.801,00	109,34	$ 9.457.801,00			
7,60	Bordillo demarcado recto interno prefabricado en concreto (A80)	ml	401,56	$ 90.840,00	$ 36.477.710,00	401,56	$ 36.477.710,00			
8,00	PISOS EN MATERIAL RECICLADO TIPO CAUCHO									
8,10	Piso caucho reciclado en color, para juegos	m2	63,69	$ 566.082,00	$ 36.053.763,00	63,69	$ 36.053.763,00			
10,00	MOBILIARIO URBANO									
10,10	Caneca metalica referencia M120 o M121.	un	4,00	$ 629.610,00	$ 2.518.440,00	4,00	$ 2.518.440,00			
10,20	Silla individual referencia M-01-A	un	17,00	$ 1.491.405,00	$ 25.353.885,00	17,00	$ 25.353.885,00			
10,17	Torre Columpio Deslizadero	un	1,00	$ 34.475.000,00	$ 34.475.000,00	1,00	$ 34.475.000,00			
10,60	Suministro baranda M-83	ml	63,69	$ 364.707,00	$ 23.228.189,00	63,69	$ 23.228.188,83			
10,70	Equipo de GYM REF flexion pierna	un	1,00	$ 4.956.332,00	$ 4.956.332,00	1,00	$ 4.956.332,00			
10,80	Equipo de GYM REF Eliptica	un	1,00	$ 4.956.332,00	$ 4.956.332,00	1,00	$ 4.956.332,00			
10,90	Equipo de GYM REF Giro de hombros	un	1,00	$ 3.032.332,00	$ 3.032.332,00	1,00	$ 3.032.332,00			
10,10	Equipo de GYM REF Giro caminador	un	1,00	$ 4.058.332,00	$ 4.058.332,00	1,00	$ 4.058.332,00			
10,50	Mesa de ajedrez en concreto	un	2,00	$ 1.541.585,00	$ 3.083.170,00	2,00	$ 3.083.170,00			
10,19	Cicloparqueadero tipo M-22 acero inoxidable	un	19,00	$ 570.462,00	$ 10.838.778,00	19,00	$ 10.838.778,00			
10,20	Bolardo en hierro	un	13,00	$ 214.013,00	$ 2.782.169,00	13,00	$ 2.782.169,00			
10,31	Suministro e instalación de BARRAS COMBINADAS .DIMENSIONES:: 4.59 x 1.41 x 2.65 mts	un	1,00	$ 13.651.680,00	$ 13.651.680,00	1,00	$ 13.651.680,00			
11,00	VEGETACION									
11,10	Cobertura tipo grama	m2	399,34	$ 10.422,00	$ 4.161.921,00	399,34	$ 4.161.921,00			
11,20	Cobertura tipo floricultura	m2	48,08	$ 98.124,00	$ 4.717.802,00	48,08	$ 4.717.802,00			
11,30	Siembra de arbol (Según propuesta paisajismo)	un	6,00	$ 291.101,00	$ 1.746.606,00	6,00	$ 1.746.606,00			
11,40	Relleno en tierra negra	m3	44,74	$ 65.431,00	$ 2.927.383,00	44,74	$ 2.927.383,00			
11,50	Limo arcilloso	m3	26,48	$ 116.667,00	$ 3.089.342,00	26,48	$ 3.089.342,00			
11,60	Arbol hayuelo	un	1,00	$ 299.197,00	$ 299.197,00	1,00	$ 299.197,00			
11,70	Arbol laurel hoja pequeña	un	4,00	$ 291.101,00	$ 1.164.404,00	4,00	$ 1.164.404,00			
11,80	Arbol Carbonero Rojo	un	3,00	$ 306.086,00	$ 918.258,00	3,00	$ 918.258,00			
11,90	Arbol Calistemo	un	1,00	$ 289.533,00	$ 289.533,00	1,00	$ 289.533,00			
12,00	SEÑALETICA									
12,10	Señaletica identificador zona de juegos infantiles	un	1,00	$ 296.774,00	$ 296.774,00	1,00	$ 296.774,00			
12,20	Señaletica GYM parque	un	2,00	$ 296.774,00	$ 593.548,00	2,00	$ 593.548,00			
12,30	Señaletica identificador	un	2,00	$ 569.478,00	$ 1.138.956,00	2,00	$ 1.138.956,00			
12,40	Señalitica SC-80	un	3,00	$ 454.702,00	$ 1.364.106,00	3,00	$ 1.364.106,00			
13,00	OTROS									
13,10	Baño portatil Alquiler	mes	4,00	$ 398.250,00	$ 1.593.000,00	4,00	$ 1.593.000,00			
13,20	Aseo general	m2	1204,00	$ 7.449,00	$ 8.968.596,00	1204,00	$ 8.968.596,00			
14,01	PROVISIÓN DE OBRAS ADICIONALES			29478330,00	29.478.330,00		$ 29.478.330,00			
					$ 483.459.252,00		$ 483.459.252,00		$ 2.400.024,00	0,50%
	AMINISTRACIÓN		26,00%		$ 125.699.406,00		$ 125.699.406,00		$ 624.006,24	0,50%
	IMPREVISTOS		1,00%		$ 4.834.593,00		$ 4.834.593,00		$ 24.000,24	0,50%
	UTILIDAD		6,00%		$ 29.007.555,00		$ 29.007.555,00		$ 144.001,44	0,50%
	VALOR IVA SOBRE LA UTILIDAD		19%		$ 5.511.435,00		$ 5.511.435,00		$ 27.360,27	0,50%
	VALORES COSTOS INDIRECTOS				$ 165.052.989,00		$ 165.052.989,00			
	COSTO TOTAL OBRA				$ 648.512.241,00		$ 648.512.241,00			
	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO				$ 5.403.728,00		$ 5.403.728,00			
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				$ 11.439.678,00		$ 11.439.678,00			
					$ 665.355.647,00		$ 665.355.647,00		$ 3.219.392,19	0,48%
										0,48%

Informe semana 1 AAU T20

	INFORME SEMANAL DE OBRA - ETAPA II				
	FRENTE DE OBRA: TERRITORIO AAUT-20				
Semana No.1	Fecha de informe	del:	**15 de enero de 2024**	al	**21 de enero de 2024**

1. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA CIVIL

OBJETO:	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA **EN TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".**
CONTRATO DE OBRA No:	1070-2022
VALOR CONTRATO :	$ 2.550.000.000
CONTRATISTA	CONSORCIO INGENIERÍA I
PLAZO:	16 MESES Y TRES DIAS
FECHA DE INICIO:	16 de diciembre de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1	20 de marzo de 2023
FECHA DE REINICIO No. 1:	5 de mayo de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.2	26 de julio de 2023
FECHA DE REINICIO No. 2:	14 de noviembre de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.3	12 de diciembre de 2024
FECHA DE REINICIO No. 3:	28 de diciembre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	19 de abril de 2024
PLAZO TRANSCURRIDO	401,00 DÍAS
VALOR INICIAL	$ 2.550.000.000,00
ADICIÓN	$ 0,00
VALOR ACTULIZADO	$ 2.550.000.000,00


2. SEGUIMIENTO DE OBRA CIVIL

RESUMEN DE AVACE DE EJECUCION DE OBRA:

Proyección de ejecución

SEMANA	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	ATRASO
SEMANA No.0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SEMANA No.1	1,00%	1,00%	0,00%	0,00%	-1,00%
SEMANA No.2	0,00%	1,00%	0,00%	0,00%	-1,00%
SEMANA No.3	0,00%	1,00%	0,00%	0,00%	-1,00%
SEMANA No.4	0,00%	1,00%	0,00%	0,00%	-1,00%
SEMANA No.5	0,00%	1,00%	0,00%	0,00%	-1,00%
SEMANA No.6	0,00%	1,00%	0,00%	0,00%	-1,00%
SEMANA No.7	0,00%	1,00%	0,00%	0,00%	-1,00%
SEMANA No.8	0,00%	1,00%	0,00%	0,00%	-1,00%
SEMANA No.9	0,00%	1,00%	0,00%	0,00%	-1,00%
SEMANA No.10	0,00%	1,00%	0,00%	0,00%	-1,00%
SEMANA No.11	0,00%	1,00%	0,00%	0,00%	-1,00%
SEMANA No.12	0,00%	1,00%	0,00%	0,00%	-1,00%
SEMANA No.13	0,00%	1,00%	0,00%	0,00%	-1,00%
SEMANA No.14	0,00%	1,00%	0,00%	0,00%	-1,00%

CURVA DE AVANCE DE ACTIVIDADES EJECUTADO VS PROGRAMADO

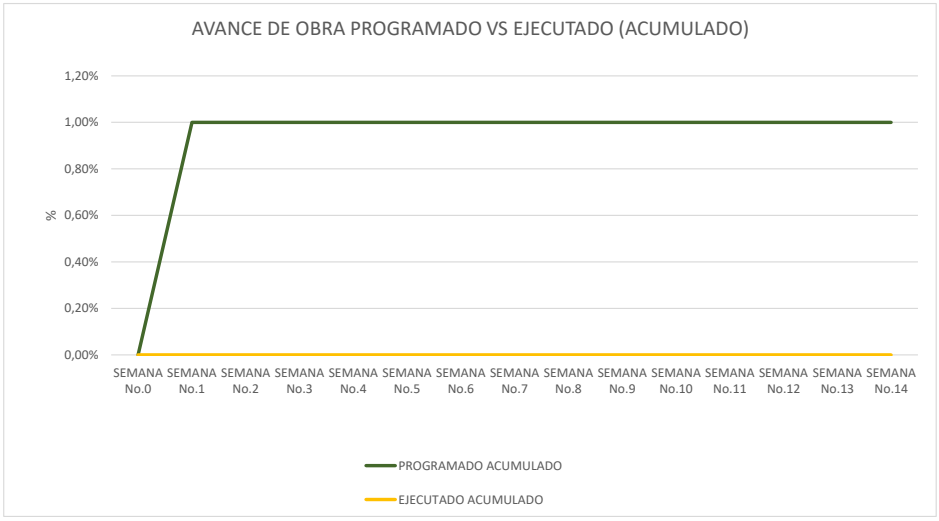

INFORME SEMANAL DE OBRA -ETAPA II
FRENTE DE OBRA: TERRITORIO AAUT-20

SEMANA N°	**1**	**DE**	**lunes, 15 de enero de 2024**	**A**	**domingo, 21 de enero de 2024**
FECHA INICIO :	16/12/2022	**FECHA TERMINACION:**	19/04/2024		

IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".				
INTERVENTOR	CONSORCIO PROSPERAR BETHEL	**NIT**	NIT.901.634.239-2	**CONTRATO N°**	1066-2022
CONTRATISTA	CONSORCIO INGENIERÍA I	**NIT**	NIT. 901.639.134-0	**CONTRATO N°**	1070-2022

3. REGISTRO FOTOGRAFICO



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 20
COMENTARIOS: ACTUALIZACIÓN INVENTARIO FORESTAL



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 20
COMENTARIOS: ACTUALIZACIÓN INVENTARIO FORESTAL



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 20
COMENTARIOS: LOCALIZACIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 20
COMENTARIOS: LOCALIZACIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 20
COMENTARIOS: PANORAMICA TERRITORIO AAUT-20



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 20
COMENTARIOS: UBICACIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL

CONSORCIO INGENIERÍA I

Nit. 901.639.134 - 0

AVANCE INFROME SEMANALES

No. DE ORDEN	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS		SEMANA No.1		
								1		
	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR	PROCENTAJE
1,00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**									
1,1	Localización y replanteo	m2	512,00	$ 8.226,00	$ 4.211.712,00	517,00	$ 4.252.842,00		$ -	
1,7	Cerramiento provisional de obra (Polisombra)	ml	93,00	$ 27.273,00	$ 2.536.389,00	93,00	$ 2.536.389,00		$ -	
1,8	Demolición y retiro de Bordillo prefabricado	ml	65,00	$ 18.468,00	$ 1.200.420,00	65,00	$ 1.200.420,00		$ -	
1,9	Desmonte y retiro de juegos infantiles	un	2,00	$ 114.946,00	$ 229.892,00	2,00	$ 229.892,00		$ -	
1,10	Proteccion de arbol de existente	un	19,00	$ 70.802,00	$ 1.345.238,00	19,00	$ 1.345.238,00		$ -	
2,00	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**								-	
2,1	Descapote a máquina nivel 0.00 (inc. retiro) e=-20 cm	m2	512,00	$ 14.422,00	$ 7.384.064,00	512,00	$ 7.384.064,00			
2,2	Nivelacion y perfilado de terreno manual	m2	512,00	$ 2.640,00	$ 1.351.680,00	512,00	$ 1.351.680,00			
2,3	Nivelación y Compactación de Subrasante	m2	512,00	$ 1.397,00	$ 715.264,00	512,00	$ 715.264,00			
2,4	Excavación manual suelo blanco	m3	47,00	$ 73.172,00	$ 3.439.084,00	47,00	$ 3.439.084,00			
2,5	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	m3	23,00	$ 109.904,00	$ 2.527.792,00	23,00	$ 2.527.792,00			
2,6	Geotextil T-2400	m2	329,00	$ 11.156,00	$ 3.670.324,00	329,00	$ 3.670.324,00			
2,7	Relleno compactado Base granular	m3	23,00	$ 11.156,00	$ 256.588,00	23,00	$ 256.588,00			
2,8	Excabacion muros y huellas vaciadas en concreto	m3	2,00	$ 73.172,00	$ 146.344,00	2,00	$ 146.344,00			
3,00	**CONCRETOS BASES Y ESTRUCTURAS**								-	
3,1	Placa contrapiso 3000 psi 21mpa e=15	m3	19,00	$ 1.027.855,00	$ 19.529.245,00	19,00	$ 19.529.245,00			
3,2	Placa contrapiso 3000 psi 21mpa para huellas en concreto	m3	1,00	$ 1.027.855,00	$ 1.027.855,00	1,00	$ 1.027.855,00			
3,3	Concreto 3000 psi 21mpa para muros (Contenedores de raiz)	m3	1,00	$ 870.250,00	$ 870.250,00	1,00	$ 870.250,00			
4,00	**ACERO DE REFUERZO**								-	
4,1	Malla Electrosoldada d=5mm@0.15 (area 6x2.35)	kg	530,00	$ 6.619,00	$ 3.508.070,00	530,00	$ 3.508.070,00			
4,2	Refuerzo acero fy=60000psi muro	kg	44,00	$ 5.726,00	$ 251.944,00	44,00	$ 251.944,00			
4,3	Refuerzo acero fy=60000psi huellas de concreto	kg	127,00	$ 5.726,00	$ 727.202,00	127,00	$ 727.202,00			
5,00	**REDES HIDROSANITARIAS SUDS**								-	
5,1	Descapote a máquina nivel 0.00 (inc. retiro) e=-1,40m	m3	97,00	$ 50.223,00	$ 4.871.631,00	97,00	$ 4.871.631,00			
5,2	Concreto limpieza (alistado de terreno) e=0.05enObra	m3	1,00	$ 29.530,00	$ 29.530,00	1,00	$ 29.530,00			
5,3	Talues perimetrales en concreto fc 21 3000 psi .15	m3	12,00	$ 570.017,00	$ 6.840.204,00	12,00	$ 6.840.204,00			
5,4	Cañuela en concreto	ml	9,00	$ 98.766,00	$ 888.894,00	9,00	$ 888.894,00			
5,5	Geotextil (NORMA) NS-088	m2	69,00	$ 11.156,00	$ 769.764,00	69,00	$ 769.764,00			
5,6	Capa drenaje (agregado Grueso)	m3	16,00	$ 147.396,00	$ 2.358.336,00	16,00	$ 2.358.336,00			
5,7	Capa filtrante (agregado Fino)	m3	3,00	$ 191.071,00	$ 573.213,00	3,00	$ 573.213,00			
5,8	Tuberia perforada PVC DE 4 PUL	ml	27,00	$ 50.832,00	$ 1.372.464,00	27,00	$ 1.372.464,00			
5,9	Tuberia de limpieza PVC 4 PUL	ml	10,00	$ 50.832,00	$ 508.320,00	10,00	$ 508.320,00			
5,10	Tuberia de salida PVC 6 PUL	ml	6,00	$ 80.411,00	$ 482.466,00	6,00	$ 482.466,00			
5,11	Sustrato (TIERRA NEGRA+ ARENA)	m3	23,00	$ 170.501,00	$ 3.921.523,00	23,00	$ 3.921.523,00			
5,12	Piedra bola	m2	5,00	$ 41.714,00	$ 208.570,00	5,00	$ 208.570,00			
5,13	Malla Electro soldada d=5mm@0.15	kg	68,00	$ 6.619,00	$ 450.092,00	68,00	$ 450.092,00			
5,14	Refuerzo acero fy=60000psi	kg	1512,00	$ 5.726,00	$ 8.657.712,00	1512,00	$ 8.657.712,00			
5,15	Reja sumidero	un	22,00	$ 292.310,00	$ 6.430.820,00	22,00	$ 6.430.820,00			
5,16	Nivelacion y perfilado de terreno manual	m2	69,00	$ 2.640,00	$ 182.160,00	69,00	$ 182.160,00			
5,17	Nivelación y Compactación de Subrasante	m2	54,00	$ 1.397,00	$ 75.438,00	54,00	$ 75.438,00			
5,18	Cerramiento reja pequeña	ml	33,00	$ 47.880,00	$ 1.580.040,00	33,00	$ 1.580.040,00			
5,19	Caja de inspeccion .60x.60 h=1.0 **	un	34,00	$ 545.257,00	$ 18.538.738,00	34,00	$ 18.538.738,00			
6,00	**PINTURA**								-	
6,10	Pintura a color espacio de GYM Biosaludable	m2	21,00	$ 34.389,00	$ 722.169,00	21,00	$ 722.169,00			
7,00	**ADOQUÍN, TABLETA, Y BORDILLOS**								-	
7,1	Adoquin prefabricados en concreto a color, de 06*15*21 (ref.Looserna-Adoquinar)	m2	21,00	$ 69.775,00	$ 1.465.275,00	21,00	$ 1.465.275,00			
7,2	Adoquin rectangular plano demarcador visual	m2	0,57	$ 137.201,00	$ 78.589,00	0,57	$ 78.589,00			
7,3	Tableta podotactil alerta 20*20 cm. Prefabricado en concreto color amarillo (A57)	ml	23,31	$ 86.499,00	$ 2.016.292,00	23,31	$ 2.016.292,00			
7,4	Tableta podotactil Guia 20*20 cm. Prefabricado en concreto, color amarillo (A58)	ml	35,33	$ 86.499,00	$ 3.056.010,00	35,33	$ 3.056.010,00			
7,5	Bordillo demarcado recto vial prefabricado en concreto (A10)	ml	65,00	$ 85.405,00	$ 5.551.325,00	65,00	$ 5.551.325,00			
7,6	Bordillo demarcado recto interno prefabricado en concreto (A80)	ml	116,00	$ 90.840,00	$ 10.537.440,00	116,00	$ 10.537.440,00			
8,00	**PISOS EN MATERIAL RECICLADO TIPO CAUCHO**								-	
8,1	Piso caucho reciclado en color, para juegos infantiles	m2	31,00	$ 566.082,00	$ 17.548.542,00	31,00	$ 17.548.542,00			
10,00	**MOBILIARIO URBANO**									
10,1	Caneca metalica referencia M120 o M121.	un	2,00	$ 629.610,00	$ 1.259.220,00	2,00	$ 1.259.220,00			
10,2	Silla individual referencia M-01-A	un	4,00	$ 1.491.405,00	$ 5.965.620,00	4,00	$ 5.965.620,00			
10,4	Deslizadero	un	1,00	$ 26.959.769,00	$ 26.959.769,00	1,00	$ 26.959.769,00			
10,5	Mesa de ajedrez en concreto	un	1,00	$ 1.541.585,00	$ 1.541.585,00	1,00	$ 1.541.585,00			
10,6	Suministro baranda M-83	ml	23,00	$ 364.707,00	$ 8.388.261,00	23,00	$ 8.388.261,00			
10,7	Equipo de GYM REF flexion pierna	un	1,00	$ 4.956.332,00	$ 4.956.332,00	1,00	$ 4.956.332,00			

CONSORCIO INGENIERÍA I

Nit. 901.639.134 - 0

AVANCE INFROME SEMANALES

No. DE ORDEN	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS		SEMANA No.1		
										1
	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR	PROCENTAJE
10,8	Equipo de GYM REF Eliptica	un	1,00	$ 4.956.332,00	$ 4.956.332,00	1,00	$ 4.956.332,00			
10,9	Equipo de GYM REF Giro de hombros	un	1,00	$ 3.032.332,00	$ 3.032.332,00	1,00	$ 3.032.332,00			
10,10	Equipo de GYM REF Giro caminador	un	1,00	$ 4.058.332,00	$ 4.058.332,00	1,00	$ 4.058.332,00			
11,00	**VEGETACION**								-	
11,1	Cobertura tipo grama	m2	247,00	$ 10.422,00	$ 2.574.234,00	247,00	$ 2.574.234,00			
11,2	Cobertura tipo floricultura	m2	47,00	$ 98.124,00	$ 4.611.828,00	47,00	$ 4.611.828,00			
11,3	Siembra de arbol (Según propuesta paisajismo)	un	1,00	$ 291.101,00	$ 291.101,00	1,00	$ 291.101,00			
11,4	Relleno en tierra negra	m3	29,00	$ 65.431,00	$ 1.897.499,00	29,00	$ 1.897.499,00			
11,7	Arbol laurel hoja pequeña	un	1,00	$ 291.101,00	$ 291.101,00	1,00	$ 291.101,00			
12,00	**SEÑALETICA**								-	
12,1	Señaletica identificador zona de juegos infantiles	un	1,00	$ 296.774,00	$ 296.774,00	1,00	$ 296.774,00			
12,2	Señaletica GYM parque	un	1,00	$ 296.774,00	$ 296.774,00	1,00	$ 296.774,00			
12,3	Señaletica identificador	un	1,00	$ 569.478,00	$ 569.478,00	1,00	$ 569.478,00			
12,4	Señalitica SC-80	un	1,00	$ 454.702,00	$ 454.702,00	1,00	$ 454.702,00			
13,00	**OTROS**								-	
13,1	Baño portatil Alquiler	mes	4,00	$ 398.250,00	$ 1.593.000,00	4,00	$ 1.593.000,00			
13,2	Aseo general	m2	512,00	$ 7.449,00	$ 3.813.888,00	512,00	$ 3.813.888,00			
14,10	**PROVISIÓN DE OBRAS ADICIONALES**			**$ 13.959.427,00**	**$ 13.959.427,00**		**13.918.297,00**		-	
					$ 246.412.503,00		**$ 246.412.503,00**		**$ -**	
	AMINISTRACIÓN		**26,00%**		**$ 64.067.251,00**		**$ 64.067.251,00**		**$ -**	
	IMPREVISTOS		**1,00%**		**$ 2.464.125,00**		**$ 2.464.125,00**		**$ -**	
	UTILIDAD		**6,00%**		**$ 14.784.750,00**		**$ 14.784.750,00**		**$ -**	
	VALOR IVA SOBRE LA UTILIDAD		**19%**		**$ 2.809.103,00**		**$ 2.809.103,00**		**$ -**	
	VALORES COSTOS INDIRECTOS				**$ 84.125.229,00**		**$ 84.125.229,00**			
	COSTO TOTAL OBRA				**$ 330.537.732,00**		**$ 330.537.732,00**			
	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO				**$ 4.276.988,00**		**$ 4.276.988,00**			
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				**$ 11.439.678,00**		**$ 11.439.678,00**			
					$ 346.254.398,00		**$ 346.254.398,00**		**$ -**	

Informe semana 2 AAU T20

	INFORME SEMANAL DE OBRA - ETAPA II				
	FRENTE DE OBRA: TERRITORIO AAUT-20				
Semana No.2	Fecha de informe	del:	**22 de enero de 2024**	al	**28 de enero de 2024**

1. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA CIVIL

OBJETO:	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA **EN TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".**
CONTRATO DE OBRA No:	1070-2022
VALOR CONTRATO :	$ 2.550.000.000
CONTRATISTA	CONSORCIO INGENIERÍA I
PLAZO:	16 MESES Y TRES DIAS
FECHA DE INICIO:	16 de diciembre de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1	20 de marzo de 2023
FECHA DE REINICIO No. 1:	5 de mayo de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.2	26 de julio de 2023
FECHA DE REINICIO No. 2:	14 de noviembre de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.3	12 de diciembre de 2024
FECHA DE REINICIO No. 3:	28 de diciembre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	19 de abril de 2024
PLAZO TRANSCURRIDO	408,00 DÍAS
VALOR INICIAL	$ 2.550.000.000,00
ADICIÓN	$ 0,00
VALOR ACTULIZADO	$ 2.550.000.000,00


2. SEGUIMIENTO DE OBRA CIVIL

RESUMEN DE AVACE DE EJECUCION DE OBRA:

Proyección de ejecución

SEMANA	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	ATRASO
SEMANA No.0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SEMANA No.1	1,00%	1,00%	0,00%	0,00%	-1,00%
SEMANA No.2	1,00%	2,00%	1,16%	1,16%	-0,84%
SEMANA No.3	0,00%	2,00%	0,00%	1,16%	-0,84%
SEMANA No.4	0,00%	2,00%	0,00%	1,16%	-0,84%
SEMANA No.5	0,00%	2,00%	0,00%	1,16%	-0,84%
SEMANA No.6	0,00%	2,00%	0,00%	1,16%	-0,84%
SEMANA No.7	0,00%	2,00%	0,00%	1,16%	-0,84%
SEMANA No.8	0,00%	2,00%	0,00%	1,16%	-0,84%
SEMANA No.9	0,00%	2,00%	0,00%	1,16%	-0,84%
SEMANA No.10	0,00%	2,00%	0,00%	1,16%	-0,84%
SEMANA No.11	0,00%	2,00%	0,00%	1,16%	-0,84%
SEMANA No.12	0,00%	2,00%	0,00%	1,16%	-0,84%
SEMANA No.13	0,00%	2,00%	0,00%	1,16%	-0,84%
SEMANA No.14	0,00%	2,00%	0,00%	1,16%	-0,84%

CURVA DE AVANCE DE ACTIVIDADES EJECUTADO VS PROGRAMADO

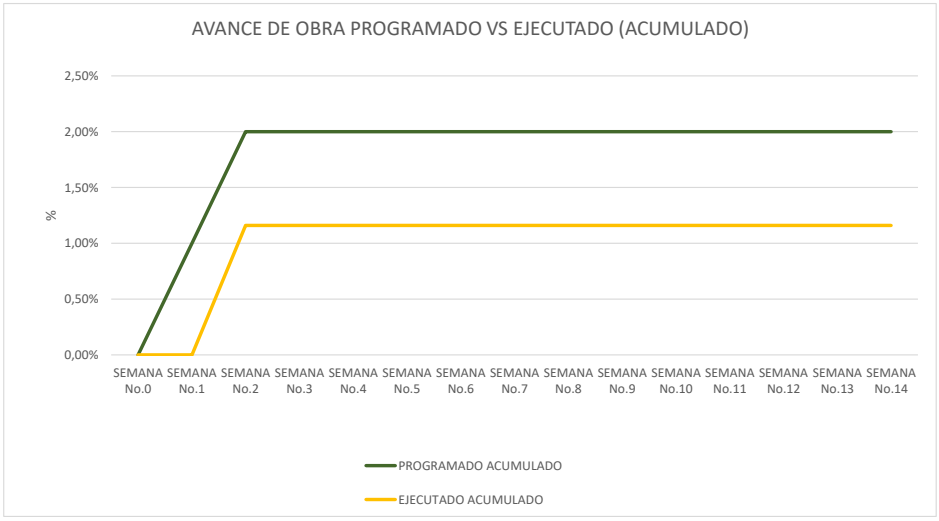

INFORME SEMANAL DE OBRA -ETAPA II
FRENTE DE OBRA: TERRITORIO AAUT-20

SEMANA N°	**2**	**DE**	**lunes, 22 de enero de 2024**	**A**	**domingo, 28 de enero de 2024**
FECHA INICIO :	16/12/2022	**FECHA TERMINACION:**	19/04/2024		

IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".				
INTERVENTOR	CONSORCIO PROSPERAR BETHEL	**NIT**	NIT.901.634.239-2	**CONTRATO N°**	1066-2022
CONTRATISTA	CONSORCIO INGENIERÍA I	**NIT**	NIT. 901.639.134-0	**CONTRATO N°**	1070-2022

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 20
COMENTARIOS: CERRAMIENTO PERIMETRAL PROVISIONAL



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 20
COMENTARIOS: PROTECCIÓN ESPECIES ARBOREAS



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 20
COMENTARIOS: PANORAMICA CERRAMIENTO PERIMETRAL



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 20
COMENTARIOS: PANORAMICA CERRAMIENTO PERIMETRAL

CONSORCIO INGENIERÍA I

Nit. 901.639.134 - 0

AVANCE INFROME SEMANALES

No. DE ORDEN	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS		SEMANA No.2		
										2
	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR	PROCENTAJE
1,00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**									
1,1	Localización y replanteo	m2	512,00	$ 8.226,00	$ 4.211.712,00	517,00	$ 4.252.842,00			
1,7	Cerramiento provisional de obra (Polisombra)	ml	93,00	$ 27.273,00	$ 2.536.389,00	93,00	$ 2.536.389,00	55,48	$ 1.513.147,03	59,66%
1,8	Demolición y retiro de Bordillo prefabricado	ml	65,00	$ 18.468,00	$ 1.200.420,00	65,00	$ 1.200.420,00			
1,9	Desmonte y retiro de juegos infantiles	un	2,00	$ 114.946,00	$ 229.892,00	2,00	$ 229.892,00			
1,10	Proteccion de arbol de existente	un	19,00	$ 70.802,00	$ 1.345.238,00	19,00	$ 1.345.238,00	19,00	$ 1.345.238,00	100,00%
2,00	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**								-	
2,1	Descapote a máquina nivel 0.00 (inc. retiro) e=-20 cm	m2	512,00	$ 14.422,00	$ 7.384.064,00	512,00	$ 7.384.064,00			
2,2	Nivelacion y perfilado de terreno manual	m2	512,00	$ 2.640,00	$ 1.351.680,00	512,00	$ 1.351.680,00			
2,3	Nivelación y Compactación de Subrasante	m2	512,00	$ 1.397,00	$ 715.264,00	512,00	$ 715.264,00			
2,4	Excavación manual suelo blanco	m3	47,00	$ 73.172,00	$ 3.439.084,00	47,00	$ 3.439.084,00		$ -	
2,5	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	m3	23,00	$ 109.904,00	$ 2.527.792,00	23,00	$ 2.527.792,00			
2,6	Geotextil T-2400	m2	329,00	$ 11.156,00	$ 3.670.324,00	329,00	$ 3.670.324,00			
2,7	Relleno compactado Base granular	m3	23,00	$ 11.156,00	$ 256.588,00	23,00	$ 256.588,00			
2,8	Excabacion muros y huellas vaciadas en concreto	m3	2,00	$ 73.172,00	$ 146.344,00	2,00	$ 146.344,00			
3,00	**CONCRETOS BASES Y ESTRUCTURAS**								-	
3,1	Placa contrapiso 3000 psi 21mpa e=15	m3	19,00	$ 1.027.855,00	$ 19.529.245,00	19,00	$ 19.529.245,00			
3,2	Placa contrapiso 3000 psi 21mpa para huellas en concreto	m3	1,00	$ 1.027.855,00	$ 1.027.855,00	1,00	$ 1.027.855,00			
3,3	Concreto 3000 psi 21mpa para muros (Contenedores de raiz)	m3	1,00	$ 870.250,00	$ 870.250,00	1,00	$ 870.250,00			
4,00	**ACERO DE REFUERZO**									
4,1	Malla Electrosoldada d=5mm@0.15 (area 6x2.35)	kg	530,00	$ 6.619,00	$ 3.508.070,00	530,00	$ 3.508.070,00			
4,2	Refuerzo acero fy=60000psi muro	kg	44,00	$ 5.726,00	$ 251.944,00	44,00	$ 251.944,00			
4,3	Refuerzo acero fy=60000psi huellas de concreto	kg	127,00	$ 5.726,00	$ 727.202,00	127,00	$ 727.202,00			
5,00	**REDES HIDROSANITARIAS SUDS**								-	
5,1	Descapote a máquina nivel 0.00 (inc. retiro) e=-1,40m	m3	97,00	$ 50.223,00	$ 4.871.631,00	97,00	$ 4.871.631,00			
5,2	Concreto limpieza (alistado de terreno) e=0.05enObra	m3	1,00	$ 29.530,00	$ 29.530,00	1,00	$ 29.530,00			
5,3	Talues perimetrales en concreto fc 21 3000 psi .15	m3	12,00	$ 570.017,00	$ 6.840.204,00	12,00	$ 6.840.204,00			
5,4	Cañuela en concreto	ml	9,00	$ 98.766,00	$ 888.894,00	9,00	$ 888.894,00			
5,5	Geotextil (NORMA) NS-088	m2	69,00	$ 11.156,00	$ 769.764,00	69,00	$ 769.764,00			
5,6	Capa drenaje (agregado Grueso)	m3	16,00	$ 147.396,00	$ 2.358.336,00	16,00	$ 2.358.336,00			
5,7	Capa filtrante (agregado Fino)	m3	3,00	$ 191.071,00	$ 573.213,00	3,00	$ 573.213,00			
5,8	Tuberia perforada PVC DE 4 PUL	ml	27,00	$ 50.832,00	$ 1.372.464,00	27,00	$ 1.372.464,00			
5,9	Tuberia de limpieza PVC 4 PUL	ml	10,00	$ 50.832,00	$ 508.320,00	10,00	$ 508.320,00			
5,10	Tuberia de salida PVC 6 PUL	ml	6,00	$ 80.411,00	$ 482.466,00	6,00	$ 482.466,00			
5,11	Sustrato (TIERRA NEGRA+ ARENA)	m3	23,00	$ 170.501,00	$ 3.921.523,00	23,00	$ 3.921.523,00			
5,12	Piedra bola	m2	5,00	$ 41.714,00	$ 208.570,00	5,00	$ 208.570,00			
5,13	Malla Electro soldada d=5mm@0.15	kg	68,00	$ 6.619,00	$ 450.092,00	68,00	$ 450.092,00			
5,14	Refuerzo acero fy=60000psi	kg	1512,00	$ 5.726,00	$ 8.657.712,00	1512,00	$ 8.657.712,00			
5,15	Reja sumidero	un	22,00	$ 292.310,00	$ 6.430.820,00	22,00	$ 6.430.820,00			
5,16	Nivelacion y perfilado de terreno manual	m2	69,00	$ 2.640,00	$ 182.160,00	69,00	$ 182.160,00			
5,17	Nivelación y Compactación de Subrasante	m2	54,00	$ 1.397,00	$ 75.438,00	54,00	$ 75.438,00			
5,18	Cerramiento reja pequeña	ml	33,00	$ 47.880,00	$ 1.580.040,00	33,00	$ 1.580.040,00			
5,19	Caja de inspeccion .60x.60 h=1.0 **	un	34,00	$ 545.257,00	$ 18.538.738,00	34,00	$ 18.538.738,00			
6,00	**PINTURA**								-	
6,10	Pintura a color espacio de GYM Biosaludable	m2	21,00	$ 34.389,00	$ 722.169,00	21,00	$ 722.169,00			
7,00	**ADOQUÍN, TABLETA, Y BORDILLOS**									
7,1	Adoquin prefabricados en concreto a color, de 06*15*21 (ref.Looserna-Adoquinar)	m2	21,00	$ 69.775,00	$ 1.465.275,00	21,00	$ 1.465.275,00			
7,2	Adoquin rectangular plano demarcador visual	m2	0,57	$ 137.201,00	$ 78.589,00	0,57	$ 78.589,00			
7,3	Tableta podotactil alerta 20*20 cm. Prefabricado en concreto color amarillo (A57)	ml	23,31	$ 86.499,00	$ 2.016.292,00	23,31	$ 2.016.292,00			
7,4	Tableta podotactil Guia 20*20 cm. Prefabricado en concreto, color amarillo (A58)	ml	35,33	$ 86.499,00	$ 3.056.010,00	35,33	$ 3.056.010,00			
7,5	Bordillo demarcado recto vial prefabricado en concreto (A10)	ml	65,00	$ 85.405,00	$ 5.551.325,00	65,00	$ 5.551.325,00			
7,6	Bordillo demarcado recto interno prefabricado en concreto (A80)	ml	116,00	$ 90.840,00	$ 10.537.440,00	116,00	$ 10.537.440,00			
8,00	**PISOS EN MATERIAL RECICLADO TIPO CAUCHO**								-	
8,1	Piso caucho reciclado en color, para juegos infantiles	m2	31,00	$ 566.082,00	$ 17.548.542,00	31,00	$ 17.548.542,00			
10,00	**MOBILIARIO URBANO**									
10,1	Caneca metalica referencia M120 o M121.	un	2,00	$ 629.610,00	$ 1.259.220,00	2,00	$ 1.259.220,00			
10,2	Silla individual referencia M-01-A	un	4,00	$ 1.491.405,00	$ 5.965.620,00	4,00	$ 5.965.620,00			
10,4	Deslizadero	un	1,00	$ 26.959.769,00	$ 26.959.769,00	1,00	$ 26.959.769,00			
10,5	Mesa de ajedrez en concreto	un	1,00	$ 1.541.585,00	$ 1.541.585,00	1,00	$ 1.541.585,00			
10,6	Suministro baranda M-83	ml	23,00	$ 364.707,00	$ 8.388.261,00	23,00	$ 8.388.261,00			
10,7	Equipo de GYM REF flexion pierna	un	1,00	$ 4.956.332,00	$ 4.956.332,00	1,00	$ 4.956.332,00			

CONSORCIO INGENIERÍA I

Nit. 901.639.134 - 0

AVANCE INFROME SEMANALES

No. DE ORDEN	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS		SEMANA No.2		
										2
	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR	PROCENTAJE
10,8	Equipo de GYM REF Eliptica	un	1,00	$ 4.956.332,00	$ 4.956.332,00	1,00	$ 4.956.332,00			
10,9	Equipo de GYM REF Giro de hombros	un	1,00	$ 3.032.332,00	$ 3.032.332,00	1,00	$ 3.032.332,00			
10,10	Equipo de GYM REF Giro caminador	un	1,00	$ 4.058.332,00	$ 4.058.332,00	1,00	$ 4.058.332,00			
11,00	**VEGETACION**									
11,1	Cobertura tipo grama	m2	247,00	$ 10.422,00	$ 2.574.234,00	247,00	$ 2.574.234,00			
11,2	Cobertura tipo floricultura	m2	47,00	$ 98.124,00	$ 4.611.828,00	47,00	$ 4.611.828,00			
11,3	Siembra de arbol (Según propuesta paisajismo)	un	1,00	$ 291.101,00	$ 291.101,00	1,00	$ 291.101,00			
11,4	Relleno en tierra negra	m3	29,00	$ 65.431,00	$ 1.897.499,00	29,00	$ 1.897.499,00			
11,7	Arbol laurel hoja pequeña	un	1,00	$ 291.101,00	$ 291.101,00	1,00	$ 291.101,00			
12,00	**SEÑALETICA**									
12,1	Señaletica identificador zona de juegos infantiles	un	1,00	$ 296.774,00	$ 296.774,00	1,00	$ 296.774,00			
12,2	Señaletica GYM parque	un	1,00	$ 296.774,00	$ 296.774,00	1,00	$ 296.774,00			
12,3	Señaletica identificador	un	1,00	$ 569.478,00	$ 569.478,00	1,00	$ 569.478,00			
12,4	Señalitica SC-80	un	1,00	$ 454.702,00	$ 454.702,00	1,00	$ 454.702,00			
13,00	**OTROS**									
13,1	Baño portatil Alquiler	mes	4,00	$ 398.250,00	$ 1.593.000,00	4,00	$ 1.593.000,00			
13,2	Aseo general	m2	512,00	$ 7.449,00	$ 3.813.888,00	512,00	$ 3.813.888,00			
14,10	**PROVISIÓN DE OBRAS ADICIONALES**			**$ 13.959.427,00**	**$ 13.959.427,00**		**13.918.297,00**		**-**	
					$ 246.412.503,00		**$ 246.412.503,00**		**$ 2.858.385,03**	**1,16%**
	AMINISTRACIÓN		**26,00%**		**$ 64.067.251,00**		**$ 64.067.251,00**		**$ 743.180,11**	**1,16%**
	IMPREVISTOS		**1,00%**		**$ 2.464.125,00**		**$ 2.464.125,00**		**$ 28.583,85**	**1,16%**
	UTILIDAD		**6,00%**		**$ 14.784.750,00**		**$ 14.784.750,00**		**$ 171.503,10**	**1,16%**
	VALOR IVA SOBRE LA UTILIDAD		**19%**		**$ 2.809.103,00**		**$ 2.809.103,00**		**$ 32.585,59**	**1,16%**
	VALORES COSTOS INDIRECTOS				**$ 84.125.229,00**		**$ 84.125.229,00**			
	COSTO TOTAL OBRA				**$ 330.537.732,00**		**$ 330.537.732,00**			
	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO				**$ 4.276.988,00**		**$ 4.276.988,00**			
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				**$ 11.439.678,00**		**$ 11.439.678,00**			
					$ 346.254.398,00		**$ 346.254.398,00**		**$ 3.834.237,68**	**1,11%**
										1,11%

Informe semana 3 AAU T20

	INFORME SEMANAL DE OBRA - ETAPA II				
	FRENTE DE OBRA: TERRITORIO AAUT-20				
Semana No.3	Fecha de informe	del:	**29 de enero de 2023**	al	**4 de febrero de 2023**

1. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA CIVIL

OBJETO:	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA **EN TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".**
CONTRATO DE OBRA No:	1070-2022
VALOR CONTRATO :	$ 2.550.000.000
CONTRATISTA	CONSORCIO INGENIERÍA I
PLAZO:	16 MESES Y TRES DIAS
FECHA DE INICIO:	16 de diciembre de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1	20 de marzo de 2023
FECHA DE REINICIO No. 1:	5 de mayo de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.2	26 de julio de 2023
FECHA DE REINICIO No. 2:	14 de noviembre de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.3	12 de diciembre de 2024
FECHA DE REINICIO No. 3:	28 de diciembre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	19 de abril de 2024
PLAZO TRANSCURRIDO	50,00 DÍAS
VALOR INICIAL	$ 2.550.000.000,00
ADICIÓN	$ 0,00
VALOR ACTULIZADO	$ 2.550.000.000,00


2. SEGUIMIENTO DE OBRA CIVIL

RESUMEN DE AVACE DE EJECUCION DE OBRA:

Proyección de ejecución

SEMANA	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	ATRASO
SEMANA No.0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SEMANA No.1	1,00%	1,00%	0,00%	0,00%	-1,00%
SEMANA No.2	1,00%	2,00%	1,16%	1,16%	-0,84%
SEMANA No.3	2,00%	4,00%	2,14%	3,30%	-0,70%
SEMANA No.4	0,00%	4,00%	0,00%	3,30%	-0,70%
SEMANA No.5	0,00%	4,00%	0,00%	3,30%	-0,70%
SEMANA No.6	0,00%	4,00%	0,00%	3,30%	-0,70%
SEMANA No.7	0,00%	4,00%	0,00%	3,30%	-0,70%
SEMANA No.8	0,00%	4,00%	0,00%	3,30%	-0,70%
SEMANA No.9	0,00%	4,00%	0,00%	3,30%	-0,70%
SEMANA No.10	0,00%	4,00%	0,00%	3,30%	-0,70%
SEMANA No.11	0,00%	4,00%	0,00%	3,30%	-0,70%
SEMANA No.12	0,00%	4,00%	0,00%	3,30%	-0,70%
SEMANA No.13	0,00%	4,00%	0,00%	3,30%	-0,70%
SEMANA No.14	0,00%	4,00%	0,00%	3,30%	-0,70%

CURVA DE AVANCE DE ACTIVIDADES EJECUTADO VS PROGRAMADO

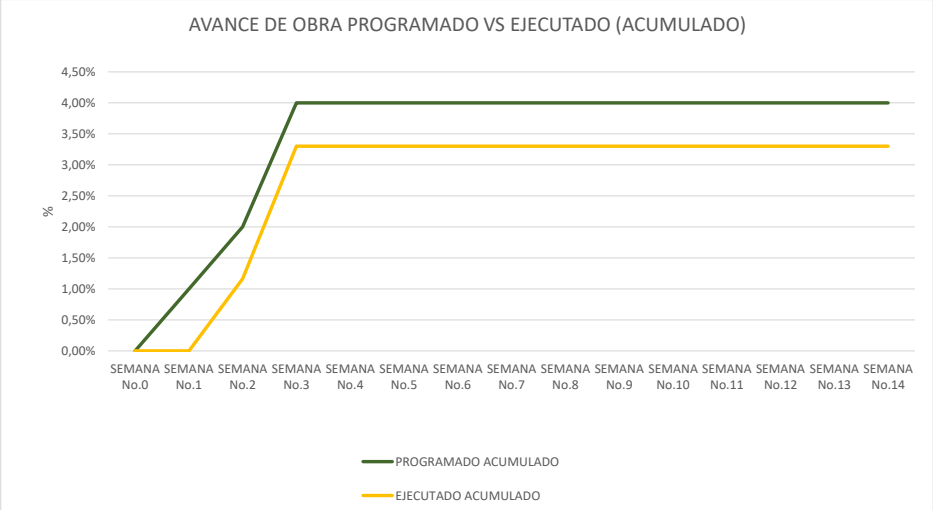

INFORME SEMANAL DE OBRA -ETAPA II
FRENTE DE OBRA: TERRITORIO AAUT-20

SEMANA N°	**3**	**DE**	**domingo, 29 de enero de 2023**	**A**	**sábado, 4 de febrero de 2023**
FECHA INICIO :	16/12/2022	**FECHA TERMINACION:**	19/04/2024		

IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".				
INTERVENTOR	CONSORCIO PROSPERAR BETHEL	**NIT**	NIT.901.634.239-2	**CONTRATO N°**	1066-2022
CONTRATISTA	CONSORCIO INGENIERÍA I	**NIT**	NIT. 901.639.134-0	**CONTRATO N°**	1070-2022

3. REGISTRO FOTOGRAFICO



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 20
COMENTARIOS: LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 20
COMENTARIOS: LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 20
COMENTARIOS: LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 20
COMENTARIOS: SUMINISTRO MATERIALES PREFABRICADOS



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 20
COMENTARIOS: PROTECCIÓN ESPECIES ARBOREAS



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 20
COMENTARIOS: EXCAVACIÓN MECÁNICA

CONSORCIO INGENIERÍA I

Nit. 901.639.134 - 0

AVANCE INFROME SEMANALES

No. DE ORDEN	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS		SEMANA No.3		
								3		
	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR	PROCENTAJE
1,00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**									
1,1	Localización y replanteo	m2	512,00	$ 8.226,00	$ 4.211.712,00	517,00	$ 4.252.842,00	517,00	$ 4.252.842,00	100,00%
1,7	Cerramiento provisional de obra (Polisombra)	ml	93,00	$ 27.273,00	$ 2.536.389,00	93,00	$ 2.536.389,00	37,52	$ 1.023.241,97	100,00%
1,8	Demolición y retiro de Bordillo prefabricado	ml	65,00	$ 18.468,00	$ 1.200.420,00	65,00	$ 1.200.420,00			
1,9	Desmonte y retiro de juegos infantiles	un	2,00	$ 114.946,00	$ 229.892,00	2,00	$ 229.892,00			
1,10	Proteccion de arbol de existente	un	19,00	$ 70.802,00	$ 1.345.238,00	19,00	$ 1.345.238,00			
2,00	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**									
2,1	Descapote a máquina nivel 0.00 (inc. retiro) e=-20 cm	m2	512,00	$ 14.422,00	$ 7.384.064,00	512,00	$ 7.384.064,00			
2,2	Nivelacion y perfilado de terreno manual	m2	512,00	$ 2.640,00	$ 1.351.680,00	512,00	$ 1.351.680,00			
2,3	Nivelación y Compactación de Subrasante	m2	512,00	$ 1.397,00	$ 715.264,00	512,00	$ 715.264,00			
2,4	Excavación manual suelo blanco	m3	47,00	$ 73.172,00	$ 3.439.084,00	47,00	$ 3.439.084,00			
2,5	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	m3	23,00	$ 109.904,00	$ 2.527.792,00	23,00	$ 2.527.792,00			
2,6	Geotextil T-2400	m2	329,00	$ 11.156,00	$ 3.670.324,00	329,00	$ 3.670.324,00			
2,7	Relleno compactado Base granular	m3	23,00	$ 11.156,00	$ 256.588,00	23,00	$ 256.588,00			
2,8	Excabacion muros y huellas vaciadas en concreto	m3	2,00	$ 73.172,00	$ 146.344,00	2,00	$ 146.344,00			
3,00	**CONCRETOS BASES Y ESTRUCTURAS**									
3,1	Placa contrapiso 3000 psi 21mpa e=15	m3	19,00	$ 1.027.855,00	$ 19.529.245,00	19,00	$ 19.529.245,00			
3,2	Placa contrapiso 3000 psi 21mpa para huellas en concreto	m3	1,00	$ 1.027.855,00	$ 1.027.855,00	1,00	$ 1.027.855,00			
3,3	Concreto 3000 psi 21mpa para muros (Contenedores de raiz)	m3	1,00	$ 870.250,00	$ 870.250,00	1,00	$ 870.250,00			
4,00	**ACERO DE REFUERZO**									
4,1	Malla Electrosoldada d=5mm@0.15 (area 6x2.35)	kg	530,00	$ 6.619,00	$ 3.508.070,00	530,00	$ 3.508.070,00			
4,2	Refuerzo acero fy=60000psi muro	kg	44,00	$ 5.726,00	$ 251.944,00	44,00	$ 251.944,00			
4,3	Refuerzo acero fy=60000psi huellas de concreto	kg	127,00	$ 5.726,00	$ 727.202,00	127,00	$ 727.202,00			
5,00	**REDES HIDROSANITARIAS SUDS**									
5,1	Descapote a máquina nivel 0.00 (inc. retiro) e=-1,40m	m3	97,00	$ 50.223,00	$ 4.871.631,00	97,00	$ 4.871.631,00			
5,2	Concreto limpieza (alistado de terreno) e=0.05enObra	m3	1,00	$ 29.530,00	$ 29.530,00	1,00	$ 29.530,00			
5,3	Talues perimetrales en concreto fc 21 3000 psi .15	m3	12,00	$ 570.017,00	$ 6.840.204,00	12,00	$ 6.840.204,00			
5,4	Cañuela en concreto	ml	9,00	$ 98.766,00	$ 888.894,00	9,00	$ 888.894,00			
5,5	Geotextil (NORMA) NS-088	m2	69,00	$ 11.156,00	$ 769.764,00	69,00	$ 769.764,00			
5,6	Capa drenaje (agregado Grueso)	m3	16,00	$ 147.396,00	$ 2.358.336,00	16,00	$ 2.358.336,00			
5,7	Capa filtrante (agregado Fino)	m3	3,00	$ 191.071,00	$ 573.213,00	3,00	$ 573.213,00			
5,8	Tuberia perforada PVC DE 4 PUL	ml	27,00	$ 50.832,00	$ 1.372.464,00	27,00	$ 1.372.464,00			
5,9	Tuberia de limpieza PVC 4 PUL	ml	10,00	$ 50.832,00	$ 508.320,00	10,00	$ 508.320,00			
5,10	Tuberia de salida PVC 6 PUL	ml	6,00	$ 80.411,00	$ 482.466,00	6,00	$ 482.466,00			
5,11	Sustrato (TIERRA NEGRA+ ARENA)	m3	23,00	$ 170.501,00	$ 3.921.523,00	23,00	$ 3.921.523,00			
5,12	Piedra bola	m2	5,00	$ 41.714,00	$ 208.570,00	5,00	$ 208.570,00			
5,13	Malla Electro soldada d=5mm@0.15	kg	68,00	$ 6.619,00	$ 450.092,00	68,00	$ 450.092,00			
5,14	Refuerzo acero fy=60000psi	kg	1512,00	$ 5.726,00	$ 8.657.712,00	1512,00	$ 8.657.712,00			
5,15	Reja sumidero	un	22,00	$ 292.310,00	$ 6.430.820,00	22,00	$ 6.430.820,00			
5,16	Nivelacion y perfilado de terreno manual	m2	69,00	$ 2.640,00	$ 182.160,00	69,00	$ 182.160,00			
5,17	Nivelación y Compactación de Subrasante	m2	54,00	$ 1.397,00	$ 75.438,00	54,00	$ 75.438,00			
5,18	Cerramiento reja pequeña	ml	33,00	$ 47.880,00	$ 1.580.040,00	33,00	$ 1.580.040,00			
5,19	Caja de inspeccion .60x.60 h=1.0 **	un	34,00	$ 545.257,00	$ 18.538.738,00	34,00	$ 18.538.738,00			
6,00	**PINTURA**									
6,10	Pintura a color espacio de GYM Biosaludable	m2	21,00	$ 34.389,00	$ 722.169,00	21,00	$ 722.169,00			
7,00	**ADOQUÍN, TABLETA, Y BORDILLOS**									
7,1	Adoquin prefabricados en concreto a color, de 06*15*21 (ref.Looserna-Adoquinar)	m2	21,00	$ 69.775,00	$ 1.465.275,00	21,00	$ 1.465.275,00			
7,2	Adoquin rectangular plano demarcador visual	m2	0,57	$ 137.201,00	$ 78.589,00	0,57	$ 78.589,00			
7,3	Tableta podotactil alerta 20*20 cm. Prefabricado en concreto color amarillo (A57)	ml	23,31	$ 86.499,00	$ 2.016.292,00	23,31	$ 2.016.292,00			
7,4	Tableta podotactil Guia 20*20 cm. Prefabricado en concreto, color amarillo (A58)	ml	35,33	$ 86.499,00	$ 3.056.010,00	35,33	$ 3.056.010,00			
7,5	Bordillo demarcado recto vial prefabricado en concreto (A10)	ml	65,00	$ 85.405,00	$ 5.551.325,00	65,00	$ 5.551.325,00			
7,6	Bordillo demarcado recto interno prefabricado en concreto (A80)	ml	116,00	$ 90.840,00	$ 10.537.440,00	116,00	$ 10.537.440,00			
8,00	**PISOS EN MATERIAL RECICLADO TIPO CAUCHO**									
8,1	Piso caucho reciclado en color, para juegos infantiles	m2	31,00	$ 566.082,00	$ 17.548.542,00	31,00	$ 17.548.542,00			
10,00	**MOBILIARIO URBANO**									
10,1	Caneca metalica referencia M120 o M121.	un	2,00	$ 629.610,00	$ 1.259.220,00	2,00	$ 1.259.220,00			
10,2	Silla individual referencia M-01-A	un	4,00	$ 1.491.405,00	$ 5.965.620,00	4,00	$ 5.965.620,00			
10,4	Deslizadero	un	1,00	$ 26.959.769,00	$ 26.959.769,00	1,00	$ 26.959.769,00			
10,5	Mesa de ajedrez en concreto	un	1,00	$ 1.541.585,00	$ 1.541.585,00	1,00	$ 1.541.585,00			
10,6	Suministro baranda M-83	ml	23,00	$ 364.707,00	$ 8.388.261,00	23,00	$ 8.388.261,00			
10,7	Equipo de GYM REF flexion pierna	un	1,00	$ 4.956.332,00	$ 4.956.332,00	1,00	$ 4.956.332,00			
10,8	Equipo de GYM REF Eliptica	un	1,00	$ 4.956.332,00	$ 4.956.332,00	1,00	$ 4.956.332,00			
10,9	Equipo de GYM REF Giro de hombros	un	1,00	$ 3.032.332,00	$ 3.032.332,00	1,00	$ 3.032.332,00			

CONSORCIO INGENIERÍA I

Nit. 901.639.134 - 0

AVANCE INFROME SEMANALES

No. DE ORDEN	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS		SEMANA No.3		
								3		
	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR	PROCENTAJE
10,10	Equipo de GYM REF Giro caminador	un	1,00	$ 4.058.332,00	$ 4.058.332,00	1,00	$ 4.058.332,00			
11,00	**VEGETACION**									
11,1	Cobertura tipo grama	m2	247,00	$ 10.422,00	$ 2.574.234,00	247,00	$ 2.574.234,00			
11,2	Cobertura tipo floricultura	m2	47,00	$ 98.124,00	$ 4.611.828,00	47,00	$ 4.611.828,00			
11,3	Siembra de arbol (Según propuesta paisajismo)	un	1,00	$ 291.101,00	$ 291.101,00	1,00	$ 291.101,00			
11,4	Relleno en tierra negra	m3	29,00	$ 65.431,00	$ 1.897.499,00	29,00	$ 1.897.499,00			
11,7	Arbol laurel hoja pequeña	un	1,00	$ 291.101,00	$ 291.101,00	1,00	$ 291.101,00			
12,00	**SEÑALETICA**									
12,1	Señaletica identificador zona de juegos infantiles	un	1,00	$ 296.774,00	$ 296.774,00	1,00	$ 296.774,00			
12,2	Señaletica GYM parque	un	1,00	$ 296.774,00	$ 296.774,00	1,00	$ 296.774,00			
12,3	Señaletica identificador	un	1,00	$ 569.478,00	$ 569.478,00	1,00	$ 569.478,00			
12,4	Señalitica SC-80	un	1,00	$ 454.702,00	$ 454.702,00	1,00	$ 454.702,00			
13,00	**OTROS**									
13,1	Baño portatil Alquiler	mes	4,00	$ 398.250,00	$ 1.593.000,00	4,00	$ 1.593.000,00			
13,2	Aseo general	m2	512,00	$ 7.449,00	$ 3.813.888,00	512,00	$ 3.813.888,00			
14,10	**PROVISIÓN DE OBRAS ADICIONALES**			**$ 13.959.427,00**	**$ 13.959.427,00**		**13.918.297,00**			
					$ 246.412.503,00		**$ 246.412.503,00**		**$ 5.276.083,97**	**2,14%**
	AMINISTRACIÓN		**26,00%**		**$ 64.067.251,00**		**$ 64.067.251,00**		**$ 1.371.781,83**	**2,14%**
	IMPREVISTOS		**1,00%**		**$ 2.464.125,00**		**$ 2.464.125,00**		**$ 52.760,84**	**2,14%**
	UTILIDAD		**6,00%**		**$ 14.784.750,00**		**$ 14.784.750,00**		**$ 316.565,04**	**2,14%**
	VALOR IVA SOBRE LA UTILIDAD		**19%**		**$ 2.809.103,00**		**$ 2.809.103,00**		**$ 60.147,36**	**2,14%**
	VALORES COSTOS INDIRECTOS				**$ 84.125.229,00**		**$ 84.125.229,00**			
	COSTO TOTAL OBRA				**$ 330.537.732,00**		**$ 330.537.732,00**			
	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO				**$ 4.276.988,00**		**$ 4.276.988,00**			
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				**$ 11.439.678,00**		**$ 11.439.678,00**			
					$ 346.254.398,00		**$ 346.254.398,00**		**$ 7.077.339,04**	**2,04%**
										3,15%

Informe semana 1 AAU T21

	INFORME SEMANAL DE OBRA - ETAPA II				
	FRENTE DE OBRA: TERRITORIO AAUT-21				
Semana No.1	Fecha de informe	del:	**15 de enero de 2024**	al	**21 de enero de 2024**

1. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA CIVIL

OBJETO:	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA **EN TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".**
CONTRATO DE OBRA No:	1070-2022
VALOR CONTRATO :	$ 2.550.000.000
CONTRATISTA	CONSORCIO INGENIERÍA I
PLAZO:	16 MESES Y TRES DIAS
FECHA DE INICIO:	16 de diciembre de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1	20 de marzo de 2023
FECHA DE REINICIO No. 1:	5 de mayo de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.2	26 de julio de 2023
FECHA DE REINICIO No. 2:	14 de noviembre de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.3	12 de diciembre de 2024
FECHA DE REINICIO No. 3:	28 de diciembre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	19 de abril de 2024
PLAZO TRANSCURRIDO	401,00 DÍAS
VALOR INICIAL	$ 2.550.000.000,00
ADICIÓN	$ 0,00
VALOR ACTULIZADO	$ 2.550.000.000,00


2. SEGUIMIENTO DE OBRA CIVIL

RESUMEN DE AVACE DE EJECUCION DE OBRA:

Proyección de ejecución

SEMANA	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	ATRASO
SEMANA No.0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SEMANA No.1	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	0,00%
SEMANA No.2	0,00%	1,00%	0,00%	1,00%	0,00%
SEMANA No.3	0,00%	1,00%	0,00%	1,00%	0,00%
SEMANA No.4	0,00%	1,00%	0,00%	1,00%	0,00%
SEMANA No.5	0,00%	1,00%	0,00%	1,00%	0,00%
SEMANA No.6	0,00%	1,00%	0,00%	1,00%	0,00%
SEMANA No.7	0,00%	1,00%	0,00%	1,00%	0,00%
SEMANA No.8	0,00%	1,00%	0,00%	1,00%	0,00%
SEMANA No.9	0,00%	1,00%	0,00%	1,00%	0,00%
SEMANA No.10	0,00%	1,00%	0,00%	1,00%	0,00%
SEMANA No.11	0,00%	1,00%	0,00%	1,00%	0,00%
SEMANA No.12	0,00%	1,00%	0,00%	1,00%	0,00%
SEMANA No.13	0,00%	1,00%	0,00%	1,00%	0,00%
SEMANA No.14	0,00%	1,00%	0,00%	1,00%	0,00%

CURVA DE AVANCE DE ACTIVIDADES EJECUTADO VS PROGRAMADO

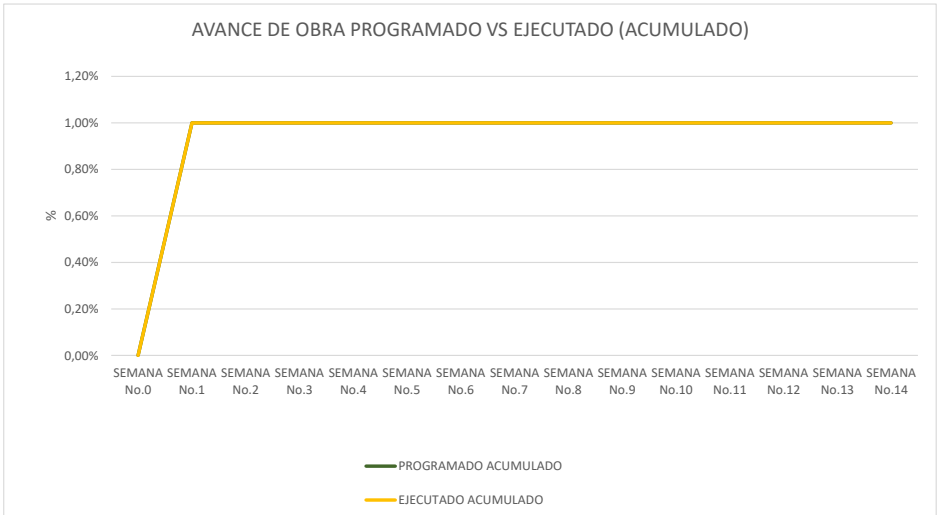

INFORME SEMANAL DE OBRA -ETAPA II
FRENTE DE OBRA: TERRITORIO AAUT-21

SEMANA N°	**1**	**DE**	**lunes, 15 de enero de 2024**	**A**	**domingo, 21 de enero de 2024**
FECHA INICIO :	16/12/2022	**FECHA TERMINACION:**	19/04/2024		

IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".				
INTERVENTOR	CONSORCIO PROSPERAR BETHEL	**NIT**	NIT.901.634.239-2	**CONTRATO N°**	1066-2022
CONTRATISTA	CONSORCIO INGENIERÍA I	**NIT**	NIT. 901.639.134-0	**CONTRATO N°**	1070-2022

3. REGISTRO FOTOGRAFICO



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 21
COMENTARIOS: VISITA DE RECONOCIMIENTO



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 21
COMENTARIOS: INSTALACIÓN DE VALLAS INFORMATIVAS CONTRATO DE OBRA No. 1070 -2022



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 21
COMENTARIOS: PROTECCIÓN DE ESPECIES ARBOREAS



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 21
COMENTARIOS: RETIRO DE ADOQUIN INTERNO Y CERRAMIENTO



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 21
COMENTARIOS: PROTECCIÓN SUMIDEROS



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 21
COMENTARIOS: LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO

CONSORCIO INGENIERÍA I
Nit. 901.639.134 - 0

AVANCE INFROME SEMANALES

No. DE ORDEN	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS		SEMANA No.1		
								1		
	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR	PROCENTAJE
1,00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**									
1,10	Localización y replanteo	m2	584,00	$ 8.226,00	$ 4.803.984,00	590,00	$ 4.853.332,00	348,25	$ 2.864.696,59	59,03%
1,70	Cerramiento provisional de obra (Polisombra)	ml	99,00	$ 27.273,00	$ 2.700.027,00	99,00	$ 2.700.027,00		$ -	
1,80	Demolición y retiro de Bordillo prefabricado	ml	99,00	$ 18.468,00	$ 1.828.332,00	179,02	$ 1.828.332,00		$ -	
1,90	Desmonte y retiro de juegos infantiles	un	1,00	$ 114.946,00	$ 114.946,00	1,00	$ 114.946,00		$ -	
1,10	Proteccion de arbol de existente	un	6,00	$ 70.802,00	$ 424.812,00	6,00	$ 424.812,00		$ -	
1,11	Desmonte y retiro de baranda	ml	16,00	$ 12.784,00	$ 204.544,00	16,00	$ 204.544,00		$ -	
1,12	Desmonte de adoquin	m2	100,00	$ 14.932,00	$ 1.493.200,00	116,00	$ 1.732.112,00		$ -	
1,13	Proteccion de rejillas	un	1,00	$ 16.273,00	$ 16.273,00	2,00	$ 32.546,00		$ -	
1,16	Demolicion placa de contrapiso (Asfalto)	m2		$ 18.596,00		68,00	$ 1.264.528,00			
2,00	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**								-	
2,10	Descapote a máquina nivel 0.00 (inc. retiro) e=-20 cm	m2	584,00	$ 14.422,00	$ 8.422.448,00	584,00	$ 8.422.448,00		$ -	
2,20	Nivelacion y perfilado de terreno manual	m2	584,00	$ 2.640,00	$ 1.541.760,00	584,00	$ 1.541.760,00		$ -	
2,30	Nivelación y Compactación de Subrasante	m2	176,00	$ 1.397,00	$ 245.872,00	176,00	$ 245.872,00		$ -	
2,40	Excavación manual suelo blando	m3	53,00	$ 73.172,00	$ 3.878.116,00	53,00	$ 3.878.116,00		$ -	
2,50	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	m3	26,00	$ 109.904,00	$ 2.857.504,00	26,00	$ 2.857.504,00		$ -	
2,60	Geotextil T-2400	m2	370,00	$ 11.156,00	$ 4.127.720,00	370,00	$ 4.127.720,00		$ -	
2,70	Relleno compactado Base granular	m3	26,00	$ 156.593,00	$ 4.071.418,00	26,00	$ 4.071.418,00		$ -	
2,80	Excabacion muros y huellas vaciadas en concreto	m3	1,00	$ 73.172,00	$ 73.172,00	1,00	$ 73.172,00		$ -	
3,00	**CONCRETOS BASES Y ESTRUCTURAS**								-	
3,10	Placa contrapiso 3000 psi 21mpa e=15	m3	25,00	$ 1.027.855,00	$ 25.696.375,00	25,00	$ 25.696.375,00		$ -	
3,20	Placa contrapiso 3000 psi 21mpa para huellas en concreto	m3	4,00	$ 1.027.855,00	$ 4.111.420,00	4,00	$ 4.111.420,00		$ -	
3,30	Concreto 3000 psi 21mpa para muros (Contenedores de raiz)	m3	1,00	$ 870.250,00	$ 870.250,00	1,00	$ 870.250,00		$ -	
4,00	**ACERO DE REFUERZO**								-	
4,10	Malla Electrosoldada d=5mm@0.15 (area 6x2.35)	kg	561,26	$ 6.619,00	$ 3.714.980,00	561,26	$ 3.714.979,94		$ -	
4,20	Refuerzo acero fy=60000psi muro	kg	22,00	$ 5.726,00	$ 125.972,00	22,00	$ 125.972,00		$ -	
4,30	Refuerzo acero fy=60000psi huellas de concreto	kg	111,00	$ 5.726,00	$ 635.586,00	111,00	$ 635.586,00		$ -	
5,00	**REDES HIDROSANITARIAS**								-	
5,10	Descapote a máquina nivel 0.00 (inc. retiro) e=-1,40m	m3	97,00	$ 50.223,00	$ 4.871.631,00	97,00	$ 4.871.631,00		$ -	
5,20	Concreto limpieza (alistado de terreno) e=0.05enObra	m3	1,00	$ 29.530,00	$ 29.530,00	1,00	$ 29.530,00		$ -	
5,30	Talues perimetrales en concreto fc 21 3000 psi .15	m3	12,00	$ 570.017,00	$ 6.840.204,00	12,00	$ 6.840.204,00		$ -	
5,40	Cañuela en concreto	ml	9,00	$ 98.766,00	$ 888.894,00	9,00	$ 888.894,00		$ -	
5,50	Geotextil (NORMA) NS-088	m2	69,00	$ 11.156,00	$ 769.764,00	69,00	$ 769.764,00		$ -	
5,60	Capa drenaje (agregado Grueso)	m3	16,00	$ 147.396,00	$ 2.358.336,00	16,00	$ 2.358.336,00		$ -	
5,70	Capa filtrante (agregado Fino)	m3	3,00	$ 191.071,00	$ 573.213,00	3,00	$ 573.213,00		$ -	
5,80	Tuberia perforada PVC DE 4 PUL	ml	27,00	$ 50.832,00	$ 1.372.464,00	27,00	$ 1.372.464,00		$ -	
5,90	Tuberia de limpieza PVC 4 PUL	ml	10,00	$ 50.832,00	$ 508.320,00	10,00	$ 508.320,00		$ -	
5,10	Tuberia de salida PVC 6 PUL	ml	6,00	$ 80.411,00	$ 482.466,00	6,00	$ 482.466,00		$ -	
5,11	Sustrato (TIERRA NEGRA+ ARENA)	m3	23,00	$ 170.501,00	$ 3.921.523,00	23,00	$ 3.921.523,00		$ -	
5,12	Piedra bola	m2	5,00	$ 41.714,00	$ 208.570,00	5,00	$ 208.570,00		$ -	
5,13	Malla Electro soldada d=5mm@0.15	kg	68,00	$ 6.619,00	$ 450.092,00	68,00	$ 450.092,00		$ -	
5,14	Refuerzo acero fy=60000psi	kg	1512,00	$ 5.726,00	$ 8.657.712,00	1512,00	$ 8.657.712,00		$ -	
5,15	Reja sumidero	un	22,00	$ 292.310,00	$ 6.430.820,00	22,00	$ 6.430.820,00		$ -	
5,16	Nivelacion y perfilado de terreno manual	m2	69,00	$ 2.640,00	$ 182.160,00	69,00	$ 182.160,00		$ -	
5,17	Nivelación y Compactación de Subrasante	m2	54,00	$ 1.397,00	$ 75.438,00	54,00	$ 75.438,00		$ -	
5,18	Cerramiento reja pequeña	ml	33,00	$ 47.880,00	$ 1.580.040,00	33,00	$ 1.580.040,00		$ -	
5,19	Caja de inspeccion .60x.60 h=1.0 **	un	1,00	$ 545.257,00	$ 545.257,00	1,00	$ 545.257,00		$ -	
6,00	**PINTURA PISO**								-	
6,10	Pintura a color espacio de GYM Biosaludable	m3	14,00	$ 34.389,00	$ 481.446,00	14,00	$ 481.446,00		$ -	
7,00	**ADOQUÍN, TABLETA, Y BORDILLOS**								-	
7,20	Adoquin rectangular plano demarcador visual	m2	1,00	$ 137.201,00	$ 137.201,00	1,00	$ 137.201,00		$ -	
7,30	Tableta podotactil alerta 20*20 cm. Prefabricado en concreto color amarillo (A57)	ml	25,00	$ 86.499,00	$ 2.162.475,00	25,00	$ 2.162.475,00		$ -	
7,40	Tableta podotactil Guia 20*20 cm. Prefabricado en concreto, color amarillo (A58)	ml	43,00	$ 86.499,00	$ 3.719.457,00	43,00	$ 3.719.457,00		$ -	
7,50	Bordillo demarcado recto vial prefabricado en concreto (A10)	ml	99,00	$ 85.405,00	$ 8.455.095,00	99,00	$ 8.455.095,00		$ -	
7,60	Bordillo demarcado recto interno prefabricado en concreto (A80)	ml	101,00	$ 90.840,00	$ 9.174.840,00	101,00	$ 9.174.840,00		$ -	
8,00	**PISOS EN MATERIAL RECICLADO TIPO CAUCHO**								-	
8,10	Piso caucho reciclado en color, para juegos infantiles	m2	35,00	$ 566.082,00	$ 19.812.870,00	35,00	$ 19.812.870,00		$ -	
10,00	**MOBILIARIO URBANO**								-	
10,10	Caneca metalica referencia M120 o M121.	un	2,00	$ 629.610,00	$ 1.259.220,00	2,00	$ 1.259.220,00		$ -	
10,20	Silla individual referencia M-01-A	un	1,00	$ 1.491.405,00	$ 1.491.405,00	1,00	$ 1.491.405,00		$ -	
10,30	Juego cuerdas piramidal	un	1,00	$ 63.788.124,00	$ 63.788.124,00	1,00	$ 63.788.124,00		$ -	
10,60	Suministro baranda M-83	ml	25,00	$ 364.707,00	$ 9.117.675,00	25,00	$ 9.117.675,00		$ -	
10,70	Equipo de GYM REF flexion pierna	un	1,00	$ 4.956.332,00	$ 4.956.332,00	1,00	$ 4.956.332,00		$ -	
10,80	Equipo de GYM REF Eliptica	un	1,00	$ 4.956.332,00	$ 4.956.332,00	1,00	$ 4.956.332,00		$ -	

10,90	Equipo de GYM REF Giro de hombros	un	1,00	$ 3.032.332,00	$ 3.032.332,00	1,00	$ 3.032.332,00		$ -	
10,10	Equipo de GYM REF Giro caminador	un	1,00	$ 4.058.332,00	$ 4.058.332,00	1,00	$ 4.058.332,00		$ -	
11,00	**VEGETACION**								**-**	
11,10	Cobertura tipo grama	m2	313,00	$ 10.422,00	$ 3.262.086,00	313,00	$ 3.262.086,00		$ -	
11,20	Cobertura tipo floricultura	m2	49,00	$ 98.124,00	$ 4.808.076,00	49,00	$ 4.808.076,00		$ -	
11,30	Siembra de arbol (Según propuesta paisajismo)	un	1,00	$ 291.101,00	$ 291.101,00	1,00	$ 291.101,00		$ -	
11,40	Relleno en tierra negra	m3	36,00	$ 65.431,00	$ 2.355.516,00	36,00	$ 2.355.516,00		$ -	
11,70	Arbol laurel hoja pequeña	un	1,00	$ 291.101,00	$ 291.101,00	1,00	$ 291.101,00		$ -	
11,90	Arbol Calistemo	un	1,00	$ 289.533,00	$ 289.533,00	1,00	$ 289.533,00		$ -	
12,00	**SEÑALETICA**								**-**	
12,10	Señaletica identificador zona de juegos infantiles	un	1,00	$ 296.774,00	$ 296.774,00	1,00	$ 296.774,00		$ -	
12,20	Señaletica GYM parque	un	1,00	$ 296.774,00	$ 296.774,00	1,00	$ 296.774,00		$ -	
12,30	Señaletica identificador	un	2,00	$ 569.478,00	$ 1.138.956,00	2,00	$ 1.138.956,00		$ -	
12,40	Señalitica SC-80	un	1,00	$ 454.702,00	$ 454.702,00	1,00	$ 454.702,00		$ -	
13,00	**OTROS**								**-**	
13,10	Baño portatil Alquiler	mes	4,00	$ 398.250,00	$ 1.593.000,00	4,00	$ 1.593.000,00		$ -	
13,20	Aseo general	m2	584,00	$ 7.449,00	$ 4.350.216,00	584,00	$ 4.350.216,00		$ -	
14,01	**PROVISIÓN DE OBRAS ADICIONALES**			**17733543,00**	**17.733.543,00**		**$ 16.164.482,00**		**-**	
					$ 286.469.659,00		**$ 286.469.659,00**		**$ 2.864.696,59**	**1,00%**
	AMINISTRACIÓN	**26,00%**			**$ 74.482.111,00**		**$ 74.482.111,00**		**$ 744.821,11**	**1,00%**
	IMPREVISTOS	**1,00%**			**$ 2.864.697,00**		**$ 2.864.697,00**		**$ 28.646,97**	**1,00%**
	UTILIDAD	**6,00%**			**$ 17.188.180,00**		**$ 17.188.180,00**		**$ 171.881,80**	**1,00%**
	VALOR IVA SOBRE LA UTILIDAD	**19%**			**$ 3.265.754,00**		**$ 3.265.754,00**		**$ 32.657,54**	**1,00%**
	VALORES COSTOS INDIRECTOS				**$ 97.800.742,00**		**$ 97.800.742,00**			
	COSTO TOTAL OBRA				**$ 384.270.401,00**		**$ 384.270.401,00**			
	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO				**$ 4.553.874,00**		**$ 4.553.874,00**			
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				**$ 11.439.678,00**		**$ 11.439.678,00**			
					$ 400.263.953,00		**$ 400.263.953,00**		**$ 3.842.704,01**	**0,96%**
										0,96%

Informe semana 2 AAU T21

	INFORME SEMANAL DE OBRA - ETAPA II				
	FRENTE DE OBRA: TERRITORIO AAUT-21				
Semana No.2	Fecha de informe	del:	**22 de enero de 2024**	al	**28 de enero de 2024**

1. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA CIVIL

OBJETO:	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA **EN TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".**
CONTRATO DE OBRA No:	1070-2022
VALOR CONTRATO :	$ 2.550.000.000
CONTRATISTA	CONSORCIO INGENIERÍA I
PLAZO:	16 MESES Y TRES DIAS
FECHA DE INICIO:	16 de diciembre de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1	20 de marzo de 2023
FECHA DE REINICIACIÓN No. 1:	5 de mayo de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.2	26 de julio de 2023
FECHA DE REINICIACIÓN No. 2:	14 de noviembre de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.3	12 de diciembre de 2024
FECHA DE REINICIACIÓN No. 3:	28 de diciembre de 2023
FECHA DE REINICIO	19 de abril de 2024
PLAZO TRANSCURRIDO	408,00 DÍAS
VALOR INICIAL	$ 2.550.000.000,00
ADICIÓN	$ 0,00
VALOR ACTULIZADO	$ 2.550.000.000,00


2. SEGUIMIENTO DE OBRA CIVIL

RESUMEN DE AVACE DE EJECUCION DE OBRA:

Proyección de ejecución

SEMANA	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	ATRASO
SEMANA No.0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SEMANA No.1	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	0,00%
SEMANA No.2	1,00%	2,00%	3,65%	4,65%	2,65%
SEMANA No.3	0,00%	2,00%	0,00%	4,65%	2,65%
SEMANA No.4	0,00%	2,00%	0,00%	4,65%	2,65%
SEMANA No.5	0,00%	2,00%	0,00%	4,65%	2,65%
SEMANA No.6	0,00%	2,00%	0,00%	4,65%	2,65%
SEMANA No.7	0,00%	2,00%	0,00%	4,65%	2,65%
SEMANA No.8	0,00%	2,00%	0,00%	4,65%	2,65%
SEMANA No.9	0,00%	2,00%	0,00%	4,65%	2,65%
SEMANA No.10	0,00%	2,00%	0,00%	4,65%	2,65%
SEMANA No.11	0,00%	2,00%	0,00%	4,65%	2,65%
SEMANA No.12	0,00%	2,00%	0,00%	4,65%	2,65%
SEMANA No.13	0,00%	2,00%	0,00%	4,65%	2,65%
SEMANA No.14	0,00%	2,00%	0,00%	4,65%	2,65%

CURVA DE AVANCE DE ACTIVIDADES EJECUTADO VS PROGRAMADO

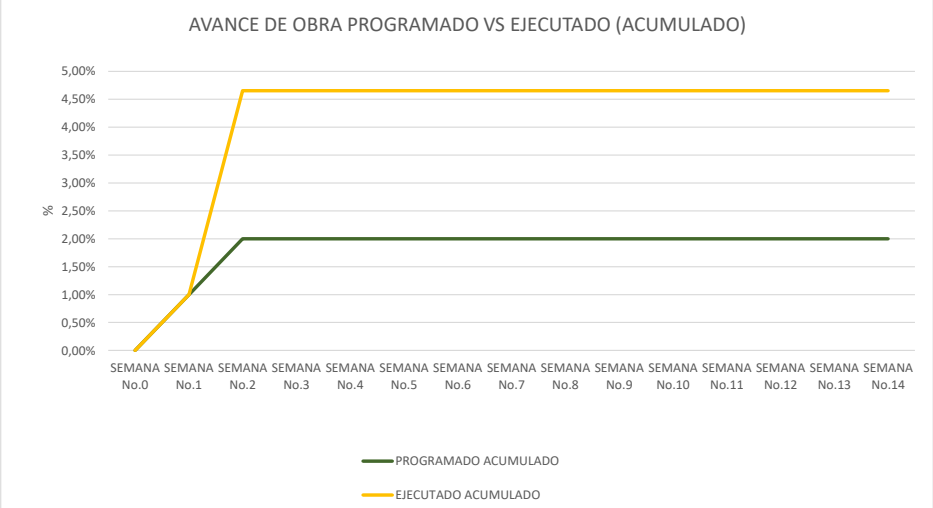

INFORME SEMANAL DE OBRA -ETAPA II
FRENTE DE OBRA: TERRITORIO AAU 21

SEMANA N°	**2**	**DE**	**lunes, 22 de enero de 2024**	**A**	**domingo, 28 de enero de 2024**
FECHA INICIO :	16/12/2022	**FECHA TERMINACION:**	19/04/2024		

IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".				
INTERVENTOR	CONSORCIO PROSPERAR BETHEL	**NIT**	NIT.901.634.239-2	**CONTRATO N°**	1066-2022
CONTRATISTA	CONSORCIO INGENIERÍA I	**NIT**	NIT. 901.639.134-0	**CONTRATO N°**	1070-2022

REGISTRO FOTOGRAFICO



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 21
COMENTARIOS: CERRAMIENTO PROVICIONAL DE OBRA (POLISOMBRA)



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 21
COMENTARIOS: DEMOLICION Y RETIRO DE BORDILLO PEFABRICADO **(INTERNO)**



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 21
COMENTARIOS: PROTECCION DE ARBOL EXISTENTE



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 21
COMENTARIOS: RETIRO DE ADOQUIN INTERNO



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 21
COMENTARIOS: PROTECCION SUMIDEROS



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 21
COMENTARIOS: DESCAPOTE A MAQUINA NIVEL 00 A -20 (ZONA TRANSITO)

CONSORCIO INGENIERÍA I

Nit. 901.639.134 - 0

AVANCE INFROME SEMANALES

No. DE ORDEN	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS		SEMANA No.2		
									2	
	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR	PROCENTAJE
1,00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**									
1,10	Localización y replanteo	m2	584,00	$ 8.226,00	$ 4.803.984,00	590,00	$ 4.853.332,00	241,75	$ 1.988.635,50	40,97%
1,70	Cerramiento provisional de obra (Polisombra)	ml	99,00	$ 27.273,00	$ 2.700.027,00	99,00	$ 2.700.027,00	99,00	$ 2.700.027,00	100,00%
1,80	Demolición y retiro de Bordillo prefabricado	ml	99,00	$ 18.468,00	$ 1.828.332,00	179,02	$ 1.828.332,00	96,80	$ 1.787.702,40	54,07%
1,90	Desmonte y retiro de juegos infantiles	un	1,00	$ 114.946,00	$ 114.946,00	1,00	$ 114.946,00		$ -	
1,10	Proteccion de arbol de existente	un	6,00	$ 70.802,00	$ 424.812,00	6,00	$ 424.812,00	6,00	$ 424.812,00	100,00%
1,11	Desmonte y retiro de baranda	ml	16,00	$ 12.784,00	$ 204.544,00	16,00	$ 204.544,00		$ -	
1,12	Desmonte de adoquin	m2	100,00	$ 14.932,00	$ 1.493.200,00	116,00	$ 1.732.112,00	116,00	$ 1.732.112,00	100,00%
1,13	Proteccion de rejillas	un	1,00	$ 16.273,00	$ 16.273,00	2,00	$ 32.546,00	2,00	$ 32.546,00	100,00%
1,16	Demolicion placa de contrapiso (Asfalto)	m2		$ 18.596,00		68,00	$ 1.264.528,00			
2,00	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**								-	
2,10	Descapote a máquina nivel 0.00 (inc. retiro) e=-20 cm	m2	584,00	$ 14.422,00	$ 8.422.448,00	584,00	$ 8.422.448,00	124,93	$ 1.801.740,46	21,39%
2,20	Nivelacion y perfilado de terreno manual	m2	584,00	$ 2.640,00	$ 1.541.760,00	584,00	$ 1.541.760,00		$ -	
2,30	Nivelación y Compactación de Subrasante	m2	176,00	$ 1.397,00	$ 245.872,00	176,00	$ 245.872,00		$ -	
2,40	Excavación manual suelo blando	m3	53,00	$ 73.172,00	$ 3.878.116,00	53,00	$ 3.878.116,00		$ -	
2,50	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	m3	26,00	$ 109.904,00	$ 2.857.504,00	26,00	$ 2.857.504,00		$ -	
2,60	Geotextil T-2400	m2	370,00	$ 11.156,00	$ 4.127.720,00	370,00	$ 4.127.720,00		$ -	
2,70	Relleno compactado Base granular	m3	26,00	$ 156.593,00	$ 4.071.418,00	26,00	$ 4.071.418,00		$ -	
2,80	Excabacion muros y huellas vaciadas en concreto	m3	1,00	$ 73.172,00	$ 73.172,00	1,00	$ 73.172,00		$ -	
3,00	**CONCRETOS BASES Y ESTRUCTURAS**								-	
3,10	Placa contrapiso 3000 psi 21mpa e=15	m3	25,00	$ 1.027.855,00	$ 25.696.375,00	25,00	$ 25.696.375,00		$ -	
3,20	Placa contrapiso 3000 psi 21mpa para huellas en concreto	m3	4,00	$ 1.027.855,00	$ 4.111.420,00	4,00	$ 4.111.420,00		$ -	
3,30	Concreto 3000 psi 21mpa para muros (Contenedores de raiz)	m3	1,00	$ 870.250,00	$ 870.250,00	1,00	$ 870.250,00		$ -	
4,00	**ACERO DE REFUERZO**								-	
4,10	Malla Electrosoldada d=5mm@0.15 (area 6x2.35)	kg	561,26	$ 6.619,00	$ 3.714.980,00	561,26	$ 3.714.979,94		$ -	
4,20	Refuerzo acero fy=60000psi muro	kg	22,00	$ 5.726,00	$ 125.972,00	22,00	$ 125.972,00		$ -	
4,30	Refuerzo acero fy=60000psi huellas de concreto	kg	111,00	$ 5.726,00	$ 635.586,00	111,00	$ 635.586,00		$ -	
5,00	**REDES HIDROSANITARIAS**								-	
5,10	Descapote a máquina nivel 0.00 (inc. retiro) e=-1,40m	m3	97,00	$ 50.223,00	$ 4.871.631,00	97,00	$ 4.871.631,00		$ -	
5,20	Concreto limpieza (alistado de terreno) e=0.05enObra	m3	1,00	$ 29.530,00	$ 29.530,00	1,00	$ 29.530,00		$ -	
5,30	Talues perimetrales en concreto fc 21 3000 psi .15	m3	12,00	$ 570.017,00	$ 6.840.204,00	12,00	$ 6.840.204,00		$ -	
5,40	Cañuela en concreto	ml	9,00	$ 98.766,00	$ 888.894,00	9,00	$ 888.894,00		$ -	
5,50	Geotextil (NORMA) NS-088	m2	69,00	$ 11.156,00	$ 769.764,00	69,00	$ 769.764,00		$ -	
5,60	Capa drenaje (agregado Grueso)	m3	16,00	$ 147.396,00	$ 2.358.336,00	16,00	$ 2.358.336,00		$ -	
5,70	Capa filtrante (agregado Fino)	m3	3,00	$ 191.071,00	$ 573.213,00	3,00	$ 573.213,00		$ -	
5,80	Tuberia perforada PVC DE 4 PUL	ml	27,00	$ 50.832,00	$ 1.372.464,00	27,00	$ 1.372.464,00		$ -	
5,90	Tuberia de limpieza PVC 4 PUL	ml	10,00	$ 50.832,00	$ 508.320,00	10,00	$ 508.320,00		$ -	
5,10	Tuberia de salida PVC 6 PUL	ml	6,00	$ 80.411,00	$ 482.466,00	6,00	$ 482.466,00		$ -	
5,11	Sustrato (TIERRA NEGRA+ ARENA)	m3	23,00	$ 170.501,00	$ 3.921.523,00	23,00	$ 3.921.523,00		$ -	
5,12	Piedra bola	m2	5,00	$ 41.714,00	$ 208.570,00	5,00	$ 208.570,00		$ -	
5,13	Malla Electro soldada d=5mm@0.15	kg	68,00	$ 6.619,00	$ 450.092,00	68,00	$ 450.092,00		$ -	
5,14	Refuerzo acero fy=60000psi	kg	1512,00	$ 5.726,00	$ 8.657.712,00	1512,00	$ 8.657.712,00		$ -	
5,15	Reja sumidero	un	22,00	$ 292.310,00	$ 6.430.820,00	22,00	$ 6.430.820,00		$ -	
5,16	Nivelacion y perfilado de terreno manual	m2	69,00	$ 2.640,00	$ 182.160,00	69,00	$ 182.160,00		$ -	
5,17	Nivelación y Compactación de Subrasante	m2	54,00	$ 1.397,00	$ 75.438,00	54,00	$ 75.438,00		$ -	
5,18	Cerramiento reja pequeña	ml	33,00	$ 47.880,00	$ 1.580.040,00	33,00	$ 1.580.040,00		$ -	
5,19	Caja de inspeccion .60x.60 h=1.0 **	un	1,00	$ 545.257,00	$ 545.257,00	1,00	$ 545.257,00		$ -	
6,00	**PINTURA PISO**								-	
6,10	Pintura a color espacio de GYM Biosaludable	m3	14,00	$ 34.389,00	$ 481.446,00	14,00	$ 481.446,00		$ -	
7,00	**ADOQUÍN, TABLETA, Y BORDILLOS**								-	
7,20	Adoquin rectangular plano demarcador visual	m2	1,00	$ 137.201,00	$ 137.201,00	1,00	$ 137.201,00		$ -	
7,30	Tableta podotactil alerta 20*20 cm. Prefabricado en concreto color amarillo (A57)	ml	25,00	$ 86.499,00	$ 2.162.475,00	25,00	$ 2.162.475,00		$ -	
7,40	Tableta podotactil Guia 20*20 cm. Prefabricado en concreto, color amarillo (A58)	ml	43,00	$ 86.499,00	$ 3.719.457,00	43,00	$ 3.719.457,00		$ -	
7,50	Bordillo demarcado recto vial prefabricado en concreto (A10)	ml	99,00	$ 85.405,00	$ 8.455.095,00	99,00	$ 8.455.095,00		$ -	
7,60	Bordillo demarcado recto interno prefabricado en concreto (A80)	ml	101,00	$ 90.840,00	$ 9.174.840,00	101,00	$ 9.174.840,00		$ -	
8,00	**PISOS EN MATERIAL RECICLADO TIPO CAUCHO**								-	
8,10	Piso caucho reciclado en color, para juegos infantiles	m2	35,00	$ 566.082,00	$ 19.812.870,00	35,00	$ 19.812.870,00		$ -	
10,00	**MOBILIARIO URBANO**								-	
10,10	Caneca metalica referencia M120 o M121.	un	2,00	$ 629.610,00	$ 1.259.220,00	2,00	$ 1.259.220,00		$ -	
10,20	Silla individual referencia M-01-A	un	1,00	$ 1.491.405,00	$ 1.491.405,00	1,00	$ 1.491.405,00		$ -	
10,30	Juego cuerdas piramidal	un	1,00	$ 63.788.124,00	$ 63.788.124,00	1,00	$ 63.788.124,00		$ -	
10,60	Suministro baranda M-83	ml	25,00	$ 364.707,00	$ 9.117.675,00	25,00	$ 9.117.675,00		$ -	
10,70	Equipo de GYM REF flexion pierna	un	1,00	$ 4.956.332,00	$ 4.956.332,00	1,00	$ 4.956.332,00		$ -	
10,80	Equipo de GYM REF Eliptica	un	1,00	$ 4.956.332,00	$ 4.956.332,00	1,00	$ 4.956.332,00		$ -	
10,90	Equipo de GYM REF Giro de hombros	un	1,00	$ 3.032.332,00	$ 3.032.332,00	1,00	$ 3.032.332,00		$ -	
10,10	Equipo de GYM REF Giro caminador	un	1,00	$ 4.058.332,00	$ 4.058.332,00	1,00	$ 4.058.332,00		$ -	
11,00	**VEGETACION**								-	
11,10	Cobertura tipo grama	m2	313,00	$ 10.422,00	$ 3.262.086,00	313,00	$ 3.262.086,00		$ -	

11,20	Cobertura tipo floricultura	m2	49,00	$ 98.124,00	$ 4.808.076,00	49,00	$ 4.808.076,00		$ -	
11,30	Siembra de arbol (Según propuesta paisajismo)	un	1,00	$ 291.101,00	$ 291.101,00	1,00	$ 291.101,00		$ -	
11,40	Relleno en tierra negra	m3	36,00	$ 65.431,00	$ 2.355.516,00	36,00	$ 2.355.516,00		$ -	
11,70	Arbol laurel hoja pequeña	un	1,00	$ 291.101,00	$ 291.101,00	1,00	$ 291.101,00		$ -	
11,90	Arbol Calistemo	un	1,00	$ 289.533,00	$ 289.533,00	1,00	$ 289.533,00		$ -	
12,00	**SEÑALETICA**								**-**	
12,10	Señaletica identificador zona de juegos infantiles	un	1,00	$ 296.774,00	$ 296.774,00	1,00	$ 296.774,00		$ -	
12,20	Señaletica GYM parque	un	1,00	$ 296.774,00	$ 296.774,00	1,00	$ 296.774,00		$ -	
12,30	Señaletica identificador	un	2,00	$ 569.478,00	$ 1.138.956,00	2,00	$ 1.138.956,00		$ -	
12,40	Señalitica SC-80	un	1,00	$ 454.702,00	$ 454.702,00	1,00	$ 454.702,00		$ -	
13,00	**OTROS**								**-**	
13,10	Baño portatil Alquiler	mes	4,00	$ 398.250,00	$ 1.593.000,00	4,00	$ 1.593.000,00		$ -	
13,20	Aseo general	m2	584,00	$ 7.449,00	$ 4.350.216,00	584,00	$ 4.350.216,00		$ -	
14,01	**PROVISIÓN DE OBRAS ADICIONALES**			**17733543,00**	**17.733.543,00**		**$ 16.164.482,00**		**-**	
					$ 286.469.659,00		**$ 286.469.659,00**		**$ 10.467.575,36**	**3,654%**
	AMINISTRACIÓN		**26,00%**		**$ 74.482.111,00**		**$ 74.482.111,00**		**$ 2.721.569,59**	**3,65%**
	IMPREVISTOS		**1,00%**		**$ 2.864.697,00**		**$ 2.864.697,00**		**$ 104.675,75**	**3,65%**
	UTILIDAD		**6,00%**		**$ 17.188.180,00**		**$ 17.188.180,00**		**$ 628.054,52**	**3,65%**
	VALOR IVA SOBRE LA UTILIDAD		**19%**		**$ 3.265.754,00**		**$ 3.265.754,00**		**$ 119.330,36**	**3,65%**
	VALORES COSTOS INDIRECTOS				**$ 97.800.742,00**		**$ 97.800.742,00**			
	COSTO TOTAL OBRA				**$ 384.270.401,00**		**$ 384.270.401,00**			
	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO				**$ 4.553.874,00**		**$ 4.553.874,00**			
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				**$ 11.439.678,00**		**$ 11.439.678,00**			
					$ 400.263.953,00		**$ 400.263.953,00**		**$ 14.041.205,58**	**3,51%**
										4,47%

Informe semana 3 AAU T21

	INFORME SEMANAL DE OBRA - ETAPA II				
	FRENTE DE OBRA: TERRITORIO AAUT-21				
Semana No.3	Fecha de informe	del:	**29 de enero de 2024**	al	**4 de febrero de 2024**

1. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA CIVIL

OBJETO:	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA **EN TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".**
CONTRATO DE OBRA No:	1070-2022
VALOR CONTRATO :	$ 2.550.000.000
CONTRATISTA	CONSORCIO INGENIERÍA I
PLAZO:	16 MESES Y TRES DIAS
FECHA DE INICIO:	16 de diciembre de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1	20 de marzo de 2023
FECHA DE REINICIACIÓN No. 1:	5 de mayo de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.2	26 de julio de 2023
FECHA DE REINICIACIÓN No. 2:	14 de noviembre de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.3	12 de diciembre de 2024
FECHA DE REINICIACIÓN No. 3:	28 de diciembre de 2023
FECHA DE REINICIO	19 de abril de 2024
PLAZO TRANSCURRIDO	415,00 DÍAS
VALOR INICIAL	$ 2.550.000.000,00
ADICIÓN	$ 0,00
VALOR ACTULIZADO	$ 2.550.000.000,00


2. SEGUIMIENTO DE OBRA CIVIL

RESUMEN DE AVACE DE EJECUCION DE OBRA:

Proyección de ejecución

SEMANA	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	ATRASO
SEMANA No.0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SEMANA No.1	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	0,00%
SEMANA No.2	1,00%	2,00%	3,65%	4,65%	2,65%
SEMANA No.3	2,00%	4,00%	3,86%	8,52%	4,52%
SEMANA No.4	0,00%	4,00%	0,00%	8,52%	4,52%
SEMANA No.5	0,00%	4,00%	0,00%	8,52%	4,52%
SEMANA No.6	0,00%	4,00%	0,00%	8,52%	4,52%
SEMANA No.7	0,00%	4,00%	0,00%	8,52%	4,52%
SEMANA No.8	0,00%	4,00%	0,00%	8,52%	4,52%
SEMANA No.9	0,00%	4,00%	0,00%	8,52%	4,52%
SEMANA No.10	0,00%	4,00%	0,00%	8,52%	4,52%
SEMANA No.11	0,00%	4,00%	0,00%	8,52%	4,52%
SEMANA No.12	0,00%	4,00%	0,00%	8,52%	4,52%
SEMANA No.13	0,00%	4,00%	0,00%	8,52%	4,52%
SEMANA No.14	0,00%	4,00%	0,00%	8,52%	4,52%

CURVA DE AVANCE DE ACTIVIDADES EJECUTADO VS PROGRAMADO

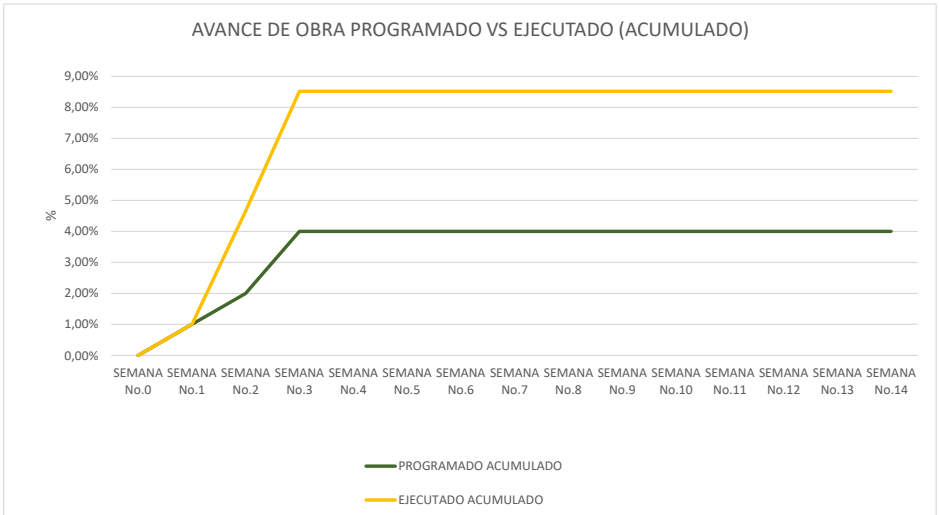

INFORME SEMANAL DE OBRA -ETAPA II
FRENTE DE OBRA: TERRITORIO AAU 21

SEMANA N°	**3**	**DE**	**lunes, 29 de enero de 2024**	**A**	**domingo, 4 de febrero de 2024**
FECHA INICIO :	16/12/2022	**FECHA TERMINACION:**	19/04/2024		

IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".				
INTERVENTOR	CONSORCIO PROSPERAR BETHEL	**NIT**	NIT.901.634.239-2	**CONTRATO N°**	1066-2022
CONTRATISTA	CONSORCIO INGENIERÍA I	**NIT**	NIT. 901.639.134-0	**CONTRATO N°**	1070-2022

REGISTRO FOTOGRAFICO



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 21
COMENTARIOS: DESMONTE DE JUEGOS INFANTILES



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 21
COMENTARIOS: DESMONTE Y RETIRO DE BARANDA



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 21
COMENTARIOS: DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO (ASFALTO)



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 21
COMENTARIOS: DESCAPOTE A MÁQUINA NIVEL 0.00 (INC. RETIRO) E=-20 CM



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 21
COMENTARIOS: EXCAVACIÓN MANUAL SUELO BLANDO



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 21
COMENTARIOS: DESCAPOTE A MÁQUINA NIVEL 0.00 (INC. RETIRO) E=-1,40M SUDS

CONSORCIO INGENIERÍA I

Nit. 901.639.134 - 0

AVANCE INFROME SEMANALES

No. DE ORDEN	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS		SEMANA No.3		
								3		
	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR	PROCENTAJE
1,00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**									
1,10	Localización y replanteo	m2	584,00	$ 8.226,00	$ 4.803.984,00	590,00	$ 4.853.332,00			
1,70	Cerramiento provisional de obra (Polisombra)	ml	99,00	$ 27.273,00	$ 2.700.027,00	99,00	$ 2.700.027,00			
1,80	Demolición y retiro de Bordillo prefabricado	ml	99,00	$ 18.468,00	$ 1.828.332,00	179,02	$ 1.828.332,00			
1,90	Desmonte y retiro de juegos infantiles	un	1,00	$ 114.946,00	$ 114.946,00	1,00	$ 114.946,00	1,00	$ 114.946,00	100,00%
1,10	Proteccion de arbol de existente	un	6,00	$ 70.802,00	$ 424.812,00	6,00	$ 424.812,00			
1,11	Desmonte y retiro de baranda	ml	16,00	$ 12.784,00	$ 204.544,00	16,00	$ 204.544,00	16,00	$ 204.544,00	100,00%
1,12	Desmonte de adoquin	m2	100,00	$ 14.932,00	$ 1.493.200,00	116,00	$ 1.732.112,00			
1,13	Proteccion de rejillas	un	1,00	$ 16.273,00	$ 16.273,00	2,00	$ 32.546,00			
1,16	Demolicion placa de contrapiso (Asfalto)	m2		$ 18.596,00		68,00	$ 1.264.528,00	68,00	$ 1.264.528,00	100,00%
2,00	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**									
2,10	Descapote a máquina nivel 0.00 (inc. retiro) e=-20 cm	m2	584,00	$ 14.422,00	$ 8.422.448,00	584,00	$ 8.422.448,00	51,07	$ 736.531,54	8,74%
2,20	Nivelacion y perfilado de terreno manual	m2	584,00	$ 2.640,00	$ 1.541.760,00	584,00	$ 1.541.760,00			
2,30	Nivelación y Compactación de Subrasante	m2	176,00	$ 1.397,00	$ 245.872,00	176,00	$ 245.872,00			
2,40	Excavación manual suelo blando	m3	53,00	$ 73.172,00	$ 3.878.116,00	53,00	$ 3.878.116,00	53,00	$ 3.878.116,00	100,00%
2,50	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	m3	26,00	$ 109.904,00	$ 2.857.504,00	26,00	$ 2.857.504,00			
2,60	Geotextil T-2400	m2	370,00	$ 11.156,00	$ 4.127.720,00	370,00	$ 4.127.720,00			
2,70	Relleno compactado Base granular	m3	26,00	$ 156.593,00	$ 4.071.418,00	26,00	$ 4.071.418,00			
2,80	Excabacion muros y huellas vaciadas en concreto	m3	1,00	$ 73.172,00	$ 73.172,00	1,00	$ 73.172,00			
3,00	**CONCRETOS BASES Y ESTRUCTURAS**									
3,10	Placa contrapiso 3000 psi 21mpa e=15	m3	25,00	$ 1.027.855,00	$ 25.696.375,00	25,00	$ 25.696.375,00			
3,20	Placa contrapiso 3000 psi 21mpa para huellas en concreto	m3	4,00	$ 1.027.855,00	$ 4.111.420,00	4,00	$ 4.111.420,00			
3,30	Concreto 3000 psi 21mpa para muros (Contenedores de raiz)	m3	1,00	$ 870.250,00	$ 870.250,00	1,00	$ 870.250,00			
4,00	**ACERO DE REFUERZO**									
4,10	Malla Electrosoldada d=5mm@0.15 (area 6x2.35)	kg	561,26	$ 6.619,00	$ 3.714.980,00	561,26	$ 3.714.979,94			
4,20	Refuerzo acero fy=60000psi muro	kg	22,00	$ 5.726,00	$ 125.972,00	22,00	$ 125.972,00			
4,30	Refuerzo acero fy=60000psi huellas de concreto	kg	111,00	$ 5.726,00	$ 635.586,00	111,00	$ 635.586,00			
5,00	**REDES HIDROSANITARIAS**									
5,10	Descapote a máquina nivel 0.00 (inc. retiro) e=-1,40m	m3	97,00	$ 50.223,00	$ 4.871.631,00	97,00	$ 4.871.631,00	97,00	$ 4.871.631,00	100,00%
5,20	Concreto limpieza (alistado de terreno) e=0.05enObra	m3	1,00	$ 29.530,00	$ 29.530,00	1,00	$ 29.530,00			
5,30	Talues perimetrales en concreto fc 21 3000 psi .15	m3	12,00	$ 570.017,00	$ 6.840.204,00	12,00	$ 6.840.204,00			
5,40	Cañuela en concreto	ml	9,00	$ 98.766,00	$ 888.894,00	9,00	$ 888.894,00			
5,50	Geotextil (NORMA) NS-088	m2	69,00	$ 11.156,00	$ 769.764,00	69,00	$ 769.764,00			
5,60	Capa drenaje (agregado Grueso)	m3	16,00	$ 147.396,00	$ 2.358.336,00	16,00	$ 2.358.336,00			
5,70	Capa filtrante (agregado Fino)	m3	3,00	$ 191.071,00	$ 573.213,00	3,00	$ 573.213,00			
5,80	Tuberia perforada PVC DE 4 PUL	ml	27,00	$ 50.832,00	$ 1.372.464,00	27,00	$ 1.372.464,00			
5,90	Tuberia de limpieza PVC 4 PUL	ml	10,00	$ 50.832,00	$ 508.320,00	10,00	$ 508.320,00			
5,10	Tuberia de salida PVC 6 PUL	ml	6,00	$ 80.411,00	$ 482.466,00	6,00	$ 482.466,00			
5,11	Sustrato (TIERRA NEGRA+ ARENA)	m3	23,00	$ 170.501,00	$ 3.921.523,00	23,00	$ 3.921.523,00			
5,12	Piedra bola	m2	5,00	$ 41.714,00	$ 208.570,00	5,00	$ 208.570,00			
5,13	Malla Electro soldada d=5mm@0.15	kg	68,00	$ 6.619,00	$ 450.092,00	68,00	$ 450.092,00			
5,14	Refuerzo acero fy=60000psi	kg	1512,00	$ 5.726,00	$ 8.657.712,00	1512,00	$ 8.657.712,00			
5,15	Reja sumidero	un	22,00	$ 292.310,00	$ 6.430.820,00	22,00	$ 6.430.820,00			
5,16	Nivelacion y perfilado de terreno manual	m2	69,00	$ 2.640,00	$ 182.160,00	69,00	$ 182.160,00			
5,17	Nivelación y Compactación de Subrasante	m2	54,00	$ 1.397,00	$ 75.438,00	54,00	$ 75.438,00			
5,18	Cerramiento reja pequeña	ml	33,00	$ 47.880,00	$ 1.580.040,00	33,00	$ 1.580.040,00			
5,19	Caja de inspeccion .60x.60 h=1.0 **	un	1,00	$ 545.257,00	$ 545.257,00	1,00	$ 545.257,00			
6,00	**PINTURA PISO**									
6,10	Pintura a color espacio de GYM Biosaludable	m3	14,00	$ 34.389,00	$ 481.446,00	14,00	$ 481.446,00			
7,00	**ADOQUÍN, TABLETA, Y BORDILLOS**									
7,20	Adoquin rectangular plano demarcador visual	m2	1,00	$ 137.201,00	$ 137.201,00	1,00	$ 137.201,00			
7,30	Tableta podotactil alerta 20*20 cm. Prefabricado en concreto color amarillo (A57)	ml	25,00	$ 86.499,00	$ 2.162.475,00	25,00	$ 2.162.475,00			
7,40	Tableta podotactil Guia 20*20 cm. Prefabricado en concreto, color amarillo (A58)	ml	43,00	$ 86.499,00	$ 3.719.457,00	43,00	$ 3.719.457,00			
7,50	Bordillo demarcado recto vial prefabricado en concreto (A10)	ml	99,00	$ 85.405,00	$ 8.455.095,00	99,00	$ 8.455.095,00			
7,60	Bordillo demarcado recto interno prefabricado en concreto (A80)	ml	101,00	$ 90.840,00	$ 9.174.840,00	101,00	$ 9.174.840,00			
8,00	**PISOS EN MATERIAL RECICLADO TIPO CAUCHO**									
8,10	Piso caucho reciclado en color, para juegos infantiles	m2	35,00	$ 566.082,00	$ 19.812.870,00	35,00	$ 19.812.870,00			
10,00	**MOBILIARIO URBANO**									
10,10	Caneca metalica referencia M120 o M121.	un	2,00	$ 629.610,00	$ 1.259.220,00	2,00	$ 1.259.220,00			
10,20	Silla individual referencia M-01-A	un	1,00	$ 1.491.405,00	$ 1.491.405,00	1,00	$ 1.491.405,00			
10,30	Juego cuerdas piramidal	un	1,00	$ 63.788.124,00	$ 63.788.124,00	1,00	$ 63.788.124,00			
10,60	Suministro baranda M-83	ml	25,00	$ 364.707,00	$ 9.117.675,00	25,00	$ 9.117.675,00			
10,70	Equipo de GYM REF flexion pierna	un	1,00	$ 4.956.332,00	$ 4.956.332,00	1,00	$ 4.956.332,00			
10,80	Equipo de GYM REF Eliptica	un	1,00	$ 4.956.332,00	$ 4.956.332,00	1,00	$ 4.956.332,00			
10,90	Equipo de GYM REF Giro de hombros	un	1,00	$ 3.032.332,00	$ 3.032.332,00	1,00	$ 3.032.332,00			
10,10	Equipo de GYM REF Giro caminador	un	1,00	$ 4.058.332,00	$ 4.058.332,00	1,00	$ 4.058.332,00			
11,00	**VEGETACION**									
11,10	Cobertura tipo grama	m2	313,00	$ 10.422,00	$ 3.262.086,00	313,00	$ 3.262.086,00			
11,20	Cobertura tipo floricultura	m2	49,00	$ 98.124,00	$ 4.808.076,00	49,00	$ 4.808.076,00			
11,30	Siembra de arbol (Según propuesta paisajismo)	un	1,00	$ 291.101,00	$ 291.101,00	1,00	$ 291.101,00			
11,40	Relleno en tierra negra	m3	36,00	$ 65.431,00	$ 2.355.516,00	36,00	$ 2.355.516,00			
11,70	Arbol laurel hoja pequeña	un	1,00	$ 291.101,00	$ 291.101,00	1,00	$ 291.101,00			


11,90	Arbol Calistemo	un	1,00	$ 289.533,00	$ 289.533,00	1,00	$ 289.533,00			
12,00	**SEÑALETICA**									
12,10	Señaletica identificador zona de juegos infantiles	un	1,00	$ 296.774,00	$ 296.774,00	1,00	$ 296.774,00			
12,20	Señaletica GYM parque	un	1,00	$ 296.774,00	$ 296.774,00	1,00	$ 296.774,00			
12,30	Señaletica identificador	un	2,00	$ 569.478,00	$ 1.138.956,00	2,00	$ 1.138.956,00			
12,40	Señalitica SC-80	un	1,00	$ 454.702,00	$ 454.702,00	1,00	$ 454.702,00			
13,00	**OTROS**									
13,10	Baño portatil Alquiler	mes	4,00	$ 398.250,00	$ 1.593.000,00	4,00	$ 1.593.000,00			
13,20	Aseo general	m2	584,00	$ 7.449,00	$ 4.350.216,00	584,00	$ 4.350.216,00			
14,01	**PROVISIÓN DE OBRAS ADICIONALES**			**17733543,00**	**17.733.543,00**		**$ 16.164.482,00**			
					$ 286.469.659,00		**$ 286.469.659,00**		**$ 11.070.296,54**	**3,86%**
	AMINISTRACIÓN	**26,00%**			**$ 74.482.111,00**		**$ 74.482.111,00**		**$ 2.878.277,10**	**3,86%**
	IMPREVISTOS	**1,00%**			**$ 2.864.697,00**		**$ 2.864.697,00**		**$ 110.702,97**	**3,86%**
	UTILIDAD	**6,00%**			**$ 17.188.180,00**		**$ 17.188.180,00**		**$ 664.217,79**	**3,86%**
	VALOR IVA SOBRE LA UTILIDAD	**19%**			**$ 3.265.754,00**		**$ 3.265.754,00**		**$ 126.201,38**	**3,86%**
	VALORES COSTOS INDIRECTOS				**$ 97.800.742,00**		**$ 97.800.742,00**			
	COSTO TOTAL OBRA				**$ 384.270.401,00**		**$ 384.270.401,00**			
	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO				**$ 4.553.874,00**		**$ 4.553.874,00**			
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				**$ 11.439.678,00**		**$ 11.439.678,00**			
					$ 400.263.953,00		**$ 400.263.953,00**		**$ 14.849.695,78**	**3,71%**
										8,18%

Anexo 7. Cronograma

CONTRATO DE OBRA No. 1070-2022

PROGRAMACION PRELIMINAR AAUT17 AURORA II

id	ITEM	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	fin
1		**PROYECTO TERRITORIO T17**	**82 días**	**lun 29/01/24**	**vie 19/04/24**
2		INICIO	0 días	lun 29/01/24	lun 29/01/24
3		**PRELIMINARES**	**10 días**	**lun 29/01/24**	**mié 7/02/24**
4	1.7	Cerramiento provisional de obra (Polisombra)	6 días	lun 29/01/24	sáb 3/02/24
5	1.101	Proteccion de arbol de existente	3 días	jue 1/02/24	sáb 3/02/24
6	13.1	Baño portatil Alquiler	1 día	jue 1/02/24	jue 1/02/24
7	1.1	Localización y replanteo	4 días	dom 4/02/24	mié 7/02/24
8		**EXCAVACIONES Y RELLENOS**	**26 días**	**jue 8/02/24**	**lun 4/03/24**
9	2.1	Descapote a máquina nivel 0.00 (rec. retiro) e=.20 cm	3 días	jue 8/02/24	sáb 10/02/24
10	2.9	Excavacion mecanica+retiro	4 días	dom 11/02/24	mié 14/02/24
11	2.6	Geotextil T-2600	2 días	jue 15/02/24	vie 16/02/24
12	2.7	Relleno compactado base granular	5 días	sáb 17/02/24	mié 21/02/24
13	2.5	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	5 días	jue 22/02/24	lun 26/02/24
14	2.2	Nivelacion y perfilado de terreno manual	4 días	mar 27/02/24	vie 1/03/24
15	2.3	Nivelación y Compactación de Subrasante	3 días	sáb 2/03/24	lun 4/03/24
16		**CONCRETOS Y ACEROS DE REFUERZO**	**19 días**	**mar 5/03/24**	**sáb 23/03/24**
17	6.1	Placa contrapiso 3000 psi 21mpa e=15	19 días	mar 5/03/24	sáb 23/03/24
18	6.1	Malla Electrosoldada d=6mm@0.15 (ancho 6x2.35)	19 días	mar 5/03/24	sáb 23/03/24
19	6.3	Concreto 3000 psi 21mpa para muros (Contenedores de raiz)	19 días	mar 5/03/24	sáb 23/03/24
20	6.2	Refuerzo acero fy=60000psi muro	10 días	mar 5/03/24	jue 14/03/24
21		**REDES HIDROLANTARIAS**	**56 días**	**jue 8/02/24**	**lun 1/04/24**
22	6.1	Descapote a máquina nivel 0.00 (rec. retiro) e=.1,40m	3 días	jue 8/02/24	sáb 10/02/24
23	6.3	Tetuve perimetrales en concreto f'c 21 3000 psi .15	5 días	jue 15/02/24	lun 19/02/24
24	6.2	Concreto limpieza (alistado de terreno) e=0.05emObra	3 días	mar 20/02/24	jue 22/02/24
25	6.4	Cañuela en concreto	5 días	mar 20/02/24	dom 25/02/24
26	6.13	Malla Electro soldada d=6mm@0.15	5 días	mar 20/02/24	dom 25/02/24
27	6.14	Refuerzo acero fy=60000psi	5 días	mar 20/02/24	dom 25/02/24
28	6.5	Geotextil (NORMA) NE-088	3 días	lun 26/02/24	mié 28/02/24
29	6.12	Piedra bola	4 días	jue 29/02/24	dom 3/03/24
30	6.6	Capa drenaje (agregado Grueso)	4 días	lun 4/03/24	jue 7/03/24
31	6.7	Capa filtrante (agregado Fino)	4 días	lun 4/03/24	jue 7/03/24
32	6.8	Tuberia perforada PVC DE 4 PUL	5 días	vie 8/03/24	mar 12/03/24
33	6.9	Tuberia de limpieza PVC 4 PUL	5 días	vie 8/03/24	mar 12/03/24
34	6.10	Tuberia de salida PVC 6 PUL	5 días	vie 8/03/24	mar 12/03/24
35	6.11	Suministo (TIERRA NEGRA+ ARENA)	4 días	mié 13/03/24	sáb 16/03/24
36	6.16	Nivelacion y perfilado de terreno manual	3 días	dom 17/03/24	mar 19/03/24
37	6.17	Nivelación y Compactación de Subrasante	3 días	mié 20/03/24	vie 22/03/24
38	6.15	Reja sumidero	7 días	mié 13/03/24	mar 19/03/24
39	6.18	Cerramiento reja pequeña	7 días	mié 13/03/24	mar 19/03/24
40	6.19	Caja de inspeccion .60x.60 h=1.0 **	20 días	mié 13/03/24	lun 1/04/24
41		**ADOQUÍN, TABLETA, Y BORDILLOS**	**10 días**	**dom 24/03/24**	**mar 2/04/24**
42	7.3	Tableta podotactil alerta 20*20 cm. Prefabricad o en concreto color amarillo (AV2)	10 días	dom 24/03/24	mar 2/04/24
43	7.4	Tableta podotactil Guia 20*20 cm. Prefabricado en concreto, color amarillo (AG6)	10 días	dom 24/03/24	mar 2/04/24
44	7.6	Bordillo demarcado recto interno prefabricado en concreto	10 días	dom 24/03/24	mar 2/04/24
45		**PISOS EN MATERIAL RECICLADO**	**6 días**	**mié 3/04/24**	**lun 8/04/24**
46	8.1	Piso caucho reciclado en color, para juegos infantiles	6 días	mié 3/04/24	lun 8/04/24
47		**PINTURA PISO**	**8 días**	**mar 9/04/24**	**mar 16/04/24**
48	8.1	Pintura a color espacio de GYM biosaturable	8 días	mar 9/04/24	mar 16/04/24
49		**MOBILIARIO URBANO**	**9 días**	**mar 9/04/24**	**mié 17/04/24**
50	10.1	Caneca metalica referencia M120 o M1.21.	8 días	mar 9/04/24	mar 16/04/24
51	10.2	Silla individual referencia M-01-A	8 días	mar 9/04/24	mar 16/04/24
52	10.17	Torre Columpio Deslizadero	9 días	mar 9/04/24	mié 17/04/24
53	10.6	Suministo baranda M-83	9 días	mar 9/04/24	mié 17/04/24
54	10.7	Equipo de GYM REF Resor pierna	9 días	mar 9/04/24	mié 17/04/24
55	10.8	Equipo de GYM REF Elptica	9 días	mar 9/04/24	mié 17/04/24
56	10.9	Equipo de GYM REF Giro de hombros	9 días	mar 9/04/24	mié 17/04/24
57	10.10	Equipo de GYM REF Giro caminador	9 días	mar 9/04/24	mié 17/04/24
58	10.5	Mesa de ajedrez en concreto	9 días	mar 9/04/24	mié 17/04/24
59	10.19	Cicloparqueadero tipo M-22 acero inoxidable	9 días	mar 9/04/24	mié 17/04/24
60	10.201	Bolardo en Nieto	9 días	mar 9/04/24	mié 17/04/24
61	10.31	Suministo e instalación de BARRAS COMBINADAS DIMENSIONES: 4.38 x 1.41 x 2.60 mts	9 días	mar 9/04/24	mié 17/04/24
62		**VEGETACIÓN**	**24 días**	**dom 24/03/24**	**mar 16/04/24**
63	11.4	Relleno en tierra negra	8 días	dom 24/03/24	dom 31/03/24
64	11.1	Cobertura tipo grama	8 días	lun 1/04/24	lun 8/04/24
65	11.2	Cobertura tipo floricultura	8 días	lun 1/04/24	lun 8/04/24
66	11.3	Siembra de arbol (Segun propuesta paisajismo)	8 días	mar 9/04/24	mar 16/04/24
67	11.5	Limo arcilloso	8 días	mar 9/04/24	mar 16/04/24
68	11.6	Arbol Nogueto	8 días	mar 9/04/24	mar 16/04/24
69	11.7	Arbol laurel hoja pequeña	8 días	mar 9/04/24	mar 16/04/24
70	11.8	Arbol Carbonero Rojo	8 días	mar 9/04/24	mar 16/04/24
71	11.9	Arbol Calistemo	8 días	mar 9/04/24	mar 16/04/24
72		**SEÑALETICA**	**8 días**	**vie 12/04/24**	**vie 19/04/24**
73	12.1	Señaletica identificador zona de juegos infantiles	6 días	vie 12/04/24	mié 17/04/24
74	12.2	Señaletica GYM parque	6 días	vie 12/04/24	mié 17/04/24
75	12.3	Señaletica identificador	8 días	vie 12/04/24	vie 19/04/24
76	12.4	Señaletica SC-60	6 días	vie 12/04/24	mié 17/04/24
77		**OTROS**	**2 días**	**jue 18/04/24**	**vie 19/04/24**
78	13.2	Aseo general	2 días	jue 18/04/24	vie 19/04/24
79		FIN	0 días	vie 19/04/24	vie 19/04/24

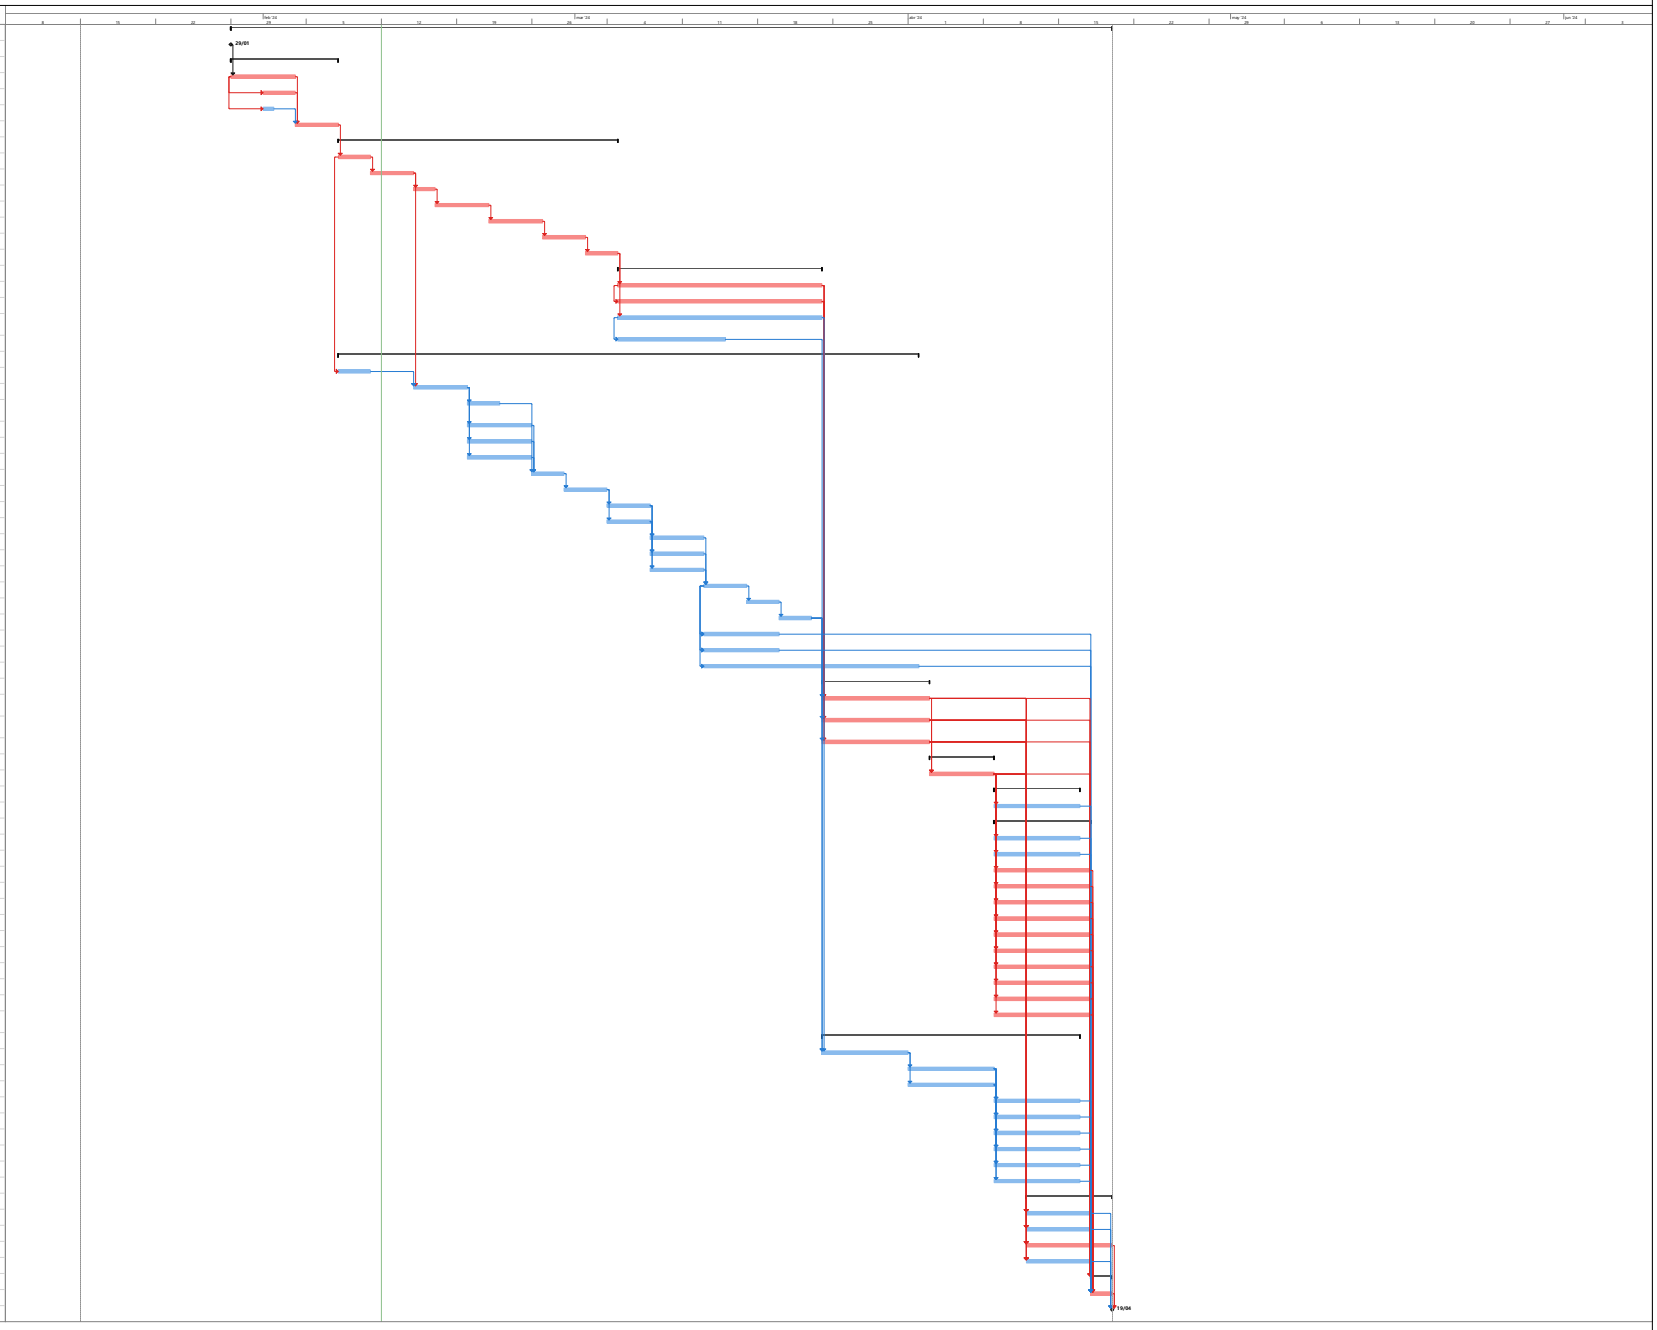

PROGRAMACIÓN PRELIMINAR

Página 1

FIRMA

DIRECTOR DE OBRA: JAIME HERRERA OSORIO


FIRMA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA : MAURICIO HERNANDEZ

CONTRATO DE OBRA No 1070-2022

PROGRAMACION PRELIMINAR AAUT20 PATIO BONITO SECTOR A

Id	ITEM	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		**PROYECTO TERRITORIO T 20**	**96 días**	**lun 15/01/24**	**vie 19/04/24**	
2		INICIO	0 días	lun 15/01/24	lun 15/01/24	
3		**PRELIMINARES**	**20 días**	**lun 15/01/24**	**sáb 3/02/24**	
4	1.7	Cerramiento provisional de obra (Polisombra)	10 días	lun 15/01/24	mié 24/01/24	2
5	1.10	Proteccion de arbol de existente	3 días	sáb 20/01/24	lun 22/01/24	4CC+50%
6	13.1	Baño portatil Alquiler	1 día	sáb 20/01/24	sáb 20/01/24	4CC+50%
7	1.8	Demolición y retiro de Bordillo prefabricado	6 días	jue 25/01/24	mar 30/01/24	4;5;6
8	1.9	Desmonte y retiro de juegos infantiles	6 días	jue 25/01/24	mar 30/01/24	4;5;6
9	1.1	Localización y replanteo	4 días	mié 31/01/24	sáb 3/02/24	7;8
10		**EXCAVACIONES Y RELLENOS**	**22 días**	**dom 4/02/24**	**dom 25/02/24**	
11	2.1	Descapote a máquina nivel 0.00 (no. retiro) e=.20 cm	4 días	dom 4/02/24	mié 7/02/24	9
12	2.4	Excavación manual suelo blanco	5 días	jue 8/02/24	lun 12/02/24	11
13	2.8	Excavación muros y huellas vaciadas en concreto	5 días	jue 8/02/24	lun 12/02/24	11
14	2.6	Geotextil T-2400	3 días	mar 13/02/24	jue 15/02/24	12;13
15	2.5	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	4 días	vie 16/02/24	lun 19/02/24	14
16	2.2	Nivelación y perfilado de terreno manual	3 días	mar 20/02/24	jue 22/02/24	15
17	2.3	Nivelación y Compactación de Subrasante	3 días	vie 23/02/24	dom 25/02/24	16
18		**CONCRETOS BASES Y ESTRUCTURAS Y ACEROS DE REFUERZO**	**21 días**	**lun 26/02/24**	**dom 17/03/24**	
19	3.1	Placa contrapiso 3000 psi 21mpa e=15	21 días	lun 26/02/24	dom 17/03/24	17
20	4.1	Malla Electrosoldada d=5mm@0.15 (area 6x2.35)	21 días	lun 26/02/24	dom 17/03/24	19CC
21	3.2	Placa contrapiso 3000 psi 21mpa para huellas en concreto	10 días	lun 26/02/24	mié 6/03/24	17
22	4.3	Refuerzo acero fy=60000psi huellas de concreto	10 días	lun 26/02/24	mié 6/03/24	21CC
23	3.3	Concreto 3000 psi 21mpa para muros (Contenedores de raiz)	10 días	lun 26/02/24	mié 6/03/24	17
24	4.2	Refuerzo acero fy=60000psi muro	10 días	lun 26/02/24	mié 6/03/24	23CC
25		**REDES HIDROSANITARIAS SUDS**	**45 días**	**dom 4/02/24**	**mar 19/03/24**	
26	5.1	Descapote a máquina nivel 0.00 (no. retiro) e=.1.40m	5 días	dom 4/02/24	jue 8/02/24	11CC
27	5.3	Taludes perimetrales en concreto fc 21 3000 psi .15	5 días	vie 9/02/24	mar 13/02/24	26
28	5.2	Concreto limpieza (alistado de terreno) e=0.05emObra	2 días	mié 14/02/24	jue 15/02/24	12;27
29	5.4	Cañuela en concreto	5 días	mié 14/02/24	dom 18/02/24	28CC
30	5.13	Malla Electro soldada d=5mm@0.15	5 días	mié 14/02/24	dom 18/02/24	28CC
31	5.14	Refuerzo acero fy=60000psi	5 días	mié 14/02/24	dom 18/02/24	28CC
32	5.5	Geotextil (NORMA) NS-088	2 días	lun 19/02/24	mar 20/02/24	31;30;29;2
33	5.12	Piedra bola	3 días	mié 21/02/24	vie 23/02/24	32
34	5.6	Capa drenaje (agregado Grueso)	5 días	mié 21/02/24	dom 25/02/24	33CC
35	5.7	Capa filtrante (agregado Fino)	5 días	mié 21/02/24	dom 25/02/24	33CC
36	5.8	Tubería perforada PVC DE 4 PUL	5 días	lun 26/02/24	vie 1/03/24	33;34;35
37	5.9	Tubería de limpieza PVC 4 PUL	5 días	lun 26/02/24	vie 1/03/24	33;34;35
38	5.10	Tubería de salida PVC 6 PUL	5 días	lun 26/02/24	vie 1/03/24	33;34;35
39	5.11	Sustrato (TIERRA NEGRA+ ARENA)	3 días	sáb 2/03/24	lun 4/03/24	36;37;38
40	5.16	Nivelación y perfilado de terreno manual	5 días	mar 5/03/24	sáb 9/03/24	39
41	5.17	Nivelación y Compactación de Subrasante	3 días	dom 10/03/24	mar 12/03/24	40
42	5.15	Reja sumidero	3 días	mar 5/03/24	jue 7/03/24	40CC
43	5.18	Cerramiento reja pequeña	3 días	mar 5/03/24	jue 7/03/24	40CC
44	5.19	Caja de inspeccion .60x.60 h=1.0 m	15 días	mar 5/03/24	mar 19/03/24	40CC
45		**ADOQUÍN, TABLETA Y BORDILLOS**	**12 días**	**lun 18/03/24**	**vie 29/03/24**	
46	7.1	Adoquin prefabricados en concreto a color, de 60*15*21 (reFLoxeeria-Adoquines)	12 días	lun 18/03/24	vie 29/03/24	19;21;20;2
47	7.2	Adoquin rectangular plano demarcador visual	12 días	lun 18/03/24	vie 29/03/24	46CC
48	7.3	Tableta podotactil alerta 20*20 cm. Prefabricado en concreto color amarillo (AD7)	12 días	lun 18/03/24	vie 29/03/24	46CC
49	7.4	Tableta podotactil Guia 20*20 cm. Prefabricado en concreto, color amarillo (AD8)	12 días	lun 18/03/24	vie 29/03/24	46CC
50	7.5	Bordillo demarcado recto vial prefabricado en concreto (A10)	12 días	lun 18/03/24	vie 29/03/24	46CC
51	7.6	Bordillo demarcado recto interno prefabricado en concreto (A60)	12 días	lun 18/03/24	vie 29/03/24	46CC
52		**PISOS EN MATERIAL RECICLADO**	**8 días**	**sáb 30/03/24**	**sáb 6/04/24**	
53	8.1	Piso caucho reciclado en color, para juegos infantiles	8 días	sáb 30/03/24	sáb 6/04/24	46;47;48;4
54		**PINTURA**	**8 días**	**dom 7/04/24**	**dom 14/04/24**	
55	9.1	Pintura a color especio de GYM Biosaludable	8 días	dom 7/04/24	dom 14/04/24	53
56		**MOBILIARIO URBANO**	**17 días**	**sáb 30/03/24**	**lun 15/04/24**	
57	10.1	Canieca metalica referencia M-120 o M121.	5 días	sáb 30/03/24	mié 3/04/24	46;47;48;4
58	10.2	Silla individual referencia M-01-A	5 días	sáb 30/03/24	mié 3/04/24	46;47;48;4
59	10.4	Deslizadero	5 días	sáb 30/03/24	mié 3/04/24	46;47;48;4
60	10.5	Mesa de ajedrez en concreto	5 días	sáb 30/03/24	mié 3/04/24	46;47;48;4
61	10.6	Suministro baranda M-83	5 días	sáb 30/03/24	mié 3/04/24	46;47;48;4
62	10.7	Equipo de GYM REF flexion pierna	9 días	dom 7/04/24	lun 15/04/24	53
63	10.8	Equipo de GYM REF Elíptica	9 días	dom 7/04/24	lun 15/04/24	53
64	10.9	Equipo de GYM REF Giro de hombros	9 días	dom 7/04/24	lun 15/04/24	53
65	10.10	Equipo de GYM REF Giro caminador	9 días	dom 7/04/24	lun 15/04/24	53
66		**VEGETACIÓN**	**34 días**	**mié 13/03/24**	**lun 15/04/24**	
67	11.4	Relleno en tierra negra	16 días	mié 13/03/24	jue 28/03/24	41;23;24
68	11.1	Cobertura tipo grama	12 días	vie 29/03/24	mar 9/04/24	67
69	11.2	Cobertura tipo floricultura	12 días	vie 29/03/24	mar 9/04/24	67
70	11.3	Siembra de arbol (Según propuesta paisajismo)	6 días	mié 10/04/24	lun 15/04/24	68;69
71	11.7	Arbol laurel hoja pequeña	6 días	mié 10/04/24	lun 15/04/24	70CC
72		**SEÑALIZACIÓN**	**5 días**	**lun 15/04/24**	**vie 19/04/24**	
73	12.1	Señaletica identificador zona de juegos infantiles	4 días	lun 15/04/24	jue 18/04/24	53;55
74	12.2	Señaletica GYM parque	4 días	lun 15/04/24	jue 18/04/24	73CC
75	12.3	Señaletica identificador	5 días	lun 15/04/24	vie 19/04/24	73CC
76	12.4	Señaletica SC-80	4 días	lun 15/04/24	jue 18/04/24	73CC
77		**OTROS**	**3 días**	**mar 16/04/24**	**jue 18/04/24**	
78	13.2	Aseo general	3 días	mar 16/04/24	jue 18/04/24	42;43;44;5
79		FIN	0 días	vie 19/04/24	vie 19/04/24	73;74;75;7

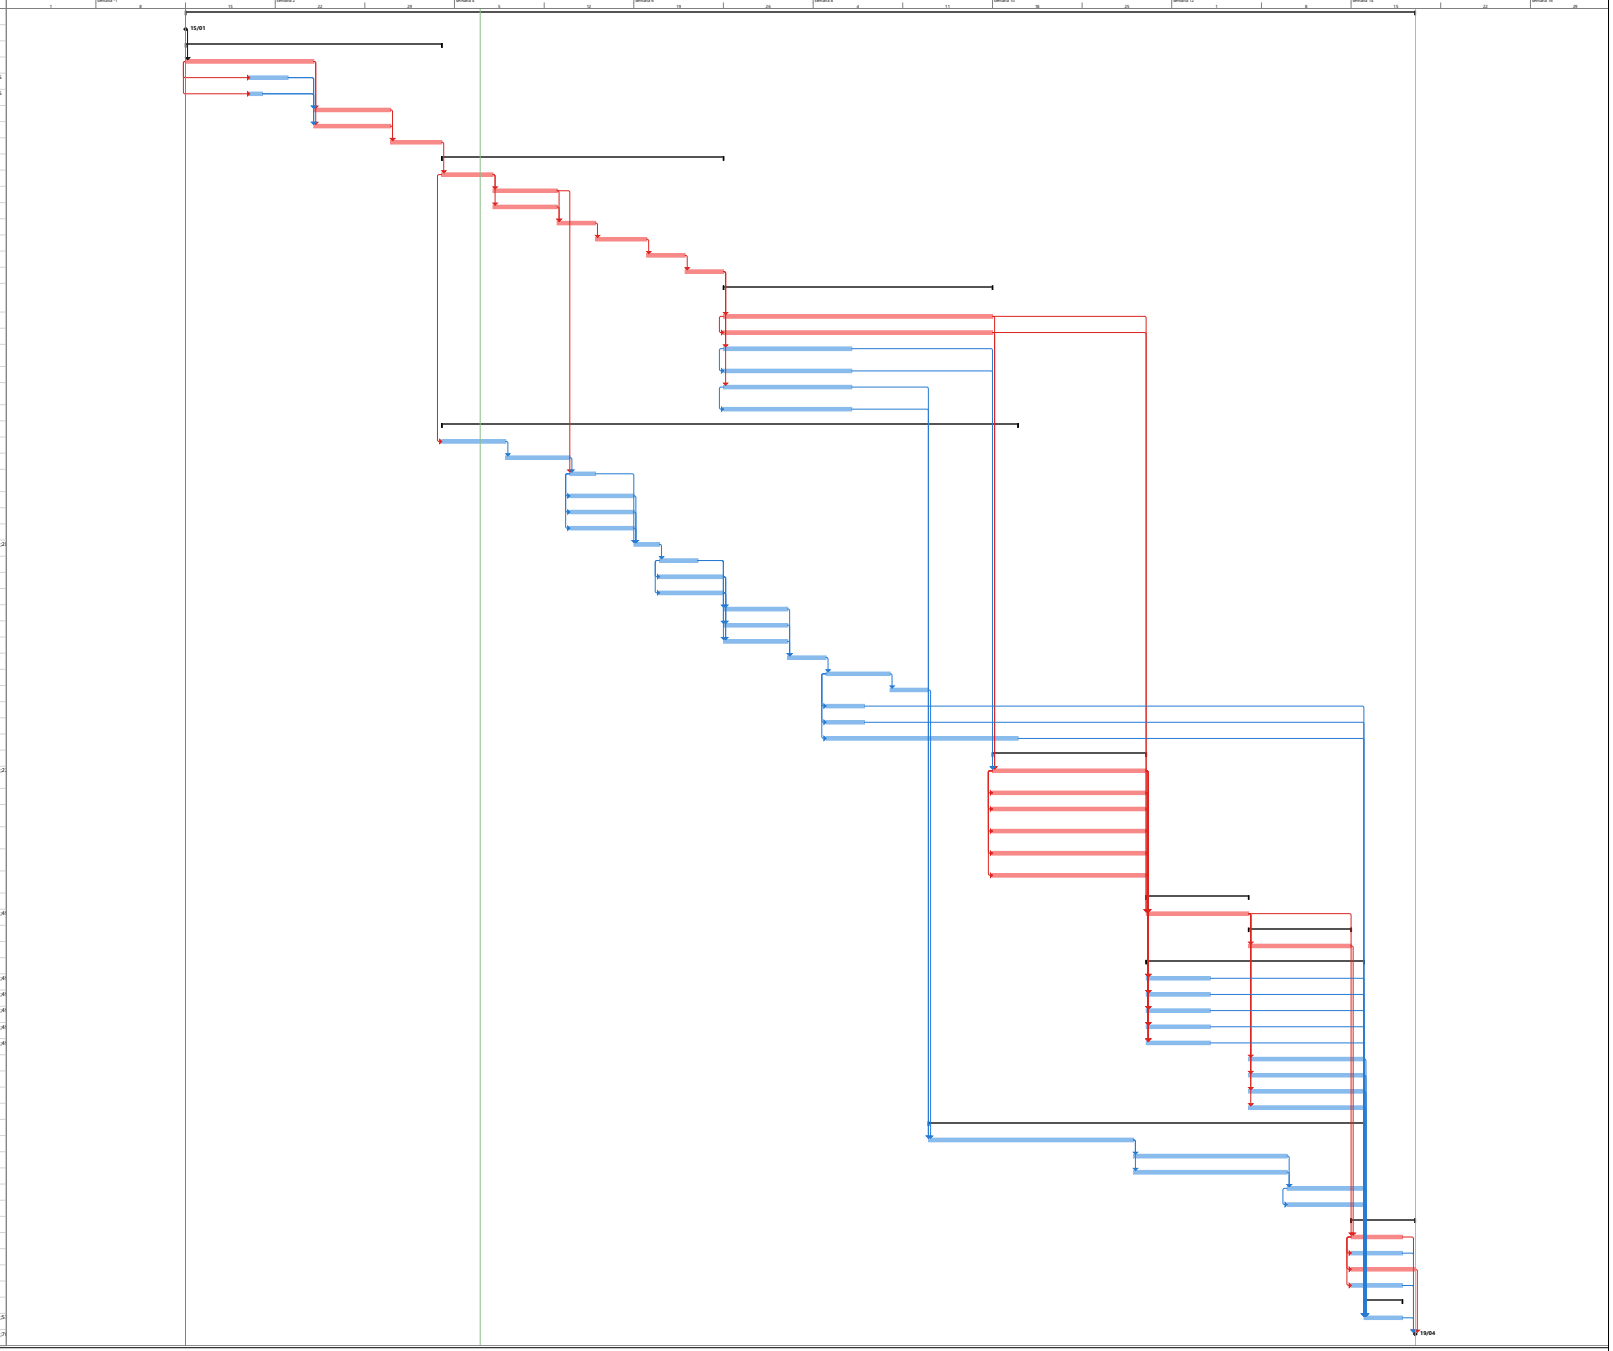

PROGRAMACIÓN PRELIMINAR

Página 1


Firma:_____
Director de obra: Ing. Jaime Herrera Osorio

Fima:_____
Director Interventoria: Ing. Mauricio Hernandez

CONTRATO DE OBRA No. 1070-2022

PROGRAMACION PRELIMINAR AAUT21 PATIO BONITO SETOR C

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		**PROYECTO TERRITORIO T21**	**96 días**	**lun 15/01/24**	**vie 19/04/24**	
2		INICIO	0 días	lun 15/01/24	lun 15/01/24	
3		**PRELIMINARES**	**25 días**	**lun 15/01/24**	**jue 8/02/24**	
4	1.7	Cerramiento provisional de obra (Polisombra)	10 días	lun 15/01/24	mié 24/01/24	2
5	1.101	Proteccion de arbol de existente	3 días	sáb 20/01/24	lun 22/01/24	4CC+50%
6	1.13	Proteccion de rejillas	3 días	sáb 20/01/24	lun 22/01/24	4CC+50%
7	1.8	Demolición y retiro de Bordillo prefabricado	10 días	jue 25/01/24	sáb 3/02/24	4,5,6
8	1.9	Desmonte y retiro de juegos infantiles	10 días	jue 25/01/24	sáb 3/02/24	4,5,6
9	1.11	Desmonte y retiro de balanda	10 días	jue 25/01/24	sáb 3/02/24	4,5,6
10	1.12	Desmonte de adoquin	10 días	jue 25/01/24	sáb 3/02/24	4,5,6
11	1.1.1	Baño portatil Alquiler	1 día	jue 25/01/24	jue 25/01/24	4
12	1.1	Localización y replanteo	5 días	dom 4/02/24	jue 8/02/24	7,8,9,10,1
13		**EXCAVACIONES Y RELLENOS**	**29 días**	**vie 9/02/24**	**vie 8/03/24**	
14	2.1	Descapote a máquina nivel 0.00 (no. retiro) e=-20 cm	5 días	vie 9/02/24	mar 13/02/24	12
15	2.4	Excavación manual suelo blanco	10 días	vie 9/02/24	dom 18/02/24	14CC
16	2.8	Excavación muros y huellas vaciadas en concreto	10 días	vie 9/02/24	dom 18/02/24	12
17	2.6	Geotextil T-2400	3 días	lun 19/02/24	mié 21/02/24	15,16;14
18	2.7	Relleno compactado Base granular	8 días	jue 22/02/24	jue 29/02/24	17
19	2.5	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	8 días	jue 22/02/24	jue 29/02/24	17
20	2.2	Nivelacion y perfilado de terreno manual	4 días	vie 1/03/24	lun 4/03/24	18,19
21	2.3	Nivelación y Compactación de Subrasante	4 días	mar 5/03/24	vie 8/03/24	20
22		**CONCRETOS BASES Y ESTRUCTURAS**	**18 días**	**sáb 9/03/24**	**mar 26/03/24**	
23	3.1	Placa contrapiso 3000 psi 21mpa e=15	18 días	sáb 9/03/24	mar 26/03/24	21
24	3.2	Placa contrapiso 3000 psi 21mpa para huellas en concreto	8 días	sáb 9/03/24	sáb 16/03/24	21
25	3.3	Concreto 3000 psi 21mpa para muros (Cortinederos de vial)	8 días	sáb 9/03/24	sáb 16/03/24	21
26		**ACERO DE REFUERZO**	**18 días**	**sáb 9/03/24**	**mar 26/03/24**	
27	4.1	Malla Electrosoldada d=9mm@0.15 (area 6x2.35)	18 días	sáb 9/03/24	mar 26/03/24	23CC
28	4.2	Refuerzo acero fy=4000Kg/e muro	8 días	sáb 9/03/24	sáb 16/03/24	25CC
29	4.3	Refuerzo acero fy=4000Kg/e huellas de concreto	8 días	sáb 9/03/24	sáb 16/03/24	24CC
30		**REDES HIDROSANITARIAS**	**59 días**	**vie 9/02/24**	**dom 7/04/24**	
31	5.1	Descapote a máquina nivel 0.00 (no. retiro) e=-1.40m	5 días	vie 9/02/24	mar 13/02/24	14CC
32	5.3	Tulues perimetrales en concreto fc 21 3000 psi -70	7 días	lun 19/02/24	dom 25/02/24	16,15;31
33	5.2	Concreto limpieza (pisitado de terreno) e=0.05mm25mm	3 días	lun 26/02/24	mar 27/02/24	32
34	5.4	Cañuela en concreto	15 días	mié 28/02/24	mié 13/03/24	33
35	5.13	Malla Electro soldada d=9mm@0.15	15 días	mié 28/02/24	mié 13/03/24	33
36	5.14	Refuerzo acero fy=4000Kg/e	15 días	mié 28/02/24	mié 13/03/24	33
37	5.5	Geotextil (NORMA) NS-088	2 días	jue 14/03/24	vie 15/03/24	34,35;36
38	5.12	Piedra bola	2 días	jue 14/03/24	vie 15/03/24	37CC
39	5.6	Capa drenaje (agregado Grueso)	3 días	sáb 16/03/24	lun 18/03/24	38,37
40	5.7	Capa filtrante (agregado Fino)	3 días	sáb 16/03/24	lun 18/03/24	38
41	5.8	Tuberia perforada PVC D6 4 PUL	3 días	mar 19/03/24	jue 21/03/24	39,40
42	5.9	Tuberia de limpieza PVC 4 PUL	3 días	mar 19/03/24	jue 21/03/24	39,40
43	5.10	Tuberia de salida PVC 6 PUL	3 días	mar 19/03/24	jue 21/03/24	39,40
44	5.11	Ilustrato (TIERRA NEGRA+ ARENA)	4 días	vie 22/03/24	lun 25/03/24	41,42;43
45	5.16	Nivelacion y perfilado de terreno manual	3 días	mar 26/03/24	jue 28/03/24	44
46	5.17	Nivelación y Compactación de Subrasante	4 días	vie 29/03/24	lun 1/04/24	45
47	5.15	Reja sumidero	4 días	mar 2/04/24	vie 5/04/24	46
48	5.18	Cerramiento reja pequeña	4 días	mar 2/04/24	vie 5/04/24	47CC
49	5.19	Caja de inspeccion 40x 40 h=1.0 **	10 días	vie 29/03/24	dom 7/04/24	46CC
50		**ADOQUIN, TABLETA Y BORDILLOS**	**10 días**	**mié 27/03/24**	**vie 5/04/24**	
51	7.2	Adoquin rectangular plano demarcador visual	10 días	mié 27/03/24	vie 5/04/24	23,27
52	7.3	Tableta podotactil alerta 20*20 cm. Prefabricado en concreto color amarillo (AM7)	10 días	mié 27/03/24	vie 5/04/24	23,27
53	7.4	Tableta podotactil Guia 20*20 cm. Prefabricado en concreto, color amarillo (AM8)	10 días	mié 27/03/24	vie 5/04/24	23,27
54	7.5	Bordillo demarcado recto vial prefabricado en concreto (AV5)	10 días	mié 27/03/24	vie 5/04/24	23,27
55	7.6	Bordillo demarcado recto interno prefabricado en concreto (AM4)	10 días	mié 27/03/24	vie 5/04/24	23,27
56		**PISOS EN MATERIAL RECICLADO TIPO CAUCHO**	**15 días**	**lun 1/04/24**	**lun 15/04/24**	
57	8.1	Piso caucho reciclado en color ,para juegos infantiles	15 días	lun 1/04/24	lun 15/04/24	52CC+50%
58		**PINTURA PISO**	**15 días**	**dom 31/03/24**	**dom 14/04/24**	
59	8.1	Pintura acolor espacio de GYM Biosaludable	15 días	dom 31/03/24	dom 14/04/24	52CC+60%
60		**MOBILIARIO URBANO**	**12 días**	**sáb 6/04/24**	**mié 17/04/24**	
61	10.1	Canecu metalica referencia M120 o M121.	8 días	sáb 6/04/24	sáb 13/04/24	52,53;54,5
62	10.2	Silla individual referencia M-01-A	8 días	sáb 6/04/24	sáb 13/04/24	52,53;54,5
63	10.3	Juego cuerdas piramidal	12 días	sáb 6/04/24	mié 17/04/24	52,53;54,5
64	10.6	Suministro balanda M-83	8 días	sáb 6/04/24	sáb 13/04/24	52,53;54,5
65	10.7	Equipo de GYM REF Sexo prensa	8 días	sáb 6/04/24	sáb 13/04/24	52,53;54,5
66	10.8	Equipo de GYM REF Elíptica	8 días	sáb 6/04/24	sáb 13/04/24	52,53;54,5
67	10.9	Equipo de GYM REF Giro de hombros	8 días	sáb 6/04/24	sáb 13/04/24	52,53;54,5
68	10.10	Equipo de GYM REF Giro caminador	8 días	sáb 6/04/24	sáb 13/04/24	52,53;54,5
69		**VEGETACIÓN**	**21 días**	**mié 27/03/24**	**mar 16/04/24**	
70	11.1	Cobertura tipo grama	15 días	mié 27/03/24	mié 10/04/24	23,27;24,
71	11.2	Cobertura tipo floricultura	15 días	mié 27/03/24	mié 10/04/24	70CC
72	11.4	Relleno en tierra negra	6 días	jue 11/04/24	mar 16/04/24	71,70
73	11.3	Siembra de arbol (Segun propuesta paisajismo)	6 días	jue 11/04/24	mar 16/04/24	72CC
74	11.7	Arbol ilusrel hoja pequeña	6 días	jue 11/04/24	mar 16/04/24	72CC
75	11.9	Arbol Calistemo	6 días	jue 11/04/24	mar 16/04/24	72CC
76		**SEÑALÍTICA**	**3 días**	**lun 15/04/24**	**mié 17/04/24**	
77	12.1	Señaletica identificador zona de juegos infantiles	2 días	lun 15/04/24	mar 16/04/24	59
78	12.2	Señaletica GYM parque	2 días	lun 15/04/24	mar 16/04/24	59
79	12.3	Señaletica identificador	3 días	lun 15/04/24	mié 17/04/24	59
80	12.4	Señaletica SC-80	2 días	lun 15/04/24	mar 16/04/24	59
81		**OTROS**	**2 días**	**jue 18/04/24**	**vie 19/04/24**	
82	13.2	Aseo general	2 días	jue 18/04/24	vie 19/04/24	65,66;67,7
83		FIN	0 días	vie 19/04/24	vie 19/04/24	82,77;78,

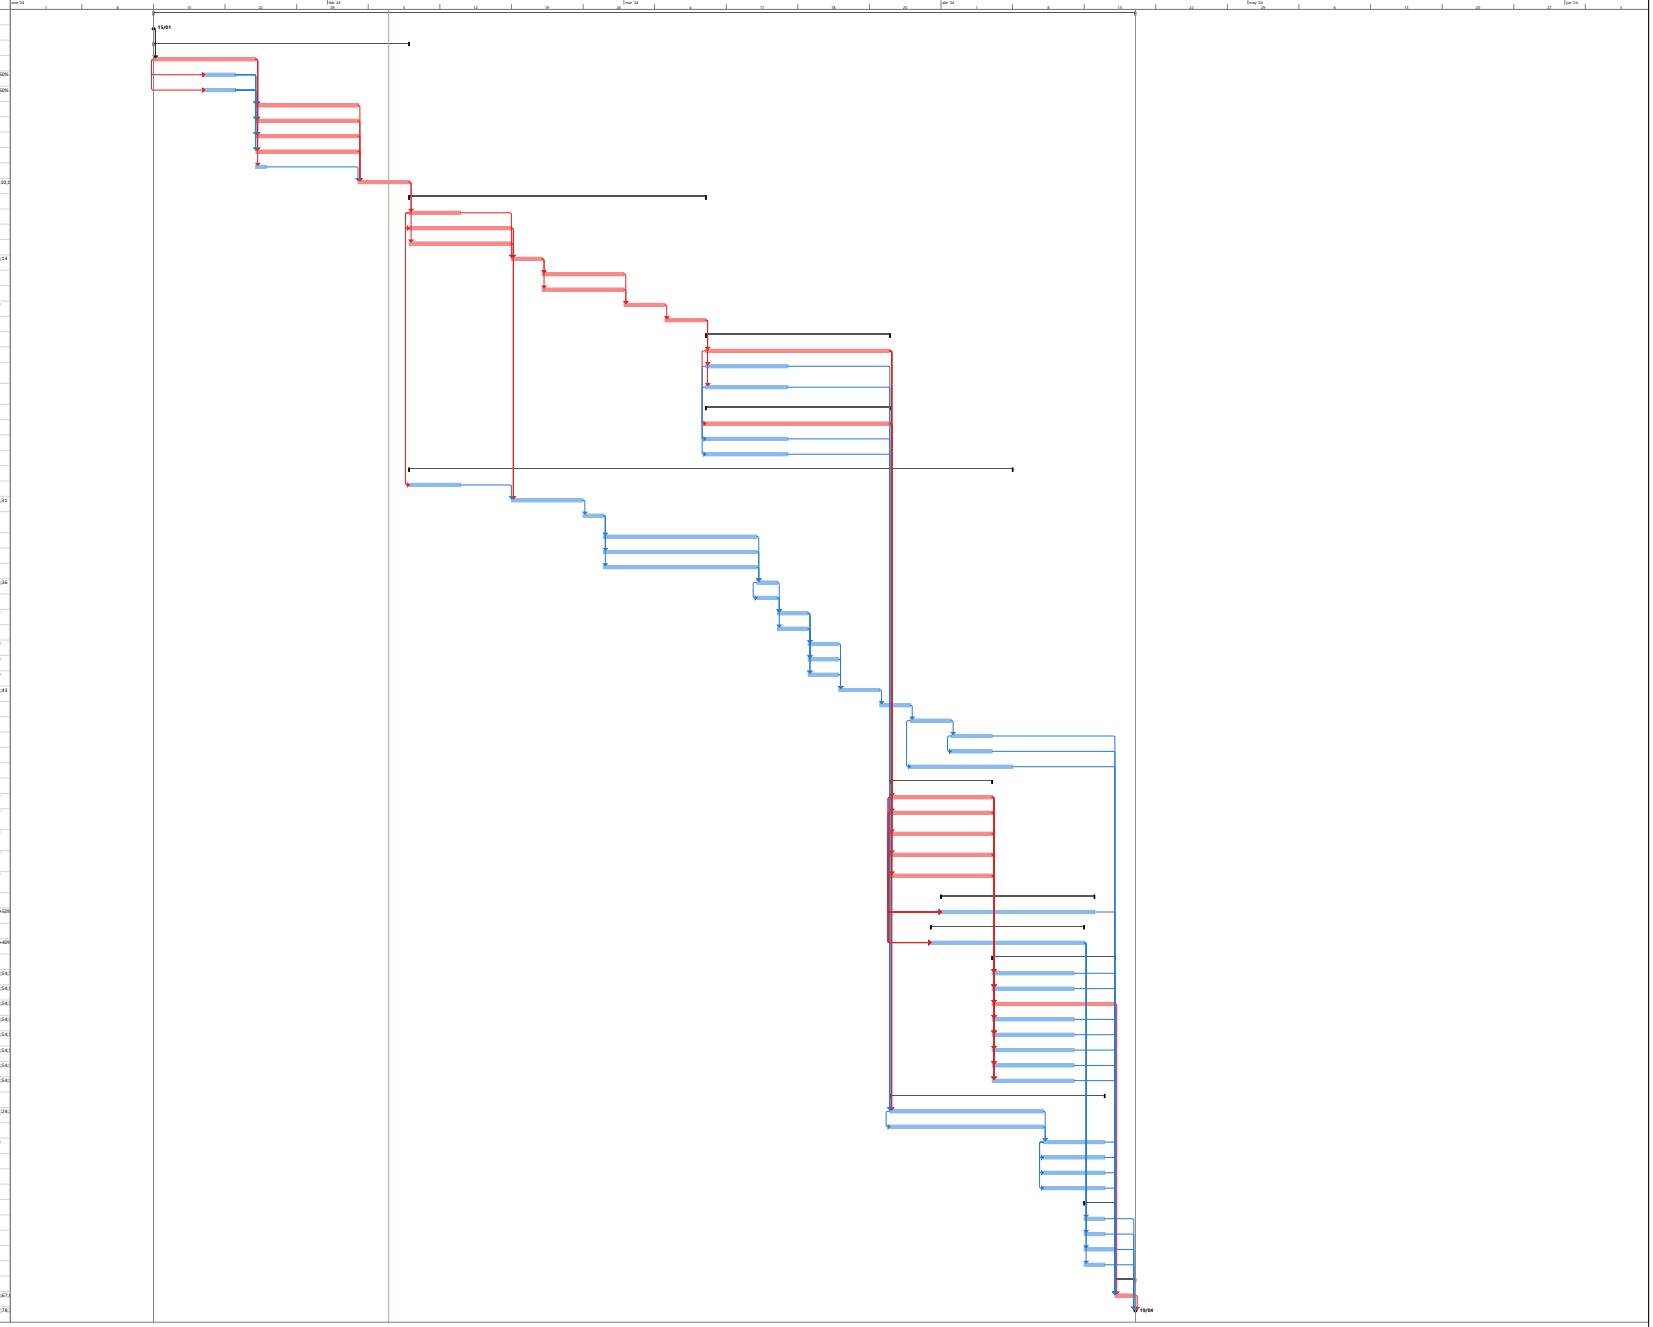

PROGRAMACIÓN PRELIMINAR

Página 1

Firma:_____
Director de obra: Ing. Jaime Herrera Osorio


Fima:_____
Director Interventoria: Ing. Mauricio Hernandez

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

CONTRATO DE OBRA No 1070-2022

PROGRAMACION PRELIMINAR AAUT22 LOS OLIVOS

Id	ITEM	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		**PROYECTO TERRITORIO T22**	**68 días**	**lun 12/02/24**	**vie 19/04/24**	
2		INICIO	0 días	lun 12/02/24	lun 12/02/24	
3		**PRELIMINARES**	**21 días**	**lun 12/02/24**	**dom 3/03/24**	
4	1.7	Cerramiento provisional de obra (Polisombra)	10 días	lun 12/02/24	mié 21/02/24	2
5	13.1	Baño portatil Alquiler	1 día	jue 15/02/24	jue 15/02/24	2FC+3 días
6	1.10	Proteccion de arbol de existente	5 días	sáb 17/02/24	mié 21/02/24	2FC+5 días
7	1.1	Localización y replanteo	3 días	jue 22/02/24	sáb 24/02/24	4;5;6
8	1.12	Desmonte de adoquín	8 días	dom 25/02/24	dom 3/03/24	7
9	1.14	Demolicion anden	8 días	dom 25/02/24	dom 3/03/24	7
10	1.15	Desmonte de bancas en concreto existente	3 días	jue 29/02/24	sáb 2/03/24	8CC+50%;9C
11	1.11	Desmonte y retiro de baranda	3 días	jue 29/02/24	sáb 2/03/24	8CC+50%;9C
12		**EXCAVACIONES**	**16 días**	**lun 4/03/24**	**mar 19/03/24**	
13	2.4	Excavación manual suelo blanco	8 días	lun 4/03/24	lun 11/03/24	8;9;10;11
14	2.5	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	8 días	mar 12/03/24	mar 19/03/24	13
15		**CONCRETOS BASES Y ESTRUCTURAS**	**16 días**	**mié 20/03/24**	**jue 4/04/24**	
16	3.101	Zapata corrida	6 días	mié 20/03/24	lun 25/03/24	14
17	3.11	Muro contenc concr 21 MPA 3000	6 días	mié 20/03/24	lun 25/03/24	14
18	3.1	Placa contrapiso 3000 psi 21mpa e=15	8 días	mar 26/03/24	mar 2/04/24	16;17
19	3.9	Escalera en concreto 3000 psi	4 días	sáb 30/03/24	mié 3/04/24	18CC+60%
20	3.8	Pdv01_piso duro vaciado. Construcción de piso duro en concreto de 21mpa	15 días	mié 20/03/24	mié 3/04/24	14
21	3.4	Cp02_conexiones peatonales livianas.	10 días	mar 26/03/24	jue 4/04/24	20CC+40%
22	3.5	Cp02_a_conexiones peatonales livianas.	10 días	mar 26/03/24	jue 4/04/24	20CC+40%
23	3.6	Cp02_b_conexiones peatonales livianas.	10 días	mar 26/03/24	jue 4/04/24	20CC+40%
24	3.7	Suministro, transporte e instalación de elemento en concreto pigmentado vaciado in situ.	10 días	mar 26/03/24	jue 4/04/24	20CC+40%
25		**PREFABRICADOS**	**25 días**	**mar 26/03/24**	**vie 19/04/24**	
26	7.5	Bordillo demarcado recto vial prefabricado en concreto (A10)	10 días	mar 26/03/24	jue 4/04/24	18CC;20CC
27	7.8	Adoquín de arcilla	10 días	mar 26/03/24	jue 4/04/24	20CC+40%
28	7.7	Rejilla sobre cañuela	5 días	lun 15/04/24	vie 19/04/24	26FC+10 días
29		**PISOS EN MATERIAL RECICLADO**	**5 días**	**mié 3/04/24**	**lun 8/04/24**	
30	8.1	Piso caucho reciclado en color, para juegos infantiles	5 días	mié 3/04/24	lun 8/04/24	18;19
31		**PINTURA**	**10 días**	**mié 3/04/24**	**sáb 13/04/24**	
32	6.1	Pintura a color espacio de GYM Biosaludable	10 días	mié 3/04/24	sáb 13/04/24	30CC
33		**MOBILIARIO URBANO**	**9 días**	**lun 8/04/24**	**mié 17/04/24**	
34	10.11	Banca prefabricada en concreto referencia dime 1.70*0.60*0.45 M13-A	8 días	lun 8/04/24	mar 16/04/24	20;18;30
35	10.12	Banca prefabricada en concreto referencia dime 0.80*0.60*0.45 M13-A	8 días	lun 8/04/24	mar 16/04/24	20;18;30
36	10.6	Suministro baranda M-83	8 días	lun 8/04/24	mar 16/04/24	20;18;30
37	10.14	Puerta metalica para cerramiento parque M80A	8 días	lun 8/04/24	mar 16/04/24	20;18;30
38	10.13	Banca de concreto vaciada en SITU.	8 días	lun 8/04/24	mar 16/04/24	20;18;30
39	10.15	Mantenimiento juegos infantiles existentes	9 días	lun 8/04/24	mié 17/04/24	20;18;30
40	10.16	Mantenimiento de GYM biosaludable	9 días	lun 8/04/24	mié 17/04/24	20;18;30
41		**VEGETACIÓN**	**15 días**	**vie 5/04/24**	**vie 19/04/24**	
42	11.1	Cobertura tipo grama	8 días	vie 5/04/24	vie 12/04/24	20;21;22;23;2
43	11.4	Relleno en tierra negra	7 días	sáb 13/04/24	vie 19/04/24	42
44	11.3	Siembra de arbol (Según propuesta paisajismo)	7 días	sáb 13/04/24	vie 19/04/24	43CC
45	11.5	Limo arcilloso	7 días	sáb 13/04/24	vie 19/04/24	43CC
46	11.6	Arbol hayuelo	7 días	sáb 13/04/24	vie 19/04/24	43CC
47	11.101	Arbol Chicala	7 días	sáb 13/04/24	vie 19/04/24	43CC
48		**SEÑALETICA**	**5 días**	**lun 8/04/24**	**sáb 13/04/24**	
49	12.5	Suministro, transporte e instalación de valla tipo SRC 000 ó SRG 000	5 días	lun 8/04/24	sáb 13/04/24	39CC;40CC
50	12.6	Suministro, transporte e instalación de valla tipo SRV 000	5 días	lun 8/04/24	sáb 13/04/24	39CC;40CC
51		**OTROS**	**4.8 días**	**lun 15/04/24**	**vie 19/04/24**	
52	13.3	Limpieza Carcamo	2 días	lun 15/04/24	mar 16/04/24	28CC
53	13.2	Aseo general	2 días	mié 17/04/24	vie 19/04/24	43CC;44CC;4
54		FIN	0 días	vie 19/04/24	vie 19/04/24	53;49;50;52;4

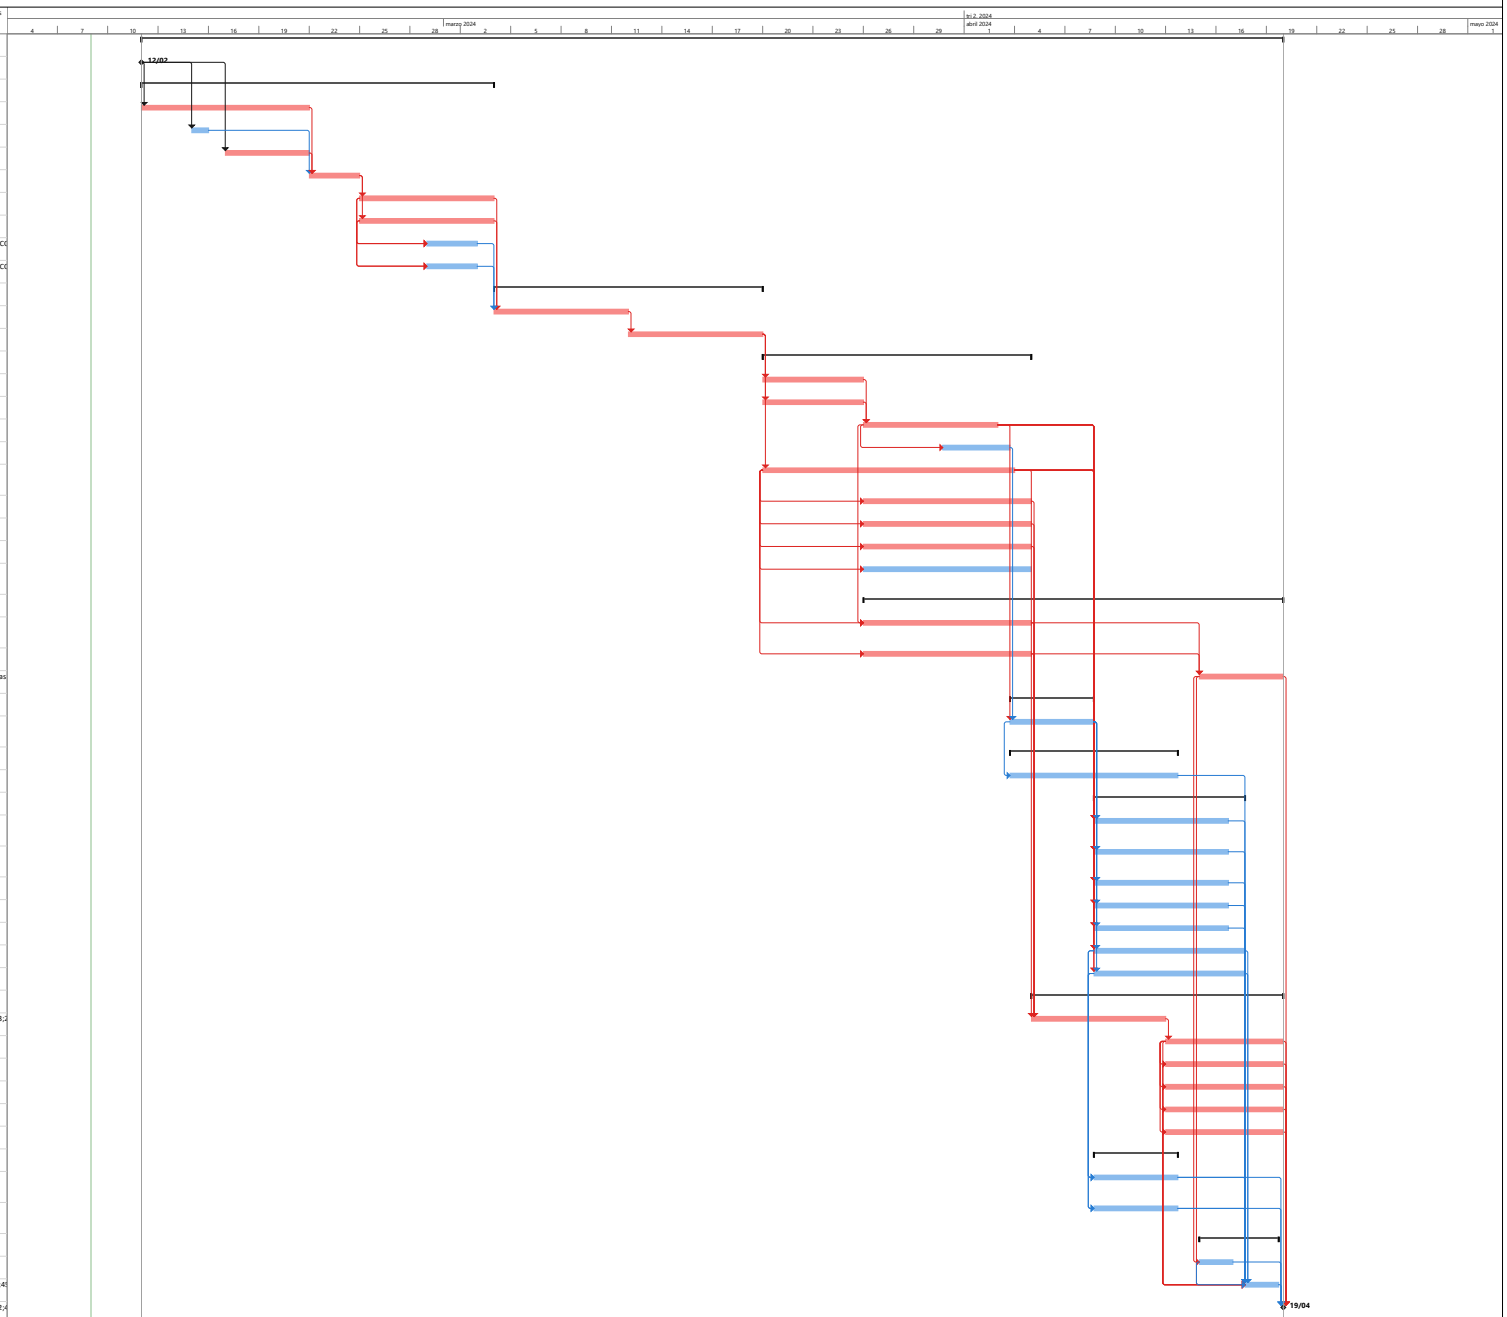

PROGRAMACIÓN PRELIMINAR

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Tareas críticas · División crítica · Progreso · Progreso manual

Firma:_____
Director de obra: Ing. Jaime Herrera Osorio


Fima:_____
Director Interventoria: Ing. Mauricio Hernandez

CONTRATO DE OBRA No 1070 - 2022

PROGRAMACIÓN AAU- MZ SAN BLAS

CONSORCIO INGENIERÍA I
NIT. 901.639.134 - 0

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
1	**PROYECTO MANZANA DEL CUIDADO**	**81 días**	**mar 30/01/24**	**vie 19/04/24**		
2	INICIO	0 días	mar 30/01/24	mar 30/01/24		4CC;27CC;30CC;31CC
3	**PRELIMINARES**	**81 días**	**mar 30/01/24**	**vie 19/04/24**		
4	Localización y replanteo	10 días	mar 30/01/24	jue 8/02/24	2CC	5;6CC+29 días;13;14;
5	Limpieza, retiro de publicidad (stickers y adhesivos) y alistamiento de superficies de pintura en postes y bolardos	8 días	vie 9/02/24	vie 16/02/24	4	15CC+50%
6	Limpieza y alistamiento de superficies para murales (grafitis)	4 días	mié 28/02/24	sáb 2/03/24	4CC+29 días	10;11
7	Anclaje a zona dura(incluye demolición zona dura, excavación manual en material común, pedestal en concreto 3500 psi y suministro e instalación acero de refuerzo de 60000 psi)	8 días	vie 5/04/24	vie 12/04/24	21CC+56 días	28;29;8
8	Relleno a tierra negra	7 días	sáb 13/04/24	vie 19/04/24	7	32
9	**PINTURA (Muralismo - Superficie blanca base)**		**mar 30/01/24**	**jue 14/03/24**		
10	Muro No.1	48 días	dom 3/03/24	vie 19/04/24	6	24CC;32
11	Muro No.10	48 días	dom 3/03/24	vie 19/04/24	6	24CC;32
12	**MOBILIARIO UBANO**	**81 días**	**mar 30/01/24**	**vie 19/04/24**		
13	Pintura de Postes	44 días	vie 9/02/24	sáb 23/03/24	4	32
14	Adhesivos "sistema distrital del cuidado y manzana del cuidado"	44 días	vie 9/02/24	sáb 23/03/24	4	32
15	Pintura Bolardos	36 días	mar 13/02/24	mar 19/03/24	5CC+50%	32
16	Logo manzana del cuidado Tipo 1 (Medidas: 1,6mx1,10m / Pintura de piso)	40 días	vie 9/02/24	mar 19/03/24	4	32
17	Logo manzana del cuidado Tipo 2 (Medidas: 1,2mx0,8m / Pintura de piso)	40 días	vie 9/02/24	mar 19/03/24	4	32
18	Eslogan (Sistema distrital del Cuidado) Tipo 1 (Medidas: 5.20 mx2.4m / Pintura de piso)	40 días	vie 9/02/24	mar 19/03/24	4	32
19	Eslogan (Sistema distrital del Cuidado) Tipo 2 (Medidas: 2,0mx1,2m / Pintura de piso)	40 días	vie 9/02/24	mar 19/03/24	4	32
20	Planos indicativos de localización (Tamaño vari	40 días	vie 9/02/24	mar 19/03/24	4	32
21	Superficies moradas esquineras	40 días	vie 9/02/24	mar 19/03/24	4	32;7CC+56 días
22	Bordillo superficie morado (A=0.6m)	50 días	vie 9/02/24	vie 29/03/24	4	32
23	**MURALISMO**	**81 días**	**mar 30/01/24**	**vie 19/04/24**		
24	Intervención artistica (Tejidos) sobre rejas	48 días	dom 3/03/24	vie 19/04/24	10CC;11CC	32
25	Cintas de banderines en cruces vehiculares	40 días	vie 9/02/24	mar 19/03/24	4	32
26	Suministro e instalación de señalización metálica informativa para postes (Tamaño 0,5m x 0,1m) incluye abrazadera tipo cinta bandit.	30 días	vie 9/02/24	sáb 9/03/24	4	32
27	Globo Esfera publicitario de 2.8 Mts	81 días	mar 30/01/24	vie 19/04/24	2CC	32
28	Mobiliario vertical Metálico con matera en concreto	7 días	sáb 13/04/24	vie 19/04/24	7	32
29	Mobiliario vertical Metálico con matera en concreto + Banca	7 días	sáb 13/04/24	vie 19/04/24	7	32
30	Suministro y aplicación de helio para Globo Esfera publicitario de 2.8 Mts	81 días	mar 30/01/24	vie 19/04/24	2CC	32
31	Suministro Contrapeso movil Globo Esfera publicitario de 2.8 Mts incluye sistema de sujeción	81 días	mar 30/01/24	vie 19/04/24	2CC	32
32	FIN	0 días	vie 19/04/24	vie 19/04/24	24;10;11;15;16	

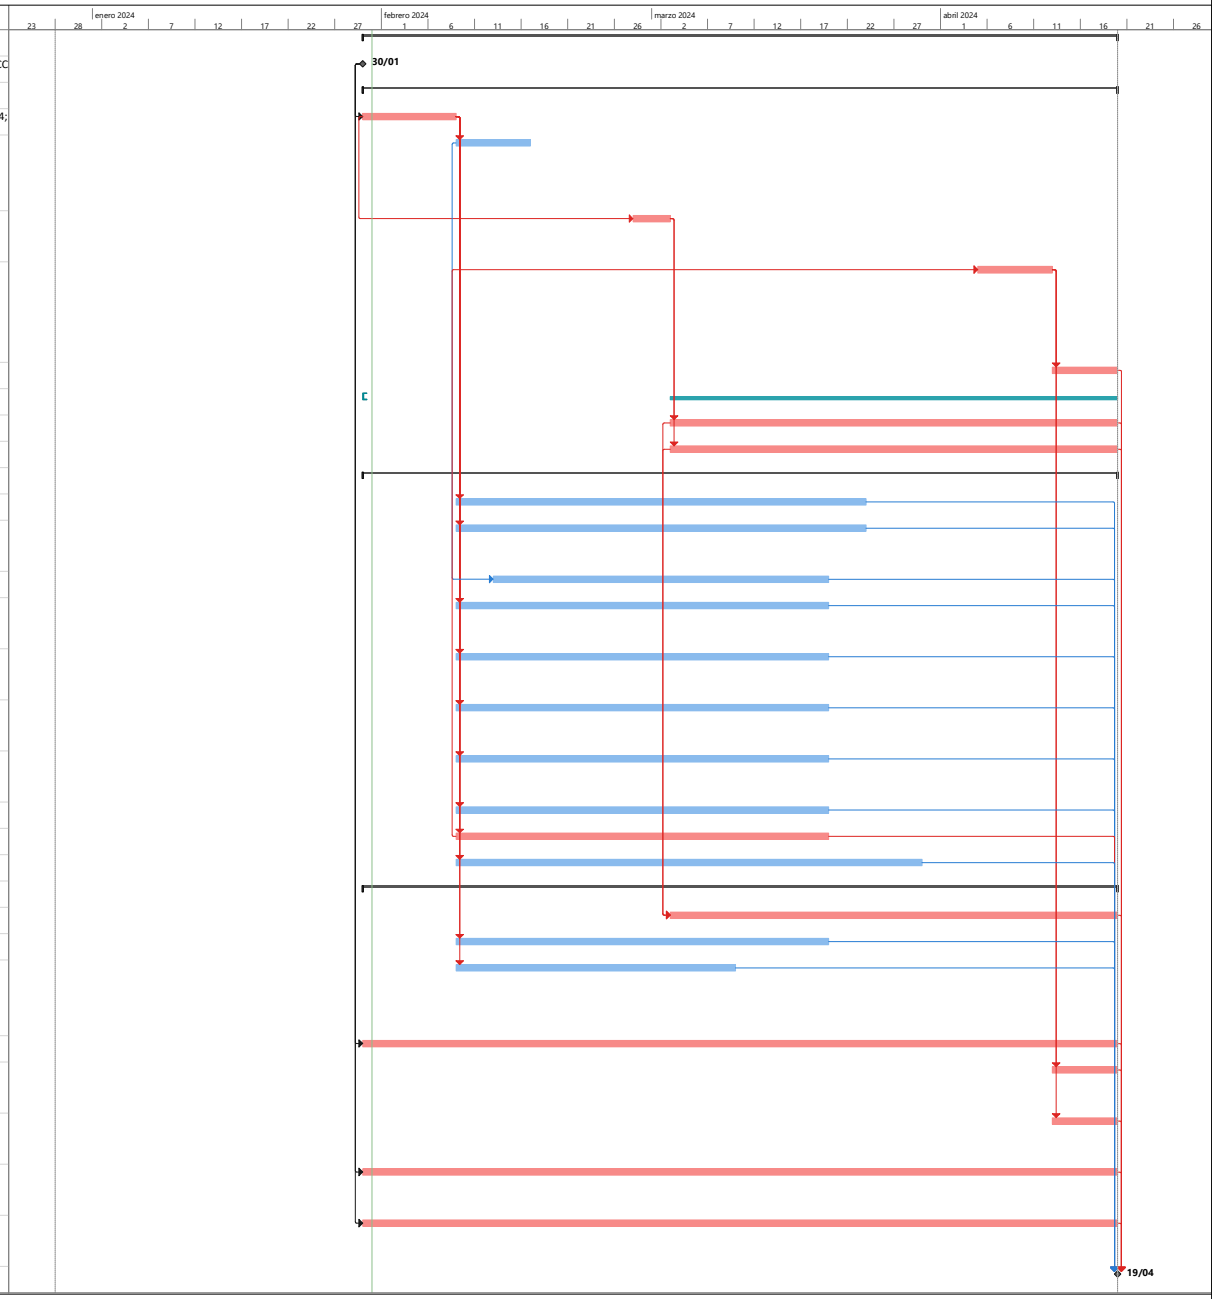

Proyecto: PROGRAMACION DE
Fecha: mié 31/01/24

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · División crítica
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite · Progreso
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Tareas críticas · Progreso manual

FIRMA

DIRECTOR DE OBRA: JAIME HERRERA OSORIO

FIRMA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA : MAURICIO HERNANDEZ

Anexo 8. Informe SST

INFORME COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONTRATO DE OBRA 1070-2022



BOGOTÁ D.C. ENERO 2024

CONTRATISTA:

	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA
ELABORÓ:	Prof. Tatiana Rocha M.	Insp. SST	
APROBÓ:	Ing. Jaime Herrera Osorio	Representante Legal	

INTERVENTORÍA:

	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA
APROBÓ:	Ing. Felipe Marín	Especialista SST	
REVISÓ:			

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 4
2.1 GESTIÓN DE PERSONAL 5
2.1.1 Afiliaciones y pagos al Sistema general de Seguridad Social 5
2.1.2 Ingresos y retiros 6
2.1.3 Seguimiento documentos y exámenes médicos ocupacionales 7
2.1.4 Entrega de dotación y elementos de protección personal 9
2.2 GESTIÓN DEL RIESGO 9
2.2.1 Permisos de trabajo para tareas de alto riesgo 10
2.2.2 Seguimiento Cumplimiento programa de inspecciones planeadas 10
2.2.3 Cumplimiento del Plan de Trabajo Anual y Capacitaciones realizadas en el periodo 10
2.2.4 INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD 12
2.3 SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN, MANTENIMIENTOS 13
2.4 PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD 14
3. PLAN DE EMERGENCIAS 14
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 15

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Información contractual del proyecto 4
Tabla 2. Correspondencia enviada área SST 5
Tabla 3. Correspondencia recibida área SST. 5
Tabla 4. Personal operativo promedio en obra.
(Fuente: Propia, 2024) 6
Tabla 5. Matriz de Seguimiento de Exámenes Médicos. (Fuente: Propia, 2023-2024) 9
Tabla 6. Listado de inspecciones programadas. (Fuente: Propia, 2024) 10
Tabla 7. Listado de capacitaciones programadas. (Fuente: Propia, 2024) 11
Tabla 8. Reporte de accidentes del periodo. (Fuente: Propia, 2024) 13

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe contiene una descripción de las principales actividades a realizar en la ejecución del proyecto y las realizadas desde el área de (seguridad y salud en el trabajo) SST en el tiempo comprendido entre el 28 de enero al 30 de enero de 2024, lo anterior para dar cumplimiento de los compromisos legales contractuales del CONSORCIO INGENIERÍA I identificado con NIT.901.639.134-0, en los cuales se establece la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, con el fin de velar y preservar por la salud y la seguridad e incentivar a cada uno de sus colaboradores a cumplir las buenas prácticas de autocuidado durante la ejecución del CONTRATO DE OBRA No. 1070-2022, el cual tiene como objeto **"REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, ASÍ COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN E INTERVENCIÓN DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT"**.

Razón Social	CONSORCIO INGENIERÍA I
NIT	901.639.134-0
Representante legal	Jaime Herrera Osorio
CC	79.655.971
Domicilio	Avenida Carrera 15 No 100 – 69 OFC. 508
Teléfono	(601) 755 09 85
Entidad Contratante	Secretaría Distrital Del Hábitat– Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Contratista	Consorcio Ingeniería I
Fecha de Inicio	15 Noviembre 2022
Fecha de Terminación	19 de abril de 2024
Número del Contrato	1070-2022
Plazo de ejecución	Ocho (8) meses

Objeto del Contrato	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, ASÍ COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN E INTERVENCIÓN DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT
Valor del Contrato:	$ 2.550.000.000

Tabla 1. Información contractual del proyecto

2. GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

A continuación, se describen las actividades ejecutadas en el periodo comprendido entre el veintiocho (28) de diciembre de 2023 al treinta 30 de enero del 2024.

En relación con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se realizó acompañamiento a los comités programados por interventoría o personal de supervisión del contrato.

También se realizaron las siguientes actividades:

- Supervisión de áreas
- Radicación de documentos ingreso de personal
- Inducciones de ingreso de personal
- Entrega de dotación
- Inspecciones de herramientas manuales
- Cerramiento de áreas de trabajo (Territorios T20, T 21 y T17)
- Instalación de PMT Territorios T20, T21 y T17
- Instalación de kit de emergencia (Botiquín, camilla)
- Instalación de punto ecológico
- Instalación de punto de hidratación
- Inspección de orden y aseo en territorios T20, T21 y T17
- Elaboración de MEDEVAC

No CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO
119	10/11/2023	CI-119 ENTREGAS HOJAS DE VIDA PERSONAL MÍNIMO
141	16/01/2024	ENTREGA DOCUMENTACIÓN SST PERSONAL PARA INGRESO A OBRA DE TERRITORIOS T20-T21
145	16/01/2024	OFICIO CI-145 - ENTREGA DE DOCUMENTOS PARQUES
146	19/01/2024	OFICIO CI-146 ENTREGA DOCUMENTACIÓN PERSONAL PARA INGRESO A OBRA
151	25/01/2024	OFICIO CI-150 - SOLICITUD CAMBIO DE RESIDENTES DE OBRA
156	29/01/2024	OFICIO CI-156 ENTREGA DOCUMENTACIÓN PERSONAL DE OBRA

Tabla 2. Correspondencia enviada área SST

No CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO

Tabla 3. Correspondencia recibida área SST.

2.1 GESTIÓN DE PERSONAL

2.1.1 Afiliaciones y pagos al Sistema general de Seguridad Social

La documentación fue validada con base en los lineamientos de las obligaciones contractuales como normativas; posteriormente fue radicada a la interventoría para su aprobación.

Los documentos radicados a la interventoría por trabajador fueron: afiliación ARL, EPS, caja de compensación, fondo de pensiones, examen médico ocupacional y planilla de

trabajadores independientes. **(Anexo 1)**

También se radicaron los documentos de los operarios de vehículos de volquetas y retroexcavadora.

A continuación, se relaciona el listado de los profesionales que han estado haciendo el acompañamiento y reconocimiento del sitio:

PERSONAL DE OBRA	No.	OBSERVACIONES
DIRECTOR	1	N/A
PROFESIONAL SST	1	N/A
RESIDENTE INGENIEROS CIVIL	2	N/A
APOYO RESIDENTE CIVIL	1	N/A
TRABAJADORA SOCIAL	1	N/A
INGENIERO AMBIENTAL	1	N/A
TOTAL	**7**	N/A

Tabla 4. Personal operativo promedio en obra.
(Fuente: Propia, 2024)

En la **Tabla No 5**., se encuentra el listado del personal y los soportes de pago al Sistema de Seguridad Social **(Anexo 2)**

2.1.2 Ingresos y retiros

A continuación, se relaciona el personal operativo de los diferentes territorios

PERSONAL ADMINISTRATIVO CONSORCIO INGENIERIA I				
ITEM	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FECHA DE INGRESO
1	Jaime Herrera	79655971	Director - R.L.	1/11/2023
2	Juan Gracia	19196565	Residente de obras	24/01/2024
3	Edwin Penagos	1031155174	Inspector tecnico	1/11/2023
4	David Lozada	1022372831	Ing. Ambiental	1/11/2023
5	Willintong Niño	79904525	Ing. Residente de obra	24/01/2024
6	Tatiana Rocha	1023897317	Profesional SST	1/11/2023
7	Yuli Patricia Pulido Najar	1030557560	Profesional Social	1/11/2023

PERSONAL PARQUES T20 Y T21				
ITEM	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FECHA DE INGRESO
1	Lemus Bernal Manuel Alejandro	1020715677	Encargado	15/01/2024
2	Perez Guatibonza Carlos Alberto	1020712879	Oficial de obra	15/01/2024
3	Barahona Wiliam Ricardo	79794584	Ayudante	16/05/2024
4	Lemus Bernal Miguel Angel	1020715676	Ayudante	15/01/2024
5	Higuera Bernal Jose David	1123566945	Ayudante	15/01/2024
6	Lemus Bernal Jeferson Steven	1013036337	Ayudante	18/01/2024
7	Lemus Vanegas Manuel Salvador	79157947	Oficial de obra	23/2/01/2024
8	Pallares Barlanoa Luis Jose	1052999971	Operario de maquina excavadora	22/01/2024

BASE DE DATOS WNM PARQUES - USME C17				
ITEM	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FECHA DE INGRESO
1	Montaño Ballen Jairo	3120997	Oficial	26/01/2024
2	Pachon Torres Diego Alejandro	3121681	Oficial	26/01/2024

2.1.3 Seguimiento documentos y exámenes médicos ocupacionales

Se anexan soportes de exámenes médicos, así como la matriz de recomendaciones médicas, con el fin de dar seguimiento y cumplimiento a dichas observaciones y recomendaciones en obra.

MATRIZ SEGUIMIENTO EXÁMENES MÉDICOS

CÓDIGO:
VERSIÓN: 1
Página 1 de 1

#	FECHA EXAMEN	TIPO DE EXAMEN	NUMERO DE IDENTIFICACIÓ	NOMBRES Y APELLIDOS	RECOMENDACIONES LABORALES	RECOMENDACIONES SST	SVE	RECOMENDACIONES MEDICAS	ACCIÓN
1	11/01/2024	Ingreso con enfasis en alturas	79794584	Barahona Wiliam Ricardo	Realizar control de optometria en su EPS Realizar pausas activas Estilos de vida saludable Evitar posturas prolongadas Ejercicio basico Uso de proteccion auditiva Valoracion por nutricionista en su EPS	Participar en las capacitaciones: estilos de vida saludable, pausas activas, solicitar cita medica general por EPS	Programa SVE visual Participación pausas activas Participación charlas estilo de vida saludable Uso adecuado de los epp	Estilos de vida saludable Evitar posturas prolongadas Ejercicio basico Valoracion por nutricionista en su EPS	N/A
2	11/01/2024	Ingreso con enfasis en alturas	1123566945	Higuera Bernal Jose David	Realizar control de optometria en su EPS Realizar pausas activas Estilos de vida saludable Evitar posturas prolongadas Ejercicio basico Uso de proteccion auditiva Valoracion por nutricionista en su EPS	Participar en las capacitaciones: estilos de vida saludable, pausas activas, solicitar cita medica general por EPS	Programa SVE visual Participación pausas activas Participación charlas estilo de vida saludable Uso adecuado de los epp	Estilos de vida saludable Evitar posturas prolongadas Ejercicio basico Valoracion por nutricionista en su EPS	N/A
3	18/01/2024	Ingreso con enfasis en alturas	1013036337	Lemus Bernal Jeferson Steven	Realizar control por optometriRealizar pausas activas Estilos de vida saludable Evitar posturas prolongadas. Ejercicio fisico Uso de protección auditoria Realizar valoración por nutrición en su EPS	Participar en las capacitaciones: estilos de vida saludable, pausas activas, solicitar cita medica general por EPS	Programa SVE visual Participación pausas activas Participación charlas estilo de vida saludable Uso adecuado de los epp	Estilos de vida saludable Evitar posturas prolongadas Ejercicio basico Valoracion por nutricionista en su EPS	N/A
4	15/11/2023	Ingreso con enfasis en alturas	1020715677	Lemus Bernal Manuel Alejandro	Realizar control por optometriRealizar pausas activas Estilos de vida saludable Evitar posturas prolongadas. Ejercicio fisico Uso de protección auditoria Realizar valoración por nutrición en su EPS	Participar en las capacitaciones: estilos de vida saludable, pausas activas, solicitar cita medica general por EPS	Programa SVE visual Participación pausas activas Participación charlas estilo de vida saludable Uso adecuado de los epp	Estilos de vida saludable Evitar posturas prolongadas Ejercicio basico Valoracion por nutricionista en su EPS	N/A
5	11/01/2024	Ingreso con enfasis en alturas	1020715676	Lemus Bernal Miguel Angel	Realizar control por optometriRealizar pausas activas Estilos de vida saludable Evitar posturas prolongadas. Ejercicio fisico Uso de protección auditoria Realizar valoración por nutrición en su EPS	Participar en las capacitaciones: estilos de vida saludable, pausas activas, solicitar cita medica general por EPS	Programa SVE visual Participación pausas activas Participación charlas estilo de vida saludable Uso adecuado de los epp	Estilos de vida saludable Evitar posturas prolongadas Ejercicio basico Valoracion por nutricionista en su EPS	N/A
6	26/01/2024	Ingreso con enfasis en osteomuscular	79157947	Lemus Vanegas Manuel Salvador	Usar correccion visual Valoración por EPS: nutrición y diabetica uso de EPP Pausas activas e higiene postural Habitos de estilo de vida saludable	Participar en las capacitaciones: estilos de vida saludable, pausas activas, solicitar cita medica general por EPS	Programa SVE visual Participación pausas activas Participación charlas estilo de vida saludable Uso adecuado de los epp	Estilos de vida saludable Evitar posturas prolongadas Ejercicio basico Valoracion por nutricionista en su EPS Ejercicioas de piernas para favorecer erl retorno venoso/vcumplir con el programa de seguridad y salud en el trabajo de la empresa, se recomienda bajar de peso, bajar el consumo de grasa, azucar y harinas Realizar actividad fisica vigorosa al menos 20 minutos diarios 3 dias a la semana Se recomienda realizar ejercicios cardiovasculares	N/A

MATRIZ SEGUIMIENTO EXÁMENES MÉDICOS									CÓDIGO: VERSIÓN: 1 Página 1 de 1
#	FECHA EXAMEN	TIPO DE EXAMEN	NUMERO DE IDENTIFICACIÓ	NOMBRES Y APELLIDOS	RECOMENDACIONES LABORALES	RECOMENDACIONES SST	SVE	RECOMENDACIONES MEDICAS	ACCIÓN
7	11/01/2024	Ingreso con enfasis en alturas	1020712879	Perez Guatibonza Carlos Alberto	Realizar control por optometriRealizar pausas activas Estilos de vida saludable Evitar posturas prolongadas. Ejercicio fisico Uso de protección auditoria Realizar valoración por nutrición en su EPS	Participar en las capacitaciones: estilos de vida saludable, pausas activas, solicitar cita medica general por EPS	Programa SVE visual Participación pausas activas Participación charlas estilo de vida saludable Uso adecuado de los epp	Estilos de vida saludable Evitar posturas prolongadas Ejercicio basico Valoracion por nutricionista en su EPS	N/A
8	21/01/2024	Ingreso	3120997	Montaño Ballen Jairo	Puede realizar labores en alturas control de optometria por la EPS Uso de lentes para laborar permanentes Control medico de rutinba EPS Higiene postural Realizar pausas activas Uso de EPP Uso obligatorio de proteccion auditiva	Participar en las capacitaciones: estilos de vida saludable, pausas activas, solicitar cita medica general por EPS	Ingresar al SVE Auditivo	Uso de medias antivarice preventivo Cuidado auditivo Control de Otorrinolalingologia y audiometria	Dar cumplimiento a la Resolución 692 dek 29 de abril de 2022
9	18/12/2023	Ingreso	3121681	Pachon Torres Diego Alexander	Puede realizar labores en alturas control de optometria por la EPS Uso de lentes Control medico de rutinba EPS Uso de medias antivarices Higiene postural Realizar pausas activas Uso de EPP Uso obligatorio de proteccion auditiva	Participar en las capacitaciones: estilos de vida saludable, pausas activas, solicitar cita medica general por EPS	Programa SVE visual Participación pausas activas Participación charlas estilo de vida saludable Uso adecuado de los epp	Valoración cirucia vascular	Dar cumplimiento a la Resolución 692 dek 29 de abril de 2022

Tabla 5. Matriz de Seguimiento de Exámenes Médicos. (Fuente: Propia, 2023-2024)

2.1.4 Entrega de dotación y elementos de protección personal

Se realizo entrega de dotación al personal de obra y administrativo con los colores distintivos de la empresa y/o lo establecido por el Manual de indumentaria del cliente (SECRETARIA DISTRITAL HÁBITAT). También se hizo entrega de los EPP correspondientes (casco, botas, guantes, protección auditiva, visual y respiratoria).

(Anexo 3)

2.2 GESTIÓN DEL RIESGO

Dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo presentado por el **CONSORCIO INGENIERÍA I,** se analizan los riesgos en obra desde el primer día de inicio de ejecución de actividades, entre ellas, riesgo psicosocial, inspecciones de terreno,

circulación peatonal, orden y aseo, inspección bodega oficina, herramientas manuales y eléctricas a usar, maquinaría para retiro de escombro y entrega de material.

2.2.1 Permisos de trabajo para tareas de alto riesgo

Para trabajos en alturas, se utilizarán los EPCC y EPP necesarios para realizar las actividades superiores a 2 metros de altura; también se harán las respectivas charlas de seguridad, diligenciamiento de ATS, permisos en alturas, verificación de cursos de alturas por la entidad emitida y ministerio de trabajo, igualmente verificación de examen medico ocupacional.

A la fecha no se han realizado este tipo de actividades.

2.2.2 Seguimiento Cumplimiento programa de inspecciones planeadas

Con el fin de orientar la identificación y manejo de condiciones inseguras o subestándar que puedan generar incidentes, accidentes o cualquier tipo de pérdidas en el proyecto, se llevó a cabo las siguientes inspecciones en el mes: **(Anexo 4).**

INSPECCIÓN	FRECUENCIA	PROGRAMADAS	EJECUTADAS	RESPONSABLE
Recursos de emergencia (Extintores, botiquín, camilla)	Mensual	X	X	SST
Inspecciones de áreas de trabajo, orden y aseo, locativas	Semanal	X	X	SST
Inspecciones preoperacionales, de herramientas manuales y herramientas eléctricas	Diario	X	X	SST

Tabla 6. Listado de inspecciones programadas. (Fuente: Propia, 2024)

2.2.3 Cumplimiento del Plan de Trabajo Anual y Capacitaciones realizadas en el periodo

Desde el primer día de inicio de actividades, se realizan las respectivas inducciones de prevención de riesgos y peligros en obra; también se realizan charlas de seguridad de acuerdo las actividades a realizar para dar cumplimiento a lo establecido en el Plan de Trabajo Anual y cronograma de capacitaciones. **(Anexo 5)**

Inducciones, charlas y capacitaciones

Este proceso se lleva a cabo con el personal tanto administrativo como operativo; se realizarán las inducciones con énfasis en las áreas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente: **(Anexo 6)**

TEMA	ÁREA	PROGRAMADOS	ASISTENCIA	OBSERVACIONES
Riesgo biológico	SST	6	6	Los trabajadores indican que deben correr la basura que la comunidad pone en diferentes puntos del perímetro de las obras
Orden y aseo en obra y bodega	SST	6	4	Se hace socialización de punto ecológico y orden y aseo en las obras (vías), cuando se retiren escombros
Punto de encuentro en caso de emergencia	SST	6	5	El punto de encuentro para los territorios T20, T21 Y T17 serán los mismos parques en un lado específico del mismo en donde se ubica la señalización.
Riesgo Psicosocial	SST	6	6	Se evidencia irrespeto de algunas personas de viviendas cercanas a los territorios T20 y T21 hacia los trabajadores de las obras

Tabla 7. Listado de capacitaciones programadas. (Fuente: Propia, 2024)

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo

Esta política está dentro de los anexos del SGSST, la cual se socializo en el momento de la inducción y se publico en el campamento T20 y T21 **(Anexo 7)**

Política de No Tabaco, Alcohol y Drogas

Esta política está dentro de los anexos del SGSST, la cual se socializo en el momento de la inducción a todo el personal de obra y administrativo que forma parte del proyecto, la cual se publicó en el campamento T20 y T21 **(Anexo 7)**

Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.

El Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial se publicó y se socializará con el personal según cronograma de capacitaciones y charlas. **(Anexo 7)**

Comité Paritario de Salud en el Trabajo – Vigía

Se realizará la respectiva convocatoria y reunión una vez al mes de acuerdo con la Resolución 2013 de 1986 y participará el personal de las diferentes obras que se tengan activas.

La conformación se realizará una vez se de inicio mínimo a tres territorios.

2.2.4 INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD

SEVERIDAD DE LOS ACCIDENTES LABORALES: Este indicador relaciona la severidad o número de días perdidos por accidentes de trabajo en un periodo de tiempo mensual de acuerdo con la normatividad, a partir de las incapacidades, frente a los días cargados en el mes y números de trabajadores.

FRECUENCIA DE LOS ACCIDENTES LABORALES: Este indicador relaciona la frecuencia de accidentes laborales en un periodo de tiempo mensual de acuerdo con la normatividad, a partir de los reportes de accidentes.

AUSENTISMO LABORAL: Desde el área de Seguridad y Salud en el Trabajo el ausentismo laboral está representado por la ausencia del trabajador a causa de incapacidades generadas por Enfermedad General, Accidentes laborales, accidentes comunes y/o Enfermedades laborales.

TABLA DE INDICADORES

FICHA TECNICA DEL INDICADOR			
1.NOMBRE (descripción del indicador)	**severidad de accidentalidad**	**frecuencia de accidentalidad**	**porcentajes de accidentes de trabajo mor**
2. FORMULA (método de cálculo)	Número de días perdidos por AT en el mes*Numero de días cargados en el mes/número de trabajadores en el mes *100	Número de accidentes detrabajo en el periodo/número de trabajadores en el periodo*100	Número de accidentes de trabajo mortale se presentaron en el periodo/ totales d accidentes de trabajo que se presentaron periodo*100
3.INTERPRETACIÓN DE INDICADOR	Por cada 100 trabajadores que laboraron en el mes de XX se perdieron X% días por accidentes de trabajo	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes de xx se presentaron X% accidentes de trabajo	En el mes XXX el % de accidentes de traba fueron mortales
META (límite de indicador)	0%	0%	0%
5. PERIODICIDAD	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL
6. FUENTE DE INFORMACIÓN	Número de trabajadores en el mes Número de accidentes de trabajo en el mes -Días de incapacidad en el mes por accidente de trabajo -Días cargados		- CARACTERIZACIÓN TABLA DIAS CARGADOS
7.PERSONAS QUE DEBEN CONOCER RESULTADO	Gerencia y trabajadores		
8. RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN	Profesional SST		

Tabla 8. Reporte de accidentes del periodo. (Fuente: Propia, 2024)

NOTA: A la fecha, los indicadores nos arrojan un valor de cero (0), en el reporte de accidentes del periodo comprendido.

2.3 SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN, MANTENIMIENTOS

Campamento

Se implementa la señalización en campamento - oficina y en los diferentes territorios, T17, T20 Y T21; dando cumplimiento al PMT. **(Anexo 7)**

Baños

Se realizará el aseo y la limpieza de manera frecuente mínimo dos veces por semana a los baños asignados en obra.

2.4 PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

De acuerdo con la lista de chequeo de la Resolución 666 del 24 de abril de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, se tendrán en cuenta las medidas generales que muestran mayor evidencia de contención de transmisión como son:

- Ventilación en áreas de trabajo cuando aplique
- Lavado de manos de manera permanente
- Distanciamiento social
- Uso de tapabocas si el trabajador presenta síntomas o ha tenido contacto con un positivo.

Además de lo anterior se verificará el cumplimiento de medidas complementarias como:

1. Procesos de limpieza y desinfección de herramientas, equipos, superficies y elementos de uso frecuente, en las áreas de trabajo (oficina)
2. Manejo de residuos y separación de estos de acuerdo con la actividad.
3. Ventilación de los espacios y cumplimiento de condiciones sanitarias.
4. Señalización de áreas, disposición de elementos de aseo y desinfección para los trabajadores y visitantes en general
5. Se realizan los componentes para mantener el distanciamiento social

3. PLAN DE EMERGENCIAS

Para el presente informe se realizaron charlas de prevención de desastres naturales en los diferentes territorios, socialización y énfasis de las medidas de prevención MEDEVAC, punto de encuentro en caso de emergencia, ubicación de kit de emergencia (camilla, botiquín y extintor**).**

Se realizo inspección de áreas y se realizará el plano correspondiente para evacuación de zonas de trabajo según los diferentes territorios**.** (ver anexo 7).

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se da cumplimiento con los requisitos de inicio de obra en cuanto a las inducciones de ingreso, charlas de seguridad, entrega de documentación y señalización de campamento en territorio T17, T20 y T21.

- En las inducciones realizadas, se socializa y se informa al personal que deben participar en las charlas y capacitaciones programadas en SST.

ANEXOS

1. **Documentos personal de obra**
2. **Planillas de seguridad social**
3. **Entrega de dotación y EPP**
4. **Inspecciones**
5. **Inducciones**
6. **Asistencias a charlas**
7. **MEDEVAC**
8. **Registros fotográficos**

Anexo 1. Documentos personal de obra



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.157.947
LEMUS VANEGAS

APELLIDOS
MANUEL SALVADOR

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 01-DIC-1961
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C. (CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.74 ESTATURA
O- G.S. RH
M SEXO

09-JUL-1982 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2024-01-19, 12:23:01 p.m. **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 68550192

Periodo Cotización 202401 **Periodo Servicio** 202401

PAGADA 2024-01-18 14:28:00.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Nombre	MANUEL SALVADOR LEMUS VANEGAS				
Documento	CC 79157947	**Dirección**	CARRERA 1 BIS # 167 -12		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3102264763		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 79157947		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01						LEMUS VANEGAS MANUEL SALVADOR	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	0	30	30	0			$ 1.160.000	NIN-AF		0 %	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	EPS017		12.5 %	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	14-7	5	6,960 %	$ 1.160.000	$ 80.800	CCF22	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
NINGUNA AFP	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	FAMISANAR EPS	SEGUROS BOLIVAR	COLSUBSIDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 80.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 225.800

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

EXPERTOS en PILA

PORSALUD S.A.S

Calle 145A # 94A 17 - PBX: 601-762603 - 601 - 7462753 - 3157096150 Bogotá
Kr 36 # 34 71 - Tel: 608 - 6458053 - 3165324324 Villavicencí - Meta
Página Web: www.porsaludips.com



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

N° 85871

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
26 DÍA	01 MES	2024 AÑO	BOGOTÁ (BOGOTÁ D.C., COLOMBIA) Ciudad	EVALUACIÓN MÉDICO OCUPACIONAL CON ENFASIS OSTEMUSCULAR DE INGRESO

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

PARTICULAR	PARTICULARES
Nombre de la empresa	Empresa en misión

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC: Cedula de Ciudadania, CE: Cedula de Extranjeria, TI: Tarjeta de Identidad, PT: Pasaporte)

LEMUS VANEGAS MANUEL SALVADOR	Genero	Edad	Documento de Identificación	
Apellidos y Nombres	MASCULINO	82 AÑOS 1 MESES 25 DÍAS	CC (Tipo)	79157947 (Número)

Cargo
OFICIAL

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

APTO SIN RESTRICCIONES LABORALES

Observaciones: *NO APLICA*

NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos)	N/A

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NINGUNA	NINGUNA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

EXAMÉN MÉDICO OCUPACIONAL CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR DE INGRESO ✓	----------

RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
USAR CORRECCIÓN VISUAL	USO DE EPP	ALIMENTACIÓN BAJA EN CARBOHIDRATOS Y DULCES
VALORACION POR EPS NUTRICION Y DIETETICA	PÁUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL	ALIMENTACIÓN RICA EN FIBRA, LÍQUIDOS Y VERDURAS
		ALIMENTACIÓN BAJA EN CARBOHIDRATOS Y DULCES
		ALIMENTACIÓN RICA EN FIBRA, LÍQUIDOS Y VERDURAS
		CONTROL DE PESO
		ACTIVIDAD FISICA AERÓBICA
		HACER DEPORTE
		DIETA BALANCEADA
		HÁBITOS SALUDABLES

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SE RECOMIENDA HIGIENE POSTURAL/EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTO DE PIERNAS PARA FAVORECER EL RETORNO VENOSO/REALIZAR PAUSAS ACTIVAS/CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA/EL TRABAJADOR NO PRESENTA ALTERACIONES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y NO REFIERE SINTOMATOLOGIA OSTEOMUSCULAR
SE RECOMIENDA. BAJAR DE PESO.
BAJAR EL CONSUMO DE GRASA, AZÚCAR Y HARINAS.
REALIZAR ACTIVIDAD FÍSICA VIGOROSA AL MENOS 20 MINUTOS DIARIOS 3 DÍAS A LA SEMANA.
SE BRINDA EDUCACION SOBRE HABITOS ALIMENTICIOS Y CUIDADOS GENERALES DE SALUD, SE RECOMIENDA REALIZAR EJERCICIOS CARDIOVASCULARES.
CITA DE NUTRICIONISTA EN EPS

(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento el doctor(a) abajo mencionado me ha ...uraleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las ... riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad ... mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas ... en este examen son completas y verídicas

...orizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completamente diligenciados en mi presencia y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Declaro que he dado información verdadera sobre mi estado de salud y mis antecedes personales que no he omitido ningún dato de importancia y autorizo al personal medico de la IPS a que se me practique el examen físico necesario. He leído y acepto los terminos de los consentimientos informados incluyendo (Venopuncion,HIV,PsicoActivas)...."De igual manera, certifico que he sido retroalimentado sobre los resultados de mi valoración médica ocupacional y las medidas de prevención que debo tomar"...

Médico		**Aspirante o Trabajador**	
Firma:		**Firma:**	
Nombre:	BOLIVAR HERNANDEZ ALEJANDRO	**Nombre:**	LEMUS VANEGAS MANUEL SALVADOR
R. M.:	3699-11 **L.S.O.:** 7317	**CC:**	79157947

PORSALUD S.A.S

Calle 145A # 94A 17 - PBX: 601-762603 - 601 - 7462783 - 3157096150 Bogotá
Kr 36 # 34 71 - Tel: 608 - 6458053 - 3165324324 Villavicencl - Meta
Página Web: www.porsaludips.com

RECOMENDACIONES

Paciente: LEMUS VANEGAS MANUEL SALVADOR

Fecha: 26/01/2024

Identificación: CC: 79157947

Fecha Nacimiento: 01/12/1961

Cargo: OFICIAL

Edad:

Género: MASCULINO

Estado Civil: CASADO(A)

Dirección: CRA 1 167 A 19

Ciudad: BOGOTÁ (BOGOTÁ D.C., COLOMBIA)

RECOMENDACIONES HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES

ACTIVIDAD FÍSICA AERÓBICA, CONTROL DE PESO, DIETA BALANCEADA, HÁBITOS SALUDABLES, HACER DEPORTE.
ALIMENTACIÓN BAJA EN CARBOHIDRATOS Y DULCES, ALIMENTACIÓN RICA EN FIBRA, LÍQUIDOS Y VERDURAS

RECOMENDACIONES OCUPACIONALES

PÁUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL, USO DE EPP

RECOMENDACIONES MÉDICAS

USAR CORRECCIÓN VISUAL. VALORACIÓN POR EPS: NUTRICION Y DIETETICA

NOMBRE DE LA PERSONA DE RECURSOS HUMANOS DE PARTICULARES	BOLIVAR HERNANDEZ ALEJANDRO **R. M.:** 3699-11 **L.S.O.:**	LEMUS VANEGAS MANUEL SALVADOR **RECIBIDO POR EL TRABAJADOR** **FIRMA DEL TRABAJADOR**


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 1.013.036.337

LEMUS BERNAL

APELLIDOS

JEFERSON STEVEN

NOMBRES

Jeferson

FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 18-MAY-2004

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.62
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

19-MAY-2022 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

INDICE DERECHO

P-1500150-01299167-M-1013036337-20220523 0079451999G 1 8504796539

Jeferson lemus 83A@gimeil.com
3228739716
maria lusdari lemus - 3134418289
EPS - Salud total
ARI - Positiva
Fondo de Pensiones - Porvenir

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	901401153
Número Afiliación:	419657
Razón social:	CONSTRUCCIONES AMBAR SAS

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	1013036337
Nombre:	JEFERSON STEVEN LEMUS BERNAL
Fecha Ingreso:	19/01/2024
Salario básico:	1,300,000
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	1
Centro de trabajo:	1
Tasa:	6.960
Fecha hora transacción:	18/01/2024 08:42:14 p.m.

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Salud Total EPS-S

No de Radicacion	Fecha de Radicación
4011598185	1|9|0|1|2|0|2|4

I. DATOS DEL TRÁMITE (Lea las instrucciones que se encuentran anexas al fromulario antes de diligenciarlo)

1.tipo de tramite	2.Tipo afiliacion	3.Regimen
A. Afiliación ☐ B.Reporte de Novedades ☒	B. Colectiva ☐ A. Individual: -Cotizante Cabeza de familia ☒ -Beneficiario afiliado adicional ☐ B. Institucional ☐ B. De oficio ☐	A.Contributivo ☒ B.Subsidiado ☐

4. Tipo de afiliado	5. Tipo de cotizante	Codigo (a registrar por la EPS)
A. Cotizante ☒ B. Cabeza de Familia ☐ C. Beneficiario ☐	A. Dependiente ☒ B. Independiente ☐ C. Pensionado ☐	1

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6.Apellidos y nombres			
LEMUS (Primer apellido)	BERNAL (Segundo apellido)	JEFERSON (Primer nombre)	STEVEN (Segundo nombre)
7.Tipo documento de Identidad	**8.Número del documento de Identidad**	**9.Sexo**	**10.Fecha de nacimiento**
CC	1013036337	Femenino ☐ Masculino ☒	1|8|0|5|2|0|0|4

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

11.Etnia	12.Discapacidad	13.Puntaje SISBEN	14.Grupo de poblacion especial
6	Tipo F N M Condicion T P		

15. Administradora de riesgos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingreso base de cotizacion - IBC
AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A	PORVENIR FPC	1300000

18.Residencia

Dirección	Telefono fijo	Telefono celular	Correo electronico
CR 11 183 A 45		3228739716	JEFERSONLEMUS83A@GMAIL.COM

Municipio/Distrito	zona	Localidad / comuna	Departamento
BOGOTA	Urbana ☒ Rural ☐		BOGOTA

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres completos			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
20. Tipo documento de identidad	**21. Número documento identidad**	**22. Sexo**	**23. Fecha de nacimiento**
		Femenino ☐ Masculino ☐	

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres				
	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	25. Tipo documento de identidad	26. Número de identidad	27.Sexo		28.Fecha de nacimiento
			Femenino	Masculino	
B1					
B2					
B3					
B4					
B5					

Datos complementarios

	29.Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad Tipo F	N	M	Condición T	P
B1							
B2							
B3							
B4							
B5							

32. Datos de residencia

	Municipio/Distrito	Zona Urbana	Zona Rural	Departamento	Teléfono Fijo y/o celular	33.Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

Seleccion de la IPS Primaria

		34. Nombre de la Institución Prestadora de Salud - IPS	Codigo de la IPS(a registrar por la EPS)
C		VS SEPTIMA AVENIDA - VS SEPTIMA AVENIDA	VSEPTIMAVE - VSEPTIMAVE
B		-	-
B		-	-
B		-	-

V. DATOS DE IDENTIFICACION DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACION COLECTIVA,INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de identificación	37. Numero de docuemnto de Identificación	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones(a registrar por la EPS)
CONSTRUCCIONES AMBAR S A S	NIT	901401153	01

39.Ubicación

Dirección	Teleéfono	Correo electrónico	Municipio/distrito	Departamento
CR 95 68 A 24	5679009	CONSTRUCCION.AMBAR@GMAIL.COM	BOGOTA	BOGOTA

No de Radicacion
4011598185

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- ☐ 1. Modificación datos básicos de identificación
- ☐ 2. Corrección datos básicos de identificación
- ☐ 3. Actualización documento de identidad
- ☐ 4. Actualización y/o corrección datos complementarios
- ☐ 5. Terminación de la inscripcion en la EPS.
  Código: ☐
- ☐ 6. Reinscripción en la EPS
- ☐ 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☒ 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- ☐ 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☐ 10. Terminación de la relacion laboral o perdida de las condiciones para seguir cotizando
- ☐ 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 13. Movilidad: ☐ A. Régimen Contributivo ☐ B. Régimen Subsidiado
- ☐ 14.Traslado: ☐ A. Mismo régimen ☐ B. Diferente régimen
- ☐ 15. Reporte de fallecimiento
- ☐ 16.Reporte del tramite de protección al cesante
- ☐ 17. Reporte de la calidad de pre-Pensionado
- ☐ 18. Reporte de la calidad del pensionado

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de la Identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de Identidad	Número documento de Identidad	Sexo	Fecha de nacimiento	42.Fecha
		Femenino ☐ Masculino ☐		1|9|0|1|2|0|2|4

43.EPS anterior	44.Motivo de traslado Código:	45.Caja de Compensación Familiar o pagador de pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- 46. ☐ Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- 47. ☐ Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributvo,Especial o de Excepción.
- 48. ☐ Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- 49. ☐ Declaración de no internación del cotizante,cabeza de familia ,beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Salud .
- 50. ☒ Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- 51. ☒ Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran
- 52. ☒ Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y el Decr eto 1377 de 2013
- 53. ☒ Autorización para que la EPS envie información al correo electronico o celular como mensaje de texto

VIII. FIRMAS

54. Cotizante o cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva institucional o de oficio
Jeferson	Daniel Gualteros. R

IX.ANEXOS

- ☐ 56.Anexo Copia del documento de identidad: CN. ☐ RC. ☐ TI. ☐ CC. ☐ PA. ☐ CE. ☐ CD. ☐ SC. ☐
  Cantidad: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ Total: 0
- ☐ 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- ☐ 58. Copia registro civil de matrimonio, o de la escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la union marital.
- ☐ 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio ,sentencia judicial para que declare la separación de cuerpos y escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la union marital.
- ☐ 60. Copia certificado de adopción o acta de entrega del menor
- ☐ 61.Copia orden judicial o acto administrativo de custodia.
- ☐ 62.Documento en que conste la perdida de la patria potestad, o el certificaco de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los padres.
- ☐ 63.Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
- ☐ 64.Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- ☐ 65.Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que consiste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial Código del municipio	Código del Departamento	67. Datos del SISBEN Número ficha	Puntaje	Nivel	68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación

70. Datos funcionario que realiza la validación Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de identidad	Número documento de identidad	71.Firma del funcionario

Observaciones

Recuerde que la firma, al final del formulario, valida las declaraciones marcadas y/o diligenciadas en el capitulo VII Declaraciones y IX. Autorizaciones, asi como la veracidad de las demás información registrada.

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR

NIT 800.144.331-3

CERTIFICA QUE:

JEFERSON STEVEN LEMUS BERNAL, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.013.036.337**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir y al Fondo de Cesantías Porvenir**.

La presente certificación se expide el 18 de Enero del 2024.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

CERTIFICACIÓN

La Caja de Compensación Familiar Cafam certifica que el (la) señor(a) **LEMUS BERNAL JEFERSON STEVEN, CC - 1013036337**, está afiliado(a) desde **18/01/2024**, como trabajador(a) de **CONSTRUCCIONES AMBAR SAS**, con NIT: **9014011538.**

Estado civil: **Soltero**
Cónyuge/Compañero(a): **NO REPORTA**
Categoría: **A**
Fecha de Ingreso a la Empresa: **19/01/2024**

Grupo familiar conformado por:

NOMBRE	No. Identificación	Parentesco
NO EXISTE REGISTRO	**-**	**-**

La presente certificación se expide en Bogotá D.C. a los **19 de enero de 2024** a solicitud del interesado

Cordialmente,

Luz Marina Teuta Ríos
Jefe Departamento Subsidio

Av. Cra. 68 No. 90-88 - Sede Administrativa La Floresta
PBX (57)1 646 8000 - cafam.com.co - Bogotá, Colombia

MEDIPLUS

DR. ALVARO ANDRES CARREÑO VELAZCO
MEDICO GENERAL, ESPECIALISTA EN GERENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
RESOLUCION No 0658 DE 2017

MEDIPLUS MEDIPLUS MEDIPLUS

CERTIFICADO DE APTITUD MEDICO LABORAL

INFORMACION GENERAL

FECHA Y LUGAR:	2024-01-18	BOGOTÁ	**EXAMEN:**	INGRESO CON ENFASIS EN ALTURA			
NOMBRE DEL PACIENTE:	LEMUS BERNAL JEFERSON STEVEN						
IDENTIFICACION:	CC 1013036337	**RH:**	O+	**EDAD:**	19,7	**GENERO:**	M
FECHA DE NACIMIENTO:	2004-05-18	**TELEFONO DE CONTACTO:**	3134418289				

INFORMACION LABORAL

EMPRESA EN MISION:	CONSTRUCCIONES AMBAR SAS	**NIT**	901401153-8
ESCOLARIDAD:	PRIMARIA	**CARGO A DESEMPEÑAR:**	AYUDANTE

EXAMENES PRACTICADOS

Evaluación médico ocupacional	X	Visiometría	X
Audiometría	X	Optometría	X
Osteomuscular	X	Espirometría	X

Exámenes de laboratorio:

Glicemia	Triglicéridos	Colesterol	Otros:
X	X	X	X

CONCEPTO MEDICO OCUPACIONAL

Presenta restricciones que le impida el desarrollo de la labor a realizar: NINGUNA

Apto para laborar en Alturas de acuerdo con la Resolución 4272: SI [X]

Apto para laborar en Espacios Confinados: SI [X] NO N/A

Apto para el cargo SI [X] NO N/A

OBSERVACIONES

Capacitación y certificación para trabajo seguro en alturas (Res 4272).

RECOMENDACIONES

* Realizar control por optometría en su EPS.
* Realizar pausas activas.
* Estilos de vida saludable
* Evitar posturas prolongadas. Ejercicio físico.
* Uso de protección auditiva.
* Realizar valoración por nutrición en su EPS.

INFORMACION ADICIONAL

Niega signos síntomas relacionados con el síndrome respiratorio (SARS-COVID19), niega morbilidades preexistentes que lo identifiquen como población en riesgo para (SARS-COVID19) según circular 030 del 2020

PROFESIONAL	PACIENTE	
Médico Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo U. de Buenos Aires Arg. FAN Y FUA **FIRMA Y SELLO** **NOMBRE DEL MEDICO: DR. ALVARO ANDRES CARREÑO VELAZCO**	**FIRMA:** Jeferson **NOMBRE:** LEMUS BERNAL JEFERSON STEVEN **DOCUMENTO:** CC 1013036337	HUELLA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.020.712.879**

PEREZ GUATIBONZA
APELLIDOS

CARLOS ALBERTO
NOMBRES

Carlos alberto perez G.
FIRMA



cll 167 I-36 este
Barrio soratama.
tel: 3219668921



FECHA DE NACIMIENTO **07-AGO-1985**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.50 ESTATURA | **A+** G.S. RH | **M** SEXO

11-MAR-2004 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1500150-00685345-M-1020712879-20150409 0043769809A 1 1243323295

Powered by CamScanner

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	901401153
Número Afiliación:	419657
Razón social:	CONSTRUCCIONES AMBAR SAS

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	1020712879
Nombre:	CARLOS ALBERTO PEREZ GUATIBONZA
Fecha Ingreso:	11/01/2024
Salario básico:	1,300,000
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	1
Centro de trabajo:	1
Tasa:	6.960
Fecha hora transacción:	10/1/2024 10:19:26 PM

Resultados del registro de novedades de reingreso

EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A.

Número de Solicitud 6l_2594376

Por favor imprima este comprobante como constancia de la novedad reportada.

Reingreso 1	
Empleador	NI 901401153 CONSTRUCCIONES AMBAR S.A.S
Afiliado	CC 1020712879 CARLOS ALBERTO PEREZ GUATIBONZA
Tipo de trabajador	1 Dependiente
Salario Base	$ 1,300,000
Cargo	OTRO
Sucursal	BOGOTA D.C. KRA 95 # 68 A 24
Fecha de ingreso	11/01/2024
Fecha de radicación	16/01/2024 05:17:36 p.m.
Código de Transacción	170846184
Resultado delReingreso 1	
Novedad aplicada con éxito	El período de inicio de pago es 02/2024

Fecha de generación 16/01/2024

Protección

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.229.739

Hace constar que:

El(la) Señor(a) **PEREZ GUATIBONZA CARLOS ALBERTO** identificado(a) con **CC** número **1.020.712.879** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 01 de junio de 2010 y sus recursos se encuentran en el **FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO**.

Esta constancia se expide a petición del interesado(a) el día 10 de enero de 2024.

Cordialmente,



Cesar Mauricio Aubad Echeverry
Equipo Soporte para Clientes

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:
Línea de servicio Protección: Bogotá: **744 44 64** - Medellín y Cali **510 90 99**
Barranquilla: **319 79 99** - Cartagena: **642 49 99** - Nacional **01 8000 52 8000**
www.proteccion.com

2024011014522

CERTIFICACIÓN

La Caja de Compensación Familiar Cafam certifica que el (la) señor(a) **PEREZ GUATIBONZA CARLOS ALBERTO, CC - 1020712879**, está afiliado(a) desde **12/01/2024**, como trabajador(a) de **CONSTRUCCIONES AMBAR SAS**, con NIT: **9014011538**.

Estado civil: **Soltero**
Cónyuge/Compañero(a): **NO REPORTA**
Categoría: **A**
Fecha de Ingreso a la Empresa: **11/01/2024**

Grupo familiar conformado por:

NOMBRE	No. Identificación	Parentesco
NO EXISTE REGISTRO	-	-

La presente certificación se expide en Bogotá D.C. a los **15 de enero de 2024** a solicitud del interesado

Cordialmente,

Luz Marina Teuta Ríos
Jefe Departamento Subsidio

MEDIC EXPERT

Siempre Pensado en tu Salud y en la de los Tuyos

DR. GLORIA LEONOR VEGA CORREDOR
MEDICO Y CIRUJANO ESPECIALISTA EN GERENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
RESOLUCION No 15-0425 DE 2019

CERTIFICADO DE APTITUD MEDICO LABORAL

INFORMACION GENERAL

FECHA Y LUGAR:	2024-01-11	**EXAMEN:**	INGRESO CON ENFASIS EN ALTURA		
NOMBRE DEL PACIENTE:		PEREZ GUATIBONZA CARLOS ALBERTO			
IDENTIFICACION:	1020712879	**RH:**	A+	**EDAD:** 39	**GENERO:** M
FECHA DE NACIMIENTO:	1985-08-07	**TELEFONO DE CONTACTO:**	3219668921		

INFORMACION LABORAL

EMPRESA EN MISION:	CONSTRUCCIONES AMBARA SAS	**NIT:**	901401153-8
ESCOLARIDAD:	PRIMARIA	**CARGO A DESEMPEÑAR:**	OFICIAL

EXAMENES PRACTICADOS

Evaluación médico ocupacional	X	Visiometría	X
Audiometría	X	Optometría	
Osteomuscular	X	Espirometría	

Examenes de laboratorio:

Glicemia [X] Trigliceridos [X] Colesterol [X] Otros: [X]

CONCEPTO MEDICO OCUPACIONAL

Presenta restricciones que le impida el desarrollo de la labor a realizar: NINGUNA

Apto para laborar en Alturas de acuerdo con la Resolucion 4272: SI [X] NO [ ] N/A [ ]

Apto para laborar en Espacios Confinados: SI [X] NO [ ] N/A [ ]

Apto para el cargo SI [X] NO [ ] N/A [ ]

OBSERVACIONES

Capacitacion y certificacion para trabajo seguro en alturas (Res 4272).

RECOMENDACIONES

*	Realizar control por optomeria en su EPS.	*	Realizar valoracion por nutricion en su EPS.
*	Realizar pausas activas.		
*	Estilos de vida saludable		
*	Evitar posturas prolongadas.		
*	Ejercicio fisico.		
*	Uso de proteccion auditiva.		

INFORMACION ADICIONAL

Niega signos sintomas relacionados con el sindrome respiratorio (SARS-COVID19), niega morbilidades preexistentes que lo identifiquen como poblacion en riesgo para (SARS-COVID19) según circular 030 del 2.020

PROFESIONAL	PACIENTE	
FIRMA Y SELLO Dra. Gloria L. Vega Médico Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo U. de Buenos Aires Arg.	**FIRMA:** Carlos alberto perez	HUELLA
NOMBRE DEL MEDICO: DR. GLORIA LEONOR VEGA CORREDOR	**NOMBRE:** PEREZ GUATIBONZA CARLOS ALBERTO	
	DOCUMENTO: 1020712879	


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.123.566.945

HIGUERA BERNAL

APELLIDOS

JOSE DAVID

NOMBRES

Jose David Higuera B.

FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 17-ENE-1998

FUENTE DE ORO
(META)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.80 O+ M

ESTATURA G.S. RH SEXO

26-ENE-2016 VISTA HERMOSA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

0046894160A 1 46044411

Dirección - Carrera 3 # 166-08 Barrio Soratama

Cel = 3204505754

Eps = Nueva Eps

ARL = Porvenir

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	901401153
Número Afiliación:	419657
Razón social:	CONSTRUCCIONES AMBAR SAS

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	1123566945
Nombre:	JOSE DAVID HIGUERA BERNAL
Fecha Ingreso:	11/01/2024
Salario básico:	1,300,000
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	1
Centro de trabajo:	1
Tasa:	6.960
Fecha hora transacción:	10/1/2024 10:04:49 PM

- ORIGINAL: E.P.S. - - 1a. COPIA: EMPLEADOR O ENTE TERRITORIAL -

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

"Código únicamente para dependientes y afiliaciones al Régimen Subsidiado"

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

nueva eps
gente cuidando gente
NIT 900.156.264-2

FORMULARIO VÍA WEB

I. DATOS DEL TRÁMITE

Lea atentamente las instrucciones antes de diligenciar este formulario

1. TIPO DE TRÁMITE: A. AFILIACIÓN [ ] B. REPORTE DE NOVEDADES [X]
2. TIPO DE AFILIACIÓN: A. Individual: a) Cotizante o cabeza de familia [X] b) Beneficiario o afiliado adicional [ ] B. Colectiva [ ] C. Institucional [ ] D. De oficio [ ]
3. RÉGIMEN: C. Contributivo [X] S. Subsidiado [ ]
4. TIPO DE AFILIADO: CO Cotizante [X] CF Cabeza de Familia [ ] BE Beneficiario [ ]
5. TIPO DE COTIZANTE: A. Dependiente [X] B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ] — Código — FECHA DE LA SOLICITUD: DÍA MES AÑO

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE
HIGUERA	BERNAL	JOSE	DAVID

7. TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD	8. NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD	9. SEXO	10. FECHA NACIMIENTO
R.C. [ ] T.I. [ ] C.C. [X] C.E. [ ] P.A. [ ] C.D. [ ] S.C. [ ]	1123566945	F [ ] M [X]	DÍA 17 MES 01 AÑO 1998

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

11. ORIGEN ÉTNICO (Código)	12. DISCAPACIDAD (Tipo / Condición)	13. PUNTAJE Y NIVEL DEL SISBEN	14. GRUPO DE POBLACIÓN ESPECIAL	15. ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
				COLPATRIA

16. ADMINISTRADORA DE PENSIONES	17. INGRESO BASE DE COTIZACIÓN - IBC	18. UBICACIÓN O DIRECCIÓN DE RESIDENCIA	ZONA U. / R.	LOCALIDAD / COMUNA	BARRIO
PORBENIR	1300000	Carrera 3 # 166 -08			

CIUDAD / MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	TELÉFONO FIJO	TELÉFONO MÓVIL	CORREO ELECTRÓNICO	CÓDIGO IPS
BOGOTA	BOGOTA		3204505754	josehiguera@gmail.com	

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

Datos de identificación del beneficiario (Cónyuge o compañero (a) permanente del cotizante)

19. APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE

20. TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD	21. NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD	22. SEXO	23. FECHA NACIMIENTO	CÓDIGO IPS
T.I. C.C. C.E. P.A. C.D.		F M	DÍA MES AÑO	

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

	24. APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS DE LOS BENEFICIARIOS	25. TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD	26. NÚMERO DE IDENTIDAD	27. SEXO F M	28. FECHA DE NACIMIENTO DÍA MES AÑO	29. PARENTESCO	30. ETNIA	31. DISCAPACIDAD Tipo	31. DISCAPACIDAD Condición
1		R.C. T.I. C.C. C.E. P.A. C.D. S.C.		F M				F. N. M.	T. P.
2		R.C. T.I. C.C. C.E. P.A. C.D. S.C.		F M				F. N. M.	T. P.
3		R.C. T.I. C.C. C.E. P.A. C.D. S.C.		F M				F. N. M.	T. P.
4		R.C. T.I. C.C. C.E. P.A. C.D. S.C.		F M				F. N. M.	T. P.

	32. DATOS DE RESIDENCIA: Ciudad / Mpio.	Departamento	Zona	Teléfono Fijo	Teléfono Móvil	33. VALOR UPC AFILIADO ADICIONAL (Lo diligencia la EPS)	34. Nombre de la institución prestadora de servicios de salud (IPS)	NIVEL DE SISBÉN	GRUPO POBLACIONAL
1			R. U.					I. II.	
2			R. U.					I. II.	
3			R. U.					I. II.	
4			R. U.					I. II.	

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o Razón Social	36. Tipo documento de identidad C.C. C.E. P.A. C.D.	37. Número documento de identidad	DV	38. Tipo de aportante a pagador de pensiones
CONSTRUCCIONES AMBAR S.A.S	X	901401153		

39. DIRECCIÓN	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	TELÉFONO FIJO	TELÉFONO MÓVIL	CORREO ELECTRÓNICO
CL 116 15 36	BOGOTA	BOGOTA		3017844934	jdgomezc94@gmail.com

FECHA INICIO DE RELACIÓN LABORAL	CARGO	SALARIO
DÍA 11 MES 01 AÑO 2024	AYUDANTE DE OBRA	1300000

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. TIPO DE NOVEDAD

1. MODIFICACIÓN DE DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN [ ]
2. CORRECCIÓN DE DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN [ ]
3. ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD [ ]
4. ACTUALIZACIÓN Y/O CORRECCIÓN DE DATOS COMPLEMENTARIOS [ ]
5. TERMINACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN EN LA EPS [ ] Código [ ]
6. REINSCRIPCIÓN EN LA EPS [ ]
7. INCLUSIÓN DE BENEFICIARIOS O DE AFILIADOS ADICIONALES [ ]
8. EXCLUSIÓN DE BENEFICIARIOS O DE AFILIADOS ADICIONALES [ ]
9. INICIO DE RELACIÓN LABORAL O ADQUISICIÓN DE CONDICIONES PARA COTIZAR [ ]
10. TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL O PERDIDA DE LAS CONDICIONES PARA SEGUIR COTIZANDO [ ]
11. VINCULACIÓN A UNA ENTIDAD AUTORIZADA PARA REALIZAR AFILIACIONES COLECTIVAS [ ]
12. DESVINCULACIÓN A UNA ENTIDAD AUTORIZADA PARA REALIZAR AFILIACIONES COLECTIVAS [ ]
13. MOVILIDAD [ ]
14. TRASLADO [ ]
15. [ ] CESANTE [ ]
16. [ ] PENSIONADO [ ]
17. RL [ ]
18. REP. [ ]

nueva eps — RECIBIDO PARA ESTUDIO EN LA EPS — NOMBRE — FIRMA — CLAVE MEDICO — FECHA

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE

TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD	NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD	SEXO F M	FECHA NACIMIENTO DÍA MES AÑO
R.C. T.I. C.C. C.E. P.A. C.D. S.C.		F M	

42. FECHA (a partir de) DÍA MES AÑO	43. EPS ANTERIOR Código	44. MOTIVO DE TRASLADO Código	45. CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR O PAGADOR DE PENSIONES

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

Declaración Juramentada de convivencia: Declaro que convivo con el(la) Señor(a) _____ identificado(a) con _____ No. _____ desde el día _____ del mes _____ del año _____

46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales: Declaro bajo la gravedad de juramento que el(los) Beneficiario(s) reportado(s) dependen económicamente de mí. [ ]
47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción. [ ]
48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acrediten la condición de beneficiarios. Anexo soporte de la Entidad [ ]
49. Declaración de no intermediación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud. [ ]
50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales. [ ]
51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigentes y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran. [ ]
52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013. [ ]
53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto. [ ]

VIII. FIRMAS

54. Firma del cotizante, cabeza de familia o beneficiario	55. Firma y sello del empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva institucional o de oficio
JOSE HIGUERA	MARTHA ESPITIA

IX. ANEXOS

56. Anexo copia del documento de identidad: CN [ ] RC [ ] TI [ ] CC [ ] PA [ ] CE [ ] CD [ ] SC [ ] Cantidad: [ ] Total [ ]

57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente. [ ]
58. Copia del registro civil de matrimonio, o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital. [ ]
59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital. [ ]
60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor. [ ]
61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia. [ ]
62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres. [ ]
63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. [ ]
64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas. [ ]
65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio. [ ]

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial	67. Datos del SISBÉN	68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación
Código del Municipio / Código del departamento	Número de ficha / Puntaje / Nivel	DÍA MES AÑO	DÍA MES AÑO

70. Datos del funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de identidad	Número del documento de identidad	71. Firma del funcionario

OBSERVACIONES:

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

01-01-F-009

- 2a. COPIA: AFILIADO -

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

JOSE DAVID HIGUERA BERNAL, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.123.566.945**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 10 de Enero del 2024.

Cordialmente,



Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

CERTIFICACIÓN

La Caja de Compensación Familiar Cafam certifica que el (la) señor(a) **HIGUERA BERNAL JOSE DAVID, CC - 1123566945**, está afiliado(a) desde **12/01/2024**, como trabajador(a) de **CONSTRUCCIONES AMBAR SAS**, con NIT: **9014011538**.

Estado civil: **Soltero**
Cónyuge/Compañero(a): **NO REPORTA**
Categoría: **A**
Fecha de Ingreso a la Empresa: **11/01/2024**

Grupo familiar conformado por:

NOMBRE	No. Identificación	Parentesco
NO EXISTE REGISTRO	-	-

La presente certificación se expide en Bogotá D.C. a los **13 de enero de 2024** a solicitud del interesado

Cordialmente,

Luz Marina Teuta Ríos
Jefe Departamento Subsidio

MEDIC EXPERT

Siempre Pensado en tú Salud y en la de los Tuyos

DR. GLORIA LEONOR VEGA CORREDOR
MEDICO Y CIRUJANO, ESPECIALISTA EN GERENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
RESOLUCION No 15-0425 DE 2019

CERTIFICADO DE APTITUD MEDICO LABORAL

INFORMACION GENERAL

FECHA Y LUGAR:	2024-01-11	**EXAMEN:**	INGRESO CON ENFASIS EN ALTURA		
NOMBRE DEL PACIENTE:		HIGUERA BERNAL JOSE DAVID			
IDENTIFICACION:	1123566945	**RH:**	O+	**EDAD:** 26	**GENERO:** M
FECHA DE NACIMIENTO:	1998-01-17	**TELEFONO DE CONTACTO:**	3204505754		

INFORMACION LABORAL

EMPRESA EN MISION:	CONSTRUCCIONES AMBARA SAS	**NIT:**	901401153-8
ESCOLARIDAD:	PRIMARIA	**CARGO A DESEMPEÑAR:**	OFICIAL

EXAMENES PRACTICADOS

Evaluación médico ocupacional	X	Visiometría	X
Audiometría	X	Optometría	
Osteomuscular	X	Espirometría	

Examenes de laboratorio:

Glicemia [X] Triglicéridos [X] Colesterol [X] Otros: [X]

CONCEPTO MEDICO OCUPACIONAL

Presenta restricciones que le impida el desarrollo de la labor a realizar: NINGUNA

Apto para laborar en Alturas de acuerdo con la Resolucion 4272: SI [X] NO [ ] N/A [ ]

Apto para laborar en Espacios Confinados: SI [X] NO [ ] N/A [ ]

Apto para el cargo SI [X] NO [ ] N/A [ ]

OBSERVACIONES

Capacitacion y certificacion para trabajo seguro en alturas (Res 4272).

RECOMENDACIONES

*	Realizar control por optomeria en su EPS.	*	Realizar valoracion por nutricion en su EPS.
*	Realizar pausas activas.		
*	Estilos de vida saludable		
*	Evitar posturas prolongadas.		
*	Ejercicio fisico.		
*	Uso de proteccion auditiva.		

INFORMACION ADICIONAL

Niega signos sintomas relacionados con el sindrome respiratorio (SARS-COVID19), niega morbilidades preexistentes que lo identifiquen como poblacion en riesgo para (SARS-COVID19) según circular 030 del 2.020

PROFESIONAL	PACIENTE	
FIRMA Y SELLO Dr. Gloria L. Vega Medico Especialista En Seguridad y Salud en el Trabajo Bajo Licencia Aires Art SAS Y FUS NOMBRE DEL MEDICO: DR. GLORIA LEONOR VEGA CORREDOR	FIRMA: Jose David Higuera B. NOMBRE: HIGUERA BERNAL JOSE DAVID DOCUMENTO: 1123566945	

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO **1.020.715.676**
LEMUS BERNAL

APELLIDOS
MIGUEL ANGEL

NOMBRES



FIRMA



EPS: Salud Total
Pensiones: porvenir
Tel: 3152324090
Contacto en Caso de: 3204114596 Ximena Diaz
Dirección: Kr 1Bis H 167A-12
virtuddemiqud@Hotmail.com



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **08-MAR-1985**
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 ESTATURA | **A+** G.S. RH | **M** SEXO

18-JUN-2004 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



A-1500150-00880686-M-1020715676-20170202 0053426886A 1 9996709685

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	901401153
Número Afiliación:	419657
Razón social:	CONSTRUCCIONES AMBAR SAS

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	1020715676
Nombre:	MIGUEL ANGEL LEMUS BERNAL
Fecha Ingreso:	11/01/2024
Salario básico:	1,300,000
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	1
Centro de trabajo:	1
Tasa:	6.960
Fecha hora transacción:	10/1/2024 10:24:30 PM

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Salud Total EPS-S

No de Radicacion	Fecha de Radicación
4011538223	1|1|0|1|2|0|2|4

I. DATOS DEL TRÁMITE (Lea las instrucciones que se encuentran anexas al fromulario antes de diligenciarlo)

1.tipo de tramite — A. Afiliación ☐ B.Reporte de Novedades ☒

2.Tipo afiliacion — B. Colectiva ☐ — A. Individual: -Cotizante Cabeza de familia ☒ -Beneficiario afiliado adicional ☐ — B. Institucional ☐ — B. De oficio ☐

3.Regimen — A.Contributivo ☒ B.Subsidiado ☐

4. Tipo de afiliado — A. Cotizante ☒ B. Cabeza de Familia ☐ C. Beneficiario ☐

5. Tipo de cotizante — A. Dependiente ☒ B. Independiente ☐ C. Pensionado ☐

Codigo (a registrar por la EPS): 1

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6.Apellidos y nombres			
LEMUS Primer apellido	BERNAL Segundo apellido	MIGUEL Primer nombre	ANGEL Segundo nombre
7.Tipo documento de Identidad	**8.Número del documento de Identidad**	**9.Sexo**	**10.Fecha de nacimiento**
CC	1020715676	Femenino ☐ Masculino ☒	0|8|0|3|1|9|8|5

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

11.Etnia	12.Discapacidad	13.Puntaje SISBEN	14.Grupo de poblacion especial
6	Tipo F N M — Condicion T P		

15. Administradora de riesgos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingreso base de cotizacion - IBC
AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A	PORVENIR FPC	1300000

18.Residencia

Dirección	Telefono fijo	Telefono celular	Correo electronico
CR 1 BIS 167 A 12		3152324090	VIRTUDDEMIGUEL@HOTMAIL.COM

Municipio/Distrito	zona	Localidad / comuna	Departamento
BOGOTA	Urbana ☒ Rural ☐		BOGOTA

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres completos			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
20. Tipo documento de identidad	**21. Número documento identidad**	**22. Sexo**	**23. Fecha de nacimiento**
		Femenino ☐ Masculino ☐	

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

	24. Apellidos y nombres			
	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	25. Tipo documento de identidad	26. Número de identidad	27.Sexo		28.Fecha de nacimiento
			Femenino	Masculino	
B1					
B2					
B3					
B4					
B5					

Datos complementarios

	29.Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad				
			Tipo			Condición	
			F	N	M	T	P
B1							
B2							
B3							
B4							
B5							

32. Datos de residencia

	Municipio/Distrito	Zona		Departamento	Teléfono Fijo y/o celular	33.Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
		Urbana	Rural			
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

Seleccion de la IPS Primaria

		34. Nombre de la Institución Prestadora de Salud - IPS	Codigo de la IPS(a registrar por la EPS)
C		VS CALLE 98 - UOD CPO CALLE 98	VSCALLE98 - UODCPOCAST
B		-	-
B		-	-
B		-	-

V. DATOS DE IDENTIFICACION DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACION COLECTIVA,INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de identificación	37. Numero de docuemnto de Identificación	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones(a registrar por la EPS)
CONSTRUCCIONES AMBAR S A S	NIT	901401153	01

39.Ubicación

Dirección	Teleéfono	Correo electrónico	Municipio/distrito	Departamento
CR 95 68 A 24	6000998	CONSTRUCCION.AMBAR@GMAIL.COM	BOGOTA	BOGOTA

No de Radicacion
4011538223

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- ☐ 1. Modificación datos básicos de identificación
- ☐ 2. Corrección datos básicos de identificación
- ☐ 3. Actualización documento de identidad
- ☐ 4. Actualización y/o corrección datos complementarios
- ☐ 5. Terminación de la inscripcion en la EPS. Código: ☐
- ☐ 6. Reinscripción en la EPS
- ☐ 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☒ 8. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- ☐ 9. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☐ 10. Terminación de la relacion laboral o perdida de las condiciones para seguir cotizando
- ☐ 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 13. Movilidad ☐ A. Régimen Contributivo ☐ B. Régimen Subsidiado
- ☐ 14.Traslado ☐ A. Mismo régimen ☐ B. Diferente régimen
- ☐ 15. Reporte de fallecimiento
- ☐ 16.Reporte del tramite de protección al cesante
- ☐ 17. Reporte de la calidad de pre-Pensionado
- ☐ 18. Reporte de la calidad del pensionado


VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de la identificación				
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre	
Tipo documento de identidad	Número documento de identidad	Sexo: Femenino ☐ Masculino ☐	Fecha de nacimiento	42.Fecha 1|1|0|1|2|0|2|4
43.EPS anterior	44.Motivo de traslado Código:	45.Caja de Compensación Familiar o pagador de pensiones		

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- 46.☐ Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- 47.☐ Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo,Especial o de Excepción.
- 48.☐ Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de documentos que acreditan la condición de beneficiarios
- 49.☐ Declaración de no internación del cotizante,cabeza de familia ,beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Salud .
- 50.☐ Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clinica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- 51.☒ Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran
- 52.☒ Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y el Decr eto 1377 de 2013
- 53.☒ Autorización para que la EPS envie información al correo electronico o celular como mensaje de texto

VIII. FIRMAS



54. Cotizante o cabeza de familia o beneficiario

Daniel Gualteros. R

55. El empleador aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva institucional o de oficio

IX.ANEXOS

- ☐ 56.Anexo Copia del documento de identidad. CN. ☐ RC. ☐ TI. ☐ CC. ☐ PA. ☐ CE. ☐ CD. ☐ SC. ☐ Cantidad: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ Total: 0
- ☐ 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- ☐ 58. Copia registro civil de matrimonio, o de la escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la union marital.
- ☐ 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio .sentencia judicial para que declare la separación de cuerpos y escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la union marital.
- ☐ 60. Copia certificado de adopción o acta de entrega del menor
- ☐ 61.Copia orden judicial o acto administrativo de custodia.
- ☐ 62.Documento en que conste la perdida de la patria potestad, o el certificaco de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los padres
- ☐ 63.Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
- ☐ 64.Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- ☐ 65.Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que consista la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial		67. Datos del SISBEN			68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación
Código del municipio	Código del Departamento	Número ficha	Puntaje	Nivel		

70. Datos funcionario que realiza la validación			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
Tipo documento de identidad	Número documento de identidad	71.Firma del funcionario	

Observaciones

Recuerde que la firma, al final del formulario, valida las declaraciones marcadas y/o diligenciadas en el capitulo VII Declaraciones y IX. Autorizaciones, asi como la veracidad de las demás información registrada.

Powered by CamScanner
