CONSORCIO INGENIERÍA I
NIT. 901.639.134 - 0

CL- 193

Bogotá D.C., Marzo 11 de 2024

CONSORCIO PROSPERAR BETHEL
Ing.: Claudia Del Pilar Suarez
Representante legal
Email: **csuarez@master.net.co**

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. 1070-2022, "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, ASÍ COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN E INTERVENCIÓN DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT".

ASUNTO: INFORME MENSUAL TÉCNICO Y AMBIENTAL NO. 8 - ETAPA I

Respetada ingeniera,

Por medio de la presente nos permitimos hacer entrega del Informe físico Mensual Componente Técnico y Ambiental No. 8 correspondiente al periodo entre el 14 y el 30 de Noviembre de 2023.

Atentamente,

Ingeniero JAIME HERRERA OSORIO
R/L CONSORCIO INGENIERÍA I

Proyectó : Ingeniero DAVID LEONARDO LOZADA CEDEÑO
Revisó : Ingeniero JAIME HERRERA OSORIO
Aprobó : Ingeniero JAIME HERRERA OSORIO
Anexo : Lo enunciado en ciento veintiséis (126) folios

CONSORCIO INGENIERÍA I
NIT. 901.639.134 - 0

CL- 194

Bogotá D.C., Marzo 11 de 2024

CONSORCIO PROSPERAR BETHEL
Ing.: Claudia Del Pilar Suarez
Representante legal
Email: **csuarez@master.net.co**

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. 1070-2022, "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, ASÍ COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN E INTERVENCIÓN DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT".

ASUNTO: INFORME MENSUAL TÉCNICO Y AMBIENTAL NO. 9 - ETAPA II

Respetada ingeniera,

Por medio de la presente nos permitimos hacer entrega del Informe físico Mensual Componente Técnico y Ambiental No. 9 correspondiente al periodo entre el 28 de diciembre 2023 al 29 de febrero de 2024.

Atentamente,

Ingeniero JAIME HERRERA OSORIO
R/L CONSORCIO INGENIERÍA I

Proyectó : Ingeniero DAVID LEONARDO LOZADA CEDEÑO
Revisó : Ingeniero JAIME HERRERA OSORIO
Aprobó : Ingeniero JAIME HERRERA OSORIO
Anexo : Lo enunciado en trecientos ochenta y dos (382) folios

CONSORCIO INGENIERÍA I
NIT. 901.639.134 - 0

CL- 195

Bogotá D.C., marzo 13 de 2024

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL
Sr: Héctor Edgar González
Barrio San Cristóbal Norte

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. 1070-2022, "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, ASÍ COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN E INTERVENCIÓN DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT".

ASUNTO: Respuesta PQR de petición de fecha 11 de marzo de 2024.

Por medio de la presente, nos permitimos dar respuesta a la PQR interpuesta el día 11 de marzo de 2024, por parte del señor Héctor Edgar González miembro de la junta de acción comunal, residente del barrio San Cristóbal Norte y usuario de la Acción de Acupuntura Urbana AAU-T22, los Olivos, en la cual realizó las siguientes apreciaciones:

> *<< Inconformidad con respecto de los elementos de hacer ejercicios de gimnasia. ya que su ubicación no es la adecuada para realizar dichos ejercicios por tener un espacio muy reducido, también miramos que está en una media luna que se diseñó para reuniones o conversatorios, por lo tanto, no se le está dando el uso adecuado al espacio. >>*
>
> *<< Aprovechando esta renovación del parque lo ideal es que se trasladen los elementos hacia el costado accidental, para poder aprovechar de una manera más efectiva el espacio dispuesto.>>*

Respuesta: En virtud de lo anterior nos permitimos informar en primera instancia al señor peticionario que los diseños de la Acción de Acupuntura Urbana AAUT-22, Los Olivos; fueron revisados, establecidos y aprobados por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) mediante el **Radicado IDRD No. 202361001085** en el marco de la ejecución del **Contrato de Consultoría No. 1280 de 2022** - **"CONCURSO PÚBLICO DE ARQUITECTURA PARA EL DISEÑO DE ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA".**

Por ende, el Consorcio Ingeniería I NO se encuentra facultado para realizar ajustes y/o modificaciones a los mismos, toda vez que los diseños del Territorio AAUT-22 cuenta con el aval por parte de la entidad pública distrital competente (IDRD) encargada de generar y fomentar los espacios para la recreación, el deporte, la actividad física y la sostenibilidad de los parques y escenarios en la ciudad de Bogotá D.C.

En segundo lugar, nos permitimos aclarar de manera respetuosa al señor Héctor Edgar González, que el Consorcio Ingeniería I No puede realizar cambios sin la

autorización de la entidad contratante y aval del IDRD, dado el alcance contractual del Contra de Obra No. 1070 de 2022, el cual únicamente contempla el desarrollo de las actividades constructivas concernientes al mantenimiento y mejoramiento del predio localizado en la dirección TV 8A BIS 164B 80 identificado con el CHIP catastral AAA0246YPZE y nombrado para los efectos del contrato de la referencia como AAU-T22.

Recuerde que tenemos a disposición los siguientes canales de atención a la comunidad:

Contratista: Consorcio Ingeniería I
Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 p.m. a 4:00 p.m.
Celular/WhatsApp: 302 686 36 22
Correo electrónico: chabitat.social@gmail.com

Atentamente,

Ingeniero JAIME HERRERA OSORIO
R/L CONSORCIO INGENIERÍA I

Proyectó : Ingeniero DAVID LEONARDO LOZADA CEDEÑO
Revisó : Ingeniero JAIME HERRERA OSORIO
Aprobó : Ingeniero JAIME HERRERA OSORIO
Anexo : Ninguno

CONSORCIO INGENIERÍA I
Nit. 901.639.134 - 0

CI-19696

Bogotá D.C., marzo 14 de 2024

Consorcio Prosperar Bethel
Ing: Claudia Del Pilar Suarez
Representante legal
Email: csuarez@master.net.co
Ciudad

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA NO. 1070-2022 - "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, ASÍ COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN E INTERVENCIÓN DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT."

ASUNTO: ENTREGA INFORME MENSUAL NO. 10 COMPONENTE AMBIENTAL.

Por medio de la presente nos permitimos enviar el Informe Mensual No. 10 del Componente Ambiental que comprende el periodo entre el 01 al 29 de febrero de 2024.

Atentamente,

Ingeniero JAIME HERRERA OSORIO
R/L CONSORCIO INGENIERIA I

Proyectó : Ingeniero DAVID LEONARDO LOZADA CEDEÑO
Revisó : Ingeniero JAIME HERRERA OSORIO
Aprobó : Ingeniero JAIME HERRERA OSORIO
Copia : CARPETA PROYECTO
Anexo : Lo enunciado en un (1) archivo magnético.

CONSORCIO INGENIERÍA I
NIT. 901.639.134 - 0

CI-197

Bogotá D.C., marzo 14 de 2024

CONSORCIO PROSPERAR BETHEL
Ing.: Claudia Del Pilar Suárez
Representante legal
Email: csuarez@master.net.co

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. 1070-2022, "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, ASÍ COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN E INTERVENCIÓN DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT".

ASUNTO: ENTREGA INFORME TÉCNICO MENSUAL NO. 10 ETAPA II

Respetada Ingeniera,

Por medio de la presente, nos permitimos hacer la entrega del informe mensual No. 10 en su componente técnico, correspondiente al periodo del 01 al 29 de febrero de 2024.

Cordialmente,

Ingeniero JAIME HERRERA OSORIO
R/L CONSORCIO INGENIERÍA I

Proyectó : Ingeniero DAVID LEONARDO LOZADA CEDEÑO
Revisó : Ingeniero JAIME HERRERA OSORIO
Aprobó : Ingeniero JAIME HERRERA OSORIO
Copia : CARPETA PROYECTO
Anexo : Lo enunciado en un (1) archivo magnético.

CONSORCIO INGENIERÍA I
NIT. 901.639.134 - 0

CI-198

Bogotá D.C., Marzo 19 de 2024

SEÑORES
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
ÁREA FINANCIERA
Email: jean.angarita@habitatbogota.gov.co
daniel.peralta@habitatbogota.gov.co
martha.duran@habitatbogota.gov.co

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. 1070-2022, "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, ASÍ COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN E INTERVENCIÓN DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT".

ASUNTO: SOLICITUD INFORMACIÓN TRAMITE DE PAGO - ETAPA I

Respetados señores,

Por medio de la presente de manera respetuosa nos dirigimos a ustedes para que se nos de información respecto al estado actual del pago de la Etapa I del contrato de la referencia, toda vez que la cuenta fue radicada en debida forma el día 25 de diciembre de 2023 como se logra evidenciar en el certificado adjunto al presente emitido por la plataforma JSP7. Sobra aclarar que el pago oportuno de las actas presentadas incide directamente en el flujo de caja y consecuentemente en la ejecución de las actividades constructivas de las acciones de acupuntura urbana priorizadas mediante el contrato de obra No. 1070-2022.

Cordialmente,

Ingeniero JAIME HERRERA OSORIO
R/L CONSORCIO INGENIERÍA I

Proyectó : Ingeniero DAVID LEONARDO LOZADA CEDEÑO
Revisó : Ingeniero JAIME HERRERA OSORIO
Aprobó : Ingeniero JAIME HERRERA OSORIO
Copia : CARPETA PROYECTO
Anexo : Certificado JSP7 (Acta Etapa I)

CONSORCIO INGENIERÍA I
NIT. 901.639.134 - 0

CI-198

Bogotá D.C., Marzo 19 de 2024

SEÑORES
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
ÁREA FINANCIERA
Email: jean.angarita@habitatbogota.gov.co
daniel.peralta@habitatbogota.gov.co
martha.duran@habitatbogota.gov.co

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. 1070-2022, "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, ASÍ COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN E INTERVENCIÓN DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT".

ASUNTO: SOLICITUD INFORMACIÓN TRAMITE DE PAGO - ETAPA I

Respetados señores,

Por medio de la presente de manera respetuosa nos dirigimos a ustedes para que se nos de información respecto al estado actual del pago de la Etapa I del contrato de la referencia, toda vez que la cuenta fue radicada en debida forma el día 25 de diciembre de 2023 como se logra evidenciar en el certificado adjunto al presente emitido por la plataforma JSP7. Sobra aclarar que el pago oportuno de las actas presentadas incide directamente en el flujo de caja y consecuentemente en la ejecución de las actividades constructivas de las acciones de acupuntura urbana priorizadas mediante el contrato de obra No. 1070-2022.

Cordialmente,

Ingeniero JAIME HERRERA OSORIO
R/L CONSORCIO INGENIERÍA I

Proyectó : Ingeniero DAVID LEONARDO LOZADA CEDEÑO
Revisó : Ingeniero JAIME HERRERA OSORIO
Aprobó : Ingeniero JAIME HERRERA OSORIO
Copia : CARPETA PROYECTO
Anexo : Certificado JSP7 (Acta Etapa I)

CONSORCIO INGENIERÍA I
NIT. 901.639.134 - 0

CI-199

Bogotá D.C., marzo 18 de 2024

CONSORCIO PROSPERAR BETHEL
Ing.: Claudia Del Pilar Suárez
Representante legal
Email: csuarez@master.net.co

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. 1070-2022, "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, ASÍ COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN E INTERVENCIÓN DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT".

ASUNTO: DOCUMENTOS PARA INGRESO DE PERSONAL – MANZANA DEL CUIDADO (MURALES)

Respetados señores,

Por medio de la presente, nos permitimos hacer la entrega de los documentos del personal que ejecutara las actividades de pintura en murales de la Manzana del Cuidado.

Cordialmente,

Ingeniero JAIME HERRERA OSORIO
R/L CONSORCIO INGENIERÍA I

Proyectó : Ingeniero DAVID LEONARDO LOZADA CEDEÑO
Revisó : Ingeniero JAIME HERRERA OSORIO
Aprobó : Ingeniero JAIME HERRERA OSORIO
Copia : CARPETA PROYECTO
Anexo : Lo enunciado en un (1) archivo magnético.

CONSORCIO INGENIERÍA I
NIT. 901.639.134 - 0

CI- 200

Bogotá D.C., marzo 19 de 2024

CONSORCIO PROSPERAR BETHEL
Ing.: Claudia Del Pilar Suarez
Representante legal
Email: csuarez@master.net.co

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. 1070-2022, "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, ASÍ COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN E INTERVENCIÓN DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT".

ASUNTO: ENTREGA INFORMES SEMANALES.

Respetada ingeniera,

Por medio de la presente nos permitimos hacer entrega de los informes semanales correspondientes a la Etapa II- Ejecución de Obra de los territorios AAU T17, AAU T20 , AAU T21 AAU T22 y Manzana de Cuidado, relacionados desde el periodo comprendido entre el 11 de marzo de 2024 hasta el 17 de marzo de 2024.

Atentamente,

Ingeniero JAIME HERRERA OSORIO
R/L CONSORCIO INGENIERÍA I

Proyectó : Ingeniero DAVID LEONARDO LOZADA CEDEÑO
Revisó : Ingeniero JAIME HERRERA OSORIO
Aprobó : Arquitecto ALBERTH FABIÁN VELASCO SANDOVAL
Copia : CARPETA PROYECTO
Anexo : Lo enunciado en (2) archivos magnéticos

CONSORCIO INGENIERÍA I
NIT. 901.639.134 - 0

CI-201

Bogotá D.C., Marzo 19 de 2024

CONSORCIO PROSPERAR BETHEL
Ing.: Claudia Del Pilar Suárez
Representante legal
Email: csuarez@master.net.co

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. 1070-2022, "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, ASÍ COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN E INTERVENCIÓN DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT".

ASUNTO: Entrega presupuesto frente AAU T22- LOS OLIVOS

Respetados señores,

Por medio de la presente, nos permitimos hacer entrega del presupuesto del frete AAU T22 Los Olivos, incluyendo el item 13,15 *Suministro y aplicación de pigmento para coloración acabado superficial de concretos, incluye sellador acrílico transparente*, solicitado por supervisión e interventoría en comité del 15 de marzo de 2024.

Se adjunta:

- Ficha técnica del producto – (Se especifica resistencia al desgaste y resistencia abrasión)
- Presupuesto AAU T22 Los Olivos

Quedamos atentos a su revisión y aprobación.

Cordialmente,

Ingeniero JAIME HERRERA OSORIO
R/L CONSORCIO INGENIERÍA I

Proyectó : Ingeniero DAVID LEONARDO LOZADA CEDEÑO
Revisó : Ingeniero JAIME HERRERA OSORIO
Aprobó : Ingeniero JAIME HERRERA OSORIO
Copia : CARPETA PROYECTO
Anexo : Ficha técnica Pigmento y presupueto

CI-202

Bogotá D.C., marzo 20 de 2024

Consorcio Prosperar Bethel
Ing: Claudia Del Pilar Suarez
Representante legal
Email: csuarez@master.net.co
Ciudad

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA NO. 1070-2022 - "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, ASÍ COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN E INTERVENCIÓN DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT."

ASUNTO: ENTREGA INFORME MENSUAL NO. 10 COMPONENTE AMBIENTAL VERSIÓN 1


Respetada Ingeniera,

En atención a su comunicación **SDHT-CBHT-00206-2024** de fecha 19 de marzo de 2024, nos permitimos adjuntar el informe mensual No. 10 – Componente Ambiental en su versión 1, para el periodo comprendido entre el 01 al 29 de febrero de 2024, con sus respectivas correcciones y observaciones:

Observación 1:	No se anexan vales de trasporte, facturas de compra, solicitudes o certificaciones de los proveedores de materiales pétreos.
Respuesta 1:	Se anexan los vales de transporte de materiales pétreos en el anexo 3. Control de materiales.
Observación 2:	Verificar la cantidad de Sardinel A-10, teniendo en cuenta que la tabla 13 registra 913 y la sumatoria en el formato FO-AC-53 registraría un valor de 912.
Respuesta 2:	Se realiza el ajuste en el formato FO-AC-53
Observación 3:	Se requiere adjuntar la documentación ambiental de los gestores de RCD: o Centro de Gestión Sostenible. o Servicios Profesionales AIA SAS.
Respuesta 3:	Se adjuntan la documentación ambiental solicitada en el anexo 4. Documentación ambiental gestores RCD y RESPEL.
Observación 4:	Se solicita complementar la tabla 25 con la vigencia de la revisión tecno mecánica y el SOAT.
Respuesta 4:	Se complementa la tabla 25 según observación.
Observación 5:	No se anexa documentos de las volquetas: SNF454, OFK039, VAF301 y GUQ485.
Respuesta 5:	Se actualiza la tabla 25 donde se dejan únicamente los vehículos que se utilizaron en el periodo del presente informe, excluyendo las volquetas de placas SNF454, OFK039, VAF301 e incluyendo el vehículo en el que se transportó el residuo peligroso resina de poleuretano (piso chip) del territorio T22. Los documentos de la volqueta GUQ485 y vehículo TDY592 se incluyen en el anexo 12. Documentos vehículos
Observación 6:	La volqueta GEV270, VAF301, QUP317, STR904, GUV485 no se encuentra el pin en la tabla de trasportadores inscritos marzo de 2024.
Respuesta 6:	Se realiza la validación en la última versión de los transportadores de RCD del 1 de marzo de 2024, encontrando: Volqueta GEV270: Se encuentra en la pág. 238, fila 9. PIN: 22810 Volqueta VAF301: Se encuentra en la pág. 229, fila 39 PIN: 21908 Volqueta QUP317: Se encuentra en la pág. 240, fila 53. PIN: 23081 Volqueta STR904: Se encuentra en la pág. 238, fila 28. PIN: 22844 **Volqueta GUV485: Se referencia una volqueta que no ha sido reportada en el informe.** La correcta es GUQ485: Se encuentra en la pág 238, fila 8. PIN: 22809

	La consulta realizada se adjunta al presente oficio.
Observación 7:	Verificar el pin de la volqueta QUP317 ya que se enuncia el 22844 y corresponde al 23081.
Respuesta 7:	Se actualiza la tabla con el pin 23081 para la volqueta de placas QUP317.
Observación 8:	En la Tabla 25. Vehículos transporte de RCD, se encuentra mal escrita la placa SBJ 441 ya que corresponde a la placa SBJ461.
Respuesta 8:	Se actualiza la tabla con la placa SBJ461.

Atentamente,



Ingeniero JAIME HERRERA OSORIO
R/L CONSORCIO INGENIERIA I

Proyectó : Ingeniero DAVID LEONARDO LOZADA CEDEÑO
Revisó : Ingeniero JAIME HERRERA OSORIO
Aprobó : Ingeniero JAIME HERRERA OSORIO
Copia : CARPETA PROYECTO
Anexo : Lo enunciado en un (1) archivo magnético.

CONSORCIO INGENIERÍA I
NIT. 901.639.134 - 0

CI-203

Bogotá D.C., Marzo 20 de 2024

CONSORCIO PROSPERAR BETHEL
Ing.: Claudia Del Pilar Suárez
Representante legal
Email: csuarez@master.net.co

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. 1070-2022, "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, ASÍ COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN E INTERVENCIÓN DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT".

ASUNTO: Entrega APU 13,15 Suministro y aplicación de pigmento

Respetados señores,

Por medio de la presente, nos permitimos hacer entrega del análisis de precios unitarios del ítem 13,15 *Suministro y aplicación de pigmento para coloración acabado superficial de concretos, incluye sellador acrílico transparente*, solicitado por supervisión e interventoría en comité del 15 de marzo de 2024 con el fin de cumplir con los detalles arquitectónicos y urbanos especificados por la consultoría del frente AAU T22- LOS OLIVOS.

Se adjunta:
- APU 13,15
- Tres (03) cotizaciones de los insumos del APU 13,15

Quedamos atentos a su revisión y aprobación.

Cordialmente,

Ingeniero JAIME HERRERA OSORIO
R/L CONSORCIO INGENIERÍA I

Proyectó : Ingeniero DAVID LEONARDO LOZADA CEDEÑO
Revisó : Ingeniero JAIME HERRERA OSORIO
Aprobó : Ingeniero JAIME HERRERA OSORIO
Copia : CARPETA PROYECTO
Anexo : APU 13,15 Y Cotizaciones Folios: 5

CONSORCIO INGENIERÍA I
NIT. 901.639.134 - 0

CI-204

Bogotá D.C., marzo 22 de 2024

CONSORCIO PROSPERAR BETHEL
Ing.: Claudia Del Pilar Suárez
Representante legal
Email: csuarez@master.net.co

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. 1070-2022, "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, ASÍ COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN E INTERVENCIÓN DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT".

ASUNTO: ENTREGA DE EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES, PERSONAL. MANZANA DEL CUIDADO (MURALES).

Respetados señores,

Por medio de la presente, nos permitimos hacer la entrega de los exámenes médicos ocupacionales del personal de los frentes según asunto en mención.

ITEM	NOMBRE
1	BARRERA DIEGO ORLANDO
2	BERNAL MENDEZ ANDRES LEONARDO
3	CASTAÑEDA LOZANO DABIAN GIONNARDY
4	CHAVES RAMIREZ JUAN DIEGO
5	GUTIERREZ RICO JORGE ANDRES
6	MARTINEZ FORERO BRAYAN ALEXIS
7	MONROY GARCIA YEFERSON ALEJANDRO
8	PALACIOS MOYA JOHAN STEVEN
9	ROBAYO PEDREROS LINA VEROMY
10	TOVAR OVIEDO NICOLAS CAMILO
11	VALENCIA ECHEVERRIA JUAN CARLOS
12	VILLAMIL FARFAN EDWARD

Cordialmente,

Ingeniero JAIME HERRERA OSORIO
R/L CONSORCIO INGENIERÍA I

Proyectó : Ingeniero DAVID LEONARDO LOZADA CEDEÑO
Revisó : Ingeniero JAIME HERRERA OSORIO
Aprobó : Ingeniero JAIME HERRERA OSORIO
Copia : CARPETA PROYECTO
Anexo : Lo enunciado en un (1) archivo magnético.

CONSORCIO INGENIERÍA I
NIT. 901.639.134 - 0

CI- 205

Bogotá D.C., Abril 3 de 2024

CONSORCIO PROSPERAR BETHEL
Ing.: Claudia Del Pilar Suarez
Representante legal
Email: csuarez@master.net.co

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. 1070-2022, "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, ASÍ COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN E INTERVENCIÓN DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT".

ASUNTO: SOLICITUD DE PRÓRROGA EN TIEMPO AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 1070 -2022.

Respetada ingeniera;

Como es de su conocimiento durante el desarrollo de la ***Etapa II (Ejecución de Obras)*** en cada una de las acciones de acupuntura urbana priorizadas mediante el contrato de la referencia han surgido situaciones imprevistas que han generado tiempos adicionales no imputables al Contratista Consorcio Ingeniería I, que han afectado el plazo inicialmente proyectado. En justificación de lo anterior nos permitimos relacionar cada una de las circunstancias y situaciones imprevistas y de fuerza mayor que han surgido hasta la fecha que soportan nuestra solicitud así:

IMPORTACIÓN DE JUEGOS INFANTILES:

Acorde con los tiempos estipulados (16 semanas) en los pliegos de condiciones para la etapa II- ejecución de obras, este NO concuerda con los tiempos estimados requeridos por el proveedor de los juegos importados requeridos y aprobados por el IDRD necesarios para su fabricación, importación, nacionalización, tránsito e instalación de estos, como se sustenta en lo siguiente:

- En los documentos que hacen parte integral del contrato se establece que la Etapa I – Estudios y Diseños, se compone de dos fases como se enuncia en el documento ANEXO TÉCNICO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y/O ENTREGA DEL BIEN.

  Específicamente para la Fase 2, es perentorio contar con los trámites y obtención de permisos ante las entidades pertinentes (SDA, IDU, SDP, JBB, IDRD, DADEP y otras).

  En virtud de lo anterior por parte del IDRD se dio aval y aprobación a los proyectos específicos AAUT17, AAUT20 y AAUT21 mediante las resoluciones No. 1721 No. 1239 y No. 1223.

- De acuerdo con las resoluciones de aprobación relacionadas previamente, se requiere la implementación de **JUEGOS INFANTILES IMPORTADOS** acorde con las especificaciones técnicas y diseños aprobados por el IDRD.

- Que conforme concepto del proveedor, para la ejecución de las actividades de obra y la fabricación, importación, nacionalización, tránsito e instalación de los juegos importados se requieren 20 semanas.

- De igual forma nos permitimos precisar que para la fecha de reinicio del Contrato (28/12/2023) No fue posible realizar la operación y adquisición de los **JUEGOS INFANTILES IMPORTADOS** ya que durante el periodo comprendido entre el 28 de diciembre de 2023 y 8 de enero de 2024 por cierre de actividades laborales el proveedor detuvo sus actividades imposibilitando la pronta y oportuna orden de compra por parte del contratista de obra, siendo así que hasta el día 15 de enero de 2024 se logró formalizar dicha negociación con el proveedor de los **JUEGOS INFANTILES IMPORTADOS,** ocasionando un retraso de 15 días que afectó directamente el tiempo estimado inicial, configurando una condición de fuerza mayor en tanto que existe una aprobación por parte del IDRD y se debe dar cabal cumplimiento a una especificación técnica y los tiempos de la misma superan los previstos para la ejecución de la Etapa II (Ejecución de Obras) inicialmente proyectados en el pliego de condiciones del Contra de Obra No. 1070 de 2022, siendo estos tiempos adicionales No imputables al Contratista De Obra.

ACCIÓN DE ACUPUNTURA URBANA AAU-T17 – ZONA DE EQUIPAMIENTO COMUNAL CARTAGENA.

- De acuerdo con el proceso constructivo propuesto por el contratista de obra para el Sistema Urbano de Drenaje Urbano Sostenible (SUDS) – Zona de Bio-retención, en consideración de las especificaciones técnicas del mismo aprobadas mediante Acta WR 1331A de fecha 5 de diciembre de 2023 y en virtud del cumplimiento de la norma NS- 166 (Criterios para diseño y construcción de sistemas urbanos de drenaje sostenible), en la cual se establece que las zonas de bio-retención son áreas ajardinadas con capacidad de almacenar temporalmente la escorrentía y promover la infiltración de ésta, es decir que no son sistemas confinados y permiten el flujo entre zonas verdes adyacentes, controlando así de este modo la escorrentía dando origen a un sistema permeable para el manejo de eventos mayores a los de diseño.

  En el territorio identificado como AAUT17 - ZONA DE EQUIPAMIENTO COMUNAL CARTAGENA, el contratista de obra tuvo que realizar una excavación a una profundidad mayor a la inicialmente planteada para el área del SUDS – Zona de Bio-Retención, exactamente 1,80 m. Toda vez que se evidenciaron suelos de relleno con trazas de contaminantes a la profundidad mínima de diseño, adicionalmente también se encontraron a una profundidad de 1,50 m estratos de suelo arcilloso bajo el área del SUDS, los cuales por sus características físicas inhiben el flujo de agua generando un sistema confinado impermeable. Actividad que generó tiempos adicionales en su construcción, afectando negativamente al Consorcio Ingeniería I en el rendimiento ya que se debió constatar en compañía de la interventoría la profundidad definitiva de intervención y verificar el método constructivo nuevamente con los profesionales de diseño, lo cual tomó un tiempo adicional de 10 días.

  Una vez avalada la profundidad de fundación se procedió con el sistema de mejoramiento, suministro e instalación de una capa filtrante adicional y construcción de un concreto ciclópeo con el fin de cumplir las determinantes de la normatividad vigente y en pro del recibo a satisfacción por parte de la SDA e IDRD, la realización de estas actividades complementarias generó tiempos adicionales en la construcción de

la Zona de Bio-retención propuesta debido a su complejidad y robustez, afectado así de este modo el tiempo inicial proyectado en 20 días.

ACCIÓN DE ACUPUNTURA URBANA AAU-T20 – PATIO BONITO II SECTOR A

- En el territorio identificado como AAUT20 – PATIO BONITO II SECTOR A, el contratista de obra tuvo que realizar una excavación a una profundidad mayor a la inicialmente planteada para el área del SUDS – Zona de Bio-Retención, toda vez que se evidenciaron suelos de relleno con trazas de contaminantes a la profundidad mínima de diseño, lo anterior afectando negativamente al Consorcio Ingeniería I en el rendimiento ya que se debió constatar en compañía de la interventoría la profundidad definitiva de intervención y verificar el método constructivo nuevamente con los profesionales de diseño. Actividad que generó tiempos adicionales en su construcción en 10 días más.

  Una vez avalada la profundidad de fundación se procedió con el sistema de mejoramiento y suministro e instalación de una capa filtrante adicional, con el fin de cumplir las determinantes de la normatividad vigente y en pro del recibo a satisfacción por parte de la SDA e IDRD, la inclusión de estas actividades complementarias generó tiempos adicionales en la construcción de la Zona de Bio-retención aproximadamente el tiempo transcurrido es de 20 días.

ACCIÓN DE ACUPUNTURA URBANA AAU-T21 – PATIO BONITO II SECTOR C

- En el territorio identificado como AAUT21– PATIO BONITO II SECTOR A, la construcción del SUDS – zona de bio-retención se vio afectada por la intersección con estructuras hidráulicas encontradas hasta el momento de realizar la excavación, generando la necesidad de ejecutar actividades complementarias de protección y hasta la ampliación del área del mismo para no generar interferencias con otros sistemas existentes, situación que conllevo un tiempo adicional de 15 días.

ACCIÓN DE ACUPUNTURA URBANA AAU-T22 – LOS OLIVOS

- En el territorio identificado como AAUT22 se presentaron circunstancias que demandaron tiempos adicionales que retrasaron el inicio del frente de obra y así mismo afectaron la ejecución de las actividades constructivas, ya que inicialmente fue necesario verificar las especificaciones técnicas especiales del territorio toda vez que el diseño del mismo fue realizado por un consultor externo al Consorcio Ingeniería I.

  Tal como las placas de contrapiso, las cuales tienen un pigmento de coloración morado en alusión a la Manzana del Cuidado, dicha especificación fue debatida en comité de obra junto con la supervisión e interventoría, en donde se contemplaron varias alternativas para cumplir con la especificación tales como pintura epóxica para pisos, pigmentos líquidos y pigmentos en polvo, evaluando su durabilidad y su equivalencia costo beneficio.

  Finalmente se concluyó que la tonalidad o acabado morado en las placas de contrapiso, se debía ejecutar mediante la aplicación de un pigmento en polvo referencia C152, por ende en cumplimiento de las obligaciones contractuales se

presentó el balance para aprobación; adicionalmente, los proveedores del producto tomaron 15 días para preparación y despacho del producto por ser una tonalidad especial, ocasionando retrasos en la programación y ejecución de la actividad de placas de contrapiso, la cual se pudo realizar tan solo hasta el 26 de marzo de 2024 afectando drásticamente el tiempo inicial establecido para acción de acupuntura urbana AAU-T22.

En virtud de lo manifestado previamente y teniendo en cuenta la necesidad de terminar las actividades propias de la etapa II (ejecución de obras), se hace necesario contemplar un tiempo adicional de treinta (30) días para la etapa en mención, los cuales se contarán a partir del 20 de abril de 2024 con el objetivo de realizar la entrega a satisfacción de las acciones de acupuntura urbana a la Secretaría Distrital Del Hábitat, de este modo asegurando la estabilidad, calidad y requisitos técnicos establecidos en las aprobaciones otorgadas por las entidades públicas tales como Instituto Distrital de Recreación y Deporte, Secretaría Distrital de Ambiente y Secretaría Distrital de la Mujer.

Así las cosas, el Consorcio Ingeniería I de manera respetuosa solicita una ampliación de tiempo y/o prorroga al plazo de ejecución actual del Contrato de Obra No 1070 de 2022 por un tiempo adicional de treinta (30) días calendario; tiempo necesario para la terminación de las actividades de la ***Etapa II - Ejecución de Obras*** de los territorios AAUT-17, AAUT20, AAUT21 y AAUT22, con fundamento en las circunstancias anteriormente mencionadas

Igualmente manifestamos que como consecuencia de la prórroga solicitada no se generarán costos adicionales por mayor permanencia ni de ninguna naturaleza al contrato de obra.

Agradecemos de antemano el recibo positivo a nuestra solicitud la cual sin duda alguna redundará en la calidad de vida de la comunidad beneficiada.

Cordialmente,

Ingeniero JAIME HERRERA OSORIO
R/L CONSORCIO INGENIERÍA I

Proyectó : Ingeniero DAVID LEONARDO LOZADA CEDEÑO
Revisó : Ingeniero JAIME HERRERA OSORIO
Aprobó : Arquitecto ALBERTH FABIÁN VELASCO SANDOVAL
Copia : CARPETA PROYECTO
Anexo : Ninguno

CONSORCIO INGENIERÍA I
NIT. 901.639.134 - 0

CI- 205

Bogotá D.C., Abril 4 de 2024

CONSORCIO PROSPERAR BETHEL
Ing.: Claudia Del Pilar Suarez
Representante legal
Email: csuarez@master.net.co

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. 1070-2022, "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, ASÍ COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN E INTERVENCIÓN DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT".

ASUNTO: SOLICITUD DE PRÓRROGA EN TIEMPO AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 1070 -2022.

Respetada ingeniera;

Como es de su conocimiento durante el desarrollo de la ***Etapa II (Ejecución de Obras)*** en cada una de las acciones de acupuntura urbana priorizadas mediante el contrato de la referencia han surgido situaciones imprevistas que han generado tiempos adicionales no imputables al Contratista Consorcio Ingeniería I, que han afectado el plazo inicialmente proyectado. En justificación de lo anterior nos permitimos relacionar cada una de las circunstancias y situaciones imprevistas y de fuerza mayor que han surgido hasta la fecha que soportan nuestra solicitud así:

ACCIÓN DE ACUPUNTURA URBANA AAU-T17 – ZONA DE EQUIPAMIENTO COMUNAL CARTAGENA.

- De acuerdo con el proceso constructivo propuesto por el contratista de obra para el Sistema Urbano de Drenaje Urbano Sostenible (SUDS) – Zona de Bio-retención, en consideración de las especificaciones técnicas del mismo aprobadas mediante Acta WR 1331A de fecha 5 de diciembre de 2023 y en virtud del cumplimiento de la norma NS- 166 (Criterios para diseño y construcción de sistemas urbanos de drenaje sostenible), en la cual se establece que las zonas de bio-retención son áreas ajardinadas con capacidad de almacenar temporalmente la escorrentía y promover la infiltración de ésta, es decir que no son sistemas confinados y permiten el flujo entre zonas verdes adyacentes, controlando así de este modo la escorrentía dando origen a un sistema permeable para el manejo de eventos mayores a los de diseño.

  En el territorio identificado como AAUT17 - ZONA DE EQUIPAMIENTO COMUNAL CARTAGENA, el contratista de obra tuvo que realizar una excavación a una profundidad mayor a la inicialmente planteada (1,0 m) para el área del SUDS – Zona de Bio-Retención, exactamente 1,80 m. Toda vez que al momento de ejecutar las excavaciones correspondientes al área del SUDS se encontraron suelos de relleno con trazas de contaminantes a la profundidad mínima de diseño, adicionalmente también se encontraron a una profundidad de 1,50 m estratos de suelo arcilloso bajo el área del SUDS, los cuales por sus características físicas inhiben el flujo de agua generando un sistema confinado impermeable. Actividad que generó tiempos adicionales en su construcción, afectando negativamente al Consorcio Ingeniería I en el rendimiento ya que se debió constatar en compañía de la interventoría la profundidad definitiva de

intervención y verificar el método constructivo nuevamente con los profesionales de diseño, hecho que prolongo la construcción del SUDS en 10 días.

Adicionalmente a los diez días descritos anteriormente se requirió realizar un sistema de mejoramiento del suelo mediante una capa de rajón, suministro e instalación de una capa filtrante adicional y construcción de un concreto ciclópeo con el fin de cumplir las determinantes de la normatividad vigente y en pro del recibo a satisfacción por parte de la SDA e IDRD. la realización de estas actividades complementarias prolongo el tiempo inicial proyectado en 20 días, por lo tanto, el tiempo adicional tomado para la construcción de los SUDS fue de 30 días.

ACCIÓN DE ACUPUNTURA URBANA AAU-T20 – PATIO BONITO II SECTOR A

- En el territorio identificado como AAUT20 – PATIO BONITO II SECTOR A, el contratista de obra tuvo que realizar una excavación a una profundidad mayor de 1,60m a la inicialmente planteada (1,0m) para el área del SUDS – Zona de Bio-Retención, Toda vez que al momento de ejecutar las excavaciones correspondientes al área del SUDS se encontraron suelos con trazas de contaminantes a la profundidad mínima de diseño, lo anterior afectando negativamente al Consorcio Ingeniería I en el rendimiento ya que se debió constatar en compañía de la interventoría la profundidad definitiva de intervención y verificar el método constructivo nuevamente con los profesionales de diseño, hecho que prolongo la construcción del SUDS en 10 días.

  Adicionalmente a los diez días descritos anteriormente se requirió realizar un sistema de mejoramiento del suelo mediante una capa de rajón, suministro e instalación de una capa filtrante adicional, con el fin de cumplir las determinantes de la normatividad vigente y en pro del recibo a satisfacción por parte de la SDA e IDRD, la realización de estas actividades complementarias prolongo el tiempo inicial proyectado en 20 días, por lo tanto, el tiempo adicional tomado para la construcción de los SUDS fue de 30 días.

ACCIÓN DE ACUPUNTURA URBANA AAU-T21 – PATIO BONITO II SECTOR C

- En el territorio identificado como AAUT21– PATIO BONITO II SECTOR A, la construcción del SUDS – zona de bio-retención se vio afectada por la interferencia con estructuras hidráulicas encontradas en el momento de realizar la actividad de excavación, las estructuras corresponden a dos pozos en concreto macizo, tubería en Gress, caja de inspección y sistemas de drenaje en gress. Por lo tanto, fue necesario ejecutar actividades complementarias, en primer lugar, se debió realizar la demolición de una de las estructuras existentes que no se encontraba en funcionamiento caja de inspección en concreto macizo, esta actividad prolongo el tiempo de construcción del SUDS en 15 días, posterior el Consorcio Ingeniería I debió realizar la protección de las otras estructuras tiempo que tomo 5 días adicionales a los 15 días ya descritos para poder conseguir la ampliación del área SUDS, incrementado el tamaño inicial planteado. la ampliación del área del SUDS debido a las interferencias encontradas y con el fin de asegurar el buen funcionamiento del sistema de drenaje urbano sostenible se prolongó en 10 días en consideración de la nueva área de intervención, que tuvo que ser replanteada, consolidada con los especialistas de diseño y verificada por la interventoría en pro de del recibo a satisfacción por parte de la SDA e IDRD.

En conclusión, es claro que el tiempo adicional invertido por el Consorcio Ingeniería I para la atención de las distintas circunstancias imprevistas y de fuerza mayor acontecidas y necesarias para la correcta terminación de las acciones de acupuntura urbana fue 30 días, de este modo se asegura la estabilidad, funcionamiento y recibo a satisfacción por parte del IDRD y SDA.

En virtud de lo manifestado previamente y teniendo en cuenta la necesidad de terminar las actividades propias de la etapa II (ejecución de obras), se hace necesario contemplar un tiempo adicional de treinta (30) días para la etapa en mención, los cuales se contarán a partir del 20 de abril de 2024 con el objetivo de realizar la entrega a satisfacción de las acciones de acupuntura urbana a la Secretaría Distrital Del Hábitat, de este modo asegurando la estabilidad, calidad y requisitos técnicos establecidos en las aprobaciones otorgadas por las entidades públicas tales como Instituto Distrital de Recreación y Deporte, Secretaría Distrital de Ambiente y Secretaría Distrital de la Mujer.

Así las cosas, el Consorcio Ingeniería I de manera respetuosa solicita una ampliación de tiempo y/o prorroga al plazo de ejecución actual del Contrato de Obra No 1070 de 2022 por treinta (30) días calendario; tiempo necesario para la terminación de las actividades de la ***Etapa II - Ejecución de Obras***, con fundamento en las circunstancias anteriormente mencionadas

Igualmente manifestamos que como consecuencia de la prórroga solicitada no se generarán costos adicionales ni reclamaciones a futuro debido a la mayor permanencia ni de ninguna naturaleza al contrato de obra.

Así mismo, el Contratista de Obra Consorcio Ingeniería I cederá el valor en sus derechos económicos por treinta y ocho millones de pesos ($38.000.000,00) incluido IVA por la mayor permanencia que se cause a la interventoría.

Agradecemos de antemano el recibo positivo a nuestra solicitud la cual sin duda alguna redundará en la calidad de vida de la comunidad beneficiada.

Cordialmente,

Ingeniero JAIME HERRERA OSORIO
R/L CONSORCIO INGENIERÍA I

Proyectó : Ingeniero DAVID LEONARDO LOZADA CEDEÑO
Revisó : Ingeniero JAIME HERRERA OSORIO
Aprobó : Arquitecto ALBERTH FABIÁN VELASCO SANDOVAL
Copia : CARPETA PROYECTO
Anexo : Ninguno

CONSORCIO INGENIERÍA I
NIT. 901.639.134 - 0

CI- 206

Bogotá D.C., marzo 27 de 2024

CONSORCIO PROSPERAR BETHEL
Ing.: Claudia Del Pilar Suarez
Representante legal
Email: csuarez@master.net.co

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. 1070-2022, "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, ASÍ COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN E INTERVENCIÓN DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT".

ASUNTO: ENTREGA INFORMES SEMANALES.

Respetada ingeniera,

Por medio de la presente nos permitimos hacer entrega de los informes semanales correspondientes a la Etapa II- Ejecución de Obra de los territorios AAU T17, AAU T20 , AAU T21 AAU T22 y Manzana de Cuidado, relacionados desde el periodo comprendido entre el 18 de marzo de 2024 hasta el 24 de marzo de 2024.

Atentamente,

Ingeniero JAIME HERRERA OSORIO
R/L CONSORCIO INGENIERÍA I

Proyectó : Ingeniero DAVID LEONARDO LOZADA CEDEÑO
Revisó : Ingeniero JAIME HERRERA OSORIO
Aprobó : Arquitecto ALBERTH FABIÁN VELASCO SANDOVAL
Copia : CARPETA PROYECTO
Anexo : Lo enunciado en (2) archivos magnéticos

Anexo 6. Informes semanales

Informe semana 8 AAU T17

	INFORME SEMANAL DE OBRA - ETAPA II				
	FRENTE DE OBRA: TERRITORIO AAUT-17				
Semana No.8	Fecha de informe	del:	**4 de marzo de 2024**	al	**10 de marzo de 2024**

1. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA CIVIL

OBJETO:	**REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".**
CONTRATO DE OBRA No:	1070-2022
VALOR CONTRATO :	$ 2.550.000.000
CONTRATISTA	CONSORCIO INGENIERÍA I
PLAZO:	16 MESES Y TRES DIAS
FECHA DE INICIO:	16 de diciembre de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1	20 de marzo de 2023
FECHA DE REINICIACIÓN No. 1:	5 de mayo de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.2	26 de julio de 2023
FECHA DE REINICIACIÓN No. 2:	14 de noviembre de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.3	12 de diciembre de 2024
FECHA DE REINICIACIÓN No. 3:	28 de diciembre de 2023
FECHA DE REINICIO	19 de abril de 2024
PLAZO TRANSCURRIDO	450,00 DÍAS
VALOR INICIAL	$ 2.550.000.000,00
ADICIÓN	$ 0,00
VALOR ACTULIZADO	$ 2.550.000.000,00


2. SEGUIMIENTO DE OBRA CIVIL

RESUMEN DE AVACE DE EJECUCION DE OBRA:

Proyección de ejecución

SEMANA	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	ATRASO
SEMANA No.0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SEMANA No.1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SEMANA No.2	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SEMANA No.3	0,52%	0,52%	0,50%	0,50%	-0,02%
SEMANA No.4	2,60%	3,12%	7,97%	8,47%	5,35%
SEMANA No.5	2,60%	5,72%	3,43%	11,90%	6,18%
SEMANA No.6	2,60%	8,32%	1,11%	13,01%	4,69%
SEMANA No.7	5,72%	14,04%	4,62%	17,63%	3,59%
SEMANA No.8	5,98%	20,02%	1,19%	18,82%	-1,20%
SEMANA No.9	0,00%	20,02%	0,00%	18,82%	-1,20%
SEMANA No.10	0,00%	20,02%	0,00%	18,82%	-1,20%
SEMANA No.11	0,00%	20,02%	0,00%	18,82%	-1,20%
SEMANA No.12	0,00%	20,02%	0,00%	18,82%	-1,20%
SEMANA No.13	0,00%	20,02%	0,00%	18,82%	-1,20%
SEMANA No.14	0,00%	20,02%	0,00%	18,82%	-1,20%

CURVA DE AVANCE DE ACTIVIDADES EJECUTADO VS PROGRAMADO

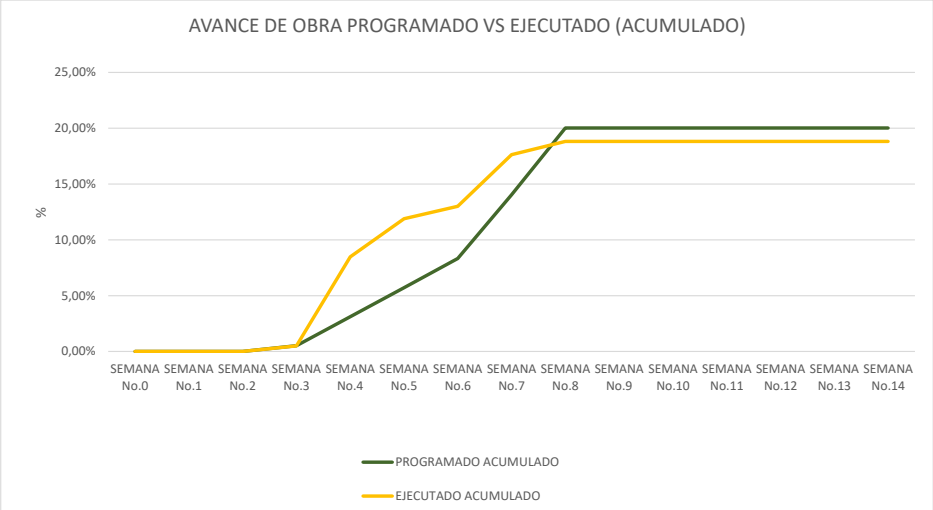

INFORME SEMANAL DE OBRA
FRENTE DE OBRA: TERRITORIO AAUT-17

SEMANA N°	**8**	**DE**	**lunes, 4 de marzo de 2024**	**A**	**domingo, 10 de marzo de 2024**
FECHA INICIO :	16/12/2022	**FECHA TERMINACION:**	19/04/2024		

IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".				
INTERVENTOR	CONSORCIO PROSPERAR BETHEL	**NIT**	NIT.901.634.239-2	**CONTRATO N°**	1066-2022
CONTRATISTA	CONSORCIO INGENIERÍA I	**NIT**	NIT. 901.639.134-0	**CONTRATO N°**	1070-2022

3. REGISTRO FOTOGRAFICO



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 17
COMENTARIOS: TERRITORIO T17 – MATERIAL RAJON



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 17
COMENTARIOS:FORMALETA PARA CICLÓPEO



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 17
COMENTARIOS: RIEGO DE RAJÓN CICLÓPEO



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 17
COMENTARIOS: CONCRETO PARA CICLÓPEO



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 17
COMENTARIOS: CONCRETO PARA CICLÓPEO



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 17
COMENTARIOS: CONCRETO PARA CICLÓPEO

CONSORCIO INGENIERÍA I

Nit. 901.639.134 - 0

AVANCE INFROME SEMANALES

No. DE ORDEN	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS		SEMANA No.8		
										8
	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR	PROCENTAJE
1,00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**									
1,10	Localización y replanteo	m2	1204,00	$ 8.226,00	$ 9.904.104,00	1309,00	$ 10.767.834,00		$ -	
1,70	Cerramiento provisional de obra (Polisombra)	ml	165,45	$ 27.273,00	$ 4.512.318,00	210,45	$ 5.739.603,00		$ -	
1,10	Protección de árbol de existente	un	9,00	$ 70.802,00	$ 637.218,00	9,00	$ 637.218,00		$ -	
1,13	Protección de rejillas	un		$ 16.273,00		3,00	$ 48.819,00		$ -	
2,00	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**									
2,10	Descapote a máquina nivel 0.00 (inc. retiro) e=-20 cm	m2	1204,00	$ 14.422,00	$ 17.364.088,00	1309,00	$ 18.878.398,00		$ -	
2,20	Nivelación y perfilado de terreno manual	m2	1204,00	$ 2.640,00	$ 3.178.560,00	80,91	$ 213.602,00		$ -	
2,30	Nivelación y Compactación de Subrasante	m2	461,00	$ 1.397,00	$ 644.017,00	1274,91	$ 1.781.049,00		$ -	
2,40	Excavación manual suelo blando	m3		$ 73.172,00		21,28	$ 1.557.100,00		$ -	
2,50	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	m3	69,15	$ 109.904,00	$ 7.599.862,00	69,15	$ 7.599.862,00		$ -	
2,60	Geotextil T-2400	m2	501,05	$ 11.156,00	$ 5.589.714,00	501,05	$ 5.589.714,00		$ -	
2,70	Relleno compactado Base granular	m3	69,15	$ 156.593,00	$ 10.828.406,00	69,15	$ 10.828.406,00		$ -	
2,90	Excavación mecanica+retiro	m3	138,30	$ 42.384,00	$ 5.861.707,00	687,23	$ 29.127.556,00		$ -	
3,00	**CONCRETOS BASES Y ESTRUCTURAS**									
3,10	Placa contrapiso 3000 psi 21mpa e=15	m3	65,21	$ 1.027.855,00	$ 67.026.425,00	65,21	$ 67.026.425,00		$ -	
3,30	Concreto 3000 psi 21mpa para muros (Contenedores de raíz)	m3	5,06	$ 870.250,00	$ 4.403.465,00	5,06	$ 4.403.465,00		$ -	
3,12	Concreto ciclopeo 3000 psi Cimentac+formaleta(SUDS)	M3		$ 548.326,00		38,00	$ 20.836.388,00	10,40	$ 5.702.590,40	27,37%
4,00	**ACERO DE REFUERZO**									
4,10	Malla Electrosoldada d=5mm@0.15 (área 6x2.35)	kg	1392,60	$ 6.619,00	$ 9.217.619,00	1392,60	$ 9.217.619,00		$ -	
4,20	Refuerzo acero fy=60000psi muro	kg	43,00	$ 5.726,00	$ 246.218,00		$ -		$ -	
5,00	**REDES HIDROSANITARIAS**									
5,10	Descapote a máquina nivel 0.00 (inc. retiro) e=-1.40m	m3	160,64	$ 50.223,00	$ 8.067.823,00	238,14	$ 11.960.105,00		$ -	
5,20	Concreto limpieza (alistado de terreno) e=0.05enObra	m3	1,33	$ 29.530,00	$ 39.275,00	1,33	$ 39.275,00		$ -	
5,30	Taludes perimetrales en concreto fc 21 3000 psi .15	m3	13,98	$ 570.017,00	$ 7.968.838,00		$ -		$ -	
5,40	Cañuela en concreto	ml	13,90	$ 98.766,00	$ 1.372.847,00	13,90	$ 1.372.847,00		$ -	
5,50	Geotextil (NORMA) NS-088	m2	89,91	$ 11.156,00	$ 1.003.036,00	89,91	$ 1.003.036,00		$ -	
5,60	Capa drenaje (agregado Grueso)	m3	24,27	$ 147.396,00	$ 3.577.301,00	24,27	$ 3.577.301,00		$ -	
5,70	Capa filtrante (agregado Fino)	m3	4,05	$ 191.071,00	$ 773.838,00	4,05	$ 773.838,00		$ -	
5,80	Tubería perforada PVC DE 4 PUL	ml	55,71	$ 50.832,00	$ 2.831.851,00	55,71	$ 2.831.851,00		$ -	
5,90	Tubería de limpieza PVC 4 PUL	ml	18,00	$ 50.832,00	$ 914.976,00	18,00	$ 914.976,00		$ -	
5,10	Tubería de salida PVC 6 PUL	ml	5,60	$ 80.411,00	$ 450.302,00	5,60	$ 450.302,00		$ -	
5,11	Sustrato (TIERRA NEGRA+ ARENA)	m3	36,41	$ 170.501,00	$ 6.207.941,00	36,41	$ 6.207.941,00		$ -	
5,12	Piedra bola	m2	7,38	$ 41.714,00	$ 307.849,00	7,38	$ 307.849,00		$ -	
5,13	Malla Electro soldada d=5mm@0.15	kg	44,09	$ 6.619,00	$ 291.832,00		$ -		$ -	
5,14	Refuerzo acero fy=60000psi	kg	1654,00	$ 5.726,00	$ 9.470.804,00	450,00	$ 2.576.700,00		$ -	
5,15	Reja sumidero	un	22,00	$ 292.310,00	$ 6.430.820,00	22,00	$ 6.430.820,00		$ -	
5,16	Nivelación y perfilado de terreno manual	m2	80,91	$ 2.640,00	$ 213.602,00		$ -		$ -	
5,17	Nivelación y Compactación de Subrasante	m2	80,91	$ 1.397,00	$ 113.031,00		$ -		$ -	
5,18	Cerramiento reja pequeña	ml	44,00	$ 47.880,00	$ 2.106.720,00	44,00	$ 2.106.720,00		$ -	
5,19	Caja de inspección .60x.60 h=1.0 **	un	2,00	$ 545.257,00	$ 1.090.514,00	2,00	$ 1.090.514,00		$ -	
6,00	**PINTURA PISO**									
6,10	Pintura a color espacio de GYM Biosaludable	m2	45,74	$ 34.389,00	$ 1.572.953,00	45,74	$ 1.572.953,00		$ -	
7,00	**ADOQUÍN, TABLETA, Y BORDILLOS**									
7,30	Tableta podotactil alerta 20*20 cm. Prefabricado en concreto color amarillo (A57)	ml	45,87	$ 86.499,00	$ 3.967.709,00	45,87	$ 3.967.709,00		$ -	
7,40	Tableta podotactil Guía 20*20 cm. Prefabricado en concreto, color amarillo (A58)	ml	109,34	$ 86.499,00	$ 9.457.801,00	109,34	$ 9.457.801,00		$ -	
7,60	Bordillo demarcado recto interno prefabricado en concreto (A80)	ml	401,56	$ 90.840,00	$ 36.477.710,00	401,56	$ 36.477.710,00		$ -	
8,00	**PISOS EN MATERIAL RECICLADO TIPO CAUCHO**									
8,10	Piso caucho reciclado en color, para juegos infantiles	m2	63,69	$ 566.082,00	$ 36.053.763,00	63,69	$ 36.053.763,00			
10,00	**MOBILIARIO URBANO**									
10,10	Caneca metálica referencia M120 o M121.	un	4,00	$ 629.610,00	$ 2.518.440,00	4,00	$ 2.518.440,00			
10,20	Silla individual referencia M-01-A	un	17,00	$ 1.491.405,00	$ 25.353.885,00	17,00	$ 25.353.885,00			
10,17	Torre Columpio Deslizadero	un	1,00	$ 34.475.000,00	$ 34.475.000,00	1,00	$ 34.475.000,00			
10,60	Suministro baranda M-83	ml	63,69	$ 364.707,00	$ 23.228.189,00	63,69	$ 23.228.189,00			
10,70	Equipo de GYM REF flexión pierna	un	1,00	$ 4.956.332,00	$ 4.956.332,00	1,00	$ 4.956.332,00			
10,80	Equipo de GYM REF Elíptica	un	1,00	$ 4.956.332,00	$ 4.956.332,00	1,00	$ 4.956.332,00			
10,90	Equipo de GYM REF Giro de hombros	un	1,00	$ 3.032.332,00	$ 3.032.332,00	1,00	$ 3.032.332,00			
10,10	Equipo de GYM REF Giro caminador	un	1,00	$ 4.058.332,00	$ 4.058.332,00	1,00	$ 4.058.332,00			
10,50	Mesa de ajedrez en concreto	un	2,00	$ 1.541.585,00	$ 3.083.170,00	2,00	$ 3.083.170,00			
10,19	Ciclo parqueadero tipo M-22 acero inoxidable	un	19,00	$ 570.462,00	$ 10.838.778,00	4,00	$ 2.281.848,00			
10,20	Bolardo en hierro	un	13,00	$ 214.013,00	$ 2.782.169,00	19,00	$ 4.066.247,00			
10,31	Suministro e instalación de BARRAS COMBINADAS DIMENSIONES.: 4.59 x 1.41 x 2.65 mts	un	1,00	$ 13.651.680,00	$ 13.651.680,00	1,00	$ 13.651.680,00			
11,00	**VEGETACION**									
11,10	Cobertura tipo grama	m2	399,34	$ 10.422,00	$ 4.161.921,00	399,34	$ 4.161.921,00			
11,20	Cobertura tipo floricultura	m2	48,08	$ 98.124,00	$ 4.717.802,00	48,08	$ 4.717.802,00			
11,30	Siembra de árbol (Según propuesta paisajismo)	un	6,00	$ 291.101,00	$ 1.746.606,00	6,00	$ 1.746.606,00			
11,40	Relleno en tierra negra	m3	44,74	$ 65.431,00	$ 2.927.383,00	44,74	$ 2.927.383,00			
11,50	Limo arcilloso	m3	26,48	$ 116.667,00	$ 3.089.342,00	26,48	$ 3.089.342,00			
11,60	Árbol hayuelo	un	1,00	$ 299.197,00	$ 299.197,00	1,00	$ 299.197,00			
11,70	Árbol laurel hoja pequeña	un	4,00	$ 291.101,00	$ 1.164.404,00	4,00	$ 1.164.404,00			
11,80	Árbol Carbonero Rojo	un	3,00	$ 306.086,00	$ 918.258,00	3,00	$ 918.258,00			
11,90	Árbol Calistenia	un	1,00	$ 289.533,00	$ 289.533,00	1,00	$ 289.533,00			
12,00	**SEÑALETICA**									
12,10	Señalética identificador zona de juegos infantiles	un	1,00	$ 296.774,00	$ 296.774,00	1,00	$ 296.774,00			
12,20	Señalética GYM parque	un	2,00	$ 296.774,00	$ 593.548,00	2,00	$ 593.548,00			
12,30	Señalética identificador	un	2,00	$ 569.478,00	$ 1.138.956,00	2,00	$ 1.138.956,00			
12,40	Señalética SC-80	un	3,00	$ 454.702,00	$ 1.364.106,00	3,00	$ 1.364.106,00			
13,00	**OTROS**									
13,10	Baño portátil Alquiler	mes	4,00	$ 398.250,00	$ 1.593.000,00		$ -			
13,20	Aseo general	m2	1204,00	$ 7.449,00	$ 8.968.596,00	1204,00	$ 8.968.596,00			
14,01	**PROVISIÓN DE OBRAS ADICIONALES**			**29478330,00**	**29.478.330,00**		**$ -**			
					$ 483.459.252,00		**$ 480.765.282,00**		**$ 5.702.590,40**	**1,19%**
	AMINISTRACIÓN		**26,00%**		**$ 125.699.406,00**		**$ 124.998.973,00**		**$ 1.482.673,50**	**1,19%**
	IMPREVISTOS		**1,00%**		**$ 4.834.593,00**		**$ 4.807.653,00**		**$ 57.025,90**	**1,19%**
	UTILIDAD		**6,00%**		**$ 29.007.555,00**		**$ 28.845.917,00**		**$ 342.155,42**	**1,19%**
	VALOR IVA SOBRE LA UTILIDAD				**$ -**		**$ -**		**$ -**	
	VALORES COSTOS INDIRECTOS				**$ 159.541.554,00**		**$ 158.652.543,00**			
	COSTO TOTAL OBRA				**$ 643.000.806,00**		**$ 639.417.825,00**			
	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO				**$ 5.403.728,00**		**$ 5.403.728,00**			
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				**$ 11.439.678,00**		**$ 11.439.678,00**			
					$ 659.844.212,00		**$ 656.261.231,00**		**$ 7.584.445,22**	**1,16%**
										1,16%

Informe semana 9 AAU T17

CONSORCIO INGENIERÍA I

Nit. 901.639.134 - 0

AVANCE INFROME SEMANALES

No. DE ORDEN	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS		SEMANA No.9		
										9
	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR	PROCENTAJE
1,00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**									
1,10	Localización y replanteo	m2	1204,00	$ 8.226,00	$ 9.904.104,00	1309,00	$ 10.767.834,00		$ -	
1,70	Cerramiento provisional de obra (Polisombra)	ml	165,45	$ 27.273,00	$ 4.512.318,00	210,45	$ 5.739.603,00		$ -	
1,10	Protección de árbol de existente	un	9,00	$ 70.802,00	$ 637.218,00	9,00	$ 637.218,00		$ -	
1,13	Protección de rejillas	un		$ 16.273,00		3,00	$ 48.819,00		$ -	
2,00	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**									
2,10	Descapote a máquina nivel 0.00 (inc. retiro) e=-20 cm	m2	1204,00	$ 14.422,00	$ 17.364.088,00	1309,00	$ 18.878.398,00		$ -	
2,20	Nivelación y perfilado de terreno manual	m2	1204,00	$ 2.640,00	$ 3.178.560,00	80,91	$ 213.602,00		$ -	
2,30	Nivelación y Compactación de Subrasante	m2	461,00	$ 1.397,00	$ 644.017,00	1274,91	$ 1.781.049,00		$ -	
2,40	Excavación manual suelo blando	m3		$ 73.172,00		21,28	$ 1.557.100,00		$ -	
2,50	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	m3	69,15	$ 109.904,00	$ 7.599.862,00	69,15	$ 7.599.862,00		$ -	
2,60	Geotextil T-2400	m2	501,05	$ 11.156,00	$ 5.589.714,00	501,05	$ 5.589.714,00		$ -	
2,70	Relleno compactado Base granular	m3	69,15	$ 156.593,00	$ 10.828.406,00	69,15	$ 10.828.406,00		$ -	
2,90	Excavación mecanica+retiro	m3	138,30	$ 42.384,00	$ 5.861.707,00	687,23	$ 29.127.556,00		$ -	
2,11	Relleno de rajon manual	m3		$ 166.430,00	$ -	79,95	$ 13.306.079,00		$ -	
3,00	**CONCRETOS BASES Y ESTRUCTURAS**									
3,10	Placa contrapiso 3000 psi 21mpa e=15	m3	65,21	$ 1.027.855,00	$ 67.026.425,00	65,21	$ 67.026.425,00		$ -	
3,30	Concreto 3000 psi 21mpa para muros (Contenedores de raíz)	m3	5,06	$ 870.250,00	$ 4.403.465,00	5,06	$ 4.403.465,00		$ -	
3,12	Concreto ciclopeo 3000 psi Cimentac+formaleta(SUDS)	M3		$ 548.326,00		46,20	$ 25.332.661,00	28,40	$ 15.572.458,40	61,47%
4,00	**ACERO DE REFUERZO**									
4,10	Malla Electrosoldada d=5mm@0.15 (área 6x2.35)	kg	1392,60	$ 6.619,00	$ 9.217.619,00	1392,60	$ 9.217.619,00		$ -	
4,20	Refuerzo acero fy=60000psi muro	kg	43,00	$ 5.726,00	$ 246.218,00		$ -		$ -	
5,00	**REDES HIDROSANITARIAS**									
5,10	Descapote a máquina nivel 0.00 (inc. retiro) e=-1,40m	m3	160,64	$ 50.223,00	$ 8.067.823,00	238,14	$ 11.960.105,00		$ -	
5,20	Concreto limpieza (alistado de terreno) e=0.05enObra	m3	1,33	$ 29.530,00	$ 39.275,00	1,33	$ 39.275,00		$ -	
5,30	Taludes perimetrales en concreto fc 21 3000 psi .15	m3	13,98	$ 570.017,00	$ 7.968.838,00		$ -		$ -	
5,40	Cañuela en concreto	ml	13,90	$ 98.766,00	$ 1.372.847,00	13,90	$ 1.372.847,00		$ -	
5,50	Geotextil (NORMA) NS-088	m2	89,91	$ 11.156,00	$ 1.003.036,00	89,91	$ 1.003.036,00		$ -	
5,60	Capa drenaje (agregado Grueso)	m3	24,27	$ 147.396,00	$ 3.577.301,00	24,27	$ 3.577.301,00		$ -	
5,70	Capa filtrante (agregado Fino)	m3	4,05	$ 191.071,00	$ 773.838,00	4,05	$ 773.838,00		$ -	
5,80	Tubería perforada PVC DE 4 PUL	ml	55,71	$ 50.832,00	$ 2.831.851,00	55,71	$ 2.831.851,00		$ -	
5,90	Tubería de limpieza PVC 4 PUL	ml	18,00	$ 50.832,00	$ 914.976,00	18,00	$ 914.976,00		$ -	
5,10	Tubería de salida PVC 6 PUL	ml	5,60	$ 80.411,00	$ 450.302,00	5,60	$ 450.302,00		$ -	
5,11	Sustrato (TIERRA NEGRA+ ARENA)	m3	36,41	$ 170.501,00	$ 6.207.941,00	36,41	$ 6.207.941,00		$ -	
5,12	Piedra bola	m2	7,38	$ 41.714,00	$ 307.849,00	7,38	$ 307.849,00		$ -	
5,13	Malla Electro soldada d=5mm@0.15	kg	44,09	$ 6.619,00	$ 291.832,00		$ -		$ -	
5,14	Refuerzo acero fy=60000psi	kg	1654,00	$ 5.726,00	$ 9.470.804,00	450,00	$ 2.576.700,00		$ -	
5,15	Reja sumidero	un	22,00	$ 292.310,00	$ 6.430.820,00	22,00	$ 6.430.820,00		$ -	
5,16	Nivelación y perfilado de terreno manual	m2	80,91	$ 2.640,00	$ 213.602,00		$ -		$ -	
5,17	Nivelación y Compactación de Subrasante	m2	80,91	$ 1.397,00	$ 113.031,00		$ -		$ -	
5,18	Cerramiento reja pequeña	ml	44,00	$ 47.880,00	$ 2.106.720,00	44,00	$ 2.106.720,00		$ -	
5,19	Caja de inspección .60x.60 h=1.0 **	un	2,00	$ 545.257,00	$ 1.090.514,00	2,00	$ 1.090.514,00		$ -	
6,00	**PINTURA PISO**									
6,10	Pintura a color espacio de GYM Biosaludable	m2	45,74	$ 34.389,00	$ 1.572.953,00	45,74	$ 1.572.953,00		$ -	
7,00	**ADOQUÍN, TABLETA, Y BORDILLOS**									
7,30	Tableta podotactil alerta 20*20 cm. Prefabricado en concreto color amarillo (A57)	ml	45,87	$ 86.499,00	$ 3.967.709,00	45,87	$ 3.967.709,00		$ -	
7,40	Tableta podotactil Guía 20*20 cm. Prefabricado en concreto, color amarillo (A58)	ml	109,34	$ 86.499,00	$ 9.457.801,00	109,34	$ 9.457.801,00		$ -	
7,60	Bordillo demarcado recto interno prefabricado en concreto (A80)	ml	401,56	$ 90.840,00	$ 36.477.710,00	401,56	$ 36.477.710,00		$ -	
8,00	**PISOS EN MATERIAL RECICLADO TIPO CAUCHO**									
8,10	Piso caucho reciclado en color, para juegos infantiles	m2	63,69	$ 566.082,00	$ 36.053.763,00	63,69	$ 36.053.763,00			
10,00	**MOBILIARIO URBANO**									
10,10	Caneca metálica referencia M120 o M121.	un	4,00	$ 629.610,00	$ 2.518.440,00	4,00	$ 2.518.440,00			
10,20	Silla individual referencia M-01-A	un	17,00	$ 1.491.405,00	$ 25.353.885,00	17,00	$ 25.353.885,00			
10,17	Torre Columpio Deslizadero	un	1,00	$ 34.475.000,00	$ 34.475.000,00	1,00	$ 34.475.000,00			
10,60	Suministro baranda M-83	ml	63,69	$ 364.707,00	$ 23.228.189,00	63,69	$ 23.228.189,00			
10,70	Equipo de GYM REF flexión pierna	un	1,00	$ 4.956.332,00	$ 4.956.332,00	1,00	$ 4.956.332,00			
10,80	Equipo de GYM REF Elíptica	un	1,00	$ 4.956.332,00	$ 4.956.332,00	1,00	$ 4.956.332,00			
10,90	Equipo de GYM REF Giro de hombros	un	1,00	$ 3.032.332,00	$ 3.032.332,00	1,00	$ 3.032.332,00			
10,10	Equipo de GYM REF Giro caminador	un	1,00	$ 4.058.332,00	$ 4.058.332,00	1,00	$ 4.058.332,00			
10,50	Mesa de ajedrez en concreto	un	2,00	$ 1.541.585,00	$ 3.083.170,00	2,00	$ 3.083.170,00			
10,19	Ciclo parqueadero tipo M-22 acero inoxidable	un	19,00	$ 570.462,00	$ 10.838.778,00	4,00	$ 2.281.848,00			
10,20	Bolardo en hierro	un	13,00	$ 214.013,00	$ 2.782.169,00	19,00	$ 4.066.247,00			
10,31	Suministro e instalación de BARRAS COMBINADAS ,DIMENSIONES:: 4.59 x 1.41 x 2.65 mts	un	1,00	$ 13.651.680,00	$ 13.651.680,00	1,00	$ 13.651.680,00			
11,00	**VEGETACION**									
11,10	Cobertura tipo grama	m2	399,34	$ 10.422,00	$ 4.161.921,00	399,34	$ 4.161.921,00			
11,20	Cobertura tipo floricultura	m2	48,08	$ 98.124,00	$ 4.717.802,00	48,08	$ 4.717.802,00			
11,30	Siembra de árbol (Según propuesta paisajismo)	un	6,00	$ 291.101,00	$ 1.746.606,00	6,00	$ 1.746.606,00			
11,40	Relleno en tierra negra	m3	44,74	$ 65.431,00	$ 2.927.383,00	44,74	$ 2.927.383,00			
11,50	Limo arcilloso	m3	26,48	$ 116.667,00	$ 3.089.342,00	26,48	$ 3.089.342,00			
11,60	Árbol hayuelo	un	1,00	$ 299.197,00	$ 299.197,00	1,00	$ 299.197,00			
11,70	Árbol laurel hoja pequeña	un	4,00	$ 291.101,00	$ 1.164.404,00	4,00	$ 1.164.404,00			
11,80	Árbol Carbonero Rojo	un	3,00	$ 306.086,00	$ 918.258,00	3,00	$ 918.258,00			
11,90	Árbol Calistenia	un	1,00	$ 289.533,00	$ 289.533,00	1,00	$ 289.533,00			
12,00	**SEÑALETICA**									
12,10	Señalética identificador zona de juegos infantiles	un	1,00	$ 296.774,00	$ 296.774,00	1,00	$ 296.774,00			
12,20	Señalética GYM parque	un	2,00	$ 296.774,00	$ 593.548,00	2,00	$ 593.548,00			
12,30	Señalética identificador	un	2,00	$ 569.478,00	$ 1.138.956,00	2,00	$ 1.138.956,00			
12,40	Señalética SC-80	un	3,00	$ 454.702,00	$ 1.364.106,00	3,00	$ 1.364.106,00			
13,00	**OTROS**									
13,10	Baño portátil Alquiler	mes	4,00	$ 398.250,00	$ 1.593.000,00		$ -			
13,20	Aseo general	m2	1204,00	$ 7.449,00	$ 8.968.596,00	1204,00	$ 8.968.596,00			
14,01	**PROVISIÓN DE OBRAS ADICIONALES**			**29478330,00**	**29.478.330,00**		$ -			
					$ 483.459.252,00		**$ 498.567.634,00**		**$ 15.572.458,40**	**3,12%**
	AMINISTRACIÓN		**26,00%**		**$ 125.699.406,00**		**$ 129.627.585,00**		**$ 4.048.839,18**	**3,12%**
	IMPREVISTOS		**1,00%**		**$ 4.834.593,00**		**$ 4.985.676,00**		**$ 155.724,58**	**3,12%**
	UTILIDAD		**6,00%**		**$ 29.007.555,00**		**$ 29.914.058,00**		**$ 934.347,50**	**3,12%**
	VALOR IVA SOBRE LA UTILIDAD				$ -		$ -		$ -	
	VALORES COSTOS INDIRECTOS				**$ 159.541.554,00**		**$ 164.527.319,00**			
	COSTO TOTAL OBRA				**$ 643.000.806,00**		**$ 663.094.953,00**			
	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO				**$ 5.403.728,00**		**$ 5.403.728,00**			
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				**$ 11.439.678,00**		**$ 11.439.678,00**			
					$ 659.844.212,00		**$ 679.938.359,00**		**$ 20.711.369,66**	**3,05%**
										3,05%

	INFORME SEMANAL DE OBRA - ETAPA II				
	FRENTE DE OBRA: TERRITORIO AAUT-17				
Semana No.9	Fecha de informe	del:	**11 de marzo de 2024**	al	**17 de marzo de 2024**

1. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA CIVIL


OBJETO:	**REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".**
CONTRATO DE OBRA No:	1070-2022
VALOR CONTRATO :	$ 2.550.000.000
CONTRATISTA	CONSORCIO INGENIERÍA I
PLAZO:	16 MESES Y TRES DÍAS
FECHA DE INICIO:	16 de diciembre de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1	20 de marzo de 2023
FECHA DE REINICIACIÓN No. 1:	5 de mayo de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.2	26 de julio de 2023
FECHA DE REINICIACIÓN No. 2:	14 de noviembre de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.3	12 de diciembre de 2024
FECHA DE REINICIACIÓN No. 3:	28 de diciembre de 2023
FECHA DE REINICIO	19 de abril de 2024
PLAZO TRANSCURRIDO	457,00 DÍAS
VALOR INICIAL	$ 2.550.000.000,00
ADICIÓN	$ 0,00
VALOR ACTULIZADO	$ 2.550.000.000,00

2. SEGUIMIENTO DE OBRA CIVIL

RESUMEN DE AVACE DE EJECUCION DE OBRA:

Proyección de ejecución	SEMANA	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	ATRASO
	SEMANA No.0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	SEMANA No.1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	SEMANA No.2	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	SEMANA No.3	0,52%	0,52%	0,48%	0,48%	-0,04%
	SEMANA No.4	2,60%	3,12%	7,69%	8,17%	5,05%
	SEMANA No.5	2,60%	5,72%	3,30%	11,47%	5,75%
	SEMANA No.6	2,60%	8,32%	1,07%	12,54%	4,22%
	SEMANA No.7	5,72%	14,04%	4,46%	17,00%	2,96%
	SEMANA No.8	5,98%	20,02%	1,14%	18,15%	-1,87%
	SEMANA No.9	5,98%	26,00%	3,12%	21,27%	-4,73%
	SEMANA No.10	0,00%	26,00%	0,00%	21,27%	-4,73%
	SEMANA No.11	0,00%	26,00%	0,00%	21,27%	-4,73%
	SEMANA No.12	0,00%	26,00%	0,00%	21,27%	-4,73%
	SEMANA No.13	0,00%	26,00%	0,00%	21,27%	-4,73%
	SEMANA No.14	0,00%	26,00%	0,00%	21,27%	-4,73%

CURVA DE AVANCE DE ACTIVIDADES EJECUTADO VS PROGRAMADO

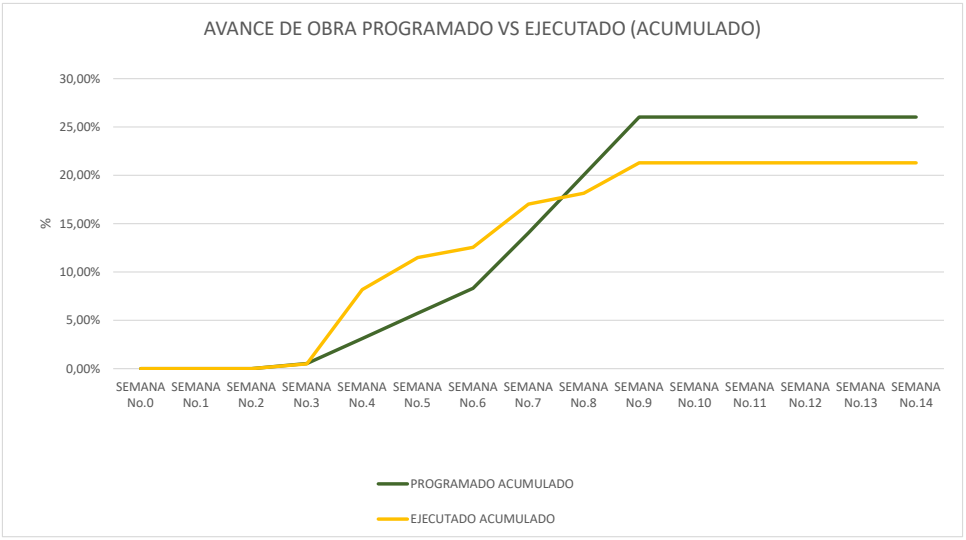


INFORME SEMANAL DE OBRA
FRENTE DE OBRA: TERRITORIO AAUT-17

SEMANA N°	9	**DE**	lunes, 11 de marzo de 2024	**A**	domingo, 17 de marzo de 2024
FECHA INICIO :	16/12/2022	**FECHA TERMINACION:**	19/04/2024		


IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".				
INTERVENTOR	CONSORCIO PROSPERAR BETHEL	**NIT**	NIT.901.634.239-2	**CONTRATO N°**	1066-2022
CONTRATISTA	CONSORCIO INGENIERÍA I	**NIT**	NIT. 901.639.134-0	**CONTRATO N°**	1070-2022

3. REGISTRO FOTOGRAFICO

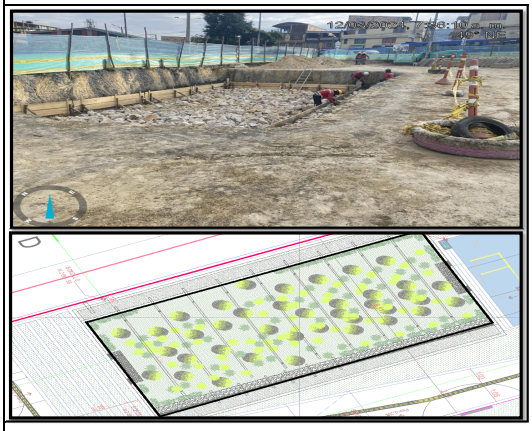

UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 17
COMENTARIOS: RELLENO DE RAJÓN MANUAL

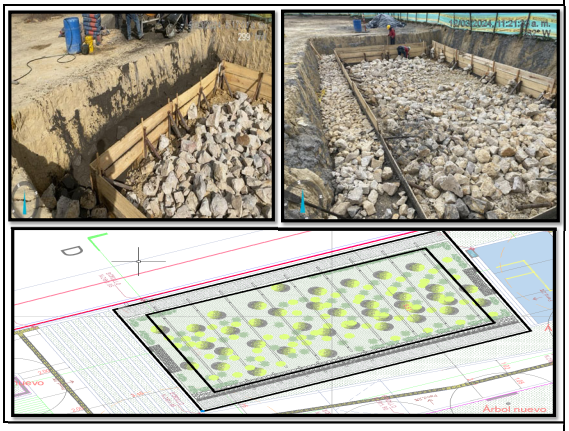

UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 17
COMENTARIOS: CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI CIMENTAC+FORMALETA(SUDS)



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 17
COMENTARIOS: MATERIAL EN OBRA



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 17
COMENTARIOS: MATERIAL EN OBRA



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 17
COMENTARIOS: OBRA TERRITORIO



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 17
COMENTARIOS: TOMA DE MEDIDAS EN SITIO

Informe semana 10 AAU T17

CONSORCIO INGENIERÍA I

Nit. 901.639.134 - 0

AVANCE INFROME SEMANALES

No. DE ORDEN	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS		SEMANA No.10		
										10
	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR	PROCENTAJE
1,00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**									
1,10	Localización y replanteo	m2	1204,00	$ 8.226,00	$ 9.904.104,00	1309,00	$ 10.767.834,00		$ -	
1,70	Cerramiento provisional de obra (Polisombra)	ml	165,45	$ 27.273,00	$ 4.512.318,00	210,45	$ 5.739.603,00		$ -	
1,10	Protección de árbol de existente	un	9,00	$ 70.802,00	$ 637.218,00	9,00	$ 637.218,00		$ -	
1,13	Protección de rejillas	un		$ 16.273,00		3,00	$ 48.819,00		$ -	
2,00	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**									
2,10	Descapote a máquina nivel 0.00 (inc. retiro) e=-20 cm	m2	1204,00	$ 14.422,00	$ 17.364.088,00	1309,00	$ 18.878.398,00		$ -	
2,20	Nivelación y perfilado de terreno manual	m2	1204,00	$ 2.640,00	$ 3.178.560,00	80,91	$ 213.602,00		$ -	
2,30	Nivelación y Compactación de Subrasante	m2	461,00	$ 1.397,00	$ 644.017,00	1274,91	$ 1.781.049,00		$ -	
2,40	Excavación manual suelo blando	m3		$ 73.172,00		21,28	$ 1.557.100,00		$ -	
2,50	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	m3	69,15	$ 109.904,00	$ 7.599.862,00	69,15	$ 7.599.862,00		$ -	
2,60	Geotextil T-2400	m2	501,05	$ 11.156,00	$ 5.589.714,00	501,05	$ 5.589.714,00		$ -	
2,70	Relleno compactado Base granular	m3	69,15	$ 156.593,00	$ 10.828.406,00	69,15	$ 10.828.406,00		$ -	
2,90	Excavación mecanica+retiro	m3	138,30	$ 42.384,00	$ 5.861.707,00	687,23	$ 29.127.556,00		$ -	
2,11	Relleno de rajon manual	m3		$ 166.430,00	$ -	87,95	$ 14.637.519,00	87,95	$ 14.637.518,50	100,00%
3,00	**CONCRETOS BASES Y ESTRUCTURAS**									
3,10	Placa contrapiso 3000 psi 21mpa e=15	m3	65,21	$ 1.027.855,00	$ 67.026.425,00	68,33	$ 70.233.332,00	3,12	$ 3.206.907,60	4,57%
3,30	Concreto 3000 psi 21mpa para muros (Contenedores de raíz)	m3	5,06	$ 870.250,00	$ 4.403.465,00	5,06	$ 4.403.465,00		$ -	
3,12	Concreto ciclopeo 3000 psi Cimentac+formaleta(SUDS)	m3		$ 548.326,00		46,20	$ 25.332.661,00		$ -	
4,00	**ACERO DE REFUERZO**									
4,10	Malla Electrosoldada d=5mm@0.15 (área 6x2.35)	kg	1392,60	$ 6.619,00	$ 9.217.619,00		$ -			
4,20	Refuerzo acero fy=60000psi muro	kg	43,00	$ 5.726,00	$ 246.218,00		$ -		$ -	
5,00	**REDES HIDROSANITARIAS**									
5,10	Descapote a máquina nivel 0.00 (inc. retiro) e=-1,40m	m3	160,64	$ 50.223,00	$ 8.067.823,00	238,14	$ 11.960.105,00		$ -	
5,20	Concreto limpieza (alistado de terreno) e=0.05enObra	m3	1,33	$ 29.530,00	$ 39.275,00		$ -			
5,30	Taludes perimetrales en concreto fc 21 3000 psi .15	m3	13,98	$ 570.017,00	$ 7.968.838,00		$ -		$ -	
5,40	Cañuela en concreto	ml	13,90	$ 98.766,00	$ 1.372.847,00	13,90	$ 1.372.847,00		$ -	
5,50	Geotextil (NORMA) NS-088	m2	89,91	$ 11.156,00	$ 1.003.036,00	89,91	$ 1.003.036,00		$ -	
5,60	Capa drenaje (agregado Grueso)	m3	24,27	$ 147.396,00	$ 3.577.301,00	24,27	$ 3.577.301,00		$ -	
5,70	Capa filtrante (agregado Fino)	m3	4,05	$ 191.071,00	$ 773.838,00	4,05	$ 773.838,00		$ -	
5,80	Tubería perforada PVC DE 4 PUL	ml	55,71	$ 50.832,00	$ 2.831.851,00	55,71	$ 2.831.851,00		$ -	
5,90	Tubería de limpieza PVC 4 PUL	ml	18,00	$ 50.832,00	$ 914.976,00	18,00	$ 914.976,00		$ -	
5,10	Tubería de salida PVC 6 PUL	ml	5,60	$ 80.411,00	$ 450.302,00	5,60	$ 450.302,00		$ -	
5,11	Sustrato (TIERRA NEGRA+ ARENA)	m3	36,41	$ 170.501,00	$ 6.207.941,00	36,41	$ 6.207.941,00		$ -	
5,12	Piedra bola	m2	7,38	$ 41.714,00	$ 307.849,00	7,38	$ 307.849,00		$ -	
5,13	Malla Electro soldada d=5mm@0.15	kg	44,09	$ 6.619,00	$ 291.832,00		$ -		$ -	
5,14	Refuerzo acero fy=60000psi	kg	1654,00	$ 5.726,00	$ 9.470.804,00	120,00	$ 687.120,00	100,80	$ 577.180,80	84,00%
5,15	Reja sumidero	un	22,00	$ 292.310,00	$ 6.430.820,00	22,00	$ 6.430.820,00		$ -	
5,16	Nivelación y perfilado de terreno manual	m2	80,91	$ 2.640,00	$ 213.602,00		$ -		$ -	
5,17	Nivelación y Compactación de Subrasante	m2	80,91	$ 1.397,00	$ 113.031,00		$ -		$ -	
5,18	Cerramiento reja pequeña	ml	44,00	$ 47.880,00	$ 2.106.720,00	44,00	$ 2.106.720,00		$ -	
5,19	Caja de inspección .60x.60 h=1.0 **	un	2,00	$ 545.257,00	$ 1.090.514,00	2,00	$ 1.090.514,00		$ -	
6,00	**PINTURA PISO**									
6,10	Pintura a color espacio de GYM Biosaludable	m2	45,74	$ 34.389,00	$ 1.572.953,00	45,74	$ 1.572.953,00		$ -	
7,00	**ADOQUÍN, TABLETA, Y BORDILLOS**									
7,30	Tableta podotactil alerta 20*20 cm. Prefabricado en concreto color amarillo (A57)	ml	45,87	$ 86.499,00	$ 3.967.709,00	45,87	$ 3.967.709,00		$ -	
7,40	Tableta podotactil Guía 20*20 cm. Prefabricado en concreto, color amarillo (A58)	ml	109,34	$ 86.499,00	$ 9.457.801,00	109,34	$ 9.457.801,00		$ -	
7,60	Bordillo demarcado recto interno prefabricado en concreto (A80)	ml	401,56	$ 90.840,00	$ 36.477.710,00	401,56	$ 36.477.710,00		$ -	
8,00	**PISOS EN MATERIAL RECICLADO TIPO CAUCHO**									
8,10	Piso caucho reciclado en color, para juegos infantiles	m2	63,69	$ 566.082,00	$ 36.053.763,00	63,69	$ 36.053.763,00			
10,00	**MOBILIARIO URBANO**									
10,10	Caneca metálica referencia M120 o M121.	un	4,00	$ 629.610,00	$ 2.518.440,00	4,00	$ 2.518.440,00			
10,20	Silla individual referencia M-01-A	un	17,00	$ 1.491.405,00	$ 25.353.885,00	17,00	$ 25.353.885,00			
10,17	Torre Columpio Deslizadero	un	1,00	$ 34.475.000,00	$ 34.475.000,00	1,00	$ 34.475.000,00			
10,60	Suministro baranda M-83	ml	63,69	$ 364.707,00	$ 23.228.189,00	63,69	$ 23.228.189,00			
10,70	Equipo de GYM REF flexión pierna	un	1,00	$ 4.956.332,00	$ 4.956.332,00	1,00	$ 4.956.332,00			
10,80	Equipo de GYM REF Elíptica	un	1,00	$ 4.956.332,00	$ 4.956.332,00	1,00	$ 4.956.332,00			
10,90	Equipo de GYM REF Giro de hombros	un	1,00	$ 3.032.332,00	$ 3.032.332,00	1,00	$ 3.032.332,00			
10,10	Equipo de GYM REF Giro caminador	un	1,00	$ 4.058.332,00	$ 4.058.332,00	1,00	$ 4.058.332,00			
10,50	Mesa de ajedrez en concreto	un	2,00	$ 1.541.585,00	$ 3.083.170,00	2,00	$ 3.083.170,00			
10,19	Ciclo parqueadero tipo M-22 acero inoxidable	un	19,00	$ 570.462,00	$ 10.838.778,00	4,00	$ 2.281.848,00			
10,20	Bolardo en hierro	un	13,00	$ 214.013,00	$ 2.782.169,00	19,00	$ 4.066.247,00			
10,31	Suministro e instalación de BARRAS COMBINADAS ,DIMENSIONES:: 4.59 x 1.41 x 2.65 mts	un	1,00	$ 13.651.680,00	$ 13.651.680,00	1,00	$ 13.651.680,00			
11,00	**VEGETACION**									
11,10	Cobertura tipo grama	m2	399,34	$ 10.422,00	$ 4.161.921,00	399,34	$ 4.161.921,00			
11,20	Cobertura tipo floricultura	m2	48,08	$ 98.124,00	$ 4.717.802,00	48,08	$ 4.717.802,00			
11,30	Siembra de árbol (Según propuesta paisajismo)	un	6,00	$ 291.101,00	$ 1.746.606,00	6,00	$ 1.746.606,00			
11,40	Relleno en tierra negra	m3	44,74	$ 65.431,00	$ 2.927.383,00	44,74	$ 2.927.383,00			
11,50	Limo arcilloso	m3	26,48	$ 116.667,00	$ 3.089.342,00	26,48	$ 3.089.342,00			
11,60	Árbol hayuelo	un	1,00	$ 299.197,00	$ 299.197,00	1,00	$ 299.197,00			
11,70	Árbol laurel hoja pequeña	un	4,00	$ 291.101,00	$ 1.164.404,00	4,00	$ 1.164.404,00			
11,80	Árbol Carbonero Rojo	un	3,00	$ 306.086,00	$ 918.258,00	3,00	$ 918.258,00			
11,90	Árbol Calistenia	un	1,00	$ 289.533,00	$ 289.533,00	1,00	$ 289.533,00			
12,00	**SEÑALETICA**									
12,10	Señalética identificador zona de juegos infantiles	un	1,00	$ 296.774,00	$ 296.774,00	1,00	$ 296.774,00			
12,20	Señalética GYM parque	un	2,00	$ 296.774,00	$ 593.548,00	2,00	$ 593.548,00			
12,30	Señalética identificador	un	2,00	$ 569.478,00	$ 1.138.956,00	2,00	$ 1.138.956,00			
12,40	Señalética SC-80	un	3,00	$ 454.702,00	$ 1.364.106,00	3,00	$ 1.364.106,00			
13,00	**OTROS**									
13,10	Baño portátil Alquiler	mes	4,00	$ 398.250,00	$ 1.593.000,00		$ -			
13,20	Aseo general	m2	1204,00	$ 7.449,00	$ 8.968.596,00	1204,00	$ 8.968.596,00			
14,01	**PROVISIÓN DE OBRAS ADICIONALES**			**29478330,00**	**29.478.330,00**		$ -			
					$ 483.459.252,00		**$ 491.959.507,00**		**$ 18.421.606,90**	**3,74%**
	AMINISTRACIÓN		**26,00%**		**$ 125.699.406,00**		**$ 127.909.472,00**		**$ 4.789.617,79**	**3,74%**
	IMPREVISTOS		**1,00%**		**$ 4.834.593,00**		**$ 4.919.595,00**		**$ 184.216,07**	**3,74%**
	UTILIDAD		**6,00%**		**$ 29.007.555,00**		**$ 29.517.570,00**		**$ 1.105.296,41**	**3,74%**
	VALOR IVA SOBRE LA UTILIDAD				$ -		$ -		$ -	
	VALORES COSTOS INDIRECTOS				**$ 159.541.554,00**		**$ 162.346.637,00**			
	COSTO TOTAL OBRA				**$ 643.000.806,00**		**$ 654.306.144,00**			
	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO				**$ 5.403.728,00**		**$ 5.403.728,00**			
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				**$ 11.439.678,00**		**$ 11.439.678,00**			
					$ 659.844.212,00		**$ 671.149.550,00**		**$ 24.500.737,17**	**3,65%**
										3,65%

	INFORME SEMANAL DE OBRA - ETAPA II				
	FRENTE DE OBRA: TERRITORIO AAUT-17				
Semana No.10	Fecha de informe	del:	**18 de marzo de 2024**	al	**24 de marzo de 2024**

1. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA CIVIL

OBJETO:	**REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".**
CONTRATO DE OBRA No:	1070-2022
VALOR CONTRATO :	$ 2.550.000.000
CONTRATISTA	CONSORCIO INGENIERÍA I
PLAZO:	16 MESES Y TRES DÍAS
FECHA DE INICIO:	16 de diciembre de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1	20 de marzo de 2023
FECHA DE REINICIACIÓN No. 1:	5 de mayo de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.2	26 de julio de 2023
FECHA DE REINICIACIÓN No. 2:	14 de noviembre de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.3	12 de diciembre de 2024
FECHA DE REINICIACIÓN No. 3:	28 de diciembre de 2023
FECHA DE REINICIO	19 de abril de 2024
PLAZO TRANSCURRIDO	464,00 DÍAS
VALOR INICIAL	$ 2.550.000.000,00
ADICIÓN	$ 0,00
VALOR ACTULIZADO	$ 2.550.000.000,00


2. SEGUIMIENTO DE OBRA CIVIL

RESUMEN DE AVACE DE EJECUCION DE OBRA:

Proyección de ejecución

SEMANA	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	ATRASO
SEMANA No.0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SEMANA No.1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SEMANA No.2	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SEMANA No.3	0,52%	0,52%	0,49%	0,49%	-0,03%
SEMANA No.4	2,60%	3,12%	7,79%	8,28%	5,16%
SEMANA No.5	2,60%	5,72%	3,35%	11,63%	5,91%
SEMANA No.6	2,60%	8,32%	1,08%	12,71%	4,39%
SEMANA No.7	3,22%	11,54%	4,52%	17,23%	5,69%
SEMANA No.8	3,85%	15,39%	1,16%	18,39%	3,00%
SEMANA No.9	5,82%	21,21%	3,17%	21,56%	0,35%
SEMANA No.10	10,78%	31,99%	3,74%	25,30%	-6,69%
SEMANA No.11	0,00%	31,99%	0,00%	25,30%	-6,69%
SEMANA No.12	0,00%	31,99%	0,00%	25,30%	-6,69%
SEMANA No.13	0,00%	31,99%	0,00%	25,30%	-6,69%
SEMANA No.14	0,00%	31,99%	0,00%	25,30%	-6,69%

CURVA DE AVANCE DE ACTIVIDADES EJECUTADO VS PROGRAMADO

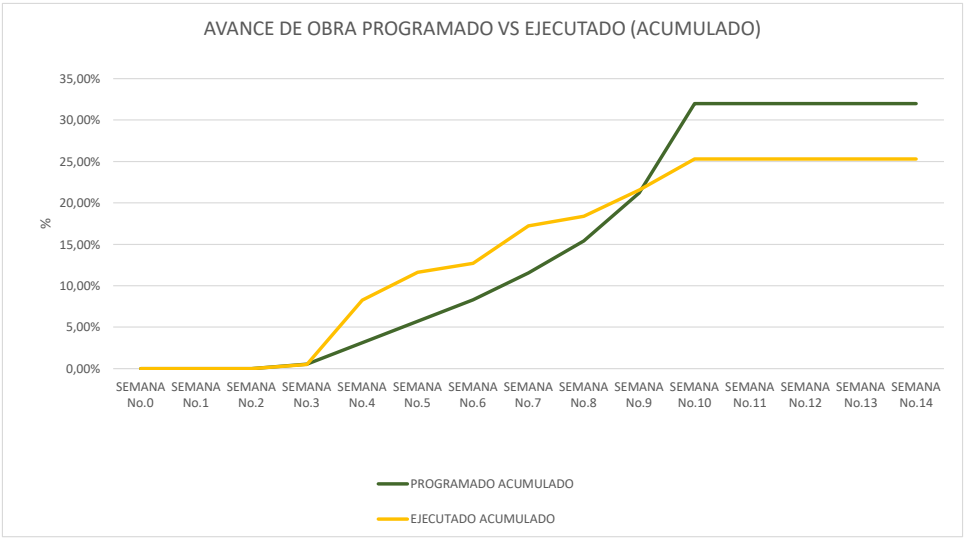


INFORME SEMANAL DE OBRA
FRENTE DE OBRA: TERRITORIO AAUT-17

SEMANA N°	10	**DE**	lunes, 18 de marzo de 2024	**A**	domingo, 24 de marzo de 2024
FECHA INICIO :	16/12/2022	**FECHA TERMINACION:**	19/04/2024		

IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".				
INTERVENTOR	CONSORCIO PROSPERAR BETHEL	**NIT**	NIT.901.634.239-2	**CONTRATO N°**	1066-2022
CONTRATISTA	CONSORCIO INGENIERÍA I	**NIT**	NIT. 901.639.134-0	**CONTRATO N°**	1070-2022

3. REGISTRO FOTOGRAFICO

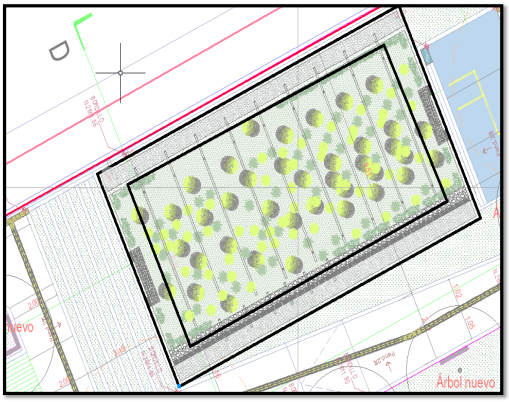

UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 17
COMENTARIOS: PLACA CONTRAPISO 3000 PSI 21MPA E=15 SUDS



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 17
COMENTARIOS: PLACA CONTRAPISO 3000 PSI 21MPA E=15 SUDS **TAMA DE MEDIDAS**



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 17
COMENTARIOS: PLACA CONTRAPISO 3000 PSI 21MPA E=15 SUDS



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 17
COMENTARIOS: PLACA CONTRAPISO 3000 PSI 21MPA E=15 SUDS-AMARRADO DE ACERO



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 17
COMENTARIOS: REPLANTEO ZONAS DURAS



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 17
COMENTARIOS:REPLANTEO ZONAS DURAS

Informe semana 11 AAU T17

CONSORCIO INGENIERÍA I

Nit. 901.639.134 - 0

AVANCE INFROME SEMANALES

No. DE ORDEN	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS		SEMANA No.11			CANTIDADES EJECUTADAS		
										11			
	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR	PROCENTAJE	CANTIDAD	VALOR	PROCENTAJE
1,00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**												
1,10	Localización y replanteo	m2	1204,00	$ 8.226,00	$ 9.904.104,00	1309,00	$ 10.767.834,00		$ -		1309,00	$ 10.767.834,00	100,00%
1,70	Cerramiento provisional de obra (Polisombra)	ml	165,45	$ 27.273,00	$ 4.512.318,00	210,45	$ 5.739.603,00		$ -		210,45	$ 5.739.602,85	100,00%
1,10	Protección de árbol de existente	un	9,00	$ 70.802,00	$ 637.218,00	9,00	$ 637.218,00		$ -		9,00	$ 637.218,00	100,00%
1,13	Protección de reillas	un		$ 16.273,00		3,00	$ 48.819,00		$ -		3,00	$ 48.819,00	100,00%
2,00	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**												
2,10	Descapote a máquina nivel 0.00 (inc. retiro) e=-20 cm	m2	1204,00	$ 14.422,00	$ 17.364.088,00	1309,00	$ 18.878.398,00		$ -		1309,00	$ 18.878.398,00	100,00%
2,20	Nivelación y perfilado de terreno manual	m2	1204,00	$ 2.640,00	$ 3.178.560,00	80,91	$ 213.602,00		$ -		80,91	$ 213.602,40	100,00%
2,30	Nivelación y Compactación de Subrasante	m2	461,00	$ 1.397,00	$ 644.017,00	1274,91	$ 1.781.049,00		$ -		1274,91	$ 1.781.049,27	100,00%
2,40	Excavación manual suelo blando	m3		$ 73.172,00		21,28	$ 1.557.100,00		$ -		21,28	$ 1.557.100,16	100,00%
2,50	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	m3	69,15	$ 109.904,00	$ 7.599.862,00	69,15	$ 7.599.862,00		$ -		35,00	$ 3.846.640,00	50,61%
2,60	Geotextil T-2400	m2	501,05	$ 11.156,00	$ 5.589.714,00	501,05	$ 5.589.714,00		$ -			$ -	
2,70	Relleno compactado Base granular	m3	69,15	$ 156.593,00	$ 10.828.406,00	69,15	$ 10.828.406,00		$ -			$ -	
2,90	Excavación mecanica+retiro	m3	138,30	$ 42.384,00	$ 5.861.707,00	687,23	$ 29.127.556,00		$ -		687,23	$ 29.127.556,32	100,00%
2,11	Relleno de rajon manual	m3		$ 166.430,00	$ -	90,00	$ 14.978.700,00		$ -		90,00	$ 14.978.700,00	100,00%
3,00	**CONCRETOS BASES Y ESTRUCTURAS**												
3,10	Placa contrapiso 3000 psi 21mpa e=15	m3	65,21	$ 1.027.855,00	$ 67.026.425,00	71,51	$ 73.501.911,00		$ -		6,30	$ 6.475.486,50	8,81%
3,30	Concreto 3000 psi 21mpa para muros (Contenedores de raíz)	m3	5,06	$ 870.250,00	$ 4.403.465,00	5,06	$ 4.403.465,00		$ -			$ -	
3,12	Concreto ciclopeo 3000 psi Cimentac+formaleta(SUDS)	m3		$ 548.326,00		52,80	$ 28.951.613,00		$ -		52,80	$ 28.951.613,00	100,00%
3,13	Dovelas	ml		$ 11.025,00		120,00	$ 1.323.000,00				120,00	$ 1.323.000,00	100,00%
4,00	**ACERO DE REFUERZO**												
4,10	Malla Electrosoldada d=5mm@0.15 (área 6x2.35)	kg	1392,60	$ 6.619,00	$ 9.217.619,00		$ -					$ -	
4,20	Refuerzo acero fy=60000psi muro	kg	43,00	$ 5.726,00	$ 246.218,00		$ -		$ -			$ -	
5,00	**REDES HIDROSANITARIAS**												
5,10	Descapote a máquina nivel 0.00 (inc. retiro) e=-1.40m	m3	160,64	$ 50.223,00	$ 8.067.823,00	238,14	$ 11.960.105,00		$ -		238,14	$ 11.960.105,22	100,00%
5,20	Concreto limpieza (alistado de terreno) e=0.05enObra	m3	1,33	$ 29.530,00	$ 39.275,00		$ -					$ -	
5,30	Taludes perimetrales en concreto fc 21 3000 psi .15	m3	13,98	$ 570.017,00	$ 7.968.838,00		$ -		$ -			$ -	
5,40	Cañuela en concreto	ml	13,90	$ 98.766,00	$ 1.372.847,00	13,90	$ 1.372.847,00		$ -			$ -	
5,50	Geotextil (NORMA) NS-088	m2	89,91	$ 11.156,00	$ 1.003.036,00	89,91	$ 1.003.036,00		$ -			$ -	
5,60	Capa drenaje (agregado Grueso)	m3	24,27	$ 147.396,00	$ 3.577.301,00	24,27	$ 3.577.301,00		$ -			$ -	
5,70	Capa filtrante (agregado Fino)	m3	4,05	$ 191.071,00	$ 773.838,00	4,05	$ 773.838,00		$ -			$ -	
5,80	Tubería perforada PVC DE 4 PUL	ml	55,71	$ 50.832,00	$ 2.831.851,00	55,71	$ 2.831.851,00		$ -			$ -	
5,90	Tubería de limpieza PVC 4 PUL	ml	18,00	$ 50.832,00	$ 914.976,00	18,00	$ 914.976,00		$ -			$ -	
5,10	Tubería de salida PVC 6 PUL	ml	2,00	$ 80.411,00	$ 160.822,00	5,60	$ 450.302,00		$ -			$ -	
5,11	Sustrato (TIERRA NEGRA+ ARENA)	m3	36,41	$ 170.501,00	$ 6.207.941,00	36,41	$ 6.207.941,00		$ -			$ -	
5,12	Piedra bola	m2	7,38	$ 41.714,00	$ 307.849,00	7,38	$ 307.849,00		$ -			$ -	
5,13	Malla Electro soldada d=5mm@0.15	kg	44,09	$ 6.619,00	$ 291.832,00		$ -		$ -			$ -	
5,14	Refuerzo acero fy=60000psi	kg	1654,00	$ 5.726,00	$ 9.470.804,00	118,75	$ 679.963,00		$ -		118,75	$ 679.963,00	100,00%
5,15	Reja sumidero	un	22,00	$ 292.310,00	$ 6.430.820,00	22,00	$ 6.430.820,00		$ -			$ -	
5,16	Nivelación y perfilado de terreno manual	m2	80,91	$ 2.640,00	$ 213.602,00		$ -		$ -			$ -	
5,17	Nivelación y Compactación de Subrasante	m2	80,91	$ 1.397,00	$ 113.031,00		$ -		$ -			$ -	
5,18	Cerramiento reja pequeña	ml	44,00	$ 47.880,00	$ 2.106.720,00	44,00	$ 2.106.720,00		$ -			$ -	
5,19	Caja de inspección .60x.60 h=1.0 **	un	2,00	$ 545.257,00	$ 1.090.514,00	2,00	$ 1.090.514,00		$ -			$ -	
6,00	**PINTURA PISO**												
6,10	Pintura a color espacio de GYM Biosaludable	m2	45,74	$ 34.389,00	$ 1.572.953,00	45,74	$ 1.572.953,00		$ -			$ -	
7,00	**ADOQUÍN, TABLETA, Y BORDILLOS**												
7,30	Tableta podotactil alerta 20*20 cm. Prefabricado en concreto color amarillo (A57)	ml	45,87	$ 86.499,00	$ 3.967.709,00	45,87	$ 3.967.709,00		$ -			$ -	
7,40	Tableta podotactil Guía 20*20 cm. Prefabricado en concreto. color amarillo (A58)	ml	109,34	$ 86.499,00	$ 9.457.801,00	109,34	$ 9.457.801,00		$ -			$ -	
7,60	Bordillo demarcado recto interno prefabricado en concreto (A80)	ml	401,56	$ 90.840,00	$ 36.477.710,00	401,56	$ 36.477.710,00	74,37	$ 6.755.697,02	18,52%	139,37	$ 12.660.297,02	34,71%
7,11	Muro bloque en concreto	m2		$ 106.588,00	$ -	60,53	$ 6.451.772,00				60,53	$ 6.451.771,64	100,00%
8,00	**PISOS EN MATERIAL RECICLADO TIPO CAUCHO**												
8,10	Piso caucho reciclado en color, para juegos infantiles	m2	63,69	$ 566.082,00	$ 36.053.763,00	63,69	$ 36.053.763,00					$ -	
10,00	**MOBILIARIO URBANO**												
10,10	Caneca metálica referencia M120 o M121.	un	4,00	$ 629.610,00	$ 2.518.440,00	4,00	$ 2.518.440,00	2,00	$ 1.259.220,00	50,00%	3,60	$ 2.266.596,00	90,00%
10,20	Silla individual referencia M-01-A	un	17,00	$ 1.491.405,00	$ 25.353.885,00	17,00	$ 25.353.885,00	10,00	$ 14.914.050,00	58,82%	16,00	$ 23.862.480,00	94,12%
10,17	Torre Columpio Deslizadero	un	1,00	$ 34.475.000,00	$ 34.475.000,00	1,00	$ 34.475.000,00	0,50	$ 17.237.500,00	50,00%	0,90	$ 31.027.500,00	90,00%
10,60	Suministro baranda M-83	ml	63,69	$ 364.707,00	$ 23.228.189,00	63,69	$ 23.228.189,00	35,00	$ 12.764.745,00	54,95%	51,00	$ 18.600.057,00	80,08%
10,70	Equipo de GYM REF flexión pierna	un	1,00	$ 4.956.332,00	$ 4.956.332,00	1,00	$ 4.956.332,00	0,50	$ 2.478.166,00	50,00%	0,90	$ 4.460.698,80	90,00%
10,80	Equipo de GYM REF Elíptica	un	1,00	$ 4.956.332,00	$ 4.956.332,00	1,00	$ 4.956.332,00	0,50	$ 2.478.166,00	50,00%	0,90	$ 4.460.698,80	90,00%
10,90	Equipo de GYM REF Giro de hombros	un	1,00	$ 3.032.332,00	$ 3.032.332,00	1,00	$ 3.032.332,00	0,50	$ 1.516.166,00	50,00%	0,90	$ 2.729.098,80	90,00%
10,10	Equipo de GYM REF Giro caminador	un	1,00	$ 4.058.332,00	$ 4.058.332,00	1,00	$ 4.058.332,00	0,50	$ 2.029.166,00	50,00%	0,90	$ 3.652.498,80	90,00%
10,50	Mesa de ajedrez en concreto	un	2,00	$ 1.541.585,00	$ 3.083.170,00	2,00	$ 3.083.170,00	1,00	$ 1.541.585,00	50,00%	1,70	$ 2.620.694,50	85,00%
10,19	Ciclo parqueadero tipo M-22 acero inoxidable	un	19,00	$ 570.462,00	$ 10.838.778,00	4,00	$ 2.281.848,00	2,00	$ 1.140.924,00	50,00%	3,50	$ 1.996.617,00	87,50%
10,20	Bolardo en hierro	un	13,00	$ 214.013,00	$ 2.782.169,00	19,00	$ 4.066.247,00	10,00	$ 2.140.130,00	52,63%	17,00	$ 3.638.221,00	89,47%
10,31	Suministro e instalación de BARRAS COMBINADAS .DIMENSIONES:: 4.59 x 1.41 x 2.65 mts	un	1,00	$ 13.651.680,00	$ 13.651.680,00	1,00	$ 13.651.680,00	0,50	$ 6.825.840,00	50,00%	0,54	$ 7.371.907,20	54,00%
11,00	**VEGETACION**												
11,10	Cobertura tipo grama	m2	399,34	$ 10.422,00	$ 4.161.921,00	399,34	$ 4.161.921,00					$ -	
11,20	Cobertura tipo floricultura	m2	48,08	$ 98.124,00	$ 4.717.802,00	48,08	$ 4.717.802,00					$ -	
11,30	Siembra de árbol (Según propuesta paisajismo)	un	6,00	$ 291.101,00	$ 1.746.606,00	6,00	$ 1.746.606,00					$ -	
11,40	Relleno en tierra negra	m3	44,74	$ 65.431,00	$ 2.927.383,00	44,74	$ 2.927.383,00					$ -	
11,50	Limo arcilloso	m3	26,48	$ 116.667,00	$ 3.089.342,00	26,48	$ 3.089.342,00					$ -	
11,60	Árbol hayuelo	un	1,00	$ 299.197,00	$ 299.197,00	1,00	$ 299.197,00					$ -	
11,70	Árbol laurel hoja pequeña	un	4,00	$ 291.101,00	$ 1.164.404,00	4,00	$ 1.164.404,00					$ -	
11,80	Árbol Carbonero Rojo	un	3,00	$ 306.086,00	$ 918.258,00	3,00	$ 918.258,00					$ -	
11,90	Árbol Calistenia	un	1,00	$ 289.533,00	$ 289.533,00	1,00	$ 289.533,00					$ -	
12,00	**SEÑALETICA**												
12,10	Señalética identificador zona de juegos infantiles	un	1,00	$ 296.774,00	$ 296.774,00	1,00	$ 296.774,00	0,50	$ 148.387,00	50,00%	0,90	$ 267.096,60	90,00%
12,20	Señalética GYM parque	un	2,00	$ 296.774,00	$ 593.548,00	2,00	$ 593.548,00	1,00	$ 296.774,00	50,00%	1,70	$ 504.515,80	85,00%
12,30	Señalética identificador	un	2,00	$ 569.478,00	$ 1.138.956,00	2,00	$ 1.138.956,00	1,00	$ 569.478,00	50,00%	1,70	$ 968.112,60	85,00%
12,40	Señalética SC-80	un	3,00	$ 454.702,00	$ 1.364.106,00	3,00	$ 1.364.106,00	1,50	$ 682.053,00	50,00%	2,50	$ 1.136.755,00	83,33%
13,00	**OTROS**												
13,10	Baño portátil Alquiler	mes	4,00	$ 398.250,00	$ 1.593.000,00		$ -					$ -	
13,20	Aseo general	m2	1204,00	$ 7.449,00	$ 8.968.596,00	1204,00	$ 8.968.596,00					$ -	
14,01	**PROVISIÓN DE OBRAS ADICIONALES**			**29478330,00**	**29.478.330,00**		**$ -**						
					$ 483.169.772,00		**$ 506.955.834,00**		**$ 74.778.047,02**	**14,75%**		**$ 265.642.304,28**	**52,40%**
	AMINISTRACIÓN		**26,00%**		**$ 125.624.141,00**		**$ 131.808.517,00**		**$ 19.442.292,23**	**14,75%**		**$ 69.066.999,11**	**52,40%**
	IMPREVISTOS		**1,00%**		**$ 4.831.698,00**		**$ 5.069.558,00**		**$ 747.780,47**	**14,75%**		**$ 2.656.423,04**	**52,40%**
	UTILIDAD		**6,00%**		**$ 28.990.186,00**		**$ 30.417.350,00**		**$ 4.486.682,82**	**14,75%**		**$ 15.938.538,26**	**52,40%**
	VALOR IVA SOBRE LA UTILIDAD				**$ -**		**$ -**		**$ -**			**$ -**	
	VALORES COSTOS INDIRECTOS				**$ 159.446.025,00**		**$ 167.295.425,00**						
	COSTO TOTAL OBRA				**$ 642.615.797,00**		**$ 674.251.259,00**						
	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO				**$ 5.403.728,00**		**$ 5.403.728,00**						
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				**$ 11.439.678,00**		**$ 11.439.678,00**						
					$ 659.459.203,00		**$ 691.094.665,00**		**$ 99.454.802,54**	**14,39%**		**$ 353.304.264,69**	**51,12%**
										14,39%			**23,95%**

	INFORME SEMANAL DE OBRA - ETAPA II					
	FRENTE DE OBRA: TERRITORIO AAUT-17					
Semana No.11	Fecha de informe	del:	**25 de marzo de 2024**	al	**31 de marzo de 2024**	

1. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA CIVIL

OBJETO:	**REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".**
CONTRATO DE OBRA No:	1070-2022
VALOR CONTRATO :	$ 2.550.000.000
CONTRATISTA	CONSORCIO INGENIERÍA I
PLAZO:	16 MESES Y TRES DÍAS
FECHA DE INICIO:	16 de diciembre de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1	20 de marzo de 2023
FECHA DE REINICIACIÓN No. 1:	5 de mayo de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.2	26 de julio de 2023
FECHA DE REINICIACIÓN No. 2:	14 de noviembre de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.3	12 de diciembre de 2024
FECHA DE REINICIACIÓN No. 3:	28 de diciembre de 2023
FECHA DE REINICIO	19 de abril de 2024
PLAZO TRANSCURRIDO	471,00 DÍAS
VALOR INICIAL	$ 2.550.000.000,00
ADICIÓN	$ 0,00
VALOR ACTULIZADO	$ 2.550.000.000,00


2. SEGUIMIENTO DE OBRA CIVIL

RESUMEN DE AVACE DE EJECUCION DE OBRA:

Proyección de ejecución

SEMANA	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	ATRASO
SEMANA No.0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SEMANA No.1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SEMANA No.2	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SEMANA No.3	0,52%	0,52%	0,00%	0,00%	-0,52%
SEMANA No.4	2,60%	3,12%	0,00%	0,00%	-3,12%
SEMANA No.5	2,60%	5,72%	0,00%	0,00%	-5,72%
SEMANA No.6	2,60%	8,32%	0,00%	0,00%	-8,32%
SEMANA No.7	3,22%	11,54%	0,00%	0,00%	-11,54%
SEMANA No.8	3,85%	15,39%	0,00%	0,00%	-15,39%
SEMANA No.9	5,82%	21,21%	0,00%	0,00%	-21,21%
SEMANA No.10	10,78%	31,99%	0,00%	0,00%	-31,99%
SEMANA No.11	15,81%	47,80%	0,00%	0,00%	-47,80%
SEMANA No.12	0,00%	47,80%	0,00%	0,00%	-47,80%
SEMANA No.13	0,00%	47,80%	0,00%	0,00%	-47,80%
SEMANA No.14	0,00%	47,80%	0,00%	0,00%	-47,80%

CURVA DE AVANCE DE ACTIVIDADES EJECUTADO VS PROGRAMADO

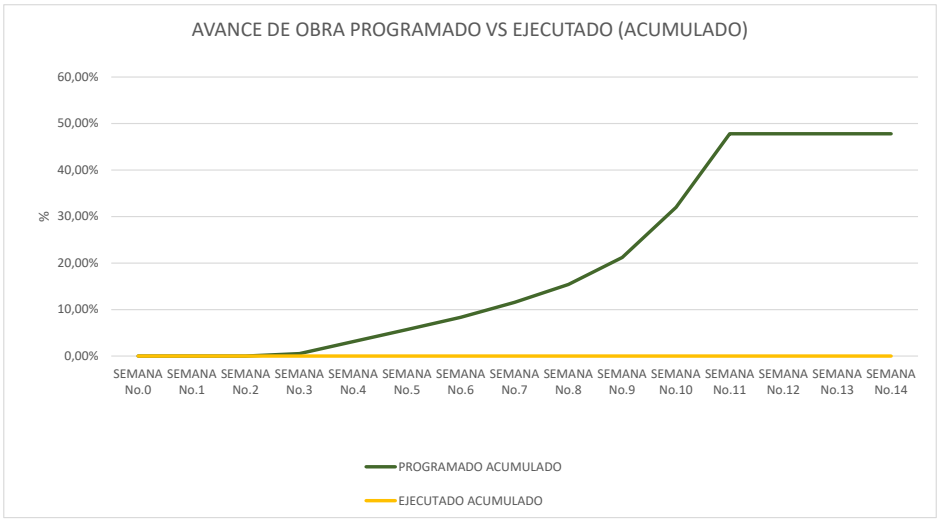

INFORME SEMANAL DE OBRA
FRENTE DE OBRA: TERRITORIO AAUT-17

SEMANA N°	**11**	**DE**	**lunes, 25 de marzo de 2024**	**A**	**domingo, 31 de marzo de 2024**
FECHA INICIO :	16/12/2022	**FECHA TERMINACION:**	19/04/2024		

IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA


OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".				
INTERVENTOR	CONSORCIO PROSPERAR BETHEL	**NIT**	NIT.901.634.239-2	**CONTRATO N°**	1066-2022
CONTRATISTA	CONSORCIO INGENIERÍA I	**NIT**	NIT. 901.639.134-0	**CONTRATO N°**	1070-2022

3. REGISTRO FOTOGRAFICO



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 17
COMENTARIOS: SUMINISTRO DE MOBILIARIO



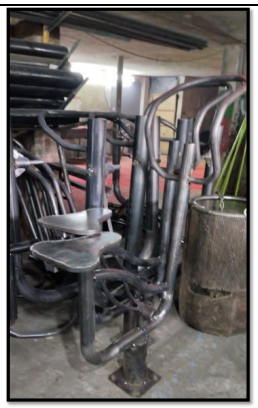

UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 17
COMENTARIOS: SUMINISTRO DE MOBILIARIO



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 17
COMENTARIOS: PLACA PARA INCIO DE MAMPOSTERIA



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 17
COMENTARIOS: SUMINITR DE BORDILLO



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 17
COMENTARIOS: INICIO DE MAMPOSTERIA



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 17
COMENTARIOS: EXCAVACION TUBERIA ZONA SUDS-TUBO DE SALIDA

Informe semana 8 AAU T20

	INFORME SEMANAL DE OBRA - ETAPA II				
	FRENTE DE OBRA: TERRITORIO AAUT-20				
Semana No.8	Fecha de informe	del:	**26 de febrero de 2024**	al	**3 de marzo de 2024**

1. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA CIVIL

OBJETO:	**REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".**
CONTRATO DE OBRA No:	1070-2022
VALOR CONTRATO :	$ 2.550.000.000
CONTRATISTA	CONSORCIO INGENIERÍA I
PLAZO:	16 MESES Y TRES DIAS
FECHA DE INICIO:	16 de diciembre de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1	20 de marzo de 2023
FECHA DE REINICIO No. 1:	5 de mayo de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.2	26 de julio de 2023
FECHA DE REINICIO No. 2:	14 de noviembre de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.3	12 de diciembre de 2024
FECHA DE REINICIO No. 3:	28 de diciembre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	19 de abril de 2024
PLAZO TRANSCURRIDO	443,00 DÍAS
VALOR INICIAL	$ 2.550.000.000,00
ADICIÓN	$ 0,00
VALOR ACTULIZADO	$ 2.550.000.000,00


2. SEGUIMIENTO DE OBRA CIVIL

RESUMEN DE AVACE DE EJECUCION DE OBRA:

Proyección de ejecución

SEMANA	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	ATRASO
SEMANA No.0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SEMANA No.1	1,23%	1,23%	0,00%	0,00%	-1,23%
SEMANA No.2	1,23%	2,46%	1,30%	1,30%	-1,16%
SEMANA No.3	2,47%	4,93%	2,61%	3,91%	-1,02%
SEMANA No.4	2,47%	7,40%	3,64%	7,55%	0,15%
SEMANA No.5	2,47%	9,87%	4,91%	12,46%	2,59%
SEMANA No.6	6,17%	16,04%	2,04%	14,50%	-1,54%
SEMANA No.7	7,06%	23,10%	7,38%	21,88%	-1,22%
SEMANA No.8	7,06%	30,16%	2,12%	24,00%	-6,16%
SEMANA No.9	0,00%	30,16%	0,00%	24,00%	-6,16%
SEMANA No.10	0,00%	30,16%	0,00%	24,00%	-6,16%
SEMANA No.11	0,00%	30,16%	0,00%	24,00%	-6,16%
SEMANA No.12	0,00%	30,16%	0,00%	24,00%	-6,16%
SEMANA No.13	0,00%	30,16%	0,00%	24,00%	-6,16%
SEMANA No.14	0,00%	30,16%	0,00%	24,00%	-6,16%

CURVA DE AVANCE DE ACTIVIDADES EJECUTADO VS PROGRAMADO

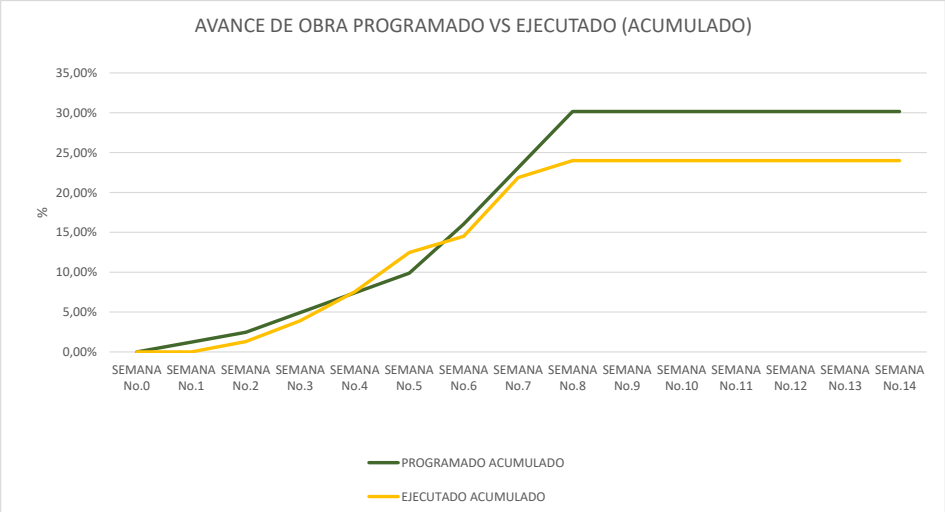


INFORME SEMANAL DE OBRA -ETAPA II
FRENTE DE OBRA: TERRITORIO AAUT-20

SEMANA N°	**8**	**DE**	**lunes, 26 de febrero de 2024**	**A**	**domingo, 3 de marzo de 2024**
FECHA INICIO :	16/12/2022	**FECHA TERMINACION:**	19/04/2024		

IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".				
INTERVENTOR	CONSORCIO PROSPERAR BETHEL	**NIT**	NIT.901.634.239-2	**CONTRATO N°**	1066-2022
CONTRATISTA	CONSORCIO INGENIERÍA I	**NIT**	NIT. 901.639.134-0	**CONTRATO N°**	1070-2022

3. REGISTRO FOTOGRAFICO

UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 20
COMENTARIOS: DEMOLICIÓN Y RETIRO DE BORDILLO PREFABRICADO



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 20
COMENTARIOS: DESCAPOTE A MÁQUINA NIVEL 0.00 (INC. RETIRO) E=-20 CM



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 20
COMENTARIOS: NIVELACIÓN Y PERFILADO DE TERRENO MANUAL- NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 20
COMENTARIOS: EXCAVACIÓN MANUAL SUELO BLANDO




UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 20
COMENTARIOS: RELLENO COMPACTADO SUBBASE GRANULAR TIPO IDRD-GEOTEXTIL T-2400



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 20
COMENTARIOS: DESCAPOTE A MÁQUINA NIVEL 0.00 (INC. RETIRO) E=-1,40M

CONSORCIO INGENIERÍA I
Nit. 901.639.134 - 0

AVANCE INFROME SEMANALES

No. DE ORDEN	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS		SEMANA No.8		
										8
	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR	PROCENTAJE
1,00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**									
1,1	Localización y replanteo	m2	512,00	$ 8.226,00	$ 4.211.712,00	517,00	$ 4.252.842,00			
1,7	Cerramiento provisional de obra (Polisombra)	ml	93,00	$ 27.273,00	$ 2.536.389,00	110,50	$ 3.013.667,00			
1,8	Demolición y retiro de Bordillo prefabricado	ml	65,00	$ 18.468,00	$ 1.200.420,00	86,30	$ 1.593.788,00		$ -	
1,9	Desmonte y retiro de juegos infantiles	un	2,00	$ 114.946,00	$ 229.892,00	2,00	$ 229.892,00			
1,10	Proteccion de arbol de existente	un	19,00	$ 70.802,00	$ 1.345.238,00	19,00	$ 1.345.238,00			
1,13	Proteccion de rejillas	un		$ 16.273,00	$ -	2,00	$ 32.546,00			
11,11	Translado de arbol pequeño	un		$ 732.656,00	$ -	1,00	$ 732.656,00			
2,00	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**									
2,1	Descapote a máquina nivel 0.00 (inc. retiro) e=-20 cm	m2	512,00	$ 14.422,00	$ 7.384.064,00	517,00	$ 7.456.174,00		$ -	
2,2	Nivelacion y perfilado de terreno manual	m2	512,00	$ 2.640,00	$ 1.351.680,00	517,00	$ 1.364.880,00		$ -	
2,3	Nivelación y Compactación de Subrasante	m2	512,00	$ 1.397,00	$ 715.264,00	517,00	$ 722.249,00		$ -	
2,4	Excavación manual suelo blando	m3	47,00	$ 73.172,00	$ 3.439.084,00	95,03	$ 6.953.535,00		$ -	
2,5	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	m3	23,00	$ 109.904,00	$ 2.527.792,00	47,10	$ 5.176.478,00		$ -	
2,6	Geotextil T-2400	m2	329,00	$ 11.156,00	$ 3.670.324,00	329,00	$ 3.670.324,00	85,00	$ 948.260,00	25,84%
2,7	Relleno compactado Base granular	m3	23,00	$ 156.593,00	$ 3.601.639,00	23,00	$ 3.601.639,00		$ -	
2,8	Excavacion muros y huellas vaciadas en concreto	m3	2,00	$ 73.172,00	$ 146.344,00	2,10	$ 153.661,00		$ -	
3,00	**CONCRETOS BASES Y ESTRUCTURAS**									
3,1	Placa contrapiso 3000 psi 21mpa e=15	m3	19,00	$ 1.027.855,00	$ 19.529.245,00	19,00	$ 19.529.245,00			
3,2	Placa contrapiso 3000 psi 21mpa para huellas en concreto	m3	1,00	$ 1.027.855,00	$ 1.027.855,00	1,00	$ 1.027.855,00			
3,3	Concreto 3000 psi 21mpa para muros (Contenedores de raiz)	m3	1,00	$ 870.250,00	$ 870.250,00	1,00	$ 870.250,00			
3,12	Concreto ciclopeo 3000 psi Cimentac+formaleta(SUDS)	M3		$ 548.326,00	$ -	8,00	$ 4.386.608,00		$ -	
4,00	**ACERO DE REFUERZO**									
4,1	Malla Electrosoldada d=5mm@0.15 (area 6x2.35)	kg	530,00	$ 6.619,00	$ 3.508.070,00	530,00	$ 3.508.070,00			
4,2	Refuerzo acero fy=60000psi muro	kg	44,00	$ 5.726,00	$ 251.944,00	44,00	$ 251.944,00			
4,3	Refuerzo acero fy=60000psi huellas de concreto	kg	127,00	$ 5.726,00	$ 727.202,00		$ -			
5,00	**REDES HIDROSANITARIAS SUDS**									
5,1	Descapote a máquina nivel 0.00 (inc. retiro) e=-1,40m	m3	97,00	$ 50.223,00	$ 4.871.631,00	112,76	$ 5.663.145,00			
5,2	Concreto limpieza (alistado de terreno) e=0.05enObra	m3	1,00	$ 29.530,00	$ 29.530,00	1,00	$ 29.530,00			
5,3	Taludes perimetrales en concreto fc 21 3000 psi .15	m3	12,00	$ 570.017,00	$ 6.840.204,00		$ -			
5,4	Cañuela en concreto	ml	9,00	$ 98.766,00	$ 888.894,00	9,00	$ 888.894,00			
5,5	Geotextil (NORMA) NS-088	m2	69,00	$ 11.156,00	$ 769.764,00	69,00	$ 769.764,00			
5,6	Capa drenaje (agregado Grueso)	m3	16,00	$ 147.396,00	$ 2.358.336,00	16,00	$ 2.358.336,00			
5,7	Capa filtrante (agregado Fino)	m3	3,00	$ 191.071,00	$ 573.213,00	3,00	$ 573.213,00			
5,8	Tuberia perforada PVC DE 4 PUL	ml	27,00	$ 50.832,00	$ 1.372.464,00	27,00	$ 1.372.464,00			
5,9	Tuberia de limpieza PVC 4 PUL	ml	10,00	$ 50.832,00	$ 508.320,00	10,00	$ 508.320,00			
5,10	Tuberia de salida PVC 6 PUL	ml	6,00	$ 80.411,00	$ 482.466,00	6,00	$ 482.466,00			
5,11	Sustrato (TIERRA NEGRA+ ARENA)	m3	23,00	$ 170.501,00	$ 3.921.523,00	23,00	$ 3.921.523,00			
5,12	Piedra bola	m2	5,00	$ 41.714,00	$ 208.570,00	5,00	$ 208.570,00			
5,13	Malla Electro soldada d=5mm@0.15	kg	68,00	$ 6.619,00	$ 450.092,00	68,00	$ 450.092,00			
5,14	Refuerzo acero fy=60000psi	kg	1512,00	$ 5.726,00	$ 8.657.712,00	400,00	$ 2.290.400,00			
5,15	Reja sumidero	un	22,00	$ 292.310,00	$ 6.430.820,00	22,00	$ 6.430.820,00			
5,16	Nivelacion y perfilado de terreno manual	m2	69,00	$ 2.640,00	$ 182.160,00	69,00	$ 182.160,00			
5,17	Nivelación y Compactación de Subrasante	m2	54,00	$ 1.397,00	$ 75.438,00	54,00	$ 75.438,00			
5,18	Cerramiento reja pequeña	ml	33,00	$ 47.880,00	$ 1.580.040,00	33,00	$ 1.580.040,00			
5,19	Caja de inspeccion .60x.60 h=1.0 **	un	34,00	$ 545.257,00	$ 18.538.738,00	4,00	$ 2.181.028,00			
6,00	**PINTURA**									
6,10	Pintura a color espacio de GYM Biosaludable	m2	21,00	$ 34.389,00	$ 722.169,00	21,00	$ 722.169,00			
7,00	**ADOQUÍN, TABLETA, Y BORDILLOS**									
7,1	Adoquin prefabricados en concreto a color, de 06*15*21 (ref.Looserna-Adoquinar)	m2	21,00	$ 69.775,00	$ 1.465.275,00	21,00	$ 1.465.275,00			
7,2	Adoquin rectangular plano demarcador visual	m2	0,57	$ 137.201,00	$ 78.589,00	0,57	$ 78.589,00			
7,3	Tableta podotactil alerta 20*20 cm. Prefabricado en concreto color amarillo (A57)	ml	23,31	$ 86.499,00	$ 2.016.292,00	23,31	$ 2.016.292,00			
7,4	Tableta podotactil Guia 20*20 cm. Prefabricado en concreto, color amarillo (A58)	ml	35,33	$ 86.499,00	$ 3.056.010,00	35,33	$ 3.056.010,00			
7,5	Bordillo demarcado recto vial prefabricado en concreto (A10)	ml	65,00	$ 85.405,00	$ 5.551.325,00	86,30	$ 7.370.452,00			
7,6	Bordillo demarcado recto interno prefabricado en concreto (A80)	ml	116,00	$ 90.840,00	$ 10.537.440,00	116,00	$ 10.537.440,00	41,00	$ 3.724.440,00	35,34%
8,00	**PISOS EN MATERIAL RECICLADO TIPO CAUCHO**									
8,1	Piso caucho reciclado en color, para juegos infantiles	m2	31,00	$ 566.082,00	$ 17.548.542,00	31,00	$ 17.548.542,00			
10,00	**MOBILIARIO URBANO**									
10,1	Caneca metalica referencia M120 o M121.	un	2,00	$ 629.610,00	$ 1.259.220,00	2,00	$ 1.259.220,00			
10,2	Silla individual referencia M-01-A	un	4,00	$ 1.491.405,00	$ 5.965.620,00	4,00	$ 5.965.620,00			
10,4	Deslizadero	un	1,00	$ 26.959.769,00	$ 26.959.769,00	1,00	$ 26.959.769,00			
10,5	Mesa de ajedrez en concreto	un	1,00	$ 1.541.585,00	$ 1.541.585,00	1,00	$ 1.541.585,00			
10,6	Suministro baranda M-83	ml	23,00	$ 364.707,00	$ 8.388.261,00	23,00	$ 8.388.261,00			
10,7	Equipo de GYM REF flexion pierna	un	1,00	$ 4.956.332,00	$ 4.956.332,00	1,00	$ 4.956.332,00			
10,8	Equipo de GYM REF Eliptica	un	1,00	$ 4.956.332,00	$ 4.956.332,00	1,00	$ 4.956.332,00			
10,9	Equipo de GYM REF Giro de hombros	un	1,00	$ 3.032.332,00	$ 3.032.332,00	1,00	$ 3.032.332,00			
10,10	Equipo de GYM REF Giro caminador	un	1,00	$ 4.058.332,00	$ 4.058.332,00	1,00	$ 4.058.332,00			
11,00	**VEGETACION**									
11,1	Cobertura tipo grama	m2	247,00	$ 10.422,00	$ 2.574.234,00	247,00	$ 2.574.234,00			
11,2	Cobertura tipo floricultura	m2	47,00	$ 98.124,00	$ 4.611.828,00	47,00	$ 4.611.828,00			
11,3	Siembra de arbol (Según propuesta paisajismo)	un	1,00	$ 291.101,00	$ 291.101,00	1,00	$ 291.101,00			
11,4	Relleno en tierra negra	m3	29,00	$ 65.431,00	$ 1.897.499,00	29,00	$ 1.897.499,00			
11,7	Arbol laurel hoja pequeña	un	1,00	$ 291.101,00	$ 291.101,00	1,00	$ 291.101,00			
12,00	**SEÑALETICA**									
12,1	Señaletica identificador zona de juegos infantiles	un	1,00	$ 296.774,00	$ 296.774,00	1,00	$ 296.774,00			
12,2	Señaletica GYM parque	un	1,00	$ 296.774,00	$ 296.774,00	1,00	$ 296.774,00			
12,3	Señaletica identificador	un	1,00	$ 569.478,00	$ 569.478,00	1,00	$ 569.478,00			
12,4	Señalitica SC-80	un	1,00	$ 454.702,00	$ 454.702,00	1,00	$ 454.702,00			
13,00	**OTROS**									
13,1	Baño portatil Alquiler	mes	4,00	$ 398.250,00	$ 1.593.000,00	4,00	$ 1.593.000,00			
13,2	Aseo general	m2	512,00	$ 7.449,00	$ 3.813.888,00	512,00	$ 3.813.888,00			
14,10	**PROVISIÓN DE OBRAS ADICIONALES**			**$ 13.959.427,00**	**$ 13.959.427,00**					
					$ 249.757.554,00		**$ 220.442.675,00**		**$ 4.672.700,00**	**2,12%**
	AMINISTRACIÓN		**26,00%**		**$ 64.936.964,00**		**$ 57.315.096,00**		**$ 1.214.902,00**	**2,12%**
	IMPREVISTOS		**1,00%**		**$ 2.497.576,00**		**$ 2.204.427,00**		**$ 46.727,00**	**2,12%**
	UTILIDAD		**6,00%**		**$ 14.985.453,00**		**$ 13.226.561,00**		**$ 280.362,00**	**2,12%**
	VALOR IVA SOBRE LA UTILIDAD				**$ -**		**$ -**		**$ -**	
	VALORES COSTOS INDIRECTOS				**$ 82.419.993,00**		**$ 72.746.084,00**			
	COSTO TOTAL OBRA				**$ 332.177.547,00**		**$ 293.188.759,00**			
	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO				**$ 4.276.988,00**		**$ 4.276.988,00**			
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				**$ 11.439.678,00**		**$ 11.439.678,00**			
					$ 347.894.213,00		**$ 308.905.425,00**		**$ 6.214.691,00**	**2,01%**
										22,78%

Informe semana 9 AAU T20

CONSORCIO INGENIERÍA I

Nit. 901.639.134 - 0

AVANCE INFROME SEMANALES

No. DE ORDEN	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS		SEMANA No.9		
								9		
	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR	PROCENTAJE
1,00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**									
4,A	Localización y replanteo	m2	512,00	$ 8.226,00	$ 4.211.712,00	517,00	$ 4.252.842,00			
4,A	Cerramiento provisional de obra (Polisombra)	ml	93,00	$ 27.273,00	$ 2.536.389,00	110,50	$ 3.013.667,00			
4,A	Demolición y retiro de Bordillo prefabricado	ml	65,00	$ 18.468,00	$ 1.200.420,00	86,30	$ 1.593.788,00		$ -	
4,A	Desmonte y retiro de juegos infantiles	un	2,00	$ 114.946,00	$ 229.892,00	2,00	$ 229.892,00			
4,A3	Proteccion de arbol de existente	un	19,00	$ 70.802,00	$ 1.345.238,00	19,00	$ 1.345.238,00			
4,A6	Proteccion de rejillas	un		$ 16.273,00	$ -	2,00	$ 32.546,00			
4,4,A4	Translado de arbol pequeño	un		$ 732.656,00	$ -	1,00	$ 732.656,00			
2,00	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**									
5,A	Descapote a máquina nivel 0.00 (inc. retiro) e=-20 cm	m2	512,00	$ 14.422,00	$ 7.384.064,00	517,00	$ 7.456.174,00		$ -	
5,A	Nivelacion y perfilado de terreno manual	m2	512,00	$ 2.640,00	$ 1.351.680,00	517,00	$ 1.364.880,00		$ -	
5,A	Nivelación y Compactación de Subrasante	m2	512,00	$ 1.397,00	$ 715.264,00	517,00	$ 722.249,00		$ -	
5,A	Excavación manual suelo blando	m3	47,00	$ 73.172,00	$ 3.439.084,00	95,03	$ 6.953.535,00		$ -	
5,A	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	m3	23,00	$ 109.904,00	$ 2.527.792,00	47,10	$ 5.176.478,00	18,00	$ 1.978.272,00	38,22%
5,A	Geotextil T-2400	m2	329,00	$ 11.156,00	$ 3.670.324,00	329,00	$ 3.670.324,00		$ -	
5,A	Relleno compactado Base granular	m3	23,00	$ 156.593,00	$ 3.601.639,00	23,00	$ 3.601.639,00		$ -	
5,A	Excavacion muros y huellas vaciadas en concreto	m3	2,00	$ 73.172,00	$ 146.344,00	2,10	$ 153.661,00		$ -	
3,00	**CONCRETOS BASES Y ESTRUCTURAS**									
6,A	Placa contrapiso 3000 psi 21mpa e=15	m3	19,00	$ 1.027.855,00	$ 19.529.245,00	21,24	$ 21.831.640,00	2,24	$ 2.302.395,20	10,55%
6,A	Placa contrapiso 3000 psi 21mpa para huellas en concreto	m3	1,00	$ 1.027.855,00	$ 1.027.855,00	1,00	$ 1.027.855,00			
6,A	Concreto 3000 psi 21mpa para muros (Contenedores de raiz)	m3	1,00	$ 870.250,00	$ 870.250,00	1,00	$ 870.250,00			
6,A5	Concreto ciclopeo 3000 psi Cimentac+formaleta(SUDS)	M3		$ 548.326,00	$ -	7,59	$ 4.161.794,00	7,59	$ 4.161.794,34	100,00%
4,00	**ACERO DE REFUERZO**									
7,A	Malla Electrosoldada d=5mm@0.15 (area 6x2.35)	kg	530,00	$ 6.619,00	$ 3.508.070,00	530,00	$ 3.508.070,00			
7,A	Refuerzo acero fy=60000psi muro	kg	44,00	$ 5.726,00	$ 251.944,00		$ -			
7,A	Refuerzo acero fy=60000psi huellas de concreto	kg	127,00	$ 5.726,00	$ 727.202,00		$ -			
5,00	**REDES HIDROSANITARIAS SUDS**									
8,A	Descapote a máquina nivel 0.00 (inc. retiro) e=-1.40m	m3	97,00	$ 50.223,00	$ 4.871.631,00	112,76	$ 5.663.145,00			
8,A	Concreto limpieza (alistado de terreno) e=0.05enObra	m3	1,00	$ 29.530,00	$ 29.530,00	1,00	$ 29.530,00			
8,A	Taludes perimetrales en concreto fc 21 3000 psi .15	m3	12,00	$ 570.017,00	$ 6.840.204,00		$ -			
8,A	Cañuela en concreto	ml	9,00	$ 98.766,00	$ 888.894,00	9,00	$ 888.894,00			
8,A	Geotextil (NORMA) NS-088	m2	69,00	$ 11.156,00	$ 769.764,00	69,00	$ 769.764,00			
8,A	Capa drenaje (agregado Grueso)	m3	16,00	$ 147.396,00	$ 2.358.336,00	16,00	$ 2.358.336,00			
8,A	Capa filtrante (agregado Fino)	m3	3,00	$ 191.071,00	$ 573.213,00	3,00	$ 573.213,00			
8,A	Tuberia perforada PVC DE 4 PUL	ml	27,00	$ 50.832,00	$ 1.372.464,00	27,00	$ 1.372.464,00			
8,A	Tuberia de limpieza PVC 4 PUL	ml	10,00	$ 50.832,00	$ 508.320,00	10,00	$ 508.320,00			
8,A3	Tuberia de salida PVC 6 PUL	ml	6,00	$ 80.411,00	$ 482.466,00	6,00	$ 482.466,00			
8,A4	Sustrato (TIERRA NEGRA+ ARENA)	m3	23,00	$ 170.501,00	$ 3.921.523,00	23,00	$ 3.921.523,00			
8,A5	Piedra bola	m2	5,00	$ 41.714,00	$ 208.570,00	5,00	$ 208.570,00			
8,A6	Malla Electro soldada d=5mm@0.15	kg	68,00	$ 6.619,00	$ 450.092,00	68,00	$ 450.092,00			
8,A7	Refuerzo acero fy=60000psi	kg	1512,00	$ 5.726,00	$ 8.657.712,00	400,00	$ 2.290.400,00			
8,A8	Reja sumidero	un	22,00	$ 292.310,00	$ 6.430.820,00	22,00	$ 6.430.820,00			
8,A9	Nivelacion y perfilado de terreno manual	m2	69,00	$ 2.640,00	$ 182.160,00		$ -			
8,A	Nivelación y Compactación de Subrasante	m2	54,00	$ 1.397,00	$ 75.438,00		$ -			
8,A	Cerramiento reja pequeña	ml	33,00	$ 47.880,00	$ 1.580.040,00	33,00	$ 1.580.040,00			
8,A<	Caja de inspeccion .60x.60 h=1.0 **	un	34,00	$ 545.257,00	$ 18.538.738,00	4,00	$ 2.181.028,00			
6,00	**PINTURA**									
6,10	Pintura a color espacio de GYM Biosaludable	m2	21,00	$ 34.389,00	$ 722.169,00	21,00	$ 722.169,00			
7,00	**ADOQUÍN, TABLETA, Y BORDILLOS**									
,A	Adoquin prefabricados en concreto a color, de 06*15*21 (ref.Looserna-Adoquinar)	m2	21,00	$ 69.775,00	$ 1.465.275,00	21,00	$ 1.465.275,00			
,A	Adoquin rectangular plano demarcador visual	m2	0,57	$ 137.201,00	$ 78.589,00	0,57	$ 78.589,00			
,A	Tableta podotactil alerta 20*20 cm. Prefabricado en concreto color amarillo (A57)	ml	23,31	$ 86.499,00	$ 2.016.292,00	23,31	$ 2.016.292,00			
,A	Tableta podotactil Guia 20*20 cm. Prefabricado en concreto, color amarillo (A58)	ml	35,33	$ 86.499,00	$ 3.056.010,00	35,33	$ 3.056.010,00			
,A	Bordillo demarcado recto vial prefabricado en concreto (A10)	ml	65,00	$ 85.405,00	$ 5.551.325,00	86,30	$ 7.370.452,00			
,A	Bordillo demarcado recto interno prefabricado en concreto (A80)	ml	116,00	$ 90.840,00	$ 10.537.440,00	116,00	$ 10.537.440,00	23,00	$ 2.089.320,00	19,83%
8,00	**PISOS EN MATERIAL RECICLADO TIPO CAUCHO**									
,A	Piso caucho reciclado en color, para juegos de niños	m2	31,00	$ 566.082,00	$ 17.548.542,00	31,00	$ 17.548.542,00			
10,00	**MOBILIARIO URBANO**									
4,3,A	Caneca metalica referencia M120 o M121.	un	2,00	$ 629.610,00	$ 1.259.220,00	2,00	$ 1.259.220,00			
4,3,A	Silla individual referencia M-01-A	un	4,00	$ 1.491.405,00	$ 5.965.620,00	4,00	$ 5.965.620,00			
4,3,A	Deslizadero	un	1,00	$ 26.959.769,00	$ 26.959.769,00	1,00	$ 26.959.769,00			
4,3,A	Mesa de ajedrez en concreto	un	1,00	$ 1.541.585,00	$ 1.541.585,00	1,00	$ 1.541.585,00			
4,3,A	Suministro baranda M-83	ml	23,00	$ 364.707,00	$ 8.388.261,00	23,00	$ 8.388.261,00			
4,3,A	Equipo de GYM REF flexion pierna	un	1,00	$ 4.956.332,00	$ 4.956.332,00	1,00	$ 4.956.332,00			
4,3,A	Equipo de GYM REF Elliptica	un	1,00	$ 4.956.332,00	$ 4.956.332,00	1,00	$ 4.956.332,00			
4,3,A	Equipo de GYM REF Giro de hombros	un	1,00	$ 3.032.332,00	$ 3.032.332,00	1,00	$ 3.032.332,00			
4,3,A3	Equipo de GYM REF Giro caminador	un	1,00	$ 4.058.332,00	$ 4.058.332,00	1,00	$ 4.058.332,00			
11,00	**VEGETACION**									
4,4,A	Cobertura tipo grama	m2	247,00	$ 10.422,00	$ 2.574.234,00	247,00	$ 2.574.234,00			
4,4,A	Cobertura tipo floricultura	m2	47,00	$ 98.124,00	$ 4.611.828,00	47,00	$ 4.611.828,00			
4,4,A	Siembra de arbol (Según propuesta paisajismo)	un	1,00	$ 291.101,00	$ 291.101,00	1,00	$ 291.101,00			
4,4,A	Relleno en tierra negra	m3	29,00	$ 65.431,00	$ 1.897.499,00	29,00	$ 1.897.499,00			
4,4,A	Arbol laurel hoja pequeña	un	1,00	$ 291.101,00	$ 291.101,00	1,00	$ 291.101,00			
12,00	**SEÑALETICA**									
4,5,A	Señaletica identificador zona de juegos infantiles	un	1,00	$ 296.774,00	$ 296.774,00	1,00	$ 296.774,00			
4,5,A	Señaletica GYM parque	un	1,00	$ 296.774,00	$ 296.774,00	1,00	$ 296.774,00			
4,5,A	Señaletica identificador	un	1,00	$ 569.478,00	$ 569.478,00	1,00	$ 569.478,00			
4,5,A	Señalitica SC-80	un	1,00	$ 454.702,00	$ 454.702,00	1,00	$ 454.702,00			
13,00	**OTROS**									
4,6,A	Baño portatil Alquiler	mes	4,00	$ 398.250,00	$ 1.593.000,00		$ -			
4,6,A	Aseo general	m2	512,00	$ 7.449,00	$ 3.813.888,00	512,00	$ 3.813.888,00			
14,10	**PROVISIÓN DE OBRAS ADICIONALES**			**$ 13.959.427,00**	**$ 13.959.427,00**					
					$ 249.757.554,00		**$ 220.417.714,00**		**$ 10.531.781,54**	**4,78%**
	AMINISTRACIÓN		**26,00%**		**$ 64.936.964,00**		**$ 57.308.606,00**		**$ 2.738.263,20**	**4,78%**
	IMPREVISTOS		**1,00%**		**$ 2.497.576,00**		**$ 2.204.177,00**		**$ 105.317,82**	**4,78%**
	UTILIDAD		**6,00%**		**$ 14.985.453,00**		**$ 13.225.063,00**		**$ 631.906,89**	**4,78%**
	VALOR IVA SOBRE LA UTILIDAD				$ -		$ -		$ -	
	VALORES COSTOS INDIRECTOS				**$ 82.419.993,00**		**$ 72.737.846,00**			
	COSTO TOTAL OBRA				**$ 332.177.547,00**		**$ 293.155.560,00**			
	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO				**$ 4.276.988,00**		**$ 4.276.988,00**			
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				**$ 11.439.678,00**		**$ 11.439.678,00**			
					$ 347.894.213,00		**$ 308.872.226,00**		**$ 14.007.269,45**	**4,53%**
										27,31%

	INFORME SEMANAL DE OBRA - ETAPA II				
	FRENTE DE OBRA: TERRITORIO AAUT-20				
Semana No.9	Fecha de informe	del:	**11 de marzo de 2024**	al	**17 de marzo de 2024**

1. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA CIVIL

OBJETO:	**REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".**
CONTRATO DE OBRA No:	1070-2022
VALOR CONTRATO :	$ 2.550.000.000
CONTRATISTA	CONSORCIO INGENIERÍA I
PLAZO:	16 MESES Y TRES DÍAS
FECHA DE INICIO:	16 de diciembre de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1	20 de marzo de 2023
FECHA DE REINICIO No. 1:	5 de mayo de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.2	26 de julio de 2023
FECHA DE REINICIO No. 2:	14 de noviembre de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.3	12 de diciembre de 2024
FECHA DE REINICIO No. 3:	28 de diciembre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	19 de abril de 2024
PLAZO TRANSCURRIDO	457,00 DÍAS
VALOR INICIAL	$ 2.550.000.000,00
ADICIÓN	$ 0,00
VALOR ACTULIZADO	$ 2.550.000.000,00


2. SEGUIMIENTO DE OBRA CIVIL

RESUMEN DE AVACE DE EJECUCION DE OBRA:

Proyección de ejecución

SEMANA	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	ATRASO
SEMANA No.0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SEMANA No.1	1,23%	1,23%	0,00%	0,00%	-1,23%
SEMANA No.2	1,23%	2,46%	1,30%	1,30%	-1,16%
SEMANA No.3	2,47%	4,93%	2,61%	3,91%	-1,02%
SEMANA No.4	2,47%	7,40%	3,64%	7,55%	0,15%
SEMANA No.5	2,47%	9,87%	4,91%	12,46%	2,59%
SEMANA No.6	6,17%	16,04%	2,04%	14,50%	-1,54%
SEMANA No.7	7,06%	23,10%	7,38%	21,88%	-1,22%
SEMANA No.8	7,06%	30,16%	2,12%	24,00%	-6,16%
SEMANA No.9	7,32%	37,48%	4,78%	28,78%	-8,70%
SEMANA No.10	0,00%	37,48%	0,00%	28,78%	-8,70%
SEMANA No.11	0,00%	37,48%	0,00%	28,78%	-8,70%
SEMANA No.12	0,00%	37,48%	0,00%	28,78%	-8,70%
SEMANA No.13	0,00%	37,48%	0,00%	28,78%	-8,70%
SEMANA No.14	0,00%	37,48%	0,00%	28,78%	-8,70%

CURVA DE AVANCE DE ACTIVIDADES EJECUTADO VS PROGRAMADO

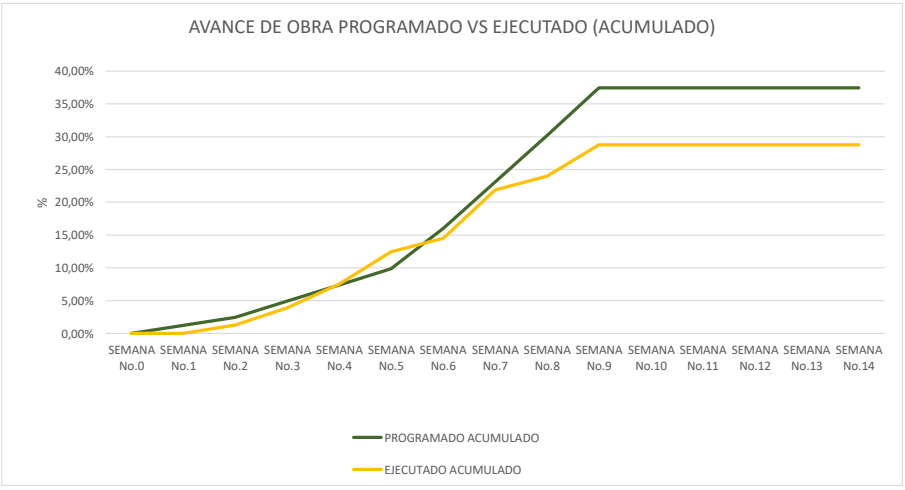

INFORME SEMANAL DE OBRA -ETAPA II
FRENTE DE OBRA: TERRITORIO AAUT-20

SEMANA N°	**9**	**DE**	**lunes, 11 de marzo de 2024**	**A**	**domingo, 17 de marzo de 2024**
FECHA INICIO :	16/12/2022	**FECHA TERMINACION:**	19/04/2024		

IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".				
INTERVENTOR	CONSORCIO PROSPERAR BETHEL	**NIT**	NIT.901.634.239-2	**CONTRATO N°**	1066-2022
CONTRATISTA	CONSORCIO INGENIERÍA I	**NIT**	NIT. 901.639.134-0	**CONTRATO N°**	1070-2022

3. REGISTRO FOTOGRAFICO



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 20
COMENTARIOS: RELLENO COMPACTADO SUBBASE GRANULAR TIPO IDRD



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 20
COMENTARIOS: PLACA CONTRAPISO 3000 PSI 21MPA E=15



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 20
COMENTARIOS: CONCRETO CICLÓPEO 3000 PSI CIMENTAC+FORMALETA(SUDS)



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 20
COMENTARIOS: CONCRETO CICLÓPEO TOMA DE MEDIDAS



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 20
COMENTARIOS: BORDILLO DEMARCADO RECTO INTERNO PREFABRICADO EN CONCRETO (A80)



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 20
COMENTARIOS: BORDILLO DEMARCADO RECTO INTERNO PREFABRICADO EN CONCRETO (A80)

Informe semana 10 AAU T20

CONSORCIO INGENIERÍA I

Nit. 901.639.134 - 0

AVANCE INFROME SEMANALES

No. DE ORDEN	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS		SEMANA No.10		
								10		
	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR	PROCENTAJE
1,00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**									
4,A	Localización y replanteo	m2	512,00	$ 8.226,00	$ 4.211.712,00	517,00	$ 4.252.842,00			
4,ñ	Cerramiento provisional de obra (Polisombra)	ml	93,00	$ 27.273,00	$ 2.536.389,00	116,50	$ 3.177.305,00	6,00	$ 163.638,00	5,15%
4,ñ	Demolición y retiro de Bordillo prefabricado	ml	65,00	$ 18.468,00	$ 1.200.420,00	86,30	$ 1.593.788,00		$ -	
4,ñ	Desmonte y retiro de juegos infantiles	un	2,00	$ 114.946,00	$ 229.892,00	2,00	$ 229.892,00			
4,A3	Protección de árbol de existente	un	19,00	$ 70.802,00	$ 1.345.238,00	19,00	$ 1.345.238,00			
4,A6	Protección de rejillas	un		$ 16.273,00	$ -	2,00	$ 32.546,00			
4,A4	Translado de arbol pequeño	un		$ 732.656,00	$ -	1,00	$ 732.656,00			
2,00	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**									
5,A	Descapote a máquina nivel 0.00 (inc. retiro) e=-20 cm	m2	512,00	$ 14.422,00	$ 7.384.064,00	517,00	$ 7.456.174,00		$ -	
5,ñ	Nivelación y perfilado de terreno manual	m2	512,00	$ 2.640,00	$ 1.351.680,00	517,00	$ 1.364.880,00		$ -	
5,6	Nivelación y Compactación de Subrasante	m2	512,00	$ 1.397,00	$ 715.264,00	517,00	$ 722.249,00		$ -	
5,7	Excavación manual suelo blando	m3	47,00	$ 73.172,00	$ 3.439.084,00	95,03	$ 6.953.535,00		$ -	
5,8	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	m3	23,00	$ 109.904,00	$ 2.527.792,00	45,00	$ 4.945.680,00	1,54	$ 169.252,16	3,42%
5,9	Geotextil T-2400	m2	329,00	$ 11.156,00	$ 3.670.324,00	329,00	$ 3.670.324,00	110,00	$ 1.227.160,00	33,43%
5,ñ	Relleno compactado Base granular	m3	23,00	$ 156.593,00	$ 3.601.639,00	23,00	$ 3.601.639,00		$ -	
5,ñ	Excavación muros y huellas vaciadas en concreto	m3	2,00	$ 73.172,00	$ 146.344,00	2,10	$ 153.661,00		$ -	
5,A4	Relleno de rajon manual	m3		$ 166.430,00	$ -	13,61	$ 2.265.112,00	13,61	$ 2.265.112,30	100,00%
3,00	**CONCRETOS BASES Y ESTRUCTURAS**									
6,A	Placa contrapiso 3000 psi 21mpa e=15	m3	19,00	$ 1.027.855,00	$ 19.529.245,00	21,24	$ 21.831.640,00		$ -	
6,ñ	Placa contrapiso 3000 psi 21mpa para huellas en concreto	m3	1,00	$ 1.027.855,00	$ 1.027.855,00	1,00	$ 1.027.855,00			
6,6	Concreto 3000 psi 21mpa para muros (Contenedores de raiz)	m3	1,00	$ 870.250,00	$ 870.250,00	1,00	$ 870.250,00			
6,A5	Concreto ciclopeo 3000 psi Cimentac+formaleta(SUDS)	m3		$ 548.326,00	$ -	7,59	$ 4.161.794,00		$ -	
6,A6	Dovelas	ml		$ 11.025,00	$ -	90,00	$ 992.250,00	65,00	$ 716.625,00	72,22%
4,00	**ACERO DE REFUERZO**									
7,A	Malla Electrosoldada d=5mm@0.15 (área 6x2.35)	kg	530,00	$ 6.619,00	$ 3.508.070,00		$ -			
7,ñ	Refuerzo acero fy=60000psi muro	kg	44,00	$ 5.726,00	$ 251.944,00		$ -			
7,6	Refuerzo acero fy=60000psi huellas de concreto	kg	127,00	$ 5.726,00	$ 727.202,00		$ -			
5,00	**REDES HIDROSANITARIAS SUDS**									
8,A	Descapote a máquina nivel 0.00 (inc. retiro) e=-1,40m	m3	97,00	$ 50.223,00	$ 4.871.631,00	112,76	$ 5.663.145,00			
8,ñ	Concreto limpieza (alistado de terreno) e=0,05enObra	m3	1,00	$ 29.530,00	$ 29.530,00		$ -			
8,6	Taludes perimetrales en concreto fc 21 3000 psi .15	m3	12,00	$ 570.017,00	$ 6.840.204,00		$ -			
8,7	Cañuela en concreto	ml	9,00	$ 98.766,00	$ 888.894,00	9,00	$ 888.894,00			
8,8	Geotextil (NORMA) NS-088	m2	69,00	$ 11.156,00	$ 769.764,00	69,00	$ 769.764,00			
8,9	Capa drenaje (agregado Grueso)	m3	16,00	$ 147.396,00	$ 2.358.336,00	16,00	$ 2.358.336,00			
8,ñ	Capa filtrante (agregado Fino)	m3	3,00	$ 191.071,00	$ 573.213,00	3,00	$ 573.213,00			
8,ñ	Tubería perforada PVC DE 4 PUL	ml	27,00	$ 50.832,00	$ 1.372.464,00	27,00	$ 1.372.464,00			
8,6	Tubería de limpieza PVC 4 PUL	ml	10,00	$ 50.832,00	$ 508.320,00	10,00	$ 508.320,00			
8,A3	Tubería de salida PVC 6 PUL	ml	6,00	$ 80.411,00	$ 482.466,00	6,00	$ 482.466,00			
8,A4	Sustrato (TIERRA NEGRA+ ARENA)	m3	23,00	$ 170.501,00	$ 3.921.523,00	23,00	$ 3.921.523,00			
8,A5	Piedra bola	m2	5,00	$ 41.714,00	$ 208.570,00	5,00	$ 208.570,00			
8,A6	Malla Electro soldada d=5mm@0.15	kg	68,00	$ 6.619,00	$ 450.092,00		$ -			
8,A7	Refuerzo acero fy=60000psi	kg	1512,00	$ 5.726,00	$ 8.657.712,00	98,57	$ 564.412,00	98,57	$ 564.411,82	100,00%
8,A8	Reja sumidero	un	22,00	$ 292.310,00	$ 6.430.820,00	22,00	$ 6.430.820,00			
8,A9	Nivelación y perfilado de terreno manual	m2	69,00	$ 2.640,00	$ 182.160,00		$ -			
8,A:	Nivelación y Compactación de Subrasante	m2	54,00	$ 1.397,00	$ 75.438,00		$ -			
8,A;	Cerramiento reja pequeña	ml	33,00	$ 47.880,00	$ 1.580.040,00	33,00	$ 1.580.040,00			
8,A<	Caja de inspección .60x.60 h=1.0 **	un	34,00	$ 545.257,00	$ 18.538.738,00	2,00	$ 1.090.514,00			
6,00	**PINTURA**									
6,10	Pintura a color espacio de GYM Biosaludable	m2	21,00	$ 34.389,00	$ 722.169,00	21,00	$ 722.169,00			
7,00	**ADOQUIN, TABLETA, Y BORDILLOS**									
:,A	Adoquín prefabricados en concreto a color, de 06*15*21 (ref.Looserna-Adoquinar)	m2	21,00	$ 69.775,00	$ 1.465.275,00	21,00	$ 1.465.275,00			
:,ñ	Adoquín rectangular plano demarcador visual	m2	0,57	$ 137.201,00	$ 78.589,00	0,57	$ 78.589,00			
:,6	Tableta podotactil alerta 20*20 cm. Prefabricado en concreto color amarillo (A57)	ml	23,31	$ 86.499,00	$ 2.016.292,00	23,31	$ 2.016.292,00			
:,7	Tableta podotactil Guía 20*20 cm. Prefabricado en concreto, color amarillo (A58)	ml	35,33	$ 86.499,00	$ 3.056.010,00	35,33	$ 3.056.010,00			
:,8	Bordillo demarcado recto vial prefabricado en concreto (A10)	ml	65,00	$ 85.405,00	$ 5.551.325,00	116,64	$ 9.961.639,00	27,00	$ 2.305.935,00	23,15%
:,9	Bordillo demarcado recto interno prefabricado en concreto (A80)	ml	116,00	$ 90.840,00	$ 10.537.440,00	116,00	$ 10.537.440,00	6,00	$ 545.040,00	5,17%
:,A4	Muro bloque en concreto	m2		$ 106.588,00	$ -	51,80	$ 5.521.258,00	48,00	$ 5.116.224,00	92,66%
8,00	**PISOS EN MATERIAL RECICLADO TIPO CAUCHO**									
;,A	Piso caucho reciclado en color, para juegos infantiles	m2	31,00	$ 566.082,00	$ 17.548.542,00	31,00	$ 17.548.542,00			
10,00	**MOBILIARIO URBANO**									
43,A	Caneca metálica referencia M120 o M121.	un	2,00	$ 629.610,00	$ 1.259.220,00	2,00	$ 1.259.220,00			
43,ñ	Silla individual referencia M-01-A	un	4,00	$ 1.491.405,00	$ 5.965.620,00	4,00	$ 5.965.620,00			
43,7	Deslizadero	un	1,00	$ 26.959.769,00	$ 26.959.769,00	1,00	$ 26.959.769,00			
43,8	Mesa de ajedrez en concreto	un	1,00	$ 1.541.585,00	$ 1.541.585,00	1,00	$ 1.541.585,00			
43,ñ	Suministro baranda M-83	ml	23,00	$ 364.707,00	$ 8.388.261,00	23,00	$ 8.388.261,00			
43,ñ	Equipo de GYM REF flexión pierna	un	1,00	$ 4.956.332,00	$ 4.956.332,00	1,00	$ 4.956.332,00			
43,ñ	Equipo de GYM REF Elíptica	un	1,00	$ 4.956.332,00	$ 4.956.332,00	1,00	$ 4.956.332,00			
43,6	Equipo de GYM REF Giro de hombros	un	1,00	$ 3.032.332,00	$ 3.032.332,00	1,00	$ 3.032.332,00			
43,A3	Equipo de GYM REF Giro caminador	un	1,00	$ 4.058.332,00	$ 4.058.332,00	1,00	$ 4.058.332,00			
11,00	**VEGETACION**									
44,A	Cobertura tipo grama	m2	247,00	$ 10.422,00	$ 2.574.234,00	247,00	$ 2.574.234,00			
44,ñ	Cobertura tipo floricultura	m2	47,00	$ 98.124,00	$ 4.611.828,00	47,00	$ 4.611.828,00			
44,6	Siembra de árbol (Según propuesta paisajismo)	un	1,00	$ 291.101,00	$ 291.101,00	1,00	$ 291.101,00			
44,7	Relleno en tierra negra	m3	29,00	$ 65.431,00	$ 1.897.499,00	29,00	$ 1.897.499,00			
44,ñ	Árbol laurel hoja pequeña	un	1,00	$ 291.101,00	$ 291.101,00	1,00	$ 291.101,00			
12,00	**SEÑALETICA**									
45,A	Señaletica identificador zona de juegos infantiles	un	1,00	$ 296.774,00	$ 296.774,00	1,00	$ 296.774,00			
45,ñ	Señaletica GYM parque	un	1,00	$ 296.774,00	$ 296.774,00	1,00	$ 296.774,00			
45,6	Señaletica identificador	un	1,00	$ 569.478,00	$ 569.478,00	1,00	$ 569.478,00			
45,7	Señalitica SC-80	un	1,00	$ 454.702,00	$ 454.702,00	1,00	$ 454.702,00			
13,00	**OTROS**									
46,A	Baño portatil Alquiler	mes	4,00	$ 398.250,00	$ 1.593.000,00		$ -			
46,ñ	Aseo general	m2	512,00	$ 7.449,00	$ 3.813.888,00	512,00	$ 3.813.888,00			
14,10	**PROVISIÓN DE OBRAS ADICIONALES**			**$ 13.959.427,00**	**$ 13.959.427,00**					
					$ 249.757.554,00		**$ 224.916.167,00**		**$ 13.073.398,28**	**5,81%**
	AMINISTRACIÓN		**26,00%**		**$ 64.936.964,00**		**$ 58.478.203,00**		**$ 3.399.083,55**	**5,81%**
	IMPREVISTOS		**1,00%**		**$ 2.497.576,00**		**$ 2.249.162,00**		**$ 130.733,98**	**5,81%**
	UTILIDAD		**6,00%**		**$ 14.985.453,00**		**$ 13.494.970,00**		**$ 784.403,90**	**5,81%**
	VALOR IVA SOBRE LA UTILIDAD				$ -		$ -		$ -	
	VALORES COSTOS INDIRECTOS				**$ 82.419.993,00**		**$ 74.222.335,00**			
	COSTO TOTAL OBRA				**$ 332.177.547,00**		**$ 299.138.502,00**			
	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO				**$ 4.276.988,00**		**$ 4.276.988,00**			
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				**$ 11.439.678,00**		**$ 11.439.678,00**			
					$ 347.894.213,00		**$ 314.855.168,00**		**$ 17.387.619,71**	**5,52%**
										32,32%

	INFORME SEMANAL DE OBRA - ETAPA II				
	FRENTE DE OBRA: TERRITORIO AAUT-20				
Semana No.10	Fecha de informe	del:	**18 de marzo de 2024**	al	**24 de marzo de 2024**

1. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA CIVIL

OBJETO:	**REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".**
CONTRATO DE OBRA No:	1070-2022
VALOR CONTRATO :	$ 2.550.000.000
CONTRATISTA	CONSORCIO INGENIERÍA I
PLAZO:	16 MESES Y TRES DÍAS
FECHA DE INICIO:	16 de diciembre de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1	20 de marzo de 2023
FECHA DE REINICIO No. 1:	5 de mayo de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.2	26 de julio de 2023
FECHA DE REINICIO No. 2:	14 de noviembre de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.3	12 de diciembre de 2024
FECHA DE REINICIO No. 3:	28 de diciembre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	19 de abril de 2024
PLAZO TRANSCURRIDO	464,00 DÍAS
VALOR INICIAL	$ 2.550.000.000,00
ADICIÓN	$ 0,00
VALOR ACTULIZADO	$ 2.550.000.000,00


2. SEGUIMIENTO DE OBRA CIVIL

RESUMEN DE AVACE DE EJECUCION DE OBRA:

Proyección de ejecución

SEMANA	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	ATRASO
SEMANA No.0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SEMANA No.1	1,23%	1,23%	0,00%	0,00%	-1,23%
SEMANA No.2	1,23%	2,46%	1,27%	1,27%	-1,19%
SEMANA No.3	2,47%	4,93%	2,56%	3,83%	-1,10%
SEMANA No.4	2,47%	7,40%	3,57%	7,40%	0,00%
SEMANA No.5	2,47%	9,87%	4,81%	12,21%	2,34%
SEMANA No.6	4,41%	14,28%	2,00%	14,21%	-0,07%
SEMANA No.7	4,41%	18,69%	7,23%	21,44%	2,75%
SEMANA No.8	4,41%	23,10%	2,08%	23,52%	0,42%
SEMANA No.9	5,47%	28,57%	4,68%	28,20%	-0,37%
SEMANA No.10	7,32%	35,89%	5,81%	34,01%	-1,88%
SEMANA No.11	0,00%	35,89%	0,00%	34,01%	-1,88%
SEMANA No.12	0,00%	35,89%	0,00%	34,01%	-1,88%
SEMANA No.13	0,00%	35,89%	0,00%	34,01%	-1,88%
SEMANA No.14	0,00%	35,89%	0,00%	34,01%	-1,88%

CURVA DE AVANCE DE ACTIVIDADES EJECUTADO VS PROGRAMADO

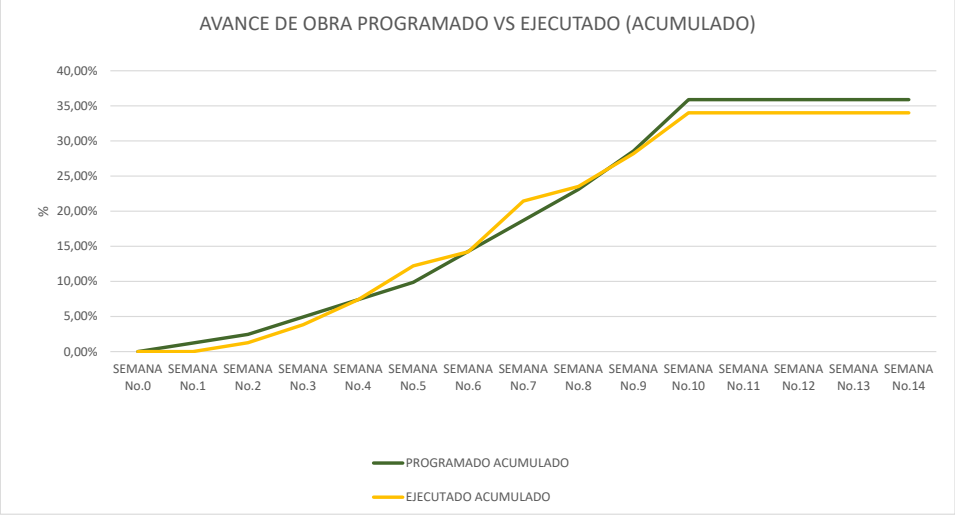


INFORME SEMANAL DE OBRA -ETAPA II
FRENTE DE OBRA: TERRITORIO AAUT-20

SEMANA N°	**10**	**DE**	**lunes, 18 de marzo de 2024**	**A**	**domingo, 24 de marzo de 2024**
FECHA INICIO :	16/12/2022	**FECHA TERMINACION:**	19/04/2024		

IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".				
INTERVENTOR	CONSORCIO PROSPERAR BETHEL	**NIT**	NIT.901.634.239-2	**CONTRATO N°**	1066-2022
CONTRATISTA	CONSORCIO INGENIERÍA I	**NIT**	NIT. 901.639.134-0	**CONTRATO N°**	1070-2022

3. REGISTRO FOTOGRAFICO

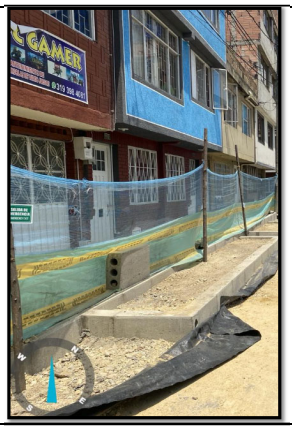

UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 20
COMENTARIOS: CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA (POLISOMBRA)



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 20
COMENTARIOS: RELLENO COMPACTADO SUBBASE GRANULAR TIPO IDRD-GEOTEXTIL T-2400



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 20
COMENTARIOS: RELLENO DE RAJON MANUAL



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 20
COMENTARIOS:DOVELAS -REFUERZO ACERO FY=60000PSI



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 20
COMENTARIOS: BORDILLO DEMARCADO RECTO VIAL PREFABRICADO EN CONCRETO (A10)- BORDILLO DEMARCADO RECTO INTERNO PREFABRICADO EN CONCRETO (A80)



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 20
COMENTARIOS:MURO BLOQUE EN CONCRETO

Informe semana 11 AAU T20

CONSORCIO INGENIERÍA I
Nit. 901.639.134 - 0

AVANCE INFROME SEMANALES

No. DE ORDEN	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS		SEMANA No.11			CANTIDADES EJECUTADAS		
										11			
	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR	PROCENTAJE	CANTIDAD	VALOR	PORCENTAJE
1,00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**												
1,1	Localización y replanteo	m2	512,00	$ 8.226,00	$ 4.211.712,00	517,00	$ 4.252.842,00				517,00	$ 4.252.842,00	100,00%
1,7	Cerramiento provisional de obra (Polisombra)	ml	93,00	$ 27.273,00	$ 2.536.389,00	116,50	$ 3.177.305,00				116,50	$ 3.177.345,49	100,00%
1,8	Demolición y retiro de Bordillo prefabricado	ml	65,00	$ 18.468,00	$ 1.200.420,00	86,30	$ 1.593.788,00		$ -		86,30	$ 1.593.788,40	100,00%
1,9	Desmonte y retiro de juegos infantiles	un	2,00	$ 114.946,00	$ 229.892,00	2,00	$ 229.892,00				2,00	$ 229.892,00	100,00%
1,10	Protección de árbol de existente	un	19,00	$ 70.802,00	$ 1.345.238,00	19,00	$ 1.345.238,00				19,00	$ 1.345.238,00	100,00%
1,13	Protección de rejillas	un		$ 16.273,00	$ -	2,00	$ 32.546,00				2	$ 32.546,00	100,00%
11,11	Traslado de árbol pequeño	un		$ 732.656,00	$ -	1,00	$ 732.656,00				1	$ 732.656,00	100,00%
2,00	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**												
2,1	Descapote a máquina nivel 0.00 (inc. retiro) e=-20 cm	m2	512,00	$ 14.422,00	$ 7.384.064,00	517,00	$ 7.456.174,00		$ -		517,00	$ 7.456.174,00	100,00%
2,2	Nivelación y perfilado de terreno manual	m2	512,00	$ 2.640,00	$ 1.351.680,00	517,00	$ 1.364.880,00		$ -		517,00	$ 1.364.880,00	100,00%
2,3	Nivelación y Compactación de Subrasante	m2	512,00	$ 1.397,00	$ 715.264,00	517,00	$ 722.249,00		$ -		517,00	$ 722.249,00	100,00%
2,4	Excavación manual suelo blando	m3	47,00	$ 73.172,00	$ 3.439.084,00	95,03	$ 6.953.535,00		$ -		95,03	$ 6.953.535,16	100,00%
2,5	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	m3	23,00	$ 109.904,00	$ 2.527.792,00	45,00	$ 4.945.680,00				45,00	$ 4.945.680,00	100,00%
2,6	Geotextil T-2400	m2	329,00	$ 11.156,00	$ 3.670.324,00	347,65	$ 3.878.383,00				268,25	$ 2.992.597,00	77,16%
2,7	Relleno compactado Base granular	m3	23,00	$ 156.593,00	$ 3.601.639,00	23,00	$ 3.601.639,00		$ -			$ -	
2,8	Excavación muros y huellas vaciadas en concreto	m3	2,00	$ 73.172,00	$ 146.344,00	2,10	$ 153.661,00		$ -		2,10	$ 153.661,20	100,00%
2,11	Relleno de rajon manual	m3		$ 166.430,00	$ -	22,68	$ 3.774.632,00				22,68	$ 3.774.632,00	100,00%
3,00	**CONCRETOS BASES Y ESTRUCTURAS**												
3,1	Placa contrapiso 3000 psi 21mpa e=15	m3	19,00	$ 1.027.855,00	$ 19.529.245,00	21,24	$ 21.831.640,00		$ -		2,24	$ 2.302.395,20	10,55%
3,2	Placa contrapiso 3000 psi 21mpa para huellas en concreto	m3	1,00	$ 1.027.855,00	$ 1.027.855,00	1,00	$ 1.027.855,00					$ -	
3,3	Concreto 3000 psi 21mpa para muros (Contenedores de raiz)	m3	1,00	$ 870.250,00	$ 870.250,00	1,00	$ 870.250,00					$ -	
3,12	Concreto ciclopeo 3000 psi Cimentac+formaleta(SUDS)	m3		$ 548.326,00	$ -	7,60	$ 4.167.278,00		$ -		7,60	$ 4.167.278,00	100,00%
3,13	Dovelas	ml		$ 11.025,00	$ -	90,00	$ 992.250,00				90,00	$ 992.250,00	100,00%
4,00	**ACERO DE REFUERZO**												
4,1	Malla Electrosoldada d=5mm@0.15 (área 6x2.35)	kg	530,00	$ 6.619,00	$ 3.508.070,00		$ -					$ -	
4,2	Refuerzo acero fy=60000psi muro	kg	44,00	$ 5.726,00	$ 251.944,00		$ -					$ -	
4,3	Refuerzo acero fy=60000psi huellas de concreto	kg	127,00	$ 5.726,00	$ 727.202,00		$ -					$ -	
5,00	**REDES HIDROSANITARIAS SUDS**												
5,1	Descapote a máquina nivel 0.00 (inc. retiro) e=-1,40m	m3	97,00	$ 50.223,00	$ 4.871.631,00	112,76	$ 5.663.145,00				112,76	$ 5.663.145,48	100,00%
5,2	Concreto limpieza (alistado de terreno) e=0.05enObra	m3	1,00	$ 29.530,00	$ 29.530,00		$ -					$ -	
5,3	Taludes perimetrales en concreto fc 21.3000 psi .15	m3	12,00	$ 570.017,00	$ 6.840.204,00		$ -					$ -	
5,4	Cañuela en concreto	ml	9,00	$ 98.766,00	$ 888.894,00	9,00	$ 888.894,00					$ -	
5,5	Geotextil (NORMA) NS-088	m2	69,00	$ 11.156,00	$ 769.764,00	69,00	$ 769.764,00					$ -	
5,6	Capa drenaje (agregado Grueso)	m3	16,00	$ 147.396,00	$ 2.358.336,00	16,00	$ 2.358.336,00					$ -	
5,7	Capa filtrante (agregado Fino)	m3	3,00	$ 191.071,00	$ 573.213,00	3,00	$ 573.213,00					$ -	
5,8	Tubería perforada PVC DE 4 PUL	ml	27,00	$ 50.832,00	$ 1.372.464,00	27,00	$ 1.372.464,00					$ -	
5,9	Tubería de limpieza PVC 4 PUL	ml	10,00	$ 50.832,00	$ 508.320,00	10,00	$ 508.320,00					$ -	
5,10	Tubería de salida PVC 6 PUL	ml	6,00	$ 80.411,00	$ 482.466,00	6,00	$ 482.466,00					$ -	
5,11	Sustrato (TIERRA NEGRA+ ARENA)	m3	23,00	$ 170.501,00	$ 3.921.523,00	23,00	$ 3.921.523,00					$ -	
5,12	Piedra bola	m2	5,00	$ 41.714,00	$ 208.570,00	5,00	$ 208.570,00					$ -	
5,13	Malla Electro soldada d=5mm@0.15	kg	68,00	$ 6.619,00	$ 450.092,00		$ -					$ -	
5,14	Refuerzo acero fy=60000psi	kg	1512,00	$ 5.726,00	$ 8.657.712,00	98,78	$ 565.614,00				98,78	$ 565.614,01	100,00%
5,15	Reja sumidero	un	22,00	$ 292.310,00	$ 6.430.820,00	22,00	$ 6.430.820,00					$ -	
5,16	Nivelación y perfilado de terreno manual	m2	69,00	$ 2.640,00	$ 182.160,00		$ -					$ -	
5,17	Nivelación y Compactación de Subrasante	m2	54,00	$ 1.397,00	$ 75.438,00		$ -					$ -	
5,18	Cerramiento reja pequeña	ml	33,00	$ 47.880,00	$ 1.580.040,00	33,00	$ 1.580.040,00					$ -	
5,19	Caja de inspección .60x.60 h=1,0 **	un	34,00	$ 545.257,00	$ 18.538.738,00	2,00	$ 1.090.514,00					$ -	
5,201	Pañete impermeab. Muro	m2		$ 42.506,00	$ -	43,62	$ 1.854.112,00				43,62	$ 1.854.111,72	100,00%
6,00	**PINTURA**												
6,10	Pintura a color espacio de GYM Ricsaludable	m2	21,00	$ 34.389,00	$ 722.169,00	21,00	$ 722.169,00					$ -	
7,00	**ADOQUIN, TABLETA, Y BORDILLOS**												
7,1	Adoquín prefabricados en concreto a color, de 06*15*21 (ref.Looserna-Adoquinar)	m2	21,00	$ 69.775,00	$ 1.465.275,00	21,00	$ 1.465.275,00						
7,2	Adoquín rectangular plano demarcador visual	m2	0,57	$ 137.201,00	$ 78.589,00	0,57	$ 78.589,00					$ -	
7,3	Tableta podotactil alerta 20*20 cm. Prefabricado en concreto color amarillo (A57)	ml	23,31	$ 86.499,00	$ 2.016.292,00	23,31	$ 2.016.292,00					$ -	
7,4	Tableta podotactil Guia 20*20 cm. Prefabricado en concreto, color amarillo (A58)	ml	35,33	$ 86.499,00	$ 3.056.010,00	35,33	$ 3.056.010,00					$ -	
7,5	Bordillo demarcado recto vial prefabricado en concreto (A10).	ml	65,00	$ 85.405,00	$ 5.551.325,00	101,70	$ 8.685.689,00				101,70	$ 8.685.689,00	100,00%
7,6	Bordillo demarcado recto interno prefabricado en concreto (A80)	ml	116,00	$ 90.840,00	$ 10.537.440,00	122,70	$ 11.146.068,00				122,70	$ 11.146.068,00	100,00%
7,11	Muro bloque en concreto	m2		$ 106.588,00	$ -	51,80	$ 5.521.258,00				51,80	$ 5.521.257,99	100,00%
8,00	**PISOS EN MATERIAL RECICLADO TIPO CAUCHO**												
8,1	Piso caucho reciclado en color, para juegos infantiles	m2	31,00	$ 566.082,00	$ 17.548.542,00	31,00	$ 17.548.542,00					$ -	
10,00	**MOBILIARIO URBANO**												
10,1	Caneca metálica referencia M120 o M121.	un	2,00	$ 629.610,00	$ 1.259.220,00	2,00	$ 1.259.220,00	1,00	$ 629.610,00	50,00%	1,90	$ 1.196.259,00	95,00%
10,2	Silla individual referencia M-01-A	un	4,00	$ 1.491.405,00	$ 5.965.620,00	4,00	$ 5.965.620,00	2,00	$ 2.982.810,00	50,00%	3,80	$ 5.667.339,00	95,00%
10,4	Deslizadero	un	1,00	$ 26.959.769,00	$ 26.959.769,00	1,00	$ 26.959.769,00	0,50	$ 13.479.884,50	50,00%	0,90	$ 24.263.792,10	90,00%
10,5	Mesa de ajedrez en concreto	un	1,00	$ 1.541.585,00	$ 1.541.585,00	1,00	$ 1.541.585,00	0,50	$ 770.792,50	50,00%	0,90	$ 1.387.426,50	90,00%
10,6	Suministro baranda M-83	ml	23,00	$ 364.707,00	$ 8.388.261,00	23,00	$ 8.388.261,00	12,00	$ 4.376.484,00	52,17%	21,00	$ 7.658.847,00	91,30%
10,7	Equipo de GYM REF flexión pierna	un	1,00	$ 4.956.332,00	$ 4.956.332,00	1,00	$ 4.956.332,00	0,50	$ 2.478.166,00	50,00%	0,90	$ 4.460.698,80	90,00%
10,8	Equipo de GYM REF Elíptica	un	1,00	$ 4.956.332,00	$ 4.956.332,00	1,00	$ 4.956.332,00	0,50	$ 2.478.166,00	50,00%	0,90	$ 4.460.698,80	90,00%
10,9	Equipo de GYM REF Giro de hombros	un	1,00	$ 3.032.332,00	$ 3.032.332,00	1,00	$ 3.032.332,00	0,50	$ 1.516.166,00	50,00%	0,90	$ 2.729.098,80	90,00%
10,10	Equipo de GYM REF Giro caminador	un	1,00	$ 4.058.332,00	$ 4.058.332,00	1,00	$ 4.058.332,00	0,50	$ 2.029.166,00	50,00%	0,90	$ 3.652.498,80	90,00%
11,00	**VEGETACION**												
11,1	Cobertura tipo grama	m2	247,00	$ 10.422,00	$ 2.574.234,00	247,00	$ 2.574.234,00					$ -	
11,2	Cobertura tipo floricultura	m2	47,00	$ 98.124,00	$ 4.611.828,00	47,00	$ 4.611.828,00					$ -	
11,3	Siembra de árbol (Según propuesta paisaismo)	un	1,00	$ 291.101,00	$ 291.101,00	1,00	$ 291.101,00					$ -	
11,4	Relleno en tierra negra	m3	29,00	$ 65.431,00	$ 1.897.499,00	29,00	$ 1.897.499,00					$ -	
11,7	Árbol laurel hoja pequeña	un	1,00	$ 291.101,00	$ 291.101,00	1,00	$ 291.101,00					$ -	
12,00	**SEÑALETICA**												
12,1	Señalética identificador zona de juegos infantiles	un	1,00	$ 296.774,00	$ 296.774,00	1,00	$ 296.774,00	0,50	$ 148.387,00	50,00%	0,90	$ 267.096,60	90,00%
12,2	Señalética GYM parque	un	1,00	$ 296.774,00	$ 296.774,00	1,00	$ 296.774,00	0,50	$ 148.387,00	50,00%	0,90	$ 267.096,60	90,00%
12,3	Señalética identificador	un	1,00	$ 569.478,00	$ 569.478,00	1,00	$ 569.478,00	0,50	$ 284.739,00	50,00%	0,90	$ 512.530,20	90,00%
12,4	Señalética SC-80	un	1,00	$ 454.702,00	$ 454.702,00	1,00	$ 454.702,00	0,50	$ 227.351,00	50,00%	0,90	$ 409.231,80	90,00%
13,00	**OTROS**												
13,1	Baño portátil Alquiler	mes	4,00	$ 398.250,00	$ 1.593.000,00		$ -					$ -	
13,2	Aseo general	m2	512,00	$ 7.449,00	$ 3.813.888,00	512,00	$ 3.813.888,00					$ -	
14,10	**PROVISIÓN DE OBRAS ADICIONALES**			**$ 13.959.427,00**	**$ 13.959.427,00**								
					$ 249.757.554,00		**$ 227.827.222,00**		**$ 31.550.109,00**	**13,85%**		**$ 137.558.139,65**	**60,38%**
	ADMINISTRACIÓN		**26,00%**		**$ 64.936.964,00**		**$ 59.235.078,00**		**$ 8.203.028,34**	**13,85%**		**$ 35.765.116,31**	**60,38%**
	IMPREVISTOS		**1,00%**		**$ 2.497.576,00**		**$ 2.278.272,00**		**$ 315.501,09**	**13,85%**		**$ 1.375.581,40**	**60,38%**
	UTILIDAD		**6,00%**		**$ 14.985.453,00**		**$ 13.669.633,00**		**$ 1.893.006,54**	**13,85%**		**$ 8.253.488,38**	**60,38%**
	VALOR IVA SOBRE LA UTILIDAD				$ -		$ -		$ -			$ -	
	VALORES COSTOS INDIRECTOS				**$ 82.419.993,00**		**$ 75.182.983,00**						
	COSTO TOTAL OBRA				**$ 332.177.547,00**		**$ 303.010.205,00**						
	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO				**$ 4.276.988,00**		**$ 4.276.988,00**						
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				**$ 11.439.678,00**		**$ 11.439.678,00**						
					$ 347.894.213,00		**$ 318.726.871,00**		**$ 41.961.644,97**	**13,17%**		**$ 182.952.325,74**	**57,40%**
										44,68%			**31,51%**

	INFORME SEMANAL DE OBRA - ETAPA II				
	FRENTE DE OBRA: TERRITORIO AAUT-20				
Semana No.11	Fecha de informe	del:	**25 de marzo de 2024**	al	**31 de marzo de 2024**

1. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA CIVIL

OBJETO:	**REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".**
CONTRATO DE OBRA No:	1070-2022
VALOR CONTRATO :	$ 2.550.000.000
CONTRATISTA	CONSORCIO INGENIERÍA I
PLAZO:	16 MESES Y TRES DÍAS
FECHA DE INICIO:	16 de diciembre de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1	20 de marzo de 2023
FECHA DE REINICIO No. 1:	5 de mayo de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.2	26 de julio de 2023
FECHA DE REINICIO No. 2:	14 de noviembre de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.3	12 de diciembre de 2024
FECHA DE REINICIO No. 3:	28 de diciembre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	19 de abril de 2024
PLAZO TRANSCURRIDO	471,00 DÍAS
VALOR INICIAL	$ 2.550.000.000,00
ADICIÓN	$ 0,00
VALOR ACTULIZADO	$ 2.550.000.000,00


2. SEGUIMIENTO DE OBRA CIVIL

RESUMEN DE AVACE DE EJECUCION DE OBRA:

Proyección de ejecución

SEMANA	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	ATRASO
SEMANA No.0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SEMANA No.1	1,23%	1,23%	0,00%	0,00%	-1,23%
SEMANA No.2	1,23%	2,46%	0,00%	0,00%	-2,46%
SEMANA No.3	2,47%	4,93%	0,00%	0,00%	-4,93%
SEMANA No.4	2,47%	7,40%	0,00%	0,00%	-7,40%
SEMANA No.5	2,47%	9,87%	0,00%	0,00%	-9,87%
SEMANA No.6	4,41%	14,28%	0,00%	0,00%	-14,28%
SEMANA No.7	4,41%	18,69%	0,00%	0,00%	-18,69%
SEMANA No.8	4,41%	23,10%	0,00%	0,00%	-23,10%
SEMANA No.9	5,47%	28,57%	0,00%	0,00%	-28,57%
SEMANA No.10	7,32%	35,89%	0,00%	0,00%	-35,89%
SEMANA No.11	14,28%	50,17%	0,00%	0,00%	-50,17%
SEMANA No.12	0,00%	50,17%	0,00%	0,00%	-50,17%
SEMANA No.13	0,00%	50,17%	0,00%	0,00%	-50,17%
SEMANA No.14	0,00%	50,17%	0,00%	0,00%	-50,17%

CURVA DE AVANCE DE ACTIVIDADES EJECUTADO VS PROGRAMADO

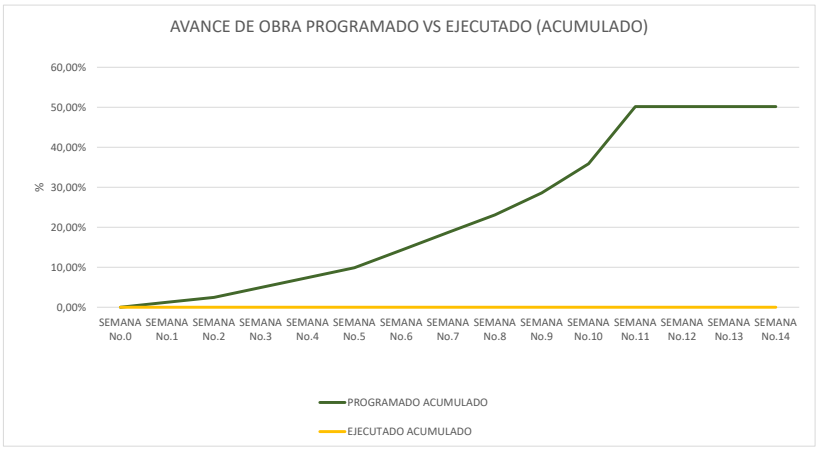

INFORME SEMANAL DE OBRA -ETAPA II
FRENTE DE OBRA: TERRITORIO AAUT-20

SEMANA N°	**11**	**DE**	**lunes, 25 de marzo de 2024**	**A**	**domingo, 31 de marzo de 2024**
FECHA INICIO :	16/12/2022	**FECHA TERMINACION:**	19/04/2024		

IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".				
INTERVENTOR	CONSORCIO PROSPERAR BETHEL	**NIT**	NIT.901.634.239-2	**CONTRATO N°**	1066-2022
CONTRATISTA	CONSORCIO INGENIERÍA I	**NIT**	NIT. 901.639.134-0	**CONTRATO N°**	1070-2022

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 20
COMENTARIOS: SUMINISTRO DE MOBILIARIO



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 20
COMENTARIOS: SUMINISTRO DE MOBILIARIO



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 20
COMENTARIOS: RETIRO RCD



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 20
COMENTARIOS:DESCAPOTE PARA ZONA VERDE



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 20
COMENTARIOS: ACOPIO DE RCD



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 20
COMENTARIOS:SUDS

Informe semana 8 AAU T21

	INFORME SEMANAL DE OBRA - ETAPA II				
	FRENTE DE OBRA: TERRITORIO AAUT-21				
Semana No.8	Fecha de informe	del:	**4 de marzo de 2024**	al	**10 de marzo de 2024**

1. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA CIVIL

OBJETO:	**REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".**
CONTRATO DE OBRA No:	1070-2022
VALOR CONTRATO :	$ 2.550.000.000
CONTRATISTA	CONSORCIO INGENIERÍA I
PLAZO:	16 MESES Y TRES DIAS
FECHA DE INICIO:	16 de diciembre de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1	20 de marzo de 2023
FECHA DE REINICIACIÓN No. 1:	5 de mayo de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.2	26 de julio de 2023
FECHA DE REINICIACIÓN No. 2:	14 de noviembre de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.3	12 de diciembre de 2024
FECHA DE REINICIACIÓN No. 3:	28 de diciembre de 2023
FECHA DE REINICIO	19 de abril de 2024
PLAZO TRANSCURRIDO	450,00 DÍAS
VALOR INICIAL	$ 2.550.000.000,00
ADICIÓN	$ 0,00
VALOR ACTULIZADO	$ 2.550.000.000,00


2. SEGUIMIENTO DE OBRA CIVIL

RESUMEN DE AVACE DE EJECUCION DE OBRA:

Proyección de ejecución

SEMANA	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	ATRASO
SEMANA No.0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SEMANA No.1	1,07%	1,07%	1,01%	1,01%	-0,06%
SEMANA No.2	1,07%	2,14%	3,68%	4,69%	2,55%
SEMANA No.3	2,15%	4,29%	3,89%	8,58%	4,29%
SEMANA No.4	2,15%	6,44%	2,06%	10,64%	4,20%
SEMANA No.5	2,15%	8,59%	2,23%	12,87%	4,28%
SEMANA No.6	4,83%	13,42%	1,04%	13,91%	0,49%
SEMANA No.7	5,37%	18,79%	2,46%	16,37%	-2,42%
SEMANA No.8	5,37%	24,16%	5,63%	22,00%	-2,16%
SEMANA No.9	0,00%	24,16%	0,00%	22,00%	-2,16%
SEMANA No.10	0,00%	24,16%	0,00%	22,00%	-2,16%
SEMANA No.11	0,00%	24,16%	0,00%	22,00%	-2,16%
SEMANA No.12	0,00%	24,16%	0,00%	22,00%	-2,16%
SEMANA No.13	0,00%	24,16%	0,00%	22,00%	-2,16%
SEMANA No.14	0,00%	24,16%	0,00%	22,00%	-2,16%

CURVA DE AVANCE DE ACTIVIDADES EJECUTADO VS PROGRAMADO

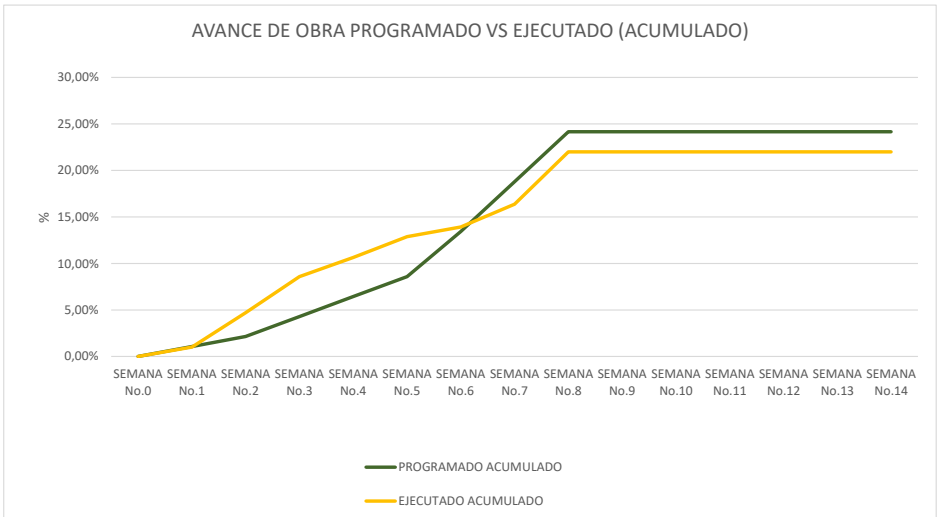

INFORME SEMANAL DE OBRA -ETAPA II
FRENTE DE OBRA: TERRITORIO AAU 21

SEMANA N°	**8**	**DE**	**lunes, 4 de marzo de 2024**	**A**	**domingo, 10 de marzo de 2024**
FECHA INICIO :	16/12/2022	**FECHA TERMINACION:**	19/04/2024		

IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".				
INTERVENTOR	CONSORCIO PROSPERAR BETHEL	**NIT**	NIT.901.634.239-2	**CONTRATO N°**	1066-2022
CONTRATISTA	CONSORCIO INGENIERÍA I	**NIT**	NIT. 901.639.134-0	**CONTRATO N°**	1070-2022

REGISTRO FOTOGRAFICO



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 21
COMENTARIOS:



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 21
COMENTARIOS:



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 21
COMENTARIOS:



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 21
COMENTARIOS:



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 21
COMENTARIOS:



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 21
COMENTARIOS:

CONSORCIO INGENIERÍA I

Nit. 901.639.134 - 0

AVANCE INFROME SEMANALES

No. DE ORDEN	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS		SEMANA No.8		
										8
	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR	PROCENTAJE
1,00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**									
1,10	Localización y replanteo	m2	584,00	$ 8.226,00	$ 4.803.984,00	590,00	$ 4.853.332,00			
1,70	Cerramiento provisional de obra (Polisombra)	ml	99,00	$ 27.273,00	$ 2.700.027,00	116,90	$ 3.188.214,00	15,90	$ 433.640,70	13,60%
1,80	Demolición y retiro de Bordillo prefabricado	ml	99,00	$ 18.468,00	$ 1.828.332,00	207,24	$ 3.827.308,00			
1,90	Desmonte y retiro de juegos infantiles	un	1,00	$ 114.946,00	$ 114.946,00	2,00	$ 229.892,00			
1,10	Protección de árbol de existente	un	6,00	$ 70.802,00	$ 424.812,00	6,00	$ 424.812,00			
1,11	Desmonte y retiro de baranda	ml	16,00	$ 12.784,00	$ 204.544,00	16,20	$ 207.101,00			
1,12	Desmonte de adoquín	m2	100,00	$ 14.932,00	$ 1.493.200,00	118,84	$ 1.774.519,00			
1,13	Protección de rejillas	un	1,00	$ 16.273,00	$ 16.273,00	2,00	$ 32.546,00			
1,16	Demolición placa de contrapiso (Asfalto)	m2		$ 18.595,86		68,00	$ 1.264.518,00			
1,17	Demolición muros de concreto	m3		$ 281.525,95		3,15	$ 886.807,00			
2,00	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**									
2,10	Descapote a máquina nivel 0.00 (inc. retiro) e=-20 cm	m2	584,00	$ 14.422,00	$ 8.422.448,00	590,00	$ 8.508.980,00	414,00	$ 5.970.708,00	70,17%
2,20	Nivelación y perfilado de terreno manual	m2	584,00	$ 2.640,00	$ 1.541.760,00	590,00	$ 1.557.600,00			
2,30	Nivelación y Compactación de Subrasante	m2	176,00	$ 1.397,00	$ 245.872,00	590,00	$ 824.230,00			
2,40	Excavación manual suelo blando	m3	53,00	$ 73.172,00	$ 3.878.116,00	109,20	$ 7.990.382,00	36,20	$ 2.648.826,40	33,15%
2,50	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	m3	26,00	$ 109.904,00	$ 2.857.504,00	26,00	$ 2.857.504,00			
2,60	Geotextil T-2400	m2	370,00	$ 11.156,00	$ 4.127.720,00	370,00	$ 4.127.720,00			
2,70	Relleno compactado Base granular	m3	26,00	$ 156.593,00	$ 4.071.418,00	26,00	$ 4.071.418,00			
2,80	Excavación muros y huellas vaciadas en concreto	m3	1,00	$ 73.172,00	$ 73.172,00	2,39	$ 174.881,00			
3,00	**CONCRETOS BASES Y ESTRUCTURAS**									
3,10	Placa contrapiso 3000 psi 21mpa e=15	m3	25,00	$ 1.027.855,00	$ 25.696.375,00	25,00	$ 25.696.375,00			
3,20	Placa contrapiso 3000 psi 21mpa para huellas en concreto	m3	4,00	$ 1.027.855,00	$ 4.111.420,00	4,00	$ 4.111.420,00			
3,30	Concreto 3000 psi 21mpa para muros (Contenedores de raíz)	m3	1,00	$ 870.250,00	$ 870.250,00	1,00	$ 870.250,00			
3,12	Concreto ciclopeo 3000 psi Cimentac+formaleta(SUDS)	M3		$ 548.325,74	$ -	7,81	$ 4.282.424,00	6,40	$ 3.509.284,74	81,95%
4,00	**ACERO DE REFUERZO**									
4,10	Malla Electrosoldada d=5mm@0.15 (área 6x2.35)	kg	561,26	$ 6.619,00	$ 3.714.980,00	561,26	$ 3.714.980,00			
4,20	Refuerzo acero fy=60000psi muro	kg	22,00	$ 5.726,00	$ 125.972,00	22,00	$ 125.972,00			
4,30	Refuerzo acero fy=60000psi huellas de concreto	kg	111,00	$ 5.726,00	$ 635.586,00	111,00	$ 635.586,00			
5,00	**REDES HIDROSANITARIAS**									
5,10	Descapote a máquina nivel 0.00 (inc. retiro) e=-1.40m	m3	97,00	$ 50.223,00	$ 4.871.631,00	109,12	$ 5.480.334,00			
5,20	Concreto limpieza (alistado de terreno) e=0.05enObra	m3	1,00	$ 29.530,00	$ 29.530,00	1,00	$ 29.530,00			
5,30	Taludes perimetrales en concreto fc 21 3000 psi .15	m3	12,00	$ 570.017,00	$ 6.840.204,00	12,00	$ 6.840.204,00			
5,40	Cañuela en concreto	ml	9,00	$ 98.766,00	$ 888.894,00	9,00	$ 888.894,00			
5,50	Geotextil (NORMA) NS-088	m2	69,00	$ 11.156,00	$ 769.764,00	69,00	$ 769.764,00			
5,60	Capa drenaje (agregado Grueso)	m3	16,00	$ 147.396,00	$ 2.358.336,00	16,00	$ 2.358.336,00			
5,70	Capa filtrante (agregado Fino)	m3	3,00	$ 191.071,00	$ 573.213,00	3,00	$ 573.213,00			
5,80	Tubería perforada PVC DE 4 PUL	ml	27,00	$ 50.832,00	$ 1.372.464,00	27,00	$ 1.372.464,00			
5,90	Tubería de limpieza PVC 4 PUL	ml	10,00	$ 50.832,00	$ 508.320,00	10,00	$ 508.320,00			
5,10	Tubería de salida PVC 6 PUL	ml	6,00	$ 80.411,00	$ 482.466,00	6,00	$ 482.466,00			
5,11	Sustrato (TIERRA NEGRA+ ARENA)	m3	23,00	$ 170.501,00	$ 3.921.523,00	23,00	$ 3.921.523,00			
5,12	Piedra bola	m2	5,00	$ 41.714,00	$ 208.570,00	5,00	$ 208.570,00			
5,13	Malla Electro soldada d=5mm@0.15	kg	68,00	$ 6.619,00	$ 450.092,00	68,00	$ 450.092,00			
5,14	Refuerzo acero fy=60000psi	kg	1512,00	$ 5.726,00	$ 8.657.712,00	1512,00	$ 8.657.712,00			
5,15	Reja sumidero	un	22,00	$ 292.310,00	$ 6.430.820,00	22,00	$ 6.430.820,00			
5,16	Nivelación y perfilado de terreno manual	m2	69,00	$ 2.640,00	$ 182.160,00	69,00	$ 182.160,00			
5,17	Nivelación y Compactación de Subrasante	m2	54,00	$ 1.397,00	$ 75.438,00	54,00	$ 75.438,00			
5,18	Cerramiento reja pequeña	ml	33,00	$ 47.880,00	$ 1.580.040,00	33,00	$ 1.580.040,00			
5,19	Caja de inspección .60x.60 h=1.0 **	un	1,00	$ 545.257,00	$ 545.257,00	1,00	$ 545.257,00			
6,00	**PINTURA PISO**									
6,10	Pintura a color espacio de GYM Biosaludable	m2	14,00	$ 34.389,00	$ 481.446,00	14,00	$ 481.446,00			
7,00	**ADOQUÍN, TABLETA, Y BORDILLOS**									
7,20	Adoquín rectangular plano demarcador visual	m2	1,00	$ 137.201,09	$ 137.201,00	1,00	$ 137.201,00			
7,30	Tableta podotactil alerta 20*20 cm. Prefabricado en concreto color amarillo (A57)	ml	25,00	$ 86.499,48	$ 2.162.487,00	25,00	$ 2.162.487,00			
7,40	Tableta podotactil Guía 20*20 cm. Prefabricado en concreto, color amarillo (A58)	ml	43,00	$ 86.499,48	$ 3.719.478,00	43,00	$ 3.719.478,00			
7,50	Bordillo demarcado recto vial prefabricado en concreto (A10)	ml	99,00	$ 85.405,00	$ 8.455.095,00	108,25	$ 9.245.091,00			
7,60	Bordillo demarcado recto interno prefabricado en concreto (A80)	ml	101,00	$ 90.840,08	$ 9.174.848,00	101,00	$ 9.174.848,00	38,00	$ 3.451.923,04	37,62%
8,00	**PISOS EN MATERIAL RECICLADO TIPO CAUCHO**									
8,10	Piso caucho reciclado en color, para juegos	m2	35,00	$ 566.082,00	$ 19.812.870,00	35,00	$ 19.812.870,00			
10,00	**MOBILIARIO URBANO**									
10,10	Caneca metálica referencia M120 o M121.	un	2,00	$ 629.610,00	$ 1.259.220,00	2,00	$ 1.259.220,00			
10,20	Silla individual referencia M-01-A	un	1,00	$ 1.491.405,00	$ 1.491.405,00	1,00	$ 1.491.405,00			
10,30	Juego cuerdas piramidal	un	1,00	$ 63.788.123,96	$ 63.788.124,00	1,00	$ 63.788.124,00			
10,60	Suministro baranda M-83	ml	25,00	$ 364.706,63	$ 9.117.666,00	25,00	$ 9.117.666,00			
10,70	Equipo de GYM REF flexión pierna	un	1,00	$ 4.956.332,00	$ 4.956.332,00	1,00	$ 4.956.332,00			
10,80	Equipo de GYM REF Elíptica	un	1,00	$ 4.956.332,00	$ 4.956.332,00	1,00	$ 4.956.332,00			
10,90	Equipo de GYM REF Giro de hombros	un	1,00	$ 3.032.332,00	$ 3.032.332,00	1,00	$ 3.032.332,00			
10,10	Equipo de GYM REF Giro caminador	un	1,00	$ 4.058.332,00	$ 4.058.332,00	1,00	$ 4.058.332,00			
11,00	**VEGETACION**									
11,10	Cobertura tipo grama	m2	313,00	$ 10.421,80	$ 3.262.023,00	313,00	$ 3.262.023,00			
11,20	Cobertura tipo floricultura	m2	49,00	$ 98.124,24	$ 4.808.088,00	49,00	$ 4.808.088,00			
11,30	Siembra de árbol (Según propuesta paisajismo)	un	1,00	$ 291.101,23	$ 291.101,00	1,00	$ 291.101,00			
11,40	Relleno en tierra negra	m3	36,00	$ 65.431,00	$ 2.355.516,00	36,00	$ 2.355.516,00			
11,70	Árbol laurel hoja pequeña	un	1,00	$ 291.101,23	$ 291.101,00	1,00	$ 291.101,00			
11,90	Árbol Calistenia	un	1,00	$ 289.533,00	$ 289.533,00	1,00	$ 289.533,00			
12,00	**SEÑALETICA**									
12,10	Señalética identificador zona de juegos infantiles	un	1,00	$ 296.773,81	$ 296.774,00	1,00	$ 296.774,00			
12,20	Señalética GYM parque	un	1,00	$ 296.773,81	$ 296.774,00	1,00	$ 296.774,00			
12,30	Señalética identificador	un	2,00	$ 569.478,17	$ 1.138.956,00	2,00	$ 1.138.956,00			
12,40	Señalética SC-80	un	1,00	$ 454.702,29	$ 454.702,00	1,00	$ 454.702,00			
13,00	**OTROS**									
13,10	Baño portátil Alquiler	mes	4,00	$ 398.250,01	$ 1.593.000,00	4,00	$ 1.593.000,00			
13,20	Aseo general	m2	584,00	$ 7.449,14	$ 4.350.298,00	584,00	$ 4.350.298,00			
14,01	**PROVISIÓN DE OBRAS ADICIONALES**			**17733543,00**	**17.733.543,00**		**$ -**			
					$ 286.469.722,00		$ 284.414.938,00		$ 16.014.382,88	5,63%
	AMINISTRACIÓN		26,00%		$ 74.482.128,00		$ 73.947.884,00		$ 4.163.739,55	5,63%
	IMPREVISTOS		1,00%		$ 2.864.697,00		$ 2.844.149,00		$ 160.143,83	5,63%
	UTILIDAD		6,00%		$ 17.188.183,00		$ 17.064.896,00		$ 960.862,97	5,63%
	VALOR IVA SOBRE LA UTILIDAD				$ -		$ -		$ -	
	VALORES COSTOS INDIRECTOS				$ 94.535.008,00		$ 93.856.929,00			
	COSTO TOTAL OBRA				$ 381.004.730,00		$ 378.271.867,00			
	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO				$ 4.553.874,00		$ 4.553.874,00			
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				$ 11.439.678,00		$ 11.439.678,00			
					$ 396.998.282,00		$ 394.265.419,00		$ 21.299.129,23	5,40%
										21,11%

Informe semana 9 AAU T21

CONSORCIO INGENIERÍA I

Nit. 901.639.134 - 0

AVANCE INFROME SEMANALES

No. DE ORDEN	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS		SEMANA No.9		
										9
	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR	PROCENTAJE
1,00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**									
1,10	Localización y replanteo	m2	584,00	$ 8.226,00	$ 4.803.984,00	590,00	$ 4.853.332,00			
1,70	Cerramiento provisional de obra (Polisombra)	ml	99,00	$ 27.273,00	$ 2.700.027,00	116,90	$ 3.188.214,00			
1,80	Demolición y retiro de Bordillo prefabricado	ml	99,00	$ 18.468,00	$ 1.828.332,00	207,24	$ 3.827.308,00			
1,90	Desmonte y retiro de juegos infantiles	un	1,00	$ 114.946,00	$ 114.946,00	2,00	$ 229.892,00			
1,10	Proteccion de arbol de existente	un	6,00	$ 70.802,00	$ 424.812,00	6,00	$ 424.812,00			
1,11	Desmonte y retiro de baranda	ml	16,00	$ 12.784,00	$ 204.544,00	16,20	$ 207.101,00			
1,12	Desmonte de adoquin	m2	100,00	$ 14.932,00	$ 1.493.200,00	118,84	$ 1.774.519,00			
1,13	Proteccion de rejillas	un	1,00	$ 16.273,00	$ 16.273,00	2,00	$ 32.546,00			
1,16	Demolición placa de contrapiso (Asfalto)	m2		$ 18.595,86		68,00	$ 1.264.518,00			
1,17	Demolición muros de concreto	m3		$ 281.525,95		3,15	$ 886.807,00			
2,00	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**									
2,10	Descapote a máquina nivel 0.00 (inc. retiro) e=-20 cm	m2	584,00	$ 14.422,00	$ 8.422.448,00	590,00	$ 8.508.980,00			
2,20	Nivelacion y perfilado de terreno manual	m2	584,00	$ 2.640,00	$ 1.541.760,00	590,00	$ 1.557.600,00			
2,30	Nivelación y Compactación de Subrasante	m2	176,00	$ 1.397,00	$ 245.872,00	590,00	$ 824.230,00			
2,40	Excavación manual suelo blanco	m3	53,00	$ 73.172,00	$ 3.878.116,00	109,20	$ 7.990.382,00			
2,50	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	m3	26,00	$ 109.904,00	$ 2.857.504,00	48,37	$ 5.316.056,00	25,00	$ 2.747.600,00	51,68%
2,60	Geotextil T-2400	m2	370,00	$ 11.156,00	$ 4.127.720,00	370,00	$ 4.127.720,00	100,00	$ 1.115.600,00	27,03%
2,70	Relleno compactado Base granular	m3	26,00	$ 156.593,00	$ 4.071.418,00	26,00	$ 4.071.418,00			
2,80	Excabacion muros y huellas vaciadas en concreto	m3	1,00	$ 73.172,00	$ 73.172,00	2,39	$ 174.881,00			
2,11	Relleno de rajon manual	m3		$ 166.429,52	$ -	13,58	$ 2.260.113,00	13,58	$ 2.260.112,88	100,00%
3,00	**CONCRETOS BASES Y ESTRUCTURAS**									
3,10	Placa contrapiso 3000 psi 21mpa e=15	m3	25,00	$ 1.027.855,00	$ 25.696.375,00	27,50	$ 28.266.013,00	2,50	$ 2.569.637,50	9,09%
3,20	Placa contrapiso 3000 psi 21mpa para huellas en concreto	m3	4,00	$ 1.027.855,00	$ 4.111.420,00	4,00	$ 4.111.420,00			
3,30	Concreto 3000 psi 21mpa para muros (Contenedores de raiz)	m3	1,00	$ 870.250,00	$ 870.250,00	1,00	$ 870.250,00			
3,12	Concreto ciclopeo 3000 psi Cimentac+formaleta(SUDS)	m3		$ 548.325,74	$ -	7,81	$ 4.282.424,00	1,41	$ 773.139,29	18,05%
3,13	Dovelas	ml		$ 11.025,25	$ -		$ -			
4,00	**ACERO DE REFUERZO**									
4,10	Malla Electrosoldada d=5mm@0.15 (area 6x2.35)	kg	561,26	$ 6.619,00	$ 3.714.980,00	561,26	$ 3.714.980,00			
4,20	Refuerzo acero fy=60000psi muro	kg	22,00	$ 5.726,00	$ 125.972,00		$ -			
4,30	Refuerzo acero fy=60000psi huellas de concreto	kg	111,00	$ 5.726,00	$ 635.586,00		$ -			
5,00	**REDES HIDROSANITARIAS**									
5,10	Descapote a máquina nivel 0.00 (inc. retiro) e=-1,40m	m3	97,00	$ 50.223,00	$ 4.871.631,00	109,12	$ 5.480.334,00			
5,20	Concreto limpieza (alistado de terreno) e=0.05enObra	m3	1,00	$ 29.530,00	$ 29.530,00	1,00	$ 29.530,00			
5,30	Talues perimetrales en concreto fc 21 3000 psi .15	m3	12,00	$ 570.017,00	$ 6.840.204,00		$ -			
5,40	Cañuela en concreto	ml	9,00	$ 98.766,00	$ 888.894,00	9,00	$ 888.894,00			
5,50	Geotextil (NORMA) NS-088	m2	69,00	$ 11.156,00	$ 769.764,00	69,00	$ 769.764,00			
5,60	Capa drenaje (agregado Grueso)	m3	16,00	$ 147.396,00	$ 2.358.336,00	16,00	$ 2.358.336,00			
5,70	Capa filtrante (agregado Fino)	m3	3,00	$ 191.071,00	$ 573.213,00	3,00	$ 573.213,00			
5,80	Tuberia perforada PVC DE 4 PUL	ml	27,00	$ 50.832,00	$ 1.372.464,00	27,00	$ 1.372.464,00			
5,90	Tuberia de limpieza PVC 4 PUL	ml	10,00	$ 50.832,00	$ 508.320,00	10,00	$ 508.320,00			
5,10	Tuberia de salida PVC 6 PUL	ml	6,00	$ 80.411,00	$ 482.466,00	6,00	$ 482.466,00			
5,11	Sustrato (TIERRA NEGRA+ ARENA)	m3	23,00	$ 170.501,00	$ 3.921.523,00	23,00	$ 3.921.523,00			
5,12	Piedra bola	m2	5,00	$ 41.714,00	$ 208.570,00	5,00	$ 208.570,00			
5,13	Malla Electro soldada d=5mm@0.15	kg	68,00	$ 6.619,00	$ 450.092,00	68,00	$ 450.092,00			
5,14	Refuerzo acero fy=60000psi	kg	1512,00	$ 5.726,00	$ 8.657.712,00	800,00	$ 4.580.800,00			
5,15	Reja sumidero	un	22,00	$ 292.310,00	$ 6.430.820,00	22,00	$ 6.430.820,00			
5,16	Nivelacion y perfilado de terreno manual	m2	69,00	$ 2.640,00	$ 182.160,00		$ -			
5,17	Nivelación y Compactación de Subrasante	m2	54,00	$ 1.397,00	$ 75.438,00		$ -			
5,18	Cerramiento reja pequeña	ml	33,00	$ 47.880,00	$ 1.580.040,00	33,00	$ 1.580.040,00			
5,19	Caja de inspeccion .60x.60 h=1.0 **	un	1,00	$ 545.257,00	$ 545.257,00	1,00	$ 545.257,00			
6,00	**PINTURA PISO**									
6,10	Pintura a color espacio de GYM Biosaludable	m2	14,00	$ 34.389,00	$ 481.446,00	14,00	$ 481.446,00			
7,00	**ADOQUIN, TABLETA, Y BORDILLOS**									
7,20	Adoquin rectangular plano demarcador visual	m2	1,00	$ 137.201,09	$ 137.201,00	1,00	$ 137.201,00			
7,30	Tableta podotactil alerta 20*20 cm. Prefabricado en concreto color amarillo (A57)	ml	25,00	$ 86.499,48	$ 2.162.487,00	25,00	$ 2.162.487,00			
7,40	Tableta podotactil Guia 20*20 cm. Prefabricado en concreto, color amarillo (A58)	ml	43,00	$ 86.499,48	$ 3.719.478,00	43,00	$ 3.719.478,00			
7,50	Bordillo demarcado recto vial prefabricado en concreto (A10)	ml	99,00	$ 85.405,00	$ 8.455.095,00	108,25	$ 9.245.091,00			
7,60	Bordillo demarcado recto interno prefabricado en concreto (A80)	ml	101,00	$ 90.840,08	$ 9.174.848,00	101,00	$ 9.174.848,00			
7,11	Muro bloque en concreto	m2		$ 106.588,00	$ -	54,00	$ 5.755.752,00	20,00	$ 2.131.760,00	37,04%
8,00	**PISOS EN MATERIAL RECICLADO TIPO CAUCHO**									
8,10	Piso caucho reciclado en color, para juegos infantiles	m2	35,00	$ 566.082,00	$ 19.812.870,00	35,00	$ 19.812.870,00			
10,00	**MOBILIARIO URBANO**									
10,10	Caneca metalica referencia M120 o M121.	un	2,00	$ 629.610,00	$ 1.259.220,00	2,00	$ 1.259.220,00			
10,20	Silla individual referencia M-01-A	un	1,00	$ 1.491.405,00	$ 1.491.405,00	1,00	$ 1.491.405,00			
10,30	Juego cuerdas piramidal	un	1,00	$ 63.788.123,96	$ 63.788.124,00	1,00	$ 63.788.124,00			
10,60	Suministro baranda M-83	ml	25,00	$ 364.706,63	$ 9.117.666,00	25,00	$ 9.117.666,00			
10,70	Equipo de GYM REF flexion pierna	un	1,00	$ 4.956.332,00	$ 4.956.332,00	1,00	$ 4.956.332,00			
10,80	Equipo de GYM REF Eliptica	un	1,00	$ 4.956.332,00	$ 4.956.332,00	1,00	$ 4.956.332,00			
10,90	Equipo de GYM REF Giro de hombros	un	1,00	$ 3.032.332,00	$ 3.032.332,00	1,00	$ 3.032.332,00			
10,10	Equipo de GYM REF Giro caminador	un	1,00	$ 4.058.332,00	$ 4.058.332,00	1,00	$ 4.058.332,00			
11,00	**VEGETACION**									
11,10	Cobertura tipo grama	m2	313,00	$ 10.421,80	$ 3.262.023,00	313,00	$ 3.262.023,00			
11,20	Cobertura tipo floricultura	m2	49,00	$ 98.124,24	$ 4.808.088,00	49,00	$ 4.808.088,00			
11,30	Siembra de arbol (Según propuesta paisajismo)	un	1,00	$ 291.101,23	$ 291.101,00	1,00	$ 291.101,00			
11,40	Relleno en tierra negra	m3	36,00	$ 65.431,00	$ 2.355.516,00	36,00	$ 2.355.516,00			
11,70	Arbol laurel hoja pequeña	un	1,00	$ 291.101,23	$ 291.101,00	1,00	$ 291.101,00			
11,90	Arbol Calistemo	un	1,00	$ 289.533,00	$ 289.533,00	1,00	$ 289.533,00			
12,00	**SEÑALETICA**									
12,10	Señaletica identificador zona de juegos infantiles	un	1,00	$ 296.773,81	$ 296.774,00	1,00	$ 296.774,00			
12,20	Señaletica GYM parque	un	1,00	$ 296.773,81	$ 296.774,00	1,00	$ 296.774,00			
12,30	Señaletica identificador	un	2,00	$ 569.478,17	$ 1.138.956,00	2,00	$ 1.138.956,00			
12,40	Señalitica SC-80	un	1,00	$ 454.702,29	$ 454.702,00	1,00	$ 454.702,00			
13,00	**OTROS**									
13,10	Baño portatil Alquiler	mes	4,00	$ 398.250,01	$ 1.593.000,00		$ -			
13,20	Aseo general	m2	584,00	$ 7.449,14	$ 4.350.298,00	584,00	$ 4.350.298,00			
14,01	**PROVISIÓN DE OBRAS ADICIONALES**			**17733543,00**	**17.733.543,00**		**$ -**			
					$ 286.469.722,00		**$ 283.929.721,00**		**$ 11.597.849,67**	**4,08%**
	AMINISTRACIÓN		**26,00%**		**$ 74.482.128,00**		**$ 73.821.727,00**		**$ 3.015.440,91**	**4,08%**
	IMPREVISTOS		**1,00%**		**$ 2.864.697,00**		**$ 2.839.297,00**		**$ 115.978,50**	**4,08%**
	UTILIDAD		**6,00%**		**$ 17.188.183,00**		**$ 17.035.783,00**		**$ 695.870,98**	**4,08%**
	VALOR IVA SOBRE LA UTILIDAD				$ -		$ -		$ -	
	VALORES COSTOS INDIRECTOS				**$ 94.535.008,00**		**$ 93.696.807,00**			
	COSTO TOTAL OBRA				**$ 381.004.730,00**		**$ 377.626.528,00**			
	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO				**$ 4.553.874,00**		**$ 4.553.874,00**			
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				**$ 11.439.678,00**		**$ 11.439.678,00**			
					$ 396.998.282,00		**$ 393.620.080,00**		**$ 15.425.140,06**	**3,92%**
										25,06%

	INFORME SEMANAL DE OBRA - ETAPA II				
	FRENTE DE OBRA: TERRITORIO AAUT-21				
Semana No.9	Fecha de informe	del:	**11 de marzo de 2024**	al	**17 de marzo de 2024**

1. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA CIVIL

OBJETO:	**REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".**
CONTRATO DE OBRA No:	1070-2022
VALOR CONTRATO :	$ 2.550.000.000
CONTRATISTA	CONSORCIO INGENIERÍA I
PLAZO:	16 MESES Y TRES DIAS
FECHA DE INICIO:	16 de diciembre de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1	20 de marzo de 2023
FECHA DE REINICIACIÓN No. 1:	5 de mayo de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.2	26 de julio de 2023
FECHA DE REINICIACIÓN No. 2:	14 de noviembre de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.3	12 de diciembre de 2024
FECHA DE REINICIACIÓN No. 3:	28 de diciembre de 2023
FECHA DE REINICIO	19 de abril de 2024
PLAZO TRANSCURRIDO	457,00 DÍAS
VALOR INICIAL	$ 2.550.000.000,00
ADICIÓN	$ 0,00
VALOR ACTULIZADO	$ 2.550.000.000,00


2. SEGUIMIENTO DE OBRA CIVIL

RESUMEN DE AVACE DE EJECUCION DE OBRA:

Proyección de ejecución

SEMANA	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	ATRASO
SEMANA No.0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SEMANA No.1	1,07%	1,07%	1,01%	1,01%	-0,06%
SEMANA No.2	1,07%	2,14%	3,69%	4,70%	2,56%
SEMANA No.3	2,15%	4,29%	3,90%	8,59%	4,30%
SEMANA No.4	2,15%	6,44%	2,07%	10,66%	4,22%
SEMANA No.5	2,15%	8,59%	2,23%	12,90%	4,31%
SEMANA No.6	4,83%	13,42%	1,04%	13,94%	0,52%
SEMANA No.7	5,37%	18,79%	2,46%	16,40%	-2,39%
SEMANA No.8	5,37%	24,16%	5,64%	22,04%	-2,12%
SEMANA No.9	6,45%	30,61%	4,08%	26,12%	-4,49%
SEMANA No.10	0,00%	30,61%	0,00%	26,12%	-4,49%
SEMANA No.11	0,00%	30,61%	0,00%	26,12%	-4,49%
SEMANA No.12	0,00%	30,61%	0,00%	26,12%	-4,49%
SEMANA No.13	0,00%	30,61%	0,00%	26,12%	-4,49%
SEMANA No.14	0,00%	30,61%	0,00%	26,12%	-4,49%

CURVA DE AVANCE DE ACTIVIDADES EJECUTADO VS PROGRAMADO

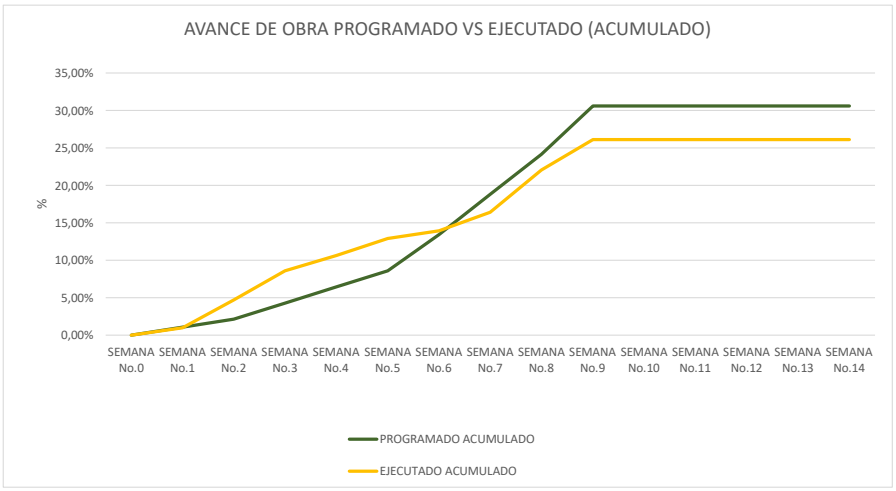

INFORME SEMANAL DE OBRA -ETAPA II
FRENTE DE OBRA: TERRITORIO AAU 21

SEMANA N°	**9**	**DE**	**lunes, 11 de marzo de 2024**	**A**	**domingo, 17 de marzo de 2024**
FECHA INICIO :	16/12/2022	**FECHA TERMINACION:**	19/04/2024		

IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".				
INTERVENTOR	CONSORCIO PROSPERAR BETHEL	**NIT**	NIT.901.634.239-2	**CONTRATO N°**	1066-2022
CONTRATISTA	CONSORCIO INGENIERÍA I	**NIT**	NIT. 901.639.134-0	**CONTRATO N°**	1070-2022


REGISTRO FOTOGRAFICO



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 21
COMENTARIOS: RELLENO DE RAJON MANUAL



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 21
COMENTARIOS: CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI CIMENTAC+FORMALETA(SUDS)

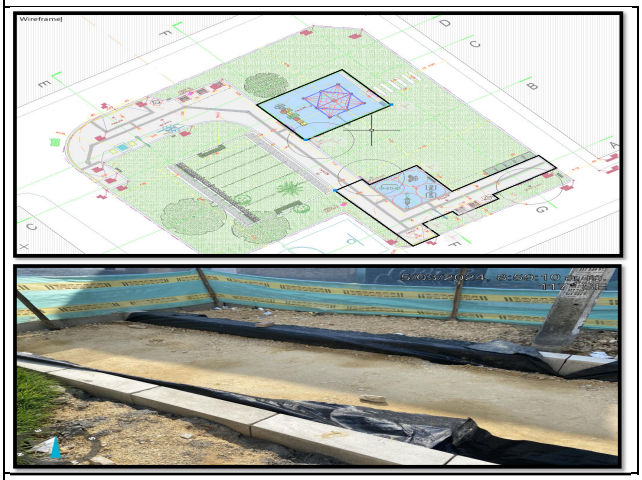

UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 21
COMENTARIOS: RELLENO COMPACTADO SUBBASE GRANULAR TIPO IDRD



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 21
COMENTARIOS: RELLENO COMPACTADO SUBBASE GRANULAR TIPO IDRD



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 21
COMENTARIOS: PLACA CONTRAPISO 3000 PSI 21MPA E=15(SUDS)



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 21
COMENTARIOS: PLACA CONTRAPISO 3000 PSI 21MPA E=15 (SUDS)

Informe semana 10 AAU T21

CONSORCIO INGENIERÍA I

Nit. 901.639.134 - 0

AVANCE INFROME SEMANALES

No. DE ORDEN	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS		SEMANA No.10		
										10
	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR	PROCENTAJE
1,00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**									
1,10	Localización y replanteo	m2	584,00	$ 8.226,00	$ 4.803.984,00	590,00	$ 4.853.332,00			
1,70	Cerramiento provisional de obra (Polisombra)	ml	99,00	$ 27.273,00	$ 2.700.027,00	121,90	$ 3.324.579,00	5,00	$ 136.365,00	4,10%
1,80	Demolición y retiro de Bordillo prefabricado	ml	99,00	$ 18.468,00	$ 1.828.332,00	207,24	$ 3.827.308,00			
1,90	Desmonte y retiro de juegos infantiles	un	1,00	$ 114.946,00	$ 114.946,00	2,00	$ 229.892,00			
1,10	Protección de árbol de existente	un	6,00	$ 70.802,00	$ 424.812,00	6,00	$ 424.812,00			
1,11	Desmonte y retiro de baranda	ml	16,00	$ 12.784,00	$ 204.544,00	16,20	$ 207.101,00			
1,12	Desmonte de adoquín	m2	100,00	$ 14.932,00	$ 1.493.200,00	118,84	$ 1.774.519,00			
1,13	Protección de rejillas	un	1,00	$ 16.273,00	$ 16.273,00	2,00	$ 32.546,00			
1,16	Demolición placa de contrapiso (Asfalto)	m2		$ 18.595,86		68,00	$ 1.264.518,00			
1,17	Demolición muros de concreto	m3		$ 281.525,95		3,15	$ 886.807,00			
2,00	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**									
2,10	Descapote a máquina nivel 0.00 (inc. retiro) e=-20 cm	m2	584,00	$ 14.422,00	$ 8.422.448,00	590,00	$ 8.508.980,00			
2,20	Nivelación y perfilado de terreno manual	m2	584,00	$ 2.640,00	$ 1.541.760,00	590,00	$ 1.557.600,00			
2,30	Nivelación y Compactación de Subrasante	m2	176,00	$ 1.397,00	$ 245.872,00	590,00	$ 824.230,00			
2,40	Excavación manual suelo blando	m3	53,00	$ 73.172,00	$ 3.878.116,00	111,90	$ 8.187.947,00	2,70	$ 197.564,40	2,41%
2,50	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	m3	26,00	$ 109.904,00	$ 2.857.504,00	42,00	$ 4.615.968,00	17,00	$ 1.868.368,00	40,48%
2,60	Geotextil T-2400	m2	370,00	$ 11.156,00	$ 4.127.720,00	370,00	$ 4.127.720,00	212,00	$ 2.365.072,00	57,30%
2,70	Relleno compactado Base granular	m3	26,00	$ 156.593,00	$ 4.071.418,00	26,00	$ 4.071.418,00			
2,80	Excavación muros y huellas vaciadas en concreto	m3	1,00	$ 73.172,00	$ 73.172,00	2,39	$ 174.881,00			
2,11	Relleno de rajon manual	m3		$ 166.429,52	$ -	13,58	$ 2.260.113,00			
3,00	**CONCRETOS BASES Y ESTRUCTURAS**									
3,10	Placa contrapiso 3000 psi 21mpa e=15	m3	25,00	$ 1.027.855,00	$ 25.696.375,00	27,50	$ 28.266.013,00			
3,20	Placa contrapiso 3000 psi 21mpa para huellas en concreto	m3	4,00	$ 1.027.855,00	$ 4.111.420,00	4,00	$ 4.111.420,00			
3,30	Concreto 3000 psi 21mpa para muros (Contenedores de raíz)	m3	1,00	$ 870.250,00	$ 870.250,00	1,00	$ 870.250,00			
3,12	Concreto ciclopeo 3000 psi Cimentac+formaleta(SUDS)	m3		$ 548.325,74	$ -	7,81	$ 4.282.424,00			
3,13	Dovelas	ml		$ 11.025,25	$ -	95,00	$ 1.047.399,00	95,00	$ 1.047.398,75	100,00%
4,00	**ACERO DE REFUERZO**									
4,10	Malla Electrosoldada d=5mm@0.15 (área 6x2.35)	kg	561,26	$ 6.619,00	$ 3.714.980,00	561,26	$ 3.714.980,00			
4,20	Refuerzo acero fy=60000psi muro	kg	22,00	$ 5.726,00	$ 125.972,00		$ -			
4,30	Refuerzo acero fy=60000psi huellas de concreto	kg	111,00	$ 5.726,00	$ 635.586,00		$ -			
5,00	**REDES HIDROSANITARIAS**									
5,10	Descapote a máquina nivel 0.00 (inc. retiro) e=-1,40m	m3	97,00	$ 50.223,00	$ 4.871.631,00	109,12	$ 5.480.334,00			
5,20	Concreto limpieza (alistado de terreno) e=0.05enObra	m3	1,00	$ 29.530,00	$ 29.530,00	1,00	$ 29.530,00			
5,30	Taludes perimetrales en concreto fc 21 3000 psi .15	m3	12,00	$ 570.017,00	$ 6.840.204,00		$ -			
5,40	Cañuela en concreto	ml	9,00	$ 98.766,00	$ 888.894,00	9,00	$ 888.894,00			
5,50	Geotextil (NORMA) NS-088	m2	69,00	$ 11.156,00	$ 769.764,00	69,00	$ 769.764,00			
5,60	Capa drenaje (agregado Grueso)	m3	16,00	$ 147.396,00	$ 2.358.336,00	16,00	$ 2.358.336,00			
5,70	Capa filtrante (agregado Fino)	m3	3,00	$ 191.071,00	$ 573.213,00	3,00	$ 573.213,00			
5,80	Tubería perforada PVC DE 4 PUL	ml	27,00	$ 50.832,00	$ 1.372.464,00	27,00	$ 1.372.464,00			
5,90	Tubería de limpieza PVC 4 PUL	ml	10,00	$ 50.832,00	$ 508.320,00	10,00	$ 508.320,00			
5,10	Tubería de salida PVC 6 PUL	ml	6,00	$ 80.411,00	$ 482.466,00	6,00	$ 482.466,00			
5,11	Sustrato (TIERRA NEGRA+ ARENA)	m3	23,00	$ 170.501,00	$ 3.921.523,00	23,00	$ 3.921.523,00			
5,12	Piedra bola	m2	5,00	$ 41.714,00	$ 208.570,00	5,00	$ 208.570,00			
5,13	Malla Electro soldada d=5mm@0.15	kg	68,00	$ 6.619,00	$ 450.092,00		$ -			
5,14	Refuerzo acero fy=60000psi	kg	1512,00	$ 5.726,00	$ 8.657.712,00	103,99	$ 595.447,00	103,99	$ 595.446,74	100,00%
5,15	Reja sumidero	un	22,00	$ 292.310,00	$ 6.430.820,00	22,00	$ 6.430.820,00			
5,16	Nivelación y perfilado de terreno manual	m2	69,00	$ 2.640,00	$ 182.160,00		$ -			
5,17	Nivelación y Compactación de Subrasante	m2	54,00	$ 1.397,00	$ 75.438,00		$ -			
5,18	Cerramiento reja pequeña	ml	33,00	$ 47.880,00	$ 1.580.040,00	33,00	$ 1.580.040,00			
5,19	Caja de inspección .60x.60 h=1.0 **	un	1,00	$ 545.257,00	$ 545.257,00	1,00	$ 545.257,00			
6,00	**PINTURA PISO**									
6,10	Pintura a color espacio de GYM Biosaludable	m2	14,00	$ 34.389,00	$ 481.446,00	14,00	$ 481.446,00			
7,00	**ADOQUÍN, TABLETA, Y BORDILLOS**									
7,20	Adoquín rectangular plano demarcador visual	m2	1,00	$ 137.201,09	$ 137.201,00	1,00	$ 137.201,00			
7,30	Tableta podotactil alerta 20*20 cm. Prefabricado en concreto color amarillo (A57)	ml	25,00	$ 86.499,48	$ 2.162.487,00	25,00	$ 2.162.487,00			
7,40	Tableta podotactil Guía 20*20 cm. Prefabricado en concreto, color amarillo (A58)	ml	43,00	$ 86.499,48	$ 3.719.478,00	43,00	$ 3.719.478,00			
7,50	Bordillo demarcado recto vial prefabricado en concreto (A10)	ml	99,00	$ 85.405,00	$ 8.455.095,00	123,25	$ 10.526.166,00	15,00	$ 1.281.075,00	12,17%
7,60	Bordillo demarcado recto interno prefabricado en concreto (A80)	ml	101,00	$ 90.840,08	$ 9.174.848,00	101,00	$ 9.174.848,00	12,49	$ 1.134.592,60	12,37%
7,11	Muro bloque en concreto	m2		$ 106.588,00	$ -	54,00	$ 5.755.752,00	34,00	$ 3.623.992,00	62,96%
8,00	**PISOS EN MATERIAL RECICLADO TIPO CAUCHO**									
8,10	Piso caucho reciclado en color, para juegos infantiles	m2	35,00	$ 566.082,00	$ 19.812.870,00	35,00	$ 19.812.870,00			
10,00	**MOBILIARIO URBANO**									
10,10	Caneca metálica referencia M120 o M121.	un	2,00	$ 629.610,00	$ 1.259.220,00	2,00	$ 1.259.220,00			
10,20	Silla individual referencia M-01-A	un	1,00	$ 1.491.405,00	$ 1.491.405,00	1,00	$ 1.491.405,00			
10,30	Juego cuerdas piramidal	un	1,00	$ 63.788.123,96	$ 63.788.124,00	1,00	$ 63.788.124,00			
10,60	Suministro baranda M-83	ml	25,00	$ 364.706,63	$ 9.117.666,00	25,00	$ 9.117.666,00			
10,70	Equipo de GYM REF flexión pierna	un	1,00	$ 4.956.332,00	$ 4.956.332,00	1,00	$ 4.956.332,00			
10,80	Equipo de GYM REF Elíptica	un	1,00	$ 4.956.332,00	$ 4.956.332,00	1,00	$ 4.956.332,00			
10,90	Equipo de GYM REF Giro de hombros	un	1,00	$ 3.032.332,00	$ 3.032.332,00	1,00	$ 3.032.332,00			
10,10	Equipo de GYM REF Giro caminador	un	1,00	$ 4.058.332,00	$ 4.058.332,00	1,00	$ 4.058.332,00			
11,00	**VEGETACION**									
11,10	Cobertura tipo grama	m2	313,00	$ 10.421,80	$ 3.262.023,00	313,00	$ 3.262.023,00			
11,20	Cobertura tipo floricultura	m2	49,00	$ 98.124,24	$ 4.808.088,00	49,00	$ 4.808.088,00			
11,30	Siembra de árbol (Según propuesta paisajismo)	un	1,00	$ 291.101,23	$ 291.101,00	1,00	$ 291.101,00			
11,40	Relleno en tierra negra	m3	36,00	$ 65.431,00	$ 2.355.516,00	36,00	$ 2.355.516,00			
11,70	Árbol laurel hoja pequeña	un	1,00	$ 291.101,23	$ 291.101,00	1,00	$ 291.101,00			
11,90	Árbol Calistenia	un	1,00	$ 289.533,00	$ 289.533,00	1,00	$ 289.533,00			
12,00	**SEÑALETICA**									
12,10	Señalética identificador zona de juegos infantiles	un	1,00	$ 296.773,81	$ 296.774,00	1,00	$ 296.774,00			
12,20	Señalética GYM parque	un	1,00	$ 296.773,81	$ 296.774,00	1,00	$ 296.774,00			
12,30	Señalética identificador	un	2,00	$ 569.478,17	$ 1.138.956,00	2,00	$ 1.138.956,00			
12,40	Señalética SC-80	un	1,00	$ 454.702,29	$ 454.702,00	1,00	$ 454.702,00			
13,00	**OTROS**									
13,10	Baño portátil Alquiler	mes	4,00	$ 398.250,01	$ 1.593.000,00		$ -			
13,20	Aseo general	m2	584,00	$ 7.449,14	$ 4.350.298,00	584,00	$ 4.350.298,00			
14,01	**PROVISIÓN DE OBRAS ADICIONALES**			**17733543,00**	**17.733.543,00**		**$ -**			
					$ 286.469.722,00		$ 281.456.592,00		$ 12.249.874,49	4,35%
	AMINISTRACIÓN		**26,00%**		$ 74.482.128,00		$ 73.178.714,00		$ 3.184.967,37	4,35%
	IMPREVISTOS		**1,00%**		$ 2.864.697,00		$ 2.814.566,00		$ 122.498,74	4,35%
	UTILIDAD		**6,00%**		$ 17.188.183,00		$ 16.887.396,00		$ 734.992,47	4,35%
	VALOR IVA SOBRE LA UTILIDAD				$ -		$ -		$ -	
	VALORES COSTOS INDIRECTOS				$ 94.535.008,00		$ 92.880.676,00			
	COSTO TOTAL OBRA				$ 381.004.730,00		$ 374.337.268,00			
	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO				$ 4.553.874,00		$ 4.553.874,00			
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				$ 11.439.678,00		$ 11.439.678,00			
					$ 396.998.282,00		$ 390.330.820,00		$ 16.292.333,07	4,17%
										29,44%

	INFORME SEMANAL DE OBRA - ETAPA II				
	FRENTE DE OBRA: TERRITORIO AAUT-21				
Semana No.10	Fecha de informe	del:	**11 de marzo de 2024**	al	**17 de marzo de 2024**

1. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA CIVIL

OBJETO:	**REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".**
CONTRATO DE OBRA No:	1070-2022
VALOR CONTRATO :	$ 2.550.000.000
CONTRATISTA	CONSORCIO INGENIERÍA I
PLAZO:	16 MESES Y TRES DIAS
FECHA DE INICIO:	16 de diciembre de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1	20 de marzo de 2023
FECHA DE REINICIACIÓN No. 1:	5 de mayo de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.2	26 de julio de 2023
FECHA DE REINICIACIÓN No. 2:	14 de noviembre de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.3	12 de diciembre de 2024
FECHA DE REINICIACIÓN No. 3:	28 de diciembre de 2023
FECHA DE REINICIO	19 de abril de 2024
PLAZO TRANSCURRIDO	457,00 DÍAS
VALOR INICIAL	$ 2.550.000.000,00
ADICIÓN	$ 0,00
VALOR ACTULIZADO	$ 2.550.000.000,00


2. SEGUIMIENTO DE OBRA CIVIL

RESUMEN DE AVACE DE EJECUCION DE OBRA:

Proyección de ejecución

SEMANA	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	ATRASO
SEMANA No.0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SEMANA No.1	1,07%	1,07%	1,02%	1,02%	-0,05%
SEMANA No.2	1,07%	2,14%	3,72%	4,74%	2,60%
SEMANA No.3	2,15%	4,29%	3,93%	8,67%	4,38%
SEMANA No.4	2,15%	6,44%	2,09%	10,76%	4,32%
SEMANA No.5	2,15%	8,59%	2,25%	13,01%	4,42%
SEMANA No.6	3,49%	12,08%	1,05%	14,06%	1,98%
SEMANA No.7	3,49%	15,57%	2,48%	16,54%	0,97%
SEMANA No.8	3,76%	19,33%	5,69%	22,23%	2,90%
SEMANA No.9	6,45%	25,78%	4,12%	26,35%	0,57%
SEMANA No.10	9,13%	34,91%	4,35%	30,70%	-4,21%
SEMANA No.11	0,00%	34,91%	0,00%	30,70%	-4,21%
SEMANA No.12	0,00%	34,91%	0,00%	30,70%	-4,21%
SEMANA No.13	0,00%	34,91%	0,00%	30,70%	-4,21%
SEMANA No.14	0,00%	34,91%	0,00%	30,70%	-4,21%

CURVA DE AVANCE DE ACTIVIDADES EJECUTADO VS PROGRAMADO

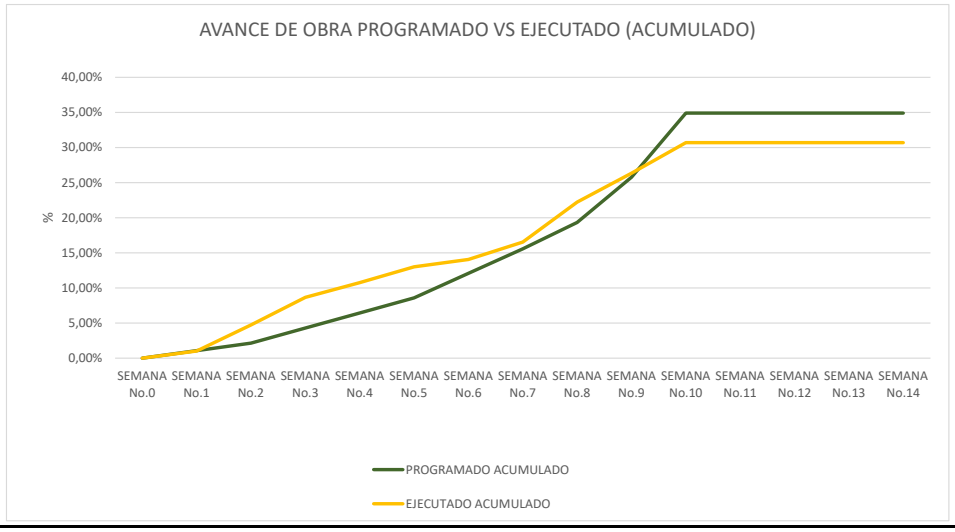

INFORME SEMANAL DE OBRA -ETAPA II
FRENTE DE OBRA: TERRITORIO AAU 21

SEMANA N°	**10**	**DE**	**lunes, 11 de marzo de 2024**	**A**	**domingo, 17 de marzo de 2024**
FECHA INICIO :	16/12/2022	**FECHA TERMINACION:**	19/04/2024		

IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".				
INTERVENTOR	CONSORCIO PROSPERAR BETHEL	**NIT**	NIT.901.634.239-2	**CONTRATO N°**	1066-2022
CONTRATISTA	CONSORCIO INGENIERÍA I	**NIT**	NIT. 901.639.134-0	**CONTRATO N°**	1070-2022

REGISTRO FOTOGRAFICO



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 21
COMENTARIOS: CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA (POLISOMBRA-**ARREGLO)**



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 21
COMENTARIOS: EXCAVACIÓN MANUAL SUELO BLANDO



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 21
COMENTARIOS: RELLENO COMPACTADO SUBBASE GRANULAR TIPO IDRD- GEOTEXTIL T-2400



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 21
COMENTARIOS: MURO BLOQUE EN CONCRETO



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 21
COMENTARIOS: DOVELAS-REFUERZO ACERO FY=60000PSI



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 21
COMENTARIOS: BORDILLO DEMARCADO RECTO VIAL PREFABRICADO EN CONCRETO (A10)
BORDILLO DEMARCADO RECTO INTERNO PREFABRICADO EN CONCRETO (A80)

Informe semana 11 AAU T21

CONSORCIO INGENIERÍA I

Nit. 901.639.134 - 0

AVANCE INFROME SEMANALES

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	SEMANA No.11 — 11 CANTIDAD EJECUTADA	VALOR	PROCENTAJE	CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDAD	VALOR	PROCENTAJE
1,00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**												
1,10	Localización y replanteo	m2	584,00	$ 8.226,00	$ 4.803.984,00	590,00	$ 4.853.332,00				590,00	$ 4.853.332,09	100,00%
1,70	Cerramiento provisional de obra (Polisombra)	ml	99,00	$ 27.273,00	$ 2.700.027,00	127,90	$ 3.488.217,00				127,90	$ 3.488.216,70	100,00%
1,80	Demolición y retiro de Bordillo prefabricado	ml	99,00	$ 18.468,00	$ 1.828.332,00	207,24	$ 3.827.308,00				207,24	$ 3.827.308,32	100,00%
1,90	Desmonte y retiro de juegos infantiles	un	1,00	$ 114.946,00	$ 114.946,00	2,00	$ 229.892,00				2,00	$ 229.892,00	100,00%
1,10	Protección de árbol de existente	un	6,00	$ 70.802,00	$ 424.812,00	6,00	$ 424.812,00				6,00	$ 424.812,00	100,00%
1,11	Desmonte y retiro de baranda	ml	16,00	$ 12.784,00	$ 204.544,00	16,20	$ 207.101,00				16,20	$ 207.100,80	100,00%
1,12	Desmonte de adoquín	m2	100,00	$ 14.932,00	$ 1.493.200,00	118,84	$ 1.774.519,00				118,84	$ 1.774.518,88	100,00%
1,13	Protección de rejillas	un	1,00	$ 16.273,00	$ 16.273,00	2,00	$ 32.546,00				2,00	$ 32.546,00	100,00%
1,16	Demolición placa de contrapiso (Asfalto)	m2		$ 18.596,00		68,00	$ 1.264.528,00				68,00	$ 1.264.528,00	100,00%
1,17	Demolición muros de concreto	m3		$ 281.526,00		3,15	$ 886.807,00				3,15	$ 886.806,90	100,00%
2,00	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**												
2,10	Descapote a máquina nivel 0.00 (inc. retiro) e=-20 cm	m2	584,00	$ 14.422,00	$ 8.422.448,00	590,00	$ 8.508.980,00				590,00	$ 8.508.980,00	100,00%
2,20	Nivelación y perfilado de terreno manual	m2	584,00	$ 2.640,00	$ 1.541.760,00	590,00	$ 1.557.600,00				590,00	$ 1.557.600,00	100,00%
2,30	Nivelación y Compactación de Subrasante	m2	176,00	$ 1.397,00	$ 245.872,00	590,00	$ 824.230,00				590,00	$ 824.230,00	100,00%
2,40	Excavación manual suelo blando	m3	53,00	$ 73.172,00	$ 3.878.116,00	111,90	$ 8.187.947,00				111,90	$ 8.187.946,80	100,00%
2,50	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	m3	26,00	$ 109.904,00	$ 2.857.504,00	39,00	$ 4.286.256,00				39,00	$ 4.286.256,00	100,00%
2,60	Geotextil T-2400	m2	370,00	$ 11.156,00	$ 4.127.720,00	370,00	$ 4.127.720,00				370,00	$ 4.127.720,00	100,00%
2,70	Relleno compactado Base granular	m3	26,00	$ 156.593,00	$ 4.071.418,00	26,00	$ 4.071.418,00				26,00	$ 4.071.418,00	100,00%
2,80	Excavación muros y huellas vaciadas en concreto	m3	1,00	$ 73.172,00	$ 73.172,00	2,39	$ 174.881,00				2,39	$ 174.881,08	100,00%
2,11	Relleno de rajon manual	m3		$ 166.430,00	$ -	23,09	$ 3.842.869,08				23,09	$ 3.842.869,08	100,00%
3,00	**CONCRETOS BASES Y ESTRUCTURAS**												
3,10	Placa contrapiso 3000 psi 21mpa e=15	m3	25,00	$ 1.027.855,00	$ 25.696.375,00	27,50	$ 28.266.013,00				2,50	$ 2.569.637,50	9,09%
3,20	Placa contrapiso 3000 psi 21mpa para huellas en concreto	m3	4,00	$ 1.027.855,00	$ 4.111.420,00	4,00	$ 4.111.420,00					$ -	
3,30	Concreto 3000 psi 21mpa para muros (Contenedores de raíz)	m3	1,00	$ 870.250,00	$ 870.250,00	1,00	$ 870.250,00					$ -	
3,12	Concreto ciclopeo 3000 psi Cimentac+formaleta(SUDS)	m3		$ 548.326,00	$ -	7,81	$ 4.282.426,00				7,81	$ 4.282.426,06	100,00%
3,13	Dovelas	ml		$ 11.025,00	$ -	100,00	$ 1.102.500,00				100,00	$ 1.102.499,99	100,00%
4,00	**ACERO DE REFUERZO**												
4,10	Malla Electrosoldada d=5mm@0.15 (área 6x2.35)	kg	561,26	$ 6.619,00	$ 3.714.980,00		$ -					$ -	
4,20	Refuerzo acero fy=60000psi muro	kg	22,00	$ 5.726,00	$ 125.972,00		$ -					$ -	
4,30	Refuerzo acero fy=60000psi huellas de concreto	kg	111,00	$ 5.726,00	$ 635.586,00		$ -					$ -	
5,00	**REDES HIDROSANITARIAS**												
5,10	Descapote a máquina nivel 0.00 (inc. retiro) e=-1.40m	m3	97,00	$ 50.223,00	$ 4.871.631,00	109,12	$ 5.480.334,00				109,12	$ 5.480.333,76	100,00%
5,20	Concreto limpieza (alistado de terreno) e=0.05enObra	m3	1,00	$ 29.530,00	$ 29.530,00	1,00	$ 29.530,00					$ -	
5,30	Taludes perimetrales en concreto fc 21 3000 psi .15	m3	12,00	$ 570.017,00	$ 6.840.204,00		$ -					$ -	
5,40	Cañuela en concreto	ml	9,00	$ 98.766,00	$ 888.894,00	9,00	$ 888.894,00					$ -	
5,50	Geotextil (NORMA) NS-088	m2	69,00	$ 11.156,00	$ 769.764,00	69,00	$ 769.764,00					$ -	
5,60	Capa drenaje (agregado Grueso)	m3	16,00	$ 147.396,00	$ 2.358.336,00	16,00	$ 2.358.336,00					$ -	
5,70	Capa filtrante (agregado Fino)	m3	3,00	$ 191.071,00	$ 573.213,00	3,00	$ 573.213,00					$ -	
5,80	Tubería perforada PVC DE 4 PUL	ml	27,00	$ 50.832,00	$ 1.372.464,00	27,00	$ 1.372.464,00					$ -	
5,90	Tubería de limpieza PVC 4 PUL	ml	10,00	$ 50.832,00	$ 508.320,00	10,00	$ 508.320,00					$ -	
5,10	Tubería de salida PVC 6 PUL	ml	6,00	$ 80.411,00	$ 482.466,00	6,00	$ 482.466,00					$ -	
5,11	Sustrato (TIERRA NEGRA+ ARENA)	m3	23,00	$ 170.501,00	$ 3.921.523,00	23,00	$ 3.921.523,00					$ -	
5,12	Piedra bola	m2	5,00	$ 41.714,00	$ 208.570,00	5,00	$ 208.570,00					$ -	
5,13	Malla Electro soldada d=5mm@0.15	kg	68,00	$ 6.619,00	$ 450.092,00		$ -					$ -	
5,14	Refuerzo acero fy=60000psi	kg	1512,00	$ 5.726,00	$ 8.657.712,00	103,99	$ 595.447,00				103,99	$ 595.446,74	100,00%
5,15	Reja sumidero	un	22,00	$ 292.310,00	$ 6.430.820,00	22,00	$ 6.430.820,00					$ -	
5,16	Nivelación y perfilado de terreno manual	m2	69,00	$ 2.640,00	$ 182.160,00		$ -					$ -	
5,17	Nivelación y Compactación de Subrasante	m2	54,00	$ 1.397,00	$ 75.438,00		$ -					$ -	
5,18	Cerramiento reja pequeña	ml	33,00	$ 47.880,00	$ 1.580.040,00	33,00	$ 1.580.040,00					$ -	
5,19	Caja de inspección .60x.60 h=1.0 **	un	1,00	$ 545.257,00	$ 545.257,00	1,00	$ 545.257,00				1,00	$ 545.257,00	100,00%
6,00	**PINTURA PISO**												
6,10	Pintura a color espacio de GYM Biosaludable	m2	14,00	$ 34.389,00	$ 481.446,00	14,00	$ 481.446,00					$ -	
7,00	**ADOQUIN, TABLETA, Y BORDILLOS**												
7,20	Adoquin rectangular plano demarcador visual	m2	1,00	$ 137.201,00	$ 137.201,00	1,00	$ 137.201,00					$ -	
7,30	Tableta podotactil alerta 20*20 cm. Prefabricado en concreto color amarillo (A57)	ml	25,00	$ 86.499,00	$ 2.162.475,00	25,00	$ 2.162.475,00					$ -	
7,40	Tableta podotactil Guia 20*20 cm. Prefabricado en concreto. color amarillo (A58)	ml	43,00	$ 86.499,00	$ 3.719.457,00	43,00	$ 3.719.457,00					$ -	
7,50	Bordillo demarcado recto vial prefabricado en concreto (A10)	ml	99,00	$ 85.405,00	$ 8.455.095,00	123,25	$ 10.526.166,00				123,25	$ 10.526.166,25	100,00%
7,60	Bordillo demarcado recto interno prefabricado en concreto (A80)	ml	101,00	$ 90.840,00	$ 9.174.840,00	101,00	$ 9.174.840,00				101,00	$ 9.174.840,00	100,00%
7,11	Muro bloque en concreto	m2		$ 106.588,00	$ -	54,00	$ 5.755.752,00				54,00	$ 5.755.752,00	100,00%
8,00	**PISOS EN MATERIAL RECICLADO TIPO CAUCHO**												
8,10	Piso caucho reciclado en color, para juegos	m2	35,00	$ 566.082,00	$ 19.812.870,00	35,00	$ 19.812.870,00					$ -	
10,00	**MOBILIARIO URBANO**												
10,10	Caneca metálica referencia M120 o M121.	un	2,00	$ 629.610,00	$ 1.259.220,00	2,00	$ 1.259.220,00	1,00	$ 629.610,00	50,00%	1,50	$ 944.415,00	75,00%
10,20	Silla individual referencia M-01-A	un	1,00	$ 1.491.405,00	$ 1.491.405,00	1,00	$ 1.491.405,00	0,50	$ 745.702,50	50,00%	0,75	$ 1.118.553,75	75,00%
10,30	Juego cuerdas piramidal	un	1,00	$ 63.788.124,00	$ 63.788.124,00	1,00	$ 63.788.124,00	0,50	$ 31.894.062,00	50,00%	0,75	$ 47.841.093,00	75,00%
10,60	Suministro baranda M-83	ml	25,00	$ 364.707,00	$ 9.117.675,00	25,00	$ 9.117.675,00	13,00	$ 4.741.191,00	52,00%	19,00	$ 6.929.433,00	76,00%
10,70	Equipo de GYM REF flexión pierna	un	1,00	$ 4.956.332,00	$ 4.956.332,00	1,00	$ 4.956.332,00	0,50	$ 2.478.166,00	50,00%	0,75	$ 3.717.249,00	75,00%
10,80	Equipo de GYM REF Elíptica	un	1,00	$ 4.956.332,00	$ 4.956.332,00	1,00	$ 4.956.332,00	0,50	$ 2.478.166,00	50,00%	0,75	$ 3.717.249,00	75,00%
10,90	Equipo de GYM REF Giro de hombros	un	1,00	$ 3.032.332,00	$ 3.032.332,00	1,00	$ 3.032.332,00	0,50	$ 1.516.166,00	50,00%	0,75	$ 2.274.249,00	75,00%
10,10	Equipo de GYM REF Giro caminador	un	1,00	$ 4.058.332,00	$ 4.058.332,00	1,00	$ 4.058.332,00	0,50	$ 2.029.166,00	50,00%	0,75	$ 3.043.749,00	75,00%
11,00	**VEGETACION**												
11,10	Cobertura tipo grama	m2	313,00	$ 10.422,00	$ 3.262.086,00	313,00	$ 3.262.086,00					$ -	
11,20	Cobertura tipo floricultura	m2	49,00	$ 98.124,00	$ 4.808.076,00	49,00	$ 4.808.076,00					$ -	
11,30	Siembra de árbol (Según propuesta paisajismo)	un	1,00	$ 291.101,00	$ 291.101,00	1,00	$ 291.101,00					$ -	
11,40	Relleno en tierra negra	m3	36,00	$ 65.431,00	$ 2.355.516,00	36,00	$ 2.355.516,00					$ -	
11,70	Arbol laurel hoja pequeña	un	1,00	$ 291.101,00	$ 291.101,00	1,00	$ 291.101,00					$ -	
11,90	Arbol Calistenia	un	1,00	$ 289.533,00	$ 289.533,00	1,00	$ 289.533,00					$ -	
12,00	**SENALETICA**												
12,10	Señalética identificador zona de juegos infantiles	un	1,00	$ 296.774,00	$ 296.774,00	1,00	$ 296.774,00	0,50	$ 148.387,00	50,00%	0,75	$ 222.580,50	75,00%
12,20	Señalética GYM parque	un	1,00	$ 296.774,00	$ 296.774,00	1,00	$ 296.774,00	0,50	$ 148.387,00	50,00%	0,75	$ 222.580,50	75,00%
12,30	Señalética identificador	un	2,00	$ 569.478,00	$ 1.138.956,00	2,00	$ 1.138.956,00	1,00	$ 569.478,00	50,00%	1,50	$ 854.217,00	75,00%
12,40	Señalética SC-80	un	1,00	$ 454.702,00	$ 454.702,00	1,00	$ 454.702,00	0,50	$ 227.351,00	50,00%	0,75	$ 338.752,99	74,50%
13,00	**OTROS**												
13,10	Baño portátil Alquiler	mes	4,00	$ 398.250,00	$ 1.593.000,00		$ -					$ -	
13,20	Aseo general	m2	584,00	$ 7.449,00	$ 4.350.216,00	584,00	$ 4.350.216,00					$ -	
14,01	**PROVISIÓN DE OBRAS ADICIONALES**			**17733543,00**	**17.733.543,00**		$ -						
					$ 286.469.659,00		**$ 279.213.344,00**		**$ 47.605.832,50**	**17,05%**		**$ 163.827.443,69**	**58,67%**
	AMINISTRACIÓN		**26,00%**		**$ 74.482.111,00**		**$ 72.595.469,00**		**$ 12.377.516,45**	**17,05%**		**$ 42.595.135,36**	**58,67%**
	IMPREVISTOS		**1,00%**		**$ 2.864.697,00**		**$ 2.792.133,00**		**$ 476.058,33**	**17,05%**		**$ 1.638.274,44**	**58,67%**
	UTILIDAD		**6,00%**		**$ 17.188.180,00**		**$ 16.752.801,00**		**$ 2.856.349,95**	**17,05%**		**$ 9.829.646,62**	**58,67%**
	VALOR IVA SOBRE LA UTILIDAD				$ -		$ -		$ -			$ -	
	VALORES COSTOS INDIRECTOS				**$ 94.534.988,00**		**$ 92.140.403,00**						
	COSTO TOTAL OBRA				**$ 381.004.647,00**		**$ 371.353.747,00**						
	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO				**$ 4.553.874,00**		**$ 4.553.874,00**						
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				**$ 11.439.678,00**		**$ 11.439.678,00**						
					$ 396.998.199,00		**$ 387.347.299,00**		**$ 63.315.757,23**	**16,35%**		**$ 217.890.500,11**	**56,25%**
										45,90%			**29,56%**

	INFORME SEMANAL DE OBRA - ETAPA II				
	FRENTE DE OBRA: TERRITORIO AAUT-21				
Semana No.11	Fecha de informe	del:	**25 de marzo de 2024**	al	**31 de marzo de 2024**

1. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA CIVIL

OBJETO:	**REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".**
CONTRATO DE OBRA No:	1070-2022
VALOR CONTRATO :	$ 2.550.000.000
CONTRATISTA	CONSORCIO INGENIERÍA I
PLAZO:	16 MESES Y TRES DÍAS
FECHA DE INICIO:	16 de diciembre de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1	20 de marzo de 2023
FECHA DE REINICIACIÓN No. 1:	5 de mayo de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.2	26 de julio de 2023
FECHA DE REINICIACIÓN No. 2:	14 de noviembre de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.3	12 de diciembre de 2024
FECHA DE REINICIACIÓN No. 3:	28 de diciembre de 2023
FECHA DE REINICIO	19 de abril de 2024
PLAZO TRANSCURRIDO	471,00 DÍAS
VALOR INICIAL	$ 2.550.000.000,00
ADICIÓN	$ 0,00
VALOR ACTULIZADO	$ 2.550.000.000,00


2. SEGUIMIENTO DE OBRA CIVIL

RESUMEN DE AVACE DE EJECUCION DE OBRA:

Proyección de ejecución

SEMANA	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	ATRASO
SEMANA No.0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SEMANA No.1	1,07%	1,07%	1,03%	1,03%	-0,04%
SEMANA No.2	1,07%	2,14%	3,75%	4,77%	2,63%
SEMANA No.3	2,15%	4,29%	3,96%	8,74%	4,45%
SEMANA No.4	2,15%	6,44%	2,10%	10,84%	4,40%
SEMANA No.5	2,15%	8,59%	2,27%	13,11%	4,52%
SEMANA No.6	3,49%	12,08%	1,06%	14,17%	2,09%
SEMANA No.7	3,49%	15,57%	2,50%	16,67%	1,10%
SEMANA No.8	3,76%	19,33%	5,74%	22,41%	3,08%
SEMANA No.9	6,45%	25,78%	4,15%	26,56%	0,78%
SEMANA No.10	9,13%	34,91%	4,27%	30,83%	-4,08%
SEMANA No.11	14,23%	49,14%	17,05%	47,88%	-1,26%
SEMANA No.12	0,00%	49,14%	0,00%	47,88%	-1,26%
SEMANA No.13	0,00%	49,14%	0,00%	47,88%	-1,26%
SEMANA No.14	0,00%	49,14%	0,00%	47,88%	-1,26%

CURVA DE AVANCE DE ACTIVIDADES EJECUTADO VS PROGRAMADO

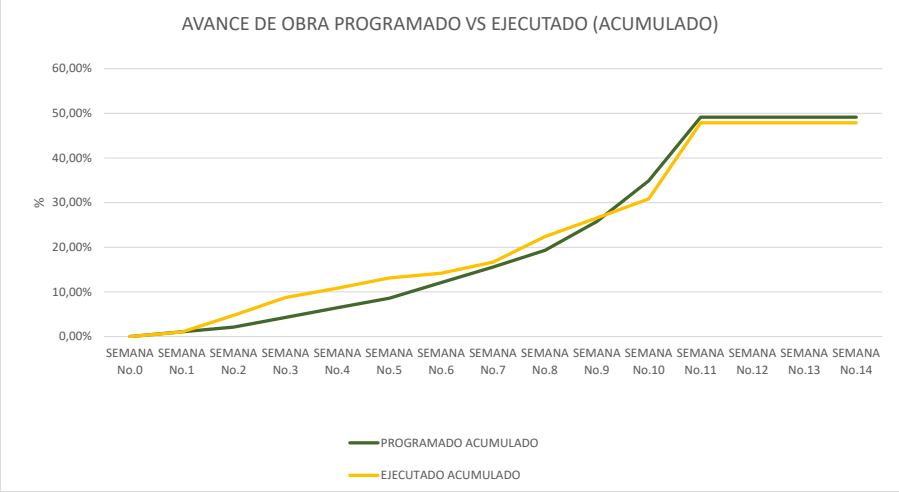

INFORME SEMANAL DE OBRA -ETAPA II
FRENTE DE OBRA: TERRITORIO AAU 21

SEMANA N°	**11**	**DE**	**lunes, 25 de marzo de 2024**	**A**	**domingo, 31 de marzo de 2024**
FECHA INICIO :	16/12/2022	**FECHA TERMINACION:**	19/04/2024		

IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA


OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".				
INTERVENTOR	CONSORCIO PROSPERAR BETHEL	**NIT**	NIT.901.634.239-2	**CONTRATO N°**	1066-2022
CONTRATISTA	CONSORCIO INGENIERÍA I	**NIT**	NIT. 901.639.134-0	**CONTRATO N°**	1070-2022

REGISTRO FOTOGRAFICO



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 21
COMENTARIOS: SUMINISTRO DE MOBILIARIO



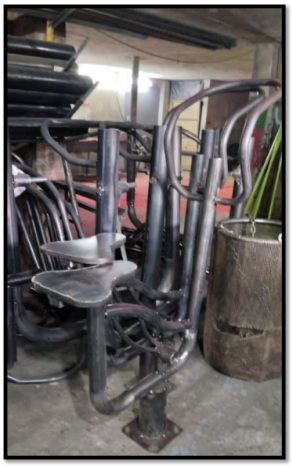

UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 21
COMENTARIOS: EXCAVACIÓN MANUAL SUELO BLANDO



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 21
COMENTARIOS: PANORAMICA DEL TERRITORIO



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 21
COMENTARIOS: MATERIAL



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 21
COMENTARIOS: SST



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 21
COMENTARIOS: PANORAMICA DEL TERRITORIO

Informe semana 8 AAU T22

	INFORME SEMANAL DE OBRA - ETAPA II					
	FRENTE DE OBRA: TERRITORIO AAUT-22					
Semana No.8	Fecha de informe	del:	**4 de marzo de 2024**	al	**10 de marzo de 2024**	

1. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA CIVIL

OBJETO:	**REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".**
CONTRATO DE OBRA No:	1070-2022
VALOR CONTRATO :	$ 2.550.000.000
CONTRATISTA	CONSORCIO INGENIERÍA I
PLAZO:	16 MESES Y TRES DIAS
FECHA DE INICIO:	16 de diciembre de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1	20 de marzo de 2023
FECHA DE REINICIO No. 1:	5 de mayo de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.2	26 de julio de 2023
FECHA DE REINICIO No. 2:	14 de noviembre de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.3	12 de diciembre de 2024
FECHA DE REINICIO No. 3:	28 de diciembre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	19 de abril de 2024
PLAZO TRANSCURRIDO	450,00 DÍAS
VALOR INICIAL	$ 2.550.000.000,00
ADICIÓN	$ 0,00
VALOR ACTULIZADO	$ 2.550.000.000,00


2. SEGUIMIENTO DE OBRA CIVIL

RESUMEN DE AVACE DE EJECUCION DE OBRA:

Proyección de ejecución

SEMANA	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	ATRASO
SEMANA No.0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SEMANA No.1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SEMANA No.2	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SEMANA No.3	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SEMANA No.4	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SEMANA No.5	1,87%	1,87%	4,49%	4,49%	2,62%
SEMANA No.6	3,73%	5,60%	2,85%	7,34%	1,74%
SEMANA No.7	3,73%	9,33%	4,12%	11,46%	2,13%
SEMANA No.8	3,73%	13,06%	2,82%	14,28%	1,22%
SEMANA No.9	0,00%	13,06%	0,00%	14,28%	1,22%
SEMANA No.10	0,00%	13,06%	0,00%	14,28%	1,22%
SEMANA No.11	0,00%	13,06%	0,00%	14,28%	1,22%
SEMANA No.12	0,00%	13,06%	0,00%	14,28%	1,22%
SEMANA No.13	0,00%	13,06%	0,00%	14,28%	1,22%
SEMANA No.14	0,00%	13,06%	0,00%	14,28%	1,22%

CURVA DE AVANCE DE ACTIVIDADES EJECUTADO VS PROGRAMADO

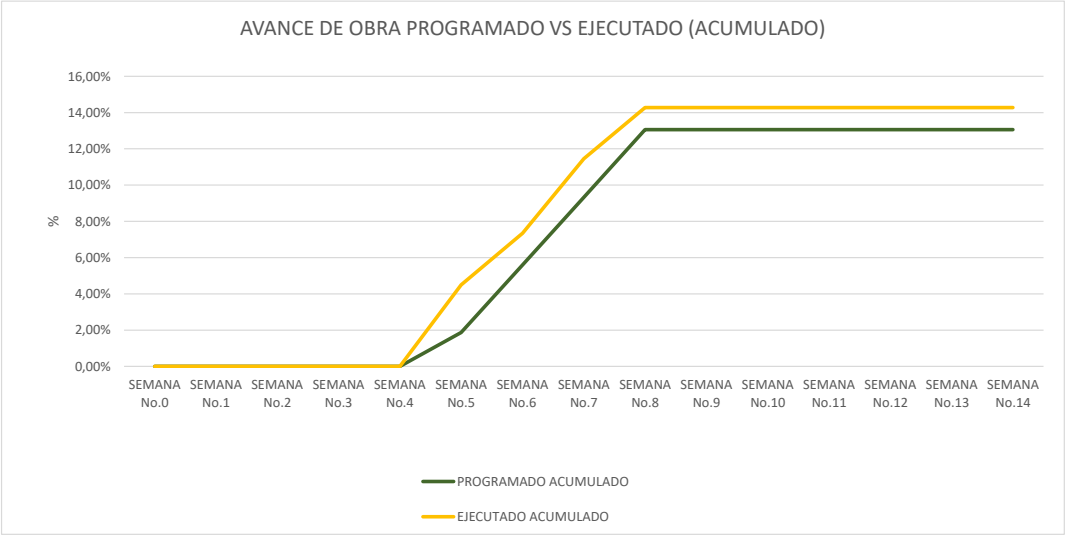

INFORME SEMANAL DE OBRA -ETAPA II
FRENTE DE OBRA: TERRITORIO AAUT-22

SEMANA N°	**8**	**DE**	**lunes, 4 de marzo de 2024**	**A**	**domingo, 10 de marzo de 2024**
FECHA INICIO :	16/12/2022	**FECHA TERMINACION:**	19/04/2024		

IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".				
INTERVENTOR	CONSORCIO PROSPERAR BETHEL	**NIT**	NIT.901.634.239-2	**CONTRATO N°**	1066-2022
CONTRATISTA	CONSORCIO INGENIERÍA I	**NIT**	NIT. 901.639.134-0	**CONTRATO N°**	1070-2022

3. REGISTRO FOTOGRAFICO



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 22
COMENTARIOS: Intalación de cañuela Tipo CU



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 22
COMENTARIOS: Intalación de cañuela Tipo CU



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 22
COMENTARIOS: Intalación de cañuela Tipo CU



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 22
COMENTARIOS: Intalación de cañuela Tipo CU



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 22
COMENTARIOS: Intalación de cañuela Tipo CU



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 22
COMENTARIOS: Mallas electrosoldadas para piso en concreto

CONSORCIO INGENIERÍA I
Nit. 901.639.134 - 0

AVANCE INFROME SEMANALES

No. DE ORDEN	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS		SEMANA No.8		
										8
	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR	PROCENTAJE
1,00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**									
1,10	Localización y replanteo	m2	759,00	$ 8.226,00	$ 6.243.534,00	948,87	$ 7.805.405,00		$ -	
1,70	Cerramiento provisional de obra (Polisombra)	ml	162,00	$ 27.273,00	$ 4.418.226,00	162,00	$ 4.418.226,00		$ -	
1,80	Demolición y retiro de Bordillo prefabricado	ml		$ 18.468,00	$ -	192,49	$ 3.554.905,00		$ -	
1,14	Demolición anden	m2	331,00	$ 21.831,00	$ 7.226.061,00	221,94	$ 4.845.172,00		$ -	
1,15	Desmonte de bancas en concreto existente	un	5,00	$ 110.971,00	$ 554.855,00	10,00	$ 1.109.710,00		$ -	
1,10	Protección de árbol de existente	un	18,00	$ 70.802,00	$ 1.274.436,00	16,00	$ 1.132.832,00		$ -	
1,11	Desmonte y retiro de baranda	ml	74,00	$ 12.784,00	$ 946.016,00	51,10	$ 653.262,00		$ -	
1,12	Desmonte de adoquín	m2	21,00	$ 14.932,00	$ 313.572,00	232,96	$ 3.478.559,00		$ -	
1,18	Desmonte piso de caucho (Trasiego+Retiro)	m2		$ 8.652,00	$ -	119,50	$ 1.033.914,00		$ -	
1,19	Desmonte equipos biosaludable (demolc+retiro)	und		$ 137.907,00	$ -	4,00	$ 551.628,00		$ -	
2,00	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**									
2,50	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	m3	3,00	$ 109.904,00	$ 329.712,00		$ -		$ -	
2,40	Excavación manual suelo blando	m3	17,00	$ 73.172,00	$ 1.243.924,00		$ -		$ -	
2,70	Relleno compactado Base granular	m3		$ 156.593,00	$ -	32,96	$ 5.161.305,00		$ -	
2,80	Excavación muros y huellas vaciadas en concreto	m3		$ 73.172,00	$ -	1,00	$ 73.172,00		$ -	
2,101	Estabilización de base granular con emulsión + cemento 5% E:0.20m	m2		$ 15.980,00	$ -		$ -		$ -	
3,00	**CONCRETOS BASES Y ESTRUCTURAS**									
3,40	Cp02 conexiones peatonales livianas.	un	19,00	$ 137.053,00	$ 2.604.007,00	19,00	$ 2.604.007,00		$ -	
3,50	Cp02 a conexiones peatonales livianas.	un	15,00	$ 51.897,00	$ 778.455,00	15,00	$ 778.455,00		$ -	
3,60	Cp02 b conexiones peatonales livianas.	un	7,00	$ 79.696,00	$ 557.872,00	7,00	$ 557.872,00		$ -	
3,70	Suministro, transporte e instalación de elemento en concreto pigmentado vaciado in situ.	ml	92,00	$ 71.945,00	$ 6.618.940,00		$ -		$ -	
3,80	Pdv01_piso duro vaciado. Construcción de piso duro en concreto de 21mpa	m2	266,00	$ 172.342,00	$ 45.842.972,00	249,36	$ 42.974.498,00		$ -	
3,10	Placa contrapiso 3000 psi 21mpa e=15	m3	2,00	$ 1.027.855,00	$ 2.055.710,00	12,09	$ 12.425.739,00		$ -	
3,90	Escalera en concreto 3000 psi	m3	1,50	$ 1.326.828,00	$ 1.990.242,00		$ -		$ -	
3,10	Zapata corrida	un	11,42	$ 473.324,00	$ 5.404.981,00		$ -		$ -	
3,11	Muro contenc concr 21 MPA 3000	m3	31,20	$ 478.109,00	$ 14.917.001,00		$ -		$ -	
4,00										
4,10	Malla Electrosoldada d=5mm@0.15 (área 6x2.35)	kg		$ 6.619,00	$ -	975,80	$ 6.458.820,00	58,00	$ 383.902,00	5,94%
6,00	**PINTURA PISO**									
6,10	Pintura a color espacio de GYM Biosaludable	m2	21,00	$ 34.389,00	$ 722.169,00	15,33	$ 527.183,00		$ -	
6,40	Pintura amarilla franja de seguridad (Incluye suministro e instaalción)	ml		$ 8.165,00	$ -	68,35	$ 558.078,00		$ -	
7,00	**ADOQUÍN, TABLETA, Y BORDILLOS**									
7,60	Bordillo demarcado recto interno prefabricado en concreto (A80)	ml		$ 90.840,00	$ -	140,50	$ 12.763.229,00	50,00	$ 4.542.000,00	35,59%
7,70	Rejilla sobre cañuela	ml	7,00	$ 177.227,00	$ 1.240.589,00	13,60	$ 2.410.287,00		$ -	
7,50	Bordillo demarcado recto vial prefabricado en concreto (A10)	ml	126,00	$ 85.405,00	$ 10.761.030,00		$ -		$ -	
7,80	Adoquín de arcilla	m2	20,00	$ 74.622,00	$ 1.492.440,00		$ -		$ -	
7,90	Cañuela Tipo CU 004 (suministro e instalación, Incluye 3cm de mortero 1:5)	ml		$ 48.173,00	$ -	75,59	$ 3.641.493,00	57,59	$ 2.774.283,07	76,19%
7,10	Desmonte, corte y reinstalacion adoquin + arena	m2		$ 34.253,00	$ -	74,37	$ 2.547.396,00		$ -	
8,00	**PISOS EN MATERIAL RECICLADO TIPO CAUCHO**									
8,10	Piso caucho reciclado en color, para juegos infantiles	m2	25,00	$ 566.082,00	$ 14.152.050,00	120,89	$ 68.433.653,00		$ -	
10,00	**MOBILIARIO URBANO**									
10,10	Caneca metálica referencia M120 o M121.	un		$ 629.610,00	$ -	11,00	$ 6.925.710,00			
10,11	Banca prefabricada en concreto referencia dime 1.70*0.60*0.45 M13-A	un	10,00	$ 1.987.744,00	$ 19.877.440,00	11,00	$ 21.865.184,00		$ -	
10,12	Banca prefabricada en concreto referencia dime 0.80*0.60*0.45 M13-A	un	2,00	$ 1.652.567,00	$ 3.305.134,00	2,00	$ 3.305.134,00		$ -	
10,60	Suministro baranda M-83	ml	96,00	$ 364.707,00	$ 35.011.872,00	48,31	$ 17.618.995,00		$ -	
10,14	Puerta metálica para cerramiento parque M80A	un	2,00	$ 1.058.763,00	$ 2.117.526,00	1,00	$ 1.058.763,00		$ -	
10,13	Banca de concreto vaciada en SITU.	ml	17,00	$ 765.922,00	$ 13.020.674,00	7,12	$ 5.455.989,00		$ -	
10,15	Mantenimiento juegos infantiles existentes	un	2,00	$ 3.057.727,00	$ 6.115.454,00	2,00	$ 6.115.454,00		$ -	
10,16	Mantenimiento de GYM biosaludable	un	4,00	$ 1.459.860,00	$ 5.839.440,00	4,00	$ 5.839.440,00		$ -	
10,32	Rodadero largo en acero (DESM+SUM+INST)	un		$ 2.441.506,00	$ -	1,00	$ 2.441.506,00		$ -	
10,29	Superficies moradas esquineras	m2		$ 116.477,00	$ -	8,30	$ 966.759,00		$ -	
11,00	**VEGETACION**									
11,10	Cobertura tipo grama	m2	440,00	$ 10.422,00	$ 4.585.680,00		$ -		$ -	
11,40	Relleno en tierra negra	m3	17,00	$ 65.431,00	$ 1.112.327,00		$ -		$ -	
11,30	Siembra de árbol (Según propuesta paisajismo)	un	1,00	$ 291.101,00	$ 291.101,00		$ -		$ -	
11,50	Limo arcilloso	m3	108,00	$ 116.667,00	$ 12.600.036,00		$ -		$ -	
11,60	Árbol hayuelo	un	2,00	$ 299.197,00	$ 598.394,00		$ -		$ -	
11,10	Árbol Chicalá	un	1,00	$ 303.871,00	$ 303.871,00		$ -		$ -	
12,00	**SENALETICA**									
12,5	Suministro, transporte e instalación de valla tipo SRC 000 ó SRG 000	un	1,00	$ 464.467,00	$ 464.467,00	1,00	$ 464.467,00		$ -	
12,6	Suministro, transporte e instalación de valla tipo SRV 000	un	1,00	$ 464.467,00	$ 464.467,00	1,00	$ 464.467,00		$ -	
13,00	**OTROS**									
13,30	Limpieza Cárcamo	ml	7,00	$ 14.319,00	$ 100.233,00	13,60	$ 194.738,00		$ -	
13,20	Aseo general	m2	759,00	$ 7.449,00	$ 5.653.791,00	948,87	$ 7.068.133,00		$ -	
13,10	Baño portátil Alquiler	mes	4,00	$ 398.250,00	$ 1.593.000,00		$ -		$ -	
13,12	Arreglo de graderias para parque	ml		$ 29.630,00	$ -	15,33	$ 454.228,00		$ -	
13,13	Reparación de barandas existentes. Incluye limpieza, mortero de reparación, inhibidor de corrosión, pintura anticarbonatación, suministro de mano de obra, equipos y manejo de desperdicios	ml		$ 39.147,00	$ -	22,18	$ 868.280,00		$ -	
13,14	Suministro+Instal. Malla Eslabonada Cal.10+Pintura	M2		$ 67.642,00	$ -	22,18	$ 1.500.300,00		$ -	
14,01	**PROVISIÓN DE OBRAS ADICIONALES**			**16204532,00**	**16.204.532,00**		**$ -**			
					$ 260.948.233,00		**$ 273.106.347,00**		**$ 7.700.185,07**	**2,82%**
	AMINISTRACIÓN		**26,00%**		**$ 67.846.541,00**		**$ 71.007.650,00**		**$ 2.002.048,12**	**2,82%**
	IMPREVISTOS		**1,00%**		**$ 2.609.482,00**		**$ 2.731.063,00**		**$ 77.001,85**	**2,82%**
	UTILIDAD		**6,00%**		**$ 15.656.894,00**		**$ 16.386.381,00**		**$ 462.011,10**	**2,82%**
	VALOR IVA SOBRE LA UTILIDAD				**$ -**		**$ -**		**$ -**	
	VALORES COSTOS INDIRECTOS				**$ 86.112.917,00**		**$ 90.125.094,00**			
	COSTO TOTAL OBRA				**$ 347.061.150,00**		**$ 363.231.441,00**			
	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO				**$ 4.276.988,00**		**$ 4.276.988,00**			
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				**$ 11.439.678,00**		**$ 11.439.678,00**			
					$ 362.777.816,00		**$ 378.948.107,00**		**$ 10.241.246,14**	**2,70%**
										13,68%

Informe semana 9 AAU T22

CONSORCIO INGENIERÍA I
Nit. 901.639.134 - 0

AVANCE INFROME SEMANALES

No. DE ORDEN	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS		SEMANA No.9		
										9
	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR	PROCENTAJE
1,00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**									
1,10	Localización y replanteo	m2	759,00	$ 8.226,00	$ 6.243.534,00	948,87	$ 7.805.405,00		$ -	
1,70	Cerramiento provisional de obra (Polisombra)	ml	162,00	$ 27.273,00	$ 4.418.226,00	162,00	$ 4.418.226,00		$ -	
1,80	Demolición y retiro de Bordillo prefabricado	ml		$ 18.468,00	$ -	192,49	$ 3.554.905,00		$ -	
1,14	Demolición anden	m2	331,00	$ 21.831,00	$ 7.226.061,00	221,94	$ 4.845.172,00		$ -	
1,15	Desmonte de bancas en concreto existente	un	5,00	$ 110.971,00	$ 554.855,00	10,00	$ 1.109.710,00		$ -	
1,10	Protección de árbol de existente	un	18,00	$ 70.802,00	$ 1.274.436,00	16,00	$ 1.132.832,00		$ -	
1,11	Desmonte y retiro de baranda	ml	74,00	$ 12.784,00	$ 946.016,00	51,10	$ 653.262,00		$ -	
1,12	Desmonte de adoquín	m2	21,00	$ 14.932,00	$ 313.572,00	232,96	$ 3.478.559,00		$ -	
1,18	Desmonte piso de caucho (Trasiego+Retiro)	m2		$ 8.652,00	$ -	119,50	$ 1.033.914,00		$ -	
1,19	Desmonte equipos biosaludable (demolc+retiro)	und		$ 137.907,00	$ -	4,00	$ 551.628,00		$ -	
2,00	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**									
2,50	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	m3	3,00	$ 109.904,00	$ 329.712,00		$ -		$ -	
2,40	Excavación manual suelo blando	m3	17,00	$ 73.172,00	$ 1.243.924,00	64,83	$ 4.743.616,00		$ -	
2,70	Relleno compactado Base granular	m3		$ 156.593,00	$ -	40,05	$ 6.272.176,00	7,09	$ 1.110.870,74	17,71%
2,80	Excavación muros y huellas vaciadas en concreto	m3		$ 73.172,00	$ -	1,00	$ 73.172,00		$ -	
2,101	Estabilización de base granular con emulsión + cemento 5% E:0.20m	m2		$ 15.980,00	$ -		$ -		$ -	
3,00	**CONCRETOS BASES Y ESTRUCTURAS**									
3,40	Cp02_conexiones peatonales livianas.	un	19,00	$ 137.053,00	$ 2.604.007,00	19,00	$ 2.604.007,00		$ -	
3,50	Cp02_a_conexiones peatonales livianas.	un	15,00	$ 51.897,00	$ 778.455,00	15,00	$ 778.455,00		$ -	
3,60	Cp02_b_conexiones peatonales livianas.	un	7,00	$ 79.696,00	$ 557.872,00	7,00	$ 557.872,00		$ -	
3,70	Suministro, transporte e instalación de elemento en concreto pigmentado vaciado in situ.	ml	92,00	$ 71.945,00	$ 6.618.940,00		$ -		$ -	
3,80	Pdv01_piso duro vaciado. Construcción de piso duro en concreto de 21mpa	m2	266,00	$ 172.342,00	$ 45.842.972,00		$ -		$ -	
3,10	Placa contrapiso 3000 psi 21mpa e=15	m3	2,00	$ 1.027.855,00	$ 2.055.710,00	41,05	$ 42.197.559,00		$ -	
3,90	Escalera en concreto 3000 psi	m3	1,50	$ 1.326.828,00	$ 1.990.242,00	1,50	$ 1.990.242,00		$ -	
3,10	Zapata corrida	un	11,42	$ 473.324,00	$ 5.404.981,00		$ -		$ -	
3,11	Muro contenc concr 21 MPA 3000	m3	31,20	$ 478.109,00	$ 14.917.001,00		$ -		$ -	
3,12	Concreto ciclopeo 3000 psi Cimentac+formaleta(SUDS)	m3		$ 548.326,00	$ -	2,48	$ 1.357.107,00		$ -	
4,00										
4,10	Malla Electrosoldada d=5mm@0.15 (área 6x2.35)	kg		$ 6.619,00	$ -	2,70	$ 17.871,00	722,64	$ 4.783.154,16	26764,44%
4,20	Refuerzo acero fy=60000psi muro	kg		$ 5.726,00	$ -	203,13	$ 1.163.122,00		$ -	
6,00	**PINTURA PISO**									
6,10	Pintura a color espacio de GYM Biosaludable	m2	21,00	$ 34.389,00	$ 722.169,00	15,33	$ 527.183,00		$ -	
6,40	Pintura amarilla franja de seguridad (Incluye suministro e instaalción)	ml		$ 8.165,00	$ -	68,35	$ 558.078,00		$ -	
7,00	**ADOQUÍN, TABLETA, Y BORDILLOS**									
7,60	Bordillo demarcado recto interno prefabricado en concreto (A80)	ml		$ 90.840,00	$ -	140,50	$ 12.763.229,00	90,50	$ 8.221.228,93	64,41%
7,70	Rejilla sobre cañuela	ml	7,00	$ 177.227,00	$ 1.240.589,00	13,60	$ 2.410.287,00		$ -	
7,50	Bordillo demarcado recto vial prefabricado en concreto (A10)	ml	126,00	$ 85.405,00	$ 10.761.030,00		$ -		$ -	
7,80	Adoquín de arcilla	m2	20,00	$ 74.622,00	$ 1.492.440,00		$ -		$ -	
7,90	Cañuela Tipo CU 004 (suministro e instalación, Incluye 3cm de mortero 1:5)	ml		$ 48.173,00	$ -	75,59	$ 3.641.493,00		$ -	
7,10	Desmonte, corte y reinstalacion adoquin + arena	m2		$ 34.253,00	$ -	74,37	$ 2.547.396,00		$ -	
8,00	**PISOS EN MATERIAL RECICLADO TIPO CAUCHO**									
8,10	Piso caucho reciclado en color, para juegos infantiles	m2	25,00	$ 566.082,00	$ 14.152.050,00	120,89	$ 68.433.653,00		$ -	
10,00	**MOBILIARIO URBANO**									
10,10	Caneca metálica referencia M120 o M121.	un		$ 629.610,00	$ -	11,00	$ 6.925.710,00			
10,11	Banca prefabricada en concreto referencia dime 1.70*0.60*0.45 M13-A	un	10,00	$ 1.987.744,00	$ 19.877.440,00	11,00	$ 21.865.184,00		$ -	
10,12	Banca prefabricada en concreto referencia dime 0.80*0.60*0.45 M13-A	un	2,00	$ 1.652.567,00	$ 3.305.134,00	2,00	$ 3.305.134,00		$ -	
10,60	Suministro baranda M-83	ml	96,00	$ 364.707,00	$ 35.011.872,00	70,49	$ 25.708.196,00		$ -	
10,14	Puerta metálica para cerramiento parque M80A	un	2,00	$ 1.058.763,00	$ 2.117.526,00	1,00	$ 1.058.763,00		$ -	
10,13	Banca de concreto vaciada en SITU.	ml	17,00	$ 765.922,00	$ 13.020.674,00	16,89	$ 12.936.423,00		$ -	
10,15	Mantenimiento juegos infantiles existentes	un	2,00	$ 3.057.727,00	$ 6.115.454,00	2,00	$ 6.115.454,00		$ -	
10,16	Mantenimiento de GYM biosaludable	un	4,00	$ 1.459.860,00	$ 5.839.440,00	4,00	$ 5.839.440,00		$ -	
10,32	Rodadero largo en acero (DESM+SUM+INST)	un		$ 2.441.506,00	$ -	1,00	$ 2.441.506,00		$ -	
10,29	Superficies moradas esquineras	m2		$ 116.477,00	$ -	65,00	$ 7.571.005,00		$ -	
11,00	**VEGETACION**									
11,10	Cobertura tipo grama	m2	440,00	$ 10.422,00	$ 4.585.680,00	261,54	$ 2.725.745,00		$ -	
11,40	Relleno en tierra negra	m3	17,00	$ 65.431,00	$ 1.112.327,00	228,24	$ 14.933.756,00		$ -	
11,30	Siembra de árbol (Según propuesta paisajismo)	un	1,00	$ 291.101,00	$ 291.101,00		$ -		$ -	
11,50	Limo arcilloso	m3	108,00	$ 116.667,00	$ 12.600.036,00		$ -		$ -	
11,60	Árbol hayuelo	un	2,00	$ 299.197,00	$ 598.394,00		$ -		$ -	
11,10	Árbol Chicalá	un	1,00	$ 303.871,00	$ 303.871,00		$ -		$ -	
12,00	**SEÑALETICA**									
45,0	Suministro, transporte e instalación de valla tipo SRC 000 ó SRG 000	un	1,00	$ 464.467,00	$ 464.467,00	1,00	$ 464.467,00		$ -	
45,0	Suministro, transporte e instalación de valla tipo SRV 000	un	1,00	$ 464.467,00	$ 464.467,00	1,00	$ 464.467,00		$ -	
13,00	**OTROS**									
13,30	Limpieza Cárcamo	ml	7,00	$ 14.319,00	$ 100.233,00	13,60	$ 194.738,00		$ -	
13,20	Aseo general	m2	759,00	$ 7.449,00	$ 5.653.791,00	948,87	$ 7.068.133,00		$ -	
13,10	Baño portátil Alquiler	mes	4,00	$ 398.250,00	$ 1.593.000,00		$ -		$ -	
13,12	Arreglo de graderias para parque	ml		$ 29.630,00	$ -	15,33	$ 454.228,00		$ -	
14,01	**PROVISIÓN DE OBRAS ADICIONALES**			**16204532,00**	**16.204.532,00**		**$ -**			
					$ 260.948.233,00		$ 301.292.480,00		$ 14.115.253,83	4,68%
	AMINISTRACIÓN		**26,00%**		**$ 67.846.541,00**		**$ 78.336.045,00**		**$ 3.669.966,00**	**4,68%**
	IMPREVISTOS		**1,00%**		**$ 2.609.482,00**		**$ 3.012.925,00**		**$ 141.152,54**	**4,68%**
	UTILIDAD		**6,00%**		**$ 15.656.894,00**		**$ 18.077.549,00**		**$ 846.915,23**	**4,68%**
	VALOR IVA SOBRE LA UTILIDAD				**$ -**		**$ -**		**$ -**	
	VALORES COSTOS INDIRECTOS				**$ 86.112.917,00**		**$ 99.426.519,00**			
	COSTO TOTAL OBRA				**$ 347.061.150,00**		**$ 400.718.999,00**			
	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO				**$ 4.276.988,00**		**$ 4.276.988,00**			
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				**$ 11.439.678,00**		**$ 11.439.678,00**			
					$ 362.777.816,00		**$ 416.435.665,00**		**$ 18.773.287,60**	**4,51%**
										16,96%

	INFORME SEMANAL DE OBRA - ETAPA II				
	FRENTE DE OBRA: TERRITORIO AAUT-22				
Semana No.9	Fecha de informe	del:	**11 de marzo de 2024**	al	**17 de marzo de 2024**

1. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA CIVIL

OBJETO:	**REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".**
CONTRATO DE OBRA No:	1070-2022
VALOR CONTRATO :	$ 2.550.000.000
CONTRATISTA	CONSORCIO INGENIERÍA I
PLAZO:	16 MESES Y TRES DÍAS
FECHA DE INICIO:	16 de diciembre de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1	20 de marzo de 2023
FECHA DE REINICIO No. 1:	5 de mayo de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.2	26 de julio de 2023
FECHA DE REINICIO No. 2:	14 de noviembre de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.3	12 de diciembre de 2024
FECHA DE REINICIO No. 3:	28 de diciembre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	19 de abril de 2024
PLAZO TRANSCURRIDO	457,00 DÍAS
VALOR INICIAL	$ 2.550.000.000,00
ADICIÓN	$ 0,00
VALOR ACTULIZADO	$ 2.550.000.000,00


2. SEGUIMIENTO DE OBRA CIVIL

RESUMEN DE AVACE DE EJECUCION DE OBRA:

Proyección de ejecución

SEMANA	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	ATRASO
SEMANA No.0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SEMANA No.1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SEMANA No.2	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SEMANA No.3	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SEMANA No.4	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SEMANA No.5	1,87%	1,87%	4,07%	4,07%	2,20%
SEMANA No.6	3,73%	5,60%	2,58%	6,65%	1,05%
SEMANA No.7	3,73%	9,33%	3,73%	10,38%	1,05%
SEMANA No.8	3,73%	13,06%	2,56%	12,94%	-0,12%
SEMANA No.9	8,38%	21,44%	4,68%	17,63%	-3,81%
SEMANA No.10	0,00%	21,44%	0,00%	17,63%	-3,81%
SEMANA No.11	0,00%	21,44%	0,00%	17,63%	-3,81%
SEMANA No.12	0,00%	21,44%	0,00%	17,63%	-3,81%
SEMANA No.13	0,00%	21,44%	0,00%	17,63%	-3,81%
SEMANA No.14	0,00%	21,44%	0,00%	17,63%	-3,81%

CURVA DE AVANCE DE ACTIVIDADES EJECUTADO VS PROGRAMADO

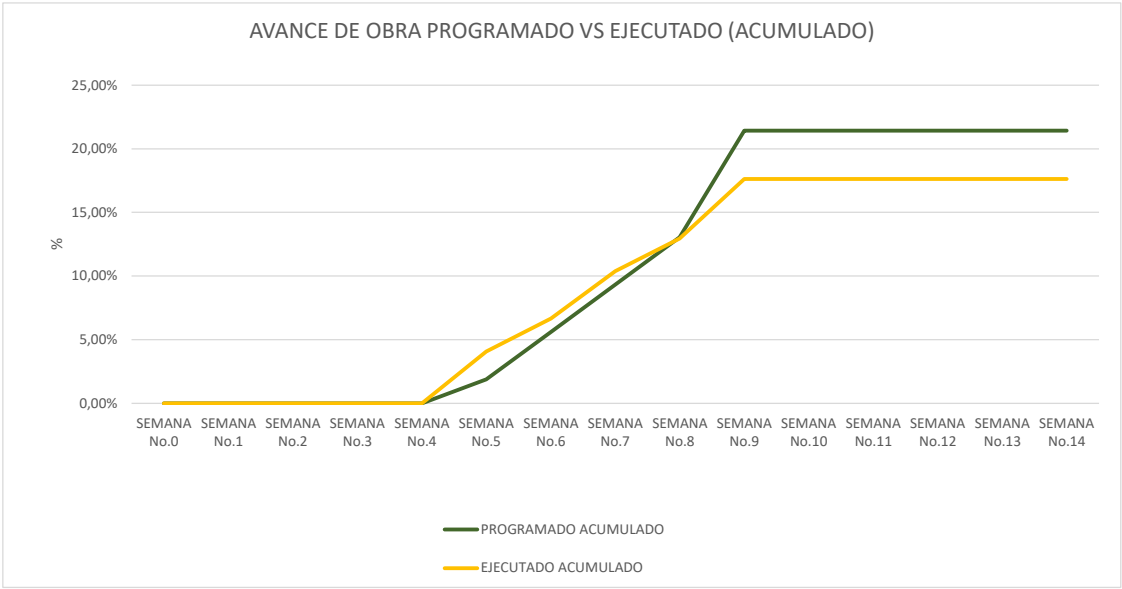

INFORME SEMANAL DE OBRA -ETAPA II
FRENTE DE OBRA: TERRITORIO AAUT-22

SEMANA N°	**9**	**DE**	**lunes, 11 de marzo de 2024**	**A**	**domingo, 17 de marzo de 2024**
FECHA INICIO :	16/12/2022	**FECHA TERMINACION:**	19/04/2024		

IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".				
INTERVENTOR	CONSORCIO PROSPERAR BETHEL	**NIT**	NIT.901.634.239-2	**CONTRATO N°**	1066-2022
CONTRATISTA	CONSORCIO INGENIERÍA I	**NIT**	NIT. 901.639.134-0	**CONTRATO N°**	1070-2022

3. REGISTRO FOTOGRAFICO



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 22
COMENTARIOS: Intalación de Bordillo A80



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 22
COMENTARIOS: Intalación de cañuela Tipo CU



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 22
COMENTARIOS: Intalación de cañuela Tipo CU y bordillo A80



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 22
COMENTARIOS: Mallas electrosoldadas para piso en concreto



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 22
COMENTARIOS: Relleno compactado Base granular



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 22
COMENTARIOS: Relleno compactado Base granular

Informe semana 10 AAU T22

	INFORME SEMANAL DE OBRA - ETAPA II				
	FRENTE DE OBRA: TERRITORIO AAUT-22				
Semana No.10	Fecha de informe	del:	**17 de marzo de 2024**	al	**23 de marzo de 2024**

1. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA CIVIL

OBJETO:	**REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".**
CONTRATO DE OBRA No:	1070-2022
VALOR CONTRATO :	$ 2.550.000.000
CONTRATISTA	CONSORCIO INGENIERÍA I
PLAZO:	16 MESES Y TRES DÍAS
FECHA DE INICIO:	16 de diciembre de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1	20 de marzo de 2023
FECHA DE REINICIO No. 1:	5 de mayo de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.2	26 de julio de 2023
FECHA DE REINICIO No. 2:	14 de noviembre de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.3	12 de diciembre de 2024
FECHA DE REINICIO No. 3:	28 de diciembre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	19 de abril de 2024
PLAZO TRANSCURRIDO	463,00 DÍAS
VALOR INICIAL	$ 2.550.000.000,00
ADICIÓN	$ 0,00
VALOR ACTULIZADO	$ 2.550.000.000,00


2. SEGUIMIENTO DE OBRA CIVIL

RESUMEN DE AVACE DE EJECUCION DE OBRA:

Proyección de ejecución

SEMANA	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	ATRASO
SEMANA No.0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SEMANA No.1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SEMANA No.2	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SEMANA No.3	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SEMANA No.4	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SEMANA No.5	1,87%	1,87%	3,60%	3,60%	1,73%
SEMANA No.6	3,73%	5,60%	2,28%	5,88%	0,28%
SEMANA No.7	3,73%	9,33%	3,30%	9,18%	-0,15%
SEMANA No.8	3,73%	13,06%	2,15%	11,33%	-1,73%
SEMANA No.9	8,38%	21,44%	2,74%	14,07%	-7,37%
SEMANA No.10	8,38%	29,82%	11,20%	25,28%	-4,54%
SEMANA No.11	0,00%	29,82%	0,00%	25,28%	-4,54%
SEMANA No.12	0,00%	29,82%	0,00%	25,28%	-4,54%
SEMANA No.13	0,00%	29,82%	0,00%	25,28%	-4,54%
SEMANA No.14	0,00%	29,82%	0,00%	25,28%	-4,54%

CURVA DE AVANCE DE ACTIVIDADES EJECUTADO VS PROGRAMADO

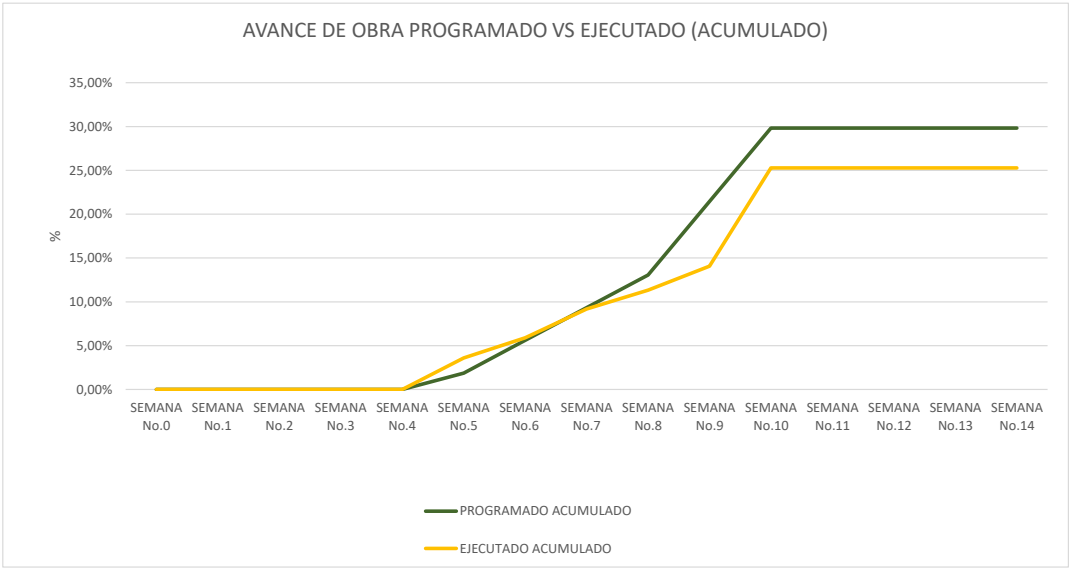


INFORME SEMANAL DE OBRA -ETAPA II
FRENTE DE OBRA: TERRITORIO AAUT-22

SEMANA N°	**10**	**DE**	**domingo, 17 de marzo de 2024**	**A**	**sábado, 23 de marzo de 2024**
FECHA INICIO :	16/12/2022	**FECHA TERMINACION:**	19/04/2024		


IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA


OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".				
INTERVENTOR	CONSORCIO PROSPERAR BETHEL	**NIT**	NIT.901.634.239-2	**CONTRATO N°**	1066-2022
CONTRATISTA	CONSORCIO INGENIERÍA I	**NIT**	NIT. 901.639.134-0	**CONTRATO N°**	1070-2022

3. REGISTRO FOTOGRAFICO

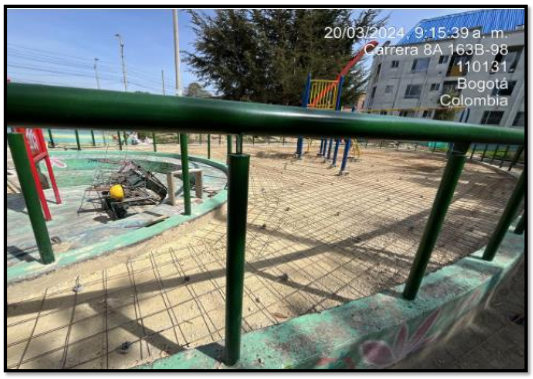

UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 22
COMENTARIOS: Compactación Base y Mallas electrosoldadas

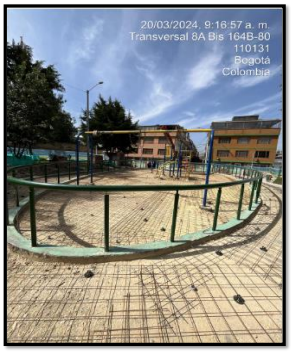

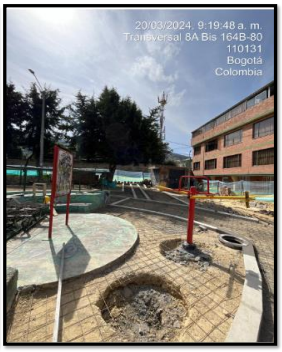

UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 22
COMENTARIOS: Compactación Base, Mallas electrosoldadas y desmonte biosaludables



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 22
COMENTARIOS: Placa contrapiso 3000 psi 21mpa e=15



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 22
COMENTARIOS: Placa contrapiso 3000 psi 21mpa e=15



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 22
COMENTARIOS: Aplicación de pigmento para acabado concreto



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 22
COMENTARIOS: Aplicación de pigmento para acabado concreto

CONSORCIO INGENIERÍA I
Nit. 901.639.134 - 0

AVANCE INFROME SEMANALES

No. DE ORDEN	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS		SEMANA No.10			CANTIDADES EJECUTADAS		
										10			
	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR	PROCENTAJE	CANTIDAD	VALOR	PROCENTAJE
1,00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**												
1,10	Localización y replanteo	m2	759,00	$ 8.226,00	$ 6.243.534,00	948,87	$ 7.805.405,00		$ -		948,87	$ 7.805.404,62	100,00%
1,70	Cerramiento provisional de obra (Polisombra)	ml	162,00	$ 27.273,00	$ 4.418.226,00	162,00	$ 4.418.226,00		$ -		162,00	$ 4.418.226,00	100,00%
1,80	Demolición y retiro de Bordillo prefabricado	ml		$ 18.468,00	$ -	192,49	$ 3.554.905,00	63,08	$ 1.164.961,44	32,77%	192,49	$ 3.554.905,32	100,00%
1,14	Demolición anden	m2	331,00	$ 21.831,00	$ 7.226.061,00	221,94	$ 4.845.172,00		$ -		221,94	$ 4.845.172,14	100,00%
1,15	Desmonte de bancas en concreto existente	un	5,00	$ 110.971,00	$ 554.855,00	10,00	$ 1.109.710,00		$ -		10,00	$ 1.109.710,00	100,00%
1,10	Protección de árbol de existente	un	18,00	$ 70.802,00	$ 1.274.436,00	16,00	$ 1.132.832,00		$ -		18,00	$ 1.274.436,00	112,50%
1,11	Desmonte y retiro de baranda	ml	74,00	$ 12.784,00	$ 946.016,00	51,10	$ 653.262,00		$ -			$ -	
1,12	Desmonte de adoquín	m2	21,00	$ 14.932,00	$ 313.572,00	232,96	$ 3.478.559,00	62,96	$ 940.118,72	27,03%	232,96	$ 3.478.558,72	100,00%
1,18	Desmonte piso de caucho (Trasiego+Retiro)	m2		$ 8.652,00	$ -	119,50	$ 1.033.914,00	17,93	$ 155.087,10	15,00%	119,50	$ 1.033.914,00	100,00%
1,19	Desmonte equipos biosaludable (demolc+retiro)	und		$ 137.907,00	$ -	4,00	$ 551.628,00	4,00	$ 551.628,00	100,00%	4,00	$ 551.628,00	100,00%
2,00	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**												
2,50	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	m3	3,00	$ 109.904,00	$ 329.712,00		$ -		$ -			$ -	
2,40	Excavación manual suelo blando	m3	17,00	$ 73.172,00	$ 1.243.924,00	64,83	$ 4.743.616,00	64,83	$ 4.743.740,76	100,00%	64,83	$ 4.743.740,76	100,00%
2,70	Relleno compactado Base granular	m3		$ 156.593,00	$ -	40,05	$ 6.272.176,00		$ -		40,05	$ 6.272.176,02	100,00%
2,80	Excavación muros y huellas vaciadas en concreto	m3		$ 73.172,00	$ -	1,00	$ 73.172,00		$ -			$ -	
2,101	Estabilización de base granular con emulsión + cemento 5% E:0.20m	m2		$ 15.980,00	$ -		$ -		$ -			$ -	
3,00	**CONCRETOS BASES Y ESTRUCTURAS**												
3,40	Cp02_conexiones peatonales livianas.	un	19,00	$ 137.053,00	$ 2.604.007,00	19,00	$ 2.604.007,00		$ -			$ -	
3,50	Cp02_a_conexiones peatonales livianas.	un	15,00	$ 51.897,00	$ 778.455,00	15,00	$ 778.455,00		$ -			$ -	
3,60	Cp02_b_conexiones peatonales livianas.	un	7,00	$ 79.696,00	$ 557.872,00	7,00	$ 557.872,00		$ -			$ -	
3,70	Suministro, transporte e instalación de elemento en concreto pigmentado vaciado in situ.	ml	92,00	$ 71.945,00	$ 6.618.940,00		$ -		$ -			$ -	
3,80	Pdv01_piso duro vaciado. Construcción de piso duro en concreto de 21mpa	m2	266,00	$ 172.342,00	$ 45.842.972,00		$ -		$ -			$ -	
3,10	Placa contrapiso 3000 psi 21mpa e=15	m3	2,00	$ 1.027.855,00	$ 2.055.710,00	41,05	$ 42.197.559,00	20,00	$ 20.557.100,00	48,72%	20,00	$ 20.557.100,00	48,72%
3,90	Escalera en concreto 3000 psi	m3	1,50	$ 1.326.828,00	$ 1.990.242,00	1,50	$ 1.990.242,00		$ -			$ -	
3,10	Zapata corrida	un	11,42	$ 473.324,00	$ 5.404.981,00		$ -		$ -			$ -	
3,11	Muro contenc concr 21 MPA 3000	m3	31,20	$ 478.109,00	$ 14.917.001,00		$ -		$ -			$ -	
3,12	Concreto ciclopeo 3000 psi Cimentac+formaleta(SUDS)	m3		$ 548.326,00	$ -	2,48	$ 1.357.107,00		$ -				
4,00													
4,20	Refuerzo acero fy=60000psi muro	kg		$ 5.726,00	$ -	203,13	$ 1.163.122,00		$ -				
6,00	**PINTURA PISO**												
6,10	Pintura a color espacio de GYM Biosaludable	m2	21,00	$ 34.389,00	$ 722.169,00	15,33	$ 527.183,00		$ -			$ -	
6,40	Pintura amarilla franja de seguridad (Incluye suministro e instalación)	ml		$ 8.165,00	$ -	68,35	$ 558.078,00		$ -			$ -	
7,00	**ADOQUÍN, TABLETA, Y BORDILLOS**												
7,60	Bordillo demarcado recto interno prefabricado en concreto (A80)	ml		$ 90.840,00	$ -	140,50	$ 12.763.229,00		$ -		140,50	$ 12.763.228,93	100,00%
7,70	Rejilla sobre cañuela	ml	7,00	$ 177.227,00	$ 1.240.589,00	13,60	$ 2.410.287,00		$ -			$ -	
7,50	Bordillo demarcado recto vial prefabricado en concreto (A10)	ml	126,00	$ 85.405,00	$ 10.761.030,00		$ -		$ -			$ -	
7,80	Adoquín de arcilla	m2	20,00	$ 74.622,00	$ 1.492.440,00		$ -		$ -			$ -	
7,90	Cañuela Tipo CU 004 (suministro e instalación, Incluye 3cm de mortero 1:5)	ml		$ 48.173,00	$ -	75,59	$ 3.641.493,00		$ -		75,59	$ 3.641.397,07	100,00%
7,10	Desmonte, corte y reinstalacion adoquin + arena	m2		$ 34.253,00	$ -	74,37	$ 2.547.396,00	52,06	$ 1.783.177,20	70,00%	52,06	$ 1.783.177,20	70,00%
8,00	**PISOS EN MATERIAL RECICLADO TIPO CAUCHO**												
8,10	Piso caucho reciclado en color, para juegos infantiles	m2	25,00	$ 566.082,00	$ 14.152.050,00	120,89	$ 68.433.653,00		$ -			$ -	
10,00	**MOBILIARIO URBANO**												
10,10	Caneca metálica referencia M120 o M121.	un		$ 629.610,00	$ -	11,00	$ 6.925.710,00						
10,11	Banca prefabricada en concreto referencia dime 1.70*0.60*0.45 M13-A	un	10,00	$ 1.987.744,00	$ 19.877.440,00	11,00	$ 21.865.184,00		$ -			$ -	
10,12	Banca prefabricada en concreto referencia dime 0.80*0.60*0.45 M13-A	un	2,00	$ 1.652.567,00	$ 3.305.134,00	2,00	$ 3.305.134,00		$ -			$ -	
10,60	Suministro baranda M-83	ml	96,00	$ 364.707,00	$ 35.011.872,00	70,49	$ 25.708.196,00		$ -			$ -	
10,14	Puerta metálica para cerramiento parque M80A	un	2,00	$ 1.058.763,00	$ 2.117.526,00	1,00	$ 1.058.763,00		$ -			$ -	
10,13	Banca de concreto vaciada en SITU.	ml	17,00	$ 765.922,00	$ 13.020.674,00	16,89	$ 12.936.423,00		$ -			$ -	
10,15	Mantenimiento juegos infantiles existentes	un	2,00	$ 3.057.727,00	$ 6.115.454,00	2,00	$ 6.115.454,00		$ -			$ -	
10,16	Mantenimiento de GYM biosaludable	un	4,00	$ 1.459.860,00	$ 5.839.440,00	4,00	$ 5.839.440,00		$ -			$ -	
10,32	Rodadero largo en acero (DESM+SUM+INST)	un		$ 2.441.506,00	$ -	1,00	$ 2.441.506,00		$ -			$ -	
10,29	Superficies moradas esquineras	m2		$ 116.477,00	$ -	65,00	$ 7.571.005,00		$ -			$ -	
11,00	**VEGETACION**												
11,10	Cobertura tipo grama	m2	440,00	$ 10.422,00	$ 4.585.680,00	261,54	$ 2.725.745,00		$ -			$ -	
11,40	Relleno en tierra negra	m3	17,00	$ 65.431,00	$ 1.112.327,00	228,24	$ 14.933.756,00		$ -			$ -	
11,30	Siembra de árbol (Según propuesta paisajismo)	un	1,00	$ 291.101,00	$ 291.101,00		$ -		$ -			$ -	
11,50	Limo arcilloso	m3	108,00	$ 116.667,00	$ 12.600.036,00		$ -		$ -			$ -	
11,60	Árbol hayuelo	un	2,00	$ 299.197,00	$ 598.394,00		$ -		$ -			$ -	
11,10	Árbol Chicalá	un	1,00	$ 303.871,00	$ 303.871,00		$ -		$ -			$ -	
12,00	**SEÑALETICA**												
12,5	Suministro, transporte e instalación de valla tipo SRC 000 ó SRG 000	un	1,00	$ 464.467,00	$ 464.467,00	1,00	$ 464.467,00		$ -			$ -	
12,6	Suministro, transporte e instalación de valla tipo SRV 000	un	1,00	$ 464.467,00	$ 464.467,00	1,00	$ 464.467,00		$ -			$ -	
13,00	**OTROS**												
13,30	Limpieza Cárcamo	ml	7,00	$ 14.319,00	$ 100.233,00	13,60	$ 194.738,00		$ -			$ -	
13,20	Aseo general	m2	759,00	$ 7.449,00	$ 5.653.791,00	948,87	$ 7.068.133,00		$ -			$ -	
13,10	Baño portátil Alquiler	mes	4,00	$ 398.250,00	$ 1.593.000,00		$ -		$ -			$ -	
13,12	Arreglo de graderias para parque	ml		$ 29.630,00	$ -	15,33	$ 454.228,00		$ -			$ -	
13,15	Suministro y aplicación de pigmento para coloracion acabado superficial de concretos, incluye sellador acrilico transparente	M2		$ 94.990,00	$ -	290,32	$ 27.577.497,00	87,10	$ 8.273.249,11	30,00%	87,10	$ 8.273.249,11	30,00%
14,01	**PROVISIÓN DE OBRAS ADICIONALES**			**16204532,00**	**16.204.532,00**		**$ -**						
					$ 260.948.233,00		$ 328.852.106,00		$ 38.169.062,33	11,61%		$ 86.106.023,89	26,18%
	AMINISTRACIÓN		26,00%		$ 67.846.541,00		$ 85.501.548,00		$ 9.923.956,21	11,61%		$ 22.387.566,21	26,18%
	IMPREVISTOS		1,00%		$ 2.609.482,00		$ 3.288.521,00		$ 381.690,62	11,61%		$ 861.060,24	26,18%
	UTILIDAD		6,00%		$ 15.656.894,00		$ 19.731.126,00		$ 2.290.143,74	11,61%		$ 5.166.361,43	26,18%
	VALOR IVA SOBRE LA UTILIDAD				$ -		$ -		$ -			$ -	
	VALORES COSTOS INDIRECTOS				$ 86.112.917,00		$ 108.521.195,00						
	COSTO TOTAL OBRA				$ 347.061.150,00		$ 437.373.301,00						
	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO				$ 4.276.988,00		$ 4.276.988,00						
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				$ 11.439.678,00		$ 11.439.678,00						
					$ 362.777.816,00		$ 453.089.967,00		$ 50.764.852,90	11,20%		$ 114.521.011,77	25,28%
										25,28%			

Informe semana 11 AAU T22

	INFORME SEMANAL DE OBRA - ETAPA II				
	FRENTE DE OBRA: TERRITORIO AAUT-22				
Semana No.11	Fecha de informe	del:	**24 de marzo de 2024**	al	**30 de marzo de 2024**

1. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA CIVIL

OBJETO:	**REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".**
CONTRATO DE OBRA No:	1070-2022
VALOR CONTRATO :	$ 2.550.000.000
CONTRATISTA	CONSORCIO INGENIERÍA I
PLAZO:	16 MESES Y TRES DÍAS
FECHA DE INICIO:	16 de diciembre de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1	20 de marzo de 2023
FECHA DE REINICIO No. 1:	5 de mayo de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.2	26 de julio de 2023
FECHA DE REINICIO No. 2:	14 de noviembre de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.3	12 de diciembre de 2024
FECHA DE REINICIO No. 3:	28 de diciembre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	19 de abril de 2024
PLAZO TRANSCURRIDO	470,00 DÍAS
VALOR INICIAL	$ 2.550.000.000,00
ADICIÓN	$ 0,00
VALOR ACTULIZADO	$ 2.550.000.000,00


2. SEGUIMIENTO DE OBRA CIVIL

RESUMEN DE AVACE DE EJECUCION DE OBRA:

Proyección de ejecución

SEMANA	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	ATRASO
SEMANA No.0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SEMANA No.1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SEMANA No.2	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SEMANA No.3	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SEMANA No.4	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SEMANA No.5	1,87%	1,87%	3,73%	3,73%	1,86%
SEMANA No.6	3,73%	5,60%	2,36%	6,09%	0,49%
SEMANA No.7	3,73%	9,33%	3,42%	9,51%	0,18%
SEMANA No.8	3,73%	13,06%	2,22%	11,73%	-1,33%
SEMANA No.9	8,38%	21,44%	2,84%	14,57%	-6,87%
SEMANA No.10	8,38%	29,82%	11,60%	26,17%	-3,65%
SEMANA No.11	15,63%	45,45%	16,01%	42,18%	-3,27%
SEMANA No.12	0,00%	45,45%	0,00%	42,18%	-3,27%
SEMANA No.13	0,00%	45,45%	0,00%	42,18%	-3,27%
SEMANA No.14	0,00%	45,45%	0,00%	42,18%	-3,27%

CURVA DE AVANCE DE ACTIVIDADES EJECUTADO VS PROGRAMADO

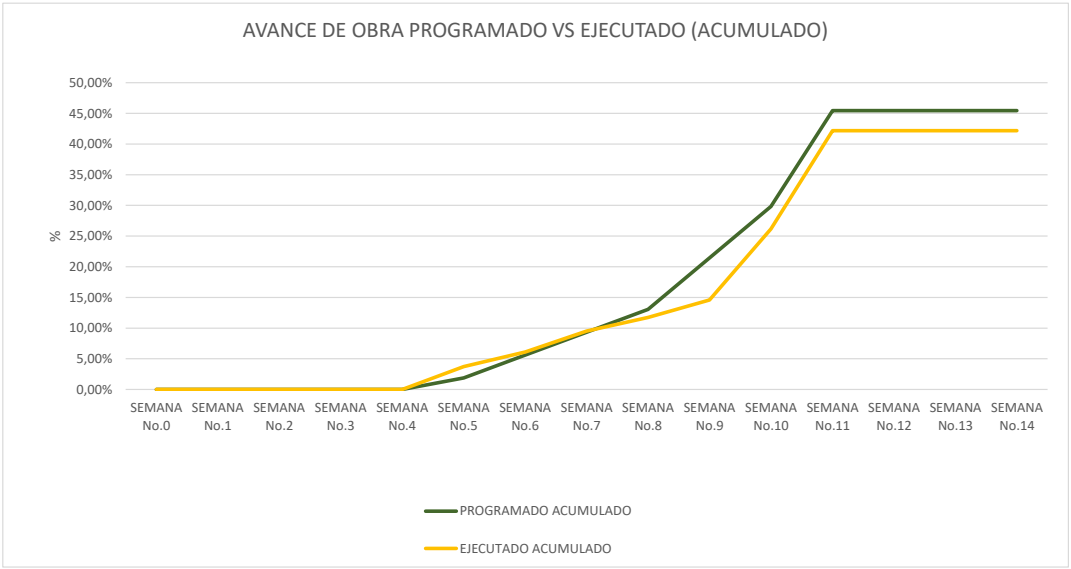

INFORME SEMANAL DE OBRA -ETAPA II
FRENTE DE OBRA: TERRITORIO AAUT-22

SEMANA N°	**11**	**DE**	**domingo, 24 de marzo de 2024**	**A**	**sábado, 30 de marzo de 2024**
FECHA INICIO :	16/12/2022	**FECHA TERMINACION:**	19/04/2024		

IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".				
INTERVENTOR	CONSORCIO PROSPERAR BETHEL	**NIT**	NIT.901.634.239-2	**CONTRATO N°**	1066-2022
CONTRATISTA	CONSORCIO INGENIERÍA I	**NIT**	NIT. 901.639.134-0	**CONTRATO N°**	1070-2022

3. REGISTRO FOTOGRAFICO



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 22
COMENTARIOS: Placa de contrapiso 3000 psi



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 22
COMENTARIOS: Placa de contrapiso 3000 psi




UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 22
COMENTARIOS: Placa contrapiso 3000 psi



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 22
COMENTARIOS: Aplicación de pigmento para acabado concreto



UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 22
COMENTARIOS: Aplicación de pigmento para acabado concreto

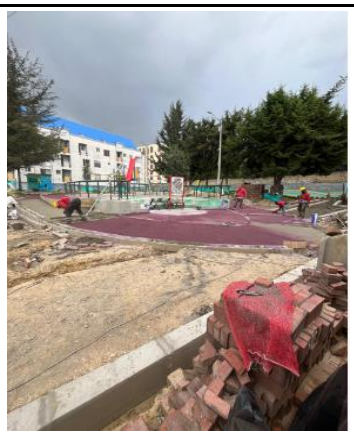

UBICACIÓN: TERRITORIO AAUT- 22
COMENTARIOS: Aplicación de pigmento para acabado concreto

CONSORCIO INGENIERÍA I
Nit. 901.639.134 - 0

AVANCE INFROME SEMANALES

No. DE ORDEN	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS		SEMANA No.11			CANTIDADES EJECUTADAS		
										11			
	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR	PROCENTAJE	CANTIDAD	VALOR	PROCENTAJE
1,00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**												
1,10	Localización y replanteo	m2	759,00	$ 8.226,00	$ 6.243.534,00	948,87	$ 7.805.405,00		$ -		948,87	$ 7.805.404,62	100,00%
1,70	Cerramiento provisional de obra (Polisombra)	ml	162,00	$ 27.273,00	$ 4.418.226,00	162,00	$ 4.418.226,00		$ -		162,00	$ 4.418.226,00	100,00%
1,80	Demolición y retiro de Bordillo prefabricado	ml		$ 18.468,00	$ -	192,49	$ 3.554.905,00		$ -		192,49	$ 3.554.905,32	100,00%
1,14	Demolición anden	m2	331,00	$ 21.831,00	$ 7.226.061,00	221,94	$ 4.845.172,00		$ -		221,94	$ 4.845.172,14	100,00%
1,15	Desmonte de bancas en concreto existente	un	5,00	$ 110.971,00	$ 554.855,00	10,00	$ 1.109.710,00		$ -		10,00	$ 1.109.710,00	100,00%
1,10	Protección de árbol de existente	un	18,00	$ 70.802,00	$ 1.274.436,00	18,00	$ 1.274.436,00		$ -		18,00	$ 1.274.436,00	100,00%
1,11	Desmonte y retiro de baranda	ml	74,00	$ 12.784,00	$ 946.016,00	51,10	$ 653.262,00		$ -			$ -	
1,12	Desmonte de adoquín	m2	21,00	$ 14.932,00	$ 313.572,00	232,96	$ 3.478.559,00		$ -		232,96	$ 3.478.558,72	100,00%
1,18	Desmonte piso de caucho (Trasiego+Retiro)	m2		$ 8.652,00	$ -	119,50	$ 1.033.914,00		$ -		119,50	$ 1.033.914,00	100,00%
1,19	Desmonte equipos biosaludable (demolc+retiro)	und		$ 137.907,00	$ -	4,00	$ 551.628,00		$ -		4,00	$ 551.628,00	100,00%
2,00	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**												
2,50	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	m3	3,00	$ 109.904,00	$ 329.712,00		$ -		$ -			$ -	
2,40	Excavación manual suelo blando	m3	17,00	$ 73.172,00	$ 1.243.924,00	64,83	$ 4.743.616,00		$ -		64,83	$ 4.743.740,76	100,00%
2,70	Relleno compactado Base granular	m3		$ 156.593,00	$ -	40,05	$ 6.272.176,00		$ -		40,05	$ 6.272.176,02	100,00%
2,80	Excavación muros y huellas vaciadas en concreto	m3		$ 73.172,00	$ -	1,00	$ 73.172,00		$ -			$ -	
2,101	Estabilización de base granular con emulsión + cemento 5% E:0.20m	m2		$ 15.980,00	$ -		$ -		$ -			$ -	
3,00	**CONCRETOS BASES Y ESTRUCTURAS**												
3,40	Cp02_conexiones peatonales livianas.	un	19,00	$ 137.053,00	$ 2.604.007,00	19,00	$ 2.604.007,00		$ -			$ -	
3,50	Cp02_a_conexiones peatonales livianas.	un	15,00	$ 51.897,00	$ 778.455,00	15,00	$ 778.455,00		$ -			$ -	
3,60	Cp02_b_conexiones peatonales livianas.	un	7,00	$ 79.696,00	$ 557.872,00	7,00	$ 557.872,00		$ -			$ -	
3,70	Suministro, transporte e instalación de elemento en concreto pigmentado vaciado in situ.	ml	92,00	$ 71.945,00	$ 6.618.940,00		$ -		$ -			$ -	
3,80	Pdv01_piso duro vaciado. Construcción de piso duro en concreto de 21mpa	m2	266,00	$ 172.342,00	$ 45.842.972,00		$ -		$ -			$ -	
3,10	Placa contrapiso 3000 psi 21mpa e=15	m3	2,00	$ 1.027.855,00	$ 2.055.710,00	41,05	$ 42.197.559,00	20,00	$ 20.557.100,00	48,72%	40,00	$ 41.114.200,00	97,43%
3,90	Escalera en concreto 3000 psi	m3	1,50	$ 1.326.828,00	$ 1.990.242,00	1,50	$ 1.990.242,00	0,35	$ 464.389,80	23,33%	0,35	$ 464.389,80	23,33%
3,10	Zapata corrida	un	11,42	$ 473.324,00	$ 5.404.981,00		$ -		$ -			$ -	
3,11	Muro contenc concr 21 MPA 3000	m3	31,20	$ 478.109,00	$ 14.917.001,00		$ -		$ -			$ -	
3,12	Concreto ciclopeo 3000 psi Cimentac+formaleta(SUDS)	m3		$ 548.326,00	$ -	2,48	$ 1.357.107,00		$ -				
4,00													
4,20	Refuerzo acero fy=60000psi muro	kg		$ 5.726,00	$ -	203,13	$ 1.163.122,00		$ -				
6,00	**PINTURA PISO**												
6,10	Pintura a color espacio de GYM Biosaludable	m2	21,00	$ 34.389,00	$ 722.169,00	15,33	$ 527.183,00		$ -			$ -	
6,40	Pintura amarilla franja de seguridad (Incluye suministro e instalación)	ml		$ 8.165,00	$ -	68,35	$ 558.078,00		$ -			$ -	
7,00	**ADOQUÍN, TABLETA, Y BORDILLOS**												
7,60	Bordillo demarcado recto interno prefabricado en concreto (A80)	ml		$ 90.840,00	$ -	140,50	$ 12.763.229,00		$ -		140,50	$ 12.763.228,93	100,00%
7,70	Rejilla sobre cañuela	ml	7,00	$ 177.227,00	$ 1.240.589,00	13,60	$ 2.410.287,00		$ -			$ -	
7,50	Bordillo demarcado recto vial prefabricado en concreto (A10)	ml	126,00	$ 85.405,00	$ 10.761.030,00		$ -		$ -			$ -	
7,80	Adoquín de arcilla	m2	20,00	$ 74.622,00	$ 1.492.440,00		$ -		$ -			$ -	
7,90	Cañuela Tipo CU 004 (suministro e instalación, Incluye 3cm de mortero 1:5)	ml		$ 48.173,00	$ -	75,59	$ 3.641.493,00		$ -		75,59	$ 3.641.397,07	100,00%
7,10	Desmonte, corte y reinstalacion adoquin + arena	m2		$ 34.253,00	$ -	74,37	$ 2.547.396,00		$ -		52,06	$ 1.783.177,20	70,00%
8,00	**PISOS EN MATERIAL RECICLADO TIPO CAUCHO**												
8,10	Piso caucho reciclado en color, para juegos infantiles	m2	25,00	$ 566.082,00	$ 14.152.050,00	120,89	$ 68.433.653,00		$ -			$ -	
10,00	**MOBILIARIO URBANO**												
10,10	Caneca metálica referencia M120 o M121.	un		$ 629.610,00	$ -	11,00	$ 6.925.710,00						
10,11	Banca prefabricada en concreto referencia dime 1.70*0.60*0.45 M13-A	un	10,00	$ 1.987.744,00	$ 19.877.440,00	11,00	$ 21.865.184,00		$ -			$ -	
10,12	Banca prefabricada en concreto referencia dime 0.80*0.60*0.45 M13-A	un	2,00	$ 1.652.567,00	$ 3.305.134,00	2,00	$ 3.305.134,00		$ -			$ -	
10,60	Suministro baranda M-83	ml	96,00	$ 364.707,00	$ 35.011.872,00	70,49	$ 25.708.196,00	35,00	$ 12.764.745,00	49,65%	35,00	$ 12.764.745,00	49,65%
10,14	Puerta metálica para cerramiento parque M80A	un	2,00	$ 1.058.763,00	$ 2.117.526,00	1,00	$ 1.058.763,00		$ -			$ -	
10,13	Banca de concreto vaciada en SITU.	ml	17,00	$ 765.922,00	$ 13.020.674,00	16,89	$ 12.936.423,00	5,00	$ 3.829.610,00	29,60%	5,00	$ 3.829.610,00	29,60%
10,15	Mantenimiento juegos infantiles existentes	un	2,00	$ 3.057.727,00	$ 6.115.454,00	2,00	$ 6.115.454,00	0,20	$ 611.545,40	10,00%	0,20	$ 611.545,40	10,00%
10,16	Mantenimiento de GYM biosaludable	un	4,00	$ 1.459.860,00	$ 5.839.440,00	4,00	$ 5.839.440,00		$ -			$ -	
10,32	Rodadero largo en acero (DESM+SUM+INST)	un		$ 2.441.506,00	$ -	1,00	$ 2.441.506,00		$ -			$ -	
10,29	Superficies moradas esquineras	m2		$ 116.477,00	$ -	65,00	$ 7.571.005,00		$ -			$ -	
11,00	**VEGETACION**												
11,10	Cobertura tipo grama	m2	440,00	$ 10.422,00	$ 4.585.680,00	261,54	$ 2.725.745,00		$ -			$ -	
11,40	Relleno en tierra negra	m3	17,00	$ 65.431,00	$ 1.112.327,00	228,24	$ 14.933.756,00		$ -			$ -	
11,30	Siembra de árbol (Según propuesta paisajismo)	un	1,00	$ 291.101,00	$ 291.101,00		$ -		$ -			$ -	
11,50	Limo arcilloso	m3	108,00	$ 116.667,00	$ 12.600.036,00		$ -		$ -			$ -	
11,60	Árbol hayuelo	un	2,00	$ 299.197,00	$ 598.394,00		$ -		$ -			$ -	
11,10	Árbol Chicalá	un	1,00	$ 303.871,00	$ 303.871,00		$ -		$ -			$ -	
12,00	**SEÑALETICA**												
12,5	Suministro, transporte e instalación de valla tipo SRC 000 ó SRG 000	un	1,00	$ 464.467,00	$ 464.467,00	1,00	$ 464.467,00		$ -			$ -	
12,6	Suministro, transporte e instalación de valla tipo SRV 000	un	1,00	$ 464.467,00	$ 464.467,00	1,00	$ 464.467,00		$ -			$ -	
13,00	**OTROS**												
13,30	Limpieza Cárcamo	ml	7,00	$ 14.319,00	$ 100.233,00	13,60	$ 194.738,00		$ -			$ -	
13,20	Aseo general	m2	759,00	$ 7.449,00	$ 5.653.791,00	948,87	$ 7.068.133,00		$ -			$ -	
13,10	Baño portátil Alquiler	mes	4,00	$ 398.250,00	$ 1.593.000,00		$ -		$ -			$ -	
13,12	Arreglo de graderias para parque	ml		$ 29.630,00	$ -	15,33	$ 454.228,00		$ -			$ -	
13,15	Suministro y aplicación de pigmento para coloracion acabado superficial de concretos, incluye sellador acrilico transparente	M2		$ 94.990,00	$ -	290,32	$ 27.577.497,00	152,00	$ 14.438.480,00	52,36%	239,10	$ 22.711.729,11	82,36%
14,01	**PROVISIÓN DE OBRAS ADICIONALES**			**16204532,00**	**16.204.532,00**		**$ -**						
					$ 260.948.233,00		$ 328.993.710,00		$ 52.665.870,20	16,01%		$ 138.771.894,09	42,18%
	AMINISTRACIÓN		26,00%		$ 67.846.541,00		$ 85.538.365,00		$ 13.693.126,25	16,01%		$ 36.080.692,46	42,18%
	IMPREVISTOS		1,00%		$ 2.609.482,00		$ 3.289.937,00		$ 526.658,70	16,01%		$ 1.387.718,94	42,18%
	UTILIDAD		6,00%		$ 15.656.894,00		$ 19.739.623,00		$ 3.159.952,21	16,01%		$ 8.326.313,65	42,18%
	VALOR IVA SOBRE LA UTILIDAD				$ -		$ -		$ -			$ -	
	VALORES COSTOS INDIRECTOS				$ 86.112.917,00		$ 108.567.925,00						
	COSTO TOTAL OBRA				$ 347.061.150,00		$ 437.561.635,00						
	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO				$ 4.276.988,00		$ 4.276.988,00						
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				$ 11.439.678,00		$ 11.439.678,00						
					$ 362.777.816,00		$ 453.278.301,00		$ 70.045.607,36	15,45%		$ 184.566.619,14	40,72%
										40,72%			

Informe semana 8 Manzana del Cuidado

	INFORME SEMANAL DE OBRA - ETAPA II				
	FRENTE DE OBRA: TERRITORIO -MZ				
Semana No.8	Fecha de informe	del:	**4 de marzo de 2024**	al	**10 de marzo de 2024**

1. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA CIVIL

OBJETO:	**REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".**
CONTRATO DE OBRA No:	1070-2022
VALOR CONTRATO :	$ 2.550.000.000
CONTRATISTA	CONSORCIO INGENIERÍA I
PLAZO:	16 MESES Y TRES DIAS
FECHA DE INICIO:	16 de diciembre de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1	20 de marzo de 2023
FECHA DE REINICIO No. 1:	5 de mayo de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.2	26 de julio de 2023
FECHA DE REINICIO No. 2:	14 de noviembre de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.3	12 de diciembre de 2024
FECHA DE REINICIO No. 3:	28 de diciembre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	19 de abril de 2024
PLAZO TRANSCURRIDO	451,00 DÍAS
VALOR INICIAL	$ 2.550.000.000,00
ADICIÓN	$ 0,00
VALOR ACTULIZADO	$ 2.550.000.000,00


2. SEGUIMIENTO DE OBRA CIVIL

RESUMEN DE AVACE DE EJECUCION DE OBRA:

Proyección de ejecución

SEMANA	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	ATRASO
SEMANA No.0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SEMANA No.1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SEMANA No.2	0,16%	0,16%	0,00%	0,00%	-0,16%
SEMANA No.3	0,23%	0,39%	0,00%	0,00%	-0,39%
SEMANA No.4	1,16%	1,55%	0,85%	0,85%	-0,70%
SEMANA No.5	1,16%	2,71%	14,13%	14,98%	12,27%
SEMANA No.6	1,16%	3,87%	34,62%	49,60%	45,73%
SEMANA No.7	5,79%	9,66%	6,33%	55,93%	46,27%
SEMANA No.8	6,65%	16,31%	8,03%	63,96%	47,65%
SEMANA No.9	0,00%	16,31%	0,00%	63,96%	47,65%
SEMANA No.10	0,00%	16,31%	0,00%	63,96%	47,65%
SEMANA No.11	0,00%	16,31%	0,00%	63,96%	47,65%
SEMANA No.12	0,00%	16,31%	0,00%	63,96%	47,65%
SEMANA No.13	0,00%	16,31%	0,00%	63,96%	47,65%
SEMANA No.14	0,00%	16,31%	0,00%	63,96%	47,65%

CURVA DE AVANCE DE ACTIVIDADES EJECUTADO VS PROGRAMADO

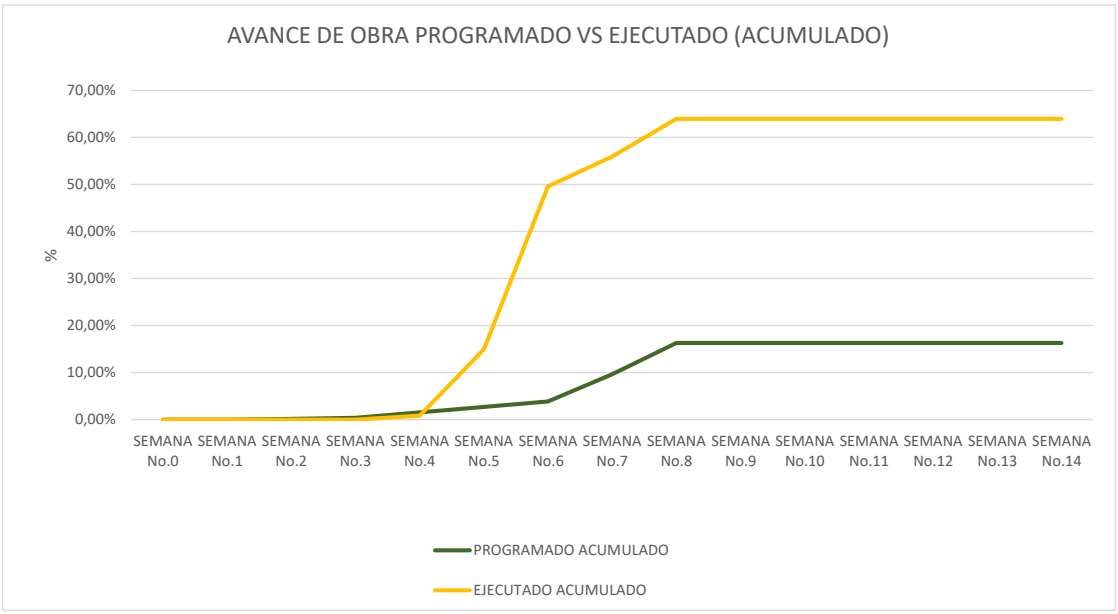

INFORME SEMANAL DE OBRA -ETAPA II
FRENTE DE OBRA: TERRITORIO-MZ

SEMANA N°	**8**	**DE**	**lunes, 4 de marzo de 2024**	**A**	**domingo, 10 de marzo de 2024**
FECHA INICIO :	16/12/2022	**FECHA TERMINACION:**	19/04/2024		

IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".				
INTERVENTOR	CONSORCIO PROSPERAR BETHEL	**NIT**	NIT.901.634.239-2	**CONTRATO N°**	1066-2022
CONTRATISTA	CONSORCIO INGENIERÍA I	**NIT**	NIT. 901.639.134-0	**CONTRATO N°**	1070-2022

3. REGISTRO FOTOGRAFICO






UBICACIÓN: TERRITORIO - MZ
COMENTARIOS: SUPERFICIES MORADAS ESQUINERAS





UBICACIÓN: TERRITORIO - MZ
COMENTARIOS: BORDILLO SUPERFICIE MORADO (A=0.6M)

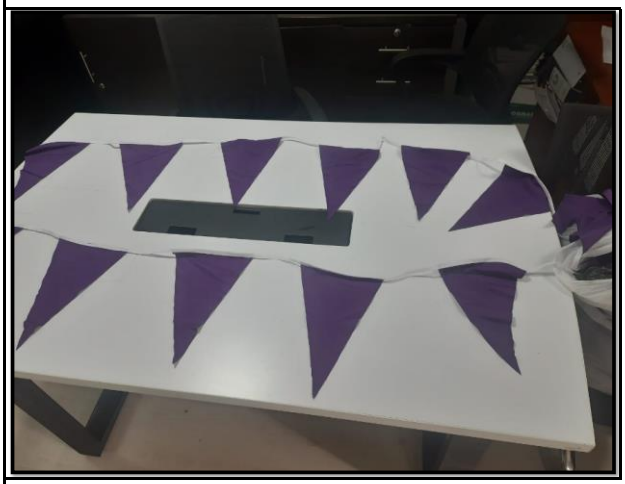

UBICACIÓN: TERRITORIO - MZ
COMENTARIOS: CINTAS DE BANDERINES EN CRUCES VEHICULARES



UBICACIÓN: TERRITORIO - MZ
COMENTARIOS:SUPERFICIES MORADAS ESQUINERAS



UBICACIÓN: TERRITORIO - MZ
COMENTARIOS: BORDILLO SUPERFICIE MORADO (A=0.6M)



UBICACIÓN: TERRITORIO - MZ
COMENTARIOS: BORDILLO SUPERFICIE MORADO (A=0.6M)

CONSORCIO INGENIERÍA I

Nit. 901.639.134 - 0

AVANCE INFROME SEMANALES

No. DE ORDEN	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS		SEMANA No.8		
										8
	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR	PROCENTAJE
1,00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**									
1,1	Localización y replanteo	m2	2723,64	$ 8.226,00	$ 22.404.661,00	2723,64	$ 22.404.661,00		$ -	
1,2	Limpieza, retiro de publicidad (stickers y adhesivos) y alistamiento de superficies de pintura en postes y bolardos	un	132,00	$ 114.883,00	$ 15.164.556,00		$ -		$ -	
1,3	Limpieza y alistamiento de superficies andenes para pintura horizontal	m2	120,00	$ 24.549,00	$ 2.945.880,00	120,00	$ 2.945.880,00		$ -	
1,4	Limpieza y alistamiento de superficies para murales (grafitis)	m2	493,00	$ 52.524,00	$ 25.894.332,00	493,00	$ 25.894.332,00		$ -	
1,5	Anclaje a zona dura(incluye demolición zona dura, excavación manual en material común, pedestal en concreto 3500 psi y suministro e instalación acero de refuerzo de 60000 psi)	un	12,00	$ 289.399,00	$ 3.472.788,00	12,00	$ 3.472.788,00		$ -	
1,6	Relleno en tierra negra	m3	1,00	$ 65.431,00	$ 65.431,00	1,00	$ 65.431,00		$ -	
6,00	**PINTURA PISO**									
6,2	Muro No.1	m2	318,00	$ 178.068,00	$ 56.625.624,00	318,00	$ 56.625.624,00		$ -	
6,3	Muro No.10	m2	175,00	$ 178.068,00	$ 31.161.900,00	175,00	$ 31.161.900,00		$ -	
10,00	**MOBILIARIO URBANO**									
10,21	Pintura de Postes	m2		$ 117.287,00	$ -		$ -		$ -	
10,22	Adhesivos "sistema distrital del cuidado y manzana del cuidado"	un	50,00	$ 55.028,00	$ 2.751.400,00		$ -		$ -	
10,23	Pintura Bolardos	un	21,00	$ 90.285,00	$ 1.895.985,00		$ -		$ -	
10,24	Logo manzana del cuidado Tipo 1 (Medidas: 1,6mx1,10m / Pintura de piso)	un	80,00	$ 220.062,00	$ 17.604.960,00	80,00	$ 17.604.960,00		$ -	
10,25	Logo manzana del cuidado Tipo 2 (Medidas: 1,2mx0,8m / Pintura de piso)	un	30,00	$ 181.462,00	$ 5.443.860,00	30,00	$ 5.443.860,00		$ -	
10,26	Eslogan (Sistema distrital del Cuidado) Tipo 1 (Medidas: 5,20 mx2,4m / Pintura de piso)	un	3,00	$ 709.229,00	$ 2.127.687,00	3,00	$ 2.127.687,00		$ -	
10,27	Eslogan (Sistema distrital del Cuidado) Tipo 2 (Medidas: 2,0mx1,2m / Pintura de piso)	un	7,00	$ 391.995,00	$ 2.743.965,00	7,00	$ 2.743.965,00		$ -	
10,28	Planos indicativos de localización (Tamaño variable)	un	4,00	$ 2.309.565,00	$ 9.238.260,00	4,00	$ 9.238.260,00		$ -	
10,29	Superficies moradas esquineras	m2	500,00	$ 116.477,00	$ 58.238.500,00	587,71	$ 68.454.698,00	100,00	$ 11.647.700,00	17,02%
10,301	Bordillo superficie morado (A=0.6m)	ml	1000,00	$ 70.993,00	$ 70.993.000,00	2723,64	$ 193.359.375,00	289,94	$ 20.583.710,42	10,65%
13,00	**OTROS**									
13,40	Intervención artística (Tejidos) sobre rejas	M2	200,00	$ 54.950,00	$ 10.990.000,00		$ -		$ -	
13,50	Cintas de banderines en cruces vehiculares	ml	478,00	$ 14.000,00	$ 6.692.000,00	478,00	$ 6.692.000,00	280,00	$ 3.920.000,00	58,58%
13,60	Suministro e instalación de señalización metálica informativa para postes (Tamaño 0,5m x 0,1m) incluye abrazadera tipo cinta bandit.	un	50,00	$ 76.484,00	$ 3.824.200,00	50,00	$ 3.824.200,00		$ -	
13,70	Globo Esfera publicitario de 2.8 Mts	un	1,00	$ 4.366.963,00	$ 4.366.963,00		$ -		$ -	
13,80	Mobiliario vertical Metálico con matera en concreto	un	2,00	$ 1.704.213,00	$ 3.408.426,00	2,00	$ 3.408.426,00	0,50	$ 852.106,50	25,00%
13,90	Mobiliario vertical Metálico con matera en concreto + Banca	un	2,00	$ 2.764.213,00	$ 5.528.426,00	2,00	$ 5.528.426,00		$ -	
13,10	Suministro y aplicación de helio para Globo Esfera publicitario de 2.8 Mts	m3	8,50	$ 365.350,00	$ 3.105.475,00		$ -		$ -	
13,11	Suministro Contrapeso móvil Globo Esfera publicitario de 2.8 Mts incluye sistema de sujeción	un	1,00	$ 420.000,00	$ 420.000,00		$ -		$ -	
14,01	**PROVISIÓN DE OBRAS ADICIONALES**			**$ 23.996.304,00**	**23.996.304,00**		**$ -**			
					$ 391.104.583,00		**$ 460.996.473,00**		**$ 37.003.516,92**	**8,03%**
	AMINISTRACIÓN		**26,00%**		**$ 101.687.192,00**		**$ 119.859.083,00**		**$ 9.620.914,40**	**8,03%**
	IMPREVISTOS		**1,00%**		**$ 3.911.046,00**		**$ 4.609.965,00**		**$ 370.035,17**	**8,03%**
	UTILIDAD		**6,00%**		**$ 23.466.275,00**		**$ 27.659.788,00**		**$ 2.220.211,02**	**8,03%**
	VALOR IVA SOBRE LA UTILIDAD				**$ -**		**$ -**		**$ -**	
	VALORES COSTOS INDIRECTOS				**$ 129.064.513,00**		**$ 152.128.836,00**			
	COSTO TOTAL OBRA				**$ 520.169.096,00**		**$ 613.125.309,00**			
	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO				**$ 5.553.407,00**		**$ 5.553.407,00**			
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				**$ 11.439.678,00**		**$ 11.439.678,00**			
					$ 537.162.181,00		**$ 630.118.394,00**		**$ 49.214.677,51**	**7,81%**
										7,81%

Informe semana 9 Manzana del Cuidado

CONSORCIO INGENIERÍA I

Nit. 901.639.134 - 0

AVANCE INFROME SEMANALES

No. DE ORDEN	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS		SEMANA No.9		
								9		
	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR	PROCENTAJE
1,00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**									
1,1	Localización y replanteo	m2	2723,64	$ 8.226,00	$ 22.404.661,00	2723,64	$ 22.404.661,00		$ -	
1,2	Limpieza, retiro de publicidad (stickers y adhesivos) y alistamiento de superficies de pintura en postes y bolardos	un	132,00	$ 114.883,00	$ 15.164.556,00		$ -		$ -	
1,3	Limpieza y alistamiento de superficies andenes para pintura horizontal	m2	120,00	$ 24.549,00	$ 2.945.880,00	120,00	$ 2.945.880,00		$ -	
1,4	Limpieza y alistamiento de superficies para murales (grafitis)	m2	493,00	$ 52.524,00	$ 25.894.332,00	493,00	$ 25.894.332,00		$ -	
1,5	Anclaje a zona dura(incluye demolición zona dura, excavación manual en material común, pedestal en concreto 3500 psi y suministro e instalación acero de refuerzo de 60000 psi)	un	12,00	$ 289.399,00	$ 3.472.788,00	12,00	$ 3.472.788,00		$ -	
1,6	Relleno en tierra negra	m3	1,00	$ 65.431,00	$ 65.431,00	1,00	$ 65.431,00		$ -	
6,00	**PINTURA PISO**									
6,2	Muro No.1	m2	318,00	$ 178.068,00	$ 56.625.624,00	318,00	$ 56.625.624,00		$ -	
6,3	Muro No.10	m2	175,00	$ 178.068,00	$ 31.161.900,00	175,00	$ 31.161.900,00		$ -	
10,00	**MOBILIARIO URBANO**									
10,21	Pintura de Postes	m2		$ 117.287,00	$ -		$ -		$ -	
10,22	Adhesivos "sistema distrital del cuidado y manzana del cuidado"	un	50,00	$ 55.028,00	$ 2.751.400,00		$ -		$ -	
10,23	Pintura Bolardos	un	21,00	$ 90.285,00	$ 1.895.985,00		$ -		$ -	
10,24	Logo manzana del cuidado Tipo 1 (Medidas: 1,6mx1,10m / Pintura de piso)	un	80,00	$ 220.062,00	$ 17.604.960,00	80,00	$ 17.604.960,00		$ -	
10,25	Logo manzana del cuidado Tipo 2 (Medidas: 1,2mx0,8m / Pintura de piso)	un	30,00	$ 181.462,00	$ 5.443.860,00	30,00	$ 5.443.860,00		$ -	
10,26	Eslogan (Sistema distrital del Cuidado) Tipo 1 (Medidas: 5.20 mx2.4m / Pintura de piso)	un	3,00	$ 709.229,00	$ 2.127.687,00	3,00	$ 2.127.687,00		$ -	
10,27	Eslogan (Sistema distrital del Cuidado) Tipo 2 (Medidas: 2,0mx1,2m / Pintura de piso)	un	7,00	$ 391.995,00	$ 2.743.965,00	7,00	$ 2.743.965,00		$ -	
10,28	Planos indicativos de localización (Tamaño variable)	un	4,00	$ 2.309.565,00	$ 9.238.260,00	4,00	$ 9.238.260,00		$ -	
10,29	Superficies moradas esquineras	m2	500,00	$ 116.477,00	$ 58.238.500,00	587,71	$ 68.454.698,00			
10,301	Bordillo superficie morado (A=0.6m)	ml	1000,00	$ 70.993,00	$ 70.993.000,00	2723,64	$ 193.359.375,00			
13,00	**OTROS**									
13,40	Intervención artística (Tejidos) sobre rejas	M2	200,00	$ 54.950,00	$ 10.990.000,00		$ -		$ -	
13,50	Cintas de banderines en cruces vehiculares	ml	478,00	$ 14.000,00	$ 6.692.000,00	478,00	$ 6.692.000,00			
13,60	Suministro e instalación de señalización metálica informativa para postes (Tamaño 0,5m x 0,1m) incluye abrazadera tipo cinta bandit.	un	50,00	$ 76.484,00	$ 3.824.200,00	50,00	$ 3.824.200,00			
13,70	Globo Esfera publicitario de 2.8 Mts	un	1,00	$ 4.366.963,00	$ 4.366.963,00		$ -			
13,80	Mobiliario vertical Metálico con matera en concreto	un	2,00	$ 1.704.213,00	$ 3.408.426,00	2,00	$ 3.408.426,00			
13,90	Mobiliario vertical Metálico con matera en concreto + Banca	un	2,00	$ 2.764.213,00	$ 5.528.426,00	2,00	$ 5.528.426,00		$ -	
13,10	Suministro y aplicación de helio para Globo Esfera publicitario de 2.8 Mts	m3	8,50	$ 365.350,00	$ 3.105.475,00		$ -		$ -	
13,11	Suministro Contrapeso móvil Globo Esfera publicitario de 2.8 Mts incluye sistema de sujeción	un	1,00	$ 420.000,00	$ 420.000,00		$ -		$ -	
14,01	**PROVISIÓN DE OBRAS ADICIONALES**			**$ 23.996.304,00**	**23.996.304,00**		**$ -**			
					$ 391.104.583,00		**$ 460.996.473,00**		**$ -**	
	AMINISTRACIÓN		**26,00%**		**$ 101.687.192,00**		**$ 119.859.083,00**		**$ -**	
	IMPREVISTOS		**1,00%**		**$ 3.911.046,00**		**$ 4.609.965,00**		**$ -**	
	UTILIDAD		**6,00%**		**$ 23.466.275,00**		**$ 27.659.788,00**		**$ -**	
	VALOR IVA SOBRE LA UTILIDAD				**$ -**		**$ -**		**$ -**	
	VALORES COSTOS INDIRECTOS				**$ 129.064.513,00**		**$ 152.128.836,00**			
	COSTO TOTAL OBRA				**$ 520.169.096,00**		**$ 613.125.309,00**			
	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO				**$ 5.553.407,00**		**$ 5.553.407,00**			
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				**$ 11.439.678,00**		**$ 11.439.678,00**			
					$ 537.162.181,00		**$ 630.118.394,00**		**$ -**	

	INFORME SEMANAL DE OBRA - ETAPA II				
	FRENTE DE OBRA: TERRITORIO -MZ				
Semana No.9	Fecha de informe	del:	**11 de marzo de 2024**	al	**17 de marzo de 2024**

1. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA CIVIL

OBJETO:	**REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".**
CONTRATO DE OBRA No:	1070-2022
VALOR CONTRATO :	$ 2.550.000.000
CONTRATISTA	CONSORCIO INGENIERÍA I
PLAZO:	16 MESES Y TRES DÍAS
FECHA DE INICIO:	16 de diciembre de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1	20 de marzo de 2023
FECHA DE REINICIO No. 1:	5 de mayo de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.2	26 de julio de 2023
FECHA DE REINICIO No. 2:	14 de noviembre de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.3	12 de diciembre de 2024
FECHA DE REINICIO No. 3:	28 de diciembre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	19 de abril de 2024
PLAZO TRANSCURRIDO	459,00 DÍAS
VALOR INICIAL	$ 2.550.000.000,00
ADICIÓN	$ 0,00
VALOR ACTULIZADO	$ 2.550.000.000,00


2. SEGUIMIENTO DE OBRA CIVIL

RESUMEN DE AVACE DE EJECUCION DE OBRA:

Proyección de ejecución

SEMANA	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	ATRASO
SEMANA No.0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SEMANA No.1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SEMANA No.2	0,16%	0,16%	0,00%	0,00%	-0,16%
SEMANA No.3	0,23%	0,39%	0,00%	0,00%	-0,39%
SEMANA No.4	1,16%	1,55%	0,85%	0,85%	-0,70%
SEMANA No.5	1,16%	2,71%	14,13%	14,98%	12,27%
SEMANA No.6	1,16%	3,87%	34,62%	49,60%	45,73%
SEMANA No.7	5,79%	9,66%	6,33%	55,93%	46,27%
SEMANA No.8	6,65%	16,31%	8,03%	63,96%	47,65%
SEMANA No.9	6,65%	22,96%	0,00%	63,96%	41,00%
SEMANA No.10	0,00%	22,96%	0,00%	63,96%	41,00%
SEMANA No.11	0,00%	22,96%	0,00%	63,96%	41,00%
SEMANA No.12	0,00%	22,96%	0,00%	63,96%	41,00%
SEMANA No.13	0,00%	22,96%	0,00%	63,96%	41,00%
SEMANA No.14	0,00%	22,96%	0,00%	63,96%	41,00%

CURVA DE AVANCE DE ACTIVIDADES EJECUTADO VS PROGRAMADO

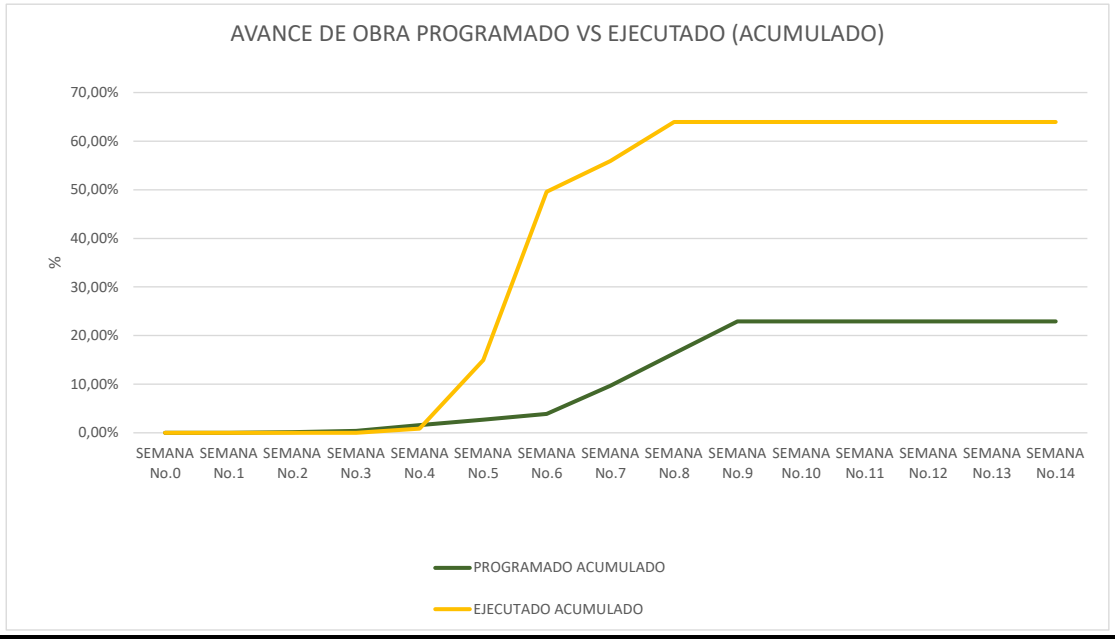

INFORME SEMANAL DE OBRA -ETAPA II
FRENTE DE OBRA: TERRITORIO-MZ

SEMANA N°	**9**	**DE**	**lunes, 11 de marzo de 2024**	**A**	**domingo, 17 de marzo de 2024**
FECHA INICIO :	16/12/2022	**FECHA TERMINACION:**	19/04/2024		

IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".				
INTERVENTOR	CONSORCIO PROSPERAR BETHEL	**NIT**	NIT.901.634.239-2	**CONTRATO N°**	1066-2022
CONTRATISTA	CONSORCIO INGENIERÍA I	**NIT**	NIT. 901.639.134-0	**CONTRATO N°**	1070-2022

3. REGISTRO FOTOGRAFICO



UBICACIÓN: TERRITORIO - MZ
COMENTARIOS: SUPERFICIES MORADAS ESQUINERAS



UBICACIÓN: TERRITORIO - MZ
COMENTARIOS: BORDILLO SUPERFICIE MORADO (A=0.6M)



UBICACIÓN: TERRITORIO - MZ
COMENTARIOS:SUPERFICIES MORADAS ESQUINERAS



UBICACIÓN: TERRITORIO - MZ
COMENTARIOS:SUPERFICIES MORADAS ESQUINERAS



UBICACIÓN: TERRITORIO - MZ
COMENTARIOS: BORDILLO SUPERFICIE MORADO (A=0.6M)



UBICACIÓN: TERRITORIO - MZ
COMENTARIOS: BORDILLO SUPERFICIE MORADO (A=0.6M)

Informe semana 10 Manzana del Cuidado

	INFORME SEMANAL DE OBRA - ETAPA II				
	FRENTE DE OBRA: TERRITORIO -MZ				
Semana No.10	Fecha de informe	del:	**18 de marzo de 2024**	al	**24 de marzo de 2024**

1. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA CIVIL

OBJETO:	**REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".**
CONTRATO DE OBRA No:	1070-2022
VALOR CONTRATO :	$ 2.550.000.000
CONTRATISTA	CONSORCIO INGENIERÍA I
PLAZO:	16 MESES Y TRES DÍAS
FECHA DE INICIO:	16 de diciembre de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1	20 de marzo de 2023
FECHA DE REINICIO No. 1:	5 de mayo de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.2	26 de julio de 2023
FECHA DE REINICIO No. 2:	14 de noviembre de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.3	12 de diciembre de 2024
FECHA DE REINICIO No. 3:	28 de diciembre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	19 de abril de 2024
PLAZO TRANSCURRIDO	467,00 DÍAS
VALOR INICIAL	$ 2.550.000.000,00
ADICIÓN	$ 0,00
VALOR ACTULIZADO	$ 2.550.000.000,00


2. SEGUIMIENTO DE OBRA CIVIL

RESUMEN DE AVACE DE EJECUCION DE OBRA:

Proyección de ejecución

SEMANA	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	ATRASO
SEMANA No.0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SEMANA No.1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SEMANA No.2	0,16%	0,16%	0,00%	0,00%	-0,16%
SEMANA No.3	0,23%	0,39%	0,00%	0,00%	-0,39%
SEMANA No.4	1,16%	1,55%	0,85%	0,85%	-0,70%
SEMANA No.5	1,16%	2,71%	14,13%	14,98%	12,27%
SEMANA No.6	1,16%	3,87%	34,62%	49,60%	45,73%
SEMANA No.7	5,79%	9,66%	6,33%	55,93%	46,27%
SEMANA No.8	6,65%	16,31%	8,03%	63,96%	47,65%
SEMANA No.9	6,65%	22,96%	0,00%	63,96%	41,00%
SEMANA No.10	6,65%	29,61%	3,81%	67,77%	38,16%
SEMANA No.11	0,00%	29,61%	0,00%	67,77%	38,16%
SEMANA No.12	0,00%	29,61%	0,00%	67,77%	38,16%
SEMANA No.13	0,00%	29,61%	0,00%	67,77%	38,16%
SEMANA No.14	0,00%	29,61%	0,00%	67,77%	38,16%

CURVA DE AVANCE DE ACTIVIDADES EJECUTADO VS PROGRAMADO

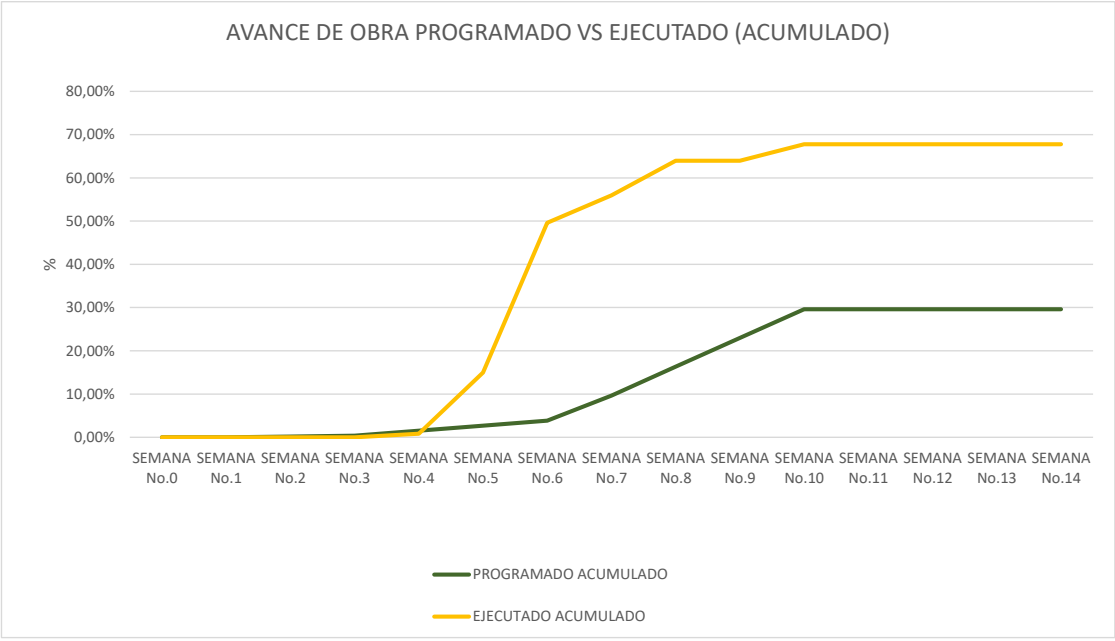

INFORME SEMANAL DE OBRA -ETAPA II
FRENTE DE OBRA: TERRITORIO-MZ

SEMANA N°	**10**	**DE**	**lunes, 18 de marzo de 2024**	**A**	**domingo, 24 de marzo de 2024**
FECHA INICIO :	16/12/2022	**FECHA TERMINACION:**	19/04/2024		

IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".				
INTERVENTOR	CONSORCIO PROSPERAR BETHEL	**NIT**	NIT.901.634.239-2	**CONTRATO N°**	1066-2022
CONTRATISTA	CONSORCIO INGENIERÍA I	**NIT**	NIT. 901.639.134-0	**CONTRATO N°**	1070-2022

3. REGISTRO FOTOGRAFICO



UBICACIÓN: TERRITORIO - MZ
COMENTARIOS: Muro No 1 - No 10



UBICACIÓN: TERRITORIO - MZ
COMENTARIOS: Muro No 1 - No 10



UBICACIÓN: TERRITORIO - MZ
COMENTARIOS: Muro No 1 - No 10



UBICACIÓN: TERRITORIO - MZ
COMENTARIOS: Muro No 1 - No 10



UBICACIÓN: TERRITORIO - MZ
COMENTARIOS: Muro No 1 - No 10



UBICACIÓN: TERRITORIO - MZ
COMENTARIOS: Muro No 1 - No 10

CONSORCIO INGENIERÍA I
Nit. 901.639.134 - 0

AVANCE INFROME SEMANALES

No. DE ORDEN	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						CONDICIONES ACTUALIZADAS		SEMANA No.10			CANTIDADES EJECUTADAS		
											10			
	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR	UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR	PROCENTAJE	CANTIDAD	VALOR	PROCENTAJE
1,00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**													
1,1	Localización y replanteo	m2	2723,64	$	8.226,00	$ 22.404.661,00	2723,64	$ 22.404.661,00		$ -		2723,64	$ 22.404.661,00	100,00%
1,2	Limpieza, retiro de publicidad (stickers y adhesivos) y alistamiento de superficies de pintura en postes y bolardos	un	132,00	$	114.883,00	$ 15.164.556,00		$ -		$ -			$ -	
1,3	Limpieza y alistamiento de superficies andenes para pintura horizontal	m2	120,00	$	24.549,00	$ 2.945.880,00	120,00	$ 2.945.880,00		$ -			$ -	
1,4	Limpieza y alistamiento de superficies para murales (grafitis)	m2	493,00	$	52.524,00	$ 25.894.332,00	493,00	$ 25.894.332,00		$ -			$ -	
1,5	Anclaje a zona dura(incluye demolición zona dura, excavación manual en material común, pedestal en concreto 3500 psi y suministro e instalación acero de refuerzo de 60000 psi)	un	12,00	$	289.399,00	$ 3.472.788,00	12,00	$ 3.472.788,00		$ -			$ -	
1,6	Relleno en tierra negra	m3	1,00	$	65.431,00	$ 65.431,00	1,00	$ 65.431,00		$ -			$ -	
6,00	**PINTURA PISO**													
6,2	Muro No.1	m2	318,00	$	178.068,00	$ 56.625.624,00	318,00	$ 56.625.624,00	63,60	$ 11.325.124,80	20,00%	63,60	$ 11.325.124,80	20,00%
6,3	Muro No.10	m2	175,00	$	178.068,00	$ 31.161.900,00	175,00	$ 31.161.900,00	35,00	$ 6.232.380,00	20,00%	35,00	$ 6.232.380,00	20,00%
10,00	**MOBILIARIO URBANO**													
10,21	Pintura de Postes	m2		$	117.287,00	$ -		$ -		$ -			$ -	
10,22	Adhesivos "sistema distrital del cuidado y manzana del cuidado"	un	50,00	$	55.028,00	$ 2.751.400,00		$ -		$ -			$ -	
10,23	Pintura Bolardos	un	21,00	$	90.285,00	$ 1.895.985,00		$ -		$ -			$ -	
10,24	Logo manzana del cuidado Tipo 1 (Medidas: 1,6mx1,10m / Pintura de piso)	un	80,00	$	220.062,00	$ 17.604.960,00	80,00	$ 17.604.960,00		$ -			$ -	
10,25	Logo manzana del cuidado Tipo 2 (Medidas: 1,2mx0,8m / Pintura de piso)	un	30,00	$	181.462,00	$ 5.443.860,00	30,00	$ 5.443.860,00		$ -			$ -	
10,26	Eslogan (Sistema distrital del Cuidado) Tipo 1 (Medidas: 5.20 mx2.4m / Pintura de piso)	un	3,00	$	709.229,00	$ 2.127.687,00	3,00	$ 2.127.687,00		$ -			$ -	
10,27	Eslogan (Sistema distrital del Cuidado) Tipo 2 (Medidas: 2,0mx1,2m / Pintura de piso)	un	7,00	$	391.995,00	$ 2.743.965,00	7,00	$ 2.743.965,00		$ -			$ -	
10,28	Planos indicativos de localización (Tamaño variable)	un	4,00	$	2.309.565,00	$ 9.238.260,00	4,00	$ 9.238.260,00		$ -			$ -	
10,29	Superficies moradas esquineras	m2	500,00	$	116.477,00	$ 58.238.500,00	587,71	$ 68.454.698,00		$ -		587,71	$ 68.454.697,67	100,00%
10,301	Bordillo superficie morado (A=0.6m)	ml	1000,00	$	70.993,00	$ 70.993.000,00	2723,64	$ 193.359.375,00		$ -		2723,64	$ 193.359.374,52	100,00%
13,00	**OTROS**													
13,40	Intervención artística (Tejidos) sobre rejas	M2	200,00	$	54.950,00	$ 10.990.000,00		$ -		$ -			$ -	
13,50	Cintas de banderines en cruces vehiculares	ml	478,00	$	14.000,00	$ 6.692.000,00	478,00	$ 6.692.000,00		$ -		280,00	$ 3.920.000,00	58,58%
13,60	Suministro e instalación de señalización metálica informativa para postes (Tamaño 0,5m x 0,1m) incluye abrazadera tipo cinta bandit.	un	50,00	$	76.484,00	$ 3.824.200,00	50,00	$ 3.824.200,00		$ -			$ -	
13,70	Globo Esfera publicitario de 2.8 Mts	un	1,00	$	4.366.963,00	$ 4.366.963,00		$ -		$ -			$ -	
13,80	Mobiliario vertical Metálico con matera en concreto	un	2,00	$	1.704.213,00	$ 3.408.426,00	2,00	$ 3.408.426,00		$ -		1,50	$ 2.556.319,50	75,00%
13,90	Mobiliario vertical Metálico con matera en concreto + Banca	un	2,00	$	2.764.213,00	$ 5.528.426,00	2,00	$ 5.528.426,00		$ -		1,50	$ 4.146.319,50	75,00%
13,10	Suministro y aplicación de helio para Globo Esfera publicitario de 2.8 Mts	m3	8,50	$	365.350,00	$ 3.105.475,00		$ -		$ -			$ -	
13,11	Suministro Contrapeso móvil Globo Esfera publicitario de 2.8 Mts incluye sistema de sujeción	un	1,00	$	420.000,00	$ 420.000,00		$ -		$ -			$ -	
14,01	**PROVISIÓN DE OBRAS ADICIONALES**			**$ 23.996.304,00**		**23.996.304,00**		**$ -**						
						$ 391.104.583,00		**$ 460.996.473,00**		**$ 17.557.504,80**	**3,81%**		**$ 312.398.876,99**	**67,77%**
	AMINISTRACIÓN	**26,00%**				**$ 101.687.192,00**		**$ 119.859.083,00**		**$ 4.564.951,25**	**3,81%**		**$ 81.223.708,02**	**67,77%**
	IMPREVISTOS	**1,00%**				**$ 3.911.046,00**		**$ 4.609.965,00**		**$ 175.575,05**	**3,81%**		**$ 3.123.988,77**	**67,77%**
	UTILIDAD	**6,00%**				**$ 23.466.275,00**		**$ 27.659.788,00**		**$ 1.053.450,29**	**3,81%**		**$ 18.743.932,62**	**67,77%**
	VALOR IVA SOBRE LA UTILIDAD					**$ -**		**$ -**		**$ -**			**$ -**	
	VALORES COSTOS INDIRECTOS					**$ 129.064.513,00**		**$ 152.128.836,00**						
	COSTO TOTAL OBRA					**$ 520.169.096,00**		**$ 613.125.309,00**						
	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO					**$ 5.553.407,00**		**$ 5.553.407,00**						
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					**$ 11.439.678,00**		**$ 11.439.678,00**						
						$ 537.162.181,00		**$ 630.118.394,00**		**$ 23.351.481,39**	**3,71%**		**$ 415.490.506,40**	**65,94%**
											65,94%			
