CONTRATO DE OBRA NO. 1070-2022

OBJETO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, ASÍ COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN E INTERVENCIÓN DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT".

CONSORCIO INGENIERÍA I

INFORME MENSUAL NO. 12 - COMPONENTE TÉCNICO

CONSORCIO INGENIERÍA I	SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT

REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, ASÍ COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN E INTERVENCIÓN DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT

CONTRATO DE OBRA NO. 1070-2022

INFORME MENSUAL NO. 12 - COMPONENTE TÉCNICO

CONTRATO DE OBRA NO. 1070-2022

INFORME MENSUAL NO. 12 - COMPONENTE TÉCNICO

CONTRATISTA:

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
REVISÓ:	Arq. María Fernanda Sánchez	Residente de Obra	
APROBÓ:	Ing. Jaime Herrera Osorio	Representante Legal	

INTERVENTORÍA:

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
APROBÓ:	Arq. Mauricio Hernández	Director de interventoría	
REVISÓ:			

CONTROL DE MODIFICACIONES:

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN
000	15/05/2024	VERSIÓN INICIAL

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 6
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 7
3. OBJETIVOS 7
3.1 OBJETIVO GENERAL 7
3.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS 7
4. LOCALIZACIÓN TERRITORIOS PRIORIZADOS POR SDHT. 8
5. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 9
5.1 GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA 9
5.2 INFORMACIÓN DE PÓLIZAS 10
5.3 ASPECTOS FINANCIEROS 13
5.4 ASPECTOS TÉCNICOS 14
5.4.1 PERSONAL TÉCNICO DE OBRA 14
5.4.2 PERSONAL MANO DE OBRA 14
6. AVANCE DE OBRA 15
6.1 ACCIÓN DE ACUPUNTURA URBANA AAU-T117 – ZONA DE EQUIPAMIENTO COMUNAL CARTAGENA. 15
6.2 ACCIÓN DE ACUPUNTURA URBANA AAU-T20 – PATIO BONITO II SECTOR A. 19
6.3 ACCIÓN DE ACUPUNTURA URBANA AAU-T21 – PATIO BONITO II SECTOR A. 23
6.4 ACCIÓN DE ACUPUNTURA URBANA AAU-T22 – LOS OLIVOS. 26
6.5 MANZANA DEL CUIDADO- SAN BLAS. 30
6.6 COMPONENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO 32
6.6.1 COMITÉS DE SEGUIMIENTO 32
6.6.2 CORRESPONDENCIA DEL CONTRATISTA A LA INTERVENTORÍA 32
6.6.3 INFORMES SEMANALES 33
6.7 ENSAYOS Y PRUEBAS A MATERIALES EN OBRA 33
6.8 COMPONENTE AMBIENTAL 34

ANEXOS

ANEXO 1. ACTA DE INICIO 35
ANEXO 2. PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO 36
ANEXO 3. PÓLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 37
ANEXO 4. COMITÉS DE SEGUIMIENTO 38
ANEXO 5. CORRESPONDENCIA DEL CONTRATISTA A INTERVENTORÍA 39
ANEXO 6. INFORMES SEMANALES 40
ANEXO 7. CRONOGRAMA 41
ANEXO 8. ENSAYOS Y PRUEBAS A MATERIALES EN OBRA 42
ANEXO 9. INFORME SST 43

ÍNDICE DE TABLAS

TABLA 1 DIRECCIÓN DE LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SDHT. FUENTE: CONSORCIO INGENIERÍA I, 2024. 8

TABLA 2 DATOS GENERALES DEL PROYECTO. FUENTE: CONSORCIO INGENIERÍA I, 2024. 10

TABLA 3 ACTUALIZACIÓN PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR NO. 21-44-101395979. FUENTE: CONSORCIO INGENIERÍA I, 2024. 12

TABLA 4 ACTUALIZACIÓN PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL NO. 21-40-101198131. FUENTE: CONSORCIO INGENIERÍA I, 2024 12

TABLA 5 VALOR TOTAL CONTRATO DE OBRA NO. 1070 -2022. FUENTE: CONSORCIO INGENIERÍA I, 2024 .. 13

TABLA 6 RELACIÓN DE PAGOS Y AMORTIZACIÓN CONTRATO DE OBRA NO. 1070 -2022. FUENTE: CONSORCIO INGENIERÍA I, 2024 13

TABLA 7 PERSONAL TÉCNICO ETAPA II. FUENTE: CONSORCIO INGENIERÍA I, 2024 14

TABLA 8 PERSONAL MANO DE OBRA ETAPA II. FUENTE: CONSORCIO INGENIERÍA I, 2024 15

TABLA 9 FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN TERRITORIOS CONTRATO DE OBRA NO. 1070 DE 2022. FUENTE: CONSORCIO INGENIERÍA I, 2024 15

TABLA 10 AVANCE TERRITORIO AAU-T17– EJECUCIÓN DE OBRAS. FUENTE: CONSORCIO INGENIERÍA I, 2024 18

TABLA 11 AVANCE TERRITORIO AAU-T20– EJECUCIÓN DE OBRAS. FUENTE: CONSORCIO INGENIERÍA I, 2024 22

TABLA 12 AVANCE TERRITORIO AAU-T21– EJECUCIÓN DE OBRAS. FUENTE: CONSORCIO INGENIERÍA I, 2024 25

TABLA 13 AVANCE TERRITORIO AAU-T22– EJECUCIÓN DE OBRAS. FUENTE: CONSORCIO INGENIERÍA I, 2024 29

TABLA 14 AVANCE MANZANA DEL CUIDADO – EJECUCIÓN DE OBRAS. FUENTE: CONSORCIO INGENIERÍA I, 2024 31

TABLA 15. COMITÉS DE SEGUIMIENTO. FUENTE: CONSORCIO INGENIERÍA I, 2024 32

TABLA 16. CORRESPONDENCIA ENVIADA A LA INTERVENTORÍA. FUENTE: CONSORCIO INGENIERÍA I, 2024 32

TABLA 17. INFORMES SEMANALES. FUENTE: CONSORCIO INGENIERÍA I, 2024 33

TABLA 18. ENSAYOS Y PRUEBAS REALIZADOS. FUENTE: CONSORCIO INGENIERÍA I, 2024 33

ÍNDICE DE IMÁGENES

IMAGEN 1 GEORREFERENCIACIÓN TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SDHT. 9
IMAGEN 2 AVANCE TERRITORIO AAU-T17 SEMANA NO. 7 ETAPA II – EJECUCIÓN DE OBRAS. 16
IMAGEN 3 AVANCE TERRITORIO AAU-T20 SEMANA NO. 7 ETAPA II – EJECUCIÓN DE OBRAS. 19
IMAGEN 4 AVANCE TERRITORIO AAU-T21 SEMANA NO. 7 ETAPA II – EJECUCIÓN DE OBRAS. 23
IMAGEN 5 AVANCE TERRITORIO AAU-T22 SEMANA NO. 7 ETAPA II – EJECUCIÓN DE OBRAS. 27
IMAGEN 6 AVANCE MANZANA DEL CUIDADO SEMANA NO. 7 ETAPA II – EJECUCIÓN DE OBRAS 30

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe de tiene como objetivo registrar los avances y resultados obtenidos en el marco del contrato de la referencia, correspondientes a la Etapa II – Ejecución de Obras en las acciones de Acupuntura Urbana priorizados por la SDHT entre el periodo comprendido entre el **1 de abril de 2024 y 30 de abril de 2024**.

El periodo de evaluación del presente reporte mensual cubre las actividades llevadas a cabo en el periodo en relación, específicamente en el marco de la Etapa II según el objetivo principal de este contrato, el cual contempla desarrollar un plan integral de mejoramiento urbano para la ciudad, mediante la implementación de estrategias de acupuntura urbana. Este enfoque consiste en identificar y abordar las áreas más críticas, a través de intervenciones precisas y focalizadas que permitan mejorar la calidad de vida de los habitantes y la funcionalidad de los espacios urbanos.

En la etapa II, se han llevado a cabo diversas actividades relacionadas a la coordinación y la de ejecución en los frentes de trabajo. Entre las actividades realizadas, se destacan las siguientes:

- Se coordina a proveedores para asegurar el suministro de materiales e insumos para el inicio y durante la ejecución de las obras.
- Se organiza al personal de mano de obra que va a realizar y ejecutar las actividades de obra, haciendo las afiliaciones correspondientes, exámenes de ingreso y entregas de dotación.
- Se tramitan y obtienen los permisos del plan de manejo de tránsito del PMT para el inicio de las obras.
- Se realizan semanal mente comités de obra en los territorios y zonas de intervención.

En este informe se presentarán una breve descripción de los avances logrados durante este periodo y se resaltarán algunos aspectos correspondientes a los reportes específicos del área de seguridad y salud en el trabajo, de igual forma al presente se adjunta los informes en su componente social y ambiental.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto de acupuntura urbana de la secretaria del Hábitat, busca mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad a través de pequeñas intervenciones urbanas que se realizan en espacios públicos. Estas intervenciones tienen como objetivo revitalizar y mejorar el entorno urbano, promoviendo la convivencia, la seguridad y la accesibilidad en el espacio público.

Las acciones de acupuntura urbana en Bogotá consideran la optimización del entorno urbano de zonas de la ciudad que presenten problemas de acceso, seguridad, iluminación, o degradación urbana. El proyecto podría incluir la realización de intervenciones urbanas pequeñas y creativas, tales como la instalación de bancas, juegos infantiles, jardines comunitarios, murales artísticos, señalizaciones y otros elementos que promuevan el uso y la apropiación del espacio público.

El proyecto se llevará a cabo en cinco territorios de Bogotá, en este proyecto, se trabajará en colaboración con la comunidad local, organizaciones de vecinos, artistas, cuidadoras y otros actores relevantes en la zona. Se realizará un proceso participativo que permita identificar las necesidades y las prioridades de la comunidad, y a partir de ello, diseñar intervenciones que sean creativas, accesibles y relevantes para los habitantes de la zona.

El proyecto va a contar con un equipo interdisciplinario que incluya profesionales en diseño urbano, arquitectura, arte, paisajismo, sociales, ambientales y otros campos relevantes para la intervención en el espacio público.

3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

- Realizar el diseño y ejecución de obra de acuerdo con las especificaciones técnicas de los estudios previos y anexo técnico de la Secretaría Distrital del Hábitat del contrato obra No. 1070 -2022 cuyo objeto es "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑO, ASÍ COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN E INTERVENCIÓN DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT".

3.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS

Los objetivos específicos que se implementaran para los espacios priorizados por la SDHT son los siguientes:

- Identificar los problemas de acceso, seguridad, iluminación o degradación urbana, a través de un diagnóstico participativo con la comunidad local y otros actores relevantes.
- Realizar un proceso participativo que permita identificar las necesidades y prioridades de la comunidad en cuanto a la mejora del espacio público, y a partir de ello, diseñar

intervenciones urbanas pequeñas y creativas que sean accesibles y relevantes para los habitantes de la zona.

- Desarrollar un plan de trabajo y un presupuesto para la implementación de las intervenciones urbanas en las zonas seleccionadas, en colaboración con un equipo interdisciplinario que incluya profesionales en diseño urbano, arquitectura, arte, paisajismo y otros campos relevantes para la intervención en el espacio público.
- Implementar las intervenciones urbanas diseñadas en las zonas seleccionadas, asegurando su calidad y durabilidad, y promoviendo su uso y apropiación por parte de la comunidad local.

4. LOCALIZACIÓN TERRITORIOS PRIORIZADOS POR SDHT.

En Tabla 1 presenta el ID de los territorios a intervenir otorgados por la Secretaría Distrital de Hábitat, dirección, nombre del polígono, localidad, enfoque y área.

ID	DIRECCIÓN OFICIAL	NOMBRE POLÍGONO	LOCALIDAD	ENFOQUE	ÁREA
17	KR 14L No. 69D - 21 Sur	Zonas de equipamiento Comunal Cartagena	Usme	Social	1.182
20	CL 34 BIS SUR No. 87D - 33	Patio Bonito II Sector A	Kennedy	Cultural	517
21	KR 87 BIS No. 34 – 39 Sur	Patio Bonito II Sector C	Kennedy	Social	590
22	TV 8A BIS No. 164B – 80	Los Olivos	Usaquén	Mantenimiento	1.200
San Blas	Calle 17 Sur entre la AV. Carrera 10 y la Carrera 6, Carrera 6 entre las Calles 17 Sur y 17A Sur, Calle 17 A Sur entre la Carrera 6 y la Carrera 6 Este, Calle 17 Sur entre Carreras 7A y 8 – costado Norte y sobre la Calle 17A Sur No. 3-15 – costado Sur	Manzana del Cuidado No. 6 San Cristóbal Sur	San Cristóbal	Mantenimiento	N/A

Tabla 1 Dirección de los territorios priorizados por la SDHT. Fuente: Consorcio Ingeniería I, 2024.

En la imagen 1 se presenta la georreferenciación de los cinco territorios priorizados mediante el contrato de la referencia cuyo objeto es "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, ASÍ COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN E INTERVENCIÓN DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT".



Imagen 1 Georreferenciación territorios priorizados por la SDHT.

5. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

5.1 GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

Razón Social	CONSORCIO INGENIERÍA I
NIT	901.639.134-0
Representante legal	Jaime Herrera Osorio
CC	79.655.971
Domicilio	Avenida Carrera 15 No 100 – 69 OFC. 508
Teléfono	(601) 755 09 85
Entidad Contratante	Secretaría Distrital Del Hábitat – Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Contratista	Consorcio Ingeniería I
Número del Contrato	1070-2022
Plazo de ejecución	Siete (7) meses
Objeto del Contrato	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, ASÍ COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN E INTERVENCIÓN DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT
Valor del Contrato:	$ 2.550.000.000
Fecha de Inicio	16 de noviembre de 2023
Fecha de terminación inicial	15 de junio de 2023

Suspensión No. 1	Cuarenta y cinco (45) días - desde el 21/03/2023 hasta el 04/05/2023.
Suspensión No. 2	Treinta (30) días - desde el 26/07/2023 hasta el 24/08/2023.
Ampliación No. 1 Suspensión No. 2	Un (1) mes (desde el 25/08/2023 hasta el 24/09/2023.
Ampliación No. 2 Suspensión No. 2	Un (1) mes (desde el 25/09/2023 hasta el 24/10/2023.
Ampliación No. 3 Suspensión No. 2	Veinte (20) días (desde el 25/10/2023 hasta el 13/11/2023.
Suspensión No. 3	Diecies (16) días (desde el 12/12/2023 hasta el 27/12/2023)
Prorroga No. 1	Cuatro (4) meses y quince (15) Días
Prorroga No. 2	Treinta (30) días.
Fecha de Terminación actual	19 de mayo de 2024

Tabla 2 Datos generales del proyecto. Fuente: Consorcio Ingeniería I, 2024.

5.2 INFORMACIÓN DE PÓLIZAS

A continuación, se presentan las correspondientes garantías con sus respectivos anexos, de acuerdo con las actualizaciones y modificaciones que se han realizado contractualmente, de igual forma los anexos registrados se presentan el **Anexo 2**:

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR No. 21-44-101395979						
ANEXO	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**CONCEPTO**	**ACTO ADMINISTRATIVO**	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
				DESDE	**HASTA**	
ANEXO 0	12/10/2022	CUMPLIMIENTO	SUSCRIPCIÓN CONTRATO	10/10/2022	10/11/2023	$ 510.000.000,00
ANEXO 0	12/10/2022	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	SUSCRIPCIÓN CONTRATO	10/10/2022	10/09/2023	$ 765.000.000,00
ANEXO 0	12/10/2022	PAGO SALARIOS	SUSCRIPCIÓN CONTRATO	10/10/2022	10/05/2026	$ 255.000.000,00
ANEXO 0	12/10/2022	ESTABILIDAD Y CALIDAD	SUSCRIPCIÓN CONTRATO	10/05/2023	10/05/2026	$ 510.000.000,00
ANEXO 0	12/10/2022	CALIDAD DEL SERVICIO	SUSCRIPCIÓN CONTRATO	10/01/2023	10/01/2025	$ 510.000.000,00
ANEXO 1 Y 2	11/12/2022	CUMPLIMIENTO	ACTA DE INICIO	16/11/2022	17/12/2023	$ 510.000.000,00
ANEXO 1 Y 2	11/12/2022	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	ACTA DE INICIO	16/11/2022	17/10/2023	$ 765.000.000,00
ANEXO 1 Y 2	11/12/2022	PAGO SALARIOS	ACTA DE INICIO	16/11/2022	16/06/2026	$ 255.000.000,00
ANEXO 1 Y 2	11/12/2022	ESTABILIDAD Y CALIDAD	ACTA DE INICIO	16/06/2023	16/06/2026	$ 510.000.000,00
ANEXO 1 Y 2	11/12/2022	CALIDAD DEL SERVICIO	ACTA DE INICIO	16/02/2023	16/02/2025	$ 510.000.000,00
ANEXO 3	24/03/2023	CUMPLIMIENTO	SUSPENSIÓN	16/11/2022	30/01/2024	$ 510.000.000,00
ANEXO 3	24/03/2023	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	SUSPENSIÓN	16/11/2022	17/10/2023	$ 765.000.000,00
ANEXO 3	24/03/2023	PAGO SALARIOS	SUSPENSIÓN	16/11/2022	16/06/2026	$ 255.000.000,00
ANEXO 3	24/03/2023	ESTABILIDAD Y CALIDAD	SUSPENSIÓN	16/06/2023	16/06/2026	$ 510.000.000,00
ANEXO 3	24/03/2023	CALIDAD DEL SERVICIO	SUSPENSIÓN	16/02/2023	16/02/2025	$ 510.000.000,00
ANEXO 4	24/03/2023	CUMPLIMIENTO	SUSPENSIÓN	16/11/2022	30/01/2024	$ 510.000.000,00
ANEXO 4	24/03/2023	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	SUSPENSIÓN	16/11/2022	30/11/2023	$ 765.000.000,00
ANEXO 4	24/03/2023	PAGO SALARIOS	SUSPENSIÓN	16/11/2022	30/07/2026	$ 255.000.000,00
ANEXO 4	24/03/2023	ESTABILIDAD Y CALIDAD	SUSPENSIÓN	16/06/2026	16/06/2026	$ 510.000.000,00
ANEXO 4	24/03/2023	CALIDAD DEL SERVICIO	SUSPENSIÓN	16/02/2023	16/02/2025	$ 510.000.000,00
ANEXO 5	31/03/2023	CUMPLIMIENTO	SUSPENSIÓN	16/11/2022	30/01/2024	$ 510.000.000,00
ANEXO 5	31/03/2023	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	SUSPENSIÓN	16/11/2022	30/11/2023	$ 765.000.000,00
ANEXO 5	31/03/2023	PAGO SALARIOS	SUSPENSIÓN	16/11/2022	30/07/2026	$ 255.000.000,00
ANEXO 5	31/03/2023	ESTABILIDAD Y CALIDAD	SUSPENSIÓN	16/06/2023	16/06/2026	$ 510.000.000,00
ANEXO 5	31/03/2023	CALIDAD DEL SERVICIO	SUSPENSIÓN	16/02/2023	16/02/2025	$ 510.000.000,00
ANEXO 6	25/05/2023	CUMPLIMIENTO	ACTA DE REINICIO	16/11/2022	30/01/2024	$ 510.000.000,00
ANEXO 6	25/05/2023	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	ACTA DE REINICIO	16/11/2022	30/11/2023	$ 765.000.000,00
ANEXO 6	25/05/2023	PAGO SALARIOS	ACTA DE REINICIO	16/11/2022	30/07/2026	$ 255.000.000,00
ANEXO 6	25/05/2023	ESTABILIDAD Y CALIDAD	ACTA DE REINICIO	16/06/2023	16/06/2026	$ 510.000.000,00

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR No. 21-44-101395979						
ANEXO	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**CONCEPTO**	**ACTO ADMINISTRATIVO**	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
				DESDE	**HASTA**	
ANEXO 6	25/05/2023	CALIDAD DEL SERVICIO	ACTA DE REINICIO	16/02/2023	16/02/2025	$ 510.000.000,00
ANEXO 7	30/06/2023	CUMPLIMIENTO	ACTA DE REINICIO	16/11/2022	30/01/2024	$ 510.000.000,00
ANEXO 7	30/06/2023	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	ACTA DE REINICIO	16/11/2022	30/11/2023	$ 765.000.000,00
ANEXO 7	30/06/2023	PAGO SALARIOS	ACTA DE REINICIO	16/11/2022	30/07/2026	$ 255.000.000,00
ANEXO 7	30/06/2023	ESTABILIDAD Y CALIDAD	ACTA DE REINICIO	16/06/2023	16/06/2026	$ 510.000.000,00
ANEXO 7	30/06/2023	CALIDAD DEL SERVICIO	ACTA DE REINICIO	16/02/2023	16/02/2025	$ 510.000.000,00
ANEXO 8	1/08/2023	CUMPLIMIENTO	SUSPENSIÓN	16/11/2022	1/03/2024	$ 510.000.000,00
ANEXO 8	1/08/2023	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	SUSPENSIÓN	16/11/2022	30/11/2023	$ 765.000.000,00
ANEXO 8	1/08/2023	PAGO SALARIOS	SUSPENSIÓN	16/11/2022	30/07/2026	$ 255.000.000,00
ANEXO 8	1/08/2023	ESTABILIDAD Y CALIDAD	SUSPENSIÓN	16/06/2023	16/06/2026	$ 510.000.000,00
ANEXO 8	1/08/2023	CALIDAD DEL SERVICIO	SUSPENSIÓN	16/02/2023	16/02/2025	$ 510.000.000,00
ANEXO 9	1/08/2023	CUMPLIMIENTO	SUSPENSIÓN	16/11/2022	1/03/2024	$ 510.000.000,00
ANEXO 9	1/08/2023	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	SUSPENSIÓN	16/11/2022	30/12/2023	$ 765.000.000,00
ANEXO 9	1/08/2023	PAGO SALARIOS	SUSPENSIÓN	16/11/2022	30/08/2026	$ 255.000.000,00
ANEXO 9	1/08/2023	ESTABILIDAD Y CALIDAD	SUSPENSIÓN	16/06/2023	16/06/2026	$ 255.000.000,00
ANEXO 9	1/08/2023	CALIDAD DEL SERVICIO	SUSPENSIÓN	16/02/2023	16/02/2025	$ 510.000.000,00
ANEXO 10	30/08/2023	CUMPLIMIENTO	PRORROGA A LA SUSPENSIÓN	16/11/2022	29/03/2024	$ 510.000.000,00
ANEXO 10	30/08/2023	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	PRORROGA A LA SUSPENSIÓN	16/11/2022	29/02/2023	$ 765.000.000,00
ANEXO 10	30/08/2023	PAGO SALARIOS	PRORROGA A LA SUSPENSIÓN	16/11/2022	29/09/2026	$ 255.000.000,00
ANEXO 10	30/08/2023	ESTABILIDAD Y CALIDAD	PRORROGA A LA SUSPENSIÓN	29/09/2023	29/09/2026	$ 510.000.000,00
ANEXO 10	30/08/2023	CALIDAD DEL SERVICIO	PRORROGA A LA SUSPENSIÓN	16/02/2023	16/02/2025	$ 510.000.000,00
ANEXO 11	2/10/2023	CUMPLIMIENTO	PRORROGA A LA SUSPENSIÓN	16/11/2022	29/04/2024	$ 510.000.000,00
ANEXO 11	2/10/2023	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	PRORROGA A LA SUSPENSIÓN	16/11/2022	29/02/2024	$ 765.000.000,00
ANEXO 11	2/10/2023	PAGO SALARIOS	PRORROGA A LA SUSPENSIÓN	16/11/2022	29/09/2026	$ 255.000.000,00
ANEXO 11	2/10/2023	ESTABILIDAD Y CALIDAD	PRORROGA A LA SUSPENSIÓN	29/10/2023	29/10/2026	$ 510.000.000,00
ANEXO 11	2/10/2023	CALIDAD DEL SERVICIO	PRORROGA A LA SUSPENSIÓN	16/02/2023	16/02/2025	$ 510.000.000,00
ANEXO 12	3/10/2023	CUMPLIMIENTO	PRORROGA A LA SUSPENSIÓN	16/11/2022	29/04/2024	$ 510.000.000,00
ANEXO 12	3/10/2023	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	PRORROGA A LA SUSPENSIÓN	16/11/2022	29/03/2024	$ 765.000.000,00
ANEXO 12	3/10/2023	PAGO SALARIOS	PRORROGA A LA SUSPENSIÓN	16/11/2022	29/10/2026	$ 255.000.000,00
ANEXO 12	3/10/2023	ESTABILIDAD Y CALIDAD	PRORROGA A LA SUSPENSIÓN	29/10/2023	29/10/2026	$ 510.000.000,00
ANEXO 12	3/10/2023	CALIDAD DEL SERVICIO	PRORROGA A LA SUSPENSIÓN	16/02/2023	16/02/2025	$ 510.000.000,00
ANEXO 13	27/10/2023	CUMPLIMIENTO	PRORROGA A LA SUSPENSIÓN	16/11/2022	19/05/023	$ 510.000.000,00
ANEXO 13	27/10/2023	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	PRORROGA A LA SUSPENSIÓN	16/11/2022	29/03/2024	$ 765.000.000,00
ANEXO 13	27/10/2023	PAGO SALARIOS	PRORROGA A LA SUSPENSIÓN	16/11/2022	29/10/2026	$ 255.000.000,00
ANEXO 13	27/10/2023	ESTABILIDAD Y CALIDAD	PRORROGA A LA SUSPENSIÓN	18/11/2023	18/11/2026	$ 510.000.000,00
ANEXO 13	27/10/2023	CALIDAD DEL SERVICIO	PRORROGA A LA SUSPENSIÓN	16/02/2023	16/02/2025	$ 510.000.000,00
ANEXO 14	27/10/2023	CUMPLIMIENTO	PRORROGA A LA SUSPENSIÓN	16/11/2022	19/05/2024	$ 510.000.000,00
ANEXO 14	27/10/2023	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	PRORROGA A LA SUSPENSIÓN	16/11/2022	19/04/2024	$ 765.000.000,00
ANEXO 14	27/10/2023	PAGO SALARIOS	PRORROGA A LA SUSPENSIÓN	16/11/2022	19/11/2026	$ 255.000.000,00
ANEXO 14	27/10/2023	ESTABILIDAD Y CALIDAD	PRORROGA A LA SUSPENSIÓN	18/11/2023	18/11/2026	$ 510.000.000,00
ANEXO 14	27/10/2023	CALIDAD DEL SERVICIO	PRORROGA A LA SUSPENSIÓN	16/02/2023	16/02/2025	$ 510.000.000,00
ANEXO 15	28/11/2023	CUMPLIMIENTO	PRORROGA	16/11/2022	3/10/2024	$ 510.000.000,00
ANEXO 15	28/11/2023	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	PRORROGA	16/11/2022	3/08/2024	$ 765.000.000,00
ANEXO 15	28/11/2023	PAGO SALARIOS	PRORROGA	16/11/2022	3/04/2027	$ 255.000.000,00
ANEXO 15	28/11/2023	ESTABILIDAD Y CALIDAD	PRORROGA	3/04/2024	3/04/2027	$ 510.000.000,00
ANEXO 15	28/11/2023	CALIDAD DEL SERVICIO	PRORROGA	16/02/2023	16/02/2025	$ 510.000.000,00
ANEXO 16	20/12/2023	CUMPLIMIENTO	SUSPENSIÓN	16/11/2022	3/11/2024	$ 510.000.000,00
ANEXO 16	20/12/2023	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	SUSPENSIÓN	16/11/2022	3/08/2024	$ 765.000.000,00
ANEXO 16	20/12/2023	PAGO SALARIOS	SUSPENSIÓN	16/11/2022	3/04/2027	$ 255.000.000,00
ANEXO 16	20/12/2023	ESTABILIDAD Y CALIDAD	SUSPENSIÓN	3/04/2024	3/04/2027	$ 510.000.000,00
ANEXO 16	20/12/2023	CALIDAD DEL SERVICIO	SUSPENSIÓN	16/02/2023	16/02/2025	$ 510.000.000,00
ANEXO 17	20/12/2023	CUMPLIMIENTO	SUSPENSIÓN	16/11/2022	3/11/2024	$ 510.000.000,00

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR No. 21-44-101395979						
ANEXO	FECHA DE EXPEDICIÓN	CONCEPTO	ACTO ADMINISTRATIVO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
				DESDE	HASTA	
ANEXO 17	20/12/2023	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	SUSPENSIÓN	16/11/2022	3/09/2024	$ 765.000.000,00
ANEXO 17	20/12/2023	PAGO SALARIOS	SUSPENSIÓN	16/11/2022	3/05/2027	$ 255.000.000,00
ANEXO 17	20/12/2023	ESTABILIDAD Y CALIDAD	SUSPENSIÓN	3/04/2024	3/04/2027	$ 510.000.000,00
ANEXO 17	20/12/2023	CALIDAD DEL SERVICIO	SUSPENSIÓN	16/02/2023	16/02/2025	$ 510.000.000,00
ANEXO 18	11/01/2024	CUMPLIMIENTO	ACTA DE REINICIO	16/11/2022	3/10/2024	$ 510.000.000,00
ANEXO 18	11/01/2024	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	ACTA DE REINICIO	16/11/2022	3/08/2024	$ 765.000.000,00
ANEXO 18	11/01/2024	PAGO SALARIOS	ACTA DE REINICIO	16/11/2022	3/04/2027	$ 255.000.000,00
ANEXO 18	11/01/2024	ESTABILIDAD Y CALIDAD	ACTA DE REINICIO	19/04/2024	19/04/2027	$ 510.000.000,00
ANEXO 18	11/01/2024	CALIDAD DEL SERVICIO	ACTA DE REINICIO	16/02/2023	16/02/2025	$ 510.000.000,00
ANEXO 19	23/02/2024	CUMPLIMIENTO	ACTA DE REINICIO	16/11/2022	19/10/2024	$ 510.000.000,00
ANEXO 19	23/02/2024	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	ACTA DE REINICIO	16/11/2022	3/08/2024	$ 765.000.000,00
ANEXO 19	23/02/2024	PAGO SALARIOS	ACTA DE REINICIO	16/11/2022	3/04/2024	$ 255.000.000,00
ANEXO 19	23/02/2024	ESTABILIDAD Y CALIDAD	ACTA DE REINICIO	19/04/2024	19/04/2027	$ 510.000.000,00
ANEXO 19	23/02/2024	CALIDAD DEL SERVICIO	ACTA DE REINICIO	16/02/2023	16/02/2025	$ 510.000.000,00
ANEXO 20	23/02/2024	CUMPLIMIENTO	ACTA DE REINICIO	16/11/2022	19/10/2024	$ 510.000.000,00
ANEXO 20	23/02/2024	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	ACTA DE REINICIO	16/11/2022	19/08/2024	$ 765.000.000,00
ANEXO 20	23/02/2024	PAGO SALARIOS	ACTA DE REINICIO	16/11/2022	19/04/2027	$ 255.000.000,00
ANEXO 20	23/02/2024	ESTABILIDAD Y CALIDAD	ACTA DE REINICIO	19/04/2024	19/04/2027	$ 510.000.000,00
ANEXO 20	23/02/2024	CALIDAD DEL SERVICIO	ACTA DE REINICIO	16/02/2023	16/02/2025	$ 510.000.000,00
ANEXO 21	24/04/2024	CUMPLIMIENTO	PRORROGA	16/11/2022	19/11/2024	$ 510.000.000,00
ANEXO 21	24/04/2024	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	PRORROGA	16/11/2022	19/09/2024	$ 765.000.000,00
ANEXO 21	24/04/2024	PAGO SALARIOS	PRORROGA	16/11/2022	19/05/2027	$ 255.000.000,00
ANEXO 21	24/04/2024	ESTABILIDAD Y CALIDAD	PRORROGA	19/05/2024	19/05/2027	$ 510.000.000,00
ANEXO 21	24/04/2024	CALIDAD DEL SERVICIO	PRORROGA	16/02/2023	16/02/2025	$ 510.000.000,00

Tabla 3 Actualización Póliza De Cumplimiento Particular No. 21-44-101395979. Fuente: Consorcio Ingeniería I, 2024.

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 21-40-101198131						
ANEXO	FECHA DE EXPEDICIÓN	CONCEPTO	ACTO ADMINISTRATIVO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
				DESDE	HASTA	
ANEXO 0	12/10/2022	RCE	SUSCRIPCIÓN CONTRATO	10/10/2022	10/05/2023	$ 400.000.000,00
ANEXO 1 Y 2	1/12/2022	RCE	ACTA DE INICIO	16/11/2022	16/06/2023	$ 400.000.000,00
ANEXO 3	24/03/2023	RCE	SUSPENSIÓN	16/11/2022	16/06/2023	$ 464.000.000,00
ANEXO 4	24/03/2023	RCE	SUSPENSIÓN	16/11/2022	30/07/2023	$ 464.000.000,00
ANEXO 5	31/03/2023	RCE	SUSPENSIÓN	16/11/2022	30/07/2023	$ 464.000.000,00
ANEXO 6	25/05/2023	RCE	ACTA DE REINICIO	16/11/2022	30/07/2023	$ 464.000.000,00
ANEXO 7	30/06/2023	RCE	ACTA DE REINICIO	16/11/2022	30/07/2023	$ 464.000.000,00
ANEXO 8	1/08/2023	RCE	SUSPENSIÓN	16/11/2022	30/08/2023	$ 464.000.000,00
ANEXO 9	30/08/2023	RCE	PRORROGA A LA SUSPENSIÓN	16/11/2022	29/09/2023	$ 464.000.000,00
ANEXO 10	2/10/2023	RCE	PRORROGA A LA SUSPENSIÓN	16/11/2022	29/10/2023	$ 464.000.000,00
ANEXO 11	27/10/2023	RCE	PRORROGA A LA SUSPENSIÓN	16/11/2022	19/11/2023	$ 464.000.000,00
ANEXO 12	28/11/2023	RCE	PRORROGA	16/11/2022	3/04/2024	$ 464.000.000,00
ANEXO 13	20/12/2023	RCE	SUSPENSIÓN	16/11/2022	3/05/2024	$ 464.000.000,00
ANEXO 14	11/01/2024	RCE	ACTA DE REINICIO	16/11/2022	3/04/2024	$ 464.000.000,00
ANEXO 15	23/02/2024	RCE	ACTA DE REINICIO	16/11/2022	19/04/2024	$ 520.000.000,00
ANEXO 15	24/04/2024	CALIDAD DEL SERVICIO	PRORROGA	16/11/2022	19/05/2024	$ 520.000.000,00

Tabla 4 Actualización Póliza De Responsabilidad Civil Extracontractual No. 21-40-101198131. Fuente: Consorcio Ingeniería I, 2024

5.3 ASPECTOS FINANCIEROS

El valor inicial del contrato es de $ 2.550.000.000,00 (DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES M/CTE).

Los valores incluyen IVA, AIU, costos directos e indirectos asociados a la prestación del servicio, y demás impuestos de ley.

Etapa	Valor total incluido AIU Y/O IVA
Etapa 1 Estudios y Diseños	$ 226.265.553,00
Etapa 2 Ejecución de Obras	$ 2.323.734.447,00
Valor Total	$ 2.550.000.000,00

Tabla 5 Valor total Contrato de Obra No. 1070 -2022. Fuente: Consorcio Ingeniería I, 2024

Para la ejecución de la etapa de obra, contractualmente se estable que se deberá girar un anticipo al Consorcio Ingeniería I, el cual corresponderá al 30% del valor destinado para la ejecución de las obras, siendo este un anticipo de $ 686.070.156,00 de esta manera se presentará a continuación la relación y debida amortización que se realizó en el periodo del presente informe.

RELACIÓN DE PAGOS Y AMORTIZACIÓN					
ETAPA O AMORTIZACIÓN	VALOR INICIAL Y CONTRACTUAL	MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO	SALDO POR PAGA Y/O AMORTIZAR
Etapa i -Estudios y diseño	$ 226.265.553,00	N/A	-	-	$ 226.265.553,00
Etapa II – Ejecución de Obra	$ 2.323.734.447,00	N/A	-	-	$ 2.323.734.447,00
Anticipo	$ 686.070.156,00	N/A	11/01/2024	$ 686.070.156,00	$ 0,00
Amortización del anticipo	$ 0,00	N/A		$ 0,00	$ 0,00

Tabla 6 Relación de Pagos y Amortización Contrato de Obra No. 1070 -2022. Fuente: Consorcio Ingeniería I, 2024

5.4 ASPECTOS TÉCNICOS

5.4.1 PERSONAL TÉCNICO DE OBRA

A continuación, se relaciona el personal del contratista para la Etapa II ejecución de Obra.

Nombre	Cargo
Jaime Herrera Osorio	Director General de Obra
Juan De Jesús Gracia	Residente de Obra
Willington Niño Melo	Residente de Obra
Yuly Patricia Pulido Najar	Profesional Gestión Social y Participativa
Leidy Tatiana Rocha Mora	Profesional de Calidad o SISO
David Leonardo Lozada Cedeño	Profesional Ambiental
Brayan Steven Acosta Ladino	Arquitecto de apoyo
Edwin Vidal Penagos Riveros	Inspector de Obra
Cristian Alexander Garzón Hernández	Almacenista
Jhoan Camilo Vivas Pulido	Celador

Tabla 7 Personal técnico Etapa II. Fuente: Consorcio Ingeniería I, 2024

5.4.2 PERSONAL MANO DE OBRA

A continuación, se relaciona el personal de mano de obra del contratista con el cual se iniciaron las obras y se ejecutaron actividades durante el periodo del presente informe.

Nombre	Cargo
Lemus Bernal Manuel Alejandro	Oficial de Obra
Suarez Mahecha Enio	Oficial de Obra
Lemus Vanegas Manuel Salvador	Oficial de Obra
Pachón Torres Diego Alexander	Oficial de Obra
Romero Camacho Jose German	Oficial de Obra
Moreno Gutiérrez Facundo	Ayudante de Obra
León Barreto Enrique Sabino	Ayudante de Obra
Barrios Luis Gabriel	Ayudante de Obra
Miranda Gómez Jonatan Michael	Ayudante de Obra
González Guerrero Pedro Pablo	Ayudante de Obra
Lemus Bernal Jefferson Steven	Ayudante de Obra
Rodríguez González Luis Eduardo	Ayudante de Obra
González Piña Juanklin	Ayudante de Obra
Suarez Cardona Jober	Ayudante de Obra
Zambrano Henrry	Ornamentador
Valencia David Esteven	Ornamentador
Mena José Máximo	Ornamentador

Nombre	Cargo
Arrollo Mosquera Luilly Daniel	Pintor
Franco Galvis Andrés Giovanny	Pintor
Narciso González Jonathan	Pintor
Rivera Romero Miguel Ángel	Pintor
Rodríguez Zabala Johan Sebastián	Pintor

Tabla 8 Personal Mano De Obra Etapa II. Fuente: Consorcio Ingeniería I, 2024

6. AVANCE DE OBRA

En este capítulo se presentan las actividades constructivas desarrolladas en cada una de las acciones de acupuntura urbana iniciadas durante el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2024 y 30 de abril de 2024, según la programación realizada por el Consorcio Ingeniería I resumida a continuación:


Territorio	Fecha de inicio	Fecha de Terminación
AAU-T17	29/01/2024	19/05/2024
AAU-T20	15/01/2024	19/05/2024
AAU-T21	15/01/2024	19/05/2024
AAU-T22	12/02/2024	19/05/2024
MANZANA DEL CUIDADO	30/01/2024	19/04/2024

Tabla 9 Fecha de inicio y terminación Territorios Contrato de Obra No. 1070 de 2022. Fuente: Consorcio Ingeniería I, 2024

6.1 ACCIÓN DE ACUPUNTURA URBANA AAU-T117 – ZONA DE EQUIPAMIENTO COMUNAL CARTAGENA.

De acuerdo con el control y supervisión semanal el valor ejecutado correspondiente a la Acción de Acupuntura Urbana AAU T17 a la fecha de cierre del presente documento, es de $ 352.929.977,06 equivalente a un avance del 62,47% en comparación del valor total proyectado para el territorio AAUT-17 en la Etapa I – Estudios y Diseños.

En la imagen presentada a continuación se registra el avance semanalmente asociado con la curva S del territorio identificado como Zona de equipamiento Comunal Cartagena.

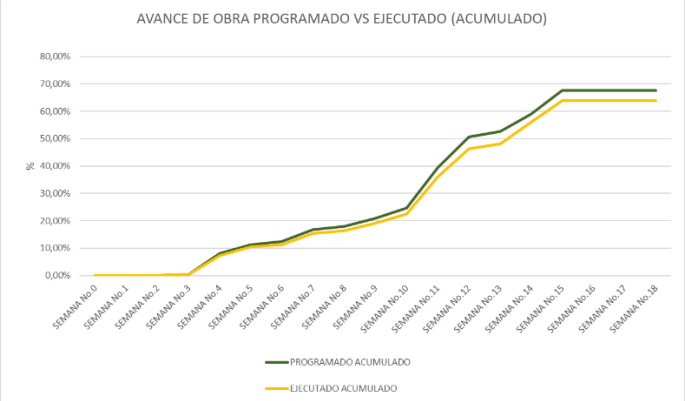

Proyección de ejecución

SEMANA	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	ATRASO
SEMANA No.0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SEMANA No.1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SEMANA No.2	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SEMANA No.3	0,48%	0,48%	0,43%	0,43%	-0,05%
SEMANA No.4	7,58%	8,06%	6,94%	7,38%	-0,68%
SEMANA No.5	3,26%	11,32%	2,98%	10,36%	-0,96%
SEMANA No.6	1,06%	12,38%	0,97%	11,32%	-1,06%
SEMANA No.7	4,40%	16,78%	4,02%	15,35%	-1,43%
SEMANA No.8	1,13%	17,91%	1,03%	16,38%	-1,53%
SEMANA No.9	3,08%	20,99%	2,82%	19,20%	-1,79%
SEMANA No.10	3,65%	24,64%	3,34%	22,54%	-2,10%
SEMANA No.11	14,80%	39,44%	13,54%	36,08%	-3,36%
SEMANA No.12	11,21%	50,65%	10,26%	46,33%	-4,32%
SEMANA No.13	1,93%	52,58%	1,77%	48,10%	-4,48%
SEMANA No.14	6,36%	58,94%	7,86%	55,96%	-2,98%
SEMANA No.15	8,71%	67,65%	7,93%	63,89%	-3,76%
SEMANA No.16	0,00%	67,65%	0,00%	63,89%	-3,76%
SEMANA No.17	0,00%	67,65%	0,00%	63,89%	-3,76%
SEMANA No.18	0,00%	67,65%	0,00%	63,89%	-3,76%

Imagen 2 Avance territorio AAU-T17 Semana No. 11 Etapa II – Ejecución de Obras.

A continuación, se registra las cantidades acumuladas ejecutadas hasta la fecha de cierre del presente informe (30/04/2024).

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CONDICIONES ACTUALIZADAS		CANTIDADES EJECUTADAS		
			CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	%
1,00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**						
1,10	Localización y replanteo	m2	1309,00	$ 10.767.834,00	1309,00	$ 10.767.834,00	100%
1,70	Cerramiento provisional de obra (Polisombra)	ml	210,45	$ 5.739.603,00	210,45	$ 5.739.602,85	100%
1,10	Protección de árbol de existente	un	9,00	$ 637.218,00	9,00	$ 637.218,00	100%
1,13	Protección de rejillas	un	3,00	$ 48.819,00	3,00	$ 48.819,00	100,%
2,00	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**						
2,10	Descapote a máquina nivel 0.00 (inc. retiro) e=-20 cm	m2	1309,00	$ 18.878.398,00	1309,00	$ 18.878.398,00	100%
2,20	Nivelación y perfilado de terreno manual	m2	80,91	$ 213.602,00	80,91	$ 213.602,40	100%
2,30	Nivelación y Compactación de Subrasante	m2	1274,91	$ 1.781.049,00	1274,91	$ 1.781.049,27	100%
2,40	Excavación manual suelo blando	m3	21,28	$ 1.557.100,00	93,47	$ 6.839.386,84	79,04%
2,50	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	m3	69,15	$ 7.599.862,00	50,00	$ 5.495.200,00	72,31%
2,60	Geotextil T-2400	m2	501,05	$ 5.589.714,00	400,00	$ 4.462.400,00	79,83%
2,70	Relleno compactado Base granular	m3	69,15	$ 10.828.406,00	52,20	$ 8.174.154,60	75,49%
2,90	Excavación mecanica+retiro	m3	687,23	$ 29.127.556,00	687,23	$ 29.127.556,32	100%
2,11	Relleno de rajon manual	m3	90,00	$ 14.978.700,00	90,00	$ 14.978.700,00	100%
2,12	Relleno recebo comun	m3	118,26	$ 10.703.831,00	67,80	$ 6.136.645,80	57,33%
	CONCRETOS BASES Y ESTRUCTURAS						
3,10	Placa contrapiso 3000 psi 21mpa e=15	m3	65,21	$ 67.026.425,00	13,30	$ 13.670.471,50	20,40%
3,30	Concreto 3000 psi 21 mpa para muros (Contenedores de raíz)	m3	5,06	$ 4.403.465,00			
3,12	Concreto ciclópeo 3000 psi Cimentac+formaleta(SUDS)	M3	52,80	$ 28.951.613,00	52,80	$ 28.951.613,00	100%
3,13	Dovelas	ml	120,00	$ 1.323.000,00	132,00	$ 1.455.300,00	100%
3,14	Viga de amarre en concreto	ml	115,00	$ 12.033.830,00	115,00	$ 12.033.830,00	100%
4,00	**ACERO DE REFUERZO**						
4,10	Malla Electrosoldada d=5mm@0.15 (area 6x2.35)	kg	750,00	$ 4.964.250,00	100,80	$ 667.195,20	13,44%
4,20	Refuerzo acero fy=60000 psi muro	kg	135,55	$ 776.159,00	17,95	$ 102.782,20	13,24%
5,00	**REDES HIDROSANITARIAS**						
5,10	Descapote a máquina nivel 0.00 (inc. retiro) e=-1,40 m	m3	238,14	$ 11.960.105,00	238,14	$ 11.960.105,22	100%

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CONDICIONES ACTUALIZADAS		CANTIDADES EJECUTADAS		
			CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	%
5,20	Concreta limpieza (alistado de terreno) e=0.05 en Obra	m3					
5,30	Talud perimetral en concreto fc 21 3000 psi .15	m3					
5,40	Cañuela en concreto	ml	32,00	$ 3.160.512,00	32,00	$ 3.160.512,00	100%
5,50	Geotextil (NORMA) NS-088	m2	89,91	$ 1.003.036,00	89,91	$ 1.003.035,96	100%
5,60	Capa drenaje (agregado Grueso)	m3	60,00	$ 8.843.760,00	24,27	$ 3.577.300,92	40,45%
5,70	Capa filtrante (agregado Fino)	m3	24,05	$ 4.595.258,00	4,05	$ 773.837,55	16,84%
5,80	Tubería perforada PVC DE 4 PUL	ml	55,71	$ 2.831.851,00	35,00	$ 1.779.120,00	62,83%
5,90	Tubería de limpieza PVC 4 PUL	ml	18,00	$ 914.976,00	15,00	$ 762.480,00	83,33%
5,10	Tubería de salida PVC 6 PUL	ml	40,00	$ 3.216.440,00	40,00	$ 3.216.440,00	100%
5,11	Sustrato (TIERRA NEGRA+ ARENA)	m3	36,41	$ 6.207.941,00			
5,12	Piedra bola	m2					
5,13	Malla Electro soldada d=5mm @ 0.15	kg					
5,14	Refuerzo acero fy=60000psi	kg					
5,15	Reja sumidero	un	22,00	$ 6.430.820,00			
5,16	Nivelación y perfilado de terreno manual	m2					
5,17	Nivelación y Compactación de Subrasante	m2					
5,18	Cerramiento reja pequeña	ml	44,00	$ 2.106.720,00			
5,19	Caja de inspección .60x.60 h=1.0 **	un					
5,22	Caja de Inspección100x100x100+Exca	un	1,00	$ 997.443,00			
5,23	Caja de inspeccion .80x.80 h=1.0+ExcaV	un	2,00	$ 1.480.522,00	2,00	$ 1.480.522,00	100%
5,25	Accesorios PVC S (4") **	un	21,00	$ 600.474,00			
6,00	**PINTURA PISO**						
6,10	Pintura a color espacio de GYM Biosaludable	m3	45,74	$ 1.572.953,00			
7,00	**ADOQUÍN, TABLETA, Y BORDILLOS**						
7,30	Tableta podotáctil alerta 20*20 cm. Prefabricado en concreto color amarillo (A57)	ml	45,87	$ 3.967.709,00			
7,40	Tableta podotáctil Guía 20*20 cm. Prefabricado en concreto, color amarillo (A58)	ml	109,34	$ 9.457.801,00			
7,60	Bordillo demarcado recto interno prefabricado en concreto (A80)	ml	401,56	$ 36.477.710,00	285,37	$ 25.922.937,02	71,07%
7,11	Muro bloque en concreto	m2	60,53	$ 6.451.772,00	60,53	$ 6.451.771,64	100%
8,00	**PISOS EN MATERIAL RECICLADO TIPO CAUCHO**						
8,10	Piso caucho reciclado en color, para juegos infantiles	m2	63,69	$ 36.053.763,00			
10,00	**MOBILIARIO URBANO**						
10,10	Caneca metálica referencia M120 o M121.	un	4,00	$ 2.518.440,00	3,80	$ 2.392.518,00	95,00%
10,20	Silla individual referencia M-01-A	un	17,00	$ 25.353.885,00	16,20	$ 24.160.761,00	95,29%
10,17	Torre Columpio Deslizadero	un	1,00	$ 34.475.000,00	0,95	$ 32.751.250,00	95,00%
10,60	Suministro baranda M-83	ml	63,69	$ 23.228.189,00	60,50	$ 22.064.773,50	94,99%
10,70	Equipo de GYM REF flexión pierna	un	1,00	$ 4.956.332,00	0,95	$ 4.708.515,40	95,00%
10,80	Equipo de GYM REF Elíptica	un	1,00	$ 4.956.332,00	0,95	$ 4.708.515,40	95,00%
10,90	Equipo de GYM REF Giro de hombros	un	1,00	$ 3.032.332,00	0,95	$ 2.880.715,40	95,00%
10,10	Equipo de GYM REF Giro caminador	un	1,00	$ 4.058.332,00	0,95	$ 3.855.415,40	95,00%
10,50	Mesa de ajedrez en concreto	un	2,00	$ 3.083.170,00	1,89	$ 2.913.595,65	94,50%
10,19	Ciclo parqueadero tipo M-22 acero inoxidable	un	4,00	$ 2.281.848,00	3,80	$ 2.167.755,60	95,00%
10,20	Bolardo en hierro	un	19,00	$ 4.066.247,00	18,04	$ 3.860.794,52	94,95%

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CONDICIONES ACTUALIZADAS		CANTIDADES EJECUTADAS		
			CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	%
10,31	Suministro e instalación de BARRAS COMBINADAS. DIMENSIONES: 4.59 x 1.41 x 2.65 mts	un	1,00	$ 13.651.680,00	0,95	$ 12.969.096,00	95,00%
11,00	**VEGETACIÓN**						
11,10	Cobertura tipo grama	m2	399,34	$ 4.161.921,00			
11,20	Cobertura tipo floricultura	m2	48,08	$ 4.717.802,00			
11,30	Siembra de árbol (Según propuesta paisajismo)	un	6,00	$ 1.746.606,00			
11,40	Relleno en tierra negra	m3	44,74	$ 2.927.383,00			
11,50	Limo arcilloso	m3	26,48	$ 3.089.342,00			
11,60	Árbol Hayuelo	un	1,00	$ 299.197,00			
11,70	Árbol laurel hoja pequeña	un	4,00	$ 1.164.404,00			
11,80	Árbol Carbonero Rojo	un	3,00	$ 918.258,00			
11,90	Árbol Calistemo	un	1,00	$ 289.533,00			
11,11	Traslado de árbol pequeño	un	2,00	$ 1.465.312,00			
12,00	**SEÑALÉTICA**						
12,10	Señalética identificador zona de juegos infantiles	un	1,00	$ 296.774,00	0,95	$ 281.935,30	95,00%
12,20	Señalética GYM parque	un	2,00	$ 593.548,00	1,90	$ 563.870,60	95,00%
12,30	Señalética identificadora	un	2,00	$ 1.138.956,00	1,90	$ 1.082.008,20	95,00%
12,40	Señalética SC-80	un	3,00	$ 1.364.106,00	2,90	$ 1.318.635,80	96,67%
13,00	**OTROS**						
13,10	Baño portátil Alquiler	mes					
13,20	Aseo general	m2	1204,00	$ 8.968.596,00			

Tabla 10 Avance territorio AAU-T17– Ejecución de Obras. Fuente: Consorcio Ingeniería I, 2024

Conforme la Tabla 10, a continuación, se en listan las actividades constructivas realizadas en el periodo del presente informe:


- Excavación manual suelo blando
- Relleno de rajón manual
- Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD
- Geotextil T-2400
- Relleno compactado Base granular
- Placa contrapiso 3000 psi 21mpa e=15
- Cañuela en concreto
- Capa drenaje (agregado Grueso)
- Capa filtrante (agregado Fino)
- Tubería perforada PVC DE 4 PUL

- Caja de Inspección100x100x100+Exca
- Caja de inspeccion .80x.80 h=1.0+ExcaV
- Muro bloque en concreto
- Bordillo demarcado recto interno prefabricado en concreto (A80)

6.2 ACCIÓN DE ACUPUNTURA URBANA AAU-T20 – PATIO BONITO II SECTOR A.

De acuerdo con el control y supervisión semanal el valor ejecutado correspondiente a la Acción de Acupuntura Urbana AAU T20 a la fecha de cierre del presente documento, es de $ $ 176.676.930,25 equivalente a un avance del 73,99% en comparación del valor total proyectado para el territorio AAUT-20 en la Etapa I – Estudios y Diseños.

En la imagen presentada a continuación se registra el avance semanalmente asociado con la curva S del territorio identificado como Acción de Acupuntura Urbana AAU-T20 – Patio Bonito II SECTOR A.

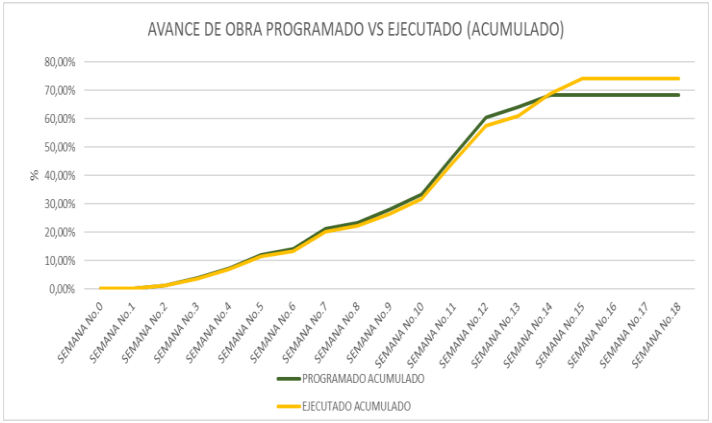

SEMANA	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	ATRASO
SEMANA No.0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SEMANA No.1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SEMANA No.2	1,26%	1,26%	1,20%	1,20%	-0,06%
SEMANA No.3	2,53%	3,79%	2,41%	3,61%	-0,18%
SEMANA No.4	3,53%	7,32%	3,36%	6,97%	-0,35%
SEMANA No.5	4,77%	12,09%	4,53%	11,50%	-0,59%
SEMANA No.6	1,98%	14,07%	1,88%	13,39%	-0,68%
SEMANA No.7	7,15%	21,22%	6,81%	20,20%	-1,02%
SEMANA No.8	2,06%	23,28%	1,96%	22,15%	-1,13%
SEMANA No.9	4,63%	27,91%	4,41%	26,56%	-1,35%
SEMANA No.10	5,32%	33,23%	5,06%	31,62%	-1,61%
SEMANA No.11	13,88%	47,11%	13,21%	44,84%	-2,27%
SEMANA No.12	13,42%	60,53%	12,77%	57,61%	-2,92%
SEMANA No.13	3,47%	64,00%	3,30%	60,91%	-3,09%
SEMANA No.14	4,40%	68,40%	8,07%	68,98%	0,58%
SEMANA No.15	0,00%	68,40%	5,01%	73,99%	5,59%
SEMANA No.16	0,00%	68,40%	0,00%	73,99%	5,59%
SEMANA No.17	0,00%	68,40%	0,00%	73,99%	5,59%
SEMANA No.18	0,00%	68,40%	0,00%	73,99%	5,59%

Imagen 3 Avance territorio AAU-T20 Semana No. 11 Etapa II – Ejecución de Obras.

A continuación, se registra las cantidades acumuladas ejecutadas hasta la fecha de cierre del presente informe (30/04/2024).

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CONDICIONES ACTUALIZADAS		CANTIDADES EJECUTADAS		
			CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	%
1,00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**						
1,1	Localización y replanteo	m2	517,00	$ 4.252.842,00	517,00	$ 4.252.842,00	100,00%
1,7	Cerramiento provisional de obra (Polisombra)	ml	110,50	$ 3.013.667,00	116,50	$ 3.177.345,49	105,43%
1,8	Demolición y retiro de Bordillo prefabricado	ml	86,30	$ 1.593.788,00	86,30	$ 1.593.788,40	100,00%
1,9	Desmonte y retiro de juegos infantiles	un	2,00	$ 229.892,00	2,00	$ 229.892,00	100,00%
1,10	Protección de árbol de existente	un	19,00	$ 1.345.238,00	19,00	$ 1.345.238,00	100,00%
1,13	Protección de rejillas	un	2,00	$ 32.546,00	2,00	$ 32.546,00	100,00%
2,00	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**						
2,1	Descapote a máquina nivel 0.00 (inc. retiro) e=-20 cm	m2	517,00	$ 7.456.174,00	517,00	$ 7.456.174,00	100,00%

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CONDICIONES ACTUALIZADAS		CANTIDADES EJECUTADAS		
			CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	%
2,2	Nivelacion y perfilado de terreno manual	m2	517,00	$ 1.364.880,00	517,00	$ 1.364.880,00	100,00%
2,3	Nivelación y Compactación de Subrasante	m2	517,00	$ 722.249,00	517,00	$ 722.249,00	100,00%
2,4	Excavación manual suelo blando	m3	95,03	$ 6.953.535,00	95,03	$ 6.953.535,16	100,00%
2,5	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	m3	52,49	$ 5.768.861,00	45,00	$ 4.945.680,00	85,73%
2,6	Geotextil T-2400	m2	404,05	$ 4.507.582,00	268,25	$ 2.992.597,00	66,39%
2,7	Relleno compactado Base granular	m3	27,15	$ 4.251.500,00			
2,8	Excavación muros y huellas vaciadas en concreto	m3	2,10	$ 153.661,00	2,10	$ 153.661,20	100,00%
2,11	Relleno de rajon manual	m3	22,68	$ 3.774.632,00	13,61	$ 2.265.112,30	60,01%
3,00	**CONCRETOS BASES Y ESTRUCTURAS**						
3,1	Placa contrapiso 3000 psi 21mpa e=15	m3	19,00	$ 19.529.245,00	2,24	$ 2.302.395,20	11,79%
3,2	Placa contrapiso 3000 psi 21mpa para huellas en concreto	m3	1,00	$ 1.027.855,00			
3,3	Concreto 3000 psi 21mpa para muros (Contenedores de raiz)	m3	1,00	$ 870.250,00			
3,12	Concreto ciclopeo 3000 psi Cimentac+formaleta(SUDS)	m3	7,60	$ 4.167.278,00	7,59	$ 4.161.794,34	99,87%
3,13	Dovelas	ml	90,00	$ 992.250,00	65,00	$ 716.625,00	72,22%
4,00	**ACERO DE REFUERZO**						
4,1	Malla Electrosoldada d=5mm@0.15 (area 6x2.35)	kg					
4,2	Refuerzo acero fy=60000psi muro	kg					
4,3	Refuerzo acero fy=60000psi huellas de concreto	kg					
5,00	**REDES HIDROSANITARIAS SUDS**						
5,1	Descapote a máquina nivel 0.00 (inc. retiro) e=-1,40m	m3	112,76	$ 5.663.145,00	112,76	$ 5.663.145,48	100,00%
5,2	Concreto limpieza (alistado de terreno) e=0.05enObra	m3					
5,3	Taludes perimetrales en concreto fc 21 3000 psi .15	m3					
5,4	Cañuela en concreto	ml	9,00	$ 888.894,00			
5,5	Geotextil (NORMA) NS-088	m2	69,00	$ 769.764,00			
5,6	Capa drenaje (agregado Grueso)	m3	16,00	$ 2.358.336,00			
5,7	Capa filtrante (agregado Fino)	m3	3,00	$ 573.213,00			
5,8	Tubería perforada PVC DE 4 PUL	ml	27,00	$ 1.372.464,00			
5,9	Tubería de limpieza PVC 4 PUL	ml	10,00	$ 508.320,00			
5,10	Tubería de salida PVC 6 PUL	ml	6,00	$ 482.466,00			
5,11	Sustrato (TIERRA NEGRA+ ARENA)	m3	23,00	$ 3.921.523,00			
5,12	Piedra bola	m2					
5,13	Malla Electro soldada d=5mm@0.15	kg					
5,14	Refuerzo acero fy=60000psi	kg	98,78	$ 565.614,00	98,57	$ 564.411,82	99,79%
5,15	Reja sumidero	un	22,00	$ 6.430.820,00			
5,16	Nivelación y perfilado de terreno manual	m2					
5,17	Nivelación y Compactación de Subrasante	m2					
5,18	Cerramiento reja pequeña	ml	33,00	$ 1.580.040,00			

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CONDICIONES ACTUALIZADAS		CANTIDADES EJECUTADAS		
			CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	%
5,19	Caja de inspección .60x.60 h=1.0 **	un	2,00	$ 1.090.514,00			
5,20	Pañete impermeab. Muro	m2	43,62	$ 1.854.112,00			
6,00	**PINTURA**						
6,10	Pintura a color espacio de GYM Biosaludable	m2	21,00	$ 722.169,00			
7,00	**ADOQUÍN, TABLETA, Y BORDILLOS**						
7,1	Adoquin prefabricados en concreto a color, de 06*15*21 (ref.Looserna-Adoquinar)	m2	21,00	$ 1.465.275,00			
7,2	Adoquin rectangular plano demarcador visual	m2	0,57	$ 78.589,00			
7,3	Tableta podotactil alerta 20*20 cm. Prefabricado en concreto color amarillo (A57)	ml	23,31	$ 2.016.292,00			
7,4	Tableta podotactil Guia 20*20 cm. Prefabricado en concreto, color amarillo (A58)	ml	35,33	$ 3.056.010,00			
7,5	Bordillo demarcado recto vial prefabricado en concreto (A10)	ml	101,70	$ 8.685.689,00	101,70	$ 8.685.689,00	100,00%
7,6	Bordillo demarcado recto interno prefabricado en concreto (A80)	ml	122,70	$ 11.146.068,00	111,00	$ 10.083.240,0	90,46%
8,00	**PISOS EN MATERIAL RECICLADO TIPO CAUCHO**						
8,1	Piso caucho reciclado en color, para juegos infantiles	m2	31,00	$ 17.548.542,00			
10,00	**MOBILIARIO URBANO**						
10,1	Caneca metalica referencia M120 o M121.	un	2,00	$ 1.259.220,00	1,00	$ 629.610,00	50,00%
10,2	Silla individual referencia M-01-A	un	4,00	$ 5.965.620,00	2,00	$ 2.982.810,00	50,00%
10,4	Deslizadero	un	1,00	$ 26.959.769,00	0,50	$ 13.479.884,50	50,00%
10,5	Mesa de ajedrez en concreto	un	1,00	$ 1.541.585,00	0,50	$ 770.792,50	50,00%
10,6	Suministro baranda M-83	ml	23,00	$ 8.388.261,00	12,00	$ 4.376.484,00	52,17%
10,7	Equipo de GYM REF flexion pierna	un	1,00	$ 4.956.332,00	0,50	$ 2.478.166,00	50,00%
10,8	Equipo de GYM REF Eliptica	un	1,00	$ 4.956.332,00	0,50	$ 2.478.166,00	50,00%
10,9	Equipo de GYM REF Giro de hombros	un	1,00	$ 3.032.332,00	0,50	$ 1.516.166,00	50,00%
10,10	Equipo de GYM REF Giro caminador	un	1,00	$ 4.058.332,00	0,50	$ 2.029.166,00	50,00%
11,00	**VEGETACIÓN**						
11,1	Cobertura tipo grama	m2	247,00	$ 2.574.234,00			
11,2	Cobertura tipo floricultura	m2	47,00	$ 4.611.828,00			
11,3	Siembra de arbol (Según propuesta paisajismo)	un	1,00	$ 291.101,00			
11,4	Relleno en tierra negra	m3	29,00	$ 1.897.499,00			
11,7	Arbol laurel hoja pequeña	un	1,00	$ 291.101,00			
12,00	**SEÑALÉTICA**						
12,1	Señalética identificador zona de juegos infantiles	un	1,00	$ 296.774,00	0,50	$ 148.387,00	50,00%
12,2	Señalética GYM parque	un	1,00	$ 296.774,00	0,50	$ 148.387,00	50,00%
12,3	Señalética identificadora	un	1,00	$ 569.478,00	0,50	$ 284.739,00	50,00%
12,4	Señalética SC-80	un	1,00	$ 454.702,00	0,50	$ 227.351,00	50,00%
13,00	**OTROS**						

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CONDICIONES ACTUALIZADAS		CANTIDADES EJECUTADAS		
			CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	%
13,1	Baño portatil Alquiler	mes					
13,2	Aseo general	m2	512,00	$ 3.813.888,00			

Tabla 11 Avance territorio AAU-T20– Ejecución de Obras. Fuente: Consorcio Ingeniería I, 2024


Conforme la Tabla 11, a continuación, se en listan las actividades constructivas realizadas en el periodo del presente informe:

- Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD
- Geotextil T-2400
- Relleno compactado Base granular
- Relleno de rajón manual
- Placa contrapiso 3000 psi 21mpa e=15
- Concreto ciclópeo 3000 psi Cimentación y formaleta (SUDS)
- Dovelas
- Viga de amarre en concreto
- Geotextil (NORMA) NS-088
- Capa drenaje (agregado Grueso)
- Capa filtrante (agregado Fino)
- Tubería perforada PVC DE 4 PUL
- Tubería de limpieza PVC 4 PUL
- Reja sumidero
- Caja de inspección .60x.60 h=1.0 **
- Muro bloque en concreto
- Refuerzo acero fy=60000psi

6.3 ACCIÓN DE ACUPUNTURA URBANA AAU-T21 – PATIO BONITO II SECTOR A.

De acuerdo con el control y supervisión semanal el valor ejecutado correspondiente a la Acción de Acupuntura Urbana AAU T21 a la fecha de cierre del presente documento, es de $ 277.805.880,64 equivalente a un avance del 85,78% en comparación del valor total proyectado para el territorio AAU-T21 en la Etapa I – Estudios y Diseños.

En la imagen presentada a continuación se registra el avance semanalmente asociado con la curva S del territorio identificado como Acción de Acupuntura Urbana AAU-T21 – Patio Bonito II SECTOR C.

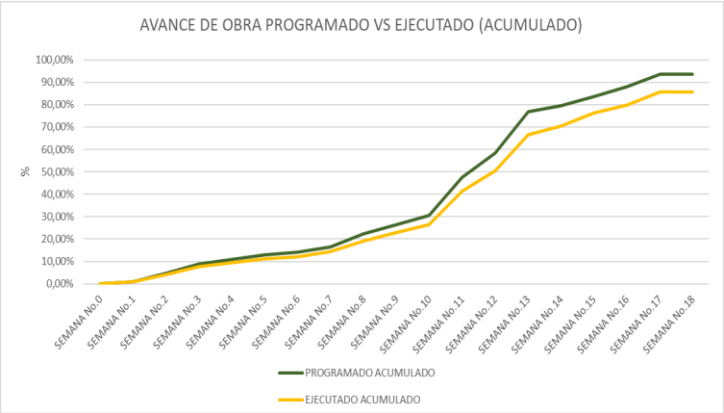

SEMANA	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	ATRASO
SEMANA No.0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SEMANA No.1	1,02%	1,02%	0,89%	0,89%	-0,13%
SEMANA No.2	3,73%	4,75%	3,24%	4,12%	-0,63%
SEMANA No.3	3,94%	8,70%	3,43%	7,55%	-1,15%
SEMANA No.4	2,08%	10,78%	1,82%	9,37%	-1,41%
SEMANA No.5	2,26%	13,04%	1,85%	11,21%	-1,83%
SEMANA No.6	1,05%	14,09%	0,91%	12,13%	-1,96%
SEMANA No.7	2,49%	16,58%	2,16%	14,29%	-2,29%
SEMANA No.8	5,71%	22,29%	4,95%	19,24%	-3,05%
SEMANA No.9	4,13%	26,42%	3,59%	22,83%	-3,59%
SEMANA No.10	4,24%	30,66%	3,69%	26,52%	-4,14%
SEMANA No.11	16,96%	47,62%	14,73%	41,25%	-6,37%
SEMANA No.12	10,74%	58,36%	9,32%	50,57%	-7,79%
SEMANA No.13	18,46%	76,82%	16,03%	66,60%	-10,22%
SEMANA No.14	2,68%	79,50%	3,84%	70,45%	-9,06%
SEMANA No.15	4,03%	83,53%	5,80%	76,24%	-7,29%
SEMANA No.16	4,56%	88,09%	3,59%	79,83%	-8,26%
SEMANA No.17	5,37%	93,46%	5,95%	85,78%	-7,68%
SEMANA No.18	0,00%	93,46%	0,00%	85,78%	-7,68%

Imagen 4 Avance territorio AAU-T21 Semana No. 11 Etapa II – Ejecución de Obras.

A continuación, se registra las cantidades acumuladas ejecutadas hasta la fecha de cierre del presente informe (30/04/2024).

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CONDICIONES ACTUALIZADAS		CANTIDADES EJECUTADAS		
			CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	%
1,00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**						
1,10	Localización y replanteo	m2	590,00	$ 4.853.340,00	590,00	$ 4.853.332,09	100,00%
1,70	Cerramiento provisional de obra (Polisombra)	ml	116,90	$ 3.188.214,00	121,90	$ 3.324.578,70	100,00%
1,80	Demolición y retiro de Bordillo prefabricado	ml	207,24	$ 3.827.308,00	207,24	$ 3.827.308,32	100,00%
1,90	Desmonte y retiro de juegos infantiles	un	2,00	$ 229.892,00	2,00	$ 229.892,00	100,00%
1,10	Protección de árbol de existente	un	6,00	$ 424.812,00	6,00	$ 424.812,00	100,00%
1,11	Desmonte y retiro de baranda	ml	16,20	$ 207.101,00	16,20	$ 207.100,80	100,00%
1,12	Desmonte de adoquín	m2	118,84	$ 1.774.519,00	118,84	$ 1.774.518,88	100,00%
1,13	Protección de rejillas	un	2,00	$ 32.546,00	2,00	$ 32.546,00	100,00%
1,16	Demolición placa de contrapiso (Asfalto)	m2	68,00	$ 1.264.528,00	68,00	$ 1.264.528,00	100,00%
1,17	Demolición muros de concreto	m3	3,15	$ 886.807,00	3,15	$ 886.806,90	100,00%
2,00	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**						
2,10	Descapote a máquina nivel 0.00 (inc. retiro) e=-20 cm	m2	590,00	$ 8.508.980,00	590,00	$ 8.508.980,00	100,00%
2,20	Nivelación y perfilado de terreno manual	m2	590,00	$ 1.557.600,00	590,00	$ 1.557.600,00	100,00%
2,30	Nivelación y Compactación de Subrasante	m2	590,00	$ 824.230,00	590,00	$ 824.230,00	100,00%
2,40	Excavación manual suelo blando	m3	110,37	$ 8.075.994,00	116,90	$ 8.553.806,80	100,00%

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CONDICIONES ACTUALIZADAS		CANTIDADES EJECUTADAS		
			CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	%
2,50	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	m3	60,03	$ 6.597.537,00	64,00	$ 7.033.856,00	100,00%
2,60	Geotextil T-2400	m2	461,22	$ 5.145.370,00	470,00	$ 5.243.320,00	100,00%
2,70	Relleno compactado Base granular	m3	31,05	$ 4.862.213,00	26,00	$ 4.071.418,00	100,00%
2,80	Excavación muros y huellas vaciadas en concreto	m3	2,39	$ 174.881,00	2,39	$ 174.881,08	100,00%
2,11	Relleno de rajon manual	m3	25,65	$ 4.268.930,00	36,67	$ 6.102.988,40	100,00%
3,00	**CONCRETOS BASES Y ESTRUCTURAS**						
3,10	Placa contrapiso 3000 psi 21mpa e=15	m3	25,00	$ 25.696.375,00			
3,20	Placa contrapiso 3000 psi 21mpa para huellas en concreto	m3	4,00	$ 4.111.420,00			
3,30	Concreto 3000 psi 21mpa para muros (Contenedores de raíz)	m3	1,00	$ 870.250,00			
3,12	Concreto ciclopeo 3000 psi Cimentac+formaleta(SUDS)	m3	7,99	$ 4.381.125,00	6,40	$ 3.509.286,40	80,10%
3,13	Dovelas	ml	102,00	$ 1.124.550,00	95,00	$ 1.047.375,00	93,14%
3,14	Viga de amarre en concreto	ml	87,40	$ 9.145.711,00	54,04	$ 5.654.853,68	61,83%
4,00	**ACERO DE REFUERZO**						
4,10	Malla Electrosoldada d=5mm@0.15 (area 6x2.35)	kg	402,13	$ 2.661.698,00			
4,20	Refuerzo acero fy=60000psi muro	kg					
4,30	Refuerzo acero fy=60000psi huellas de concreto	kg					
5,00	**REDES HIDROSANITARIAS**						
5,10	Descapote a máquina nivel 0.00 (inc. retiro) e=-1,40m	m3	109,12	$ 5.480.334,00	109,12	$ 5.480.333,76	100,00%
5,20	Concreto limpieza (alistado de terreno) e=0.05enObra	m3					
5,30	Taludes perimetrales en concreto fc 21 3000 psi .15	m3					
5,40	Cañuela en concreto	ml	18,00	$ 1.777.788,00	2,00	$ 197.532,00	11,11%
5,50	Geotextil (NORMA) NS-088	m2	67,50	$ 753.030,00	69,00	$ 769.764,00	102,22%
5,60	Capa drenaje (agregado Grueso)	m3	30,38	$ 4.477.890,00	16,00	$ 2.358.336,00	52,67%
5,70	Capa filtrante (agregado Fino)	m3	27,00	$ 5.158.917,00	3,00	$ 573.213,00	11,11%
5,80	Tubería perforada PVC DE 4 PUL	ml	35,00	$ 1.779.120,00	27,00	$ 1.372.464,00	77,14%
5,90	Tubería de limpieza PVC 4 PUL	ml	10,00	$ 508.320,00	10,00	$ 508.320,00	100,00%
5,10	Tubería de salida PVC 6 PUL	ml	5,00	$ 402.055,00	6,00	$ 482.466,00	120,00%
5,11	Sustrato (TIERRA NEGRA+ ARENA)	m3	9,72	$ 1.657.270,00			
5,12	Piedra bola	m2	5,20	$ 216.913,00			
5,13	Malla Electro soldada d=5mm@0.15	kg					
5,14	Refuerzo acero fy=60000psi	kg			103,99	$ 595.446,74	100%
5,15	Reja sumidero	un	36,00	$ 10.523.160,00			
5,16	Nivelación y perfilado de terreno manual	m2	64,80	$ 171.072,00			
5,17	Nivelación y Compactación de Subrasante	m2					
5,18	Cerramiento reja pequeña	ml	32,40	$ 1.551.312,00			
5,19	Caja de inspección .60x.60 h=1.0 **	un	1,00	$ 545.257,00	1,00	$ 545.257,00	100,00%
5,25	Accesorios PVC S (4") **	un	15,00	$ 428.910,00			
5,20	Pañete impermeab. Muro	m2	44,47	$ 1.890.327,00			
6,00	**PINTURA PISO**						
6,10	Pintura a color espacio de GYM Biosaludable	m3	14,00	$ 481.446,00			
7,00	**ADOQUÍN, TABLETA, Y BORDILLOS**						
7,20	Adoquín rectangular plano demarcador visual	m2					

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CONDICIONES ACTUALIZADAS		CANTIDADES EJECUTADAS		
			CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	%
7,30	Tableta podotactil alerta 20*20 cm. Prefabricado en concreto color amarillo (A57)	ml	40,10	$ 3.468.610,00			
7,40	Tableta podotactil Guía 20*20 cm. Prefabricado en concreto, color amarillo (A58)	ml	43,78	$ 3.786.926,00			
7,50	Bordillo demarcado recto vial prefabricado en concreto (A10)	ml	108,25	$ 9.245.091,00	123,25	$ 10.526.166,2	113,86%
7,60	Bordillo demarcado recto interno prefabricado en concreto (A80)	ml	114,20	$ 10.373.928,00	101,00	$ 9.174.840,00	88,44%
7,11	Muro bloque en concreto	m2	63,84	$ 6.804.578,00	34,00	$ 3.623.992,00	62,96%
8,00	**PISOS EN MATERIAL RECICLADO TIPO CAUCHO**						
8,10	Piso caucho reciclado en color, para juegos infantiles	m2	35,00	$ 19.812.870,00	25,00	$ 14.152.050,0	66,77%
10,00	**MOBILIARIO URBANO**						
10,10	Caneca metálica referencia M120 o M121.	un	3,00	$ 1.888.830,00	2,50	$ 1.574.025,00	83,33%
10,20	Silla individual referencia M-01-A	un	10,00	$ 14.914.050,00	5,00	$ 7.457.025,00	50,00%
10,30	Juego cuerdas piramidal	un	1,00	$ 63.788.124,00	1,25	$ 79.735.155,0	125,00%
10,60	Suministro baranda M-83	ml	21,80	$ 7.950.613,00	29,00	$ 10.576.503,0	133,03%
10,70	Equipo de GYM REF flexión pierna	un	1,00	$ 4.956.332,00	1,00	$ 4.956.332,00	100,00%
10,80	Equipo de GYM REF Elíptica	un	1,00	$ 4.956.332,00	1,00	$ 4.956.332,00	100,00%
10,90	Equipo de GYM REF Giro de hombros	un	1,00	$ 3.032.332,00	1,00	$ 3.032.332,00	100,00%
10,10	Equipo de GYM REF Giro caminador	un	1,00	$ 4.058.332,00	1,00	$ 4.058.332,00	100,00%
10,14	Puerta metálica para cerramiento parque M80A	un	2,00	$ 2.117.526,00			
11,00	**VEGETACIÓN**						
11,10	Cobertura tipo grama	m2	304,13	$ 3.169.643,00	304,13	$ 3.169.642,86	100,00%
11,20	Cobertura tipo floricultura	m2	48,54	$ 4.762.939,00			
11,30	Siembra de árbol (Según propuesta paisajismo)	un	1,00	$ 291.101,00			
11,40	Relleno en tierra negra	m3	29,14	$ 1.906.659,00	29,14	$ 1.906.659,34	100,00%
11,70	Árbol laurel hoja pequeña	un	1,00	$ 291.101,00			
11,90	Árbol Calistenia	un	1,00	$ 289.533,00			
12,00	**SEÑALÉTICA**						
12,10	Señalética identificador zona de juegos infantiles	un	1,00	$ 296.774,00	1,00	$ 296.774,00	100,00%
12,20	Señalética GYM parque	un	1,00	$ 296.774,00	1,00	$ 296.774,00	100,00%
12,30	Señalética identificador	un	2,00	$ 1.138.956,00	1,75	$ 996.586,50	87,50%
12,40	Señalética SC-80	un	3,00	$ 1.364.106,00	1,00	$ 452.428,49	33,17%
13,00	**OTROS**						
13,10	Baño portátil Alquiler	mes					
13,20	Aseo general	m2	584,00	$ 4.350.298,00			

Tabla 12 Avance territorio AAU-T21– Ejecución de Obras. Fuente: Consorcio Ingeniería I, 2024

Conforme la Tabla 12, a continuación, se en listan las actividades constructivas realizadas en el periodo del presente informe:


- Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD
- Geotextil T-2400
- Relleno compactado Base granular
- Relleno de rajón manual

- Placa contrapiso 3000 psi 21mpa e=15
- Concreto ciclópeo 3000 psi Cimentación y formaleta (SUDS)
- Dovelas
- Viga de amarre en concreto
- Geotextil (NORMA) NS-088
- Capa drenaje (agregado Grueso)
- Capa filtrante (agregado Fino)
- Tubería perforada PVC DE 4 PUL
- Tubería de limpieza PVC 4 PUL
- Reja sumidero
- Caja de inspección .60x.60 h=1.0 **
- Muro bloque en concreto
- Refuerzo acero fy=60000psi

6.4 ACCIÓN DE ACUPUNTURA URBANA AAU-T22 – LOS OLIVOS.

De acuerdo con el control y supervisión semanal el valor ejecutado correspondiente a la Acción de Acupuntura Urbana AAU T22 a la fecha de cierre del presente documento, es de $ 250.294.113,39 equivalente a un avance del 76,74% en comparación del valor total proyectado para el territorio AAU-T22 en la Etapa I – Estudios y Diseños.

En la imagen presentada a continuación se registra el avance semanalmente asociado con la curva S del territorio identificado como Acción de Acupuntura Urbana AAU-T22 – Los Olivos.

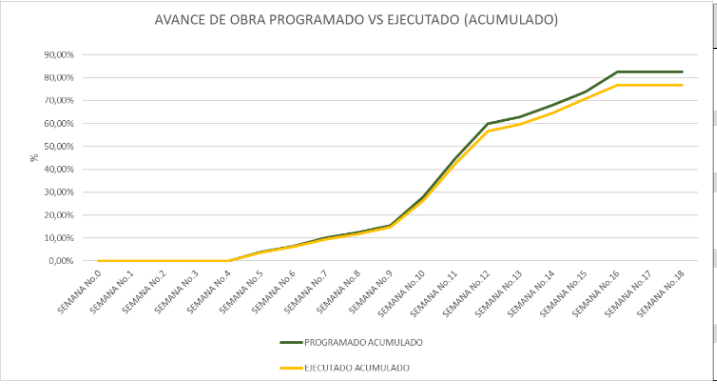

SEMANA	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	ATRASO
SEMANA No.0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SEMANA No.1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SEMANA No.2	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SEMANA No.3	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SEMANA No.4	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SEMANA No.5	3,98%	3,98%	3,76%	3,76%	-0,22%
SEMANA No.6	2,52%	6,50%	2,38%	6,15%	-0,35%
SEMANA No.7	3,64%	10,14%	3,45%	9,59%	-0,55%
SEMANA No.8	2,37%	12,51%	2,24%	11,84%	-0,67%
SEMANA No.9	3,03%	15,54%	2,86%	14,70%	-0,84%
SEMANA No.10	12,37%	27,91%	11,70%	26,40%	-1,51%
SEMANA No.11	17,07%	44,98%	16,15%	42,55%	-2,43%
SEMANA No.12	14,85%	59,83%	14,04%	56,59%	-3,24%
SEMANA No.13	3,17%	63,00%	3,00%	59,59%	-3,41%
SEMANA No.14	5,10%	68,10%	4,85%	64,44%	-3,66%
SEMANA No.15	5,74%	73,84%	6,29%	70,74%	-3,10%
SEMANA No.16	8,67%	82,51%	6,00%	76,74%	-5,77%
SEMANA No.17	0,00%	82,51%	0,00%	76,74%	-5,77%
SEMANA No.18	0,00%	82,51%	0,00%	76,74%	-5,77%

Imagen 5 Avance territorio AAU-T22 Semana No. 11 Etapa II – Ejecución de Obras.

A continuación, se registra las cantidades acumuladas ejecutadas hasta la fecha de cierre del presente informe (30/04/2024).

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CONDICIONES ACTUALIZADAS		CANTIDADES EJECUTADAS		
			CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	%
1,00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**						
1,10	Localización y replanteo	m2	948,87	$ 7.805.405,00	948,87	$ 7.805.404,62	100,00%
1,70	Cerramiento provisional de obra (Polisombra)	ml	162,00	$ 4.418.226,00	162,00	$ 4.418.226,00	100,00%
1,80	Demolición y retiro de Bordillo prefabricado	ml	129,41	$ 2.389.944,00	192,49	$ 3.554.905,32	99,48%
1,14	Demolición anden	m2	221,94	$ 4.845.172,00	221,94	$ 4.845.172,14	100,00%
1,15	Desmonte de bancas en concreto existente	un	10,00	$ 1.109.710,00	10,00	$ 1.109.710,00	100,00%
1,10	Protección de árbol de existente	un	18,00	$ 1.274.436,00	18,00	$ 1.274.436,00	100,00%
1,11	Desmonte y retiro de baranda	ml	51,10	$ 653.262,00	51,10	$ 653.262,40	100,00%
1,12	Desmonte de adoquín	m2	234,95	$ 3.508.273,00	232,96	$ 3.478.558,72	99,15%
1,18	Desmonte piso de caucho (Trasiego+Retiro)	m2	119,50	$ 1.033.914,00	119,50	$ 1.033.914,00	100,00%
1,19	Desmonte equipos biosaludable (demolc+retiro)	und	4,00	$ 551.628,00	4,00	$ 551.628,00	100,00%
1,20	Demolición carcamo manual incly. cargue y retiro*	ml	13,63	$ 839.444,000			
2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**						
2,1	Descapote a máquina nivel 0.00 (inc. retiro) e=-20 cm	m2	420,50	$ 6.064.451,00			
2,5	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	m3					
2,4	Excavación manual suelo blando	m3	60,00	$ 4.390.100,00	68,28	$ 4.996.403,68	100,00%
2,7	Relleno compactado Base granular	m3	40,05	$ 6.272.176,00	40,05	$ 6.272.176,02	100,00%
2,8	Excavación muros y huellas vaciadas en concreto	m3	1,00	$ 73.172,00			
2,101	Estabilización de base granular con emulsión + cemento 5% E:0.20m	m2					
2,120	Relleno recebo común	m3	15,00	$ 1.357.665,00	15,00	$ 1.357.665,00	100,00%
3,00	**CONCRETOS BASES Y ESTRUCTURAS**						
3,40	Cp02_conexiones peatonales livianas.	un	19,00	$ 2.604.007,00			
3,50	Cp02_a_conexiones peatonales livianas.	un	15,00	$ 778.455,00			
3,60	Cp02_b_conexiones peatonales livianas.	un	7,00	$ 557.872,00			
3,70	Suministro, transporte e instalación de elemento en concreto pigmentado vaciado in situ.	ml					
3,80	Pdv01_piso duro vaciado. Construcción de piso duro en concreto de 21mpa	m2					
3,10	Placa contrapiso 3000 psi 21mpa e=15	m3	41,05	$ 42.197.559,00	40,00	$ 41.114.200,0	97,43%

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CONDICIONES ACTUALIZADAS		CANTIDADES EJECUTADAS		
			CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	%
3,90	Escalera en concreto 3000 psi	m3	1,50	$ 1.990.242,00	0,35	$ 464.389,80	23,33%
3,10	Zapata corrida	un					
3,11	Muro contenc concr 21 MPA 3000	m3					
3,12	Concreto ciclopeo 3000 psi Cimentac+formaleta(SUDS)	m3	2,48	$ 1.357.107,00			
4,00	**ACERO DE REFUERZO**						
4,20	Refuerzo acero fy=60000psi muro	kg	203,13	$ 1.163.122,00	5,00	$ 28.630,00	2,46%
6,00	**PINTURA PISO**						
6,10	Pintura a color espacio de GYM Biosaludable	m2	15,33	$ 527.183,00			
6,40	Pintura amarilla franja de seguridad (Incluye suministro e instalación)	ml	68,35	$ 558.078,00			
7,00	**ADOQUÍN, TABLETA, Y BORDILLOS**						
7,60	Bordillo demarcado recto interno prefabricado en concreto (A80)	ml	127,32	$ 11.565.749,00	140,50	$ 12.763.228,9	110,35%
7,70	Rejilla sobre cañuela	ml	13,60	$ 2.410.287,00			
7,50	Bordillo demarcado recto vial prefabricado en concreto (A10)	ml					
7,80	Adoquín de arcilla	m2					
7,90	Cañuela Tipo CU 004 (suministro e instalación, Incluye 3cm de mortero 1:5)	ml	72,67	$ 3.500.732,00	75,59	$ 3.641.397,07	104,02%
7,10	Desmonte, corte y reinstalacion adoquin + arena	m2	74,37	$ 2.547.396,00	52,06	$ 1.783.177,20	70,00%
8,00	**PISOS EN MATERIAL RECICLADO TIPO CAUCHO**						
8,10	Piso caucho reciclado en color, para juegos infantiles	m2	120,89	$ 68.433.653,00	50,77	$ 28.739.983,1	42,00%
10,00	**MOBILIARIO URBANO**						
10,10	Caneca metálica referencia M120 o M121.	un	11,00	$ 6.925.710,00	10,00	$ 6.296.100,00	90,91%
10,11	Banca prefabricada en concreto referencia dime 1.70*0.60*0.45 M13-A	un	11,00	$ 21.865.184,00	10,00	$ 19.877.440,0	90,91%
10,12	Banca prefabricada en concreto referencia dime 0.80*0.60*0.45 M13-A	un	2,00	$ 3.305.134,00	1,00	$ 1.652.567,00	50,00%
10,60	Suministro baranda M-83	ml	70,49	$ 25.708.196,00	70,49	$ 25.708.196,0	100,00%
10,14	Puerta metálica para cerramiento parque M80A	un	1,00	$ 1.058.763,00	1,00	$ 1.058.763,00	100,00%
10,13	Banca de concreto vaciada en SITU.	ml	16,89	$ 12.936.423,00	16,89	$ 12.936.423,00	100,00%
10,15	Mantenimiento juegos infantiles existentes	un	2,00	$ 6.115.454,00	2,00	$ 6.115.454,00	100,00%
10,16	Mantenimiento de GYM biosaludable	un	4,00	$ 5.839.440,00	4,00	$ 5.839.440,00	100,00%
10,32	Rodadero largo en acero (DESM+SUM+INST)	un	1,00	$ 2.441.506,00	1,00	$ 2.441.506,00	100,00%
10,29	Superficies moradas esquineras	m2	65,00	$ 7.571.005,00			
11,00	**VEGETACION**						
11,10	Cobertura tipo grama	m2	300,00	$ 3.126.600,00			
11,40	Relleno en tierra negra	m3					
11,30	Siembra de árbol (Según propuesta paisajismo)	un					
11,50	Limo arcilloso	m3					
11,60	Árbol hayuelo	un					
11,10	Árbol Chicalá	un					
12	**SEÑALÉTICA**						
12,5	Suministro, transporte e instalación de valla tipo SRC 000 ó SRG 000	un	1,00	$ 464.467,00	0,90	$ 418.020,30	90,00%
12,6	Suministro, transporte e instalación de valla tipo SRV 000	un	1,00	$ 464.467,00	0,90	$ 418.020,30	90,00%
13	**OTROS**						
13,30	Limpieza Cárcamo	ml	13,60	$ 194.738,00	13,60	$ 194.738,40	100,00%
13,20	Aseo general	m2	948,87	$ 7.068.133,00			
13,10	Baño portátil Alquiler	mes					

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CONDICIONES ACTUALIZADAS		CANTIDADES EJECUTADAS		
			CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	%
13,12	Arreglo de graderias para parque	ml	15,33	$ 454.228,00	12,00	$ 355.560,00	78,28%
13,15	Suministro y aplicación de pigmento para coloracion acabado superficial de concretos, incluye sellador acrilico transparente	M2	290,32	$ 27.577.497,00	290,32	$ 27.577.497,0	100,00%

Tabla 13 Avance territorio AAU-T22– Ejecución de Obras. Fuente: Consorcio Ingeniería I, 2024


Conforme la Tabla 13, a continuación, se en listan las actividades constructivas realizadas en el periodo del presente informe:

- Placa contrapiso 3000 psi 21mpa e=15
- Relleno recebo común
- Escalera en concreto 3000 psi
- Bordillo demarcado recto interno prefabricado en concreto (A80)
- Cañuela Tipo CU 004 (suministro e instalación, Incluye 3cm de mortero 1:5)
- Desmonte, corte y reinstalación adoquín + arena
- Piso caucho reciclado en color, para juegos infantiles
- Caneca metálica referencia M120 o M121
- Banca prefabricada en concreto referencia dime 1.70*0.60*0.45 M13-A
- Suministro baranda M-83
- Puerta metálica para cerramiento parque M80A
- Banca de concreto vaciada en SITU
- Mantenimiento juegos infantiles existentes
- Mantenimiento de GYM biosaludable
- Rodadero largo en acero (DESM+SUM+INST)
- Limpieza Cárcamo
- Arreglo de graderías para parque
- Suministro y aplicación de pigmento para coloración acabado superficial de concretos, incluye sellador acrílico transparente

6.5 MANZANA DEL CUIDADO- SAN BLAS.

De acuerdo con el control y supervisión semanal el valor ejecutado correspondiente al proyecto Manzana del Cuidado a la fecha de cierre del presente documento, es de $ $ 433.532.798,00 equivalente a un avance del 100% en comparación del valor total proyectado para la Manzana del Cuidado- San Blas.

En la imagen presentada a continuación se registra el avance semanalmente asociado con la curva S del territorio identificado como la Manzana del Cuidado- San Blas.

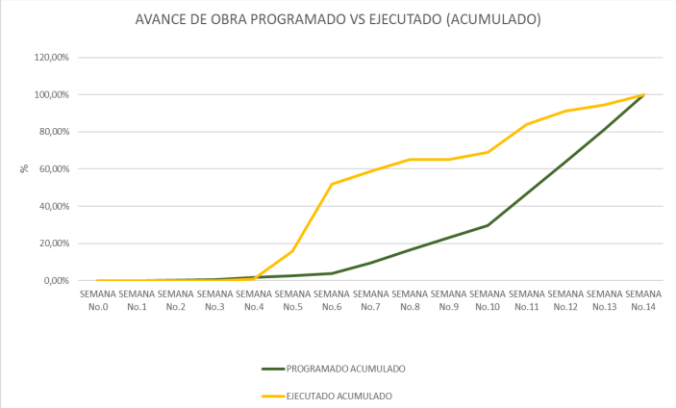

SEMANA	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	ATRASO
SEMANA No.0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SEMANA No.1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SEMANA No.2	0,16%	0,16%	0,00%	0,00%	-0,16%
SEMANA No.3	0,23%	0,39%	0,00%	0,00%	-0,39%
SEMANA No.4	1,16%	1,55%	0,90%	0,90%	-0,65%
SEMANA No.5	1,16%	2,71%	15,02%	15,92%	13,21%
SEMANA No.6	1,16%	3,87%	36,04%	51,97%	48,10%
SEMANA No.7	5,79%	9,66%	6,73%	58,70%	49,04%
SEMANA No.8	6,65%	16,31%	6,33%	65,03%	48,72%
SEMANA No.9	6,65%	22,96%	0,00%	65,03%	42,07%
SEMANA No.10	6,65%	29,61%	4,05%	69,08%	39,47%
SEMANA No.11	17,07%	46,68%	15,05%	84,13%	37,45%
SEMANA No.12	17,07%	63,75%	7,01%	91,14%	27,39%
SEMANA No.13	17,46%	81,21%	3,26%	94,39%	13,18%
SEMANA No.14	18,79%	100,00%	5,61%	100,00%	0,00%

Imagen 6 Avance Manzana del Cuidado Semana No. 11 Etapa II – Ejecución de Obras

A continuación, se registra las cantidades acumuladas ejecutadas hasta la fecha de cierre del presente informe (30/04/2024).

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CONDICIONES ACTUALIZADAS		CANTIDADES EJECUTADAS		
			CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	%
1,00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**						
1,10	Localización y replanteo	m2	2316,00	$ 19.051.416,00	2316,00	$ 19.051.416,00	100,00%
1,20	Limpieza, retiro de publicidad (stickers y adhesivos) y alistamiento de superficies de pintura en postes y bolardos	un					
1,30	Limpieza y alistamiento de superficies andenes para pintura horizontal	m2					
1,40	Limpieza y alistamiento de superficies para murales (grafitis)	m2	480,00	$ 25.211.520,00	480,00	$ 25.211.520,00	100,00%
1,50	Anclaje a zona dura(incluye demolición zona dura, excavación manual en material común, pedestal en concreto 3500 psi y suministro e instalación acero de refuerzo de 60000 psi)	un					
1,60	Relleno en tierra negra	m3					
6,00	**PINTURA**						
6,2	Muro No.1	m2	300,00	$ 53.420.400,00	300,00	$ 53.420.400,00	100,%
6,3	Muro No.10	m2	180,00	$ 32.052.240,00	180,00	$ 32.052.240,00	100,%
10,00	**MOBILIARIO URBANO**						

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CONDICIONES ACTUALIZADAS		CANTIDADES EJECUTADAS		
			CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	%
10,21	Pintura de Postes	m2					
10,22	Adhesivos "sistema distrital del cuidado y manzana del cuidado"	un	8,00	$ 440.224,00	8,00	$ 440.224,00	100,00%
10,23	Pintura Bolardos	un					
10,24	Logo manzana del cuidado Tipo 1 (Medidas: 1,6mx1,10m / Pintura de piso)	un	80,00	$ 17.604.960,00	80,00	$ 17.604.960,00	100,00%
10,25	Logo manzana del cuidado Tipo 2 (Medidas: 1,2mx0,8m / Pintura de piso)	un	30,00	$ 5.443.860,00	30,00	$ 5.443.860,00	100,00%
10,26	Eslogan (Sistema distrital del Cuidado) Tipo 1 (Medidas: 5.20 mx2.4m / Pintura de piso)	un	4,00	$ 2.836.916,00	4,00	$ 2.836.916,00	100,00%
10,27	Eslogan (Sistema distrital del Cuidado) Tipo 2 (Medidas: 2,0mx1,2m / Pintura de piso)	un	8,00	$ 3.135.960,00	8,00	$ 3.135.960,00	100,00%
10,28	Planos indicativos de localización (Tamaño variable)	un	4,00	$ 9.238.260,00	4,00	$ 9.238.260,00	100,00%
10,29	Superficies moradas esquineras	m2	587,71	$ 68.454.698,00	587,71	$ 68.454.697,67	100,00%
10,301	Bordillo superficie morado (A=0.6m)	ml	2644,00	$ 187.705.492,00	2644,00	$ 187.705.492,00	100,00%
13,00	**OTROS**						
13,40	Intervención artística (Tejidos) sobre rejas	M2					
13,50	Cintas de banderines en cruces vehiculares	ml					
13,60	Suministro e instalación de señalización metálica informativa para postes (Tamaño 0,5m x 0,1m) incluye abrazadera tipo cinta bandit.	un					
13,70	Globo Esfera publicitario de 2.8 Mts	un					
13,80	Mobiliario vertical Metálico con matera en concreto	un	2,00	$ 3.408.426,00	2,00	$ 3.408.426,00	100,00%
13,90	Mobiliario vertical Metálico con matera en concreto + Banca	un	2,00	$ 5.528.426,00	2,00	$ 5.528.426,00	100,00%
13,10	Suministro y aplicación de helio para Globo Esfera publicitario de 2.8 Mts	m3					
13,11	Suministro Contrapeso móvil Globo Esfera publicitario de 2.8 Mts incluye sistema de sujeción	un					

Tabla 14 Avance Manzana del Cuidado – Ejecución de Obras. Fuente: Consorcio Ingeniería I, 2024

Conforme la Tabla 14, a continuación, se en listan las actividades constructivas realizadas en el periodo del presente informe:

- Limpieza y alistamiento de superficies para murales (grafitis)
- Muro No. 1
- Muro No.10
- Superficies moradas esquineras
- Bordillo superficie morado (A=0.6m)
- Mobiliario vertical Metálico con matera en concreto
- Mobiliario vertical Metálico con matera en concreto + Banca

6.6 COMPONENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO

En el área técnica, se ha hecho entrega de los informes semanales No. 45, 46, 47 y 48 correspondientes a este periodo, se ha recibido y enviado correspondencia a través de correo electrónico y se ha asistido a los comités de seguimiento coordinados por la entidad, de manera presencial y virtual.

6.6.1 COMITÉS DE SEGUIMIENTO

Durante el periodo que corresponde del 1 al 30 de abril se realizaron los siguientes comités técnicos de obra segun tabla 15. Se anexan los archivos de cada uno de estos comités en el Anexo 4.

FECHA	TEMAS TRATADOS	LUGAR
05/04/2024	Recorrido parque AAU-T22, seguimiento de actividades constructivas	Campamento AAU-T22
12/04/2024	Seguimiento componente Técnico, componente SST, Componente social, y ambiental	Virtual
15/03/2024	Seguimiento componente Técnico, componente SST, Componente social, y ambiental.	Manzana del cuidado
26/04/2024	Recorrido parques AAU-T17, seguimiento de actividades constructivas	Campamento AAU-T17

Tabla 15. Comités de seguimiento. Fuente: Consorcio Ingeniería I, 2024

6.6.2 CORRESPONDENCIA DEL CONTRATISTA A LA INTERVENTORÍA

La correspondencia enviada por parte del contratista durante el periodo de evaluación del presente periodo se enlista en la tabla 16 y sus archivos de encuentran en el Anexo 5.

FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO
1/04/2024	CI-207	ENTREGA INFORMES SEMANALES
2/04/2024	CI-208	ENTREGA INFORME MENSUAL DE OBRA NO. 8
2/04/2024	CI-209	ENTREGA INFORME MENSUAL DE OBRA NO. 9
9/04/2024	CI-210	ENTREGA RESULTADOS CBR MATERIALES DE BASE Y SUB BASE
12/04/2024	CI-211	ENTREGA INFORME MENSUAL NO. 11 COMPONENTE AMBIENTAL
12/04/2024	CI-212	ENTREGA INFORME FÍSICO NO, 10
12/04/2024	CI-212A	OPERACIÓN 9
12/04/2024	CI-213	RADICACIÓN HOJAS DE VIDA
16/04/2024	CI-214	ENTREGA INFORMES SEMANA No 13.
17/04/2024	CI-215	ENTREGA INFORME TÉCNICO MENSUAL NO. 11 ETAPA II
22/04/2024	CI-216	ENTREGA DE DOCUMENTOS - TERRITORIOS 17 Y 22
22/04/2024	CI-217	ENTREGA DOCUMENTACIÓN JARDINERÍA EL RESGUARDO AR S.A.S
23/04/2024	CI-218	ENTREGA INFORMES SEMANA No 14.
29/02/2024	CI-219	PLAN DE CONTINGENCIA AAU-T17
24/04/2024	CI-220	ENTREGA POLIZAS ACTUALIZADAS PRÓRROGA NO.2
24/04/2024	CI-221	SOLICITUD INFORMACIÓN Y PAGO
27/04/2024	CI-222	ENTREGA DISEÑOS ESQUEMÁTICOS PARA PISOS DE CAUCHO

Tabla 16. Correspondencia enviada a la interventoría. Fuente: Consorcio Ingeniería I, 2024

6.6.3 INFORMES SEMANALES

Los informes semanales citados en la tabla 17 correspondientes al mes de abril se encuentran adjuntos en el **Anexo 6.**

INFORME	INICIO	TERMINACIÓN
Semana 12 (etapa II)	01/04/2024	7/04/2024
Semana 13 (etapa II)	8/04/2024	14/04/2024
Semana 14(etapa II)	14/04/2024	20/04/2024
Semana 15 (etapa II)	22/04/2024	28/04/2024
Semana 16 (etapa II)	29/04/2024	5/05/2024

Tabla 17. Informes semanales. Fuente: Consorcio Ingeniería I, 2024

6.7 ENSAYOS Y PRUEBAS A MATERIALES EN OBRA

ENSAYOS Y PRUEBAS REALIZADAS			
AAU T17: ZONAS DE EQUIPAMIENTO COMUNAL CARTAGENA			
ACTIVIDAD REALIZADA	**ENSAYO Y/O PRUEBA**	**FECHA DE TOMA**	**RESULTADO E INFORME**
Estos ensayos tienen por finalidad determinar la relación humedad-densidad de un suelo compactado en un molde normalizado mediante un pisón de masa normalizada, en caída libre y con una energía específica de compactación	Densidades en terreno	13/05/2024	Anexo No. 8
AAU T20: PATIO BONITO II SECTOR A			
ACTIVIDAD REALIZADA	**ENSAYO Y/O PRUEBA**	**FECHA DE TOMA**	**RESULTADO E INFORME**
La resistencia a la compresión simple es la característica mecánica principal del concreto. Se define como la capacidad para soportar una carga por unidad de área, y se expresa en términos de esfuerzo, generalmente en kg/cm2	Resistencia a la compresión de cilindros de concreto	19/04/2024	Anexo No. 8
AAU T21: PATIO BONITO II SECTOR C			
ACTIVIDAD REALIZADA	**ENSAYO Y/O PRUEBA**	**FECHA DE TOMA**	**RESULTADO E INFORME**
La resistencia a la compresión simple es la característica mecánica principal del concreto. Se define como la capacidad para soportar una carga por unidad de área, y se expresa en términos de esfuerzo, generalmente en kg/cm2	Resistencia a la compresión de cilindros de concreto	19/04/2024	Anexo No. 8
AAU T22: LOS OLIVOS			
ACTIVIDAD REALIZADA	**ENSAYO Y/O PRUEBA**	**FECHA DE TOMA**	**RESULTADO E INFORME**
		MANZANA DEL CUIDADO	
ACTIVIDAD REALIZADA	**ENSAYO Y/O PRUEBA**	**FECHA DE TOMA**	**RESULTADO E INFORME**
Para el presente periodo no se realizó ningún ensayo en este parque			

Tabla 18. Ensayos y pruebas realizados. Fuente: Consorcio Ingeniería I, 2024

6.8 COMPONENTE AMBIENTAL

En el periodo del presente informe se realizaron las siguientes actividades:

- Se realiza el cerramiento de los árboles con el fin de procurar su protección y se adelantaron actividades de fumigación contra plaga cochinilla, abono y riego de los individuos presentes en los territorios T20 y T21.
- Se realiza la protección y limpieza de los sumideros presentes en cercanía de los territorios priorizados por la SDHT, procurando su buen funcionamiento cuando se presentan lluvias en los diferentes sectores.
- Se realiza el control de los RCD de los parques que actualmente están en ejecución presentando las debidas evidencias ante la interventoría.
- Se realiza control y cumplimiento del MAO.

Anexo 1. Acta de inicio

MEMORANDO	
PARA:	OSCAR FLOREZ MORENO SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
DE:	SUBDIRECCION DE OPERACIONES ALBA JACQUELINE CELIS HERRERA
ASUNTO:	ALCANCE A LOS MEMORANDOS 3-2023-9690 Y 3-2023-9689 - SOLICITUD TRAMITE DE REINICIO CONTRATOS NO 1105 Y 1106 DE 2023 Y 1070 Y 1066 DE 2022.

Cordial saludo,

De manera atenta, me permito solicitar el reinicio y/o reactivación del Contrato de Obra No 1106 de 2023, suscrito entre Secretaría Distrital del Hábitat - SDTH y el CONSORCIO ARQING, y el Contrato de Interventoría No 1105 de 2023, suscrito entre la SDHT y la empresa NOGAALL SAS, al igual que el Contrato de Obra No 1070 de 2022, suscrito entre Secretaría Distrital del Hábitat - SDTH y el CONSORCIO INGENIERÍA I, y el Contrato de Interventoría No 1066 de 2022, suscrito entre Secretaría Distrital del Hábitat - SDTH y el CONSORCIO PROSPERAR BETHEL de conformidad con las condiciones pactadas en las suspensiones objeto de reinicio, toda vez, que los hechos que justificaron la mismas se encuentran superados, por tanto, es procedente llevar a cabo el reinicio vía SECOP de los contratos aquí referidos, trámite que deberá realizarse a partir de la fecha 28 de diciembre de 2023. Por lo tanto, una vez reiniciados o reactivados los contratos se debe proceder a realizar el ajuste de la nueva fecha de terminación del contrato vía Secop.

Cordialmente,

ALBA JACQUELINE CELIS HERRERA
SUBDIRECCION DE OPERACIONES

c.c.e.:
Anexo: N/A
Anexos Digitales: 0

Elaboró: MADIYERLEING SUATERNA ARAGON-SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Revisó: MADIYERLEING SUATERNA ARAGON-SUBDIRECCION DE OPERACIONES |
Aprobó: ALBA JACQUELINE CELIS HERRERA-SUBDIRECCION DE OPERACIONES

Anexo 2. Pólizas de cumplimiento

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**ANTIGUO COUNTRY**	**21**	**21-44-101395979**	**0**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
12	**10**	**2022**	**10**	**10**	**2022**	**00:00**	**10**	**05**	**2026**	**23:59**	**EMISION ORIGINAL**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO INGENIERIA I	**NIT: 901.639.134-0**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV CARRERA 15 NRO. 100 - 69 OF 508	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6017550985

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	**NIT: 899.999.061-9**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 52 NRO. 13 - 64	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3581600

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO DE OBRA No. 1070-2022, CUYO OBJETO ES: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT.
NOTA: - LA VIGENCIA PARA EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE TRES (3) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCION DE LA OBRA.
- LA VIGENCIA PARA EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO ES DE (2) DOS AÑOS CONTADOS DESDE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA ETAPA 1

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**10/10/2022**	**10/11/2023**	**$510,000,000.00**
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	**10/10/2022**	**10/09/2023**	**$765,000,000.00**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**10/10/2022**	**10/05/2026**	**$255,000,000.00**
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	**10/05/2023**	**10/05/2026**	**$510,000,000.00**
CALIDAD DEL SERVICIO	**10/01/2023**	**10/01/2025**	**$510,000,000.00**

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
INGENIERIA ESPECIALIZADA GESTION AMBIENTAL SEGURIDAD INDUSTR	900496836-3	50.00
IC INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	901291812-1	50.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***7,083,061.00	$ ******20,000.00	$ ***1,349,581.00	$ *********8,452,643.00	$ ****2,550,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
LUZ DARY BECERRA VANEGAS	122783	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101395979

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101395979, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 12 días del mes de OCTUBRE de 2022

21-44-101395979

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**ANTIGUO COUNTRY**	**21**	**21-44-101395979**	**1**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
01	**12**	**2022**	**10**	**10**	**2022**	**00:00**	**10**	**05**	**2026**	**23:59**	**ANEXO DE MODIFICACION**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO INGENIERIA I	**NIT: 901.639.134-0**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV CARRERA 15 NRO. 100 - 69 OF 508	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6017550985

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	**NIT: 899.999.061-9**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 52 NRO. 13 - 64	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3581600

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO DE OBRA No. 1070-2022, CUYO OBJETO ES: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT.
NOTA: - LA VIGENCIA PARA EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE TRES (3) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCION DE LA OBRA.
- LA VIGENCIA PARA EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO ES DE (2) DOS AÑOS CONTADOS DESDE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA ETAPA 1

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO A SOLICITUD DEL ASEGURADO Y SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 DEL CONTRATO DE OBRA No. 1070-2022, SE ACLARA LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADAS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *(7,083,061.00)	$ ****(20,000.00)	$ *(1,349,581.00)	$ *******(8,452,643.00)	$ **(2,550,000,000.00)	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LUZ DARY BECERRA VANEGAS	122783	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101395979

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101395979	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
01	12	2022	10	10	2022	00:00	10	05	2026	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO INGENIERIA I		**NIT: 901.639.134-0**
DIRECCIÓN: AV CARRERA 15 NRO. 100 - 69 OF 508	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	6017550985

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT		**NIT: 899.999.061-9**
DIRECCIÓN: CL 52 NRO. 13 - 64	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3581600

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
INGENIERIA ESPECIALIZADA GESTION AMBIENTAL SEGURIDAD INDUSTR	900496836-3	50.00
IC INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	901291812-1	50.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101395979

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

LEIDYDIAZ

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101395979, anexo 1, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 01 días del mes de DICIEMBRE de 2022

21-44-101395979

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**ANTIGUO COUNTRY**	**21**	**21-44-101395979**	**2**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
01	**12**	**2022**	**16**	**11**	**2022**	**00:00**	**16**	**06**	**2026**	**23:59**	**ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO INGENIERIA I	**NIT: 901.639.134-0**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV CARRERA 15 NRO. 100 - 69 OF 508	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6017550985

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	**NIT: 899.999.061-9**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 52 NRO. 13 - 64	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3581600

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO DE OBRA No. 1070-2022, CUYO OBJETO ES: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT.
NOTA: - LA VIGENCIA PARA EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE TRES (3) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCION DE LA OBRA.
- LA VIGENCIA PARA EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO ES DE (2) DOS AÑOS CONTADOS DESDE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA ETAPA 1

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**16/11/2022**	**17/12/2023**	**$510,000,000.00**	
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	**16/11/2022**	**17/10/2023**	**$765,000,000.00**	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**16/11/2022**	**16/06/2026**	**$255,000,000.00**	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	**16/06/2023**	**16/06/2026**	**$510,000,000.00**	
CALIDAD DEL SERVICIO	**16/02/2023**	**16/02/2025**	**$510,000,000.00**	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO A SOLICITUD DEL ASEGURADO Y SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 DEL CONTRATO DE OBRA No. 1070-2022, SE ACLARA LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADAS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***7,083,061.00	$ ******20,000.00	$ ***1,349,581.00	$ *********8,452,643.00	$ ****2,550,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
LUZ DARY BECERRA VANEGAS	122783	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101395979

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101395979	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
01	12	2022	16	11	2022	00:00	16	06	2026	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO INGENIERIA I		**NIT: 901.639.134-0**
DIRECCIÓN: AV CARRERA 15 NRO. 100 - 69 OF 508	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	6017550985

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT		**NIT: 899.999.061-9**
DIRECCIÓN: CL 52 NRO. 13 - 64	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3581600

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
INGENIERIA ESPECIALIZADA GESTION AMBIENTAL SEGURIDAD INDUSTR	900496836-3	50.00
IC INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	901291812-1	50.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101395979

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

LEIDYDIAZ

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101395979, anexo 2, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 01 días del mes de DICIEMBRE de 2022

21-44-101395979

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**ANTIGUO COUNTRY**	**21**	**21-44-101395979**	**1**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
01	**12**	**2022**	**10**	**10**	**2022**	**00:00**	**10**	**05**	**2026**	**23:59**	**ANEXO DE MODIFICACION**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO INGENIERIA I	**NIT: 901.639.134-0**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV CARRERA 15 NRO. 100 - 69 OF 508	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6017550985

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	**NIT: 899.999.061-9**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 52 NRO. 13 - 64	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3581600

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO DE OBRA No. 1070-2022, CUYO OBJETO ES: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT.
NOTA: - LA VIGENCIA PARA EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE TRES (3) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCION DE LA OBRA.
- LA VIGENCIA PARA EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO ES DE (2) DOS AÑOS CONTADOS DESDE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA ETAPA 1

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO A SOLICITUD DEL ASEGURADO Y SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 DEL CONTRATO DE OBRA No. 1070-2022, SE ACLARA LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADAS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *(7,083,061.00)	$ ****(20,000.00)	$ *(1,349,581.00)	$ *******(8,452,643.00)	$ **(2,550,000,000.00)	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LUZ DARY BECERRA VANEGAS	122783	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101395979

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101395979	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
01	12	2022	10	10	2022	00:00	10	05	2026	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO INGENIERIA I		**NIT: 901.639.134-0**
DIRECCIÓN: AV CARRERA 15 NRO. 100 - 69 OF 508	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	6017550985

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT		**NIT: 899.999.061-9**
DIRECCIÓN: CL 52 NRO. 13 - 64	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3581600

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
INGENIERIA ESPECIALIZADA GESTION AMBIENTAL SEGURIDAD INDUSTR	900496836-3	50.00
IC INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	901291812-1	50.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101395979

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

LEIDYDIAZ

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101395979, anexo 1, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 01 días del mes de DICIEMBRE de 2022

21-44-101395979

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**ANTIGUO COUNTRY**	**21**	**21-44-101395979**	**2**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
01	**12**	**2022**	**16**	**11**	**2022**	**00:00**	**16**	**06**	**2026**	**23:59**	**ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO INGENIERIA I	**NIT: 901.639.134-0**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV CARRERA 15 NRO. 100 - 69 OF 508	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6017550985

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	**NIT: 899.999.061-9**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 52 NRO. 13 - 64	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3581600

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO DE OBRA No. 1070-2022, CUYO OBJETO ES: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT.
NOTA: - LA VIGENCIA PARA EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE TRES (3) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCION DE LA OBRA.
- LA VIGENCIA PARA EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO ES DE (2) DOS AÑOS CONTADOS DESDE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA ETAPA 1

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**16/11/2022**	**17/12/2023**	**$510,000,000.00**	
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	**16/11/2022**	**17/10/2023**	**$765,000,000.00**	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**16/11/2022**	**16/06/2026**	**$255,000,000.00**	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	**16/06/2023**	**16/06/2026**	**$510,000,000.00**	
CALIDAD DEL SERVICIO	**16/02/2023**	**16/02/2025**	**$510,000,000.00**	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO A SOLICITUD DEL ASEGURADO Y SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 DEL CONTRATO DE OBRA No. 1070-2022, SE ACLARA LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADAS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***7,083,061.00	$ ******20,000.00	$ ***1,349,581.00	$ *********8,452,643.00	$ ****2,550,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
LUZ DARY BECERRA VANEGAS	122783	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101395979

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101395979	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
01	12	2022	16	11	2022	00:00	16	06	2026	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO INGENIERIA I		**NIT: 901.639.134-0**
DIRECCIÓN: AV CARRERA 15 NRO. 100 - 69 OF 508	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	6017550985

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT		**NIT: 899.999.061-9**
DIRECCIÓN: CL 52 NRO. 13 - 64	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3581600

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
INGENIERIA ESPECIALIZADA GESTION AMBIENTAL SEGURIDAD INDUSTR	900496836-3	50.00
IC INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	901291812-1	50.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101395979

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

LEIDYDIAZ

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101395979, anexo 2, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 01 días del mes de DICIEMBRE de 2022

21-44-101395979

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**ANTIGUO COUNTRY**	**21**	**21-44-101395979**	**3**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
24	**03**	**2023**	**16**	**11**	**2022**	**00:00**	**16**	**06**	**2026**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CONSORCIO INGENIERIA I	**NIT: 901.639.134-0**	AV CARRERA 15 NRO. 100 - 69 OF 508	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6017550985

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	**NIT: 899.999.061-9**	CL 52 NRO. 13 - 64	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3581600

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO DE OBRA No. 1070-2022, CUYO OBJETO ES: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT.
NOTA: - LA VIGENCIA PARA EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE TRES (3) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCION DE LA OBRA.
- LA VIGENCIA PARA EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO ES DE (2) DOS AÑOS CONTADOS DESDE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA ETAPA 1

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**16/11/2022**	**30/01/2024**	**$510,000,000.00**	**$510,000,000.00**
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	**16/11/2022**	**17/10/2023**	**$765,000,000.00**	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**16/11/2022**	**16/06/2026**	**$255,000,000.00**	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	**16/06/2023**	**16/06/2026**	**$510,000,000.00**	
CALIDAD DEL SERVICIO	**16/02/2023**	**16/02/2025**	**$510,000,000.00**	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO A SOLICITUD DEL ASEGURADO Y SEGUN SUSPENSION NO. 1 CONTRATO DE OBRA NO. 1070 DE 2022, MEDIANTE LA CUAL ACUERDAN SUSPENDER EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA NO. 1070 - 2022, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL DIA EL VEINTIUN (21) DE MARZO DE 2023 Y EL DIA CUATRO (04) DE MAYO DE 2023, INCLUSIVE, CON FECHA DE REINICIO EL DIA CINCO (5) DE MAYO DE 2023, POR LO ANTERIOR SE ACLARA LA VIGENCIA PARA EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE LA PRESENTE POLIZA.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADAS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ****2,550,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
LUZ DARY BECERRA VANEGAS	122783	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101395979

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101395979	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
24	03	2023	16	11	2022	00:00	16	06	2026	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO INGENIERIA I		**NIT: 901.639.134-0**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	AV CARRERA 15 NRO. 100 - 69 OF 508		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		6017550985

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT		**NIT: 899.999.061-9**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	CL 52 NRO. 13 - 64		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		3581600

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
INGENIERIA ESPECIALIZADA GESTION AMBIENTAL SEGURIDAD INDUSTR	900496836-3	50.00
IC INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	901291812-1	50.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101395979

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101395979, anexo 3, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 24 días del mes de MARZO de 2023

21-44-101395979

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**ANTIGUO COUNTRY**	**21**	**21-44-101395979**	**4**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
24	**03**	**2023**	**16**	**11**	**2022**	**00:00**	**30**	**07**	**2026**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO INGENIERIA I	**NIT: 901.639.134-0**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV CARRERA 15 NRO. 100 - 69 OF 508	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6017550985

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	**NIT: 899.999.061-9**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 52 NRO. 13 - 64	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3581600

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO DE OBRA No. 1070-2022, CUYO OBJETO ES: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT.
NOTA: - LA VIGENCIA PARA EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE TRES (3) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCION DE LA OBRA.
- LA VIGENCIA PARA EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO ES DE (2) DOS AÑOS CONTADOS DESDE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA ETAPA 1

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**16/11/2022**	**30/01/2024**	**$510,000,000.00**	**$510,000,000.00**
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	**16/11/2022**	**30/11/2023**	**$765,000,000.00**	**$765,000,000.00**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**16/11/2022**	**30/07/2026**	**$255,000,000.00**	**$255,000,000.00**
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	**16/06/2023**	**16/06/2026**	**$510,000,000.00**	
CALIDAD DEL SERVICIO	**16/02/2023**	**16/02/2025**	**$510,000,000.00**	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO A SOLICITUD DEL ASEGURADO Y SEGUN SUSPENSION NO. 1 CONTRATO DE OBRA NO. 1070 DE 2022, MEDIANTE LA CUAL ACUERDAN SUSPENDER EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA NO. 1070 - 2022, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL DIA EL VEINTIUN (21) DE MARZO DE 2023 Y EL DIA CUATRO (04) DE MAYO DE 2023, INCLUSIVE, CON FECHA DE REINICIO EL DIA CINCO (5) DE MAYO DE 2023, POR LO ANTERIOR SE ACLARA LA VIGENCIA PARA LOS AMPAROS DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DE LA PRESENTE POLIZA.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADAS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****184,438.00	$ *******8,000.00	$ ******36,563.00	$ **********229,001.00	$ ****2,550,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LUZ DARY BECERRA VANEGAS	122783	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101395979

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101395979	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
24	03	2023	16	11	2022	00:00	30	07	2026	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO INGENIERIA I		**NIT: 901.639.134-0**
DIRECCIÓN: AV CARRERA 15 NRO. 100 - 69 OF 508	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	6017550985

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT		**NIT: 899.999.061-9**
DIRECCIÓN: CL 52 NRO. 13 - 64	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3581600

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
INGENIERIA ESPECIALIZADA GESTION AMBIENTAL SEGURIDAD INDUSTR	900496836-3	50.00
IC INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	901291812-1	50.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101395979

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101395979, anexo 4, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 24 días del mes de MARZO de 2023

21-44-101395979

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**ANTIGUO COUNTRY**	**21**	**21-44-101395979**	**5**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
31	**03**	**2023**	**16**	**11**	**2022**	**00:00**	**30**	**07**	**2026**	**23:59**	**ANEXO NO CAUSA PRIMA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO INGENIERIA I	**NIT: 901.639.134-0**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV CARRERA 15 NRO. 100 - 69 OF 508	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6017550985

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	**NIT: 899.999.061-9**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 52 NRO. 13 - 64	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3581600

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO DE OBRA No. 1070-2022, CUYO OBJETO ES: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT.
NOTA: - LA VIGENCIA PARA EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE TRES (3) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCION DE LA OBRA.
- LA VIGENCIA PARA EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO ES DE (2) DOS AÑOS CONTADOS DESDE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA ETAPA 1

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**16/11/2022**	**30/01/2024**	**$510,000,000.00**	**$510,000,000.00**
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	**16/11/2022**	**30/11/2023**	**$765,000,000.00**	**$765,000,000.00**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**16/11/2022**	**30/07/2026**	**$255,000,000.00**	**$255,000,000.00**
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	**16/06/2023**	**16/06/2026**	**$510,000,000.00**	
CALIDAD DEL SERVICIO	**16/02/2023**	**16/02/2025**	**$510,000,000.00**	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO A SOLICITUD DEL ASEGURADO SE INCLUYE EL MODIFICACION No. 1, DEL CONTRATO DE OBRA No. 1070 DE 2022 AMPARADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADAS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ****2,550,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
LUZ DARY BECERRA VANEGAS	122783	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101395979

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101395979	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
31	03	2023	16	11	2022	00:00	30	07	2026	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO INGENIERIA I		**NIT: 901.639.134-0**
DIRECCIÓN: AV CARRERA 15 NRO. 100 - 69 OF 508	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	6017550985

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT		**NIT: 899.999.061-9**
DIRECCIÓN: CL 52 NRO. 13 - 64	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3581600

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
INGENIERIA ESPECIALIZADA GESTION AMBIENTAL SEGURIDAD INDUSTR	900496836-3	50.00
IC INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	901291812-1	50.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101395979

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101395979, anexo 5, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 31 días del mes de MARZO de 2023

21-44-101395979

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101395979	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
25	05	2023	16	11	2022	00:00	30	07	2026	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CONSORCIO INGENIERIA I	NIT: 901.639.134-0	AV CARRERA 15 NRO. 100 - 69 OF 508	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6017550985

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	NIT: 899.999.061-9	CL 52 NRO. 13 - 64	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3581600

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO DE OBRA No. 1070-2022, CUYO OBJETO ES: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT.
NOTA: - LA VIGENCIA PARA EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE TRES (3) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCION DE LA OBRA.
- LA VIGENCIA PARA EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO ES DE (2) DOS AÑOS CONTADOS DESDE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA ETAPA 1

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16/11/2022	30/01/2024	$510,000,000.00	$510,000,000.00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	16/11/2022	30/11/2023	$765,000,000.00	$765,000,000.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	16/11/2022	30/07/2026	$255,000,000.00	$255,000,000.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	16/06/2023	16/06/2026	$510,000,000.00	
CALIDAD DEL SERVICIO	16/02/2023	16/02/2025	$510,000,000.00	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO LA COMPAÑIA SE DA POR ENTERADA DEL ACTA DE REUNION DE FECHA 5/05/2023 DONDE SE RATIFICACA EL REINICIO DEL CONTRATO A PARTIR DEL DIA 5/05/2023 QUEDANDO COMO NUEVO PLAZO DE EJECUCION HASTA EL DIA 30/07/2023

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES DE LA PRESENTE POLIZA NO SE MODIFICAN

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ****2,550,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LUZ DARY BECERRA VANEGAS	122783	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101395979

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101395979	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
25	05	2023	16	11	2022	00:00	30	07	2026	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO INGENIERIA I		**NIT: 901.639.134-0**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	AV CARRERA 15 NRO. 100 - 69 OF 508		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		6017550985

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT		**NIT: 899.999.061-9**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	CL 52 NRO. 13 - 64		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		3581600

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
INGENIERIA ESPECIALIZADA GESTION AMBIENTAL SEGURIDAD INDUSTR	900496836-3	50.00
IC INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	901291812-1	50.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

21-44-101395979

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

EDITHLOPEZ

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**ANTIGUO COUNTRY**	**21**	**21-44-101395979**	**7**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
30	**06**	**2023**	**16**	**11**	**2022**	**00:00**	**30**	**07**	**2026**	**23:59**	**ANEXO NO CAUSA PRIMA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO INGENIERIA I	**NIT: 901.639.134-0**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV CARRERA 15 NRO. 100 - 69 OF 508	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6017550985

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	**NIT: 899.999.061-9**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 52 NRO. 13 - 64	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3581600

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO DE OBRA No. 1070-2022, CUYO OBJETO ES: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT.
NOTA: - LA VIGENCIA PARA EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE TRES (3) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCION DE LA OBRA.
- LA VIGENCIA PARA EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO ES DE (2) DOS AÑOS CONTADOS DESDE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA ETAPA 1

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**16/11/2022**	**30/01/2024**	**$510,000,000.00**	**$510,000,000.00**
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	**16/11/2022**	**30/11/2023**	**$765,000,000.00**	**$765,000,000.00**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**16/11/2022**	**30/07/2026**	**$255,000,000.00**	**$255,000,000.00**
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	**16/06/2023**	**16/06/2026**	**$510,000,000.00**	
CALIDAD DEL SERVICIO	**16/02/2023**	**16/02/2025**	**$510,000,000.00**	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO A SOLICITUD DEL ASEGURADO Y SEGUN MODIFICACION NO. 2. CONTRATO DE OBRA NO. 1070 DE 2022 , INCLUYENDO LOS NUEVOS TERRITORIOS O PROYECTOS SEÑALADOS A CONTINUACION: 1. EL PROYECTO DE LA MANZANA DEL CUIDADO DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL (ANEXO 9). 2. EL TERRITORIO AAU-T22 LOS OLIVOS DE LA LOCALIDAD DE USAQUEN (ANEXO 10).
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADAS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ****2,550,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
LUZ DARY BECERRA VANEGAS	122783	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101395979

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101395979	7

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
30	06	2023	16	11	2022	00:00	30	07	2026	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO INGENIERIA I		**NIT: 901.639.134-0**
DIRECCIÓN: AV CARRERA 15 NRO. 100 - 69 OF 508	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	6017550985

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT		**NIT: 899.999.061-9**
DIRECCIÓN: CL 52 NRO. 13 - 64	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3581600

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
INGENIERIA ESPECIALIZADA GESTION AMBIENTAL SEGURIDAD INDUSTR	900496836-3	50.00
IC INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	901291812-1	50.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101395979

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

LEIDYDIAZ

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**ANTIGUO COUNTRY**	**21**	**21-44-101395979**	**8**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
01	**08**	**2023**	**16**	**11**	**2022**	**00:00**	**30**	**07**	**2026**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO INGENIERIA I	**NIT: 901.639.134-0**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV CARRERA 15 NRO. 100 - 69 OF 508	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6017550985

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN
BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	**NIT: 899.999.061-9**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 52 NRO. 13 - 64	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3581600

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO DE OBRA No. 1070-2022, CUYO OBJETO ES: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT.
NOTA: - LA VIGENCIA PARA EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE TRES (3) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCION DE LA OBRA.
- LA VIGENCIA PARA EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO ES DE (2) DOS AÑOS CONTADOS DESDE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA ETAPA 1

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**16/11/2022**	**01/03/2024**	**$510,000,000.00**	**$510,000,000.00**
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	**16/11/2022**	**30/11/2023**	**$765,000,000.00**	**$765,000,000.00**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**16/11/2022**	**30/07/2026**	**$255,000,000.00**	**$255,000,000.00**
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	**16/06/2023**	**16/06/2026**	**$510,000,000.00**	
CALIDAD DEL SERVICIO	**16/02/2023**	**16/02/2025**	**$510,000,000.00**	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO A SOLICITUD DEL ASEGURADO Y SEGUN SUSPENSION No.2 AL CONTRATO DE OBRA No. 1070 DE 2022 , SE SUSPENDER EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA NO. 1070 DE 2022, A PARTIR DEL 26 DE JULIO DE 2023 Y HASTA EL 24 DE AGOSTO DE 2023 INCLUSIVE, CON FECHA DE REINICIO EL 25 DE AGOSTO DE 2023, O HASTA QUE LA CAUSA O SITUACION QUE DIO ORIGEN A ESTA SUSPENSION SEA SUPERADA, SIN NECESIDAD DE ACTA QUE LO DECLARE. POR LO ANTERIOR SE AMPLIA LA VIGENCIA PARA EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE LA PRESENTE POLIZA.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADAS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ****2,550,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
LUZ DARY BECERRA VANEGAS	122783	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

21-44-101395979

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101395979	8

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
01	08	2023	16	11	2022	00:00	30	07	2026	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO INGENIERIA I		**NIT: 901.639.134-0**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	AV CARRERA 15 NRO. 100 - 69 OF 508		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		6017550985

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT		**NIT: 899.999.061-9**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	CL 52 NRO. 13 - 64		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		3581600

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
INGENIERIA ESPECIALIZADA GESTION AMBIENTAL SEGURIDAD INDUSTR	900496836-3	50.00
IC INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	901291812-1	50.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

21-44-101395979

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

LEIDYDIAZ

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101395979, anexo 8, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 01 días del mes de AGOSTO de 2023

21-44-101395979

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**ANTIGUO COUNTRY**	**21**	**21-44-101395979**	**9**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
01	**08**	**2023**	**16**	**11**	**2022**	**00:00**	**30**	**08**	**2026**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO INGENIERIA I	**NIT: 901.639.134-0**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV CARRERA 15 NRO. 100 - 69 OF 508	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6017550985

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	**NIT: 899.999.061-9**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 52 NRO. 13 - 64	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3581600

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO DE OBRA No. 1070-2022, CUYO OBJETO ES: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT.
NOTA: - LA VIGENCIA PARA EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE TRES (3) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCION DE LA OBRA.
- LA VIGENCIA PARA EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO ES DE (2) DOS AÑOS CONTADOS DESDE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA ETAPA 1

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**16/11/2022**	**01/03/2024**	**$510,000,000.00**	**$510,000,000.00**
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	**16/11/2022**	**30/12/2023**	**$765,000,000.00**	**$765,000,000.00**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**16/11/2022**	**30/08/2026**	**$255,000,000.00**	**$255,000,000.00**
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	**16/06/2023**	**16/06/2026**	**$510,000,000.00**	
CALIDAD DEL SERVICIO	**16/02/2023**	**16/02/2025**	**$510,000,000.00**	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO A SOLICITUD DEL ASEGURADO Y SEGUN SUSPENSION No.2 AL CONTRATO DE OBRA No. 1070 DE 2022 , SE SUSPENDER EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA NO. 1070 DE 2022, A PARTIR DEL 26 DE JULIO DE 2023 Y HASTA EL 24 DE AGOSTO DE 2023 INCLUSIVE, CON FECHA DE REINICIO EL 25 DE AGOSTO DE 2023, O HASTA QUE LA CAUSA O SITUACION QUE DIO ORIGEN A ESTA SUSPENSION SEA SUPERADA, SIN NECESIDAD DE ACTA QUE LO DECLARE. POR LO ANTERIOR SE AMPLIA LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADAS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****126,801.00	$ *******8,000.00	$ ******25,612.00	$ **********160,413.00	$ ****2,550,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LUZ DARY BECERRA VANEGAS	122783	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101395979

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101395979	9

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
01	08	2023	16	11	2022	00:00	30	08	2026	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO INGENIERIA I		**NIT: 901.639.134-0**
DIRECCIÓN: AV CARRERA 15 NRO. 100 - 69 OF 508	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	6017550985

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT		**NIT: 899.999.061-9**
DIRECCIÓN: CL 52 NRO. 13 - 64	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3581600

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
INGENIERIA ESPECIALIZADA GESTION AMBIENTAL SEGURIDAD INDUSTR	900496836-3	50.00
IC INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	901291812-1	50.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

21-44-101395979

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

LEIDYDIAZ

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101395979, anexo 9, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 01 días del mes de AGOSTO de 2023

21-44-101395979

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**ANTIGUO COUNTRY**	**21**	**21-44-101395979**	**10**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
30	**08**	**2023**	**16**	**11**	**2022**	**00:00**	**29**	**09**	**2026**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO INGENIERIA I	**NIT: 901.639.134-0**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
AV CARRERA 15 NRO. 100 - 69 OF 508	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6017550985

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	**NIT: 899.999.061-9**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 52 NRO. 13 - 64	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3581600

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO DE OBRA No. 1070-2022, CUYO OBJETO ES: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT.
NOTA: - LA VIGENCIA PARA EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE TRES (3) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCION DE LA OBRA.
- LA VIGENCIA PARA EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO ES DE (2) DOS AÑOS CONTADOS DESDE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA ETAPA 1

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**16/11/2022**	**29/03/2024**	**$510,000,000.00**	**$510,000,000.00**
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	**16/11/2022**	**29/02/2024**	**$765,000,000.00**	**$765,000,000.00**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**16/11/2022**	**29/09/2026**	**$255,000,000.00**	**$255,000,000.00**
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	**SI AMPARA 3 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS ***		**$510,000,000.00**	**$510,000,000.00**
CALIDAD DEL SERVICIO	**16/02/2023**	**16/02/2025**	**$510,000,000.00**	

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y SEGUN AMPLIACION N. 1 A LA SUSPENSION N. 02 AL CONTRATO DE OBRA N. 1070-2022, SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LAS GARANTIAS QUEDANDO COMO SE DESCRIBE EN LA SECCION DE AMPAROS
LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****281,897.00	$ *******8,000.00	$ ******55,080.00	$ **********344,977.00	$ ****2,550,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
LUZ DARY BECERRA VANEGAS	122783	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101395979

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA VIGILADO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101395979	10

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
30	08	2023	16	11	2022	00:00	29	09	2026	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO INGENIERIA I		**NIT: 901.639.134-0**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	AV CARRERA 15 NRO. 100 - 69 OF 508		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		6017550985

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT		**NIT: 899.999.061-9**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	CL 52 NRO. 13 - 64		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		3581600

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
INGENIERIA ESPECIALIZADA GESTION AMBIENTAL SEGURIDAD INDUSTR	900496836-3	50.00
IC INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	901291812-1	50.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

21-44-101395979

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**ANTIGUO COUNTRY**	**21**	**21-44-101395979**	**11**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
02	**10**	**2023**	**16**	**11**	**2022**	**00:00**	**29**	**09**	**2026**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO INGENIERIA I	**NIT: 901.639.134-0**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV CARRERA 15 NRO. 100 - 69 OF 508	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6017550985

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	**NIT: 899.999.061-9**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 52 NRO. 13 - 64	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3581600

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO DE OBRA No. 1070-2022, CUYO OBJETO ES: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT.
NOTA: - LA VIGENCIA PARA EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE TRES (3) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCION DE LA OBRA.
- LA VIGENCIA PARA EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO ES DE (2) DOS AÑOS CONTADOS DESDE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA ETAPA 1

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**16/11/2022**	**29/04/2024**	**$510,000,000.00**	**$510,000,000.00**
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	**16/11/2022**	**29/02/2024**	**$765,000,000.00**	**$765,000,000.00**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**16/11/2022**	**29/09/2026**	**$255,000,000.00**	**$255,000,000.00**
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	**SI AMPARA 3 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS ***		**$510,000,000.00**	**$510,000,000.00**
CALIDAD DEL SERVICIO	**16/02/2023**	**16/02/2025**	**$510,000,000.00**	

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO A SOLICITUD DEL ASEGURADO Y SEGUN SEGUN AMPLIACION A LA SUSPENSION N. 02 DEL CONTRATO DE OBRA N. 1070-2022, SE AMPLIA LA VIGENCIA PARA EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE LA PRESENTE POLIZA.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADAS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ****2,550,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
LUZ DARY BECERRA VANEGAS	122783	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101395979

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101395979	11

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
02	10	2023	16	11	2022	00:00	29	09	2026	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO INGENIERIA I		**NIT: 901.639.134-0**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	AV CARRERA 15 NRO. 100 - 69 OF 508		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		6017550985

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT		**NIT: 899.999.061-9**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	CL 52 NRO. 13 - 64		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		3581600

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
INGENIERIA ESPECIALIZADA GESTION AMBIENTAL SEGURIDAD INDUSTR	900496836-3	50.00
IC INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	901291812-1	50.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

21-44-101395979

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

LEIDYDIAZ

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101395979, anexo 11, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 02 días del mes de OCTUBRE de 2023

21-44-101395979

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**ANTIGUO COUNTRY**	**21**	**21-44-101395979**	**12**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
03	**10**	**2023**	**16**	**11**	**2022**	**00:00**	**29**	**10**	**2026**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CONSORCIO INGENIERIA I	**NIT: 901.639.134-0**	AV CARRERA 15 NRO. 100 - 69 OF 508	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6017550985

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	**NIT: 899.999.061-9**	CL 52 NRO. 13 - 64	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3581600

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO DE OBRA No. 1070-2022, CUYO OBJETO ES: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT.
NOTA: - LA VIGENCIA PARA EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE TRES (3) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCION DE LA OBRA.
- LA VIGENCIA PARA EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO ES DE (2) DOS AÑOS CONTADOS DESDE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA ETAPA 1

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**16/11/2022**	**29/04/2024**	**$510,000,000.00**	**$510,000,000.00**
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	**16/11/2022**	**29/03/2024**	**$765,000,000.00**	**$765,000,000.00**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**16/11/2022**	**29/10/2026**	**$255,000,000.00**	**$255,000,000.00**
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	**SI AMPARA 3 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS ***		**$510,000,000.00**	**$510,000,000.00**
CALIDAD DEL SERVICIO	**16/02/2023**	**16/02/2025**	**$510,000,000.00**	

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO
POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO A SOLICITUD DEL ASEGURADO Y SEGUN SEGUN AMPLIACION A LA SUSPENSION N. 02 DEL CONTRATO DE OBRA N. 1070-2022, SE AMPLIA LA VIGENCIA PARA LOS AMPAROS DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DE LA PRESENTE POLIZA.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADAS CONTINUAN VIGENTES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****122,609.00	$ *******8,000.00	$ ******24,815.00	$ **********155,425.00	$ ****2,550,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LUZ DARY BECERRA VANEGAS	122783	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

21-44-101395979

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101395979	12

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
03	10	2023	16	11	2022	00:00	29	10	2026	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO INGENIERIA I		**NIT: 901.639.134-0**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	AV CARRERA 15 NRO. 100 - 69 OF 508		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		6017550985

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT		**NIT: 899.999.061-9**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	CL 52 NRO. 13 - 64		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		3581600

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
INGENIERIA ESPECIALIZADA GESTION AMBIENTAL SEGURIDAD INDUSTR	900496836-3	50.00
IC INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	901291812-1	50.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

21-44-101395979

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

LEIDYDIAZ

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101395979, anexo 12, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 03 días del mes de OCTUBRE de 2023



21-44-101395979

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**ANTIGUO COUNTRY**	**21**	**21-44-101395979**	**13**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	**10**	**2023**	**16**	**11**	**2022**	**00:00**	**29**	**10**	**2026**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO INGENIERIA I	**NIT: 901.639.134-0**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV CARRERA 15 NRO. 100 - 69 OF 508	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6017550985

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	**NIT: 899.999.061-9**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 52 NRO. 13 - 64	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3581600

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO DE OBRA No. 1070-2022, CUYO OBJETO ES: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT.
NOTA: - LA VIGENCIA PARA EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE TRES (3) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCION DE LA OBRA.
- LA VIGENCIA PARA EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO ES DE (2) DOS AÑOS CONTADOS DESDE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA ETAPA 1

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**16/11/2022**	**19/05/2024**	**$510,000,000.00**	**$510,000,000.00**
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	**16/11/2022**	**29/03/2024**	**$765,000,000.00**	**$765,000,000.00**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**16/11/2022**	**29/10/2026**	**$255,000,000.00**	**$255,000,000.00**
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	**SI AMPARA 3 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS ***		**$510,000,000.00**	**$510,000,000.00**
CALIDAD DEL SERVICIO	**16/02/2023**	**16/02/2025**	**$510,000,000.00**	

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO
POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO A SOLICITUD DEL ASEGURADO Y SEGUN SEGUN ACTA DE AMPLIACION No. 3 SUSPENSION No. 2 DEL CONTRATO DE OBRA N. 1070-2022, SE AMPLIA LA VIGENCIA PARA EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE LA PRESENTE POLIZA.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADAS CONTINUAN VIGENTES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ****2,550,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
LUZ DARY BECERRA VANEGAS	122783	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101395979

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**ANTIGUO COUNTRY**	**21**	**21-44-101395979**	**13**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	**10**	**2023**	**16**	**11**	**2022**	**00:00**	**29**	**10**	**2026**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO INGENIERIA I	**NIT: 901.639.134-0**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
AV CARRERA 15 NRO. 100 - 69 OF 508	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6017550985

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	**NIT: 899.999.061-9**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 52 NRO. 13 - 64	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3581600

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse

VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla · Super INTER · SURTIMAX · Movil Red · Bancolombia Corresponsal Bancario · éxito · Gana Gana · CODENSA

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ****2,550,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
LUZ DARY BECERRA VANEGAS	122783	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101395979	13

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	10	2023	16	11	2022	00:00	29	10	2026	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO INGENIERIA I		**NIT: 901.639.134-0**
DIRECCIÓN: AV CARRERA 15 NRO. 100 - 69 OF 508	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	6017550985

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT		**NIT: 899.999.061-9**
DIRECCIÓN: CL 52 NRO. 13 - 64	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3581600

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
INGENIERIA ESPECIALIZADA GESTION AMBIENTAL SEGURIDAD INDUSTR	900496836-3	50.00
IC INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	901291812-1	50.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

21-44-101395979

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101395979, anexo 13, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 27 días del mes de OCTUBRE de 2023

21-44-101395979

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**ANTIGUO COUNTRY**	**21**	**21-44-101395979**	**14**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	**10**	**2023**	**16**	**11**	**2022**	**00:00**	**19**	**11**	**2026**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CONSORCIO INGENIERIA I	**NIT: 901.639.134-0**	AV CARRERA 15 NRO. 100 - 69 OF 508	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6017550985

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	**NIT: 899.999.061-9**	CL 52 NRO. 13 - 64	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3581600

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO DE OBRA No. 1070-2022, CUYO OBJETO ES: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT.
NOTA: - LA VIGENCIA PARA EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE TRES (3) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCION DE LA OBRA.
- LA VIGENCIA PARA EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO ES DE (2) DOS AÑOS CONTADOS DESDE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA ETAPA 1

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**16/11/2022**	**19/05/2024**	**$510,000,000.00**	**$510,000,000.00**
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	**16/11/2022**	**19/04/2024**	**$765,000,000.00**	**$765,000,000.00**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**16/11/2022**	**19/11/2026**	**$255,000,000.00**	**$255,000,000.00**
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	**SI AMPARA 3 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS ***		**$510,000,000.00**	**$510,000,000.00**
CALIDAD DEL SERVICIO	**16/02/2023**	**16/02/2025**	**$510,000,000.00**	

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO
POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO A SOLICITUD DEL ASEGURADO Y SEGUN SEGUN ACTA DE AMPLIACION No. 3 SUSPENSION No. 2 DEL CONTRATO DE OBRA N. 1070-2022, SE AMPLIA LA VIGENCIA PARA LOS AMPAROS DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALE DE LA PRESENTE POLIZA.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADAS CONTINUAN VIGENTES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******88,027.00	$ *******8,000.00	$ ******18,245.00	$ **********114,272.00	$ ****2,550,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
LUZ DARY BECERRA VANEGAS	122783	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101395979

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101395979	14

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	10	2023	16	11	2022	00:00	19	11	2026	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO INGENIERIA I		**NIT: 901.639.134-0**
DIRECCIÓN: AV CARRERA 15 NRO. 100 - 69 OF 508	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	6017550985

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT		**NIT: 899.999.061-9**
DIRECCIÓN: CL 52 NRO. 13 - 64	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3581600

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
INGENIERIA ESPECIALIZADA GESTION AMBIENTAL SEGURIDAD INDUSTR	900496836-3	50.00
IC INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	901291812-1	50.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

21-44-101395979

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101395979, anexo 14, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 27 días del mes de OCTUBRE de 2023

21-44-101395979

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**ANTIGUO COUNTRY**	**21**	**21-44-101395979**	15

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
28	**11**	**2023**	**16**	**11**	**2022**	**00:00**	**03**	**04**	**2027**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO INGENIERIA I	**NIT: 901.639.134-0**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV CARRERA 15 NRO. 100 - 69 OF 508	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6017550985

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	**NIT: 899.999.061-9**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 52 NRO. 13 - 64	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3581600

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO DE OBRA No. 1070-2022, CUYO OBJETO ES: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT.
NOTA: - LA VIGENCIA PARA EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE TRES (3) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCION DE LA OBRA.
- LA VIGENCIA PARA EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO ES DE (2) DOS AÑOS CONTADOS DESDE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA ETAPA 1

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16/11/2022	03/10/2024	$510,000,000.00	$510,000,000.00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	16/11/2022	03/08/2024	$765,000,000.00	$765,000,000.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	16/11/2022	03/04/2027	$255,000,000.00	$255,000,000.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	**SI AMPARA 3 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS ***		$510,000,000.00	$510,000,000.00
CALIDAD DEL SERVICIO	16/02/2023	16/02/2025	$510,000,000.00	

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO DE ACUERDO CON PRORROGA No. 1 AL CONTRATO DE OBRA No. 1070-202, SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LAS GARANTIAS DE LA PRESENTE POLIZA.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****761,856.00	$ *******8,000.00	$ *****146,272.00	$ **********916,128.00	$ ****2,550,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LUZ DARY BECERRA VANEGAS	122783	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101395979

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101395979	15

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
28	11	2023	16	11	2022	00:00	03	04	2027	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO INGENIERIA I		**NIT: 901.639.134-0**
DIRECCIÓN: AV CARRERA 15 NRO. 100 - 69 OF 508	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	6017550985

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT		**NIT: 899.999.061-9**
DIRECCIÓN: CL 52 NRO. 13 - 64	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3581600

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
INGENIERIA ESPECIALIZADA GESTION AMBIENTAL SEGURIDAD INDUSTR	900496836-3	50.00
IC INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	901291812-1	50.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

21-44-101395979

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101395979, anexo 15, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 28 días del mes de NOVIEMBRE de 2023



21-44-101395979

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**ANTIGUO COUNTRY**	**21**	**21-44-101395979**	**16**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
20	**12**	**2023**	**16**	**11**	**2022**	**00:00**	**03**	**04**	**2027**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO INGENIERIA I	**NIT: 901.639.134-0**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV CARRERA 15 NRO. 100 - 69 OF 508	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6017550985

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	**NIT: 899.999.061-9**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 52 NRO. 13 - 64	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3581600

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO DE OBRA No. 1070-2022, CUYO OBJETO ES: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT.
NOTA: - LA VIGENCIA PARA EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE TRES (3) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCION DE LA OBRA.
- LA VIGENCIA PARA EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO ES DE (2) DOS AÑOS CONTADOS DESDE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA ETAPA 1

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**16/11/2022**	**03/11/2024**	**$510,000,000.00**	**$510,000,000.00**
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	**16/11/2022**	**03/08/2024**	**$765,000,000.00**	**$765,000,000.00**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**16/11/2022**	**03/04/2027**	**$255,000,000.00**	**$255,000,000.00**
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	**SI AMPARA 3 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS ***		**$510,000,000.00**	**$510,000,000.00**
CALIDAD DEL SERVICIO	**16/02/2023**	**16/02/2025**	**$510,000,000.00**	

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO A SOLICITUD DEL ASEGURADO Y SEGUN ACTA DE SUSPENSION No. 3, MEDIANTE EL CUAL SE SUSPENDER EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA NO. 1070 DE 2022, A PARTIR DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2023 Y HASTA EL 11 DE ENERO DE 2024 INCLUSIVE, CON FECHA DE REINICIO EL 12 DE ENERO DE 2024, SIN NECESIDAD DE ACTA QUE LO DECLARE, SE ACLARA LA VIGENCIA PARA EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE LA PRESENTE POLIZA.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADAS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ****2,550,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
LUZ DARY BECERRA VANEGAS	122783	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

21-44-101395979

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101395979	16

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
20	12	2023	16	11	2022	00:00	03	04	2027	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO INGENIERIA I		**NIT: 901.639.134-0**
DIRECCIÓN: AV CARRERA 15 NRO. 100 - 69 OF 508	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	6017550985

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT		**NIT: 899.999.061-9**
DIRECCIÓN: CL 52 NRO. 13 - 64	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3581600

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
INGENIERIA ESPECIALIZADA GESTION AMBIENTAL SEGURIDAD INDUSTR	900496836-3	50.00
IC INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	901291812-1	50.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

21-44-101395979

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101395979, anexo 16, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 20 días del mes de DICIEMBRE de 2023

21-44-101395979

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**ANTIGUO COUNTRY**	**21**	**21-44-101395979**	**17**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
20	**12**	**2023**	**16**	**11**	**2022**	**00:00**	**03**	**05**	**2027**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO INGENIERIA I	**NIT: 901.639.134-0**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV CARRERA 15 NRO. 100 - 69 OF 508	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6017550985

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	**NIT: 899.999.061-9**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 52 NRO. 13 - 64	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3581600

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO DE OBRA No. 1070-2022, CUYO OBJETO ES: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT.
NOTA: - LA VIGENCIA PARA EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE TRES (3) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCION DE LA OBRA.
- LA VIGENCIA PARA EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO ES DE (2) DOS AÑOS CONTADOS DESDE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA ETAPA 1

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**16/11/2022**	**03/11/2024**	**$510,000,000.00**	**$510,000,000.00**
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	**16/11/2022**	**03/09/2024**	**$765,000,000.00**	**$765,000,000.00**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**16/11/2022**	**03/05/2027**	**$255,000,000.00**	**$255,000,000.00**
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	**SI AMPARA 3 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS ***		**$510,000,000.00**	**$510,000,000.00**
CALIDAD DEL SERVICIO	**16/02/2023**	**16/02/2025**	**$510,000,000.00**	

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO
POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO A SOLICITUD DEL ASEGURADO Y SEGUN ACTA DE SUSPENSION No. 3, AL
CONTRATO DE OBRA No 1070 de 2022 MEDIANTE EL CUAL SE SUSPENDER EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA NO. 1070 DE 2022, A PARTIR DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2023 Y HASTA EL 11 DE ENERO DE 2024 INCLUSIVE, CON FECHA DE REINICIO EL 12 DE ENERO DE 2024, SIN NECESIDAD DE ACTA QUE LO DECLARE, SE AMPLIA LA VIGENCIA PARA LOS AMPAROS DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DE LA PRESENTE POLIZA.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADAS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****128,897.00	$ *******8,000.00	$ ******26,010.00	$ **********162,907.00	$ ****2,550,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LUZ DARY BECERRA VANEGAS	122783	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101395979

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101395979	17

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
20	12	2023	16	11	2022	00:00	03	05	2027	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO INGENIERIA I		**NIT: 901.639.134-0**
DIRECCIÓN: AV CARRERA 15 NRO. 100 - 69 OF 508	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	6017550985

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT		**NIT: 899.999.061-9**
DIRECCIÓN: CL 52 NRO. 13 - 64	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3581600

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
INGENIERIA ESPECIALIZADA GESTION AMBIENTAL SEGURIDAD INDUSTR	900496836-3	50.00
IC INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	901291812-1	50.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

21-44-101395979

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101395979, anexo 17, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 20 días del mes de DICIEMBRE de 2023

21-44-101395979

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**ANTIGUO COUNTRY**	**21**	**21-44-101395979**	**18**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
11	**01**	**2024**	**16**	**11**	**2022**	**00:00**	**03**	**04**	**2027**	**23:59**	**ANEXO DE DISMINUCION DE LA VIGENCIA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO INGENIERIA I		**NIT: 901.639.134-0**
DIRECCIÓN: AV CARRERA 15 NRO. 100 - 69 OF 508	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	6017550985

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT		**NIT: 899.999.061-9**
DIRECCIÓN: CL 52 NRO. 13 - 64	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3581600
ADICIONAL:			

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO DE OBRA No. 1070-2022, CUYO OBJETO ES: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT.
NOTA: - LA VIGENCIA PARA EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE TRES (3) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCION DE LA OBRA.
- LA VIGENCIA PARA EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO ES DE (2) DOS AÑOS CONTADOS DESDE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA ETAPA 1

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**16/11/2022**	**03/10/2024**	**$510,000,000.00**	**$510,000,000.00**
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	**16/11/2022**	**03/08/2024**	**$765,000,000.00**	**$765,000,000.00**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**16/11/2022**	**03/04/2027**	**$255,000,000.00**	**$255,000,000.00**
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	**SI AMPARA 3 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS ***		**$510,000,000.00**	**$510,000,000.00**
CALIDAD DEL SERVICIO	**16/02/2023**	**16/02/2025**	**$510,000,000.00**	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO A SOLICITUD DEL ASEGURADO Y SEGUN REINICIO Y/O REACTIVACION DEL CONTRATO DE OBRA NO 1106 DE 2023, SE REINICA A PARTIR DE LA FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2023, EL CONTRATO AMPARADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADAS CONTINUAN VIGENTES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ****2,550,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
LUZ DARY BECERRA VANEGAS	122783	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101395979

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101395979	18

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
11	01	2024	16	11	2022	00:00	03	04	2027	23:59	ANEXO DE DISMINUCION DE LA VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO INGENIERIA I		**NIT: 901.639.134-0**
DIRECCIÓN: AV CARRERA 15 NRO. 100 - 69 OF 508	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	6017550985

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT		**NIT: 899.999.061-9**
DIRECCIÓN: CL 52 NRO. 13 - 64	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3581600

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
INGENIERIA ESPECIALIZADA GESTION AMBIENTAL SEGURIDAD INDUSTR	900496836-3	50.00
IC INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	901291812-1	50.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

21-44-101395979

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

LEIDYDIAZ

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101395979, anexo 18, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 11 días del mes de ENERO de 2024

21-44-101395979

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**ANTIGUO COUNTRY**	**21**	**21-44-101395979**	**19**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
23	**02**	**2024**	**16**	**11**	**2022**	**00:00**	**03**	**04**	**2027**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO INGENIERIA I	**NIT: 901.639.134-0**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV CARRERA 15 NRO. 100 - 69 OF 508	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6017550985

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	**NIT: 899.999.061-9**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 52 NRO. 13 - 64	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3581600

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO DE OBRA No. 1070-2022, CUYO OBJETO ES: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT.
NOTA: - LA VIGENCIA PARA EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE TRES (3) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCION DE LA OBRA.
- LA VIGENCIA PARA EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO ES DE (2) DOS AÑOS CONTADOS DESDE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA ETAPA 1

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**16/11/2022**	**19/10/2024**	**$510,000,000.00**	**$510,000,000.00**
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	**16/11/2022**	**03/08/2024**	**$765,000,000.00**	**$765,000,000.00**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**16/11/2022**	**03/04/2027**	**$255,000,000.00**	**$255,000,000.00**
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	**SI AMPARA 3 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS ***		**$510,000,000.00**	
CALIDAD DEL SERVICIO	**16/02/2023**	**16/02/2025**	**$510,000,000.00**	

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO A SOLICITUD DEL ASEGURADO Y SEGUN REINICIO Y/O REACTIVACION DEL CONTRATO DE OBRA NO 1106 DE 2023,SE TOMA COMO NUEVA FECHA DE TERMINACION DEL 19 DE ABRIL DE 2024 POR LO ANTERIOR SE AMPLIA LA VIGECIA PARA EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE LA PRESENTE POLIZA.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADAS CONTINUAN VIGENTES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ****2,550,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
LUZ DARY BECERRA VANEGAS	122783	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101395979

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101395979	19

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
23	02	2024	16	11	2022	00:00	03	04	2027	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO INGENIERIA I		**NIT: 901.639.134-0**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	AV CARRERA 15 NRO. 100 - 69 OF 508		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		6017550985

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT		**NIT: 899.999.061-9**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	CL 52 NRO. 13 - 64		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		3581600

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
INGENIERIA ESPECIALIZADA GESTION AMBIENTAL SEGURIDAD INDUSTR	900496836-3	50.00
IC INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	901291812-1	50.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101395979

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
