FORMATO				
AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	**INFORME SEMANAL DE OBRA**			
Principio de Procedencia: 4602.375	**Clave: GSAP 1.0-12-028**	**Versión:** 01	**Fecha:** 01/MARZO/2020	**Página: ___ de #**

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS **FECHA:** 20/07/2025

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORORIENTE

Semana No	**1**	**Del :**	11 DE JULIO DE 2025	AL:	20 DE JULIO DE 2025
Plazo Total		158	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		10	días		
porcentaje del tiempo transcurrido(%)		6,33%			
Nombre del Supervisor :		ALDEMAR PINZON			

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

REALIZAR LA NIVELACIÓN DE LA PISTA 16-34 DEL AEROPUERTO CAMILO DAZA DE CÚCUTA.

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

CUCUTA

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	**0,00%**	**0,00%**	**(%) Ejecutado**	**0,00%**	**0,00%**
Valor programado ($)	**$ 94.230.000,00**	**$ 0,00**	**Valor ejecutado ($)**	**$ 0,00**	**$ 0,00**
			Evaluación	**Porcentaje Adelanto**	**0,00%**
				Valor Adelanto	**$ 0,00**


DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista:	CONSORCIO PISTA 16-34	**Contratista:**	CONSORCIO INTERPISTAS 25
Contrato No:	25000602 H4 de 2025	**Contrato No:**	25000713 H3 de 2025
Valor Inicial:	$ 8.815.490.694	**Valor Inicial:**	$ 986.277.667
Valor Actualizado al modificatorio :	$ 0	**Valor Actualizado al modificatorio :**	$ 0
Valor actualizado 2:	$ 0	**Valor actualizado 2:**	$ 0
Plazo inicial:	HASTA EL 16 DE DICIEMBRE DE 2025	**Plazo inicial:**	HASTA EL 16 DE DICIEMBRE DE 2025
Plazo actualizado:	N/A	**Plazo actualizado:**	N/A
Fecha de iniciación:	11 de julio de 2025	**Fecha de iniciación:**	11 de julio de 2025
Fecha de vencimiento:	16 de diciembre de 2025	**Fecha de vencimiento:**	16 de diciembre de 2025
Modificatorio No. Prórroga No.	N/A	**Modificatorio No. Prórroga No.**	N/A
Fecha de Terminación Según Prórroga No.	N/A	**Fecha de Terminación Según Prórroga No.**	N/A
Suspensión No.	N/A	**Suspensión No.**	N/A
Periodo de Suspensión No.	N/A	**Periodo de Suspensión No.**	N/A
Levantamiento de la suspensión No.	N/A	**Levantamiento de la suspensión No.**	N/A
Nueva fecha de terminación	N/A	**Nueva fecha de terminación**	N/A
Valor total actual del contrato	$ 8.815.490.694	**Valor total actual del contrato**	$ 986.277.667

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Durante El presente corte se realizaron las siguientes actividades administrativas:
1. Suscripcion acta de inicio viernes 11 de julio del 2025
2. Reunion preliminar mediante la plataforma meet sabado 12 de julio del 2025 (Se anexa acta de la reunion)
3. Reunion presecial en las instalaciones de la Aerocivil - Edificio NEAA tercer piso Dirección de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias, Avenida el Dorado # 103-15, Bogotá,lunes 14 de julio de 2025
4.Comite tecnico presencial oficina Aerocivil Aeropuerto Camilo daza Cucuta martes 15 de julio de 2025 (Se anexa acta del comite)
5.Socializacion del contrato de obra con las Aerolíneas, Seguridad, Infraestructura, Interventoría del Contrato, ANI, AEROCIVIL, Concesión, entre otros, en la sala de juntas ATSEP de la Aerocivil Cucuta, jueves 17 de julio de 2025 (Se anexa acta de socializacion)
6. Otras actividades realizadas por la interventoria durante la semana incluyeron la verificacion de documentacion del contratista de obra, revision de hojas de vida del personal conforme a los pliegos, plan operacional, remision d eoficios, ajustes, observaciones y recomendaciones al contratista d eobra.

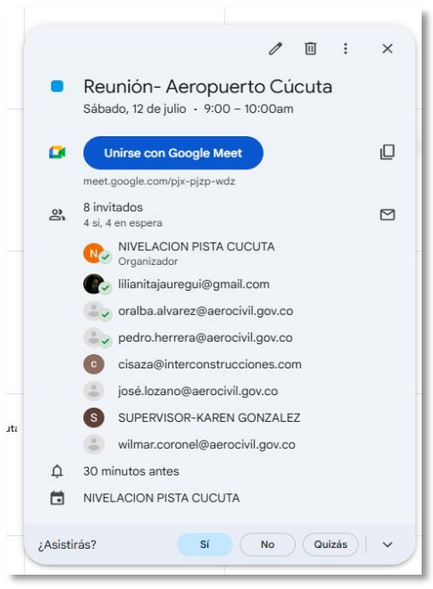





AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	**FORMATO** **INFORME SEMANAL DE OBRA**			
Principio de Procedencia: 4602.375	**Clave: GSAP 1.0-12-028**	**Versión:** 01	**Fecha:** 01/MARZO/2020	**Página:** ___ de #

ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO EN CAMPO

Durante El presente corte se realizaron las siguientes actividades de campo:

1. Recorrido de reconocimiento inicial pista 16-34 aeropuerto camilo daza viernes, 11de julio de 2025. Se logro contar con el acompañamiento del Supervisor del contrato de la entidad Aerocivil, Directora de la Aerocivil Cucuta, Gerente del Aeropuerto y la interventoria.
2.En las horas de la mañana se realiza recorrido recorrido inicial con profesionales de la eronautica civil Ingeniero de infraestructura , contratista de obra, supervision del contrato e interventoria en el cual se da indicaciones de las ventanas operacionales, ajustes de programacion de aerolineas para los meses de agosto y septiembre por fuertes vientos, horario para intervencion en las horas de la madrugada dodne de no hay operaciones aereas programas entre ottos aspectos. En las horas de la noche se realiza segundo recorrido por la pista en las horas de la nochepara identificar el sitema de red electrica y luces, con la finalidad de que el contratista tome las medidas preventivas para evitar daños en el momento del inicio de la etapa de construccion ene sta visita se conto con la presencia del contratista de obra, interventoria y por la aerocivil el supervisor del contrato., miercoles 16 de julio de 2025
3.Se realizo acompañamiento al contratista con las actividades iniciales de levantamiento topografico en la pista esta labor se desarro los dias 17,18 y 19 de julio del 2025.
4. 20 de julio de 2025 sia Domingo no laborado.














RESUMEN EJECUTIVO

En la actualidad el presente contrato s eencuentra en el avance de la etapa preliminar del item 1.1. Localización, Replanteo, Verificación Topográfica y seguimiento de obra, incluye topografía y entrega de planos seguimiento y record (Comisión Topografía, estación total, logística y demás elementos necesarios) proyectada para un mes de ejecucion el valor del item es de $ 282.690.000 y lleva 10 dias de ejecucion de mes.

Durante el presente periodo se adentantan actividades administrativas correspondientes a revision d ehojas de vidas de los profeionales y demas personal establecidos en los pliegos para la vinculacion al proyecto, tramites de documentacion para los permisos de carnetizacion para ingreso a la pista, socializacion, recorridos de inspeccion, resepcion y contestacion de las respectivas solicitudes por el contratista y acompañamiento en campo.

PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

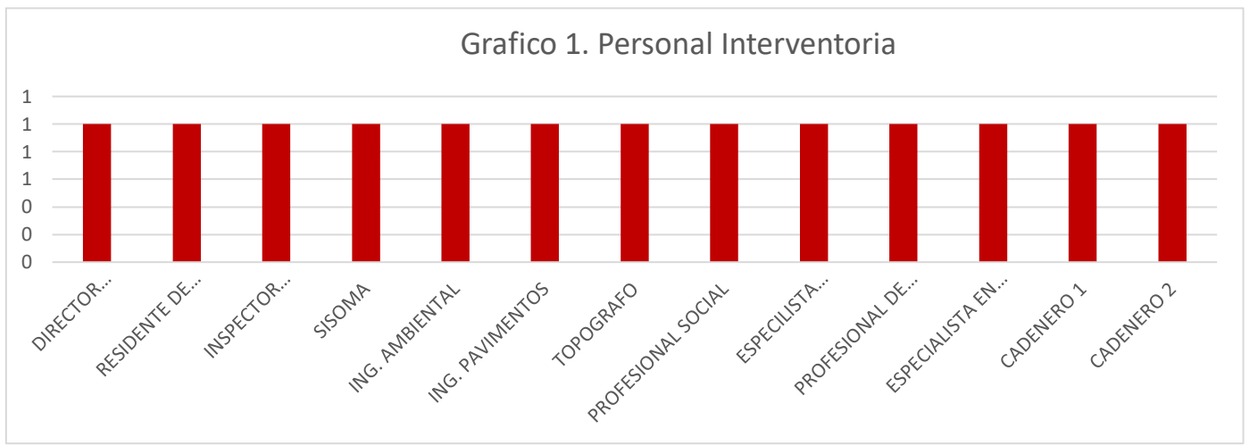

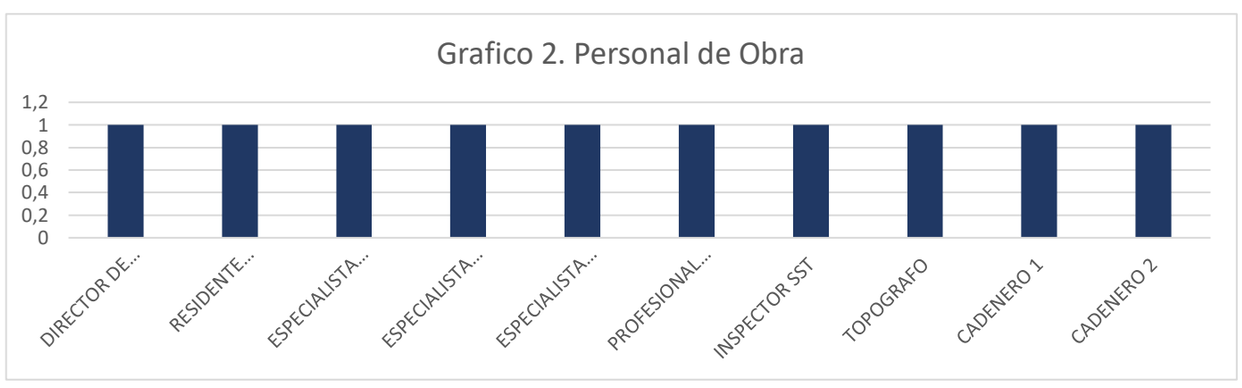

CONTRATO DE INTERVENTORIA	**13**
DIRECTOR INTERVENTORIA	1
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1
INSPECTOR INTERVENTORIA	1
SISOMA	1
ING. AMBIENTAL	1
ING. PAVIMENTOS	1
TOPOGRAFO	1
PROFESIONAL SOCIAL	1
ESPECILISTA ELÉCTRICO	1
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS	1
ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMETRICO	1
CADENERO 1	1
CADENERO 2	1
CONTRATO DE OBRA	**10**
DIRECTOR DE OBRA	1
RESIDENTE DEOBRA	1
ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	1
ESPECIALISTA ELECTRICO	1
ESPECIALISTA GEOMETRICO	1
PROFESIONAL AMBIENTAL	1
INSPECTOR SST	1
TOPOGRAFO	1
CADENERO 1	1
CADENERO 2	1

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

INFORME SEMANAL DE OBRA

Principio de Procedencia: 4602.375	Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 01/MARZO/2020	Página: ___ de #

RELACION MAQUINARIA

TIPO	CONTRACTUAL	ACTUAL	OBSERVACIONES
Estacion Total	1	1	
Nivel Digital	1	1	
Torre de Iluminación 4 reflentores 1000W/CU	1	0	No fue necesario la Torre de Iluminación 4
Herramienta menor	1	1	
Total Maquinaría	4	3	

AVANCE FINANCIERO DE OBRA

Acta Parcial de Obra No.	Periodo	Costo Total
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total Acumulado		

AVANCE FINANCIERO

Valor Total Contrato Obra
$ 8.815.490.694,00
Valor facturado Contrato Obra
$ 0,00
% Avance facturado Acumulado
0,00%

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA

Acta Parcial de interventoría No.	Periodo	Costo Total
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total Acumulado		

Valor Total Contrato interventoría
$ 986.277.667,00
Valor facturado Contrato Interventoría
$ 0,00
% Avance facturado Acumulado
0,00%

OBSERVACIONES

DIRECTOR DE OBRA

Liliana Jáuregui A.

LILIANA KARINA JAUREGUI APARICIO
