	República de Colombia **Departamento de Cundinamarca** **MUNICIPIO DE TAUSA**	**MEMORIA DE CALCULO** **CALCULO DE CANTIDADES** **DE OBRA**

FORMATO MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No.	**148-2025-SAMC-006**	**ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA**		**ELABORÓ**	SEBASTIAN REYES PRIETO

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES DEL MUNICIPIO DE TAUSA CUNDINAMARCA					
CONTRATISTA	CONSORCIO MONARCA TAUSA	**NIT O C.C.**	901976148-8	**CONTRATO N°**	148-2025-SAMC-006	
INTERVENTORÍA		**NIT O C.C.**		**CONTRATO N°**		
CONTRATANTE	Alcaldía municipio de Tausa	**NIT O C.C.**		**SUPERVISOR**	SAUL PEREZ LUNA	
CAPÍTULO N° 1		**ITEM No. 1**	**DESMOMTE VIGA CANAL**		**UNID.**	**ML**



Localización	Dimensiones			CANT	% Ejecucion	TOTALES
	Longitud	Ancho	espesor			
	90,00			-	100	90,00
				TOTAL		90,00
				Subtotal Actas Parciales		
				TOTAL (Ajustado a 2 decimales)		90,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA:

SEBASTIAN REYES PRIETO
RESIDENTE DE OBRA

INTERVENTORIA:

ING. SAUL PEREZ LUNA
SUPERVISOR DE OBRA

	República de Colombia **Departamento de Cundinamarca** **MUNICIPIO DE TAUSA**	**MEMORIA DE CALCULO** **CALCULO DE CANTIDADES** **DE OBRA**

FORMATO MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No.	**148-2025-SAMC-006**	**ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA**		**ELABORÓ**	SEBASTIAN REYES PRIETO

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES DEL MUNICIPIO DE TAUSA CUNDINAMARCA						
CONTRATISTA	CONSORCIO MONARCA TAUSA	**NIT O C.C.**	901976148-8	**CONTRATO N°**	148-2025-SAMC-006		
INTERVENTORÍA		**NIT O C.C.**		**CONTRATO N°**			
CONTRATANTE	Alcaldía municipio de Tausa	**NIT O C.C.**		**SUPERVISOR**	SAUL PEREZ LUNA		
CAPÍTULO N° 1		**ITEM No. 2**	**CANAL EN LAMINA CAL. 22**		**UNID.**	**ML**	



Localización	Dimensiones			CANT	% Ejecucion	TOTALES
	Longitud	Ancho	espesor			
	90,00			-	100	90,00
				TOTAL		90,00
				Subtotal Actas Parciales		
				TOTAL (Ajustado a 2 decimales)		90,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA:

SEBASTIAN REYES PRIETO
RESIDENTE DE OBRA

INTERVENTORIA:

ING. SAUL PEREZ LUNA
SUPERVISOR DE OBRA

	República de Colombia **Departamento de Cundinamarca** **MUNICIPIO DE TAUSA**	**MEMORIA DE CALCULO** **CALCULO DE CANTIDADES** **DE OBRA**

FORMATO MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No.	**148-2025-SAMC-006**	**ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA**		**ELABORÓ**	SEBASTIAN REYES PRIETO

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES DEL MUNICIPIO DE TAUSA CUNDINAMARCA					
CONTRATISTA	CONSORCIO MONARCA TAUSA	**NIT O C.C.**	901976148-8	**CONTRATO N°**	148-2025-SAMC-006	
INTERVENTORÍA		**NIT O C.C.**		**CONTRATO N°**		
CONTRATANTE	Alcaldía municipio de Tausa	**NIT O C.C.**		**SUPERVISOR**	SAUL PEREZ LUNA	
CAPÍTULO N° 1		**ITEM No.3**	**TEJA FIBROCEMENTO No. 6**		**UNID.**	**M2**



Localización	Dimensiones			CANT	% Ejecucion	TOTALES
	Longitud	Ancho	espesor			
	2,80	0,30		42	100	35,00
				TOTAL		**35,00**
				Subtotal Actas Parciales		
				TOTAL (Ajustado a 2 decimales)		**35,00**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA:

SEBASTIAN REYES PRIETO
RESIDENTE DE OBRA

INTERVENTORIA:

ING. SAUL PEREZ LUNA
SUPERVISOR DE OBRA

	República de Colombia **Departamento de Cundinamarca** **MUNICIPIO DE TAUSA**	**MEMORIA DE CALCULO** **CALCULO DE CANTIDADES** **DE OBRA**

FORMATO MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No.	**148-2025-SAMC-006**	**ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA**		**ELABORÓ**	SEBASTIAN REYES PRIETO

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES DEL MUNICIPIO DE TAUSA CUNDINAMARCA					
CONTRATISTA	CONSORCIO MONARCA TAUSA	**NIT O C.C.**	901976148-8	**CONTRATO N°**	148-2025-SAMC-006	
INTERVENTORÍA		**NIT O C.C.**		**CONTRATO N°**		
CONTRATANTE	Alcaldía municipio de Tausa	**NIT O C.C.**		**SUPERVISOR**	SAUL PEREZ LUNA	
CAPÍTULO N° 1		**ITEM No. 4**	**DESMONTE TECHO EN DRYWALL**		**UNID.**	**M2**



Localización	Dimensiones			CANT	% Ejecucion	TOTALES
	Longitud	Ancho	espesor			
	25,00	1,00		25	100	25,00
				TOTAL		**25,00**
				Subtotal Actas Parciales		
				TOTAL (Ajustado a 2 decimales)		**25,00**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA:

SEBASTIAN REYES PRIETO
RESIDENTE DE OBRA

INTERVENTORIA:

ING. SAUL PEREZ LUNA
SUPERVISOR DE OBRA

	República de Colombia **Departamento de Cundinamarca** **MUNICIPIO DE TAUSA**	**MEMORIA DE CALCULO** **CALCULO DE CANTIDADES** **DE OBRA**

FORMATO MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No.	**148-2025-SAMC-006**	**ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA**		**ELABORÓ**	SEBASTIAN REYES PRIETO

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES DEL MUNICIPIO DE TAUSA CUNDINAMARCA					
CONTRATISTA	CONSORCIO MONARCA TAUSA	**NIT O C.C.**	901976148-8	**CONTRATO N°**	148-2025-SAMC-006	
INTERVENTORÍA		**NIT O C.C.**		**CONTRATO N°**		
CONTRATANTE	Alcaldía municipio de Tausa	**NIT O C.C.**		**SUPERVISOR**	SAUL PEREZ LUNA	
CAPÍTULO N° 1		**ITEM No. 5**	**CIELO RASO PLANO EN DRYWALL (INCLUYE PINTURA)**		**UNID.**	**M2**



Localización	Dimensiones			CANT	% Ejecucion	TOTALES
	Longitud	Ancho	espesor			
	25,00	1,00		25	100	25,00
				TOTAL		25,00
				Subtotal Actas Parciales		
				TOTAL (Ajustado a 2 decimales)		25,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA:

SEBASTIAN REYES PRIETO
RESIDENTE DE OBRA

INTERVENTORIA:

ING. SAUL PEREZ LUNA
SUPERVISOR DE OBRA

	República de Colombia **Departamento de Cundinamarca** **MUNICIPIO DE TAUSA**	**MEMORIA DE CALCULO** **CALCULO DE CANTIDADES** **DE OBRA**

FORMATO MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No.	**148-2025-SAMC-006**	**ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA**		**ELABORÓ**	SEBASTIAN REYES PRIETO

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES DEL MUNICIPIO DE TAUSA CUNDINAMARCA						
CONTRATISTA	CONSORCIO MONARCA TAUSA	**NIT O C.C.**	901976148-8	**CONTRATO N°**	148-2025-SAMC-006		
INTERVENTORÍA		**NIT O C.C.**		**CONTRATO N°**			
CONTRATANTE	Alcaldía municipio de Tausa	**NIT O C.C.**		**SUPERVISOR**	SAUL PEREZ LUNA		
CAPÍTULO N° 1		**ITEM No. 6**	**FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA**		**UNID.**	**ML**	



Localización	Dimensiones			CANT	% Ejecucion	TOTALES
	Longitud	Ancho	espesor			
	20,00			-	100	20,00
				TOTAL		20,00
				Subtotal Actas Parciales		
				TOTAL (Ajustado a 2 decimales)		20,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA:

SEBASTIAN REYES PRIETO
RESIDENTE DE OBRA

INTERVENTORIA:

ING. SAUL PEREZ LUNA
SUPERVISOR DE OBRA

	República de Colombia **Departamento de Cundinamarca** **MUNICIPIO DE TAUSA**	**MEMORIA DE CALCULO** **CALCULO DE CANTIDADES** **DE OBRA**

FORMATO MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No.	**148-2025-SAMC-006**	**ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA**		**ELABORÓ**	SEBASTIAN REYES PRIETO

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES DEL MUNICIPIO DE TAUSA CUNDINAMARCA						
CONTRATISTA	CONSORCIO MONARCA TAUSA	**NIT O C.C.**	901976148-8	**CONTRATO N°**	148-2025-SAMC-006		
INTERVENTORÍA		**NIT O C.C.**		**CONTRATO N°**			
CONTRATANTE	Alcaldía municipio de Tausa	**NIT O C.C.**		**SUPERVISOR**	SAUL PEREZ LUNA		
CAPÍTULO N° 1		**ITEM No. 7**	**ESTUCO Y VINILO 3 MANOS**		**UNID.**	**M2**	

Localización	**Dimensiones**			**CANT**	**% Ejecucion**	**TOTALES**
	Longitud	**Ancho**	**espesor**			
	-			-	100	-
				TOTAL		**0,00**
				Subtotal Actas Parciales		
				TOTAL (Ajustado a 2 decimales)		**0,00**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA:

SEBASTIAN REYES PRIETO
RESIDENTE DE OBRA

INTERVENTORIA:

ING. SAUL PEREZ LUNA
SUPERVISOR DE OBRA

	República de Colombia **Departamento de Cundinamarca** **MUNICIPIO DE TAUSA**	**MEMORIA DE CALCULO** **CALCULO DE CANTIDADES** **DE OBRA**

FORMATO MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No.	**148-2025-SAMC-006**	**ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA**		**ELABORÓ**	SEBASTIAN REYES PRIETO

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES DEL MUNICIPIO DE TAUSA CUNDINAMARCA						
CONTRATISTA	CONSORCIO MONARCA TAUSA	**NIT O C.C.**	901976148-8	**CONTRATO N°**	148-2025-SAMC-006		
INTERVENTORÍA		**NIT O C.C.**		**CONTRATO N°**			
CONTRATANTE	Alcaldía municipio de Tausa	**NIT O C.C.**		**SUPERVISOR**	SAUL PEREZ LUNA		
CAPÍTULO N° 1		**ITEM No. 8**	**MANTENIMIENTOS GENERALES DE ASCENSORES CENTRO DIA Y ALCALDIA**		**UNID.**	**UND**	

Localización	**Dimensiones**			**CANT**	**% Ejecucion**	**TOTALES**
	Longitud	**Ancho**	**espesor**			
				-	100	-
				TOTAL		**0,00**
				Subtotal Actas Parciales		
				TOTAL (Ajustado a 2 decimales)		**0,00**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA:	**INTERVENTORIA:**
SEBASTIAN REYES PRIETO **RESIDENTE DE OBRA**	**ING. SAUL PEREZ LUNA** **SUPERVISOR DE OBRA**

	República de Colombia **Departamento de Cundinamarca** **MUNICIPIO DE TAUSA**	**MEMORIA DE CALCULO** **CALCULO DE CANTIDADES** **DE OBRA**

FORMATO MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No.	**148-2025-SAMC-006**	**ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA**		**ELABORÓ**	SEBASTIAN REYES PRIETO

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES DEL MUNICIPIO DE TAUSA CUNDINAMARCA						
CONTRATISTA	CONSORCIO MONARCA TAUSA	**NIT O C.C.**	901976148-8	**CONTRATO N°**	148-2025-SAMC-006		
INTERVENTORÍA		**NIT O C.C.**		**CONTRATO N°**			
CONTRATANTE	Alcaldía municipio de Tausa	**NIT O C.C.**		**SUPERVISOR**	SAUL PEREZ LUNA		
CAPÍTULO N° 1		**ITEM No. 9**	**PINTURA EPOXICA**		**UNID.**	**M2**	

Localización	**Dimensiones**			**CANT**	**% Ejecucion**	**TOTALES**
	Longitud	**Ancho**	**espesor**			
				-	100	-
				TOTAL		**0,00**
				Subtotal Actas Parciales		
				TOTAL (Ajustado a 2 decimales)		**0,00**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA:	**INTERVENTORIA:**
SEBASTIAN REYES PRIETO **RESIDENTE DE OBRA**	**ING. SAUL PEREZ LUNA** **SUPERVISOR DE OBRA**

	República de Colombia **Departamento de Cundinamarca** **MUNICIPIO DE TAUSA**	**MEMORIA DE CALCULO** **CALCULO DE CANTIDADES** **DE OBRA**

FORMATO MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No.	**148-2025-SAMC-006**	**ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA**		**ELABORÓ**	SEBASTIAN REYES PRIETO

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES DEL MUNICIPIO DE TAUSA CUNDINAMARCA						
CONTRATISTA	CONSORCIO MONARCA TAUSA	**NIT O C.C.**	901976148-8	**CONTRATO N°**	148-2025-SAMC-006		
INTERVENTORÍA		**NIT O C.C.**		**CONTRATO N°**			
CONTRATANTE	Alcaldía municipio de Tausa	**NIT O C.C.**		**SUPERVISOR**	SAUL PEREZ LUNA		
CAPÍTULO N° 1		**ITEM No. 10**	**TEJA ESPAÑOLA ETERNIT**		**UNID.**	**M2**	

Localización	**Dimensiones**			**CANT**	**% Ejecucion**	**TOTALES**
	Longitud	**Ancho**	**espesor**			
				-	100	-
				TOTAL		**0,00**
				Subtotal Actas Parciales		
				TOTAL (Ajustado a 2 decimales)		**0,00**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA:

SEBASTIAN REYES PRIETO
RESIDENTE DE OBRA

INTERVENTORIA:

ING. SAUL PEREZ LUNA
SUPERVISOR DE OBRA

	República de Colombia **Departamento de Cundinamarca** **MUNICIPIO DE TAUSA**	**MEMORIA DE CALCULO** **CALCULO DE CANTIDADES** **DE OBRA**

FORMATO MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No.	**148-2025-SAMC-006**	**ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA**		**ELABORÓ**	SEBASTIAN REYES PRIETO

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES DEL MUNICIPIO DE TAUSA CUNDINAMARCA						
CONTRATISTA	CONSORCIO MONARCA TAUSA	**NIT O C.C.**	901976148-8	**CONTRATO N°**	148-2025-SAMC-006		
INTERVENTORÍA		**NIT O C.C.**		**CONTRATO N°**			
CONTRATANTE	Alcaldía municipio de Tausa	**NIT O C.C.**		**SUPERVISOR**	SAUL PEREZ LUNA		
CAPÍTULO N° 1		**ITEM No. 11**	**IMPERMEABILIZACION FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR**		**UNID.**	**M2**	

Localización	**Dimensiones**			**CANT**	**% Ejecucion**	**TOTALES**
	Longitud	**Ancho**	**espesor**			
				-	100	-
				TOTAL		**0,00**
				Subtotal Actas Parciales		
				TOTAL (Ajustado a 2 decimales)		**0,00**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA:

SEBASTIAN REYES PRIETO
RESIDENTE DE OBRA

INTERVENTORIA:

ING. SAUL PEREZ LUNA
SUPERVISOR DE OBRA

	República de Colombia **Departamento de Cundinamarca** **MUNICIPIO DE TAUSA**	**MEMORIA DE CALCULO** **CALCULO DE CANTIDADES** **DE OBRA**

FORMATO MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No.	**148-2025-SAMC-006**	**ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA**		**ELABORÓ**	SEBASTIAN REYES PRIETO

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES DEL MUNICIPIO DE TAUSA CUNDINAMARCA					
CONTRATISTA	CONSORCIO MONARCA TAUSA	**NIT O C.C.**	901976148-8	**CONTRATO N°**	148-2025-SAMC-006	
INTERVENTORÍA		**NIT O C.C.**		**CONTRATO N°**		
CONTRATANTE	Alcaldía municipio de Tausa	**NIT O C.C.**		**SUPERVISOR**	SAUL PEREZ LUNA	
CAPÍTULO N° 1		**ITEM No. 12**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMULSION ALFALTICA PARA CANALES Y VIGA CANALES Y OTROS**	**UNID.**	**ML**	



Localización	Dimensiones			CANT	% Ejecucion	TOTALES
	Longitud	Ancho	espesor			
	120,00			-	100	120,00
				TOTAL		120,00
				Subtotal Actas Parciales		
				TOTAL (Ajustado a 2 decimales)		120,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA:

SEBASTIAN REYES PRIETO
RESIDENTE DE OBRA

INTERVENTORIA:

ING. SAUL PEREZ LUNA
SUPERVISOR DE OBRA

	República de Colombia **Departamento de Cundinamarca** **MUNICIPIO DE TAUSA**	**MEMORIA DE CALCULO** **CALCULO DE CANTIDADES** **DE OBRA**

FORMATO MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No.	**148-2025-SAMC-006**	**ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA**		**ELABORÓ**	SEBASTIAN REYES PRIETO

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES DEL MUNICIPIO DE TAUSA CUNDINAMARCA						
CONTRATISTA	CONSORCIO MONARCA TAUSA	**NIT O C.C.**	901976148-8	**CONTRATO N°**	148-2025-SAMC-006		
INTERVENTORÍA		**NIT O C.C.**		**CONTRATO N°**			
CONTRATANTE	Alcaldía municipio de Tausa	**NIT O C.C.**		**SUPERVISOR**	SAUL PEREZ LUNA		
CAPÍTULO N° 1		**ITEM No. 13**	**LIMPIEZA DE CUBIERTAS Y VIGA CANALES INCLUYE EL TRABAJO EN ALTURAS**		**UNID.**	**M2**	



Localización	Dimensiones			CANT	% Ejecucion	TOTALES
	Longitud	Ancho	espesor			
	102,80	1,00		103	100	102,80
				TOTAL		102,80
				Subtotal Actas Parciales		
				TOTAL (Ajustado a 2 decimales)		102,80

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA:

SEBASTIAN REYES PRIETO
RESIDENTE DE OBRA

INTERVENTORIA:


ING. SAUL PEREZ LUNA
SUPERVISOR DE OBRA

	República de Colombia **Departamento de Cundinamarca** **MUNICIPIO DE TAUSA**	**MEMORIA DE CALCULO** **CALCULO DE CANTIDADES** **DE OBRA**

FORMATO MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No.	**148-2025-SAMC-006**	**ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA**		**ELABORÓ**	SEBASTIAN REYES PRIETO

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES DEL MUNICIPIO DE TAUSA CUNDINAMARCA				
CONTRATISTA	CONSORCIO MONARCA TAUSA	**NIT O C.C.**	901976148-8	**CONTRATO N°**	148-2025-SAMC-006
INTERVENTORÍA		**NIT O C.C.**		**CONTRATO N°**	
CONTRATANTE	Alcaldía municipio de Tausa	**NIT O C.C.**		**SUPERVISOR**	SAUL PEREZ LUNA
CAPÍTULO N° 1		**ITEM No. 14**	**VINILO SOBRE ESTUCO DOS MANOS**	**UNID.**	**M2**

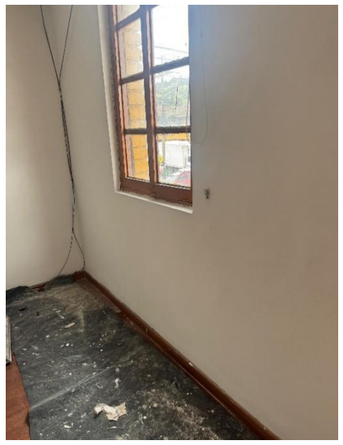

Localización	Dimensiones			CANT	% Ejecucion	TOTALES
	Longitud	Ancho	espesor			
	100,00	3,43		343	100	342,51
				TOTAL		342,51
				Subtotal Actas Parciales		
				TOTAL (Ajustado a 2 decimales)		**342,51**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA:	**INTERVENTORIA:**
SEBASTIAN REYES PRIETO **RESIDENTE DE OBRA**	**ING. SAUL PEREZ LUNA** **SUPERVISOR DE OBRA**

	República de Colombia **Departamento de Cundinamarca** **MUNICIPIO DE TAUSA**	**MEMORIA DE CALCULO** **CALCULO DE CANTIDADES** **DE OBRA**

FORMATO MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No.	**148-2025-SAMC-006**	**ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA**		**ELABORÓ**	SEBASTIAN REYES PRIETO

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES DEL MUNICIPIO DE TAUSA CUNDINAMARCA				
CONTRATISTA	CONSORCIO MONARCA TAUSA	**NIT O C.C.**	901976148-8	**CONTRATO N°**	148-2025-SAMC-006
INTERVENTORÍA		**NIT O C.C.**		**CONTRATO N°**	
CONTRATANTE	Alcaldía municipio de Tausa	**NIT O C.C.**		**SUPERVISOR**	SAUL PEREZ LUNA
CAPÍTULO N° 1		**ITEM No. 15**	**REVISION MANTENIMIENTO VERIFICACION DE ASCENSORES CENTRO DIA Y ALCALDIA**	**UNID.**	**UN**



Localización	Dimensiones			CANT	% Ejecucion	TOTALES
	CANTDAD					
	2,00			-	100	2,00
				TOTAL		2,00
				Subtotal Actas Parciales		
				TOTAL (Ajustado a 2 decimales)		2,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA:

SEBASTIAN REYES PRIETO
RESIDENTE DE OBRA

INTERVENTORIA:

ING. SAUL PEREZ LUNA
SUPERVISOR DE OBRA

	República de Colombia **Departamento de Cundinamarca** **MUNICIPIO DE TAUSA**	**MEMORIA DE CALCULO** **CALCULO DE CANTIDADES** **DE OBRA**

FORMATO MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No.	**148-2025-SAMC-006**	**ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA**		**ELABORÓ**	SEBASTIAN REYES PRIETO

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES DEL MUNICIPIO DE TAUSA CUNDINAMARCA				
CONTRATISTA	CONSORCIO MONARCA TAUSA	**NIT O C.C.**	901976148-8	**CONTRATO N°**	148-2025-SAMC-006
INTERVENTORÍA		**NIT O C.C.**		**CONTRATO N°**	
CONTRATANTE	Alcaldía municipio de Tausa	**NIT O C.C.**		**SUPERVISOR**	SAUL PEREZ LUNA
CAPÍTULO N° 1		**ITEM No. 16**	**CIELO RASO EN PVC e=8 mm (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)**	**UNID.**	**M2**



Localización	Dimensiones			CANT	% Ejecucion	TOTALES
	Longitud	Ancho	espesor			
	8,00	5,00		40	100	40,00
				TOTAL		40,00
				Subtotal Actas Parciales		
				TOTAL (Ajustado a 2 decimales)		40,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA:

SEBASTIAN REYES PRIETO
RESIDENTE DE OBRA

INTERVENTORIA:

ING. SAUL PEREZ LUNA
SUPERVISOR DE OBRA

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

REPUBLICA DE COLOMBIA	**CONTRATO DE OBRA SAMC No.**	**148-2025-SAMC-006**			
	OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES DEL MUNICIPIO DE TAUSA CUNDINAMARCA			
	CONTRATISTA:	CONSORCIO MONARCA TAUSA		**FECHA ELABORACION PRESENTE ACTA:**	10 DE SEPTIEMBRE DE 2025
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	**SUPERVISOR:**	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEACION - ING. SAUL PEREZ LUNA		**PLAZO INICIAL:**	DOS MESES
				FECHA DE INICIO:	19 DE AGOSTO DE 2025
	V/R. INICIAL:	$ 49.960.810,00	% OBRA EJECTADA	**FECHA DE TERMINACION INICIAL:**	10 DE SEPTIEMBRE DE 2025
MUNICIPIO DE TAUSA	**V/R. ADICIONAL:**	$ 0,00	100,00%	**PLAZO ADICIONAL:**	N/A
	VALOR TOTAL:	**$ 49.960.810,00**		**FECHA DE TERMINACION REAL:**	10 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONDICIONES ORIGINALES						**OBRA EJECUTADA**			
						CANTIDADES		**EJECUTADO**	
No.	**DESCRIPCION**	**UND.**	**CANT.**	**V/R. UNITARIO**	**V/R. TOTAL**	**MAYORES (+)**	**MENORES (-)**	**CANTIDAD FINAL**	**V/R. TOTAL**
1	DESMONTE VIGA CANAL	ML	110	$ 12.500,00	$ 1.375.000,00		20	90,00	$ 1.125.000,00
2	CANAL EN LAMINA CAL. 22	ML	110	$ 152.350,00	$ 16.758.500,00		20	90,00	$ 13.711.500,00
3	TEJA FIBROCEMENTO No. 6	M2	35	$ 54.600,00	$ 1.911.000,00			35,00	$ 1.911.000,00
4	DESMONTE TECHO EN DRYWALL	M2	80	$ 7.800,00	$ 624.000,00		55	25,00	$ 195.000,00
5	CIELO RASO PLANO EN DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M2	120	$ 78.400,00	$ 9.408.000,00		95	25,00	$ 1.960.000,00
6	FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA	ML	45	$ 45.000,00	$ 2.025.000,00		25	20,00	$ 900.000,00
7	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	M2	140	$ 25.700,00	$ 3.598.000,00		140	0,00	$ 0,00
8	MANTENIMIENTOS GENERALES DE ASCENSORES CENTRO DIA Y ALCALDIA	UND	2	$ 1.000,00	$ 2.000,00		2	0,00	$ 0,00
9	PINTURA EPOXICA	M2	40	$ 21.300,00	$ 852.000,00		40	0,00	$ 0,00
10	TEJA ESPAÑOLA ETERNIT	M2	10	$ 91.400,00	$ 914.000,00		10	0,00	$ 0,00
11	IMPERMEABILIZACION FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR	M2	54,22	$ 13.600,00	$ 737.392,00		54,22	0,00	$ 0,00
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMULSION ALFALTICA PARA CANALES Y VIGA CANALES Y OTROS	ML	120	$ 25.500,00	$ 3.060.000,00			120,00	$ 3.060.000,00
13	LIMPIEZA DE CUBIERTAS Y VIGA CANALES INCLUYE EL TRABAJO EN ALTURAS	M2	102,8	$ 38.500,00	$ 3.957.800,00			102,80	$ 3.957.800,00
14	VINILO SOBRE ESTUCO DOS MANOS	M2	342,51	$ 11.707,00	$ 4.009.764,57			342,51	$ 4.009.746,31
15	REVISION MANTENIMIENTO VERIFICACION DE ASCENSORES CENTRO DIA Y ALCALDIA	UN	2	$ 2.087.513,00	$ 4.175.026,00			2,00	$ 4.175.026,00
16	CIELO RASO EN PVC e=8 mm (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	M2	40	$ 85.658,00	$ 3.426.320,00			40,00	$ 3.426.320,00

VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$**	**38.431.392,31**
ADMINISTRACION 20%	**$**	**7.686.278,46**
IMPREVISTOS 5%	**$**	**1.921.569,62**
UTILIDAD 5%	**$**	**1.921.569,62**
VALOR TOTAL CONTRATO	**$**	**49.960.810**

SEBASTIAN REYES PRIETO
RESIDENTE
CONTRATISTA

ING.. SAUL PEREZ LUNA
SUPERVISOR
