INFORME No. 03

CONTRATO:	345	**DEL AÑO:**	**2025**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO TERMINACION UMI**	**NIT No.:**	**901.919.277-7**
OBJETO:	**CONSTRUCCION PARA LA TERMINACION DE LA REMODELACION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL** DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACA.		
PERIODO DEL INFORME:	**JULIO DE 2025.**		

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	VALOR FACTURADO	FECHA DE INFORME	SALDO	FACTURA
6.167.353.887,00	416.317.801,00	JUNIO DE 2025	5.751.036.086,00	FV - 1
	444.278.554,00	JULIO DE 2025	5.306.757.532,00	FV - 2
ADICION	3.083.611.678,00	JULIO DE 2025	8.390.369.210,00	N/A
	1.416.257.582,00	AGOSTO DE 2025	6.974.111.628,00	FV - 3

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 345 DE 2025

HACE CONSTAR:

Que: el **CONSORCIO TERMINACION UMI,** DURANTE EL MES DE **JULIO DE 2025,** HA VENIDO REALIZANDO LA **CONSTRUCCION PARA LA TERMINACION DE LA REMODELACION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE** LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACA.

El supervisor del contrato se permite certificar que el contratista cumplió con el objeto del contrato, de acuerdo con las especificaciones técnicas exigidas por el Hospital, tal como lo indican en certificación el Arquitecto **ALEXIS FABIAN MORENO GONZALEZ,** y la Arquitecta **MELISSA BERMUDEZ GUARIN,** en su condición de Apoyo a la Supervisión del Contrato por parte del Hospital, el Acta Parcial No. 3, la Sábana de Cuadro de Cantidades Contratadas y Ejecutadas, las Cantidades de Obra Acumulada, la Certificación de Interventoría de pago de Aportes a Seguridad Social y Parafiscales por parte del Contratista, Certificación de Interventoría de Cumplimiento con Requisitos Ambientales y Seguridad en el Trabajo por parte del Contratista, Certificación de Interventoría de Cumplimiento de Especificaciones Técnicas de Materiales y Procesos Constructivos por parte del Contratista, Certificación de Interventoría de Revisión y Verificación de Planillas de Pago de Seguridad Social de los empleados por parte del Contratista, Informe de Interventoría del mes de Julio de 2025, y Bitácora de Obra, los que hacen parte integral del presente, y sobre los cuales se basa la supervisión para la elaboración de este informe. (Se anexa CD con Acta Parcial No. 3. La cual contiene Sábana de Cantidades de Obra Ejecutada e Informe del mes de **JULIO DE 2025** con todos sus soportes).

PERSONA NATURAL			PERSONA JURÍDICA		
DOCUMENTO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**DOCUMENTO**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
PAGO INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL	79452307		FACTURA	X	
CUENTA DE COBRO			CERTIFICACIÓN DE ÁREA TÉCNICA	X	
INFORME DE ACTIVIDADES			CERTIFICACIÓN DE REVISOR FISCAL Y/O REPRESENTANTE LEGAL SOBRE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	X	
			INFORME DE ACTIVIDADES	X	

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

En consecuencia, el valor a pagar al contratista es de: **MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS ($1.416.257.582.00) M/CTE.**

Se deja constancia que lo anterior no exime de futuros requerimientos por responsabilidad del orden legal, fiscal, penal etc. derivados de actuaciones en este contrato.

En constancia, se firma para efectos de pago. Tunja, agosto de dos mil veinticinco (2025).

VICTOR MANUEL SANCHEZ VARGAS
Supervisor Contrato.

Revisó: ARQ. **ALEXIS FABIAN MORENO GONZALEZ**. Apoyo Supervisión Contrato No. 345 de 2023.
ARQ. **IVON MELISSA BERMUDEZ GUARIN.** Apoyo Supervisión Contrato No. 345 de 2023.

C.C. Carpeta del Contrato.

Elaboró: Dora v. Secretaria Técnica Subgerencia Administrativa y Financiera.

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

LOS ARQUITECTOS DE APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No 345-2025 DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

CERTIFICA:

Que el: **CONSORCIO TERMINACIÓN UMI**, identificado con Nit. 901.919.277-7, presentó acta parcial de obra No 3, correspondiente al periodo de ejecución de obra del 01 de julio al 31 de julio del 2025, de acuerdo con las obligaciones derivadas del contrato 345 de 2025.

La siguiente es la relación de documentos a los cuales se les realizo la revisión, y que hacen parte del acta No 3. Aprobada por la interventoría.

1. Formato de ACTA PARCIAL, de la entidad, firmada por los representantes legales de contratista de obra e interventoría. (1 folio).

2. SABANA- CUADRO DE CANTIDADES CONTRATADAS Y EJECUTADAS, con cantidades de obra contractuales, Balance de obra, condiciones actualizadas, cantidades de obra ejecutada en la presente acta, cantidades de obra acumuladas en acta anterior, Cantidades de obra acumulada. con valor total a pagar en la presente acta de MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS, ($1.416.257.582,00) mtc moneda legal y corriente (3 folios).

3. Factura electrónica de venta No FV 3, emitida por el CONSORCIO TERMINACIÓN UMI. por valor ($1.416.257.582,00). (1 folio).

4. CERTIFICACION BANCARIA de la empresa CONSORCIO TERMINACIÓN UMI, con NIT. 901.919.277-7 expedida por el banco DAVIVIENDA el producto cuenta de Ahorros Ahorro No 0371 0009 3436 Aperturada el 05 DE JUNIO DE 2025. (1 folio).

5. CERTIFICACION DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL, emitida por la representante legal, ING. ESTEFANÍA CARVAJAL HENAO, firmada la BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO. (1 folio). Con fecha del 11 de agosto del 2025.

6. CERTIFICACION DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES, por parte de contador de la empresa o CONSORCIO TERMINACIÓN UMI firmada bajo la gravedad de juramento y emitida por Contador público ELIZABETH JEIN ARIAS SOTO, con C.C. No 44.008.013 y tarjeta profesional No. 207538-T de la Junta Central de Contadores de Colombia. ANEXA fotocopia de cedula de ciudadanía, tarjeta profesional de contador público y certificación de vigencia emitida por la junta central de contadores. (4 folios).

7. Certificación firmada por la representante legal del CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025, certificando el Acta Parcial No 3 del contrato de obra, en cuanto al cumplimiento: Técnico, Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo. (2 folios).

8. Certificación firmada por la representante legal del CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025, certificando al contratista en el CUMPLIMIENTO DE OBRA AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. (1 folio).

9. Certificación emitida por el representante legal del CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025, certificando al contratista en el CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS. (1 folio).

10. Certificación firmada por el representante legal del CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025, certificando al contratista en el CUMPLIMIENTO DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.
    ANEXA:
    - Planillas de seguridad social No 79452307, (3) folios mes de Julio 2025 paga.

11. Los profesionales de Apoyo a la supervisión anexan a esta certificación la siguiente documentación:
    - Informe No. 2 de supervisión a la interventoría contrato No.352 de 2025 correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de julio de 2025. (6) folios.
    - Certificación de adherencia ISO 14001 DE 2015 Sistema de Gestión Ambiental mes de julio 2025 (4) folios.
    - Certificación de adherencia en Seguridad y Salud en el trabajo mes de julio 2025. (3) folios.

Razón por la cual, y considerando las revisiones, avales o aprobaciones de cantidades por parte de la interventoría función específica de la misma, vemos procedente realizar el pago correspondiente al acta parcial de obra No 1, por la suma total de MIL CUATROCIENTOS DIECISEIR MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS, ($1.416.257.582,00) mtc moneda legal y corriente. Correspondiente al periodo del 01 de julio al 31 de julio del 2025.

Dada en Tunja a los 15 días del mes de agosto de 2025.

Anexo CD:

- Acta parcial de obra No 3 de fecha 12 agosto del 2025.
  Incluye certificaciones y memorias de cantidades firmadas por representantes de obra e interventoría.
- Informe de obra de interventoría del mes de julio 2025.
- Informe No. 3 de supervisión a la interventoría contrato No.352 de 2025 correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de julio de 2025. (6) folios.
- Certificación de adherencia ISO 14001 DE 2015 Sistema de Gestión Ambiental mes de julio 2025 (4) folios.
- Certificación de adherencia en Seguridad y Salud en el trabajo mes de julio 2025. (3) folios.
- Acta técnica de fijación de precios (APM, apus, estudio de mercado, flujo de fuentes, informe modificación, memorias de cantidades, sabana modificación de cantidades, soporte técnico)
- Acta técnica 001

Cordialmente,

ALEXIS FABIAN MORENO GONZALEZ
Profesional universitario arquitecto
Apoyo supervisión contrato No 345/2025

MELISSA BERMUDEZ GUARIN
Profesional universitario arquitecta
Apoyo supervisión contrato No 345/2025

CONSORCIO TERMINACION UMI
NIT 901.919.277-7
Diagonal 74D 32BB 25
Tel: (604) 4883991
Medellin - Colombia
retencionesdelafuente@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 3

Señores	ESE Hospital Universitarios San Rafael de Tunja			**Fecha y hora Factura**	
NIT	891.800.231-0	**Teléfono**	(608) 7405030 - Ext. 000	**Generación**	11/08/2025, 18:51
Dirección	Carrera 11 27 27	**Ciudad**	Tunja - Colombia	**Expedición**	11/08/2025, 18:55
				Vencimiento	18/08/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CONTRATO 345 DE 2025	1.00	1,089,428,909.00
2	AIU	1.00	326,828,673.00

Total ítems: 2

Valor en Letras:
Mil cuatrocientos dieciseis millones doscientos cincuenta y siete mil quinientos ochenta y dos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-18 por $ 1,416,257,582.00

Total Bruto	1,416,257,582.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	1,416,257,582.00

Observaciones:
Valor total ejecutado presente acta parcial #3 (1 de Julio 2025 a 31 de Julio 2025)
$ 1,416,257,582.00

Favor consignar en la cuenta de Ahorros DAVIVIENDA No 0371 0009 3436 a nombre de CONSORCIO TERMINACION UMI Nit. 901.919.277-7

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764090657101 aprobado en 20250318 prefijo FV desde el número 1 al 100 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de: IVA - Actividad Económica 4112, Construcción de edificios no residenciales Tarifa
CUFE: 1a0b83323e4e401f2c300971ce79e1d60e880f8d9abf84c1c46ddeb318a7880a316a2697904b7c0a9660447df592f5b5

Código: C-F-45	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA	
Versión: 01	FORMATO ACTA PARCIAL	Fecha: 24/03/2023
ACTA PARCIAL		FECHA: 12 DE AGOSTO DE 2025

ACTA PARCIAL	No 3	
FECHA PRESENTE ACTA	12 DE AGOSTO DE 2025	
CONTRATO X CONVENIO	CONTRATO DE OBRA 345 DE 2025	DE FECHA: 08 DE MARZO DE 2025
OBJETO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	
CONTRATISTA	CONSORCIO TERMINACIÓN UMI R.L. ING. ESTEFANÍA CARVAJAL HENAO	NIT: 901.919.277-7 C.C: 1.037.630.101
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025 R.L. BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO	NIT: 901.928.027 0 C.C: 1.123.628.511
VALOR DEL CONTRATO:	VALOR INICIAL : $ 6.167.353.887,00	
ADICIONAL N° 1	VALOR $ 3.083.611.678,00	
ADICIONAL N°	VALOR $ 0,00	
VALOR TOTAL CON ADICIONES	$ 9.250.965.565,00	
PLAZO INICIAL	10 meses	
PRORROGA N°	Tiempo:	De Fecha:
PRORROGA N°	Tiempo:	De Fecha:
PLAZO TOTAL	10 meses	
FECHA DE INICIACION	21/03/2025	
ACTA DE SUSPENSIÓN N°	De Fecha:	
ACTA DE REINICIACIÓN N°	De Fecha:	
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	31/12/2025	
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	Del 01/07/2025 al 31/07/2025	
RBPP N°	23201010010208	

No/s Y ANO DE REGISTRO S PRESUPUESTALES QUE RESPALDAN EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: RPC No: 23201010010208080B

En las oficinas de la obra en la Avenida universitaria 51 - 80 se reunieron los señores, BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO Interventora y la señora ING.ESTEFANÍA CARVAJAL HENAO como representante legal o contratista, con el fin de suscribir la presente acta.

En visita al lugar de los trabajos se constató, que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, caracteristicas y condiciones estipuladas en el contrato y registradas en los in'ormes, por tanto el suscrito interventor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales de acuerdo a la(s) planilla (s) N° 79452307 de Julio 2025 de conformidad con la normatividad vigente.

CONTROL ANTICIPOS

Valor Anticipo	$ 0,00
Sumatoria Amortizaciones	$ 0,00
Saldo por Amortizar	$ 0,00

**Nota bi Anticipo: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiación debe discriminarse el anticipo por cada fuente de finfinciacion, segun hoja anexa de fuentes de financiacion (aclarar dentro de las observaciones), diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato	9.250.965.565,00	
Amortización Anticipo		-
Valor a pagar de la presente acta		1.416.257.582,00
Valor Total actas pagadas		860.596.355,00
Saldo por ejecutar		6.974.111.628,00
Sumas iguales	9.250.965.565,00	9.250.965.565,00

**Nota al balance: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiacion debe discriminarse el balance por cada fuente segun hoja anexa (fuentes de financiacion- Balance) , diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGU DE LA PRESENTE ACTA

No. CUENTA: 0371 0009 3436	BANCO: DAVIVIENDA	AHORROS: X	CORRIENTE:

*Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el interventor y el contratista realizan las mediciones en campo y los revisiones efectuadas a los informes por parte del interventor.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES.

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron

Firma:
Nombre: ING. ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Contratista
CONSORCIO TERMINACIÓN UMI

Firma:
Nombre: BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

* Si se requieren se pueden adicionar mas firmas.

ANEXO: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE
ANEXO: LIQUIDACION PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE)
ANEXO: FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO APLIQUE)
ANEXO: INFORME COMPLETO DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR Y O INTERVENTOR

	FORMATO	VERSION: 0
	SASANA - CUADRO DE CANTIDADES CONTRATADAS Y EJECUTADAS	CODIGO: A-AD-GC-F-028
		FECHA: 24/JUL/2019

FECHA:	23/DIC/2025
CONTRATO:	345 DE 2025
OBJETO:	CONTRATACION PARA LA TERMINACION DE LA REMODELACION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUTA DEPARTAMENTO DE BOYACA.
CONTRATISTA:	CONSORCIO TERMINACION UMI
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERHOSPITAL SAN RAFAEL DE TUTA
V. INICIAL	$ 6,167,335,867.00
V. ADICIONAL	$ 3,083,611,678.00
VALOR TOTAL	$ 9,250,965,565.00

FECHA DE INICIACION REAL: 21/13 2025 — ACTA PARCIAL: x

FECHA TERMINACION CONTRACTUAL: 31/12 2025 — ACTA FINAL:

FECHA DE TERMINACION REAL: 31/12 2025 — ACTA No.: 3; FECHA: 31 de agosto de 2125; MES: jul / 2225

% OBRA EJECT.	24,6%	% TIEMPO	46,5%

CONDICIONES ORIGINALES					OBRA EJECUTADA									
					MODIFICACION No 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA		ACUM. ACTA ANTERIOR		ACUMULADO	
No.	Descripción	Un	Cant.	Valor Unit.	Cantidad	Valor	CANTIDAD	VALOR	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA Y PINTURA			$ 324,530,480.00		$ 78,675,589		$ 403,412,044		$ 13,106,868.00		$ 38,240,408.00		$ 147,427,826.00
1.1	ESTRUCTURAS	Metro Cuadrado	3,377.00	$ 44,000.00			3,377.00	$ 44,000.00			2,481.00	$ 34,466,184.00	2,481.00	$ 75,464,464.00
1.2	MUROS DE CONTENCIÓN DE CONCRETO	Metro Cubico	1,027.80	$ 711,400.00			1,027.80	$ 731,101.20						
1.3	PLACAS DE CONCRETO REFORZADO	Metro Cubico	3,752.35	$ 8,500.00			3,752.35	$ 31,920,974.00	2,617.65	$ 22,259,752.50	1,134.70	$ 9,649,221.50	3,752.35	$ 31,908,974.00
1.4	ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA TEJAS SOBRE ESTRUCTURA	Metro Cuadrado	8,396.71	$ 5,470			8,396.71	$ 45,921,148.00	6,695.51	$ 36,610,285	12,340.45	$ 67,487,659.75	19,035.96	$ 104,097,944.25
1.5	PINTURA ANTIOXIDO Y ANTICORROSIVA	Metro Cuadrado	8,396.71	$ 21,816.00			8,396.71	$ 183,193,149.36						
1.6	PINTURA FACHADAS EN VINILO PARA BATIDORES	Metro Cuadrado	2,617.65	$ 47,643.00			2,617.65	$ 124,711,143						
1.7	PINTURA FACHADAS EN VINILO PARA BATIDORES (FACHADA MEDIANERA)	Metro Cuadrado	2,617.65	$ 47,643.00			2,617.65	$ 124,711,143						
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPES			$ 225,468,000.00				$ 229,646,196				$ 34,323,322.00		$ 34,323,322.00
2.1	BALDOSA DE CERAMICA EN VIVIENDA	Metro Cuadrado	1,746.95	$ 129,000.00			1,746.95	$ 225,383,550.00						
2.2	ZOCALOS DE GRES ANTIDESLIZANTE VIVIENDA	Metro Lineal	1,746.95	$ 8,000.00			1,746.95	$ 13,975,600.00						
2.3	PLATINA DE BORDE	Metro Lineal	348.00	$ 11,000.00			348.00	$ 3,828,000.00						
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISOS - BASES - ACABADOS							$ 943,773,562.00						
3.1	CONTRAPISO ANTIPOLVO EN ARE	Metro Cuadrado	938.24	$ 59,315.00		$ 230,161.06		$ 55,647,368.00		$ 56,353,518.00		$ 199,987,130.00		$ 199,987,130.00
3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERAMICA PARA VIVIENDA	Metro Cuadrado	4,230.00	$ 65,910.00			4,230.00	$ 278,829,300.00						
3.3	BARRA PERFIL ESQUINERO EN ALUMINIO NO BOCELADO DE 20 MM ESPESOR	Metro Lineal	1,746.95	$ 74,400.00		$ 53,255,200	1,746.95	$ 129,974,963	1,746.95	$ 56,353,518.00	1,746.95	$ 129,987,130.00	1,746.95	$ 185,340,648.00
3.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA DE BALDOSA EN DE GRANITO	Metro Cuadrado	348.00	$ 74,400.00			348.00	$ 25,891,200						
3.5	ESCALERAS INTERIORES	Metro Cuadrado	4,084.95	$ 41,000.00			4,084.95	$ 167,483,295						
3.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO - MADERA COMERCIAL PARA VIVIENDA	Metro Cuadrado	1,746.95	$ 74,400.00			1,746.95	$ 129,974,963						
3.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO - MADERA COMERCIAL PARA VIVIENDA	Metro Cuadrado	938.24	$ 65,910.00			938.24	$ 61,844,438.00						
3.8	ESTRUCTURA DE CUBIERTA, PERFILERIA METALICA	Kilogramo	2,350.00	$ 4,000.00			2,350.00	$ 9,400,000						
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA			$ 966,798,393.00				$ 966,798,393						
4.1	DVH CLARA EN BATERIA SENCILLA EN ALUMINIO DOBLE CAJA PERFIL 38 MM 3A TANQUE	Metro Cuadrado	707.00	$ 77,337.00			707.00	$ 54,681,459.00						
4.2	PUERTAS PARA INTERIORES Y CLOSET EN MADERA CEDRO	Unidad	90.00	$ 400,000.00			90.00	$ 36,000,000.00						
4.3	PUERTA DE ACCESO VIVIENDA EN LAMINA PINTURA BLANCA INCLUYE CERRADURA	Metro Cuadrado	141.00	$ 455,000.00			141.00	$ 64,155,000.00						
4.4	ENTREPAÑO EN VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 6 MM INCLUYE HERRAJES ESTRUCTURA DE SOPORTE	Metro Cuadrado	644.94	$ 544,654.83			644.94	$ 351,281,983.00						
4.5	PUERTAS BATIENTES EN VIDRIO TEMPLADO	Metro Cuadrado	387.00	$ 324,000.00			387.00	$ 125,388,000.00						
4.6	MAMPARA DIVISORIA EN VIDRIO TEMPLADO	Metro Cuadrado	167.00	$ 324,000.00			167.00	$ 54,108,000.00						
4.7	CIELO RASO	Metro Cuadrado	1,746.95	$ 44,500.00			1,746.95	$ 77,731,775.00						
4.8	CIELO RASO HIDROFUGO INCLUIDO EN VIVIENDA	Metro Cuadrado	938.24	$ 35,500.00			938.24	$ 33,309,520.00						
4.9	CERRADURA BAÑO	Unidad	418.00	$ 47,000.00			418.00	$ 19,646,000.00						
4.1	CERRADURA BAÑO	Unidad	90.00	$ 47,000.00			90.00	$ 4,230,000.00						
4.11	CERRADURA ENTRADA DOBLE FONDO	Unidad	90.00	$ 47,000.00			90.00	$ 4,230,000.00						
4.12	RELLENO DE PLANTA DE MAMPOSTERIA CON PIEDRA DE MANO DE MAMPOSTERIA Y ALBAÑILERIA DE RUEDA (INCLUYE LA PUESTA DE PIEDRA DE MANO)	Metro Cubico	1,548.00	$ 24,400.00			1,548.00	$ 37,771,200.00						
4.13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLASTICO REFLECTIVO PARA CUBIERTA (INCLUYE ACCESORIOS)	Metro Cuadrado	2,963.00	$ 12,000.00			2,963.00	$ 35,556,000.00						
4.14	PINTURA CERRADURA	Unidad	418.00	$ 47,000.00			418.00	$ 19,646,000.00						
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS			$ 270,143,248.00				$ 270,143,248				$ 106,781,749.00		
5.1	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO DE FLUXOMETRO	Unidad	112.00	$ 1,979,464.00			112.00	$ 221,722,368.00						
5.2	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS DE SOBREPONER PARA COLGAR INCLUYE GRIFERIA	Unidad	448.00	$ 454,824.00			448.00	$ 203,806,752.00						
5.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO TANQUE BAJO SIFONICO INCLUYE ASIENTO	Unidad	448.00	$ 603,594.00			448.00	$ 270,443,712.00						
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED DE DETECCIÓN			$ 330,884,334.00				$ 330,884,334				$ 100,948,689.00		$ 100,948,689.00
6.1	TUBERIA EMT (INCLUYE CONDUCTORES, SOPORTES, ETC)	Metro Lineal	2,666.00	$ 124,000.00			2,666.00	$ 330,584,000.00						
6.2	BASE DE APARATOS DE DETECCION	Unidad	5,000.00	$ 115,000.00			2,666.00	$ 306,590,000.00				$ 61,681,950.00		$ 61,681,950.00
6.3	PRE-FIERO	Unidad	1,116.00	$ 300.00			1,116.00	$ 334,800.00				$ 39,266,739.00		$ 39,266,739.00
6.4	SOCALO (INCLUYENTE)	Unidad	45.00	$ 4,000.00			45.00	$ 180,000.00						
6.5	DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO	Unidad	45.00	$ 4,000.00			45.00	$ 180,000.00						
6.6	DETECTOR TERMICO	Unidad	45.00	$ 4,000.00			45.00	$ 180,000.00						
6.7	ESTACION MANUAL DE ALARMA	Unidad	45.00	$ 4,000.00			45.00	$ 180,000.00						
6.8	MODULO DE ATENTORES	Unidad	1.00	$ 4,000.00			1.00	$ 4,000.00						
6.9	PANEL DE CONTROL	Unidad	1.00	$ 4,000.00			1.00	$ 4,000.00						
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASES HIDROSANITARIAS			$ 1,116,040,814.00				$ 1,116,040,814						
7.1	TUBERIA DE AGUA FRIA (INCLUYE ACCESORIOS)	Metro Lineal	1,116.00	$ 109,430.00			1,116.00	$ 122,126,280.00						
7.2	TUBERIA DE DESAGUE PVC - 4" (INCLUYE ACCESORIOS)	Metro Lineal	1,512.00	$ 109,430.00			1,512.00	$ 165,469,440.00						
7.3	TUBERIA DE DESAGUE PVC - 2" (INCLUYE ACCESORIOS)	Metro Lineal	174.00	$ 109,430.00			174.00	$ 19,039,020.00						
7.4	TUBERIA DE CONDENSADOS PVC - 2" (INCLUYE ACCESORIOS)	Metro Lineal	45.00	$ 109,430.00			45.00	$ 4,924,350.00						
7.5	CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO	Unidad	45.00	$ 1,500,000.00			45.00	$ 67,500,000.00						
7.6	SIFON	Unidad	448.00	$ 603,594.00			448.00	$ 270,443,712.00						
7.7	ACCESORIOS DE TUBERIA	Unidad	1,116.00	$ 65,000.00			1,116.00	$ 72,540,000.00						
7.8	ALARMA DE AREA DE FABRICACION (INCLUYE TUBERIA, CONDUCTORES, CANALIZACION, INSTALACION DE SIRENAS Y PANEL)	Unidad	6.00	$ 3,321,337.00			6.00	$ 19,928,022.00						
8	ALARMA DE AREA DE FABRICACION (INCLUYE TUBERIA, CONDUCTORES, CANALIZACION, INSTALACION DE SIRENAS Y PANEL)	Unidad	14.00	$ 11,000,000.00			14.00	$ 154,000,000.00						
9	ALARMA DE AREA DE FABRICACION (INCLUYE TUBERIA, CONDUCTORES, CANALIZACION, INSTALACION DE SIRENAS Y PANEL)	Unidad	3.00	$ 11,000,000.00			3.00	$ 33,000,000.00						
10	CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO	Unidad	6.00	$ 2,495,333.00		$ 4,875,333	3.00	$ 9,370,999.00						
11	CAJA DE AGUAS CON VALVULAS EN HIERRO FUNDIDO 60 PSI DE DIAMETRO (INCLUYE ACCESORIOS, INSTALACION Y CONEXIONES)	Unidad	2.00	$ 1,050,000.00			2.00	$ 2,100,000.00						
12	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE (INCLUYE ACCESORIOS)	Unidad	1.00	$ 2,500,000.00			1.00	$ 2,500,000.00						
13	CONTROLES DE REGULACION DE PRESION Y CAUDAL	Unidad	1.00	$ 9,205,587.00			1.00	$ 9,205,587.00						
14	CONTROLES DE REGULACION DE PRESION Y CAUDAL	Unidad	1.00	$ 9,205,587.00			1.00	$ 9,205,587.00						
15	REGULADORES DE PRESION DE AGUA CALIENTE (INCLUYE ACCESORIOS)	Unidad	1.00	$ 3,682,235.00			1.00	$ 3,682,235.00						
16	BOMBA PARA AGUA POTABLE (INCLUYE ACCESORIOS, CONTROLES DE ARRANQUE Y PROTECCION)	Unidad	2.00	$ 13,811,294.00			2.00	$ 27,622,588.00						
17	RED CONTRA INCENDIOS	Metro Lineal	45.00	$ 68,747			45.00	$ 3,093,615						
18	RADIO DE 6"	Unidad	1.00	$ 22,000			1.00	$ 22,000						
19	SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS (INCLUYE ACCESORIOS, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA)	Unidad	1.00	$ 9,000,000.00			1.00	$ 9,000,000.00						
20	SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS (INCLUYE ACCESORIOS, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA)	Unidad	1.00	$ 9,000,000.00			1.00	$ 9,000,000.00						
21	PUNTO PANEL COMBATE INCENDIO	Unidad	1.00	$ 9,000,000.00			1.00	$ 9,000,000.00						

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACION No 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA					
										PRESENTE ACTA		ACUM. ACTA ANTERIOR		ACUMULADO	
No.	Descripción	Un	Cant	Valor. Unit	Valor. Total	Cantidad	Valor	CANTIDAD	VALOR	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor

No.	Descripción	Un	Cant	Valor Unit.	Valor Total	MODIFICACION No 1 Cantidad	MODIFICACION No 1 Valor	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANTIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA Cantidad	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA Valor	OBRA EJECUTADA ACUM. ACTA ANTERIOR Cantidad	OBRA EJECUTADA ACUM. ACTA ANTERIOR Valor	OBRA EJECUTADA ACUMULADO Cantidad	OBRA EJECUTADA ACUMULADO Valor
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PROYECTO	CONSTRUCCION PARA LA TERMINACION DE LA REMODELACION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

ITEM	1.02	ESTUCO MUROS ANCHOS MENORES DE 0.5 M	CAP	1.00

Registro fotográfico










SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA		UNIDAD	Metro lineal		UBICACIÓN	UNIDAD SAN RAFAEL
Dimensiones						
L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%	Total (m)	Observaciones
SOTANO						
2.57	N/A	N/A	12	100%	30.60	BODEGA FARMACIA
2.52	N/A	N/A	11	100%	27.72	ARCHIVO 1
2.10	N/A	N/A	5	100%	10.50	CIRCULACION DE ARCHIVO A DESPACHO DE DIETAS
0.80	N/A	N/A	1	100%	0.80	CIRCULACION DE ARCHIVO A DESPACHO DE DIETAS
0.90	N/A	N/A	1	100%	0.90	CIRCULACION DE ARCHIVO A DESPACHO DE DIETAS
1.40	N/A	N/A	1	100%	1.40	CIRCULACION DE ARCHIVO A DESPACHO DE DIETAS
2.10	N/A	N/A	3	100%	6.30	CIRCULACION DE ROPA SUCIA A DEPOSITO DE CADAVERES
2.53	N/A	N/A	3	100%	7.59	CIRCULACION DE ROPA SUCIA A DEPOSITO DE CADAVERES
1.30	N/A	N/A	1	100%	1.30	CIRCULACION DE ROPA SUCIA A DEPOSITO DE CADAVERES
1.40	N/A	N/A	1	100%	1.40	CIRCULACION DE ROPA SUCIA A DEPOSITO DE CADAVERES
2.50	N/A	N/A	3	100%	7.50	DEP. CADAVERES
2.10	N/A	N/A	8	100%	16.80	CIRCULACION ENTRE ROPA LIMPIA A PARQUEADERO
2.00	N/A	N/A	2	100%	4.00	CIRCULACION ENTRE ROPA LIMPIA A PARQUEADERO
1.40	N/A	N/A	1	100%	1.40	CIRCULACION ENTRE ROPA LIMPIA A PARQUEADERO
0.80	N/A	N/A	1	100%	0.80	CIRCULACION ENTRE ROPA LIMPIA A PARQUEADERO
2.10	N/A	N/A	3	100%	6.30	CIRCULACION SALA DE STAR
0.90	N/A	N/A	1	100%	0.90	CIRCULACION SALA DE STAR
8.70	N/A	N/A	1	100%	8.70	CIRCULACION SALA DE STAR
2.53	N/A	N/A	5	100%	12.65	DEPOSITO ALIMEN
2.50	N/A	N/A	5	100%	12.50	LAVANDERIA
2.70	N/A	N/A	1	100%	2.70	PARQUEADERO SOTANO
2.80	N/A	N/A	3	100%	0.40	PARQUEADERO SOTANO
PISO 1						
4.02	N/A	N/A	1	100%	4.02	LAVADO DE OJOS
2.90	N/A	N/A	1	100%	2.90	LAVADO DE OJOS
0.96	N/A	N/A	1	100%	8.96	LAVADO DE OJOS
1.30	N/A	N/A	15	100%	19.50	LABORATORIO
2.29	N/A	N/A	2	100%	4.48	LABORATORIO
0.80	N/A	N/A	2	100%	1.60	LABORATORIO
1.60	N/A	N/A	1	100%	1.60	INYECTOLOGIA
2.28	N/A	N/A	1	100%	2.28	INYECTOLOGIA
4.27	N/A	N/A	1	100%	4.27	INYECTOLOGIA
2.60	N/A	N/A	1	100%	2.60	INYECTOLOGIA
1.70	N/A	N/A	1	100%	1.70	INYECTOLOGIA
3.86	N/A	N/A	1	100%	3.86	INYECTOLOGIA
2.76	N/A	N/A	1	100%	2.76	INYECTOLOGIA
2.02	N/A	N/A	1	100%	2.02	RESIDUOS
0.80	N/A	N/A	1	100%	0.80	RESIDUOS
0.64	N/A	N/A	2	100%	1.28	RESIDUOS
1.30	N/A	N/A	1	100%	1.30	RESIDUOS
0.47	N/A	N/A	1	100%	0.47	RESIDUOS
1.30	N/A	N/A	1	100%	1.30	RESIDUOS
2.60	N/A	N/A	3	100%	7.80	INYECTOLOGIA
1.88	N/A	N/A	1	100%	1.88	AREA NEVERA
2.02	N/A	N/A	2	100%	4.04	PRETRASFUCIONAL
1.16	N/A	N/A	1	100%	1.16	PRETRASFUCIONAL
0.96	N/A	N/A	2	100%	1.92	PRETRASFUCIONAL
2.60	N/A	N/A	3	100%	7.80	PRETRASFUCIONAL
0.69	N/A	N/A	2	100%	1.38	PRETRASFUCIONAL
1.86	N/A	N/A	1	100%	1.86	PRETRASFUCIONAL
2.14	N/A	N/A	2	100%	4.28	BAÑO URGENCIAS
0.88	N/A	N/A	1	100%	0.88	MUESTRAS SINCIO
1.32	N/A	N/A	4	100%	5.28	MUESTRAS SINCIO
1.07	N/A	N/A	3	100%	3.21	MUESTRAS SINCIO
2.64	N/A	N/A	2	100%	5.28	TOMA DE MUESTRAS
1.21	N/A	N/A	2	100%	2.42	ENTRADA INSPECION HOSPITALARIA
1.16	N/A	N/A	1	100%	1.16	ENTRADA INSPECION HOSPITALARIA
2.56	N/A	N/A	14	100%	35.48	FARMACIA
2.10	N/A	N/A	1	100%	2.10	FARMACIA
3.04	N/A	N/A	2	100%	6.08	FARMACIA
1.50	N/A	N/A	6	100%	9.00	FARMACIA
1.64	N/A	N/A	1	100%	1.64	FARMACIA
2.10	N/A	N/A	6	100%	12.60	FARMACIA
2.60	N/A	N/A	4	100%	10.40	FARMACIA
1.00	N/A	N/A	1	100%	1.88	CIRCULACION HALL
0.90	N/A	N/A	1	100%	0.90	CIRCULACION HALL
1.29	N/A	N/A	1	100%	1.29	CIRCULACION HALL
1.20	N/A	N/A	1	100%	1.20	CIRCULACION HALL
2.10	N/A	N/A	3	100%	6.30	ADMISIONES
0.80	N/A	N/A	1	100%	0.80	HANOGRAFO
1.10	N/A	N/A	1	100%	1.10	IMAGENOLOGIA
1.00	N/A	N/A	1	100%	1.00	IMAGENOLOGIA
0.40	N/A	N/A	2	100%	0.80	IMAGENOLOGIA
2.60	N/A	N/A	1	100%	2.40	ADMISIONES
2.10	N/A	N/A	9	100%	19.50	ADMISIONES
1.10	N/A	N/A	1	100%	1.10	ADMISIONES
0.90	N/A	N/A	2	100%	1.80	ADMISIONES
2.60	N/A	N/A	1	100%	2.60	PROCEDIMIETOS
2.10	N/A	N/A	2	100%	4.28	PROCEDIMIENTOS
0.90	N/A	N/A	1	100%	0.90	PROCEDIMIETOS
2.60	N/A	N/A	2	100%	5.20	CONSULTORIO CARDIOLOGIA
0.70	N/A	N/A	1	100%	0.70	CIRCULACION HALL A ASEPSIA
2.10	N/A	N/A	2	100%	4.20	CIRCULACION HALL A ASEPSIA
0.90	N/A	N/A	1	100%	0.90	CIRCULACION HALL A ASEPSIA
2.60	N/A	N/A	1	100%	2.40	OFICINA RADIOLOGIA
2.60	N/A	N/A	1	100%	2.60	INSUMOS
0.90	N/A	N/A	1	100%	0.90	INSUMOS
2.10	N/A	N/A	1	100%	2.10	INSUMOS
2.60	N/A	N/A	3	100%	10.40	SALA DE ESPERA CONSULTORIO ECOGRAFIA
2.10	N/A	N/A	2	100%	4.28	SALA DE ESPERA CONSULTORIO ECOGRAFIA
1.10	N/A	N/A	2	100%	2.28	SALA DE ESPERA CONSULTORIO ECOGRAFIA
1.00	N/A	N/A	2	100%	2.00	SALA DE ESPERA CONSULTORIO ECOGRAFIA
0.80	N/A	N/A	2	100%	8.80	SALA DE ESPERA CONSULTORIO ECOGRAFIA
2.10	N/A	N/A	2	100%	4.28	ECOGRAFIA
1.20	N/A	N/A	1	100%	1.28	ECOGRAFIA
2.10	N/A	N/A	2	100%	4.70	ECOGRAFIA
0.80	N/A	N/A	1	100%	0.80	ECOGRAFIA
2.80	N/A	N/A	3	100%	7.08	CONSULTORIO ECOGRAFIA
2.10	N/A	N/A	2	100%	4.28	CONSULTORIO ECOGRAFIA
0.80	N/A	N/A	1	100%	0.80	CONSULTORIO ECOGRAFIA
2.10	N/A	N/A	9	100%	19.98	CIRCULACION AGUDO URGENCIAS
11.47	N/A	N/A	1	100%	11.47	SALAS DINTE CONSULTORIO 1
4.00	N/A	N/A	4	100%	16.00	SALAS DINTE CONSULTORIO 1
1.40	N/A	N/A	2	100%	2.80	CONSULTORIO 1
1.00	N/A	N/A	4	100%	4.00	CONSULTORIO 1
2.10	N/A	N/A	2	100%	4.20	CONSULTORIO 1
0.80	N/A	N/A	1	100%	0.80	APOYO AREA GINECOLOGIA
1.73	N/A	N/A	1	100%	1.73	REANIMACION
1.30	N/A	N/A	8	100%	10.40	REANIMACION
2.10	N/A	N/A	2	100%	4.20	REANIMACION
2.15	N/A	N/A	1	100%	2.15	CIRCULACION SALA DE ESPERA HALL
2.10	N/A	N/A	6	100%	12.60	CIRCULACION SALA DE ESPERA HALL
1.00	N/A	N/A	1	100%	1.00	CIRCULACION SALA DE ESPERA HALL
2.70	N/A	N/A	1	100%	2.70	CIRCULACION SALA DE ESPERA HALL
1.70	N/A	N/A	1	100%	1.70	CIRCULACION SALA DE ESPERA HALL
1.00	N/A	N/A	1	100%	1.00	CIRCULACION SALA DE ESPERA HALL
0.90	N/A	N/A	1	100%	0.90	CIRCULACION SALA DE ESPERA HALL
0.60	N/A	N/A	3	100%	3.20	CIRCULACION SALA DE ESPERA HALL
2.50	N/A	N/A	1	100%	0.00	CIRCULACION SALA DE ESPERA HALL
0.40	N/A	N/A	8	100%	3.20	CIRCULACION SALA DE ESPERA HALL
0.80	N/A	N/A	2	100%	1.60	CUARTO PERSONAL ASISTENCIAL
2.00	N/A	N/A	2	100%	4.00	CUARTO PERSONAL ASISTENCIAL
0.80	N/A	N/A	1	100%	1.60	CUARTO PERSONAL ASISTENCIAL
2.76	N/A	N/A	6	100%	16.28	FACTURACION




30 jun 2025 12:03:05 p. m.
51 Avenida Universitaria
Tunja
Boyacá
#CONSORCIO TERMINACIÓN UMI

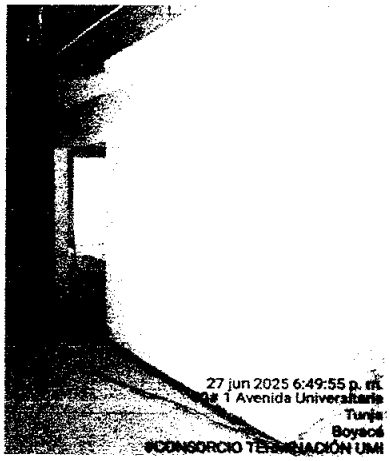

27 jun 2025 6:49:55 p. m.
1 Avenida Universitaria
Tunja
Boyacá
#CONSORCIO TERMINACIÓN UMI




2025 3:56:36 p. m.
Universitaria
Tunja
Boyacá
#CONSORCIO TERMINACIÓN UMI




2:55:17 p.
Universitaria
Tunja
Boyacá
TERMINACIÓN UMI

1.00	N/A	N/A	4	100%	4.08	ILACTURACION
2.75	N/A	N/A	1	100%	16.28	SALE GENERAL
2.30	N/A	N/A	4	100%	9.20	COCINETA
1.90	N/A	N/A	1	100%	1.90	COCINETA
2.10	N/A	N/A	3	100%	6.30	CAFETERIA
0.99	N/A	N/A	2	100%	1.80	CAFETERIA
1.30	N/A	N/A	1	100%	1.30	CAFETERIA
2.10	N/A	N/A	1	100%	2.10	PUERTA MAMOGRAFO
0.50	N/A	N/A	1	100%	0.50	PUERTA PINTU
1.70	N/A	N/A	1	100%	1.70	TAC
2.10	N/A	N/A	1	100%	2.10	TAC
0.80	N/A	N/A	3	100%	2.40	TAC
1.70	N/A	N/A	2	100%	3.40	DISPARO
2.38	N/A	N/A	3	100%	7.14	DISPARO
2.10	N/A	N/A	2	100%	4.20	DISPARO
0.90	N/A	N/A	1	100%	0.90	DISPARO
2.35	N/A	N/A	6	100%	14.70	OBSERVACION GINECOSTETRICA
2.16	N/A	N/A	6	100%	12.96	OBSERVACION GINECOSTETRICA
0.80	N/A	N/A	2	100%	1.60	OBSERVACION GINECOSTETRICA
0.90	N/A	N/A	1	100%	0.90	OBSERVACION GINECOSTETRICA
2.73	N/A	N/A	3	100%	8.19	OBSERVACION PEDIATRIA
0.79	N/A	N/A	3	100%	2.37	OBSERVACION PEDIATRIA
0.51	N/A	N/A	2	100%	1.02	OBSERVACION PEDIATRIA
2.15	N/A	N/A	11	100%	23.65	OBSERVACION PEDIATRIA
2.13	N/A	N/A	3	100%	6.39	OBSERVACION PEDIATRIA
6.67	N/A	N/A	1	100%	6.67	CENTRAL DE UMI ENFERMERIA
0.80	N/A	N/A	2	100%	1.60	CENTRAL DE ENFERMERIA
1.00	N/A	N/A	3	100%	3.00	DRUGNOJAS
2.42	N/A	N/A	3	100%	7.26	CRUCE DIMERO DO ASEPTICOS
0.90	N/A	N/A	2	100%	1.80	DIGITACION
2.10	N/A	N/A	1	100%	8.40	DIGITACION
1.00	N/A	N/A	2	100%	2.00	DIGITACION
1.30	N/A	N/A	2	100%	2.60	DIGITACION
2.50	N/A	N/A	3	100%	7.50	SALA ERA
2.10	N/A	N/A	3	100%	6.30	SALA ERA
1.30	N/A	N/A	2	100%	2.60	SALA ERA
1.00	N/A	N/A	2	100%	2.00	SALA ERA
0.90	N/A	N/A	1	100%	0.90	SALA ERA
2.00	N/A	N/A	1	100%	18.00	CONSULTORIO 1
2.10	N/A	N/A	1	100%	2.10	CONSULTORIO 1
0.90	N/A	N/A	1	100%	8.90	CONSULTORIO 1
1.00	N/A	N/A	2	100%	2.00	CONSULTORIO 1
1.40	N/A	N/A	2	100%	2.80	CONSULTORIO 1
2.90	N/A	N/A	2	180%	5.80	CONSULTORIO 2
2.10	N/A	N/A	1	100%	2.10	CONSULTORIO 2
0.99	N/A	N/A	1	100%	8.90	CONSULTORIO 2
1.20	N/A	N/A	1	100%	1.20	CONSULTORIO 2
1.30	N/A	N/A	2	100%	2.60	CONSULTORIO 2
1.50	N/A	N/A	2	100%	3.00	CONSULTORIO 2
2.50	N/A	N/A	2	100%	5.00	CONSULTORIO 1
2.10	N/A	N/A	1	100%	2.10	CONSULTORIO 1
1.20	N/A	N/A	1	100%	1.20	CONSULTORIO 1
0.93	N/A	N/A	2	100%	1.86	CONSULTORIO 1
0.92	N/A	N/A	2	100%	1.84	CONSULTORIO 1
2.50	N/A	N/A	3	100%	7.50	ADMISIONES
2.10	N/A	N/A	2	100%	4.20	NEUROCONTINUIDAD
2.52	N/A	N/A	1	100%	19.08	SALA ESPERA URGENCIAS
1.40	N/A	N/A	4	100%	5.60	SALA ESPERA URGENCIAS
2.10	N/A	N/A	2	100%	4.20	SALA ESPERA URGENCIAS
2.52	N/A	N/A	2	100%	5.04	SALA ESPERA URGENCIAS
1.20	N/A	N/A	2	100%	2.48	SALA ESPERA URGENCIAS
1.70	N/A	N/A	1	100%	1.70	SALA ESPERA URGENCIAS
0.75	N/A	N/A	2	100%	1.50	CONSULTORIO SALA DE ESPERA
2.52	N/A	N/A	1	100%	2.52	DESCANSO INTERNOS
2.10	N/A	N/A	1	180%	2.10	DESCANSO INTERNOS
0.80	N/A	N/A	1	180%	8.88	DESCANSO INTERNOS
2.42	N/A	N/A	3	180%	12.60	EQUIPOS
2.10	N/A	N/A	1	100%	2.10	EQUIPOS
6.00	N/A	N/A	1	100%	6.00	EQUIPOS
2.34	N/A	N/A	4	122%	10.16	PASILLO - SALA ESPERA A FARMACIA: COLUMNA
1.84	N/A	N/A	1	180%	1.84	PASILLO - SALA ESPERA A FARMACIA: VENTANA
2.10	N/A	N/A	1	100%	2.10	CONTROL INGENOLOGIA - CARDIOLOGIA: VANO PUERTA (ALTO)
0.90	N/A	N/A	1	180%	8.90	CONTROL INGENOLOGIA - CARDIOLOGIA: VANO PUERTA (ANCHO)
2.50	N/A	N/A	1	100%	2.50	SALA ESPERA - RECEPCION: ANTEPECHO (LARGO)
1.80	N/A	N/A	1	180%	1.80	SALA ESPERA - RECEPCION: ANTEPECHO (ALTO)
3.51	N/A	N/A	1	180%	3.51	CONTROL INGENOLOGIA - CARDIO: ANTEPECHO
1.50	N/A	N/A	1	122%	1.50	CONTROL INGENOLOGIA - CARDIOCOLUMNA
2.50	N/A	N/A	1	100%	2.50	SALA ESPERA - RECEPCION: MURO CORTO LATERAL INFRENO
2.64	N/A	N/A	2	180%	5.28	CAMILLA Y SILLAS RUEDAS: COLUMNA
2.00	N/A	N/A	1	100%	2.00	DE ACCESO URG A PASILLO HACIA CENTRAL DE ENFERMERIA: PUERTA ACCESO (ANCHO)
2.10	N/A	N/A	1	100%	2.10	DE ACCESO URG A PASILLO HACIA CENTRAL DE ENFERMERIA: PUERTA ACCESO (ALTO)
2.54	N/A	N/A	5	100%	12.70	MONITOREO GINECOOBTETRIA: COLUMNAS
2.10	N/A	N/A	3	100%	6.30	MONITOREO GINECOOBTETRIA: PUERTAS (ALTOS)
0.90	N/A	N/A	1	180%	0.88	MONITOREO GINECOOBTETRIA: PUERTA BAÑO (ANCHO)
0.70	N/A	N/A	1	100%	0.70	ENTORNO GINECOOBTETRIA: PUERTA CUARTO LIMPIEZA (ANCHO)
1.71	N/A	N/A	1	122%	1.71	MONITOREO GINECOOBTETRIA: PUERTA PRINCIPAL (ANCHO)
0.95	N/A	N/A	4	122%	3.88	SALA EDA: VENTANA EXTERIOR
1.00	N/A	N/A	2	100%	2.00	SALA EDA: VENTANA PASILLO (ANCHO)
1.07	N/A	N/A	2	180%	2.14	SALA EDA: VENTANA PASILLO (ALTO)
2.10	N/A	N/A	4	180%	8.40	SALA EDA: PUERTAS (ALTOS)
0.80	N/A	N/A	1	100%	0.80	SALA EDA: PUERTA BAÑO (ANCHO)
1.00	N/A	N/A	1	108%	1.88	SALA EDA: PUERTA PRINCIPAL (ANCHO)
2.62	N/A	N/A	4	180%	10.52	SALA EDA: COLUMNAS
1.13	N/A	N/A	2	100%	2.26	AUDITORIO (MURO ORIENTAL): VENTANA (ANCHO)
1.72	N/A	N/A	1	100%	1.72	AUDITORIO (MURO ORIENTAL): VENTANA (ALTO)
2.62	N/A	N/A	1	180%	2.62	AUDITORIO (MURO ORIENTAL): COLUMNA
3.80	N/A	N/A	4	100%	15.20	
2.37	N/A	N/A	1	100%	2.37	AUDITORIO (MURO NORTE): VENTANA
2.62	N/A	N/A	1	100%	2.62	
2.66	N/A	N/A	5	100%	13.30	AUDITORIO (MURO NORTE): COLUMNAS
3.88	N/A	N/A	2	180%	7.76	SALA ESPERA ADULTO: VENTANA (ANCHO)
2.60	N/A	N/A	1	100%	2.60	SALA ESPERA ADULTO: VENTANA (ALTO)
2.60	N/A	N/A	6	100%	15.60	SALA ESPERA ADULTO: COLUMNAS
2.10	N/A	N/A	1	100%	2.52	INSUMOS DISPOSITIVOS FARMACIA (DIGITACION): PUERTA (ALTO)
0.79	N/A	N/A	1	100%	0.79	INSUMOS DISPOSITIVOS FARMACIA (DIGITACION): PUERTA (ANCHO)
2.10	N/A	N/A	2	100%	4.20	ROPA LIMPIA (DIGITACION): PUERTA (ALTO)
0.90	N/A	N/A	1	100%	0.90	ROPA LIMPIA (DIGITACION): PUERTA (ANCHO)
2.10	N/A	N/A	1	122%	2.10	ROPA SUCIA (DIGITACION): PUERTA (ALTO)
0.90	N/A	N/A	1	100%	0.90	ROPA SUCIA (DIGITACION): PUERTA (ANCHO)
2.53	N/A	N/A	2	100%	5.06	REANIMACION: COLUMNA
2.57	N/A	N/A	4	108%	10.28	DIGITACION: COLUMNA
2.80	N/A	N/A	3	100%	7.80	OBS GINECOTETRICA
2.56	N/A	N/A	2	180%	5.12	PROCEDIMIENTOS: COLUMNAS
2.52	N/A	N/A	2	100%	5.04	SALA DE LECTURA DE MAMOGRAFIA: COLUMNAS
2.50	N/A	N/A	5	180%	12.50	RX: COLUMNAS
2.56	N/A	N/A	2	180%	5.12	TOMA DE MUESTRAS GINECOLOGICA: COLUMNA
2.56	N/A	N/A	2	100%	5.12	RESIDUOS REGULARES ORDINARIOS: COLUMNAS
2.60	N/A	N/A	8	100%	20.80	COCINA: COLUMNAS
2.60	N/A	N/A	2	180%	5.20	CAFETERIA: COLUMNAS
2.10	N/A	N/A	1	180%	2.10	INSUMOS DISPOSITIVOS FARMACIA (DIGITACION):
0.70	N/A	N/A	1	100%	0.70	PUERTA
2.10	N/A	N/A	2	122%	4.20	ROPA LIMPIA (DIGITACION): PUERTA
0.90	N/A	N/A	1	122%	0.93	
2.10	N/A	N/A	1	100%	2.10	ROPA SUCIA (DIGITACION): PUERTA
0.92	N/A	N/A	1	100%	0.90	
		PISO 2				
0.90	N/A	N/A	1	100%	8.05	PASILLO RECUPERACION QUIRURGICA
2.10	N/A	N/A	8	100%	16.80	PASILLO RECUPERACION QUIRURGICA
2.50	N/A	N/A	3	100%	7.50	PASILLO RECUPERACION QUIRURGICA



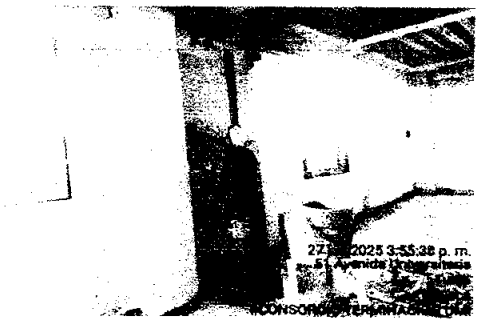




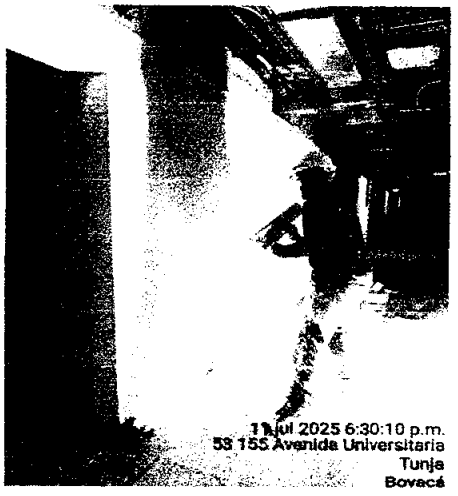



3.70	N/A	N/A	1	100%	3.70	PREPARACION PACIENTES
2.10	N/A	N/A	4	100%	8.40	PREPARACION PACIENTES
2.40	N/A	N/A	2	100%	4.80	PREPARACION PACIENTES
3.11	N/A	N/A	1	100%	3.11	RECUPERACION QUIRURGICA
2.10	N/A	N/A	3	100%	6.30	PACIENTES
2.97	N/A	N/A	6	100%	17.82	LUJAN ESCORREDIZAS
1.70	N/A	N/A	1	100%	1.70	COLUMNA
8.47	N/A	N/A	1	100%	8.47	CENTRAL DE ESTERILIZACION
1.48	N/A	N/A	2	100%	2.96	FAJAS VENTANAS
1.00	N/A	N/A	2	100%	2.00	FAJAS VENTANAS
2.50	N/A	N/A	6	100%	15.00	CENTRAL DE ESTERILIZACION
2.50	N/A	N/A	2	100%	5.00	INGRESO AUTOCLAVE
18.61	N/A	N/A	1	100%	18.61	CIRCULACION QUIROFANOS
2.10	N/A	N/A	21	100%	44.10	CIRCULACION QUIROFANOS
1.00	N/A	N/A	18	100%	18.00	CIRCULACION QUIROFANOS
1.50	N/A	N/A	2	100%	3.00	CIRCULACION QUIROFANOS
0.90	N/A	N/A	2	100%	1.80	CIRCULACION QUIROFANOS
2.15	N/A	N/A	2	100%	4.30	CIRCULACION QUIROFANOS
2.50	N/A	N/A	5	180%	12.50	SALA DE PARTOS 1
0.95	N/A	N/A	4	100%	3.80	SALA DE PARTOS 1
2.60	N/A	N/A	2	100%	5.20	SALA DE PARTOS 2
0.98	N/A	N/A	2	100%	1.96	VENTANA
1.12	N/A	N/A	2	100%	8.24	VENTANA
3.21	N/A	N/A	2	180%	6.42	DESCANSO QUIROFANOS
0.50	N/A	N/A	2	180%	1.00	VENTANA OFICINA COLUMNA
2.10	N/A	N/A	1	100%	2.10	QUIROFANO 1
2.50	N/A	N/A	2	100%	5.00	QUIROFANO 2
2.60	N/A	N/A	2	100%	5.20	QUIROFANO 2
2.60	N/A	N/A	3	100%	7.80	PASILLO TRABAJO SUCIO
0.80	N/A	N/A	2	180%	1.60	PASILLO TRABAJO SUCIO
2.10	N/A	N/A	2	180%	4.20	PASILLO TRABAJO SUCIO
1.08	N/A	N/A	1	100%	1.08	PASILLO TRABAJO SUCIO
0.37	N/A	N/A	2	180%	0.74	PASILLO TRABAJO SUCIO
2.00	N/A	N/A	2	100%	4.00	FARMACIA
0.37	N/A	N/A	2	100%	0.74	FARMACIA
2.00	N/A	N/A	2	100%	4.00	FARMACIA
2.50	N/A	N/A	5	100%	12.50	FARMACIA
2.10	N/A	N/A	1	100%	2.10	FARMACIA
0.86	N/A	N/A	1	100%	0.86	FARMACIA
2.10	N/A	N/A	1	100%	2.10	BODEGA
0.86	N/A	N/A	1	100%	0.86	BODEGA
2.10	N/A	N/A	3	180%	6.30	DESCANSO
0.86	N/A	N/A	1	100%	0.86	DESCANSO
1.00	N/A	N/A	4	100%	4.00	DESCANSO
0.60	N/A	N/A	1	100%	0.60	DESCANSO
2.50	N/A	N/A	9	100%	22.50	DESCANSO
2.10	N/A	N/A	7	100%	14.70	VESTIER MUJERES
0.80	N/A	N/A	2	180%	1.60	VESTIER MUJERES
0.70	N/A	N/A	3	100%	2.10	VESTIER MUJERES
2.40	N/A	N/A	1	100%	2.40	VESTIER MUJERES
2.10	N/A	N/A	4	100%	8.40	VESTIER HOMBRES
0.87	N/A	N/A	2	100%	1.60	VESTIER HOMBRES
0.70	N/A	N/A	2	100%	1.40	VESTIER HOMBRES
2.10	N/A	N/A	3	180%	7.20	VESTIER HOMBRES
2.10	N/A	N/A	23	105%	48.30	PASILLO PRINCIPAL UCI
15.60	N/A	N/A	1	100%	15.60	PUERTA DINTEL
2.25	N/A	N/A	5	100%	12.25	ESQUINERO
3.00	N/A	N/A	1	100%	3.00	RECEPCION
2.10	N/A	N/A	3	100%	6.30	TRABAJO DE PARTOS
0.70	N/A	N/A	1	100%	0.70	TRABAJO DE PARTOS
0.86	N/A	N/A	1	100%	0.86	TRABAJO DE PARTOS
0.90	N/A	N/A	1	100%	0.90	TRABAJO DE PARTOS
2.50	N/A	N/A	8	100%	20.00	TRABAJO DE PARTOS
4.69	N/A	N/A	1	100%	4.69	CENTRAL DE ENFERMERIA
2.10	N/A	N/A	3	100%	6.48	RECUPERACION PARTOS
0.95	N/A	N/A	1	100%	8.95	RECUPERACION PARTOS
0.80	N/A	N/A	1	100%	0.80	RECUPERACION PARTOS
1.80	N/A	N/A	1	100%	1.80	RECUPERACION PARTOS
0.89	N/A	N/A	1	100%	0.89	RECUPERACION PARTOS
0.90	N/A	N/A	1	188%	0.90	RECUPERACION PARTOS
2.50	N/A	N/A	20	100%	50.00	RECUPERACION PARTOS
5.31	N/A	N/A	1	100%	5.31	CENTRAL DE ENFERMERIA
2.50	N/A	N/A	2	100%	5.00	ROPA LIMPIA
2.50	N/A	N/A	2	188%	5.00	FAJA VESTIER PARTOS
2.17	N/A	N/A	12	188%	25.20	UCI ADULTOS (UARO)
0.86	N/A	N/A	4	180%	3.28	UCI ADULTOS (UARO)
1.10	N/A	N/A	2	100%	2.20	UCI ADULTOS (UARO)
1.80	N/A	N/A	3	100%	3.90	UCI ADULTOS (UARO)
1.91	N/A	N/A	2	100%	2.66	UCI ADULTOS (UARO)
0.92	N/A	N/A	2	180%	1.84	UCI ADULTOS (UARO)
0.20	N/A	N/A	4	100%	1.09	UCI ADULTOS (UARO)
0.80	N/A	N/A	2	188%	1.60	UCI ADULTOS (UARO)
0.98	N/A	N/A	3	100%	3.88	UCI ADULTOS (UARO)
1.30	N/A	N/A	1	100%	1.30	UCI ADULTOS (UARO)
1.20	N/A	N/A	2	100%	7.40	UCI ADULTOS (UARO)
0.60	N/A	N/A	1	188%	0.60	UCI ADULTOS (UARO)
2.47	N/A	N/A	2	100%	4.78	UCI ADULTOS (UARO)
0.95	N/A	N/A	4	100%	3.80	UCI ADULTOS (UARO)
0.98	N/A	N/A	1	180%	0.98	UCI ADULTOS (UARO)
0.80	N/A	N/A	3	100%	2.40	UCI ADULTOS (UARO)
0.70	N/A	N/A	1	100%	0.70	UCI ADULTOS (UARO)
0.80	N/A	N/A	1	100%	0.80	UCI ADULTOS (UARO)
2.50	N/A	N/A	47	180%	117.50	UCI ADULTOS (UARO)
12.00	N/A	N/A	2	100%	24.00	MUR DIVISORIO UCI 1 Y UCI 2
11.72	N/A	N/A	2	100%	23.44	MUR DIVISORIO UCI 2 Y UCI 3
12.56	N/A	N/A	2	100%	25.12	MUR DIVISORIO UCI 3 Y UCI 4
11.72	N/A	N/A	2	100%	23.44	MUR DIVISORIO UCI 4 Y UCI 5
11.79	N/A	N/A	2	100%	23.59	MUR DIVISORIO UCI 5 Y UCI 6
13.31	N/A	N/A	2	100%	26.62	MUR DIVISORIO UCI 7 Y UCI 8
12.74	N/A	N/A	2	100%	25.48	MURO DIVISORIO UCI 8 Y UCI 9
3.77	N/A	N/A	1	188%	3.77	CENTRAL DE ENFERMERIA UCI 8 Y 9
4.54	N/A	N/A	1	100%	4.54	CENTRAL DE ENFERMERIA UCI 5 A 6
0.80	N/A	N/A	4	100%	3.20	DESCANSO
2.10	N/A	N/A	4	188%	8.40	DESCANSO
2.50	N/A	N/A	1	180%	2.50	DESCANSO
1.50	N/A	N/A	2	188%	3.00	FILTRO
1.00	N/A	N/A	2	100%	2.00	BUFFET
2.50	N/A	N/A	2	100%	5.00	ACCESO UCI NEONATAL
2.50	N/A	N/A	3	100%	7.50	LACTARIO
2.50	N/A	N/A	1	180%	2.50	LACTARIO
2.40	N/A	N/A	4	100%	8.60	LACTARIO
0.80	N/A	N/A	1	100%	0.88	AMBIENTE DE TRABAJO ESTERIL
1.00	N/A	N/A	1	100%	1.00	AMBIENTE DE TRABAJO ESTERIL
2.10	N/A	N/A	4	100%	8.40	AMBIENTE DE TRABAJO ESTERIL
0.80	N/A	N/A	2	100%	1.00	AMBIENTE DE TRABAJO ESTERIL
2.40	N/A	N/A	1	100%	2.40	UCI NEONATAL
0.70	N/A	N/A	2	100%	1.40	UCI NEONATAL
0.80	N/A	N/A	2	100%	1.60	UCI NEONATAL
1.30	N/A	N/A	28	100%	36.40	UCI NEONATAL
0.95	N/A	N/A	2	188%	8.60	UCI NEONATAL
0.90	N/A	N/A	2	100%	1.88	UCI NEONATAL
1.05	N/A	N/A	2	100%	2.10	UCI NEONATAL
1.00	N/A	N/A	2	100%	2.00	UCI NEONATAL
3.70	N/A	N/A	6	100%	4.20	UCI NEONATAL
0.90	N/A	N/A	4	100%	3.60	UCI NEONATAL
1.00	N/A	N/A	1	100%	1.08	UCI NEONATAL
0.70	N/A	N/A	1	100%	0.70	UCI NEONATAL
1.35	N/A	N/A	1	100%	1.35	UCI NEONATAL
0.70	N/A	N/A	1	100%	0.70	UCI NEONATAL
2.50	N/A	N/A	36	100%	90.08	UCI NEONATAL
3.71	N/A	N/A	1	100%	3.71	AISLADO INTENSIVO
8.67	N/A	N/A	1	100%	8.67	AISLADO INTENSIVO
4.56	N/A	N/A	3	100%	15.64	CENTRAL DE ESTERILIZACION
7.69	N/A	N/A	1	188%	7.69	CENTRAL DE ENFERMERIA
0.90	N/A	N/A	4	100%	3.20	PASILLO DESCANSO
2.10	N/A	N/A	4	100%	8.30	PASILLO DESCANSO
0.80	N/A	N/A	1	100%	0.80	DESCANSO
2.10	N/A	N/A	1	100%	2.80	DESCANSO
1.80	N/A	N/A	1	100%	5.20	DESCANSO
1.90	N/A	N/A	1	100%	1.88	DESCANSO
0.90	N/A	N/A	1	188%	0.98	DESCANSO
0.80	N/A	N/A	1	100%	8.00	PASILLO DESCANSO
1.20	N/A	N/A	1	100%	1.20	PASILLO DESCANSO
2.10	N/A	N/A	2	100%	4.20	PASILLO DESCANSO
2.10	N/A	N/A	3	100%	6.30	PASILLO ACCESO ASISTENCIAL


[illegible] CONSOLIDACIÓN, TERMINACIÓN UMI






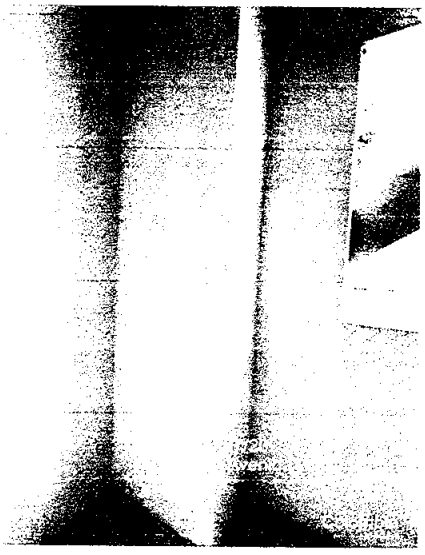







0.90	N/A	N/A	1	100%	8.98	PASILLO ACCESO ASISTENCIAL
0.75	N/A	N/A	1	100%	0.75	PASILLO ACCESO ASISTENCIAL
0.80	N/A	N/A	1	100%	8.80	PASILLO ACCESO ASISTENCIAL
1.50	N/A	N/A	1	100%	1.50	ROPA LIMPIA
1.73	N/A	N/A	1	100%	1.73	ROPA SUCIA
8.40	N/A	N/A	1	100%	8.40	VESTIER
0.80	N/A	N/A	4	100%	3.20	VESTIER
0.70	N/A	N/A	1	100%	8.70	VESTIER
3.60	N/A	N/A	2	100%	7.20	VESTIER
2.10	N/A	N/A	2	100%	4.28	COORDINACION
1.80	N/A	N/A	1	100%	1.80	COORDINACION
4.30	N/A	N/A	2	100%	8.60	COORDINACION
2.50	N/A	N/A	3	100%	7.50	HALL
		PISO 3				
2.10	N/A	N/A	2	100%	4.28	
0.90	N/A	N/A	1	100%	0.90	
2.10	N/A	N/A	1	100%	2.18	
0.80	N/A	N/A	1	100%	8.80	
2.10	N/A	N/A	2	100%	8.20	
0.80	N/A	N/A	2	100%	1.60	
2.60	N/A	N/A	1	100%	2.60	
2.10	N/A	N/A	2	100%	4.20	
1.80	N/A	N/A	1	100%	1.80	
1.50	N/A	N/A	2	100%	3.00	
1.05	N/A	N/A	1	100%	1.85	
2.10	N/A	N/A	1	100%	2.10	
0.90	N/A	N/A	1	100%	8.90	
2.10	N/A	N/A	1	100%	2.10	
0.90	N/A	N/A	1	100%	6.90	
2.52	N/A	N/A	6	100%	15.12	
0.90	N/A	N/A	5	100%	4.50	
2.10	N/A	N/A	14	100%	29.40	
0.70	N/A	N/A	2	100%	1.40	
5.10	N/A	N/A	1	100%	5.18	
6.10	N/A	N/A	1	100%	6.40	
5.70	N/A	N/A	1	100%	5.70	
1.90	N/A	N/A	1	100%	3.80	
2.50	N/A	N/A	1	100%	2.50	
2.10	N/A	N/A	2	100%	4.28	
0.90	N/A	N/A	1	100%	8.90	
2.10	N/A	N/A	1	100%	2.10	
0.83	N/A	N/A	2	100%	1.66	
0.90	N/A	N/A	2	100%	1.88	
2.10	N/A	N/A	2	100%	4.20	
0.80	N/A	N/A	2	100%	1.60	
2.10	N/A	N/A	9	100%	18.90	
0.80	N/A	N/A	7	100%	5.60	
0.99	N/A	N/A	1	100%	0.99	
2.40	N/A	N/A	3	100%	6.09	
2.80	N/A	N/A	1	100%	2.88	
2.12	N/A	N/A	1	100%	2.12	
2.10	N/A	N/A	2	100%	4.90	
2.55	N/A	N/A	2	100%	5.10	
1.18	N/A	N/A	1	100%	1.18	
2.75	N/A	N/A	5	100%	5.49	UCI # 1
0.80	N/A	N/A	2	100%	1.60	UCI # 1
1.50	N/A	N/A	2	100%	3.88	UCI # 1
0.70	N/A	N/A	2	100%	1.48	UCI # 1
0.90	N/A	N/A	2	100%	1.88	UCI # 2
1.50	N/A	N/A	2	188%	3.08	UCI # 2
2.70	N/A	N/A	1	188%	2.78	UCI # 2
0.70	N/A	N/A	2	160%	1.48	UCI # 2
2.40	N/A	N/A	1	100%	5.00	UCI # 3
0.90	N/A	N/A	2	100%	1.80	UCI # 5
1.90	N/A	N/A	2	198%	3.88	UCI # 5
1.70	N/A	N/A	1	100%	1.70	UCI # 5
0.70	N/A	N/A	2	180%	1.40	UCI # 5
2.50	N/A	N/A	2	100%	5.00	UCI # 6
2.50	N/A	N/A	2	180%	5.00	UCI # 7
0.70	N/A	N/A	2	100%	1.40	UCI # 7
2.70	N/A	N/A	1	180%	2.78	UCI # 7
2.70	N/A	N/A	2	180%	5.40	UCI # 8
0.90	N/A	N/A	2	180%	1.80	UCI # 8
1.50	N/A	N/A	2	100%	3.88	UCI # 8
1.70	N/A	N/A	1	100%	1.78	UCI # 8
0.90	N/A	N/A	2	100%	1.80	UCI # 11
2.50	N/A	N/A	2	180%	5.00	UCI # 11
0.70	N/A	N/A	2	180%	1.40	UCI # 11
1.70	N/A	N/A	1	100%	1.78	UCI # 11
2.10	N/A	N/A	2	100%	4.28	UCI # 12
0.90	N/A	N/A	1	189%	0.98	UCI # 12
1.80	N/A	N/A	1	100%	4.08	UCI # 12
1.70	N/A	N/A	1	100%	1.78	UCI # 12
0.90	N/A	N/A	2	100%	1.88	UCI # 12
1.50	N/A	N/A	2	180%	3.09	UCI # 12
2.50	N/A	N/A	2	188%	5.88	UCI # 10
0.77	N/A	N/A	2	100%	1.48	UCI # 10
1.70	N/A	N/A	1	180%	1.78	UCI # 10
3.05	N/A	N/A	2	100%	6.10	UCI # 8
0.70	N/A	N/A	2	100%	1.40	UCI # 8
1.50	N/A	N/A	2	100%	3.00	UCI # 8
0.90	N/A	N/A	2	100%	1.88	UCI # 8
1.05	N/A	N/A	1	180%	1.65	UCI # 8
3.00	N/A	N/A	2	180%	6.88	UCI # 2
0.70	N/A	N/A	2	100%	1.40	UCI # 2
2.70	N/A	N/A	1	100%	2.78	UCI # 2
3.00	N/A	N/A	2	108%	6.00	UCI # 4
0.70	N/A	N/A	2	100%	1.40	UCI # 4
2.70	N/A	N/A	2	100%	5.40	UCI # 4
3.00	N/A	N/A	2	188%	6.88	UCI # 2
0.70	N/A	N/A	2	109%	1.40	UCI # 2
2.10	N/A	N/A	2	100%	4.20	CIRCULACION
0.85	N/A	N/A	2	100%	1.60	CIRCULACION
2.39	N/A	N/A	1	100%	2.78	CIRCULACION
		PISO 4				
2.40	N/A	N/A	3	100%	6.98	HABITACION 425
0.90	N/A	N/A	1	100%	0.80	HABITACION 425
1.90	N/A	N/A	3	100%	7.84	HABITACION 425
1.70	N/A	N/A	1	100%	1.20	HABITACION 425
0.77	N/A	N/A	1	100%	0.77	HABITACION 425
2.40	N/A	N/A	5	100%	11.50	HABITACION 424
0.90	N/A	N/A	1	100%	8.90	HABITACION 424
1.90	N/A	N/A	3	100%	7.84	HABITACION 424
1.70	N/A	N/A	1	100%	1.20	HABITACION 424
0.77	N/A	N/A	1	100%	0.77	HABITACION 424
2.40	N/A	N/A	4	100%	6.90	HABITACION 423
0.90	N/A	N/A	1	100%	0.98	HABITACION 423
1.90	N/A	N/A	3	100%	7.84	HABITACION 423
1.20	N/A	N/A	1	100%	1.20	HABITACION 423
0.77	N/A	N/A	1	100%	8.77	HABITACION 423
2.30	N/A	N/A	5	100%	11.50	HABITACION 422
0.90	N/A	N/A	1	100%	8.98	HABITACION 422
1.90	N/A	N/A	2	100%	3.92	HABITACION 422
1.20	N/A	N/A	1	100%	1.28	HABITACION 422
0.77	N/A	N/A	1	100%	0.77	HABITACION 422
2.40	N/A	N/A	3	100%	6.90	HABITACION 421
0.90	N/A	N/A	1	100%	0.90	HABITACION 421
1.90	N/A	N/A	3	100%	5.88	HABITACION 421
1.20	N/A	N/A	1	100%	1.20	HABITACION 421
0.77	N/A	N/A	1	100%	0.77	HABITACION 421
2.40	N/A	N/A	3	100%	6.90	HABITACION 420
0.90	N/A	N/A	1	100%	0.98	HABITACION 420
1.90	N/A	N/A	1	100%	7.84	HABITACION 420
1.20	N/A	N/A	1	100%	1.20	HABITACION 420
0.77	N/A	N/A	1	100%	8.77	HABITACION 420
2.30	N/A	N/A	3	100%	6.88	HABITACION 419
0.90	N/A	N/A	1	100%	0.98	HABITACION 419
1.90	N/A	N/A	2	100%	3.92	HABITACION 419
1.20	N/A	N/A	1	100%	1.20	HABITACION 419
0.77	N/A	N/A	1	100%	0.77	HABITACION 419
2.40	N/A	N/A	1	100%	2.90	HABITACION 418
0.90	N/A	N/A	1	100%	0.90	HABITACION 418
1.90	N/A	N/A	6	100%	11.76	HABITACION 418



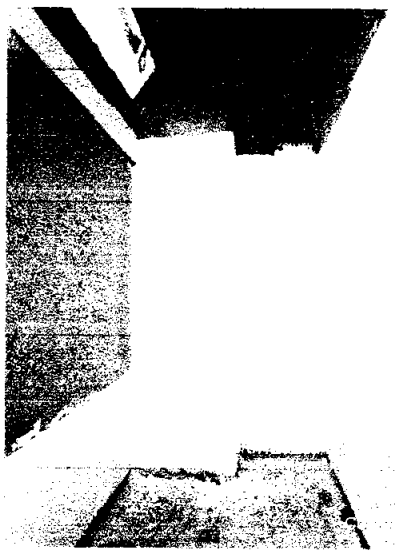

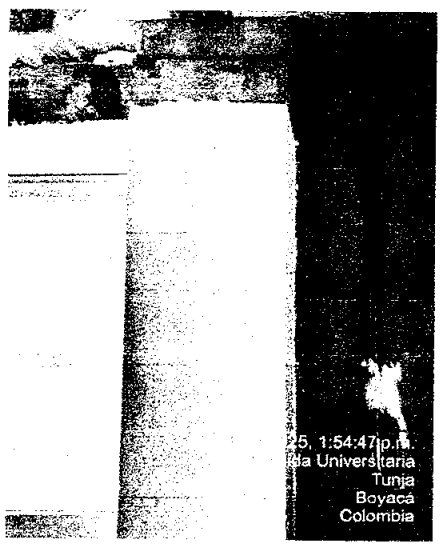


1.28	N/A	N/A	1	100%	1.28	HABITACION 318
0.77	N/A	N/A	1	100%	0.76	HABITACION 318
2.30	N/A	N/A	3	100%	6.90	HABITACION 317
0.98	N/A	N/A	1	100%	0.98	HABITACION 317
1.96	N/A	N/A	3	100%	5.88	HABITACION 317
1.20	N/A	N/A	1	100%	1.20	HABITACION 317
0.77	N/A	N/A	1	100%	0.77	HABITACION 317
2.30	N/A	N/A	3	100%	6.90	HABITACION 316
0.99	N/A	N/A	1	100%	0.99	HABITACION 316
1.96	N/A	N/A	4	100%	7.84	HABITACION 316
1.20	N/A	N/A	1	100%	1.20	HABITACION 316
0.77	N/A	N/A	1	100%	0.77	HABITACION 316
2.30	N/A	N/A	3	100%	6.90	HABITACION 315
0.98	N/A	N/A	1	100%	0.98	HABITACION 315
1.96	N/A	N/A	3	100%	5.88	HABITACION 315
1.20	N/A	N/A	1	100%	1.20	HABITACION 315
0.77	N/A	N/A	1	100%	0.77	HABITACION 315
2.30	N/A	N/A	3	100%	6.90	HABITACION 314
0.99	N/A	N/A	1	100%	0.99	HABITACION 314
1.96	N/A	N/A	3	100%	5.88	HABITACION 314
1.20	N/A	N/A	1	100%	1.20	HABITACION 314
0.77	N/A	N/A	1	100%	0.77	HABITACION 314
2.30	N/A	N/A	1	100%	2.30	HABITACION 313
0.99	N/A	N/A	1	100%	0.99	HABITACION 313
1.96	N/A	N/A	3	100%	5.88	HABITACION 313
1.20	N/A	N/A	1	100%	1.20	HABITACION 313
0.77	N/A	N/A	1	100%	0.77	HABITACION 313
2.30	N/A	N/A	3	100%	6.90	HABITACION 312
0.99	N/A	N/A	1	100%	0.99	HABITACION 312
1.96	N/A	N/A	4	100%	7.84	HABITACION 312
1.20	N/A	N/A	1	100%	1.20	HABITACION 312
0.77	N/A	N/A	2	100%	1.52	HABITACION 312
2.30	N/A	N/A	3	100%	6.90	HABITACION 311
0.99	N/A	N/A	1	100%	0.98	HABITACION 311
1.96	N/A	N/A	4	100%	7.84	HABITACION 311
1.20	N/A	N/A	1	100%	1.20	HABITACION 311
0.77	N/A	N/A	2	100%	1.54	HABITACION 311
2.30	N/A	N/A	3	100%	6.90	HABITACION 310
0.99	N/A	N/A	1	100%	0.99	HABITACION 310
1.96	N/A	N/A	4	100%	7.84	HABITACION 310
1.20	N/A	N/A	1	100%	1.20	HABITACION 310
0.77	N/A	N/A	2	100%	1.54	HABITACION 310
2.30	N/A	N/A	3	100%	6.90	HABITACION 309
0.99	N/A	N/A	1	100%	0.99	HABITACION 309
1.96	N/A	N/A	4	100%	7.84	HABITACION 309
1.20	N/A	N/A	1	100%	1.20	HABITACION 309
0.77	N/A	N/A	2	100%	1.54	HABITACION 309
2.30	N/A	N/A	3	100%	6.90	HABITACION 308
0.99	N/A	N/A	1	100%	0.99	HABITACION 308
1.96	N/A	N/A	4	100%	7.84	HABITACION 308
1.20	N/A	N/A	1	100%	1.20	HABITACION 308
0.77	N/A	N/A	2	100%	1.54	HABITACION 308
2.30	N/A	N/A	1	100%	2.30	HABITACION 307
0.99	N/A	N/A	1	100%	0.99	HABITACION 307
1.96	N/A	N/A	4	100%	7.84	HABITACION 307
1.20	N/A	N/A	1	100%	1.20	HABITACION 307
0.77	N/A	N/A	2	100%	1.54	HABITACION 307
2.30	N/A	N/A	3	100%	6.90	HABITACION 306
0.99	N/A	N/A	1	100%	0.99	HABITACION 306
1.96	N/A	N/A	4	100%	7.84	HABITACION 306
1.20	N/A	N/A	1	100%	1.20	HABITACION 306
0.77	N/A	N/A	2	100%	1.54	HABITACION 306
2.30	N/A	N/A	5	100%	11.50	HABITACION 305
0.99	N/A	N/A	1	100%	0.98	HABITACION 305
1.96	N/A	N/A	3	100%	5.88	HABITACION 305
1.20	N/A	N/A	1	100%	1.28	HABITACION 305
0.77	N/A	N/A	2	100%	1.54	HABITACION 305
2.30	N/A	N/A	2	100%	4.60	HABITACION 304
0.99	N/A	N/A	1	100%	0.99	HABITACION 304
1.96	N/A	N/A	4	100%	7.84	HABITACION 304
1.20	N/A	N/A	1	100%	1.20	HABITACION 304
0.77	N/A	N/A	2	100%	1.54	HABITACION 304
2.30	N/A	N/A	11	100%	25.30	HABITACION 303
0.99	N/A	N/A	1	100%	0.96	HABITACION 303
1.96	N/A	N/A	3	100%	3.88	HABITACION 303
1.20	N/A	N/A	1	100%	1.20	HABITACION 303
0.77	N/A	N/A	2	100%	1.54	HABITACION 303
2.30	N/A	N/A	3	100%	6.90	HABITACION 302
0.99	N/A	N/A	1	100%	0.99	HABITACION 302
1.96	N/A	N/A	3	100%	5.88	HABITACION 302
1.20	N/A	N/A	1	100%	1.20	HABITACION 302
0.77	N/A	N/A	2	100%	1.54	HABITACION 302
2.30	N/A	N/A	4	100%	9.20	HABITACION 301
0.99	N/A	N/A	1	100%	0.99	HABITACION 301
1.96	N/A	N/A	4	100%	7.84	HABITACION 301
1.20	N/A	N/A	1	100%	1.20	HABITACION 301
0.77	N/A	N/A	2	100%	1.54	HABITACION 301
7.84	N/A	N/A	1	100%	7.84	CENTRAL DE ENTRAMPERIA
1.96	N/A	N/A	1	100%	1.86	TRABAJO LIMPIO
0.98	N/A	N/A	1	100%	0.98	TRABAJO LIMPIO
0.80	N/A	N/A	1	100%	0.80	TRABAJO SUCIO
1.96	N/A	N/A	1	100%	1.86	TRABAJO SUCIO
1.96	N/A	N/A	1	100%	1.96	PROCEDIMIENTO
1.40	N/A	N/A	1	100%	1.40	PROCEDIMIENTO
2.40	N/A	N/A	4	100%	9.60	PROCEDIMIENTO
0.86	N/A	N/A	1	100%	0.96	CUARTO DE ASEO
0.96	N/A	N/A	1	100%	0.96	CUARTO DE ASEO
2.40	N/A	N/A	2	100%	4.60	DESCANSO VESTIER
1.96	N/A	N/A	4	100%	7.84	DESCANSO VESTIER
1.90	N/A	N/A	2	100%	3.80	DESCANSO VESTIER
2.40	N/A	N/A	9	100%	21.60	CIRCULACION RESTRINGIDA
1.96	N/A	N/A	2	100%	3.92	CIRCULACION RESTRINGIDA
1.30	N/A	N/A	1	100%	1.38	CIRCULACION RESTRINGIDA
2.40	N/A	N/A	1	100%	2.40	RESIDUOS ORDINARIOS
1.96	N/A	N/A	1	100%	1.96	RESIDUOS ORDINARIOS
0.86	N/A	N/A	1	100%	0.86	RESIDUOS ORDINARIOS
1.96	N/A	N/A	1	100%	1.96	RESIDUOS PELIGROSO
1.96	N/A	N/A	4	100%	7.84	BAÑOS
0.86	N/A	N/A	2	100%	1.72	BAÑOS
0.98	N/A	N/A	1	100%	0.93	BAÑOS
1.96	N/A	N/A	1	100%	1.95	COORDINACION
2.63	N/A	N/A	1	100%	2.63	COORDINACION
1.95	N/A	N/A	1	100%	1.95	COORDINACION
2.74	N/A	N/A	1	100%	2.74	COORDINACION
2.40	N/A	N/A	4	100%	7.28	COORDINACION
4.79	N/A	N/A	1	100%	4.79	COORDINACION
0.78	N/A	N/A	2	100%	1.56	COORDINACION
6.75	N/A	N/A	4	100%	20.25	SALA DE ESPERA
3.43	N/A	N/A	3	100%	10.25	SALA DE ESPERA
2.40	N/A	N/A	5	100%	12.80	SALA DE ESPERA
5.50	N/A	N/A	1	100%	5.50	SALA DE ESPERA

OBSERVACIONES:

TOTAL	3,302.26	Metro Lineal
ACUMULADO ANTERIOR	2,697.48	
PRESENTE ACTA	604.79	

Elaboró contratista:	Estefania Carvajal Henao	FIRMA:
Aprobo Interventoria:	Brenda Luz Hurtado	FIRMA

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACION Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA								
ITEM	FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO	CAP	1.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO	UNIDAD	Metro lineal		UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL
Registro fotográfico				Dimensiones				Total (m)	Observaciones
				L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%	
SOTANO - FILOS									
				2.1	N/A	N/A	1	100%	2.10	CONSULTORIO DE DIETAS
				0.9	N/A	N/A	1	100%	0.90	CONSULTORIO DE DIETAS
				2.1	N/A	N/A	2	100%	4.20	ROPA LIMPIA
				1.4	N/A	N/A	1	100%	1.40	ROPA LIMPIA
				2.45	N/A	N/A	1	100%	2.45	ROPA LIMPIA
				2.1	N/A	N/A	2	100%	4.20	ROPA SUCIA
				0.8	N/A	N/A	1	100%	0.80	ROPA SUCIA
				2.55	N/A	N/A	15	100%	38.60	BODEGA FARMACIA
				2.1	N/A	N/A	5	100%	10.50	BODEGA FARMACIA
				2.8	N/A	N/A	1	100%	2.80	BODEGA FARMACIA
				0.8	N/A	N/A	2	100%	1.60	BODEGA FARMACIA
				1.21	N/A	N/A	1	100%	1.21	BODEGA FARMACIA
				2.52	N/A	N/A	11	100%	27.72	ARCHIVO
				3.31	N/A	N/A	1	100%	3.31	ARCHIVO
				2.8	N/A	N/A	1	100%	2.80	ARCHIVO
				2.45	N/A	N/A	4	100%	8.80	CIRCULACION DE ARCHIVO A DESPACHO DE DIETAS
				2.1	N/A	N/A	6	100%	12.60	CIRCULACION DE ARCHIVO A DESPACHO DE DIETAS
				0.8	N/A	N/A	1	100%	0.80	CIRCULACION DE ARCHIVO A DESPACHO DE DIETAS
				0.9	N/A	N/A	1	100%	0.90	CIRCULACION DE ARCHIVO A DESPACHO DE DIETAS
				1.4	N/A	N/A	1	100%	1.40	CIRCULACION DE ARCHIVO A DESPACHO DE DIETAS
				2.1	N/A	N/A	3	100%	6.30	CIRCULACION DE ROPA SUCIA A DEPOSITO DE CADAVERES
				2.53	N/A	N/A	5	100%	12.65	CIRCULACION DE ROPA SUCIA A DEPOSITO DE CADAVERES
				1.3	N/A	N/A	1	100%	1.30	CIRCULACION DE ROPA SUCIA A DEPOSITO DE CADAVERES
				1.4	N/A	N/A	1	100%	1.40	CIRCULACION DE ROPA SUCIA A DEPOSITO DE CADAVERES
				2.1	N/A	N/A	1	100%	2.10	DEP. CADAVERES
				1.4	N/A	N/A	1	100%	1.40	DEP. CADAVERES
				2.5	N/A	N/A	3	100%	7.50	DEP. CADAVERES
				2.1	N/A	N/A	9	100%	18.90	CIRCULACION ENTRE ROPA LIMPIA A PARQUEADERO
				2	N/A	N/A	1	100%	2.80	CIRCULACION ENTRE ROPA LIMPIA A PARQUEADERO
				0.5	N/A	N/A	2	100%	1.00	CIRCULACION ENTRE ROPA LIMPIA A PARQUEADERO
				2.4	N/A	N/A	1	100%	2.40	CIRCULACION ENTRE ROPA LIMPIA A PARQUEADERO
				2.5	N/A	N/A	2	100%	5.80	CIRCULACION SALA DE STAR
				2.1	N/A	N/A	3	100%	6.30	CIRCULACION SALA DE STAR
				0.7	N/A	N/A	1	100%	0.70	CIRCULACION SALA DE STAR
				2.3	N/A	N/A	1	100%	2.30	CIRCULACION SALA DE STAR
				2.1	N/A	N/A	2	100%	4.20	DEPOSITO ALMACEN
				0.8	N/A	N/A	1	100%	0.80	DEPOSITO ALMACEN
				3.1	N/A	N/A	1	100%	3.10	DEPOSITO ALMACEN
				4.5	N/A	N/A	3	100%	13.50	DEPOSITO ALMACEN
				4.8	N/A	N/A	1	100%	4.80	DEPOSITO ALMACEN
				2.5	N/A	N/A	3	100%	7.50	LAVANDERIA
				2.7	N/A	N/A	3	100%	3.18	PARQUEADERO SOTANO
				2.8	N/A	N/A	4	100%	11.20	PARQUEADERO SOTANO
PISO 1 - FILOS									
				2.91	N/A	N/A	2	100%	5.82	MURO DIVISOR LAVADO DE COCHES
				2.09	N/A	N/A	2	100%	4.18	MURO DIVISOR LAVADO DE COCHES
				0.96	N/A	N/A	2	100%	1.92	MURO DIVISOR LAVADO DE COCHES
				1.3	N/A	N/A	15	100%	19.50	VENTANA
				2.2	N/A	N/A	5	100%	11.00	PUERTAS BAÑOS Y CUERTO FARMACIA
				0.8	N/A	N/A	1	100%	3.20	PUERTAS BAÑOS Y CUERTO FARMACIA
				2.3	N/A	N/A	4	100%	18.40	LABORATORIO
				1.6	N/A	N/A	1	100%	1.60	FILOS PARA ENTRAR A INYECTOLOGIA
				2.28	N/A	N/A	2	100%	4.56	FILOS PARA ENTRAR A INYECTOLOGIA
				4.37	N/A	N/A	2	100%	8.74	FILOS PARA ENTRAR A INYECTOLOGIA
				2.6	N/A	N/A	2	100%	5.20	FILOS PARA ENTRAR A INYECTOLOGIA
				1.7	N/A	N/A	2	100%	3.40	FILOS PARA ENTRAR A INYECTOLOGIA
				3.86	N/A	N/A	2	100%	7.72	FILOS PARA ENTRAR A INYECTOLOGIA
				2.76	N/A	N/A	2	100%	5.52	FILOS PARA ENTRAR A INYECTOLOGIA
				1.4	N/A	N/A	1	100%	1.40	RESIDUOS ORDINARIOS
				0.9	N/A	N/A	1	100%	0.90	RESIDUOS ORDINARIOS
				6.96	N/A	N/A	1	100%	6.96	RESIDUOS ORDINARIOS
				2.1	N/A	N/A	2	100%	4.20	RESIDUOS ORDINARIOS
				0.8	N/A	N/A	2	100%	1.60	RESIDUOS ORDINARIOS
				0.64	N/A	N/A	2	100%	1.28	VENTANA RESIDUOS PELIGROSOS
				1.3	N/A	N/A	1	100%	1.30	VENTANA RESIDUOS PELIGROSOS
				0.47	N/A	N/A	2	100%	0.94	VENTANA RESIDUOS PELIGROSOS
				1.3	N/A	N/A	1	100%	1.30	VENTANA RESIDUOS PELIGROSOS
				2.6	N/A	N/A	6	100%	15.60	INYECTOLOGIA
				2.02	N/A	N/A	4	100%	8.08	INYECTOLOGIA
				1.08	N/A	N/A	2	100%	2.16	PUERTAS NEVERA
				1.1	N/A	N/A	4	100%	4.40	VENTANA PRETASEJIONAL
				0.96	N/A	N/A	2	100%	1.92	VENTANA PRETASEJIONAL
				2.6	N/A	N/A	2	100%	5.20	FILOS COLUMNA PRETASEJIONAL
				1.65	N/A	N/A	2	100%	3.30	FILOS COLUMNA PRETASEJIONAL
				1	N/A	N/A	1	100%	1.08	FILOS VENTANA PRETASEJIONAL
				2.6	N/A	N/A	2	100%	5.20	ENTRADA HALL A LOBORATORIO
				1.21	N/A	N/A	1	100%	1.21	ENTRADA HALL A LOBORATORIO
				2.6	N/A	N/A	5	100%	13.00	TOMA DE MUESTRA
				1.3	N/A	N/A	4	100%	5.20	TOMA DE MUESTRA
				2.1	N/A	N/A	2	100%	4.20	BAÑOS EN TOMA DE MUESTRA
				0.8	N/A	N/A	2	100%	1.60	BAÑOS EN TOMA DE MUESTRA
				2.6	N/A	N/A	10	100%	26.00	FARMACIA
				2.1	N/A	N/A	5	100%	10.50	FARMACIA
				3	N/A	N/A	4	100%	12.00	FARMACIA
				1.5	N/A	N/A	4	100%	6.00	FARMACIA
				1.64	N/A	N/A	1	100%	1.64	FARMACIA
				2.1	N/A	N/A	8	100%	16.80	CIRCULACION HALL
				2.6	N/A	N/A	10	100%	26.00	CIRCULACION HALL
				1.1	N/A	N/A	1	100%	1.10	CIRCULACION HALL
				0.9	N/A	N/A	1	100%	0.90	CIRCULACION HALL
				1.2	N/A	N/A	1	100%	1.20	FILOS UNITEC EXTERIOR ADMINISTRA S
				1.2	N/A	N/A	1	100%	1.28	PROCEDIMIENTOS
				2.1	N/A	N/A	3	100%	6.30	PROCEDIMIENTOS
				0.8	N/A	N/A	1	100%	0.80	PROCEDIMIENTOS
				1.1	N/A	N/A	1	100%	1.10	PROCEDIMIENTOS
				1	N/A	N/A	2	100%	2.00	PROCEDIMIENTOS
				0.4	N/A	N/A	2	100%	0.80	PROCEDIMIENTOS
				2.6	N/A	N/A	2	100%	5.20	SALA DE LECTURA INYECTOLOGIA
				2.1	N/A	N/A	2	100%	4.20	SALA DE LECTURA INYECTOLOGIA
				0.9	N/A	N/A	2	100%	1.80	SALA DE LECTURA INYECTOLOGIA
				2.5	N/A	N/A	4	100%	10.00	ADMISIONES FUENTE
				2.1	N/A	N/A	6	100%	12.60	ADMISIONES VENTANA
				0.8	N/A	N/A	2	100%	1.60	ADMISIONES PUERTA
				1.29	N/A	N/A	1	100%	1.29	ADMISIONES PUERTA
				1.1	N/A	N/A	1	100%	1.10	PUERTA PROCEDIMIENTOS
				2.6	N/A	N/A	2	100%	5.20	PUERTA PROCEDIMIENTOS
				2.1	N/A	N/A	1	100%	2.10	PUERTA PROCEDIMIENTOS
				1.1	N/A	N/A	1	100%	1.10	VENTANA PROCEDIMIENTOS











30 jun 2025 12:03:32 p. m.
51 Avenida Universitaria
Tunja
Boyacá
#CONSORCIO TERMINACIÓN UMI

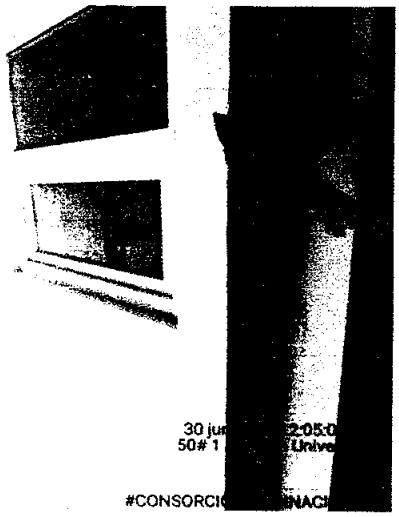

30 jun 2025 12:05:0
50# 1 Univ
#CONSORCIO NACI

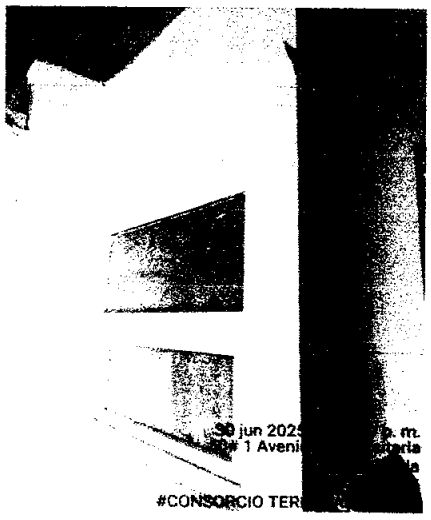


30 jun 2025 p. m.
50# 1 Avenida ria
#CONSORCIO TER




n 2025 p.
Avenida ria


2.6	N/A	N/A	1	100%	2.60	ADMISIONES PUERTA
2.1	N/A	N/A	2	100%	4.20	ADMISIONES PUERTA
0.9	N/A	N/A	2	100%	1.80	ADMISIONES VENTANA
2.6	N/A	N/A	2	100%	5.20	ADMISIONES PUERTA
2.1	N/A	N/A	1	100%	2.10	CONSULTORIO
0.3	N/A	N/A	1	100%	0.30	CONSULTORIO
1.7	N/A	N/A	1	100%	1.70	CONSULTORIO
2.1	N/A	N/A	2	100%	4.20	CIRCULACION ASENSOR
0.9	N/A	N/A	1	100%	0.90	CIRCULACION ASENSOR
2.1	N/A	N/A	3	100%	6.30	CIRCULACION ASENSOR
2.6	N/A	N/A	1	100%	2.60	OFICINA RADIOLOGIA
2.6	N/A	N/A	1	100%	2.60	OFICINA RAIOLOGIA
2.1	N/A	N/A	1	100%	2.10	INSUMOS
0.8	N/A	N/A	1	100%	0.80	INSUMOS
2.0	N/A	N/A	5	100%	13.00	INSUMOS
2.1	N/A	N/A	3	100%	6.30	INSUMOS
1.1	N/A	N/A	2	100%	2.20	INSUMOS
1.1	N/A	N/A	1	100%	3.30	SALA ESPERA CONSULTORIO
2.8	N/A	N/A	1	100%	2.80	SALA ESPERA CONSULTORIO
1.1	N/A	N/A	1	100%	1.10	SALA ESPERA CONSULTORIO
1.2	N/A	N/A	1	100%	1.20	ECOGRAFO SERVICIO DE RADIOLOGIA
2.8	N/A	N/A	3	100%	7.80	ECOGRAFO SERVICIO DE RADIOLOGIA
2.1	N/A	N/A	3	100%	6.30	ECOGRAFO SERVICIO DE RADIOLOGIA
0.8	N/A	N/A	1	100%	0.80	ECOGRAFO SERVICIO DE RADIOLOGIA
1.1	N/A	N/A	1	100%	1.10	CONSULTORIO DISPONIBLE
2.1	N/A	N/A	20	100%	42.00	CONSULTORIO DISPONIBLE
1.1	N/A	N/A	2	100%	2.20	CONSULTORIO DISPONIBLE
10.34	N/A	N/A	1	100%	10.34	CONSULTORIO DISPONIBLE
2.1	N/A	N/A	16	100%	33.60	CENTRAL DE ENFERMERIA
11.47	N/A	N/A	1	100%	11.47	CENTRAL DE ENFERMERIA
2.42	N/A	N/A	7	100%	16.94	CENTRAL DE ENFERMERIA
4	N/A	N/A	4	100%	16.80	CIRCULACION HALL
1.4	N/A	N/A	2	100%	2.80	CIRCULACION HALL
1	N/A	N/A	2	100%	2.00	CIRCULACION HALL
2.1	N/A	N/A	3	100%	6.30	CIRCULACION HALL
2.54	N/A	N/A	1	100%	2.54	CIRCULACION HALL
1.2	N/A	N/A	1	100%	1.20	CIRCULACION HALL
0.8	N/A	N/A	1	100%	0.80	CIRCULACION HALL
4.5	N/A	N/A	4	100%	10.00	CIRCULACION HALL
2.1	N/A	N/A	3	100%	6.30	CIRCULACION HALL
1.8	N/A	N/A	1	100%	1.80	CIRCULACION HALL
0.2	N/A	N/A	1	100%	0.28	CONSULTORIO 1
1	N/A	N/A	4	100%	4.00	CONSULTORIO 1
1.73	N/A	N/A	1	100%	1.73	CONSULTORIO 1
2.6	N/A	N/A	2	100%	5.20	CONSULTORIO 1
2.1	N/A	N/A	2	100%	4.20	CONSULTORIO 1
1.3	N/A	N/A	8	100%	10.40	REANIMACION
2.1	N/A	N/A	9	100%	18.90	REANIMACION
0.7	N/A	N/A	1	100%	0.70	REANIMACION
1.7	N/A	N/A	2	100%	3.40	REANIMACION
1	N/A	N/A	1	100%	1.00	CIRCULACION SALA ESPERA HALL
0.8	N/A	N/A	4	100%	3.20	CIRCULACION SALA ESPERA HALL
2	N/A	N/A	4	100%	8.00	CIRCULACION SALA ESPERA HALL
0.4	N/A	N/A	8	100%	3.20	CIRCULACION SALA ESPERA HALL
0.8	N/A	N/A	2	100%	1.60	CIRCULACION SALA ESPERA HALL
2	N/A	N/A	2	100%	4.88	CIRCULACION SALA ESPERA HALL
1	N/A	N/A	1	100%	1.08	CIRCULACION SALA ESPERA HALL
0.4	N/A	N/A	4	100%	1.60	PERSONAN ASISTENCIAL
2.1	N/A	N/A	1	100%	2.10	PERSONAN ASISTENCIAL
1	N/A	N/A	4	100%	4.00	PERSONAN ASISTENCIAL
2.7	N/A	N/A	5	100%	8.15	PERSONAN ASISTENCIAL
2.3	N/A	N/A	7	100%	16.10	PERSONAN ASISTENCIAL
2.1	N/A	N/A	4	100%	8.40	HALL GENERAL
1.2	N/A	N/A	1	100%	1.20	HALL GENERAL
0.8	N/A	N/A	1	100%	0.80	AUTOSERVICIO
2.1	N/A	N/A	3	100%	6.30	AUTOSERVICIO
2.55	N/A	N/A	1	100%	2.55	AUTOSERVICIO
0.9	N/A	N/A	2	100%	1.80	AUTOSERVICIO
1.3	N/A	N/A	1	100%	1.30	AUTOSERVICIO
2.1	N/A	N/A	5	100%	10.50	MAMOGRAFO
0.8	N/A	N/A	3	100%	2.40	MAMOGRAFO
1.2	N/A	N/A	1	100%	1.20	MAMOGRAFO
2.1	N/A	N/A	4	100%	8.40	CIRCULACION
1.7	N/A	N/A	1	100%	1.70	TAC
0.88	N/A	N/A	1	100%	0.88	TAC
2	N/A	N/A	2	100%	4.00	TAC
2.1	N/A	N/A	3	100%	6.30	CIRCULACION
1.47	N/A	N/A	2	100%	2.94	TAC
0.8	N/A	N/A	2	100%	1.28	TAC
2.1	N/A	N/A	3	100%	6.30	TAC
0.9	N/A	N/A	1	100%	0.90	DISPARO
0.8	N/A	N/A	1	100%	0.80	DISPARO
1.7	N/A	N/A	2	100%	3.40	DISPARO
2.38	N/A	N/A	2	100%	4.76	DISPARO
2.15	N/A	N/A	5	100%	10.50	OBSERVACION GINECOESTETRICA
2.1	N/A	N/A	6	100%	12.60	OBSERVACION GINECOESTETRICA
0.8	N/A	N/A	2	100%	1.60	OBSERVACION GINECOESTETRICA
0.9	N/A	N/A	1	100%	0.90	OBSERVACION GINECOESTETRICA
2.45	N/A	N/A	3	100%	19.00	OBSERVACION PEDIATRIA
2.43	N/A	N/A	2	100%	4.86	OBSERVACION PEDIATRIA
0.71	N/A	N/A	2	100%	1.42	OBSERVACION PEDIATRIA
2.1	N/A	N/A	4	100%	8.30	OBSERVACION PEDIATRIA
6.87	N/A	N/A	2	100%	13.30	OBSERVACION PEDIATRIA
0.4	N/A	N/A	4	100%	3.20	CENTRAL DE ENFERMERIA
2.1	N/A	N/A	2	100%	4.20	CENTRAL DE ENFERMERIA
0.8	N/A	N/A	1	100%	0.80	CUARTO DE RESIDUOS ORDINARIOS
0.8	N/A	N/A	1	100%	0.80	CUARTO DE RESIDUOS ORDINARIOS
2.1	N/A	N/A	1	100%	2.10	RESIDUOS PELIGROSOS
1	N/A	N/A	3	100%	3.05	RESIDUOS PELIGROSOS
2.1	N/A	N/A	2	100%	4.28	DIR URGENCIAS
0.8	N/A	N/A	1	100%	0.80	DIR URGENCIAS
2.42	N/A	N/A	2	100%	4.84	DIR URGENCIAS
2.1	N/A	N/A	2	100%	4.20	PROCEDIMIENTOS
2.1	N/A	N/A	2	100%	4.20	SALA DE YESOS
1.7	N/A	N/A	1	100%	1.70	SALA DE YESOS
0.94	N/A	N/A	2	100%	1.88	SALA DE YESOS
1	N/A	N/A	1	100%	1.05	SALA DE YESOS
2.1	N/A	N/A	4	100%	8.40	DIGITACION
0.9	N/A	N/A	2	100%	1.80	DIGITACION
1.3	N/A	N/A	2	100%	2.60	DIGITACION
1	N/A	N/A	1	100%	1.00	DIGITACION
2.5	N/A	N/A	3	100%	7.50	SALA ERA
2.1	N/A	N/A	2	100%	4.20	SALA ERA
0.9	N/A	N/A	1	100%	0.90	SALA ERA
0.9	N/A	N/A	1	100%	0.90	SALA ERA
1.3	N/A	N/A	2	100%	2.60	SALA ERA
1	N/A	N/A	2	100%	2.00	SALA ERA
2.5	N/A	N/A	3	100%	7.50	CONSULTORIO 3
2.1	N/A	N/A	2	100%	4.20	CONSULTORIO 3
0.9	N/A	N/A	1	100%	0.95	CONSULTORIO 3
1.3	N/A	N/A	1	100%	1.30	CONSULTORIO 3
1.4	N/A	N/A	2	100%	2.80	CONSULTORIO 3

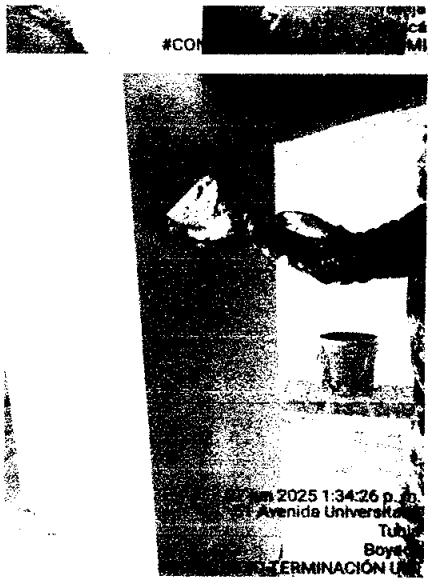




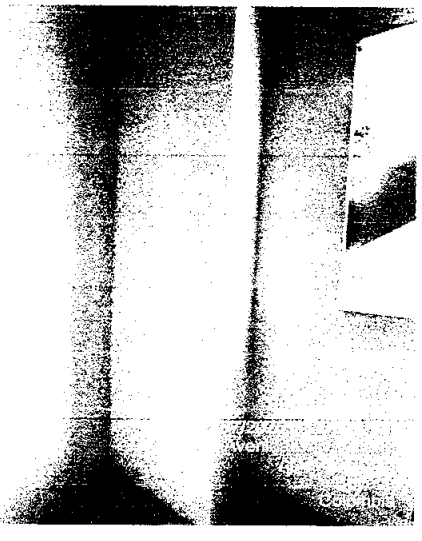

	N/A	N/A	2	100%	2.08	CONSULTORIO 3
2.1	N/A	N/A	3	100%	6.30	CONSULTORIO 2
2.5	N/A	N/A	2	100%	5.00	CONSULTORIO 2
0.9	N/A	N/A	1	100%	0.90	CONSULTORIO 2
1.2	N/A	N/A	1	100%	1.20	CONSULTORIO 2
1.3	N/A	N/A	2	100%	2.60	CONSULTORIO 2
1.5	N/A	N/A	2	100%	3.00	CONSULTORIO 2
2.1	N/A	N/A	3	100%	6.30	CONSULTORIO 1
2.5	N/A	N/A	1	100%	2.50	CONSULTORIO 1
1	N/A	N/A	1	100%	1.00	CONSULTORIO 1
1.2	N/A	N/A	1	100%	1.20	CONSULTORIO 1
0.92	N/A	N/A	2	100%	1.84	CONSULTORIO 1
0.93	N/A	N/A	2	100%	1.86	CONSULTORIO 1
2.1	N/A	N/A	3	100%	6.30	ADMISIONES URGENCIAS
2.5	N/A	N/A	3	100%	7.50	ADMISIONES URGENCIAS
0.8	N/A	N/A	1	100%	0.80	ADMISIONES URGENCIAS
0.9	N/A	N/A	1	100%	0.90	ADMISIONES URGENCIAS
	N/A	N/A	3	100%	1.89	ADMISIONES URGENCIAS
2.1	N/A	N/A	2	100%	4.20	REF Y CONTRA REF
1	N/A	N/A	1	100%	1.00	REF Y CONTRA REF
2.5	N/A	N/A	3	100%	7.50	SALA ESPERA URGENCIAS
1.4	N/A	N/A	4	100%	5.60	SALA ESPERA URGENCIAS
2.32	N/A	N/A	1	100%	2.32	SALA ESPERA URGENCIAS
1.7	N/A	N/A	1	100%	1.70	SALA ESPERA URGENCIAS
1.2	N/A	N/A	2	100%	2.40	SALA ESPERA URGENCIAS
2.1	N/A	N/A	2	100%	4.20	SALA ESPERA URGENCIAS
1.7	N/A	N/A	1	100%	1.70	SALA ESPERA URGENCIAS
0.37	N/A	N/A	1	100%	0.37	ANTEFECHO URGENCIAS
0.75	N/A	N/A	1	100%	0.00	ANTEFECHO URGENCIAS
0.97	N/A	N/A	4	100%	3.88	DESCANSO INTERNOS
2.1	N/A	N/A	1	100%	3.10	DESCANSO INTERNOS
0.8	N/A	N/A	1	100%	0.80	DESCANSO INTERNOS
2.52	N/A	N/A	1	100%	2.52	DESCANSO INTERNOS
7.56	N/A	N/A	3	100%	7.56	EQUIPOS
2.1	N/A	N/A	1	100%	2.10	EQUIPOS
0.9	N/A	N/A	1	100%	0.90	EQUIPOS
		PISO 2				
2.1	N/A	N/A	16	100%	33.60	PASILLO A AUTOCLAVE
1	N/A	N/A	2	100%	2.00	
	N/A	N/A	2	100%	0.00	
1.2	N/A	N/A	2	100%	2.40	
2	N/A	N/A	2	100%	4.00	
2	N/A	N/A	2	100%	4.80	
2.5	N/A	N/A	2	100%	5.00	
2.5	N/A	N/A	6	100%	15.00	REFRIGERACIÓN QUIRÚRGICA
1.75	N/A	N/A	2	100%	3.50	
4.2	N/A	N/A	2	100%	8.40	CENTRAL DE ENFERMERIA
0.76	N/A	N/A	4	100%	3.04	
2.1	N/A	N/A	7	100%	14.70	TRABAJO SUCIO
0.7	N/A	N/A	1	100%	2.80	
2.1	N/A	N/A	40	100%	84.00	PASILLO QUIROFANO
1	N/A	N/A	4	100%	4.00	
1.5	N/A	N/A	4	100%	6.00	VENTANA AUTOCLAVE
0.9	N/A	N/A	2	100%	1.80	
1	N/A	N/A	16	100%	16.00	FARMACIA
1.8	N/A	N/A	2	100%	3.60	
0.4	N/A	N/A	2	100%	0.80	PASILLO QUIROFANO
1.7	N/A	N/A	2	100%	3.40	
0.9	N/A	N/A	2	100%	1.80	
1.5	N/A	N/A	2	100%	3.00	VENTANA PASILLO
2.15	N/A	N/A	2	100%	4.30	
1	N/A	N/A	2	100%	2.00	
0.8	N/A	N/A	2	100%	1.60	PASILLO QUIROFANO
1.7	N/A	N/A	2	100%	3.40	
2.5	N/A	N/A	13	100%	32.50	
2.5	N/A	N/A	3	100%	7.50	QUIROFANO 1
	N/A	N/A	2	100%	0.00	QUIROFANO 2
2.5	N/A	N/A	2	100%	5.00	QUIROFANO 1
0.9	N/A	N/A	2	100%	1.80	
2.1	N/A	N/A	2	100%	4.20	DESCANSO QUIRURGICO
2.5	N/A	N/A	3	100%	7.50	
2.5	N/A	N/A	1	100%	2.50	PARTOS 2
2.5	N/A	N/A	3	100%	7.50	PARTOS 1
2.5	N/A	N/A	3	100%	7.50	
2.1	N/A	N/A	4	100%	1.40	PASILLO TRABAJO SUCIO
0.8	N/A	N/A	2	100%	1.60	
2.5	N/A	N/A	5	100%	12.50	FARMACIA
1	N/A	N/A	4	100%	4.80	
2.1	N/A	N/A	67	100%	140.70	
0.8	N/A	N/A	2	100%	1.60	
1.03	N/A	N/A	2	100%	2.06	
1.67	N/A	N/A	2	100%	3.34	
0.8	N/A	N/A	2	100%	1.60	
2	N/A	N/A	2	100%	4.00	
0.8	N/A	N/A	1	100%	0.80	CIRCULACIÓN QUIROFANO A UCI NEONATAL
0.7	N/A	N/A	1	100%	0.70	
0.6	N/A	N/A	1	100%	0.60	
	N/A	N/A	2	100%	2.60	
1.7	N/A	N/A	2	100%	3.40	
0.76	N/A	N/A	2	100%	1.52	
1	N/A	N/A	2	100%	2.00	
1	N/A	N/A	2	100%	2.00	
8	N/A	N/A	2	100%	16.00	
	N/A	N/A	2	100%	0.80	
1.97	N/A	N/A	2	100%	3.94	
0.8	N/A	N/A	2	100%	1.60	
0.8	N/A	N/A	2	100%	1.60	CIRCULACIÓN QUIROFANO A UCI NEONATAL
0.8	N/A	N/A	2	100%	1.60	PUERTAS
0.85	N/A	N/A	2	100%	1.70	
0.74	N/A	N/A	2	100%	1.48	
1	N/A	N/A	2	100%	2.00	
1.9	N/A	N/A	2	100%	3.80	
2	N/A	N/A	2	100%	4.00	
0.7	N/A	N/A	2	100%	1.40	
0.15	N/A	N/A	2	100%	0.30	VENTANAS CIRCULACIÓN
1	N/A	N/A	2	100%	2.00	
2.72	N/A	N/A	2	100%	5.44	ATENCIÓN A USUARIO
0.97	N/A	N/A	1	100%	0.97	
2.1	N/A	N/A	5	100%	10.50	
0.6	N/A	N/A	1	100%	0.60	DESCANSO MEDICO
0.8	N/A	N/A	2	100%	1.60	
2.45	N/A	N/A	7	100%	17.15	
2.1	N/A	N/A	12	100%	25.20	
0.5	N/A	N/A	2	100%	1.00	VESTIER M.
0.7	N/A	N/A	3	100%	2.10	
0.8	N/A	N/A	2	100%	1.60	
2.1	N/A	N/A	8	100%	16.80	
0.8	N/A	N/A	4	100%	3.20	VESTIER H
0.7	N/A	N/A	2	100%	1.40	
2.4	N/A	N/A	5	100%	12.00	
2.5	N/A	N/A	12	100%	30.00	
2.1	N/A	N/A	4	100%	8.40	TRABAJO PARTOS



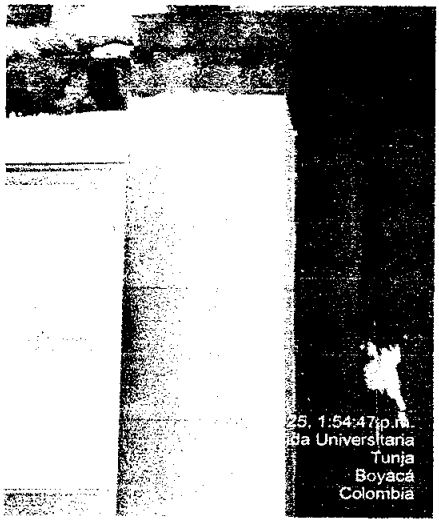




0.9	N/A	N/A	1	100%	0.98	
0.7	N/A	N/A	1	100%	0.78	
6.75	N/A	N/A	2	108%	7.46	CENTRAL DE ENFERMERIA T.P.
0.8	N/A	N/A	3	100%	2.40	
2.1	N/A	N/A	12	100%	25.20	
0.8	N/A	N/A	1	100%	0.80	
1	N/A	N/A	1	100%	1.80	
0.9	N/A	N/A	3	100%	1.80	RECUPERACION PARTOS
0.8	N/A	N/A	1	100%	0.88	
0.95	N/A	N/A	2	100%	1.98	
2.4	N/A	N/A	17	100%	40.80	
4.47	N/A	N/A	2	100%	8.74	CENTRAL DE ENFERMERIA RECUPERACION
0.8	N/A	N/A	3	100%	2.40	
2.5	N/A	N/A	5	100%	12.50	VESTIER PARTOS
2.1	N/A	N/A	8	100%	16.88	
0.8	N/A	N/A	1	100%	0.80	
0.7	N/A	N/A	2	100%	1.40	FILTRO PERSONAL ASISTENCIAL
0.8	N/A	N/A	4	100%	3.20	
2.5	N/A	N/A	1	100%	2.50	
2.1	N/A	N/A	3	100%	6.30	FILTRO ACCESO FAMILIARES UARO
0.8	N/A	N/A	2	100%	1.60	
2.1	N/A	N/A	3	100%	6.30	INFORMACIÓN FAMILIARES
0.7	N/A	N/A	2	100%	1.40	
5.8	N/A	N/A	1	100%	5.80	UCI URO 1
2.4	N/A	N/A	3	100%	7.20	
11.23	N/A	N/A	1	100%	11.23	UCI URO 2
2.7	N/A	N/A	3	100%	8.08	
11.55	N/A	N/A	1	100%	11.55	UCI URO 3
2.4	N/A	N/A	2	100%	4.80	
12.06	N/A	N/A	1	188%	12.86	UCI URO 1
2.4	N/A	N/A	1	100%	2.48	
11.17	N/A	N/A	1	100%	11.17	UCI URO 5
2.4	N/A	N/A	2	100%	4.88	
7.47	N/A	N/A	1	180%	7.47	
2.4	N/A	N/A	3	108%	7.20	
0.95	N/A	N/A	4	100%	3.68	UCI URO 6 - AISLADO
2.1	N/A	N/A	1	100%	2.10	
6.9	N/A	N/A	1	100%	6.94	
6.85	N/A	N/A	1	100%	6.85	
2.4	N/A	N/A	3	180%	7.28	UCI URO 7
1.2	N/A	N/A	2	100%	2.40	
1.5	N/A	N/A	1	100%	1.50	
7.12	N/A	N/A	1	100%	7.12	
0.95	N/A	N/A	4	108%	3.88	UCI URO 8
0.8	N/A	N/A	2	100%	1.60	
1.25	N/A	N/A	2	200%	2.50	
2.8	N/A	N/A	1	100%	2.86	
0.8	N/A	N/A	1	100%	0.80	
1.25	N/A	N/A	2	100%	2.50	UCI URO 9
1.3	N/A	N/A	2	100%	2.60	
1.3	N/A	N/A	4	100%	5.20	
0.98	N/A	N/A	2	100%	1.96	
2.1	N/A	N/A	11	100%	23.10	
0.8	N/A	N/A	4	100%	3.20	
1.1	N/A	N/A	2	100%	2.20	PASILLO UCI URO 7 A 9
1.6	N/A	N/A	2	100%	3.20	
2.22	N/A	N/A	4	100%	8.88	
2.5	N/A	N/A	1	100%	2.50	CENTRAL ENFERMERIA
2.06	N/A	N/A	1	100%	2.06	
0.8	N/A	N/A	3	100%	2.40	PASILLO UCI URO 7 A 9
2.4	N/A	N/A	3	100%	7.20	
7.84	N/A	N/A	1	100%	7.84	ANTEPECHO SOBRE PASILLO
0.6	N/A	N/A	10	100%	6.00	PASILLO UCI URO 1 A 6
7.42	N/A	N/A	1	100%	7.42	ANTEPECHO SOBRE PASILLO
7.32	N/A	N/A	1	100%	7.32	
0.8	N/A	N/A	3	100%	2.40	CENTRAL DE ENFERMERIA
1.7	N/A	N/A	4	100%	6.80	
2.1	N/A	N/A	4	100%	8.40	PASILLO UCI URO 1 A 6
0.8	N/A	N/A	2	100%	1.60	
2.4	N/A	N/A	4	100%	9.60	CENTRAL ENFERMERIA
-	N/A	N/A	2	100%	2.88	
1.5	N/A	N/A	2	100%	3.00	DESCANSO
2.5	N/A	N/A	1	100%	2.50	
2.5	N/A	N/A	1	100%	2.50	EXTRACCION
2.5	N/A	N/A	4	100%	10.00	TRIAGE UCI URO
2.1	N/A	N/A	4	100%	8.40	
2.5	N/A	N/A	1	100%	2.50	EXTRACCION
1.39	N/A	N/A	2	100%	2.78	RESIDUOS UCI NEONATAL
2.1	N/A	N/A	1	100%	2.10	
2.16	N/A	N/A	1	100%	2.16	
0.8	N/A	N/A	2	100%	1.60	
2.1	N/A	N/A	2	100%	4.20	CIRCULACION ASEO UCI NEONATAL
1.2	N/A	N/A	1	100%	1.20	
2.5	N/A	N/A	4	100%	10.00	
2.1	N/A	N/A	4	100%	8.40	
0.8	N/A	N/A	2	100%	1.60	AMBIENTE DE TRABAJO ESTERIL
2.5	N/A	N/A	2	100%	5.00	
2.1	N/A	N/A	7	100%	14.70	
0.75	N/A	N/A	1	100%	0.75	UCI NEONATAL
0.7	N/A	N/A	1	100%	0.70	
1.35	N/A	N/A	1	100%	1.35	
5.12	N/A	N/A	9	100%	18.24	CENTRAL ENFERMERIA UCI NEO
0.85	N/A	N/A	6	100%	5.10	
25	N/A	N/A	1	100%	25.00	UCI INTENSIVO
18.84	N/A	N/A	1	100%	18.84	AISLADOS INTENSIVOS
1.3	N/A	N/A	1	100%	1.38	
0.9	N/A	N/A	2	100%	1.80	VENTANA UCI NEONATAL
1.3	N/A	N/A	9	100%	18.30	
2.5	N/A	N/A	7	100%	17.50	CUARTO EQUIPOS
2.8	N/A	N/A	19	100%	47.50	
2.7	N/A	N/A	2	100%	5.40	CUIDADOS INTERMEDIOS
2.71	N/A	N/A	2	100%	5.42	
1	N/A	N/A	2	100%	6.80	
1.3	N/A	N/A	4	100%	5.20	
0.25	N/A	N/A	2	100%	0.50	
0.9	N/A	N/A	2	100%	1.80	VENTANA INTERMEDIOS
2.3	N/A	N/A	2	100%	4.60	
1	N/A	N/A	2	100%	2.00	
8.56	N/A	N/A	4	100%	34.24	SATELITES ENFERMERIA
2.1	N/A	N/A	2	100%	4.20	
2.5	N/A	N/A	1	100%	2.50	CUIDADOS BASICOS UCI
0.7	N/A	N/A	4	100%	2.80	
1.9	N/A	N/A	4	100%	7.60	
1.3	N/A	N/A	12	100%	15.60	VENTANA BASICOS
0.7	N/A	N/A	2	100%	1.40	
1	N/A	N/A	2	100%	2.00	
1.3	N/A	N/A	2	100%	2.60	
1	N/A	N/A	2	188%	2.00	
1.3	N/A	N/A	2	100%	2.60	
0.95	N/A	N/A	9	180%	1.98	
1.2	N/A	N/A	4	180%	5.28	DESCANSO UCI NEONATAL
1.9	N/A	N/A	2	180%	3.88	
2.1	N/A	N/A	3	180%	6.38	



30 jun 2025 12:03:05 p. m.
51 Avenida Universitaria
Tunja
Boyacá
#CONSORCIO TERMINACIÓN UMI



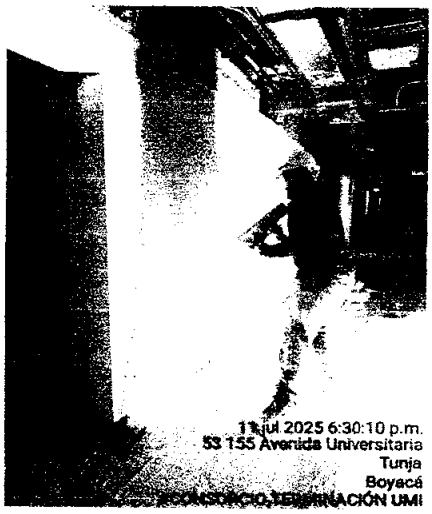


11 jul 2025 6:30:10 p.m.
53 155 Avenida Universitaria
Tunja
Boyacá
#CONSORCIO TERMINACIÓN UMI



0.8	N/A	N/A	4	100%	3.20	
2.1	N/A	N/A	6	100%	12.60	
0.8	N/A	N/A	3	100%	2.40	PASILLO A DESCANSO
2.5	N/A	N/A	2	100%	5.00	
2.5	N/A	N/A	4	100%	10.00	
2.1	N/A	N/A	21	100%	44.10	
1.8	N/A	N/A	2	100%	3.60	
0.9	N/A	N/A	1	100%	0.90	PASILLO ASISTENCIA Y UCI NEONATAL
0.75	N/A	N/A	1	100%	0.75	
0.6	N/A	N/A	4	100%	2.40	
1.73	N/A	N/A	2	100%	3.46	
1.51	N/A	N/A	2	100%	3.02	
2.1	N/A	N/A	2	100%	4.20	
0.7	N/A	N/A	1	100%	8.78	VESTIER PERSONAL ASISTENCIA
3.6	N/A	N/A	2	100%	7.20	
2.5	N/A	N/A	2	100%	5.00	COORDINACION UCI NEONATAL
4.13	N/A	N/A	2	100%	8.26	
2.1	N/A	N/A	6	100%	12.60	
1.9	N/A	N/A	1	100%	1.90	
0.7	N/A	N/A	1	100%	0.70	HALL
0.8	N/A	N/A	1	100%	0.80	
2.8	N/A	N/A	7	100%	19.60	
2.5	N/A	N/A	3	100%	7.50	
2.1	N/A	N/A	3	100%	6.30	PASILLO ESTER
0.7	N/A	N/A	2	100%	1.40	
0.8	N/A	N/A	4	100%	3.20	
		PISO 3 - PILOS				
2.1	N/A	N/A	4	100%	8.40	EXTRACION DE LECHE MATERNA
0.9	N/A	N/A	2	100%	1.80	EXTRACION DE LECHE MATERNA
2.1	N/A	N/A	1	100%	2.10	DEPOSITO DE INSUMOS
0.8	N/A	N/A	1	100%	0.80	DEPOSITO DE INSUMOS
2.1	N/A	N/A	3	100%	6.30	FILTRO INGRESO
0.8	N/A	N/A	2	100%	2.40	FILTRO INGRESO
4.05	N/A	N/A	1	100%	4.05	PREPARACION DE FORMULAS
2.6	N/A	N/A	1	100%	2.60	PREPARACION DE FORMULAS
5	N/A	N/A	1	100%	5.80	PREPARACION DE FORMULAS
2.1	N/A	N/A	1	100%	2.18	INFORMACION FAMILIARES
0.9	N/A	N/A	1	100%	0.98	INFORMACION FAMILIARES
2.1	N/A	N/A	1	100%	2.10	COORDINACION PEDIATRA
0.9	N/A	N/A	1	100%	0.90	COORDINACION PEDIATRA
2.52	N/A	N/A	3	100%	7.56	CIRCULACION
5.1	N/A	N/A	1	100%	5.10	DESCANSO DE MEDICO
8.4	N/A	N/A	1	100%	8.40	DESCANSO DE MEDICO
5.7	N/A	N/A	1	100%	5.70	DESCANSO ENFERMERIA
3	N/A	N/A	1	100%	3.00	DESCANSO ENFERMERIA
2.5	N/A	N/A	2	100%	5.00	ESTACION DE CAFE
3.9	N/A	N/A	1	100%	3.90	ESTACION DE CAFE
2.1	N/A	N/A	2	100%	4.20	COORDINACION UCI PEDIATRICA
0.9	N/A	N/A	1	100%	0.90	COORDINACION UCI PEDIATRICA
2.8	N/A	N/A	1	100%	2.80	COORDINACION UCI PEDIATRICA
2.1	N/A	N/A	1	100%	2.18	TRANFERENCIA MEDICAMENTOS
1.83	N/A	N/A	2	100%	1.66	TRANFERENCIA MEDICAMENTOS
0.93	N/A	N/A	1	100%	0.93	TRANFERENCIA MEDICAMENTOS
2.1	N/A	N/A	5	100%	10.50	ASISTENCIAL
0.8	N/A	N/A	3	100%	2.40	ASISTENCIAL
2.1	N/A	N/A	1	100%	2.10	ROPA LIMPIA
0.8	N/A	N/A	1	100%	0.80	ROPA LIMPIA
2.1	N/A	N/A	1	100%	2.10	CUARTO STERIL DEPOSITO DE INSUMOS
0.8	N/A	N/A	1	100%	0.80	CUARTO STERIL DEPOSITO DE INSUMOS
2.1	N/A	N/A	1	100%	2.10	CUARTO EQUIPOS
0.9	N/A	N/A	1	100%	8.98	CUARTO EQUIPOS
2.1	N/A	N/A	14	100%	29.40	CIRCULACION
0.8	N/A	N/A	7	100%	5.60	CIRCULACION
0.9	N/A	N/A	2	100%	1.80	CIRCULACION
2	N/A	N/A	8	100%	16.00	CIRCULACION INFORMACION FAMILIAR
2.1	N/A	N/A	4	100%	0.40	CIRCULACION INFORMACION FAMILIAR
0.9	N/A	N/A	1	100%	0.98	CIRCULACION INFORMACION FAMILIAR
4.12	N/A	N/A	2	100%	4.24	ORATORIO
2.45	N/A	N/A	1	100%	2.45	ORATORIO
2.55	N/A	N/A	5	100%	12.25	SALA DE ESPERA
1.16	N/A	N/A	1	100%	1.16	SALA DE ESPERA
2	N/A	N/A	1	100%	2.00	SALA DE ESPERA
2.7	N/A	N/A	4	100%	10.80	UCI # 1
0.9	N/A	N/A	2	100%	1.80	UCI # 1
1.5	N/A	N/A	2	100%	3.00	UCI # 1
0.9	N/A	N/A	4	100%	3.60	UCI # 3
1.5	N/A	N/A	4	100%	6.00	UCI # 3
2.7	N/A	N/A	1	100%	2.70	UCI # 3
0.7	N/A	N/A	1	100%	0.70	UCI # 3
2.5	N/A	N/A	2	100%	5.00	UCI # 3
0.9	N/A	N/A	4	100%	3.60	UCI # 5
1.5	N/A	N/A	4	100%	6.00	UCI # 5
1.7	N/A	N/A	1	100%	1.70	UCI # 5
0.7	N/A	N/A	1	100%	8.70	UCI # 5
2.5	N/A	N/A	2	100%	5.00	UCI # 5
0.9	N/A	N/A	2	100%	1.88	UCI # 7
1.5	N/A	N/A	2	100%	3.00	UCI # 7
1.7	N/A	N/A	1	100%	1.70	UCI # 7
2.5	N/A	N/A	2	100%	5.00	UCI # 7
0.7	N/A	N/A	1	100%	0.78	UCI # 7
2.7	N/A	N/A	1	100%	2.70	UCI # 7
2.7	N/A	N/A	1	100%	2.70	UCI # 9
0.9	N/A	N/A	2	100%	1.80	UCI # 9
1.5	N/A	N/A	2	100%	3.00	UCI # 9
2.5	N/A	N/A	2	100%	5.08	UCI # 9
0.7	N/A	N/A	1	100%	0.78	UCI # 9
1.7	N/A	N/A	1	100%	1.70	UCI # 9
0.9	N/A	N/A	2	100%	1.80	UCI # 11
1.5	N/A	N/A	4	100%	6.00	UCI # 11
2.5	N/A	N/A	2	100%	5.00	UCI # 11
0.7	N/A	N/A	3	100%	2.10	UCI # 11
2.75	N/A	N/A	2	100%	5.50	UCI # 11
0.9	N/A	N/A	1	100%	0.90	UCI # 12
2.1	N/A	N/A	2	100%	4.20	UCI # 12
1	N/A	N/A	4	100%	4.00	UCI # 12
1.7	N/A	N/A	1	100%	1.70	UCI # 12
0.9	N/A	N/A	2	100%	1.80	UCI # 12
1.5	N/A	N/A	2	100%	3.00	UCI # 12
0.9	N/A	N/A	2	100%	1.80	UCI # 10
1.5	N/A	N/A	2	100%	3.00	UCI # 10
1.7	N/A	N/A	1	100%	1.70	UCI # 10
2.7	N/A	N/A	1	100%	2.70	UCI # 10
2.5	N/A	N/A	2	100%	5.00	UCI # 10
0.7	N/A	N/A	2	100%	7.40	UCI # 10
3.05	N/A	N/A	2	100%	6.10	UCI # 8
0.7	N/A	N/A	2	100%	7.40	UCI # 8
1.5	N/A	N/A	2	100%	3.00	UCI # 8
0.9	N/A	N/A	2	100%	1.80	UCI # 8
1.65	N/A	N/A	1	100%	1.65	UCI # 8
2.7	N/A	N/A	1	100%	2.70	UCI # 8
1	N/A	N/A	2	100%	6.00	UCI # 8
0.7	N/A	N/A	2	100%	1.40	UCI # 6




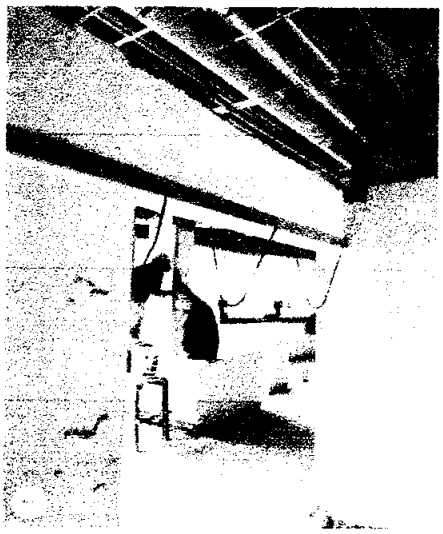






6	N.A.	N.A.	2	100%	18.00	UC # 6
1.5	N.A.	N.A.	2	100%	3.00	UC # 6
1.65	N.A.	N.A.	1	100%	1.65	UC # 6
2.7	N.A.	N.A.	1	100%	2.70	UC # 6
2.7	N.A.	N.A.	1	100%	2.70	UC # 4
3	N.A.	N.A.	2	100%	6.00	UC # 4
0.7	N.A.	N.A.	2	100%	1.40	UC # 4
2.7	N.A.	N.A.	2	100%	5.40	UC # 2
3	N.A.	N.A.	2	100%	6.00	UC # 2
0.7	N.A.	N.A.	1	100%	0.70	UC # 2
2.7	N.A.	N.A.	1	100%	2.70	CIRCULACION
2.1	N.A.	N.A.	1	100%	8.00	CIRCULACION
		PISO 3 - DILATACIONES				
4.9	N.A.	N.A.	2	100%	9.80	TERRAZA SOLAR
3.35	N.A.	N.A.	2	100%	6.70	TERRAZA SOLAR
2.28	N.A.	N.A.	1	100%	2.28	TERRAZA SOLAR
0.97	N.A.	N.A.	2	100%	1.94	TERRAZA SOLAR
0.2	N.A.	N.A.	2	100%	0.40	TERRAZA SOLAR
2.7	N.A.	N.A.	1	100%	2.70	TERRAZA SOLAR
2.32	N.A.	N.A.	1	100%	2.32	TERRAZA SOLAR
2.7	N.A.	N.A.	11	100%	29.70	LUDOTECA
2.17	N.A.	N.A.	2	100%	4.34	LUDOTECA
0.3	N.A.	N.A.	4	100%	1.20	LUDOTECA
1	N.A.	N.A.	2	100%	2.00	LUDOTECA
0.9	N.A.	N.A.	2	100%	1.80	LUDOTECA
0.72	N.A.	N.A.	3	100%	2.16	LUDOTECA
0.32	N.A.	N.A.	3	100%	0.96	LUDOTECA
2.43	N.A.	N.A.	2	100%	4.86	LUDOTECA
0.79	N.A.	N.A.	2	100%	1.58	LUDOTECA
1.6	N.A.	N.A.	4	100%	6.40	LUDOTECA
0.9	N.A.	N.A.	1	100%	5.90	LUDOTECA
2.05	N.A.	N.A.	2	100%	4.10	LUDOTECA
1.91	N.A.	N.A.	2	100%	3.82	LUDOTECA
3.3	N.A.	N.A.	1	100%	3.30	LUDOTECA
2.5	N.A.	N.A.	1	100%	2.50	LUDOTECA
4.8	N.A.	N.A.	2	100%	9.60	LUDOTECA
1.73	N.A.	N.A.	2	100%	3.46	LUDOTECA
3.95	N.A.	N.A.	1	100%	3.95	LUDOTECA
3.05	N.A.	N.A.	1	100%	3.05	LUDOTECA
1.48	N.A.	N.A.	1	100%	1.48	LUDOTECA
1.28	N.A.	N.A.	2	100%	2.56	LUDOTECA
1.54	N.A.	N.A.	2	100%	3.08	LUDOTECA
2.35	N.A.	N.A.	1	100%	2.35	LUDOTECA
0.95	N.A.	N.A.	1	100%	0.95	LUDOTECA
6.26	N.A.	N.A.	1	100%	6.26	LUDOTECA
2.8	N.A.	N.A.	1	100%	2.80	LUDOTECA
1.1	N.A.	N.A.	1	100%	1.10	LUDOTECA
2.7	N.A.	N.A.	1	100%	2.70	LUDOTECA
6.49	N.A.	N.A.	1	100%	6.49	LUDOTECA
0.9	N.A.	N.A.	1	100%	-0.90	DESCUENTO PUERTA
2.7	N.A.	N.A.	6	100%	18.20	CIRCULACION A DESCANSO
2.53	N.A.	N.A.	1	100%	2.53	CIRCULACION A DESCANSO
0.5	N.A.	N.A.	1	100%	0.50	CIRCULACION A DESCANSO
3.94	N.A.	N.A.	2	100%	7.88	CIRCULACION A DESCANSO
1.46	N.A.	N.A.	1	100%	1.46	CIRCULACION A DESCANSO
0.34	N.A.	N.A.	1	100%	0.34	CIRCULACION A DESCANSO
3.98	N.A.	N.A.	1	100%	3.98	CIRCULACION A DESCANSO
3.18	N.A.	N.A.	1	100%	3.18	CIRCULACION A DESCANSO
0.77	N.A.	N.A.	2	100%	1.54	CIRCULACION A DESCANSO
0.4	N.A.	N.A.	2	100%	0.80	CIRCULACION A DESCANSO
1.15	N.A.	N.A.	1	100%	1.15	CIRCULACION A DESCANSO
4.25	N.A.	N.A.	1	100%	4.25	CIRCULACION A DESCANSO
5.33	N.A.	N.A.	1	100%	5.33	CIRCULACION A DESCANSO
4.43	N.A.	N.A.	1	100%	4.43	CIRCULACION A DESCANSO
6.24	N.A.	N.A.	3	100%	6.24	CIRCULACION A DESCANSO
1.00	N.A.	N.A.	1	100%	1.00	CIRCULACION A DESCANSO
1.1	N.A.	N.A.	2	100%	2.20	CIRCULACION A DESCANSO
1.7	N.A.	N.A.	1	100%	1.70	CIRCULACION A DESCANSO
0.6	N.A.	N.A.	1	100%	0.60	CIRCULACION A DESCANSO
0.2	N.A.	N.A.	1	100%	0.20	CIRCULACION A DESCANSO
4.47	N.A.	N.A.	2	100%	8.94	CIRCULACION A DESCANSO
5.25	N.A.	N.A.	1	100%	5.25	CIRCULACION A DESCANSO
2.94	N.A.	N.A.	1	100%	2.94	CIRCULACION A DESCANSO
0.9	N.A.	N.A.	1	100%	-0.90	DESCUENTO
2.7	N.A.	N.A.	1	100%	2.70	DESCANSO MEDICO
1.61	N.A.	N.A.	1	100%	1.61	DESCANSO MEDICO
4.86	N.A.	N.A.	1	100%	4.86	DESCANSO MEDICO
2.17	N.A.	N.A.	1	100%	2.17	DESCANSO MEDICO
4.63	N.A.	N.A.	1	100%	4.63	DESCANSO MEDICO
0.5	N.A.	N.A.	1	100%	0.50	DESCANSO MEDICO
1.64	N.A.	N.A.	1	100%	1.64	DESCANSO MEDICO
0.9	N.A.	N.A.	1	100%	0.60	DESCANSO MEDICO
2.98	N.A.	N.A.	1	100%	2.98	DESCANSO MEDICO
2.91	N.A.	N.A.	1	100%	2.91	DESCANSO ENFERMERIA
0.5	N.A.	N.A.	1	100%	0.50	DESCANSO ENFERMERIA
6.93	N.A.	N.A.	1	100%	6.93	DESCANSO ENFERMERIA
0.78	N.A.	N.A.	1	100%	5.78	DESCANSO ENFERMERIA
0.6	N.A.	N.A.	2	100%	1.20	DESCANSO ENFERMERIA
1.33	N.A.	N.A.	1	100%	1.33	DESCANSO ENFERMERIA
0.97	N.A.	N.A.	1	100%	0.97	DESCANSO ENFERMERIA
3.59	N.A.	N.A.	2	100%	7.18	COORDINACION PEDIATRICA
0.44	N.A.	N.A.	1	100%	5.44	COORDINACION PEDIATRICA
2.85	N.A.	N.A.	1	100%	2.85	COORDINACION PEDIATRICA
1.76	N.A.	N.A.	1	100%	1.76	COORDINACION PEDIATRICA
2.62	N.A.	N.A.	1	100%	2.62	COORDINACION PEDIATRICA
3.52	N.A.	N.A.	3	100%	10.56	UC # 11
1.3	N.A.	N.A.	3	100%	1.90	UC # 11
0.99	N.A.	N.A.	3	100%	2.97	UC # 11
0.98	N.A.	N.A.	2	100%	1.96	UC # 11
2.35	N.A.	N.A.	1	100%	2.35	UC # 11
1.43	N.A.	N.A.	2	100%	2.86	UC # 11
2.01	N.A.	N.A.	1	100%	2.01	UC # 11
2.02	N.A.	N.A.	2	100%	6.04	UC 10
1.34	N.A.	N.A.	2	100%	2.68	UC 10
2.75	N.A.	N.A.	2	100%	5.50	UC 10
3.44	N.A.	N.A.	2	100%	6.88	UC 10
3.08	N.A.	N.A.	1	100%	3.08	UC 10
1.03	N.A.	N.A.	1	100%	1.03	UC 10
0.487	N.A.	N.A.	1	100%	0.48	UC 10
5.05	N.A.	N.A.	1	100%	5.05	UC 8
4.11	N.A.	N.A.	1	100%	4.11	UC 8
2.12	N.A.	N.A.	1	100%	2.12	UC 8
2.44	N.A.	N.A.	1	100%	2.44	UC 8
0.56	N.A.	N.A.	1	100%	0.56	UC 8
2.44	N.A.	N.A.	1	100%	2.44	UC 8
3.07	N.A.	N.A.	1	100%	3.07	UC 8
4.07	N.A.	N.A.	1	100%	4.07	UC 8
3.04	N.A.	N.A.	1	100%	3.04	UC 8
1.28	N.A.	N.A.	1	100%	1.28	UC 8
1.85	N.A.	N.A.	1	100%	1.85	UC 8
2.55	N.A.	N.A.	1	100%	2.55	UC 8
2.17	N.A.	N.A.	1	100%	2.17	UC 8
2.5	N.A.	N.A.	3	100%	7.50	UC 4





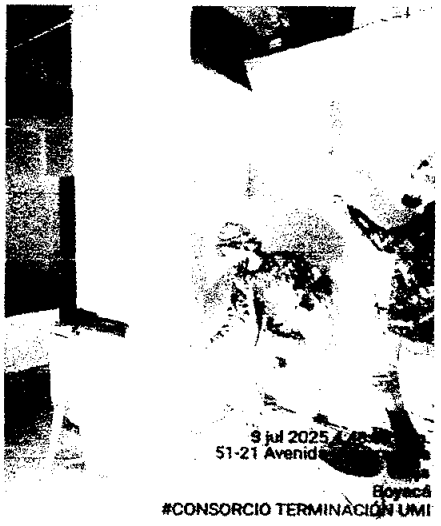




3.77	N/A	N/A	1	100%	3.77	UCI 4
3.72	N/A	N/A	1	100%	3.72	UCI 4
4.12	N/A	N/A	1	100%	4.12	UCI 4
6.66	N/A	N/A	2	100%	6.66	UCI 4
3.24	N/A	N/A	1	100%	3.24	UCI 4
1.36	N/A	N/A	1	100%	1.36	ACCESO ASISTENCIAL
1.48	N/A	N/A	1	100%	1.48	ACCESO ASISTENCIAL
1.79	N/A	N/A	1	100%	1.79	ACCESO ASISTENCIAL
1.67	N/A	N/A	1	100%	1.67	ACCESO ASISTENCIAL
1.74	N/A	N/A	1	100%	1.74	ACCESO ASISTENCIAL
1.37	N/A	N/A	1	100%	1.37	ACCESO ASISTENCIAL
4.14	N/A	N/A	2	100%	4.14	ACCESO ASISTENCIAL
9.71	N/A	N/A	1	100%	9.71	ACCESO ASISTENCIAL
2.79	N/A	N/A	3	100%	2.79	ACCESO ASISTENCIAL
2.07	N/A	N/A	1	100%	2.07	ACCESO ASISTENCIAL
0.80	N/A	N/A	1	100%	0.80	ACCESO ASISTENCIAL
8.88	N/A	N/A	2	100%	8.88	ACCESO ASISTENCIAL
1.44	N/A	N/A	1	100%	1.44	ACCESO ASISTENCIAL
2.27	N/A	N/A	1	100%	2.27	ACCESO ASISTENCIAL
1.50	N/A	N/A	1	100%	1.50	ACCESO ASISTENCIAL
8.66	N/A	N/A	1	100%	8.66	ACCESO ASISTENCIAL
8.38	N/A	N/A	1	100%	8.38	ACCESO ASISTENCIAL
1.32	N/A	N/A	2	100%	1.32	ACCESO ASISTENCIAL
1.80	N/A	N/A	2	100%	1.80	ACCESO ASISTENCIAL
2.08	N/A	N/A	1	100%	2.08	ACCESO ASISTENCIAL
2.00	N/A	N/A	1	100%	2.00	CIRCULACION INFORMACION
0.60	N/A	N/A	2	100%	0.60	CIRCULACION INFORMACION
2.71	N/A	N/A	1	100%	2.71	CIRCULACION INFORMACION
3.78	N/A	N/A	1	100%	3.78	CIRCULACION INFORMACION
1.48	N/A	N/A	1	100%	1.48	COORDINACION UCI PEDIATRICA
3.72	N/A	N/A	1	100%	3.72	COORDINACION UCI PEDIATRICA
3.86	N/A	N/A	1	100%	3.86	COORDINACION UCI PEDIATRICA
2.60	N/A	N/A	2	100%	2.60	COORDINACION UCI PEDIATRICA
8.22	N/A	N/A	1	100%	8.22	COORDINACION UCI PEDIATRICA
1.90	N/A	N/A	1	100%	1.90	COORDINACION UCI PEDIATRICA
5.00	N/A	N/A	2	100%	5.00	COORDINACION UCI PEDIATRICA
1.30	N/A	N/A	1	100%	1.30	COORDINACION UCI PEDIATRICA
2.75	N/A	N/A	1	100%	2.75	COORDINACION UCI PEDIATRICA
0.50	N/A	N/A	1	100%	0.50	COORDINACION UCI PEDIATRICA
1.20	N/A	N/A	1	100%	1.20	COORDINACION UCI PEDIATRICA
1.63	N/A	N/A	1	100%	1.63	COORDINACION UCI PEDIATRICA
1.57	N/A	N/A	1	100%	1.57	COORDINACION UCI PEDIATRICA
3.76	N/A	N/A	1	100%	3.76	COORDINACION UCI PEDIATRICA
		PISO 4 - FELOS				
2.30	N/A	N/A	3	100%	6.90	HABITACION 426
0.90	N/A	N/A	1	100%	0.90	HABITACION 425
1.96	N/A	N/A	6	100%	11.76	HABITACION 425
1.20	N/A	N/A	1	100%	1.20	HABITACION 425
0.77	N/A	N/A	1	100%	0.77	HABITACION 425
2.30	N/A	N/A	1	100%	9.20	HABITACION 424
0.90	N/A	N/A	1	100%	0.90	HABITACION 424
1.96	N/A	N/A	6	100%	11.76	HABITACION 424
1.20	N/A	N/A	1	100%	1.20	HABITACION 424
0.77	N/A	N/A	1	100%	0.77	HABITACION 424
2.30	N/A	N/A	3	100%	6.90	HABITACION 423
0.90	N/A	N/A	1	100%	0.90	HABITACION 423
1.96	N/A	N/A	4	100%	7.84	HABITACION 423
1.20	N/A	N/A	1	100%	1.20	HABITACION 423
0.77	N/A	N/A	1	100%	0.77	HABITACION 423
2.30	N/A	N/A	5	100%	11.50	HABITACION 422
0.90	N/A	N/A	1	100%	0.90	HABITACION 422
1.96	N/A	N/A	4	100%	7.84	HABITACION 422
1.20	N/A	N/A	1	100%	1.20	HABITACION 422
0.77	N/A	N/A	1	100%	0.77	HABITACION 422
2.30	N/A	N/A	3	100%	6.90	HABITACION 421
0.90	N/A	N/A	1	100%	0.90	HABITACION 421
1.96	N/A	N/A	3	100%	5.88	HABITACION 421
1.20	N/A	N/A	1	100%	1.20	HABITACION 421
0.77	N/A	N/A	1	100%	0.77	HABITACION 421
2.30	N/A	N/A	3	100%	6.90	HABITACION 420
0.90	N/A	N/A	1	100%	0.90	HABITACION 420
1.96	N/A	N/A	6	100%	11.76	HABITACION 420
1.20	N/A	N/A	1	100%	1.20	HABITACION 420
0.77	N/A	N/A	1	100%	0.77	HABITACION 420
2.30	N/A	N/A	3	100%	6.90	HABITACION 419
0.90	N/A	N/A	1	100%	0.90	HABITACION 419
1.96	N/A	N/A	4	100%	7.84	HABITACION 419
1.20	N/A	N/A	1	100%	1.20	HABITACION 419
0.77	N/A	N/A	1	100%	0.77	HABITACION 419
2.30	N/A	N/A	2	100%	4.60	HABITACION 418
0.90	N/A	N/A	1	100%	0.90	HABITACION 418
1.96	N/A	N/A	6	100%	11.76	HABITACION 418
1.20	N/A	N/A	1	100%	1.20	HABITACION 418
0.77	N/A	N/A	1	100%	0.77	HABITACION 418
2.30	N/A	N/A	3	100%	6.90	HABITACION 417
0.90	N/A	N/A	1	100%	0.90	HABITACION 417
1.96	N/A	N/A	5	100%	9.80	HABITACION 417
1.20	N/A	N/A	1	100%	1.20	HABITACION 417
0.77	N/A	N/A	1	100%	0.77	HABITACION 417
2.30	N/A	N/A	3	100%	6.90	HABITACION 416
0.90	N/A	N/A	1	100%	0.90	HABITACION 416
1.96	N/A	N/A	6	100%	11.76	HABITACION 416
1.20	N/A	N/A	1	100%	1.20	HABITACION 416
0.77	N/A	N/A	2	100%	1.54	HABITACION 416
2.30	N/A	N/A	3	100%	6.90	HABITACION 415
0.90	N/A	N/A	1	100%	0.90	HABITACION 415
1.96	N/A	N/A	5	100%	9.80	HABITACION 415
1.20	N/A	N/A	1	100%	1.20	HABITACION 415
0.77	N/A	N/A	2	100%	1.54	HABITACION 415
2.30	N/A	N/A	3	100%	6.90	HABITACION 414
0.90	N/A	N/A	1	100%	0.90	HABITACION 414
1.96	N/A	N/A	5	100%	9.80	HABITACION 414
1.20	N/A	N/A	1	100%	1.20	HABITACION 414
0.77	N/A	N/A	2	100%	1.54	HABITACION 414
2.30	N/A	N/A	2	100%	4.60	HABITACION 413
0.90	N/A	N/A	1	100%	0.90	HABITACION 413
1.96	N/A	N/A	5	100%	9.80	HABITACION 413
1.20	N/A	N/A	1	100%	1.20	HABITACION 413
0.77	N/A	N/A	2	100%	1.54	HABITACION 413
2.30	N/A	N/A	3	100%	6.90	HABITACION 412
0.90	N/A	N/A	1	100%	0.90	HABITACION 412
1.96	N/A	N/A	6	100%	11.76	HABITACION 412
1.20	N/A	N/A	1	100%	1.20	HABITACION 412
0.77	N/A	N/A	2	100%	1.54	HABITACION 412
2.30	N/A	N/A	3	100%	6.90	HABITACION 411
0.90	N/A	N/A	1	100%	0.90	HABITACION 411
1.96	N/A	N/A	6	100%	11.76	HABITACION 411
1.20	N/A	N/A	1	100%	1.20	HABITACION 411
0.77	N/A	N/A	2	100%	1.54	HABITACION 411
2.30	N/A	N/A	3	100%	6.90	HABITACION 410
0.90	N/A	N/A	1	100%	0.90	HABITACION 410
1.96	N/A	N/A	6	100%	11.76	HABITACION 410





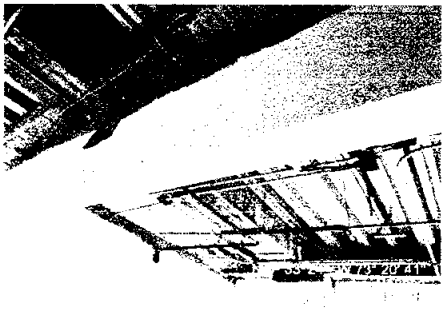


1.20	N/A	N/A	1	100%	1.20	HABITACION 410
0.76	N/A	N/A	2	100%	1.52	HABITACION 410
2.30	N/A	N/A	3	100%	6.90	HABITACION 409
0.90	N/A	N/A	1	100%	0.90	HABITACION 409
1.96	N/A	N/A	6	100%	11.76	HABITACION 409
1.20	N/A	N/A	1	100%	1.20	HABITACION 409
0.77	N/A	N/A	2	100%	1.54	HABITACION 409
2.30	N/A	N/A	3	100%	6.90	HABITACION 408
0.90	N/A	N/A	1	100%	0.90	HABITACION 408
1.96	N/A	N/A	6	100%	11.76	HABITACION 408
1.20	N/A	N/A	1	100%	1.20	HABITACION 408
0.77	N/A	N/A	2	100%	1.54	HABITACION 408
2.30	N/A	N/A	2	100%	4.60	HABITACION 407
0.90	N/A	N/A	1	100%	0.90	HABITACION 407
1.96	N/A	N/A	6	100%	11.76	HABITACION 407
1.20	N/A	N/A	1	100%	1.20	HABITACION 407
0.77	N/A	N/A	2	100%	1.54	HABITACION 407
2.30	N/A	N/A	2	100%	4.60	HABITACION 406
0.90	N/A	N/A	1	100%	0.90	HABITACION 406
1.96	N/A	N/A	6	100%	11.76	HABITACION 406
1.20	N/A	N/A	2	100%	2.40	HABITACION 406
0.77	N/A	N/A	1	100%	0.77	HABITACION 406
2.30	N/A	N/A	6	100%	13.80	HABITACION 405
0.90	N/A	N/A	1	100%	0.90	HABITACION 405
1.96	N/A	N/A	4	100%	7.84	HABITACION 405
1.20	N/A	N/A	1	100%	1.20	HABITACION 405
0.77	N/A	N/A	2	100%	1.54	HABITACION 405
2.30	N/A	N/A	2	100%	4.60	HABITACION 404
0.90	N/A	N/A	1	100%	0.90	HABITACION 404
1.96	N/A	N/A	6	100%	11.76	HABITACION 404
1.20	N/A	N/A	1	100%	1.20	HABITACION 404
0.77	N/A	N/A	2	100%	1.54	HABITACION 404
2.30	N/A	N/A	10	100%	23.00	HABITACION 403
0.90	N/A	N/A	1	100%	0.90	HABITACION 403
1.96	N/A	N/A	6	100%	11.76	HABITACION 403
1.20	N/A	N/A	1	100%	1.20	HABITACION 403
0.77	N/A	N/A	2	100%	1.54	HABITACION 403
2.30	N/A	N/A	3	100%	6.90	HABITACION 402
0.90	N/A	N/A	1	100%	0.90	HABITACION 402
1.96	N/A	N/A	5	100%	9.80	HABITACION 402
1.20	N/A	N/A	1	100%	1.20	HABITACION 402
0.77	N/A	N/A	2	100%	1.54	HABITACION 402
2.30	N/A	N/A	3	100%	6.90	HABITACION 401
0.90	N/A	N/A	1	100%	0.90	HABITACION 401
1.96	N/A	N/A	5	100%	9.80	HABITACION 401
1.20	N/A	N/A	1	100%	1.20	HABITACION 401
0.77	N/A	N/A	2	100%	1.54	HABITACION 401
1.20	N/A	N/A	25	100%	30.00	CIRCULACION HOSPITALIZACION
0.40	N/A	N/A	1	100%	0.40	CUARTO DE EQUIPO
1.96	N/A	N/A	40	100%	40.00	CIRCULACION ELLIS
7.61	N/A	N/A	2	100%	15.22	CENTRAL DE ENFERMERIA
0.80	N/A	N/A	1	100%	0.80	TRABAJO LIMPIO
1.96	N/A	N/A	1	100%	1.96	TRABAJO LIMPIO
2.40	N/A	N/A	3	100%	7.20	PROCEDIMIENTO
1.96	N/A	N/A	1	100%	1.96	PROCEDIMIENTO
1.48	N/A	N/A	1	100%	1.48	PROCEDIMIENTO
0.70	N/A	N/A	1	100%	0.70	CUARTO DE ASEO
0.80	N/A	N/A	1	100%	0.80	CUARTO DE ASEO
2.10	N/A	N/A	2	100%	4.68	DESCANSO Y VESTIER
1.96	N/A	N/A	4	100%	7.84	DESCANSO Y VESTIER
0.90	N/A	N/A	2	100%	1.80	DESCANSO Y VESTIER
2.40	N/A	N/A	9	100%	21.60	CIRCULACION RESTRINGIDA
1.96	N/A	N/A	10	100%	19.60	CIRCULACION RESTRINGIDA
1.30	N/A	N/A	1	100%	1.30	CIRCULACION RESTRINGIDA
0.80	N/A	N/A	2	100%	1.60	CIRCULACION RESTRINGIDA
0.90	N/A	N/A	1	100%	0.90	CIRCULACION RESTRINGIDA
1.96	N/A	N/A	2	100%	3.92	LIDO LLEGADA DIRECTAS
0.93	N/A	N/A	2	100%	1.86	BAÑO
1.96	N/A	N/A	2	100%	3.92	BAÑO
0.86	N/A	N/A	2	100%	1.72	BAÑO
1.96	N/A	N/A	2	100%	3.92	BAÑO
0.88	N/A	N/A	2	100%	1.76	BAÑO
2.30	N/A	N/A	2	100%	4.60	ROPA SUCIA
1.96	N/A	N/A	3	100%	5.88	RESIDUOS ORDINARIOS
2.77	N/A	N/A	2	100%	5.54	RESIDUOS ORDINARIOS
1.96	N/A	N/A	3	100%	5.88	RESIDUOS PELIGROSO
0.75	N/A	N/A	2	100%	1.50	RESIDUOS PELIGROSO
2.40	N/A	N/A	2	100%	4.80	CIRCULACION UCI
2.40	N/A	N/A	5	100%	12.00	COORDINACION
2.67	N/A	N/A	2	100%	5.34	COORDINACION
1.96	N/A	N/A	2	100%	3.92	COORDINACION
2.63	N/A	N/A	2	100%	5.26	COORDINACION
1.03	N/A	N/A	2	100%	2.06	COORDINACION
4.79	N/A	N/A	1	100%	4.79	COORDINACION
0.78	N/A	N/A	2	100%	1.54	COORDINACION
2.40	N/A	N/A	2	100%	4.80	SALA ESPERA
3.44	N/A	N/A	2	100%	6.88	SALA ESPERA
6.39	N/A	N/A	2	100%	12.74	SALA ESPERA

OBSERVACIONES:

TOTAL	4,590.82	Metro lineal
ACUMULADO ANTERIOR	3,780.65	
PRESENTE ACTA	810.23	

Elabor4 contratista:	Estefanía Carvajal Hong4	FIRMA:
Aprobo Interventorra:	Brenda Luz Hurtado	FIRMA:

PROYECTO	CONSTRUCCION PARA LA TERMINACION DE LA REMODELACION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA										
ITEM	3.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIACAÑA EN GRANITO (URGENCIAS + PARTOS)	CAP	3,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISOS GASES - ACABADOS		UNIDAD	Metro lineal		UBICACIÓN	HMI-SAN RAFAEL
Registro fotográfico							Dimensiones			Total (m)	Observaciones
					L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%		
							PISO 2				
					13.57	N/A	N/A	1	100%	13.57	OCUPADO 6
					15.64	N/A	N/A	1	100%	15.64	OCUPADO 8
					13.63	N/A	N/A	1	100%	13.63	OCUPADO 7
					11.67	N/A	N/A	1	100%	11.67	PASILLO Y/O CIRCULACION DE OCUPADO DE 6 A 9
					7.61	N/A	N/A	1	100%	7.61	OCUPADO 9
					13.2	N/A	N/A	1	100%	13.20	
					14.17	N/A	N/A	1	100%	14.17	OCUPADO 5
					14.15	N/A	N/A	1	100%	14.15	OCUPADO 4
					14.14	N/A	N/A	1	100%	14.14	OCUPADO 3
					13.22	N/A	N/A	1	100%	13.22	OCUPADO 2
					14.09	N/A	N/A	1	100%	14.09	OCUPADO 1
					16.72	N/A	N/A	1	100%	16.72	PASILLO Y/O CIRCULACION DE OCUPADO DE 1 A 5
					9.53	N/A	N/A	1	100%	9.53	CENTRAL DE ENFERMERIA + MATERNI FRENTE A OCUPADO 5
					3.57	N/A	N/A	1	100%	3.57	INGRESO CUARTOS DE OCUPADO
					10.26	N/A	N/A	1	100%	10.26	CENTRAL DE ENFERMERIA FRENTE A OCUPADO 2
					2.57	N/A	N/A	1	100%	2.57	RECORRIDO INTIMIDAD
					6.52	N/A	N/A	1	100%	6.52	FILTRO ACCESO PERSONAL UARO
					5.84	N/A	N/A	1	100%	5.84	PASILLO ACCESO BAÑO COSTADO DE VESTIER PACIENTES
					18.31	N/A	N/A	1	100%	18.31	VESTIER PACIENTES
					2.38	N/A	N/A	1	100%	2.38	BAÑO
						N/A	N/A		100%		
					40.76	N/A	N/A	1	100%	40.76	RECUPERACION SALA PARTO
					0.93	N/A	N/A	1	100%	0.93	ESTACION ENFERMERIA RECUPERACION
					9.84	N/A	N/A	1	100%	9.84	DISTRIBUCION DE SALA PARTO ADICIONADO LATERAL DERECHO
					17.67	N/A	N/A	1	100%	17.67	CIRCULACION DE SALA DE PARTO 1 Y 2 A DESCANSO
					10.31	N/A	N/A	1	100%	10.31	CUARTO DE EQUIPOS
						N/A	N/A				
					8.66	N/A	N/A	1	100%	8.66	CIRCULACION HACIA U.NEONATOS DESDE RECUPERACION PARTOS COSTADO IZQUIERDO
					20.86	N/A	N/A	1	100%	20.86	DESCANSO MEDICO + QUIROFANOS
					9.37	N/A	N/A	1	100%	9.37	CIRCULACION DE PERSONAL DE SALA COSTADO DERECHO
					5.13	N/A	N/A	1	100%	5.13	BODEGA
					49.36	N/A	N/A	1	100%	49.36	RECUPERACION CUIRURGICA + ESTACION ENFERMERIA
					10.78	N/A	N/A	1	100%	10.78	PASILLO A AUTOCLAVE DESDE RECUPERACION QUIRURGICA
					31.83	N/A	N/A	1	100%	31.83	AUTOCLAVE
					7.45	N/A	N/A	1	100%	7.45	PASILLO AUTOCLAVE HACIA OTROS AREAS
					2.75	N/A	N/A	1	100%	2.75	COSTADO DERECHO
					14.34	N/A	N/A	1	100%	14.34	PREPARACION PACIENTES AMBULATORIOS
					5.35	N/A	N/A	1	100%	5.35	VC H PREPARACION DE PACIENTES AMBULA
					6.99	N/A	N/A	1	100%	6.99	VC M PREPARACION DE PACIENTES AMBULA
					14.54	N/A	N/A	1	100%	14.54	PASILLO QUIROFANOS 01 AL 3 COSTADO DERECHO
					18.34	N/A	N/A	1	100%	18.34	FARMACIA
					24.89	N/A	N/A	1	100%	24.89	PASILLO POSTERIOR FARMACIA
					5.05	N/A	N/A	1	100%	5.05	RESIDUOS TEMPORALES 1
					4.76	N/A	N/A	1	100%	4.76	RESIDUOS TEMPORALES 2
					5.21	N/A	N/A	1	100%	5.21	ASEO MUJERES QUIROFANO 3
					13.19	N/A	N/A	1	100%	13.19	PASILLO EN L QUIROFANOS 01 AL 03 DESDE QUIROFANOS COSTADO DERECHO
					15.40	N/A	N/A	1	100%	15.40	DESCANSO RECUPERACION Y QUIROFANOS
					5.18	N/A	N/A	1	100%	5.18	BODEGA COSTADO DERECHO DE DESCANSO
					5.31	N/A	N/A	1	100%	5.31	CIRCULACION DESCANSO VESTIER
					16.89	N/A	N/A	1	100%	16.89	VESTIER MUJERES VESTIER HOMBRES
					18.25	N/A	N/A	1	100%	18.25	VESTIER MUJERES VESTIER HOMBRES
					4.53	N/A	N/A	1	100%	4.53	VESTIER MUJERES DUCHA
					4.11	N/A	N/A	1	100%	4.11	VESTIER MUJERES BAÑO 1
					4.86	N/A	N/A	1	100%	4.86	VESTIER MUJERES BAÑO 2
					3.72	N/A	N/A	1	100%	3.72	VESTIER HOMBRE DUCHA
					4.53	N/A	N/A	1	100%	4.53	VESTIER HOMBRE BAÑO
					3.99	N/A	N/A	1	100%	3.99	PASILLO ENTRADA VESTIER + CIRCULACION RECUPERACION PARTOS
					3.17	N/A	N/A	1	100%	3.17	PASILLO RESIDUOS PASILLO FRENTE A RECUPERACION PARTOS
					7.81	N/A	N/A	1	100%	7.81	RECEPCION CONTROL COSTADO IZQUIERDO
					9.61	N/A	N/A	1	100%	9.61	MURO EXTERIOR DESCANSO OCUPADO
					8.28	N/A	N/A	1	100%	8.28	DESCANSO OCUPADO
					6.76	N/A	N/A	1	100%	6.76	PETRO PARA MUROS URO
					19.86	N/A	N/A	1	100%	19.86	CIRCULACION OCUPADO A UCI NEO
					6.28	N/A	N/A	1	100%	6.28	ESCRITORIO ENFERMERIA OCUPADO
					9.40	N/A	N/A	1	100%	9.40	FILTRO VISITANTES UCI NEO
					15.11	N/A	N/A	1	100%	15.11	LACTARIO + BODEGA
					4.76	N/A	N/A	1	100%	4.76	VC PARTOS COSTADO DE PESEBRES TEMPORALES
					10.05	N/A	N/A	1	100%	10.05	AMBIENTE TRABAJADORES FIJOS
					11.35	N/A	N/A	1	100%	11.35	EXTRACCION
					2.67	N/A	N/A	1	100%	2.67	RESIDUOS TEMPORALES
					9.76	N/A	N/A	1	100%	9.76	CIRCULACION ASEO UCI NEO
					5.92	N/A	N/A	1	100%	5.92	LAVADO DE INCUBADORAS
					2.53	N/A	N/A	1	100%	2.53	ASEO TRUNCO
					45.52	N/A	N/A	1	100%	45.52	UCI NEO INTENSIVOS
					11.04	N/A	N/A	1	100%	11.04	U INTERMEDIA NEONATOS UCI NEO INTERMEDIOS
					68.89	N/A	N/A	1	100%	68.89	CUARTO DE BATERIAS
					13.35	N/A	N/A	1	100%	13.35	CENTRAL ENFERMERIA UCI NEO INTERMEDIOS
					4.78	N/A	N/A	1	100%	4.78	TUMBADO CENTRAL ENFERMERIA INTERMEDIO
					9.50	N/A	N/A	1	100%	9.50	ESTACION SATELITE Y ARCHIVO
					11.24	N/A	N/A	1	100%	11.24	PASILLO HACIA DESCANSO UCI NEO
					18.93	N/A	N/A	1	100%	18.93	DESCANSO UCI NEO
					4.83	N/A	N/A	1	100%	4.83	INSUMOS TERAPIA RESPIRATORIA
					3.57	N/A	N/A	1	100%	3.57	1 SUCIO UCI NEO
					4.79	N/A	N/A	1	100%	4.79	VC UCI NEO PASILLO HACIA DESCANSO UCI NEO
					8.23	N/A	N/A	1	100%	8.23	ESPACIO INCLEFAS HACIA DESCANSO + MURO POSTERIOR DE CENTRAL ENFERMERIA DE INTENSIVOS
					20.14	N/A	N/A	1	100%	20.14	CUARTO DE EQUIPOS
					6.77	N/A	N/A	1	100%	6.77	LIMPIO UCI NEO
					6.66	N/A	N/A	1	100%	6.66	SUCIO UCI NEO
					8.54	N/A	N/A	1	100%	8.54	PASILLO VESTIER PERSONAL ASISTENCIAL
					2.67	N/A	N/A	1	100%	2.67	SUCIO PASILLO VESTIER PERSONAL ASISTENCIAL
					2.02	N/A	N/A	1	100%	2.02	LIMPIO PASILLO VESTIER PERSONAL ASISTENCIAL
					6.13	N/A	N/A	1	100%	6.13	INSUMOS TERAPIA RESPIRATORIA
					4.88	N/A	N/A	1	100%	4.88	VC MUJERES
					6.31	N/A	N/A	1	100%	6.31	VC PMR MUJERES
					11.25	N/A	N/A	1	100%	11.25	COORDINACION UCI NEO
					11.57	N/A	N/A	1	100%	11.57	VESTIER ASISTENCIAL
					5.03	N/A	N/A	1	100%	5.03	VC VESTIER


















9 jul 2025 4:55:40 p.m.
51 Avenida Universitaria
Tunja
Boyacá
#CONSORCIO TERMINACIÓN UMI



1 Calle 49
Tunja
Boyacá
#CLINIICA MARTERNO INFANTIL

24.14	N/A	N/A	1	100%	24.14	SALA ESPERA HALL	
4.85	N/A	N/A	1	100%	4.85	BAÑO	
9.49	N/A	N/A	1	100%	9.49	PASILLO HACIA WCH Y ESTER AUTOCLAVE	
4.51	N/A	N/A	1	100%	4.51	WC (E) PANELI (H) HACIA WC (H) ESTER AUTOCLAVE)	
4.85	N/A	N/A	1	100%	4.85	ESTER AUTOCLAVE	
9.81	N/A	N/A	1	100%	9.81	ESTRO AUTOCLAVE	
11.93	N/A	N/A	1	100%	11.93	WC (M) (H) + BAÑO SOLO WC	
3.93	N/A	N/A	1	100%	3.93	R PASILLO CENTRAL SUPER DE RECUPERACION PARTO	
5.46	N/A	N/A	1	100%	5.46	T SUCIO FRENTE CENTRAL ENFERMERIA DE RECUPERACION PACIENTE	
41.22	N/A	N/A	1	100%	41.22	TRABAJO PARTO + CENTRAL DE ENFERMERIA	
7.77	N/A	N/A	1	100%	7.77	WC (M) HACIA PARTO	
6.86	N/A	N/A	1	100%	6.86	T LIMPIO FRENTE CENTRAL ENFERMERIA DE RECUPERACION PARTOS	
5.59	N/A	N/A	1	100%	5.59	ROPA LIMPIA CENTRAL SUPER DE RECUPERACION PARTO	
6.94	N/A	N/A	1	100%	6.94	T LIMPIO CENTRAL ENFER DE RECUPERACION PARTO	
5.47	N/A	N/A	1	100%	5.47	WC 1 RECUPERACION PARTO	
4.2	N/A	N/A	1	100%	4.20	WC 2 RECUPERACION PARTO	
3.78	N/A	N/A	1	100%	3.78	DEP ROPA SUCIA CUARTO	
5.64	N/A	N/A	1	100%	5.64	LIMPIO CUARTO	
7.74	N/A	N/A	1	100%	7.74	WC CUARTO AISLADO 06	
6.79	N/A	N/A	1	100%	6.79	WC 1 (FRENTE CUARTO 07)	
8.26	N/A	N/A	1	100%	8.26	WC 2 (FRENTE CUARTO 07)	
5.34	N/A	N/A	1	100%	5.34	LAVADOS 1 FRENTE CUARTO 09	
3.24	N/A	N/A	1	100%	3.24	ASEO FRENTE CUARTO 09	
4.65	N/A	N/A	1	100%	4.65	T SUCIO CENTRAL DE ENFERMERIA FRENTE A CUARTO 09	
		PISO 1					
28.73	N/A	N/A	1	100%	28.73	AUDITORIO	
39.16	N/A	N/A	1	100%	39.16	CAFETERIA	
1.64	N/A	N/A	1	100%	1.64		
20.06	N/A	N/A	1	100%	20.06	COCINA	
35.37	N/A	N/A	1	100%	35.37	SALA ESPERA IMAGENOLOGIA	
22.25	N/A	N/A	1	100%	22.25	RECEPCION DEPARTAMENTO FARMACIA	
28.27	N/A	N/A	1	100%	28.27	FARMACIA	
45.22	N/A	N/A	1	100%	45.22	EQUIPOS LABORATORIO	
25.43	N/A	N/A	1	100%	25.43	CENTRIFUGA Y LAVADO LABORATORIO	
9.04	N/A	N/A	1	100%	9.04	INFESTRAL ADMINISTRATIVO	
13.51	N/A	N/A	1	100%	13.51	PRETRASFUNCIONAL LABORATORIO	
18.84	N/A	N/A	1	100%	18.84	RESIDUO INFECCIOSO RESIDUOS RECICLABLE ASEO LABORATORIO	
7.89	N/A	N/A	1	100%	7.89	BIOSEGURIDAD	
17.90	N/A	N/A	1	100%	17.90	TOMA DE MUESTRA GINECOLOGIA	
15.68	N/A	N/A	1	100%	15.68	TOMA DE MUESTRA	
10.47	N/A	N/A	1	100%	10.47	PASILLO CON MAGNEOCRA	
6.74	N/A	N/A	1	100%	6.74	PROCEDIMIENTO PLACENCOLOGIA	
9.53	N/A	N/A	1	100%	9.53	SALA DE ESPERA OBSTRACIA	
20.38	N/A	N/A	1	100%	20.38	ECOGRAFO 1	
15.75	N/A	N/A	1	100%	15.75	ECOGRAFO 2	
14.64	N/A	N/A	1	100%	14.64	MONITORIA PROCEDIMIENTO	
19.82	N/A	N/A	1	100%	19.82	PROCEDIMIENTO CARDIO	
12.19	N/A	N/A	1	100%	12.19	CONSULTORIO GINECOLOGIA	
20.06	N/A	N/A	1	100%	20.06	OBSERVACION GINECOPERATIVA	
11.29	N/A	N/A	1	100%	11.29	CIRCULACION RX	
9.09	N/A	N/A	1	100%	9.09	CIRCULACION MAMOGRAFIA	
34.67	N/A	N/A	1	100%	34.67	OBSERVACION PEDIATRICA	
23.41	N/A	N/A	1	100%	23.41	CENTRAL DE ENFERMERIA	
7.78	N/A	N/A	1	100%	7.78	DISPAP	
16.29	N/A	N/A	1	100%	16.29	TAC	
14.48	N/A	N/A	1	100%	14.48	OFICINA RADIOLOGIA Y RESIDUO RX	
9.48	N/A	N/A	1	100%	9.48	SALA LECTURA RADIOLOGIA	
2.53	N/A	N/A	1	100%	2.53	CIRCULACION RECEPCION SALA DE LECTURA	
3.95	N/A	N/A	1	100%	3.95	RESIDUO ORDINARIO Y RECICLABLE	
3.50	N/A	N/A	1	100%	3.50	RESIDUO PELIGROSO	
15.46	N/A	N/A	1	100%	15.46	SALA ECO	
18.54	N/A	N/A	1	100%	18.54	DIGITACION	
3.88	N/A	N/A	1	100%	3.88	ROPA SUCIA	
4.85	N/A	N/A	1	100%	4.85	DISPAP	
13.23	N/A	N/A	1	100%	13.23	ERA	
9.57	N/A	N/A	1	100%	9.57	CENTRAL VIGILANCIA DEL UNIFAMILIAR LRX	

OBSERVACIONES:


TOTAL	1,322.09	Metro lineal
ACUMULADO ANTERIOR	1,267.84	Metro lineal
PRESENTE ACTA	654.16	Metro lineal


Elaboro contratista:	Estefania Carvajal Henao	FIRMA:
Aprobo Interventoria:	Brenda Luz Hurtado	FIRMA:


PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

ITEM	7.01	TUBERIA DE COBRE TIPO L, DIAM. 1/2", INCLUYE ACCESORIOS	CAP	7.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE GASES MEDICINALES	UNIDAD	Metro lineal		UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL
Registro fotográfico						Dimensiones				
						L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%	Total (m)	Observaciones
								PISO 4				
						7.85	N.A	N.A	1	100%	7.85	HABITACION 424
						8.23	N.A	N.A	1	100%	8.23	HABITACION 425
						8.65	N.A	N.A	1	100%	8.65	HABITACION 423
						8.92	N.A	N.A	1	100%	8.92	HABITACION 422
						8.24	N/A	N.A	1	100%	8.24	HABITACION 421
						8.29	N.A	N.A	1	100%	8.29	HABITACION 420
						8.32	N.A	N.A	1	100%	8.32	HABITACION 419
						7.94	N.A	N.A	1	100%	7.94	HABITACION 418
						8.11	N.A	N.A	1	100%	8.11	HABITACION 417
						8.07	N.A	N.A	1	100%	8.07	HABITACION 416
						8.09	N.A	N.A	1	100%	8.09	HABITACION 415
						8.10	N/A	N.A	1	100%	8.10	HABITACION 414
						12.16	N.A	N.A	1	100%	12.16	HABITACION 413
						7.90	N.A	N.A	1	100%	7.90	HABITACION 412
						7.61	N.A	N.A	1	100%	7.61	HABITACION 411
						7.92	N.A	N.A	1	100%	7.92	HABITACION 410
						8.24	N.A	N.A	1	100%	8.24	HABITACION 409
						7.7	N.A	N.A	1	100%	7.70	HABITACION 407
						10.2	N.A	N.A	1	100%	10.20	HABITACION 408
						7.99	N.A	N.A	1	100%	7.99	HABITACION 405
						18.54	N.A	N.A	1	100%	18.54	HABITACION 426
						8.82	N.A	N.A	1	100%	8.82	HABITACION 103
						18.76	N.A	N.A	1	100%	18.76	HABITACION 404
						7.53	N.A	N.A	1	100%	7.53	HABITACION 401
						7.94	N.A	N.A	1	100%	7.94	HABITACION 402
						6.16	N.A	N.A	1	100%	6.16	CIRCULACION A PROCEDIMIENTOS
						2.16	N.A	N.A	1	100%	2.16	CUARTO PROCEDIMIENTOS
						1.52	N.A	N.A	1	100%	1.52	CUARTO PROCEDIMIENTOS
								PISO 1				
								AIRE MEDICINAL				
						19.91	N.A	N.A	1	100%	19.91	PASILLO FRENTE A CONSULTORIO N°5 A CAJA G. DE PASILLO HACIA FARMACIA PRINCIPAL
						3.12	N.A	N.A	2	100%	3.12	FARMACIA PRINCIPAL
						4.75	N.A	N.A	1	100%	4.75	PASILLO FRENTE A SALA Y ESPERA A CAJA G. EN EXTERIOR DE SALA
						19.06	N.A	N.A	1	100%	19.06	U.M.I. PRINCIPAL
						13.53	N.A	N.A	1	100%	13.53	REANIMACION DERIVACION
						2.84	N/A	N/A	2	100%	2.84	PASILLO FRENTE A CONSULTORIO N°5 A CAJA G. DE PASILLO HACIA FARMACIA PRINCIPAL
						11.91	N/A	N/A	1	100%	11.91	OBSERVACION CINECOSTRTRICA (VIENE DE CAJA G. DE PASILLO HACIA FARMACIA PRINCIPAL
						3.99	N.A	N.A	1	100%	3.99	OBSERVACION CINECOSTETRICA - CAMA 1 DERIVACION
						5.33	N.A	N.A	1	100%	5.33	OBSERVACION GINECOLOGETRICA - CAMA 2 DERIVACION
						6.25	N.A	N.A	1	100%	6.25	OBSERVACION CINECOSTETRICA - CAMA 3, DERIVACION
						5.75	N.A	N.A	1	100%	5.75	OBSERVACION GINECOLOGETRICA - CAMA 4 DERIVACION
						5.31	N.A	N.A	1	100%	5.31	OBSERVACION CINECOSTETRICA - CAMA 5, DERIVACION
						6.79	N.A	N.A	1	100%	6.79	DE CAJA DE C. EN SALA Y A OBSERVACION PEDIATRICA
						16.91	N.A	N.A	1	100%	16.91	PRINCIPAL
						4.80	N.A	N.A	1	100%	4.80	OBSERVACION PEDIATRICA - CAMA 1 DERIVACION
						8.34	N.A	N.A	1	100%	8.34	OBSERVACION PEDIATRICA - CAMA 2 Y 3 DERIVACION
						8.67	N.A	N.A	1	100%	8.67	OBSERVACION PEDIATRICA - CAMA 4 Y 5 DERIVACION
						5.70	N/A	N.A	1	100%	5.70	OBSERVACION PEDIATRICA - CAMA 6, DERIVACION
						4.91	N.A	N.A	1	100%	4.91	OBSERVACION PEDIATRICA - CAMA 7, DERIVACION
						7.70	N.A	N.A	1	100%	7.70	OBSERVACION PEDIATRICA - CAMA 7 Y 8 DERIVACION
						4.39	N.A	N.A	1	100%	4.39	PASILLO FRENTE A SALA Y ESPERA A CAJA C. EN EXTERIOR DE SALA
						16.06	N.A	N.A	1	100%	16.06	U.M.I. ADMINISTRACION PRINCIPAL
						13.71	N.A	N.A	1	100%	13.71	REANIMACION DERIVACION
						12.89	N.A	N.A	1	100%	12.89	SALA ERA DERIVACION
						8.37	N.A	N.A	1	100%	8.37	SALA ERA DERIVACION
						9.37	N.A	N.A	1	100%	9.37	PROCEDIMIENTOS SEPTICOS, DERIVACION
						8.80						
								PISO 3				
								AIRE MEDICINAL				
						3.58	N.A	N.A	1	100%	3.58	UCIP - 12 DERIVACION
						6.43	N.A	N.A	1	100%	6.43	UCIP - 11 DERIVACION
						4.99	N.A	N.A	1	100%	4.99	UCIP - 10 DERIVACION
						6.55	N.A	N.A	1	100%	6.55	UCIP - 09 DERIVACION
						4.75	N.A	N.A	1	100%	4.75	UCIP - 08 DERIVACION
						6.56	N.A	N.A	1	100%	6.56	UCIP - 07 DERIVACION
						5.18	N.A	N.A	1	100%	5.18	UCIP - 06 DERIVACION
						6.52	N.A	N.A	1	100%	6.52	UCIP - 05 DERIVACION
						5.24	N.A	N.A	1	100%	5.24	UCIP - 04 DERIVACION
						6.56	N.A	N.A	1	100%	6.56	UCIP - 03 DERIVACION
						5.19	N.A	N.A	1	100%	5.19	UCIP - 02 DERIVACION
						6.50	N.A	N.A	1	100%	6.50	UCIP - 01 DERIVACION
						3.64	N/A	N.A	1	100%	3.64	UCIP - 12 DERIVACION
						6.37	N.A	N.A	1	100%	6.37	UCIP - 11 DERIVACION
						4.22	N.A	N.A	1	100%	4.22	UCIP - 10 DERIVACION
						6.35	N.A	N.A	1	100%	6.35	UCIP - 09 DERIVACION
						4.42	N.A	N.A	1	100%	4.42	UCIP - 08 DERIVACION
						6.52	N/A	N.A	1	100%	6.52	UCIP - 07 DERIVACION
						5.22	N.A	N.A	1	100%	5.22	UCIP - 06 DERIVACION
						6.48	N.A	N.A	1	100%	6.48	UCIP - 05 DERIVACION
						5.30	N/A	N.A	1	100%	5.30	UCIP - 01 DERIVACION
						6.55	N.A	N.A	1	100%	6.55	UCIP - 03 DERIVACION
						5.17	N.A	N.A	1	100%	5.17	UCIP - 02 DERIVACION
						6.47	N.A	N.A	1	100%	6.47	UCIP - 01 DERIVACION
						0.95	N.A	N.A	1	100%	0.95	ENTRA CAJA AL DE HABITACION 13 DE HOSPITALIZACION
						2.25	N.A	N.A	1	100%	2.25	ENTRA CAJA E CAJA AL DE HABITACION 13 DE HOSPITALIZACION
						7.41	N.A	N.A	1	100%	7.41	PATRA CAJA AL DE HABITACION 13 DE HOSPITALIZACION
						11.06	N.A	N.A	1	100%	11.06	DERIVACION HABITACION 13 CAMAS 1 Y 2
						8.80	N.A	N.A	1	100%	8.80	DERIVACION HABITACION 14 CAMA 1
						38.02	N.A	N.A	1	100%	38.02	DESDE PRINCIPAL POR CIRCULACION RESTRINGIDA A PUNTOS EN LUDOTECA
								PISO 2				
								AIRE MEDICINAL				
						1.51	N.A	N.A	1	100%	1.51	A CAJA 3G DE QUIROFANO 4
						2.11	N.A	N.A	1	100%	2.11	A CAJA 3G DE QUIROFANO 2
						2.83	N.A	N.A	1	100%	2.83	A CAJA 3G DE QUIROFANO 1
						1.82	N/A	N.A	1	100%	1.82	PRINCIPAL A CAJA 3E DE SALA PARTO 2
						1.90	N.A	N.A	1	100%	1.90	PRINCIPAL A CAJA 3I DE SALA PARTO 1
						1.59	N.A	N.A	1	100%	1.59	ENTRA CAJA 3G DE QUIRU
						1.45	N.A	N.A	1	100%	1.45	SALE DE CAJA 3G A ESPERA GAL DE QUIRU
						4.88	N.A	N.A	1	100%	4.88	DERIVACION CAMA 1 DE QUIRU
						10.24	N.A	N.A	4	100%	10.24	DERIVACION CAMAS 2 A 5 DE QUIRU
						8.13	N.A	N.A	1	100%	8.13	DERIVACION CAMA 6 DE QUIRU
						3.41	N.A	N.A	1	100%	3.41	DERIVACION CAMA 7 A 9 DE QUIRU
						1.57	N.A	N.A	1	100%	1.57	A CAJA 3G DE QUIROFANO 1
						2.88	N.A	N.A	1	100%	2.88	A CAJA 3G DE QUIROFANO 2
						2.99	N.A	N.A	1	100%	2.99	A CAJA 3G DE QUIROFANO 3
						1.93	N.A	N.A	1	100%	1.93	PRINCIPAL A CAJA 3G DE SALA PARTO 2
						1.94	N.A	N.A	1	100%	1.94	PRINCIPAL A CAJA 3I DE SALA PARTO 1
						18.97	N.A	N.A	1	100%	18.97	PRINCIPAL FRENTE A QUIROFANO 2 A PASILLO AUTOCLAVE
						3.35	N.A	N.A	1	100%	3.35	PASILLO AUTOCLAVE A CAJA 3G
						6.13	N.A	N.A	1	100%	6.13	SALE CAJA 3G A RECUPERACION QUIRURGICA
						1.48	N.A	N.A	1	100%	1.48	PRINCIPAL DE RECUPERACION QUIRURGICA A CAMAS 3 Y 1
						4.34	N.A	N.A	1	100%	4.34	DERIVACION A CAMA 2
						1.56	N.A	N.A	1	100%	1.56	DERIVACION A CAMA 1
						9.92	N.A	N.A	1	100%	9.92	DERIVACION A CAMAS 1 Y 2
						14.24	N.A	N.A	1	100%	14.24	DERIVACION A CAMAS 3 Y 5
						3.83	N.A	N.A	1	100%	3.83	DERIVACION A CAMA 7
						5.66	N.A	N.A	1	100%	5.66	DERIVACION DE CAMA 7 A CAMA 8
						5.24	N.A	N.A	1	100%	5.24	DERIVACION DE CAMA 8 A CAMA 9
						3.22	N.A	N.A	1	100%	3.22	ENTRA PRINCIPAL PASILLO TRABAJO PARTO A CAJA DE 3" DE RECUPERACION PARTOS
						18.64	N.A	N.A	1	100%	18.64	DE CAJA 3"G A DERIVACION DE CAMAS DE RECUPERACION PARTOS
						9.44	N.A	N.A	4	100%	9.44	DERIVACION A CAMAS 1, 2, 4
						2.70	N.A	N.A	1	100%	2.70	DERIVACION DE CAMA 2 A CAMA 3



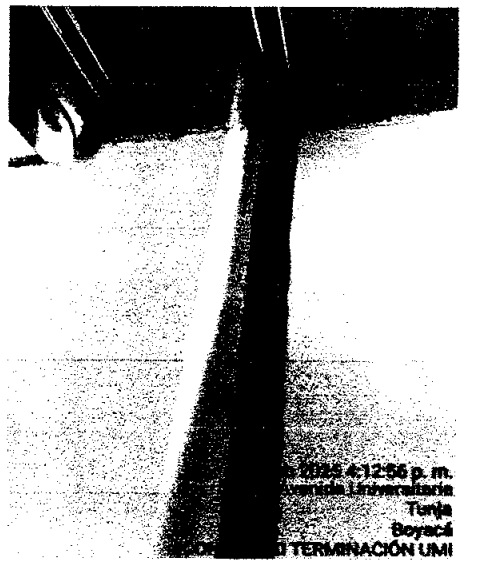

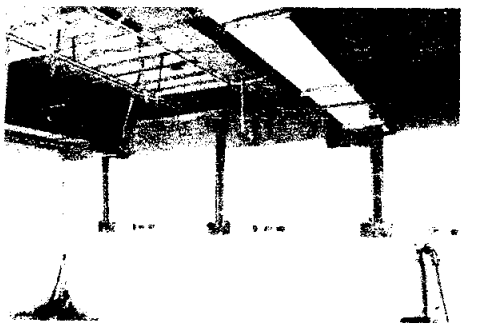

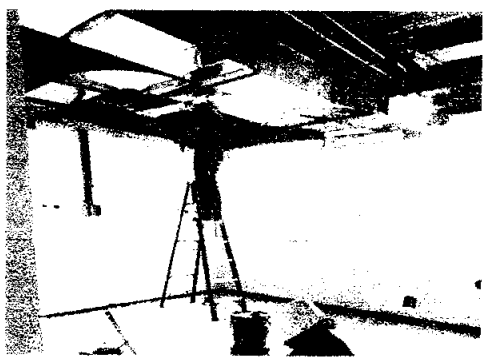



9.13	N.A	N.A	1	100%	9.13	DE PRINCIPAL RECORRIDO CON PARTOS A TRABAJO PARTOS
4.43	N.A	N.A	1	100%	4.43	DERIVACION CAMA 1 HOSPITALIZACION PISO 1 ENTRAL
6.47	N.A	N.A	1	100%	6.47	DERIVACION A CAMAS: 2, 3, 4, 5
6.34	N.A	N.A	1	100%	6.34	
1.35	N.A	N.A	1	100%	1.35	ENTRA CAJA 3C DE OXIGENO A PRINCIPAL
1.3	N.A	N.A	1	100%	1.30	SALE CAJA 3C DE OXIGENO A PRINCIPAL
4.22	N.A	N.A	1	100%	4.22	DERIVACION CAMA 1 - UCI ADULTO
4.37	N.A	N.A	4	100%	17.48	DERIVACION CAMAS: 2, 3, 4, 5 - UCI ADULTO
6.13	N.A	N.A	1	100%	6.13	DERIVACION CAMA 6 - UCI ADULTO
9.65	N.A	N.A	1	100%	19.30	DERIVACION CAMAS: 7, 8, 9 - UCI ADULTO
		OXIGENO				
1.66	N.A	N.A	1	100%	1.66	A CAJA 3C DE OXIGENO 3
2.84	N.A	N.A	1	100%	2.84	A CAJA 3C DE OXIGENO 2
2.12	N.A	N.A	1	100%	2.12	A CAJA 3C DE OXIGENO 1
		DIOXIDO DE CARBONO (CO2)				
1.59	N.A	N.A	1	100%	1.59	A CAJA N1 DE CO2 PACIENTE 3
1.67	N.A	N.A	1	100%	1.67	A CAJA 3C DE CO2 PACIENTE 2
2	N.A	N.A	1	100%	2.00	A CAJA N1 DE CO2 PACIENTE 1


OBSERVACIONES:

TOTAL	886.27	Metro lineal
ACUMULADO ANTERIOR	589.19	Metro lineal
PRESENTE ACTA	297.08	Metro lineal


Elaboró contratista:	Estefania Carvajal Henao	FIRMA:
Aprobó Interventoria:	Brenda Luz Heriado	FIRMA:

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACION DE LA REMODELACION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA									
ITEM	7.02	TUBERIA DE COBRE TIPO L, DIAM. 3/4", INCLUYE ACCESORIOS.	CAP	7.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE GASES MEDICINALES	UNIDAD	Metro lineal		UBICACIÓN	UNIVANTRAFAEL

Registro fotográfico






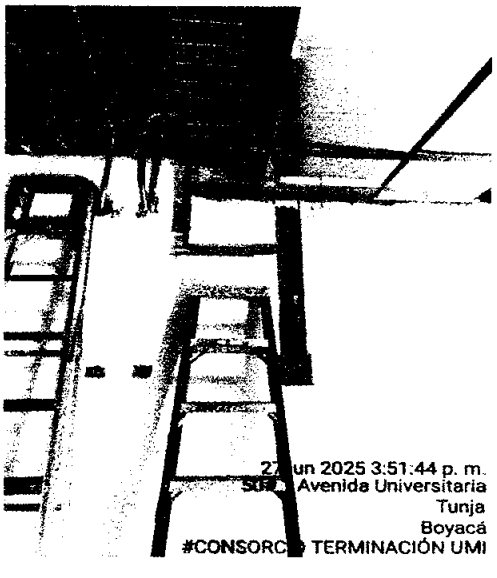



Dimensiones						Observaciones
L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%	Total (m)	
		PISO 4				
		VACIO				
7.37	N/A	N/A	1	100%	7.37	HABITACION 424
8.95	N/A	N/A	1	100%	8.95	HABITACION 425
8.86	N/A	N/A	1	100%	8.86	HABITACION 426
8.76	N/A	N/A	1	100%	8.76	HABITACION 427
8.67	N/A	N/A	1	100%	8.67	HABITACION 428
7.66	N/A	N/A	1	100%	7.66	HABITACION 501
8.66	N/A	N/A	1	100%	8.66	HABITACION 419
7.56	N/A	N/A	1	100%	7.56	HABITACION 418
8.69	N/A	N/A	1	100%	8.69	HABITACION 417
7.91	N/A	N/A	1	100%	7.91	HABITACION 416
8.41	N/A	N/A	1	100%	8.41	HABITACION 415
7.77	N/A	N/A	1	100%	7.77	HABITACION 414
12.71	N/A	N/A	1	100%	12.71	HABITACION 413
7.82	N/A	N/A	1	100%	7.82	HABITACION 412
8.23	N/A	N/A	1	100%	8.23	HABITACION 411
7.90	N/A	N/A	1	100%	7.90	HABITACION 410
8.23	N/A	N/A	1	100%	8.23	HABITACION 409
8.96	N/A	N/A	1	100%	8.96	HABITACION 408
11.14	N/A	N/A	1	100%	11.14	HABITACION 408
8.34	N/A	N/A	1	100%	8.34	HABITACION 408
18.54	N/A	N/A	1	100%	18.54	HABITACION 406
8.83	N/A	N/A	1	100%	8.83	HABITACION 403
18.96	N/A	N/A	1	100%	18.96	HABITACION 404
7.87	N/A	N/A	1	100%	7.87	HABITACION 401
8.96	N/A	N/A	1	100%	8.96	HABITACION 402
2.41	N/A	N/A	1	100%	2.41	CUARTO PROCEDIMIENTOS
1.32	N/A	N/A	1	100%	1.32	CUARTO PROCEDIMIENTOS
8.83	N/A	N/A	1	100%	8.83	CIRCULACION PROCEDIMIENTOS
23.68	N/A	N/A	1	100%	23.68	CIRCULACION HALL PRINCIPAL ANILLO SUR
0.59	N/A	N/A	4	100%	0.18	CIRCULACION HALL PRINCIPAL ANILLO SUR
1.4	N/A	N/A	2	100%	2.80	CIRCULACION HALL PRINCIPAL ANILLO SUR
23.46	N/A	N/A	1	100%	23.46	CIRCULACION HALL PRINCIPAL ANILLO SUR
21.13	N/A	N/A	2	100%	42.26	CIRCULACION HALL PRINCIPAL ANILLO NORTE
1.07	N/A	N/A	2	100%	2.14	CIRCULACION HALL PRINCIPAL ANILLO NORTE
0.9	N/A	N/A	2	100%	1.80	CIRCULACION HALL PRINCIPAL ANILLO NORTE
1.32	N/A	N/A	1	100%	1.32	CAJA DE CORTE
1.26	N/A	N/A	1	100%	1.26	CAJA DE CORTE
		PISO 1				
		NITROGENO				
7.18	N/A	N/A	1	100%	7.18	LAVADO DE PACIENTES A ACCESO PASILLO URGENCIAS: RED PRENCIPAL DE TANQUE
13.96	N/A	N/A	1	100%	13.96	ACCESO A PASILLO URGANCIAS A FRENTE A CONSULTORIO N 5. RED PRINCIPAL
		DIOXIDO DE CARBONO (CO2)				
7.13	N/A	N/A	1	100%	7.13	LAVADO DE PACIENTES A ACCESO PASILLO URGENCIAS: RED PRENCIPAL DE TANQUE
13.93	N/A	N/A	1	100%	13.93	ACCESO A PASILLO URGANCIAS A FRENTE A CONSULTORIO N 5. RED PRINCIPAL
1.8	N/A	N/A	1	100%	1.80	PASILLO FRENTE A CONSULTORIO N°5 A CAJA G, DE PASILLO HACIA LARINGACIA PRINCIPAL
		VACIO				
1.7	N/A	N/A	2	100%	3.40	PASILLO FRENTE A CONSULTORIO N°5 A CAJA G, DE PASILLO HACIA FARMACIA PRINCIPAL
11.82	N/A	N/A	1	100%	11.82	OBSERVACION GINECOSTETRICA (VIENE DE CAJA G, DE PASILLO HACIA FARMACIA PRINCIPAL
4.86	N/A	N/A	1	100%	4.86	OBSERVACION GINECOSTETRICA - CAMA 1 DERIVACION
5.32	N/A	N/A	1	100%	5.32	OBSERVACION GINECOSTETRICA - CAMA 2 DERIVACION
6.13	N/A	N/A	1	100%	6.13	OBSERVACION GINECOSTETRICA - CAMA 3 DERIVACION
5.68	N/A	N/A	1	100%	5.68	OBSERVACION GINECOSTETRICA - CAMA 4 DERIVACION
5.31	N/A	N/A	1	100%	5.31	OBSERVACION GINECOSTETRICA - CAMA 5 DERIVACION
8.76	N/A	N/A	1	100%	8.76	DE CAJA DE G EN SALA PDA A OBSERVACION PEDIATRICA PRINCIPAL
16.61	N/A	N/A	1	100%	16.61	
4.7	N/A	N/A	1	100%	4.70	OBSERVACION PEDIATRICA - CAMA 1 DERIVACION
8.13	N/A	N/A	1	100%	8.13	OBSERVACION PEDIATRICA - CAMA 2 Y 3 DERIVACION
8.87	N/A	N/A	1	100%	8.87	OBSERVACION PEDIATRICA - CAMA 4 Y 5 DERIVACION
5.58	N/A	N/A	1	100%	5.58	OBSERVACION PEDIATRICA - CAMA 6 DERIVACION
4.82	N/A	N/A	1	100%	4.82	OBSERVACION PEDIATRICA - CAMA 7 DERIVACION
7.44	N/A	N/A	1	100%	7.44	OBSERVACION PEDIATRICA - CAMA 8 Y 9 DERIVACIÓN
4.9	N/A	N/A	1	100%	4.90	PASILLO FRENTE A SALA 10 NO A CAJA G, EN EL PISO 1
18.6	N/A	N/A	1	100%	18.60	SALA EDA ALIMENTACION PRINCIPAL
13.74	N/A	N/A	1	100%	13.74	REHABILITACION DE UCI
9.38	N/A	N/A	1	100%	9.38	PROCEDIMIENTOS ASEPTICOS DERIVACION
		PISO 3				
23.35	N/A	N/A	1	100%	23.35	UCI PEDIATRICA CIRCULACION PRINCIPAL
14.83	N/A	N/A	1	100%	14.83	SALE CAJA 2G DE UCI PEDIATRICA A FRENTE EN PASILLO HACIA HOSPITALIZACION
20.82	N/A	N/A	1	100%	20.82	ENTRA A CAJA 2G DE PASILLO HOSPITALIZACION ENTRE HABITACIONES 13 A 25
18.82	N/A	N/A	1	100%	18.82	PRINCIPAL PASILLO HOSPITALIZACION ENTRE HABITACIONES 1 A 7 HASTA CAJA 2G
9.68	N/A	N/A	1	100%	9.68	PRINCIPAL PASILLO HOSPITALIZACIÓN ENTRE HABITACIONES 7 A 12 HASTA CAJA 2G
25.19	N/A	N/A	1	100%	25.19	PRINCIPAL PASILLO HOSPITALIZACIÓN DE CAJA 2G A HABITACIÓN 25 (COSTADO DERECHO)
		VACIO				
3.54	N/A	N/A	1	100%	3.54	UCIP - 12 DERIVACION
6.49	N/A	N/A	1	100%	6.49	UCIP - 11 DERIVACION
4.65	N/A	N/A	1	100%	4.65	UCIP - 10 DERIVACIÓN
9.61	N/A	N/A	1	100%	9.61	UCIP - 09 DERIVACION
4.71	N/A	N/A	1	100%	4.71	UCIP - 08 DERIVACION
6.86	N/A	N/A	1	100%	6.86	UCIP - 07 DERIVACION
5.14	N/A	N/A	1	100%	5.14	UCIP - 06 DERIVACIÓN
6.66	N/A	N/A	1	100%	6.66	UCIP - 05 DERIVACION
5.15	N/A	N/A	1	100%	5.15	UCIP - 04 DERIVACION
6.62	N/A	N/A	1	100%	6.62	UCIP - 03 DERIVACION
5.18	N/A	N/A	1	100%	5.18	UCIP - 02 DERIVACION
6.56	N/A	N/A	1	100%	6.56	UCIP - 01 DERIVACION
1.44	N/A	N/A	1	100%	1.44	ENTRA CAJA 2G DE HABITACION 13
2.55	N/A	N/A	1	100%	2.55	ENTRA Y SALE CAMA 2 HABITACION 2
1.48	N/A	N/A	1	100%	1.48	ENTRA CAJA 2G HABITACION 12
11.47	N/A	N/A	1	100%	11.47	DERIVACION A HABITACION 1 CAMAS 1 Y 2
7.98	N/A	N/A	1	100%	7.98	DERIVACION A HABITACION 3 CAMA 1
		PISO 2				
8.96	N/A	N/A	1	100%	8.96	PRINCIPAL DE QUIROFANO 1 A SALA PARTO 1
5.46	N/A	N/A	1	100%	5.46	SALE CAJA 5G A PRINCIPAL UCI URO
17.03	N/A	N/A	1	100%	17.03	PRINCIPAL PASILLO UCI URO
10.33	N/A	N/A	1	100%	10.33	PRINCIPAL PASILLO UCI URO, ENTRE CAMAS 7 A 9
		VACIO				
3.99	N/A	N/A	1	100%	3.99	A CAJA 5G DE QUIROFANO 3
1.98	N/A	N/A	1	100%	1.98	A CAJA 5G DE QUIROFANO 2
1.96	N/A	N/A	1	100%	1.96	A CAJA 5G DE QUIROFANO 1
2.10	N/A	N/A	1	100%	2.10	PRINCIPAL A CAJA 5G DE SALA PARTO 2
2.88	N/A	N/A	1	100%	2.88	PRINCIPAL A CAJA 5G DE SALA PARTO 1
11.12	N/A	N/A	1	100%	11.12	PRINCIPAL FRENTE QUIROFANO 2 A PASILLO AUTOCLAVE
3.89	N/A	N/A	1	100%	3.89	DE PASILLO AUTOCLAVE A CAJA 5G
4.46	N/A	N/A	1	100%	4.46	DE CAJA 5G A RECUPPERACIÓN QUIRURGICA
6.57	N/A	N/A	1	100%	6.57	PRINPAL A CAMAS 3 Y 4
4.44	N/A	N/A	1	100%	4.44	DERIVACION CAMA 3
1.97	N/A	N/A	1	100%	1.97	DERIVACION CAMA 4



13 jun 2025 10:54:13 a. m.
49-50 Avenida Universitaria
Tunja
Boyacá
ONSORCIO TERMINACIÓN UMI

8.92	N/A	N/A	1	100%	8.92	DERIVACION A CAMAS 1 Y 2
14.44	N/A	N/A	1	100%	14.44	DERIVACION A CAMAS 3 Y 4
3.93	N/A	N/A	1	100%	3.93	DERIVACION CAMA 7
5.66	N/A	N/A	1	100%	5.66	DERIVACION DE CAMA 7 A CAMA 8
5.24	N/A	N/A	1	100%	5.24	DERIVACION DE CAMA 8 A CAMA 9
3.46	N/A	N/A	1	100%	3.46	ENTRA DE PASILLO TRABAJO PARTO A CAJA 2G DE RECUPERACION PARTOS
18.44	N/A	N/A	1	100%	18.44	SALE DE CAJA 2G A CAMAS DE RECUPERACION PARTOS
22.6	N/A	N/A	4	100%	94.40	DERIVACION A CAMAS 1, 2, 4, 5
2.7	N/A	N/A	1	100%	2.70	DERIVACION DE CAMA 2 A CAMA 3
9.03	N/A	N/A	1	100%	9.03	PRINCIPAL RECUPERACION PARTOS A TRABAJO PARTO
4.53	N/A	N/A	1	100%	4.53	DERIVACION CAMA 1 DE TRABAJO PARTO (COSTADO DE CENTRAL)
6.57	N/A	N/A	1	100%	6.57	DERIVACION A CAMAS 2, 3, 4, 5
8.34	N/A	N/A	1	100%	8.34	
4.21	N/A	N/A	1	100%	4.21	DERIVACION CAMA 1 DE UCI URO
4.51	N/A	N/A	4	100%	18.04	DERIVACION CAMA 2 A 5 DE UCI URO
6.13	N/A	N/A	1	100%	6.13	DERIVACION CAMA 6 DE UCI URO
3.31	N/A	N/A	3	100%	9.93	DERIVACION CAMA 7 A 9 DE UCI URO
		AIRE MEDICINAL				
9.96	N/A	N/A	3	100%	29.88	PRINCIPAL QUIROFANO 1 A SALA PARTO 1
		NITROGENO				
4.63	N/A	N/A	1	100%	4.63	DE CAJA 3G DE QUIROFANO 3 A CAJA 3G DE QUIROFANO 2
7.15	N/A	N/A	1	100%	7.15	DE CAJA 3G DE QUIROFANO 2 A CAJA 3G DE QUIROFANO 1
19.6	N/A	N/A	1	100%	19.60	PRINCIPAL QUIROFANOS A PASILLO TRABAJO PARTO
		DIOXIDO DE CARBONO (CO2)				
4.63	N/A	N/A	1	100%	4.63	DE CAJA 3G DE QUIROFANO 3 A CAJA 3G DE QUIROFANO 2
7.15	N/A	N/A	1	100%	7.15	DE CAJA 3G DE QUIROFANO 2 A CAJA 3G DE QUIROFANO 1
19.6	N/A	N/A	1	100%	19.60	PRINCIPAL QUIROFANOS A PASILLO TRABAJO PARTO

OBSERVACIONES:

TOTAL	1.119,97	Metro lineal
ACUMULADO ANTERIOR	611,97	Metro lineal
PRESENTE ACTA	508,00	Metro lineal

Elaboró contratista:	Estefonia Carvajal Henao	FIRMA:
Aprobo Interventoria:	Brenda Luz Hurtado	FIRMA:


PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

ITEM	7.03	TUBERIA DE COBRE TIPO L DIAM. 1" INCLUYE ACCESORIOS.	CAP	7.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE GASES MEDICINALES	UNIDAD	Metro lineal	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico





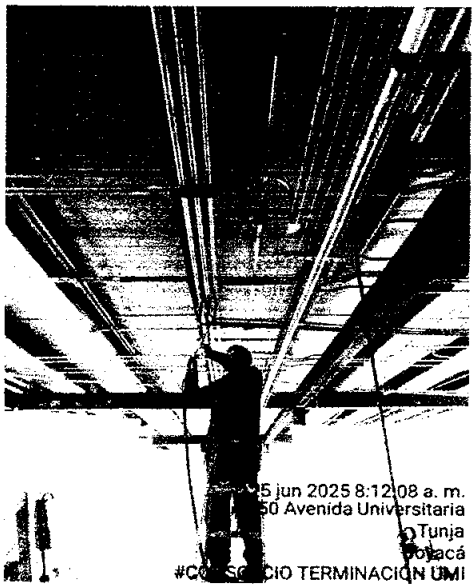

Dimensiones L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%	Total (m)	Observaciones
			PISO 4			
			VACIO			
23.9	N/A	N/A	1	100%	23.90	ANILLO SUR CIRCULACIÓN PRINCIPAL
23.67	N/A	N/A	1	100%	23.67	ANILLO SUR CIRCULACIÓN PRINCIPAL
0.9	N/A	N/A	2	100%	1.80	ANILLO SUR CIRCULACIÓN PRINCIPAL
1.65	N/A	N/A	2	100%	3.30	ANILLO SUR CIRCULACIÓN PRINCIPAL
21.28	N/A	N/A	2	100%	42.56	ANILLO NORTE CIRCULACIÓN PRINCIPAL
0.9	N/A	N/A	2	100%	1.80	ANILLO NORTE CIRCULACIÓN PRINCIPAL
1.33	N/A	N/A	2	100%	2.66	ANILLO NORTE CIRCULACIÓN PRINCIPAL
1.31	N/A	N/A	1	100%	1.31	CAJA DE CORTE DOBLE
1.35	N/A	N/A	1	100%	1.35	CAJA DE CORTE DOBLE
8.71	N/A	N/A	1	100%	8.71	TUBERIA EN DUCTO ALIMENTACION
			PISO 1			
			VACIO			
18.12	N/A	N/A	1	100%	18.12	PASILLO FRENTE A CONSULTORIO N°5 A CAJA G. DE PASILLO HACIA FARMACIA PRINCIPAL
			VACIO			
19.92	N/A	N/A	1	100%	19.92	PASILLO FRENTE A CONSULTORIO N°5 A CAJA G. DE PASILLO HACIA FARMACIA PRINCIPAL
14.7	N/A	N/A	1	100%	14.70	SALE CAJA 3G DE UCI HLA HOSPITALIZACION
			PISO 3			
			AIRE MEDICINAL			
23.35	N/A	N/A	1	100%	23.35	UCI PEDIATRICA - CIRCULACION PRINCIPAL
			VACIO			
23.35	N/A	N/A	1	100%	23.35	UCI PEDIATRICA - CIRCULACION PRINCIPAL
14.37	N/A	N/A	1	100%	14.37	SALE CAJA 3G DE UCI HLA HOSPITALIZACION
19.45	N/A	N/A	1	100%	19.45	ENTRA CAJA 2G A PASILLO HOSPITALIZACIÓN ENTRE HABITACIONES 13 A 25
10.66	N/A	N/A	1	100%	10.66	PASILLO HOSPITALIZACIÓN DE HABITACIONES 1 A 7 HASTA CAJA 2G
9.73	N/A	N/A	1	100%	9.73	PASILLO HOSPITALIZACIÓN DE HABITACIONES 7 A 13 HASTA CAJA 2G
24.19	N/A	N/A	1	100%	24.19	PASILLO HOSPITALIZACIÓN DE CAJA 3G DE HAB. 12 A HAB. 25
			PISO 2			
4.78	N/A	N/A	1	100%	4.78	PRINCIPAL A CAJA 3G DE QUIROFANO 3 A 2
7.21	N/A	N/A	1	100%	7.21	PRINCIPAL A CAJA 3G DE QUIROFANO 2 A 1
5.31	N/A	N/A	1	100%	5.31	PRINCIPAL DE QUIROFANO 1 A PRINCIPAL DE TRABAJO DE PARTO
19.6	N/A	N/A	1	100%	19.60	PRINCIPAL DE PASILLO TRABAJO DE PARTO
8.2	N/A	N/A	1	100%	8.20	PRINCIPAL DE RESIDUOS ORDINARIOS A CAJA 3G DE TOCURO
1.42	N/A	N/A	1	100%	1.42	ENTRA CAJA 3G DE UCI URO
4.11	N/A	N/A	1	100%	4.11	PASILLO ENTRE UCI URO A UCI LO
4.13	N/A	N/A	1	100%	4.13	
			VACIO			
9.96	N/A	N/A	1	100%	9.96	PRINCIPAL QUIROFANOS A PRINCIPAL SALA DE PARTO
3.96	N/A	N/A	1	100%	3.96	ENTRA CAJA 3G DE UCI URO
7.17	N/A	N/A	1	100%	7.17	SALE CAJA 3G A PRINCIPAL UCI URO
17.13	N/A	N/A	1	100%	17.13	PRINCIPAL PASILLO UCI URO - ENTRE CAMAS 1 A 6
10.33	N/A	N/A	1	100%	10.33	PRINCIPAL PASILLO UCI URO - ENTRE CAMAS 7 A 9
			AIRE MEDICINAL			
1.31	N/A	N/A	1	100%	1.31	ENTRA CAJA 3G DE TOCURO
5.56	N/A	N/A	1	100%	5.56	SALE CAJA 3G A PRINCIPAL DE UCI URO
17.13	N/A	N/A	1	100%	17.13	PRINCIPAL PASILLO UCI URO - ENTRE CAMAS 1 A 6
10.33	N/A	N/A	1	100%	10.33	PRINCIPAL PASILLO UCI URO - ENTRE CAMAS 7 A 9

OBSERVACIONES:

TOTAL	423.64	Metro lineal
ACUMULADO ANTERIOR	187.09	Metro lineal
PRESENTE ACTA	236.55	Metro lineal

Elaboro contratista:	Estefania Carvajal Henao	FIRMA:
Aprobó Interventoria:	Brenda Lur Iturtado	FIRMA:

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA										
ITEM	7.04	TUBERIA DE COBRE TIPO L EMUP 1-1/2" INCLUYE ACCESORIOS	CAP	7.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE GASES MEDICINALES	UNIDAD	Metro lineal			UBICACIÓN	UBI SAN RAFAEL
Registro fotográfico						Dimensiones				Total (m)	Observaciones
						L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%		
					PISO 1							
						7.21	N/A	N/A	1	100%	7.21	LAVADO DE PACIENTES A ACCESO PASILLO URGENCIAS RED PRENCIPAL DE TANQUE
						14.01	N/A	N/A	1	100%	14.01	ACCESO A PASILLO URGANCIAS A FRENTE A CONSULTORIO N 5 RED PRINCIPAL
					AIRE MEDICINAL							
						7.25	N/A	N/A	1	100%	7.25	LAVADO DE PACIENTES A ACCESO PASILLO URGENCIAS RED PRENCIPAL DE TANQUE
						14.05	N/A	N/A	1	100%	14.05	ACCESO A PASILLO URGANCIAS A FRENTE A CONSULTORIO N 5 RED PRINCIPAL
					PISO 1							
					AIRE MEDICINAL							
						4.86	N/A	N/A	1	100%	4.86	PRINCIPAL DE CAJAS DE QUIROFANO 2 A 7
						6.96	N/A	N/A	1	100%	6.96	PRINCIPAL DE CAJAS DE QUIROFANO 2 A 7
						5.21	N/A	N/A	1	100%	5.21	PRINCIPAL FRENTE QUIROFANO 1 A PASILLO TRABAJO DE PARTO
						5.31	N/A	N/A	1	100%	5.31	
						19.68	N/A	N/A	1	100%	19.68	PRINCIPAL PASILLO TRABAJO DE PARTO
						8.8	N/A	N/A	1	100%	8.80	PRINCIPAL DE RESIDUOS ORDINARIOS A CAJA DE QUIROFANO
						4.82	N/A	N/A	1	100%	4.82	PASILLO QUIROFANO A QUIROFANO
						4.12	N/A	N/A	1	100%	4.12	
OBSERVACIONES:												
									TOTAL		101.40	Metro lineal
									ACUMULADO ANTERIOR		42.52	Metro lineal
									PRESENTE ACTA		58.88	Metro lineal
Elaboró contratista:					Estefanía Carvajal Henao						FIRMA	
Aprobó Interventoría:					Brenda Luz Hurtado						FIRMA	

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA									
ITEM	7.13	CAJA DE VALVULAS CON VALVULAS TIPO 4 TORNILLOS 600 PSIG DIAM 1/2" 1" 1" FABRICACION NACIONAL INCLUYE INSTALACION	CAP	7.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE GASES MEDICINALES	UNIDAD	Unidad		UBICACIÓN	UCI SAN RAFAEL

Registro fotográfico			Dimensiones					Total (m)	Observaciones
			L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%		
		PISO 2							
			N/A	N/A	N/A	1	100%	1.00	SALA PARTO 1
			N/A	N/A	N/A	1	100%	1.00	SALA PARTO 2
			N/A	N/A	N/A	1	100%	1.00	UCI LIBO
		PISO 3							
			N/A	N/A	N/A	1	100%	1.00	UCI PEDIATRICA


OBSERVACIONES:

TOTAL	4.00	Unidad
ACUMULADO ANTERIOR	0.00	Unidad
PRESENTE ACTA	4.00	Unidad

Elaboro contratista:	Estefania Carvajal Henao	FIRMA:
Aprobó Interventoria:	Brenda Luz Hurtado	FIRMA:

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

ITEM	7.23	VÁLVULA DE CORTE EN BRONCE, MARCA C M O SIMILAR (NO PROCEDENCIA ASIÁTICA) DIAM. 1" INCLUYE ADAPTADORES DE BRONCE, TODO COSTO	CAP	7.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE GASES MEDICINALES	UNIDAD	Unidad	UBICACIÓN	UIE SAN RAFAEL

Registro fotográfico			Dimensiones					Total (m)	Observaciones
			L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%		
		PISO 3							
			N/A	N.A	N/A	1	100%	1.00	ALARMA CAJA 3G - HOSPITALARIA (VACIO)
		PISO 4							
			N/A	N.A	N/A	1	100%	1.00	ALARMA CAJA 2G - HABITACIÓN 11 (VACIO)
			N/A	N.A	N/A	1	100%	1.00	ALARMA CAJA 2G - HABITACIÓN 12 (VACIO)

OBSERVACIONES:


TOTAL	3.00	Unidad
ACUMULADO ANTERIOR	0.00	Unidad
PRESENTE ACTA	3.00	Unidad


Elaboró contratista:	Estefanía Carvajal Ronao	FIRMA:
Aprobo Interventoría:	Brenda Lucia Hurtado	FIRMA:

PROYECTO	CONSTRUCCION PARA LA TERMINACION DE LA REMODELACION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

ITEM	8.1	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPA - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	CAP	8.00

Registro fotográfico





TANQUE DE ALMACENAMIENTO	UNIDAD	Metro Cubico	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL


Dimensiones						
L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%	Total (m)	Observaciones
28.2	0.3	1.5	1	100%	12.69	MUROS PERIMETRALES, TANQUE ALMACENAMIENTO

OBSERVACIONES:

TOTAL	12.69	Metro Cubico
ACUMULADO ANTERIOR	0.00	Metro Cubico
PRESENTE ACTA	12.69	Metro Cubico

Elaboro contratista:	Estefania Carvajal Hoyos	FIRMA:
Aprobo interventoria:	Brenda Luz Hurtado	FIRMA:

PROYECTO	CONSTRUCCION PARA LA TERMINACION DE LA REMODELACION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA									
ITEM	9.01	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN		CAP	9.00	CONSTRUCCION DE URBANISMO	UNIDAD	metro cubico		UBICACION	HM SAN RAFAEL
Registro fotografico						Dimensiones				Total (m)	Observaciones
						L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%	
						URBANISMO					
						68.16	0.5	0.1	1	100%	13.63	BORDILLO PEATONAL DE COSTADO OCCIDENTAL
						39.12	4.09	0.42	1	100%	164.74	VIA PRINCIPAL
						7.00	9.13	0.73	1	100%	23.33	VIA PRINCIPAL (AREA TRIANGULO)
						54.04	11.58	0.20	1	100%	111.35	ANDEN Y ZONA VERDE (AREA TRIANGULO)
						5.89	6.71	0.60	1	100%	15.16	VIA PRINCIPAL ACCESO FARMACIA
						8.24	4.55	0.60	1	100%	8.52	
						9.87	2.00	0.50	1	100%	2.81	ANDEN CONTIGUO A TANQUES DE AGUA POTABLE
						5.64	19.00	0.60	1	100%	33.24	ZONA PEATONAL - ACCESO PRINCIPAL
						4.69	0.74	0.60	1	100%	17.36	
						r	area	h (m)	Cantidad	%		
						0	113.10	0.73	1	100%	82.56	ROTONDA (CIRCULAR)
						RED DE ALCANTARILLADO						
						56	1.8	1.2	1	100%	82.66	TUBERIA 12" DE CAJA DE INSPECCION SUR A MH NORTE
						28	1.8	1.45	1	100%	52.78	TUBERIA 12" - DE MH NORTE A MH VIA DE INGRESO
						31.2	1.8	0.65	1	100%	33.77	TUBERIA 10" DE SUR A NORTE
						12	1.8	0.85	1	100%	18.34	TUBERIA 10" DE CAJA INSPECCION SUR A MH NORTE
						4	1.8	0.60	1	100%	4.32	TUBERIA 8" DE SUR A NORTE
						26.2	2.4	1.6	1	100%	100.61	FILTRO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO

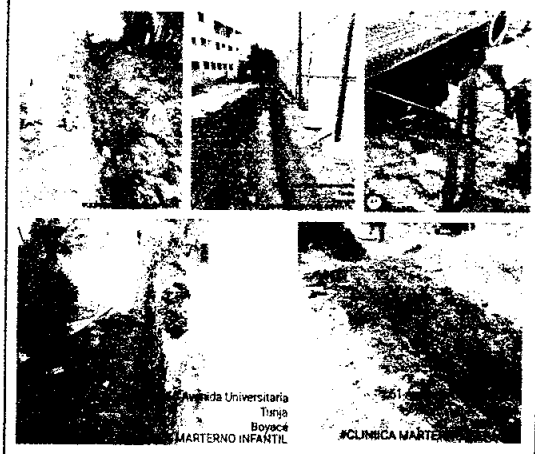

OBSERVACIONES:

TOTAL	503.41	metro cubico
ACUMULADO ANTERIOR	0.00	metro cubico
PRESENTE ACTA	503.41	metro cubico

Elaboro contratista:	Estefania Carvajal Henao	FIRMA:
Aprobó interventoria:	Brenda Lux Hurtado	FIRMA:

PROYECTO	CONSTRUCCION PARA LA TERMINACION DE LA REMODELACION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA										
ITEM	9.02	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRUADO COMPACTADO (CAMA SOPORTE/RECOMPACTADO)	CAP	9.00	CONSTRUCCION DE URBANISMO	UNIDAD	metro cubico		UBICACION	UMI SAN RAFAEL	
Registro fotográfico						Dimensiones			Total (m)	Observaciones	
					L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%		
					TANQUE						
					76.5	2.1	1.0	1	100%	160.65	PERIMETRAL TANQUE
					28.2	0.3	0.9	-1	100%	-8.38	DESCUENTO PUERTO
					URBANISMO						
					33.12	7.00	0.20	1	100%	46.37	VIA PRINCIPAL
					7.00	9.13	0.20	1	100%	6.39	VIA PRINCIPAL (AREA TRIANGULO)
					54.48	17.53	0.20	1	100%	26.31	ANDEN Y VIA VEHICULAR (AREA TRIANGULO)
					5.90	0.71	0.20	1	100%	0.95	VIA PRINCIPAL - ACCESO FARMACIA
					6.24	4.65	0.20	1	100%	2.44	
					9.37	2.60	0.20	1	100%	1.67	ANDEN CONTIGUO A TANQUES DE AGUA POTABLE
					9.54	15.00	0.20	1	100%	8.31	CUNA PEATONAL ACCESO PRINCIPAL
					4.61	9.74	0.20	1	100%	4.49	
					#	área	h (m)	Cantidad	%		
					6	113.10	0.2	1	100%	22.62	ROTONDA (CIRCULAR)
					RED DE ALCANTARILLADO						
					54	1.3	0.15	1	100%	10.04	CAMA BASE PARA TUBERIA 12"
					28	1.3	0.15	1	100%	5.46	CAMA BASE PARA TUBERIA 12"
					27.3	1.3	0.15	1	100%	5.30	CAMA BASE PARA TUBERIA 10"
					17	1.3	0.15	1	100%	3.32	CAMA BASE PARA TUBERIA 10"
					4	1.3	0.15	1	100%	0.78	CAMA BASE PARA TUBERIA 8"
					53	1.3	0.52	1	100%	35.83	ATRAQUE BASE PARA TUBERIA 12"
					28	1.3	0.52	1	100%	18.93	ATRAQUE BASE PARA TUBERIA 12"
					31.3	1.3	0.45	1	100%	18.31	ATRAQUE BASE PARA TUBERIA 10"
					17	1.3	0.45	1	100%	9.95	ATRAQUE BASE PARA TUBERIA 10"
					4	1.3	0.4	1	100%	2.08	ATRAQUE BASE PARA TUBERIA 8"

OBSERVACIONES:


TOTAL	387.56	metro cubico
ACUMULADO ANTERIOR	0.00	metro cubico
PRESENTE ACTA	387.56	metro cubico


Elaboro contratista:	Estefania Corvajal Hereo	FIRMA:
Aprobo Interventoria:	Brenda Luz Hurtado	FIRMA:

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA


ITEM	Nº Z	AISLADO PISO 1 S.E. 4,6 FOLL	CAP	10.00

Proyecto: [illegible]









ITEMS NO PREVISTOS	UNIDAD	Metro Cuadrado			UBICACIÓN	OBSERVACIONES
Dimensiones						
L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%	Total (m)	Observaciones
			SOTANO ZONAS HUMEDAS			
3.7	2.6	N/A	1	100%	9.62	MOPA LIMPIA
2.9	2.1	N/A	1	100%	6.09	MOPA SUCIA
3.1	3.23	N/A	1	100%	10.013	DEPOSITO CADAVERES
2.15	1.5	N/A	1	100%	3.225	DEPOSITO CADAVERES
1.12	1	N/A	1	100%	1.12	CUARTO ASEO
1.65	1.6	N/A	1	100%	1.648	PARQUEO CLARADA
			PISO 1 ZONAS HUMEDAS			
1.35	1.05	N/A	1	100%	1.4175	BAÑO FUNCIONARIOS CON LAVADO
1.15	1.82	N/A	1	100%	2.116	BAÑO W C CAFETERIA
2.87	2.82	N/A	1	100%	8.0934	BAÑO MUJERES URGENCIAS
1.17	1.96	N/A	1	100%	2.2932	BAÑO HOMBRES URGENCIAS
2.32	2.82	N/A	1	100%	6.5424	BAÑO MUJERES URGENCIAS
2.12	1.57	N/A	1	100%	3.3284	BAÑO DISCAPACITADOS URGENCIAS
1.58	1.56	N/A	1	100%	2.4648	BAÑO HOMBRES CONSULTORIO 1
1.99	1.11	N/A	1	100%	2.2089	BAÑO MUJERES CONSULTORIO 1
3.45	2.1	N/A	1	100%	7.245	LAVADO DE PASIENTES
1.91	0.3	N/A	1	100%	0.423	LAVADO DE PASIENTES
1.78	0.35	N/A	1	100%	0.623	LAVADO DE PASIENTES
1.2	h9	N/A	1	100%	1.23	CONSULTORIO 2
1.47	0.32	N/A	1	100%	0.4704	CONSULTORIO 2
1.96	1.2	N/A	1	100%	2.352	MONITOREO GINECOBSTETRICA
1.81	0.16	N/A	1	100%	0.2784	MUJERES CAMA LABOR OBSTETRICA
1.53	1.2	N/A	1	100%	1.905	SALA ERA
0.76	0.9	N/A	1	100%	0.738	SALA ERA
2.85	1.65	N/A	1	100%	2.9715	SALA ERA
2.8	0.35	N/A	1	100%	0.98	SALA ERA
0.76	1.05	N/A	1	100%	0.8526	CONSULTORIO 3
0.9	0.16	N/A	1	100%	0.144	CONSULTORIO 3
1.08	2.05	N/A	1	100%	2.214	BAÑO ACUERDO OBSERVACION PEDIATRA
2.1	2.15	N/A	1	100%	0.84	BAÑO ACUERDO OBSERVACION PEDIATRA
1.6	1.37	N/A	1	100%	2.192	BAÑO DISCAPACITADOS OBSERVACION PEDIATRA
1.8	1.81	N/A	1	100%	2.443	BAÑO FAMILIAR OBSERVACION PEDIATRA
1.75	2.1	N/A	1	100%	3.675	BAÑO FAMILIAR OBSERVACION PEDIATRA
1.15	1.24	N/A	1	100%	1.426	LAVADO
2.33	1.4	N/A	1	100%	2.262	W C ADULTOS OBSERVACION GINECOBSTETRICA
0.8	0.2	N/A	1	100%	0.16	W C ADULTOS EDUCACION GINECOBSTETRICA
0.9	2.4	N/A	1	100%	2.16	CUARTO ASEO FRENTE A TAC
1.4	1.62	N/A	1	100%	2.268	BAÑO ESTAR SALA DE ADMISIONES
1.1	0.3	N/A	1	100%	0.33	BAÑO ESTAR SALA DE ADMISIONES
1.8	0.1	N/A	1	100%	0.18	BAÑO ESTAR SALA DE ADMISIONES
1.1	2.37	N/A	1	100%	2.607	LAVAMANOS LIMPIO INSUMOS PROCEDIMIENTOS
0.8	0.1	N/A	1	100%	0.08	TRABAJO LIMPIO INSUMOS PROCEDIMIENTOS
1.3	3.75	N/A	1	100%	4.875	CONSULTORIO PARA ECOGRAFO
0.8	0.16	N/A	1	100%	0.128	CONSULTORIO PARA ECOGRAFO
1.25	1.45	N/A	1	100%	1.8125	VESTIER ECOGRAFO
1.2	0.55	N/A	1	100%	0.66	VESTIER ECOGRAFO
1.87	1.6	N/A	1	100%	2.992	PROCEDIMIENTOS BAÑO
2.8	0.35	N/A	1	100%	0.98	PROCEDIMIENTOS BAÑO
1.5	2.01	N/A	1	100%	3.015	BAÑO MUJER SALA DE ESPERA
0.9	0.16	N/A	1	100%	0.144	BAÑO MUJER SALA DE ESPERA
1.05	0.95	N/A	1	100%	1.57	BAÑO HERRA DE LABORATORIO
1.13	1.45	N/A	1	100%	1.6385	BAÑO TOMA DE MUESTRAS GINECOLOGICAS
			PISO 2 ZONAS HUMEDAS			
1.2	1.05	N/A	1	100%	2.1525	W C HOMBRES FRENTE ESCALAS Y ASCENSOR
2.25	0.9	N/A	1	100%	2.025	W C HOMBRES FRENTE ESCALAS Y ASCENSOR
1.47	1.55	N/A	1	100%	1.9435	W C HOMBRES FRENTE ESCALAS Y ASCENSOR
0.8	0.16	N/A	1	100%	0.128	W C HOMBRES FRENTE ESCALAS Y ASCENSOR
0.94	1.5	N/A	1	100%	1.41	VESTIER HOMBRES 1
2.6	0.1	N/A	1	100%	0.26	VESTIER MUJERES 1
1.19	0.95	N/A	1	100%	1.1424	VESTIER HOMBRES 2
0.7	0.16	N/A	1	100%	0.112	VESTIER HOMBRES 2
1.1	1.1	N/A	1	100%	1.21	VESTIER MUJERES
0.7	0.16	N/A	1	100%	0.112	VESTIER MUJERES
2	2.1	N/A	1	100%	4.2	BAÑO TRABAJO DE PARTO
1.6	1.54	N/A	1	100%	2.464	BAÑO TRABAJO DE PARTO
0.9	0.16	N/A	1	100%	0.144	BAÑO TRABAJO DE PARTO
1.35	1.75	N/A	1	100%	1.9652	ASEO SALA ASEPTICOS
0.78	0.3	N/A	1	100%	0.2028	DESCUENTO CAMBIA
2.7	2.55	N/A	1	100%	6.885	ASEO SALA ASEPTICOS
1.72	1.71	N/A	1	100%	2.9412	BAÑO MUJERES PREPARACION PASIENTES
0.9	0.16	N/A	1	100%	0.144	CAMBIADOR DE PESEBRAS PASIENTES
1.7	1.54	N/A	1	100%	2.618	BAÑO HOMBRES PREPARACION PASIENTES
0.9	0.16	N/A	1	100%	0.144	BAÑO HOMBRES PREPARACION PASIENTES
1.57	1.9	N/A	1	100%	2.983	BAÑO FRENTE A COORDINACION UCI
0.9	0.16	N/A	1	100%	0.144	BAÑO FRENTE A COORDINACION UCI
1.65	1.07	N/A	1	100%	1.7655	BAÑO FRENTE A COORDINACION UCI
0.95	0.16	N/A	1	100%	0.152	BAÑO FRENTE A COORDINACION UCI
1.72	1.12	N/A	1	100%	2.0064	W C FRENTE A COORDINACION UCI
2	1.87	N/A	1	100%	3.74	W C PISO PACIENTES
0.9	1.16	N/A	1	100%	1.044	W C FRENTE APARTADOS
2	1.86	N/A	1	100%	3.72	BAÑO FRENTE A URO 07
0.78	0.48	N/A	1	100%	0.3744	DESCUENTO CAMBIA
3	1.5	N/A	1	100%	4.5	BAÑO W C AL LADO DE CENTRAL DE ENFERMERIA
0.16	0.8	N/A	1	100%	0.128	BAÑO W C AL LADO DE CENTRAL DE ENFERMERIA
2.7	1	N/A	1	100%	2.7	PUERTAS EN LADO LOS
0.8	0.16	N/A	1	100%	0.128	EQUIPOS NO ADULTOS
4.2	0.9	N/A	1	100%	3.87	ASEO UCI ADULTOS
0.8	0.16	N/A	1	100%	0.128	ASEO UCI ADULTOS
			PISO 3 ZONAS HUMEDAS			
1.35	1.57	N/A	1	100%	2.1197	W C COORDINACION PEDIATRA
1.7	0.16	N/A	1	100%	0.272	W C COORDINACION PEDIATRA
1.41	1.52	N/A	1	100%	2.1432	W C COORDINACION UCI PEDIATRA
0.7	1.19	N/A	1	100%	0.833	W C COORDINACION UCI PEDIATRA
2.53	1.11	N/A	1	100%	2.8083	W C ACCESO ASISTENCIAL
0.8	0.16	N/A	1	100%	0.128	W C ACCESO ASISTENCIAL
			PISO 4 ZONAS HUMEDAS			
2.15	1.05	N/A	1	100%	2.2575	HABITACION 401
1.6	1.05	N/A	1	100%	1.848	HABITACION 402
1.2	0.55	N/A	1	100%	0.726	TALLER ENFERMO
0.7	0.1	N/A	1	100%	0.07	HABITACION 405
1.65	1.15	N/A	1	100%	1.196	HABITACION 410
1.05	1.1	N/A	1	100%	1.111	HABITACION 411

OBSERVACIONES:

TOTAL	180.96	Metro Cuadrado
ACUMULADO ANTERIOR	-	
PRESENTE ACTA	180.96	

Elaboró contratista:	Estefanía Carvajal Henao	FIRMA:
Aprobó Interventoría:	Brenda Luz Murtado	FIRMA:

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARID SAN RAFAEL DE TUNJA

ITEM	NP 3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALCOSIN DE GRANITO No. 5 (30 X 30 X 1.7 CM.)	CAP	10.00

Registro fotográfico





ITEMS NO PREVISTOS	UNIDAD	Metro Cuadrado	UBICACIÓN	LIMI SAN RAFAEL

Dimensiones					Total (m)	Observaciones
L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%		
PISO 3						
2.26	1.37	N A	1	100%	3.0962	DEPOSITO INSUMOS
0.79	0.16	N A	1	100%	0.1264	DEPOSITO INSUMOS
1.38	1.36	N A	1	100%	2.1804	FILTRO INGRESO
0.79	0.16	N A	1	100%	0.1264	FILTRO INGRESO
0.76	0.61	N A	1	100%	0.4636	PREPACION FORMULAS
0.6	1.36	N A	1	100%	0.8638	PREPACION FORMULAS
3.56	2.56	N A	1	100%	9.7273	PREPACION FORMULAS
0.79	0.15	N A	1	100%	0.1185	PREPACION FORMULAS
3.74	2.07	N A	1	100%	7.6174	CIRCULACION
3.37	0.3	N A	1	100%	0.921	CIRCULACION
2	0.3	N A	1	100%	0.6	CIRCULACION
1.9	3.0	N A	1	100%	1.14	CIRCULACION
2.94	1.37	N A	1	100%	10.4014	CIRCULACION
0.75	0.93	N A	1	100%	0.6975	CIRCULACION
1.89	0.93	N A	1	100%	1.1787	CIRCULACION
3.9	0.15	N A	1	100%	0.135	CIRCULACION
3.59	2.15	N A	1	100%	7.7185	INFORMACION A FAMILIARES
5.45	1.32	N A	1	100%	7.194	CIRCULACION
2.77	1.52	N A	1	100%	3.2984	ESTACION DE CAFE
3.27	4.9	N A	1	100%	10.0557	DESCANSO MEDICO
3.0	0.15	N A	1	100%	0.135	DESCANSO MEDICO
3.76	3.15	N A	1	100%	11.844	DESCANSO ENFERMERIA
2.94	3.57	N A	1	100%	13.4382	TERRAZA SOLAR
5.1	3.23	N A	1	100%	16.8076	LUDOTECA
9.59	6.86	N A	1	100%	67.8154	
4.7	0.16	N A	-1	100%	-0.752	DESCUENTO CENTRAL ENFERMERIA
3.17	3	N A	1	100%	12.33	INGRESO A LUDOTECA
1.55	1.29	N A	-1	100%	-1.9995	DESCUENTO
3.53	2	N A	1	100%	7.06	PASILLO A ZONA ADMINISTRATIVA
0.96	1.63	N A	1	100%	1.4019	BODEGA
4.85	3.72	N A	1	100%	18.042	UCI 11
0.84	0.15	N A	-1	100%	-0.126	DESCUENTO
5.32	3.55	N A	1	100%	17.483	UCI 9
0.15	1.6	N A	-1	100%	-0.24	DESCUENTO
3.99	2.88	N A	1	100%	11.4912	UCI 12
0.4	0.12	N A	1	100%	0.048	DESCUENTO
3.57	3.3	N A	1	100%	10.781	UCI 10
0.73	1	N A	1	100%	3.73	UCI 10
1.2	0.15	N A	-1	100%	-0.18	DESCUENTO
1.87	5.43	N A	1	100%	10.1541	CIRCULACION ENTRE UCIS 7-8-9-10-11
3.2	3.99	N A	1	100%	12.733	UCI 8
0.96	1	N A	1	100%	2.96	UCI 8
1.6	0.15	N A	-1	100%	-0.24	DESCUENTO
5.25	3.1	N A	1	100%	17.225	UCI 7
1.6	0.15	N A	-1	100%	-0.24	DESCUENTO
5.32	3.3	N A	1	100%	17.553	UCI 5
1.76	0.15	N A	-1	100%	-0.267	DESCUENTO
4.55	3.25	N A	1	100%	14.7875	UCI 6
1.65	0.15	N A	-1	100%	-0.2475	DESCUENTO
7.51	0.92	N A	1	100%	10.6568	CIRCULACION 5-6-7-8
5.12	3.21	N A	1	100%	16.3488	UCI 4
1.29	0.15	N A	-1	100%	-0.1845	DESCUENTO
3.74	3.23	N A	1	100%	12.155	UCI 2
1.58	0.15	N A	-1	100%	-0.237	DESCUENTO
5.45	2.96	N A	1	100%	16.132	UCI 1 AISLADO
2.97	0.13	N A	-1	100%	-0.3072	DESCUENTO
5.5	3.59	N A	1	100%	19.685	UCI 3
1.7	0.15	N A	-1	100%	-0.255	DESCUENTO
6.35	2.35	N A	1	100%	14.9225	CIRCULACION ENTRE UCIS 1-3-6
13.84	2	N A	1	100%	27.68	CIRCULACION ENTRE UCI Y LUDOTECA
1.31	3.07	N A	1	100%	4.0217	CIRCULACION FRENTE A TRABAJO LIMPIO
7.92	0.96	N A	1	100%	7.604	CIRCULACION A TRANFERENCIA
1.7	2.82	N A	1	100%	4.8222	CUARTO EQUIPOS
1.5	2.79	N A	1	100%	4.185	CUARTO ESTERIL
	1.5	N A	1	100%	0.5	TRANSFERENCIA MEDICAMENTOS
1.65	0.88	N A	1	100%	1.452	TRANSFERENCIA MEDICAMENTOS
3.8	0.15	N A	1	100%	0.12	ACCESO ASISTENCIAL
1.17	3.24	N A	1	100%	3.8584	ACCESO ASISTENCIAL
0.83	0.15	N A	1	100%	0.1245	TRANSFERENCIA MEDICAMENTOS
0.92	1.7	N A	1	100%	1.564	TRANSFERENCIA MEDICAMENTOS
1.35	2.01	N A	1	100%	2.7135	INFORMACION FAMILIAR
3.99	2.82	N A	1	100%	11.6658	EXTRACION LECHE MATERNA
3.8	4.99	N A	1	100%	13.794	COORD NACION PEDIATRA
1.36	1.63	N A	1	100%	2.2168	COORD NACION JCI PEDIATRA
2.95	3.19	N A	1	100%	9.8642	COORD NACION JCI PEDIATRA
PISO 2						
11.49	N A	4.83	1	100%	53.83	CUIDADOS INTERMEDIOS







0.42	N A	3.82	1	100%	1.60	CUIDADOS INTERMEDIOS
0.42	N A	3.02	1	100%	1.27	CUIDADOS INTERMEDIOS
3.1	N A	1.5	1	100%	4.65	CUIDADOS INTERMEDIOS
9.36	N A	4.62	1	100%	43.34	CUIDADOS INTERMEDIOS
0.12	N A	2.88	-4	100%	-1.38	DESCUENTO MUROS
0.42	N A	2.3'	1	100%	0.97	CUIDADOS INTENSOS
0.42	N A	6.3'	1	100%	2.85	CUIDADOS INTENSOS
12.19	N A	4.09	1	100%	49.86	CUIDADOS INTENSOS
6.4'	N A	0.12	-1	100%	-0.77	DESCUENTO MUROS
5.68	N A	4.18	1	100%	23.74	CUIDADOS INTENSIVOS
6.69	N A	4.07	1	100%	27.11	CUIDADOS INTENSIVOS
0.84	N A	5.49	1	100%	4.61	CIRCULACION LAVADO ENCAJADORAS
2.5'	N A	2.06	1	100%	5.17	CIRCULACION FRENTE AMBIENTE DE TRABAJO ESTERIL
3.8	N A	5.46	1	100%	4.37	CICLACION A DESCANSO
0.12	N A	5.48	-1	100%	-0.66	DESCUENTO MURO CENTRAL ENFERMERIA
3.4	N A	0.79	-1	100%	-0.36	DESCUENTO AREA DE COLUMNAS
0.42	N A	0.81	-1	100%	-0.14	DESCUENTO AREA DE COLUMNAS
0.42	N A	0.81	-1	100%	-0.34	DESCUENTO AREA DE COLUMNAS
7.5'	N A	0.12	-1	100%	-0.90	DESCUENTO MUROS
6.76	N A	7.22	1	100%	49.81	RECUPERACIÓN PARTOS
0.86	N A	0.7	1	100%	0.67	
3.4	N A	0.7	-1	100%	-0.04	DESCUENTO COLUMNAS
0.15	N A	0.7	-1	100%	-0.02	DESCUENTO COLUMNAS
0.74	N A	0.3	-1	100%	-0.22	DESCUENTO COLUMNAS
0.75	N A	0.26	-1	100%	-0.20	DESCUENTO COLUMNAS
3.6	N A	0.16	-1	100%	-0.10	DESCUENTO COLUMNAS
1.45	N A	0.16	-1	100%	-0.23	DESCUENTO ESPACIO DE DILITACIÓN
2.85	N A	3.68	1	100%	10.49	CENTRAL ENFERMERIA - RECUPERACIÓN PARTOS
3.8	N A	0.16	-1	100%	-0.62	DESCUENTO AREA
5.52	N A	0.83	1	100%	4.58	UCI NEO - CIRCULACION CUARTO DE ASEO


OBSERVACIONES:

TOTAL	**793.42**	**Metro Cuadrado**
ACUMULADO ANTERIOR		
PRESENTE ACTA	**793.42**	

Elaboró contratista:	Estefania Carvajal Henao	FIRMA:
Aprobó Interventoría:	Brenda Luz Hurtado	FIRMA:

PROYECTO	CONSTRUCCION PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

ITEM	Nº 10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA DE ALCANTARILLADO PVC D=6"	CAP	10.00	ITEMS NO PREVISTOS	UNIDAD	Metro lineal	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico	Dimensiones						
	L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%	Total (m)	Observaciones
			URBANISMO				
 	4			1	100%	4.00	DE CUSTADO SUR A NORTE

OBSERVACIONES:

TOTAL	4.00	Metro lineal
ACUMULADO ANTERIOR	0.00	Metro lineal
PRESENTE ACTA	4.00	Metro lineal

Elaboró contratista:	Estefania Carvajal Hoyos	FIRMA
Aprobo Interventoria:	Brenda Luz Hurtado	FIRMA

PROYECTO	CONSTRUCCION PARA LA TERMINACION DE LA REMODELACION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA										
ITEM	MP11	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ALCANTARILLADO PVC D=12"	CAP	10.00	ITEMS NO PREVISTOS		UNIDAD	Metro lineal		UBICACIÓN	UNIVERSITARIO
Registro fotográfico					Dimensiones					Total (m)	Observaciones
					L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%		
					URBANISMO						
					31			1	100%	53.00	DE CAJA DE INSPECCION SUR A MH NORTE RED SANITARIA
					28			1	100%	28.00	DE MH NORTE A MH VIA DE INGRESO RED SANITARIA
					21			1	100%	21.00	DE CAJA FRENTE A TANQUE ROTA MH FRENTE A TORRES ESPECIALISTAS RED AGUAS LLUVIAS

OBSERVACIONES:

TOTAL	102.00	Metro lineal
ACUMULADO ANTERIOR	0.00	Metro lineal
PRESENTE ACTA	102.00	Metro lineal

Elaboro contratista:	Estefania Carvajal Henao	FIRMA
Aprobó Interventoria:	Brenda Luz Hurtado	FIRMA

PROYECTO	CONSTRUCCION PARA LA TERMINACION DE LA REMODELACION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

ITEM	NP 15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1600 PARA SEPARACION SUBRASANTE CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENES FILTROS	CAP	10.00	ITEMS NO PREVISTOS	UNIDAD	Metro cuadrado	UBICACIÓN	UNIDAD MATERNO INFANTIL

Registro fotográfico	Dimensiones					Total (m)	Observaciones
	L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%		
	29.2		2.1	1	100%	81.22	TANQUE DE ALMACENAMIENTO







OBSERVACIONES:

TOTAL	81.22	Metro cuadrado
ACUMULADO ANTERIOR	0.00	Metro cuadrado
PRESENTE ACTA	81.22	Metro cuadrado

Elaboro contratista:	Estefania Carvajal Henao	FIRMA
Aprobó interventoria:	Brenda Luz Hurtado	FIRMA

PROYECTO	CONSTRUCCION PARA LA TERMINACION DE LA REMODELACION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

ITEM	NP 16	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAVAS PARA HORMIGO PERMEABLE (16-25 MM) DE CANTO RODADO	CAP	10.00	ITEMS NO PREVISTOS	UNIDAD	Metro cubico		UBICACIÓN	MACROPROCESO
Registro fotográfico					Dimensiones				Total (m)	Observaciones
					L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%	
					TANQUE ALMACENAMIENTO					
					26.7	0.3	0.8	1	100%	8.38	TANQUE DE ALMACENAMIENTO
					RED DE ALCANTARILLADO					
					53	1.3	0.1	1	100%	20.67	MEJORAMIENTO DE TIERRA RAJON PARA TUBERIA 10"
					28	1.3	0.1	1	100%	10.92	MEJORAMIENTO DE TIERRA RAJON PARA TUBERIA 10"
					31.3	1.3	0.3	1	100%	12.21	MEJORAMIENTO DE TIERRA RAJON PARA TUBERIA 10"
					17	1.3	0.1	1	100%	6.63	MEJORAMIENTO DE TIERRA RAJON PARA TUBERIA 10"
					4	1.3	0.3	1	100%	1.56	BASE PARA TUBERIA 8" DE SURA NORTE

OBSERVACIONES:

TOTAL	60.37	Metro cubico
ACUMULADO ANTERIOR	0.00	Metro cubico
PRESENTE ACTA	60.37	Metro cubico

Elaboro contratista:	Estefania Carvajal Henao	FIRMA:
Aprobo Interventoria:	Brenda Luz Hurtado	FIRMA:

PROYECTO	CONSTRUCCION PARA LA TERMINACION DE LA REMODELACION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA									
ITEM	Nº 17	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC D = 4" PARA DRENAJE SANITARIO	CAP	16.00	ITEMS NO PREVISTOS	UNIDAD	Metro lineal		UBICACIÓN	UBICACIÓN
Registro fotográfico					Dimensiones				Total (m)	Observaciones
					L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%	
					26.2			1	100%	26.20



OBSERVACIONES:

TOTAL	26.20	Metro lineal
ACUMULADO ANTERIOR	0.00	Metro lineal
PRESENTE ACTA	26.20	Metro lineal

Elaboro contratista:	Estefania Carvajal Henao	FIRMA
Aprobó Interventoría:	Brenda Luz Hurtado	FIRMA

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

ITEM	NP 18	CONCRETO CICLÓPEO DE 21 MPa (3000 PSI) RELACION 60C:40P	CAP	10.00	ITEMS NO PREVISTOS	UNIDAD	Metro cubico	UBICACIÓN	UM SAN RAFAEL

Registro fotográfico	Dimensiones					Total (m)	Observaciones
	L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%		
	11.88	7.56	0.4	1	100%	35.9	Reemplazo base de tanque
	2.22	0.95	0.1	1	100%	0.8436	Reemplazo base de tanque
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	

OBSERVACIONES:


TOTAL	30.77	Metro cubico
ACUMULADO ANTERIOR	-	
PRESENTE ACTA	30.77	

Elaboró contratista:	Estefania Carvajal Henao	FIRMA:
Aprobó Interventoria:	Brenda Luz Hurtado	FIRMA:


PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

ITEM	NP 20	RESATAS SOBRE MUROS EN CONCRETO, MAMPOSTERIA DE LADRILLO O DE BLOQUE	CAP	10.00

Registro fotográfico





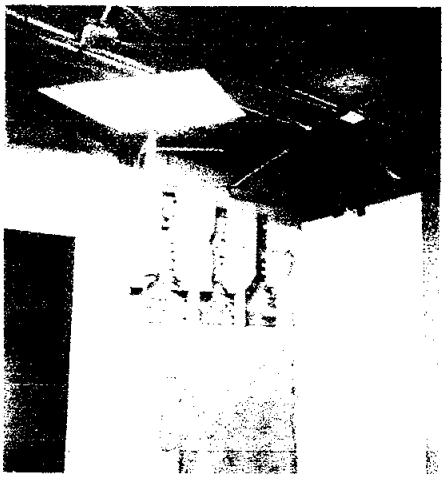

ITEMS NO PREVISTOS	UNIDAD	Metro lineal			UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL
Dimensiones						
L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%	Total (m)	Observaciones
			PISO 1			
13.2	N/A	N/A	1	100%	13.2	W.C BAÑO HOMBRES
9.2	N/A	N/A	1	100%	9.2	W.C BAÑO MUJERES
2.3	N/A	N/A	1	100%	2.3	BAÑO CONSULTORIO 4
7.43	N/A	N/A	1	100%	7.4	BAÑO CONSULTORIO 1
7.5	N/A	N/A	1	100%	7.5	BAÑO CONSULTORIO 2
7.5	N/A	N/A	1	100%	7.5	BAÑO MONITORIO
7.5	N/A	N/A	1	100%	7.5	BAÑO CONSULTORIO 3
7.5	N/A	N/A	1	100%	7.5	SARTA FRA BAÑO
2.3	N/A	N/A	1	100%	2.3	SARA FRA
7.5	N/A	N/A	1	100%	7.5	BAÑO CUBICULO AISLAMIENTO
7.5	N/A	N/A	1	100%	7.5	BAÑO GESTIER ADMINISTRACION
7.5	N/A	N/A	1	100%	7.5	PROCEDIMIENTO IMAGENOLOGIA
7.5	N/A	N/A	1	100%	7.5	TOMA DE MUESTRAS CINECOLOGICAS
7.5	N/A	N/A	1	100%	7.5	BAÑO LAVADO DE OJOS
7.5	N/A	N/A	1	100%	7.5	W.C SALA DE ESPERA
1.80	N/A	N/A	2	100%	2.7	REANIMACION
1.84	N/A	N/A	3	100%	4.6	MONITORIO CLICO
1.43	N/A	N/A	2	100%	2.9	SALA ERA
1.56	N/A	N/A	1	100%	1.6	SALA LRA
1.67	N/A	N/A	1	100%	1.7	SALA ERA
0.9	N/A	N/A	1	100%	0.9	SALA ERA
1.1	N/A	N/A	1	100%	1.1	YESOS
1.3	N/A	N/A	1	100%	1.3	PROCEDIMIENTO
1.4	N/A	N/A	2	100%	2.8	CIRCULACION
4.44	N/A	N/A	1	100%	4.4	OBSERVACION PEDIATRA
1.61	N/A	N/A	1	100%	1.6	OBSERVACION PEDIATRA
2.65	N/A	N/A	1	100%	2.7	OBSERVACION PEDIATRA
5.53	N/A	N/A	1	100%	5.5	OBSERVACION PEDIATRA
5.48	N/A	N/A	1	100%	5.5	OBSERVACION PEDIATRA
1.4	N/A	N/A	2	100%	2.8	ALAMB
4.17	N/A	N/A	1	100%	4.1	OBSERVACION GINECO
3.3	N/A	N/A	3	100%	3.3	CAJA DE CORTE CIRCULAR
1.17	N/A	N/A	1	100%	1.2	CONOHIGIANO
2.8	N/A	N/A	2	100%	2.8	CARRO
1.9	N/A	N/A	1	100%	1.9	RX
			PISO 2			
2.5	N/A	N/A	1	100%	2.5	W.C DISCAPACITADOS
2.3	N/A	N/A	1	100%	2.3	GESTIER MUJERES BAÑO
2.5	N/A	N/A	1	100%	2.5	GESTIER MUJERES BAÑO
2.7	N/A	N/A	1	100%	2.7	GESTIER HOMBRES BAÑO
2.5	N/A	N/A	1	100%	2.5	BAÑOS RECUPERACION PARTO
2.5	N/A	N/A	1	100%	2.5	PREPARACION PASIENTES AISLADOS
2.5	N/A	N/A	1	100%	2.5	PREPARACION PASIENTES AISLADOS
2.5	N/A	N/A	1	100%	2.5	W.C DISCAPASITADOS COORDINACION UCI
2.3	N/A	N/A	1	100%	2.3	W.C HOMBRES COORDINACION UCI
2.5	N/A	N/A	1	100%	2.5	BAÑO DISCAPACITADOS AL LADO DEL LACTARIO
2.5	N/A	N/A	1	100%	2.5	BAÑO FRENTE A UCI ADULTOS
2.3	N/A	N/A	1	100%	2.3	BAÑO FRENTE A UCI ADULTOS
7.5	N/A	N/A	1	100%	7.5	BAÑO AISLADO UNPU
0.87	N/A	N/A	1	100%	0.9	UCI ADULTOS CENTRAL DE ENFERMERIA
1.08	N/A	N/A	1	100%	1.1	ENTRADA UCI ADULTOS
1	N/A	N/A	1	100%	1.0	CIRCULACION A SALA DE PARTOS
0.95	N/A	N/A	2	100%	1.9	RECUPERACION SALA DE PARTOS
1.2	N/A	N/A	1	100%	1.2	RECUPERACION SALA DE PARTOS
1.62	N/A	N/A	1	100%	1.6	RECUPERACION SALA DE PARTOS
0.64	N/A	N/A	1	100%	0.6	RECUPERACION SALA DE PARTOS
1.15	N/A	N/A	1	100%	1.1	RECUPERACION SALA DE PARTOS
2.15	N/A	N/A	1	100%	2.2	PREPARACION PARTOS
1.11	N/A	N/A	1	100%	1.1	PREPARACION PARTOS
1.11	N/A	N/A	1	100%	1.1	PREPARACION PARTOS
1.1	N/A	N/A	4	100%	5.6	CIRCULACION SALA DE PARTOS
3.31	N/A	N/A	3	100%	3.3	SALA DE PARTOS 2
7.1	N/A	N/A	6	100%	7.1	CIRCULACION QUIROFANOS
5.72	N/A	N/A	1	100%	5.7	RECUPERACION QUIRURGICA
8.21	N/A	N/A	1	100%	8.2	RECUPERACION QUIRURGICA
1.04	N/A	N/A	2	100%	2.1	RECUPERACION QUIRURGICA
1.75	N/A	N/A	3	100%	5.6	RECUPERACION QUIRURGICA
0.94	N/A	N/A	2	100%	1.9	RECUPERACION QUIRURGICA
1.15	N/A	N/A	2	100%	2.3	ENTRADA CUIDADOS INTERMEDIOS
1	N/A	N/A	6	100%	6.0	ENTRADA CUIDADOS INTENSIVOS
				100%	1.0	
			PISO 3			
2.2	N/A	N/A	1	100%	2.2	W.C ADULTOS LUDOTECA
0.6	N/A	N/A	1	100%	0.6	W.C NIÑOS LUDOTECA
7.5	N/A	N/A	1	100%	7.5	W.C COORDINACION PEDIATRIA
2.3	N/A	N/A	1	100%	2.3	W.C COORDINACION PEDIATRIA
2.3	N/A	N/A	1	100%	2.3	W.C ALCESO ASISTENCIAL
7.5	N/A	N/A	1	100%	7.5	UCI PEDIATRIA
1.74	N/A	N/A	2	100%	2.5	306
1.03	N/A	N/A	1	100%	1.0	307
1.1	N/A	N/A	1	100%	1.1	310
1.12	N/A	N/A	1	100%	1.1	311
1.15	N/A	N/A	1	100%	1.2	314
1.17	N/A	N/A	1	100%	1.2	315
1.04	N/A	N/A	1	100%	1.0	325
0.85	N/A	N/A	4	100%	3.1	CAJA DE CORTE CIRCULAR
1.32	N/A	N/A	1	100%	1.3	UCI PEDIATRIA
1.11	N/A	N/A	1	100%	1.1	ENTRADA UCI PEDIATRIA
			PISO 4			
1.9	N/A	N/A	1	100%	1.9	401
1.25	N/A	N/A	1	100%	1.3	403
1.25	N/A	N/A	1	100%	1.3	405
1.27	N/A	N/A	1	100%	1.3	407
1.27	N/A	N/A	1	100%	1.3	408
1.28	N/A	N/A	1	100%	1.3	410
0.81	N/A	N/A	5	100%	1.6	CENTRAL DE ENFERMERIA
1.2	N/A	N/A	1	100%	1.2	411
1.25	N/A	N/A	1	100%	1.3	412
1.26	N/A	N/A	2	100%	2.5	413
1.27	N/A	N/A	1	100%	1.3	414
1.25	N/A	N/A	1	100%	1.3	415
1.27	N/A	N/A	1	100%	1.3	416
1.27	N/A	N/A	1	100%	1.3	417
1.2	N/A	N/A	1	100%	1.2	418
1.3	N/A	N/A	1	100%	1.3	419
1.26	N/A	N/A	1	100%	1.3	420
1.27	N/A	N/A	1	100%	1.3	422
1.21	N/A	N/A	1	100%	1.2	423
1.25	N/A	N/A	1	100%	1.3	424
1.25	N/A	N/A	1	100%	1.3	425
1.1	N/A	N/A	4	100%	4.4	VALVULAS DE CORTE

OBSERVACIONES:

TOTAL	379.62	Metro lineal
ACUMULADO ANTERIOR	-	
PRESENTE ACTA	379.62	

Elaboró contratista:	Estefania Carvajal Henao	FIRMA:
Aprobó interventoria:	Brenda Luz Hurtado	FIRMA:


PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA											
ITEM	NP 22	CERRAMIENTO EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO DE 8 M.M.	CAP	10.00	ITEMS NO PREVISTOS		UNIDAD	Metro cuadrado		UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL	
Registro fotografico					Dimensiones					Total (m)	Observaciones	
					L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%			
					6.53		2.44	1	100%	15.9	Costado sur	
					59.7		2.44	1	100%	143.228	Costado occidente	
					28.51		2.44	1	100%	69.5644	Costado norte	
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
OBSERVACIONES:												
									TOTAL	228.73	Metro cuadrado	
									ACUMULADO ANTERIOR	-		
									PRESENTE ACTA	228.73		


Elaboró contratista:	Estefanía Carvajal Henao	FIRMA:
Aprobó interventoría:	Sranda Luz Hurtado	FIRMA:

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACION DE LA REMODELACION Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

ITEM	NP 25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA CONVENA PARA PAÑETAR	CAP	0.00	ITEMS NO PREVISTOS	UNIDAD	Metro cuadrado	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico



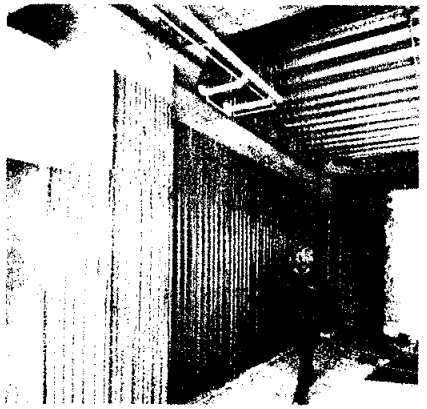

Dimensiones					Total (m)	Observaciones
L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%		
SOTANO						
1.26	2.7	N A	1	100%	3.402	DESPACHO DIETAS
0.6	2.7	N A	1	100%	1.62	DESPACHO DIETAS
1.8	2.7	N A	1	100%	4.86	DESPACHO DIETAS
2.14	2.7	N A	1	100%	5.832	CIRCULACION A ARCHIVO
PRIMER PISO						
0.73	2.7	N A	1	100%	1.971	HALL GENERAL
1.37	2.7	N A	1	100%	3.699	HALL GENERAL
1.2	2.7	N A	1	100%	3.24	AUTO SERVICIO
0.6	2.7	N A	1	100%	1.62	AUTO SERVICIO
1.09	2.7	N A	1	100%	2.916	AUDITORIO
0.73	2.7	N A	1	100%	1.971	SALA DE ESPERA ADULTOS
1.62	2.7	N A	1	100%	4.374	SALA DE ESPERA ADULTOS
0.48	2.7	N A	1	100%	1.242	REANIMACION
0.69	2.7	N A	1	100%	1.836	DILITACION
0.43	2.7	N A	1	100%	1.161	DILITACION
0.89	2.7	N A	1	100%	2.403	SALA EDA
0.6	2.7	N A	1	100%	1.62	SALA EDA
1.26	2.7	N A	1	100%	3.402	OBSERVACION GINECOSTETRICA
1.56	2.7	N A	1	100%	4.212	RX
0.57	2.7	N A	1	100%	1.539	RX
1.01	2.7	N A	1	100%	2.727	TOMA DE MUESTRAS GINECOLOGICAS
0.7	2.7	N A	1	100%	1.89	RESIDUOS RESICLABLES ORGANICOS
SEGUNDO PISO						
10.73	2.7	N A	1	100%	28.971	HALL GENERAL PANTALLA
3.4	2.7	N A	1	100%	9.18	VESTIER HOMBRES PANTALLA
3.4	2.7	N A	1	100%	9.18	VESTIER MUJERES PANTALLA
0.8	2.7	N A	1	100%	2.16	QUIROFANO 2
0.6	2.7	N A	1	100%	1.62	QUIROFANO 2
0.75	2.7	N A	1	100%	2.025	QUIROFANO 1
0.7	2.7	N A	1	100%	1.89	QUIROFANO 1
5.91	2.7	N A	1	100%	15.957	TRABAJO DE PARTO PANTALLA
5.15	2.7	N A	1	100%	13.905	RECUPERACION DE SALA DE PARTO PANTALLA
4.02	2.7	N A	1	100%	10.854	RECUPERACION DE SALA DE PARTO PANTALLA
5.3	2.7	N A	1	100%	14.31	U.R.O.V. PANTALLA
0.77	2.7	N A	1	100%	2.079	U.R.O.V.
2.44	2.7	N A	1	100%	6.588	FILTRO VESTIERES
2.2	2.7	N A	1	100%	5.94	AMBIENTE DE TRABAJO ESTERIL
2.48	2.7	N A	1	100%	6.696	CUARTO EQUIPOS
1.01	2.7	N A	1	100%	2.727	ASEADO
1.22	2.7	N A	1	100%	3.294	INTERMEDIOS
TERCER PISO						
2.6	2.7	N A	1	100%	7.02	SALA DE ESPERA
2.94	2.7	N A	1	100%	7.938	U.C.I.P.O. PANTALLA
1.66	2.7	N A	1	100%	4.482	U.C.I.P. BAÑO PANTALLA
4.73	2.7	N A	1	100%	12.906	ESTAR DE TELEVISION LUDOTECA PANTALLA
0.6	2.7	N A	1	100%	1.62	HABITACION -02
0.9	2.7	N A	1	100%	2.43	HABITACION-08
0.6	2.7	N A	1	100%	1.62	HABITACION-10
0.6	2.7	N A	1	100%	1.62	HABITACION -11
0.6	2.7	N A	1	100%	1.62	HABITACION-16
0.6	2.7	N A	1	100%	1.62	HABITACION 24
0.75	2.7	N A	1	100%	2.025	HABITACION-25
CUARTO PISO						
1.1	2.7	N A	1	100%	2.97	CIRCULACION RESTRINGIDA
0.6	2.7	N A	1	100%	1.62	HABITACION-02
0.5	2.7	N A	1	100%	1.35	HABITACION-02
1.07	2.7	N A	1	100%	2.889	HABITACION-08
0.6	2.7	N A	1	100%	1.62	HABITACION-10
0.7	2.7	N A	1	100%	1.89	HABITACION-25

OBSERVACIONES:


TOTAL	252.15	Metro cuadrado
ACUMULADO ANTERIOR	-	
PRESENTE ACTA	252.15	


Elaboró contratista:	Estefanía Carvajal Henao	FIRMA:
Aprobó Interventoría:	Brenda Luz Hurtado	FIRMA:


PROYECTO	CONSTRUCCION PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

ITEM	NP 26	PAÑETE LISO BAJO MALLA 1:4	CAP	10.00	ITEMS NO PREVISTOS	UNIDAD	Metro cuadrado	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico

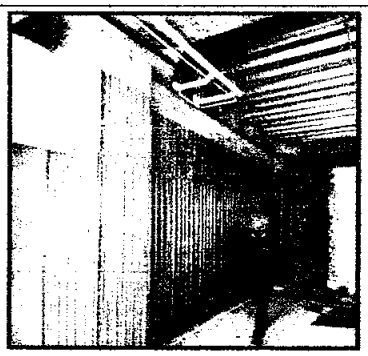

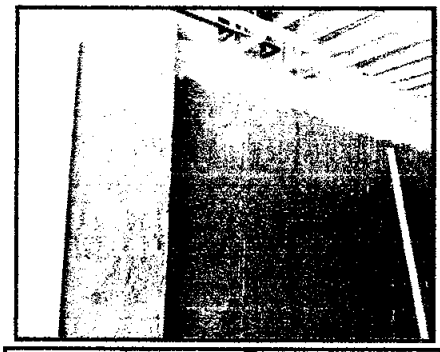

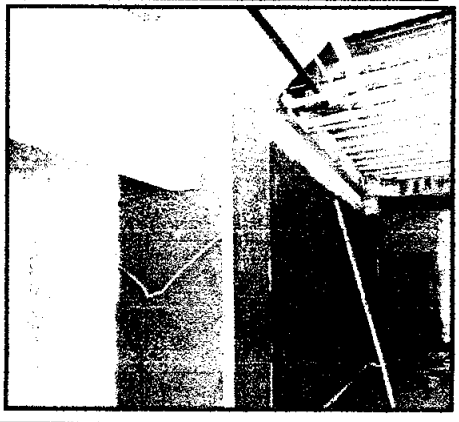

Dimensiones L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%	Total (m)	Observaciones
SOTANO						
1.26	2.6	N/A	1	100%	3.276	DESPACHO DIETAS
0.6	2.6	N/A	1	100%	1.56	DESPACHO DIETAS
1.8	2.6	N/A	1	100%	4.68	DESPACHO DIETAS
2.46	2.6	N/A	1	100%	6.396	CIRCULACION A ARCHIVO
4.06	2.6	N/A	1	100%	9.711	BAÑO VESTIER H-C
3.56	2.6	N/A	1	100%	8.544	CUARTO ASEO FRENTE A ARCHIVO
1.15	2.6	N/A	1	100%	2.99	BAÑO FRENTE A ARCHIVO
2.52	2.55	N/A	1	100%	6.426	COLUMNA LAVADO DE CARRO
3.5	2.6	N/A	1	100%	9.1	COLUMNA AL LADO DE ARCHIVO
PRIMER PISO						
0.73	2.6	N/A	1	100%	1.898	HALL GENERAL
1.37	2.6	N/A	1	100%	3.562	HALL GENERAL
1.2	2.6	N/A	1	100%	3.12	AUTO SERVICIO
0.6	2.6	N/A	1	100%	1.56	AUTO SERVICIO
1.08	2.6	N/A	1	100%	2.808	AUDITORIO
0.73	2.6	N/A	1	100%	1.898	SALA DE ESPERA ADULTOS
1.62	2.6	N/A	1	100%	4.212	SALA DE ESPERA ADULTOS
0.46	2.6	N/A	1	100%	1.196	REANIMACION
0.68	2.6	N/A	1	100%	1.768	DUITACION
0.43	2.6	N/A	1	100%	1.118	DUITACION
0.89	2.6	N/A	1	100%	2.314	SALA EDA
0.6	2.6	N/A	1	100%	1.56	SALA EDA
1.26	2.6	N/A	1	100%	3.276	OBSERVACION GINECOSTETRICA
1.56	2.6	N/A	1	100%	4.056	RX
0.57	2.6	N/A	1	100%	1.482	RX
1.01	2.6	N/A	1	100%	2.626	TOMA DE MUESTRAS GINECOLOGICAS
0.7	2.6	N/A	1	100%	1.82	RESIDUOS RESICLABLES ORGANICOS
12.19	2.6	N/A	1	100%	31.694	W.C HOMBRES
9.13	2.6	N/A	1	100%	23.738	W.C MUJERES
7.12	2.6	N/A	1	100%	18.512	DISCAPASITADOS BAÑO
7.13	2.6	N/A	1	100%	18.538	W.C SALA DE ESPERA
0.9	2.1	N/A	1	100%	1.89	W.C SALA DE ESPERA
4.28	2.6	N/A	2	100%	22.256	MUROS SEPARADORES CAFETERIA
				100%	0	
SEGUNDO PISO						
10.73	2.6	N/A	1	100%	27.898	HALL GENERAL PANTALLA
3.4	2.6	N/A	1	100%	8.84	VESTIER HOMBRES PANTALLA
3.4	2.6	N/A	1	100%	8.84	VESTIER MUJERES PANTALLA
0.8	2.6	N/A	1	100%	2.08	QUIROFANO 2
0.6	2.6	N/A	1	100%	1.56	QUIROFANO 2
0.75	2.6	N/A	1	100%	1.95	QUIROFANO 1
0.7	2.6	N/A	1	100%	1.82	QUIROFANO 1
5.91	2.6	N/A	1	100%	15.366	TRABAJO DE PARTO PANTALLA
5.15	2.6	N/A	1	100%	13.39	RECUPERACION DE SALA DE PARTO PANTALLA
4.02	2.6	N/A	1	100%	10.452	RECUPERACION DE SALA DE PARTO PANTALLA
5.3	2.6	N/A	1	100%	13.78	U.R.O.M PANTALLA
0.77	2.6	N/A	1	100%	2.002	U.R.O.M
2.44	2.6	N/A	1	100%	6.344	FILTRO VESTIERES
2.2	2.6	N/A	1	100%	5.72	AMBIENTE DE TRABAJO ESTERIL
2.48	2.6	N/A	1	100%	6.448	CUARTO EQUIPOS
1.01	2.6	N/A	1	100%	2.626	AISLADO
1.22	2.6	N/A	1	100%	3.172	INTERMEDIOS
12.8	2.6	N/A	1	100%	33.28	W.C DISCAPASITADOS HOMBRES
-0.7	2.1	N/A	-1	100%	-1.47	DESCUENTO
8.7	2.6	N/A	1	100%	22.62	BAÑO RECUPERACION PARTO
4.33	1.2	N/A	1	100%	5.196	BAÑO UCI ADULTOS
				100%	0	
TERCER PISO						
2.6	2.6	N/A	1	100%	6.76	SALA DE ESPERA
2.94	2.6	N/A	1	100%	7.644	U.C.I.P 01 PANTALLA
1.66	2.6	N/A	1	100%	4.316	U.C.I.P BAÑO PANTALLA
4.78	2.6	N/A	1	100%	12.428	ESTAR DE TELEVICION LUDOTECA PANTALLA
0.6	2.6	N/A	1	100%	1.56	HABITACION 07
0.9	2.6	N/A	1	100%	2.34	HABITACION-08
0.6	2.6	N/A	1	100%	1.56	HABITACION 10
0.6	2.6	N/A	1	100%	1.56	HABITACION 11
0.6	2.6	N/A	1	100%	1.56	HABITACION-16
0.6	2.6	N/A	1	100%	1.56	HABITACION-24
0.75	2.6	N/A	1	100%	1.95	HABITACION-25
5.43	2.5	N/A	1	100%	13.575	BAÑO DESCANSO Y VESTIER
0.7	2.1	N/A	-1	100%	-1.47	DESCUENTO
				100%	0	
CUARTO PISO						
1.1	2.7	N/A	1	100%	2.97	CIRCULACION RESTRINGIDA
0.6	2.7	N/A	1	100%	1.62	HABITACION-02
0.5	2.7	N/A	1	100%	1.35	HABITACION-07
1.07	2.7	N/A	1	100%	2.889	HABITACION-08
0.6	2.7	N/A	1	100%	1.62	HABITACION-10
0.7	2.7	N/A	1	100%	1.89	HABITACION-25


OBSERVACIONES:


TOTAL	471.37	Metro cuadrado
ACUMULADO ANTERIOR	-	
PRESENTE ACTA	471.37	

Elaboró contratista:	Estefania Carvajal Henao	FIRMA:
Aprobó interventoría:	Brenda Luz Hurtado	FIRMA:

PROYECTO	CONSTRUCCION PARA LA TERMINACION DE LA REMODELACION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

ITEM	NP 27	FAJA PAÑETE LISO MUROS 1:4	CAP	10.00	ITEMS NO PREVISTOS	UNIDAD	Metro lineal		UBICACIÓN	UM SAN RAFAEL
Registro fotográfico					Dimensiones				Total (m)	Observaciones
					L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%	
					SOTANO					
					N/A	0.7	2.1	1	100%	4.9 ROPA SUCIA
					N/A	0.7	2.1	1	100%	4.9 CUARTO ASEO
					N/A	0.8	2.1	1	100%	5 BAÑO
					N/A	1.55	2.1	1	100%	5.75 CIRCULACION ARCHIVO
					PRIMER PISO					
					N/A	0.7	2.1	1	100%	4.9 VESTIER TAC
					N/A	0.7	2.1	1	100%	4.9 OBSERVACION GINECOOBSTETRICIA INTERNA
					N/A	0.9	2.1	1	100%	5.1 BAÑO MIXTO SALA ESPERA
					N/A	0.9	2.1	1	100%	5.1 BAÑO MOVILIDAD REDUCIDA SALA DE ESPERA
					SEGUNDO PISO					
					N/A	0.8	2.1	1	100%	5 C.R.O INCAPACIDADES
					N/A	0.8	2.1	1	100%	5 W.C
					N/A	0.7	2.1	1	100%	4.9 TRABAJO SUCIO
					N/A	0.7	2.1	1	100%	4.9 ASEO
					N/A	0.7	2.1	1	100%	4.9 DEP ROPA SUCIA
					N/A	0.7	2.1	1	100%	4.9 TRABAJO LIMPIO
					N/A	0.7	2.1	1	100%	4.9 FILTRO ACCESO FAMILIARES U.R.O
					N/A	0.7	2.1	1	100%	4.9 FILTRO ACCESO U.R.O
					N/A	0.7	2.1	1	100%	4.9 BACK
					N/A	0.8	2.1	1	100%	5 ACCESO BAÑO
					N/A	1	2.1	1	100%	5.2 VESTIER PASIENTES
					N/A	0.7	2.1	1	100%	4.9 ASEO
					N/A	0.9	2.1	1	100%	5.1 W.C H INCAPACIDADES
					N/A	0.8	2.1	1	100%	5 DUCTO
					N/A	0.8	2.1	1	100%	5 DESCANSO
					N/A	0.7	2.1	1	100%	4.9 TRABAJO SUCIO
					N/A	0.8	2.1	1	100%	5 BAÑO RECUPERACION SALA DE PARTOS
					N/A	0.7	2.1	1	100%	4.9 TRABAJO LIMPIO
					N/A	0.8	2.1	1	100%	5 BAÑO EN TRABAJO DE PARTOS
					N/A	0.7	2.1	1	100%	4.9 ASEO
					N/A	0.8	2.1	1	100%	5 AMBIENTE DE TRABAJO ESTERIL
					N/A	0.7	2.1	1	100%	4.9 BODEGA
					TERCER PISO					
					N/A	1.2	2.1	1	100%	5.4 301 ENTRADA HABITACION
					N/A	0.8	2.1	1	100%	5 301 BAÑO
					N/A	1.2	2.1	1	100%	5.4 302 ENTRADA HABITACION
					N/A	0.8	2.1	1	100%	5 302 BAÑO
					N/A	1.2	2.1	1	100%	5.4 307 ENTRADA HABITACION
					N/A	0.8	2.1	1	100%	5 307 BAÑO
					N/A	1.2	2.1	1	100%	5.4 308 ENTRADA HABITACION
					N/A	0.8	2.1	1	100%	5 308 BAÑO
					N/A	1.2	2.1	1	100%	5.4 310 ENTRADA HABITACION
					N/A	0.8	2.1	1	100%	5 310 BAÑO
					N/A	1.2	2.1	1	100%	5.4 311 ENTRADA HABITACION
					N/A	0.8	2.1	1	100%	5 311 BAÑO
					N/A	1.2	2.1	1	100%	5.4 316 ENTRADA HABITACION
					N/A	0.8	2.1	1	100%	5 316 BAÑO
					N/A	1.2	2.1	1	100%	5.4 318 ENTRADA HABITACION
					N/A	0.8	2.1	1	100%	5 318 BAÑO
					N/A	1.2	2.1	1	100%	5.4 325 ENTRADA HABITACION
					N/A	0.8	2.1	1	100%	5 325 BAÑO
					N/A	0.7	2.1	1	100%	4.9 TRABAJO LIMPIO
					N/A	0.7	2.1	1	100%	4.9 TRABAJO SUCIO
					N/A	0.7	2.1	1	100%	4.9 ROPA LIMPIA
					N/A	1.4	2.1	1	100%	5.9 PROCEDIMIENTO
					N/A	0.7	2.1	1	100%	4.9 ASEO
					N/A	0.8	2.1	1	100%	5 DESCANSO Y VESTIER
					N/A	0.7	2.1	1	100%	4.9 ROPA SUCIA
					N/A	0.7	2.1	1	100%	4.9 DEP RESIDUOS
					N/A	0.7	2.1	1	100%	4.9 DEP RESIDUOS PELIGROSOS
					N/A	0.8	2.1	1	100%	5 W.C M
					N/A	0.8	2.1	1	100%	5 W.C H
					N/A	0.8	2.1	1	100%	5 DUCTO
					CUARTO PISO					
					N/A	1.2	2.1	1	100%	5.1 401 ENTRADA HABITACION
					N/A	0.8	2.1	1	100%	5 401 BAÑO
					N/A	1.2	2.1	1	100%	5.4 402 ENTRADA HABITACION
					N/A	0.8	2.1	1	100%	5 402 BAÑO
					N/A	1.2	2.1	1	100%	5.4 403 ENTRADA HABITACION
					N/A	0.8	2.1	1	100%	5 403 BAÑO
					N/A	1.2	2.1	1	100%	5.4 404 ENTRADA HABITACION
					N/A	0.8	2.1	1	100%	5 404 BAÑO
					N/A	1.2	2.1	1	100%	5.1 405 ENTRADA HABITACION
					N/A	0.8	2.1	1	100%	5 405 BAÑO
					N/A	1.2	2.1	1	100%	5.4 406 ENTRADA HABITACION
					N/A	0.8	2.1	1	100%	5 406 BAÑO
					N/A	1.2	2.1	1	100%	5.4 407 ENTRADA HABITACION
					N/A	0.8	2.1	1	100%	5 407 BAÑO
					N/A	1.2	2.1	1	100%	5.4 408 ENTRADA HABITACION
					N/A	0.8	2.1	1	100%	5 408 BAÑO
					N/A	1.2	2.1	1	100%	5.4 409 ENTRADA HABITACION
					N/A	0.8	2.1	1	100%	5 409 BAÑO
					N/A	1.2	2.1	1	100%	5.4 410 ENTRADA HABITACION
					N/A	0.8	2.1	1	100%	5 410 BAÑO
					N/A	1.2	2.1	1	100%	5.1 411 ENTRADA HABITACION
					N/A	0.8	2.1	1	100%	5 411 BAÑO
					N/A	1.2	2.1	1	100%	5.1 412 ENTRADA HABITACION
					N/A	0.8	2.1	1	100%	5 412 BAÑO
					N/A	1.2	2.1	1	100%	5.4 413 ENTRADA HABITACION
					N/A	0.8	2.1	1	100%	5 413 BAÑO
					N/A	1.2	2.1	1	100%	5.4 414 ENTRADA HABITACION
					N/A	0.8	2.1	1	100%	5 414 BAÑO
					N/A	1.2	2.1	1	100%	5.4 415 ENTRADA HABITACION
					N/A	0.8	2.1	1	100%	5 415 BAÑO
					N/A	1.2	2.1	1	100%	5.4 416 ENTRADA HABITACION
					N/A	0.8	2.1	1	100%	5 416 BAÑO
					N/A	1.2	2.1	1	100%	5.1 417 ENTRADA HABITACION
					N/A	0.8	2.1	1	100%	5 417 BAÑO
					N/A	1.2	2.1	1	100%	5.1 418 ENTRADA HABITACION
					N/A	0.8	2.1	1	100%	5 418 BAÑO
					N/A	1.2	2.1	1	100%	5.4 419 ENTRADA HABITACION
					N/A	0.8	2.1	1	100%	5 419 BAÑO
					N/A	1.2	2.1	1	100%	5.4 420 ENTRADA HABITACION
					N/A	0.8	2.1	1	100%	5 420 BAÑO
					N/A	1.2	2.1	1	100%	5.4 421 ENTRADA HABITACION
					N/A	0.8	2.1	1	100%	5 421 BAÑO
					N/A	1.2	2.1	1	100%	5.1 422 ENTRADA HABITACION
					N/A	0.8	2.1	1	100%	5 422 BAÑO
					N/A	1.2	2.1	1	100%	5.4 423 ENTRADA HABITACION
					N/A	0.8	2.1	1	100%	5 423 BAÑO
					N/A	1.2	2.1	1	100%	5.4 424 ENTRADA HABITACION
					N/A	0.8	2.1	1	100%	5 424 BAÑO
					N/A	1.2	2.1	1	100%	5.4 425 ENTRADA HABITACION
					N/A	0.9	2.1	1	100%	5.1 425 BAÑO

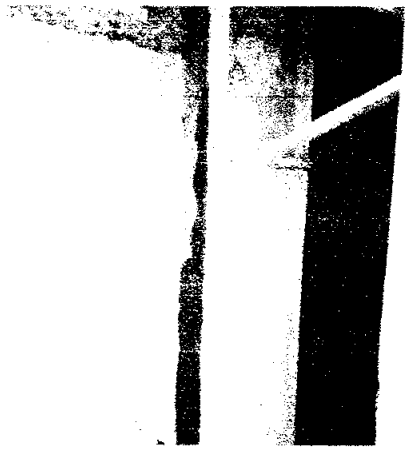

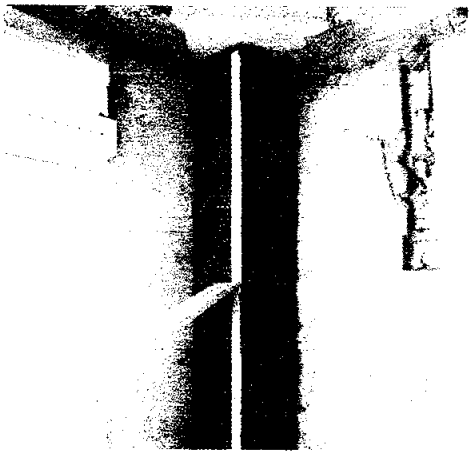



[redacted]

N/A	0.8	2.1	1	100%	5	TRABAJO LIMPIO
N/A	0.8	2.1	1	100%	5	TRABAJO SUCIO
N/A	0.8	2.1	1	100%	5	ROPA LIMPIA
N/A	1.4	2.1	1	100%	5.6	PROCEDIMIENTO
N/A	0.7	2.1	1	100%	4.9	ASEO
N/A	0.8	2.1	1	100%	5	DESCANSO Y VESTIER
N/A	0.7	2.1	1	100%	4.9	ROPA SUCIA
N/A	0.7	2.1	1	100%	4.9	DEP RESIDUOS
N/A	0.7	2.1	1	100%	4.9	DEP RESIDUOS PELIGROSOS
N/A	0.8	2.1	1	100%	5	W.C. M
N/A	0.8	2.1	1	100%	5	W.C. H
N/A	0.8	2.1	1	100%	5	DUCTO

OBSERVACIONES:


TOTAL	623.45	Metro lineal
ACUMULADO ANTERIOR		
PRESENTE ACTA	623.45	

Elaboró contratista:	Estefania Carvajal Henao	FIRMA:
Aprobó Interventoria:	Brenda Luz Hurtado	FIRMA:

PROYECTO	CONSTRUCCION PARA LA TERMINACION DE LA REMODELACION Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA


ITEM	NP 28	DESMONTE DE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS.	CAP	10.00

Registro fotográfico

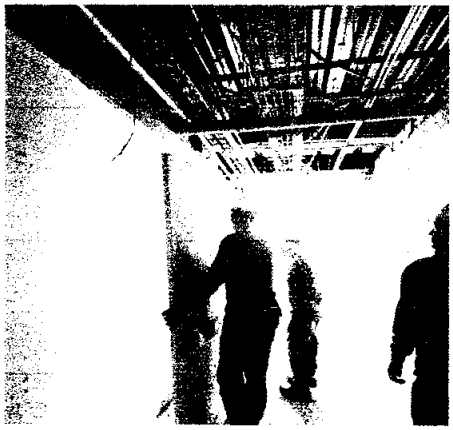







ITEMS NO PREVISTOS	UNIDAD	Metro cuadrado		USICACIÓN	UM SAN RAFAEL
Dimensiones				Total (m)	Observaciones
L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%	
SOTANO					
N/A	0.7	2.1	1	100%	1.47	ROPA SUCIA
N/A	0.7	2.1	1	100%	1.47	CUARTO ASEO
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	BAÑO
N/A	1.55	2.1	1	100%	3.255	CIRCULACION ARCHIVO
PRIMER PISO					
N/A	0.7	2.1	1	100%	1.47	VESTIER TAC
N/A	0.7	2.1	1	100%	1.47	OBSERVACION GINECOOBSTETRICIA INTERNA
N/A	0.9	2.1	1	100%	1.89	BAÑO MIXTO SALA ESPERA
N/A	0.9	2.1	1	100%	1.89	BAÑO MOVILIDAD REDUCIDA SALA DE ESPERA
SEGUNDO PISO					
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	U.R.O INCAPACIDADES
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	W.C
N/A	0.7	2.1	1	100%	1.47	TRABAJO SUCIO
N/A	0.7	2.1	1	100%	1.47	ASEO
N/A	0.7	2.1	1	100%	1.47	DEP ROPA SUCIA
N/A	0.7	2.1	1	100%	1.47	TRABAJO LIMPIO
N/A	0.7	2.1	1	100%	1.47	FILTRO ACCESO FAMILIARES U.R.O
N/A	0.7	2.1	1	100%	1.47	FILTRO ACCESO U.R.O
N/A	0.7	2.1	1	100%	1.47	RACK
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	ACCESO BAÑO
N/A	1	2.1	1	100%	2.1	VESTIER PACIENTES
N/A	0.7	2.1	1	100%	1.47	ASEO
N/A	0.9	2.1	1	100%	1.89	W.C H INCAPACIDADES
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	DUCTO
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	DESCANSO
N/A	0.7	2.1	1	100%	1.47	TRABAJO SUCIO
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	BAÑO RECUPERACION SALA DE PARTOS
N/A	0.7	2.1	1	100%	1.47	TRABAJO LIMPIO
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	BAÑO EN TRABAJO DE PARTOS
N/A	0.7	2.1	1	100%	1.47	ASEO
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	AMBIENTE DE TRABAJO ESTERIL
N/A	0.7	2.1	1	100%	1.47	BODEGA
TERCER PISO					
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	301 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	301 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	302 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	302 BAÑO
N/A	1.2	2.1	4	100%	10.08	307 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	307 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	308 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	308 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	310 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	310 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	311 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	311 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	316 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	316 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	318 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	318 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	325 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	325 BAÑO
N/A	0.7	2.1	1	100%	1.47	TRABAJO LIMPIO
N/A	0.7	2.1	1	100%	1.47	TRABAJO SUCIO
N/A	0.7	2.1	1	100%	1.47	ROPA LIMPIA
N/A	1.4	2.1	1	100%	2.94	PROCEDIMIENTO
N/A	0.7	2.1	1	100%	1.47	ASEO
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	DESCANSO Y VESTIER
N/A	0.7	2.1	1	100%	1.47	ROPA SUCIA
N/A	0.7	2.1	1	100%	1.47	DEP RESIDUOS
N/A	0.7	2.1	1	100%	1.47	DEP RESIDUOS PELIGROSOS
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	W.C. M
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	W.C. H
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	DUCTO
CUARTO PISO					
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	401 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	401 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	402 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	402 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	403 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	403 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	404 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	404 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	405 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	405 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	406 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	406 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	407 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	407 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	408 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	408 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	409 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	409 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	410 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	410 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	411 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	411 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	412 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	412 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	413 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	413 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	414 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	414 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	415 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	415 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	416 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	416 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	417 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	417 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	418 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	418 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	419 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	419 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	420 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	420 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	421 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	421 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	422 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	422 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	423 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	423 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	424 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	424 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	425 ENTRADA HABITACION
N/A	0.9	2.1	1	100%	1.89	425 BAÑO



N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	TRABAJO LIMPIO
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	TRABAJO SUCIO
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	ROPA LIMPIA
N/A	1.4	2.1	1	100%	2.94	PROCEDIMIENTO
N/A	0.7	2.1	1	100%	1.47	ASEO
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	DECANSO Y VESTIER
N/A	0.7	2.1	1	100%	1.47	ROPA SUCIA
N/A	0.7	2.1	1	100%	1.47	DEP RESIDUOS
N/A	0.7	2.1	1	100%	1.47	DEP RESIDUOS PELIGROSOS
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	WC_M
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	WC_H
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	DUCTO

OBSERVACIONES:


TOTAL	**240.77**	**Metro cuadrado**
ACUMULADO ANTERIOR	-	
PRESENTE ACTA	**240.77**	

Elaboró contratista:	**Estefania Carvajal Henao**	FIRMA:
Aprobó interventoria:	**Brenda Luz Hurtado**	FIRMA:

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

ITEM	NP 29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE TIPO L. DIÁM: 2". INCLUYE ACCESORIOS.	CAP	10.00	ITEMS NO PREVISTOS	UNIDAD	Metro lineal	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico








Dimensiones						
L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%	Total (m)	Observaciones
		ENTREPISOS				
		VACIO				
6.7			1	100%	6.7	Red de d stribuc on central de vacio de 2 piso a piso 4 : POR BUITRON
		PISO 1				
		VACIO				
7.35			1	100%	7.35	LAVADO DE PACIENTES A ACCESO PAS LLO URGENCIAS: RED PRENCIPAL DE TANQUE
14.15			1	100%	14.15	PASILLO FRENTE A CONSULTORIO N°5 A CAJA C. DE PASILLO HACIA FARMACIA: PRINCIPAL
		PISO 2				
		VACIO				
4.67			1	100%	4.67	PRINCIPAL ENTRE CAJA 5G DE QUIROFANO 3 A 2
6.76			1	100%	6.76	PRINCIPAL ENTRE CAJA 5G DE QUIROFANO 2 A 1
5.31			1	100%	5.31	PRINCIPAL FRENTE A QUIROFANO A A PRINCIPAL PASILLO TRABAJO DE PARTO
13.6			1	100%	13.6	PRINCIPAL PASILLO TRABAJO DE PARTO
8.92			1	100%	8.92	PRINCIPAL: DE RESIDUOS ORDINARIOS A CAJA 3G DE UCI UARO
4.05			1	100%	4.05	PASILLO DE UCI UARO A UCI NEO
4.02			1	100%	4.02	

OBSERVACIONES:

TOTAL	81.73	Metro lineal
ACUMULADO ANTERIOR	-	
PRESENTE ACTA	81.73	

Elaboro contratista:	Estefania Carvajal Henao	FIRMA:
Aprobó Interventoría:	Brenda Luz Hurtado	FIRMA:

PROYECTO	CONSTRUCCION PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA									
ITEM	INP 31	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE CORTE TIPO BOLA 4 TORNILLOS EN BRONCE D:4M 2"	CAP	10.00	ITEMS NO PREVISTOS	UNIDAD	UNIdad		UBICACIÓN	UNIVERSITARIO
Registro fotográfico					Dimensiones				Total (m)	Observaciones
					L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%	
							PISO 4			
					N/A	N/A	N/A	1	100%	1.00	CIRCULACIÓN DE HALL A HOSPITALIZACIÓN

OBSERVACIONES:

TOTAL	1.00	Unidad
ACUMULADO ANTERIOR	0.00	Unidad
PRESENTE ACTA	1.00	Unidad

Elaboró contratista:	Estefanía Carvajal Henao	FIRMA:
Aprobó Interventoría:	Brenda Luz Hurtado	FIRMA:

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA MISMA ESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL TUNJA HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA

ITEM	NP 35	CONDUCTOS EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 7 DIMENSIONES DE SECCIÓN CIRCULAR DE DIÁMETRO MAYOR A 1.20 M, INCLUYE LA MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, SOLDADURA DE PLATA, ANCLAJES, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, SOPORTERÍA Y CHAZOS, ACCESORIOS RECTOS, ABSOLUTAMENTE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	CAP	NIVEL	REMEDIO PRESUPUESTOS		UNIDAD	N.Segmento		UBICACIÓN	LA FICHA CATALOGADA	
					Dimensiones						
					L (m)	A (cm)(pulgadas)	h (cm)(pulgadas)	Cantidad	No de pestañas	Calibre	peso x m2 (kg)
					PISO 1						
					SISTEMA DE SUMINISTRO (1)						
					1.10	20	12	1	2	24	4.09
					1	22	12	1	2	24	4.09
					1.10	20	12	1	2	24	4.09
					1.23	20	12	1	2	24	4.09
					0.05	20	12	1	2	24	4.09
					1	22	12	1	2	24	4.09
					1.10	20	12	1	2	24	4.09
					0.05	20	12	1	2	24	4.09
					1	20	12	1	2	24	4.09
					1.23




2025 4:35:09 p. m.
51 Avenida Universitaria
Tunja
Boyacá
#CONSORCIO TERMINACIÓN UMI


#CONSORCIO TERMINACIÓN UMI




3 jul 2025 2:15:40 p.m.
53-160 Avenida Universitaria
Tunja
Boyacá
#CONSORCIO_TERMINACIÓN UMI









2025 4:35:09 p. m.
51 Avenida Universitaria
Tunja
Boyacá
#CONSORCIO TERMINACIÓN UMI


Boyacá
#CONSORCIO TERMINACIÓN UMI




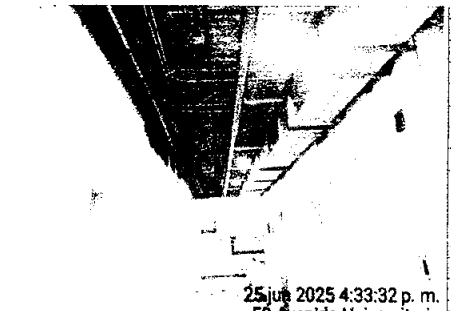



25 jun 2025 4:33:32 p. m.
50 Avenida Universitaria
Tunja
Boyacá
#CONSORCIO TERMINACIÓN UMI



3 jul 2025 2:15:51 p.m.
53-160 Avenida Universitaria
Tunja
Boyacá
#CONSORCIO TERMINACIÓN UMI

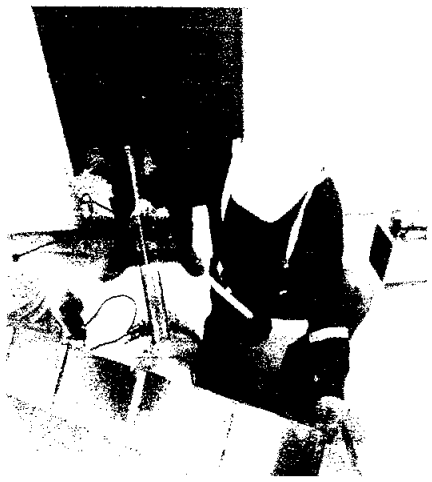

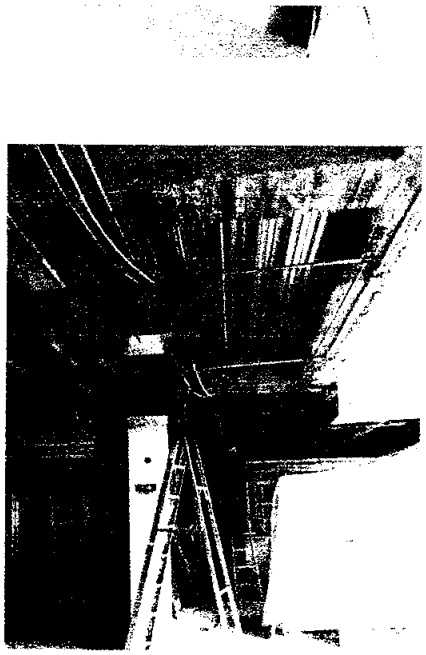


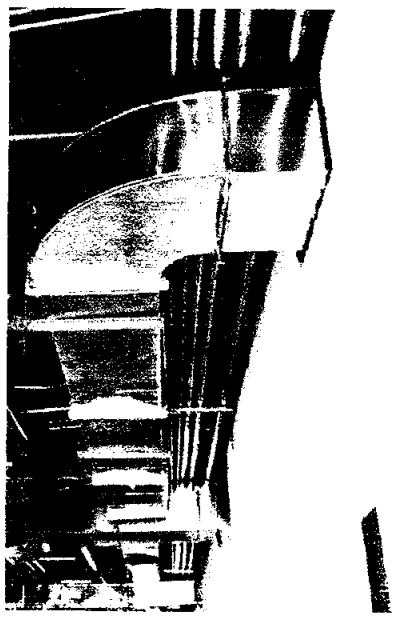







Tunja
Boyacá
#CLINIICA MARTERNO INFANTIL

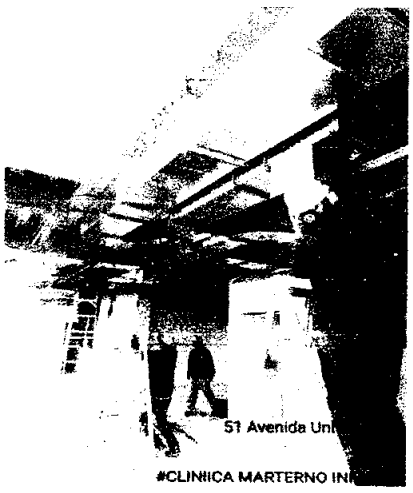
#CLINIICA MARTERNO IN





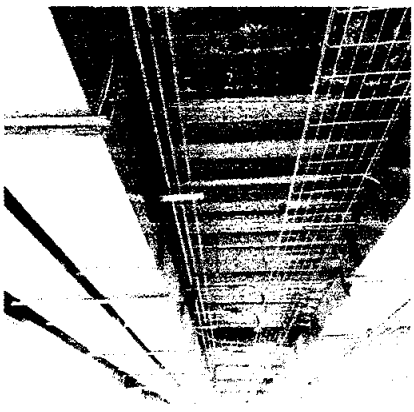


51 Avenida Universitaria
Tunja
Boyacá
#CLINIICA MARTERNO INFANTIL



53-51 Avenida Universitaria
Tunja
Boyacá
#CLINIICA MARTERNO INFANTIL







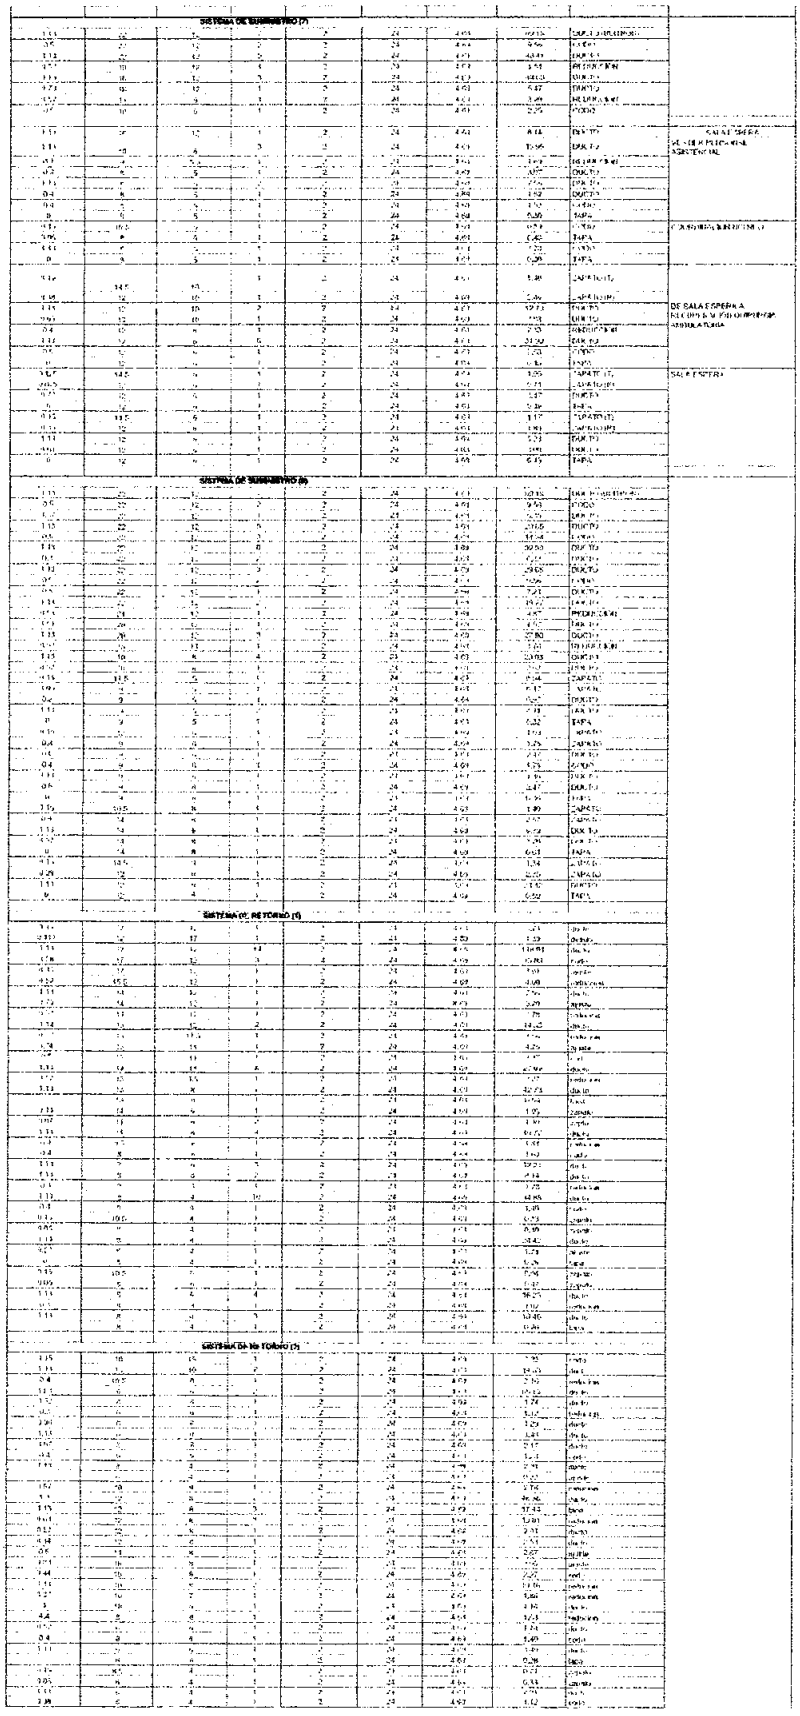




12 Jul 2025 4:36:03 p.m.
No 50-85 Avenida Universitaria
Tunja
Boyacá
#CONSORCIO TERMINACIÓN UMI

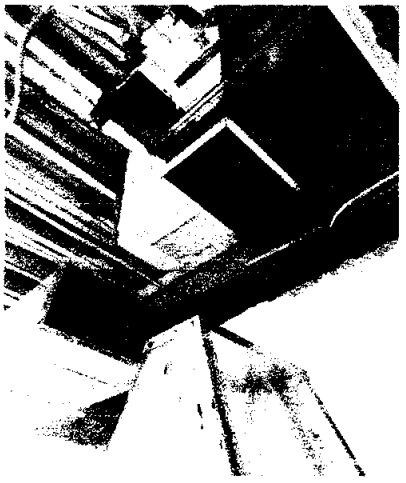


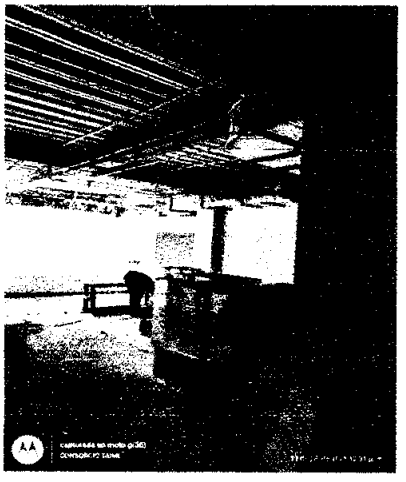


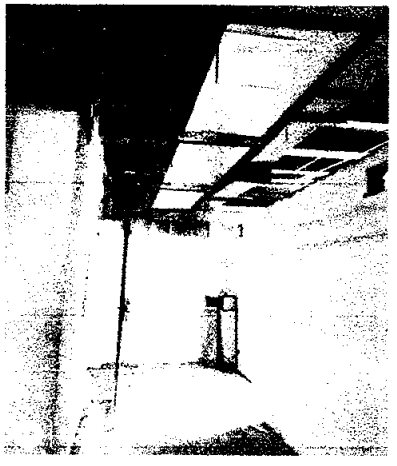



					PISO 3				
					SISTEMA DE SUMINISTRO (1)				
0.00	0	0	1	2	24	4.00	0.00	TAPA	
0.15	15	15	1	2	24	4.00	60.00	DUCTO	
0.0	0	0	1	2	24	4.00	0.00	TAPA	
0.4	15	15	1	2	24	4.00	60.00	REDUCCION	
0.7	4	4	1	2	24	4.00	16.00	CAP.(1)	
0.7	14	12	1	2	24	4.00	3.96	DUCTO	
0.11	12	12	2	2	24	8.00	25.13	CAP.(1)	
0.11	14	15	1	2	24	4.00	3.63	REDUCCION	
0.11	14	14	3	2	24	4.00	24.00	CAP.(1)	
0.11	15	14	1	2	24	4.00	3.08	RECODO(1)	
0.11	12	14	1	2	24	4.00	3.08	DUCTO	
0.12	10.5	12	1	2	24	3.00	2.02	REDUCCION	
0.12	2	2	1	2	24	4.00	0.48	CAP.(1)	
0.12	5	5	1	2	24	4.00	2.04	DUCTO	
0.12	1	1	1	2	24	4.00	0.20	CAP.(1)	
0	0	0	1	2	24	4.00	0.00	TAPA	
0.12	3.5	5	1	2	24	4.00	0.84	CAP.(1)	
0.12	5	5	1	2	24	4.00	2.04	CAP.(1)	
0	0	0	1	2	24	4.00	0.00	TAPA	
0.12	14.5	15	1	2	24	4.00	3.05	CAP.(1)	CAMBIO DE PENDIENTE
0.12	12	15	1	2	24	4.00	3.05	CAP.(1)	
0.12	12	12	1	2	24	4.00	2.47	DUCTO	
0	0	0	1	2	24	4.00	0.00	TAPA	
0.13	14	14	1	2	24	4.00	3.39	DUCTO	SUBE PRINCIPAL EN CAMBIO DE PENDIENTE A
					SISTEMA DE SUMINISTRO (2)				
0.13	16	16	1	2	24	4.00	4.21	DUCTO	
0.13	16	15	1	2	24	4.00	4.21	REDUCCION	
0.12	16	15	2	2	24	8.00	16.21	DUCTO	
0.0	0	0	1	2	24	4.00	0.00	TAPA	
0.0	15	15	1	2	24	4.00	0.00	REDUCCION	
0.0	8	8	1	2	24	4.00	0.00	DUCTO	
0.0	8	8	1	2	24	4.00	0.00	REDUCCION	
0.0	5	5	1	2	24	4.00	0.00	DUCTO	
0.13	14	10	1	2	24	4.00	8.00	REDUCCION	
0.0	12	10	1	2	24	4.00	0.00	DUCTO	
0.0	10	10	1	2	24	4.00	0.00	REDUCCION	
0.0	8	8	1	2	24	4.00	0.00	DUCTO	
0.0	6	6	1	2	24	4.00	0.00	REDUCCION	
0.0	5	5	1	2	24	4.00	0.00	DUCTO	
0.0	0	0	1	2	24	4.00	0.00	TAPA	
					SISTEMA DE SUMINISTRO (3)				
0.13	12	14	1	2	24	4.00	4.79	DUCTO	SUBE PRINCIPAL EN CAMBIO DE PENDIENTE
0.13	16	14	1	2	24	4.00	4.79	CAP.(1)	
0.13	16	14	1	2	24	4.00	4.79	DUCTO	
0.13	12	14	1	2	24	4.00	4.79	CAP.(1)	CAMBIO DE PENDIENTE
0.13	5	5	1	2	24	4.00	2.04	CAP.(1)	
0	0	0	1	2	24	4.00	0.00	TAPA	
0.12	8	5	1	2	24	4.00	2.04	DUCTO	
0.12	1	1	1	2	24	4.00	0.20	CAP.(1)	
0.12	5	5	1	2	24	4.00	2.04	DUCTO	
0.12	1	1	1	2	24	4.00	0.20	CAP.(1)	
0.12	5	5	1	2	24	4.00	2.04	DUCTO	
0.12	1	1	1	2	24	4.00	0.20	CAP.(1)	
0.12	5	5	1	2	24	4.00	2.04	DUCTO	
0	0	0	1	2	24	4.00	0.00	TAPA	
					SISTEMA DE SUMINISTRO (4)				
0.13	12	14	1	2	24	4.00	4.79	DUCTO	
0.13	16	14	1	2	24	4.00	4.79	CAP.(1)	
0.13	16	14	1	2	24	4.00	4.79	DUCTO	
0.13	12	14	1	2	24	4.00	4.79	CAP.(1)	CAMBIO DE PENDIENTE
0.13	5	5	1	2	24	4.00	2.04	CAP.(1)	
0	0	0	1	2	24	4.00	0.00	TAPA	
0.12	8	5	1	2	24	4.00	2.04	DUCTO	
0.12	1	1	1	2	24	4.00	0.20	CAP.(1)	
0.12	5	5	1	2	24	4.00	2.04	DUCTO	
0.12	1	1	1	2	24	4.00	0.20	CAP.(1)	
0.12	5	5	1	2	24	4.00	2.04	DUCTO	
0	0	0	1	2	24	4.00	0.00	TAPA	
					SISTEMA DE SUMINISTRO (5)				
0.13	16	16	3	2	24	4.00	24.42	DUCTO	
0.13	16	15.5	1	2	24	4.00	4.73	REDUCCION	
0.06	5	5	1	2	24	4.00	2.02	DUCTO	
0.11	12	12	1	2	24	4.00	12.11	DUCTO	
0.12	12	7.5	1	2	24	4.00	4.03	REDUCCION	
0.13	12	12	1	2	24	4.00	12.11	DUCTO	
0	0	0	1	2	24	4.00	0.00	TAPA	
0.13	14.5	14	1	2	24	4.00	3.96	CAP.(1)	ENTRA A PENDIENTE
0.13	12	14	1	2	24	4.00	3.96	CAP.(1)	
0.11	12	12	1	2	24	4.00	10.09	DUCTO	
0.11	12	12	1	2	24	4.00	10.09	REDUCCION	
0.11	12	12	1	2	24	4.00	10.09	DUCTO	
0	0	0	1	2	24	4.00	0.00	TAPA	
0.12	14.5	14	1	2	24	4.00	3.96	CAP.(1)	ENTRA A PENDIENTE
0.12	12	14	1	2	24	4.00	3.96	CAP.(1)	
0.12	12	12	1	2	24	4.00	2.47	DUCTO	
0.12	5	5	1	2	24	4.00	2.04	CAP.(1)	
0.12	1	1	1	2	24	4.00	0.20	CAP.(1)	
0.12	5	5	1	2	24	4.00	2.04	DUCTO	
0	0	0	1	2	24	4.00	0.00	TAPA	
0.13	14	14	1	2	24	4.00	3.39	CAP.(1)	ENTRA A PENDIENTE
0.13	12	14	1	2	24	4.00	3.39	CAP.(1)	
0.13	12	12	1	2	24	4.00	2.42	DUCTO	
0.13	12	12	1	2	24	4.00	2.42	REDUCCION	
0.13	12	12	1	2	24	4.00	2.42	DUCTO	
0	0	0	1	2	24	4.00	0.00	TAPA	
0.13	14	14	1	2	24	4.00	3.39	CAP.(1)	ENTRA A PENDIENTE
0.13	12	14	1	2	24	4.00	3.39	CAP.(1)	
0.13	12	12	1	2	24	4.00	2.42	DUCTO	
0.13	10.5	12	1	2	24	4.00	1.91	REDUCCION	
0.13	12	12	1	2	24	4.00	2.42	DUCTO	
0	0	0	1	2	24	4.00	0.00	TAPA	
0.13	14	14	1	2	24	4.00	3.39	CAP.(1)	ENTRA A PENDIENTE
0.13	12	14	1	2	24	4.00	3.39	CAP.(1)	
0.13	12	12	1	2	24	4.00	2.42	DUCTO	
0.13	10.5	12	1	2	24	4.00	1.91	CAP.(1)	
0.13	5	5	1	2	24	4.00	0.93	CAP.(1)	
0.06	5	5	1	2	24	4.00	0.93	CAP.(1)	
0	0	0	1	2	24	4.00	0.00	TAPA	
0.13	10.5	0	1	2	24	4.00	1.91	REDUCCION	ENTRA A PENDIENTE
0.13	12	12	1	2	24	4.00	2.42	CAP.(1)	
0.12	9	12	1	2	24	4.00	1.82	CAP.(1)	
0	0	0	1	2	24	4.00	0.00	TAPA	
					SISTEMA DE SUMINISTRO (6)				
0.13	12	0	2	2	24	4.00	19.83	DUCTO	PASILLO TECNICO
0.1	12	0	1	2	24	4.00	0.00	TAPA(1)	
0.1	12	5	1	2	24	4.00	2.04	REDUCCION	
0.11	12	5	1	2	24	4.00	12.11	DUCTO	
0.12	5	5	1	2	24	4.00	2.04	REDUCCION	
0.12	5	5	2	2	24	8.00	11.48	DUCTO	
0.1	4.5	5	1	2	24	4.00	0.97	REDUCCION	
0.11	5	4	1	2	24	4.00	1.93	DUCTO	
0	0	0	1	2	24	4.00	0.00	TAPA	
0.13	10.5	0	1	2	24	4.00	1.91	CAP.(1)	TRASLADO MEDIO AN
0.06	5	0	1	2	24	4.00	0.93	CAP.(1)	
0.13	5	0	1	2	24	4.00	0.93	DUCTO	
0	0	0	1	2	24	4.00	0.00	TAPA	

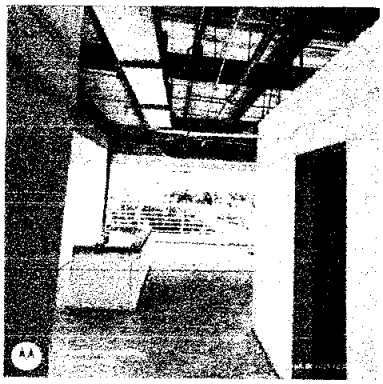

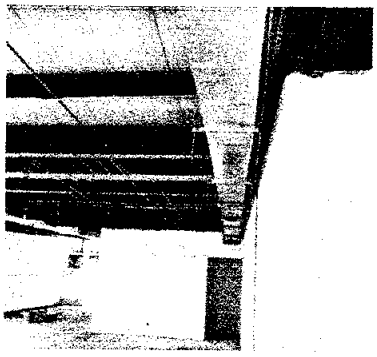

SISTEMA DE RETORNO (1)

1.11	21	4	10	2	24	4.69	12.30	DUCTO	
2.2	16	6	1	2	24	4.69	2.81	CODO	
2.11	21	8	1	2	32	4.69	4.69	DUCTO	
2.12	16	6.5	1	2	24	4.69	2.46	REDUCCION	
2.13	21	4	1	2	24	4.69	2.81	REDUCCION	ALIMENTACION A DIFUSOR
1.11	21	10	1	2	24	4.69	5.59	CODO	
1.12	21	10	1	2	24	4.69	5.63	DUCTO	
1.13	21	10	1	2	24	4.69	4.69	DUCTO	
1.14	21	8	2	2	24	4.69	10.96	DUCTO	ENTRADA A DIFUSOR DE RETORNO
2.1	10.5	4	1	1	24	4.69	0.74	CAPACITO	
1.09	8	4	1	2	24	4.69	0.94	ZAPATO (R)	
1.10	8	4	1	2	24	4.69	0.94	CODO	
0	8	4	1	2	24	4.69	0.94	TAPA	
1.15	21	4	1	2	24	4.69	2.81	REDUCCION	CAMBIO DE DIMENSION DUCTO
1.02	16	4	1	2	24	4.69	2.05	D	
0	16	4	1	2	24	4.69	2.05	D	
1.03	16	4	1	2	24	4.69	2.07	D	
1.08	8	4	1	2	24	4.69	1.40	D	
0	10	4	1	2	24	4.69	1.31	TAPA	
1.12	10.5	4	1	2	24	4.69	1.23	CAPACITO	
1.07	8	4	1	2	24	4.69	1.03	ZAPATO (R)	
1.14	8	4	1	2	24	4.69	1.03	CODO	
0	8	4	1	2	24	4.69	0.94	TAPA	
1.13	10.5	4	1	2	24	4.69	1.23	CAPACITO	CAMBIO DE DIMENSION DUCTO A REDUCCION
1.06	8	4	1	2	24	4.69	0.94	ZAPATO (R)	
1.02	8	4	1	2	24	4.69	1.03	CODO	
0	8	4	1	2	24	4.69	0.94	TAPA	
1.11	10.5	4	1	2	24	4.69	1.23	CAPACITO	CAMBIO DE DIMENSION DUCTO
1.09	8	4	1	2	24	4.69	0.89	ZAPATO (R)	
1.10	8	4	1	2	24	4.69	1.03	CODO	
0	8	4	1	2	24	4.69	0.94	TAPA	
1.16	10.5	4	1	2	24	4.69	1.23	CAPACITO	CAMBIO DE DIMENSION DUCTO A REDUCCION
1.05	8	4	1	2	24	4.69	0.89	ZAPATO (R)	
1.42	8	4	3	2	24	4.69	12.55	DUCTO	
1.54	8	4	1	2	24	4.69	1.84	CODO	
0	8	4	1	2	24	4.69	0.94	DUCTO	
1.45	10.5	4	1	2	24	4.69	0.94	TAPA	
1.55	8	4	2	2	24	4.69	1.23	ZAPATO (R)	
1.48	8	4	2	2	24	4.69	0.89	ZAPATO (R)	
0	8	4	2	2	24	4.69	1.03	DUCTO	
							0.94	TAPA	

SISTEMA DE RETORNO (2)

1.11	21	27	6	2	24	4.69	20.74	DUCTO	
2.11	16	10	4	2	24	4.69	7.03	CODO	
2.12	13.5	10	1	2	24	4.69	5.63	REDUCCION	
1.11	13	10	1	2	24	4.69	5.15	CODO	
0.7	10	10	1	2	24	4.69	4.69	DUCTO	
1.12	12.5	10	1	2	24	4.69	5.17	REDUCCION	
1.11	16	10	5	2	24	4.69	23.47	DUCTO	
0.2	12	10	1	2	24	4.69	4.84	CODO	
0.52	13	8	1	2	24	4.69	5.41	REDUCCION	
1.11	60	8	5	2	24	4.69	25.16	CODO	
0.7	10	8	1	2	24	4.69	3.76	DUCTO	
0.52	8	8	1	2	24	4.69	3.76	REDUCCION	
1.11	16	8	4	2	24	4.69	13.95	DUCTO	
0.52	10	8	1	2	24	4.69	4.84	CODO	
0.52	10.5	6	1	2	24	4.69	3.41	REDUCCION	
1.11	9	6	1	2	24	4.69	3.76	CODO	
0.5	9	6	1	2	24	4.69	3.53	DUCTO	
1.10	6.5	6	1	2	24	4.69	2.11	REDUCCION	
1.11	8	6	2	2	24	4.69	7.44	DUCTO	
0	8	4	1	2	24	4.69	0.94	TAPA	

OBSERVACIONES

TOTAL	8,924.57
ACUMULADO ANTERIOR	0.00
PRESENTE ACTA	8,924.57

Elaboró contratista	Estefanía Carvajal Henao	FIRMA	
Aprobó fiscal/supervisor	Revisó / Liq. Borrado	FIRMA	

DAVIVIENDA

CERTIFICACIÓN

Banco Davivienda S.A certifica que el **CONSORCIO TEMINACION UMI** con Nit **901.919.277-7** tiene con el Banco la siguiente cuenta de ahorros Persona Jurídica:

Cuenta de Ahorros	**0371 0009 3436**
Fecha de Apertura	**05/06/2025**

Se expide por solicitud del cliente a los 05 días del mes de Junio del año 2025 dirigida **A QUIEN INTERESE**

Cordialmente,

DAVIVIENDA
0371 - OFICINA SANTA TERESITA

FIRMA AUTORIZADA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Banco Davivienda S.A

Tunja, 12 de agosto de 2025

Señores,
E.S.E. Hospital Universitario San Rafael de
Tunja Carrera 11 No 27-27
Tunja, Departamento de Boyacá

Asunto: Certificación de pago de seguridad social y aportes legales.

Cordial saludo,

Yo, Estefanía Carvajal Henao, identificada con C.C. 1.037.630.191, en mi condición de Representante Legal, BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, certifico que el CONSORCIO TERMINACIÓN UMI, identificado con NIT. 901.919.277-7 se encuentra al día y a paz y salvo en el pago de Aportes a Seguridad Social y Parafiscales Vigentes de todos sus empleados, de conformidad con lo establecido por el artículo 50, de la Ley 789 de 202 y demás disposiciones sobre la materia (APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES). Correspondientes al periodo comprendido entre el 01 de julio y el 31 de julio de 2025.

La presente certificación se expide en Tunja a los 12 días del mes de agosto de 2025.

Atentamente,

ESTEFANÍA CARVAJAL HENAO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TERMINACIÓN UMI

Tunja, 12 de agosto de 2025

Señores,
E.S.E. Hospital Universitario San Rafael de
Tunja Carrera 11 No 27-27
Tunja, Departamento de Boyacá

Asunto: Certificación de pago de seguridad social y aportes legales.

Cordial saludo,

Yo, Elizabeth Jein Arias Soto, identificada con C.C. 44.008.013, y con Tarjeta Profesional No. 207538-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contador, BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, certifico que el CONSORCIO TERMINACIÓN UMI, identificado con NIT. 901.919.277-7 se encuentra al día y a paz y salvo en el pago de Aportes a Seguridad Social y Parafiscales Vigentes de todos sus empleados, de conformidad con lo establecido por el artículo 50, de la Ley 789 de 202 y demás disposiciones sobre la materia (APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES). Correspondientes al periodo comprendido entre el 01 de julio y el 31 de julio de 2025.

La presente certificación se expide en Tunja a los 12 días del mes de agosto de 2025.

Atentamente,

ELIZABETH JEIN ARIAS SOTO
CONTADORA
CONSORCIO TERMINACIÓN UMI

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

44.008.013
ARIAS SOTO

ELIZABETH JEIN

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO **16-ENE-1986**

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60	**B-**	**F**
ESTATURA	G.S RH	SEXO

28-ENE-2004 MEDELLIN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-3100100-00392145-F-0044008013-20120809 00307**44926**A 1



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

207538-T

ELIZABETH JEIN
ARIAS SOTO
C.C. 44008013
RESOLUCION INSCRIPCION 650 FECHA 30/09/2015
UNIVERSIDAD AUTONOMA LATINOAMERICANA

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 221265

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

Certificado No:

A 6 6 2 0 0 5 8 2 C 3 4 7 A B E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ELIZABETH JEIN ARIAS SOTO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 44008013 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 207538-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

JULIO 2025

INFORME DE SUPERVISION No.3 A LA INTERVENTORIA CONTRATO 352 2025	HOSPITAL UNIVERSITARIO San Rafael de Tunja

INFORME No:	4	FECHA:	14	de	AGOSTO	de	2025

PERIODO: DEL	1	de	JULIO	de	2025	AL	30	de	JULIO	de	2025

CONTRATO DE OBRA No:	345	DE	2025

OBJETO:

CONSTRUCCION PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

LOCALIZACIÓN:

AVENIDA UNIVERSITARIA No. 51-60 UNIDAD MATERNO INFANTIL MARIA JOSEFA CANELONES

INFORMACION DEL CONTRATO

ENTIDAD TERRITORIAL

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	
VICTOR MANUEL SANCHEZ VARGAS Teléfono: 3115228103 Dirección CARRERA 11 No. 27-27	

APORTES:ENTIDAD CONTRANTE

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA			TOTAL
$ 6.167.353.887,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.167.353.887,00

OBSERVACIÓN

ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

ETAPA DEL PROCESO	FECHA	OBSERVACIONES
Proceso No RE-CD- 352 - 2025	18 DE MARZO 2025	CRP-758
Estudios Previos	04 DE MARZO 2025	
Proyecto de pliego de condiciones	N/A	MODALIDAD DE CONTRATACION DIRECTA
Pliego de condiciones definitivos	N/A	MODALIDAD DE CONTRATACION DIRECTA
Acto de adjudicación	N/A	MODALIDAD DE CONTRATACION DIRECTA

INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA

ENTIDAD CONTRATANTE:	VALOR:
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA	$ 332.100.432,99

CONTRATO No:	352	DE	2025

OBJETO:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA , FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURIDICA, PARA LA TERMINACION DE LA REMODELACION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACA.

NOMBRE DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	REPRESENTANTE LEGAL:
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025 Teléfono: 3022948180 Dirección: calle 14 No. 30-247 CARTAGENA BOLV	BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO Teléfono: 3022948180 Dirección: calle 14 No. 30-247 CARTAGENA BOLV


INFORME DE SUPERVISION No.3 A LA INTERVENTORIA CONTRATO 352 2025	HOSPITAL UNIVERSITARIO San Rafael de Tunja

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CTO. INTERVENTORÍA		
	dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	21	3	2025
PLAZO INICIAL (MESES)		10	
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL	31	12	2025
ADICIONES EN PLAZO			
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	31	12	2025

AVANCE DE EJECUCION

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

% DE AVANCE CTO INTERV.	25,98%	% TIEMPO TRANSCURRIDO INTERV.	46,30%	% PAGOS AUTORIZADOS	13,95%



DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO Y PINTURA Durante el periodo, se presentó la ejecución de actividades que abarcan este capítulo, como lo es: revestimiento de estuco (m2), estuco en áreas con anchos menores a 0.6m (m), la construcción de filos (m), en zonas de habitaciones de hospitalización de 4 nivel, 2 y 1 nivel. En fachada, se avanza revestimiento con estuco (m2), construcción de filos y dilataciones (m) y estuco de anchos menores a 0.6m (m), en fachadas: Sur y Oriental.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPES: Dentro de la ejecución de obra, se registra la instalación sobre muros de zonas húmedas, como: unidades sanitarias, trabajos limpios, trabajos sucios, cuartos de aseo y filtros de zonas de 1 y 2 nivel. Donde, dentro de las actividades del capítulo se realiza ejecución de suministro e instalación de: enchape en muro (m2), enchape en muro con anchos menores a 0.6m (m) e instalación de win esquinero.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISOS BASES Y ACABADOS, En zonas de 1 nivel, como: Auditorio, Laboratorio, Farmacia, Observación Ginecobstetricia, Sala EDA, Sala ERA, Digitación, Ecografía, T.A.C., Sala de Espera y Circulaciones.

SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE DETECCION, en Tubería emt instalada, registrándose en zonas de 1 nivel de Laboratorio y pasillos de Imagenología.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GASES MEDICINALES, En 2do nivel, de: UCI adultos, Recuperaciones y Trabajos de parto, en 3 nivel, zonas de: hospitalización y ludoteca,

CONSTRUCCION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO, actividades del frente de trabajo de Tanque de reserva
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO, EXCAVACIÓN MANUAL DE MATERIAL Y LLEND CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO, DE ACUERDO A DISEÑOS Y ESPECIFICACIONES, actividades realizadas en Urbanismo.

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Suspensión, Reinicio, etc.)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
Acta de Inicio	21	3	2025	

INFORME DE SUPERVISION No.3 A LA INTERVENTORIA CONTRATO 352 2025

HOSPITAL UNIVERSITARIO San Rafael de Tunja

POLIZAS VIGENTES

CONTRATO DE INTERVENTORIA

No PÓLIZA	BCH-100042077	ANEXO No.	2	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL	FECHA APROB.	dd	mm	aa
							21	3	2025

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21	3	2025	3	7	2026	$ 33.210.018,50
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E IND.	21	3	2025	3	1	2029	$ 33.210.018,50
CALIDAD DEL SERVICIO	3	1	2026	3	1	2031	$ 66.420.037,00

No PÓLIZA	BCH-100008970	ANEXO No.	2	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL	FECHA APROB.	dd	mm	aa
							21	3	2025

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	21	3	2025	3	1	2026	$ 569.400.000,00

ADICIONALES Y PRORROGAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
1	ACTA DE INICIO 21-03-25 (Plazo inicial)		DIEZ (10) MESES
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 0,00	

SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	FECHA			VALOR
Anticipo				SIN ANTICIPO
ACTA 1	24	6	2025	$ 22.417.915,57
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS				**$ 22.417.915,57**

INFORME DE SUPERVISION No.3 A LA INTERVENTORIA CONTRATO 352 2025	HOSPITAL UNIVERSITARIO San Rafael de Tunja

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONTRATO DE INTERVENTORIA

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN
* Supervisar el cumplimiento de las actividades programadas en cada ficha de manejo ambiental	todo el proyecto
* Control de personal, aportes legales y seguridad social, contrato de obra	todo el proyecto
* Verificar que el proyecto cumpla con los permisos ambientales requeridos	todo el proyecto
* Verificar que el personal este siendo debidamente capacitado	todo el proyecto
* Verificar registros de maquinaria y equipo de obra	todo el proyecto
* Verificar que los elementos de atención a emergencias cumplan con los protocolos de seguridad	todo el proyecto
* Verificar que el personal reciba pausas activas	todo el proyecto

RELACIÓN DE COMITÉS REALIZADOS DE OBRA E INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
Comité de obra 10.	2	7	2025	* Se registra avance de obra tanto de acabados como redes. * se registra compromiso para definir camaras, parlanteo y puntos de tv el dia 3/07/2025 a las 9:00 am. Pendiente reunion para definir torres de vida
Comité de obra 11.	9	7	2025	* Se registra seguimiento y avance en la programacion de la obra.
Comité de obra 12.	16	7	2025	* Se registra seguimiento y avance en la programacion de la obra. * Se registra por parte del hospital falta de diseño del area RX. * se realiza recorrido de obra
Comité de obra 13.	30	7	2025	* Se registra seguimiento y avance en la programacion de la obra. * Solicitud de ajustar programacion de obra a fecha de 31 de diciembre 2025 * Avance del modificatorio. * Se realiza recorrido de obra donde se fijan dimensiones constructivas en cuanto a la altura de sala de parto y quirpfafo de 2.70 y 2.80 mts respectivamente y dejar polo tierra alterna en estos espacios.

RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS

DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Informe de Supervisión No. 1	21	3	2025	30	4	2025	
Informe de Supervisión No. 2	1	5	2025	31	5	2025	
Informe de Supervisión No. 3	1	6	2025	30	6	2025	
Informe de Supervisión No. 3	1	7	2025	30	7	2025	INFORME ACTUAL

INFORME DE SUPERVISION No.3 A LA INTERVENTORIA CONTRATO 352 2025	HOSPITAL UNIVERSITARIO San Rafael de Tunja

OBSERVACIONES:

INFORME DE SUPERVISION		
	VERIFICACIÓN	**FOLIOS**
Etapa precontractual		
Copia de certificación de apertura de cuenta para el manejo de los recursos	YA SE RADICO	
Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de las obras	YA SE RADICO	
Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de la interventoría para el contrato de obra	YA SE RADICO	
Copia del Acto administrativo ,mediante el cual se incorporarón los recursos	YA SE RADICO	
Copia del Contrato de obra e interventoría	YA SE RADICO	
Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de obra	YA SE RADICO	
Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de interventoría	YA SE RADICO	
Copia de acto administrativo mediante el cual se nombra supervisor al contrato de interventoría	YA SE RADICO	
SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Obra		
Informe de Interventoría:	SI	6 - 657
Acta de socialización del contrato de obra	N.A.	
Copia de Informes de Interventoría presentadas de acuerdo al manual de interventoría	SI	1 - 8
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de obra	SI	485 - 492
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Dir. De Contratación ó Municipio ó Entidad)	SI	119 - 140
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.)	YA SE RADICO	
El personal de obra cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo)	YA SE RADICO	
Bitácora de obra	SI	493 - 508
Seguimiento Financiero del Contrato de Obra		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo	N.A.	
Amortización del anticipo	N.A.	
Copia de actas de pago generadas en el periodo	N.A.	

INFORME DE SUPERVISION No.3 A LA INTERVENTORIA CONTRATO 352 2025	HOSPITAL UNIVERSITARIO San Rafael de Tunja	
Seguimiento Técnico del Contrato de Obra		
Constancia de entrega de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones	N.A.	
Actas Generadas (Visitas ,comités de obra, vecindad, socialización, etc.)	SI	181 - 198
Cronograma de ejecución de actividades "Actualizado"	SI	555 - 615
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	NO	
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	SI	509 - 541
Registro de uso correcto de los elementos de protección personal (entrega de dotaciones, planillas, fotos, etc.)	SI	222 - 292
Registro de cumplimiento de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental (Seguimiento de fichas ambientales)	SI	218 - 287
Generales		
Registro fotográfico	SI	199 - 217
Correspondencia enviada y recibida	SI	141 - 180
Registro de instalación Valla informativa	YA SE RADICO	
SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Interventoria		
Copia de Informes de Interventoría presentadas de acuerdo al manual de interventoría	SI	1 - 657
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de Interventoría	SI	189 - 192
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación ó Municipio ó Entidad)	SI	120 - 140
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.) contrato de Interventoría	N.A.	
El personal de interventoría cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales	YA SE RADICO	
Seguimiento Financiero del Contrato de Interventoría		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo contrato de Interventoría	N.A.	
Amortización del anticipo contrato de Interventoría	N.A.	
Copia de actas de pago generadas en el periodo	N.A.	
Seguimiento Técnico del Contrato de Interventoría		
Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas	SI	656
Certificación de recibo y aprobación de estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones	YA SE RADICO	
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	NO	
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría	SI	655
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	SI	657
Generales		
Registro fotográfico	SI	199 - 217
Correspondencia enviada y recibida	SI	141 - 180

* Se refiere a requisitos mínimos del informe de interventoria al cual se le pueden incluir todos los demás documentos que el interventor considere necesarios.

Verificación: Indica si se entregan documentos soporte (Completar con SI, NO, N.A., YA SE RADICO) Folios No.: Indica en que folio del informe se encuentran los soportes indicados

FIRMA: [redacted]

SubGerente HUSRT

NOMBRE: VICTOR MANUEL SANCHEZ VARGAS

ELABORO/REVISO ARQ. [redacted] BERMUDEZ/PROF. APOYO A LA SUPERVISION

CERTIFICADO DE ADHERENCIA ISO 14001 DE 2015
SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
MES DE JULIO 2025

El presente informe se genera luego de realizar revisión documental, operacional y verificación de la certificación del contratista CONSORCIO TERMINACIÓN UMI de los requisitos contractuales solicitados, socializados y pactados en el contrato 345 de 2025, cuyo objeto contractual es la "CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA".

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL- CUMPLIMIENTO ISO 14001 DE 2015				
REQUISITO		**CUMPLIMIENTO**		**SEGUIMIENTO JULIO DE 2025**
		CUMPLE	**NO CUMPLE**	
FUENTES DE MATERIALES E INSUMOS				
1	Licencias ambientales de las canteras de la materia prima (Arena, Grava, etc.).	1		LICENCIA AMBIENTAL LUIS HERNANDO ACERO CUERVO: FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2007. LICENCIA MINERA DE JESUS MARIA REYES MOZO OOLA00023-21- EN PROCESO. LA ANTERIOR INFORMACIÓN ES AVALADA POR LA INTERVENTORIA EN SU INFORME MENSUAL. **Vigente para el mes de julio del 2025.**
2	Almacenamiento del material de forma adecuada conforme a las características técnicas que debe tener el acopio de cada material (Fotografías)	**1**		SE ADJUNTAN EVIDENCIAS DE ACOPIO ADECUADAS – SE CORROBORAN POR MEDIO DE INSPECCION EN SITIO. **Vigente para el mes de julio del 2025.**
3	Títulos Mineros de las canteras de material.	1		TITULO MINERO DE AGREGADOS EL VERGEL CUYO REPRESENTANTE LEGAL JESUS MARIA REYES MOZO CODIGO DEL EXPEDIENTE ARE-TIR-15241 EN CONCESION A NELSON ARCOS PACACIRA. **Vigente para el mes de julio del 2025.**

4	Órdenes de compra o facturas de compra que acrediten el vínculo comercial con esas canteras.	1		ORDEN DE COMPRA AGREGADOS EL VERGEL. ORDEN DE COMPRA FERRECONSTRUCCIONES JL. S.A.S ORDEN DE COMPRA ARGOS. **Vigente para el mes de julio del 2025.**
5	Demarcar las áreas con el nombre de material de acopio (Fotografías)	**1**		SE ADJUNTAN EVIDENCIAS DE ACOPIO ADECUADAS – SE CORROBORAN POR MEDIO DE INSPECCION EN SITIO. **Vigente para el mes de julio del 2025.**
	Garantizar que el sitio de acopio cumpla con las condiciones de temperatura y humedad para garantizar la calidad de los materiales.	**1**		SE ADJUNTAN EVIDENCIAS DE ACOPIO ADECUADAS – SE CORROBORAN POR MEDIO DE INSPECCION EN SITIO. **Vigente para el mes de julio del 2025.**
IMPACTOS AMBIENTALES Y CONTROLES DE MANEJO				
1	Matriz de aspectos e impactos ambientales, metodología CONESA. **Única vez al inicio del contrato.**	1		Se carga matriz de aspectos e impactos ambientales dentro del PAGA. **Vigente para el mes de julio del 2025.**
2	Plan de Manejo Ambiental con cronograma de actividades definido al tiempo de duración de la obra, en este se deben contemplar todos los recursos de la matriz de aspectos e impactos y plantear las actividades que se ejecutaran para minimizar los impactos. **Mensualmente deberán ser reportadas las actividades y resultado de indicadores de las Fichas de Manejo Ambiental**	1		EVIDENCIAS DEL PAGA COMPLETAS – CARGADAS EN EL DRIVE DE INFORMACIÓN. **Vigente para el mes de julio del 2025.**
3	Plan de Manejo de los residuos en donde se clasifiquen e identifiquen los tipos de residuos generados por la obra y la correcta forma de disponerlos	1		CONTRATO DE RESIDUOS PELIGROSOS Y RESPECTIVA CERTIFICACION POR EL AREA DE INTERVENTORIA. **Vigente para el mes de julio del 2025.**

	ETIQUETAR LAS CANECAS, LOS CONTENEDORES Y LOS DIFERENTES ESPACIOS CONFORME A LOS RESIDUOS QUE SE PUEDEN DEPOSITAR EN ESTOS ESPACIOS. **Única vez al inicio del contrato.**	1		PUNTO ECOLOGICO EN BUEN ESTADO. **Vigente para el mes de julio del 2025.**
ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN CORRECTA DE ESCOMBROS				
1	Presentar ante la corporación autónoma regional de Boyacá el Plan de Manejo y solicitar apertura de expediente como gran generador de Residuos de Construcción y Demolición, realizar luego del inicio del trámite todos los informes normativos que exija la corporación para cumplir con el Plan de Manejo de este tipo de residuos. Cargar en el drive el Plan presentado, el radicado, y posteriormente el radicado de respuesta. **Única vez al inicio del contrato.**	1		Plan de RCD radicados a Corpoboyacá. **Vigente para el mes de julio del 2025.**
2	Presentación de informes mensuales con información referente a Manejo de Residuos, Orden y Limpieza	1		Respuesta oportuna de informe de hallazgos de la inspección realizada el 27 de junio del 2025. Desde el Sistema de Gestión Ambiental vamos a revisar la normativa vigente para generadores de RCDs y dependiendo de la investigación se definirá si son grandes o pequeños generadores. De ser grandes generadores, se realizará el acompañamiento oportuno para presentarse ante la autoridad ambiental competente. **Vigente para el mes de julio del 2025.**
	INCLUIR EN EL INFORME FOTOGRAFIAS DEL CORRECTO ALMACENAMIENTO DE LOS ESCOMBROS	1		
3	Reportar semanalmente al área de gestión ambiental la salida de escombros que incluya el siguiente cuadro y cargar en el drive el archivo Excel que contenga el cuadro y las respectivas actas de disposición	1		Certificaciones de disposición final de los escombros. **Vigente para el mes de julio del 2025.**

	final.			
SUSTANCIAS QUIMICAS				
1	Fichas de seguridad de sustancias químicas empleadas	1		Se reciben 51 fichas de seguridad- Evidencia correos de notificación. **Vigente para el mes de julio del 2025.**
VEHICULOS DE OBRA				
1	Relación de vehículos y respectiva revisión tecno mecánica de los mismos	1		Se recibe información y revisiones tecno mecánicas vigentes de los vehículos. **Vigente para el mes de julio del 2025.**
CANINOS DE LA INSTITUCIÓN				
1	Documentos de vacunación y carta de responsabilidad de tenencia canina en caso de ser responsables de algún canino	1		SE ENTREGAN CARNETS DE VACUNACION DE RAFAEL-RAFAELA Y PILOTICO. **Vigente para el mes de julio del 2025.**
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		14	0	100%

LA ANTERIOR INFORMACIÓN ES AVALADA Y CERTIFICADA POR LA INTERVENTORIA DEL PROYECTO EN EL INFORME PRESENTADO PARA EL MES DE JULIO.

En conclusión, se puede observar que para el mes de **JULIO DE 2025** el contratista presenta adherencia de 100% al sistema de gestión ambiental.

Atentamente,

Laura Natalia Espinosa G

LAURA NATALIA ESPINOSA GRIMALDOS
Líder Sistema de Gestión Ambiental
E.S.E Hospital Universitario San Rafael de Tunja

Valeria Herrera T.

VALERIA HERRERA TINJACA
Sistema de Gestión Ambiental
E.S.E Hospital Universitario San Rafael de Tunja

CERTIFICADO DE ADHERENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO MES DE JULIO 2025

El presente informe se genera luego de realizar revisión documental, operacional de la empresa CONSORCIO TERMINACION UMI, de los requisitos contractuales solicitados, socializados y pactados en el contrato 345 de 2025, cuyo objeto contractual es "CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA".

	ITEM A EVALUAR	C	N.C	NA
1	El consorcio terminación UMI presentar ATS Analís de trabajo seguro hasta la fecha de entrega de la información.	1		
2	El consorcio terminación UMI certificación de equipos de trabajo en alturas con fecha.	1		
3	El consorcio terminación UMI cuenta Inspecciones de arnés, eslinga, línea de vida	1		
4	El consorcio terminación UMI cuanta con registro de entrega de elementos de protección personal, estos son ergonómicos de acuerdo al peligro y/o factor de riesgo existente en su actividad, verificando que cumplan con la normatividad legal vigente y se realiza control.	1		
5	El consorcio terminación UMI Cuenta con registro de accidentes e incidentes presentar indicadores	1		
6	El consorcio terminación UMI cuenta con plan de seguridad vial (Programas de gestión de riesgos críticos y factores de desempeño, Plan anual de trabajo, Vías seguras administradas por la organización, Inspección de vehículos y equipos, Mantenimiento y control de vehículos seguros y equipos, Plan de capacitación de conductores,	1		
7	El consorcio terminación UMI cuenta inspección a herramientas	1		
8	El consorcio terminación UMI cuenta con Inspección de elementos de protección personal	1		
9	Inspección de maquinaria y equipos	1		
10	El consorcio terminación UMI Verifica el uso de elementos de protección personal	1		
11	El consorcio terminación UMI cuenta con Lista de asistencia de El consorcio	1		

	terminación UMI realiza capacitaciones, reinducción			
12	El consorcio terminación UMI cuenta con vacuna de tétano para sus trabajadores	1		
13	El consorcio terminación UMI Verifica la señalización del control de acceso en especial los que tienen que ver con cliente externo y la seguridad de personal ajeno a obra) esta es clara, pertinente, suficiente	1		
	TOTAL	100%		

Por lo anterior se certifica CUMPLIMIENTO DE 100% con los criterios evaluados para el mes de julio 2025

Elaboro JOSÉ RICARDO CASTRO
Profesional de apoyo SGSST
E.S.E. Hospital Universitario San Rafael de Tunja

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-08-13, 11:11:54 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 79452307

Periodo Cotización: julio de 2025 **Periodo Servicio:** agosto de 2025

PAGADO 13/08/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO TERMINACION UMI		
Documento	NI901919277	**Dirección**	AV 51 #51 - 60 AVENIDA UNIVERSITARIA
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	2621938
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	TUNJA	**Departamento**	BOYACA
Representante Legal	CARVAJAL HENAO ESTEFANIA	**Identificación**	CC 1037630191
Total Afiliados	49	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días ARP	Días EPS	Días PEN	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1002329251	SERGIO ANDRES URIAN BAUTISTA	01	00																	0	30	30	30	30		(230301) PORVENIR	$ 1,423,900	$ 227,800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1,423,900	$ 57,000	8,960	$ 1,423,500	$ 89,100	(CCF10) COMFABOY	$ 1,423,500	$ 57,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440,900
CC 1002364890	DEYVIT STEVEN ACERO MENDOZA	01	00																	0	30	30	30	30		(230201) PROTECCION	$ 2,000,000	$ 320,000	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 2,000,000	$ 80,000	6,960	$ 2,000,000	$ 139,200	(CCF10) COMFABOY	$ 2,000,000	$ 80,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 619,200
CC 1002395483	DEYNER STIVEN PIRACOCA ESPINOSA	01	00	X																0	6	6	0	6		(230301) PORVENIR	$ 284,700	$ 45,600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 284,700	$ 11,400	8,960	$ 284,700	$ 19,900	(CCF10) COMFABOY	$ 284,700	$ 11,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 88,300
CC 1010084992	CARLOS ARTURO LOPEZ PINZON	01	00											X						0	10	10	10	10		(230301) PORVENIR	$ 474,900	$ 76,000	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 474,500	$ 0	0,000	$ 474,500	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 474,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76,000
CC 1010084992	CARLOS ARTURO LOPEZ PINZON	01	00		X															0	20	20	20	20		(230301) PORVENIR	$ 949,000	$ 151,900	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 949,806	$ 38,000	6,960	$ 949,000	$ 66,100	(CCF10) COMFABOY	$ 949,000	$ 38,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 294,000
CC 1016033129	EMILIO JOSE SILVAPACHECO	01	00	X																0	6	6	6	6		(230301) PORVENIR	$ 356,900	$ 57,000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 356,000	$ 14,300	6,960	$ 356,000	$ 24,800	(CCF10) COMFABOY	$ 356,000	$ 14,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 110,400
CC 1026160645	DAVID LEANDRO GIL ACEVEDO	01	00																	0	30	30	30	30		(230201) PROTECCION	$ 2,400,000	$ 384,000	(EPS010) EPS SURA	$ 2,400,800	$ 96,000	6,960	$ 2,400,800	$ 167,100	(CCF04) COMFAMA	$ 2,400,000	$ 96,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 743,100
CC 1029520476	ANDERSON GIOVANY LOPEZ RODRIGUEZ	01	00	X																0	6	6	6	6		(230301) PORVENIR	$ 284,700	$ 45,900	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 284,700	$ 11,400	6,960	$ 284,700	$ 19,800	(CCF10) COMFABOY	$ 284,700	$ 11,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 88,300
CC 1029520797	JUAN FELIPE NOVA FONSECA	61	00	X																0	17	17	17	17		(25-14) COLPENSIONES	$ 806,650	$ 129,100	(EPS005) EPS SANITAS	$ 806,650	$ 32,300	6,960	$ 806,650	$ 56,200	(CCF10) COMFABOY	$ 806,650	$ 32,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 249,900
CC 1032255551	WILLIAM MIGUEL SANCHEZ TORIBIO	01	00	X																0	3	3	3	3		(230201) PROTECCION	$ 220,000	$ 35,200	(EPS010) EPS SURA	$ 220,000	$ 8,800	6,960	$ 220,000	$ 15,400	(CCF10) COMFABOY	$ 220,000	$ 8,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 68,200
CC 1037630101	ESTEFANIA CARVAJAL HENAO	01	00																	0	30	30	30	30		(230201) PROTECCION	$ 4,000,000	$ 640,000	(EPS010) EPS SURA	$ 4,000,000	$ 160,000	6,960	$ 4,000,800	$ 278,400	(CCF04) COMFAMA	$ 4,000,000	$ 160,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,238,400
CC 1048015312	WILMAR ALEXANDER JIMENEZ RIVERA	01	00																	0	30	30	30	30		(25-14) COLPENSIONES	$ 1,700,000	$ 272,000	(EPS010) EPS SURA	$ 1,700,000	$ 68,000	6,960	$ 1,700,000	$ 118,400	(CCF04) COMFAMA	$ 1,700,000	$ 68,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 526,400
CC 1049612358	OSCAR MAURICIO RATIVA SUAREZ	01	00																	0	30	30	30	30		(230301) PORVENIR	$ 1,920,000	$ 307,200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1,920,000	$ 76,800	6,960	$ 1,920,800	$ 133,700	(CCF10) COMFABOY	$ 1,920,800	$ 76,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 594,500
CC 1048019098	YEISSON ALEXANDER RATIVA SUAREZ	61	00																	0	30	30	30	30		(230301) PORVENIR	$ 1,920,000	$ 307,200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1,920,000	$ 76,800	6,960	$ 1,920,000	$ 133,700	(CCF10) COMFABOY	$ 1,920,000	$ 76,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 594,500
CC 1049637057	FABIO ANDRES HURTADO VARGAS	01	00																	0	30	30	30	30		(230201) PROTECCION	$ 1,700,000	$ 272,000	(EPS010) EPS SURA	$ 1,700,806	$ 68,000	6,960	$ 1,700,000	$ 110,400	(CCF10) COMFABOY	$ 1,700,000	$ 68,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 526,400
CC 1049638614	JONATAN SNEIDER DIAZ AREVALO	01	00														L			0	1	1	1	1		(231001) COLFONDOS	$ 47,450	$ 7,600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 47,450	$ 1,900	6,960	$ 47,450	$ 1,900	(CCF10) COMFABOY	$ 47,450	$ 1,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11,400
CC 1049638614	JONATAN SNEIDER DIAZ AREVALO	01	00											X						0	1	1	1	1		(231001) COLFONDOS	$ 47,450	$ 7,600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 47,450	$ 0	0,960	$ 47,450	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 47,450	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7,600
CC 1049638614	JONATAN SNEIDER DIAZ AREVALO	01	00												X					0	6	6	6	6		(231001) COLFONDOS	$ 284,700	$ 45,900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 284,700	$ 11,400	0,000	$ 284,700	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 284,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57,000
CC 1049638614	JONATAN SNEIDER DIAZ AREVALO	01	00																	0	22	22	22	22		(231001) COLFONDOS	$ 1,043,900	$ 167,100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1,043,900	$ 41,800	6,960	$ 1,043,800	$ 72,700	(CCF10) COMFABOY	$ 1,043,900	$ 41,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 323,400

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Pagado: 13/08/2025 | Empresa NI901919277 CONSORCIO TERMINACION UMI | Planilla Nro: 79452307 | Periodo Cotización: julio de 2025 | Periodo Servicio: agosto de 2025

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IND	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1049640553	JOHAO ALEXANDER RUIZ PEÑA	D1	80											X					0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 116.667	$ 19.000	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 116.667	$ 4.900	0,000	$ 116.667	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 116.667	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6	$ 6	$ 23.600
CC 1049640553	JOHAO ALEXANDER RUIZ PEÑA	D1	00																0	28	28	28	28	(230301) PORVENIR	$ 1.661.334	$ 265.900	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.661.334	$ 66.500	6,960	$ 1.661.334	$ 115.700	(CCF10) COMFABOY	$ 1.661.334	$ 66.500	$ 0	$ 0	$ 6	$ 6	$ 514.600
CC 1049642651	MARCO ANTONIO MOLINA LOPEZ	61	00																6	30	30	30	36	(230301) PORVENIR	$ 1.780.000	$ 284.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.780.900	$ 71.200	6,960	$ 1.780.900	$ 123.900	(CCF16) COMFABDY	$ 1.780.000	$ 71.200	$ 0	$ 0	$ 6	$ 6	$ 551.100
CC 1049649890	HEYNER ARLEY DIAZ LOPEZ	D1	80																6	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.180	(CCF10) COMFABOY	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ D	$ 440.900
CC 1049651882	HARRINSON RIVERA MARTINEZ	D1	00	X															0	16	10	10	16	(238301) PORVENIR	$ 593.334	$ 95.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 593.334	$ 23.800	6,968	$ 593.334	$ 41.300	(CCF10) COMFABOY	$ 593.334	$ 23.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 183.900
CC 1049655819	ANDRES FELIPE LOPEZ PINZON	01	00																0	30	38	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.900	(EPS841) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 6	$ 6	$ 446.900
CC 1049662404	RICARDO DANIEL LOPEZ CASTELLANO	91	80																0	30	30	30	36	(238201) PROTECCIDN	$ 1.780.000	$ 284.000	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.766.800	$ 71.200	6,960	$ 1.780.000	$ 123.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.780.000	$ 71.200	$ 0	$ 0	$ 6	$ 6	$ 551.100
CC 1050090863	LUIS MIGUEL FORERO YANQUEN	01	80	X															0	6	6	6	6	(25-14) COLPENSIONES	$ 284.700	$ 45.500	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 284.700	$ 11.400	6,960	$ 284.700	$ 19.900	(CCF16) COMFABOY	$ 284.700	$ 11.400	$ 0	$ 0	$ 6	$ 0	$ 88.300
CC 1050091640	NICOLAS ALEJANDRO ALVARADO SANCHEZ	61	80	X															0	6	6	8	6	(25-14) COLPENSIONES	$ 284.700	$ 45.000	(EPS841) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 284.700	$ 11.400	6,960	$ 284.700	$ 19.900	(CCF10) COMFABOY	$ 284.700	$ 11.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6	$ 88.300
CC 1050096499	CRISTIAN JULIAN FAGUA BULLA	91	00											X					0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 47.450	$ 7.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 47.450	$ 0	9,000	$ 47.450	$ 6	(CCF16) COMFABOY	$ 47.450	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.600
CC 1050096498	CRISTIAN JULIAN FAGUA BULLA	01	80	X															6	20	20	20	26	(230301) PORVENIR	$ 949.000	$ 151.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 949.000	$ 38.000	6,960	$ 949.000	$ 66.100	(CCF10) COMFABOY	$ 949.000	$ 38.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ D	$ 294.900
CC 1056074885	WILMER CAMILO BARON PEÑA	01	80	X															0	9	9	9	9	(231001) COLFONDOS	$ 534.000	$ 85.500	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 534.800	$ 21.400	6,960	$ 534.000	$ 37.200	(CCF16) COMFABOY	$ 534.000	$ 21.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 165.500
CC 1099926313	DIEGO MIGUEL PEDREROS LEMUS	61	80											X					0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 142.350	$ 22.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 142.350	$ 0	0,000	$ 142.350	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 142.350	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6	$ 6	$ 22.800
CC 1099926313	DIEGO MIGUEL PEDREROS LEMUS	D1	00																0	27	27	27	27	(230301) PORVENIR	$ 1.281.150	$ 205.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.281.150	$ 51.300	6,960	$ 1.281.150	$ 89.200	(CCF10) COMFABOY	$ 1.281.150	$ 51.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ D	$ 396.800
CC 1882479563	JAIR ROBERTO VILLARREAL RANGEL	D1	00																6	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.180	(CCF16) COMFABOY	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6	$ 440.900
CC 1095625763	YEISMAR ARLEY RODRIGUEZ GONZALEZ	01	00																9	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.180	(CCF16) COMFABOY	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ D	$ 440.900
CC 1096202957	CINDY JOHANNA SUAREZ SERRANO	91	00																6	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.400.800	$ 384.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.480.000	$ 96.000	6,960	$ 2.480.800	$ 167.100	(CCF10) COMFABOY	$ 2.400.000	$ 96.000	$ 0	$ 0	$ 6	$ 6	$ 743.100
CC 1096951681	JULIAN DAVID SALGUERO SOTO	91	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.900	$ 99.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 6	$ D	$ 440.900
CC 1106933336	MARCO FABIAN SANCHEZ SANCHEZ	D1	00	X															0	6	6	6	6	(238301) PORVENIR	$ 284.700	$ 45.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 284.700	$ 11.400	6,960	$ 284.700	$ 19.900	(CCF10) COMFABOY	$ 284.700	$ 11.400	$ 0	$ 0	$ 6	$ 6	$ 88.300
CC 1116992589	HAIVER ARNULFO CONTRERAS MENDOZA	D1	00	X															6	17	17	17	17	(230301) PORVENIR	$ 806.650	$ 129.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 806.650	$ 32.300	6,960	$ 806.650	$ 56.200	(CCF10) COMFABOY	$ 806.650	$ 32.300	$ 0	$ 0	$ 6	$ 6	$ 249.900
CC 1126429572	JUAN GABRIEL BERRIO VARGAS	91	80											X					0	3	3	3	3	(230201) PROTECCION	$ 176.000	$ 26.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 176.000	$ 7.200	0,000	$ 176.000	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 176.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6	$ 35.700
CC 1128429572	JUAN GABRIEL BERRIO VARGAS	01	00																0	27	27	27	27	(230201) PROTECCION	$ 1.602.800	$ 256.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.602.800	$ 64.100	6,960	$ 1.602.000	$ 111.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.602.000	$ 64.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6	$ 496.100
CC 4061382	VICENTE BURGOS MALDONADO	01	80																0	30	30	30	36	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.600	(CCFC55) EPS CAJACOPI	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.180	(CCF10) COMFABOY	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 6	$ 0	$ 440.900
CC 4252142	VICTOR SAMUEL MANRIQUE PINZON	01	00											X					6	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 47.450	$ 7.800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 47.450	$ 0	0,000	$ 47.450	$ 0	(CCF19) COMFABOY	$ 47.450	$ 0	$ 0	$ D	$ 0	$ 0	$ 7.800
CC 4252142	VICTOR SAMUEL MANRIQUE PINZON	01	80	X	X														6	20	20	20	20	(25-14) COLPENSIONES	$ 949.000	$ 151.900	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 949.000	$ 38.000	6,960	$ 949.000	$ 66.100	(CCF10) COMFABOY	$ 949.000	$ 38.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ D	$ 294.800
CC 4252509	MARIO ALIPIO CAMACHO BETANCOUR	01	00																8	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.429.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.600	$ 99.180	(CCF10) COMFABOY	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 43429459	MARGOTH ELENA MEDINA RIVERA	01	03																9	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ D	$ 6	(EPS010) EPS SURA	$ 1.900.000	$ 76.000	6,966	$ 1.900.000	$ 132.300	(CCF16) COMFABOY	$ 1.900.000	$ 76.000	$ 0	$ 0	$ 6	$ 6	$ 284.300
CC 52443156	DORIS LOBATON TORRES	01	00																0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.423.900	$ 227.900	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.423.500	$ 57.800	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.423.500	$ 57.800	$ D	$ 0	$ 0	$ 6	$ 440.800
CC 7126249	ERLIS ANTONIO RIVERA HUERFANO	D1	00																6	30	30	30	36	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.423.500	$ 57.900	6,960	$ 1.423.500	$ 99.180	(CCF19) COMFABOY	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 6	$ 6	$ 446.900
CC 7164173	WILLIAM RODRIGUEZ PINEDA	01	00																6	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6	$ 440.600
CC 7165076	EUGENIO SORA ARAQUE	61	80																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.780.000	$ 284.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.780.000	$ 71.200	6,960	$ 1.780.900	$ 123.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.780.800	$ 71.200	$ D	$ 0	$ 0	$ 6	$ 551.100
CC 71877387	JORGE ELIECER CORTES GONZALEZ	61	00																9	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.800.000	$ 288.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.800.000	$ 72.000	6,960	$ 1.800.000	$ 125.300	(CCF04) COMFAMA	$ 1.800.000	$ 72.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 557.300
CC 7181812	ROBERT MACIAS DURAN	61	80											X					9	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 59.334	$ 9.500	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 58.334	$ 2.400	6,800	$ 59.334	$ D	(CCF10) COMFABOY	$ 59.334	$ 6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.900
CC 7181912	ROBERT MACIAS DURAN	91	00											X					0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 237.334	$ 38.000	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 237.334	$ 9	9,000	$ 237.334	$ 0	(CCF19) COMFABOY	$ 237.334	$ 6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6	$ 38.000
CC 7181812	ROBERT MACIAS DURAN	91	00																8	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.483.334	$ 237.400	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.483.334	$ 59.400	6,960	$ 1.483.334	$ 193.300	(CCF10) COMFABOY	$ 1.483.334	$ 59.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6	$ 459.500
CC 72249570	CARLOS AUGUSTO BERRIO CANO	01	00													L			6	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 237.334	$ 38.000	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	$ 237.334	$ 9.500	0,000	$ 237.334	$ D	(CCF10) COMFABOY	$ 237.334	$ 9.500	$ 0	$ 0	$ 6	$ 0	$ 57.900
CC 72249576	CARLOS AUGUSTO BERRIO CANO	61	00											X					6	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 296.667	$ 47.500	(ESSC07) ASOCIACIDN MUTUAL SER	$ 296.667	$ 0	0,000	$ 296.667	$ 9	(CCF18) COMFABOY	$ 296.667	$ 6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6	$ 47.500
CC 72249576	CARLOS AUGUSTO BERRIO CANO	61	00												X				8	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 116.667	$ 19.000	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	$ 116.667	$ 4.800	0,800	$ 116.667	$ 0	(CCF18) COMFABOY	$ 116.667	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.800

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Pagado: 13/08/2025 | Empresa NI901919277 CONSORCIO TERMINACION UMI | Planilla Nro: 79452307 | Periodo Cotización: julio de 2025 | Periodo Servicio: agosto de 2025

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 72249576	CARLOS AUGUSTO BERRIO CANO	01	00																	0	19	19	19	19	(230301) PORVENIR	$ 1.127.334	$ 180.400	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	$ 1.127.334	$ 45.100	6,960	$ 1.127.334	$ 78.500	(CCF10) COMFABOY	$ 1.127.334	$ 45.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 349.100
CC 7979127S	GERMAN ALONSO GUTIERREZ BONILLA	01	00																	8	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 79824451	JOSE CARLOS JULIO LOPEZ BERNAL	81	00																	8	30	30	30	30	(238301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF18) COMFABOY	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 86049770	EIDER GUSTAVO REINA SIEMPIRA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.780.000	$ 284.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.780.900	$ 71.200	6,960	$ 1.780.000	$ 123.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.700.900	$ 71.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 551.100
CC 98503499	NORBER RAMIRO CORTES GONZALEZ	81	00																	8	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	6,968	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 98564715	OSCAR DUVAN SANCHEZ MARIN	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.000.000	$ 480.000	(EPS010) EPS SURA	$ 3.000.000	$ 120.000	6,960	$ 3.000.000	$ 208.800	(CCF04) COMFAMA	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 928.800

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 68.012.539	$ 69.912.539	$ 69.912.539	$ 69.912.539	$ 10.883.900	$ 2.746.500	$ 4.705.200	$ 2.715.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.051.500	$ 0	$ 21.051.500

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 465 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

INTERVENTORÍA
UMI

Tunja, 12 de agosto de 2025

Señores
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA
DR. VICTOR MANUEL SANCHEZ VARGAS
Supervisor
Ciudad

Referencia: Contrato de Interventoría No 352 de 2025, "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ."

Asunto: CERTIFICACION ACTA PARCIAL No 3 CONTRATO DE OBRA No 345 DE 2025.

Cordial Saludo.

Por medio de la presente nos permitimos certificar acta parcial No 3 del contrato de obra 345 de 2025 "CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ", las actividades ejecutadas en el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de julio de 2025, correspondiente a los componentes técnicos, financieros, contables, SST y Ambientales lo anterior en cumplimiento a lo contemplado contractualmente.

Técnico.
Certifica que las cantidades presentadas en acta parcial son la ejecutadas en obra, de acuerdo con las memorias de cálculo presentadas y firmadas por la interventoría.

El porcentaje de tiempo transcurrido, avance de obra ejecutado y avance de obra programado son los indicados teniendo en cuenta programación de obra.

El seguimiento financiero es acorde a las actas parciales de obra.

Ambiental.

Certifica que las licencias y permisos ambientales se encuentran al día en la fecha de corte de la presente acta.
Certifica que el almacenamiento y disposición de materiales y residuos se ha realizado conforme a la normatividad legal ambiental vigente y el contratista cumple con los respectivos soportes de cumplimiento ambiental.

INTERVENTORÍA
UMI

Que se verificaron cada una de las actividades del Plan de Manejo ambiental definidas por el contratista y se verifico el total cumplimiento y eficacia de las mismas en el periodo de la presente acta.

Seguridad Salud En El Trabajo

Informe a seguimiento mensual obra civil.
Indicadores clave de desempeño.
Cumplimiento normativo formación y capacitación.
Evaluación de la efectividad de la formación.

Lo anterior en cumplimiento a lo contemplado contractualmente.

Atentamente,

BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

INTERVENTORÍA
UMI

Tunja, 12 de agosto de 2025

Señores
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA
DR. VICTOR MANUEL SANCHEZ VARGAS
Supervisor
Ciudad

Referencia: Contrato de Interventoría No 352 de 2025, "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ."

Asunto: CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

Cordial Saludo.

Por medio del presente certificamos que luego de verificadas las planillas y constatadas con el personal en obra, el Consorcio Terminación UMI identificado con NIT. 901.919.277-7 se encuentra al día y a PAZ Y SALVO en el pago de Aportes a Seguridad Social y Parafiscales Vigentes de todos sus empleados, de conformidad con lo establecido por el artículo 50, de la Ley 789 de 2002 y demás disposiciones sobre la materia (APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES). Para el periodo comprendido entre el 01 de julio y el 31 de julio de 2025.

Atentamente,

BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

INTERVENTORÍA
UMI

Tunja, 12 de agosto de 2025

Señores
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA
DR. VICTOR MANUEL SANCHEZ VARGAS
Supervisor
Ciudad

Referencia: Contrato de Interventoría No 352 de 2025, "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ."

Asunto: CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS.

Cordial Saludo.

Por medio del presente certificamos que luego de verificadas cada una de las actividades ejecutadas en obra por el contratista Consorcio Terminación UMI en el periodo comprendido entre el 01 de julio y el 31 de julio de 2025, las mismas cumplen en su totalidad con las especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos.

Atentamente,

BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

INTERVENTORÍA
UMI

Tunja, 12 de agosto de 2025

Señores
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA
DR. VICTOR MANUEL SANCHEZ VARGAS
Supervisor
Ciudad

Referencia: Contrato de Interventoría No 352 de 2025, "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ."

Asunto: CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO CONTRATISTA DE OBRA AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Cordial Saludo.

Por medio del presente certificamos que luego de verificadas las condiciones en obra y la documentación presentada por el contratista Consorcio Terminación UMI para el periodo comprendido entre el 01 de julio y el 31 de julio de 2025, se da cumplimiento a todo lo relacionado con los requisitos Ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Atentamente,

BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025
