INFORME MENSUAL No 1

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1695-2024

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS BARRIO PUERTAS DEL SOL, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO INTERVENTORÍA.



ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

CORTE: 28 DE NOVIEMBRE AL DE DICIEMBRE DE 2024

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN ---- 4
2. INFORMACIÓN PREVIA DEL PROYECTO ---- 5
2.1. DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO ---- 5
2.2. NECESIDAD DEL PROYECTO ---- 6
2.3. ALCANCE DEL PROYECTO ---- 7
3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA ---- 7
3.1. INFORMACIÓN GENERAL – CONTRATO DE OBRA ---- 7
3.1.1. GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA ---- 8
3.2. INFORMACIÓN GENERAL - CONTRATO DE INTERVENTORÍA ---- 12
3.2.1. GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA ---- 12
3.3. EQUIPO PROFESIONAL Y TÉCNICO DE TRABAJO EN OBRA ---- 15
3.4. EQUIPO PROFESIONAL Y TÉCNICO DE INTERVENTORÍA ---- 16
4. ACTIVIDADES EJECUTADAS HASTA EL PERIODO DE INFORME ---- 17
5. ESTADO FINANCIERO DEL PROYECTO ---- 24
6. RESUMEN CUBICACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME ---- 25
7. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA DE SUS OBLIGACIÓN CON RELACIÓN AL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES ---- 27
8. PERMANENCIA, ESTADO Y UTILIZACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO OFRECIDO EN LA PROPUESTA ---- 27
9. RETRASOS, INCONVENIENTES PRESENTADOS Y ASUNTOS PENDIENTES POR RESOLVER ---- 27
10. COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. ---- 28

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

ANEXOS

ANEXO 1– Aprobación de las pólizas por parte de la entidad contratante del contrato de obra. (Anexo 0).

ANEXO 2– Pólizas de cumplimento (anexos 0,1y 2) de interventoría.

ANEXO 3– Registro fotográfico de las actividades de obra ejecutadas.

ANEXO 4 – Relación de correspondencia

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

1. INTRODUCCIÓN

Por medio del siguiente informe se evidencia la vigilancia, seguimiento y control de todas y cada una de las actividades comprendidas en el contrato que tiene como objeto: **"CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS BARRIO PUERTAS DEL SOL, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"**, el cual se encuentra avalado por la interventoría del contrato **No 1695-2024**, cuyo objeto es **"CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS BARRIO PUERTAS DEL SOL, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO-INTERVENTORÍA"**, ejecutado por el contratista de interventoría: **SERVICON CS SAS;** el cual contempla las actividades desarrolladas en el periodo comprendido entre el 28 de Octubre al 27 de Noviembre del 2024.

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

2. INFORMACIÓN PREVIA DEL PROYECTO

2.1. DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El contrato de obra No 0190-2024 que tiene por objeto **"CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS BARRIO PUERTAS DEL SOL, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO",** se ejecutarán las actividades en los tramos de tubería sanitaria "CAM 500, P11, P12 Y P13", "CAM 172, P01, P02, P03, P04, P05, P06 y P07", "P05 y P08", "P03, P10 y P09", "P10 y P02" "CAM 482 y P01". Así mismo se contempla el tramo pluvial sobre el eje 5 en tubería de 36", realizado en el casco urbano, barrio Puertas del Sol, en el municipio de Orito, departamento del Putumayo.

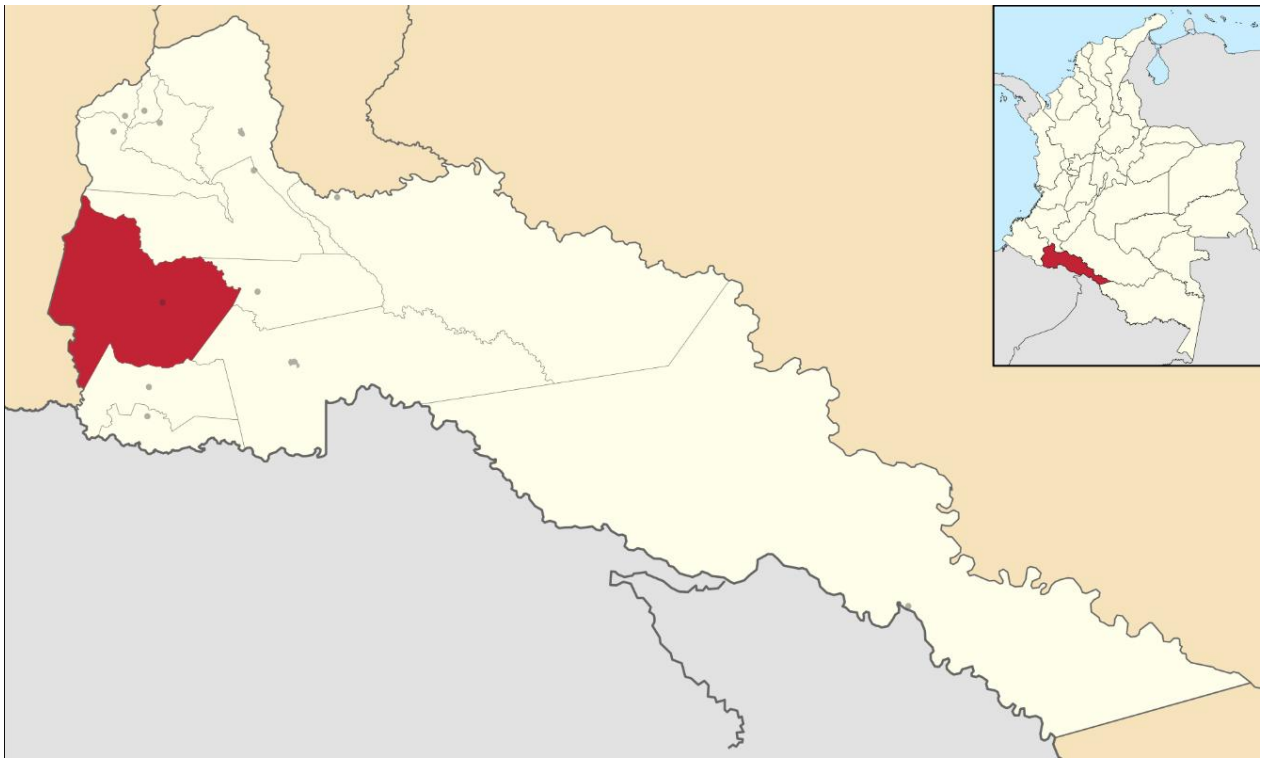


Imagen No 1. Ubicación Orito - Putumayo

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo



Imagen No 2. Ubicación tramos a intervenir del Proyecto- B/ Puertas del sol-Orito Putumayo

2.2. NECESIDAD DEL PROYECTO

En el municipio de orito actualmente no cuenta con la suficiente cobertura del sistema de alcantarillado sanitario y aguas lluvias, para su disposición final, los habitantes de algunos sectores de la zona urbana como lo es el barrio Puertas del Sol el cual se encuentra utilizando alternativas no convencionales como letrinas, lo que produce contaminación del suelo y las aguas superficiales produciendo insalubridad, esta eliminación de excretas y desechos en forma inadecuada afecta negativamente el ambiente generando focos de vectores patógenos que provocan enfermedades gastrointestinales, de igual forma la proliferación de insectos y ratas que transmiten de agentes infecciosos. Se presenta deficiencia en el sistema de alcantarillado y deficiente calidad de vida en la comunidad del barrio Puertas del Sol.

2.3. ALCANCE DEL PROYECTO

Ampliar la cobertura del sistema de alcantarillado para mejorar la calidad de vida de la comunidad de Orito y del barrio Puertas del Sol, implementando el sistema de saneamiento básico en las viviendas de este sector del municipio.

3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA

3.1. INFORMACIÓN GENERAL – CONTRATO DE OBRA

Tabla 1. Datos contractuales del contrato de Obra

CONTRATO No.	0190-2024
OBJETO	"CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS BARRIO PUERTAS DEL SOL, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO" "
ENTIDAD CONTRATANTE	EMPORITO ESP
NIT	846000381-0
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES, DISTRIBUIDORA Y SUMINISTROS ORITO S.A.S CODISUM R.L RENE ESTUARDO ORTEGA NOVOA CC.18.145.945 de Orito Putumayo
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$1.169.698.265,10
INTERVENTORÍA	SERVICON CS SAS R.L. ELIANA ANDREA CEBALLOS ARÉVALO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	22 DE OCTUBRE DEL 2024
FECHA DE INICIO	28 DE OCTUBRE DEL 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	28 DEFEBRERO DEL 2025
PLAZO DEL CONTRATO	CUATRO (04) MESES

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

3.1.1. GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA

Según la CLAUSULA DECIMA SEXTA– GARANTÍAS, del contrato de obra del proyecto en referencia. El contratista debe presentar una garantía de cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, a favor de la Entidad Contratante. La garantía de cumplimiento debe tener los siguientes amparos:

Tabla No 2. Garantías del Contrato de obra

AMPARO	SUFICIENCIA	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10% del Valor del Contrato.	Igual al plazo del Contrato y seis (06) meses más.
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales	5% del Valor del Contrato.	Igual al plazo del Contrato y (3) Tres Años más.
Responsabilidad Civil Extracontractual	200 S.M.L.V.	Igual al plazo de ejecución del Contrato y dos años más.
Calidad del servicio	10% del Valor del Contrato.	Igual al plazo de ejecución del Contrato
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100% del monto entregado a título de anticipo	Igual al plazo del Contrato y (6) Seis Años más.
Estabilidad y Calidad de la Obra	10% del Valor del Contrato.	Por cinco (5) Años Contados a partir de la Finalización de la Obra.

Ante lo anterior la Empresa EMPORITO ESP, representado por su Unidad Jurídica, aprobó bajo las pólizas presentadas a la entidad, las cuales se detallan a continuación.

En el presente informe se presentan las pólizas actualizadas según acta de inicio de obra.

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL ANEXO No 0

AMPARO	N° POLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento entidad estatal Fecha de Exped: 24/10/2024				
Cumplimiento del Contrato	**560-47-994000183733**	22/10/2024	23/08/2025	$116.969.826,51
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales		22/10/2024	23/02/2028	$116.969.826,51
Estabilidad de la obra		SE AMPARA 5 AÑOS.		$233.939.653,02
Calidad del servicio		22/10/2024	23/02/2025	$116.969.826,51

Tabla N° 3. Control de póliza de cumplimiento entidad estatal Anexo No 0 del contrato de obra

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL ANEXO No 1

AMPARO	N° POLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento entidad estatal Fecha de Exped: 28/11/2024				
Cumplimiento	**560-47-994000183733**	22/10/2024	29/08/2025	$116.969.826,50
Pago de Salarios, prestaciones sociales e IND		22/10/2024	29/02/2028	$116.969.826,50
Estabilidad y calidad de la obra		SE AMPARA 5 AÑOS.		$233.939.653,00
Calidad del servicio		22/10/2024	01/03/2025	$116.969.826,50

Tabla N° 4. Control de póliza de cumplimiento entidad estatal Anexo No 1 del contrato de obra

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL ANEXO No 2

AMPARO	N° POLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento entidad estatal Fecha de Exped: 04/12/2024				
Cumplimiento	**560-47-994000183733**	28/10/2024	29/08/2025	$116.969.826,50
Pago de Salarios, prestaciones sociales e IND		28/10/2024	29/02/2028	$116.969.826,50
Estabilidad y calidad de la obra		SE AMPARA 5 AÑOS.		$233.939.653,00
Calidad del servicio		28/10/2024	01/03/2025	$116.969.826,50

Tabla N° 5. Control de póliza de cumplimiento entidad estatal Anexo No 2 del contrato de obra

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO No 0.

AMPARO	N° POLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Responsabilidad Civil Extracontractual Fecha Exp: 24/10/2024				
Predios, Labores y Operaciones	**560 – 74 - 994000033583**	22/10/2024	23/02/2027	$260,000,000.00
Contratistas y Subcontratistas		22/10/2024	23/02/2027	$260,000,000.00
RCE Patronal		22/10/2024	23/02/2027	$260,000,000.00
Vehículos Propios y no Propios		22/10/2024	23/02/2027	$260,000,000.00
Gastos Médicos		22/10/2024	23/02/2027	$26,000,000.00
Responsabilidad Civil Cruzada		22/10/2024	23/02/2027	$260,000,000.00

Tabla N° 6. Control de póliza responsabilidad civil extracontractual Anexo No 0 del contrato de obra

PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO No 1.

AMPARO	N° POLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Responsabilidad Civil Extracontractual Fecha Exp: 28/11/2024				
Predios, Labores y Operaciones	**560 – 74 - 994000033583**	23/02/2027	01/03/2027	$260,000,000.00
Contratistas y Subcontratistas		23/02/2027	01/03/2027	$260,000,000.00
RCE Patronal		23/02/2027	01/03/2027	$260,000,000.00
Vehículos Propios y no Propios		23/02/2027	01/03/2027	$260,000,000.00
Gastos Médicos		23/02/2027	01/03/2027	$26,000,000.00
Responsabilidad Civil Cruzada		23/02/2027	01/03/2027	$260,000,000.00

Tabla N° 7. Control de póliza responsabilidad civil extracontractual Anexo No 1 del contrato de obra.

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO No 2.

AMPARO	N° POLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Responsabilidad Civil Extracontractual Fecha Exp: 28/11/2024				
Predios, Labores y Operaciones	**560 – 74 - 994000033583**	22/10/2024	01/03/2027	$260,000,000.00
Contratistas y Subcontratistas		22/10/2024	01/03/2027	$260,000,000.00
RCE Patronal		22/10/2024	01/03/2027	$260,000,000.00
Vehículos Propios y no Propios		22/10/2024	01/03/2027	$260,000,000.00
Gastos Médicos		22/10/2024	01/03/2027	$26,000,000.00
Responsabilidad Civil Cruzada		22/10/2024	01/03/2027	$260,000,000.00

Tabla N° 8. Control de póliza responsabilidad civil extracontractual Anexo No 2 del contrato de obra

PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO No 3.

AMPARO	N° POLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Responsabilidad Civil Extracontractual Fecha Exp: 04/12/2024				
Predios, Labores y Operaciones	**560 – 74 - 994000033583**	28/10/2024	01/03/2027	$260,000,000.00
Contratistas y Subcontratistas		28/10/2024	01/03/2027	$260,000,000.00
RCE Patronal		28/10/2024	01/03/2027	$260,000,000.00
Vehículos Propios y no Propios		28/10/2024	01/03/2027	$260,000,000.00
Gastos Médicos		28/10/2024	01/03/2027	$26,000,000.00
Responsabilidad Civil Cruzada		28/10/2024	01/03/2027	$260,000,000.00

Tabla N° 9. Control de póliza responsabilidad civil extracontractual Anexo No 3 del contrato de obra.

Observaciones:

Mediante la presente póliza, se amparan los perjuicios patrimoniales que cause directamente el asegurado con motivo de una determinada responsabilidad civil extracontractual en el que incurra, de acuerdo con la ley colombiana, en virtud de la ejecución del contrato de obra No. 0190 – 2024 referente a la construcción alcantarillado sanitario y colector aguas lluvias barrio Puertas del Sol, municipio de Orito, departamento del Putumayo.

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

Se registra acta de inicio del día 28/10/2024.

El contratista de presenta las pólizas como anexo en los informes de obra

En el presente informe se anexa la aprobación de las pólizas (anexo 0) por parte de la entidad contratante del contrato de obra. (Anexo 1).

3.2. INFORMACIÓN GENERAL - CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Tabla No 10. Datos contractuales del contrato de Interventoría

CONTRATO NO.	No 1695-2024
OBJETO	"CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS BARRIO PUERTAS DEL SOL, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO-INTERVENTORÍA"
ENTIDAD CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
NIT	800094164-4
CONTRATISTA	SERVICON CS SAS NIT 900.949.050-7 R.L. ELIANA ANDREA CEBALLOS ARÉVALO CC. 1.123.333.549 de Orito Put.
VALOR DEL CONTRATO	$ 77.611.800
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA DE INICIO	28 DE OCTUBRE DEL 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	27 DE FEBRERO DEL 2024
PLAZO DEL CONTRATO	CUATRO (04) MESES

3.2.1. GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CLÁUSULA 8ª –GARANTÍA ÚNICA. Dentro de un plazo de dos (2) días hábiles siguiente a la fecha de la firma del contrato, el contratista presentará a la Entidad una garantía única, la cual debe ser suficiente de acuerdo con las distintas clases de obligaciones amparadas.

Los riesgos que deben cubrir, el monto y la vigencia de los mecanismos de cobertura se determinan teniendo en cuenta el objeto, la naturaleza y las características del contrato a celebrar.

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

El Contratista se obliga a garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas a favor de la Entidad Estatal, con ocasión de la ejecución del contrato, de acuerdo con la siguiente tabla:

Tabla No 11. Garantías del Contrato de Interventoría

AMPARO	SUFICIENCIA	VIGENCIA
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, o el pago de multas y demás sanciones que se deriven de su incumplimiento	10% del Valor del Contrato.	Desde la suscripción del contrato, durante su ejecución y 6 meses más. En todo caso deberá estar vigente hasta su liquidación.
Calidad del servicio	10% del Valor del Contrato.	Desde la suscripción del contrato, con vigencia igual al plazo de la garantía de estabilidad principal (5 años)
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales	5% del Valor del Contrato.	Plazo del contrato y tres (3) años más. Contados a partir de la fecha de su expedición.

Ante lo anterior la gobernación del Putumayo, a través de su Asesor Jurídico, aprobó las pólizas presentadas a la entidad por el contratista, la cual se detallan a continuación.

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL ANEXO No 0

AMPARO	N° POLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento entidad estatal Fecha de Exped: 04/09/2024				
Cumplimiento del Contrato	**11 – 44 - 101234140**	02/09/2024	02/07/2025	$7,761,180.00
Calidad del servicio		02/01/2025	02/01/2030	$7,761,180.00
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e Indemnizaciones Laborales		02/09/2024	02/01/2028	$3,880,590.00

Tabla N° 12. Control de póliza de cumplimiento entidad estatal Anexo No 0 del contrato de obra

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL ANEXO No 1

AMPARO	N° POLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento entidad estatal Fecha de Exped: 27/11/2024				
Cumplimiento del Contrato	**11 – 44 - 101234140**			
Pago de Salarios, prestaciones sociales e IND				
Estabilidad y calidad de la obra				
Calidad del servicio				

Tabla N° 13. Control de póliza de cumplimiento entidad estatal Anexo No 0 del contrato de obra**.**

Observaciones: Mediante el presente anexo se actualizan las vigencias de la póliza según acta de inicio de fecha 28/10/2024. los demás términos y condiciones continúan vigentes y sin modificar.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL ANEXO No 2.

AMPARO	N° POLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento entidad estatal Fecha de Exped: 27/11/2024				
Cumplimiento del Contrato	**11 – 44 - 101234140**	28/10/2024	27/08/2025	$7,761,180.00
Calidad del servicio		27/02/2025	27/02/2030	$7,761,180.00
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e Indemnizaciones Laborales		28/10/2024	27/02/2028	$3,880,590.00

Tabla N° 14. Control de póliza de cumplimiento entidad estatal Anexo No 0 del contrato de obra**.**

Observaciones: Mediante el presente anexo se actualizan las vigencias de la póliza según acta de inicio de fecha 28/10/2024. Los demás términos y condiciones continúan vigentes y sin modificar.

En el presente informe mediante el anexo No 2 se adjunta las pólizas de cumplimento (anexos 0,1y 2)de interventoría.

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

3.3. EQUIPO PROFESIONAL Y TÉCNICO DE TRABAJO EN OBRA

La interventoría contrastó que el personal vinculado por parte del contratista de obra cumplió a cabalidad con lo exigido en el pliego de condiciones, desarrollando las funciones establecidas de manera oportuna y con la mejor calidad profesional para el desarrollo de las actividades en los aspectos administrativos, técnicos, y ambientales respecto a la ejecución de la obra. Adicionalmente la mano de obra no calificada fue contratada del sector involucrado en el presente contrato, del barrio Puertas del Sol, cabecera municipal Orito.

Tabla No 15. Descripción de la mano de obra calificada empleada por el contratista en la obra

CARGO	NOMBRE
Director de Obra	MARCO ANTONIO BARRERA NAVARRO
Residente de Obra	JEFFERSON ARTEAGA
HSEQ	YADY LIZETH RUEDA
Topógrafo	WILSON EDUARDO PATIÑO
Cadenero	LIBARDO FAVIO MEJIA
Secretaria	MARIA CONGOTE

Tabla No 16. Descripción de personal de apoyo empleada por el contratista en la obra

NOMBRE	CARGO
DARIO QUENGUAN MONTALVO	PALETERO
BRAYAN VARGAS	PALETERO
OLIVO PINCHAO	MAESTRO
BARTOLO PINCHAO	MAESTRO
MILTON JAVIER GUERRERO	MAESTRO
JAIRO DAGOBERTO ARTEGA	OFICIAL
JESUS EUDORO PESILLO	OFICIAL
CESAR STIVEN MEJIA	OBRERO
OLIVEIRO ALVAREZ	OBRERO
JAIDER RODRIGUEZ	OBRERO
EDUAR NORVEY NARVAES	OBRERO
DANIEL GOMEZ	OBRERO

CELULAR: 3178545839 E-MAIL: SERVICONCSSAS@GMAIL.COM
ORITO PUTUMAYO

Tabla No 17. Descripción de maquinaria y equipos empleados para la labor.

DESCRIPCIÓN	MARCA
RETRO EXCAVADORA	HYUNDAI
PAJARITA	HULLAND BLLUB

3.4. EQUIPO PROFESIONAL Y TÉCNICO DE INTERVENTORÍA

El personal empleado en la interventoría cumple con las especificaciones de equipo mínimo establecidas en el pliego de condiciones del proceso, siendo idóneos y con alta experiencia para ejercer las funciones de control requeridas por parte de la interventoría, cumpliendo con los porcentajes de dedicación y tiempos establecidos, con la mejor calidad profesional para el desarrollo de las actividades en los aspectos administrativos, técnicos, financieros y ambiental.

Durante el periodo reportado en el presente informe, cumpliendo con lo establecido en los pliegos respecto a equipo mínimo, la Interventoría cuenta con el siguiente personal:

Tabla No 8. Descripción personal Interventoría

CARGO	NOMBRE
Director de Interventoría	BENJAMIN SANJUANES ROMERO
Residente de Interventoría	GUSTAVO ANDRES GRIJALBA JARAMILLO
Topógrafo	YILBER EDILBERTO OROÑEZ BASTIDAS
Cadenero	GERMAN TORIJANO
Supervisor HSEQ	ELIANA ZUÑIGA

En el informe de SST se anexa las planillas de seguridad social de Servicon CS SAS correspondiente al periodo de informe. (periodo 28 de octubre al 27 de noviembre).

4. ACTIVIDADES EJECUTADAS HASTA EL PERIODO DE INFORME

El contrato de obra No 0190-2024 inició el día 28 de octubre de 2024, se realizaron las actividades de acuerdo a los ítems contratados, del contrato en mención cuyo objeto es **"CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS BARRIO PUERTAS DEL SOL, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO",** se ejecutarán las actividades en los tramos de tubería sanitaria "CAM 500, P11, P12 Y P13", "CAM 172, P01, P02, P03, P04, P05, P06 y P07", "P05 y P08", "P03, P10 y P09", "P10 y P02" "CAM 482 y P01".

La interventoría tiene como objeto controlar, verificar y realizar seguimiento a la ejecución y cumplimiento del contrato de obra, el cual está siendo ejecutado actualmente por el contratista CONSTRUCCIONES, DISTRIBUIDORA Y SUMINISTROS ORITO S.A.S CODISUM.

Las actividades de la interventoría, entre otras son las siguientes:

- ✓ Control permanente del personal de la obra que tenga su respectiva seguridad social e implementos de seguridad.
- ✓ Cumplimiento de cada una de cláusulas del contrato (pliego de condiciones, Especificaciones técnicas, análisis de precios unitarios, presupuestos).
- ✓ En todas las actividades que se desarrollen se le exige al contratista el cumplimiento a Cabalidad de todas las sugerencias y procesos Constructivos que garanticen el buen desarrollo de la obra.
- ✓ Asesoría permanente para la ejecución de las obras objeto del presente Contrato.
- ✓ Solución de diferentes interrogantes planteados por el personal
- ✓ Supervisión constante de las labores ejecutadas en el lugar de trabajo.

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

Durante el periodo de ejecución comprendido entre el 28 de Octubre al 27 de Noviembre de 2024, el contratista realizó las siguientes actividades:

CAPITULO 1.0 EXCAVACIONES

ITEM 1.1 Excavación mecánica (m3)

Esta especificación aplica para excavaciones que se realizaron a máquina, lo cual comprende en general la excavación necesaria para la instalación de redes de alcantarillado.

Esta actividad se ejecutó según las especificaciones técnicas, de acuerdo con las líneas y pendientes que se muestran en los planos, según las indicaciones por parte de la Interventoría.

Se recomendó al contratista tener especial cuidado con las redes de acueducto, alcantarillado, energía, entre otras.

MEDIDA Y PAGO

La medida de las excavaciones se tomó por metro cúbico (m3) de material excavado, medido en su posición original, de acuerdo con los alineamientos, pendientes, cotas y dimensiones indicadas en los pliegos, mostradas en los planos o autorizadas por el Interventor. Los precios para excavaciones incluyen el costo de los equipos, herramientas, materiales, mano de obra y los demás costos directos e indirectos necesarios para ejecutar las excavaciones de acuerdo con estas especificaciones.

La ejecución de este ítem se realizó con la previa autorización de interventoría y las cuales tendrán la medida indicada en los planos.

ITEM 1.2 Excavación a mano en material común (m3)

Se realizó excavación manual en material común, esta actividad comprende toda remoción de materiales térreos o pétreos in situ, con el fin de permitir la conformación de la estructura del alcantarillado según los diseños técnicos del proyecto.

MEDIDA Y PAGO

La unidad de medida se calculó mediante metro cúbico (m3) de material excavado, dicho cálculo se hizo con la nivelación topográfica antes y después de ejecutado el trabajo de excavación medidas que se lograron directamente en el terreno y se sustentará con carteras topográficas por parte del contratista y otras por parte de la interventoría para confrontación.

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

La ejecución de este ítem se realizó con la previa autorización de interventoría y las cuales tendrán la medida indicada en los planos.

ITEM 1.3 Entibado (Apuntalamiento en madera) (m2)

Se realizó instalación de entibado, esta actividad consiste en que la superficie lateral de la zanja se sostiene totalmente por tableros constituidos de elementos de madera de 0.10m x 0.20m x 3.00m y demás especiaciones técnicas, de acuerdo a las recomendaciones de la interventoría.

MEDIDA Y PAGO

La unidad de medida se calculó mediante el metro cuadrado (m2) de entibado, dicho cálculo se hizo con la nivelación topográfica antes y después de ejecutado el trabajo de excavación medidas que se lograron directamente en el terreno y se sustentan con carteras topográficas por parte del contratista y otras por parte de la interventoría para confrontación, cotejando con los planos.

La ejecución de este ítem se realizó con la previa autorización de interventoría y las cuales tendrán la medida indicada en los planos.

CAPITULO 2.0 TUBERIA ALCANTARILLADO

ITEM 2.1 Tubería sanitaria PVC Ø = 8" (Incluye Instalación) (m)

Se refiere a la instalación de tubería de PVC tipo Novafort o similar en los sitios indicados en los planos u ordenados por el Interventor.

Previo a la instalación de la Tubería, se verificó el replanteo de hilos, niveles y pendientes, de acuerdo con lo definido en los planos, esquemas y diseños del proyecto o con lo definido por la Interventoría. Esta revisión incluyó los hiladeros, mojones y referencias que se propuso utilizar el contratista para la correcta instalación de la tubería.

MEDIDA Y PAGO

La longitud de la tubería instalada se midió directamente en la zanja después de su colocación, expresada en metros (m) con dos decimales, a satisfacción del Interventor, incluyendo los accesorios que fueren necesarios instalar, de acuerdo con los alineamientos especificados en los planos y la ubicación final de la tubería.

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

La ejecución de este ítem se realizó con la previa autorización de interventoría y las cuales tendrán la medida indicada en los planos.

ITEM 2.2 Tubería sanitaria PVC Ø = 36" (Incluye Instalación (m)

NOTA: PROCESO CONSTRUCTIVO IGUAL AL NUMERAL 2.1

La ejecución de este ítem se realizó con la previa autorización de interventoría y las cuales tendrán la medida indicada en los planos.

ITEM 2.3 Sustitución material de cimentación 50% triturado - 50% recebo E=0,40 compactado mecánicamente al 95% del próctor modificado (m3).

Se denomina relleno el constituido por 50% de triturado – 50% recebo, una mezcla de estos dos materiales, convenientemente colocado y compactado.

Este relleno se utilizó para la cimentación de tuberías o en los sitios de la obra indicados en los planos o en los ordenados por la INTERVENTORIA.

MEDIDA Y PAGO

La medida para el pago de relleno colocado bajo las tuberías se calculó mediante el volumen en metros cúbicos (m3) medido en el lugar y comprendido entre las líneas y cotas de excavación mostradas en los planos con recomendación de la interventoría.

La ejecución de este ítem se realizó con la previa autorización de interventoría y las cuales tendrán la medida indicada en los planos.

ITEM 2.4 Atraque y relleno inicial con recebo E=0,15m por encima de la clave compactado manualmente 90% con pizón. (m3)

Se realizó la actividad de atraque y relleno inicial para las tuberías instaladas, de acuerdo con lo indicado en los planos.

MEDIDA Y PAGO

La medida para el pago de atraque y relleno colocados en medio y sobre las tuberías es el volumen en metros cúbicos (m3) medido en el lugar y comprendido entre las líneas y cotas de excavación mostradas en los planos con recomendación de la interventoría.

La ejecución de este ítem se realizó con la previa autorización de interventoría y las cuales tendrán la medida indicada en los planos.

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

CAPITULO 3.0 CONSTRUCCIÓN CÁMARAS DE INSPECCIÓN

3.1 Cámara de inspección en concreto de 4.000 psi D=1,2

Consistió en la construcción de cilindros de concreto de 4.000 psi, el diámetro interno de la parte cilíndrica de los pozos de inspección para aguas residuales tiene una medida de 1.20m, de acuerdo con las especificaciones técnicas.

MEDIDA Y PAGO

La unidad de medida de cámaras de inspección construidas en concreto de 4000 psi se tomó mediante Unidad (und), con aproximación a dos decimales y sin distinción de tipo, forma y dimensiones, de cámaras de inspección que haya sido construida cumpliendo con lo especificado.

La ejecución de este ítem se realizó con la previa autorización de interventoría y las cuales tendrán la medida indicada en los planos.

CAPITULO 4.0 CONSTRUCCIÓN ACOMETIDAS DOMICILIARIAS ALCANTARILLADO

4.1 Tubería sanitaria PVC Ø = 6 (Incluye Instalación (m)

NOTA: PROCESO CONSTRUCTIVO IGUAL AL NUMERAL 2.1

La ejecución de este ítem se realizó con la previa autorización de interventoría y las cuales tendrán la medida indicada en los planos.

4.2 kit Silla Yee estructurada 200mm x 160mm (Incluye Instalación) (Und)

Se realizó la instalación de sillas yee con la derivación del tamaño especificado, incorporadas al tubo durante su fabricación. Las yees, tienen sus ejes aproximadamente a 35 grados del eje longitudinal del tubo medidos desde el extremo de la campana, esta actividad se hizo de acuerdo con las especificaciones técnicas y recomendación de la interventoría.

MEDIDA Y PAGO

La medida para este item se tomó mediante la unidad del suministro e instalación de silla yee para las conexiones domiciliarias. El pago se hará al precio unitario del Contrato, por toda obra ejecutada de acuerdo con esta especificación y aceptada a satisfacción por el

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

Interventor.

El precio unitario deberá incluir todos los costos por concepto de suministro en el lugar de las sillas tee y su instalación; el suministro de los demás materiales y accesorios requeridos.

La ejecución de este ítem se realizó con la previa autorización de interventoría y las cuales tendrán la medida indicada en los planos.

4.3 Caja conexión domiciliaria en concreto de 3,000 psi de 0,70x0,70m medidas internas (Und).

Se realizó la construcción de cajas conexión domiciliaria en concreto reforzado de 3.000 psi con refuerzo en acero de 37000psi, de acuerdo con las especificaciones técnicas y recomendación de la interventoría.

MEDIDA Y PAGO

La medida se tomó mediante la unidad (und) y el valor de esta será el estipulado en el Contrato de obra.

La ejecución de este ítem se realizó con la previa autorización de interventoría y las cuales tendrán la medida indicada en los planos.

CAPITULO 5.0 RELLENOS Y OTRAS ACTIVIDADES

5.1 Entrega final a box coulvert (Und)

Esta actividad consistió en la demolición de estructuras en concreto tipo box coulvert en el punto de entrega de la tubería de pvc de 36” mediante la utilización de martillo autopropulsado y otras herramientas, incluyendo el retiro de los escombros y el empalme de la tubería.

MEDIDA Y PAGO

La medida se tomó mediante el número de Unidades de demoliciones y entregas finales de tuberías.

Los precios propuestos incluyen el costo de la mano de obra, herramienta y el equipo necesario para realizar la demolición.

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

La ejecución de este ítem se realizó con la previa autorización de interventoría y las cuales tendrán la medida indicada en los planos.

5.2 Relleno con material seleccionado de la excavación compactado mecánicamente (m3)

Se realizó relleno con material seleccionado, una vez colocada la capa de material seleccionado que protege las tuberías y aprobadas por la interventoría, el Contratista procedió a colocar los rellenos necesarios con material proveniente de la excavación y consiguiendo la compactación de acuerdo con las especificaciones técnicas y con recomendación de la interventoría.

MEDIDA Y PAGO

La medida y para el pago de este ítem se toma por metro cúbico (m3) de material compactado, obtenido del producto de los metros lineales de zanja multiplicados por profundidad excavada según los perfiles y por el ancho de zanja que, según el diámetro de las tuberías, de acuerdo con las normas técnicas y recomendación de la interventoría.

La ejecución de este ítem se realizó con la previa autorización de interventoría y las cuales tendrán la medida indicada en los planos.

Registro fotográfico de las actividades de obra ejecutadas -Anexo No 3

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

5. ESTADO FINANCIERO DEL PROYECTO

A continuación, se detalla de manera general el estado financiero del proyecto.

I. CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO INICIAL	$ 1.169.698.265,10.

II. VALORES RECONOCIDOS AL CONTRATISTA POR OBRA EJECUTADA

VALOR CANCELADO POR CONCEPTO DE ANTICIPO	$	0,00

III. BALANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

VALOR PAGADO ACUMULADO	$	0,00
% PAGADO ACUMULADO		0 %
VALOR PENDIENTE POR PAGAR	$	1.169.698.265,10
% PENDIENTE POR PAGAR		100 %

IV. BALANCE DE INVERSIÓN DEL PROYECTO A CORTE DE 27 DE NOVIEMBRE DE 2024

A CORTE 27 DE NOVIEMBRE	
VALOR EJECUTADO A CORTE 27 DE NOVIEMBRE	**$ 124.793.562,03**
% EJECUTADO A CORTE 27 DE NOVIEMBRE	**10.67%**
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	**$ 1.044.904.703,07**
% PENDIENTE POR EJECUTAR	**89.33%**


Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

6. RESUMEN CUBICACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA EN EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME

Las actividades acumuladas desarrolladas desde el 28 de octubre al 27 de noviembre fueron las siguientes:

"CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTOR AGUAS LLUVIAS BARRIO PUERTAS DEL SOL, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"					
ITEM NO.	**DESCRIPCION DE LA OBRA**	**UND**	**CANT CONTRATADA**	**CANTIDAD EJECUTADA**	**%**
1.	**EXCAVACIONES**				
1.1	Excavación mecánica	m3	1968,45	464,33	24%
1.2	Excavación a mano en material común	m3	531,83	183,37	34%
1.3	Entibado (Apuntalamiento en metálico - madera)	m2	378,39	74,88	20%
2.	**TUBERIA ALCANTARILLADO**				
2.1	Tubería sanitaria PVC Ø = 8". (Incluye instalación)	m	663,57	101,29	15%
2.2	Tubería sanitaria PVC Ø = 36". (Incluye instalación)	m	133,83		
2.3	Sustitución material de cimentación 50% triturado - 50% recebo E=0,40 compactado mecánicamente al 95% del próctor modificado.	m3	413,67	128,94	31%
2.4	Atraque y relleno inicial con material seleccionado E=0,15m por encima de la clave compactado manualmente 90% con pizón.	m3	581,81	34,79	6%
3.	**CONSTRUCCIÓN CÁMARAS DE INSPECCIÓN**				
3.1	Cámara de inspección en concreto de 4000 psi D=1,2 prof: H < 3,00 m, Incluye 6 peldaños en varilla 5/8" y tapa en ferroconcreto.	und	13,00	2,00	15%
3.2	Cámara de inspección en concreto de 4000 psi D=1,8 prof: H < 2,00 m, Incluye 6 peldaños en varilla 5/8" y tapa en ferroconcreto.	und	1,00		
4.	**CONSTRUCCIÓN ACOMETIDAS DOMICILIARIAS ALCANTARILLADO**				
4.1	Tubería sanitaria PVC Ø = 6". (Incluye Instalación)	m	474,00	79,29	17%
4.2	Kid Silla Yee estructurada 200mm x 160mm (Incluye instalación)	und	79,00	12,00	15%
4.3	Codo sanitario campana x espigo 45° PVC Ø = 6" (Incluye instalación)	und	79,00		
4.4	Caja conexión domiciliaria en concreto de 4000 psi de 0,70x0,70m medidas internas	und	79,00	12,00	15%
5.	**RELLENOS Y OTRAS ACTIVIDADES**				
5.1	Entrega final a box coulvert	und	1,00	1,00	100%
5.2	Relleno con material seleccionado de la excavación compactado mecanicamente.	m3	1281,72	194,37	15%
5.3	Retiro de material sobrante (Obra - escombrera)	m3	973,16		
5.4	Reposición (Material seleccionado para vía E=0.1m)	m3	398,14		
5.5	Encofrado en concreto de 4000 psi para tubería de 8" y 36", incluye refuerzo d=3/8".	m3	71,86		

CELULAR: 3178545839 E-MAIL: SERVICONCSSAS@GMAIL.COM
ORITO PUTUMAYO

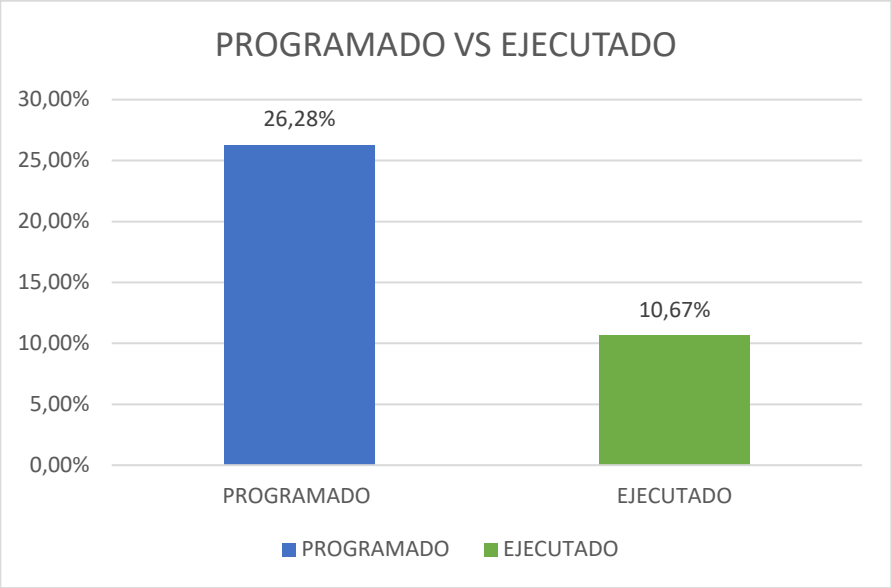

			ACUMULADO	
	PROGRAMADO	**EJECUTADO**	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**
MES 1	26,28%	10,67%	26,28%	10,67%
MES 2	31,28%		58,80%	0

Por lo anterior, en vista al desarrollo de las actividades se puede concluir que hasta la fecha en proyecto presenta un avance del **10.67%** de obra ejecutada, de acuerdo con la programación establecida, hay un retraso del **15,61%** por las lluvias y el replanteo inicial, sin embargo, el contratista ya cuenta con materiales en obra como tubería y material de río, así como también maquinaria y se espera que en el siguiente periodo se pueda nivelar el avance con respecto a lo programado

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

7. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA DE SUS OBLIGACIÓN CON RELACIÓN AL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

La interventoría verifico cumplimiento mediante la presentación de soportes de pago de planillas de seguridad social a nombre del contratista CODISUM correspondientes al presente periodo desde el 28 de octubre al 27.de noviembre.

8. PERMANENCIA, ESTADO Y UTILIZACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO OFRECIDO EN LA PROPUESTA

En el periodo de ejecución del presente informe la interventoría verificó que el contratista cumplió con el personal requerido, tanto a mano de obra calificada y no calificada. Al igual que con el equipo necesario para llevar a cabo las actividades constructivas planificadas bajo estándar de calidad normativo y particular según especificaciones técnicas inherentes en el pliego de condiciones del proceso que derivo el proyecto.

9. RETRASOS, INCONVENIENTES PRESENTADOS Y ASUNTOS PENDIENTES POR RESOLVER

La interventoría constato que, durante el proceso de localización y replanteo del proyecto, se detectaron inconsistencias en los levantamientos topográficos iniciales. Como medida correctiva, se llevó a cabo un nuevo levantamiento topográfico total del proyecto, priorizando los tramos de los Ejes 4 y 5, zonas donde se están desarrollando actividades de obra.

Este ajuste permite que las labores de construcción se ejecuten con mayor precisión, alineándose con las condiciones reales del terreno y cumpliendo con los estándares técnicos establecidos para el proyecto. Sin embargo, estas modificaciones han generado retraso en la ejecución de las actividades de acuerdo con lo programado y variaciones en las cantidades de obra inicialmente previstas, lo que requerirá una actualización de los análisis correspondientes para garantizar la adecuada planificación y ejecución del proyecto.

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

10. COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta el desarrollo de las actividades por el contratista durante el periodo comprendido entre el 28 de octubre al 27 de noviembre del 2024, la interventoría evidenció el cumplimiento de las actividades constructivas tales como:

- Excavaciones: Excavación mecánica y manual en material común, así como entibado para estabilización.
- Instalación de tuberías de alcantarillado sanitario: Tubería sanitaria de PVC Ø 8", con sustitución de material de cimentación y rellenos compactados según especificaciones técnicas.
- Construcción de cámaras de inspección: Cámaras en concreto de 4000 psi con dimensiones y elementos requeridos para garantizar funcionalidad y durabilidad.
- Construcción de acometidas domiciliarias: Conexiones de PVC Ø 6", instalación de kits estructurados y cajas de conexión domiciliaria.
- Rellenos y otras actividades: Compactación con material seleccionado y entrega final en conexión con el box culvert..

Avance financiero: Considerando que la firma contratista **CODISUM SAS**, ha realizado durante periodo del 28 de octubre al 27 de noviembre de 2024 la ejecución parcial de los ítems del contrato de obra, los cuales fueron descritos anteriormente, se tiene que el avance financiero de obra ejecutado es por **CIENTO VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON CERO TRES CENTAVOS** (**$ 124.793.562,03 M/CTE),** siendo el **10.67 %** del valor total del contrato de obra.

El contratista está cumpliendo con sus obligaciones y adelantan las actividades conforme a la ruta crítica del proyecto, el suministro de materiales se hace de la mejor manera ya que es fundamental para que la obra avance de la mejor manera.


La interventoría ha hecho presencia constantemente en la ejecución del contrato de obra para aprobación de especificaciones técnicas de la obra, el informe No 01 de obra se realizó de acuerdo con lo supervisado por la interventoría donde se dio cumplimiento al desarrollo de las actividades en los aspectos administrativos, técnicos, financieros y ambientales, teniendo en cuenta el control de la cantidad y calidad de los productos parciales obtenidos para el periodo reportado.

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

La interventoría contrastó que en el lapso de ejecución del proyecto se presentaron afectaciones en cuanto al tema del clima, ya que se evidenciaron lluvias continuas e intensas, siendo de mayor proporción los días 18 y 25 del mes de noviembre, en estos días hubo dificultades en la realización de las actividades constructivas, obligando a la suspensión y generando un cambio drástico sobre la programación y causando retrasos en actividades programadas.

Se evidenció una adecuada gestión técnica y administrativa del contratista, garantizando la calidad y el cumplimiento de las especificaciones técnicas en cada actividad.

Presento,



ELIANA ANDREA CEBALLOS AREVALO
REPRESENTANTE LEGAL
SERVICON CS S.A.S

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**BOGOTA**	**11**	**11-44-101234140**	**0**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
04	**09**	**2024**	**02**	**09**	**2024**	**00:00**	**02**	**01**	**2030**	**23:59**	**EMISION ORIGINAL**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
SERVICON CS S.A.S	**NIT: 900.949.050-7**	DG 8 N 5 41 B. VERGEL	ORITO, PUTUMAYO	4291111

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
GOBERNACION DEL PUTUMAYO	**NIT: 800.094.164-4**	CALLE 8 NO. 7-40	MOCOA, PUTUMAYO	4206600

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL CUMPLIMIENTO, EL PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMIZACIONES LABORALES Y LA CALIDAD DEL SERVICIO SEGUN CONTRATO NO.1695-2024 REFERENTE A: CONSTRUCCION BARRIO PUERTAS DEL SOL, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO-INTERVENTORIA.

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**02/09/2024**	**02/07/2025**	**$7,761,180.00**
CALIDAD DEL SERVICIO	**02/01/2025**	**02/01/2030**	**$7,761,180.00**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**02/09/2024**	**02/01/2028**	**$3,880,590.00**

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****175,298.00	$ *******8,000.00	$ ******34,826.00	$ **********218,124.00	$ *******19,402,950.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ASINPETROL LIMITADA ASESORES DE SEG	83052	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101234140

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**BOGOTA**	**11**	**11-44-101234140**	**0**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
04	**09**	**2024**	**02**	**09**	**2024**	**00:00**	**02**	**01**	**2030**	**23:59**	**EMISION ORIGINAL**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	SERVICON CS S.A.S	**NIT: 900.949.050-7**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
DG 8 N 5 41 B. VERGEL		ORITO, PUTUMAYO		4291111	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	GOBERNACION DEL PUTUMAYO	**NIT: 800.094.164-4**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO	
CALLE 8 NO. 7-40		MOCOA, PUTUMAYO		4206600	

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse

VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla · Super INTER · SURTIMAX · Movil Red · Bancolombia Corresponsal Bancario · éxito · Gana Gana · CODENSA

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****175,298.00	$ *******8,000.00	$ ******34,826.00	$ **********218,124.00	$ *******19,402,950.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ASINPETROL LIMITADA ASESORES DE SEG	83052	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11000627808757(3900)000000218124(96)20250902

REFERENCIA PAGO:

1100062780875-7

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**BOGOTA**	**11**	**11-44-101234140**	**1**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	**11**	**2024**	**02**	**09**	**2024**	**00:00**	**02**	**01**	**2030**	**23:59**	**ANEXO DE MODIFICACION**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
SERVICON CS S.A.S	**NIT: 900.949.050-7**	DG 8 N 5 41 B. VERGEL	ORITO, PUTUMAYO	4291111

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
GOBERNACION DEL PUTUMAYO	**NIT: 800.094.164-4**	CALLE 8 NO. 7-40	MOCOA, PUTUMAYO	4206600

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL CUMPLIMIENTO, EL PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMIZACIONES LABORALES Y LA CALIDAD DEL SERVICIO SEGUN CONTRATO NO.1695-2024 REFERENTE A: CONSTRUCCION BARRIO PUERTAS DEL SOL, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO-INTERVENTORIA.

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZAN LAS VIGENCIAS DE LA POLIZA SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 28/10/2024.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***(175,298.00)	$ *****(8,000.00)	$ ****(34,826.00)	$ *********(218,124.00)	$ *****(19,402,950.00)	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ASINPETROL LIMITADA ASESORES DE SEG	83052	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101234140

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**BOGOTA**	**11**	**11-44-101234140**	**1**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	**11**	**2024**	**02**	**09**	**2024**	**00:00**	**02**	**01**	**2030**	**23:59**	**ANEXO DE MODIFICACION**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	SERVICON CS S.A.S	**NIT: 900.949.050-7**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:
DG 8 N 5 41 B. VERGEL		ORITO, PUTUMAYO		4291111

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	GOBERNACION DEL PUTUMAYO	**NIT: 800.094.164-4**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO
CALLE 8 NO. 7-40		MOCOA, PUTUMAYO		4206600

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse

VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla · Super INTER · SURTIMAX · Movil Red · Bancolombia Corresponsal Bancario · éxito · Gana Gana · CODENSA

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***(175,298.00)	$ *****(8,000.00)	$ ****(34,826.00)	$ *********(218,124.00)	$ *****(19,402,950.00)	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ASINPETROL LIMITADA ASESORES DE SEG	83052	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101234140	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	11	2024	02	09	2024	00:00	02	01	2030	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	SERVICON CS S.A.S	**NIT: 900.949.050-7**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	DG 8 N 5 41 B. VERGEL		ORITO, PUTUMAYO		4291111

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	GOBERNACION DEL PUTUMAYO	**NIT: 800.094.164-4**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	CALLE 8 NO. 7-40		MOCOA, PUTUMAYO		4206600

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101234140

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**BOGOTA**	**11**	**11-44-101234140**	**2**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	**11**	**2024**	**28**	**10**	**2024**	**00:00**	**27**	**02**	**2030**	**23:59**	**ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
SERVICON CS S.A.S	**NIT: 900.949.050-7**	DG 8 N 5 41 B. VERGEL	ORITO, PUTUMAYO	4291111

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
GOBERNACION DEL PUTUMAYO	**NIT: 800.094.164-4**	CALLE 8 NO. 7-40	MOCOA, PUTUMAYO	4206600

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL CUMPLIMIENTO, EL PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMIZACIONES LABORALES Y LA CALIDAD DEL SERVICIO SEGUN CONTRATO NO.1695-2024 REFERENTE A: CONSTRUCCION BARRIO PUERTAS DEL SOL, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO-INTERVENTORIA.

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**28/10/2024**	**27/08/2025**	**$7,761,180.00**	
CALIDAD DEL SERVICIO	**27/02/2025**	**27/02/2030**	**$7,761,180.00**	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**28/10/2024**	**27/02/2028**	**$3,880,590.00**	

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZAN LAS VIGENCIAS DE LA POLIZA SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 28/10/2024.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****175,298.00	$ *******8,000.00	$ ******34,826.00	$ **********218,124.00	$ *******19,402,950.00	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
ASINPETROL LIMITADA ASESORES DE SEG	83052	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101234140

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**BOGOTA**	**11**	**11-44-101234140**	**2**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	**11**	**2024**	**28**	**10**	**2024**	**00:00**	**27**	**02**	**2030**	**23:59**	**ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
SERVICON CS S.A.S	**NIT: 900.949.050-7**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
DG 8 N 5 41 B. VERGEL	ORITO, PUTUMAYO	4291111

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
GOBERNACION DEL PUTUMAYO	**NIT: 800.094.164-4**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CALLE 8 NO. 7-40	MOCOA, PUTUMAYO	4206600

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****175,298.00	$ *******8,000.00	$ ******34,826.00	$ **********218,124.00	$ *******19,402,950.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ASINPETROL LIMITADA ASESORES DE SEG	83052	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11000628353414(3900)000000218124(96)20251028

REFERENCIA PAGO:

1100062835341-4

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101234140	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	11	2024	28	10	2024	00:00	27	02	2030	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	SERVICON CS S.A.S		**NIT: 900.949.050-7**
DIRECCIÓN: DG 8 N 5 41 B. VERGEL	**CIUDAD:** ORITO, PUTUMAYO	**TELÉFONO:**	4291111

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	GOBERNACION DEL PUTUMAYO		**NIT: 800.094.164-4**
DIRECCIÓN: CALLE 8 NO. 7-40	**CIUDAD:** MOCOA, PUTUMAYO	**TELÉFONO:**	4206600

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101234140

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Orito, 05 de diciembre de 2024

EXT-0503-2024

Señor (es):
SERVICON CS S.A.S

REF. Proyecto "CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS BARRIO PUERTAS DEL SOL MUNICIPIO ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"

ASUNTO: Respuesta al oficio INT-ALC-007 Solicitud de información

Cordial Saludo,

La Empresa de Agua Potable y Saneamiento Básico, EMPORITO E.S.P., en su calidad de supervisora del contrato de obra No. 0190-2024, correspondiente al proyecto en referencia, se permite dar respuesta formal a la solicitud presentada mediante el oficio INT-ALC-007. De acuerdo a los requisitos exigidos en nuestro manual de contratación, se informa que dichas pólizas han sido revisadas y validadas, garantizando su conformidad con los requisitos establecidos.

En atención a lo anterior, se anexa a la presente comunicación copia de pólizas entregadas por el contratista de obra y la resolución de aprobación de las mismas, la cual certifica su vigencia y adecuación para respaldar el cumplimiento de las obligaciones contractuales. EMPORITO E.S.P. reafirma su compromiso con la gestión oportuna y transparente en el desarrollo del proyecto y permanece a disposición para atender cualquier consulta adicional.

Sin otro en particular, se suscribe.

MILENA ANDREA RIVERA REVELO
Gerente **EMPORITO E.S.P.**

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:	LEOS STIVEN CASAÑAS CASAÑAS	INGENIERO CIVIL	
REVISADO POR:	FABIO CAMILO RODRIGUEZ ACOSTA	ASESOR JURIDICO INTERNO	
Quienes tramitamos, proyectamos, revisamos y aprobamos el texto, declaramos que el presente documento lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto lo presentamos para la firma			

Aseguradora Solidaria de Colombia

NIT. 860.524.654-6

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS - LEY 142 DE 1994 - PATRICLSUSP03V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5607996880

PÓLIZA No: 560 - 47 - 994000183733 ANEXO: 0

AGENCIA EXPEDIDORA: **NEIVA** COD. AGENCIA: 560 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

	DIA	MES	AÑO
FECHA DE EXPEDICIÓN	24	10	2024
FECHA DE IMPRESIÓN	24	10	2024

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: **CONSTRUCCIONES, DISTRIBUIDORA Y SUMINISTROS ORITO S.A.S** IDENTIFICACIÓN: NIT **900.556.729-1**

DIRECCIÓN: CALLE 8 #11 - 77, MCO FISEL S CIUDAD: ORITO, PUTUMAYO TELÉFONO: 3132621221

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ORITO EMPORITO E.S.P.** IDENTIFICACIÓN: NIT **846.000.381-0**

BENEFICIARIO: **EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ORITO EMPORITO E.S.P.** IDENTIFICACIÓN: NIT **846.000.381-0**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION CONTRATO	AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
	CUMPLIMIENTO	22/10/2024	23/08/2025	116,969,826.51
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	22/10/2024	23/02/2028	116,969,826.51
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		VER NOTA ACLARATORIA	233,939,653.02
	CALIDAD DEL SERVICIO	22/10/2024	23/02/2025	116,969,826.51

BENEFICIARIOS
NIT 846000381 - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ORITO EMPORITO E.S.P.

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONTRATO DE OBRA No. 0190-2024 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTOR AGUAS LLUVIAS BARRIO PUERTAS DEL SOL, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

*** NOTA ACLARATORIA ***

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE CINCO AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***584,849,132.55	$ ********2,809,263	$****11,000.00	$ ******535,850	$ *********3,356,113

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
BUSTOS AGENCIA DE SEGUROS LTDA	10169	100.00			

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wa_digitalclient/#/login

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN: HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

LAS CONDICIONES GENERALES DE SU PÓLIZA SE PUEDEN DESCARGAR DE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. ASEGURADORA SOLIDARIA PENSANDO EN SU TRANQUILIDAD, LO INVITA A VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SERVICIOS – CONSULTA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000560799688

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

CBDE207F0606FA7657

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Manuel Guillermo Rueda Serrano * **Celular:** 312 342 6229 * **Correo electrónico:** defensoriasolidaria@gmail.com
Defensor del Consumidor Financiero – Suplente: Jorge Humberto Martínez Luna * **Celular:** 310 223 4304 * **Correo electrónico:** martinezlunaabogados@gmail.com
Dirección: Carrera 13A# 28-38 oficina 221, Bogotá * **Teléfono:** (601) 791 91 80 * **Fax:** (601) 791 91 80 * **Horario:** Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento
Compañía de Seguros
GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN No 00220 del 25 de octubre de 2024
Por medio de la cual se aprueba una póliza

La Gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Orito EMPORITO E.S.P., en ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, en especial las establecidas dentro del manual de contratación y,

CONSIDERANDO:

1. Que el manual de contratación acogido a través del acuerdo No 002 del 12 de marzo de 2013, establece en el capítulo III artículo 25 la constitución de garantías a favor de EMPORITO E.S.P. sobre los contratos que la empresa suscriba.

2. Que Emporito E.S.P. suscribió el 22 de octubre de 2024 contrato de obra No. 0190-2024 con la empresa CONSTRUCCIONES, DISTRIBUIDORA Y SUMINISTROS ORITO SAS identificada con NIT 900556729-1, cuyo objeto es la "CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTOR AGUAS LLUVIAS BARRIO PUERTAS DEL SOL, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."

3. Que el referido contrato establece en su cláusula DÉCIMA SEXTA GARANTÍAS *"Para garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones que asumirá el contratista por la suscripción del contrato, deberá constituir póliza de seguros a favor de EMPORITO E.S.P. ante una entidad de Seguros que se encuentre debidamente aprobada por la Superintendencia Financiera de Colombia, que ampare los siguientes siniestros y durante las siguientes vigencias:"*

AMPARO	CUANTIA	VIGENCIA
cumplimiento	Por una cuantia correspondiente al 10% del valor del contrato	Con una vigencia Igual al plazo de ejecución del contrato y seis meses más
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnización Laboral	Por una cuantia correspondiente al 10% del valor del contrato	Con una vigencia Igual al plazo de ejecución del contrato y 3 años mas
Responsabilidad civil extracontractual	Por daños a terceros en la ejecución del contrato por un valor de 200 S.M.M.L.V., por el plazo de ejecución del contrato.	Con una vigencia Igual al plazo de ejecución del contrato y dos años mas
Calidad del servicio	Por una cuantia correspondiente al 10% del valor del contrato	Con una vigencia Igual al plazo de ejecución del contrato
Estabilidad y calidad de la obra	Por una cuantia correspondiente al 20% del valor del contrato	Cinco (05) años contados a partir del acta de recibo final de la obra

4. Que para dar cumplimiento a la cláusula décima sexta (16) contrato de obra No. 0190-2024, cuyo objeto es la "CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTOR AGUAS LLUVIAS BARRIO PUERTAS DEL SOL, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.", suscrito entre las partes el día veintidós (22) de octubre de 2024, EL

CONTRATISTA presentó póliza de seguros de cumplimiento a favor de entidades estatales No. 560 – 47 – 994000183733 anexo 0, expedida el día veinticuatro (24) de octubre de 2024, por ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, identificada con Nit. 860.524.654-6, cuyo objeto de la póliza es garantizar el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista derivadas del contrato de obra celebrado entre las partes.

5. Que los amparos y vigencias de las pólizas son los siguientes:

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	PLAZO	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	22/10/2024 hasta 23/08/2025	$ 116,969,826.51
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	22/10/2024 hasta 23/02/2028	$ 116,969,826.51
Estabilidad y calidad de la obra	Tiene vigencia de cinco años, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo y entrega final de la obra	$ 233,939,653.02
Calidad del servicio	22/10/2024 hasta 23/02/2025	$ 116,969,826.51

Por lo anterior,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la póliza de seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales No. 560 – 47 – 994000183733 anexo 0, expedida el dia veinticuatro (24) de octubre de 2024, por ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, identificada con Nit. 860.524.654-6, cuyo objeto de la póliza: "es garantizar el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista derivadas de contrato de obra No.0190-2024".

ARTÍCULO SEGUNDO: La presente resolución se rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Orito EMPORITO E.S.P. a los veinticinco (25) días del mes de octubre de 2024.

MILENA ANDREA RIVERA REVELO
GERENTE EMPORITO E.S.P.

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR	LEOS STEVEN CASAÑAS CASAÑAS	INGENIERO ÁREA CIVIL	
REVISADO Y APROBADO	FABIO CAMILO RODRÍGUEZ ACOSTA	ASESOR JURÍDICO EMPORITO ESP	
Quienes tramitamos, proyectamos, revisamos y aprobamos el texto, declaramos que el presente documento lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto lo presentamos para la firma			

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT. 860.524.654-6

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

Compañía de Seguros

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5607996906

PÓLIZA No: 560 -74 - 994000033583 ANEXO:0

AGENCIA EXPEDIDORA: NEIVA — COD. AGE: 560 — RAMO: 74 — PAP:

FECHA DE EXPEDICIÓN DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DE LA PÓLIZA	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	HORAS	DIAS	FECHA DE IMPRESIÓN DIA	MES	AÑO
24	10	2024		22	10	2024	23:59 A LAS	23	02	2027	23:59 A LAS	854	24	10	2024

MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL — TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION

VIGENCIA DEL ANEXO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	HORAS	DIAS
	22	10	2024	23:59 A LAS	23	02	2027	23:59 A LAS	854

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE:: CONSTRUCCIONES, DISTRIBUIDORA Y SUMINISTROS ORITO S.A.S — IDENTIFICACIÓN: NIT 900.556.729-1

DIRECCIÓN: CALLE 8 #11 - 77, MCO FISEL S — CIUDAD: ORITO, PUTUMAYO — TELÉFONO: 3132621221

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: CONSTRUCCIONES, DISTRIBUIDORA Y SUMINISTROS ORITO S.A.S — IDENTIFICACIÓN: NIT 900.556.729-1

DIRECCIÓN: CALLE 8 #11 - 77, MCO FISEL S — CIUDAD: ORITO, PUTUMAYO — TELÉFONO: 3132621221

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS — IDENTIFICACIÓN: NIT 001-8

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: CONSTRUCCIONES, DISTRIBUIDORA Y SUMINIST NIT : 900556729

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: PUTUMAYO CIUDAD: ORITO

DIRECCION: LA ENUNCIADA EN EL CONTRATO

ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: ESTATAL MANZANA:

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO		$ 260,000,000.00		
	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	260,000,000.00		
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	260,000,000.00		
	RCE PATRONAL	260,000,000.00		
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	260,000,000.00		
	GASTOS MEDICOS	26,000,000.00		
	RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	260,000,000.00		

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES/CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS/RCE PATRONAL/VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS/RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA

BENEFICIARIOS
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA, DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA No. 0190-2024 REFERENTE A CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTOR AGUAS LLUVIAS BARRIO PUERTAS DEL SOL, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

ASEGURADO: CONSTRUCCIONES, DISTRIBUIDORA Y SUMINISTROS ORITO S.A.S NIT: 900.556.729-1 Y/O EMPRESA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EMPORITO E.S.P. NIT: 846.000.381-0
BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS Y/O EMPRESA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EMPORITO E.S.P. NIT: 846.000.381-0

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***260,000,000.00	$ ********1,216,658	$*********0.00	$ ******231,165	$ ********1,447,822

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	%PART
BUSTOS AGENCIA DE SEGUROS LTDA	10169	100.00

COASEGURO CEDIDO

NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000560799690

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CBDE207F0606FA775F

CLIENTE

YEIBUSTOS 0

RESOLUCIÓN No 00221 del 25 de octubre de 2024
Por medio de la cual se aprueba una póliza

La Gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Orito EMPORITO E.S.P., en ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, en especial las establecidas dentro del manual de contratación y,

CONSIDERANDO:

1. Que el manual de contratación acogido a través del acuerdo No 002 del 12 de marzo de 2013, establece en el capítulo III artículo 25 la constitución de garantías a favor de EMPORITO E.S.P. sobre los contratos que la empresa suscriba.

2. Que Emporito E.S.P. suscribió el 22 de octubre de 2024 contrato de obra No. 0190-2024 con la empresa CONSTRUCCIONES, DISTRIBUIDORA Y SUMINISTROS ORITO SAS identificada con NIT 900556729-1, cuyo objeto es la "CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTOR AGUAS LLUVIAS BARRIO PUERTAS DEL SOL, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."

3. Que el referido contrato establece en su cláusula DÉCIMA SEXTA GARANTÍAS "*Para garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones que asumirá el contratista por la suscripción del contrato, deberá constituir póliza de seguros a favor de EMPORITO E.S.P. ante una entidad de Seguros que se encuentre debidamente aprobada por la Superintendencia Financiera de Colombia, que ampare los siguientes siniestros y durante las siguientes vigencias:*"

AMPARO	CUANTIA	VIGENCIA
cumplimiento	Por una cuantia correspondiente al 10% del valor del contrato	Con una vigencia Igual al plazo de ejecución del contrato y seis meses más
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnización Laboral	Por una cuantia correspondiente al 10% del valor del contrato	Con una vigencia Igual al plazo de ejecución del contrato y 3 años mas
Responsabilidad civil extracontractual	Por daños a terceros en la ejecución del contrato por un valor de 200 S.M.M.L.V., por el plazo de ejecución del contrato.	Con una vigencia Igual al plazo de ejecución del contrato y dos años mas
Calidad del servicio	Por una cuantia correspondiente al 10% del valor del contrato	Con una vigencia Igual al plazo de ejecución del contrato
Estabilidad y calidad de la obra	Por una cuantia correspondiente al 20% del valor del contrato	Cinco (05) años contados a partir del acta de recibo final de la obra

4. Que para dar cumplimiento a la cláusula décima sexta (16) contrato de obra No. 0190-2024, cuyo objeto es la "CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTOR AGUAS LLUVIAS BARRIO PUERTAS DEL SOL, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.", suscrito entre las partes el día veintidós (22) de octubre de 2024, EL CONTRATISTA presentó póliza de seguros de responsabilidad civil extra contractual No. 560 – 74 – 994000033583 anexo 0, expedida el día veinticuatro (24) de octubre de 2024, por ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, identificada con Nit. 860.524.654-6, cuyo objeto de la póliza "*mediante la presente póliza, se amparan los perjuicios patrimoniales que cause directamente el asegurado con motivo de una determinada responsabilidad civil extracontractual en que incurra, de acuerdo con la ley colombiana, en virtud de la ejecución del contrato de obra No. 0190-2024 referente a construcción alcantarillado sanitario y colector aguas lluvias barrio puertas del sol, municipio de Orito, departamento del Putumayo. asegurado: construcciones, distribuidora y suministros Orito S.A.S Nit: 900.556.729-1 y/o empresa de agua potable y saneamiento básico emporito E.S.P. Nit: 846.000.381-0 beneficiario: terceros afectados y/o empresa de agua potable y saneamiento básico emporito E.S.P. Nit: 846.000.381-0*".

5. Que los amparos y vigencias de las pólizas son los siguientes:

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	PLAZO	VALOR ASEGURADO
• PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES • CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS • RCE PATRONAL • VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS • GASTOS MEDICOS • RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	22/10/2024 hasta 23/02/2027	$ 260,000,000.00

Por lo anterior,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la póliza de seguros de responsabilidad civil extra contractual No. 560 – 74 – 994000033583 anexo 0, expedida el día veinticuatro (24) de octubre de 2024, por ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, identificada con Nit. 860.524.654-6, cuyo objeto de la póliza "mediante la presente póliza, se amparan los perjuicios patrimoniales que cause directamente el asegurado con motivo de una determinada responsabilidad civil extracontractual en que incurra, de acuerdo con la ley colombiana, en virtud de la ejecución del contrato de obra No. 0190-2024 referente a construcción alcantarillado sanitario y colector aguas lluvias barrio puertas del sol, municipio de Orito, departamento del Putumayo. asegurado: construcciones, distribuidora y suministros Orito S.A.S Nit: 900.556.729-1 y/o empresa de agua potable y saneamiento básico emporito E.S.P. Nit: 846.000.381-

0 beneficiario: terceros afectados y/o empresa de agua potable y saneamiento básico emporito E.S.P. Nit: 846.000.381-0.

ARTÍCULO SEGUNDO: La presente resolución se rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Orito EMPORITO E.S.P. a los veinticinco (25) días del mes de octubre de 2024.

MILENA ANDREA RIVERA REVELO
GERENTE EMPORITO E.S.P.

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR	LEOS STEVEN CASAÑAS CASAÑAS	INGENIERO ÁREA CIVIL	
REVISADO Y APROBADO	FABIO CAMILO RODRÍGUEZ ACOSTA	ASESOR JURÍDICO EMPORITO ESP	
Quienes tramitamos, proyectamos, revisamos y aprobamos el texto, declaramos que el presente documento lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto lo presentamos para la firma			

SERVICON CS S.A.S.
Juntos Trabajando
NIT: 900.949.050-7

Orito, 27 de noviembre del 2024

GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
Fecha: 27-11-2024
Recibido por: Anderson M
Registro No. 6174
No. Folios: Hora: 17:05

Señores:
OFICINA DE CONTRATACION DEPARTAMENTAL
Gobernación del Putumayo

ASUNTO: entrega de pólizas

Cordial saludo,

Mediante la presente me permito hacer entrega de las pólizas para el contrato No. 1695 de 2023 cuyo objeto es Contrato No. 1695-2024 del 03 de septiembre de 2024, denominado**: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS BARRIO PUERTAS DEL SOL, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO INTERVENTORÍA**. el cual será ejecutado por **SERVICON CS SAS.**

Se hace entrega de la Póliza No. 11-44-101234140 - **ANEXO 0**; No. 11-44-101234140 - **ANEXO 1** y la póliza No. 11-44-101234140 - **ANEXO 2,** tomada con **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

Cordialmente,

ELIANA ANDREA CEBALLOS ARÉVALO
R. Legal SERVICON CS S.A.S

Celular: 3144181561 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

Escaneado con CamScanner

SERVICON CS S.A.S.
Juntos Trabajando
NIT: 900.949.050-7

Rdo PDA = 329
Minon Pantoja
27 - Nov - 2024
Hora: 5:01 pm.

Orito, 27 de noviembre del 2024

Ingeniero:
JORGE ANDRÉS CORTEZ VERA
Secretario de Infraestructura Departamental
Gobernación del Putumayo

ASUNTO: entrega de pólizas

Cordial saludo,

Mediante la presente me permito hacer entrega de las pólizas para el contrato No. 1695 de 2023 cuyo objeto es Contrato No. 1695-2024 del 03 de septiembre de 2024, denominado**: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS BARRIO PUERTAS DEL SOL, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO INTERVENTORÍA**. el cual será ejecutado por **SERVICON CS SAS.**

Se hace entrega de la Póliza No. 11-44-101234140 - **ANEXO 0**; No. 11-44-101234140 - **ANEXO 1** y la póliza No. 11-44-101234140 - **ANEXO 2,** tomada con **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

Cordialmente,

ELIANA ANDREA CEBALLOS ARÉVALO
R. Legal SERVICON CS S.A.S

Celular: 3144181561 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

Escaneado con CamScanner

Orito, 03 de octubre del 2024

Señor:

JORGE ANDRÉS CORTEZ VERA
Secretario de Infraestructura Departamental
Gestor del Plan de Departamental de Aguas Putumayo
Gobernación del Putumayo

Ref.: Contrato No. 1695-2024 del 03 de septiembre de 2024, denominado: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS BARRIO PUERTAS DEL SOL, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO INTERVENTORÍA.

ASUNTO: Solicitud de información correspondiente al Contrato No. 1695-2024 del 03 de septiembre de 2024.

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta que la empresa SERVICON CS SAS representada por la señora ELIANA ANDREA CEBALLOS ARÉVALO, quien actualmente tiene suscrito el Contrato de interventoría No. 1695-2024 del 03 de septiembre de 2024, requiere la siguiente información pertinente al contrato en mención:

- Copia del convenio y origen de los recursos
- Copia del contrato de obra
- Pólizas, resolución de aprobación de las pólizas del contrato
- Copia del contrato de interventoría

La anterior información se solicita con el fin dar cumplimiento a las funciones de la interventoría para realizar seguimiento vigilancia, control al contrato de obra.

Cordialmente,



ELIANA ANDREA CEBALLOS ARÉVALO
R. Legal SERVICON CS S.A.S

Orito, 23 de octubre del 2024

Señora:
MILENA RIVERA REVELO
GERENTE EMPORITO ESP

Ref.: Contrato No. 1695-2024 del 03 de septiembre de 2024, denominado: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS BARRIO PUERTAS DEL SOL, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO INTERVENTORÍA.

ASUNTO: Solicitud de documentación

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta que la empresa SERVICON CS SAS identificada con NIT 900.949.050-7 y representada legalmente por la señora ELIANA ANDREA CEBALLOS ARÉVALO, tiene suscrito el Contrato de interventoría No. 1695-2024 del 03 de septiembre de 2024 con la GOBERNACION DEL PUTUMAYO, se solicita su colaboración con el suministro de la información pertinente al proyecto en referencia:

- Documentación precontractual
- Documentación contractual

La anterior información se solicita a EMPORITO ESP quien ha sido designado como ejecutor, con el fin dar cumplimiento a las funciones de la interventoría para realizar seguimiento vigilancia, control al contrato de obra.

Cordialmente,



ELIANA ANDREA CEBALLOS ARÉVALO
R. Legal SERVICON CS S.A.S

Orito, 8 de noviembre del 2024

Señora:
MILENA RIVERA REVELO
GERENTE EMPORITO ESP

Ref.: Contrato No. 1695-2024 del 03 de septiembre de 2024, denominado: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS BARRIO PUERTAS DEL SOL, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO INTERVENTORÍA.

ASUNTO: Respuesta oficio EXT-0452-2024

Cordial saludo,

De acuerdo a su solicitud, se envía la información del Contrato de Interventoria en referencia, asi como también se adjunta la información del proyecto suministrada por el PDA del Departamento de Putumayo.

Cordialmente,

ELIANA ANDREA CEBALLOS ARÉVALO
R. Legal SERVICON CS S.A.S

Orito, 12 de noviembre del 2024

Señores:
CODISUM S.A.S
R.L RENE ESTUARDO ORTEGA

Ref.: Contrato No. 1695-2024 del 03 de septiembre de 2024, denominado: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS BARRIO PUERTAS DEL SOL, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. INTERVENTORÍA.

ASUNTO: Solicitud de documentación Contrato de obra No 0190-2024.

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta que la empresa SERVICON CS SAS identificada con NIT 900.949.050-7 y representada legalmente por la señora ELIANA ANDREA CEBALLOS ARÉVALO, tiene suscrito el Contrato de interventoría No. 1695-2024 del 03 de septiembre de 2024 con la GOBERNACION DEL PUTUMAYO, se solicita su colaboración con el suministro de la información pertinente al Contrato de obra No 0190-2024:

- Hojas de vida necesarias del equipo mínimo.
- Afiliaciones del personal vinculado al proyecto.
- Pólizas actualizadas según acta de inicio.

La anterior información se solicita con el fin dar cumplimiento a las funciones de la interventoría para realizar seguimiento vigilancia y control al contrato de obra en referencia.

Cordialmente,



ELIANA ANDREA CEBALLOS ARÉVALO
R. L SERVICON CS S.A.S

Orito, 18 de noviembre del 2024

Señora:
MILENA RIVERA REVELO
GERENTE EMPORITO ESP

Ref.: Contrato No. 1695-2024 del 03 de septiembre de 2024, denominado: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS BARRIO PUERTAS DEL SOL, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO INTERVENTORÍA.

ASUNTO: respuesta a oficio EXT-0463-2024. Solicitud de chequeo de planos del nuevo levantamiento topográfico al contrato de obra 0190-2024.

Cordial saludo,

De acuerdo con la solicitud recibida mediante el oficio EXT-0463-2024 de fecha 13 de noviembre del 2024, se informa que la comisión topográfica de la interventoría en conjunto con personal del contratista de obra, realizaron el chequeo topográfico con el respectivo plano, dicha información se anexa a la presente respuesta mediante medio magnético.

Cordialmente,

ELIANA ANDREA CEBALLOS ARÉVALO
R. Legal SERVICON CS S.A.S

Orito, 19 de noviembre del 2024

Señora:
MILENA RIVERA REVELO
GERENTE EMPORITO ESP

Atn. **CODISUM S.A.S**
R.L RENE ESTUARDO ORTEGA

Ref.: Contrato No. 1695-2024 del 03 de septiembre de 2024, denominado: "CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS BARRIO PUERTAS DEL SOL, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. INTERVENTORÍA".

ASUNTO: Citación Comité técnico No 1

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta que la empresa contratista CODISUM S.A.S actualmente tiene suscrito el Contrato Civil de obra No 0190-2024 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS BARRIO PUERTAS DEL SOL, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO", la interventoría extiende la invitación para realizar comité técnico el día jueves 21 de noviembre del 2024 a las 4:00 pm en la oficina de interventoría ubicada en el barrio la unión.

Lo anterior para tratar temas técnicos, avance y programación de la obra.

Cordialmente,

ELIANA ANDREA CEBALLOS ARÉVALO
R. Legal SERVICON CS S.A.S

INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL No. 01

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1695-2024

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS BARRIO PUERTAS DEL SOL, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. INTERVENTORÍA.

28 DE OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024
MUNICIPIO DE ORITO
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN---3
2. OBJETIVOS---4
2.1. OBJETIVO GENERAL---4
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS---4
3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO---5
4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO---7
5. GENERALIDADES CONTRACTUALES---8
6. GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL CONTRATISTA---10
6.1. ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA---10
6.2. REVISIÓN DOCUMENTAL---10
7. SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL---10
7.1. PROGRAMA DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL---11
7.1.1. Programa de información y participación comunitaria---11
7.1.2. Programa de contratación de mano de obra local---13
7.1.3. Plan de capacitación, educación y concientización ambiental y social a la comunidad aledaña al proyecto---14
7.2. ACTIVIDADES DE ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN---15
7.2.1. Plan de instalación de obras---15
7.2.2. Uso y almacenamiento de materiales y elementos de construcción---17
7.2.3. Plan de manejo de aguas residuales y calidad de los efluentes domésticos---21
7.2.4. Plan de seguridad vial y manejo de tránsito---22
7.2.5. Programa de manejo de aguas superficiales---23
7.2.6. Plan de contingencia, riesgos y respuestas a emergencias---25
7.2.7. Plan de reforestación zonas intervenidas---25
7.3. PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS Y ESCOMBROS---26
7.3.1. Plan de manejo de desechos sólidos y su debido tratamiento y disposición final---26
7.4. PROGRAMA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL PROYECTO---29
7.4.1. Programa de educación y capacitación al personal vinculado al proyecto---29
7.4.2. Plan de Salud y Seguridad en el trabajo---30
8. PRESUPUESTO EJECUTADO---31
9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES---32

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe describe el seguimiento realizado al Plan de Manejo Ambiental PMA en la ejecución del proyecto denominado: **"CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS BARRIO PUERTAS DEL SOL, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"**, derivando el Contrato de Obra No 0190-2024, cuyo objeto es la referencia y el cual tiene una duración de 04 (cuatro) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

La interventoría realizó seguimiento al cumplimiento de las actividades encaminadas a prevenir, minimizar, mitigar y compensar los impactos ambientales negativos y fortalecer los positivos que conlleven su ejecución según la normatividad ambiental vigente y los lineamientos ambientales especificados dentro de los estudios previos del Proyecto.

A continuación, se presenta el informe mensual No 01 que comprende el seguimiento realizado por la interventoría para las actividades del PMA programadas en el desarrollo de este proyecto desde el 28 de octubre al 27 de noviembre de 2024.

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

Seguimiento a la ejecución del Plan de Manejo Ambiental y herramientas para la implementación de medidas para el manejo, prevención, mitigación, control, protección, vigilancia o compensación de impactos ambientales previstos durante las actividades de la Construcción alcantarillado sanitario y colector de aguas lluvias barrio puertas del sol, en el municipio de Orito, departamento del Putumayo.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades de los programas del PMA para la construcción del proyecto.

- Asegurar el cumplimiento de la legislación, reglamentación y normativa ambiental aplicable a las actividades que se realicen y adoptar compromisos en materia de medio ambiente.

- Ejecutar diferentes programas de gestión ambiental, social y de seguridad, que apliquen según las condiciones del proyecto establecidas en el PMA.

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El contrato de obra No 1695-2024, se ejecutará las actividades en el barrio Puertas del Sol, en el municipio de Orito, departamento del Putumayo.

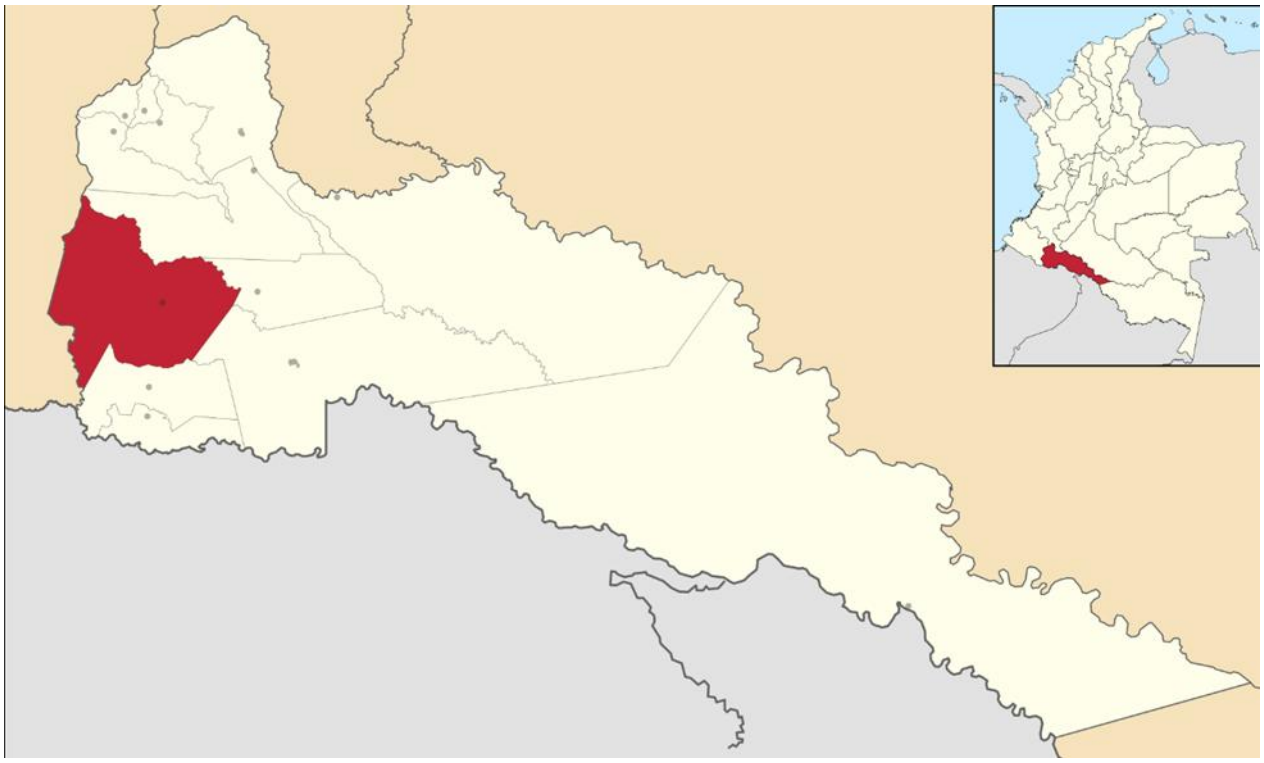


Figura 1. Municipio de Orito - Putumayo

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

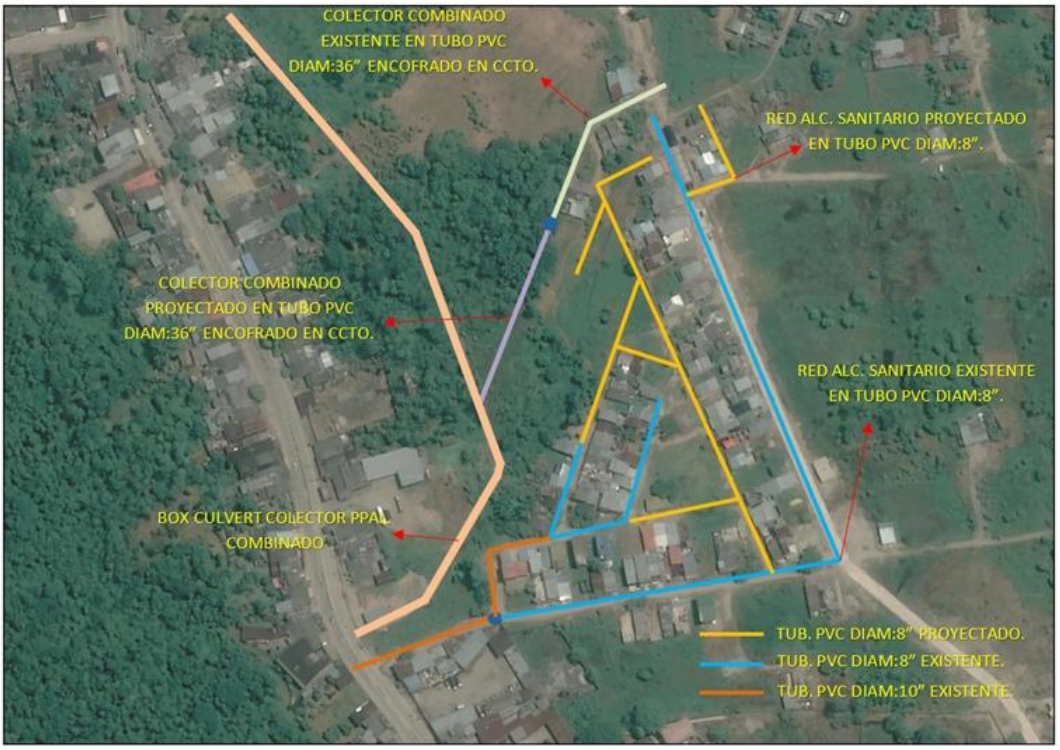


Figura 2. Ubicación tramos a intervenir del Proyecto- B/ Puertas del sol-Orito Putumayo

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Dentro del municipio de Orito, teniendo en cuenta la necesidad de mejorar la calidad de vida de las personas, de proteger los derechos a la salud y el bienestar social de la población, mediante la prestación de servicios de saneamiento básico, se ha planteado este proyecto el cual tiene por objeto **"CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS BARRIO PUERTAS DEL SOL, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"**, donde se contemplan la instalación de alcantarillado pluvial sanitario y colector de aguad lluvias.

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

5. GENERALIDADES CONTRACTUALES

Tabla No 1. Datos contractuales del contrato de Obra

CONTRATO No.	0190-2024
OBJETO	"CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS BARRIO PUERTAS DEL SOL, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO" "
ENTIDAD CONTRATANTE	EMPORITO ESP
NIT	846000381-0
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES, DISTRIBUIDORA Y SUMINISTROS ORITO S.A.S CODISUM R.L RENE ESTUARDO ORTEGA NOVOA CC.18.145.945 de Orito Putumayo
NIT	900556729-1
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$1.169.698.265,10
INTERVENTORÍA	SERVICON CS SAS R.L. ELIANA ANDREA CEBALLOS ARÉVALO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	22 DE OCTUBRE DEL 2024
FECHA DE INICIO	28 DE OCTUBRE DEL 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	28 DE FEBRERO DEL 2025
PLAZO DEL CONTRATO	CUATRO (04) MESES

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

Tabla No 2. Datos contractuales del contrato de Interventoría

CONTRATO No	No 1695-2024
OBJETO	"CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS BARRIO PUERTAS DEL SOL, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO- INTERVENTORÍA"
ENTIDAD CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
NIT	800094164-4
CONTRATISTA	SERVICON CS SAS R.L. ELIANA ANDREA CEBALLOS ARÉVALO CC. 1.123.333.549 de Orito Put.
NIT	900.949.050-7
VALOR DEL CONTRATO	$ 77.611.800
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA DE INICIO	28 DE OCTUBRE DEL 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	27 DE FEBRERO DEL 2024
PLAZO DEL CONTRATO	CUATRO (04) MESES

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

6. GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL CONTRATISTA

En el periodo transcurrido entre el 28 de octubre al 27 de noviembre del 2024 en la ejecución del proyecto “CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS BARRIO PUERTAS DEL SOL, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO” el contratista ha destinado los materiales, equipo y el personal necesario para realizar las actividades objeto del contrato.

6.1. ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA

- Realizar seguimiento y control del PMA, para cumplimiento de todos los objetivos y metas, con el fin de mitigar el impacto ambiental que se pueda generar en la ejecución de las activades constructivas.
- Realizar observaciones a los procedimientos propuestos
- Realizar revisión de los informes ambientales presentados por el contratista de obra y proponer observaciones.
- Realizar sugerencias para la implementación de actividades
- Acompañamiento en obra
- Seguimiento presupuesto asignado PMA

6.2. REVISIÓN DOCUMENTAL

Para el presente periodo se inició con la ejecución de actividades, el contratista de obra e Interventoría realizaron las labores de revisión de documentación de las actividades de gestión del medio ambiente y gestión social realizadas por el contratista en virtud de las obligaciones contractuales.

7. SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Se inició la ejecución de actividades constructivas en obra, y de la misma manera con el cumplimento de las actividades establecidas en el PMA, se realizó trabajo en conjunto con los profesionales del área ambiental y de salud ocupacional. Una de las tareas principales de la interventoría es realizar revisión a cada uno de los programas del PMA y sus requerimientos para que sean implementados en la obra.

A continuación, se menciona el seguimiento y avance en los respectivos programas establecidos en el PMA para el proyecto.

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

7.1. PROGRAMA DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL

7.1.1. Proyecto de información y participación comunitaria

El presente proyecto tiene como objetivo brindar información clara, veraz, oportuna y suficiente a la población del área de influencia directa, a las autoridades locales, Juntas de Acción Comunal y líderes comunitarios.

Para el cumplimento de este programa la interventoría verificó que se realizaron las siguientes actividades:

Se realizó reunión de inicio (socialización) con los habitantes del barrio puertas del sol, donde se sustentó las actividades a desarrollarse, tiempos de ejecución, personal requerido, y demás información referente al contrato.

Para el presente periodo se evidenció que se realizó la conformación de la veeduría ciudadana, queda pendiente anexar la inscripción mediante una resolución ante el personero municipal.

A continuación, se relaciona las personas que conforman la veeduría ciudadana.

NOMBRE	IDENTIFICACION	CELULAR
Luis Hernando Burgos	98396794	3126311463
Nancy Lasso	41107651	3108497608
Orlando Fernández	72340694	3212399535

Por otra parte, posterior a la conformación de la veeduría ciudadana, se verificó que se realizó la conformación y consolidación del Comité de Participación Comunitaria, mediante el acta 01 realizada el día 28 de octubre en el barrio Puertas del Sol, donde se indican los roles de cada cargo y el objetivo de la conformación del presente comité.

Personas que conforman el comité de Participación Comunitaria

NOMBRE	IDENTIFICACION	CELULAR
Julio Mejía	18.142.471	3203995867
Marisol de Jesús Agudelo	41.107.351	3138204213
Lucely Varona Gonzales	34.674.790	3118775617

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

En el informe ambiental de obra se presenta los siguientes anexos:

Anexo 1.1. Acta de Reunión Acta de Socialización -inicio del proyecto.

Anexo 1.2. Acta de conformación de veeduría ciudadana

Anexo 1.3. Acta de Conformación de comité de participación comunitaria

Teniendo en cuenta el ítem de seguimiento para el presente programa, el contratista de obra presenta el siguiente anexo:

Anexo 1.4. Lista de chequeo semanal G1

Por otra parte, el contratista de obra en el informe técnico relaciona como ***anexo las actas de vecindad levantadas en el área de influencia directa del proyecto.***



Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo



Imagen No 1-2. Reunión – Socialización inicio del proyecto – Puertas del sol

7.1.2. Programa de contratación de mano de obra local

Tiene como objetivo controlar la contratación de la mano de obra requerida en el desarrollo del proyecto, donde se ha establecido que como mínimo el 75% del personal de obra calificado y no calificado para la ejecución del proyecto, deben tener domicilio en la zona urbana y rural de Orito.

La interventoría verificó que, el contratista en la reunión de socialización del proyecto informó los requisitos para la contratación del personal mano de obra no calificada requeridos para la ejecución de las actividades constructivas, lo cual era necesario hacer llegar las hojas de vida de las personas interesadas a la empresa, proceso que se manejó por medio de la JAC del barrio Puertas de sol. La generación de empleo para para el periodo reportado, se contó con un total de 18 empleados trabajando, e indirectos 4 personas que están generando el proyecto a la región un movimiento de importante a la economía del contexto.

En el informe ambiental de obra se presenta el siguiente anexo:

Anexo 2.1. Formato Generación de empleo octubre -noviembre

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

Teniendo en cuenta el ítem de seguimiento para el presente programa, el contratista de obra presenta el siguiente anexo:

Anexo 2.2 Lista de chequeo semanal G2

7.1.3. Plan de capacitación, educación y concientización ambiental y social a la comunidad aledaña al proyecto

Tiene como objetivo brindar a la comunidad del área del proyecto información oportuna acerca de las condiciones técnicas del mismo, situaciones de riesgo, alcances, actividades constructivas, duración, efectos positivos y negativos causados sobre el ambiente natural y social, mediante capacitación, educación y concientización ambiental.

La interventoría verificó que el contratista de obra realizó taller de concientización a los habitantes de las zonas aledañas al proyecto, con la temática: *Manejo, clasificación y aprovechamiento de residuos sólidos.*

En el informe ambiental de obra se presenta los siguientes anexos:

Anexo 3.1 Acta de reunión -comunidad aledaña al área de influencia del proyecto y trabajadores *y el* ***Anexo 3.2. lista de chequeo G3.***



Imagen No 3. Reunión – Capacitación a los habitantes de las zonas aledañas al proyecto y trabajadores.

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

7.2. ACTIVIDADES DE ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN

El cumplimiento de este programa busca minimizar los impactos sobre el ambiente causados por el manejo de agregados pétreos, materiales para construcción, manejo de concretos durante el desarrollo de la obra.

7.2.1. Plan de instalación de obras

El presente proyecto tiene como objetivo prevenir, minimizar y controlar los impactos generados por la instalación, operación y desmantelamiento del campamento y áreas de acopio temporal, mediante la Implementación de los mecanismos necesarios para manejar adecuadamente los impactos que la construcción de campamentos pueda causar al equipamiento e infraestructura comunitarios, así como el manejo de los servicios públicos que se demanden o intercepten.

Para el presente periodo la interventoría verificó el cumplimiento de las siguientes actividades:

Se adecuó una bodega temporalmente para el almacenamiento de los materiales de construcción, donde se da manejo de acuerdo mediante la implementación de plásticos para cubrimiento de materiales.

Se adecuado temporalmente la oficina, correspondiente al área administrativa de trabajo, se implementaron elementos de primeros auxilios tales como: Extintor, camilla rígida de plástico, cuello ortopédico, botiquín de primeros auxilios, extintor.





Imagen No 4-5. Adecuacion bodega- oficia en obra

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo



Imagen No 6. Instalación de elementos de primeros auxilios en obra



Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo



Imagen No 7-8. Instalación de plástico en campamento y adecuación del suelo con recebo.

En el informe ambiental de obra se presenta el siguiente anexo:

Anexo 4.1. Formato Lista de chequeo M1.

7.2.2. Uso y almacenamiento de materiales y elementos de construcción

Teniendo en cuenta que los materiales pétreos utilizados para la ejecución de las actividades deben provenir de fuentes legales, contar con los permisos ambientales y mineros. La interventoría verificó que los comercializadores de los materiales pétreos cuentan con la respectiva documentación legal de fuentes de materiales.

En el informe ambiental de obra se presenta los siguientes anexos:

Anexo 5.1. Documentación legal (Licencia ambiental mediante la Resolución 1142 del 18 noviembre del 2011) y Anexo 5.2. Certificado de Registro Minero.

Anexo 5.2. Formato lista de chequeo M2.

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

De manera periódica se realiza recomendaciones para el adecuado manejo de los materiales de construcción dentro de la obra; tales como:

Para el manejo de los materiales de construcción se recomienda que su almacenamiento temporal en las instalaciones o frentes de obra se utilicen lonas de protección que impidan el contacto con las aguas de escorrentía y emisión de material particulado por acción eólica.

Para el manejo adecuado del cemento, acero, prefabricados, tuberías, etc., se recomienda una zona donde se puedan acopiar estos materiales de manera óptima, con las alturas máximas de acopio, aislamiento del suelo y del agua haciendo uso de estibas.

Los vehículos para el transporte de materiales deben contar con platones o contenedores adecuados y en buen estado.

El material transportado no puede sobrepasar los bordes superiores más bajos del contenedor o platón. Las compuertas de cargue y descargue deben permanecer, durante el transporte, debidamente cerradas y aseguradas.

Se realizó recomendación para control de la velocidad de volquetas en la obra, que no sea mayor a 20 km/h con el fin de disminuir las emisiones fugitivas y prevenir accidentes de trabajo.

El mantenimiento de los equipos y maquinaria debe garantizar la perfecta combustión de los motores, con el objeto de disminuir las emisiones contaminantes.

La interventoría verificó el cumplimento de las siguientes actividades:

El contratista cuenta con una bodega para realizar el almacenamiento de los materiales utilizados en la ejecución de la obra como: Cemento, varillas, tuberías, etc.

Se verificó que los materiales pétreos que se utilizaron en la obra fueron resguardados del agua y el viento, se utilizó plástico para su protección, con el fin de evitar contaminación del aire y el suelo.

La interventoría verificó el cumplimiento de las inspecciones preoperacionales, de acuerdo con el cronograma establecido para el presente periodo.

La interventoría verificó que para el presente periodo no se generó RDC que haya requerido manejo adecuado para la disposición final en escombrera.

Se encuentra en trámite realizar la donación del material proveniente de las excavaciones de la instalación de alcantarillado, siguiendo las directrices de la resolución 1257 del 2021.

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo







Imagen No 9-11. Almacenamiento temporal materiales de construcción (cemento, tuberías, herramientas, equipos)





Imagen No 12-13. Cubrimientos de materiales de construcción

7.2.3. Plan de manejo de aguas residuales y calidad de los efluentes domésticos

El presente proyecto tiene como objetivo establecer medidas para controlar y mitigar los impactos generados por los vertimientos de aguas residuales resultantes del funcionamiento de campamentos.

La interventoría verificó que, para el presente periodo, el contratista de obra alquiló la caseta comunal para campamento temporal, cuenta con 2 unidades sanitarias, las cuales cumplen con la normatividad colombiana siendo en proporción de uno (1) por cada quince (15) trabajadores. Se evidenció que se realizan jornadas de limpieza de los sanitarios.

Por otra parte, el contratista de obra implementó un kit antiderrames, en caso de requerirse en la obra.



Imagen No 14. Kit antiderrames -implementado en obra

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo





Imagen No 15-16. Baño en campamento- instalación de equipo contraincendios (extintor)

7.2.4. Plan de seguridad vial y manejo de tránsito

Para dar cumplimento a este programa se considera necesario el cerramiento de todas las áreas de trabajo demarcando completamente el sitio de la obra con cinta peligro, de igual manera la instalación de avisos preventivos para las excavaciones, de acordonar dentro de la señalización del frente de obra los materiales que sean necesarios para el desarrollo de esta.

Este proyecto se describe en el informe Plan de Manejo de Tránsito

La interventoría verificó el cumplimiento de las siguientes actividades:

- Implementación de señales de tránsito requeridas para en el desarrollo de la obra, controladores viales, uso de paletas de PARE, cintas de demarcación, con el fin de garantizar la seguridad e integridad de peatones y trabajadores, de acuerdo con los requerimientos de la obra.

- Implementación de señalización de áreas de trabajo con letreros preventivos y acordonamiento de materiales dispuestos en obra.

7.2.5. Programa de manejo de aguas superficiales

El presente proyecto tiene como objetivo el manejo adecuado de aguas superficiales, que pueden verse afectadas por la construcción de obra, se incluye el manejo de aguas lluvias y de escorrentía superficial.

La interventoría realiza recomendaciones para cada periodo, tales como:

- Se prohíbe el lavado, reparación y mantenimiento general de vehículos y equipos en los frentes de obra, esta actividad deberá ser realizada por el responsable del vehículo y fuera de la obra.

- Todo vehículo y/o equipo que funcione con sistemas de combustión, debe realizar el mantenimiento necesario que garantice reacciones de combustión completa en su funcionamiento.

- El personal encargado deberá brindar capacitación al personal de obra sobre el manejo de maquinaria, vehículos y equipos en la obra, realizar inspección rutinaria de los mismos verificando su perfecto estado de funcionamiento, la combustión de los motores, el ajuste de los componentes mecánicos, el balanceo y la calibración de las llantas.

- No eliminar el material sobrante con agua, ni dirigirlo a los canales de desagüe.

- Adecuar un sitio especial para el almacenamiento de materiales lo más alejado posible de los cuerpos de agua, el cual contenga un cerramiento en malla sintética que evite la dispersión del material a causa de la acción erosiva del viento y/o del agua.

La interventoría verificó que el contratista implementó un kit ambiental antiderrame, en caso de que se llegará presentar algún derrame en el suelo de alguna sustancia contaminada.

Para el manejo de aguas lluvias, el contratista realizó canalización de agua en las calles intervenidas.

En el informe ambiental de obra se presenta el siguiente anexo:

Anexo 6.1. Formato lista de chequeo M5

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo



Imagen No 17. Recubrimiento Volco para el cargue de materiales pétreos



Imagen No 18. Almacenamiento de aceites, combustible en la obra con su respectiva rotulación

7.2.6. Plan de contingencia, riesgos y respuestas a emergencias

El presente proyecto tiene como objetivo la implementación de un Plan de Contingencias, el cual debe dirigirse a puntualizar el sistema de organización y los procedimientos específicos por punto crítico para enfrentar situaciones de calamidad, desastre o emergencia en un lugar y período determinados o para unas condiciones puntuales que se presenten en el lugar donde se desarrolla la obra.

La interventoría verificó que el contratista de obra cuenta con el plan de contingencias y emergencias adaptado para proyecto, donde se dispone de recursos técnicos y organización para la atención y respuesta a cualquier emergencia.

Por otra parte, se verificó que el periodo reportado se realizó la conformación de la brigada de emergencias.

- Se recomienda realizar la socialización con los trabajadores y se deberán efectuar simulacros para capacitación y entrenamiento.

  En el informe ambiental de obra se presenta los siguientes anexos:

  Anexo 7.1. Acta de conformación de la brigada de emergencias
  Anexo 7.2. Documento plan de Contingencia CODISUM SAS
  Anexo 7.3. Formato lista de chequeo M6.

7.2.7. Plan de reforestación zonas intervenidas

El cumplimiento del presente proyecto tiene como objetivo establecer los lineamientos para las compensaciones forestales a que haya lugar, y que hayan sido requeridas dentro de los permisos ambientales que otorgue CORPOAMAZONÍA, buscando garantizar el mínimo impacto al componente arbóreo y vegetal y establecer los procedimientos para realizar el manejo de la vegetación herbácea, arbustiva y arbórea que se encuentren en el área del proyecto.

De acuerdo con las características iniciales del terreno para el desarrollo de las actividades en obra, se encontró que el área a intervenir estaba compuesta por cobertura vegetal menor, principalmente hierbas y algunos árboles con diámetros menores a 10 cm en el área donde se requiere intervenir, algunas especies mayores existentes en el terreno no se requieren intervenir. Hasta la fecha, No se ha visto afectada la alteración del paisaje en fauna y flora.

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

Este ítem se manejará una vez se hayan culminado las actividades constructivas del proyecto, teniendo en cuenta las características finales del área intervenida. Hasta la fecha no se ha requerido solicitar permiso de aprovechamiento forestal.

7.3. PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS Y ESCOMBROS

El cumplimiento del presente programa tiene como objetivo manejar adecuadamente los residuos sólidos e industriales, material reutilizable generados durante las actividades de construcción.

7.3.1. Plan de manejo de desechos sólidos y su debido tratamiento y disposición final

La interventoría recomienda, para la separación de residuos, se realice teniendo en cuenta el código de colores establecido de acuerdo con la normatividad vigente, se cuenta con son los siguientes:

Bolsa Blanca: residuos aprovechables, reciclables como papel, cartón, botellas plásticas, bolsas plásticas.

Bolsa Verde: residuos orgánicos aprovechables como restos de comida, desechos agrícolas.

Bolsa Negra: residuos no aprovechables como papel higiénico, servilletas, papeles y cartones contaminados con comida, papeles metalizados.

Clasificación y manejo de los residuos solidos

Los residuos generados en el proyecto son clasificados y almacenados temporalmente en obra, posteriormente se deberá realizar la gestión para cada uno de ellos, como lo es residuos reciclables, no aprovechables y peligros, especiales con empresas que cuenten con la documentación legal.

La interventoría verificó el manejo de los residuos generados en la obra, lo cual se realizó de la siguiente manera:

Residuos reciclables

La interventoría verificó que, para el presente periodo no se generados residuos reciclables, en caso de generarse se recomienda realizar su aprovechamiento mediante donación a un

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

reciclador del área de influencia, de esta manera los residuos reciclables son incorporados nuevamente al ciclo productivo mediante su aprovechamiento, reutilización y comercialización.

Residuos no Aprovechables

El contratista realizó entrega de los residuos sólidos No aprovechables a la empresa de Servicios Públicos Emporito ESP del municipio de Orito, para su transporte, manejo y disposición final de estos residuos. Para el presente informe se reporta 20 kilogramos de material no aprovechable.

Residuos peligrosos (Contaminados, especiales)

Para el caso de los residuos especiales tales como sacos de cemento, lubricantes, aceites, combustibles, etc, se recomienda realizar la gestión para el transporte, tratamiento y disposición final con una empresa autorizada con documentación legal en regla que se encargará de su transporte y disposición final de manera adecuada, de manera que no cause afectación al medio ambiente y a la salud de las personas.

Tabla No 3. Relación de residuos provenientes en la obra- corte 27 de noviembre-24

Tipo de residuos	Cantidad Kg	Entregado
Residuos reciclables (plástico y cartón)	0	
Ordinarios no aprovechables	20	EMPORITO E.S.P
Residuos peligrosos (Contaminados, Especiales) Sacos de cemento		Almacenamiento temporal en obra
Total	**20 kilogramos**	

La interventoría recomienda solicitar la certificación de la entrega de los residuos sólidos a la empresa emporito ESP.

Para el presente periodo el contratista de obra informa se realizó almacenamiento temporal de los residuos no aprovechables, queda pendiente darles manejo en el siguiente periodo.

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo





Imagen No 19-20. Puntos ecológicos instalados en obra

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

7.4. PROGRAMA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL PROYECTO

7.4.1. Programa de educación y capacitación al personal vinculado al proyecto

El presente proyecto tiene como objetivo establecer los lineamientos para educación y capacitación a todo el personal del proyecto en temas técnicos, ambientales, sociales y en seguridad y salud en el trabajo relacionados con el proyecto. Asimismo, generar estrategias de apropiación del proyecto a través de procesos de educación y sensibilización con la mano de obra Crear espacios para la participación y sensibilización a través de la socialización de temas de interés.

La interventoría verificó el cumplimiento de las actividades de capacitación y charlas en temas ambientales para la concientización, cuidado y protección de los recursos naturales, manejo de residuos, entre otros temas encaminados a prevenir, mitigar, reducir impactos ambientales negativos que se pueden generar durante la ejecución de las actividades. Por otra parte, dio aprobación para la realización de estas.

De acuerdo con la revisión realizada por parte de la interventoría, se avaló el cronograma mensual de charlas y capacitaciones programadas para el periodo ejecutado, y se verificó la realización de estas mediante las listas de asistencia.

A continuación, se presenta la relación de charlas y capacitación en temas ambientales realizados en el presente periodo.

Tabla No 4. Temas charlas y capacitación mensuales desarrolladas

TEMA A TRATAR	FECHA REALIZADA
Charla: Conciencia Ambiental	09/11/2024
Charla: Manejo de residuos solidos	18/11/2024
Charla: Orden y aseo	27/11/2024

El contratista de obra presenta en el informe de SST el *anexo de Registro de asistencia de Charlas- capacitaciones ambientales y* en el informe ambiental de obra presentan el siguiente anexo:

- ***Anexo 8.1. Formato lista de chequeo E1.***

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo



Imagen No 21. Charlas ambientales

7.4.2. Plan de Salud y Seguridad en el trabajo

El presente proyecto tiene como objetivo evitar, minimizar y mitigar los inconvenientes de los trabajadores y a la comunidad a causa de accidentes potenciales que se pueden presentar. Asimismo, dar a conocer a todo el personal involucrado en el proyecto, las políticas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y medio ambiente.

La interventoría verificó el cumplimiento de actividades tales como:

- Realización de exámenes de ingreso al personal vinculado al proyecto
- Realización de inducción al personal vinculado al proyecto

El presente programa se especifica con mayor detalle en el informe de SST de interventoría.

El contratista de obra presenta en el informe ambiental de obra el siguiente anexo:

- ***Anexo 9.1. Formato lista de chequeo E2.***

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

8. PRESUPUESTO EJECUTADO

Para el presente periodo de acuerdo con las actividades realizadas en obra, se presenta la ejecución del **58%**, correspondiente a un valor de **$ 9.102.000,00 MCTE.**

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS BARRIO PUERTAS DEL SOL, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	VALOR FINANCIERO EJECUTADO MES 1	VALOS ASIGANADO PARA EL PROYECTO
G1. PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	$ 267.500,00	$ 1.360.000,00
G2.PROGRAMA DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL	$ 300.000,00	$ 300.000,00
G3.PLAN DE CAPACITACIÓN, EDUCACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL A LA COMUNIDAD	$ 1.332.500,00	$ 1.409.000,00
M1.PLAN DE INSTALACIÓN DE OBRAS	$ 1.260.000,00	$ 1.260.000,00
M2.PROGRAMA DE USO Y ALMACENAMIENTO ADECUADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN	$ 810.000,00	$ 2.605.000,00
M3.PLAN DE MANEJO DE AGUAS RESIDUALES Y CALIDAD DE LOS EFLUENTES DOMÉSTICOS	$ 605.000,00	$ 1.495.000,00
M4.PLAN DE SEGURIDAD VIAL Y MANEJO DE TRANSITO	$ -	$ -
M5. PROGRAMA DE MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES	$ 580.000,00	$ 930.000,00
M6.PLAN DE CONTINGENCIA, RIESGOS Y RESPUESTAS A EMERGENCIAS	$ 807.000,00	$ 1.620.000,00
M7. PLAN DE REFORESTACIÓN ZONAS INTERVENIDAS	$ -	$ 1.156.000,00
R1.PLAN DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS Y SU DEBIDO TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL	$ 585.000,00	$ 785.000,00
E1. PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO	$ 305.000,00	$ 500.000,00
E2. PLAN DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	$ 2.250.000,00	$ 2.250.000,00
	$ 9.102.000,00	**$ 15.670.000,00**

CELULAR: 3178545839 E-MAIL: SERVICONCSSAS@GMAIL.COM
ORITO PUTUMAYO

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta las actividades ejecutadas por el contratista durante el periodo comprendido entre el 28 de octubre al 27 de noviembre del 2024, la interventoría evidenció el cumplimiento de las actividades de los programas del PMA tales como:

- Realización de socialización para el inicio del proyecto con los habitantes del área de influencia, barrio puertas del sol.

- Levantamiento de las actas de vecindad en el área de influencia directa del proyecto, para validar las condiciones estructurales de los predios antes de iniciar las actividades constructivas.

- Charlas y capacitación en temas ambientales, de acuerdo con el cronograma establecido para el periodo reportado.

- Instalación puntos ecológicos en el campamento de obra, separación y disposición de residuos correctamente.

- Manejo adecuado de residuos sólidos No aprovechables con la empresa de servicios públicos Emporito ESP.

- Demarcación y señalización adecuada de áreas que representan peligro en la zona de influencia directa del proyecto.

- Uso adecuado de equipos, maquinaria, combustibles evitando contaminación del suelo.

- Cubrimiento de materiales pétreos en su almacenamiento temporal en obra.

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

- El contratista de obra para el presente periodo ha desarrollado actividades estipuladas en los programas del PMA, según las necesidades de la obra se ha dispuesto los elementos necesarios señalados en el presupuesto para dar cumplimiento a los programas, según lo realizado en este periodo de informe, se presenta un porcentaje de avance mensual del **58%**, lo cual corresponde a un valor acumulado de **$ $ 9.102.000,00 MCTE.**

Presentó,



ELIANA ANDREA CEBALLOS AREVALO
REPRESENTANTE LEGAL
SERVICON CS SAS
INTERVENTORÍA

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

INFORME DE PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO No 1

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1695-2024

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS BARRIO PUERTAS DEL SOL, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO- INTERVENTORÍA.

28 DE OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024
MUNICIPIO DE ORITO
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA 4
3. OBJETIVO 6
4. CUMPLIMIENTO PLAN DE MANEJO DE TRANSITO.....6
5. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES.....7
6. AVANCE PRESUPUESTO PMT 16
7. CONCLUSIONES.....17

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento describe el seguimiento por parte de la interventoría al cumplimiento del Plan de Manejo de Transito PMT, de acuerdo con la normatividad aplicable y los requerimientos establecidos en la ejecución del contrato No 23-0696-2023, con objeto CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS BARRIO PUERTAS DEL SOL, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

A continuación, se presenta el informe mensual No 1 de interventoría que comprende el seguimiento realizado para las actividades del PMT programadas por el contratista de obra en el desarrollo de este proyecto, desde el 28 de octubre al 27 de noviembre de 2024.

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

2. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA

Tabla No 1. Datos contractuales del contrato de Obra

CONTRATO No.	0190-2024
OBJETO	"CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS BARRIO PUERTAS DEL SOL, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO" "
ENTIDAD CONTRATANTE	EMPORITO ESP
NIT	846000381-0
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES, DISTRIBUIDORA Y SUMINISTROS ORITO S.A.S CODISUM R.L RENE ESTUARDO ORTEGA NOVOA CC.18.145.945 de Orito Putumayo
NIT	900556729-1
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$1.169.698.265,10
INTERVENTORÍA	SERVICON CS SAS R.L. ELIANA ANDREA CEBALLOS ARÉVALO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	22 DE OCTUBRE DEL 2024
FECHA DE INICIO	28 DE OCTUBRE DEL 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	28 DE FEBRERO DEL 2025
PLAZO DEL CONTRATO	CUATRO (04) MESES

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

Tabla No 2. Datos contractuales del contrato de Interventoría

CONTRATO NO.	No 1695-2024
OBJETO	"CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS BARRIO PUERTAS DEL SOL, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO- INTERVENTORÍA"
ENTIDAD CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
NIT	800094164-4
CONTRATISTA	SERVICON CS SAS R.L. ELIANA ANDREA CEBALLOS ARÉVALO CC. 1.123.333.549 de Orito Put.
NIT	900.949.050-7
VALOR DEL CONTRATO	$ 77.611.800
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA DE INICIO	28 DE OCTUBRE DEL 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	27 DE FEBRERO DEL 2024
PLAZO DEL CONTRATO	CUATRO (04) MESES

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

3. OBJETIVO

Presentar el seguimiento al cumplimiento del Plan de Manejo de Tránsito para la CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS BARRIO PUERTAS DEL SOL, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, por parte del contratista de obra.

4. CUMPLIMIENTO PLAN DE MANEJO DE TRANSITO

El Plan de manejo de tránsito, de acuerdo a la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UAERMV) se considera una técnica que plantea las estrategias, alternativas y actividades necesarias para minimizar o mitigar el impacto generado a las condiciones normales de movilización y desplazamiento de los usuarios de las vías (peatones, ciclistas, usuarios de transporte público, conductores y pasajeros de vehículos privados y de carga, y comunidad en general), causados por la ejecución de una obra o la realización de actividades (intervenciones colectivas asociadas a eventos), de tal manera que siempre se favorezca la seguridad vial de los usuarios de la infraestructura y de quienes participan en la intervención y/u obras o eventos.

De esta manera se considera de vital importancia la implementación del PMT y su cumplimiento, durante la ejecución del presente proyecto, para mitigar el impacto generado por la obra que se desarrollan dentro del alcance del proyecto y en las zonas aledañas a este, con el propósito de brindar un ambiente seguro, ordenado, ágil y cómodo en el área de construcción y a los conductores, pasajeros, ciclistas, peatones, personal de la obra y vecinos del lugar, en cumplimiento a las normas establecidas para la regulación.

De acuerdo con la clasificación de la señalización a implementar en obra se menciona las siguientes:

Señalización reglamentaria: Tienen por finalidad notificar a los usuarios de las vías las prioridades en el uso de estas, así como las limitaciones, prohibiciones, restricciones, obligaciones y autorizaciones existentes.

Señalización Preventiva: Tiene como propósito advertir a los usuarios de la vía sobre el cambio de condiciones o la existencia y naturaleza de riesgos y/o situaciones presentes en la vía.

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

Señalización Informativa: Orientar y guiar a los usuarios de las vías a través de la zona de obra, entregándole la información necesaria con suficiente anticipación para que se pueda transitar por ella de la forma más segura simple y directa posible.

Se utilizaron señales informativas indicando con anterioridad el trabajo que se ejecuta, inicio de obra, fin de obra.

Señalización y demarcación de áreas de trabajo: En el avance de la ejecución de las actividades constructivas programadas por el contratista, se verificó que se realizó señalización de áreas que representan peligro para los habitantes del sector, trabajadores dentro de la obra.

5. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

- De acuerdo con la ejecución de las actividades programadas por el contratista de obra para el presente periodo, la interventoría verificó que se implementó señalización de las áreas intervenidas en la obra, para que los trabajadores, personal en general que transitan, lo hagan con el mayor cuidado y puedan identificar los peligros que se pueden presentar en la ejecución de las actividades constructivas.

- Se evidencio implementación de señales reglamentarias, preventivas, informativas de acuerdo con las necesidades de la obra.

- Se realizaron demarcaciones de áreas intervenidas, donde se almacenan materiales como hierro, madera, materiales pétreos.

- Se evidenció controladores viales, para el control de tráfico en las entradas a las vías intervenidas, para controlar la circulación de volquetas que ingresan a la obra a descargar materiales pétreos, por otra parte, el ingreso vehículos que ingresan materiales de construcción. La interventoría recalca la importancia de realizar control de tráfico, para evitar accidentes.

- Se evidenció el uso de chalecos reflectivos, pitos en las actividades de control de tráfico, instalación de conos.

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo





Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo





Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo





Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo





Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo



Imagen No 1-11. Implementación señalización informativa, preventiva, reglamentaria- conos, vías intervenidas en obra







Imagen No 12-14. Señalización con cinta peligro de áreas intervenidas en la obra

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo





Imagen No 15 -16. Auxiliares de tránsito en obra con uso de chalecos reflectivos y paleta pare-siga, control vehicular y peatonal.

6. AVANCE PRESUPUESTO PMT

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTOR AGUAS LLUVIAS BARRIO PUERTAS DEL SOL, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO						PRESUPUESTO PMT		
ANEXO No 1. PRESUPUESTO PLAN MANEJO DE TRAFICO						MUNICIPIO:		ORITO
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR. TOTAL			
1	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (DISPOSITIVOS, SEÑALIZACION Y EQUIPOS) (A)							
	DISPOSITIVOS DE CONTROL							
1,1	BARRICADAS	UND	4	$ 290.000,00	$ 1.160.000,00			
1,2	PALETAS PARE SIGA 30 cm	UND	4	$ 35.000,00	$ 140.000,00			
1,3	DELINEADORES TUBULARES (COLOMBINAS)	UND	20	$ 55.000,00	$ 1.100.000,00			
1,4	CINTA PLASTICA "PELIGRO NO PASE" ROLLO X 500 Mts	Rollo	10	$ 40.000,00	$ 400.000,00			
1,5	CONOS H= .70 cms	UND	12	$ 65.000	$ 780.000,00			
2	SEÑALIZACION							
2,1	SEÑAL VERTICALES (SPO-01 TRABAJOS EN LA VÍA,SPO-03 Auxiliar de tránsito,SPO-05 ANGOSTAMIENTO A LA DERECHA,SPO-06 ANGOSTAMIENTO A LA IZQUIERDA,SIO-03 FIN DE OBRA)	UND	10	$ 382.000,00	$ 3.820.000			
3	EQUIPOS VARIOS							
3,1	CHALECOS REFLECTIVOS	UNID.	4	$ 25.000,00	$ 100.000			
3,2	VOLANTES INFORMATIVOS	UNID.	100	$ 4.000,00	$ 400.000			
3,3	PITOS PARA AUXILIARES DE TRÁNSITO	UNID.	2	$ 11.500,00	$ 23.000			
	SUBTOTAL PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (DISPOSITIVOS, SEÑALIZACION Y EQUIPOS)				$ 7.923.000			

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	VR. UNITARIO	MESES	DEDICACIÓN	FACTOR PRESTACIONAL	VR. TOTAL
	PERSONAL PROFESIONAL, AUXILIARES DE TRANSITO Y BRIGADAS (B)							
	PALETEROS (Frente de Obra Conejo)	MES	2,0	$ 1.160.000	4	100%	72,45	$ 16.003.360
SUBTOTAL PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (PERSONAL)								$ 16.003.360
VALOR COSTOS DIRECTOS (A) + (B)								$ 23.926.360,0

	MES 1. 28 DE OCTUBRE DE 30 DE NOVIEMBRE										MES 1. 28 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE
CANT.	SEMANA 1	CANT.	SEMANA 2	CANT.	SEMANA 3	CANT.	SEMANA 4	CANT.	SEMANA 5	
				2	$ 580.000,00					$ 580.000,00
						2	$ 70.000,00			$ 70.000,00
				5	$ 275.000,00					$ 275.000,00
				3	$ 120.000,00					$ 120.000,00
				4	$ 260.000					$ 260.000,00
		6	$ 2.292.000,00							$ 2.292.000,00
				2	$ 50.000,00					$ 50.000,00
		10	$ 40.000,00					10	$ 40.000,00	$ 80.000,00
		2	$ 23.000,00							$ 23.000,00
	$ -	18	$ 2.355.000,00	16	$ 1.285.000,00	2	$ 70.000,00	10	$ 40.000,00	$ 3.750.000,00
								1	$ 4.000.840,00	$ 4.000.840,00
									TOTAL	$ 7.750.840,00

7. CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta las actividades ejecutadas por el contratista de obra durante el periodo comprendido entre 28 de octubre al 27 de noviembre del 2024, se evidenció la implementación de actividades estipuladas en el PMT, tales como:

- Instalación de de señales de tránsito en obra, de tipos reglamentarias, informativas, preventivas, e instalación de estas en las áreas intervenidas del proyecto, de acuerdo con las necesidades de la obra.

- Demarcación de áreas intervenidas y áreas de trabajo, mediante el uso de cinta plástica “No pase”, señalización de excavaciones en las actividades de instalación de redes de alcantarillado, cámaras de inspección.


- Auxiliares de tránsito, control vehicular para el ingreso de volquetas, vehículos o maquinaria a la obra.

- Uso de chalecos reflectivos, silbatos, paletas de Pare y Siga para el control vehicular y peatonal.

- Instalación de conos para señalización de actividades en obra.

- El contratista en el presente periodo reportado ha desarrollado actividades estipuladas en el PMT, según las necesidades de la obra se ha dispuesto los elementos necesarios señalados en el presupuesto para dar cumplimiento al PMT, según lo realizado este periodo de informe, se presenta un porcentaje de ejecución mensual del **32%**, lo cual corresponde a un valor de **$ 7.750.840,00 MCTE.**

Presentó,



ELIANA ANDREA CEBALLOS AREVALO
REPRESENTANTE LEGAL
SERVICON CS SAS
INTERVENTORÍA

INFORME DE SST No 01

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1695-2024

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS BARRIO PUERTAS DEL SOL, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO- INTERVENTORÍA.

28 DE OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024
MUNICIPIO DE ORITO
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. OBJETIVO 6
3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 7
4. RELACION DE PERSONAL 8
5. CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 9
5.1. EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES 10
5.2. INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y CHARLAS DIARIAS SST 11
5.3. PAUSAS ACTIVAS 13
5.4. USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 14
5.5. REPOSICIÓN DE EPP 14
5.6. INSPECCIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO Y HERRAMIENTAS 15
5.7. PLAN DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA 17
5.8. PUNTO DE HIDRATACIÓN 18
5.9. PAGOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y AFILIACIONES 18
5.10. ORDEN Y ASEO EN LA OBRA 19
6. CONCLUSIONES 20

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

1. INTRODUCCIÓN

La Seguridad y Salud en el trabajo SST, son funciones importantes a tener en cuenta en cualquier actividad, en el sector de la construcción de obras civiles es primordial, ya que los trabajadores deben realizar diversas actividades, las cuales se enfrentan factores de riesgo. La calidad de vida, salud física y mental del trabajador, el desarrollo de sus capacidades y desempeño, desarrollo personal y social, son promovidas a través del plan de salud y seguridad ocupacional implementado durante todas las etapas constructivas del proyecto de obra “CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS BARRIO PUERTAS DEL SOL, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO”.

Por parte del área del sistema de gestión de seguridad, salud en el trabajo, se realizó la implementación de actividades como inducción al personal vinculado al proyecto, charlas preoperacionales en materia de SST, entrega de dotación, inspección de herramientas maquinaria, vehículos, y equipos utilizados en obra, reposición de EPP, hidratación.

A continuación, se presenta el informe mensual No 01 que comprende el seguimiento realizado por la interventoría para las actividades de SST programadas por el contratista de obra en el desarrollo de este proyecto, desde el 28 de octubre al 27 de noviembre de 2024.

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA

Tabla No 1. Datos contractuales del contrato de Obra

CONTRATO No.	0190-2024
OBJETO	"CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS BARRIO PUERTAS DEL SOL, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO" "
ENTIDAD CONTRATANTE	EMPORITO ESP
NIT	846000381-0
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES, DISTRIBUIDORA Y SUMINISTROS ORITO S.A.S CODISUM R.L RENE ESTUARDO ORTEGA NOVOA CC.18.145.945 de Orito Putumayo
NIT	900556729-1
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$1.169.698.265,10
INTERVENTORÍA	SERVICON CS SAS R.L. ELIANA ANDREA CEBALLOS ARÉVALO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	22 DE OCTUBRE DEL 2024
FECHA DE INICIO	28 DE OCTUBRE DEL 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	28 DE FEBRERO DEL 2025
PLAZO DEL CONTRATO	CUATRO (04) MESES

CELULAR: 3178545839 E-MAIL: SERVICONCSSAS@GMAIL.COM
ORITO PUTUMAYO

Tabla No 2. Datos contractuales del contrato de Interventoría

CONTRATO NO.	No 1695-2024
OBJETO	"CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS BARRIO PUERTAS DEL SOL, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO-INTERVENTORÍA"
ENTIDAD CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
NIT	800094164-4
CONTRATISTA	SERVICON CS SAS R.L. ELIANA ANDREA CEBALLOS ARÉVALO CC. 1.123.333.549 de Orito Put.
NIT	900.949.050-7
VALOR DEL CONTRATO	$ 77.611.800
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA DE INICIO	28 DE OCTUBRE DEL 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	27 DE FEBRERO DEL 2024
PLAZO DEL CONTRATO	CUATRO (04) MESES

CELULAR: 3178545839 E-MAIL: SERVICONCSSAS@GMAIL.COM
ORITO PUTUMAYO

2. OBJETIVO

Realizar seguimiento a las actividades de gestión de salud, seguridad y medio ambiente durante la ejecución del proyecto “CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS BARRIO PUERTAS DEL SOL, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO”, de manera que se dé cumplimiento al SG-SST, velando por la salud física y mental de los trabajadores, el desarrollo de sus capacidades y desempeño, desarrollo personal y social, buscando que los trabajadores tengan el conocimiento necesario para desempeñar su trabajo en forma eficiente, cumpliendo con los estándares de calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo durante sus labores.

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

El contrato de obra No 0190-2024 inició el día 28 de octubre del 2024, se realizaron las actividades de acuerdo con los ítems contratados, el contrato en mención cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS BARRIO PUERTAS DEL SOL, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".

A continuación, se describe el seguimiento por parte de la interventoría a las actividades en SST desarrolladas durante el presente periodo.

Entre las actividades que realiza la interventoría en cada periodo se relaciona las siguientes:

- Realizar seguimiento y control de las actividades de SST, con el objetivo de prevenir los riegos a salud y velar por la seguridad de los trabajadores y las condiciones de lugares de trabajo.
- Seguimiento a las afiliaciones y los pagos de planillas de seguridad social de los trabajadores.
- Realizar observaciones a los procedimientos propuestos.
- Realizar revisión de los informes de SST presentados por el contratista de obra y proponer observaciones.
- Realizar sugerencias para la implementación de actividades en materia de SST.
- Acompañamiento en obra.
- Seguimiento presupuesto asignado para la ejecución de las actividades.

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

4. RELACION DE PERSONAL

Se presenta la relación de personal de los contratos de obra e interventoría, de acuerdo con las condiciones de los pliegos, a continuación, se presenta las siguientes tablas:

Tabla 3. Relación de personal mano de obra calificada Contratista de Interventoría.

	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
1	BENJAMÍN SANJUANES ROMERO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
2	GUSTAVO ANDRES GRIJALBA JARAMILLO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
3	YILBER EDILBERTO ORDOÑEZ BASTIDAS	TOPOGRAFO
4	GERMAN TORIJANO	CADENERO
5	ELIANA ZUÑIGA	PROFESIONAL HSE

Tabla 4. Relación de personal mano de obra calificada Contratista de Obra.

	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
1	MARCO ANTONIO BARRERA	DIRECTOR DE OBRA
2	JEEFERSON ARTEAGA	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
3	YADY LIZETH RUEDA	HSEQ
4	WILSON PATIÑO	TOPOGRAFO
5	FABIO MEJIA	CADENERO
6	MARIA CONGOTE	SECRETARIA

Tabla 5. Relación de personal de apoyo periodo corte 27 al 31 de octubre-2024.

	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
1	OLIVO PINCHAO	MAESTRO
2	BARTOLO PINCHAO	MAESTRO

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

Tabla 6. Relación de personal de apoyo periodo corte 01 al 27 de noviembre-2024.

	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
1	DARIO QUENGUAN MONTALVO	PALETERO
2	BRAYAN VARGAS	PALETERO
3	OLIVO PINCHAO	MAESTRO
4	BARTOLO PINCHAO	MAESTRO
5	MILTON JAVIER GUERRERO	MAESTRO
6	JAIRO DAGOBERTO ARTEGA	OFICIAL
7	JESUS EUDORO PESILLO	OFICIAL
8	CESAR STIVEN MEJIA	OBRERO
9	OLIVEIRO ALVAREZ	OBRERO
10	JAIDER RODRIGUEZ	OBRERO
11	EDUAR NORVEY NARVAES	OBRERO
12	DANIEL GOMEZ	OBRERO

*El contratista de obra presenta como anexo a los informes las **Afiliaciones y Planillas de seguridad social personal periodo de octubre- noviembre de 2024 del personal vinculado al proyecto.***

*Por otra parte, presentan en como anexo **el** formato **de control de personal**, donde se especifica la asistencia de los trabajadores.*

5. CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

El cumplimiento del presente programa tiene como finalidad principal la promoción, prevención y control de la salud de los trabajadores, mediante la protección de los factores de riesgos ocupacionales; condiciones adecuadas donde los espacios de trabajo sean acordes con condiciones psicofisiológicas y en aptitud de producción de trabajo.

El contratista de obra, a través del área de SG-SST avanza en la implementación de actividades mencionadas a continuación:

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

5.1. EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES

La interventoría verificó que el contratista por medio de IPS realizó exámenes médicos de ingreso al personal contratado en el periodo reportado, donde se tiene en cuenta el resultado emitido por los profesionales de la salud de la IPS en el momento de vincular el personal a la empresa en el contrato de obra.

A continuación, se relaciona los resultados de los exámenes médicos de ingreso del personal nuevo vinculado.

Tabla 7. Relación de personal- Exámenes de ingreso

NOMBRES	APTITUD	OBSERVACIONES
MARCO ANTONIO BARRERA	Apto sin restricción	
JEEFERSON ARTEAGA	Apto sin restricción	
YADY LIZETH RUEDA	Apto sin restricciones	
WILSON PATIÑO	Apto sin restricciones	
FABIO MEJIA	Apto sin restricciones	
MARIA CONGOTE	Apto sin restricciones	
DARIO QUENGUAN MONTALVO	Apto sin restricciones	
BRAYAN VARGAS	Apto sin restricciones	
OLIVO PINCHAO	Apto sin restricciones	
BARTOLO PINCHAO	Apto sin restricciones con recomendaciones	Paciente con alteración del peso por lo cual se recomienda bajar de peso ingreso al programa de obesidad de la E.A.P.B. Se recomienda hábitos saludables dieta balanceada, ejercicio 150 minutos a la semana repartidos en jornadas de 15 minutos por sesión.
MILTON JAVIER GUERRERO	Apto sin restricciones	
JAIRO DAGOBERTO ARTEGA	Apto sin restricciones	
JESUS EUDORO PESILLO	Apto sin restricciones	
CESAR STIVEN MEJIA	Apto sin restricciones	
OLIVEIRO ALVAREZ	Apto con restricción	Apto con restricción de cargue de peso sin elementos de protección personal
JAIDER RODRIGUEZ	Apto sin restricción	
EDUAR NORVEY NARVAES	Apto sin restricción	
DANIEL GOMEZ	Apto sin restricción	

El contratista de obra presenta en el informe de SST el siguiente anexo:

Anexo de Reporte exámenes médicos ocupacionales de ingreso.

CELULAR: 3178545839 E-MAIL: SERVICONCSSAS@GMAIL.COM
ORITO PUTUMAYO

5.2. INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y CHARLAS DIARIAS SST

- **INDUCCIÓN**

El proceso de inducción es muy importante para la empresa como para el trabajador, presenta ventajas como mejora el rendimiento de los trabajadores, disminuye las dudas de los nuevos colaboradores, facilitan el aprendizaje de las funciones a desempeñar y el proceso de adaptación, reduce o evitar errores porque se proporciona toda la información necesaria al nuevo miembro del equipo, etc.

La interventoría verificó la realización del proceso de inducción al personal nuevo vinculado al proyecto para el periodo reportado, mediante el área de SST se dio a conocer información general de la empresa, políticas, procedimientos de la organización a manera de familiarizar a los nuevos trabajadores con la empresa, medidas de seguridad de los cargos a ocupar, presentación de las áreas donde se trabajará, de esta manera se pretende dejar claro el rol de cada trabajador.

- **CAPACITACIÓN**

Las capacitaciones y charlas son de gran importancia para lograr que los trabajadores de la obra, de todos los niveles, adquieran los conocimientos, actitudes y prácticas necesarios para generar ambientes de trabajo sano, seguro y confortable.

- Para el presente periodo, la interventoría verificó que se realizaron charlas preoperacionales de seguridad y salud en el trabajo al personal de la obra antes de iniciar la jornada laboral, la duración de estas es aproximadamente 5 y 10 minutos. Todas las charlas fueron realizadas por la persona de SST.

- La interventoría dio aval al cronograma de programación de charlas y capacitaciones, presentado para el periodo reportado, a continuación, se relaciona las charlas y capacitaciones brindadas por el área de SST.

Tabla No 8. Relación charlas preoperacionales durante el periodo de ejecución **corte 27 de octubre-24.**

TEMAS	FECHAS
Uso adecuado de los EPP	01/11/2024
Las lesiones leves también se deben informar	05/11/2024
Herramienta manual	07/11/2024
Agotamiento por calor	12/11/2024
Investigación de accidentes	14/11/2024

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

Primeros auxilios	16/11/2024
Prevención de lesiones en la columna	18/11/2024
Levantamiento de objetos	22/11/2024
Manejo de extintores	25/11/2024

El contratista de obra presenta en el informe de SST los siguientes anexos:

Anexo de Registro de inducción y listado de asistencia a la inducción
Anexo de Registro de asistencia a charlas pre operacionales



Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo



Imagen No 1-2. Charlas pre operacionales personal en obra

5.3. PAUSAS ACTIVAS

Las pausas activas son sesiones de actividad física desarrolladas en el entorno laboral, con una duración mínima de 10 minutos, que incluye adaptación física cardiovascular, fortalecimiento muscular, mejoramiento de la flexibilidad, entre otros.

Las pausas activas son de vital importancia ya que ayudan a controlar los niveles de estrés, evita la fatiga física y mental, previenen los espasmos musculares, combate la baja productividad, aumenta la motivación y el estado de ánimo.

La interventoría evidenció que para el periodo reportado se realizaron pausas activas en la obra y en el horario laboral.

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo



Imagen No 3. Pausas activas al personal de la obra

5.4. USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Los elementos de protección personal (EPP) son equipos de seguridad, de uso individual, que tienen como finalidad proteger al trabajador de los peligros propios o derivados de la labor que se ejecuta. Su función no es eliminar el peligro, si no minimizar la exposición a éste en conjunto con la aplicación de controles.

La interventoría verificó que se realizó la entrega oportuna de EPP a los trabajadores de la obra y el uso correcto en todas las actividades que se realizaron en obra.

5.5. REPOSICIÓN DE EPP

El uso de los EPP es de vital importancia en el desarrollo de las actividades, si se observa algún defecto o deterioro de los EPP, o que estos elementos sufran cualquier agresión de tipo impacto o aplastamiento, cristalización por calor que lo deteriore ocasionado por el uso normal, el trabajador debe informar al profesor de SST del área de trabajo, para que coordine su reposición.

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

La interventoría verificó que se realizó la reposición de EPP, para soportar esta actividad el contratista de obra realiza el registro de la entrega de dotación y la reposición de EPP.

El contratista de obra presenta en el informe de SG- SST el **anexo No 5. Registro de Reposición de EPP.**

5.6. INSPECCIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO Y HERRAMIENTAS

El cumplimiento de la presente actividad está encaminado a velar por la seguridad de los trabajadores, al cuidado del medio ambiente. Para el presente periodo el contratista realizó inspecciones a la maquinaria y equipos para evitar accidentes de trabajo, derrames de aceites, lubricantes, combustibles.

La herramienta menor utilizada en las actividades de obra se debe examinar para identificar en qué condiciones se encuentran verificando que estén en buen estado, libres de grasa o suciedad, sus partes movibles y ajustables deben estar bien aceitadas; los mangos deben tener un acabado liso, ser fáciles de agarrar y no tener puntas o bordes agudos, las herramientas deben estar firmemente armadas.

La interventoría aprobó la programación de las inspecciones periódicas de maquinaria y equipos, herramienta menor dispuestas en obra mediante un cronograma mensual para el presente periodo.

El contratista de obra presenta en el informe de SG- SST el siguiente anexo:

Anexo de Registro inspecciones preoperacionales maquinaria y equipos

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo





Imagen No 4-5. Inspecciones pre operacionales de maquinaria y herramientas

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

5.7. PLAN DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA.

El contratista cuenta con el Plan de emergencias y contingencias y el MEDEVAC. En el Plan de Evacuación de Emergencias Médicas – **MEDEVAC** se debe establecer la secuencia de comunicaciones y procedimientos en caso de un accidente o emergencia médica que se pueda presentar en la zona de influencia directa del proyecto. Así mismo asignar y describir las funciones del personal clave durante la operación, quienes deben evaluar, clasificar las lesiones y determinar el nivel de respuesta oportuna al evento.

Se Verificó que se realizó conformación de la brigada de emergencias y se implementó la cadena de llamadas obra Puertas del sol, donde se asignaron roles y se tomaron los números de las líneas de emergencia iniciando con los contactos del grupo del coordinador de emergencias de la obra y las líneas telefónicas de bomberos, policía, Gaula, ambulancia, positiva, etc.

Es de vital importancia tener disponibles los elementos de emergencia tales como Camilla, botiquín, extintor, con sus respectivas señalizaciones.

La interventoría evidenció que se tiene implementado en la obra elementos de primeros auxilios como camilla, botiquín dotado, extintor, kit de silbato, linterna en el campamento de la obra.





Imagen No 6-7. Instalación de elementos de primeros auxilios, Camilla, Extintor, Botiquín.

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

5.8. PUNTO DE HIDRATACIÓN

La interventoría verificó que cuenta con puntos de hidratación en el campamento de la obra, mediante termos con agua potable, suministrada por la empresa Agua Cristalina





Imagen No 8-9. Puntos de hidratación- Termos con agua potable

5.9. PAGOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y AFILIACIONES

Es de vital importancia cumplir con afiliaciones y los respectivos pagos de seguridad social, para proteger a los trabajadores y a sus familias en situaciones que puedan afectar su vida, como pueden ser enfermedades, discapacidad, desempleo, vejez, maternidad o distintos eventos.

La interventoría verificó que el contratista de obra presentó los soportes de Pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos trabajadores vinculados al proyecto desde el 28 al 31 de octubre y del 01 al 27 de noviembre de 2024.

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

El contratista de obra presenta en el informe de SG- SST el anexo de **Planillas de pago de Seguridad Social mes de octubre-noviembre 2024_ Personal proyecto alcantarillado-CODISUM**

Para el presente periodo se presenta el **Anexo No 1 de interventoría, correspondiente a las planillas de pago de Seguridad Social_ Personal Interventoría SERVICON CS SAS, para el periodo de octubre_ noviembre 2024.**

5.10. ORDEN Y ASEO EN LA OBRA

Los lugares de trabajo deben permanecer limpios y ordenados durante todo el día, esto con el fin de optimizar el uso del espacio, mejorar la eficiencia del trabajo, evitar problemas sanitarios y en general, por conservar un entorno más seguro para toda la población vinculada directa o indirectamente a la obra para la construcción del alcantarillado.

La interventoría verificó la implementación de puntos ecológicos, para el manejo de los residuos generados en obra, realizando una buena disposición de estos. Se recomienda realizar jornadas de aseo de la obra para evitar accidentes de trabajo, generar un ambiente limpio y ordenado



Imagen No 10. Punto ecológico dispuesto en obra

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

6. CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta las actividades ejecutadas por el contratista durante el periodo comprendido entre el 28 de octubre al 27 de noviembre de 2024, la interventoría verificó la implementación de las actividades de SST, tales como:

- Realización de exámenes médicos ocupacionales e inducción del personal vinculado al proyecto.

- Realización de Charlas preoperacionales diarias y capacitaciones en materia de SST y realización de pausas activas durante las jornadas de trabajo.

- Cumplimiento de inspecciones preoperacionales a la maquinaria, herramientas manuales, de acuerdo con el cronograma establecido para el periodo ejecutado.

- Uso adecuado de los EPP, durante las diferentes actividades realizadas en obra, reposición de EPP.

- Implementación de puntos ecológicos en la obra, esto con el fin de hacer una adecuada disposición final con los residuos generados en obra.

- Instalación de puntos de hidratación en frente de trabajo, mediante el suministro de agua potable embotellada.


- Instalación y ubicación de elementos de emergencia en el campamento de obra.

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

- Pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, con los aportes parafiscales, contratista de obra e interventoría, 28 al 31 de octubre – 01 al 27 de noviembre 2024.

- Para el presente periodo no se presentaron accidentes de trabajo.

Presentó,



ELIANA ANDREA CEBALLOS AREVALO
REPRESENTANTE LEGAL
SERVICON CS SAS
INTERVENTORÍA

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo
