INFORME MENSUAL No 4

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1695-2024

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS BARRIO PUERTAS DEL SOL, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO INTERVENTORÍA.



ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

CORTE: 28 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN ---- 4
2. INFORMACIÓN PREVIA DEL PROYECTO ---- 5
2.1. DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO ---- 5
2.2. NECESIDAD DEL PROYECTO ---- 6
2.3. ALCANCE DEL PROYECTO ---- 6
3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA ---- 7
3.1. INFORMACIÓN GENERAL – CONTRATO DE OBRA ---- 7
3.1.1. GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA ---- 8
3.2. INFORMACIÓN GENERAL - CONTRATO DE INTERVENTORÍA ---- 13
3.2.1. GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA ---- 13
3.3. EQUIPO PROFESIONAL Y TÉCNICO DE TRABAJO EN OBRA ---- 15
3.4. EQUIPO PROFESIONAL Y TÉCNICO DE INTERVENTORÍA ---- 17
4. ACTIVIDADES EJECUTADAS HASTA EL PERIODO DE INFORME ---- 17
4.1. MODIFICATORIO No 1. ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES. ---- 18
4.2. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA ---- 25
5. ESTADO FINANCIERO DEL PROYECTO ---- 31
6. RESUMEN CUBICACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA EN EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME ---- 32
7. COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ---- 35

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

ANEXOS

ANEXO 1 – Registro fotográfico de las actividades de obra ejecutadas

ANEXO 2 – Ensayos de Concreto

ANEXO 3 – Relación de correspondencia

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

1. INTRODUCCIÓN

Por medio del siguiente informe se evidencia la vigilancia, seguimiento y control de todas y cada una de las actividades comprendidas en el contrato que tiene como objeto: **"CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS BARRIO PUERTAS DEL SOL, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"**, el cual se encuentra avalado por la interventoría del contrato **No 1695-2024**, cuyo objeto es **"CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS BARRIO PUERTAS DEL SOL, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO-INTERVENTORÍA"**, ejecutado por el contratista de interventoría: **SERVICON CS SAS;** el cual contempla las actividades desarrolladas en el periodo comprendido entre el 28 de Enero al 28 de Febrero del 2025.

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

2. INFORMACIÓN PREVIA DEL PROYECTO

2.1. DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El contrato de obra No 0190-2024 que tiene por objeto **"CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS BARRIO PUERTAS DEL SOL, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO",** se ejecutarán las actividades en los tramos de tubería sanitaria "CAM 500, P11, P12 Y P13", "CAM 172, P01, P02, P03, P04, P05, P06 y P07", "P05 y P08", "P03, P10 y P09", "P10 y P02" "CAM 482 y P01". Así mismo se contempla el tramo pluvial sobre el eje 5 en tubería de 36", realizado en el casco urbano, barrio Puertas del Sol, en el municipio de Orito, departamento del Putumayo.

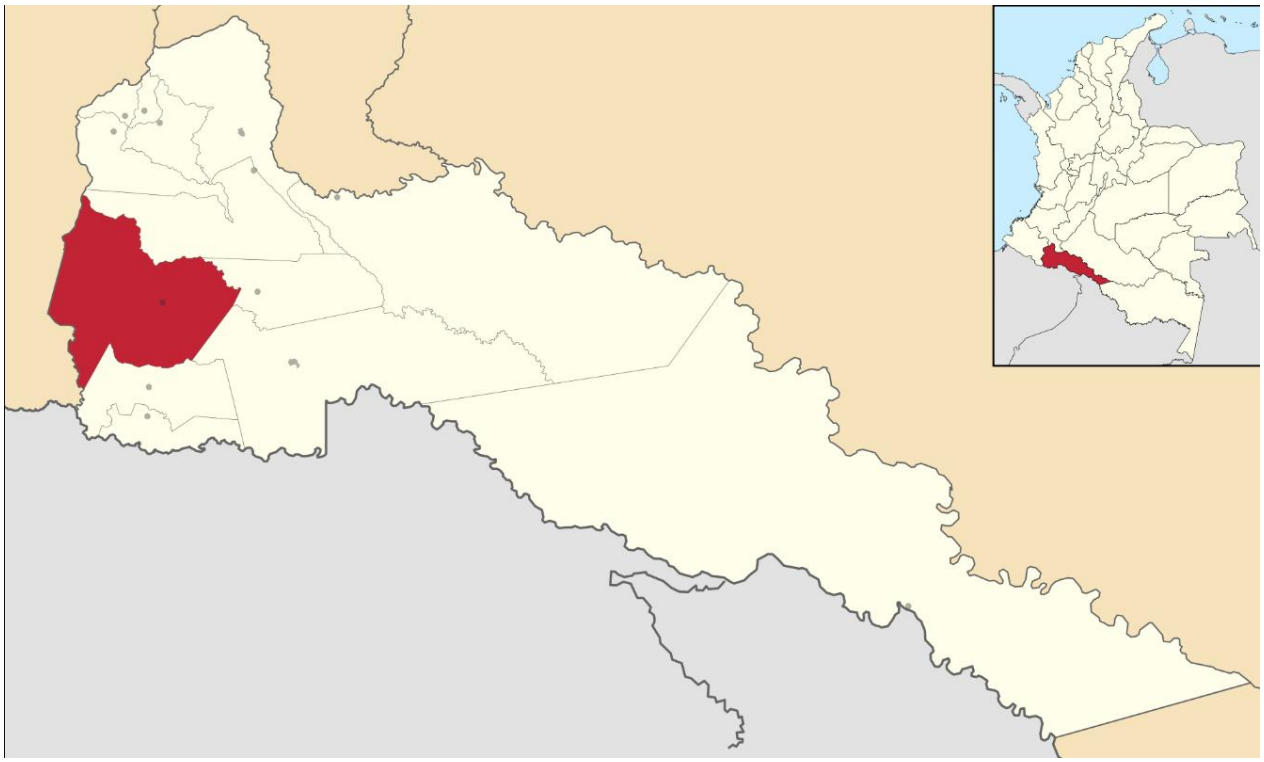


Imagen No 1. Ubicación Orito - Putumayo

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo



Imagen No 2. Ubicación tramos a intervenir del Proyecto- B/ Puertas del sol-Orito Putumayo

2.2. NECESIDAD DEL PROYECTO

En el municipio de orito actualmente no cuenta con la suficiente cobertura del sistema de alcantarillado sanitario y aguas lluvias, para su disposición final, los habitantes de algunos sectores de la zona urbana como lo es el barrio Puertas del Sol el cual se encuentra utilizando alternativas no convencionales como letrinas, lo que produce contaminación del suelo y las aguas superficiales produciendo insalubridad, esta eliminación de excretas y desechos en forma inadecuada afecta negativamente el ambiente generando focos de vectores patógenos que provocan enfermedades gastrointestinales, de igual forma la proliferación de insectos y ratas que transmiten de agentes infecciosos. Se presenta deficiencia en el sistema de alcantarillado y deficiente calidad de vida en la comunidad del barrio Puertas del Sol.

2.3. ALCANCE DEL PROYECTO

Ampliar la cobertura del sistema de alcantarillado para mejorar la calidad de vida de la comunidad de Orito y del barrio Puertas del Sol, implementando el sistema de saneamiento básico en las viviendas de este sector del municipio.

3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA

3.1. INFORMACIÓN GENERAL – CONTRATO DE OBRA

Tabla 1. Datos contractuales del contrato de Obra

CONTRATO No.	0190-2024
OBJETO	"CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS BARRIO PUERTAS DEL SOL, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO" "
ENTIDAD CONTRATANTE	EMPORITO ESP
NIT	846000381-0
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES, DISTRIBUIDORA Y SUMINISTROS ORITO S.A.S CODISUM R.L RENE ESTUARDO ORTEGA NOVOA CC.18.145.945 de Orito Putumayo
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$1.169.698.265,10
INTERVENTORÍA	SERVICON CS SAS R.L. ELIANA ANDREA CEBALLOS ARÉVALO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	22 DE OCTUBRE DEL 2024
FECHA DE INICIO	28 DE OCTUBRE DEL 2024
PLAZO DEL CONTRATO	CUATRO (04) MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN No 1	30 DE DICIEMBRE DEL 2024 HASTA EL 06 DE ENERO DEL 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	28 DE FEBRERO DEL 2025

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

3.1.1. GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA

Según la CLAUSULA DECIMA SEXTA– GARANTÍAS, del contrato de obra del proyecto en referencia. El contratista debe presentar una garantía de cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, a favor de la Entidad Contratante. La garantía de cumplimiento debe tener los siguientes amparos:

Tabla No 2. Garantías del Contrato de obra

AMPARO	SUFICIENCIA	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10% del Valor del Contrato.	Igual al plazo del Contrato y seis (06) meses más.
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales	5% del Valor del Contrato.	Igual al plazo del Contrato y (3) Tres Años más.
Responsabilidad Civil Extracontractual	200 S.M.L.V.	Igual al plazo de ejecución del Contrato y dos años más.
Calidad del servicio	10% del Valor del Contrato.	Igual al plazo de ejecución del Contrato
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100% del monto entregado a título de anticipo	Igual al plazo del Contrato y (6) Seis Años más.
Estabilidad y Calidad de la Obra	10% del Valor del Contrato.	Por cinco (5) Años Contados a partir de la Finalización de la Obra.

Ante lo anterior la Empresa EMPORITO ESP, representado por su Unidad Jurídica, aprobó bajo las pólizas presentadas a la entidad, las cuales se detallan a continuación.

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

En el presente informe se presentan las pólizas actualizadas según acta de inicio de obra.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL ANEXO No 0

AMPARO	N° POLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento entidad estatal Fecha de Exped: 24/10/2024				
Cumplimiento del Contrato	**560-47-99400183733**	22/10/2024	23/08/2025	$116.969.826,51
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales		22/10/2024	23/02/2028	$116.969.826,51
Estabilidad de la obra		SE AMPARA 5 AÑOS.		$233.939.653,02
Calidad del servicio		22/10/2024	23/02/2025	$116.969.826,51

Tabla N° 3. Control de póliza de cumplimiento entidad estatal Anexo No 0 del contrato de obra

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL ANEXO No 1

AMPARO	N° POLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento entidad estatal Fecha de Exped: 28/11/2024				
Cumplimiento	**560-47-99400183733**	22/10/2024	29/08/2025	$116.969.826,50
Pago de Salarios, prestaciones sociales e IND		22/10/2024	29/02/2028	$116.969.826,50
Estabilidad y calidad de la obra		SE AMPARA 5 AÑOS.		$233.939.653,00
Calidad del servicio		22/10/2024	01/03/2025	$116.969.826,50

Tabla N° 4. Control de póliza de cumplimiento entidad estatal Anexo No 1 del contrato de obra

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL ANEXO No 2

AMPARO	N° POLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento entidad estatal Fecha de Exped: 04/12/2024				
Cumplimiento	**560-47-99400183733**	28/10/2024	29/08/2025	$116.969.826,50
Pago de Salarios, prestaciones sociales e IND		28/10/2024	29/02/2028	$116.969.826,50

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

Estabilidad y calidad de la obra		SE AMPARA 5 AÑOS.		$233.939.653,00
Calidad del servicio		28/10/2024	01/03/2025	$116.969.826,50

Tabla N° 5. Control de póliza de cumplimiento entidad estatal Anexo No 2 del contrato de obra

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL ANEXO No 3

AMPARO	N° POLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento entidad estatal Fecha de Exped: 09/01/2025				
Cumplimiento	560-47-994000183733	28/10/2024	10/09/2025	$116.969.826,51
Pago de Salarios, prestaciones sociales e IND		28/10/2024	10/03/2028	$116.969.826,51
Estabilidad y calidad de la obra		SE AMPARA 5 AÑOS.		$233.939.653,02
Calidad del servicio		28/10/2024	10/03/2025	$116.969.826,51

Tabla N° 6. Control de póliza de cumplimiento entidad estatal Anexo No 3 del contrato de obra

PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO No 0.

AMPARO	N° POLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Responsabilidad Civil Extracontractual Fecha Exp: 24/10/2024				
Predios, Labores y Operaciones	560 – 74 - 994000033583	22/10/2024	23/02/2027	$260,000,000.00
Contratistas y Subcontratistas		22/10/2024	23/02/2027	$260,000,000.00
RCE Patronal		22/10/2024	23/02/2027	$260,000,000.00
Vehículos Propios y no Propios		22/10/2024	23/02/2027	$260,000,000.00
Gastos Médicos		22/10/2024	23/02/2027	$26,000,000.00
Responsabilidad Civil Cruzada		22/10/2024	23/02/2027	$260,000,000.00

Tabla N° 7. Control de póliza responsabilidad civil extracontractual Anexo No 0 del contrato de obra

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO No 1.

AMPARO	N° POLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Responsabilidad Civil Extracontractual Fecha Exp: 28/11/2024				
Predios, Labores y Operaciones	**560 – 74 - 994000033583**	23/02/2027	01/03/2027	$260,000,000.00
Contratistas y Subcontratistas		23/02/2027	01/03/2027	$260,000,000.00
RCE Patronal		23/02/2027	01/03/2027	$260,000,000.00
Vehículos Propios y no Propios		23/02/2027	01/03/2027	$260,000,000.00
Gastos Médicos		23/02/2027	01/03/2027	$26,000,000.00
Responsabilidad Civil Cruzada		23/02/2027	01/03/2027	$260,000,000.00

Tabla N° 8. Control de póliza responsabilidad civil extracontractual Anexo No 1 del contrato de obra.

PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO No 2.

AMPARO	N° POLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Responsabilidad Civil Extracontractual Fecha Exp: 28/11/2024				
Predios, Labores y Operaciones	**560 – 74 - 994000033583**	22/10/2024	01/03/2027	$260,000,000.00
Contratistas y Subcontratistas		22/10/2024	01/03/2027	$260,000,000.00
RCE Patronal		22/10/2024	01/03/2027	$260,000,000.00
Vehículos Propios y no Propios		22/10/2024	01/03/2027	$260,000,000.00
Gastos Médicos		22/10/2024	01/03/2027	$26,000,000.00
Responsabilidad Civil Cruzada		22/10/2024	01/03/2027	$260,000,000.00

Tabla N° 9. Control de póliza responsabilidad civil extracontractual Anexo No 2 del contrato de obra

PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO No 3.

AMPARO	N° POLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Responsabilidad Civil Extracontractual Fecha Exp: 04/12/2024				
Predios, Labores y Operaciones	**56 0 – 74**	28/10/2024	01/03/2027	$260,000,000.00

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

Contratistas y Subcontratistas		28/10/2024	01/03/2027	$260,000,000.00
RCE Patronal		28/10/2024	01/03/2027	$260,000,000.00
Vehículos Propios y no Propios		28/10/2024	01/03/2027	$260,000,000.00
Gastos Médicos		28/10/2024	01/03/2027	$26,000,000.00
Responsabilidad Civil Cruzada		28/10/2024	01/03/2027	$260,000,000.00

Tabla N° 10. Control de póliza responsabilidad civil extracontractual Anexo No 3 del contrato de obra.

PÓLIZAS ACTUALIZAS DE ACUERDO CON EL ACTA DE SUSPENSIÓN NO 1 Y REINICIO NO 1.

PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO No 4.

AMPARO	N° POLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Responsabilidad Civil Extracontractual Fecha Exp: 09/01/2025				
Predios, Labores y Operaciones	**560 – 74 - 994000033583**	01/03/2027	10/03/2027	$260,000,000.00
Contratistas y Subcontratistas		01/03/2027	10/03/2027	$260,000,000.00
RCE Patronal		01/03/2027	10/03/2027	$260,000,000.00
Vehículos Propios y no Propios		01/03/2027	10/03/2027	$260,000,000.00
Gastos Médicos		01/03/2027	10/03/2027	$26,000,000.00
Responsabilidad Civil Cruzada		01/03/2027	10/03/2027	$260,000,000.00

Tabla N° 11. Control de póliza responsabilidad civil extracontractual Anexo No 4 del contrato de obra.

Observaciones:

Mediante la presente póliza, se amparan los perjuicios patrimoniales que cause directamente el asegurado con motivo de una determinada responsabilidad civil extracontractual en el que incurra, de acuerdo con la ley colombiana, en virtud de la ejecución del contrato de obra No. 0190 – 2024 referente a la construcción alcantarillado sanitario y colector aguas lluvias barrio Puertas del Sol, municipio de Orito, departamento del Putumayo.

Se registra acta de inicio del día 28/10/2024.

Se prorroga el plazo de ejecución por el tiempo comprendido entre el 30 de diciembre del 2024 al 07 de enero del 2025, según acta de suspensión y reinicio No 1, las demás condiciones y ítems se mantienen igual.

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

3.2. INFORMACIÓN GENERAL - CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Tabla No 10. Datos contractuales del contrato de Interventoría

CONTRATO NO.	No 1695-2024
OBJETO	"CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS BARRIO PUERTAS DEL SOL, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO-INTERVENTORÍA"
ENTIDAD CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
NIT	800094164-4
CONTRATISTA	SERVICON CS SAS NIT 900.949.050-7 R.L. ELIANA ANDREA CEBALLOS ARÉVALO CC. 1.123.333.549 de Orito Put.
VALOR DEL CONTRATO	$ 77.611.800
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA DE INICIO	28 DE OCTUBRE DEL 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	27 DE FEBRERO DEL 2025
PLAZO DEL CONTRATO	CUATRO (04) MESES

3.2.1. GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CLÁUSULA 8ª –GARANTÍA ÚNICA. Dentro de un plazo de dos (2) días hábiles siguiente a la fecha de la firma del contrato, el contratista presentará a la Entidad una garantía única, la cual debe ser suficiente de acuerdo con las distintas clases de obligaciones amparadas.

Los riesgos que deben cubrir, el monto y la vigencia de los mecanismos de cobertura se determinan teniendo en cuenta el objeto, la naturaleza y las características del contrato a celebrar.

El Contratista se obliga a garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas a favor de la Entidad Estatal, con ocasión de la ejecución del contrato, de acuerdo con la siguiente tabla:

Tabla No 11. Garantías del Contrato de Interventoría

AMPARO	SUFICIENCIA	VIGENCIA
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del	10% del Valor del Contrato.	Desde la suscripción del contrato, durante su ejecución y 6 meses más.

contrato, o el pago de multas y demás sanciones que se deriven de su incumplimiento		En todo caso deberá estar vigente hasta su liquidación.
Calidad del servicio	10% del Valor del Contrato.	Desde la suscripción del contrato, con vigencia igual al plazo de la garantía de estabilidad principal (5 años)
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales	5% del Valor del Contrato.	Plazo del contrato y tres (3) años más. Contados a partir de la Fecha de su expedición.

Ante lo anterior la gobernación del Putumayo, a través de su Asesor Jurídico, aprobó las pólizas presentadas a la entidad por el contratista, la cual se detallan a continuación.

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL ANEXO No 0

AMPARO	N° POLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento entidad estatal Fecha de Exped: 04/09/2024				
Cumplimiento del Contrato	**11 – 44 - 101234140**	02/09/2024	02/07/2025	$7,761,180.00
Calidad del servicio		02/01/2025	02/01/2030	$7,761,180.00
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e Indemnizaciones Laborales		02/09/2024	02/01/2028	$3,880,590.00

Tabla N° 12. Control de póliza de cumplimiento entidad estatal Anexo No 0 del contrato de obra

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL ANEXO No 1

AMPARO	N° POLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento entidad estatal Fecha de Exped: 27/11/2024				

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

Cumplimiento del Contrato	11 – 44 - 101234140			
Pago de Salarios, prestaciones sociales e IND				
Estabilidad y calidad de la obra				
Calidad del servicio				

Tabla N° 13. Control de póliza de cumplimiento entidad estatal Anexo No 0 del contrato de obra**.**

Observaciones: Mediante el presente anexo se actualizan las vigencias de la póliza según acta de inicio de fecha 28/10/2024. los demás términos y condiciones continúan vigentes y sin modificar.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL ANEXO No 2.

AMPARO	N° POLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento entidad estatal Fecha de Exped: 27/11/2024				
Cumplimiento del Contrato	11 – 44 - 101234140	28/10/2024	27/08/2025	$7,761,180.00
Calidad del servicio		27/02/2025	27/02/2030	$7,761,180.00
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e Indemnizaciones Laborales		28/10/2024	27/02/2028	$3,880,590.00

Tabla N° 14. Control de póliza de cumplimiento entidad estatal Anexo No 0 del contrato de obra**.**

Observaciones: Mediante el presente anexo se actualizan las vigencias de la póliza según acta de inicio de fecha 28/10/2024. Los demás términos y condiciones continúan vigentes y sin modificar.

3.3. EQUIPO PROFESIONAL Y TÉCNICO DE TRABAJO EN OBRA

La interventoría contrastó que el personal vinculado por parte del contratista de obra cumplió a cabalidad con lo exigido en el pliego de condiciones, desarrollando las funciones establecidas de manera oportuna y con la mejor calidad profesional para el desarrollo de las actividades en los aspectos administrativos, técnicos, y ambientales respecto a la ejecución de la obra.

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

Adicionalmente la mano de obra no calificada fue contratada del sector involucrado en el presente contrato, del barrio Puertas del Sol, cabecera municipal Orito.

Tabla No 15. Descripción de la mano de obra calificada empleada por el contratista en la obra

NOMBRE	CARGO
MARCO ANTONIO BARRERA NAVARRO	Director de Obra
JEFFERSON ARTEAGA	Residente de Obra
YADY LIZETH RUEDA	HSEQ
WILSON EDUARDO PATIÑO	Topógrafo
LIBARDO FAVIO MEJIA	Cadenero
EDILSON LUNA	Secretario

Tabla No 16. Descripción de personal de apoyo empleada por el contratista en la obra

	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
1	DARIO QUENGUAN MONTALVO	PALETERO
2	BRAYAN VARGAS	PALETERO
3	OLIVO PINCHAO	MAESTRO
4	BARTOLO PINCHAO	MAESTRO
5	MILTON JAVIER GUERRERO	MAESTRO
6	ALVARO SANTACRUZ	OFICIAL
7	OLIVEIRO ALVAREZ	OBRERO
8	EDUAR NORVEY NARVAES	OBRERO
9	JOSE DANIEL GOMEZ	CELADOR

Tabla No 17. Descripción de maquinaria y equipos empleados para la labor.

DESCRIPCIÓN	MARCA
RETRO EXCAVADORA	HYUNDAI

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

3.4. EQUIPO PROFESIONAL Y TÉCNICO DE INTERVENTORÍA

El personal empleado en la interventoría cumple con las especificaciones de equipo mínimo establecidas en el pliego de condiciones del proceso, siendo idóneos y con alta experiencia para ejercer las funciones de control requeridas por parte de la interventoría, cumpliendo con los porcentajes de dedicación y tiempos establecidos, con la mejor calidad profesional para el desarrollo de las actividades en los aspectos administrativos, técnicos, financieros y ambiental.

Durante el periodo reportado en el presente informe, cumpliendo con lo establecido en los pliegos respecto a equipo mínimo, la Interventoría cuenta con el siguiente personal:

Tabla No 18. Descripción personal Interventoría

NOMBRE	CARGO
BENJAMIN SANJUANES ROMERO	Director de Interventoría
GUSTAVO ANDRES GRIJALBA JARAMILLO	Residente de Interventoría
YILBER EDILBERTO OROÑEZ BASTIDAS	Topógrafo
GERMAN TORIJANO	Cadenero
ELIANA ZUÑIGA	Supervisor HSEQ

En el informe de SST se anexa las planillas de seguridad social de Servicon CS SAS correspondiente al periodo de informe. (periodo 28 de Enero al 28 de Febrero de 2025).

4. ACTIVIDADES EJECUTADAS HASTA EL PERIODO DE INFORME

El contrato de obra No 0190-2024 inició el día 28 de octubre de 2024, se realizaron las actividades de acuerdo a los ítems contratados, del contrato en mención cuyo objeto es **“CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS BARRIO PUERTAS DEL SOL, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO”,** se ejecutaron las actividades en los tramos de tubería sanitaria “CAM 500, P11, P12 Y P13”, “CAM 172, P01, P02, P03, P04, P05, P06 y P07”, “P05 y P08”, “P03, P10 y P09”, “P10 y P02” “CAM 482 y P01”. Asi mismo se ejecutaron actividades sobre el eje 5, el cual contempla instalación de la red pluvial de 36” tubería encofrada.

La interventoría tiene como objeto controlar, verificar y realizar seguimiento a la ejecución y cumplimiento del contrato de obra, el cual está siendo ejecutado actualmente por el contratista

CONSTRUCCIONES, DISTRIBUIDORA Y SUMINISTROS ORITO S.A.S CODISUM.

Las actividades de la interventoría, entre otras son las siguientes:

- ✓ Control permanente del personal de la obra que tenga su respectiva seguridad social e implementos de seguridad.
- ✓ Cumplimiento de cada una de cláusulas del contrato (pliego de condiciones, Especificaciones técnicas, análisis de precios unitarios, presupuestos).
- ✓ En todas las actividades que se desarrollen se le exige al contratista el cumplimiento a Cabalidad de todas las sugerencias y procesos Constructivos que garanticen el buen desarrollo de la obra.
- ✓ Asesoría permanente para la ejecución de las obras objeto del presente Contrato.
- ✓ Solución de diferentes interrogantes planteados por el personal
- ✓ Supervisión constante de las labores ejecutadas en el lugar de trabajo.

4.1. MODIFICATORIO No 1. ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES.

La interventoría recibió el oficio de fecha 12 de diciembre del 2024, donde el contratista de obra mencionó que una vez realizado el replanteo topográfico encontraron diferentes situaciones con las obras contempladas en el proyecto, como es el caso, según la localización en los planos topográficos en el EJE 5, en este punto se observó que el terreno presenta una altura inferior al nivel requerido para la instalación de la tubería corrugada de PVC de 36”, asimismo se identificó que en el EJE 5, se cuenta con un colector ya existente para aguas combinadas compuesto por una tubería de 36” recubierta en concreto, el cual está construido de manera rectangular, de acuerdo a lo anterior se ve la necesidad de continuar con la construcción del encofrado haciendo recubrimiento de placa y laterales de forma rectangular con malla electrosoldada.

Por otra parte, posterior al replanteo topográfico, el contratista de obra identificó que el colector combinado de 36” existente afecta la construcción del alcantarillado sanitario en la sección comprendida entre el pozo P08 y el pozo P05. Lo anterior debido a que la cota del colector combinado de 36” es superior a la cota proyectada para la tubería de 8” en este tramo, lo que impide el paso normal del flujo.

También se evidenció una problemática en el tramo comprendido entre el pozo P10 y el pozo P02, donde el flujo de aguas residuales se dirige desde el pozo P10 hacia el pozo P02. Según

los diseños contemplados en el proyecto, y de acuerdo con el replanteo topográfico realizado este tramo presenta un contrapendiente, teniendo en cuenta los datos de la topografía el pozo P10 se encuentra a una cota de 336.7 msnm, mientras que el pozo P02 está a una cota de 337.20 msnm, lo que implica una diferencia de altura de 50 cm, generando una contrapendiente del 1.38%, situación que afectaría el funcionamiento del sistema en este sector.

De acuerdo con lo anterior, se solicitó a la empresa Emporito ESP, convocar a un comité técnico con las partes interesadas con el propósito de tratar los temas pertinentes a las situaciones presentadas en la ejecución del contrato de obra en mención. Por lo tanto, una vez analizada la situación presentada, se tomó la decisión de llevar a cabo el modificatorio No 1" acta de mayores y menores cantidades, el presente modificatorio no implicó una adición de recurso alguno y el valor del presupuesto del contrato no presenta variación, ni afecta el alcance del proyecto.

En las siguientes tablas se presenta el presupuesto con las condiciones iniciales, y el presupuesto con las condiciones actualizadas:

Tabla No 19. Presupuesto condiciones iniciales

1	**EXCAVACIONES**				
1.1	Excavación mecánica	m3	1968,45	$ 14.450,00	$ 28.444.102,50
1.2	Excavación a mano en material común	m3	531,83	$ 33.799,00	$ 17.975.322,17
1.3	Entibado (Apuntalamiento en metálico - madera)	m2	378,39	$ 34.611,00	$ 13.096.456,29
				subtotal	**$ 59.515.880,96**
2	**TUBERIA ALCANTARILLADO**				
2.1	Tubería sanitaria PVC Ø = 8". (Incluye instalación)	m	663,57	$ 87.696,00	$ 58.192.434,72
2.2	Tubería sanitaria PVC Ø = 36". (Incluye instalación)	m	133,83	$ 1.760.400,00	$ 235.594.332,00
2.3	Sustitución material de cimentación 50% triturado - 50% recebo E=0,40 compactado mecánicamente al 95% del próctor modificado.	m3	413,67	$ 175.000,00	$ 72.392.250,00
2.4	Atraque y relleno inicial con material seleccionado E=0,15m por encima de la clave compactado manualmente 90% con pizón.	m3	581,81	$ 114.402,00	$ 66.560.227,62
				subtotal	**$ 432.739.244,34**
3.	**CONSTRUCCIÓN CÁMARAS DE INSPECCIÓN**				
3.1	Cámara de inspección en concreto de 4000 psi D=1,2 prof: H < 3,00 m, Incluye 6 peldaños en varilla 5/8" y tapa en ferroconcreto.	und	13,00	$ 4.702.700,00	$ 61.135.100,00
3.2	Cámara de inspección en concreto de 4000 psi D=1,8 prof: H < 2,00 m, Incluye 6 peldaños en varilla 5/8" y tapa en ferroconcreto.	und	1,00	$ 5.106.055,00	$ 5.106.055,00

CELULAR: 3178545839 E-MAIL: SERVICONCSSAS@GMAIL.COM
ORITO PUTUMAYO

				subtotal	**$ 66.241.155,00**
4.	**CONSTRUCCIÓN ACOMETIDAS DOMICILIARIAS ALCANTARILLADO**				
4.1	Tubería sanitaria PVC Ø = 6". (Incluye Instalación)	m	474,00	$ 63.769,00	$ 30.226.506,00
4.2	Kid Silla Yee estructurada 200mm x 160mm (Incluye instalación)	und	79,00	$ 213.600,00	$ 16.874.400,00
4.3	Codo sanitario campana x espigo 45° PVC Ø = 6" (Incluye instalación)	und	79,00	$ 104.023,00	$ 8.217.817,00
4.4	Caja conexión domiciliaria en concreto de 4000 psi de 0,70x0,70m medidas internas	und	79,00	$ 667.600,00	$ 52.740.400,00
				subtotal	**$ 108.059.123,00**
5.	**RELLENOS Y OTRAS ACTIVIDADES**				
5.1	Entrega final a box coulvert	und	1,00	$ 791.480,00	$ 791.480,00
5.2	Relleno con material seleccionado de la excavación compactado mecanicamente.	m3	1281,72	$ 25.825,00	$ 33.100.419,00
5.3	Retiro de material sobrante (Obra - escombrera)	m3	973,16	$ 18.550,00	$ 18.052.118,00
5.4	Reposición (Material seleccionado para vía E=0.1m)	m3	398,14	$ 157.020,00	$ 62.515.942,80
5.5	Encofrado en concreto de 4000 psi para tubería de 8" y 36", incluye refuerzo d=3/8".	m3	71,86	$ 1.045.400,00	$ 75.122.444,00
				subtotal	**$ 189.582.403,80**
6.	**MODIFICATORIO**				
6.1	Encofrado en concreto de 4000 psi para tubería DE 36", incluye malla electrosoldada	m3		$ 1.110.356,00	
				subtotal	**$ 0,00**
	TOTAL COSTO DIRECTO				$ 856.137.807,10
	ADMINISTRACION			25,00%	$ 214.034.452,00
	IMPREVISTOS			2,00%	$ 17.122.756,00
	UTILIDAD			**5,00%**	$42.806.890,00
	Implementación Plan de Manejo ambiental				$15.670.000,00
	Implementación Plan de Manejo de Tránsito en obra				$23.926.360,00
	VALOR TOTAL DE PROYECTO				**$1.169.698.265,10**

CELULAR: 3178545839 E-MAIL: SERVICONCSSAS@GMAIL.COM
ORITO PUTUMAYO

Tabla No 20. Cuadro de mayores y menores cantidades

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	MENOR CANTIDAD		MAYOR CANTIDAD		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	**EXCAVACIONES**						
1.1	Excavación mecánica	-		-		1.968,45	$ 28.444.102,50
1.2	Excavación a mano en material común	-		-		531,83	$ 17.975.322,17
1.3	Entibado (Apuntalamiento en metálico - madera)	270,64	$ 9.367.121,04	-		107,75	$ 3.729.335,25
			$ 9.367.121,04		**$ 0,00**		**$ 50.148.759,92**
2	**TUBERIA ALCANTARILLADO**						
2.1	Tubería sanitaria PVC Ø = 8". (Incluye instalación)	-		-		663,57	$ 58.192.434,72
2.2	Tubería sanitaria PVC Ø = 36". (Incluye instalación)	-		-		133,83	$ 235.594.332,00
2.3	Sustitución material de cimentación 50% triturado - 50% recebo E=0,40 compactado mecánicamente al 95% del próctor modificado.	-		-		413,67	$ 72.392.250,00
2.4	Atraque y relleno inicial con material seleccionado E=0,15m por encima de la clave compactado manualmente 90% con pizón.	361,46	$ 41.351.746,92	-		220,35	$ 25.208.480,70
			$ 41.351.746,92		**$ 0,00**		**$ 391.387.497,42**
3.	**CONSTRUCCIÓN CÁMARAS DE INSPECCIÓN**						
3.1	Cámara de inspección en concreto de 4000 psi D=1,2 prof: H < 3,00 m, Incluye 6 peldaños en varilla 5/8" y tapa en ferroconcreto.	-		-		13,00	$ 61.135.100,00
3.2	Cámara de inspección en concreto de 4000 psi D=1,8 prof: H < 2,00 m, Incluye 6 peldaños en varilla 5/8" y tapa en ferroconcreto.	-		-		1,00	$ 5.106.055,00
			$ 0,00		**$ 0,00**		**$ 66.241.155,00**
4.	**CONSTRUCCIÓN ACOMETIDAS DOMICILIARIAS ALCANTARILLADO**						
4.1	Tubería sanitaria PVC Ø = 6". (Incluye Instalación)	-		-		474,00	$ 30.226.506,00
4.2	Kid Silla Yee estructurada 200mm x 160mm (Incluye instalación)	-		-		79,00	$ 16.874.400,00
4.3	Codo sanitario campana x espigo 45° PVC Ø = 6" (Incluye instalación)	-		-		79,00	$ 8.217.817,00
4.4	Caja conexión domiciliaria en concreto de 4000 psi de 0,70x0,70m medidas internas	-		-		79,000	$ 52.740.400,00
			$ 0,00		**$ 0,00**		**$ 108.059.123,00**
5.	**RELLENOS Y OTRAS ACTIVIDADES**						
5.1	Entrega final a box coulvert	-		-		1,00	$ 791.480,00
5.2	Relleno con material seleccionado de la excavación compactado mecanicamente.	-		-		1.281,72	$ 33.100.419,00

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

5.3	Retiro de material sobrante (Obra - escombrera)	-		300,57	$ 5.575.573,50	1.273,73	$ 23.627.691,50
5.4	Reposición (Material seleccionado para vía E=0.1m)	-		-		398,14	$ 62.515.942,80
5.5	Encofrado en concreto de 4000 psi para tubería de 8" y 36", incluye refuerzo d=3/8".	33,73	$ 35.261.342,00	-		38,13	$ 39.861.102,00
			$ 35.261.342,00		**$ 5.575.573,50**		**$ 159.896.635,30**
6.	**ITEM NUEVO**						
6.1	Encofrado en concreto de 4000 psi para tubería DE 36", incluye malla electrosoldada	-		60,89	$ 80.404.636,46	60,89	$ 80.404.636,46
			$ 0,00		**$ 80.404.636,46**		**$ 80.404.636,46**
	TOTAL COSTO DIRECTO		$ 85.980.209,96		$ 85.980.209,96		$ 856.137.807,10
	ADMINISTRACION		$ 21.495.052,00		$ 21.495.052,00		$ 214.034.452,00
	IMPREVISTOS		$ 1.719.604,00		$ 1.719.604,00		$ 17.122.756,00
	UTILIDAD		$ 4.299.010,00		$ 4.299.010,00		$ 42.806.890,00
	Implementación Plan de Manejo ambiental		$ 15.670.000,00		$ 15.670.000,00		$ 15.670.000,00
	Implementación Plan de Manejo de Tránsito en obra		$ 23.926.360,00		$ 23.926.360,00		$ 23.926.360,00
	VALOR TOTAL DE PROYECTO		**$ 153.090.235,96**		**$ 153.090.235,96**		**$ 1.169.698.265,10**

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

Tabla No 21. Presupuesto condiciones actualizas

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MENOR CANTIDAD		MAYOR CANTIDAD		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	**EXCAVACIONES**										
1.1	Excavación mecánica	m3	1968,45	$ 14.450,00	$ 28.444.102,50	-		-		1.968,45	$ 28.444.102,50
1.2	Excavación a mano en material común	m3	531,83	$ 33.799,00	$ 17.975.322,17	-		-		531,83	$ 17.975.322,17
1.3	Entibado (Apuntalamiento en metálico - madera)	m2	378,39	$ 34.611,00	$ 13.096.456,29	270,64	$ 9.367.121,04	-		107,75	$ 3.729.335,25
				subtotal	**$ 59.515.880,96**		**$ 9.367.121,04**		**$ 0,00**		**$ 50.148.759,92**
2	**TUBERIA ALCANTARILLADO**										
2.1	Tubería sanitaria PVC Ø = 8". (Incluye instalación)	m	663,57	$ 87.696,00	$ 58.192.434,72	-		-		663,57	$ 58.192.434,72
2.2	Tubería sanitaria PVC Ø = 36". (Incluye instalación)	m	133,83	$ 1.760.400,00	$ 235.594.332,00	-		-		133,83	$ 235.594.332,00
2.3	Sustitución material de cimentación 50% triturado - 50% recebo E=0,40 compactado mecánicamente al 95% del próctor modificado.	m3	413,67	$ 175.000,00	$ 72.392.250,00	-		-		413,67	$ 72.392.250,00
2.4	Atraque y relleno inicial con material seleccionado E=0,15m por encima de la clave compactado manualmente 90% con pizón.	m3	581,81	$ 114.402,00	$ 66.560.227,62	361,46	$ 41.351.746,92	-		220,35	$ 25.208.480,70
				subtotal	**$ 432.739.244,34**		**$ 41.351.746,92**		**$ 0,00**		**$ 391.387.497,42**
3.	**CONSTRUCCIÓN CÁMARAS DE INSPECCIÓN**										
3.1	Cámara de inspección en concreto de 4000 psi D=1,2 prof: H < 3,00 m, Incluye 6 peldaños en varilla 5/8" y tapa en ferroconcreto.	und	13,00	$ 4.702.700,00	$ 61.135.100,00	-		-		13,00	$ 61.135.100,00
3.2	Cámara de inspección en concreto de 4000 psi D=1,8 prof: H < 2,00 m, Incluye 6 peldaños en varilla 5/8" y tapa en ferroconcreto.	und	1,00	$ 5.106.055,00	$ 5.106.055,00	-		-		1,00	$ 5.106.055,00
				subtotal	**$ 66.241.155,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 66.241.155,00**
4.	**CONSTRUCCIÓN ACOMETIDAS DOMICILIARIAS ALCANTARILLADO**										

4.1	Tubería sanitaria PVC Ø = 6". (Incluye Instalación)	m	474,00	$ 63.769,00	$ 30.226.506,00	-		-		474,00	$ 30.226.506,00
4.2	Kid Silla Yee estructurada 200mm x 160mm (Incluye instalación)	und	79,00	$ 213.600,00	$ 16.874.400,00	-		-		79,00	$ 16.874.400,00
4.3	Codo sanitario campana x espigo 45° PVC Ø = 6" (Incluye instalación)	und	79,00	$ 104.023,00	$ 8.217.817,00	-		-		79,00	$ 8.217.817,00
4.4	Caja conexión domiciliaria en concreto de 4000 psi de 0,70x0,70m medidas internas	und	79,00	$ 667.600,00	$ 52.740.400,00	-		-		79,000	$ 52.740.400,00
				subtotal	**$ 108.059.123,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 108.059.123,00**
5.	**RELLENOS Y OTRAS ACTIVIDADES**										
5.1	Entrega final a box coulvert	und	1,00	$ 791.480,00	$ 791.480,00	-		-		1,00	$ 791.480,00
5.2	Relleno con material seleccionado de la excavación compactado mecanicamente.	m3	1281,72	$ 25.825,00	$ 33.100.419,00	-		-		1.281,72	$ 33.100.419,00
5.3	Retiro de material sobrante (Obra - escombrera)	m3	973,16	$ 18.550,00	$ 18.052.118,00	-		300,57	$ 5.575.573,50	1.273,73	$ 23.627.691,50
5.4	Reposición (Material seleccionado para vía E=0.1m)	m3	398,14	$ 157.020,00	$ 62.515.942,80	-		-		398,14	$ 62.515.942,80
5.5	Encofrado en concreto de 4000 psi para tubería de 8" y 36", incluye refuerzo d=3/8".	m3	71,86	$ 1.045.400,00	$ 75.122.444,00	33,73	$ 35.261.342,00	-		38,13	$ 39.861.102,00
				subtotal	**$ 189.582.403,80**		**$ 35.261.342,00**		**$ 5.575.573,50**		**$ 159.896.635,30**
6.	**ITEM NUEVO**										
6.1	Encofrado en concreto de 4000 psi para tubería DE 36", incluye malla electrosoldada	m3		$ 1.320.394,00		-		60,89	$ 80.404.636,46	60,89	$ 80.404.636,46
				subtotal	**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 80.404.636,46**		**$ 80.404.636,46**
	TOTAL COSTO DIRECTO				$ 856.137.807,10		$ 85.980.209,96		$ 85.980.209,96		$ 856.137.807,10
	ADMINISTRACION			25,00%	$ 214.034.452,00		$ 21.495.052,00		$ 21.495.052,00		$ 214.034.452,00
	IMPREVISTOS			2,00%	$ 17.122.756,00		$ 1.719.604,00		$ 1.719.604,00		$ 17.122.756,00
	UTILIDAD			**5,00%**	$ 42.806.890,00		$ 4.299.010,00		$ 4.299.010,00		$ 42.806.890,00
	Implementación Plan de Manejo ambiental				$ 15.670.000,00		$ 15.670.000,00		$ 15.670.000,00		$ 15.670.000,00
	Implementación Plan de Manejo de Tránsito en obra				$ 23.926.360,00		$ 23.926.360,00		$ 23.926.360,00		$ 23.926.360,00
	VALOR TOTAL DE PROYECTO				**$ 1.169.698.265,10**		**$ 153.090.235,96**		**$ 153.090.235,96**		**$ 1.169.698.265,10**

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

4.2. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA

Durante el periodo de ejecución comprendido entre el 28 de Enero al 28 de Febrero de 2025, el contratista realizó las siguientes actividades:

CAPITULO 1.0 EXCAVACIONES

ITEM 1.1 Excavación mecánica (m3)

Esta especificación aplica para excavaciones que se realizaron a máquina, lo cual comprende en general la excavación necesaria para la instalación de redes de alcantarillado.

Esta actividad se ejecutó según las especificaciones técnicas, de acuerdo con las líneas y pendientes que se muestran en los planos, según las indicaciones por parte de la Interventoría.

Se recomendó al contratista tener especial cuidado con las redes de acueducto, alcantarillado, energía, entre otras.

MEDIDA Y PAGO

La medida de las excavaciones se tomó por metro cúbico (m3) de material excavado, medido en su posición original, de acuerdo con los alineamientos, pendientes, cotas y dimensiones indicadas en los pliegos, mostradas en los planos o autorizadas por el Interventor. Los precios para excavaciones incluyen el costo de los equipos, herramientas, materiales, mano de obra y los demás costos directos e indirectos necesarios para ejecutar las excavaciones de acuerdo con estas especificaciones.

La ejecución de este ítem se realizó con la previa autorización de interventoría y las cuales tendrán la medida indicada en los planos.

ITEM 1.2 Excavación a mano en material común (m3)

Se realizó excavación manual en material común, esta actividad comprende toda remoción de materiales térreos o pétreos in situ, con el fin de permitir la conformación de la estructura del alcantarillado según los diseños técnicos del proyecto.

MEDIDA Y PAGO

La unidad de medida se calculó mediante metro cúbico (m3) de material excavado, dicho cálculo se hizo con la nivelación topográfica antes y después de ejecutado el trabajo de excavación medidas que se lograron directamente en el terreno y se sustentará con carteras topográficas por parte del contratista y otras por parte de la interventoría para confrontación.

La ejecución de este ítem se realizó con la previa autorización de interventoría y las cuales tendrán la medida indicada en los planos.

CAPITULO 2.0 TUBERIA ALCANTARILLADO

ITEM 2.1 Tubería sanitaria PVC Ø = 8" (Incluye Instalación) (m)

Se realizó instalación de tubería de 8". Esta actividad se refiere a la instalación de tubería de PVC tipo Novafort o similar en los sitios indicados en los planos u ordenados por el Interventor.

Previo a la instalación de la Tubería, se verificó el replanteo de hilos, niveles y pendientes, de acuerdo con lo definido en los planos, esquemas y diseños del proyecto o con lo definido por la Interventoría. Esta revisión incluyó los hiladeros, mojones y referencias que se propuso utilizar el contratista para la correcta instalación de la tubería.

MEDIDA Y PAGO

La longitud de la tubería instalada se midió directamente en la zanja después de su colocación, expresada en metros (m) con dos decimales, a satisfacción del Interventor, incluyendo los accesorios que fueren necesarios instalar, de acuerdo con los alineamientos especificados en los planos y la ubicación final de la tubería.

La ejecución de este ítem se realizó con la previa autorización de interventoría y las cuales tendrán la medida indicada en los planos.

ITEM 2.3 Sustitución material de cimentación 50% triturado - 50% recebo E=0,40 compactado mecánicamente al 95% del próctor modificado (m3).

Se denomina relleno el constituido por 50% de triturado – 50% recebo, una mezcla de estos dos materiales, convenientemente colocado y compactado.

Este relleno se utilizó para la cimentación de tuberías o en los sitios de la obra indicados en los planos o en los ordenados por la INTERVENTORIA.

MEDIDA Y PAGO

La medida para el pago de relleno colocado bajo las tuberías se calculó mediante el volumen en metros cúbicos (m3) medido en el lugar y comprendido entre las líneas y cotas de excavación mostradas en los planos con recomendación de la interventoría.

La ejecución de este ítem se realizó con la previa autorización de interventoría y las cuales tendrán la medida indicada en los planos.

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

ITEM 2.4 Atraque y relleno inicial con recebo E=0,15m por encima de la clave compactado manualmente 90% con pizón. (m3)

Se realizó la actividad de atraque y relleno inicial para las tuberías instaladas, de acuerdo con lo indicado en los planos.

MEDIDA Y PAGO

La medida para el pago de atraque y relleno colocados en medio y sobre las tuberías es el volumen en metros cúbicos (m3) medido en el lugar y comprendido entre las líneas y cotas de excavación mostradas en los planos con recomendación de la interventoría.

La ejecución de este ítem se realizó con la previa autorización de interventoría y las cuales tendrán la medida indicada en los planos.

CAPITULO 3.0 CONSTRUCCIÓN CÁMARAS DE INSPECCIÓN

3.1 Cámara de inspección en concreto de 4.000 psi D=1,2

Esta actividad consistió en la construcción de cilindros de concreto de 4.000 psi, el diámetro interno de la parte cilíndrica de los pozos de inspección para aguas residuales tiene una medida de 1.20m, de acuerdo con las especificaciones técnicas.

MEDIDA Y PAGO

La unidad de medida de cámaras de inspección construidas en concreto de 4000 psi se tomó mediante Unidad (und), con aproximación a dos decimales y sin distinción de tipo, forma y dimensiones, de cámaras de inspección que haya sido construida cumpliendo con lo especificado.

La ejecución de este ítem se realizó con la previa autorización de interventoría y las cuales tendrán la medida indicada en los planos.

CAPITULO 4.0 CONSTRUCCIÓN ACOMETIDAS DOMICILIARIAS ALCANTARILLADO

4.1 Tubería sanitaria PVC Ø = 6 (Incluye Instalación (m)

NOTA: PROCESO CONSTRUCTIVO IGUAL AL NUMERAL 2.1

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

La ejecución de este ítem se realizó con la previa autorización de interventoría y las cuales tendrán la medida indicada en los planos.

4.2 kit Silla Yee estructurada 200mm x 160mm (Incluye Instalación) (Und)

Se realizó la instalación de sillas yee con la derivación del tamaño especificado, incorporadas al tubo durante su fabricación. Las yees, tienen sus ejes aproximadamente a 35 grados del eje longitudinal del tubo medidos desde el extremo de la campana, esta actividad se hizo de acuerdo con las especificaciones técnicas y recomendación de la interventoría.

MEDIDA Y PAGO

La medida para este item se tomó mediante la unidad del suministro e instalación de silla yee para las conexiones domiciliarias. El pago se hará al precio unitario del Contrato, por toda obra ejecutada de acuerdo con esta especificación y aceptada a satisfacción por el Interventor.

El precio unitario deberá incluir todos los costos por concepto de suministro en el lugar de las sillas tee y su instalación; el suministro de los demás materiales y accesorios requeridos.

La ejecución de este ítem se realizó con la previa autorización de interventoría y las cuales tendrán la medida indicada en los planos.

4.3 Codo sanitario estructurado PVC Ø = 6" (Incluye Instalación) (Und)

Se realizó instalación de codos de 6” de diámetro con la derivación del tamaño especificado, incorporadas al tubo durante su fabricación. Los codos, tienen sus ejes aproximadamente a 45 grados del eje longitudinal del tubo medidos desde el extremo de la campana.

MEDIDA Y PAGO

La medida para este ítem se tomó mediante la unidad del suministro e instalación de codos para las conexiones domiciliarias. El pago se hará al precio unitario del Contrato, por toda obra ejecutada de acuerdo con esta especificación y aceptada a satisfacción por el Interventor.

La ejecución de este ítem se realizó con la previa autorización de interventoría y las cuales tendrán la medida indicada en los planos.

4.4 Caja conexión domiciliaria en concreto de 3,000 psi de 0,70x0,70m medidas internas (Und).

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

Se realizó la construcción de cajas conexión domiciliaria en concreto reforzado de 3.000 psi con refuerzo en acero de 37000psi, de acuerdo con las especificaciones técnicas y recomendación de la interventoría.

MEDIDA Y PAGO

La medida se tomó mediante la unidad (und) y el valor de esta será el estipulado en el Contrato de obra.

La ejecución de este ítem se realizó con la previa autorización de interventoría y las cuales tendrán la medida indicada en los planos.

5. CAPITULO 5.0 RELLENOS Y OTRAS ACTIVIDADES

5.2 Relleno con material seleccionado de la excavación compactado mecánicamente (m3)

Se realizó relleno con material seleccionado, una vez colocada la capa de material seleccionado que protege las tuberías y aprobadas por la interventoría, el Contratista procedió a colocar los rellenos necesarios con material proveniente de la excavación y consiguiendo la compactación de acuerdo con las especificaciones técnicas y con recomendación de la interventoría.

MEDIDA Y PAGO

La medida y para el pago de este ítem se toma por metro cúbico (m3) de material compactado, obtenido del producto de los metros lineales de zanja multiplicados por profundidad excavada según los perfiles y por el ancho de zanja que, según el diámetro de las tuberías, de acuerdo con las normas técnicas y recomendación de la interventoría.

La ejecución de este ítem se realizó con la previa autorización de interventoría y las cuales tendrán la medida indicada en los planos.

5.3 Retiro de material sobrante (Obra – escombrera) (m3)

Se realizó retiro de material sobrante proveniente de las excavaciones, de acuerdo con las especificaciones técnicas, y se dio manejo mediante actas de donación siguiendo las directrices de la resolución 1257 del 2021.

Esta Especificación se refiere a las operaciones que deberá ejecutar el CONTRATISTA para cargar, transportar, descargar y disponer, en los sitios de despeje de materiales de excavación

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

de Obra autorizados por la Interventoría, los materiales que a juicio de ésta son inservibles o sobrantes, para que desde allí se puedan cargar, transportar, descargar y disponer adecuadamente en las escombreras autorizadas por el Municipio de Orito y por la Interventoría.

MEDIDA Y PAGO

La unidad de medida será el Metro Cúbico (m3), medido compacto y con aproximación a dos decimales, de Evacuación de Escombros o Materiales sobrantes debidamente ejecutada y aprobada por la Interventoría.

El pago se hará al costo unitario más A.I.U. establecidos en el Contrato.

5.4. Reposición (Material seleccionado para vía E=0.10m) (m3)

Se realizó reposición para las vías intervenidas con material seleccionado, esta actividad consistió en el suministro, transporte, colocación, sobre la rasante definida en los diseños, conformación y compactación de recebo, grava, piedra partida, arenilla u otro material granular aprobado por la Interventoría.

FORMA DE PAGO

La forma de pago de la reposición de material seleccionado para vías estabilizadas con material seleccionado de río al que se refiere el numeral de esta especificación se realizará por metro cúbico (m3) de mejoramiento de la rasante con material tipo seleccionado compactado de río, medido con aproximación a dos decimales, en el costo unitario de este ítem se deben incluir todos los costos inherentes al suministro del material, transporte, compactación necesaria para cumplir con las resistencias y demás especificaciones que se establecen para este ítem.

La ejecución de este ítem se realizó con la previa autorización de interventoría y las cuales tendrán la medida indicada en los planos.

5.5. Encofrado en concreto de 4.000 psi para tubería de 8” y 36", Incluye refuerzo d= 3/8” (m).

Se realizó encofrado en concreto de 4000 psi para tubería de 8”. Este item se refiere al recubrimiento en concreto rígido sobre tubería pvc que se encuentra a profundidades inferiores a las permitidas por la norma RAS 2017 o al aire libre, y consiste en la construcción de una

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

estructura compuesta por una capa de subbase y una losa con muros laterales de concreto de acuerdo a diseños y demás especificaciones técnicas.

MEDIDA Y PAGO

El encofrado para tubería en concreto se tomó la medida siguiendo el eje especificado en los planos y en un ancho igual al especificado en los mismos para la excavación de las zanjas, o el ordenado por el INTERVENTOR, tomando como unidad de medida el metro (m) con aproximación a dos decimales.

La ejecución de este ítem se realizó con la previa autorización de interventoría y las cuales tendrán la medida indicada en los planos.

6. ESTADO FINANCIERO DEL PROYECTO

A continuación, se detalla de manera general el estado financiero del proyecto.

I. CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO INICIAL	$ 1.169.698.265,10.

II. VALORES RECONOCIDOS AL CONTRATISTA POR OBRA EJECUTADA

VALOR CANCELADO POR CONCEPTO DE ANTICIPO	$	0,00

III. BALANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

VALOR PAGADO ACUMULADO	$	0,00
% PAGADO ACUMULADO		0 %
VALOR PENDIENTE POR PAGAR	$	1.169.698.265,10
% PENDIENTE POR PAGAR		100 %

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

IV. BALANCE DE INVERSIÓN DEL PROYECTO A CORTE DE 28 DE FEBRERO DE 2025

A CORTE 28 DE FEBRERO	
VALOR EJECUTADO ACUMULADO A CORTE 28 DE FEBRERO	**$ 1.169.698.265,10**
% EJECUTADO PRESENTE A CORTE 28 DE FEBRERO	**23.16%**
% ACUMULADO EJECUTADO A CORTE 28 DE FEBRERO	**100%**
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	**$ 0.00**
% PENDIENTE POR EJECUTAR	**0%**

7. RESUMEN CUBICACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA EN EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME

Las actividades acumuladas desarrolladas desde el 28 de Enero al 28 de Febrero fueron las siguientes:

"CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTOR AGUAS LLUVIAS BARRIO PUERTAS DEL SOL, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"							
ITEM NO.	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND	CANT CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA 28 ENE. – 28 FEB. 2025	CANTIDAD EJECUTADA MES 1, 2 Y 3	ACUMULADO TOTAL	%
1	**EXCAVACIONES**						
1.1	Excavación mecánica	m3	1968.45	335.9	1632.56	1968.45	100.00%
1.2	Excavación a mano en material común	m3	531.83	83.181	448.65	531.83	100.00%
1.3	Entibado (Apuntalamiento en metálico - madera)	m2	107.75	0.00	107.75	107.75	100.00%
2	**TUBERIA ALCANTARILLADO**						
2.1	Tubería sanitaria PVC Ø = 8". (Incluye instalación)	m	663.57	133,03	530.64	663.57	100.00%
2.2	Tubería sanitaria PVC Ø = 36". (Incluye instalación)	m	133.83	0.00	133.83	133.83	100.00%
2.3	Sustitución material de cimentación 50% triturado - 50% recebo E=0,40 compactado mecánicamente al 95% del próctor modificado.	m3	413.67	61,24	352.43	413.67	100.00%

CELULAR: 3178545839 E-MAIL: SERVICONCSSAS@GMAIL.COM
ORITO PUTUMAYO

2.4	Atraque y relleno inicial con material seleccionado E=0,15m por encima de la clave compactado manualmente 90% con pizón.	m3	220.35	39,35	181	220.35	100.00%
3	**CONSTRUCCIÓN CÁMARAS DE INSPECCIÓN**						
3.1	Cámara de inspección en concreto de 4000 psi D=1,2 prof: H < 3,00 m, Incluye 6 peldaños en varilla 5/8" y tapa en ferroconcreto.	und	13	4	9	13	100.00%
3.2	Cámara de inspección en concreto de 4000 psi D=1,8 prof: H < 2,00 m, Incluye 6 peldaños en varilla 5/8" y tapa en ferroconcreto.	und	1	0	1	1	100%
4	**CONSTRUCCIÓN ACOMETIDAS DOMICILIARIAS ALCANTARILLADO**						
4.1	Tubería sanitaria PVC Ø = 6". (Incluye Instalación)	m	474	66,	408	474	100%
4.2	Kid Silla Yee estructurada 200mm x 160mm (Incluye instalación)	und	79	11	68	79	100%
4.3	Codo sanitario campana x espigo 45° PVC Ø = 6" (Incluye instalación)	und	79	11	68	79	100.00%
4.4	Caja conexión domiciliaria en concreto de 4000 psi de 0,70x0,70m medidas internas	und	79	14	65	79	100.00%
5	**RELLENOS Y OTRAS ACTIVIDADES**						
5.1	Entrega final a box coulvert	und	1	0.00	1	1	100.00%
5.2	Relleno con material seleccionado de la excavación compactado mecánicamente.	m3	1281.72	178,18	1103.53	1281.72	100.00%
5.3	Retiro de material sobrante (Obra - escombrera)	m3	973.16	913.16	0.00	913.16	100.00%
5.4	Reposición (Material seleccionado para vía E=0.1m)	m3	398.14	398.14	0.00	398.14	100.00 %
5.5	Encofrado en concreto de 4000 psi para tubería de 8" y 36", incluye refuerzo d=3/8".	m3	71.86	71.86	0.00	71.86	100.00 %
6	**MODIFICATORIO**						
6.1	Encofrado en concreto de 4000 psi para tubería DE 36", incluye malla electrosoldada	**M3**	**60.89**	**0.00**	60.89	60.89	100.00%

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo



			ACUMULADO	
	PROGRAMADO	**EJECUTADO**	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**
MES 1	26,28%	10,67%	26,28%	10,67%
MES 2	31,28%	46,95%	57,56%	57.62%
MES 3	20.12%	19.22%	80.42%	76.84%
MES 4	22.32%	23.16%	100%	100%

Por lo anterior, en vista al desarrollo de las actividades se puede concluir que el proyecto presenta un avance del **100%** de obra ejecutada, de acuerdo con la programación establecida, se cumplieron las metas propuestas, cabe resaltar que en el anterior periodo se presentó afectaciones en el avance de la obra debido a las constantes lluvias, por lo cual no se ha podido compactar el material de conformación de las vías afectadas. Por tales motivos la empresa contratista hace aclaración que se ha establecido un compromiso de realizar las debidas compactaciones al cambio de clima.

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

8. COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta el desarrollo de las actividades por el contratista durante el periodo comprendido entre el 28 de enero al 28 de febrero del 2025, la interventoría evidenció el cumplimiento de las actividades constructivas tales como:

- Excavaciones: Excavación mecánica y manual en material común, así como entibado para estabilización.
- Instalación de tuberías de alcantarillado sanitario: Tubería sanitaria de PVC Ø 8", con sustitución de material de cimentación y rellenos compactados según especificaciones técnicas.
- Construcción de cámaras de inspección: Cámaras en concreto de 4000 psi con dimensiones y elementos requeridos para garantizar funcionalidad y durabilidad.
- Construcción de acometidas domiciliarias: Conexiones de PVC Ø 6", instalación de kits estructurados y cajas de conexión domiciliaria.
- Rellenos y otras actividades: Compactación con material seleccionado y entrega final en conexión con el box culvert.

Avance financiero: Considerando que la firma contratista **CODISUM SAS**, ha realizado durante periodo del 28 de Enero al 28 de Febrero de 2025, la ejecución total de los ítems del contrato de obra, los cuales fueron descritos anteriormente, se tiene que el avance financiero de obra ejecutado acumulado por **MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES SEICIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON DIEZ CENTAVOS ($ 1.169.698.265,10),** siendo el **100 %** del valor total del contrato de obra.

El contratista está cumpliendo con sus obligaciones y adelantan las actividades conforme a la ruta crítica del proyecto, el suministro de materiales se hace de la mejor manera ya que es fundamental para que la obra avance de la mejor manera.

La interventoría ha hecho presencia constantemente en la ejecución del contrato de obra para aprobación de especificaciones técnicas de la obra, el informe No 04 de obra se realizó de acuerdo con lo supervisado por la interventoría donde se dio cumplimiento al desarrollo de las actividades en los aspectos administrativos, técnicos, financieros y ambientales, teniendo en cuenta el control de la cantidad y calidad de los productos parciales obtenidos para el periodo reportado.

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

Se evidenció una adecuada gestión técnica y administrativa del contratista, garantizando la calidad y el cumplimiento de las especificaciones técnicas en cada actividad.

Presentó,

ELIANA ANDREA CEBALLOS AREVALO
REPRESENTANTE LEGAL
SERVICON CS S.A.S

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**BOGOTA**	**11**	**11-44-101234140**	**0**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
04	**09**	**2024**	**02**	**09**	**2024**	**00:00**	**02**	**01**	**2030**	**23:59**	**EMISION ORIGINAL**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
SERVICON CS S.A.S	**NIT: 900.949.050-7**	DG 8 N 5 41 B. VERGEL	ORITO, PUTUMAYO	4291111

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
GOBERNACION DEL PUTUMAYO	**NIT: 800.094.164-4**	CALLE 8 NO. 7-40	MOCOA, PUTUMAYO	4206600

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL CUMPLIMIENTO, EL PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMIZACIONES LABORALES Y LA CALIDAD DEL SERVICIO SEGUN CONTRATO NO.1695-2024 REFERENTE A: CONSTRUCCION BARRIO PUERTAS DEL SOL, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO-INTERVENTORIA.

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**02/09/2024**	**02/07/2025**	**$7,761,180.00**
CALIDAD DEL SERVICIO	**02/01/2025**	**02/01/2030**	**$7,761,180.00**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**02/09/2024**	**02/01/2028**	**$3,880,590.00**

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****175,298.00	$ *******8,000.00	$ ******34,826.00	$ **********218,124.00	$ *******19,402,950.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ASINPETROL LIMITADA ASESORES DE SEG	83052	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101234140

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**BOGOTA**	**11**	**11-44-101234140**	**0**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
04	**09**	**2024**	**02**	**09**	**2024**	**00:00**	**02**	**01**	**2030**	**23:59**	**EMISION ORIGINAL**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	SERVICON CS S.A.S	**NIT: 900.949.050-7**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
DG 8 N 5 41 B. VERGEL		ORITO, PUTUMAYO		4291111	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	GOBERNACION DEL PUTUMAYO	**NIT: 800.094.164-4**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO	
CALLE 8 NO. 7-40		MOCOA, PUTUMAYO		4206600	

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse

VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla · Super INTER · SURTIMAX · Movil Red · Bancolombia Corresponsal Bancario · éxito · Gana Gana · CODENSA

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****175,298.00	$ *******8,000.00	$ ******34,826.00	$ **********218,124.00	$ *******19,402,950.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ASINPETROL LIMITADA ASESORES DE SEG	83052	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11000627808757(3900)000000218124(96)20250902

REFERENCIA PAGO:

1100062780875-7

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**BOGOTA**	**11**	**11-44-101234140**	**1**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	**11**	**2024**	**02**	**09**	**2024**	**00:00**	**02**	**01**	**2030**	**23:59**	**ANEXO DE MODIFICACION**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
SERVICON CS S.A.S	**NIT: 900.949.050-7**	DG 8 N 5 41 B. VERGEL	ORITO, PUTUMAYO	4291111

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
GOBERNACION DEL PUTUMAYO	**NIT: 800.094.164-4**	CALLE 8 NO. 7-40	MOCOA, PUTUMAYO	4206600

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL CUMPLIMIENTO, EL PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMIZACIONES LABORALES Y LA CALIDAD DEL SERVICIO SEGUN CONTRATO NO.1695-2024 REFERENTE A: CONSTRUCCION BARRIO PUERTAS DEL SOL, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO-INTERVENTORIA.

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZAN LAS VIGENCIAS DE LA POLIZA SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 28/10/2024.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***(175,298.00)	$ *****(8,000.00)	$ ****(34,826.00)	$ *********(218,124.00)	$ *****(19,402,950.00)	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ASINPETROL LIMITADA ASESORES DE SEG	83052	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101234140

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**BOGOTA**	**11**	**11-44-101234140**	**1**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	**11**	**2024**	**02**	**09**	**2024**	**00:00**	**02**	**01**	**2030**	**23:59**	**ANEXO DE MODIFICACION**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	SERVICON CS S.A.S	**NIT: 900.949.050-7**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:
DG 8 N 5 41 B. VERGEL		ORITO, PUTUMAYO		4291111

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	GOBERNACION DEL PUTUMAYO	**NIT: 800.094.164-4**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO
CALLE 8 NO. 7-40		MOCOA, PUTUMAYO		4206600

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse

VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla · Super INTER · SURTIMAX · Movil Red · Bancolombia Corresponsal Bancario · éxito · Gana Gana · CODENSA

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***(175,298.00)	$ *****(8,000.00)	$ ****(34,826.00)	$ *********(218,124.00)	$ *****(19,402,950.00)	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ASINPETROL LIMITADA ASESORES DE SEG	83052	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101234140	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	11	2024	02	09	2024	00:00	02	01	2030	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	SERVICON CS S.A.S	**NIT: 900.949.050-7**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	DG 8 N 5 41 B. VERGEL		ORITO, PUTUMAYO		4291111

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	GOBERNACION DEL PUTUMAYO	**NIT: 800.094.164-4**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	CALLE 8 NO. 7-40		MOCOA, PUTUMAYO		4206600

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101234140

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**BOGOTA**	**11**	**11-44-101234140**	**2**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	**11**	**2024**	**28**	**10**	**2024**	**00:00**	**27**	**02**	**2030**	**23:59**	**ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
SERVICON CS S.A.S	**NIT: 900.949.050-7**	DG 8 N 5 41 B. VERGEL	ORITO, PUTUMAYO	4291111

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
GOBERNACION DEL PUTUMAYO	**NIT: 800.094.164-4**	CALLE 8 NO. 7-40	MOCOA, PUTUMAYO	4206600

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL CUMPLIMIENTO, EL PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMIZACIONES LABORALES Y LA CALIDAD DEL SERVICIO SEGUN CONTRATO NO.1695-2024 REFERENTE A: CONSTRUCCION BARRIO PUERTAS DEL SOL, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO-INTERVENTORIA.

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**28/10/2024**	**27/08/2025**	**$7,761,180.00**	
CALIDAD DEL SERVICIO	**27/02/2025**	**27/02/2030**	**$7,761,180.00**	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**28/10/2024**	**27/02/2028**	**$3,880,590.00**	

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZAN LAS VIGENCIAS DE LA POLIZA SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 28/10/2024.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****175,298.00	$ *******8,000.00	$ ******34,826.00	$ **********218,124.00	$ *******19,402,950.00	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
ASINPETROL LIMITADA ASESORES DE SEG	83052	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101234140

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**BOGOTA**	**11**	**11-44-101234140**	**2**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	**11**	**2024**	**28**	**10**	**2024**	**00:00**	**27**	**02**	**2030**	**23:59**	**ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
SERVICON CS S.A.S	**NIT: 900.949.050-7**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
DG 8 N 5 41 B. VERGEL	ORITO, PUTUMAYO	4291111

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
GOBERNACION DEL PUTUMAYO	**NIT: 800.094.164-4**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CALLE 8 NO. 7-40	MOCOA, PUTUMAYO	4206600

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****175,298.00	$ *******8,000.00	$ ******34,826.00	$ **********218,124.00	$ *******19,402,950.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ASINPETROL LIMITADA ASESORES DE SEG	83052	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11000628353414(3900)000000218124(96)20251028

REFERENCIA PAGO:

1100062835341-4

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101234140	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	11	2024	28	10	2024	00:00	27	02	2030	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	SERVICON CS S.A.S		**NIT: 900.949.050-7**
DIRECCIÓN: DG 8 N 5 41 B. VERGEL	**CIUDAD:** ORITO, PUTUMAYO	**TELÉFONO:**	4291111

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	GOBERNACION DEL PUTUMAYO		**NIT: 800.094.164-4**
DIRECCIÓN: CALLE 8 NO. 7-40	**CIUDAD:** MOCOA, PUTUMAYO	**TELÉFONO:**	4206600

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101234140

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Orito, 05 de diciembre de 2024

EXT-0503-2024

Señor (es):
SERVICON CS S.A.S

REF. Proyecto "CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS BARRIO PUERTAS DEL SOL MUNICIPIO ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"

ASUNTO: Respuesta al oficio INT-ALC-007 Solicitud de información

Cordial Saludo,

La Empresa de Agua Potable y Saneamiento Básico, EMPORITO E.S.P., en su calidad de supervisora del contrato de obra No. 0190-2024, correspondiente al proyecto en referencia, se permite dar respuesta formal a la solicitud presentada mediante el oficio INT-ALC-007. De acuerdo a los requisitos exigidos en nuestro manual de contratación, se informa que dichas pólizas han sido revisadas y validadas, garantizando su conformidad con los requisitos establecidos.

En atención a lo anterior, se anexa a la presente comunicación copia de pólizas entregadas por el contratista de obra y la resolución de aprobación de las mismas, la cual certifica su vigencia y adecuación para respaldar el cumplimiento de las obligaciones contractuales. EMPORITO E.S.P. reafirma su compromiso con la gestión oportuna y transparente en el desarrollo del proyecto y permanece a disposición para atender cualquier consulta adicional.

Sin otro en particular, se suscribe.

MILENA ANDREA RIVERA REVELO
Gerente **EMPORITO E.S.P.**

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:	LEOS STIVEN CASAÑAS CASAÑAS	INGENIERO CIVIL	
REVISADO POR:	FABIO CAMILO RODRIGUEZ ACOSTA	ASESOR JURIDICO INTERNO	
Quienes tramitamos, proyectamos, revisamos y aprobamos el texto, declaramos que el presente documento lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto lo presentamos para la firma			

Aseguradora Solidaria de Colombia

NIT. 860.524.654-6

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS - LEY 142 DE 1994 - PATRICLSUSP03V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5607996880

PÓLIZA No: 560 - 47 - 994000183733 ANEXO: 0

AGENCIA EXPEDIDORA: **NEIVA** COD. AGENCIA: 560 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

	DIA	MES	AÑO
FECHA DE EXPEDICIÓN	24	10	2024
FECHA DE IMPRESIÓN	24	10	2024

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: **CONSTRUCCIONES, DISTRIBUIDORA Y SUMINISTROS ORITO S.A.S** IDENTIFICACIÓN: NIT **900.556.729-1**

DIRECCIÓN: CALLE 8 #11 - 77, MCO FISEL S CIUDAD: ORITO, PUTUMAYO TELÉFONO: 3132621221

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ORITO EMPORITO E.S.P.** IDENTIFICACIÓN: NIT **846.000.381-0**

BENEFICIARIO: **EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ORITO EMPORITO E.S.P.** IDENTIFICACIÓN: NIT **846.000.381-0**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION CONTRATO	AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
	CUMPLIMIENTO	22/10/2024	23/08/2025	116,969,826.51
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	22/10/2024	23/02/2028	116,969,826.51
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		VER NOTA ACLARATORIA	233,939,653.02
	CALIDAD DEL SERVICIO	22/10/2024	23/02/2025	116,969,826.51

BENEFICIARIOS
NIT 846000381 - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ORITO EMPORITO E.S.P.

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONTRATO DE OBRA No. 0190-2024 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTOR AGUAS LLUVIAS BARRIO PUERTAS DEL SOL, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

*** NOTA ACLARATORIA ***

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE CINCO AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***584,849,132.55	$ ********2,809,263	$****11,000.00	$ ******535,850	$ *********3,356,113

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
BUSTOS AGENCIA DE SEGUROS LTDA	10169	100.00			

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wa_digitalclient/#/login

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN: HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

LAS CONDICIONES GENERALES DE SU PÓLIZA SE PUEDEN DESCARGAR DE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. ASEGURADORA SOLIDARIA PENSANDO EN SU TRANQUILIDAD, LO INVITA A VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SERVICIOS – CONSULTA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000560799688

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

CBDE207F0606FA7657

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Manuel Guillermo Rueda Serrano * **Celular:** 312 342 6229 * **Correo electrónico:** defensoriasolidaria@gmail.com
Defensor del Consumidor Financiero – Suplente: Jorge Humberto Martínez Luna * **Celular:** 310 223 4304 * **Correo electrónico:** martinezlunaabogados@gmail.com
Dirección: Carrera 13A# 28-38 oficina 221, Bogotá * **Teléfono:** (601) 791 91 80 * **Fax:** (601) 791 91 80 * **Horario:** Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento
Compañía de Seguros
GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN No 00220 del 25 de octubre de 2024
Por medio de la cual se aprueba una póliza

La Gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Orito EMPORITO E.S.P., en ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, en especial las establecidas dentro del manual de contratación y,

CONSIDERANDO:

1. Que el manual de contratación acogido a través del acuerdo No 002 del 12 de marzo de 2013, establece en el capítulo III artículo 25 la constitución de garantías a favor de EMPORITO E.S.P. sobre los contratos que la empresa suscriba.

2. Que Emporito E.S.P. suscribió el 22 de octubre de 2024 contrato de obra No. 0190-2024 con la empresa CONSTRUCCIONES, DISTRIBUIDORA Y SUMINISTROS ORITO SAS identificada con NIT 900556729-1, cuyo objeto es la "CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTOR AGUAS LLUVIAS BARRIO PUERTAS DEL SOL, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."

3. Que el referido contrato establece en su cláusula DÉCIMA SEXTA GARANTÍAS *"Para garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones que asumirá el contratista por la suscripción del contrato, deberá constituir póliza de seguros a favor de EMPORITO E.S.P. ante una entidad de Seguros que se encuentre debidamente aprobada por la Superintendencia Financiera de Colombia, que ampare los siguientes siniestros y durante las siguientes vigencias:"*

AMPARO	CUANTIA	VIGENCIA
cumplimiento	Por una cuantia correspondiente al 10% del valor del contrato	Con una vigencia Igual al plazo de ejecución del contrato y seis meses más
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnización Laboral	Por una cuantia correspondiente al 10% del valor del contrato	Con una vigencia Igual al plazo de ejecución del contrato y 3 años mas
Responsabilidad civil extracontractual	Por daños a terceros en la ejecución del contrato por un valor de 200 S.M.M.L.V., por el plazo de ejecución del contrato.	Con una vigencia Igual al plazo de ejecución del contrato y dos años mas
Calidad del servicio	Por una cuantia correspondiente al 10% del valor del contrato	Con una vigencia Igual al plazo de ejecución del contrato
Estabilidad y calidad de la obra	Por una cuantia correspondiente al 20% del valor del contrato	Cinco (05) años contados a partir del acta de recibo final de la obra

4. Que para dar cumplimiento a la cláusula décima sexta (16) contrato de obra No. 0190-2024, cuyo objeto es la "CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTOR AGUAS LLUVIAS BARRIO PUERTAS DEL SOL, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.", suscrito entre las partes el día veintidós (22) de octubre de 2024, EL

CONTRATISTA presentó póliza de seguros de cumplimiento a favor de entidades estatales No. 560 – 47 – 994000183733 anexo 0, expedida el día veinticuatro (24) de octubre de 2024, por ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, identificada con Nit. 860.524.654-6, cuyo objeto de la póliza es garantizar el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista derivadas del contrato de obra celebrado entre las partes.

5. Que los amparos y vigencias de las pólizas son los siguientes:

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	PLAZO	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	22/10/2024 hasta 23/08/2025	$ 116,969,826.51
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	22/10/2024 hasta 23/02/2028	$ 116,969,826.51
Estabilidad y calidad de la obra	Tiene vigencia de cinco años, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo y entrega final de la obra	$ 233,939,653.02
Calidad del servicio	22/10/2024 hasta 23/02/2025	$ 116,969,826.51

Por lo anterior,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la póliza de seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales No. 560 – 47 – 994000183733 anexo 0, expedida el dia veinticuatro (24) de octubre de 2024, por ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, identificada con Nit. 860.524.654-6, cuyo objeto de la póliza: "es garantizar el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista derivadas de contrato de obra No.0190-2024".

ARTÍCULO SEGUNDO: La presente resolución se rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Orito EMPORITO E.S.P. a los veinticinco (25) días del mes de octubre de 2024.

MILENA ANDREA RIVERA REVELO
GERENTE EMPORITO E.S.P.

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR	LEOS STEVEN CASAÑAS CASAÑAS	INGENIERO ÁREA CIVIL	
REVISADO Y APROBADO	FABIO CAMILO RODRÍGUEZ ACOSTA	ASESOR JURÍDICO EMPORITO ESP	
Quienes tramitamos, proyectamos, revisamos y aprobamos el texto, declaramos que el presente documento lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto lo presentamos para la firma			

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT. 860.524.654-6

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

Compañía de Seguros

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5607996906

PÓLIZA No: 560 -74 - 994000033583 ANEXO:0

AGENCIA EXPEDIDORA: NEIVA — COD. AGE: 560 — RAMO: 74 — PAP:

FECHA DE EXPEDICIÓN DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DE LA PÓLIZA	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	HORAS	DIAS	FECHA DE IMPRESIÓN DIA	MES	AÑO
24	10	2024		22	10	2024	23:59 A LAS	23	02	2027	23:59 A LAS	854	24	10	2024

MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL — TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION

VIGENCIA DEL ANEXO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	HORAS	DIAS
	22	10	2024	23:59 A LAS	23	02	2027	23:59 A LAS	854

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE:: CONSTRUCCIONES, DISTRIBUIDORA Y SUMINISTROS ORITO S.A.S — IDENTIFICACIÓN: NIT 900.556.729-1

DIRECCIÓN: CALLE 8 #11 - 77, MCO FISEL S — CIUDAD: ORITO, PUTUMAYO — TELÉFONO: 3132621221

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: CONSTRUCCIONES, DISTRIBUIDORA Y SUMINISTROS ORITO S.A.S — IDENTIFICACIÓN: NIT 900.556.729-1

DIRECCIÓN: CALLE 8 #11 - 77, MCO FISEL S — CIUDAD: ORITO, PUTUMAYO — TELÉFONO: 3132621221

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS — IDENTIFICACIÓN: NIT 001-8

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: CONSTRUCCIONES, DISTRIBUIDORA Y SUMINIST NIT : 900556729

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: PUTUMAYO CIUDAD: ORITO

DIRECCION: LA ENUNCIADA EN EL CONTRATO

ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: ESTATAL MANZANA:

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO		$ 260,000,000.00		
	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	260,000,000.00		
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	260,000,000.00		
	RCE PATRONAL	260,000,000.00		
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	260,000,000.00		
	GASTOS MEDICOS	26,000,000.00		
	RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	260,000,000.00		

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES/CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS/RCE PATRONAL/VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS/RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA

BENEFICIARIOS
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA, DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA No. 0190-2024 REFERENTE A CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTOR AGUAS LLUVIAS BARRIO PUERTAS DEL SOL, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

ASEGURADO: CONSTRUCCIONES, DISTRIBUIDORA Y SUMINISTROS ORITO S.A.S NIT: 900.556.729-1 Y/O EMPRESA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EMPORITO E.S.P. NIT: 846.000.381-0
BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS Y/O EMPRESA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EMPORITO E.S.P. NIT: 846.000.381-0

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***260,000,000.00	$ ********1,216,658	$*********0.00	$ ******231,165	$ ********1,447,822

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	%PART
BUSTOS AGENCIA DE SEGUROS LTDA	10169	100.00

COASEGURO CEDIDO

NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000560799690

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CBDE207F0606FA775F

CLIENTE

YEIBUSTOS 0

RESOLUCIÓN No 00221 del 25 de octubre de 2024
Por medio de la cual se aprueba una póliza

La Gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Orito EMPORITO E.S.P., en ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, en especial las establecidas dentro del manual de contratación y,

CONSIDERANDO:

1. Que el manual de contratación acogido a través del acuerdo No 002 del 12 de marzo de 2013, establece en el capítulo III artículo 25 la constitución de garantías a favor de EMPORITO E.S.P. sobre los contratos que la empresa suscriba.

2. Que Emporito E.S.P. suscribió el 22 de octubre de 2024 contrato de obra No. 0190-2024 con la empresa CONSTRUCCIONES, DISTRIBUIDORA Y SUMINISTROS ORITO SAS identificada con NIT 900556729-1, cuyo objeto es la "CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTOR AGUAS LLUVIAS BARRIO PUERTAS DEL SOL, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."

3. Que el referido contrato establece en su cláusula DÉCIMA SEXTA GARANTÍAS "*Para garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones que asumirá el contratista por la suscripción del contrato, deberá constituir póliza de seguros a favor de EMPORITO E.S.P. ante una entidad de Seguros que se encuentre debidamente aprobada por la Superintendencia Financiera de Colombia, que ampare los siguientes siniestros y durante las siguientes vigencias:*"

AMPARO	CUANTIA	VIGENCIA
cumplimiento	Por una cuantia correspondiente al 10% del valor del contrato	Con una vigencia Igual al plazo de ejecución del contrato y seis meses más
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnización Laboral	Por una cuantia correspondiente al 10% del valor del contrato	Con una vigencia Igual al plazo de ejecución del contrato y 3 años mas
Responsabilidad civil extracontractual	Por daños a terceros en la ejecución del contrato por un valor de 200 S.M.M.L.V., por el plazo de ejecución del contrato.	Con una vigencia Igual al plazo de ejecución del contrato y dos años mas
Calidad del servicio	Por una cuantia correspondiente al 10% del valor del contrato	Con una vigencia Igual al plazo de ejecución del contrato
Estabilidad y calidad de la obra	Por una cuantia correspondiente al 20% del valor del contrato	Cinco (05) años contados a partir del acta de recibo final de la obra

4. Que para dar cumplimiento a la cláusula décima sexta (16) contrato de obra No. 0190-2024, cuyo objeto es la "CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTOR AGUAS LLUVIAS BARRIO PUERTAS DEL SOL, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.", suscrito entre las partes el día veintidós (22) de octubre de 2024, EL CONTRATISTA presentó póliza de seguros de responsabilidad civil extra contractual No. 560 – 74 – 994000033583 anexo 0, expedida el día veinticuatro (24) de octubre de 2024, por ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, identificada con Nit. 860.524.654-6, cuyo objeto de la póliza "*mediante la presente póliza, se amparan los perjuicios patrimoniales que cause directamente el asegurado con motivo de una determinada responsabilidad civil extracontractual en que incurra, de acuerdo con la ley colombiana, en virtud de la ejecución del contrato de obra No. 0190-2024 referente a construcción alcantarillado sanitario y colector aguas lluvias barrio puertas del sol, municipio de Orito, departamento del Putumayo. asegurado: construcciones, distribuidora y suministros Orito S.A.S Nit: 900.556.729-1 y/o empresa de agua potable y saneamiento básico emporito E.S.P. Nit: 846.000.381-0 beneficiario: terceros afectados y/o empresa de agua potable y saneamiento básico emporito E.S.P. Nit: 846.000.381-0*".

5. Que los amparos y vigencias de las pólizas son los siguientes:

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	PLAZO	VALOR ASEGURADO
• PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES • CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS • RCE PATRONAL • VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS • GASTOS MEDICOS • RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	22/10/2024 hasta 23/02/2027	$ 260,000,000.00

Por lo anterior,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la póliza de seguros de responsabilidad civil extra contractual No. 560 – 74 – 994000033583 anexo 0, expedida el día veinticuatro (24) de octubre de 2024, por ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, identificada con Nit. 860.524.654-6, cuyo objeto de la póliza "mediante la presente póliza, se amparan los perjuicios patrimoniales que cause directamente el asegurado con motivo de una determinada responsabilidad civil extracontractual en que incurra, de acuerdo con la ley colombiana, en virtud de la ejecución del contrato de obra No. 0190-2024 referente a construcción alcantarillado sanitario y colector aguas lluvias barrio puertas del sol, municipio de Orito, departamento del Putumayo. asegurado: construcciones, distribuidora y suministros Orito S.A.S Nit: 900.556.729-1 y/o empresa de agua potable y saneamiento básico emporito E.S.P. Nit: 846.000.381-

0 beneficiario: terceros afectados y/o empresa de agua potable y saneamiento básico emporito E.S.P. Nit: 846.000.381-0.

ARTÍCULO SEGUNDO: La presente resolución se rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Orito EMPORITO E.S.P. a los veinticinco (25) días del mes de octubre de 2024.

MILENA ANDREA RIVERA REVELO
GERENTE EMPORITO E.S.P.

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR	LEOS STEVEN CASAÑAS CASAÑAS	INGENIERO ÁREA CIVIL	
REVISADO Y APROBADO	FABIO CAMILO RODRÍGUEZ ACOSTA	ASESOR JURÍDICO EMPORITO ESP	
Quienes tramitamos, proyectamos, revisamos y aprobamos el texto, declaramos que el presente documento lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto lo presentamos para la firma			

Orito, 31 de enero del 2025

Rdo
Kathemn T. Cor.
31-01-2025.

Señora:
MILENA RIVERA REVELO
GERENTE EMPORITO ESP

Ref.: Contrato No. 1695-2024 del 03 de septiembre de 2024, denominado: "CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS BARRIO PUERTAS DEL SOL, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO- INTERVENTORÍA".

ASUNTO: Entrega de informes – periodo 28 de noviembre al 27 de diciembre del 2024

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta que la empresa SERVICON CS SAS identificada con NIT 900.949.050-7 y representada legalmente por la señora ELIANA ANDREA CEBALLOS ARÉVALO, tiene suscrito el Contrato de interventoría No. 1695-2024 del 03 de septiembre de 2024 con la GOBERNACION DEL PUTUMAYO, en marco de sus funciones remite los informes del contrato de obra No 0190-2024 con sus respectivos anexos, correspondientes al periodo del 28 de noviembre al 27 de diciembre del 2024, asimismo se remite una copia de los informes de interventoría, pertinentes al seguimiento de las actividades del contrato de obra en mención.

Cordialmente,

ELIANA ANDREA CEBALLOS ARÉVALO
R. Legal SERVICON CS S.A.S
Interventoría

Orito, 26 de diciembre del 2024

Rdo Katherine 26-12-2024.

Señora:
MILENA RIVERA REVELO
GERENTE EMPORITO ESP

Ref.: Contrato No. 1695-2024 del 03 de septiembre de 2024, denominado: "CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS BARRIO PUERTAS DEL SOL, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO- INTERVENTORÍA".

ASUNTO: RESPUESTA A SOLICITUD DE SUSPENSIÓN CONTRATO DE OBRA No 0190-2024.

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta que la empresa SERVICON CS SAS identificada con NIT 900.949.050-7 y representada legalmente por la señora ELIANA ANDREA CEBALLOS ARÉVALO, tiene suscrito el Contrato de interventoría No. 1695-2024 del 03 de septiembre de 2024 con la GOBERNACION DEL PUTUMAYO, para vigilancia y control del Contrato de obra No 0190-2024, 2024 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS BARRIO PUERTAS DEL SOL, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO", ejecutado por la empresa CODISUM S.A.S, la interventoría recibió el oficio de fecha 23 de diciembre del 2024, enviado por el contratista de obra, donde se solicita la suspensión temporal de actividades del contrato de obra en mención, por motivos de las festividades de fin de año, una vez revisada dicha solicitud la INTERVENTORIA manifiesta que es viable que se realice la suspensión temporal de las actividades de obra, teniendo en cuenta que en los días de festividades se podrían presentar interrupciones en la ejecución de actividades, dificultad para el suministro de algunos materiales necesarios para la ejecución de las actividades constructivas, ausencia de personal en obra.

Se recomienda al contratista de obra una vez se reinicie, realizar una buena planificación de las actividades programadas, contar con el personal, equipos, maquinarias e insumos necesarios para continuar con las actividades de tal manera que no se afecte el avance de la obra.

Cordialmente,

ELIANA ANDREA CEBALLOS ARÉVALO
R. Legal SERVICON CS S.A.S
Interventoría

Al presente oficio se relaciona el siguiente anexo:

Oficio contratista de obra -23 de diciembre 2024. Solicitud suspensión temporal de actividades en obra

Orito, 10 de enero del 2025

Señores:
CODISUM S.A.S
R.L RENE ESTUARDO ORTEGA

Ref.: Contrato No. 1695-2024 del 03 de septiembre de 2024, denominado: "CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS BARRIO PUERTAS DEL SOL, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO- INTERVENTORÍA".

ASUNTO: Solicitud de Observaciones Informe No 1 emitidas por la Gobernación del Putumayo.

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta que la empresa SERVICON CS SAS identificada con NIT 900.949.050-7 y representada legalmente por la señora ELIANA ANDREA CEBALLOS ARÉVALO, tiene suscrito el Contrato de interventoría No. 1695-2024 del 03 de septiembre de 2024 con la GOBERNACION DEL PUTUMAYO, para vigilancia y control del Contrato Civil de obra No 0190-2024, 2024 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS BARRIO PUERTAS DEL SOL, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO", ejecutado por la empresa CODISUM S.A.S, la interventoría recibió el oficio SID-PDA-2025-0016 de fecha 09 de enero del 2025, emitido por la Gobernación del Putumayo donde se realizaron observaciones al informe Mensual No 1 entregado por parte de la interventoría para su respectiva revisión y aprobación, las cuales corresponden en su gran mayoría a las actividades ejecutadas del Plan de Manejo Ambiental, asimismo en la parte técnica se realizó observaciones respecto al *item 1.3 Entibado, item 2.3 Sustitución de material de cimentación 50% triturado 50%, recebo E:0.40 compactado mecánicamente al 95% proctor modificado* y se solicita presentar soportes de los ensayos de laboratorio como ensayos de concreto y de toma de densidades insitu del suelo instalado en la cimentación como los pozos de inspección, tuberías, que permitan corroborar los porcentajes de compactación exigidos.

De acuerdo con lo anterior se adjunta el oficio SID-PDA-2025-0016 de fecha 09 de enero del 2025, donde se encuentran detalladas las observaciones mencionadas y se solicita al contratista de obra la colaboración para poder subsanar estas observaciones.

Cordialmente,

ELIANA ANDREA CEBALLOS ARÉVALO
R. Legal SERVICON CS S.A.S
Interventoría

Al presente oficio se relaciona el siguiente anexo:

Oficio SID-PDA-2025-0016 de fecha 09 de enero del 2025

SID-PDA-2025-0016

San Miguel Agreda de Mocoa, 9 de enero de 2025

Señores
SERVICON CS SAS.
Atn: ELIANA ANDREA CEBALLOS AREVALO
Representante legal - Contratista de interventoría
Correo electrónico: serviconcssas@gmail.com

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1695-2024 "CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS BARRIO PUERTAS DEL SOL, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO INTERVENTORÍA"

Asunto: OBSERVACIONES INFORME NO. 1 INTERVENTORIA ALLEGADO MEDIANTE OFICIO INT-ALC-010, EL 13/12/24 RDO No. 447

Cordial saludo,

En calidad de secretario de Infraestructura Departamental, Gestor del Plan Departamental de Agua y Saneamiento Básico del Departamento del Putumayo, como supervisor del contrato de la referencia bajo las facultades de control y vigilancia que me atañen, me permito realizar las siguientes observaciones al informe No. 1 de interventoría:

OBSERVACIONES AL INFORME DE INTERVENTORIA:

1. Debe ser anexado un registro fotográfico claro de los entibados en donde se realizaron, se recuerda que los entibados de acuerdo a las especificaciones técnicas argumentan lo siguiente:

1.3 **ENTIBADO (APUNTALAMIENTO EN MADERA)**	**(M2)**
Esta actividad consiste en que la superficie lateral de la zanja será sostenida totalmente por tableros constituidos de elementos de madera de 0.10m x 0.20m x 3.00m debidamente acuñados en perfiles metálicos W 8" x 17 (puntales), hincados a una profundidad mínima de 2.50m por debajo del fondo de la zanja, o según lo indique la interventoría, y trabados horizontalmente por dos largueros metálicos en perfiles 2 W 8"x17 que estarán apuntalados por dos codales metálicos W 8"x17 espaciados cada 3.50m como máximo de acuerdo con los detalles mostrados en los planos o indicados por la interventoría.	

2. AJUSTAR el IBC en el pago de seguridad social Mediante planilla No. 9478594979, se anexa el pago de seguridad social de interventoría, en la cual se paga la seguridad social del residente de obra Ingeniero GUSTAVO ANDRES GRIJALBA JARAMILLO, en donde de acuerdo a la propuesta económica el sueldo a devengar para este profesional corresponde a $3.200.000, por lo anterior se solicita ajustar de esta persona como también anexar el soporte de pago de seguridad de la secretaria que ofertaron en la propuesta económica.

3. CORREGIR en el informe de obra (pag. 18), dice textualmente "Valor ejecutado según pre-acta parcial de obra al 29 de agosto de 2024", fecha que no corresponde al periodo del reporte.

4. CORREGIR en el informe de obra pagina 20, dice textualmente "programación establecida en el Gesproy". Este proyecto no cuenta con reporte al Gesproy debido a que no es un proyecto financiado con recursos de regalías, así mismo en el informe anexar la programación de la obra.

5. Una vez revisado los informes se evidencia la ejecución del ítem 2.3 SUSTITUCION MATERIAL DE CIMENTACION 50% TRITURADO-50% RECEBO E:0.40 COMPACTADO MECANICAMENTE AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO. No se evidencian soportes de ensayos de laboratorio como ensayo de toma de densidades insitu del suelo instalado en la cimentación como en los pozos de inspección, tuberías, que permitan constatar este porcentaje de compactación exigido y en los ítems que contemplan concreto, ensayos de comprensión para medir resistencia del concreto. Anexar

   Es de vital importancia y responsabilidad de la interventoría garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas anexas desde la etapa precontractual, como en el caso de la especificación técnica del ítem 2.3 debido a que el suelo donde se apoyara las diferentes tuberías y cámaras de inspección, son suelos limo arenosos y limos no plásticos y de baja plasticidad, que de acuerdo al estudio de suelos del proyecto están sometidos a nivel freático desde los 0.20 m, desde los 1 m,1.20m. volviendo esto un estado crítico el suelo a la hora de remoldeo producto de la misma excavación, siendo un suelo no apto para fundar, haciendo imperativo el cumplimiento de esta sustitución del material de cimentación para evitar asentamientos a la hora de la operación del alcantarillado.

6. ANEXAR los pagos de seguridad social del personal de obra; cabe mencionar que, se debe tener en cuenta el pago correspondiente del IBC del personal ofertado en la propuesta económica de obra justificado en el AIU del presupuesto oficial de obra.

7. ANEXAR las fichas técnicas de la tubería utilizada para fines de control de calidad.

OBSERVACIONES AL INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL No 1

PROGRAMA	PROYECTO	OBSERVACIÓN
GESTIÓN SOCIAL	G1. PROGRAMA DE INFORMACION Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	En el folio 109 de la AZ o página 11 del informe de gestión ambiental No 1, se indica que el informe ambiental de obra se presenta el anexo 1 acta de reunión de socialización – inicio del proyecto, sin embargo, revisando los respectivos anexos, solo se presenta una hoja con la lista de asistencia, pero no se presenta el acta de reunión, del mismo modo, en el informe de obra se indica que se conformó veeduría ciudadana pero no se menciona nombres ni representantes, ni se presenta la documentación y legalización respectiva de la veeduría.

PROGRAMA	PROYECTO	OBSERVACIÓN
		Por otro lado, en el PMA del proyecto en la página 88, en la ficha correspondiente al proyecto se indica que se debe conformar y consolidar el COMITÉ DE PARTICIPACION COMUNITARIA, pero ni en el informe de obra ni interventoría se observa información referente a dicha actividad. Por ultimo dentro del PMA del proyecto en la página 90, se indica en el ítem de seguimiento que se hará entrega de lista de chequeo semanal para este programa sin embargo no se menciona nada en el informe de obra ni interventoría. Se reporta un valor ejecutado del proyecto de $ 230.000 M/CTE, pero no se dan soporte del mismo.
	G2. PROGRAMA DE CONTRATACION DE MANO DE OBRA LOCAL	En el informe ambiental de obra en la página 6 del informe o folio 232 de la AZ que fue radicada en el PDA, se indica que se anexa los contrato y afiliaciones del personal contratado, sin embargo, solo se anexa, una hoja denominada Generación de Empleo CODISUM SAS, pero no se anexa los contratos y demás información que se indica en el informe ambiental de la obra. Dentro del PMA del proyecto en la página 93, se indica en el ítem de seguimiento que se hará entrega de lista de chequeo semanal para este programa sin embargo no se menciona nada en el informe de obra ni interventoría. Se reporta un valor ejecutado del proyecto de $ 300.000 M/CTE, pero no se dan soporte del mismo.
	G3. PLAN DE CAPACITACION, EDUCACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL A LA COMUNIDAD	De acuerdo con lo presentado en los informes de obra e interventoría, se indica que la información que se presenta no corresponde a la información ficha del PLAN DE CAPACITACION, EDUCACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL A LA COMUNIDAD, teniendo en cuenta que lo descrito en el informe ambiental de CODISUM SAS se manifiesta que la capacitación fue dirigida a los trabajadores, así mismo es posible observarlo en el registro fotográfico que se presenta, y teniendo en cuenta con el PMA del proyecto en las páginas 82 a la 85, este programa está dirigido a la comunidad aledaña, no a los trabajadores, así mismo se reporta un valor ejecutado del proyecto de $ 850.000 M/CTE, pero no se dan soporte del mismo.
MANEJO DE ACTIVIDADES DE	M1. PLAN DE INSTALACION DE OBRAS	De acuerdo con lo presentado en los informes de obra e interventoría, se indica que la información que se presenta no corresponde a la información ficha del PLAN DE INSTALACIÓN DE OBRAS,

PROGRAMA	PROYECTO	OBSERVACIÓN
CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN		teniendo en cuenta que en la ficha se establece que: - Se establecerá un plan de manejo de desechos sólidos y líquidos para los campamentos de construcción. (información que no se entrega) - Dentro del PMA del proyecto en la página 35, se indica en el ítem de seguimiento que se hará entrega de lista de chequeo mensual para este programa sin embargo no se menciona nada en el informe de obra ni interventoría. - Se presenta un presupuesto discriminado en el PMA del proyecto por un valor de $ 1.260.000 M/CTE, y en el informe de SEVICON CS SAS se indica que ese presupuesto fue ejecutado pero no se presentan soportes del mismo que den evidencia de la ejecución del presupuesto del PMA del proyecto.
	M2. PROGRAMA DE USO Y ALMACENAMIENTO ADECUADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN	De acuerdo con lo presentado en los informes de obra e interventoría, se indica que la información que se presenta no corresponde a la información ficha del PROGRAMA DE USO Y ALMACENAMIENTO ADECUADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN, teniendo en cuenta que en la ficha se establece que: - Dentro del PMA del proyecto en la página 39, se indica en el ítem de seguimiento que se hará entrega de lista de chequeo semanal para este programa sin embargo no se menciona nada en el informe de obra ni interventoría, ni tampoco del formato de control de disposición de materiales de excavación y escombros. - Se presenta un presupuesto discriminado en el PMA del proyecto por un valor de $ 2.605.000 M/CTE, y en el informe de SEVICON CS SAS se indica que se ejecutaron $ 810.000 M/CTE, pero no se presentan soportes del mismo que den evidencia de la ejecución del presupuesto del PMA del proyecto. - Se recomienda tener en cuenta lo dispuesto en el PMA del proyecto en las páginas 36 a 40.
	M3. PLAN DE MANEJO DE AGUAS RESIDUALES Y	De acuerdo con lo presentado en los informes de obra e interventoría, se indica que la información que se presenta no corresponde a la información

PROGRAMA	PROYECTO	OBSERVACIÓN
	CALIDAD DE LOS EFLUENTES DOMÉSTICOS	ficha del PLAN DE MANEJO DE AGUAS RESIDUALES Y CALIDAD DE LOS EFLUENTES DOMÉSTICOS, teniendo en cuenta que en la ficha se establece que: - Se presenta un presupuesto discriminado en el PMA del proyecto por un valor de $ 1.495.000 M/CTE, y en el informe de SEVICON CS SAS se indica que se ejecutaron $ 605.000 M/CTE, pero no se presentan soportes del mismo que den evidencia de la ejecución del presupuesto del PMA del proyecto. - Así mismo, no se presenta el contrato de obra ni registro fotográfico de los baños portátiles que se instalaran.
	M4. PLAN DE SEGURIDAD VIAL Y MANEJO DE TRANSITO	N.A.
	M5. PROGRAMA DE MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES	De acuerdo con lo presentado en los informes de obra e interventoría, se indica que la información que se presenta no corresponde a la información ficha del PROGRAMA DE MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES, teniendo en cuenta que en la ficha se establece que: - Se presenta un presupuesto discriminado en el PMA del proyecto por un valor de $ 930.000 M/CTE, y en el informe de SEVICON CS SAS se indica que se ejecutaron $ 580.000 M/CTE, pero no se presentan soportes del mismo que den evidencia de la ejecución del presupuesto del PMA del proyecto. - Así mismo, en el informe de interventoría en el folio 19 y 20, solo se presentan recomendaciones por parte de la interventoría, pero no evidencia de ninguna implementación de medida de manejo ambiental. - Dentro del PMA del proyecto en la página 48, se indica en el ítem de seguimiento que se hará entrega de lista de chequeo mensual para este programa sin embargo no se menciona nada en el informe de obra ni interventoría, ni tampoco los documentos que se indican en el formato de control.
	M6. PLAN DE CONTINGENCIA, RIESGOS Y RESPUESTAS A EMERGENCIAS	De acuerdo con lo presentado en los informes de obra e interventoría, se indica que la información que se presenta no corresponde a la información ficha del PLAN DE CONTINGENCIA, RIESGOS Y RESPUESTAS A EMERGENCIAS, teniendo en cuenta que en la ficha se establece que:

PROGRAMA	PROYECTO	OBSERVACIÓN
		- Se presenta un presupuesto discriminado en el PMA del proyecto por un valor de $ 1.620.000 M/CTE, y en el informe de SEVICON CS SAS se indica que se ejecutaron $ 807.000 M/CTE, pero no se presentan soportes del mismo que den evidencia de la ejecución del presupuesto del PMA del proyecto. - Dentro del PMA del proyecto en la página 76, se indica en el ítem de seguimiento que se hará entrega de lista de chequeo semanal para este programa sin embargo no se menciona nada en el informe de obra ni interventoría. - Se hace un llamado a la interventoría que más que una recomendación que se le indique al contratista de obra la obligación de realizar la socialización con los trabajadores y efectuar los simulacros para capacitación y entrenamiento, conformar la brigada de emergencia para la atención y respuesta a cualquier emergencia.
	M7. PLAN DE REFORESTACIÓN ZONAS INTERVENIDAS	De acuerdo con lo presentado en los informes de obra e interventoría, se indica que la información que se presenta no corresponde a la información ficha del PLAN DE REFORESTACIÓN ZONAS INTERVENIDAS, teniendo en cuenta que en la ficha se establece que: - Dentro del PMA del proyecto en la página 58, se indica en el ítem de seguimiento que se hará entrega de lista de chequeo semanal para este programa sin embargo no se menciona nada en el informe de obra ni interventoría. - Se recomienda a la interventoría un seguimiento riguroso en caso de requerirse un permiso de aprovechamiento forestal.
MANEJO DE RESIDOS Y ESCOMBROS	R1. PLAN DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS Y SU DEBIDO TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL	De acuerdo con lo presentado en los informes de obra e interventoría, se indica que la información que se presenta no corresponde a la información ficha del PLAN DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS Y SU DEBIDO TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL, teniendo en cuenta que en la ficha se establece que: - Se presenta un presupuesto discriminado en el PMA del proyecto por un valor de $ 785.000 M/CTE, y en el informe de SEVICON CS SAS se indica que se ejecutaron $ 585.000 M/CTE, pero no se presentan soportes del mismo que den evidencia de la ejecución del presupuesto del PMA del proyecto.

PROGRAMA	PROYECTO	OBSERVACIÓN
		- Se requiere que hagan entrega de los certificados de residuos sólidos a la empresa EMPORITO EPS.
EDUCACIÓN Y CAPACITACION AL PERSONAL DEL PROYECTO	E1. PROGRAMA DE EDUCACION Y CAPACITACION AL PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO	De acuerdo con lo presentado en los informes de obra e interventoría, se indica que la información que se presenta no corresponde a la información ficha del PROGRAMA DE EDUCACION Y CAPACITACION AL PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO, teniendo en cuenta que en la ficha se establece que: - Se presenta un presupuesto discriminado en el PMA del proyecto por un valor de $ 500.000 M/CTE, y en el informe de SEVICON CS SAS se indica que se ejecutaron $ 305.000 M/CTE, pero no se presentan soportes del mismo que den evidencia de la ejecución del presupuesto del PMA del proyecto. - Se recomienda a la interventoría, llevar un registro fotográfico de cada uno de las capacitaciones que se realiza al personal además de las listas de asistencia que aportan, y del mismo modo indicar los temas tratados que estén acorde a lo indicado en el PMA en la página 81. - Dentro del PMA del proyecto en la página 81, se indica en el ítem de seguimiento que se hará entrega de lista de chequeo semanal para este programa sin embargo no se menciona nada en el informe de obra ni interventoría.
	E2. PLAN DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	De acuerdo con lo presentado en los informes de obra e interventoría, se indica que la información que se presenta no corresponde a la información ficha del PLAN DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, teniendo en cuenta que en la ficha se establece que: - Se presenta un presupuesto discriminado en el PMA del proyecto por un valor de $ 2.250.000 M/CTE, y en el informe de SEVICON CS SAS se indica que se ejecutaron $ 2.250.000 M/CTE, pero no se presentan soportes del mismo que den evidencia de la ejecución del presupuesto del PMA del proyecto. - Dentro del PMA del proyecto en la página 68, se indica en el ítem de seguimiento que se hará entrega de lista de chequeo semanal para este programa sin embargo no se menciona nada en el informe de obra ni interventoría.

Cabe recordar que, si el interventor no cumple cabalmente con su responsabilidad, podría acarrear consecuencias jurídicas de tipo: penal, disciplinario, fiscal, administrativo y hasta civil, en ocasión a los daños antijurídicos que en el ejercicio de sus actividades llegaren a ocasionar, esto en concordancia al artículo 82 de la Ley 1474 de 2011, así mismo es pertinente recordar que la omisión en la entrega de esta información podría constituir un presunto incumplimiento, el cual se configura por el incumplimiento del deber u obligación contractual, bien porque no se ejecutó o se realizó de manera parcial o en forma defectuosa o tardía esto, en concordancia al artículo 86 de la Ley ibíd.

Por último, se solicita al contratista de interventoría recoger los informes presentados y se tenga en cuenta las observaciones manifestadas en el presente oficio. Sin más por mencionar, quedamos atentos a resolver cualquier inquietud sobre el particular, a través del correo electrónico pap-pda@putumayo.gov.co.

Atentamente,

JORGE ANDRÉS CORTEZ VERA
Secretario de Infraestructura Departamental
Gestor del Plan Departamental de Aguas y Saneamiento Básico
Departamento del Putumayo

	Nombre y apellido	Cargo	Dependencia	Firma
Elaboró:	Maycol Calderón	Profesional de apoyo técnico-PDA	Secretaria de Infraestructura Departamental	
Elaboró:	Juliana Dueñas Sandoval	Profesional de apoyo. ambiental-PDA	Secretaria de Infraestructura Departamental	
Reviso:	Daniela Alejandra Ordóñez Pérez	Profesional de apoyo. Jurídico-PDA	Secretaria de Infraestructura Departamental	

PUTUMAYO
PARAISO ENCANTADOR

NIT: 900.949.050-7

SERVICON CS S.A.S.
Juntos Trabajando

INT-ALC -016

Rcb Vanessa B.
Hora: 4:01 PM
Fecha: 03/02/2025
PDA 0011

Orito, 03 de febrero del 2025

Señor:

JORGE ANDRÉS CORTEZ VERA
Secretario de Infraestructura Departamental
Gestor del Plan de Departamental de Aguas Putumayo
Gobernación del Putumayo

Ref.: Contrato No. 1695-2024 del 03 de septiembre de 2024, denominado: "CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS BARRIO PUERTAS DEL SOL, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO- INTERVENTORÍA".

ASUNTO: Entrega de informes – periodo 28 de noviembre al 27 de diciembre del 2024

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta que la empresa SERVICON CS SAS identificada con NIT 900.949.050-7 y representada legalmente por la señora ELIANA ANDREA CEBALLOS ARÉVALO, tiene suscrito el Contrato de interventoría No. 1695-2024 del 03 de septiembre de 2024 con la GOBERNACION DEL PUTUMAYO, en marco de sus funciones remite los informes de interventoría con sus respectivos anexos, correspondientes al periodo del 28 de noviembre al 27 de diciembre del 2024, asimismo se remite una copia de los informes No 2 del contrato de obra No 0190-2024.

Informe de Interventoría 137 folios
Informe de Obra 434 folios

Cordialmente,

ELIANA ANDREA CEBALLOS ARÉVALO
R. Legal SERVICON CS S.A.S
Interventoría

Powered by CamScanner

	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO MUNICIPIO DE ORITO **CODISUM S.A.S** NIT: 900556729-1	Código	INF.003
		Versión	003
		Fecha	16 Diciem.-2019
		Pagina	1 de 1

Orito, 22 de enero de 2025

Sr.
Interventoría
SERVICON CS S.A.S.
Orito.

Referencia: Contrato de obra No. 0190 - 2024 "CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTOR AGUAS LLUVIAS BARRIO PUERTAS DEL SOL, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"

Asunto: Invitación reunión de avance de obra.

Cordial saludo,

Por medio del presente oficio CODISUM SAS, extiende la invitación a participar en la reunión de avance del proyecto de la referencia, con el comité de participación el día sábado 25 de enero del presente año, a las 5:00 pm en la caseta barrio puertas del sol.

Quedamos atentos.

Cordialmente,

RENE ESTUARDO ORTEGA NOVOA
CC: 18145945
Representante Legal CODISUM SAS

Recibido. 22-01-2025.

"Calle 8 # 11 -77 B/ Marco Fidel Suarez"
Email-codisumsas@hotmail.comCel. : 313 262 1221

con CamScanner

	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO MUNICIPIO DE ORITO CODISUM S.A.S NIT: 900556729-1	Código	INF.001
		Versión	003
		Fecha	16 Diciem.-2019
		Pagina	1 de 1

ORITO, PUTUMAYO 30 DE DICIEMBRE DE 2024

Rdo INT 08-01-2025

Señores
SERVICON CS S.A.S
Interventoría

Asunto: Entrega de informe 02 de contrato de obra 0190 – 2024

Por medio de la presente realizo la entrega del informe N°. 02 del contrato de obra 0190 – 2024 cuyo objeto es "**CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS BARRIO PUERTAS DEL SOL, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**" del periodo correspondiente entre el 28 de noviembre hasta el 27 de diciembre de 2024.

Atentamente:

RENE ORTEGA NOVOA
R,L CODISUM S.A.S
NIT. 900.556.729-9

ORITO, PUTUMAYO, LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 2024

RDO INT 23-dic-24

SEÑORES:

SERVICON CS S.A.S
Interventoría

Asunto: Solicitud de Suspensión Temporal de Actividades

Respetados señores,

Por medio del presente, solicitamos formalmente la suspensión temporal de las actividades en la obra del contrato de obra 0190-2024, cuyo objeto es la **"CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTOR AGUAS LLUVIAS BARRIO PUERTAS DEL SOL, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"**. La suspensión se solicita desde el 30 de diciembre de 2024 hasta el 6 de enero de 2025, con reanudación de labores el 7 de enero de 2025.

Esta solicitud se fundamenta en las festividades de fin de año y en el hecho de que gran parte del personal reside fuera de Orito, lo que dificulta su disponibilidad en dichas fechas. No obstante, se realizará la planificación necesaria para que esta suspensión no genere retrasos en la ejecución de la obra, asegurando el cumplimiento del cronograma establecido.

Adicionalmente, durante este período, se implementarán las medidas de seguridad pertinentes para la protección de la obra y sus alrededores.

Agradecemos su comprensión y aprobación para llevar a cabo esta pausa programada. Quedamos atentos a su pronta respuesta.

Atentamente:

RENE ORTEGA NOVOA
representante legal
CODISUM SAS
NIT: 900556729-1

SID-PDA-2025-0016

San Miguel Agreda de Mocoa, 9 de enero de 2025

Señores
SERVICON CS SAS.
Atn: ELIANA ANDREA CEBALLOS AREVALO
Representante legal - Contratista de interventoría
Correo electrónico: serviconcssas@gmail.com

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1695-2024 "CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS BARRIO PUERTAS DEL SOL, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO INTERVENTORÍA"

Asunto: OBSERVACIONES INFORME NO. 1 INTERVENTORIA ALLEGADO MEDIANTE OFICIO INT-ALC-010, EL 13/12/24 RDO No. 447

Cordial saludo,

En calidad de secretario de Infraestructura Departamental, Gestor del Plan Departamental de Agua y Saneamiento Básico del Departamento del Putumayo, como supervisor del contrato de la referencia bajo las facultades de control y vigilancia que me atañen, me permito realizar las siguientes observaciones al informe No. 1 de interventoría:

OBSERVACIONES AL INFORME DE INTERVENTORIA:

1. Debe ser anexado un registro fotográfico claro de los entibados en donde se realizaron, se recuerda que los entibados de acuerdo a las especificaciones técnicas argumentan lo siguiente:

1.3 **ENTIBADO (APUNTALAMIENTO EN MADERA)**	**(M2)**
Esta actividad consiste en que la superficie lateral de la zanja será sostenida totalmente por tableros constituidos de elementos de madera de 0.10m x 0.20m x 3.00m debidamente acuñados en perfiles metálicos W 8" x 17 (puntales), hincados a una profundidad mínima de 2.50m por debajo del fondo de la zanja, o según lo indique la interventoría, y trabados horizontalmente por dos largueros metálicos en perfiles 2 W 8"x17 que estarán apuntalados por dos codales metálicos W 8"x17 espaciados cada 3.50m como máximo de acuerdo con los detalles mostrados en los planos o indicados por la interventoría.	

2. AJUSTAR el IBC en el pago de seguridad social Mediante planilla No. 9478594979, se anexa el pago de seguridad social de interventoría, en la cual se paga la seguridad social del residente de obra Ingeniero GUSTAVO ANDRES GRIJALBA JARAMILLO, en donde de acuerdo a la propuesta económica el sueldo a devengar para este profesional corresponde a $3.200.000, por lo anterior se solicita ajustar de esta persona como también anexar el soporte de pago de seguridad de la secretaria que ofertaron en la propuesta económica.

3. CORREGIR en el informe de obra (pag. 18), dice textualmente "Valor ejecutado según pre-acta parcial de obra al 29 de agosto de 2024", fecha que no corresponde al periodo del reporte.

4. CORREGIR en el informe de obra pagina 20, dice textualmente "programación establecida en el Gesproy". Este proyecto no cuenta con reporte al Gesproy debido a que no es un proyecto financiado con recursos de regalías, así mismo en el informe anexar la programación de la obra.

5. Una vez revisado los informes se evidencia la ejecución del ítem 2.3 SUSTITUCION MATERIAL DE CIMENTACION 50% TRITURADO-50% RECEBO E:0.40 COMPACTADO MECANICAMENTE AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO. No se evidencian soportes de ensayos de laboratorio como ensayo de toma de densidades insitu del suelo instalado en la cimentación como en los pozos de inspección, tuberías, que permitan constatar este porcentaje de compactación exigido y en los ítems que contemplan concreto, ensayos de comprensión para medir resistencia del concreto. Anexar

   Es de vital importancia y responsabilidad de la interventoría garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas anexas desde la etapa precontractual, como en el caso de la especificación técnica del ítem 2.3 debido a que el suelo donde se apoyara las diferentes tuberías y cámaras de inspección, son suelos limo arenosos y limos no plásticos y de baja plasticidad, que de acuerdo al estudio de suelos del proyecto están sometidos a nivel freático desde los 0.20 m, desde los 1 m,1.20m. volviendo esto un estado crítico el suelo a la hora de remoldeo producto de la misma excavación, siendo un suelo no apto para fundar, haciendo imperativo el cumplimiento de esta sustitución del material de cimentación para evitar asentamientos a la hora de la operación del alcantarillado.

6. ANEXAR los pagos de seguridad social del personal de obra; cabe mencionar que, se debe tener en cuenta el pago correspondiente del IBC del personal ofertado en la propuesta económica de obra justificado en el AIU del presupuesto oficial de obra.

7. ANEXAR las fichas técnicas de la tubería utilizada para fines de control de calidad.

OBSERVACIONES AL INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL No 1

PROGRAMA	PROYECTO	OBSERVACIÓN
GESTIÓN SOCIAL	G1. PROGRAMA DE INFORMACION Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	En el folio 109 de la AZ o página 11 del informe de gestión ambiental No 1, se indica que el informe ambiental de obra se presenta el anexo 1 acta de reunión de socialización – inicio del proyecto, sin embargo, revisando los respectivos anexos, solo se presenta una hoja con la lista de asistencia, pero no se presenta el acta de reunión, del mismo modo, en el informe de obra se indica que se conformó veeduría ciudadana pero no se menciona nombres ni representantes, ni se presenta la documentación y legalización respectiva de la veeduría.

PROGRAMA	PROYECTO	OBSERVACIÓN
		Por otro lado, en el PMA del proyecto en la página 88, en la ficha correspondiente al proyecto se indica que se debe conformar y consolidar el COMITÉ DE PARTICIPACION COMUNITARIA, pero ni en el informe de obra ni interventoría se observa información referente a dicha actividad. Por ultimo dentro del PMA del proyecto en la página 90, se indica en el ítem de seguimiento que se hará entrega de lista de chequeo semanal para este programa sin embargo no se menciona nada en el informe de obra ni interventoría. Se reporta un valor ejecutado del proyecto de $ 230.000 M/CTE, pero no se dan soporte del mismo.
	G2. PROGRAMA DE CONTRATACION DE MANO DE OBRA LOCAL	En el informe ambiental de obra en la página 6 del informe o folio 232 de la AZ que fue radicada en el PDA, se indica que se anexa los contrato y afiliaciones del personal contratado, sin embargo, solo se anexa, una hoja denominada Generación de Empleo CODISUM SAS, pero no se anexa los contratos y demás información que se indica en el informe ambiental de la obra. Dentro del PMA del proyecto en la página 93, se indica en el ítem de seguimiento que se hará entrega de lista de chequeo semanal para este programa sin embargo no se menciona nada en el informe de obra ni interventoría. Se reporta un valor ejecutado del proyecto de $ 300.000 M/CTE, pero no se dan soporte del mismo.
	G3. PLAN DE CAPACITACION, EDUCACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL A LA COMUNIDAD	De acuerdo con lo presentado en los informes de obra e interventoría, se indica que la información que se presenta no corresponde a la información ficha del PLAN DE CAPACITACION, EDUCACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL A LA COMUNIDAD, teniendo en cuenta que lo descrito en el informe ambiental de CODISUM SAS se manifiesta que la capacitación fue dirigida a los trabajadores, así mismo es posible observarlo en el registro fotográfico que se presenta, y teniendo en cuenta con el PMA del proyecto en las páginas 82 a la 85, este programa está dirigido a la comunidad aledaña, no a los trabajadores, así mismo se reporta un valor ejecutado del proyecto de $ 850.000 M/CTE, pero no se dan soporte del mismo.
MANEJO DE ACTIVIDADES DE	M1. PLAN DE INSTALACION DE OBRAS	De acuerdo con lo presentado en los informes de obra e interventoría, se indica que la información que se presenta no corresponde a la información ficha del PLAN DE INSTALACIÓN DE OBRAS,

PROGRAMA	PROYECTO	OBSERVACIÓN
CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN		teniendo en cuenta que en la ficha se establece que: - Se establecerá un plan de manejo de desechos sólidos y líquidos para los campamentos de construcción. (información que no se entrega) - Dentro del PMA del proyecto en la página 35, se indica en el ítem de seguimiento que se hará entrega de lista de chequeo mensual para este programa sin embargo no se menciona nada en el informe de obra ni interventoría. - Se presenta un presupuesto discriminado en el PMA del proyecto por un valor de $ 1.260.000 M/CTE, y en el informe de SEVICON CS SAS se indica que ese presupuesto fue ejecutado pero no se presentan soportes del mismo que den evidencia de la ejecución del presupuesto del PMA del proyecto.
	M2. PROGRAMA DE USO Y ALMACENAMIENTO ADECUADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN	De acuerdo con lo presentado en los informes de obra e interventoría, se indica que la información que se presenta no corresponde a la información ficha del PROGRAMA DE USO Y ALMACENAMIENTO ADECUADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN, teniendo en cuenta que en la ficha se establece que: - Dentro del PMA del proyecto en la página 39, se indica en el ítem de seguimiento que se hará entrega de lista de chequeo semanal para este programa sin embargo no se menciona nada en el informe de obra ni interventoría, ni tampoco del formato de control de disposición de materiales de excavación y escombros. - Se presenta un presupuesto discriminado en el PMA del proyecto por un valor de $ 2.605.000 M/CTE, y en el informe de SEVICON CS SAS se indica que se ejecutaron $ 810.000 M/CTE, pero no se presentan soportes del mismo que den evidencia de la ejecución del presupuesto del PMA del proyecto. - Se recomienda tener en cuenta lo dispuesto en el PMA del proyecto en las páginas 36 a 40.
	M3. PLAN DE MANEJO DE AGUAS RESIDUALES Y	De acuerdo con lo presentado en los informes de obra e interventoría, se indica que la información que se presenta no corresponde a la información

PROGRAMA	PROYECTO	OBSERVACIÓN
	CALIDAD DE LOS EFLUENTES DOMÉSTICOS	ficha del PLAN DE MANEJO DE AGUAS RESIDUALES Y CALIDAD DE LOS EFLUENTES DOMÉSTICOS, teniendo en cuenta que en la ficha se establece que: - Se presenta un presupuesto discriminado en el PMA del proyecto por un valor de $ 1.495.000 M/CTE, y en el informe de SEVICON CS SAS se indica que se ejecutaron $ 605.000 M/CTE, pero no se presentan soportes del mismo que den evidencia de la ejecución del presupuesto del PMA del proyecto. - Así mismo, no se presenta el contrato de obra ni registro fotográfico de los baños portátiles que se instalaran.
	M4. PLAN DE SEGURIDAD VIAL Y MANEJO DE TRANSITO	N.A.
	M5. PROGRAMA DE MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES	De acuerdo con lo presentado en los informes de obra e interventoría, se indica que la información que se presenta no corresponde a la información ficha del PROGRAMA DE MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES, teniendo en cuenta que en la ficha se establece que: - Se presenta un presupuesto discriminado en el PMA del proyecto por un valor de $ 930.000 M/CTE, y en el informe de SEVICON CS SAS se indica que se ejecutaron $ 580.000 M/CTE, pero no se presentan soportes del mismo que den evidencia de la ejecución del presupuesto del PMA del proyecto. - Así mismo, en el informe de interventoría en el folio 19 y 20, solo se presentan recomendaciones por parte de la interventoría, pero no evidencia de ninguna implementación de medida de manejo ambiental. - Dentro del PMA del proyecto en la página 48, se indica en el ítem de seguimiento que se hará entrega de lista de chequeo mensual para este programa sin embargo no se menciona nada en el informe de obra ni interventoría, ni tampoco los documentos que se indican en el formato de control.
	M6. PLAN DE CONTINGENCIA, RIESGOS Y RESPUESTAS A EMERGENCIAS	De acuerdo con lo presentado en los informes de obra e interventoría, se indica que la información que se presenta no corresponde a la información ficha del PLAN DE CONTINGENCIA, RIESGOS Y RESPUESTAS A EMERGENCIAS, teniendo en cuenta que en la ficha se establece que:

PROGRAMA	PROYECTO	OBSERVACIÓN
		- Se presenta un presupuesto discriminado en el PMA del proyecto por un valor de $ 1.620.000 M/CTE, y en el informe de SEVICON CS SAS se indica que se ejecutaron $ 807.000 M/CTE, pero no se presentan soportes del mismo que den evidencia de la ejecución del presupuesto del PMA del proyecto. - Dentro del PMA del proyecto en la página 76, se indica en el ítem de seguimiento que se hará entrega de lista de chequeo semanal para este programa sin embargo no se menciona nada en el informe de obra ni interventoría. - Se hace un llamado a la interventoría que más que una recomendación que se le indique al contratista de obra la obligación de realizar la socialización con los trabajadores y efectuar los simulacros para capacitación y entrenamiento, conformar la brigada de emergencia para la atención y respuesta a cualquier emergencia.
	M7. PLAN DE REFORESTACIÓN ZONAS INTERVENIDAS	De acuerdo con lo presentado en los informes de obra e interventoría, se indica que la información que se presenta no corresponde a la información ficha del PLAN DE REFORESTACIÓN ZONAS INTERVENIDAS, teniendo en cuenta que en la ficha se establece que: - Dentro del PMA del proyecto en la página 58, se indica en el ítem de seguimiento que se hará entrega de lista de chequeo semanal para este programa sin embargo no se menciona nada en el informe de obra ni interventoría. - Se recomienda a la interventoría un seguimiento riguroso en caso de requerirse un permiso de aprovechamiento forestal.
MANEJO DE RESIDOS Y ESCOMBROS	R1. PLAN DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS Y SU DEBIDO TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL	De acuerdo con lo presentado en los informes de obra e interventoría, se indica que la información que se presenta no corresponde a la información ficha del PLAN DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS Y SU DEBIDO TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL, teniendo en cuenta que en la ficha se establece que: - Se presenta un presupuesto discriminado en el PMA del proyecto por un valor de $ 785.000 M/CTE, y en el informe de SEVICON CS SAS se indica que se ejecutaron $ 585.000 M/CTE, pero no se presentan soportes del mismo que den evidencia de la ejecución del presupuesto del PMA del proyecto.

PROGRAMA	PROYECTO	OBSERVACIÓN
		- Se requiere que hagan entrega de los certificados de residuos sólidos a la empresa EMPORITO EPS.
EDUCACIÓN Y CAPACITACION AL PERSONAL DEL PROYECTO	E1. PROGRAMA DE EDUCACION Y CAPACITACION AL PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO	De acuerdo con lo presentado en los informes de obra e interventoría, se indica que la información que se presenta no corresponde a la información ficha del PROGRAMA DE EDUCACION Y CAPACITACION AL PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO, teniendo en cuenta que en la ficha se establece que: - Se presenta un presupuesto discriminado en el PMA del proyecto por un valor de $ 500.000 M/CTE, y en el informe de SEVICON CS SAS se indica que se ejecutaron $ 305.000 M/CTE, pero no se presentan soportes del mismo que den evidencia de la ejecución del presupuesto del PMA del proyecto. - Se recomienda a la interventoría, llevar un registro fotográfico de cada uno de las capacitaciones que se realiza al personal además de las listas de asistencia que aportan, y del mismo modo indicar los temas tratados que estén acorde a lo indicado en el PMA en la página 81. - Dentro del PMA del proyecto en la página 81, se indica en el ítem de seguimiento que se hará entrega de lista de chequeo semanal para este programa sin embargo no se menciona nada en el informe de obra ni interventoría.
	E2. PLAN DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	De acuerdo con lo presentado en los informes de obra e interventoría, se indica que la información que se presenta no corresponde a la información ficha del PLAN DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, teniendo en cuenta que en la ficha se establece que: - Se presenta un presupuesto discriminado en el PMA del proyecto por un valor de $ 2.250.000 M/CTE, y en el informe de SEVICON CS SAS se indica que se ejecutaron $ 2.250.000 M/CTE, pero no se presentan soportes del mismo que den evidencia de la ejecución del presupuesto del PMA del proyecto. - Dentro del PMA del proyecto en la página 68, se indica en el ítem de seguimiento que se hará entrega de lista de chequeo semanal para este programa sin embargo no se menciona nada en el informe de obra ni interventoría.

Cabe recordar que, si el interventor no cumple cabalmente con su responsabilidad, podría acarrear consecuencias jurídicas de tipo: penal, disciplinario, fiscal, administrativo y hasta civil, en ocasión a los daños antijurídicos que en el ejercicio de sus actividades llegaren a ocasionar, esto en concordancia al artículo 82 de la Ley 1474 de 2011, así mismo es pertinente recordar que la omisión en la entrega de esta información podría constituir un presunto incumplimiento, el cual se configura por el incumplimiento del deber u obligación contractual, bien porque no se ejecutó o se realizó de manera parcial o en forma defectuosa o tardía esto, en concordancia al artículo 86 de la Ley ibíd.

Por último, se solicita al contratista de interventoría recoger los informes presentados y se tenga en cuenta las observaciones manifestadas en el presente oficio. Sin más por mencionar, quedamos atentos a resolver cualquier inquietud sobre el particular, a través del correo electrónico pap-pda@putumayo.gov.co.

Atentamente,

JORGE ANDRÉS CORTEZ VERA
Secretario de Infraestructura Departamental
Gestor del Plan Departamental de Aguas y Saneamiento Básico
Departamento del Putumayo

	Nombre y apellido	Cargo	Dependencia	Firma
Elaboró:	Maycol Calderón	Profesional de apoyo técnico-PDA	Secretaria de Infraestructura Departamental	
Elaboró:	Juliana Dueñas Sandoval	Profesional de apoyo. ambiental-PDA	Secretaria de Infraestructura Departamental	
Reviso:	Daniela Alejandra Ordóñez Pérez	Profesional de apoyo. Jurídico-PDA	Secretaria de Infraestructura Departamental	

PUTUMAYO
PARAISO ENCANTADOR

INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL No. 03

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1695-2024

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS BARRIO PUERTAS DEL SOL, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. INTERVENTORÍA.

28 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 27 DE ENERO DE 2025
MUNICIPIO DE ORITO
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN ---- 3
2. OBJETIVOS ---- 4
2.1. OBJETIVO GENERAL ---- 4
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ---- 4
3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO ---- 5
4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ---- 7
5. GENERALIDADES CONTRACTUALES ---- 8
6. GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL CONTRATISTA ---- 10
6.1. ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA ---- 10
6.2. REVISIÓN DOCUMENTAL ---- 10
7. SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL ---- 10
7.1. PROGRAMA DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL ---- 11
7.1.1. Programa de información y participación comunitaria ---- 11
7.1.2. Programa de contratación de mano de obra local ---- 13
7.1.3. Plan de capacitación, educación y concientización ambiental y social a la comunidad aledaña al proyecto ---- 13
7.2. ACTIVIDADES DE ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN ---- 16
7.2.1. Plan de instalación de obras ---- 16
7.2.2. Uso y almacenamiento de materiales y elementos de construcción ---- 18
7.2.3. Plan de manejo de aguas residuales y calidad de los efluentes domésticos ---- 21
7.2.4. Plan de seguridad vial y manejo de tránsito ---- 22
7.2.5. Programa de manejo de aguas superficiales ---- 22
7.2.6. Plan de contingencia, riesgos y respuestas a emergencias ---- 24
7.2.7. Plan de reforestación zonas intervenidas ---- 25
7.3. PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS Y ESCOMBROS ---- 25
7.3.1. Plan de manejo de desechos sólidos y su debido tratamiento y disposición final ---- 26
7.4. PROGRAMA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL PROYECTO ---- 29
7.4.1. Programa de educación y capacitación al personal vinculado al proyecto ---- 29
7.4.2. Plan de Salud y Seguridad en el trabajo ---- 31
8. PRESUPUESTO EJECUTADO ---- 31
9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ---- 32

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe describe el seguimiento realizado al Plan de Manejo Ambiental PMA en la ejecución del proyecto denominado: **"CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS BARRIO PUERTAS DEL SOL, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"**, derivando el Contrato de Obra No 0190-2024, cuyo objeto es la referencia y el cual tiene una duración de 04 (cuatro) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

La interventoría realizó seguimiento al cumplimiento de las actividades encaminadas a prevenir, minimizar, mitigar y compensar los impactos ambientales negativos y fortalecer los positivos que conlleven su ejecución según la normatividad ambiental vigente y los lineamientos ambientales especificados dentro de los estudios previos del Proyecto.

A continuación, se presenta el informe mensual No 03 que comprende el seguimiento realizado por la interventoría para las actividades del PMA programadas en el desarrollo de este proyecto desde el 28 de diciembre de 2024 al 27 de enero de 2025.

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

Seguimiento a la ejecución del Plan de Manejo Ambiental y herramientas para la implementación de medidas para el manejo, prevención, mitigación, control, protección, vigilancia o compensación de impactos ambientales previstos durante las actividades de la Construcción alcantarillado sanitario y colector de aguas lluvias barrio puertas del sol, en el municipio de Orito, departamento del Putumayo.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades de los programas del PMA para la construcción del proyecto.

- Asegurar el cumplimiento de la legislación, reglamentación y normativa ambiental aplicable a las actividades que se realicen y adoptar compromisos en materia de medio ambiente.

- Ejecutar diferentes programas de gestión ambiental, social y de seguridad, que apliquen según las condiciones del proyecto establecidas en el PMA.

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El contrato de obra No 1695-2024, se ejecutará las actividades en el barrio Puertas del Sol, en el municipio de Orito, departamento del Putumayo.

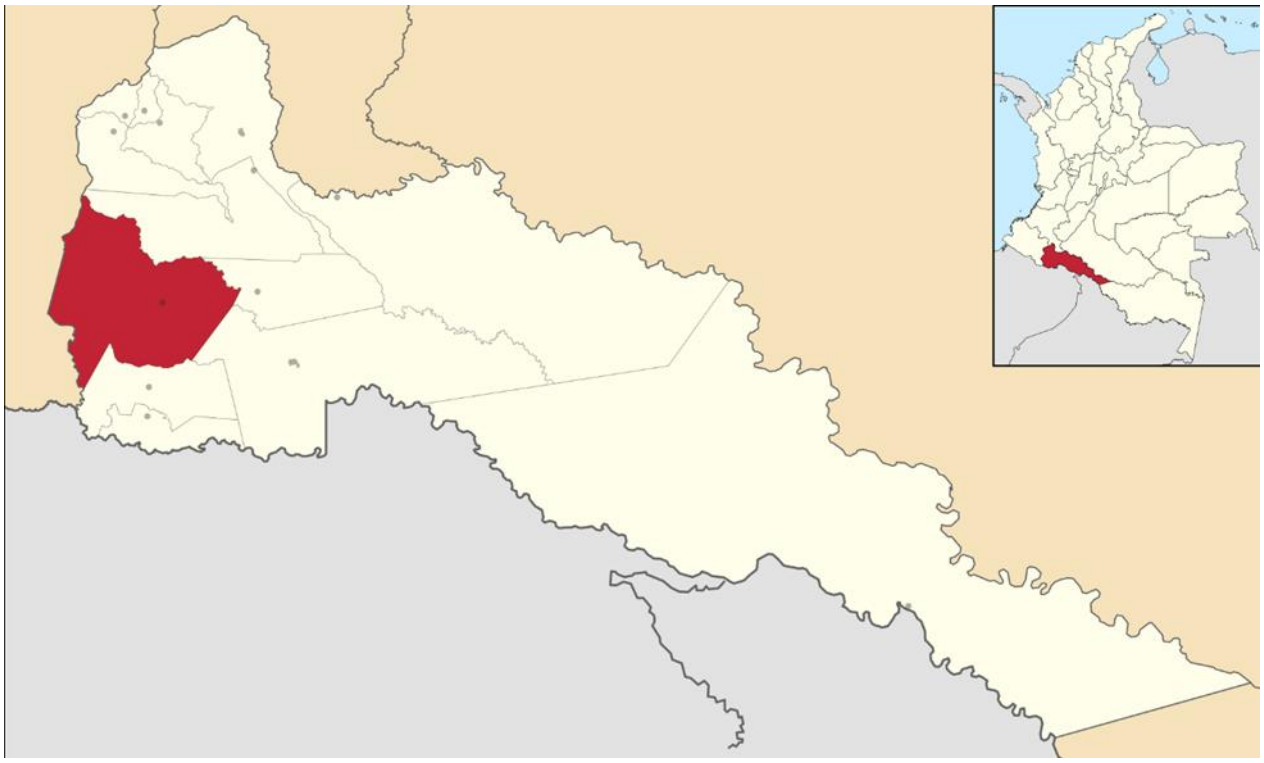


Figura 1. Municipio de Orito - Putumayo

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

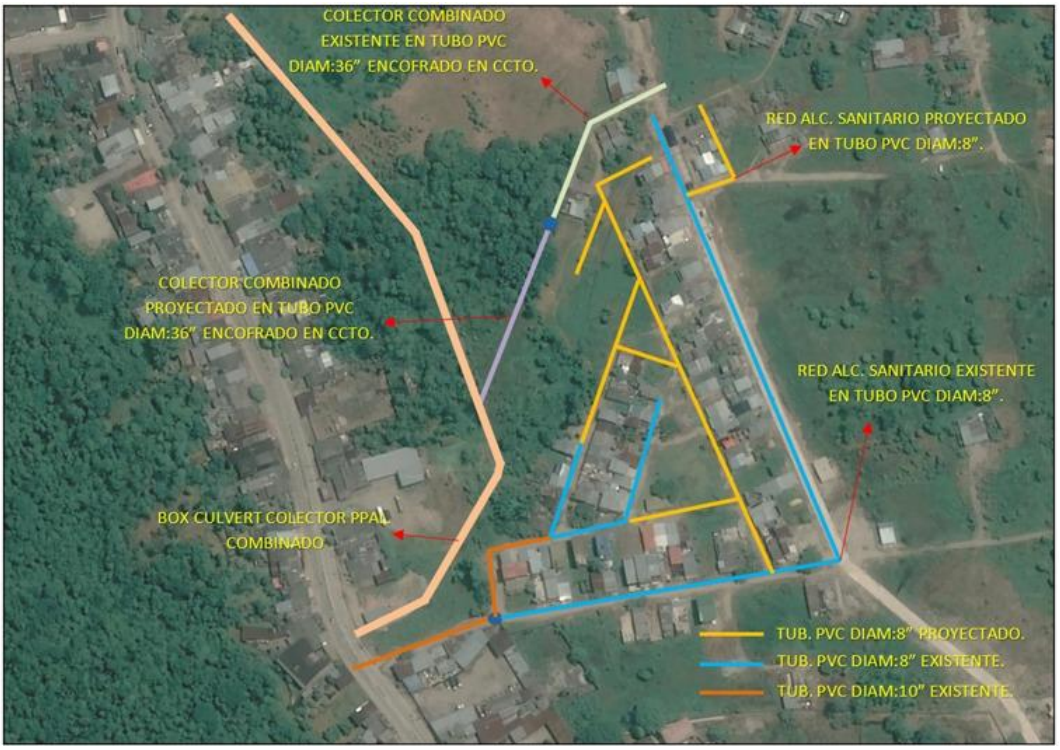


Figura 2. Ubicación tramos a intervenir del Proyecto- B/ Puertas del sol-Orito Putumayo

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Dentro del municipio de Orito, teniendo en cuenta la necesidad de mejorar la calidad de vida de las personas, de proteger los derechos a la salud y el bienestar social de la población, mediante la prestación de servicios de saneamiento básico, se ha planteado este proyecto el cual tiene por objeto **"CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS BARRIO PUERTAS DEL SOL, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"**, donde se contemplan la instalación de alcantarillado pluvial sanitario y colector de aguad lluvias.

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

5. GENERALIDADES CONTRACTUALES

Tabla No 1. Datos contractuales del contrato de Obra

CONTRATO No.	0190-2024
OBJETO	"CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS BARRIO PUERTAS DEL SOL, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO" "
ENTIDAD CONTRATANTE	EMPORITO ESP
NIT	846000381-0
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES, DISTRIBUIDORA Y SUMINISTROS ORITO S.A.S CODISUM R.L RENE ESTUARDO ORTEGA NOVOA CC.18.145.945 de Orito Putumayo
NIT	900556729-1
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$1.169.698.265,10
INTERVENTORÍA	SERVICON CS SAS R.L. ELIANA ANDREA CEBALLOS ARÉVALO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	22 DE OCTUBRE DEL 2024
FECHA DE INICIO	28 DE OCTUBRE DEL 2024
PLAZO DEL CONTRATO	CUATRO (04) MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN No 1	30 DE DICIEMBRE DEL 2024 HASTA EL 06 DE ENERO DEL 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	28 DE FEBRERO DEL 2025

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

Tabla No 2. Datos contractuales del contrato de Interventoría

CONTRATO No	No 1695-2024
OBJETO	"CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS BARRIO PUERTAS DEL SOL, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO- INTERVENTORÍA"
ENTIDAD CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
NIT	800094164-4
CONTRATISTA	SERVICON CS SAS R.L. ELIANA ANDREA CEBALLOS ARÉVALO CC. 1.123.333.549 de Orito Put.
NIT	900.949.050-7
VALOR DEL CONTRATO	$ 77.611.800
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA DE INICIO	28 DE OCTUBRE DEL 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	27 DE FEBRERO DEL 2024
PLAZO DEL CONTRATO	CUATRO (04) MESES

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

6. GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL CONTRATISTA

En el periodo transcurrido entre el 28 de diciembre del 2024 al 27 de enero del 2025 en la ejecución del proyecto “CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS BARRIO PUERTAS DEL SOL, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO” el contratista ha destinado los materiales, equipo y el personal necesario para realizar las actividades objeto del contrato.

6.1. ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA

- Realizar seguimiento y control del PMA, para cumplimiento de todos los objetivos y metas, con el fin de mitigar el impacto ambiental que se pueda generar en la ejecución de las activades constructivas.
- Realizar observaciones a los procedimientos propuestos
- Realizar revisión de los informes ambientales presentados por el contratista de obra y proponer observaciones.
- Realizar sugerencias para la implementación de actividades
- Acompañamiento en obra
- Seguimiento presupuesto asignado PMA

6.2. REVISIÓN DOCUMENTAL

Para el presente periodo se continúa con la ejecución de actividades constructivas, el contratista de obra e Interventoría realizaron las labores de revisión de documentación de las actividades de gestión del medio ambiente y gestión social ejecutadas en virtud de las obligaciones contractuales.

7. SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Para el presente periodo se realizaron actividades constructivas en obra, y de la misma manera se dio cumplimento a las actividades establecidas en el PMA, se realizó trabajo en conjunto con los profesionales del área ambiental y de salud ocupacional. Una de las tareas principales de la interventoría es realizar revisión a cada uno de los programas del PMA y sus requerimientos para que sean implementados en la obra.

A continuación, se menciona el seguimiento y avance en los respectivos programas establecidos en el PMA para el proyecto en el presente periodo.

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

7.1. PROGRAMA DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL

7.1.1. Proyecto de información y participación comunitaria

El presente proyecto tiene como objetivo brindar información clara, veraz, oportuna y suficiente a la población del área de influencia directa, a las autoridades locales, Juntas de Acción Comunal y líderes comunitarios.

Para el cumplimento de este programa la interventoría verificó que se realizaron las siguientes actividades:

Inicialmente se realizó la reunión de inicio (socialización) con los habitantes del barrio puertas del sol, donde se sustentó las actividades a desarrollarse, tiempos de ejecución, personal requerido, y demás información referente al contrato. Asimismo, en el anterior periodo el contratista de obra presentó el acta completa de la reunión de socialización y se realizó la conformación de la veeduría ciudadana y la conformación del comité de participación ciudadana. Además, se anexó la resolución 028 (15 de noviembre de 2024) de la conformación de la veeduría ciudadana, emitida ante el personero municipal.

Para el presente periodo se evidenció la realización por parte del contratista de una reunión de avance con la comunidad pertenecientes al área de influencia del proyecto, se realizó la invitación por medio de un volante informativo en la fecha 23 de enero del 2025, y mediante oficios y la reunión se realizó el día 27 de enero del 2025.

La interventoría participó de la reunión de avance, donde el contratista de obra dio a conocer el avance en la ejecución de proyecto, las actividades realizadas hasta la fecha, también brindó información de los inconvenientes presentados, y resolvió dudas de la comunidad. Asimismo, la comunidad realizó algunas recomendaciones, reclamos por algunas afectaciones presentadas a raíz de la ejecución de la obra. Se recomendó al contratista de obra tener presente todas las observaciones realizadas por parte de la comunidad, y se subsane los inconvenientes presentados.

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo





Imagen No 1-2. Reunión avance de obra- comunidad

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

En el informe ambiental de obra se presenta los siguientes anexos:

Anexo 1.1.Oficios invitación de la reunión de avance
Anexo 1.2.Acta reunión de avance -
Anexo 1.3. Formato listo de chequeo G1. programa de Información y Participación Comunitaria. G1

7.1.2. Programa de contratación de mano de obra local

Tiene como objetivo controlar la contratación de la mano de obra requerida en el desarrollo del proyecto, donde se ha establecido que como mínimo el 75% del personal de obra calificado y no calificado para la ejecución del proyecto, deben tener domicilio en la zona urbana y rural de Orito.

Anteriormente se realizó la reunión de socialización del proyecto, por parte del contratista de obra se informó los requisitos para la contratación del personal mano de obra no calificada requeridos para la ejecución de las actividades constructivas, lo cual era necesario hacer llegar las hojas de vida de las personas interesadas a la empresa, proceso que se manejó por medio de la JAC del barrio Puertas de sol. Asimismo, el personal mano de obra calificada en su gran mayoría pertenece a la región.

Para el presente periodo la interventoría verificó que, de acuerdo con el reporte de generación de empleo para el periodo de diciembre- enero, se reporta un total de15 empleados activos, e indirectos 3 personas, con un cumplimiento a la contratación del 50% del personal del AID – Área de influencia directa.

La interventoría evidencio que, durante el periodo reportado se realizó la contratación de 1 celador del AID. Y 1 ayudante de obra del AII.

En el informe ambiental de obra se presenta los siguientes anexos:

Anexo 2.1 Formato Generación de empleo – enero. G2
Anexo 2.2. Formato lista de chequeo Programa de Contratación de Mano de Obra Local G.2.

7.1.3. Plan de capacitación, educación y concientización ambiental y social a la comunidad aledaña al proyecto.

Tiene como objetivo brindar a la comunidad del área del proyecto información oportuna acerca de las condiciones técnicas del mismo, situaciones de riesgo, alcances, actividades

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

constructivas, duración, efectos positivos y negativos causados sobre el ambiente natural y social, mediante capacitación, educación y concientización ambiental.

Para el presente periodo no se realizaron reuniones o capacitaciones con la población aledaña al área de influencia del proyecto, sin embargo, el contratista de obra informó a la interventoría que se tiene programada una reunión para el siguiente periodo con el fin de capacitar en temas de movilidad vial y peatonal a los habitantes de este sector.

Dando cumplimiento a las actividades estipuladas en el presente programa, la interventoría verificó que el contratista de obra programó para el día 27 de enero del 2025 una capacitación con la población aledaña al área de influencia del proyecto, la invitación se realizó a través de volantes informativos y con información al presidente de la junta de acción comunal. Lo anterior en pro de generar una cultura vial se realiza la capacitación con la comunidad sobre la movilidad vial y peatonal.

En la reunión- capacitación brindada a la comunidad se dio a conocer algunos temas tales como:

- Normas de seguridad vial
- Señalización vial
- Cultura de la prevención
- Comportamientos seguros en la vía
- Políticas y regulaciones de seguridad vial
- Impacto del cambio climático en la seguridad vial

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo





Imagen No 3-4. Reunión- capacitación comunidad

En el informe ambiental de obra se presenta el siguiente anexo:

Anexo 3.1. Acta de reunión – capacitación con la comunidad
Anexo 3.2. Programa de Capacitación, Educación y Concientización Ambiental y Social a la Comunidad Aledaña al Proyecto. Formato lista de chequeo G3.

7.2. ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN

El cumplimiento de este programa busca minimizar los impactos sobre el ambiente causados por el manejo de agregados pétreos, materiales para construcción, manejo de concretos durante el desarrollo de la obra.

7.2.1. Plan de instalación de obras

El presente proyecto tiene como objetivo prevenir, minimizar y controlar los impactos generados por la instalación, operación y desmantelamiento del campamento y áreas de acopio temporal, mediante la Implementación de los mecanismos necesarios para manejar adecuadamente los impactos que la construcción de campamentos pueda causar al equipamiento e infraestructura comunitarios, así como el manejo de los servicios públicos que se demanden o intercepten.

Para el presente periodo la interventoría verificó el cumplimiento de las siguientes actividades:

El contratista de obra cuenta con una bodega temporalmente para el almacenamiento de los materiales de construcción, se realizó cubrimiento de materiales dispuestos en obra.

Se adecuado temporalmente la oficina, correspondiente al área administrativa de trabajo, se implementaron elementos de primeros auxilios tales como: Extintor, camilla rígida de plástico, cuello ortopédico, botiquín de primeros auxilios, extintor.

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo



Imagen No 5. Adecuacion bodega- oficia en obra

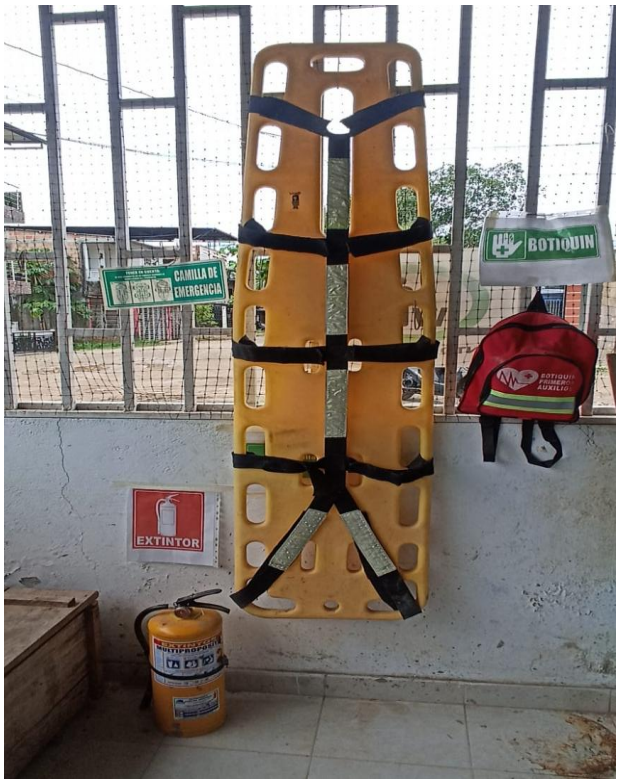




Imagen No 6-7. Instalación de elementos de primeros auxilios en obra

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

En el informe ambiental de obra se presenta el siguiente anexo:

Anexo 4.1. Soporte recibo de energía -caseta comunal

Anexo 4.2. Programa de manejo de campamentos e instalaciones temporales. Formato lista de chequeo M1.

7.2.2. Uso y almacenamiento de materiales y elementos de construcción

Teniendo en cuenta que los materiales pétreos utilizados para la ejecución de las actividades deben provenir de fuentes legales, contar con los permisos ambientales y mineros. La interventoría verificó que los comercializadores de los materiales pétreos cuentan con la respectiva documentación legal de fuentes de materiales.

En el informe ambiental No 1 de obra se presentó el siguiente anexo:

Anexo de Documentación legal (Licencia ambiental mediante la Resolución 1142 del 18 noviembre del 2011) y Certificado de Registro Minero.

De manera periódica se realiza recomendaciones para el adecuado manejo de los materiales de construcción dentro de la obra; tales como:

Para el manejo de los materiales de construcción se recomienda que su almacenamiento temporal en las instalaciones o frentes de obra se utilicen lonas de protección que impidan el contacto con las aguas de escorrentía y emisión de material particulado por acción eólica.

Para el manejo adecuado del cemento, acero, tuberías, formaletas, etc., se recomienda una zona donde se puedan acopiar estos materiales de manera óptima, con las alturas máximas de acopio, aislamiento del suelo y del agua haciendo uso de estibas.

Los vehículos para el transporte de materiales deben contar con platones o contenedores adecuados y en buen estado.

El material transportado no puede sobrepasar los bordes superiores más bajos del contenedor o platón. Las compuertas de cargue y descargue deben permanecer, durante el transporte, debidamente cerradas y aseguradas.

Se realizó recomendación para control de la velocidad de volquetas en la obra, que no sea mayor a 20 km/h con el fin de disminuir las emisiones fugitivas y prevenir accidentes de trabajo.

El mantenimiento de los equipos y maquinaria debe garantizar la perfecta combustión de los motores, con el objeto de disminuir las emisiones contaminantes.

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

La interventoría verificó el cumplimento de las siguientes actividades:

El contratista cuenta con una bodega para realizar el almacenamiento de los materiales utilizados en la ejecución de la obra como: Cemento, varillas, tuberías, formaletas, etc.

Se verificó que los materiales pétreos que se utilizaron en la obra fueron resguardados del agua y el viento, se utilizó plástico para su protección, con el fin de evitar contaminación del aire y el suelo.

Las volquetas que transportan los materiales pétreos cuentan con platones adecuados, con cubrimiento de volcos y en buen estado.

La interventoría verificó el cumplimiento de las inspecciones preoperacionales a los equipos, maquinaria dispuestos en obra.

La interventoría verificó que para el presente periodo no se generó RDC que haya requerido manejo adecuado para la disposición final en escombrera.

Se evidenció que se utilizó material proveniente de las excavaciones para conformación de las vías intervenidas.



Imagen No 8. Almacenamiento temporal materiales de construcción (cemento)

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo







Imagen No 9-11. material de excavación- adecuación vías intervenidas

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

En el informe ambiental de obra se presenta el siguiente anexo:

Anexo 5.1. Programa de uso y almacenamiento de materiales y elementos de construcción. Formato lista de chequeo M2

7.2.3. Plan de manejo de aguas residuales y calidad de los efluentes domésticos

El presente proyecto tiene como objetivo establecer medidas para controlar y mitigar los impactos generados por los vertimientos de aguas residuales resultantes del funcionamiento de campamentos.

La interventoría verificó que, para el periodo reportado, el contratista de obra continúa con el alquiler de la caseta comunal para el campamento temporal, cuenta con 2 unidades sanitarias, las cuales cumplen con la normatividad colombiana siendo en proporción de uno (1) por cada quince (15) trabajadores. Se evidenció que se realizan jornadas de limpieza de los sanitarios.

Por otra parte, el contratista de obra implementó un kit antiderrames, en caso de requerirse en la obra.





Imagen No 12-13. Baño en campamento- instalación de equipo contraincendios

7.2.4. Plan de seguridad vial y manejo de tránsito

Para dar cumplimento a este programa se considera necesario el cerramiento de todas las áreas de trabajo demarcando completamente el sitio de la obra con cinta peligro, de igual manera la instalación de avisos preventivos para las excavaciones, de acordonar dentro de la señalización del frente de obra los materiales que sean necesarios para el desarrollo de esta.

Este proyecto se describe en el informe Plan de Manejo de Tránsito

Para el presente periodo la interventoría verificó el cumplimiento de las siguientes actividades:

- Implementación de señales de tránsito requeridas para en el desarrollo de la obra, controladores viales, uso de paletas de PARE, cintas de demarcación, con el fin de garantizar la seguridad e integridad de peatones y trabajadores, de acuerdo con los requerimientos de la obra.

- Implementación de señalización de áreas de trabajo con letreros preventivos y acordonamiento de materiales dispuestos en obra.

7.2.5. Programa de manejo de aguas superficiales

El presente proyecto tiene como objetivo el manejo adecuado de aguas superficiales, que pueden verse afectadas por la construcción de obra, se incluye el manejo de aguas lluvias y de escorrentía superficial.

La interventoría evidenció el cumplimiento de recomendaciones tales como:

- Se prohíbe el lavado, reparación y mantenimiento general de vehículos y equipos en los frentes de obra, esta actividad deberá ser realizada por el responsable del vehículo y fuera de la obra.

- Todo vehículo y/o equipo que funcione con sistemas de combustión, debe realizar el mantenimiento necesario que garantice reacciones de combustión completa en su funcionamiento.

- El personal encargado deberá brindar capacitación al personal de obra sobre el manejo de maquinaria, vehículos y equipos en la obra, realizar inspección rutinaria de los mismos verificando su perfecto estado de funcionamiento, la combustión de los motores, el ajuste de los componentes mecánicos, el balanceo y la calibración de las llantas.

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

- No eliminar el material sobrante con agua, ni dirigirlo a los canales de desagüe.

- Efectuar una limpieza diaria con el fin de evitar posibles obstrucciones por residuos.

- Adecuar un sitio especial para el almacenamiento de materiales lo más alejado posible de los cuerpos de agua, el cual contenga un cerramiento en malla sintética que evite la dispersión del material a causa de la acción erosiva del viento y/o del agua.

La interventoría evidenció que el contratista de obra implementó un kit ambiental antiderrame, en caso de que se llegará presentar algún derrame en el suelo de alguna sustancia contaminada.

Por otra parte, en la bodega se tiene implementado recipientes rotulados para almacenamiento de aceites, lubricantes, con su debida señalización.



Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo



Imagen No 14-15. Kit ambiental antiderrames- recipientes lubricantes y aceites

En el informe ambiental de obra se presenta el siguiente anexo:

Anexo 6.1. Programa de manejo de aguas Superficiales. Formato lista de chequeo M5

7.2.6. Plan de contingencia, riesgos y respuestas a emergencias

El presente proyecto tiene como objetivo la implementación de un Plan de Contingencias, el cual debe dirigirse a puntualizar el sistema de organización y los procedimientos específicos por punto crítico para enfrentar situaciones de calamidad, desastre o emergencia en un lugar y período determinados o para unas condiciones puntuales que se presenten en el lugar donde se desarrolla la obra.

La interventoría verificó que el contratista de obra cuenta con el plan de contingencias y emergencias adaptado para proyecto, donde se dispone de recursos técnicos y organización para la atención y respuesta a cualquier emergencia.

En el anterior periodo el contratista de obra realizó la conformación de la brigada de emergencias.

En el informe ambiental de obra se presenta el siguiente anexo:

Anexo 7.1. Programa del Plan de Contingencia, Riesgos y Respuestas a Emergencias. Formato lista de chequeo M6.

7.2.7. Plan de reforestación zonas intervenidas

El cumplimiento del presente proyecto tiene como objetivo establecer los lineamientos para las compensaciones forestales a que haya lugar, y que hayan sido requeridas dentro de los permisos ambientales que otorgue CORPOAMAZONÍA, buscando garantizar el mínimo impacto al componente arbóreo y vegetal y establecer los procedimientos para realizar el manejo de la vegetación herbácea, arbustiva y arbórea que se encuentren en el área del proyecto.

De acuerdo con las características iniciales del terreno para el desarrollo de las actividades en obra, se encontró que el área a intervenir estaba compuesta por cobertura vegetal menor, principalmente hierbas y algunos árboles con diámetros menores a 10 cm en el área donde se requiere intervenir, algunas especies mayores existentes en el terreno no se requieren intervenir. Hasta la fecha, No se ha visto afectada la alteración del paisaje en fauna y flora.

Este ítem se manejará una vez se hayan culminado las actividades constructivas del proyecto, teniendo en cuenta las características finales del área intervenida. Hasta la fecha no se ha requerido solicitar permiso de aprovechamiento forestal.

7.3. PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS Y ESCOMBROS

El cumplimiento del presente programa tiene como objetivo manejar adecuadamente los residuos sólidos e industriales, material reutilizable generados durante las actividades de construcción.

7.3.1. Plan de manejo de desechos sólidos y su debido tratamiento y disposición final

La interventoría recomienda, para la separación de residuos, se realice teniendo en cuenta el código de colores establecido de acuerdo con la normatividad vigente, se cuenta con son los siguientes:

Bolsa Blanca: residuos aprovechables, reciclables como papel, cartón, botellas plásticas, bolsas plásticas.

Bolsa Verde: residuos orgánicos aprovechables como restos de comida, desechos agrícolas.

Bolsa Negra: residuos no aprovechables como papel higiénico, servilletas, papeles y cartones contaminados con comida, papeles metalizados.

Clasificación y manejo de los residuos solidos

Los residuos generados en el proyecto son clasificados y almacenados temporalmente en obra, posteriormente se deberá realizar la gestión para cada uno de ellos, como lo es residuos reciclables, no aprovechables y peligros, especiales con empresas que cuenten con la documentación legal.

La interventoría verificó el manejo de los residuos generados en la obra, lo cual se realizó de la siguiente manera:

Residuos orgánicos y reciclables

La interventoría verificó que, para el presente periodo se generaron 15 kilogramos de residuos orgánicos y 6 kilogramos de residuos reciclables entre cartón y plástico, se dio manejo mediante la empresa de servicios públicos Emporito ESP, la cual tiene incorporada una ruta de reciclaje, de esta manera los residuos reciclables son incorporados nuevamente al ciclo productivo mediante su aprovechamiento, reutilización y comercialización.

Residuos no Aprovechables

El contratista realizó entrega de los residuos sólidos No aprovechables a la empresa de Servicios Públicos Emporito ESP del municipio de Orito, para su transporte, manejo y disposición final de estos residuos. Para el presente informe se reporta 29 kilogramos de material no aprovechable.

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

Residuos peligrosos (Contaminados, especiales)

Para el caso de los residuos especiales tales como sacos de cemento, lubricantes, aceites, combustibles, etc, se recomienda realizar la gestión para el transporte, tratamiento y disposición final con una empresa autorizada con documentación legal en regla que se encargará de su transporte y disposición final de manera adecuada, de manera que no cause afectación al medio ambiente y a la salud de las personas.

Para el presente periodo el contratista de obra realizó almacenamiento temporal de los residuos especiales generados en obra, principalmente residuos de sacos de cemento.

Tabla No 3. Relación de residuos provenientes en la obra- corte 27 de enero-24

Tipo de residuos	Cantidad Kg	Entregado
Residuos reciclables (plástico y cartón)	6	EMPORITO E.S.P
Residuos orgánicos	15	EMPORITO E.S.P
Ordinarios no aprovechables	29	EMPORITO E.S.P
Residuos peligrosos (Contaminados, Especiales) Sacos de cemento		Almacenamiento temporal en obra
Total	**50 kilogramos**	

En el informe ambiental de obra se presenta los siguientes anexos:

Anexo 8.1. Certificación de la entrega de los residuos sólidos a la empresa emporito ESP-Enero- 2025.

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo





Imagen No 16-17. Puntos ecológicos instalados en obra

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

7.4. PROGRAMA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL PROYECTO

7.4.1. Programa de educación y capacitación al personal vinculado al proyecto

El presente proyecto tiene como objetivo establecer los lineamientos para educación y capacitación a todo el personal del proyecto en temas técnicos, ambientales, sociales y en seguridad y salud en el trabajo relacionados con el proyecto. Asimismo, generar estrategias de apropiación del proyecto a través de procesos de educación y sensibilización con la mano de obra Crear espacios para la participación y sensibilización a través de la socialización de temas de interés.

La interventoría verificó el cumplimiento de las actividades de capacitación y charlas en temas ambientales para la concientización, cuidado y protección de los recursos naturales, manejo de residuos, entre otros temas encaminados a prevenir, mitigar, reducir impactos ambientales negativos que se pueden generar durante la ejecución de las actividades.

De acuerdo con la revisión realizada por parte de la interventoría, se verificó la realización de estas mediante las listas de asistencia.

A continuación, se presenta la relación de charlas y capacitación en temas ambientales realizados en el presente periodo.

Tabla No 4. Temas charlas y capacitación mensuales desarrolladas

TEMA A TRATAR	FECHA REALIZADA
Charla: Manejo de escombros y RCD	09/01/2025
Charla: Manejo de residuos sólidos	15/01/2025
Charla: Protección de cuerpos de agua	22/01/2025

El contratista de obra presenta en el informe de SST el *anexo de Registro de asistencia de Charlas- capacitaciones ambientales*

En el informe ambiental de obra se presenta el siguiente anexo:

Anexo 9.1. Programa educación y capacitación al personal vinculado al proyecto. Formato lista de chequeo E1.

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo





Imagen No 18- 19. Charlas ambientales

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

7.4.2. Plan de Salud y Seguridad en el trabajo

El presente proyecto tiene como objetivo evitar, minimizar y mitigar los inconvenientes de los trabajadores y a la comunidad a causa de accidentes potenciales que se pueden presentar. Asimismo, dar a conocer a todo el personal involucrado en el proyecto, las políticas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y medio ambiente.

Para el presente periodo la interventoría verificó el cumplimiento de actividades tales como:

- Realización de exámenes de ingreso al personal vinculado al proyecto periodo diciembre
- Realización de inducción al personal vinculado al proyecto periodo diciembre

El presente programa se especifica con mayor detalle en el informe de SST de interventoría.

En el informe ambiental de obra se presenta el siguiente anexo:

Anexo 10.1. Programa de Higiene, Seguridad Industrial, Salud Ocupacional. Formato lista de chequeo E2.

8. PRESUPUESTO EJECUTADO

Para el presente periodo de acuerdo con las actividades realizadas en obra, se presenta la ejecución del **18%**, correspondiente a un valor de **$ 2.691.500,00 MCTE.**

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS BARRIO PUERTAS DEL SOL, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	VALOR FINANCIERO EJECUTADO MES 3	VALOS ASIGANADO PARA EL PROYECTO
G1. PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	$ 515.000	$ 1.360.000,00
G2.PROGRAMA DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL	$ -	$ 300.000,00
G3.PLAN DE CAPACITACIÓN, EDUCACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL A LA COMUNIDAD	$ 76.500,00	$ 1.409.000,00
M1.PLAN DE INSTALACIÓN DE OBRAS	$ -	$ 1.260.000,00
M2.PROGRAMA DE USO Y ALMACENAMIENTO ADECUADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN	$ 1.400.000,00	$ 2.605.000,00
M3.PLAN DE MANEJO DE AGUAS RESIDUALES Y CALIDAD DE LOS EFLUENTES DOMÉSTICOS	$ -	$ 1.495.000,00
M4.PLAN DE SEGURIDAD VIAL Y MANEJO DE TRANSITO	$ -	$ -
M5. PROGRAMA DE MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES	$ 200.000,00	$ 930.000,00
M6.PLAN DE CONTINGENCIA, RIESGOS Y RESPUESTAS A EMERGENCIAS	$ -	$ 1.620.000,00
M7. PLAN DE REFORESTACIÓN ZONAS INTERVENIDAS		$ 1.156.000,00
R1.PLAN DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS Y SU DEBIDO TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL	$ -	$ 785.000,00
E1. PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO	$ 500.000,00	$ 500.000,00
E2. PLAN DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	$ -	$ 2.250.000,00
	$ 2.691.500	**$ 15.670.000,00**

CELULAR: 3178545839 E-MAIL: SERVICONCSSAS@GMAIL.COM
ORITO PUTUMAYO

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta las actividades ejecutadas por el contratista durante el periodo comprendido entre el 28 de diciembre del 2024 al 27 de enero del 2025, la interventoría evidenció el cumplimiento de las actividades de los programas del PMA tales como:

- Charlas y capacitación en temas ambientales, de acuerdo con el cronograma establecido para el periodo reportado.

- Instalación puntos ecológicos en el campamento de obra, separación y disposición de residuos correctamente.

- Manejo adecuado de residuos sólidos No aprovechables, reciclables y orgánicos con la empresa de servicios públicos Emporito ESP.

- Demarcación y señalización adecuada de áreas que representan peligro en la zona de influencia directa del proyecto.

- Uso adecuado de equipos, maquinaria, combustibles evitando contaminación del suelo.

- Cubrimiento de materiales pétreos en su almacenamiento temporal en obra.

- Presentación de la certificación por parte de Emporito ESP de la entrega de residuos sólidos.

- El contratista de obra para el presente periodo ha desarrollado actividades estipuladas en los programas del PMA, según las necesidades de la obra se ha dispuesto los elementos necesarios señalados en el presupuesto para dar cumplimiento a los programas, según lo realizado en este periodo de informe, se presenta un porcentaje de avance mensual del **18%**, lo cual corresponde a un porcentaje acumulado del **91%** y un valor acumulado de **$14.196.500.00 MCTE.**

Presentó,

ELIANA ANDREA CEBALLOS AREVALO
REPRESENTANTE LEGAL
SERVICON CS SAS
INTERVENTORÍA

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

INFORME DE PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO No 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1695-2024

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS BARRIO PUERTAS DEL SOL, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO- INTERVENTORÍA.

28 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 27 DE ENERO DE 2025
MUNICIPIO DE ORITO
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA 4
3. OBJETIVO 6
4. CUMPLIMIENTO PLAN DE MANEJO DE TRANSITO.....6
5. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES.....7
6. AVANCE PRESUPUESTO PMT 15
7. CONCLUSIONES.....16

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento describe el seguimiento por parte de la interventoría al cumplimiento del Plan de Manejo de Transito PMT, de acuerdo con la normatividad aplicable y los requerimientos establecidos en la ejecución del contrato No 23-0696-2023, con objeto CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS BARRIO PUERTAS DEL SOL, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

A continuación, se presenta el informe mensual No 3 de interventoría que comprende el seguimiento realizado para las actividades del PMT programadas por el contratista de obra en el desarrollo de este proyecto, desde el 28 de diciembre de 2024 al 27 de enero de 2025.

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

2. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA

Tabla No 1. Datos contractuales del contrato de Obra

CONTRATO No.	0190-2024
OBJETO	"CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS BARRIO PUERTAS DEL SOL, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO" "
ENTIDAD CONTRATANTE	EMPORITO ESP
NIT	846000381-0
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES, DISTRIBUIDORA Y SUMINISTROS ORITO S.A.S CODISUM R.L RENE ESTUARDO ORTEGA NOVOA CC.18.145.945 de Orito Putumayo
NIT	900556729-1
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$1.169.698.265,10
INTERVENTORÍA	SERVICON CS SAS R.L. ELIANA ANDREA CEBALLOS ARÉVALO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	22 DE OCTUBRE DEL 2024
FECHA DE INICIO	28 DE OCTUBRE DEL 2024
PLAZO DEL CONTRATO	CUATRO (04) MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN No 1	30 DE DICIEMBRE DEL 2024 HASTA EL 06 DE ENERO DEL 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	28 DE FEBRERO DEL 2025

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

Tabla No 2. Datos contractuales del contrato de Interventoría

CONTRATO NO.	No 1695-2024
OBJETO	"CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS BARRIO PUERTAS DEL SOL, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO- INTERVENTORÍA"
ENTIDAD CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
NIT	800094164-4
CONTRATISTA	SERVICON CS SAS R.L. ELIANA ANDREA CEBALLOS ARÉVALO CC. 1.123.333.549 de Orito Put.
NIT	900.949.050-7
VALOR DEL CONTRATO	$ 77.611.800
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA DE INICIO	28 DE OCTUBRE DEL 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	27 DE FEBRERO DEL 2024
PLAZO DEL CONTRATO	CUATRO (04) MESES

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

3. OBJETIVO

Presentar el seguimiento al cumplimiento del Plan de Manejo de Tránsito para la CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS BARRIO PUERTAS DEL SOL, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, por parte del contratista de obra.

4. CUMPLIMIENTO PLAN DE MANEJO DE TRANSITO

El Plan de manejo de tránsito, de acuerdo a la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UAERMV) se considera una técnica que plantea las estrategias, alternativas y actividades necesarias para minimizar o mitigar el impacto generado a las condiciones normales de movilización y desplazamiento de los usuarios de las vías (peatones, ciclistas, usuarios de transporte público, conductores y pasajeros de vehículos privados y de carga, y comunidad en general), causados por la ejecución de una obra o la realización de actividades (intervenciones colectivas asociadas a eventos), de tal manera que siempre se favorezca la seguridad vial de los usuarios de la infraestructura y de quienes participan en la intervención y/u obras o eventos.

De esta manera se considera de vital importancia la implementación del PMT y su cumplimiento, durante la ejecución del presente proyecto, para mitigar el impacto generado por la obra que se desarrollan dentro del alcance del proyecto y en las zonas aledañas a este, con el propósito de brindar un ambiente seguro, ordenado, ágil y cómodo en el área de construcción y a los conductores, pasajeros, ciclistas, peatones, personal de la obra y vecinos del lugar, en cumplimiento a las normas establecidas para la regulación.

De acuerdo con la clasificación de la señalización a implementar en obra se menciona las siguientes:

Señalización reglamentaria: Tienen por finalidad notificar a los usuarios de las vías las prioridades en el uso de estas, así como las limitaciones, prohibiciones, restricciones, obligaciones y autorizaciones existentes.

Señalización Preventiva: Tiene como propósito advertir a los usuarios de la vía sobre el cambio de condiciones o la existencia y naturaleza de riesgos y/o situaciones presentes en la vía.

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

Señalización Informativa: Orientar y guiar a los usuarios de las vías a través de la zona de obra, entregándole la información necesaria con suficiente anticipación para que se pueda transitar por ella de la forma más segura simple y directa posible.

Se utilizaron señales informativas indicando con anterioridad el trabajo que se ejecuta, inicio de obra, fin de obra.

Señalización y demarcación de áreas de trabajo: En el avance de la ejecución de las actividades constructivas programadas por el contratista, se verificó que se realizó señalización de áreas que representan peligro para los habitantes del sector, trabajadores dentro de la obra.

5. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

- La interventoría verificó para el presente periodo, de acuerdo con la ejecución de las actividades programadas por el contratista de obra, que se realizó la implementación de señalización de las áreas intervenidas en la obra, para que los trabajadores, personal en general que transitan, lo hagan con el mayor cuidado y puedan identificar los peligros que se pueden presentar en la ejecución de las actividades constructivas.

- Se evidencio implementación de señales reglamentarias, preventivas, informativas de acuerdo con las necesidades de la obra.

- Se evidenció controladores viales, para el control de tráfico en las entradas a las vías intervenidas, para controlar la circulación de volquetas que ingresan a la obra a descargar materiales pétreos, por otra parte, el ingreso vehículos que ingresan materiales de construcción. La interventoría recalca la importancia de realizar control de tráfico, para evitar accidentes.

- Se evidenció el uso de chalecos reflectivos, pitos en las actividades de control de tráfico, instalación de conos.

- Se evidenció demarcación y señalización con cinta peligro de áreas intervenidas, para prevención de riesgos en la obra,

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo





Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo





Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo





Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo



Imagen No 1-9. Implementación señalización informativa, preventiva, reglamentaria- conos, vías intervenidas en obra





Imagen No 10-11. Señalización con cinta peligro de áreas intervenidas en la obra



Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo



Imagen No 12 -13. Auxiliares de tránsito en obra con uso de chalecos reflectivos y paleta pare-siga, control vehicular y peatonal.

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

6. AVANCE PRESUPUESTO PMT

ANEXO No 1. PRESUPUESTO PLAN MANEJO DE TRAFICO						MUNICIPIO:	ORITO
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR. TOTAL		
1	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (DISPOSITIVOS, SEÑALIZACION Y EQUIPOS) (A)						
	DISPOSITIVOS DE CONTROL						
1,1	BARRICADAS	UND	4	$ 290.000,00	$ 1.160.000,00		
1,2	PALETAS PARE SIGA 30 cm	UND	4	$ 35.000,00	$ 140.000,00		
1,3	DELINEADORES TUBULARES (COLOMBINAS)	UND	20	$ 55.000,00	$ 1.100.000,00		
1,4	CINTA PLASTICA "PELIGRO NO PASE" ROLLO X 500	Rollo	10	$ 40.000,00	$ 400.000,00		
1,5	CONOS H= .70 cms	UND	12	$ 65.000	$ 780.000,00		
2	SEÑALIZACION						
2,1	SEÑAL VERTICALES (SPO-01 TRABAJOS EN LA VIA,SPO-03 Auxiliar de tránsito,SPO-05 ANGOSTAMIENTO A LA DERECHA,SPO-06	UND	10	$ 382.000,00	$ 3.820.000		
3	EQUIPOS VARIOS						
3,1	CHALECOS REFLECTIVOS	UNID.	4	$ 25.000,00	$ 100.000		
3,2	VOLANTES INFORMATIVOS	UNID.	100	$ 4.000,00	$ 400.000		
3,3	PITOS PARA AUXILIARES DE TRÁNSITO	UNID.	2	$ 11.500,00	$ 23.000		
	SUBTOTAL PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (DISPOSITIVOS, SEÑALIZACION Y EQUIPOS)				$ 7.923.000		

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	VR. UNITARIO	MESES	DEDICACIÓN	FACTOR PRESTACIONAL	VR. TOTAL
	PERSONAL PROFESIONAL, AUXILIARES DE TRANSITO Y BRIGADAS (B)							
	PALETEROS (Frente de Obra Conejo)	MES	2,0	$ 1.160.000	4	100%	72,45	$ 16.003.360
SUBTOTAL PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (PERSONAL)								$ 16.003.360
VALOR COSTOS DIRECTOS (A) + (B)								$ 23.926.360,0

28 DE DICIEMBRE - 27 DE ENERO								28 DE DICIEMBRE - 27 DE ENERO
CANT.	SEMANA 1	CANT.	SEMANA 2	CANT.	SEMANA 3	CANT.	SEMANA 4	
4	$ 1.528.000,00							$ 1.528.000,00
						20	$ 80.000,00	$ 80.000,00
						$ 1,00	$ 4.000.840,00	$ 4.000.840,00
							TOTAL	$ 5.608.840,00

7. CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta las actividades ejecutadas por el contratista de obra durante el periodo comprendido entre 28 de diciembre del 2024 al 27 de enero del 2025, se evidenció la implementación de actividades estipuladas en el PMT, tales como:

- Instalación de señales de tránsito en obra, de tipos reglamentarias, informativas, preventivas, en las áreas intervenidas del proyecto, de acuerdo con las necesidades de la obra.

- Demarcación de áreas intervenidas y áreas de trabajo, mediante el uso de cinta plástica “No pase”, señalización de excavaciones en las actividades de instalación de redes de alcantarillado, cámaras de inspección.

- Auxiliares de tránsito, control vehicular para el ingreso de volquetas, vehículos o maquinaria a la obra.

- Uso de chalecos reflectivos, silbatos, paletas de Pare y Siga para el control vehicular y peatonal.

- Instalación de conos para señalización de actividades en obra.

- El contratista en el presente periodo reportado ha desarrollado actividades estipuladas en el PMT, según las necesidades de la obra se ha dispuesto los elementos necesarios señalados en el presupuesto para dar cumplimiento al PMT, según lo realizado este periodo de informe, se presenta un porcentaje de ejecución mensual del **23,44%**, un valor de **$5.608.840,00 MCTE,** lo cual corresponde a un porcentaje acumulado del **83%** y a un valor acumulado de **$19.845.520,00 MCTE.**

Presentó,

ELIANA ANDREA CEBALLOS AREVALO
REPRESENTANTE LEGAL
SERVICON CS SAS
INTERVENTORÍA

INFORME DE SST No 03

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1695-2024

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS BARRIO PUERTAS DEL SOL, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO- INTERVENTORÍA.

28 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 27 DE ENERO DE 2025
MUNICIPIO DE ORITO
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. OBJETIVO 6
3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 7
4. RELACION DE PERSONAL 8
5. CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 9
5.1. EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES 9
5.2. INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y CHARLAS DIARIAS SST 10
5.3. PAUSAS ACTIVAS 11
5.4. USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 12
5.5. REPOSICIÓN DE EPP 13
5.6. INSPECCIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO Y HERRAMIENTAS 13
5.7. PLAN DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA 13
5.8. PUNTO DE HIDRATACIÓN 15
5.9. PAGOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y AFILIACIONES 15
5.10. ORDEN Y ASEO EN LA OBRA 16
6. CONCLUSIONES 17

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

1. INTRODUCCIÓN

La Seguridad y Salud en el trabajo SST, son funciones importantes a tener en cuenta en cualquier actividad, en el sector de la construcción de obras civiles es primordial, ya que los trabajadores deben realizar diversas actividades, las cuales se enfrentan factores de riesgo. La calidad de vida, salud física y mental del trabajador, el desarrollo de sus capacidades y desempeño, desarrollo personal y social, son promovidas a través del plan de salud y seguridad ocupacional implementado durante todas las etapas constructivas del proyecto de obra "CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS BARRIO PUERTAS DEL SOL, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".

Por parte del área del sistema de gestión de seguridad, salud en el trabajo, se realizó la implementación de actividades como inducción al personal vinculado al proyecto, charlas preoperacionales en materia de SST, entrega de dotación, inspección de herramientas maquinaria, vehículos, y equipos utilizados en obra, reposición de EPP, hidratación.

A continuación, se presenta el informe mensual No 03 que comprende el seguimiento realizado por la interventoría para las actividades de SST programadas por el contratista de obra en el desarrollo de este proyecto, desde el 28 de diciembre al 27 de enero de 2025.

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA

Tabla No 1. Datos contractuales del contrato de Obra

CONTRATO No.	0190-2024
OBJETO	"CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS BARRIO PUERTAS DEL SOL, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO" "
ENTIDAD CONTRATANTE	EMPORITO ESP
NIT	846000381-0
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES, DISTRIBUIDORA Y SUMINISTROS ORITO S.A.S CODISUM R.L RENE ESTUARDO ORTEGA NOVOA CC.18.145.945 de Orito Putumayo
NIT	900556729-1
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$1.169.698.265,10
INTERVENTORÍA	SERVICON CS SAS R.L. ELIANA ANDREA CEBALLOS ARÉVALO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	22 DE OCTUBRE DEL 2024
FECHA DE INICIO	28 DE OCTUBRE DEL 2024
PLAZO DEL CONTRATO	CUATRO (04) MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN No 1	30 DE DICIEMBRE DEL 2024 HASTA EL 06 DE ENERO DEL 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	28 DE FEBRERO DEL 2025

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

Tabla No 2. Datos contractuales del contrato de Interventoría

CONTRATO NO.	No 1695-2024
OBJETO	"CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS BARRIO PUERTAS DEL SOL, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO-INTERVENTORÍA"
ENTIDAD CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
NIT	800094164-4
CONTRATISTA	SERVICON CS SAS R.L. ELIANA ANDREA CEBALLOS ARÉVALO CC. 1.123.333.549 de Orito Put.
NIT	900.949.050-7
VALOR DEL CONTRATO	$ 77.611.800
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA DE INICIO	28 DE OCTUBRE DEL 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	27 DE FEBRERO DEL 2024
PLAZO DEL CONTRATO	CUATRO (04) MESES

CELULAR: 3178545839 E-MAIL: SERVICONCSSAS@GMAIL.COM
ORITO PUTUMAYO

2. OBJETIVO

Realizar seguimiento periódico a las actividades de gestión de salud, seguridad y medio ambiente durante la ejecución del proyecto "CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS BARRIO PUERTAS DEL SOL, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO", de manera que se dé cumplimiento al SG-SST, velando por la salud física y mental de los trabajadores, el desarrollo de sus capacidades y desempeño, desarrollo personal y social, buscando que los trabajadores tengan el conocimiento necesario para desempeñar su trabajo en forma eficiente, cumpliendo con los estándares de calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo durante sus labores.

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

El contrato de obra No 0190-2024 inició el día 28 de octubre del 2024, se realizaron las actividades de acuerdo con los ítems contratados, el contrato en mención cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS BARRIO PUERTAS DEL SOL, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".

A continuación, se describe el seguimiento por parte de la interventoría a las actividades en SST desarrolladas durante el presente periodo.

Entre las actividades que realiza la interventoría en cada periodo se relaciona las siguientes:

- Realizar seguimiento y control de las actividades de SST, con el objetivo de prevenir los riegos a salud y velar por la seguridad de los trabajadores y las condiciones de lugares de trabajo.
- Seguimiento a las afiliaciones y los pagos de planillas de seguridad social de los trabajadores.
- Realizar observaciones a los procedimientos propuestos.
- Realizar revisión de los informes de SST presentados por el contratista de obra y proponer observaciones.
- Realizar sugerencias para la implementación de actividades en materia de SST.
- Acompañamiento en obra.
- Seguimiento presupuesto asignado para la ejecución de las actividades.

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

4. RELACION DE PERSONAL

Se presenta la relación de personal de los contratos de obra e interventoría, de acuerdo con las condiciones de los pliegos, a continuación, a continuación, se relacionan las siguientes tablas:

Tabla 3. Relación de personal mano de obra calificada Contratista de Interventoría.

	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
1	BENJAMÍN SANJUANES ROMERO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
2	GUSTAVO ANDRES GRIJALBA JARAMILLO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
3	YILBER EDILBERTO ORDOÑEZ BASTIDAS	TOPOGRAFO
4	GERMAN TORIJANO	CADENERO
5	ELIANA ZUÑIGA	PROFESIONAL HSE

Tabla 4. Relación de personal mano de obra calificada Contratista de Obra.

	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
1	MARCO ANTONIO BARRERA	DIRECTOR DE OBRA
2	JEEFERSON ARTEAGA	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
3	YADY LIZETH RUEDA	HSEQ
4	WILSON PATIÑO	TOPOGRAFO
5	FABIO MEJIA	CADENERO
6	EDILSON ALDAIR LUNA	SECRETARIO

Tabla 5. Relación de personal de apoyo periodo corte 28 de diciembre del 2024 al 27 de enero-2025.

	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
1	DARIO QUENGUAN MONTALVO	PALETERO
2	BRAYAN VARGAS	PALETERO
3	OLIVO PINCHAO	MAESTRO
4	BARTOLO PINCHAO	MAESTRO

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

5	MILTON JAVIER GUERRERO	MAESTRO
6	ALVARO LEONEL SANTACRUZ	OFICIAL
7	OLIVEIRO ALVAREZ	OBRERO
8	EDUAR NORVEY NARVAES	OBRERO
9	JOSE DANIEL GOMEZ VERONA	CELADOR

*El contratista de obra presenta como anexo a los informes las **Afiliaciones y Planillas de seguridad social personal periodo de diciembre de 2024 - enero de 2025 del personal vinculado al proyecto.***

*Por otra parte, presentan como anexo el formato **de control de personal**, donde se especifica la asistencia de los trabajadores.*

5. CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

El cumplimiento del presente programa tiene como finalidad principal la promoción, prevención y control de la salud de los trabajadores, mediante la protección de los factores de riesgos ocupacionales; condiciones adecuadas donde los espacios de trabajo sean acordes con condiciones psicofisiológicas y en aptitud de producción de trabajo.

El contratista de obra, a través del área de SG-SST para el presente periodo avanza en la implementación de actividades mencionadas a continuación:

5.1. EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES

La interventoría verificó que el contratista por medio de IPS realizó exámenes médicos de ingreso al personal contratado en el periodo reportado, donde se tiene en cuenta el resultado emitido por los profesionales de la salud de la IPS en el momento de vincular el personal a la empresa en el contrato de obra.

A continuación, se relaciona los resultados de los exámenes médicos de ingreso del personal nuevo vinculado en el presente periodo.

Tabla 6. Relación de personal- Exámenes de ingreso

NOMBRES	APTITUD	OBSERVACIONES
EDILSON ALDAIR LUNA	Apto sin restricción	

El contratista de obra presenta en el informe de SST el siguiente anexo:

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

Anexo de Reporte exámenes médicos ocupacionales de ingreso.

5.2. INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y CHARLAS DIARIAS SST

- **INDUCCIÓN**

El proceso de inducción es muy importante para la empresa como para el trabajador, presenta ventajas como mejorar el rendimiento de los trabajadores, disminuye las dudas de los nuevos colaboradores, facilitan el aprendizaje de las funciones a desempeñar y el proceso de adaptación, reduce o evitar errores porque se proporciona toda la información necesaria al nuevo miembro del equipo, etc.

En el presente periodo la interventoría verificó la realización del proceso de inducción al personal nuevo vinculado al proyecto, mediante el área de SST se dio a conocer información general de la empresa, políticas, procedimientos de la organización a manera de familiarizar a los nuevos trabajadores con la empresa, medidas de seguridad de los cargos a ocupar, presentación de las áreas donde se trabajará, de esta manera se pretende dejar claro el rol de cada trabajador.

- **CAPACITACIÓN**

Las capacitaciones y charlas son de gran importancia para lograr que los trabajadores de la obra, de todos los niveles, adquieran los conocimientos, actitudes y prácticas necesarios para generar ambientes de trabajo sano, seguro y confortable.

- Para el presente periodo, la interventoría verificó que se realizaron charlas preoperacionales de seguridad y salud en el trabajo al personal de la obra antes de iniciar la jornada laboral, la duración de estas es aproximadamente 5 y 10 minutos. Todas las charlas fueron realizadas por la persona de SST.

- A continuación, se relaciona las charlas y capacitaciones brindadas por el área de SST.

Tabla No 7. Relación charlas preoperacionales durante el periodo de ejecución **corte 27 de enero-25.**

TEMAS	FECHAS
Manejo de materiales granulares	07/01/2025
Primeros auxilios	11/01/2025
Uso de elementos de protección personal	13/01/2025
Riesgos en los puestos de trabajo	17/01/2025
Manejo de sustancias químicas	20/01/2025

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

Trabajo seguro en frentes de obra	25/01/2025
Señalización del área de trabajo	27/01/2025

El contratista de obra presenta en el informe de SST los siguientes anexos:

Anexo de Registro de inducción y listado de asistencia a la inducción
Anexo de Registro de asistencia a charlas pre operacionales



Imagen No 1. Charlas pre operacionales personal en obra

5.3. PAUSAS ACTIVAS

Las pausas activas son sesiones de actividad física desarrolladas en el entorno laboral, con una duración mínima de 10 minutos, que incluye adaptación física cardiovascular, fortalecimiento muscular, mejoramiento de la flexibilidad, entre otros. Son de vital importancia ya que ayudan a controlar los niveles de estrés, evita la fatiga física y mental, previenen los espasmos musculares, combate la baja productividad, aumenta la motivación y el estado de ánimo.

La interventoría evidenció que continúa con la realización de pausas activas en la obra, dentro del horario laboral.

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo





Imagen No 2-3. Pausas activas al personal de la obra

5.4. USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Los elementos de protección personal (EPP) son equipos de seguridad, de uso individual, que tienen como finalidad proteger al trabajador de los peligros propios o derivados de la labor que se ejecuta. Su función no es eliminar el peligro, si no minimizar la exposición a éste en conjunto con la aplicación de controles.

La interventoría verificó que se realizó la entrega oportuna de los EPP a los trabajadores de la obra y el uso correcto en todas las actividades que se realizaron en obra.

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

5.5. REPOSICIÓN DE EPP

El uso de los EPP es de vital importancia en el desarrollo de las actividades, si se observa algún defecto o deterioro de los EPP, o que estos elementos sufran cualquier agresión de tipo impacto o aplastamiento, cristalización por calor que lo deteriore ocasionado por el uso normal, el trabajador debe informar al profesor de SST del área de trabajo, para que coordine su reposición.

Para soportar esta actividad el contratista de obra realiza el registro de la entrega de dotación y la reposición de EPP. En el presente periodo la interventoría verificó que se realizó la reposición de EPP.

El contratista de obra presenta en el informe de SG- SST el **anexo de Registro de Reposición de EPP.**

5.6. INSPECCIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO Y HERRAMIENTAS

El cumplimiento de la presente actividad está encaminado a velar por la seguridad de los trabajadores, al cuidado del medio ambiente. La herramienta menor utilizada en las actividades de obra se debe examinar para identificar en qué condiciones se encuentran verificando que estén en buen estado, libres de grasa o suciedad, sus partes movibles y ajustables deben estar bien aceitadas; los mangos deben tener un acabado liso, ser fáciles de agarrar y no tener puntas o bordes agudos, las herramientas deben estar firmemente armadas.

La interventoría verificó que, durante el periodo reportado, el contratista realizó inspecciones a la maquinaria y equipos para evitar accidentes de trabajo, derrames de aceites, lubricantes, combustibles.

El contratista de obra presenta en el informe de SG- SST el siguiente anexo:

Anexo de Registro inspecciones preoperacionales maquinaria y equipos

5.7. PLAN DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA.

El contratista cuenta con el Plan de emergencias y contingencias y el MEDEVAC. En el Plan de Evacuación de Emergencias Médicas – **MEDEVAC** se debe establecer la secuencia de comunicaciones y procedimientos en caso de un accidente o emergencia médica que se pueda presentar en la zona de influencia directa del proyecto. Así mismo asignar y describir las funciones del personal clave durante la operación, quienes deben evaluar, clasificar las lesiones y determinar el nivel de respuesta oportuna al evento.

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

La interventoría verificó que se tiene conformada la brigada de emergencias y se implementó la cadena de llamadas obra Puertas del sol, donde se asignaron roles y se tomaron los números de las líneas de emergencia iniciando con los contactos del grupo del coordinador de emergencias de la obra y las líneas telefónicas de bomberos, policía, Gaula, ambulancia, positiva, etc.

Por otra parte, la interventoría evidenció la implementación en la obra de elementos de primeros auxilios como camilla, botiquín dotado, extintor, kit de silbato, linterna en el campamento de la obra. Asimismo, en el anterior período se realizó una reunión del COPASST, el cual tiene como función promover, vigilar el cumplimiento de las normas y reglamentos de la Seguridad y Salud en el Trabajo.





Imagen No 4- 5. Instalación de elementos de primeros auxilios, Camilla, Extintor, Botiquín.

5.8. PUNTO DE HIDRATACIÓN

La interventoría verificó que en la obra se tienen implementado puntos de hidratación en el campamento mediante termos con agua potable, suministrada por la empresa Agua Cristalina.





Imagen No 6-7. Puntos de hidratación- Termos con agua potable

5.9. PAGOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y AFILIACIONES

Es de vital importancia cumplir con afiliaciones y los respectivos pagos de seguridad social, para proteger a los trabajadores y a sus familias en situaciones que puedan afectar su vida, como pueden ser enfermedades, discapacidad, desempleo, vejez, maternidad o distintos eventos.

La interventoría verificó que el contratista de obra presentó los soportes de Pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos trabajadores vinculados al proyecto desde el 28 de diciembre al 31 de diciembre del 2024 y desde el 07 de enero al 28 de enero del 2025.

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

El contratista de obra presenta en el informe de SG- SST el anexo de **Planillas de pago de Seguridad Social periodo diciembre- enero 2025. _ Personal proyecto alcantarillado-CODISUM.**

Para el presente periodo se presenta el **Anexo No 1 de interventoría, correspondiente a las planillas de pago de Seguridad Social_ Personal Interventoría SERVICON CS SAS, para el periodo del 28 de diciembre del 2024 al 27 enero de 2025.**

5.10. ORDEN Y ASEO EN LA OBRA

Los lugares de trabajo deben permanecer limpios y ordenados durante todo el día, esto con el fin de optimizar el uso del espacio, mejorar la eficiencia del trabajo, evitar problemas sanitarios y en general, por conservar un entorno más seguro para toda la población vinculada directa o indirectamente a la obra para la construcción del alcantarillado.

La interventoría verificó que se continúa con la implementación de puntos ecológicos, para el manejo de los residuos generados en obra, realizando una buena disposición de estos. Se recomienda realizar jornadas de aseo de la obra para evitar accidentes de trabajo, generar un ambiente limpio y ordenado

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

6. CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta las actividades ejecutadas por el contratista durante el periodo comprendido entre el 28 de diciembre del 2024 al 27 enero de 2025 la interventoría verificó la implementación de las actividades de SST, tales como:

- Realización de exámenes médicos ocupacionales e inducción del personal vinculado al proyecto.

- Realización de Charlas preoperacionales diarias y capacitaciones en materia de SST y realización de pausas activas durante las jornadas de trabajo.

- Cumplimiento de inspecciones preoperacionales a la maquinaria, herramientas manuales, de acuerdo con el cronograma establecido para el periodo ejecutado.

- Uso adecuado de los EPP, durante las diferentes actividades realizadas en obra, reposición de EPP.

- Instalación de puntos de hidratación en frente de trabajo, mediante el suministro de agua potable embotellada.

- Continuidad en la implementación de elementos de emergencia en el campamento de obra.

- Pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, con los aportes parafiscales, contratista de obra e interventoría, periodo diciembre- enero 2025.

- Para el presente periodo no se presentaron accidentes de trabajo.

Presentó,

ELIANA ANDREA CEBALLOS AREVALO
REPRESENTANTE LEGAL
SERVICON CS SAS
INTERVENTORÍA

Celular: 3178545839 E-mail: serviconcssas@gmail.com
Orito Putumayo

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900949050	7	SERVICON CS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SERVICON CS SAS	barrio vergel	ORITO-PUTUMAYO	4291111	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1074679000	9477905494	E	2024/11/15	2024/11/25	BANCOLOMBIA	10	$3,909,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SERVICON CS SAS (12 Afiliados)																							$13,523,334	$2,163,800			$13,523,334	$541,000			$13,393,334	$535,800			$13,523,334		$640,800		$0	$0		$3,881,400
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (2 Afiliados)																							$390,000	$62,400			$390,000	$15,600			$390,000	$15,600			$390,000		$27,200		$0	$0		$120,800
Ciudad: ORITO Depto: PUTUMAYO (2 Afiliados)																							$390,000	$62,400			$390,000	$15,600			$390,000	$15,600			$390,000		$27,200		$0	$0		$120,800
1	CC	93476909	SANJUANES BENJAMIN	X																	25-14	3	$260,000	$41,600	EPS002	3	$260,000	$10,400	CCF63	3	$260,000	$10,400	14-11	3	$260,000	6.960%	$18,100	3	$0	$0	Si	$80,500
2	CC	18111714	TORIJANO GERMAN	X																	230301	3	$130,000	$20,800	EPS037	3	$130,000	$5,200	CCF63	3	$130,000	$5,200	14-11	3	$130,000	6.960%	$9,100	3	$0	$0	Si	$40,300
Centro de Trabajo: RIESGO UNO (4 Afiliados)																							$4,673,334	$747,800			$4,673,334	$187,000			$4,673,334	$187,000			$4,673,334		$24,500		$0	$0		$1,146,300
Ciudad: ORITO Depto: PUTUMAYO (4 Afiliados)																							$4,673,334	$747,800			$4,673,334	$187,000			$4,673,334	$187,000			$4,673,334		$24,500		$0	$0		$1,146,300
3	CC	1123333549	CEBALLOS ELIANA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC18	30	$1,300,000	$52,000	CCF63	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
4	CC	1061751834	ESPAÑA KELLY		X																230301	1	$43,334	$7,000	EPS037	1	$43,334	$1,800	CCF63	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	0.522%	$300	1	$0	$0	Si	$10,900
5	CC	1110456797	GRIJALBA GUSTAVO	X								X									25-14	3	$2,030,000	$324,800	EPS005	3	$2,030,000	$81,200	CCF63	3	$2,030,000	$81,200	14-11	3	$2,030,000	0.522%	$10,600	3	$0	$0	Si	$497,800
6	CC	18127314	PIEDRAHITA JOSE																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF63	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
Centro de Trabajo: SERVICONCSSAS (6 Afiliados)																							$8,460,000	$1,353,600			$8,460,000	$338,400			$8,330,000	$333,200			$8,460,000		$589,100		$0	$0		$2,614,300
Ciudad: ORITO Depto: PUTUMAYO (6 Afiliados)																							$8,460,000	$1,353,600			$8,460,000	$338,400			$8,330,000	$333,200			$8,460,000		$589,100		$0	$0		$2,614,300
7	CC	1124865008	ARTEAGA JULIANA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF63	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
8	CC	1123334302	DIAZ MAYRA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC18	30	$1,300,000	$52,000	CCF63	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
9	CC	14298136	GUZMAN CAMILO																		230301	30	$3,200,000	$512,000	EPS037	30	$3,200,000	$128,000	CCF63	30	$3,200,000	$128,000	14-11	30	$3,200,000	6.960%	$222,800	30	$0	$0	Si	$990,800
10	CC	1123322789	ORDOÑEZ YILBER	X																	25-14	3	$130,000	$20,800	EPS037	3	$130,000	$5,200	CCF63	3	$130,000	$5,200	14-11	3	$130,000	6.960%	$9,100	3	$0	$0	Si	$40,300
11	CC	1083916566	VARGAS FREIDER																		230301	30	$2,400,000	$384,000	EPS005	30	$2,400,000	$96,000	CCF63	30	$2,400,000	$96,000	14-11	30	$2,400,000	6.960%	$167,100	30	$0	$0	Si	$743,100
12	CC	66681750	ZUÑIGA ELIANA	X								X									230301	3	$130,000	$20,800	EPS005	3	$130,000	$5,200	CCF63	3	$0	$0	14-11	3	$130,000	6.960%	$9,100	3	$0	$0	Si	$35,100
Total			**Afiliados(12)**																				$13,523,334	$2,163,800			$13,523,334	$541,000			$13,393,334	$535,800			$13,523,334		$640,800		$0	$0		$3,881,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900949050	7	SERVICON CS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SERVICON CS SAS	barrio vergel	ORITO-PUTUMAYO	4291111	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1074679000	9477905494	E	2024/11/15	2024/11/25	BANCOLOMBIA	10	$3,909,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				12	$2,163,800	$15,400	$0	$2,179,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$387,200	$2,800	$0	$390,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$1,776,600	$12,600	$0	$1,789,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$640,800	$4,600	$0	$645,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	12	$640,800	$4,600	$0	$645,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$535,800	$3,800	$0	$539,600
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	12	$535,800	$3,800	$0	$539,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				12	$541,000	$4,000	$0	$545,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	$104,000	$800	$0	$104,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$244,200	$1,800	$0	$246,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$10,400	$100	$0	$10,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$182,400	$1,300	$0	$183,700
TOTAL				12	$3,881,400	$27,800	$0	$3,909,200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900949050	7	SERVICON CS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SERVICON CS SAS	barrio vergel	ORITO-PUTUMAYO	4291111	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1105643363	9478594979	E	2024/12/12	2024/12/06	BANCOLOMBIA	0	$5,755,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SERVICON CS SAS (11 Afiliados)																						$19,400,000	$3,104,000			$19,400,000	$776,000			$19,400,000	$776,000			$19,400,000		$1,099,500		$0	$0		$5,755,500
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (2 Afiliados)																						$3,900,000	$624,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000		$271,500		$0	$0		$1,207,500
Ciudad: ORITO Depto: PUTUMAYO (2 Afiliados)																						$3,900,000	$624,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000		$271,500		$0	$0		$1,207,500
1	CC	93476909	SANJUANES BENJAMIN																		25-14	30	$2,600,000	$416,000	EPS002	30	$2,600,000	$104,000	CCF63	30	$2,600,000	$104,000	14-11	30	$2,600,000	6.960%	$181,000	30	$0	$0	Si	$805,000
2	CC	18111714	TORIJANO GERMAN																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF63	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
Centro de Trabajo: RIESGO UNO (3 Afiliados)																						$3,900,000	$624,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000		$20,400		$0	$0		$956,400
Ciudad: ORITO Depto: PUTUMAYO (3 Afiliados)																						$3,900,000	$624,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000		$20,400		$0	$0		$956,400
3	CC	1123333549	CEBALLOS ELIANA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC18	30	$1,300,000	$52,000	CCF63	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
4	CC	1110456797	GRIJALBA GUSTAVO																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF63	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
5	CC	18127314	PIEDRAHITA JOSE																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF63	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
Centro de Trabajo: SERVICONCSSAS (6 Afiliados)																						$11,600,000	$1,856,000			$11,600,000	$464,000			$11,600,000	$464,000			$11,600,000		$807,600		$0	$0		$3,591,600
Ciudad: ORITO Depto: PUTUMAYO (6 Afiliados)																						$11,600,000	$1,856,000			$11,600,000	$464,000			$11,600,000	$464,000			$11,600,000		$807,600		$0	$0		$3,591,600
6	CC	1124865008	ARTEAGA JULIANA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF63	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
7	CC	1123334302	DIAZ MAYRA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC18	30	$1,300,000	$52,000	CCF63	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
8	CC	14298136	GUZMAN CAMILO																		230301	30	$3,200,000	$512,000	EPS037	30	$3,200,000	$128,000	CCF63	30	$3,200,000	$128,000	14-11	30	$3,200,000	6.960%	$222,800	30	$0	$0	Si	$990,800
9	CC	1123322789	ORDOÑEZ YILBER																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF63	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
10	CC	1083916566	VARGAS FREIDER																		230301	30	$2,400,000	$384,000	EPS005	30	$2,400,000	$96,000	CCF63	30	$2,400,000	$96,000	14-11	30	$2,400,000	6.960%	$167,100	30	$0	$0	Si	$743,100
11	CC	66681750	ZUÑIGA ELIANA																		230301	30	$2,100,000	$336,000	EPS005	30	$2,100,000	$84,000	CCF63	30	$2,100,000	$84,000	14-11	30	$2,100,000	6.960%	$146,200	30	$0	$0	Si	$650,200
Total			**Afiliados(11)**																				$19,400,000	$3,104,000			$19,400,000	$776,000			$19,400,000	$776,000			$19,400,000		$1,099,500		$0	$0		$5,755,500

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900949050	7	SERVICON CS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SERVICON CS SAS	barrio vergel	ORITO-PUTUMAYO	4291111	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1105643363	9478594979	E	2024/12/12	2024/12/06	BANCOLOMBIA	0	$5,755,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				11	$3,104,000	$0	$0	$3,104,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$832,000	$0	$0	$832,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$2,272,000	$0	$0	$2,272,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$1,099,500	$0	$0	$1,099,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	11	$1,099,500	$0	$0	$1,099,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$776,000	$0	$0	$776,000
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	11	$776,000	$0	$0	$776,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				11	$776,000	$0	$0	$776,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	$104,000	$0	$0	$104,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$336,000	$0	$0	$336,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$104,000	$0	$0	$104,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$232,000	$0	$0	$232,000
TOTAL				**11**	**$5,755,500**	**$0**	**$0**	**$5,755,500**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900949050	7	SERVICON CS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SERVICON CS SAS	barrio vergel	ORITO-PUTUMAYO	4291111	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1180285991	9480048647	E	2025/01/15	2025/01/08	BANCOLOMBIA	0	$5,413,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SERVICON CS SAS (9 Afiliados)																							$18,022,791	$2,883,700			$18,022,791	$721,000			$18,022,791	$721,000			$18,022,791		$1,087,300		$0	$0		$5,413,000
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (5 Afiliados)																							$12,022,791	$1,923,700			$12,022,791	$481,000			$12,022,791	$481,000			$12,022,791		$837,000		$0	$0		$3,722,700
Ciudad: ORITO Depto: PUTUMAYO (5 Afiliados)																							$12,022,791	$1,923,700			$12,022,791	$481,000			$12,022,791	$481,000			$12,022,791		$837,000		$0	$0		$3,722,700
1	CC	1018459239	ARTEAGA JEFFERSON																		25-14	30	$3,471,591	$555,500	EPS037	30	$3,471,591	$138,900	CCF63	30	$3,471,591	$138,900	14-11	30	$3,471,591	6.960%	$241,700	30	$0	$0	Si	$1,075,000
2	CC	87490216	GALVEZ HOLGUER																		25-14	30	$2,101,200	$336,200	EPS037	30	$2,101,200	$84,100	CCF63	30	$2,101,200	$84,100	14-11	30	$2,101,200	6.960%	$146,300	30	$0	$0	Si	$650,700
3	CC	93476909	SANJUANES BENJAMIN																		25-14	30	$2,600,000	$416,000	EPS002	30	$2,600,000	$104,000	CCF63	30	$2,600,000	$104,000	14-11	30	$2,600,000	6.960%	$181,000	30	$0	$0	Si	$805,000
4	CC	18111714	TORIJANO GERMAN																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF63	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
5	CC	1123328192	VILLOTA CARLOS																		230301	30	$2,550,000	$408,000	EPS037	30	$2,550,000	$102,000	CCF63	30	$2,550,000	$102,000	14-11	30	$2,550,000	6.960%	$177,500	30	$0	$0	Si	$789,500
Centro de Trabajo: RIESGO UNO (2 Afiliados)																							$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000		$13,600		$0	$0		$637,600
Ciudad: ORITO Depto: PUTUMAYO (2 Afiliados)																							$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000		$13,600		$0	$0		$637,600
6	CC	1123333549	CEBALLOS ELIANA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC18	30	$1,300,000	$52,000	CCF63	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
7	CC	1110456797	GRIJALBA GUSTAVO																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF63	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
Centro de Trabajo: SERVICONCSSAS (2 Afiliados)																							$3,400,000	$544,000			$3,400,000	$136,000			$3,400,000	$136,000			$3,400,000		$236,700		$0	$0		$1,052,700
Ciudad: ORITO Depto: PUTUMAYO (2 Afiliados)																							$3,400,000	$544,000			$3,400,000	$136,000			$3,400,000	$136,000			$3,400,000		$236,700		$0	$0		$1,052,700
8	CC	1123322789	ORDOÑEZ YILBER																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF63	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
9	CC	66681750	ZUÑIGA ELIANA																		230301	30	$2,100,000	$336,000	EPS005	30	$2,100,000	$84,000	CCF63	30	$2,100,000	$84,000	14-11	30	$2,100,000	6.960%	$146,200	30	$0	$0	Si	$650,200
Total			**Afiliados(9)**																				$18,022,791	$2,883,700			$18,022,791	$721,000			$18,022,791	$721,000			$18,022,791		$1,087,300		$0	$0		$5,413,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900949050	7	SERVICON CS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SERVICON CS SAS	barrio vergel	ORITO-PUTUMAYO	4291111	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1180285991	9480048647	E	2025/01/15	2025/01/08	BANCOLOMBIA	0	$5,413,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				9	$2,883,700	$0	$0	$2,883,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,723,700	$0	$0	$1,723,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,160,000	$0	$0	$1,160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$1,087,300	$0	$0	$1,087,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	$1,087,300	$0	$0	$1,087,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$721,000	$0	$0	$721,000
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	9	$721,000	$0	$0	$721,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				9	$721,000	$0	$0	$721,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$52,000	$0	$0	$52,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$429,000	$0	$0	$429,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$104,000	$0	$0	$104,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$136,000	$0	$0	$136,000
TOTAL				9	$5,413,000	$0	$0	$5,413,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900949050	7	SERVICON CS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SERVICON CS SAS	barrio vergel	ORITO-PUTUMAYO	4291111	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1225041580	9480760213	N	2025/01/15	2025/01/28	BANCOLOMBIA	13	$470,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SERVICON CS SAS (1 Afiliados)																						$1,900,000	$304,000			$1,900,000	$76,000			$1,900,000	$76,000			$1,900,000		$10,000		$0	$0		$466,000
Centro de Trabajo: RIESGO UNO (1 Afiliados)																						$1,900,000	$304,000			$1,900,000	$76,000			$1,900,000	$76,000			$1,900,000		$10,000		$0	$0		$466,000
Ciudad: ORITO Depto: PUTUMAYO (1 Afiliados)																						$1,900,000	$304,000			$1,900,000	$76,000			$1,900,000	$76,000			$1,900,000		$10,000		$0	$0		$466,000
1	CC	1110456797 GRIJALBA GUSTAVO										A				▫				25-14	30	($1,300,000)	($208,000)	EPS005	30	($1,300,000)	($52,000)	CCF63	30	($1,300,000)	($52,000)	14-11	30	($1,300,000)	0.522%	($6,800)	30	$0	$0	Si	($318,800)
2	CC	1110456797 GRIJALBA GUSTAVO										C								25-14	30	$3,200,000	$512,000	EPS005	30	$3,200,000	$128,000	CCF63	30	$3,200,000	$128,000	14-11	30	$3,200,000	0.522%	$16,800	30	$0	$0	Si	$784,800
Total	**Afiliados(1)**																					$1,900,000	$304,000			$1,900,000	$76,000			$1,900,000	$76,000			$1,900,000		$10,000		$0	$0		$466,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900949050	7	SERVICON CS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SERVICON CS SAS	barrio vergel	ORITO-PUTUMAYO	4291111	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1225041580	9480760213	N	2025/01/15	2025/01/28	BANCOLOMBIA	13	$470,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$304,000	$2,500	$0	$306,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$304,000	$2,500	$0	$306,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,000	$100	$0	$10,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$10,000	$100	$0	$10,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$76,000	$700	$0	$76,700
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	1	$76,000	$700	$0	$76,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$76,000	$700	$0	$76,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$76,000	$700	$0	$76,700
TOTAL				**1**	**$466,000**	**$4,000**	**$0**	**$470,000**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900949050	7	SERVICON CS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SERVICON CS SAS	barrio vergel	ORITO-PUTUMAYO	4291111	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1275295487	9481776844	E	2025/02/13	2025/02/18	BANCOLOMBIA	5	$11,329,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SERVICON CS SAS (16 Afiliados)																							**$38,587,291**	**$6,174,300**			**$38,587,291**	**$1,544,000**			**$38,216,791**	**$1,529,000**			**$38,587,291**		**$2,044,500**		**$0**	**$0**		**$11,291,800**
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (5 Afiliados)																							**$12,146,291**	**$1,943,500**			**$12,146,291**	**$486,000**			**$12,146,291**	**$486,000**			**$12,146,291**		**$845,600**		**$0**	**$0**		**$3,761,100**
Ciudad: ORITO Depto: PUTUMAYO (5 Afiliados)																							**$12,146,291**	**$1,943,500**			**$12,146,291**	**$486,000**			**$12,146,291**	**$486,000**			**$12,146,291**		**$845,600**		**$0**	**$0**		**$3,761,100**
1	CC	1018459239	ARTEAGA JEFFERSON																		25-14	30	$3,471,591	$555,500	EPS037	30	$3,471,591	$138,900	CCF63	30	$3,471,591	$138,900	14-11	30	$3,471,591	6.960%	$241,700	30	$0	$0	Si	$1,075,000
2	CC	87490216	GALVEZ HOLGUER																		25-14	30	$2,101,200	$336,200	EPS037	30	$2,101,200	$84,100	CCF63	30	$2,101,200	$84,100	14-11	30	$2,101,200	6.960%	$146,300	30	$0	$0	Si	$650,700
3	CC	93476909	SANJUANES BENJAMIN																		25-14	30	$2,600,000	$416,000	EPS002	30	$2,600,000	$104,000	CCF63	30	$2,600,000	$104,000	14-11	30	$2,600,000	6.960%	$181,000	30	$0	$0	Si	$805,000
4	CC	18111714	TORIJANO GERMAN							X											23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF63	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
5	CC	1123328192	VILLOTA CARLOS																		23030 1	30	$2,550,000	$408,000	EPS037	30	$2,550,000	$102,000	CCF63	30	$2,550,000	$102,000	14-11	30	$2,550,000	6.960%	$177,500	30	$0	$0	Si	$789,500
Centro de Trabajo: RIESGO UNO (4 Afiliados)																							**$9,970,500**	**$1,595,400**			**$9,970,500**	**$399,000**			**$9,847,000**	**$394,000**			**$9,970,500**		**$52,300**		**$0**	**$0**		**$2,440,700**
Ciudad: ORITO Depto: PUTUMAYO (4 Afiliados)																							**$9,970,500**	**$1,595,400**			**$9,970,500**	**$399,000**			**$9,847,000**	**$394,000**			**$9,970,500**		**$52,300**		**$0**	**$0**		**$2,440,700**
6	CC	1123333549	CEBALLOS ELIANA							X											23030 1	30	$1,423,500	$227,800	ESSC18	30	$1,423,500	$57,000	CCF63	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
7	CC	1110456797	GRIJALBA GUSTAVO							X											25-14	30	$3,323,500	$531,800	EPS005	30	$3,323,500	$133,000	CCF63	30	$3,323,500	$133,000	14-11	30	$3,323,500	0.522%	$17,400	30	$0	$0	Si	$815,200
8	CC	18127314	PIEDRAHITA JOSE																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF63	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$344,300
9	CC	97472356	QUIROZ WUILLIAMS																		23030 1	30	$3,800,000	$608,000	EPS037	30	$3,800,000	$152,000	CCF63	30	$3,800,000	$152,000	14-11	30	$3,800,000	0.522%	$19,900	30	$0	$0	Si	$931,900
Centro de Trabajo: SERVICONCSSAS (7 Afiliados)																							**$16,470,500**	**$2,635,400**			**$16,470,500**	**$659,000**			**$16,223,500**	**$649,000**			**$16,470,500**		**$1,146,600**		**$0**	**$0**		**$5,090,000**
Ciudad: ORITO Depto: PUTUMAYO (7 Afiliados)																							**$16,470,500**	**$2,635,400**			**$16,470,500**	**$659,000**			**$16,223,500**	**$649,000**			**$16,470,500**		**$1,146,600**		**$0**	**$0**		**$5,090,000**
10	CC	1124865008	ARTEAGA JULIANA																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF63	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$435,900
11	CC	1123334302	DIAZ MAYRA																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	ESSC18	30	$1,423,500	$57,000	CCF63	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$435,900
12	CC	14298136	GUZMAN CAMILO																		23030 1	30	$3,200,000	$512,000	EPS037	30	$3,200,000	$128,000	CCF63	30	$3,200,000	$128,000	14-11	30	$3,200,000	6.960%	$222,800	30	$0	$0	Si	$990,800
13	CC	1123322789	ORDOÑEZ YILBER							X											25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF63	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
14	CC	12996429	RUEDA JAVIER																		23020 1	30	$4,500,000	$720,000	EPS037	30	$4,500,000	$180,000	CCF63	30	$4,500,000	$180,000	14-11	30	$4,500,000	6.960%	$313,200	30	$0	$0	Si	$1,393,200
15	CC	1083916566	VARGAS FREIDER																		23030 1	30	$2,400,000	$384,000	EPS005	30	$2,400,000	$96,000	CCF63	30	$2,400,000	$96,000	14-11	30	$2,400,000	6.960%	$167,100	30	$0	$0	Si	$743,100
16	CC	66681750	ZUÑIGA ELIANA																		23030 1	30	$2,100,000	$336,000	EPS005	30	$2,100,000	$84,000	CCF63	30	$2,100,000	$84,000	14-11	30	$2,100,000	6.960%	$146,200	30	$0	$0	Si	$650,200
Total			**Afiliados(16)**																				$38,587,291	$6,174,300			$38,587,291	$1,544,000			$38,216,791	$1,529,000			$38,587,291		$2,044,500		$0	$0		$11,291,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900949050	7	SERVICON CS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SERVICON CS SAS	barrio vergel	ORITO-PUTUMAYO	4291111	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1275295487	9481776844	E	2025/02/13	2025/02/18	BANCOLOMBIA	5	$11,329,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				16	$6,174,300	$20,600	$0	$6,194,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$2,067,300	$6,900	$0	$2,074,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$3,387,000	$11,300	$0	$3,398,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$720,000	$2,400	$0	$722,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$2,044,500	$6,800	$0	$2,051,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	16	$2,044,500	$6,800	$0	$2,051,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$1,529,000	$5,100	$0	$1,534,100
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	16	$1,529,000	$5,100	$0	$1,534,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				16	$1,544,000	$5,300	$0	$1,549,300
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	$114,000	$400	$0	$114,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	10	$1,013,000	$3,400	$0	$1,016,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$104,000	$400	$0	$104,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$313,000	$1,100	$0	$314,100
TOTAL				16	$11,291,800	$37,800	$0	$11,329,600
