	CUADRO CONTROL DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE CONTRATISTA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Código: F-GDI-5000-238,37-097 Versión: 0.0 Fecha aprobación: Septiembre-19-2019 Página 1 de 1

CONTRATISTA: CONSORCIO LA FLORA 2023
NIT: 901.706.924 – 1
CONTRATO DE OBRA N° 069 DEL 14 DE ABRIL DEL 2023
OBJETO: CONSTRUCCION CANALIZACION DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION (Nomina, CPS, Otro)	SALARIO ($)	% DEDICACION	FECHA DE INGRESO	DIAS LABORADOS	MES FACTURADO	IBC(SEGÚN CONTRATO)	NUMERO DE PLANILLA	IBC (PAGADO)	SALUD	PENSION	ARL	CCF	TOTAL
APARICIO SANCHEZ JHON ANDREY	1098780561	TOPÓGRAFO	NOMINA	$ 2.365.000	100%	19/07/2023	30	MAYO	$ 2.365.000	9487673111	$ 2.365.000	$ 94.600	$ 378.400	$ 164.700	$ 94.600	$ 732.300
BUITRAGO RÍOS JAIRO JAVIER	9735010	DIRECTOR DE OBRA	NOMINA	$ 7.000.000	100%	22/08/2024	30	MAYO	$ 7.000.000	9487673111	$ 7.000.000	$ 280.000	$ 1.190.000	$ 487.200	$ 280.000	$ 2.237.200
GOMEZ BARRAGAN DANIEL ALBERTO	1095826837	INGENIERO CIVIL	NOMINA	$ 3.547.000	100%	26/04/2023	30	MAYO	$ 3.547.000	9487673111	$ 3.547.000	$ 141.900	$ 567.600	$ 246.900	$ 141.900	$ 1.098.300
GONZALEZ LOPEZ SOAD ELENA	1123992828	TRABAJADORA SOCIAL	NOMINA	$ 2.956.000	100%	9/05/2023	11	MAYO	$ 2.956.000	9487673111	$ 1.083.867	$ 43.400	$ 173.500	$ 75.500	$ 156.100	$ 448.500
CRISTANCHO PIÑA JENNIFER ZARELY	1098781099	TRABAJADORA SOCIAL	NOMINA	$ 3.000.000	100%	12/05/2025	19	MAYO	$ 2.956.000	9487673111	$ 1.900.000	$ 76.000	$ 304.000	$ 132.300	$ 76.000	$ 588.300
NAVARRO MURCIA EDUARD JAIVIER	1098602734	TOPOGRAFO	NOMINA	$ 2.720.000	100%	26/04/2023	30	MAYO	$ 2.720.000	9487673111	$ 2.720.000	$ 108.800	$ 435.200	$ 189.400	$ 108.800	$ 842.200
PALOMINO GUEVARA KAREN EUGENIA	26863946	HSEQ	NOMINA	$ 3.547.000	100%	9/05/2023	30	MAYO	$ 3.547.000	9487673111	$ 3.547.000	$ 141.900	$ 567.600	$ 246.900	$ 141.900	$ 1.098.300
QUINTERO HERNÁNDEZ DIEGO ANDRÉS	13742977	INGENIERO RESIDENTE	NOMINA	$ 4.139.000	100%	26/05/2023	30	MAYO	$ 4.139.000	9487673111	$ 4.001.034	$ 160.200	$ 640.300	$ 259.300	$ 149.100	$ 1.208.900
FABIAN ANDRÉS TAVERA GÓMEZ	1095937018	INGENIERO AMBIENTAL	NOMINA	$ 3.000.000	100%	4/04/2024	30	MAYO	$ 3.000.000	9487673111	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 480.000	$ 208.800	$ 120.000	$ 928.800
VALENCIA PINZON EDWIN FERNANDO	91494944	ESP.GEOTECNICO	CPS	$ 2.150.000	50%	1/05/2023	30	MAYO	$ 1.423.500	34370516	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 227.800	$ 99.100	$ 0	$ 504.900
SILVA CAMACHO LAURA TATIANA	1096956702	INGENIERA FORESTAL	CPS	$ 1.423.500	25%	1/05/2023	30	MAYO	$ 1.423.500	33505095	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 227.800	$ 7.500	$ 0	$ 413.300
BERMUDEZ FLOREZ WILIAM FERNANDO	91530295	ESP. HIDRAÚLICO	CPS	$ 2.150.000	50%	1/05/2023	30	MAYO	$ 1.423.500	9486309068	$ 3.000.000	$ 375.000	$ 480.000	$ 73.100	$ 0	$ 928.100
GAITAN PRADA CARLOS ALFONSO	1098672661	ESP. ESTRUCTURAL	CPS	$ 2.150.000	50%	1/05/2023	30	MAYO	$ 1.423.500	9486663850	$ 2.800.000	$ 350.000	$ 448.000	$ 14.700	$ 0	$ 812.700
											$ 37.810.901	$ 2.247.800	$ 6.120.200	$ 2.205.400	$ 1.268.400	

IBC: Ingreso base de cotizacion

GONZALO CARDENAS OREJARENA
CONSORCIO LA FLORA 2023
REP. LEGAL

ALFONSO VEGA ACUÑO
CONSORCIO INTERVENTORIA CANALIZACION BGA
REP. LEGAL

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901702490	7	CONSORCIO LA FLORA 2023	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	AV 4 N 6 N 67 OF 602	BUCARAMANGA-SANTANDER	6381213	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1574645184	9487673111	E	2025/06/24	2025/06/24	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$21,762,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (31 Afiliados)																						$64,055,807	$10,320,400			$64,055,807	$2,306,630			$65,175,811	$2,561,900			$64,055,807		$4,229,400		$0	$0		$19,418,300

Planilla Resumen

Centro de Trabajo: Principal (31 Afiliados)																							$64,055,807	$10,320,400			$64,055,807	$2,506,600			$65,175,817	$2,561,900			$64,055,807		$4,229,400		$0	$0		$19,618,300
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (31 Afiliados)																							$64,055,807	$10,320,400			$64,055,807	$2,506,600			$65,175,817	$2,561,900			$64,055,807		$4,229,400		$0	$0		$19,618,300
1	CC	1095916963	ALMEYDA IVAN									X									230301	30	$2,244,590	$359,200	EPS005	30	$2,244,590	$89,800	CCF40	30	$2,244,590	$89,800	14-7	30	$2,244,590	6.960%	$156,300	30	$0	$0	SI	$695,100
2	CC	1098780561	APARICIO JHON																		230201	30	$2,365,000	$378,400	EPS010	30	$2,365,000	$94,600	CCF40	30	$2,365,000	$94,600	14-7	30	$2,365,000	6.960%	$164,700	30	$0	$0	SI	$732,300
3	CC	19789132	ARRIETA HUGO																		230201	30	$1,424,000	$227,900	EPS010	30	$1,424,000	$57,000	CCF40	30	$1,424,000	$57,000	14-7	30	$1,424,000	6.960%	$99,200	30	$0	$0	SI	$441,100
4	CC	91298725	BARAJAS ALVARO									X									25-14	30	$2,215,132	$354,500	EPS002	30	$2,215,132	$88,700	CCF40	30	$2,215,132	$88,700	14-7	30	$2,215,132	6.960%	$154,200	30	$0	$0	SI	$686,100
5	CC	9735010	BUITRAGO JAIRO																		231001	30	$7,000,000	$1,190,000	EPS005	30	$7,000,000	$280,000	CCF40	30	$7,000,000	$280,000	14-7	30	$7,000,000	6.960%	$487,200	30	$0	$0	SI	$2,237,200
6	CC	5010380	CARVAJAL JAVIER									X									230201	30	$1,513,003	$242,100	EPS037	30	$1,513,003	$60,600	CCF40	30	$1,513,003	$60,600	14-7	30	$1,513,003	6.960%	$105,400	30	$0	$0	SI	$468,700
7	CC	1098820465	CASTILLO PAOLA												X						230301	30	$1,424,000	$227,900	EPS017	30	$1,424,000	$57,000	CCF40	0	$0	$0	14-7	30	$1,424,000	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$284,900
8	CC	1098726884	CEPEDA JEFERSON										X								230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS042	30	$1,423,500	$0	CCF40	30	$1,160,000	$0	14-7	30	$1,423,500	0.000%	$0	30	$0	$0	SI	$227,800
9	CC	1098781099	CRISTANCHO JENIFFER	X																	230201	19	$1,900,000	$304,000	EPS037	19	$1,900,000	$76,000	CCF40	19	$1,900,000	$76,000	14-7	19	$1,900,000	6.960%	$132,300	19	$0	$0	SI	$588,300
10	CC	1104126726	DUARTE JUAN																		230201	28	$1,773,334	$283,800	EPS037	28	$1,773,334	$71,000	CCF40	28	$1,773,334	$71,000	14-7	28	$1,773,334	6.960%	$123,500	28	$0	$0	SI	$549,300
11	CC	1104126726	DUARTE JUAN											X							230201	2	$94,900	$15,200	EPS037	2	$94,900	$3,800	CCF40	0	$0	$0	14-7	2	$94,900	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$19,000
12	CC	1095826837	GOMEZ DANIEL																		25-14	30	$3,547,000	$567,600	EPS005	30	$3,547,000	$141,900	CCF40	30	$3,547,000	$141,900	14-7	30	$3,547,000	6.960%	$246,900	30	$0	$0	SI	$1,098,300
13	CC	1123992828	GONZALEZ SOAD		X															X	230301	11	$1,083,867	$173,500	EPS037	11	$1,083,867	$43,400	CCF40	11	$3,900,278	$156,100	14-7	11	$1,083,867	6.960%	$75,500	11	$0	$0	SI	$448,500
14	CC	7600898	GUERRA JORGE									X									230301	30	$1,485,916	$237,800	EPS002	30	$1,485,916	$59,500	CCF40	30	$1,485,916	$59,500	14-7	30	$1,485,916	6.960%	$103,500	30	$0	$0	SI	$460,300
15	CC	1095834868	LANDAZABAL IVAN									X									230301	30	$1,458,827	$233,500	EPS005	30	$1,458,827	$58,400	CCF40	30	$1,458,827	$58,400	14-7	30	$1,458,827	6.960%	$101,600	30	$0	$0	SI	$451,900
16	CC	1003334373	MACHUCA LUIS																		230301	30	$1,424,000	$227,900	EPS002	30	$1,424,000	$57,000	CCF40	30	$1,424,000	$57,000	14-7	30	$1,424,000	6.960%	$99,200	30	$0	$0	SI	$441,100
17	CC	19768481	MARTINEZ LUIS									X									230301	30	$1,563,310	$250,200	EPS037	30	$1,563,310	$62,600	CCF40	30	$1,563,310	$62,600	14-7	30	$1,563,310	6.960%	$108,900	30	$0	$0	SI	$484,300
18	CC	63451296	MONOGA OLGA									X									230201	30	$1,447,218	$231,600	EPS037	30	$1,447,218	$57,900	CCF40	30	$1,447,218	$57,900	14-7	30	$1,447,218	6.960%	$100,800	30	$0	$0	SI	$448,200
19	CC	1098602734	NAVARRO EDUARD																		230301	30	$2,720,000	$435,200	EPS002	30	$2,720,000	$108,800	CCF40	30	$2,720,000	$108,800	14-7	30	$2,720,000	6.960%	$189,400	30	$0	$0	SI	$842,200
20	CC	1005329307	PABON BRAIAN		X							X								X	230301	27	$1,289,339	$206,300	EPS005	27	$1,289,339	$51,600	CCF40	27	$1,746,206	$69,900	14-7	27	$1,289,339	6.960%	$89,800	27	$0	$0	SI	$417,600
21	CC	1005329307	PABON BRAIAN																X		230301	2	$94,934	$15,200	EPS005	2	$94,934	$3,800	CCF40	0	$0	$0	14-7	2	$94,934	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$19,000
22	CC	1098720858	PABON JOSE																		230301	30	$1,424,000	$227,900	EPS002	30	$1,424,000	$57,000	CCF40	30	$1,424,000	$57,000	14-7	30	$1,424,000	6.960%	$99,200	30	$0	$0	SI	$441,100
23	CC	26863946	PALOMINO KAREN																		230201	30	$3,547,000	$567,600	EPS005	30	$3,547,000	$141,900	CCF40	30	$3,547,000	$141,900	14-7	30	$3,547,000	6.960%	$246,900	30	$0	$0	SI	$1,098,300
24	CC	13742977	QUINTERO DIEGO																		230201	27	$3,725,100	$596,100	EPS037	27	$3,725,100	$149,100	CCF40	27	$3,725,100	$149,100	14-7	27	$3,725,100	6.960%	$259,300	27	$0	$0	SI	$1,153,600
25	CC	13742977	QUINTERO DIEGO											X							230201	3	$275,934	$44,200	EPS037	3	$275,934	$11,100	CCF40	0	$0	$0	14-7	3	$275,934	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$55,300
26	CC	91527086	QUINTERO GERARDO																		230301	30	$1,987,000	$318,000	EPS005	30	$1,987,000	$79,500	CCF40	30	$1,987,000	$79,500	14-7	30	$1,987,000	6.960%	$138,300	30	$0	$0	SI	$615,300
27	CC	5629152	ROJAS PEDRO									X									230301	30	$1,435,609	$229,700	EPS002	30	$1,435,609	$57,500	CCF40	30	$1,435,609	$57,500	14-7	30	$1,435,609	6.960%	$100,000	30	$0	$0	SI	$444,700
28	CC	1080650301	SAENZ JHAN									X									230301	30	$1,493,655	$239,000	ESSC07	30	$1,493,655	$59,800	CCF40	30	$1,493,655	$59,800	14-7	30	$1,493,655	6.960%	$104,000	30	$0	$0	SI	$462,600
29	CC	1082838396	SILVA GUSTAVO									X									230301	30	$2,174,263	$347,900	EPS002	30	$2,174,263	$87,000	CCF40	30	$2,174,263	$87,000	14-7	30	$2,174,263	6.960%	$151,400	30	$0	$0	SI	$673,300
30	CC	17594632	TABORDA ORLANDO	X								X									230301	15	$1,101,675	$176,300	EPS005	15	$1,101,675	$44,100	CCF40	15	$1,101,675	$44,100	14-7	15	$1,101,675	6.960%	$76,700	15	$0	$0	SI	$341,200
31	CC	1095937018	TAVERA FABIAN																		25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF40	30	$3,000,000	$120,000	14-7	30	$3,000,000	6.960%	$208,800	30	$0	$0	SI	$928,800
32	CC	91240282	TORRES JOSE																		25-14	30	$1,424,000	$227,900	EPS002	30	$1,424,000	$57,000	CCF40	30	$1,424,000	$57,000	14-7	30	$1,424,000	6.960%	$99,200	30	$0	$0	SI	$441,100
33	CC	3983570	TORRES LUIS									X									230301	30	$1,427,870	$228,500	EPS037	30	$1,427,870	$57,200	CCF40	30	$1,427,870	$57,200	14-7	30	$1,427,870	6.960%	$99,400	30	$0	$0	SI	$442,300
34	CC	19710847	VILORIA ATANAEL									X									230301	30	$1,547,831	$247,700	EPS037	30	$1,547,831	$62,000	CCF40	30	$1,547,831	$62,000	14-7	30	$1,547,831	6.960%	$107,800	30	$0	$0	SI	$479,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMINISTRATIVA (4 Afiliados)																						$8,742,500	$1,398,800			$8,742,500	$349,700			$8,742,500	$349,700			$8,742,500		$45,900		$0	$0		$2,144,100

2025/06/24 03:36 PM

Planilla Resumen

Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (4 Afiliados)						$8,742,500	$1,398,800			$8,742,500	$349,700			$8,742,500	$349,700			$8,742,500		$45,900		$0	$0		$2,144,100
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (4 Afiliados)						$8,742,500	$1,398,800			$8,742,500	$349,700			$8,742,500	$349,700			$8,742,500		$45,900		$0	$0		$2,144,100
35	CC	1098804045	CORTES SARAI	231001	30	$1,650,000	$264,000	EPS010	30	$1,650,000	$66,000	CCF40	30	$1,650,000	$66,000	14-7	30	$1,650,000	0.522%	$8,700	30	$0	$0	SI	$404,700
36	CC	1065907751	DOMINGUEZ DAYANA	230301	30	$2,365,000	$378,400	EPS037	30	$2,365,000	$94,600	CCF40	30	$2,365,000	$94,600	14-7	30	$2,365,000	0.522%	$12,400	30	$0	$0	SI	$580,000
37	CC	1090526122	MARTINEZ ASTRID	230201	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF40	30	$2,000,000	$80,000	14-7	30	$2,000,000	0.522%	$10,500	30	$0	$0	SI	$490,500
38	CC	91509603	URIBE FELIPE	230201	30	$2,727,500	$436,400	EPS010	30	$2,727,500	$109,100	CCF40	30	$2,727,500	$109,100	14-7	30	$2,727,500	0.522%	$14,300	30	$0	$0	SI	$668,900
Total	Afiliados(35)					$72,798,307	$11,719,200			$72,798,307	$2,856,300			$73,918,317	$2,911,600			$72,798,307		$4,275,300		$0	$0		$21,762,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901702490	7	CONSORCIO LA FLORA 2023	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	AV 4 N 6 N 67 OF 602	BUCARAMANGA-SANTANDER	6381213	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1574645184	9487673111	E	2025/06/24	2025/06/24	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$21,762,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				35	$11,719,200	$0	$0	$11,719,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$1,454,000	$0	$0	$1,454,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,630,000	$0	$0	$1,630,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	19	$4,987,900	$0	$0	$4,987,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	10	$3,647,300	$0	$0	$3,647,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				35	$4,275,300	$0	$0	$4,275,300
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	35	$4,275,300	$0	$0	$4,275,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				35	$2,911,600	$0	$0	$2,911,600
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	35	$2,911,600	$0	$0	$2,911,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				34	$2,856,300	$0	$0	$2,856,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$326,700	$0	$0	$326,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$57,000	$0	$0	$57,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$59,800	$0	$0	$59,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	10	$749,300	$0	$0	$749,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	$572,500	$0	$0	$572,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	10	$1,091,000	$0	$0	$1,091,000
TOTAL				35	$21,762,400	$0	$0	$21,762,400

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 34370516
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-08-21

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	EDWIN FERNANDO VALENCIA PINZON	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	91494944	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 30 22 200 APTO 402 EDIFICIO CAAVER	DEPARTAMENTO	SANTANDER	MUNICIPIO	FLORIDABLANCA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	8299	CORREO ELECTRÓNICO	VALENCIAEDWIN@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	6392386
FAX	0	SUCURSAL	04	NOMBRE SUCURSAL	2025
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Administrador de pensiones

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	91494944	PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 05	Año: 2025	Mes: 05	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$0		34370516

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-91494944	57	No	No	No	68	276	0	Salario	VALENCIA PINZON EDWIN FERNANDO	$1.423.500

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 91494944			X	2025-05-30																									0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 91494944	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 91494944	SALUD MIA EPS	30	$1.423.500	0.1250000	$178.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	91494944	0.0696000	$99.100

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-91494944	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 05											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	1	$227.800	$0	$0	$0	$0	70	$10.100	$0	$0	$237.900

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SALUD MIA EPS	1	$178.000	$0	0	$0	0	$0	$178.000	70	$7.900	$0	$185.900	$0	0	$0	$0	$185.900	$0	$0	$185.900

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA												
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	1	$99.100	0	$0	$0	$99.100	70	$4.400	$103.500	0	$0	$1.035	$103.500

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	$0	70	$0	$0
SENA	0	$0	70	$0	$0
ICBF	0	$0	70	$0	$0
ESAP	0	$0	70	$0	$0
MinEdu	0	$0	70	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$185.900
PENSIONES	1	$237.900
RIESGOS PROFESIONALES	1	$103.500
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$527.300

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	LAURA TATIANA SILVA CAMACHO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1096956702
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-07-15
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-06-04
FECHA DE PAGO:	2025-05-26
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO POPULAR
PERÍODO PENSIÓN:	2025-05
PERÍODO SALUD:	2025-05
NÚMERO PLANILLA:	33505095
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33505095
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.500	$ 7.500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300	$ 413.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	02/07/2025

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 91530295		BERMUDEZ FLOREZ WILLIAM FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 21B No 115 116	BUCARAMANGA-SANTANDER	6047279	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05	1496747038	9486309068	I	2025/06/25	2025/05/21	BANCOLOMBIA	0	$928,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	91530295	BERMUDEZ FLOREZ WILLIAM FERNANDO	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS010	30	$3,000,000	$375,000		0	$0	$0	14-23	30	$3,000,000	$73,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$375,000			$0	$0			$3,000,000	$73,100		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$480,000	$0	$0	$480,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$480,000	$0	$0	$480,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$73,100	$0	$0	$73,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$73,100	$0	$0	$73,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$375,000	$0	$0	$375,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$375,000	$0	$0	$375,000
TOTAL				1	$928,100	$0	$0	$928,100

2025/05/21 06:59 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1098672661		GAITAN PRADA CARLOS ALFONSO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 23 # 31 -63 apto 907	BUCARAMANGA-SANTANDER	6175167	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05	1566978317	9486663850	I	2025/06/16	2025/06/20	BANCOLOMBIA	4	$815,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,800,000	$448,000			$2,800,000	$350,000			$0	$0			$2,800,000	$14,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,800,000	$448,000			$2,800,000	$350,000			$0	$0			$2,800,000	$14,700		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					$2,800,000	$448,000			$2,800,000	$350,000			$0	$0			$2,800,000	$14,700		$0	$0
1	CC 1098672661	GAITAN CARLOS	230301	30	$2,800,000	$448,000	EPS010	30	$2,800,000	$350,000		0	$0	$0	14-11	30	$2,800,000	$14,700	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$2,800,000	$448,000			$2,800,000	$350,000			$0	$0			$2,800,000	$14,700		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1098672661		GAITAN PRADA CARLOS ALFONSO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 23 # 31 -63 apto 907	BUCARAMANGA-SANTANDER	6175167	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05	1566978317	9486663850	I	2025/06/16	2025/06/20	BANCOLOMBIA	4	$815,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$448,000	$1,200	$0	$449,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$448,000	$1,200	$0	$449,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,700	$100	$0	$14,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$14,700	$100	$0	$14,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$350,000	$1,000	$0	$351,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$350,000	$1,000	$0	$351,000
TOTAL				1	$812,700	$2,300	$0	$815,000

	CUADRO CONTROL DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE CONTRATISTA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Código: F-GDI-5000-238,37-097 Versión: 0.0 Fecha aprobación: Septiembre-19-2019 Página 1 de 1

CONTRATISTA: CONSORCIO LA FLORA 2023
NIT: 901.706.924 – 1
CONTRATO DE OBRA N° 069 DEL 14 DE ABRIL DEL 2023
OBJETO: CONSTRUCCION CANALIZACION DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION (Nomina, CPS, Otro)	SALARIO ($)	% DEDICACION	FECHA DE INGRESO	DIAS LABORADOS	MES FACTURADO	IBC(SEGÚN CONTRATO)	NUMERO DE PLANILLA	IBC (PAGADO)	SALUD	PENSION	ARL	CCF	TOTAL
APARICIO SANCHEZ JHON ANDREY	1098780561	TOPÓGRAFO	NOMINA	$ 2.365.000	100%	19/07/2023	30	JUNIO	$ 2.365.000	9488338650	$ 2.365.000	$ 94.700	$ 378.500	$ 126.200	$ 94.700	$ 694.100
BUITRAGO RÍOS JAIRO JAVIER	9735010	DIRECTOR DE OBRA	NOMINA	$ 7.000.000	100%	22/08/2024	30	JUNIO	$ 7.000.000	9488338650	$ 7.000.000	$ 280.000	$ 1.190.000	$ 487.200	$ 280.000	$ 2.237.200
GOMEZ BARRAGAN DANIEL ALBERTO	1095826837	INGENIERO CIVIL	NOMINA	$ 3.547.000	100%	26/04/2023	30	JUNIO	$ 3.547.000	9488338650	$ 3.547.000	$ 141.900	$ 567.600	$ 246.900	$ 141.900	$ 1.098.300
CRISTANCHO PIÑA JENNIFER ZARELY	1098781099	TRABAJADORA SOCIAL	NOMINA	$ 3.000.000	100%	12/05/2025	30	JUNIO	$ 2.956.000	9488338650	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 480.000	$ 208.800	$ 120.000	$ 928.800
NAVARRO MURCIA EDUARD JAIVIER	1098602734	TOPOGRAFO	NOMINA	$ 2.720.000	100%	26/04/2023	30	JUNIO	$ 2.720.000	9488338650	$ 2.629.334	$ 105.300	$ 420.800	$ 170.400	$ 98.000	$ 794.500
PALOMINO GUEVARA KAREN EUGENIA	26863946	HSEQ	NOMINA	$ 3.547.000	100%	9/05/2023	30	JUNIO	$ 3.547.000	9488338650	$ 3.547.000	$ 141.900	$ 567.600	$ 246.900	$ 141.900	$ 1.098.300
QUINTERO HERNÁNDEZ DIEGO ANDRÉS	13742977	INGENIERO RESIDENTE	NOMINA	$ 4.139.000	100%	26/05/2023	30	JUNIO	$ 4.139.000	9488338650	$ 4.139.000	$ 165.600	$ 662.300	$ 288.100	$ 165.600	$ 1.281.600
FABIAN ANDRÉS TAVERA GÓMEZ	1095937018	INGENIERO AMBIENTAL	NOMINA	$ 3.000.000	100%	4/04/2024	30	JUNIO	$ 3.000.000	9488338650	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 480.000	$ 208.800	$ 120.000	$ 928.800
VALENCIA PINZON EDWIN FERNANDO	91494944	ESP.GEOTECNICO	CPS	$ 2.150.000	50%	1/05/2023	30	JUNIO	$ 1.423.500	34646038	$ 2.560.000	$ 320.000	$ 409.600	$ 178.200	$ 0	$ 907.800
SILVA CAMACHO LAURA TATIANA	1096956702	INGENIERA FORESTAL	CPS	$ 1.423.500	25%	1/05/2023	30	JUNIO	$ 1.423.500	33557489	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 227.800	$ 7.500	$ 0	$ 413.300
BERMUDEZ FLOREZ WILIAM FERNANDO	91530295	ESP. HIDRAÚLICO	CPS	$ 2.150.000	50%	1/05/2023	30	JUNIO	$ 1.423.500	9487665261	$ 3.000.000	$ 375.000	$ 480.000	$ 73.100	$ 0	$ 928.100
GAITAN PRADA CARLOS ALFONSO	1098672661	ESP. ESTRUCTURAL	CPS	$ 2.150.000	50%	1/05/2023	30	JUNIO	$ 1.423.500	9488450659	$ 2.800.000	$ 350.000	$ 448.000	$ 14.700	$ 0	$ 812.700
											$ 39.010.834	$ 2.392.400	$ 6.312.200	$ 2.256.800	$ 1.162.100	

IBC: Ingreso base de cotizacion

GONZALO CARDENAS OREJARENA
CONSORCIO LA FLORA 2023
REP. LEGAL

ALFONSO VEGA ALBINO
CONSORCIO INTERVENTORIA CANALIZACION BGA
REP. LEGAL

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901702490	7	CONSORCIO LA FLORA 2023	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	AV 4 N 6 N 67 OF 602	BUCARAMANGA-SANTANDER	6381213	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1602523113	9488338650	E	2025/07/21	2025/07/04	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$21,588,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (30 Afiliados)																						$63,906,977	$10,296,600			$63,906,977	$2,500,600			$61,491,810	$2,494,500			$63,906,977		$4,223,100		$0	$0		$19,514,800

aportes en línea

Planilla Resumen

Centro de Trabajo: Principal (30 Afiliados)																							$63,906,977	$10,296,600			$63,906,977	$2,500,600			$63,491,810	$2,494,500			$63,906,977		$4,223,100		$0	$0		$19,514,800
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (30 Afiliados)																							$63,906,977	$10,296,600			$63,906,977	$2,500,600			$63,491,810	$2,494,500			$63,906,977		$4,223,100		$0	$0		$19,514,800
1	CC	1095916963	ALMEYDA IVAN									X									230301	30	$2,232,807	$357,300	EPS005	30	$2,232,807	$89,400	CCF40	30	$2,232,807	$89,400	14-7	30	$2,232,807	6.960%	$155,500	30	$0	$0	SI	$691,600
2	CC	1098780561	APARICIO JHON																		230201	23	$1,813,167	$290,200	EPS010	23	$1,813,167	$72,600	CCF40	23	$1,813,167	$72,600	14-7	23	$1,813,167	6.960%	$126,200	23	$0	$0	SI	$561,600
3	CC	1098780561	APARICIO JHON													X					230201	7	$551,833	$88,300	EPS010	7	$551,833	$22,100	CCF40	7	$551,833	$22,100	14-7	7	$551,833	0.000%	$0	7	$0	$0	SI	$132,500
4	CC	1005154334	ARRIETA BRAYAN	X																	230301	11	$867,167	$138,800	EPS037	11	$867,167	$34,700	CCF40	11	$867,167	$34,700	14-7	11	$867,167	6.960%	$60,400	11	$0	$0	SI	$268,600
5	CC	19789132	ARRIETA HUGO									X									230201	30	$1,435,609	$229,700	EPS010	30	$1,435,609	$57,500	CCF40	30	$1,435,609	$57,500	14-7	30	$1,435,609	6.960%	$100,000	30	$0	$0	SI	$444,700
6	CC	91298725	BARAJAS ALVARO									X									25-14	30	$2,232,807	$357,300	EPS002	30	$2,232,807	$89,400	CCF40	30	$2,232,807	$89,400	14-7	30	$2,232,807	6.960%	$155,500	30	$0	$0	SI	$691,600
7	CC	9735010	BUITRAGO JAIRO																		231001	30	$7,000,000	$1,190,000	EPS005	30	$7,000,000	$280,000	CCF40	30	$7,000,000	$280,000	14-7	30	$7,000,000	6.960%	$487,200	30	$0	$0	SI	$2,237,200
8	CC	5010380	CARVAJAL JAVIER									X									230201	30	$1,567,179	$250,800	EPS037	30	$1,567,179	$62,700	CCF40	30	$1,567,179	$62,700	14-7	30	$1,567,179	6.960%	$109,100	30	$0	$0	SI	$485,300
9	CC	1098820465	CASTILLO PAOLA												X						230301	23	$1,091,733	$174,700	EPS017	23	$1,091,733	$43,700	CCF40	0	$0	$0	14-7	23	$1,091,733	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$218,400
10	CC	1098820465	CASTILLO PAOLA		X															X	230301	1	$47,467	$7,600	EPS017	1	$47,467	$1,900	CCF40	1	$1,073,934	$43,000	14-7	1	$47,467	6.960%	$3,400	1	$0	$0	SI	$55,900
11	CC	1098726884	CEPEDA JEFERSON										X								230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS042	30	$1,423,500	$0	CCF40	30	$1,160,000	$0	14-7	30	$1,423,500	0.000%	$0	30	$0	$0	SI	$227,800
12	CC	1098781099	CRISTANCHO JENIFFER																		230201	30	$3,000,000	$480,000	EPS037	30	$3,000,000	$120,000	CCF40	30	$3,000,000	$120,000	14-7	30	$3,000,000	6.960%	$208,800	30	$0	$0	SI	$928,800
13	CC	1104126726	DUARTE JUAN																		230201	30	$1,900,000	$304,000	EPS037	30	$1,900,000	$76,000	CCF40	30	$1,900,000	$76,000	14-7	30	$1,900,000	6.960%	$132,300	30	$0	$0	SI	$588,300
14	CC	1095826837	GOMEZ DANIEL																		25-14	30	$3,547,000	$567,600	EPS005	30	$3,547,000	$141,900	CCF40	30	$3,547,000	$141,900	14-7	30	$3,547,000	6.960%	$246,900	30	$0	$0	SI	$1,098,300
15	CC	7600898	GUERRA JORGE									X									230301	30	$1,482,046	$237,200	EPS002	30	$1,482,046	$59,300	CCF40	30	$1,482,046	$59,300	14-7	30	$1,482,046	6.960%	$103,200	30	$0	$0	SI	$459,000
16	CC	1095834868	LANDAZABAL IVAN									X									230301	30	$1,431,739	$229,100	EPS005	30	$1,431,739	$57,300	CCF40	30	$1,431,739	$57,300	14-7	30	$1,431,739	6.960%	$99,700	30	$0	$0	SI	$443,400
17	CC	1003334373	MACHUCA LUIS																		230301	30	$1,424,000	$227,900	EPS002	30	$1,424,000	$57,000	CCF40	30	$1,424,000	$57,000	14-7	30	$1,424,000	6.960%	$99,200	30	$0	$0	SI	$441,100
18	CC	19768481	MARTINEZ LUIS									X									230301	30	$1,586,528	$253,900	EPS037	30	$1,586,528	$63,500	CCF40	30	$1,586,528	$63,500	14-7	30	$1,586,528	6.960%	$110,500	30	$0	$0	SI	$491,400
19	CC	63451296	MONOGA OLGA									X									230201	30	$1,443,349	$231,000	EPS037	30	$1,443,349	$57,800	CCF40	30	$1,443,349	$57,800	14-7	30	$1,443,349	6.960%	$100,500	30	$0	$0	SI	$447,100
20	CC	1098602734	NAVARRO EDUARD																		230301	27	$2,448,000	$391,700	EPS002	27	$2,448,000	$98,000	CCF40	27	$2,448,000	$98,000	14-7	27	$2,448,000	6.960%	$170,400	27	$0	$0	SI	$758,100
21	CC	1098602734	NAVARRO EDUARD											X							230301	3	$181,334	$29,100	EPS002	3	$181,334	$7,300	CCF40	0	$0	$0	14-7	3	$181,334	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$36,400
22	CC	1098720858	PABON JOSE									X									230301	30	$1,451,088	$232,200	EPS002	30	$1,451,088	$58,100	CCF40	30	$1,451,088	$58,100	14-7	30	$1,451,088	6.960%	$101,000	30	$0	$0	SI	$449,400
23	CC	26863946	PALOMINO KAREN																		230201	30	$3,547,000	$567,600	EPS005	30	$3,547,000	$141,900	CCF40	30	$3,547,000	$141,900	14-7	30	$3,547,000	6.960%	$246,900	30	$0	$0	SI	$1,098,300
24	CC	13742977	QUINTERO DIEGO																		230201	30	$4,139,000	$662,300	EPS037	30	$4,139,000	$165,600	CCF40	30	$4,139,000	$165,600	14-7	30	$4,139,000	6.960%	$288,100	30	$0	$0	SI	$1,281,600
25	CC	91527086	QUINTERO GERARDO																		230301	30	$1,987,000	$318,000	EPS005	30	$1,987,000	$79,500	CCF40	30	$1,987,000	$79,500	14-7	30	$1,987,000	6.960%	$138,300	30	$0	$0	SI	$615,300
26	CC	5629152	ROJAS PEDRO									X									230301	30	$1,435,609	$229,700	EPS002	30	$1,435,609	$57,500	CCF40	30	$1,435,609	$57,500	14-7	30	$1,435,609	6.960%	$100,000	30	$0	$0	SI	$444,700
27	CC	1080650301	SAENZ JHAN		X							X								X	230301	15	$735,218	$117,700	ESSC07	15	$735,218	$29,500	CCF40	15	$830,151	$33,300	14-7	15	$735,218	6.960%	$51,200	15	$0	$0	SI	$231,700
28	CC	1082838396	SILVA GUSTAVO									X									230301	30	$2,232,091	$357,200	EPS002	30	$2,232,091	$89,300	CCF40	30	$2,232,091	$89,300	14-7	30	$2,232,091	6.960%	$155,400	30	$0	$0	SI	$691,200
29	CC	17594632	TABORDA ORLANDO									X									230301	30	$2,203,350	$352,600	EPS005	30	$2,203,350	$88,200	CCF40	30	$2,203,350	$88,200	14-7	30	$2,203,350	6.960%	$153,400	30	$0	$0	SI	$682,400
30	CC	1095937018	TAVERA FABIAN																		25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF40	30	$3,000,000	$120,000	14-7	30	$3,000,000	6.960%	$208,800	30	$0	$0	SI	$928,800
31	CC	91240282	TORRES JOSE																		25-14	30	$1,424,000	$227,900	EPS002	30	$1,424,000	$57,000	CCF40	30	$1,424,000	$57,000	14-7	30	$1,424,000	6.960%	$99,200	30	$0	$0	SI	$441,100
32	CC	3983570	TORRES LUIS									X									230301	30	$1,466,567	$234,700	EPS037	30	$1,466,567	$58,700	CCF40	30	$1,466,567	$58,700	14-7	30	$1,466,567	6.960%	$102,100	30	$0	$0	SI	$454,200
33	CC	19710847	VILORIA ATANAEL									X									230301	30	$1,578,789	$252,700	EPS037	30	$1,578,789	$63,200	CCF40	30	$1,578,789	$63,200	14-7	30	$1,578,789	6.960%	$109,900	30	$0	$0	SI	$489,000
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																										
EMPLEADO				**NOVEDADES**																	**PENSION**				**SALUD**				**CCF**				**RIESGOS**						**PARAFISCALES**				
No.		Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMINISTRATIVA (5 Afiliados)																							[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]		$0	$0		[illegible]

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 34646038
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-09-08

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	EDWIN FERNANDO VALENCIA PINZON	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	91494944	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 30 22 200 APTO 402 EDIFICIO CAAVER	DEPARTAMENTO	SANTANDER	MUNICIPIO	FLORIDABLANCA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	8299	CORREO ELECTRÓNICO	VALENCIAEDWIN@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	6392386
FAX	0	SUCURSAL	04	NOMBRE SUCURSAL	2025
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Administrador de pensiones

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	91494944	PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 06	Año: 2025	Mes: 06	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$0		34646038

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-91494944	57	No	No	No	68	276	0	Salario	VALENCIA PINZON EDWIN FERNANDO	$4.800.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 91494944	X	2025-06-15																											0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES										
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 91494944	PORVENIR	16	$2.560.000	0.1600000	$409.600	$0	$0	$409.600	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 91494944	SALUD MIA EPS	16	$2.560.000	0.1250000	$320.000	$0	0	$0	0	$0	16	$2.560.000	9149494 4	0.0696000	$178.200

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-91494944	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 06											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	1	$409.600	$0	$0	$0	$0	60	$15.500	$0	$0	$425.100

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SALUD MIA EPS	1	$320.000	$0	0	$0	0	$0	$320.000	60	$12.100	$0	$332.100	$0	0	$0	$0	$332.100	$0	$0	$332.100

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA												
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	1	$178.200	0	$0	$0	$178.200	60	$6.800	$185.000	0	$0	$0	$185.000

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	$0	60	$0	$0
SENA	0	$0	60	$0	$0
ICBF	0	$0	60	$0	$0
ESAP	0	$0	60	$0	$0
MinEdu	0	$0	60	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$332.100
PENSIONES	1	$425.100
RIESGOS PROFESIONALES	1	$185.000
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$942.200

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	LAURA TATIANA SILVA CAMACHO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1096956702
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-07-15
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-07-03
FECHA DE PAGO:	2025-07-03
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO POPULAR
PERÍODO PENSIÓN:	2025-06
PERÍODO SALUD:	2025-06
NÚMERO PLANILLA:	33557489
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33557489
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 200	$ 178.000	$ 178.200
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 200	$ 227.800	$ 228.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 100	$ 7.500	$ 7.600
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 500	$ 413.300	$ 413.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	04/08/2025

PAGADO

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 91530295		BERMUDEZ FLOREZ WILLIAM FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 21B No 115 116	BUCARAMANGA-SANTANDER	6047279	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	1573990196	9487665261	I	2025/07/22	2025/06/24	BANCOLOMBIA	0	$928,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	91530295	BERMUDEZ FLOREZ WILLIAM FERNANDO	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS010	30	$3,000,000	$375,000		0	$0	$0	14-23	30	$3,000,000	$73,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$375,000			$0	$0			$3,000,000	$73,100		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$480,000	$0	$0	$480,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$480,000	$0	$0	$480,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$73,100	$0	$0	$73,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$73,100	$0	$0	$73,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$375,000	$0	$0	$375,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$375,000	$0	$0	$375,000
TOTAL				1	$928,100	$0	$0	$928,100

2025/06/23 07:47 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1098672661		GAITAN PRADA CARLOS ALFONSO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 23 # 31 -63 apto 907	BUCARAMANGA-SANTANDER	6175167	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	1610438159	9488450659	I	2025/07/14	2025/07/07	BANCOLOMBIA	0	$812,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,800,000	$448,000			$2,800,000	$350,000			$0	$0			$2,800,000	$14,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					**$2,800,000**	**$448,000**			**$2,800,000**	**$350,000**			**$0**	**$0**			**$2,800,000**	**$14,700**		**$0**	**$0**
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					$2,800,000	$448,000			$2,800,000	$350,000			$0	$0			$2,800,000	$14,700		$0	$0
1	CC 1098672661	GAITAN CARLOS	230301	30	$2,800,000	$448,000	EPS010	30	$2,800,000	$350,000		0	$0	$0	14-11	30	$2,800,000	$14,700	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					**$2,800,000**	**$448,000**			**$2,800,000**	**$350,000**			**$0**	**$0**			**$2,800,000**	**$14,700**		**$0**	**$0**

2025/07/07 03:06 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1098672661		GAITAN PRADA CARLOS ALFONSO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 23 # 31 -63 apto 907	BUCARAMANGA-SANTANDER	6175167	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	1610438159	9488450659	I	2025/07/14	2025/07/07	BANCOLOMBIA	0	$812,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$448,000	$0	$0	$448,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$448,000	$0	$0	$448,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,700	$0	$0	$14,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$14,700	$0	$0	$14,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$350,000	$0	$0	$350,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$350,000	$0	$0	$350,000
TOTAL				1	$812,700	$0	$0	$812,700

2025/07/07 03:06 PM

ALCALDÍA DE
BUCARAMANGA

CERTIFICACIÓN DE RECIBO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

ALFONSO VEGA ALBINO, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.497.873, y **JULIO LOZANO GARCÍA,** identificado con cédula de ciudadanía No. 73.083.496, en calidad de Representante Legal y Director de Interventoría, respectivamente, en el marco de la ejecución del **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 085** del 26 de abril de 2023, nos permitimos certificar que hemos recibido a entera satisfacción las actividades reportadas por el contratista del **CONTRATO DE OBRA No. 069** del 14 de abril de 2023, con las siguientes características:

PERIODO A COBRAR	01 DE MAYO DEL 2025 AL 30 DE JUNIO DEL 2025
VALOR AUTORIZADO A PAGAR	$ 3.839.101.658,07
PORCENTAJE DE EJECUCION A PAGAR	6.33%

CONTRATO DE OBRA No.	069
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO LA FLORA 2023
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	NIT 901.702.490-7
OBJETO	"CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTOR: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"
FECHA DEL CONTRATO	14 DE ABRIL DEL 2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 40.514'056.113.00
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$ 20,168,495,053.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 60,682,551,166.00
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	DIECIOCHO (18) MESES
PLAZO ADICIONAL DE EJECUCIÓN	TRECE (13) MESES
PLAZO TOTAL DEL EJECUCIÓN	TREINTA Y UN (31) MESES
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORÍA CANALIZACIÓN BGA
IDENTIFICACIÓN DEL INTERVENTOR	NIT 901.706.924-1
FECHA DE INICIO	MAYO 05 DEL 2023
FECHA DE TERMINACION INICIAL	NOVIEMBRE 04 DEL 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 01	DICIEMBRE 04 DEL 2024
FECHA DE REINICIO No. 01	DICIEMBRE 11 DEL 2024
FECHA DE TERMINACION	DICIEMBRE 10 DEL 2025
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
No. DE POLIZA	96-44-101180422 - 7 96-40-101063839 - 6
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP CONTRATO ORIGINAL	2843 DEL 25 DE FEBRERO DEL 2023
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP RESERVA CONTRATO ORIGINAL	0470 DEL 26 DE ENERO DEL 2024
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP PASIVO EXIGIBLE	4278 DEL 30 DE MAYO DEL 2025
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP ADICIONAL NO.01	3950 DEL 09 DE MAYO DEL 2025
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL – RP CONTRATO ORIGINAL	4562 DEL 18 DE ABRIL DEL 2023
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL – RP RESERVA CONTRATO ORIGINAL	0260 DEL 26 DE ENERO DEL 2024
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL – RP PASIVO EXIGIBLE	5819 DEL 30 DE MAYO DEL 2025
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL – RP ADICIONAL NO.01	5340 DEL 09 DE MAYO DEL 2025

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA DE
BUCARAMANGA

Certificamos que los informes Técnico, HSEQ – Plan de Gerencia, Social, aportes a la seguridad social, cumplimiento de soportes parafiscales, entre otros, fueron presentados por el contratista del **CONTRATO DE OBRA No. 069** del 14 de abril de 2023. Dichos informes han sido revisados y se encuentran aprobados por esta interventoría, dado que cumplen con lo pactado en el contrato, el pliego de condiciones y los demás anexos estipulados en el proceso de contratación.

La presente certificación se expide exclusivamente para el trámite de pago del **Acta de Ejecución Parcial No. 10** ante la **Alcaldía de Bucaramanga**, a los diez (10) días del mes de septiembre de 2025. Por lo tanto, este documento no es idóneo para acreditar experiencia.

Atentamente,

Firma: _____

ALFONSO VEGA ALBINO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORÍA CANALIZACIÓN BGA

Firma: _____

JULIO LOZANO GARCÍA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO INTERVENTORÍA CANALIZACIÓN BGA

Scanned with CamScanner

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA ALCALDÍA DE BUCARAMANGA	Alcaldía de Bucaramanga	Consorcio La Flora 2023	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	30	MM	06	AAAA	2025	ACTA No.	10	ELABORÓ	DANIEL GÓMEZ BARRAGÁN

OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
ENT CONTRATANTE:	ALCALDÍA DE BUCARAMANGA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
CONTRATISTA:	CONSORCIO LA FLORA 2023
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORÍA CANALIZACIÓN BGA

CAPÍTULO 1. PRELIMINARES

1.03.01.02	Encerramiento con tela de polipropileno verde		UNIDAD	m

ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMÁGEN

ENCERRAMIENTO PARA DELIMITAR EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DEL BOX DESDE LA ABSCISA K5+220 HASTA LA K4+795





Fecha	Ubicación		DIMENSIONES			Elemento (und)	Longitud (m)
			Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)		
ACTA #10							
ENCERRAMIENTO PARA DELIMITAR EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DEL BOX DESDE LA ABSCISA K5+220 HASTA LA K4+795							
31/05/2025	K5+220	K4+080	149,60			1,00	149,60
31/05/2025	K5+035	K4+915	261,30			1,00	261,30
30/06/2025	K4+910	K4+795	238,00			1,00	238,00
						SUBTOTAL - ACTA #10	648,90

REGISTRO FOTOGRAFICO







ENCERRAMIENTO PARA DELIMITAR EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DEL BOX DESDE LA ABSCISA K5+220 HASTA LA K4+795	REGISTRO FOTOGRAFICO









OBSERVACIONES:	PRESENTE ACTA 10		ACUMULADO			TOTALES	648,90
	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	EJECUTADO		
	648,90	$ 16.217.308,80	3.041,93	$ 76.001.421,76	67,28%		

CONTRATISTA: CONSORCIO LA FLORA 2023

Firma:

REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERVENTORIA CANALIZACIÓN BGA

Firma:

REPRESENTANTE LEGAL

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA ALCALDÍA DE BUCARAMANGA	Alcaldía de Bucaramanga	Consorcio La Flora 2023	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	30	MM	06	AAAA	2025	ACTA No.	10	ELABORÓ	DANIEL GÓMEZ BARRAGÁN

OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
ENTIDAD CONTRATANTE:	ALCALDÍA DE BUCARAMANGA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
CONTRATISTA:	CONSORCIO LA FLORA 2023
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORÍA CANALIZACIÓN BGA

CAPÍTULO 1. PRELIMINARES

1.04	Replanteo, control y medición permanente de la obra	UNIDAD	mes

ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMÁGEN

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Periodo	Ubicación		DIMENSIONES			Cantidad (mes)	Duración (mes)
			Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)		
ACTA #10							
5 MAY - 4 JUN 2025	K4+440	K4+193				1,00	1,00
5 JUN - 4 JUL 2025	K4+440	K4+193				1,00	1,00
SUBTOTAL - ACTA #10							2,00

OBSERVACIONES:	PRESENTE ACTA 10		ACUMULADO			TOTALES	2,00
	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% EJECUTADO		
	2,00	$ 15.298.228,00	26	$ 198.876.964,00	81,25%		

CONTRATISTA: CONSORCIO LA FLORA 2023	INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERVENTORÍA CANALIZACIÓN BGA
Firma:	Firma:
REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL

Secretaria de Infraestructura Fisica Alcaldía de Bucaramanga	Alcaldía de Bucaramanga	Consorcio La Flora 2023	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	30	MM	06	AAAA	2025	ACTA No.	10	ELABORÓ	DANIEL GÓMEZ BARRAGÁN

OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
ENTIDAD	ALCALDÍA DE BUCARAMANGA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
CONTRATISTA:	CONSORCIO LA FLORA 2023
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORIA CANALIZACIÓN BGA

CAPÍTULO 1. PRELIMINARES

1.07.01.02	Espesor entre 0.06m y 0.10m		UNIDAD	m2


ILUSTRACIÓN - GRAFICA - IMAGEN

ESQUEMA AREA DE PAVIMENTO DEMOLIDA DESDE K0+198 HASTA K0+945




ABSCISA	DIMENSIONES Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Ancho promedio (m)	Área (m2)
ACTA #10					
DEMOLICIÓN PAVIMENTO BARRIOS SAN MARTIN, QUEBRADA LA IGLESIA, SAN PEDRO Y URBANIZACIONES EL SOL 1 Y SOL 2. ENTRE LAS ABSCISAS K0+198 Y LA K0+416					
k0+416,00		7,94			
	20,00			7,98	159,60
k0+436,00		8,02			
	20,00			6,53	130,60
k0+456,00		5,04			
	20,00			7,45	149,00
k0+476,00		9,86			
	20,00			7,48	149,60
k0+496,00		5,09			
	20,00			5,09	101,80
k0+516,00		5,08			
	20,00			5,17	103,40
k0+536,00		5,26			
	20,00			5,41	108,20
k0+556,00		5,56			
	20,00			5,69	113,80
k0+576,00		5,82			
	20,00			5,87	117,40
k0+596,00		5,91			
	20,00			5,96	119,20
k0+616,00		6,00			
	20,00			5,71	114,20
k0+636,00		5,41			
	20,00			5,28	105,60
k0+656,00		5,15			
	20,00			5,74	114,80
k0+676,00		6,32			
	20,00			5,78	115,60
k0+696,00		5,23			
	20,00			7,34	146,80
k0+716,00		9,45			
	20,00			7,77	155,40
k0+736,00		6,09			
	20,00			6,13	122,60
k0+756,00		6,16			
	20,00			6,09	121,80
k0+776,00		6,02			
	20,00			5,98	119,60
k0+796,00		5,94			
	20,00			5,96	119,20
k0+816,00		5,98			
	20,00			5,97	119,40
k0+836,00		5,96			
	20,00			5,95	119,00
k0+856,00		5,94			
	20,00			5,87	117,40
k0+876,00		5,80			
	20,00			5,88	117,60
k0+896,00		5,96			
	20,00			6,12	122,40
k0+916,00		6,27			
	29,00			5,83	169,07
k0+945,00		5,39			
				SUBTOTAL - ACTA #10	3.253,07


CONTINUACIÓN - ESQUEMA ÁREA DE PAVIMENTO DEMOLIDA DESDE K0+198 HASTA K0+945

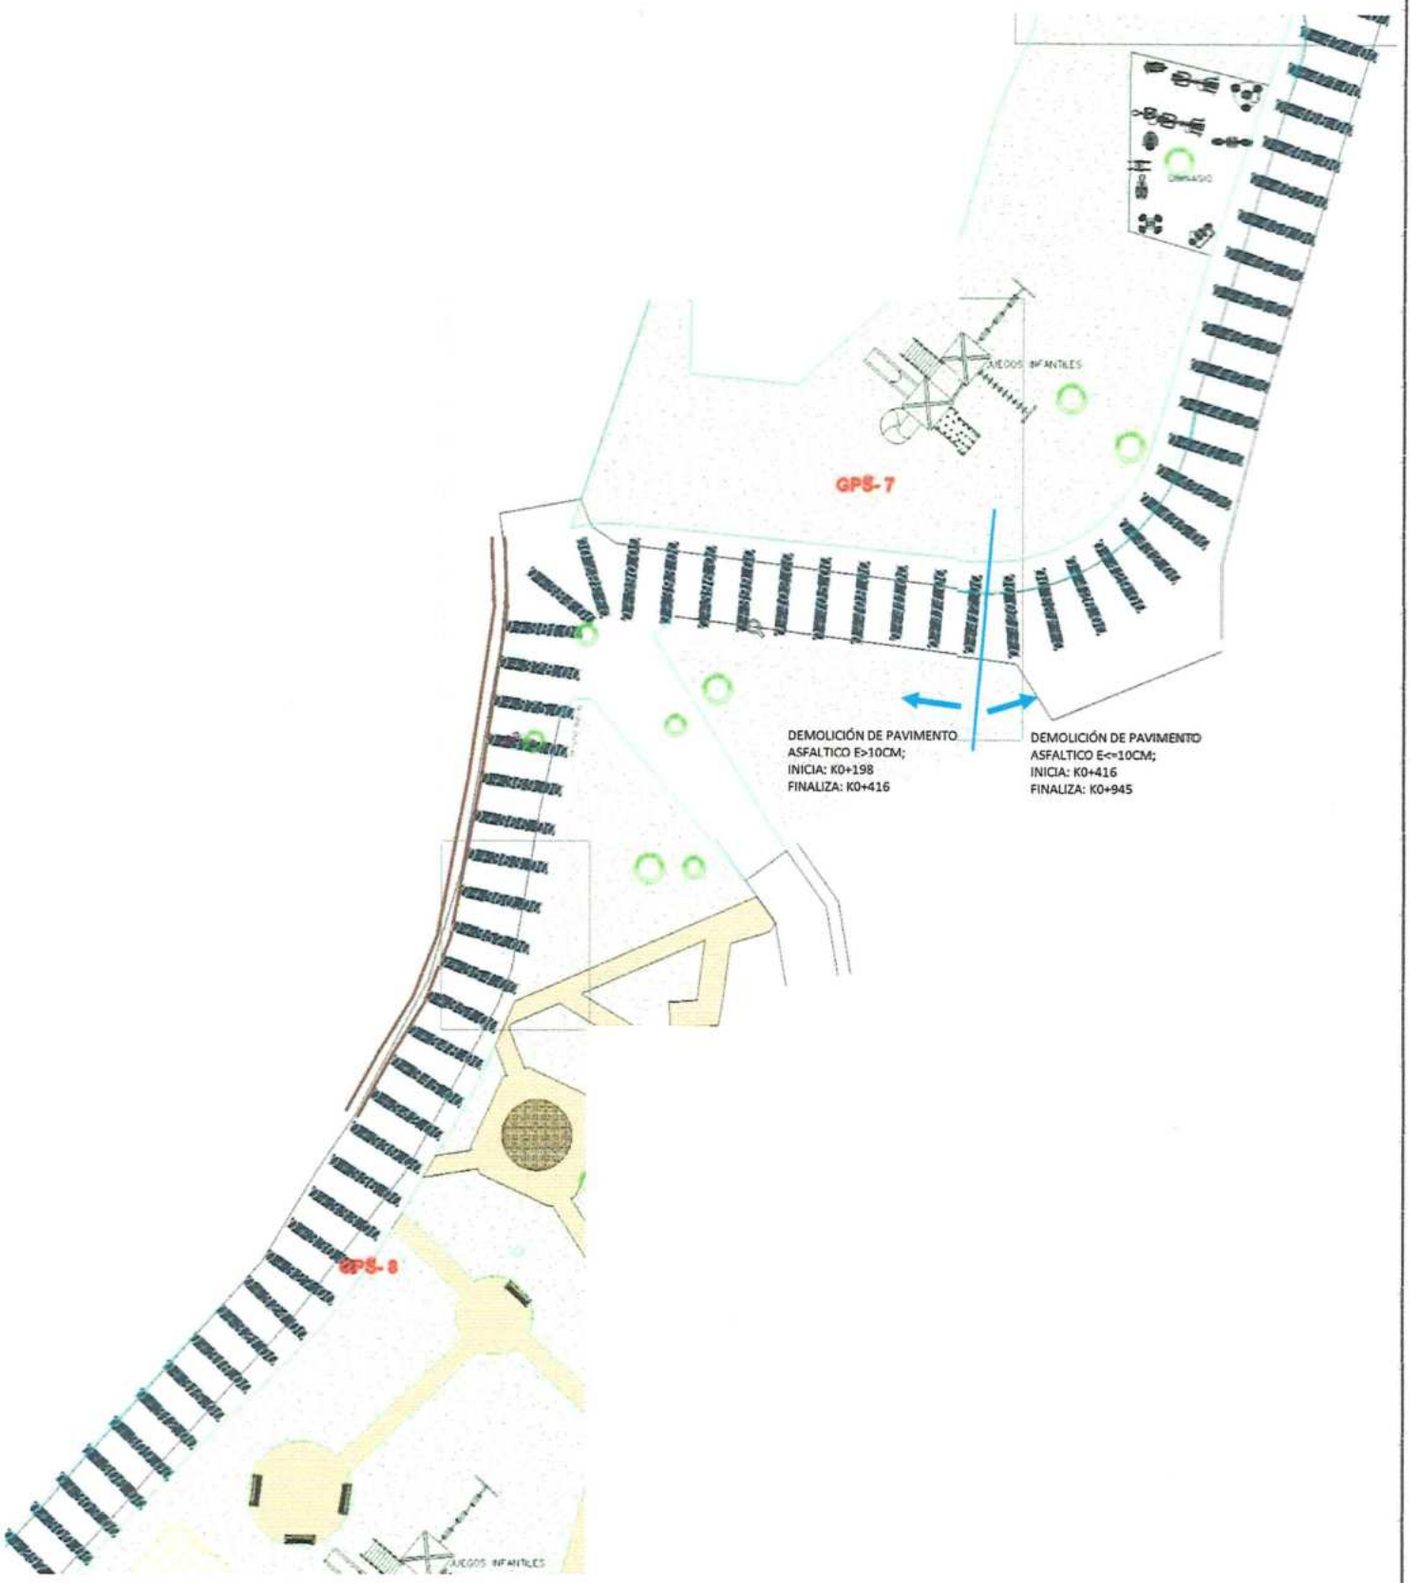


CONTINUACIÓN - ESQUEMA AREA DE PAVIMENTO DEMOLIDA DESDE K0+198 HASTA K0+945

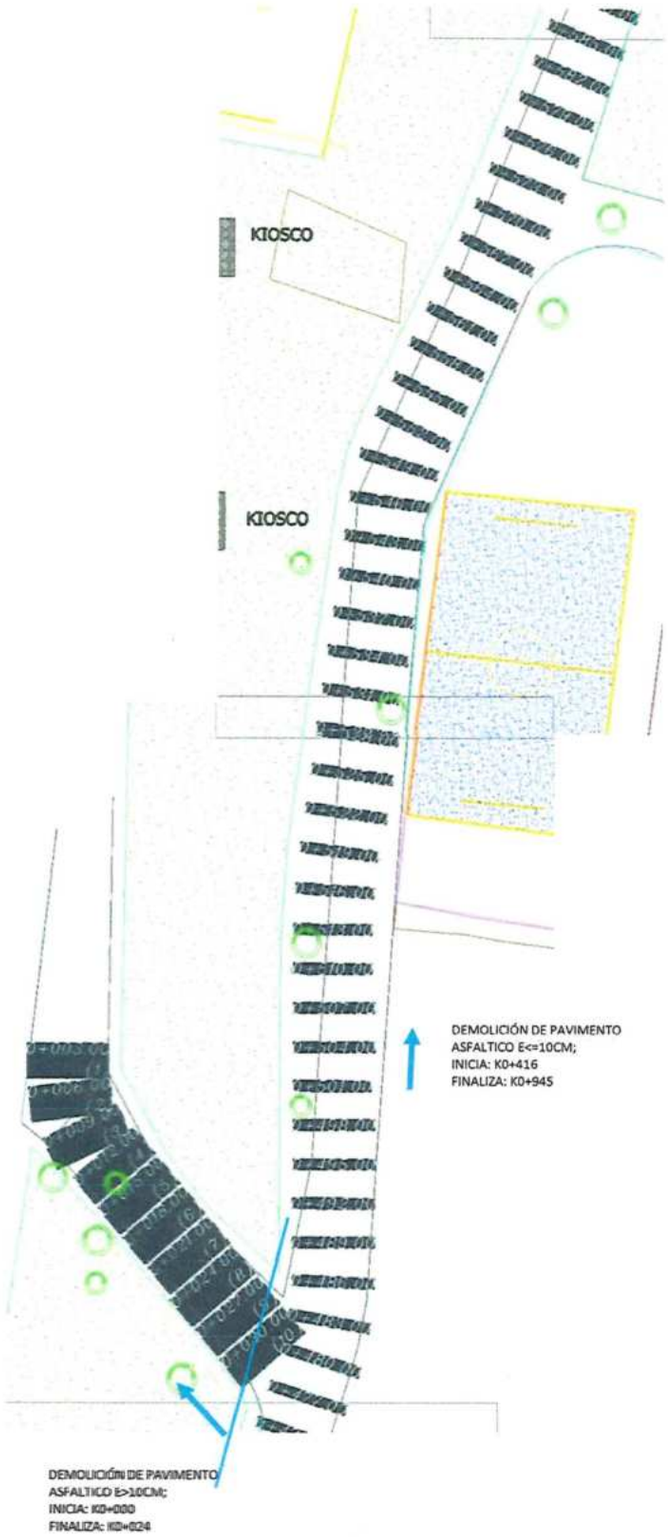


CONTINUACIÓN - ESQUEMA AREA DE PAVIMENTO DEMOLIDA DESDE K0+198 HASTA K0+945

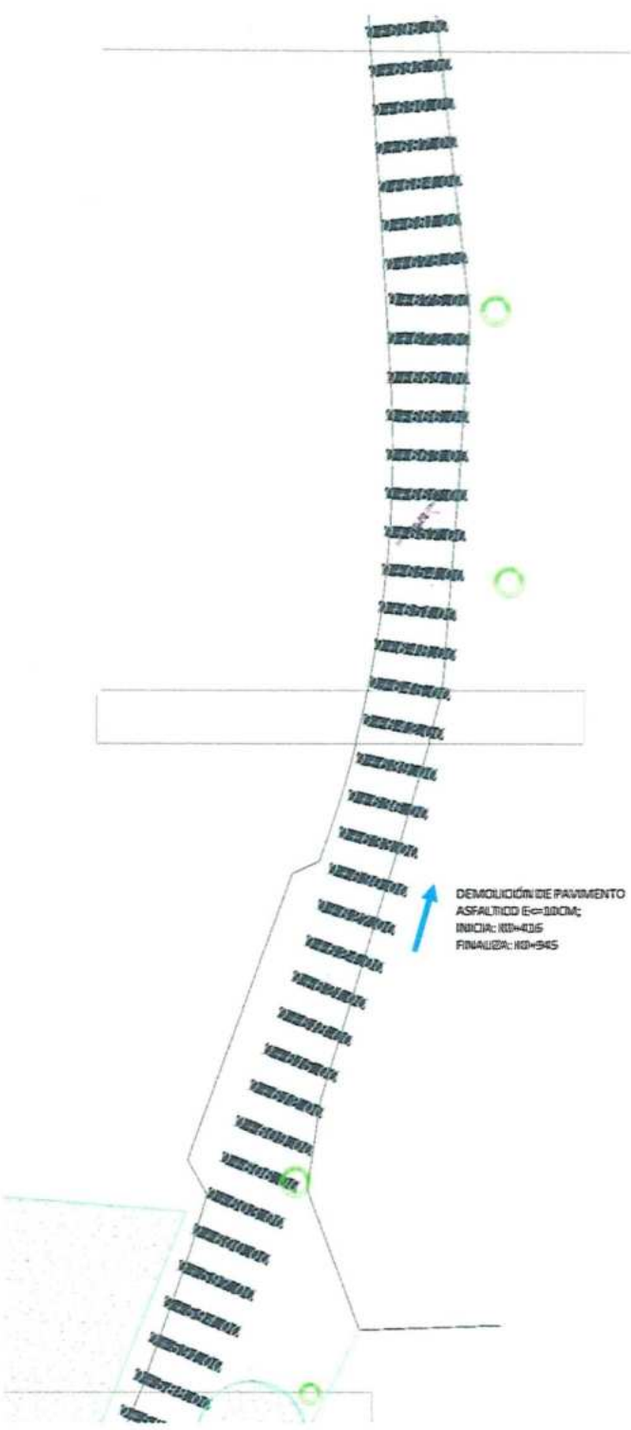

CONTINUACIÓN - ESQUEMA AREA DE PAVIMENTO DEMOLIDA DESDE K0+198 HASTA K0+945

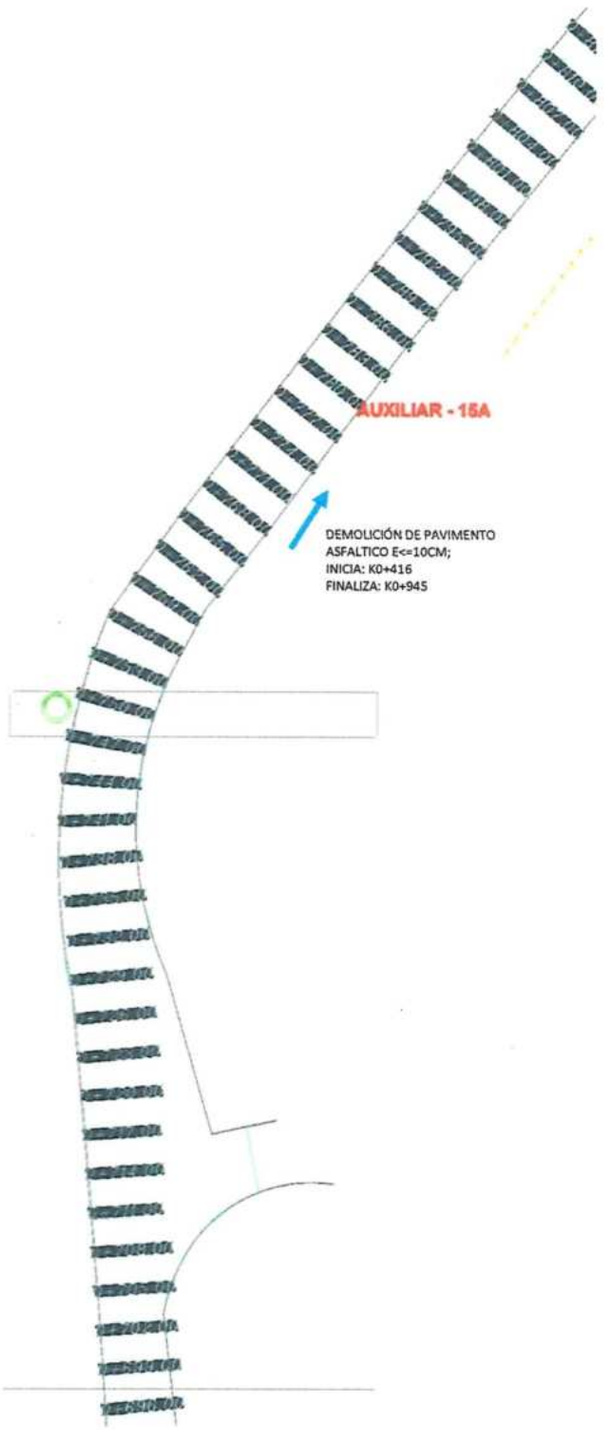

CONTINUACIÓN - ESQUEMA AREA DE PAVIMENTO DEMOLIDA DESDE K0+198 HASTA K0+945

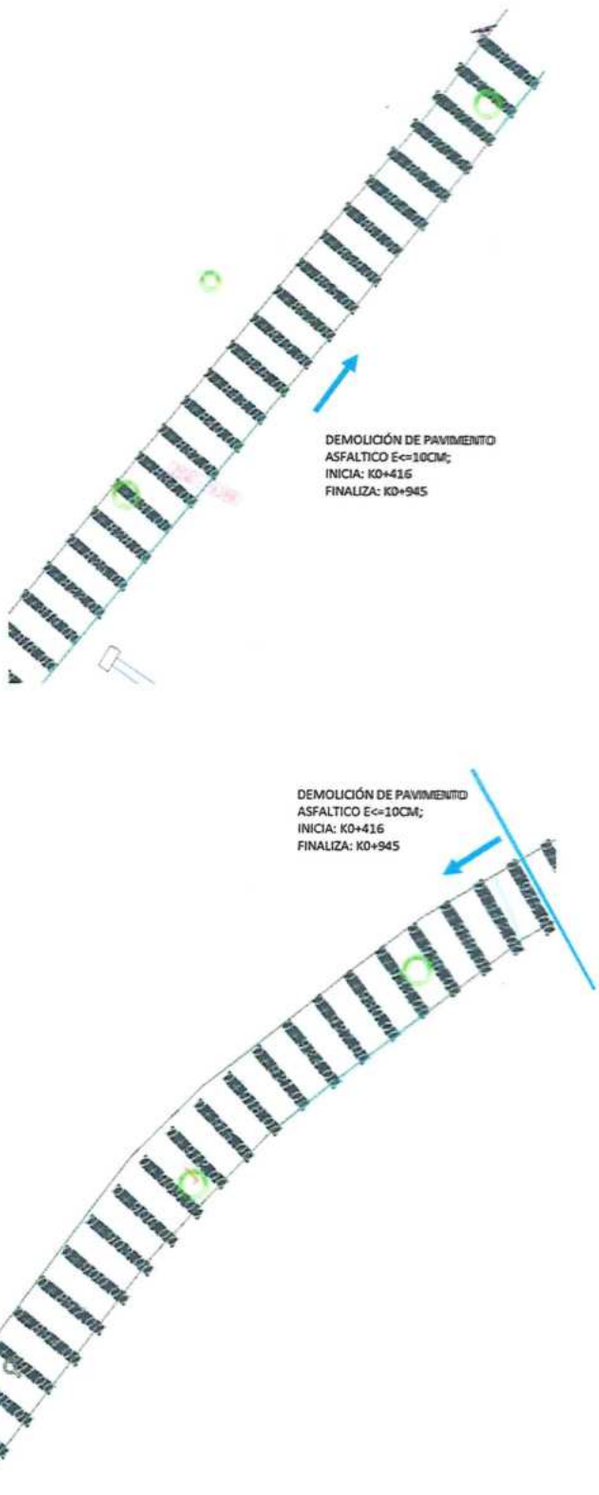

OBSERVACIONES:	PRESENTE ACTA 10		ACUMULADO			TOTALES	3.253,07
	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	EJECUTADO		
	3.253,07	$ 135.643.259,79	3.253,07	$ 135.643.259,79	98,76%		

CONTRATISTA: CONSORCIO LA FLORA 2023

Firma: _____
REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERVENTORÍA CANALIZACIÓN BGA

Firma: _____
REPRESENTANTE LEGAL

Secretaria de Infraestructura Fisica Alcaldía de Bucaramanga	Alcaldía de Bucaramanga	Consorcio La Flora 2023	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	30	MM	06	AAAA	2025	ACTA No.	10	ELABORÓ	DANIEL GÓMEZ BARRAGÁN

OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
ENTIDAD	ALCALDIA DE BUCARAMANGA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
CONTRATISTA:	CONSORCIO LA FLORA 2023
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORÍA CANALIZACIÓN BGA

CAPÍTULO 1. PRELIMINARES

1.07.01.03	Espesor entre 0.10 m y 0.20 m	UNIDAD	m2


ILUSTRACIÓN - GRAFICA - IMAGEN

ESQUEMA AREA DE PAVIMENTO DEMOLIDA DESDE K0+198 HASTA K0+945




ABSCISA	DIMENSIONES			Ancho promedio (m)	Área (m2)
	Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)		
ACTA #10					
DEMOLICIÓN PAVIMENTO BARRIOS SAN MARTIN, QUEBRADA LA IGLESIA, SAN PEDRO Y URBANIZACIONES EL SOL 1 Y SOL 2. ENTRE LAS ABSCISAS K0+198 Y LA K0+416					
k0+198,00		6,56			
	20,00			6,55	131,00
k0+218,00		6,54			
	20,00			6,55	131,00
k0+238,00		6,56			
	11,00			6,39	70,29
k0+249,00		6,22			
ENTRE K0+238 Y K0+270 - TRAMO FUE DEMOLIDO DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL BOX Y SE COBRÓ EN ACTAS ANTERIORES					
k0+263,00		5,20			
	15,00			4,91	73,65
k0+278,00		4,61			
	20,00			4,61	92,20
k0+298,00		4,61			
	20,00			4,62	92,40
k0+318,00		4,63			
	20,00			5,17	103,40
k0+338,00		5,71			
	20,00			6,76	135,20
k0+358,00		7,80			
	20,00			10,61	212,20
k0+378,00		13,41			
	20,00			10,92	218,40
k0+398,00		8,42			
	18,00			8,18	147,24
k0+416,00		7,94			
DEMOLICIÓN PAVIMENTO BARRIOS SAN MARTIN, QUEBRADA LA IGLESIA, SAN PEDRO Y URBANIZACIONES EL SOL 1 Y SOL 2. CARRERA 31 ENTRE CRA 30 Y CALLE 74A					
k0+000,00		6,24			
	12,00			6,11	73,32
k0+012,00		5,98			
	16,00			6,20	99,20
k0+028,00		6,42			
SUBTOTAL - ACTA #10					1.579,50


CONTINUACIÓN - ESQUEMA ÁREA DE PAVIMENTO DEMOLIDA DESDE K0+198 HASTA K0+945

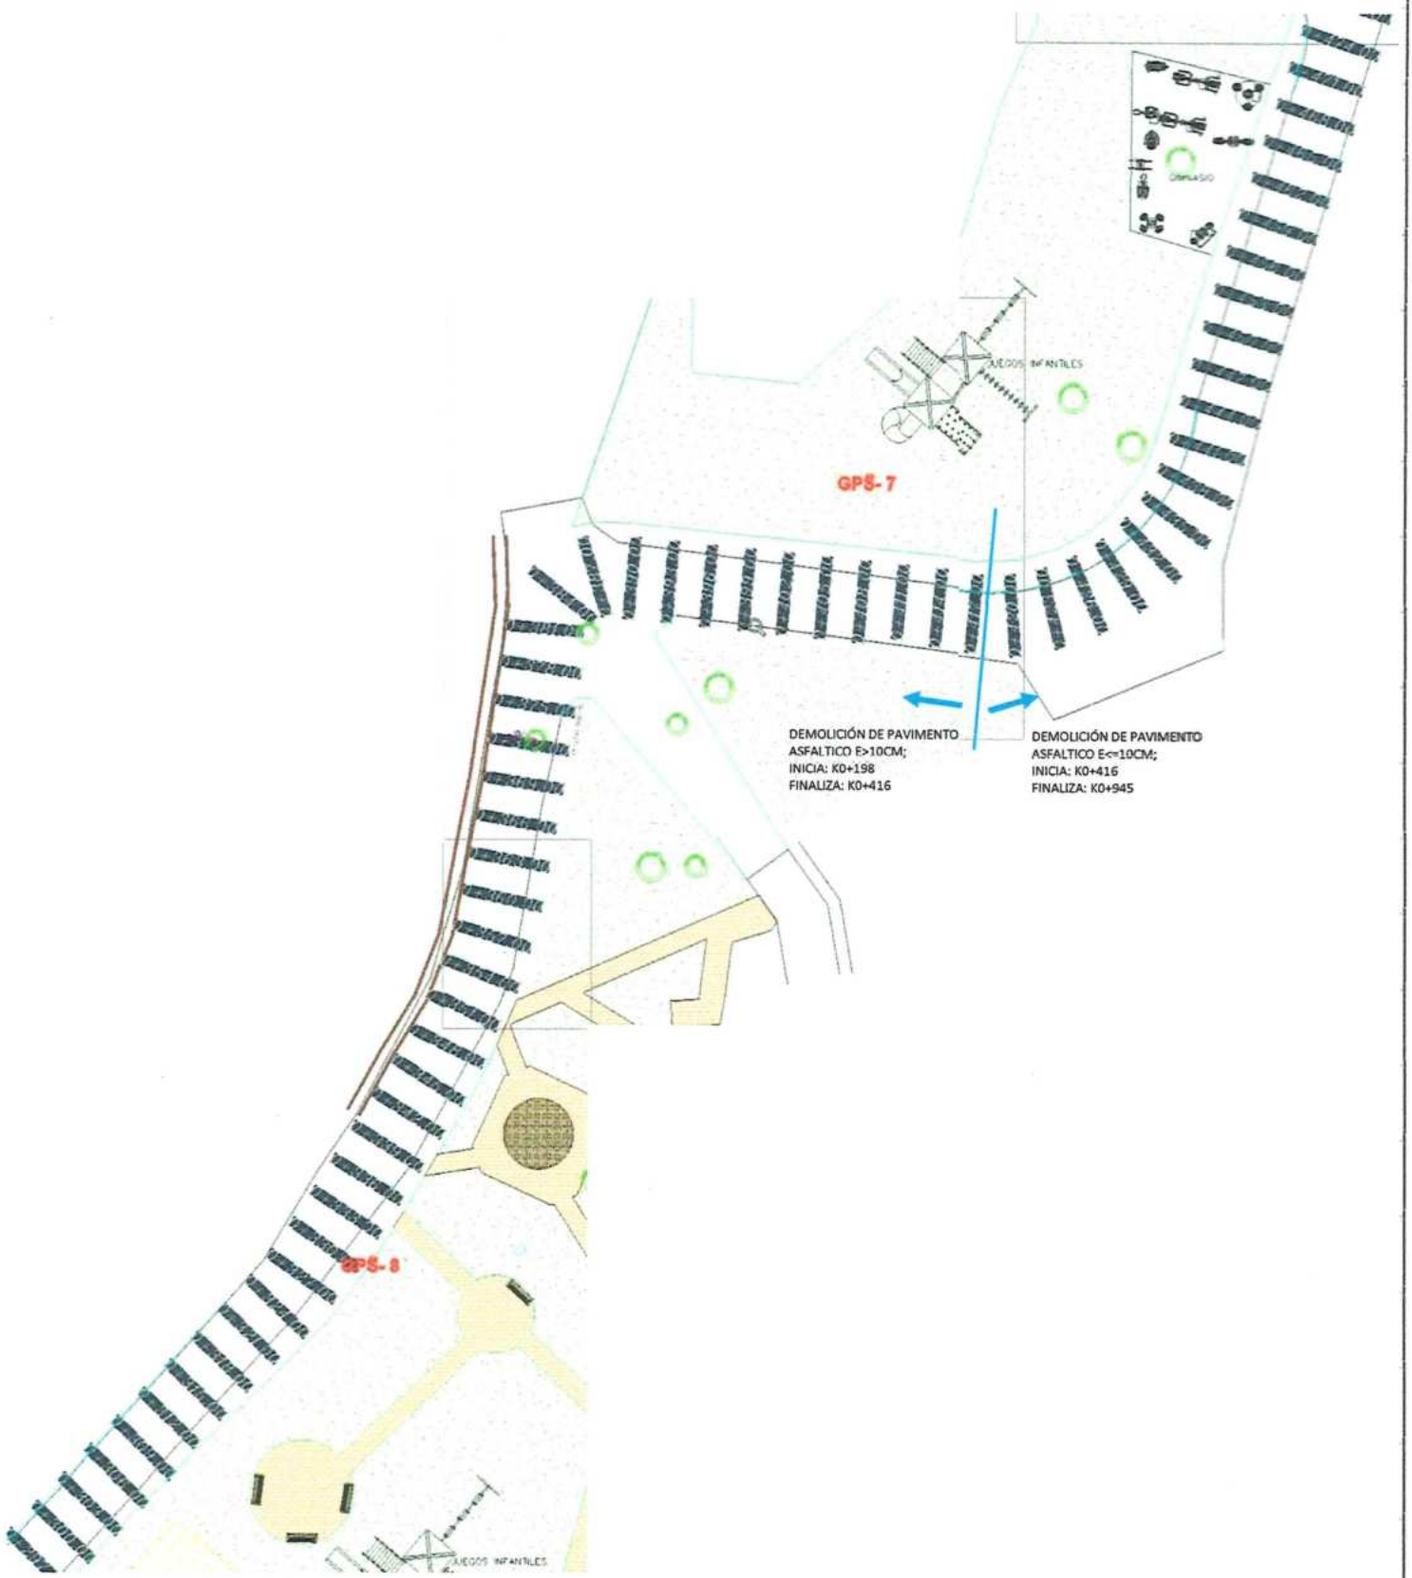


CONTINUACIÓN - ESQUEMA ÁREA DE PAVIMENTO DEMOLIDA DESDE K0+198 HASTA K0+945

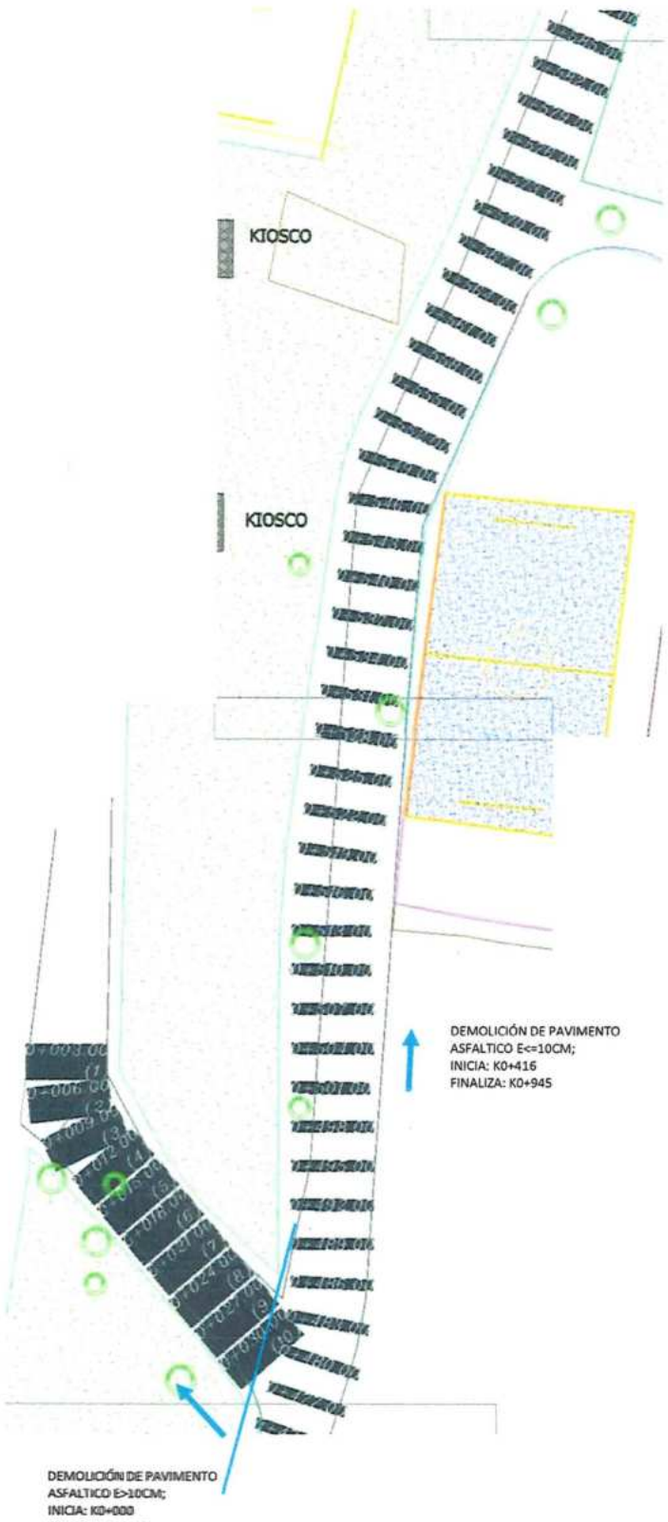


CONTINUACIÓN - ESQUEMA ÁREA DE PAVIMENTO DEMOLIDA DESDE K0+198 HASTA K0+945

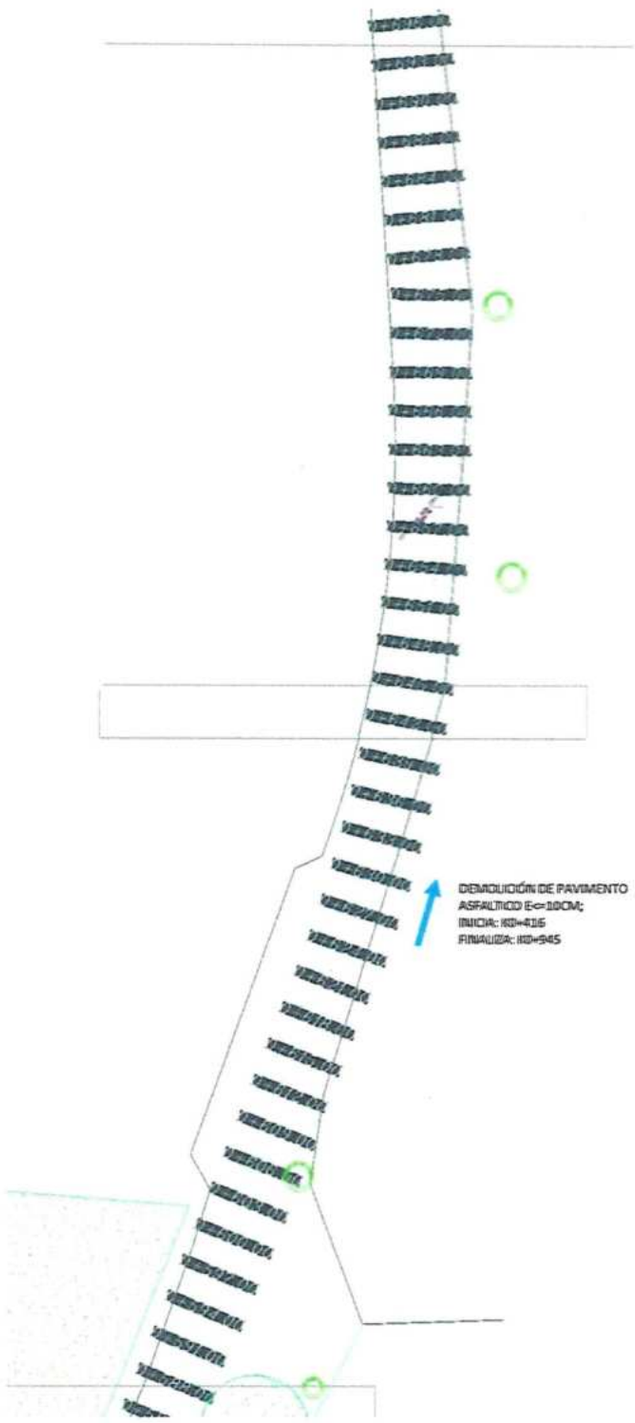

CONTINUACIÓN - ESQUEMA ÁREA DE PAVIMENTO DEMOLIDA DESDE K0+198 HASTA K0+945

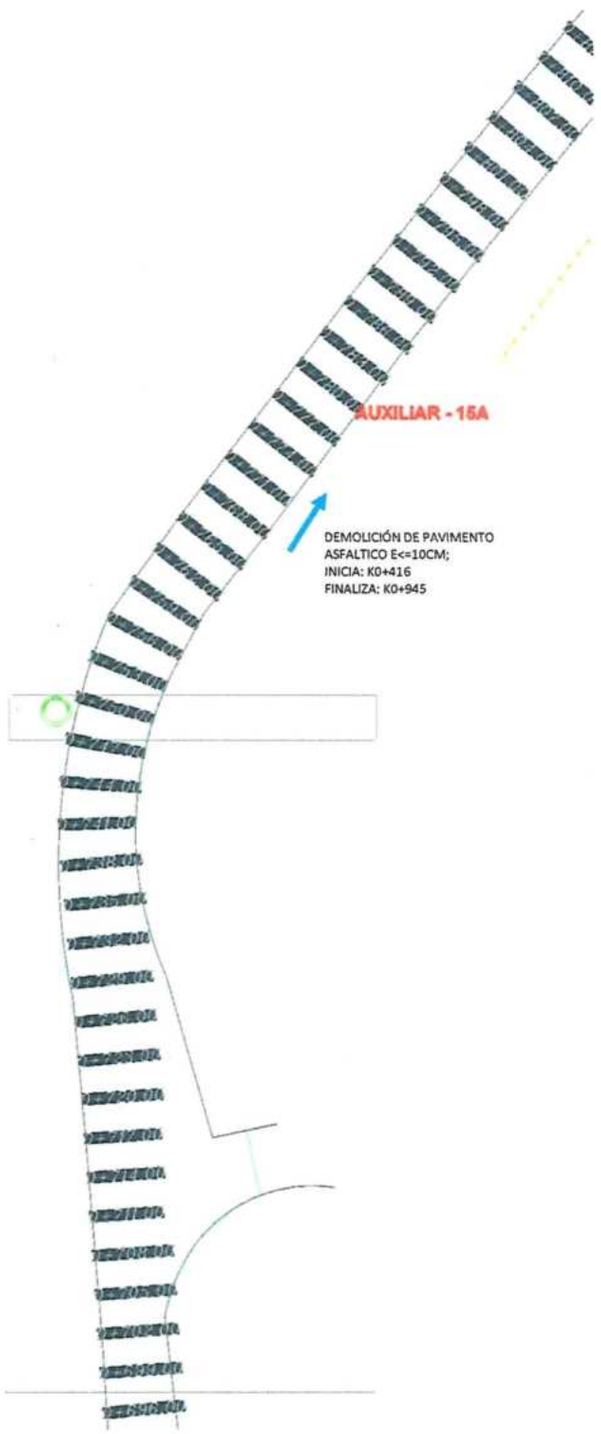

CONTINUACIÓN - ESQUEMA ÁREA DE PAVIMENTO DEMOLIDA DESDE K0+198 HASTA K0+945

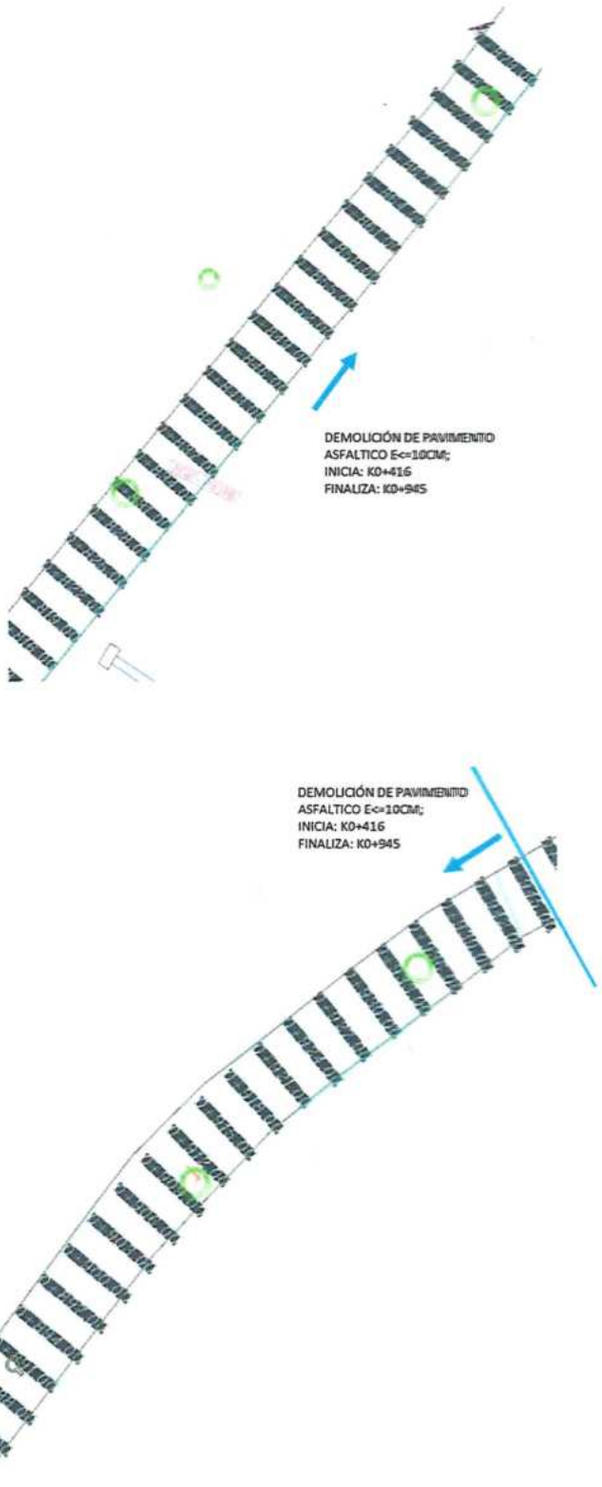

OBSERVACIONES:	PRESENTE ACTA 10		ACUMULADO			TOTALES	1.579,50
	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% EJECUTADO		
	1.579,50	$ 78.979.738,50	1.676,04	$ 83.807.028,12	22,49%		

CONTRATISTA: CONSORCIO LA FLORA 2023

Firma:

REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERVENTORÍA CANALIZACIÓN BGA

Firma:

REPRESENTANTE LEGAL

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA ALCALDÍA DE BUCARAMANGA	Alcaldía de Bucaramanga	Consorcio La Flora 2023	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	30	MM	06	AAAA	2025	ACTA No.	10	ELABORÓ	DANIEL GÓMEZ BARRAGÁN

OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
ENTIDAD CONTRATANTE:	ALCALDÍA DE BUCARAMANGA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
CONTRATISTA:	CONSORCIO LA FLORA 2023
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORÍA CANALIZACIÓN BGA

CAPÍTULO 2. MOVIMIENTO DE TIERRA

2.01.01.01.2	A	En tierra sin entibados	-	De 0.00 a 2.50 m de profundidad	UNIDAD	m3

ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMÁGEN

REGISTRO FOTOGRÁFICO







	Abscisado	DIMENSIONES Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Área (m2)	Volumen (m3)
			ACTA #10			
		EXCAVACIÓN PARA BOX-CULVERT DE K4+333 A K4+323.				
MOD 91	K4+333,00		15,77	2,50	39,42	
		10,00				459,35
MOD 92	K4+323,00		20,98	2,50	52,45	
		EXCAVACIÓN PARA BOX-CULVERT DE K4+243.3 A K4+194.				
MOD 97	K4+273,80		15,42	2,50	38,54	
		13,80				527,23
MOD 98	K4+260,00		15,15	2,50	37,87	
		10,00				362,60
MOD 99	K4+250,00		13,86	2,50	34,65	
		6,70				249,24
MOD 100	K4+243,30		15,90	2,50	39,75	
					SUBTOTAL EXCAVACIÓN PARA BOX	1.598,42
					SUBTOTAL EXCAVACIÓN PARA BOX E.C.A.L EN TIERRA SIN ENTIBADOS 80%	1278,74
		CAJEO DEL PAVIMENTO ANTIGUO PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO NUEVO BARRIOS SAN MARTIN, QUEBRADA LA IGLESIA, SAN PEDRO Y URBANIZACIONES EL SOL I Y SOL 2. ENTRE LAS ABSCISAS K0+195 Y LA K0+375				
	K0+195,00		6,43			
		6,00		0,3	6,43	11,57
	K0+201,00		6,43			
		6,00		0,3	6,43	11,57
	K0+207,00		6,42			
		6,00		0,3	6,45	11,61
	K0+213,00		6,47			
		6,00		0,3	6,48	11,66
	K0+219,00		6,48			
		6,00		0,3	6,45	11,61
	K0+225,00		6,42			
		6,00		0,3	6,41	11,54
	K0+231,00		6,4			
		6,00		0,3	6,41	11,54
	K0+237,00		6,41			
		4,00		0,3	6,4	7,68
	K0+241,00		6,39			
		6,50		0,3	3,2	6,24
	K0+247,50		0			
		6,50			0	-
	K0+254,00		0			
		4,00			0	-
	K0+258,00		0			
		6,00			0	-
	K0+264,00		0			
		6,00			0	-
	K0+270,00		0			
		9,00		0,3	2,95	7,97
	K0+279,00		5,9			
		6,00		0,3	5,65	10,17
	K0+285,00		5,4			
		6,00		0,3	5,43	9,77
	K0+291,00		5,45			
		6,00		0,3	5,41	9,74
	K0+297,00		5,37			
		6,00		0,3	5,39	9,70
	K0+303,00		5,41			
		6,00		0,3	5,4	9,72
	K0+309,00		5,39			
		6,00		0,3	5,43	9,77
	K0+315,00		5,46			
		6,00		0,3	5,44	9,79
	K0+321,00		5,42			
		6,00		0,3	5,43	9,77
	K0+327,00		5,43			
		6,00		0,3	5,61	10,10
	K0+333,00		5,79			
		6,00		0,3	5,89	10,60
	K0+339,00		5,99			
		6,00		0,3	6,01	10,82
	K0+345,00		6,02			
		6,00		0,3	5,94	10,69
	K0+351,00		5,86			
		6,00		0,3	5,87	10,57
	K0+357,00		5,88			

ÁREA PAVIMENTACIÓN BARRIOS SAN MARTIN, QUEBRADA LA IGLESIA, SAN PEDRO Y URBANIZACIONES EL SOL 1 Y SOL 2. ENTRE LAS ABSCISAS K0+195 Y LA K0+375




EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS ABSCISAS K0+247,5 Y K0+270 FUE EXCAVADO PREVIAMENTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL BOX-CULVERT.

	6,00		0,3	5,9	10,62
K0+363,00		5,92			
	6,00		0,3	5,92	10,66
K0+369,00		5,91			
	6,00		0,3	5,96	10,73
K0+375,00		6,01			
PAVIMENTACIÓN BARRIOS SAN MARTIN, QUEBRADA LA IGLESIA, SAN PEDRO Y URBANIZACIONES EL SOL 1 Y SOL 2. ENTRE LAS ABSCISAS K0+405,3 Y LA K0+526,3					
K0+405,30		6,17			
	5,70		0,3	6,12	10,47
K0+411,00		6,07			
	6,00		0,3	5,98	10,76
K0+417,00		5,89			
	6,00		0,3	8,62	15,52
K0+423,00		11,34			
	9,00		0,3	11,68	31,54
K0+432,00		12,02			
	5,50		0,3	9,41	15,53
K0+437,50		6,79			
	6,00		0,3	6,34	11,41
K0+443,50		5,89			
	9,50		0,3	5,73	16,33
K0+453,00		5,56			
	9,00		0,3	5,51	14,88
K0+462,00		5,46			
	6,00		0,3	5,53	9,95
K0+468,00		5,59			
	5,50		0,3	5,66	9,34
K0+473,50		5,72			
	6,20		0,3	5,81	10,81
K0+479,70		5,89			
	6,60		0,3	5,84	11,56
K0+486,30		5,79			
	7,20		0,3	5,88	12,70
K0+493,50		5,96			
	7,80		0,3	5,96	13,95
K0+501,30		5,95			
	5,80		0,3	5,95	10,35
K0+507,10		5,94			
	6,40		0,3	5,96	11,44
K0+513,50		5,97			
	6,40		0,3	5,96	11,44
K0+519,90		5,94			
	6,40		0,3	5,95	11,42
K0+526,30		5,96			
LOSAS IRREGULARES					
K0+422,00	2,94	1,41	0,3		1,24
K0+433,00	3,02	2,62	0,3		2,37
K0+437,00	1,1	0,91	0,3		0,30
K0+475,80	2,03	0,52	0,3		0,32
K0+483,00	1,19	0,53	0,3		0,19


DESCUENTO DE VOLUMEN

ABSCISAS	DIMENSIONES Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Área (m2)	Volumen (m3)
PAVIMENTACIÓN BARRIOS SAN MARTIN, QUEBRADA LA IGLESIA, SAN PEDRO Y URBANIZACIONES EL SOL 1 Y SOL 2. ENTRE LAS ABSCISAS K0+195 Y LA K0+375					
CORONA DE POZO D=1,80MTS - K0+240,5			0,3	2,54	-0,76
CORONA DE POZO D=2,10MTS - K0+249			0,3	3,46	-1,04
CORONA DE POZO D=2,10MTS - K0+253,50			0,3	3,46	-1,04
CORONA DE POZO D=1,20MTS - K0+280,5			0,3	1,13	-0,34
CORONA DE POZO D=1,20MTS - K0+330			0,3	1,13	-0,34
CORONA DE POZO D=1,20MTS - K0+373,5			0,3	1,13	-0,34
PAVIMENTACIÓN BARRIOS SAN MARTIN, QUEBRADA LA IGLESIA, SAN PEDRO Y URBANIZACIONES EL SOL 1 Y SOL 2. ENTRE LAS ABSCISAS K0+405,3 Y LA K0+526,3					
CORONA DE POZO D=1,20MTS - K0+424			0,3	1,13	-0,34
CORONA DE POZO D=1,20MTS - K0+427,5			0,3	1,13	-0,34
CAJA DE INSPECCIÓN - K0+436	1,04	0,87	0,3		-0,27
CORONA DE POZO D=2,10MTS - K0+439,00			0,3	3,46	-1,04
CORONA DE POZO D=1,20MTS - K0+444,4			0,3	1,13	-0,34
CORONA DE POZO D=1,20MTS - K0+500			0,3	1,13	-0,34
CORONA DE POZO D=1,20MTS - K0+511,3			0,3	1,13	-0,34
SUBTOTAL EXCAVACIÓN PARA CAJEO DE VÍA					503,16
SUBTOTAL E.C.A.L EN MAT GRANULAR SIN ENTIBADOS 80% - ACTA #10.					1781,90

CONTINUACIÓN - ÁREA PAVIMENTACIÓN BARRIOS SAN MARTIN, QUEBRADA LA IGLESIA, SAN PEDRO Y URBANIZACIONES EL SOL 1 Y SOL 2. ENTRE LAS ABSCISAS K0+195 Y LA K0+375

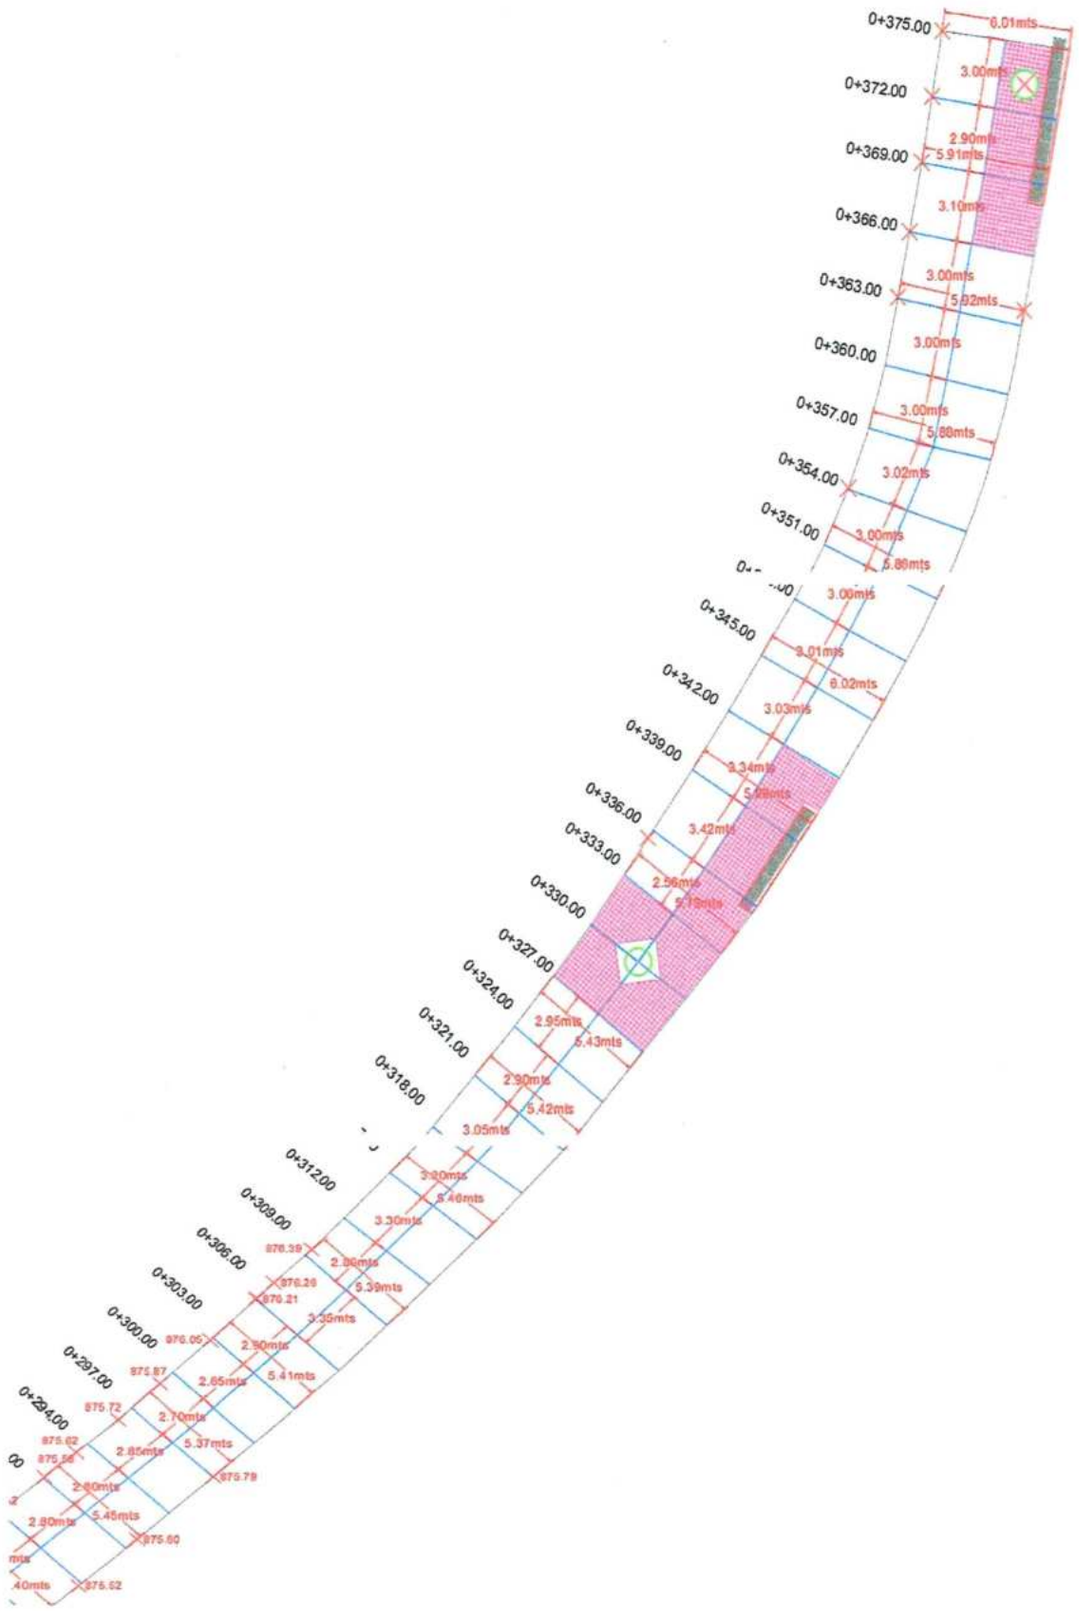


ÁREA PAVIMENTACIÓN BARRIOS SAN MARTIN, QUEBRADA LA IGLESIA, SAN PEDRO Y URBANIZACIONES EL SOL 1 Y SOL 2. ENTRE LAS ABSCISAS K0+405,3 Y LA K0+526,3

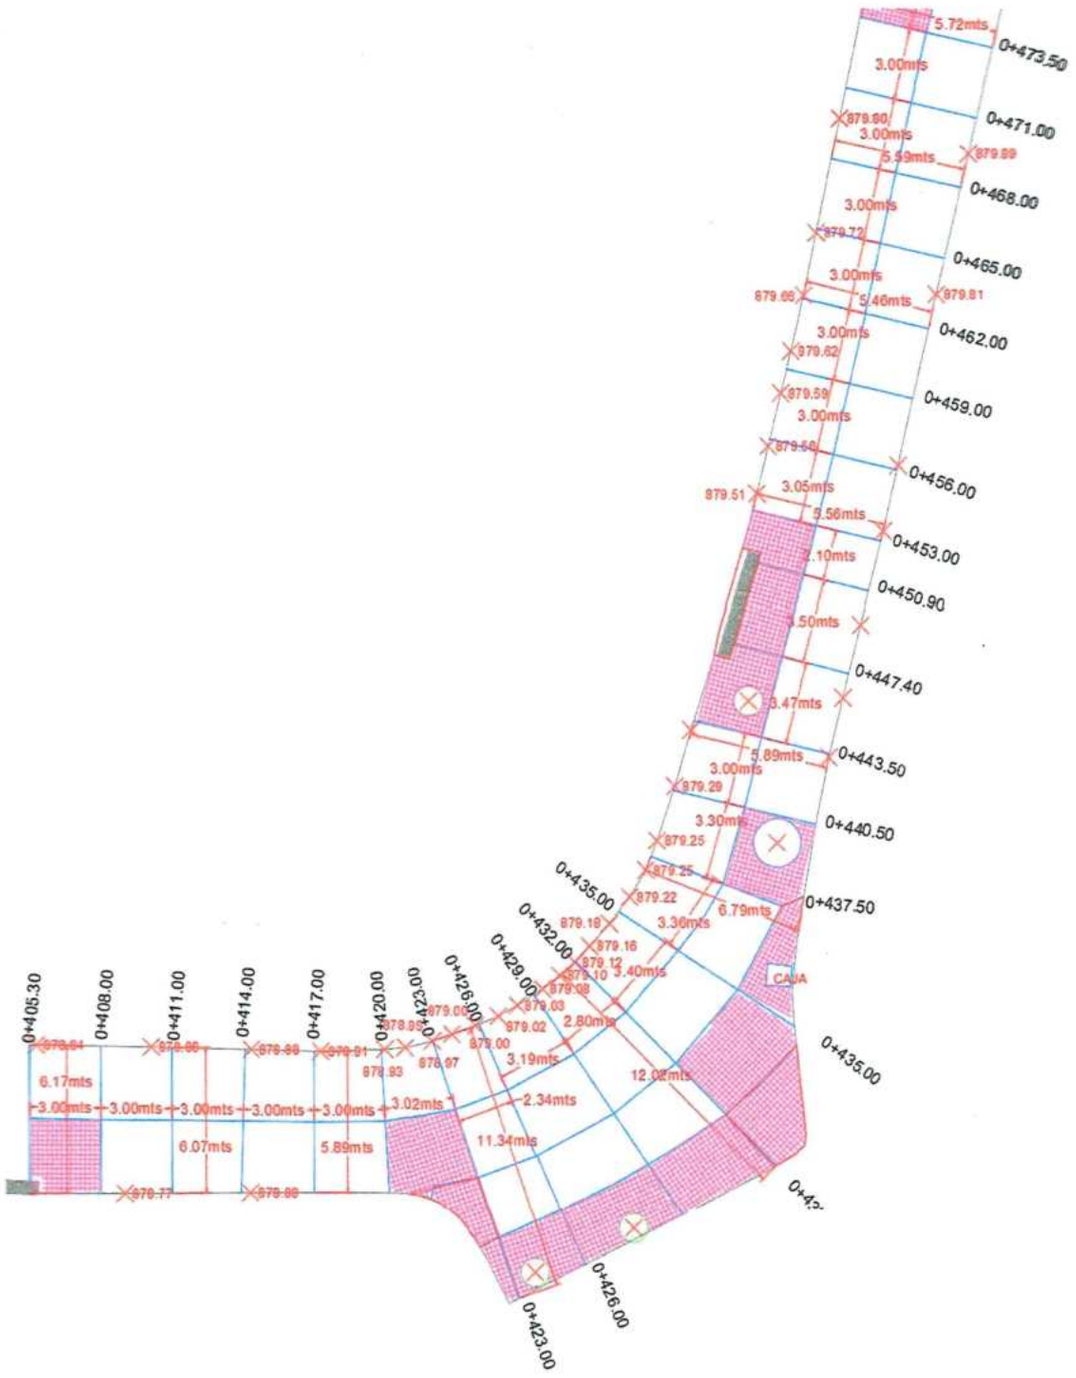


CONTINUACIÓN - ÁREA PAVIMENTACIÓN BARRIOS SAN MARTIN, QUEBRADA LA IGLESIA, SAN PEDRO Y URBANIZACIONES EL SOL 1 Y SOL 2. ENTRE LAS ABSCISAS K0+405,3 Y LA K0+526,3




SECCIONES - EXCAVACIÓN PARA BOX-CULVERT DE K4+333 A K4+323.

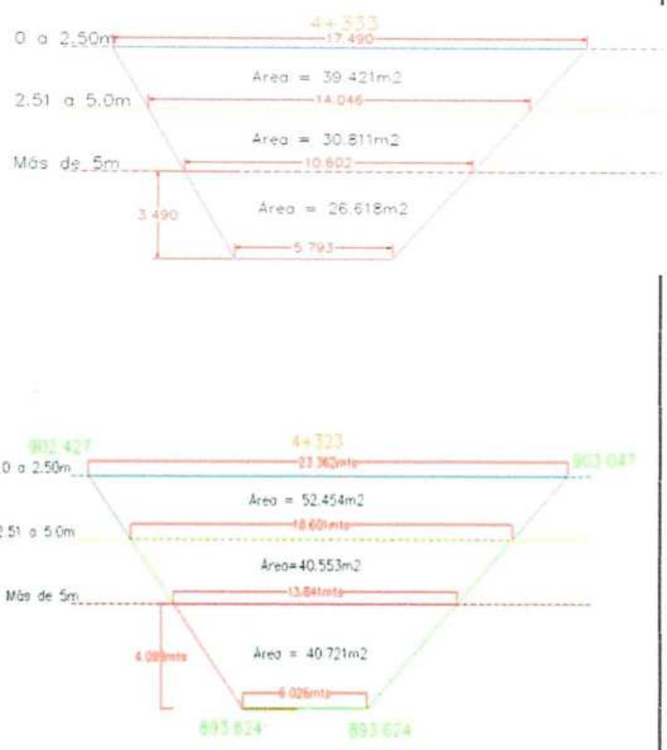



SECCIONES - EXCAVACIÓN PARA BOX-CULVERT DE K4+273,8 A K4+243,3.

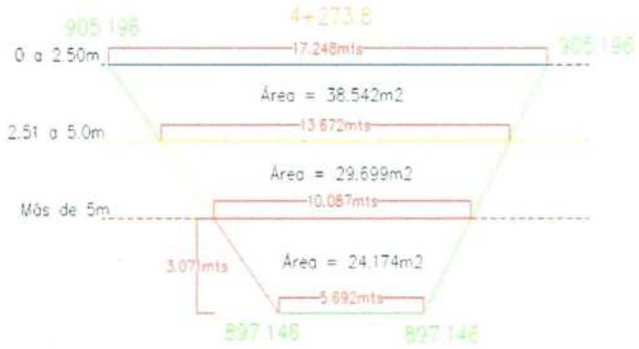

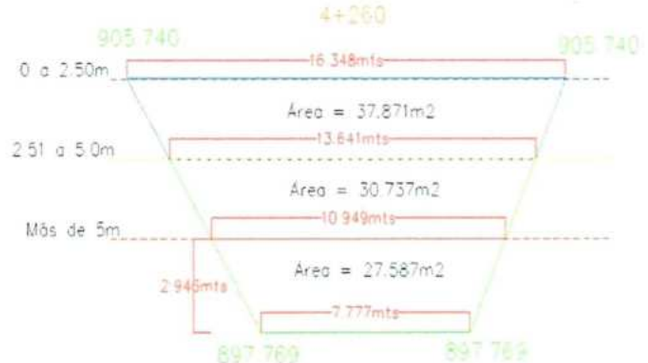

SECCIONES - EXCAVACIÓN PARA BOX-CULVERT DE K4+273,8 A K4+243,3.

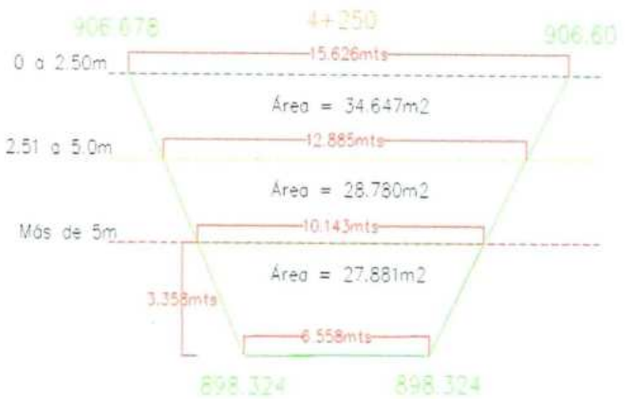



OBSERVACIONES:	PRESENTE ACTA 10		ACUMULADO			TOTALES	1.781,90
	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% EJECUTADO		
	1.781,90	$ 61.537.916,50	24.380,04	$ 841.964.681,40	99,99%		

CONTRATISTA: CONSORCIO LA FLORA 2023

Firma: _____
REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERVENTORÍA CANALIZACIÓN EGA

Firma: _____
REPRESENTANTE LEGAL

Secretaria de Infraestructura Fisica Alcaldía de Bucaramanga	Alcaldía de Bucaramanga	Consorcio La Flora 2023	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	30	MM	06	AAAA	2025	ACTA No.	10	ELABORÓ	DANIEL GÓMEZ BARRAGÁN

OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
ENTIDAD CONTRATANTE:	ALCALDÍA DE BUCARAMANGA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
CONTRATISTA:	CONSORCIO LA FLORA 2023
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORÍA CANALIZACIÓN BGA

CAPÍTULO 2. MOVIMIENTO DE TIERRA

2.01.01.01.4	B	En material granular sin entibados - De 2.51 a 5.00 m de profundidad	UNIDAD	m3


ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMÁGEN

REGISTRO FOTOGRÁFICO






SECCIONES - EXCAVACIÓN PARA BOX-CULVERT DE K4+333 A K4+323.

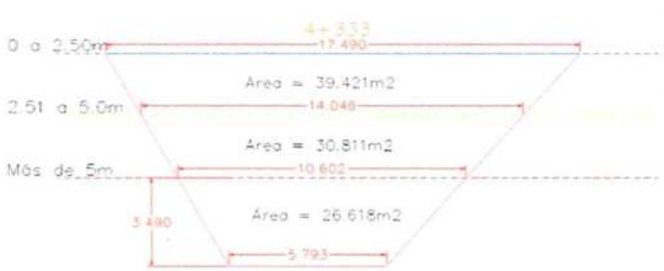


	Abscisado	DIMENSIONES Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Área (m2)	Volumen (m3)
			ACTA #10			
			EXCAVACIÓN PARA BOX-CULVERT DE K4+333 A K4+323.			
MOD 91	K4+333,00		12,32	2,50	30,811	
		10,00				356,80
MOD 92	K4+323,00		16,22	2,50	40,55	
			EXCAVACIÓN PARA BOX-CULVERT DE K4+243.3 A K4+194.			
MOD 97	K4+273,80		11,88	2,50	29,70	
		13,80				417,04
MOD 98	K4+260,00		12,30	2,50	30,74	
		10,00				297,60
MOD 99	K4+250,00		11,51	2,50	28,78	
		6,70				209,81
MOD 100	K4+243,30		13,54	2,50	33,85	
					SUBTOTAL EXCAVACIÓN	1.281,25
					SUBTOTAL E.C.A.L EN MAT GRANULAR SIN ENTIBADOS 80% - ACTA #10.	1.025,00

CONTINUACIÓN SECCIONES - EXCAVACIÓN PARA BOX-CULVERT DE K4+333 A K4+323.

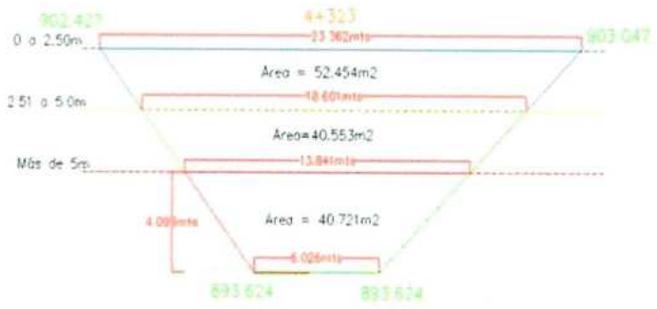



CONTINUACIÓN SECCIONES - EXCAVACIÓN PARA BOX-CULVERT DE K4+273,8 A K4+243,3.

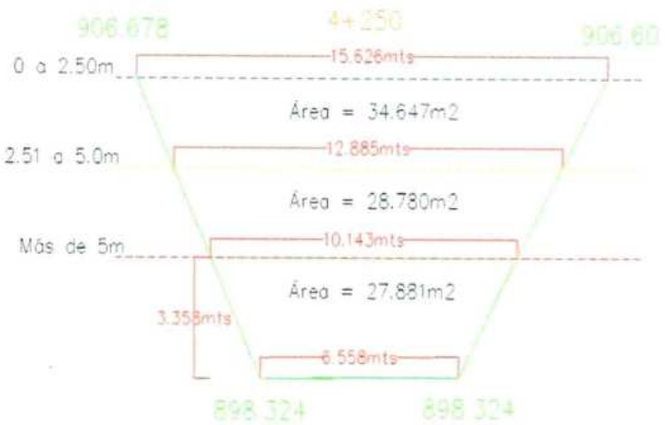

SECCIONES - EXCAVACIÓN PARA BOX-CULVERT DE K4+273,8 A K4+243,3.





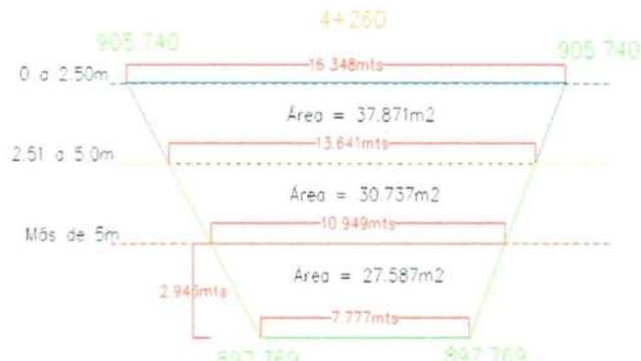

OBSERVACIONES:	PRESENTE ACTA 10		ACUMULADO			TOTALES	1.025,00
	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% EJECUTAD		
	1.025,00	$ 45.720.125,00	15.738,40	$ 702.011.332,00	84,83%		

CONTRATISTA: CONSORCIO LA FLORA 2023

Firma: REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERVENTORÍA CANALIZACIÓN BGA

Firma: REPRESENTANTE LEGAL

Secretaria de Infraestructura Física Alcaldía de Bucaramanga	Alcaldía de Bucaramanga	Consorcio La Flora 2023	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	30	MM	06	AAAA	2025	ACTA No.	10	ELABORÓ	DANIEL GÓMEZ BARRAGÁN

OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
ENTIDAD CONTRATANTE:	ALCALDÍA DE BUCARAMANGA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
CONTRATISTA:	CONSORCIO LA FLORA 2023
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORÍA CANALIZACIÓN BGA

CAPÍTULO 2. MOVIMIENTO DE TIERRA

2.01.01.01.4	C	En material granular sin entibados - A más de 5.00 m de profundidad	UNIDAD	m3


ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMÁGEN

REGISTRO FOTOGRÁFICO






SECCIONES - EXCAVACIÓN PARA BOX-CULVERT DE K4+333 A K4+323.

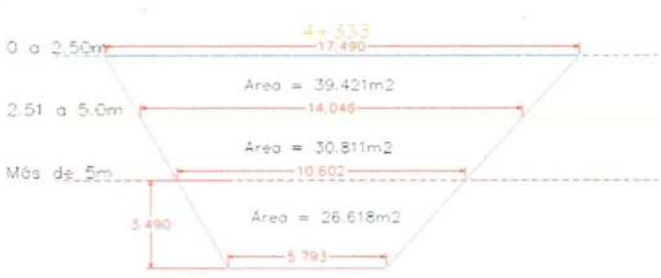


	Abscisado	DIMENSIONES Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Área (m2)	Volumen (m3)
			ACTA #10			
			EXCAVACIÓN PARA BOX-CULVERT DE K4+333 A K4+323.			
MOD 91	K4+333,00		10,65	2,50	26,62	
		10,00				336,70
MOD 92	K4+323,00		16,29	2,50	40,72	
			EXCAVACIÓN PARA BOX-CULVERT DE K4+243.3 A K4+194.			
MOD 97	K4+273,80		9,67	2,50	24,17	
		13,80				357,14
MOD 98	K4+260,00		11,04	2,50	27,59	
		10,00				277,35
MOD 99	K4+250,00		11,15	2,50	27,88	
		6,70				169,24
MOD 100	K4+243,30		9,06	2,50	22,64	
					SUBTOTAL EXCAVACIÓN	1.140,43
					SUBTOTAL E.C.A.L EN MAT GRANULAR SIN ENTIBADOS 80% - ACTA #10.	912,34


CONTINUACIÓN SECCIONES - EXCAVACIÓN PARA BOX-CULVERT DE K4+333 A K4+323.

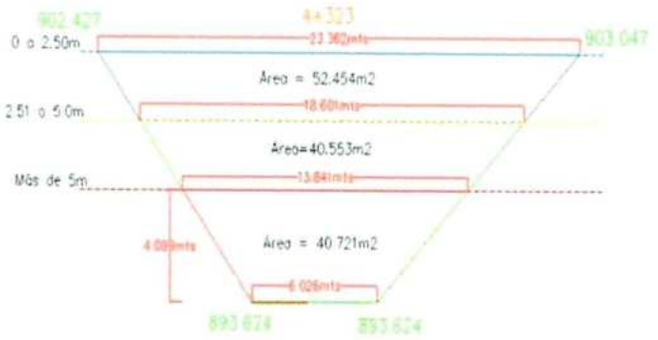



CONTINUACIÓN SECCIONES - EXCAVACIÓN PARA BOX-CULVERT DE K4+273,8 A K4+243,3.

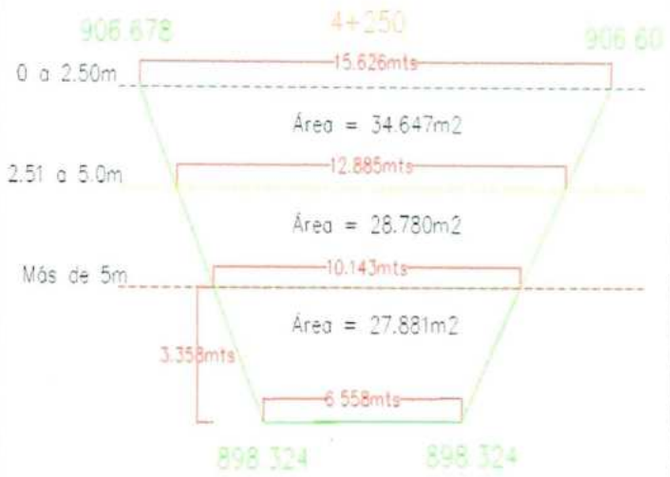

SECCIONES - EXCAVACIÓN PARA BOX-CULVERT DE K4+273,8 A K4+243,3.

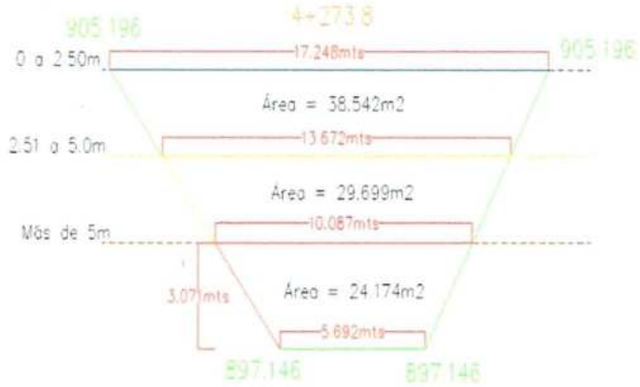



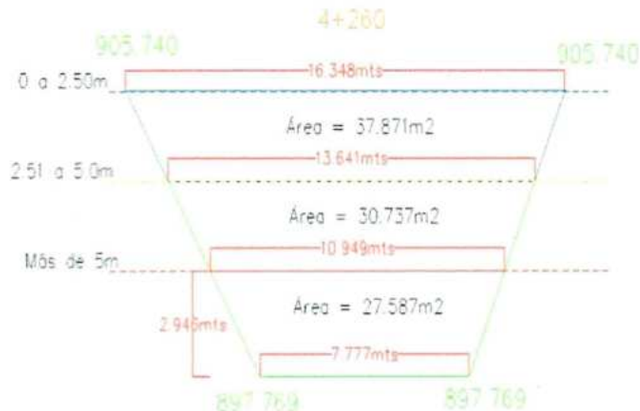

OBSERVACIONES:	PRESENTE ACTA 10		ACUMULADO			TOTALES	912,34
	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% EJECUTAD		
	912,34	$ 63.240.671,78	12.073,32	$ 836.886.322,44	99,89%		

CONTRATISTA: CONSORCIO LA FLORA 2023

Firma: REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERVENTORÍA CANALIZACIÓN BGA

Firma: REPRESENTANTE LEGAL

Secretaría de Infraestructura Física Alcaldía de Bucaramanga	Alcaldía de Bucaramanga	Consorcio La Flora 2023	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	30	MM	06	AAAA	2025	ACTA No.	10	ELABORÓ	DANIEL GÓMEZ BARRAGÁN

OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
ENTIDAD CONTRATANTE:	ALCALDÍA DE BUCARAMANGA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
CONTRATISTA:	CONSORCIO LA FLORA 2023
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORÍA CANALIZACIÓN BGA

CAPÍTULO 2. MOVIMIENTO DE TIERRA

2.01.01.01.5	En roca a cualquier profundidad	UNIDAD	m3

ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMAGEN

REGISTRO FOTOGRÁFICO






SECCIONES - EXCAVACIÓN PARA BOX-CULVERT DE K4+333 A K4+323.




	Abscisado local (m)	DIMENSIONES Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Área (m2)	Volumen (m3)
ACTA #10						
EXCAVACIÓN EN TIERRA SIN ENTIBADOS CON ACARREO LIBRE DE 0 A 2.5 MTS DE PROFUNDIDAD. ITEM 2.01.01.01.2-A						
EXCAVACIÓN PARA BOX-CULVERT DE K4+333 A K4+323.						
MOD 91	K4+333,00		15,77	2,50	39,42	
		10,00				459,35
MOD 92	K4+323,00		20,98	2,50	52,45	
EXCAVACIÓN PARA BOX-CULVERT DE K4+243.3 A K4+194.						
MOD 97	K4+273,80		15,42	2,50	38,54	
		13,80				527,23
MOD 98	K4+260,00		15,15	2,50	37,87	
		10,00				362,60
MOD 99	K4+250,00		13,86	2,50	34,65	
		6,70				249,24
MOD 100	K4+243,30		15,90	2,50	39,75	
EXCAVACIÓN EN MATERIAL GRANULAR SIN ENTIBADOS CON ACARREO LIBRE DE 2.51 A 5MTS DE PROFUNDIDAD. ITEM 2.01.01.01.4-B						
EXCAVACIÓN PARA BOX-CULVERT DE K4+333 A K4+323.						
MOD 91	K4+333,00		12,32	2,50	30,81	
		10,00				356,80
MOD 92	K4+323,00		16,22	2,50	40,55	
EXCAVACIÓN PARA BOX-CULVERT DE K4+243.3 A K4+194.						
MOD 97	K4+273,80		11,88	2,50	29,70	
		13,80				417,04
MOD 98	K4+260,00		12,30	2,50	30,74	
		10,00				297,60
MOD 99	K4+250,00		11,51	2,50	28,78	
		6,70				209,81
MOD 100	K4+243,30		13,54	2,50	33,85	
EXCAVACIÓN EN MATERIAL GRANULAR SIN ENTIBADOS CON ACARREO LIBRE A MÁS DE 5MTS DE PROFUNDIDAD. ITEM 2.01.01.01.4-C						
EXCAVACIÓN PARA BOX-CULVERT DE K4+333 A K4+323.						
MOD 91	K4+333,00		10,65	2,50	26,62	
		10,00				336,70
MOD 92	K4+323,00		16,29	2,50	40,72	
EXCAVACIÓN PARA BOX-CULVERT DE K4+243.3 A K4+190.						
MOD 97	K4+273,80		9,67	2,50	24,17	
		13,80				357,14
MOD 98	K4+260,00		11,04	2,50	27,59	
		10,00				277,35
MOD 99	K4+250,00		11,15	2,50	27,88	
		6,70				169,24
MOD 100	K4+243,30		9,06	2,50	22,64	
					SUBTOTAL EXCAVACIÓN	4.020,10
SUBTOTAL E.C.A.L EN ROCA A CUALQUIER PROFUNDIDAD 20% - ACTA #10.						804,02


CONTINUACIÓN SECCIONES - EXCAVACIÓN PARA BOX-CULVERT DE K4+333 A K4+323.

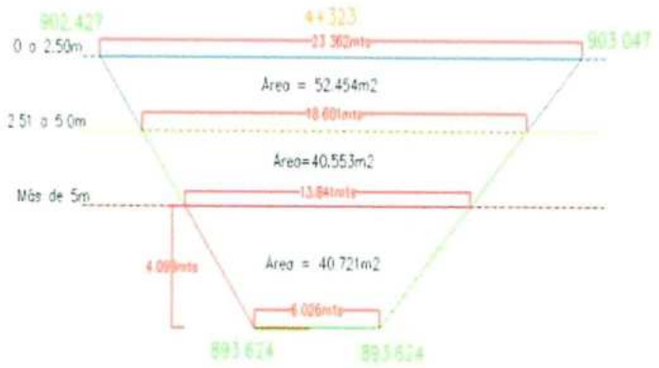



CONTINUACIÓN SECCIONES - EXCAVACIÓN PARA BOX-CULVERT DE K4+273,8 A K4+243,3.

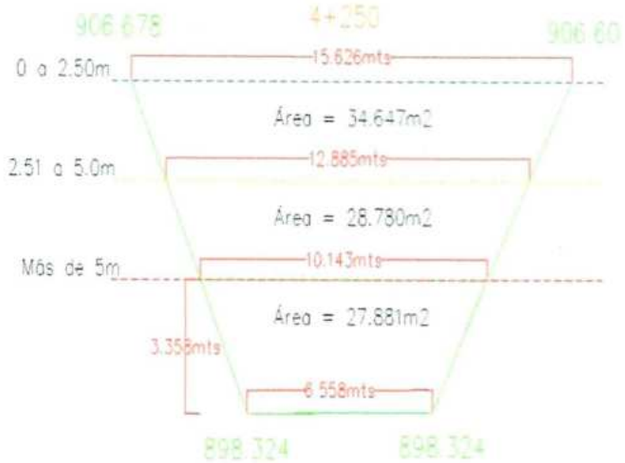

SECCIONES - EXCAVACIÓN PARA BOX-CULVERT DE K4+273,8 A K4+243,3.

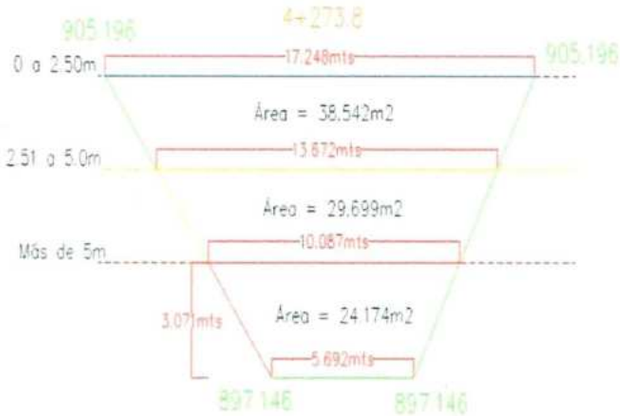



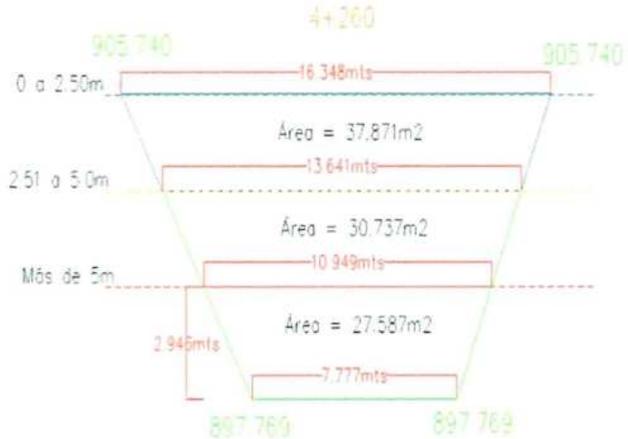

OBSERVACIONES:	ACTA 09		ACUMULADO			TOTALES	804,02
	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% EJECUTADO		
	804,02	$ 104.644.007,02	13.890,21	$ 1.807.954.872,71	83,27%		

CONTRATISTA: CONSORCIO LA FLORA 2023

Firma: _____
REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERVENTORÍA CANALIZACIÓN BGA

Firma: _____
REPRESENTANTE LEGAL

Secretaria de Infraestructura Fisica Alcaldía de Bucaramanga	Alcaldía de Bucaramanga	Consorcio La Flora 2023	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	30	MM	06	AAAA	2025	ACTA No.	10	ELABORÓ	DANIEL GÓMEZ BARRAGÁN

OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
ENTIDAD CONTRATANTE:	ALCALDÍA DE BUCARAMANGA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
CONTRATISTA:	CONSORCIO LA FLORA 2023
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORÍA CANALIZACIÓN BGA

CAPÍTULO 2. MOVIMIENTO DE TIERRA

2.02.02.01	Suministro, conformación y compactación de rellenos comunes - En zanja		UNIDAD	m3

ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMÁGEN

REGISTRO FOTOGRÁFICO








Abscisas	DIMENSIONES Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Área (m2)	Volumen (m3)
ACTA #10					
RELLENOS PARA ZANJA DEL BOX					
RELLENO A LOS COSTADOS Y SOBRE EL NIVEL DEL BOX HASTA RASANTE DEL TERRENO, ENTRE LAS ABSCISAS K4+433 (MÓDULO 80) Y LA K4+353 (MÓDULO 88).					
K4+433,00		7,86	6,80	53,46	
	10,00				716,00
K4+423,00		11,01	8,15	89,72	
	10,00				863,40
K4+413,00		11,06	7,50	82,94	
	10,00				793,25
K4+403,00		10,37	7,30	75,71	
	10,00				833,55
K4+393,00		11,82	7,70	91,00	
	10,00				951,00
K4+383,00		13,66	7,26	99,20	
	10,00				821,00
K4+373,00		9,19	7,07	65,00	
	10,00				632,40
K4+363,00		8,07	7,62	61,48	
	10,00				678,70
K4+353,00		9,63	7,71	74,26	
				SUBTOTAL - ACTA #10	6.289,30






SECCIÓN TRANSVERSAL - RELLENO A LOS COSTADOS Y SOBRE EL NIVEL DEL BOX HASTA RASANTE DEL TERRENO, ENTRE LAS ABSCISAS K4+433 (MÓDULO 80) Y LA K4+353 (MÓDULO 88).

4+433

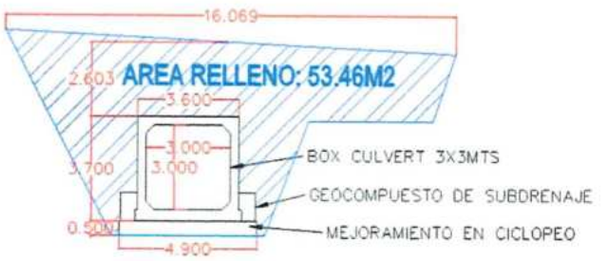

4+423

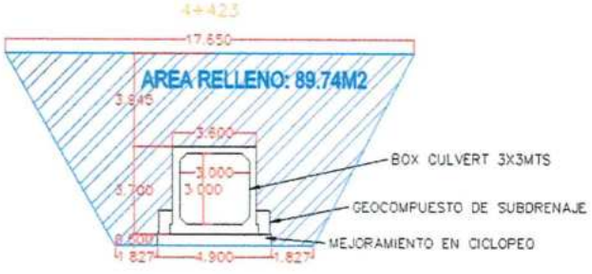




4+413




CONTINUACIÓN SECCIÓN TRANSVERSAL - RELLENO A LOS COSTADOS Y SOBRE EL NIVEL DEL BOX HASTA RASANTE DEL TERRENO, ENTRE LAS ABSCISAS K4+433 (MÓDULO 80) Y LA K4+353 (MÓDULO 88).

4+403

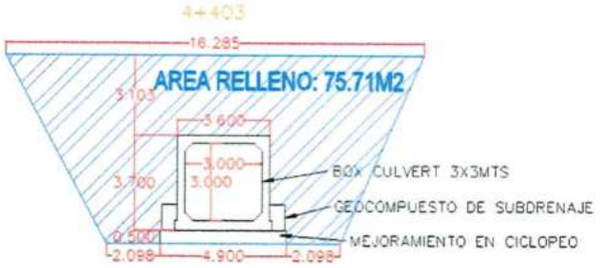

4+393

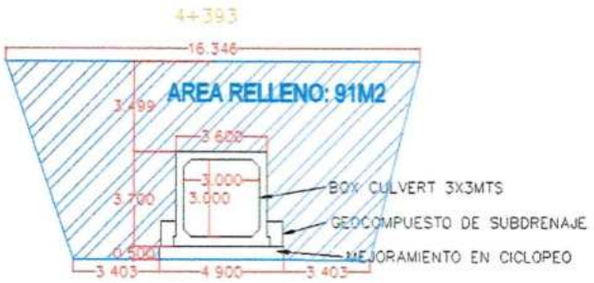


4+383




4+373



CONTINUACIÓN SECCIÓN TRANSVERSAL - RELLENO A LOS COSTADOS Y SOBRE EL NIVEL DEL BOX HASTA RASANTE DEL TERRENO, ENTRE LAS ABSCISAS K4+433 (MÓDULO 80) Y LA K4+353 (MÓDULO 88).

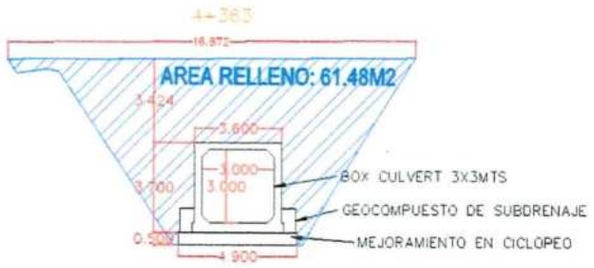

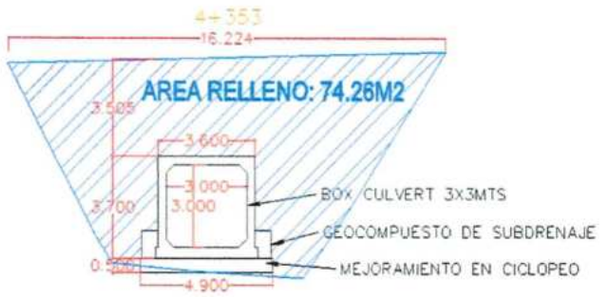

OBSERVACIONES:	PRESENTE ACTA 10		ACUMULADO			TOTALES	6.289,30
	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% EJECUTADO		
	6.289,30	$ 525.200.575,10	48.682,37	$ 4.065.402.178,59	76,06%		

CONTRATISTA: CONSORCIO LA FLORA 2023

Firma: REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERVENTORIA CANALIZACIÓN BGA

Firma: REPRESENTANTE LEGAL

Secretaria de Infraestructura Fisica Alcaldía de Bucaramanga	Alcaldía de Bucaramanga	Consorcio La Flora 2023	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	30	MM	06	AAAA	2025	ACTA No.	10	ELABORÓ	DANIEL GÓMEZ BARRAGÁN

OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
ENTIDAD CONTRATANTE:	ALCALDÍA DE BUCARAMANGA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
CONTRATISTA:	CONSORCIO LA FLORA 2023
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORÍA CANALIZACIÓN BGA

CAPITULO 2. MOVIMIENTO DE TIERRA

2.02.06	Suministro, conformación y compactación de relleno en arena para cimentación de tubería		UNIDAD	m3

ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMÁGEN

REGISTRO FOTOGRÁFICO








Ubicación			DIMENSIONES Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Volumen por metro (m3/ml)	Volumen (m3)
ACTA #10							
RED INTERCEPTOR AGUAS RESIDUALES							
TUBERÍA 24"	P(QI-PA)R7 (K0+750)	P(QI-PA)R6 (K0+831)	81,93	1,30	0,8	1,04	85,21
TUBERÍA 24"	P(QI-PA)R6 (K0+831)	P(QI-PA)R5 (K0+876)	42,61	1,30	0,8	1,04	44,31
TUBERÍA 24"	P(QI-PA)R5 (K0+876)	P(QI-PA)R4 (K0+910)	32,71	1,30	0,8	1,04	34,02
TUBERÍA 24"	P(QI-PA)R4 (K0+910)	P(QI-PA)R3 (K0+935)	21,68	1,30	0,8	1,04	22,55
OTRAS REDES							
TUBERÍA 12"	P(26-27A)R	P(26-27A)R1	2,90	0,90	0,5	0,45	1,31
TUBERÍA 12"	P(26-27A)R1	P(26-27A)R2	47,74	0,90	0,5	0,45	21,48
TUBERÍA 12"	P(26-27A)R2	CAJA	4,20	0,90	0,5	0,45	1,89
DESCUENTO VOLUMEN TUBERÍA							
	Ubicación		**DIMENSIONES Longitud (m)**	**Diametro (m)**	**Alto (m)**	**Volumen por metro (m3/ml)**	**Volumen (m3)**
TUBERÍA 24"	P(QI-PA)R7 (K0+750)	P(QI-PA)R6 (K0+831)	81,93	0,60		-0,28	- 23,17
TUBERÍA 24"	P(QI-PA)R6 (K0+831)	P(QI-PA)R5 (K0+876)	42,61	0,60		-0,28	- 12,05
TUBERÍA 24"	P(QI-PA)R5 (K0+876)	P(QI-PA)R4 (K0+910)	32,71	0,60		-0,28	- 9,25
TUBERÍA 24"	P(QI-PA)R4 (K0+910)	P(QI-PA)R3 (K0+935)	21,68	0,60		-0,28	- 6,13
OTRAS REDES							
TUBERÍA 12"	P(26-27A)R	P(26-27A)R1	2,90	0,30		-0,07	- 0,20
TUBERÍA 12"	P(26-27A)R1	P(26-27A)R2	47,74	0,30		-0,07	- 3,37
TUBERÍA 12"	P(26-27A)R2	CAJA	4,20	0,30		-0,07	- 0,30
						SUBTOTAL - ACTA #10	156,30


SECCIÓN TRANSVERSAL - CIMENTACIÓN EN ARENA PARA TUBERÍA DE 24"

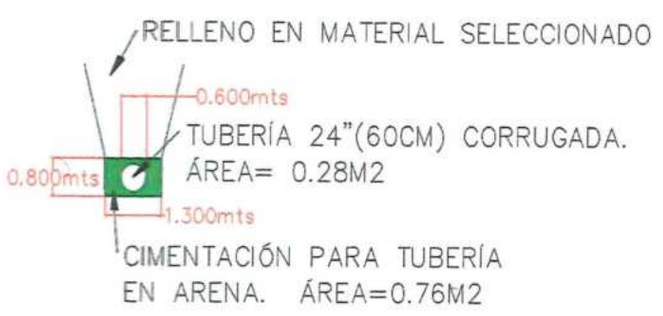


SECCIÓN TRANSVERSAL - CIMENTACIÓN EN ARENA PARA TUBERÍA DE 12"



VISTA EN PLANTA - RED INTERCEPTOR AGUAS RESIDUALES DE LA ABSCISA K0+750 A LA K0+935

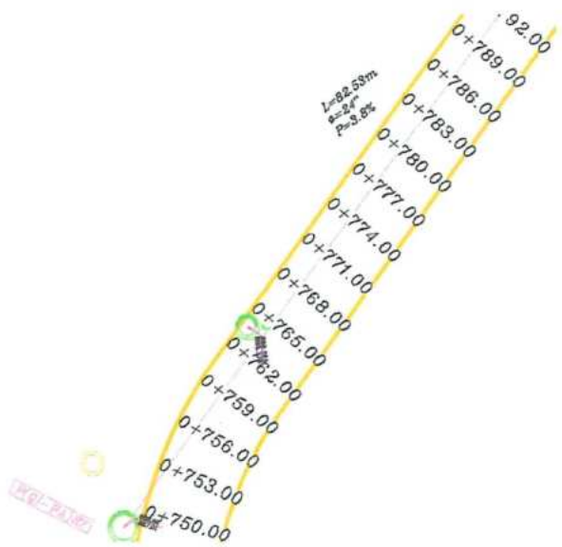

CONTINUACIÓN VISTA EN PLANTA - RED INTERCEPTOR AGUAS RESIDUALES DE LA ABSCISA K0+750 A LA K0+935

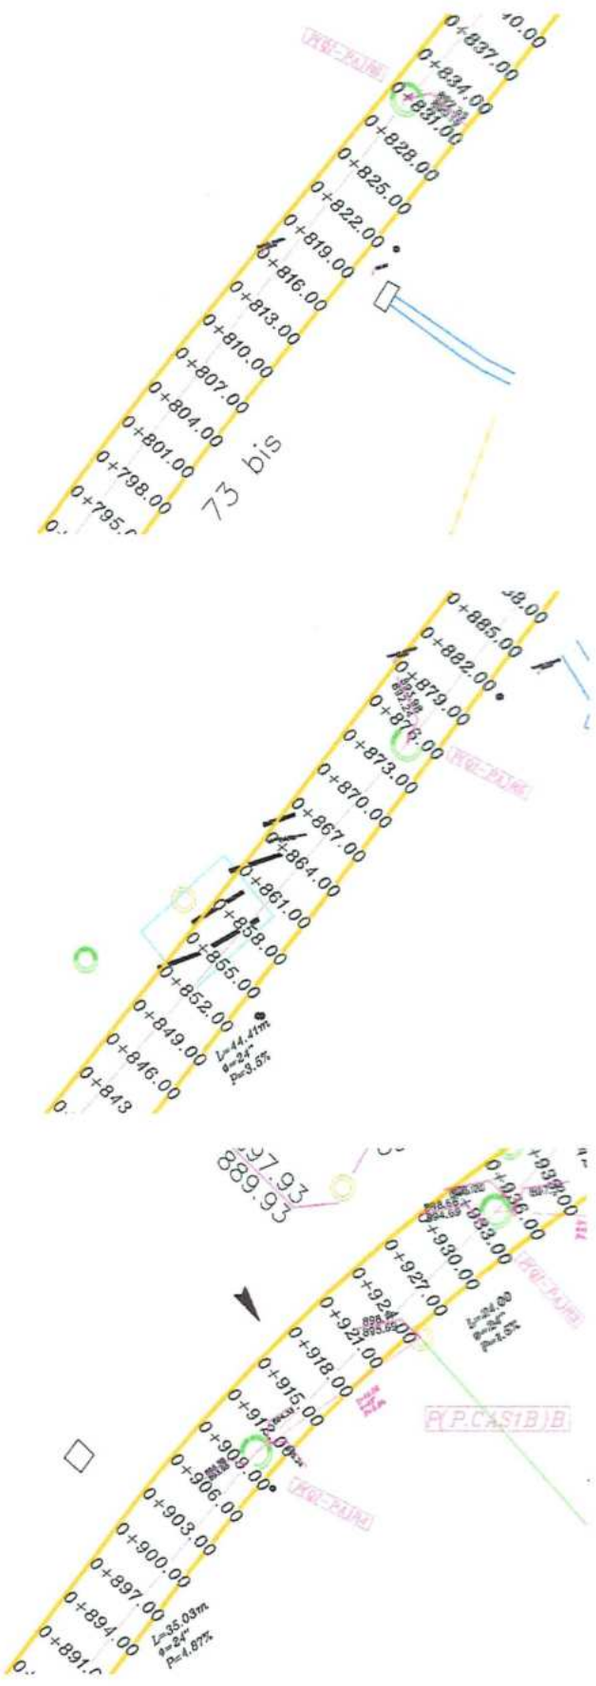

OBSERVACIONES:	PRESENTE ACTA 10		ACUMULADO			TOTALES	156,30
	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% EJECUTADO		
	156,30	$ 22.848.090,30	1.216,79	$ 177.871.578,99	59,20%		

CONTRATISTA: CONSORCIO LA FLORA 2023

Firma:

REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERVENTORIA CANALIZACIÓN BGA

Firma:

REPRESENTANTE LEGAL

Secretaría de Infraestructura Física Alcaldía de Bucaramanga	Alcaldía de Bucaramanga	Consorcio La Flora 2023	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	30	MM	06	AAAA	2025	ACTA No.	10	ELABORÓ	DANIEL GÓMEZ BARRAGÁN

OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
ENTIDAD CONTRATANTE:	ALCALDÍA DE BUCARAMANGA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
CONTRATISTA:	CONSORCIO LA FLORA 2023
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORÍA CANALIZACIÓN BGA

CAPÍTULO 2. MOVIMIENTO DE TIERRA

2.03.04	Sobrecarreos para acarreos totales mayores de 1000 m.		UNIDAD	m3-est

ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMÁGEN

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Descripción	DIMENSIONES Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Área sección (m2)	Volumen (m3)
ACTA #10					
EXCAVACIONES CON ACARREO LIBRE					
EXCAVACIÓN EN TIERRA SIN ENTIBADOS CON ACARREO LIBRE DE 0 A 2.5MTS DE PROFUNDIDAD. ITEM 2.01.01.01.2-A					1781,90
EXCAVACIÓN EN MATERIAL GRANULAR SIN ENTIBADOS CON ACARREO LIBRE DE 2.51 A 5MTS DE PROFUNDIDAD. ITEM 2.01.01.01.4-B					1025,00
EXCAVACIÓN EN MATERIAL GRANULAR SIN ENTIBADOS CON ACARREO LIBRE A MÁS DE 5MTS DE PROFUNDIDAD. ITEM 2.01.01.01.4-C					912,34
EXCAVACIÓN EN ROCA CON ACARREO LIBRE A CUALQUIER PROFUNDIDAD. ITEM 2.01.01.01.5					804,02
TOTAL EXCAVACIÓN CON ACARREO LIBRE					**4.523,26**
DEMOLICIONES					
ROTURA DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS ESPESOR ENTRE 0,06 M Y 0,10 M. ITEM 1.07.01.02					325,31
ROTURA DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS ESPESOR ENTRE 0,10 M Y 0,20 M. ITEM 1.07.01.03					157,95
DEMOLICIÓN DE PISOS, SARDINELES, CANALETAS Y ESCALERAS. ITEM 5.01.01					123,92
TOTAL DEMOLICIONES					**607,18**
TOTAL VOLUMEN ACARREO					5.130,44
TOTAL ESTACIONES					11,30
SUBTOTAL - ACTA #10					57973,94

OBSERVACIONES:	PRESENTE ACTA 10		ACUMULADO			TOTALES	
	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% EJECUTADO		
	57.973,94	$ 185.284.712,24	837.827,16	$ 2.677.695.603,36	85,23%		57.973,94

CONTRATISTA: CONSORCIO LA FLORA 2023	INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERVENTORIA CANALIZACION BGA
Firma:	Firma:
REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL

Secretaria de Infraestructura Fisica Alcaldía de Bucaramanga	Alcaldía de Bucaramanga	Consorcio La Flora 2023	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	30	MM	06	AAAA	2025	ACTA No.	10	ELABORÓ	DANIEL GÓMEZ BARRAGÁN

OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
ENTIDAD CONTRATANTE:	ALCALDÍA DE BUCARAMANGA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
CONTRATISTA:	CONSORCIO LA FLORA 2023
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORÍA CANALIZACIÓN BGA

CAPÍTULO 3. TUBERÍAS PREFABRICADAS

3.04.02.10	Suministro e instalación de tubería de D= 24"	UNIDAD	m

ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMAGEN

REGISTRO FOTOGRÁFICO







	Ubicación		DIMENSIONES			Elemento (und)	Longitud (m)
			Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)		
ACTA #10							
TUBERÍA 24"	P(QI-PA)R7 (K0+750)	P(QI-PA)R6 (K0+831)	82,53			1,00	82,53
TUBERÍA 24"	P(QI-PA)R6 (K0+831)	P(QI-PA)R5 (K0+876)	43,21			1,00	43,21
TUBERÍA 24"	P(QI-PA)R5 (K0+876)	P(QI-PA)R4 (K0+910)	33,31			1,00	33,31
TUBERÍA 24"	P(QI-PA)R4 (K0+910)	P(QI-PA)R3 (K0+935)	22,28			1,00	22,28
						SUBTOTAL - ACTA #10	181,33

Secretaria de Infraestructura Fisica Alcaldía de Bucaramanga	Alcaldía de Bucaramanga	Consorcio La Flora 2023	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	30	MM	06	AAAA	2025	ACTA No.	10	ELABORÓ	DANIEL GÓMEZ BARRAGAN


OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
ENTIDAD CONTRATANTE:	ALCALDÍA DE BUCARAMANGA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
CONTRATISTA:	CONSORCIO LA FLORA 2023
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORÍA CANALIZACIÓN BGA

CAPÍTULO 4. ESTRUCTURAS

4.02.01	Suministro y colocación de concreto de 4000 psi	UNIDAD	m3

ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMÁGEN

SECCIÓN TRANSVERSAL DEL BOX CULVERT 3.00X3.00 M

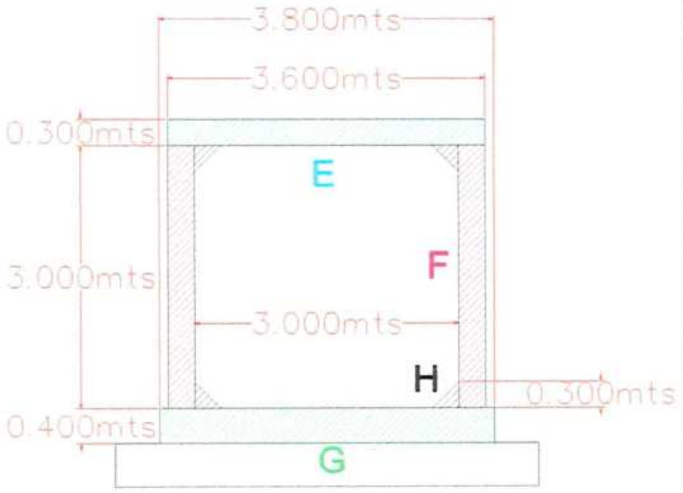





	Ubicación	DIMENSIONES			Elemento (und)	Volumen (m3)
		Longitud (m)	Ancho (m)	Altura (m)		
ACTA #10						
BOX CULVERT DE SECCIÓN 3.00X3.00 M						
BOX-CULVERT 3.00X3.00 M, MÓDULO 91 DE LA ABSCISA K4+329.9 A K4+319.9.						
LOZA INFERIOR, E=0.40MT. (G)		10,00	3,80	0,4	1,00	15,20
MUROS IZQUIERDO Y DERECHO, E=0.30MT. (F)		10,00	0,30	3	2,00	18,00
CHAFLANES 0,30x0,30MT. 45°. (H)		10,00	0,15	0,3	4,00	1,80
LOZA SUPERIOR, E=0.30MT. (E)		10,00	3,60	0,3	1,00	10,80
BOX-CULVERT 3.00X3.00 M, MÓDULO 97 DE LA ABSCISA K4+270,6 A K4+260,6. (INC ESCALÓN)						
LOZA INFERIOR, E=0.40MT. (G)		10,00	3,80	0,4	1,00	15,20
ESCALÓN (DISIPADOR) - LOZA INFERIOR. EN K4+270,6.		3,80	1,00	0,3	1,00	1,14
LOZA SUPERIOR, E=0.30MT. (E)		10,00	3,60	0,3	1,00	10,80
MUROS IZQUIERDO Y DERECHO, E=0.30MT. (F)		10,00	0,30	3	2,00	18,00
CHAFLANES 0,30x0,30MT. 45°. (H)		10,00	0,15	0,3	4,00	1,80
ESCALÓN (DISIPADOR) - LOZA SUPERIOR. EN K4+270,6.		1,00	3,60	0,3	1,00	1,08
ESCALÓN (DISIPADOR) - MUROS. EN K4+270,6		2,50	0,30	1	2,00	1,50
BOX-CULVERT 3.00X3.00 M, MÓDULO 98 DE LA ABSCISA K4+260,6 A K4+250,6. (INC ESCALÓN)						
LOZA INFERIOR, E=0.40MT. (G)		10,00	3,80	0,4	1,00	15,20
ESCALÓN (DISIPADOR) - LOZA INFERIOR. EN K4+260,6.		3,80	1,00	0,3	1,00	1,14
LOZA SUPERIOR, E=0.30MT. (E)		10,00	3,60	0,3	1,00	10,80
MUROS IZQUIERDO Y DERECHO, E=0.30MT. (F)		10,00	0,30	3	2,00	18,00
CHAFLANES 0,30x0,30MT. 45°. (H)		10,00	0,15	0,3	4,00	1,80
ESCALÓN (DISIPADOR) - LOZA SUPERIOR. EN K4+260,6.		1,00	3,60	0,3	1,00	1,08
ESCALÓN (DISIPADOR) - MUROS. EN K4+260,6		2,50	0,30	1	2,00	1,50
BOX-CULVERT 3.00X3.00 M, MÓDULO 99 DE LA ABSCISA K4+250,6 A K4+240,6.						
LOZA INFERIOR, E=0.40MT. (G)		10,00	3,80	0,4	1,00	15,20
MUROS IZQUIERDO Y DERECHO, E=0.30MT. (F)		10,00	0,30	3	2,00	18,00
CHAFLANES 0,30x0,30MT. 45°. (H)		10,00	0,15	0,3	4,00	1,80
LOZA SUPERIOR, E=0.30MT. (E)		10,00	3,60	0,3	1,00	10,80
					SUBTOTAL - ACTA No. 10	190,64

OBSERVACIONES:	PRESENTE ACTA 10		ACUMULADO			TOTALES	190,64
	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% EJECUTADO		
	190,64	$ 199.414.396,64	5.991,66	$ 6.267.432.143,16	91,04%		

CONTRATISTA: CONSORCIO LA FLORA 2023	INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERVENTORÍA CANALIZACIÓN BGA
Firma:	Firma:
REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL

Secretaria de Infraestructura Física Alcaldía de Bucaramanga	Alcaldía de Bucaramanga	Consorcio La Flora 2023	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD 30	MM 06	AAAA 2025	ACTA No.	10	ELABORÓ	DANIEL GÓMEZ BARRAGÁN


OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
ENTIDAD CONTRATANTE:	ALCALDÍA DE BUCARAMANGA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
CONTRATISTA:	CONSORCIO LA FLORA 2023
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORÍA CANALIZACIÓN BGA

CAPÍTULO 4. ESTRUCTURAS

4.02.05	Suministro y colocación de concreto de 3000 psi		UNIDAD	m3

ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMAGEN


DIMENSIONES PROMEDIO MURO DE CONTENCIÓN. TRAMO 1: L=6,05MTS Hpromedio=2,20MTS

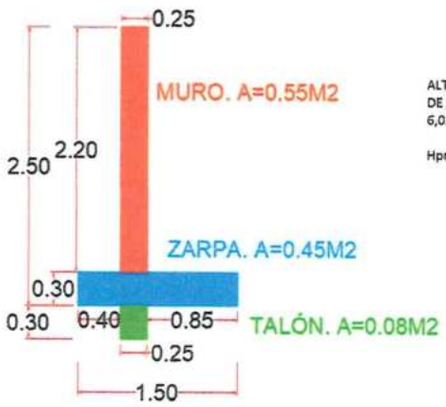

ALTURA DEL VÁSTAGO VARÍA DE **2,75MTS A 1,65MTS** EN LOS 6,05MTS DE LONGITUD.

Hpromedio: 2,20mts

DIMENSIONES PROMEDIO MURO DE CONTENCIÓN. TRAMO 2: L=5,70MTS Hpromedio=1,30MTS

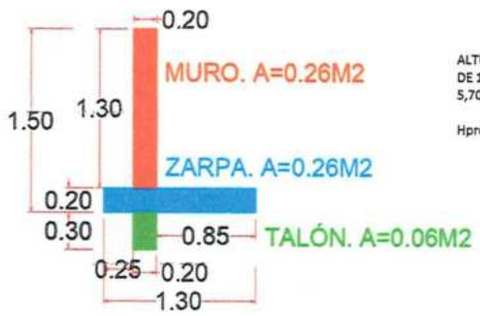

ALTURA DEL VÁSTAGO VARÍA DE **1,75MTS A 0,85MTS** EN LOS 5,70MTS DE LONGITUD.

Hpromedio: 1,30mts

REGISTRO FOTOGRÁFICO



	Ubicación	DIMENSIONES Longitud (m)	DIMENSIONES Área sección transversal (m2)	Elemento (und)	Volumen (m3)
		ACTA #10			
		MURO DE CONTENCIÓN RAMPA EN PARQUE EXTREMO			
		MURO PRIMER TRAMO L=6,05MTS, ALTURA VARÍA DE 2,75MTS A 1,65MTS			
	TALÓN	6,05	0,08	1,00	0,48
	ZARPA	6,05	0,45	1,00	2,72
	VÁSTAGO H=2,20M	6,05	0,55	1,00	3,33
		MURO SEGUNDO TRAMO L=5,7MTS, ALTURA VARIA DE 1,75MTS A 0,85MTS			
	TALÓN	5,70	0,06	1,00	0,34
	ZARPA	5,70	0,26	1,00	1,48
	VÁSTAGO H=1.30M	5,70	0,26	1,00	1,48
		MURO FRENTE A SEGUNDO TRAMO L=4MTS, CONFINA RAMPA POR COSTADO IZQUIERDO, ALTURA VARÍA DE 1,5MTS A 0,8MTS			
	TALÓN	4,00	0,06	1,00	0,24
	ZARPA	4,00	0,26	1,00	1,04
	VÁSTAGO H=1.15M	4,00	0,23	1,00	0,92
				SUBTOTAL - ACTA No. 10	12,03

OBSERVACIONES:	PRESENTE ACTA 10		ACUMULADO			TOTALES	12,03
	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% EJECUTADO		
	12,03	$ 11.656.239,93	163,26	$ 158.187.675,06	58,55%		

CONTRATISTA: CONSORCIO LA FLORA 2023

Firma: _____ REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERVENTORÍA CANALIZACIÓN BGA

Firma: _____ REPRESENTANTE LEGAL

Secretaria de Infraestructura Fisica Alcaldía de Bucaramanga	Alcaldía de Bucaramanga	Consorcio La Flora 2023	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	30	MM	06	AAAA	2025	ACTA No.	10	ELABORÓ	DANIEL GÓMEZ BARRAGÁN

OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
ENTIDAD CONTRATANTE:	ALCALDÍA DE BUCARAMANGA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
CONTRATISTA:	CONSORCIO LA FLORA 2023
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORÍA CANALIZACIÓN BGA

CAPÍTULO 4. ESTRUCTURAS

4.02.09	Suministro y colocación de concreto pobre para solados	UNIDAD	m3

ILUSTRACIÓN - GRAFICA - IMÁGEN

REGISTRO FOTOGRÁFICO



	Ubicación	DIMENSIONES			Elemento (mml)	Volumen (m3)
		Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)		
ACTA #10						
MURO DE CONTENCIÓN RAMPA PARQUE EXTREMO BARRIO SAN MARTIN						
SOLADO DE LIMPIEZA PARA MURO DE CONTENCIÓN L=6MTS		6,00	1,50	0,07	1,00	0,63
SOLADO DE LIMPIEZA PARA MURO DE CONTENCIÓN L=5MTS		5,00	1,30	0,07	2,00	0,91
					SUBTOTAL - ACTA No. 09	1,54

OBSERVACIONES:	PRESENTE ACTA 10		ACUMULADO			TOTALES	1,54
	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% EJECUTADO		
	1,54	$ 708.210,58	36,93	$ 16.983.257,61	20,21%		

CONTRATISTA: CONSORCIO LA FLORA 2023	INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERVENTORÍA CANALIZACIÓN BGA
Firma:	Firma:
REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL

Secretaria de Infraestructura Fisica Alcaldía de Bucaramanga	Alcaldía de Bucaramanga	Consorcio La Flora 2023	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	30	MM	06	AAAA	2025	ACTA No.	10	ELABORÓ	DANIEL GÓMEZ BARRAGÁN

OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
ENTIDAD CONTRATANTE:	ALCALDÍA DE BUCARAMANGA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
CONTRATISTA:	CONSORCIO LA FLORA 2023
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORÍA CANALIZACIÓN BGA

CAPÍTULO 4. ESTRUCTURAS

4.03.01	Suministro y colocación de acero de refuerzo fy=2590 kg/cm2	UNIDAD	kg


ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMÁGEN

SECCIÓN TRANSVERSAL - DISTRIBUCIÓN DEL ACERO DE REFUERZO EN LA ESTRUCTURA DEL BOX-CULVERT CON DIMENSIONES 3.00 X 3.00 METROS.





SECCIÓN TRANSVERSAL - DISTRIBUCIÓN DEL ACERO DE REFUERZO EN LA ESTRUCTURA DEL BOX-CULVERT CON DIMENSIONES 3.00 X 3.00 METROS.

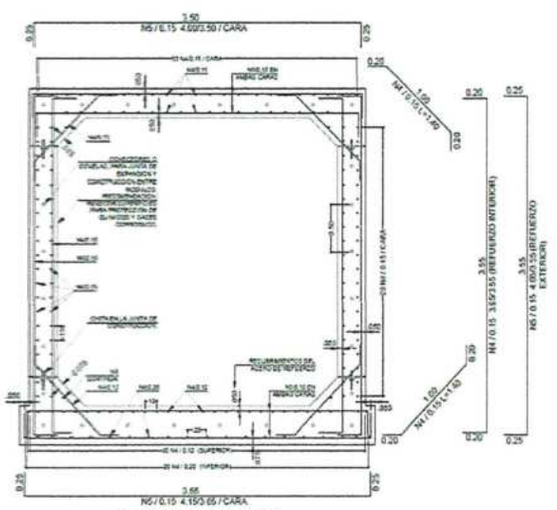


BOX (3.00x3.00)
DESPIECE DEL REFUERZO. ESC 1:25

Ubicación		DIMENSIONES Longitud (m)	Cantidad (und)	Diámetro (pulg)	Peso barra / ml (kg/ml)	Peso (kg)
ACTA #10						
BOX-CULVERT 3.00X3.00 M, MÓDULO 91 DE LA ABSCISA K4+329,9 A K4+319,9.						
LONGITUDINAL EN CHAFLÁN INFERIOR Y SUPERIOR 3/8"		10,30	4,00	3/8"	0,560	23,07
SEPARADORES DE PARRILLAS LOZA INFERIOR 3/8"		1,05	35,00	3/8"	0,560	20,58
SEPARADORES DE PARRILLAS LOZA SUPERIOR 3/8"		0,90	35,00	3/8"	0,560	17,64
BOX-CULVERT 3.00X3.00 M, MÓDULO 97 DE LA ABSCISA K4+270,6 A K4+260,6. (INC ESCALÓN)						
LONGITUDINAL EN CHAFLÁN INFERIOR Y SUPERIOR 3/8"		11,30	4,00	3/8"	0,560	25,31
SEPARADORES DE PARRILLAS LOZA INFERIOR 3/8"		1,05	35,00	3/8"	0,560	20,58
SEPARADORES DE PARRILLAS LOZA SUPERIOR 3/8"		0,90	35,00	3/8"	0,560	17,64
BOX-CULVERT 3.00X3.00 M, MÓDULO 98 DE LA ABSCISA K4+260,6 A K4+250,6. (INC ESCALÓN)						
LONGITUDINAL EN CHAFLÁN INFERIOR Y SUPERIOR 3/8"		11,30	4,00	3/8"	0,560	25,31
SEPARADORES DE PARRILLAS LOZA INFERIOR 3/8"		1,05	35,00	3/8"	0,560	20,58
SEPARADORES DE PARRILLAS LOZA SUPERIOR 3/8"		0,90	35,00	3/8"	0,560	17,64
BOX-CULVERT 3.00X3.00 M, MÓDULO 99 DE LA ABSCISA K4+250,6 A K4+240,6.						
LONGITUDINAL EN CHAFLÁN INFERIOR Y SUPERIOR 3/8"		10,30	4,00	3/8"	0,560	23,07
SEPARADORES DE PARRILLAS LOZA INFERIOR 3/8"		1,05	35,00	3/8"	0,560	20,58
SEPARADORES DE PARRILLAS LOZA SUPERIOR 3/8"		0,90	35,00	3/8"	0,560	17,64
MURO DE CONTENCIÓN RAMPA PARQUE EXTREMO SAN MARTIN						
MURO SEGUNDO TRAMO L=6,05MTS, H=2,5MTS						
ZARPA	TRANSVERSAL 3/8"	1,45	36,00	3/8"	0,560	29,23
	LONGITUDINAL 3/8"	5,40	12,00	3/8"	0,560	36,29
MURO	TRANSVERSAL 3/8"	1,20	36,00	3/8"	0,560	24,19
	LONGITUDINAL 3/8"	4,20	12,00	3/8"	0,560	28,22
MURO FRENTE A SEGUNDO TRAMO L=5MTS, CONFINA RAMPA POR COSTADO IZQUIERDO, ALTURA VARÍA DE 1,3MTS A 0,2MTS						
ZARPA	TRANSVERSAL 3/8"	1,45	36,00	3/8"	0,560	29,23
	LONGITUDINAL 3/8"	5,40	12,00	3/8"	0,560	36,29
MURO	TRANSVERSAL 3/8"	1,20	36,00	3/8"	0,560	24,19
	LONGITUDINAL 3/8"	4,20	12,00	3/8"	0,560	28,22


Ubicación		DIMENSIONES Área (m2)	Cantidad (und)	Diámetro (pulg)	Peso barra / ml (kg/ml)	Peso (kg)
LOSAS EN CONCRETO SOBRE LA CARRERA 27A						
k0+201,00	Soporte Malla	1,35	2	4mm	1,340	3,62
k0+204,00	Soporte Malla	1,35	2	4mm	1,340	3,62
k0+207,00	Soporte Malla	1,35	2	4mm	1,340	3,62
k0+210,00	Soporte Malla	1,35	2	4mm	1,340	3,62
k0+213,00	Soporte Malla	1,35	2	4mm	1,340	3,62
k0+216,00	Soporte Malla	1,35	2	4mm	1,340	3,62
k0+219,00	Soporte Malla	1,35	2	4mm	1,340	3,62
k0+222,00	Soporte Malla	1,35	2	4mm	1,340	3,62
k0+225,00	Soporte Malla	1,35	2	4mm	1,340	3,62
k0+228,00	Soporte Malla	1,35	2	4mm	1,340	3,62
k0+231,00	Soporte Malla	1,35	2	4mm	1,340	3,62
k0+234,00	Soporte Malla	1,35	2	4mm	1,340	3,62
k0+237,00	Soporte Malla	1,35	2	4mm	1,340	3,62
k0+239,50	Soporte Malla	1,35	2	4mm	1,340	3,62
k0+241,00	Soporte Malla	1,35	2	4mm	1,340	3,62
k0+244,50	Soporte Malla	1,35	2	4mm	1,340	3,62
k0+247,50	Soporte Malla	1,35	2	4mm	1,340	3,62
k0+251,00	Soporte Malla	1,35	2	4mm	1,340	3,62
k0+254,00	Soporte Malla	1,35	2	4mm	1,340	3,62
k0+258,00	Soporte Malla	1,35	2	4mm	1,340	3,62
k0+261,00	Soporte Malla	1,35	2	4mm	1,340	3,62
k0+264,00	Soporte Malla	1,35	2	4mm	1,340	3,62
k0+267,00	Soporte Malla	1,35	2	4mm	1,340	3,62
k0+270,00	Soporte Malla	1,35	2	4mm	1,340	3,62
k0+273,00	Soporte Malla	1,35	2	4mm	1,340	3,62
k0+276,00	Soporte Malla	1,35	2	4mm	1,340	3,62
k0+279,00	Soporte Malla	1,35	2	4mm	1,340	3,62
k0+282,00	Soporte Malla	1,35	2	4mm	1,340	3,62
k0+285,00	Soporte Malla	1,35	2	4mm	1,340	3,62
k0+288,00	Soporte Malla	1,35	2	4mm	1,340	3,62
k0+291,00	Soporte Malla	1,35	2	4mm	1,340	3,62

ÁREA PAVIMENTACIÓN - BARRIOS SAN MARTIN, QUEBRADA LA IGLESIA, SAN PEDRO Y URBANIZACIONES EL SOL 1 Y SOL 2. ENTRE LAS ABSCISAS K0+195 Y LA K0+375

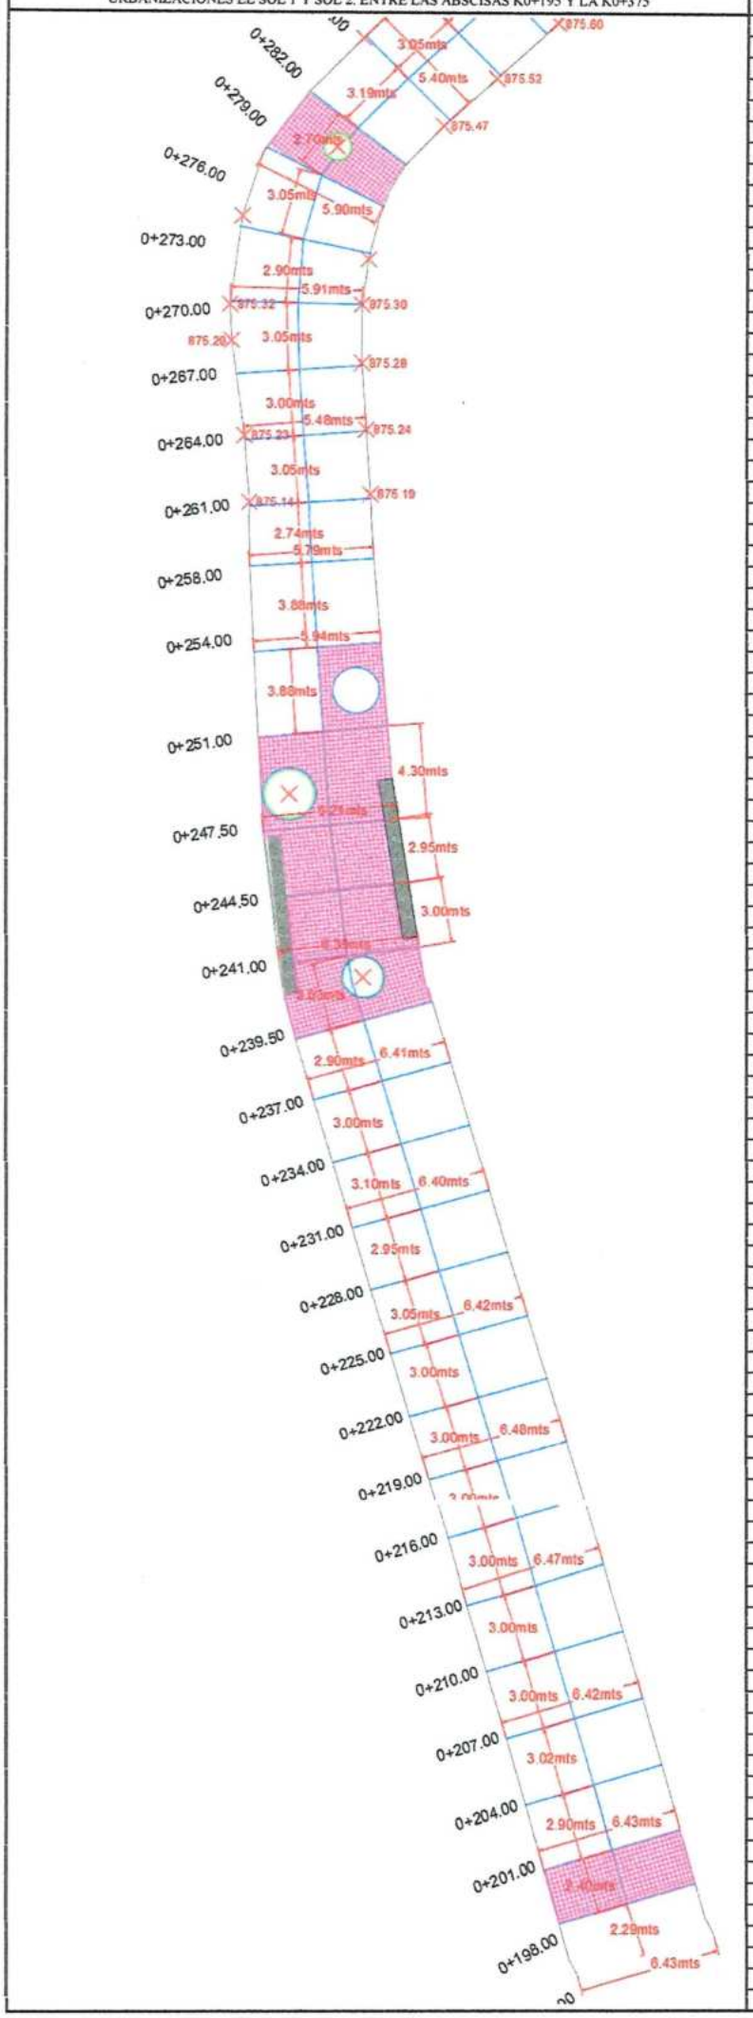


k0+294,00	Soporte Malla	1,35	2	4mm	1,340	3,62
k0+297,00	Soporte Malla	1,35	2	4mm	1,340	3,62
k0+300,00	Soporte Malla	1,35	2	4mm	1,340	3,62
k0+303,00	Soporte Malla	1,35	2	4mm	1,340	3,62
k0+306,00	Soporte Malla	1,35	2	4mm	1,340	3,62
k0+309,00	Soporte Malla	1,35	2	4mm	1,340	3,62
k0+312,00	Soporte Malla	1,35	2	4mm	1,340	3,62
k0+315,00	Soporte Malla	1,35	2	4mm	1,340	3,62
k0+318,00	Soporte Malla	1,35	2	4mm	1,340	3,62
k0+321,00	Soporte Malla	1,35	2	4mm	1,340	3,62
k0+324,00	Soporte Malla	1,35	2	4mm	1,340	3,62
k0+327,00	Soporte Malla	1,35	2	4mm	1,340	3,62
k0+330,00	Soporte Malla	0,68	2	4mm	1,340	1,81
k0+333,00	Soporte Malla	1,35	2	4mm	1,340	3,62
k0+336,00	Soporte Malla	2,25	1	4mm	1,340	3,02
k0+339,00	Soporte Malla	2,25	1	4mm	1,340	3,02
k0+342,00	Soporte Malla	1,35	2	4mm	1,340	3,62
k0+345,00	Soporte Malla	1,35	2	4mm	1,340	3,62
k0+348,00	Soporte Malla	1,35	2	4mm	1,340	3,62
k0+351,00	Soporte Malla	1,35	2	4mm	1,340	3,62
k0+354,00	Soporte Malla	1,35	2	4mm	1,340	3,62
k0+357,00	Soporte Malla	1,35	2	4mm	1,340	3,62
k0+360,00	Soporte Malla	1,35	2	4mm	1,340	3,62
k0+363,00	Soporte Malla	1,35	2	4mm	1,340	3,62
k0+366,00	Soporte Malla	2,25	1	4mm	1,340	3,02
k0+369,00	Soporte Malla	2,25	1	4mm	1,340	3,02
k0+375,00	Soporte Malla	2,25	1	4mm	1,340	3,02
LOSAS EN CONCRETO ENTRE CALLE 74 Y CALLE 86 SOBRE LA CARRERA 30						
k0+405,30	Soporte Malla	1,35	2	4mm	1,340	3,62
k0+408,00	Soporte Malla	1,35	2	4mm	1,340	3,62
k0+411,00	Soporte Malla	1,35	2	4mm	1,340	3,62
k0+414,00	Soporte Malla	1,35	2	4mm	1,340	3,62
k0+417,00	Soporte Malla	1,35	2	4mm	1,340	3,62
k0+420,00	Soporte Malla	1,35	2	4mm	1,340	3,62
k0+423,00	Soporte Malla	1,35	4	4mm	1,340	7,24
k0+426,00	Soporte Malla	1,35	4	4mm	1,340	7,24
k0+429,00	Soporte Malla	1,35	4	4mm	1,340	7,24
k0+432,00	Soporte Malla	1,35	4	4mm	1,340	7,24
k0+435,00	Soporte Malla	1,35	3	4mm	1,340	5,43
k0+437,50	Soporte Malla	1,35	2	4mm	1,340	3,62
k0+440,50	Soporte Malla	1,35	2	4mm	1,340	3,62
k0+443,50	Soporte Malla	1,35	2	4mm	1,340	3,62
k0+447,40	Soporte Malla	2,25	1	4mm	1,340	3,02
k0+450,90	Soporte Malla	2,25	1	4mm	1,340	3,02
k0+453,00	Soporte Malla	1,35	2	4mm	1,340	3,62
k0+456,00	Soporte Malla	1,35	2	4mm	1,340	3,62
k0+459,00	Soporte Malla	1,35	2	4mm	1,340	3,62
k0+462,00	Soporte Malla	1,35	2	4mm	1,340	3,62
k0+465,00	Soporte Malla	1,35	2	4mm	1,340	3,62
k0+468,00	Soporte Malla	1,35	2	4mm	1,340	3,62
k0+471,00	Soporte Malla	1,35	2	4mm	1,340	3,62
k0+473,50	Soporte Malla	1,35	2	4mm	1,340	3,62
k0+476,50	Soporte Malla	1,35	2	4mm	1,340	3,62
k0+479,70	Soporte Malla	1,35	2	4mm	1,340	3,62
k0+482,80	Soporte Malla	1,35	2	4mm	1,340	3,62
k0+486,30	Soporte Malla	1,35	2	4mm	1,340	3,62
k0+489,80	Soporte Malla	1,35	2	4mm	1,340	3,62
k0+493,50	Soporte Malla	2,25	1	4mm	1,340	3,02
k0+495,60	Soporte Malla	2,25	1	4mm	1,340	3,02
k0+498,30	Soporte Malla	2,25	1	4mm	1,340	3,02
k0+501,30	Soporte Malla	1,35	2	4mm	1,340	3,62
k0+504,00	Soporte Malla	1,35	2	4mm	1,340	3,62
k0+507,10	Soporte Malla	1,35	2	4mm	1,340	3,62
k0+510,30	Soporte Malla	1,35	2	4mm	1,340	3,62
k0+513,50	Soporte Malla	1,35	2	4mm	1,340	3,62
k0+516,70	Soporte Malla	1,35	2	4mm	1,340	3,62
k0+519,90	Soporte Malla	1,35	2	4mm	1,340	3,62
k0+523,10	Soporte Malla	1,35	2	4mm	1,340	3,62
					SUBTOTAL - ACTA No. 10	**848,74**


ÁREA PAVIMENTACIÓN - BARRIOS SAN MARTIN, QUEBRADA LA IGLESIA, SAN PEDRO Y URBANIZACIONES EL SOL 1 Y SOL 2. ENTRE LAS ABSCISAS K0+195 Y LA K0+375

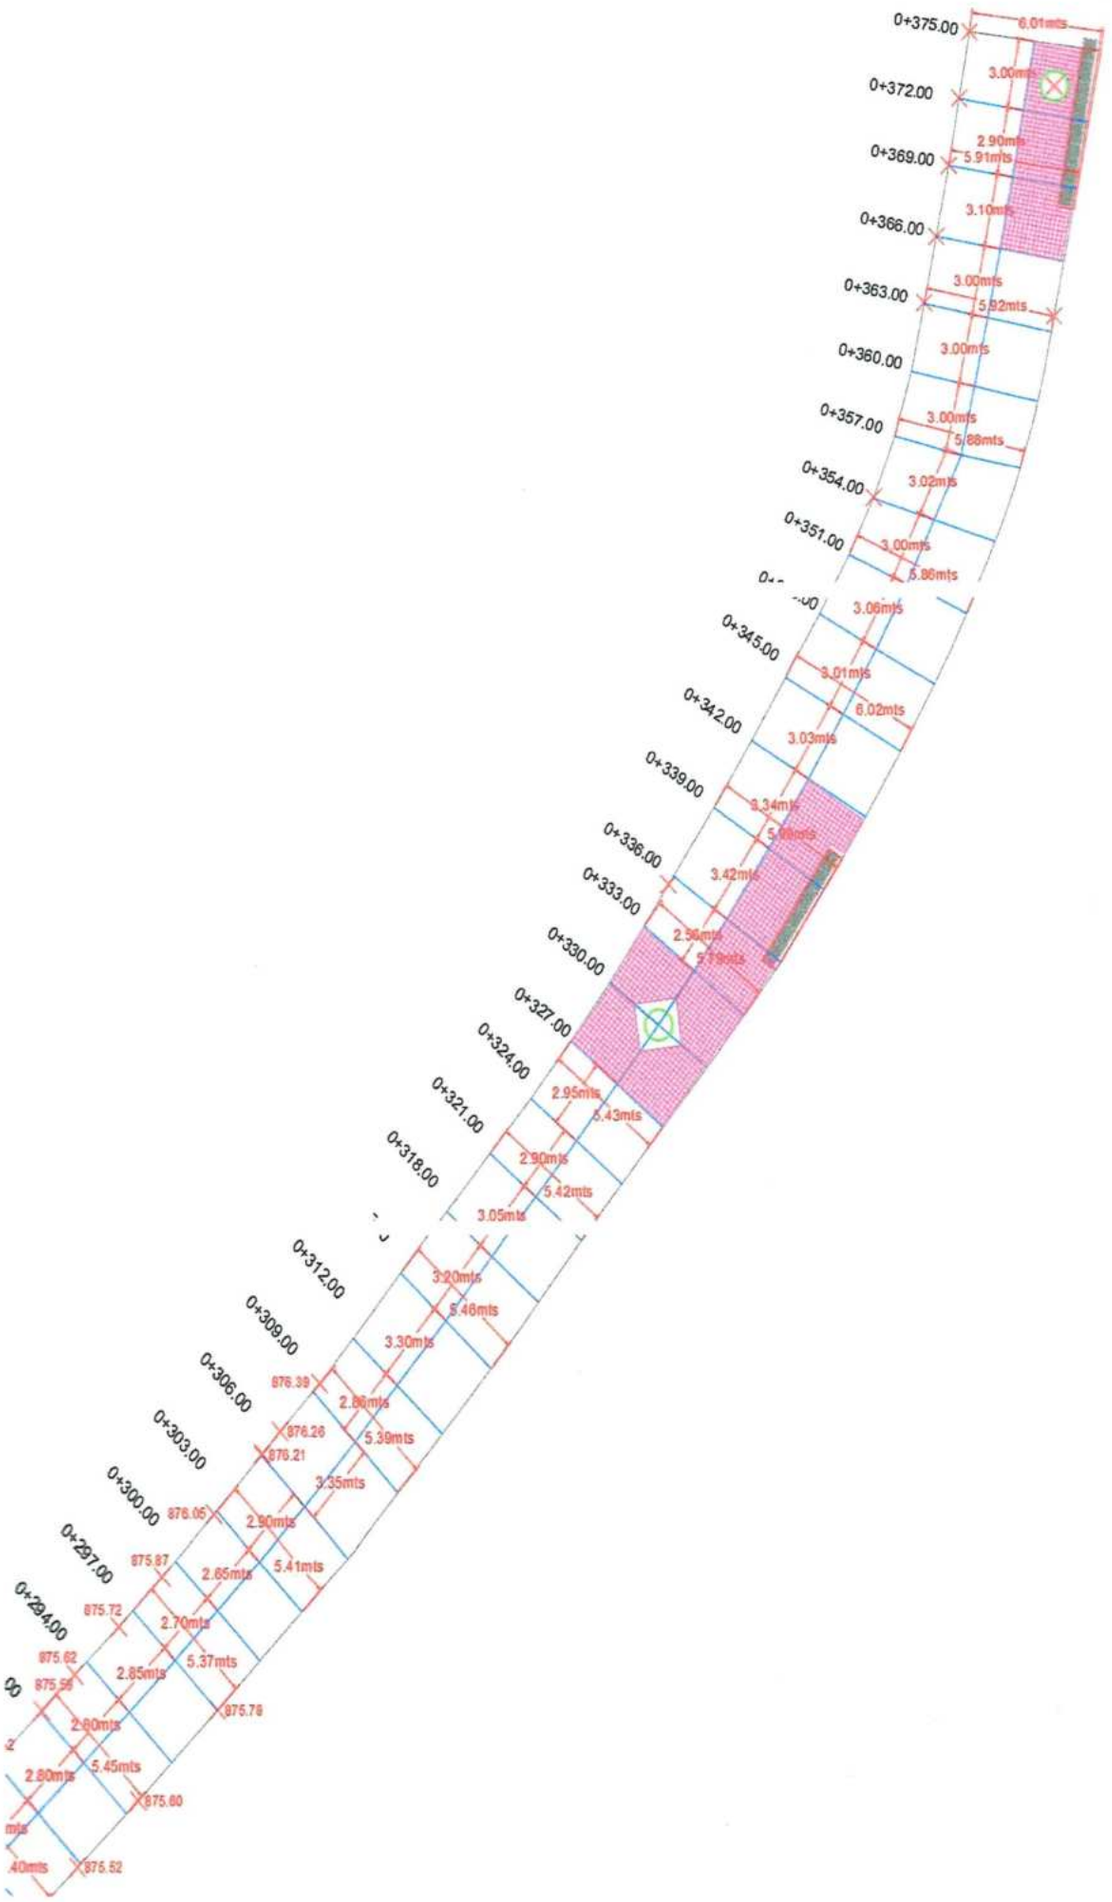

ÁREA PAVIMENTACIÓN BARRIOS SAN MARTIN, QUEBRADA LA IGLESIA, SAN PEDRO Y URBANIZACIONES EL SOL 1 Y SOL 2. ENTRE LAS ABSCISAS K0+405,3 Y LA K0+526,3

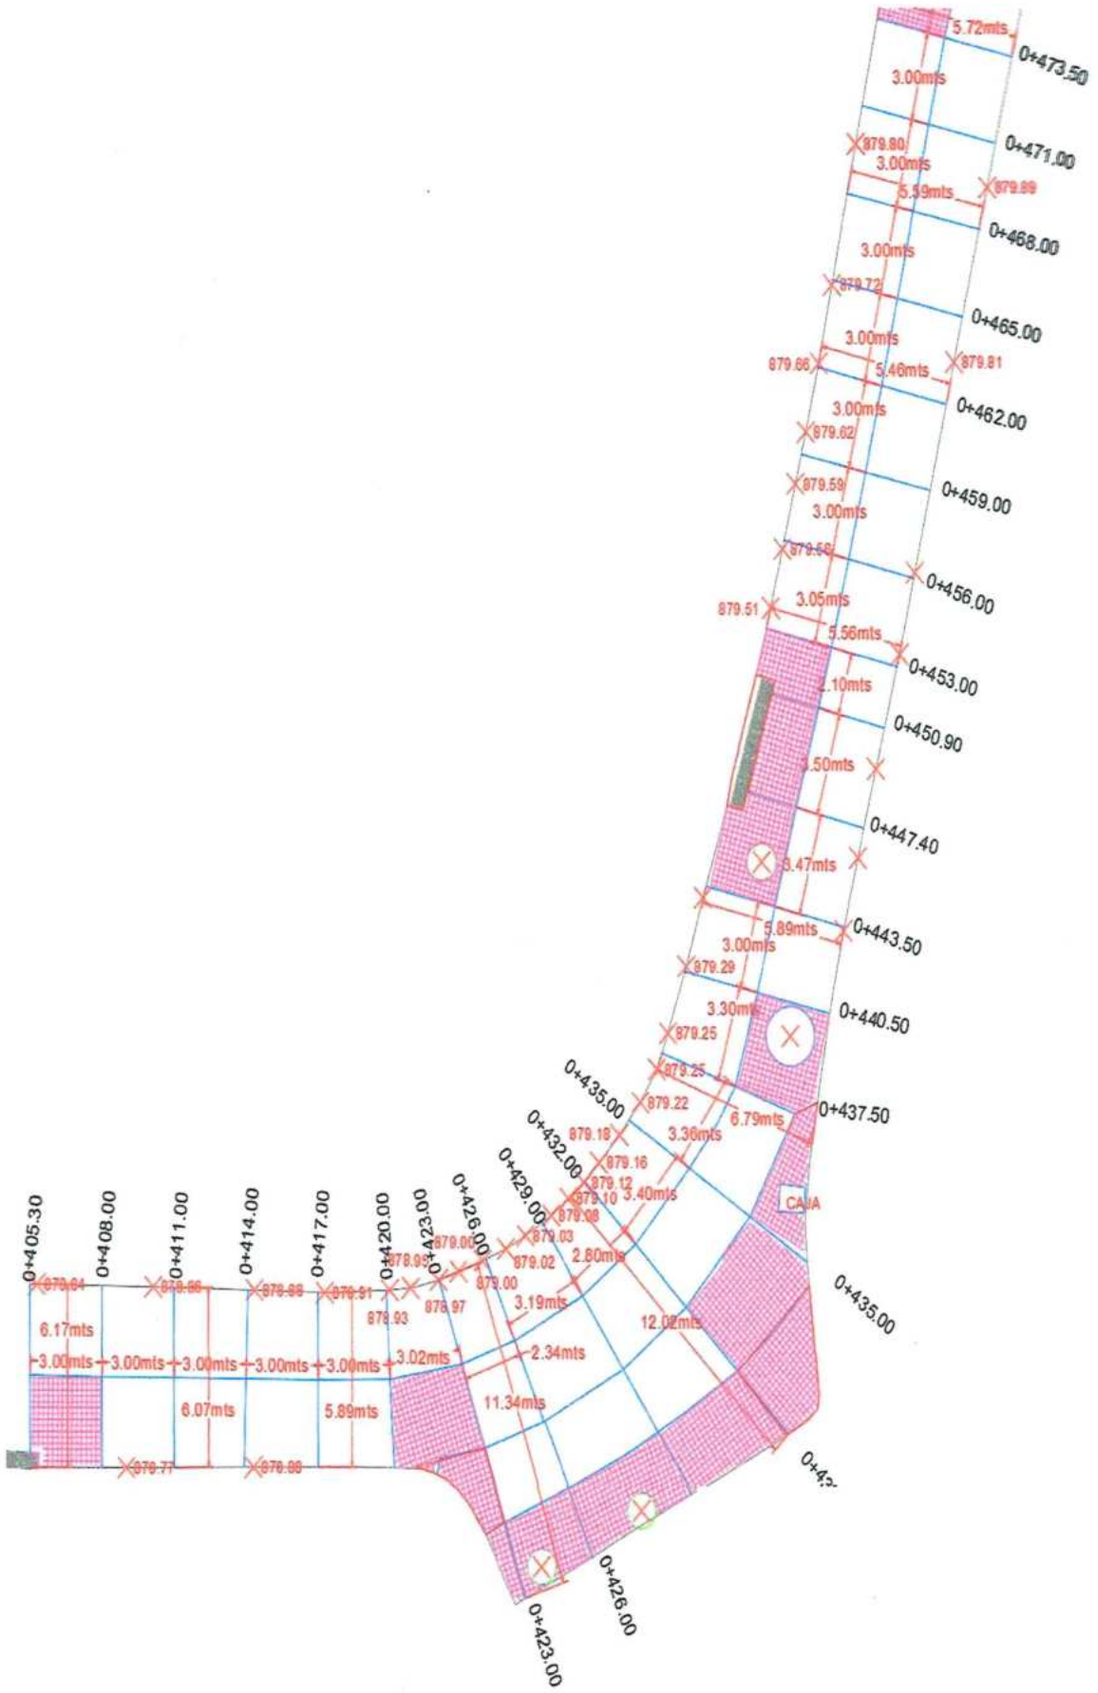

CONTINUACIÓN - ÁREA PAVIMENTACIÓN BARRIOS SAN MARTIN, QUEBRADA LA IGLESIA, SAN PEDRO Y URBANIZACIONES EL SOL 1 Y SOL 2. ENTRE LAS ABSCISAS K0+~~495,3~~ Y LA K0+526,3

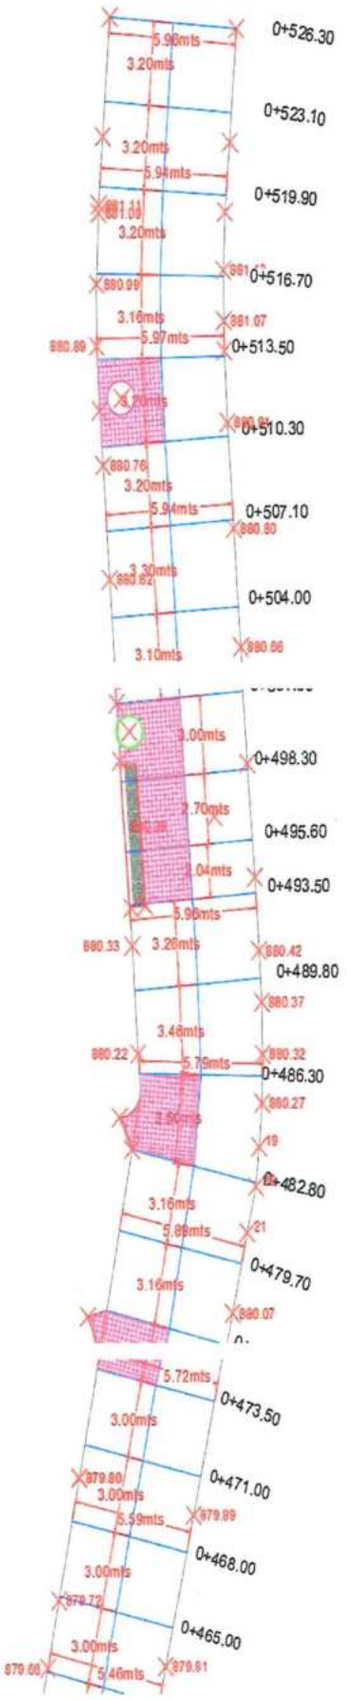

OBSERVACIONES:	PRESENTE ACTA 10		ACUMULADO			TOTALES	848,74
	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% EJECUTADO		
	848,74	$ 7.439.206,10	8.940,72	$ 78.365.410,80	79,49%		

CONTRATISTA: CONSORCIO LA FLORA 2023

Firma: REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERVENTORIA CANALIZACION BGA

Firma: REPRESENTANTE LEGAL

Secretaria de Infraestructura Física Alcaldía de Bucaramanga	Alcaldía de Bucaramanga	Consorcio La Flora 2023	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	30	MM	06	AAAA	2025	ACTA No.	10	ELABORÓ	DANIEL GÓMEZ BARRAGAN

OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
ENTIDAD CONTRATANTE:	ALCALDÍA DE BUCARAMANGA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
CONTRATISTA:	CONSORCIO LA FLORA 2023
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORÍA CANALIZACIÓN BGA

CAPÍTULO 4. ESTRUCTURAS

4.03.02	Suministro y colocación de acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2	UNIDAD	Kg

ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMÁGEN








	Ubicación	DIMENSIONES Longitud (m)	Cantidad (und)	Diametro (pulg)	Peso barra / ml (kg/ml)	Peso (kg)
ACTA #10						
BOX-CULVERT 3.00X3.00 M, MÓDULO 91 DE LA ABSCISA K4+329,9 A K4+319,9.						
LOZA INFERIOR	TRANSVERSAL 5/8"	4,15	134,00	5/8"	1,552	863,07
	LONGITUDINAL 1/2"	10,30	54,00	1/2"	0,994	552,86
	TRANSVERSAL EN CHAFLÁN 1/2"	1,40	134,00	1/2"	0,994	186,47
MUROS IZQUIERDO Y DERECHO	TRANSVERSAL PARRILLA INTERNA 1/2"	3,95	134,00	1/2"	0,994	526,12
	TRANSVERSAL PARRILLA EXTERNA 5/8"	4,05	134,00	5/8"	1,552	842,27
	LONGITUDINAL 1/2"	10,30	84,00	1/2"	0,994	860,01
LOZA SUPERIOR	TRANSVERSAL 5/8"	4,00	134,00	5/8"	1,552	831,87
	LONGITUDINAL 1/2"	10,30	48,00	1/2"	0,994	491,43
	TRANSVERSAL EN CHAFLÁN 1/2"	1,55	134,00	1/2"	0,994	206,45
DOVELAS DE TRANSFERENCIA	K4+319,9 ENTRE MOD 91 Y MOD 92	0,50	28,00	5/8"	1,552	21,73
ESTRIBOS A INICIO Y FIN DE MÓDULO LOZA INFERIOR 1/2"		1,55	22,00	1/2"	0,994	33,90
ESTRIBOS A INICIO Y FIN DE MÓDULO LOZA SUPERIOR Y MUROS 1/2"		1,40	62,00	1/2"	0,994	86,28
BOX-CULVERT 3.00X3.00 M, MÓDULO 97 DE LA ABSCISA K4+270,6 A K4+260,6. (INC ESCALÓN)						
LOZA INFERIOR	TRANSVERSAL 5/8"	4,15	134,00	5/8"	1,552	863,07
	LONGITUDINAL 1/2"	10,30	54,00	1/2"	0,994	552,86
	TRANSVERSAL EN CHAFLÁN 1/2"	1,40	134,00	1/2"	0,994	186,47
	ESCALÓN K4+270,6 (DISIPADOR) - TRANSVERSAL 5/8"	4,05	16,00	5/8"	1,552	100,57
	ESCALÓN K4+270,6 (DISIPADOR) - LONGITUDINAL 1/2"	1,65	40,00	1/2"	0,994	65,60
ESTRIBOS A INICIO Y FIN DE MÓDULO LOZA INFERIOR 1/2"		1,60	24,00	1/2"	0,994	38,17
MUROS IZQUIERDO Y DERECHO	TRANSVERSAL PARRILA INTERNA	3,95	112,00	1/2"	0,994	439,75
	TRANSVERSAL PARRILLA EXTERNA 5/8"	4,05	112,00	5/8"	1,552	703,99
	LONGITUDINAL 1/2"	10,30	84,00	1/2"	0,994	860,01
	ESCALÓN K4+270,6 (DISIPADOR) - TRANSVERSAL PARRILLA EXT 5/8"	5,05	36,00	5/8"	1,552	282,15
	ESCALÓN K4+270,6 - TRANSVERSAL PARRILLA INTERNA 1/2"	4,95	36,00	1/2"	0,994	177,13
	ESCALÓN K4+270,6 (DISIPADOR) - LONGITUDINAL 1/2"	2,00	56,00	1/2"	0,994	111,33
LOZA SUPERIOR	TRANSVERSAL 5/8"	4,00	134,00	5/8"	1,552	831,87
	LONGITUDINAL 1/2"	10,30	48,00	1/2"	0,994	491,43
	TRANSVERSAL EN CHAFLÁN 1/2"	1,40	134,00	1/2"	0,994	186,47
LOZA SUPERIOR	ESCALÓN K4+270,6 (DISIPADOR) - TRANSVERSAL 1/2"	3,90	20,00	1/2"	0,994	77,53
	ESCALÓN K4+270,6 (DISIPADOR) - LONGITUDINAL 1/2"	1,55	40,00	1/2"	0,994	61,63
DOVELAS DE TRANSFERENCIA	K4+260,6 ENTRE MOD 97 Y MOD 98	0,50	29,00	5/8"	1,552	22,50
ESTRIBOS A INICIO Y FIN DE MÓDULO LOZA INFERIOR 1/2"		1,52	20,00	1/2"	0,994	30,22
ESTRIBOS A INICIO Y FIN DE MÓDULO LOZA SUPERIOR Y MUROS 1/2"		1,36	60,00	1/2"	0,994	81,11
ESTRIBOS EN ESCALÓN (DISIPADOR) K4+270,6. LOZA SUPERIOR Y MUROS 1/2"		1,36	32,00	1/2"	0,994	43,26
BOX-CULVERT 3.00X3.00 M, MÓDULO 98 DE LA ABSCISA K4+260,6 A K4+250,6. (INC ESCALÓN)						
LOZA INFERIOR	TRANSVERSAL 5/8"	4,15	134,00	5/8"	1,552	863,07
	LONGITUDINAL 1/2"	10,30	54,00	1/2"	0,994	552,86
	TRANSVERSAL EN CHAFLÁN 1/2"	1,40	134,00	1/2"	0,994	186,47
	ESCALÓN K4+711.7 (DISIPADOR) - TRANSVERSAL 5/8"	4,05	16,00	5/8"	1,552	100,57


ÁREA PAVIMENTACIÓN - BARRIOS SAN MARTIN, QUEBRADA LA IGLESIA, SAN PEDRO Y URBANIZACIONES EL SOL 1 Y SOL 2. ENTRE LAS ABSCISAS K0+195 Y LA K0+375

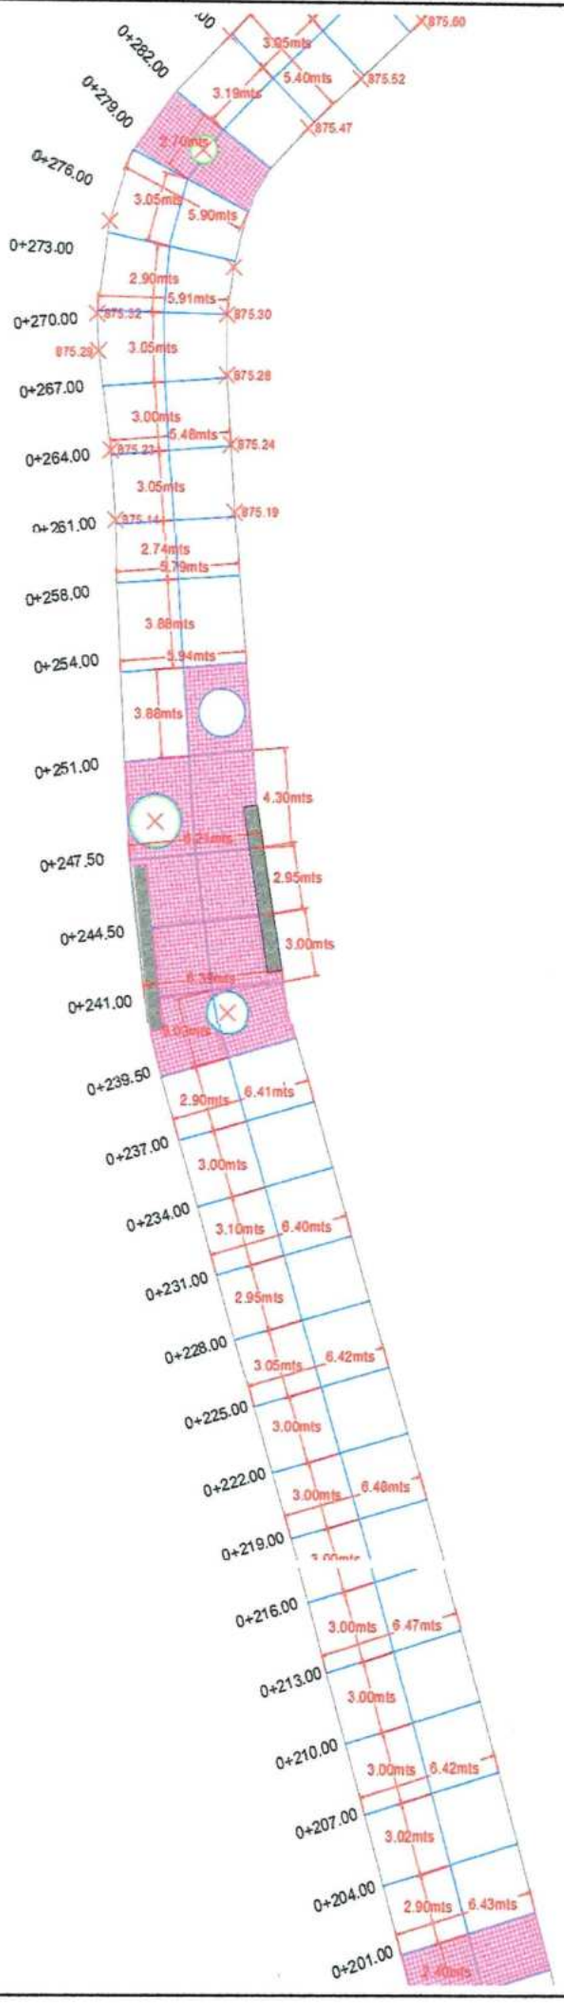



LOZA INFERIOR	ESCALÓN K4+711.7 (DISIPADOR) - LONGITUDINAL 1/2"	1,65	40,00	1/2"	0,994	65,60
ESTRIBOS A INICIO Y FIN DE MÓDULO LOZA INFERIOR 1/2"		1,60	24,00	1/2"	0,994	38,17
MUROS IZQUIERDO Y DERECHO	TRANSVERSAL PARRILA INTERNA 1/2"	3,95	112,00	1/2"	0,994	439,75
	TRANSVERSAL PARRILLA EXTERNA 5/8"	4,05	112,00	5/8"	1,552	703,99
	LONGITUDINAL 1/2"	10,30	84,00	1/2"	0,994	860,01
	ESCALÓN K4+711.7 (DISIPADOR) - TRANSVERSAL PARRILLA EXT 5/8"	5,05	36,00	5/8"	1,552	282,15
	ESCALÓN K4+711.7 - TRANSVERSAL PARRILLA INTERNA 1/2"	4,95	36,00	1/2"	0,994	177,13
	ESCALÓN K4+711.7 (DISIPADOR) - LONGITUDINAL 1/2"	2,00	56,00	1/2"	0,994	111,33
LOZA SUPERIOR	TRANSVERSAL 5/8"	4,00	134,00	5/8"	1,552	831,87
	LONGITUDINAL 1/2"	10,30	48,00	1/2"	0,994	491,43
	TRANSVERSAL EN CHAFLÁN 1/2"	1,40	134,00	1/2"	0,994	186,47
LOZA SUPERIOR	ESCALÓN K4+711.7 (DISIPADOR) - TRANSVERSAL 1/2"	3,90	20,00	1/2"	0,994	77,53
	ESCALÓN K4+711.7 (DISIPADOR) - LONGITUDINAL 1/2"	1,55	40,00	1/2"	0,994	61,63
DOVELAS DE TRANSFERENCIA	K4+701.7 ENTRE MOD 53 Y MOD 52'	0,50	29,00	5/8"	1,552	22,50
ESTRIBOS A INICIO Y FIN DE MÓDULO LOZA INFERIOR 1/2"		1,52	20,00	1/2"	0,994	30,22
ESTRIBOS A INICIO Y FIN DE MÓDULO LOZA SUPERIOR Y MUROS 1/2"		1,36	60,00	1/2"	0,994	81,11
ESTRIBOS EN ESCALÓN (DISIPADOR) K4+711.7. LOZA SUPERIOR Y MUROS 1/2"		1,36	32,00	1/2"	0,994	43,26
BOX-CULVERT 3.00X3.00 M, MÓDULO 99 DE LA ABSCISA K4+250,6 A K4+280,6.						
LOZA INFERIOR	TRANSVERSAL 5/8"	4,15	134,00	5/8"	1,552	863,07
	LONGITUDINAL 1/2"	10,30	54,00	1/2"	0,994	552,86
	TRANSVERSAL EN CHAFLÁN 1/2"	1,40	134,00	1/2"	0,994	186,47
MUROS IZQUIERDO Y DERECHO	TRANSVERSAL PARRILLA INTERNA 1/2"	3,95	134,00	1/2"	0,994	526,12
	TRANSVERSAL PARRILLA EXTERNA 5/8".	4,05	134,00	5/8"	1,552	842,27
	LONGITUDINAL 1/2"	10,30	84,00	1/2"	0,994	860,01
LOZA SUPERIOR	TRANSVERSAL 5/8"	4,00	134,00	5/8"	1,552	831,87
	LONGITUDINAL 1/2"	10,30	48,00	1/2"	0,994	491,43
	TRANSVERSAL EN CHAFLÁN 1/2"	1,55	134,00	1/2"	0,994	206,45
DOVELAS DE TRANSFERENCIA	K4+617.3 ENTRE MOD 61 Y MOD 62	0,50	28,00	5/8"	1,552	21,73
ESTRIBOS A INICIO Y FIN DE MÓDULO LOZA INFERIOR 1/2"		1,55	22,00	1/2"	0,994	33,90
ESTRIBOS A INICIO Y FIN DE MÓDULO LOZA SUPERIOR Y MUROS 1/2"		1,40	62,00	1/2"	0,994	86,28
MURO DE CONTENCIÓN RAMPA PARQUE EXTREMO SAN MARTIN						
MURO PRIMER TRAMO L=6,05MTS, H=2,5MTS						
ZARPA	TRANSVERSAL 1/2"	1,80	42,00	1/2"	0,994	75,15
	LONGITUDINAL 1/2"	6,40	12,00	1/2"	0,994	76,34
MURO	TRANSVERSAL 1/2"	1,95	42,00	1/2"	0,994	81,41
	LONGITUDINAL 1/2"	5,20	18,00	1/2"	0,994	93,04

Ubicación		DIMENSIONES			Peso barra / mll (kg/mll)	Peso (kg)
		Área (m2)	Cantidad (und)	Diametro (pulg)		
LOSAS EN CONCRETO SOBRE LA CARRERA 27A						
k0+201,00	Barra de Anclaje	0,85	3	1/2"	0,994	2,53
k0+204,00	Barra de Anclaje	0,85	3	1/2"	0,994	2,53
k0+201,00	Pasador de carga	0,35	18	1"	3,973	25,03
k0+207,00	Barra de Anclaje	0,85	3	1/2"	0,994	2,53
k0+204,00	Pasador de carga	0,35	18	1"	3,973	25,03
k0+210,00	Barra de Anclaje	0,85	3	1/2"	0,994	2,53
k0+207,00	Pasador de carga	0,35	18	1"	3,973	25,03
k0+213,00	Barra de Anclaje	0,85	3	1/2"	0,994	2,53
k0+210,00	Pasador de carga	0,35	18	1"	3,973	25,03
k0+216,00	Barra de Anclaje	0,85	3	1/2"	0,994	2,53
k0+213,00	Pasador de carga	0,35	18	1"	3,973	25,03
k0+219,00	Barra de Anclaje	0,85	3	1/2"	0,994	2,53
k0+216,00	Pasador de carga	0,35	18	1"	3,973	25,03
k0+222,00	Barra de Anclaje	0,85	3	1/2"	0,994	2,53
k0+219,00	Pasador de carga	0,35	18	1"	3,973	25,03
k0+225,00	Barra de Anclaje	0,85	3	1/2"	0,994	2,53
k0+222,00	Pasador de carga	0,35	18	1"	3,973	25,03
k0+228,00	Barra de Anclaje	0,85	3	1/2"	0,994	2,53
k0+225,00	Pasador de carga	0,35	18	1"	3,973	25,03
k0+231,00	Barra de Anclaje	0,85	3	1/2"	0,994	2,53

ÁREA PAVIMENTACIÓN - BARRIOS SAN MARTIN, QUEBRADA LA IGLESIA, SAN PEDRO Y URBANIZACIONES EL SOL 1 Y SOL 2. ENTRE LAS ABSCISAS K0+195 Y LA K0+375

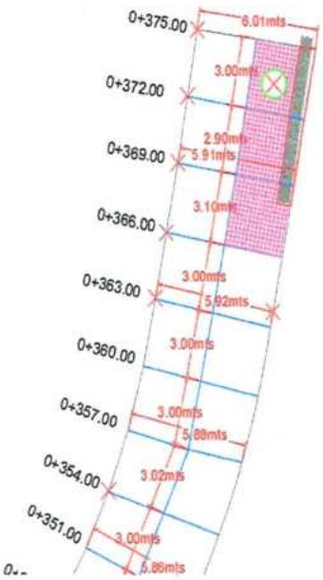

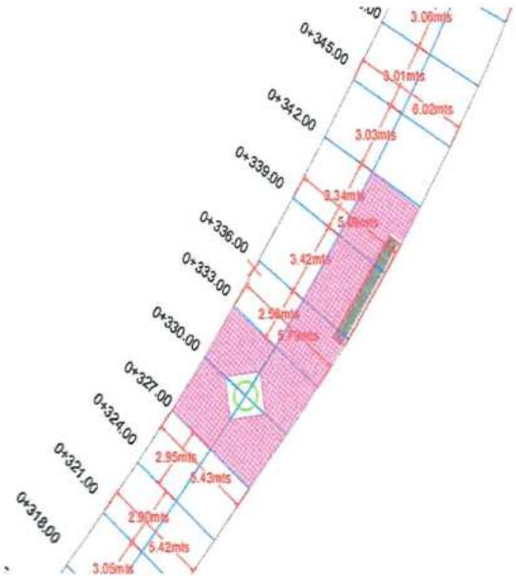

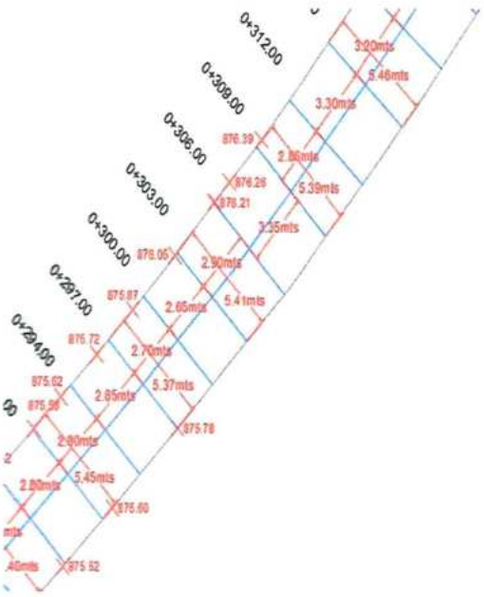


k0+228,00	Pasador de carga	0,35	18	1"	3,973	25,03
k0+234,00	Barra de Anclaje	0,85	3	1/2"	0,994	2,53
k0+231,00	Pasador de carga	0,35	18	1"	3,973	25,03
k0+237,00	Barra de Anclaje	0,85	3	1/2"	0,994	2,53
k0+234,00	Pasador de carga	0,35	18	1"	3,973	25,03
k0+239,50	Barra de Anclaje	0,85	3	1/2"	0,994	2,53
k0+237,00	Pasador de carga	0,35	18	1"	3,973	25,03
k0+241,00	Barra de Anclaje	0,85	3	1/2"	0,994	2,53
k0+239,50	Pasador de carga	0,35	18	1"	3,973	25,03
k0+244,50	Barra de Anclaje	0,85	3	1/2"	0,994	2,53
k0+241,00	Pasador de carga	0,35	16	1"	3,973	22,25
k0+247,50	Barra de Anclaje	0,85	3	1/2"	0,994	2,53
k0+244,50	Pasador de carga	0,35	14	1"	3,973	19,47
k0+251,00	Barra de Anclaje	0,85	3	1/2"	0,994	2,53
k0+247,50	Pasador de carga	0,35	16	1"	3,973	22,25
k0+254,00	Barra de Anclaje	0,85	3	1/2"	0,994	2,53
k0+251,00	Pasador de carga	0,35	18	1"	3,973	25,03
k0+258,00	Barra de Anclaje	0,85	3	1/2"	0,994	2,53
k0+254,00	Pasador de carga	0,35	18	1"	3,973	25,03
k0+258,00	Pasador de carga	0,35	18	1"	3,973	25,03
k0+261,00	Barra de Anclaje	0,85	3	1/2"	0,994	2,53
k0+264,00	Barra de Anclaje	0,85	3	1/2"	0,994	2,53
k0+261,00	Pasador de carga	0,35	18	1"	3,973	25,03
k0+267,00	Barra de Anclaje	0,85	3	1/2"	0,994	2,53
k0+264,00	Pasador de carga	0,35	18	1"	3,973	25,03
k0+270,00	Barra de Anclaje	0,85	3	1/2"	0,994	2,53
k0+267,00	Pasador de carga	0,35	18	1"	3,973	25,03
k0+273,00	Barra de Anclaje	0,85	3	1/2"	0,994	2,53
k0+270,00	Pasador de carga	0,35	18	1"	3,973	25,03
k0+276,00	Barra de Anclaje	0,85	3	1/2"	0,994	2,53
k0+273,00	Pasador de carga	0,35	18	1"	3,973	25,03
k0+279,00	Barra de Anclaje	0,85	3	1/2"	0,994	2,53
k0+276,00	Pasador de carga	0,35	18	1"	3,973	25,03
k0+282,00	Barra de Anclaje	0,85	2	1/2"	0,994	1,69
k0+279,00	Pasador de carga	0,35	18	1"	3,973	25,03
k0+285,00	Barra de Anclaje	0,85	3	1/2"	0,994	2,53
k0+282,00	Pasador de carga	0,35	18	1"	3,973	25,03
k0+288,00	Barra de Anclaje	0,85	3	1/2"	0,994	2,53
k0+285,00	Pasador de carga	0,35	18	1"	3,973	25,03
k0+291,00	Barra de Anclaje	0,85	3	1/2"	0,994	2,53
k0+288,00	Pasador de carga	0,35	18	1"	3,973	25,03
k0+294,00	Barra de Anclaje	0,85	3	1/2"	0,994	2,53
k0+291,00	Pasador de carga	0,35	18	1"	3,973	25,03
k0+297,00	Barra de Anclaje	0,85	3	1/2"	0,994	2,53
k0+294,00	Pasador de carga	0,35	18	1"	3,973	25,03
k0+300,00	Barra de Anclaje	0,85	3	1/2"	0,994	2,53
k0+297,00	Pasador de carga	0,35	18	1"	3,973	25,03
k0+303,00	Barra de Anclaje	0,85	3	1/2"	0,994	2,53
k0+300,00	Pasador de carga	0,35	18	1"	3,973	25,03
k0+306,00	Barra de Anclaje	0,85	3	1/2"	0,994	2,53
k0+303,00	Pasador de carga	0,35	18	1"	3,973	25,03
k0+309,00	Barra de Anclaje	0,85	3	1/2"	0,994	2,53
k0+306,00	Pasador de carga	0,35	18	1"	3,973	25,03
k0+312,00	Barra de Anclaje	0,85	3	1/2"	0,994	2,53
k0+309,00	Pasador de carga	0,35	18	1"	3,973	25,03
k0+315,00	Barra de Anclaje	0,85	3	1/2"	0,994	2,53
k0+312,00	Pasador de carga	0,35	18	1"	3,973	25,03
k0+318,00	Barra de Anclaje	0,85	3	1/2"	0,994	2,53
k0+315,00	Pasador de carga	0,35	18	1"	3,973	25,03
k0+321,00	Barra de Anclaje	0,85	3	1/2"	0,994	2,53
k0+318,00	Pasador de carga	0,35	18	1"	3,973	25,03
k0+324,00	Barra de Anclaje	0,85	3	1/2"	0,994	2,53
k0+321,00	Pasador de carga	0,35	18	1"	3,973	25,03
k0+327,00	Barra de Anclaje	0,85	3	1/2"	0,994	2,53
k0+324,00	Pasador de carga	0,35	18	1"	3,973	25,03
k0+330,00	Barra de Anclaje	0,85	2	1/2"	0,994	1,69
k0+327,00	Pasador de carga	0,35	18	1"	3,973	25,03
k0+333,00	Barra de Anclaje	0,85	2	1/2"	0,994	1,69
k0+330,00	Pasador de carga	0,35	12	1"	3,973	16,69
k0+336,00	Barra de Anclaje	0,85	3	1/2"	0,994	2,53
k0+333,00	Pasador de carga	0,35	18	1"	3,973	25,03
k0+339,00	Barra de Anclaje	0,85	3	1/2"	0,994	2,53
k0+336,00	Pasador de carga	0,35	16	1"	3,973	22,25
k0+342,00	Barra de Anclaje	0,85	3	1/2"	0,994	2,53
k0+339,00	Pasador de carga	0,35	16	1"	3,973	22,25
k0+345,00	Barra de Anclaje	0,85	3	1/2"	0,994	2,53
k0+342,00	Pasador de carga	0,35	18	1"	3,973	25,03
k0+348,00	Barra de Anclaje	0,85	3	1/2"	0,994	2,53
k0+345,00	Pasador de carga	0,35	18	1"	3,973	25,03
k0+351,00	Barra de Anclaje	0,85	3	1/2"	0,994	2,53
k0+348,00	Pasador de carga	0,35	18	1"	3,973	25,03
k0+354,00	Barra de Anclaje	0,85	3	1/2"	0,994	2,53
k0+351,00	Pasador de carga	0,35	18	1"	3,973	25,03
k0+357,00	Barra de Anclaje	0,85	3	1/2"	0,994	2,53
k0+354,00	Pasador de carga	0,35	18	1"	3,973	25,03
k0+360,00	Barra de Anclaje	0,85	3	1/2"	0,994	2,53
k0+357,00	Pasador de carga	0,35	18	1"	3,973	25,03
k0+363,00	Barra de Anclaje	0,85	3	1/2"	0,994	2,53
k0+360,00	Pasador de carga	0,35	18	1"	3,973	25,03
k0+366,00	Barra de Anclaje	0,85	3	1/2"	0,994	2,53
k0+363,00	Pasador de carga	0,35	18	1"	3,973	25,03
k0+369,00	Barra de Anclaje	0,85	3	1/2"	0,994	2,53
k0+366,00	Pasador de carga	0,35	16	1"	3,973	22,25
k0+375,00	Barra de Anclaje	0,85	3	1/2"	0,994	2,53
k0+369,00	Pasador de carga	0,35	16	1"	3,973	22,25
k0+375,00	Pasador de carga	0,35	16	1"	3,973	22,25
LOSAS EN CONCRETO ENTRE CALLE 74 Y CALLE 86 SOBRE LA CARRERA 30						
k0+405,30	Barra de Anclaje	0,85	3	1/2"	0,994	2,53

k0+408,00	Barra de Anclaje	0,85	3	1/2"	0,994	2,53
k0+405,30	Pasador de carga	0,35	18	1"	3,973	25,03
k0+411,00	Barra de Anclaje	0,85	3	1/2"	0,994	2,53
k0+408,00	Pasador de carga	0,35	18	1"	3,973	25,03
k0+414,00	Barra de Anclaje	0,85	3	1/2"	0,994	2,53
k0+411,00	Pasador de carga	0,35	18	1"	3,973	25,03
k0+417,00	Barra de Anclaje	0,85	3	1/2"	0,994	2,53
k0+414,00	Pasador de carga	0,35	18	1"	3,973	25,03
k0+420,00	Barra de Anclaje	0,85	3	1/2"	0,994	2,53
k0+417,00	Pasador de carga	0,35	18	1"	3,973	25,03
k0+423,00	Barra de Anclaje	0,85	6	1/2"	0,994	5,07
k0+420,00	Pasador de carga	0,35	18	1"	3,973	25,03
k0+426,00	Barra de Anclaje	0,85	9	1/2"	0,994	7,60
k0+423,00	Pasador de carga	0,35	36	1"	3,973	50,06
k0+429,00	Barra de Anclaje	0,85	9	1/2"	0,994	7,60
k0+426,00	Pasador de carga	0,35	36	1"	3,973	50,06
k0+432,00	Barra de Anclaje	0,85	9	1/2"	0,994	7,60
k0+429,00	Pasador de carga	0,35	34	1"	3,973	47,28
k0+435,00	Barra de Anclaje	0,85	9	1/2"	0,994	7,60
k0+432,00	Pasador de carga	0,35	36	1"	3,973	50,06
k0+437,50	Barra de Anclaje	0,85	6	1/2"	0,994	5,07
k0+435,00	Pasador de carga	0,35	27	1"	3,973	37,54
k0+440,50	Barra de Anclaje	0,85	3	1/2"	0,994	2,53
k0+437,50	Pasador de carga	0,35	18	1"	3,973	25,03
k0+443,50	Barra de Anclaje	0,85	3	1/2"	0,994	2,53
k0+440,50	Pasador de carga	0,35	18	1"	3,973	25,03
k0+447,40	Barra de Anclaje	0,85	3	1/2"	0,994	2,53
k0+443,50	Pasador de carga	0,35	18	1"	3,973	25,03
k0+450,90	Barra de Anclaje	0,85	3	1/2"	0,994	2,53
k0+447,40	Pasador de carga	0,35	16	1"	3,973	22,25
k0+453,00	Barra de Anclaje	0,85	3	1/2"	0,994	2,53
k0+450,90	Pasador de carga	0,35	16	1"	3,973	22,25
k0+456,00	Barra de Anclaje	0,85	3	1/2"	0,994	2,53
k0+453,00	Pasador de carga	0,35	18	1"	3,973	25,03
k0+459,00	Barra de Anclaje	0,85	3	1/2"	0,994	2,53
k0+456,00	Pasador de carga	0,35	18	1"	3,973	25,03
k0+462,00	Barra de Anclaje	0,85	3	1/2"	0,994	2,53
k0+459,00	Pasador de carga	0,35	18	1"	3,973	25,03
k0+465,00	Barra de Anclaje	0,85	3	1/2"	0,994	2,53
k0+462,00	Pasador de carga	0,35	18	1"	3,973	25,03
k0+468,00	Barra de Anclaje	0,85	3	1/2"	0,994	2,53
k0+465,00	Pasador de carga	0,35	18	1"	3,973	25,03
k0+471,00	Barra de Anclaje	0,85	3	1/2"	0,994	2,53
k0+468,00	Pasador de carga	0,35	18	1"	3,973	25,03
k0+473,50	Barra de Anclaje	0,85	3	1/2"	0,994	2,53
k0+471,00	Pasador de carga	0,35	18	1"	3,973	25,03
k0+476,50	Barra de Anclaje	0,85	3	1/2"	0,994	2,53
k0+473,50	Pasador de carga	0,35	18	1"	3,973	25,03
k0+479,70	Barra de Anclaje	0,85	3	1/2"	0,994	2,53
k0+476,50	Pasador de carga	0,35	18	1"	3,973	25,03
k0+482,80	Barra de Anclaje	0,85	3	1/2"	0,994	2,53
k0+479,70	Pasador de carga	0,35	18	1"	3,973	25,03
k0+486,30	Barra de Anclaje	0,85	3	1/2"	0,994	2,53
k0+482,80	Pasador de carga	0,35	18	1"	3,973	25,03
k0+489,80	Barra de Anclaje	0,85	3	1/2"	0,994	2,53
k0+486,30	Pasador de carga	0,35	18	1"	3,973	25,03
k0+493,50	Barra de Anclaje	0,85	3	1/2"	0,994	2,53
k0+489,80	Pasador de carga	0,35	18	1"	3,973	25,03
k0+495,60	Barra de Anclaje	0,85	2	1/2"	0,994	1,69
k0+493,50	Pasador de carga	0,35	16	1"	3,973	22,25
k0+498,30	Barra de Anclaje	0,85	3	1/2"	0,994	2,53
k0+495,60	Pasador de carga	0,35	16	1"	3,973	22,25
k0+501,30	Barra de Anclaje	0,85	3	1/2"	0,994	2,53
k0+498,30	Pasador de carga	0,35	16	1"	3,973	22,25
k0+504,00	Barra de Anclaje	0,85	3	1/2"	0,994	2,53
k0+501,30	Pasador de carga	0,35	18	1"	3,973	25,03
k0+507,10	Barra de Anclaje	0,85	3	1/2"	0,994	2,53
k0+504,00	Pasador de carga	0,35	18	1"	3,973	25,03
k0+510,30	Barra de Anclaje	0,85	3	1/2"	0,994	2,53
k0+507,10	Pasador de carga	0,35	18	1"	3,973	25,03
k0+513,50	Barra de Anclaje	0,85	3	1/2"	0,994	2,53
k0+510,30	Pasador de carga	0,35	18	1"	3,973	25,03
k0+516,70	Barra de Anclaje	0,85	3	1/2"	0,994	2,53
k0+513,50	Pasador de carga	0,35	18	1"	3,973	25,03
k0+519,90	Barra de Anclaje	0,85	3	1/2"	0,994	2,53
k0+516,70	Pasador de carga	0,35	18	1"	3,973	25,03
k0+523,10	Barra de Anclaje	0,85	3	1/2"	0,994	2,53
k0+519,90	Pasador de carga	0,35	18	1"	3,973	25,03
k0+523,10	Pasador de carga	0,35	18	1"	3,973	25,03
k0+526,30	Pasador de carga	0,35	18	1"	3,973	25,03
LOSAS IRREGULARES EN CONCRETO SOBRE LA CARRERA 27A						
k0+201,00	Losa Irregular M.der	3,10	13	1/2"	0,994	40,06
k0+201,00	Losa Irregular M.der	2,30	17	1/2"	0,994	38,87
k0+201,00	Losa Irregular M.izq	3,10	13	1/2"	0,994	40,06
k0+201,00	Losa Irregular M.izq	2,30	17	1/2"	0,994	38,87
k0+241,00	Losa Irregular M.der	2,62	9	1/2"	0,994	23,44
k0+241,00	Losa Irregular M.der	1,19	8	1/2"	0,994	9,42
k0+241,00	Losa Irregular M.der	0,40	6	1/2"	0,994	2,39
k0+241,00	Losa Irregular M.der	3,08	5	1/2"	0,994	15,31
k0+241,00	Losa Irregular M.der	1,94	8	1/2"	0,994	15,39
k0+241,00	Losa Irregular M.der	1,00	2	1/2"	0,994	1,99
k0+241,00	Losa Irregular M.der	3,15	1	1/2"	0,994	3,13
k0+241,00	Losa Irregular M.izq	3,18	10	1/2"	0,994	31,61
k0+241,00	Losa Irregular M.izq	1,96	4	1/2"	0,994	7,79
k0+241,00	Losa Irregular M.izq	1,26	3	1/2"	0,994	3,76
k0+241,00	Losa Irregular M.izq	0,40	3	1/2"	0,994	1,19
k0+241,00	Losa Irregular M.izq	3,05	7	1/2"	0,994	21,22

k0+241,00	Losa Irregular M.izq	2,75	4	1/2"	0,994	10,93
k0+241,00	Losa Irregular M.izq	2,17	4	1/2"	0,994	8,63
k0+241,00	Losa Irregular M.izq	1,57	5	1/2"	0,994	7,80
k0+244,50	Losa Irregular M.der	2,90	14	1/2"	0,994	40,36
k0+244,50	Losa Irregular M.der	0,42	3	1/2"	0,994	1,25
k0+244,50	Losa Irregular M.der	2,50	12	1/2"	0,994	29,82
k0+244,50	Losa Irregular M.der	3,15	4	1/2"	0,994	12,52
k0+244,50	Losa Irregular M.izq	2,90	13	1/2"	0,994	37,47
k0+244,50	Losa Irregular M.izq	2,30	16	1/2"	0,994	36,58
k0+247,50	Losa Irregular M.der	2,90	13	1/2"	0,994	37,47
k0+247,50	Losa Irregular M.der	2,44	16	1/2"	0,994	38,81
k0+247,50	Losa Irregular M.izq	2,95	12	1/2"	0,994	35,19
k0+247,50	Losa Irregular M.izq	0,20	4	1/2"	0,994	0,80
k0+247,50	Losa Irregular M.izq	2,20	14	1/2"	0,994	30,62
k0+247,50	Losa Irregular M.izq	2,90	2	1/2"	0,994	5,77
k0+251,00	Losa Irregular M.der	4,20	12	1/2"	0,994	50,10
k0+251,00	Losa Irregular M.der	2,40	4	1/2"	0,994	9,54
k0+251,00	Losa Irregular M.der	2,84	13	1/2"	0,994	36,70
k0+251,00	Losa Irregular M.der	2,36	9	1/2"	0,994	21,11
k0+251,00	Losa Irregular M.izq	4,20	4	1/2"	0,994	16,70
k0+251,00	Losa Irregular M.izq	1,80	12	1/2"	0,994	21,47
k0+251,00	Losa Irregular M.izq	0,69	12	1/2"	0,994	8,23
k0+251,00	Losa Irregular M.izq	2,90	10	1/2"	0,994	28,83
k0+251,00	Losa Irregular M.izq	0,89	12	1/2"	0,994	10,62
k0+251,00	Losa Irregular M.izq	0,54	7	1/2"	0,994	3,76
k0+254,00	Losa Irregular M.der	3,78	5	1/2"	0,994	18,79
k0+254,00	Losa Irregular M.der	1,31	10	1/2"	0,994	12,97
k0+254,00	Losa Irregular M.der	0,98	10	1/2"	0,994	9,69
k0+254,00	Losa Irregular M.der	2,82	10	1/2"	0,994	28,03
k0+254,00	Losa Irregular M.der	0,78	10	1/2"	0,994	7,70
k0+254,00	Losa Irregular M.der	0,44	10	1/2"	0,994	4,37
k0+254,00	Losa Irregular M.der	0,44	10	1/2"	0,994	4,37
k0+282,00	Losa Irregular M.der	0,52	1	1/2"	0,994	0,52
k0+282,00	Losa Irregular M.der	2,29	12	1/2"	0,994	27,32
k0+282,00	Losa Irregular M.der	0,74	4	1/2"	0,994	2,94
k0+282,00	Losa Irregular M.der	2,65	4	1/2"	0,994	10,54
k0+282,00	Losa Irregular M.der	2,94	2	1/2"	0,994	5,84
k0+282,00	Losa Irregular M.der	2,49	6	1/2"	0,994	14,82
k0+282,00	Losa Irregular M.der	0,86	1	1/2"	0,994	0,85
k0+282,00	Losa Irregular M.izq	2,87	10	1/2"	0,994	28,53
k0+282,00	Losa Irregular M.izq	0,95	4	1/2"	0,994	3,76
k0+282,00	Losa Irregular M.izq	0,62	4	1/2"	0,994	2,45
k0+282,00	Losa Irregular M.izq	1,46	1	1/2"	0,994	1,45
k0+282,00	Losa Irregular M.izq	2,63	7	1/2"	0,994	18,30
k0+282,00	Losa Irregular M.izq	2,08	7	1/2"	0,994	14,47
k0+330,00	Losa Irregular M.der	3,00	7	1/2"	0,994	20,87
k0+330,00	Losa Irregular M.der	2,32	7	1/2"	0,994	16,11
k0+330,00	Losa Irregular M.der	2,62	9	1/2"	0,994	23,44
k0+330,00	Losa Irregular M.der	2,00	6	1/2"	0,994	11,93
k0+330,00	Losa Irregular M.izq	2,84	7	1/2"	0,994	19,76
k0+330,00	Losa Irregular M.izq	2,22	7	1/2"	0,994	15,41
k0+330,00	Losa Irregular M.izq	2,60	9	1/2"	0,994	23,26
k0+330,00	Losa Irregular M.izq	2,00	6	1/2"	0,994	11,90
k0+333,00	Losa Irregular M.der	1,34	1	1/2"	0,994	1,33
k0+333,00	Losa Irregular M.der	2,56	7	1/2"	0,994	17,78
k0+333,00	Losa Irregular M.der	1,97	7	1/2"	0,994	13,67
k0+333,00	Losa Irregular M.der	2,77	7	1/2"	0,994	19,24
k0+333,00	Losa Irregular M.der	2,08	7	1/2"	0,994	14,47
k0+333,00	Losa Irregular M.izq	1,40	1	1/2"	0,994	1,39
k0+333,00	Losa Irregular M.izq	2,60	8	1/2"	0,994	20,68
k0+333,00	Losa Irregular M.izq	1,95	7	1/2"	0,994	13,57
k0+333,00	Losa Irregular M.izq	2,77	7	1/2"	0,994	19,24
k0+333,00	Losa Irregular M.izq	2,16	7	1/2"	0,994	15,03
k0+336,00	Losa Irregular M.der	2,47	12	1/2"	0,994	29,46
k0+336,00	Losa Irregular M.der	2,17	3	1/2"	0,994	6,47
k0+336,00	Losa Irregular M.der	2,78	11	1/2"	0,994	30,40
k0+336,00	Losa Irregular M.der	2,20	2	1/2"	0,994	4,37
k0+336,00	Losa Irregular M.der	1,17	1	1/2"	0,994	1,16
k0+339,00	Losa Irregular M.der	3,36	12	1/2"	0,994	40,08
k0+339,00	Losa Irregular M.der	2,14	18	1/2"	0,994	38,29
k0+342,00	Losa Irregular M.der	3,42	12	1/2"	0,994	40,79
k0+342,00	Losa Irregular M.der	1,60	4	1/2"	0,994	6,36
k0+342,00	Losa Irregular M.der	2,90	9	1/2"	0,994	25,94
k0+342,00	Losa Irregular M.der	2,17	8	1/2"	0,994	17,26
k0+369,00	Losa Irregular M.der	3,00	12	1/2"	0,994	35,78
k0+369,00	Losa Irregular M.der	2,20	3	1/2"	0,994	6,56
k0+369,00	Losa Irregular M.der	2,80	12	1/2"	0,994	33,40
k0+369,00	Losa Irregular M.der	2,20	4	1/2"	0,994	8,75
k0+372,00	Losa Irregular M.der	2,17	15	1/2"	0,994	32,35
k0+372,00	Losa Irregular M.der	2,80	12	1/2"	0,994	33,40
k0+375,00	Losa Irregular M.der	2,97	5	1/2"	0,994	14,76
k0+375,00	Losa Irregular M.der	0,82	7	1/2"	0,994	5,71
k0+375,00	Losa Irregular M.der	1,36	7	1/2"	0,994	9,46
k0+375,00	Losa Irregular M.der	2,14	8	1/2"	0,994	17,02
k0+375,00	Losa Irregular M.der	0,54	7	1/2"	0,994	3,72
k0+375,00	Losa Irregular M.der	0,72	7	1/2"	0,994	4,97
k0+408,00	Losa Irregular M.der	2,97	12	1/2"	0,994	35,43
k0+408,00	Losa Irregular M.der	2,34	3	1/2"	0,994	6,98
k0+408,00	Losa Irregular M.der	2,89	12	1/2"	0,994	34,47
k0+408,00	Losa Irregular M.der	2,39	3	1/2"	0,994	7,13
k0+423,00	Losa Irregular Bahia	2,54	1	1/2"	0,994	2,52
k0+423,00	Losa Irregular Bahia	2,57	1	1/2"	0,994	2,55
k0+423,00	Losa Irregular Bahia	2,32	1	1/2"	0,994	2,31
k0+423,00	Losa Irregular Bahia	0,95	1	1/2"	0,994	0,94
k0+423,00	Losa Irregular Bahia	0,57	12	1/2"	0,994	6,74
k0+423,00	Losa Irregular Bahia	2,68	5	1/2"	0,994	13,32
k0+423,00	Losa Irregular Bahia	1,14	5	1/2"	0,994	5,67
k0+423,00	Losa Irregular Bahia	1,40	14	1/2"	0,994	19,48

k0+423,00	Losa Irregular Bahia	0,45	1	1/2"	0,994	0,45
k0+423,00	Losa Irregular M.der	2,90	10	1/2"	0,994	28,83
k0+423,00	Losa Irregular M.der	3,22	5	1/2"	0,994	16,00
k0+423,00	Losa Irregular M.der	1,01	3	1/2"	0,994	3,01
k0+423,00	Losa Irregular M.der	1,70	1	1/2"	0,994	1,69
k0+423,00	Losa Irregular M.der	3,31	13	1/2"	0,994	42,71
k0+423,00	Losa Irregular M.der	3,00	1	1/2"	0,994	2,98
k0+423,00	Losa Irregular M.der	0,50	2	1/2"	0,994	0,99
k0+426,00	Losa Irregular Bahia	2,56	8	1/2"	0,994	20,36
k0+426,00	Losa Irregular Bahia	2,06	1	1/2"	0,994	2,05
k0+426,00	Losa Irregular Bahia	1,46	6	1/2"	0,994	8,68
k0+426,00	Losa Irregular Bahia	2,79	7	1/2"	0,994	19,41
k0+426,00	Losa Irregular Bahia	0,61	6	1/2"	0,994	3,64
k0+426,00	Losa Irregular Bahia	1,48	6	1/2"	0,994	8,83
k0+426,00	Losa Irregular Bahia	0,77	1	1/2"	0,994	0,77
k0+429,00	Losa Irregular Bahia	4,20	7	1/2"	0,994	29,22
k0+429,00	Losa Irregular Bahia	1,45	5	1/2"	0,994	7,21
k0+429,00	Losa Irregular Bahia	1,98	5	1/2"	0,994	9,84
k0+429,00	Losa Irregular Bahia	2,37	10	1/2"	0,994	23,56
k0+429,00	Losa Irregular Bahia	2,32	6	1/2"	0,994	13,81
k0+429,00	Losa Irregular Bahia	1,53	6	1/2"	0,994	9,12
k0+429,00	Losa Irregular Bahia	0,78	1	1/2"	0,994	0,78
k0+432,00	Losa Irregular Bahia	3,98	13	1/2"	0,994	51,36
k0+432,00	Losa Irregular Bahia	2,23	1	1/2"	0,994	2,22
k0+432,00	Losa Irregular Bahia	0,67	1	1/2"	0,994	0,67
k0+432,00	Losa Irregular Bahia	2,56	19	1/2"	0,994	48,35
k0+432,00	Losa Irregular Bahia	1,51	3	1/2"	0,994	4,49
k0+435,00	Losa Irregular Bahia	2,70	15	1/2"	0,994	40,26
k0+435,00	Losa Irregular Bahia	2,90	8	1/2"	0,994	23,06
k0+435,00	Losa Irregular Bahia	1,60	11	1/2"	0,994	17,49
k0+435,00	Losa Irregular Bahia	4,15	15	1/2"	0,994	61,88
k0+435,00	Losa Irregular Bahia	1,60	1	1/2"	0,994	1,59
k0+435,00	Losa Irregular Bahia	2,93	11	1/2"	0,994	32,04
k0+435,00	Losa Irregular Bahia	3,20	9	1/2"	0,994	28,63
k0+435,00	Losa Irregular Bahia	1,91	2	1/2"	0,994	3,79
k0+437,50	Losa Irregular Bahia	4,20	3	1/2"	0,994	12,52
k0+437,50	Losa Irregular Bahia	1,84	4	1/2"	0,994	7,30
k0+437,50	Losa Irregular Bahia	0,82	9	1/2"	0,994	7,29
k0+437,50	Losa Irregular Bahia	2,25	4	1/2"	0,994	8,95
k0+437,50	Losa Irregular Bahia	1,00	19	1/2"	0,994	18,79
k0+440,50	Losa Irregular M.der	3,00	8	1/2"	0,994	23,86
k0+440,50	Losa Irregular M.der	0,76	10	1/2"	0,994	7,55
k0+440,50	Losa Irregular M.der	1,01	10	1/2"	0,994	9,99
k0+440,50	Losa Irregular M.der	3,24	6	1/2"	0,994	19,32
k0+440,50	Losa Irregular M.der	0,48	4	1/2"	0,994	1,89
k0+440,50	Losa Irregular M.der	1,65	10	1/2"	0,994	16,35
k0+447,40	Losa Irregular M.izq	3,37	5	1/2"	0,994	16,75
k0+447,40	Losa Irregular M.izq	2,77	4	1/2"	0,994	11,01
k0+447,40	Losa Irregular M.izq	1,60	6	1/2"	0,994	9,54
k0+447,40	Losa Irregular M.izq	0,81	6	1/2"	0,994	4,83
k0+447,40	Losa Irregular M.izq	2,70	9	1/2"	0,994	24,15
k0+447,40	Losa Irregular M.izq	1,90	3	1/2"	0,994	5,67
k0+447,40	Losa Irregular M.izq	1,31	6	1/2"	0,994	7,81
k0+447,40	Losa Irregular M.izq	0,36	6	1/2"	0,994	2,15
k0+450,90	Losa Irregular M.izq	3,38	11	1/2"	0,994	36,96
k0+450,90	Losa Irregular M.izq	1,95	18	1/2"	0,994	34,89
k0+453,00	Losa Irregular M.izq	2,70	9	1/2"	0,994	24,15
k0+453,00	Losa Irregular M.izq	1,90	2	1/2"	0,994	3,78
k0+453,00	Losa Irregular M.izq	2,00	11	1/2"	0,994	21,87
k0+453,00	Losa Irregular M.izq	1,60	4	1/2"	0,994	6,36
k0+476,50	Losa Irregular M.izq	2,90	15	1/2"	0,994	43,24
k0+476,50	Losa Irregular M.izq	1,24	5	1/2"	0,994	6,16
k0+476,50	Losa Irregular M.izq	2,90	9	1/2"	0,994	25,94
k0+476,50	Losa Irregular M.izq	3,27	7	1/2"	0,994	22,72
k0+486,30	Losa Irregular M.izq	3,11	15	1/2"	0,994	46,37
k0+486,30	Losa Irregular M.izq	1,00	3	1/2"	0,994	2,98
k0+486,30	Losa Irregular M.izq	2,66	8	1/2"	0,994	21,15
k0+486,30	Losa Irregular M.izq	3,20	8	1/2"	0,994	25,45
k0+486,30	Losa Irregular M.izq	1,56	5	1/2"	0,994	7,75
k0+495,60	Losa Irregular M.izq	1,90	12	1/2"	0,994	22,66
k0+495,60	Losa Irregular M.izq	2,15	11	1/2"	0,994	23,51
k0+498,30	Losa Irregular M.izq	2,90	12	1/2"	0,994	34,59
k0+498,30	Losa Irregular M.izq	2,15	14	1/2"	0,994	29,92
k0+501,30	Losa Irregular M.izq	2,90	10	1/2"	0,994	28,83
k0+501,30	Losa Irregular M.izq	0,98	12	1/2"	0,994	11,69
k0+501,30	Losa Irregular M.izq	2,90	6	1/2"	0,994	17,30
k0+501,30	Losa Irregular M.izq	2,00	10	1/2"	0,994	19,88
k0+513,50	Losa Irregular M.izq	3,00	9	1/2"	0,994	26,84
k0+513,50	Losa Irregular M.izq	1,05	7	1/2"	0,994	7,27
k0+513,50	Losa Irregular M.izq	1,34	7	1/2"	0,994	9,32
k0+513,50	Losa Irregular M.izq	2,90	11	1/2"	0,994	31,71
k0+513,50	Losa Irregular M.izq	0,48	6	1/2"	0,994	2,86
k0+513,50	Losa Irregular M.izq	1,44	6	1/2"	0,994	8,59
					SUBTOTAL - ACTA No. 10	2986220

ÁREA PAVIMENTACIÓN BARRIOS SAN MARTIN, QUEBRADA LA IGLESIA, SAN PEDRO Y URBANIZACIONES EL SOL 1 Y SOL 2. ENTRE LAS ABSCISAS K0+405.3 Y LA K0+526.3

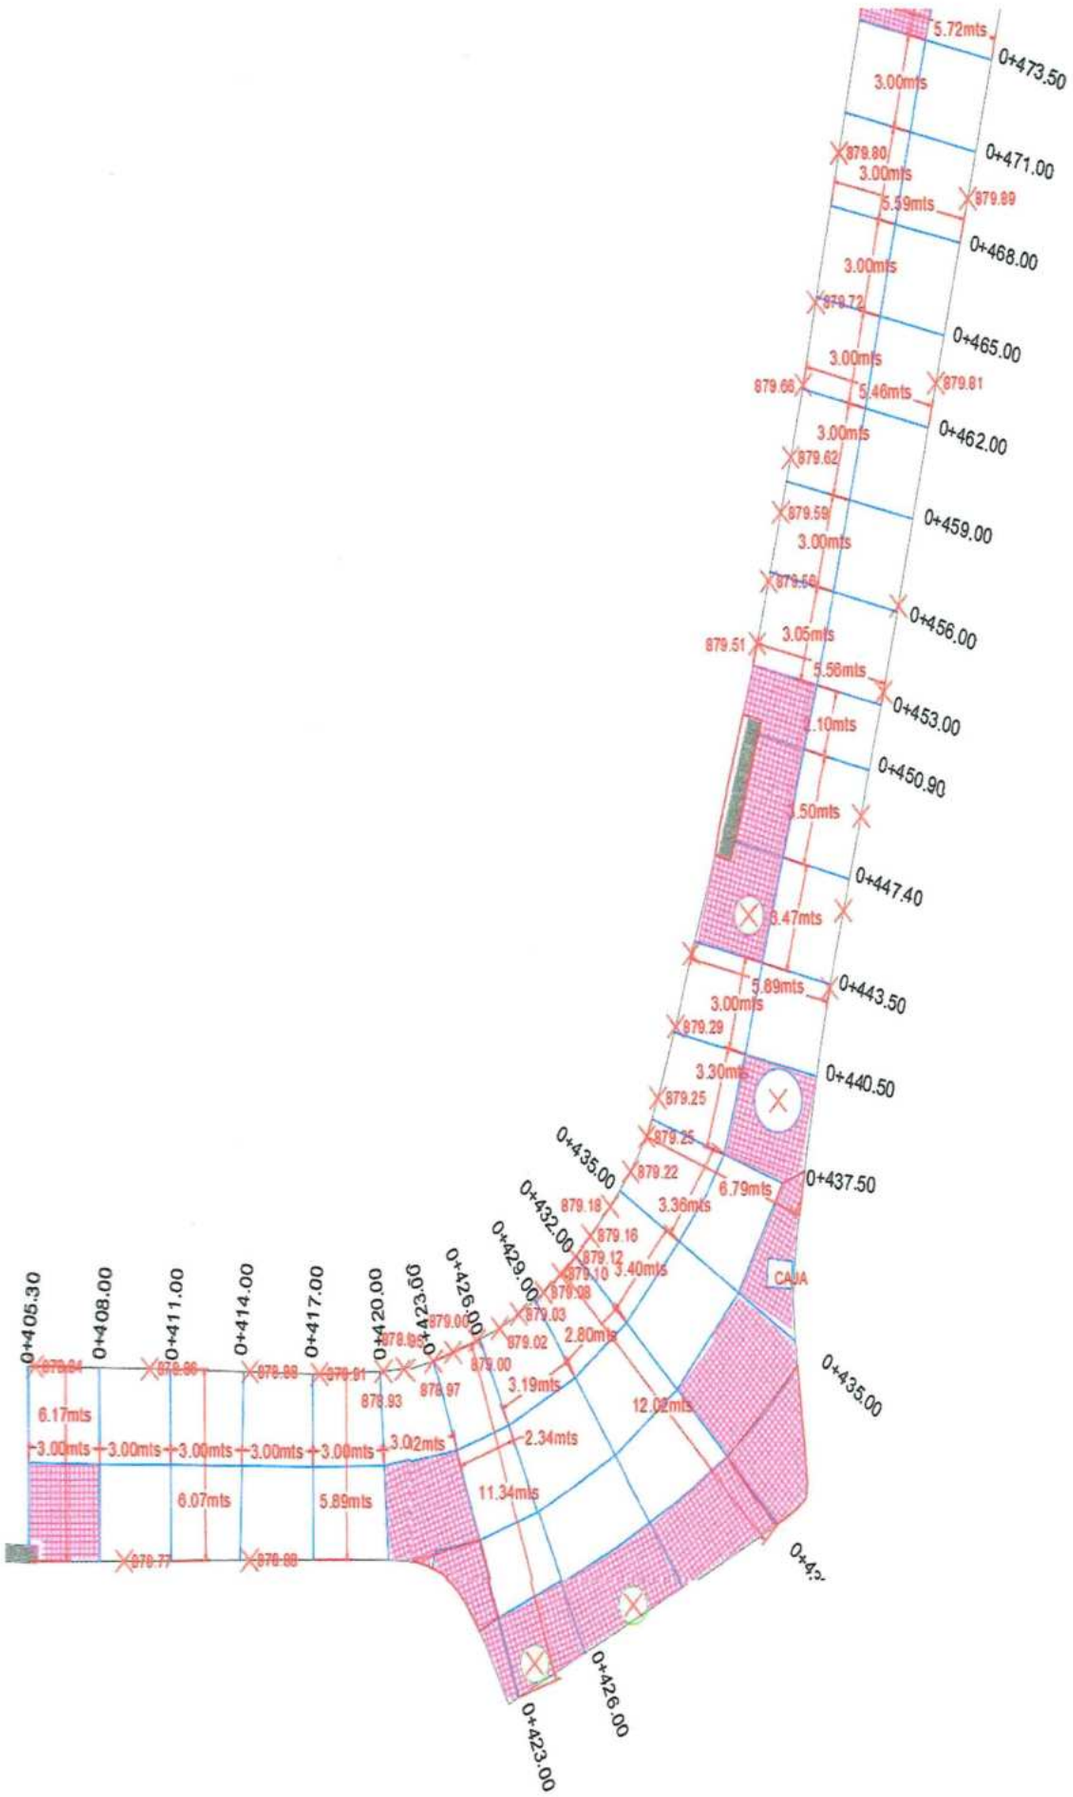

CONTINUACIÓN - ÁREA PAVIMENTACIÓN BARRIOS SAN MARTIN, QUEBRADA LA IGLESIA, SAN PEDRO Y URBANIZACIONES EL SOL 1 Y SOL 2. ENTRE LAS ABSCISAS K0+405,3 Y LA K0+526,3



OBSERVACIONES:	PRESENTE ACTA 10		ACUMULADO			TOTALES	29.862,20
	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% EJECUTADO		
	29.862,20	$ 269.207.733,00	661.781,86	$ 5.965.963.467,90	86,84%		

CONTRATISTA: CONSORCIO LA FLORA 2023

Firma: Cantado V

REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERVENTORÍA CANALIZACIÓN EGA

Firma:

REPRESENTANTE LEGAL

Secretaria de Infraestructura Física Alcaldía de Bucaramanga	Alcaldía de Bucaramanga	Consorcio La Flora 2023	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	30	MM	06	AAAA	2025	ACTA No.	10	ELABORÓ	DANIEL GÓMEZ BARRAGAN

OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
ENTIDAD CONTRATANTE:	ALCALDÍA DE BUCARAMANGA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
CONTRATISTA:	CONSORCIO LA FLORA 2023
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORÍA CANALIZACIÓN BGA

CAPÍTULO 4. ESTRUCTURAS

4.08.02	Juntas con sello de P.V.C. ancho 15 cm		UNIDAD	m

ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMÁGEN

REGISTRO FOTOGRÁFICO







Ubicación	DIMENSIONES Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Elemento (und)	Longitud (m)
ACTA #10					
BOX-CULVERT 3.00 X 3.00 MTS					
BOX-CULVERT 3.00X3.00 M, MÓDULO 91 DE LA ABSCISA K4+329.9 A K4+309.9.					
EN JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN LOZA INFERIOR - MUROS	10,00			2,00	20,00
EN JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN MUROS - LOZA SUPERIOR	10,00			2,00	20,00
BOX-CULVERT 3.00X3.00 M, MÓDULO 97 DE LA ABSCISA K4+270,6 A K4+260,6. (INC ESCALÓN)					
EN JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN LOZA INFERIOR - MUROS	11,00			2,00	22,00
EN JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN MUROS - LOZA SUPERIOR	11,00			2,00	22,00
BOX-CULVERT 3.00X3.00 M, MÓDULO 98 DE LA ABSCISA K4+260,6 A K4+250,6. (INC ESCALÓN)					
EN JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN LOZA INFERIOR - MUROS	11,00			2,00	22,00
EN JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN MUROS - LOZA SUPERIOR	11,00			2,00	22,00
BOX-CULVERT 3.00X3.00 M, MÓDULO 99 DE LA ABSCISA K4+250,6 A K4+240,6.					
EN JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN LOZA INFERIOR - MUROS	10,00			2,00	20,00
EN JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN MUROS - LOZA SUPERIOR	10,00			2,00	20,00
				SUBTOTAL - ACTA #10	168,00

OBSERVACIONES:	PRESENTE ACTA 10		ACUMULADO			TOTALES	168,00
	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% EJECUTADO		
	168,00	$ 10.479.504,00	4.421,90	$ 275.829.278,20	88,01%		

CONTRATISTA: CONSORCIO LA FLORA 2023

Firma:

REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERVENTORÍA CANALIZACIÓN BGA

Firma:

REPRESENTANTE LEGAL

Secretaria de Infraestructura Fisica Alcaldía de Bucaramanga	Alcaldía de Bucaramanga	Consorcio La Flora 2023	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	30	MM	06	AAAA	2025	ACTA No.	10	ELABORÓ	DANIEL GÓMEZ BARRAGÁN

OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
ENTIDAD CONTRATANTE:	ALCALDÍA DE BUCARAMANGA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
CONTRATISTA:	CONSORCIO LA FLORA 2023
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORÍA CANALIZACIÓN BGA

CAPÍTULO 4. ESTRUCTURAS

4.08.02.P	Junta de dilatación constructiva. Incluye sello P.V.C. ancho 10 cm y sellante de poliuretano		UNIDAD	m

ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMÁGEN

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Ubicación	DIMENSIONES			Elemento (und)	Longitud (m)
	Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)		
ACTA #10					
BOX-CULVERT 3.00X3.00 M, MÓDULO 91 DE LA ABSCISA K4+329,9 A K4+309,9.					
CINTA PVC TRANSVERSAL 22CM. JUNTAS DE DILATACIÓN EN TODA LA SECCIÓN. K4+597.3	13,50			1,00	13,50
BOX-CULVERT 3.00X3.00 M, MÓDULO 97 DE LA ABSCISA K4+270,6 A K4+260,6. (INC ESCALÓN)					
CINTA PVC TRANSVERSAL 22CM. JUNTAS DE DILATACIÓN EN TODA LA SECCIÓN. K4+597.3	13,50			1,00	13,50
BOX-CULVERT 3.00X3.00 M, MÓDULO 98 DE LA ABSCISA K4+260,6 A K4+250,6. (INC ESCALÓN)					
CINTA PVC TRANSVERSAL 22CM. JUNTAS DE DILATACIÓN EN TODA LA SECCIÓN. K4+597.3	13,50			1,00	13,50
BOX-CULVERT 3.00X3.00 M, MÓDULO 99 DE LA ABSCISA K4+250,6 A K4+240,6.					
CINTA PVC TRANSVERSAL 22CM. JUNTAS DE DILATACIÓN EN TODA LA SECCIÓN. K4+597.3	13,50			1,00	13,50
				SUBTOTAL - ACTA #10	54,00

OBSERVACIONES:	PRESENTE ACTA 10		ACUMULADO			TOTALES	54,00
	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% EJECUTADO		
	54,00	$ 9.244.692,00	1.477,50	$ 252.936.045,00	94,14%		

CONTRATISTA:	CONSORCIO LA FLORA 2023	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVENTORÍA CANALIZACIÓN BGA
Firma:	REPRESENTANTE LEGAL	Firma:	REPRESENTANTE LEGAL

Secretaria de Infraestructura Fisica Alcaldía de Bucaramanga	Alcaldía de Bucaramanga	Consorcio La Flora 2023	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD 30	MM 06	AAAA 2025	ACTA No.	10	ELABORÓ	DANIEL GÓMEZ BARRAGÁN

OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
ENTIDAD	ALCALDÍA DE BUCARAMANGA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
CONTRATISTA:	CONSORCIO LA FLORA 2023
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORÍA CANALIZACIÓN BGA

CAPÍTULO 5. VARIOS


5.01.01	Demolición de pisos, sardineles, canaletas y escaleras	UNIDAD	m3

ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMÁGEN

REGISTRO FOTOGRÁFICO





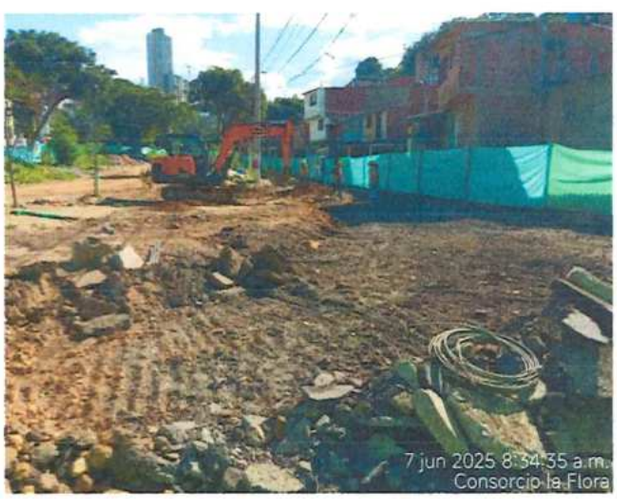

ABSCISADO LOCAL	DIMENSIONES Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Area sección (m2)	Volumen (m3)
ACTA #10					
SARDINELES CONFINAMIENTO DE PAVIMENTO EXISTENTE EN BARRIOS SAN MARTIN, QUEBRADA LA IGLESIA, SAN PEDRO Y URBANIZACIONES EL SOL 1 Y SOL 2. ENTRE LAS ABSCISAS K0+198 Y LA K0+945					
SARDINEL DE COSTADO DERECHO					
K0+198,00					
CONCRETO IN SITU 20X40CM	198,00	0,2	0,4	0,08	15,84
K0+384,00					
K0+387,00					
CONCRETO IN SITU 20X40CM	220,00	0,2	0,4	0,08	17,60
K0+573,00					
K0+576,00					
CONCRETO IN SITU 20X40CM	33,30	0,2	0,4	0,08	2,66
K0+591,00					
K0+600,00					
CONCRETO IN SITU 20X40CM	118,00	0,2	0,4	0,08	9,44
K0+711,00					
K0+717,00					
CONCRETO IN SITU 20X40CM	228,00	0,2	0,4	0,08	18,24
K0+945,00					
SARDINELES CONFINAMIENTO DE PAVIMENTO EXISTENTE EN BARRIOS SAN MARTIN, QUEBRADA LA IGLESIA, SAN PEDRO Y URBANIZACIONES EL SOL 1 Y SOL 2. ENTRE LAS ABSCISAS K0+198 Y LA K0+945					
SARDINEL DE COSTADO IZQUIERDO					
K0+198,00					
PREFABRICADO 20X50CM	47,00	0,2	0,45	0,09	4,23
K0+246,00					
K0+264,00					
CONCRETO IN SITU 20X40CM	48,90	0,2	0,4	0,08	3,91
K0+312,00					
K0+327,00					
CONCRETO IN SITU 20X40CM	62,90	0,2	0,4	0,08	5,03
K0+384,00					
K0+387,00					
CONCRETO IN SITU 20X40CM	118,00	0,2	0,4	0,08	9,44
K0+480,00					
K0+483,00					
CONCRETO IN SITU 20X40CM	244,11	0,2	0,4	0,08	19,53
K0+703,00					
K0+703,00					
PREFABRICADO 20X50CM	156,94	0,2	0,45	0,09	14,12
K0+855,00					
K0+903,00					
PREFABRICADO 20X50CM	43,12	0,2	0,45	0,09	3,88
K0+945,00					
				SUBTOTAL - ACTA #10	123,92

REGISTRO FOTOGRÁFICO - ESTADO INICIAL SARDINELES ENTRE LAS ABSCISAS K0+198 Y LA K0+945









REGISTRO FOTOGRÁFICO - ESTADO INICIAL SARDINELES ENTRE LAS ABSCISAS K0+198 Y LA K0+945











REGISTRO FOTOGRÁFICO - ESTADO INICIAL SARDINELES ENTRE LAS ABSCISAS K0+198 Y LA K0+945









REGISTRO FOTOGRÁFICO - ESTADO INICIAL SARDINELES ENTRE LAS ABSCISAS K0+198 Y LA K0+945









OBSERVACIONES:	PRESENTE ACTA 10		ACUMULADO			TOTALES	123,92
	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% EJECUTADO		
	123,92	$ 24.656.858,08	161,14	$ 32.062.670,36	33,89%		

CONTRATISTA: CONSORCIO LA FLORA 2023

Firma: REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERVENTORÍA CANALIZACIÓN BGA

Firma: REPRESENTANTE LEGAL

Secretaría de Infraestructura Física Alcaldía de Bucaramanga	Alcaldía de Bucaramanga	Consorcio La Flora 2023	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	30	MM	06	AAAA	2025	ACTA No.	10	ELABORÓ	DANIEL GÓMEZ BARRAGÁN

OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
ENTIDAD CONTRATANTE:	ALCALDÍA DE BUCARAMANGA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
CONTRATISTA:	CONSORCIO LA FLORA 2023
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORÍA CANALIZACIÓN BGA

CAPÍTULO 5. VARIOS

5,03	1	e	Reparación de pavimento asfáltico	Suministro e instalación de base granular	UNIDAD	m3

ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMÁGEN

REGISTRO FOTOGRÁFICO








ABSCISAS	DIMENSIONES			Ancho promedio (m)	Área (m2)
	Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)		
ACTA #10					
PAVIMENTACIÓN BARRIOS SAN MARTIN, QUEBRADA LA IGLESIA, SAN PEDRO Y URBANIZACIONES EL SOL 1 Y SOL 2. ENTRE LAS ABSCISAS K0+195 Y LA K0+375					
K0+195,00		6,43			
	6,00		0,2	6,43	7,72
K0+201,00		6,43			
	6,00		0,2	6,43	7,72
K0+207,00		6,42			
	6,00		0,2	6,45	7,74
K0+213,00		6,47			
	6,00		0,2	6,48	7,78
K0+219,00		6,48			
	6,00		0,2	6,45	7,74
K0+225,00		6,42			
	6,00		0,2	6,41	7,69
K0+231,00		6,4			
	6,00		0,2	6,41	7,69
K0+237,00		6,41			
	4,00		0,2	6,4	5,12
K0+241,00		6,39			
	6,50		0,2	6,3	8,19
K0+247,50		6,21			
	6,50		0,2	6,08	7,90
K0+254,00		5,94			
	4,00		0,2	5,87	4,70
K0+258,00		5,79			
	6,00		0,2	5,64	6,77
K0+264,00		5,48			
	6,00		0,2	5,7	6,84
K0+270,00		5,91			
	9,00		0,2	5,91	10,64
K0+279,00		5,9			
	6,00		0,2	5,65	6,78
K0+285,00		5,4			
	6,00		0,2	5,43	6,52
K0+291,00		5,45			
	6,00		0,2	5,41	6,49
K0+297,00		5,37			
	6,00		0,2	5,39	6,47
K0+303,00		5,41			
	6,00		0,2	5,4	6,48
K0+309,00		5,39			
	6,00		0,2	5,43	6,52
K0+315,00		5,46			
	6,00		0,2	5,44	6,53
K0+321,00		5,42			
	6,00		0,2	5,43	6,52
K0+327,00		5,43			
	6,00		0,2	5,61	6,73
K0+333,00		5,79			
	6,00		0,2	5,89	7,07
K0+339,00		5,99			
	6,00		0,2	6,01	7,21
K0+345,00		6,02			
	6,00		0,2	5,94	7,13
K0+351,00		5,86			
	6,00		0,2	5,87	7,04
K0+357,00		5,88			
	6,00		0,2	5,9	7,08
K0+363,00		5,92			
	6,00		0,2	5,92	7,10
K0+369,00		5,91			
	6,00		0,2	5,96	7,15
K0+375,00		6,01			
PAVIMENTACIÓN BARRIOS SAN MARTIN, QUEBRADA LA IGLESIA, SAN PEDRO Y URBANIZACIONES EL SOL 1 Y SOL 2. ENTRE LAS ABSCISAS K0+405,3 Y LA K0+526,3					
K0+405,30		6,17			
	5,70		0,2	6,12	6,98
K0+411,00		6,07			
	6,00		0,2	5,98	7,18
K0+417,00		5,89			
	6,00		0,2	5,62	10,34
K0+423,00		11,34			
	9,00		0,2	11,68	21,02
K0+432,00		12,02			
	5,50		0,2	9,41	10,35
K0+437,50		6,79			
	6,00		0,2	6,34	7,61

ÁREA PAVIMENTACIÓN BARRIOS SAN MARTIN, QUEBRADA LA IGLESIA, SAN PEDRO Y URBANIZACIONES EL SOL 1 Y SOL 2. ENTRE LAS ABSCISAS K0+195 Y LA K0+375

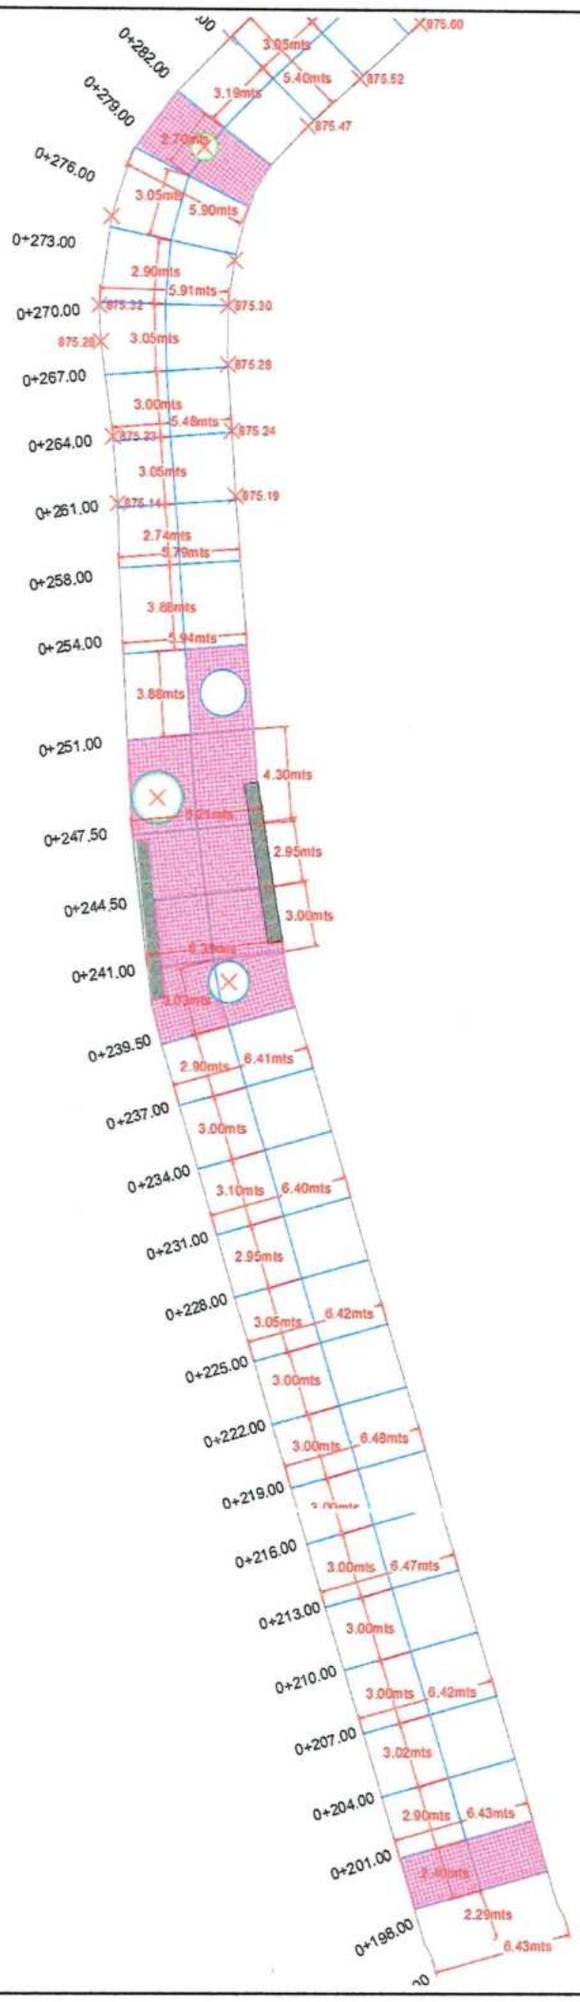


K0+443,50		5,89			
	9,50		0,2	5,73	10,89
K0+453,00		5,56			
	9,00		0,2	5,51	9,92
K0+462,00		5,46			
	6,00		0,2	5,53	6,64
K0+468,00		5,59			
	5,50		0,2	5,66	6,23
K0+473,50		5,72			
	6,20		0,2	5,81	7,20
K0+479,70		5,89			
	6,60		0,2	5,84	7,71
K0+486,30		5,79			
	7,20		0,2	5,88	8,47
K0+493,50		5,96			
	7,80		0,2	5,96	9,30
K0+501,30		5,95			
	5,80		0,2	5,95	6,90
K0+507,10		5,94			
	6,40		0,2	5,96	7,63
K0+513,50		5,97			
	6,40		0,2	5,96	7,63
K0+519,90		5,94			
	6,40		0,2	5,95	7,62
K0+526,30		5,96			
LOSAS IRREGULARES					
K0+422,00	2,94	1,41	0,2		0,83
K0+433,00	3,02	2,62	0,2		1,58
K0+437,00	1,1	0,91	0,2		0,20
K0+475,80	2,03	0,52	0,2		0,21
K0+483,00	1,19	0,53	0,2		0,13


DESCUENTO DE VOLUMEN

ABSCISAS	DIMENSIONES			Área (m2)	Volumen (m3)
	Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)		
PAVIMENTACIÓN BARRIOS SAN MARTIN, QUEBRADA LA IGLESIA, SAN PEDRO Y URBANIZACIONES EL SOL 1 Y SOL 2. ENTRE LAS ABSCISAS K0+195 Y LA K0+375					
CORONA DE POZO D=1,80MTS - K0+240,5			0,2	2,54	-0,51
SUMIDERO LATERAL CON REJILLAS SL800 - K0+243,5	7,4	0,75	0,2		-1,11
SUMIDERO LATERAL CON REJILLAS SL800 - K0+245,3	7,4	0,75	0,2		-1,11
CORONA DE POZO D=2,10MTS - K0+249			0,2	3,46	-0,69
CORONA DE POZO D=2,10MTS - K0+253,50			0,2	3,46	-0,69
CORONA DE POZO D=1,20MTS - K0+280,5			0,2	1,13	-0,23
CORONA DE POZO D=1,20MTS - K0+330			0,2	1,13	-0,23
SUMIDERO LATERAL CON REJILLAS SL600 - K0+337,5	5,8	0,75	0,2		-0,87
SUMIDERO LATERAL CON REJILLAS SL800 - K0+372	7,4	0,75	0,2		-1,11
CORONA DE POZO D=1,20MTS - K0+373,5			0,2	1,13	-0,23
PAVIMENTACIÓN BARRIOS SAN MARTIN, QUEBRADA LA IGLESIA, SAN PEDRO Y URBANIZACIONES EL SOL 1 Y SOL 2. ENTRE LAS ABSCISAS K0+405,3 Y LA K0+526,3					
CORONA DE POZO D=1,20MTS - K0+424			0,2	1,13	-0,23
CORONA DE POZO D=1,20MTS - K0+427,5			0,2	1,13	-0,23
CAJA DE INSPECCIÓN - K0+436	1,04	0,87	0,2		-0,18
CORONA DE POZO D=2,10MTS - K0+439,00			0,2	3,46	-0,69
CORONA DE POZO D=1,20MTS - K0+444,4			0,2	1,13	-0,23
SUMIDERO LATERAL CON REJILLAS SL500 - K0+448,3	4,7	0,75	0,2		-0,71
SUMIDERO LATERAL CON REJILLAS SL600 - K0+496	5,8	0,75	0,2		-0,87
CORONA DE POZO D=1,20MTS - K0+500			0,2	1,13	-0,23
CORONA DE POZO D=1,20MTS - K0+511,3			0,2	1,13	-0,23
				SUBTOTAL - ACTA #10	365,25


CONTINUACIÓN - ÁREA PAVIMENTACIÓN BARRIOS SAN MARTIN, QUEBRADA LA IGLESIA, SAN PEDRO Y URBANIZACIONES EL SOL 1 Y SOL 2. ENTRE LAS ABSCISAS K0+195 Y LA K0+375

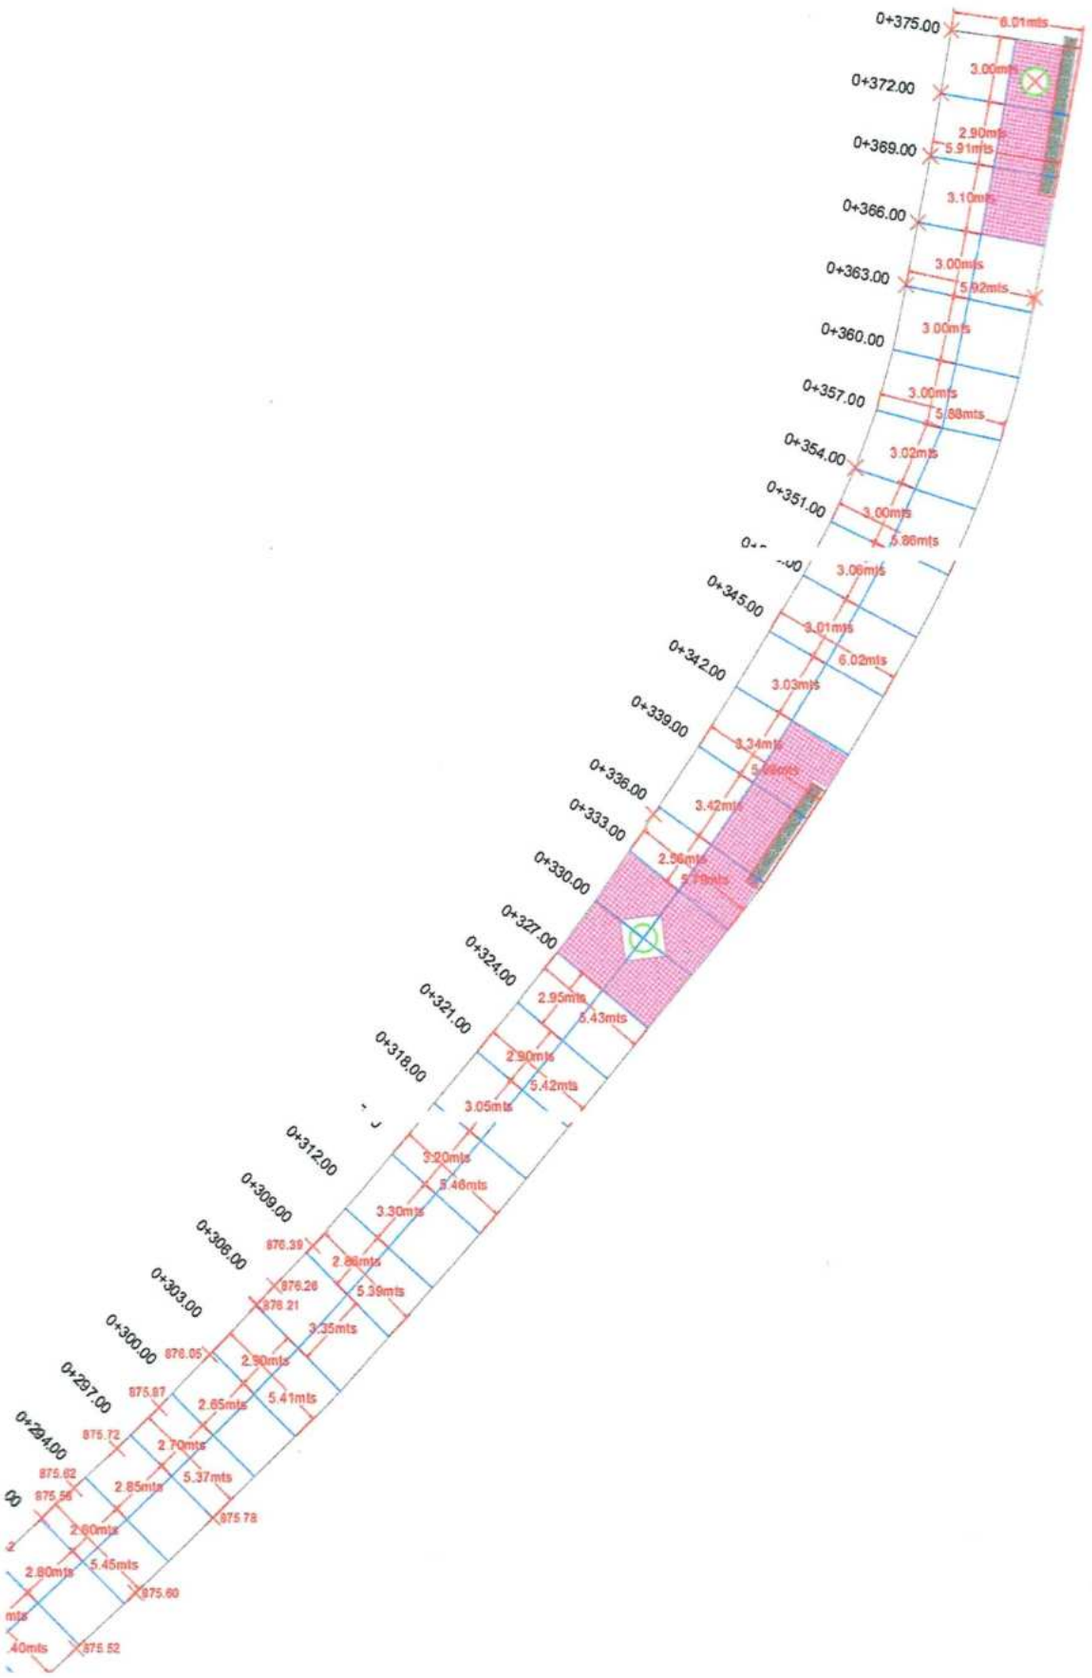

ÁREA PAVIMENTACIÓN BARRIOS SAN MARTIN, QUEBRADA LA IGLESIA, SAN PEDRO Y URBANIZACIONES EL SOL 1 Y SOL 2. ENTRE LAS ABSCISAS K0+405,3 Y LA K0+526,3

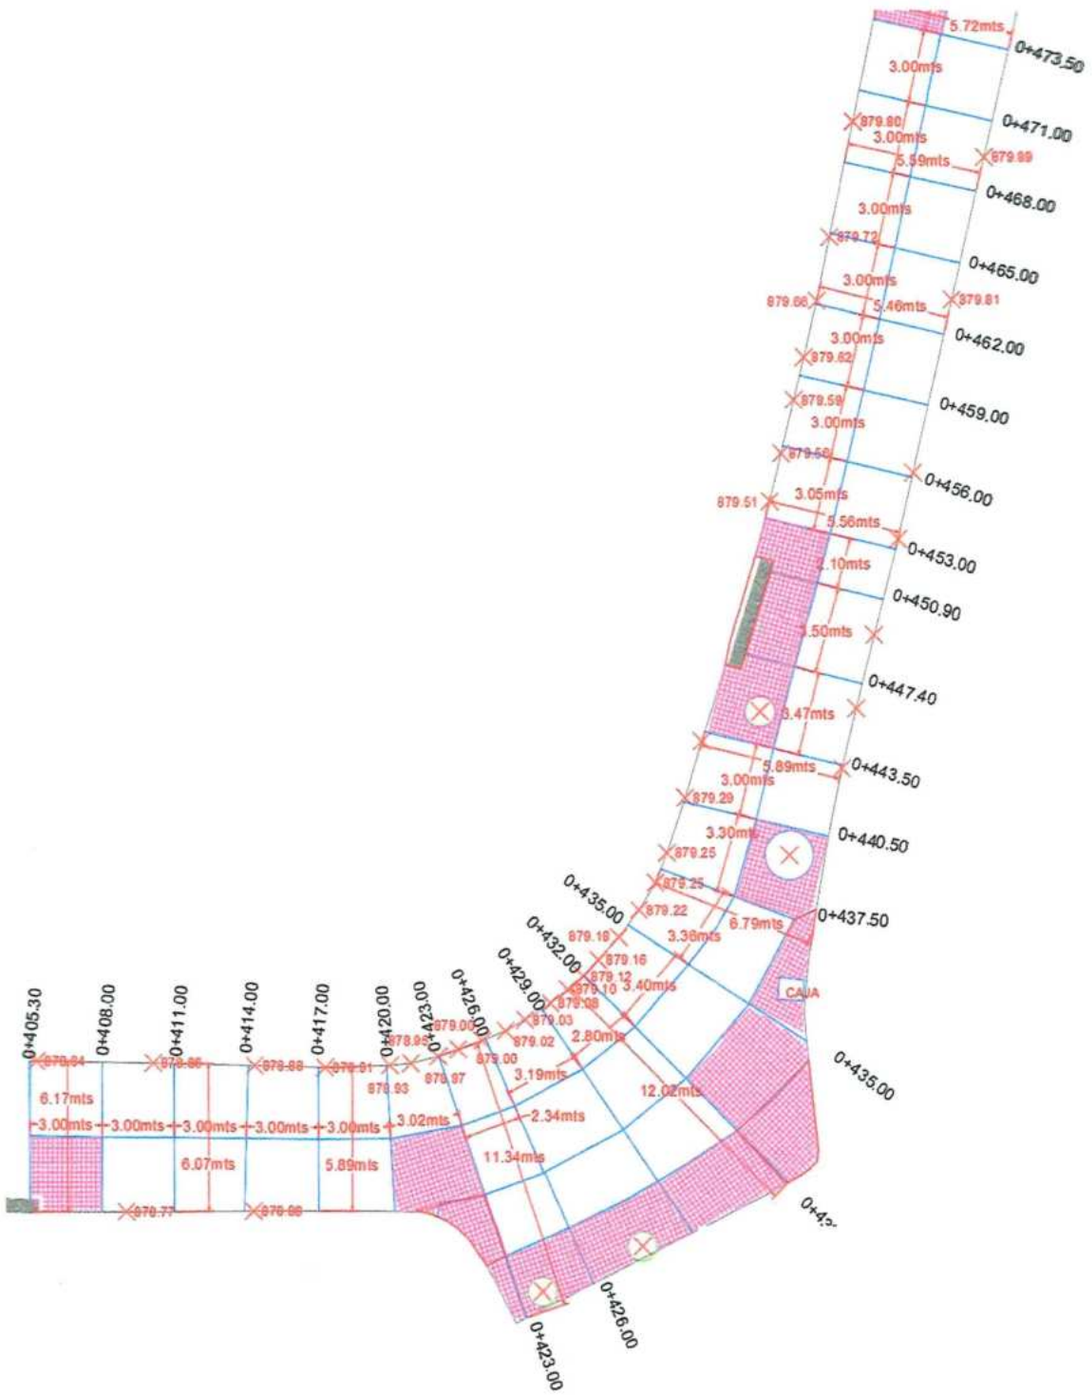

CONTINUACIÓN - ÁREA PAVIMENTACIÓN BARRIOS SAN MARTIN, QUEBRADA LA IGLESIA, SAN PEDRO Y URBANIZACIONES EL SOL 1 Y SOL 2. ENTRE LAS ABSCISAS K0+405,3 Y LA K0+526,3

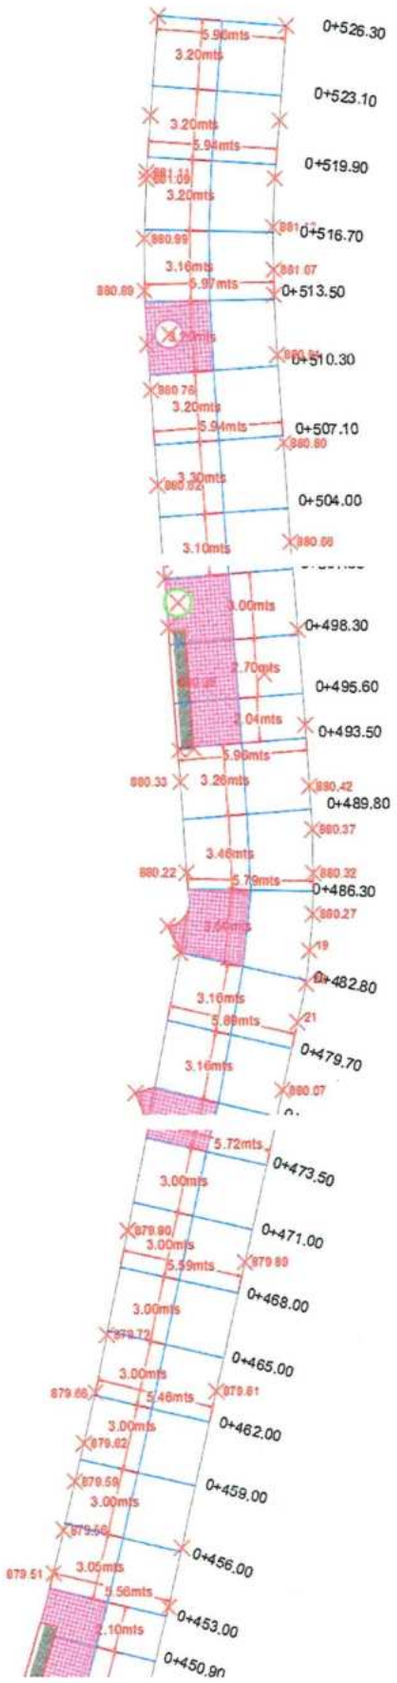

OBSERVACIONES:	PRESENTE ACTA 10		ACUMULADO			TOTALES	365,25
	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% EJECUTADO		
	365,25	$ 67.125.279,75	365,25	$ 67.125.279,75	18,68%		

CONTRATISTA: CONSORCIO LA FLORA 2023

Firma: REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERVENTORIA CANALIZACIÓN EGA

Firma: REPRESENTANTE LEGAL

Secretaria de Infraestructura Fisica Alcaldía de Bucaramanga	Alcaldía de Bucaramanga	Consorcio La Flora 2023	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	30	MM	06	AAAA	2025	ACTA No.	10	ELABORÓ	DANIEL GÓMEZ BARRAGÁN

OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
ENTIDAD CONTRATANTE:	ALCALDÍA DE BUCARAMANGA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
CONTRATISTA:	CONSORCIO LA FLORA 2023
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORÍA CANALIZACIÓN BGA

CAPÍTULO 6. NO PREVISTOS

6.0.8.	Suministro y colocacion de concreto ciclopeo 35% piedra rajón y 65% concreto de 2500 psi	UNIDAD	m3

ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMÁGEN

REGISTRO FOTOGRÁFICO







LOCALIZACIÓN	Ubicación	DIMENSIONES Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Elemento (und)	Cantidad (und)
	ACTA #10					
	MEJORAMIENTO PARA CIMENTACIÓN DE BOX-CULVERT 3,0X3,0 MTS, QUEBRADAS LA FLORA Y LA IGLESIA DE LA ABSCISA K4+333 HASTA LA K4+319					
MOD 90	K4+333,00					
		13,00	4,90	0,50	1,00	31,85
MOD 92	K4+320,00					
		1,00	4,90	0,50	1,00	2,45
MOD 92	K4+319,00					
	MEJORAMIENTO PARA CIMENTACIÓN DE BOX-CULVERT 3,0X3,0 MTS, QUEBRADAS LA FLORA Y LA IGLESIA DE LA ABSCISA K4+333 HASTA LA K4+319					
MOD 97	K4+270,60					
ESCALÓN	K4+270,6	1,50	4,90	0,50	1,00	3,68
		10,60	5,40	0,50	1,00	28,62
MOD 98	K4+260,00					
ESCALÓN	K4+260,6	1,50	4,90	0,50	1,00	3,68
		10,00	5,40	0,50	1,00	27,00
MOD 99	K4+250,00					
		6,70	5,40	0,50	1,00	18,09
MOD 100	K4+243,30					
					SUBTOTAL – ACTA #10	115,37

OBSERVACIONES:

PRESENTE ACTA 10		ACUMULADO			TOTALES	
CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% EJECUTADO		115,37
115,37	$ 61.976.319,83	2.667,26	$ 1.432.841.803,05	91,54%		

CONTRATISTA: CONSORCIO LA FLORA 2023

Firma: _____
REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERVENTORÍA CANALIZACIÓN BGA

Firma: _____
REPRESENTANTE LEGAL

Secretaria de Infraestructura Fisica Alcaldía de Bucaramanga	Alcaldía de Bucaramanga	Consorcio La Flora 2023	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	30	MM	06	AAAA	2025	ACTA No.	10	ELABORÓ	DANIEL GÓMEZ BARRAGÁN

OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
ENTIDAD CONTRATANTE:	ALCALDÍA DE BUCARAMANGA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
CONTRATISTA:	CONSORCIO LA FLORA 2023
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORÍA CANALIZACIÓN BGA

CAPÍTULO 6. NO PREVISTOS

6.0.11.	Geocompuesto de subdrenaje (geodren planar H = 1:00 m -Tuberia perforada diametro 4")		UNIDAD	ml

ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMÁGEN

REGISTRO FOTOGRÁFICO





DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			Elemento (und)	Longitud (m)
	Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)		
ACTA #10					
GEOSINTÉTICOS PARA MANEJO DE AGUAS SUBTERRANEAS EXTERNAS AL BOX-CULVERT					
AL COSTADO DERECHO DEL BOX-CULVERT CONSTRUIDO. DESDE LA ABSCISA K4+333 (MÓDULO 90) HASTA LA K4+319 (MÓDULO 92)	14,00			1,00	14,00
AL COSTADO IZQUIERDO DEL BOX-CULVERT CONSTRUIDO. DESDE LA ABSCISA K4+333 (MÓDULO 90) HASTA LA K4+319 (MÓDULO 92)	14,00			1,00	14,00
A AMBOS COSTADOS DEL BOX DESDE K4+270,6 (MÓDULO 97) HASTA K4+243.3 (MÓDULO 100)	54,60			1,00	54,60
				SUBTOTAL - ACTA #10	82,60

OBSERVACIONES:

PRESENTE ACTA 10		ACUMULADO			TOTALES
CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% EJECUTADO	82,60
82,60	$ 15.388.049,60	1.923,20	$ 358.284.467,20	89,64%	

CONTRATISTA: CONSORCIO LA FLORA 2023

Firma: Carlos Lo

REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERVENTORÍA CANALIZACIÓN BGA

Firma:

REPRESENTANTE LEGAL

Secretaría de Infraestructura Física Alcaldía de Bucaramanga	Alcaldía de Bucaramanga	Consorcio La Flora 2023	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	30	MM	06	AAAA	2025	ACTA No.	10	ELABORÓ	DANIEL GÓMEZ BARRAGAN

OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
ENTIDAD CONTRATANTE:	ALCALDÍA DE BUCARAMANGA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
CONTRATISTA:	CONSORCIO LA FLORA 2023
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORÍA CANALIZACIÓN BGA

CAPÍTULO 6. NO PREVISTOS

6.0.13.	Excavación manual en zanja en material común en seco, ancho máx: 60 cm, prof máx: 100 cm, incluye acarreo libre a máximo 50 metros. Para andenes y sardineles.		UNIDAD	m3

ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMÁGEN

REGISTRO FOTOGRÁFICO







ABSCISAS	DIMENSIONES			Ancho pavimento (m)	Volumen (m3)
	Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)		
ACTA #10					
EXCAVACIÓN PARA SARDINELES DE PAVIMENTO BARRIOS SAN MARTIN, QUEBRADA LA IGLESIA, SAN PEDRO Y URBANIZACIONES EL SOL 1 Y SOL 2. ENTRE LAS ABSCISAS K0+195 Y LA K0+375					
SARDINEL DE COSTADO DERECHO					
K0+195,00					
	176,72	0,3	0,2		10,60
K0+375,00					
SARDINEL DE COSTADO IZQUIERDO					
K0+195,00					
	179,13	0,3	0,2		10,75
K0+375,00					
EXCAVACIÓN PARA SARDINELES DE PAVIMENTO BARRIOS SAN MARTIN, QUEBRADA LA IGLESIA, SAN PEDRO Y URBANIZACIONES EL SOL 1 Y SOL 2. ENTRE LAS ABSCISAS K0+405,3 Y LA					
SARDINEL DE COSTADO DERECHO					
K0+405,30					
	136,68	0,3	0,2		8,20
K0+526,30					
SARDINEL DE COSTADO IZQUIERDO					
K0+405,30					
	68,35	0,3	0,2		4,10
K0+476,50					
K0+482,80					
	42,44	0,3	0,2		2,55
K0+526,30					
				SUBTOTAL - ACTA #10	36,20

REGISTRO FOTOGRÁFICO	ÁREA PAVIMENTACIÓN BARRIOS SAN MARTIN, QUEBRADA LA IGLESIA, SAN PEDRO Y URBANIZACIONES EL SOL 1 Y SOL 2. ENTRE LAS ABSCISAS K0+195 Y LA K0+375












CONTINUACIÓN - ÁREA PAVIMENTACIÓN BARRIOS SAN MARTIN, QUEBRADA LA IGLESIA, SAN PEDRO Y URBANIZACIONES EL SOL 1 Y SOL 2. ENTRE LAS ABSCISAS K0+195 Y LA K0+375

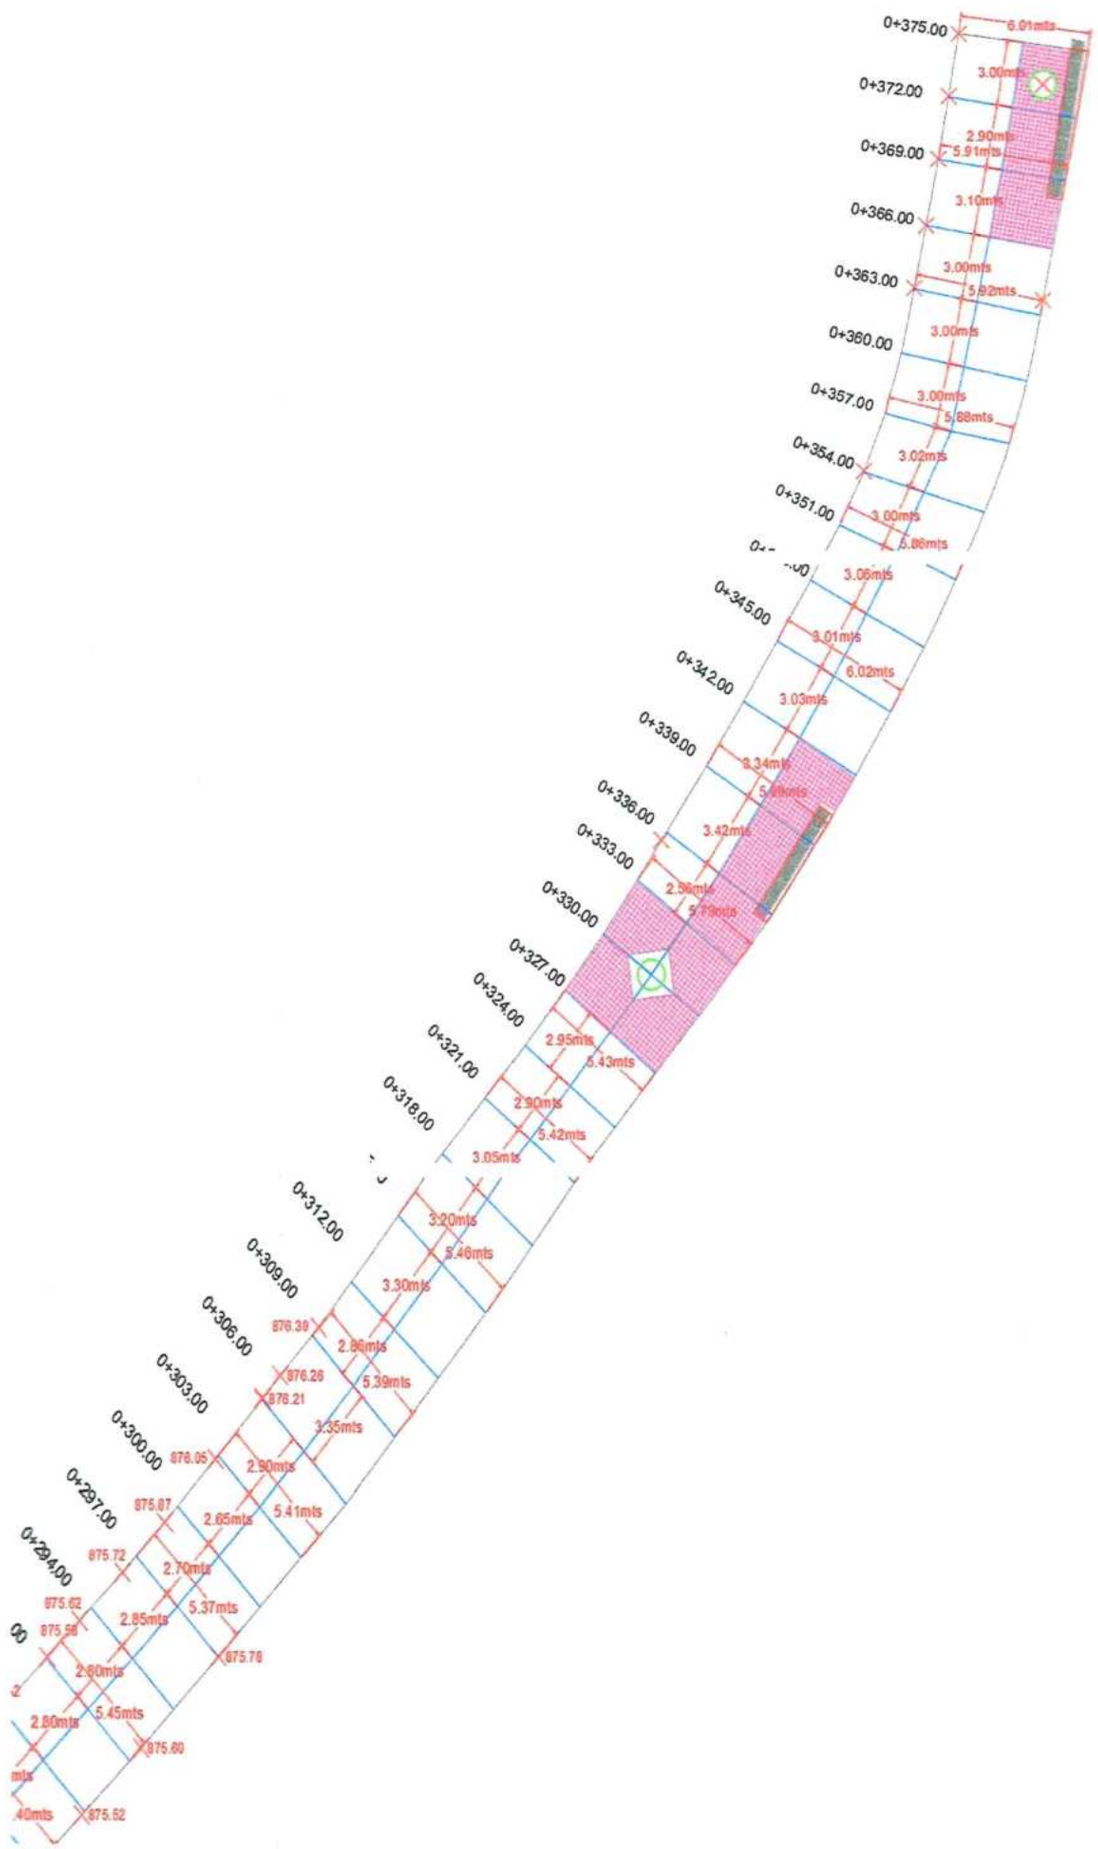

ÁREA PAVIMENTACIÓN BARRIOS SAN MARTIN, QUEBRADA LA IGLESIA, SAN PEDRO Y URBANIZACIONES EL SOL 1 Y SOL 2. ENTRE LAS ABSCISAS K0+405,3 Y LA K0+526,3

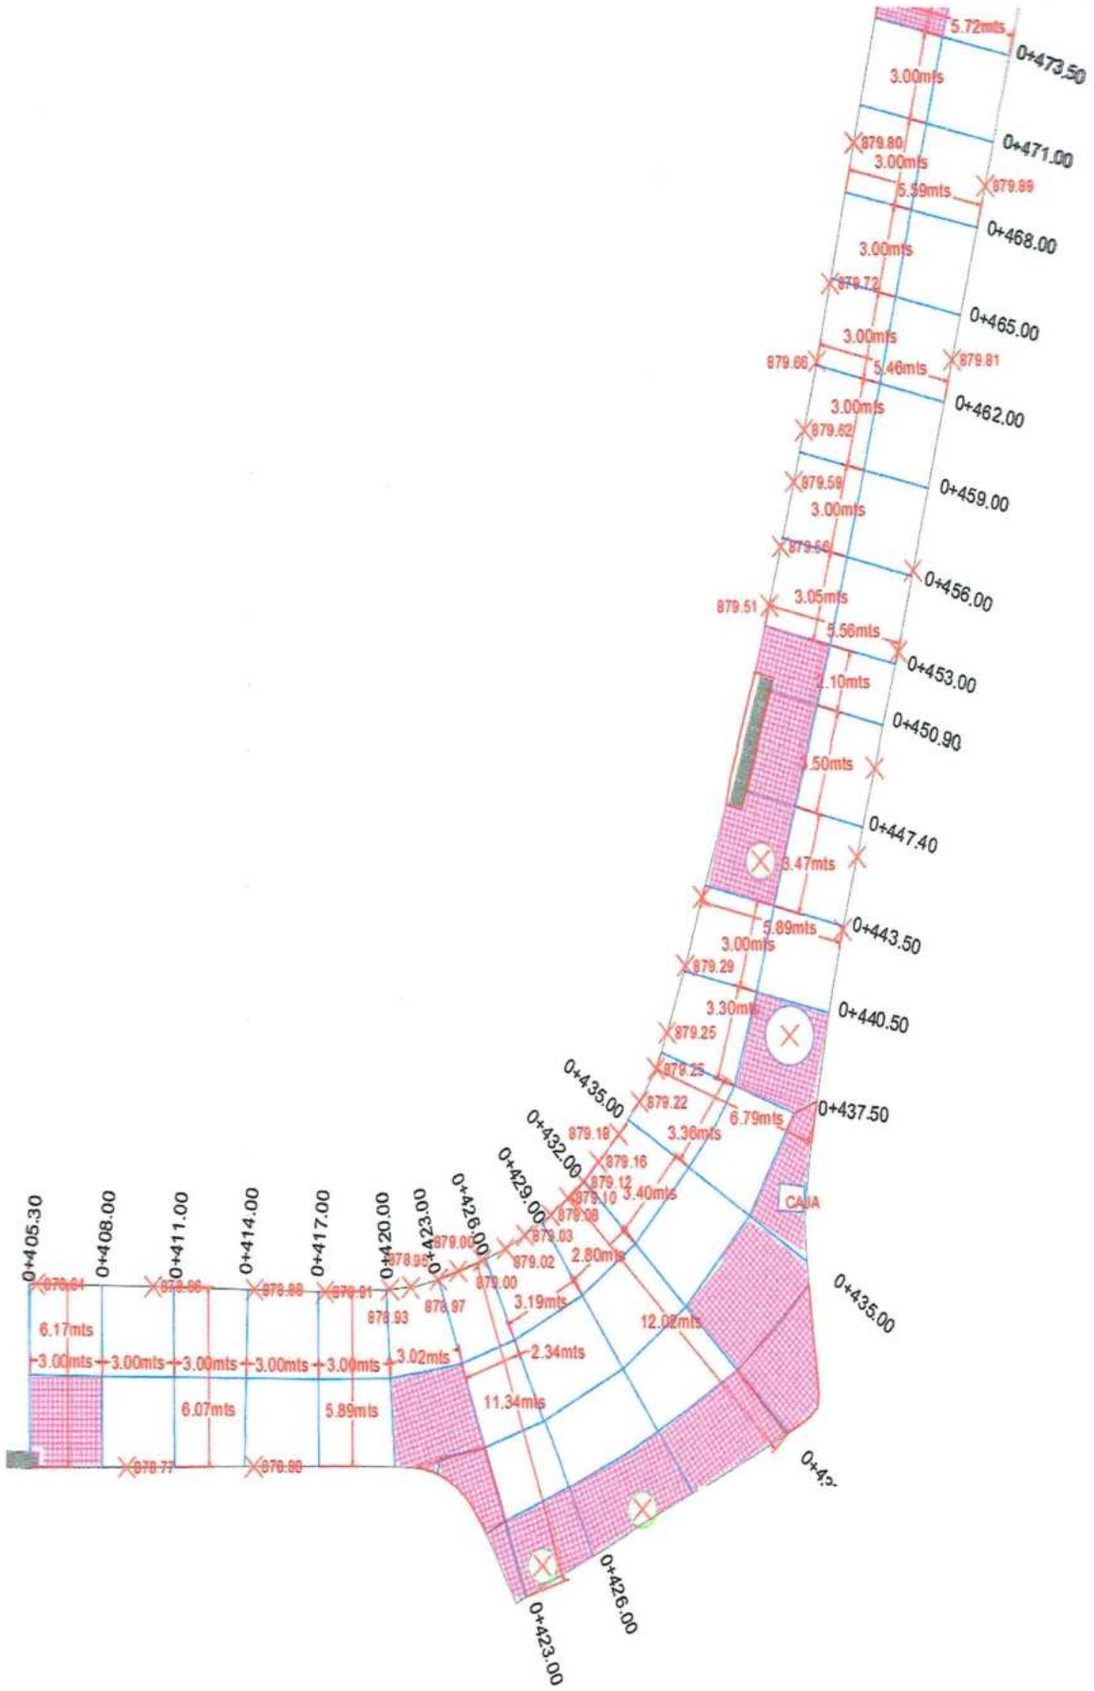

CONTINUACIÓN - ÁREA PAVIMENTACIÓN BARRIOS SAN MARTIN, QUEBRADA LA IGLESIA, SAN PEDRO Y URBANIZACIONES EL SOL 1 Y SOL 2. ENTRE LAS ABSCISAS K0+405,3 Y LA K0+526,3

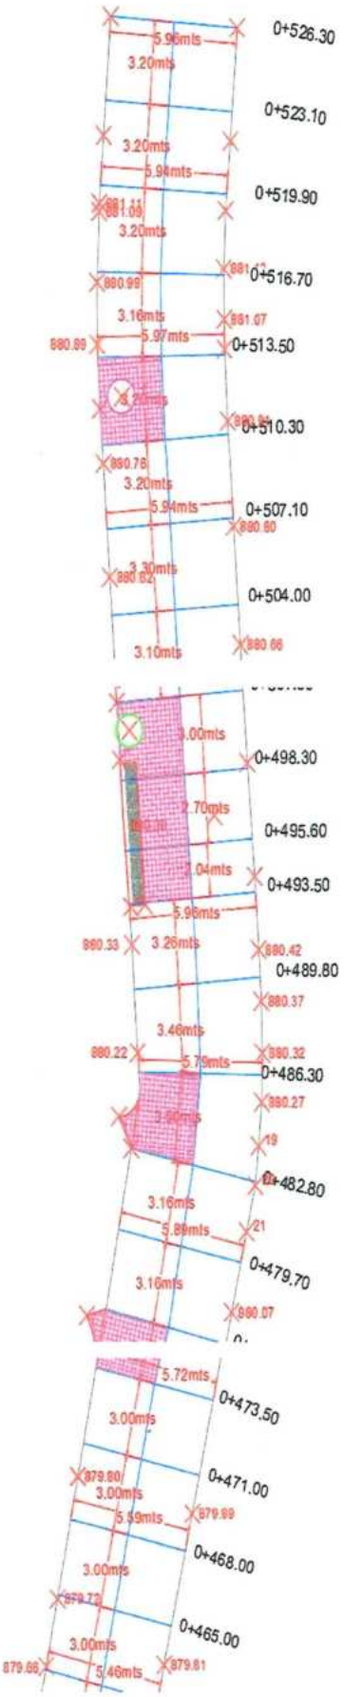

OBSERVACIONES:	PRESENTE ACTA 10		ACUMULADO			TOTALES	36,20
	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% EJECUTADO		
	36,20	$ 1.998.421,00	36,20	$ 1.998.421,00	26,70%		

CONTRATISTA: CONSORCIO LA FLORA 2023

Firma: _____
REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERVENTORIA CANALIZACION BGA

Firma: _____
REPRESENTANTE LEGAL

Secretaria de Infraestructura Física Alcaldía de Bucaramanga	Alcaldía de Bucaramanga	Consorcio La Flora 2023	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	30	MM	06	AAAA	2025	ACTA No.	10	ELABORÓ	DANIEL GÓMEZ BARRAGÁN

OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
ENTIDAD CONTRATANTE:	ALCALDÍA DE BUCARAMANGA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
CONTRATISTA:	CONSORCIO LA FLORA 2023
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORÍA CANALIZACIÓN BGA

CAPÍTULO 6. NO PREVISTOS

6.0.17.	Tubería PVC de pared estructural alcantarillado hermético, diámetro 315mm (12"), incluye accesorios de conexión. Para manijas.		UNIDAD	ml

ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMÁGEN







DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Elemento (und)	Longitud (m)
ACTA #10					
TUBERÍA INSTALADA CRA 27A ENTRE LAS ABSCISAS K0+275 Y K0+336 DE LA VÍA					
TUBERÍA DE P(26-27A)R HACIA P(26-27A)R1 - ABSCISA K0+330	3,20				3,20
TUBERÍA DE P(26-27A)R1 HACIA P(26-27A)R2	48,34				48,34
TUBERÍA DE P(26-27A)R2 HACIA CAJA - ABSCISA K0+278	4,50				4,50
				SUBTOTAL - ACTA #10	56,04
				TOTALES	56,04

OBSERVACIONES:

PRESENTE ACTA 10		ACUMULADO		
CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% EJECUTADO
56,04	$ 9.280.410,05	103,93	$ 17.211.153,05	65,99%

CONTRATISTA: CONSORCIO LA FLORA 2023

Firma:

REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERVENTORÍA CANALIZACIÓN BGA

Firma:

REPRESENTANTE LEGAL

Secretaria de Infraestructura Fisica Alcaldía de Bucaramanga	Alcaldía de Bucaramanga	Consorcio La Flora 2023	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	30	MM	06	AAAA	2025	ACTA No.	10	ELABORÓ	DANIEL GÓMEZ BARRAGÁN

OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
ENTIDAD CONTRATANTE:	ALCALDÍA DE BUCARAMANGA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
CONTRATISTA:	CONSORCIO LA FLORA 2023
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORÍA CANALIZACIÓN BGA

CAPÍTULO 6. NO PREVISTOS

6.0.35.	Suministro e instalación de rejillas en hierro fundido para sumidero 54 x 90 x 7cm		UNIDAD	und

ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMÁGEN

REGISTRO FOTOGRÁFICO








DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Cantidad (und)	Cantidad (und)
ACTA #10					
SUMIDEROS LATERALES CON REJILLAS. ENTRE LAS ABSCISAS K0+195 Y LA K0+526,3					
SL-600 K(27A-12) ABSCISA K0+336				6,00	6,00
SL-800 K(27-4) ABSCISA K0+372				8,00	8,00
SL-800 K(28-5) ABSCISA K0+387				8,00	8,00
SL-800 (CL86-6) ABSCISA K0+400				8,00	8,00
SL-600(K30-13) ABSCISA K0+448				6,00	6,00
SL-600(K31-9) ABSCISA K0+480				6,00	6,00
SL-600 K(30-8) ABSCISA K0+495				6,00	6,00
				SUBTOTAL - ACTA #10	48,00


LOCALIZACIÓN DE SUMIDEROS EN BARRIOS SAN MARTIN, QUEBRADA LA IGLESIA, SAN PEDRO Y URBANIZACIONES EL SOL 1 Y SOL 2.

SUMIDEROS SL-800M CRA 27A #87-25, COSTADO IZQUIERDO Y DERECHO. ABSCISA K0+244,5

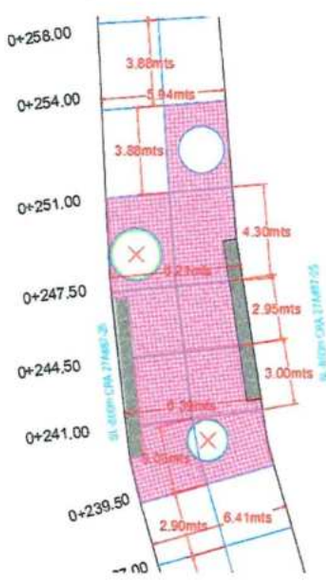


CONTINUACIÓN - LOCALIZACIÓN DE SUMIDEROS EN BARRIOS SAN MARTIN, QUEBRADA LA IGLESIA, SAN PEDRO Y URBANIZACIONES EL SOL 1 Y SOL 2.

SUMIDERO SL-600 K(27A-12), ABSCISA K0+336

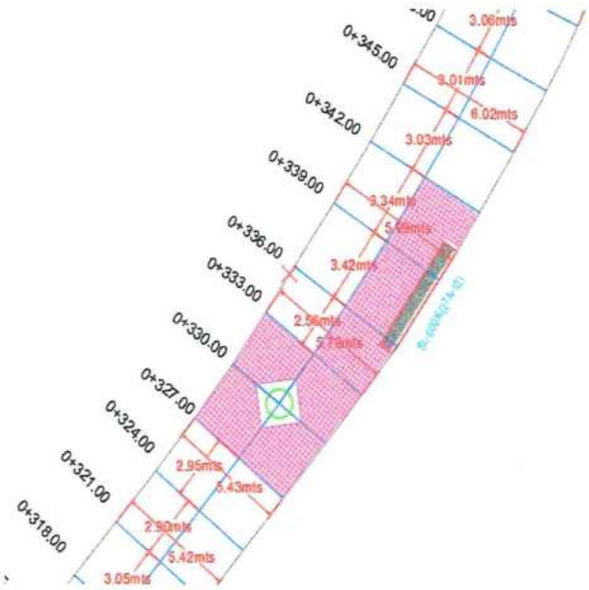


SUMIDERO SL-800 K(27-4), ABSCISA K0+372

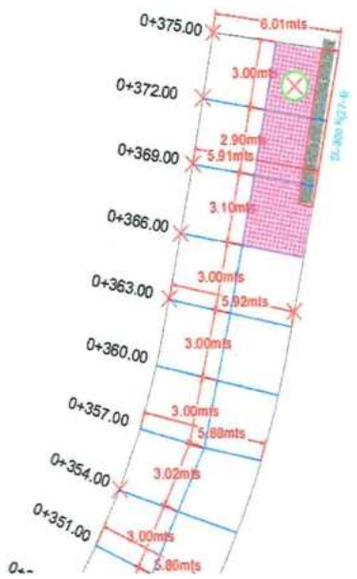

CONTINUACIÓN - LOCALIZACIÓN DE SUMIDEROS EN BARRIOS SAN MARTIN, QUEBRADA LA IGLESIA, SAN PEDRO Y URBANIZACIONES EL SOL 1 Y SOL 2.


SUMIDERO SL-800 (CL86-6) ABSCISA K0+400

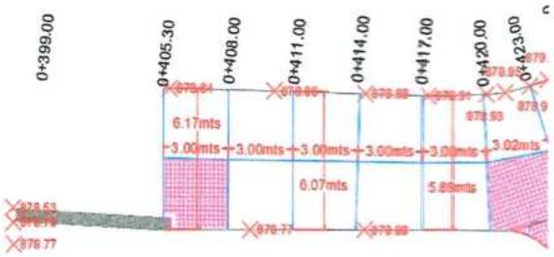

SUMIDERO SL-600(K30-13) ABSCISA K0+448



SUMIDERO SL-600 K(30-8) ABSCISA K0+495

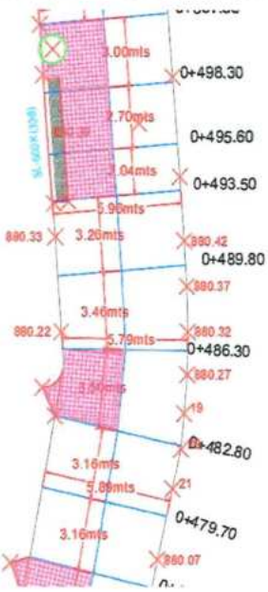

OBSERVACIONES:	PRESENTE ACTA 10		ACUMULADO			TOTALES	48,00
	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% EJECUTADO		
	48,00	$ 59.326.034,88	82,00	$ 101.348.642,92	97,62%		

CONTRATISTA: CONSORCIO LA FLORA 2023

Firma:

REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERVENTORIA CANALIZACION EGA

Firma:

REPRESENTANTE LEGAL

Secretaría de Infraestructura Física Alcaldía de Bucaramanga	Alcaldía de Bucaramanga	Consorcio La Flora 2023	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	30	MM	06	AAAA	2025	ACTA No.	10	ELABORÓ	DANIEL GÓMEZ BARRAGÁN

OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
ENTIDAD CONTRATANTE:	ALCALDÍA DE BUCARAMANGA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
CONTRATISTA:	CONSORCIO LA FLORA 2023
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORÍA CANALIZACIÓN BGA

CAPÍTULO 6. NO PREVISTOS

6.0.41	Suministro e instalación de sardinel tipo A-10 prefabricado en concreto, achaflanado de 0,20 x 0,50 x 0,80 m. Incluye sello de juntas.	UNIDAD	ml

ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMÁGEN

REGISTRO FOTOGRÁFICO





ABSCISAS	DIMENSIONES Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Ancho promedio (m)	Volumen (m3)
ACTA #10					
CONFINAMIENTO PARA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO BARRIOS SAN MARTIN, QUEBRADA LA IGLESIA, SAN PEDRO Y URBANIZACIONES EL SOL 1 Y SOL 2. ENTRE LAS ABSCISAS K0+195 Y LA K0+375					
SARDINEL DE COSTADO DERECHO					
K0+195,00					
	176,72				176,72
K0+375,00					
SARDINEL DE COSTADO IZQUIERDO					
K0+195,00					
	179,13				179,13
K0+375,00					
CONFINAMIENTO PARA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO BARRIOS SAN MARTIN, QUEBRADA LA IGLESIA, SAN PEDRO Y URBANIZACIONES EL SOL 1 Y SOL 2. ENTRE LAS ABSCISAS K0+405,3 Y LA					
SARDINEL DE COSTADO DERECHO					
K0+405,30					
	136,68				136,68
K0+526,30					
SARDINEL DE COSTADO IZQUIERDO					
K0+405,30					
	68,35				68,35
K0+476,50					
K0+482,80					
	42,44				42,44
K0+526,30					
				SUBTOTAL - ACTA #10	603,32


REGISTRO FOTOGRÁFICO









ÁREA PAVIMENTACIÓN BARRIOS SAN MARTIN, QUEBRADA LA IGLESIA, SAN PEDRO Y URBANIZACIONES EL SOL 1 Y SOL 2. ENTRE LAS ABSCISAS K0+195 Y LA K0+375

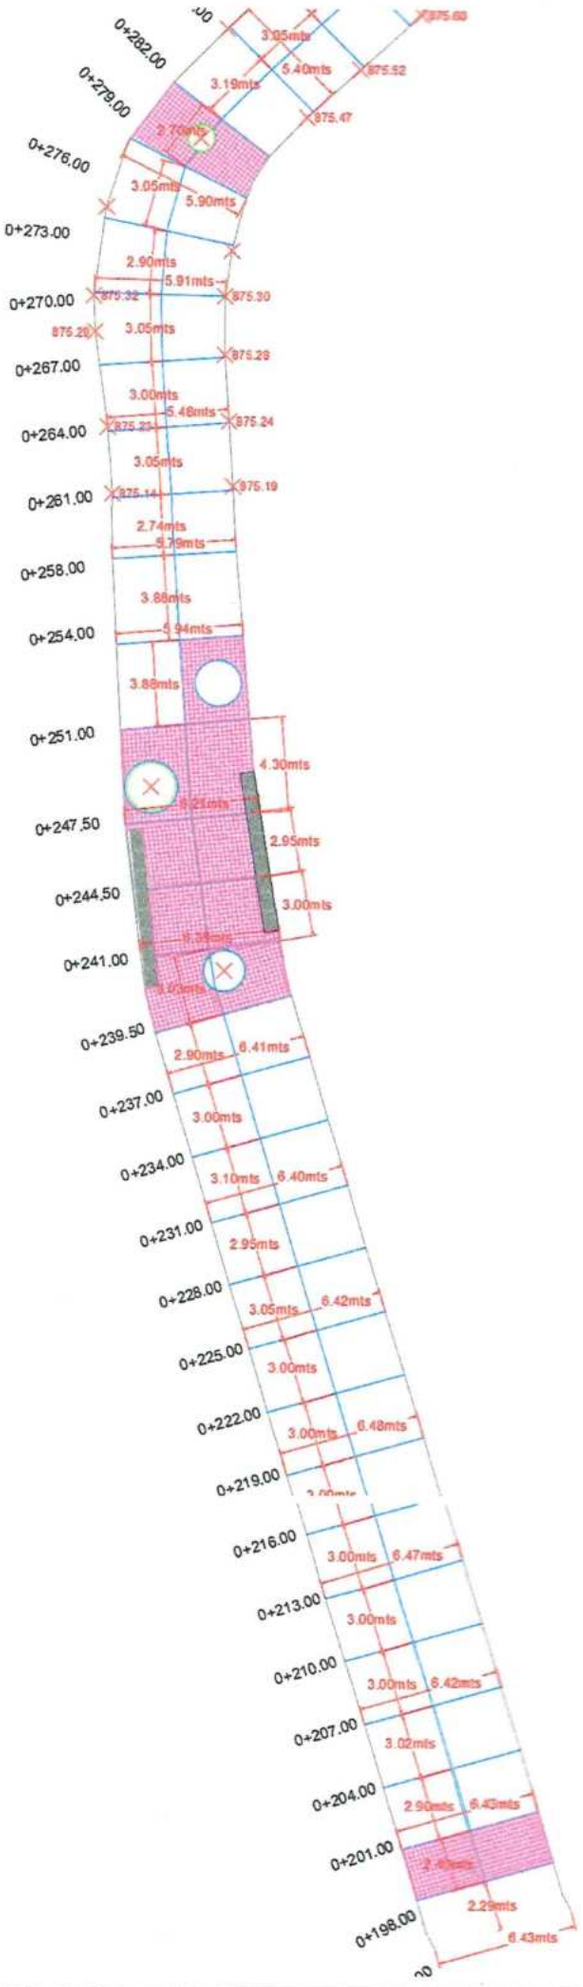

CONTINUACIÓN - ÁREA PAVIMENTACIÓN BARRIOS SAN MARTIN, QUEBRADA LA IGLESIA, SAN PEDRO Y URBANIZACIONES EL SOL 1 Y SOL 2. ENTRE LAS ABSCISAS K0+195 Y LA K0+375

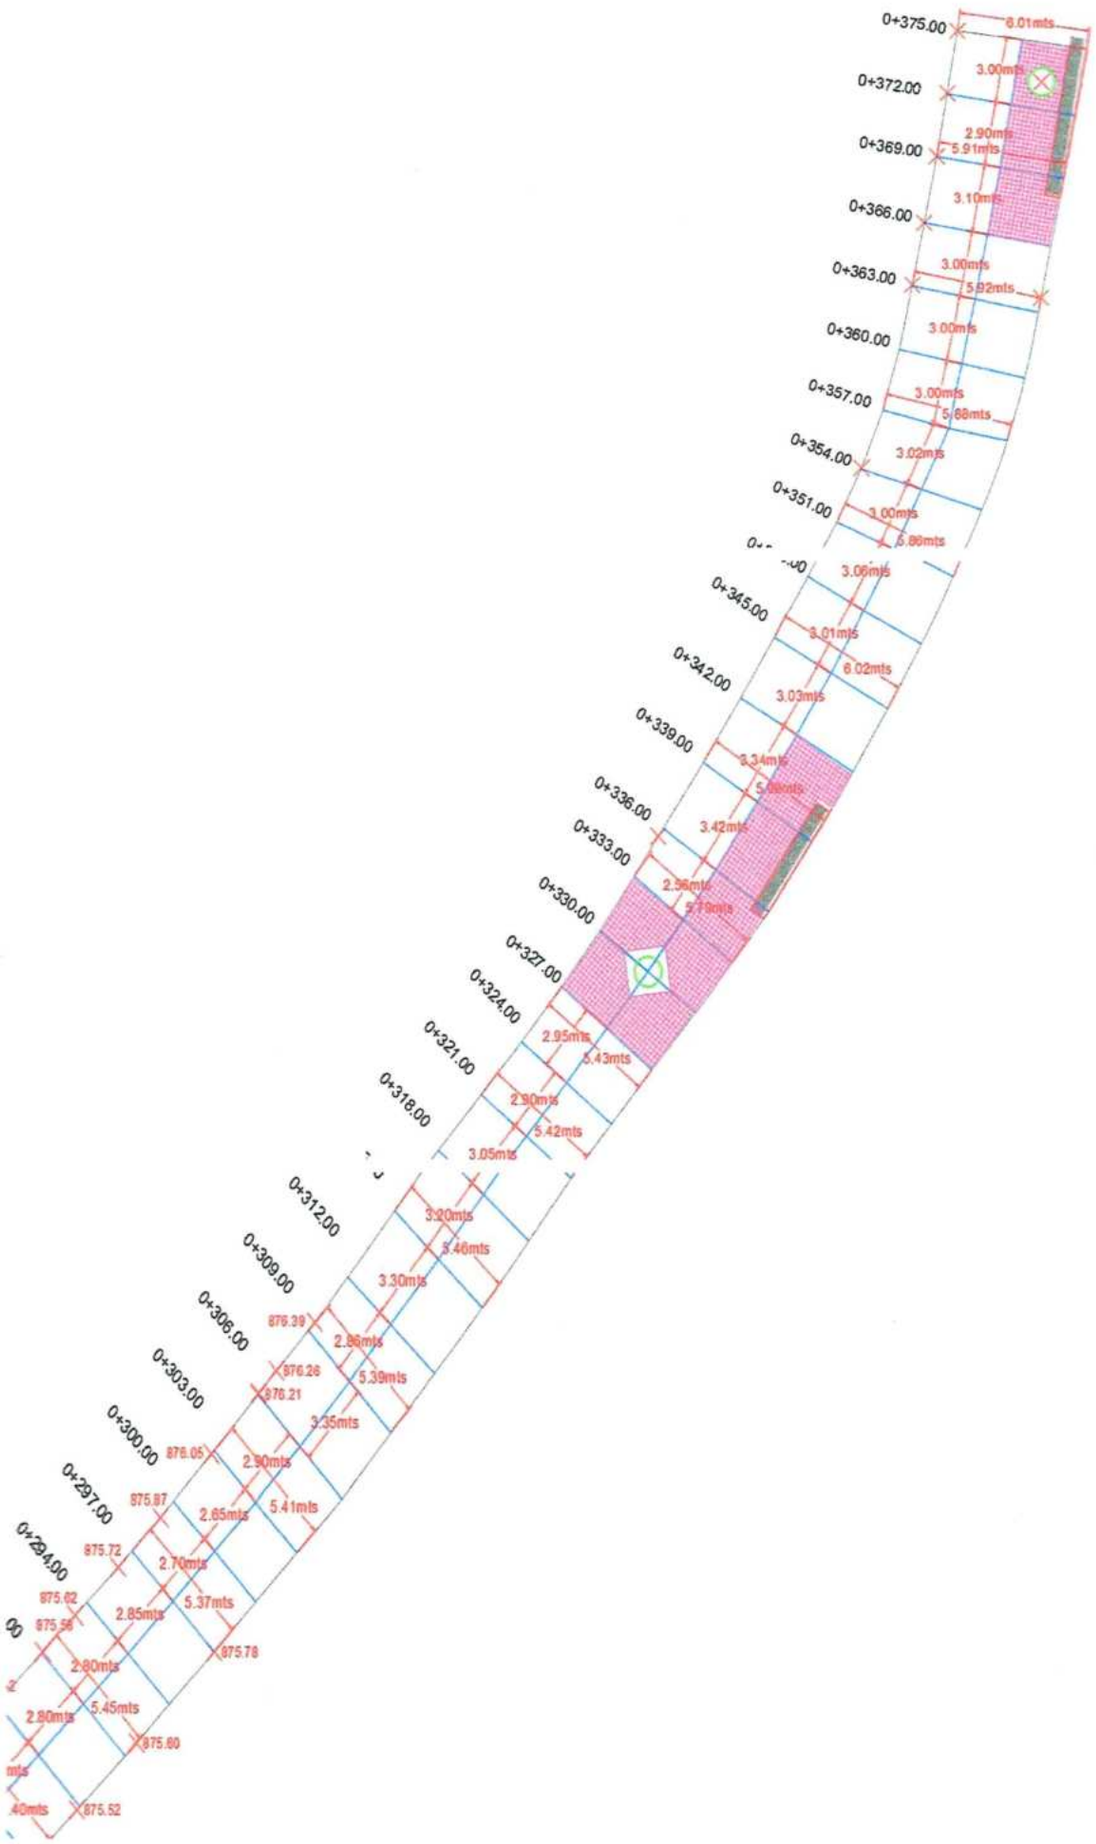

ÁREA PAVIMENTACIÓN BARRIOS SAN MARTIN, QUEBRADA LA IGLESIA, SAN PEDRO Y URBANIZACIONES EL SOL 1 Y SOL 2. ENTRE LAS ABSCISAS K0+405,3 Y LA K0+526,3

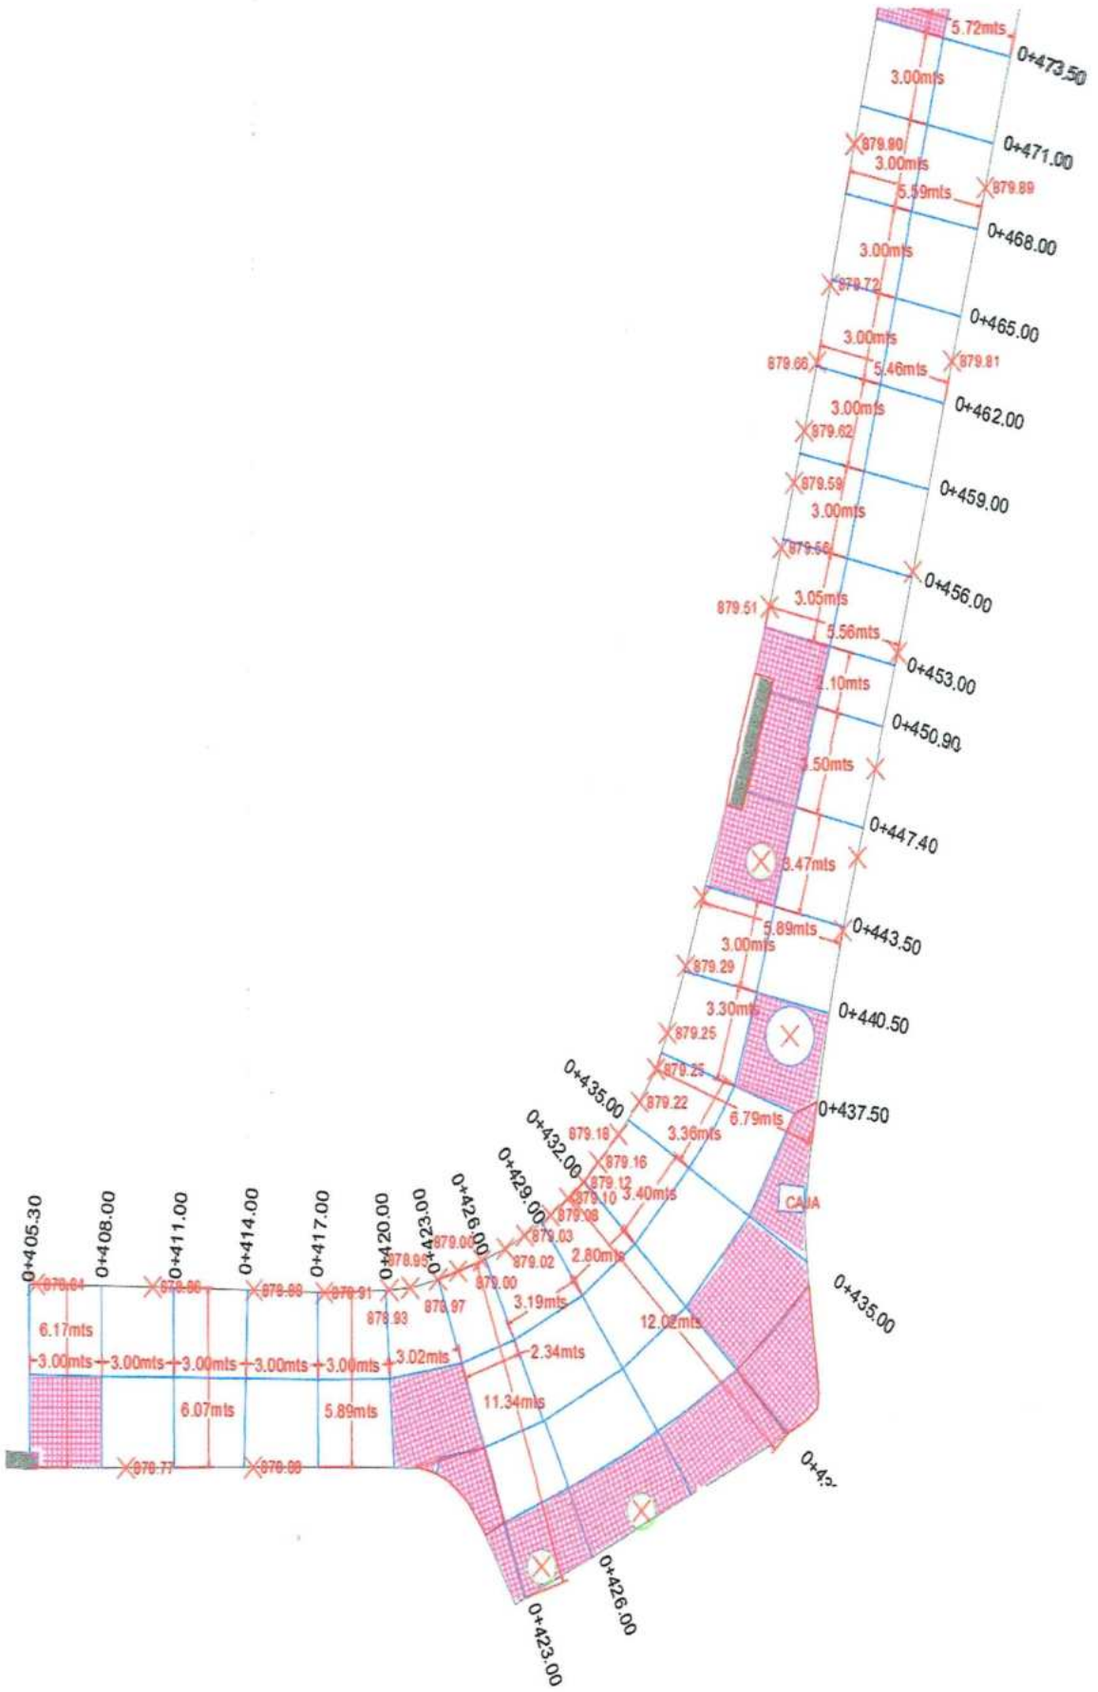

CONTINUACIÓN - ÁREA PAVIMENTACIÓN BARRIOS SAN MARTIN, QUEBRADA LA IGLESIA, SAN PEDRO Y URBANIZACIONES EL SOL 1 Y SOL 2. ENTRE LAS ABSCISAS K0+405,3 Y LA K0+526,3



OBSERVACIONES:	PRESENTE ACTA 10		ACUMULADO			TOTALES	603,32
	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% EJECUTADO		
	603,32	$ 57.927.697,40	603,32	$ 57.927.697,40	26,35%		

CONTRATISTA: CONSORCIO LA FLORA 2023

Firma: Contado LO

REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERVENTORÍA CANALIZACIÓN 6GA

Firma:

REPRESENTANTE LEGAL

Secretaría de Infraestructura Física Alcaldía de Bucaramanga	Alcaldía de Bucaramanga	Consorcio La Flora 2023	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	30	MM	06	AAAA	2025	ACTA No.	10	ELABORÓ	DANIEL GÓMEZ BARRAGÁN

OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
ENTIDAD CONTRATANTE:	ALCALDÍA DE BUCARAMANGA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
CONTRATISTA:	CONSORCIO LA FLORA 2023
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORÍA CANALIZACIÓN BGA

CAPÍTULO 6. NO PREVISTOS

6.0.43.	Concreto hidráulico de fraguado rápido MR 41 (fast track)		UNIDAD	m3

ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMÁGEN

REGISTRO FOTOGRÁFICO








ABSCISAS	DIMENSIONES			Ancho promedio (m)	Volumen (m3)
	Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)		
ACTA #10					
PAVIMENTACIÓN BARRIOS SAN MARTIN, QUEBRADA LA IGLESIA, SAN PEDRO Y URBANIZACIONES EL SOL 1 Y SOL 2. ENTRE LAS ABSCISAS K0+195 Y LA K0+375					
K0+195,00		6,43			
	6,00		0,2	6,43	7,72
K0+201,00		6,43			
	6,00		0,2	6,43	7,72
K0+207,00		6,42			
	6,00		0,2	6,45	7,74
K0+213,00		6,47			
	6,00		0,2	6,48	7,78
K0+219,00		6,48			
	6,00		0,2	6,45	7,74
K0+225,00		6,42			
	6,00		0,2	6,41	7,69
K0+231,00		6,4			
	6,00		0,2	6,41	7,69
K0+237,00		6,41			
	4,00		0,2	6,4	5,12
K0+241,00		6,39			
	6,50		0,2	6,3	8,19
K0+247,50		6,21			
	6,50		0,2	6,08	7,90
K0+254,00		5,94			
	4,00		0,2	5,87	4,70
K0+258,00		5,79			
	6,00		0,2	5,64	6,77
K0+264,00		5,48			
	6,00		0,2	5,7	6,84
K0+270,00		5,91			
	9,00		0,2	5,91	10,64
K0+279,00		5,9			
	6,00		0,2	5,65	6,78
K0+285,00		5,4			
	6,00		0,2	5,43	6,52
K0+291,00		5,45			
	6,00		0,2	5,41	6,49
K0+297,00		5,37			
	6,00		0,2	5,39	6,47
K0+303,00		5,41			
	6,00		0,2	5,4	6,48
K0+309,00		5,39			
	6,00		0,2	5,43	6,52
K0+315,00		5,46			
	6,00		0,2	5,44	6,53
K0+321,00		5,42			
	6,00		0,2	5,43	6,52
K0+327,00		5,43			
	6,00		0,2	5,61	6,73
K0+333,00		5,79			
	6,00		0,2	5,89	7,07
K0+339,00		5,99			
	6,00		0,2	6,01	7,21
K0+345,00		6,02			
	6,00		0,2	5,94	7,13
K0+351,00		5,86			
	6,00		0,2	5,87	7,04
K0+357,00		5,88			
	6,00		0,2	5,9	7,08
K0+363,00		5,92			
	6,00		0,2	5,92	7,10
K0+369,00		5,91			
	6,00		0,2	5,96	7,15
K0+375,00		6,01			
PAVIMENTACIÓN BARRIOS SAN MARTIN, QUEBRADA LA IGLESIA, SAN PEDRO Y URBANIZACIONES EL SOL 1 Y SOL 2. ENTRE LAS ABSCISAS K0+405,3 Y LA K0+526,3					
K0+405,30		6,17			
	5,70		0,2	6,12	6,98
K0+411,00		6,07			
	6,00		0,2	5,98	7,18
K0+417,00		5,89			
	6,00		0,2	8,62	10,34
K0+423,00		11,34			
	9,00		0,2	11,68	21,02
K0+432,00		12,02			
	5,50		0,2	9,41	10,35
K0+437,50		6,79			
	6,00		0,2	6,34	7,61

ÁREA PAVIMENTACIÓN BARRIOS SAN MARTIN, QUEBRADA LA IGLESIA, SAN PEDRO Y URBANIZACIONES EL SOL 1 Y SOL 2. ENTRE LAS ABSCISAS K0+195 Y LA K0+375

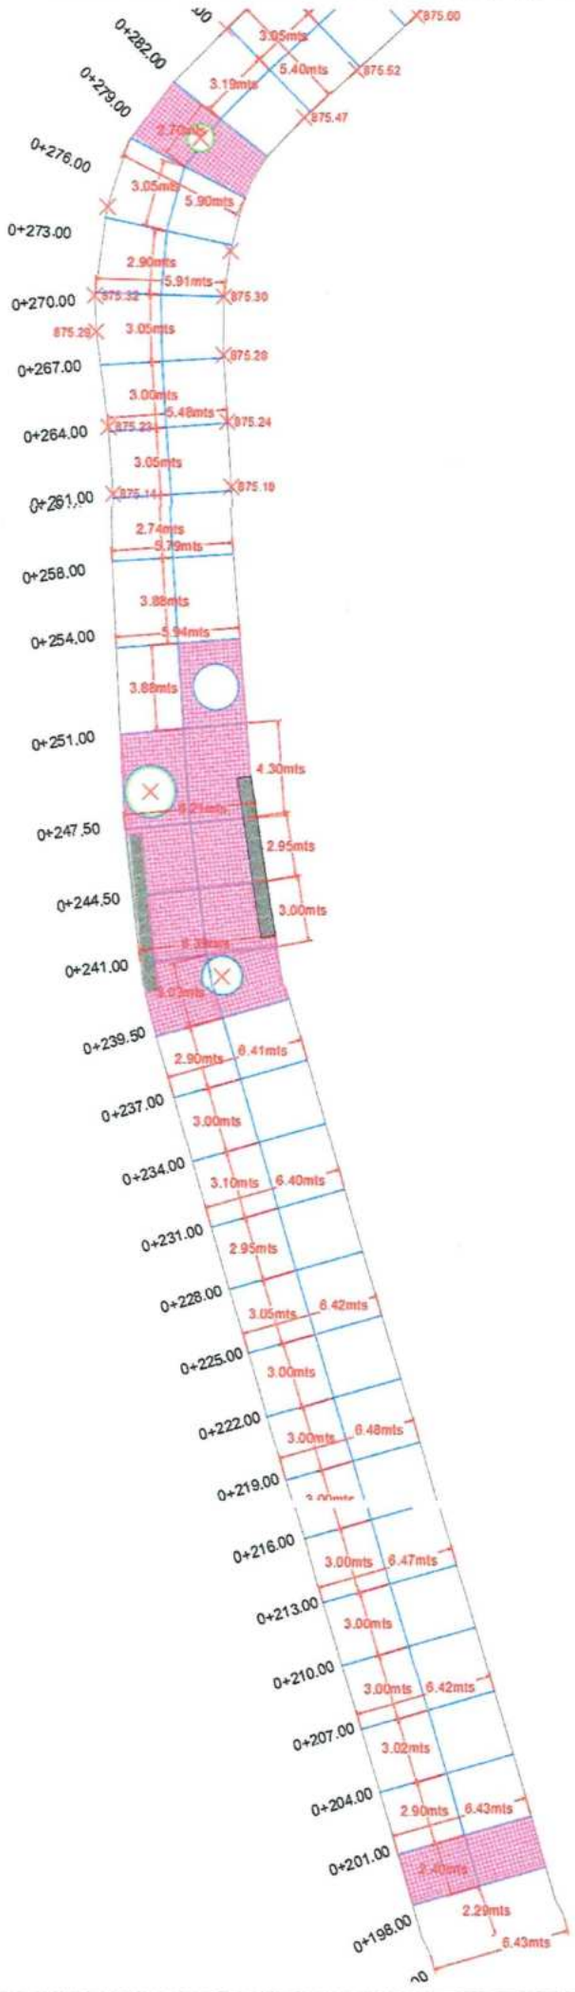


K0+443,50		5,89			
	9,50		0,2	5,73	10,89
K0+453,00		5,56			
	9,00		0,2	5,51	9,92
K0+462,00		5,46			
	6,00		0,2	5,53	6,64
K0+468,00		5,59			
	5,50		0,2	5,66	6,23
K0+473,50		5,72			
	6,20		0,2	5,81	7,20
K0+479,70		5,89			
	6,60		0,2	5,84	7,71
K0+486,30		5,79			
	7,20		0,2	5,88	8,47
K0+493,50		5,96			
	7,80		0,2	5,96	9,30
K0+501,30		5,95			
	5,80		0,2	5,95	6,90
K0+507,10		5,94			
	6,40		0,2	5,96	7,63
K0+513,50		5,97			
	6,40		0,2	5,96	7,63
K0+519,90		5,94			
	6,40		0,2	5,95	7,62
K0+526,30		5,96			
LOSAS IRREGULARES					
K0+422,00	2,94	1,41	0,2		0,83
K0+433,00	3,02	2,62	0,2		1,58
K0+437,00	1,1	0,91	0,2		0,20
K0+475,80	2,03	0,52	0,2		0,21
K0+483,00	1,19	0,53	0,2		0,13


DESCUENTO DE VOLUMEN

ABSCISAS	DIMENSIONES			Área (m2)	Volumen (m3)
	Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)		
PAVIMENTACIÓN BARRIOS SAN MARTIN, QUEBRADA LA IGLESIA, SAN PEDRO Y URBANIZACIONES EL SOL 1 Y SOL 2. ENTRE LAS ABSCISAS K0+195 Y LA K0+375					
CORONA DE POZO D=1,80MTS - K0+240,5			0,2	2,54	-0,51
SUMIDERO LATERAL CON REJILLAS SL800 - K0+243,5	7,4	0,75	0,2		-1,11
SUMIDERO LATERAL CON REJILLAS SL800 - K0+245,3	7,4	0,75	0,2		-1,11
CORONA DE POZO D=2,10MTS - K0+249			0,2	3,46	-0,69
CORONA DE POZO D=2,10MTS - K0+253,50			0,2	3,46	-0,69
CORONA DE POZO D=1,20MTS - K0+280,5			0,2	1,13	-0,23
CORONA DE POZO D=1,20MTS - K0+330			0,2	1,13	-0,23
SUMIDERO LATERAL CON REJILLAS SL600 - K0+337,5	5,8	0,75	0,2		-0,87
SUMIDERO LATERAL CON REJILLAS SL800 - K0+372	7,4	0,75	0,2		-1,11
CORONA DE POZO D=1,20MTS - K0+373,5			0,2	1,13	-0,23
PAVIMENTACIÓN BARRIOS SAN MARTIN, QUEBRADA LA IGLESIA, SAN PEDRO Y URBANIZACIONES EL SOL 1 Y SOL 2. ENTRE LAS ABSCISAS K0+405,3 Y LA K0+526,3					
CORONA DE POZO D=1,20MTS - K0+424			0,2	1,13	-0,23
CORONA DE POZO D=1,20MTS - K0+427,5			0,2	1,13	-0,23
CAJA DE INSPECCIÓN - K0+436	1,04	0,87	0,2		-0,18
CORONA DE POZO D=2,10MTS - K0+439,00			0,2	3,46	-0,69
CORONA DE POZO D=1,20MTS - K0+444,4			0,2	1,13	-0,23
SUMIDERO LATERAL CON REJILLAS SL500 - K0+448,3	4,7	0,75	0,2		-0,71
SUMIDERO LATERAL CON REJILLAS SL600 - K0+496	5,8	0,75	0,2		-0,87
CORONA DE POZO D=1,20MTS - K0+500			0,2	1,13	-0,23
CORONA DE POZO D=1,20MTS - K0+511,3			0,2	1,13	-0,23
			SUBTOTAL - ACTA #10		365,25


CONTINUACIÓN - ÁREA PAVIMENTACIÓN BARRIOS SAN MARTIN, QUEBRADA LA IGLESIA, SAN PEDRO Y URBANIZACIONES EL SOL 1 Y SOL 2. ENTRE LAS ABSCISAS K0+195 Y LA K0+375

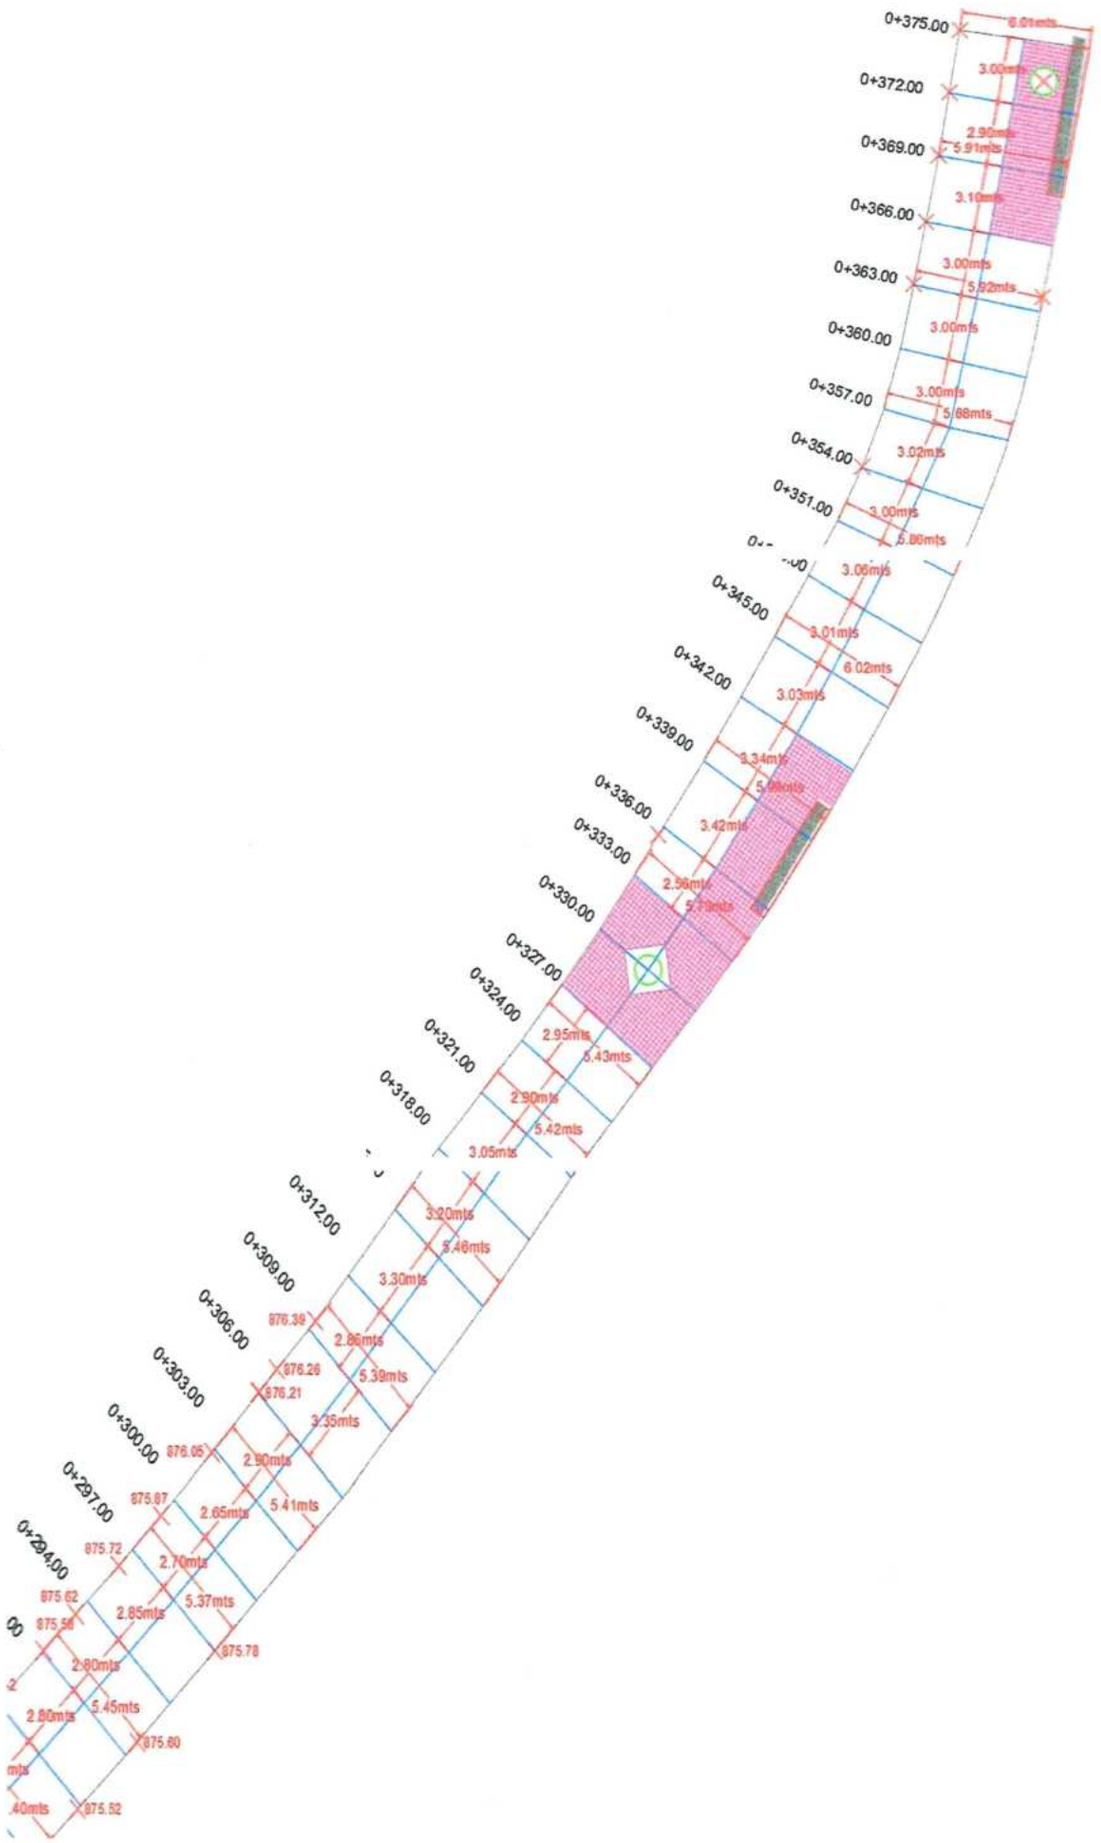

ÁREA PAVIMENTACIÒN BARRIOS SAN MARTIN, QUEBRADA LA IGLESIA, SAN PEDRO Y URBANIZACIONES EL SOL 1 Y SOL 2. ENTRE LAS ABSCISAS K0+405,3 Y LA K0+526,3

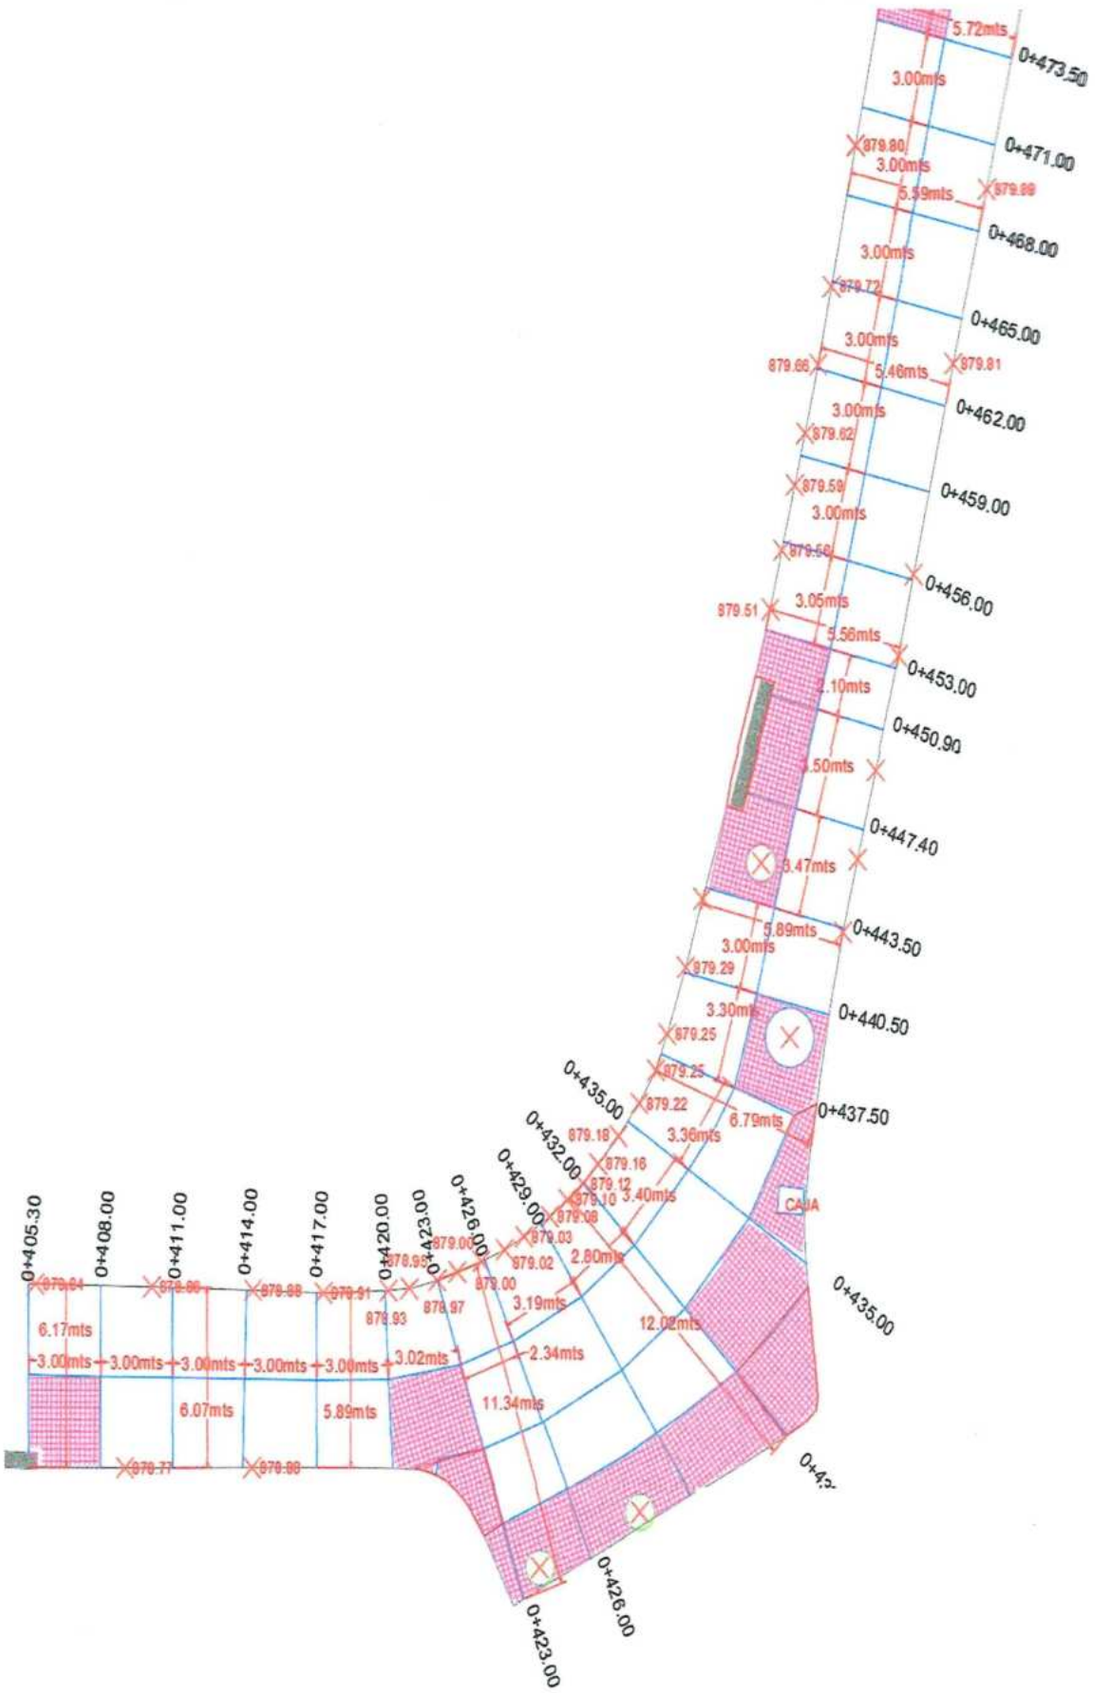

CONTINUACIÓN - ÁREA PAVIMENTACIÓN BARRIOS SAN MARTIN, QUEBRADA LA IGLESIA, SAN PEDRO Y URBANIZACIONES EL SOL 1 Y SOL 2. ENTRE LAS ABSCISAS K0+405,3 Y LA K0+526,3

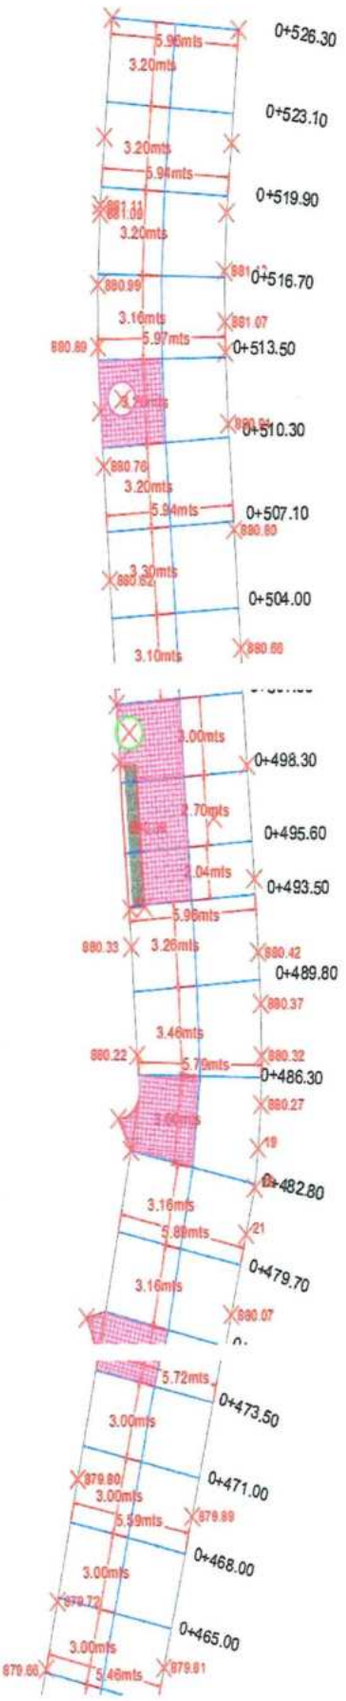

OBSERVACIONES:	PRESENTE ACTA 10		ACUMULADO			TOTALES	365,25
	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% EJECUTADO		
	365,25	$ 399.138.716,81	365,25	$ 399.138.716,81	23,51%		

CONTRATISTA: CONSORCIO LA FLORA 2023

Firma:

REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERVENTORÍA CANALIZACIÓN VBGA

Firma:

REPRESENTANTE LEGAL

Secretaría de Infraestructura Física Alcaldía de Bucaramanga	Alcaldía de Bucaramanga	Consorcio La Flora 2023	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	30	MM	06	AAAA	2025	ACTA No.	10	ELABORÓ	DANIEL GÓMEZ BARRAGÁN

OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
ENTIDAD CONTRATANTE:	ALCALDÍA DE BUCARAMANGA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
CONTRATISTA:	CONSORCIO LA FLORA 2023
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORÍA CANALIZACIÓN BGA

CAPÍTULO 6. NO PREVISTOS

6.0.49	Conformación de calzada existente		UNIDAD	m2

ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMÁGEN

REGISTRO FOTOGRÁFICO








ABSCISAS	DIMENSIONES Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Ancho promedio (m)	Área (m2)
ACTA #10					
PAVIMENTACIÓN BARRIOS SAN MARTIN, QUEBRADA LA IGLESIA, SAN PEDRO Y URBANIZACIONES EL SOL 1 Y SOL 2. ENTRE LAS ABSCISAS K0+252 Y LA K0+375					
K0+195,00		6,43			
	6,00			6,43	38,58
K0+201,00		6,43			
	6,00			6,43	38,58
K0+207,00		6,42			
	6,00			6,45	38,70
K0+213,00		6,47			
	6,00			6,48	38,88
K0+219,00		6,48			
	6,00			6,45	38,70
K0+225,00		6,42			
	6,00			6,41	38,46
K0+231,00		6,4			
	6,00			6,41	38,46
K0+237,00		6,41			
	4,00			6,4	25,60
K0+241,00		6,39			
	6,50			6,3	40,95
K0+247,50		6,21			
	6,50			6,08	39,52
K0+254,00		5,94			
	4,00			5,87	23,48
K0+258,00		5,79			
	6,00			5,64	33,84
K0+264,00		5,48			
	6,00			5,7	34,20
K0+270,00		5,91			
	9,00			5,91	53,19
K0+279,00		5,9			
	6,00			5,65	33,90
K0+285,00		5,4			
	6,00			5,43	32,58
K0+291,00		5,45			
	6,00			5,41	32,46
K0+297,00		5,37			
	6,00			5,39	32,34
K0+303,00		5,41			
	6,00			5,4	32,40
K0+309,00		5,39			
	6,00			5,43	32,58
K0+315,00		5,46			
	6,00			5,44	32,64
K0+321,00		5,42			
	6,00			5,43	32,58
K0+327,00		5,43			
	6,00			5,61	33,66
K0+333,00		5,79			
	6,00			5,89	35,34
K0+339,00		5,99			
	6,00			6,01	36,06
K0+345,00		6,02			
	6,00			5,94	35,64
K0+351,00		5,86			
	6,00			5,87	35,22
K0+357,00		5,88			
	6,00			5,9	35,40
K0+363,00		5,92			
	6,00			5,92	35,52
K0+369,00		5,91			
	6,00			5,96	35,76
K0+375,00		6,01			
PAVIMENTACIÓN BARRIOS SAN MARTIN, QUEBRADA LA IGLESIA, SAN PEDRO Y URBANIZACIONES EL SOL 1 Y SOL 2. ENTRE LAS ABSCISAS K0+405,3 Y LA K0+526,3					
K0+405,30		6,17			
	5,70			6,12	34,88
K0+411,00		6,07			
	6,00			5,98	35,88
K0+417,00		5,89			
	6,00			8,62	51,72
K0+423,00		11,34			
	9,00			11,68	105,12
K0+432,00		12,02			
	5,50			9,41	51,76
K0+437,50		6,79			
	6,00			6,34	38,04

ÁREA PAVIMENTACIÓN BARRIOS SAN MARTIN, QUEBRADA LA IGLESIA, SAN PEDRO Y URBANIZACIONES EL SOL 1 Y SOL 2. ENTRE LAS ABSCISAS K0+195 Y LA K0+375

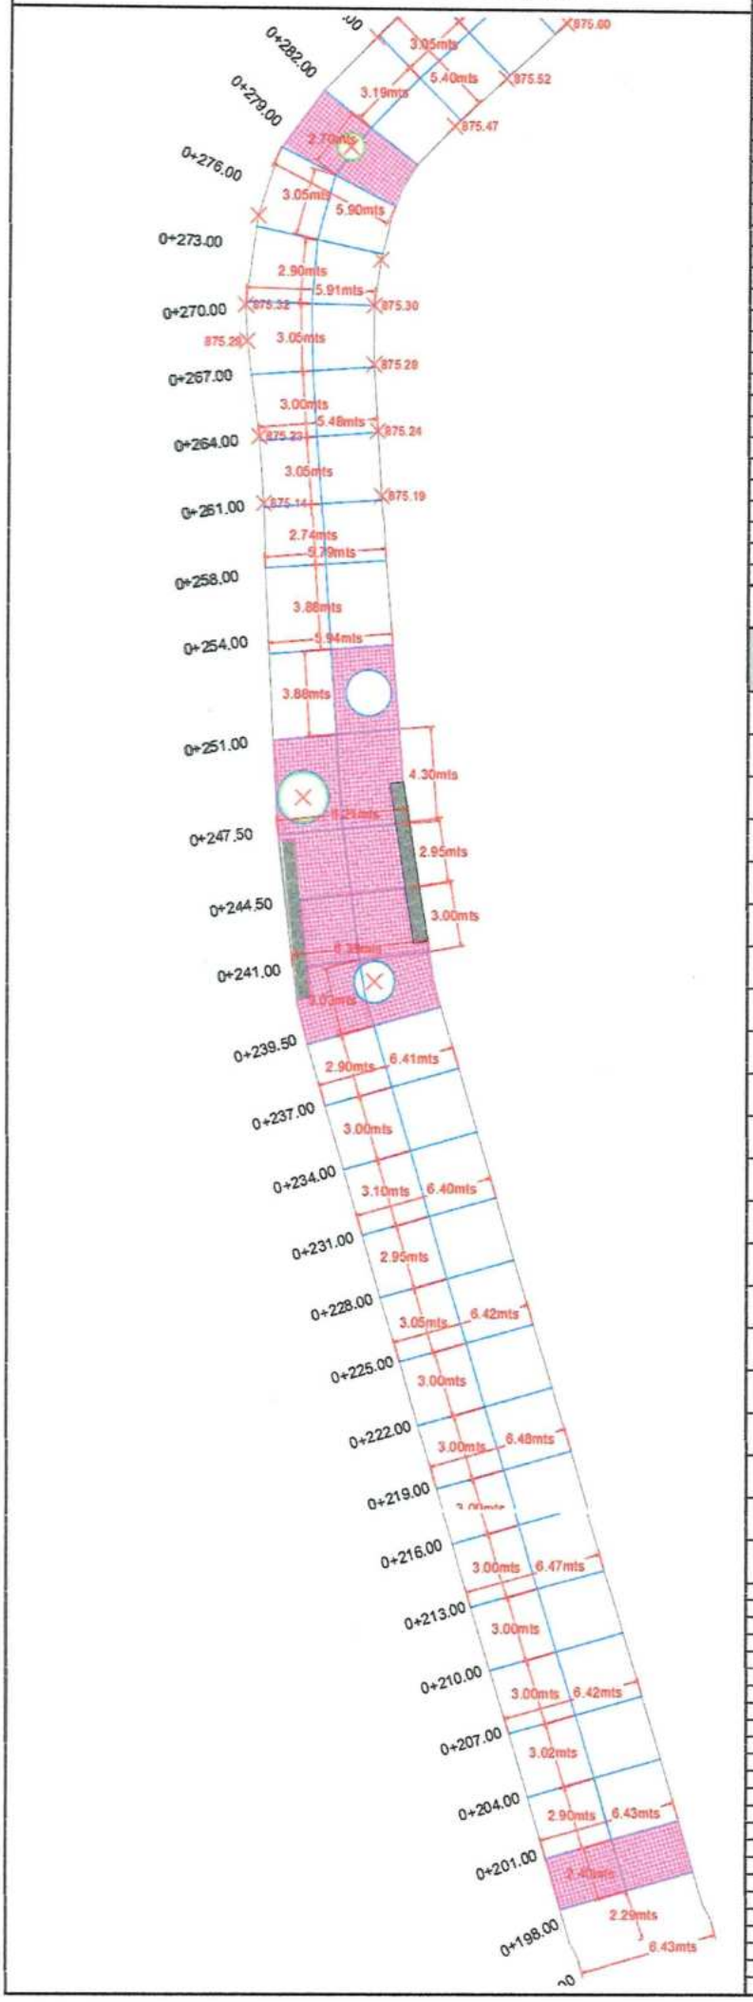


K0+443,50		5,89			
	9,50			5,73	54,44
K0+453,00		5,56			
	9,00			5,51	49,59
K0+462,00		5,46			
	6,00			5,53	33,18
K0+468,00		5,59			
	5,50			5,66	31,13
K0+473,50		5,72			
	6,20			5,81	36,02
K0+479,70		5,89			
	6,60			5,84	38,54
K0+486,30		5,79			
	7,20			5,88	42,34
K0+493,50		5,96			
	7,80			5,96	46,49
K0+501,30		5,95			
	5,80			5,95	34,51
K0+507,10		5,94			
	6,40			5,96	38,14
K0+513,50		5,97			
	6,40			5,96	38,14
K0+519,90		5,94			
	6,40			5,95	38,08
K0+526,30		5,96			
LOSAS IRREGULARES					
K0+422,00	2,94	1,41			4,15
K0+433,00	3,02	2,62			7,91
K0+437,00	1,1	0,91			1,00
K0+475,80	2,03	0,52			1,06
K0+483,00	1,19	0,53			0,63


DESCUENTO DE VOLUMEN

ABSCISAS	DIMENSIONES			Área (m2)	Área (m2)
	Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)		
PAVIMENTACIÓN BARRIOS SAN MARTIN, QUEBRADA LA IGLESIA, SAN PEDRO Y URBANIZACIONES EL SOL 1 Y SOL 2. ENTRE LAS ABSCISAS K0+252 Y LA K0+375					
CORONA DE POZO D=1,80MTS - K0+240,5				2,54	-2,54
SUMIDERO LATERAL CON REJILLAS SL800 - K0+243,5	7,4	0,75			-5,55
SUMIDERO LATERAL CON REJILLAS SL800 - K0+245,3	7,4	0,75			-5,55
CORONA DE POZO D=2,10MTS - K0+249				3,46	-3,46
CORONA DE POZO D=2,10MTS - K0+253,50				3,46	-3,46
CORONA DE POZO D=1,20MTS - K0+280,5				1,13	-1,13
CORONA DE POZO D=1,20MTS - K0+330				1,13	-1,13
SUMIDERO LATERAL CON REJILLAS SL600 - K0+337,5	5,6	0,75			-4,2
SUMIDERO LATERAL CON REJILLAS SL800 - K0+372	6,88	0,75			-5,16
CORONA DE POZO D=1,20MTS - K0+373,5				1,13	-1,13
PAVIMENTACIÓN BARRIOS SAN MARTIN, QUEBRADA LA IGLESIA, SAN PEDRO Y URBANIZACIONES EL SOL 1 Y SOL 2. ENTRE LAS ABSCISAS K0+405,3 Y LA K0+526,3					
CORONA DE POZO D=1,20MTS - K0+424				1,13	-1,13
CORONA DE POZO D=1,20MTS - K0+427,5				1,13	-1,13
CAJA DE INSPECCIÓN - K0+436	1,04	0,87			-0,9
CORONA DE POZO D=2,10MTS - K0+439,00				3,46	-3,46
CORONA DE POZO D=1,20MTS - K0+444,4				1,13	-1,13
SUMIDERO LATERAL CON REJILLAS SL500 - K0+448,3	4,7	0,75			-3,53
SUMIDERO LATERAL CON REJILLAS SL600 - K0+496	5,6	0,75			-4,2
CORONA DE POZO D=1,20MTS - K0+500				1,13	-1,13
CORONA DE POZO D=1,20MTS - K0+511,3				1,13	-1,13
				SUBTOTAL - ACTA #10	1.826,92


CONTINUACIÓN - ÁREA PAVIMENTACIÓN BARRIOS SAN MARTIN, QUEBRADA LA IGLESIA, SAN PEDRO Y URBANIZACIONES EL SOL 1 Y SOL 2. ENTRE LAS ABSCISAS K0+195 Y LA K0+375

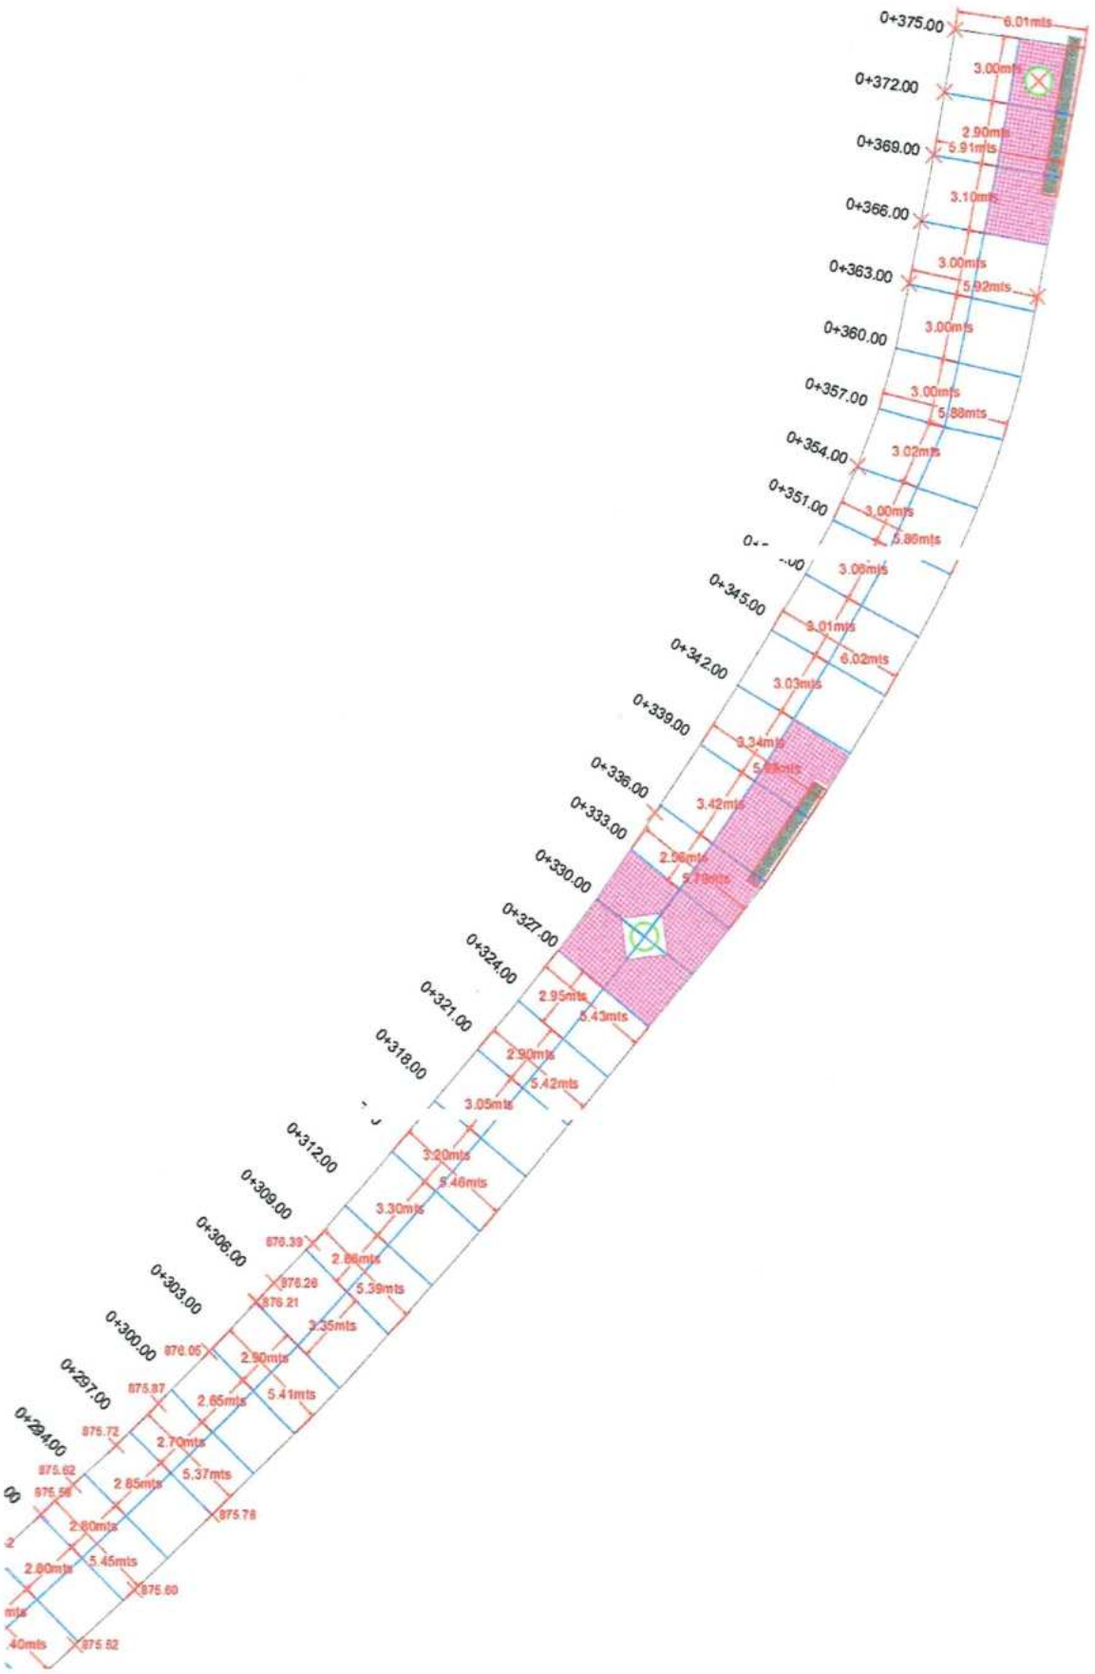

ÁREA PAVIMENTACIÓN BARRIOS SAN MARTIN, QUEBRADA LA IGLESIA, SAN PEDRO Y URBANIZACIONES EL SOL 1 Y SOL 2. ENTRE LAS ABSCISAS K0+405.3 Y LA K0+526.3

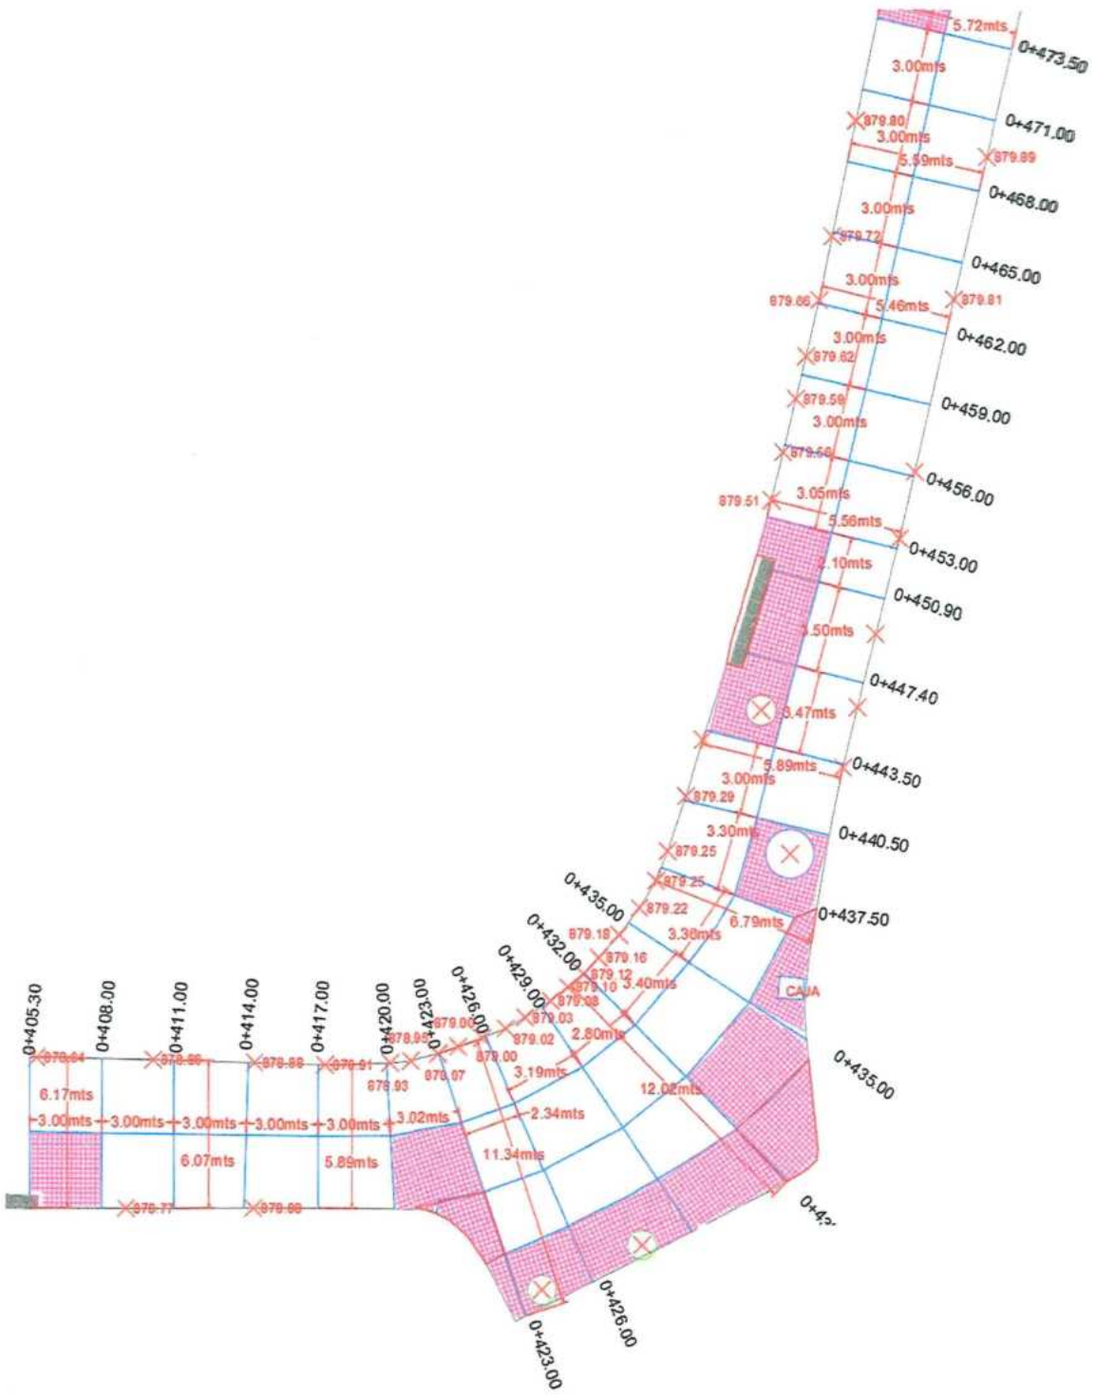

CONTINUACIÓN - ÁREA PAVIMENTACIÓN BARRIOS SAN MARTIN, QUEBRADA LA IGLESIA, SAN PEDRO Y URBANIZACIONES EL SOL 1 Y SOL 2. ENTRE LAS ABSCISAS K0+405,3 Y LA K0+526,3

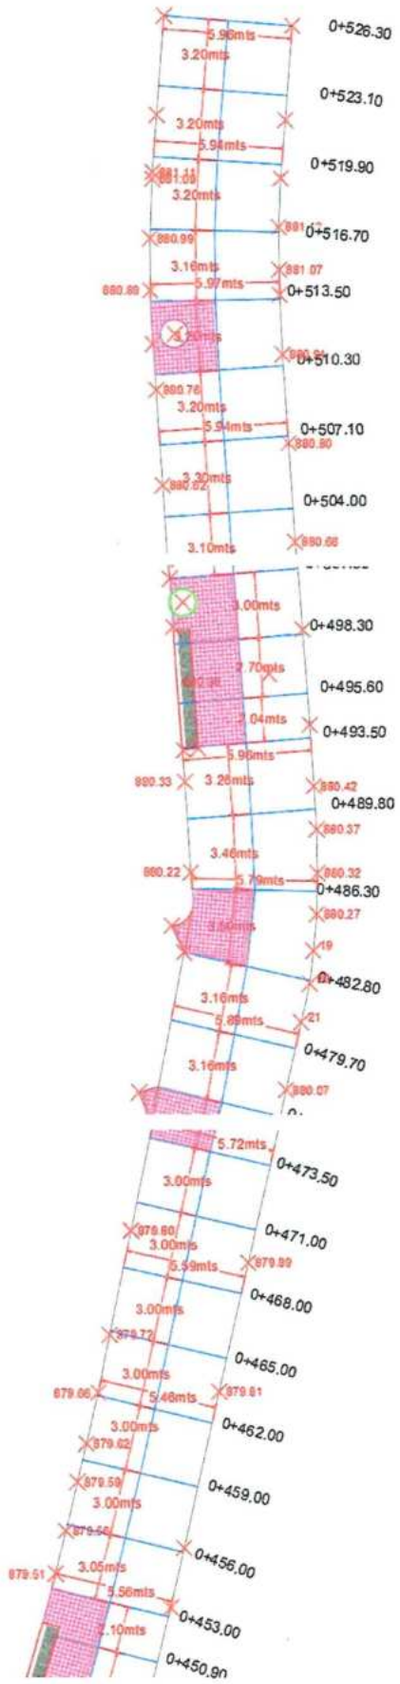

OBSERVACIONES:	PRESENTE ACTA 10		ACUMULADO			TOTALES	1.826,92
	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% EJECUTADO		
	1.826,92	$ 2.204.635,71	1.826,92	$ 2.204.635,71	16,44%		

CONTRATISTA: CONSORCIO LA FLORA 2023

Firma: Gustavo G
REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERVENTORÍA CANALIZACIÓN BGA

Firma:
REPRESENTANTE LEGAL

Secretaria de Infraestructura Fisica Alcaldía de Bucaramanga	Alcaldía de Bucaramanga	Consorcio La Flora 2023	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	30	MM	06	AAAA	2025	ACTA No.	10	ELABORÓ	DANIEL GÓMEZ BARRAGÁN


OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
ENTIDAD CONTRATANTE:	ALCALDÍA DE BUCARAMANGA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
CONTRATISTA:	CONSORCIO LA FLORA 2023
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORÍA CANALIZACIÓN BGA

CAPÍTULO 6. NO PREVISTOS

6.0.58.	Reubicación de tubería de la red de acueducto D=20" L=55 m en hierro dúctil C30, con tramo elevado en acero SCH40 soportado mediante estructura metálica tipo cercha de 24 m, incluyendo instalación de codos, uniones, excavación, construcción de caissons, anclajes y relleno	UNIDAD	und

ILUSTRACIÓN - GRAFICA - IMÁGEN

DETALLE Y UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD. SOBRE EL MÓDULO 92 Y 93 DEL BOX-CULVERT 3X3MTS

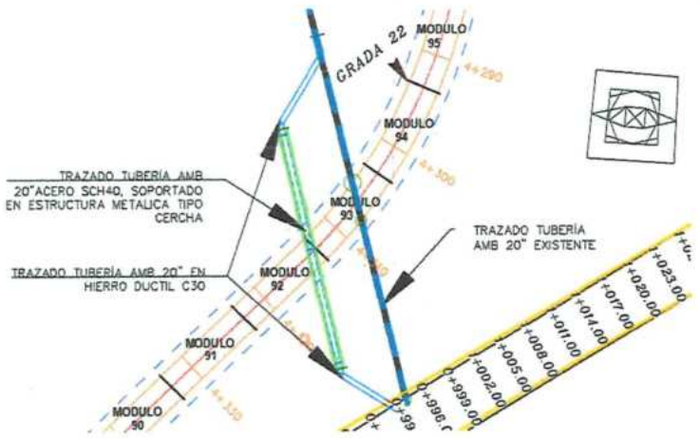

Ubicación	DIMENSIONES Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Elemento (und)	Longitud (m)
ACTA #10					
BOX-CULVERT 3.00 X 3.00 MTS					
BOX-CULVERT 3.00X3.00 M, MODULO 91 DE LA ABSCISA K4+329.9 A K4+319.9.					
Reubicación de la red del acueducto D=20" sobre los módulos 92 y 93 del box (Abscisa K4+310)				1,00	1,00
				SUBTOTAL - ACTA #10	1,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO





REGISTRO FOTOGRÁFICO





OBSERVACIONES:	PRESENTE ACTA 10		ACUMULADO			TOTALES	1,00
	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% EJECUTADO		
	1,00	$ 249.735.006,00	1,00	$ 249.735.006,00	100,00%		

CONTRATISTA: CONSORCIO LA FLORA 2023

Firma:

REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERVENTORÍA CANALIZACIÓN BGA

Firma:

REPRESENTANTE LEGAL

baños portatiles
NIT: 900.332.069-7

NIT . 900.332.069-7

Autorización DIAN No. 18764092885886

Numeración Autorizada del No. FEVP 5769 al No. FEVP 6000

ACT. ECO. 7730 - NO REALIZAR RETENCIONES
RST-REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION - IVA REGÍMEN COMÚN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nro. FEVP 5781

FECHA: MAYO 9 DE 2025

DIRECCIÓN: AV 4 6N - 67 OFC 602

TELÉFONOS: 3208567478

ATENCIÓN:. SR GUSTAVO SILVA

ORDEN DE COMPRA:

CLIENTE: CONSORCIO LA FLORA 2023

NIT: 901702490 DV 7

CIUDAD: CALI

FORMA DE PAGO: 8 DIAS

CONCEPTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
24 ASEOS REALIZADOS A TRES BAÑOS PORT. PROPIEDAD DEL CLIENTE	57,334.00	1,376,016.00
ASEOS DE ABRIL:01-04-08-11-15-22-25-29 DEL 2025		
LOC. EN LA CRA 274 Nº 87-52 BR SAN MARTIN		
BUCARAMANGA- SANTANDER		

FAVOR REALIZAR EL PAGO EN LA CUENTA DE AHORROS DEL BANCO DAVIVIENDA No 485800032917 A NOMBRE DE BAÑOS PORTATILES

SON: UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS

ACT PPAL 7730-NO PRACTICAR RTEFTE NI RTEICA POR RST

I.V.A.	261443
TOTAL:	1,637,459.00

RESOLUCION DIAN No 18764092885886 DE FECHA 2025/05/07, Numeracion Autorizada del No. FEVP 5769 al No. FEVP 6000. Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a un Titulo Valor (Art. 772 al 774 del código de comercio) y la Ley 1231 de Julio de 2008, Se pactan intereses de 3% de mora, siendo estos exigibles y el total del capital por incumplimiento o mora en el pago a condiciones de crédito aquí pactados, acepto y declaro haber recibido real y materialmente los artículos arriba mencionados.

CUDE: fe1252b284132cacdfc54f16ff9781abfaaf5b2963b37d0ff9745a49810641276e07c79a76bb09fbed045e3c8313c604

CUFE: fe1252b284132cacdfc54f16ff9781abfaaf5b2963b37d0ff9745a49810641276e07c79a76bb09fbed045e3c8313c604

FECHA Y HORA: 2025 5 9 11:15:06

Impreso por el Programa Helisa. Nit. 800.042.928-1 Tel 3144840

baños portatiles
NIT: 900.332.069-7

NIT . 900.332.069-7

Autorización DIAN No. 18764092885886

Numeración Autorizada del No. FEVP 5769 al No. FEVP 6000

ACT. ECO. 7730 - NO REALIZAR RETENCIONES
RST-REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION - IVA REGIMEN COMÚN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nro. FEVP 5823

FECHA:	JUNIO 9 DE 2025	CLIENTE:	CONSORCIO LA FLORA 2023
DIRECCIÓN:	AV 4 6N - 67 OFC 602	NIT:	901702490 DV 7
TELÉFONOS:	3208567478	CIUDAD:	CALI
ATENCIÓN:.	SR GUSTAVO SILVA		
ORDEN DE COMPRA:		FORMA DE PAGO:	8 DIAS

CONCEPTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
27 ASEOS REALIZADOS A TRES BAÑOS PORT. PROPIEDAD DEL CLIENTE ASEOS DE MAYO: 02-06-09-13-16-20-23-27-30 DEL 2025 LOC. EN LA CRA 274 Nº 87-52 BR SAN MARTIN BUCARAMANGA-SANTANDER	57,334.00	1,548,018.00

FAVOR REALIZAR EL PAGO EN LA CUENTA DE AHORROS DEL BANCO DAVIVIENDA No 485800032917 A NOMBRE DE BAÑOS PORTÁTILES

SON:	UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS	I.V.A.	294123
	ACT PPAL 7730-NO PRACTICAR RTEFTE NI RTEICA POR RST	TOTAL:	1,842,141.00

RESOLUCION DIAN No 18764092885886 DE FECHA 2025/05/07, Numeracion Autorizada del No. FEVP 5769 al No. FEVP 6000. Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a un Titulo Valor (Art. 772 al 774 del código de comercio) y la Ley 1231 de Julio de 2008, Se pactan intereses de 3% de mora, siendo estos exigibles y el total del capital por incumplimiento o mora en el pago a condiciones de crédito aquí pactados, acepto y declaro haber recibido real y materialmente los artículos arriba mencionados.

CUDE: 69f6a109053537f3e6f6c857ce5f522c631d68c64f88d946b4408e0da55158f45af5259ed1595fa65678466244cfc20a

CUFE: 69f6a109053537f3e6f6c857ce5f522c631d68c64f88d946b4408e0da55158f45af5259ed1595fa65678466244cfc20a

FECHA Y HORA: 2025 6 9 15:39:22

Impreso por el Programa Helisa, Nit. 800.042.928-1 Tel 3144840

Factura Electrónica de Venta FEV - 2843

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764087176241 de 15/01/2025 - 15/07/2025 autoriza FEV-2638 a FEV-5000

No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	16/06/2025 14:17
Fecha de Vencimiento	16/06/2025 14:17
Fecha de Validación	16/06/2025 14:17
Forma de Pago	Crédito
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	MARGY NELLY SARMIENTO RUEDA
CC	63354657
Obligación	IVA
Email	margynel@hotmail.com
Teléfono	6307674
Dirección	CL 23 10 05
Ciudad, Depart.	BUCARAMANGA, SANTANDER (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	CONSORCIO LA FLORA 2023
NIT	901702490
Obligación	IVA
Email	consorciolaflora2023@gmail.com
Teléfono	3208567478
Dirección	AV 4 N 6 N 67 OF 602
Ciudad, Depart.	CALI, VALLE DEL CAUCA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PLASTICO	ROLLO PLASTICO X 50 MTS X 6 MTS	3	EA	$378,151.00	IVA 19%	$1,134,453.00	$1,349,999.00

1

Subtotal	$1,134,453.00
IVA 19%	$215,546.00
Total a Pagar	$1,349,999.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 48b30e906c153e5c9067707aa11d5e5459379d4f3d9644e652ddf247cc7ea3394451aa2a6f36f5988366fe38e0102865

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FEV - 2841

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764087176241 de 15/01/2025 - 15/07/2025 autoriza FEV-2638 a FEV-5000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	16/06/2025 09:59
Fecha de Vencimiento	16/06/2025 09:59
Fecha de Validación	16/06/2025 09:59
Forma de Pago	Crédito
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	MARGY NELLY SARMIENTO RUEDA
CC	63354657
Obligación	IVA
Email	margynel@hotmail.com
Teléfono	6307674
Dirección	CL 23 10 05
Ciudad, Depart.	BUCARAMANGA, SANTANDER (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	CONSORCIO LA FLORA 2023
NIT	901702490
Obligación	IVA
Email	consorciolaflora2023@gmail.com
Teléfono	3208567478
Dirección	AV 4 N 6 N 67 OF 602
Ciudad, Depart.	CALI, VALLE DEL CAUCA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PRODUCTOS	PLASTICO NEGRO 50X6MTS	2	EA	$378,151.00	IVA 19%	$756,302.00	$899,999.00

1

Subtotal	$756,302.00
IVA 19%	$143,697.00
Total a Pagar	$899,999.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: aacf3b2b9e575debc3a473250603464bef7e5369279cf4cf03a7cb857d58a08ee61e64b2af94ab8ade063dec5b2e5db6

Factura Electrónica de Venta FEV - 2818

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764087176241 de 15/01/2025 - 15/07/2025 autoriza FEV-2638 a FEV-5000

MARGY NELLY SARMIENTO RUEDA NIT 63354657
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	28/05/2025 10:02
Fecha de Vencimiento	28/05/2025 10:02
Fecha de Validación	28/05/2025 10:10
Forma de Pago	Crédito
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	MARGY NELLY SARMIENTO RUEDA
CC	63354657
Obligación	IVA
Email	margynel@hotmail.com
Teléfono	6307674
Dirección	CL 23 10 05
Ciudad, Depart.	BUCARAMANGA, SANTANDER (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	CONSORCIO LA FLORA 2023
NIT	901702490
Obligación	IVA
Email	consorciolaflora2023@gmail.com
Teléfono	3208567478
Dirección	AV 4 N 6 N 67 OF 602
Ciudad, Depart.	CALI, VALLE DEL CAUCA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PLASTICO	ROLLO PLASTICO X 50 MTS X 6 MTS	2	EA	$378,152.00	IVA 19%	$756,304.00	$900,002.00
2	TRANSPORTE	SERVICIO	1	94	$35,000.00		$35,000.00	$35,000.00

2

Subtotal	$791,304.00
IVA 19%	$143,698.00
Total a Pagar	$935,002.00

Unidades de medida: 94 = unidad

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 69db1f054943a79225ba4a60f656ee66e99c1b198af1928c5889fbb4e79bfc254f03b93c3287b62e5e06d1674061795e

CONSORCIO LA FLORA 2023

Nit: 901702490

Nómina # NOM 94 correspondiente al periodo del 01/05/2025 al 15/05/2025

Concepto Nómina		*Cantidad*	*V/r. Unitario*	*Devengado*	*Deducido*
MONOGA RIAÑO OLGA PATRICIA				***CC 63451296***	
Cargo: ***AUXILIAR DE TRAFICO***				**Sueldo Básico**	***1.424.000***
Sueldo		15	47.467	712.000	0
Auxilio de Transporte		15	6.667	100.000	0
Hora Extra Diurna		1	7.739	7.739	0
Aportes Pension Trabajador	PROTECCIÓN S.A. AFPC			0	28.790
Aportes Salud Trabajador	NUEVA EPS			0	28.790
Firma del Empleado			**Total**	**819.739**	**57.580**
C.C. 63451296 de Flora			**Neto Pagado**		**762.159**

CONSORCIO LA FLORA 2023

Nit: 901702490

Nómina # NOM 96 correspondiente al periodo del 16/05/2025 al 31/05/2025

Concepto Nómina		*Cantidad*	*V/r. Unitario*	*Devengado*	*Deducido*
MONOGA RIAÑO OLGA PATRICIA				***CC 63451296***	
Cargo: AUXILIAR DE TRAFICO				**Sueldo Básico**	***1.424.000***
Sueldo		15	47.467	712.000	0
Auxilio de Transporte		15	6.667	100.000	0
Auxilio Extra		1	54.133	54.133	0
Hora Extra Diurna		2	7.739	15.479	0
Aportes Pension Trabajador	PROTECCIÓN S.A. AFPC			0	29.099
Aportes Salud Trabajador	NUEVA EPS			0	29.099
Firma del Empleado			**Total**	**881.612**	**58.198**
C.C. 63451290 Floridablanca			**Neto Pagado**		**823.414**

CONSORCIO LA FLORA 2023

Nit: 901702490

Nómina # NOM 94 correspondiente al periodo del 01/05/2025 al 15/05/2025

Concepto Nómina		Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
TORRES MENDOZA JOSE DE JESUS				CC 91240282	
Cargo: AYUDANTE				Sueldo Básico	1.424.000
Sueldo		15	47.467	712.000	0
Auxilio de Transporte		15	6.667	100.000	0
Auxilio Extra		1	117.855	117.855	0
Aportes Pension Trabajador	COLPENSIONES			0	28.480
Aportes Salud Trabajador	SALUD TOTAL EPS			0	28.480
			Total	**929.855**	**56.960**
			Neto Pagado		**872.895**

Firma del Empleado Jose Torres

C.C. 91240282 Bucaramanga

CONSORCIO LA FLORA 2023

Nit: 901702490

Nómina # NOM 96 correspondiente al periodo del
16/05/2025 al 31/05/2025

Concepto Nómina		*Cantidad*	*V/r. Unitario*	*Devengado*	*Deducido*
TORRES MENDOZA JOSE DE JESUS				***CC 91240282***	
Cargo: AYUDANTE				**Sueldo Básico**	***1.424.000***
Sueldo		15	47.467	712.000	0
Auxilio de Transporte		15	6.667	100.000	0
Auxilio Extra		1	171.988	171.988	0
Aportes Pension Trabajador	COLPENSIONES			0	28.480
Aportes Salud Trabajador	SALUD TOTAL EPS			0	28.480
Firma del Empleado		**Total**		**983.988**	**56.960**
C.C. 91240282		**Neto Pagado**			**927.028**

CONSORCIO LA FLORA 2023

Nit: 901702490

Nómina # NOM 97 correspondiente al periodo del
01/06/2025 al 15/06/2025

Concepto Nómina		*Cantidad*	*V/r. Unitario*	*Devengado*	*Deducido*
MONOGA RIAÑO OLGA PATRICIA				***CC 63451296***	
Cargo: AUXILIAR DE TRAFICO				**Sueldo Básico**	***1.424.000***
Sueldo		15	47.467	712.000	0
Auxilio de Transporte		15	6.667	100.000	0
Hora Extra Diurna		0,5	7.739	3.870	0
Aportes Pension Trabajador	PROTECCIÓN S.A. AFPC			0	28.635
Aportes Salud Trabajador	NUEVA EPS			0	28.635
Firma del Empleado			**Total**	**815.870**	**57.270**
C.C. 63451296 Ptbla			**Neto Pagado**		**758.600**

CONSORCIO LA FLORA 2023

Nit: 901702490

Nómina # NOM 99 correspondiente al periodo del 16/06/2025 al 30/06/2025

Concepto Nómina		*Cantidad*	*V/r. Unitario*	*Devengado*	*Deducido*
MONOGA RIAÑO OLGA PATRICIA				***CC 63451296***	
Cargo: ***AUXILIAR DE TRAFICO***				**Sueldo Básico**	***1.424.000***
Sueldo		15	47.467	712.000	0
Auxilio de Transporte		15	6.667	100.000	0
Hora Extra Diurna		2	7.739	15.479	0
Aportes Pension Trabajador	PROTECCIÓN S.A. AFPC			0	29.099
Aportes Salud Trabajador	NUEVA EPS			0	29.099
Firma del Empleado			**Total**	**827.479**	**58.198**
C.C.			**Neto Pagado**		**769.281**

63'451296 Tolima

CONSORCIO LA FLORA 2023

Nit: 901702490

Nómina # NOM 97 correspondiente al periodo del 01/06/2025 al 15/06/2025

Concepto Nómina		*Cantidad*	*V/r. Unitario*	*Devengado*	*Deducido*
TORRES MENDOZA JOSE DE JESUS				***CC 91240282***	
Cargo: AYUDANTE				**Sueldo Básico**	***1.424.000***
Sueldo		15	47.467	712.000	0
Auxilio de Transporte		15	6.667	100.000	0
Auxilio Extra		1	117.855	117.855	0
Aportes Pension Trabajador	COLPENSIONES			0	28.480
Aportes Salud Trabajador	SALUD TOTAL EPS			0	28.480
			Total	**929.855**	**56.960**
			Neto Pagado		**872.895**

Firma del Empleado Jose Torres

C.C. 91240282 - El manager

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA SAS EN REORGANIZACION

NIT : 804,015,242 - 8
CALLE 29 No. 9 - 68 BARRIO LAGOS 1
FLORIDABLANCA - COLOMBIA
6076851009 6076398314
factura2construsuelosbga@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	CONSORCIO LA FLORA 2023		
NIT	901,702,490 - 7	**Teléfono**	3208567478
Dirección	AVENIDA 4N 6N 67 OF 602	**Vendedor**	MIGUEL ANGEL CAMARGO
Ciudad	BUCARAMANGA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	CONSORCIOLAFLORA2023@GMAIL.COM		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FERO 332

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-06-04	09:51:05
Expedición	2025-06-04	09:54:54
Vencimiento	2025-06-04	

Item	Código	Descripcion	Unid	Cant	V. Unit	Impto a Cargo	Valor Total
1	0010003000003	F.20 COMPRESIÓN DE CONCRETOS (DEL 291 HASTA EL 296)		24	10,000.00	19	240,000.00
2	0010002000001	PROCTOR MODIFICADO CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓN DE CAUCES: "QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA E INTERCEPTORES LA FLORA 2 Y LA IGLESIA ALTA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA".		1	70,000.00	19	70,000.00

Total Bruto	310,000.00
IVA 19%	58,900.00
Total a Pagar	**$ 368.900,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 368.900,00 Cuota 1 Vence el 2025-06-04

VALOR EN LETRAS

Trescientos Sesenta Y Ocho Mil Novecientos Pesos Mcte

OBSERVACIONES

En cumplimiento de la Ley 1231 de 2008, modificada por laLey 1676 de 2013 y la resolución 085 de 2022, la empresadará por aceptada irrevocablemente la factura a los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción, de lo contrario el rechazo de información se realizará a travésdel mecanismo electrónico apropiado. El pago de la factura se realizará al tener legítimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después de los descuentos por Ley y contractuales.

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : KAREN LISETH SA

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764072477921 **aprobado en** 2024-06-06 **vigente** 24 Meses, **prefijo** FERO **desde el número** 1 **al** 5000

CUFE :7a31d9bbfd9e52a00c31dc6fe21335b11137549a16464a8d5426e7a46b99417d53ed3a5f353658e2e0f2d0a0166c35e5

COPIA



CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA SAS EN REORGANIZACION

NIT : 804,015,242 - 8
CALLE 29 No. 9 - 68 BARRIO LAGOS 1
FLORIDABLANCA - COLOMBIA
6076382809 6076398314
factura2construsuelosbga@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	CONSORCIO LA FLORA 2023		
NIT	901,702,490 - 7	**Teléfono**	3208567478
Dirección	AVENIDA 4N 6N 67 OF 602	**Vendedor**	MIGUEL ANGEL CAMARGO
Ciudad	BUCARAMANGA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	CONSORCIOLAFLORA2023@GMAIL.COM		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FERO 303

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-05-02	12:16:31
Expedición	2025-05-02	12:19:33
Vencimiento	2025-05-02	

Item	Código	Descripcion	Unid	Cant	V. Unit	Impto a Cargo	Valor Total
1	0010003000003	F.19 COMPRESIÓN DE CONCRETOS (DEL 285 HASTA EL 290) CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓN DE CAUCES: "QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA E INTERCEPTORES LA FLORA 2 Y LA IGLESIA ALTA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"		24	10,000.00	19	240,000.00

Total Bruto	240,000.00
IVA 19%	45,600.00
Total a Pagar	**$ 285.600,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 285.600,00 Cuota 1 Vence el 2025-05-02

VALOR EN LETRAS

Doscientos Ochenta Y Cinco Mil Seiscientos Pesos Mcte

OBSERVACIONES

En cumplimiento de la Ley 1231 de 2008, modificada por laLey 1676 de 2013 y la resolución 085 de 2022, la empresadará por aceptada irrevocablemente la factura a los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción, de lo contrario el rechazo de información se realizará a travésdel mecanismo electrónico apropiado. El pago de la factura se realizará al tener legítimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después de los descuentos por Ley y contractuales.

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : KAREN LISETH SA

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764072477921 **aprobado en** 2024-06-06 **vigente** 24 Meses, **prefijo** FERO **desde el número** 1 **al** 5000

CUFE :4354ae9a32e54a3c388ad0a013f3cded6926df789a30a1791717c26e6eb5c9e4ce26ef974d5c748ded6165486dd57ea2

ORIGINAL



CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA SAS EN REORGANIZACION

NIT : 804,015,242 - 8
CALLE 29 No. 9 - 68 BARRIO LAGOS 1
FLORIDABLANCA - COLOMBIA
6076382809 6076398314
factura2construsuelosbga@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	CONSORCIO LA FLORA 2023		
NIT	901,702,490 - 7	**Teléfono**	3208567478
Dirección	AVENIDA 4N 6N 67 OF 602	**Vendedor**	MIGUEL ANGEL CAMARGO
Ciudad	BUCARAMANGA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	CONSORCIOLAFLORA2023@GMAIL.COM		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FERO 302

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-05-02	12:13:09
Expedición	2025-05-02	12:15:48
Vencimiento	2025-05-02	

Item	Código	Descripcion	Unid	Cant	V. Unit	Impto a Cargo	Valor Total
1	0010003000003	F.18 COMPRESIÓN DE CONCRETOS (DEL 281 HASTA EL 284) CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓN DE CAUCES: "QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA E INTERCEPTORES LA FLORA 2 Y LA IGLESIA ALTA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"		16	10,000.00	19	160,000.00

Total Bruto	160,000.00
IVA 19%	30,400.00
Total a Pagar	**$ 190.400,00**

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito Clientes | Efectivo | 190.400,00 | Cuota 1 Vence el 2025-05-02

VALOR EN LETRAS

Ciento Noventa Mil Cuatrocientos Pesos Mcte

OBSERVACIONES

En cumplimiento de la Ley 1231 de 2008, modificada por laLey 1676 de 2013 y la resolución 085 de 2022, la empresadará por aceptada irrevocablemente la factura a los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción, de lo contrario el rechazo de información se realizará a travésdel mecanismo electrónico apropiado. El pago de la factura se realizará al tener legítimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después de los descuentos por Ley y contractuales.

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : KAREN LISETH SA

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764072477921 **aprobado en** 2024-06-06 **vigente** 24 Meses, **prefijo** FERO **desde el número** 1 **al** 5000

CUFE :233b8ce31202a98e6ca9efc44aaf6eab36b57e33698b1ec1606c3bff1eddeaa37954bcba5aada0470e2a56c5865b6a4c

ORIGINAL
