RN Ingeniería S.A.S

INFORME DE OBRA PARCIAL OCAÑA

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA 8A, CONECTANDO CON LA RED PRINCIPAL DE LA CALLE 13 EN EL BARRIO LAS MERCEDES PARTE BAJA, MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER



CONTRATISTA: RN INGENIERIA S.A.S.

SUPERVISIÓN: SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA.

ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE OCAÑA.

JUNIO DE 2025

RN Ingeniería S.A.S

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 5
2.1. LOCALIZACIÓN 6
2.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA 7
2.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 8
3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 9
3.1 INFORMACIÓN GENERAL 9
3.2. ACTIVIDADES DEL CONTRATO 11
3.3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES ... 14
3.4. SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTO 22

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Localización del proyecto..... 6
Ilustración 2. 6
Ilustración 3.Inventario y estado inicial de la via 7
Ilustración 4. 7

LISTA DE ANEXOS

Anexo 1. Seguimiento a la programación de obra.

Anexo 2. Maquinaria y equipo de contrato de obra.

Anexo 3. Personal, control aporte legales y seguridad social contrato de obra.

1. INTRODUCCIÓN

En el marco de la ejecución del contrato N° SVIV-SAMC 001 de 2025, que tiene como objeto construcción de sistema de alcantarillado sanitario en la carrera 8a, conectando con la red principal de la calle 13 en el barrio las mercedes parte baja, municipio de Ocaña, norte de Santander, Esta iniciativa surge como respuesta a la necesidad urgente de mejorar las condiciones sanitarias y de infraestructura de esta zona, la cual actualmente carece de un sistema adecuado para la recolección y disposición de aguas residuales.

la ejecución de esta obra busca garantizar el acceso a servicios básicos de saneamiento, contribuyendo al bienestar de la comunidad, la protección del medio ambiente y la prevención de enfermedades de origen hídrico. Además, el proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de desarrollo urbano sostenible y las políticas de mejoramiento de calidad de vida de los habitantes del municipio.

Con esta intervención se espera impactar positivamente la salud pública, la calidad del entorno y la dignidad de los residentes del barrio Las Mercedes, promoviendo así un desarrollo más equitativo y eficiente en la prestación de los servicios públicos domiciliarios.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Las obras por realizar consisten en el **CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA 8A, CONECTANDO CON LA RED PRINCIPAL DE LA CALLE 13 EN EL BARRIO LAS MERCEDES PARTE BAJA, MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**, La intervención contempla la instalación de tuberías, cajas de inspección, pozos de visita y demás elementos necesarios para garantizar el adecuado transporte de las aguas residuales domésticas hacia la red matriz.

Actualmente, la zona carece de una infraestructura sanitaria adecuada, lo que genera problemas de salubridad, contaminación y deterioro del entorno. A través de este proyecto se busca proporcionar una solución técnica eficiente y duradera que cumpla con las normas vigentes en materia de saneamiento básico y que atienda a una población que ha venido demandando este servicio de forma prioritaria.

Las actividades a ejecutar incluyen el diseño hidráulico-sanitario, excavación, suministro e instalación de redes de alcantarillado, y obras de conexión a la red existente. Asimismo, se garantizará la reposición de la infraestructura vial intervenida y el manejo ambiental adecuado durante todo el proceso constructivo.

Este proyecto no solo responde a una necesidad técnica, sino también social, al mejorar las condiciones de vida de los habitantes del sector, reducir los focos de contaminación y contribuir al desarrollo urbano ordenado del municipio.

2.1. LOCALIZACIÓN

El desarrollo del proyecto se encuentra localizado en la zona urbana del Municipio de Ocaña, del departamento de norte de Santander, específicamente en las direcciones mencionadas.

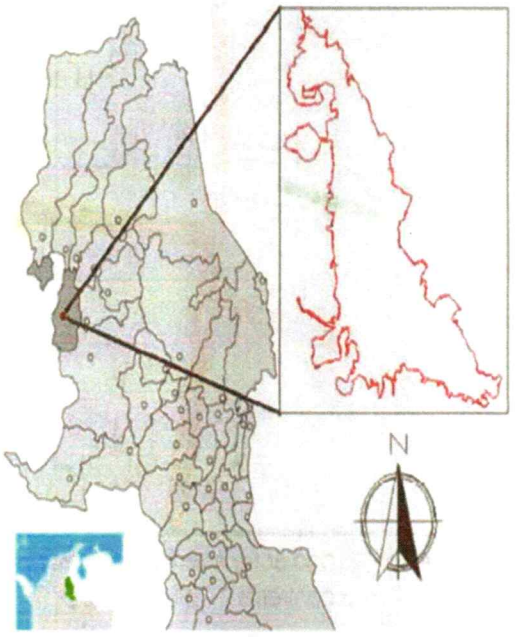


Ilustración 1. Localización del proyecto.



Ilustración 2.

2.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

En visita técnica de inspección inicial, por lo que a continuación se relacionan los tramos a intervenir.

TRAMO	REFERENCIA	ANCHO	LARGO
1	CAREREA 8A (TRAMO 1)	6	108

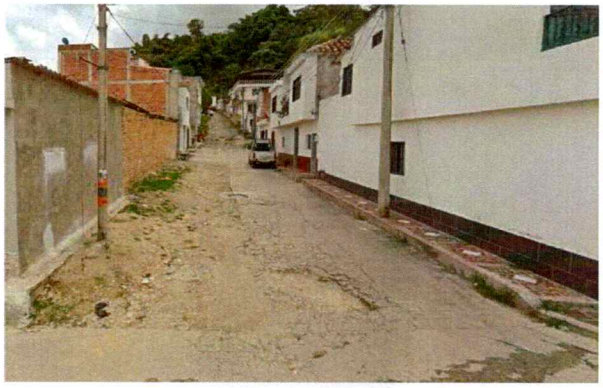


Ilustración3.

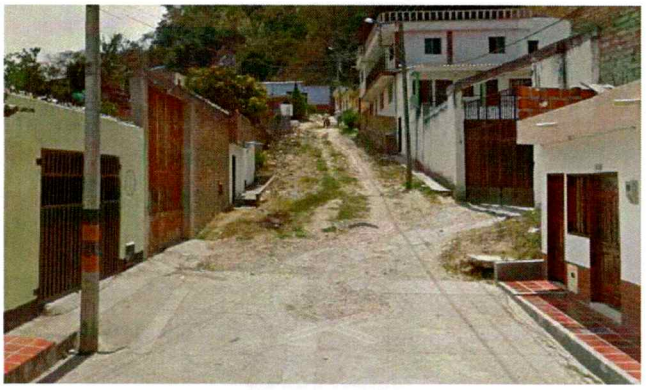


Ilustración 4.

2.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Sistema de alcantarillado sanitario separado, destinado exclusivamente al transporte de aguas residuales domésticas.

Instalación de aproximadamente 108 metros lineales de tubería de PVC 8" sanitaria de tubería principal, instalación de domiciliarios en PVC 6" para cada vivienda con caja de inspección y punto de conexión a la red principal.

Construcción de pozos de inspección de 1.50 a 2.00 metros para los puntos de cambio de dirección o pendientes con tapas de fundición dúctil tipo tráfico pesado.

Señalización y cerramiento de obra, cumpliendo con normas de seguridad vial y laboral.

Manejo y disposición de excavación y material sobrante.

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

3.1 INFORMACIÓN GENERAL

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA	
Número del contrato	SVIV-SAMC 001 DEL 2025
Fecha de suscripción	14 de mayo de 2025
Objeto	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA 8A, CONECTANDO CON LA RED PRINCIPAL DE LA CALLE 13 EN EL BARRIO LAS MERCEDES PARTE BAJA, MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.
Contratista	RN INGENIERIA S.A.S.
NIT	900830873-9
Representante Legal	JOSE JULIAN ROJAS NUMA
C.C	79.789.690 de Bogotá
Valor total inicial	NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y DOS PESOS ($99.847.092).
Supervisión	SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA
Supervisor	OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA
Adiciones	$47.862.409
Valor acumulado del contrato	$147.709.501
Modificaciones	MODIFICACIÓN N°1 DEL 24 DE JUNIO
Aclaraciones	N/A
Suspensiones	N/A
Cesiones de participación contractual	N/A
Plazo	DOS (2) meses
Fecha de inicio	15 de mayo de 2025
Fecha de terminación actual del contrato	14 de julio de 2025
Dirección	Calle 10 #11-46
Número de teléfono	3185149410

RN Ingeniería S.A.S


AMPAROS	No. De pólizas	DESDE (DD-MM-AAAA)	HASTA (DD-MM-AAAA)	VALOR ASEGURADO
PREDIOS LABORALES Y OPERACONES	56-40-101004363	09/05/2025	09/07/2025	$ 284.700.000
DAÑO EMERGENTE Y LUCRI CESANTE	56-40-101004363	09/05/2025	09/07/2025	$ 284.700.000
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	56-40-101004363	09/05/2025	09/07/2025	$ 284.700.000
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	56-44-101010189	09/05/2025	09/11/2025	$ 9.984.709,20
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMIZACIONES LABORALES	56-44-101010189	09/05/2025	09/07/2025	$ 4.992.354,60
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	56-44-101010189	SI AMPARA 5 AÑOS	0 MESES Y 0 DIAS	$ 9.984.709,20
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	56-44-101010189	09/06/2025	10/12/2025	$ 14.770.950,10
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMIZACIONES LABORALES	56-44-101010189	09/06/2025	09/08/2025	$ 7.385.475,05
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	56-44-101010189	SI AMPARA 5 AÑOS	0 MESES Y 0 DIAS	$ 14.770.950,10

CONDICIONES CONTRACTUALES						MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		CONDICION MODIFICADA	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. PARCIAL	CANT.(+)	VR/PARC.	CANT.(-)	VR/PARC.	CANT.	VALOR
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				**$ 3.339.115,80**						**$ 3.339.115,80**
1.1	Localización y replanteo	m^2	111,00	$ 6.033,00	$ 669.663,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	111,00	$ 669.663,00
1.2	Demolición de concreto, pavimento y/o andenes	m^2	67,20	$ 39.724,00	$ 2.669.452,80	0	$ 0,00	0	$ 0,00	67,20	$ 2.669.452,80
2	**MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RELLENOS**				**$ 27.206.909,28**						**$ 43.264.070,16**
2.1	Excavación manual	m^3	170,64	$ 73.461,00	$ 12.535.385,04	102,46	$ 7.526.814,06	0	$ 0,00	273,10	$ 20.062.199,10
2.2	Retiro de escombros	m^3	150,30	$ 19.260,00	$ 2.894.778,00	128,08	$ 2.466.724,50	0	$ 0,00	278,38	$ 5.361.502,50
2.3	Suministro e instalación de recebo compactado	m^3	141,12	$ 83.452,00	$ 11.776.746,24	72,66	$ 6.063.622,32	0	$ 0,00	213,78	$ 17.840.368,56
3	**ESTRUCTURAS**				**$ 22.377.345,04**						**$ 22.377.345,04**
3.1	Reposición Andenes en concreto	m^2	8,64	$ 119.711,00	$ 1.034.303,04	0	$ 0,00	0	$ 0,00	8,64	$ 1.034.303,04
3.2	Pozo de inspección de H=1,50 a H=2,0 MTS	und	2,00	$ 3.784.253,00	$ 7.568.506,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	2,00	$ 7.568.506,00
3.3	Caja de inspección sanitaria	und	24,00	$ 573.939,00	$ 13.774.536,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	24,00	$ 13.774.536,00
4	**REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO**				**$ 23.882.084,94**						**$ 28.071.508,14**
4.1	Extracción de redes domiciliarias existentes	ml	204,00	$ 11.019,00	$ 2.247.876,00	61	$ 672.159,00	0	$ 0,00	265,00	$ 2.920.035,00
4.2	Colchón de arena	m^3	36,86	$ 118.029,00	$ 4.350.548,94	29,8	$ 3.517.264,20	0	$ 0,00	66,66	$ 7.867.813,14
4.3	Suministro e instalación de tuberia PVC 8"	ml	108,00	$ 94.385,00	$ 10.193.580,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	108,00	$ 10.193.580,00
4.4	Suministro e instalación de tuberia sanitaria PVC 6"	ml	96,00	$ 73.855,00	$ 7.090.080,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	96,00	$ 7.090.080,00
	ITEMS NO PREVISTOS										**$ 16.570.654,07**
NP01	suministro e instalacion de SILLA YEE 8" a 6"	und		$ 286.360,00		24	$ 6.872.640,00	0	$ 0,00	24	$ 6.872.640,00
NP02	Concreto de 3000 PSI para reposición de vias	m^3		$ 731.796,00		9,132	$ 6.682.761,07	0	$ 0,00	9,132	$ 6.682.761,07
NP03	nivelacion de pozo existente; incluye intacion de arobase y tapa	und		$ 3.015.253,00		1	$ 3.015.253,00	0	$ 0,00	1	$ 3.015.253,00
				SUBTOTAL	**$ 76.805.455,06**		$ 36.817.238,15			**SUBTOTAL**	**$ 113.622.693,21**
				COSTOS DIRECTOS DE OBRA	$ 76.805.455,06					COSTOS DIRECTOS DE OBRA	$ 113.622.693,21
				ADMINISTRACIÓN	24,50% $ 18.817.336,49					ADMINISTRACIÓN	24,50% $ 27.837.559,84
				IMPREVISTOS	0,50% $ 384.027,28					IMPREVISTOS	0,50% $ 568.113,47
				UTILIDAD	5,00% $ 3.840.272,75					UTILIDAD	5,00% $ 5.681.134,66
				COSTO INDIRECTOS OBRA	$ 23.041.636,52					COSTO INDIRECTOS OBRA	$ 34.086.807,96
				VALOR TOTAL OBRAS CIVILES	$ 76.805.455,06					VALOR TOTAL OBRAS CIVILES	$ 113.622.693,21
				VALOR TOTAL PROYECTO REDONDEADO AL PESO	**$ 99.847.092,00**					VALOR TOTAL PROYECTO REDONDEADO AL PESO	**$ 147.709.501,00**

RN Ingeniería S.A.S

- **AVANCE FISICO DE OBRA**

Inversión Contratada:	**$147.709.501,00**
Inversión ejecutada en acta 1:	**$ 132.938.539,64**
Inversión por ejecutar:	**10%**
Porcentaje total ejecutado:	**90%**

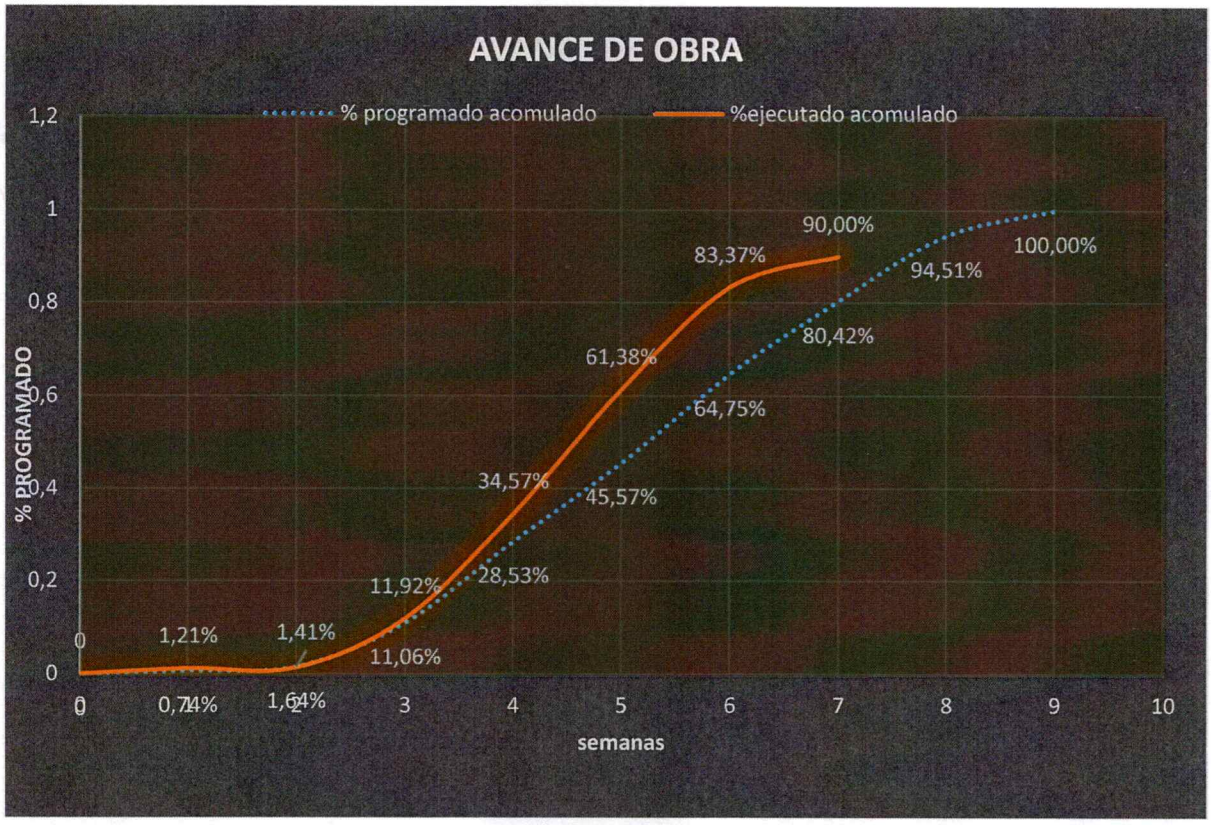

- **CANTIDADES DE OBRA EJCUTADA**

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

CONTRATO DE OBRA No. SVIV SAMC 001 DE 2025

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA 8A, CONECTANDO CON LA RED PRINCIPAL DE LA CALLE 13 EN EL BARRIO LAS MERCEDES PARTE BAJA, MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER "

DATOS DEL CONTRATO						MES DE MAYO		MES DE JUNIO					TOTAL mayo - junio		MES DE JULIO		TOTAL ENERO					
ITEM	DESCRIPCION ITEM	UNID	CONDICIONES ATUALIZADAS CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANTIDADE EJECUTADAS A LA FECHA	SEMANA 1 15/05-18/05	SEMANA 2 19/05-25/05	SEMANA 3 26/05-1/06	SEMANA 4 2/06-08/06	SEMANA 5 9/06-15/06	SEMANA 6 16/06-22/06	SEMANA 7 23/06-29/06	TOTAL CANTIDAD EJEC	VALOR EJECUTADO	SEMANA 8 30/06-6/07	SEMANA 9 7/07-14/07	TOTAL CANTIDAD EJEC	VALOR EJECUTADO	TOTAL CANTIDAD	SALDO POR EJECUTAR	VALOR EJECUTADO	%EJECUTADO
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				**$ 3.338.115,80**										$ 4.340.850,54				$ -			$ 4.340.850,54	$ 3.339.115,80
1,10	Localización y replanteo	m2	111,00	$ 6.033,00	$ 669.663,00	111,00	111,00							111,00	$ 669.663,00			0,00	$ -	111,0	0,00	$ 669.663,00	100%
1,20	Demolición de concreto, pavimento y/o andenes	m3	67,20	$ 39.724,00	$ 2.669.452,80	67,20	17,76	3,84	17,76	16,32	8,96		2,56	67,20	$ 2.669.452,80			0,00	$ -	67,2	0,00	$ 2.669.452,80	100%
2	**MOVIEMINETO DE TIERRAS y rellenos**				**$ 43.264.070,16**										$ 49.091.051,02				$ -			$ 49.091.051,02	$ 37.762.346,94
2,10	Excavación manual	m3	273,10	$ 73.461,00	$ 20.062.199,10	273,10			37,74	52,86	59,88	57,94	64,68	273,10	$ 20.062.199,10			0,00	$ -	273,1	0,00	$ 20.062.199,10	100%
2,20	Retiro de escombros	m3	278,38	$ 19.260,00	$ 5.361.502,50	197,06		4,05	50,51	50,24	45,03	47,23		197,06	$ 3.795.375,60			0,00	$ -	197,06	-81,32	$ 3.795.375,60	71%
2,30	Suministro e instalación de recebo compactado	m3	213,78	$ 83.452,00	$ 17.840.368,56	166,62			31,08	43,68	49,56	42,30		166,62	$ 13.904.772,24			0,00	$ -	166,6	-47,16	$ 13.904.772,24	78%
3	**ESTRUCTURAS**				**$ 22.377.345,04**										$ 29.090.548,55				$ -			$ 29.090.548,55	$ 22.377.345,00
3,10	Reposición Andenes en concreto	m²	8,64	$ 119.711,00	$ 1.034.303,04	8,64				2,16	3,60	1,44	1,44	8,64	$ 1.034.303,04			0,00	$ -	8,6	0,00	$ 1.034.303,04	100%
3,20	Pozo de inspección de H=1,50 a H=2,0 MTS	und	2,00	$ 3.784.253,00	$ 7.568.506,00	2,00				1,00		1,00		2,00	$ 7.568.506,00			0,00	$ -	2,0	0,00	$ 7.568.506,00	100%
3,30	Caja de inspección sanitaria	und	24,00	$ 573.939,00	$ 13.774.536,00	24,00				6,00	10,00	4,00	4,00	24,00	$ 13.774.536,00			0,00	$ -	24,0	0,00	$ 13.774.536,00	100%
4	**REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO**				**$ 28.071.508,14**										$ 33.600.470,51				$ -			$ 33.600.470,51	$ 25.846.516,00
4.1	Extracción de redes domiciliarias existentes	ml	265,00	$ 11.019,00	$ 2.920.035,00	252,99			37,00	62,20	76,00	58,80	19	252,99	$ 2.787.696,81			0,00	$ -	253,0	-12,01	$ 2.787.696,81	95%
4.2	Colchón de arena	m³	66,66	$ 118.029,00	$ 7.867.813,14	48,93			8,41	11,44	12,77	16,31		48,93	$ 5.775.158,97			0,00	$ -	48,9	-17,73	$ 5.775.158,97	73%
4.3	Suministro e instalación de tubería PVC 8"	ml	108,00	$ 94.385,00	$ 10.193.580,00	108,00			37,00	37,00	34,00			108,00	$ 10.193.580,00			0,00	$ -	108,0	0,00	$ 10.193.580,00	100%
4.4	Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC 6"	ml	96,00	$ 73.855,00	$ 7.090.080,00	96,00				25,20	42,00	28,80		96,00	$ 7.090.080,00			0,00	$ -	96,0	0,00	$ 7.090.080,00	100%
	Item no previstos				**$ 16.570.654,07**										$ 16.815.619,01				$ -			$ 16.815.619,01	$ 9.919.839,00
NP01	suministro e instalacion de SILLA YEE 8" a 6"	und	24,00	$ 286.360,00	$ 6.872.640,00	24,0				6,00	10,00	8,00		24,00	$ 6.872.640,00			0,00	$ -	24,0	0,00	$ 6.872.640,00	100%
NP02	Concreto de 3000 PSI para reposición de vías	m³	9,132	$ 731.796,00	$ 6.682.761,07	4,16						4,16		4,16	$ 3.047.198,54			0,00	$ -	4,2	-4,97	$ 3.047.198,54	46%
NP03	nivelacion de pozo existente; incluye intacion de anobase y tapa	und	1,00	$ 3.015.253,00	$ 3.015.253,00	1,0					1,00			1,00	$ 3.015.253,00			0,00	$ -	1,0	0,00	$ 3.015.253,00	100%

COSTO DIRECTO DE OBRA (INCLUYE AIU)		$ 113.622.693,21	
ADMINISTRACION	24,50%	$ 27.837.560,00	
IMPREVISTOS	0,5%	$ 568.113,00	
UTILIDAD	5%	$ 5.681.135,00	
VALOR TOTAL		$ 147.709.501,00	

COSTO DIRECTO DE OBRA (INCLUYE AIU)	$	132.938.539,64
ADMINISTRACION	24,50%	$ 32.569.942,21
IMPREVISTOS	0,50%	$ 664.692,70
UTILIDAD	5%	$ 6.646.926,98
TOTAL	$	132.938.539,64

JOSE JULIAN ROJAS NUMA
R/L RN INGENIERIA S.A.S.

RN Ingeniería S.A.S	INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA	VERSIÓN:
	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	25/06/2025

CONTRATISTA DE OBRA: RN INGENIERIAS S.A.S. CONTRATO No: No. SVIV SAMC 001 DE 2025
SUPERVISOR: OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA CONTRATO No: N/A

Semana Número: 1 Del: 15 de mayo de 2025 Al: 18 de mayo de 2025
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 3 Días
Tiempo restante para la finalización del contrato: 49 Días

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA 8A, CONECTANDO CON LA RED PRINCIPAL DE LA CALLE 13 EN EL BARRIO LAS MERCEDES PARTE BAJA, MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	0,736%	0,736%
Valor básico de la Obra programada:	$ 1.087.454,94	$ 1.087.454,94

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	1,21%	1,21%
Valor básico de la Obra Ejecutada:	$ 1.787.709,61	$ 1.787.709,61

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	RN INGENIERIAS S.A.S.
Contrato No.	No. SVIV SAMC 001 DE 2025
Valor Inicial:	99.847.092.00
Valor Actualizado:	$ 147.709.501,00
Plazo Inicial:	DOS (02) meses
Plazo Actualizado:	DOS (02) meses
Fecha de Iniciación:	15 de mayo de 2025
Fecha de Vencimiento:	14 de julio de 2025

SUPERVISOR:

Supervisor	OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA
Contrato No.	N/A
Valor Inicial:	N/A
Valor Actualizado:	N/A
Plazo Inicial:	DOS (02) MESES
Plazo Actualizado:	DOS (02) MESES
Fecha de Iniciación:	15 de mayo de 2025
Fecha de Vencimiento:	14 de julio de 2025

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

localizacion y replanteo, demolicion de concreto, pavimento y/o andenes

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

demolicion de concreto, pavimento y/o andenes, retiro de escombros

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO


El equipo de trabajo se mantuvo comprometido con los estándares de seguridad y calidad establecidos, promoviendo un ambiente de trabajo seguro y eficiente.

OBSERVACIONES

Firma
Nombre ELIZABETH RINCON
ING RESIDENTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Descripción:
localizacion y replanteo





Descripción:
demolicion de concreto, pavimento y/o andenes

RN Ingeniería S.A.S	INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA	VERSIÓN:
	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	25/06/2025

CONTRATISTA DE OBRA: RN INGENIERIAS S.A.S. CONTRATO No: No. SVIV SAMC 001 DE 2025
SUPERVISOR: OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA CONTRATO No: N/A

Semana Número: 2 Del: 19 de mayo de 2025 Al: 25 de mayo de 2025
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 6 Días
Tiempo restante para la finalización del contrato: 43 Días

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA 8A, CONECTANDO CON LA RED PRINCIPAL DE LA CALLE 13 EN EL BARRIO LAS MERCEDES PARTE BAJA, MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	0,901%	1,637%
Valor básico de la Obra programada:	$ 1.330.674,56	$ 2.418.129,50

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	0,20%	1,41%
Valor básico de la Obra Ejecutada:	$ 299.706,11	$ 2.087.415,72

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	RN INGENIERIAS S.A.S.
Contrato No.	No. SVIV SAMC 001 DE 2025
Valor Inicial:	99.847.092.00
Valor Actualizado:	$ 147.709.501,00
Plazo Inicial:	DOS (02) meses
Plazo Actualizado:	DOS (02) meses
Fecha de Iniciación:	15 de mayo de 2025
Fecha de Vencimiento:	14 de julio de 2025

SUPERVISOR:

Supervisor	OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA
Contrato No.	N/A
Valor Inicial:	N/A
Valor Actualizado:	N/A
Plazo Inicial:	DOS (02) MESES
Plazo Actualizado:	DOS (02) MESES
Fecha de Iniciación:	15 de mayo de 2025
Fecha de Vencimiento:	14 de julio de 2025

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

demolicion de concreto, pavimento y/o andenes, retiro de escombros

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

demolicion de concreto, pavimento y/o andenes,excavacion manual, retiro de escobros, suministro e instalacion de recebo compactado, extraccion de redes domiciliarias existente, colchon de arena, suministro e instalacion de tuberia de 8" .

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El equipo de trabajo se mantuvo comprometido con los estándares de seguridad y calidad establecidos, promoviendo un ambiente de trabajo seguro y eficiente.

OBSERVACIONES

Firma
Nombre ELIZABETH RINCON
ING RESIDENTE


REGISTRO FOTOGRÁFICO





Descripción:
demolicion de concreto, pavimento y/o andenes





Descripción:
retiro de escombros

RN Ingeniería S.A.S	INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA	VERSIÓN:
	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	25/06/2025

CONTRATISTA DE OBRA: RN INGENIERIAS S.A.S. CONTRATO No: No. SVIV SAMC 001 DE 2025
SUPERVISOR: OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA CONTRATO No: N/A

Semana Número: 3 Del: 26 de mayo de 2025 Al: 1 de junio de 2025
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 6 Días
Tiempo restante para la finalización del contrato: 37 Días

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA 8A, CONECTANDO CON LA RED PRINCIPAL DE LA CALLE 13 EN EL BARRIO LAS MERCEDES PARTE BAJA, MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	9,423%	11,060%
Valor básico de la Obra programada:	$ 13.918.874,79	$ 16.337.004,29
Obra Física Ejecutada (%)	10,51%	11,92%
Valor básico de la Obra Ejecutada:	$ 15.518.098,74	$ 17.605.514,46

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	RN INGENIERIAS S.A.S.
Contrato No.	No. SVIV SAMC 001 DE 2025
Valor Inicial:	99.847.092.00
Valor Actualizado:	$ 147.709.501,00
Plazo Inicial:	DOS (02) meses
Plazo Actualizado:	DOS (02) meses
Fecha de Iniciación:	15 de mayo de 2025
Fecha de Vencimiento:	14 de julio de 2025

SUPERVISOR:

Supervisor	OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA
Contrato No.	N/A
Valor Inicial:	N/A
Valor Actualizado:	N/A
Plazo Inicial:	DOS (02) MESES
Plazo Actualizado:	DOS (02) MESES
Fecha de Iniciación:	15 de mayo de 2025
Fecha de Vencimiento:	14 de julio de 2025

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

demolicion de concreto, pavimento y/o andenes,excavacion manual, retiro de escobros, suministro e instalacion de recebo compactado, extraccion de redes domiciliarias existente, colchon de arena, suministro e instalacion de tuberia de 8" .

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

demolicion de concreto, pavimento y/o andenes,excavacion manual, retiro de escobros, suministro e instalacion de recebo compactado,reposicion andenes en concreto, pozo de inspeccion, caja de inspeccion sanitaria, extraccion de redes domiciliarias existente, colchon de arena, suministro e instalacion de tuberia de 8" y tuberia de tuberia 6", suministro e instalacion de silla yee 8" a 6" .

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El equipo de trabajo se mantuvo comprometido con los estándares de seguridad y calidad establecidos, promoviendo un ambiente de trabajo seguro y eficiente.

OBSERVACIONES

Firma
Nombre ELIZABETH RINCON
ING RESIDENTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Descripción: demolicion de concreto, pavimento y/o andenes





Descripción: excavacion manual





Descripción: retiro de escombros





Descripción: suministro e instalacion de recebo compactado

RN Ingeniería S.A.S	INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA	VERSIÓN:
	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	25/06/2025




Descripción:
extraccion de redes domiciliarias existente




Descripción:
colchon de arena




Descripción:
sumistro e instacion de tuberia PVC 8"

Descripción:

RN Ingeniería S.A.S	INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA	VERSIÓN:
	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	25/06/2025

CONTRATISTA DE OBRA: RN INGENIERIAS S.A.S. CONTRATO No: No. SVIV SAMC 001 DE 2025
SUPERVISOR: OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA CONTRATO No: N/A

Semana Número: 3 Del: 26 de mayo de 2025 Al: 1 de junio de 2025
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 6 Días
Tiempo restante para la finalización del contrato: 37 Días

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA 8A, CONECTANDO CON LA RED PRINCIPAL DE LA CALLE 13 EN EL BARRIO LAS MERCEDES PARTE BAJA, MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	9,423%	11,060%
Valor básico de la Obra programada:	$ 13.918.874,79	$ 16.337.004,29
Obra Física Ejecutada (%)	10,51%	11,92%
Valor básico de la Obra Ejecutada:	$ 15.518.098,74	$ 17.605.514,46

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	RN INGENIERIAS S.A.S.
Contrato No.	No. SVIV SAMC 001 DE 2025
Valor Inicial:	99.847.092.00
Valor Actualizado:	$ 147.709.501,00
Plazo Inicial:	DOS (02) meses
Plazo Actualizado:	DOS (02) meses
Fecha de Iniciación:	15 de mayo de 2025
Fecha de Vencimiento:	14 de julio de 2025

SUPERVISOR:

Supervisor	OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA
Contrato No.	N/A
Valor Inicial:	N/A
Valor Actualizado:	N/A
Plazo Inicial:	DOS (02) MESES
Plazo Actualizado:	DOS (02) MESES
Fecha de Iniciación:	15 de mayo de 2025
Fecha de Vencimiento:	14 de julio de 2025

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

demolicion de concreto, pavimento y/o andenes,excavacion manual, retiro de escobros, suministro e instalacion de recebo compactado, extraccion de redes domiciliarias existente, colchon de arena, suministro e instalacion de tuberia de 8" .

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

demolicion de concreto, pavimento y/o andenes,excavacion manual, retiro de escobros, suministro e instalacion de recebo compactado,reposicion andenes en concreto, pozo de inspeccion, caja de inspeccion sanitaria, extraccion de redes domiciliarias existente, colchon de arena, suministro e instalacion de tuberia de 8" y tuberia de tuberia 6", suministro e instalacion de silla yee 8" a 6" .

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El equipo de trabajo se mantuvo comprometido con los estándares de seguridad y calidad establecidos, promoviendo un ambiente de trabajo seguro y eficiente.

OBSERVACIONES

Firma
Nombre ELIZABETH RINCON
ING RESIDENTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Descripción:
demolicion de concreto, pavimento y/o andenes





Descripción:
excavacion manual





Descripción:
retiro de escombros





Descripción:
suministro e instalacion de recebo compactado

RN Ingeniería S.A.S	INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA	VERSIÓN:
	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	25/06/2025




Descripción:
extraccion de redes domiciliarias existente




Descripción:
colchon de arena




Descripción:
sumistro e instacion de tuberia PVC 8"

Descripción:

RN Ingeniería S.A.S	INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA	VERSIÓN:
	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	25/06/2025

CONTRATISTA DE OBRA: RN INGENIERIAS S.A.S. CONTRATO No: No. SVIV SAMC 001 DE 2025
SUPERVISOR: OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA CONTRATO No: N/A

Semana Número: 4 Del: 2 de junio de 2025 Al: 8 de junio de 2025
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 6 Días
Tiempo restante para la finalización del contrato: 31 Días

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA 8A, CONECTANDO CON LA RED PRINCIPAL DE LA CALLE 13 EN EL BARRIO LAS MERCEDES PARTE BAJA, MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	17,468%	28,528%
Valor básico de la Obra programada:	$ 25.801.896,78	$ 42.138.901,07

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	22,65%	34,57%
Valor básico de la Obra Ejecutada:	$ 33.459.266,39	$ 51.064.780,85

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	RN INGENIERIAS S.A.S.
Contrato No.	No. SVIV SAMC 001 DE 2025
Valor Inicial:	99.847.092.00
Valor Actualizado:	$ 147.709.501,00
Plazo Inicial:	DOS (02) meses
Plazo Actualizado:	DOS (02) meses
Fecha de Iniciación:	15 de mayo de 2025
Fecha de Vencimiento:	14 de julio de 2025

SUPERVISOR:

Supervisor	OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA
Contrato No.	N/A
Valor Inicial:	N/A
Valor Actualizado:	N/A
Plazo Inicial:	DOS (02) MESES
Plazo Actualizado:	DOS (02) MESES
Fecha de Iniciación:	15 de mayo de 2025
Fecha de Vencimiento:	14 de julio de 2025

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

demolicion de concreto, pavimento y/o andenes,excavacion manual, retiro de escobros, suministro e instalacion de recebo compactado,reposicion andenes en concreto, pozo de inspeccion, caja de inspeccion sanitaria, extraccion de redes domiciliarias existente, colchon de arena, suministro e instalacion de tuberia de 8" y tuberia de tuberia 6", suministro e instalacion de silla yee 8" a 6" .

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

demolicion de concreto, pavimento y/o andenes,excavacion manual, retiro de escobros, suministro e instalacion de recebo compactado,reposicion andenes en concreto, caja de inspeccion sanitaria, extraccion de redes domiciliarias existente, colchon de arena, suministro e instalacion de tuberia de 8" y tuberia de tuberia 6", suministro e instalacion de silla yee 8" a 6" , nivelacion de pozo, incluye instalacion de arobase y tapa.


RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El equipo de trabajo se mantuvo comprometido con los estándares de seguridad y calidad establecidos, promoviendo un ambiente de trabajo seguro y eficiente.

OBSERVACIONES

Firma
Nombre ELIZABETH RINCON
ING RESIDENTE


REGISTRO FOTOGRÁFICO

Descripción: demolicion de concreto, pavimento y/o andenes




Descripción: excavacion manual

Descripción: retiro de escombros

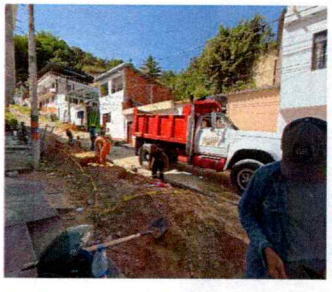


Descripción: suministro e instalacion de recebo compactado

RN Ingeniería S.A.S	INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA	VERSIÓN:
	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	25/06/2025




Descripción:
reposicion andenes en concreto




Descripción:
pozo de inspeccion




Descripción:
Cajas de inspeccion sanitarias




Descripción:
extraccion de redes domiciliarias existente




Descripción:
colchon de arena




Descripción:
sumistro e instacion de tuberia PVC 8"




Descripción:
sumistro e instacion de tuberia PVC 6"




Descripción:
suministro e instalacion de silla yee 8" a 6"

RN Ingeniería S.A.S	INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA	VERSIÓN:
	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	25/06/2025

CONTRATISTA DE OBRA: RN INGENIERIAS S.A.S. CONTRATO No: No. SVIV SAMC 001 DE 2025
SUPERVISOR: OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA CONTRATO No: N/A

Semana Número: 5 Del: 9 de junio de 2025 Al: 15 de junio de 2025
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 6 Días
Tiempo restante para la finalización del contrato: 25 Días

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA 8A, CONECTANDO CON LA RED PRINCIPAL DE LA CALLE 13 EN EL BARRIO LAS MERCEDES PARTE BAJA, MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	17,041%	45,569%
Valor básico de la Obra programada:	$ 25.170.880,94	$ 67.309.782,01

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	26,81%	61,38%
Valor básico de la Obra Ejecutada:	$ 39.601.649,84	$ 90.666.430,69

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	RN INGENIERIAS S.A.S.
Contrato No.	No. SVIV SAMC 001 DE 2025
Valor Inicial:	99.847.092.00
Valor Actualizado:	$ 147.709.501,00
Plazo Inicial:	DOS (02) meses
Plazo Actualizado:	DOS (02) meses
Fecha de Iniciación:	15 de mayo de 2025
Fecha de Vencimiento:	14 de julio de 2025

SUPERVISOR:

Supervisor	OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA
Contrato No.	N/A
Valor Inicial:	N/A
Valor Actualizado:	N/A
Plazo Inicial:	DOS (02) MESES
Plazo Actualizado:	DOS (02) MESES
Fecha de Iniciación:	15 de mayo de 2025
Fecha de Vencimiento:	14 de julio de 2025

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

demolicion de concreto, pavimento y/o andenes,excavacion manual, retiro de escobros, suministro e instalacion de recebo compactado,reposicion andenes en concreto, caja de inspeccion sanitaria, extraccion de redes domiciliarias existente, colchon de arena, suministro e instalacion de tuberia de 8" y tuberia de tuberia 6", suministro e instalacion de silla yee 8" a 6" , nivelacion de pozo, incluye instalacion de arobase y tapa.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

excavacion manual, retiro de escobros, suministro e instalacion de recebo compactado,reposicion andenes en concreto, pozo de inspeccion, caja de inspeccion sanitaria, extraccion de redes domiciliarias existente, colchon de arena, suministro e instalacion de tuberia de 8" y tuberia de tuberia 6", suministro e instalacion de silla yee 8" a 6" , concreto de 300 PSI para reposicion de vias.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El equipo de trabajo se mantuvo comprometido con los estándares de seguridad y calidad establecidos, promoviendo un ambiente de trabajo seguro y eficiente.

OBSERVACIONES

Firma
Nombre ELIZABETH RINCON
ING RESIDENTE



REGISTRO FOTOGRÁFICO




Descripción: demolicion de concreto, pavimento y/o andenes




Descripción: excavacion manual

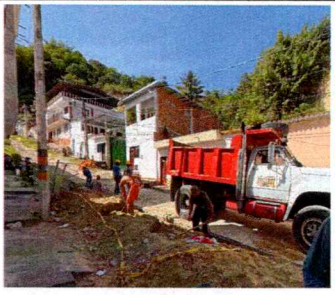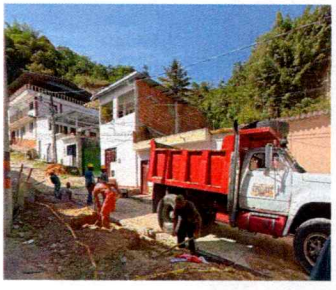Descripción: retiro de escombros




Descripción: suministro e instalacion de recebo compactado

RN Ingeniería S.A.S	INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA	VERSIÓN:
	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	25/06/2025




Descripción:
reposicion andenes en concreto




Descripción:
Cajas de inspeccion sanitarias




Descripción:
extraccion de redes domiciliarias existente




Descripción:
colchon de arena




Descripción:
sumistro e instacion de tuberia PVC 8"




Descripción:
sumistro e instacion de tuberia PVC 6"




Descripción:
suministro e instalacion de silla yee 8" a 6"




Descripción:
nivelacion de pozo, incluye instalacion de arobase y tapa

RN Ingeniería S.A.S	INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA	VERSIÓN:
	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	25/06/2025

CONTRATISTA DE OBRA: RN INGENIERIAS S.A.S. CONTRATO No: No. SVIV SAMC 001 DE 2025
SUPERVISOR: OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA CONTRATO No: N/A

Semana Número: 6 Del: 16 de junio de 2025 Al: 22 de junio de 2025
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 6 Días
Tiempo restante para la finalización del contrato: 19 Días

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA 8A, CONECTANDO CON LA RED PRINCIPAL DE LA CALLE 13 EN EL BARRIO LAS MERCEDES PARTE BAJA, MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	19,176%	64,745%
Valor básico de la Obra programada:	$ 28.324.912,51	$ 95.634.694,51
Obra Física Ejecutada (%)	21,99%	83,37%
Valor básico de la Obra Ejecutada:	$ 32.482.404,91	$ 123.148.835,59

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	RN INGENIERIAS S.A.S.
Contrato No.	No. SVIV SAMC 001 DE 2025
Valor Inicial:	99.847.092.00
Valor Actualizado:	$ 147.709.501,00
Plazo Inicial:	DOS (02) meses
Plazo Actualizado:	DOS (02) meses
Fecha de Iniciación:	15 de mayo de 2025
Fecha de Vencimiento:	14 de julio de 2025

SUPERVISOR:

Supervisor	OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA
Contrato No.	N/A
Valor Inicial:	N/A
Valor Actualizado:	N/A
Plazo Inicial:	DOS (02) MESES
Plazo Actualizado:	DOS (02) MESES
Fecha de Iniciación:	15 de mayo de 2025
Fecha de Vencimiento:	14 de julio de 2025

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

excavacion manual, retiro de escobros, suministro e instalacion de recebo compactado,reposicion andenes en concreto, pozo de inspeccion, caja de inspeccion sanitaria, extraccion de redes domiciliarias existente, colchon de arena, suministro e instalacion de tuberia de 8" y tuberia de tuberia 6", suministro e instalacion de silla yee 8" a 6" , concreto de 300 PSI para reposicion de vias.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

demolicion de concreto, pavimento y/o andenes, excavacion manual, retiro de escobros, suministro e instalacion de recebo compactado,reposicion andenes en concreto, caja de inspeccion sanitaria, extraccion de redes domiciliarias existente, colchon de arena, suministro e instalacion de tuberia de 8" y tuberia de tuberia 6", suministro e instalacion de silla yee 8" a 6" , concreto de 300 PSI para reposicion de vias.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El equipo de trabajo se mantuvo comprometido con los estándares de seguridad y calidad establecidos, promoviendo un ambiente de trabajo seguro y eficiente.

OBSERVACIONES

Firma
Nombre ELIZABETH RINCON
ING RESIDENTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO




Descripción: excavacion manual




Descripción: retiro de escombros





Descripción: suministro e instalacion de recebo compactado




Descripción: reposicion andenes en concreto

RN Ingeniería S.A.S	INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA	VERSIÓN:
	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	25/06/2025

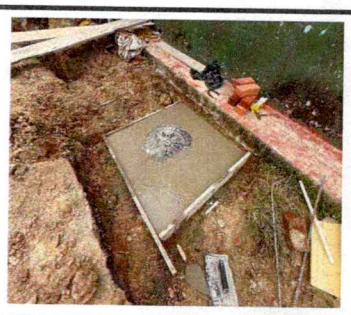
Descripción:
pozo de inspeccion




Descripción:
Cajas de inspeccion sanitarias




Descripción:
extraccion de redes domiciliarias existente

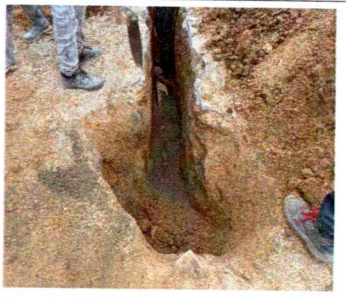

Descripción:
colchon de arena




Descripción:
sumistro e instacion de tuberia PVC 6"




Descripción:
suministro e instalacion de silla yee 8" a 6"




Descripción:
concreto de 300 PSI para reposicion de vias

Descripción:

RN Ingeniería S.A.S	INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA	VERSIÓN:
	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	25/06/2025

CONTRATISTA DE OBRA: RN INGENIERIAS S.A.S. CONTRATO No: No. SVIV SAMC 001 DE 2025
SUPERVISOR: OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA CONTRATO No: N/A

Semana Número: 7 Del: 23 de junio de 2025 Al: 29 de junio de 2025
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 6 Días
Tiempo restante para la finalización del contrato: 13 Días

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA 8A, CONECTANDO CON LA RED PRINCIPAL DE LA CALLE 13 EN EL BARRIO LAS MERCEDES PARTE BAJA, MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	15,672%	80,417%
Valor básico de la Obra programada:	$ 23.148.695,55	$ 118.783.390,06
Obra Física Ejecutada (%)	6,63%	90,00%
Valor básico de la Obra Ejecutada:	$ 9.789.847,29	$ 132.938.539,64

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	RN INGENIERIAS S.A.S.
Contrato No.	No. SVIV SAMC 001 DE 2025
Valor Inicial:	99.847.092.00
Valor Actualizado:	$ 147.709.501,00
Plazo Inicial:	DOS (02) meses
Plazo Actualizado:	DOS (02) meses
Fecha de Iniciación:	15 de mayo de 2025
Fecha de Vencimiento:	14 de julio de 2025

SUPERVISOR:

Supervisor	OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA
Contrato No.	N/A
Valor Inicial:	N/A
Valor Actualizado:	N/A
Plazo Inicial:	DOS (02) MESES
Plazo Actualizado:	DOS (02) MESES
Fecha de Iniciación:	15 de mayo de 2025
Fecha de Vencimiento:	14 de julio de 2025

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

demolicion de concreto, pavimento y/o andenes, excavacion manual, retiro de escobros, suministro e instalacion de recebo compactado,reposicion andenes en concreto, caja de inspeccion sanitaria, extraccion de redes domiciliarias existente, colchon de arena, suministro e instalacion de tuberia de 8" y tuberia de tuberia 6", suministro e instalacion de silla yee 8" a 6" , concreto de 300 PSI para reposicion de vias.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

excavacion manual, retiro de escobros, suministro e instalacion de recebo compactado,reposicion andenes en concreto, caja de inspeccion sanitaria, extraccion de redes domiciliarias existente, colchon de arena, suministro e instalacion de tuberia de 8" y tuberia de tuberia 6", concreto de 300 PSI para reposicion de vias.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El equipo de trabajo se mantuvo comprometido con los estándares de seguridad y calidad establecidos, promoviendo un ambiente de trabajo seguro y eficiente.

OBSERVACIONES

Firma
Nombre ELIZABETH RINCON
ING RESIDENTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Descripción: demolicion de concreto, pavimento y/o andenes





Descripción: excavacion manual





Descripción: reposicion andenes en concreto





Descripción: Cajas de inspeccion sanitarias

RN Ingeniería S.A.S	INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA	VERSIÓN:
	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	25/06/2025





Descripción:	Descripción:
extraccion de redes domiciliarias existente	

3.3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Durante el mes de mayo y junio, se adelantaron actividades relacionadas con el sistema de alcantarillado , consiguiendo con esto un avance de 90%.

- **ACTIVIDADES PRELIMINARES**

➢ **Localización y replanteo**




➢ **Demolición de concreto, pavimento y/o andenes**

Se realizo la demolición de pavimentos rígido y andenes





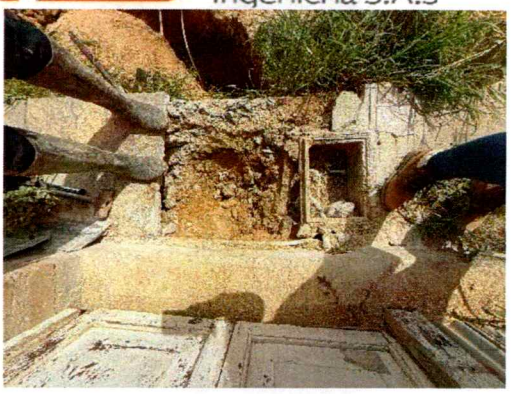

- **MOVIMIENTOS DE TIERRAS**

  - **Excavación manual**

  Se realizo la excavación en material común.









➢ **Retiro de escombros**

Se realizo el retiro del material.





➢ **Suministro e instalación de recebo compactado**







- **ESTRUCTURAS**
  - **Reposición andenes en concreto**

Se realizo la reposición de andenes.






  - **Pozo de inspección de H:1.50 a H:2.00 mts**

Se realizo la excavación, mampostería y fundida de concreto para asegurar tapa del pozo.







- **Caja de inspección sanitaria**

Se realizo la excavación, suministro de mampostería empañetada, piso, tapa, suministro de receba






RN
Ingeniería S.A.S





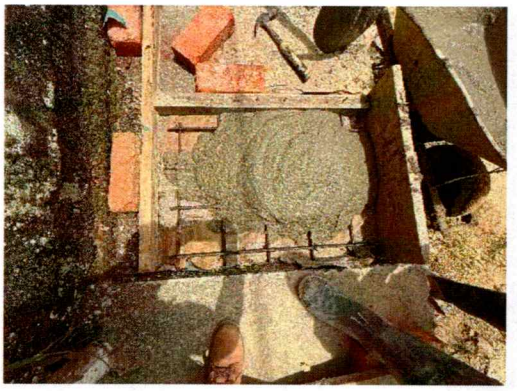





- **REPOSICION DE REDES DE LACANTARILLADO**
  - extraccion de redes domiciliarias existentes







- **Colchón de arena**
  Se realizo el suministro e instalación del colchon de arena





- **Suministro e instalación de tubería PVC 8"**

  Se realizo el suministro e instalación de tubería de pvc 8" para red principal del alcantarillado





- **Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC 6"**





3.4. SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTO

Durante el periodo se solicitó la inclusión de ítem no previstos

- NP01. suministro e instalación de SILLA YEE 8" a 6





- Concreto de 3000 PSI para reposición de vías





- nivelación de pozo existente; incluye instalación de arobase y tapa





JOSE JULIAN ROJAS NUMA
REPRESENTATE LEGAL
