FECHA			CONSORCIO VR RUU
1	AGOSTO	2025	
DD	MM	AA	NIT. 901.903 181-9

CONTRATO N° CDP 748-2024

CONTRATO N° 748-2024

ACTA DE RECIBO PARCIAL

"EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PÚBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."

CONTRATISTA: CONSORCIO VR RUU

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERVIAS ARM 2024

ACTA GENERAL DE OBRAS

En Bogotá D.C ; a los 1 días del mes de agosto de 2025 , se reunieron FARLEY ANDREA LARRARTE BARRERA Representante Legal del Contratista , JUAN PABLO LEMUS ACEVEDO Representante legal de la Interventoria , para dejar constancia por medio de la presente acta del cobro parcial de obra y/o modificaciones del mes del 1 JULIO 2025 AL 31 DE JULIO DE 2025, según condiciones que se detallan a continuación

MP-23		MODELACION DE PAVIMENTOS PARA REHABILITACION O RECONSTRUCCION DE VIAS Y ESPACIO PUBLICO (INCLUYE PROCESAMIENTO, EVALUACIÓN Y ENTREGA DE LA INFORMACIÓN) no incluye via,		$ 13.021,80		1979,34	$ 25.657.373,00		934,76	$ 12.172.256,00		$ 37.829.631,80
		IVA	19,00%				$ 4.874.901,00			$ 2.312.729,00		$ 7.187.630,00
		TOTAL MODELACION DE PAVIMENTOS					$ 30.532.274,00			$ 14.484.987,00		$ 45.017.261,80
		TOTAL OBRA					$ 2.215.744.745,00			$ 1.025.408.366,00		$ 3.359.183.641,00
		TOTAL ACTA NUMERO 3					$ 2.215.744.745,00			$ 1.025.408.366,00		$ 3.359.183.641,00

RESUMEN DEL CONTRATO

V/R INICIAL CONTRATO	$ 6.117.748.360,00
V/R ANTICIPO	N/A
V/R ADICION	N/A
V/R ACTUAL	$ 2.215.744.745,00
V/R PRESENTE ACTA	Dos mil ciento quince millones setecientos cuarenta y cuatro mil setecientos cuarenta y cinco pesos M/cte

No	DESCRIPCION	FECHA DEL ACTA	VALOR FACTURADO	% PAGADO	RETENCION GARANTIA	AMORTIZACION ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGO ACUMULADO
1	ACTA PARCIAL N° 1	1-jun-25	$ 114.030.530,00	1,20%	$ -	$ -	$ -	$ 114.030.530,00	$ 9.351.789.830,00	1,20%
2	ACTA PARCIAL N° 2	1-jul-25	$ 2.215.744.745,00	23,41%	$ -	$ -	$ -	$ 2.215.744.745,00	$ 7.136.045.085,00	24,61%
	ADICION 1 MAS SALDO POR PAGAR								$ 7.136.045.085,00	
3	ACTA PARCIAL N° 3	1-ago-25	$ 1.025.408.366,00	10,83%	$ -	$ -	$ -	$ 1.025.408.366,00	$ 6.110.636.719,00	35,45%
4				0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.110.636.719,00	35,45%
5				0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.110.636.719,00	35,45%
6				0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.110.636.719,00	35,45%
7				0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.110.636.719,00	35,45%
8				0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.110.636.719,00	35,45%

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos,a los

Proyecto (1) Agosto 2025

FARLEY ANDREA LARRARTE BARRERA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
CONSORCIO VR RUU

DIANA CAROLINA SANCHEZ CASTILLO
ALCALDESA LOCAL
LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE

JUAN PABLO LEMUS ACEVEDO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA
CONSORCIO INTERVIAS ARM 2024

CONSORCIO VR RUU	PRE-ACTA DE OBRA	FR-OB-19
CONTRATISTA		VERSION 0
		1 de 1

CONTRATO Nº 748-2024	"EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PÚBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Nº 2

ITEM:	1001	DESCRIPCIÓN:	REPLANTEO GENERAL

FECHA DE CORTE:	31-jul-25	MES DE EJECUCION Y AÑO:						
CIV	**CANTIDAD**	**UNIDAD**						
18003126	192,00	M2						
18003182		M2						
18004026		M2						
18005026		M2						
18005042		M2						
18005057	192,00	M2						
18000313		M2						
18003163	416,00	M2						
18003250		M2						
18002962		M2						
18005161		M2						
TOTAL ACTA 3	800,00	M2						
	TOTAL							**800,00**

Ing. Carlos Mauricio Castillo
Consorcio VR RUU
Residente de Obra

Ing. Juan Pablo Lemus
Consorcio Inter Vias ARM 24
Residente de Interventoria

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

CONTRATO No 748 (Número de Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PÚBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."

(Incluya el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 3 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/07/2025 **HASTA** 31/07/2025

ÍTEM N° 1001 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM REPLANTEO GENERAL

CONTRATISTA CONSORCIO VR RUU

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO INTER VIAS ARM 24


(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

CIV 18003126

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el FDLRUU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ACTA 3					
REPLANTEO VIA					
REPLANTEO GENERAL					
K0+000,00					
K0+030,00	30,00	4,00			120,00
REPLANTEO EP					
REPLANTEO GENERAL					
K0+000,00					
K0+030,00	30,00	1,20			36,00
REPLANTEO EP					
REPLANTEO GENERAL					
K0+000,00					
K0+030,00	30,00	1,20			36,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					192,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					192,00

PLANO / ESQUEMA - CIV: 18003126

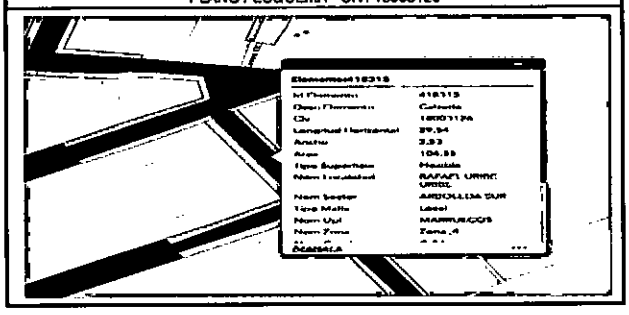

FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Carlos Mauricio Castillo
Residente de Obra

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Juan Pablo Lemus
Residente de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del proceso.

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

CONTRATO No 748 (Número de Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PÚBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 3 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/07/2025 **HASTA** 31/07/2025

ÍTEM N° 1001 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM REPLANTEO GENERAL


CONTRATISTA CONSORCIO VR RUU (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO INTER VIAS ARM 24 (Escriba el nombre o razón social del interventor)

CIV 18005057 (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el FDLRUU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ACTA 3					
REPLANTEO VIA					
REPLANTEO GENERAL					
K0+000,00					
K0+032,00	32,00	6,00			192,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					192,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					192,00

PLANO / ESQUEMA - CIV: 18005057

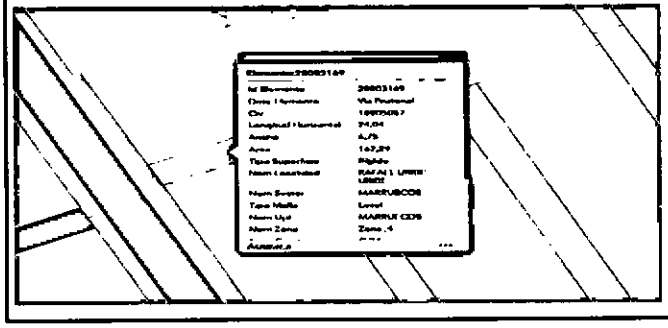

FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Carlos Mauricio Castillo
Residente de Obra

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Juan Pablo Lemus
Residente de Interventoria

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

CONTRATO No 748 (Número de Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PÚBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 3 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/07/2025 **HASTA** 31/07/2025

ÍTEM N° 1001 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM REPLANTEO GENERAL


CONTRATISTA CONSORCIO VR RUU (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO INTER VIAS ARM 24 (Escriba el nombre o razón social del interventor)


CIV 18003163 (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el FDLRUU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ACTA 3					
REPLANTEO VIA					
REPLANTEO GENERAL					
K0+000,00					
K0+065,00	65,00	3,40			221,00
REPLANTEO EP					
REPLANTEO GENERAL					
K0+000,00					
K0+065,00	65,00	1,50			97,50
REPLANTEO EP					
REPLANTEO GENERAL					
K0+000,00					
K0+065,00	65,00	1,50			97,50
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					416,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					416,00

PLANO / ESQUEMA - CIV: 18003163

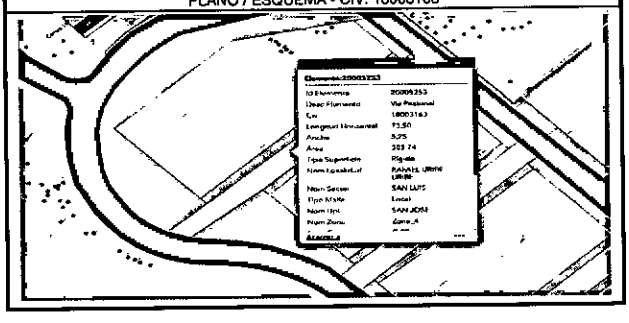

FOTOGRAFÍA

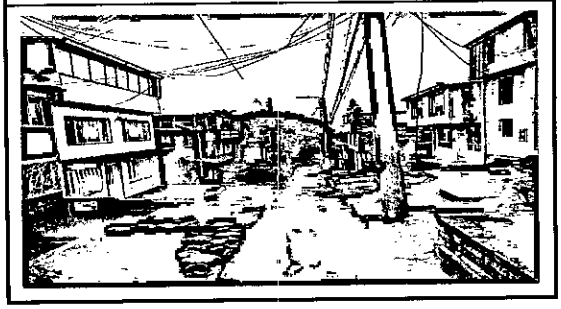

OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Carlos Mauricio Castillo
Residente de Obra

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Juan Pablo Lemus
Residente de Interventoria

Original : Interventor
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

CONSORCIO VR RUU	PRE-ACTA DE OBRA	FR-OB-19
CONTRATISTA		VERSION 0
		1 de 1

CONTRATO Nº 748-2024	"EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PÚBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Nº 2

ITEM:	1002	DESCRIPCIÓN:	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

FECHA DE CORTE:	31-jul-25	MES DE EJECUCION Y AÑO:						
CIV	**CANTIDAD**	**UNIDAD**						
18003126	72,00	M2						
18003182		M2						
18004026		M2						
18005026		M2						
18005042		M2						
18005057		M2						
18000313		M2						
18003163	221,00	M2						
18003250		M2						
18002962		M2						
18005161		M2						
TOTAL ACTA 3	293,00	M2						
		TOTAL						**293,00**

Ing. Carlos Mauricio Castillo
Consorcio VR RUU
Residente de Obra

Ing. Juan Pablo Lemus
Consorcio Inter Vias ARM 24
Residente de Interventoria

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

CONTRATO No 748 (Número de Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PÚBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 3 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/07/2025 **HASTA** 31/07/2025

ÍTEM N° 1002 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

CONTRATISTA CONSORCIO VR RUU

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO INTER VIAS ARM 24


(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

CIV 18003126


(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el FDLRUU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ACTA 3					
REPLANTEO EP					
DEMOLICION PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE)					
K0+000,00					
K0+030,00	30,00	1,20			36,00
REPLANTEO EP					
DEMOLICION PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE)					
K0+000,00					
K0+030,00	30,00	1,20			36,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					72,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					72,00

PLANO / ESQUEMA - CIV: 18003126

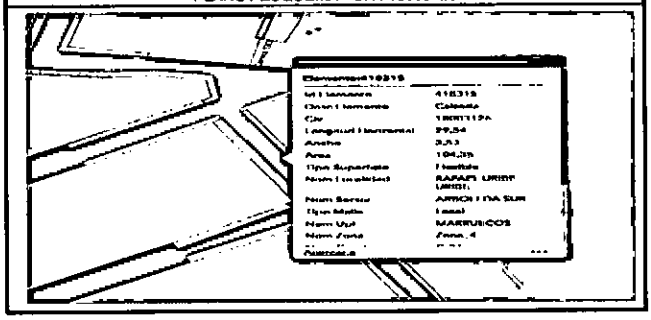

FOTOGRAFÍA

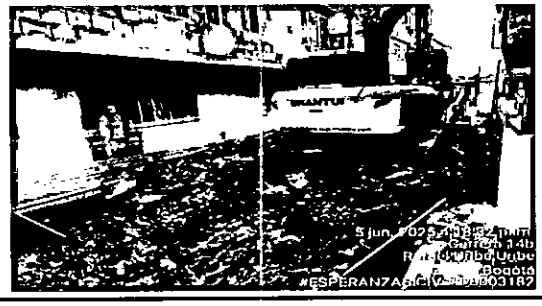

OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Carlos Mauricio Castillo
Residente de Obra

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Juan Pablo Lemus
Residente de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

CONTRATO No 748 (Numero de Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PÚBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 3 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/07/2025 **HASTA** 31/07/2025

ÍTEM N° 1002 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.


CONTRATISTA CONSORCIO VR RUU (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO INTER VIAS ARM 24 (Escriba el nombre o razón social del interventor)

CIV **18003163** (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el FDLRUU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ACTA 3					
REPLANTEO EP					
DEMOLICION PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE).					
K0+000,00					
K0+065,00	65,00	3,40			221,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					221,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					221,00

PLANO / ESQUEMA - CIV: 18003163

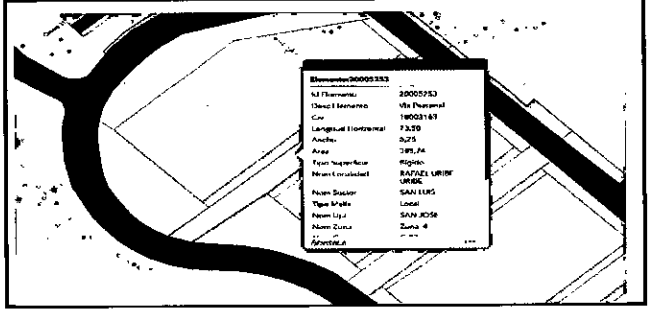

FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Carlos Mauricio Castillo
Residente de Obra

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Juan Pablo Lemus
Residente de Interventoria

Original : Interventor
1ra copia : Contratista
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

CONSORCIO VR RUU	PRE-ACTA DE OBRA	FR-OB-19
CONTRATISTA		VERSION 0
		1 de 1

CONTRATO Nº 748-2024	"EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PÚBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Nº 2

ITEM:	2001	DESCRIPCIÓN:	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)

FECHA DE CORTE:	31-jul-25	MES DE EJECUCION Y AÑO:

CIV	CANTIDAD	UNIDAD
18003126	115,80	M3
18003182		M3
18004026		M3
18005026	47,04	M3
18005042	60,48	M3
18005057	103,10	M3
18000313		M3
18003163	151,52	M3
18003250		M3
18002962		M3
18005161		M3
TOTAL ACTA 3	477,94	M3
	TOTAL	**477,94**

Ing. Carlos Mauricio Castillo
Consorcio VR RUU
Residente de Obra

Ing. Juan Pablo Lemus
Consorcio Inter Vias ARM 24
Residente de Interventoria

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES — SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No 748 (Número de Contrato) DE 2024 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PÚBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."

(Trabajo el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 1/07/2025 HASTA 31/07/2025

ÍTEM N° 2001 UNIDAD M3 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)

CONTRATISTA CONSORCIO VR RUU (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO INTER VIAS ARM 24 (Escriba el nombre o razón social del interventor)

CIV 18003126 (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el FDLRUU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ACTA 3					
EXCAVACION VIA PRIMERA CAPA					
EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)					
K0+000,00					
K0+030,00	30,00	4,00	0,06		7,20
EXCAVACION VIASEGUNDA CAPA					
EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)					
K0+000,00					
K0+030,00	30,00	4,00	0,15		18,00
EXCAVACION VIASEGUNDA CAPA					
EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)					
K0+000,00					
K0+030,00	30,00	4,00	0,05		6,00
EXCAVACION VIASEGUNDA CAPA ESTABILIZADO					
EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)					
K0+000,00					
K0+030,00	30,00	4,00	0,20		24,00
EXCAVACION VIASEGUNDA CAPA CONCRETO					
EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)					
K0+000,00					
K0+030,00	30,00	4,00	0,20		24,00
EXCAVACION TUBERIA					
EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)					
K0+000,00					
K0+030,00	30,00	1,20	1,10		39,60
DESCUENTO DE POZOS					
EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)					
K0+000,00					
K0+045,00	2,27		0,66	2,00	-3,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					115,80
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					115,80


FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA


DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

CONTRATO No 748 (Número de Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

PLANO / ESQUEMA - CIV: 18003126

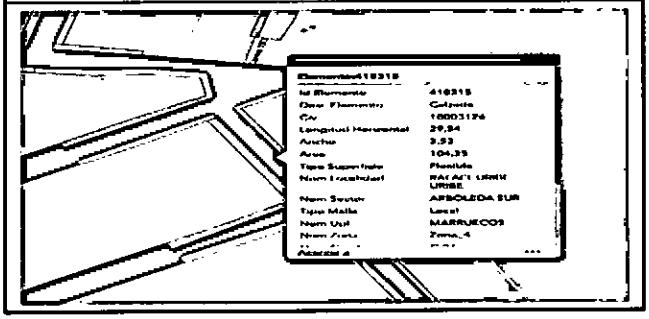

FOTOGRAFÍA

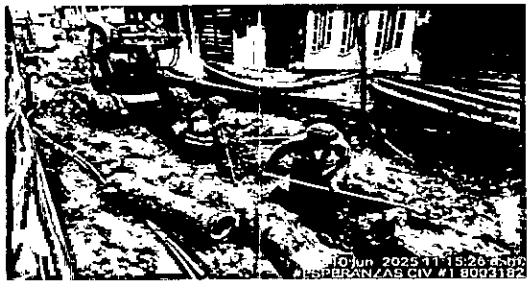

OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Carlos Mauricio Castillo
Residente de Obra

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Juan Pablo Lemus
Residente de Interventoría

Original : Interventor
1ra copia : Contratista
2da copia : Dependencia responsable del contrato

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA		
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

CONTRATO No 746 (Número de Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PUBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 3 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/07/2025 **HASTA** 31/07/2025

ÍTEM Nº 2001 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)

CONTRATISTA CONSORCIO VR RUU


INTERVENTOR CONSORCIO INTER VIAS ARM 24

CIV 18005026


(Escriba el número del Supervisor (a) designado (a) por el FDLRUU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ACTA 3					
EXCAVACION VIA PRIMERA CAPA					
EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)					
K0+000,00					
K0+028,00	28,00	1,20	1,40		47,04
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					47,04
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					89,90
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					136,94

PLANO / ESQUEMA - CIV: 18005026

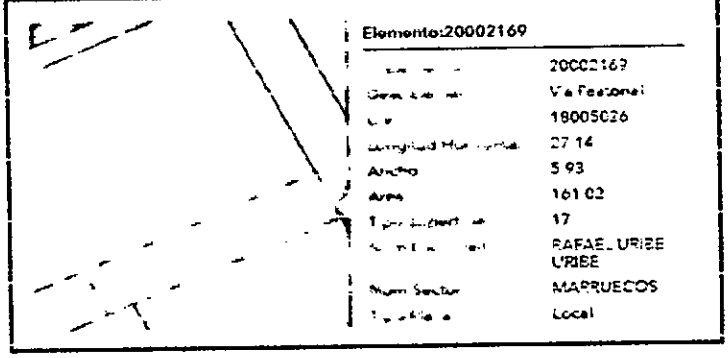

FOTOGRAFÍA

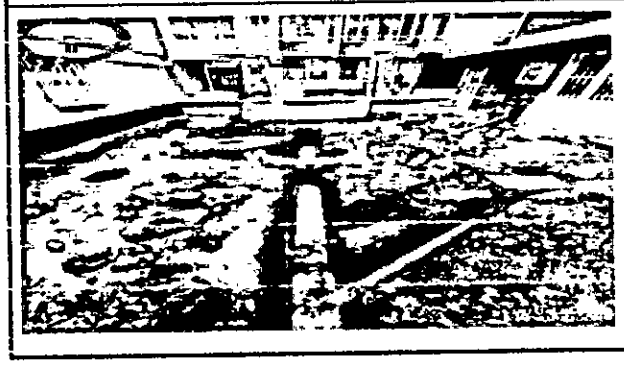

OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Carlos Mauricio Castillo
Residente de Obra

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Juan Pablo Lemus
Residente de Interventoria

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

CONTRATO No 748 (Número del Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PÚBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."

(Indique el objeto del contrato de ejecución inicialmente)

RECIBO PARCIAL No 3 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/07/2025 **HASTA** 31/07/2025

ÍTEM N° 2001 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)


CONTRATISTA CONSORCIO VR RUU (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO INTER VIAS ARM 24 (Escriba el nombre o razón social del interventor)

CIV 18005042 (Escriba el nombre del Supervisor (a) designado (a) por el IDU/RAA)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ACTA 3					
EXCAVACION VIA PRIMERA CAPA					
EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)					
K0+000,00					
K0+036,00	36,00	1,20	1,40		60,48
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					60,48
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					116,30
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					176,78

PLANO / ESQUEMA - CIV: 18005042

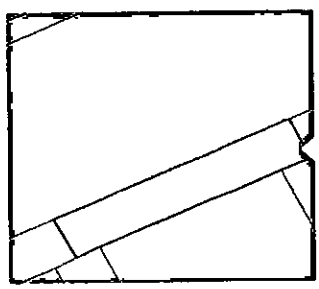

Id Elemento	20008545
Desc Elemento	Via Peatonal
Civ	18005042
Longitud Horizontal	35,69
Ancho	5,09
Area	181,44
Tipo Superficie	Rigido
Nom Localidad	RAFAEL URIBE URIBE
Nom Sector	MARRUECOS
Tipo Malla	Local
Nom Upl	MARRUECOS

FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Carlos Mauricio Castillo
Residente de Obra

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Juan Pablo Lemus
Residente de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

CONTRATO No 748 (Número de Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PÚBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."

(Indique el objeto del contrato de ejecución vigente)

RECIBO PARCIAL No 3 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/07/2025 **HASTA** 31/07/2025

ÍTEM N° 2001 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)

CONTRATISTA CONSORCIO VR RUU (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO INTER VIAS ARM 24 (Escriba el nombre o razón social del interventor)

CIV 18005057 (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el FDLRUU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ACTA 3					
EXCAVACION VIA PRIMERA CAPA					
EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)					
K0+000,00					
K0+032,00	32,00	6,00	0,05		9,60
EXCAVACION VIASEGUNDA CAPA					
EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)					
K0+000,00					
K0+032,00	32,00	6,00	0,15		28,80
EXCAVACION VIASEGUNDA CAPA					
EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)					
K0+000,00					
K0+032,00	32,00	6,00	0,05		9,60
EXCAVACION VIASEGUNDA CAPA ESTABILIZADO					
EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)					
K0+000,00					
K0+032,00	32,00	6,00	0,20		38,40
EXCAVACION VIASEGUNDA CAPA CONCRETO					
EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)					
K0+000,00					
K0+032,00	32,00	6,00	0,10		19,20
DESCUENTO DE POZOS					
EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)					
K0+000,00					
K0+032,00	2,27		0,55	2,00	-2,50
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					103,10
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					103,10

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA		
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** _____

CONTRATO No 748 (Número de Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

PLANO / ESQUEMA - CIV: 18005057

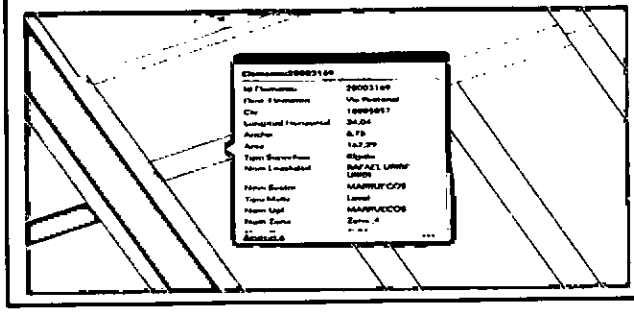

FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Carlos Mauricio Castillo
Residente de Obra

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Juan Pablo Lemus
Residente de Interventoria

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES — SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No 748 (Número de Contrato) DE 2024 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PÚBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."

(Incluye el objeto del otrosí de ejecución inusitado)

RECIBO PARCIAL No 3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 1/07/2025 HASTA 31/07/2025

ÍTEM N° 2001 UNIDAD M3 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)

CONTRATISTA CONSORCIO VR RUU (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO INTER VIAS ARM 24 (Escriba el nombre o razón social del interventor)

CIV 18003163 (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU/RUU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ACTA 3					
EXCAVACION VIA PRIMERA CAPA					
EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)					
K0+000,00					
K0+065,00	65,00	3,40	0,10		22,10
EXCAVACION VIASEGUNDA CAPA					
EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)					
K0+000,00					
K0+065,00	65,00	3,40	0,15		33,15
EXCAVACION VIASEGUNDA CAPA					
EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)					
K0+000,00					
K0+065,00	65,00	3,40	0,05		11,05
EXCAVACION VIASEGUNDA CAPA ESTABILIZADO					
EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)					
K0+000,00					
K0+065,00	65,00	3,40	0,20		44,20
EXCAVACION VIASEGUNDA CAPA CONCRETO					
EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)					
K0+000,00					
K0+065,00	65,00	3,40	0,20		44,20
DESCUENTO DE POZOS					
EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)					
K0+000,00					
K0+045,00	2,27		0,70	2,00	-3,18
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					151,52
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					151,52


FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** _____

CONTRATO No 748 (Número de Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

PLANO / ESQUEMA - CIV: 18003163

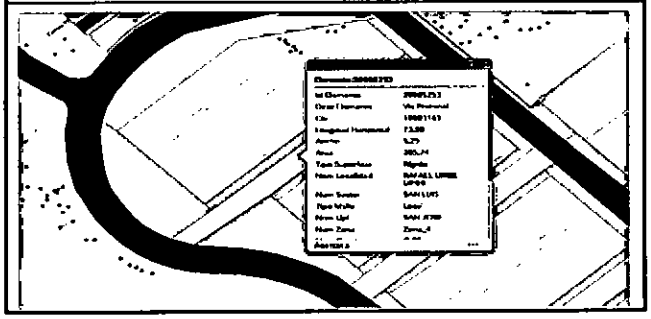

FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Carlos Mauricio Castillo
Residente de Obra

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Juan Pablo Lemus
Residente de Interventoria

Original : Interventor
1re copia : Contratista
2da copia : Dependencia responsable del contrato

CONSORCIO VR RUU CONTRATISTA	PRE-ACTA DE OBRA	FR-OB-19 VERSION 0 1 de 1

CONTRATO Nº 748-2024	"EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PÚBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Nº 2

ITEM:	2002	DESCRIPCIÓN:	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.

FECHA DE CORTE:	31-jul-25	MES DE EJECUCION Y AÑO:							
CIV	**CANTIDAD**	**UNIDAD**							
18003126	48,50	M3							
18003182		M3							
18004026		M3							
18005026	127,27	M3							
18005042	156,52	M3							
18005057		M3							
18000313		M3							
18003163		M3							
18003250		M3							
18002962		M3							
18005161		M3							
TOTAL ACTA 3	332,29	M3							
		TOTAL							**332,29**

Ing. Carlos Mauricio Castillo
Consorcio VR RUU
Residente de Obra

Ing. Juan Pablo Lemus
Consorcio Inter Vias ARM 24
Residente de Interventoria

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

CONTRATO No 748 (Número de Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PÚBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 3 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/07/2025 **HASTA** 31/07/2025

ÍTEM N° 2002 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.

CONTRATISTA CONSORCIO VR RUU

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO INTER VIAS ARM 24

(Escriba el nombre o razón social de interventor)

CIV 18003126

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU/RUU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ACTA 3					
DOMICILIARIACASA 1 SIN NOMENCLATURA					
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.					
K0+000,00					
K0+004,00	4,00	1,00	0,80		3,20
DOMICILIARIACASA 2 SIN NOMENCLATURA					
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.					
K0+000,00					
K0+004,00	4,00	1,00	0,80		3,20
DOMICILIARIACASA 3 SIN NOMENCLATURA					
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.					
K0+000,00					
K0+004,00	4,00	1,00	0,80		3,20
DOMICILIARIACASA 4 SIN NOMENCLATURA					
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.					
K0+000,00					
K0+004,00	4,00	1,00	0,80		3,20
DOMICILIARIACASA 5 13A-32					
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.					
K0+000,00					
K0+004,00	4,00	1,00	0,80		3,20
DOMICILIARIACASA 6 13A-07					
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.					
K0+000,00					
K0+004,00	4,00	1,00	0,80		3,20
DOMICILIARIACASA 6 13A-19					
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.					
K0+000,00					
K0+004,00	4,00	1,00	0,80		3,20
CAJA CASA 1 SIN NOMENCLATURA					
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.					
K0+000,00					
K0+004,00	1,00	1,00	1,50		1,50

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** _____

CONTRATO No 748 (Número de Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

CAJA CASA 2 SIN NOMENCLATURA					
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.					
K0+000,00					
K0+004,00	1,00	1,00	1,50		1,50
CAJACASA 3 SIN NOMENCLATURA					
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.					
K0+000,00					
K0+004,00	1,00	1,00	1,50		1,50
CAJACASA 4 SIN NOMENCLATURA					
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.					
K0+000,00					
K0+004,00	1,00	1,00	1,50		1,50
CAJACASA 5 13A-32					
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.					
K0+000,00					
K0+004,00	1,00	1,00	1,50		1,50
CAJACASA 6 13A-07					
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.					
K0+000,00					
K0+004,00	1,00	1,00	1,50		1,50
CAJACASA 6 13A-19					
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.					
K0+000,00					
K0+004,00	1,00	1,00	1,50		1,50
EXCAVACION SARDINEL					
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.					
K0+000,00					
K0+030,00	30,00	0,40	0,25		3,00
EXCAVACION SARDINEL					
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.					
K0+000,00					
K0+030,00	30,00	0,40	0,25		3,00
EXCAVACION ESPACIO PUBLICO					
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.					
K0+000,00					
K0+030,00	30,00	0,80	0,20		4,80
EXCAVACION ESPACIO PUBLICO					
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.					
K0+000,00					
K0+030,00	30,00	0,80	0,20		4,80
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					48,50
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					48,50


FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

CONTRATO No 748 (Número de Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

PLANO / ESQUEMA - CIV: 18003126

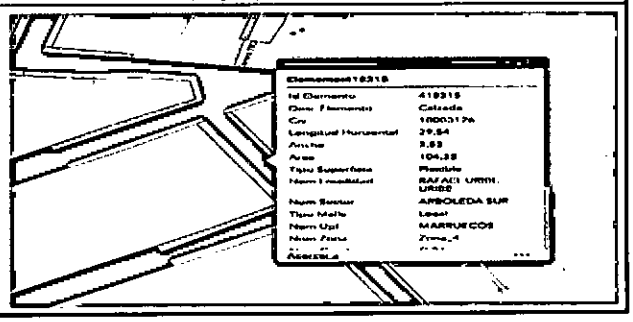

FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Carlos Mauricio Castillo
Residente de Obra

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Juan Pablo Lemus
Residente de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES — SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No 748 (Número de Contrato) DE 2024 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PÚBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."

(Indique el objeto del contrato de ejecución sucrito)

RECIBO PARCIAL No 3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 1/07/2025 HASTA 31/07/2025

ÍTEM N° 2002 UNIDAD M3 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.

CONTRATISTA CONSORCIO VR RUU

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO INTER VIAS ARM 24

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

CIV 18005026

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el FCULRJU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ACTA 3					
DOMICILIARIACASA 1					
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.					
K0+000,00					
K0+004,00	7,50	1,00	1,30		9,75
DOMICILIARIACASA 2					
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.					
K0+000,00					
K0+004,00	7,20	1,00	1,30		9,36
DOMICILIARIACASA 3					
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.					
K0+000,00					
K0+004,00	7,60	1,00	1,30		9,88
DOMICILIARIACASA 4					
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.					
K0+000,00					
K0+004,00	7,80	1,00	1,30		10,14
DOMICILIARIACASA 5					
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.					
K0+000,00					
K0+004,00	7,60	1,00	1,30		9,88
DOMICILIARIACASA 6					
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.					
K0+000,00					
K0+004,00	7,50	1,00	1,30		9,75
DOMICILIARIACASA 7					

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No 748 (Número de Contrato) DE 2024 (Año de suscripción)

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.					
K0+000,00					
K0+004,00	7,50	1,00	1,30		9,75
DOMICILIARIACASA 8					
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.					
K0+000,00					
K0+004,00	7,50	1,00	1,30		9,75
DOMICILIARIACASA 9					
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.					
K0+000,00					
K0+004,00	7,20	1,00	1,30		9,36
DOMICILIARIACASA 10					
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.					
K0+000,00					
K0+004,00	7,60	1,00	1,30		9,88
DOMICILIARIACASA 11					
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.					
K0+000,00					
K0+004,00	7,80	1,00	1,30		10,14
DOMICILIARIACASA 12					
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.					
K0+000,00					
K0+004,00	7,60	1,00	1,30		9,88
DOMICILIARIACASA 13					
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.					
K0+000,00					
K0+004,00	7,50	1,00	1,30		9,75
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					127,27
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					127,27


FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** _____

CONTRATO No 748 (Número de Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

PLANO / ESQUEMA - CIV: 18005026

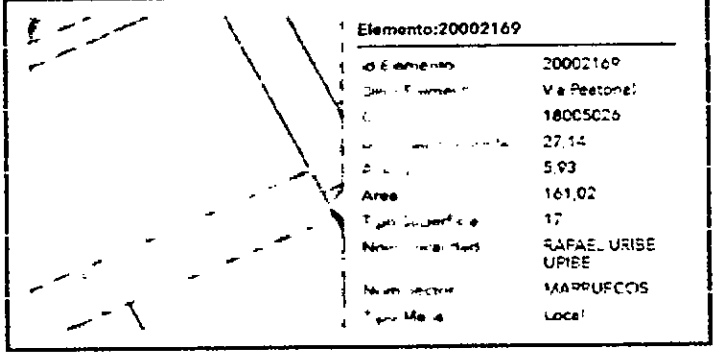

FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ	REVISÓ
(Firma)	(Firma)
(Nombre) Ing. Carlos Mauricio Castillo Residente de Obra	(Nombre) Ing. Juan Pablo Lemus Residente de Interventoria

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista
2da copia : Dependencia responsable del control.

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA		
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No 748 (Número de Contrato) DE 2024 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PÚBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 1/07/2025 HASTA 31/07/2025

ÍTEM N° 2002 UNIDAD M3 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.

CONTRATISTA CONSORCIO VR RUU

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO INTER VIAS ARM 24

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

CIV 18005042

(Escriba el nombre del Supervisor designado por la FDLRUU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ACTA 3					
DOMICILIARIACASA 1					
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.					
K0+000,00					
K0+004,00	7,50	1,00	1,30		9,75
DOMICILIARIACASA 2					
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.					
K0+000,00					
K0+004,00	7,20	1,00	1,30		9,36
DOMICILIARIACASA 3					
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.					
K0+000,00					
K0+004,00	7,60	1,00	1,30		9,88
DOMICILIARIACASA 4					
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.					
K0+000,00					
K0+004,00	7,80	1,00	1,30		10,14
DOMICILIARIACASA 5					
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.					
K0+000,00					
K0+004,00	7,60	1,00	1,30		9,88
DOMICILIARIACASA 6					
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.					
K0+000,00					
K0+004,00	7,50	1,00	1,30		9,75
DOMICILIARIACASA 7					
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.					
K0+000,00					
K0+004,00	7,50	1,00	1,30		9,75
DOMICILIARIACASA 8					
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.					
K0+000,00					
K0+004,00	7,50	1,00	1,30		9,75
DOMICILIARIACASA 9					
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.					
K0+000,00					
K0+004,00	7,20	1,00	1,30		9,36

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA		
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0


SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

CONTRATO No 748 (Número de Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)


DOMICILIARIACASA 10					
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.					
K0+000,00					
K0+004,00	7,60	1,00	1,30		9,88
DOMICILIARIACASA 11					
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.					
K0+000,00					
K0+004,00	7,80	1,00	1,30		10,14
DOMICILIARIACASA 12					
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.					
K0+000,00					
K0+004,00	7,60	1,00	1,30		9,88
DOMICILIARIACASA 13					
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.					
K0+000,00					
K0+004,00	7,50	1,00	1,30		9,75
DOMICILIARIACASA 14					
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.					
K0+000,00					
K0+004,00	7,50	1,00	1,30		9,75
DOMICILIARIACASA 15					
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.					
K0+000,00					
K0+004,00	7,50	1,00	1,30		9,75
DOMICILIARIACASA 16					
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.					
K0+000,00					
K0+004,00	7,50	1,00	1,30		9,75
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					156,52
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					156,52

PLANO / ESQUEMA - CIV: 18005042

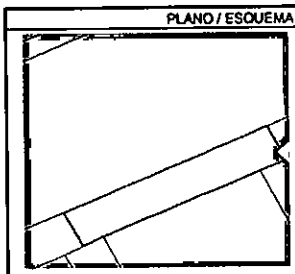

Id Elemento	20008545
Desc Elemento	Via Peatonal
Civ	18005042
Longitud Horizontal	35,69
Ancho	5,08
Area	181,44
Tipo Superficie	Rigido
Nom Localidad	RAFAEL URIBE URIBE
Nom Sector	MARRUECOS
Tipo Malla	Local
Nom Upl	MARRUECOS

FOTOGRAFÍA

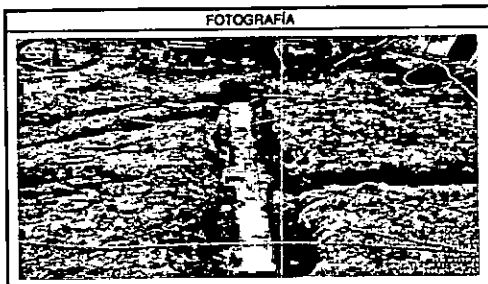

OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Carlos Mauricio Castillo
Residente de Obra

Original : 1 Interventor
1ra copia : 1 Contratista
2da copia : 1 Dependencia responsable del contrato

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Juan Pablo Lemus
Residente de Interventoría

CONSORCIO VR RUU	PRE-ACTA DE OBRA	FR-OB-19
CONTRATISTA		VERSION 0
		1 de 1

CONTRATO Nº 748-2024	"EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PÚBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Nº 2

ITEM:	2004	DESCRIPCIÓN:	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)

FECHA DE CORTE:	31-jul-25	MES DE EJECUCION Y AÑO:						
CIV	**CANTIDAD**	**UNIDAD**						
18003126	230,88	M3						
18003182		M3						
18004026		M3						
18005026	226,60	M3						
18005042	282,10	M3						
18005057	133,38	M3						
18000313		M3						
18003163	225,71	M3						
18003250		M3						
18002962		M3						
18005161		M3						
TOTAL ACTA 3	1098,67	M3						
	TOTAL							**1.098,67**

Ing. Carlos Mauricio Castillo
Consorcio VR RUU
Residente de Obra

Ing. Juan Pablo Lemus
Consorcio Inter Vias ARM 24
Residente de Interventoria

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

CONTRATO No 748 (Número de Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PUBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."

(Indique el objeto del contrato de ejecución inversión)

RECIBO PARCIAL No 3 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/07/2025 **HASTA** 31/07/2025

ÍTEM N° 2004 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)

CONTRATISTA CONSORCIO VR RUU

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO INTER VIAS ARM 24

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

CIV 18003126

(Escriba el nombre del Supervisor (a) designado (a) por el FOPLAUS

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ACTA 3					
REPLANTEO EP					
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO					
K0+000,00					
K0+030,00	30,00	1,20	0,10	1,30	4,68
REPLANTEO EP					
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO					
K0+000,00					
K0+030,00	30,00	1,20	0,10	1,30	4,68
EXCAVACION VIA PRIMERA CAPA					
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO					
K0+000,00					
K0+030,00	30,00	4,00	0,06	1,30	9,36
EXCAVACION VIASEGUNDA CAPA					
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO					
K0+000,00					
K0+030,00	30,00	4,00	0,15	1,30	23,40
EXCAVACION VIASEGUNDA CAPA					
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO					
K0+000,00					
K0+030,00	30,00	4,00	0,05	1,30	7,80
EXCAVACION VIASEGUNDA CAPA ESTABILIZADO					
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO					
K0+000,00					
K0+030,00	30,00	4,00	0,20	1,30	31,20
EXCAVACION VIASEGUNDA CAPA CONCRETO					
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO					
K0+000,00					
K0+030,00	30,00	4,00	0,20	1,30	31,20
EXCAVACION VIA					
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO					
K0+000,00					
K0+030,00	30,00	1,20	1,10	1,30	51,48
DESCUENTO DE POZOS					
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO					
K0+000,00					
K0+030,00	2,27		0,66	2,00	-3,90

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

CONTRATO No 748 (Número de Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

DOMICILIARIACASA 1 SIN NOMENCLATURA					
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO					
K0+000,00					
K0+004,00	4,00	1,00	0,80	1,30	4,16
DOMICILIARIACASA 2 SIN NOMENCLATURA					
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO					
K0+000,00					
K0+004,00	4,00	1,00	0,80	1,30	4,16
DOMICILIARIACASA 3 SIN NOMENCLATURA					
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO					
K0+000,00					
K0+004,00	4,00	1,00	0,80	1,30	4,16
DOMICILIARIACASA 4 SIN NOMENCLATURA					
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO					
K0+000,00					
K0+004,00	4,00	1,00	0,80	1,30	4,16
DOMICILIARIACASA 5 13A-32					
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO					
K0+000,00					
K0+004,00	4,00	1,00	0,80	1,30	4,16
DOMICILIARIACASA 6 13A-07					
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO					
K0+000,00					
K0+004,00	4,00	1,00	0,80	1,30	4,16
DOMICILIARIACASA 6 13A-19					
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO					
K0+000,00					
K0+004,00	1,00	1,00	1,50	1,30	1,95
CAJA CASA 1 SIN NOMENCLATURA					
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO					
K0+000,00					
K0+004,00	1,00	1,00	1,50	1,30	1,95
CAJA CASA 2 SIN NOMENCLATURA					
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO					
K0+000,00					
K0+004,00	1,00	1,00	1,50	1,30	1,95
CAJACASA 3 SIN NOMENCLATURA					
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO					
K0+000,00					
K0+004,00	1,00	1,00	1,50	1,30	1,95
CAJACASA 4 SIN NOMENCLATURA					
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO					
K0+000,00					
K0+004,00	1,00	1,00	1,50	1,30	1,95
CAJACASA 5 13A-32					
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO					
K0+000,00					
K0+004,00	1,00	1,00	1,50	1,30	1,95

FORMATO		
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA		
CÓDIGO: FO-EO-04	PROCESO: EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN: 1.0


SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**


CONTRATO No 748 (Número de Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

CAJACASA 6 13A-07					
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO					
K0+000,00					
K0+004,00	1,00	1,00	1,50	1,30	1,95
CAJACASA 6 13A-19					
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO					
K0+000,00					
K0+004,00	1,00	1,00	1,50	1,30	1,95
EXCAVACION SARDINEL					
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO					
K0+000,00					
K0+045,00	45,00	0,40	0,25	1,30	5,85
EXCAVACION SARDINEL					
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO					
K0+000,00					
K0+045,00	45,00	0,40	0,25	1,30	5,85
EXCAVACION ESPACIO PÚBLICO					
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO					
K0+000,00					
K0+045,00	45,00	0,80	0,20	1,30	9,36
EXCAVACION ESPACIO PÚBLICO					
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO					
K0+000,00					
K0+045,00	45,00	0,80	0,20	1,30	9,36
					230,88
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					0,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					230,88
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					

PLANO / ESQUEMA - CIV: 18003126

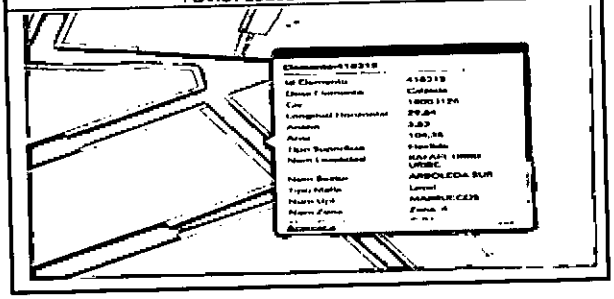

FOTOGRAFÍA

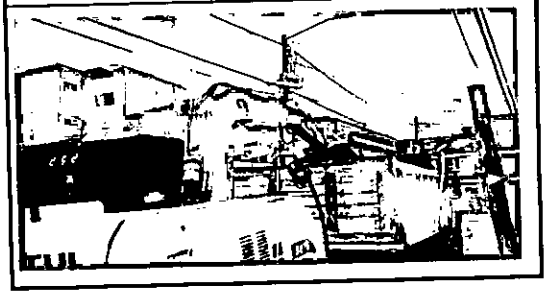

OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Carlos Mauricio Castillo
Residente de Obra

Original: Interventor
1ra copia: Contratista
2da copia: Dependencia responsable del control

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Juan Pablo Lemus
Residente de Interventoría

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES — SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No 749 (Número de Contrato) DE 2024 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO
"EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PÚBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."
(Indique el objeto del contrato de ejecución sucesiva)

RECIBO PARCIAL No 3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 1/07/2025 HASTA 31/07/2025

ÍTEM Nº 2004 UNIDAD M3 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)

CONTRATISTA CONSORCIO VR RUU (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO INTER VIAS ARM 24 (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

CIV 18005026 (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el FDLRUU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ACTA 3					
EXCAVACION VIA PRIMERA CAPA					
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO					
K0+000,00					
K0+028,00	28,00	1,20	1,40	1,30	61,15
DOMICILIARIACASA 1					
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO					
K0+000,00					
K0+004,00	7,50	1,00	1,30	1,30	12,68
DOMICILIARIACASA 2					
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO					
K0+000,00					
K0+004,00	7,20	1,00	1,30	1,30	12,17
DOMICILIARIACASA 3					
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)					
K0+000,00					
K0+004,00	7,60	1,00	1,30	1,30	12,84
DOMICILIARIACASA 4					
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)					
K0+000,00					
K0+004,00	7,80	1,00	1,30	1,30	13,18
DOMICILIARIACASA 5					
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)					
K0+000,00					
K0+004,00	7,60	1,00	1,30	1,30	12,84
DOMICILIARIACASA 6					
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)					

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES — SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No 748 (Número de Contrato) DE 2024 (Año de suscripción)

K0+000,00					
K0+004,00	7,50	1,00	1,30	1,30	12,68
DOMICILIARIACASA 7					
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)					
K0+000,00					
K0+004,00	7,50	1,00	1,30	1,30	12,68
DOMICILIARIACASA 8					
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO					
K0+000,00					
K0+004,00	7,50	1,00	1,30	1,30	12,68
DOMICILIARIACASA 9					
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO					
K0+000,00					
K0+004,00	7,20	1,00	1,30	1,30	12,17
DOMICILIARIACASA 10					
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)					
K0+000,00					
K0+004,00	7,60	1,00	1,30	1,30	12,84
DOMICILIARIACASA 11					
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)					
K0+000,00					
K0+004,00	7,80	1,00	1,30	1,30	13,18
DOMICILIARIACASA 12					
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)					
K0+000,00					
K0+004,00	7,60	1,00	1,30	1,30	12,84
DOMICILIARIACASA 13					
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)					
K0+000,00					
K0+004,00	7,60	1,00	1,30	1,30	12,68
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					226,60
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					116,22
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					342,83


FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

CONTRATO No 748 (número de Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)


PLANO / ESQUEMA - CIV: 18005026

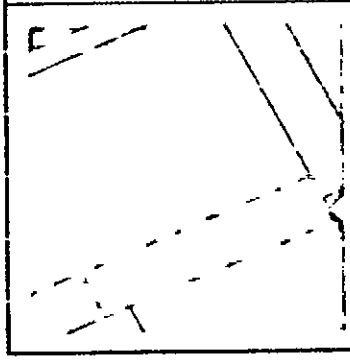

Elemento:20002169

[illegible]	20002169
[illegible]	Vía Peatonal
[illegible]	18005026
[illegible]	27.14
[illegible]	5.93
Area	161.02
[illegible]	17
[illegible]	RAFAEL URIBE URIBE
[illegible]	MARRUECOS
[illegible]	Local

FOTOGRAFÍA

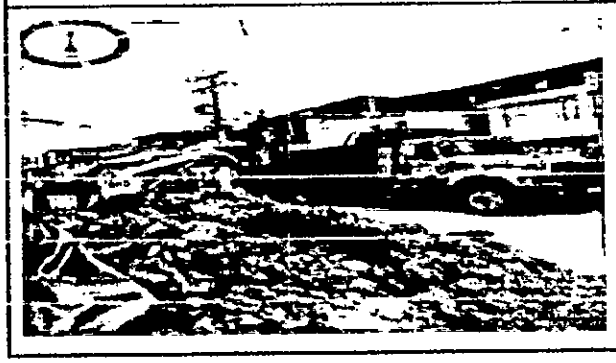

OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Carlos Mauricio Castillo
Residente de Obra

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Juan Pablo Lemus
Residente de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES — SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No 748 (Número de Contrato) DE 2024 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO
"EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PUBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."

RECIBO PARCIAL No 3 — CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 1/07/2025 — HASTA 31/07/2025

ÍTEM N° 2004 — UNIDAD M3 — ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM: TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)

CONTRATISTA: CONSORCIO VR RUU (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAS ARM 24 (Escriba el nombre o razón social del interventor)

CIV: 18005042 (Escriba el número de Supervisor (a) designado (a) por el FONDO)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ACTA 3					
EXCAVACION VIA PRIMERA CAPA					
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO					
K0+000,00	36,00	1,20	1,40	1,30	78,62
K0+036,00					
DOMICILIARIACASA 1					
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO					
K0+000,00	7,50	1,00	1,30	1,30	12,68
K0+004,00					
DOMICILIARIACASA 2					
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO					
K0+000,00	7,20	1,00	1,30	1,30	12,17
K0+004,00					
DOMICILIARIACASA 3					
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)					
K0+000,00	7,60	1,00	1,30	1,30	12,84
K0+004,00					
DOMICILIARIACASA 4					
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)					
K0+000,00	7,80	1,00	1,30	1,30	13,18
K0+004,00					
DOMICILIARIACASA 5					
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)					
K0+000,00	7,60	1,00	1,30	1,30	12,84
K0+004,00					
DOMICILIARIACASA 6					
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)					
K0+000,00	7,50	1,00	1,30	1,30	12,68
K0+004,00					
DOMICILIARIACASA 7					
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)					
K0+000,00	7,50	1,00	1,30	1,30	12,68
K0+004,00					
DOMICILIARIACASA 8					
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO					
K0+000,00	7,50	1,00	1,30	1,30	12,68
K0+004,00					

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA		
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES — SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No 748 (Número de Contrato) DE 2024 (Año de suscripción)

DOMICILIARIACASA 9					
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO					
K0+000,00					
K0+004,00	7,20	1,00	1,30	1,30	12,17
DOMICILIARIACASA 10					
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)					
K0+000,00					
K0+004,00	7,60	1,00	1,30	1,30	12,84
DOMICILIARIACASA 11					
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)					
K0+000,00					
K0+004,00	7,80	1,00	1,30	1,30	13,18
DOMICILIARIACASA 12					
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)					
K0+000,00					
K0+004,00	7,60	1,00	1,30	1,30	12,84
DOMICILIARIACASA 13					
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)					
K0+000,00					
K0+004,00	7,50	1,00	1,30	1,30	12,68
DOMICILIARIACASA 14					
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)					
K0+000,00					
K0+004,00	7,50	1,00	1,30	1,30	12,68
DOMICILIARIACASA 15					
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)					
K0+000,00					
K0+004,00	7,50	1,00	1,30	1,30	12,68
DOMICILIARIACASA 16					
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)					
K0+000,00					
K0+004,00	7,50	1,00	1,30	1,30	12,68
					282,10
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					150,54
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					432,64
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					


FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA		
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** _____

CONTRATO No 748 (Número de Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

PLANO / ESQUEMA - CIV: 18005042

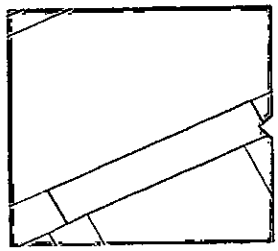

Id Elemento	20008545
Desc Elemento	Via Peatonal
Civ	18005042
Longitud Horizontal	33,69
Ancho	5,08
Area	161,44
Tipo Superficie	Rigido
Nom Localidad	RAFAEL URIBE URIBE
Nom Sector	MARRUECOS
Tipo Malla	Local
Nom Upl	MARRUECOS

FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma) _____

(Nombre) Ing. Carlos Mauricio Castillo
Residente de Obra

REVISÓ

(Firma) _____

(Nombre) Ing. Juan Pablo Lemus
Residente de Interventoría

Original : Interventor
1ra copia : Contratista
2da copia : Dependencia responsable del contrato

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES — SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No 748 (Número de Contrato) DE 2024 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO
"EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PÚBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."
(Indique el objeto del contrato de ejecución sucesivo)

RECIBO PARCIAL No 3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 1/07/2025 HASTA 31/07/2025

ÍTEM N° 2004 UNIDAD M3 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)

CONTRATISTA CONSORCIO VR RUU (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO INTER VIAS ARM 24 (Escriba el nombre o razón social del interventor)

CIV 18005057 (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el FDLRUU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ACTA 3					
EXCAVACION VIA PRIMERA CAPA					
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO					
K0+000,00					
K0+032,00	32,00	6,00	0,05	1,30	12,48
EXCAVACION VIASEGUNDA CAPA					
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO					
K0+000,00					
K0+032,00	32,00	6,00	0,15	1,30	37,44
EXCAVACION VIASEGUNDA CAPA					
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO					
K0+000,00					
K0+032,00	32,00	6,00	0,05	1,30	12,48
EXCAVACION VIASEGUNDA CAPA ESTABILIZADO					
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO					
K0+000,00					
K0+032,00	32,00	6,00	0,20	1,30	49,92
EXCAVACION VIASEGUNDA CAPA CONCRETO					
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO					
K0+000,00					
K0+032,00	32,00	6,00	0,10	1,30	24,96
DESCUENTO DE POZOS					
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO					
K0+000,00					
K0+032,00	2,27		0,66	2,00	-3,90
					133,38
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					0,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					133,38
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					


FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** _____

CONTRATO No 748 (Número de Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

PLANO / ESQUEMA - CIV: 18005057

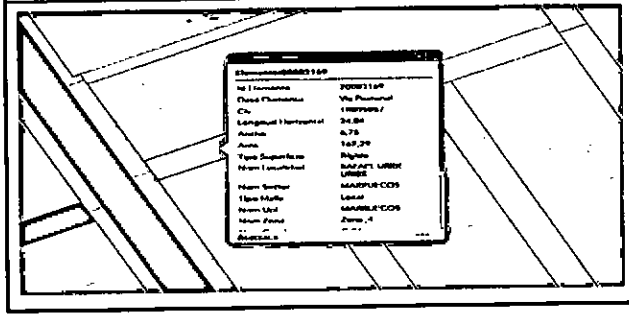

FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma) _____

(Nombre) Ing. Carlos Mauricio Castillo
Residente de Obra

REVISÓ

(Firma) _____

(Nombre) Ing. Juan Pablo Lemus
Residente de Interventoría

Original : Interventor
1ra copia : Contratista
2da copia : Dependencia responsable del contrato

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA		
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

CONTRATO No 748 (Número de Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PUBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."

(Indique el objeto del contrato de ejecución autorizado)

RECIBO PARCIAL No 3 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/07/2025 **HASTA** 31/07/2025

ÍTEM N° 2004 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)

CONTRATISTA CONSORCIO VR RUU

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO INTER VIAS ARM 24

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

CIV 18003163

(El nombre del Supervisor (a) designado (a) por el FDLRUU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ACTA 3					
REPLANTEO EP					
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO					
K0+000,00					
K0+065,00	65,00	3,40	0,10	1,30	28,73
EXCAVACION VIA PRIMERA CAPA					
CONSORCIO INTER VIAS ARM 24					
K0+000,00					
K0+065,00	65,00	3,40	0,10	1,30	28,73
EXCAVACION VIASEGUNDA CAPA					
CONSORCIO INTER VIAS ARM 24					
K0+000,00					
K0+065,00	65,00	3,40	0,15	1,30	43,10
EXCAVACION VIASEGUNDA CAPA					
CONSORCIO INTER VIAS ARM 24					
K0+000,00					
K0+065,00	65,00	3,40	0,05	1,30	14,37
EXCAVACION VIASEGUNDA CAPA					
CONSORCIO INTER VIAS ARM 24					
K0+000,00					
K0+065,00	65,00	3,40	0,20	1,30	57,46
EXCAVACION VIASEGUNDA CAPA CONCRETO					
CONSORCIO INTER VIAS ARM 24					
K0+000,00					
K0+065,00	65,00	3,40	0,20	1,30	57,46
DESCUENTO DE POZOS					
CONSORCIO INTER VIAS ARM 24					
K0+000,00					
K0+045,00	2,27		0,70	2,00	-4,13
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					225,71
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					225,71


FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** _____

CONTRATO No 748 (Número de Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

PLANO / ESQUEMA - CIV: 18003163

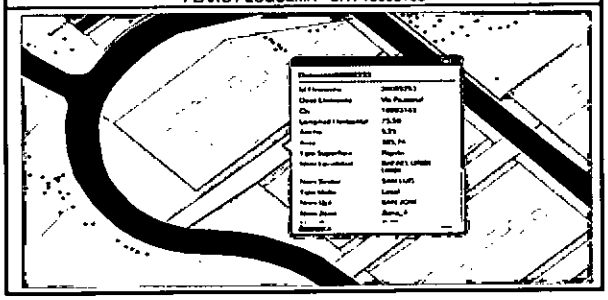

FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Carlos Mauricio Castillo
Residente de Obra

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Juan Pablo Lemus
Residente de Interventoría

Original : Interventoría
1ra copia : Contratista
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

CONSORCIO VR RUU	PRE-ACTA DE OBRA	FR-OB-19
CONTRATISTA		VERSION 0
		1 de 1

CONTRATO Nº 748-2024	"EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PÚBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Nº 2

ITEM:	3001	DESCRIPCIÓN:	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE

FECHA DE CORTE:	31-jul-25	MES DE EJECUCION Y AÑO:
CIV	**CANTIDAD**	**UNIDAD**
18003126	187,46	M2
18003182		M2
18004026		M2
18005026		M2
18005042		M2
18005057	187,46	M2
18000313		M2
18003163	216,46	M2
18003250		M2
18002962		M2
18005161		M2
TOTAL ACTA 3	591,38	M2
	TOTAL	**591,38**

Ing. Carlos Mauricio Castillo
Consorcio VR RUU
Residente de Obra

Ing. Juan Pablo Lemus
Consorcio Inter Vias ARM 24
Residente de Interventoria

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA		
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES — SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No 748 (Número de contrato) DE 2024 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PÚBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 3 — CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 1/07/2025 HASTA 31/07/2025

ÍTEM Nº 3001 — UNIDAD M2 — ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM: NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE


CONTRATISTA: CONSORCIO VR RUU (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAS ARM 24 (Escriba el nombre o razón social del interventor)


CIV: 18003126 (Escriba el nombre del Supervisor o su delegado (a) por el IDU/RAU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ACTA 3					
REPLANTEO VIA					
NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE					
K0+000,00					
K0+030,00	30,00	4,00			120,00
REPLANTEO EP					
NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE					
K0+000,00					
K0+030,00	30,00	1,20			36,00
REPLANTEO EP					
NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE					
K0+000,00					
K0+030,00	30,00	1,20			36,00
DESCUENTO DE POZOS					
NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE					
K0+000,00					
K0+045,00	2,27			2,00	-4,54
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					187,46
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					187,46

PLANO / ESQUEMA - CIV: 18003126

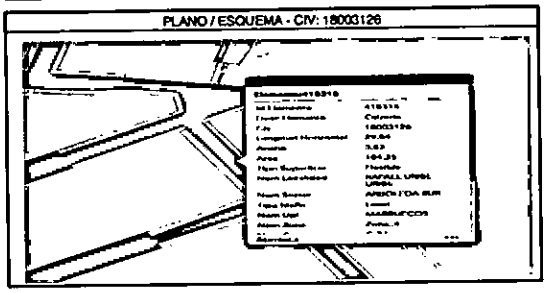

FOTOGRAFÍA

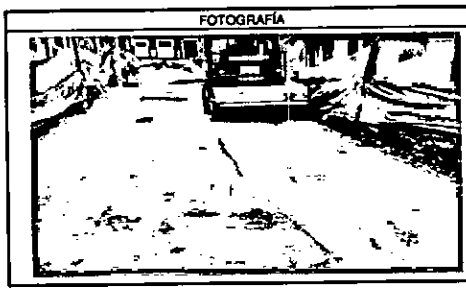

OBSERVACIONES

ELABORÓ

Ing. Carlos Mauricio Castillo
Residente de Obra

REVISÓ

Ing. Juan Pablo Lemus
Residente de Interventoría

Original — Interventor
1ra copia — Contratista
2da copia — Dependencia responsable del control

CONSORCIO VR RUU	PRE-ACTA DE OBRA	FR-OB-19
CONTRATISTA		VERSION 0
		1 de 1

CONTRATO Nº 748-2024	"EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PÚBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Nº 2

ITEM:	5019	DESCRIPCIÓN:	BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE PEGA 2000 PSI Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN).

FECHA DE CORTE:	31-jul-25	MES DE EJECUCION Y AÑO:							
CIV	**CANTIDAD**	**UNIDAD**							
18003126		ML							
18003182		ML							
18004026		ML							
18005026		ML							
18005042		ML							
18005057	64,00	ML							
18000313		ML							
18003163		ML							
18003250		ML							
18002962		ML							
18005161		ML							
TOTAL ACTA 3	64,00	ML							
		TOTAL							**64,00**

Ing. Carlos Mauricio Castillo
Consorcio VR RUU
Residente de Obra

Ing. Juan Pablo Lemus
Consorcio Inter Vias ARM 24
Residente de Interventoria

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

CONTRATO No 748 (Número de Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PÚBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."

(Indique si alguno por corrección de aplicación suscrito)

RECIBO PARCIAL No 3 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/07/2025 **HASTA** 31/07/2025

ÍTEM N° 5019 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE PEGA 2000 PSI Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN).


CONTRATISTA CONSORCIO VR RUU (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO INTER VIAS ARM 24 (Escriba el nombre o razón social del Interventor)


CIV 18005057 (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU/RUU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ACTA 3					
REPLANTEO VIA					
BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE					
K0+000,00					
K0+032,00	32,00				32,00
REPLANTEO VIA					
BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE					
K0+000,00					
K0+032,00	32,00				32,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					64,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					64,00

PLANO / ESQUEMA - CIV: 18005057

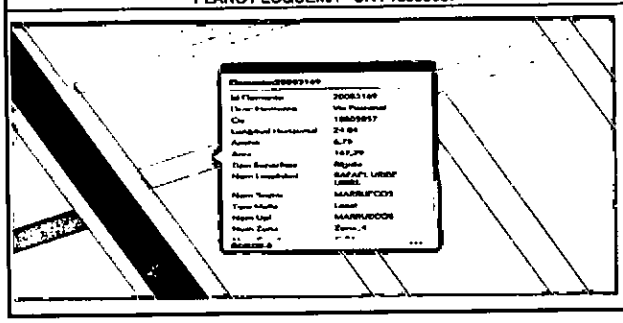

FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Carlos Mauricio Castillo
Residente de Obra

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Juan Pablo Lemus
Residente de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

CONSORCIO VR RUU	PRE-ACTA DE OBRA	FR-OB-19
CONTRATISTA		VERSION 0
		1 de 1

CONTRATO Nº 748-2024	"EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PÚBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Nº 2

ITEM:	5020	DESCRIPCIÓN:	SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)

FECHA DE CORTE:	31-jul-25	MES DE EJECUCION Y AÑO:						
CIV	**CANTIDAD**	**UNIDAD**						
18003126	60,00	ML						
18003182		ML						
18004026		ML						
18005026		ML						
18005042		ML						
18005057		ML						
18000313		ML						
18003163	130,00	ML						
18003250		ML						
18002962		ML						
18005161		ML						
TOTAL ACTA 3	190,00	ML						
	TOTAL							**190,00**

Ing. Carlos Mauricio Castillo
Consorcio VR RUU
Residente de Obra

Ing. Juan Pablo Lemus
Consorcio Inter Vias ARM 24
Residente de Interventoria

100

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** _____

CONTRATO No 748 (Número de Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PÚBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 3 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/07/2025 **HASTA** 31/07/2025

ÍTEM N° 5020 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** _____

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)


CONTRATISTA CONSORCIO VR RUU (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO INTER VIAS ARM 24 (Escriba el nombre o razón social de Interventor)

CIV 18003126 (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU/RUU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ACTA 3					
SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)					
K0+000,00					
K0+030,00	30,00				30,00
SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)					
K0+000,00					
K0+030,00	30,00				30,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					60,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					60,00

PLANO / ESQUEMA - CIV: 18003126

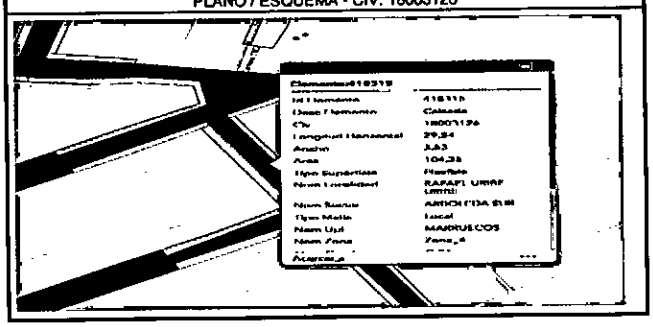

FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Carlos Mauricio Castillo
Residente de Obra

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Juan Pablo Lemus
Residente de Interventoría

Original : Interventor
1ra copia : Contratista
2da copia : Dependencia responsable del contrato

FORMATO		
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA		
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

CONTRATO No 748 (Número de Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PÚBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 3 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/07/2025 **HASTA** 31/07/2025

ÍTEM N° 5020 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)


CONTRATISTA CONSORCIO VR RUU (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO INTER VIAS ARM 24 (Escriba el nombre o razón social del interventor)

CIV 18003163 (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU/RUU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ACTA 3					
SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)					
K0+000,00					
K0+065,00	65,00				65,00
SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)					
K0+000,00					
K0+065,00	65,00				65,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					130,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					130,00

PLANO / ESQUEMA - CIV: 18003163

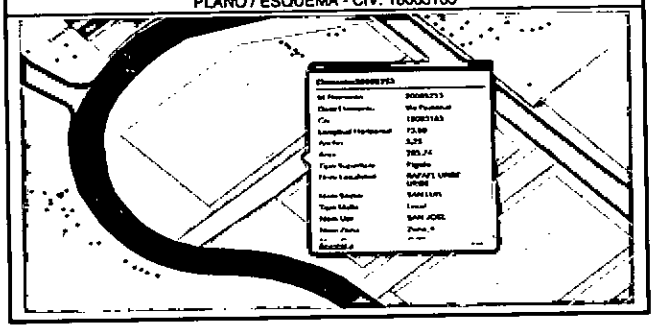

FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Carlos Mauricio Castillo
Residente de Obra

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Juan Pablo Lemus
Residente de Interventoría

Original : Interventor
1ra copia : Contratista
2da copia : Dependencia responsable del contrato

CONSORCIO VR RUU	PRE-ACTA DE OBRA	FR-OB-19
CONTRATISTA		VERSION 0
		1 de 1

CONTRATO Nº 748-2024	"EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PÚBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Nº 2

ITEM:	6002	DESCRIPCIÓN:	ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO

FECHA DE CORTE:	31-jul-25	MES DE EJECUCION Y AÑO:						
CIV	**CANTIDAD**	**UNIDAD**						
18003126	557,76	KG						
18003182		KG						
18004026		KG						
18005026		KG						
18005042		KG						
18005057		KG						
18000313		KG						
18003163		KG						
18003250		KG						
18002962		KG						
18005161		KG						
TOTAL ACTA 3	557,76	KG						
	TOTAL							**557,76**

Ing. Carlos Mauricio Castillo
Consorcio VR RUU
Residente de Obra

Ing. Juan Pablo Lemus
Consorcio Inter Vias ARM 24
Residente de Interventoria

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

CONTRATO No 748 (Número de Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PÚBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."

(Indique el objeto del contrato de intervención suscrito)

RECIBO PARCIAL No 3 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/07/2025 **HASTA** 31/07/2025

ÍTEM N° 6002 **UNIDAD** KG **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G60) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.

CONTRATISTA CONSORCIO VR RUU

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO INTER VIAS ARM 24

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

CIV 18003126

(Escriba el nombre del Supervisor (a) designado (a) por el FDLRUU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		TOTAL
ACTA 3						
ACERO REFUERZO POZO						
ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-	LONG	ANCHO	SEPARACION	CANTIDAD	35,00,	
POZO				ACER	140,00	
POZO	3,50	4,00	0,20	KG	0,996	139,44
ACERO REFUERZO POZO						
ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-	LONG	ANCHO	SEPARACION	CANTIDAD	40,00	
POZO				ACER	140,00	
POZO	4,00	3,50	0,20	KG	0,996	139,44
ACERO REFUERZO POZO						
ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-	LONG	ANCHO	SEPARACION	CANTIDAD	35,00	
POZO				ACER	140,00	
POZO	3,50	4,00	0,20	KG	0,996	139,44
ACERO REFUERZO POZO						
ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-	LONG	ANCHO	SEPARACION	CANTIDAD	40,00	
POZO				ACER	140,00	
POZO	4,00	3,50	0,20	KG	0,996	139,44
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA						557,76
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES						0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO						557,76

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA		
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA


DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

CONTRATO No 748 (Número de Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

PLANO / ESQUEMA - CIV: 18003126

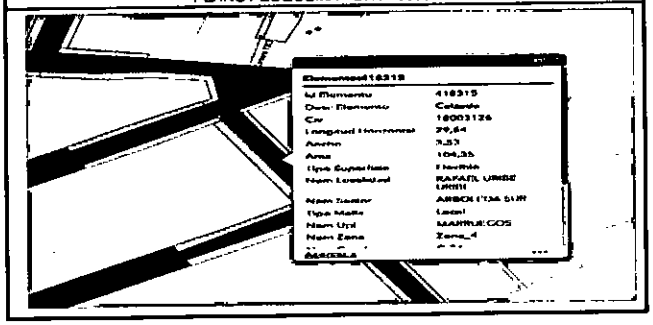

FOTOGRAFÍA

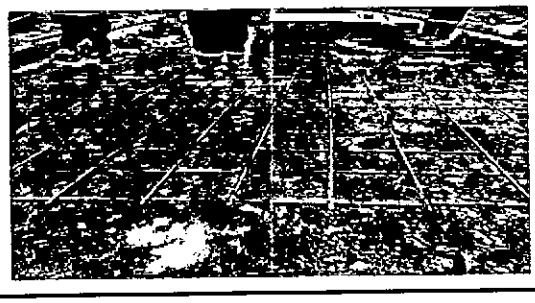

OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Carlos Mauricio Castillo
Residente de Obra

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Juan Pablo Lemus
Residente de Interventoría

Original : Interventor
1ra copia : Contratista
2da copia : Dependencia responsable del contrato

CONSORCIO VR RUU	PRE-ACTA DE OBRA	FR-OB-19
CONTRATISTA		VERSION 0
		1 de 1

CONTRATO Nº 748-2024	"EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PÚBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Nº 2

ITEM:	7024	DESCRIPCIÓN:	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

FECHA DE CORTE:	31-jul-25	MES DE EJECUCION Y AÑO:						
CIV	**CANTIDAD**	**UNIDAD**						
18003126		ML						
18003182		ML						
18004026		ML						
18005026	28,00	ML						
18005042	36,00	ML						
18005057		ML						
18000313		ML						
18003163		ML						
18003250		ML						
18002962		ML						
18005161		ML						
TOTAL ACTA 3	64,00	ML						
	TOTAL							**64,00**

Ing. Carlos Mauricio Castillo
Consorcio VR RUU
Residente de Obra

Ing. Juan Pablo Lemus
Consorcio Inter Vias ARM 24
Residente de Interventoria
