UNION TEMPORAL ANDINO 066
NIT 901.477.981-6
CRA 15 90 64 OF 402
Tel: (601) 7672876
Bogotá - Colombia
uniontemporalandino066@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 106

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS		
NIT	800.215.807-2	**Teléfono**	(601) 3770600
Dirección	CLL 25 G 73B 90	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	08/09/2025, 07:27
Expedición	08/09/2025, 07:37
Vencimiento	08/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 51 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025. CONTRATO 1009-2021. CONFORMACION DE LA UNION TEMPORAL Conytrac S.A. Nit 890.932.730-7 24% Gaico Ingenieros Constructores S.A. en Reorganización Nit. 860.034551-3 1% Construcción y Desarrollo Ingenieria S.A.S Nit. 900.182.018-7 24% Construcciones, Cimentaciones y Soluciones Integrales S.A.S Nit. 901.259.571-5 1% Proyectos y Vias S.A.S Nit. 800.119.086-8 25% Teccivil S.A.S Nit. 830.117.761-1 1% JMV Ingenieros S.A.S Nit. 800.095.951-9 24%	1.00	1,794,582,170.00
2	ADMINISTRACION 20%	1.00	358,916,434.00
3	IMPREVISTOS 5%	1.00	89,729,109.00
4	UTILIDAD 5%	1.00	106,777,639.71

Total items: 4

Valor en Letras:
Dos mil doscientos setenta y cuatro millones novecientos siete mil cuatrocientos setenta y tres pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-10-08 por $ 2,274,907,473.00

Total Bruto	2,332,956,822.00
IVA 19%	17,048,530.71
Descuento - AMORTIZACION ANTICIPO	75,097,880.00
Cargo - AJUSTE AL PESO	0.29
Total a Pagar	2,274,907,473.00

Observaciones:
Contrato 1009 de 2021 "Mejoramiento y mantenimiento gestión predial, social y ambiental sostenible en el corredor conexión alta Guajira-Uribia-puerto Bolívar Estrella-Vias wayú y Cabo de la Vela-San Martin en el departamento de la Guajira" Favor Consignar a la cuenta de ahorros # 408905032 Banco de Occidente a nombre de FID PA 422140 UT ANDINO 066
#$24-02-00;1009-2021;wmolano@invias.gov.co#$

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764080086479 aprobado en 20240923 prefijo FE desde el número 81 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 7.12 X 1000
CUFE: 9d263af03d5ee5df6bb83c442d4b068c1be71db11a5e063bc4dc27c4ac3cb281191e9e7f953e6c3d1de918b72d3a1865

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 29/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** LA GUAJIRA PERIODO MES: ago-25

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 51 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 2.332.956.822

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	29-ago-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	RICHARD DIAZ ORTEGA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	2-sep-25	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	RICHARD DIAZ ORTEGA		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	2-sep-25	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ	Firmado digitalmente por CAMARGO ALMENAREZ DUBIN JOSE	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	05-sep-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	05-Sep-25	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Luis Guillermo Pinto Soler		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	09-09-2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	William Molano	Firmado digitalmente por MOLANO RODRIGUEZ WILLIAM	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 1009 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2.

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066 **NIT.** 901.477.981-6

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 2.274.907.473 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS MCTE.

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 51 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** ago-25 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma — Firmado digitalmente por CAMARGO ALMENAREZ DUBIN JOSE
Nombre: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ
Matricula profesional No.: 08202-38090 ATL
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma — Firmado digitalmente por CAMARGO ALMENAREZ DUBIN JOSE
Nombre: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ
Matricula profesional No.: 08202-38090 ATL
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: LUIS GUILLERMO PINTO SOLER
Matricula profesional No.: 15202-281003 BYC
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma: RES 970 02/04/2024
(Suscribe según su competencia)

Firma — Firmado digitalmente por MOLANO RODRIGUEZ WILLIAM
Nombre: WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ
Matrícula Profesional No.: A25072000-79463217
ORDENADOR DEL PAGO SVR (E)
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: LA GUAJIRA | ACTA Nº: 51 ACTA FINAL | VALOR BÁSICO ACTA: $ 2.332.956.822,00 | MES: ago-25

CONTRATO No : 1009 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARATAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2.

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1005 DE 2021 | INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191

PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato principal) | PLAZO ACUMULADO: 110 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28-jun-21 (Indique día/mes/año) | FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 5-sep-30 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 18/08/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) | FECHA DE REANUDACIÓN: 23/08/2023 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IV: $ 265.853.856.477 (Según contrato principal) | VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 10.000.000.000,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 275.853.856.477,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 11 de fecha 03-2025 CANTIDAD	VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	VALOR	ACUMULADO CANTIDAD	VALOR
EXPLANACIONES														
1	1	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	113,00	$ 1.187.326,00	$ 134.167.838,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2	1	201-13		Demolición de Estructuras	m3	6.300,00	$ 113.989,00	$ 718.130.700,00	4.291,76	$ 489.213.431,00	75,00	$ 8.549.175,00	2.104,46	$ 239.885.289,00
3	1	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	29.162,00	$ 4.475,00	$ 130.499.950,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4	1	210-13		Excavación sin clasificar e la explanación y canales	m3	336.858,00	$ 10.642,00	$ 3.584.842.836,00	21.550,45	$ 229.339.889,00	-	$ -	16.187,69	$ 172.269.397,00
5	1	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	35.000,00	$ 12.579,00	$ 440.265.000,00	198.579,32	$ 2.497.929.266,00	1.450,00	$ 18.239.550,00	164.612,37	$ 2.070.659.001,00
6	1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	430,00	$ 62.892,00	$ 27.043.560,00	8.630,00	$ 542.757.960,00	-	$ -	8.386,75	$ 527.459.481,00
7	1	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	36.564,00	$ 10.642,00	$ 389.114.088,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
8	1	220.1		Terraplenes	m3	262.150,00	$ 13.249,00	$ 3.473.225.350,00	197.523,20	$ 2.616.984.877,00	1.450,00	$ 19.211.050,00	162.209,16	$ 2.149.109.160,00
Subtotal								$ 8.897.289.322,00		$ 6.376.225.423,00	-	$ 45.999.775,00	-	$ 5.159.382.328,00
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS														
9	1	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	650.000,00	$ 961,00	$ 624.650.000,00	298.477,11	$ 286.836.503,00	194,00	$ 186.434,00	5.500,27	$ 5.285.765,00
10	2		351.1P	Base Estabilizada con cemento (incluye suministro de cemento)	m3	164.500,00	$ 184.809,00	$ 30.401.080.500,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
11	2		351.2P	Subbase Estabilizada con cemento (incluye suministro de cemento)	m3	279.300,00	$ 90.850,00	$ 25.374.405.000,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal								$ 56.400.135.500,00		$ 286.836.503,00	-	$ 186.434,00	-	$ 5.285.765,00
PAVIMENTOS ASFALTICOS														
12	7	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	782.271,00	$ 2.926,00	$ 2.288.924.946,00	656.476,84	$ 1.920.851.234,00	6.862,00	$ 20.078.212,00	243.385,80	$ 712.146.851,00
13	7		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	84.150,00	$ 932.536,00	$ 78.472.904.400,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal								$ 80.761.829.346,00		$ 1.920.851.234,00	-	$ 20.078.212,00	-	$ 712.146.851,00
ESTRUCTURAS Y DRENAJES														
14	5	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	9.448,00	$ 32.667,00	$ 308.637.816,00	39.723,25	$ 1.297.639.408,00	1.408,75	$ 46.019.636,00	37.745,61	$ 1.233.035.843,00
15	5	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	439,00	$ 81.882,00	$ 35.946.198,00	317,10	$ 25.964.782,00	-	$ -	-	$ -
16	5	600-13		Excavaciones varias en material comun en seco	m3	11.955,00	$ 25.958,00	$ 310.327.890,00	10.035,30	$ 260.496.317,00	-	$ -	-	$ -
17	5	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	6.326,00	$ 109.936,00	$ 695.455.136,00	34.726,08	$ 3.817.646.331,00	709,13	$ 77.958.916,00	11.981,70	$ 1.317.220.171,00
18	6		621.1P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 MPA de diámetro 1.0 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m	2.440,00	$ 2.100.926,00	$ 5.126.259.440,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
19	6		621.1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 MPA de diámetro 1.2 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m	187,00	$ 2.471.730,00	$ 462.213.510,00	720,00	$ 1.779.645.600,00	-	$ -	480,00	$ 1.186.430.400,00
20	6		630.1.1P	Concreto clase 35 MPA, para para Viga de puentes	m3	2.337,00	$ 1.433.984,00	$ 3.351.220.608,00	537,00	$ 770.049.408,00	46,78	$ 67.081.772,00	327,43	$ 469.529.381,00
21	6		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos , Aletas y placas	m3	5.817,00	$ 1.165.384,00	$ 6.779.038.728,00	1.317,00	$ 1.534.810.728,00	-	$ -	648,93	$ 756.252.637,00
22	6		630.3.4P	Concreto clase 28 MPA para tablero y anden	m3	362,00	$ 1.255.761,00	$ 454.585.482,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
23	5	630-13		Concrreto 28 MPA	m3	10.350,00	$ 956.449,00	$ 9.899.247.150,00	4.268,50	$ 4.082.602.557,00	26,08	$ 24.944.190,00	1.470,90	$ 1.406.840.834,00
24	5	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	9.630,00	$ 809.984,00	$ 7.800.145.920,00	3.430,00	$ 2.778.245.120,00	6,32	$ 5.119.099,00	59,25	$ 47.991.552,00
25	5	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	918,00	$ 633.414,00	$ 581.474.052,00	936,95	$ 593.477.247,00	-	$ -	241,68	$ 153.083.498,00
26	4		632.1P	Baranda Metalica	m	1.071,00	$ 545.130,00	$ 583.834.230,00	471,00	$ 256.756.230,00	-	$ -	123,22	$ 67.170.919,00
27	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	3.543.655,00	$ 5.378,00	$ 19.057.776.590,00	538.921,30	$ 2.898.318.751,00	1.983,07	$ 10.664.950,00	460.444,42	$ 2.476.270.082,00
28	4	641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m	279.568,00	$ 2.237,00	$ 625.393.616,00	350.000,00	$ 782.950.000,00	66.116,92	$ 147.903.550,00	198.350,76	$ 443.710.650,00
29	5	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	2.198,00	$ 704.737,00	$ 1.549.011.926,00	50,00	$ 35.236.850,00	-	$ -	12,00	$ 8.456.844,00
30	5		671.1.1P	Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo (concreto f´c 21 mpa)	m3	2.905,00	$ 847.572,00	$ 2.462.196.660,00	1.801,00	$ 1.526.477.172,00	-	$ -	574,49	$ 486.921.640,00
31	7	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	86.945,00	$ 7.720,00	$ 671.215.400,00	52.729,11	$ 407.068.704,00	-	$ -	-	$ -
32	5	673-13		Material granular drenante	m3	3.921,00	$ 239.511,00	$ 939.122.631,00	3.921,00	$ 939.122.631,00	-	$ -	-	$ -
Subtotal								$ 61.693.102.983,00		$ 23.786.507.836,00	-	$ 379.692.113,00	-	$ 10.052.914.451,00
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD														
33	7	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	253.599,00	$ 1.794,00	$ 454.956.606,00	244.899,53	$ 439.349.757,00	-	$ -	53.175,63	$ 95.397.081,00
34	7	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	786,00	$ 22.076,00	$ 17.351.736,00	1.486,00	$ 32.804.936,00	-	$ -	429,63	$ 9.484.512,00
35	7	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	95.783,00	$ 8.346,00	$ 799.404.918,00	31.123,00	$ 259.752.558,00	-	$ -	7.460,00	$ 62.261.160,00

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: LA GUAJIRA | ACTA Nº: 51 ACTA FINAL | VALOR BÁSICO ACTA: $ 2.332.956.822,00 | MES: ago-25

CONTRATO No: 1009 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARATAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2.

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1005 DE 2021 | INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191

PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato principal) | PLAZO ACUMULADO: 110 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28-jun-21 (Indique día/mes/año) | FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 5-sep-30 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 18/08/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta) | FECHA DE REANUDACIÓN: 23/08/2023 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IV): $ 265.853.856.477 (Según contrato principal) | VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 10.000.000.000,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 275.853.856.477,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 11 de fecha 03-2025 CANTIDAD	VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	VALOR	ACUMULADO CANTIDAD	VALOR
36	4	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	1.960,00	$ 403.818,00	$ 791.483.280,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
37	4	730-13		Defensa metalica	m	1.100,00	$ 230.532,00	$ 253.585.200,00	7.600,00	$ 1.752.043.200,00	36,00	$ 8.299.152,00	36,00	$ 8.299.152,00
38	4	730-13		Sección final	u	280,00	$ 103.189,00	$ 28.892.920,00	280,00	$ 28.892.920,00	2,00	$ 206.378,00	2,00	$ 206.378,00
39	4	740-13		Captafaros	u	2.980,00	$ 22.031,00	$ 65.652.380,00	2.980,00	$ 65.652.380,00	-	$ -	-	$ -
Subtotal								$ 2.411.327.040,00		$ 2.578.495.751,00	-	$ 8.505.530,00	-	$ 175.648.283,00
TRANSPORTES														
40	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	2.391.784,00	$ 1.057,00	$ 2.528.115.688,00	1.000.000,00	$ 1.057.000.000,00	-	$ -	303.452,02	$ 320.748.785,00
41	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	7.972.614,00	$ 1.175,00	$ 9.367.821.450,00	3.000.000,00	$ 3.525.000.000,00	18.422,83	$ 21.646.825,00	1.938.784,68	$ 2.278.072.008,00
Subtotal								$ 11.895.937.138,00		$ 4.582.000.000,00	-	$ 21.646.825,00	-	$ 2.598.820.793,00
ITEM NO PREVISTOS														
NP1	NP1	320.13		Subbase granular clase B (Especificación 320.13)	m3		$ 303.867,00		135.998,50	$ 41.325.457.054,00	793,00	$ 240.966.531,00	45.742,26	$ 13.899.563.320,00
NP2	NP2	330.13		Base granular clase B (Especificación 330.13)	m3		$ 318.020,00		115.885,35	$ 36.853.859.007,00	1.077,00	$ 342.507.540,00	36.305,31	$ 11.545.814.686,00
NP3	NP3	450-13		Mezcla semidensa en caliente Tipo MSC-19	m3		$ 1.002.812,00		72.198,91	$ 72.401.933.335,00	953,00	$ 955.679.836,00	21.462,38	$ 21.522.732.214,00
NP4	NP4	231-13		Geotextil BX 50 o similar	m2		$ 13.127,00		896.071,43	$ 11.762.729.662,00	4.580,00	$ 60.121.660,00	272.263,70	$ 3.574.005.592,00
NP5	NP5	662,13		Tubería metálica corrugada galvanizada calibre 14 y 48" diámetro interior (Especificación 662.13)	m		$ 1.682.190,00		2.373,00	$ 3.991.836.870,00	65,10	$ 109.510.569,00	856,07	$ 1.440.072.394,00
NP6	NP6	662,13		Tubería metálica corrugada galvanizada calibre 14 y 96" diámetro interior (Especificación 662.13)	m		$ 3.770.044,00		1.674,00	$ 6.311.053.656,00	-	$ -	472,94	$ 1.783.004.609,00
NP7	NP7	201,13		Remoción de alcantarillas metálicas diámetros 0.90 a 1.20 m	m		$ 77.932,00		1.111,98	$ 86.658.825,00	101,60	$ 7.917.891,00	886,70	$ 69.102.305,00
NP8	NP8	201,13		Remoción de alcantarillas metálicas diámetros 1.90 a 2.70 m	m		$ 106.496,00		904,00	$ 96.272.384,00	-	$ -	411,06	$ 43.776.247,00
NP9	NP9	201,13		Remoción de alcantarillas metálicas diámetros 3.00 a 3.50 m	m		$ 159.744,00		808,00	$ 129.073.152,00	-	$ -	468,00	$ 74.760.191,00
NP10	NP10	662,13		Recubrimiento con base en resinas epóxicas Coaltar Epóxico o similar para protección de tuberías metálicas contra agentes altamente agresivos	m2		$ 38.846,00		42.263,70	$ 1.641.775.654,00	445,50	$ 17.305.893,00	17.120,37	$ 665.057.895,00
NP11	NP11	662,13		Tubería metálica corrugada galvanizada calibre 14 y 36" diámetro interior (Especificación 662.13)	m	-	$ 1.306.682,00		300,00	$ 392.004.600,00	-	$ -	-	$ -
NP12	NP12	662,13		Tubería metálica corrugada galvanizada calibre 14 y 60" diámetro interior (Especificación 662.13)	m	-	$ 2.357.951,00		850,00	$ 2.004.258.350,00	32,90	$ 77.576.588,00	463,41	$ 1.092.698.073,00
NP13	NP13	662,13		Tubería metálica corrugada galvanizada calibre 14 y 72" diámetro interior (Especificación 662.13)	m	-	$ 2.766.862,00		210,00	$ 581.041.020,00	-	$ -	46,62	$ 128.991.106,00
NP14	NP14	662,13		Tubería metálica corrugada galvanizada calibre 14 y 84" diámetro interior (Especificación 662.13)	m	-	$ 3.312.344,00		650,00	$ 2.153.023.600,00	-	$ -	241,31	$ 799.301.731,00
NP15	NP15	662,13		Tubería metálica corrugada galvanizada calibre 14 y 108" diámetro interior (Especificación 662.13)	m	-	$ 5.029.589,00		800,00	$ 4.023.671.200,00	-	$ -	316,29	$ 1.590.808.704,00
NP16	NP16	Manual de Señalización Vial 2015		Señal vertical de transito tipo SR, SP y/o SI, con lámina retrorreflectiva tipo IV (90x90 cm)	u	-	$ 711.620,00		1.226,00	$ 872.446.120,00	-	$ -	103,00	$ 73.296.860,00
NP17	NP17	Manual de Señalización Vial 2016		Señal vertical de transito tipo SI-04 (postes de referencia) doble tablero, reflectivo tipo IV (1.00m x 0.45m)	u	-	$ 698.422,00		80,00	$ 55.873.760,00	-	$ -	19,00	$ 13.270.018,00
NP18	NP18	Manual de Señalización Vial 2017		Señal vertical de transito tipo informativa (SI-05) con lamina retrorreflectiva tipo IV	u	-	$ 711.002,00		60,00	$ 42.660.120,00	-	$ -	-	$ -
NP19	NP19	Manual de Señalización Vial 2018		Señal vertical de tránsito tipo preventiva delineador de curva horizontal SP-75. Reflectivo tipo IV (75x60cm)	u	-	$ 552.005,00		400,00	$ 220.802.000,00	-	$ -	-	$ -
NP20	NP20	670	EP NP20	Enrocado para protección de entregas o revestimiento de cauce con disipadores de energia (Especificación 670.13)	m3	-	$ 638.812,00		2.000,00	$ 1.277.624.000,00	-	$ -	-	$ -

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEP-MINT-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 3
FECHA	29/08/2025 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL** LA GUAJIRA **ACTA Nº** 51 **ACTA FINAL** **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 2.332.956.822,00 **MES** ago-25

CONTRATO No : **1009 DE 2021** (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARATAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2.

CONTRATISTA: **UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : **1005 DE 2021** INTERVENTOR: **CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191**

PLAZO INICIAL: **110 MESES** (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: **110 MESES** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: **28-jun-21** (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: **5-sep-30** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: **18/08/2023** (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: 23/08/2023 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IV **$ 265.853.856.477** (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** **$ 10.000.000.000,00**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** **$ 275.853.856.477,00**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 11 de fecha 03-2025 CANTIDAD	VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	VALOR	ACUMULADO CANTIDAD	VALOR
NP21	NP21		EP NP21	Protección de taludes con piedra pegada	m2	-	$ 119.328,00		9.240,00	$ 1.102.590.720,00	193,29	$ 23.064.909,00	1.637,23	$ 195.367.381,00
NP22	NP22		EP NP22	Concreto fc=35 MPa para Losa tablero con Luz de 30 a 32 metros	m3	-	$ 1.372.191,00		462,77	$ 635.008.829,00	-	$ -	165,40	$ 226.960.392,00
NP23	NP23		EP NP23	Concreto fc=28 MPa para Columna Ø1.50	m3	-	$ 1.318.594,00		33,93	$ 44.739.894,00	-	$ -	33,92	$ 44.726.708,00
NP24	NP24		EP NP24	Concreto fc=28 MPa para viga cabezal, Diafragma y topes sismicos	m3	-	$ 1.378.655,00		192,04	$ 264.756.906,00	10,87	$ 14.985.980,00	123,90	$ 170.815.355,00
NP25	NP25		EP NP25	Concreto f'c = 28 MPa, para barreras tipo New Jersey	m3	-	$ 1.235.506,00		77,80	$ 96.122.367,00	-	$ -	27,24	$ 33.655.183,00
NP26	NP26		EP NP26	Concreto f'c = 28 MPa, para losa de aproximación	m3	-	$ 1.221.355,00		102,00	$ 124.578.210,00	-	$ -	22,15	$ 27.053.013,00
NP27	NP27		EP NP27	Apoyo elastomérico 500 * 500 * 100 Dureza 60	u	-	$ 2.007.896,00		32,00	$ 64.252.672,00	-	$ -	32,00	$ 64.252.672,00
NP28	NP28		EP NP28	Apoyo elastomérico 300 * 300 * 20 Dureza 60	u	-	$ 600.878,00		72,00	$ 43.263.216,00	12,00	$ 7.210.536,00	36,00	$ 21.631.608,00
NP29	NP29		EP NP29	Junta elastomérica	m	-	$ 1.823.866,00		96,80	$ 176.550.229,00	-	$ -	24,20	$ 44.137.557,00
NP30	NP30		EP NP30	Corte de junta, limpieza, colocación de cordón de resguardo y sellos de junta con polipropileno.	m	-	$ 71.935,00		600,00	$ 43.161.000,00	-	$ -	-	$ -
NP31	NP31	662-13		Tubería metálica corrugada galvanizada calibre 10 y 144" diámetro interior (Especificación 662.13)	m	-	$ 9.981.731,00		116,00	$ 1.157.880.796,00	-	$ -	115,14	$ 1.149.296.507,00
NP32	NP32		EP-NP32	Geomalla Uniaxial de refuerzo para terraplenes reforzados con geosintéticos	m2	-	$ 23.233,00		68.600,00	$ 1.593.783.800,00	-	$ -	-	$ -
NP33	NP33		EP-NP33	Tubería perforada para drenaje de 65 mm (2 1/2")	m	-	$ 40.696,00		10.140,52	$ 412.678.677,00	-	$ -	-	$ -
Subtotal								$ -		$ 191.983.421.685,00		$ 1.856.847.933,00		$ 60.294.152.321,00
	SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)							**$ 222.059.621.329,00**		**$ 231.514.338.432,00**		**$ 2.332.956.822,00**		**$ 78.998.350.792,00**
	PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)							$ 24.652.634.122,00		$ 25.125.369.990,00		$ -		$ 11.692.854.061,00
	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)							$ 1.150.000.000,00		$ 1.150.000.000,00		$ -		$ -
	VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)							$ 247.862.255.451,00		$ 257.789.708.422,00		$ 2.332.956.822,00		$ 90.691.204.853,00
	VALOR IVA (OBRA) (E)							$ 1.811.301.098,00		$ 1.883.847.869,00		$ 17.048.531,00		$ 662.743.420,00
	VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E)							**$ 249.673.556.549,00**		**$ 259.673.556.291,00**		**$ 2.350.005.353,00**		**$ 91.353.948.273,00**
	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)							$ 1.500.000.000,00		$ 1.500.000.000,00				$ 1.455.000.000,00
	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)							$ 285.000.000,00		$ 285.000.000,00		$ -		$ 276.450.000,00
	TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H							**$ 1.785.000.000,00**		**$ 1.785.000.000,00**		**$ -**		**$ 1.731.450.000,00**
	GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) (J)							**$ 13.987.299.928,00**		**$ 13.987.299.928,00**				**$ 223.412.852,00**
	PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (K)							**$ 408.000.000,00**		**$ 408.000.000,00**		**$ -**		**$ 5.002.158,00**
	VALOR TOTAL (F+I+J+K)							**$ 265.853.856.477,00**		**$ 275.853.856.477,00**		**$ 2.350.005.353,00**		**$ 93.313.813.283,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30 %
Utilidad 5 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ 11.500.000.000,00	100,00%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ 75.097.880,00	3,219%
Valor Amortizado Acumulado	$ 6.761.552.437,95	58,80%
Valor Saldo por Amortizar	$ 4.738.447.562,05	41,20%

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MNI-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 3
FECHA	29/08/2025 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL** LA GUAJIRA **ACTA N°** 51 **ACTA FINAL** **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 2.332.956.822,00 **MES** ago-25

CONTRATO No : **1009 DE 2021** (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARATAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2

CONTRATISTA: **UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : **1005 DE 2021** INTERVENTOR: **CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191**

PLAZO INICIAL: **110 MESES** (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: **110 MESES** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: **28-jun-21** (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: **5-sep-30** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: **18/08/2023** (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: 23/08/2023 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IV **$ 265.853.856.477** (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: **$ 10.000.000.000,00**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 275.853.856.477,00**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 11 de fecha 03-2025 CANTIDAD	VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	VALOR	ACUMULADO CANTIDAD	VALOR

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	$ 2.332.956.822,00	$ 17.048.531,00	$ 2.350.005.353,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ -	$ -	$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -	$ -	$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS		$ -	$ -
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			$ -
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 2.332.956.822,00	$ 17.048.531,00	$ 2.350.005.353,00

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	$ 46.186.209	$ 5.164.504.971
SB-GEO	$ 301.088.191,00	$ 17.473.405.790,14
B	$ 342.507.540,00	$ 11.545.651.563,14
P	$ 975.758.048,00	$ 22.234.715.943,14
OA	$ 637.264.479,00	$ 19.718.220.960,14
SCT	$ 8.505.530,00	$ 262.052.039,14
OV	$ -	$ -
T	$ 21.646.825,00	$ 2.598.657.671,14

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación	$ -	$ 795.441.900,00
2 Sub-bases y bases	$ -	$ 2.909.977.806,00
3 Transporte de materiales	$ -	$ 389.317.414,00
4 Aceros y elementos metálicos	$ -	$ 53.970.658,00
5 Concretos, morteros y obras varias	$ -	$ 2.407.903.346,00
6 Concreto para superestructuras	$ -	
7 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	$ -	$ 4.917.606.192,00
Acero de refuerzo Fy= 420 Mpa	$ -	$ 106.017.261,00
Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. (sin acero) - MATERIALES	$ -	$ 21.936.243,00
Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. (sin acero) - EQUIPOS	$ -	$ 5.536.440,00
Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. (sin acero) - MANO DE OBRA	$ -	$ 86.288.655,00
(N) Ítems no sujetos a ajuste		

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 2.332.956.822,00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 2.257.858.942,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 2.274.907.473,00 **VALOR EN LETRAS:** **DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS MCTE.**

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma
Nombre : **ANDRES ALBERTO ALVARADO ANGEL**
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista: **UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066**
Matricula No.:

Firma ISABEL ARREDONDO V.
Nombre: **ISABEL CRISTINA ARREDONDO VÉLEZ**
Representante Legal o Apoderado
Interventoría: **CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191**
Matrícula Profesional No.:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N°: 1009/2021

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA	X	**51**	**AGOSTO-25**
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA			
DESEMBOLSO	X	0,82468%	ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	**159825**	RUBRO No.	**C-2402-0600-13-51102A-2402006-02**	RECURSO No.	**11**	VALOR AFECTADO **$2.274.907.473**
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO
					TOTAL ACTA	**$2.274.907.473**

Firmado digitalmente por CAMARGO ALMENAREZ DUBIN JOSE

SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE: DUBIN JOSÉ CAMARGO ALMENAREZ
Matricula profesional No.: 08202-38090 ATL

Formulado RP159825;11;2274907473
Texto Libre GR5 - ACTA DE OBRA 51 CONT 1009 UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066 NIT: 901477981-6
Asunto **GR5 - ACTA DE OBRA 51 CONT 1009 UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066 NIT: 901477981-6 RP159825;11;2274907473**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° 1009-2021 Contratista UNION TEMPORAL ANDINO 066

Objeto del Contrato: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2.

Acta N° **51** Valor basico $ 2.332.956.822 Período ago-25

Valor Incluido Iva $ $ 2.350.005.353

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	N.A.	CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN	$ 2.350.005.353			$ 2.350.005.353,00
		TOTALES	$ 2.350.005.353,00	$ -	$ -	**$ 2.350.005.353,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	GUAJIRA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	URIBIA	$ 2.350.005.353,00	$ 2.332.956.822,00
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		$ 2.350.005.353,00	$ 2.332.956.822,00

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			$ 0

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			$ 0

Firma:
Nombre: **JUAN CARLOS CAMARGO RODRIGUEZ**
Director de Obra UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066
Matrícula No.: 01107-0907
CONTRATISTA

Firma:
Nombre: **RICHARD DIAZ ORTEGA**
Director de Obra CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030 /191
Matrícula No.: 01101-0595 CPTIVC
INTERVENTORIA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** LA GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No: 1009 DE 2021 **CONTRATISTA:** UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066

MES INFORME MENSUAL: ago-25 **PROYECTO:** URIBIA - PUERTO BOLIVAR - CABO DE LA VELA -ESTRELLA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1005 de 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	469121	VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA	54 C-2402-0600-13-0-2402006-02	NACION	1009 - 2021	$ 4.363.070.830	$ -
2021	469121		54 C-2402-0600-13-0-2402015-02	NACION	1009 - 2021	$ 4.641.385.647	$ -
2021	469121		54 C-2402-0600-13-0-2402021-02	NACION	1009 - 2021	$ 104.400.000	$ -
2021	469121		54 C-2402-0600-13-0-2402118-02	NACION	1009 - 2021	$ 4.165.000.000	$ -
2022	268222	VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA	11 C-2402-0600-13-0-2402006-02	NACION	1009 - 2021	$ 14.284.000.000	$ -
2022	268222		11 C-2402-0600-13-0-2402015-02	NACION	1009 - 2021	$ 4.096.000.000	$ -
2022	268222		11 C-2402-0600-13-0-2402021-02	NACION	1009 - 2021	$ 133.333.333	$ -
2022	760222	VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA	20 C-2402-0600-13-0-2402006-02	PROPIOS	1	$ 10.000.000.000	$ -
2023	215923	VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA	11 C-2402-0600-13-0-2402021-02	NACIÓN	1009- 2021	$ 93.192.823	$ -
2023	215923	VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA	11 C-2402-0600-13-0-2402006-02	NACIÓN	1009- 2021	$ 10.878.807.177	$ -
2023	215923	VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA	11 C-2402-0600-13-0-2402015-02	NACIÓN	1009- 2021	$ 3.072.000.000	$ -
2023	999323	VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA	11 C-2402-0600-13-0-2402006-02	NACIÓN	1009- 2021	$ 5.000.000.000	$ -
2024	244624	VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA	10 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	NACIÓN	1009- 2021	$ 11.118.320.000	$ -
2024	244624	VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA	10 C-2402-0600-13-51102A-2402015-02	NACIÓN	1009- 2021	$ 2.831.680.000	$ -
2024	244624	VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA	10 C-2402-0600-13-51102A-2402021-02	NACIÓN	1009- 2021	$ 94.000.000	$ -
2024	903124	VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA	10 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	NACIÓN	1009- 2021	$ 13.000.000.000	$ -
2025	159825	VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA	11 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	NACIÓN	1009- 2021	$ 25.088.000.000	$ 17.185.836.438
			TOTAL			$ 112.963.189.810	$ 17.185.836.438

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 275.853.856.477,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
ANTICIPO 1					$ -	$ -	$ -	$ 6.500.000.000	469121 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2021-11-16	$ -	$ 265.853.856.477		X		
									469121 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2021-11-16	$ 2.504.456.477	$ 265.853.856.477				
1	OBRA	jun-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.500.000.000	469121 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2021-11-16	$ 2.504.456.477	$ 265.853.856.477				

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** LA GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No: 1009 DE 2021 **CONTRATISTA:** UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066

MES INFORME MENSUAL: ago-25 **PROYECTO:** URIBIA - PUERTO BOLIVAR - CABO DE LA VELA -ESTRELLA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1005 de 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191

1D	AJUSTES	jun-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.500.000.000	469121 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2021-11-16	$ 2.504.456.477	$ 265.853.856.477				
2	OBRA	jul-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.500.000.000	469121 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2021-11-16	$ 2.504.456.477	$ 265.853.856.477				
2P	AJUSTES	jul-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.500.000.000	469121 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2021-11-16	$ 2.504.456.477	$ 265.853.856.477				
2D	AJUSTES	jul-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.500.000.000	469121 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2021-11-16	$ 2.504.456.477	$ 265.853.856.477				
3	OBRA	ago-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.500.000.000	469121 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2021-11-16	$ 2.504.456.477	$ 265.853.856.477				
3P	AJUSTES	ago-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.500.000.000	469121 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2021-11-16	$ 2.504.456.477	$ 265.853.856.477				
3D	AJUSTES	ago-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.500.000.000	469121 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2021-11-16	$ 2.504.456.477	$ 265.853.856.477				
4	OBRA	sep-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.500.000.000	469121 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2021-11-16	$ 2.504.456.477	$ 265.853.856.477				
4P	AJUSTES	sep-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.500.000.000	469121 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2021-11-16	$ 2.504.456.477	$ 265.853.856.477				
4D	AJUSTES	sep-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.500.000.000	469121 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2021-11-16	$ 2.504.456.477	$ 265.853.856.477				
5	OBRA	oct-21	$ 60.185.430	$ 439.817	$ 60.625.247	$ -	$ 60.625.247	$ 6.500.000.000	469121 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2021-11-16	$ 2.086.831.230	$ 265.793.231.230	120848 15-12-2021	X		
	E&D		$ 300.000.000	$ 57.000.000	$ 357.000.000	$ -	$ 357.000.000	$ 6.500.000.000			$ 265.436.231.230				
5P	AJUSTES	oct-21	$ 1.001.780	$ 7.321	$ 1.009.101	$ -	$ 1.009.101	$ 6.500.000.000	469121 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2021-11-16	$ 2.085.822.129	$ 265.435.222.129	123736 20-12-2021	X		
5D	AJUSTES	oct-21	$ 86.279	$ 631	$ 86.910	$ -	$ 86.910	$ 6.500.000.000	469121 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2021-11-16	$ 2.085.735.219	$ 265.435.135.219	123729 20-12-2021	X		
6	OBRA	nov-21	$ 305.151.023	$ 2.229.950	$ 307.380.973	$ -	$ 307.380.973	$ 6.500.000.000	469121 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2021-11-16	$ 1.778.354.246	$ 265.127.754.246	119973 13-12-2021 124327 21-12-2021	X		
6P	AJUSTES	nov-21	$ 4.639.328	$ 33.903	$ 4.673.231	$ -	$ 4.673.231	$ 6.500.000.000	469121 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2021-11-16	$ 1.773.681.015	$ 265.123.081.015	123741 20-12-2021	X		
7	OBRA	dic-21	$ 7.214.453.093	$ 52.721.003	$ 7.267.174.096	$ 1.360.216.747	$ 5.906.957.349	$ 5.139.783.253	469121 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2021-11-16	$ -	$ 257.855.906.919	124186 21-12-2021	X		
									469121 (C-2402-0600-13-0-2402021-02) 2021-11-16	$ -	$ 257.855.906.919				
									469121 (C-2402-0600-13-0-2402118-02) 2021-11-16	$ 136.123.666	$ 257.855.906.919				
7P	AJUSTES	dic-21	$ 135.136.133	$ 987.533	$ 136.123.666	$ -	$ 136.123.666	$ 5.139.783.253	469121 (C-2402-0600-13-0-2402118-02) 2021-11-16	$ -	$ 257.719.783.253	123945 21-12-2021	X		
6D	AJUSTES	nov-21	$ 602.101	$ 4.400	$ 606.501	$ -	$ 606.501	$ 5.139.783.253	268222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-02-21	$ 14.283.393.499	$ 257.719.176.752		X		
8	OBRA	ene-22	$ 384.632.498	$ 2.810.776	$ 387.443.274	$ 192.316.249	$ 195.127.025	$ 4.947.467.004	268222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-02-21	$ 14.088.266.474	$ 257.331.733.478	35552 07-04-2022	X		
9	OBRA	feb-22	$ 910.877.671	$ 6.656.414	$ 917.534.085	$ 455.438.836	$ 462.095.248	$ 4.492.028.168	268222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-02-21	$ 13.626.171.226	$ 256.414.199.393	35557 07-04-2022	X		
10	OBRA	mar-22	$ 1.939.415.022	$ 14.172.648	$ 1.953.587.670	$ 135.759.052	$ 1.817.828.618	$ 4.356.269.116	268222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-02-21	$ 11.808.342.608	$ 254.460.611.723	44706 03-05-2022	X		
11	OBRA	abr-22	$ 5.183.649.828	$ 37.880.518	$ 5.221.530.346	$ 414.691.986	$ 4.806.838.360	$ 3.941.577.130	268222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-02-21	$ 7.001.504.247	$ 249.239.081.377	57088 03-06-2022	X		
7D	AJUSTES	dic-21	$ 80.431.253	$ 587.767	$ 81.019.020	$ -	$ 81.019.020	$ 3.941.577.130	268222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-02-21	$ 6.920.485.227	$ 249.158.062.357	95595 07-09-2022	X		
12	OBRA	may-22	$ 3.304.260.771	$ 24.146.521	$ 3.328.407.292	$ 264.340.862	$ 3.069.068.588	$ 3.677.236.268	268222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-02-21	$ 3.851.416.639	$ 245.829.655.065	65904 24-06-2022	X		
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	may-22	$ 4.203.494	$ 798.664	$ 5.002.158	$ -					$ 245.824.652.907				
8D	AJUSTES	ene-22	$ 18.926.637	$ 138.310	$ 19.064.947	$ -	$ 19.064.947	$ 3.677.236.268	268222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-02-21	$ 3.832.351.692	$ 245.805.587.960	94336 02-09-2022	X		
9D	AJUSTES	feb-22	$ 26.496.596	$ 193.629	$ 26.690.225	$ -	$ 26.690.225	$ 3.677.236.268	268222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-02-21	$ 3.805.661.467	$ 245.778.897.735	96931 09-09-2022	X		

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** LA GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No: 1009 DE 2021 **CONTRATISTA:** UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066

MES INFORME MENSUAL: ago-25 **PROYECTO:** URIBIA - PUERTO BOLIVAR - CABO DE LA VELA -ESTRELLA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1005 de 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191

13	OBRA	jun-22	$ 3.104.941.512	$ 22.689.957	$ 3.127.631.469	$ 248.395.321	$ 2.879.236.148	$ 3.428.840.947	268222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-02-21	$ 926.425.319	$ 242.651.266.266	83424 08-08-2022	X		
6D	AJUSTES	nov-21	-$ 602.101	-$ 4.400	-$ 606.501	$ -	-$ 606.501	$ 3.428.840.947		$ 927.031.820	$ 242.651.872.767				Desistimiento pago Acta 6D por Glosa 604. Memorando Invias SF-GCP 44314 del 13-06-22
10D	AJUSTES	mar-22	$ 122.315.344	$ 893.843	$ 123.209.187	$ -	$ 123.209.187	$ 3.428.840.947	268222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-02-21	$ 803.822.633	$ 242.528.663.580	96953 09-09-2022	X		
11D	AJUSTES	abr-22	$ 448.267.524	$ 3.275.801	$ 451.543.325	$ -	$ 451.543.325	$ 3.428.840.947	268222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-02-21	$ 352.279.308	$ 252.077.120.255	96172 12-09-2022	X		Saldo del contrato incluye valor de Adición No. 1 por $10MM
12D	AJUSTES	may-22	$ 290.046.283	$ 2.119.569	$ 292.165.852	$ -	$ 292.165.852	$ 3.428.840.947	268222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-02-21	$ 60.113.456	$ 251.784.954.403	102512 23-09-2022	X		
14	OBRA	jul-22	$ 3.623.646.251	$ 26.480.492	$ 3.650.126.743	$ 289.891.700	$ 3.360.235.043	$ 3.138.949.247	268222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-02-21 268222 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2022-02-21	$ - $ 795.878.413	$ 248.134.827.660	96912 12-09-2022	X		
13D	AJUSTES	jun-22	$ 303.714.643	$ 2.219.453	$ 305.934.096	$ -	$ 305.934.096	$ 3.138.949.247	268222 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2022-02-21	$ 489.944.317	$ 247.828.893.564	102508 23-09-2022	X		
15	OBRA	ago-22	$ 2.610.147.019	$ 19.074.151	$ 2.629.221.170	$ 208.811.762	$ 2.420.409.408	$ 2.930.137.485	268222 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2022-02-21 268222 (C-2402-0600-13-0-2402021-02) 2022-02-21	$ - $ -	$ 245.195.425.619	109825 13-10-2022	X		
	PAGA	ago-22	$ 4.159.949	$ 86.826	$ 4.246.775	$ -	$ 4.246.775	$ 2.930.137.485	760222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-07-13	$ 8.198.621.467					
14D	AJUSTES	jul-22	$ 411.388.771	$ 3.006.303	$ 414.395.074	$ -	$ 414.395.074	$ 2.930.137.485	760222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-07-13	$ 7.784.226.393	$ 244.781.030.545	127738 25-11-22	X		
16	OBRA	sep-22	$ 2.331.780.845	$ 17.039.937	$ 2.348.820.782	$ 186.542.468	$ 2.162.278.314	$ 2.743.595.017	760222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-07-13	$ 5.621.948.079	$ 242.432.209.763	127747 25-11-22	X		
15D	AJUSTES	ago-22	$ 308.364.033	$ 2.253.429	$ 310.617.462	$ -	$ 310.617.462	$ 2.743.595.017	760222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-07-13	$ 5.311.330.617	$ 242.121.592.301	126430 01-12-22	X		
17	OBRA	oct-22	$ 2.730.866.474	$ 19.956.332	$ 2.750.822.806	$ 218.469.318	$ 2.532.353.488	$ 2.525.125.699	760222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-07-13	$ 2.778.977.129	$ 239.370.769.495	136798 14-12-22	X		
16D	AJUSTES	sep-22	$ 242.147.686	$ 1.769.541	$ 243.917.227	$ -	$ 243.917.227	$ 2.525.125.699	760222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-07-13	$ 2.535.059.902	$ 239.126.852.268	137978 15-12-22	X		
17D	AJUSTES	oct-22	$ 301.476.049	$ 2.203.094	$ 303.679.143	$ -	$ 303.679.143	$ 2.525.125.699	760222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-07-13	$ 2.231.380.759	$ 238.823.173.125	137982 15-12-22	X		
18	0BRA	nov-22	$ 1.664.505.438	$ 12.163.694	$ 1.676.669.132	$ 133.160.435	$ 1.543.508.697	$ 2.391.965.264	760222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-07-13	$ 687.872.062	$ 237.146.503.993	137973 22-12-22	X		
18P	AJUSTES	nov-22	$ 227.474.899	$ 1.662.317	$ 229.137.216	$ -	$ 229.137.216	$ 2.391.965.264	760222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-07-13	$ 458.734.846	$ 236.917.366.777	140590 19-12-22	X		
19	0BRA	dic-22	$ 433.625.741	$ 3.168.803	$ 436.794.544	$ 34.690.059	$ 402.104.485	$ 2.357.275.205	760222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-07-13	$ 56.630.361	$ 236.480.572.233	140565 19-12-22	X		
19P	AJUSTES	dic-22	$ 56.219.526	$ 410.835	$ 56.630.361	$ -	$ 56.630.361	$ 2.357.275.205	760222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-07-13	$ -	$ 236.423.941.872	140576 19-12-22	X		
20	0BRA	ene-23	$ 3.384.565.917	$ 24.733.366	$ 3.409.299.283	$ 270.765.273	$ 3.138.534.010	$ 2.086.509.932	215923 C-2402-0600-13-0-2402021-02 2023-03-01 215923 C-2402-0600-13-0-2402006-02 2023-03-02	$ - $ 7.833.465.990	$ 233.014.642.589	26674 21-03-23	X		
21	0BRA	feb-23	$ 1.620.164.535	$ 11.839.664	$ 1.632.004.199	$ 129.613.163	$ 1.502.391.036	$ 1.956.896.769	215923 C-2402-0600-13-0-2402006-02 2023-03-02	$ 6.331.074.954	$ 231.382.638.390	26527 21-03-23	X		
18D	AJUSTES	nov-22	$ 7.045.928	$ 51.489	$ 7.097.417	$ -	$ 7.097.417	$ 1.956.896.769	215923 C-2402-0600-13-0-2402006-02 2023-03-02	$ 6.323.977.537	$ 231.375.540.973	42704 01-06-23	X		
19D	AJUSTES	dic-22	-$ 560.666	-$ 4.097	-$ 564.763	$ -		$ 1.956.896.769	215923 (C-2402-0600-13-0-2402021-02) 2023-03-01	$ 6.323.977.537	$ 231.376.105.736				Desistimiento pago Acta 19D por Glosa
22	OBRA	mar-23	$ 2.443.986.327	$ 17.859.900	$ 2.461.846.227	$ 195.518.906	$ 2.265.762.558	$ 1.761.377.863	215923 (C-2402-0600-13-0-2402021-02) 2023-03-01	$ 4.058.214.979	$ 228.914.259.509	65800 17-07-23	X		
23	OBRA	abr-23	$ 1.486.437.508	$ 10.862.428	$ 1.497.299.936	$ 118.915.001	$ 1.378.384.935	$ 1.642.462.862	215923 C-2402-0600-13-0-2402006-02 2023-03-02	$ 2.679.830.044	$ 227.416.959.573	52169 13-06-23	X		
20D	AJUSTES	ene-23	$ 567.472.495	$ 4.146.914	$ 571.619.409	$ -	$ 571.619.409	$ 1.642.462.862	215923 C-2402-0600-13-0-2402006-02 2023-03-02	$ 2.108.210.635	$ 226.845.340.164	75979 10-08-23	X		
21D	AJUSTES	feb-23	$ 301.376.853	$ 2.202.369	$ 303.579.222	$ -	$ 303.579.222	$ 1.642.462.862	215923 C-2402-0600-13-0-2402006-02 2023-03-02	$ 1.804.631.413	$ 226.541.760.942	75991 09-08-23	X		
22D	AJUSTES	mar-23	$ 450.367.300	$ 3.291.146	$ 453.658.446	$ -	$ 453.658.446	$ 1.642.462.862	215923 C-2402-0600-13-0-2402006-02 2023-03-02	$ 1.350.972.967	$ 226.088.102.496	76001 08-08-23	X		

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** LA GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No: 1009 DE 2021 **CONTRATISTA:** UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066

MES INFORME MENSUAL: ago-25 **PROYECTO:** URIBIA - PUERTO BOLIVAR - CABO DE LA VELA -ESTRELLA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1005 de 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191

23D	AJUSTES	abr-23	$ 300.355.396	$ 2.194.905	$ 302.550.301	$ -	$ 302.550.301	$ 1.642.462.862	215923 C-2402-0600-13-0-2402006-02 2023-03-02	$ 1.048.422.666	$ 225.785.552.195	76005 10-08-23	X		
24	OBRA	may-23	$ 840.448.879	$ 6.141.742	$ 846.590.621	$ 67.235.910	$ 779.354.711	$ 1.575.226.952	215923 C-2402-0600-13-0-2402006-02 2023-03-02	$ 269.067.955	$ 224.938.961.574	75769 15-08-23	X		
	PAGA SOCIAL		$ 72.796.352	$ 337.349	$ 73.133.701	$ -	$ 73.133.701	$ 1.575.226.952	215923 C-2402-0600-13-0-2402006-02 2023-03-02	$ 195.934.254	$ 224.865.827.873				
24D	AJUSTES	may-23	$ 194.512.814	$ 1.421.440	$ 195.934.254	$ -	$ 195.934.254	$ 1.575.226.952	215923 C-2402-0600-13-0-2402006-02 2023-03-02	$ 3.072.000.000	$ 224.669.893.619	79009 08-08-23	X		
25	OBRA	jun-23	$ 2.681.153.298	$ 19.593.043	$ 2.700.746.341	$ 214.492.264	$ 2.486.254.077	$ 1.360.734.688	215923 C-2402-0600-13-0-2402015-02 2023-03-02	$ 585.745.923	$ 221.969.147.278	81559 14-09-23	X		
25P	AJUSTES	jun-23	$ 581.496.525	$ 4.249.398	$ 585.745.923	$ -	$ 585.745.923	$ 1.360.734.688	215923 C-2402-0600-13-0-2402015-02 2023-03-02	$ -	$ 221.383.401.355	81086 08-9-23	X		
26	OBRA	jul-23		$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.360.734.688	215923 C-2402-0600-13-0-2402006-02 2023-03-02	$ -	$ 221.383.401.355			X	Ceros
27	OBRA	ago-23	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.360.734.688	215923 C-2402-0600-13-0-2402006-02 2023-03-02	$ -	$ 221.383.401.355			X	Ceros
25D	AJUSTES	jun-23	-$ 581.188	-$ 4.247	-$ 585.435	$ -		$ 1.360.734.688	999323 C-2402-0600-13-0-2402006-02 2023-09-06	$ 5.000.000.000	$ 221.383.986.790				Desistimiento pago Acta 25D por Glosa
26D	AJUSTES	jul-23	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 1.360.734.688	999323 C-2402-0600-13-0-2402006-02 2023-09-06	$ 5.000.000.000	$ 221.383.986.790			X	Ceros
27D	AJUSTES	ago-23	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 1.360.734.688	999323 C-2402-0600-13-0-2402006-02 2023-09-06	$ 5.000.000.000	$ 221.383.986.790			X	Ceros
28	OBRA	sep-23	$ 1.701.256.730	$ 12.432.261	$ 1.713.688.991	$ 136.100.538	$ 1.577.003.018	$ 1.224.634.150	999323 C-2402-0600-13-0-2402006-02 2023-09-06	$ 3.422.996.982	$ 219.670.297.799	2643223 25-10-23	X		
28D	AJUSTES	sep-23	$ 315.540.681	$ 2.305.874	$ 317.846.555	$ -	$ 317.846.555	$ 1.224.634.150	999323 C-2402-0600-13-0-2402006-02 2023-09-06	$ 3.105.150.427	$ 219.352.451.244	3080123 28-11-23	X		
29	OBRA	oct-23	$ 405.972.753	$ 2.966.724	$ 408.939.477	$ 32.477.820	$ 376.461.657	$ 1.192.156.330	999323 C-2402-0600-13-0-2402006-02 2023-09-06	$ 2.728.688.770	$ 218.943.511.767	3084323 28-11-23	X		
29D	AJUSTES	oct-23	$ 87.615.761	$ 640.269	$ 88.256.030	$ -	$ 88.256.030	$ 1.192.156.330	999323 C-2402-0600-13-0-2402006-02 2023-09-06	$ 2.640.432.740	$ 218.855.255.737	3218923 06-12-23	X		
30	OBRA	nov-23	$ 540.073.013	$ 3.946.687	$ 544.019.700	$ 43.205.841	$ 500.813.859	$ 1.148.950.489	999323 C-2402-0600-13-0-2402006-02 2023-09-06	$ 2.139.618.881	$ 218.311.236.037	3565323 18-12-23	X		
30P	AJUSTES	nov-23	$ 140.865.867	$ 1.029.404	$ 141.895.271	$ -	$ 141.895.271	$ 1.148.950.489	999323 C-2402-0600-13-0-2402006-02 2023-09-06	$ 1.997.723.610	$ 218.169.340.766	3371923 12-12-23	X		
31	OBRA	dic-23	$ 1.686.291.908	$ 12.322.902	$ 1.698.614.810	$ 134.903.353	$ 1.563.711.457	$ 1.014.047.136	999323 C-2402-0600-13-0-2402006-02 2023-09-06	$ 434.012.153	$ 216.470.725.956	3673723 21-12-23	X		
31P	AJUSTES	dic-23	$ 430.863.535	$ 3.148.618	$ 434.012.153	$ -	$ 434.012.153	$ 1.014.047.136	999323 C-2402-0600-13-0-2402006-02 2023-09-06	$ -	$ 216.036.713.803	180324 2402-24	X		
30D	AJUSTES	nov-23	$ 4.581.393	$ 33.480	$ 4.614.873	$ -	$ 4.614.873	$ 1.014.047.136	244624 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 2024-03-22	$ 11.113.705.127	$ 216.032.098.930	583324 12-04-24	X		
									244624 C-2402-0600-13-51102A-2402015-02 2024-03-22	$ 2.831.680.000					
									244624 C-2402-0600-13-51102A-2402021-02 2024-03-22	$ 94.000.000					
31D	AJUSTES	dic-23	$ 14.396.091	$ 105.202	$ 14.501.293	$ -	$ 14.501.293	$ 1.014.047.136	244624 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 2024-03-22	$ 11.099.203.834	$ 216.017.597.637	583224 12-04-24	X		
									244624 C-2402-0600-13-51102A-2402015-02 2024-03-22	$ 2.831.680.000					
									244624 C-2402-0600-13-51102A-2402021-02 2024-03-22	$ 94.000.000					
32	OBRA	ene-24	$ 272.881.308	$ 1.994.133	$ 274.875.441	$ 21.830.505	$ 253.044.936	$ 992.216.631	244624 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 2024-03-22	$ 10.846.158.898	$ 215.742.722.196	1049024 29-05-24	X		
									244624 C-2402-0600-13-51102A-2402015-02 2024-03-22	$ 2.831.680.000					
									244624 C-2402-0600-13-51102A-2402021-02 2024-03-22	$ 94.000.000					
33	OBRA	feb-24	$ 482.523.993	$ 3.526.137	$ 486.050.130	$ 38.601.919	$ 447.448.211	$ 953.614.712	244624 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 2024-03-22	$ 10.398.710.687	$ 213.882.222.066	734424 01-05-24	X		
									244624 C-2402-0600-13-51102A-2402015-02 2024-03-22	$ 2.831.680.000					
									244624 C-2402-0600-13-51102A-2402021-02 2024-03-22	$ 94.000.000					
									244624 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 2024-03-22	$ 9.024.260.687					

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: LA GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No: 1009 DE 2021

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066

MES INFORME MENSUAL: ago-25

PROYECTO: URIBIA - PUERTO BOLIVAR - CABO DE LA VELA -ESTRELLA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1005 de 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191

	E&D		$ 1.155.000.000	$ 219.450.000	$ 1.374.450.000	$ -	$ 1.374.450.000	$ 953.614.712	244624 C-2402-0600-13-51102A-2402015-02 2024-03-22	$ 2.831.680.000			X		
									244624 C-2402-0600-13-51102A-2402021-02 2024-03-22	$ 94.000.000					
32D	AJUSTES	ene-24	$ 59.925.613	$ 437.918	$ 60.363.531	$ -	$ 60.363.531	$ 953.614.712	244624 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 2024-03-22	$ 8.963.897.156					
									244624 C-2402-0600-13-51102A-2402015-02 2024-03-22	$ 2.831.680.000	$ 213.821.858.535	897224 14-5-24	X		
									244624 C-2402-0600-13-51102A-2402021-02 2024-03-22	$ 94.000.000					
33D	AJUSTES	feb-24	$ 124.598.517	$ 910.528	$ 125.509.045	$ -	$ 125.509.045	$ 953.614.712	244624 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 2024-03-22	$ 8.838.388.111					
									244624 C-2402-0600-13-51102A-2402015-02 2024-03-22	$ 2.831.680.000	$ 213.696.349.490	95552 20-05-24	X		
									244624 C-2402-0600-13-51102A-2402021-02 2024-03-22	$ 94.000.000					
34	OBRA	mar-24	$ 702.780.676	$ 5.135.705	$ 707.916.381	$ 56.222.454	$ 651.693.927	$ 897.392.258	244624 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 2024-03-22	$ 8.186.694.184					
									244624 C-2402-0600-13-51102A-2402015-02 2024-03-22	$ 2.831.680.000	$ 212.988.433.109	873824 09-05-24	X		
									244624 C-2402-0600-13-51102A-2402021-02 2024-03-22	$ 94.000.000					
35	OBRA	abr-24	$ 1.058.687.258	$ 7.736.561	$ 1.066.423.819	$ 84.694.981	$ 981.728.838	$ 812.697.277	244624 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 2024-03-22	$ 7.204.965.346					
									244624 C-2402-0600-13-51102A-2402015-02 2024-03-22	$ 2.831.680.000	$ 211.922.009.290	986324 22-05-24	X		
									244624 C-2402-0600-13-51102A-2402021-02 2024-03-22	$ 94.000.000					
34D	AJUSTES	mar-24	$ 207.253.703	$ 1.514.546	$ 208.768.249	$ -	$ 208.768.249	$ 812.697.277	244624 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 2024-03-22	$ 6.996.197.097					
									244624 C-2402-0600-13-51102A-2402015-02 2024-03-22	$ 2.831.680.000	$ 211.713.241.041	1051224 30-05-24	X		
									244624 C-2402-0600-13-51102A-2402021-02 2024-03-22	$ 94.000.000					
36	OBRA	may-24	$ 540.273.497	$ 3.948.152	$ 544.221.649	$ 43.221.880	$ 500.999.769	$ 769.475.397	244624 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 2024-03-22	$ 6.495.197.328					
									244624 C-2402-0600-13-51102A-2402015-02 2024-03-22	$ 2.831.680.000	$ 211.169.019.392	1338524 26-06-24	X		
									244624 C-2402-0600-13-51102A-2402021-02 2024-03-22	$ 94.000.000					
35D	AJUSTES	abr-24	$ 224.133.500	$ 1.637.899	$ 225.771.399	$ -	$ 225.771.399	$ 769.475.397	244624 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 2024-03-22	$ 6.269.425.929					
									244624 C-2402-0600-13-51102A-2402015-02 2024-03-22	$ 2.831.680.000	$ 210.943.247.993	1292624 20-06-24	X		
									244624 C-2402-0600-13-51102A-2402021-02 2024-03-22	$ 94.000.000					
37	OBRA	jun-24	$ 770.171.624	$ 5.628.177	$ 775.799.801	$ 61.613.730	$ 714.186.071	$ 707.861.667	244624 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 2024-03-22	$ 5.555.239.858					
									244624 C-2402-0600-13-51102A-2402015-02 2024-03-22	$ 2.831.680.000	$ 210.167.448.192	1442524 07-07-24	X		
									244624 C-2402-0600-13-51102A-2402021-02 2024-03-22	$ 94.000.000					
36D	AJUSTES	may-24	$ 107.039.625	$ 782.213	$ 107.821.838	$ -	$ 107.821.838	$ 707.861.667	244624 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 2024-03-22	$ 5.447.418.020					
									244624 C-2402-0600-13-51102A-2402015-02 2024-03-22	$ 2.831.680.000	$ 210.059.626.354		X		
									244624 C-2402-0600-13-51102A-2402021-02 2024-03-22	$ 94.000.000					
									244624 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 2024-03-22	$ 5.284.341.444					

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** LA GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No: 1009 DE 2021 **CONTRATISTA:** UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066

MES INFORME MENSUAL: ago-25 **PROYECTO:** URIBIA - PUERTO BOLIVAR - CABO DE LA VELA -ESTRELLA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1005 de 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191

37D	AJUSTES	jun-24	$ 161.893.508	$ 1.183.068	$ 163.076.576	$ -	$ 163.076.576	$ 707.861.667	244624 C-2402-0600-13-51102A-2402015-02 2024-03-22	$ 2.831.680.000	$ 209.896.549.778		X		
									244624 C-2402-0600-13-51102A-2402021-02 2024-03-22	$ 94.000.000					
39	OBRA	ago-24	$ 657.008.529	$ 4.801.216	$ 661.809.745	$ 135.906.812	$ 525.902.933	$ 571.954.855	244624 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 2024-03-22	$ 4.758.438.511	$ 209.234.740.033		X		
									244624 C-2402-0600-13-51102A-2402015-02 2024-03-22	$ 2.831.680.000					
									244624 C-2402-0600-13-51102A-2402021-02 2024-03-22	$ 94.000.000					
38D	AJUSTES	jul-24	$ 10.291.144	$ 75.205	$ 10.366.349	$ -	$ 10.366.349	$ 571.954.855	244624 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 2024-03-22	$ 4.748.072.162	$ 209.224.373.684		X		
									244624 C-2402-0600-13-51102A-2402015-02 2024-03-22	$ 2.831.680.000					
									244624 C-2402-0600-13-51102A-2402021-02 2024-03-22	$ 94.000.000					
40	OBRA	sep-24	$ 1.971.626.161	$ 14.408.037	$ 1.986.034.198	$ -	$ 1.986.034.198	$ 571.954.855	244624 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 2024-03-22	$ 4.748.072.162	$ 207.238.339.486		X		
									244624 C-2402-0600-13-51102A-2402015-02 2024-03-22	$ 845.645.802					
									244624 C-2402-0600-13-51102A-2402021-02 2024-03-22	$ -					
									903124 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 2024-09-16	$ 13.000.000.000					
38	OBRA	jul-24	$ 504.869.908	$ 3.689.434	$ 508.559.342	$ 429.139.422	$ 79.419.920	$ 142.815.433	244624 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 2024-03-22	$ 4.748.072.162	$ 206.729.780.144		X		Desistimiento pago Acta 38 por Glosa 1117. Memorando Invias 2024I-VBOG-080130 2024-10-24
									244624 C-2402-0600-13-51102A-2402015-02 2024-03-22	$ 766.225.882					
									244624 C-2402-0600-13-51102A-2402021-02 2024-03-22	$ -					
									903124 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 2024-09-16	$ 13.000.000.000					
	PAGA SOCIAL		$ 67.084.947	$ 361.126	$ 67.446.073	$ 57.022.205	$ 10.423.868	$ 85.793.228	244624 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 2024-03-22	$ 4.748.072.162	$ 206.662.334.071		X		
									244624 C-2402-0600-13-51102A-2402015-02 2024-03-22	$ 755.802.014					
									244624 C-2402-0600-13-51102A-2402021-02 2024-03-22	$ -					
									903124 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 2024-09-16	$ 13.000.000.000					
39D	AJUSTES	ago-24	$ 18.129.971	$ 132.488	$ 18.262.459	$ -	$ 18.262.459	$ 85.793.228	244624 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 2024-03-22	$ 4.729.809.703	$ 206.644.071.612		X		
									244624 C-2402-0600-13-51102A-2402015-02 2024-03-22	$ 755.802.014					
									244624 C-2402-0600-13-51102A-2402021-02 2024-03-22	$ -					
									903124 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 2024-09-16	$ 13.000.000.000					
41	OBRA	oct-24	$ 1.851.747.653	$ 13.532.002	$ 1.865.279.655	$ 85.793.228	$ 1.779.486.427	$ -	244624 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 2024-03-22	$ 3.800.125.290	$ 204.778.791.957		X		
									244624 C-2402-0600-13-51102A-2402015-02 2024-03-22	$ -					
									244624 C-2402-0600-13-51102A-2402021-02 2024-03-22	$ -					
									903124 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 2024-09-16	$ 13.000.000.000					
42D	AJUSTES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	244624 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 2024-03-22	$ 3.411.868.906	[illegible]		X		
									244624 C-2402-0600-13-51102A-2402015-02 2024-03-22	$ -					

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** LA GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No: 1009 DE 2021 **CONTRATISTA:** UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066

MES INFORME MENSUAL: ago-25 **PROYECTO:** URIBIA - PUERTO BOLIVAR - CABO DE LA VELA -ESTRELLA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1005 de 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191

40D	AJUSTES	sep-24	$ 385.439.709	$ 2.816.675	$ 388.256.384	$ -	$ 388.256.384	$ -	244624 C-2402-0600-13-51102A-2402021-02 2024-03-22 903124 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 2024-09-16	$ - $ 13.000.000.000	$ 204.390.535.573		X		
ANTICIPO 2					$ -	$ -	$ -	$ 5.000.000.000	244624 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 2024-03-22 903124 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 2024-09-16	$ 3.411.868.906 $ 8.000.000.000	$ 199.390.535.573		X		
41D	AJUSTES	oct-24	$ 441.525.614	$ 3.226.533	$ 444.752.147	$ -	$ 444.752.147	$ 5.000.000.000	244624 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 2024-03-22 903124 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 2024-09-16	$ 2.967.116.759 $ 8.000.000.000	$ 198.945.783.426		X		
42	OBRA	nov-24	$ 4.992.301.836	$ 36.482.206	$ 5.028.784.042	$ -	$ 5.028.784.042	$ 5.000.000.000	244624 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 2024-03-22 244624 C-2402-0600-13-51102A-2402015-02 2024-03-22	 $ 5.938.332.717	$ 193.916.999.384		X		
	SOCIAL	nov-24	$ 78.223.802	$ 362.501	$ 78.586.303	$ -	$ 78.586.303		244624 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 2024-03-22 903124 C-2402-0600-13-51102A-2402015-02 2024-03-22	 $ 5.859.746.414	$ 193.838.413.081		X		
42P	AJUSTES	nov-24	$ 1.196.423.796	$ 8.743.097	$ 1.205.166.893	$ -	$ 1.205.166.893	$ 5.000.000.000	903124 C-2402-0600-13-51102A-2402015-02 2024-03-22	$ 4.654.579.521	$ 192.633.246.188		X		
43	OBRA	dic-24	$ 3.652.445.734	$ 26.690.950	$ 3.679.136.684		$ 3.679.136.684	$ 5.000.000.000	903124 C-2402-0600-13-51102A-2402015-02 2024-03-22	$ 975.442.837	$ 190.159.276.397		X		
43P	AJUSTES	dic-24	$ 968.366.314	$ 7.076.523	$ 975.442.837	$ -	$ 975.442.837	$ 5.000.000.000	903124 C-2402-0600-13-51102A-2402015-02 2024-03-22	$ -	$ 189.183.833.560		X		
44	OBRA	ene-25	$ 554.703.210	$ 4.053.600	$ 558.756.810		$ 558.756.810	$ 5.000.000.000	159825 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	$ 24.529.243.190	$ 188.625.076.750		X		
45	OBRA	feb-25	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 5.000.000.000	159825 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	$ 24.529.243.190	$ 188.625.076.750		X		
46	OBRA	mar-25	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 5.000.000.000	159825 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	$ 24.529.243.190	$ 188.625.076.750		X		
42D	AJUSTES	nov-24	$ 5.740.534	$ 41.950	$ 5.782.484	$ -	$ 5.782.484	$ 5.000.000.000	159825 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	$ 24.523.460.706	$ 188.619.294.266		X		
43D	AJUSTES	dic-24	-$ 8.453.265	-$ 61.774	-$ 8.515.039	$ -	-$ 8.515.039	$ 5.000.000.000	159825 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	$ 24.531.975.745	$ 188.619.294.266		X		
44D	AJUSTES	ene-25	$ 83.313.972	$ 608.833	$ 83.922.805	$ -	$ 83.922.805	$ 5.000.000.000	159825 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	$ 24.448.052.940	$ 188.526.856.422		X		
45D	AJUSTES	feb-25	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.000.000.000	159825 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	$ 24.448.052.940	$ 188.526.856.422		X		
46D	AJUSTES	mar-25	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.000.000.000	159825 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	$ 24.448.052.940	$ 188.526.856.422		X		
47	OBRA	abr-25	$ 268.570.016	$ 1.962.627	$ 270.532.643		$ 270.532.643	$ 5.000.000.000	159825 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	$ 24.177.520.297	$ 188.256.323.779		X		
48	OBRA	may-25	$ 1.986.934.940	$ 14.519.909	$ 2.001.454.849	$ 63.959.436	$ 1.937.495.413	$ 4.936.040.564	159825 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	$ 22.240.024.884	$ 186.254.868.930		X		
47D	AJUSTES	abr-25	$ 74.456.108	$ 544.102	$ 75.000.210	$ -	$ 75.000.210	$ 4.936.040.564	159825 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	$ 22.165.024.674	$ 186.179.868.720		X		
49	OBRA	jun-25	$ 1.801.902.003	$ 13.167.745	$ 1.815.069.748	$ 58.003.225	$ 1.757.066.523	$ 4.878.037.339	159825 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	$ 20.407.958.151	$ 184.364.798.972		X		
48D	AJUSTES	may-25	$ 681.370.782	$ 4.979.248	$ 686.350.030	$ -	$ 686.350.030	$ 4.878.037.339	159825 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	$ 19.721.608.121	$ 183.678.448.942		X		
50	OBRA	jul-25	$ 2.003.476.140	$ 14.640.787	$ 2.018.116.927	$ 64.491.897	$ 1.953.625.030	$ 4.813.545.442	159825 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	$ 17.767.983.091	$ 181.660.332.015			X	
49D	AJUSTES	jun-25	$ 577.923.367	$ 4.223.286	$ 582.146.653	$ -	$ 582.146.653	$ 4.813.545.442	159825 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	$ 17.185.836.438	$ 181.078.185.362		X		
51	OBRA	Ago-25	$ 2.332.956.822	$ 17.048.531	$ 2.350.005.353	$ 75.097.880	$ 2.274.907.473	$ 4.738.447.562	159825 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	$ 14.910.928.965	$ 178.728.180.009			X	
TOTALES			**$ 92.372.673.397**	**$ 941.139.886**	**$ 93.313.813.283**	**$ 6.761.552.438**	**$ 86.552.260.844**	**$ 4.738.447.562**		**$ 14.910.928.965**	**$ 178.728.180.009**				

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** LA GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No: 1009 DE 2021 **CONTRATISTA:** UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066

MES INFORME MENSUAL: ago-25 **PROYECTO:** URIBIA - PUERTO BOLIVAR - CABO DE LA VELA -ESTRELLA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1005 de 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BASICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 78.998.350.792	$ 577.295.640	**$ 79.575.646.432**
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 11.692.854.061	$ 85.447.780	**$ 11.778.301.841**
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ -	$ -	**$ -**
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 1.455.000.000	$ 276.450.000	**$ 1.731.450.000**
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE	$ 222.265.050	$ 1.147.802	**$ 223.412.852**
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	$ 4.203.494	$ 798.664	**$ 5.002.158**
VALOR TOTAL	**$ 92.372.673.397**	**$ 941.139.886**	**$ 93.313.813.283**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA: Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: **JUAN CARLOS CAMARGO RODRIGUEZ**
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 01107-0907

Firma
Nombre: **RICHARD DIAZ ORTEGA**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 01101-0595 CPTIVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

PREACTA DE OBRA No. 51

CONTRATO No : **1009 DE 2021** FECHA: **25/08/2025**

OBJETO : "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2.

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO) URIBIA - PUERTO BOLIVAR - CABO DE LA VELA - ESTRELLA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1005 DE 2021 CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
EXPLANACIONES								
2	201.7	201-13		Demolición de Estructuras	m3	75,00	$ 113.989,00	$ 8.549.175,00
5	210.1.2	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	1.450,00	$ 12.579,00	$ 18.239.550,00
8	220.1	220.1		Terraplenes	m3	1.450,00	$ 13.249,00	$ 19.211.050,00
Subtotal								**$ 45.999.775,00**
BASES,								
9	310.1	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	194,00	$ 961,00	$ 186.434,00
Subtotal								**$ 186.434,00**
PAVIM								
12	420-13	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	6.862,00	$ 2.926,00	$ 20.078.212,00
Subtotal								**$ 20.078.212,00**
ESTRUCTURAS Y DRENAJES								
14	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	1.408,75	$ 32.667,00	$ 46.019.636,00
17	610.2	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	709,13	$ 109.936,00	$ 77.958.916,00
20	630.1.1P		630.1.1P	Concreto clase 35 MPA, para para Viga de puentes	m3	46,78	$ 1.433.984,00	$ 67.081.772,00
23	630.3	630-13		Concrreto 28 MPA	m3	26,08	$ 956.449,00	$ 24.944.190,00
24	630.4	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	6,32	$ 809.984,00	$ 5.119.099,00
27	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	1.983,07	$ 5.378,00	$ 10.664.950,00
28	641.1	641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m	66.116,92	$ 2.237,00	$ 147.903.550,00
Subtotal								**$ 379.692.113,00**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD								
37	730.1	730-13		Defensa metalica	m	36,00	$ 230.532,00	$ 8.299.152,00
38	730.2	730-13		Sección final	u	2,00	$ 103.189,00	$ 206.378,00
Subtotal								**$ 8.505.530,00**
TRANS								
41	900.2	900-13	900-13	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	18.422,83	$ 1.175,00	$ 21.646.825,00
Subtotal								**$ 21.646.825,00**
ITEMS NUEVOS								
NP1		320-13		Sub base granular Clase B	m3	793,00	$ 303.867,00	$ 240.966.531,00
NP2		330-13		Base granular Clase B	m3	1.077,00	$ 318.020,00	$ 342.507.540,00
NP3		450-13		Mezcla semidensa en caliente Tipo MSC-19	m3	953,00	$ 1.002.812,00	$ 955.679.836,00
NP4				Geotextil bx-50 o Similar	m2	4.580,00	$ 13.127,00	$ 60.121.660,00
NP5		662-13		Tubería metálica corrugada galvanizada calibre 14 y 48" diámetro interior	m	65,10	$ 1.682.190,00	$ 109.510.569,00
NP7				Remoción de alcantarillas metálicas diámetros 0.90 a 1.20 m	m	101,60	$ 77.932,00	$ 7.917.891,00
NP10				Recubrimiento con base en resinas epóxicas Coaltar Epóxico o similar para protección de tuberías metálicas contra agentes altamente agresivos	m2	445,50	$ 38.846,00	$ 17.305.893,00
NP12		662-13		Tubería metálica corrugada galvanizada calibre 14 y 60" diámetro interior (Especificación 662.13)	m	32,90	$ 2.357.951,00	$ 77.576.588,00
NP21	NP21		EP NP21	Protección de taludes con piedra pegada	m2	193,29	$ 119.328,00	$ 23.064.909,00
NP24	NP24		EP NP24	Concreto fc=28 MPa para viga cabezal, Diafragma y topes sismicos	m3	10,87	$ 1.378.655,00	$ 14.985.980,00
NP28	NP28		EP NP27	Apoyo elastomérico 300 * 300 * 20 Dureza 60	u	12,00	$ 600.878,00	$ 7.210.536,00
Subtotal								**$ 1.856.847.933,00**
ESTUDIOS Y DISEÑOS								
Subtotal								
						TOTAL OBRA		**$ 2.332.956.822,00**

Residente de obra
ING. JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL
Matrícula Profesional No.: 68202-135522 STD

Residente de interventoría
ING. LUIS ACUÑA
Matrícula Profesional No.: 08202089213 ATL

MEMORIA DE CANTIDADES - PREACTA PARCIAL DE COBRO

CONTRATO No.	1009 DE 2021	**CONTRATISTA**	UT ANDINO 066						CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191
FECHA REPORTE:	**DD** 25	**MM** 8	**AA** 2025	**CORTE N°**	51	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No**			1005 DE 2021

OBJETO DEL CONTRATO	"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2.

CAPÍTULO	**EXPLANACIONES**	**ITEM**	Demolición de Estructuras	**UNID.**






Localización: | **m3** | **OBSERVACIÓN**


TRAMO URIBIA PUERTO

ABSCISA	ELEMENTO	DIÁMETRO	CANTIDAD DUCTOS / ELEMENTOS	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	VOLÚMEN	OBSERVACIÓN
PR 100+025	MURO	1,22	2	3,5	1,8	0,3	2 m3	14,18 m3 CANTIDAD EJECUTADA $VOL = A * B * C - 3.1416E^2 * C * D$
	ALETAS		4	2,95	1,4	0,3	5 m3	
	DENTELLÓN							
	CIMIENTO/LOSA		2	5,15	2,2	0,3	7 m3	
PR 100+110	MURO	1,22	2	14,35	1,5	0,25	10 m3	60,89 m3 CANTIDAD EJECUTADA $VOL = A * B * C - 3.1416E^2 * C * D$ $VOL = A * B * C - 3.1416E^2 * C * D$
	ALETAS		4	1,05	2,45	0,34	3 m3	
	CIMIENTO/LOSA		2	16,15	2,2	0,4	28 m3	
	PIEDRA PEGADA ALETAS		2	2	1,8	0,2	1 m3	
	PIEDRA PEGADA ALETAS		2	2	1,8	0,2	1 m3	
	PIEDRA PEGADA CABEZOTE		2	20,615	2	0,2	16 m3	

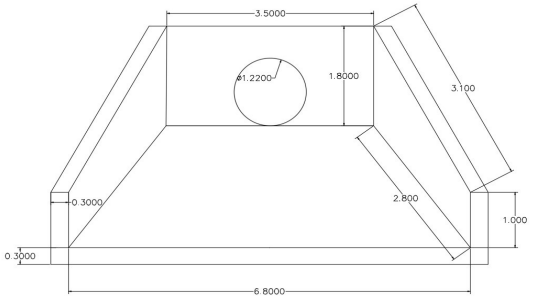

ALCANTARILLA
PR 100+025

ALCANTARILLA
PR 100+110

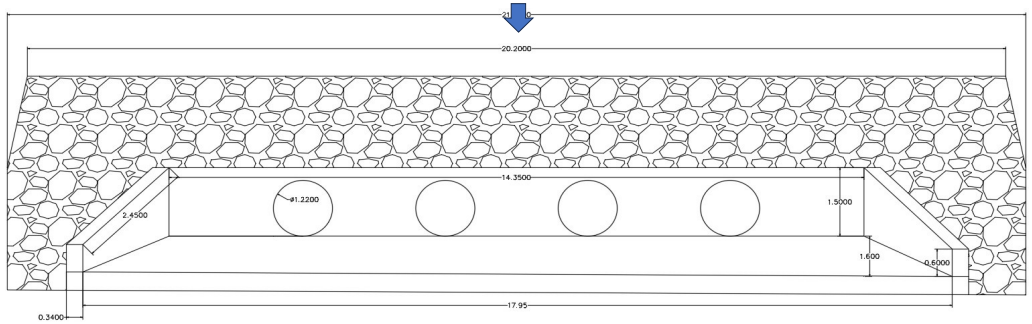

75,00 m3

TOTAL EJECUTADO	2.104,46
FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR	2.029,46
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA	**75,00**

OBSERVACIONES :

Residente de obra
ING. JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL
Matrícula Profesional No.: 68202-135522 STD

Residente de interventoría
ING. LUIS ACUÑA
Matrícula Profesional No.: 68202089213 ATL

MEMORIA DE CANTIDADES - PREACTA PARCIAL DE COBRO

CONTRATO No.	1009 DE 2021	CONTRATISTA	UT ANDINO 066		INTERVENTORIA	CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191
FECHA REPORTE:	DD 25 MM 8 AA 2025	CORTE N°	51		CONTRATO DE INTERVENTORIA No	1005 DE 2021
OBJETO DEL CONTRATO	"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2.					

CAPÍTULO	EXPLANACIONES	ITEM	Excavación sin clasificar de préstamos	UNID.	m3	



Localización inicial	Localización final	Distancia	vol. De terraplen	Vol. De terraplen ACUMULADO	OBSERVACIÓN
MATERIAL DE PRESTAMO LATERALES PR 94 AL PR 103+640 - 104+000					
PR 103+640	PR 104+000	360	1449,80	**1449,80**	
				1449,80	**total**

Observación:

TOTAL EJECUTADO	164.612,17
FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR	163.162,37
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA	**1.450,00**

Residente de obra
ING. JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL **Matrícula**
Profesional No.: 68202-135522 STD

Residente de interventoría
ING. LUIS ACUÑA
Matrícula Profesiona No.: 08202089213 ATL

	CARTERA DE TERRENO NATURAL						CARTERA DE TERRAPLEN										
PUNTO	V. ATRÁS	A.INSTRU	V.INTER	DISTANCIA	DESCRIPCION	COTA TERRENO NATURAL	V. ATRÁS	A. INSTRU	V. INTER	DISTANCIA	DESCRIPCION	COTA SUB RASANTE	PROMEDIO ALTURA	PROMEDIO ANCHO	AREA	DISTANCIA	VOLUMEN TERRAPLEN
BM	**1,182**	**11,774**				**10,592**	**1,228**	**11,820**				**10,592**					
			0,714	-8,000	PATA .IZQ	11,060			0,790	-6,000	PATA .IZQ	11,030					
			0,714	-6,000	HOM . IZQ	11,060			0,760	-5,340	HOM . IZQ	11,060					
103+640			0,714	0,000	EJE	11,060			0,660	0,000	EJE	11,160	0,093	11,340	1,058	0,000	0,000
			0,894	6,000	HOM. DER	10,880			0,760	5,340	HOM. DER	11,060					
			0,844	8,000	PATA. DER	10,930			0,890	6,000	PATA. DER	10,930					
			0,870	-8,000	PATA .IZQ	10,904			1,100	-6,000	PATA .IZQ	10,720					
			0,710	-6,000	HOM . IZQ	10,900			0,820	-5,340	HOM . IZQ	11,000					
103+660			0,630	0,000	EJE	10,900			0,720	0,000	EJE	11,100	0,153	11,390	1,746	20,000	34,929
			0,830	6,000	HOM. DER	10,840			0,820	5,340	HOM. DER	11,000					
			0,960	8,000	PATA. DER	10,814			1,000	6,100	PATA. DER	10,820					
			1,000	-8,000	PATA .IZQ	10,774			1,080	-6,000	PATA .IZQ	10,740					
			0,900	-6,000	HOM . IZQ	10,874			0,880	-5,340	HOM . IZQ	10,940					
103+680			0,900	0,000	EJE	10,874			0,780	0,000	EJE	11,040	0,133	11,340	1,504	20,000	30,089
			1,000	6,000	HOM. DER	10,774			0,880	5,340	HOM. DER	10,940					
			1,200	8,000	PATA. DER	10,574			1,050	6,000	PATA. DER	10,770					
			1,100	-8,000	PATA .IZQ	10,674			1,030	-6,000	PATA .IZQ	10,790					
			1,000	-6,000	HOM . IZQ	10,774			0,940	-5,340	HOM . IZQ	10,880					
103+700			1,020	0,000	EJE	10,754			0,840	0,000	EJE	10,980	0,206	11,440	2,357	20,000	47,133
			1,180	6,000	HOM. DER	10,594			0,940	5,340	HOM. DER	10,880					
			1,220	8,000	PATA. DER	10,554			1,170	6,200	PATA. DER	10,650					
			1,030	-8,000	PATA .IZQ	10,744			0,967	-6,000	PATA .IZQ	10,853					
			1,020	-6,000	HOM . IZQ	10,754			1,000	-5,340	HOM . IZQ	10,820					
103+720			1,050	0,000	EJE	10,724			0,900	0,000	EJE	10,920	0,203	11,490	2,329	20,000	46,573
			1,300	6,000	HOM. DER	10,474			1,000	5,340	HOM. DER	10,820					
			1,300	8,000	PATA. DER	10,474			1,330	6,300	PATA. DER	10,490					
			1,150	-8,000	PATA .IZQ	10,624			1,090	-6,000	PATA .IZQ	10,730					
			1,120	-6,000	HOM . IZQ	10,654			1,060	-5,340	HOM . IZQ	10,760					
103+740			1,100	0,000	EJE	10,674			0,960	0,000	EJE	10,860	0,203	11,490	2,329	20,000	46,573
			1,330	6,000	HOM. DER	10,444			1,060	5,340	HOM. DER	10,760					
			1,400	8,000	PATA. DER	10,374			1,360	6,300	PATA. DER	10,460					
			1,200	-8,000	PATA .IZQ	10,574			1,090	-6,000	PATA .IZQ	10,730					
			1,150	-6,000	HOM . IZQ	10,624			1,120	-5,340	HOM . IZQ	10,700					
103+760			1,130	0,000	EJE	10,644			1,020	0,000	EJE	10,800	0,196	11,540	2,262	20,000	45,237
			1,430	6,000	HOM. DER	10,344			1,120	5,340	HOM. DER	10,700					
			1,430	8,000	PATA. DER	10,344			1,480	6,400	PATA. DER	10,340					
			1,200	-8,000	PATA .IZQ	10,574			1,540	-6,000	PATA .IZQ	10,280					
			1,180	-6,000	HOM . IZQ	10,594			1,180	-5,340	HOM . IZQ	10,640					
103+780			1,180	0,000	EJE	10,594			1,080	0,000	EJE	10,740	0,166	11,490	1,907	20,000	38,147
			1,440	6,000	HOM. DER	10,334			1,180	5,340	HOM. DER	10,640					
			1,490	8,000	PATA. DER	10,284			1,540	6,300	PATA. DER	10,280					
			1,270	-8,000	PATA .IZQ	10,504			1,600	-6,000	PATA .IZQ	10,220					
			1,210	-6,000	HOM . IZQ	10,564			1,150	-5,340	HOM . IZQ	10,670					
103+800			1,190	0,000	EJE	10,584			1,050	0,000	EJE	10,770	0,209	11,590	2,426	20,000	48,523
			1,440	6,000	HOM. DER	10,334			1,150	5,340	HOM. DER	10,670					
			1,600	8,000	PATA. DER	10,174			1,650	6,500	PATA. DER	10,170					
			1,140	-8,000	PATA .IZQ	10,634			1,550	-6,200	PATA .IZQ	10,270					
			1,200	-6,000	HOM . IZQ	10,574			1,090	-5,340	HOM . IZQ	10,730					
103+820			1,220	0,000	EJE	10,554			0,990	0,000	EJE	10,830	0,286	11,740	3,358	20,000	67,153
			1,470	6,000	HOM. DER	10,304			1,090	5,340	HOM. DER	10,730					
			1,630	8,000	PATA. DER	10,144			1,670	6,600	PATA. DER	10,150					
			1,190	-8,000	PATA .IZQ	10,584			1,600	-6,200	PATA .IZQ	10,220					
			1,180	-6,000	HOM . IZQ	10,594			1,030	-5,340	HOM . IZQ	10,790					
103+840			1,190	0,000	EJE	10,584			0,930	0,000	EJE	10,890	0,316	11,690	3,694	20,000	73,881
			1,430	6,000	HOM. DER	10,344			1,030	5,340	HOM. DER	10,790					
			1,650	8,000	PATA. DER	10,124			1,700	6,500	PATA. DER	10,120					
			1,280	-8,000	PATA .IZQ	10,494			1,600	-6,400	PATA .IZQ	10,220					
			1,250	-6,000	HOM . IZQ	10,524			0,970	-5,340	HOM . IZQ	10,850					
103+860			1,220	0,000	EJE	10,554			0,870	0,000	EJE	10,950	0,416	11,890	4,946	20,000	98,925
			1,450	6,000	HOM. DER	10,324			0,970	5,340	HOM. DER	10,850					
			1,620	8,000	PATA. DER	10,154			1,670	6,700	PATA. DER	10,150					
			1,300	-8,000	PATA .IZQ	10,474			1,620	-6,600	PATA .IZQ	10,200					
			1,270	-6,000	HOM . IZQ	10,504			0,910	-5,340	HOM . IZQ	10,910					
103+880			1,250	0,000	EJE	10,524			0,810	0,000	EJE	11,010	0,486	11,990	5,827	20,000	116,543
			1,430	6,000	HOM. DER	10,344			0,910	5,340	HOM. DER	10,910					
			1,700	8,000	PATA. DER	10,074			1,770	6,700	PATA. DER	10,050					
			1,130	-8,000	PATA .IZQ	10,644			1,620	-6,500	PATA .IZQ	10,200					
			1,150	-6,000	HOM . IZQ	10,624			0,850	-5,340	HOM . IZQ	10,970					
103+900			1,100	0,000	EJE	10,674			0,750	0,000	EJE	11,070	0,506	12,090	6,118	20,000	122,351
			1,580	6,000	HOM. DER	10,194			0,850	5,340	HOM. DER	10,970					
			1,750	8,000	PATA. DER	10,024			1,800	7,000	PATA. DER	10,020					
103+860	**1,456**	**11,573**				**10,117**	**1,523**	**11,640**				**10,117**					
			1,410	-8,000	PATA .IZQ	10,364			1,180	-6,500	PATA .IZQ	10,460					
			1,200	-6,000	HOM . IZQ	10,574			0,610	-5,340	HOM . IZQ	11,030					
103+920			1,120	0,000	EJE	10,654			0,510	0,000	EJE	11,130	0,529	12,090	6,400	20,000	127,993
			1,400	6,000	HOM. DER	10,374			0,610	5,340	HOM. DER	11,030					
			1,400	8,000	PATA. DER	10,374			1,210	7,000	PATA. DER	10,430					
			1,420	-8,000	PATA .IZQ	10,354			1,290	-6,600	PATA .IZQ	10,350					
			1,350	-6,000	HOM . IZQ	10,424			0,550	-5,340	HOM . IZQ	11,090					

103+940			1,100	0,000	EJE	10,674			0,450	0,000	EJE	11,190	0,616	12,190	7,509	20,000	150,181
			1,350	6,000	HOM. DER	10,424			0,550	5,340	HOM. DER	11,090					
			1,360	8,000	PATA. DER	10,414			1,330	7,100	PATA. DER	10,310					
103+960			1,140	-8,000	PATA .IZQ	10,634			1,200	-6,500	PATA .IZQ	10,440					
			1,330	-6,000	HOM . IZQ	10,444			0,520	-5,340	HOM . IZQ	11,120					
			1,110	0,000	EJE	10,664			0,420	0,000	EJE	11,220	0,633	12,190	7,712	20,000	154,244
			1,320	6,000	HOM. DER	10,454			0,520	5,340	HOM. DER	11,120					
			1,320	8,000	PATA. DER	10,454			1,150	7,200	PATA. DER	10,490					
103+980			1,270	-8,000	PATA .IZQ	10,504			1,130	-6,500	PATA .IZQ	10,510					
			1,240	-6,000	HOM . IZQ	10,534			0,580	-5,340	HOM . IZQ	11,060					
			1,020	0,000	EJE	10,754			0,480	0,000	EJE	11,160	0,506	12,090	6,118	20,000	122,351
			1,300	6,000	HOM. DER	10,474			0,580	5,340	HOM. DER	11,060					
			1,340	8,000	PATA. DER	10,434			1,090	7,000	PATA. DER	10,550					
104+000			1,130	-8,000	PATA .IZQ	10,644			1,040	-6,500	PATA .IZQ	10,600					
			1,000	-6,000	HOM . IZQ	10,774			0,640	-5,340	HOM . IZQ	11,000					
			1,010	0,000	EJE	10,764			0,540	0,000	EJE	11,100	0,329	11,990	3,949	20,000	78,974
			1,200	6,000	HOM. DER	10,574			0,640	5,340	HOM. DER	11,000					
			1,220	8,000	PATA. DER	10,554			1,300	6,800	PATA. DER	10,340					
																TOTAL	**1449,798**

Topografo Obra : OSCAR QUIROZ MARTINEZ
Matrícula Topografo Profesional: 01-15911

Topografo Interventoria : ENEMITH CARDONA ORTIZ
Matrícula topografo profesional: 0115888 CNPT

MEMORIA DE CANTIDADES - PREACTA PARCIAL DE COBRO

CONTRATO No.	1009 DE 2021	CONTRATISTA	UT ANDINO 066	INTERVENTORIA	CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191

FECHA REPORTE:	DD	25	MM	8	AA	2025	CORTE N°	51

CONTRATO DE INTERVENTORIA No	1005 DE 2021

OBJETO DEL CONTRATO	"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2.

CAPÍTULO	EXPLANACIONES	ITEM	Terraplenes	UNID.	M3	Observación



Localización inicial	Localización final	Distancia	vol. De terraplen	vol. De terraplen ACUMULADO	OBSERVACIÓN
MATERIAL DE PRESTAMO LATERALES PR 94 AL PR 103+640 al 104+000					
PR 103+640	PR 104+000	360,00	1449,80	**1449,80**	
				1449,80	**total**

Observación: Revisar soportes (Volumendel PR 103+640- 104+000)

TOTAL EJECUTADO	162.209
FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR	160.759
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA	**1.450,0**

Residente de obra
ING. JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL
Matrícula Profesional No.: 68202-135522 STD

Residente de interventoría
ING. LUIS ACUÑA
Matrícula Profesional No.: 08202089213 ATL

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATO No.	1009 DE 2021	**CONTRATISTA**	UT ANDINO 066
FECHA REPORTE:	**DD** 25 **MM** 8 **AA** 2025	**CORTE N°**	51


INTERVENTORÍA	CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191
ONTRATO DE INTERVENTORIA I	1005 DE 2021

OBJETO DEL CONTRATO	"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2.

CAPÍTULO	**ESTRUCTURAS Y DRENAJES**	**ITEM**	Conformación de la calzada existente	**UNID.**	**m2**	



Localización:			**m2**			**OBSERVACIÓN**
TRAMO URIBIA PUERTO						
Inicial	**Longitud**	**Ancho**	**Área**	**CANTIDAD**	**Total**	
PR 78+038	4,90	4,85	23,77	1,00	23,77	Cuadricula 6
	5,05	4,80	24,24	1,00	24,24	Cuadricula 7
	5,10	4,85	24,74	1,00	24,74	Cuadricula 8
	5,20	4,85	25,22	1,00	25,22	Cuadricula 9
	5,25	4,90	25,73	1,00	25,73	Cuadricula 10
					124,00	
PR 78+000	4,80	4,85	23,28	1,00	23,28	Cuadricula 11
	4,80	4,80	23,04	1,00	23,04	Cuadricula 12
	4,80	4,85	23,28	1,00	23,28	Cuadricula 13
					70,00	



presente acta

Actas previas

TOTAL EJECUTADO	5.500
FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR	5.306
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA	**194,00**

Residente de obra
ING. JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL
Matrícula Profesional No.: 68202-135522 STD

Residente de interventoria
ING. LUIS ACUÑA
Matrícula Profesional No.: 08202089213 ATL

MEMORIA DE CANTIDADES - PREACTA FINAL DE COBRO

CONTRATO No.	1009 DE 2021	CONTRATISTA	UT ANDINO 066				INTERVENTORIA	CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191

FECHA REPORTE:	DD	25	MM	8	AA	2025	CORTE N°	51	CONTRATO DE INTERVENTORIA No	1005 DE 2021

OBJETO DEL CONTRATO	"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2.

CAPÍTULO	PAVIMENTOS ASFALTICOS	ITEM	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	UNID.	m2	





Localización:					m2	OBSERVACIÓN
TRAMOS						
Inicial	Final	Longitud	Ancho		Total	
PR 103+070	PR 103+800	730,00	9,40		6.862,00	
					6.862,00	

OBSERVACIONES :	

TOTAL EJECUTADO	240.472
FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR	233.610
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA	**6.862**

Residente de obra
ING. JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL
Matrícula Profesional No.: 68202-135522 STD

Residente de Interventoria
ING. LUIS ACUÑA
Matrícula Profesional No.: 08202089213 ATL

MEMORIA DE CANTIDADES - PREACTA PARCIAL DE COBRO

CONTRATO No.	1009 DE 2021	**CONTRATISTA**		**INTERVENTORIA**	CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191
FECHA REPORTE:	**DD** 25 **MM** 8 **AA** 2025	**CORTE N°**	51	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No**	1005 DE 2021

OBJETO DEL CONTRATO	"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2.

CAPÍTULO	**ESTRUCTURAS Y DRENAJES**	**ITEM**	Excavaciones varias sin clasificar	**UNID.**	OBSERVACIÓN



Localización: **M3**

TRAMO URIBIA PUERTO

Abscisa	elemento	Diámetro	Radio	conductos	Longitud prom (A)	ancho (B)	alto (C)	Volumen	Observación
PR 100+025	alcantarilla	1,22	0,61	1,00	19,00	8,40	3,20	493,42	
PR 100+110	alcantarilla	1,22	0,61	4,00	20,00	16,40	3,10	915,33	
								1408,75	**Total excavación**

TOTAL EJECUTADO	37.745,61
FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR	36.336,86
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA	**1.408,75**

OBSERVACIONES :

Residente de obra
ING. JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL
Matrícula Profesional No.: 68202-135522 STD

Residente de interventoría
ING. RAUL ACUÑA
Matrícula Profesional No.: 08202089213 ATL

MEMORIA DE CANTIDADES - PREACTA FINAL DE COBRO

CONTRATO No.	1009 DE 2021	**CONTRATISTA**	UT ANDINO 066	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191
FECHA REPORTE: DD 25 MM 8 AA 2025		**CORTE N°**	51	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No**	1005 DE 2021

OBJETO DEL CONTRATO	"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2.

CAPÍTULO	**ESTRUCTURAS Y DRENAJES**	**ITEM**	Relleno para estructuras con recebo	**UNID.**	**m3**		OBSERVACIÓN



Localización:							**m3**	**OBSERVACION**
TRAMO URIBIA PUERTO								
Abscisa	**Longitud**	**Ancho**	**Diametro**	**# de tuberias**	**Volumen total**	**Volumen de tubería**	**Volumen relleno**	**OBSERVACION**
PR 100+025	16,28 m	8,40 m	1,52	1,0	207,80 m3	29,53 m3	**178,27 m3**	**Relleno**
PR 100+110	16,45 m	16,40 m	1,22	4,0	329,17 m3	76,93 m3	**252,24 m3**	**Relleno**
PR 103+110	16,40 m	16,80 m	1,22	3,0	336,13 m3	57,51 m3	**278,62 m3**	**Relleno**
							709,13 m3	**Total**

OBSERVACIONES :	

TOTAL EJECUTADO	**11.981,69**
FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR	**11.272,57**
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA	**709,13**

Residente de obra
ING. JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL
Matrícula Profesional No.: 68202-135522 STD

Residente de interventoría
ING. LUIS ACUÑA
Matrícula Profesional No.: 08202089213 ATL


MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATO No.	1009 DE 2021			**CONTRATISTA**	UT ANDINO 066						**INTERVENTORIA**		CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191
FECHA REPORTE:	**DD** 25	**MM** 8	**AA** 2025	**CORTE N°**	51	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No**					1005 DE 2021		
OBJETO DEL CONTRATO	"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2.												
CAPÍTULO	**ESTRUCTURAS Y DRENAJES**	**ITEM**	Concreto clase 35 MPA, para para Viga de puentes	**UNID.**	M3								



VIGAS I # 4 y3

ELEMENTO	SUBELEMENTO	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	ÁREA	ÁREA PROMEDIO	CANTIDAD ELEMENTO	VOLUMEN UNITARIO	VOLUMEN TOTAL	OBSERVACIÓN
CULATA	SECCIÓN A	1,85 m	0,60	2, m	1,20 m2		2	2,22 m3	4,44 m3	
	TRAPECIOS SUPERIOR	1,85 m	0,18	,15 m	0,03 m2		4	,05 m3	,2 m3	
TRANSICIÓN	SECCIÓN A	1, m	0,60	2, m	1,35 m2	1,00 m2	2	1, m3	2, m3	Se promedio el área de las 3 secciones, teniendo en cuenta el centro de la transición.
	SECCIÓN B	1, m	0,40	2, m	0,94 m2					
	SECCIÓN CL	1, m	0,21	2, m	0,71 m2					
ALMA DE LA VIGA	SECCIÓN CL	25, m	0,21	2, m	0,42 m2		1	10,5 m3	10,5 m3	
	TRAPECIOS INFERIOR	25, m	0,28	,2 m	0,06 m2		2	1,38 m3	2,75 m3	
	TRAPECIOS SUPERIOR	25, m	0,20	,35 m	0,07 m2		2	1,75 m3	3,5 m3	
									23,39 m3	UNIDAD DE VIGA
									46,78 m3	**2 VIGAS**

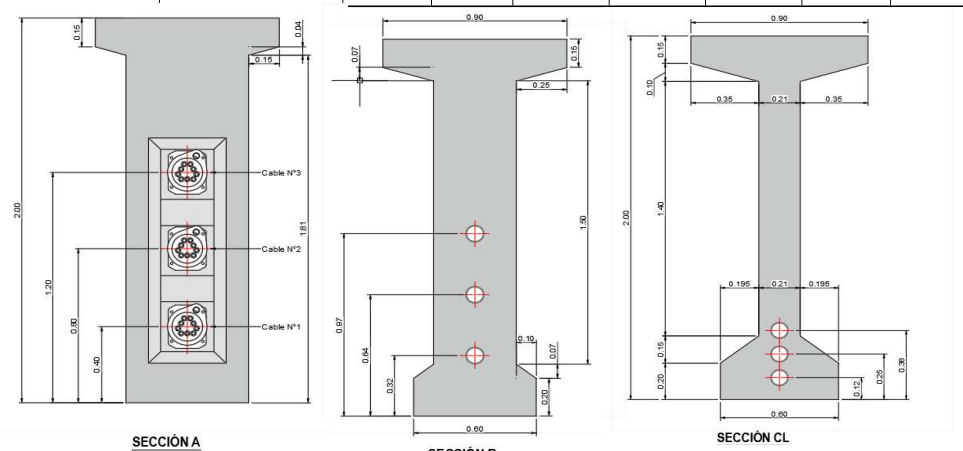

TOTAL EJECUTADO	327,43
FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR	280,65
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA	**46,78**

OBSERVACIONES :

Residente de obra
ING. JUAN LUBO SPROCKEL
Matrícula Profesional No.: 68202-135522 STD

Residente de interventoría
ING. LUIS ACUÑA
Matrícula Profesional No.: 08202089213 ATL

MEMORIA DE CANTIDADES - PREACTA PARCIAL DE COBRO


CONTRATO No.	1009 DE 2021	CONTRATISTA	UT ANDINO 066			INTERVENTORIA	CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191
FECHA REPORTE:	DD 25 MM 8 AA 2024	CORTE N°	51	CONTRATO DE INTERVENTORIA No			1005 DE 2021
OBJETO DEL CONTRATO	"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2.						

CAPÍTULO	ESTRUCTURAS Y DRENAJES	ITEM	Concreto clase 21 MPA	UNID.			





Localización:					m3	OBSERVACIÓN
TRAMO URIBIA PUERTO						
ABSCISA	ELEMENTOS	Largo	ancho	ALTURA	VOLUMEN TOTAL	OBSERVACIÓN
PR 78+038	Vigas riostras piedra pegada 2.1	4,9 m	,25 m	,25 m	,31 m3	Vertical
	Vigas riostras piedra pegada 2.2	5,15 m	,25 m	,25 m	,32 m3	Vertical
	Vigas riostras piedra pegada 2.3	5,25 m	,25 m	,25 m	,33 m3	Vertical
	Vigas riostras piedra pegada 2.4	5,25 m	,25 m	,25 m	,33 m3	Vertical
	Vigas riostras piedra pegada 2.5	5,25 m	,25 m	,25 m	,33 m3	Vertical
	Vigas riostras piedra pegada 2.6	5,05 m	,25 m	,25 m	,32 m3	Vertical
	Vigas riostras piedra pegada 1.7	5,05 m	,25 m	,25 m	,32 m3	Vertical
PR 78+000	Vigas riostras piedra pegada 1.8	5,05 m	,25 m	,25 m	,32 m3	Vertical
	Vigas riostras piedra pegada 1.9	5,05 m	,25 m	,25 m	,32 m3	Vertical
	Vigas riostras piedra pegada 1.10	5,05 m	,25 m	,25 m	,32 m3	Vertical
	Vigas riostras piedra pegada 2	50, m	,25 m	,25 m	3,13 m3	Horizontal inferior
				Presente acta		
				Acta anterior		



					6,316 m3	

OBSERVACIONES :	

TOTAL EJECUTADO	59,25
FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR	52,93
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA	**6,32**

Residente de obra
ING. JUAN LUBO SPROCKEL
Matrícula Profesional No.: 68202-135522 STD

Residente de Interventoria
ING. LUIS ACUÑA
Matrícula Profesional No.: 08202089213 ATL

MEMORIA DE CANTIDADES


CONTRATO No.	1009 DE 2021	CONTRATISTA	UT ANDINO 066			INTERVENTORIA		CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191

FECHA REPORTE:	DD	25	MM	8	AA	2025	CORTE N°	51	CONTRATO DE INTERVENTORIA No	

OBJETO DEL CONTRATO	"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2.

CAPÍTULO	ESTRUCTURAS Y DRENAJES	ITEM	CONCRETO DE 28 MPA	UNID.	m3	



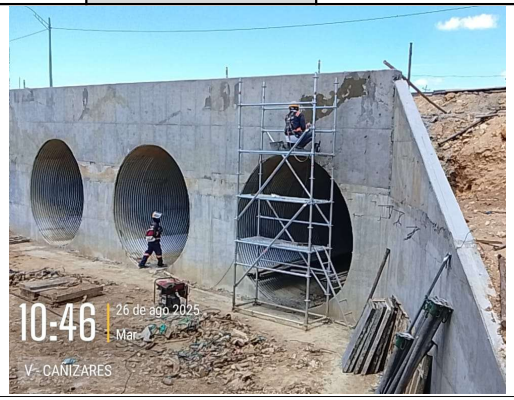

Abscisa	ELEMENTO	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIÓN
PR 77+670	LOSA				DESCOLE 77+670
	MURO	32,57	0,50	16,28	
	ALETAS	15,39	0,50	7,70	
	CIMIENTO ALETA				
	CIMIENTO LOSA				
				23,98	
ESCALERA PIEDRA PEGADA	escalones	,9 m	1	,9 m3	Huella y contrahuella (31)
	Placa	1,2 m	1	1,2 m3	Placa de escalera
				2,10	



OBSERVACIONES :	

TOTAL EJECUTADO	1.470,90
FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR	1.444,82
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA	**26,08**

Residente de obra
ING. JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL
Matrícula Profesional No.: 68202-135522 STD

Residente de interventoria
ING. LUIS ACUÑA
Matrícula Profesional No.: 08202089213 ATL

ALCANTARILLA 77+670 DESCOLE

ELEMENTO	FIGURA	LARGO	ANCHO	ALTURA	VOLUMEN
		A	B	C	D=AXBXC
MURO		31,95 m	5,68 m	0,28 m	49,91
Observaciones		1,83 m	10,51 m2	2,89 m3	17,34
	VOLUMEN TOTAL MURO 4000 PSI				**32,57 m3**
ALETA 1		9,50 m	0,25 m	3,24 m	7,70
ALETA 2		9,50 m	0,25 m	3,24 m	7,70
	VOLUMEN TOTAL ALETA 4000 PSI				**15,39 m3**

ESCALERA PIEDRA PEGADA


ELEMENTO	FIGURA	ÁREA	ANCHO	Cantidad	VOLUMEN
		A	B	C	D=AXBXC
Escalera Huella y Contrahuella		0,02	1,20	31,00	0,90
ELEMENTO	FIGURA	LARGO	ANCHO	ALTURA	VOLUMEN
PLACA BASE		10	1,2	0,1	1,2


MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATO No.	1009 DE 2021	**CONTRATISTA**	UT ANDINO 066					**INTERVENTORIA**	CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191
FECHA REPORTE:	**DD** 25 **MM** 8 **AA** 2025	**CORTE N°**	51	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No**					1005 DE 2021

OBJETO DEL CONTRATO	"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2.

CAPÍTULO	**ESTRUCTURAS Y DRENAJES**	**ITEM**	acero de refuerzo fy420 mpa	**UNID.**	**kg**	

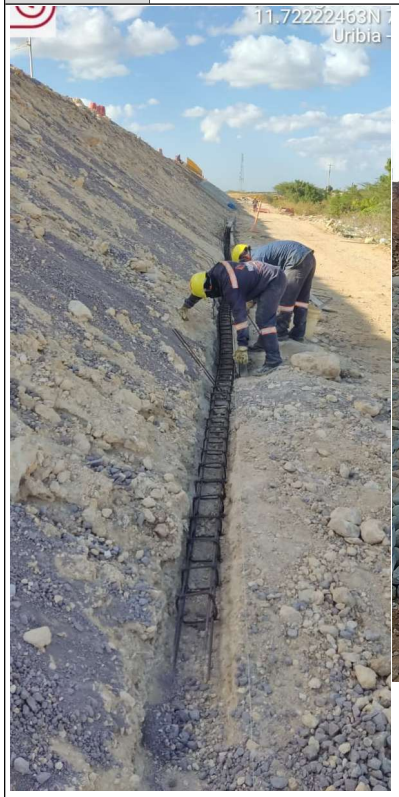

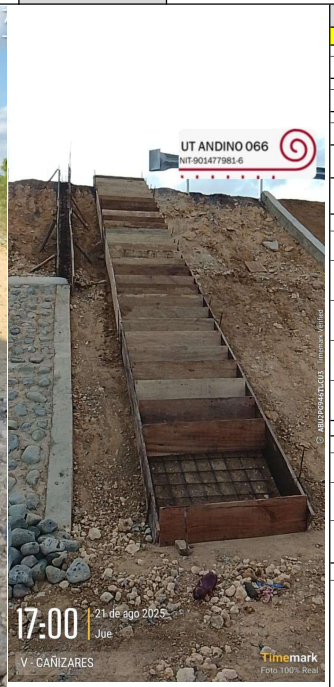

Localización:					**kg**	**OBSERVACIÓN**

RESUMEN ACERO TRAMO URIBIA PUERTO

ABSCISA	ELEMENTO	NUMERO ELEMENTO	Longitud	peso	TOTAL	OBSERVACIÓN
78038	Refuerzo longitudinal (viga vertical)	4	30,85	1	123,4	Viga vertical
	Refuerzo transversal (viga vertical)	154	0,64	0,56	55,2	Viga vertical
ABSCISA	**ELEMENTO**	**NUMERO ELEMENTO**	**Longitud**	**peso**	**TOTAL**	**OBSERVACIÓN**
78038	Refuerzo longitudinal (viga horizontal)	4	50	1	200,0	Viga horizontal
	Refuerzo transversal (viga horizontal)	250	0,22	0,56	30,8	Viga horizontal
ABSCISA	**ELEMENTO**	**NUMERO ELEMENTO**	**Longitud**	**peso**	**TOTAL**	**OBSERVACIÓN**
ESCALERA	Refuerzo longitudinal (viga Cimentación)	4	1,1	1	4,4	Cimentación
	Refuerzo transversal (viga cimentación	7	0,64	0,56	2,5	Cimentación
ESCALERA(PLACA)	Refuerzo longitudinal (PLACA)	67	1,1	0,56	41,3	soporte escalera
	Refuerzo transversal (PLACA)	8	9,9	0,56	44,4	soporte escalera
	Refuerzo transversal (Huella)	31	1,1	1	34,1	refuerzo huella
PUENTE KM 100+200	TOPES SISMICOS	6	188,27 kg		1129,64 kg	
	FALDONES	6	52,90 kg		317,40 kg	


CUADRO DE DESPIECE UNIDADES DE TOPE SISMICO

Codigo	Barra N°	Longitud (m)	Peso/m	Cant.	Long. Total	Pesos Total kg	Figuracion
T1	8	2,84	3,97	6	17,04	67,65	0.40 — 2.44
T2	6	2,25	2,25	6	13,50	30,38	0.30 — 1.95
T3	4	4,03	1	10	40,25	40,25	1.90 — 0.225 — 1.90
T4	4	5,00	1	10	50,00	50,00	0.25 — 0.125 — 2.12
Peso Total Kg						**188,27**	

CUADRO DE DESPIECE 1 UNIDADES FALDONES

Codigo	Barra N°	Longitud (m)	Peso/m	Cant.	Long. Total	Pesos Total kg	Figuracion
F1	4	2,74	1	10	27,4	27,40	0.17 — 2.40 — 0.17
F2	4	2,55	1	10	25,5	25,50	0.20 — 0.125 — 0.95
Peso Total Kg						**52,90**	


SECCION VIGA 1




SECCION VIGA 2



1983,07 **SECCIÓN VIGA DE CIMENTACIÓN**



PARRILLA ESCALERA



OBSERVACIÓN:

TOTAL EJECUTADO	460.444,41
FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR	458.461,34
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA	**1.983,07**

Residente de obra
ING. JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL
Matrícula Profesional No.: 68202-135522 STD

Residente de Interventoria
ING. LUIS ACUÑA
Matrícula Profesional No.: 08202089213 ATL

MEMORIA DE CANTIDADES - PREACTA FINAL DE COBRO

CONTRATO No.	1009 DE 2021	CONTRATISTA	UT ANDINO 066		INTERVENTORIA	
FECHA REPORTE:	DD 25 MM 8 AA 2024	CORTE N°	51		CONTRATO DE INTERVENTORIA No	

OBJETO DEL CONTRATO	"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2.

CAPÍTULO	ESTRUCTURAS Y DRENAJES	ITEMS	Acero de Preesfuerzo	UNIDAD	ton.f



Localización: | **OBSERVACIÓN**

TRAMO URIBIA PUERTO

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	FUERZA E. CENTRO DE LUZ	DISTANCIA	CANTIDAD	
VIGA I #8	CABLE 1	Tf-m	180,86 Tf	30,71 Tf	5554,2 Tf-m	
	CABLE 2	Tf-m	179,27 Tf	30,73 Tf	5509,0 Tf-m	
	CABLE 3	Tf-m	177,70 Tf	30,76 Tf	5466,1 Tf-m	
VIGA I #7	CABLE 1	Tf-m	180,86 Tf	30,71 Tf	5554,2 Tf-m	
	CABLE 2	Tf-m	179,27 Tf	30,73 Tf	5509,0 Tf-m	
	CABLE 3	Tf-m	177,70 Tf	30,76 Tf	5466,1 Tf-m	
VIGA I #6	CABLE 1	Tf-m	180,86 Tf	30,71 Tf	5554,2 Tf-m	
	CABLE 2	Tf-m	179,27 Tf	30,73 Tf	5509,0 Tf-m	
	CABLE 3	Tf-m	177,70 Tf	30,76 Tf	5466,1 Tf-m	
VIGA I #5	CABLE 1	Tf-m	180,86 Tf	30,71 Tf	5554,2 Tf-m	
	CABLE 2	Tf-m	179,27 Tf	30,73 Tf	5509,0 Tf-m	
	CABLE 3	Tf-m	177,70 Tf	30,76 Tf	5466,1 Tf-m	

Etapa	Cable N°	Torones 0.6"	Orden de Tensionamiento	Fuerza en el gato (t)	Fuerza E. Anclaje A. (t)	Fuerza E. CL (t)	Elongación (m)	Angulo Grados	Angulo Radianes	CL 0.00
Etapa Única	1	9	2	191.12	171.37	180.86	0.216	2.98	0.052	0.120
	2	9	1	191.12	169.99	179.27	0.214	5.95	0.104	0.250
	3	9	3	191.12	168.73	177.70	0.212	8.89	0.156	0.380

66116,9 Tf | **TOTAL PREESFUERZO**

TOTAL EJECUTADO	198.350,76
FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR	132.233,84
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA	**66.116,92**

OBSERVACIONES :

Residente de obra
ING. JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL
Matrícula Profesional No.: 68202-135522 STD

Residente de Interventoria
ING. LUIS ACUÑA
Matrícula Profesional No.: 08202089213 ATL

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATO No.	1009 DE 2021	**CONTRATISTA**	UT ANDINO 066
INTERVENTORÍA	CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191		
FECHA REPORTE:	**DD** 25 **MM** 8 **AA** 2025	**CORTE N°**	51
CONTRATO DE INTERVENTORIA No	1005 DE 2021		

OBJETO DEL CONTRATO	"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2.

CAPÍTULO	**SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD**	**ITEM**	Defensa metalica	**UNID.**	**ml**	



Localización:				**m2**	**OBSERVACIÓN**
TRAMO URIBIA PUERTO					
Abscisa Inicial	**Abscisa Final**	**Longitud**	**cantidad**	**CANTIDAD**	
PR 78+038	PR 78+002	36,00	1,00	36,00	

TOTAL EJECUTADO	36
FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR	0
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA	**36,00**

OBSERVACIONES :

Residente de obra
ING. JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL
Matrícula Profesional No.: 68202-135522 STD

Residente de interventoría
ING. LUIS ACUÑA
Matrícula Profesional No.: 08202089213 ATL

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATO No.	1009 DE 2021	**CONTRATISTA**	UT ANDINO 066	**INTERVENTORÍA**	CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191		
FECHA REPORTE:	**DD** 25	**MM** 8	**AA** 2025	**CORTE N°**	51	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No**	1005 DE 2021

OBJETO DEL CONTRATO	"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2.

CAPÍTULO	**SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD**	**ITEM**	Sección final	**UNID.**	**Und**	



Localización:				**und**	**OBSERVACIÓN**
TRAMO URIBIA PUERTO					
Abscisa Inicial	**Abscisa Final**	**Longitud**	**Cantidad**	**TOTAL**	
PR 78+038	PR 78+002	36,00	2,00	2,00	

TOTAL EJECUTADO	2
FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR	0
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA	**2,00**

OBSERVACIONES :

Residente de obra
ING. JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL
Matrícula Profesional No.: 68202-135522 STD

Residente de interventoría
ING. LUIS ACUÑA
Matrícula Profesional No.: 08202089213 ATL

MEMORIA DE CANTIDADES - PREACTA PARCIAL DE COBRO

CONTRATO No.	1009 DE 2021	**CONTRATISTA**	UT ANDINO 066			**INTERVENTORIA**	CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191
FECHA REPORTE:	**DD** 25 **MM** 8 **AA** 2025	**CORTE N°**	51	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No**			1005 DE 2021

OBJETO DEL CONTRATO	"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2.

CAPÍTULO	**TRANSPORTES**	**ITEM**	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	**UNID.**	**m3-km**		OSERVACIÓN



Localización:							**Volúmen**	**f.e**	**vol suelto**	**M3/km**	**OBSERVACIÓN**
TRAMO URIBIA PUERTO											
CORTE		DESCARGUE/LLENO		CENTRO DE GRAVEDAD		Distancia	VOL	**# Factor de expansión**	**vol suelto**	**M3-km**	**OBSERVACIÓN**
inicial	final	inicial	final	centroide cargue	Centroide descargue	**km**	**m3**				
TRANSPORTE DE MATERIAL TERRAPLÉN PR 103+100 al 103+640 y 101900 al 102020 (ver soportes)											
PR 94+000	PR 94+000	PR 103+100	PR 103+640	PR 94+000	PR 103+370	9,37	1.449,80	1,3	1884,7	**18.422,83**	EJECUTADO
										18.422,83	**FACTURAR 2025**

OBSERVACIONES :	

TOTAL EJECUTADO	1.938.784,68
FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR	1.920.361,85
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA	**18.422,83**

Residente de obra
ING. JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL
Matrícula Profesional No.: 68202-135522 STD

Residente de Interventoria
ING. LUIS ACUÑA
Matrícula Profesional No.: 08202089213 ATL

	CARTERA DE TERRENO NATURAL						CARTERA DE TERRAPLEN														
PUNTO	V. ATRÁS	A.INSTRU	V.INTER	DISTANCIA	DESCRIPCION	COTA TERRENO NATURAL	V. ATRÁS	A. INSTRU	V. INTER	DISTANCIA	DESCRIPCION	COTA SUB RASANTE	PROMEDIO ALTURA	PROMEDIO ANCHO	AREA	DISTANCIA	VOLUMEN TERRAPLEN	FACTOR EXPANSIÓN	ABSCISA DE CARGUE	ABSCISA DE DESCARGUE	DISTANCIA (KM)	M3/KM
BM	1,182	11,774				10,592	1,228	11,820				10,592										
103640			0,714	-8,000	PATA .IZQ	11,060			0,790	-6,000	PATA .IZQ	11,030										
			0,714	-6,000	HOM . IZQ	11,060			0,760	-5,340	HOM . IZQ	11,060										
			0,714	0,000	EJE	11,060			0,660	0,000	EJE	11,160	0,093	11,340	1,058	0,000	0,000	1,3	Pr 94+100	Pr 103+640	9,54	0,00
			0,894	6,000	HOM. DER	10,880			0,760	5,340	HOM. DER	11,060										
			0,844	8,000	PATA. DER	10,930			0,890	6,000	PATA. DER	10,930										
103660			0,870	-8,000	PATA .IZQ	10,904			1,100	-6,000	PATA .IZQ	10,720										
			0,710	-6,000	HOM . IZQ	10,900			0,820	-5,340	HOM . IZQ	11,000										
			0,630	0,000	EJE	10,900			0,720	0,000	EJE	11,100	0,153	11,390	1,746	20,000	34,929	1,3	Pr 94+100	Pr 103+660	9,56	434,10
			0,830	6,000	HOM. DER	10,840			0,820	5,340	HOM. DER	11,000										
			0,960	8,000	PATA. DER	10,814			1,000	6,100	PATA. DER	10,820										
103680			1,000	-8,000	PATA .IZQ	10,774			1,080	-6,000	PATA .IZQ	10,740										
			0,900	-6,000	HOM . IZQ	10,874			0,880	-5,340	HOM . IZQ	10,940										
			0,900	0,000	EJE	10,874			0,780	0,000	EJE	11,040	0,133	11,340	1,504	20,000	30,089	1,3	Pr 94+100	Pr 103+680	9,58	374,73
			1,000	6,000	HOM. DER	10,774			0,880	5,340	HOM. DER	10,940										
			1,200	8,000	PATA. DER	10,574			1,050	6,000	PATA. DER	10,770										
103700			1,100	-8,000	PATA .IZQ	10,674			1,030	-6,000	PATA .IZQ	10,790										
			1,000	-6,000	HOM . IZQ	10,774			0,940	-5,340	HOM . IZQ	10,880										
			1,020	0,000	EJE	10,754			0,840	0,000	EJE	10,980	0,206	11,440	2,357	20,000	47,133	1,3	Pr 94+100	Pr 103+700	9,60	588,22
			1,180	6,000	HOM. DER	10,594			0,940	5,340	HOM. DER	10,880										
			1,220	8,000	PATA. DER	10,554			1,170	6,200	PATA. DER	10,650										
103720			1,030	-8,000	PATA .IZQ	10,744			0,967	-6,000	PATA .IZQ	10,853										
			1,020	-6,000	HOM . IZQ	10,754			1,000	-5,340	HOM . IZQ	10,820										
			1,050	0,000	EJE	10,724			0,900	0,000	EJE	10,920	0,203	11,490	2,329	20,000	46,573	1,3	Pr 94+100	Pr 103+720	9,62	582,44
			1,300	6,000	HOM. DER	10,474			1,000	5,340	HOM. DER	10,820										
			1,300	8,000	PATA. DER	10,474			1,330	6,300	PATA. DER	10,490										
103740			1,150	-8,000	PATA .IZQ	10,624			1,090	-6,000	PATA .IZQ	10,730										
			1,120	-6,000	HOM . IZQ	10,654			1,060	-5,340	HOM . IZQ	10,760										
			1,100	0,000	EJE	10,674			0,960	0,000	EJE	10,860	0,203	11,490	2,329	20,000	46,573	1,3	Pr 94+100	Pr 103+740	9,64	583,65
			1,330	6,000	HOM. DER	10,444			1,060	5,340	HOM. DER	10,760										
			1,400	8,000	PATA. DER	10,374			1,360	6,300	PATA. DER	10,460										
103760			1,200	-8,000	PATA .IZQ	10,574			1,090	-6,000	PATA .IZQ	10,730										
			1,150	-6,000	HOM . IZQ	10,624			1,120	-5,340	HOM . IZQ	10,700										
			1,130	0,000	EJE	10,644			1,020	0,000	EJE	10,800	0,196	11,540	2,262	20,000	45,237	1,3	Pr 94+100	Pr 103+760	9,66	568,08
			1,430	6,000	HOM. DER	10,344			1,120	5,340	HOM. DER	10,700										
			1,430	8,000	PATA. DER	10,344			1,480	6,400	PATA. DER	10,340										
103780			1,200	-8,000	PATA .IZQ	10,574			1,540	-6,000	PATA .IZQ	10,280										
			1,180	-6,000	HOM . IZQ	10,594			1,180	-5,340	HOM . IZQ	10,640										
			1,180	0,000	EJE	10,594			1,080	0,000	EJE	10,740	0,166	11,490	1,907	20,000	38,147	1,3	Pr 94+100	Pr 103+780	9,68	480,04
			1,440	6,000	HOM. DER	10,334			1,180	5,340	HOM. DER	10,640										
			1,490	8,000	PATA. DER	10,284			1,540	6,300	PATA. DER	10,280										
103800			1,270	-8,000	PATA .IZQ	10,504			1,600	-6,000	PATA .IZQ	10,220										
			1,210	-6,000	HOM . IZQ	10,564			1,150	-5,340	HOM . IZQ	10,670										
			1,190	0,000	EJE	10,584			1,050	0,000	EJE	10,770	0,209	11,590	2,426	20,000	48,523	1,3	Pr 94+100	Pr 103+800	9,70	611,88
			1,440	6,000	HOM. DER	10,334			1,150	5,340	HOM. DER	10,670										
			1,600	8,000	PATA. DER	10,174			1,650	6,500	PATA. DER	10,170										
103820			1,140	-8,000	PATA .IZQ	10,634			1,550	-6,200	PATA .IZQ	10,270										
			1,200	-6,000	HOM . IZQ	10,574			1,090	-5,340	HOM . IZQ	10,730										
			1,220	0,000	EJE	10,554			0,990	0,000	EJE	10,830	0,286	11,740	3,358	20,000	67,153	1,3	Pr 94+100	Pr 103+820	9,72	848,54
			1,470	6,000	HOM. DER	10,304			1,090	5,340	HOM. DER	10,730										
			1,630	8,000	PATA. DER	10,144			1,670	6,600	PATA. DER	10,150										
103840			1,190	-8,000	PATA .IZQ	10,584			1,600	-6,200	PATA .IZQ	10,220										
			1,180	-6,000	HOM . IZQ	10,594			1,030	-5,340	HOM . IZQ	10,790										
			1,190	0,000	EJE	10,584			0,930	0,000	EJE	10,890	0,316	11,690	3,694	20,000	73,881	1,3	Pr 94+100	Pr 103+840	9,74	935,48
			1,430	6,000	HOM. DER	10,344			1,030	5,340	HOM. DER	10,790										
			1,650	8,000	PATA. DER	10,124			1,700	6,500	PATA. DER	10,120										
103860			1,280	-8,000	PATA .IZQ	10,494			1,600	-6,400	PATA .IZQ	10,220										
			1,250	-6,000	HOM . IZQ	10,524			0,970	-5,340	HOM . IZQ	10,850										
			1,220	0,000	EJE	10,554			0,870	0,000	EJE	10,950	0,416	11,890	4,946	20,000	98,925	1,3	Pr 94+100	Pr 103+860	9,76	1255,16
			1,450	6,000	HOM. DER	10,324			0,970	5,340	HOM. DER	10,850										
			1,620	8,000	PATA. DER	10,154			1,670	6,700	PATA. DER	10,150										
103880			1,300	-8,000	PATA .IZQ	10,474			1,620	-6,600	PATA .IZQ	10,200										
			1,270	-6,000	HOM . IZQ	10,504			0,910	-5,340	HOM . IZQ	10,910										
			1,250	0,000	EJE	10,524			0,810	0,000	EJE	11,010	0,486	11,990	5,827	20,000	116,543	1,3	Pr 94+100	Pr 103+880	9,78	1481,73
			1,430	6,000	HOM. DER	10,344			0,910	5,340	HOM. DER	10,910										
			1,700	8,000	PATA. DER	10,074			1,770	6,700	PATA. DER	10,050										
103900			1,130	-8,000	PATA .IZQ	10,644			1,620	-6,500	PATA .IZQ	10,200										
			1,150	-6,000	HOM . IZQ	10,624			0,850	-5,340	HOM . IZQ	10,970										
			1,100	0,000	EJE	10,674			0,750	0,000	EJE	11,070	0,506	12,090	6,118	20,000	122,351	1,3	Pr 94+100	Pr 103+900	9,80	1558,75
			1,580	6,000	HOM. DER	10,194			0,850	5,340	HOM. DER	10,970										
			1,750	8,000	PATA. DER	10,024			1,800	7,000	PATA. DER	10,020										
103+860	1,456	11,573				10,117	1,523	11,640				10,117										
103920			1,410	-8,000	PATA .IZQ	10,364			1,180	-6,500	PATA .IZQ	10,460										
			1,200	-6,000	HOM . IZQ	10,574			0,610	-5,340	HOM . IZQ	11,030										
			1,120	0,000	EJE	10,654			0,510	0,000	EJE	11,130	0,529	12,090	6,400	20,000	127,993	1,3	Pr 94+100	Pr 103+920	9,82	1633,96
			1,400	6,000	HOM. DER	10,374			0,610	5,340	HOM. DER	11,030										
			1,400	8,000	PATA. DER	10,374			1,210	7,000	PATA. DER	10,430										
103940			1,420	-8,000	PATA .IZQ	10,354			1,290	-6,600	PATA .IZQ	10,350										
			1,350	-6,000	HOM . IZQ	10,424			0,550	-5,340	HOM . IZQ	11,090										
			1,100	0,000	EJE	10,674			0,450	0,000	EJE	11,190	0,616	12,190	7,509	20,000	150,181	1,3	Pr 94+100	Pr 103+940	9,84	1921,11
			1,350	6,000	HOM. DER	10,424			0,550	5,340	HOM. DER	11,090										
			1,360	8,000	PATA. DER	10,414			1,330	7,100	PATA. DER	10,310										
103960			1,140	-8,000	PATA .IZQ	10,634			1,200	-6,500	PATA .IZQ	10,440										
			1,330	-6,000	HOM . IZQ	10,444			0,520	-5,340	HOM . IZQ	11,120										
			1,110	0,000	EJE	10,664			0,420	0,000	EJE	11,220	0,633	12,190	7,712	20,000	154,244	1,3	Pr 94+100	Pr 103+960	9,86	1977,10
			1,320	6,000	HOM. DER	10,454			0,520	5,340	HOM. DER	11,120										
			1,320	8,000	PATA. DER	10,454			1,150	7,200	PATA. DER	10,490										
103980			1,270	-8,000	PATA .IZQ	10,504			1,130	-6,500	PATA .IZQ	10,510										
			1,240	-6,000	HOM . IZQ	10,534			0,580	-5,340	HOM . IZQ	11,060										
			1,020	0,000	EJE	10,754			0,480	0,000	EJE	11,160	0,506	12,090	6,118	20,000	122,351	1,3	Pr 94+100	Pr 103+980	9,88	1571,47
			1,300	6,000	HOM. DER	10,474			0,580	5,340	HOM. DER	11,060										
			1,340	8,000	PATA. DER	10,434			1,090	7,000	PATA. DER	10,550										
104000			1,130	-8,000	PATA .IZQ	10,644			1,040	-6,500	PATA .IZQ	10,600										
			1,000	-6,000	HOM . IZQ	10,774			0,640	-5,340	HOM . IZQ	11,000										
			1,010	0,000	EJE	10,764			0,540	0,000	EJE	11,100	0,329	11,990	3,949	20,000	78,974	1,3	Pr 94+100	Pr 104+000	9,90	1016,40
			1,200	6,000	HOM. DER	10,574			0,640	5,340	HOM. DER	11,000										
			1,220	8,000	PATA. DER	10,554			1,300	6,800	PATA. DER	10,340										
																TOTAL	1449,798					18422,833

Topografo Obra : OSCAR QUIROZ MARTINEZ
Matrícula Topografo Profesional: 01-15911

Topografo Interventoria : ENEMITH CARDONA ORTIZ
Matrícula topografo profesional: 0115888 CNPT

MEMORIA DE CANTIDADES - PREACTA PARCIAL DE COBRO

CONTRATO No.	1009 DE 2021	**CONTRATISTA**	UT ANDINO 066				**INTERVENTORIA**	CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191	
FECHA REPORTE:	**DD** 25	**MM** 8	**AA** 2025	**CORTE N°**	51		**CONTRATO DE INTERVENTORIA No**	1005 DE 2021	

OBJETO DEL CONTRATO	"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2.

CAPÍTULO	**ITEMS NUEVOS**	**ITEM**	Sub base granular Clase B	**UNID.**	**m3**		OBSERVACIÓN





Localización:					**m3**			**OBSERVACIÓN**
TRAMO URIBIA PUERTO								
Inicial	**Final**	**Longitud**	**Ancho 1**	**Ancho 2**	**Ancho Prom**	**Espesor**	**Volúmen**	
PR 103+100	PR 103+120	20,00	10,68	10,00	10,34	0,17	35,16 m3	
PR 103+280	PR 103+340	60,00	10,68	10,00	10,34	0,17	105,47 m3	
PR 103+630	PR 103+980	350,00	10,68	10,00	10,34	0,17	615,23 m3	
COLCHÓN CON MATERIAL DE SUB BASE PARA APOYO DE TUBERÍA								
Abscisa		**Longitud**	**Ancho**	**Espesor**			**Volumen**	
PR 100+025		16,90	4,04	0,20			**13,66**	
PR 100+110		16,80	7,08	0,20			**23,79**	
							793 m3	**Total MATERIAL DE SUBBASE**


TOTAL EJECUTADO	45.742
FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR	44.949
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA	**793,00**

Residente de obra
ING. JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL
Matrícula Profesional No.: 68202-135522 STD

Residente de interventoria
ING. LUIS ACUÑA
Matrícula Profesional No.: 08202089213 ATL

CARTERA DE TERRAPLEN							CARTERA DE SUBBASE						
PUNTO	V. ATRÁS	A.INSTRU	V.INTER	DISTANCIA	DESCRIPCION	TA SUB RASA	V. ATRÁS	A.INSTRU	V. INTER SUB BASE	DISTANCIA	DESCRIPCION	OTA SUB BAS	VOL SUB BASE GRANULAR
D 102+930	**2,470**	**12,007**				**9,537**	**2,533**	**12,070**				**9,537**	
103+100			2,420	-7,800	PATA .IZQ	9,587			1,280	-5,34	PATA .IZQ	10,790	
			1,220	-5,340	HOM . IZQ	10,787			1,110	-5,00	HOM . IZQ	10,960	
			1,117	0,000	EJE	10,890			1,010	0,00	EJE	11,060	
			1,220	5,340	HOM. DER	10,787			1,110	5,00	HOM. DER	10,960	
			1,750	8,000	PATA. DER	10,257			1,280	5,34	PATA. DER	10,790	
MOJON 100	**1,780**	**11,367**				**9,587**	**2,777**	**12,364**				**9,587**	
103+120			1,000	-6,600	PATA .IZQ	10,367			1,560	-5,34	PATA .IZQ	10,804	
			0,550	-5,340	HOM . IZQ	10,817			1,400	-5,00	HOM . IZQ	10,964	
			0,477	0,000	EJE	10,890			1,304	0,00	EJE	11,060	35,156
			0,978	5,340	HOM. DER	10,389			1,400	5,00	HOM. DER	10,964	
			1,900	6,500	PATA. DER	9,467			1,570	5,34	PATA. DER	10,794	
													35,156
MOJON 200	**1,780**	**11,552**				**9,772**	**2,533**	**12,305**				**9,772**	
103+280			0,870	-7,000	PATA .IZQ	10,682			1,580	-5,34	PATA .IZQ	10,725	
			0,820	-5,340	HOM . IZQ	10,732			1,405	-5,00	HOM . IZQ	10,900	
			0,722	0,000	EJE	10,830			1,305	0,00	EJE	11,000	
			0,811	5,340	HOM. DER	10,741			1,405	5,00	HOM. DER	10,900	
			1,160	7,000	PATA. DER	10,392			1,575	5,34	PATA. DER	10,730	
103+300			0,760	-7,000	PATA .IZQ	10,792			1,510	-5,34	PATA .IZQ	10,795	
			0,762	-5,340	HOM . IZQ	10,790			1,345	-5,00	HOM . IZQ	10,960	
			0,662	0,000	EJE	10,890			1,245	0,00	EJE	11,060	35,156
			0,762	5,340	HOM. DER	10,790			1,345	5,00	HOM. DER	10,960	
			0,810	7,000	PATA. DER	10,742			1,510	5,34	PATA. DER	10,795	
103+320			0,980	-7,000	PATA .IZQ	10,572			1,450	-5,34	PATA .IZQ	10,855	
			0,702	-5,340	HOM . IZQ	10,850			1,285	-5,00	HOM . IZQ	11,020	
			0,602	0,000	EJE	10,950			1,185	0,00	EJE	11,120	35,156
			0,710	5,340	HOM. DER	10,842			1,285	5,00	HOM. DER	11,020	
			1,020	7,000	PATA. DER	10,532			1,455	5,34	PATA. DER	10,850	
103+340			1,000	-7,000	PATA .IZQ	10,552			1,390	-5,34	PATA .IZQ	10,915	
			0,645	-5,340	HOM . IZQ	10,907			1,220	-5,00	HOM . IZQ	11,085	
			0,542	0,000	EJE	11,010			1,125	0,00	EJE	11,180	35,156
			0,650	5,340	HOM. DER	10,902			1,224	5,00	HOM. DER	11,081	
			1,270	7,000	PATA. DER	10,282			1,396	5,34	PATA. DER	10,909	
													105,468
DELTA 480	**1,422**	**12,167**				**10,745**	**2,005**	**12,750**				**10,745**	
103+630			1,390	-6,100	PATA .IZQ	10,777			1,700	-5,34	PATA .IZQ	11,050	
			1,100	-5,340	HOM . IZQ	11,067			1,520	-5,00	HOM . IZQ	11,230	
			1,007	0,000	EJE	11,160			1,420	0,00	EJE	11,330	17,578
			1,110	5,340	HOM. DER	11,057			1,520	5,00	HOM. DER	11,230	
			1,390	6,300	PATA. DER	10,777			1,690	5,34	PATA. DER	11,060	
BM	**1,228**	**11,820**				**10,592**	**1,333**	**11,925**				**10,592**	
103+660			1,100	-6,000	PATA .IZQ	10,720			0,925	-5,34	PATA .IZQ	11,000	
			0,820	-5,340	HOM . IZQ	11,000			0,755	-5,00	HOM . IZQ	11,170	
			0,720	0,000	EJE	11,100			0,655	0,00	EJE	11,270	35,156
			0,820	5,340	HOM. DER	11,000			0,755	5,00	HOM. DER	11,170	
			1,000	6,100	PATA. DER	10,820			0,925	5,34	PATA. DER	11,000	
103+680			1,080	-6,000	PATA .IZQ	10,740			0,972	-5,34	PATA .IZQ	10,953	
			0,880	-5,340	HOM . IZQ	10,940			0,815	-5,00	HOM . IZQ	11,110	
			0,780	0,000	EJE	11,040			0,715	0,00	EJE	11,210	35,156
			0,880	5,340	HOM. DER	10,940			0,815	5,00	HOM. DER	11,110	
			1,050	6,000	PATA. DER	10,770			0,975	5,34	PATA. DER	10,950	
103+700			1,030	-6,000	PATA .IZQ	10,790			1,046	-5,34	PATA .IZQ	10,879	
			0,940	-5,340	HOM . IZQ	10,880			0,875	-5,00	HOM . IZQ	11,050	
			0,840	0,000	EJE	10,980			0,775	0,00	EJE	11,150	35,156
			0,940	5,340	HOM. DER	10,880			0,875	5,00	HOM. DER	11,050	
			1,170	6,200	PATA. DER	10,650			1,040	5,34	PATA. DER	10,885	
103+720			0,967	-6,000	PATA .IZQ	10,853			1,105	-5,34	PATA .IZQ	10,820	
			1,000	-5,340	HOM . IZQ	10,820			0,935	-5,00	HOM . IZQ	10,990	
			0,900	0,000	EJE	10,920			0,835	0,00	EJE	11,090	35,156
			1,000	5,340	HOM. DER	10,820			0,935	5,00	HOM. DER	10,990	
			1,330	6,300	PATA. DER	10,490			1,105	5,34	PATA. DER	10,820	
103+740			1,090	-6,000	PATA .IZQ	10,730			1,167	-5,34	PATA .IZQ	10,758	
			1,060	-5,340	HOM . IZQ	10,760			0,995	-5,00	HOM . IZQ	10,930	
			0,960	0,000	EJE	10,860			0,895	0,00	EJE	11,030	35,156
			1,060	5,340	HOM. DER	10,760			0,995	5,00	HOM. DER	10,930	
			1,360	6,300	PATA. DER	10,460			1,167	5,34	PATA. DER	10,758	
103+760			1,090	-6,000	PATA .IZQ	10,730			1,225	-5,34	PATA .IZQ	10,700	
			1,120	-5,340	HOM . IZQ	10,700			1,055	-5,00	HOM . IZQ	10,870	
			1,020	0,000	EJE	10,800			0,955	0,00	EJE	10,970	35,156
			1,120	5,340	HOM. DER	10,700			1,055	5,00	HOM. DER	10,870	
			1,480	6,400	PATA. DER	10,340			1,225	5,34	PATA. DER	10,700	
103+780			1,540	-6,000	PATA .IZQ	10,280			1,284	-5,34	PATA .IZQ	10,641	
			1,180	-5,340	HOM . IZQ	10,640			1,105	-5,00	HOM . IZQ	10,820	
			1,080	0,000	EJE	10,740			1,015	0,00	EJE	10,910	35,156
			1,180	5,340	HOM. DER	10,640			1,115	5,00	HOM. DER	10,810	
			1,540	6,300	PATA. DER	10,280			1,285	5,34	PATA. DER	10,640	

			1,600	-6,000	PATA .IZQ	10,220			1,255	-5,34	PATA .IZQ	10,670	
			1,150	-5,340	HOM . IZQ	10,670			1,085	-5,00	HOM . IZQ	10,840	
103+800			1,050	0,000	EJE	10,770			0,985	0,00	EJE	10,940	35,156
			1,150	5,340	HOM. DER	10,670			1,086	5,00	HOM. DER	10,839	
			1,650	6,500	PATA. DER	10,170			1,256	5,34	PATA. DER	10,669	
			1,550	-6,200	PATA .IZQ	10,270			1,175	-5,34	PATA .IZQ	10,750	
			1,090	-5,340	HOM . IZQ	10,730			1,025	-5,00	HOM . IZQ	10,900	
103+820			0,990	0,000	EJE	10,830			0,925	0,00	EJE	11,000	35,156
			1,090	5,340	HOM. DER	10,730			1,025	5,00	HOM. DER	10,900	
			1,670	6,600	PATA. DER	10,150			1,170	5,34	PATA. DER	10,755	
			1,600	-6,200	PATA .IZQ	10,220			1,125	-5,34	PATA .IZQ	10,800	
			1,030	-5,340	HOM . IZQ	10,790			0,965	-5,00	HOM . IZQ	10,960	
103+840			0,930	0,000	EJE	10,890			0,865	0,00	EJE	11,060	35,156
			1,030	5,340	HOM. DER	10,790			0,956	5,00	HOM. DER	10,969	
			1,700	6,500	PATA. DER	10,120			1,125	5,34	PATA. DER	10,800	
			1,600	-6,400	PATA .IZQ	10,220			1,055	-5,34	PATA .IZQ	10,870	
			0,970	-5,340	HOM . IZQ	10,850			0,905	-5,00	HOM . IZQ	11,020	
103+860			0,870	0,000	EJE	10,950			0,805	0,00	EJE	11,120	35,156
			0,970	5,340	HOM. DER	10,850			0,905	5,00	HOM. DER	11,020	
			1,670	6,700	PATA. DER	10,150			1,055	5,34	PATA. DER	10,870	
			1,620	-6,600	PATA .IZQ	10,200			1,010	-5,34	PATA .IZQ	10,915	
			0,910	-5,340	HOM . IZQ	10,910			0,845	-5,00	HOM . IZQ	11,080	
103+880			0,810	0,000	EJE	11,010			0,745	0,00	EJE	11,180	35,156
			0,910	5,340	HOM. DER	10,910			0,845	5,00	HOM. DER	11,080	
			1,770	6,700	PATA. DER	10,050			1,017	5,34	PATA. DER	10,908	
			1,620	-6,500	PATA .IZQ	10,200			0,955	-5,34	PATA .IZQ	10,970	
			0,850	-5,340	HOM . IZQ	10,970			0,785	-5,00	HOM . IZQ	11,140	
103+900			0,750	0,000	EJE	11,070			0,685	0,00	EJE	11,240	35,156
			0,850	5,340	HOM. DER	10,970			0,785	5,00	HOM. DER	11,140	
			1,800	7,000	PATA. DER	10,020			0,950	5,34	PATA. DER	10,975	
103+860	**1,523**	**11,640**				**10,117**	**1,673**	**11,790**				**10,117**	
			1,180	-6,500	PATA .IZQ	10,460			0,760	-5,34	PATA .IZQ	11,030	
			0,610	-5,340	HOM . IZQ	11,030			0,590	-5,00	HOM . IZQ	11,200	
103+920			0,510	0,000	EJE	11,130			0,490	0,00	EJE	11,300	35,156
			0,610	5,340	HOM. DER	11,030			0,590	5,00	HOM. DER	11,200	
			1,210	7,000	PATA. DER	10,430			0,760	5,34	PATA. DER	11,030	
			1,290	-6,600	PATA .IZQ	10,350			0,700	-5,34	PATA .IZQ	11,090	
			0,550	-5,340	HOM . IZQ	11,090			0,530	-5,00	HOM . IZQ	11,260	
103+940			0,450	0,000	EJE	11,190			0,430	0,00	EJE	11,360	35,156
			0,550	5,340	HOM. DER	11,090			0,530	5,00	HOM. DER	11,260	
			1,330	7,100	PATA. DER	10,310			0,700	5,34	PATA. DER	11,090	
			1,200	-6,500	PATA .IZQ	10,440			0,640	-5,34	PATA .IZQ	11,150	
			0,490	-5,340	HOM . IZQ	11,150			0,470	-5,00	HOM . IZQ	11,320	
103+960			0,390	0,000	EJE	11,250			0,370	0,00	EJE	11,420	35,156
			0,490	5,340	HOM. DER	11,150			0,470	5,00	HOM. DER	11,320	
			1,150	7,200	PATA. DER	10,490			0,640	5,34	PATA. DER	11,150	
			1,130	-6,500	PATA .IZQ	10,510			0,580	-5,34	PATA .IZQ	11,210	
			0,430	-5,340	HOM . IZQ	11,210			0,410	-5,00	HOM . IZQ	11,380	
103+980			0,330	0,000	EJE	11,310			0,310	0,00	EJE	11,480	35,156
			0,430	5,340	HOM. DER	11,210			0,410	5,00	HOM. DER	11,380	
			1,090	7,000	PATA. DER	10,550			0,580	5,34	PATA. DER	11,210	
													615,23





MEMORIA DE CANTIDADES - PREACTA FINAL DE COBRO

CONTRATO No.	1009 DE 2021	**CONTRATISTA**	UT ANDINO 066				**INTERVENTORIA**	CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191

FECHA REPORTE:	**DD**	**25**	**MM**	**8**	**AA**	**2025**	**CORTE N°**	51	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No**				1005 DE 2021

OBJETO DEL CONTRATO	"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2.

CAPÍTULO	**ITEMS NUEVOS**	**ITEM**	NP2	Base granular Clase B	**UNID.**	**m3**	





Localización:							**m3**	**OBSERVACION**
PROYECCIÓN								
Inicial	**Final**	**Longitud**	**Ancho Corona**	**Ancho Pata**	**Ancho Promedio**	**Espesor**	**Volúmen**	**Observación**
PR 103+080	PR 103+120	40,00	10,00	9,40	9,70	0,15	58,2 m3	
PR 103+280	PR 103+980	700,00	10,00	9,40	9,70	0,15	1018,5 m3	
							1077 m3	**SUB TOTAL**

OBSERVACIONES :

TOTAL EJECUTADO	36.305
FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR	35.228
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA	**1.077,00**

Residente de obra
ING. JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL
Matrícula Profesional No.: 68202-135522 STD


Residente de interventoría
ING. LUIS ACUÑA
Matrícula Profesional No.: 08202089213 ATL

ERA DE TERRA	CARTERA DE SUBBASE						CARTERA DE BASE						
PUNTO	V. ATRÁS	A. INSTRU	V. INTER SUB BASE	DISTANCIA	DESCRIPCION	COTA SUB BASE	V. ATRÁS	A. INSTRU	V. INTER BASE	DISTANCIA	DESCRIPCION	COTA BASE GRANULAR	VOL BASE GRANULAR
D 102+930	**2,533**	**12,070**				**9,537**	**2,656**	**12,193**				**9,537**	
			1,340	-5,34	PATA .IZQ	10,730			1,300	-5,00	PATA .IZQ	10,893	
			1,170	-5,00	HOM . IZQ	10,900			1,143	-4,70	HOM . IZQ	11,050	
103+080			1,070	0,00	EJE	11,000			1,043	0,00	EJE	11,150	
			1,170	5,00	HOM. DER	10,900			1,143	4,70	HOM. DER	11,050	
			1,340	5,34	PATA. DER	10,730			1,290	5,00	PATA. DER	10,903	
			1,280	-5,34	PATA .IZQ	10,790			1,230	-5,00	PATA .IZQ	10,963	
			1,110	-5,00	HOM . IZQ	10,960			1,083	-4,70	HOM . IZQ	11,110	
103+100			1,010	0,00	EJE	11,060			0,983	0,00	EJE	11,210	29,100
			1,110	5,00	HOM. DER	10,960			1,083	4,70	HOM. DER	11,110	
			1,280	5,34	PATA. DER	10,790			1,230	5,00	PATA. DER	10,963	
MOJON 100	**2,777**	**12,364**				**9,587**	**2,603**	**12,190**				**9,587**	
			1,560	-5,34	PATA .IZQ	10,804			1,250	-5,00	PATA .IZQ	10,940	
			1,400	-5,00	HOM . IZQ	10,964			1,080	-4,70	HOM . IZQ	11,110	
103+120			1,304	0,00	EJE	11,060			0,980	0,00	EJE	11,210	29,100
			1,400	5,00	HOM. DER	10,964			1,080	4,70	HOM. DER	11,110	
			1,570	5,34	PATA. DER	10,794			1,250	5,00	PATA. DER	10,940	
													58,200
MOJON 200	**2,533**	**12,305**				**9,772**	**2,238**	**12,010**				**9,772**	
			1,580	-5,34	PATA .IZQ	10,725			1,110	-5,00	PATA .IZQ	10,900	
			1,405	-5,00	HOM . IZQ	10,900			0,960	-4,70	HOM . IZQ	11,050	
103+280			1,305	0,00	EJE	11,000			0,860	0,00	EJE	11,150	29,100
			1,405	5,00	HOM. DER	10,900			0,960	4,70	HOM. DER	11,050	
			1,575	5,34	PATA. DER	10,730			1,110	5,00	PATA. DER	10,900	
			1,510	-5,34	PATA .IZQ	10,795			1,050	-5,00	PATA .IZQ	10,960	
			1,345	-5,00	HOM . IZQ	10,960			0,900	-4,70	HOM . IZQ	11,110	
103+300			1,245	0,00	EJE	11,060			0,800	0,00	EJE	11,210	29,100
			1,345	5,00	HOM. DER	10,960			0,900	4,70	HOM. DER	11,110	
			1,510	5,34	PATA. DER	10,795			1,050	5,00	PATA. DER	10,960	
			1,450	-5,34	PATA .IZQ	10,855			0,990	-5,00	PATA .IZQ	11,020	
			1,285	-5,00	HOM . IZQ	11,020			0,840	-4,70	HOM . IZQ	11,170	
103+320			1,185	0,00	EJE	11,120			0,740	0,00	EJE	11,270	29,100
			1,285	5,00	HOM. DER	11,020			0,840	4,70	HOM. DER	11,170	
			1,455	5,34	PATA. DER	10,850			0,990	5,00	PATA. DER	11,020	
			1,390	-5,34	PATA .IZQ	10,915			0,930	-5,00	PATA .IZQ	11,080	
			1,220	-5,00	HOM . IZQ	11,085			0,780	-4,70	HOM . IZQ	11,230	
103+340			1,125	0,00	EJE	11,180			0,680	0,00	EJE	11,330	29,100
			1,224	5,00	HOM. DER	11,081			0,780	4,70	HOM. DER	11,230	
			1,396	5,34	PATA. DER	10,909			0,930	5,00	PATA. DER	11,080	
			1,366	-5,34	PATA .IZQ	10,939			0,900	-5,00	PATA .IZQ	11,110	
			1,195	-5,00	HOM . IZQ	11,110			0,750	-4,70	HOM . IZQ	11,260	
103+360			1,095	0,00	EJE	11,210			0,650	0,00	EJE	11,360	29,100
			1,195	5,00	HOM. DER	11,110			0,760	4,70	HOM. DER	11,250	
			1,365	5,34	PATA. DER	10,940			0,900	5,00	PATA. DER	11,110	
			1,325	-5,34	PATA .IZQ	10,980			0,960	-5,00	PATA .IZQ	11,050	
			1,255	-5,00	HOM . IZQ	11,050			0,810	-4,70	HOM . IZQ	11,200	
103+380			1,155	0,00	EJE	11,150			0,710	0,00	EJE	11,300	29,100
			1,260	5,00	HOM. DER	11,045			0,810	4,70	HOM. DER	11,200	
			1,325	5,34	PATA. DER	10,980			0,960	5,00	PATA. DER	11,050	
			1,480	-5,34	PATA .IZQ	10,825			1,020	-5,00	PATA .IZQ	10,990	
			1,315	-5,00	HOM . IZQ	10,990			0,870	-4,70	HOM . IZQ	11,140	
103+400			1,215	0,00	EJE	11,090			0,770	0,00	EJE	11,240	29,100
			1,315	5,00	HOM. DER	10,990			0,870	4,70	HOM. DER	11,140	
			1,480	5,34	PATA. DER	10,825			1,020	5,00	PATA. DER	10,990	
DELTA 480	**2,005**	**12,750**				**10,745**	**2,101**	**12,846**				**10,745**	
			1,900	-5,34	PATA .IZQ	10,850			1,826	-5,00	PATA .IZQ	11,020	
			1,730	-5,00	HOM . IZQ	11,020			1,676	-4,70	HOM . IZQ	11,170	
103+420			1,630	0,00	EJE	11,120			1,576	0,00	EJE	11,270	29,100
			1,730	5,00	HOM. DER	11,020			1,670	4,70	HOM. DER	11,176	
			1,900	5,34	PATA. DER	10,850			1,826	5,00	PATA. DER	11,020	
			1,740	-5,34	PATA .IZQ	11,010			1,770	-5,00	PATA .IZQ	11,076	
			1,671	-5,00	HOM . IZQ	11,079			1,616	-4,70	HOM . IZQ	11,230	
103+440			1,570	0,00	EJE	11,180			1,516	0,00	EJE	11,330	29,100
			1,667	5,00	HOM. DER	11,083			1,616	4,70	HOM. DER	11,230	
			1,740	5,34	PATA. DER	11,010			1,766	5,00	PATA. DER	11,080	
			1,780	-5,34	PATA .IZQ	10,970			1,706	-5,00	PATA .IZQ	11,140	
			1,610	-5,00	HOM . IZQ	11,140			1,556	-4,70	HOM . IZQ	11,290	
103+460			1,510	0,00	EJE	11,240			1,456	0,00	EJE	11,390	29,100
			1,610	5,00	HOM. DER	11,140			1,556	4,70	HOM. DER	11,290	
			1,790	5,34	PATA. DER	10,960			1,706	5,00	PATA. DER	11,140	
			1,720	-5,34	PATA .IZQ	11,030			1,654	-5,00	PATA .IZQ	11,192	
			1,550	-5,00	HOM . IZQ	11,200			1,496	-4,70	HOM . IZQ	11,350	
103+480			1,450	0,00	EJE	11,300			1,396	0,00	EJE	11,450	29,100
			1,550	5,00	HOM. DER	11,200			1,496	4,70	HOM. DER	11,350	
			1,720	5,34	PATA. DER	11,030			1,550	5,00	PATA. DER	11,296	
			1,660	-5,34	PATA .IZQ	11,090			1,586	-5,00	PATA .IZQ	11,260	
			1,490	-5,00	HOM . IZQ	11,260			1,434	-4,70	HOM . IZQ	11,412	

103+500			1,390	0,00	EJE	11,360			1,336	0,00	EJE	11,510	29,100
			1,490	5,00	HOM. DER	11,260			1,436	4,70	HOM. DER	11,410	
			1,660	5,34	PATA. DER	11,090			1,590	5,00	PATA. DER	11,256	
103+520			1,605	-5,34	PATA .IZQ	11,145			1,526	-5,00	PATA .IZQ	11,320	
			1,430	-5,00	HOM . IZQ	11,320			1,376	-4,70	HOM . IZQ	11,470	
			1,330	0,00	EJE	11,420			1,276	0,00	EJE	11,570	29,100
			1,430	5,00	HOM. DER	11,320			1,376	4,70	HOM. DER	11,470	
			1,600	5,34	PATA. DER	11,150			1,530	5,00	PATA. DER	11,316	
103+540			1,540	-5,34	PATA .IZQ	11,210			1,466	-5,00	PATA .IZQ	11,380	
			1,370	-5,00	HOM . IZQ	11,380			1,316	-4,70	HOM . IZQ	11,530	
			1,270	0,00	EJE	11,480			1,216	0,00	EJE	11,630	29,100
			1,370	5,00	HOM. DER	11,380			1,316	4,70	HOM. DER	11,530	
			1,540	5,34	PATA. DER	11,210			1,466	5,00	PATA. DER	11,380	
103+560			1,480	-5,34	PATA .IZQ	11,270			1,406	-5,00	PATA .IZQ	11,440	
			1,310	-5,00	HOM . IZQ	11,440			1,256	-4,70	HOM . IZQ	11,590	
			1,210	0,00	EJE	11,540			1,156	0,00	EJE	11,690	29,100
			1,310	5,00	HOM. DER	11,440			1,256	4,70	HOM. DER	11,590	
			1,480	5,34	PATA. DER	11,270			1,400	5,00	PATA. DER	11,446	
103+580			1,520	-5,34	PATA .IZQ	11,230			1,436	-5,00	PATA .IZQ	11,410	
			1,340	-5,00	HOM . IZQ	11,410			1,286	-4,70	HOM . IZQ	11,560	
			1,240	0,00	EJE	11,510			1,186	0,00	EJE	11,660	29,100
			1,340	5,00	HOM. DER	11,410			1,286	4,70	HOM. DER	11,560	
			1,510	5,34	PATA. DER	11,240			1,436	5,00	PATA. DER	11,410	
103+600			1,577	-5,34	PATA .IZQ	11,173			1,490	-5,00	PATA .IZQ	11,356	
			1,400	-5,00	HOM . IZQ	11,350			1,346	-4,70	HOM . IZQ	11,500	
			1,300	0,00	EJE	11,450			1,246	0,00	EJE	11,600	29,100
			1,400	5,00	HOM. DER	11,350			1,346	4,70	HOM. DER	11,500	
			1,570	5,34	PATA. DER	11,180			1,496	5,00	PATA. DER	11,350	
103+620			1,630	-5,34	PATA .IZQ	11,120			1,556	-5,00	PATA .IZQ	11,290	
			1,460	-5,00	HOM . IZQ	11,290			1,400	-4,70	HOM . IZQ	11,446	
			1,360	0,00	EJE	11,390			1,306	0,00	EJE	11,540	29,100
			1,460	5,00	HOM. DER	11,290			1,410	4,70	HOM. DER	11,436	
			1,630	5,34	PATA. DER	11,120			1,556	5,00	PATA. DER	11,290	
103+640			1,700	-5,34	PATA .IZQ	11,050			1,630	-5,00	PATA .IZQ	11,216	
			1,520	-5,00	HOM . IZQ	11,230			1,466	-4,70	HOM . IZQ	11,380	
			1,420	0,00	EJE	11,330			1,366	0,00	EJE	11,480	29,100
			1,520	5,00	HOM. DER	11,230			1,466	4,70	HOM. DER	11,380	
			1,690	5,34	PATA. DER	11,060			1,626	5,00	PATA. DER	11,220	
BM	**1,333**	**11,925**				**10,592**	**1,418**	**12,010**				**10,592**	
103+660			0,925	-5,34	PATA .IZQ	11,000			0,840	-5,00	PATA .IZQ	11,170	
			0,755	-5,00	HOM . IZQ	11,170			0,690	-4,70	HOM . IZQ	11,320	
			0,655	0,00	EJE	11,270			0,590	0,00	EJE	11,420	29,100
			0,755	5,00	HOM. DER	11,170			0,690	4,70	HOM. DER	11,320	
			0,925	5,34	PATA. DER	11,000			0,840	5,00	PATA. DER	11,170	
103+680			0,972	-5,34	PATA .IZQ	10,953			0,900	-5,00	PATA .IZQ	11,110	
			0,815	-5,00	HOM . IZQ	11,110			0,750	-4,70	HOM . IZQ	11,260	
			0,715	0,00	EJE	11,210			0,650	0,00	EJE	11,360	29,100
			0,815	5,00	HOM. DER	11,110			0,750	4,70	HOM. DER	11,260	
			0,975	5,34	PATA. DER	10,950			0,980	5,00	PATA. DER	11,030	
103+700			1,046	-5,34	PATA .IZQ	10,879			0,960	-5,00	PATA .IZQ	11,050	
			0,875	-5,00	HOM . IZQ	11,050			0,810	-4,70	HOM . IZQ	11,200	
			0,775	0,00	EJE	11,150			0,710	0,00	EJE	11,300	29,100
			0,875	5,00	HOM. DER	11,050			0,810	4,70	HOM. DER	11,200	
			1,040	5,34	PATA. DER	10,885			0,960	5,00	PATA. DER	11,050	
103+720			1,105	-5,34	PATA .IZQ	10,820			1,020	-5,00	PATA .IZQ	10,990	
			0,935	-5,00	HOM . IZQ	10,990			0,870	-4,70	HOM . IZQ	11,140	
			0,835	0,00	EJE	11,090			0,770	0,00	EJE	11,240	29,100
			0,935	5,00	HOM. DER	10,990			0,870	4,70	HOM. DER	11,140	
			1,105	5,34	PATA. DER	10,820			1,020	5,00	PATA. DER	10,990	
103+740			1,167	-5,34	PATA .IZQ	10,758			1,080	-5,00	PATA .IZQ	10,930	
			0,995	-5,00	HOM . IZQ	10,930			0,930	-4,70	HOM . IZQ	11,080	
			0,895	0,00	EJE	11,030			0,830	0,00	EJE	11,180	29,100
			0,995	5,00	HOM. DER	10,930			0,930	4,70	HOM. DER	11,080	
			1,167	5,34	PATA. DER	10,758			1,080	5,00	PATA. DER	10,930	
103+760			1,225	-5,34	PATA .IZQ	10,700			1,140	-5,00	PATA .IZQ	10,870	
			1,055	-5,00	HOM . IZQ	10,870			0,990	-4,70	HOM . IZQ	11,020	
			0,955	0,00	EJE	10,970			0,890	0,00	EJE	11,120	29,100
			1,055	5,00	HOM. DER	10,870			0,990	4,70	HOM. DER	11,020	
			1,225	5,34	PATA. DER	10,700			1,140	5,00	PATA. DER	10,870	
103+780			1,284	-5,34	PATA .IZQ	10,641			1,200	-5,00	PATA .IZQ	10,810	
			1,105	-5,00	HOM . IZQ	10,820			1,050	-4,70	HOM . IZQ	10,960	
			1,015	0,00	EJE	10,910			0,950	0,00	EJE	11,060	29,100
			1,115	5,00	HOM. DER	10,810			1,050	4,70	HOM. DER	10,960	
			1,285	5,34	PATA. DER	10,640			1,200	5,00	PATA. DER	10,810	
103+800			1,255	-5,34	PATA .IZQ	10,670			1,170	-5,00	PATA .IZQ	10,840	
			1,085	-5,00	HOM . IZQ	10,840			1,020	-4,70	HOM . IZQ	10,990	
			0,985	0,00	EJE	10,940			0,920	0,00	EJE	11,090	29,100
			1,086	5,00	HOM. DER	10,839			1,020	4,70	HOM. DER	10,990	
			1,256	5,34	PATA. DER	10,669			1,170	5,00	PATA. DER	10,840	
103+820			1,175	-5,34	PATA .IZQ	10,750			1,110	-5,00	PATA .IZQ	10,900	
			1,025	-5,00	HOM . IZQ	10,900			0,960	-4,70	HOM . IZQ	11,050	
			0,925	0,00	EJE	11,000			0,860	0,00	EJE	11,150	29,100

			1,025	5,00	HOM. DER	10,900			0,960	4,70	HOM. DER	11,050	
			1,170	5,34	PATA. DER	10,755			1,110	5,00	PATA. DER	10,900	
			1,125	-5,34	PATA .IZQ	10,800			1,050	-5,00	PATA .IZQ	10,960	
			0,965	-5,00	HOM . IZQ	10,960			0,900	-4,70	HOM . IZQ	11,110	
103+840			0,865	0,00	EJE	11,060			0,800	0,00	EJE	11,210	29,100
			0,956	5,00	HOM. DER	10,969			0,900	4,70	HOM. DER	11,110	
			1,125	5,34	PATA. DER	10,800			1,050	5,00	PATA. DER	10,960	
			1,055	-5,34	PATA .IZQ	10,870			0,990	-5,00	PATA .IZQ	11,020	
			0,905	-5,00	HOM . IZQ	11,020			0,840	-4,70	HOM . IZQ	11,170	
103+860			0,805	0,00	EJE	11,120			0,740	0,00	EJE	11,270	29,100
			0,905	5,00	HOM. DER	11,020			0,840	4,70	HOM. DER	11,170	
			1,055	5,34	PATA. DER	10,870			0,990	5,00	PATA. DER	11,020	
			1,010	-5,34	PATA .IZQ	10,915			0,930	-5,00	PATA .IZQ	11,080	
			0,845	-5,00	HOM . IZQ	11,080			0,780	-4,70	HOM . IZQ	11,230	
103+880			0,745	0,00	EJE	11,180			0,680	0,00	EJE	11,330	29,100
			0,845	5,00	HOM. DER	11,080			0,780	4,70	HOM. DER	11,230	
			1,017	5,34	PATA. DER	10,908			0,930	5,00	PATA. DER	11,080	
			0,955	-5,34	PATA .IZQ	10,970			0,870	-5,00	PATA .IZQ	11,140	
			0,785	-5,00	HOM . IZQ	11,140			0,720	-4,70	HOM . IZQ	11,290	
103+900			0,685	0,00	EJE	11,240			0,620	0,00	EJE	11,390	29,100
			0,785	5,00	HOM. DER	11,140			0,720	4,70	HOM. DER	11,290	
			0,950	5,34	PATA. DER	10,975			0,870	5,00	PATA. DER	11,140	
103+860	**1,673**	**11,790**				**10,117**	**1,773**	**11,890**				**10,117**	
			0,760	-5,34	PATA .IZQ	11,030			0,690	-5,00	PATA .IZQ	11,200	
			0,590	-5,00	HOM . IZQ	11,200			0,540	-4,70	HOM . IZQ	11,350	
103+920			0,490	0,00	EJE	11,300			0,440	0,00	EJE	11,450	29,100
			0,590	5,00	HOM. DER	11,200			0,540	4,70	HOM. DER	11,350	
			0,760	5,34	PATA. DER	11,030			0,690	5,00	PATA. DER	11,200	
			0,700	-5,34	PATA .IZQ	11,090			0,630	-5,00	PATA .IZQ	11,260	
			0,530	-5,00	HOM . IZQ	11,260			0,480	-4,70	HOM . IZQ	11,410	
103+940			0,430	0,00	EJE	11,360			0,380	0,00	EJE	11,510	29,100
			0,530	5,00	HOM. DER	11,260			0,480	4,70	HOM. DER	11,410	
			0,700	5,34	PATA. DER	11,090			0,630	5,00	PATA. DER	11,260	
			0,640	-5,34	PATA .IZQ	11,150			0,570	-5,00	PATA .IZQ	11,320	
			0,470	-5,00	HOM . IZQ	11,320			0,420	-4,70	HOM . IZQ	11,470	
103+960			0,370	0,00	EJE	11,420			0,320	0,00	EJE	11,570	29,100
			0,470	5,00	HOM. DER	11,320			0,420	4,70	HOM. DER	11,470	
			0,640	5,34	PATA. DER	11,150			0,570	5,00	PATA. DER	11,320	
			0,580	-5,34	PATA .IZQ	11,210			0,510	-5,00	PATA .IZQ	11,380	
			0,410	-5,00	HOM . IZQ	11,380			0,360	-4,70	HOM . IZQ	11,530	
103+980			0,310	0,00	EJE	11,480			0,260	0,00	EJE	11,630	
			0,410	5,00	HOM. DER	11,380			0,360	4,70	HOM. DER	11,530	
			0,580	5,34	PATA. DER	11,210			0,510	5,00	PATA. DER	11,380	
													1018,5





MEMORIA DE CANTIDADES - PREACTA FINAL DE COBRO

CONTRATO No.	1009 DE 2021	CONTRATISTA	UT ANDINO 066				INTERVENTORIA	CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191
FECHA REPORTE:	DD 25	MM 8	AA 2025	CORTE N°	51	CONTRATO DE INTERVENTORIA No		1005 DE 2021

OBJETO DEL CONTRATO	"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2.

CAPÍTULO	ITEMS NUEVOS	ITEM	Mezcla semidensa en caliente Tipo MSC-19	UNID.		





Localización:					m3	Observación
MEZCLA EJECUTADA A CORTE 25 Diciembre 2024						
Inicial	Final	Longitud	Ancho	Espesor	Volumen	
PR 98+645	PR 99+745	1100,0 m	4,50 m	0,05 m	247,5 m3	2 capa carril der
PR 98+805	PR 99+710	905,0 m	4,50 m	0,05 m	203,625 m3	2 capa carril izq
PR 101+893	PR 101+979	86,0 m	4,50 m	0,05 m	19,35 m3	1 capa carril izq
PR 101+890	PR 101+993	103,0 m	4,50 m	0,05 m	23,175 m3	1 capa carril der
PR 102+730	PR 103+700	970,0 m	4,50 m	0,05 m	218,25 m3	1 capa carril der
PR 102+730	PR 103+800	1070,0 m	4,50 m	0,05 m	240,75 m3	1 capa carril izq
				TOTAL	**953 m3**	**Cantidad a facturar presente acta**

TOTAL EJECUTADO	21.462
FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR	20.509
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA	**953,00**

OBSERVACIONES :

Residente de obra
ING. JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL
Matrícula Profesional No.: 68202-135522 STD

Residente de Interventoria
ING. LUIS ACUÑA
Matrícula Profesional No.: 08202089213 ATL

MEMORIA DE CANTIDADES - PREACTA PARCIAL DE COBRO

CONTRATO No.	1009 DE 2021	CONTRATISTA		INTERVENTORÍA	CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191
FECHA REPORTE: DD 25 MM 8 AA 2025		CORTE N°	51	CONTRATO DE INTERVENTORIA No	1005 DE 2021
OBJETO DEL CONTRATO	"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2.				

CAPÍTULO	ITEMS NUEVOS	ITEM	Geotextil bx-50 o Similar	UNID.	OBSERVACIÓN



Localización:				m2	OBSERVACIÓN
TRAMO URIBIA PUERTO					
Inicial	Final	Longitud	Ancho	Área	
PR 103+100	PR 103+120	20,00	10,65	213,00 m2	
PR 103+280	PR 103+340	60,00	10,65	639,00 m2	
PR 103+630	PR 103+980	350,00	10,65	3727,50 m2	
				4580 m2	SUB TOTAL GEOTEXTIL

OBSERVACIONES :

TOTAL EJECUTADO	272.264
FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR	267.684
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA	**4.580,00**

Residente de obra
ING. JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL
Matrícula Profesional No.: 68202-135522 STD

Residente de interventoría
ING. LUIS ACUÑA
Matrícula Profesional No.: 08202089213 ATL

MEMORIA DE CANTIDADES - PREACTA FINAL DE COBRO

CONTRATO No.	1009 DE 2021	CONTRATISTA	UT ANDINO 066				INTERVENTORIA	CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191

FECHA REPORTE:	DD	25	MM	8	AA	2024	CORTE N°	51	CONTRATO DE INTERVENTORIA No	1005 DE 2021

OBJETO DEL CONTRATO	"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2.

CAPÍTULO	ITEMS NUEVOS	ITEM	Tubería metálica corrugada galvanizada calibre 14 y 48" diámetro interior	UNID.	ml		



Localización: TRAMO URIBIA PUERTO

ABSCISA	# DE LÍNEA	LONGUITID	# NO. DE TUBOS	UNIDAD	DIÁMETRO	TOTAL
PR 100+110	4,00	16,28 ml	4,00	ml	48"	65,1 ml

OBSERVACIÓN

OBSERVACIONES :

TOTAL EJECUTADO	856,07
FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR	790,97
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA	**65,10**

Residente de obra
ING. JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL
Matrícula Profesional No.: 68202-135522 STD

Residente de interventoría
ING. LUIS ACUÑA
Matrícula Profesional No.: 08202089213 ATL

MEMORIA DE CANTIDADES - PREACTA FINAL DE COBRO

CONTRATO No.	1009 DE 2021	**CONTRATISTA**	UT ANDINO 066	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191
FECHA REPORTE:	**DD** 25 **MM** 8 **AA** 2025	**CORTE N°**	51	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No**	1005 DE 2021

OBJETO DEL CONTRATO	"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2.

CAPÍTULO	**ITEMS NUEVOS**	**ITEM**	Remoción de alcantarillas metálicas diámetros 0.90 a 1.20 m	**UNID.**	**m**





Localización:						**m**	**OBSERVACIÓN**
TRAMO URIBIA PUERTO							
ABSCISA	# DE TUBOS	LONGITUD	L. TOTAL	DIAMETRO (M)	UNIDAD	Cantidad	
PR 100+110	4,00	21,70	86,80	1,20	m	86,80	
PR 100+025	1,00	14,80	14,80	1,20	m	14,80	
						101,60	**Total Remoción**

OBSERVACIONES :

TOTAL EJECUTADO	886,70
FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR	785,10
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA	**101,60**

Residente de obra
ING. JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL
Matrícula Profesional No.: 68202-135522 STD

Residente de interventoría
ING. LUIS ACUÑA
Matrícula Profesional No.: 08202089213 ATL

MEMORIA DE CANTIDADES - PREACTA FINAL DE COBRO

CONTRATO No.	1009 DE 2021	CONTRATISTA	UT ANDINO 066	INTERVENTORÍA	CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191

FECHA REPORTE:	DD	25	MM	8	AA	2025	CORTE N°	51	CONTRATO DE INTERVENTORIA No	1005 DE 2021

OBJETO DEL CONTRATO	"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2.

CAPÍTULO	ITEMS NUEVOS	ITEM	Recubrimiento con base en resinas epóxicas Coaltar Epóxico o similar para protección de tuberías metálicas contra agentes altamente agresivos	UNID.		



Localización:			m2	OBSERVACIÓN
TRAMO URIBIA PUERTO				
ABSCISA	**Diámetro**	**N. tubos**	**ÁREA**	
PR 100+025	48	4	263,23	
PR 100+110	60	2	182,26	Ejecutao real
			445,50	Total

OBSERVACIONES :

TOTAL EJECUTADO	17.120,38
FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR	16.674,88
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA	**445,50**

Residente de obra
ING. JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL
Matrícula Profesional No.: 68202-135522 STD

Residente de interventoría
ING. LUIS ACUÑA
Matrícula Profesional No.: 08202089213 ATL

FACTOR MULTIPLICADOR POR ONDULACIONES PARA EL CÁLCULO DEL ÁREA EFECTIVA DE TUBERÍAS MP 68, 76 y 152

Calculo de la longitud efectiva de pintura para Tubería MP 68

Paso máximo (A)	Profundidad (B)	Longitud efectiva (C)	Factor Multiplicador por Ondulación (D)
0,073 m	0,012 m	0,077 m	1,055



MP 68 = CONFORMADO 01

MP 68

$C = \left(\sqrt{\left(\frac{A}{2}\right)^2 + (B)^2}\right) * 2$

$C = \left(\sqrt{\left(\frac{0,073}{2}\right)^2 + (0,012)^2}\right) * 2$

C = 0,077m


$D = \frac{C}{A}$

$D = \frac{0,077}{0,073}$

D = 1,055

Calculo de la longitud efectiva de pintura para Tubería MP 76

Paso máximo (A)	Profundidad (B)	Longitud efectiva (C)	Factor Multiplicador por Ondulación (D)
0,083 m	0,024 m	0,096 m	1,16



MP 76

MP 76

$C = \left(\sqrt{\left(\frac{A}{2}\right)^2 + (B)^2}\right) * 2$

$C = \left(\sqrt{\left(\frac{0,083}{2}\right)^2 + (0,024)^2}\right) * 2$

C = 0,096m


$D = \frac{C}{A}$

$D = \frac{0,096}{0,083}$

D = 1,16

Calculo de la longitud efectiva de pintura para Tubería MP 152

Paso máximo (A)	Profundidad (B)	Longitud efectiva (C)	Factor Multiplicador por Ondulación (D)
0,158 m	0,048 m	0,185 m	1,17



MP 152 * CONFORMADO 03

MP 152

$C = \left(\sqrt{\left(\frac{A}{2}\right)^2 + (B)^2}\right) * 2$

$C = \left(\sqrt{\left(\frac{0,158}{2}\right)^2 + (0,048)^2}\right) * 2$

C = 0,18488m

$D = \frac{C}{A}$

$D = \frac{0,18488}{0,158}$

D = 1,17

ALCANTARILLA 100+011

ELEMENTO	LARGO	FACTOR MULTIPLICADOR POR ONDULACIÓN MP-76	ESPESOR	DIÁMETRO	N° TUBOS	PERÍMETRO	ÁREA
	A	B	C	D	E	F=D*π	G=F*E*B*A
RECUBRIMIENTO CON COALTAR EPÓXICO	16,45 m	1,16	0,127 mm	1,52 m	2,00	4,78 m	182,26 m2
				RECUBRIMIENTO EPÓXICO			182,26 m2

ALCANTARILLA 100+108

ELEMENTO	LARGO	FACTOR MULTIPLICADOR POR ONDULACIÓN MP-76	ESPESOR	DIÁMETRO	N° TUBOS	PERÍMETRO	ÁREA
	A	B	C	D	E	F=D*π	G=F*E*B*A
RECUBRIMIENTO CON COALTAR EPÓXICO	16,28 m	1,06	0,127 mm	1,22 m	4,00	3,83 m	263,23 m2
				RECUBRIMIENTO EPÓXICO			263,23 m2

Residente de obra
ING. JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL
Matrícula Profesional No.: 68202-135522 STD

Residente de interventoría
ING. LUIS ACUÑA
Matrícula Profesional No.: 08202089213 ATL

MEMORIA DE CANTIDADES - PREACTA FINAL DE COBRO

CONTRATO No.	1009 DE 2021		**CONTRATISTA**	UT ANDINO 066				**INTERVENTORIA**	CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191
FECHA REPORTE:	**DD** 25	**MM** 8	**AA** 2023	**CORTE N°** 51				**CONTRATO DE INTERVENTORIA No**	1005 DE 2021
OBJETO DEL CONTRATO	"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2.								

CAPÍTULO	**ITEMS NUEVOS**	**ITEM**	Tubería metálica corrugada galvanizada calibre 14 y 60" diámetro interior (Especificación 662.13)	**UNID.**	**ml**		





Localización:							**ml**	**OBSERVACIÓN**
TRAMO URIBIA PUERTO								
ABSCISA	CONDUCTOS	LONGUITID	# NO. DE TUBOS				TOTAL	
PR 100+025	linea 1	16,45 ml	2,00				32,9 ml	
							32,9 ml	**Sub Total**

TOTAL EJECUTADO	359,21
FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR	326,31
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA	**32,90**

OBSERVACIONES :

Residente de obra
ING. JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL
Matrícula Profesional No.: 68202-135522 STD

Residente de interventoría
ING. LUIS ACUÑA
Matrícula Profesional No.: 08202089213 ATL

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATO No.	1009 DE 2021	CONTRATISTA	UT ANDINO 066

FECHA REPORTE:	DD	25	MM	8	AA	2025

CORTE N°	51

INTERVENTORÍA	CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191
CONTRATO DE INTERVENTORIA No	1005 DE 2021

OBJETO DEL CONTRATO	"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2.

CAPÍTULO	ITEMS NUEVOS	ITEM	Protección de taludes con piedra pegada	UNID.	m2	




Localización:		m2	OBSERVACIÓN

TRAMO URIBIA PUERTO

Inicial	Longitud 1	Altura	Cantidad	Área	Observación
PR 78+038	4,90	4,85	1,00	23,77	Cuadricula 6
	5,05	4,80	1,00	24,24	Cuadricula 7
	5,10	4,85	1,00	24,74	Cuadricula 8
	5,20	4,85	1,00	25,22	Cuadricula 9
	5,25	4,90	1,00	25,73	Cuadricula 10
PR 78+000	4,80	4,85	1,00	23,28	Cuadricula 11
	4,80	4,80	1,00	23,04	Cuadricula 12
	4,80	4,85	1,00	23,28	Cuadricula 13
				193,29	

PIEDRA PEGADA

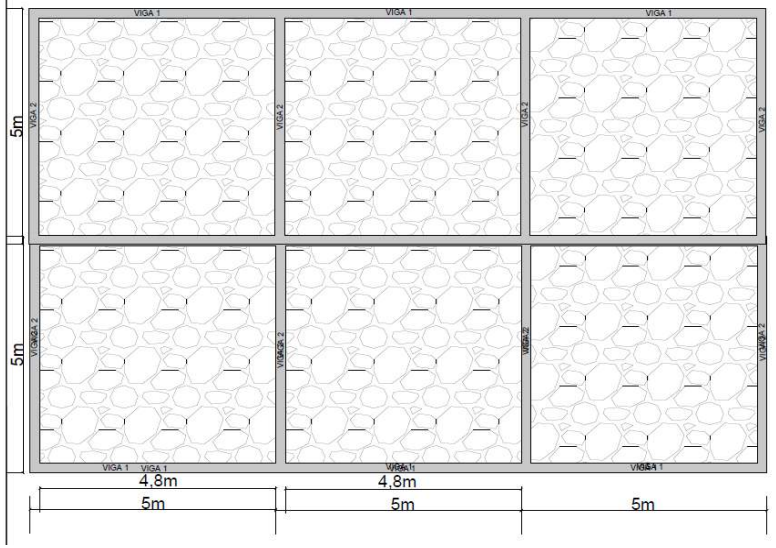

OBSERVACIONES :		TOTAL EJECUTADO	1.637,22
		FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR	1.443,94
		TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA	**193,29**

Residente de obra
ING. JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL
Matrícula Profesional No.: 68202-135522 STD

Residente de interventoria
ING. LUIS ACUÑA
Matrícula Profesional No.: 08202089213 ATL

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATO No.	1009 DE 2021	**CONTRATISTA**	UT ANDINO 066				**INTERVENTORIA**		CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191
FECHA REPORTE:	**DD** 25	**MM** 8	**AA** 2025	**CORTE N°**	51	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No**		1005 DE 2021	


OBJETO DEL CONTRATO	"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2.


CAPÍTULO	**ITEMS NUEVOS**	**ITEM**	Concreto fc=28 MPa para viga cabezal, Diafragma y topes sismicos	**UNID.**	M3



TOPES SISMICOS

ABSCISA	ELEMENTOS	LONGITUD	ESPESOR	ALTO	CANTIDAD	VOLUMEN TOTAL	OBSERVACIÓN
PR 78+038	FALDONES 3,4,5,6,7 Y 8	2, m	,3 m	1, m	6,00	3,6 m3	
PR 110+215	TOPE SISMICO 12,11,10, 9,8, y 7	2,22 m	,35 m	1,56 m	6,00	7,27 m3	Rectangulo
						10,87 m3	

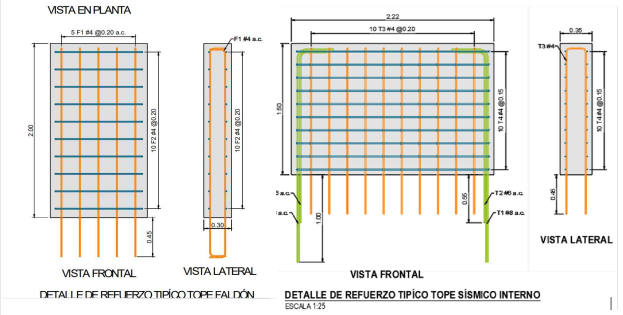

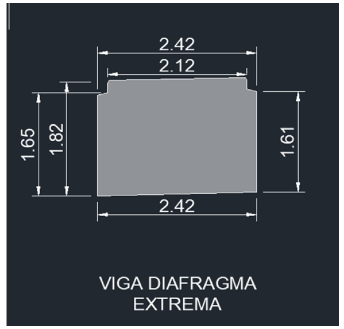

OBSERVACIONES :	

TOTAL EJECUTADO	87,60
FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR	76,73
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA	**10,87**

Residente de obra
ING. JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL
Matrícula Profesional No.: 68202-135522 STD

Residente de interventoría
ING. LUIS ACUÑA
Matrícula Profesional No.: 08202089213 ATL

MEMORIA DE CANTIDADES - PREACTA FINAL DE COBRO

CONTRATO No.	1009 DE 2021	**CONTRATISTA**	UT ANDINO 066	**INTERVENTORIA**	
FECHA REPORTE	**DD** 25 **MM** 8 **AA** 2025	**CORTE N°**	51	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No**	

OBJETO DEL CONTRATO	"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2.

CAPÍTULO	**ITEMS NUEVOS**	**ITEM**	Apoyo elastomérico 300 * 300 * 20 Dureza 60	**UNIDAD**	



Localización: **TRAMO URIBIA PUERTO**

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
TOPE SISMICO # 7	Apoyo elastomérico 300 * 300 * 20 Dureza 60	Und	2	
TOPE SISMICO # 8	Apoyo elastomérico 300 * 300 * 20 Dureza 60	Und	2	
TOPE SISMICO # 9	Apoyo elastomérico 300 * 300 * 20 Dureza 60	Und	2	
TOPE SISMICO # 10	Apoyo elastomérico 300 * 300 * 20 Dureza 60	Und	2	
TOPE SISMICO # 11	Apoyo elastomérico 300 * 300 * 20 Dureza 60	Und	2	
TOPE SISMICO # 12	Apoyo elastomérico 300 * 300 * 20 Dureza 60	Und	2	
			12	**TOTAL NEOPRENO**

TOTAL EJECUTADO	36,00
FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR	24,00
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA	**12,00**

OBSERVACIONES

Residente de obra
ING. JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL
Matrícula Profesional No.: 68202-135522 STD

Residente de interventoría Matrícula
ING. LUIS ACUÑA
Profesional No.: **08202089213 ATL**

GINPROVIAS
901480409-5

Medellín, 2 de agosto de 2025

A QUIEN PUEDA INTERESAR

CERTIFICA

Una vez validada la información a través de los soportes de pago de pago de los aportes SALUD, PENSIONES, RIESGOS PROFESIONALES, APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR del personal activo que se encuentra vinculados a la UT ANDINO 066, certifico que se encuentran contabilizados y pagados a la fecha.

Atentamente,



ING. RICHARD DIAZ ORTEGA
Director de Interventoría
Consorcio Ginprovias visión 2030/191

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

ANDRES ALBERTO ALVARADO ANGEL, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.876.040 de Bogotá, y JANETH LOZANO GARCIA, identificada con cédula de ciudadanía No. 28.057.912 de Carcasí Santander, en la condición de Representante legal principal y contadora respectivamente, de la UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066, identificada con Nit. 901.477.981-6, certificamos Que, durante el periodo comprendido entre el 01 de agosto de 2025 al 31 de agosto de 2025, se ha cumplido y realizado el pago de aportes de Seguridad Social y Parafiscales (Salud, Pensión,ARL); así como los propios a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, como corresponde, dando conformidad al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

.

Expedida en Bogotá D.C., el 02 de septiembre de 2025.

Digitally signed by Andres Alvarado Angel
Date: 2025.07.03 10:27:53 -05'00'

ANDRES ALBERTO ALVARADO ANGEL
Representante Legal

JANETH LOZANO GARCIA
Contadora

Certificado No:

A 3 4 9 8 3 6 3 8 5 5 B C C 9 1

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JANETH LOZANO GARCIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 28057912 de CARCASI (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 216883-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ******************************
****
****

Dado en BOGOTA a los 5 días del mes de Junio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

78478-T

VICTOR MANUEL
DUEÑAS SANCHEZ
C.C. 79668279
RESOLUCION INSCRIPCION 64 FECHA 10/05/2001
UNIVERSIDAD F.U. AUTONOMA DE COLOMBIA

PRESIDENTE
JAIME A. HERNANDEZ V.

87596

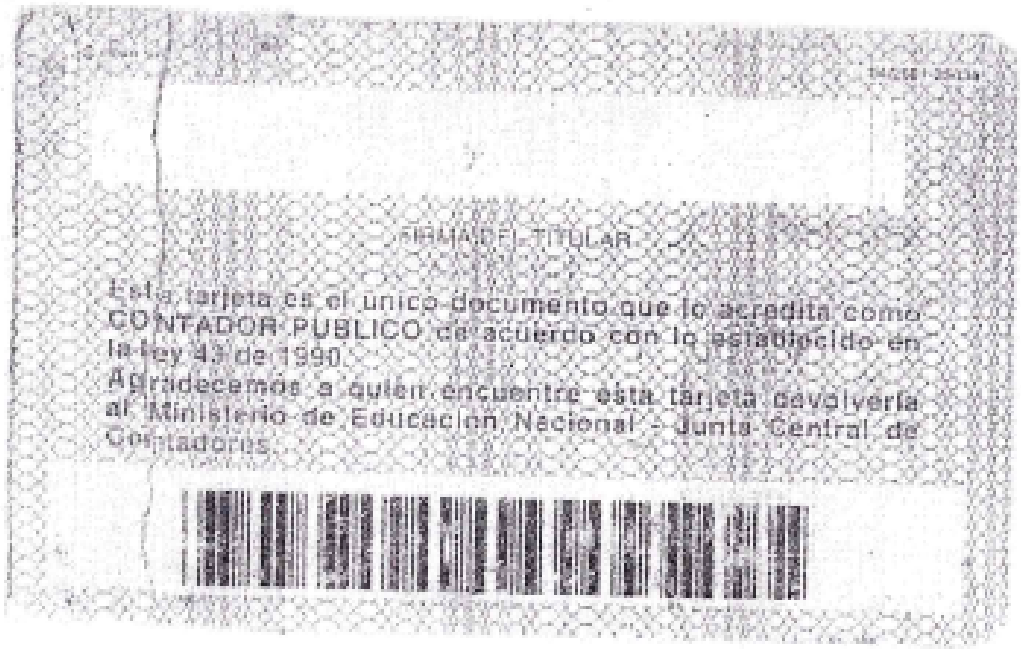

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de Contadores.


GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A
CONSTRUCCION Y DESARROLLO INGENIERIA SAS






CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.



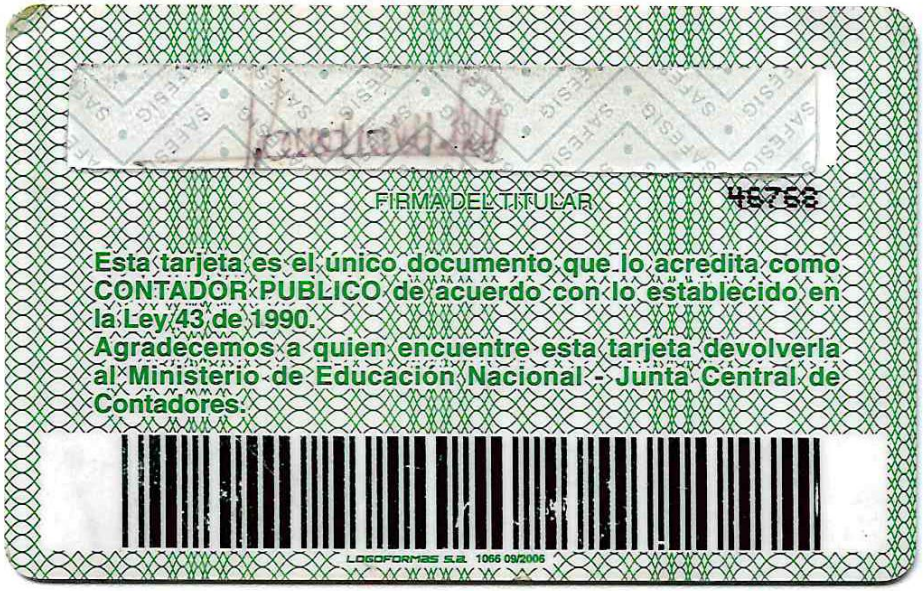

CONSTRUCCIONES, CIMENTACIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS



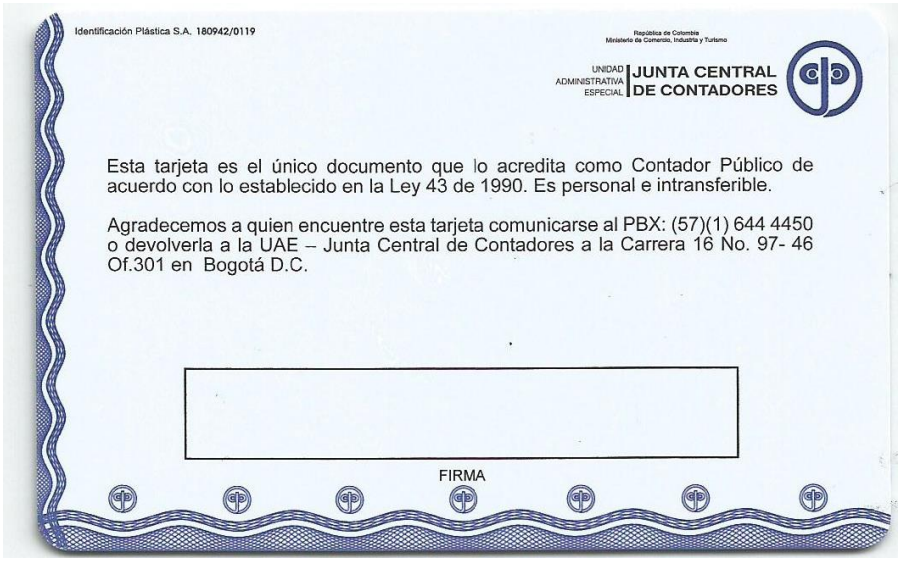

PROVIAS S.A.S.




República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

90929-T

JOSEFINA
LOPEZ GIRALDO
C.C. 21847823
RESOLUCION INSCRIPCION 10 FECHA 2003/03/13
UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA

PRESIDENTE
BENJAMIN LOPEZ ARCINIEGAS

100300

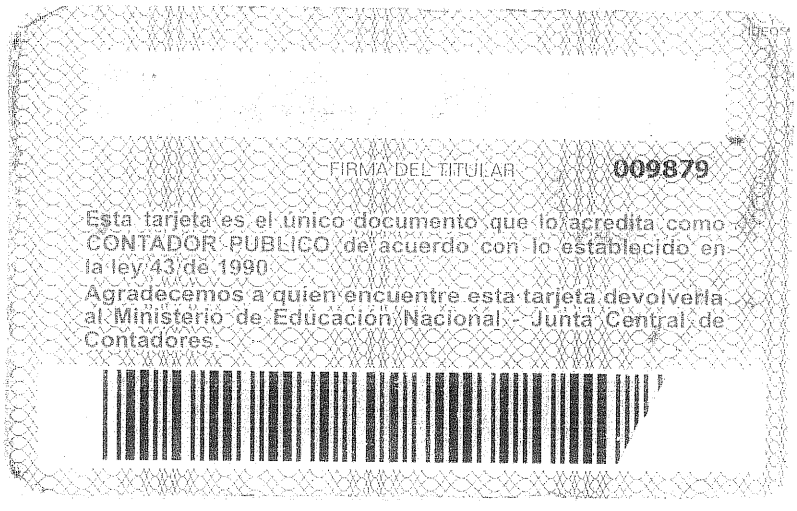

FIRMA DEL TITULAR

009879

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	10

FECHA: 31/08/2025 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** LA GUAJIRA **ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA No.** 51 ago-25 **BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 2.332.956.822,00

SEGUIMIENTO No. 51
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 1009-2021


OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR ESTRELLA - VIAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1005-2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191

PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 110 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 5/09/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A. (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: N.A. (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 265.853.856.477,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 10.000.000.000,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 275.853.856.477,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor Ejecutado / % Ejecutado	junio 2021	julio 2021	agosto 2021	septiembre 2021	}	noviembre 2021	diciembre 2021
GPP1 EXPLANACIONES (Items 1,2,3,4,5,6,7 y 8)	$6.376.225	2,75%	2,229%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,63%	1,41%	1,44%
				$ P	$0	$0	$0	$2.159	$56.115	$125.305	$117.582
			$5.159.382	$ E					$56.115	$250.903	$371.979
				% E					0,63%	2,82%	4,56%
GPP2 BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (Item 9,10,11,NP1,NP2,NP4)	$90.228.882	38,97%	12,666%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,20%	6,40%
				$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$1.240.142	$3.656.759
			$29.324.315	$ E							$3.288.651
				% E							5,76%
GPP3 PAVIMENTOS ASFALTICOS (Item 12, 13,NP3)	$74.322.785	32,10%	9,475%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,81%	3,03%
				$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$652.246	$2.443.970
			$21.935.234	$ E							$3.367.381
				% E						0,00%	4,17%
GPP4 ESTRUCTURAS Y DRENAJES (Items14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,NP5,NP6,NP7,NP8,NP9,NP10,NP11,NP12,NP13,NP14,NP15, NP20 AL NP 34)	$52.234.168	22,56%	8,517%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,44%	1,32%
				$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$272.137	$816.412
			$19.718.384	$ E							
				% E							
GPP5 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (Items 33,34,35,36,37,38,39,NP16,NP17,NP18,NP19)	$3.770.278	1,63%	0,113%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,13%
				$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$75.466
			$262.215	$ E							$4.038
				% E							0,17%
GPP6 TRANSPORTES (Items 40 y 41)	$4.582.000	1,98%	1,123%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	1,41%	2,93%
				$ P	$0	$0	$0	$0	$4.070	$167.536	$348.562
			$2.598.821	$ E					$4.070	$54.248	$182.404
				% E					0,03%	0,46%	0,96%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$222.059.621										
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ 231.514.338	100%	$78.998.351								

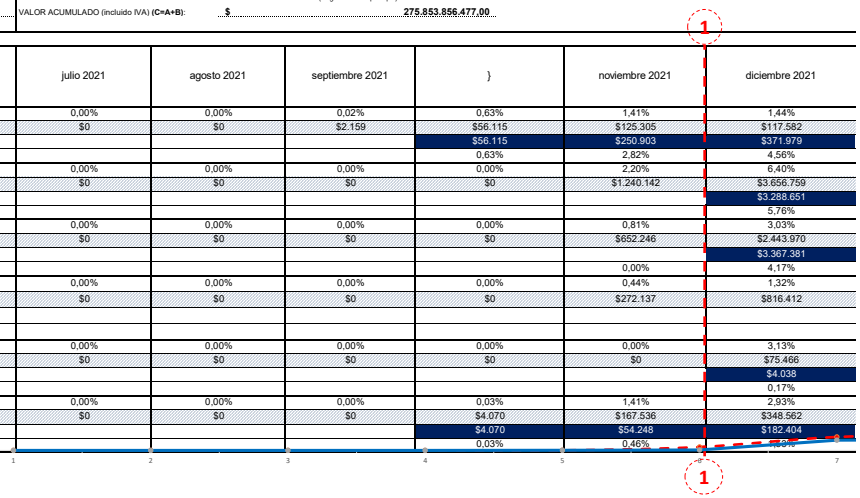

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,001%	0,03%	1,06%	3,22%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$2.159	$60.185	$2.457.367	$7.458.751
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,001%	0,03%	1,09%	4,31%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$2.159	$62.345	$2.519.712	$9.978.463
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,13%	3,12%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$60.185	$305.151	$7.214.453
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,16%	3,27%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$60.185	$365.336	$7.579.790

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$24.652.634 / $25.125.370	$ 11.692.854	46,54%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$1.150.000 / $1.150.000	$ -	0,00%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$1.811.301 / $1.883.848	$ 662.743	35,180%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$1.500.000 / $1.500.000	$ 1.455.000	97,00%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$285.000 / $285.000	$ 276.450	97,00%
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)	$13.987.300 / $13.987.300	$ 223.413	1,60%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$408.000 / $408.000	$ 5.002	1,23%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$43.794.235	$ 14.315.462	278,54%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$44.339.518		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 265.853.856**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$275.853.856**	**93.313.813,282**	**33,83%**

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: **JUAN CARLOS CANARSO RODRIGUEZ**
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 01107-0907

Revisó Firma:
Nombre: **RICHARD DIAZ ORTEGA**
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 01101-0595 CPTIVC

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	2	DE	10

FECHA: 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** LA GUAJIRA **ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA No.** 51 ago-25

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 2.332.956.822,00

SEGUIMIENTO No. 51
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 1009-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1005-2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191

PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 110 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 5/09/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 265.853.856.477,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 10.000.000.000,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 275.853.856.477,00

enero 2022	febrero 2022	marzo 2022	abril 2022	mayo 2022	junio 2022	julio 2022	agosto 2022	septiembre 2022	octubre 2022	noviembre 2022	diciembre 2022
0,27%	0,27%	0,27%	0,20%	0,01%	0,00%	0,82%	1,36%	1,04%	0,66%	1,13%	2,31%
$22.036	$22.036	$22.036	$13.471	$906	$0	$51.992	$86.807	$66.554	$42.108	$72.157	$147.144
	$113.439	$43.811	$49.470	$80.143	$161.275	$48.450	$8.930	$281.891	$20.728	$1.136	$0
	1,39%	0,54%	0,73%	1,18%	2,37%	0,69%	0,14%	4,42%	0,33%	0,02%	0,00%
0,62%	0,62%	0,62%	0,46%	0,25%	0,52%	1,63%	1,60%	1,52%	1,42%	1,57%	1,95%
$355.847	$355.847	$355.847	$422.365	$231.429	$482.983	$1.469.752	$1.442.563	$1.375.357	$1.278.741	$1.415.141	$1.763.379
$118.860	$447.549	$1.237.548	$2.222.375	$2.084.203	$1.177.373	$1.756.925	$869.299	$1.108.068	$1.206.838	$1.098.277	$0
0,21%	0,78%	2,17%	2,40%	2,25%	1,27%	1,81%	0,96%	1,23%	1,34%	1,22%	0,00%
0,65%	0,79%	0,79%	0,44%	0,56%	1,16%	1,70%	1,40%	1,51%	1,41%	1,56%	1,93%
$528.571	$634.285	$634.285	$338.253	$427.469	$892.109	$1.261.523	$1.040.787	$1.125.343	$1.046.290	$1.157.894	$1.432.331
$265.773	$0	$532.396	$1.607.038	$998.041	$1.470.101	$1.648.635	$1.215.004	$834.202	$740.188	$59.967	$125.452
0,33%		0,66%	2,10%	1,30%	1,92%	2,06%	1,63%	1,12%	1,00%	0,08%	0,17%
0,29%	0,35%	0,35%	0,55%	1,35%	0,44%	0,32%	0,38%	0,37%	0,74%	1,61%	0,77%
$181.425	$217.710	$217.710	$228.614	$564.837	$184.928	$169.026	$197.129	$191.505	$388.842	$839.542	$401.542
	$142.302	$98.027	$1.269.848	$110.139	$246.160	$136.227	$516.914	$1.911	$705.393	$466.445	$272.551
	0,23%	0,16%	3,04%	0,26%	0,59%	0,32%	0,99%	0,00%	1,35%	0,89%	0,52%
0,42%	0,52%	0,52%	0,09%	3,08%	0,00%	0,76%	0,00%	0,00%	0,00%	1,01%	0,01%
$10.062	$12.578	$12.578	$852	$30.653	$0	$28.547	$0	$0	$0	$37.977	$535
	$12.782					$24.446			$45.314	$38.680	$35.623
	0,53%		0,00%	0,00%		2,39%			1,20%	1,03%	0,94%
0,31%	0,31%	0,21%	0,17%	0,00%	0,00%	0,82%	0,60%	0,17%	0,16%	0,00%	1,37%
$37.230	$37.230	$24.820	$5.423	$0	$0	$37.788	$52.104	$8.900	$7.383	$0	$58.355
	$194.806	$27.632	$34.920	$31.785	$50.052	$8.963		$105.709	$12.407	$0	$0
	1,64%	0,23%	1,10%	1,00%	1,57%	0,28%		2,31%	0,27%	0,00%	0,00%

0,49%	**0,55%**	**0,55%**	**0,44%**	**0,54%**	**0,67%**	**1,30%**	**1,21%**	**1,20%**	**1,19%**	**1,52%**	**1,64%**
$1.135.172	**$1.279.687**	**$1.267.277**	**$1.008.977**	**$1.255.294**	**$1.560.020**	**$3.018.628**	**$2.794.750**	**$2.766.768**	**$2.763.364**	**$3.522.711**	**$3.803.287**
4,80%	**5,35%**	**5,90%**	**6,34%**	**6,88%**	**7,55%**	**8,86%**	**10,06%**	**11,26%**	**12,45%**	**13,97%**	**15,62%**
$11.113.635	**$12.393.321**	**$13.660.598**	**$14.669.575**	**$15.924.869**	**$17.484.890**	**$20.503.518**	**$23.298.268**	**$26.065.036**	**$28.828.400**	**$32.351.111**	**$36.154.397**
0,17%	**0,39%**	**0,84%**	**2,24%**	**1,43%**	**1,34%**	**1,57%**	**1,13%**	**1,01%**	**1,18%**	**0,72%**	**0,19%**
$384.632	**$910.878**	**$1.939.415**	**$5.183.650**	**$3.304.261**	**$3.104.942**	**$3.623.646**	**$2.610.147**	**$2.331.781**	**$2.730.866**	**$1.664.505**	**$433.626**
3,44%	**3,83%**	**4,67%**	**6,91%**	**8,34%**	**9,68%**	**11,24%**	**12,37%**	**13,38%**	**14,56%**	**15,28%**	**15,46%**
$7.964.422	**$8.875.300**	**$10.814.715**	**$15.998.365**	**$19.302.625**	**$22.407.567**	**$26.031.213**	**$28.641.360**	**$30.973.141**	**$33.704.007**	**$35.368.513**	**$35.802.139**

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$24.652.634 / $25.125.370	$ 11.692.854	46,54%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$1.150.000 / $1.150.000	$ -	$ -
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$1.811.301 / $1.883.848	$ 662.743	35,18%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$1.500.000 / $1.500.000	$ 1.455.000	97,00%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$285.000 / $285.000	$ 276.450	97,00%
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)	$13.987.300 / $13.987.300	$ 223.412,85	$ 0,02
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$408.000 / $408.000	$ 5.002,16	$ 0,01
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$43.794.235	$ 14.315.462	278,54%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$44.339.518		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 265.853.856**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$275.853.856**	$ 93.313.813	**33,83%**

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: JUAN CARLOS CAMARGO RODRIGUEZ
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 01107-0907

Revisó Firma:
Nombre: RICHARD DIAZ ORTEGA
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 01101-0595 CPTIVC

0

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

FECHA: 31/08/2025 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** LA GUAJIRA

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA No. 51 **ago-25** **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 2.332.956.822,00

SEGUIMIENTO No. 51
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 1009-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR ESTRELLA - VIAS WAYU Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1005-2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191

PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 110 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 5/09/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 265.853.856.477,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 10.000.000.000,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 275.853.856.477,00

enero 2023	febrero 2023	marzo 2023	abril 2023	mayo 2023	junio 2023	julio 2023	agosto 2023	septiembre 2023	octubre 2023	noviembre 2023	diciembre 2023
0,71%	0,71%	0,28%	0,37%	0,28%	0,38%	0,38%	0,34%	5,07%	8,02%	8,20%	5,26%
$45.388	$45.388	$17.760	$23.680	$17.760	$24.446	$24.446	$21.546	$323.092	$511.546	$522.780	$335.133
$118.848	$329.446	$240.538	$80.320	$8.228	$319.596	$0	$0	$69.277	$247.462	$22.399	$281.789
1,86%	5,17%	3,77%	1,26%	0,13%	5,01%	0,00%	0,00%	1,09%	3,88%	0,35%	4,42%
0,63%	0,63%	0,38%	0,51%	0,38%	0,63%	0,63%	0,32%	0,63%	0,54%	0,72%	0,61%
$570.299	$570.299	$342.179	$456.239	$342.179	$570.299	$570.299	$285.149	$570.299	$485.149	$653.585	$552.654
$2.227.674	$463.162	$909.322	$322.924	$382.722	$894.072	$0	$0	$342.014	$0	$195.284	$449.131
2,47%	0,51%	1,01%	0,36%	0,42%	0,99%	0,00%	0,00%	0,38%	0,00%	0,22%	0,50%
0,63%	0,63%	0,38%	0,50%	0,38%	0,63%	0,63%	0,31%	0,36%	0,31%	0,39%	0,11%
$465.018	$465.018	$279.011	$372.014	$279.011	$465.018	$465.018	$232.509	$265.018	$232.509	$288.311	$83.897
$883.720	$398.016	$383.719	$388.612	$364.382	$818.193	$0	$0	$270.452	$117.680	$312.055	$935.403
1,19%	0,54%	0,52%	0,52%	0,49%	1,10%	0,00%	0,00%	0,36%	0,16%	0,42%	1,26%
0,30%	0,30%	0,15%	0,20%	0,15%	0,81%	0,81%	1,34%	0,23%	0,88%	0,66%	1,12%
$157.883	$157.883	$78.764	$105.018	$78.764	$423.801	$423.801	$699.641	$119.282	$459.641	$347.222	$582.774
$129.092	$184.694	$763.038	$672.437	$83.809	$491.397	$0	$0	$962.484	$0	$0	$0
0,25%	0,35%	1,46%	1,29%	0,16%	0,94%	0,00%	0,00%	1,84%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00%	0,36%	0,00%	0,00%	0,25%	0,00%	0,36%	0,00%	0,00%	0,25%	0,00%	0,00%
$0	$13.620	$0	$0	$9.374	$0	$13.620	$0	$0	$9.374	$0	$0
$0	$0	$0	$0	$0	$53.652	$0	$0	$8.539	$0	$0	$0
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,42%	0,00%	0,00%	0,36%	0,00%	0,00%	0,00%
0,29%	0,29%	0,09%	0,12%	0,09%	0,09%	0,09%	1,51%	1,55%	1,75%	1,64%	1,66%
$13.293	$13.293	$3.971	$5.295	$3.971	$3.934	$3.934	$68.988	$70.977	$79.977	$74.977	$75.977
$25.233	$244.846	$147.369	$22.144	$1.307	$104.244	$0	$0	$48.490	$40.831	$10.334	$19.969
0,55%	5,34%	3,22%	0,48%	0,03%	2,28%	0,00%	0,00%	1,06%	0,89%	0,23%	0,44%



0,54%	**0,55%**	**0,31%**	**0,42%**	**0,32%**	**0,64%**	**0,65%**	**0,56%**	**0,58%**	**0,77%**	**0,82%**	**0,70%**
$1.251.881	**$1.265.501**	**$721.685**	**$962.246**	**$731.059**	**$1.487.497**	**$1.501.117**	**$1.307.834**	**$1.348.667**	**$1.778.197**	**$1.886.875**	**$1.630.435**
16,16%	**16,70%**	**17,02%**	**17,43%**	**17,75%**	**18,39%**	**19,04%**	**19,60%**	**20,19%**	**20,95%**	**21,77%**	**22,47%**
$37.406.278	**$38.671.779**	**$39.393.464**	**$40.355.710**	**$41.086.769**	**$42.574.266**	**$44.075.383**	**$45.383.217**	**$46.731.884**	**$48.510.080**	**$50.396.956**	**$52.027.391**
1,46%	**0,70%**	**1,06%**	**0,64%**	**0,36%**	**1,16%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,73%**	**0,18%**	**0,23%**	**0,73%**	
$3.384.566	**$1.620.165**	**$2.443.986**	**$1.486.438**	**$840.449**	**$2.681.153**	**$0**	**$0**	**$1.701.257**	**$405.973**	**$540.073**	**$1.686.292**
16,93%	**17,63%**	**18,68%**	**19,32%**	**19,69%**	**20,84%**	**20,84%**	**20,84%**	**21,58%**	**21,76%**	**21,99%**	**22,72%**
$39.186.705	**$40.806.869**	**$43.250.855**	**$44.737.293**	**$45.577.742**	**$48.258.895**	**$48.258.895**	**$48.258.895**	**$49.960.152**	**$50.366.125**	**$50.906.198**	**$52.592.489**

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$24.652.634 / $25.125.370	$ 11.692.854	46,54%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$1.150.000 / $1.150.000	$ -	$ -
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$1.811.301 / $1.883.848	$ 662.743	35,18%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$1.500.000 / $1.500.000	$ 1.455.000	97,00%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$285.000 / $285.000	$ 276.450	97,00%
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)	$13.987.300 / $13.987.300	$ 223.412,85	$ 0,02
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$408.000 / $408.000	$ 5.002,16	$ 0,01
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$43.794.235	$ 14.315.462	278,54%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$44.339.518		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 265.853.856**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$275.853.856**	**$ 93.313.813**	**33,83%**

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: **JUAN CARLOS CAMARGO RODRIGUEZ**
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 01107-0907

Revisó Firma:
Nombre: **RICHARD DIAZ ORTEGA**
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 01101-0595 CPTIVC

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	4 DE 10

FECHA: 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** LA GUAJIRA

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA No. 51 ago-25 **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 2.332.956.822,00

SEGUIMIENTO No. 51
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 1009-2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR ESTRELLA - VIAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA - SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1005-2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191

PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 110 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 5/09/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 265.853.856.477,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 10.000.000.000,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 275.853.856.477,00

7 8 9

enero 2024	febrero 2024	marzo 2024	abril 2024	mayo 2024	junio 2024	julio 2024	agosto 2024	septiembre 2024	octubre 2024	noviembre 2024	diciembre 2024
0,24%	0,60%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,27%	0,47%	7,06%	8,63%	7,84%
$15.570	$38.001	$10.000	$10.000	$10.000	$10.000	$10.000	$17.000	$30.000	$450.000	$550.000	$500.000
$31.032	$30.912	$2.287	$18.148	$1.148	$6.403	$206.915	$0	$65.014	$289.862	$375.635	$323.801
0,49%	0,48%	0,04%	0,28%	0,02%	0,10%	3,25%	0,00%	1,02%	4,55%	5,89%	5,08%
0,26%	0,63%	0,01%	0,01%	0,01%	0,06%	0,06%	0,06%	0,33%	0,78%	1,33%	3,11%
$234.358	$570.299	$10.000	$10.000	$10.000	$50.000	$50.000	$50.000	$300.000	$700.000	$1.200.000	$2.801.651
$156.114	$292.074	$76.747	$107.831	$2.066	$8.909	$9.298	$7.256	$117.602	$884.793	$1.215.644	$683.226
0,17%	0,32%	0,09%	0,12%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,13%	0,98%	1,35%	0,74%
0,26%	0,63%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,07%	0,27%	1,48%	0,94%	3,77%
$191.094	$465.018	$10.000	$10.000	$10.000	$10.000	$10.000	$50.000	$200.000	$1.100.000	$700.000	$2.800.000
$0	$79.197	$444.094	$34.296	$0	$92.058	$0	$0	$0	$0	$802.684	$1.211.648
0,00%	0,11%	0,60%	0,05%	0,00%	0,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,08%	1,63%
0,44%	0,28%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,38%	0,66%	2,30%	1,91%	5,97%
$230.140	$148.325	$50.000	$50.000	$50.000	$50.000	$50.000	$200.000	$344.212	$1.200.000	$1.000.000	$3.118.000
$58.928	$63.369	$179.653	$863.006	$535.985	$662.801	$288.657	$649.752	$1.746.871	$530.646	$2.289.663	$1.194.628
0,11%	0,12%	0,34%	1,65%	1,03%	1,27%	0,55%	1,24%	3,34%	1,02%	4,38%	2,29%
0,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,61%	2,65%
$14.413	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$400.000	$100.000
$0	$0	$0	$17.237	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
0,00%	0,00%	0,00%	0,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	5,46%	8,73%	12,87%
$0	$10.000	$10.000	$10.000	$10.000	$10.000	$10.000	$10.000	$10.000	$250.000	$400.000	$589.608
$26.807	$16.972	$0	$18.169	$1.074	$0	$0	$0	$42.139	$146.446	$308.675	$259.141
0,59%	0,37%	0,00%	0,40%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,92%	3,20%	6,74%	5,66%
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43

7 8 9

0,30%	**0,53%**	**0,04%**	**0,04%**	**0,04%**	**0,06%**	**0,06%**	**0,14%**	**0,38%**	**1,60%**	**1,84%**	**4,28%**
$685.575	**$1.231.642**	**$90.000**	**$90.000**	**$90.000**	**$130.000**	**$130.000**	**$327.000**	**$884.212**	**$3.700.000**	**$4.250.000**	**$9.909.259**
22,77%	**23,30%**	**23,34%**	**23,38%**	**23,42%**	**23,47%**	**23,53%**	**23,67%**	**24,05%**	**25,65%**	**27,49%**	**31,77%**
$52.712.966	**$53.944.608**	**$54.034.608**	**$54.124.608**	**$54.214.608**	**$54.344.608**	**$54.474.608**	**$54.801.608**	**$55.685.820**	**$59.385.820**	**$63.635.820**	**$73.545.079**
0,12%	**0,21%**	**0,30%**	**0,46%**	**0,23%**	**0,33%**	**0,22%**	**0,28%**	**0,85%**	**0,80%**	**2,16%**	**1,58%**
$272.881	**$482.524**	**$702.781**	**$1.058.687**	**$540.273**	**$770.172**	**$504.870**	**$657.009**	**$1.971.626**	**$1.851.748**	**$4.992.302**	**$3.652.446**
22,83%	**23,04%**	**23,35%**	**23,80%**	**24,04%**	**24,37%**	**24,59%**	**24,87%**	**25,72%**	**26,52%**	**28,68%**	**30,26%**
$52.865.371	**$53.347.895**	**$54.050.675**	**$55.109.363**	**$55.649.636**	**$56.419.808**	**$56.924.678**	**$57.581.686**	**$59.553.312**	**$61.405.060**	**$66.397.362**	**$70.049.808**

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$24.652.634 / $25.125.370	$ 11.692.854	46,54%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$1.150.000 / $1.150.000	$ -	$ -
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$1.811.301 / $1.883.848	$ 662.743	35,18%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$1.500.000 / $1.500.000	$ 1.455.000	97,00%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$285.000 / $285.000	$ 276.450	97,00%
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)	$13.987.300 / $13.987.300	$ 223.412,85	$ 0,02
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$408.000 / $408.000	$ 5.002,16	$ 0,01
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$43.794.235	$ 14.315.462	278,54%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$44.339.518		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 265.853.856**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$275.853.856**	**$ 93.313.813**	**33,83%**

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: **JUAN CARLOS CAMARGO RODRIGUEZ**
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 01107-0907

Revisó Firma:
Nombre: **RICHARD DIAZ ORTEGA**
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 01101-0595 CPTIVC

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

FECHA: 31/08/2025 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** LA GUAJIRA

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA No. 51 ago-25

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 2.332.956.822,00

SEGUIMIENTO No. 51
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 1009-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1005-2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191

PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 110 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 5/09/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 265.853.856.477,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 10.000.000.000,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 275.853.856.477,00

enero 2025	febrero 2025	marzo 2025	abril 2025	mayo 2025	junio 2025	julio 2025	agosto 2025	septiembre 2025	octubre 2025	noviembre 2025	diciembre 2025
0,48%	1,51%	2,15%	0,08%	0,09%	0,11%	0,14%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	2,46%
$33.513	$96.195	$137.195	$5.000	$6.000	$7.000	$9.000	$10.000	$10.000	$10.000	$10.000	$157.073
$299.299	$0	$0	$4.033	$182.334	$57.149	$13.235	$46.000				
4,31%	0,00%	0,00%	0,06%	2,86%	0,90%	0,21%	0,72%				
0,03%	0,21%	0,43%	0,02%	0,03%	0,03%	0,03%	0,09%	0,39%	0,76%	0,64%	1,79%
$25.176	$186.065	$386.065	$21.251	$24.000	$24.000	$28.000	$80.232	$350.000	$690.000	$575.363	$1.612.184
$227.332	$0	$0	$46.913	$543.374	$917.347	$601.734	$643.782				
0,25%	0,00%	0,00%	0,05%	0,60%	1,02%	0,67%	0,71%				
0,13%	0,17%	0,24%	0,01%	0,02%	0,03%	0,05%	0,26%	0,43%	0,53%	0,93%	1,37%
$95.642	$126.436	$176.436	$7.641	$17.163	$26.000	$39.000	$190.000	$320.000	$393.770	$693.668	$1.015.030
-$432.312	$0	$0	$0	$621.796	$298.101	$71.503	$975.758				
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,84%	0,40%	0,10%	1,31%				
0,11%	0,36%	0,17%	0,00%	0,01%	0,01%	0,03%	2,72%	3,68%	4,89%	5,55%	4,13%
$54.141,937	$189.042	$89.042	$2.000	$3.000	$4.000	$18.000	$1.420.000	$1.920.000	$2.552.541	$2.900.707	$2.154.992
$227.888	$0	$0	$217.624	$541.991	$502.796	$1.273.993	$637.264				
0,44%	0,00%	0,00%	0,42%	1,04%	0,96%	2,44%	1,22%				
0,47%	0,01%	0,30%	0,05%	0,08%	0,11%	0,24%	0,15%	3,68%	1,75%	0,40%	0,52%
$11.180	$484	$11.180	$2.000	$3.000	$4.000	$8.000	$130.000	$138.780	$65.929	$15.000	$19.678
$13.398	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$8.506				
0,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,23%				
1,02%	0,42%	0,42%	0,07%	0,07%	0,09%	0,17%	3,14%	5,35%	6,24%	6,65%	11,59%
$46.944	$19.216	$19.216	$3.000	$3.000	$4.000	$8.000	$144.000	$245.085	$285.739	$304.739	$531.105
$219.098	$0	$0	$0	$97.441	$26.510	$43.011	$21.647				
4,78%	0,00%	0,00%	0,00%	2,13%	0,58%	0,94%	0,47%				
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55

10 11

10 11

0,12%	**0,27%**	**0,35%**	**0,02%**	**0,02%**	**0,03%**	**0,05%**	**0,85%**	**1,29%**	**1,73%**	**1,94%**	**2,37%**
$266.597	**$617.438**	**$819.134**	**$40.892**	**$56.163**	**$69.000**	**$110.000**	**$1.974.232**	**$2.983.864**	**$3.997.979**	**$4.499.476**	**$5.490.061**
31,88%	**32,15%**	**32,50%**	**32,52%**	**32,54%**	**32,57%**	**32,62%**	**33,47%**	**34,76%**	**36,49%**	**38,43%**	**40,81%**
$73.811.676	**$74.429.114**	**$75.248.248**	**$75.289.140**	**$75.345.303**	**$75.414.303**	**$75.524.303**	**$77.498.535**	**$80.482.399**	**$84.480.378**	**$88.979.854**	**$94.469.916**
0,24%	**0,00%**	**0,00%**	**0,12%**	**0,86%**	**0,78%**	**0,87%**	**1,01%**				
$554.703	**$0**	**$0**	**$268.570**	**$1.986.935**	**$1.801.902**	**$2.003.476**	**$2.332.957**				
30,50%	**30,50%**	**30,50%**	**30,61%**	**31,47%**	**32,25%**	**33,11%**	**34,12%**				
$70.604.511	**$70.604.511**	**$70.604.511**	**$70.873.081**	**$72.860.016**	**$74.661.918**	**$76.665.394**	**$78.998.351**				

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$24.652.634 / $25.125.370	$ 11.692.854	46,54%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$1.150.000 / $1.150.000	$ -	$ -
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$1.811.301 / $1.883.848	$ 662.743	35,18%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$1.500.000 / $1.500.000	$ 1.455.000	97,00%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$285.000 / $285.000	$ 276.450	97,00%
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)	$13.987.300 / $13.987.300	$ 223.412,85	$ 0,02
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$408.000 / $408.000	$ 5.002,16	$ 0,01
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$43.794.235	$ 14.315.462	278,54%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$44.339.518		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 265.853.856**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$275.853.856**	**$ 93.313.813**	**33,83%**

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: **JUAN CARLOS CAMARGO RODRIGUEZ**
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 01107-0907

Revisó Firma:
Nombre: **RICHARD DIAZ ORTEGA**
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 01101-0595 CPTIVC

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

FECHA: 31/08/2025 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** LA GUAJIRA **ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA No.** 51 **ago-25**

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 2.332.956.822,00

SEGUIMIENTO No. 51
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 1009-2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR ESTRELLA - VIAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA - SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1005-2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191

PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 110 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 5/09/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 265.853.856.477,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 10.000.000.000,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 275.853.856.477,00

enero 2026	febrero 2026	marzo 2026	abril 2026	mayo 2026	junio 2026	julio 2026	agosto 2026	septiembre 2026	octubre 2026	noviembre 2026	diciembre 2026
0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	2,37%	0,16%	0,16%	2,37%	0,16%	0,16%
$10.000	$10.000	$10.000	$10.000	$10.000	$10.000	$151.000	$10.000	$10.000	$151.000	$10.000	$10.000
0,76%	0,09%	0,98%	0,98%	1,07%	0,51%	0,61%	2,50%	0,52%	0,61%	0,96%	0,63%
$681.341	$84.703	$886.065	$886.065	$965.274	$463.911	$551.339	$2.259.671	$465.841	$551.339	$863.911	$565.274
1,18%	1,61%	0,31%	0,31%	0,32%	1,08%	0,62%	0,10%	1,18%	1,10%	1,04%	1,25%
$879.064	$1.197.390	$233.987	$233.987	$235.667	$800.749	$462.103	$76.436	$876.436	$817.953	$772.531	$931.890
0,07%	0,62%	0,79%	0,56%	0,50%	0,31%	0,95%	0,07%	0,36%	0,53%	0,43%	0,92%
$34.880	$325.460	$412.212	$292.658	$259.856	$159.856	$498.495	$39.042	$189.042	$278.086	$265.460	$481.342
1,22%	1,22%	0,00%	1,22%	1,61%	0,98%	0,69%	0,69%	0,98%	0,98%	0,69%	0,98%
$45.929	$45.929	$0	$45.929	$60.672	$37.103	$25.923	$25.923	$37.103	$37.103	$25.923	$37.103	
0,77%	0,42%	0,42%	0,42%	0,44%	0,44%	0,86%	0,44%	0,44%	0,86%	0,44%	0,44%
$35.455	$19.216	$19.216	$19.216	$20.357	$20.357	$39.573	$20.357	$20.357	$39.573	$20.357	$20.357
56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67
0,73%	**0,73%**	**0,67%**	**0,64%**	**0,67%**	**0,64%**	**0,75%**	**1,05%**	**0,69%**	**0,81%**	**0,83%**	**0,88%**
$1.686.669	**$1.682.697**	**$1.561.480**	**$1.487.855**	**$1.551.826**	**$1.491.977**	**$1.728.432**	**$2.431.429**	**$1.598.779**	**$1.875.053**	**$1.918.182**	**$2.045.966**
41,53%	**42,26%**	**42,94%**	**43,58%**	**44,25%**	**44,89%**	**45,64%**	**46,69%**	**47,38%**	**48,19%**	**49,02%**	**49,90%**
$96.156.585	**$97.839.281**	**$99.400.762**	**$100.888.617**	**$102.440.443**	**$103.932.419**	**$105.660.851**	**$108.092.280**	**$109.691.059**	**$111.566.112**	**$113.484.293**	**$115.530.259**

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$24.652.634 / $25.125.370	$ 11.692.854	46,54%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$1.150.000 / $1.150.000	$ -	$ -
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$1.811.301 / $1.883.848	$ 662.743	35,18%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$1.500.000 / $1.500.000	$ 1.455.000	97,00%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$285.000 / $285.000	$ 276.450	97,00%
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)	$13.987.300 / $13.987.300	$ 223.412,85	$ 0,02
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$408.000 / $408.000	$ 5.002,16	$ 0,01
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$43.794.235	$ 14.315.462	278,54%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$44.339.518		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 265.853.856**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$275.853.856**	**$ 93.313.813**	**33,83%**

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: **JUAN CARLOS CAMARGO RODRIGUEZ**
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 01107-0907

Revisó Firma:
Nombre: **RICHARD DIAZ ORTEGA**
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 01101-0595 CPTIVC

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

FECHA: 31/08/2025 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** LA GUAJIRA

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA No. 51 ago-25 **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 2.332.956.822,00

SEGUIMIENTO No. 51
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 1009-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR ESTRELLA - VIAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA - SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1005-2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191

PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 110 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 5/09/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 265.853.856.477,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 10.000.000.000,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 275.853.856.477,00

enero 2027	febrero 2027	marzo 2027	abril 2027	mayo 2027	junio 2027	julio 2027	agosto 2027	septiembre 2027	octubre 2027	noviembre 2027	diciembre 2027
0,16%	2,37%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	2,37%	0,16%	0,16%	0,16%	2,37%	0,16%
$10.000	$151.000	$10.000	$10.000	$10.000	$10.000	$151.000	$10.000	$10.000	$10.000	$151.000	$10.000
0,63%	0,63%	0,71%	0,63%	0,84%	1,19%	0,63%	0,73%	1,41%	0,63%	1,28%	0,67%
$572.204	$572.204	$642.204	$570.842	$758.269	$1.072.204	$572.204	$658.269	$1.272.204	$572.204	$1.158.269	$600.162
0,53%	0,66%	0,44%	0,74%	0,74%	0,64%	1,00%	1,01%	0,64%	0,81%	1,70%	0,74%
$393.690	$493.247	$328.165	$553.247	$552.871	$476.436	$741.517	$752.871	$476.436	$601.347	$1.265.333	$547.333
0,39%	0,50%	0,59%	0,63%	0,44%	0,36%	0,36%	0,72%	0,36%	0,36%	0,24%	2,64%
$203.325	$259.208	$309.208	$329.207	$228.085	$189.042	$189.042	$378.085	$189.042	$189.926	$125.008	$1.378.782
0,46%	0,75%	0,46%	0,75%	0,75%	0,46%	0,75%	0,75%	0,46%	0,75%	0,75%	0,46%
$17.282	$28.462	$17.282	$28.462	$28.462	$17.282	$28.462	$28.462	$17.282	$28.462	$28.462	$17.282
0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%
$5.000	$5.000	$5.000	$5.000	$5.000	$5.000	$5.000	$5.000	$5.000	$5.000	$5.000	$5.000
68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
0,52%	**0,65%**	**0,57%**	**0,65%**	**0,68%**	**0,76%**	**0,73%**	**0,79%**	**0,85%**	**0,61%**	**1,18%**	**1,11%**
$1.201.502	**$1.509.122**	**$1.311.860**	**$1.496.758**	**$1.582.688**	**$1.769.964**	**$1.687.226**	**$1.832.688**	**$1.969.964**	**$1.406.939**	**$2.733.073**	**$2.558.559**
50,42%	**51,07%**	**51,64%**	**52,29%**	**52,97%**	**53,73%**	**54,46%**	**55,25%**	**56,11%**	**56,71%**	**57,89%**	**59,00%**
$116.731.761	**$118.240.883**	**$119.552.742**	**$121.049.501**	**$122.632.189**	**$124.402.153**	**$126.089.379**	**$127.922.067**	**$129.892.031**	**$131.298.971**	**$134.032.044**	**$136.590.603**

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$24.652.634 / $25.125.370	$ 11.692.854	46,54%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$1.150.000 / $1.150.000	$ -	$ -
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$1.811.301 / $1.883.848	$ 662.743	35,18%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$1.500.000 / $1.500.000	$ 1.455.000	97,00%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$285.000 / $285.000	$ 276.450	97,00%
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)	$13.987.300 / $13.987.300	$ 223.412,85	$ 0,02
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$408.000 / $408.000	$ 5.002,16	$ 0,01
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$43.794.235	$ 14.315.462	278,54%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$44.339.518		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 265.853.856**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$275.853.856**	**$ 93.313.813**	**33,83%**

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: JUAN CARLOS CAMARGO RODRIGUEZ
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 01107-0907

Revisó Firma:
Nombre: RICHARD DIAZ ORTEGA
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 01101-0595 CPTIVC

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

FECHA: 31/08/2025 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** LA GUAJIRA

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA No. 51 ago-25 **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 2.332.956.822,00

SEGUIMIENTO No. 51
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 1009-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR ESTRELLA - VIAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA - SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1005-2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191

PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 110 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 5/09/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 265.853.856.477,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 10.000.000.000,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 275.853.856.477,00

enero 2028	febrero 2028	marzo 2028	abril 2028	mayo 2028	junio 2028	julio 2028	agosto 2028	septiembre 2028	octubre 2028	noviembre 2028	diciembre 2028
0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%
$5.000	$5.000	$5.000	$5.000	$10.000	$10.000	$10.000	$10.000	$10.000	$10.000	$10.000	$10.000
0,60%	0,30%	0,58%	0,71%	0,93%	0,95%	1,28%	1,44%	1,59%	1,59%	0,79%	2,26%
$544.246	$272.204	$520.024	$637.237	$837.237	$855.925	$1.155.925	$1.296.581	$1.437.236	$1.437.237	$716.142	$2.038.568
0,83%	0,81%	0,92%	0,92%	1,33%	0,80%	1,20%	1,33%	1,46%	1,46%	0,75%	1,16%
$615.194	$603.004	$684.367	$684.367	$991.449	$593.793	$893.793	$989.080	$1.084.367	$1.084.367	$555.333	$861.770
0,58%	1,28%	1,05%	0,55%	1,16%	0,51%	0,74%	0,84%	2,11%	0,93%	1,65%	0,74%
$301.010	$670.671	$547.257	$286.973	$603.970	$265.535	$388.671	$437.822	$1.103.970	$486.973	$860.029	$386.626
0,75%	0,75%	0,75%	0,84%	0,75%	1,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
$28.462	$28.462	$28.462	$31.548	$28.462	$42.728						
0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%
$5.000	$5.000	$5.000	$5.000	$5.000	$5.000	$5.000	$5.000	$5.000	$5.000	$5.000	$5.000
80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
0,65%	**0,68%**	**0,77%**	**0,71%**	**1,07%**	**0,77%**	**1,06%**	**1,18%**	**1,57%**	**1,31%**	**0,93%**	**1,43%**
$1.498.913	**$1.584.341**	**$1.790.110**	**$1.650.125**	**$2.476.118**	**$1.772.982**	**$2.453.390**	**$2.738.484**	**$3.640.573**	**$3.023.577**	**$2.146.504**	**$3.301.965**
59,65%	**60,33%**	**61,10%**	**61,82%**	**62,89%**	**63,65%**	**64,71%**	**65,89%**	**67,47%**	**68,77%**	**69,70%**	**71,13%**
$138.089.515	**$139.673.857**	**$141.463.967**	**$143.114.093**	**$145.590.210**	**$147.363.192**	**$149.816.582**	**$152.555.066**	**$156.195.639**	**$159.219.216**	**$161.365.721**	**$164.667.686**

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$24.652.634 / $25.125.370	$ 11.692.854	46,54%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$1.150.000 / $1.150.000	$ -	$ -
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$1.811.301 / $1.883.848	$ 662.743	35,18%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$1.500.000 / $1.500.000	$ 1.455.000	97,00%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$285.000 / $285.000	$ 276.450	97,00%
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)	$13.987.300 / $13.987.300	$ 223.412,85	$ 0,02
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$408.000 / $408.000	$ 5.002,16	$ 0,01
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$43.794.235	$ 14.315.462	278,54%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$44.339.518		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 265.853.856**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$275.853.856**	**$ 93.313.813**	**33,83%**

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: **JUAN CARLOS CAMARGO RODRIGUEZ**
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 01107-0907

Revisó Firma:
Nombre: **RICHARD DIAZ ORTEGA**
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 01101-0595 CPTIVC

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

FECHA: 31/08/2025 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** LA GUAJIRA

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA No. 51 ago-25

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 2.332.956.822,00

SEGUIMIENTO No. 51
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 1009-2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA - SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1005-2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191

PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 110 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 5/09/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 265.853.856.477,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 10.000.000.000,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 275.853.856.477,00

enero 2029	febrero 2029	marzo 2029	abril 2029	mayo 2029	junio 2029	julio 2029	agosto 2029	septiembre 2029	octubre 2029	noviembre 2029	diciembre 2029
0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%
$10.000	$10.000	$10.000	$10.000	$10.000	$10.000	$10.000	$10.000	$10.000	$10.000	$10.000	$10.000
0,67%	0,73%	0,73%	0,88%	2,39%	1,06%	3,65%	1,59%	1,59%	1,13%	1,13%	1,11%
$605.902	$655.925	$655.925	$796.581	$2.155.925	$955.925	$3.296.581	$1.437.237	$1.437.236	$1.015.270	$1.015.270	$997.589
0,61%	0,72%	0,72%	0,86%	0,45%	1,26%	1,37%	1,51%	1,51%	2,42%	1,07%	2,13%
$451.631	$533.178	$533.178	$628.465	$333.178	$933.178	$1.014.824	$1.123.752	$1.123.752	$1.798.506	$798.506	$1.586.528
0,66%	0,75%	0,75%	0,84%	0,75%	0,75%	0,11%	0,93%	0,93%	1,83%	0,65%	1,82%
$344.287	$389.872	$389.872	$439.023	$389.872	$389.872	$56.020	$488.174	$488.174	$956.517	$339.520	$950.338
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,03%	0,00%
$5.000	$5.000	$5.000	$5.000	$5.000	$5.000	$5.000	$5.000	$5.000	$5.000	$1.500	
92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103
0,61%	**0,69%**	**0,69%**	**0,81%**	**1,25%**	**0,99%**	**1,89%**	**1,32%**	**1,32%**	**1,64%**	**0,94%**	**1,53%**
$1.416.820	**$1.593.975**	**$1.593.975**	**$1.879.069**	**$2.893.975**	**$2.293.975**	**$4.382.424**	**$3.064.163**	**$3.064.162**	**$3.785.292**	**$2.164.796**	**$3.544.456**
71,74%	**72,43%**	**73,12%**	**73,93%**	**75,18%**	**76,17%**	**78,06%**	**79,38%**	**80,71%**	**82,34%**	**83,28%**	**84,81%**
$166.084.506	**$167.678.481**	**$169.272.457**	**$171.151.526**	**$174.045.501**	**$176.339.476**	**$180.721.900**	**$183.786.063**	**$186.850.225**	**$190.635.518**	**$192.800.313**	**$196.344.769**

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$24.652.634 / $25.125.370	$ 11.692.854	46,54%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$1.150.000 / $1.150.000	$ -	$ -
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$1.811.301 / $1.883.848	$ 662.743	35,18%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$1.500.000 / $1.500.000	$ 1.455.000	97,00%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$285.000 / $285.000	$ 276.450	97,00%
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)	$13.987.300 / $13.987.300	$ 223.412,85	$ 0,02
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$408.000 / $408.000	$ 5.002,16	$ 0,01
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$43.794.235	$ 14.315.462	278,54%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$44.339.518		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 265.853.856**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$275.853.856**	**$ 93.313.813**	**33,83%**

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: **JUAN CARLOS LAMARGO RODRIGUEZ**
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 01107-0907

Revisó Firma:
Nombre: **RICHARD DIAZ ORTEGA**
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 01101-0595 CPTIVC

0

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

FECHA: 31/08/2025 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** LA GUAJIRA

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA No. 51 ago-25

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 2.332.956.822,00

SEGUIMIENTO No. 51
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 1009-2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1005-2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191

PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 110 MESES (En meses según las prorrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 5/09/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)


FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 265.853.856.477,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 10.000.000.000,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 275.853.856.477,00

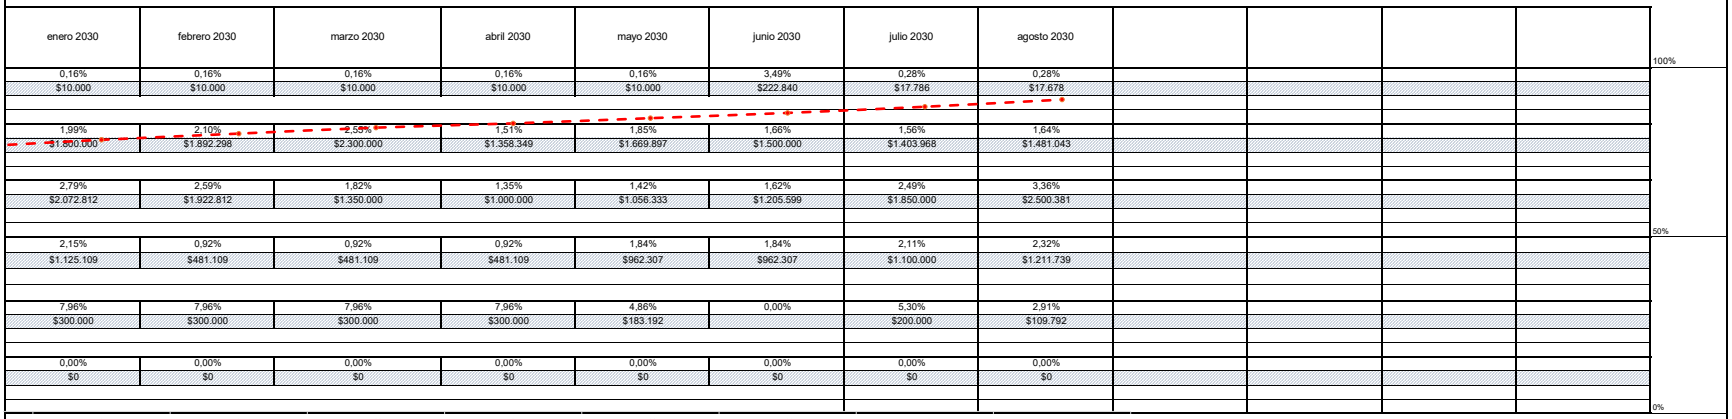

0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	3,49%	0,28%	0,28%
$10.000	$10.000	$10.000	$10.000	$10.000	$222.840	$17.786	$17.678
1,99%	2,10%	2,59%	1,51%	1,85%	1,66%	1,56%	1,64%
$1.800.000	$1.892.298	$2.300.000	$1.358.349	$1.669.897	$1.500.000	$1.403.968	$1.481.043
2,79%	2,59%	1,82%	1,35%	1,42%	1,62%	2,49%	3,36%
$2.072.812	$1.922.812	$1.350.000	$1.000.000	$1.056.333	$1.205.599	$1.850.000	$2.500.381
2,15%	0,92%	0,92%	0,92%	1,84%	1,84%	2,11%	2,32%
$1.125.109	$481.109	$481.109	$481.109	$962.307	$962.307	$1.100.000	$1.211.739
7,96%	7,96%	7,96%	7,96%	4,86%	0,00%	5,30%	2,91%
$300.000	$300.000	$300.000	$300.000	$183.192		$200.000	$109.792
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
2,29%	**1,99%**	**1,92%**	**1,36%**	**1,68%**	**1,68%**	**1,97%**	**2,30%**
$5.307.921	**$4.606.218**	**$4.441.109**	**$3.149.458**	**$3.881.729**	**$3.890.746**	**$4.571.754**	**$5.320.634**
87,10%	**89,09%**	**91,01%**	**92,37%**	**94,05%**	**95,73%**	**97,70%**	**100,00%**
$201.652.690	**$206.258.908**	**$210.700.017**	**$213.849.475**	**$217.731.204**	**$221.621.950**	**$226.193.705**	**$231.514.338**

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$24.652.634 / $25.125.370	$ 11.692.854	46,54%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$1.150.000 / $1.150.000	$ -	$ -
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$1.811.301 / $1.883.848	$ 662.743	35,18%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$1.500.000 / $1.500.000	$ 1.455.000	97,00%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$285.000 / $285.000	$ 276.450	97,00%
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)	$13.987.300 / $13.987.300	$ 223.412,85	$ 0,02
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$408.000 / $408.000	$ 5.002,16	$ 0,01
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$43.794.235	$ 14.315.462	278,54%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$44.339.518		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 265.853.856**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$275.853.856**	**$ 93.313.813**	**33,83%**

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: **JUAN CARLOS CAMARGO RODRIGUEZ**
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 01107-0907

Revisó Firma:
Nombre: **RICHARD DIAZ ORTEGA**
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 01101-0595 CPTIVC

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141161219202

(415)7707212489984(8020) 000014116121920 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 7 9 8 1	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
UNION TEMPORAL ANDINO 066

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CALLE 75 A 66 46 OF 501

42. Correo electrónico uniontemporalandino066@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 7 6 7 2 8 7 6	3 1 3 6 2 8 2 2 1 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 1 0 4 1 9	0 9 9 0	2 0 2 4 0 4 1 7		0 8 1 1	7 1 1 2		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	9	1	4	4	8	5	2	5	5																

07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ALVARADO ANGEL ANDRES ALBERTO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141161219202

(415)7707212489984(8020) **000014116121920 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 7 9 8 1	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	7	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	1	
73. Fecha	2 0 2 1 0 2 1 2	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro	2 0 2 1 0 2 1 2	
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento		
79. Ciudad/Municipio		
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 1 0 2 1 2	
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141161219202

(415)7707212489984(8020) **000014116121920 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 7 9 8 1	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 1 0 2 1 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	8 0 8 7 6 0 4 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ALVARADO	ANGEL	ANDRES	ALBERTO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 1 0 2 1 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 9 9 8 9 1 3 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MOSQUERA	MOSQUERA	MAURICIO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 1 0 2 1 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 0 5 5 6 4 9 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
HOYOS	CEBALLOS	JUAN	DIEGO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 1 0 2 1 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 1 5 9 5 4 0 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ALVAREZ	MACIAS	LUIS	FERNANDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141161219202

(415)7707212489984(8020) **000014116121920 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 7 9 8 1	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 9 0 9 3 2 7 3 0	7	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	2 4	2 0 2 1 0 2 1 2	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 6 0 0 0 3 4 5 5 1	3	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. - EN REORGANIZACION

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	1	2 0 2 1 0 2 1 2	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 1 8 2 0 1 8	7	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: GAICO CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	2 4	2 0 2 1 0 2 1 2	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 2 5 9 5 7 1	5	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CONSTRUCCIONES, CIMENTACIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	1	2 0 2 1 0 2 1 2	

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 0 0 1 1 9 0 8 6	8	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: PROYECTOS Y VIAS S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	2 5	2 0 2 1 0 2 1 2	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141161219202

(415)7707212489984(8020) **000014116121920 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 7 9 8 1	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 3 0 1 1 7 7 6 1	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: TECCIVIL S A S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		1 2 0 2 1 0 2 1 2	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 0 0 0 9 5 9 5 1	9	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: JMV INGENIEROS S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	2 4	2 0 2 1 0 2 1 2	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141161219202

(415)7707212489984(8020) **000014116121920 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 7 9 8 1	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	2 8 0 5 7 9 1 2		2 1 6 8 8 3

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
LOZANO	GARCIA	JANETH	

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 2 0 7 1 8

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141133876943

(415)7707212489984(8020) 000014113387694 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 1 8 2 0 1 8	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
GAICO CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 75 A 66 46 OF 501

42. Correo electrónico notificaciones@gaico.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 7 6 7 2 8 7 6	3 1 3 2 4 6 7 6 4 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		**Actividad secundaria**		**Otras actividades**			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 0 7 1 0 1 3	4 2 1 0	2 0 0 7 1 0 1 3	4 6 6 3	0 8 1 1			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5	5	9										

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales
59 - Autorretención especial renta

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ALVARADO ANGEL ANDRES ALBERTO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141133876943

(415)7707212489984(8020) **000014113387694 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 1 8 2 0 1 8	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 0 8 3 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	8 0 8 7 6 0 4 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ALVARADO	ANGEL	ANDRES	ALBERTO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 2 0 2 0 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 9 1 1 7 2 4 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ALVARADO	LINCE	GERMAN	ANTONIO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 0 1 0 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 2 2 7 9 4 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GONZALEZ	PRIETO	LUIS	EDUARDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141174501036

(415)7707212489984(8020) 000014117450103 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 9 3 2 7 3 0	7	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla
	CONYTRAC S.A.S

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Sabaneta 6 3 1

41. Dirección principal
CR 48 78 C SUR 71

42. Correo electrónico contabilidad@conytrac.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 4 3 0 1 2 2 6 6	3 1 1 6 3 7 3 2 0 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		**Actividad secundaria**		**Otras actividades**				
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	1 9 9 2 0 5 2 0	4 2 9 0	1 9 9 2 0 5 2 0	4 3 1 2	0 8 1 1			1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	9	1 0	1 4	4 2	4 8	5 2	5 5	5 9															

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales
59 - Autorretención especial renta

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre HOYOS CEBALLOS JUAN DIEGO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141174501036

(415)7707212489984(8020) **000014117450103 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 9 0 9 3 2 7 3 0	7	Impuestos de Medellín	1 1	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 5
72. Número	8 9 2	4 7 9 1
73. Fecha	1 9 8 3 0 5 2 3	2 0 1 9 1 1 1 4
74. Número de notaría	1	2 5
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 9 2 0 5 2 0	2 0 1 9 1 2 0 2
77. No. Matrícula mercantil	2 9 8 4	2 9 8 4
78. Departamento	0 5	0 5
79. Ciudad/Municipio	0 5 5	0 5 5
Vigencia		
80. Desde	1 9 8 3 0 5 2 3	1 9 8 3 0 5 2 3
81. Hasta	2 2 1 9 1 1 1 3	2 2 1 9 1 1 1 3

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2	2 1	1 9 9 9 1 2 2 7		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141174501036

(415)7707212489984(8020) **000014117450103 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 9 3 2 7 3 0	7	Impuestos de Medellín 1 1	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 7 0 2 2 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 0 5 5 6 4 9 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
HOYOS	CEBALLOS	JUAN	DIEGO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	1 9 9 9 1 2 2 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	4 2 8 8 0 8 4 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
HOYOS	PEREZ	HILDA	LUCIA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141174501036

(415)7707212489984(8020) **000014117450103 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 9 0 9 3 2 7 3 0	7	Impuestos de Medellín	1 1	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	3 3 0 5 7 3 3		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
HOYOS	POSADA	RODRIGO	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		1 9 9 9 1 2 2 7	2 0 1 8 0 3 2 8

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 0 5 5 6 4 9 8		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
HOYOS	CEBALLOS	JUAN	DIEGO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		1 9 9 9 1 2 2 7	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	4 2 8 8 0 8 4 5		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
HOYOS	PEREZ	HILDA	LUCIA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		1 9 9 9 1 2 2 7	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	2 1 3 1 7 6 1 1		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
PEREZ	DE HOYOS	LUCIA	NOEL

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		1 9 9 9 1 2 2 7	

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	4 2 8 7 9 8 0 6		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
HOYOS	CEBALLOS	ANGELA	MARIA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 8 0 3 2 8	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141174501036

(415)7707212489984(8020) **000014117450103 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 9 0 9 3 2 7 3 0	7	Impuestos de Medellín	1 1	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	4 2 8 9 0 0 7 1		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
HOYOS	PEREZ	ANA	CECILIA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 8 0 3 2 8	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	4 3 5 8 2 0 7 6		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
HOYOS	PEREZ	ELENA	MARIA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 8 0 3 2 8	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	4 3 5 6 5 1 5 2		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
RENDON	ORTIZ	ELIANA	MARIA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 9 0 3 2 4	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	2 1 2 9 5 2 0 8		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
CEBALLOS	DE HOYOS	MARGARITA	ISABEL

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 9 0 3 2 4	

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141174501036

(415)7707212489984(8020) **000014117450103 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 9 0 9 3 2 7 3 0	7	Impuestos de Medellín	1 1	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	4 3 1 6 3 1 1 2		1 2 4 2 1 7 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
ARANGO	MUNERA	SANDRA	MILENA

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada
8 0 0 0 1 5 8 2 1	8	CONTABLER S.A.

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 0 1 2 1 5

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 5 2 4 4 2 8 7 5		2 3 3 5 1 7 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
CASTAÑO	ARENAS	ESTEFANIA	

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada
8 0 0 0 1 5 8 2 1	8	CONTABLER S.A.

147. Fecha de nombramiento
2 0 2 0 1 2 1 5

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	3 9 3 5 5 3 8 6	3	1 1 7 4 8 4 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
ALGARIN	LONDOÑO	DIANA	LUZ

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 5 0 4 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 7 de 7 **Hoja 6**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141174501036

(415)7707212489984(8020) **000014117450103 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 9 3 2 7 3 0	7	Impuestos de Medellín 1 1	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 4 2 1 0

162. Nombre del establecimiento: CONSTRUCCIONES Y TRACTORES CONYTRAC

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Antioquia 0 5	Sabaneta 6 3 1

165. Dirección: CR 48 78 C SUR 71

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
2 9 8 5	1 9 9 2 0 4 0 9
168. Teléfono: 6 0 4 3 0 1 2 2 6 6	169. Fecha de cierre

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141147047036

(415)7707212489984(8020) 000014114704703 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 0 9 5 9 5 1	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
JMV INGENIEROS S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla
JMV S.A.S	JMV S.A.S

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 15 90 64 OF 402 BRR CHICO

42. Correo electrónico contabilidad@jmvingenieros.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 1 0 2 3 1	6 0 1 6 0 1 7 3 3 3	6 0 1 6 0 1 8 8 5 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	1 9 9 0 0 6 0 1	7 1 1 2	1 9 9 0 0 6 0 1	4 9 2 3	0 9 9 0			1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	0	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5											

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código	2 2	2 3																		

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre MOSQUERA MOSQUERA MAURICIO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141147047036

(415)7707212489984(8020) **000014114704703 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 0 9 5 9 5 1	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	
72. Número	2 1	
73. Fecha	1 9 9 0 0 5 2 5	
74. Número de notaría	4 4	
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	1 9 9 0 0 5 2 9	
77. No. Matrícula mercantil	4 1 0 7 7 5	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	4	
Vigencia		
80. Desde	1 9 9 0 0 5 2 5	
81. Hasta	2 0 1 0 0 5 2 5	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141147047036

(415)7707212489984(8020) **000014114704703 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 0 9 5 9 5 1	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 6 0 2 0 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 9 9 8 9 1 3 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MOSQUERA	MOSQUERA	MAURICIO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 6 0 2 0 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	5 1 6 7 5 8 4 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MOSQUERA	DE MOSQUERA	MARIA	VICTORIA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 6 0 2 0 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	8 0 8 5 1 5 4 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MOSQUERA	MOSQUERA	JUAN	CAMILO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141147047036

(415)7707212489984(8020) **000014114704703 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 0 0 0 9 5 9 5 1	9	Impuestos de Bogotá	3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	5 1 6 7 5 8 4 0		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
MOSQUERA	DE MOSQUERA	MARIA	VICTORIA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
72,000,000		5 0 1 9 9 0 0 5 2 5	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 9 3 4 4 0 9 7		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
MOSQUERA	TELLEZ	GUSTAVO	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
72,000,000		5 0 1 9 9 0 0 5 2 5	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141147047036

(415)7707212489984(8020) **000014114704703 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 0 9 5 9 5 1	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 2 2 3 9 6 9 8 7		2 1 4 2 2 1 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
GARAVITO	RODRIGUEZ	CRISTIAN	FERNANDO

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 4 0 7 0 1

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 2 8 0 5 6 1 9	3	2 1 7 8 6 8 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
NEIRA	CUELLAR	CLAUDIA	JENNETH

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 4 0 8 2 8

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141176284908

(415)7707212489984(8020) **000014117628490 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 1 1 9 0 8 6	8	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
PROYECTOS Y VIAS S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla
	PROVIAS S.A.S.

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

41. Dirección principal
CL 30 A 81 37

42. Correo electrónico administracion@provias.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	4 4 4 8 1 7 2	3 1 1 3 9 0 2 3 0 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
4 2 1 0	1 9 9 1 0 1 2 6	4 2 9 0	1 9 9 1 1 0 2 6		0 8 1 1	0 9 9 0

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos
	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 8 9 10 14 42 48 52 55

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código: 2 3

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141176284908

(415)7707212489984(8020) **000014117628490 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 0 0 1 1 9 0 8 6	8	Impuestos de Medellín	1 1	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o insitutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	1 1 7	6 9
73. Fecha	1 9 9 1 0 1 2 6	2 0 1 1 0 6 2 1
74. Número de notaría	1 4	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 9 1 0 1 3 1	2 0 1 1 0 8 0 8
77. No. Matrícula mercantil	2 1 1 5 3 3 1 1 3	2 1 1 5 3 3 1 1 1 2
78. Departamento	0 5	0 5
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	0 2 1
Vigencia		
80. Desde	1 9 9 1 0 1 2 6	2 0 1 2 1 2 1 3
81. Hasta	2 0 2 5 0 1 2 6	3 0 0 0 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 7 1 0 3 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141176284908

(415)7707212489984(8020) **000014117628490 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 1 1 9 0 8 6	8	Impuestos de Medellín 1 1	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	1 9 9 8 1 2 1 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 1 5 9 5 4 0 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ALVAREZ	MACIAS	LUIS	FERNANDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	1 9 9 8 1 2 1 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 1 6 3 1 4 6 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ALVAREZ	MACIAS	JESUS	ALFONSO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 1 0 6 2 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 1 6 8 6 5 8 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ALVAREZ	MACIAS	JUAN	CARLOS

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141176284908

(415)7707212489984(8020) **000014117628490 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 1 1 9 0 8 6	8	Impuestos de Medellín 1 1	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 1 5 9 5 4 0 7		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
ALVAREZ	MACIAS	LUIS	FERNANDO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
272,000,000	3 4	1 9 9 1 0 1 2 6	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 1 6 3 1 4 6 3		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
ALVAREZ	MACIAS	JESUS	ALFONSO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
264,000,000	3 3	1 9 9 1 0 1 2 6	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 1 6 8 6 5 8 4		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
ALVAREZ	MACIAS	JUAN	CARLOS

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
264,000,000	3 3	1 9 9 1 0 1 2 6	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141176284908

(415)7707212489984(8020) **000014117628490 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 1 1 9 0 8 6	8	Impuestos de Medellín 1 1	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	2 1 8 4 7 8 2 3		9 0 9 2 9 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
LOPEZ	GIRALDO	JOSEFINA	

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 0 8 0 1 0 2

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141176284908

(415)7707212489984(8020) **000014117628490 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 1 1 9 0 8 6	8	Impuestos de Medellín 1 1	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 4 2 1 0	
162. Nombre del establecimiento: PROVIAS		
163. Departamento: Antioquia 0 5	164. Ciudad/Municipio: Medellín 0 0 1	
165. Dirección: CL 30 A 81 37		
166. Número de matrícula mercantil: 2 2 1 1 7 3 - 2	167. Fecha de la matrícula mercantil: 1 9 9 1 0 1 2 6	
168. Teléfono: 4 4 4 8 1 7 2	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento		
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección		
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento:		
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección		
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141125195584

(415)7707212489984(8020) 000014112519558 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 1 1 7 7 6 1	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
TECCIVIL S A S

36. Nombre comercial	37. Sigla
TECCIVIL S A S	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 15 90 64 OF 402

42. Correo electrónico teccivil@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 8 8 5 0	6 0 1 7 3 3 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 0 0 6 0 1	7 1 1 2	2 0 2 0 0 6 0 1	0 9 9 0	4 3 9 0		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	8	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5												

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre MOSQUERA MATIZ BLANCA SUSANA

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141125195584

(415)7707212489984(8020) **000014112519558 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 1 1 7 7 6 1	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	0 3 3 3	8
73. Fecha	2 0 0 3 0 2 1 4	2 0 0 9 0 8 2 8
74. Número de notaría	4 0	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 3 0 3 1 8	2 0 0 9 0 9 0 1
77. No. Matrícula mercantil	0 1 2 5 6 6 0 2	1 3 2 3 2 3 5
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	4

Vigencia

80. Desde	2 0 0 3 0 2 1 4
81. Hasta	2 0 5 3 0 2 1 4

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 7 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141125195584

(415)7707212489984(8020) **000014112519558 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 1 1 7 7 6 1	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 0 3 0 3 1 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	3 9 5 3 9 0 4 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MOSQUERA	MATIZ	BLANCA	SUSANA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141125195584

(415)7707212489984(8020) **000014112519558 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 1 1 7 7 6 1	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 9 9 8 9 1 3 9		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
MOSQUERA	MOSQUERA	MAURICIO	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 0 3 0 2 1 4	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	3 9 5 3 9 0 4 5		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
MOSQUERA	MATIZ	BLANCA	SUSANA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 0 3 0 2 1 4	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	5 1 9 5 9 9 7 4		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
MOSQUERA	MATIZ	AZUCENA	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 0 3 0 2 1 4	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	1 1 1 8 9 9 6 5		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
MOSQUERA	MATIZ	DIEGO	ALONSO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 0 3 0 2 1 4	

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 0 8 5 1 5 4 3	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
MOSQUERA	MOSQUERA	JUAN	CAMILO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 0 3 0 2 1 4	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141125195584

(415)7707212489984(8020) **000014112519558 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 1 1 7 7 6 1	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 9 6 8 8 8 8 3		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
GEIRINGER	ORTEGA	SAMUEL	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 0 3 0 2 1 4	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141125195584

(415)7707212489984(8020) **000014112519558 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 3 0 1 1 7 7 6 1	1	Impuestos de Bogotá	3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 2 2 3 9 6 9 8 7		2 1 4 2 2 1 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
GARAVITO	RODRIGUEZ	CRISTIAN	FERNANDO

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 4 0 8 0 1

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 2 8 0 5 6 1 9	3	2 1 7 8 6 8 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
NEIRA	CUELLAR	CLAUDIA	JENNETH

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 4 0 8 2 8

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141125195584

(415)7707212489984(8020) **000014112519558 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 1 1 7 7 6 1	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica 7 1 1 2

162. Nombre del establecimiento: TECCIVIL S A

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

165. Dirección: CR 15 90 64 OF 402

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
1 2 5 6 7 8 5	2 0 0 3 0 3 1 9
168. Teléfono: 6 0 1 7 3 3 3	169. Fecha de cierre

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141058761357

(415)7707212489984(8020) 000014105876135 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 5 9 5 7 1	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSTRUCCIONES, CIMENTACIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
	C2SI S.A.S.

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 17 93 82 OF 504

42. Correo electrónico infoc2sisas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 1 0 2 2 1	6 0 1 7 0 3 7 5 0 1	3 1 8 8 9 7 9 8 4 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 1 9 0 2 2 6	4 2 1 0	2 0 1 9 0 2 2 6	4 3 3 0 7 1 1 2		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5	5	9												

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales
59 - Autorretención especial renta

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores						
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3	
		57. Modo				
		58. CPC				

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre VEJARANO SAMPER ALFONSO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141058761357

(415)7707212489984(8020) **000014105876135 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 5 9 5 7 1	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 9 0 2 2 1	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 9 0 2 2 6	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 3 0 7 4 2 7 7	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 9 0 2 2 1	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 9 0 2 2 6		-
2	8 0	2 0 1 9 0 2 2 1		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 3 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141058761357

(415)7707212489984(8020) **000014105876135 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 5 9 5 7 1	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 0 2 1 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 9 5 3 3 2 6 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VEJARANO	SAMPER	ALFONSO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

CERTIFICACION BANCARIA

Nos complace informar que la **FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.** identificado con Nit. **830.054.076-2** es nuestro cliente a través de la cuenta **AHORROS No. 408-90503-2** a nombre de **FID PA 422140 UT ANDINO 066,** desde el día 11 de mayo del 2023. Con estado **ACTIVA**.

Lo anterior nos permite certificar que la mejor referencia de nuestro cliente **FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.** es ser un "Cliente activo del BANCO de OCCIDENTE".

Dirigimos esta constancia a **FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.** hoy 02 de **agosto** del **2023** en la ciudad de Bogotá D.C.

Cordialmente,



Maria Alejandra Saboya Martinez
Auxiliar Operaciones Nacionales
Gerencia de Operaciones

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Banco de Occidente | Del lado de los que hacen.

Grupo AVAL

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjmendiet	JOSE LIBORIO MENDIETA REGALADO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2025-03-14-3:10 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 39125 de fecha 2025-03-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	159825	**Fecha Registro:**	2025-03-14	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	28.088.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	-3.000.000.000,00			**Valor Actual:**	25.088.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	25.088.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901477981	**Razón Social:**	UNION TEMPORAL ANDINO 066	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	008584971	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	35195494	**Nombre:**	CATALINA TELLEZ POSADA	**Cargo:**	DIRECTOR DE CONTRATACION

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	1009/2021	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2025-03-14

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
13-21 SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA SECUNDARIA MEJORADA - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / A. INTERVENCIÓN DE VÍAS REGIONALES (SECUNDARIAS Y TERCIARIAS), TERMINALES FLUVIALES Y AERÓDROMOS	Nación	11	CSF	2025-03-14	28.088.000.000,00	-3.000.000.000,00		
					Total:	28.088.000.000,00	-3.000.000.000,00	25.088.000.000,00	25.088.000.000,00

Objeto:	SVR CTO 1009/2021 VIGENCIA FUTURA PLAZO 114 MES SOL490 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL AMBIENTAL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA PUERTO BOLÍVAR ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN DEP GUAJIRA, EN MARCO D

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-03-31	88.000.000,00	88.000.000,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-06-30	14.000.000.000,00	14.000.000.000,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-12-31	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
