INFORME SEMANAL

HOJA 1 de 2	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	Contrato 323 del 05 AGO 2025
		22	9	2025		

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DESCRIPCION DE LA SEMANA DE INFORME

Semana Número 1 de 12 Del: 13-ago-25 Al: 19-ago-25

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 6 Días. Tiempo faltante: 85 Días

Nombre del Supervisor: JAIRO RODRIGUEZ ESCOBAR % Tiempo transcurrido: 6.593%

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

REALIZAR LA INDEPENDIZACIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA URBANIZACIÓN LA PALMAREÑA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA.

CONTROL DE EJECUCION

PROGRAMADO	SEMANAL	ACUMULADO	EJECUTADO	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	6.00%	6.00%	Obra Ejecutada (%)	8.00%	6.00%
Valor de la Obra programada:	$21,738,887.94	$ 21,738,887.94	Valor de la Obra	$ 28,985,183.92	$ 21,738,887.94
Diferencia semanal:		2.0%	**Diferencia acumulada:**		**0.00%**

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
Contratista:	EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ	**Interventor:**	N/A
Contrato No.	323 DE 2025	Contrato No.	N/A
Valor Inicial:	$ 362,314,799.00	Valor Inicial:	N/A
Valor Actualizado:	$ 362,314,799.00	Valor Actualizado:	N/A
Plazo Inicial:	TRES (03) MESES	Plazo Inicial:	N/A
Plazo Actualizado:	N/A	Plazo Actualizado:	N/A
Fecha de Iniciación:	13-ago-25	Fecha de Iniciación:	N/A
Fecha de Terminación:	12-nov-25	Fecha de Terminación:	N/A
Estado del contrato:	EN EJECUCION	Estado del contrato:	N/A
Avance financiero:	$21,738,887.94	Avance financiero:	N/A
% avance financiero:	6.00%	% avance financiero:	N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

- Se realizo localización y replanteo las redes.
- Se inicia excavación de la red de alumbrado publico para las tuberia de 2 pulgadas en pvc
- Se inicia la instalación de tubería de 2 pulgadas con su respectivo cinta de señalizacion, atraque en arena, y relleno con material local compactado.
- Se Inicio la construccion de cajas de inspección AP 280.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- Continuar con excavaciones.
- Iniciar los cruces de via esto implica corte, demolición y excavacion
- Continuar con la instalación de tubería de 2"
- Continuar con la construccion de las cajas de inspección AP 280 (fundir los marcos de las cajas construidas)

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El contrato se encuentra en ejecución.

OBSERVACIONES

Durante esta semana se contabilizaron 7 horas de lluvia.

APOYO A LA SUPERVISIÓN	RESIDENTE DE OBRA	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL
GABRIEL CARDENAS	JAIRO RODRIGUEZ ESCOBAR	PAOLA ORTEGON
Firma	Firma	Firma

INFORME SEMANAL

HOJA 1 de 2	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	Contrato 323 del 05 AGO 2025
		22	9	2025		

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DESCRIPCION DE LA SEMANA DE INFORME

Semana Número 1 de 12 Del: 13-ago-25 Al: 19-ago-25

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 6 Días. Tiempo faltante: 85 Días

Nombre del Supervisor: JAIRO RODRIGUEZ ESCOBAR % Tiempo transcurrido: 6.593%

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

REALIZAR LA INDEPENDIZACIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA URBANIZACIÓN LA PALMAREÑA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA.

CONTROL DE EJECUCION

PROGRAMADO	SEMANAL	ACUMULADO	EJECUTADO	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	6.00%	6.00%	Obra Ejecutada (%)	8.00%	6.00%
Valor de la Obra programada:	$21,738,887.94	$ 21,738,887.94	Valor de la Obra	$ 28,985,183.92	$ 21,738,887.94
Diferencia semanal:		2.0%	**Diferencia acumulada:**		**0.00%**

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
Contratista:	EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ	**Interventor:**	N/A
Contrato No.	323 DE 2025	Contrato No.	N/A
Valor Inicial:	$ 362,314,799.00	Valor Inicial:	N/A
Valor Actualizado:	$ 362,314,799.00	Valor Actualizado:	N/A
Plazo Inicial:	TRES (03) MESES	Plazo Inicial:	N/A
Plazo Actualizado:	N/A	Plazo Actualizado:	N/A
Fecha de Iniciación:	13-ago-25	Fecha de Iniciación:	N/A
Fecha de Terminación:	12-nov-25	Fecha de Terminación:	N/A
Estado del contrato:	EN EJECUCION	Estado del contrato:	N/A
Avance financiero:	$21,738,887.94	Avance financiero:	N/A
% avance financiero:	6.00%	% avance financiero:	N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

- Se realizo localización y replanteo las redes.
- Se inicia excavación de la red de alumbrado publico para las tuberia de 2 pulgadas en pvc
- Se inicia la instalación de tubería de 2 pulgadas con su respectivo cinta de señalizacion, atraque en arena, y relleno con material local compactado.
- Se Inicio la construccion de cajas de inspección AP 280.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- Continuar con excavaciones.
- Iniciar los cruces de via esto implica corte, demolición y excavacion
- Continuar con la instalación de tubería de 2"
- Continuar con la construccion de las cajas de inspección AP 280 (fundir los marcos de las cajas construidas)

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El contrato se encuentra en ejecución.

OBSERVACIONES

Durante esta semana se contabilizaron 7 horas de lluvia.

APOYO A LA SUPERVISIÓN	RESIDENTE DE OBRA	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL
GABRIEL CARDENAS	JAIRO RODRIGUEZ ESCOBAR	PAOLA ORTEGON
Firma	Firma	Firma

INFORME SEMANAL

HOJA 2 de 2	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	Contrato 323 del 05 AGO 2025
		22	9	2025		

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA INDEPENDIZACIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA URBANIZACIÓN LA PALMAREÑA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA.

REGISTRO FOTOGRAFICO



FOTOGRAFÍA No.1 Excavaciones zonas verdes .



FOTOGRAFÍA No. 2 Corte de concreto en zonas peatonales.



FOTOGRAFÍA No.3 Inicio de construccion de cajas de isnpección AP 280



FOTOGRAFÍA No. 4 excavación tapado de tuberia e instalación de cinta de peligro CS-273 mas arena de rio.

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
CONTRATISTA

GABRIEL CARDENAS
APOYO A SUPERVISIÓN

ALCALDIA MUNICIPAL DE TAURAMENA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA N° 09

D	D	M	M	A	A
1	4	0	8	2	0 2 5

ACTA DE COMITÉ

SUMINISTRO ☐ CONSULTORIA ☐ OBRA ☒ DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐


I. PARTICIPANTES	CARGO
ANDREA PAOLA IBAÑEZ	PRESIDENTE.
Fioralba Arenas osto	Recidente Residente.
Aida Lucia Pérez Moreno	APOYO A LA SUPERVISIÓN.
GABRIEL CARRENAS PERILLA	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA.
LINO RODRIGUEZ OCHOA.	CONTRATISTA
EDWAR BARRETO	

II. OBJETO

SOCIALIZACIÓN CONTRATO N° 323 DE 2025.

III. TEMAS TRATADOS

- ALCANCE DEL CONTRATO N° 323 DE 2025.
- SE COMENTA QUE SE REALIZARAN [redacted] EXCAVACIONES DONDE SE INTERVIENEN ANDENES QUE INVADEN EL ESPACIO PUBLICO, LOS CUALES SOLO SE REALIZARA RESANE.
- SE ENSEÑAN PLANOS Y TRAZADO DE LAS EXCAVACIONES.
-

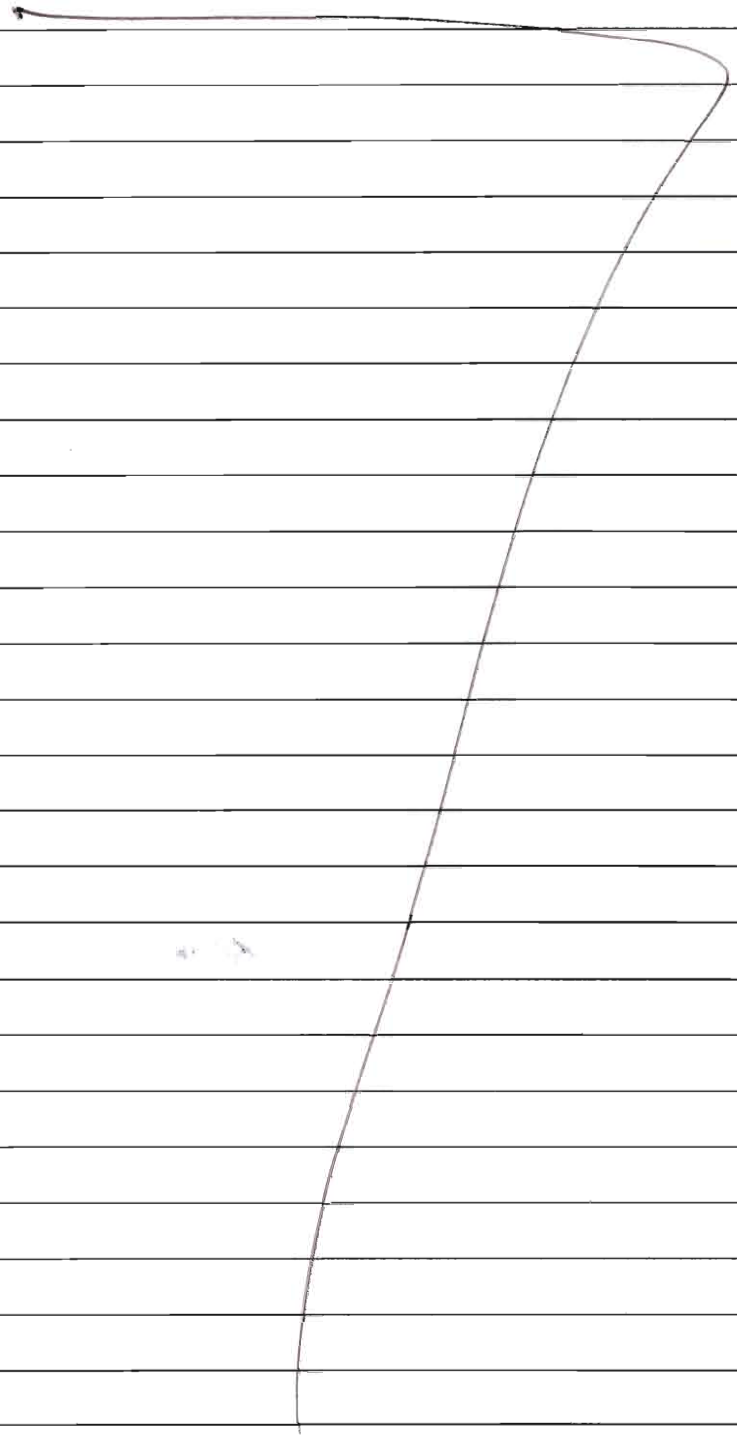

IV. COMPROMISOS PACTADOS	RESPONSABLES
PRESENTAR EL PERSONAL DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR LOS TRABAJO	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Tauramena, a los

(Día en letras) (Día en números) días del mes de (Mes en que se firma el acta) de (Año de firma del acta)

(Firma)

(Firma)

(Firma) Floralba Arenas osto

(Firma)

(Firma)

(Firma)

(Firma)

(Firma)

(Firma)

(Firma)

ARL | sura

Medellín, 14 de Agosto de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ, en el centro de trabajo 0000000001 - PRINCIPAL CASANARE, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C1006415999	GOMEZ CHAPARRO ERIKA YULIANA	15/08/2025		15015717	DEPENDIENTE	POR INICIAR
C1118120282	OLARTE VANEGAS ALEX YOHEL	15/08/2025		931032B2	DEPENDIENTE	POR INICIAR
C1115913120	RODRIGUEZ IBAÑEZ JIMY SADDAM	15/08/2025		236u1417	DEPENDIENTE	POR INICIAR
C74856795	ROJAS LEONARDO	15/08/2025		92226232	DEPENDIENTE	POR INICIAR
C1006415455	SANDOVAL BERNAL GHELBER OCTAVIO	15/08/2025		177186ly	DEPENDIENTE	POR INICIAR

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C797996142522648592

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 14/08/2025 13:29:48 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 179.1.207.43, 192.230.104.9, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ARL | sura

Medellín, 12 de Agosto de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ, en el centro de trabajo 0000000001 - PRINCIPAL CASANARE, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C1032496789	ORTEGON MELO SINDY PAOLA	13/08/2025		251243t²	DEPENDIENTE	POR INICIAR
C4148988	ROA BARRETO MILTON	13/08/2025		D205s262	DEPENDIENTE	POR INICIAR
C1052387924	RODRIGUEZ ESCOBAR JAIRO HUMBERTO	13/08/2025		41451891	DEPENDIENTE	POR INICIAR

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C797996142522435778

Atentamente,



Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 12/08/2025 09:56:18 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 179.1.207.43, 192.230.104.9, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

LA SUBDIRECTORA OPERATIVA DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CASANARE "COMFACASANARE"

HACE CONSTAR

Que de acuerdo a la información de nuestro archivo, constatamos que la documentación de la afiliación del señor(a) **JIMMY SADDAM RODRIGUEZ IBAÑEZ** identificado con cédula de ciudadanía No. **1115913120** ha sido radicada y su cargue en el sistema se encuentra pendiente en el orden de la respectiva revisión por el área encargada.

Información laboral:

Nit	Razón Social	Fecha afiliación solicitada
79799614	EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ	2025-08-15

Codigo radicacion:2025-08-14-G22Dqwcbe-afi
Esta constancia se expide a solicitud del interesado a los 14 días del mes de Agosto de 2025

Generado: Software Caja de compensación Familiar de Casanare

LA SUBDIRECTORA OPERATIVA DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CASANARE "COMFACASANARE"

HACE CONSTAR

Que de acuerdo a la información de nuestro archivo, constatamos que la documentación de la afiliación del señor(a) **LEONARDO ROJAS** identificado con cédula de ciudadanía No. **74856795** ha sido radicada y su cargue en el sistema se encuentra pendiente en el orden de la respectiva revisión por el área encargada.

Información laboral:

Nit	Razón Social	Fecha afiliación solicitada
79799614	EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ	2025-08-15

Codigo radicacion:2025-08-14-KKYbbCQuV-afi
Esta constancia se expide a solicitud del interesado a los 14 días del mes de Agosto de 2025

Generado: Software Caja de compensación Familiar de Casanare

LA SUBDIRECTORA OPERATIVA DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CASANARE "COMFACASANARE"

HACE CONSTAR

Que de acuerdo a la información de nuestro archivo, constatamos que la documentación de la afiliación del señor(a) **ALEX YOHEL OLARTE VANEGAS** identificado con cédula de ciudadanía No. **1118120282** ha sido radicada y su cargue en el sistema se encuentra pendiente en el orden de la respectiva revisión por el área encargada.

Información laboral:

Nit	Razón Social	Fecha afiliación solicitada
79799614	EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ	2025-08-15

Codigo radicacion:2025-08-14-maJubQ3a6-afi
Esta constancia se expide a solicitud del interesado a los 14 días del mes de Agosto de 2025

Generado: Software Caja de compensación Familiar de Casanare

LA SUBDIRECTORA OPERATIVA DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CASANARE "COMFACASANARE"

HACE CONSTAR

Que de acuerdo a la información de nuestro archivo, constatamos que la documentación de la afiliación del señor(a) **GHELBER OCTAVIO SANDOVAL BERNAL** identificado con cédula de ciudadanía No. **1006415455** ha sido radicada y su cargue en el sistema se encuentra pendiente en el orden de la respectiva revisión por el área encargada.

Información laboral:

Nit	Razón Social	Fecha afiliación solicitada
79799614	EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ	2025-08-15

Codigo radicacion:2025-08-14-3GbD7ntp6-afi
Esta constancia se expide a solicitud del interesado a los 14 días del mes de Agosto de 2025

Generado: Software Caja de compensación Familiar de Casanare

LA SUBDIRECTORA OPERATIVA DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CASANARE "COMFACASANARE"

HACE CONSTAR

Que de acuerdo a la información de nuestro archivo, constatamos que la documentación de la afiliación del señor(a) **ERIKA YULIANA GOMEZ CHAPARRO** identificado con cédula de ciudadanía No. **1006415999** ha sido radicada y su cargue en el sistema se encuentra pendiente en el orden de la respectiva revisión por el área encargada.

Información laboral:

Nit	Razón Social	Fecha afiliación solicitada
79799614	EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ	2025-08-15

Codigo radicacion:2025-08-14-nvfPwiZj2-afi
Esta constancia se expide a solicitud del interesado a los 14 días del mes de Agosto de 2025

Generado: Software Caja de compensación Familiar de Casanare

Personería Municipal de Tauramena	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MECI-MIPG**	**CÓDIGO: FOR-1-01-01**
	DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN	**VERSIÓN: 2**
	CERTIFICACION	**FECHA: 28/12/2023**

Tauramena Casanare, quince (15) de septiembre de dos mil veinticinco (2025).

Señor:
R/L EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
Tauramena Casanare

REF. CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO

De acuerdo a la solicitud enviada a este despacho, una vez revisados los Archivos de la oficina no se encontró queja alguna, ni reclamaciones laborales en lo concerniente a la ejecución del CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 323 DE 2025, cuyo objeto es: **"REALIZAR LA INDEPENDIZACIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA URBANIZACIÓN LA PALMAREÑA DEL MUNICIPIO"** actividad desarrollada en esta jurisdicción.

Cordialmente,

LIZETH BALLESTEROS RAMOS
Personera Municipal

Proyectó: JULIANA MORA BARON
Judicante delegado para derecho humanos

Tauramena, 12 de SEPTIEMBRE de 2025

Personeria Municipal
Tauramena Casanare
12 SEP 2025
Hora: 3:11 pm
Firma: Alejandra Sierra Gómez

Doctora.
LIZETH BALLESTEROS RAMOS
Personería Municipal de Tauramena

Ref. Contrato de Obra pública No 323 de 2025.

Asunto: Paz y salvo Municipal

Cordial saludo,

La presente tiene como fin de solicitarlo muy comedidamente, la certificación o paz y salvo donde señale que no se ha recibido quejas sobre pago de salarios y prestaciones sociales, del personal vinculado durante la ejecución del contrato de la referencia, ni otro tipo de queja o reclamo sobre este.

- CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 323 DEL 05 DE AGOSTO DE 2025, QUE TIENE POR OBJETO "REALIZAR LA INDEPENDIZACIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA URBANIZACIÓN LA PALMAREÑA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA."

Este contrato fue celebrado entre el MUNICIPIO DE TAURAMENA y EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ, esto con el fin de liquidar el contrato de la referencia
Sin otro en particular.

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
Nit: 79799614-9
R/L: EDWAR BARRETO
CC: 79.799.614

INFORME SEMANAL

HOJA 1 de 2	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	Contrato 323 del 05 AGO 2025
		22	9	2025		

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DESCRIPCION DE LA SEMANA DE INFORME

Semana Número: 2 de 12 Del: 20-ago-25 Al: 26-ago-25

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 12 Días. Tiempo faltante: 78 Días

Nombre del Supervisor: JAIRO RODRIGUEZ ESCOBAR % Tiempo transcurrido: 13.333%

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

REALIZAR LA INDEPENDIZACIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA URBANIZACIÓN LA PALMAREÑA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA.

CONTROL DE EJECUCION

PROGRAMADO	SEMANAL	ACUMULADO	EJECUTADO	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	8.00%	14.00%	Obra Ejecutada (%)	8.00%	14.00%
Valor de la Obra programada:	$28,985,183.92	$ 50,724,071.86	Valor de la Obra	$ 28,985,183.92	$ 50,724,071.86
Diferencia semanal:		0.0%	**Diferencia acumulada:**		**0.00%**

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
Contratista:	EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ	**Interventor:**	N/A
Contrato No.	323 DE 2025	Contrato No.	N/A
Valor Inicial:	$ 362,314,799.00	Valor Inicial:	N/A
Valor Actualizado:	$ 362,314,799.00	Valor Actualizado:	N/A
Plazo Inicial:	TRES (03) MESES	Plazo Inicial:	N/A
Plazo Actualizado:	N/A	Plazo Actualizado:	N/A
Fecha de Iniciación:	13-sep-25	Fecha de Iniciación:	N/A
Fecha de Terminación:	12-nov-25	Fecha de Terminación:	N/A
Estado del contrato:	EN EJECUCION	Estado del contrato:	N/A
Avance financiero:	$50,724,071.86	Avance financiero:	N/A
% avance financiero:	14.00%	% avance financiero:	N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

- Se continuo con la excavación de la red de alumbrado publico para las tuberia de 2 pulgadas en pvc
- Se ralizaron 4 cruces de via los cuales incluyen cortes, demolicion, excavacion.
- Se continuo la instalación de tubería de 2 pulgadas con su respectivo cinta de señalizacion, atraque en arena, y relleno con material local compactado.
- Se continuo la construccion de cajas de inspección AP 280 y se fuendio el marco de concreto a las cajas realizadas la semana pasada.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- Continuar con excavaciones.
- Realizar la excavacion
- Continuar con la instalación de tubería de 2"
- Continuar con la construccion de las cajas de inspección AP 280

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El contrato se encuentra en ejecución.

OBSERVACIONES

Durante esta semana se contabilizaron 6 horas de lluvia.

APOYO A LA SUPERVISIÓN	RESIDENTE DE OBRA	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL
GABRIEL CARDENAS	JAIRO RODRIGUEZ ESCOBAR	PAOLA ORTEGON
Firma	Firma	Firma

INFORME SEMANAL

HOJA 2 de 2	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	Contrato 323 del 05 AGO 2025
		22	9	2025		

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA INDEPENDIZACIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA URBANIZACIÓN LA PALMAREÑA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA.

REGISTRO FOTOGRAFICO



FOTOGRAFÍA No.1 Excavaciones zonas verdes .



FOTOGRAFÍA No. 2 Corte, excavacion de cruces de via.



FOTOGRAFÍA No.3 construcion de cajas de isnpección AP280 y se fundieron los marcos de concreoto



FOTOGRAFÍA No. 4 tapado de tuberia e instalación de cinta de peligro CS-273 mas arena de rio.

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
CONTRATISTA

GABRIEL CARDENAS
APOYO A LA SUPERVISIÓN

INFORME SEMANAL

HOJA 1 de 2	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	Contrato 323 del 05 AGO 2025
		29	9	2025		

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DESCRIPCION DE LA SEMANA DE INFORME

Semana Número: 3 de 12 Del: 27-ago-25 Al: 26-ago-25

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 18 Días. Tiempo faltante: 71 Días

Nombre del Supervisor: JAIRO RODRIGUEZ ESCOBAR % Tiempo transcurrido: 20.225%

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

REALIZAR LA INDEPENDIZACIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA URBANIZACIÓN LA PALMAREÑA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA.

CONTROL DE EJECUCION

PROGRAMADO	SEMANAL	ACUMULADO	EJECUTADO	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	8.00%	22.00%	Obra Ejecutada (%)	8.00%	22.00%
Valor de la Obra programada:	$28,985,183.92	$ 79,709,255.78	Valor de la Obra	$ 28,985,183.92	$ 79,709,255.78
Diferencia semanal:		0.0%	**Diferencia acumulada:**		**0.00%**

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
Contratista:	EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ	**Interventor:**	N/A
Contrato No.	323 DE 2025	Contrato No.	N/A
Valor Inicial:	$ 362,314,799.00	Valor Inicial:	N/A
Valor Actualizado:	$ 362,314,799.00	Valor Actualizado:	N/A
Plazo Inicial:	TRES (03) MESES	Plazo Inicial:	N/A
Plazo Actualizado:	N/A	Plazo Actualizado:	N/A
Fecha de Iniciación:	13-sep-25	Fecha de Iniciación:	N/A
Fecha de Terminación:	12-nov-25	Fecha de Terminación:	N/A
Estado del contrato:	EN EJECUCION	Estado del contrato:	N/A
Avance financiero:	$79,709,255.78	Avance financiero:	N/A
% avance financiero:	22.00%	% avance financiero:	N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

- Se continuo con la excavación de la red de alumbrado publico para las tuberia de 2 pulgadas en pvc
- Se ralizaron 3 cruces de via los cuales incluyen cortes, demolicion, excavacion.
- Se continuo la instalación de tubería de 2 pulgadas con su respectivo cinta de señalizacion, atraque en arena, y relleno con material local compactado.
- Se continuo la construccion de cajas de inspección AP 280 y se fuendio el marco de concreto a las cajas realizadas la semana pasada y se les pusieron tapas.
- Se realizo el proceso de compra de materiales electricos: Cableado, Luminarias, Posteria y demas accesorios para iniciar la segunda parte del proyecto.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- Terminar con excavaciones y obra civil.
- Recibir material electrico comprado durante esta semana.
- Iniciar porceso de cableado.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El contrato se encuentra en ejecución.

OBSERVACIONES

Durante esta semana se contabilizaron 5 horas de lluvia.

APOYO A LA SUPERVISIÓN	RESIDENTE DE OBRA	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL
GABRIEL CARDENAS	JAIRO RODRIGUEZ ESCOBAR	PAOLA ORTEGON
Firma	Firma	Firma

INFORME SEMANAL

HOJA 2 de 2	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	Contrato 323 del 05 AGO 2025
		29	9	2025		

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA INDEPENDIZACIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA URBANIZACIÓN LA PALMAREÑA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA.

REGISTRO FOTOGRAFICO



FOTOGRAFÍA No.1 Proceso de corte y excavaciones peatonal.



FOTOGRAFÍA No. 2 Corte, excavacion de cruces de via.



FOTOGRAFÍA No.3 construcion de cajas de isnpección AP280 y se fundieron los marcos de concreoto y tapas.



FOTOGRAFÍA No. 4 tapado de tuberia e instalación de cinta de peligro CS-273 mas arena de rio.

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
CONTRATISTA

GABRIEL CARDENAS
APOYO A LA SUPERVISIÓN

REALIZAR LA INDEPENDIZACIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA URBANIZACIÓN LA PALMAREÑA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA.

INFORME MENSUAL DE OBRA 1.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

323 del 05 AGO 2025



CONTRATISTA

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ

13 ago 2025 a 15 sep 2025

APOYO A LA SUPERVISION

GABRIEL CARDENAS

SUPERVISION

LINO RODRIGUEZ

REALIZAR LA INDEPENDIZACIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA URBANIZACIÓN LA PALMAREÑA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA.

INFORME MENSUAL DE OBRA 1.



CONSTRUCTOR
EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ

SUPERVISION
LINO RODRIGUEZ
Secretario de Infraestructura

REALIZAR LA INDEPENDIZACIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA URBANIZACIÓN LA PALMAREÑA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA.	
CONTRATO DE OBRA No.:	323 del 05 AGO 2025
CONTRATISTA:	EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde al seguimiento y ejecución del Contrato de Obra Pública No. 323 del 05 de agosto de 2025, celebrado entre el Municipio de Tauramena – Casanare, en calidad de contratante, representado por el señor Javier Augusto Álvarez Alfonso, Alcalde Municipal, y el contratista Edwar Alexander Barreto Gutiérrez, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.799.614 de Bogotá D.C.

El objeto del contrato es realizar la independización de las redes eléctricas de alumbrado público en la Urbanización La Palmareña del municipio de Tauramena, con el fin de garantizar un servicio eficiente, seguro y ajustado a la normatividad vigente.

El proyecto contempla un conjunto de actividades orientadas a la modernización y adecuación de la infraestructura eléctrica, entre las cuales se destacan: replanteo y construcción de redes de baja tensión, instalación de canalización subterránea con cableado de cobre, reposición de cajas de inspección, empalmes en gel subterráneo, suministro e instalación de luminarias LED de última tecnología, postes metálicos galvanizados, brazos, cableado encauchetado y demás accesorios necesarios para la correcta operación del sistema de alumbrado público.

Finalmente, este informe tiene como propósito documentar de manera clara y precisa el desarrollo de las actividades ejecutadas, los avances alcanzados y los resultados esperados, sirviendo como instrumento de control, seguimiento y transparencia en la gestión del proyecto.

Durante este primer mes de ejecución no se han presentado contratiempos que no se hayan podico superar. A la fecha de este informe el contrato transcurre con normalidad y se encuentra en ejecución.

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
REPRESENTANTE LEGAL
323 del 05 AGO 2025

REALIZAR LA INDEPENDIZACIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA URBANIZACIÓN LA PALMAREÑA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA.	
CONTRATO DE OBRA No.:	323 del 05 AGO 2025
CONTRATISTA:	EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ

3.0 CUADRO RESUMEN DEL CONTRATO DE OBRA	
3.1 INFORMACION BASICA DEL CONTRATO	
CONTRATO INICIAL	
Nombre del Contratante	MUNICIPIO DE TAURAMENA
Nombre del Contratista	EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
Representante Legal	EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
Numero del Contrato	323 del 05 AGO 2025
Fecha del Contrato	05 AGOSTO DEL 2025
Plazo inicial de Ejecución	TRES (3) MESES
Valor Inicial del Contrato	$ 362,314,799.00
Fecha Acta de Iniciación	13 DE AGOSTO DE 2025
Fecha Acta de terminación inicial	12 DE NOVIEMBRE DEL 2025
Total de adicion de Plazo	N/A
Plazo final de Ejecución	TRES (3) MESES
Nueva Fecha de terminación	15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
SUSPENSIÓN DEL PLAZO	
Fecha de Suspensión NO. 1	N/A
Dias de Suspensión	N/A
Fecha de Reiniciación	N/A
PRORROGA 1	
Fecha	N/A
Plazo adicional	N/A
Valor adicional	N/A
Nueva fecha terminación	N/A
ADICIONAL 1	
Fecha	N/A
Valor del acta	N/A
ESTADO ACTUAL	
Valor ejecutado (100%)	$ 362,314,799.00
Valor actas parciales	N/A
Valor anticipo	$181,157,399.50
Valor por ejecutar	$0.00
TOTAL	**$362,314,799.00**

INFORME MENSUAL DE OBRA 1.	
CONTRATO DE OBRA No.:	323 del 05 AGO 2025
CONTRATISTA:	EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ

2. TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN

2. TABLA DE CONTENIDO

3. CUADRO RESUMEN DEL CONTRATO DE OBRA 595 de 2023

- 3.1 INFORMACIÓN BASICA DEL CONTRATO DE OBRA
- 3.2 INFORME DE EQUIPOS - PERSONAL E INSTALACIONES DEL CONTRATISTA DE OBRA
- 3.3 AVANCE FISICO DE LA OBRA
- 3.4 CANTIDADES ORIGINALES
- 3.5 AVANCE CANTIDADES EJECUTADAS
- 3.6 GRAFICO DE EJECUCIÓN DE OBRA
- 3.7 GRAFICO DE EJECUCIÓN EN TIEMPO
- 3.8 RELACION DE POLIZAS

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5. ANEXOS

- 5.1 REGISTRO FOTOGRAFICO
- 5.2 INFORME HSEQ

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
REPRESENTANTE LEGAL
323 del 05 AGO 2025

REALIZAR LA INDEPENDIZACIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA URBANIZACIÓN LA PALMAREÑA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA.

CONTRATO DE OBRA No.: 323 del 05 AGO 2025

CONTRATISTA: EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ

3.2 INFORMACIÓN DE EQUIPO - PERSONAL E INSTALACIONES CONTRATISTA

TIEMPO

DESCRIPCION	Agost - 2024		Sept - 2024	
	S1	S2	S1	S2
EQUIPO				
Camioneta	1	1	1	1
generador		1	1	1
cortodora de pavimento		1	1	1
demoledor		1	1	1
vibrocopactador tipo canguro		1	1	1
camion canasta			1	1
camion grua			1	1
Herramienta menor	2	2	2	2
PERSONAL				
Residente de Obra	1	1	1	1
Coord. De seguridad y salud en el trabajo	1	1	1	1
Supervisor	1	1	1	1
Oficial	3	3	3	3
Ayudante	3	3	3	3
Electricista	2	2	2	2
Conductor	1	1	1	1
TOTAL	12	12	12	12
INSTALACIONES				
BODEGA	1	1	1	1

REALIZAR LA INDEPENDIZACIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA URBANIZACIÓN LA PALMAREÑA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA.	
CONTRATO DE OBRA No.:	323 del 05 AGO 2025
CONTRATISTA:	EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ

3.3 AVANCE FÍSICO DE LA OBRA

ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA

En el presente informe final del contrato de obra 323 del 2025 se muestra el desarrollo del contrato de obra el cual comprende las actividades desarrolladas desde el periodo del 13 de agosto de 2025 al 15 de septiembre de 2025.

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades propias del contrato de obra :

Replanteo y verificación de la red de baja tensión existente.
-Apertura de zanjas para la instalación de canalizaciones subterráneas.
-Corte de asfato y excavacion de cruces de via, incluye remates en concreto.
-Suministro e instalación de tubería PVC.
-Instalación de cableado de cobre tipo THHN/THWN-2, con cinta de peligro y arena de protección.
-Mantenimiento y reposición de cajas de inspección.
Ejecución de empalmes subterráneos en gel conforme a normas técnicas.Desmonte y reemplazo de luminarias existentes.
-Instalación de nuevas luminarias LED con fotoceldas..
-Montaje de postes metálicos galvanizados con sus bases en concreto y puesta a tierra.
-Instalación de brazos metálicos galvanizados para luminarias.
-Tendido de cable encauchetado desde cajas de conexión hasta cada punto de alumbrado.
-Pruebas eléctricas de continuidad, aislamiento y puesta en servicio de la red.
Señalización y control de tránsito en las zonas de intervención.
-Limpieza de obra y retiro de escombros sobrantes.

En la parte de anexos del presente informe esta agregado el registro fotografico de las actividades ejecutadas en mencion.

3.5 . AVANCE CANTIDADES EJECUTADAS INFORME No 1

MUNICIPIO DE TAURAMENA	BALANCE DE CANTIDADES MES No 1	Porcentaje ejecución 100.00%	323 del 05 AGO 2025	EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ	
REALIZAR LA INDEPENDIZACIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA URBANIZACIÓN LA PALMARENA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA.	Valor inicial del contrato: $362,314,799.00	Fecha del presente informe: 15 de septiembre de 2025	Valor ejecutado al presente informe:	$ 362,314,799.00	

CONDICIONES INICIALES						ACUMULADO MES 1	
ITEM	DESCRIPCION	UND	VR. UNIT (Con AIU)	CANT.	VR.TOTAL	CANT	VR TOTAL
	ACTIVIDADES PRELIMINARES						
1	Replanteo Baja tensión	mts	$ 2,213.00	843	$ 1,865,163.00	843	$ 1,865,163.00
2	Suministro y montaje de Aforamiento tubería Galvanizada IMC 2".	Un	$ 607,060.00	2	$ 1,214,120.00	2	$ 1,214,120.00
3	Suministro e instalación de canalización subterránea en tubo PVC T.P. 2ΦP2", incluye cable de cobre 2 - AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C + 1X No. CU AW 3 4 THHN, incluya excavación tapado e instalación de cinta de peligro CS-273 mas arena de rio.	Un	$ 291,035.00	843	$ 245,342,249.00	843	$ 245,342,249.00
4	Mantenimiento y/o reposición de caja de inspección A.P 280	Un	$ 394,813.00	53	$ 20,925,089.00	53	$ 20,925,089.00
5	Suministro e instalación de juego de empalmes en gal subterráneo Norma CS-339, AF-839	Un	$ 325,544.00	63	$ 20,509,272.00	63	$ 20,509,272.00
6	Luminaria de 84 leds, 70-250W, 7500-25200lm, corriente de alimentación hasta 700mA, incluye fusible y DPS, base para fotocelda y fotocelda. Suministro e instalación	UN	$ 3,172,801.00	10	$ 31,728,010.00	10	$ 31,728,010.00
7	Desmonte Luminaria.	UN	$ 150,419.00	8	$ 1,203,352.00	8	$ 1,203,352.00
8	Suministro e instalación de brazo galvanizado en caliente de 2 Φ x 1.83m doble	UN	$ 507,791.00	6	$ 3,046,746.00	6	$ 3,046,746.00
9	Suministro e instalación cable encauchetado 3x12 awg desde caja de conexiones hasta brazo luminaria	UN	$ 406,392.00	73	$ 29,668,616.00	73	$ 29,668,616.00
10	Poste metálico galvanizado perfil redondo y brazo doble, con altura de montaje de 10 m, incluye: pernos de anclaje, puesta a tierra y base en concreto reforzado. Suministro e instalación	UN	$ 3,407,091.00	2	$ 6,814,182.00	2	$ 6,814,182.00
		TOTAL COSTO DE LA OBRA			$ 362,314,799.00		$ 362,314,799.00


3.4. CONDICIONES ORIGINALES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO(CON AIU)	VALOR TOTAL
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				
1	Replanteo Baja tensión	mts	843	$ 2,213.00	$ 1,865,163.00
2	Suministro y montaje de Afloramiento tubería Galvanizada IMC 2".	Un	2	$ 607,060.00	$ 1,214,120.00
3	Suministro e instalación de canalización subterránea en tubo PVC T.P. 2Φ2", incluye cable de cobre 2 - AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C + 1XNo. CU AWG 4 THHN, incluye excavación tapado e instalación de cinta de peligro CS-273 mas arena de rio.	mts	843	$ 291,035.00	$ 245,342,249.00
4	Mantenimiento y/o reposición de caja de inspección AP 260	Un	53	$ 394,813.00	$ 20,925,089.00
5	Suministro e instalación de juego de empalmes en gel subterráneo Norma CS-339, AP-839	Un	63	$ 325,544.00	$ 20,509,272.00
6	Luminaria de 64 leds, 70-250W, 7500-25200lm, corriente de alimentación hasta 700mA, incluye fusible y DPS, base para fotocelda y fotocelda. Suministro e instalación	UN	10	$ 3,172,801.00	$ 31,728,010.00
7	Desmonte Luminaria.	UN	8	$ 150,419.00	$ 1,203,352.00
8	Suministro e instalación de brazo galvanizado en caliente de 2 Φ x1.83m doble	UN	6	$ 507,791.00	$ 3,046,746.00
9	Suministro e instalación cable encauchetado 3x12 awg desde caja de conexiones hasta brazo luminaria	UN	73	$ 406,392.00	$ 29,666,616.00
10	Poste metálico galvanizado perfil redondo y brazo doble, con altura de montaje de 10 m. incluye: pernos de anclaje, puesta a tierra y base en concreto reforzado. Suministro e instalación	UN	2	$ 3,407,091.00	$ 6,814,182.00
		COSTO TOTAL OBRA			**$ 362,314,799.00**

REALIZAR LA INDEPENDIZACIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA URBANIZACIÓN LA PALMAREÑA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA.	
CONTRATO DE OBRA No.:	323 del 05 AGO 2025
CONTRATISTA:	EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ

3.6 GRAFICO AVANCE DE OBRA (Porcentaje Ejecutado Acumulado)

GRAFICO DE AVANCE DE OBRA (PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO CONTRATO DE OBRA 323 de 2025)

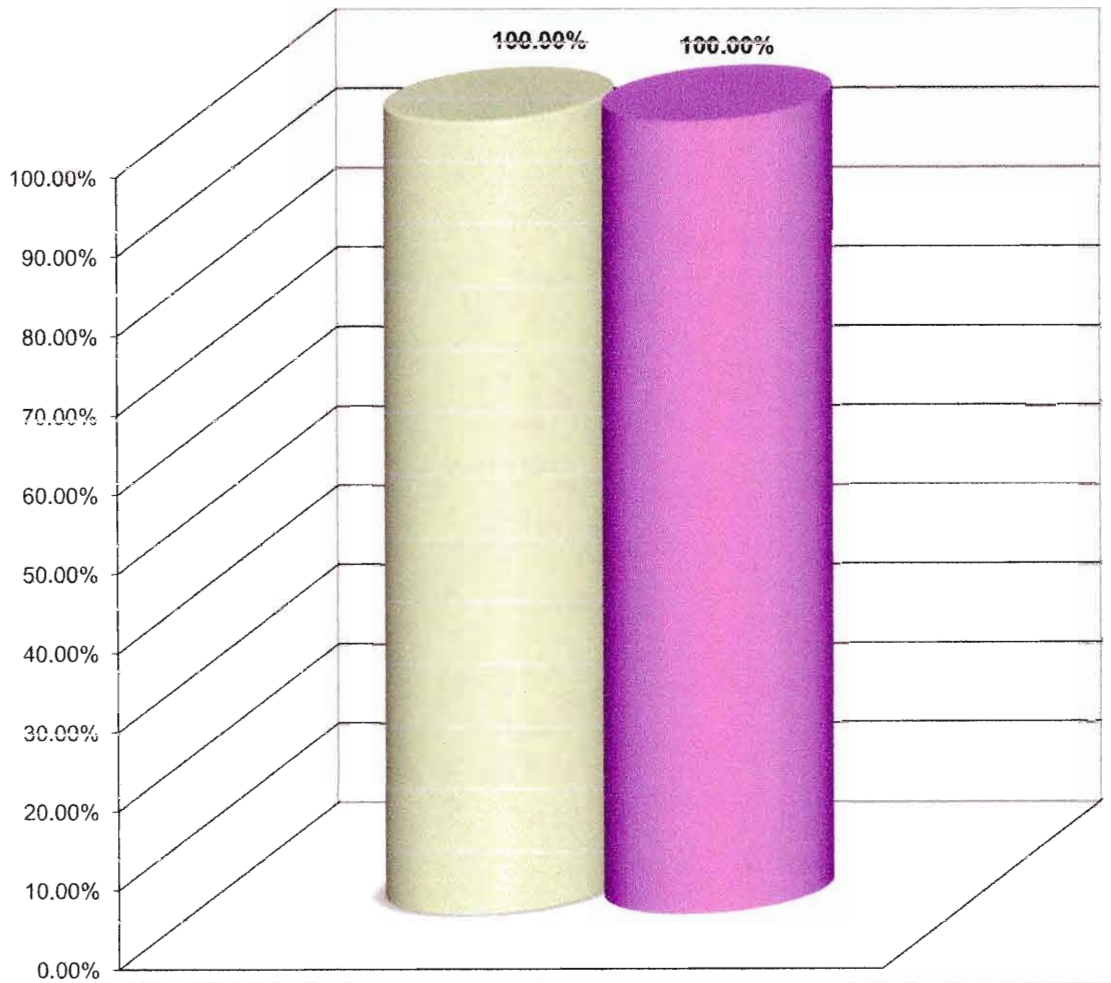


CONTRATADO	**100.00%**
EJECUTADO	**100.00%**

REALIZAR LA INDEPENDIZACIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA URBANIZACIÓN LA PALMAREÑA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA.	
CONTRATO DE OBRA No.:	323 del 05 AGO 2025
CONTRATISTA:	EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ

3.7 GRAFICO AVANCE DE TIEMPO (Porcentaje Contratado / Avanzado)

GRAFICO DE AVANCE DE TIEMPO (PORCENTAJE CONTRATADO / AVANZADO)

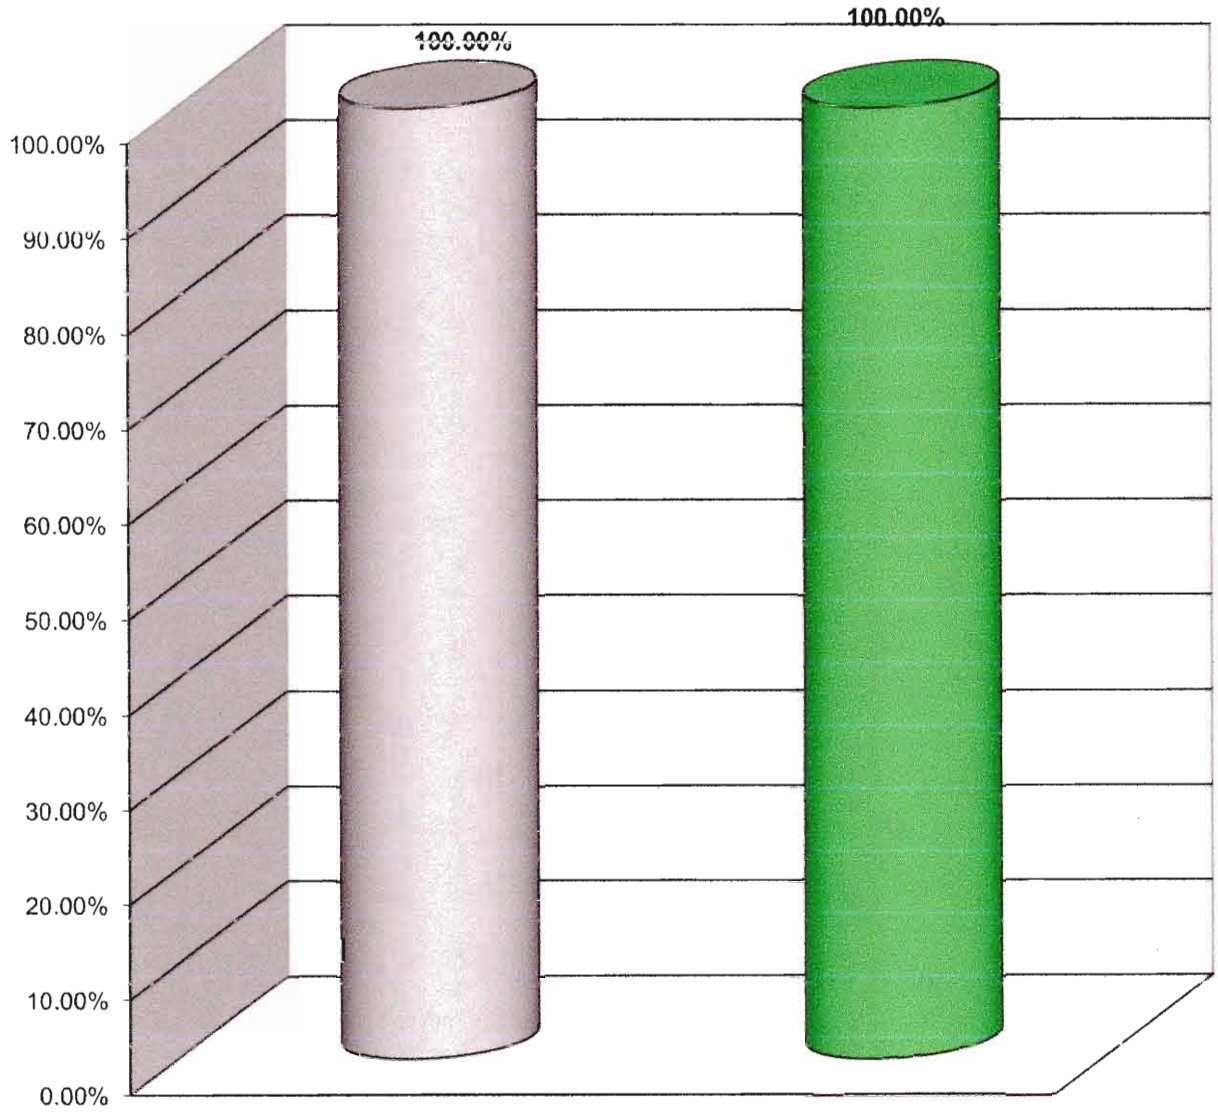

CONTRATADO	AVANZADO
100.00%	100.00%

REALIZAR LA INDEPENDIZACIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA URBANIZACIÓN LA PALMAREÑA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA.

CONTRATO DE OBRA No:	323 del 05 AGO 2025
CONTRATISTA:	EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ

3.8. POLIZAS INICIALES CONTRATO DE OBRA - ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

POLIZA No	DESCRIPCION AMPAROS	%	SUMA ASEGURADA	VIGENCIA		APROBADA
				DESDE	HASTA	
172118-10-4120003113	Cumplimiento del Contrato	10%	$ 36,231,479.90	5/08/2025	15/03/2026	SI
	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 181,157,399.50	5/08/2025	15/03/2026	
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	10%	$ 18,115,739.95	5/08/2025	5/11/2028	
	Estabilidad y calidad de la obra	10%	$ 36,231,479.90	5/11/2025	5/11/2026	
172118-10-4120003113	Responsabilidad civil Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	200 SMMLV	$ 36,231,479.90	5/11/2025	5/11/2026	

REALIZAR LA INDEPENDIZACIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA URBANIZACIÓN LA PALMAREÑA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA.	
CONTRATO DE OBRA No:	323 del 05 AGO 2025
CONTRATISTA:	EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La ejecución del contrato de obra 323 de 2025 se ha ejecutado sin contratiempos este proyecto permitió la independización de las redes de alumbrado público en la Urbanización La Palmareña, logrando una infraestructura moderna, segura y eficiente, acorde con la normatividad RETILAP. La instalación de canalizaciones subterráneas, cableado nuevo y luminarias LED optimizó el consumo energético y garantizó mayor durabilidad del sistema. Con estas intervenciones se fortaleció la seguridad, la movilidad y la calidad de vida de la comunidad, evidenciando una gestión técnica y administrativa adecuada y transparente en el uso de los recursos públicos.

Se recomienda al municipio garantizar un mantenimiento preventivo y correctivo periódico de la red de alumbrado público instalada, con el fin de preservar la eficiencia y seguridad del sistema. Así mismo, se sugiere la implementación de programas de monitoreo del consumo energético y control de luminarias, que permitan optimizar los costos de operación.

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATO DE OBRA No.323 DEL 2025

5.0. ANEXOS



REALIZAR LA INDEPENDIZACIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA URBANIZACIÓN LA PALMAREÑA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA.

ANEXOS

5.1 REGISTRO FOTOGRAFICO

	CONTRATO OBRA No.	**323 del 05 AGO 2025**

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA INDEPENDIZACIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA URBANIZACIÓN LA PALMAREÑA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA.

REGISTRO FOTOGRAFICO



FOTOGRAFIA N.01 Delimitacion y señalizacion del área a intervenir



FOTOGRAFIA N.02 Excavacion en zonas peatonales.



FOTOGRAFIA N.03 Corte y excavacion de cruces de via.



FOTOGRAFIA N.04 . Suministro e instalación de tubería PVC



FOTOGRAFIA N.05. mantenimiento y reposicion de cajas de inspeccion AP280.



FOTOGRAFIA N.06 . Inslacion del cableado de cobre THHN cu # 2 y THHN Cu #4

	CONTRATO OBRA No.	**323 del 05 AGO 2025**

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA


OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA INDEPENDIZACIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA URBANIZACIÓN LA PALMAREÑA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA.

REGISTRO FOTOGRAFICO



FOTOGRAFIA N.07 . Instalacion de empalmes subterramos

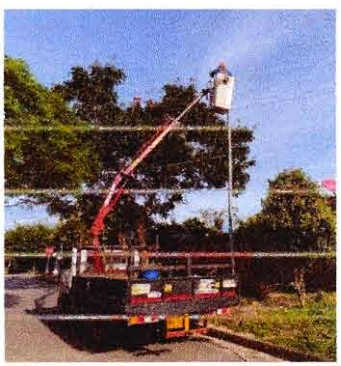


FOTOGRAFIA N.08. desmonte y remplazo de luminarias LED con fotoceida



FOTOGRAFIA N.09. Montaje de postes metalicos galvanizados con bases en concreto



FOTOGRAFIA N.10 instalacion de brazos metalicos galvanizados para luminarias

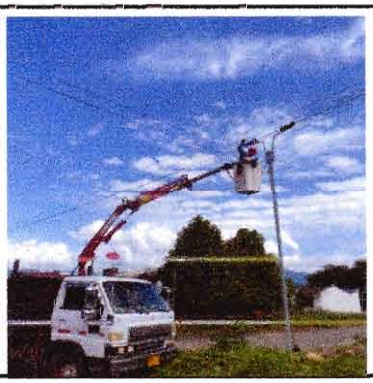

FOTOGRAFIA N.11 tendido de cable encauchedao deSde cada caja de conexión hasta cada punto de alumbrado.

REALIZAR LA INDEPENDIZACIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA URBANIZACIÓN LA PALMAREÑA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA

ITEM	ACTIVIDADES	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
		ACTIVIDADES CONTRACTUALES			
101	Replanteo Baja tensión	mts	843	$ 2,213.00	$ 1,865,163.00
102	Suministro y montaje de Afloramiento tubería Galvanizada IMC 2".	Un	2	$ 607,060.00	$ 1,214,120.00
103	Suministro e instalación de canalización subterránea en tubo PVC T.P. 2Φ2", incluye cable de cobre 2 - AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C + 1XNo. CU AWG 4 THHN, incluye excavación tapado e instalación de cinta de peligro CS-273 mas arena de rio.	mts	843	$ 291,035.00	$ 245,342,249.00
104	Mantenimiento y/o reposición de caja de inspección AP 280	Un	53	$ 394,813.00	$ 20,925,089.00
105	Suministro e instalación de juego de empalmes en gel subterráneo Norma CS-339, AP-839	Un	63	$ 325,544.00	$ 20,509,272.00
106	Luminaria de 64 leds, 70-250W, 7500-25200lm, corriente de alimentación hasta 700mA, incluye fusible y DPS, base para fotocelda y fotocelda. Suministro e instalación	UN	10	$ 3,172,801.00	$ 31,728,010.00
107	Desmonte Luminaria.	UN	8	$ 150,419.00	$ 1,203,352.00
108	Suministro e instalación de brazo galvanizado en caliente de 2 Φ x1.83m doble	UN	6	$ 507,791.00	$ 3,046,746.00
109	Suministro e instalación cable encauchetado 3x12 awg desde caja de conexiones hasta brazo luminaria	UN	73	$ 406,392.00	$ 29,666,616.00
110	Poste metálico galvanizado perfil redondo y brazo doble, con altura de montaje de 10 m. incluye: pernos de anclaje, puesta a tierra y base en concreto reforzado. Suministro e instalacion	UN	2	$ 3,407,091.00	$ 6,814,182.00

TOTAL	$ 362,314,799.00
SUBTOTAL	$ 253,620,359.30
ADMINISTRACION 23%	$ 83,332,403.77
IMPREVISTO 2%	$ 7,246,295.98
UTILIDAD 5%	$ 18,115,739.95
CERTIFICACION RETIE 1%	NA
CERTIFICACION RETILAP 1%	NA
TOTAL PRESUPUESTO OBRA	**$ 362,314,799.00**
TOTAL INTERVENTORIA	**NA**
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NA**
TOTAL PROYECTO	**$ 362,314,799.00**

ING. JAIRO RODIRGUEZ ESCOBAR
MP BY250-141060


REALIZAR LA INDEPENDIZACIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA URBANIZACIÓN LA PALMAREÑA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CAPITULO:	100 INDEPENDIZACION REDES ELECTRICAS

ITEM	101.00	Replanteo Baja tensión	UM	mts

SOPORTE GRAFICO

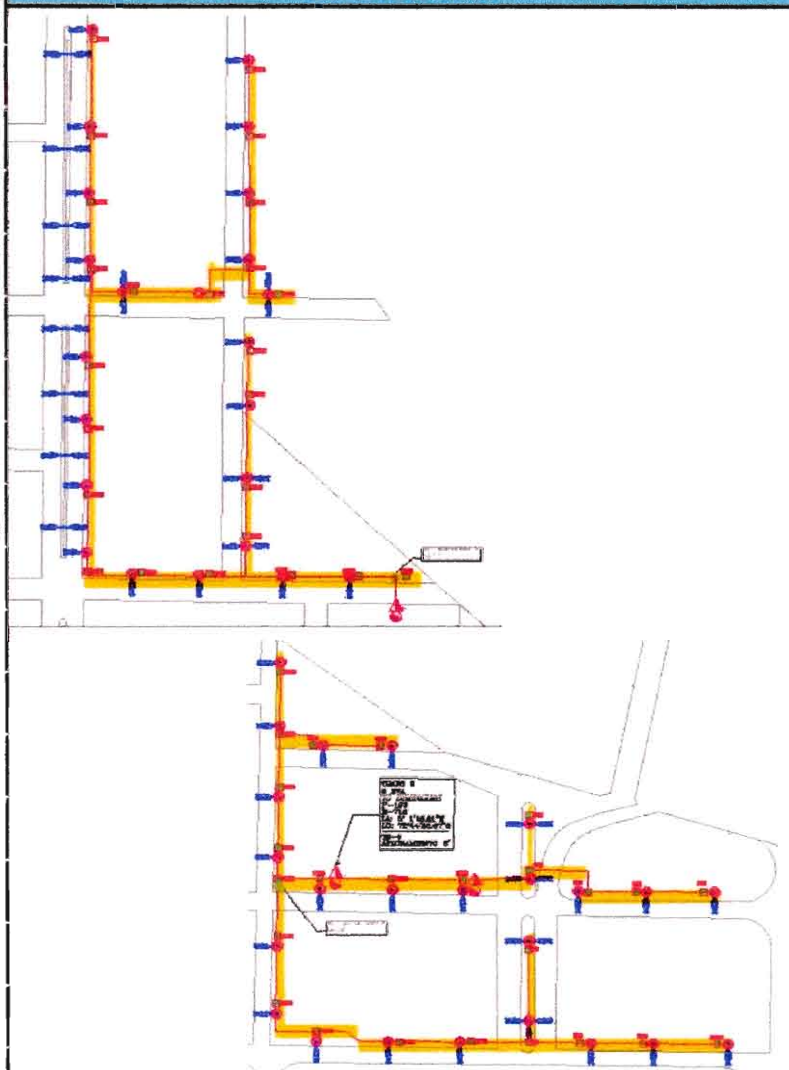

DESCRIPCION	LONGITUD	VOLUM	AREA	CANTIDAD	SUBTOTAL
Replanteo Baja tensión	843	NA	NA	NA	843
				TOTAL	843

FIRMA

NOMBRE ING. JAIRO RODIRGUEZ ESCOBAR

M.P. MP BY250-141060


	REALIZAR LA INDEPENDIZACIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA URBANIZACIÓN LA PALMAREÑA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA	

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CAPITULO:	100

ITEM	102.00	Suministro y montaje de Afloramiento tubería Galvanizada IMC 2".	UM	Un

SOPORTE GRAFICO

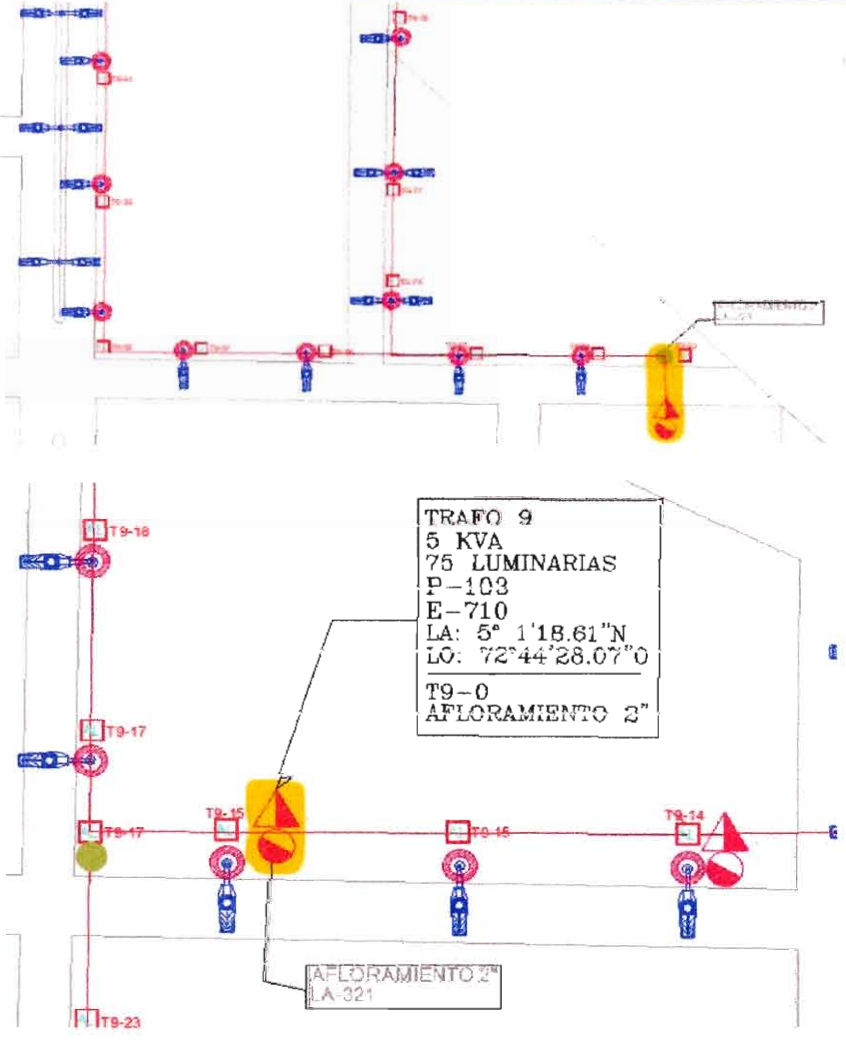

DESCRIPCION	LONGITUD	VOLUM	AREA	CANTIDAD	SUBTOTAL
Suministro y montaje de Afloramiento tubería Galvanizada IMC 2".	NA	NA	NA	2	2.000
				TOTAL	**2.000**

FIRMA

NOMBRE ING. JAIRO RODIRGUEZ ESCOBAR


M.P. MP BY250-141060

	REALIZAR LA INDEPENDIZACIÓN DE LAS REDES ELÈCTRICAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA URBANIZACIÓN LA PALMAREÑA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA	

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CAPITULO:	100			
ITEM	104.00	Mantenimiento y/o reposición de caja de inspección AP 280	UM	Un

SOPORTE GRAFICO

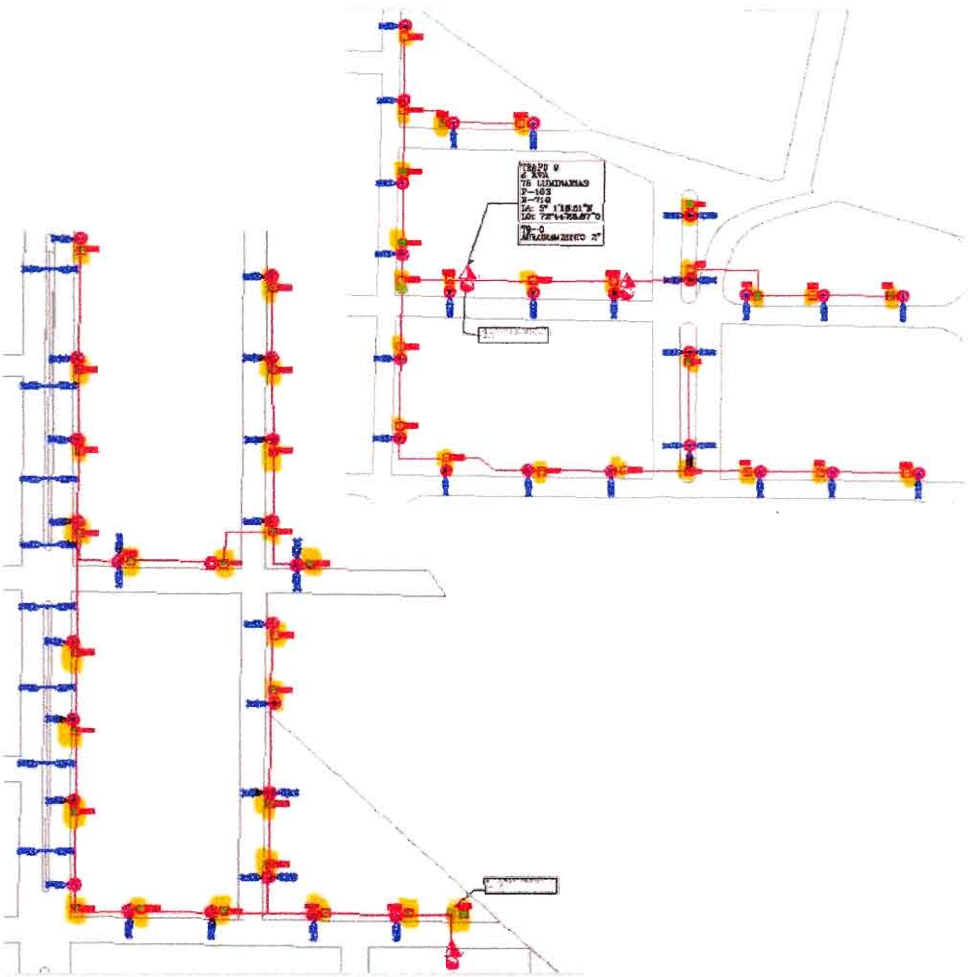

DESCRIPCION	LONGITUD	VOLUM	AREA	CANTIDAD	SUBTOTAL
Mantenimiento y/o reposición de caja de inspección AP 280	NA	NA	NA	53	53
				TOTAL	53

FIRMA

NOMBRE ING. JAIRO RODIRGUEZ ESCOBAR

M.P. MP BY250-141060


	REALIZAR LA INDEPENDIZACIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA URBANIZACIÓN LA PALMAREÑA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA	

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CAPITULO:	*100*

ITEM	*103.00*	*Suministro e instalación de canalización subterránea en tubo PVC T.P. 2Φ2", incluye cable de cobre 2 - AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C + 1XNo. CU AWG 4 THHN, incluye excavación tapado e instalación de cinta de peligro CS-273 mas arena de rio.*	*UM*	*m*

SOPORTE GRAFICO

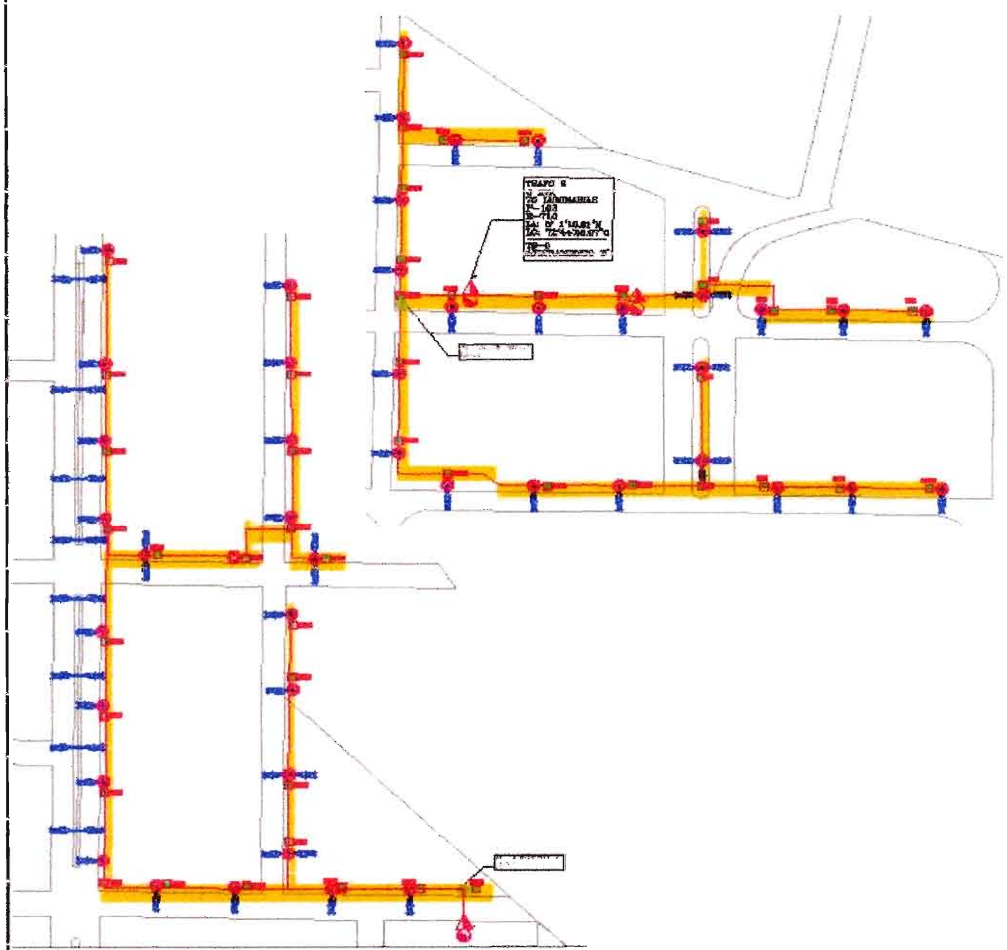

DESCRIPCION	LONGITUD	VOLUM	AREA	CANTIDAD	SUBTOTAL
Suministro e instalación de canalización subterránea en tubo PVC T.P. 2Φ2", incluye cable de cobre 2 - AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C + 1XNo. CU AWG 4 THHN, incluye excavación	843	NA	NA	NA	843
				TOTAL	**843**

FIRMA


NOMBRE **ING. JAIRO RODIRGUEZ ESCOBAR**

M.P. **MP BY250-141060**

	REALIZAR LA INDEPENDIZACIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA URBANIZACIÓN LA PALMAREÑA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA	

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA				
CAPITULO:	*100*			
ITEM	*105.00*	*Suministro e instalación de juego de empalmes en gel subterráneo Norma CS-339, AP-839*	*UM*	*Un*

SOPORTE GRAFICO

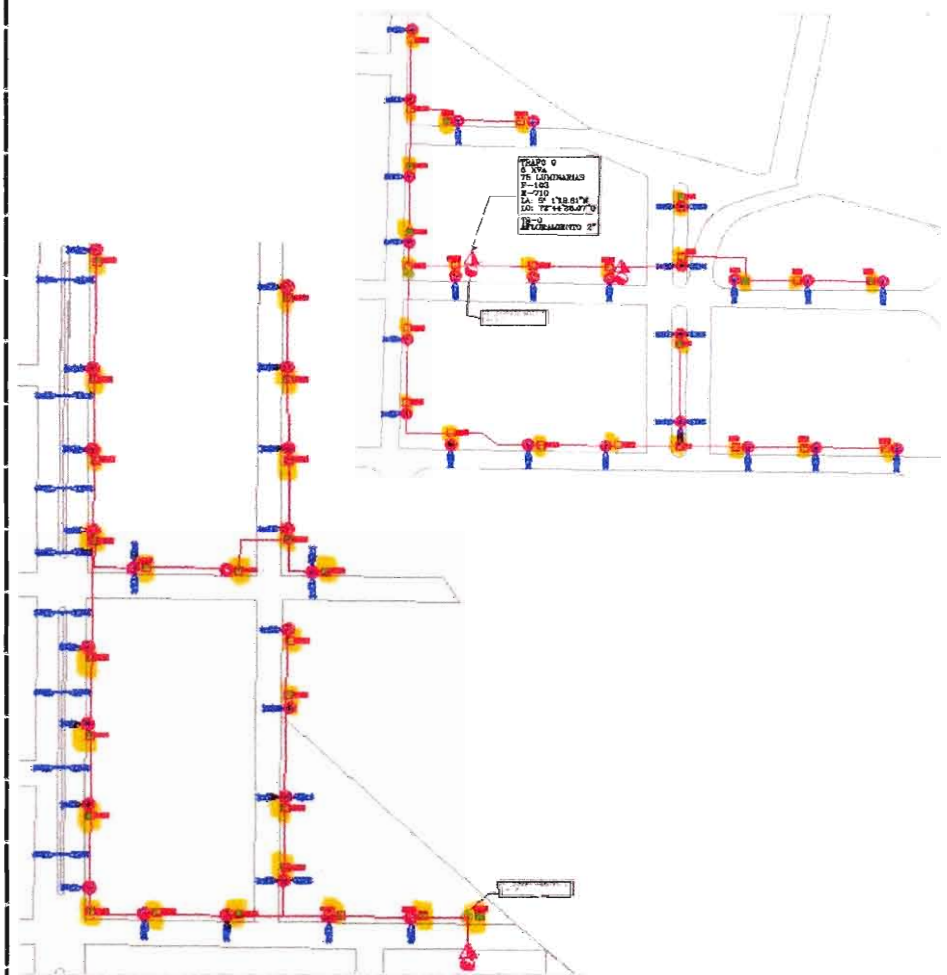

DESCRIPCION	LONGITUD	VOLUM	AREA	CANTIDAD	SUBTOTAL
Suministro e instalación de juego de empalmes en gel subterráneo Norma CS-339, AP-839	NA	NA	NA	63	63
				TOTAL	63

FIRMA

NOMBRE ING. JAIRO RODIRGUEZ ESCOBAR

M.P. MP BY250-141060


	REALIZAR LA INDEPENDIZACIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA URBANIZACIÓN LA PALMAREÑA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA	

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CAPITULO:	***100***

ITEM	***106.00***	***Luminaria de 64 leds, 70-250W, 7500-25200lm, corriente de alimentación hasta 700mA, incluye fusible y DPS, base para fotocelda y fotocelda. Suministro e instalación***	***UM***	***UN***

SOPORTE GRAFICO



DESCRIPCION	LONGITUD	VOLUM	AREA	CANTIDAD	SUBTOTAL
Luminaria de 64 leds, 70-250W, 7500-25200lm, corriente de alimentación hasta 700mA, incluye fusible y DPS, base para	NA	NA	NA	10	10
				TOTAL	**10**

FIRMA
NOMBRE **ING. JAIRO RODIRGUEZ ESCOBAR**
M.P. **MP BY250-141060**


	REALIZAR LA INDEPENDIZACIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA URBANIZACIÓN LA PALMAREÑA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA	

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CAPITULO:	*100*

ITEM	*107.00*	*Desmonte Luminaria.*	*UM*	*UN*

SOPORTE GRAFICO



DESCRIPCION	LONGITUD	VOLUM	AREA	CANTIDAD	SUBTOTAL
Desmonte Luminaria.	NA	NA	NA	8	8
				TOTAL	8

FIRMA


NOMBRE ING. JAIRO RODIRGUEZ ESCOBAR

M.P. MP BY250-141060

	REALIZAR LA INDEPENDIZACIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA URBANIZACIÓN LA PALMAREÑA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA	

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA				
CAPITULO:	***100***			
ITEM	***108.00***	***Suministro e instalación de brazo galvanizado en caliente de 2 Φ x1.83m doble***	***UM***	***UN***

SOPORTE GRAFICO



DESCRIPCION	LONGITUD	VOLUM	AREA	CANTIDAD	SUBTOTAL
Suministro e instalación de brazo galvanizado en caliente de 2 Φ x1.83m doble	NA	NA	NA	6	6
				TOTAL	6

FIRMA

NOMBRE ING. JAIRO RODIRGUEZ ESCOBAR

M.P. MP BY250-141060


	REALIZAR LA INDEPENDIZACION DE LAS REDES ELECTRICAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA URBANIZACIÓN LA PALMAREÑA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA	

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CAPITULO:	*100*

ITEM	*109.00*	*Suministro e instalación cable encauchetado 3x12 awg desde caja de conexiones hasta brazo luminaria*	*UM*	*UN*

SOPORTE GRAFICO

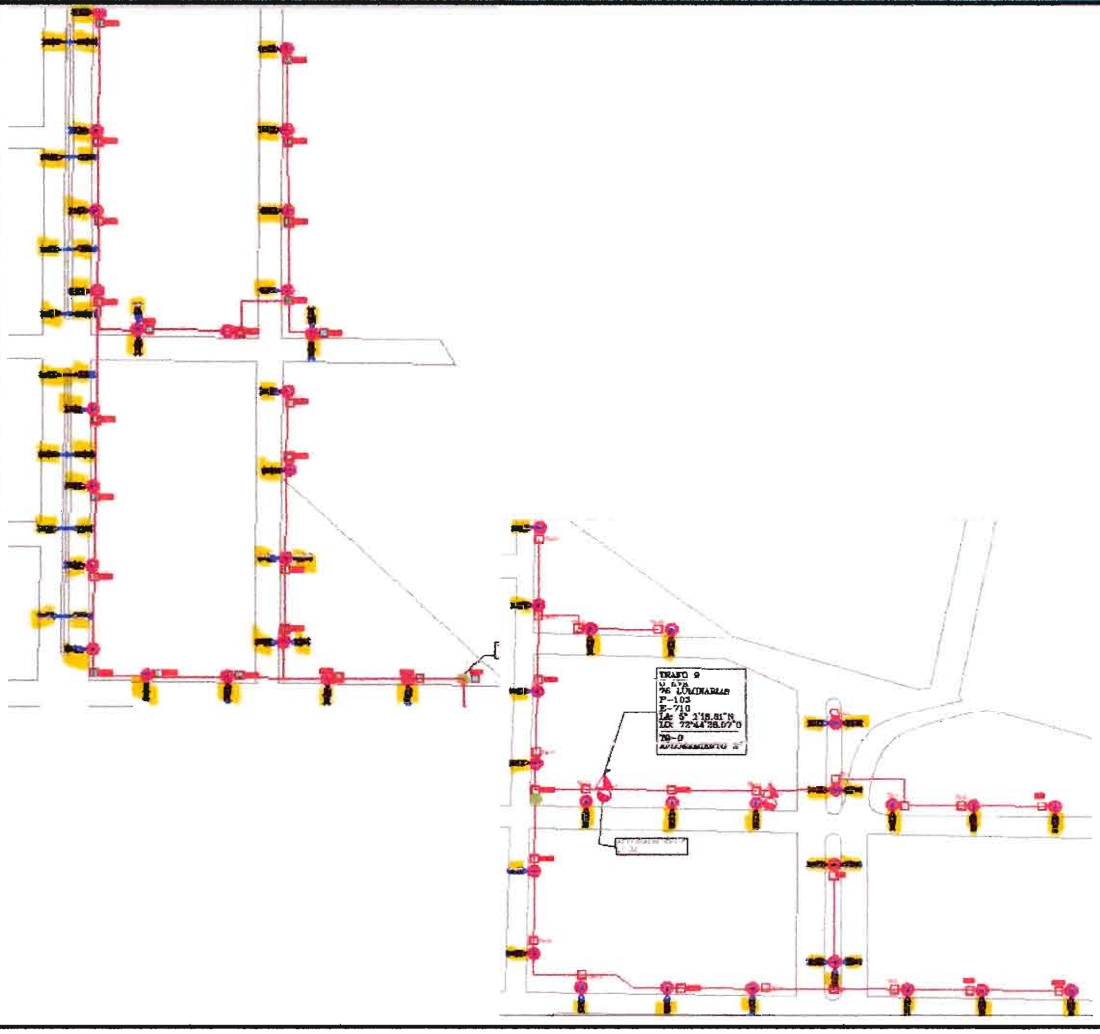

DESCRIPCION	LONGITUD	VOLUM	AREA	CANTIDAD	SUBTOTAL
Suministro e instalación cable encauchetado 3x12 awg desde caja de conexiones hasta brazo	NA	NA	NA	73	73
				TOTAL	**73**

FIRMA

NOMBRE ING. JAIRO RODIRGUEZ ESCOBAR


M.P. MP BY250-141060

	REALIZAR LA INDEPENDIZACIÒN DE LAS REDES ELÈCTRICAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA URBANIZACIÓN LA PALMAREÑA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA	

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CAPITULO:	**100**			
ITEM	**110.00**	**Poste metálico galvanizado perfil redondo y brazo doble, con altura de montaje de 10 m. incluye: pernos de anclaje, puesta a tierra y base en concreto reforzado. Suministro e instalación**	**UM**	**UN**

SOPORTE GRAFICO



DESCRIPCION	LONGITUD	VOLUM	AREA	CANTIDAD	SUBTOTAL
Poste metálico galvanizado perfil redondo y brazo doble, con altura de montaje de 10 m. incluye: pernos de	NA	NA	NA	2	2
				TOTAL	**2**

FIRMA

NOMBRE ING. JAIRO RODIRGUEZ ESCOBAR

M.P. MP BY250-141060

INFORME FINAL DE GESTION SST DEL CONTRATO N.º 323
DEL 05 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

INFORME DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

NOMBRE A QUIEN INFORMA: EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA

OBJETO Y PERIODO DEL INFORME: INFORME DE GESTION SST DEL CONTRATO N.º 323 CON EL OBJETO DE REALIZAR LA INDEPENDIZACIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA URBANIZACIÓN LA PALMAREÑA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA.

.Tabla de contenido.

1. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL RIESGO. 2
2. LISTADO DE LOS TRABAJADORES. 2
3. CHARLAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2
4. EVALUACION DE INDUCCION. 4
5. ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL. 4
6. AFILIACIONES Y PAGOS EN SEGURIDAD SOCIAL 4
7. INSPECCIONES DE SEGURIDAD 4
8. EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 4
9. VERIFICACION DE GESTION SST 4
10. TABLA DE ANEXOS 6

1. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL RIESGO.

Con el objetivo de identificar los peligros a los cuales se encuentran expuestos el personal en la realización de las actividades se realiza la matriz de riesgos, se dan a conocer los controles existentes, se evalúa el riesgo y se generan nuevos controles para los que son aceptables y pueden generar accidentes laborales, el resultado de esta identificación se refleja en el **Matriz de identificación de peligros, evaluación y control del riesgo.**

2. LISTADO DE LOS TRABAJADORES.

Se tiene presente con el fin de que las empresas permitan tener información sobre los trabajadores, lo que facilita la toma de decisiones y el proceso productivo. **Registro de listado del personal**

3. CHARLAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Con el fin de recordar al inicio de las labores la importancia de cuidar la integridad de cada uno y de su grupo de trabajo, de socializar los peligros y riesgos a los que están expuestos y sus controles, exponer condiciones y actos inseguros entre otros; se dictan las charlas de seguridad y salud en el trabajo, las charlas se dictan en horario de la mañana. **Registros de charlas SST.**

4. EVALUACION DE INDUCCION.

proceso de capacitación que se realiza a los nuevos empleados de una empresa para informarles sobre los riesgos y peligros asociados a su trabajo. El objetivo es prevenir accidentes y lesiones, y mejorar las condiciones de trabajo. **Soporte de personal.**

5. ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL.

entrega de Equipo de Protección Personal, que es un conjunto de piezas o dispositivos que se utilizan para evitar que los trabajadores tengan contacto directo con peligros en el entorno laboral. **Soporte personal**

6. AFILIACIONES Y PAGOS EN SEGURIDAD SOCIAL

En cumplimiento de la normativa y para garantizar una calidad de vida acorde con la dignidad humana, donde se garantice las prestaciones económicas y de salud a sus trabajadores se tienen afiliados a los trabajadores vinculados para el cumplimiento del contrato y se anexan los soportes de pago en seguridad social de los meses en actividad para el desarrollo del contrato. **Soportes de personal.**

7. INSPECCIONES DE SEGURIDAD

Se realizaron las inspecciones técnicas de análisis mediante observación directa de posibles condiciones inseguras en elementos de protección personal, herramientas menores, máquinas y elementos de trabajo, además se realizan inspecciones de trabajo en busca de actos y condiciones inseguras por parte de los trabajadores o identificar posibles peligros existentes en las actividades. También se inspecciona el kit de emergencia para tenerlo en óptimas condiciones en el momento de necesitarlo mínimo una vez al mes, **Inspecciones de seguridad.**

8. EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS


Las evidencias fotográficas de trabajo son una forma de acordar y fijar el trabajo realizado en un campo, de acuerdo con el cliente. **soporte de fotos**

9. VERIFICACION DE GESTION SST

Como verificación de la gestión en seguridad y salud en el trabajo se muestran las estadísticas en accidentalidad, primeros auxilios y ausentismo presentadas durante el desarrollo de las actividades en el periodo del presente informe.


	TEMA
11/08/2025	inducción / epp
12/08/2025	Charla sobre ergonomía
13/08/2025	Riesgo cardiovascular
14/08/2025	Metodología 5´s
15/08/2025	Reglamento interno de trabajo
16/08/2025	Cuidado de manos
18/08/2025	Calistenia
19/08/2025	Uso correcto de herramienta menores
20/08/2025	Manejo adecuado de cargas
21/08/2025	Conservación auditiva
22/08/2025	Radicaciones ionizantes
23/08/2025	Calistenia
25/08/2025	Reglamento de higiene y seguridad industrial
26/08/2025	Actividades rutinarias
27/08/2025	Riesgo eléctrico
28/08/2025	Importancia de EPP
29/08/2025	Divulgación del programa de gestión riesgo químico
30/08/2025	Sistema globalmente armonizado
01/09/2025	Inhalación pasiva de humos
02/09/2025	Protocolo para pruebas de alcoholemia
03/09/2025	Lesiones en la espalda
04/09/2025	Gestión ambiental
05/09/2025	Estrés laboral
06/09/2025	Comité de convivencia

ACCIDENTALIDAD E INCIDENTALIDAD		
AÑO	MES	Nº DE EVENTOS
2025	AGOSTO	0
2025	SEPTIEMBRE	0



Grafica 01: Nos muestra que durante el desarrollo de las actividaes del contrato no se presento ningun accidente o incidente.

CASOS EN PRIMEROS AUXILIOS		
AÑO	MES	Nº DE EVENTOS
2025	AGOSTO	0
2025	SEPTIEMBRE	0



Grafica 2: Nos muestra que durante el desarrollo de las actividaes del contrato no se presento ningun caso de atencion a primeros auxilios.

10.TABLA DE ANEXOS

Como soporte de las actividades realizadas se adjuntan los siguientes anexos físicos:

Anexo 01	Matriz de identificación de peligros, evaluación y control de riesgo
Anexo 02	Listado de los trabajadores
Anexo 03	Registros de charlas SST
Anexo 04	Evaluación de inducción
Anexo 05	Entrega de elementos de protección personal
Anexo 06	Pagos de seguridad social
Anexo 07	Registros de inspecciones de herramienta menor
Anexo 08	Registros de inspección de cortadora de concreto
Anexo 09	Evidencias fotográficas

Agradezco su atención y manifiesto disposición de ampliar información.

Atentamente;
ERIKA GOMEZ
HSEQ



ANEXO N° 01

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGO

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA
ANALISIS DE RIESGOS DE TRABAJO

FECHA ELABORACION:	11-ago-25	**EMPRESA QUE EJECUTA LA ACTIVIDAD:**	☑ Contratista				
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	REALIZAR LA INDEPENDIZACIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA URBANIZACIÓN LA PALMAREÑA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA.						
SEDE DE TRABAJO:	**BARRIO PALMAREÑA**		**Sitio especifico:**	**BARRIO PALMAREÑA**			
USA RECURSOS	☐ No	☐ Si	**PERMISOS AMBIENTALES:**	☑ No	☐ Si	Especifique:	
TIPO DE TRABAJO:	☑ Frío	☐ Caliente					
CERTIFICADOS	☐ Alturas	☐ Espacios confinados	☐ Excavaciones	☐ Aislamiento		**TIPO DE AISLAMIENTO REQUERIDO:**	☐ Eléctrico ☑ Mecánico ☐ Neumático ☐ Hidráulico

	Pasos de la actividad (se recomiendan entre 5 y no más de 10)	¿Qué equipos y herramientas debo usar?	¿Qué materiales y productos químicos debo usar?	Seguridad y salud: ¿Qué me puede pasar?	Seguridad y salud: ¿Por qué peligro?	Seguridad y salud: ¿Qué tan grave puede ser?	Seguridad y salud: ¿Qué controles se requieren?	Ambiente: ¿Qué daño ambiental puede haber?	Ambiente: ¿Por qué aspecto?	Ambiente: ¿Qué tan grave puede ser?	Ambiente: ¿Qué controles se requieren?
0	**CONDICIONES ESTABLES PARA TODO EL DESARROLLO DEL TRABAJO:** Que pueden generar condiciones de seguridad y salud o impactos ambientales similares durante toda la actividad y que son inherentes a la estación.	NINGUNA	Jabon de manos, Agua, Alcohol etanol al 70%, gel antibacterial	Exposición a contagio viral con personas u objetos infectados con COVID-19. Exposición a contagio viral por alimentos manipulados por personas que no cumplan con medidas de higiene requeridas. Contaminación viral durante el transporte de Personal. Infección a personas del núcleo familiar	**Biologico** Covid-19	**BAJO**	**Fuente:**ninguna **Medio:**Uso lavado de manos frecuentemente **Trabajador:** Concientización de cada trabajador de los riesgos asociados a la enfermedad, promover hábitos de limpieza y autocuidado en los grupos de trabajo. No presentarse a trabajar en caso de síntomas de la enfermedad, acudir al médico.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
		NINGUNA	N.A.	Según el caso se pueden presentar mordeduras, picaduras de diferente severidad, golpes, irritaciones	**Biológico:** presencia de serpientes, insectos, hongos y bacterias	**BAJO**	**Fuente:** Verificar e inspeccionar área de trabajo antes de iniciar actividades para definir si hay serpientes, insectos o panales de avispas o abejas. **Medio:** Identificar previamente si hay personas alérgicas, Identificar centros de salud que tengan suero antiofídico. No molestar panales de abejas o avispas e informar a jefe inmediato. **Trabajador:** No usar perfumes fuertes. Ojos y mente en la tarea, en áreas donde no se alcance a identificar presencia de animales, hacer una inspección e informar a las personas competentes para realizar el control adecuado.	Deterioro del medio ambiente	Generación de residuos sólidos domésticos	**BAJO**	Disponer los residuos en los puntos ecológicos, clasificación de residuos según el código de colores de Ocensa (Verde: reciclable, Negro: Orgánico y Rojo: Contaminado) **Subprograma A-1** Manejo de residuos sólidos domésticos
				Fatiga, deshidratación, insolación y en casos extremos golpe de calor, lesiones en ojos, cancer de piel	**Físicos:** Temperaturas elevadas por exposición a radiación solar	**BAJO**	**Fuente:** Ninguno **Medio:** Destinar área de descanso bajo techo con puntos de hidratación. **Trabajador:** Uso de bloqueador solar, capuchón, hidratación, buen uso de las prendas de dotación (camisa manga larga).	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
				Resbalones al mismo y diferente nivel, fracturas, esguinces, luxaciones, contusiones o fatalidad	**Locativo:** Por terrenos irregulares, desniveles, obstáculos.	**MEDIO**	**Fuente:** Ninguno **Medio:** Inspeccionar las condiciones de area de trabajo, adecuar vías de acceso, demarcadas y despejadas, mantener orden y aseo, Desplazamiento por zonas permitidas para peatones, **Trabajador:** Uso de calzado antideslizante, revisar arriba, abajo, a los lados y atrás.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
				Fatalidad o lesiones graves por descargas atmosféricas, tormentas eléctricas, lluvia fuerte, resbalones, machucones, laxeraciones, contusiones	**Físicos** Lluvia, tormentas eléctricas, vientos fuertes	**MEDIO**	**Fuente:** Estar atento a las condiciones atmósferias del área de trabajo, seguir recomendaciones de la estación sobre cercanía de tormentas eléctricas. **Medio:** Destinar área de protección aterrizada para el personal en caso de tormentas eléctricas, buscra refugio seguro, suspender actividades ante aviso de tormentas eléctricas o presencia de lluvia fuerte. **Trabajador:** Uso traje de invierno ante llovizna, hacer charla sobre riego de tormentes eléctricas, no exponerse en caso de aviso, para cualquier actividad en caso de aviso de tormenta eléctrica.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
1	**ALISTAMIENTO, SEÑALIZACIÒN DEL ÀREA,**	EQUIPOS MENORES	N.A	Heridas en manos machucones, golpes atrapamientos, laxeraciones, contusiones	**Mecanico** Por manejo de herramientas manuales	**MEDIO**	**Fuente:** Realizar revision tecnomecanica **Medio:** Realizar inspeccion del área de trabajo, identificar y señalar puntos de atrapamiento y obstáculos. **Trabajador:** Evitar la exposicion de manos o dedos en puntos de atrapamiento. Seguir procedimientos y/o instructivos. Planear y asegurar cargas manuales uso de guantes de vaqueta, casco gafas y botas de seguridad dar Cumplimiento estandar Ocensa elementos de protección personal guantes, casco, gafas, etc.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
2	**INSPECCION Y SEÑALIZACION DE AREA**	HERRAMIENTAS MENORES	N.A.	Lesiones osteomusculares, desgarros, lesiones de columna por manipulación indebida de cargas manuales, contusiones	**Biomecánico:** levantamiento manual de carga	**MEDIO**	**Fuente:** Instrucción al personal sobre posiciones adecuadas de trabajo e Instrucción en la técnica adecuada de levantamiento manual de cargas (Acercarse a la carga en posición de cuclillas (rodillas flexionadas), con la espalda recta, acercar la carga al cuerpo, levantar el peso con las piernas y no con la espalda. Cuando necesite girar, recuerde siempre hacerlo con el cuerpo moviendo los pies y no el tronco). Peso máximo para hombres es de 25 kg y para mujeres de 12.5 kg si excede este peso uso de ayuda mecánica. **Medio:** Hacer pausas activas de trabajo de manera individual. **Trabajador:** Realizar la Calistenia antes de iniciar la jornada. Ojos y mente en la tarea. Ayuda de otros, manipulación entre 2 o más personas.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
				Heridas en manos machucones, golpes atrapamientos.	**Mecanico** Por manejo de herramientas manuales	**MEDIO**	**Fuente:** Realizar inspeccion de herramientas manuales. **Medio:** Inspeccion del área de trabajo, identificar y señalar puntos de atrapamiento y obstáculos. **Trabajador:** Evitar la exposicion de manos o dedos en puntos de atrapamiento. Seguir procedimientos y/o instructivos. Planear y asegurar cargas manuales uso de guantes de vaqueta, casco gafas y botas de seguridad dar Cumplimiento estandar Ocensa elementos de protección personal guantes, casco, gafas, etc.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
				Se pueden presentar mordeduras, picaduras de diferente severidad, golpes, irritaciones o enfermedades transmitidas por animales (como rabia)	**Biologico** Por mordeduras y picaduras de animales	**MEDIO**	**Fuente:** Verificar si hay presencia de nidos o panales de animales. **Medio:** Inspeccion del área de trabajo, identificar y señalar puntos de atrapamiento y obstáculos. **Trabajador:** Evitar la exposicion de manos o dedos en puntos de atrapamiento. Seguir procedimientos y/o instructivos. Planear y asegurar cargas manuales uso de guantes de vaqueta, casco gafas y botas de seguridad dar Cumplimiento estandar Ocensa elementos de protección personal guantes, casco, gafas, etc.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
3	**DESCARGUE DE HERRAMENTAS Y EQUIPOS**	HERRAMIENTAS MENORES	N.A.	Heridas en manos machucones, golpes, atrapamiento	**Mecanico** Por manejo de herramientas manuales	**MEDIO**	**Fuente:** Mantenimiento preventivo de herramientas y equipos **Medio:** Realizar inspeccion de herramientas manuales, inspeccion del área de trabajo, identificar y señalar puntos de atrapamiento y obstáculos. **Trabajador:** Seguir instructivos. Planear y asegurar cargas manuales uso de guantes de vaqueta, casco gafas y botas de seguridad dar Cumplimiento a elementos de protección personal guantes, casco, gafas, etc.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
4	**LOCALIZACION DE PLANTEOS Y EXCAVACION**	HERRAMIENTAS MENORES	N.A.	Fatalidad o lesiones graves por descargas atmosféricas.	**Físicos** cambios atmosfericos-	**BAJO**	**Fuente:** Estar atento a las condiciones atmósferias del área de trabajo, seguir recomendaciones de la estación sobre cercanía de tormentas eléctricas. **Medio:** Destinar área de protección aterrizada para el personal en caso de tormentas eléctricas, buscra refugio seguro, suspender actividades ante aviso de tormentas eléctricas o presencia de lluvia fuerte. **Trabajador:** Uso traje de invierno ante llovizna, hacer charla sobre riego de tormentes eléctricas, no exponerse en caso de aviso, para cualquier actividad en caso de aviso de tormenta eléctrica.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
				Heridas en manos machucones, golpes atrapamientos, laxeraciones, contusiones, caida de herramientas en difetente nivel	**Mecanico** Por manejo de herramientas manuales	**MEDIO**	**Fuente:** Mantenimiento preventivo de herramientas y equipos **Medio:** Realizar inspeccion de herramientas manuales, inspeccion del área de trabajo, identificar y señalar puntos de atrapamiento y obstáculos. **Trabajador:** Evitar la exposicion de manos o dedos en puntos de atrapamiento. Seguir procedimientos y/o instructivos. Planear y asegurar cargas manuales uso de guantes de vaqueta, casco gafas y botas de seguridad dar Cumplimiento estandar Ocensa elementos de protección personal guantes, casco, gafas, etc.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno

Este documento es propiedad de Oleoducto Central S.A. documento no está destinado para circulación general y no debe ser reproducido o distribuido sin la aprobación escrita de Oleoducto Central S.A. o su representante

5	REVESTIMIENTO EN PAÑETE IMPERMEABILIZADO	HERRAMIENTAS MENORES	N.A.	Heridas en manos machucones, golpes atrapamientos, laxeraciones, contusiones, caida de herramientas en difetente nivel	**Mecanico** Proyección partículas incandescentes	MEDIO	**Fuente:** Inpección preoperacional del equipo de herramienta menor, Diligenciar formato de inspección preopracional. Verificar que no es un área clasificada. **Medio:** Inspeccion del área de trabajo, identificar y señalar puntos de atrapamiento y obstáculos. **Trabajador:** Evitar la exposicion de manos o dedos. Seguir procedimientos y/o instructivos. Planear y asegurar cargas manuales, uso de guantes de camaza, peto, mangas, casco gafas y botas de seguridad	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
6	RECONTRUCCCION DE PLACA BASE Y CUÑUELA	HERRAMIENTAS MENORES	N.A	Fatiga, deshidratación, insolación y en casos extremos golpe de calor, lesiones en ojos, cancer de piel	**Fisicos:** Temperaturas elevadas por exposición a radiación solar	MEDIO	**Fuente:** Ninguno **Medio:** Destinar área de descanso bajo techo con puntos de hidratación. **Trabajador:** Uso de bloqueador solar, capuchón, hidratación, buen uso de las prendas de dotación (camisa manga larga).	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
7	TOMA DE FOTOGRAFIAS	CAMARA FOTOGRAFICA	N.A	golpe, daño o caida de elemento fotografico	**Mecanico** Por manejo de herramientas manuales	BAJO	**Fuente:** Realizar inspeccion de herramientas manuales. **Medio:** Inspeccion del área, identificar y señalar puntos de atrapamiento y obstáculos. **Trabajador:** uso adecuado de la camara, ojo y mente en el momento de tomar la fotografia	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
8	ORDEN Y ASEO DEL AREA	NINGUNA	N.A.	Fracturas, heridas abiertas, lesiones oculares.	**Locativos:** Presencia de obstáculos	BAJO	**Fuente:** Las áreas de trabajo deben estar claramente definidas y libres de obstáculos. Señalización adecuada. Identifique los riesgos existentes en el area de trabajo **Medio:** Verificación del terreno durante la jornada de orden y aseo. **Trabajador:** Desplazamiento por áreas asignadas, concentración y ojos y mante en la tarea. Correcta señalización en áreas de acopio de los residuos generados por dicha actividad.	Contaminación del suelo y/o visual	Residuos reciclables	BAJO	Clasificar los residuos
		NINGUNA	N.A.	Lesiones en manos, dolor de espalda	**Biomecánico:** levantamiento de carga realizando orden y aseo	MEDIO	**Fuente:** Ninguno **Medio:** Seguimiento riesgo biomecánico, manejo de posturas, Instrucción al personal sobre posiciones adecuadas de trabajo e instrucción en la técnica adecuada de levantamiento manual de cargas (Acercarse a la carga en posición de cuclillas (rodillas flexionadas), con la espalda recta, acercar la carga al cuerpo, levantar el peso con las piernas y no con la espalda. Cuando necesite girar, recuerde siempre hacerlo con el cuerpo moviendo los pies y no el tronco). Peso máximo para hombres es de 25 kg y para mujeres de 12.5 kg si excede este peso uso de ayuda mecánica. **Trabajador:** Realizar la Calistenia antes de iniciar la jornada. Ojos y mente en la tarea.				
		Bolsas de colores para la clasificación de residuos	N.A.	Infecciones en la piel, ojos, manos. alergias respiratorias	Clasificación inadecuada de residuos desde la fuente.	BAJO	**Fuente:** Tener disponibilidad de recipientes para disposición de residuos según el código de colores. **Medio:** Identificar los residuos , realizar campañas de la importancia de mantener el área de trabajo en condiciones de orden y aseo antes, durante y después de cada jornada. **Trabajador:** Uso de EPP's: Guantes				

Habilitador: Persona encargada de validar que los requerimientos de HSE se cumplen en el documento.	**APROBACION:** Quienes firman a continuación han examinado las condiciones de la actividad y el área de trabajo, son responsables por identificar y registrar posibles cambios de las condiciones de trabajo anotadas y verificar que se han tomado los controles especificados:			
NOMBRE Y FIRMA				
PROFESIONAL ASEGURAMIENTO TÉCNICO / AUTORIDAD DE AREA (PSAT-AA)	SUPERVISOR (S)	EJECUTANTE (E)		HSE DEL CONTRATISTA QUE VERIFICA

ANEXO1 . VALIDACION DIARIA A MANO (MANEJO DEL CAMBIO)

Se verifican las condiciones cambiantes en el dia a dia y se identifica la existencia o no de riesgos periféricos (nuevos, distintos a los planeados antes de iniciar las actividades) descritos en la presente VALIDACION DIARIA A MANO y el ART original planeado.

Fecha y paso de la actividad con el riesgo periferico (describa brevemente el paso involucrado en la nueva condicion)	¿Qué equipos y herramientas debo usar?	¿Qué materiales y productos químicos debo usar?	Seguridad y salud - Riesgos periféricos				Ambiente - Impactos Periféricos			
			¿Qué me puede pasar?	¿Por qué peligro?	¿Qué tan grave puede ser?	¿Qué controles se requieren?	¿Qué daño ambiental puede haber?	¿Por qué aspecto?	¿Qué tan grave puede ser?	¿Qué controles se requieren?
N/A										
N/A										
N/A										

ANEXO 2: DIVULGACION A TODO EL PERSONAL EJECUTOR ENTRE AUTORIDAD EJECUTORA Y/O SUPERVISORES QUE PARTICIPAN EN EL TRABAJO.

Al entender y reconocer todos los riesgos y controles de la actividad diaria, los abajo firmantes verificamos los peligros especificos de la actividad, entendemos y reconocemos los riesgos y controles y hemos verificado que adicionalmente no hay riesgos periféricos o nuevos distintos a los descritos a la presente VALIDACION DIARIA A MANO y al ART original planeado.

No.	NOMBRE	No. CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Erika Gomez	1006445999	HSEQ	
2	Leonardo Rojas	74856795	OFICIAL	
3	Alex Alarte	1118120282	AYUDANTE TECNICO	
4	Jimi Rodriguez	1115913720	obrero	
5	Helber Bernal	1006415455	obrero	Helber sandoval
6				

Este documento es propiedad de Oleoducto Central S.A documento no está destinado para circulación general y no debe ser reproducido o distribuido sin la aprobación escrita de Oleoducto Central S.A o su representante

ANEXO N° 02

LISTADO DE LOS TRABAJADORES

RELACION DE PERSONAL CONTRARO N° 323 DE 2025

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO
1	ERIKA YULIANA GOMEZ CHAPARRO	1006415999	HSEQ
2	LEONARDO ROJAS	74856795	OFICIAL
3	ALEX YOHEL OLARTE VANEGAS	1118120282	AYUDANTE TECNICO
4	JIMI SADDAM RODRIGUEZ IBAÑEZ	1115913120	OBRERO
5	GHELBER OCTAVIO SANDOVAL BERNAL	1006415455	OBRERO

ANEXO N° 03

REGISTROS DE CHARLAS SST

CRONOGRAMA DE CHARLAS

ACTIVIDADES PROGRAMADAS	RESPONSABLE	DURACIÓN	DIRIGIDO A	PROGRAMADO /EJECUTADO	AGOSTO																												OBSERVACIONES
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Divulgación de enfermedades en salud pública	HSE	10 MIN	Personal operativo	P																													CHARLA
				E																													
Calistenia	HSE	10 MIN	Personal operativo	P																													CHARLA
				E																													
gestión de mantenimiento	HSE	10 MIN	Personal operativo	P																													CHARLA
				E																													
programa de salud publica	HSE	10 MIN	Personal operativo	P																													CHARLA
				E																													
Medio ambiente	HSE	10 MIN	Personal operativo	P																													CHARLA
				E																													
Charlas en normatividad vial	HSE	10 MIN	Personal operativo	P																													CHARLA
				E																													
Calistenia	HSE	10 MIN	Personal operativo	P																													CHARLA
				E																													
Divulgación políticas HSE, objetivos y estrategias	HSE	10 MIN	Personal operativo	P																													CHARLA
				E																													
Isométricos, dimensionalidad, y trabajabilidad.	HSE	10 MIN	Personal operativo	P										I																				CHARLA
				E										I																			
pausas activas	HSE	10 MIN	Personal operativo	P											I																			CHARLA
				E											I																		
Divulgación del programa de mantenimiento	HSE	10 MIN	Personal operativo	P												I																		CHARLA
				E												I																	
Factor de riesgo de ruido.	HSE	10 MIN	Personal operativo	P													I																	CHARLA
				E													I																
Calistenia	HSE	10 MIN	Personal operativo	P														I																CHARLA
				E														I															
Tratamiento Salidas No Conforme	HSE	10 MIN	Personal operativo	P															I															CHARLA
				E															I														
Agentes de riesgo biológico.	HSE	10 MIN	Personal operativo	P																	I													CHARLA
				E																	I												
Calistenia	HSE	10 MIN	Personal operativo	P																		I												CHARLA
				E																		I											
Divulgación de enfermedades en salud pública.	HSE	10 MIN	Personal operativo	P																			I											CHARLA
				E																			I										
Charla sobre protección de manos	HSE	10 MIN	Personal operativo	P																				I										CHARLA
				E																				I									
uso de tapabocas	HSE	10 MIN	Personal operativo	P																					I									CHARLA
				E																					I								
sustancias químicas	HSE	10 MIN	Personal operativo	P																						I								CHARLA
				E																						I							
Viruela símica	HSE	10 MIN	Personal operativo	P																							I							CHARLA
				E																							I						
Uso correcto de herramientas menores	HSE	10 MIN	Personal operativo	P																								I						CHARLA
				E																								I					
manejo de residuos solidos	HSE	10 MIN	Personal operativo	P																									I					CHARLA
				E																									I				
calistenia	HSE	10 MIN	Personal operativo	P																										I				CHARLA
				E																										I			
Hábitos y estilos de vida saludable.	HSE	10 MIN	Personal operativo	P																											I			CHARLA
				E																											I		
código de colores clasificación de residuos	HSE	10 MIN	Personal operativo	P																												I		CHARLA
				E																											I		
TOTAL				P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	0	18
				E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	0	18
																																		100%

ELABORADO	
NOMBRE	ERIKA GOMEZ
CARGO	HSEQ
FIRMA	

CRONOGRAMA DE CHARLAS

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ

ACTIVIDADES PROGRAMADAS	RESPONSABLE	DURACION	DIRIGIDO A	PROGRAMADO /EJECUTADO	SEPTIEMBRE																										OBSERVACIONES
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Inhalación pasiva de humos	HSE	10 MIN	Personal operativo	P	1																												CHARLA
				E	1																												
protocolo para pruebas de alcoholemia	HSE	10 MIN	Personal operativo	P		1																											CHARLA
				E		1																											
lesiones en la espalda	HSE	10 MIN	Personal operativo	P			1																										CHARLA
				E			1																										
gestion ambiental	HSE	10 MIN	Personal operativo	P				1																									CHARLA
				E				1																									
estrés laboral	HSE	10 MIN	Personal operativo	P					1																								CHARLA
				E					1																								
comité de convivencia	HSE	10 MIN	Personal operativo	P						1																							CHARLA
				E						1																							
primeros auxilios en el trabajo	HSE	10 MIN	Personal operativo	P																													CHARLA
				E																													
obedecer las normas establecidas	HSE	10 MIN	Personal operativo	P																													CHARLA
				E																													
proteccion auditiva	HSE	10 MIN	Personal operativo	P																													CHARLA
				E																													
Seguridad de maquinaria	HSE	10 MIN	Personal operativo	P																													CHARLA
				E																													
primeros auxilios en el trabajo	HSE	10 MIN	Personal operativo	P																													CHARLA
				E																													
programa de seguridad general	HSE	10 MIN	Personal operativo	P																													CHARLA
				E																													
Calistenia / trabajo en alturas	HSE	10 MIN	Personal operativo	P																													CHARLA
				E																													
cuidado del medio ambiente	HSE	10 MIN	Personal operativo	P																													CHARLA
				E																													
proteccion de riesgo electrico	HSE	10 MIN	Personal operativo	P																													CHARLA
				E																													
Señales de transito	HSE	10 MIN	Personal operativo	P																													CHARLA
				E																													
Radiaciones ionizantes	HSE	10 MIN	Personal operativo	P																													CHARLA
				E																													
Calistenia	HSE	10 MIN	Personal operativo	P																													CHARLA
				E																													
Reglamento de higiene y seguridad industrial	HSE	10 MIN	Personal operativo	P																													CHARLA
				E																													
Actividades rutinarias	HSE	10 MIN	Personal operativo	P																													CHARLA
				E																													
Riesgo musculo esqueletico	HSE	10 MIN	Personal operativo	P																													CHARLA
				E																													
Charla sobre la importancia de EPP.	HSE	10 MIN	Personal operativo	P																													CHARLA
				E																													
Divulgación del programa de gestión Riesgo químico	HSE	10 MIN	Personal operativo	P																													CHARLA
				E																													
calistenia	HSE	10 MIN	Personal operativo	P																													CHARLA
				E																													
Hábitos y estilos de vida saludable	HSE	10 MIN	Personal operativo	P																													CHARLA
				E																													
código de colores clasificación de residuos	HSE	10 MIN	Personal operativo	P																													CHARLA
				E																													
TOTAL				P	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
				E	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
																																	100%

ELABORADO	
NOMBRE	ERIKA GOMEZ
CARGO	HSEQ
FIRMA	

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

REGISTRO DE ASISTENCIA

TEMA: Inducción / uso de EPP
DIRIGIDO A: Trabajadores
LUGAR: Palmareña CAPACITADOR: Erika Gomez
FECHA: 14-08-2025 HORA: 7:00 AM

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	Leonardo Rojas	oficial	
2	Jahel Olivo	Ayudas	
3	Gleiber Sandoval	obrero	Gleiber Sandoval
4	Jimy Rodriguez	Obrero	
5	Erika Gomez	HSEQ	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

REGISTRO DE ASISTENCIA

TEMA: charla sobre ergonomia
DIRIGIDO A: Trabajadores
LUGAR: Palmareña CAPACITADOR: Erika Gomez
FECHA: 12-08-2025 HORA: 7:00 AM

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	Leonardo Rojas	oficial	
2	Jadel Oberto	Ayuda	
3	Chelbe Sandoval	obrero	Chelbe Sandoval
4	Jimy Rodriguez	Obrero	
5	Erika Gomez	HSEQ	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

REGISTRO DE ASISTENCIA

TEMA: Riesgo cardiobascular
DIRIGIDO A: Trabajadores
LUGAR: Palmareña CAPACITADOR: Erika Gomez
FECHA: 13-08-2025 HORA: 7:00 AM

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	Facundo Reyes.	oficial.	
2	Alex Johel Olarte	Ayudar	
3	Chilber Sandoval	obrero	Chilber Sandoval
4	Jomy Rodriguez	obrero	Jim R
5	Erika Gomez	HSEQ	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

REGISTRO DE ASISTENCIA

TEMA: Metodologia 5'S
DIRIGIDO A: Trabajadores
LUGAR: Palmareña CAPACITADOR: TiKA Gomez
FECHA: 14-08-2025 HORA: 7:00 AM

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	Leonardo Reyes	oficial	
2	Alex Johet Olarte	Ayuda	
3	Chulbe Sandoval	obrero	Chulbe Sandoval
4	Jomy Rodriguez	obrero	Jim Rus
5	TiKA Gomez	HSEQ	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

REGISTRO DE ASISTENCIA

TEMA: Reglamento interno de trabajo
DIRIGIDO A: trabajadores
LUGAR: Palmareña CAPACITADOR: Erika Gomez
FECHA: 15-08-2015 HORA: 7:00 AM

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	Amanda Rojas	oficial	
2	Yeli Yohel Olarte	ayuda	
3	Edwar Sandoval	obrero	
4	Jimy Rodriguez	obrero	
5	Erika Gomez	HSEQ	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

REGISTRO DE ASISTENCIA

TEMA: Cuidado de manos
DIRIGIDO A: Trabajadores
LUGAR: Palmareña CAPACITADOR: Erika Gomez
FECHA: 16-08-2023 HORA: 7.00 AM

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	Leonardo Rojas	oficial	
2	Alex Johel Olarte	Ayudor	
3	Chelbe Sandoval	obrero	Chelbe Sandoval
4	Jimy Rodriguez	obrero	
5	Erika Gomez	HSEQ	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

REGISTRO DE ASISTENCIA

TEMA: calistenia
DIRIGIDO A: Trabajadores
LUGAR: Barrio Bosque CAPACITADOR: Erika Gomez
FECHA: 12-08-2024 HORA: 7:00 AM

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	Alex John Olorte	Ayuda	
2	Chelber Sandoval	Obrero	
3	Jimy Rodriguez	obrero	
4	Erika Gomez	HSEQ	
5	Leonardo Peña	oficial	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

REGISTRO DE ASISTENCIA

TEMA: Uso correcto de herramienta menores
DIRIGIDO A: Trabajadores
LUGAR: Palmeña CAPACITADOR: Erika Gomez
FECHA: 19-08-2024 HORA: 7:00 Am

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	Alex Johel Olarte	Ayuda	
2	Chelber Sandoval	Obrero	
3	Jim Rodriguez	obrero	
4	Erika Gomez	HSEQ	
5	Leonardo Rojas	Oficial	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

REGISTRO DE ASISTENCIA

TEMA: Manejo adecuado de cargas
DIRIGIDO A: Trabajadores
LUGAR: Palmarita CAPACITADOR: Erika Gomez
FECHA: 20-08-2024 HORA: 7:00 Am

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	Alex Johel Olarte	Ayuda	
2	Ghelber Sandoval	Obrero	
3	Erika Gomez	HSEQ	
4	Jimy Rodriguez	Obrero	
5	Leonardo Rojas	oficial	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

REGISTRO DE ASISTENCIA

TEMA: Conservación auditiva
DIRIGIDO A: Trabajadores
LUGAR: Palmarita CAPACITADOR: Erika Gomez
FECHA: 21-08-2024 HORA: 7:00 AM

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	Yeis Johel Olarte	Ayuda	
2	Cristhian Sanchez	Obrero	
3	Jhony Rodriguez	obrero	
4	Erika Gomez	HSEQ	
5	Leonardo Rojas	oficial	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

REGISTRO DE ASISTENCIA

TEMA: Radiaciones ionizantes
DIRIGIDO A: Trabajadores
LUGAR: Palmaceña CAPACITADOR: Tuka Gomez
FECHA: 22-08-2024 HORA: 7:00 AM

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	Alex John Olarte	Ayuda	
2	Gilbar Sandoval	obrero	
3	Tuka Gomez	HSEQ	
4	Jimy Rodriguez	Obrero	
5	Leonardo Rojas	oficial	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

REGISTRO DE ASISTENCIA

TEMA: Colisteria

DIRIGIDO A: Trabajadores

LUGAR: Palmarcito CAPACITADOR: Erika Gomez

FECHA: 23-08-2024 HORA: 7:00 AM

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	Alex Johel Olarte	Ayuda	
2	Gilber Sandoval	Obrero	
3	Jimy Rodriguez	Obrero	
4	Erika Gomez	HSEQ	
5	Leonardo Rojas	Oficial	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

REGISTRO DE ASISTENCIA

TEMA: Reglamento de seguridad
DIRIGIDO A: Trabajadores
LUGAR: Palmarera CAPACITADOR: Erika Gomez
FECHA: 25-08-2025 HORA: 7:00 AM

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	Leonardo Rojas	oficial	
2	Alex Jahel Olate	Ayudar	
3	Chelbar Sandoval	obrero	Chelbar Sandoval
4	Jimy Rodriguez	Obrero	
5	Erika Gomez	HSEQ	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

REGISTRO DE ASISTENCIA

TEMA: Actividades rutinarias
DIRIGIDO A: Trabajadores
LUGAR: palmarejo CAPACITADOR: Finka Gomez
FECHA: 26-08-2025 HORA: 7:00 AM

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	Alex Jahel Olarte	AYUDA	
2	Jhony Rodriguez	Obrero	
3	Finka Gomez	HSEQ	
4	Ghelber Sandoval	obrero	Ghelber Sandoval
5	Leonardo Rojas	oficial	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

REGISTRO DE ASISTENCIA

TEMA: Riesgo electrico
DIRIGIDO A: trabajadores
LUGAR: Palmarcita CAPACITADOR: Erika Gomez
FECHA: 21-08-2025 HORA: 1:00 Am

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	Alex Johel Olarte	Ayuda	
2	Erika Gomez	HSEQ	
3	Jimy Rodriguez	Obrero	
4	Gelbar Sandoval	obrero	
5	Leonardo Rojas	oficial	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

REGISTRO DE ASISTENCIA

TEMA: Importancia de EPP
DIRIGIDO A: Trabajadores
LUGAR: Palmareña CAPACITADOR: Erika Gomez
FECHA: 28-08-2025 HORA: 7:00 Am

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	Alex Jobel Olarte	Ayuda	
2	Jimy Rodriguez	obrero	
3	Erika Gomez	HSEQ	
4	Ghelber Sagdoval	obrero	
5	Leonardo Royce	oficial	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

REGISTRO DE ASISTENCIA

TEMA: Programa de riesgo quimico
DIRIGIDO A: Trabajadores
LUGAR: Palmaxeña CAPACITADOR: Erika Gomez
FECHA: 29-08-2025 HORA: 7:00 AM

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	Alex Johel Clorte	Ayuda	
2	Jonny Rodriguez	Obrero	
3	Erika Gomez	HSEQ	
4	Ghelber Sandoval	Obrero	Ghelber Sandoval
5	Leonardo Rojas	Oficial	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

REGISTRO DE ASISTENCIA

TEMA: Gestión ambiental
DIRIGIDO A: Trabajadores
LUGAR: Palmarejo CAPACITADOR: Erika Gomez
FECHA: 04-09-2025 HORA: 7:00 AM

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	Jumy Rodriguez	Obrero	
2	Erika Gomez	HSEQ	
3	Gualber Sandoval	obrero	
4	Leonardo Rojas	oficial	
5	Alex Johel Duarte	ayudar	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

REGISTRO DE ASISTENCIA

TEMA: Estres laboral
DIRIGIDO A: trabajadores
LUGAR: Palmarosa CAPACITADOR: Erika Gomez
FECHA: 05-09-2025 HORA: 7:00 AM

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	Erika Gomez	HSEQ	
2	Jenny Rodriguez	obrero	
3	Ghelber Sandoval	obrero	
4	Leonardo Rojas	oficial	
5	Alex Johel Olarte	Ayudar	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

REGISTRO DE ASISTENCIA

TEMA: Comité de convivencia
DIRIGIDO A: Trabajadores
LUGAR: Palmarosa CAPACITADOR: Erika Gomez
FECHA: 06-09-2025 HORA: 7:00 AM

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	Jimy Rodriguez	Obrero	Jimy Rodriguez
2	Erika Gomez	HSEQ	
3	Gilbar Sandoval	obrero	Gilbar Sandoval
4	Leonardo Rojas	oficial	
5	Jahel Olarte	Ayudar	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

ANEXO N° 04

REGISTROS DE EVALUACION DE INDUCCION

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ	EVALUACION DE INDUCCION Y REINDUCCION	Versión:	
		Código:	
		Fecha:	
		Pagina:	1 de 2

NOMBRES Y APELLIDOS: Chelber Sandoval

FECHA: 11-08-2025

INDUCCIÓN [X]
REINDUCCION [ ]

CARGO: obrero

TIEMPO EN LA EMPRESA: _____

EVALUACION DE INDUCCIÓN Y RE INDUCCIÓN.

1. Significado de las siguientes definiciones

a. Acoso Laboral:
Todo Suceso que conyebe repentinamente la Jornada laboral, conducta persistente y demostrable. de hostigamiento o agresion ya sea fisica o psicologica, ejercida sobre un trabajador por parte de un superior.

b. Enfermedad Laboral:
Se denomina enfermedad profesional o aquella enfermedad adquirida en el puesto de trabajo de un trabajador por cuenta ajena.

c. Accidente de Trabajo:
Un accidente de trabajo es un suceso repentino que ocurre durante el trabajo o en relación con el causando una lesión, perturbación funcional invalidez. o la muerte al trabajador. Este suceso debe estar directamente relacionado con las actividades.

2. Participar en la prevención de accidentalidad y riesgos dentro de la empresa es obligación de :

a. El Trabajador.
b. El empleador (jefe).
c. El coordinador de Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y Medio Ambiente
d. Todas las anteriores.

3. Escribir la respuesta.
Mencione los riesgos a los que esta expuesto usted en su puesto de trabajo:

a. Fisico.
b. Biologico.
c. locativos.
d. Biomecanico.
e. Espacios Confinados.
f. Alturas.
g. Atrapamiento.

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ	EVALUACION DE INDUCCION Y REINDUCCION	Versión:	
		Código:	
		Fecha:	
		Pagina:	1 de 2

4. Nombre los programas de gestión de riesgo unión temporal establecidos en la empresa.
   a. P salud ocupacional
   b. P seguridad vial
   c. P No al acoso laboral

5. Mencione los elementos de protección personal que usted debe usar en su puesto de trabajo:
   Gafas, Guantes camisa mango largo botas seguridad

6. Nombre las brigadas de emergencia con las que cuenta unión temporal
   Primeros auxilio verificar punto de encuentro hacer llamado al centro mas cercano

7. En caso de emergencia que se debe hacer?
   mantener la calma verificar punto de encuentro hacer llamado centro atencion

8. Mencione las políticas de nuestra empresa.
   Cero alcohol
   Cero drogas
   prevencion acoso laboral
   politica HSEQ

9. Nombre 2 deberes y derechos que tiene frente a la Administradora de riesgos Laborales
   Derechos Desempeñar las funciones del cargo asignacion
   Deberes procurar el cuidado de mi salud uso adecuado los EPP

FIRMA DEL EVALUADO. Gholber Sandoval

FIRMA DEL EVALUADOR

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ	EVALUACION DE INDUCCION Y REINDUCCION	Versión:	
		Código:	
		Fecha:	
		Pagina:	1 de 2

NOMBRES Y APELLIDOS: Leonardo Reyes

FECHA: 11-08-2015

INDUCCIÓN ☑
REINDUCCION ☐

CARGO: Fiscal

TIEMPO EN LA EMPRESA: _____

EVALUACION DE INDUCCIÓN Y RE INDUCCIÓN.

1. Significado de las siguientes definiciones

a. Acoso Laboral:
Todo suceso que conyebe repentinamente la jornada laboral conducta persitente y demostrable de hostanimiento o agrecion ya sea fisica o cicolo gica ejecida sobre un trabajador por parte de un superior

b. Enfermedad Laboral:
Se denomino enfermedad profecional o aquella enfermedad adquerido en puesto de trabajo de un trabajador por cuenta ajena

c. Accidente de Trabajo:
un accidente de trabajo es un suceso repentino que ocurre durante el trabajo o relacion con el causado una lecion pertubacion funcional invalidez o la muerte al trabajador este suceso debe estar directamente relacionado con las actividades

2. Participar en la prevención de accidentalidad y riesgos dentro de la empresa es obligación de :

   a. El Trabajador.
   b. El empleador (jefe).
   c. El coordinador de Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y Medio Ambiente
   d. Todas las anteriores.

3. Escribir la respuesta.
   Mencione los riesgos a los que esta expuesto usted en su puesto de trabajo:

   a. fisico
   b. Biologico
   c. locativos
   d. Biomecanicos
   e. espacios confinados
   f. alturas
   g. atrapamientos

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ	EVALUACION DE INDUCCION Y REINDUCCION	Versión:	
		Código:	
		Fecha:	
		Pagina:	1 de 2

4. Nombre los programas de gestión de riesgo unión temporal establecidos en la empresa.
   a. P salud ocupacional
   b. P seguridad vial
   c. P NO alcohol laboral

5. Mencione los elementos de protección personal que usted debe usar en su puesto de trabajo:
   Gafas, guantes. casco. camisa manga larga Botas seguridad

6. Nombre las brigadas de emergencia con las que cuenta unión temporal
   primeros auxilios contigencia e incendio
   evacuacion

7. En caso de emergencia que se debe hacer?
   mantener la calma verificar el punto de encuentro hacer llamado al centro mas sercano

8. Mencione las políticas de nuestra empresa.
   Cero alcohol
   cero drogas
   prevencion acoso laboral
   politica HSEQ

9. Nombre 2 deberes y derechos que tiene frente a la Administradora de riesgos Laborales
   Derecho desenpeñar los funciones del cargo dotacion
   Deveres procurar el cuidado de mi solud uso adecuado de los EPP.

FIRMA DEL EVALUADO. _____

FIRMA DEL EVALUADOR _____

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ	EVALUACION DE INDUCCION Y REINDUCCION	Versión:	
		Código:	
		Fecha:	
		Pagina:	1 de 2

NOMBRES Y APELLIDOS: Alex Johel Olarte Vanegas

FECHA: 11-08-2025

INDUCCIÓN ☑
REINDUCCION ☐

CARGO: Ayudante

TIEMPO EN LA EMPRESA: _____

EVALUACION DE INDUCCIÓN Y RE INDUCCIÓN.

1. Significado de las siguientes definiciones

a. Acoso Laboral:
Todo suceso que conyebe repentinamente la jornada laboral conducta persitente y demostrable de hostigamiento o agresion ya sea física o psicologica ejercida sobre un trabajador por parte de superior

b. Enfermedad Laboral:
se denomina enfermedad profecional o aquella enfermedad adquirida en un puesto de trabajo de un trabajador por cuenta ajena

c. Accidente de Trabajo:
Un accidente de trabajo es un suceso repentino que ocurre durante el trabajo on en relacion con el causado una lesion perturbacion funcional invalidez o la muerte al trabajador este suceso debe estar directamente relacionado con las actividades

2. Participar en la prevención de accidentalidad y riesgos dentro de la empresa es obligación de :

   a. El Trabajador.
   b. El empleador (jefe).
   c. El coordinador de Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y Medio Ambiente
   ☒ Todas las anteriores.

3. Escribir la respuesta.
   Mencione los riesgos a los que esta expuesto usted en su puesto de trabajo:

   a. fisico
   b. Biologico
   c. locativo
   d. Biomecanico
   e. espacio confinado
   f. Altura
   g. Atrapamiento

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ	EVALUACION DE INDUCCION Y REINDUCCION	Versión:	
		Código:	
		Fecha:	
		Pagina:	1 de 2

4. Nombre los programas de gestión de riesgo unión temporal establecidos en la empresa.
   a. P salud ocupacional
   b. P seguridad vial
   c. P No al acoso laboral

5. Mencione los elementos de protección personal que usted debe usar en su puesto de trabajo:
   Gafas. Guantes. casco. camisa mango largo
   Botas de seguridad

6. Nombre las brigadas de emergencia con las que cuenta unión temporal
   primero auxilio contingencial e incendios

7. En caso de emergencia que se debe hacer?
   mantener la calma Verificar el punto de encuentro
   hacer llamado al cetro mas sercano

8. Mencione las políticas de nuestra empresa.
   Cero alcohol
   Cero drogas
   prevencion acoso laboral
   politica HSQE

9. Nombre 2 deberes y derechos que tiene frente a la Administradora de riesgos Laborales
   Derecho Desepeñar los funciones del cargo dotrion
   Deveres procurar el cuidado de mi salud uso adecuado de los EPP

FIRMA DEL EVALUADO. _____

FIRMA DEL EVALUADOR _____

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ	EVALUACION DE INDUCCION Y REINDUCCION	Versión:	
		Código:	
		Fecha:	
		Pagina:	1 de 2

NOMBRES Y APELLIDOS: Jimy Rodriguez

FECHA: 11-08-2023

INDUCCIÓN ☑

REINDUCCION ☐

CARGO: obrero

TIEMPO EN LA EMPRESA: _____

EVALUACION DE INDUCCIÓN Y RE INDUCCIÓN.

1. Significado de las siguientes definiciones

a. Acoso Laboral:
Todo suceso que conlebe repentinamente la jornada laboral conducto persiterte y demostrable de hostigamiento o agiecion ya sea fisica o psicologica ejesciba sobre un trabajador por parte de un superior

b. Enfermedad Laboral:
Se denomina enfermedad profecional o aquella enfamedad adquirida en el puesto de trabajo de un trabajador por cuenta ajena

c. Accidente de Trabajo:
un accidente de trabajo es un suceso repentino que ocurre durante el trabajo o en relacion con el causado una lecion perturbacion funcional invalidez o muerte al trabajador este suceso debe estar direfamal relacionado con las actividades

2. Participar en la prevención de accidentalidad y riesgos dentro de la empresa es obligación de :

   a. El Trabajador.
   b. El empleador (jefe).
   c. El coordinador de Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y Medio Ambiente
   d. Todas las anteriores.

3. Escribir la respuesta.
   Mencione los riesgos a los que esta expuesto usted en su puesto de trabajo:

   a. fisico
   b. Biologico
   c. locativos
   d. Biomecanicos
   e. Espacio confinado
   f. Alturas
   g. Atrapamiento

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ	EVALUACION DE INDUCCION Y REINDUCCION	Versión:	
		Código:	
		Fecha:	
		Pagina:	1 de 2

4. Nombre los programas de gestión de riesgo unión temporal establecidos en la empresa.
   a. P. Salud Ocupacional
   b. P. Seguridad Vial.
   c. P. No al acoso laboral.

5. Mencione los elementos de protección personal que usted debe usar en su puesto de trabajo:
   Gafas, Guantes, Casco, Camisa manga larga, Botas de Seguridad.

6. Nombre las brigadas de emergencia con las que cuenta unión temporal
   Primeros auxilios, Contigencia e incendios, Evacuación

7. En caso de emergencia que se debe hacer?
   mantener la calma, verificar el punto de encuentro, hacer llamado al centro mas sercano.

8. Mencione las políticas de nuestra empresa.
   Cero alcohol.
   Cero drogas.
   Prevención de acoso laboral.
   Política de HSEQ.

9. Nombre 2 deberes y derechos que tiene frente a la Administradora de riesgos Laborales
   Derechos: Desempeñar las funciones del cargo, dotación
   Deberes: Procurar el cuidado de mi Salud, USO adecuado de los EPP.

FIRMA DEL EVALUADO. Jim R W

FIRMA DEL EVALUADOR

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ	EVALUACION DE INDUCCION Y REINDUCCION	Versión:	
		Código:	
		Fecha:	
		Pagina:	1 de 2

NOMBRES Y APELLIDOS: Erika Gomez

FECHA: 11-03-2025

INDUCCIÓN ☑
REINDUCCION ☐

CARGO: HSEQ

TIEMPO EN LA EMPRESA: _____

EVALUACION DE INDUCCIÓN Y RE INDUCCIÓN.

1. Significado de las siguientes definiciones

a. Acoso Laboral:
Todo suceso que conlebe repentinamente la jornada laboral conducta persistente y demostrable de hostigamiento o agresion ya sea fisica o psicologica ejercida sobre un trabajador por parte de un superior

b. Enfermedad Laboral:
se denomina enfermedad profesional o aquella enfermedad adquirida en el puesto de trabajo de un trabajador por cuenta ajena

c. Accidente de Trabajo:
un accidente de trabajo es un suceso repentino que ocurre durante el trabajo o en relacion con el causado una lecion perturbacion funcional invalidez o la muerte al trabajador este suceso debe estar directamente relacionada con las actividades

2. Participar en la prevención de accidentalidad y riesgos dentro de la empresa es obligación de :

   a. El Trabajador.
   b. El empleador (jefe).
   c. El coordinador de Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y Medio Ambiente
   d. Todas las anteriores.

3. Escribir la respuesta.
   Mencione los riesgos a los que esta expuesto usted en su puesto de trabajo:

   a. fisica
   b. Biologico
   c. locativo
   d. Biomecanico
   e. espacio confinado
   f. Alturas
   g. Atrapamiento

ANEXO N° 05

REGISTROS DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL																			EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	
GESTION HSEQ																			
NOMBRE DEL TRABAJADOR	Jonny Rodriguez																		
CARGO	Obrero							DOCUMENTO DE IDENTIDAD	1115913120										
FECHA DE ENTREGA	ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL																CENTRO DE COSTOS	FIRMA COMO CONSTANCIA DE RECIBIDO	FIRMA COMO CONTANCIA DE ENTREGADO
	CASCO DE SEGURIDAD	PROTECTOR AUDITIVO DE INSERCION	BOTA DE SEGURIDAD	BARBUQUEJO	MASCARILLA DESECHABLES	GAFAS DE SEGURIDAD OSCURAS	GAFAS DE SEGURIDAD CLARAS	GUANTES DE NYLON RECUBIERTOS EN NITRILO (PAR)	GUANTES DE HILAZA	GUANTES DE VAQUETA (PAR)	GUANTES DE NITRILO DESECHABLES (PAR)	PETO	MANGAS	FILTROS HUMOS METALICOS	FILTROS PARA VAPORES	MASCARILLA	OTROS ELEMENTOS			
11-08-2025	✓		✓			✓		✓											

	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL																				EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ INGENIERO CIVIL - ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA		
	GESTION HSEQ																						
NOMBRE DEL TRABAJADOR	Alex Johel Olarte																						
CARGO	Ayudante								DOCUMENTO DE IDENTIDAD	1118120282												
FECHA DE ENTREGA	ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL																		CENTRO DE COSTOS	FIRMA COMO CONSTANCIA DE RECIBIDO	FIRMA COMO CONTANCIA DE ENTREGADO
	CASCO DE SEGURIDAD	PROTECTOR AUDITIVO DE INSERCCION	BOTA DE SEGURIDAD	BARBUQUEJO	MASCARILLA DESECHABLES	GAFAS DE SEGURIDAD OSCURAS	GAFAS DE SEGURIDAD CLARAS	GUANTES DE NYLON RECUBIERTOS EN NITRILO (PAR)	GUANTES DE HILAZA	GUANTES DE VAQUETA (PAR)	GUANTES DE NITRILO DESECHABLES (PAR)	PETO	MANGAS	FILTROS HUMOS METALICOS	FILTROS PARA VAPORES	MASCARILLA	OTROS ELEMENTOS			
11.08	11.08.2025	✓		✓			✓		✓								✓						

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E
INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

GESTION HSEQ

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Ghelber Sandoval

CARGO: obrero

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 1006415455

FECHA DE ENTREGA	ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL																	CENTRO DE COSTOS	FIRMA COMO CONSTANCIA DE RECIBIDO	FIRMA COMO CONTANCIA DE ENTREGADO
	CASCO DE SEGURIDAD	PROTECTOR AUDITIVO DE INSERCION	BOTA DE SEGURIDAD	BARBUQUEJO	MASCARILLA DESECHABLES	GAFAS DE SEGURIDAD OSCURAS	GAFAS DE SEGURIDAD CLARAS	GUANTES DE NYLON RECUBIERTOS EN NITRILO (PAR)	GUANTES DE HILAZA	GUANTES DE VAQUETA (PAR)	GUANTES DE NITRILO DESECHABLES (PAR)	PETO	MANGAS	FILTROS HUMOS METALICOS	FILTROS PARA VAPORES	MASCARILLA	OTROS ELEMENTOS			
11-08-2023	✓		✓			✓		✓											Ghelber S	

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E
INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

GESTION HSEQ

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Leonardo Rojas -

CARGO: Oficial.

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 7485695.

FECHA DE ENTREGA	ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL																	CENTRO DE COSTOS	FIRMA COMO CONSTANCIA DE RECIBIDO	FIRMA COMO CONTANCIA DE ENTREGADO
	CASCO DE SEGURIDAD	PROTECTOR AUDITIVO DE INSERCCION	BOTA DE SEGURIDAD	BARBUQUEJO	MASCARILLA DESECHABLES	GAFAS DE SEGURIDAD OSCURAS	GAFAS DE SEGURIDAD CLARAS	GUANTES DE NYLON RECUBIERTOS EN NITRILO (PAR)	GUANTES DE HILAZA	GUANTES DE VAQUETA (PAR)	GUANTES DE NITRILO DESECHABLES (PAR)	PETO	MANGAS	FILTROS HUMOS METALICOS	FILTROS PARA VAPORES	MASCARILLA	OTROS ELEMENTOS			
11-02-2021	✓		✓			✓		✓												

ANEXO N° 06

REGISTROS DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

ARL | sura

Medellín, 14 de Agosto de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ, en el centro de trabajo 0000000001 - PRINCIPAL CASANARE, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C1006415999	GOMEZ CHAPARRO ERIKA YULIANA	15/08/2025		15015717	DEPENDIENTE	POR INICIAR
C1118120282	OLARTE VANEGAS ALEX YOHEL	15/08/2025		931032B2	DEPENDIENTE	POR INICIAR
C1115913120	RODRIGUEZ IBAÑEZ JIMY SADDAM	15/08/2025		236u1417	DEPENDIENTE	POR INICIAR
C74856795	ROJAS LEONARDO	15/08/2025		92226232	DEPENDIENTE	POR INICIAR
C1006415455	SANDOVAL BERNAL GHELBER OCTAVIO	15/08/2025		177186ty	DEPENDIENTE	POR INICIAR

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C797996142522648592

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 14/08/2025 13:29:48 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 179.1.207.43, 192.230.104.9, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO N° 07

REGISTROS DE INSPECCIONES DE HERRAMIENTA MENOR

LISTA DE CHEQUEO PARA HERRAMIENTA MENOR

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA

PERIODO	DEL 11-08-2025	AL 17-08-2025	FECHA	17-08-25
ÁREA DE TRABAJO	barrio bosque			

DESCRIPCIÓN	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	B	R	N/A	B	R	N/A	B	R	N/A	B	R	N/A	B	R	N/A	B	R	N/A	B	R	N/A
SEGUETA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ALICATES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LLAVE DE TUBO																					
CINCELES																					
CINTA METRICA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO GENERAL CAJA DE HERRAMIENTAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DESTORNILLADOR																					
EXTENSIONES ELECTRICAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
HOMBRESOLO																					
LIMAS																					
LLAVES EXPANSIVA																					
PALAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
TIJERAS																					
MACETAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LLAVES MIXTAS																					
MARTILLO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
PLOMADAS																					
CARRETILLAS O CARROS DE MANO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
MACHETE CON FUNDA																					
PATECABRAS																					
FLEXOMETRO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
NIVELES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
PALUSTRE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESCUADRAS																					
PALADRAGAS																					
PORRAS																					
PICAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SIERRA MANUAL																					
ZIMBRAS																					
DECAMETRO																✓					
BARRAS	✓			✓			✓			✓			✓								
MANGUERAS PARA NIVEL																					
OTROS																					
OTROS																					

OBSERVACIONES:

Nombre del Trabajador	Alex Olivete	Alex Olivete	Alex Olivete	Alex Olivete	Alex Olivete	Alex Olivete	Alex Olivete
Nombre Del Supervisor	Leonardo	Leonardo	Leonardo	Leonardo	Leonardo	Leonardo	
V°B° Supervisor							

Vo/BO REPRESENTANTE HSE	NOMBRE	Erika Gomez	FIRMA		FECHA	17-08-25

LISTA DE CHEQUEO PARA HERRAMIENTA MENOR

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA

PERIODO DEL 18-08-2025 AL 24-08-2025 **FECHA** 18-08-25

ÁREA DE TRABAJO Barrio Dorado

DESCRIPCIÓN	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
	B	R	N/A	B	R	N/A	B	R	N/A	B	R	N/A	B	R	N/A	B	R	N/A	B	R	N/A
SECUETA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ALICATES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LLAVE DE TUBO																					
CINCELES																					
CINTA METRICA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO GENERAL CAJA DE HERRAMIENTAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DESTORNILLADOR																					
EXTENSIONES ELECTRICAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
HOMBRES SOLO																					
LIMAS																					
LLAVES EXPANSIVA																					
PALAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
TIJERAS																					
MACETAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LLAVES MIXTAS																					
MARTILLO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
PLOMADAS																					
CARRETILLAS O CARRO DE MANO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
MACHETE CON FUNDA																					
PATECABRAS																					
FLEXOMETRO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
NIVELES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
PALUSTRE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESCUADRAS																					
PALADRAGAS																					
PORRAS																					
PICAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SIERRA MANUAL																					
ZIMBRAS																					
DECAMETRO																					
BARRAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
MANGUERAS PARA NIVEL																					
OTROS																					
OTROS																					

OBSERVACIONES:

	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Nombre del Trabajador	Alex Clarke	Alex Clarke	Alex Clarke	Alex Clarke	Alex Clarke	Alex Clarke	
Nombre Del Supervisor	Leonardo	Leonardo	Leonardo	Leonardo	Leonardo	Leonardo	
V°B° Supervisor							

Vo/BO REPRESENTANTE HSE	NOMBRE	Erika Gomez	FIRMA		FECHA	18-08-25

LISTA DE CHEQUEO PARA HERRAMIENTA MENOR

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA

PERIODO DEL 25-08-2025 AL 31-08-2025 **FECHA** 25-08-25

ÁREA DE TRABAJO Bario bosque

DESCRIPCIÓN	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
	B	R	N/A	B	R	N/A	B	R	N/A	B	R	N/A	B	R	N/A	B	R	N/A	B	R	N/A
SEQUETA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ALICATES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LLAVE DE TUBO																					
CINCELES																					
CINTA METRICA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO GENERAL CAJA DE HERRAMIENTAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DESTORNILLADOR																					
EXTENSIONES ELECTRICAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
HOMBRESOLO																					
LIMAS																					
LLAVES EXPANSIVA																					
PALAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
TIJERAS																					
MACETAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LLAVES MIXTAS																					
MARTILLO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
PLOMADAS																					
CARRETILLAS O CARRO DE MANO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
MACHETE CON FUNDA																					
PATECABRAS																					
FLEXOMETRO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
NIVELES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
PALUSTRE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESCUADRAS																					
PALADRAGAS																					
PORRAS																					
PICAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SIERRA MANUAL																					
ZIMBRAS																					
DECAMETRO																					
BARRAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
MANGUERAS PARA NIVEL																					
OTROS																					
OTROS																					

OBSERVACIONES:

Nombre del Trabajador	Alex Olaya	Alex Olaya	Alex Olaya	Alex Olaya	Alex Olaya	Alex Olaya
Nombre Del Supervisor	Ingeniero	Ingeniero	Ingeniero	Ingeniero	Ingeniero	Ingeniero
V°B° Supervisor						

Vo/BO REPRESENTANTE HSE **NOMBRE** Erika Gomez **FIRMA** **FECHA** 25-08-25

LISTA DE CHEQUEO PARA HERRAMIENTA MENOR

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA

PERIODO	DEL 07-09-2025	AL 07-09-2025	FECHA	07-09-25
ÁREA DE TRABAJO	bomba	bodega		

DESCRIPCIÓN	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
	B	R	N/A	B	R	N/A	B	R	N/A	B	R	N/A	B	R	N/A	B	R	N/A	B	R	N/A
SECUETA	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
ALICATES	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
LLAVE DE TUBO																					
CINCELES																					
CINTA METRICA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO GENERAL CAJA DE HERRAMIENTAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DESTORNILLADOR																					
EXTENSIONES ELECTRICAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
HOMBRESOLO																					
LIMAS																					
LLAVES EXPANSIVA																					
PALAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
TIJERAS																					
MACETAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LLAVES MIXTAS																					
MARTILLO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
PLOMADAS																					
CARRETILLAS O CARROS DE MANO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
MACHETE CON FUNDA																					
PATECABRAS																					
FLEXOMETRO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
NIVELES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
PALUSTRE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESCUADRAS																					
PALADRAGAS																					
PORRAS																					
PICAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SIERRA MANUAL																					
ZIMBRAS																					
DECAMETRO																					
BARRAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
MANGUERAS PARA NIVEL																					
OTROS																					
OTROS																					

OBSERVACIONES:							
Nombre del Trabajador	Alex olarte	Alex olarte	Alex olarte	Alex olarte	Alex olarte	Alex olarte	Alex olarte
Nombre Del Supervisor	Leyro	Leyro	Leyro	Leyro	Leyro	Leyro	
V°B° Supervisor							

Vo/BO REPRESENTANTE HSE	NOMBRE	Erika Gomez	FIRMA		FECHA	07-09-25

ANEXO N° 08

REGISTRO DE INSPECCION DE CORTADORA DE CONCRETO

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL** **CORTADORA**	Fecha:

Obra /Proyecto: 323				**Cortadora Nº:** 001
Semana del	11/08/25	**al**	17/08/25	**Año:** 2025	**RPM:**

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
OPERACIÓN	El equipo cuenta con el guarda polea y el protector o guarda del disco.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Las tapas y/o las guardas cubren completamente las partes en movimiento del motor, poleas, y el disco.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	El uso de las guardas permite un buen funcionamiento del equipo.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	El uso de la tapa o protectores no interfiere en la operación del equipo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	La tapa cuenta con un sistema de seguridad que impida ser retirada en el momento de la operación.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Hoja de vida de la cortadora.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Las conexiones eléctricas de la Cortadora están completamente protegidas de la humedad.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	La conexión eléctrica cuenta con polo a tierra.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	El cableado de las conexiones eléctricas es recubierto en caucho y libre de abrasiones, cuenta con las clavijas de seguridad.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Las conexiones eléctricas están en cable encauchetado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	La conexión de la Cortadora se hace a un tablero que resista la capacidad de voltaje para el funcionamiento del equipo.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Se cuenta con sistema de humectación y/o irrigación para el disco y para el material.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	La ubicación de la cortadora esta fuera del área de izaje de cargas y/o de otras actividades.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Se conservan la distancia de seguridad respecto a las fuentes de energía (líneas eléctricas.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Se realiza y se mantiene el orden y aseo en el área de acción de la cortadora.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Esta la zona despejada, aislada y señalizada y solo se permite el acceso de del personal involucrado en la maniobra.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL	Estado General del Cable Electrico o de Potencia.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado General de la Carcasa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado General del Mango de Agarre	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado General del interruptor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado General del Disco.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado General de la Guarda.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la Prensa.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Otro:														
FIRMA	**FIRMA OPERADOR**														
	FIRMA SST														

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

HALLAZGOS:

ACCIONES INMEDIATAS:

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL** **CORTADORA**	Fecha:

Obra /Proyecto: 323				Cortadora Nº: 001
Semana del	18/08/25	al	24-08-25	Año: 2025	RPM:

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
OPERACIÓN	El equipo cuenta con el guarda polea y el protector o guarda del disco.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Las tapas y/o las guardas cubren completamente las partes en movimiento del motor, poleas, y el disco.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	El uso de las guardas permite un buen funcionamiento del equipo.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	El uso de la tapa o protectores no interfiere en la operación del equipo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	La tapa cuenta con un sistema de seguridad que impida ser retirada en el momento de la operación.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Hoja de vida de la cortadora.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Las conexiones eléctricas de la Cortadora están completamente protegidas de la humedad.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	La conexión eléctrica cuenta con polo a tierra.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	El cableado de las conexiones eléctricas es recubierto en caucho y libre de abrasiones, cuenta con las clavijas de seguridad.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Las conexiones eléctricas están en cable encauchetado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	La conexión de la Cortadora se hace a un tablero que resista la capacidad de voltaje para el funcionamiento del equipo.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Se cuenta con sistema de humectación y/o irrigación para el disco y para el material.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	La ubicación de la cortadora esta fuera del área de izaje de cargas y/o de otras actividades.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Se conservan la distancia de seguridad respecto a las fuentes de energía (líneas eléctricas.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Se realiza y se mantiene el orden y aseo en el área de acción de la cortadora.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Esta la zona despejada, aislada y señalizada y solo se permite el acceso de del personal involucrado en la maniobra.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL	Estado General del Cable Electrico o de Potencia.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado General de la Carcasa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado General del Mango de Agarre	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado General del interruptor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado General del Disco.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado General de la Guarda.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la Prensa.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Otro:														
FIRMA	FIRMA OPERADOR														
	FIRMA SST														

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

HALLAZGOS:

ACCIONES INMEDIATAS:

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL** **CORTADORA**	**Fecha:**

Obra /Proyecto: 323				**Cortadora Nº:** 001
Semana del	25-08-25	**al**	31-08-25	**Año:** 2025	**RPM:**

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
OPERACIÓN	El equipo cuenta con el guarda polea y el protector o guarda del disco.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Las tapas y/o las guardas cubren completamente las partes en movimiento del motor, poleas, y el disco.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	El uso de las guardas permite un buen funcionamiento del equipo.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	El uso de la tapa o protectores no interfiere en la operación del equipo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	La tapa cuenta con un sistema de seguridad que impida ser retirada en el momento de la operación.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Hoja de vida de la cortadora.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Las conexiones eléctricas de la Cortadora están completamente protegidas de la humedad.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	La conexión eléctrica cuenta con polo a tierra.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	El cableado de las conexiones eléctricas es recubierto en caucho y libre de abrasiones, cuenta con las clavijas de seguridad.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Las conexiones eléctricas están en cable encauchetado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	La conexión de la Cortadora se hace a un tablero que resista la capacidad de voltaje para el funcionamiento del equipo.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Se cuenta con sistema de humectación y/o irrigación para el disco y para el material.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	La ubicación de la cortadora esta fuera del área de izaje de cargas y/o de otras actividades.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Se conservan la distancia de seguridad respecto a las fuentes de energía (líneas eléctricas.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Se realiza y se mantiene el orden y aseo en el área de acción de la cortadora.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Esta la zona despejada, aislada y señalizada y solo se permite el acceso de del personal involucrado en la maniobra.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL	Estado General del Cable Electrico o de Potencia.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado General de la Carcasa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado General del Mango de Agarre	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado General del interruptor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado General del Disco.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado General de la Guarda.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la Prensa.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Otro:														
FIRMA	**FIRMA OPERADOR**														
	FIRMA SST														

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

HALLAZGOS:

ACCIONES INMEDIATAS:

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL
CORTADORA

Fecha:

Obra /Proyecto: 323 **Cortadora Nº:** 001

Semana del 01-09-25 **al** 07-09-25 **Año:** 2025 **RPM:**

ITEM	CONCEPTO	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIERC. B	MIERC. M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SABADO B	SABADO M	DOMINGO B	DOMINGO M
OPERACIÓN	El equipo cuenta con el guarda polea y el protector o guarda del disco.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Las tapas y/o las guardas cubren completamente las partes en movimiento del motor, poleas, y el disco.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	El uso de las guardas permite un buen funcionamiento del equipo.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	El uso de la tapa o protectores no interfiere en la operación del equipo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	La tapa cuenta con un sistema de seguridad que impida ser retirada en el momento de la operación.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Hoja de vida de la cortadora.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Las conexiones eléctricas de la Cortadora están completamente protegidas de la humedad.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	La conexión eléctrica cuenta con polo a tierra.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	El cableado de las conexiones eléctricas es recubierto en caucho y libre de abrasiones, cuenta con las clavijas de seguridad.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Las conexiones eléctricas están en cable encauchetado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	La conexión de la Cortadora se hace a un tablero que resista la capacidad de voltaje para el funcionamiento del equipo.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Se cuenta con sistema de humectación y/o irrigación para el disco y para el material.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	La ubicación de la cortadora esta fuera del área de izaje de cargas y/o de otras actividades.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Se conservan la distancia de seguridad respecto a las fuentes de energía (líneas eléctricas.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Se realiza y se mantiene el orden y aseo en el área de acción de la cortadora.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Esta la zona despejada, aislada y señalizada y solo se permite el acceso de del personal involucrado en la maniobra.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL	Estado General del Cable Electrico o de Potencia.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado General de la Carcasa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado General del Mango de Agarre	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado General del interruptor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado General del Disco	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado General de la Guarda	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la Prensa.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Otro:														
FIRMA	FIRMA OPERADOR														
	FIRMA SST														

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

HALLAZGOS:

ACCIONES INMEDIATAS:

ANEXO N° 09

REGISTRO DE EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS.









