los baños del primer piso, los encargados de primera infancia de la secretaria de integración social, solicitan sea aislada la zona del primer piso con una polisombra para garantizar que no se ingresen a las zonas en ejecución. igualmente se solicita a la sede realizar el respectivo embalaje y protección de los alimentos que ya se encuentran en obra. igualmente se hizo la aclaración que el contratista de obra no se hara cargo de posibles daños o contaminación de los alimentos, ya que se habra notificado de las actividades de pintura en la cocina. tiempo: soleado.

Duvan Tamayo
Interventoria

Continua fundida de mesón baño ornamental y pintura y remates en el area del comedor.

Entregado

Carol Forero González
Arquitecta

Viernes, 17 de enero de 2024.
Continuan actividades en los baños del primer piso, remate de pintura en comedor y pintura en cocina
Personal en obra: Residente de obra, Inspector de Obra, Auxiliar SST, 2 oficiales

Entregado

Carol Forero González
Arquitecta

Duvan Tamayo
interventoria

sabado, 18 de enero de 2025.

se continua con actividades de remates en comedor y cocina, se verifica la instalación de aparatos del segundo piso. se solicita al contratista limpiar las guardaescobas del comedor.
personal en obra: un oficial, un electrico, un inspector y SST.

Entregado

Duvan Tamayo
Interventoria

Continuan actividades de pintura en baños de segundo piso, instalación de sanitarios, aplicación granulito en mesones. Se realiza instalación de luminarias en comedor
Personal en obra: Residente de obra, Inspector obra, técnico electrico, 1 oficial

Entrado

Domingo Enero 19 de 2025
Se realiza pintura epóxica en baños del segundo piso, remate de pintura en área del comedor, se realiza instalacion de luminarias panel 120x30. Se realiza instalación de sanitarios.
Personal en obra: Residente de obra, Inspector de obra, tecnico eléctrico, 9 oficiales, 1 ayudante. Se presentan lluvias en la tarde.

Entrado

Carol Forero González
Arquitecta

Lunes 20 de enero de 2025
Continua instalación de luminarias en el primer piso (panel redondo, panel 120x30, emergencia), continua instalación de griferias y acoples. Se realizan actividades de remate en mesones de granito.
Personal en obra: Residente de obra, inspector de obra, técnico eléctrico. 3 oficiales.

Entrado

Carol Forero González
Arquitecta

Duvan Tarazo
Interventoría

Martes 21 de enero 2025
Se realiza recubrimiento de mesones en granito, instalación aparatos sanitarios, cambio de griferias, sello de ventanas lavandería.
Personal en obra: Residente de obra, inspecta de obra, sst, 3 oficiales

Entrado

Carol Forero González
Arquitecta

Miércoles 22 de enero 2025
Continua instalación de luminarias panel 120x30, redondo 18W embaquillado de sanitarios, cambio de griferias, instalación de sanitario adulto, asientos para sanitario y pintura epoxica.

Entrado

Carol Forero González

Jueves 23 de enero de 2025
Continuan actividades de pintura, hidrosanitarias, verificación de sanitarios y sifones, instalación reflectores
Personal en obra: Residente de obra, inspector de obra, sst, técnico eléctrico, 3 oficiales.

Enterado

Carol Forero González
Arquitecta

Viernes 24 de enero de 2025
Se realiza instalación de enchape blanco en áreas de lavacolas pulido de granito, instalación de luminarias herméticas, sello de griferia y sanitarios.

Enterado

Carol Forero González
Arquitecta

Sabado 25 de enero de 2025
Se realiza recorrido en compañía del Ing. Diwan Tamayo, por parte de la interventoria, se reciben observaciones frente a la pintura del comedor, las cuales seran subsanadas el lunes 27 de enero, se hace verificación de luminarias y aparatos sanitarios
Personal en obra: residente de obra, inspector de obra, sst, técnico electrico, 2 oficiales

Enterado

Carol Forero González

Lunes 27 de enero de 2025
Continuan actividades de pintura, llega a obra lavacoles en fibra de vidrio, continua enchape blanco, retiro de escombros.
Personal en obra: residente de obra, inspector de obra, sst, 2 oficiales

Enterado

Carol Forero González
Arquitecta

Scanned with CamScanner

SEDE: J.I Tintalito mis Primeras Pasos.

Contratista:

CONSORCIO OBRAS GT N° de Contrato: 9176-2024

Interventoria:

CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES N° de contrato: 9355-2024

Scanned with CamScanner

CONSORCIO OBRAS GT

NIT: 901886750-6

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS GT

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

CONTRATO DE OBRA No.: 9176 DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA: 9355 DE 2024

OBJETO: "REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DEL CUIDADO".

UNIDAD OPERATIVA: JARDIN INFANTIL TINTALITO

ING. GUSTAVO ADOLFO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

ING. CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ
REPRENTENTE LEGAL INTERVENTORIA

ING. ADRIANA VELANDIA
APOYO A LA SUPERVISION
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

Scanned with CamScanner

26/12/2024 SE DA INICIO DE ACTIVIDADES DE OBRA EN LA SEDE DEL JARDÍN INFANTIL TENTALITO MIS PRIMEROS PASOS.

ACTIVIDADES EJECUTADAS: DEMOLICIÓN DE CIELORRASO DEL SEGUNDO PISO, RETIRO DE ESTRUCTURA EN ALUMINIO DE CIELORRASO.

PERSONAL DE OBRA: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE TÉCNICO, 1 ELÉCTRICO, 1 INSPECTOR SST, 1 INSPECTOR TÉCNICO. 2 OFICIALES

MAQUINARIA Y EQUIPO: HERRAMIENTA MENOR

TIEMPO: SOLEADO 7 am a 3 pm LLUVIAS FUERTES 3 pm a 4 pm

R.O:



27/12/2024 ACTIVIDADES EJECUTADAS: RETIRO DE ESTRUCTURA EN ALUMINIO DE CIELORRASO

PERSONAL CONTRATISTA: 1 RESIDENTE TÉCNICO, 1 ELÉCTRICO, 1 INSPECTOR SST, 1 INSPECTOR TECNICO, 2 OFICIALES

PERSONAL INTERVENTORÍA: 1 INSPECTOR TÉCNICO.

MAQUINARIA Y EQUIPOS: HERRAMIENTA MENOR

TIEMPO: FAVORABLE 7 am a 4 pm

RO



08/01/25 ACTIVIDADES EJECUTADAS: ACOPIO DE MATERIAL DE DEMOLICIÓN DE CIELORRASO

PERSONAL CONTRATISTA: 1 INSPECTOR SST, 1 INSPECTOR TÉCNICO, 2 OFICIALES.

MAQUINARIA Y EQUIPOS: HERRAMIENTA MENOR

TIEMPO: MAÑANA: FAVORABLE.

09-01-25 Se realiza visita de subdireccion plantes fisicos, en donde se observa. desmonte de cielorasos, sistema electrico. Se recomienda proteger los piso dado el desmonte de los materiales, cualquier daño q' se presente al mismo, deberá ser subsanado x el contratista.

*Se evidencia avance en el retiro de cielo raso y suministro de materiales eléctricos.

*Por parte de la interventoría se recomienda realizar la protección de los pisos ya que se encuentran en caucho.

*Teniendo en cuenta que se va hacer el desmonte de cubierta, se solicita dar cumplimiento al procedimiento enviado, Todo el personal debe tener la dotación

Hugo Supervisor

y EPP correspondientes. y los Tejas desmontados deben embalarse para su disposición final.

Alex — Sisoma Interventoría

09/01/25 ACTIVIDADES EJECUTADAS: ACOPIO DE MATERIAL DE DEMOLICIÓN Y ESTRUCTURA DE CIELORASO

PERSONAL CONTRATISTA: 1 DIRECTOR DE OBRA, 1 RESIDENTE TÉCNICO, 1 INSPECTOR SST 1 INSPECTOR TÉCNICO, 2 OFICIALES

PERSONAL INTERVENTORIA: 1 DIRECTORA, 1 RESIDENTES, 1 RESIDENTE SST, 1 INSPECTORA SST.

MAQUINARIA Y EQUIPOS: HERRAMIENTA MENOR

TIEMPO: MAÑANA: FAVORABLE, TARDE: FAVORABLE.

OBSERVACIONES:

10/01/25 ACTIVIDADES EJECUTADAS: RETIRO COMPLETO DE CUBIERTA DEL 2DO PISO, DISPOSIÓN DE MATERIAL DE CUBIERTA, CIELORASO Y TUBERÍA ELECTRICA EN PVC A SITIO AUTORIZADO

PERSONAL DE CONTRATISTA: 1 RESIDENTE TÉCNICO, 1 INSPECTOR SST, 1 INSPECTOR TÉCNICO 3 OFICIALES DE OBRA.



MAQUINARIA Y EQUIPOS: HERRAMIENTA MENOR.

TIEMPO: MAÑANA: SOLEADO, TARDE: SOLEADO.

OBSERVACIONES:

La supervisión y esta interventoria le recuerda al contratista de obra que cualquier costo adicional que incurra en la prestación de servicio de la vigilancia de la institución, sera asumida por el contratista de obra. De igual manera si se presentan daños en el piso exutento del segundo piso por causa de las lluvias por el desmonte de la cubierta, y demas areas de la unidad operativa, seran responsabilidad del contratista de obra.

Supervisor SDIS — Interventoria

Se identifica personal en alturas no aprobado para esta actividad, por lo que se hará requerimiento de manera oficial y Se solicita al contratista el envio del registro fotografico de la actividad de desmonte y retiro de los tejas de asbesto - cemento.

SISOMA- INTERVENTORIA

Con base a la novedad que dió interventoria se hace correcaión de la actividad y se realizan labores acordes a la norma, cabe resaltar que el material de cubierta desmontado no era asbesto sino fibro-cemento. una aleación de material diferente.

INT SST — RO

11/01/2025	Actividades Ejecutadas: Limpieza de estructura existente y inicio de aplicación de primera capa de pintura en cerchas existentes. Personal del contratista: Residente tecnico obra, Inspector SST, 2 Pintores Tiempo: Sokado. en la jornada de trabajo. R.O: Sub[illegible] S. 
11-01-2025	Se realiza visita por parte de la supervision de interventoría por parte de la SDIS, observando q' no fue suministrada en sitio la cubierta para la sede. Se reportó por parte del contratista, q' el dia lunes llegaria a la obra los insumos para iniciar con la instalacion de elementos de apoyo y proceso de instalación. Nuevamente se le reuerda a la interventoria, q' cualquier costo adicional en daños de pisos, o estructura de la institucion, deberá ser asumido por el contratista, asi como los costos q' se lleguen a causar a la entidad por el suministro de mayor personal de vigilancia, quieren tendrán q' cuidar las zonas descubiertas (cubierta) a penas de tenerse cubierta con plastico. Para el dia lunes 13-01-2025, se requiere una comunicacion de la interventoria quien deberá informar del por que se desmonto la cubierta existente, sin contar en sitio con los nuevos elementos y por q' sólo hasta el dia lunes se programa el despacho. Asi mismo, los atrasos q' se esten presentando en la ejecucion. Apoyo SDIS. 

13-01-2024

Se realizo visita de seguimiento en la unidad operativo, observando pintura de cerchas instalacion de perfiles de cubierta. A la hora de la visita 3:30pm, no se tiene la instalacion de la cubierta nueva.

En cuanto a los perfiles nuevos q' apoyaran la cubierta, se requiere de la visita del ingeniero estructural de obra y de interventoria, dado q' la supervision de interventoria por parte de la SDIS, observa un posible riesgo, teniendo en cuta q' estos elementos estan simplemente apoyados en los muros, sin un minimo traslapo q' en el evento de un movimiento sismico, puede generar un posible riesgo a los niños niñas y comunidad educativa. Una vez se realice visita de los especialistas, se deberá dejar registro en bitacora, del proceso de anclaje q' permitan garantizar las condiciones estructurales y remitir los mismo a la entidad para su conocimiento.

supervisor SDIS.



Estado del clima: Soleado

Personal: cubierta 3 oberas, inspector obra, SST, residente obra, e interventoria.

Actividades ejecutadas: se realiza instalacion de perfiles en "C" de para reforzamiento de la cubierta.

Llego a la obra la cubierta, pero se revisa especificacion por parte de la supervision de interventoria SDIS observando q' esta no cumple con lo aprobado por la interventoria, observacion q' fue de igual forma, verificado por el residente de interventoria. Se solicita el desmonte de los tramos instalado y el cumplimiento en lo ofertado y aprobado.

supervisor Apoyo SDIS

Alex Interventoria.



14/01/2025	Se realiza el seguimiento del cambio de la cubierta, se realiza aseo inicial. Personal Obra: 1 Residente obra 1 Inspector 1 Ayudante Tiempo soleado. Alex P. R.O Sulu.S
15/01/2025	Se realiza el seguimiento del cambio de la cubierta se confirma entrega el dia 16-Enero-2025 Personal Obra 1 Inspector. Tiempo Soleado Alex P. R.O Sulu.S Estado
16-01-2025	Se realiza visita x parte de la supervision de SPF, observando el dismantel e instalación de la cubierta q' se instalo el lunes y q' se debió dsmontar. Se solicita Limpia y aseo, organizacion y plan de contingencia, teniendo en cuenta los atrasos q' se tienen segun programacion de obra, la cual deberá ser remitido por la interventoría. Estado Supervisor SDIS
	• Se realiza Visita por parte de la interventoria donde se verifica el espesor de las tejas determinando que esta comple con la especificaciones del contrato. Alex P.
	Actividades: Se realiza instalacion de la teja tipo Ecoroof con caballetes e instalacion de Flanches. R.O Sulu.S Tiempo Soleado. Alex P.
17/01/2025	Personal de obra: 2 ayudantes cubierta, residente de obra inspector SST. Actividades de obra: Se realiza sello de juntas de cubierta "Flanches" sobre el perimetro. Se realizo aseo de las aulas intervenidas. Tiempo: Soleado. R.O Sulu.S Observacion: Se solicita iniciar con las actividades electricas. Alex P. R.

20/01/25 Estado del clima: Soleado
Equipos y materiales: Herramienta menor
Personal obra: Director de obra, residente, inspector SST
Actividades: Se realiza recorrido de obra y se revisan las actividades pendientes por realizar, como es la intervención eléctrica, el contratista manifiesta que el día de hoy inicia intervención eléctrica del segundo piso y pintura de el Primer piso, se solicita revisar programación y adelantar actividades de obra atrasadas. RIO SST

20/01/25 ACTIVIDADES EJECUTADAS: SE INICIAN INTERVENCIONES DE LA RED ELECTRICA DEL SEGUNDO PISO, INSTALACIÓN DE TUBERIA METÁLICA EMT Y REPLANTEO DE LA MISMA. RIO SST

21/01/25 ACTIVIDADES EJECUTADAS: INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT Y CAJAS DE PASO, RESANE DE MUROS SALÓN PREJARDÍN SEGUNDO PISO.
PERSONAL CONTRATISTA: 1 INSPECTOR TÉCNICO, 1 ELECTRICO, 1 OFICIAL DE OBRA.
MAQUINARIA Y EQUIPOS: HERRAMIENTA MENOR, ANDAMIOS CERTIFICADOS
TIEMPO: MAÑANA: SOLEADO, TARDE: SOLEADO.
OBSERVACIONES. Se solicita contratista realizar aseo de las zonas intervenidas RO SST

22/01/25 ACTIVIDADES EJECUTADAS: INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT Y CAJAS DE PASO, RESANE DE MUROS SALÓN PREJARDÍN SEGUNDO PISO.
PERSONAL CONTRATISTA: 1 INSPECTOR TECNICO, 1 ELECTRICO, 1 OFICIAL DE OBRA
MAQUINARIA Y EQUIPO: HERRAMIENTA MENOR.
TIEMPO: MAÑANA: SOLEADO: TARDE SOLEADO.
OBSERVACIONES: RO SST

23/01/25 ACTIVIDADES EJECUTADAS: INSTALACIÓN DE CABLEADO ELECTRICO E INTERRUPTORES DE LUMINARIAS. RESANE DE MUROS SALÓN, PREJARDIN SEGUNDO PISO.
PERSONAL CONTRATISTA: 1 INSPECTOR TÉCNICO, 1 ELECTRICO, 1 OFICIAL DE OBRA
MAQUINARIA Y EQUIPO: HERRAMIENTA MENOR.
TIEMPO: MAÑANA: SOLEADO: TARDE: SOLEADO. RO SST

24/01/25 ACTIVIDADES EJECUTADAS: APLICACIÓN PAÑETE SOBRE MUROS PACA EMPATE DE SUBIECTA APLICACIÓN DE ESTUCO EN MUROS, RESANE DE MUROS SALÓN PREJARDIN Y DORMITORIO SEGUNDO PISO.
PERSONAL CONTRATISTA: 1 INSPECTOR TÉCNICO, 1 ELECTRICO, 1 OFICIAL DE OBRA.
MAQUINARIA Y EQUIPO: HERRAMIENTA MENOR, TIEMPO: MAÑANA FAVORABLE TARDE: SOLEADO.

Scanned with CamScanner

25/01/25	ACTIVIDADES EJECUTADAS: APLICACIÓN DE PAÑETE MUROS, APLICACION ESTUCO EN MUROS, RESANE DE FILAS EN SALÓN PREJARDIN Y DORMITORIO 2DO PISO PERSONAL CONTRATISTA: 1 INSPECTOR TECNICO, 2 OFICIALES DE OBRA. MAQUINARIA Y EQUIPO: HERRAMIENTA MENOR. TIEMPO: MAÑANA: FAVORABLE. OBSERVACIONES: Se solicita al contratista mayor rendimiento en las actividades a ejecutar
27/01/25	ACTIVIDADES EJECUTADAS: APLICACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA SOBRE MUROS EN SALÓN PREJARDÍN Y DORMITORIO 2DO PISO. PERSONAL CONTRATISTA: 1 INSPECTOR TÉCNICO, 2 OFICIALES DE OBRA. MAQUINARIA Y EQUIPO: HERRAMIENTA MENOR. TIEMPO: MAÑANA: FAVORABLE TARDE: SOLEADO OBSERVACIONES: En el salón de coordinación se observa que el muro en ladrillo a la vista se encuentra regatiado Se solicita al contratista ajustar o arreglar la observación
28/01/25	ACTIVIDADES EJECUTADAS: APLICACIÓN DE ESTUCO EN SALÓN DORMITORIO, RESANE DE MUROS COMEDOR 1er PISO, APLICACIÓN PAÑETE SALA COORDINACIÓN PERSONAL CONTRATISTA: 1 INSPECTOR TÉCNICO, 3 OFICIALES DE OBRA. MAQUINARIA Y EQUIPOS: HERRAMIENTA MENOR. TIEMPO: MAÑANA: FAVORABLE, TARDE: SOLEADO OBSERVACIONES:
29/01/25	ACTIVIDADES EJECUTADAS: APLICACIÓN DE PAÑETE SOBRE MUROS DE LA SALA DE COORDINACIÓN Y PUNTO FIJO, APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS DE SALÓN DE PREJARDIN. PERSONAL CONTRATISTA: 1 INSPECTOR TÉCNICO, 2 OFICIALES DE OBRA. MAQUINARIA Y EQUIPO: HERRAMIENTA MENOR TIEMPO: MAÑANA: FAVORABLE, TARDE: FAVORABLE.
30/01/25	. Se realiza visita a la sede jardin infantil Timbolito con el ingeniero electrico de la interventoria con el fin de revisar la instalación electricas, encontrandose lo siguiente: TABLERO ELECTRICO: * Armada tablero con interruptores enchufables de 20 Amperios, no esta conforme a la norma 2. Circuitos nuevos deben llevar la tierra independiente 3. No hay directorio actualizado

Scanned with CamScanner

SALIDAS ELECTRICAS:

1 Se debe dejar las tapas ciegas con prensa estopa en salidas de alumbrado.

2 El cable hacia las lampara debe ser encauchetado

3 Las derivaciones en cajas de alumbrado deben ser en conector en resorte.

En la visita no se visualizan luminarias instaladas las lamparas de emergencia deben llevar su toma-corriente.

Atte: Ing Alberto Giraldo
Residente Interventoria

Recibido
Ing Alejandro Garcia
Director de Obra

F.O

D. Interventoria

Alex
Interventoria

30/01/25 ACTIVIDADES EJECUTADAS: APLICACIÓN DE PAÑETE SOBRE MUROS SALA DE COORDINACIÓN APLICACIÓN DE PINTURA VINILO EN MUROS SALÓN DORMITORIO, INSTALACIÓN DE CIELO RASO SALA DE COORDINACIÓN Y BAÑO 2DO PISO.

PERSONAL CONTRATISTA: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE, 1 INSPECTOR, 3 OFICIALES DE OBRA

MAQUINARIA Y EQUIPOS: HERRAMIENTA MENOR

TIEMPO: MAÑANA: LLOVIZNA, TARDE: SOLEADO. F.O Alex

31/01/25 ACTIVIDADES EJECUTADAS: APLICACIÓN DE PAÑETE SOBRE MUROS SALA DE COORDINACIÓN, PINTURA DE MUROS EN DORMITORIO, PUNTO FIJO Y SALÓN PREPARADÍN INSTALACIÓN DE REJA DE SEGURIDAD CUBIERTA DE COCINA, RETIRO DE MALLA ESLABONADA CUBIERTA DE COCINA

PERSONAL CONTRATISTA: 1 RESIDENTE/1 INSPECTOR, 4 OFICIALES DE OBRA, 2 AYUDANTES

MAQUINARIA Y EQUIPOS: HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SOLDADURA

TIEMPO: LLOVIZNA: MAÑANA, TARDE: F.O Alex

01/02/25 ACTIVIDADES EJECUTADAS: APLICACIÓN ESTUCO SOBRE MUROS Y CIELORASO SALA DE COORDINACION, APLICACION PINTURA DE MUROS 1er y 2DO PISO.

PERSONAL CONTRATISTA: 1 INSPECTOR, 5 OFICIALES DE OBRA.

MAQUINARIA Y EQUIPOS: HERRAMIENTA MENOR

TIEMPO: MAÑANA: SOLEADO, TARDE: FAVORABK. F.O Alex

Scanned with CamScanner

03/02/25	ACTIVIDADES EJECUTADAS: APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA SOBRE MUROS 1er Y 2D. PISO, IMPERMEABILIZACIÓN PLACA DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PERSONAL CONTRATISTA: 1 INSPECTOR TÉCNICO, 4 OFICIALES DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO: HERRAMIENTA MENOR TIEMPO: MAÑANA: SOLEADO, TARDE: SOLEADO.
04/02/25	ACTIVIDADES EJECUTADAS: APLICACION PINTURA VINILO Y PINTURA EPOXICA 1er y 2DO PISO, APLICACIÓN MANTO ASFALTICO PLACA TANQUE. INSTALACIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO, PINTURA DE MARCOS VENTANAS MAQUINARIA Y EQUIPO: HERRAMIENTA MENOR TIEMPO: MAÑANA: SOLEADO, TARDE: SOLEADO
05/02/25	ACTIVIDADES EJECUTADAS: ACTIVIDADES DE RESANE DE MUROS EN COMEDOR 1er PISO Y DORMITORIO 2DO PISO, PINTURA DE PUERTA INTERIOR Y MARCOS DE COMEDOR. PERSONAL CONTRATISTA: 1 INSPECTOR TÉCNICO, 2 OFICIALES DE OBRA. 1 SST HERRAMIENTA Y EQUIPO: HERRAMIENTA MENOR. TIEMPO: MAÑANA: FAVORABLE, TARDE: LLUVIA
06/02/25	ACTIVIDADES EJECUTADAS: RESANE DE MUROS SALÓN PREJARDÍN, DORMITORIO Y SALA DE COORDINACIÓN 2DO PISO, APLICACION DE PINTURA EPOXICA 2DO PISO PERSONAL CONTRATISTA: 1 INSPECTOR SST, 1 INSPECTOR TI, 2 OFICIALES DE OBRA. MAQUINARIA Y EQUIPO: HERRAMIENTA MENOR TIEMPO: MANANA: SOLEADO, TARDE: FAVORABLE
07/02/25	ACTIVIDADES EJECUTADAS: RESANE DE MUROS SALONES Y PASILLO 2DO PISO APLICACIÓN PINTURA VINILO Y EPOXICA MUROS 2DO PISO. PERSONAL CONTRATISTA: 1 INSPECTOR SST, 1 INSPECTOR TI, 3 OFICIALES DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO: HERRAMIENTA MENOR TIEMPO: MAÑANA: SOLEADO TARDE: SOLEADO
08/02/25	ACTIVIDADES EJECUTADAS: RESANE DE MUROS PASILLO 2DO PISO Y PUNTO FIJO, APLICACIÓN PINTURA VINILO SALA COORDINACIÓN Y PASILLO PERSONAL CONTRATISTA: 1 INSPECTOR SST, 1 INSPECTOR TI, 2 OFICIALES DE OBRA MAQUINARIA Y EQUIPO: HERRAMIENTA MENOR TIEMPO: MAÑANA: FAVORABLE, TARDE: FAVORABLE
10/02/25	ACTIVIDADES EJECUTADAS: APLICACIÓN PINTURA EPOXICA SALA DE COORDINACIÓN APLICACIÓN DE ESMALTE SOBRE BARANDA PUNTO FIJO Y VENTANAS 2DO PISO PERSONAL CONTRATISTA: 1 INSPECTOR SST, 1 INSPECTOR TI, 1 OFICIAL DE OBRA MAQUINARIA Y EQUIPO: HERRAMIENTA MENOR TIEMPO: MAÑANA: SOLEADO TARDE: FAVORABLE

11/02/25 ACTIVIDADES EJECUTADAS: APLICACIÓN PINTURA ESMALTE SOBRE MARCOS DE PUERTAS Y VENTANAS 2DO PISO, APLICACIÓN VINILO SALONE 2DO PISO
PERSONAL CONTRATISTA: 1 INSPECTOR TÉCNICO, 1 OFICIAL DE OBRA
HERRAMIENTA Y EQUIPO: HERRAMIENTA MENOR
TIEMPO: MAÑANA FAVORABLE TARDE: FAVORABLE RO

12/02/25 ACTIVIDADES EJECUTADAS: APLICACIÓN PINTURA EPÓXICA SALONES 2DO PISO APLICACIÓN ESMALTE SOBRE VENTANAS SEGUNDO PISO
PERSONAL CONTRATISTA: 1 INSPECTOR TÉCNICO, 1 OFICIAL DE OBRA.
MAQUINARIA Y EQUIPO: HERRAMIENTA MENOR.
TIEMPO: MAÑANA: FAVORABLE, TARDE: LLUVIA MODERADA. RO

13/02/25 ACTIVIDADES EJECUTADAS: APLICACIÓN PINTURA ESMALTE SOBRE PUERTAS EXTERIORES FACHADA SECUNDARIA.
PERSONAL CONTRATISTA: 1 INSPECTOR TÉCNICO, 1 OFICIAL DE OBRA.
MAQUINARIA Y EQUIPO: HERRAMIENTA MENOR.
TIEMPO: MAÑANA: FAVORABLE, TARDE:

. Se realiza visita por parte de la Interventoría verificando detalles finales de obra en la 1ª y 2ª planta, donde se le recomienda al contratista repasos finales y limpieza en general, se evidencia trabajos respecto a la pintura de las puertas metálicas para el ingreso a la sede.

Enterado en el acompañamiento a la obra

Ing Alejandro Gordo M
Director de Obra

14/02/25. observaciones: se debe realizar limpieza de guarda escobas. se debe realizar la limpieza de los tejas manchado de mortero y pintura. se debe realizar limpieza de tubería eléctrica y cajas, ya que están manchadas de pintura, se debe realizar la limpieza y retoques de la ventana del 2do numero 2, ya que se ensucio al momento de realizar el cambio de la cubierta.
personal en obra: un residente, inspector SST, un ayudante y un oficial.
Actividades de obra: cambio de cubierta de cocina y conciliación de cantidades de obra para acta No. 2

Devon Tamayo
Interventoría

R.O

14/02/2025	ACTIVIDADES EJECUTADAS: RETIRO DE TEJA SOBRE LA COCINA, INSTALACIÓN TEJA TERMOACUSTICA, APLICACIÓN PINTURA ESMALTE SOBRE PUERTAS EXTERIORES. PERSONAL CONTRATISTA: 1 RESIDENTE, 1 INSPECTOR, 2 OFICIALES, 1 SST. MAQUINARIA Y EQUIPO: HERRAMIENTA MENOR. TIEMPO: MAÑANA: FAVORABLE, TARDE: FAVORABLE. Duvan Tamayo Interventoria.
15/02/2025	ACTIVIDADES EJECUTADAS: APLICACIÓN PINTURA EPOXICA SOBRE MUROS 2DO PISO, APLICACION ESMALTE SOBRE VENTANAS EXTERIORES. PERSONAL CONTRATISTA: 1 INSPECTOR SST, 1 INSPECTOR T., 2 OFICIALES. TIEMPO: MAÑANA: FAVORABLE. Duvan Tamayo Interventoria SST Interventoria
17/02/2025	ACTIVIDADES EJECUTADAS: APLICACIÓN PINTURA SOBRE FACHADA PRINCIPAL RESANE DE MUROS SALÓN 1er PISO. PERSONAL CONTRATISTA: 1 RESIDENTE, 1 SST, 2 OFICIALES. MAQUINARIA Y EQUIPO: HERRAMIENTA MENOR, ANDAMIO CERTIFICADO. TIEMPO: MAÑANA: FAVORABLE, TARDE: LLUVIAS FUERTES. 3PM Duvan Tamayo Interventoria
18/02/25	ACTIVIDADES EJECUTADAS: IMPERMEABILIZACIÓN DE CANALES EN LA CUBIERTA RESANE DE MUROS DE LA COCINA, PINTURA DE CIELORRASO BAÑO 1er PISO. PERSONAL CONTRATISTA: 1 INSPECTOR SST, 1 INSPECTOR TÉCNICO, 2 OFICIALES DE OBRA MAQUINARIA Y EQUIPO: ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTA MENOR. TIEMPO: MAÑANA FAVORABLE, TARDE: LLOVIZNA. Duvan Tamayo Interventoria. SST Interventoria
19-02-25.	Se hace inspección del área SST y ambiental, encontrando todo en Orden. SSTMA Interventoria.

SE REALIZA VISITA DEL ESPECIALISTA ESTRUCTURAL Y SE PRESENTAN LOS SIGUIENTES COMENTARIOS.

1. SE MANTUVIERON LAS CORREAS EXISTENTES Y SE INSTALÓ UNA CORREA INTERMEDIA COMO REQUISITO DE APOYO DE LA TEJA. NO SE EVIDENCIAN DEFORMACIONES QUE INDIQUEN UN INADECUADO COMPORTAMIENTO.
2. SE RECOMIENDA REFORZAR LA CONEXIÓN DE LAS CORREAS MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE UNA "MENSULA" CONFORMADA POR UN ÁNGULO.

Se realiza visita Tecnica de especialista Estructural, revisan de tanque nuevo e instalación sin novedad, dentando pruebas sin observaciones. 20/02/25 Juan Cubillos

MP. 68202108602STD
ESP. ESTRUCTURAL

19/02/25 ACTIVIDADES EJECUTADAS: IMPERMEABILIZACIÓN DE CANALES CUBIERTA DE COCINA RESANE DE MUROS COCINA, INSTALACIÓN DE FLANCHES CUBIERTA DE COCINA
PERSONAL CONTRATISTA: 1 RESIDENTE, 1 INSPECTOR SST, 1 INSPECTOR T, 2 OFICIALES
MAQUINARIA Y EQUIPO: ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTA MENOR.
TIEMPO: MAÑANA: FAVORABLE, TARDE: LLOVIZNA. RO SdS

20/02/25 ACTIVIDADES EJECUTADAS: INSTALACIÓN DE FLANCHES CUBIERTA DE COCINA RESANE DE MUROS COCINA, PINTURA DE FACHADA.
PERSONAL CONTRATISTA: 1 RESIDENTE, 1 INSPECTOR SST, 1 INSPECTOR T, 2 OFICIALES.
MAQUINARIA Y EQUIPO: ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTA MENOR.
TIEMPO: MAÑANA: FAVORABLE, TARDE: FAVORABLE. RO SdS

21/02/25 ACTIVIDADES EJECUTADAS: RESANE DE MUROS DE FACHADA, PINTURA DE FACHADA APLICACIÓN VINILO EN LA COCINA.
PERSONAL CONTRATISTA: RO SdS

21/02/25 Tentelito
Se revisan los puntos nuevos de luminarias & Puntos de manera correcta, las tomas se revisan y se identifican los breakers, se encuentran 2 circuitos los cuales estan identificados para cada zona, las cargas y distribución son correctas.

RO SdS
Ing. Electricista.

se realiza visita por parte de interventoria y se realiza las siguientes observaciones:
fachada: se debe realizar limpieza de ladrillos manchados con pintura. hace falta una mano de pintura en puerta principal
Aula primer piso: se solicita cubrir piso ya que estan manchados, los guarda escobas se encuentran manchados con pintura y estuco.
terminar pintura en el primer piso, se debe realizar pintura y aseo en todo el primer piso.
segundo piso: limpieza de guarda escoba, se debe instalar nuevamente la reja de la cocina, se debe retocar nuevamente los muros del aula de preescolar. se debe realizar limpieza piso, cerchas y tejas que se encuentran sucios.
se debe limpiar tuberia de puntos electricos.

se solicita una cuadrilla de aseo y retoques en tintalito y en la localidad de Kennedy en general.
se debe redirar y recotar las baldosas de la escalera.

D. Interventoría.

Diana Tamayo
Interventora

22/02/25	ACTIVIDADES EJECUTADAS: APLICACIÓN PINTURA EN GUARDAESCOBAS Y ESQUINEROS, APLICACIÓN ESMALTE SOBRE BARANDAS, ASEO GENERAL PERSONAL CONTRATISTA: 1 RESIDENTE, 1 INSPECTOR, 2 OFICIALES MAQUINARIA Y EQUIPOS: HERRAMIENTA MENOR. TIEMPO: MAÑANA: FAVORABLE, TARDE: LLUVIAS FUERTES.
23/02/25	ACTIVIDADES EJECUTADAS: APLICACIÓN PINTURA CUARTO LAVANDERIA PINTURA ESQUINEROS Y GUARDA ESCOBAS. PERSONAL CONTRATISTA: 1 INSPECTOR, 2 OFICIALES TIEMPO: MAÑANA FAVORABLE, TARDE:

CONSOLIDADO DE INFORMES SEMANALES

1. FECHA ELABORACIÓN:	11	12	24	2. No. INFORME	1	3. SEMANA No.	11/12/24 al 15/12/24	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDE CASA JUVENTUD ALDEA DE PENSADORES			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	KRA 88A 69B 61			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$	1.299.753.000
9. FECHA ACTA INICIO:	11 / 12 / 24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	11. PLAZO:	31 de diciembre	Meses/días
VV 12. PRORROGAS:	N/A	13. SUSPENSIONES:			Meses/días	14. ADICIONES:	$	-
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO							
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$	284.642.402
20. FECHA ACTA INICIO:	11 / 12 / 24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	22. PLAZO:	31 de diciembre	Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A	24. SUSPENSIONES:			Meses/días	25. ADICIONES:	$	-
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES							
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,0%	2,0%	Se realizaron actividades administrativas.	
CIMENTACION	0,0%	0,0%		
MAMPOSTERIA	0,0%	0,0%		
INSTALACIONES ELECTRICAS	0,0%	0,0%		
PAÑETE Y PINTURA	0,0%	0,0%		
CUBIERTAS	0,0%	0,0%		
ASEO Y DISPOSICION FINAL	0,0%	0,0%		
TOTAL	0,0%	2,0%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	0,0%	0,0%	0,0%
Durante el periodo	2,0%	0,0%	2,0%
Acumulado Actual	2,0%	0,0%	2,0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0,0%	0,0%
Valor de la Obra Programada	$ -	$ -

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	2,0%	2,0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 2.617.486,85	$ 2.617.486,85

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

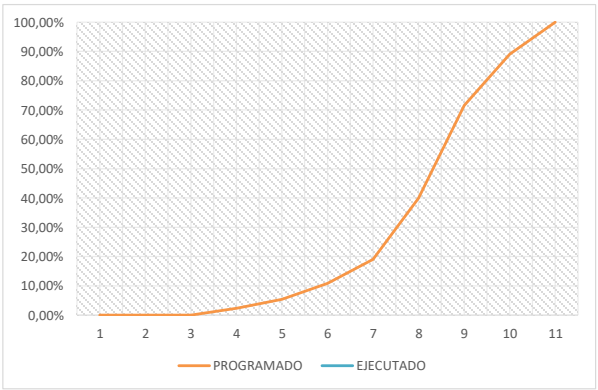

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
ALMACENISTA	0			LUNES	L
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	0			MARTES	L
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIERCOLES	F
MAESTRO	0			JUEVES	F
OFICIAL	0			VIERNES	F
AYUDANTE	0			SÁBADO	F
RESIDENTE	1		1	LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se relizaron actividades administrativas como revisión de información contrual del contrato.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realiza visita de campo a cada uno de los frentes de obra, asi mismo se realizan mesas de trabajo conjuntas para la verificacion y ajuste de los presupuestos iniciales y elaboracion de diagnosticos.
El porcentaje de ejecución obedece al tiempo en el cual se han realizado para la elaboracion de presupuestos y diagnosticos de las 13 sedes a intervenir.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	11	12	24	2. No. INFORME	1	3. SEMANA No.	11/12/24 al 15/12/24	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDE CENTRO LUZ ESPERANZA			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	CL 63L 124 - 38			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000	
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	11. PLAZO: 31 de diciembre Meses/días
VV								
12. PRORROGAS:	N/A	13. SUSPENSIONES:		Meses/días	14. ADICIONES:	$ -		
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO							
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.642.402	
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	22. PLAZO: 31 de diciembre Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A	24. SUSPENSIONES:		Meses/días	25. ADICIONES:	$ -		
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES							
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,0%	2,0%	Se realizaron actividades administrativas.	
CIMENTACION	0,0%	0,0%		
MAMPOSTERIA	0,0%	0,0%		
INSTALACIONES ELECTRICAS	0,0%	0,0%		
PAÑETE Y PINTURA	0,0%	0,0%		
CUBIERTAS	0,0%	0,0%		
ASEO Y DISPOSICION FINAL	0,0%	0,0%		
TOTAL	0,0%	2,0%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	0,0%	0,0%	0,0%
Durante el periodo	2,0%	0,0%	2,0%
Acumulado Actual	2,0%	0,0%	2,0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0,0%	0,0%
Valor de la Obra Programada	$ -	$ -

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	2,0%	2,0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 2.400.000,00	$ 2.400.000,00

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

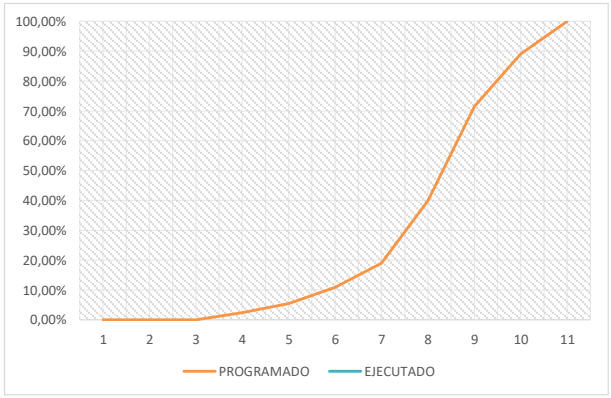

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
ALMACENISTA	0			LUNES	L
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	0			MARTES	L
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIERCOLES	F
MAESTRO	0			JUEVES	F
OFICIAL	0			VIERNES	F
AYUDANTE	0			SÁBADO	F
RESIDENTE	1		1	LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se relizaron actividades administrativas como revisión de información contrual del contrato.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realiza visita de campo a cada uno de los frentes de obra, asi mismo se realizan mesas de trabajo conjuntas para la verificacion y ajuste de los presupuestos iniciales y elaboracion de diagnosticos.
El porcentaje de ejecución obedece al tiempo en el cual se han realizado para la elaboracion de presupuestos y diagnosticos de las 13 sedes a intervenir.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	11	12	24	2. No. INFORME	1	3. SEMANA No.	11/12/24 al 15/12/24	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDE JARDÍN INFANTIL ENGATIVÁ			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	CL 66B 122-03			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000	
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	11. PLAZO: 31 de diciembre Meses/días
VV								
12. PRORROGAS:	N/A	13. SUSPENSIONES:		Meses/días	14. ADICIONES:	$ -		
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO							
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.642.402	
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	22. PLAZO: 31 de diciembre Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A	24. SUSPENSIONES:		Meses/días	25. ADICIONES:	$ -		
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES							
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,0%	2,0%	Se realizaron actividades administrativas.	
CIMENTACION	0,0%	0,0%		
MAMPOSTERIA	0,0%	0,0%		
INSTALACIONES ELECTRICAS	0,0%	0,0%		
PAÑETE Y PINTURA	0,0%	0,0%		
CUBIERTAS	0,0%	0,0%		
ASEO Y DISPOSICION FINAL	0,0%	0,0%		
TOTAL	0,0%	2,0%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	0,0%	0,0%	0,0%
Durante el periodo	2,0%	0,0%	2,0%
Acumulado Actual	2,0%	0,0%	2,0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0,0%	0,0%
Valor de la Obra Programada	$ -	$ -

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	2,0%	2,0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ -	$ -

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

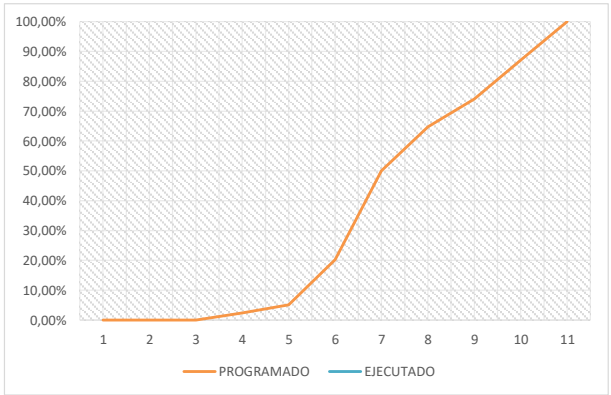

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
ALMACENISTA	0			LUNES	L
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	0			MARTES	L
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIERCOLES	F
MAESTRO	0			JUEVES	F
OFICIAL	0			VIERNES	F
AYUDANTE	0			SÁBADO	F
RESIDENTE	1		1	LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se relizaron actividades administrativas como revisión de información contrual del contrato.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realiza visita de campo a cada uno de los frentes de obra, asi mismo se realizan mesas de trabajo conjuntas para la verificacion y ajuste de los presupuestos iniciales y elaboracion de diagnosticos.

El porcentaje de ejecución obedece al tiempo en el cual se han realizado para la elaboracion de presupuestos y diagnosticos de las 13 sedes a intervenir.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	11	12	24	2. No. INFORME	1	3. SEMANA No.	11/12/24 al 15/12/24	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDE JARDÍN INFANTIL LOS SAUCES			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	CL 69 121-29			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000	
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	11. PLAZO: 31 de diciembre Meses/días
VV								
12. PRORROGAS:	N/A	13. SUSPENSIONES:		Meses/días	14. ADICIONES:	$ -		
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO							
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.642.402	
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	22. PLAZO: 31 de diciembre Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A	24. SUSPENSIONES:		Meses/días	25. ADICIONES:	$ -		
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES							
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,0%	2,0%	Se realizaron actividades administrativas.	
CIMENTACION	0,0%	0,0%		
MAMPOSTERIA	0,0%	0,0%		
INSTALACIONES ELECTRICAS	0,0%	0,0%		
PAÑETE Y PINTURA	0,0%	0,0%		
CUBIERTAS	0,0%	0,0%		
ASEO Y DISPOSICION FINAL	0,0%	0,0%		
TOTAL	0,0%	2,0%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	0,0%	0,0%	0,0%
Durante el periodo	2,0%	0,0%	2,0%
Acumulado Actual	2,0%	0,0%	2,0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0,0%	0,0%
Valor de la Obra Programada	$ -	$ -

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	2,0%	2,0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 2.397.063,21	$ 2.397.063,21

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

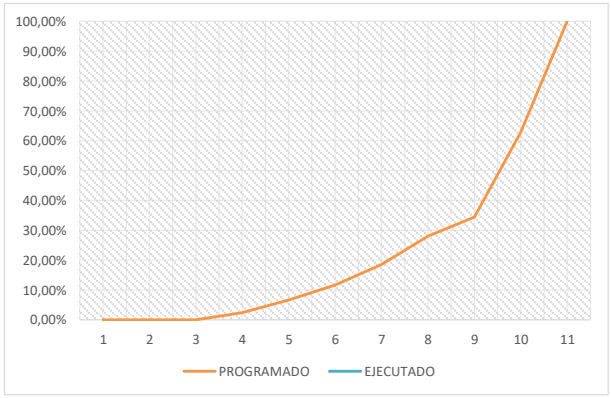

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
ALMACENISTA	0			LUNES	L
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	0			MARTES	L
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIERCOLES	F
MAESTRO	0			JUEVES	F
OFICIAL	0			VIERNES	F
AYUDANTE	0			SÁBADO	F
RESIDENTE	1		1	LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se relizaron actividades administrativas como revisión de información contrual del contrato.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realiza visita de campo a cada uno de los frentes de obra, asi mismo se realizan mesas de trabajo conjuntas para la verificacion y ajuste de los presupuestos iniciales y elaboracion de diagnosticos.

El porcentaje de ejecución obedece al tiempo en el cual se han realizado para la elaboracion de presupuestos y diagnosticos de las 13 sedes a intervenir.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	11	12	24	2. No. INFORME	1	3. SEMANA No.	11/12/24 al 15/12/24	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	CASA DE PENSAMIENTO INTERCULTURAL SHUSH UREK			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	DIAGONAL 15D #98-40			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024			7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO: $ 1.299.753.000
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	11. PLAZO: 31 de diciembre Meses/días
VV 12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:		Meses/días		14. ADICIONES: $ -
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO							
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024			18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO: $ 284.642.402
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	22. PLAZO: 31 de diciembre Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:		Meses/días		25. ADICIONES: $ -
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES							
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,0%	2,0%	Se realizaron actividades administrativas.	
CIMENTACION	0,0%	0,0%		
MAMPOSTERIA	0,0%	0,0%		
INSTALACIONES ELECTRICAS	0,0%	0,0%		
PAÑETE Y PINTURA	0,0%	0,0%		
CUBIERTAS	0,0%	0,0%		
ASEO Y DISPOSICION FINAL	0,0%	0,0%		
TOTAL	0,0%	2,0%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	0,0%	0,0%	0,0%
Durante el periodo	2,0%	0,0%	2,0%
Acumulado Actual	2,0%	0,0%	2,0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0,0%	0,0%
Valor de la Obra Programada	$ -	$ -

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	2,0%	2,0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 1.217.145,18	$ 1.217.145,18

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

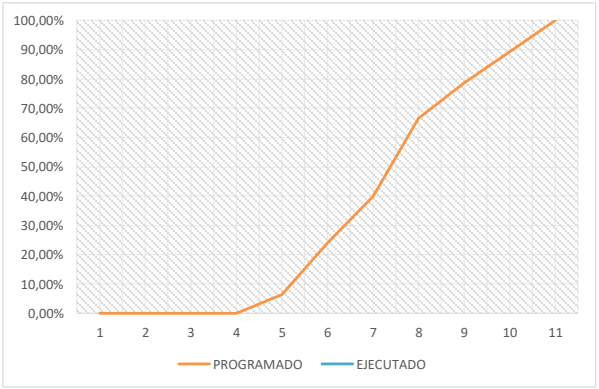

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
ALMACENISTA	0			LUNES	L
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	0			MARTES	L
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIERCOLES	F
MAESTRO	0			JUEVES	F
OFICIAL	0			VIERNES	F
AYUDANTE	0			SÁBADO	F
RESIDENTE	1		1	LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se relizaron actividades administrativas como revisión de información contrual del contrato.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realiza visita de campo a cada uno de los frentes de obra, asi mismo se realizan mesas de trabajo conjuntas para la verificacion y ajuste de los presupuestos iniciales y elaboracion de diagnosticos.
El porcentaje de ejecución obedece al tiempo en el cual se han realizado para la elaboracion de presupuestos y diagnosticos de las 13 sedes a intervenir.



Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	11	12	24	2. No. INFORME	1	3. SEMANA No.	11/12/24 al 15/12/24	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	CENTRO CRECER FONTIBON			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	CALLE 22F #106-26			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024			7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO: $ 1.299.753.000
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	11. PLAZO: 31 de diciembre Meses/días
VV 12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:				Meses/días 14. ADICIONES: $ -
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO							
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024			18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO: $ 284.642.402
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	22. PLAZO: 31 de diciembre Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:				Meses/días 25. ADICIONES: $ -
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES							
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,0%	2,0%	Se realizaron actividades administrativas.	
CIMENTACION	0,0%	0,0%		
MAMPOSTERIA	0,0%	0,0%		
INSTALACIONES ELECTRICAS	0,0%	0,0%		
PAÑETE Y PINTURA	0,0%	0,0%		
CUBIERTAS	0,0%	0,0%		
ASEO Y DISPOSICION FINAL	0,0%	0,0%		
TOTAL	0,0%	2,0%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	0,0%	0,0%	0,0%
Durante el periodo	2,0%	0,0%	2,0%
Acumulado Actual	2,0%	0,0%	2,0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0,0%	0,0%
Valor de la Obra Programada	$ -	$ -

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	2,0%	2,0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 437.538,71	$ 437.538,71

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

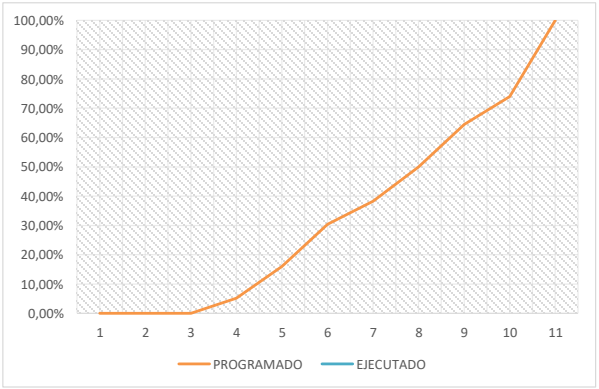

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
ALMACENISTA	0			LUNES	L
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	0			MARTES	L
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIERCOLES	F
MAESTRO	0			JUEVES	F
OFICIAL	0			VIERNES	F
AYUDANTE	0			SÁBADO	F
RESIDENTE	1		1	LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se relizaron actividades administrativas como revisión de información contrual del contrato.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realiza visita de campo a cada uno de los frentes de obra, asi mismo se realizan mesas de trabajo conjuntas para la verificacion y ajuste de los presupuestos iniciales y elaboracion de diagnosticos.

El porcentaje de ejecución obedece al tiempo en el cual se han realizado para la elaboracion de presupuestos y diagnosticos de las 13 sedes a intervenir.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	11	12	24	2. No. INFORME	1	3. SEMANA No.	11/12/24 al 15/12/24	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDÍN INFANTIL OSO DE ANTEOJOS			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	CARRERA 100 #23-22			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000	
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	11. PLAZO: 31 de diciembre Meses/días
VV								
12. PRORROGAS:	N/A	13. SUSPENSIONES:		Meses/días	14. ADICIONES:	$ -		
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO							
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.642.402	
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	22. PLAZO: 31 de diciembre Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A	24. SUSPENSIONES:		Meses/días	25. ADICIONES:	$ -		
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES							
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,0%	2,0%	Se realizaron actividades administrativas.	
CIMENTACION	0,0%	0,0%		
MAMPOSTERIA	0,0%	0,0%		
INSTALACIONES ELECTRICAS	0,0%	0,0%		
PAÑETE Y PINTURA	0,0%	0,0%		
CUBIERTAS	0,0%	0,0%		
ASEO Y DISPOSICION FINAL	0,0%	0,0%		
TOTAL	0,0%	2,0%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	0,0%	0,0%	0,0%
Durante el periodo	2,0%	0,0%	2,0%
Acumulado Actual	2,0%	0,0%	2,0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0,0%	0,0%
Valor de la Obra Programada	$ -	$ -

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	2,0%	2,0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 1.847.808,03	$ 1.847.808,03

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

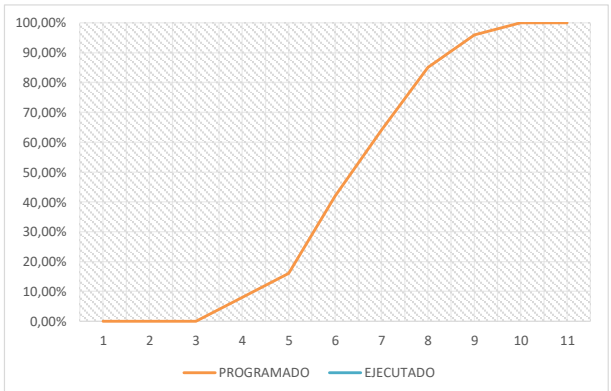

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
ALMACENISTA	0			LUNES	L
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	0			MARTES	L
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIERCOLES	F
MAESTRO	0			JUEVES	F
OFICIAL	0			VIERNES	F
AYUDANTE	0			SÁBADO	F
RESIDENTE	1		1	LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se relizaron actividades administrativas como revisión de información contrual del contrato.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realiza visita de campo a cada uno de los frentes de obra, asi mismo se realizan mesas de trabajo conjuntas para la verificacion y ajuste de los presupuestos iniciales y elaboracion de diagnosticos.
El porcentaje de ejecución obedece al tiempo en el cual se han realizado para la elaboracion de presupuestos y diagnosticos de las 13 sedes a intervenir.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	11	12	24	2. No. INFORME	1	3. SEMANA No.	11/12/24 al 15/12/24	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDÍN INFANTIL SABANA GRANDE			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	CARRERA 106 #15A-32			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024			7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO: $ 1.299.753.000
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	11. PLAZO: 31 de diciembre Meses/días
VV 12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:		Meses/días		14. ADICIONES: $ -
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO							
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024			18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO: $ 284.642.402
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	22. PLAZO: 31 de diciembre Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:		Meses/días		25. ADICIONES: $ -
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES							
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,0%	2,0%	Se realizaron actividades administrativas.	
CIMENTACION	0,0%	0,0%		
MAMPOSTERIA	0,0%	0,0%		
INSTALACIONES ELECTRICAS	0,0%	0,0%		
PAÑETE Y PINTURA	0,0%	0,0%		
CUBIERTAS	0,0%	0,0%		
ASEO Y DISPOSICION FINAL	0,0%	0,0%		
TOTAL	0,0%	2,0%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	0,0%	0,0%	0,0%
Durante el periodo	2,0%	0,0%	2,0%
Acumulado Actual	2,0%	0,0%	2,0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0,0%	0,0%
Valor de la Obra Programada	$ -	$ -

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	2,0%	2,0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 2.511.017,59	$ 2.511.017,59

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

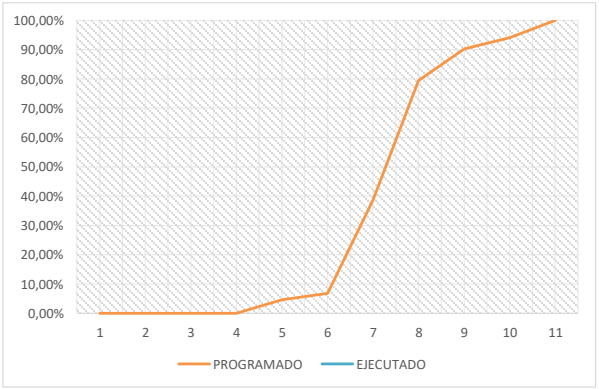

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
ALMACENISTA	0			LUNES	L
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	0			MARTES	L
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIERCOLES	F
MAESTRO	0			JUEVES	F
OFICIAL	0			VIERNES	F
AYUDANTE	0			SÁBADO	F
RESIDENTE	1		1	LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se relizaron actividades administrativas como revisión de información contrual del contrato.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realiza visita de campo a cada uno de los frentes de obra, asi mismo se realizan mesas de trabajo conjuntas para la verificacion y ajuste de los presupuestos iniciales y elaboracion de diagnosticos.
El porcentaje de ejecución obedece al tiempo en el cual se han realizado para la elaboracion de presupuestos y diagnosticos de las 13 sedes a intervenir.



Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	11	12	24	2. No. INFORME	1	3. SEMANA No.	11/12/24 al 15/12/24	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	CENTRO CRECER CAMPO ALEGRE CALANDAIMA			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	KR 88 # 6A – 36			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000	
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	11. PLAZO: 31 de diciembre Meses/días
VV								
12. PRORROGAS:	N/A	13. SUSPENSIONES:		Meses/días	14. ADICIONES:	$ -		
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO							
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.642.402	
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	22. PLAZO: 31 de diciembre Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A	24. SUSPENSIONES:		Meses/días	25. ADICIONES:	$ -		
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES							
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,0%	2,0%	Se realizaron actividades administrativas.	
CIMENTACION	0,0%	0,0%		
MAMPOSTERIA	0,0%	0,0%		
INSTALACIONES ELECTRICAS	0,0%	0,0%		
PAÑETE Y PINTURA	0,0%	0,0%		
CUBIERTAS	0,0%	0,0%		
ASEO Y DISPOSICION FINAL	0,0%	0,0%		
TOTAL	0,0%	2,0%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	0,0%	0,0%	0,0%
Durante el periodo	2,0%	0,0%	2,0%
Acumulado Actual	2,0%	0,0%	2,0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0,0%	0,0%
Valor de la Obra Programada	$ -	$ -

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	2,0%	2,0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 2.305.397,63	$ 2.305.397,63

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

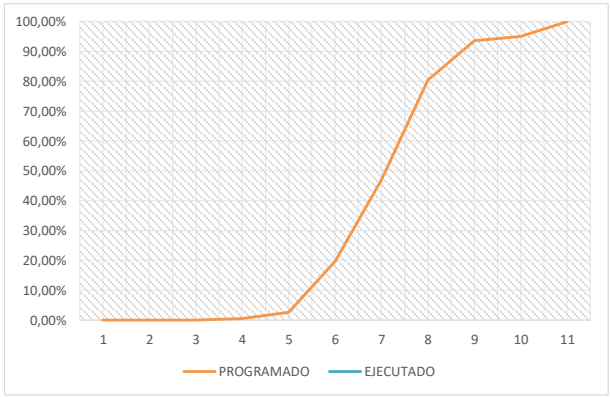

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
ALMACENISTA	0			LUNES	L
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	0			MARTES	L
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIERCOLES	F
MAESTRO	0			JUEVES	F
OFICIAL	0			VIERNES	F
AYUDANTE	0			SÁBADO	F
RESIDENTE	1		1	LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se relizaron actividades administrativas como revisión de información contrual del contrato.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realiza visita de campo a cada uno de los frentes de obra, asi mismo se realizan mesas de trabajo conjuntas para la verificacion y ajuste de los presupuestos iniciales y elaboracion de diagnosticos.
El porcentaje de ejecución obedece al tiempo en el cual se han realizado para la elaboracion de presupuestos y diagnosticos de las 13 sedes a intervenir.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	11	12	24	2. No. INFORME	1	3. SEMANA No.	11/12/24 al 15/12/24
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO KENNEDY			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	AK 80 # 43-43 SUR		

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000			
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	11. PLAZO:	31 de diciembre	Meses/días
VV										
12. PRORROGAS:	N/A	13. SUSPENSIONES:		Meses/días	14. ADICIONES:	$ -				
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO									
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT									
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.642.402			
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	22. PLAZO:	31 de diciembre	Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A	24. SUSPENSIONES:		Meses/días	25. ADICIONES:	$ -				
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES									
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA									

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,0%	2,0%	Se realizaron actividades administrativas.	
CIMENTACION	0,0%	0,0%		
MAMPOSTERIA	0,0%	0,0%		
INSTALACIONES ELECTRICAS	0,0%	0,0%		
PAÑETE Y PINTURA	0,0%	0,0%		
CUBIERTAS	0,0%	0,0%		
ASEO Y DISPOSICION FINAL	0,0%	0,0%		
TOTAL	0,0%	2,0%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	0,0%	0,0%	0,0%
Durante el periodo	2,0%	0,0%	2,0%
Acumulado Actual	2,0%	0,0%	2,0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0,0%	0,0%
Valor de la Obra Programada	$ -	$ -

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	2,0%	2,0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 1.514.342,68	$ 1.514.342,68

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

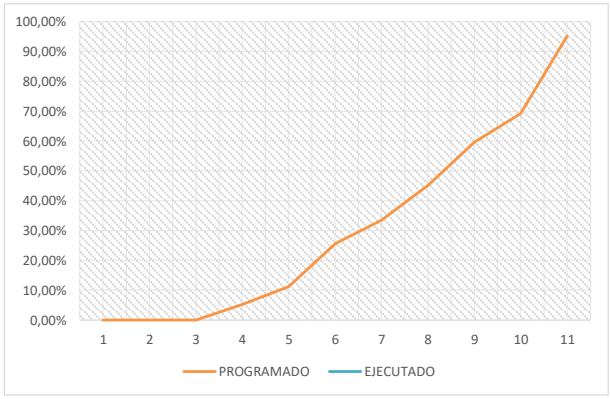

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
ALMACENISTA	0			LUNES	L
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	0			MARTES	L
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIERCOLES	F
MAESTRO	0			JUEVES	F
OFICIAL	0			VIERNES	F
AYUDANTE	0			SÁBADO	F
RESIDENTE	1		1	LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se relizaron actividades administrativas como revisión de información contrual del contrato.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realiza visita de campo a cada uno de los frentes de obra, asi mismo se realizan mesas de trabajo conjuntas para la verificacion y ajuste de los presupuestos iniciales y elaboracion de diagnosticos.
El porcentaje de ejecución obedece al tiempo en el cual se han realizado para la elaboracion de presupuestos y diagnosticos de las 13 sedes a intervenir.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	11	12	24	2. No. INFORME	1	3. SEMANA No.	11/12/24 al 15/12/24	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDÍN INFANTIL BRITALIA			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	CL 56 SUR # 81-26			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$	1.299.753.000
9. FECHA ACTA INICIO:	11 / 12 / 24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	11. PLAZO:	31 de diciembre	Meses/días
VV								
12. PRORROGAS:	N/A	13. SUSPENSIONES:				Meses/días	14. ADICIONES:	$ -
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO							
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$	284.642.402
20. FECHA ACTA INICIO:	11 / 12 / 24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	22. PLAZO:	31 de diciembre	Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A	24. SUSPENSIONES:				Meses/días	25. ADICIONES:	$ -
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES							
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,0%	2,0%	Se realizaron actividades administrativas.	
CIMENTACION	0,0%	0,0%		
MAMPOSTERIA	0,0%	0,0%		
INSTALACIONES ELECTRICAS	0,0%	0,0%		
PAÑETE Y PINTURA	0,0%	0,0%		
CUBIERTAS	0,0%	0,0%		
ASEO Y DISPOSICION FINAL	0,0%	0,0%		
TOTAL	0,0%	2,0%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	0,0%	0,0%	0,0%
Durante el periodo	2,0%	0,0%	2,0%
Acumulado Actual	2,0%	0,0%	2,0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0,0%	0,0%
Valor de la Obra Programada	$ -	$ -

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	2,0%	2,0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 1.471.925,14	$ 1.471.925,14

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

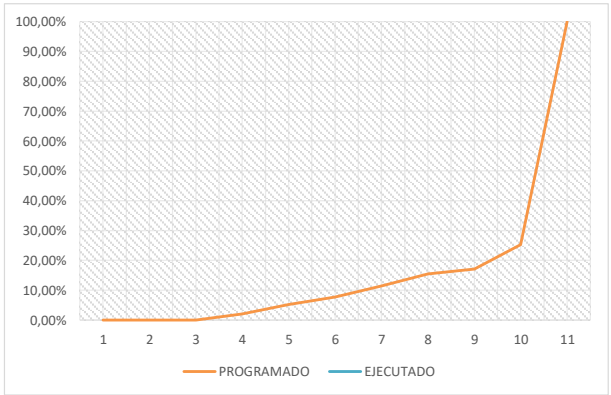

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
ALMACENISTA	0			LUNES	L
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	0			MARTES	L
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIERCOLES	F
MAESTRO	0			JUEVES	F
OFICIAL	0			VIERNES	F
AYUDANTE	0			SÁBADO	F
RESIDENTE	1		1	LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se relizaron actividades administrativas como revisión de información contrual del contrato.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realiza visita de campo a cada uno de los frentes de obra, asi mismo se realizan mesas de trabajo conjuntas para la verificacion y ajuste de los presupuestos iniciales y elaboracion de diagnosticos.
El porcentaje de ejecución obedece al tiempo en el cual se han realizado para la elaboracion de presupuestos y diagnosticos de las 13 sedes a intervenir.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	11	12	24	2. No. INFORME	1	3. SEMANA No.	11/12/24 al 15/12/24	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDÍN INFANTIL EL CARACOL			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	KR 95A # 34-86 SUR			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$	1.299.753.000
9. FECHA ACTA INICIO:	11 / 12 / 24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	11. PLAZO:	31 de diciembre	Meses/días
VV 12. PRORROGAS:	N/A	13. SUSPENSIONES:			Meses/días	14. ADICIONES:	$	-
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO							
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$	284.642.402
20. FECHA ACTA INICIO:	11 / 12 / 24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	22. PLAZO:	31 de diciembre	Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A	24. SUSPENSIONES:			Meses/días	25. ADICIONES:	$	-
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES							
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,0%	2,0%	Se realizaron actividades administrativas.	
CIMENTACION	0,0%	0,0%		
MAMPOSTERIA	0,0%	0,0%		
INSTALACIONES ELECTRICAS	0,0%	0,0%		
PAÑETE Y PINTURA	0,0%	0,0%		
CUBIERTAS	0,0%	0,0%		
ASEO Y DISPOSICION FINAL	0,0%	0,0%		
TOTAL	0,0%	2,0%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	0,0%	0,0%	0,0%
Durante el periodo	2,0%	0,0%	2,0%
Acumulado Actual	2,0%	0,0%	2,0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0,0%	0,0%
Valor de la Obra Programada	$ -	$ -

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	2,0%	2,0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 2.127.032,43	$ 2.127.032,43

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

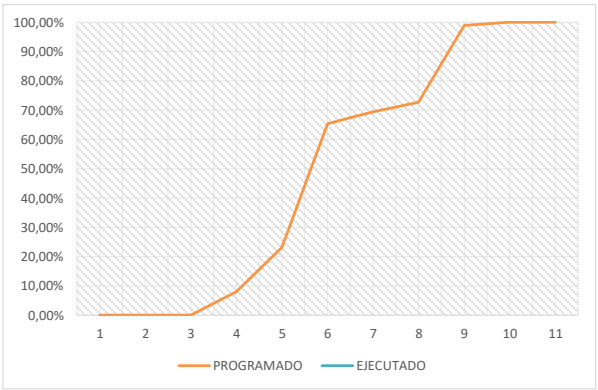

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
ALMACENISTA	0			LUNES	L
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	0			MARTES	L
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIERCOLES	F
MAESTRO	0			JUEVES	F
OFICIAL	0			VIERNES	F
AYUDANTE	0			SÁBADO	F
RESIDENTE	1		1	LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se relizaron actividades administrativas como revisión de información contrual del contrato.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realiza visita de campo a cada uno de los frentes de obra, asi mismo se realizan mesas de trabajo conjuntas para la verificacion y ajuste de los presupuestos iniciales y elaboracion de diagnosticos.
El porcentaje de ejecución obedece al tiempo en el cual se han realizado para la elaboracion de presupuestos y diagnosticos de las 13 sedes a intervenir.



Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	11	12	24	2. No. INFORME	1	3. SEMANA No.	11/12/24 al 15/12/24	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDÍN INFANTIL TINTALITO MIS PRIMEROS PASOS			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	KR 86 B # 42 F - 03 SUR			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$	1.299.753.000
9. FECHA ACTA INICIO:	11 12 24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	11. PLAZO:	31 de diciembre	Meses/días
VV								
12. PRORROGAS:	N/A	13. SUSPENSIONES:				Meses/días	14. ADICIONES:	$ -
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO							
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$	284.642.402
20. FECHA ACTA INICIO:	11 12 24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	22. PLAZO:	31 de diciembre	Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A	24. SUSPENSIONES:				Meses/días	25. ADICIONES:	$ -
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES							
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,0%	2,0%	Se realizaron actividades administrativas.	
CIMENTACION	0,0%	0,0%		
MAMPOSTERIA	0,0%	0,0%		
INSTALACIONES ELECTRICAS	0,0%	0,0%		
PAÑETE Y PINTURA	0,0%	0,0%		
CUBIERTAS	0,0%	0,0%		
ASEO Y DISPOSICION FINAL	0,0%	0,0%		
TOTAL	0,0%	2,0%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	0,0%	0,0%	0,0%
Durante el periodo	2,0%	0,0%	2,0%
Acumulado Actual	2,0%	0,0%	2,0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0,0%	0,0%
Valor de la Obra Programada	$ -	$ -

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	2,0%	2,0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 2.285.236,77	$ 2.285.236,77

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

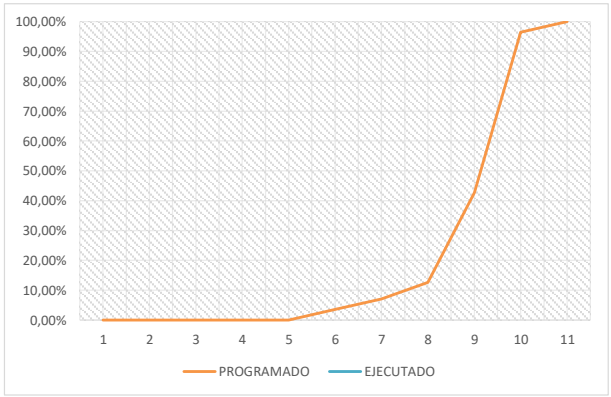

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
ALMACENISTA	0			LUNES	L
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	0			MARTES	L
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIERCOLES	F
MAESTRO	0			JUEVES	F
OFICIAL	0			VIERNES	F
AYUDANTE	0			SÁBADO	F
RESIDENTE	1		1	LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se relizaron actividades administrativas como revisión de información contrual del contrato.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realiza visita de campo a cada uno de los frentes de obra, asi mismo se realizan mesas de trabajo conjuntas para la verificacion y ajuste de los presupuestos iniciales y elaboracion de diagnosticos.
El porcentaje de ejecución obedece al tiempo en el cual se han realizado para la elaboracion de presupuestos y diagnosticos de las 13 sedes a intervenir.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	16	12	24	2. No. INFORME	2	3. SEMANA No.	16/12/24 al 22/12/24	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDE CASA JUVENTUD ALDEA DE PENSADORES			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	KRA 88A 69B 61			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$	1.299.753.000
9. FECHA ACTA INICIO:	11 / 12 / 24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	11. PLAZO:	31 de diciembre	Meses/días
VV								
12. PRORROGAS:	N/A	13. SUSPENSIONES:				Meses/días	14. ADICIONES:	$ -
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO							
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$	284.642.402
20. FECHA ACTA INICIO:	11 / 12 / 24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	22. PLAZO:	31 de diciembre	Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A	24. SUSPENSIONES:				Meses/días	25. ADICIONES:	$ -
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES							
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,0%	2,0%	Se realizaron actividades administrativas.	
CIMENTACION	0,0%	0,0%		
MAMPOSTERIA	0,0%	0,0%		
INSTALACIONES ELECTRICAS	0,0%	0,0%		
PAÑETE Y PINTURA	0,0%	0,0%		
CUBIERTAS	0,0%	0,0%		
ASEO Y DISPOSICION FINAL	0,0%	0,0%		
TOTAL	0,0%	2,0%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	2,0%	0,0%	2,0%
Durante el periodo	2,0%	0,0%	2,0%
Acumulado Actual	4,0%	0,0%	4,0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0,0%	0,0%
Valor de la Obra Programada	$ -	$ -

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	2,0%	2,0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 2.617.486,85	$ 2.617.486,85

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

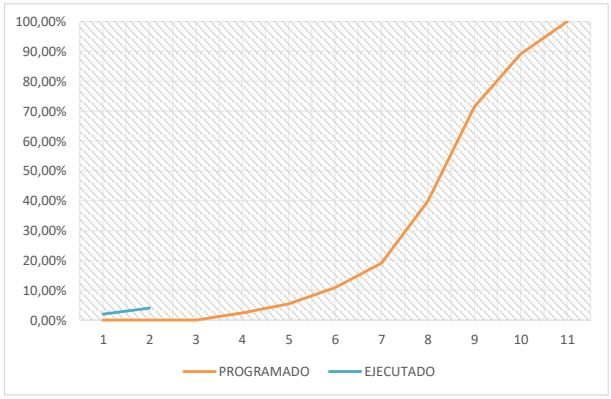

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
ALMACENISTA	0			LUNES	L
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	0			MARTES	L
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIERCOLES	F
MAESTRO	0			JUEVES	F
OFICIAL	0			VIERNES	F
AYUDANTE	0			SÁBADO	F
RESIDENTE	1		1	LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se relizaron actividades administrativas como revisión de información contrual del contrato.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realiza visita de campo a cada uno de los frentes de obra, asi mismo se realizan mesas de trabajo conjuntas para la verificacion y ajuste de los presupuestos iniciales y elaboracion de diagnosticos.
El porcentaje de ejecución obedece al tiempo en el cual se han realizado para la elaboracion de presupuestos y diagnosticos de las 13 sedes a intervenir.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	16	12	24	2. No. INFORME	2	3. SEMANA No.	16/12/24 al 22/12/24	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDE CENTRO LUZ ESPERANZA			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	CL 63L 124 - 38			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000	
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	11. PLAZO: 31 de diciembre Meses/días
VV								
12. PRORROGAS:	N/A	13. SUSPENSIONES:		Meses/días	14. ADICIONES:	$ -		
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO							
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.642.402	
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	22. PLAZO: 31 de diciembre Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A	24. SUSPENSIONES:		Meses/días	25. ADICIONES:	$ -		
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES							
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,0%	2,0%	Se realizaron actividades administrativas.	
CIMENTACION	0,0%	0,0%		
MAMPOSTERIA	0,0%	0,0%		
INSTALACIONES ELECTRICAS	0,0%	0,0%		
PAÑETE Y PINTURA	0,0%	0,0%		
CUBIERTAS	0,0%	0,0%		
ASEO Y DISPOSICION FINAL	0,0%	0,0%		
TOTAL	0,0%	2,0%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	2,0%	0,0%	2,0%
Durante el periodo	2,0%	0,0%	2,0%
Acumulado Actual	4,0%	0,0%	4,0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0,0%	0,0%
Valor de la Obra Programada	$ -	$ -

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	2,0%	2,0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 2.400.000,00	$ 2.400.000,00

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

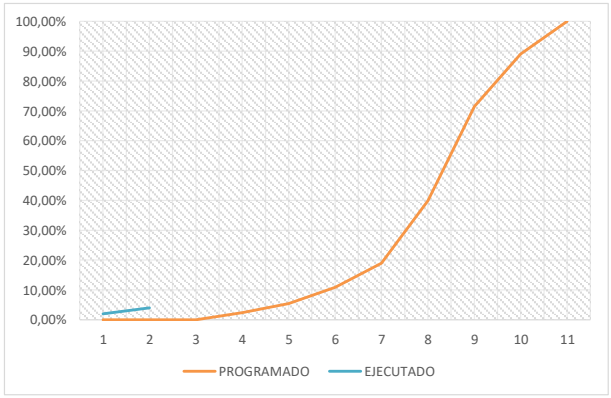

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
ALMACENISTA	0			LUNES	L
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	0			MARTES	L
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIERCOLES	F
MAESTRO	0			JUEVES	F
OFICIAL	0			VIERNES	F
AYUDANTE	0			SÁBADO	F
RESIDENTE	1		1	LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se relizaron actividades administrativas como revisión de información contrual del contrato.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realiza visita de campo a cada uno de los frentes de obra, asi mismo se realizan mesas de trabajo conjuntas para la verificacion y ajuste de los presupuestos iniciales y elaboracion de diagnosticos.
El porcentaje de ejecución obedece al tiempo en el cual se han realizado para la elaboracion de presupuestos y diagnosticos de las 13 sedes a intervenir.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	16	12	24	2. No. INFORME	2	3. SEMANA No.	16/12/24 al 22/12/24	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDE JARDÍN INFANTIL ENGATIVÁ			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	CL 66B 122-03			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000	
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	11. PLAZO: 31 de diciembre Meses/días
VV								
12. PRORROGAS:	N/A	13. SUSPENSIONES:		Meses/días	14. ADICIONES:	$ -		
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO							
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.642.402	
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	22. PLAZO: 31 de diciembre Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A	24. SUSPENSIONES:		Meses/días	25. ADICIONES:	$ -		
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES							
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,0%	2,0%	Se realizaron actividades administrativas.	
CIMENTACION	0,0%	0,0%		
MAMPOSTERIA	0,0%	0,0%		
INSTALACIONES ELECTRICAS	0,0%	0,0%		
PAÑETE Y PINTURA	0,0%	0,0%		
CUBIERTAS	0,0%	0,0%		
ASEO Y DISPOSICION FINAL	0,0%	0,0%		
TOTAL	0,0%	2,0%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	2,0%	0,0%	2,0%
Durante el periodo	2,0%	0,0%	2,0%
Acumulado Actual	4,0%	0,0%	4,0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0,0%	0,0%
Valor de la Obra Programada	$ -	$ -

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	2,0%	2,0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 2.863.065,77	$ 2.863.065,77

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

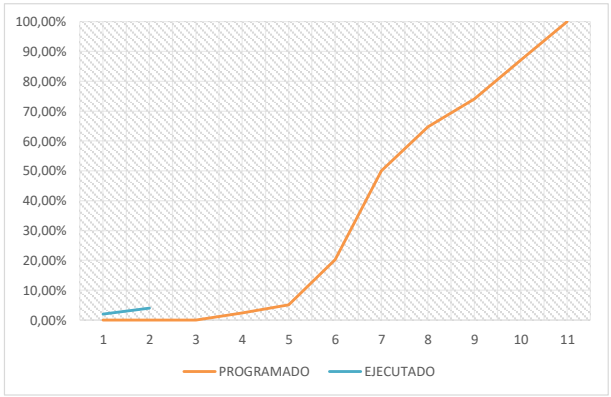

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
ALMACENISTA	0			LUNES	L
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	0			MARTES	L
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIERCOLES	F
MAESTRO	0			JUEVES	F
OFICIAL	0			VIERNES	F
AYUDANTE	0			SÁBADO	F
RESIDENTE	1		1	LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se relizaron actividades administrativas como revisión de información contrual del contrato.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realiza visita de campo a cada uno de los frentes de obra, asi mismo se realizan mesas de trabajo conjuntas para la verificacion y ajuste de los presupuestos iniciales y elaboracion de diagnosticos.
El porcentaje de ejecución obedece al tiempo en el cual se han realizado para la elaboracion de presupuestos y diagnosticos de las 13 sedes a intervenir.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	16	12	24	2. No. INFORME	2	3. SEMANA No.	16/12/24 al 22/12/24	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDE JARDÍN INFANTIL LOS SAUCES			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	CL 69 121-29			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$	1.299.753.000
9. FECHA ACTA INICIO:	11 / 12 / 24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	11. PLAZO:	31 de diciembre	Meses/días
VV								
12. PRORROGAS:	N/A	13. SUSPENSIONES:				Meses/días	14. ADICIONES:	$ -
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO							
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$	284.642.402
20. FECHA ACTA INICIO:	11 / 12 / 24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	22. PLAZO:	31 de diciembre	Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A	24. SUSPENSIONES:				Meses/días	25. ADICIONES:	$ -
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES							
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,0%	2,0%	Se realizaron actividades administrativas.	
CIMENTACION	0,0%	0,0%		
MAMPOSTERIA	0,0%	0,0%		
INSTALACIONES ELECTRICAS	0,0%	0,0%		
PAÑETE Y PINTURA	0,0%	0,0%		
CUBIERTAS	0,0%	0,0%		
ASEO Y DISPOSICION FINAL	0,0%	0,0%		
TOTAL	0,0%	2,0%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	2,0%	0,0%	2,0%
Durante el periodo	2,0%	0,0%	2,0%
Acumulado Actual	4,0%	0,0%	4,0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0,0%	0,0%
Valor de la Obra Programada	$ -	$ -

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	2,0%	2,0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 2.397.063,21	$ 2.397.063,21

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

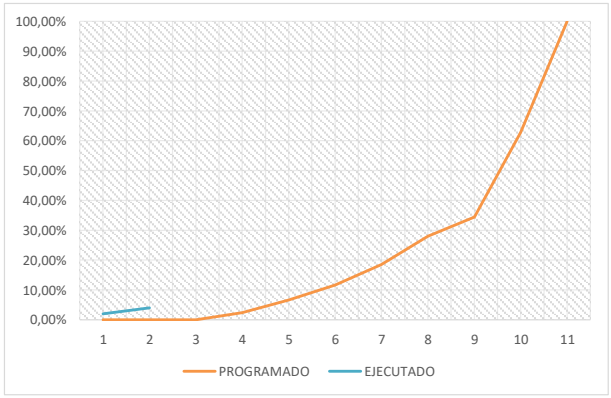

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
ALMACENISTA	0			LUNES	L
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	0			MARTES	L
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIERCOLES	F
MAESTRO	0			JUEVES	F
OFICIAL	0			VIERNES	F
AYUDANTE	0			SÁBADO	F
RESIDENTE	1		1	LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se relizaron actividades administrativas como revisión de información contrual del contrato.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realiza visita de campo a cada uno de los frentes de obra, asi mismo se realizan mesas de trabajo conjuntas para la verificacion y ajuste de los presupuestos iniciales y elaboracion de diagnosticos.
El porcentaje de ejecución obedece al tiempo en el cual se han realizado para la elaboracion de presupuestos y diagnosticos de las 13 sedes a intervenir.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	16	12	24	2. No. INFORME	2	3. SEMANA No.	16/12/24 al 22/12/24	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	CASA DE PENSAMIENTO INTERCULTURAL SHUSH UREK			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	DIAGONAL 15D #98-40			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$	1.299.753.000
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	11. PLAZO: 31 de diciembre Meses/días
VV								
12. PRORROGAS:	N/A	13. SUSPENSIONES:		Meses/días	14. ADICIONES:	$	-	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO							
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$	284.642.402
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	22. PLAZO: 31 de diciembre Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A	24. SUSPENSIONES:		Meses/días	25. ADICIONES:	$	-	
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES							
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,0%	2,0%	Se realizaron actividades administrativas.	
CIMENTACION	0,0%	0,0%		
MAMPOSTERIA	0,0%	0,0%		
INSTALACIONES ELECTRICAS	0,0%	0,0%		
PAÑETE Y PINTURA	0,0%	0,0%		
CUBIERTAS	0,0%	0,0%		
ASEO Y DISPOSICION FINAL	0,0%	0,0%		
TOTAL	0,0%	2,0%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	2,0%	0,0%	2,0%
Durante el periodo	2,0%	0,0%	2,0%
Acumulado Actual	4,0%	0,0%	4,0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0,0%	0,0%
Valor de la Obra Programada	$ -	$ -

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	2,0%	2,0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 1.217.145,18	$ 1.217.145,18

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

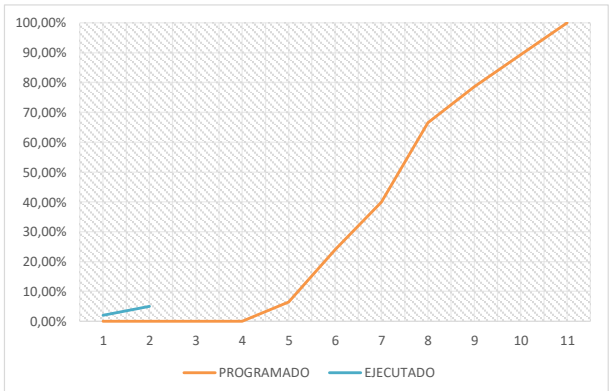

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
ALMACENISTA	0			LUNES	L
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	0			MARTES	L
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIERCOLES	F
MAESTRO	0			JUEVES	F
OFICIAL	0			VIERNES	F
AYUDANTE	0			SÁBADO	F
RESIDENTE	1		1	LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se relizaron actividades administrativas como revisión de información contrual del contrato.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realiza visita de campo a cada uno de los frentes de obra, asi mismo se realizan mesas de trabajo conjuntas para la verificacion y ajuste de los presupuestos iniciales y elaboracion de diagnosticos.
El porcentaje de ejecución obedece al tiempo en el cual se han realizado para la elaboracion de presupuestos y diagnosticos de las 13 sedes a intervenir.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	16	12	24	2. No. INFORME	2	3. SEMANA No.	16/12/24 al 22/12/24	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	CENTRO CRECER FONTIBON			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	CALLE 22F #106-26			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000	
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	11. PLAZO: 31 de diciembre Meses/días
VV								
12. PRORROGAS:	N/A	13. SUSPENSIONES:		Meses/días	14. ADICIONES:	$ -		
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO							
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.642.402	
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	22. PLAZO: 31 de diciembre Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A	24. SUSPENSIONES:		Meses/días	25. ADICIONES:	$ -		
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES							
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,0%	2,0%	Se realizaron actividades administrativas.	
CIMENTACION	0,0%	0,0%		
MAMPOSTERIA	0,0%	0,0%		
INSTALACIONES ELECTRICAS	0,0%	0,0%		
PAÑETE Y PINTURA	0,0%	0,0%		
CUBIERTAS	0,0%	0,0%		
ASEO Y DISPOSICION FINAL	0,0%	0,0%		
TOTAL	0,0%	2,0%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	2,0%	0,0%	2,0%
Durante el periodo	2,0%	0,0%	2,0%
Acumulado Actual	4,0%	0,0%	4,0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0,0%	0,0%
Valor de la Obra Programada	$ -	$ -

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	2,0%	2,0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 437.538,71	$ 437.538,71

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

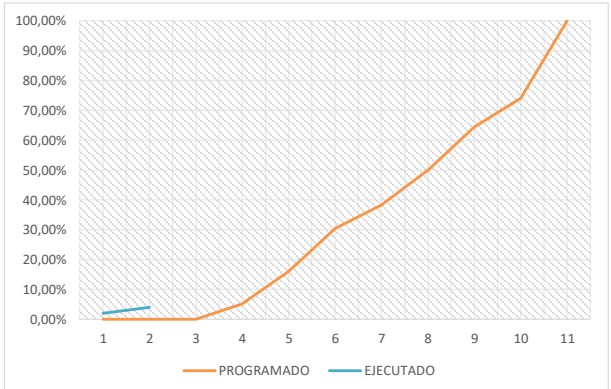

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
ALMACENISTA	0			LUNES	L
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	0			MARTES	L
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIERCOLES	F
MAESTRO	0			JUEVES	F
OFICIAL	0			VIERNES	F
AYUDANTE	0			SÁBADO	F
RESIDENTE	1		1	LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se relizaron actividades administrativas como revisión de información contrual del contrato.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realiza visita de campo a cada uno de los frentes de obra, asi mismo se realizan mesas de trabajo conjuntas para la verificacion y ajuste de los presupuestos iniciales y elaboracion de diagnosticos.
El porcentaje de ejecución obedece al tiempo en el cual se han realizado para la elaboracion de presupuestos y diagnosticos de las 13 sedes a intervenir.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	16	12	24	2. No. INFORME	2	3. SEMANA No.	16/12/24 al 22/12/24	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDÍN INFANTIL OSO DE ANTEOJOS			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	CARRERA 100 #23-22			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$	1.299.753.000
9. FECHA ACTA INICIO:	11 / 12 / 24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	11. PLAZO:	31 de diciembre	Meses/días
VV 12. PRORROGAS:	N/A	13. SUSPENSIONES:			Meses/días	14. ADICIONES:	$	-
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO							
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$	284.642.402
20. FECHA ACTA INICIO:	11 / 12 / 24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	22. PLAZO:	31 de diciembre	Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A	24. SUSPENSIONES:			Meses/días	25. ADICIONES:	$	-
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES							
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,0%	2,0%	Se realizaron actividades administrativas.	
CIMENTACION	0,0%	0,0%		
MAMPOSTERIA	0,0%	0,0%		
INSTALACIONES ELECTRICAS	0,0%	0,0%		
PAÑETE Y PINTURA	0,0%	0,0%		
CUBIERTAS	0,0%	0,0%		
ASEO Y DISPOSICION FINAL	0,0%	0,0%		
TOTAL	0,0%	2,0%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	2,0%	0,0%	2,0%
Durante el periodo	2,0%	0,0%	2,0%
Acumulado Actual	4,0%	0,0%	4,0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0,0%	0,0%
Valor de la Obra Programada	$ -	$ -

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	2,0%	2,0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 1.847.808,03	$ 1.847.808,03

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

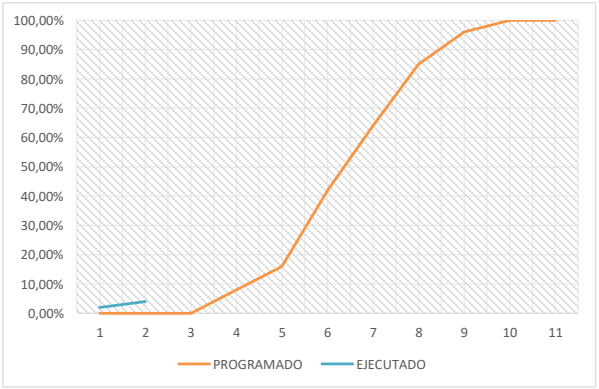

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
ALMACENISTA	0			LUNES	L
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	0			MARTES	L
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIERCOLES	F
MAESTRO	0			JUEVES	F
OFICIAL	0			VIERNES	F
AYUDANTE	0			SÁBADO	F
RESIDENTE	1		1	LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se relizaron actividades administrativas como revisión de información contrual del contrato.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realiza visita de campo a cada uno de los frentes de obra, asi mismo se realizan mesas de trabajo conjuntas para la verificacion y ajuste de los presupuestos iniciales y elaboracion de diagnosticos.
El porcentaje de ejecución obedece al tiempo en el cual se han realizado para la elaboracion de presupuestos y diagnosticos de las 13 sedes a intervenir.



Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	16	12	24	2. No. INFORME	2	3. SEMANA No.	16/12/24 al 22/12/24	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDÍN INFANTIL SABANA GRANDE			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	CARRERA 106 #15A-32			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$	1.299.753.000
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	11. PLAZO: 31 de diciembre Meses/días
VV								
12. PRORROGAS:	N/A	13. SUSPENSIONES:		Meses/días	14. ADICIONES:	$	-	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO							
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$	284.642.402
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	22. PLAZO: 31 de diciembre Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A	24. SUSPENSIONES:		Meses/días	25. ADICIONES:	$	-	
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES							
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,0%	2,0%	Se realizaron actividades administrativas.	
CIMENTACION	0,0%	0,0%		
MAMPOSTERIA	0,0%	0,0%		
INSTALACIONES ELECTRICAS	0,0%	0,0%		
PAÑETE Y PINTURA	0,0%	0,0%		
CUBIERTAS	0,0%	0,0%		
ASEO Y DISPOSICION FINAL	0,0%	0,0%		
TOTAL	0,0%	2,0%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	2,0%	0,0%	2,0%
Durante el periodo	2,0%	0,0%	2,0%
Acumulado Actual	4,0%	0,0%	4,0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0,0%	0,0%
Valor de la Obra Programada	$ -	$ -

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	2,0%	2,0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 2.511.017,59	$ 2.511.017,59

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

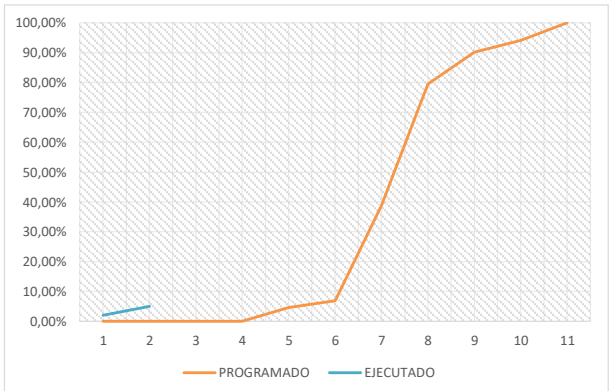

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
ALMACENISTA	0			LUNES	L
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	0			MARTES	L
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIERCOLES	F
MAESTRO	0			JUEVES	F
OFICIAL	0			VIERNES	F
AYUDANTE	0			SÁBADO	F
RESIDENTE	1		1	LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se relizaron actividades administrativas como revisión de información contrual del contrato.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realiza visita de campo a cada uno de los frentes de obra, asi mismo se realizan mesas de trabajo conjuntas para la verificacion y ajuste de los presupuestos iniciales y elaboracion de diagnosticos.
El porcentaje de ejecución obedece al tiempo en el cual se han realizado para la elaboracion de presupuestos y diagnosticos de las 13 sedes a intervenir.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	16	12	24	2. No. INFORME	2	3. SEMANA No.	16/12/24 al 22/12/24			
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	CENTRO CRECER CAMPO ALEGRE CALANDAIMA			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	KR 88 # 6A – 36					

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000			
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	11. PLAZO:	31 de diciembre	Meses/días
VV 12. PRORROGAS:	N/A	13. SUSPENSIONES:		Meses/días	14. ADICIONES:	$ -				
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO									
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT									
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.642.402			
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	22. PLAZO:	31 de diciembre	Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A	24. SUSPENSIONES:		Meses/días	25. ADICIONES:	$ -				
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES									
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA									

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,0%	2,0%	Se realizaron actividades administrativas.	
CIMENTACION	0,0%	0,0%		
MAMPOSTERIA	0,0%	0,0%		
INSTALACIONES ELECTRICAS	0,0%	0,0%		
PAÑETE Y PINTURA	0,0%	0,0%		
CUBIERTAS	0,0%	0,0%		
ASEO Y DISPOSICION FINAL	0,0%	0,0%		
TOTAL	0,0%	2,0%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	0,0%	0,0%	0,0%
Durante el periodo	2,0%	0,0%	2,0%
Acumulado Actual	2,0%	0,0%	2,0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0,0%	0,0%
Valor de la Obra Programada	$ -	$ -

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	2,0%	2,0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 2.305.397,63	$ 2.305.397,63

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

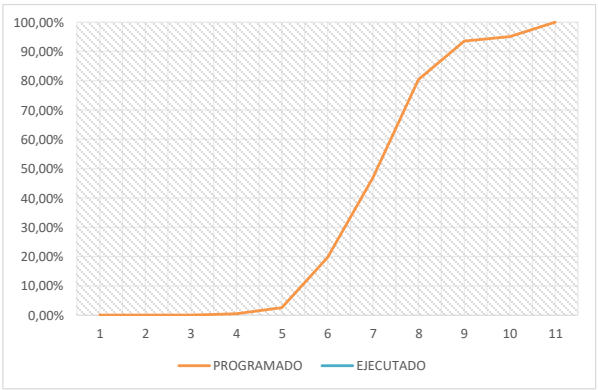

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
ALMACENISTA	0			LUNES	L
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	0			MARTES	L
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIERCOLES	F
MAESTRO	0			JUEVES	F
OFICIAL	0			VIERNES	F
AYUDANTE	0			SÁBADO	F
RESIDENTE	1		1	LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se relizaron actividades administrativas como revisión de información contrual del contrato.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realiza visita de campo a cada uno de los frentes de obra, asi mismo se realizan mesas de trabajo conjuntas para la verificacion y ajuste de los presupuestos iniciales y elaboracion de diagnosticos.
El porcentaje de ejecución obedece al tiempo en el cual se han realizado para la elaboracion de presupuestos y diagnosticos de las 13 sedes a intervenir.



Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	16	12	24	2. No. INFORME	2	3. SEMANA No.	16/12/24 al 22/12/24	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO KENNEDY			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	AK 80 # 43-43 SUR			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$	1.299.753.000
9. FECHA ACTA INICIO:	11 / 12 / 24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	11. PLAZO:	31 de diciembre	Meses/días
VV								
12. PRORROGAS:	N/A	13. SUSPENSIONES:				Meses/días	14. ADICIONES:	$ -
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO							
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$	284.642.402
20. FECHA ACTA INICIO:	11 / 12 / 24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	22. PLAZO:	31 de diciembre	Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A	24. SUSPENSIONES:				Meses/días	25. ADICIONES:	$ -
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES							
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,0%	2,0%	Se realizaron actividades administrativas.	
CIMENTACION	0,0%	0,0%		
MAMPOSTERIA	0,0%	0,0%		
INSTALACIONES ELECTRICAS	0,0%	0,0%		
PAÑETE Y PINTURA	0,0%	0,0%		
CUBIERTAS	0,0%	0,0%		
ASEO Y DISPOSICION FINAL	0,0%	0,0%		
TOTAL	0,0%	2,0%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	0,0%	0,0%	0,0%
Durante el periodo	2,0%	0,0%	2,0%
Acumulado Actual	2,0%	0,0%	2,0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0,0%	0,0%
Valor de la Obra Programada	$ -	$ -

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	2,0%	2,0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 1.514.342,68	$ 1.514.342,68

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

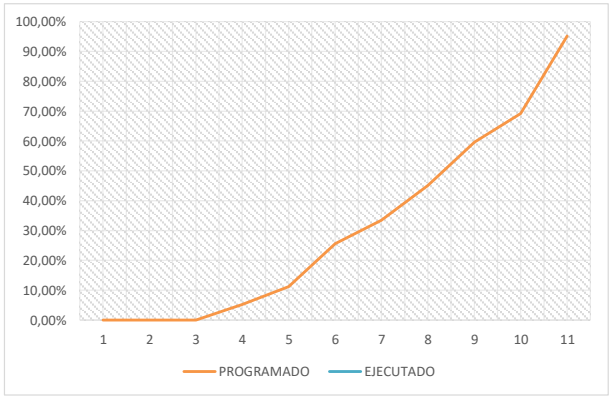

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
ALMACENISTA	0			LUNES	L
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	0			MARTES	L
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIERCOLES	F
MAESTRO	0			JUEVES	F
OFICIAL	0			VIERNES	F
AYUDANTE	0			SÁBADO	F
RESIDENTE	1		1	LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se relizaron actividades administrativas como revisión de información contrual del contrato.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realiza visita de campo a cada uno de los frentes de obra, asi mismo se realizan mesas de trabajo conjuntas para la verificacion y ajuste de los presupuestos iniciales y elaboracion de diagnosticos.
El porcentaje de ejecución obedece al tiempo en el cual se han realizado para la elaboracion de presupuestos y diagnosticos de las 13 sedes a intervenir.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	16	12	24	2. No. INFORME	2	3. SEMANA No.	16/12/24 al 22/12/24	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDÍN INFANTIL BRITALIA			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	CL 56 SUR # 81-26			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$	1.299.753.000
9. FECHA ACTA INICIO:	11 / 12 / 24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	11. PLAZO:	31 de diciembre	Meses/días
VV								
12. PRORROGAS:	N/A	13. SUSPENSIONES:				Meses/días	14. ADICIONES:	$ -
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO							
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$	284.642.402
20. FECHA ACTA INICIO:	11 / 12 / 24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	22. PLAZO:	31 de diciembre	Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A	24. SUSPENSIONES:				Meses/días	25. ADICIONES:	$ -
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES							
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,0%	2,0%	Se realizaron actividades administrativas.	
CIMENTACION	0,0%	0,0%		
MAMPOSTERIA	0,0%	0,0%		
INSTALACIONES ELECTRICAS	0,0%	0,0%		
PAÑETE Y PINTURA	0,0%	0,0%		
CUBIERTAS	0,0%	0,0%		
ASEO Y DISPOSICION FINAL	0,0%	0,0%		
TOTAL	0,0%	2,0%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	0,0%	0,0%	0,0%
Durante el periodo	2,0%	0,0%	2,0%
Acumulado Actual	2,0%	0,0%	2,0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0,0%	0,0%
Valor de la Obra Programada	$ -	$ -

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	2,0%	2,0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 1.471.925,14	$ 1.471.925,14

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

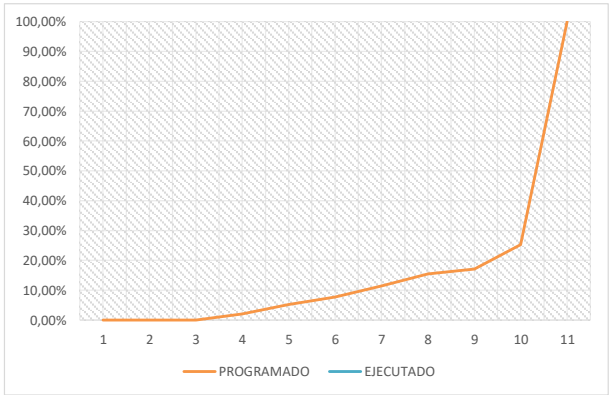

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
ALMACENISTA	0			LUNES	L
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	0			MARTES	L
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIERCOLES	F
MAESTRO	0			JUEVES	F
OFICIAL	0			VIERNES	F
AYUDANTE	0			SÁBADO	F
RESIDENTE	1		1	LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se relizaron actividades administrativas como revisión de información contrual del contrato.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realiza visita de campo a cada uno de los frentes de obra, asi mismo se realizan mesas de trabajo conjuntas para la verificacion y ajuste de los presupuestos iniciales y elaboracion de diagnosticos.
El porcentaje de ejecución obedece al tiempo en el cual se han realizado para la elaboracion de presupuestos y diagnosticos de las 13 sedes a intervenir.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	16	12	24	2. No. INFORME	2	3. SEMANA No.	16/12/24 al 22/12/24	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDÍN INFANTIL EL CARACOL			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	KR 95A # 34-86 SUR			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$	1.299.753.000
9. FECHA ACTA INICIO:	11 / 12 / 24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	11. PLAZO:	31 de diciembre	Meses/días
VV 12. PRORROGAS:	N/A	13. SUSPENSIONES:			Meses/días	14. ADICIONES:	$	-
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO							
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$	284.642.402
20. FECHA ACTA INICIO:	11 / 12 / 24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	22. PLAZO:	31 de diciembre	Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A	24. SUSPENSIONES:			Meses/días	25. ADICIONES:	$	-
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES							
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,0%	2,0%	Se realizaron actividades administrativas.	
CIMENTACION	0,0%	0,0%		
MAMPOSTERIA	0,0%	0,0%		
INSTALACIONES ELECTRICAS	0,0%	0,0%		
PAÑETE Y PINTURA	0,0%	0,0%		
CUBIERTAS	0,0%	0,0%		
ASEO Y DISPOSICION FINAL	0,0%	0,0%		
TOTAL	0,0%	2,0%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	0,0%	0,0%	0,0%
Durante el periodo	2,0%	0,0%	2,0%
Acumulado Actual	2,0%	0,0%	2,0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0,0%	0,0%
Valor de la Obra Programada	$ -	$ -

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	2,0%	2,0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 2.127.032,43	$ 2.127.032,43

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

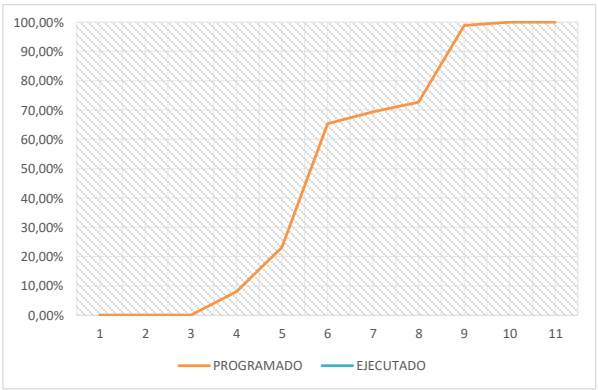

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
ALMACENISTA	0			LUNES	L
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	0			MARTES	L
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIERCOLES	F
MAESTRO	0			JUEVES	F
OFICIAL	0			VIERNES	F
AYUDANTE	0			SÁBADO	F
RESIDENTE	1		1	LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se relizaron actividades administrativas como revisión de información contrual del contrato.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realiza visita de campo a cada uno de los frentes de obra, asi mismo se realizan mesas de trabajo conjuntas para la verificacion y ajuste de los presupuestos iniciales y elaboracion de diagnosticos.
El porcentaje de ejecución obedece al tiempo en el cual se han realizado para la elaboracion de presupuestos y diagnosticos de las 13 sedes a intervenir.



Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	16	12	24	2. No. INFORME	2	3. SEMANA No.	16/12/24 al 22/12/24	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDÍN INFANTIL TINTALITO MIS PRIMEROS PASOS			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	KR 86 B # 42 F - 03 SUR			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$	1.299.753.000
9. FECHA ACTA INICIO:	11 / 12 / 24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	11. PLAZO:	31 de diciembre	Meses/días
VV								
12. PRORROGAS:	N/A	13. SUSPENSIONES:				Meses/días	14. ADICIONES:	$ -
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO							
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$	284.642.402
20. FECHA ACTA INICIO:	11 / 12 / 24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	22. PLAZO:	31 de diciembre	Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A	24. SUSPENSIONES:				Meses/días	25. ADICIONES:	$ -
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES							
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,0%	2,0%	Se realizaron actividades administrativas.	
CIMENTACION	0,0%	0,0%		
MAMPOSTERIA	0,0%	0,0%		
INSTALACIONES ELECTRICAS	0,0%	0,0%		
PAÑETE Y PINTURA	0,0%	0,0%		
CUBIERTAS	0,0%	0,0%		
ASEO Y DISPOSICION FINAL	0,0%	0,0%		
TOTAL	0,0%	2,0%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	0,0%	0,0%	0,0%
Durante el periodo	2,0%	0,0%	2,0%
Acumulado Actual	2,0%	0,0%	2,0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0,0%	0,0%
Valor de la Obra Programada	$ -	$ -

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	2,0%	2,0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 2.285.236,77	$ 2.285.236,77

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

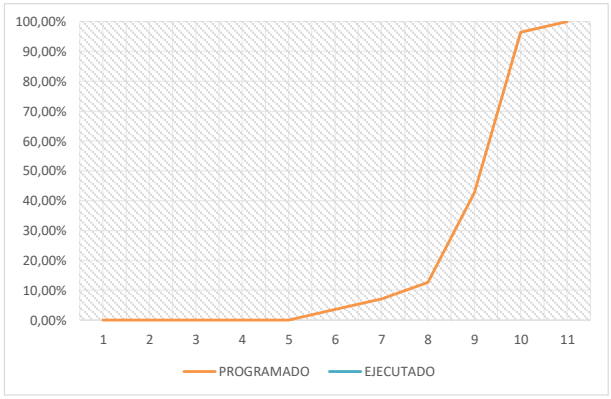

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
ALMACENISTA	0			LUNES	L
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	0			MARTES	L
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIERCOLES	F
MAESTRO	0			JUEVES	F
OFICIAL	0			VIERNES	F
AYUDANTE	0			SÁBADO	F
RESIDENTE	1		1	LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se relizaron actividades administrativas como revisión de información contrual del contrato.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realiza visita de campo a cada uno de los frentes de obra, asi mismo se realizan mesas de trabajo conjuntas para la verificacion y ajuste de los presupuestos iniciales y elaboracion de diagnosticos.
El porcentaje de ejecución obedece al tiempo en el cual se han realizado para la elaboracion de presupuestos y diagnosticos de las 13 sedes a intervenir.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	23	12	24	2. No. INFORME	3	3. SEMANA No.	23/12/24 al 29/12/24	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDE CASA JUVENTUD ALDEA DE PENSADORES			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	KRA 88A 69B 61			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$	1.299.753.000
9. FECHA ACTA INICIO:	11 12 24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	11. PLAZO:	31 de diciembre	Meses/días
VV								
12. PRORROGAS:	N/A	13. SUSPENSIONES:				Meses/días	14. ADICIONES:	$ -
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO							
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$	284.642.402
20. FECHA ACTA INICIO:	11 12 24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	22. PLAZO:	31 de diciembre	Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A	24. SUSPENSIONES:				Meses/días	25. ADICIONES:	$ -
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES							
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,0%	1,0%	Se realizaron actividades administrativas.	
CIMENTACION	0,0%	0,0%		
MAMPOSTERIA	0,0%	0,0%		
INSTALACIONES ELECTRICAS	0,0%	0,0%		
PAÑETE Y PINTURA	0,0%	0,0%		
CUBIERTAS	0,0%	0,0%		
ASEO Y DISPOSICION FINAL	0,0%	0,0%		
TOTAL	0,0%	1,0%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	4,0%	0,0%	4,0%
Durante el periodo	1,0%	0,0%	1,0%
Acumulado Actual	5,0%	0,0%	5,0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0,0%	0,0%
Valor de la Obra Programada	$ -	$ -

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	1,0%	1,0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 1.308.743,43	$ 1.308.743,43

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

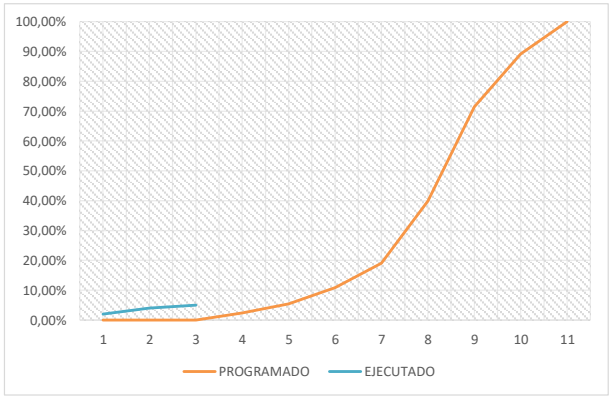

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
ALMACENISTA	0			LUNES	L
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	0			MARTES	L
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIERCOLES	F
MAESTRO	0			JUEVES	F
OFICIAL	0			VIERNES	F
AYUDANTE	0			SÁBADO	F
RESIDENTE	1		1	LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se relizaron actividades administrativas como revisión de información contrual del contrato.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realiza visita de campo a cada uno de los frentes de obra, asi mismo se realizan mesas de trabajo conjuntas para la verificacion y ajuste de los presupuestos iniciales y elaboracion de diagnosticos.
El porcentaje de ejecución obedece al tiempo en el cual se han realizado para la elaboracion de presupuestos y diagnosticos de las 13 sedes a intervenir.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA


Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	23	12	24	No. INFORME	3	SEMANA No.	23/12/24 al 29/12/24

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO

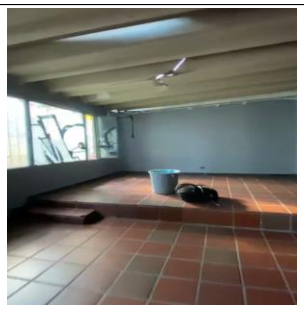

Fecha:27/12/24
Descripción: Visita de obra



Fecha:27/12/24
Descripción: Visita de obra



Fecha:27/12/24
Descripción: Visita de obra



Fecha:27/12/24
Descripción: Visita de obra

1. FECHA ELABORACIÓN:	23	12	24	2. No. INFORME	3	3. SEMANA No.	23/12/24 al 29/12/24			
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDE CENTRO LUZ ESPERANZA			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	CL 63L 124 - 38					

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024			7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$	1.299.753.000
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	11. PLAZO:	31 de diciembre	Meses/días
VV 12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:			Meses/días	14. ADICIONES:	$	-
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO									
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT									
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024			18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$	284.642.402
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	22. PLAZO:	31 de diciembre	Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:			Meses/días	25. ADICIONES:	$	-
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES									
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA									

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,0%	1,0%	Se realizaron actividades administrativas.	
CIMENTACION	0,0%	0,0%		
MAMPOSTERIA	0,0%	0,0%		
INSTALACIONES ELECTRICAS	0,0%	0,0%		
PAÑETE Y PINTURA	0,0%	0,0%		
CUBIERTAS	0,0%	0,0%		
ASEO Y DISPOSICION FINAL	0,0%	0,0%		
TOTAL	0,0%	1,0%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	4,0%	0,0%	4,0%
Durante el periodo	1,0%	0,0%	1,0%
Acumulado Actual	5,0%	0,0%	5,0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0,0%	0,0%
Valor de la Obra Programada	$ -	$ -

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	2,0%	2,0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 2.400.000,00	$ 2.400.000,00

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

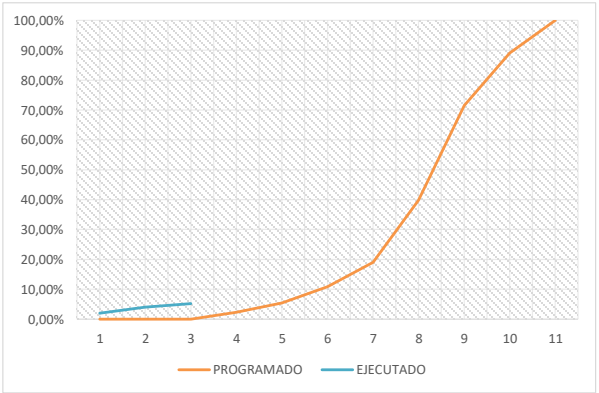

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
ALMACENISTA	0			LUNES	L
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	0			MARTES	L
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIERCOLES	F
MAESTRO	0			JUEVES	F
OFICIAL	0			VIERNES	F
AYUDANTE	0			SÁBADO	F
RESIDENTE	1		1	LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se relizaron actividades administrativas como revisión de información contrual del contrato.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realiza visita de campo a cada uno de los frentes de obra, asi mismo se realizan mesas de trabajo conjuntas para la verificacion y ajuste de los presupuestos iniciales y elaboracion de diagnosticos.
El porcentaje de ejecución obedece al tiempo en el cual se han realizado para la elaboracion de presupuestos y diagnosticos de las 13 sedes a intervenir.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	23	12	24	No. INFORME	3	SEMANA No.	23/12/24 al 29/12/24

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



Fecha:27/12/24
Descripción: Visita de obra



Fecha:27/12/24
Descripción: Visita de obra



Fecha:27/12/24
Descripción: Visita de obra



Fecha:27/12/24
Descripción: Visita de obra

1. FECHA ELABORACIÓN:	23	12	24	2. No. INFORME	3	3. SEMANA No.	23/12/24 al 29/12/24	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDE JARDÍN INFANTIL ENGATIVÁ			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	CL 66B 122-03			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000	
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	11. PLAZO: 31 de diciembre Meses/días
VV								
12. PRORROGAS:	N/A	13. SUSPENSIONES:		Meses/días	14. ADICIONES:	$ -		
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO							
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.642.402	
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	22. PLAZO: 31 de diciembre Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A	24. SUSPENSIONES:		Meses/días	25. ADICIONES:	$ -		
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES							
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,0%	1,0%	Se realizaron actividades administrativas.	
CIMENTACION	0,0%	0,0%		
MAMPOSTERIA	0,0%	0,0%		
INSTALACIONES ELECTRICAS	0,0%	0,0%		
PAÑETE Y PINTURA	0,0%	0,0%		
CUBIERTAS	0,0%	0,0%		
ASEO Y DISPOSICION FINAL	0,0%	0,0%		
TOTAL	0,0%	1,0%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	4,0%	0,0%	4,0%
Durante el periodo	1,0%	0,0%	1,0%
Acumulado Actual	5,0%	0,0%	5,0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0,0%	0,0%
Valor de la Obra Programada	$ -	$ -

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	1,0%	1,0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 1.431.532,88	$ 1.431.532,88

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

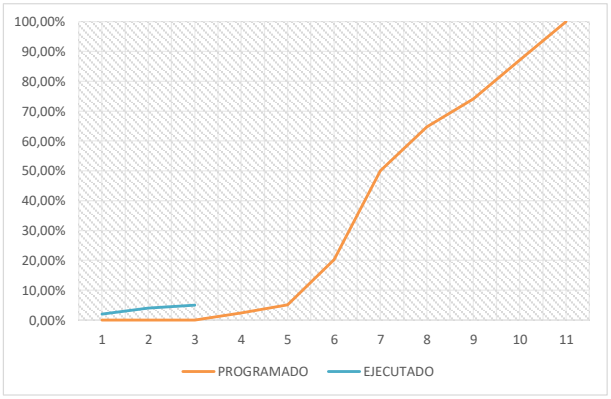

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
ALMACENISTA	0			LUNES	L
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	0			MARTES	L
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIERCOLES	F
MAESTRO	0			JUEVES	F
OFICIAL	0			VIERNES	F
AYUDANTE	0			SÁBADO	F
RESIDENTE	1		1	LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se relizaron actividades administrativas como revisión de información contrual del contrato.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realiza visita de campo a cada uno de los frentes de obra, asi mismo se realizan mesas de trabajo conjuntas para la verificacion y ajuste de los presupuestos iniciales y elaboracion de diagnosticos.
El porcentaje de ejecución obedece al tiempo en el cual se han realizado para la elaboracion de presupuestos y diagnosticos de las 13 sedes a intervenir.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	23	12	24	No. INFORME	3	SEMANA No.	23/12/24 al 29/12/24

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



Fecha:27/12/24
Descripción: Visita de obra



Fecha:27/12/24
Descripción: Visita de obra



Fecha:27/12/24
Descripción: Visita de obra



Fecha:27/12/24
Descripción: Visita de obra

1. FECHA ELABORACIÓN:	23	12	24	2. No. INFORME	3	3. SEMANA No.	23/12/24 al 29/12/24	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDE JARDÍN INFANTIL LOS SAUCES			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	CL 69 121-29			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$	1.299.753.000
9. FECHA ACTA INICIO:	11 12 24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	11. PLAZO:	31 de diciembre	Meses/días
VV								
12. PRORROGAS:	N/A	13. SUSPENSIONES:				Meses/días	14. ADICIONES:	$ -
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO							
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$	284.642.402
20. FECHA ACTA INICIO:	11 12 24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	22. PLAZO:	31 de diciembre	Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A	24. SUSPENSIONES:				Meses/días	25. ADICIONES:	$ -
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES							
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,0%	1,0%	Se realizaron actividades administrativas.	
CIMENTACION	0,0%	0,0%		
MAMPOSTERIA	0,0%	0,0%		
INSTALACIONES ELECTRICAS	0,0%	0,0%		
PAÑETE Y PINTURA	0,0%	0,0%		
CUBIERTAS	0,0%	0,0%		
ASEO Y DISPOSICION FINAL	0,0%	0,0%		
TOTAL	0,0%	1,0%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	4,0%	0,0%	4,0%
Durante el periodo	1,0%	0,0%	1,0%
Acumulado Actual	5,0%	0,0%	5,0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0,0%	0,0%
Valor de la Obra Programada	$ -	$ -

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	1,0%	1,0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 1.198.531,61	$ 1.198.531,61

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

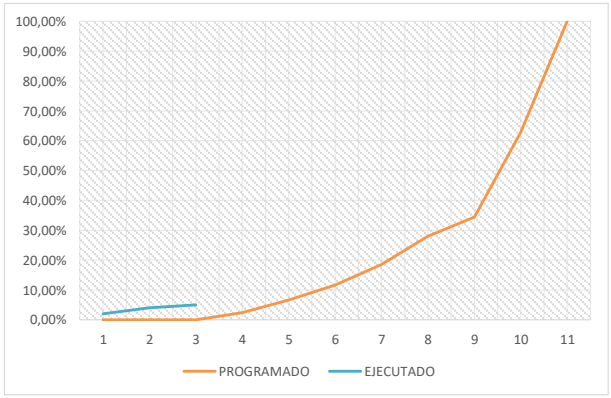

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
ALMACENISTA	0			LUNES	L
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	0			MARTES	L
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIERCOLES	F
MAESTRO	0			JUEVES	F
OFICIAL	0			VIERNES	F
AYUDANTE	0			SÁBADO	F
RESIDENTE	1		1	LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se relizaron actividades administrativas como revisión de información contrual del contrato.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realiza visita de campo a cada uno de los frentes de obra, asi mismo se realizan mesas de trabajo conjuntas para la verificacion y ajuste de los presupuestos iniciales y elaboracion de diagnosticos.
El porcentaje de ejecución obedece al tiempo en el cual se han realizado para la elaboracion de presupuestos y diagnosticos de las 13 sedes a intervenir.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	23	12	24	No. INFORME	3	SEMANA No.	23/12/24 al 29/12/24

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



Fecha:27/12/24
Descripción: Visita de obra



Fecha:27/12/24
Descripción: Visita de obra



Fecha:27/12/24
Descripción: Visita de obra



Fecha:27/12/24
Descripción: Visita de obra

1. FECHA ELABORACIÓN:	30	12	24	2. No. INFORME	3	3. SEMANA No.	23/12/24 al 29/12/24			
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	CASA DE PENSAMIENTO INTERCULTURAL SHUSH UREK			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	DIAGONAL 15D #98-40					

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024			7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$	1.299.753.000
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	11. PLAZO:	31 de diciembre	Meses/días
VV										
12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:			Meses/días	14. ADICIONES:	$	-
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO									
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT									
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024			18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$	284.642.402
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	22. PLAZO:	31 de diciembre	Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:			Meses/días	25. ADICIONES:	$	-
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES									
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA									

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,0%	1,0%	Se realizaron actividades administrativas.	
CIMENTACION	0,0%	0,0%		
MAMPOSTERIA	0,0%	0,0%		
INSTALACIONES ELECTRICAS	0,0%	0,0%		
PAÑETE Y PINTURA	0,0%	0,0%		
CUBIERTAS	0,0%	0,0%		
ASEO Y DISPOSICION FINAL	0,0%	0,0%		
TOTAL	0,0%	1,0%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	5,0%	0,0%	5,0%
Durante el periodo	0,0%	0,0%	0,0%
Acumulado Actual	5,0%	0,0%	5,0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0,0%	0,0%
Valor de la Obra Programada	0,00%	$ -

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0,0%	5,0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ -	$ 3.042.862,96

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

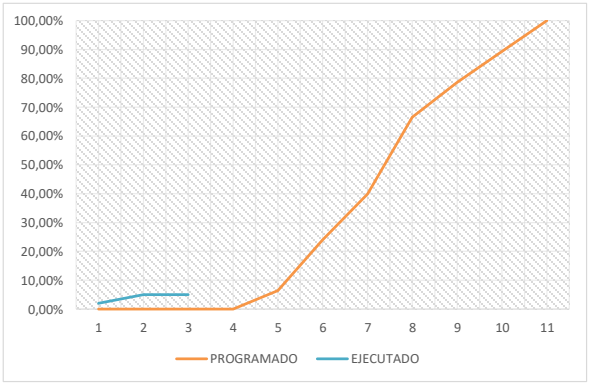

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
ALMACENISTA	0			LUNES	L
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	0			MARTES	L
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIERCOLES	F
MAESTRO	0			JUEVES	F
OFICIAL	0			VIERNES	F
AYUDANTE	0			SÁBADO	F
RESIDENTE	1		1	LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se relizaron actividades administrativas como revisión de información contrual del contrato.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realiza visita de campo a cada uno de los frentes de obra, asi mismo se realizan mesas de trabajo conjuntas para la verificacion y ajuste de los presupuestos iniciales y elaboracion de diagnosticos.

El porcentaje de ejecución obedece al tiempo en el cual se han realizado para la elaboracion de presupuestos y diagnosticos de las 13 sedes a intervenir.



Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	30	12	24	No. INFORME	3	SEMANA No.	23/12/24 al 29/12/24

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES


F. REGISTRO FOTOGRAFICO




Fecha:27/12/24
Descripción: Visita de obra



Fecha:27/12/24
Descripción: Visita de obra

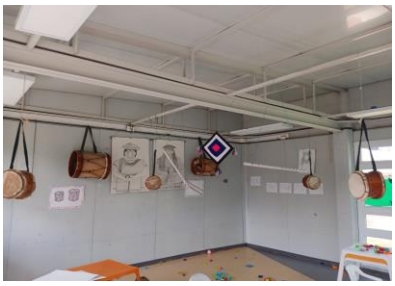

Fecha:27/12/24
Descripción: Visita de obra

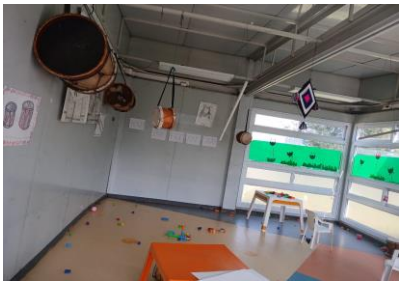

Fecha:27/12/24
Descripción: Visita de obra

1. FECHA ELABORACIÓN:	30	12	24	2. No. INFORME	3	3. SEMANA No.	23/12/24 al 29/12/24	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	CENTRO CRECER FONTIBON			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	CALLE 22F #106-26			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$	1.299.753.000
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	11. PLAZO: 31 de diciembre Meses/días
VV								
12. PRORROGAS:	N/A	13. SUSPENSIONES:		Meses/días		14. ADICIONES:	$	-
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO							
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$	284.642.402
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	22. PLAZO: 31 de diciembre Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A	24. SUSPENSIONES:		Meses/días		25. ADICIONES:	$	-
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES							
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,0%	1,0%	Se realizaron actividades administrativas.	
CIMENTACION	0,0%	0,0%		
MAMPOSTERIA	0,0%	0,0%		
INSTALACIONES ELECTRICAS	0,0%	0,0%		
PAÑETE Y PINTURA	0,0%	0,0%		
CUBIERTAS	0,0%	0,0%		
ASEO Y DISPOSICION FINAL	0,0%	0,0%		
TOTAL	0,0%	1,0%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	4,0%	0,0%	4,0%
Durante el periodo	1,2%	0,0%	1,2%
Acumulado Actual	5,2%	0,0%	5,2%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0,0%	1,2%
Valor de la Obra Programada	$ -	$ 262.523,23

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	1,2%	5,2%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 262.523,23	$ 1.137.600,65

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

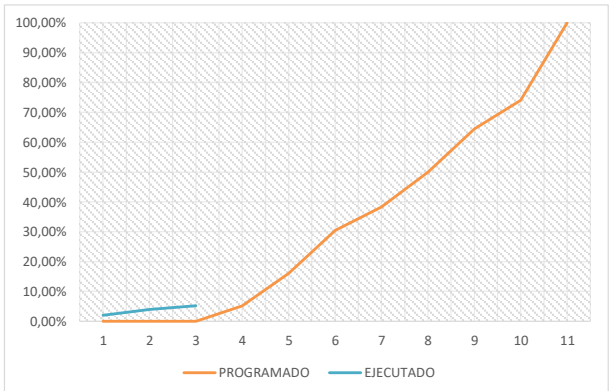

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
ALMACENISTA	0			LUNES	L
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	0			MARTES	L
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIERCOLES	F
MAESTRO	0			JUEVES	F
OFICIAL	0			VIERNES	F
AYUDANTE	0			SÁBADO	F
RESIDENTE	1		1	LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se relizaron actividades administrativas como revisión de información contrual del contrato.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realiza visita de campo a cada uno de los frentes de obra, asi mismo se realizan mesas de trabajo conjuntas para la verificacion y ajuste de los presupuestos iniciales y elaboracion de diagnosticos.
El porcentaje de ejecución obedece al tiempo en el cual se han realizado para la elaboracion de presupuestos y diagnosticos de las 13 sedes a intervenir.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	30	12	24	No. INFORME	3	SEMANA No.	23/12/24 al 29/12/24

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



Fecha:27/12/24
Descripción: Visita de obra



Fecha:27/12/24
Descripción: Visita de obra



Fecha:27/12/24
Descripción: Llegada de material a obra



Fecha:27/12/24
Descripción: Visita de obra, estado actual del comedor

1. FECHA ELABORACIÓN:	30	12	24	2. No. INFORME	3	3. SEMANA No.	23/12/24 al 29/12/24	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDÍN INFANTIL OSO DE ANTEOJOS			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	CARRERA 100 #23-22			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024			7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO: $ 1.299.753.000
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	11. PLAZO: 31 de diciembre Meses/días
VV 12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:		Meses/días		14. ADICIONES: $ -
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO							
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024			18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO: $ 284.642.402
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	22. PLAZO: 31 de diciembre Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:		Meses/días		25. ADICIONES: $ -
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES							
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,0%	1,0%	Se realizaron actividades administrativas.	
CIMENTACION	0,0%	0,0%		
MAMPOSTERIA	0,0%	0,0%		
INSTALACIONES ELECTRICAS	0,0%	0,0%		
PAÑETE Y PINTURA	0,0%	0,0%		
CUBIERTAS	0,0%	0,0%		
ASEO Y DISPOSICION FINAL	0,0%	0,0%		
TOTAL	0,0%	1,0%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	4,0%	0,0%	4,0%
Durante el periodo	1,7%	0,0%	1,7%
Acumulado Actual	5,7%	0,0%	5,7%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0,0%	0,0%
Valor de la Obra Programada	$ -	$ -

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	1,7%	0,0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 1.570.636,83	$ -

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

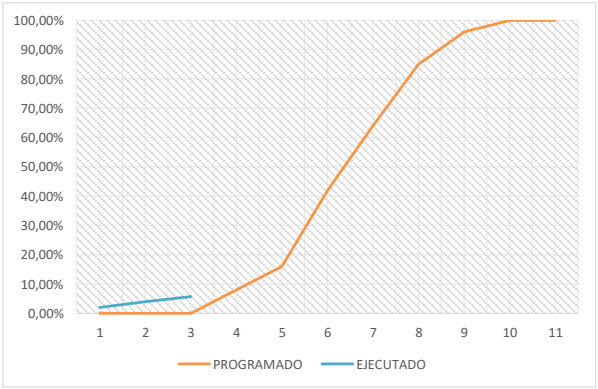

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
ALMACENISTA	0			LUNES	L
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	0			MARTES	L
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIERCOLES	F
MAESTRO	0			JUEVES	F
OFICIAL	0			VIERNES	F
AYUDANTE	0			SÁBADO	F
RESIDENTE	1		1	LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se relizaron actividades administrativas como revisión de información contrual del contrato.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realiza visita de campo a cada uno de los frentes de obra, asi mismo se realizan mesas de trabajo conjuntas para la verificacion y ajuste de los presupuestos iniciales y elaboracion de diagnosticos.
El porcentaje de ejecución obedece al tiempo en el cual se han realizado para la elaboracion de presupuestos y diagnosticos de las 13 sedes a intervenir.



Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	30	12	24	No. INFORME	3	SEMANA No.	23/12/24 al 29/12/24

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



Fecha:27/12/24
Descripción: Se alista zona del comedor para realizar resane de grietas.



Fecha:27/12/24
Descripción: Se realiza el picado de cubierta.



Fecha:27/12/24
Descripción: Llegada de material en obra, para impermeabilizacion de cubierta.



Fecha:27/12/24
Descripción: Se alista zona del comedor para realizar resane de grietas.

1. FECHA ELABORACIÓN:	30	12	24	2. No. INFORME	3	3. SEMANA No.	23/12/24 al 29/12/24	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDÍN INFANTIL SABANA GRANDE			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	CARRERA 106 #15A-32			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000	
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	11. PLAZO: 31 de diciembre Meses/días
VV								
12. PRORROGAS:	N/A	13. SUSPENSIONES:		Meses/días	14. ADICIONES:	$ -		
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO							
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.642.402	
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	22. PLAZO: 31 de diciembre Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A	24. SUSPENSIONES:		Meses/días	25. ADICIONES:	$ -		
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES							
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,0%	1,0%	Se realizaron actividades administrativas.	
CIMENTACION	0,0%	0,0%		
MAMPOSTERIA	0,0%	0,0%		
INSTALACIONES ELECTRICAS	0,0%	0,0%		
PAÑETE Y PINTURA	0,0%	0,0%		
CUBIERTAS	0,0%	0,0%		
ASEO Y DISPOSICION FINAL	0,0%	0,0%		
TOTAL	0,0%	1,0%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	5,0%	0,0%	5,0%
Durante el periodo	0,0%	0,0%	0,0%
Acumulado Actual	5,0%	0,0%	5,0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0,0%	0,0%
Valor de la Obra Programada	$ -	$ -

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0,0%	5,0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ -	$ 6.277.543,97

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

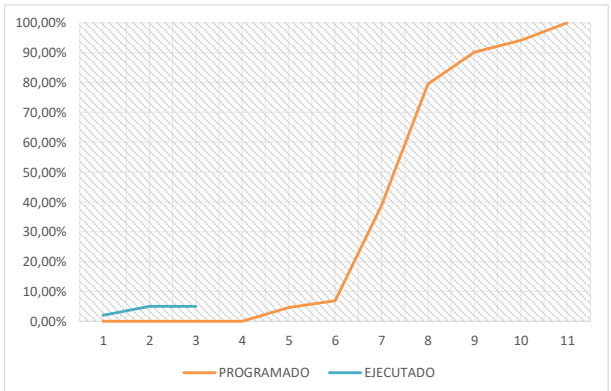

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
ALMACENISTA	0			LUNES	L
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	0			MARTES	L
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIERCOLES	F
MAESTRO	0			JUEVES	F
OFICIAL	0			VIERNES	F
AYUDANTE	0			SÁBADO	F
RESIDENTE	1		1	LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se relizaron actividades administrativas como revisión de información contrual del contrato.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realiza visita de campo a cada uno de los frentes de obra, asi mismo se realizan mesas de trabajo conjuntas para la verificacion y ajuste de los presupuestos iniciales y elaboracion de diagnosticos.
El porcentaje de ejecución obedece al tiempo en el cual se han realizado para la elaboracion de presupuestos y diagnosticos de las 13 sedes a intervenir.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	30	12	24	No. INFORME	3	SEMANA No.	23/12/24 al 29/12/24

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



Fecha:27/12/24
Descripción: Visita de obra para la compra de material.



Fecha:27/12/24
Descripción: Visita de obra para la compra de material.



Fecha:27/12/24
Descripción: Visita de obra para la compra de material.



Fecha:27/12/24
Descripción: Visita de obra para la compra de material.

1. FECHA ELABORACIÓN:	30	12	24	2. No. INFORME	3	3. SEMANA No.	23/12/24 al 29/12/24			
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	CENTRO CRECER CAMPO ALEGRE CALANDAIMA			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	KR 88 # 6A – 36					

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024			7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$	1.299.753.000
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	11. PLAZO:	31 de diciembre	Meses/días
VV 12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:			Meses/días	14. ADICIONES:	$	-
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO									
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT									
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024			18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$	284.642.402
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	22. PLAZO:	31 de diciembre	Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:			Meses/días	25. ADICIONES:	$	-
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES									
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA									

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,0%	1,0%	Se realizaron actividades administrativas.	
CIMENTACION	0,0%	0,0%		
MAMPOSTERIA	0,0%	0,0%		
INSTALACIONES ELECTRICAS	0,0%	0,0%		
PAÑETE Y PINTURA	0,0%	0,0%		
CUBIERTAS	0,0%	0,0%		
ASEO Y DISPOSICION FINAL	0,0%	0,0%		
TOTAL	0,0%	1,0%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	4,0%	0,0%	4,0%
Durante el periodo	1,2%	0,0%	1,2%
Acumulado Actual	5,2%	0,0%	5,2%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0,0%	0,0%
Valor de la Obra Programada	$ -	$ -

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	1,2%	5,2%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 1.383.238,58	$ 5.994.033,83

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

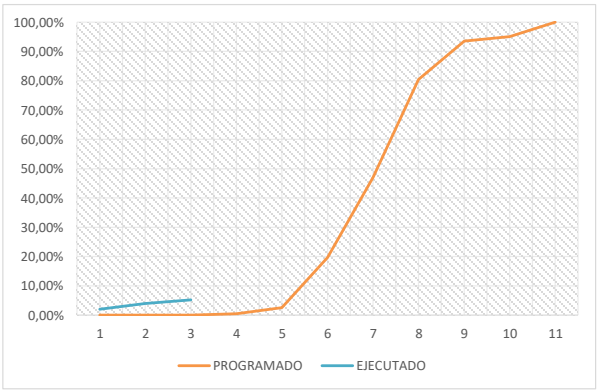

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
ALMACENISTA	0			LUNES	L
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	0			MARTES	L
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIERCOLES	F
MAESTRO	0			JUEVES	F
OFICIAL	0			VIERNES	F
AYUDANTE	0			SÁBADO	F
RESIDENTE	1		1	LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se relizaron actividades administrativas como revisión de información contrual del contrato.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realiza visita de campo a cada uno de los frentes de obra, asi mismo se realizan mesas de trabajo conjuntas para la verificacion y ajuste de los presupuestos iniciales y elaboracion de diagnosticos.
El porcentaje de ejecución obedece al tiempo en el cual se han realizado para la elaboracion de presupuestos y diagnosticos de las 13 sedes a intervenir.



Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	30	12	24	No. INFORME	3	SEMANA No.	23/12/24 al 29/12/24

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



Fecha:27/12/24
Descripción: Visita de obra



Fecha:27/12/24
Descripción: Visita de obra



Fecha:27/12/24
Descripción: Visita de obra



Fecha:27/12/24
Descripción: Visita de obra

1. FECHA ELABORACIÓN:	30	12	24	2. No. INFORME	3	3. SEMANA No.	23/12/24 al 29/12/24	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO KENNEDY			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	AK 80 # 43-43 SUR			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$	1.299.753.000
9. FECHA ACTA INICIO:	11 / 12 / 24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	11. PLAZO:	31 de diciembre	Meses/días
VV								
12. PRORROGAS:	N/A	13. SUSPENSIONES:				Meses/días	14. ADICIONES:	$ -
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO							
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$	284.642.402
20. FECHA ACTA INICIO:	11 / 12 / 24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	22. PLAZO:	31 de diciembre	Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A	24. SUSPENSIONES:				Meses/días	25. ADICIONES:	$ -
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES							
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,0%	1,0%	Se realizaron actividades administrativas.	
CIMENTACION	0,0%	0,0%		
MAMPOSTERIA	0,0%	0,0%		
INSTALACIONES ELECTRICAS	0,0%	0,0%		
PAÑETE Y PINTURA	0,0%	0,0%		
CUBIERTAS	0,0%	0,0%		
ASEO Y DISPOSICION FINAL	0,0%	0,0%		
TOTAL	0,0%	1,0%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	5,0%	0,0%	5,0%
Durante el periodo	0,0%	0,0%	0,0%
Acumulado Actual	5,0%	0,0%	5,0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0,0%	0,0%
Valor de la Obra Programada	$ -	$ -

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0,0%	5,0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ -	$ 3.785.856,69

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

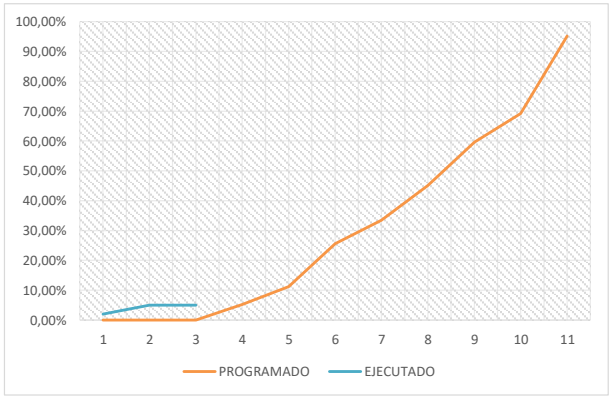

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
ALMACENISTA	0			LUNES	L
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	0			MARTES	L
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIERCOLES	F
MAESTRO	0			JUEVES	F
OFICIAL	0			VIERNES	F
AYUDANTE	0			SÁBADO	F
RESIDENTE	1		1	LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se relizaron actividades administrativas como revisión de información contrual del contrato.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realiza visita de campo a cada uno de los frentes de obra, asi mismo se realizan mesas de trabajo conjuntas para la verificacion y ajuste de los presupuestos iniciales y elaboracion de diagnosticos.
El porcentaje de ejecución obedece al tiempo en el cual se han realizado para la elaboracion de presupuestos y diagnosticos de las 13 sedes a intervenir.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	30	12	24	No. INFORME	3	SEMANA No.	23/12/24 al 29/12/24

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



Fecha:27/12/24
Descripción: Visita de obra



Fecha:27/12/24
Descripción: Visita de obra



Fecha:27/12/24
Descripción: Visita de obra



Fecha:27/12/24
Descripción: Visita de obra

1. FECHA ELABORACIÓN:	30	12	24	2. No. INFORME	3	3. SEMANA No.	23/12/24 al 29/12/24	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDÍN INFANTIL BRITALIA			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	CL 56 SUR # 81-26			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$	1.299.753.000
9. FECHA ACTA INICIO:	11 / 12 / 24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	11. PLAZO:	31 de diciembre	Meses/días
VV 12. PRORROGAS:	N/A	13. SUSPENSIONES:				Meses/días	14. ADICIONES:	$ -
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO							
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$	284.642.402
20. FECHA ACTA INICIO:	11 / 12 / 24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	22. PLAZO:	31 de diciembre	Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A	24. SUSPENSIONES:				Meses/días	25. ADICIONES:	$ -
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES							
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,0%	1,0%	Se realizaron actividades administrativas.	
CIMENTACION	0,0%	0,0%		
MAMPOSTERIA	0,0%	0,0%		
INSTALACIONES ELECTRICAS	0,0%	0,0%		
PAÑETE Y PINTURA	0,0%	0,0%		
CUBIERTAS	0,0%	0,0%		
ASEO Y DISPOSICION FINAL	0,0%	0,0%		
TOTAL	0,0%	1,0%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	5,0%	0,0%	5,0%
Durante el periodo	0,0%	0,0%	0,0%
Acumulado Actual	5,0%	0,0%	5,0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0,0%	0,0%
Valor de la Obra Programada	$ -	$ -

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0,0%	5,0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ -	$ 3.679.812,85

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

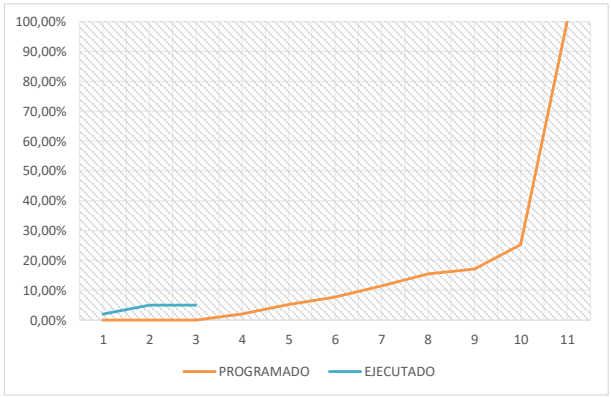

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
ALMACENISTA	0			LUNES	L
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	0			MARTES	L
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIERCOLES	F
MAESTRO	0			JUEVES	F
OFICIAL	0			VIERNES	F
AYUDANTE	0			SÁBADO	F
RESIDENTE	1		1	LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se relizaron actividades administrativas como revisión de información contrual del contrato.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realiza visita de campo a cada uno de los frentes de obra, asi mismo se realizan mesas de trabajo conjuntas para la verificacion y ajuste de los presupuestos iniciales y elaboracion de diagnosticos.
El porcentaje de ejecución obedece al tiempo en el cual se han realizado para la elaboracion de presupuestos y diagnosticos de las 13 sedes a intervenir.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	30	12	24	No. INFORME	3	SEMANA No.	23/12/24 al 29/12/24

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES


F. REGISTRO FOTOGRAFICO



Fecha:27/12/24
Descripción: Visita de obra



Fecha:27/12/24
Descripción: Visita de obra

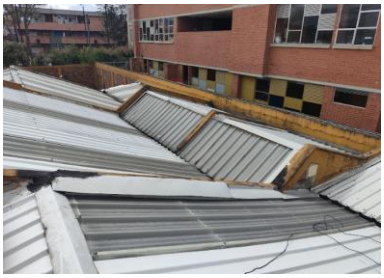

Fecha:27/12/24
Descripción: Visita de obra



Fecha:27/12/24
Descripción: Visita de obra

1. FECHA ELABORACIÓN:	30	12	24	2. No. INFORME	3	3. SEMANA No.	23/12/24 al 29/12/24	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDÍN INFANTIL EL CARACOL			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	KR 95A # 34-86 SUR			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000	
9. FECHA ACTA INICIO:	11 12 24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	11. PLAZO:	31 de diciembre	Meses/días
VV								
12. PRORROGAS:	N/A	13. SUSPENSIONES:				Meses/días	14. ADICIONES:	$ -
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO							
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.642.402	
20. FECHA ACTA INICIO:	11 12 24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	22. PLAZO:	31 de diciembre	Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A	24. SUSPENSIONES:				Meses/días	25. ADICIONES:	$ -
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES							
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,0%	1,0%	Se realizaron actividades administrativas.	
CIMENTACION	0,0%	0,0%		
MAMPOSTERIA	0,0%	0,0%		
INSTALACIONES ELECTRICAS	0,0%	0,0%		
PAÑETE Y PINTURA	0,0%	0,0%		
CUBIERTAS	0,0%	0,0%		
ASEO Y DISPOSICION FINAL	0,0%	0,0%		
TOTAL	0,0%	1,0%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	4,0%	0,0%	4,0%
Durante el periodo	1,7%	0,0%	1,7%
Acumulado Actual	5,7%	0,0%	5,7%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0,0%	0,0%
Valor de la Obra Programada	$ -	$ -

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	1,7%	0,0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 1.807.977,57	$ -

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

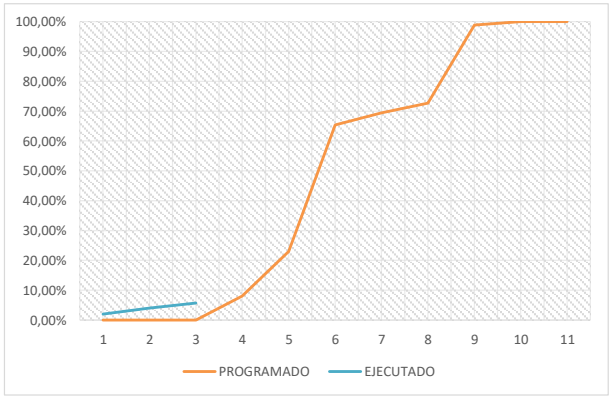

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
ALMACENISTA	0			LUNES	L
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	0			MARTES	L
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIERCOLES	F
MAESTRO	0			JUEVES	F
OFICIAL	0			VIERNES	F
AYUDANTE	0			SÁBADO	F
RESIDENTE	1		1	LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se relizaron actividades administrativas como revisión de información contrual del contrato.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realiza visita de campo a cada uno de los frentes de obra, asi mismo se realizan mesas de trabajo conjuntas para la verificacion y ajuste de los presupuestos iniciales y elaboracion de diagnosticos.
El porcentaje de ejecución obedece al tiempo en el cual se han realizado para la elaboracion de presupuestos y diagnosticos de las 13 sedes a intervenir.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	30	12	24	No. INFORME	3	SEMANA No.	23/12/24 al 29/12/24

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



Fecha:27/12/24
Descripción: Se realiza levantamiento de piso de caucho.



Fecha:27/12/24
Descripción: Se realiza levantamiento de piso de caucho.



Fecha:27/12/24
Descripción: Se realiza levantamiento de piso de caucho.



Fecha:27/12/24
Descripción: Se realiza levantamiento de piso de caucho.

1. FECHA ELABORACIÓN:	30	12	24	2. No. INFORME	3	3. SEMANA No.	23/12/24 al 29/12/24	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDÍN INFANTIL TINTALITO MIS PRIMEROS PASOS			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	KR 86 B # 42 F - 03 SUR			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$	1.299.753.000
9. FECHA ACTA INICIO:	11 / 12 / 24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	11. PLAZO:	31 de diciembre	Meses/días
VV								
12. PRORROGAS:	N/A	13. SUSPENSIONES:				Meses/días	14. ADICIONES:	$ -
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO							
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$	284.642.402
20. FECHA ACTA INICIO:	11 / 12 / 24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	22. PLAZO:	31 de diciembre	Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A	24. SUSPENSIONES:				Meses/días	25. ADICIONES:	$ -
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES							
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,0%	1,0%	Se realizaron actividades administrativas.	
CIMENTACION	0,0%	0,0%		
MAMPOSTERIA	0,0%	0,0%		
INSTALACIONES ELECTRICAS	0,0%	0,0%		
PAÑETE Y PINTURA	0,0%	0,0%		
CUBIERTAS	0,0%	0,0%		
ASEO Y DISPOSICION FINAL	0,0%	0,0%		
TOTAL	0,0%	1,0%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	4,0%	0,0%	4,0%
Durante el periodo	1,7%	0,0%	1,7%
Acumulado Actual	5,7%	0,0%	5,7%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0,0%	0,0%
Valor de la Obra Programada	$ -	$ -

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	1,7%	5,7%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 1.942.451,26	$ 6.512.924,80

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

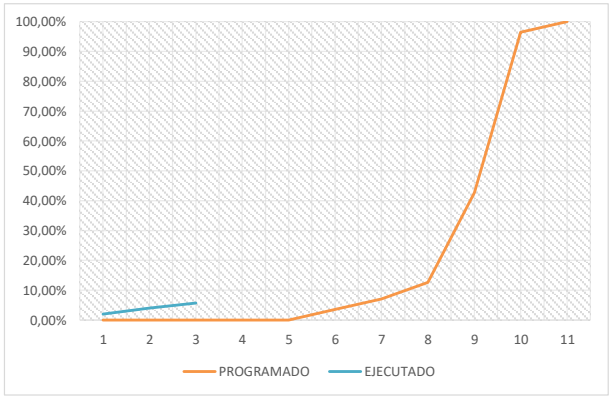

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
ALMACENISTA	0			LUNES	L
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	0			MARTES	L
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIERCOLES	F
MAESTRO	0			JUEVES	F
OFICIAL	0			VIERNES	F
AYUDANTE	0			SÁBADO	F
RESIDENTE	1		1	LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se relizaron actividades administrativas como revisión de información contrual del contrato.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realiza visita de campo a cada uno de los frentes de obra, asi mismo se realizan mesas de trabajo conjuntas para la verificacion y ajuste de los presupuestos iniciales y elaboracion de diagnosticos.
El porcentaje de ejecución obedece al tiempo en el cual se han realizado para la elaboracion de presupuestos y diagnosticos de las 13 sedes a intervenir.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	30	12	24	No. INFORME	3	SEMANA No.	23/12/24 al 29/12/24

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



Fecha:27/12/24
Descripción: Se realiza el desmonte de cielo raso del segundo piso.



Fecha:27/12/24
Descripción: Se realiza el desmonte de cielo raso del segundo piso.



Fecha:27/12/24
Descripción: Se realiza el desmonte de cielo raso del segundo piso.



Fecha:27/12/24
Descripción: Se realiza el desmonte de cielo raso del segundo piso.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Código: FOR-GIF-016 Versión: 0 Fecha: Memo I2021022167 -27/07/2021 Página: 1 de 2

1. FECHA ELABORACIÓN:	6	1	25	2. No. INFORME	4	3. SEMANA No.	30/12/24 al 05/01/25	
4. NOMBRE EQUIPAMENTO	CENTRO LUZ DE ESPERANZA			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	ENGATIVÁ			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000	
9. FECHA ACTA INICIO:	11 / 12 / 24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días
12. PRORROGAS:	23/02/2025	13. SUSPENSIONES:			Meses/días	14. ADICIONES:	$ -	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO							
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.642.402	
20. FECHA ACTA INICIO:	11 / 12 / 24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días
23. PRORROGAS:	23/02/2025	24. SUSPENSIONES:			Meses/días	25. ADICIONES:	$ -	
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES							
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
ALMACENISTA	0,00%	0,00%		
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	2,33%	3,65%	Se realiza el retiro de salidas de iluminarias y tomacorrientes, que se encuentran en las materas a demoler.	Se realiza la solicitud en campo respecto a necesidad de ingresar mayor numero de personal a obra y que pueda adelantar las actividades de demolición de las materas existentes .
TECNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0,00%	0,00%		
MAESTRO	0,00%	0,00%		
OFICIAL	0,00%	0,00%		
AYUDANTE	0,00%	0,00%		
RESIDENTE	0,00%	0,00%		
TOTAL	2,33%	3,65%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	5,2%	0,0%	5,2%
Durante el periodo	3,7%	2,3%	1,3%
Acumulado Actual	8,9%	2,3%	6,5%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	2,3%	2,3%
Valor de la Obra Programada	$ 2.799.448,54	$ 2.799.448,54

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	3,65%	8,85%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 4.381.092,54	$ 10.621.092,54

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

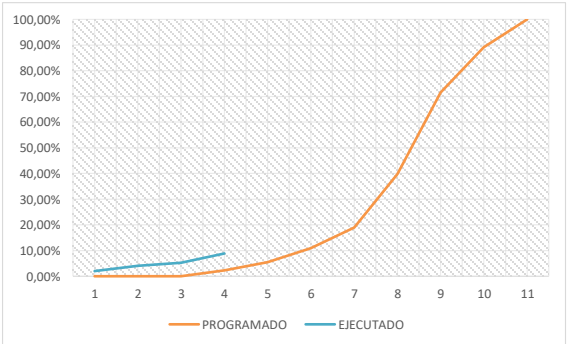

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
ALMACENISTA	0			LUNES	S
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	0			MARTES	S
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIERCOLES	S
MAESTRO	1			JUEVES	L
OFICIAL	0			VIERNES	L
INPECTOR	1			SÁBADO	L
AYUDANTE	1				
RESIDENTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realizara la demolición del enchape existente, retiro del acabado en mortero.
Demolición de materas existentes.
Retiro de material de demolición en terraza.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realiza seguimiento y control del estado actual de este frente de obra, se le solicita al contratista de obra el ingreso de mayor numero de personal ya que a la fecha solo se cuenta con dos trabajadores en este frente.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTORDE INTERVENTORIA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	6	1	25	No. INFORME	4	SEMANA No.	30/12/24 al 05/01/25

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 26/11/2024
DESCRIPCIÓN: Estado actual zona de terraza



FECHA FOTO: 26/11/2024
DESCRIPCIÓN: Estado actual de fachada prinicipal



FECHA FOTO: 26/11/2024
DESCRIPCIÓN: Estado inicial de matera para huerta en terraza



FECHA FOTO: 26/11/2024
DESCRIPCIÓN: Estado actual de áreas piso en terraza

1. FECHA ELABORACIÓN:	6	1	25	2. No. INFORME	4	3. SEMANA No.	30/12/24 al 05/01/25				
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	CENTRO CRECER FONTIBON			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	CALLE 22F #106-26						

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024			7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000		
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días	
12. PRORROGAS:	23/02/2025			13. SUSPENSIONES:		Meses/días		14. ADICIONES:	$ -		
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.682.402		
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días	
23. PRORROGAS:	23/02/2025			24. SUSPENSIONES:		Meses/días		25. ADICIONES:	$ -		
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES										
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA										

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,00%	0,00%	N/A	N/A
MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	5,00%	9,92%	Se realiza el resane de la fisuras presentes el en comedor.	liza el resane de la fisuras presentes el en co
PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	0,00%	0,00%	N/A	N/A
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0,00%	0,00%	N/A	N/A
TOTAL	5,00%	9,92%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	5,2%	0,0%	5,2%
Durante el periodo	9,9%	5,2%	4,7%
Acumulado Actual	15,1%	5,2%	9,9%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	5,2%	5,2%
Valor de la Obra Programada	$ 1.131.669,33	$ 1.131.669,33

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	9,9%	15,1%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 2.170.192,01	$ 3.307.792,66

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

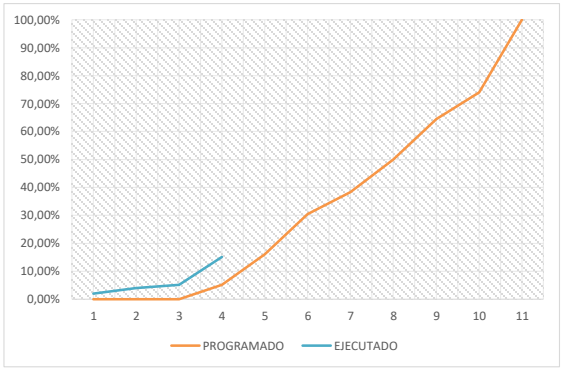

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
RESIDENTE	1			LUNES	S
INSPECTOR DE OBRA	1			MARTES	S
TÉCNICOS ELECTRICO	1			MIERCOLES	S
INSPECTOR SST	1			JUEVES	S
AYUDANTES	1			VIERNES	S
OFICIALES	1			SÁBADO	F
MAESTRO	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se realiza el picado de la superficie de la cubierta.
Se realiaza el alistado del cielo raso y muros del comedor.
Se realizan actividades de resane de muros y techos.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

A la fecha se han adelantado actividades para el resane de las gritas existentes en el sector del comedor; el personal en obra cuenta con los respectivos implementos de seguridad.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	6	1	25	No. INFORME	4	SEMANA No.	30/12/24 al 05/01/25

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO

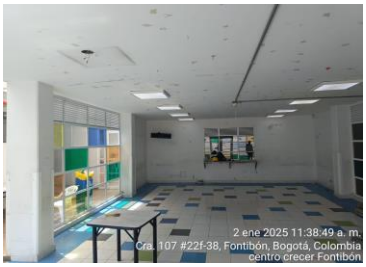

FECHA FOTO: 03/01/2025
DESCRIPCIÓN:



FECHA FOTO: 03/01/2025
DESCRIPCIÓN:



FECHA FOTO: 03/01/2025
DESCRIPCIÓN:



FECHA FOTO: 03/01/2025
DESCRIPCIÓN:

1. FECHA ELABORACIÓN:	6	1	25	2. No. INFORME	4	3. SEMANA No.	30/12/24 al 05/01/25				
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDÍN INFANTIL OSO DE ANTEOJOS			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	CARRERA 100 #23-22						

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024			7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000		
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días	
12. PRORROGAS:	23/02/2025			13. SUSPENSIONES:		Meses/días		14. ADICIONES:	$ -		
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.682.402		
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días	
23. PRORROGAS:	23/02/2025			24. SUSPENSIONES:		Meses/días		25. ADICIONES:	$ -		
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES										
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA										

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	1,12%	1,12%	Se realiza el picado de la superficie de la cubierta.	Se realiza el picado de la superficie de la cubierta.
MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	6,88%	8,18%	Se realizan actividades de resane de muros y techos.	Se realizan actividades de resane de muros y techos.
PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	0,00%	0,00%	N/A	N/A
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0,00%	0,00%	N/A	N/A
TOTAL	8,0%	9,3%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	5,7%	0,0%	5,7%
Durante el periodo	9,3%	8,0%	1,3%
Acumulado Actual	15,0%	8,0%	7,0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	8,0%	8,0%
Valor de la Obra Programada	$ 7.391.232,14	$ 7.391.232,14

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	9,3%	15,0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 8.592.307,36	$ 13.858.560,26

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

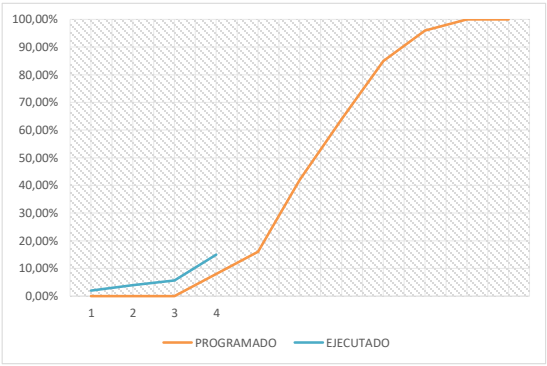

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
RESIDENTE	1			LUNES	S
INSPECTOR DE OBRA	1			MARTES	S
TÉCNICOS ELECTRICO	1			MIERCOLES	S
INSPECTOR SST	1			JUEVES	S
AYUDANTES	3			VIERNES	S
OFICIALES	1			SÁBADO	F
MAESTRO	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se realiza el picado de la superficie de la cubierta.
Se realiaza el alistado del cielo raso y muros del comedor.
Se realizan actividades de resane de muros y techos.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

A la fecha se han adelantado actividades de picado en la cubierta para la nivelacvion de con mortero impermeabilizado, de igual formas se resanan las gritas existentes en el sector del comedor; el personal en obra cuenta con los respectivos implementos de seguridad.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	6	1	25	No. INFORME	4	SEMANA No.	30/12/24 al 05/01/25

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVEN

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 03/01/25
DESCRIPCIÓN:



FECHA FOTO: 03/01/25
DESCRIPCIÓN:



FECHA FOTO: 03/01/25
DESCRIPCIÓN:



FECHA FOTO: 03/01/25
DESCRIPCIÓN:



FECHA FOTO: 03/01/25
DESCRIPCIÓN:



FECHA FOTO: 03/01/25
DESCRIPCIÓN:

1. FECHA ELABORACIÓN:	6	1	25	2. No. INFORME	4	3. SEMANA No.	30/12/24 al 05/01/25			
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDÍN INFANTIL SABANA GRANDE			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	CARRERA 106 #15A-32					

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000			
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días
12. PRORROGAS:	23/02/2025	13. SUSPENSIONES:		Meses/días	14. ADICIONES:	$ -				
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.									
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT									
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.682.402			
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días
23. PRORROGAS:	23/02/2025	24. SUSPENSIONES:		Meses/días	25. ADICIONES:	$ -				
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES									
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA									

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,00%	0,00%	N/A	N/A
MAMPOSTERÍA	0%	0%	N/A	N/A
INSTALACIONES DOMICILIARIAS	0%	0%	N/A	N/A
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES	0%	0%	N/A	N/A
CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	Se realizan actividades de resane de muros y techos.	Se realizan actividades de resane de muros y techos.
CARPINTERÍA METÁLICA	0%	0%	N/A	N/A
CARPINTERÍA MADERA	0%	0%	N/A	N/A
PAÑETE Y PINTURA	0%	0%	N/A	N/A
EQUIPOS	0%	0%	N/A	N/A
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0%	0%	N/A	N/A
TOTAL	0,0%	0,0%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	5,0%	0,0%	5,0%
Durante el periodo	1,8%	0,0%	1,8%
Acumulado Actual	6,8%	0,0%	6,8%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0,0%	0,0%
Valor de la Obra Programada	$ -	$ -

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	1,8%	6,8%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 2.209.695,48	$ 8.487.239,45

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

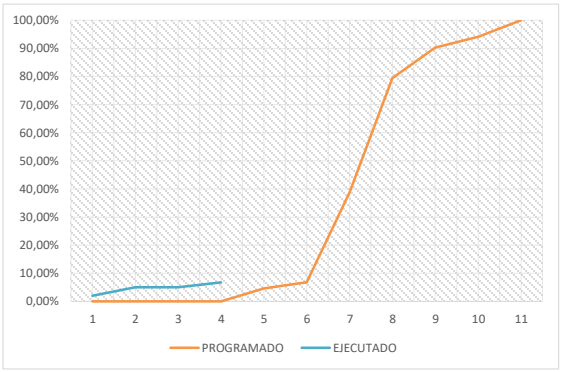

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
RESIDENTE	1			LUNES	S
INSPECTOR DE OBRA	1			MARTES	S
TÉCNICOS ELECTRICO	1			MIERCOLES	S
INSPECTOR SST	1			JUEVES	S
AYUDANTES	1			VIERNES	S
OFICIALES	1			SÁBADO	F
MAESTRO	0			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se realiaza el alistado del cielo raso y muros del comedor.
Se realizan actividades de resane de muros y techos.
En obra ya se encuentra el material necesario para realizar las actividades de obra

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

A la fecha se han adelantado actividades para el resane de las gritas existentes en el sector del comedor; el personal en obra cuenta con los respectivos implementos de seguridad.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	6	1	25	No. INFORME	4	SEMANA No.	30/12/24 al 05/01/25

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVEN

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 03/01/25
DESCRIPCIÓN:



FECHA FOTO: 03/01/25
DESCRIPCIÓN:



FECHA FOTO: 03/01/25
DESCRIPCIÓN:



FECHA FOTO: 03/01/25
DESCRIPCIÓN:



FECHA FOTO: 03/01/25
DESCRIPCIÓN:



FECHA FOTO: 03/01/25
DESCRIPCIÓN:

1. FECHA ELABORACIÓN:	6	1	25	2. No. INFORME	4	3. SEMANA No.	30/12/24 al 05/01/25			
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDÍN INFANTIL EL CARACOL			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	KR 95A # 34-86 SUR					

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024			7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$	1.299.753.000
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días
12. PRORROGAS:	23/02/2025			13. SUSPENSIONES:			Meses/días	14. ADICIONES:	$	-
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.									
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT									
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$	284.682.402
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días
23. PRORROGAS:	23/02/2025			24. SUSPENSIONES:			Meses/días	25. ADICIONES:	$	-
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES									
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA									

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	2,00%	2,00%	Se realiza el retiro del piso de caucho de los salones que se encintraban en mal estado	Se realiza el retiro del piso de caucho de los salones que se encintraban en mal estado
MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	1,00%	1,00%	Se realiza el retiro del cielo razo de las zonas de los corredores del segundo piso	Se realiza el retiro del cielo razo de las zonas de los corredores del segundo piso
CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	2,08%	Se realiza el resane de los cielo rasos en las zonas de los corredores	Se realiza el resane de los cielo rasos en las zonas de los corredores
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0,00%	0,00%	N/A	N/A
TOTAL	3,00%	5,08%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	5,7%	0,0%	5,7%
Durante el periodo	5,1%	8,0%	-2,9%
Acumulado Actual	10,8%	8,0%	2,8%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	8,0%	8,0%
Valor de la Obra Programada	$ 8.518.822,06	$ 8.518.822,06

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	5,1%	10,8%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 5.402.662,38	$ 11.464.704,81

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

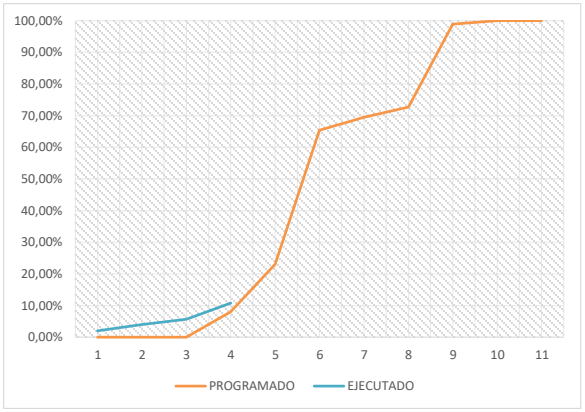

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
RESIDENTE	1			LUNES	S
INSPECTOR DE OBRA	1			MARTES	S
TÉCNICOS ELECTRICO	1			MIERCOLES	S
INSPECTOR SST	1			JUEVES	S
MAESTRO	0			VIERNES	S
OFICIAL	1			SÁBADO	F
AYUDANTE	2			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se realiza el retiro del piso de caucho de los salones que se encintraban en mal estado
Se realiza el retiro del cielo razo de las zonas de los corredores del segundo piso
Se realiza el resane de los cielo rasos en las zonas de los corredores

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

A la fecha se han adelantado actividades para el resane de las gritas y levantamiento de piso de paucho de las aulas; el personal en obra cuenta con los respectivos implementos de seguridad.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	6	1	25	No. INFORME	4	SEMANA No.	30/12/24 al 05/01/25

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO

23	2	25	23 de febrero




FECHA FOTO: 03/01/25
DESCRIPCIÓN:




FECHA FOTO: 03/01/25
DESCRIPCIÓN:



FECHA FOTO: 03/01/25
DESCRIPCIÓN:



FECHA FOTO: 03/01/25
DESCRIPCIÓN:

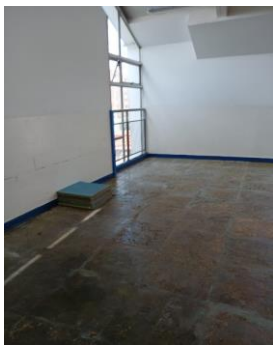

FECHA FOTO: 03/01/25
DESCRIPCIÓN:



FECHA FOTO: 03/01/25
DESCRIPCIÓN:

1. FECHA ELABORACIÓN:	6	1	25	2. No. INFORME	4	3. SEMANA No.	30/12/24 al 05/01/25				
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	CENTRO CRECER CAMPO ALEGRE CALANDAIMA			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	KR 88 # 6A – 36						
A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO											
6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024			7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000		
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días	
12. PRORROGAS:	23/02/2025			13. SUSPENSIONES:		Meses/días		14. ADICIONES:	$ -		
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.682.402		
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días	
23. PRORROGAS:	23/02/2025			24. SUSPENSIONES:		Meses/días		25. ADICIONES:	$ -		
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES										
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA										

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,00%	0,00%	N/A	N/A
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	2,33%	0,98%	Se realiza el retiro de canaleta troquelada y puntos electricos ubicados en el piso para la posterior construccion de la division de cuarto de archivo	Se realiza el retiro de canaleta troquelada y puntos electricos ubicados en el piso para la posterior construccion de la division de cuarto de archivo
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CARPINTERÍA DE MADERA	0,00%	0,00%	N/A	N/A
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0,00%	0,00%	N/A	N/A
TOTAL	2,33%	0,98%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	5,2%	0,0%	5,2%
Durante el periodo	1,0%	0,5%	0,5%
Acumulado Actual	6,2%	0,5%	5,7%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0,5%	0,5%
Valor de la Obra Programada	$ 591.832,70	$ 591.832,70

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	1,0%	6,2%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 1.129.644,84	$ 7.123.678,67

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

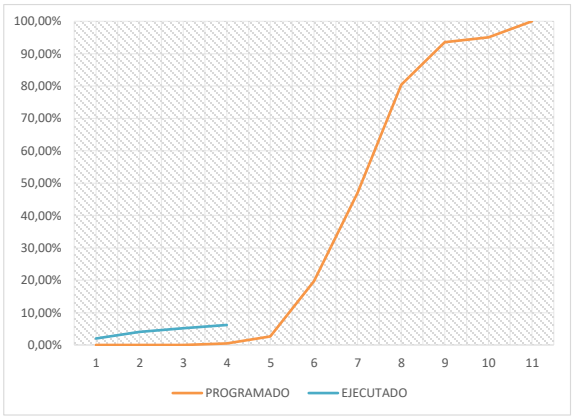

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
RESIDENTE	1			LUNES	S
INSPECTOR DE OBRA	1			MARTES	S
TÉCNICOS ELECTRICO	1			MIERCOLES	S
INSPECTOR SST	1			JUEVES	S
				VIERNES	S
				SÁBADO	F
				LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se realiza el retiro de canaleta troquelada y puntos electricos ubicados en el piso para la posterior construccion de la division de cuarto de archivo

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

A la fecha se han adelantado actividades de retiro de puntos electricos existentes y de la oficina; el personal en obra cuenta con los respectivos implementos de seguridad.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE LA INTERVENTORÍA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	6	12	24	No. INFORME	4	SEMANA No.	30/12/24 al 05/01/25

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 03/01/2025
DESCRIPCIÓN:



ECHA FOTO: 03/01/2025
DESCRIPCIÓN:

1. FECHA ELABORACIÓN:	6	1	25	2. No. INFORME	4	3. SEMANA No.	30/12/24 al 05/01/25	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDÍN INFANTIL TINTALITO MIS PRIMEROS PASOS			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	KR 86 B # 42 F - 03 SUR			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000				
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días	
12. PRORROGAS:	23/02/2025	13. SUSPENSIONES:		Meses/días	14. ADICIONES:	$ -					
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.682.402				
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días	
23. PRORROGAS:	23/02/2025	24. SUSPENSIONES:		Meses/días	25. ADICIONES:	$ -					
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES										
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA										

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	2,0%	2,0%	Se realiza el desmonte de luminarias existentes.	Se realiza el desmonte de luminarias existentes.
INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	2,0%	3,2%	Se alista superficie de muros para el respectivo resane.	Se alista superficie de muros para el respectivo resane.
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0,0%	0,0%	N/A	N/A
TOTAL	4,0%	5,2%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	5,7%	0,0%	5,7%
Durante el periodo	5,2%	0,0%	5,2%
Acumulado Actual	10,9%	0,0%	10,9%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0,0%	0,0%
Valor de la Obra Programada	$ -	$ -

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	5,2%	10,9%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 5.941.615,61	$ 12.454.540,41

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

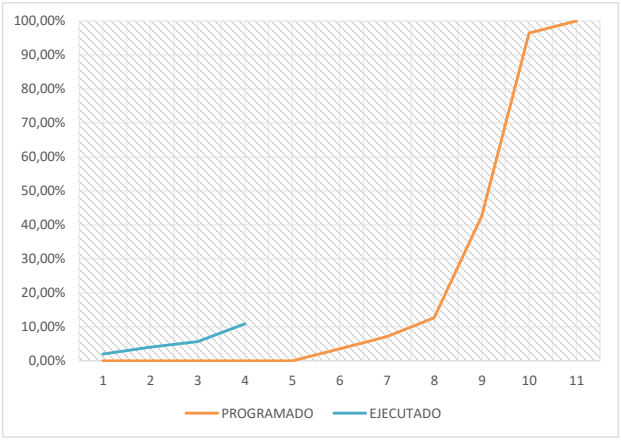

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
RESIDENTE	1			LUNES	S
INSPECTOR DE OBRA	1			MARTES	S
TÉCNICOS ELECTRICO	1			MIERCOLES	S
INSPECTOR SST	1			JUEVES	L
MAESTRO	0			VIERNES	L
OFICIAL	1			SÁBADO	L
AYUDANTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Retiro de cielo raso existente.
Retiro de luminarias existentes.
Se realiaza el alistado del cielo raso y muros del comedor.
Se realizan actividades de resane de muros y techos.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

A la fecha se han adelantado actividades para el resane de las gritas existentes; el personal en obra cuenta con los respectivos implementos de seguridad.

Nombre: MARGRITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	6	1	25	No. INFORME	4	SEMANA No.	30/12/24 al 05/01/25

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 03/01/25
DESCRIPCIÓN:



FECHA FOTO: 03/01/25
DESCRIPCIÓN:



FECHA
DESCRIPCIÓN:



FECHA FOTO: 03/01/25
DESCRIPCIÓN:

1. FECHA ELABORACIÓN:	13	1	25	2. No. INFORME	5	3. SEMANA No.	06/01/25 al 12/01/25			
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDE JARDÍN INFANTIL ENGATIVÁ			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	CL 66B 122-03					

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000			
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO:	23 de febrero de 2025	Meses/días
VV 12. PRORROGAS:	N/A	13. SUSPENSIONES:		Meses/días	14. ADICIONES:	$ -				
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO									
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT									
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.642.402			
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO:	23 de febrero de 2025	Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A	24. SUSPENSIONES:		Meses/días	25. ADICIONES:	$ -				
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES									
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA									

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,0%	12,4%	Se realiza el desmonte de la cubierta existente del comedor.	Se evidencia un avance significativo ya que este frente da inicio a sus actividades.
CIMENTACION	0,0%	0,0%		
MAMPOSTERIA	0,0%	0,0%		
INSTALACIONES ELECTRICAS	0,0%	0,0%		
PAÑETE Y PINTURA	2,8%	0,0%		
CUBIERTAS	0,0%	0,0%		
ASEO Y DISPOSICION FINAL	0,0%	0,0%		
TOTAL	2,8%	12,4%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	5,0%	2,3%	2,7%
Durante el periodo	12,4%	2,8%	9,5%
Acumulado Actual	17,4%	5,1%	12,2%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	2,8%	5,1%
Valor de la Obra Programada	$ 4.016.240,75	$ 7.355.826,29

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	12,4%	17,4%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 17.679.431,12	$ 24.837.095,54

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

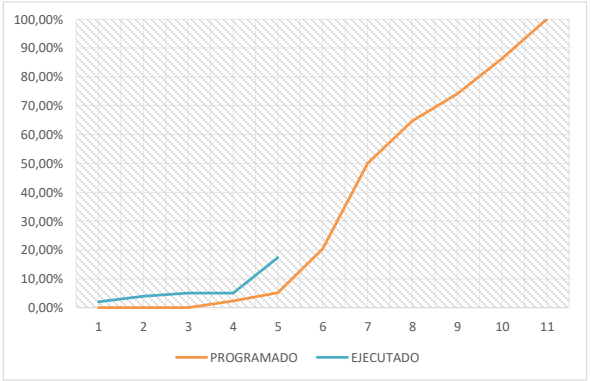

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
INSPECTOR TECNICO	1			LUNES	S
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	1			MARTES	S
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	1			MIERCOLES	S
MAESTRO	1			JUEVES	S
OFICIAL	0			VIERNES	S
AYUDANTE	2			SÁBADO	S
RESIDENTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realiza una observación respecto la cubierta instalada ya que esta no corresponde a la contratada, el contratista realizara el suministro de la teja correspondiente para su instalación.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Para este frente de obra el contratista realiza la instalación de una teja que no corresponde a la contratada, se le solicita al contratista de obra realizar el retiro de la cubierta que no corresponde y la cual no es tenida en cuenta para el calculo del porcentaje ejecutado de la semana 5 para este frente.

Se realizara el cambio de la cubierta según indicaciones de la interventoría y supervisión.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	13	1	25	No. INFORME	5	SEMANA No.	06/01/25 al 12/01/25

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



Fecha:10/01/25
Descripción: Cambio de cubierta en el sector del comedor.



Fecha:10/01/25
Descripción: Desmonte de ventana existente.



Fecha:10/01/25
Descripción: Cambio de cubierta en el sector del comedor.



Fecha:10/01/25
Descripción: Cambio de cubierta en el sector del comedor.



Fecha:10/01/25
Descripción: Cambio de cubierta en el sector del comedor.



Fecha:10/01/25
Descripción: Cambio de cubierta en el sector del comedor.

1. FECHA ELABORACIÓN:	13	1	25	2. No. INFORME	5	3. SEMANA No.	06/01/25 al 12/01/25	
4. NOMBRE EQUIPAMENTO	CENTRO LUZ DE ESPERANZA			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	ENGATIVÁ			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$	1.299.753.000
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO: 23 de febrero 2025 Meses/días
12. PRORROGAS:	23/02/2025	13. SUSPENSIONES:		Meses/días	14. ADICIONES:	$	-	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO							
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$	284.642.402
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO: 23 de febrero 2025 Meses/días
23. PRORROGAS:	23/02/2025	24. SUSPENSIONES:		Meses/días	25. ADICIONES:	$	-	
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES							
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
ALMACENISTA	0,00%	0,00%		
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	2,33%	3,65%	Se realiza el retiro de salidas de iluminarias y tomacorrientes, que se encuentran en las materas a demoler.	Se realiza la solicitud en campo respecto a necesidad de ingresar mayor numero de personal a obra y que pueda adelantar las actividades de demolición de las materas existentes .
TECNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0,00%	0,00%		
MAESTRO	0,00%	0,00%		
OFICIAL	0,00%	0,00%		
AYUDANTE	0,00%	0,00%		
RESIDENTE	0,00%	0,00%		
TOTAL	2,33%	3,65%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	8,9%	2,3%	6,5%
Durante el periodo	0,5%	3,1%	-2,6%
Acumulado Actual	9,4%	5,4%	3,9%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	3,1%	5,4%
Valor de la Obra Programada	$ 3.713.738,97	$ 6.513.187,52

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0,50%	9,35%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 600.000,00	$ 11.221.092,54

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

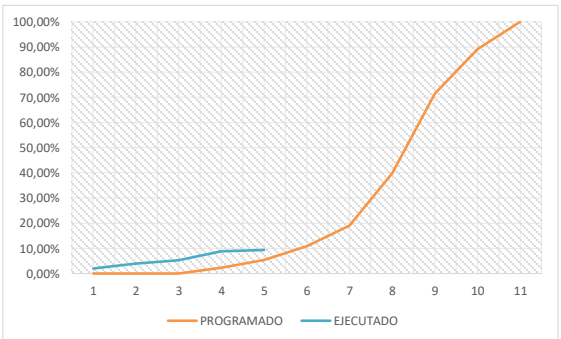

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
INSPECTOR TECNICO	1			LUNES	S
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	1			MARTES	S
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIERCOLES	S
MAESTRO	1			JUEVES	S
OFICIAL	0			VIERNES	S
INPECTOR SST	1			SÁBADO	S
AYUDANTE	1				
RESIDENTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realiza solamente la demolición de los muros de las materas existentes y el retiro de manto asfaltico de dos de estas materas.
Retiro de material de demolición en terraza.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realiza seguimiento y control del estado actual de este frente de obra, se le solicita al contratista de obra el ingreso de mayor numero de personal ya que a la fecha solo se cuenta con dos trabajadores en este frente; se realiza reunión con el referente de Engativá el cual solicita modificaciones al presupuesto lo cual implico retrasos en la ejecución de este frente.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTORDE INTERVENTORIA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	13	1	25	No. INFORME	5	SEMANA No.	06/01/25 al 12/01/25

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



Fecha:10/01/25
Descripción: Demolición de materas existentes.




Fecha:10/01/25
Descripción: Demolición de materas existentes.



Fecha:10/01/25
Descripción: Demolición de materas existentes.



Fecha:10/01/25
Descripción: Demolición de materas existentes.

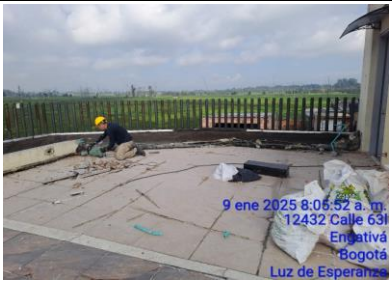

Fecha:10/01/25
Descripción: Enlonado de escombros, para su retiro.



Fecha:10/01/25
Descripción: Enlonado de escombros, para su retiro.

1. FECHA ELABORACIÓN:	13	1	25	2. No. INFORME	5	3. SEMANA No.	06/01/25 al 12/01/25	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	CASA DE PENSAMIENTO INTERCULTURAL SHUSH UREK			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	DIAGONAL 15D #98-40			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$	1.299.753.000
9. FECHA ACTA INICIO:	11 / 12 / 24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días
VV								
12. PRORROGAS:	N/A	13. SUSPENSIONES:			Meses/días	14. ADICIONES:	$	-
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO							
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$	284.642.402
20. FECHA ACTA INICIO:	11 / 12 / 24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A	24. SUSPENSIONES:			Meses/días	25. ADICIONES:	$	-
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES							
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,0%	0,0%		
CIMENTACION	0,0%	0,0%		
MAMPOSTERIA	0,0%	0,0%		
INSTALACIONES ELECTRICAS	0,0%	0,0%		
PAÑETE Y PINTURA	0,0%	0,0%		
CUBIERTAS	6,4%	36,7%	Se realizo en su totalidad el mantenimiento de cubierta de los módulos a intervenir.	Se logro intervenir en su totalidad la intervención y mantenimiento de la cubierta.
ASEO Y DISPOSICION FINAL	0,0%	0,0%		
TOTAL	6,4%	36,7%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	5,0%	0,0%	5,0%
Durante el periodo	36,7%	0,0%	36,7%
Acumulado Actual	41,7%	0,0%	41,7%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	6,4%	6,4%
Valor de la Obra Programada	389717236,91%	$ 3.897.172,37

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	36,7%	41,7%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 22.342.930,96	$ 25.385.793,92

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

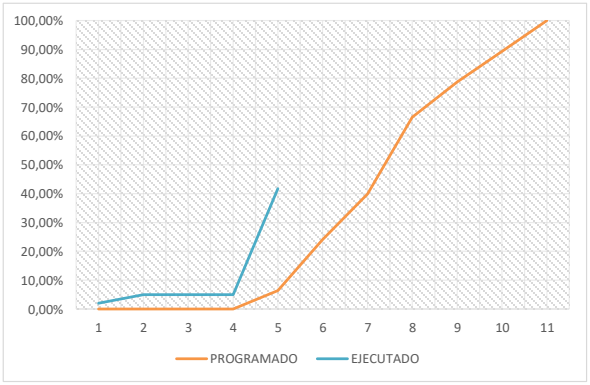

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
INSPECTOR SST	1			LUNES	S
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	0			MARTES	S
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIERCOLES	S
MAESTRO	1			JUEVES	S
OFICIAL	0			VIERNES	S
AYUDANTE	1			SÁBADO	S
RESIDENTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realizo en su totalidad el mantenimiento de cubierta de los módulos a intervenir.
Se realiza el alistado de la superficie de los muros para realizar su posterior aplicación de pintura en esmalte a dos manos.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se da inicio ejecutivo en este frente de obra y se logra realizarla intervención del mantenimiento de la cubierta de los módulos a intervenir.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	13	1	25	No. INFORME	5	SEMANA No.	06/01/25 al 12/01/25

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



Fecha:10/01/25
Descripción: Preparación de superficies para aplicación de pintura.



Fecha:10/01/25
Descripción: Preparación de superficies para aplicación de pintura.



Fecha:10/01/25
Descripción: Mantenimiento de cubierta



Fecha:10/01/25
Descripción: Reunión de seguimiento.



Fecha:10/01/25
Descripción: Preparación de superficies para aplicación de pintura.



Fecha:10/01/25
Descripción: Preparación de superficies para aplicación de pintura.

1. FECHA ELABORACIÓN:	13	1	25	2. No. INFORME	5	3. SEMANA No.	06/01/25 al 12/01/25	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	CENTRO CRECER FONTIBON			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	CALLE 22F #106-26			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$	1.299.753.000
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO: 23 de febrero 2025 Meses/días
12. PRORROGAS:	23/02/2025	13. SUSPENSIONES:		Meses/días	14. ADICIONES:	$	-	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.							
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$	284.682.402
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO: 23 de febrero 2025 Meses/días
23. PRORROGAS:	23/02/2025	24. SUSPENSIONES:		Meses/días	25. ADICIONES:	$	-	
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES							
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,00%	0,00%	N/A	N/A
MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	5,17%	10,08%	Se realiza el resane de la fisuras presentes el en comedor.	Se realiza el resane de la fisuras presentes el en comedor.
PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
INSTALACION DE LUMINARIAS	0,00%	42,90%	Se realiza la instalacion de luminarias del tercer y segundo piso, las cuales se encontraban en mal estado.	Se realiza la instalacion de luminarias del tercer y segundo piso, las cuales se encontraban en mal estado.
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0,00%	0,00%	N/A	N/A
TOTAL	5,17%	52,98%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	15,1%	5,2%	9,9%
Durante el periodo	53,0%	10,8%	42,1%
Acumulado Actual	68,1%	16,0%	52,1%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	10,8%	16,0%
Valor de la Obra Programada	$ 2.372.855,04	$ 3.504.524,37

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

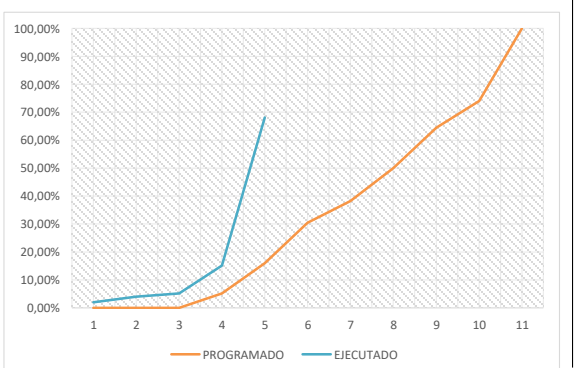

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	53,0%	68,1%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 11.590.400,49	$ 14.898.193,15

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
RESIDENTE	1			LUNES	S
INSPECTOR DE OBRA	1			MARTES	S
TÉCNICOS ELECTRICO	1			MIERCOLES	S
INSPECTOR SST	1			JUEVES	S
AYUDANTES	1			VIERNES	S
OFICIALES	1			SÁBADO	S
MAESTRO	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se realiza la instalacion de luminarias tipo tortuga del tercer piso (zona de las rampas de acceso); instalacion de paneles LED 120x30 e instalacion de iluminarias de energencia.
Se realiaza el alistado del cielo raso y muros del comedor.
Se realizan actividades de resane de muros y techos del sector del comedor.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

A la fecha se han adelantado actividades para el resane de las gritas existentes en el sector del comedor; el personal en obra cuenta con los respectivos implementos de seguridad; asi mismo se ha tenido un gran avance en la parte electrica teniendo ya instaladas mas del 50% de las luminarias.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	13	1	25	No. INFORME	5	SEMANA No.	06/01/25 al 12/01/25

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



Fecha:10/01/25
Descripción: Instalacion de reflectores.



Fecha:10/01/25
Descripción: Instalacion de luminarias de emergencia.



Fecha:10/01/25
Descripción: Resane y pintura del comedor.



Fecha:10/01/25
Descripción: Instalacion de luminarias de emergencia.



Fecha:10/01/25
Descripción: Resane y pintura del comedor.



Fecha:10/01/25
Descripción: Resane y pintura del comedor.

1. FECHA ELABORACIÓN:	13	1	25	2. No. INFORME	5	3. SEMANA No.	06/01/25 al 12/01/25				
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDÍN INFANTIL OSO DE ANTEOJOS			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	CARRERA 100 #23-22						
A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO											
6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024			7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$	1.299.753.000	
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días	
12. PRORROGAS:	23/02/2025			13. SUSPENSIONES:		Meses/días		14. ADICIONES:	$	-	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$	284.682.402	
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días	
23. PRORROGAS:	23/02/2025			24. SUSPENSIONES:		Meses/días		25. ADICIONES:	$	-	
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES										
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA										

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	4,00%	13,04%	Se realiza el picado de la superficie de la cubierta en su totalidad.	Se realiza el enlonado del material de escombro para el retiro de material.
MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	4,00%	20,50%	Se realiza la aplicación de pintura vinilo tipo 1 y pintura epoxica en una altura de 1,50 m.	Se realiza la aplicación de pintura vinilo tipo 1 y pintura epoxica en una altura de 1,50 m.
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	0,00%	0,00%	N/A	N/A
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0,00%	0,00%	N/A	N/A
TOTAL	8,0%	33,5%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	15,0%	8,0%	7,0%
Durante el periodo	33,5%	8,0%	25,5%
Acumulado Actual	48,5%	16,0%	32,5%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	8,0%	16,0%
Valor de la Obra Programada	$ 7.391.232,14	$ 14.782.464,27

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	33,5%	48,5%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 30.987.740,73	$ 44.846.300,99

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

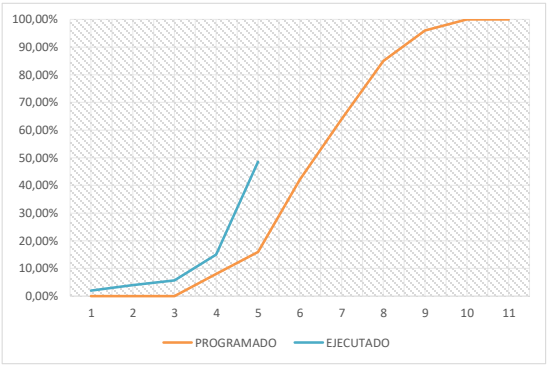

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
RESIDENTE	1			LUNES	S
INSPECTOR DE OBRA	1			MARTES	S
TÉCNICOS ELECTRICO	1			MIERCOLES	S
INSPECTOR SST	1			JUEVES	S
AYUDANTES	3			VIERNES	S
OFICIALES	2			SÁBADO	S
MAESTRO	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se realiza el picado de la superficie de la cubierta en su totalidad.
Se realiza la aplicaciones pintura vinilo tipo 1, en el sector del comedor y deposito.
Se realiza la aplicación de pintura epoxica a una altura de 1,50 m.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

A la fecha se han adelantado actividades de picado en la cubierta para la nivelación de con mortero impermeabilizado, de igual formas se realiza la aplicación de pintura en el sectordel comedor y depositor; el personal en obra cuenta con los respectivos implementos de seguridad.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	13	1	25	No. INFORME	5	SEMANA No. 06/01/25 al 12/01/25

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVEN
CONTRATO OBRA No: 9176-2024	CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No: 9355-2024	INTEVENTORÍA: CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



Fecha:10/01/25
Descripción: Aplicación de pintura en deposito.



Fecha:10/01/25
Descripción: Demarcacion para aplicar pintura epoxica a 1,50.



Fecha:10/01/25
Descripción: Demolicion de mortero en zona de la cubierta.



Fecha:10/01/25
Descripción: Limpieza de elementos como guarda escobas.



Fecha:10/01/25
Descripción: Demolicion de mortero en zona de la cubierta.



Fecha:10/01/25
Descripción: Aplicación de pintura en elsector del comedor.

1. FECHA ELABORACIÓN:	13	1	25	2. No. INFORME	5	3. SEMANA No.	06/01/25 al 12/01/25			
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDÍN INFANTIL SABANA GRANDE			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	CARRERA 106 #15A-32					

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000			
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días
12. PRORROGAS:	23/02/2025	13. SUSPENSIONES:		Meses/días	14. ADICIONES:	$ -				
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.									
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT									
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.682.402			
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días
23. PRORROGAS:	23/02/2025	24. SUSPENSIONES:		Meses/días	25. ADICIONES:	$ -				
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES									
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA									

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,00%	8,20%	N/A	N/A
MAMPOSTERÍA	0,00%	0,00%	N/A	N/A
INSTALACIONES DOMICILIARIAS	0,00%	0,00%	N/A	N/A
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES	0,00%	10,82%	Se realiza la instalación de luminarias de segundo piso, así como la instalación de luminarias de emergencia.	Se realiza la instalación de luminarias de segundo piso, así como la instalación de luminarias de emergencia.
CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	4,64%	5,20%	Se realizan actividades de resane de muros y techos en el sector del comedor.	Se realizan actividades de resane de muros y techos en el sector del comedor.
CARPINTERÍA METÁLICA	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CARPINTERÍA MADERA	0,00%	0,00%	N/A	N/A
PAÑETE Y PINTURA	0,00%	8,36%	Se realizan actividades de pintura de muros y techos en el sector del comedor.	Se realizan actividades de pintura de muros y techos en el sector del comedor.
EQUIPOS	0,00%	0,00%	N/A	N/A
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0,00%	0,00%	N/A	N/A
TOTAL	4,64%	32,58%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	6,8%	0,0%	6,8%
Durante el periodo	32,6%	4,6%	27,9%
Acumulado Actual	39,3%	4,6%	34,7%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	4,6%	4,6%
Valor de la Obra Programada	$ 5.819.598,25	$ 5.819.598,25

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	32,6%	39,3%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 40.907.741,96	$ 49.394.981,41

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

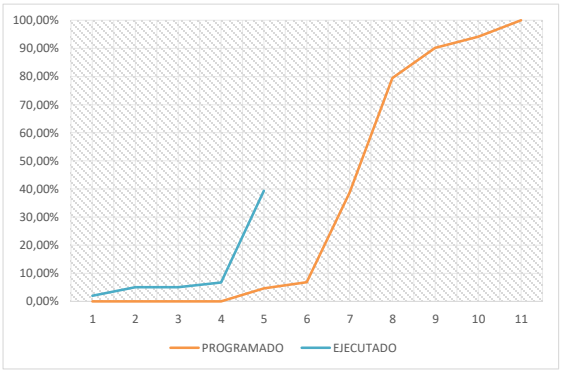

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
RESIDENTE	1			LUNES	S
INSPECTOR DE OBRA	1			MARTES	S
TÉCNICOS ELECTRICO	1			MIERCOLES	S
INSPECTOR SST	1			JUEVES	S
AYUDANTES	1			VIERNES	S
OFICIALES	1			SÁBADO	S
MAESTRO	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se realiza el alistado del cielo raso y muros del comedor.
Se realizan actividades de pintura de muros y techos en el sector del comedor.
En obra ya se encuentra el material necesario para realizar las actividades de obra
Se realiza la instalación de luminarias de segundo piso, así como la instalación de luminarias de emergencia.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

A la fecha se han adelantado actividades para el resane de las gritas existentes en el sector del comedor, de igual formas se a realizado la instalación de luminarias del segundo piso; el personal en obra cuenta con los respectivos implementos de seguridad.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	13	1	25	No. INFORME	5	SEMANA No.	06/01/25 al 12/01/25

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVEN

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



Fecha:10/01/25
Descripción: Verificación de medidas en baños



Fecha:10/01/25
Descripción: Verificación de medidas en baños



Fecha:10/01/25
Descripción: Aplicación de primera mano de pintura epoxica en cocina



Fecha:10/01/25
Descripción: Verificación de luminarias segundo piso



Fecha:10/01/25
Descripción: Armado de mesones para lava colas.



Fecha:10/01/25
Descripción: Demolición de enchape.

1. FECHA ELABORACIÓN:	6	1	25	2. No. INFORME	4	3. SEMANA No.	30/12/24 al 05/01/25				
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDÍN INFANTIL EL CARACOL			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	KR 95A # 34-86 SUR						

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024			7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000		
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días	
12. PRORROGAS:	23/02/2025			13. SUSPENSIONES:		Meses/días		14. ADICIONES:	$ -		
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.682.402		
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días	
23. PRORROGAS:	23/02/2025			24. SUSPENSIONES:		Meses/días		25. ADICIONES:	$ -		
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES										
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA										

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	2,00%	2,00%	Se realiza el retiro del piso de caucho de los salones que se encintraban en mal estado	Se realiza el retiro del piso de caucho de los salones que se encintraban en mal estado
MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	1,00%	1,00%	Se realiza el retiro del cielo razo de las zonas de los corredores del segundo piso	Se realiza el retiro del cielo razo de las zonas de los corredores del segundo piso
CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	2,08%	Se realiza el resane de los cielo rasos en las zonas de los corredores	Se realiza el resane de los cielo rasos en las zonas de los corredores
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0,00%	0,00%	N/A	N/A
TOTAL	3,00%	5,08%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	5,7%	0,0%	5,7%
Durante el periodo	5,1%	3,0%	2,1%
Acumulado Actual	10,8%	3,0%	7,8%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	3,0%	3,0%
Valor de la Obra Programada	$ 3.190.548,65	$ 3.190.548,65

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	5,1%	10,8%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 5.402.662,38	$ 11.464.704,81

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

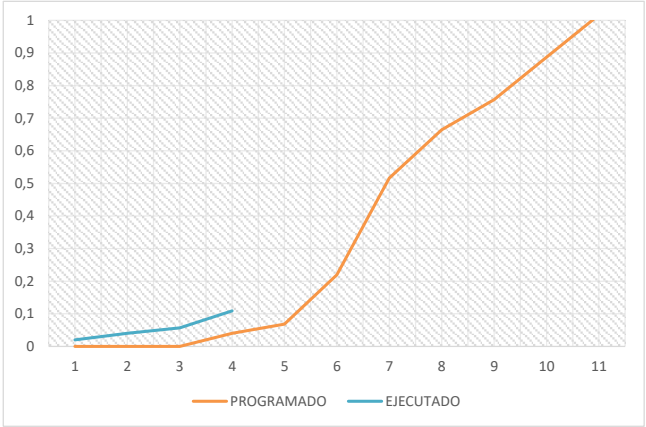

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
RESIDENTE	1			LUNES	S
INSPECTOR DE OBRA	1			MARTES	S
TÉCNICOS ELECTRICO	1			MIERCOLES	S
INSPECTOR SST	1			JUEVES	S
MAESTRO	0			VIERNES	S
OFICIAL	1			SÁBADO	F
AYUDANTE	2			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se realiza el retiro del piso de caucho de los salones que se encintraban en mal estado
Se realiza el retiro del cielo razo de las zonas de los corredores del segundo piso
Se realiza el resane de los cielo rasos en las zonas de los corredores

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

A la fecha se han adelantado actividades para el resane de las gritas y levantamiento de piso de paucho de las aulas; el personal en obra cuenta con los respectivos implementos de seguridad.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	6	1	25	2. No. INFORME	4	3. SEMANA No.	30/12/24 al 05/01/25				
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	CENTRO CRECER CAMPO ALEGRE CALANDAIMA			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	KR 88 # 6A – 36						

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024			7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000		
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días	
12. PRORROGAS:	23/02/2025			13. SUSPENSIONES:		Meses/días		14. ADICIONES:	$ -		
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.682.402		
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días	
23. PRORROGAS:	23/02/2025			24. SUSPENSIONES:		Meses/días		25. ADICIONES:	$ -		
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES										
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA										

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,00%	0,00%	N/A	N/A
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	2,33%	0,98%	Se realiza el retiro de canaleta troquelada y puntos electricos ubicados en el piso para la posterior construccion de la division de cuarto de archivo	Se realiza el retiro de canaleta troquelada y puntos electricos ubicados en el piso para la posterior construccion de la division de cuarto de archivo
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CARPINTERÍA DE MADERA	0,00%	0,00%	N/A	N/A
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0,00%	0,00%	N/A	N/A
TOTAL	2,33%	0,98%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	5,7%	0,0%	5,7%
Durante el periodo	1,0%	2,3%	-1,4%
Acumulado Actual	6,7%	2,3%	4,4%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	2,3%	2,3%
Valor de la Obra Programada	$ 2.685.788,24	$ 2.685.788,24

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	1,0%	6,7%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 1.129.644,84	$ 7.700.028,08

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

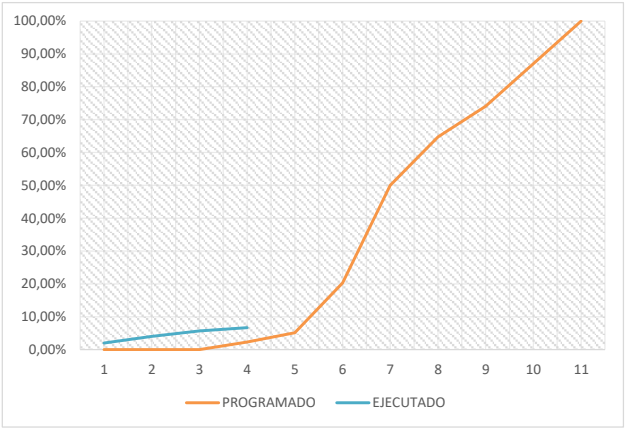

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
RESIDENTE	1			LUNES	S
INSPECTOR DE OBRA	1			MARTES	S
TÉCNICOS ELECTRICO	1			MIERCOLES	S
INSPECTOR SST	1			JUEVES	S
				VIERNES	S
				SÁBADO	F
				LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se realiza el retiro de canaleta troquelada y puntos electricos ubicados en el piso para la posterior construccion de la division de cuarto de archivo

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

A la fecha se han adelantado actividades de retiro de puntos electricos existentes y de la oficina; el personal en obra cuenta con los respectivos implementos de seguridad.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE LA INTERVENTORÍA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	6	1	25	2. No. INFORME	4	3. SEMANA No.	30/12/24 al 05/01/25				
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDÍN INFANTIL TINTALITO MIS PRIMEROS PASOS			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	KR 86 B # 42 F - 03 SUR						

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024			7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000		
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días	
12. PRORROGAS:	23/02/2025			13. SUSPENSIONES:		Meses/días		14. ADICIONES:	$ -		
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.682.402		
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días	
23. PRORROGAS:	23/02/2025			24. SUSPENSIONES:		Meses/días		25. ADICIONES:	$ -		
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES										
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA										

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	2,0%	2,0%	Se realiza el desmonte de luminarias existentes.	Se realiza el desmonte de luminarias existentes.
INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	2,0%	3,2%	Se alista superficie de muros para el respectivo resane.	Se alista superficie de muros para el respectivo resane.
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0,0%	0,0%	N/A	N/A
TOTAL	4,0%	5,2%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	5,7%	0,0%	5,7%
Durante el periodo	5,2%	4,0%	1,2%
Acumulado Actual	10,9%	4,0%	6,9%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	4,0%	4,0%
Valor de la Obra Programada	$ 4.570.473,54	$ 4.570.473,54

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	5,2%	10,9%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 5.941.615,61	$ 12.454.540,41

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

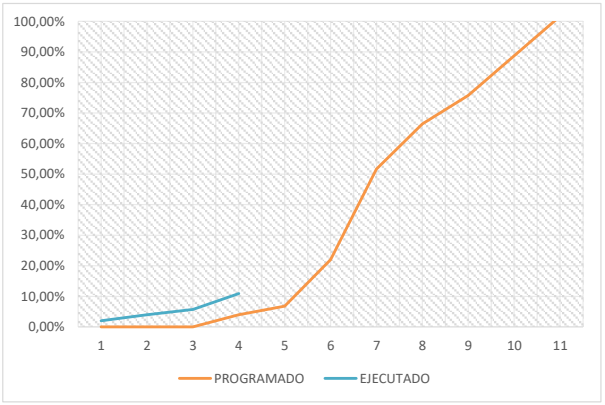

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
RESIDENTE	1			LUNES	S
INSPECTOR DE OBRA	1			MARTES	S
TÉCNICOS ELECTRICO	1			MIERCOLES	S
INSPECTOR SST	1			JUEVES	L
MAESTRO	0			VIERNES	L
OFICIAL	1			SÁBADO	L
AYUDANTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Retiro de cielo raso existente.
Retiro de luminarias existentes.
Se realiaza el alistado del cielo raso y muros del comedor.
Se realizan actividades de resane de muros y techos.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

A la fecha se han adelantado actividades para el resane de las gritas existentes; el personal en obra cuenta con los respectivos implementos de seguridad.

Nombre: MARGRITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	20	1	25	2. No. INFORME	6	3. SEMANA No.	13/01/25 al 19/01/25			
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDE JARDÍN INFANTIL ENGATIVÁ			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	CL 66B 122-03					

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000			
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO:	23 de febrero de 2025	Meses/días
VV 12. PRORROGAS:	N/A	13. SUSPENSIONES:		Meses/días	14. ADICIONES:	$ -				
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO									
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT									
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.642.402			
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO:	23 de febrero de 2025	Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A	24. SUSPENSIONES:		Meses/días	25. ADICIONES:	$ -				
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES									
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA									

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,0%	0,0%	N/A	N/A
MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	7,2%	0,0%	Se realiza el resane de la y alistados de muros, para aplicación de pintura vinilo tipo 1.	Se realiza el resane de la y alistados de muros, para aplicación de pintura vinilo tipo 1.
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	8,0%	26,7%	Se realiza el cambio de la cubierta del sector del comedro, asi mismo se instalan los refuerzos requeridos.	Se realiza el cambio de la cubierta del sector del comedro, asi mismo se instalan los refuerzos requeridos.
INSTALACIONES ELECTRICAS	0,0%	0,0%		
TOTAL	15,2%	26,7%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	17,4%	5,1%	12,2%
Durante el periodo	26,7%	15,2%	11,6%
Acumulado Actual	44,1%	20,3%	23,8%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	15,2%	20,3%
Valor de la Obra Programada	$ 21.698.688,99	$ 29.054.515,28

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	26,7%	44,1%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 38.236.243,34	$ 63.073.338,88

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

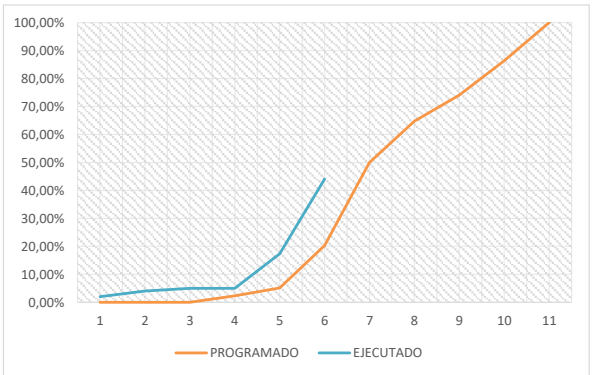

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
INSPECTOR TECNICO	1			LUNES	S
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	1			MARTES	S
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	1			MIERCOLES	S
MAESTRO	1			JUEVES	S
OFICIAL	2			VIERNES	S
AYUDANTE	3			SÁBADO	L
RESIDENTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realiza el cambio de la cubierta del sector del comedro, asi mismo se instalan los refuerzos requeridos.

Se realiza el resane de la y alistados de muros, para aplicación de pintura vinilo tipo 1.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realizo el cambio de la cubierta las cuales cumplen con las condiciones contratadas, asi mismo se instalaron los refuerzos necesarios.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	20	1	25	No. INFORME	6	SEMANA No.	13/01/25 al 19/01/25

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



Fecha:18/01/25
Descripción: Resane y primera mano de pintura muros en comedor.



Fecha:18/01/25
Descripción: Resane y primera mano de pintura de muros en baños.



Fecha:17/01/25
Descripción: Se quitan los ttanques de agua potable.



Fecha:16/01/25
Descripción: Cambio de cubierta.



Fecha:15/01/25
Descripción: Se hace demolición de muro para ventana en salon.



Fecha:16/01/25
Descripción: Cambio de cubierta.

1. FECHA ELABORACIÓN:	20	1	25	2. No. INFORME	6	3. SEMANA No.	13/01/25 al 19/01/25
4. NOMBRE EQUIPAMENTO	CENTRO LUZ DE ESPERANZA			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	ENGATIVÁ		

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000		
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO:	23 de febrero 2025 Meses/días
12. PRORROGAS:	23/02/2025	13. SUSPENSIONES:		Meses/días	14. ADICIONES:	$ -			
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO								
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT								
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.642.402		
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO:	23 de febrero 2025 Meses/días
23. PRORROGAS:	23/02/2025	24. SUSPENSIONES:		Meses/días	25. ADICIONES:	$ -			
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES								
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA								

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,00%	0,00%		
MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	5,44%	8,30%	Se realiza el retiro de manto, en las cubiertas de los puntos fijos.	Se realiza el retiro de manto, en las cubiertas de los puntos fijos.
INSTALACIONES ELECTRICAS	0,00%	4,44%	Se realiza la instalacion de reflectores en terraza.	Se realiza la instalacion de reflectores en terraza.
TOTAL	5,44%	12,74%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	9,4%	5,4%	3,9%
Durante el periodo	12,7%	5,4%	7,3%
Acumulado Actual	22,1%	10,9%	11,2%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	5,4%	10,9%
Valor de la Obra Programada	$ 6.531.530,07	$ 13.044.717,59

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	12,74%	22,09%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 15.289.092,54	$ 26.510.185,09

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

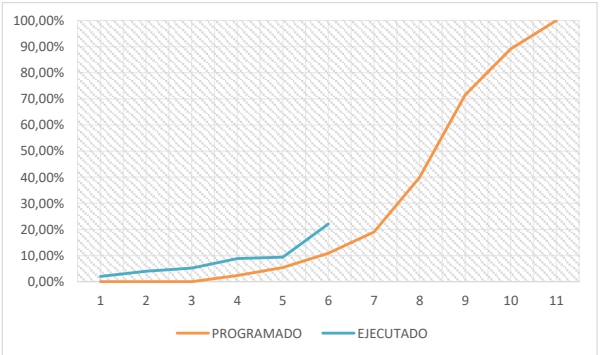

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA


35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
INSPECTOR TECNICO	1			LUNES	S
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	1			MARTES	S
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIERCOLES	S
MAESTRO	1			JUEVES	S
OFICIAL	0			VIERNES	S
INPECTOR SST	1			SÁBADO	L
AYUDANTE	1				
RESIDENTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realiza solamente la demolición de los muros de las materas existentes y el retiro de manto asfaltico de dos de estas materas.
Retiro de material de demolición en terraza.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realiza seguimiento y control del estado actual de este frente de obra, se le solicita al contratista de obra el ingreso de mayor numero de personal ya que a la fecha solo se cuenta con dos trabajadores en este frente.



Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTORDE INTERVENTORIA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	20	1	25	No. INFORME	6	SEMANA No.	13/01/25 al 19/01/25

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



Fecha:20/01/25
Descripción: Suninistro e instalación tuberia EMT, en terraza.



Fecha:20/01/25
Descripción: Suninistro e instalación cajas para reflectores, en terraza.



Fecha:16/01/25
Descripción: Suministro e instalación panel led 24 w.



Fecha:15/01/25
Descripción: Suministro e instalación de luninaria de emergencia.



Fecha:15/01/25
Descripción: Retiro de manto impermeale de materas.



Fecha:13/01/25
Descripción: Recolección de materiales de demolición de materas.

1. FECHA ELABORACIÓN:	20	1	25	2. No. INFORME	6	3. SEMANA No.	13/01/25 al 19/01/25			
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	CASA DE PENSAMIENTO INTERCULTURAL SHUSH UREK			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	DIAGONAL 15D #98-40					

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000			
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días
VV 12. PRORROGAS:	N/A	13. SUSPENSIONES:		Meses/días	14. ADICIONES:	$ -				
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO									
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT									
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.642.402			
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A	24. SUSPENSIONES:		Meses/días	25. ADICIONES:	$ -				
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES									
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA									

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,0%	0,0%		
CIMENTACION	0,0%	0,0%		
MAMPOSTERIA	0,0%	0,0%		
INSTALACIONES ELECTRICAS	0,0%	0,0%		
PAÑETE Y PINTURA	17,1%	42,3%	Se reliza la aplicación de pintura en esmalte a dos manos, en cuatro aulas.	Se reliza la aplicación de pintura en esmalte a dos manos, en cuatro aulas.
CUBIERTAS	0,0%	0,0%		
ASEO Y DISPOSICION FINAL	0,0%	0,0%		
TOTAL	17,1%	42,3%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	41,7%	6,4%	35,3%
Durante el periodo	42,3%	6,4%	35,9%
Acumulado Actual	84,0%	12,8%	71,2%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	17,6%	24,0%
Valor de la Obra Programada	1071530658,27%	$ 14.612.478,95

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	42,3%	84,0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 25.754.792,11	$ 51.140.586,03

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

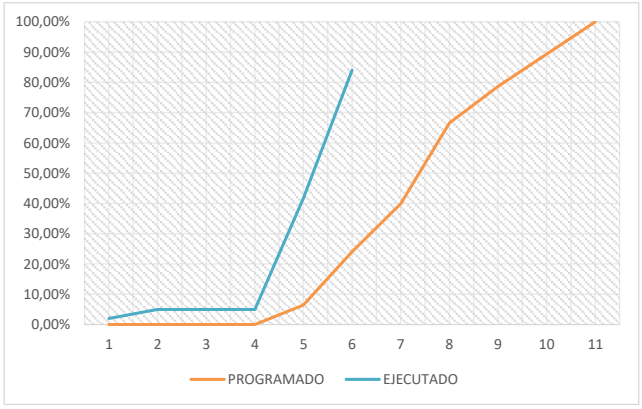

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
INSPECTOR SST	1			LUNES	S
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	0			MARTES	S
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIERCOLES	S
MAESTRO	1			JUEVES	S
OFICIAL	0			VIERNES	S
AYUDANTE	1			SÁBADO	L
RESIDENTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realizo la aplicación de pintura de esmalte a dos manos en cuatro aulas, quedando pendiente la intervencion en el aula ludica la cual es la mas grande en intervencion.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se evidencia un avance significativo en este frente de obra, se realizo al aislamiento del area en intervencion evitando el ingreso de niños en las zonas de trabajo.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA


Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	20	1	25	No. INFORME	6	SEMANA No.	13/01/25 al 19/01/25

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO

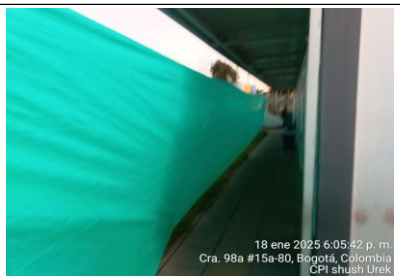

Fecha: 18/01/25
Descripción: Cerramiento con polisombra.



Fecha: 18/01/25
Descripción: Cerramiento con polisombra.



Fecha: 18/01/25
Descripción: Aplicación de pintura de esmalte.



Fecha: 18/01/25
Descripción: Aplicación de pintura de esmalte.



Fecha: 18/01/25
Descripción: Aplicación de pintura de esmalte.



Fecha: 18/01/25
Descripción: Aplicación de pintura de esmalte.

1. FECHA ELABORACIÓN:	20	1	25	2. No. INFORME	6	3. SEMANA No.	13/01/25 al 19/01/25	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	CENTRO CRECER FONTIBON			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	CALLE 22F #106-26			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$	1.299.753.000
9. FECHA ACTA INICIO:	11 / 12 / 2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días
12. PRORROGAS:	23/02/2025	13. SUSPENSIONES:			Meses/días	14. ADICIONES:	$	-
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.							
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$	284.682.402
20. FECHA ACTA INICIO:	11 / 12 / 24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días
23. PRORROGAS:	23/02/2025	24. SUSPENSIONES:			Meses/días	25. ADICIONES:	$	-
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES							
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,00%	0,00%	N/A	N/A
MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
INSTALACION DE LUMINARIAS	14,41%	31,90%	se termina con la instalacion de luminarias.	se termina con la instalacion de luminarias.
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0,00%	0,00%	N/A	N/A
TOTAL	14,41%	31,90%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	68,1%	16,0%	52,1%
Durante el periodo	31,9%	14,4%	17,5%
Acumulado Actual	100,0%	30,4%	69,6%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	14,4%	30,4%
Valor de la Obra Programada	$ 3.152.228,26	$ 6.656.752,63

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	31,9%	100,0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 6.978.742,46	$ 21.876.935,61

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

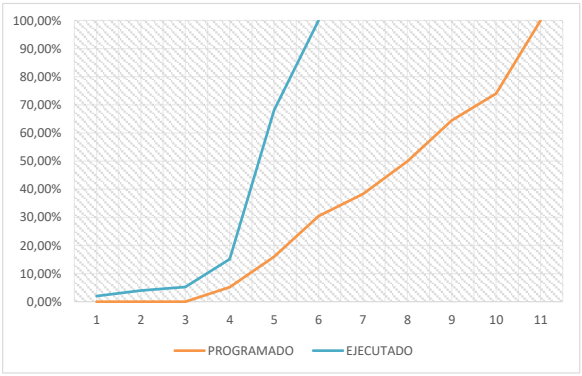

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
RESIDENTE	1			LUNES	S
INSPECTOR DE OBRA	1			MARTES	S
TÉCNICOS ELECTRICO	1			MIERCOLES	S
INSPECTOR SST	1			JUEVES	S
AYUDANTES	0			VIERNES	S
OFICIALES	0			SÁBADO	L
MAESTRO	0			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se culmina con la instalacion de luminaras.
Se realiza recorrido con la coordinacion para la entrega de espacios culminados.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Este frente de obra culmina actividades teniendo un porcentaje ejecutado a la fecha del 100%

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	20	1	25	No. INFORME	6	SEMANA No.	13/01/25 al 19/01/25

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO

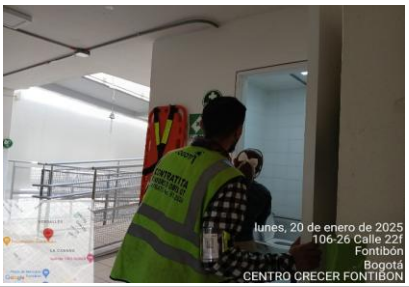

Fecha:18/01/25
Descripción: Recorrido con la coordinadora de la sede.



Fecha:18/01/25
Descripción: Verificacion de luminarias.



Fecha:18/01/25
Descripción: Estado final del comedor.



Fecha:18/01/25
Descripción: Verificacion de luminarias.



Fecha:18/01/25
Descripción: Recorrido con la coordinadora de la sede.



Fecha:18/01/25
Descripción: Recorrido con la coordinadora de la sede.

1. FECHA ELABORACIÓN:	20	1	25	2. No. INFORME	6	3. SEMANA No.	13/01/25 al 19/01/25				
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDÍN INFANTIL OSO DE ANTEOJOS			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	CARRERA 100 #23-22						

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024			7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000		
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días	
12. PRORROGAS:	23/02/2025			13. SUSPENSIONES:		Meses/días		14. ADICIONES:	$ -		
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.682.402		
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días	
23. PRORROGAS:	23/02/2025			24. SUSPENSIONES:		Meses/días		25. ADICIONES:	$ -		
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES										
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA										

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,00%	0,00%	N/A	N/A
MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	26,00%	2,40%	Se reliza la subida de material para la impermeabilizacion de la cubierta; lo cual retraso el avance de la obra.	Se reliza la subida de material para la impermeabilizacion de la cubierta; lo cual retraso el avance de la obra.
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0,00%	0,00%	N/A	N/A
TOTAL	26,0%	2,4%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	48,5%	16,0%	32,5%
Durante el periodo	2,4%	26,0%	-23,6%
Acumulado Actual	50,9%	42,0%	8,9%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	26,0%	42,0%
Valor de la Obra Programada	$ 24.021.504,44	$ 38.803.968,72

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	2,4%	50,9%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 2.217.369,64	$ 47.063.670,63

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

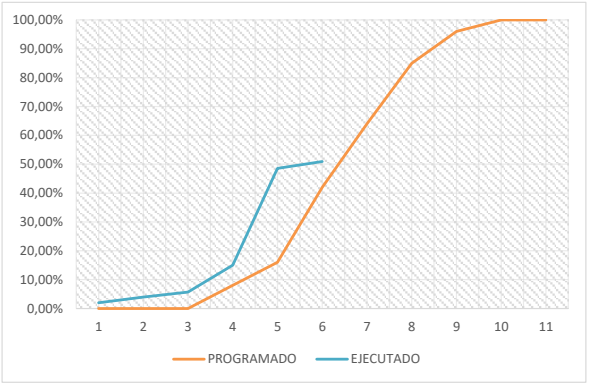

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
RESIDENTE	1			LUNES	S
INSPECTOR DE OBRA	1			MARTES	S
TÉCNICOS ELECTRICO	1			MIERCOLES	S
INSPECTOR SST	1			JUEVES	S
AYUDANTES	3			VIERNES	S
OFICIALES	2			SÁBADO	L
MAESTRO	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se reliza la subida de material para la impermeabilizacion de la cubierta; lo cual retraso el avance de la obra.
Se realiza la aplicaciones pintura epoxica en el sector de la cocina.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se ha subido el material necesario para el alistado del piso en mortero impermeabilizado lo cual retraso las actividades; teniendo en cuenta que el material fue necesario fubirlo hasta la cubierta que esta en l cuarto piso de la sede.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	20	1	25	No. INFORME	6	SEMANA No.	13/01/25 al 19/01/25

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVEN

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



Fecha:18/01/25
Descripción: Resane de fisuras en techo de la cocina.



Fecha:18/01/25
Descripción: Cargue de material para alistado de piso.



Fecha:18/01/25
Descripción: Pintura en techos en la zona del ascensor.



Fecha:18/01/25
Descripción: Cubierta.



Fecha:18/01/25
Descripción: Estado final del comedor



Fecha:18/01/25
Descripción: estado final del deposito.

1. FECHA ELABORACIÓN:	20	1	25	2. No. INFORME	6			3. SEMANA No.	13/01/25 al 19/01/25		
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDÍN INFANTIL SABANA GRANDE			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	CARRERA 106 #15A-32						

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024			7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000		
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días	
12. PRORROGAS:	23/02/2025			13. SUSPENSIONES:				Meses/días	14. ADICIONES:	$ -	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.682.402		
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días	
23. PRORROGAS:	23/02/2025			24. SUSPENSIONES:				Meses/días	25. ADICIONES:	$ -	
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES										
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA										

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,00%	0,00%	N/A	N/A
MAMPOSTERÍA	0,70%	0,00%	N/A	N/A
INSTALACIONES DOMICILIARIAS	0,00%	0,00%	N/A	N/A
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	1,20%	1,72%	Se realizan actividades de resane de muros y techos en el sector de la cocina.	Se realizan actividades de resane de muros y techos en el sector de la cocina.
CARPINTERÍA METÁLICA	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CARPINTERÍA MADERA	0,00%	0,00%	N/A	N/A
PAÑETE Y PINTURA	0,00%	0,00%	N/A	N/A
INSTALACION DE SANITARIOS	0,31%	2,00%	Se realiza la instalación de sanitarios en los baños del segundo piso.	Se realiza la instalación de sanitarios en los baños del segundo piso.
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0,00%	0,00%	N/A	N/A
TOTAL	2,21%	3,72%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	39,3%	4,6%	34,7%
Durante el periodo	3,7%	2,2%	1,5%
Acumulado Actual	43,1%	6,8%	36,2%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	2,2%	6,8%
Valor de la Obra Programada	$ 2.771.896,05	$ 8.591.494,30

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	3,7%	43,1%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 4.670.492,72	$ 54.065.474,13

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

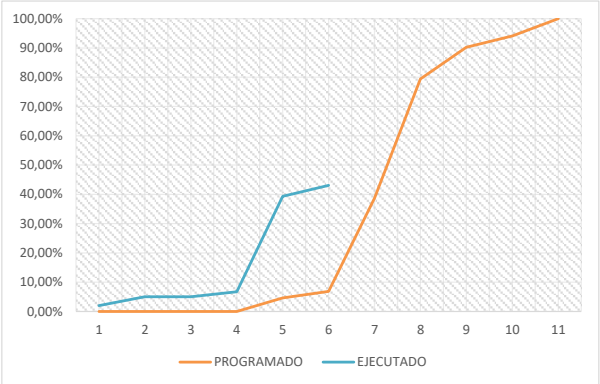

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
RESIDENTE	1			LUNES	S
INSPECTOR DE OBRA	1			MARTES	S
TÉCNICOS ELECTRICO	1			MIERCOLES	S
INSPECTOR SST	1			JUEVES	S
AYUDANTES	0			VIERNES	S
OFICIALES	1			SÁBADO	L
MAESTRO	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se realizan actividades de resane de muros y techos en el sector de la cocina y poder habilitar este espacio para su funcionamiento.
Se realiza la instalación de sanitarios en los baños del segundo piso.
Se realiza la instalación de luminarias del primer piso.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realiza observaciones en los acabados de la pintura en el sector del comedor, así como en la instalación de sanitarios del segundo piso, los cuales se encontraban desnivelados.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	20	1	25	No. INFORME	6	SEMANA No.	13/01/25 al 19/01/25

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVEN

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



Fecha:18/01/25
Descripción: Instalación de granito en el mesón de lava colas.



Fecha:18/01/25
Descripción: Verificación de acabados en el comedor.



Fecha:18/01/25
Descripción: Verificación en la instalacion de sanitarios.



Fecha:18/01/25
Descripción: Verificación en la instalacion de sanitarios.



Fecha:18/01/25
Descripción: Verificación en la instalacion de sanitarios.



Fecha:18/01/25
Descripción: Verificación de luminarias.

1. FECHA ELABORACIÓN:	20	1	25	2. No. INFORME	6	3. SEMANA No.	13/01/25 al 19/01/25				
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDÍN INFANTIL EL CARACOL			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	KR 95A # 34-86 SUR						

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024			7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000		
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días	
12. PRORROGAS:	23/02/2025			13. SUSPENSIONES:		Meses/días		14. ADICIONES:	$ -		
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.682.402		
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días	
23. PRORROGAS:	23/02/2025			24. SUSPENSIONES:		Meses/días		25. ADICIONES:	$ -		
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES										
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA										

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	5,00%	4,50%	Se termina con el levantamiento de piso de caucho en las aulas del segundo piso	Se termina con el levantamiento de piso de caucho en las aulas del segundo piso
MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	60,00%	0,00%	N/A	N/A
CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,40%	0,00%	N/A	N/A
PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	24,75%	Se realiza el resane en los muros de los corresdores y aplicación de pintura en vinilo y Pintura epóxic..	Se realiza el resane en los muros de los corresdores y aplicación de pintura en vinilo y Pintura epóxic..
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0,00%	0,00%	N/A	N/A
TOTAL	65,40%	29,25%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	26,9%	23,0%	3,8%
Durante el periodo	2,4%	42,4%	-40,0%
Acumulado Actual	29,25%	65,4%	-36,1%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	42,4%	65,4%
Valor de la Obra Programada	$ 45.065.086,69	$ 69.551.339,97

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	2,4%	29,3%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 2.552.438,92	$ 31.107.849,33

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

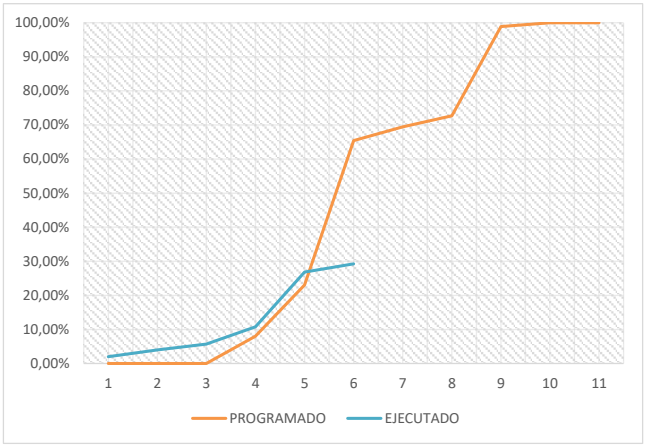

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
RESIDENTE	1			LUNES	S
INSPECTOR DE OBRA	1			MARTES	S
TÉCNICOS ELECTRICO	1			MIERCOLES	S
INSPECTOR SST	1			JUEVES	S
MAESTRO	0			VIERNES	S
OFICIAL	1			SÁBADO	F
AYUDANTE	2			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Resane de muros pasillo norte y sur segundo nivel
Aplicación de pintura tipo vinilo y epóxica en muros del pasillo o corredor del segundo piso.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Revision de puntos de humedad en cielo raso, se recomienda revision en cubierta por filtraciones.

Se recomienda la priorizacion de instalacion de los pisos dado a los olores que se general con el pegamento

Se solicita al personal el suministro de dotacion de acuerdo al manual de identidad visual del distitivo

Se solicita realizar limpieza de los pisos ventanas y paredes salpicadas con pintura aplicada.

Se recomienda revisar el estado del cerramiento provisional de las aulas del segundo piso.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	20	1	25	No. INFORME	6	SEMANA No.	13/01/25 al 19/01/25

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO

23	2	25	23 de febrero



FECHA FOTO: 14/01/25
DESCRIPCIÓN: Se realiza aplicación de pintura tipo vinilo en corredor nororiental de la sede.




FECHA FOTO: 14/01/25
DESCRIPCIÓN: Se realizan resanes de filos en corredor del segundo piso



FECHA FOTO: 17/01/25
DESCRIPCIÓN: Se continuan la aplicación de pintura tipo vinilo en muros de corredor.



FECHA FOTO: 18/01/25
DESCRIPCIÓN: Se realiza resane de filos.

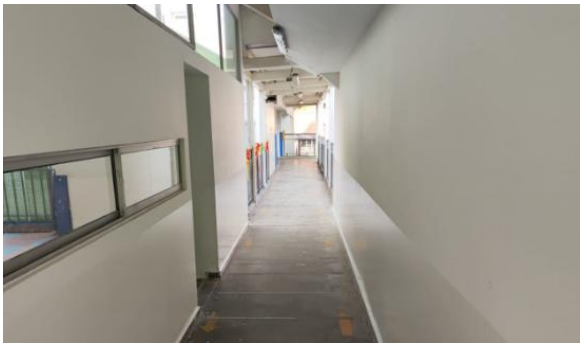

FECHA FOTO: 19/01/25
DESCRIPCIÓN: Se observa muros pintados en vinilo y pintura epóxica.



FECHA FOTO: 19/01/25
DESCRIPCIÓN: Se observa muros pintados en vinilo y pintura epóxica.

1. FECHA ELABORACIÓN:	20	1	25	2. No. INFORME	6	3. SEMANA No.	13/01/25 al 19/01/25				
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	CENTRO CRECER CAMPO ALEGRE CALANDAIMA			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	KR 88 # 6A – 36						

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000				
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días	
12. PRORROGAS:	23/02/2025	13. SUSPENSIONES:		Meses/días	14. ADICIONES:	$ -					
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.682.402				
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días	
23. PRORROGAS:	23/02/2025	24. SUSPENSIONES:		Meses/días	25. ADICIONES:	$ -					
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES										
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA										

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,00%	0,00%	Se realiza la instalacion de luminarias de energencia, para el nuevo muro a construir.	Se realiza la instalacion de luminarias de energencia, para el nuevo muro a construir.
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	2,07%	2,07%	N/A	N/A
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	13,88%	13,88%	N/A	N/A
CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CARPINTERÍA DE MADERA	3,77%	0,00%	N/A	N/A
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0,00%	0,00%	N/A	N/A
TOTAL	19,72%	15,95%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	7,4%	2,6%	4,8%
Durante el periodo	8,6%	17,1%	-8,6%
Acumulado Actual	15,95%	19,72%	-3,8%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	17,1%	19,7%
Valor de la Obra Programada	$ 19.753.897,22	$ 22.734.753,04

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	8,6%	16,0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 9.878.628,84	$ 18.385.546,09

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

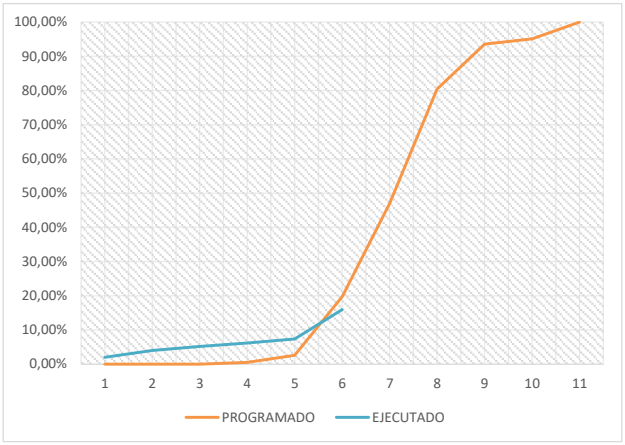

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
RESIDENTE	1			LUNES	S
INSPECTOR DE OBRA	1			MARTES	S
TÉCNICOS ELECTRICO	1			MIERCOLES	S
INSPECTOR SST	1			JUEVES	S
				VIERNES	S
				SÁBADO	F
				LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Suministro e instalacion de canaleta troquelada
Instalacion de puntos electricos
Construccion de Muro en drywall
Aplicación de pintur sobre muros

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se solicita instalar la puerta del archivo con el fin de realizar la entrega del area intervenida.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE LA INTERVENTORÍA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	20	1	25	No. INFORME	6	SEMANA No. 13/01/25 al 19/01/25

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.
CONTRATO OBRA No:	9176-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024
INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 17/01/2025
DESCRIPCIÓN:Se adelantan actividades electricas



ECHA FOTO: 17/01/2025
DESCRIPCIÓN: Se realiza instalacion de puntos electricos



FECHA FOTO: 17/01/2025
DESCRIPCIÓN: Se realiza instalacion de canaleta troquelada de 4x 8 cm



ECHA FOTO: 17/01/2025
DESCRIPCIÓN: Se aplica pintur sobre muro existente en area de archivo.



FECHA FOTO: 17/01/2025
DESCRIPCIÓN: Se realiza construccion de muros en drywall para archivo.



FECHA FOTO: 17/01/2025
DESCRIPCIÓN: Se realiza construccion de muros en drywall para archivo.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Código: FOR-GIF-016 Versión: 0 Fecha: Memo I2021022167 -27/07/2021 Página: 1 de 2

1. FECHA ELABORACIÓN:	20	1	25	2. No. INFORME	6	3. SEMANA No.	13/01/25 al 19/01/25	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDÍN INFANTIL TINTALITO MIS PRIMEROS PASOS			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	KR 86 B # 42 F - 03 SUR			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$	1.299.753.000
9. FECHA ACTA INICIO:	11 / 12 / 24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días
12. PRORROGAS:	23/02/2025	13. SUSPENSIONES:			Meses/días	14. ADICIONES:	$	-
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.							
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$	284.682.402
20. FECHA ACTA INICIO:	11 / 12 / 24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días
23. PRORROGAS:	23/02/2025	24. SUSPENSIONES:			Meses/días	25. ADICIONES:	$	-
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES							
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,0%	5,8%	Se realiza el desmonte de luminarias existentes.	Se realiza el desmonte de luminarias existentes.
INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	1,6%	0,0%	N/A	N/A
ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	2,0%	3,2%	Se alista superficie de muros para el respectivo resane.	Se alista superficie de muros para el respectivo resane.
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	22,5%	Se instala cubierta Ecorrof	Se instala cubierta Ecorrof
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0,0%	0,0%	N/A	N/A
TOTAL	3,55%	31,46%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	16,7%	0,0%	16,7%
Durante el periodo	14,8%	3,5%	11,2%
Acumulado Actual	31,46%	3,5%	27,91%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	3,5%	3,5%
Valor de la Obra Programada	$ 4.054.735,88	$ 4.054.735,88

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	14,8%	31,5%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 16.876.473,56	$ 35.949.970,29

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

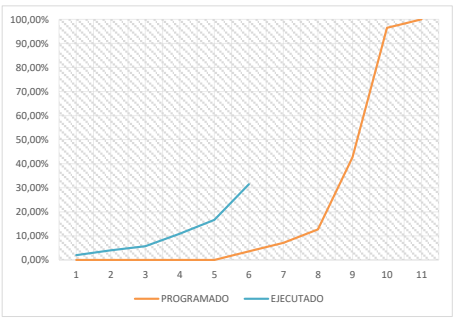

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
RESIDENTE	1			LUNES	S
INSPECTOR DE OBRA	1			MARTES	S
TÉCNICOS ELECTRICO	1			MIERCOLES	S
INSPECTOR SST	1			JUEVES	L
MAESTRO	0			VIERNES	L
OFICIAL	1			SÁBADO	L
AYUDANTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se realiza instalacion de cubierta tipo ecoroof de 2.5 mm de espesor.
Se realiza instalacion de caballetes
Se realiza instalacion de Flanches
Se realiza sello de juntas en cubierta

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se recomienda al contratista de obra iniciar con las actividades electricas programadas.

Nombre: MARGRITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	20	1	25	No. INFORME	6	SEMANA No.	13/01/25 al 19/01/25

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO




FECHA FOTO: 16/01/25
DESCRIPCIÓN: Se realiza instalacion de teja ecorrof.



FECHA FOTO: 16/01/25
DESCRIPCIÓN: Se realiza instalacion de teja ecorrof.



FECHA FOTO: 16/01/25
DESCRIPCIÓN: Se realiza instalacion de teja ecorrof.

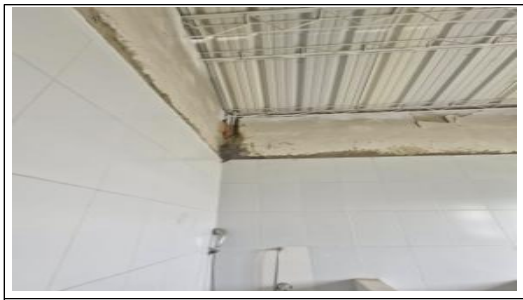

FECHA FOTO: 16/01/25
DESCRIPCIÓN: Se realiza instalacion de teja ecorrof.



FECHA FOTO: 16/01/25
DESCRIPCIÓN: Se realiza instalacion de teja ecorrof.



FECHA FOTO: 16/01/25
DESCRIPCIÓN: Se realiza instalacion de teja ecorrof.



FECHA FOTO: 16/01/25
DESCRIPCIÓN: Se verifica espesor de la teja ecorrof, y cumple con el espersor de 2.5 mm.



FECHA FOTO: 16/01/25
DESCRIPCIÓN: Se realiza instalacion de teja ecorrof.

1. FECHA ELABORACIÓN:	27	1	25	2. No. INFORME	7		3. SEMANA No.	20/01/25 al 26/01/25		
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDE CASA JUVENTUD ALDEA DE PENSADORES			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	KRA 88A 69B 61					

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024			7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$	1.299.753.000
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días
VV 12. PRORROGAS:	23/02/2025			13. SUSPENSIONES:			Meses/días	14. ADICIONES:	$	-
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO									
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT									
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024			18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$	284.642.402
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días
23. PRORROGAS:	23/02/2025			24. SUSPENSIONES:			Meses/días	25. ADICIONES:	$	-
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES									
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA									

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,0%	1,0%	DEMOLICION DEL SHUT DE BASURAS	DEMOLICION DEL SHUT DE BASURAS
MAMPOSTERÍA	0,0%	0,0%	N/A	N/A
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES	0,0%	0,0%	Se realiza instalación de punto eléctrico de interruptor en la portería.	Se realiza instalación de punto eléctrico de interruptor en la portería.
CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
CARPINTERÍA METÁLICA	0,0%	0,0%		
CUBIERTA	0,0%	0,0%	Se realiza el retiro de manto asfaltico, alistado de mortero.	Se realiza el retiro de manto asfaltico, alistado de mortero.
PAÑETE Y PINTURA	0,0%	0,0%	N/A	N/A
TOTAL	0,0%	1,0%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	5,0%	10,9%	-5,9%
Durante el periodo	27,6%	8,1%	19,5%
Acumulado Actual	32,6%	19,0%	13,6%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	8,1%	19,0%
Valor de la Obra Programada	$ 10.645.502,53	$ 24.872.326,18

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	32,6%	27,6%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 42.704.297,97	$ 36.160.580,84

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

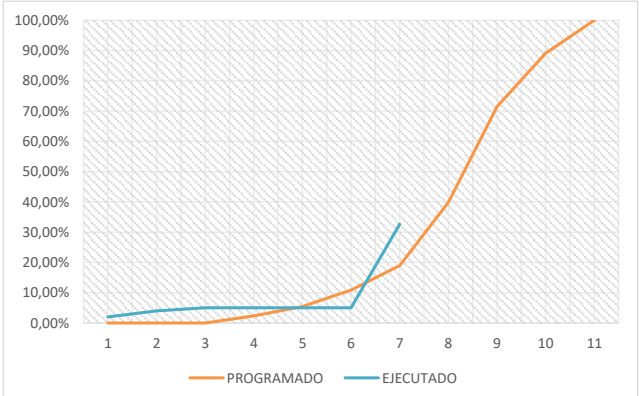

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
INSPECTOR TECNICO	1			LUNES	L
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	1			MARTES	L
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIERCOLES	F
MAESTRO	1			JUEVES	F
OFICIAL	1			VIERNES	F
AYUDANTE	2			SÁBADO	S
RESIDENTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realiza desmonte de cubierta de teja de asbesto.
En obra se encuentra la estructura metálica para la cubierta.
Se realiza la instalación de estructura metálica para la cubierta.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realiza observaciones por parte del profesional SSt y ambiental de interventoría; respecto al desmonte de la cubierta en teja de asbesto, toda vez que no se estaba realizando de manera adecuada.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	27	1	25	2. No. INFORME	7	3. SEMANA No.	20/01/25 al 26/01/25

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



Fecha:23/01/25
Descripción: Se instala la estructura de la cubierta.





Fecha:22/01/25
Descripción: Se termina de bajar la canaleta 90 de la cubierta.



Fecha:21/01/25
Descripción: Llega la estructura metalica para la cubierta.



Fecha:21/01/25
Descripción: Se comienza a bajar la canaleta 90 de la cubierta.

1. FECHA ELABORACIÓN:	27	1	25	2. No. INFORME	7	3. SEMANA No.	20/01/25 al 26/01/25			
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDE JARDÍN INFANTIL ENGATIVÁ			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	CL 66B 122-03					

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000			
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO:	23 de febrero de 2025	Meses/días
VV 12. PRORROGAS:	N/A	13. SUSPENSIONES:		Meses/días		14. ADICIONES:	$ -			
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO									
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT									
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.642.402			
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO:	23 de febrero de 2025	Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A	24. SUSPENSIONES:		Meses/días		25. ADICIONES:	$ -			
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES									
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA									

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,0%	0,0%	Se realiza el desmonte de la cubierta existente del comedor.	Se evidencia un avance significativo ya que este frente da inicio a sus actividades.
MAMPOSTERÍA	0,0%	0,0%	N/A	N/A
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES	2,0%	2,0%	N/A	N/A
CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
CARPINTERÍA METÁLICA	2,8%	0,0%	N/A	N/A
CUBIERTA	22,5%	22,5%	N/A	N/A
PAÑETE Y PINTURA	2,4%	10,8%	N/A	N/A
TOTAL	29,7%	35,3%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	44,1%	20,3%	23,8%
Durante el periodo	35,3%	29,7%	5,6%
Acumulado Actual	79,3%	50,0%	29,3%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	29,7%	50,0%
Valor de la Obra Programada	$ 42.489.245,12	$ 71.543.760,40

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	35,3%	79,3%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 50.475.849,50	$ 113.549.188,38

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

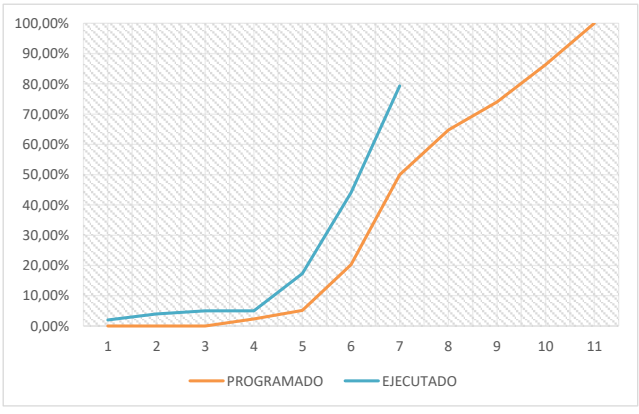

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
INSPECTOR TECNICO	1			LUNES	S
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	1			MARTES	S
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	1			MIERCOLES	S
MAESTRO	1			JUEVES	S
OFICIAL	2			VIERNES	S
AYUDANTE	2			SÁBADO	L
RESIDENTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realiza instalación de cubierta en el sector del comedor y patio.
Se realiza el resane de muros del comedor, pasillo y cocina.
Se aplicación de pintura de vinilo tipo 1, en comedor y pasillo.
Se realiza aplicación de pintura epoxica en cocina, baños y comedor.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se evidencia avance en las actividades de obra, en el sector de la cocina, comedor y patio; así mismo se ha instalado los nuevos tanques de almacenamiento.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	27	1	25	2. No. INFORME	7	3. SEMANA No.	20/01/25 al 26/01/25

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



Fecha:18/01/25
Descripción: Se aplica pintura epoxica en muros del corredor.



Fecha:25/01/25
Descripción: Se cinstalan los dos tanques de agua potable.



Fecha:18/01/25
Descripción: Se aplica pintura epoxica en muros del comedor.



Fecha:24/01/25
Descripción: Se cambian luminarias dañadas.



Fecha:20/01/25
Descripción: Se continua resanando y pintando los muros.



Fecha:20/01/25
Descripción: Se limpia la estructura y se cambia la teja de la cubierta.

1. FECHA ELABORACIÓN:	27	1	25	2. No. INFORME	7	3. SEMANA No.	20/01/25 al 26/01/25	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDE JARDÍN INFANTIL LOS SAUCES			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	CL 69 121-29			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000	
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO: 23 de febrero 2025 Meses/días
VV 12. PRORROGAS:	23/02/2025	13. SUSPENSIONES:		Meses/días	14. ADICIONES:	$ -		
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO							
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.642.402	
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO: 23 de febrero 2025 Meses/días
23. PRORROGAS:	23/02/2025	24. SUSPENSIONES:		Meses/días	25. ADICIONES:	$ -		
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES							
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	5,2%	12,2%	Se realiza raspado de la pintura en mal estado de la fachada; de igual formas se realiza retiro de manto asfaltico en la zona de la cubierta.	Se realiza raspado de la pintura en mal estado de la fachada; de igual formas se realiza retiro de manto asfaltico en la zona de la cubierta.
MAMPOSTERÍA	0,0%	0,0%	N/A	N/A
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES	0,0%	0,0%	N/A	N/A
CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
CARPINTERÍA METÁLICA	0,0%	0,0%	N/A	N/A
CUBIERTA	0,0%	0,0%	N/A	N/A
PAÑETE Y PINTURA	0,0%	0,0%	N/A	N/A
TOTAL	5,2%	12,2%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	5,0%	11,7%	-6,7%
Durante el periodo	7,7%	6,8%	0,9%
Acumulado Actual	12,7%	18,5%	-5,8%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	6,8%	18,5%
Valor de la Obra Programada	$ 8.148.273,16	$ 22.161.954,55

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	7,7%	12,7%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 9.216.708,05	$ 15.209.366,09

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

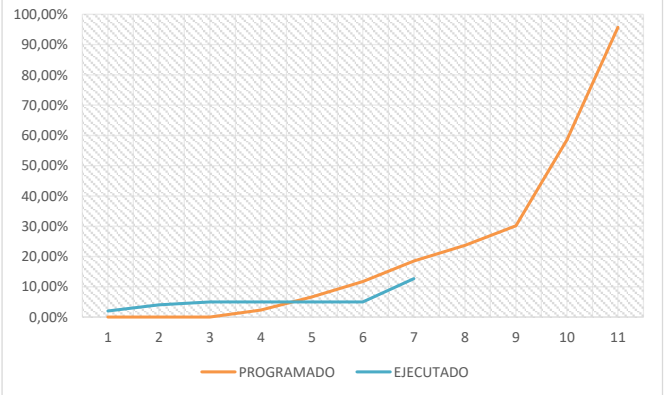

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
INSPECTOR TECNICO	1			LUNES	S
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	0			MARTES	S
INPECTOR SST	1			MIERCOLES	S
MAESTRO	1			JUEVES	S
OFICIAL	2			VIERNES	S
AYUDANTE	4			SÁBADO	S
RESIDENTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realiza raspado de la pintura en mal estado de la fachada; de igual formas se realiza retiro de manto asfaltico en la zona de la cubierta.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se adelanta actividades del retiro de manto asfaltico en la cubierta, se realiza la impermeabilizacion de areas completas mas no de parches.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	27	1	25	2. No. INFORME	7	3. SEMANA No. 20/01/25 al 26/01/25

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



Fecha:27/12/24
Descripción: Visita de obra



Fecha:27/12/24
Descripción: Visita de obra



Fecha:20/01/25
Descripción: Se comienza a pelar la pintura de la fachada



Fecha:20/01/25
Descripción: Se comienza a pelar la pintura de la fachada

1. FECHA ELABORACIÓN:	27	1	25	2. No. INFORME	7	3. SEMANA No.	20/01/25 al 26/01/25
4. NOMBRE EQUIPAMENTO	CENTRO LUZ DE ESPERANZA			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	ENGATIVÁ		

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000			
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días
12. PRORROGAS:	23/02/2025	13. SUSPENSIONES:		Meses/días		14. ADICIONES:	$ -			
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO									
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT									
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.642.402			
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días
23. PRORROGAS:	23/02/2025	24. SUSPENSIONES:		Meses/días		25. ADICIONES:	$ -			
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES									
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA									

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	1,13%	1,13%	DEMOLICION DEL SHUT DE BASURAS	DEMOLICION DEL SHUT DE BASURAS
MAMPOSTERÍA	0,00%	0,00%	N/A	N/A
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES	2,00%	5,00%	Se realiza instalacion de punto electrico de interruptur en la porterira.	Se realiza instalacion de punto electrico de interruptur en la porterira.
CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CARPINTERÍA METÁLICA	0,00%	0,00%		
CUBIERTA	5,00%	6,52%	Se realiza el retiro de manto asfaltico, alistado de mortero.	Se realiza el retiro de manto asfaltico, alistado de mortero.
PAÑETE Y PINTURA	0,00%	0,00%	N/A	N/A
TOTAL	8,13%	12,65%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	12,7%	10,9%	1,9%
Durante el periodo	12,7%	8,1%	4,5%
Acumulado Actual	25,4%	19,0%	6,4%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	8,1%	19,0%
Valor de la Obra Programada	$ 9.760.968,26	$ 22.805.685,85

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	12,65%	25,39%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 15.180.000,00	$ 30.469.092,54

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

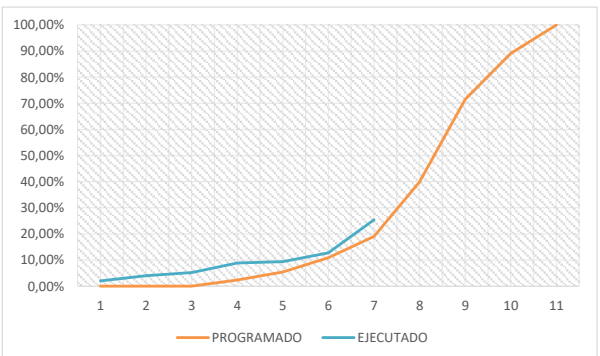

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA


35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
INSPECTOR TECNICO	1			LUNES	S
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	1			MARTES	S
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIERCOLES	S
MAESTRO	1			JUEVES	S
OFICIAL	0			VIERNES	S
INPECTOR SST	1			SÁBADO	S
AYUDANTE	1				
RESIDENTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realiza retiro de manto asfaltico en la cubierta de los puntos fijos.
Se realiza el alistado de pisos en mortero impermeabilizado.
Se realiza demolicion del shut de basuras existente.
Se realiza construccion de muros en superboard de 8mm.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se adelantan actividades durante el fin de semana respecto a la intervencion de la cocina; se han construido 37 ml de media caña en granito.



Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTORDE INTERVENTORIA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	27	1	25	2. No. INFORME	7	3. SEMANA No.	20/01/25 al 26/01/25

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



Fecha:26/01/25
Descripción: Se comienza a fundir el media caña en granito de la cocina.



Fecha:25/01/25
Descripción: Se comienza a enchapar el shut de basuras.



Fecha:23/01/25
Descripción: Se demuele el shut de basuras y se reconstruye con superboard.



Fecha:22/01/25
Descripción: Se hace nivelación con mortero impermeable de la placa del punto fijo.



Fecha:21/01/25
Descripción: Se levanta el manto y se pica la placa del punto fijo.





Fecha:20/01/25
Descripción: Se instala tuberia EMT y los reflectores en la terraza.

1. FECHA ELABORACIÓN:	27	1	25	2. No. INFORME	7	3. SEMANA No.	20/01/25 al 26/01/25			
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	CASA DE PENSAMIENTO INTERCULTURAL SHUSH UREK			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	DIAGONAL 15D #98-40					

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024			7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$	1.299.753.000
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días
VV 12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:			Meses/días	14. ADICIONES:	$	-
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO									
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT									
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024			18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$	284.642.402
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:			Meses/días	25. ADICIONES:	$	-
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES									
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA									

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,0%	0,0%		
CIMENTACION	0,0%	0,0%		
MAMPOSTERIA	0,0%	0,0%		
INSTALACIONES ELECTRICAS	0,0%	0,0%		
PAÑETE Y PINTURA	15,9%	16,0%	Se termina con la aplicación de pintura de esmalte, en las aulas intervenidad.	Se termina con la aplicación de pintura de esmalte, en las aulas intervenidad.
CUBIERTAS	0,0%	0,0%		
ASEO Y DISPOSICION FINAL	0,0%	0,0%		
TOTAL	15,9%	15,97%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	84,0%	24,0%	60,0%
Durante el periodo	16,0%	17,6%	-1,6%
Acumulado Actual	100,0%	41,6%	58,4%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	15,9%	39,9%
Valor de la Obra Programada	967518332,71%	$ 24.287.662,28

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	16,0%	100,0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 9.718.904,30	$ 60.859.490,33

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

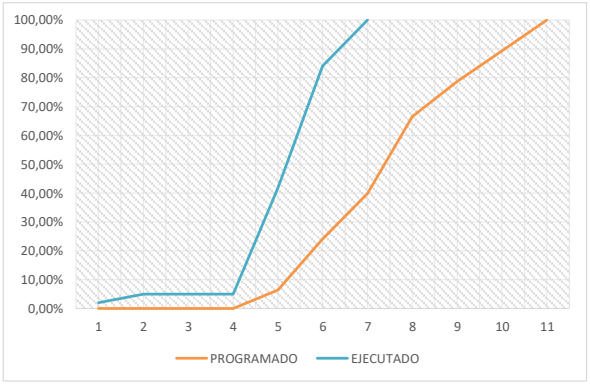

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
INSPECTOR SST	1			LUNES	S
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	0			MARTES	S
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIERCOLES	S
MAESTRO	1			JUEVES	S
OFICIAL	0			VIERNES	S
AYUDANTE	1			SÁBADO	L
RESIDENTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se termina con la aplicación de pintura de esmalte, en las aulas intervenidad.

Para el presente informe se culmina actividades en este frente de obra; en donde su alcance correspondio al manetnimiento de cubierta, aplicación de pintura de esmalte en cuatro aulas y una salal ludica; remplazo de bajantes en mal estado.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Para el presente informe se culmina actividades en este frente de obra; en donde su alcance correspondio al manetnimiento de cubierta, aplicación de pintura de esmalte en cuatro aulas y una salal ludica; remplazo de bajantes en mal estado.



Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	27	1	25	2. No. INFORME	7	3. SEMANA No.	20/01/25 al 26/01/25

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



Fecha: 27/01/25
Descripción: Entrega de espacios a la coordinacion de la sede.



Fecha: 27/01/25
Descripción: Entrega de espacios a la coordinacion de la sede.



Fecha: 27/01/25
Descripción: Entrega de espacios a la coordinacion de la sede.



Fecha: 27/01/25
Descripción: Entrega de espacios a la coordinacion de la sede.



Fecha: 25/01/25
Descripción: Trabajos finales en la sede.



Fecha: 25/01/25
Descripción: Trabajos finales en la sede.

1. FECHA ELABORACIÓN:	27	1	25	2. No. INFORME	7	3. SEMANA No.	20/01/25 al 26/01/25	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDÍN INFANTIL OSO DE ANTEOJOS			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	CARRERA 100 #23-22			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$	1.299.753.000
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO: 23 de febrero 2025 Meses/días
12. PRORROGAS:	23/02/2025	13. SUSPENSIONES:		Meses/días		14. ADICIONES:	$	-
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.							
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$	284.682.402
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO: 23 de febrero 2025 Meses/días
23. PRORROGAS:	23/02/2025	24. SUSPENSIONES:		Meses/días		25. ADICIONES:	$	-
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES							
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,00%	0,00%	N/A	N/A
MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	22,00%	25,20%	Se da inicio con las actividades de instalacion de manto asfaltico.	Se da inicio con las actividades de instalacion de manto asfaltico.
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0,00%	0,00%	N/A	N/A
TOTAL	22,0%	25,2%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	50,9%	42,0%	8,9%
Durante el periodo	25,2%	22,0%	3,2%
Acumulado Actual	76,1%	64,0%	12,1%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	22,0%	64,0%
Valor de la Obra Programada	$ 20.325.888,37	$ 59.129.857,09

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	25,2%	76,1%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 23.282.381,23	$ 70.346.051,86

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

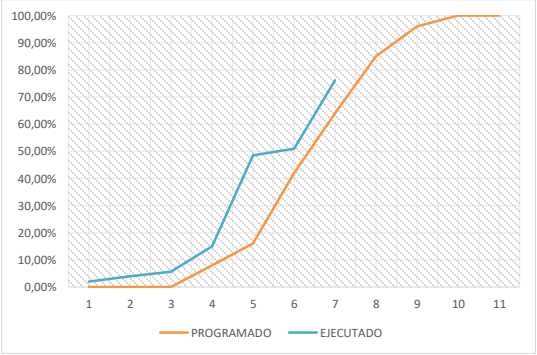

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
RESIDENTE	1			LUNES	S
INSPECTOR DE OBRA	1			MARTES	S
TÉCNICOS ELECTRICO	1			MIERCOLES	S
INSPECTOR SST	1			JUEVES	S
AYUDANTES	3			VIERNES	S
OFICIALES	2			SÁBADO	L
MAESTRO	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se da inicio con las actividades de instalacion de manto asfaltico.

Para el presente conrte de obra se culmina con la intervencion en las zonas de la cocina, alacena, depodito y pasillo de acceso a la cocina; dichos espacios ya se encuentra en funcionamiento por parte de la sede.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Para el presente conrte de obra se culmina con la intervencion en las zonas de la cocina, alacena, depodito y pasillo de acceso a la cocina; dichos espacios ya se encuentra en funcionamiento por parte de la sede.



Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	27	1	25	2. No. INFORME	7	3. SEMANA No.	20/01/25 al 26/01/25

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVEN

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



Fecha:25/01/25
Descripción: Instalacion de manto asfaltico.



Fecha:25/01/25
Descripción: Instalacion de manto asfaltico.



Fecha:25/01/25
Descripción: Instalacion de manto asfaltico.



Fecha:25/01/25
Descripción: Estado final del comedor.



Fecha:25/01/25
Descripción: Instalacion de manto asfaltico.



Fecha:25/01/25
Descripción: Estado final del comedor.

1. FECHA ELABORACIÓN:	27	1	25	2. No. INFORME	7	3. SEMANA No.	20/01/25 al 26/01/25			
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDÍN INFANTIL SABANA GRANDE			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	CARRERA 106 #15A-32					

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000			
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días
12. PRORROGAS:	23/02/2025	13. SUSPENSIONES:		Meses/días	14. ADICIONES:	$ -				
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.									
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT									
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.682.402			
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días
23. PRORROGAS:	23/02/2025	24. SUSPENSIONES:		Meses/días	25. ADICIONES:	$ -				
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES									
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA									

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,00%	0,00%	N/A	N/A
MAMPOSTERÍA	0,00%	0,00%	N/A	N/A
INSTALACIONES DOMICILIARIAS	0,00%	0,00%	N/A	N/A
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES	15,00%	15,00%	Se culmina con la instalación de luminarias de la sede.	Se culmina con la instalación de luminarias de la sede.
CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CARPINTERÍA METÁLICA	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CARPINTERÍA MADERA	0,00%	0,00%	N/A	N/A
PAÑETE Y PINTURA	6,84%	8,36%	Se realiza el resane y pintura en el sector de los baños.	Se realiza el resane y pintura en el sector de los baños.
INSTALACION DE SANITARIOS	10,00%	5,00%	Se realiza la instalación de sanitarios en los baños del segundo piso y primer piso.	Se realiza la instalación de sanitarios en los baños del segundo piso y primer piso.
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0,00%	0,00%	N/A	N/A
TOTAL	31,84%	28,36%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	43,1%	6,8%	36,2%
Durante el periodo	28,4%	31,8%	-3,5%
Acumulado Actual	71,4%	38,7%	32,7%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	31,8%	38,7%
Valor de la Obra Programada	$ 39.975.848,14	$ 48.567.342,44

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	28,4%	71,4%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 35.606.229,41	$ 89.671.703,54

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

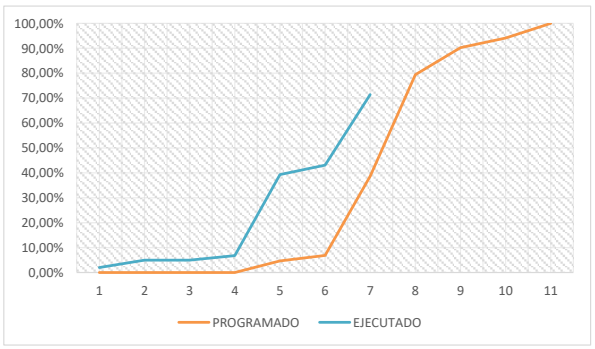

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
RESIDENTE	1			LUNES	S
INSPECTOR DE OBRA	1			MARTES	S
TÉCNICOS ELECTRICO	1			MIERCOLES	S
INSPECTOR SST	1			JUEVES	S
AYUDANTES	0			VIERNES	S
OFICIALES	1			SÁBADO	L
MAESTRO	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se realiza la instalación de sanitarios en los baños del segundo piso y primer piso.
Se realiza el resane y pintura en el sector de los baños.
Se culmina con la instalación de luminarias de la sede.
Se realiza pulida de mesones en granito, para los lava colas.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realiza observaciones en los acabados de la pintura en el sector del comedor, así como en la instalación de sanitarios del segundo piso, los cuales se encontraban desnivelados.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	27	1	25	2. No. INFORME	7	3. SEMANA No.	20/01/25 al 26/01/25

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVEN

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



Fecha: 25/01/2025
Descripción: Instalación de luminarias



Fecha: 25/01/2025
Descripción: Verificacion de luminarias.



Fecha: 25/01/2025
Descripción: Aplicación de pintura epoxica en baños primer piso.



Fecha: 25/01/2025
Descripción: Verificacion de luminarias.



Fecha: 25/01/2025
Descripción: Verificacion de luminarias.



Fecha: 25/01/2025
Descripción: Aplicación de pintura epoxica en baños primer piso.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Código: FOR-GIF-016 Versión: 0 Fecha: Memo I2021022167 - Página: 1 de 2

1. FECHA ELABORACIÓN:	27	1	25	2. No. INFORME	7	3. SEMANA No.	20/01/25 al 26/01/25	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO KENNEDY			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	AK 80 # 43-43 SUR			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$	1.299.753.000
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO: 23 de febrero 2025 Meses/días
VV 12. PRORROGAS:	23/02/2025	13. SUSPENSIONES:		Meses/días	14. ADICIONES:	$	-	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO							
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$	284.642.402
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO: 23 de febrero 2025 Meses/días
23. PRORROGAS:	23/02/2025	24. SUSPENSIONES:		Meses/días	25. ADICIONES:	$	-	
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES							
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	2,1%	0,0%	N/A	N/A
MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	0,0%	0,0%	N/A	N/A
ASEO Y DISPOSICION FINAL	0,0%	0,0%	N/A	N/A
TOTAL	2,1%	0,0%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	5,0%	25,6%	-20,6%
Durante el periodo	0,0%	2,1%	-2,1%
Acumulado Actual	5,0%	27,7%	-22,7%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	2,1%	27,7%
Valor de la Obra Programada	$ 1.590.059,81	$ 20.959.864,90

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0,0%	5,0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ -	$ 3.785.856,69

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

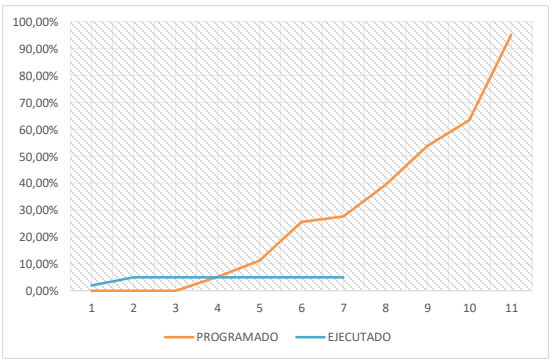

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
ALMACENISTA	1			LUNES	L
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	1			MARTES	L
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	1			MIERCOLES	F
MAESTRO	1			JUEVES	F
OFICIAL	3			VIERNES	F
AYUDANTE	2			SÁBADO	F
RESIDENTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

A la fecha este frente de obra no ha dado inicio efectivo a sus actividades de obra.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se presentara plan de contingencia para este frente de obra toda vez que sus actividades no ha dado inicio.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	27	1	25	2. No. INFORME	7	3. SEMANA No.	20/01/25 al 26/01/25

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



Fecha:27/12/24
Descripción: Visita de obra



Fecha:27/12/24
Descripción: Visita de obra



Fecha:27/12/24
Descripción: Visita de obra



Fecha:27/12/24
Descripción: Visita de obra

1. FECHA ELABORACIÓN:	27	1	25	2. No. INFORME	7		3. SEMANA No.	20/01/25 al 26/01/25		
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDÍN INFANTIL BRITALIA			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	CL 56 SUR # 81-26					

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024			7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$	1.299.753.000
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días
VV 12. PRORROGAS:	23/02/2025			13. SUSPENSIONES:			Meses/días	14. ADICIONES:	$	-
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO									
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT									
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024			18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$	284.642.402
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días
23. PRORROGAS:	23/02/2025			24. SUSPENSIONES:			Meses/días	25. ADICIONES:	$	-
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES									
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA									

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	3,6%	0,3%	Se realiza demolicion de mamposteria para la posterior instalacion de ventana.	Se realiza demolicion de mamposteria para la posterior instalacion de ventana.
MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	0,0%	0,0%	N/A	N/A
ASEO Y DISPOSICION FINAL	0,0%	0,0%	N/A	N/A
TOTAL	3,6%	0,3%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	5,0%	7,8%	-2,8%
Durante el periodo	0,3%	3,6%	-3,4%
Acumulado Actual	5,3%	11,4%	-6,1%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	3,6%	11,4%
Valor de la Obra Programada	$ 2.679.495,45	$ 8.389.548,11

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0,3%	5,3%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 191.350,27	$ 3.871.163,11

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

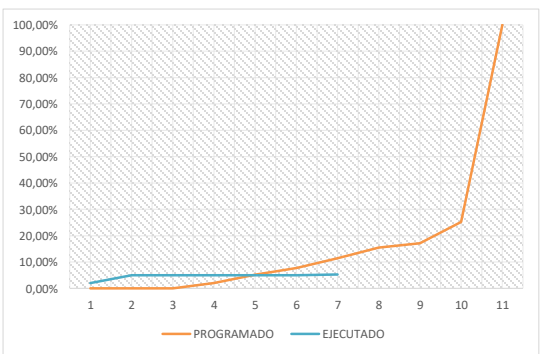

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
ALMACENISTA	1			LUNES	L
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	1			MARTES	L
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	1			MIERCOLES	F
MAESTRO	1			JUEVES	F
OFICIAL	1			VIERNES	F
AYUDANTE	2			SÁBADO	F
RESIDENTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realiza demolicion de mamposteria para la posterior instalacion de ventana.
Se realiza el retiro del tanque, el cual se encontraba en mal estado.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se da inicio a las actividades de este frente de obra, se ha dado inicio a las actividades de demolicion de mamposteria para la instalacion de ventana y de la cual ya se encuentra su suministro en obra.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	27	1	25	2. No. INFORME	7	3. SEMANA No.	20/01/25 al 26/01/25

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



Fecha:26/12/24
Descripción: Verificacion de medidas en obra



Fecha:26/12/24
Descripción: Demolicion de mamposteria para ventana



Fecha:26/12/24
Descripción: Visita de obra



Fecha:26/12/24
Descripción: Estado actual de tanque



Fecha:26/12/24
Descripción: Estado actual de tanque



Fecha:26/12/24
Descripción: Estado actual de canal

1. FECHA ELABORACIÓN:	27	1	25	2. No. INFORME	7	3. SEMANA No.	20/01/25 al 26/01/25				
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDÍN INFANTIL EL CARACOL			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	KR 95A # 34-86 SUR						

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024			7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000		
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días	
12. PRORROGAS:	23/02/2025			13. SUSPENSIONES:		Meses/días		14. ADICIONES:	$ -		
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.682.402		
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días	
23. PRORROGAS:	23/02/2025			24. SUSPENSIONES:		Meses/días		25. ADICIONES:	$ -		
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES										
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA										

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,00%	0,00%	N/A	N/A
MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	4,03%	5,30%	Se realiza el resane en los muros de los corresdores y aplicación de pintura en vinilo y Pintura epóxic..	Se realiza el resane en los muros de los corresdores y aplicación de pintura en vinilo y Pintura epóxic..
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0,00%	0,00%	N/A	N/A
TOTAL	4,03%	5,30%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	29,3%	65,4%	-36,1%
Durante el periodo	5,3%	4,0%	1,3%
Acumulado Actual	34,55%	69,4%	-34,9%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	4,0%	69,4%
Valor de la Obra Programada	$ 4.289.915,60	$ 73.841.255,57

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	2,4%	29,3%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 2.552.438,92	$ 31.107.849,33

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

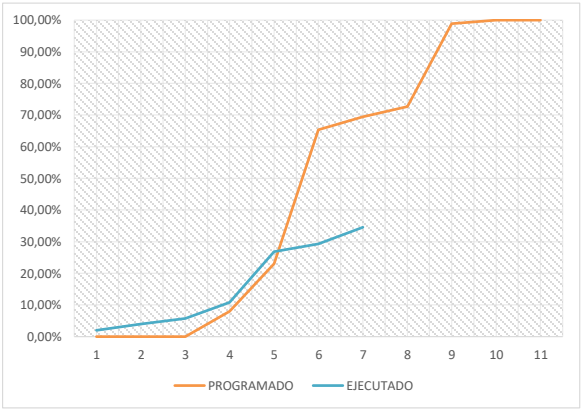

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
RESIDENTE	1			LUNES	S
INSPECTOR DE OBRA	1			MARTES	S
TÉCNICOS ELECTRICO	1			MIERCOLES	S
INSPECTOR SST	1			JUEVES	S
MAESTRO	0			VIERNES	S
OFICIAL	1			SÁBADO	F
AYUDANTE	2			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Resane de muros pasillo norte y sur segundo nivel
Aplicación de pintura tipo vinilo y epóxica en muros del pasillo o corredor del segundo piso.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Revision de puntos de humedad en cielo raso, se recomienda revision en cubierta por filtraciones.

Se recomienda la priorizacion de instalacion de los pisos dado a los olores que se general con el pegamento

Se solicita al personal el suministro de dotacion de acuerdo al manual de identidad visual del distitivo

Se le solicita al contratista de obra la instalacion del piso de caucho, ya que a la fecha no se han instalado lo cual esta causando atrasos en la programacion de obra .

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	27	1	25	2. No. INFORME	7	3. SEMANA No.	20/01/25 al 26/01/25

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.


CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO

23	2	25	23 de febrero



FECHA FOTO: 25/01/25
DESCRIPCIÓN: Se realiza aplicación de pintura tipo vinilo en corredor nororiental de la sede.



FECHA FOTO: 25/01/25
DESCRIPCIÓN: Se realiza aplicación de pintura tipo vinilo en corredor nororiental de la sede.




FECHA FOTO: 25/01/25
DESCRIPCIÓN: Se realiza aplicación de pintura tipo vinilo en corredor nororiental de la sede.



FECHA FOTO: 25/01/25
DESCRIPCIÓN: Se realiza aplicación de pintura tipo vinilo en corredor nororiental de la sede.



FECHA FOTO: 25/01/25
DESCRIPCIÓN: Se realiza aplicación de pintura tipo vinilo en corredor nororiental de la sede.



FECHA FOTO: 25/01/25
DESCRIPCIÓN: Se realiza cerramiento de areas intervenidas

1. FECHA ELABORACIÓN:	27	1	25	2. No. INFORME	7	3. SEMANA No.	20/01/25 al 26/01/25				
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	CENTRO CRECER CAMPO ALEGRE CALANDAIMA			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	KR 88 # 6A – 36						
A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO											
6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000				
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días	
12. PRORROGAS:	23/02/2025	13. SUSPENSIONES:		Meses/días	14. ADICIONES:	$ -					
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.682.402				
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días	
23. PRORROGAS:	23/02/2025	24. SUSPENSIONES:		Meses/días	25. ADICIONES:	$ -					
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES										
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA										

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,00%	0,00%	N/A	N/A
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	4,46%	N/A	Se culmina con la construccion del muro en Drywall para el cuarto de archivo
CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	27,23%	0,00%	N/A	N/A
CARPINTERÍA DE MADERA	0,00%	0,00%	N/A	N/A
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0,00%	0,00%	N/A	N/A
TOTAL	27,23%	4,46%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	16,0%	19,7%	-3,8%
Durante el periodo	5,0%	27,2%	-22,3%
Acumulado Actual	20,91%	46,95%	-26,0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	27,2%	47,0%
Valor de la Obra Programada	$ 31.389.748,76	$ 54.124.501,80

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0,0%	20,9%
Valor de la Obra Ejecutada	$ -	$ 24.102.932,21

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

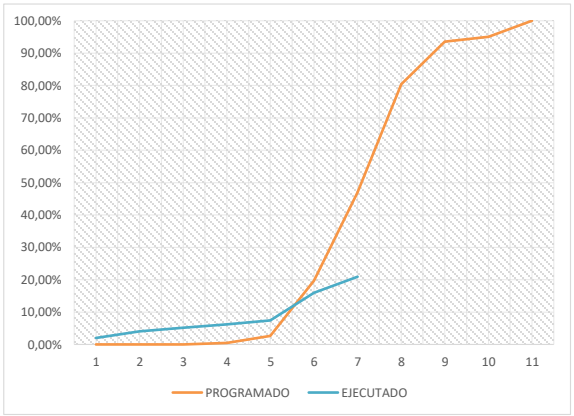

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
RESIDENTE	1			LUNES	L
INSPECTOR DE OBRA	1			MARTES	L
TÉCNICOS ELECTRICO	0			MIERCOLES	F
INSPECTOR SST	0			JUEVES	F
MAESTRO	0			VIERNES	F
AYUDANTE	1			SÁBADO	F
OFICIAL	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Suministro e instalacion de canaleta troquelada
Instalacion de puntos electricos
Construccion de Muro en drywall
Aplicación de pintur sobre muros

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se solicita instalar la puerta del archivo con el fin de realizar la entrega del area intervenida.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE LA INTERVENTORÍA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	27	1	25	2. No. INFORME	7	3. SEMANA No.	20/01/25 al 26/01/25

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 25/01/2025
DESCRIPCIÓN:Se adelantan actividades electricas



ECHA FOTO: 25/01/2025
DESCRIPCIÓN: Se realiza instalacion de puntos electricos



FECHA FOTO:25/01/2025
DESCRIPCIÓN: Se realiza instalacion de canaleta troquelada de 4x 8 cm



ECHA FOTO: 25/01/2025
DESCRIPCIÓN: Se aplica pintur sobre muro existente en area de archivo.



FECHA FOTO:25/01/2025
DESCRIPCIÓN: Se realiza construccion de muros en drywall para archivo.



FECHA FOTO: 25/01/2025
DESCRIPCIÓN: Se realiza construccion de muros en drywall para archivo.

1. FECHA ELABORACIÓN:	27	1	25	2. No. INFORME	7	3. SEMANA No.	20/01/25 al 26/01/25	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDÍN INFANTIL TINTALITO MIS PRIMEROS PASOS			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	KR 86 B # 42 F - 03 SUR			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$	1.299.753.000
9. FECHA ACTA INICIO:	11 / 12 / 24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días
12. PRORROGAS:	23/02/2025	13. SUSPENSIONES:			Meses/días	14. ADICIONES:	$	-
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.							
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$	284.682.402
20. FECHA ACTA INICIO:	11 / 12 / 24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días
23. PRORROGAS:	23/02/2025	24. SUSPENSIONES:			Meses/días	25. ADICIONES:	$	-
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES							
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,0%	0,0%	N/A	N/A
INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	3,6%	6,3%	Se alista superficie de muros para el respectivo resane.	Se alista superficie de muros para el respectivo resane.
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0,0%	0,0%	N/A	N/A
TOTAL	3,55%	6,32%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	31,5%	3,5%	27,9%
Durante el periodo	6,3%	3,5%	2,8%
Acumulado Actual	37,78%	7,1%	30,69%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	3,5%	7,1%
Valor de la Obra Programada	$ 4.054.735,88	$ 8.109.471,76

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	6,3%	37,8%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 7.221.348,20	$ 43.171.318,49

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

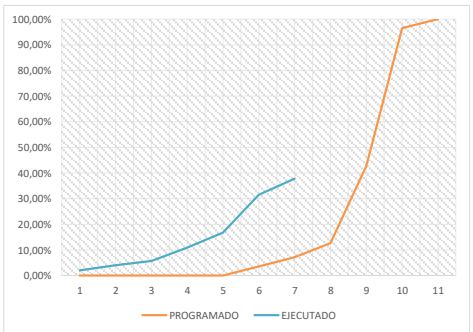

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
RESIDENTE	1			LUNES	L
INSPECTOR DE OBRA	1			MARTES	L
TÉCNICOS ELECTRICO	1			MIERCOLES	F
INSPECTOR SST	1			JUEVES	F
MAESTRO	0			VIERNES	F
OFICIAL	1			SÁBADO	F
AYUDANTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se realiza el resane de la parte superior del muro que no se encontraba pañetado.
Se continua con las actividades de resane de muros del segundo piso.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realiza el resane de la parte superior del muro que no se encontraba pañetado.
Se realiza la instalacion de puntos electricos del segundo piso.

Nombre: MARGRITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	27	1	25	2. No. INFORME	7	3. SEMANA No.	20/01/25 al 26/01/25

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 26/01/25
DESCRIPCIÓN: Se realiza resane de la parte superior de los muros.



FECHA FOTO: 26/01/25
DESCRIPCIÓN: Se realiza resane de la parte superior de los muros.



FECHA FOTO: 26/01/25
DESCRIPCIÓN: Se realiza resane de la parte superior de los muros.



FECHA FOTO: 26/01/25
DESCRIPCIÓN: Se realiza resane de la parte superior de los muros.



FECHA FOTO: 26/01/25
DESCRIPCIÓN: Se realiza resane de la parte superior de los muros.



FECHA FOTO: 26/01/25
DESCRIPCIÓN: Se realiza resane de la parte superior de los muros.

1. FECHA ELABORACIÓN:	3	2	25	2. No. INFORME	8		3. SEMANA No.	27/01/25 al 02/02/25		
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDE CASA JUVENTUD ALDEA DE PENSADORES			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	KRA 88A 69B 61					

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024			7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$	1.299.753.000
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días
VV 12. PRORROGAS:	23/02/2025			13. SUSPENSIONES:			Meses/días	14. ADICIONES:	$	-
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO									
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT									
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024			18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$	284.642.402
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días
23. PRORROGAS:	23/02/2025			24. SUSPENSIONES:			Meses/días	25. ADICIONES:	$	-
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES									
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA									

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,0%	0,0%	N/A	N/A
MAMPOSTERÍA	0,0%	0,0%	N/A	N/A
INSTALACIONES DOMICILIARIAS	0,0%	0,0%	N/A	N/A
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES	0,0%	0,0%	N/A	N/A
CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACINES	20,8%	12,4%	Se realiza la instalacion de estructura metalica para la cubierta.	Se realiza la instalacion de estructura metalica para la cubierta.
ASEO Y DISPOSICION FINAL	0,0%	0,0%	N/A	N/A
TOTAL	20,8%	12,4%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	32,6%	19,0%	13,6%
Durante el periodo	12,4%	20,8%	-8,4%
Acumulado Actual	45,1%	39,8%	5,2%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	20,8%	39,8%
Valor de la Obra Programada	$ 27.276.242,97	$ 52.148.569,15

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	45,1%	12,4%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 58.971.978,75	$ 16.267.680,78

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

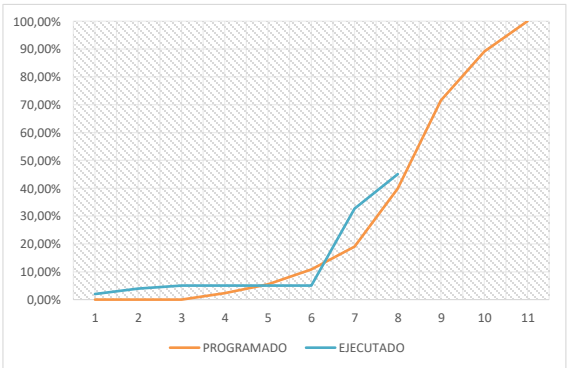

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
INSPECTOR TECNICO	1			LUNES	S
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	1			MARTES	S
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	1			MIERCOLES	S
MAESTRO	1			JUEVES	S
OFICIAL	1			VIERNES	S
AYUDANTE	2			SÁBADO	F
RESIDENTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realiza la instalacion de estructura metalica de la cubierta.
Se realiza disposicion final de cubierta en teja de asbesto.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realiza la instalacion de estructura metalica de la cubierta.
Se realiza disposicion final de cubierta en teja de asbesto.
Se solicitra concepto tecnico de los especialistas para la parte estructural.



Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	3	2	25	2. No. INFORME	8	3. SEMANA No.	27/01/25 al 02/02/25

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



Fecha:01/02/25
Descripción: Se instala la estructura de la cubierta.



Fecha:01/02/25
Descripción: Se instala la estructura de la cubierta.



Fecha:01/02/25
Descripción: Se realiza la aplicación de pintura en estructura metalica



Fecha:01/02/25
Descripción: Se realiza la aplicación de pintura en estructura metalica



Fecha:01/02/25
Descripción: Se realiza la aplicación de pintura en estructura metalica



Fecha:01/02/25
Descripción: Se realiza disposicion final de cubierta en asbesto

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Código: FOR-GIF-016 Versión: 0 Fecha: Memo I2021022167 - Página: 1 de 2

1. FECHA ELABORACIÓN:	3	2	25	2. No. INFORME	8	3. SEMANA No.	27/01/25 al 02/02/25	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDE JARDÍN INFANTIL ENGATIVÁ			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	CL 66B 122-03			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$	1.299.753.000
9. FECHA ACTA INICIO:	11 / 12 / 24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO:	23 de febrero de 2025	Meses/días
VV 12. PRORROGAS:	N/A	13. SUSPENSIONES:			Meses/días	14. ADICIONES:	$	-
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO							
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$	284.642.402
20. FECHA ACTA INICIO:	11 / 12 / 24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO:	23 de febrero de 2025	Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A	24. SUSPENSIONES:			Meses/días	25. ADICIONES:	$	-
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES							
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,0%	0,0%	N/A	N/A
MAMPOSTERÍA	0,0%	0,0%	N/A	N/A
INSTALACIONES DOMICILIARIAS	0,0%	0,0%	N/A	N/A
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES	0,0%	0,0%	N/A	N/A
CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	1,8%	N/A	Se realiza remates en muros de los baños.
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACINES	14,2%	0,0%	N/A	N/A
ASEO Y DISPOSICION FINAL	0,0%	0,0%	N/A	N/A
TOTAL	14,2%	1,8%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	79,3%	50,0%	29,3%
Durante el periodo	1,8%	14,8%	-12,9%
Acumulado Actual	81,2%	64,7%	16,4%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	14,8%	64,7%
Valor de la Obra Programada	$ 21.143.214,96	$ 92.686.975,36

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	1,8%	81,2%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 2.634.020,51	$ 116.183.208,89

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

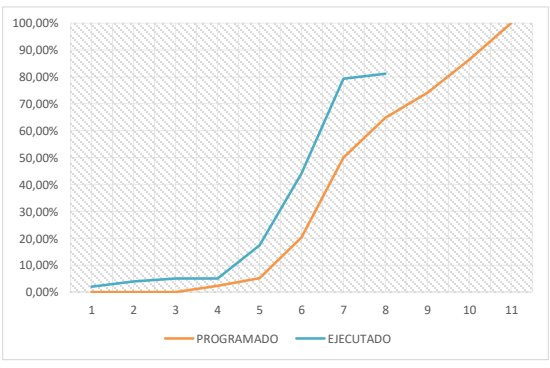

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
INSPECTOR TECNICO	1			LUNES	S
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	1			MARTES	S
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	1			MIERCOLES	S
MAESTRO	1			JUEVES	S
OFICIAL	2			VIERNES	S
AYUDANTE	2			SÁBADO	F
RESIDENTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realiza remates de la pintura de muros en los baños y comedor.
Se realiza observaciones a la instalación de la película de seguridad de la ventana instalada y la cual no se recibirá si no se subsana esta observación.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realiza observaciones a la instalación de la película de seguridad de la ventana instalada y la cual no se recibirá si no se subsana esta observación.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	3	2	25	2. No. INFORME	8	3. SEMANA No.	27/01/25 al 02/02/25

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



Fecha:29/01/25
Descripción: Se comienza a pintar los muros de lavanderia.



Fecha:01/02/25
Descripción: Se termina de pintar los muros de lavanderia..



Fecha:3001/25
Descripción: Se comienza a pintar los esquineros de muros.



Fecha:01/02/25
Descripción: Se termina de pintar los esquineros de muros y se instalan.



Fecha:27/01/25
Descripción: Se solicita entregar el area de colchonetas desocupado para realizar el cambio de teja.



Fecha:31/01/25
Descripción: Se entrega el area de colchonetas desocupado para realizar el cambio de teja.

1. FECHA ELABORACIÓN:	3	2	25	2. No. INFORME	8	3. SEMANA No.	27/01/25 al 02/02/25			
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDE JARDÍN INFANTIL ENGATIVÁ			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	CL 66B 122-03					

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000			
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO:	23 de febrero de 2025	Meses/días
VV 12. PRORROGAS:	N/A	13. SUSPENSIONES:		Meses/días	14. ADICIONES:	$ -				
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO									
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT									
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.642.402			
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO:	23 de febrero de 2025	Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A	24. SUSPENSIONES:		Meses/días	25. ADICIONES:	$ -				
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES									
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA									

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,0%	0,0%	N/A	N/A
CIMENTACION	0,0%	0,0%	N/A	N/A
MAMPOSTERIA	0,0%	0,0%	N/A	N/A
INSTALACIONES ELECTRICAS	0,0%	0,0%	N/A	N/A
PAÑETE Y PINTURA	0,0%	0,0%	N/A	N/A
CUBIERTAS	9,5%	7,5%	Se realiza levantamien de manto asfaltico y seyo de juntas.	Se realiza levantamien de manto asfaltico y seyo de juntas.
ASEO Y DISPOSICION FINAL	0,0%	0,0%	N/A	N/A
TOTAL	9,5%	7,5%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	12,7%	18,5%	-5,8%
Durante el periodo	7,5%	9,5%	-2,0%
Acumulado Actual	20,2%	28,0%	-7,8%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	9,5%	28,0%
Valor de la Obra Programada	$ 11.396.783,04	$ 33.558.737,60

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	7,5%	20,2%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 8.988.987,05	$ 24.198.353,13

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

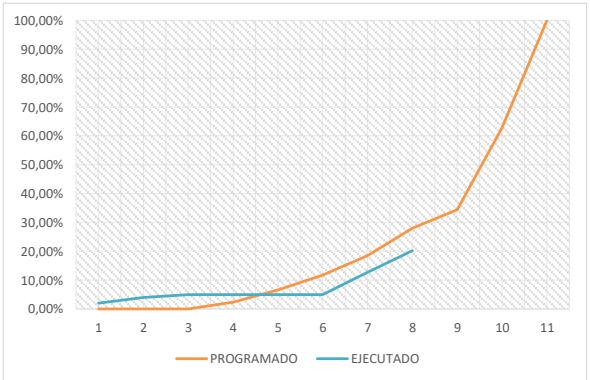

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
ALMACENISTA	1			LUNES	S
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	1			MARTES	S
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	1			MIERCOLES	S
MAESTRO	1			JUEVES	S
OFICIAL	2			VIERNES	S
AYUDANTE	2			SÁBADO	F
RESIDENTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realiza retiro de manto asfaltico en cubierta.
Se realiza sello de juntas en cubierta.
Se realiza alistado de fachada para aplicación de estuco impermeabilizado.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se suspende el uso de andamios ya que los existentes no cumplen con lo solicitado por esta interventoria.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	3	2	25	2. No. INFORME	8	3. SEMANA No.	27/01/25 al 02/02/25

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



Fecha:27/12/24
Descripción: Visita de obra



Fecha:27/12/24
Descripción: Visita de obra



Fecha:20/01/25
Descripción: Se comienza a pelar la pintura de la fachada



Fecha:20/01/25
Descripción: Se comienza a pelar la pintura de la fachada

1. FECHA ELABORACIÓN:	3	2	25	2. No. INFORME	8	3. SEMANA No.	27/01/25 al 02/02/25	
4. NOMBRE EQUIPAMENTO	CENTRO LUZ DE ESPERANZA			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	ENGATIVÁ			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$	1.299.753.000
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO: 23 de febrero 2025 Meses/días
12. PRORROGAS:	23/02/2025	13. SUSPENSIONES:		Meses/días	14. ADICIONES:	$	-	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO							
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$	284.642.402
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO: 23 de febrero 2025 Meses/días
23. PRORROGAS:	23/02/2025	24. SUSPENSIONES:		Meses/días	25. ADICIONES:	$	-	
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES							
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,00%	0,00%	N/A	N/A
MAMPOSTERÍA	5,00%	8,30%	Se realiza construcción de media caña en granito, en el sector de la cocina.	Se realiza construcción de media caña en granito, en el sector de la cocina.
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES	2,00%	0,00%	N/A	N/A
CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CARPINTERÍA METÁLICA	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CUBIERTA	0,00%	0,00%	N/A	N/A
PAÑETE Y PINTURA	5,91%	0,00%	N/A	N/A
TOTAL	12,91%	8,30%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	25,4%	19,0%	6,4%
Durante el periodo	8,3%	10,9%	-2,6%
Acumulado Actual	33,7%	29,9%	3,8%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	10,9%	29,9%
Valor de la Obra Programada	$ 13.092.000,00	$ 35.897.685,85

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	8,30%	33,69%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 9.960.000,00	$ 40.429.092,54

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

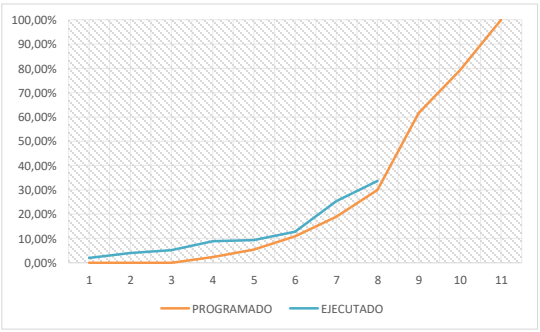

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
INSPECTOR TECNICO	1			LUNES	L
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	1			MARTES	L
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIERCOLES	L
MAESTRO	1			JUEVES	F
OFICIAL	0			VIERNES	F
INPECTOR SST	1			SÁBADO	S
AYUDANTE	1				
RESIDENTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realiza construcción de media caña en granito, en el sector de la cocina.
Se realiza actividades de enchape de shut de basuras.
Se instala puerta para el shut de basura y puerta de acceso para la terraza.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realiza observaciones al enchape del si de basuras, de igual formas se solicita corregir la instalación de película de seguridad de la puerta de la terraza, ya que esta presentaba burbujas por mala instalación.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTORDE INTERVENTORIA


Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	3	2	25	2. No. INFORME	8	3. SEMANA No. 27/01/25 al 02/02/25

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO

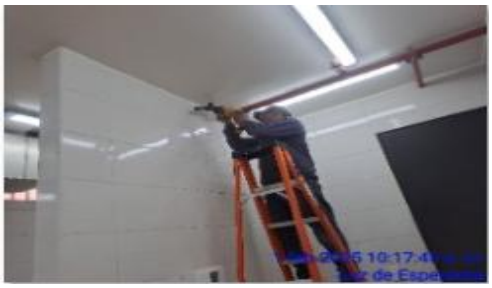

Fecha:01/02/25
Descripción: Se colocan los mediacañas en PVC en la cocina.



Fecha:01/02/25
Descripción: Se termina de cortar y fundir media caña en granito de la cocina.



Fecha:30/01/25
Descripción: Se coloca masilla en los muros exteriores del superboard del shut de basuras..



Fecha:30/01/25
Descripción: Se termina de enchapar el shut de basuras.



Fecha:30/01/25
Descripción: Se termina de hacer los guardaescobas en mortero impermeabilizado de las placas del punto fijo y ascensor



Fecha:29/01/25
Descripción: Se instala luminaria en el shut de basuras.

1. FECHA ELABORACIÓN:	3	2	25	2. No. INFORME	8	3. SEMANA No.	27/01/25 al 02/02/25	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDÍN INFANTIL SABANA GRANDE			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	CARRERA 106 #15A-32			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000	
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO: 23 de febrero 2025 Meses/días
12. PRORROGAS:	23/02/2025	13. SUSPENSIONES:		Meses/días	14. ADICIONES:	$ -		
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.							
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.682.402	
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO: 23 de febrero 2025 Meses/días
23. PRORROGAS:	23/02/2025	24. SUSPENSIONES:		Meses/días	25. ADICIONES:	$ -		
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES							
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,00%	0,00%	N/A	N/A
MAMPOSTERÍA	0,00%	0,00%	N/A	N/A
INSTALACIONES DOMICILIARIAS	0,00%	0,00%	N/A	N/A
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES	28,20%	18,00%	Se culmina con la instalacion de luminarios en la sede .	Se culmina con la instalacion de luminarios en la sede .
CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CARPINTERÍA METÁLICA	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CARPINTERÍA MADERA	0,00%	0,00%	N/A	N/A
PAÑETE Y PINTURA	12,56%	10,00%	Se culmina con la aplicación de vinilo tipo 1 y aplicación de epoxica.	Se culmina con la aplicación de vinilo tipo 1 y aplicación de epoxica.
INSTALACION DE SANITARIOS	0,00%	0,00%	Se realiza la intalacion de sanitarios en los baños del primer y segundo piso	Se realiza la intalacion de sanitarios en los baños del primer y segundo piso
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0,00%	0,00%	N/A	N/A
TOTAL	40,76%	28,00%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	71,4%	38,7%	32,7%
Durante el periodo	28,0%	40,8%	-12,8%
Acumulado Actual	99,4%	79,4%	20,0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	40,8%	79,4%
Valor de la Obra Programada	$ 51.173.945,68	$ 99.741.288,12

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	28,0%	99,4%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 35.154.246,25	$ 124.825.949,79

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

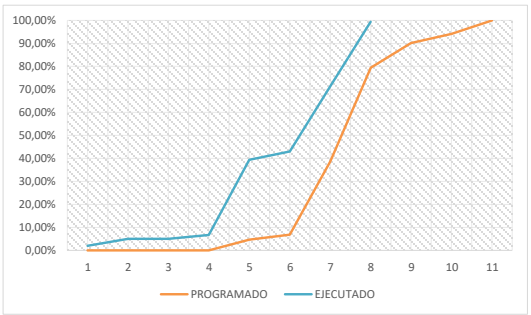

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
RESIDENTE	1			LUNES	S
INSPECTOR DE OBRA	1			MARTES	S
TÉCNICOS ELECTRICO	1			MIERCOLES	F
INSPECTOR SST	1			JUEVES	L
AYUDANTES	0			VIERNES	L
OFICIALES	1			SÁBADO	L
MAESTRO	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se realiza la instalación de sanitarios en los baños del segundo piso y primer piso.
Se realiza el resane y pintura en el sector de los baños.
Se culmina con la instalación de luminarias de la sede.
Se intalan los lava colas de los baños del primer piso.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realiza observaciones en los acabados de la pintura en el sector del comedor, y en baños, se realiza observaciones a la instalacion de lava colas ya que no se encuentran rematados debidamente. Se debe realizar el respectivo ajuste, no se resibiran estos espacios sin estos remates.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	3	2	25	2. No. INFORME	8	3. SEMANA No.	27/01/25 al 02/02/25

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVEN

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



Fecha: 01/02/2025
Descripción: Entrega parcial con observaciones de los espacios intervenidos.



Fecha: 01/02/2025
Descripción: Entrega parcial con observaciones de los espacios intervenidos.



Fecha: 01/02/2025
Descripción: Entrega parcial con observaciones de los espacios intervenidos.



Fecha: 01/02/2025
Descripción: Instalación de lava colas



Fecha: 01/02/2025
Descripción: Instalación de lava colas



Fecha: 01/02/2025
Descripción: Instalación de lava colas

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Código: FOR-GIF-016 Versión: 0 Fecha: Memo I2021022167 - Página: 1 de 2

1. FECHA ELABORACIÓN:	3	2	25	2. No. INFORME	8	3. SEMANA No.	27/01/25 al 02/02/25	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO KENNEDY			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	AK 80 # 43-43 SUR			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000	
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO: 23 de febrero 2025 Meses/días
VV 12. PRORROGAS:	23/02/2025	13. SUSPENSIONES:		Meses/días	14. ADICIONES:	$ -		
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO							
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.642.402	
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO: 23 de febrero 2025 Meses/días
23. PRORROGAS:	23/02/2025	24. SUSPENSIONES:		Meses/días	25. ADICIONES:	$ -		
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES							
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,0%	0,0%	N/A	N/A
MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	11,7%	85,1%	Se da inicio con actividades del retiro de cubierta existente y asi mismo se procede con la instalacion de cubierta Ecoroof y policarbonato.	Se da inicio con actividades del retiro de cubierta existente y asi mismo se procede con la instalacion de cubierta Ecoroof y policarbonato.
ASEO Y DISPOSICION FINAL	0,0%	0,0%	N/A	N/A
TOTAL	11,7%	85,1%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	5,0%	27,7%	-22,7%
Durante el periodo	85,1%	11,7%	73,4%
Acumulado Actual	90,1%	39,3%	50,7%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	11,7%	39,3%
Valor de la Obra Programada	$ 8.829.233,03	$ 29.789.097,93

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	85,1%	90,1%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 64.412.565,72	$ 68.198.422,41

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

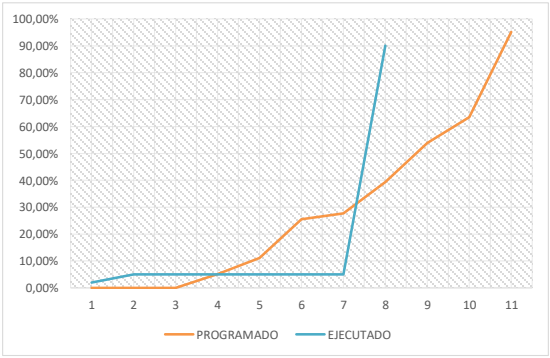

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
ALMACENISTA	1			LUNES	L
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	1			MARTES	L
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	1			MIERCOLES	S
MAESTRO	1			JUEVES	S
OFICIAL	3			VIERNES	S
AYUDANTE	2			SÁBADO	S
RESIDENTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se da inicio con actividades del retiro de cubierta existente y asi mismo se procede con la instalacion de cubierta Ecoroof y policarbonato.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se da inicio con actividades del retiro de cubierta existente y asi mismo se procede con la instalacion de cubierta Ecoroof y policarbonato.
Se ha exigido los implementos de seguridad de los trabajadores.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	3	2	25	2. No. INFORME	8	3. SEMANA No.	27/01/25 al 02/02/25

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



Fecha:01/02/25
Descripción: Instalacion de cubierta



Fecha:01/02/25
Descripción: Verificacion del espesor de cubierta




Fecha:01/02/25
Descripción: Instalacion de cubierta



Fecha:01/02/25
Descripción: Instalacion de cubierta



Fecha:01/02/25
Descripción: Instalacion de cubierta



Fecha:01/02/25
Descripción: Instalacion de cubierta

1. FECHA ELABORACIÓN:	3	2	25	2. No. INFORME	8	3. SEMANA No.	27/01/25 al 02/02/25	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO KENNEDY			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	AK 80 # 43-43 SUR			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$	1.299.753.000
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO: 23 de febrero 2025 Meses/días
VV								
12. PRORROGAS:	23/02/2025	13. SUSPENSIONES:		Meses/días		14. ADICIONES:	$	-
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO							
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$	284.642.402
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO: 23 de febrero 2025 Meses/días
23. PRORROGAS:	23/02/2025	24. SUSPENSIONES:		Meses/días		25. ADICIONES:	$	-
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES							
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,0%	0,0%	N/A	N/A
MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	4,1%	17,9%	Se realiza resana, aplicación de vinilo tipo 1 y aplicación de pintura epoxica en las tres aulas de clase intervenidas.	Se realiza resana, aplicación de vinilo tipo 1 y aplicación de pintura epoxica en las tres aulas de clase intervenidas.
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	0,0%	0,0%	N/A	N/A
ASEO Y DISPOSICION FINAL	0,0%	0,0%	N/A	N/A
TOTAL	4,1%	17,9%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	5,3%	11,4%	-6,1%
Durante el periodo	17,9%	4,1%	13,7%
Acumulado Actual	23,1%	15,5%	7,6%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	4,1%	15,5%
Valor de la Obra Programada	$ 3.020.353,09	$ 11.409.901,21

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	17,9%	23,1%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 13.136.931,86	$ 17.008.094,98

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

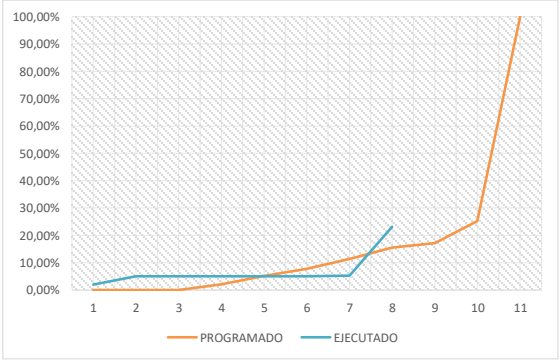

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
ALMACENISTA	1			LUNES	L
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	1			MARTES	L
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	1			MIERCOLES	S
MAESTRO	1			JUEVES	S
OFICIAL	3			VIERNES	S
AYUDANTE	2			SÁBADO	S
RESIDENTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realiza resana, aplicación de vinilo tipo 1 y aplicación de pintura epoxica en las tres aulas de clase intervenidas.
Se realiza aplicación de pintura epoxica en cocina.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realiza resana, aplicación de vinilo tipo 1 y aplicación de pintura epoxica en las tres aulas de clase intervenidas.
Se verifica cantidades de obra y se verifica la calidad de las obras.
Se realiza impermeabilización de cubierta donde se encuentran los tanques.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	3	2	25	2. No. INFORME	8	3. SEMANA No.	27/01/25 al 02/02/25

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO




Fecha:01/02/24
Descripción: Aplicacion de pintura.



Fecha:01/02/24
Descripción: Aplicacion de pintura.




Fecha:01/02/24
Descripción: Aplicación de emulsion asfaltica.



Fecha:01/02/24
Descripción: Aplicación de emulsion asfaltica.



Fecha:01/02/24
Descripción: Instalacion de manto asfaltico.



Fecha:01/02/24
Descripción: Instalacion de manto asfaltico.

1. FECHA ELABORACIÓN:	3	2	25	2. No. INFORME	8	3. SEMANA No.	27/01/25 al 02/02/25				
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDÍN INFANTIL EL CARACOL			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	KR 95A # 34-86 SUR						

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024			7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000		
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días	
12. PRORROGAS:	23/02/2025			13. SUSPENSIONES:		Meses/días		14. ADICIONES:	$ -		
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.682.402		
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días	
23. PRORROGAS:	23/02/2025			24. SUSPENSIONES:		Meses/días		25. ADICIONES:	$ -		
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES										
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA										

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,00%	0,00%	Se termina con el levantamiento de piso de caucho en las aulas del segundo piso	Se termina con el levantamiento de piso de caucho en las aulas del segundo piso
MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	3,24%	2,50%	Se realiza el resane en los muros de los corresdores y aplicación de pintura en vinilo y Pintura epóxic..	Se realiza el resane en los muros de los corresdores y aplicación de pintura en vinilo y Pintura epóxic..
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0,00%	0,00%	N/A	N/A
TOTAL	3,24%	2,50%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	34,6%	69,4%	-34,9%
Durante el periodo	2,5%	3,2%	-0,7%
Acumulado Actual	37,05%	72,7%	-35,6%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	3,2%	72,7%
Valor de la Obra Programada	$ 3.446.453,96	$ 77.287.709,54

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	2,5%	37,1%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 2.658.790,54	$ 39.403.275,82

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

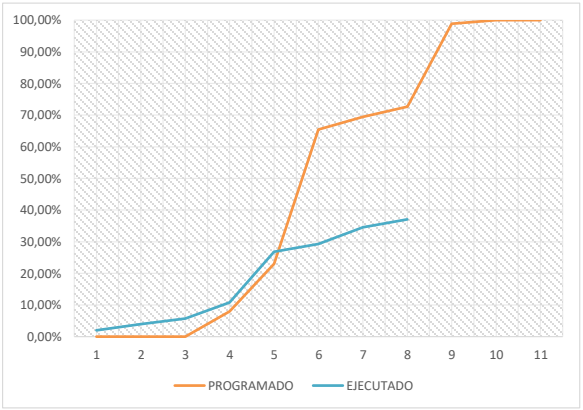

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
RESIDENTE	1			LUNES	S
INSPECTOR DE OBRA	1			MARTES	S
TÉCNICOS ELECTRICO	1			MIERCOLES	S
INSPECTOR SST	1			JUEVES	S
MAESTRO	0			VIERNES	S
OFICIAL	1			SÁBADO	F
AYUDANTE	2			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Resane de muros pasillo norte y sur segundo nivel.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se solicita al personal el suministro de dotacion de acuerdo al manual de identidad visual del distitivo

Se solicita realizar limpieza de los pisos ventanas y paredes salpicadas con pintura aplicada.

Se recomienda revisar el estado del cerramiento provisional de las aulas del segundo piso.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	3	2	25	2. No. INFORME	8	3. SEMANA No.	27/01/25 al 02/02/25

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.
CONTRATO OBRA No:	9176-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024
INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO


23	2	25	23 de febrero



FECHA FOTO: 01/02/25
DESCRIPCIÓN: Se realiza aplicación de pintura tipo vinilo en corredor nororiental de la sede.



FECHA FOTO: 01/02/25
DESCRIPCIÓN: Se realizan resanes de filos en corredor del segundo piso

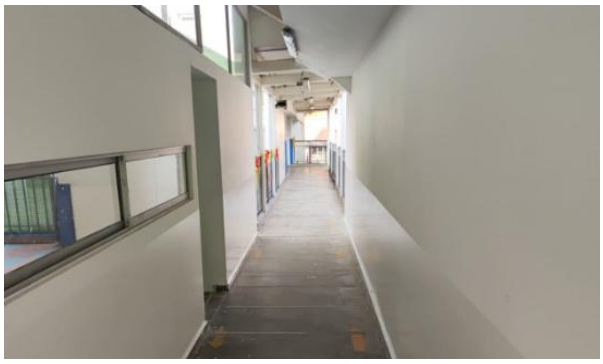

FECHA FOTO: 01/02/25
DESCRIPCIÓN: Se observa muros pintados en vinilo y pintura epóxica.



FECHA FOTO: 01/02/25
DESCRIPCIÓN: Se observa muros pintados en vinilo y pintura epóxica.

1. FECHA ELABORACIÓN:	3	2	25	2. No. INFORME	8	3. SEMANA No.	27/01/25 al 02/02/25				
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	CENTRO CRECER CAMPO ALEGRE CALANDAIMA			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	KR 88 # 6A – 36						
A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO											
6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000				
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días	
12. PRORROGAS:	23/02/2025	13. SUSPENSIONES:		Meses/días	14. ADICIONES:	$ -					
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.682.402				
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días	
23. PRORROGAS:	23/02/2025	24. SUSPENSIONES:		Meses/días	25. ADICIONES:	$ -					
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES										
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA										

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,00%	0,00%	N/A	N/A
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	3,24%	2,50%	N/A	N/A
CARPINTERÍA DE MADERA	0,00%	0,00%	N/A	N/A
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0,00%	0,00%	N/A	N/A
TOTAL	3,24%	2,50%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	34,6%	69,4%	-34,9%
Durante el periodo	2,5%	3,2%	-0,7%
Acumulado Actual	37,05%	72,67%	-35,6%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	3,2%	72,7%
Valor de la Obra Programada	$ 3.735.461,04	$ 83.768.775,46

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	2,5%	37,1%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 2.881.747,04	$ 42.707.491,07

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

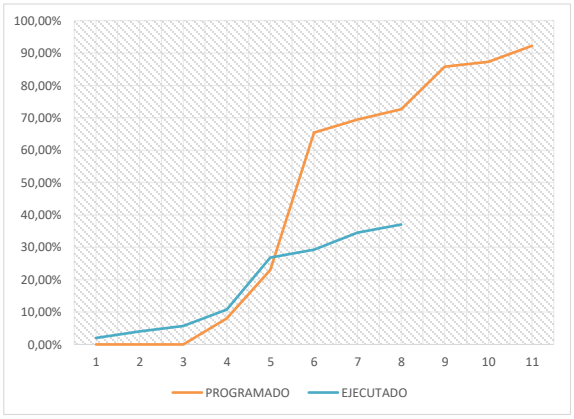

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
RESIDENTE	1			LUNES	L
INSPECTOR DE OBRA	1			MARTES	L
TÉCNICOS ELECTRICO	0			MIERCOLES	F
INSPECTOR SST	0			JUEVES	F
MAESTRO	0			VIERNES	F
AYUDANTE	1			SÁBADO	F
OFICIAL	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se realiza impermeabilización de la cubierta con manto asfaltico.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realizan observaciones a la instalación de manto asfaltico y las cuales deberán ser atendidas por parte del contratista de obra.
Se realiza visita técnica por parte del especialista eléctrico de interventoría.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE LA INTERVENTORÍA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	3	2	25	2. No. INFORME	8	3. SEMANA No.	27/01/25 al 02/02/25


OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO




FECHA FOTO: 01/02/2025
DESCRIPCIÓN:Verificacion de instalacion de manto asfaltico con observaciones



FECHA FOTO: 01/02/2025
DESCRIPCIÓN:Verificacion de instalacion de manto asfaltico con observaciones



FECHA FOTO: 01/02/2025
DESCRIPCIÓN:Verificacion de instalacion de manto asfaltico con observaciones



FECHA FOTO: 01/02/2025
DESCRIPCIÓN:Verificacion de instalacion de manto asfaltico con observaciones

1. FECHA ELABORACIÓN:	3	2	25	2. No. INFORME	8	3. SEMANA No.	27/01/25 al 02/02/25	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDÍN INFANTIL TINTALITO MIS PRIMEROS PASOS			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	KR 86 B # 42 F - 03 SUR			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$	1.299.753.000
9. FECHA ACTA INICIO:	11 / 12 / 24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días
12. PRORROGAS:	23/02/2025	13. SUSPENSIONES:			Meses/días	14. ADICIONES:	$	-
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.							
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$	284.682.402
20. FECHA ACTA INICIO:	11 / 12 / 24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días
23. PRORROGAS:	23/02/2025	24. SUSPENSIONES:			Meses/días	25. ADICIONES:	$	-
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES							
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,0%	0,0%	Se realiza el desmonte de luminarias existentes.	Se realiza el desmonte de luminarias existentes.
INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	1,6%	0,0%	N/A	N/A
ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	Se alista superficie de muros para el respectivo resane.	Se alista superficie de muros para el respectivo resane.
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0,0%	0,0%	N/A	N/A
TOTAL	1,55%	0,00%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	37,8%	7,1%	30,7%
Durante el periodo	4,0%	5,6%	-1,6%
Acumulado Actual	41,78%	12,7%	29,12%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	5,6%	12,7%
Valor de la Obra Programada	$ 6.362.611,41	$ 14.472.083,17

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	4,0%	41,8%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 4.570.473,54	$ 47.741.792,04

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

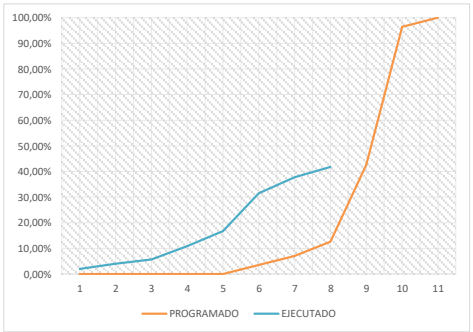

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
RESIDENTE	1			LUNES	L
INSPECTOR DE OBRA	1			MARTES	L
TÉCNICOS ELECTRICO	0			MIERCOLES	F
INSPECTOR SST	0			JUEVES	F
MAESTRO	0			VIERNES	F
OFICIAL	1			SÁBADO	F
AYUDANTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se alista superficie de muros para el respectivo resane.
Se realiza instalaciones electricas del segundo piso.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realizan observaciones a la instalación de manto asfaltico y las cuales deberán ser atendidas por parte del contratista de obra.
Se realiza visita técnica por parte del especialista eléctrico de interventoría.

Nombre: MARGRITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	3	2	25	2. No. INFORME	8	3. SEMANA No.	27/01/25 al 02/02/25

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 01/02/2025
DESCRIPCIÓN: Verificacion de la instalacion de redes electricas



FECHA FOTO: 01/02/2025
DESCRIPCIÓN: Verificacion de la instalacion de redes electricas



FECHA FOTO: 01/02/2025
DESCRIPCIÓN: Verificacion de la instalacion de redes electricas



FECHA FOTO: 01/02/2025
DESCRIPCIÓN: Verificacion de la instalacion de redes electricas



FECHA FOTO: 01/02/2025
DESCRIPCIÓN: Verificacion de la instalacion de redes electricas



FECHA FOTO: 01/02/2025
DESCRIPCIÓN: Verificacion de la instalacion de redes electricas

1. FECHA ELABORACIÓN:	10	2	25	2. No. INFORME	9	3. SEMANA No.	03/02/25 al 09/02/25	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDÍN INFANTIL OSO DE ANTEOJOS			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	CARRERA 100 #23-22			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$	1.299.753.000
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO: 23 de febrero 2025 Meses/días
12. PRORROGAS:	23/02/2025	13. SUSPENSIONES:		Meses/días	14. ADICIONES:	$	-	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.							
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$	284.682.402
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO: 23 de febrero 2025 Meses/días
23. PRORROGAS:	23/02/2025	24. SUSPENSIONES:		Meses/días	25. ADICIONES:	$	-	
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES							
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,00%	0,00%	N/A	N/A
MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	7,67%	N/A	N/A
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	10,91%	15,68%	N/A	N/A
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0,00%	0,00%	N/A	N/A
TOTAL	10,9%	23,4%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	45,1%	39,8%	5,2%
Durante el periodo	23,4%	10,9%	12,4%
Acumulado Actual	68,4%	50,8%	17,7%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	10,9%	50,8%
Valor de la Obra Programada	$ 14.278.390,77	$ 66.426.959,93

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	68,4%	23,4%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 89.531.137,73	$ 30.559.158,98

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

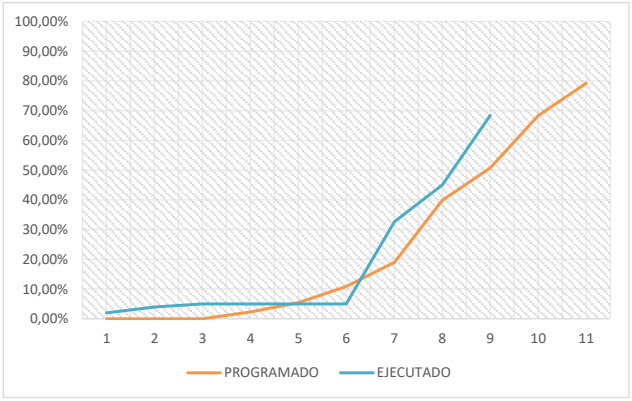

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
RESIDENTE	0			LUNES	L
INSPECTOR DE OBRA	1			MARTES	S
TÉCNICOS ELECTRICO	0			MIERCOLES	L
INSPECTOR SST	0			JUEVES	F
AYUDANTES	1			VIERNES	F
OFICIALES	1			SÁBADO	S
MAESTRO	0			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se termina con la instalacion de la cubierta ecorrof
Se continua con las actividades de mamposteria para el remate superior del muro con la fachada.
Se da inicio con las actividades de resane en muros internos.
Se da inicio al mantenimiento de las rejas existentes.
Se realiza visita con el especialista estructural para la revision de la estructura de la cubierta y se solicita al contratista de obra completar el cordon de soldadura de las platinas.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realiza visita con el especialista estructural para la revision de la estructura de la cubierta y se solicita al contratista de obra completar el cordon de soldadura de las platinas.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	10	2	25	2. No. INFORME	9	3. SEMANA No.	03/02/25 al 09/02/25

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



Fecha:07/02/2025
Descripción: Aplicación de primera mano de pintura



Fecha:07/02/2025
Descripción: Aplicación de primera mano de pintura



Fecha:23/01/25
Descripción: Remate de muro en mamposteria



Fecha:22/01/25
Descripción: Mantenimiento de ventanas



Fecha:21/01/25
Descripción:Visita tecnica con estructural



Fecha:21/01/25
Descripción:Visita tecnica con estructural

1. FECHA ELABORACIÓN:	10	2	25	2. No. INFORME	9	3. SEMANA No.	03/02/25 al 09/02/25			
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDE JARDÍN INFANTIL ENGATIVÁ			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	CL 66B 122-03					

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024			7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$	1.299.753.000
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO:	23 de febrero de 2025	Meses/días
VV 12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:			Meses/días	14. ADICIONES:	$	-
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO									
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT									
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024			18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$	284.642.402
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO:	23 de febrero de 2025	Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:			Meses/días	25. ADICIONES:	$	-
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES									
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA									

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,0%	0,0%	N/A	N/A
MAMPOSTERÍA	0,0%	0,0%	N/A	N/A
INSTALACIONES DOMICILIARIAS	0,0%	0,0%	N/A	N/A
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES	0,0%	0,0%	N/A	N/A
PAÑETES Y PINTURA	0,0%	1,9%	N/A	Se realiza remates en muros de los baños, corredores y cocina
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACINES	9,3%	0,0%	N/A	N/A
ASEO Y DISPOSICION FINAL	0,0%	0,0%	N/A	N/A
TOTAL	9,3%	1,9%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	81,2%	64,7%	16,4%
Durante el periodo	1,9%	9,3%	-7,5%
Acumulado Actual	83,0%	74,1%	9,0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	9,3%	74,1%
Valor de la Obra Programada	$ 13.325.851,90	$ 106.012.827,26

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	1,9%	83,0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 2.648.335,84	$ 118.831.544,73

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

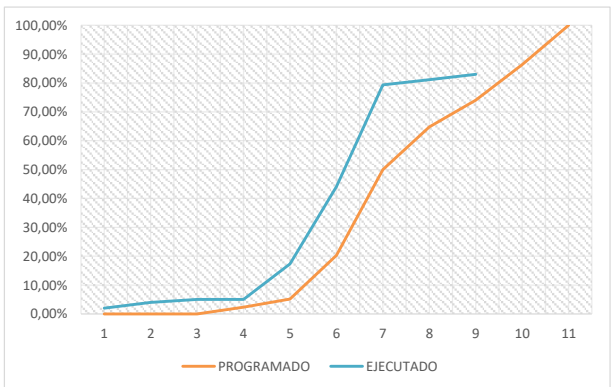

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
INSPECTOR TECNICO	1			LUNES	L
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	0			MARTES	S
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIERCOLES	L
MAESTRO	0			JUEVES	F
OFICIAL	1			VIERNES	F
AYUDANTE	1			SÁBADO	S
RESIDENTE	0			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realiza remates en muros de los baños, corredores y cocina
Se realiza el retiro de la ventana instalada la cual presentaba mala instalación en su película de seguridad.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se solicita al contratista de obra realizar el cambio de película de seguridad de la ventana instalada.
Se solicita realizar el cambio de la cubierta del sector del patio ya que la instalada no cumple con las especificaciones contratadas.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	10	2	25	2. No. INFORME	9	3. SEMANA No.	03/02/25 al 09/02/25

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



Fecha:03/02/2025
Descripción: Instalacion de esquineros



Fecha:05/02/2025
Descripción: Cambio de pelicula de seguridad



Fecha:05/02/2025
Descripción: Remates de pintura



Fecha:05/02/2025
Descripción: Cambio de pelicula de seguridad



Fecha:05/02/2025
Descripción: Verificacion de la instalacion de tanques.



Fecha:05/02/2025
Descripción: Verificacion de la instalacion de tanques.

1. FECHA ELABORACIÓN:	10	2	25	2. No. INFORME	9	3. SEMANA No.	03/02/25 al 09/02/25			
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDÍN INFANTIL OSO DE ANTEOJOS			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	CARRERA 100 #23-22					

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000			
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días
12. PRORROGAS:	23/02/2025	13. SUSPENSIONES:		Meses/días	14. ADICIONES:	$ -				
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.									
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT									
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.682.402			
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días
23. PRORROGAS:	23/02/2025	24. SUSPENSIONES:		Meses/días	25. ADICIONES:	$ -				
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES									
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA									

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,00%	0,00%	N/A	N/A
MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	3,02%	N/A	Se realiza la aplicación de estuco impermeabilizado en la fachada.
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	9,55%	8,00%	Se realiza el alistado de mortero impermeabilizado.	Se realiza el alistado de mortero impermeabilizado.
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0,00%	0,00%	N/A	N/A
TOTAL	9,6%	11,0%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	24,9%	23,7%	1,2%
Durante el periodo	11,0%	9,6%	1,5%
Acumulado Actual	35,9%	33,2%	2,7%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	9,6%	33,2%
Valor de la Obra Programada	$ 11.445.976,84	$ 39.840.295,75

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	12,2%	24,9%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 14.622.085,60	$ 29.831.451,68

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

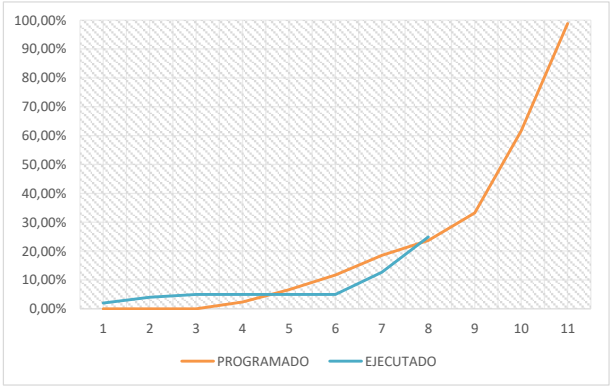

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
RESIDENTE	0			LUNES	L
INSPECTOR DE OBRA	1			MARTES	S
TÉCNICOS ELECTRICO	0			MIERCOLES	L
INSPECTOR SST	0			JUEVES	F
AYUDANTES	1			VIERNES	F
OFICIALES	1			SÁBADO	S
MAESTRO	0			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realiza el alistado de mortero impermeabilizado.
Se realiza la aplicación de estuco impermeabilizado en la fachada.
Se realiza la construcción de media caña en mortero impermeabilizado.
Se realiza la aplicación de emulsión asfáltica.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se ha realizado observaciones a los andamios que se encuentra utilizando el contratista de obra ya que estos no cumplen con lo solicitado por esta interventoría.
Se ha exigido la implementación de EPP para el personal en obra.
Se han revisado niveles en el alistado en mortero impermeabilizado, instalado por el contratista de obra.



Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	10	2	25	2. No. INFORME	9	3. SEMANA No.	03/02/25 al 09/02/25

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



Fecha: 07/02/2025
Descripción: Aplicación de estuco impermeabilizado



Fecha: 07/02/2025
Descripción: Aplicación de estuco impermeabilizado



Fecha: 07/02/2025
Descripción: Alistado de mortero impermeabilizado



Fecha: 07/02/2025
Descripción: Alistado de mortero impermeabilizado



Fecha: 07/02/2025
Descripción: Verificacion de niveles.



Fecha: 07/02/2025
Descripción: Alistado de mortero impermeabilizado

1. FECHA ELABORACIÓN:	10	2	25	2. No. INFORME	9	3. SEMANA No.	03/02/25 al 09/02/25	
4. NOMBRE EQUIPAMENTO	CENTRO LUZ DE ESPERANZA			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	ENGATIVÁ			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$	1.299.753.000
9. FECHA ACTA INICIO:	11 / 12 / 24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días
12. PRORROGAS:	23/02/2025	13. SUSPENSIONES:			Meses/días	14. ADICIONES:	$	-
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO							
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$	284.642.402
20. FECHA ACTA INICIO:	11 / 12 / 24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días
23. PRORROGAS:	23/02/2025	24. SUSPENSIONES:			Meses/días	25. ADICIONES:	$	-
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES							
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,00%	0,00%	N/A	Demolicion de carcamo existente.
MAMPOSTERÍA	0,00%	0,00%	N/A	N/A
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CARPINTERÍA METÁLICA	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CUBIERTA	10,20%	1,30%	Se realiza la instalacion de manto asfaltico en las cubiertas de los puntos fijos.	Se realiza la instalacion de manto asfaltico en las cubiertas de los puntos fijos.
PAÑETE Y PINTURA	0,00%	1,00%	Se realiza el resane de los muros de las escaleras principales.	Se realiza el resane de los muros de las escaleras principales.
TOTAL	10,20%	2,30%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	33,7%	29,9%	3,8%
Durante el periodo	2,3%	10,2%	-7,9%
Acumulado Actual	36,0%	40,1%	-4,1%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	10,2%	40,1%
Valor de la Obra Programada	$ 12.240.000,00	$ 48.137.685,85

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	2,30%	35,99%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 2.760.000,00	$ 43.189.092,54

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

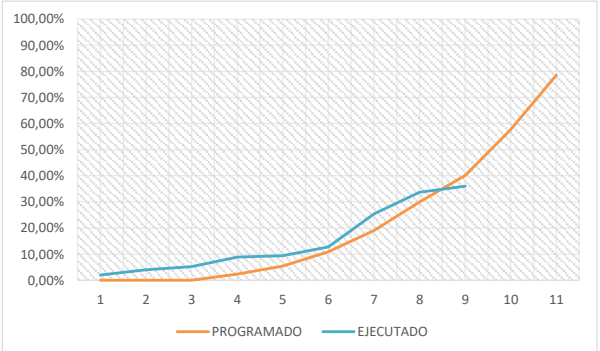

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
INSPECTOR TECNICO	1			LUNES	L
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	0			MARTES	S
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIERCOLES	L
MAESTRO	0			JUEVES	F
OFICIAL	1			VIERNES	F
INPECTOR SST	1			SÁBADO	S
AYUDANTE	2				
RESIDENTE	0			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realiza la instalacion de manto asfaltico en las cubiertas de los puntos fijos.
Se realiza el resane de los muros de las escaleras principales.
Se realiza la pulida de media caña en granito.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se recomienda al contratista el ingreso de mayor numero de personal operativo para las actividades de pintura ya que el avance a la fecha ha sido muy minimo.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTORDE INTERVENTORIA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	10	2	25	2. No. INFORME	9	3. SEMANA No. 03/02/25 al 09/02/25

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



Fecha: 08/02/2025
Descripción: Resane de muros.



Fecha: 08/02/2025
Descripción: Pulida y destronque de media caña en granito.



Fecha: 08/02/2025
Descripción: Demolicion de carcamo existente.



Fecha: 08/02/2025
Descripción: Pulida y destronque de media caña en granito.



Fecha: 08/02/2025
Descripción: Instalacion de manto.



Fecha: 08/02/2025
Descripción: Instalacion de manto.

1. FECHA ELABORACIÓN:	10	2	25	2. No. INFORME	9	3. SEMANA No.	03/02/25 al 09/02/25			
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDÍN INFANTIL OSO DE ANTEOJOS			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	CARRERA 100 #23-22					

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000			
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días
12. PRORROGAS:	23/02/2025	13. SUSPENSIONES:		Meses/días	14. ADICIONES:	$ -				
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.									
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT									
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.682.402			
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días
23. PRORROGAS:	23/02/2025	24. SUSPENSIONES:		Meses/días	25. ADICIONES:	$ -				
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES									
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA									

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,00%	0,00%	N/A	N/A
MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	0,00%	0,00%	N/A	N/A
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0,00%	0,00%	N/A	N/A
TOTAL	0,0%	0,0%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	100,0%	85,0%	15,0%
Durante el periodo	0,0%	11,0%	-11,0%
Acumulado Actual	100,0%	96,0%	4,0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	11,0%	96,0%
Valor de la Obra Programada	$ 10.162.944,19	$ 88.694.785,63

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0,0%	100,0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ -	$ 92.390.401,70

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

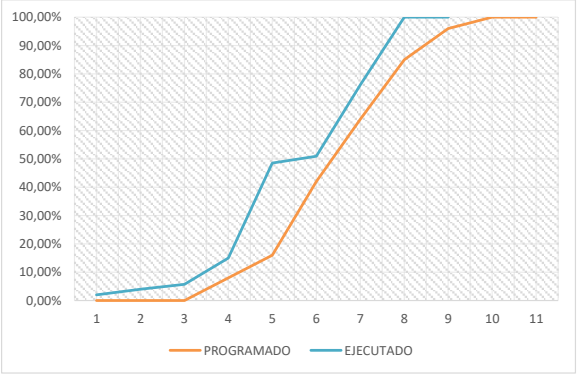

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
RESIDENTE	0			LUNES	L
INSPECTOR DE OBRA	0			MARTES	L
TÉCNICOS ELECTRICO	1			MIERCOLES	L
INSPECTOR SST	0			JUEVES	F
AYUDANTES	0			VIERNES	F
OFICIALES	0			SÁBADO	L
MAESTRO	0			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se realiza visita de obra para la verificacion de remates pendientes y la reparcion de piso; sin embargo se pubo verificar que a la fecha el contratista de obra no ha subsanado las observaciones realizadas el dia 30 de enero de presente año.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realiza visita de obra para la verificacion de remates pendientes y la reparcion de piso; sin embargo se pubo verificar que a la fecha el contratista de obra no ha subsanado las observaciones realizadas el dia 30 de enero de presente año.

Se ha solicitado al contratista de obra realizar los remates pertinentes y los cuales se realizaran los fines de semana.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	10	2	25	2. No. INFORME	9	3. SEMANA No.	03/02/25 al 09/02/25

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVEN

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



Fecha:08/02/2025
Descripción: Reparacion de piso, con observaciones



Fecha:08/02/2025
Descripción: Reparacion de piso, con observaciones



Fecha:08/02/2025
Descripción: Verificacion de remates con observaciones



Fecha:08/02/2025
Descripción: Verificacion de remates con observaciones



Fecha:08/02/2025
Descripción: Verificacion de remates con observaciones



Fecha:08/02/2025
Descripción: Verificacion de remates con observaciones

1. FECHA ELABORACIÓN:	10	2	25	2. No. INFORME	9	3. SEMANA No.	03/02/25 al 09/02/25	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDÍN INFANTIL SABANA GRANDE			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	CARRERA 106 #15A-32			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$	1.299.753.000
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO: 23 de febrero 2025 Meses/días
12. PRORROGAS:	23/02/2025	13. SUSPENSIONES:		Meses/días	14. ADICIONES:	$	-	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.							
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$	284.682.402
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO: 23 de febrero 2025 Meses/días
23. PRORROGAS:	23/02/2025	24. SUSPENSIONES:		Meses/días	25. ADICIONES:	$	-	
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES							
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,00%	0,00%	N/A	N/A
MAMPOSTERÍA	0,00%	0,00%	N/A	N/A
INSTALACIONES DOMICILIARIAS	0,00%	0,00%	N/A	N/A
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CARPINTERÍA METÁLICA	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CARPINTERÍA MADERA	0,00%	0,00%	N/A	N/A
PAÑETE Y PINTURA	0,00%	0,00%	N/A	N/A
INSTALACION DE SANITARIOS	0,00%	0,00%	N/A	N/A
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0,00%	0,00%	N/A	N/A
TOTAL	0,00%	0,00%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	99,4%	79,4%	20,0%
Durante el periodo	0,6%	10,8%	-10,2%
Acumulado Actual	100,0%	90,2%	9,8%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	10,8%	90,2%
Valor de la Obra Programada	$ 13.541.401,89	$ 113.282.690,01

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0,6%	100,0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 728.195,10	$ 125.554.144,89

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

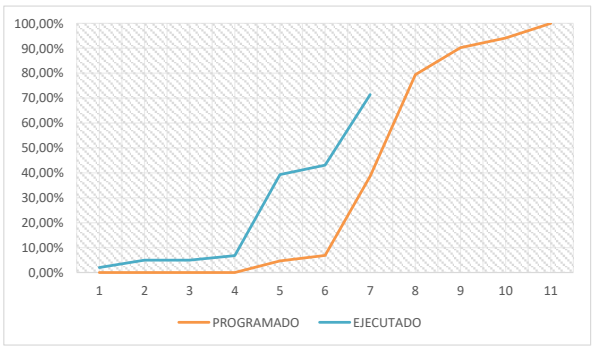

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
RESIDENTE	0			LUNES	L
INSPECTOR DE OBRA	0			MARTES	L
TÉCNICOS ELECTRICO	0			MIERCOLES	L
INSPECTOR SST	0			JUEVES	F
AYUDANTES	0			VIERNES	F
OFICIALES	0			SÁBADO	L
MAESTRO	0			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se realiza visita de obra para la verificacion de remates pendientes y la reparcion de piso; sin embargo se pubo verificar que a la fecha el contratista de obra no ha subsanado las observaciones realizadas el dia 30 de enero de presente año.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realiza visita de obra para la verificacion de remates pendientes y la reparcion de piso; sin embargo se pubo verificar que a la fecha el contratista de obra no ha subsanado las observaciones realizadas el dia 30 de enero de presente año.

Se ha solicitado al contratista de obra realizar los remates pertinentes y los cuales se realizaran los fines de semana.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	10	2	25	2. No. INFORME	9	3. SEMANA No. 03/02/25 al 09/02/25

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVEN

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



Fecha: 28/02/2025
Descripción: Observaciones en la limpieza de guarda escobas



Fecha: 28/02/2025
Descripción: Observaciones en el retiro de materiles del consorcio



Fecha: 28/02/2025
Descripción: Observaciones de pintura en comedor



Fecha: 28/02/2025
Descripción: Observaciones de los acabados de los lavacolas



Fecha: 28/02/2025
Descripción: Observaciones de los acabados de los lavacolas



Fecha: 28/02/2025
Descripción: Observaciones de los acabados de los lavacolas

1. FECHA ELABORACIÓN:	10	2	25	2. No. INFORME	9	3. SEMANA No.	03/02/25 al 09/02/25	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO KENNEDY			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	AK 80 # 43-43 SUR			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$	1.299.753.000
9. FECHA ACTA INICIO:	11 / 12 / 2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días
VV 12. PRORROGAS:	23/02/2025	13. SUSPENSIONES:			Meses/días	14. ADICIONES:	$	-
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO							
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$	284.642.402
20. FECHA ACTA INICIO:	11 / 12 / 24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días
23. PRORROGAS:	23/02/2025	24. SUSPENSIONES:			Meses/días	25. ADICIONES:	$	-
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES							
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,0%	0,0%	N/A	N/A
MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	14,5%	5,1%	Se culmina con la instalación de la cubierta icoroso.	Se culmina con la instalación de la cubierta icoroso.
ASEO Y DISPOSICION FINAL	0,0%	0,0%	N/A	N/A
TOTAL	14,5%	5,1%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	90,1%	39,3%	50,7%
Durante el periodo	5,1%	14,5%	-9,4%
Acumulado Actual	95,2%	53,8%	41,3%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	14,5%	53,8%
Valor de la Obra Programada	$ 10.982.494,75	$ 40.771.592,68

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	5,1%	95,2%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 3.861.573,82	$ 72.059.996,23

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

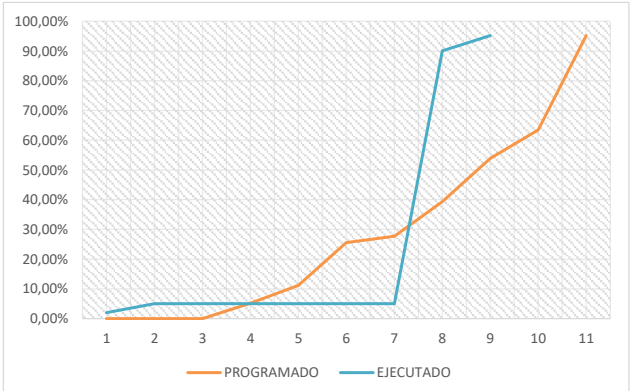

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
ALMACENISTA	1			LUNES	L
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	1			MARTES	L
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	1			MIERCOLES	F
MAESTRO	1			JUEVES	F
OFICIAL	3			VIERNES	F
AYUDANTE	2			SÁBADO	F
RESIDENTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se culmina con la instalación de la cubierta icoroso.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se le solicita al contratista de obra realizar el cerramiento de los materiales retirados ya que estos puede causar un accidente, teniendo en cuenta que la zona están siendo utilizadas por niños.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	10	2	25	2. No. INFORME	9	3. SEMANA No. 03/02/25 al 09/02/25

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



Fecha:08/02/2025
Descripción: Instalación de laminas de policarbonato




Fecha:08/02/2025
Descripción: Verificación de tejas



Fecha:08/02/2025
Descripción: Retiro de material que no se encuentra señalizado



Fecha:08/02/2025
Descripción: Retiro de material que no se encuentra señalizado



Fecha:08/02/2025
Descripción: Cubierta ecoroof.



Fecha:08/02/2025
Descripción: Cubierta ecoroof.

1. FECHA ELABORACIÓN:	10	2	25	2. No. INFORME	9	3. SEMANA No.	03/02/25 al 09/02/25			
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO KENNEDY			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	AK 80 # 43-43 SUR					

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000			
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días
VV 12. PRORROGAS:	23/02/2025	13. SUSPENSIONES:		Meses/días		14. ADICIONES:	$ -			
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO									
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT									
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.642.402			
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días
23. PRORROGAS:	23/02/2025	24. SUSPENSIONES:		Meses/días		25. ADICIONES:	$ -			
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES									
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA									

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,0%	1,0%	N/A	N/A
MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	18,2%	35,9%	N/A	Se realiza mantenimiento de canales, bajantes y cubierta.
ASEO Y DISPOSICION FINAL	0,0%	0,0%	N/A	N/A
TOTAL	18,2%	36,9%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	25,3%	15,5%	9,8%
Durante el periodo	35,9%	1,6%	34,3%
Acumulado Actual	61,2%	17,1%	44,0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	1,6%	17,1%
Valor de la Obra Programada	$ 1.190.282,61	$ 12.600.183,82

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	35,9%	61,2%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 26.421.056,24	$ 45.011.470,74

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

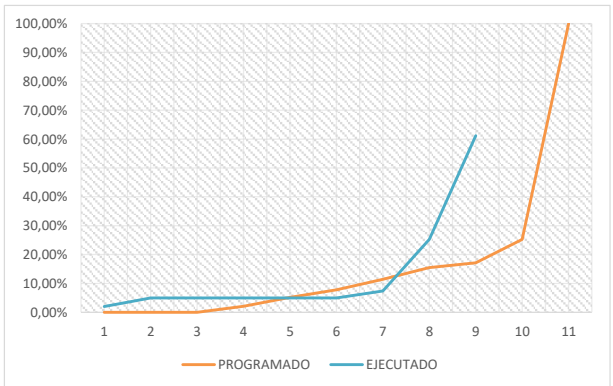

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
INSPECTOR TECNICO	1			LUNES	L
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	0			MARTES	L
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIERCOLES	F
MAESTRO	1			JUEVES	F
OFICIAL	0			VIERNES	F
AYUDANTE	0			SÁBADO	F
RESIDENTE	0			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realiza mantenimiento de canales, bajantes y cubierta.
Se realiza el retiro de escombros.
Se realiza instalación de bajante.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se recibe las tres aulas intervenidas, pero las cuales se dejan observaciones y serán atendidas por el contratista de obra en el próximo fin de semana ya que estos espacios están siendo utilizados por el jardín.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	10	2	25	2. No. INFORME	9	3. SEMANA No. 03/02/25 al 09/02/25

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



Fecha:28/02/2025
Descripción: Visita de obra



Fecha:28/02/2025
Descripción: Visita de obra



Fecha:28/02/2025
Descripción: Visita de obra



Fecha:28/02/2025
Descripción: Visita de obra



Fecha:28/02/2025
Descripción: Visita de obra



Fecha:28/02/2025
Descripción: Visita de obra

1. FECHA ELABORACIÓN:	10	2	25	2. No. INFORME	9	3. SEMANA No.	03/02/25 al 09/02/25				
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDÍN INFANTIL EL CARACOL			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	KR 95A # 34-86 SUR						

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024			7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000		
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días	
12. PRORROGAS:	23/02/2025			13. SUSPENSIONES:		Meses/días		14. ADICIONES:	$ -		
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.682.402		
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días	
23. PRORROGAS:	23/02/2025			24. SUSPENSIONES:		Meses/días		25. ADICIONES:	$ -		
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES										
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA										

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,00%	0,00%	Se termina con el levantamiento de piso de caucho en las aulas del segundo piso	Se termina con el levantamiento de piso de caucho en las aulas del segundo piso
MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	26,22%	0,00%	N/A	N/A
CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,20%	N/A	Se realiza el resane en los muros de los corresdores y aplicación de pintura en vinilo y Pintura epóxic..
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0,00%	0,00%	N/A	N/A
TOTAL	26,22%	0,20%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	37,1%	72,7%	-35,6%
Durante el periodo	0,2%	26,2%	-26,0%
Acumulado Actual	37,25%	98,9%	-61,6%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	26,2%	98,9%
Valor de la Obra Programada	$ 27.882.066,41	$ 105.169.775,94

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0,2%	37,3%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 212.703,24	$ 39.615.979,06

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

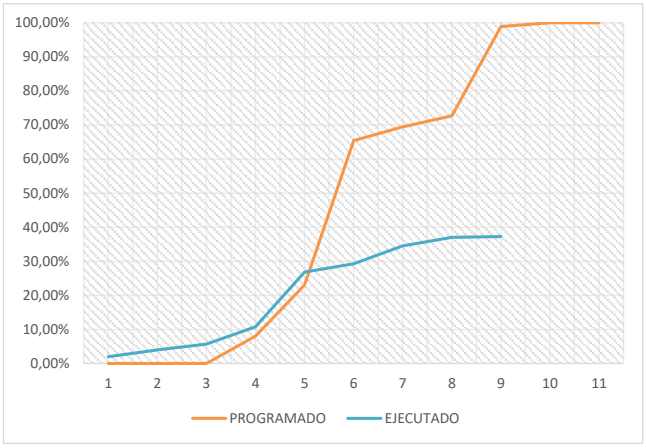

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
INSPECTOR TECNICO	1			LUNES	L
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	0			MARTES	L
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIERCOLES	F
MAESTRO	1			JUEVES	F
OFICIAL	0			VIERNES	F
AYUDANTE	0			SÁBADO	F
RESIDENTE	0			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Resane de muros pasillo norte y sur segundo nivel
Se realiza el alistado de piso para la instalacion de piso de caucha.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se solicita al personal el suministro de dotacion de acuerdo al manual de identidad visual del distitivo
Se solicita realizar limpieza de los pisos ventanas y paredes salpicadas con pintura aplicada.
Se recomienda revisar el estado del cerramiento provisional de las aulas del segundo piso.
Se ha solitado en diferentes ocasiones la revision y estado actual de la compra del piso de caucho.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	10	2	25	2. No. INFORME	9	3. SEMANA No.	03/02/25 al 09/02/25

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES


F. REGISTRO FOTOGRAFICO




FECHA FOTO: 06/02/25
DESCRIPCIÓN: Se realiza aplicación de pintura tipo vinilo



FECHA FOTO: 06/02/25
DESCRIPCIÓN: Se realiza mantenimiento de cubierta.



FECHA FOTO: 06/02/25
DESCRIPCIÓN: Se realiza aplicación de pintura tipo vinilo



FECHA FOTO: 06/02/25
DESCRIPCIÓN: Se realiza mantenimiento de cubierta.



FECHA FOTO: 06/02/25
DESCRIPCIÓN: Se realiza limpieza de pisos afectados por las manchas de pintura.



FECHA FOTO: 06/02/25
DESCRIPCIÓN: Se realiza mantenimiento de cubierta.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Código: FOR-GIF-016 Versión: 0 Fecha: Memo 12021022167 -27/07/2021 Página: 1 de 2

1. FECHA ELABORACIÓN:	10	2	25	2. No. INFORME	9	3. SEMANA No.	03/02/25 al 09/02/25	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	CENTRO CRECER CAMPO ALEGRE CALANDAIMA			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	KR 88 # 6A – 36			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000	
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO: 23 de febrero 2025 Meses/días
12. PRORROGAS:	23/02/2025	13. SUSPENSIONES:		Meses/días	14. ADICIONES:	$ -		
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.							
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.682.402	
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO: 23 de febrero 2025 Meses/días
23. PRORROGAS:	23/02/2025	24. SUSPENSIONES:		Meses/días	25. ADICIONES:	$ -		
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES							
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,00%	0,00%	N/A	N/A
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	4,92%	5,60%	N/A	N/A
CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CARPINTERÍA DE MADERA	0,00%	0,00%	N/A	N/A
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0,00%	0,00%	N/A	N/A
TOTAL	4,92%	5,60%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	30,9%	80,4%	-49,5%
Durante el periodo	5,6%	4,9%	0,7%
Acumulado Actual	36,51%	85,33%	-48,8%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	4,9%	85,3%
Valor de la Obra Programada	$ 5.671.278,17	$ 98.364.196,30

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	5,6%	36,5%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 6.455.113,36	$ 42.085.033,71

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

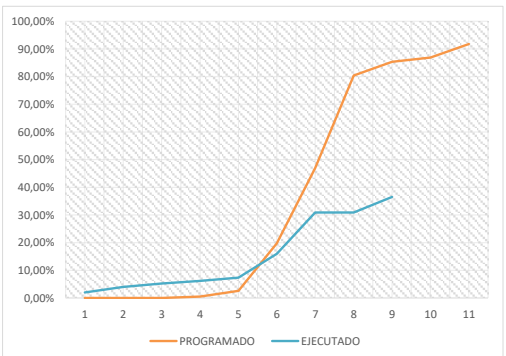

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
RESIDENTE	1			LUNES	S
INSPECTOR DE OBRA	1			MARTES	S
TÉCNICOS ELECTRICO	1			MIERCOLES	S
INSPECTOR SST	1			JUEVES	S
				VIERNES	S
				SÁBADO	F
				LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se realiza resane de muros y techos en las aulas del primer piso en los cuales se impermeabilizo su cubierta.
Aplicación de pintor sobre muros

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realiza resane de muros y techos en las aulas del primer piso en los cuales se impermeabilizo su cubierta.
Aplicación de pintor sobre muros.
Se realiza observaciones a la instalación de la puerta del cuarto de archivo, ya que al momento de su instalación afectaron el muro y el cual aun no han resanado.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE LA INTERVENTORÍA


Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	10	2	25	2. No. INFORME	9	3. SEMANA No.	03/02/25 al 09/02/25

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO

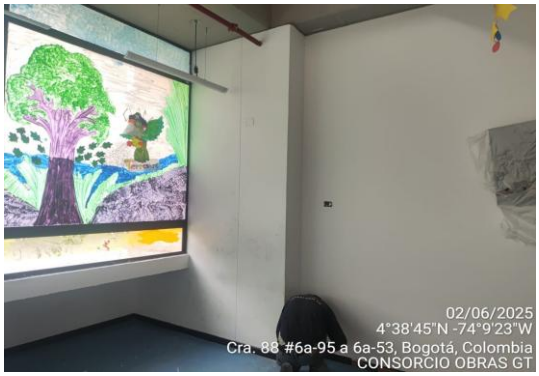

FECHA FOTO: 03/02/2025
DESCRIPCIÓN:Resane de muros.



FECHA FOTO: 03/02/2025
DESCRIPCIÓN:Resane de muros.



FECHA FOTO: 03/02/2025
DESCRIPCIÓN:Resane de muros.



FECHA FOTO: 03/02/2025
DESCRIPCIÓN:Resane de muros.

1. FECHA ELABORACIÓN:	10	2	25	2. No. INFORME	9	3. SEMANA No.	03/02/25 al 09/02/25	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDÍN INFANTIL TINTALITO MIS PRIMEROS PASOS			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	KR 86 B # 42 F - 03 SUR			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$	1.299.753.000
9. FECHA ACTA INICIO:	11 / 12 / 24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días
12. PRORROGAS:	23/02/2025	13. SUSPENSIONES:		Meses/días		14. ADICIONES:	$	-
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.							
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$	284.682.402
20. FECHA ACTA INICIO:	11 / 12 / 24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días
23. PRORROGAS:	23/02/2025	24. SUSPENSIONES:		Meses/días		25. ADICIONES:	$	-
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES							
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,0%	0,0%	N/A	N/A
INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	Se alista superficie de muros para el respectivo resane.	Se alista superficie de muros para el respectivo resane.
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0,0%	0,0%	N/A	N/A
TOTAL	0,00%	0,00%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	39,7%	7,1%	32,6%
Durante el periodo	4,0%	5,6%	-1,6%
Acumulado Actual	43,66%	12,7%	31,00%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	5,6%	12,7%
Valor de la Obra Programada	$ 6.362.611,41	$ 14.472.083,17

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	4,0%	43,7%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 4.570.473,54	$ 49.889.914,60

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

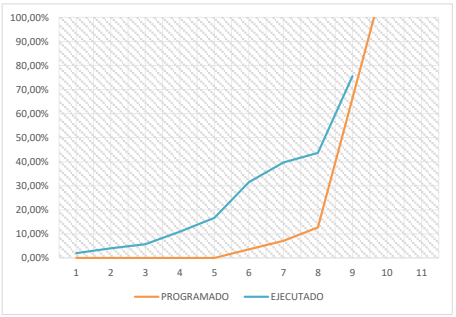

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
RESIDENTE	1			LUNES	S
INSPECTOR DE OBRA	1			MARTES	S
TÉCNICOS ELECTRICO	1			MIERCOLES	S
INSPECTOR SST	1			JUEVES	L
MAESTRO	0			VIERNES	L
OFICIAL	1			SÁBADO	L
AYUDANTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se alista superficie de muros para el respectivo resane.
Se realiza instalaciones electricas del segundo piso.
Se realiza actividades de aplicación de pintura de esmalte en carpinteria metalica.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realizan observaciones a la instalación de manto asfaltico y las cuales deberán ser atendidas por parte del contratista de obra.
Se realiza observaciones a los acabados de muros en el segundo piso y los cuales ya estan siendo atendidas.

Nombre: MARGRITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	10	2	25	2. No. INFORME	9	3. SEMANA No. 03/02/25 al 09/02/25

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 04/02/2025
DESCRIPCIÓN: Aplicación de vinilo tipo 1



FECHA FOTO: 04/02/2025
DESCRIPCIÓN: Aplicación de vinilo tipo 1



FECHA FOTO: 04/02/2025
DESCRIPCIÓN: Aplicación de vinilo tipo 1



FECHA FOTO: 04/02/2025
DESCRIPCIÓN: Aplicación de vinilo tipo 1



FECHA FOTO: 04/02/2025
DESCRIPCIÓN: Aplicación de vinilo tipo 1



FECHA FOTO: 04/02/2025
DESCRIPCIÓN: Aplicación de vinilo tipo 1

1. FECHA ELABORACIÓN:	17	2	25	2. No. INFORME	10			3. SEMANA No.	10/02/25 al 16/02/25		
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDÍN INFANTIL OSO DE ANTEOJOS			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	CARRERA 100 #23-22						
A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO											
6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024			7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000		
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días	
12. PRORROGAS:	23/02/2025			13. SUSPENSIONES:				Meses/días	14. ADICIONES:	$ -	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.682.402		
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días	
23. PRORROGAS:	23/02/2025			24. SUSPENSIONES:				Meses/días	25. ADICIONES:	$ -	
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES										
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA										

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,00%	0,00%	N/A	N/A
MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	7,00%	0,00%	N/A	N/A
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	10,57%	2,35%	N/A	N/A
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	0,00%	0,00%	N/A	N/A
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0,00%	0,00%	N/A	N/A
TOTAL	17,6%	2,4%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	68,4%	50,8%	17,7%
Durante el periodo	2,4%	17,6%	-15,2%
Acumulado Actual	70,8%	68,3%	2,4%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	17,6%	68,3%
Valor de la Obra Programada	$ 22.990.366,73	$ 89.417.326,66

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	70,8%	2,4%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 92.606.684,78	$ 3.075.547,05

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

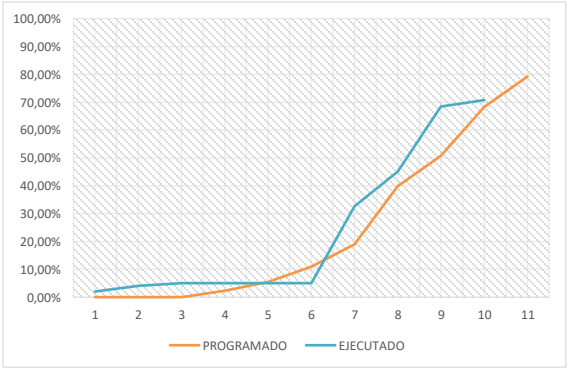

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
RESIDENTE	1			LUNES	L
INSPECTOR DE OBRA	1			MARTES	S
TÉCNICOS ELECTRICO	0			MIERCOLES	L
INSPECTOR SST	0			JUEVES	F
AYUDANTES	1			VIERNES	F
OFICIALES	1			SÁBADO	S
MAESTRO	0			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se culmina con las actividades de encoroce.
Se continua con las actividades de resane en muros internos.
Se continua al mantenimiento de las rejas existentes.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se evidencia avance de obra en las actividades de encoroce, resane y pintura en el auditorio y vestier.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	17	2	25	2. No. INFORME	10	3. SEMANA No.	10/02/25 al 16/02/25

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



Fecha:15/02/2025
Descripción: Aplicación de pintura en muros.



Fecha:15/02/2025
Descripción: Aplicación de pintura en muros.



Fecha:141/02/25
Descripción: Remate de muro en mamposteria



Fecha:12/02/25
Descripción: Encoroce de muro contra teja.



Fecha:10/02/25
Descripción: Mantenimiento de ventanas



Fecha:10/02/25
Descripción: Mantenimiento de ventanas

1. FECHA ELABORACIÓN:	17	2	25	2. No. INFORME	10	3. SEMANA No.	10/02/25 al 16/02/25			
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDE JARDÍN INFANTIL ENGATIVÁ			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	CL 66B 122-03					

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024			7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$	1.299.753.000
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO:	23 de febrero de 2025	Meses/días
VV 12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:			Meses/días	14. ADICIONES:	$	-
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO									
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT									
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024			18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$	284.642.402
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO:	23 de febrero de 2025	Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:			Meses/días	25. ADICIONES:	$	-
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES									
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA									

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,0%	0,0%	N/A	N/A
MAMPOSTERÍA	0,0%	0,0%	N/A	N/A
INSTALACIONES DOMICILIARIAS	0,0%	0,0%	N/A	N/A
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES	0,0%	0,0%	N/A	N/A
PAÑETES Y PINTURA	0,0%	0,0%	N/A	N/A
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACINES	12,3%	6,5%	N/A	N/A
ASEO Y DISPOSICION FINAL	0,0%	0,0%	N/A	N/A
TOTAL	12,3%	6,5%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	83,0%	74,1%	9,0%
Durante el periodo	6,5%	12,3%	-5,8%
Acumulado Actual	89,6%	86,4%	3,2%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	12,3%	86,4%
Valor de la Obra Programada	$ 17.608.894,91	$ 123.621.722,17

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	6,5%	89,6%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 9.362.225,06	$ 128.193.769,79

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

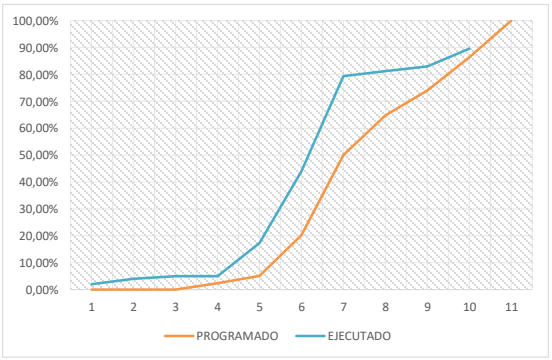

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
INSPECTOR TECNICO	1			LUNES	L
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	0			MARTES	S
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIERCOLES	L
MAESTRO	0			JUEVES	F
OFICIAL	1			VIERNES	F
AYUDANTE	1			SÁBADO	S
RESIDENTE	0			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realiza remates en muros de los baños, corredores y cocina
Se da inicio con la instalacion de refuerzos para la estructura metalico de la cubierta del patio.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realiza remates en muros de los baños, corredores y cocina
Se da inicio con la instalacion de refuerzos para la estructura metalico de la cubierta del patio.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	17	2	25	2. No. INFORME	10	3. SEMANA No.	10/02/25 al 16/02/25

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



Fecha:15/02/2025
Descripción: Aplicación de pintura epoxica.



Fecha:15/02/2025
Descripción: Aplicación de pintura en vinilo en muros.



Fecha:14/02/2025
Descripción: Instalación de estructura metalica para cubierta en zona de colchonetas.



Fecha:14/02/2025
Descripción: Instalación de estructura metalica para cubierta en zona de colchonetas.



Fecha:14/02/2025
Descripción: Cambio de pelicula de seguridad



Fecha:10/02/2025
Descripción: Instalación de dos tele duchas.

1. FECHA ELABORACIÓN:	17	2	25	2. No. INFORME	10	3. SEMANA No.	10/02/25 al 16/02/25			
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDÍN INFANTIL OSO DE ANTEOJOS			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	CARRERA 100 #23-22					

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024			7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$	1.299.753.000
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días
12. PRORROGAS:	23/02/2025			13. SUSPENSIONES:			Meses/días	14. ADICIONES:	$	-
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.									
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT									
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$	284.682.402
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días
23. PRORROGAS:	23/02/2025			24. SUSPENSIONES:			Meses/días	25. ADICIONES:	$	-
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES									
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA									

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,00%	0,00%	N/A	N/A
MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	28,39%	29,39%	N/A	N/A
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0,00%	0,00%	N/A	N/A
TOTAL	28,4%	29,4%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	35,9%	33,2%	2,7%
Durante el periodo	29,4%	28,4%	1,0%
Acumulado Actual	65,3%	61,6%	3,7%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	28,4%	61,6%
Valor de la Obra Programada	$ 34.021.199,75	$ 73.861.495,50

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	11,0%	35,9%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 13.207.818,30	$ 43.039.269,99

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

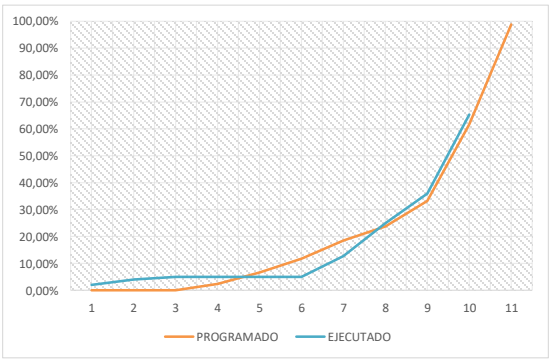

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
RESIDENTE	0			LUNES	L
INSPECTOR DE OBRA	1			MARTES	S
TÉCNICOS ELECTRICO	0			MIERCOLES	L
INSPECTOR SST	0			JUEVES	F
AYUDANTES	1			VIERNES	F
OFICIALES	1			SÁBADO	S
MAESTRO	0			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realiza el alistado de mortero impermeabilizado.
Se realiza la aplicación de estuco impermeabilizado en la fachada.
Se realiza la construcción de media caña en mortero impermeabilizado.
Se realiza la aplicación de emulsión asfáltica.
Se da inicio con la instalacion de manto asfaltico.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realiza el alistado de mortero impermeabilizado.
Se realiza la aplicación de estuco impermeabilizado en la fachada.
Se realiza la construcción de media caña en mortero impermeabilizado.
Se realiza la aplicación de emulsión asfáltica.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	17	2	25	2. No. INFORME	10	3. SEMANA No.	10/02/25 al 16/02/25

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



Fecha: 15/02/2025
Descripción: Resane de fachada costado norte.



Fecha: 14/02/2025
Descripción: Aplicación de estuco impermeabilizado



Fecha: 14/02/2025
Descripción: Instalación de manto impermeable en cubierta.



Fecha: 14/02/2025
Descripción: Apliacación de emulsión asfaltica sobre mortero impermeabilizado.



Fecha: 13/02/2025
Descripción: Alistado de mortero impermeabilizado



Fecha: 07/02/2025
Descripción: Media caña en mortero impermeabilizado.

1. FECHA ELABORACIÓN:	17 / 2 / 25	2. No. INFORME	10	3. SEMANA No.	10/02/25 al 16/02/25		
4. NOMBRE EQUIPAMENTO	CENTRO LUZ DE ESPERANZA	5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	ENGATIVÁ				

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19 / 11 / 24	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000		
9. FECHA ACTA INICIO:	11 / 12 / 24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23 / 2 / 25	11. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días	
12. PRORROGAS:	23/02/2025	13. SUSPENSIONES:		Meses/días	14. ADICIONES:	$ -	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO						
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT						
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26 / 11 / 24	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.642.402		
20. FECHA ACTA INICIO:	11 / 12 / 24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23 / 2 / 25	22. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días	
23. PRORROGAS:	23/02/2025	24. SUSPENSIONES:		Meses/días	25. ADICIONES:	$ -	
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES						
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA						

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,00%	0,00%	N/A	Demolicion de carcamo existente.
MAMPOSTERÍA	0,00%	0,00%	N/A	N/A
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CARPINTERÍA METÁLICA	0,00%	11,92%	N/A	N/A
CUBIERTA	10,20%	10,20%	N/A	N/A
PAÑETE Y PINTURA	7,37%	7,37%	N/A	N/A
TOTAL	17,57%	29,49%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	36,0%	40,1%	-4,1%
Durante el periodo	29,5%	17,6%	11,9%
Acumulado Actual	65,5%	57,7%	7,8%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	17,6%	57,7%
Valor de la Obra Programada	$ 21.080.098,32	$ 69.217.784,17

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	29,49%	65,48%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 35.388.000,00	$ 78.577.092,54

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

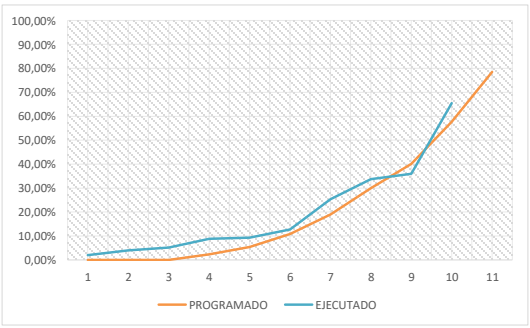

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
INSPECTOR TECNICO	1			LUNES	L
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	0			MARTES	S
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIERCOLES	L
MAESTRO	0			JUEVES	F
OFICIAL	1			VIERNES	F
INPECTOR SST	1			SÁBADO	S
AYUDANTE	2				
RESIDENTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realiza la instalacion de manto asfaltico en las cubiertas de los puntos fijos.
Se realiza el resane de los muros de las escaleras principales.
Se realiza la pulida de media caña en granito.
Se instala puerta de la terraza y shut de basuras.
Se culminan actividades en el shut de basuras.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realiza la instalacion de manto asfaltico en las cubiertas de los puntos fijos.
Se realiza el resane de los muros de las escaleras principales.
Se realiza la pulida de media caña en granito.
Se instala puerta de la terraza y shut de basuras.
Se culminan actividades en el shut de basuras.



Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTORDE INTERVENTORIA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	17	2	25	2. No. INFORME	10	3. SEMANA No.	10/02/25 al 16/02/25


OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



Fecha: 15/02/2025
Descripción: Pintura en muros y techos en escaleras principal.

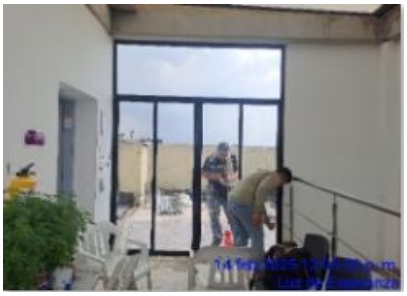

Fecha: 14/02/2025
Descripción: Instalación de puera ventana en terraza.



Fecha: 12/02/2025
Descripción: Resane de muros en escaleras principal.



Fecha: 10/02/2025
Descripción: Instalación de manto impermeable en placas del punto fijo.



Fecha: 10/02/2025
Descripción: Pulida y destronque de media caña en granito.



Fecha:10/02/2025
Descripción: Construcción de Carcamo Nuevo.

1. FECHA ELABORACIÓN:	17	2	25	2. No. INFORME	10	3. SEMANA No.	10/02/25 al 16/02/25	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDÍN INFANTIL OSO DE ANTEOJOS			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	CARRERA 100 #23-22			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$	1.299.753.000
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO: 23 de febrero 2025 Meses/días
12. PRORROGAS:	23/02/2025	13. SUSPENSIONES:		Meses/días	14. ADICIONES:	$	-	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.							
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$	284.682.402
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO: 23 de febrero 2025 Meses/días
23. PRORROGAS:	23/02/2025	24. SUSPENSIONES:		Meses/días	25. ADICIONES:	$	-	
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES							
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,00%	0,00%	N/A	N/A
MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	0,00%	0,00%	N/A	N/A
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0,00%	0,00%	N/A	N/A
TOTAL	0,0%	0,0%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	100,0%	100,0%	0,0%
Durante el periodo	0,0%	0,0%	0,0%
Acumulado Actual	100,0%	100,0%	0,0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	4,0%	100,0%
Valor de la Obra Programada	$ 3.695.616,07	$ 92.390.401,70

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0,0%	100,0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ -	$ 92.390.401,70

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

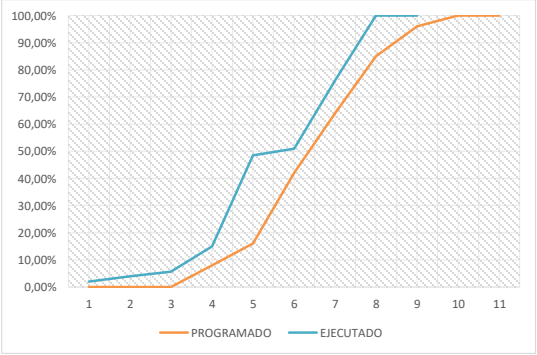

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
RESIDENTE	1			LUNES	S
INSPECTOR DE OBRA	0			MARTES	S
TÉCNICOS ELECTRICO	0			MIERCOLES	L
INSPECTOR SST	1			JUEVES	S
AYUDANTES	3			VIERNES	F
OFICIALES	2			SÁBADO	L
MAESTRO	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se realiza suministro de material para realizar el alistado del mortero impermeabilizado.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realiza suministro de material para realizar el alistado del mortero impermeabilizado.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	17	2	25	2. No. INFORME	10	3. SEMANA No.	10/02/25 al 16/02/25

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVEN

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



Fecha:16/02/2025
Descripción: Material para alistado de mortero impermeabilizado.



Fecha:16/02/2025
Descripción: Material para alistado de mortero impermeabilizado.



Fecha:16/02/2025
Descripción: Material para alistado de mortero impermeabilizado.



Fecha:16/02/2025
Descripción: Material para alistado de mortero impermeabilizado.



Fecha:16/02/2025
Descripción: Material para alistado de mortero impermeabilizado.



Fecha:16/02/2025
Descripción: Material para alistado de mortero impermeabilizado.

1. FECHA ELABORACIÓN:	17	2	25	2. No. INFORME	10	3. SEMANA No.	10/02/25 al 16/02/25	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDÍN INFANTIL SABANA GRANDE			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	CARRERA 106 #15A-32			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000	
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO: 23 de febrero 2025 Meses/días
12. PRORROGAS:	23/02/2025	13. SUSPENSIONES:		Meses/días	14. ADICIONES:	$ -		
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.							
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.682.402	
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO: 23 de febrero 2025 Meses/días
23. PRORROGAS:	23/02/2025	24. SUSPENSIONES:		Meses/días	25. ADICIONES:	$ -		
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES							
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,00%	0,00%	N/A	N/A
MAMPOSTERÍA	0,00%	0,00%	N/A	N/A
INSTALACIONES DOMICILIARIAS	0,00%	0,00%	N/A	N/A
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CARPINTERÍA METÁLICA	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CARPINTERÍA MADERA	0,00%	0,00%	N/A	N/A
PAÑETE Y PINTURA	0,00%	0,00%	N/A	N/A
INSTALACION DE SANITARIOS	0,00%	0,00%	N/A	N/A
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0,00%	0,00%	N/A	N/A
TOTAL	0,00%	0,00%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	100,0%	94,1%	5,9%
Durante el periodo	0,0%	5,9%	-5,9%
Acumulado Actual	100,0%	100,0%	0,0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	3,9%	94,1%
Valor de la Obra Programada	$ 4.890.799,69	$ 118.173.489,70

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0,0%	100,0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ -	$ 125.554.144,89

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

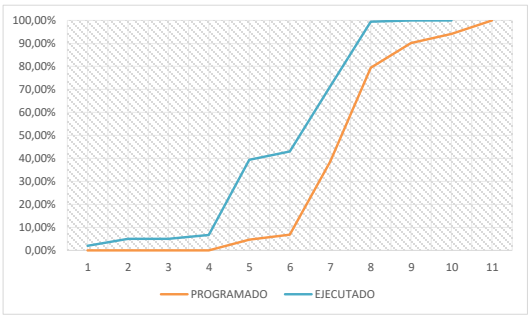

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
RESIDENTE	1			LUNES	S
INSPECTOR DE OBRA	1			MARTES	S
TÉCNICOS ELECTRICO	0			MIERCOLES	L
INSPECTOR SST	1			JUEVES	S
AYUDANTES	1			VIERNES	F
OFICIALES	1			SÁBADO	L
MAESTRO	0			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se realiza reparacion del piso donde se instalaron los lava colas.
Se realiza retiro de granito, para realizar la respectiva reparacion del mismo.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realiza reparacion del piso donde se instalaron los lava colas.
Se realiza retiro de granito, para realizar la respectiva reparacion del mismo.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	17	2	25	2. No. INFORME	10	3. SEMANA No.	10/02/25 al 16/02/25

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVEN

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



Fecha: 16/02/2025
Descripción: Reparacion de piso de lava colas.



Fecha: 16/02/2025
Descripción: Reparacion de piso de lava colas.



Fecha: 16/02/2025
Descripción: Reparacion de piso de lava colas.



Fecha: 16/02/2025
Descripción: Reparacion de lava colas.



Fecha: 16/02/2025
Descripción: Reparacion de piso de lava colas.



Fecha: 16/02/2025
Descripción: Reparacion de lava colas.

1. FECHA ELABORACIÓN:	17	2	25	2. No. INFORME	10	3. SEMANA No.	10/02/25 al 16/02/25	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDÍN INFANTIL EL CARACOL			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	KR 95A # 34-86 SUR			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000	
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO: 23 de febrero 2025 Meses/días
12. PRORROGAS:	23/02/2025	13. SUSPENSIONES:		Meses/días	14. ADICIONES:	$ -		
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.							
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.682.402	
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO: 23 de febrero 2025 Meses/días
23. PRORROGAS:	23/02/2025	24. SUSPENSIONES:		Meses/días	25. ADICIONES:	$ -		
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES							
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,00%	0,00%	N/A	N/A
MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0,00%	0,00%	N/A	N/A
TOTAL	0,00%	0,00%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	37,3%	98,9%	-61,6%
Durante el periodo	2,6%	1,1%	1,4%
Acumulado Actual	39,81%	100,0%	-60,2%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	1,1%	100,0%
Valor de la Obra Programada	$ 1.181.845,70	$ 106.351.621,65

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	2,6%	39,8%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 2.722.601,51	$ 42.338.580,58

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

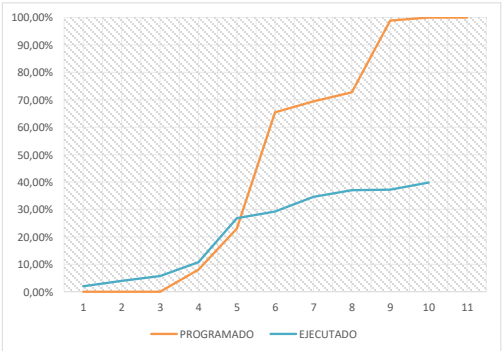

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
INSPECTOR TECNICO	1			LUNES	S
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	0			MARTES	F
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIERCOLES	F
MAESTRO	1			JUEVES	F
OFICIAL	0			VIERNES	F
AYUDANTE	2			SÁBADO	F
RESIDENTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se realiza resane y pintura de dos aulas del segundo piso.
Se realiza limpieza de guardaescobas y corredores.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realiza resane y pintura de dos aulas del segundo piso.
Se realiza limpieza de guardaescobas y corredores.
Se recomienda revisar el estado del cerramiento provisional de las aulas del segundo piso.
Se ha solitado en diferentes ocasiones la revision y estado actual de la compra del piso de caucho.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	17	2	25	2. No. INFORME	10	3. SEMANA No.	10/02/25 al 16/02/25

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 16/02/25
DESCRIPCIÓN: Pintura de muros terminada.



FECHA FOTO: 14/02/25
DESCRIPCIÓN: Se hace observación de limpieza en guardaescobas.



FECHA FOTO: 14/02/25
DESCRIPCIÓN: Se hace observación de limpieza en guardaescobas.



FECHA FOTO: 06/02/25
DESCRIPCIÓN: Se realiza aplicación de pintura tipo epoxica.



FECHA FOTO: 14/02/25
DESCRIPCIÓN: Se realiza aplicación de pintura tipo vinilo.



FECHA FOTO: 14/02/25
DESCRIPCIÓN: Se realiza resane de muros.

1. FECHA ELABORACIÓN:	17	2	25	2. No. INFORME	10	3. SEMANA No.	10/02/25 al 16/02/25	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	CENTRO CRECER CAMPO ALEGRE CALANDAIMA			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	KR 88 # 6A – 36			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$	1.299.753.000
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO: 23 de febrero 2025 Meses/días
12. PRORROGAS:	23/02/2025	13. SUSPENSIONES:		Meses/días	14. ADICIONES:	$	-	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.							
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$	284.682.402
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO: 23 de febrero 2025 Meses/días
23. PRORROGAS:	23/02/2025	24. SUSPENSIONES:		Meses/días	25. ADICIONES:	$	-	
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES							
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,00%	0,00%	N/A	N/A
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	4,92%	5,60%	N/A	N/A
CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CARPINTERÍA DE MADERA	0,00%	0,00%	N/A	N/A
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0,00%	0,00%	N/A	N/A
TOTAL	4,92%	5,60%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	36,5%	85,3%	-48,8%
Durante el periodo	25,2%	1,5%	23,7%
Acumulado Actual	61,71%	86,85%	-25,1%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	1,5%	86,9%
Valor de la Obra Programada	$ 1.751.039,45	$ 100.115.235,75

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	25,2%	61,7%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 29.048.010,12	$ 71.133.043,83

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

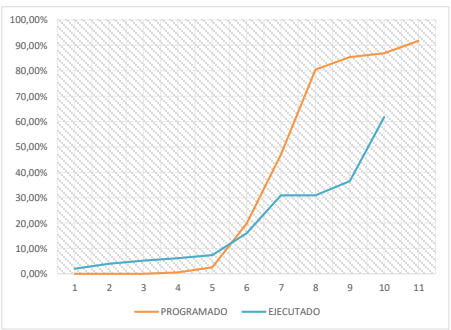

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
RESIDENTE	1			LUNES	S
INSPECTOR DE OBRA	1			MARTES	S
TÉCNICOS ELECTRICO	1			MIERCOLES	F
INSPECTOR SST	1			JUEVES	F
				VIERNES	F
				SÁBADO	F
				LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se realiza resane de muros y techos en las aulas del primer piso en los cuales se impermeabilizo su cubierta.
Aplicación de pintor sobre muros
Aplicación de pintura epoxica.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realiza resane de muros y techos en las aulas del primer piso en los cuales se impermeabilizo su cubierta.
Aplicación de pintor sobre muros
Aplicación de pintura epoxica.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE LA INTERVENTORÍA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	17	2	25	2. No. INFORME	10	3. SEMANA No.	10/02/25 al 16/02/25

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.
CONTRATO OBRA No:	9176-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024
INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 17/02/2025
DESCRIPCIÓN: Pintura tipo vinilo y epooxica de muros terminada.



FECHA FOTO: 17/02/2025
DESCRIPCIÓN: Pintura tipo vinilo y epooxica de muros terminada.



FECHA FOTO: 03/02/2025
DESCRIPCIÓN:Resane de muros.



FECHA FOTO: 15/02/2025
DESCRIPCIÓN: Pintura de muros terminada, se hace orden y aseo.

1. FECHA ELABORACIÓN:	17	2	25	2. No. INFORME	10	3. SEMANA No.	10/02/25 al 16/02/25	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDÍN INFANTIL TINTALITO MIS PRIMEROS PASOS			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	KR 86 B # 42 F - 03 SUR			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$	1.299.753.000
9. FECHA ACTA INICIO:	11 / 12 / 24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días
12. PRORROGAS:	23/02/2025	13. SUSPENSIONES:			Meses/días	14. ADICIONES:	$	-
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.							
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$	284.682.402
20. FECHA ACTA INICIO:	11 / 12 / 24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días
23. PRORROGAS:	23/02/2025	24. SUSPENSIONES:			Meses/días	25. ADICIONES:	$	-
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES							
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,0%	0,0%	N/A	N/A
INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0,0%	0,0%	N/A	N/A
TOTAL	0,00%	0,00%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	75,6%	66,4%	9,1%
Durante el periodo	5,3%	53,8%	-48,5%
Acumulado Actual	80,86%	120,2%	-39,37%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	53,8%	120,2%
Valor de la Obra Programada	$ 61.454.567,94	$ 137.381.219,05

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	5,3%	80,9%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 6.055.877,45	$ 92.395.318,56

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

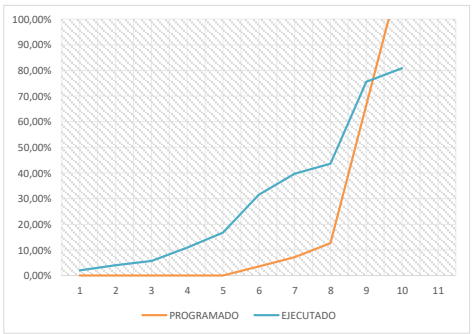

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
RESIDENTE	1			LUNES	S
INSPECTOR DE OBRA	1			MARTES	S
TÉCNICOS ELECTRICO	1			MIERCOLES	S
INSPECTOR SST	1			JUEVES	L
MAESTRO	0			VIERNES	L
OFICIAL	1			SÁBADO	L
AYUDANTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se realiza limpieza de los espacios del segundo piso.
Se realiza limpieza de guarda escobas del segundo piso.
Se realiza instalacion de cubierta enel area de la cocina.
Se realiza el resane y pintura de aula del primer piso y corredores del primer piso.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realiza limpieza de los espacios del segundo piso.
Se realiza limpieza de guarda escobas del segundo piso.
Se realiza instalacion de cubierta enel area de la cocina.
Se realiza el resane y pintura de aula del primer piso y corredores del primer piso.

Nombre: MARGRITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	17	2	25	2. No. INFORME	10	3. SEMANA No.	10/02/25 al 16/02/25


OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO

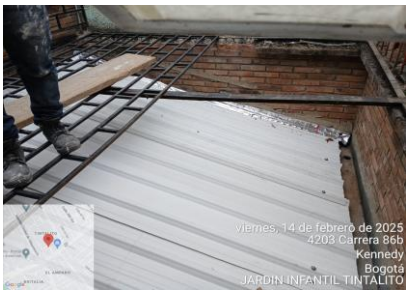

FECHA FOTO: 17/02/2025
DESCRIPCIÓN: Instalacion de cubierta cocina.

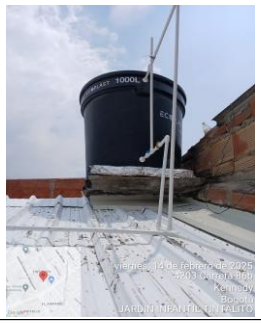

FECHA FOTO: 17/02/2025
DESCRIPCIÓN: Verificacion de tanque.



FECHA FOTO: 17/02/2025
DESCRIPCIÓN: Instalacion de cubierta cocina.



FECHA FOTO: 17/02/2025
DESCRIPCIÓN: Iverificacion de luminarias.



FECHA FOTO: 17/02/2025
DESCRIPCIÓN: Iverificacion de luminarias.



FECHA FOTO: 17/02/2025
DESCRIPCIÓN: Resane y pintura primer piso.

1. FECHA ELABORACIÓN:	24	2	25	2. No. INFORME	11	3. SEMANA No.	17/02/25 al 23/02/25	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDÍN INFANTIL OSO DE ANTEOJOS			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	CARRERA 100 #23-22			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$	1.299.753.000
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO: 23 de febrero 2025 Meses/días
12. PRORROGAS:	23/02/2025	13. SUSPENSIONES:		Meses/días	14. ADICIONES:	$	-	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.							
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$	284.682.402
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO: 23 de febrero 2025 Meses/días
23. PRORROGAS:	23/02/2025	24. SUSPENSIONES:		Meses/días	25. ADICIONES:	$	-	
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES							
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,00%	0,00%	N/A	N/A
MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	30,68%	28,24%	N/A	N/A
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	1,00%	1,00%	N/A	N/A
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0,00%	0,00%	N/A	N/A
TOTAL	31,7%	29,2%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	70,8%	68,3%	2,4%
Durante el periodo	29,2%	31,7%	-2,4%
Acumulado Actual	100,0%	100,0%	0,0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	31,7%	100,0%
Valor de la Obra Programada	$ 40.669.171,94	$ 128.375.163,70

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	29,2%	100,0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 37.535.263,03	$ 128.369.572,62

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

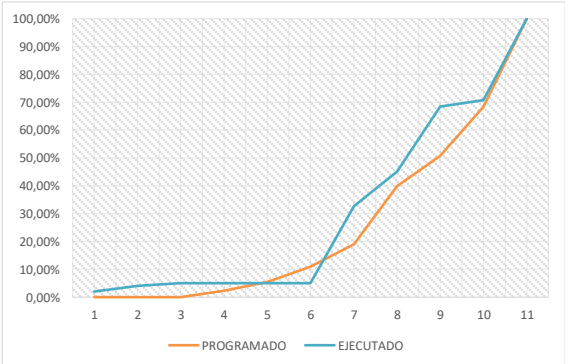

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
RESIDENTE	1			LUNES	S
INSPECTOR DE OBRA	1			MARTES	S
TÉCNICOS ELECTRICO	0			MIERCOLES	L
INSPECTOR SST	0			JUEVES	F
AYUDANTES	1			VIERNES	F
OFICIALES	1			SÁBADO	S
MAESTRO	0			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se culmina con la aplicación de pintura de vinilo tipo 1.
Se realiza actiiadades de aseo general.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se culmina con la aplicación de pintura de vinilo tipo 1.
Se realiza actiiadades de aseo general.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	24	2	25	2. No. INFORME	11	3. SEMANA No.	17/02/25 al 23/02/25

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



Fecha:15/02/2025
Descripción: Pintura en muro de fachada.



Fecha:23/02/2025
Descripción: Pintura de guardaescoba.



Fecha:23/02/2025
Descripción: Pintura en fachada interna.



Fecha:23/02/2025
Descripción: Pintura en muros interiores.





Fecha:21/02/25
Descripción: Mantenimiento y pintura de pujertas y ventanas.



Fecha:181/02/25
Descripción: Remate de muro en fachada.

1. FECHA ELABORACIÓN:	24	2	25	2. No. INFORME	11	3. SEMANA No.	17/02/25 al 23/02/25			
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDE JARDÍN INFANTIL ENGATIVÁ			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	CL 66B 122-03					

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024			7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$	1.299.753.000
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO:	23 de febrero de 2025	Meses/días
VV 12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:		Meses/días		14. ADICIONES:	$	-
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO									
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT									
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024			18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$	284.642.402
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO:	23 de febrero de 2025	Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:		Meses/días		25. ADICIONES:	$	-
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES									
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA									

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,0%	0,0%	N/A	N/A
MAMPOSTERÍA	0,0%	0,0%	N/A	N/A
INSTALACIONES DOMICILIARIAS	0,0%	0,0%	N/A	N/A
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES	0,0%	0,0%	N/A	N/A
PAÑETES Y PINTURA	0,0%	0,0%	N/A	N/A
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACINES	12,6%	9,5%	N/A	N/A
ASEO Y DISPOSICION FINAL	1,0%	1,0%	N/A	N/A
TOTAL	13,6%	10,5%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	89,6%	86,4%	3,2%
Durante el periodo	10,4%	13,6%	-3,2%
Acumulado Actual	100,0%	100,0%	0,0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	13,6%	100,0%
Valor de la Obra Programada	$ 19.773.847,63	$ 144.929.048,44

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	10,4%	100,0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 15.145.085,56	$ 144.929.048,44

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

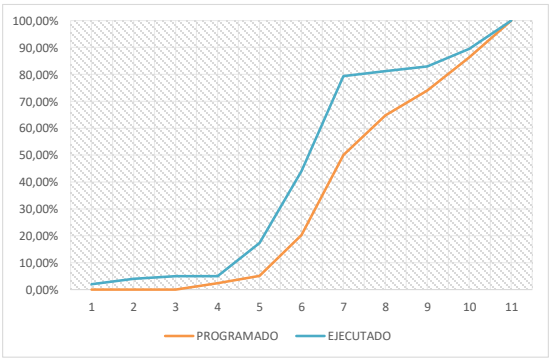

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
INSPECTOR TECNICO	1			LUNES	S
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	0			MARTES	S
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIERCOLES	L
MAESTRO	0			JUEVES	F
OFICIAL	1			VIERNES	F
AYUDANTE	1			SÁBADO	S
RESIDENTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se culmina con las actividades de instalacion de estreuctura metalica y cubierta del patio.
Se realiza actividades de aseo general en la sede.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se culmina con las actividades de instalacion de estreuctura metalica y cubierta del patio.
Se realiza actividades de aseo general en la sede.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	24	2	25	2. No. INFORME	11	3. SEMANA No.	17/02/25 al 23/02/25

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



Fecha:23/02/2025
Descripción: Pintura fachada.



Fecha:21/02/2025
Descripción: Instalación flanche metalico.



Fecha:20/02/2025
Descripción: Pintura en corredores.



Fecha:20/02/2025
Descripción: Pintura Koraza en zona de lavanderia.



Fecha:21/02/2025
Descripción: Pintura muros interiores.



Fecha:18/02/2025
Descripción: Instalación de teja en zona de colchonetas.

1. FECHA ELABORACIÓN:	24	2	25	2. No. INFORME	11	3. SEMANA No.	17/02/25 al 23/02/25	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDÍN INFANTIL OSO DE ANTEOJOS			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	CARRERA 100 #23-22			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$	1.299.753.000
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO: 23 de febrero 2025 Meses/días
12. PRORROGAS:	23/02/2025	13. SUSPENSIONES:		Meses/días	14. ADICIONES:	$	-	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.							
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$	284.682.402
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO: 23 de febrero 2025 Meses/días
23. PRORROGAS:	23/02/2025	24. SUSPENSIONES:		Meses/días	25. ADICIONES:	$	-	
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES							
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,00%	0,00%	N/A	N/A
MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	3,02%	N/A	N/A
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	9,55%	8,00%	N/A	N/A
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0,00%	0,00%	N/A	N/A
TOTAL	9,6%	11,0%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	65,3%	61,6%	3,7%
Durante el periodo	34,7%	38,4%	-3,7%
Acumulado Actual	100,0%	100,0%	0,0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	38,4%	100,0%
Valor de la Obra Programada	$ 44.250.944,05	$ 115.316.883,81

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	34,7%	100,0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 40.014.958,68	$ 115.316.883,81

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

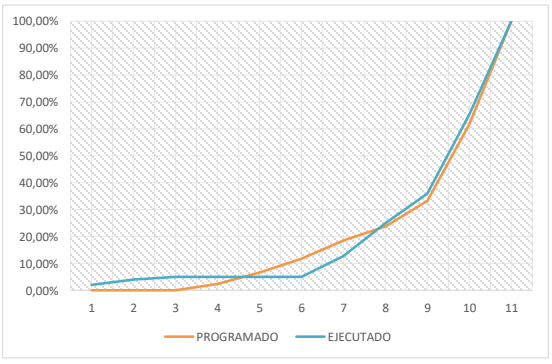

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
RESIDENTE	1			LUNES	S
INSPECTOR DE OBRA	1			MARTES	S
TÉCNICOS ELECTRICO	0			MIERCOLES	L
INSPECTOR SST	0			JUEVES	F
AYUDANTES	1			VIERNES	F
OFICIALES	1			SÁBADO	S
MAESTRO	0			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se culmina con la instalacion de manto asfaltico en la cubierta.
Se culmina con la aplicación de pintura Koraza en fachada.
Se realiza aseo general.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se culmina con la instalacion de manto asfaltico en la cubierta.
Se culmina con la aplicación de pintura Koraza en fachada.
Se realiza aseo general.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	24	2	25	2. No. INFORME	11	3. SEMANA No.	17/02/25 al 23/02/25

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



Fecha: 15/02/2025
Descripción: Resane de fachada costado norte.



Fecha: 21/02/2025
Descripción: Instalación de manto impermeable en cubierta.



Fecha: 20/02/2025
Descripción: Remta de manto impermeable en muros.



Fecha: 21/02/2025
Descripción: Instalación de manto impermeable en cubierta.





Fecha: 20/02/2025
Descripción: Pintura de fachada.



Fecha: 07/02/2025
Descripción: Media caña en mortero impermeabilizado.

1. FECHA ELABORACIÓN:	24 / 2 / 25		2. No. INFORME	11	3. SEMANA No.	17/02/25 al 23/02/25	
4. NOMBRE EQUIPAMENTO	CENTRO LUZ DE ESPERANZA		5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	ENGATIVÁ			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024		7. FECHA CONTRATO:	19 / 11 / 24	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000	
9. FECHA ACTA INICIO:	11 / 12 / 24		10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23 / 2 / 25	11. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días
12. PRORROGAS:	23/02/2025		13. SUSPENSIONES:		Meses/días	14. ADICIONES:	$ -
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO						
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT						
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024		18. FECHA CONTRATO:	26 / 11 / 24	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.642.402	
20. FECHA ACTA INICIO:	11 / 12 / 24		21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23 / 2 / 25	22. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días
23. PRORROGAS:	23/02/2025		24. SUSPENSIONES:		Meses/días	25. ADICIONES:	$ -
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES						
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA						

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,00%	0,00%	N/A	Demolicion de carcamo existente.
MAMPOSTERÍA	0,00%	0,00%	N/A	N/A
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CARPINTERÍA METÁLICA	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CUBIERTA	10,20%	1,30%	N/A	N/A
PAÑETE Y PINTURA	0,00%	1,00%	N/A	N/A
TOTAL	10,20%	2,30%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	65,5%	70,1%	-4,6%
Durante el periodo	34,5%	29,9%	4,6%
Acumulado Actual	100,0%	100,0%	0,0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	29,9%	100,0%
Valor de la Obra Programada	$ 35.932.821,90	$ 119.999.940,59

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	34,52%	100,00%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 41.423.979,49	$ 119.999.940,59

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

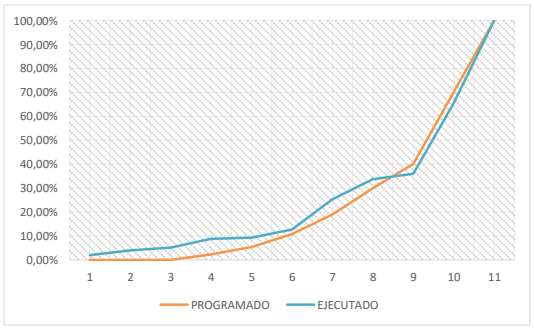

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA


35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
INSPECTOR TECNICO	1			LUNES	S
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	0			MARTES	S
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIERCOLES	L
MAESTRO	0			JUEVES	F
OFICIAL	1			VIERNES	F
INPECTOR SST	1			SÁBADO	S
AYUDANTE	2				
RESIDENTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se culmina con la aplicación de pintura en vinilo tipo 1 .
Se culmina con la construccion de media caña.
Se realiza aseo general en la sede.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se culmina con la aplicación de pintura en vinilo tipo 1 .
Se culmina con la construccion de media caña.
Se realiza aseo general en la sede.



Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTORDE INTERVENTORIA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	24	2	25	2. No. INFORME	11	3. SEMANA No.	17/02/25 al 23/02/25

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



Fecha: 21/02/2025
Descripción: Cambio de cubierta en punto fijo del cuarto piso.





Fecha: 10/02/2025
Descripción: Instalación de manto impermeable en placas del punto fijo.



Fecha: 21/02/2025
Descripción: Demolición, reconstrucción, enchape y pintura de cuarto de basuras.





Fecha: 21/02/2025
Descripción: Instalación de mediacaña en PVC, fundida y pulido de guardaescoba en granito.





Fecha: 21/02/2025
Descripción: Resane y Pintura en muros y techos.





Fecha:20/02/2025
Descripción: Suministro e instalación de luminarias.

1. FECHA ELABORACIÓN:	24	2	25	2. No. INFORME	11	3. SEMANA No.	17/02/25 al 23/02/25	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	CASA DE PENSAMIENTO INTERCULTURAL SHUSH UREK			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	DIAGONAL 15D #98-40			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000	
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO: 23 de febrero 2025 Meses/días
VV								
12. PRORROGAS:	N/A	13. SUSPENSIONES:		Meses/días	14. ADICIONES:	$ -		
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO							
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.642.402	
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO: 23 de febrero 2025 Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A	24. SUSPENSIONES:		Meses/días	25. ADICIONES:	$ -		
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES							
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,0%	0,0%		
CIMENTACION	0,0%	0,0%		
MAMPOSTERIA	0,0%	0,0%		
INSTALACIONES ELECTRICAS	0,0%	0,0%		
PAÑETE Y PINTURA	0,0%	0,0%		
CUBIERTAS	0,0%	0,0%		
ASEO Y DISPOSICION FINAL	0,0%	0,0%		
TOTAL	0,0%	0,00%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	100,0%	89,3%	10,7%
Durante el periodo	0,0%	10,7%	-10,7%
Acumulado Actual	100,0%	100,0%	0,0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	10,7%	100,0%
Valor de la Obra Programada	631642103,11%	$ 58.993.941,48

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0,0%	100,0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ -	$ 58.996.104,27

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

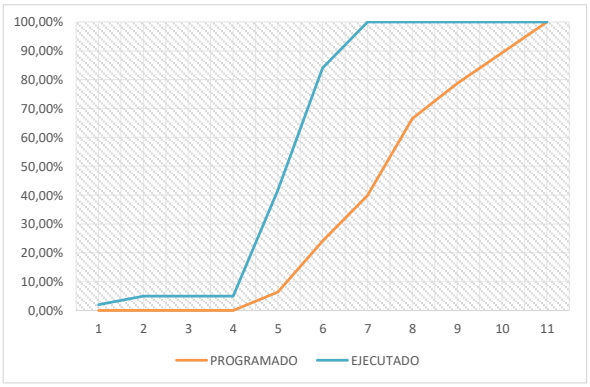

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
INSPECTOR SST	0			LUNES	S
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	0			MARTES	S
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIERCOLES	S
MAESTRO	0			JUEVES	S
OFICIAL	0			VIERNES	S
AYUDANTE	0			SÁBADO	L
RESIDENTE	0			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se entregan espacios intervenidos.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se entregan espacios intervenidos.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	24	2	25	2. No. INFORME	11	3. SEMANA No.	17/02/25 al 23/02/25

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



Fecha: 27/01/25
Descripción: Entrega de espacios a la coordinacion de la sede.



Fecha: 27/01/25
Descripción: Entrega de espacios a la coordinacion de la sede.



Fecha: 27/01/25
Descripción: Entrega de espacios a la coordinacion de la sede.



Fecha: 27/01/25
Descripción: Entrega de espacios a la coordinacion de la sede.



Fecha: 25/01/25
Descripción: Trabajos finales en la sede.



Fecha: 25/01/25
Descripción: Trabajos finales en la sede.

1. FECHA ELABORACIÓN:	24	2	25	2. No. INFORME	11	3. SEMANA No.	17/02/25 al 23/02/25	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	CENTRO CRECER FONTIBON			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	CALLE 22F #106-26			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$	1.299.753.000
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO: 23 de febrero 2025 Meses/días
12. PRORROGAS:	23/02/2025	13. SUSPENSIONES:		Meses/días	14. ADICIONES:	$	-	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.							
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$	284.682.402
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO: 23 de febrero 2025 Meses/días
23. PRORROGAS:	23/02/2025	24. SUSPENSIONES:		Meses/días	25. ADICIONES:	$	-	
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES							
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,00%	0,00%	N/A	N/A
MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
INSTALACION DE LUMINARIAS	0,00%	0,00%	N/A	N/A
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0,00%	0,00%	N/A	N/A
TOTAL	0,00%	0,00%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	100,0%	74,0%	26,0%
Durante el periodo	0,0%	26,0%	-26,0%
Acumulado Actual	100,0%	100,0%	0,0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	26,0%	100,0%
Valor de la Obra Programada	$ 4.417.567,88	$ 17.008.151,05

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0,0%	100,0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ -	$ 17.008.151,05

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

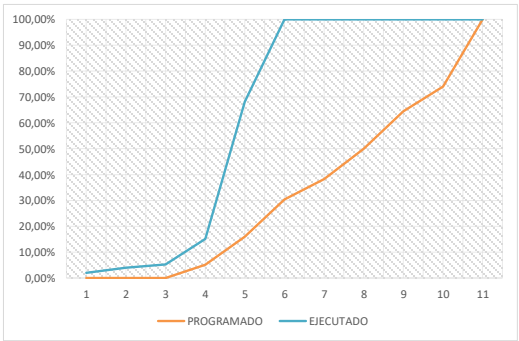

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
RESIDENTE	0			LUNES	S
INSPECTOR DE OBRA	0			MARTES	S
TÉCNICOS ELECTRICO	0			MIERCOLES	S
INSPECTOR SST	0			JUEVES	S
AYUDANTES	0			VIERNES	S
OFICIALES	0			SÁBADO	L
MAESTRO	0			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se entregan los espacios intervenidos.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se entregan los espacios intervenidos.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	24	2	25	2. No. INFORME	11	3. SEMANA No.	17/02/25 al 23/02/25

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



Fecha:18/01/25
Descripción: Recorrido con la coordinadora de la sede.



Fecha:18/01/25
Descripción: Verificacion de luminarias.



Fecha:18/01/25
Descripción: Estado final del comedor.



Fecha:18/01/25
Descripción: Verificacion de luminarias.



Fecha:18/01/25
Descripción: Recorrido con la coordinadora de la sede.



Fecha:18/01/25
Descripción: Recorrido con la coordinadora de la sede.

1. FECHA ELABORACIÓN:	24	2	25	2. No. INFORME	11	3. SEMANA No.	17/02/25 al 23/02/25	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDÍN INFANTIL OSO DE ANTEOJOS			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	CARRERA 100 #23-22			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$	1.299.753.000
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO: 23 de febrero 2025 Meses/días
12. PRORROGAS:	23/02/2025	13. SUSPENSIONES:		Meses/días	14. ADICIONES:	$	-	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.							
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$	284.682.402
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO: 23 de febrero 2025 Meses/días
23. PRORROGAS:	23/02/2025	24. SUSPENSIONES:		Meses/días	25. ADICIONES:	$	-	
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES							
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,00%	0,00%	N/A	N/A
MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	0,00%	0,00%	N/A	N/A
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0,00%	0,00%	N/A	N/A
TOTAL	0,0%	0,0%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	100,0%	100,0%	0,0%
Durante el periodo	0,0%	0,0%	0,0%
Acumulado Actual	100,0%	100,0%	0,0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0,0%	100,0%
Valor de la Obra Programada	$ -	$ 160.904.588,39

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0,0%	100,0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ -	$ 160.904.588,39

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

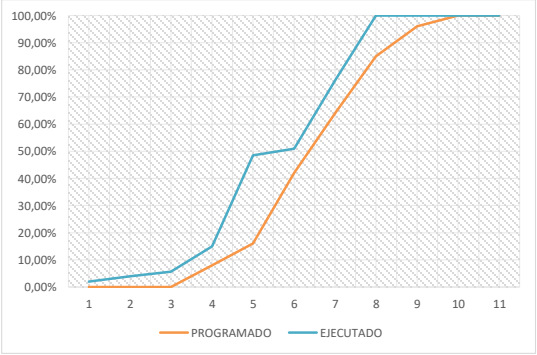

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
RESIDENTE	1			LUNES	S
INSPECTOR DE OBRA	0			MARTES	S
TÉCNICOS ELECTRICO	0			MIERCOLES	L
INSPECTOR SST	1			JUEVES	S
AYUDANTES	3			VIERNES	F
OFICIALES	2			SÁBADO	L
MAESTRO	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se realiza el alistado de mortero impermeabilizado.
Se realiza la construccion de mediacaña en mortero.
Se realiza la impermeabilizacion con manto asfaltico.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realiza el alistado de mortero impermeabilizado.
Se realiza la construccion de mediacaña en mortero.
Se realiza la impermeabilizacion con manto asfaltico.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	24	2	25	2. No. INFORME	11	3. SEMANA No.	17/02/25 al 23/02/25

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVEN

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



Fecha:16/02/2025
Descripción: Alistado de mortero impermeabilizado.



Fecha:16/02/2025
Descripción: Alistado de mortero impermeabilizado.



Fecha:16/02/2025
Descripción: Elaboracion en media caña en mortero impermeabilizado.



Fecha:16/02/2025
Descripción: Instalacion de manto asfaltico.



Fecha:16/02/2025
Descripción: Instalacion de manto asfaltico.



Fecha:16/02/2025
Descripción: Instalacion de manto asfaltico.

1. FECHA ELABORACIÓN:	24	2	25	2. No. INFORME	11	3. SEMANA No.	17/02/25 al 23/02/25	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDÍN INFANTIL SABANA GRANDE			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	CARRERA 106 #15A-32			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000	
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO: 23 de febrero 2025 Meses/días
12. PRORROGAS:	23/02/2025	13. SUSPENSIONES:		Meses/días	14. ADICIONES:	$ -		
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.							
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.682.402	
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO: 23 de febrero 2025 Meses/días
23. PRORROGAS:	23/02/2025	24. SUSPENSIONES:		Meses/días	25. ADICIONES:	$ -		
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES							
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,00%	0,00%	N/A	N/A
MAMPOSTERÍA	0,00%	0,00%	N/A	N/A
INSTALACIONES DOMICILIARIAS	0,00%	0,00%	N/A	N/A
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CARPINTERÍA METÁLICA	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CARPINTERÍA MADERA	0,00%	0,00%	N/A	N/A
PAÑETE Y PINTURA	0,00%	0,00%	N/A	N/A
INSTALACION DE SANITARIOS	0,00%	0,00%	N/A	N/A
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0,00%	0,00%	N/A	N/A
TOTAL	0,00%	0,00%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	100,0%	100,0%	0,0%
Durante el periodo	0,0%	5,9%	-5,9%
Acumulado Actual	100,0%	105,9%	-5,9%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	5,9%	100,0%
Valor de la Obra Programada	$ 5.520.621,65	$ 93.951.780,52

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0,0%	100,0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ -	$ 93.954.224,10

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

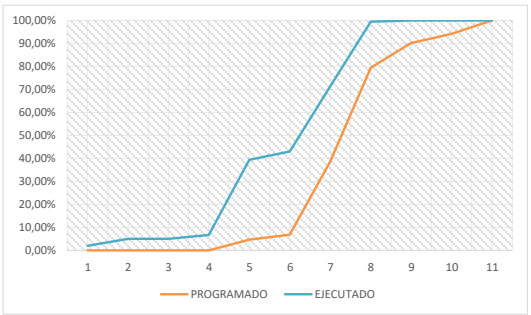

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
RESIDENTE	1			LUNES	S
INSPECTOR DE OBRA	1			MARTES	S
TÉCNICOS ELECTRICO	0			MIERCOLES	L
INSPECTOR SST	1			JUEVES	S
AYUDANTES	1			VIERNES	F
OFICIALES	1			SÁBADO	L
MAESTRO	0			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se realiza reparacion del piso donde se instalaron los lava colas.
Se realiza retiro de granito, para realizar la respectiva reparacion del mismo.
Se instala tele duchas en lava colas.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realiza reparacion del piso donde se instalaron los lava colas.
Se realiza retiro de granito, para realizar la respectiva reparacion del mismo.
Se instala tele duchas en lava colas.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	24	2	25	2. No. INFORME	11	3. SEMANA No.	17/02/25 al 23/02/25

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVEN

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



Fecha: 16/02/2025
Descripción: Reparacion de piso de lava colas.



Fecha: 16/02/2025
Descripción: Resane y pintura de aula.



Fecha: 16/02/2025
Descripción: Resane y pintura de aula.



Fecha: 16/02/2025
Descripción: Resane y pintura de aula.



Fecha: 16/02/2025
Descripción: Reparacion de piso de lava colas.



Fecha: 16/02/2025
Descripción: Reparacion de piso de lava colas.

1. FECHA ELABORACIÓN:	24	2	25	2. No. INFORME	11	3. SEMANA No.	17/02/25 al 23/02/25	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO KENNEDY			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	AK 80 # 43-43 SUR			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$	1.299.753.000
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO: 23 de febrero 2025 Meses/días
VV								
12. PRORROGAS:	23/02/2025	13. SUSPENSIONES:		Meses/días	14. ADICIONES:	$	-	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO							
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$	284.642.402
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO: 23 de febrero 2025 Meses/días
23. PRORROGAS:	23/02/2025	24. SUSPENSIONES:		Meses/días	25. ADICIONES:	$	-	
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES							
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,0%	0,0%	N/A	N/A
MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	0,0%	0,0%	N/A	N/A
ASEO Y DISPOSICION FINAL	0,0%	0,0%	N/A	N/A
TOTAL	0,0%	0,0%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	96,7%	63,4%	33,2%
Durante el periodo	3,3%	36,6%	-33,2%
Acumulado Actual	100,0%	100,0%	0,0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	36,6%	100,0%
Valor de la Obra Programada	$ 65.852.676,54	$ 180.063.738,56

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	3,3%	100,0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 5.996.122,49	$ 180.063.738,56

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

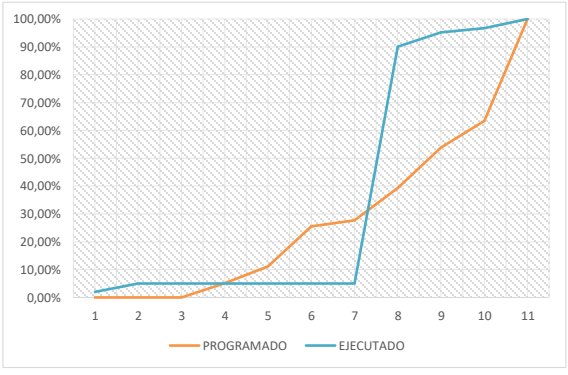

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
ALMACENISTA	0			LUNES	F
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	0			MARTES	F
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIERCOLES	L
MAESTRO	0			JUEVES	L
OFICIAL	0			VIERNES	S
AYUDANTE	0			SÁBADO	S
RESIDENTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se culmina con la instalación de la cubierta en policarbonado.
Se realiza visita.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se culmina con la instalación de la cubierta en policarbonado.
Se realiza visita.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	24	2	25	2. No. INFORME	11	3. SEMANA No.	17/02/25 al 23/02/25

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



Fecha:24/02/2025
Descripción: Instalación de laminas de policarbonato




Fecha:24/02/2025
Descripción: Instalación de laminas de policarbonato



Fecha:24/02/2025
Descripción: Instalación de laminas de policarbonato



Fecha:24/02/2025
Descripción: Instalación de laminas de policarbonato

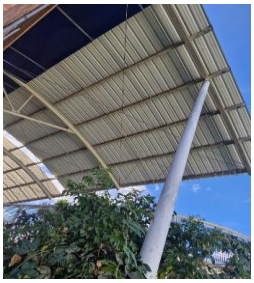

Fecha:24/02/2025
Descripción: Cubierta ecoroof.



Fecha:24/02/2025
Descripción: Cubierta ecoroof.

1. FECHA ELABORACIÓN:	24	2	25	2. No. INFORME	11		3. SEMANA No.	17/02/25 al 23/02/25		
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO KENNEDY				5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:		AK 80 # 43-43 SUR			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024		7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000		
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días
VV										
12. PRORROGAS:	23/02/2025		13. SUSPENSIONES:				Meses/días	14. ADICIONES:	$ -	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO									
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT									
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024		18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.642.402		
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días
23. PRORROGAS:	23/02/2025		24. SUSPENSIONES:				Meses/días	25. ADICIONES:	$ -	
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES									
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA									

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,0%	0,0%	N/A	N/A
MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	0,0%	0,0%	N/A	N/A
ASEO Y DISPOSICION FINAL	0,0%	0,0%	N/A	N/A
TOTAL	0,0%	0,0%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	61,4%	25,3%	36,1%
Durante el periodo	38,6%	74,7%	-36,1%
Acumulado Actual	100,0%	100,0%	0,0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	74,7%	100,0%
Valor de la Obra Programada	$ 23.369.330,72	$ 31.265.276,36

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	38,6%	100,0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 12.080.902,79	$ 31.265.276,36

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

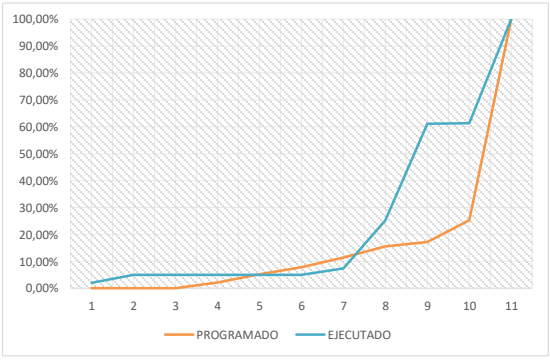

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
INSPECTOR TECNICO	0			LUNES	F
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	0			MARTES	F
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIERCOLES	L
MAESTRO	0			JUEVES	L
OFICIAL	0			VIERNES	S
AYUDANTE	0			SÁBADO	S
RESIDENTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realiza visita de obra.
Se evidencia que del colegio están arrogando basura la cual esta obstruyendo las canales y bajantes del jardín.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realiza visita de obra.
Se evidencia que del colegio están arrogando basura la cual esta obstruyendo las canales y bajantes del jardín.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	24	2	25	2. No. INFORME	11	3. SEMANA No.	17/02/25 al 23/02/25

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



Fecha:24/02/2025
Descripción: Visita de obra




Fecha:24/02/2025
Descripción: Visita de obra




Fecha:24/02/2025
Descripción: Visita de obra



Fecha:24/02/2025
Descripción: Limpieza de canales



Fecha:24/02/2025
Descripción: Limpieza de canales



Fecha:24/02/2025
Descripción: Limpieza de canales

1. FECHA ELABORACIÓN:	24	2	25	2. No. INFORME	11	3. SEMANA No.	17/02/25 al 23/02/25	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDÍN INFANTIL EL CARACOL			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	KR 95A # 34-86 SUR			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$	1.299.753.000
9. FECHA ACTA INICIO:	11 / 12 / 24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días
12. PRORROGAS:	23/02/2025	13. SUSPENSIONES:		Meses/días		14. ADICIONES:	$	-
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.							
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$	284.682.402
20. FECHA ACTA INICIO:	11 / 12 / 24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días
23. PRORROGAS:	23/02/2025	24. SUSPENSIONES:		Meses/días		25. ADICIONES:	$	-
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES							
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,00%	0,00%	N/A	N/A
MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0,00%	0,00%	N/A	N/A
TOTAL	0,00%	0,00%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	39,8%	100,0%	-60,2%
Durante el periodo	60,2%	0,0%	60,2%
Acumulado Actual	100,00%	100,0%	0,0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0,0%	100,0%
Valor de la Obra Programada	$ -	$ 106.655.052,39

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	60,2%	100,0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 64.196.486,52	$ 106.656.398,94

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

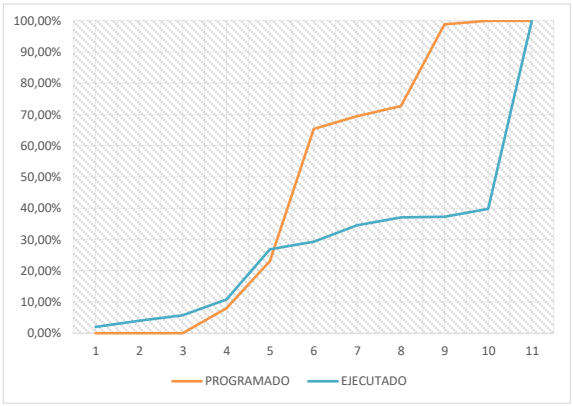

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
INSPECTOR TECNICO	1			LUNES	F
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	0			MARTES	F
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIERCOLES	L
MAESTRO	1			JUEVES	L
OFICIAL	0			VIERNES	S
AYUDANTE	0			SÁBADO	S
RESIDENTE	0			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se realiza instalacion del piso de caucho.
Se realiza instalacion de vidrios con su respectiva pelicula de seguridad.
Se realiza limpieza de aulas y corredores intervenidos.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realiza instalacion del piso de caucho.
Se realiza instalacion de vidrios con su respectiva pelicula de seguridad.
Se realiza limpieza de aulas y corredores intervenidos.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	24	2	25	2. No. INFORME	11	3. SEMANA No.	17/02/25 al 23/02/25

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 21/02/25
DESCRIPCIÓN: Instalacion de esquinerios.



FECHA FOTO: 21/02/25
DESCRIPCIÓN: Aseo y limpieza



FECHA FOTO: 21/02/25
DESCRIPCIÓN: Instalacion de vidrios.



FECHA FOTO: 21/02/25
DESCRIPCIÓN: Instalacion de esquinerios.



FECHA FOTO: 21/02/25
DESCRIPCIÓN: Instalacion de piso de caucho.



FECHA FOTO: 21/02/25
DESCRIPCIÓN: Instalacion de piso de caucho.



FECHA FOTO: 21/02/25
DESCRIPCIÓN: Instalacion de piso de caucho.



FECHA FOTO: 21/02/25
DESCRIPCIÓN: Instalacion de piso de caucho.

1. FECHA ELABORACIÓN:	24	2	25	2. No. INFORME	11	3. SEMANA No.	17/02/25 al 23/02/25	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	CENTRO CRECER CAMPO ALEGRE CALANDAIMA			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	KR 88 # 6A – 36			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$	1.299.753.000
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO: 23 de febrero 2025 Meses/días
12. PRORROGAS:	23/02/2025	13. SUSPENSIONES:		Meses/días	14. ADICIONES:	$	-	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.							
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$	284.682.402
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO: 23 de febrero 2025 Meses/días
23. PRORROGAS:	23/02/2025	24. SUSPENSIONES:		Meses/días	25. ADICIONES:	$	-	
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES							
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,00%	0,00%	N/A	N/A
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CARPINTERÍA DE MADERA	0,00%	0,00%	N/A	N/A
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0,00%	0,00%	N/A	N/A
TOTAL	0,00%	0,00%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	61,7%	86,9%	-25,1%
Durante el periodo	38,3%	13,1%	25,1%
Acumulado Actual	100,00%	100,00%	0,0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	13,1%	100,0%
Valor de la Obra Programada	$ 8.208.931,43	$ 62.439.107,62

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	38,3%	100,0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 23.907.934,31	$ 62.439.107,62

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

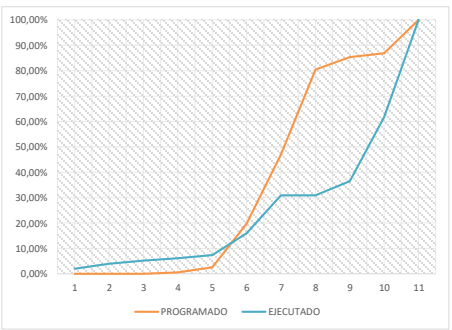

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
RESIDENTE	1			LUNES	S
INSPECTOR DE OBRA	1			MARTES	F
TÉCNICOS ELECTRICO	1			MIERCOLES	F
INSPECTOR SST	1			JUEVES	L
				VIERNES	L
				SÁBADO	F
				LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se realiza resane de muros y techos en las aulas del primer piso en los cuales se impermeabilizo su cubierta.
Se realiza aplicación de pintura epoxica en los muros de las tres aulas intervenidas.
Se realizan observaciones en zonas especificas de los muros, los cuales seran atendidas por el consorcio.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realiza resane de muros y techos en las aulas del primer piso en los cuales se impermeabilizo su cubierta.
Se realiza aplicación de pintura epoxica en los muros de las tres aulas intervenidas.
Se realizan observaciones en zonas especificas de los muros, los cuales seran atendidas por el consorcio.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE LA INTERVENTORÍA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	24	2	25	2. No. INFORME	11	3. SEMANA No.	17/02/25 al 23/02/25

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 21/02/2025
DESCRIPCIÓN: Verificacion de pendientes.



FECHA FOTO: 21/02/2025
DESCRIPCIÓN: Verificacion de pendientes.



FECHA FOTO: 21/02/2025
DESCRIPCIÓN: Verificacion de pendientes.



FECHA FOTO: 21/02/2025
DESCRIPCIÓN: Verificacion de pendientes.



FECHA FOTO: 21/02/2025
DESCRIPCIÓN: Verificacion de pendientes.



FECHA FOTO: 21/02/2025
DESCRIPCIÓN: Verificacion de pendientes.

1. FECHA ELABORACIÓN:	24	2	25	2. No. INFORME	11	3. SEMANA No.	17/02/25 al 23/02/25	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDÍN INFANTIL TINTALITO MIS PRIMEROS PASOS			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	KR 86 B # 42 F - 03 SUR			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$	1.299.753.000
9. FECHA ACTA INICIO:	11 / 12 / 24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días
12. PRORROGAS:	23/02/2025	13. SUSPENSIONES:			Meses/días	14. ADICIONES:	$	-
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.							
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$	284.682.402
20. FECHA ACTA INICIO:	11 / 12 / 24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días
23. PRORROGAS:	23/02/2025	24. SUSPENSIONES:			Meses/días	25. ADICIONES:	$	-
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES							
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,0%	0,0%	N/A	N/A
INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0,0%	0,0%	N/A	N/A
TOTAL	0,00%	0,00%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	80,9%	96,5%	-15,6%
Durante el periodo	19,1%	3,5%	15,6%
Acumulado Actual	100,00%	100,0%	0,00%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	3,5%	100,0%
Valor de la Obra Programada	$ 2.817.639,27	$ 79.853.122,35

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	19,1%	100,0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 15.284.168,16	$ 79.856.821,61

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

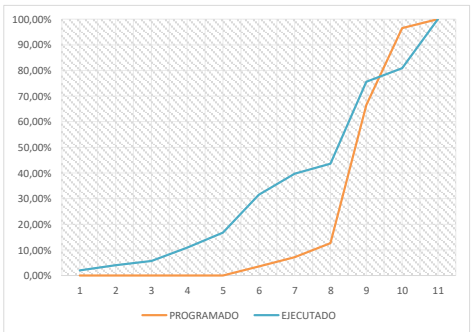

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
RESIDENTE	1			LUNES	F
INSPECTOR DE OBRA	1			MARTES	F
TÉCNICOS ELECTRICO	0			MIERCOLES	L
INSPECTOR SST	0			JUEVES	L
MAESTRO	0			VIERNES	S
OFICIAL	1			SÁBADO	S
AYUDANTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se realiza visita de obra.
Se realiza aseo general en la sede.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realiza visita de obra.
Se realiza aseo general en la sede.

Nombre: MARGRITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	24	2	25	2. No. INFORME	11	3. SEMANA No.	17/02/25 al 23/02/25

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 21/02/2025
DESCRIPCIÓN: Instalacion de cinta antideslizante.



FECHA FOTO: 21/02/2025
DESCRIPCIÓN: Visita de obra.



FECHA FOTO: 21/02/2025
DESCRIPCIÓN: Visita de obra.



FECHA FOTO: 21/02/2025
DESCRIPCIÓN: Visita de obra.



FECHA FOTO: 21/02/2025
DESCRIPCIÓN: Visita de obra.



FECHA FOTO: 21/02/2025
DESCRIPCIÓN: Visita de obra.

ACTAS DE ENTREGA POR FRENTE DE OBRA

ACTA DE RECIBO CDC KENNEDY

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE MANTENIMIENTO	Código: FOR-GIF-006 Versión: 2 Fecha: Memo I2024010244 - 17/04/2024 Página: 1 de 1

1. FECHA VERIFICACIÓN:	24	2	25						2. CONSECUTIVO			
3. LOCALIDAD:	KENNEDY				4. FORMATO DE SOLICITUD ATENDIDO:		No. RADICADO:					
5. NOMBRE DEL CENTRO O SEDE ATENDIDO:	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO KENNEDY						FECHA DEL RADICADO:	DD	MM	AA		
6. DIRECCION DEL CENTRO	AK 80 43 43 SUR											
8. ESTRATEGIA POR MEDIO DEL CUAL SE ATENDIO LA UNIDAD OPERATIVA:	2. Técnicos de la Subdirección de Plantas Físicas					7. TELÉFONO DE LA UNIDAD OPERATIVA:						
	3. Contratista de obra			x								
9. EMPRESA CONTRATISTA QUE EJECUTÓ LA OBRA:	CONSORCIO OBRAS GT						10. NÚMERO DE CONTRATO Y AÑO:	9176-2024				
11. PERIODO DE REALIZACIÓN DE TRABAJOS :	FECHA INICIO:	23	12	2024		FECHA FINAL:	23	2	225			

12. DESCRIPCION GENERAL DE LOS SERVICIOS ATENDIDOS

SOPORTE TECNICO EQUIPOS HIDRONEUMATICOS		SOPORTE TECNICO SISTEMA DETECCION HUMO:		SOPORTE TECNICO SISTEMA DE ELEVACION:		GARANTÍA SOBRE OBRAS CIVILES REALIZADAS	
SOPORTE TECNICO SISTEMAS ELECTRICOS:		SOPORTE TECNICO HIDROSANITARIO:		SOPORTE TECNICO SISTEMAS GAS:		SOPORTE TECNICO SISTEMAS DE REDES CONTRAINCENDIOS:	
SOPORTE TECNICO SISTEMAS DE COMUNICACIONES		SOPORTE TECNICO SISTEMAS FOTOVOLTAICOS:		SOPORTE TECNICO EQUIPOS ELECTROGENOS:		OTROS:	x

13. DESCRIPCION DE LOS TRABAJO REALIZADOS

Lugar especifico donde se realizaron las obras (detalle de manera especifica)	Trabajos realizados (agregue filas según considere pertinente)
Cubierta exterior centro Amar	Se realizo el desmonte de cubierta en policarbonato que se encontraba en mal estado y se instalO teja ecoroof.

14. ENCUESTA DE SATISFACCION

PREGUNTA	CALIFICACION (siendo 1 malo y 5 excelente)					OBSERVACIONES
	1	2	3	4	5	
1. Califique el aseo y orden durante la ejecución del servicio				X		
2. Califique la cortesía y amabilidad del personal técnico y profesional de la empresa contratista.				X		

15. FIRMAS

Liliana M	
FIRMA DEL RESPONSABLE DEL CENTRO O PERSONA QUE SOLICITO EL SERVICIO	CONTRATISTA DE OBRA
Nombre: Liliana M	Nombre: GUSTAVO A. TORRES DUARTE
Cargo: Coordinadora	Cargo: REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	SUPERVISION DE APOYO (SDIS)
Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ	Nombre: ADRIANA MARCELA VELANDIA BOHORQUEZ
Cargo: DIRECTORA DE INTERVENTORIA	Cargo: APOYO A LA SUPERVISION

16. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA (OBLIGATORIO)

Antes



Después



ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FORMATO: SATISFACCIÓN DE MANTENIMIENTO	CODIGO F-GIF-006 VERSIÓN: 0 FECHA: memo I2019047320 - 12/11/2019 PÁGINA: 2 de 2

16. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANEXO

Nombre:	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO KENNEDY				
Dirección:	AK 80 43 43 SUR				
Localidad:	KENNEDY	Fecha Visita:	24	7	25

ANTES



CUBIERTA CENTRO AMAR

DESPUÉS



CUBIERTA CENTRO AMAR



CUBIERTA CENTRO AMAR



CUBIERTA CENTRO AMAR

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE MANTENIMIENTO	Código: FOR-GIF-006 Versión: 2 Fecha: Memo I2024010244 - 17/04/2024 Página: 1 de 1

1. FECHA VERIFICACIÓN:	24	2	25						2. CONSECUTIVO			
3. LOCALIDAD:	KENNEDY				4. FORMATO DE SOLICITUD ATENDIDO:		No. RADICADO:					
5. NOMBRE DEL CENTRO O SEDE ATENDIDO:	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO KENNEDY						FECHA DEL RADICADO:	DD	MM	AA		
6. DIRECCION DEL CENTRO	AK 80 43 43 SUR											
8. ESTRATEGIA POR MEDIO DEL CUAL SE ATENDIO LA UNIDAD OPERATIVA:	2. Técnicos de la Subdirección de Plantas Físicas				7. TELÉFONO DE LA UNIDAD OPERATIVA:							
	3. Contratista de obra			x								
9. EMPRESA CONTRATISTA QUE EJECUTÓ LA OBRA:	CONSORCIO OBRAS GT						10. NÚMERO DE CONTRATO Y AÑO:	9176-2024				
11. PERIODO DE REALIZACIÓN DE TRABAJOS :	FECHA INICIO:	23	12	2024		FECHA FINAL:	23	2	225			

12. DESCRIPCION GENERAL DE LOS SERVICIOS ATENDIDOS							
SOPORTE TÉCNICO EQUIPOS HIDRONEUMATICOS:		SOPORTE TÉCNICO SISTEMA DETECCION HUMO:		SOPORTE TÉCNICO SISTEMA DE ELEVACION:		GARANTÍA SOBRE OBRAS CIVILES REALIZADAS	
SOPORTE TÉCNICO SISTEMAS ELECTRICOS:		SOPORTE TÉCNICO HIDROSANITARIO:		SOPORTE TÉCNICO SISTEMAS GAS:		SOPORTE TÉCNICO SISTEMAS DE REDES CONTRAINCENDIOS:	
SOPORTE TÉCNICO SISTEMAS DE COMUNICACIONES		SOPORTE TÉCNICO SISTEMAS FOTOVOLTAICOS:		SOPORTE TÉCNICO EQUIPOS ELECTROGENOS:		OTROS:	x

13. DESCRIPCION DE LOS TRABAJO REALIZADOS	
Lugar especifico donde se realizaron las obras (detalle de manera especifica)	Trabajos realizados (agregue filas según considere pertinente)
Domo	Se realizo el retiro de policarbonato que se encontraba en mal estado en el domo; así mismo se realizo la instalación de nuevas laminas de policarbonato con protección uv, calibre 5 mm, traslúcido blanco.

14. ENCUESTA DE SATISFACCION						
PREGUNTA	CALIFICACION (siendo 1 malo y 5 excelente)					OBSERVACIONES
	1	2	3	4	5	
1. Califique el aseo y orden durante la ejecución del servicio						
2. Califique la cortesía y amabilidad del personal técnico y profesional de la empresa contratista.						

15. FIRMAS	
FIRMA DEL RESPONSABLE DEL CENTRO O PERSONA QUE SOLICITO EL SERVICIO	CONTRATISTA DE OBRA
Nombre: Fernando A Forero Fonseca	Nombre: GUSTAVO A. TORRES DUARTE
Cargo: Reperente	Cargo: REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	SUPERVISION DE APOYO (SDIS)
Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ	Nombre: ADRIANA MARCELA VELANDIA BOHORQUEZ
Cargo: DIRECTORA DE INTERVENTORIA	Cargo: APOYO A LA SUPERVISION

16. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA (OBLIGATORIO)

Antes



Después



ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	PROCESO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FORMATO: SATISFACCIÓN DE MANTENIMIENTO	CODIGO F-GIF-006 VERSIÓN: 0 FECHA: memo I2019047320 - 12/11/2019 PÁGINA: 2 de 2

16. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANEXO


Nombre:	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO KENNEDY				
Dirección:	AK 80 43 43 SUR				
Localidad:	KENNEDY	Fecha Visita:	24	2	25

ANTES



DOMO

DESPUÉS

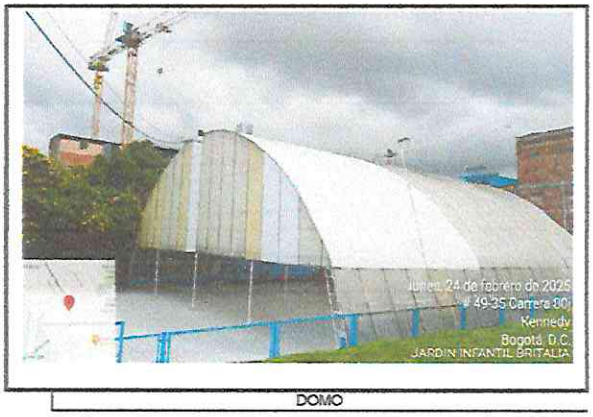

DOMO



DOMO



DOMO

ACTA DE RECIBO CASA DE LA JUVENTUD

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

FORMATO RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE MANTENIMIENTO

Código: FOR-GIF-006	
Versión: 2	
Fecha: Memo I2024010244 - 17/04/2024	
Página: 1 de 1	

1. FECHA VERIFICACIÓN:	24	2	25				2. CONSECUTIVO				
3. LOCALIDAD:	ENGATIVA			4. FORMATO DE SOLICITUD ATENDIDO:	No. RADICADO:						
5. NOMBRE DEL CENTRO O SEDE ATENDIDO:	CASA JUVENTUD ALDEA DE PENSADORES				FECHA DEL RADICADO:		DD	MM	AA		
6. DIRECCION DEL CENTRO	KRA 88A #69B-61				7. TELÉFONO DE LA UNIDAD OPERATIVA:						
8. ESTRATEGIA POR MEDIO DEL CUAL SE ATENDIO LA UNIDAD OPERATIVA:	2. Técnicos de la Subdirección de Plantas Físicas										
	3. Contratista de obra			x							
9. EMPRESA CONTRATISTA QUE EJECUTÓ LA OBRA:	CONSORCIO OBRAS GT						10. NÚMERO DE CONTRATO Y AÑO:			9176-2024	
11. PERIODO DE REALIZACIÓN DE TRABAJOS :	FECHA INICIO:	21	12	2024		FECHA FINAL:	23	2	25		

12. DESCRIPCION GENERAL DE LOS SERVICIOS ATENDIDOS

SOPORTE TÉCNICO EQUIPOS HIDRONEUMATICOS:		SOPORTE TÉCNICO SISTEMA DETECCION HUMO:		SOPORTE TÉCNICO SISTEMA DE ELEVACION:		GARANTÍA SOBRE OBRAS CIVILES REALIZADAS	
SOPORTE TÉCNICO SISTEMAS ELECTRICOS:		SOPORTE TÉCNICO HIDROSANITARIO:		SOPORTE TÉCNICO SISTEMAS GAS:		SOPORTE TÉCNICO SISTEMAS DE REDES CONTRAINCENDIOS:	
SOPORTE TÉCNICO SISTEMAS DE COMUNICACIONES		SOPORTE TÉCNICO SISTEMAS FOTOVOLTAICOS:		SOPORTE TÉCNICO EQUIPOS ELECTROGENOS:		OTROS:	x

13. DESCRIPCION DE LOS TRABAJO REALIZADOS

Lugar especifico donde se realizaron las obras (detalle de manera especifica)	Trabajos realizados (agregue filas según considere pertinente)
Teatro y vestier.	Retiro y disposición final de teja de asbesto en el área correspondiente.
Teatro y vestier.	Instalación de estructura metálica e instalación de teja Ecoroof.
Teatro y vestier.	Ejecución de pañete y encoroce de muros en las áreas designadas.
Teatro y vestier.	Instalación de puntos eléctricos para interruptores, luminarias y tomas corrientes.
Teatro y vestier.	Colocación de luminarias de 120x30 en las áreas correspondientes.
Teatro y vestier.	Resane y pintura en el auditorio y vestier.
Teatro y vestier.	Mantenimiento y pintura de rejas, ventanas y puertas en las áreas requeridas.

Teatro y vestier.

PREGUNTA	CALIFICACION (siendo 1 malo y 5 excelente)					OBSERVACIONES
	1	2	3	4	5	
1. Califique el aseo y orden durante la ejecución del servicio					X	Muy bien Gracias
2. Califique la cortesía y amabilidad del personal técnico y profesional de la empresa contratista.					X	Excelente

15. FIRMAS

Hugo F. Núñez D.	
FIRMA DEL RESPONSABLE DEL CENTRO O PERSONA QUE SOLICITO EL SERVICIO	CONTRATISTA DE OBRA
Nombre:	Nombre: GUSTAVO A. TORRES DUARTE
Cargo: Coordinador Administrativo	Cargo: REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	SUPERVISION DE APOYO (SDIS)
Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ	Nombre: ADRIANA MARCELA VELANDIA BOHORQUEZ
Cargo: DIRECTORA DE INTERVENTORIA	Cargo: APOYO A LA SUPERVISION

16. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA (OBLIGATORIO)

Antes



Después



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	PROCESO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FORMATO: SATISFACCIÓN DE MANTENIMIENTO	CODIGO F-GIF-006 VERSIÓN: 0 FECHA: memo I2019047320 - 12/11/2019 PÁGINA: 2 de 2

16. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANEXO

Nombre:	CASA JUVENTUD ALDEA DE PENSADORES				
Dirección:	KRA 88A #69B-61				
Localidad:	ENGATIVA	Fecha Visita:	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ANTES



TEATRO Y VESTIER

DESPUÉS



TEATRO Y VESTIER



TEATRO Y VESTIER



TEATRO Y VESTIER

ACTA DE RECIBO CENTRO CRECER CALANDAIMA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

FORMATO RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE MANTENIMIENTO

Código: FOR-GIF-006	
Versión: 2	
Fecha: Memo I2024010244 - 17/04/2024	
Página: 1 de 1	

1. FECHA VERIFICACIÓN:	24	2	25					2. CONSECUTIVO			
3. LOCALIDAD:	KENNEDY			4. FORMATO DE SOLICITUD ATENDIDO:		No. RADICADO:					
5. NOMBRE DEL CENTRO O SEDE ATENDIDO:	CENTRO CRECER CAMPO ALEGRE CALANDAIMA					FECHA DEL RADICADO:	DD	MM	AA		
6. DIRECCION DEL CENTRO	KR 88 6A 36										
8. ESTRATEGIA POR MEDIO DEL CUAL SE ATENDIO LA UNIDAD OPERATIVA:	2. Técnicos de la Subdirección de Plantas Físicas				7. TELÉFONO DE LA UNIDAD OPERATIVA:						
	3. Contratista de obra			x							
9. EMPRESA CONTRATISTA QUE EJECUTÓ LA OBRA:	CONSORCIO OBRAS GT						10. NÚMERO DE CONTRATO Y AÑO:		9176-2024		
11. PERIODO DE REALIZACIÓN DE TRABAJOS :	FECHA INICIO:	23	12	2024		FECHA FINAL:	23	2	225		

12. DESCRIPCION GENERAL DE LOS SERVICIOS ATENDIDOS

SOPORTE TÉCNICO EQUIPOS HIDRONEUMATICOS:		SOPORTE TÉCNICO SISTEMA DETECCION HUMO:		SOPORTE TÉCNICO SISTEMA DE ELEVACION:		GARANTÍA SOBRE OBRAS CIVILES REALIZADAS	
SOPORTE TÉCNICO SISTEMAS ELECTRICOS:		SOPORTE TÉCNICO HIDROSANITARIO:		SOPORTE TÉCNICO SISTEMAS GAS:		SOPORTE TÉCNICO SISTEMAS DE REDES CONTRAINCENDIOS:	
SOPORTE TÉCNICO SISTEMAS DE COMUNICACIONES		SOPORTE TÉCNICO SISTEMAS FOTOVOLTAICOS:		SOPORTE TÉCNICO EQUIPOS ELECTROGENOS:		OTROS:	x

13. DESCRIPCION DE LOS TRABAJO REALIZADOS

Lugar especifico donde se realizaron las obras (detalle de manera especifica)	Trabajos realizados (agregue filas según considere pertinente)
Fachada principal.	Retiro e instalación de pelicula de seguridad en la fachada de coordinación
Coordinacion segundo piso.	Construcción de muros divisorios para el cuarto de archivo.
Coordinacion segundo piso.	Instalación de puerta en el cuarto de archivo.
Coordinacion segundo piso.	Instalación de luminarias de emergencia en las áreas correspondientes.
Coordinacion segundo piso.	Resane y pintura del cuarto de coordinación.
Aulas primer piso.	Resane y pintura de tres aulas para su mantenimiento y mejora estética.
Cubierta.	Impermeabilización de cubiertas mediante la aplicación de manto asfáltico para prevenir filtraciones

14. ENCUESTA DE SATISFACCION

PREGUNTA	CALIFICACION (siendo 1 malo y 5 excelente) 1	2	3	4	5	OBSERVACIONES
1. Califique el aseo y orden durante la ejecución del servicio			X			De manera permanente dejaban material abierto y sin control.
2. Califique la cortesía y amabilidad del personal técnico y profesional de la empresa contratista.			X			Hacen de cortesia con dificultad.

15. FIRMAS

Marcela Guacaneme fl.	
FIRMA DEL RESPONSABLE DEL CENTRO O PERSONA QUE SOLICITO EL SERVICIO	CONTRATISTA DE OBRA
Nombre: Marcela Guacaneme fl.	Nombre: GUSTAVO A. TORRES DUARTE
Cargo: Coordinadora.	Cargo: REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	SUPERVISION DE APOYO (SDIS)
Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ	Nombre: ADRIANA MARCELA VELANDIA BOHORQUEZ
Cargo: DIRECTORA DE INTERVENTORIA	Cargo: APOYO A LA SUPERVISION

16. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA (OBLIGATORIO)

Antes



Después



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FORMATO: SATISFACCIÓN DE MANTENIMIENTO	CODIGO F-GIF-006 VERSIÓN: 0 FECHA: memo I2018047320 - 12/11/2019 PAGINA: 2 de 2

16. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANEXO

Nombre:	CENTRO CRECER CAMPO ALEGRE CALANDAIMA					
Dirección:	KR 88 6A 36					
Localidad:	KENNEDY		Fecha Visita:			

ANTES



AULAS

DESPUÉS



CUBIERTA



ARCHIVO Y COORDINACION



ARCHIVO Y COORDINACION

ACTA DE RECIBO CENTRO CRECER FONTIBON

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE MANTENIMIENTO	Código: FOR-GIF-006 Versión: 2 Fecha: Memo I2024010244 - 17/04/2024 Página: 1 de 1

1. FECHA VERIFICACIÓN:	24	2	25							2. CONSECUTIVO			
3. LOCALIDAD:	FONTIBON				4. FORMATO DE SOLICITUD ATENDIDO:		No. RADICADO:						
5. NOMBRE DEL CENTRO O SEDE ATENDIDO:	CENTRO CRECER FONTIBON						FECHA DEL RADICADO:	DD	MM	AA			
6. DIRECCION DEL CENTRO	CL 22F #106-22												
8. ESTRATEGIA POR MEDIO DEL CUAL SE ATENDIO LA UNIDAD OPERATIVA:	2. Técnicos de la Subdirección de Plantas Físicas				7. TELÉFONO DE LA UNIDAD OPERATIVA:								
	3. Contratista de obra			x									
9. EMPRESA CONTRATISTA QUE EJECUTÓ LA OBRA:	CONSORCIO OBRAS GT						10. NÚMERO DE CONTRATO Y AÑO:	9176-2024					
11. PERIODO DE REALIZACIÓN DE TRABAJOS :	FECHA INICIO:	23	12	2024		FECHA FINAL:	23	2	25				

12. DESCRIPCION GENERAL DE LOS SERVICIOS ATENDIDOS

SOPORTE TÉCNICO EQUIPOS HIDRONEUMATICOS:		SOPORTE TÉCNICO SISTEMA DETECCION HUMO:		SOPORTE TÉCNICO SISTEMA DE ELEVACION:		GARANTÍA SOBRE OBRAS CIVILES REALIZADAS	
SOPORTE TÉCNICO SISTEMAS ELECTRICOS:		SOPORTE TÉCNICO HIDROSANITARIO:		SOPORTE TÉCNICO SISTEMAS GAS:		SOPORTE TÉCNICO SISTEMAS DE REDES CONTRAINCENDIOS:	
SOPORTE TÉCNICO SISTEMAS DE COMUNICACIONES		SOPORTE TÉCNICO SISTEMAS FOTOVOLTAICOS:		SOPORTE TÉCNICO EQUIPOS ELECTROGENOS:		OTROS:	x

13. DESCRIPCION DE LOS TRABAJO REALIZADOS

Lugar especifico donde se realizaron las obras (detalle de manera especifica)	Trabajos realizados (agregue filas según considere pertinente)
Corredoras primer piso y segundo piso.	Instalación de luminarias de 120x30 en los corredores.
Porteria, fachada y baños.	Instalación de luminarias de 24W en la porteria y los baños.
Cocina.	Instalación de luminarias herméticas en la cocina.
Patio.	Instalación de reflectores en el patio para mejorar la iluminación exterior.
Comedor.	Resane y pintura del comedor.

14. ENCUESTA DE SATISFACCION

PREGUNTA	CALIFICACION (siendo 1 malo y 5 excelente)					OBSERVACIONES
	1	2	3	4	5	
1. Califique el aseo y orden durante la ejecución del servicio					X	Sin novedad
2. Califique la cortesía y amabilidad del personal técnico y profesional de la empresa contratista.					X	Sin Novedad.

15. FIRMAS

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL CENTRO O PERSONA QUE SOLICITO EL SERVICIO	CONTRATISTA DE OBRA
Nombre: Cindy Sharay Cardozo P.	Nombre: GUSTAVO A. TORRES DUARTE
Cargo: Coordinadora	Cargo: REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	SUPERVISION DE APOYO (SDIS)
Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ	Nombre: ADRIANA MARCELA VELANDIA BOHORQUEZ
Cargo: DIRECTORA DE INTERVENTORIA	Cargo: APOYO A LA SUPERVISION

16. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA (OBLIGATORIO)

Antes



Después



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FORMATO: SATISFACCIÓN DE MANTENIMIENTO	CODIGO F-GIF-006 VERSIÓN: 0 FECHA: memo I2019047320 - 12/11/2019 PÁGINA: 2 de 2

16. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANEXO

Nombre:	CENTRO CRECER FONTIBON				
Dirección:	CL 22F #106-22				
Localidad:	FONTIBON	Fecha Visita:	24	2	20

ANTES



COMEDOR

DESPUÉS



COMEDOR



CORREDOR PRIMER PISO



CORREDOR PRIMER PISO

ACTA DE RECIBO J.I BRITALIA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE MANTENIMIENTO	Código: FOR-GIF-006 Versión: 2 Fecha: Memo I2024010244 - 17/04/2024 Página: 1 de 1

1. FECHA VERIFICACIÓN:	24	2	25					2. CONSECUTIVO			
3. LOCALIDAD:	KENNEDY			4. FORMATO DE SOLICITUD ATENDIDO:	No. RADICADO:						
5. NOMBRE DEL CENTRO O SEDE ATENDIDO:	JARDIN INFANTIL BRITALIA				FECHA DEL RADICADO:	DD	MM	AA			
6. DIRECCION DEL CENTRO	CL 56 SUR 81 26				7. TELÉFONO DE LA UNIDAD OPERATIVA:						
8. ESTRATEGIA POR MEDIO DEL CUAL SE ATENDIO LA UNIDAD OPERATIVA:	2. Técnicos de la Subdirección de Plantas Físicas										
	3. Contratista de obra		x								
9. EMPRESA CONTRATISTA QUE EJECUTÓ LA OBRA:	CONSORCIO OBRAS GT							10. NÚMERO DE CONTRATO Y AÑO:	9176-2024		
11. PERIODO DE REALIZACIÓN DE TRABAJOS :	FECHA INICIO:	23	12	2024		FECHA FINAL:	23	2	25		

12. DESCRIPCION GENERAL DE LOS SERVICIOS ATENDIDOS							
SOPORTE TÉCNICO EQUIPOS HIDRONEUMATICOS:		SOPORTE TÉCNICO SISTEMA DETECCION HUMO:		SOPORTE TÉCNICO SISTEMA DE ELEVACION:		GARANTÍA SOBRE OBRAS CIVILES REALIZADAS	
SOPORTE TÉCNICO SISTEMAS ELECTRICOS:		SOPORTE TÉCNICO HIDROSANITARIO:		SOPORTE TÉCNICO SISTEMAS GAS:		SOPORTE TÉCNICO SISTEMAS DE REDES CONTRAINCENDIOS:	
SOPORTE TÉCNICO SISTEMAS DE COMUNICACIONES		SOPORTE TÉCNICO SISTEMAS FOTOVOLTAICOS:		SOPORTE TÉCNICO EQUIPOS ELECTROGENOS:		OTROS:	x


13. DESCRIPCION DE LOS TRABAJO REALIZADOS	
Lugar especifico donde se realizaron las obras (detalle de manera especifica)	Trabajos realizados (agregue filas según considere pertinente)
Aulas.	Instalación de ventanas en dos aulas.
Aulas y cocina.	Resane y pintura de las aulas de clase y la cocina.
Patio.	Instalación de tanques e impermeabilización de la placa con manto asfáltico.
Cubierta y canales.	Mantenimiento general de la cubierta.
Canal de aguas lluvias.	Limpieza y mantenimiento de la viga canal.
Patio.	Instalación de bajante en el área correspondiente.

14. ENCUESTA DE SATISFACCION						
PREGUNTA	CALIFICACION (siendo 1 malo y 5 excelente)					OBSERVACIONES
	1	2	3	4	5	
1. Califique el aseo y orden durante la ejecución del servicio						
2. Califique la cortesía y amabilidad del personal técnico y profesional de la empresa contratista.						

15. FIRMAS	
FIRMA DEL RESPONSABLE DEL CENTRO O PERSONA QUE SOLICITO EL SERVICIO	CONTRATISTA DE OBRA
Nombre: Olga Velandia	Nombre: GUSTAVO A. TORRES DUARTE
Cargo: Responsable.	Cargo: REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	SUPERVISIÓN DE APOYO (SDIS)
Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ	Nombre: ADRIANA MARCELA VELANDIA BOHORQUEZ
Cargo: DIRECTORA DE INTERVENTORIA	Cargo: APOYO A LA SUPERVISION

16. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA (OBLIGATORIO)

Antes

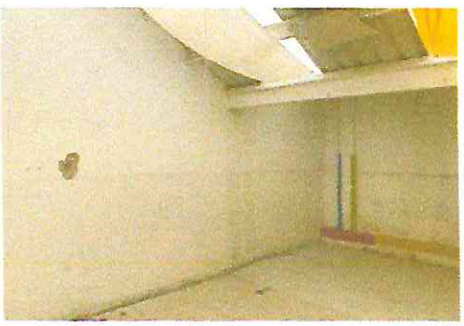

Después




ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FORMATO: SATISFACCIÓN DE MANTENIMIENTO	CODIGO F-GIF-006 VERSIÓN: 0 FECHA: memo I2019047320 - 12/11/2019 PÁGINA: 2 de 2

16. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANEXO

Nombre:	JARDIN INFANTIL BRITALIA				
Dirección:	CL 56 SUR 81 26				
Localidad:	KENNEDY	Fecha Visita:	24	2	23

ANTES

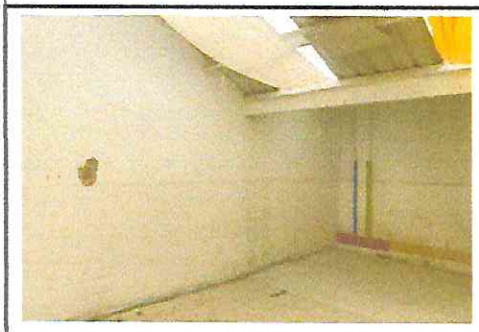

PARVULOS B

DESPUÉS



PARVULOS B



PARVULOS A Y B



PARVULOS B

ACTA DE RECIBO J.I EL CARACOL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

FORMATO RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE MANTENIMIENTO

Código: FOR-GIF-006	
Versión: 2	
Fecha: Memo I2024010244 - 17/04/2024	
Página: 1 de 1	

1. FECHA VERIFICACIÓN:	24	2	25					2. CONSECUTIVO			
3. LOCALIDAD:	KENNEDY			4. FORMATO DE SOLICITUD ATENDIDO:		No. RADICADO:					
5. NOMBRE DEL CENTRO O SEDE ATENDIDO:	JARDIN INFANTIL EL CARACOL					FECHA DEL RADICADO:	DD	MM	AA		
6. DIRECCION DEL CENTRO	KR 95A 34 94 SUR										
8. ESTRATEGIA POR MEDIO DEL CUAL SE ATENDIO LA UNIDAD OPERATIVA:	2. Técnicos de la Subdirección de Plantas Físicas				7. TELÉFONO DE LA UNIDAD OPERATIVA:						
	3. Contratista de obra		x								
9. EMPRESA CONTRATISTA QUE EJECUTÓ LA OBRA:	CONSORCIO OBRAS GT						10. NÚMERO DE CONTRATO Y AÑO:	9176-2024			
11. PERIODO DE REALIZACIÓN DE TRABAJOS :	FECHA INICIO:	23	12	2024		FECHA FINAL:	23	2	25		

12. DESCRIPCION GENERAL DE LOS SERVICIOS ATENDIDOS

SOPORTE TÉCNICO EQUIPOS HIDRONEUMATICOS:		SOPORTE TÉCNICO SISTEMA DETECCION HUMO:		SOPORTE TÉCNICO SISTEMA DE ELEVACION:		GARANTÍA SOBRE OBRAS CIVILES REALIZADAS	
SOPORTE TÉCNICO SISTEMAS ELECTRICOS:		SOPORTE TÉCNICO HIDROSANITARIO:		SOPORTE TÉCNICO SISTEMAS GAS:		SOPORTE TÉCNICO SISTEMAS DE REDES CONTRAINCENDIOS:	
SOPORTE TÉCNICO SISTEMAS DE COMUNICACIONES		SOPORTE TÉCNICO SISTEMAS FOTOVOLTAICOS:		SOPORTE TÉCNICO EQUIPOS ELECTROGENOS:		OTROS:	x

13. DESCRIPCION DE LOS TRABAJO REALIZADOS

Lugar especifico donde se realizaron las obras (detalle de manera especifica)	Trabajos realizados (agregue filas según considere pertinente)
Dos aulas del primer piso y tres del segundo piso	Instalación de piso de caucho en cinco aulas.
Dos aulas del primer piso y cinco del segundo piso	Reposición de esquineros de espuma en las áreas correspondientes.
Dos aulas del primer piso, cinco del segundo piso y corredor sur y corredor norte.	Resane y pintura de siete aulas y corredores.
Aula del primer piso y corredor segundo piso	Instalación de vidrios con película de seguridad en las áreas requeridas.
Cubierta y canales.	Mantenimiento general de la cubierta y limpieza de los canales.
Aulas del segundo piso y corredores.	Reparación de humedades en el cielo raso en las zonas afectadas.

14. ENCUESTA DE SATISFACCION

PREGUNTA	CALIFICACION (siendo 1 malo y 5 excelente)					OBSERVACIONES
	1	2	3	4	5	
1. Califique el aseo y orden durante la ejecución del servicio				X		
2. Califique la cortesía y amabilidad del personal técnico y profesional de la empresa contratista.					X	

15. FIRMAS

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL CENTRO O PERSONA QUE SOLICITO EL SERVICIO	CONTRATISTA DE OBRA
Nombre: Sonia Bernal B	Nombre: GUSTAVO A. TORRES DUARTE
Cargo: Responsable SI	Cargo: REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	SUPERVICION DE APOYO (SDIS)
Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ	Nombre: ADRIANA MARCELA VELANDIA BOHORQUEZ
Cargo: DIRECTORA DE INTERVENTORIA	Cargo: APOYO A LA SUPERVISION

16. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA (OBLIGATORIO)

Antes



Después



16. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANEXO

Nombre:	JARDIN INFANTIL EL CARACOL					
Dirección:	KR 95A 34 94 SUR					
Localidad:	KENNEDY		Fecha Visita:	24	2	25

ANTES



AULA SEGUNDO PISO

DESPUÉS



AULA SEGUNDO PISO



CORREDOR SEGUNDO PISO



CORREDOR SEGUNDO PISO

ACTA DE RECIBO J.I ENGATIVA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE MANTENIMIENTO	Código: FOR-GIF-006 Versión: 2 Fecha: Memo I2024010244 - 17/04/2024 Página: 1 de 1

1. FECHA VERIFICACIÓN:	24	2	25							2. CONSECUTIVO			
3. LOCALIDAD:	ENGATIVA					4. FORMATO DE SOLICITUD ATENDIDO:		No. RADICADO:					
5. NOMBRE DEL CENTRO O SEDE ATENDIDO:	JARDIN INFANTIL ENGATIVA							FECHA DEL RADICADO:	DD	MM	AA		
6. DIRECCION DEL CENTRO	CL 66B #122-03					7. TELÉFONO DE LA UNIDAD OPERATIVA:							
8. ESTRATEGIA POR MEDIO DEL CUAL SE ATENDIO LA UNIDAD OPERATIVA:	2. Técnicos de la Subdirección de Plantas Físicas												
	3. Contratista de obra				x								
9. EMPRESA CONTRATISTA QUE EJECUTÓ LA OBRA:	CONSORCIO OBRAS GT							10. NÚMERO DE CONTRATO Y AÑO:				9176-2024	
11. PERIODO DE REALIZACIÓN DE TRABAJOS :	FECHA INICIO:		23	12	2024		FECHA FINAL:	23	2	25			

12. DESCRIPCION GENERAL DE LOS SERVICIOS ATENDIDOS

SOPORTE TÉCNICO EQUIPOS HIDRONEUMATICOS:		SOPORTE TÉCNICO SISTEMA DETECCION HUMO:		SOPORTE TÉCNICO SISTEMA DE ELEVACION:		GARANTÍA SOBRE OBRAS CIVILES REALIZADAS	
SOPORTE TÉCNICO SISTEMAS ELECTRICOS:		SOPORTE TÉCNICO HIDROSANITARIO:		SOPORTE TÉCNICO SISTEMAS GAS:		SOPORTE TÉCNICO SISTEMAS DE REDES CONTRAINCENDIOS:	
SOPORTE TÉCNICO SISTEMAS DE COMUNICACIONES		SOPORTE TÉCNICO SISTEMAS FOTOVOLTAICOS:		SOPORTE TÉCNICO EQUIPOS ELECTROGENOS:		OTROS:	x

13. DESCRIPCION DE LOS TRABAJO REALIZADOS

Lugar especifico donde se realizaron las obras (detalle de manera especifica)	Trabajos realizados (agregue filas según considere pertinente)
Comedor y patio.	Sustitución de la cubierta en el comedor y el cuarto de ropas.
Comedor, corredores, parvulos, sala materna, cocina y lavanderia.	Resane y pintura de las siguientes áreas: corredores, comedor, cocina, baños, salón de reuniones, aula de párvulos y sala materna.
Comedor.	Instalación de luminarias en el comedor.
Lavanderia.	Sustitución de los tanques y ejecución de la impermeabilización de la placa de tanques.
Lavanderia.	Resane y pintura de la lavanderia.
Cuarto de Reuniones de padres.	Adecuación del aula para reuniones de padres.
Fachada principal.	Resane y pintura de la fachada principal y la zona de parqueadero.
Cubierta.	Mantenimiento general de la cubierta y limpieza de canales.

Teatro y vestier.

PREGUNTA	CALIFICACION (siendo 1 malo y 5 excelente)					OBSERVACIONES
	1	2	3	4	5	
1. Califique el aseo y orden durante la ejecución del servicio						
2. Califique la cortesía y amabilidad del personal técnico y profesional de la empresa contratista.						

15. FIRMAS

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL CENTRO O PERSONA QUE SOLICITO EL SERVICIO	CONTRATISTA DE OBRA
Nombre: Erika Ramirez S	Nombre: GUSTAVO A. TORRES DUARTE
Cargo: Coord Administrativa	Cargo: REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	SUPERVISION DE APOYO (SDIS)
Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ	Nombre: ADRIANA MARCELA VELANDIA BOHORQUEZ
Cargo: DIRECTORA DE INTERVENTORIA	Cargo: APOYO A LA SUPERVISION

16. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA (OBLIGATORIO)

Antes



Después



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FORMATO: SATISFACCIÓN DE MANTENIMIENTO	CODIGO F-GIF-006 VERSIÓN: 0 FECHA: memo I2019047320 - 12/11/2019 PÁGINA: 2 de 2

16. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANEXO

Nombre:	JARDIN INFANTIL ENGATIVA					
Dirección:	CL 66B #122-03					
Localidad:	ENGATIVA	Fecha Visita:	24	2	25	

ANTES



BANOS PRIMER PISO

DESPUÉS



BANOS PRIMER PISO



COMEDOR



COMEDOR

ACTA DE RECIBO J.I OSO DE ANTEOJOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE MANTENIMIENTO	Código: FOR-GIF-006 Versión: 2 Fecha: Memo I2024010244 - 17/04/2024 Página: 1 de 1

1. FECHA VERIFICACIÓN:	24	2	25							2. CONSECUTIVO			
3. LOCALIDAD:	FONTIBON					4. FORMATO DE SOLICITUD ATENDIDO:	No. RADICADO:						
5. NOMBRE DEL CENTRO O SEDE ATENDIDO:	JARDIN INFANTIL OSO DE ANTEOJOS						FECHA DEL RADICADO:	DD	MM	AA			
6. DIRECCION DEL CENTRO	KR 100 #23-22					7. TELÉFONO DE LA UNIDAD OPERATIVA:							
8. ESTRATEGIA POR MEDIO DEL CUAL SE ATENDIO LA UNIDAD OPERATIVA:	2. Técnicos de la Subdirección de Plantas Físicas												
	3. Contratista de obra				x								
9. EMPRESA CONTRATISTA QUE EJECUTÓ LA OBRA:	CONSORCIO OBRAS GT						10. NÚMERO DE CONTRATO Y AÑO:	9176-2024					
11. PERIODO DE REALIZACIÓN DE TRABAJOS :	FECHA INICIO:	23	12	2024		FECHA FINAL:	23	2	25				

12. DESCRIPCION GENERAL DE LOS SERVICIOS ATENDIDOS

SOPORTE TÉCNICO EQUIPOS HIDRONEUMATICOS:		SOPORTE TÉCNICO SISTEMA DETECCION HUMO:		SOPORTE TÉCNICO SISTEMA DE ELEVACION:		GARANTÍA SOBRE OBRAS CIVILES REALIZADAS	
SOPORTE TÉCNICO SISTEMAS ELECTRICOS:		SOPORTE TÉCNICO HIDROSANITARIO:		SOPORTE TÉCNICO SISTEMAS GAS:		SOPORTE TÉCNICO SISTEMAS DE REDES CONTRAINCENDIOS:	
SOPORTE TÉCNICO SISTEMAS DE COMUNICACIONES		SOPORTE TÉCNICO SISTEMAS FOTOVOLTAICOS:		SOPORTE TÉCNICO EQUIPOS ELECTROGENOS:		OTROS:	x

13. DESCRIPCION DE LOS TRABAJO REALIZADOS

Lugar especifico donde se realizaron las obras (detalle de manera especifica)	Trabajos realizados (agregue filas según considere pertinente)
Cubierta.	Ejecución de picado, alistado de mortero impermeabilizado e instalación de manto asfáltico en la cubierta del comedor y cocina.
Comedor y cocina.	Instalación de luminarias en las áreas del comedor y la cocina.
Comedor, cocina, alacena, deposito, punto fijo cuarto piso y zona de ascensor.	Resane y pintura de las siguientes áreas: comedor, cocina, escalera, alacena y depósito.

14. ENCUESTA DE SATISFACCION

PREGUNTA	CALIFICACION (siendo 1 malo y 5 excelente)					OBSERVACIONES
	1	2	3	4	5	
1. Califique el aseo y orden durante la ejecución del servicio					X	
2. Califique la cortesía y amabilidad del personal técnico y profesional de la empresa contratista.					X	

15. FIRMAS

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL CENTRO O PERSONA QUE SOLICITO EL SERVICIO	CONTRATISTA DE OBRA
Nombre: YEISON FABIAN ORTIZ	Nombre: GUSTAVO A. TORRES DUARTE
Cargo: RET. MANTENIMIENTO LOCAL	Cargo: REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	SUPERVISION DE APOYO (SDIS)
Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ	Nombre: ADRIANA MARCELA VELANDIA BOHORQUEZ
Cargo: DIRECTORA DE INTERVENTORIA	Cargo: APOYO A LA SUPERVISION

16. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA (OBLIGATORIO)

Antes



Después



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FORMATO: SATISFACCIÓN DE MANTENIMIENTO	CODIGO F-GIF-006 VERSIÓN: 0 FECHA: memo I2019047320 - 12/11/2019 PÁGINA: 2 de 2

16. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANEXO

Nombre:	JARDIN INFANTIL OSO DE ANTEOJOS				
Dirección:	KR 100 #23-22				
Localidad:	FONTIBON	Fecha Visita:	24	2	25

ANTES



CUBIERTA

DESPUÉS



COMEDOR



CUBIERTA



CUBIERTA

ACTA DE RECIBO J.I SABANA GRANDE

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE MANTENIMIENTO	Código: FOR-GIF-006 Versión: 2 Fecha: Memo I2024010244 - 17/04/2024 Página: 1 de 1

1. FECHA VERIFICACIÓN:	24	2	25					2. CONSECUTIVO			
3. LOCALIDAD:	FONTIBON			4. FORMATO DE SOLICITUD ATENDIDO:		No. RADICADO:					
5. NOMBRE DEL CENTRO O SEDE ATENDIDO:	JARDIN INFANTIL SABANA GRANDE					FECHA DEL RADICADO:	DD	MM	AA		
6. DIRECCION DEL CENTRO	KR 100 #23-22										
8. ESTRATEGIA POR MEDIO DEL CUAL SE ATENDIO LA UNIDAD OPERATIVA:	2. Técnicos de la Subdirección de Plantas Físicas			7. TELÉFONO DE LA UNIDAD OPERATIVA:							
	3. Contratista de obra		x								
9. EMPRESA CONTRATISTA QUE EJECUTÓ LA OBRA:	CONSORCIO OBRAS GT						10. NÚMERO DE CONTRATO Y AÑO:			9176-2024	
11. PERIODO DE REALIZACIÓN DE TRABAJOS :	FECHA INICIO:	23	12	2024		FECHA FINAL:	23	2	25		

12. DESCRIPCION GENERAL DE LOS SERVICIOS ATENDIDOS

SOPORTE TÉCNICO EQUIPOS HIDRONEUMATICOS:		SOPORTE TÉCNICO SISTEMA DETECCION HUMO:		SOPORTE TÉCNICO SISTEMA DE ELEVACION:		GARANTÍA SOBRE OBRAS CIVILES REALIZADAS	
SOPORTE TÉCNICO SISTEMAS ELECTRICOS:		SOPORTE TÉCNICO HIDROSANITARIO:		SOPORTE TÉCNICO SISTEMAS GAS:		SOPORTE TÉCNICO SISTEMAS DE REDES CONTRAINCENDIOS:	
SOPORTE TÉCNICO SISTEMAS DE COMUNICACIONES		SOPORTE TÉCNICO SISTEMAS FOTOVOLTAICOS:		SOPORTE TÉCNICO EQUIPOS ELECTROGENOS:		OTROS:	x

13. DESCRIPCION DE LOS TRABAJO REALIZADOS

Lugar especifico donde se realizaron las obras (detalle de manera especifica)	Trabajos realizados (agregue filas según considere pertinente)
Aulas de primer piso, segundo piso y comedor.	Instalación de luminarias de 120x30 en las áreas del primer piso.
Coomedor segundo piso y aula segundo piso.	Instalación de luminarias de 60x60 en el comedor y la oficina de coordinación.
Cocina, baños primer piso y segundo piso.	Instalación de luminarias herméticas en la cocina y los baños del primer piso.
Fachada principal y terraza segundo piso.	Instalación de reflectores en la fachada y en la terraza para mejorar la iluminación exterior.
Comedor, cocina, baños segundo piso, baños primer piso y aula primer piso.	Resane y pintura de las áreas del comedor, baños y cocina.
Baños primer piso y segundo piso.	Instalación de sanitarios de línea infantil y adulto en los baños correspondientes.
Baño segundo piso.	Instalación de orinal en el área indicada.
Lava manos primer piso.	Instalación de llaves tipo push con desagüe en las zonas requeridas.
Baños primer piso.	Construcción y adecuación del área para lava colas en el primer piso.

14. ENCUESTA DE SATISFACCION

PREGUNTA	CALIFICACION (siendo 1 malo y 5 excelente)					OBSERVACIONES
	1	2	3	4	5	
1. Califique el aseo y orden durante la ejecución del servicio					X	
2. Califique la cortesía y amabilidad del personal técnico y profesional de la empresa contratista.					X	

15. FIRMAS

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL CENTRO O PERSONA QUE SOLICITO EL SERVICIO	CONTRATISTA DE OBRA
Nombre: YEISON FABIAN ORTIZ	Nombre: GUSTAVO A. TORRES DUARTE
Cargo: REF MANTENIMIENTO LOCAL	Cargo: REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	SUPERVISION DE APOYO (SDIS)
Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ	Nombre: ADRIANA MARCELA VELANDIA BOHORQUEZ
Cargo: DIRECTORA DE INTERVENTORIA	Cargo: APOYO A LA SUPERVISION

16. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA (OBLIGATORIO)

Antes



Después



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FORMATO: SATISFACCIÓN DE MANTENIMIENTO	CODIGO F-GIF-006 VERSIÓN: 0 FECHA: memo I2019047320 - 12/11/2019 PÁGINA: 2 de 2

16. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANEXO

Nombre:	JARDIN INFANTIL SABANA GRANDE					
Dirección:	KR 100 #23-22					
Localidad:	FONTIBON		Fecha Visita:	24	2	20

ANTES



CORREDOR

DESPUÉS



AULA PRIMER PISO



AULA SEGUNDO PISO



AULA SEGUNDO PISO

ACTA DE RECIBO J.I SAUCES

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

FORMATO RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE MANTENIMIENTO

Código: FOR-GIF-006	
Versión: 2	
Fecha: Memo I2024010244 - 17/04/2024	
Página: 1 de 1	

1. FECHA VERIFICACIÓN:	24	2	25						2. CONSECUTIVO		
3. LOCALIDAD:	ENGATIVA				4. FORMATO DE SOLICITUD ATENDIDO:		No. RADICADO:				
5. NOMBRE DEL CENTRO O SEDE ATENDIDO:	JARDIN INFANTIL LOS SAUCES						FECHA DEL RADICADO:	DD	MM	AA	
6. DIRECCION DEL CENTRO	CL 69 #121-29				7. TELÉFONO DE LA UNIDAD OPERATIVA:						
8. ESTRATEGIA POR MEDIO DEL CUAL SE ATENDIO LA UNIDAD OPERATIVA:	2. Técnicos de la Subdirección de Plantas Físicas										
	3. Contratista de obra			x							
9. EMPRESA CONTRATISTA QUE EJECUTÓ LA OBRA:	CONSORCIO OBRAS GT						10. NÚMERO DE CONTRATO Y AÑO:	9176-2024			
11. PERIODO DE REALIZACIÓN DE TRABAJOS :	FECHA INICIO:	23	12	2024		FECHA FINAL:	23	2	25		

12. DESCRIPCION GENERAL DE LOS SERVICIOS ATENDIDOS

SOPORTE TECNICO EQUIPOS HIDRONEUMATICOS:		SOPORTE TECNICO SISTEMA DETECCION HUMO:		SOPORTE TECNICO SISTEMA DE ELEVACION:		GARANTÍA SOBRE OBRAS CIVILES REALIZADAS	
SOPORTE TECNICO SISTEMAS ELECTRICOS:		SOPORTE TECNICO HIDROSANITARIO:		SOPORTE TECNICO SISTEMAS GAS:		SOPORTE TECNICO SISTEMAS DE REDES CONTRAINCENDIOS:	
SOPORTE TECNICO SISTEMAS DE COMUNICACIONES		SOPORTE TECNICO SISTEMAS FOTOVOLTAICOS:		SOPORTE TECNICO EQUIPOS ELECTROGENOS:		OTROS:	x

13. DESCRIPCION DE LOS TRABAJO REALIZADOS

Lugar especifico donde se realizaron las obras (detalle de manera especifica)	Trabajos realizados (agregue filas según considere pertinente)
Fachada principal.	Resane y pintura de la fachada principal.
Cubierta.	Retiro del manto asfáltico en la cubierta.
Cubierta.	Picado, alistado de mortero impermeabilizado e instalación de nuevo manto asfáltico en la cubierta.

Teatro y vestier.

PREGUNTA	CALIFICACION (siendo 1 malo y 5 excelente)					OBSERVACIONES
	1	2	3	4	5	
1. Califique el aseo y orden durante la ejecución del servicio						
2. Califique la cortesía y amabilidad del personal técnico y profesional de la empresa contratista.						

15. FIRMAS

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL CENTRO O PERSONA QUE SOLICITO EL SERVICIO	CONTRATISTA DE OBRA
Nombre: Estiva Ramirez S	Nombre: GUSTAVO A. TORRES DUARTE
Cargo: Coord Administrativo	Cargo: REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	SUPERVISION DE APOYO (SDIS)
Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ	Nombre: ADRIANA MARCELA VELANDIA BOHORQUEZ
Cargo: DIRECTORA DE INTERVENTORIA	Cargo: APOYO A LA SUPERVISION

16. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA (OBLIGATORIO)

Antes



Después



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FORMATO: SATISFACCIÓN DE MANTENIMIENTO	CODIGO F-GIF-006 VERSIÓN: 0 FECHA: memo 12019047320 - 12/11/2019 PÁGINA: 2 de 2

16. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANEXO

Nombre:	JARDIN INFANTIL LOS SAUCES					
Dirección:	CL 69 #121-29					
Localidad:	ENGATIVA	Fecha Visita:	24	2	20	

ANTES



CUBIERTA


DESPUÉS



FACHADA PRINCIPAL



CUBIERTA

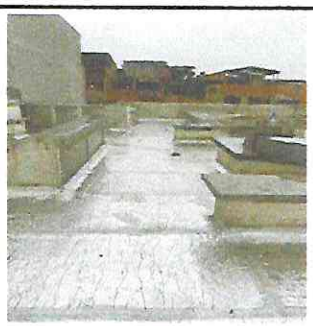

CUBIERTA

ACTA DE RECIBO J.I TINTALITO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE MANTENIMIENTO	Código: FOR-GIF-006 Versión: 2 Fecha: Memo I2024010244 - 17/04/2024 Página: 1 de 1

1. FECHA VERIFICACIÓN:	24	2	25						2. CONSECUTIVO		
3. LOCALIDAD:	KENNEDY				4. FORMATO DE SOLICITUD ATENDIDO:		No. RADICADO:				
5. NOMBRE DEL CENTRO O SEDE ATENDIDO:	JARDIN INFANTIL TINTALITO MIS PRIMEROS PASOS						FECHA DEL RADICADO:	DD	MM	AA	
6. DIRECCION DEL CENTRO	KR 86B 42F 03 SUR MJ 1										
8. ESTRATEGIA POR MEDIO DEL CUAL SE ATENDIO LA UNIDAD OPERATIVA:	2. Técnicos de la Subdirección de Plantas Físicas				7. TELÉFONO DE LA UNIDAD OPERATIVA:						
	3. Contratista de obra		x								
9. EMPRESA CONTRATISTA QUE EJECUTÓ LA OBRA:	CONSORCIO OBRAS GT						10. NÚMERO DE CONTRATO Y AÑO:	9176-2024			
11. PERIODO DE REALIZACIÓN DE TRABAJOS :	FECHA INICIO:	23	12	2024		FECHA FINAL:	23	2	25		

12. DESCRIPCION GENERAL DE LOS SERVICIOS ATENDIDOS

SOPORTE TÉCNICO EQUIPOS HIDRONEUMATICOS:		SOPORTE TÉCNICO SISTEMA DETECCION HUMO:		SOPORTE TÉCNICO SISTEMA DE ELEVACION:		GARANTÍA SOBRE OBRAS CIVILES REALIZADAS	
SOPORTE TÉCNICO SISTEMAS ELECTRICOS:		SOPORTE TÉCNICO HIDROSANITARIO:		SOPORTE TÉCNICO SISTEMAS GAS:		SOPORTE TÉCNICO SISTEMAS DE REDES CONTRAINCENDIOS:	
SOPORTE TÉCNICO SISTEMAS DE COMUNICACIONES		SOPORTE TÉCNICO SISTEMAS FOTOVOLTAICOS:		SOPORTE TÉCNICO EQUIPOS ELECTROGENOS:		OTROS:	x

13. DESCRIPCION DE LOS TRABAJO REALIZADOS

Lugar especifico donde se realizaron las obras (detalle de manera especifica)	Trabajos realizados (agregue filas según considere pertinente)
Segundo piso	Retiro de los cielo rasos existentes en las áreas correspondientes.
Cubierta segundo piso y cocina	Retiro y disposición final de la cubierta de asbesto en la zona indicada.
Cubierta segundo piso y cocina	Instalación de nueva cubierta Ecorrof en el área establecida.
En la sede en genral tanto muros como cielo rasos.	Resane y pintura general de toda la sede
Segundo piso y tomo GFCI en cocina.	Instalación de redes eléctricas para luminarias e interruptores en el segundo piso.
En cubierta del primer piso.	Instalación de reja de seguridad en la cocina.
En toda la sede.	Pintura en esmalte de puertas y ventanas en las áreas correspondientes.
Escalesras.	Instalación de cinta antideslizante en las escaleras para mayor seguridad.
Segundo piso aulas, baños, coordinacion y pasillo.	Instalación de luminarias en el segundo piso.
Fachada.	Resano y pintura de la fachada principal para mejorar la estética y protección de la estructura.
Baños primer y segundo piso.	Instalacion de divisiones de baño.

14. ENCUESTA DE SATISFACCION

PREGUNTA	CALIFICACION (siendo 1 malo y 5 excelente)					OBSERVACIONES
	1	2	3	4	5	
1. Califique el aseo y orden durante la ejecución del servicio				X		Se sugiere mejorar compromiso y tiempos de entrega de la labor
2. Califique la cortesía y amabilidad del personal técnico y profesional de la empresa contratista.				X		

15. FIRMAS

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL CENTRO O PERSONA QUE SOLICITO EL SERVICIO	CONTRATISTA DE OBRA
Nombre: Yinnet Alexandra Torres Cortes	Nombre: GUSTAVO A. TORRES DUARTE
Cargo: Responsable del Servicio	Cargo: REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	SUPERVISIÓN DE APOYO (SDIS)
Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ	Nombre: ADRIANA MARCELA VELANDIA BOHORQUEZ
Cargo: DIRECTORA DE INTERVENTORIA	Cargo: APOYO A LA SUPERVISION

16. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA (OBLIGATORIO)

Antes



Después



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FORMATO: SATISFACCIÓN DE MANTENIMIENTO	CODIGO F-GIF-006 VERSIÓN: 0 FECHA: memo I2019047320 - 12/11/2019 PÁGINA: 2 de 2

16. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANEXO

Nombre:	JARDIN INFANTIL TINTALITO MIS PRIMEROS PASOS					
Dirección:	KR 86B 42F 03 SUR MJ 1					
Localidad:	KENNEDY	Fecha Visita:	24	2	25	

ANTES



CUBIERTA COCINA

DESPUÉS



AULA SEGUNDO PISO



AULA SEGUNDO PISO



AULA SEGUNDO PISO

ACTA DE RECIBO J.I SHUSH UREK

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE MANTENIMIENTO	Código: FOR-GIF-006 Versión: 2 Fecha: Memo I2024010244 - 17/04/2024 Página: 1 de 1

1. FECHA VERIFICACIÓN:	24	2	25						2. CONSECUTIVO		
3. LOCALIDAD:	FONTIBON			4. FORMATO DE SOLICITUD ATENDIDO:		No. RADICADO:					
5. NOMBRE DEL CENTRO O SEDE ATENDIDO:	CPI SHUSH UREK KUSREIK YA (MISAK)					FECHA DEL RADICADO:	DD	MM	AA		
6. DIRECCION DEL CENTRO	DG 15D #98-40										
8. ESTRATEGIA POR MEDIO DEL CUAL SE ATENDIO LA UNIDAD OPERATIVA:	2. Técnicos de la Subdirección de Plantas Físicas			7. TELÉFONO DE LA UNIDAD OPERATIVA:							
	3. Contratista de obra		x								
9. EMPRESA CONTRATISTA QUE EJECUTÓ LA OBRA:	CONSORCIO OBRAS GT					10. NÚMERO DE CONTRATO Y AÑO:	9176-2024				
11. PERIODO DE REALIZACIÓN DE TRABAJOS :	FECHA INICIO:	23	12	2024		FECHA FINAL:	23	2	25		

12. DESCRIPCION GENERAL DE LOS SERVICIOS ATENDIDOS

SOPORTE TECNICO EQUIPOS HIDRONEUMATICOS:		SOPORTE TECNICO SISTEMA DETECCION HUMO:		SOPORTE TECNICO SISTEMA DE ELEVACION:		GARANTÍA SOBRE OBRAS CIVILES REALIZADAS	
SOPORTE TECNICO SISTEMAS ELECTRICOS:		SOPORTE TECNICO HIDROSANITARIO:		SOPORTE TECNICO SISTEMAS GAS:		SOPORTE TECNICO SISTEMAS DE REDES CONTRAINCENDIOS:	
SOPORTE TECNICO SISTEMAS DE COMUNICACIONES		SOPORTE TECNICO SISTEMAS FOTOVOLTAICOS:		SOPORTE TECNICO EQUIPOS ELECTROGENOS:		OTROS:	x

13. DESCRIPCION DE LOS TRABAJO REALIZADOS

Lugar especifico donde se realizaron las obras (detalle de manera especifica)	Trabajos realizados (agregue filas según considere pertinente)
Cubierta de los cinco modulos intervenidos.	Mantenimiento general de la cubierta y limpieza de los canales para asegurar su adecuado funcionamiento.
Cubierta de los cinco modulos intervenidos.	Sustitución de los bajantes en mal estado en las áreas correspondientes.
Cinco aulas intervenidas.	Aplicación de pintura en esmalte en las aulas para mejorar su estética y protección.

14. ENCUESTA DE SATISFACCION

PREGUNTA	CALIFICACION (siendo 1 malo y 5 excelente)					OBSERVACIONES
	1	2	3	4	5	
1. Califique el aseo y orden durante la ejecución del servicio					X	
2. Califique la cortesía y amabilidad del personal técnico y profesional de la empresa contratista.					X	

15. FIRMAS

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL CENTRO O PERSONA QUE SOLICITO EL SERVICIO	CONTRATISTA DE OBRA
Nombre: YEISON TARAZONA ORTIZ A.	Nombre: GUSTAVO A. TORRES DUARTE
Cargo: REF MANTENIMIENTO LOCAL	Cargo: REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	SUPERVISION DE APOYO (SDIS)
Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ	Nombre: ADRIANA MARCELA VELANDIA BOHORQUEZ
Cargo: DIRECTORA DE INTERVENTORIA	Cargo: APOYO A LA SUPERVISION

16. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA (OBLIGATORIO)

Antes



Después



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FORMATO: SATISFACCIÓN DE MANTENIMIENTO	CODIGO F-GIF-006 VERSIÓN: 0 FECHA: memo I2019047320 - 12/11/2019 PÁGINA: 2 de 2

16. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANEXO

Nombre:	CPI SHUSH UREK KUSREIK YA (MISAK)				
Dirección:	DG 15D #98-40				
Localidad:	FONTIBON	Fecha Visita:	24	2	20

ANTES



AULAS

DESPUÉS



AULAS



AULAS



AULAS

ACTA DE RECIBO LUZ DE ESPERANZA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE MANTENIMIENTO	Código: FOR-GIF-006 Versión: 2 Fecha: Memo I2024010244 - 17/04/2024 Página: 1 de 1

1. FECHA VERIFICACIÓN:	24	2	25					2. CONSECUTIVO			
3. LOCALIDAD:	ENGATIVA			4. FORMATO DE SOLICITUD ATENDIDO:	No. RADICADO:						
5. NOMBRE DEL CENTRO O SEDE ATENDIDO:	CASA SABIDURIA ADULTO MAYOR LUZ DE ESPERANZA				FECHA DEL RADICADO:	DD	MM	AA			
6. DIRECCION DEL CENTRO	CL 63L #124-38			7. TELÉFONO DE LA UNIDAD OPERATIVA:							
8. ESTRATEGIA POR MEDIO DEL CUAL SE ATENDIO LA UNIDAD OPERATIVA:	2. Técnicos de la Subdirección de Plantas Físicas										
	3. Contratista de obra		x								
9. EMPRESA CONTRATISTA QUE EJECUTÓ LA OBRA:	CONSORCIO OBRAS GT							10. NÚMERO DE CONTRATO Y AÑO:	9176-2024		
11. PERIODO DE REALIZACIÓN DE TRABAJOS :	FECHA INICIO:	23	12	2024		FECHA FINAL:	23	2	25		

12. DESCRIPCION GENERAL DE LOS SERVICIOS ATENDIDOS

SOPORTE TÉCNICO EQUIPOS HIDRONEUMATICOS:		SOPORTE TÉCNICO SISTEMA DETECCION HUMO:		SOPORTE TÉCNICO SISTEMA DE ELEVACION:		GARANTÍA SOBRE OBRAS CIVILES REALIZADAS	
SOPORTE TÉCNICO SISTEMAS ELECTRICOS:		SOPORTE TÉCNICO HIDROSANITARIO:		SOPORTE TÉCNICO SISTEMAS GAS:		SOPORTE TÉCNICO SISTEMAS DE REDES CONTRAINCENDIOS:	
SOPORTE TÉCNICO SISTEMAS DE COMUNICACIONES		SOPORTE TÉCNICO SISTEMAS FOTOVOLTAICOS:		SOPORTE TÉCNICO EQUIPOS ELECTROGENOS:		OTROS:	x

13. DESCRIPCION DE LOS TRABAJO REALIZADOS

Lugar especifico donde se realizaron las obras (detalle de manera especifica)	Trabajos realizados (agregue filas según considere pertinente)
Cubierta punto fijo de escaleras y ascensor.	Instalación de mortero impermeabilizado y colocación de manto asfáltico en las cubiertas de puntos fijos y del área del ascensor.
Escaleras auxiliares, escaleras principales, punto fijo, corredores, oficna principal, cocina, shut de basuras y garaje.	Resane y pintura de las siguientes áreas: escaleras principales, escaleras auxiliares, corredores, oficinas de coordinación, cocina, cocineta, shut de basuras y garaje.
Cocina	Sustitución de media caña en mal estado en la cocina, tanto en el piso, techo como en los muros.
Cocina.	Reconstrucción del cárcamo en la cocina y sustitución de luminarias herméticas.
Cocineta primer piso.	Adecuación del área de la cocineta, incluyendo la instalación de un mesón en acero inoxidable y toma corriente GFCI.
Shut de basuras.	Reconstrucción del shut de basuras, con la instalación de una puerta, media caña, enchape e iluminación.
Baños segundo y tercer piso.	Instalación de luminarias de emergencia y luminarias de 24 W.

14. ENCUESTA DE SATISFACCION

PREGUNTA	CALIFICACION (siendo 1 malo y 5 excelente)					OBSERVACIONES
	1	2	3	4	5	
1. Califique el aseo y orden durante la ejecución del servicio				X		
2. Califique la cortesia y amabilidad del personal técnico y profesional de la empresa contratista.					X	

15. FIRMAS

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL CENTRO O PERSONA QUE SOLICITO EL SERVICIO	CONTRATISTA DE OBRA
Nombre: Dayra Edilcerto Murcia U.	Nombre: GUSTAVO A. TORRES DUARTE
Cargo: Responsable	Cargo: REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	SUPERVISIÓN DE APOYO (SDIS)
Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ	Nombre: ADRIANA MARCELA VELANDIA BOHORQUEZ
Cargo: DIRECTORA DE INTERVENTORIA	Cargo: APOYO A LA SUPERVISION

16. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA (OBLIGATORIO)

Antes



Después



ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C	PROCESO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FORMATO: SATISFACCIÓN DE MANTENIMIENTO	CODIGO F-GIF-006 VERSIÓN: 0 FECHA: memo I2019047320 - 12/11/2019 PÁGINA: 2 de 2

16. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANEXO

Nombre:	CASA SABIDURIA ADULTO MAYOR LUZ DE ESPERANZA				
Dirección:	CL 63L #124-38				
Localidad:	ENGATIVA	Fecha Visita:	24	2	20

ANTES



ESCALERAS PRIMER PISO

DESPUÉS



COCINETA



ESCALERAS PRIMER PISO



ESCALERAS PRIMER PISO
