
Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración
1		**1**	**PROYECTO PARQUE NEIVA**	**360 días?**
2		**1.1**	**OBRA PARQUE**	**360 días?**
3		**1.1.1**	**PRELIMINARES**	**10 días**
4		1.1.1.1	Localización y replanteo	5 días
5		1.1.1.2	Tala de árboles	5 días
6		1.1.1.3	Limpieza de lote y retiro de sobrantes	5 días
7		1.1.1.4	Retiro de sobrantes – en sitio autorizado	5 días
8		**1.1.2**	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**	**135 días**
9		1.1.2.1	Descapote hasta 0,30 m	5 días
10		1.1.2.2	Excavación Mecánica	45 días
11		1.1.2.3	Excavación Manual	45 días
12		1.1.2.4	Relleno y compactación de la Subrasante. Esp. 230 Invias	30 días
13		1.1.2.5	Relleno y Compactación SBG-1. Esp 320-07 inv.	30 días
14		**1.1.3**	**URBANISMO**	**213 días**
15		1.1.3.1	Suministro e Instalación de Pasador de Carga de 1" (35cm)	48 días
16		1.1.3.2	Suministro e instalación de barra de anclaje de ½" (85cm)	48 días
17		1.1.3.3	Acero de refuerzo figurado fy= 4200 kg/cm2	48 días
18		1.1.3.4	Suministro e instalación de árbol H=1.50 m	6 días
19		1.1.3.5	Construcción de Piso TIPO P1 para	48 días
20		1.1.3.6	Construcción de Piso TIPO P2 para ciclorrutas	22 días
21		1.1.3.7	Construcción de Piso TIPO P3 para plazoletas	37 días
22		1.1.3.8	Pintura de demarcación de ciclorruta	12 días
23		1.1.3.9	Bordillo fundido en sitio, concreto de 3000 PSI	25 días
24		1.1.3.10	Empradización en grama	9 días
25		1.1.3.11	Construccion de piso para zonas de juegos en arena (e:0,10m)	15 días
26		1.1.3.12	Construccion de piso en gravilla mixta 3/4" a 1" (e:0,10m)	15 días
27		1.1.3.13	Malla electrosoldada (15x15cm) para andenes y ciclovía.	40 días
28		1.1.3.14	Escalera de concreto	4 días
29		1.1.3.15	Muro en concreto	20 días
30		**1.1.4**	**ESTRUCTURA METALICA Y BARANDAS**	**100 días**
31		1.1.4.1	Baranda exterior con pasamanos tubular rectangular	100 días
32		1.1.4.2	Recolectores metalicos de agua pluvial.	100 días
33		**1.1.5**	**MOBILIARIO URBANO**	**10 días?**
34		1.1.5.1	Banca en concreto con arena lavada y gravilla de 1/2 " 12mm, acabado liso con llana metálica, incluye dilataciones y soporte para luz led. Altura 0.45m, Ancho 0.50m y Largo 1.80m	1 día
35		1.1.5.2	Bicicletero unitario metálico plegado calibre 26, en láminas de 1.82m x 0.13m (pliegues a 11+11+80+80cm) con anticorrosivo y pintura electroestática color negro mate, incluye pernos, anclajes y soldaduras.	1 día
36		1.1.5.3	Caneca metálica con estructura metálica de acero galvanizado y pintura poliéster. Dimensiones 1.10 alto, 0.51m ancho y .29 de profundo, dobleces redondeados. Incluye anclaje con chazo expansivo a dado de concreto o bordillo existente.	1 día
37		1.1.5.4	Caneca metálica para residuos de mascotas con estructura metálica de acero galvanizado y pintura poliéster. Dimensiones 1.02 alto, 0.26m ancho y .26 de profundo, dobleces redondeados. Incluye anclaje con chazo expansivo a dado de concreto o bordillo exist	1 día
38		1.1.5.5	Bebedero en lámina de acero inoxidable satinado CAL 26. Contiene grifo suministro superior e inferior para mascotas. Parte superior de 53cm y soporte de 64cm y ancho de 13cm	1 día
39		1.1.5.6	Suministro, transporte e instalación de aparato biosaludable "Escalador", según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación	1 día




Proyecto: Programación - Parqu
Fecha: lun 25/08/25

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite	Progreso
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual


DANIEL ANDRES FORERO GONZALEZ
INGENIERO CIVIL ESP GERENCIA DE PROYECTOS

Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración
40		1.1.5.7	Suministro, transporte e instalación de aparato biosaludable "Cintura Alisio Doble", según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación	1 día
41		1.1.5.8	Suministro, transporte e instalación de columpio metalico para adultos doble. según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación.	1 día
42		1.1.5.9	Suministro, transporte e instalación de balancín doble grande según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación.	1 día
43		1.1.5.10	Suministro, transporte e instalación de balancín según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación.	1 día
44		1.1.5.11	Suministro, transporte e instalación de circuito de juegos infantiles, según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación.	3 días
45		1.1.5.12	Suministro, transporte e instalación de red para escalar - parques infantiles, según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación.	3 días
46		1.1.5.13	Suministro, transporte e instalación de figura tipo animal en concreto de alto desempeñode acabado pulido mate modula.	4 días
47		1.1.5.14	Suministro, transporte	1 día?
48		**1.1.6**	**DOTACIÓN**	**1 día**
49		1.1.6.1	SL 1 - Señalización de mapa del parque	1 día
50		1.1.6.2	SL 2 - Señalización explicativo de utilización de elementos	1 día
51		**1.1.7**	**ESTRUCTURA TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL**	**16 días**
52		1.1.7.1	Localización y replanteo	1 día
53		1.1.7.2	Excavación Mecánica	2 días
54		1.1.7.3	Relleno en recebo seleccionado compactado con canguro	5 días
55		1.1.7.4	Solado en concreto de limpieza (e= 5cm) de 2000 PSI	1 día
56		1.1.7.5	Construcción de estructura en concreto 4000 PSI de baja permeabilidad para tanque de agua y desarenador.	7 días
57		1.1.7.6	Acero de refuerzo figurado fy= 4200 kg/cm2	7 días
58		1.1.7.7	Suministro e instalación de entibado Tipo ED1, discontinuo en madera	9 días
59		**1.1.8**	**REDES DE AGUAS LLUVIAS**	**54 días**
60		1.1.8.1	Localización y Replanteo General de redes	18 días
61		1.1.8.2	Excavación manual sin clasificar.	18 días
62		1.1.8.3	Excavación mecánica para redes H <= 2 m	18 días
63		1.1.8.4	Retiro de sobrantes – en sitio autorizado	4 días
64		1.1.8.5	Suministro e instalación de relleno para cama en triturado de 3/4 (incluye transporte)	3 días
65		1.1.8.6	Relleno en recebo seleccionado compactado con canguro	3 días
66		1.1.8.7	Suministro e instalacion de tubería PVC sanitaria Φ2 incluye accesorios, empalme del tubo, lubricante y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra.	3 días
67		1.1.8.8	Suministro e instalacion de tubería PVC sanitaria Φ3 incluye accesorios, empalme del tubo, lubricante y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra.	3 días
68		1.1.8.9	Suministro e instalacion de tubería PVC sanitaria Φ4 incluye accesorios, empalme del tubo, lubricante y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra.	3 días
69		1.1.8.10	Suministro e instalacion de tubería PVC sanitaria Φ6 incluye accesorios, empalme del tubo, lubricante y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra.	3 días




DANIEL ANDRES FORERO GONZALEZ
INGENIERO CIVIL ESP GERENCIA DE PROYECTOS

Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración
70		1.1.8.11	Suministro e instalacion de tubería PVC sanitaria Φ8 incluye accesorios, empalme del tubo, lubricante y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra.	3 días
71		1.1.8.12	Construcción de caja de inspección con placa de fondo en concreto y tapa en concreto, de 0,60m x 0,60 m (incluye marco)	3 días
72		1.1.8.13	Construcción de caja de inspección con placa de fondo en concreto y tapa en concreto, de 0,80m x 0,80 m (incluye marco)	3 días
73		1.1.8.14	Suministro e instalación de sumidero en concreto, H=0.80m (Incluye rejilla y tapa)	3 días
74		1.1.8.15	Suministro e Instalación de cañuela Tipo A-120 (80x30x22cm)	3 días
75		1.1.8.16	Suministro e instalación de entibado Tipo ED1, discontinuo en madera	3 días
76		**1.1.9**	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS**	**285 días**
77		1.1.9.1	Excavación manual para redes de 0 a 1m	15 días
78		1.1.9.2	Relleno en material seleccionado de la excavación, compactado con canguro	15 días
79		1.1.9.3	Suministro e instalación de medidor totalizador Ø 1, incluye conexión a red de acueducto existente	2 días
80		1.1.9.4	Suministro e instalación de Tubería PVC-P RDE 21 Ø 1 1/2, incluye accesorios	4 días
81		**1.1.9.5**	**CUARTO DE BOMBAS AGUA POTABLE**	**130 días**
82		1.1.9.5.1	Suministro e instalación de Tubería PVC SCH 80 diámetro 3"	10 días
83		1.1.9.5.2	Suministro e instalación de Tubería PVC SCH 80 diámetro 2 1/2",	10 días
84		1.1.9.5.3	Suministro e instalación de Tubería PVC SCH 80 diámetro 1 1/2"	10 días
85		1.1.9.5.4	Suministro e Instalación Registro de Doble Universal Ø 3"	10 días
86		1.1.9.5.5	Suministro e Instalación Registro Corte Cortina Ø 2 1/2"	10 días
87		1.1.9.5.6	Suministro e Instalación Registro Corte Cortina Ø 1 1/2"	10 días
88		1.1.9.5.7	Suministro e Instalación De Junta Flexible Ø 3"	10 días
89		1.1.9.5.8	Suministro e Instalación de Reducción Excéntrica HD 3" x 1 1/2"	10 días
90		1.1.9.5.9	Suministro e Instalación de Ampliación Concéntrica HD 1 1/2" x 3"	10 días
91		1.1.9.5.10	Suministro e Instalación de manómetro 0-200PSI	10 días
92		1.1.9.5.11	Suministro e Instalación Válvula cheque hidro roscada 3"	10 días
93		1.1.9.5.12	Suministro e Instalación Válvula cheque cortina roscada para bypass 1/2", incluye unión universal para conexión	10 días
94		1.1.9.5.13	Suministro e Instalación Válvula cheque perforada para hidroacumulador 1/2", incluye unión universal para conexión	5 días
95		1.1.9.5.14	Suministro e instalación de Registro de corte bola 1/2", incluye accesorios	5 días
96		1.1.9.5.15	Suministro e Instalación Unión universal PVC-P de bomba eyectora 2"	5 días
97		1.1.9.5.16	Suministro e Instalación Válvula de corte de bomba eyectora 2"	5 días
98		1.1.9.5.17	Suministro e Instalación Válvula cheque hidroroscada de bomba eyectora	5 días
99		1.1.9.5.18	Suministro e instalación de Tubería PVC-P RDE 21 Ø 2", incluye accesorios para conexión de bomba eyectora y rebose de tanque de agua potable	5 días
100		1.1.9.5.19	Suministro e instalación de Niple pasamuro en acero inoxidable 3"	5 días
101		1.1.9.5.20	Suministro e instalación de Niple pasamuro en acero inoxidable 2"	5 días
102		1.1.9.5.21	Suministro e instalación de Niple pasamuro en acero inoxidable 1 1/2"	5 días
103		**1.1.9.6**	**EQUIPOS ESPECIALES**	**94 días**




Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración
104		1.1.9.6.1	Suministro y montaje equipo de bombeo agua potable compuesto por 2 bombas eléctricas instaladas en paralelo con succión positiva, incluye suministro e instalación de bombas, tablero controlador, así como su configuración y puesta en servicio.	45 días
105		1.1.9.6.2	Suministro y montaje de bomba sumergible eléctrica para pozo eyector, de mínimo 7,78L/s @ 7,71mca, a ser instalada en red eléctrica trifásica de 220V y 60Hz, de acuerdo con planos (incluye suministro e instalación de bomba, flotantes eléctricos para contr	45 días
106		1.1.9.6.3	Suministro y montaje de fuente de agua interactiva automatica (incluye suministro e instalacion de filtros, bombas de potencia, valvulas y accesorios para su puesta en servicio)	34 días
107		**1.1.10**	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**150 días**
108		1.1.10.1	instalacion de Tablero bifasico para ilumnacion publica	15 días
109		1.1.10.2	Suministro e instalacion de Medidor trifasico	15 días
110		1.1.10.3	Instalacion de Caja de Inspeccion de 40x40	10 días
111		1.1.10.4	Suministro e instalacion de poste metalico ornamental de 8 metros	10 días
112		1.1.10.5	Excavacion, instalación de tuberia 1 1/2", relleno y compactación x metro lineal con profundidad de 1mts . Terreno duro	10 días
113		1.1.10.6	Excavacion, instalación de tuberia 2", relleno y compactación x metro lineal con profundidad de 1mts . Terreno duro	10 días
114		1.1.10.7	Suministro e instalacion de luminaria de 35 W en diferentes alturas	10 días
115		1.1.10.8	Suministro e instalacion de cable monopolar # 6 AWG Cobre THHN Color Negro	10 días
116		1.1.10.9	Suministro e instalacion de transformador 75kVA	20 días
117		1.1.10.10	simunistro e instalacion de EH-NC-550 Circuito trifásico estructura terminal, disposición	10 días
118		1.1.10.11	simunistro e instalaci	60 días
119		1.1.10.12	suministro e instalaci	60 días
120		1.1.10.13	suministro e instalaci	60 días
121		1.1.10.14	suministro e instalacion de cable 2/0 aluminio serie 80000	60 días
122		1.1.10.15	Instalacion de reflector fotovoltaico 15W para cubierta auto soportada a cualquier altura	90 días
123		**1.2**	**INTERVENTORÍA**	360 días
124		**1.3**	**PMA**	360 días
125		**1.4**	**PMT**	360 días
126		**1.5**	**CERTIFICACION RETIE DEL PROYECTO ELECTRICO**	360 días
127		**1.6**	**CERTIFICACION RETILAP DEL PROYECTO ALUMBRADO**	360 días
128		**1.7**	**AIU**	360 días



Proyecto: Programación - Parqu
Fecha: lun 25/08/25

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica			
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite	Progreso			
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual			


DANIEL ANDRES FORERO GONZALEZ
INGENIERO CIVIL ESP GERENCIA DE PROYECTOS

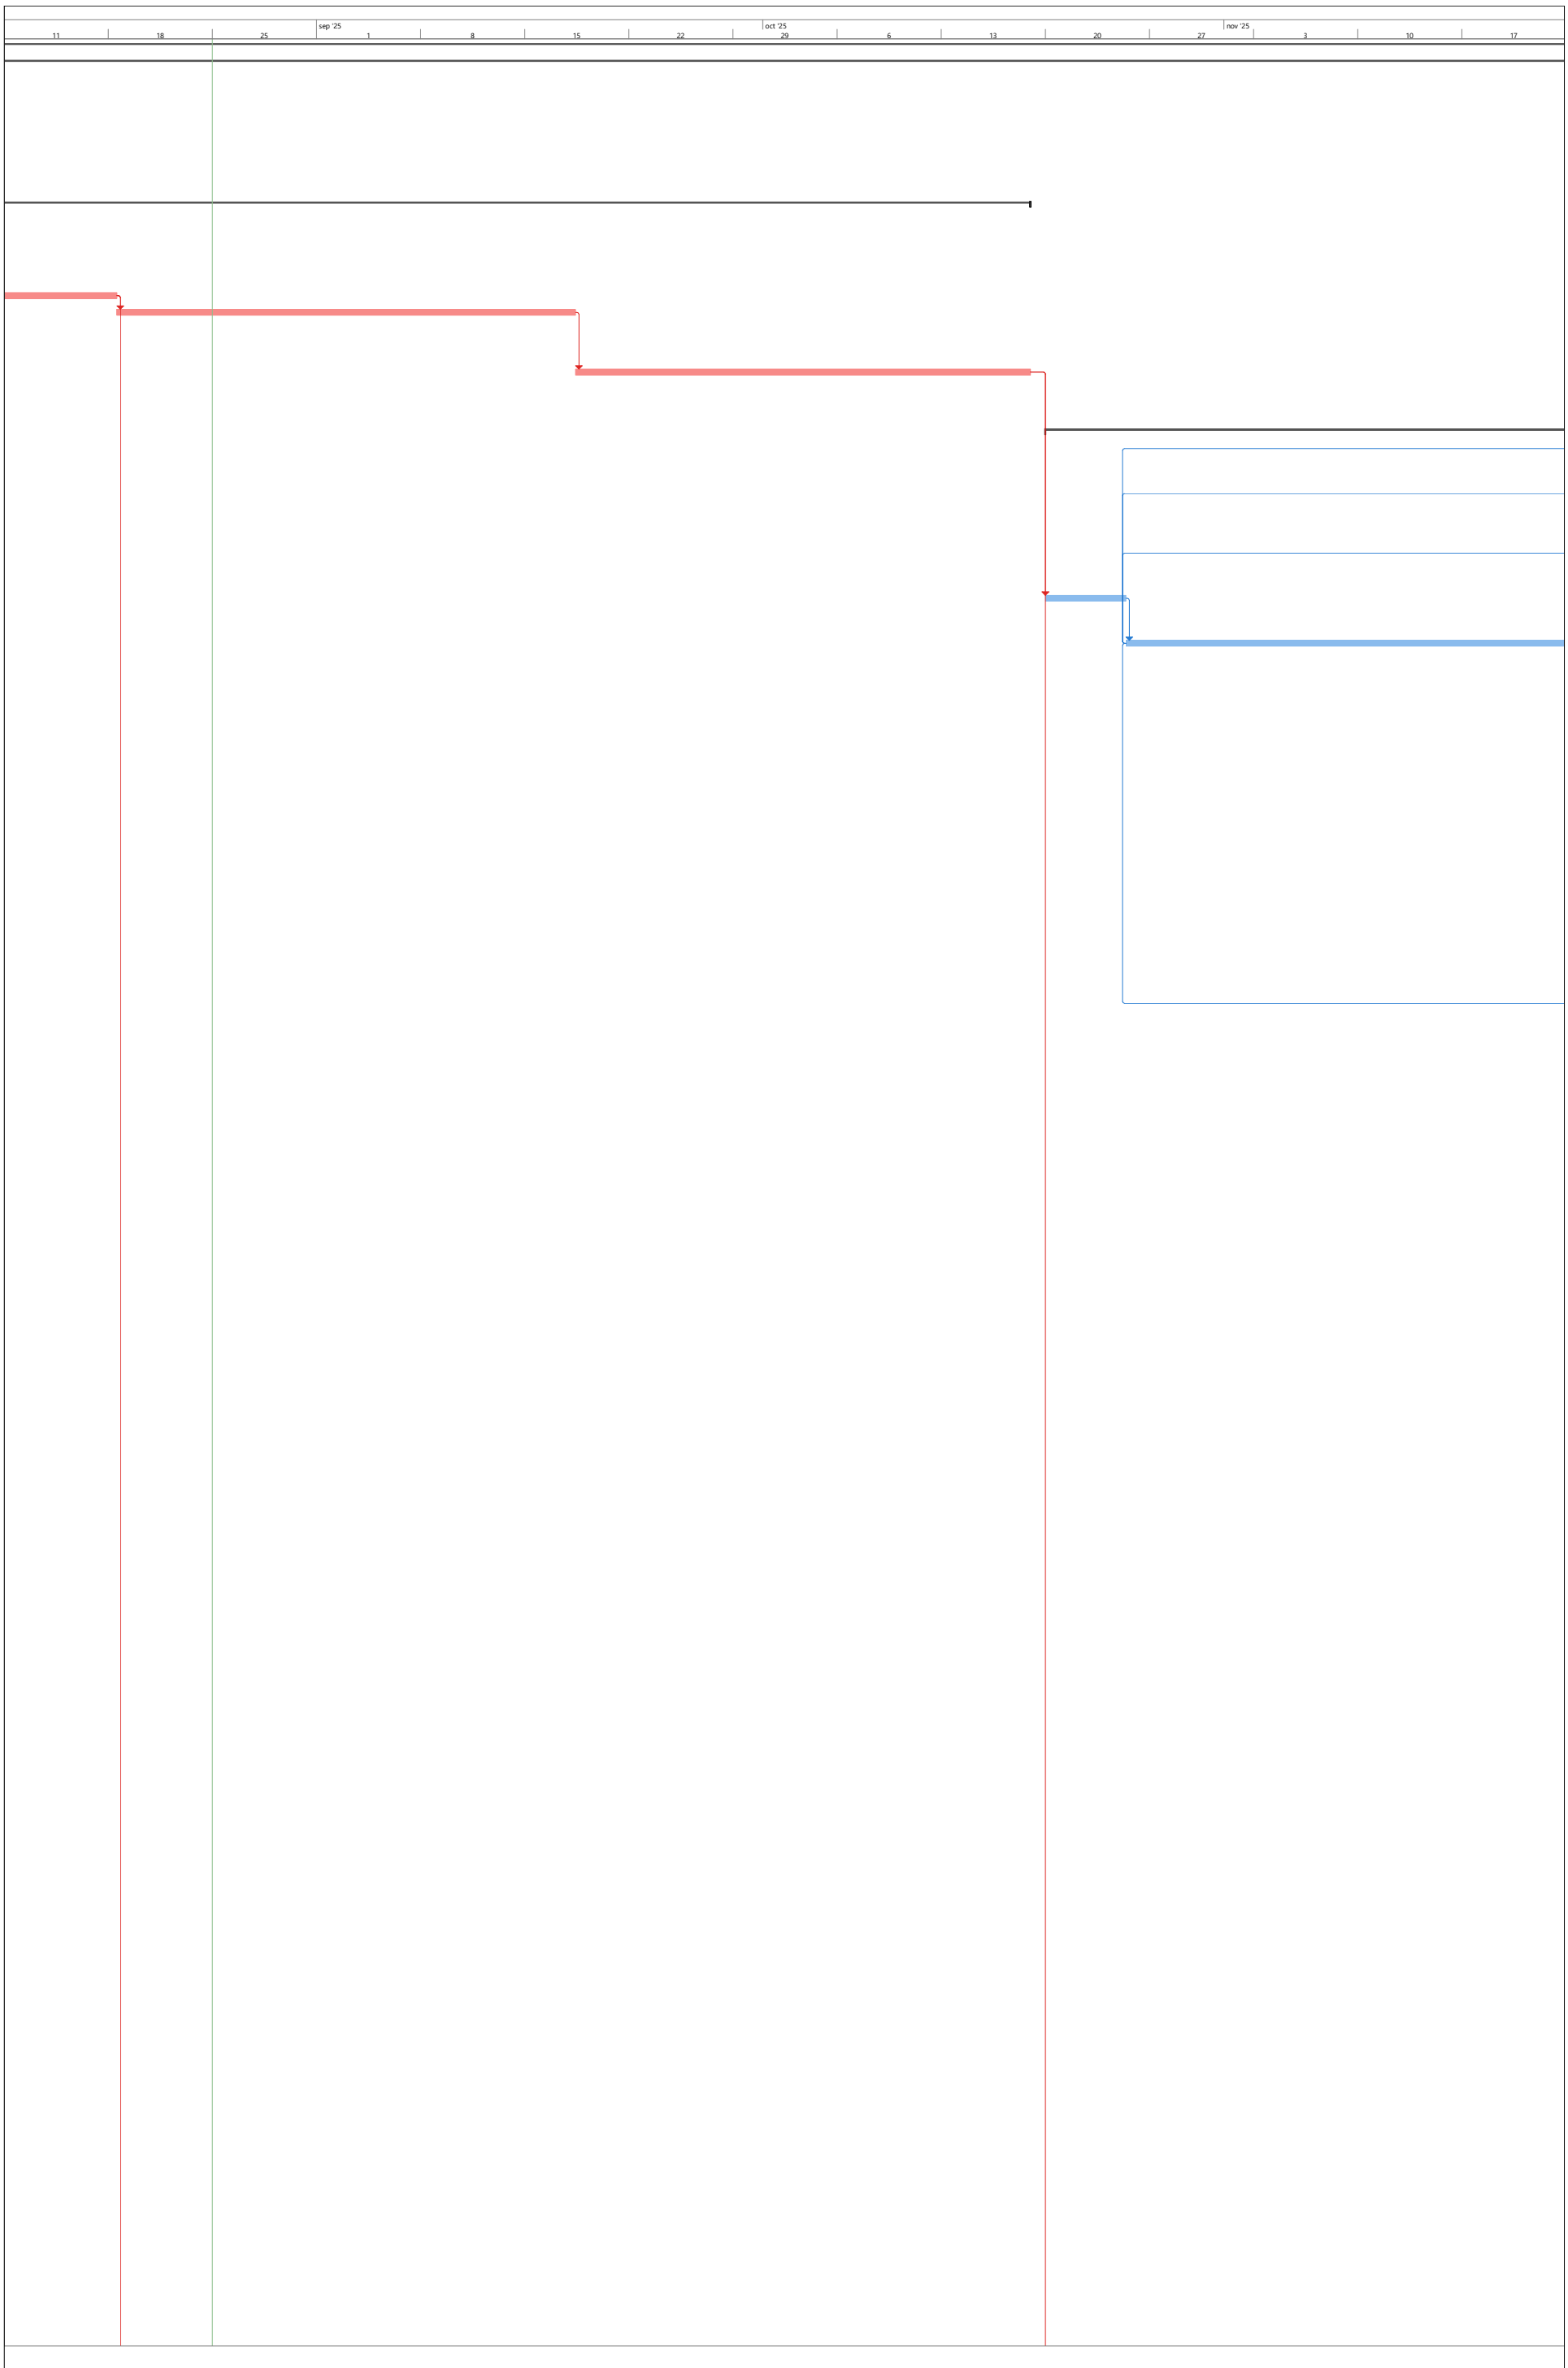

Proyecto: Programación - Parqu
Fecha: lun 25/08/25

Tarea		Resumen		Hito inactivo		solo duración		solo el comienzo		Hito externo		División crítica	
División		Resumen del proyecto		Resumen inactivo		Informe de resumen manual		solo fin		Fecha límite		Progreso	
Hito		Tarea inactiva		Tarea manual		Resumen manual		Tareas externas		Tareas críticas		Progreso manual	


DANIEL ANDRES FORERO GONZALEZ
INGENIERO CIVIL ESP GERENCIA DE PROYECTOS

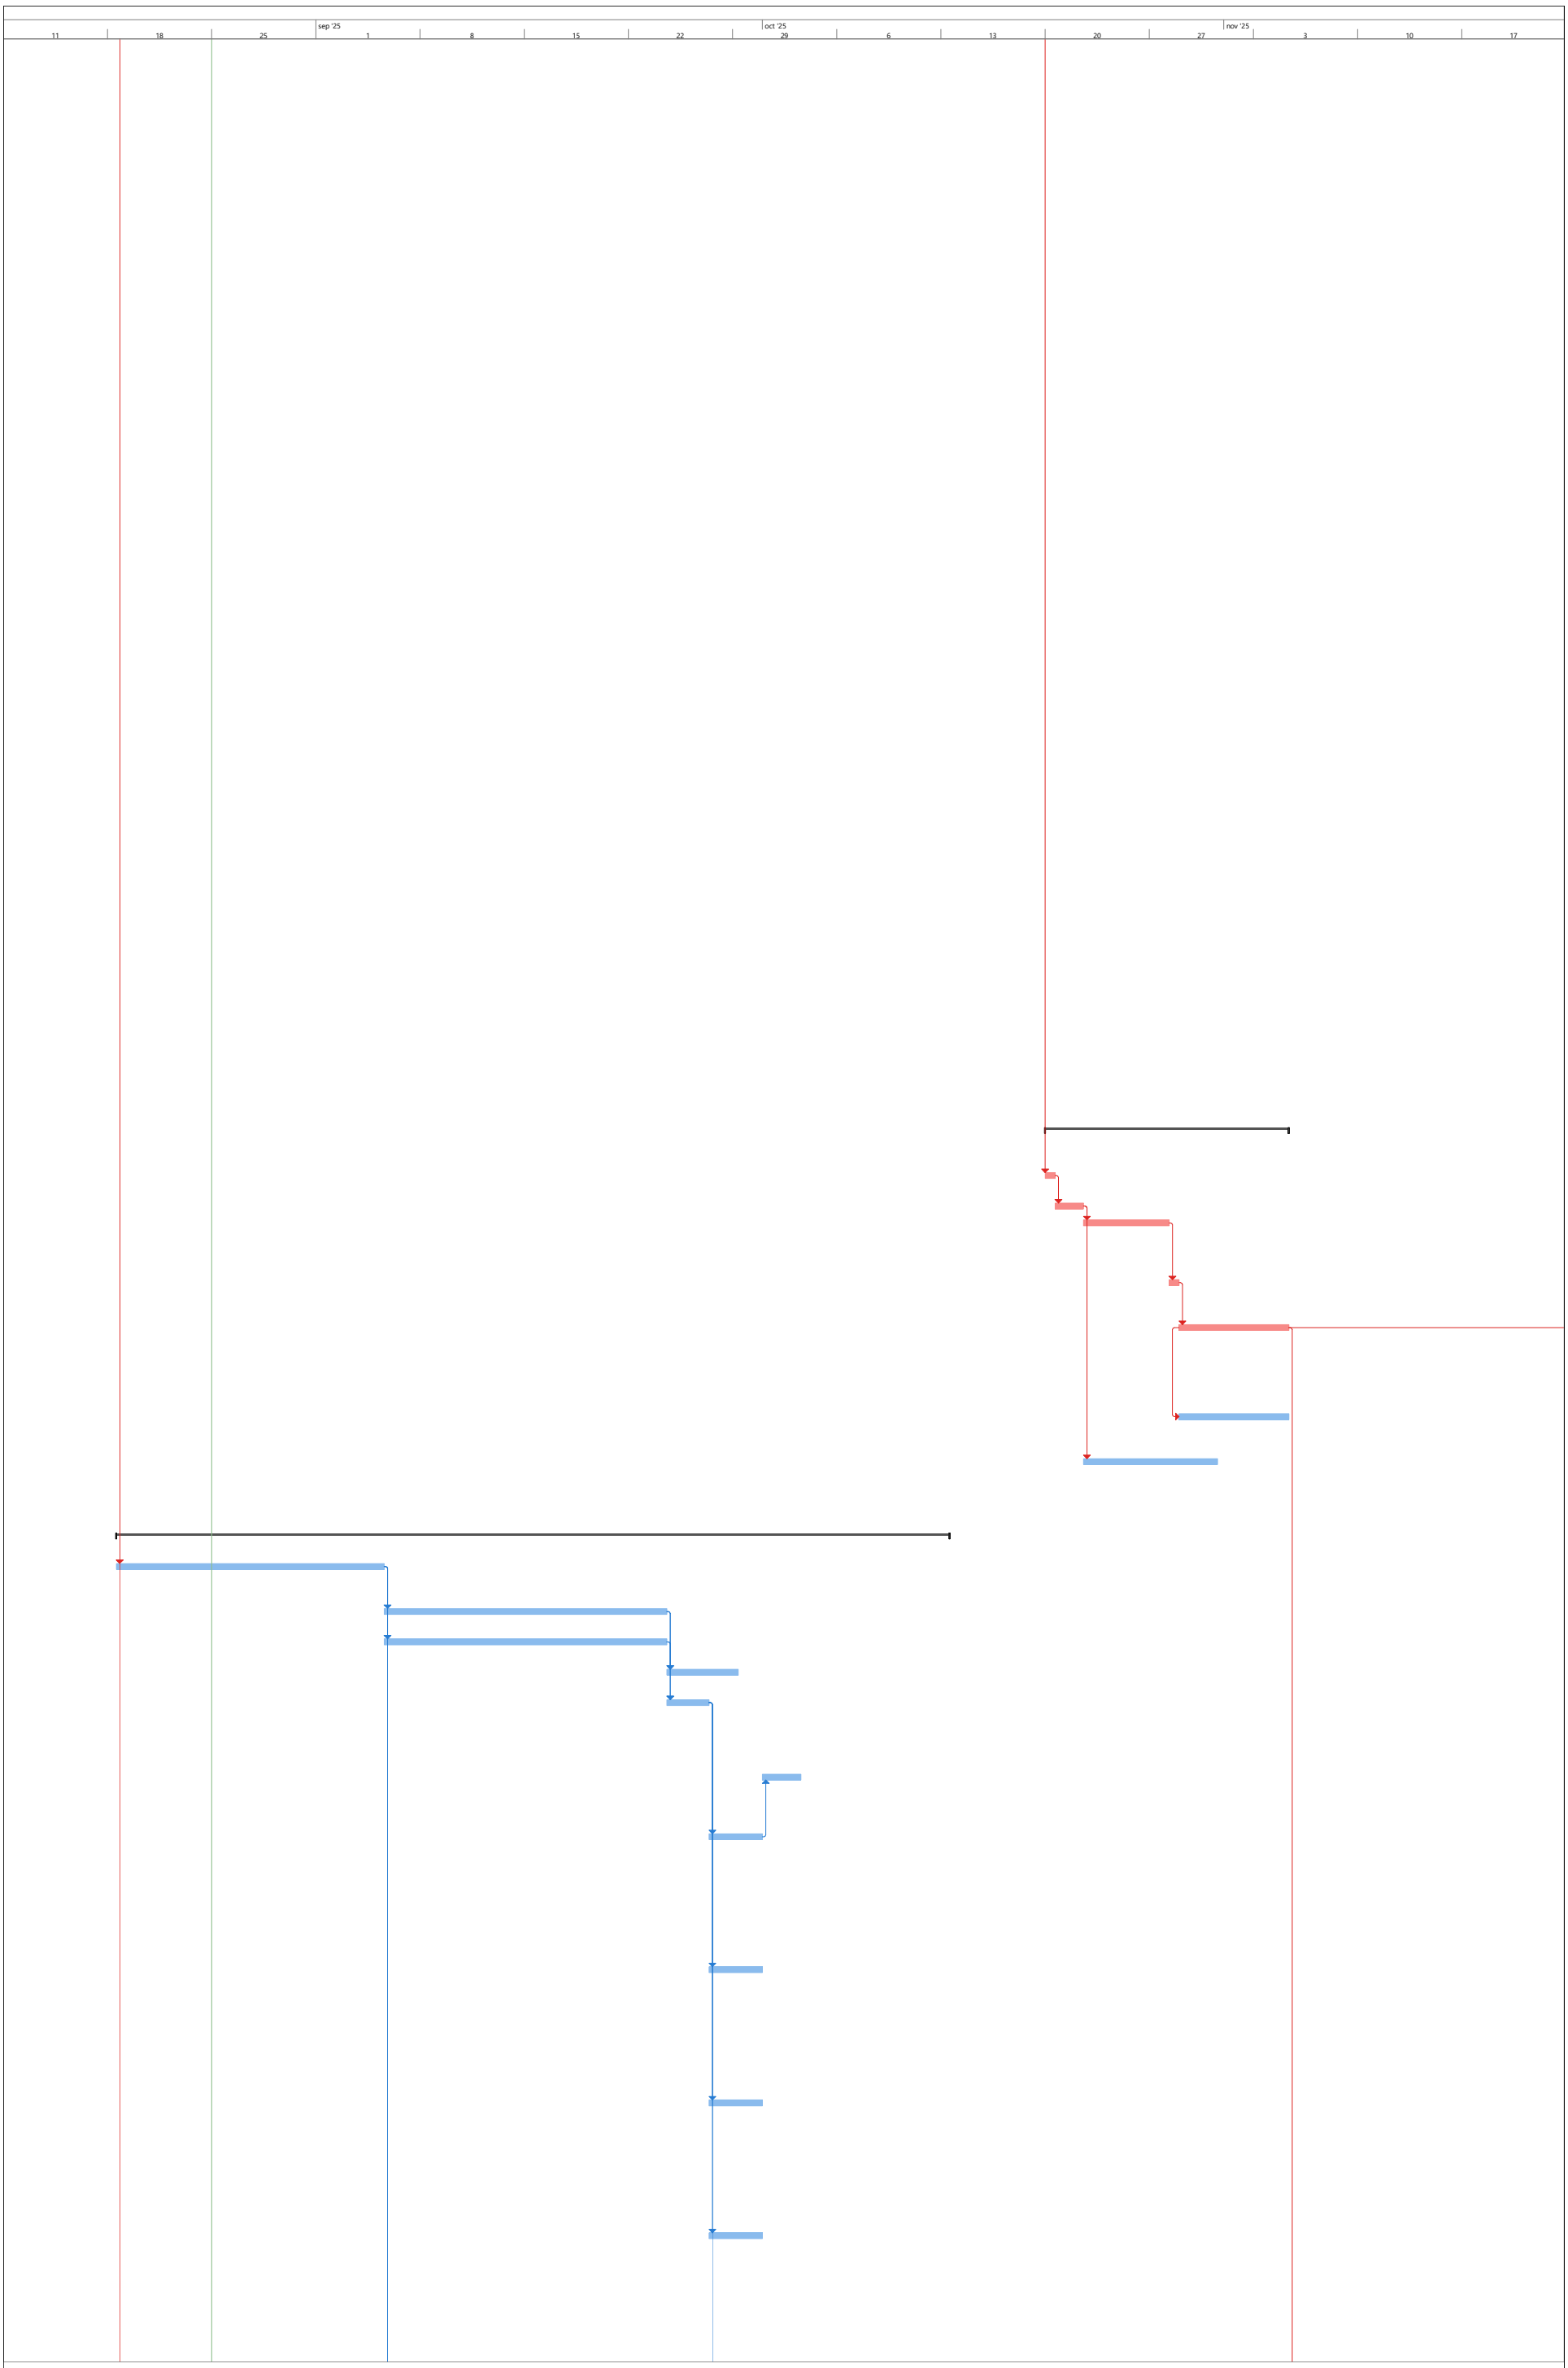

Proyecto: Programación - Parqu
Fecha: lun 25/08/25

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica			
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite	Progreso			
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual			


DANIEL ANDRES FORERO GONZALEZ
INGENIERO CIVIL ESP GERENCIA DE PROYECTOS

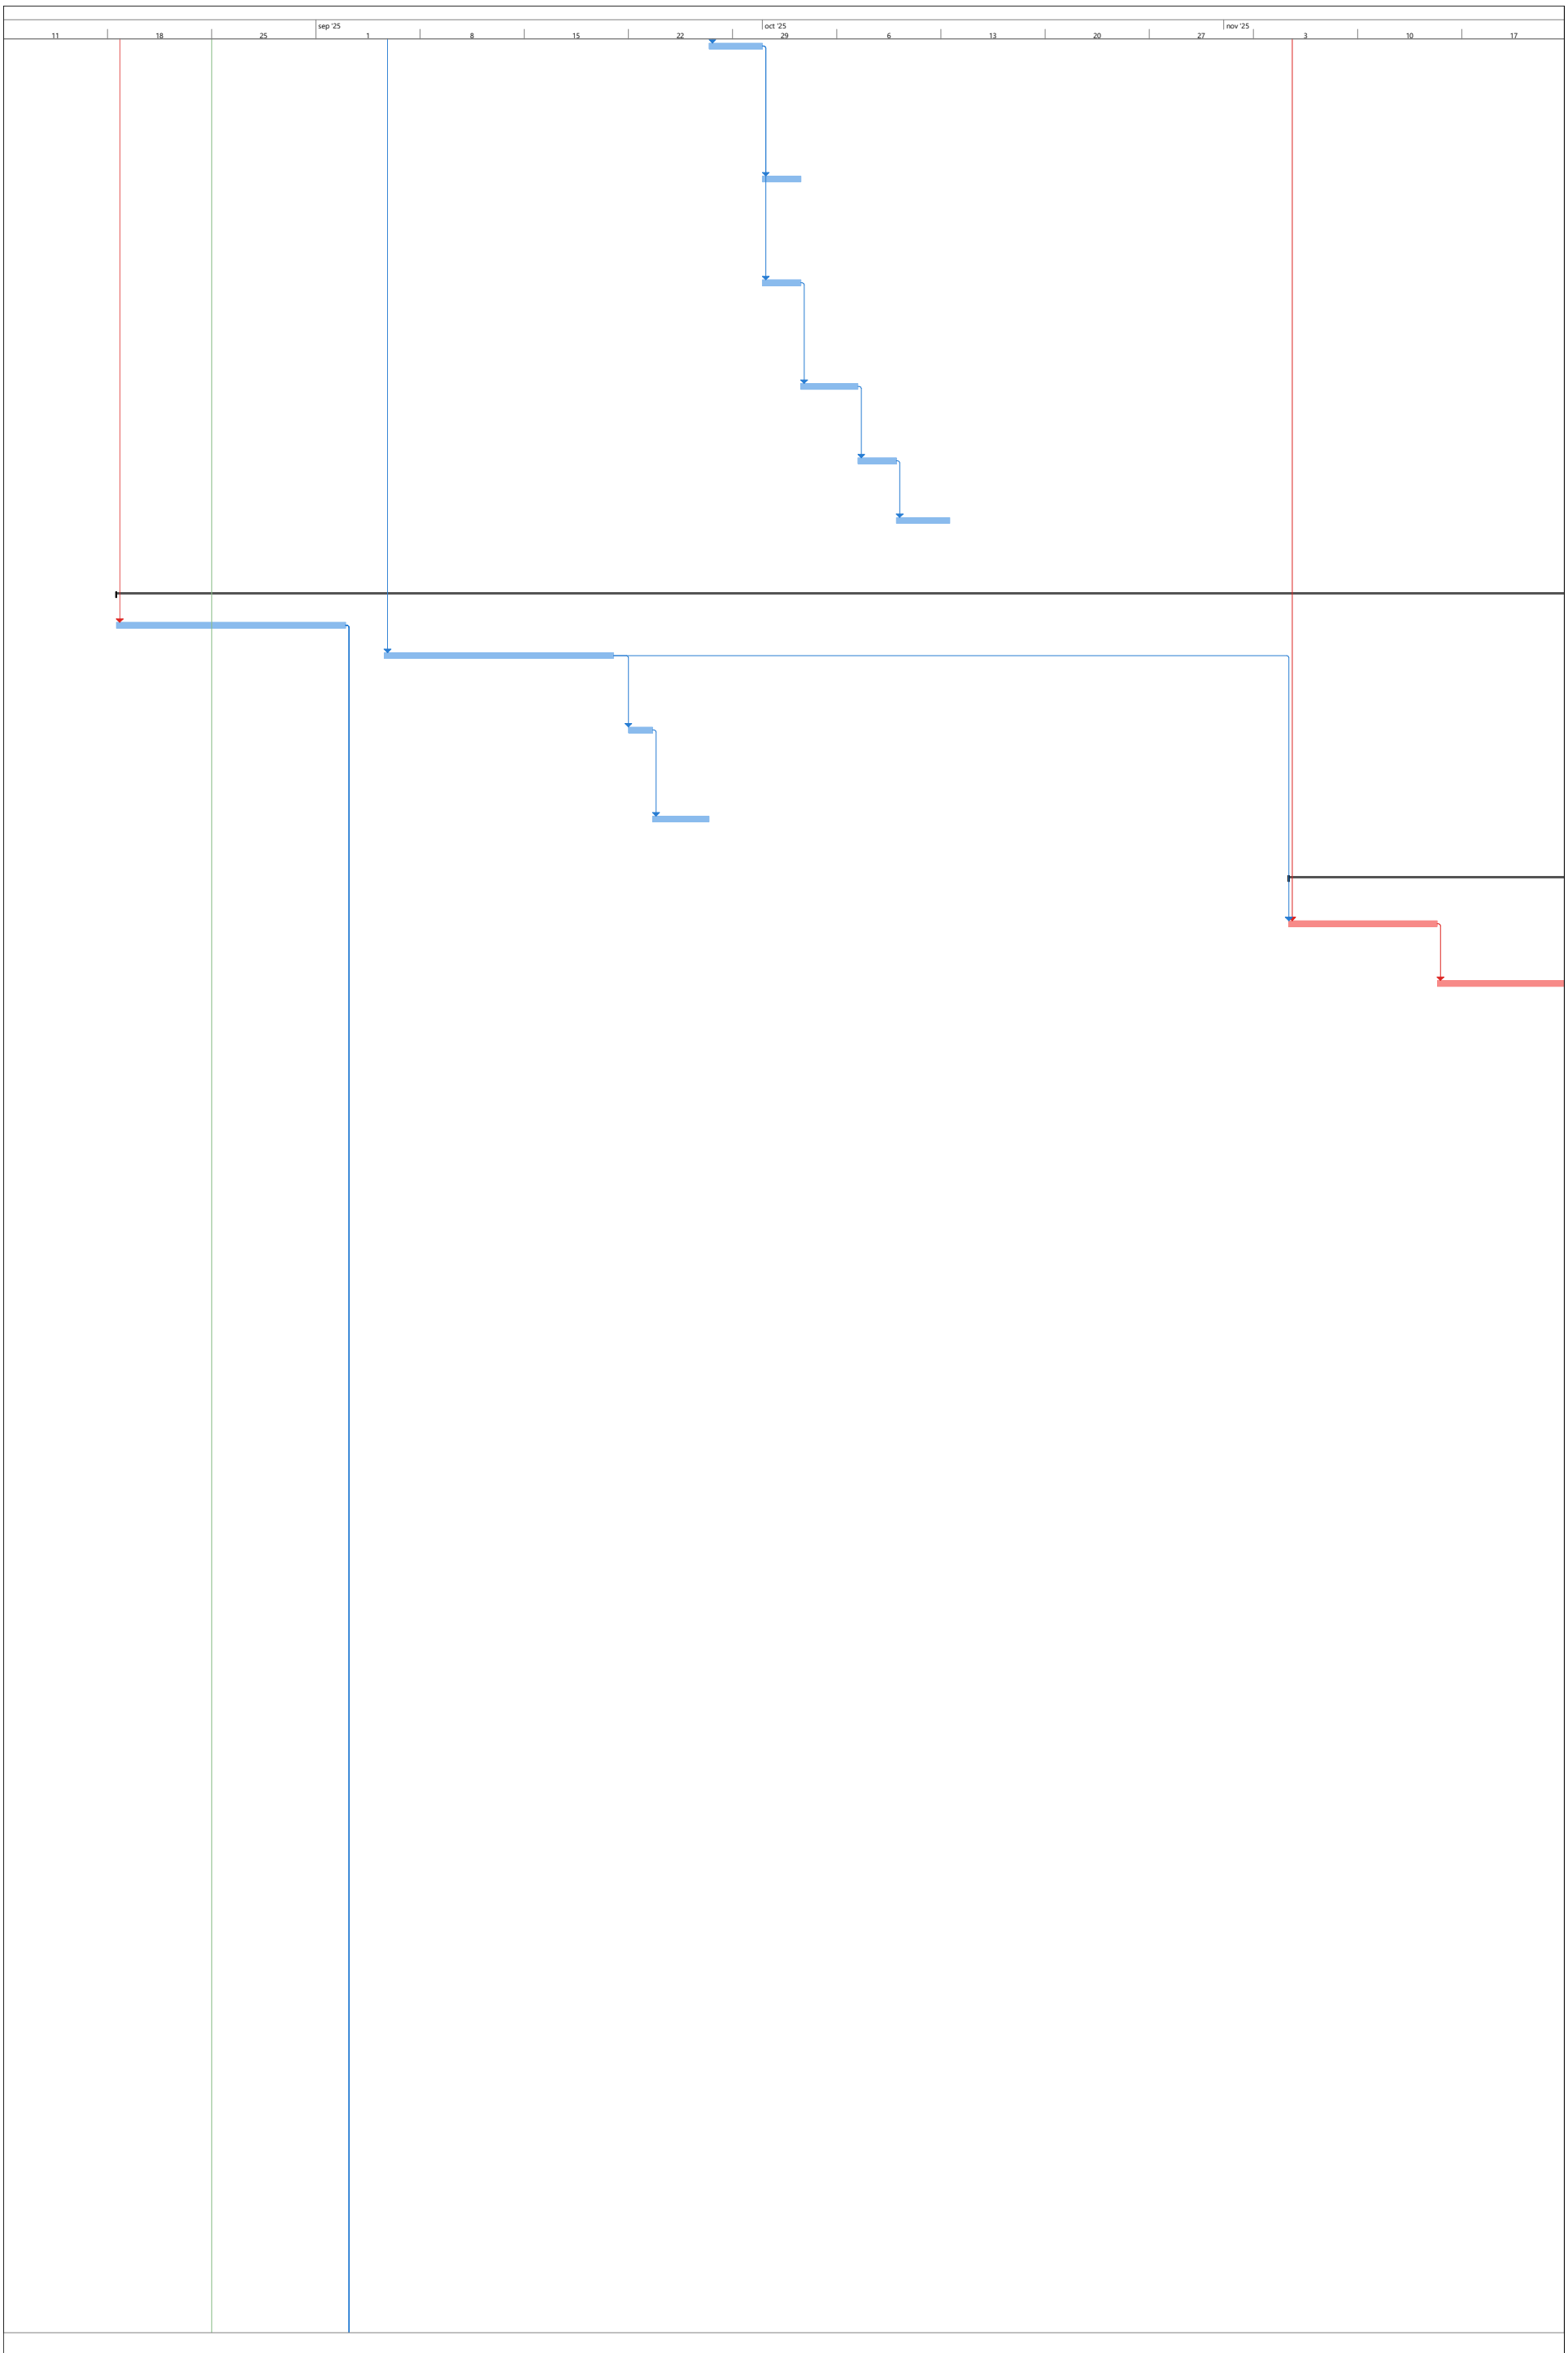

Proyecto: Programación - Parqu
Fecha: lun 25/08/25

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite	Progreso
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual


DANIEL ANDRES FORERO GONZALEZ
INGENIERO CIVIL ESP GERENCIA DE PROYECTOS

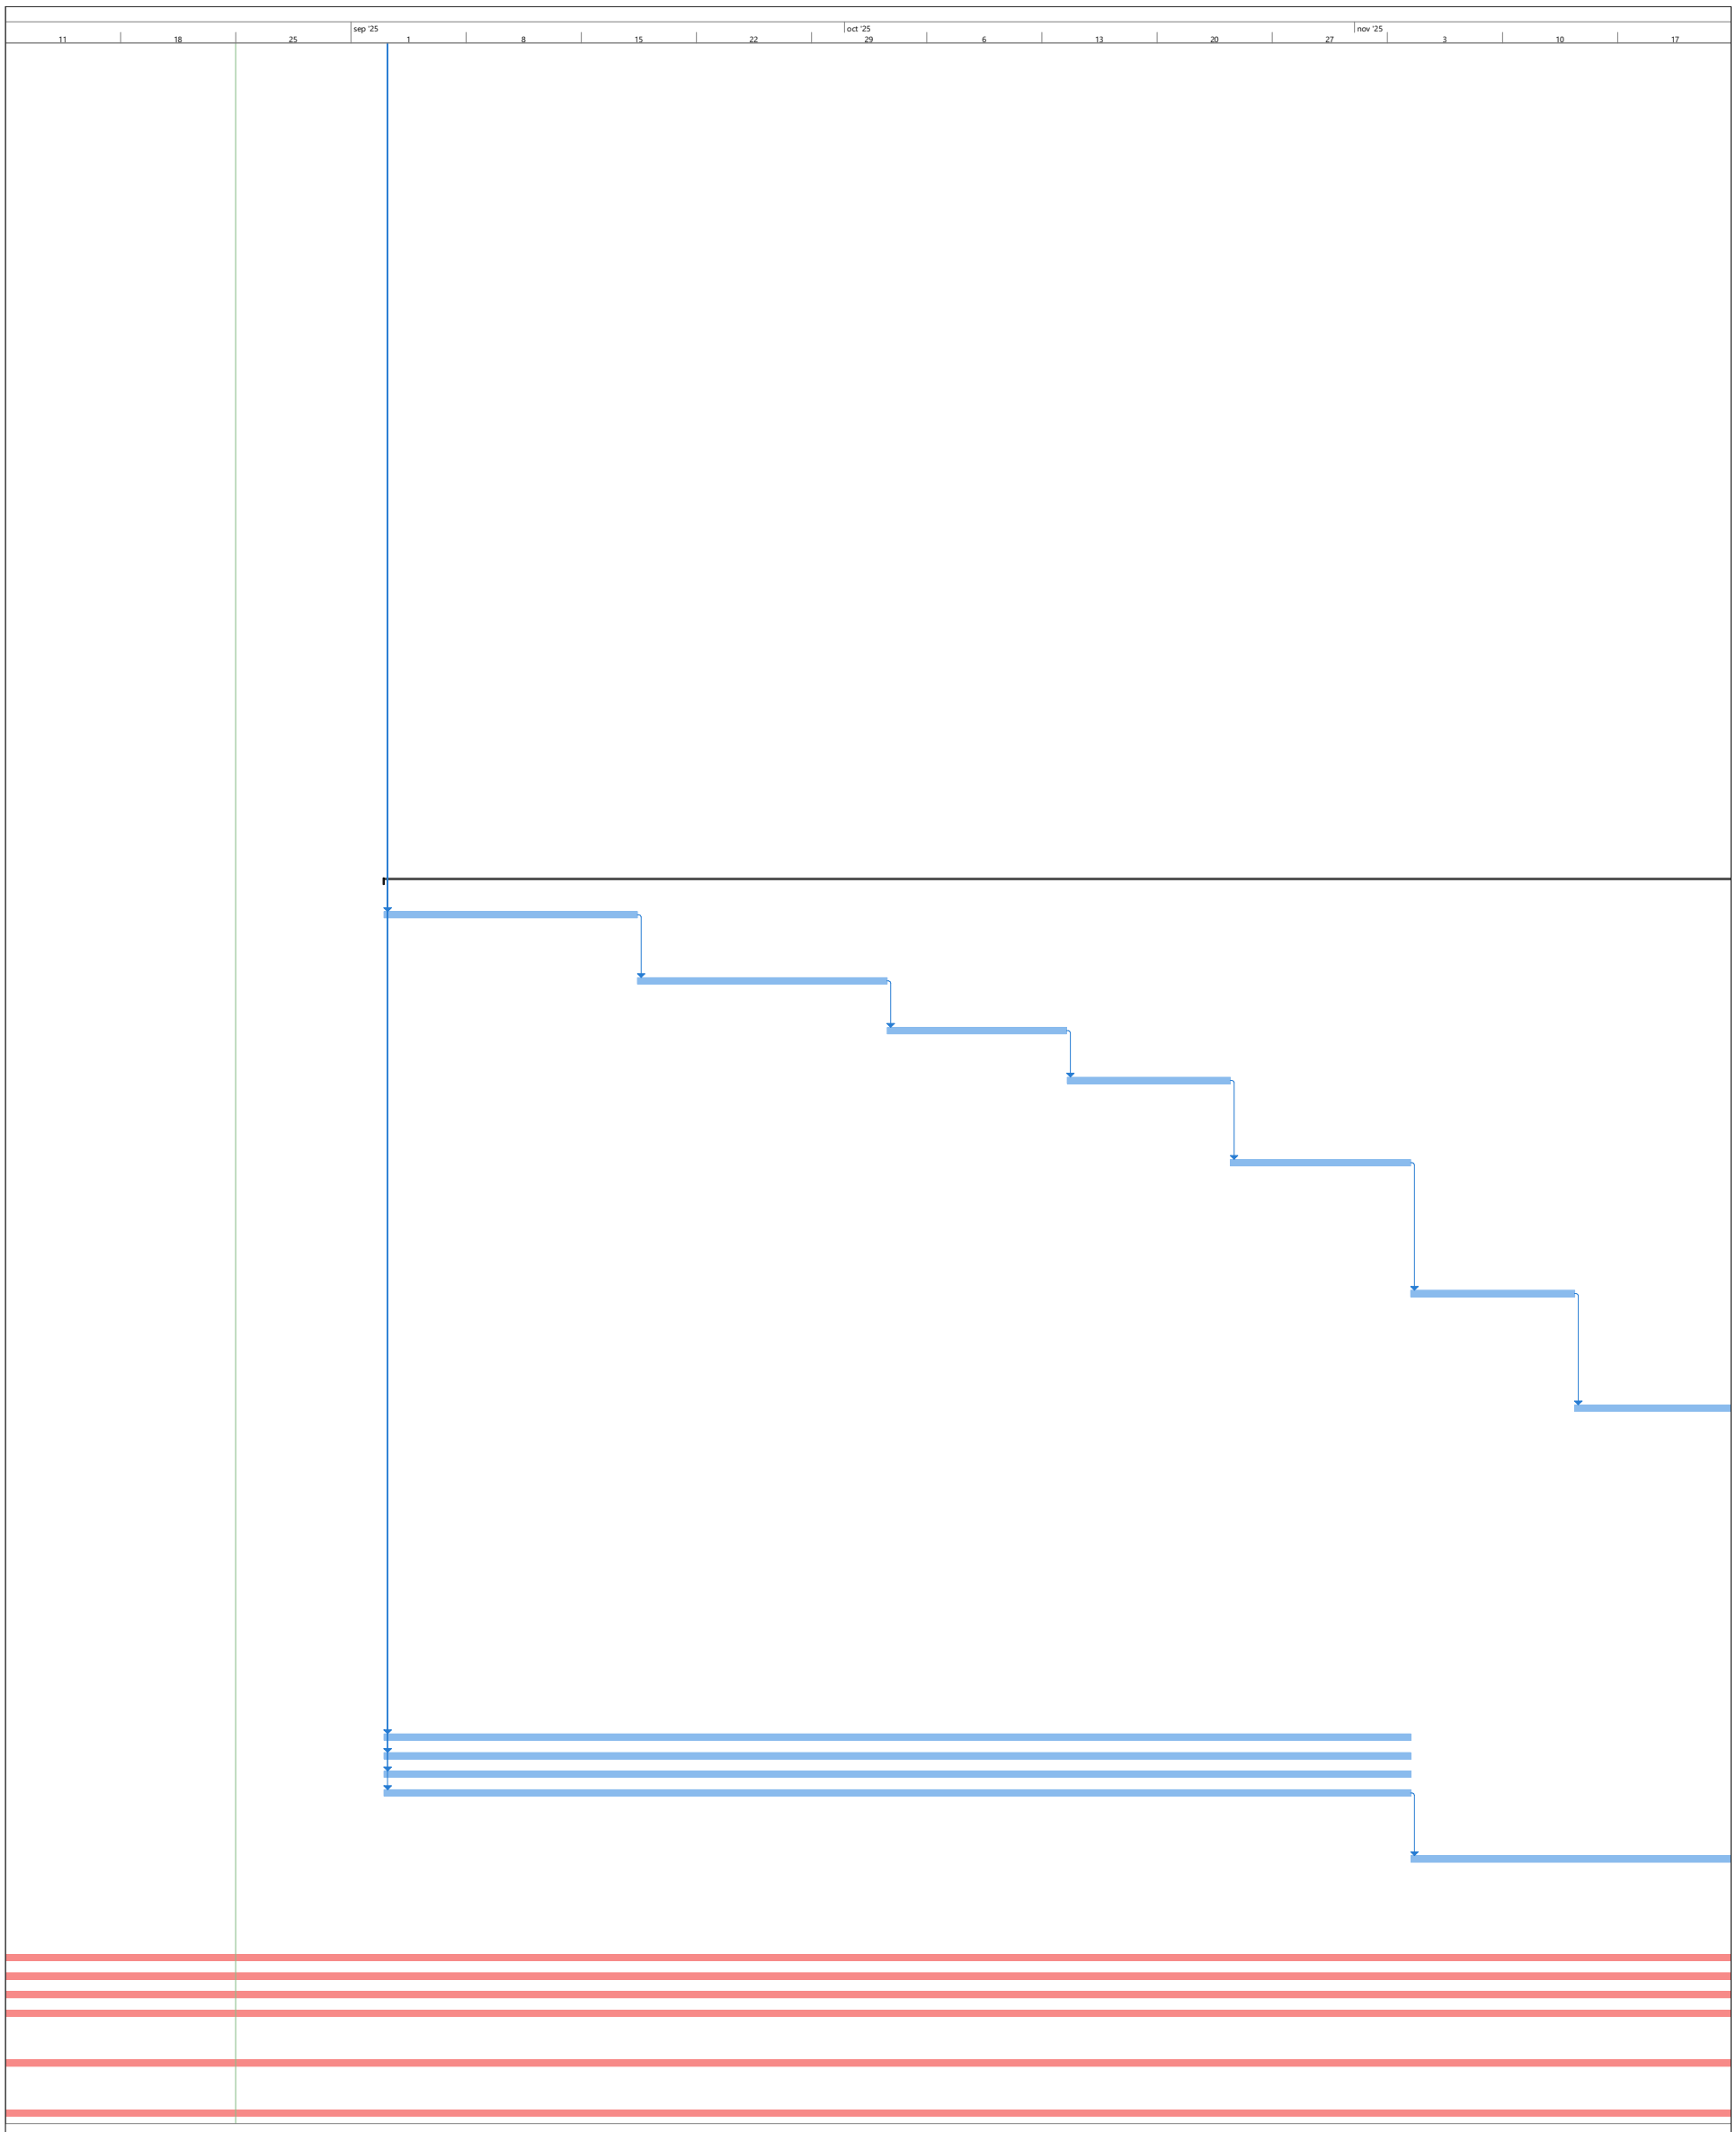

Proyecto: Programación - Parqu
Fecha: lun 25/08/25

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite	Progreso
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual


DANIEL ANDRES FORERO GONZALEZ
INGENIERO CIVIL ESP GERENCIA DE PROYECTOS



Proyecto: Programación - Parqu
Fecha: lun 25/08/25

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite	Progreso
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual


DANIEL ANDRES FORERO GONZALEZ
INGENIERO CIVIL ESP GERENCIA DE PROYECTOS



Proyecto: Programación - Parqu
Fecha: lun 25/08/25


Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite	Progreso
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual

DANIEL ANDRES FORERO GONZALEZ
INGENIERO CIVIL ESP GERENCIA DE PROYECTOS

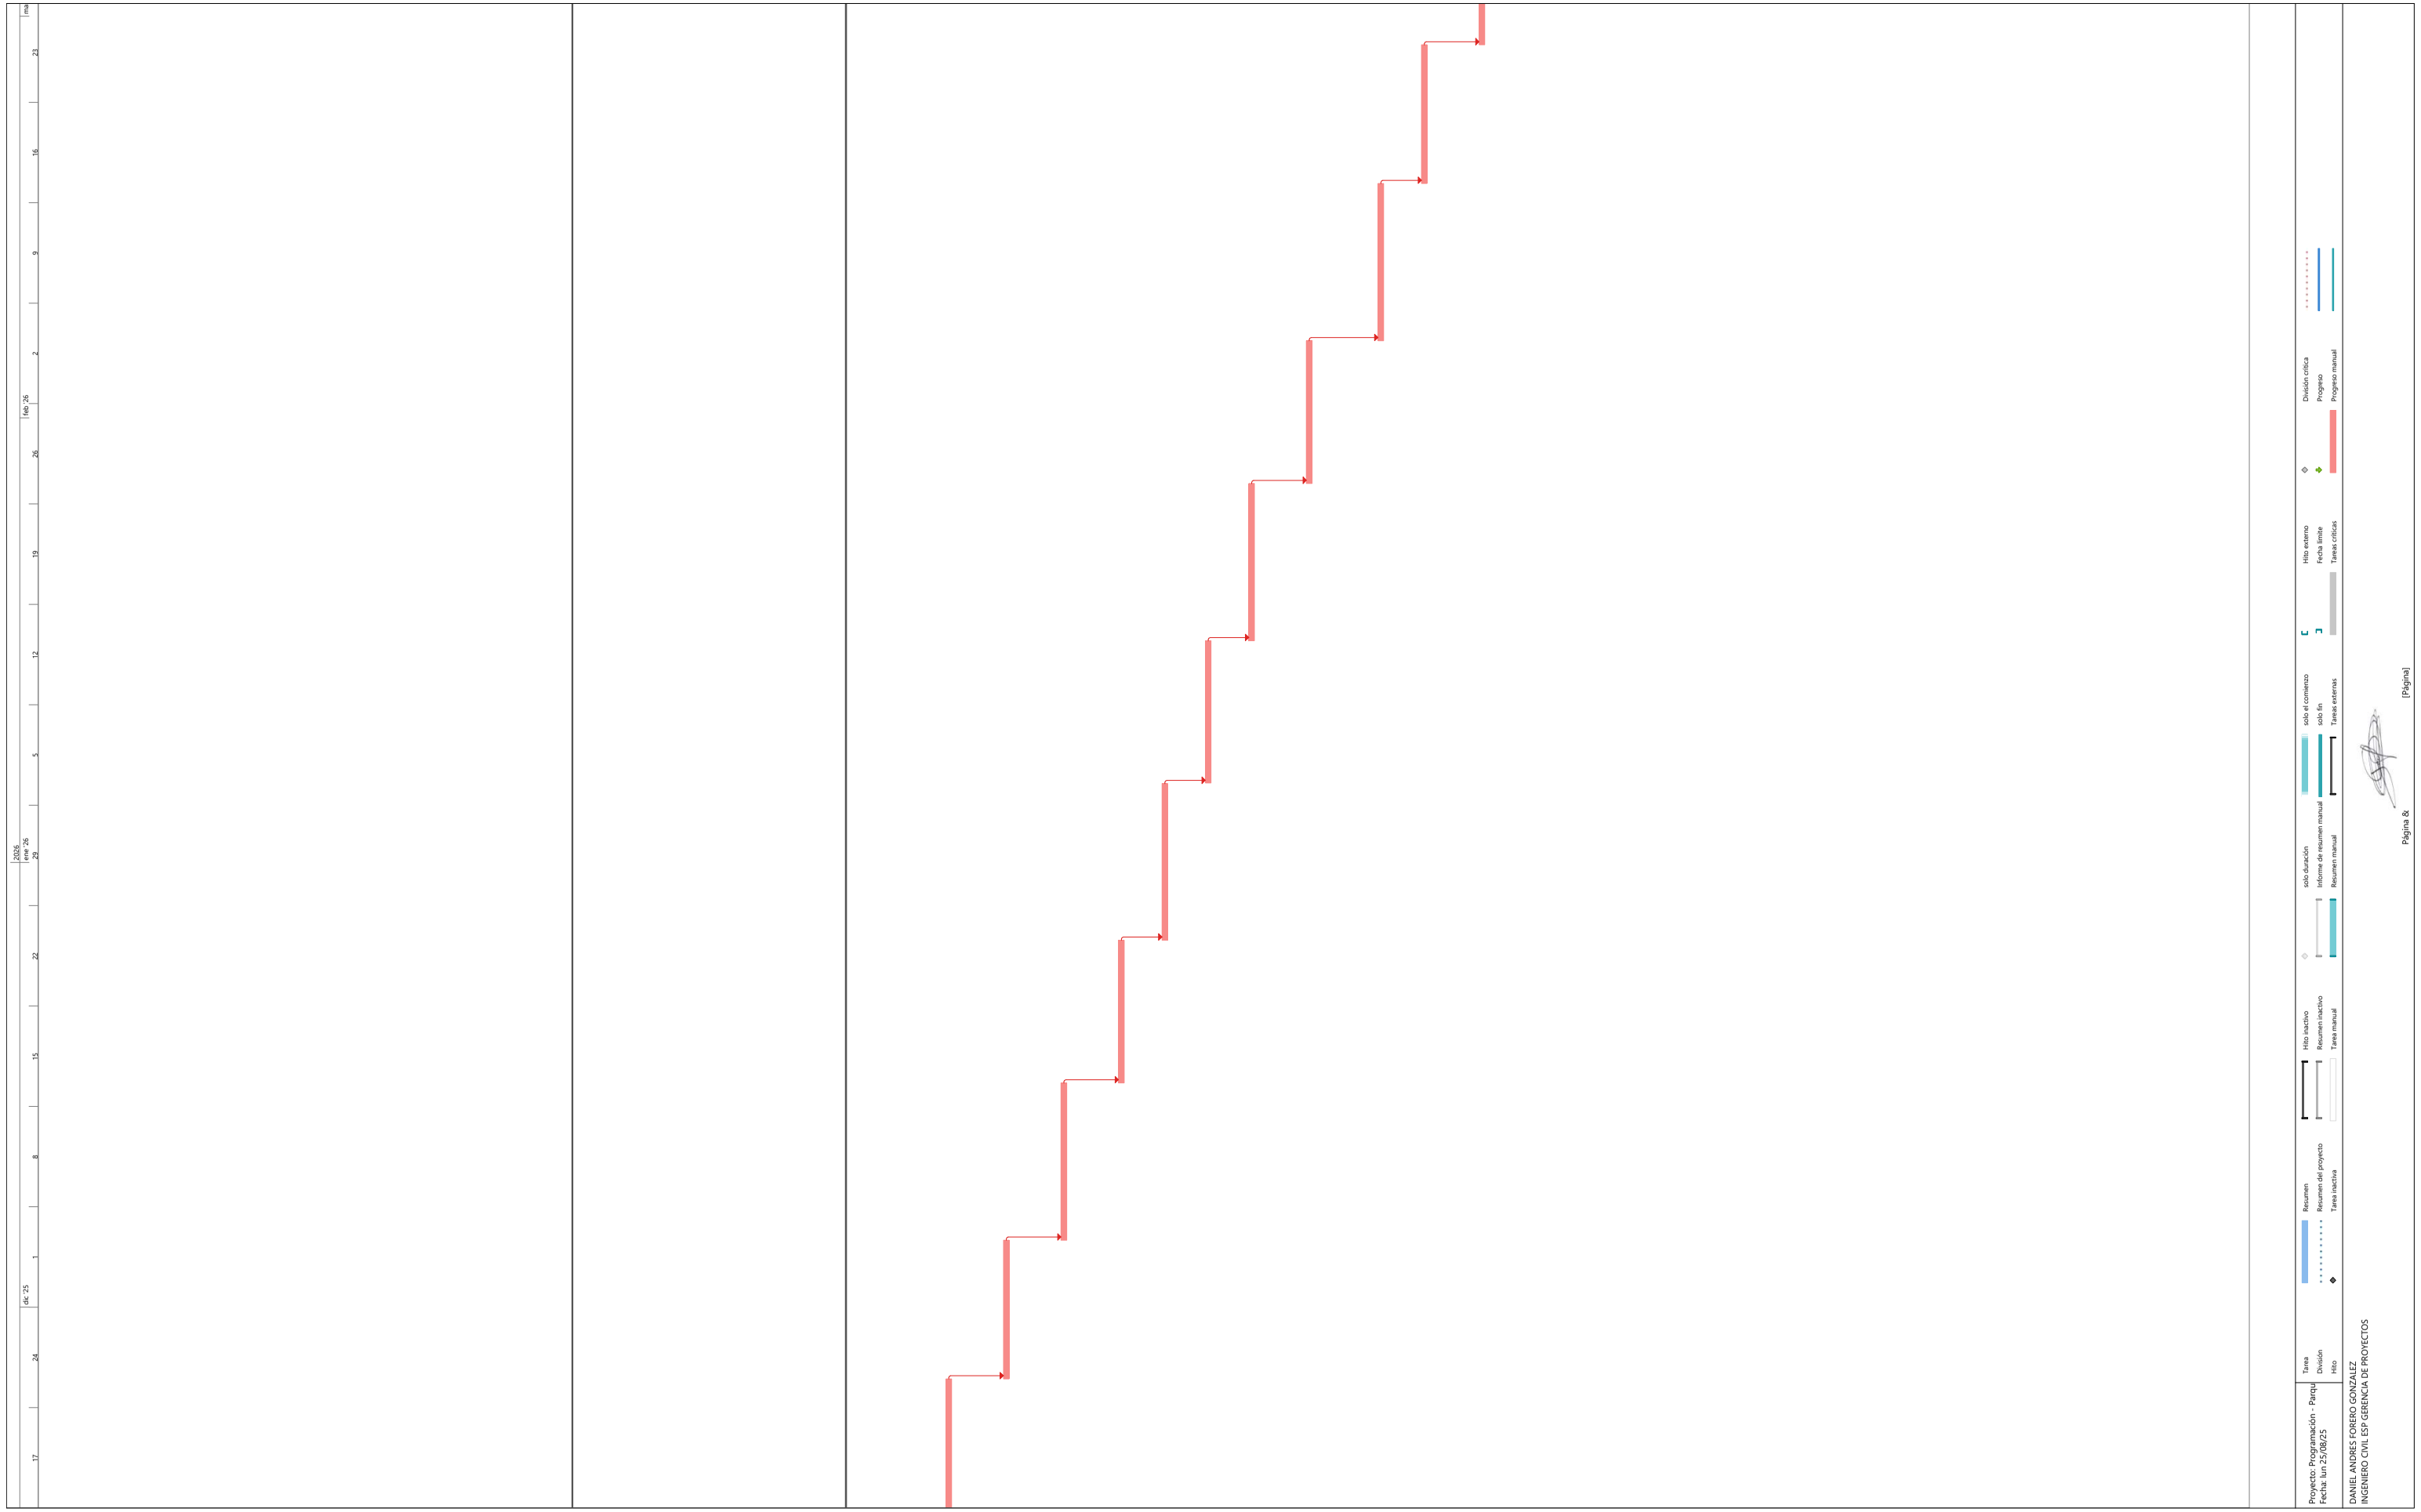

Proyecto: Programación - Parqu
Fecha: lun 25/08/25


DANIEL ANDRES FORERO GONZALEZ
INGENIERO CIVIL ESP GERENCIA DE PROYECTOS



Proyecto: Programación - Parqu
Fecha: lun 25/08/25

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite	Progreso
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual


DANIEL ANDRES FORERO GONZALEZ
INGENIERO CIVIL ESP GERENCIA DE PROYECTOS



Proyecto: Programación - Parqu
Fecha: lun 25/08/25

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite	Progreso
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual


DANIEL ANDRES FORERO GONZALEZ
INGENIERO CIVIL ESP GERENCIA DE PROYECTOS



Proyecto: Programación - Parqu
Fecha: lun 25/08/25

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite	Progreso
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual


DANIEL ANDRES FORERO GONZALEZ
INGENIERO CIVIL ESP GERENCIA DE PROYECTOS



Proyecto: Programación - Parqu
Fecha: lun 25/08/25

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite	Progreso
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual


DANIEL ANDRES FORERO GONZALEZ
INGENIERO CIVIL ESP GERENCIA DE PROYECTOS



Proyecto: Programación - Parqu
Fecha: lun 25/08/25

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite	Progreso
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual


DANIEL ANDRES FORERO GONZALEZ
INGENIERO CIVIL ESP GERENCIA DE PROYECTOS



Proyecto: Programación - Parqu
Fecha: lun 25/08/25

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite	Progreso
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual


DANIEL ANDRES FORERO GONZALEZ
INGENIERO CIVIL ESP GERENCIA DE PROYECTOS



Proyecto: Programación - Parqu
Fecha: lun 25/08/25

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite	Progreso
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual


DANIEL ANDRES FORERO GONZALEZ
INGENIERO CIVIL ESP GERENCIA DE PROYECTOS



Proyecto: Programación - Parqu
Fecha: lun 25/08/25

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite	Progreso
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual

DANIEL ANDRES FORERO GONZALEZ
INGENIERO CIVIL ESP GERENCIA DE PROYECTOS



Proyecto: Programación - Parqu
Fecha: lun 25/08/25

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite	Progreso
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual

DANIEL ANDRES FORERO GONZALEZ
INGENIERO CIVIL ESP GERENCIA DE PROYECTOS
