MUNICIPIO EL CARMEN DE VIBORAL
"Mas cerca, más oportunidades"

INFORME SEMANAL N° 17 DE OBRA

Semana: 17	**Del:** 21 DE NOVIEMBRE DE 2023		**Al:** 27 DE NOVIEMBRE DE 2023		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		días	119	**% del tiempo transcurrido contrato**	132.22%
Tiempo adicional:		días	30	**% del tiempo adicional**	33.33%
Tiempo transcurrido de tiempo adicional:		días	29	**% del tiempo transcurrido adición:**	96.67%
Nombre de la Supervisora de la EDUR: Oscar Dario Londoño					

CONTRATO DE OBRA: COP-007-2023-CO

ACTA DE INICIO: 01 DE AGOSTO DE 2023

"Equipamiento Municipal y Amoblamiento para la Consolidación del Parque Lineal La Cimarrona en el municipio de El Carmen de Viboral Departamento de Antioquia"

BALANCE FINANCIERO SEMANAL

PROGRAMADO			EJECUTADO			
	TOTAL	ACUMULADO	Obra Física Ejecutada (%)	SEMANAL	COBRADO EN ACTAS	SALDO PENDIENTE
Obra programada (%)	99%	73.56%				
Valor de la obra programada:	$ 778,728,095	$ 577,674,993	Valor de la Obra Ejecutada:	$ 16,874,523	$ -	$ 577,674,993

CONTRATO DE OBRA PUBLICA	
Contrato No.	COP-007-2023-CO
Contratista	CONSTRUCTORA ZUGA S.A.S
Valor inicial	$ 785,272,029
Plazo inicial	Tres (3) meses. A partir de la firma del acta de inicio.
Fecha de iniciación	01 DE AGOSTO DE 2023
Fecha de terminación	28 DE OCTUBRE DE 2023
Prorroga N°01	Un (1) mes. A partir de la fecha de terminacion del tiempo inicial
Fecha de iniciación	29 DE OCTUBRE DE 2023
Fecha de terminación	28 DE NOVIEMBRE DE 2023

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA - AREA ADMINISTRATIVA

Bitacora de obra
Comité de obra

ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA - AREA JURIDICA

*N/A

ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA - AREA SST

*Acompañamiento por parte de la profesional SST

ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA - AREA AMBIENTAL

*Acompañamiento por parte del ingeniero ambiental

ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA - AREA TÉCNICA

Instalación de arenilla para posterior instalacion de adoquin
Instalación de malla electrosoldada en andenes en concreto
Vaciado de concreto en andenes
Instalación de plaqueta tactil para andenes en concreto

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Instalación de adoquin en cicloruta y andenes

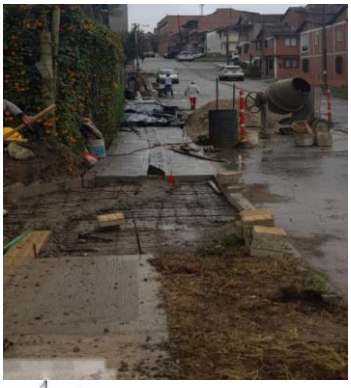
PERSONAL DEL CONTRATISTA EN OBRA Y SUPERVISIÓN

1	Residente de Obra
1	Tecnologo en construcciones civiles
1	Residente SST
1	Ingeniero ambiental
1	Oficial
2	Ayudantes
1	Operario de maquinaria

EQUIPO DEL CONSTRUCTOR

	CANT.	% DEL TIEMPO EN OBRA
HERRAMIENTA MENOR	1	100%
VIBROCOMPACTADOR	1	50%

REGISTRO FOTOGRAFICO

		
Instalación de plaqueta tactil en andenes en concreto	Instalación de arenilla	Vaciado de concreto en andenes
		
Instalación de malla electrosoldada		
