	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	Código: GDM-F-03
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL	Versión: 01
		Fecha: 28/05/2025
	FORMATO HOJA DE CONTROL DOCUMENTAL	Página 1 de 1

CONTROL DE DILIGENCIAMIENTO	Hoja No.	De

IDENTIFICACIÓN	
Código y nombre de la unidad administrativa	1000 DESPACHO DEL ALCALDE
Código y nombre de la oficina productora	1030 – OFICINA DE CONTRATACIÓN
Código y nombre de la serie documental	1030 – 19 CONTRATOS
Código y nombre de la subserie documental	1030 – 19.07 CONTRATO DE OBRA
Nombre del expediente	MEGA PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S

CONTENIDO

Ítem	Fecha de incorporación al expediente (AAAA-MM-DD)	Fecha del documento (AAAA-MM-DD)	Tipo documental (Descripción)	Folios	Funcionario que ingresa el documento (Nombres y Apellidos)	Observaciones
1	17/09/2025	17/09/2025	NOTA INTERNA	520	MAX LAVERDE	
2	17/09/2025	15/09/2025	INFORME CONTRATISTA PRÓRROGA	521-533	MAX LAVERDE	
3	17/09/2025	15/09/2025	REPROGRAMACIÓN DE OBRA	534-538	MAX LAVERDE	
4	17/09/2025	15/09/2025	CONDICIONES HIDROLÓGICAS ACTUALES	539-599	MAX LAVERDE	
5	17/09/2025	15/09/2025	SOLICITUD DE PRORROGA NO 2 POR PARTE DE CONTRATISTA	600-601	MAX LAVERDE	
6	17/09/2025	17/09/2025	INFORME DE SUPERVISIÓN	602-608	MAX LAVERDE	

RESPONSABLES

NOTA INTERNA

1402/0644	
FECHA	17 de septiembre de 2025
PARA:	**Dra. ALBA AURORA COLINA** Jefe Oficina de Contratación
DE:	**Arq. DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE** Director de Obras Civiles

Ref.: **CONTRATO N°1692 DE 2025 No. DEL PROCESO EN SECOP: SMC-066 DE 2025**

Asunto: **ENVÍO DE DOCUMENTOS SOLICITUD DE PRORROGA No 2**

Cordial saludo,

De manera atenta envío en archivo adjunto, los siguientes documentos:

1. Documentos solicitud de prorroga No2 del contrato 1692 de 2025

Lo anterior para su información, aprobación y archivo en el expediente contractual correspondiente

Sin otro en particular, muy atentamente

FIRMA REMITENTE	FIRMA DESTINATARIO/RECIBIDO	
DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE	**FECHA:**	**HORA:**
Director Obras Civiles	**RADICADO No:**	

Anexos: Folios 1 carpeta
Copias: NA

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
V°B°: NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Revisó:	NO APLICA	NO APLICA
Elaboró: Max Laverde Mosquera	Técnico Operativo	

Municipio de Villavicencio

Fecha ___17____/___09____/_____2025_____/ D/M/A.

DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA	SI	NO	N.A.
Informe del contratista			
Solicitud del contratista al interventor de la suspensión/Prorroga			
DOCUMENTOS DEL INTERVENTOR/SUPERVISOR			
Informe del Interventor (1010-F-GCT-69-V3) y/o supervisor (1010-F-GCT-22)			
Acta de Solicitud de Adición y/o Prórroga (1010-F-GCT-115)			
Numero de folios, foliado en lápiz en la esquina superior derecha			

Observaciones: _____

Nombre y firma del profesional que revisó: _____

827

INFORME CONTRATISTA PRORROGA

CONTRATO DE OBRA No. 1692 del 2025

OBJETO DEL CONTRATO:

"Mantenimiento, Adecuación Y Reformas A Las Instalaciones De Los Puntos Vive Digital Del Municipio De Villavicencio"

"MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REFORMAS A LAS INSTALACIONES DE LOS PUNTOS VIVE DIGITAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO"

VILLA FABIOLA



LA MADRID



NOMBRE DE LA EMPRESA:
MEGA PROYECTOS E INVERSIONES SAS

NIT:
901744193

DIRECCIÓN DEL PROYECTO:
CL. 42ª # 17b – 27, Villa Fabiola

DIRECCIÓN DE LA EMPRESA:
CL. 47ª # 29ª - 46, El Caudal

CORREO ELECTRÓNICO:
megaproyectosei@gmail.com

522

Contenido

INTRODUCCIÓN 2
OBJETIVO GENERAL DEL PRESENTE INFORME 3
GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA 3
DATOS GENERALES DEL CONTRATO 3
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 4
AVANCE EN TIEMPO 4
..... 4
AVANCE FÍSICO 4
GRAFICA DEL AVANCE 5
PROBLEMÁTICAS PRESENTADAS 5
PRONOSTICO MES DE AGOSTO 6
PRONOSTICO MES DE SEPTIEMBRE 7
CONDICIONES ACTUALIZADAS DEL PROYECTO 7
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES 10
RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS 10
CONTROL DE POLIZAS 11
VALOR DEL CONTRATO 11
REGISTRO PRESUPUESTAL 12
FORMA DE PAGO 12
AVANCE FINANCIERO 12
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 12
Mes de julio 12
Mes de agosto 12
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES 13

INTRODUCCIÓN

La alcaldía de Villavicencio requería contratar las obras de la SMC-066 de 2025, de acuerdo a las exigencias de la implementación optimización y sostenibilidad operativa de los puntos digital en el municipio de Villavicencio Meta, con el fin de mejorar los espacios para que goce, disfrute la sociedad, por tal motivo se procedió a realizar la aceptación de oferta No 1692 de 2025 el cual fue adjudicado a la empresa MEGA PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S, con Nit 901.744.193-4.

El presente informe se realiza con el fin, de exponer los inconvenientes presentados en los últimos días de la ejecución del presente contrato, los cuales dan lugar a solicitar una Prórroga No 2 por un término de 12 días a partir del 19 de septiembre de 2025 al 30 septiembre de 2025.

OBJETIVO GENERAL DEL PRESENTE INFORME

Presentar informe para solicitud de Prórroga No. 2 del Contrato 1692 de 2025


GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA N.º 1692 de 2025	
OBJETO: "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REFORMAS A LAS INSTALACIONES DE LOS PUNTOS VIVE DIGITAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO"	
CONTRATISTA	MEGA PROYECTOS E INVERSIONES SAS
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
NIT. N°	901.744.193-4
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS AUGUSTO GIRALDO RENGIFO
PLAZO INICIAL	SETENTA Y CINCO (75) DÍAS
FECHA DEL CONTRATO	03 DE JUNIO DE 2025
FECHA ACTA DE INICIO	05 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	19 DE AGOSTO DE 2025
VALOR CONTRATADO	CIENTO VEINTE MILLONES SETECIENTOS VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS ($ 120.721.957,42)
MODIFICACIONES	
PRORROGA 1	30 DIAS FECHA 19/08/2025
PLAZO DEL CONTRATO ACTUALIZADO	105 DIAS
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	CIENTO VEINTE MILLONES SETECIENTOS VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS ($ 120.721.957,42)
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADO	18/09/2025

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO



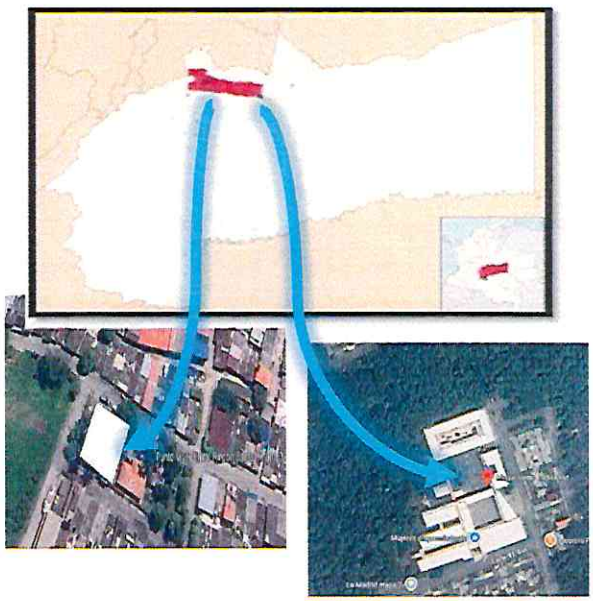

El proyecto a ejecutar dentro del objeto del contrato de obra N°1692 de 2025 se encuentra ubicado en la zona urbana en la calle 42ª # 17b-27, Vive Digital Villa Fabiola, y la institución educativa la Madrid; ubicada en la calle 91 Sur No. 54 esquina en el Municipio de Villavicencio.

AVANCE EN TIEMPO

A la fecha de presentación del presente informe ha transcurrido un total de CIENTO UN (101) días, equivalente al 96.19% de tiempo transcurrido a partir de la suscripción del acta de inicio de las actividades del proyecto de No de Contrato 1692 de 2025 como objeto del Contrato "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REFORMAS A LAS INSTALACIONES DE LOS PUNTOS VIVE DIGITAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO".


OBJETO	PLAZO ACTUAL	ACTA DE INICIO	TIEMPO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE DE TIEMPO TRANSCURRIDO
"MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REFORMAS A LAS INSTALACIONES DE LOS PUNTOS VIVE DIGITAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO"	SETENTA Y CINCO DÍAS	05/06/2025	105 DÍAS	96,19%

AVANCE FÍSICO

RESUMEN DE AVANCE		
Valor inicial del contrato	$	120,721,957,42

Tiempo de ejecución (acumulado)	101 días
Porcentaje programado del contrato (acumulado)	80%
Porcentaje ejecutado del contrato (acumulado)	64%

GRAFICA DEL AVANCE

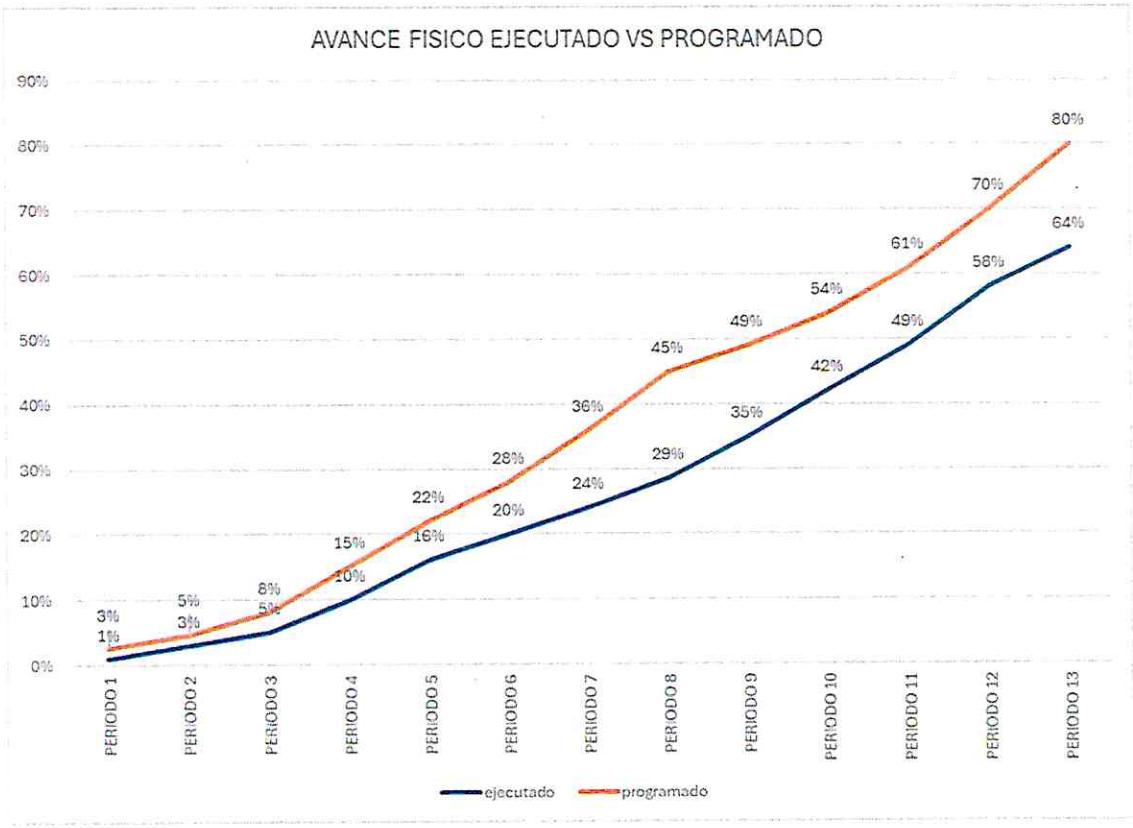

PROBLEMÁTICAS PRESENTADAS

A la fecha el contrato de obra presenta un avance físico del 64%. pese a las intermitencias debido a circunstancias ajenas a la voluntad de la obra y del contratista, que afectaron directamente el cumplimiento del cronograma inicialmente establecido.

En primer lugar, las condiciones climáticas adversas, particularmente las lluvias constantes, generaron la imposibilidad de ejecutar los trabajos en los tiempos programados, debido a los riesgos que implicaba para la seguridad de los trabajadores, la calidad de las actividades constructivas y la afectación del terreno.

Por las razones expuestas, se considera necesario solicitar una prórroga No. 2, con el fin de garantizar la correcta ejecución de los trabajos, el cumplimiento de los estándares de calidad y la seguridad del personal, todo ello en aras de entregar una obra en condiciones óptimas.

Como evidencia se da a conocer que, durante la ejecución de las actividades programadas dentro de la institución, se han presentado condiciones operativas que han incidido en el

presencia de precipitaciones ha generado la suspensión temporal de estas labores, tanto por criterios de seguridad industrial como para garantizar la calidad y durabilidad de los procesos constructivos.

Esta situación repercutió en la imposibilidad de iniciar a tiempo las actividades programadas dentro del cronograma, reduciendo las horas efectivas de trabajo diario y retrasando la ejecución de tareas fundamentales para el avance del proyecto

En consecuencia, los factores climáticos, incidieron directamente a la puntualidad en el normal desarrollo de la obra, motivo por el cual se considera necesario justificar los atrasos ocasionados y así autorizar una prórroga No. 2.

PRONOSTICO MES DE AGOSTO

Duramente el mes de agosto del 2025 Villavicencio experimentara temperaturas mínimas de 11° C y Máximas hasta de 26 °C.



ILUSTRACIÓN 1 *METEUM. FUENTE PREVISIÓN METEOROLÓGICA PARA EL MES DE AGOSTO*

PRONOSTICO MES DE SEPTIEMBRE

Duramente el mes de septiembre del 2025 Villavicencio experimentara temperaturas mínimas de 11° C y Máximas hasta de 26 °C.



ILUSTRACIÓN 2 *METEUM. FUENTE PREVISIÓN METEOROLÓGICA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE*

Es necesario aclarar que como contratistas estamos comprometidos con la culminación de la obra, por estas razones se ve necesario solicitar una prórroga No 2 al contrato 1692 de 2025 por un término de doce (12) días a partir del 19 de septiembre de 2025 al 30 de septiembre de 2025, con el fin de superar los inconvenientes manifestados y así cumplir con el objeto con tratado.

CONDICIONES ACTUALIZADAS DEL PROYECTO

El contrato a la fecha cuenta con un tiempo de ejecución de ciento un (101) días de ejecución.

CONDICIONES INICIALES						CANTIDADES EJECUTADAS		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V.UNITARIO	V.TOTAL	CANT	VALOR	%
PUNTO VIVE DIGITAL LA MADRID								
PRELIMINARES								
1,01	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO NCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	178,75	$ 3.630,00	$ 648.862,50	178,75	648.862,50	100%
1,02	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	69,34	$ 73.000,00	$ 5.061.820,00	10,47	764.310,00	15%

1,04	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	2,00	$ 228.000,00	$ 456.000,00	2,00	456.000,00	100%
	OBRAS INTERIORES							
2,01	MURO TOLETE RECOCIDO COMUN 0.20X0.10X0.06, MORTERO TIPO 1:3	M2	24,42	$ 76.900,00	$ 1.877.898,00	16,26	$ 1.250.394,00	67%
2,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA TABLERO CORRIDO MARCO, PASADOR LAMINA COLL ROLLED CAL 20 2 X 0.80 M	UND	2,00	$ 280.500,00	$ 561.000,00	2,00	$ 561.000,00	100%
2,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJA TIPO BANCO CUADRADO 1" CAL 18	M2	15,10	$ 127.800,00	$ 1.929.780,00	15,10	$ 1.929.780,00	100%
2,04	PERFIL CUADR. NEGRO 100X100X4 MM ASTM A-500	ML	7,00	$ 133.300,00	$ 933.100,00	6,04	$ 805.132,00	86%
2,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ALUMINIO CORREDIZA, CON VIDRIO 4 MM	M2	4,71	$ 993.800,00	$ 4.680.798,00	4,71	$ 4.680.798,00	100%
2,06	MURO SUPER BOARD DOBLE CARA, E=0.11 M, CAL 8 MM, INCLUYE PINTURA	M2	7,49	$ 178.200,00	$ 1.334.718,00	7,49	$ 1.334.718,00	100%
2,07	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	4,50	$ 28.400,00	$ 127.800,00	4,50	$ 127.800,00	100%
2,08	SALIDA SANITARIA SIFÓN DE PISO 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	2,00	$ 67.700,00	$ 135.400,00	2,00	$ 135.400,00	100%
2,09	SALIDA SANITARIA SIFÓN DE PISO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	2,00	$ 82.900,00	$ 165.800,00	2,00	$ 165.800,00	100%
2,10	TUBERIA PVCL 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	21,00	$ 35.900,00	$ 753.900,00	21,00	$ 753.900,00	100%
2,11	TUBERÍA CPVC 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	7,50	$ 63.200,00	$ 474.000,00	7,50	$ 474.000,00	100%
2,12	VALVULA CHEQUE CORTINA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	2,00	$ 67.800,00	$ 135.600,00	2,00	$ 135.600,00	100%
2,13	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA	UND	2,00	$ 389.600,00	$ 779.200,00	2,00	$ 779.200,00	100%

2,15	PISO EN CERAMICA LISO 0.20X0.20 LINEA DUROTECH	M2	14,80	$ 66.500,00	$ 984.200,00	14,64	$ 973.560,00	99%
	OBRAS ELÉCTRICAS							
3,01	CANALETA PLASTICA	ML	16,15	$ 67.900,00	$ 1.096.585,00	16,15	$ 1.096.585,00	100%
3,02	ACOMETIDA PARCIAL 3 No6+1 No12 DUCTO 1" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	16,15	$ 60.400,00	$ 975.460,00	16,15	$ 975.460,00	100%
3,03	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	4,00	$ 117.900,00	$ 471.600,00	4,00	$ 471.600,00	100%
3,04	REFLECTOR LED 200W IP 65 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	2,00	$ 345.200,00	$ 690.400,00	2,00	$ 690.400,00	100%
	PUNTO VIVE DIGITAL VILLA FABIOLA							
	PRELIMINARES							
4,01	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	363,95	$ 3.630,00	$ 1.321.138,50	259,06	$ 940.387,80	71%
4,02	DESMONTE DE CIELO RASO EN LAMINA LIVIANA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	356,00	$ 6.200,00	$ 2.207.200,00	250,41	$ 1.552.542,00	70%
4,03	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	2,00	$ 228.000,00	$ 456.000,00	2,00	$ 456.000,00	100%
4,04	DEMOLICION MANUAL MURO DIVISORIO BLOQUE DE ARCILLA. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	21,92	$ 12.900,00	$ 282.768,00	21,92	$ 282.768,00	100%
4,05	DESMONTE DE TEJA ASBESTO CEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	90,00	$ 20.600,00	$ 1.854.000,00	0,00	$ 0,00	0%
	OBRA INTERIOR Y EXTERIOR							
5,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC	M2	157,98	$ 114.900,00	$ 18.151.902,00	157,98	$ 18.151.902,00	100%

5,03	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 M(MORTERO TIPO S 1:3)	M2	12,46	$ 55.900,00	$ 696.514,00	1,73	$ 96.707,00	14%
5,04	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	24,92	$ 27.000,00	$ 672.840,00	15,98	$ 431.460,00	64%
5,05	ESTUCO PLASTICO	M2	24,92	$ 17.500,00	$ 436.100,00	24,92	$ 436.100,00	100%
5,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ALUMINIO CORREDIZA, CON VIDRIO 4 MM	M2	2,80	$ 993.800,00	$ 2.782.640,00	2,80	$ 2.782.640,00	100%
5,07	MURO SUPER BOARD DOBLE CARA, E=0.11 M, CAL 8 MM, INCLUYE PINTURA	M2	37,51	$ 178.200,00	$ 6.684.282,00	37,51	$ 6.684.282,00	100%
5,08	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	125,86	$ 12.000,00	$ 1.510.320,00	125,86	$ 1.510.320,00	100%
5,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TIPO SANDWICH 333C CAL. 26 PREPINTADA. INCLUYE POLIURETANO O MATERIAL SIMILAR. NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	90,00	$ 222.300,00	$ 20.007.000,00	0,00	$ 0,00	0%
5,10	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	36,00	$ 30.800,00	$ 1.108.800,00	24,00	$ 739.200,00	67%
5,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREAS EN MADERA INMUNIZADA DE 0.14X0.04X3M INCLUYE TORNILLERIA ROTHOBLAAS Y ACCESORIOS DE INSTALACION	UND	30,00	$ 119.000,00	$ 3.570.000,00	0,00	$ 0,00	0%
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS DIRECTO DEL PROYECTO				$ 90.091.013		$ 57.257.840,30	64,00%

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS

Desde la suscripción del contrato hasta la fecha de corte se han generado los siguientes actos administrativos:

ACTA	FECHA	OBSERVACIÓN
ACEPTACIÓN DE OFERTA SMC CONTRATO	3/06/2025	Se suscribe Contrato 1692 de 2025 entre el municipio de Villavicencio - Meta, Mega Proyectos E Inversiones SAS (contratante), representado legalmente por Carlos

ACTA DE PRORROGA	5/06/2025	Firma del acta de prórroga el día 19 del mes de agosto

CONTROL DE POLIZAS

El contrato de obra 1692 DE 2025, se encuentra amparado por la compañía aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A con las pólizas 30-44-101064160 y 30-40-101024067 a favor de entidades estatales (Ley 80 de 1993) para garantizar cumplimiento del contrato, calidad del servicio, en desarrollo del contrato de OBRA No.1692 de 2025 referente a la "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REFORMAS A LAS INSTALACIONES DE LOS PUNTOS VIVE DIGITAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO". El amparo de estabilidad y calidad de la obra otorgado mediante la presente póliza tiene vigencia de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recibo Final.

Las pólizas aprobadas corresponden a la compañía aseguradora seguros mundiales_las cuales están a favor del MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, las siguientes pólizas fueron expedidas con la firma del contrato.

A continuación, se presentan las fechas de vigencia de las pólizas actualizadas según la suscripción del contrato de obra No. 1692 de 2025, junto con el valor asegurado.

ASEGURADORA	No POLIZA CERTIFICADO	AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	VIGENTE
			DESDE	HASTA		
SEGUROS DEL ESTADO S. A	30-44-101064160	Cumplimiento del contrato	5/06/2025	19/12/2025	$ 24.144.391,49	SI
		Prestaciones Sociales Legales	5/06/2025	19/08/2028	$ 6.036.097,87	SI
		Estabilidad y calidad de la obra	SI AMPARA 5 AÑOS ,0 MESES Y 1 DIAS		$ 24.144.391,48	SI
	30-40-101024067	Responsabilidad Civil Extracontractual	5/06/2025	19/08/2025	$ 284.700.000,00	SI
TOTAL ASEGURADO					$ 339.024.880,84	

GARANTÍA ÚNICA PÓLIZAS SEGÚN PRORROGA No. 01

ASEGURADORA	No POLIZA CERTIFICADO	AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	VIGENTE
			DESDE	HASTA		
SEGUROS DEL ESTADO S. A	30-44-101064160	Cumplimiento del contrato	5/06/2025	18/01/2026	$ 24.144.391,49	SI
		Prestaciones Sociales Legales	5/06/2025	19/09/2028	$ 6.036.097,87	SI
		Estabilidad y calidad de la obra	SI AMPARA 5 AÑOS ,0 MESES Y 1 DIAS		$ 24.144.391,48	SI
	30-40-101024067	Responsabilidad Civil Extracontractual	5/06/2025	18/09/2025	$ 284.700.000,00	SI
TOTAL, ASEGURADO					$ 339.024.880,84	

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

Una vez expuestos los inconvenientes que presenta el contratista MEGAPROYECTOS E INVERSIONES SAS, se ve la necesidad de solicitar una prórroga No 02 al contrato de obra No 1692 de 2025; por un término de 12 días contados a partir del 19 de septiembre de 2025 al 30 de septiembre de 2025, con el fin de superar los inconvenientes manifestados y así cumplir con el objeto contratado.

Cabe resaltar que como contratista de obra se mantiene el compromiso de llegar a feliz término el presente contrato de obra, el cual beneficiara a la comunidad del sector de Villa Fabiola y la Madrid; mejorando así su calidad de vida.

Anexos


- Solicitud de prorroga
- Acta de solicitud de prorroga
- Reprogramación de obra

Para la constancia de lo anterior se firma el presente informe el día _____


Firma
MEGA PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S
CARLOS AUGUSTO GIRALDO RENGIFO
Contratista

Firma
Residente de Obra
Jesús Gregorio Cuyares Rodríguez
TP: A172015-1121851569

	Duration	Start	Finish	Cost	Predecessors
ACION Y ACIONES DE LOS L MUNICIPIO DE	**73.22 days**	**Thu 05/06/25**	**Sat 30/08/25**	**$ 104,382,462.78**	
	0 days	Thu 05/06/25	Thu 05/06/25	$ 0.00	
ID	**49.56 days?**	**Sat 02/08/25**	**Tue 30/09/25**	**$ 28,999,281.50**	
	8 days	**Sat 02/08/25**	**Wed 13/08/2**	**$ 1,922,772.50**	
EPLANTEO BRA (M2) NO N TOPOGRAFICA	2 days	Sat 02/08/25	Tue 05/08/25	$ 648,862.50	
UAL EN H= 0 - 2.00 M	2 days	Tue 05/08/25	Fri 08/08/25	$ 682,550.00	5
UAL BALDOSA CLUYE JE MANUAL	2 days	Fri 08/08/25	Mon 11/08/25	$ 135,360.00	6
POSICIÓN FINAL SOBRANTES	2 days	Mon 11/08/25	Wed 13/08/25	$ 456,000.00	7
	23.33 days?	**Wed 03/09/2**	**Tue 30/09/25**	**$ 20,819,847.00**	
OCIDO COMUN ORTERO TIPO	2 days	Fri 19/09/25	Mon 22/09/25	$ 1,087,366.00	
TALACIÓN CORRIDO LAMINA COLL 0.80 M	2 days	Fri 26/09/25	Tue 30/09/25	$ 561,000.00	15
TALACIÓN REJA RADO 1" CAL 18	3 days	Wed 03/09/25	Fri 05/09/25	$ 4,208,454.00	
GRO 100X100X4	2 days	Wed 03/09/25	Thu 04/09/25	$ 933,100.00	

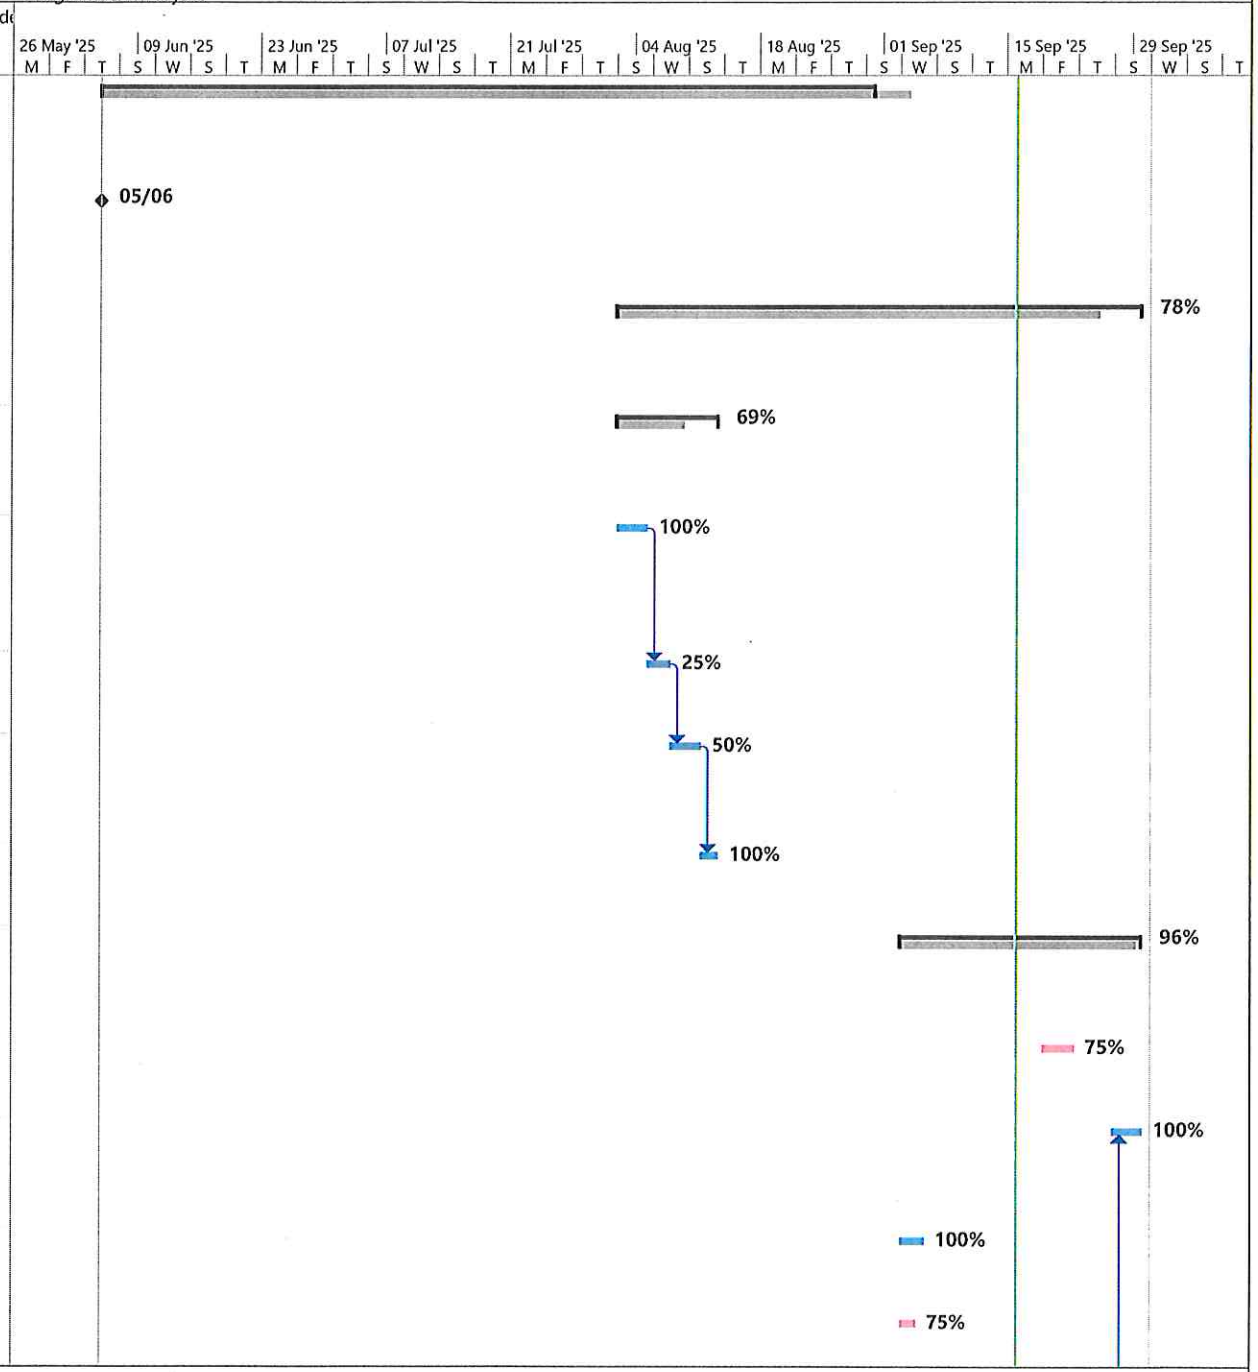


	Duration	Start	Finish	Cost	Predec
TALACIÓN ' CORREDIZA,	2 days	Wed 24/09/25	Thu 25/09/25	$ 4,680,798.00	
RD DOBLE AL 8 MM,	3 days	Wed 24/09/25	Fri 26/09/25	$ 2,639,142.00	
UMINISTRO E	1 day	Wed 24/09/25	Wed 24/09/25	$ 127,800.00	
SIFON DE PISO	1 day?	Wed 24/09/25	Wed 24/09/25	$ 270,800.00	
SANITARIO 4" TALACIÓN	1 day?	Wed 24/09/25	Wed 24/09/25	$ 165,800.00	
UMINISTRO E	1 day?	Wed 24/09/25	Wed 24/09/25	$ 920,835.00	
' SUMINISTRO E	1 day?	Wed 24/09/25	Wed 24/09/25	$ 2,294,792.00	
CORTINA 1/2" TALACIÓN	1 day?	Wed 24/09/25	Wed 24/09/25	$ 135,600.00	
ER BLANCO	1 day?	Thu 25/09/25	Thu 25/09/25	$ 779,200.00	18
EPONER R INCLUYE)RIOS	1 day?	Thu 25/09/25	Thu 25/09/25	$ 1,041,600.00	20
LISO 0.20X0.20	2 days	Thu 25/09/25	Mon 29/09/25	$ 973,560.00	23
	4.33 days?	**Tue 09/09/2!**	**Fri 12/09/25**	**$ 3,234,045.00**	
A	1 day?	Thu 11/09/2!	Thu 11/09/2!	$ 1,096,585.00	
AL 3 No6+1 'C SUMINISTRO	2 days	Tue 09/09/25	Wed 10/09/25	$ 975,460.00	
ACORRIENTE A TIERRA TALACION	1 day?	Thu 11/09/25	Thu 11/09/25	$ 471,600.00	
OW IP 65 TALACIÓN TALACIÓN	1 day?	Fri 12/09/25	Fri 12/09/25	$ 690,400.00	

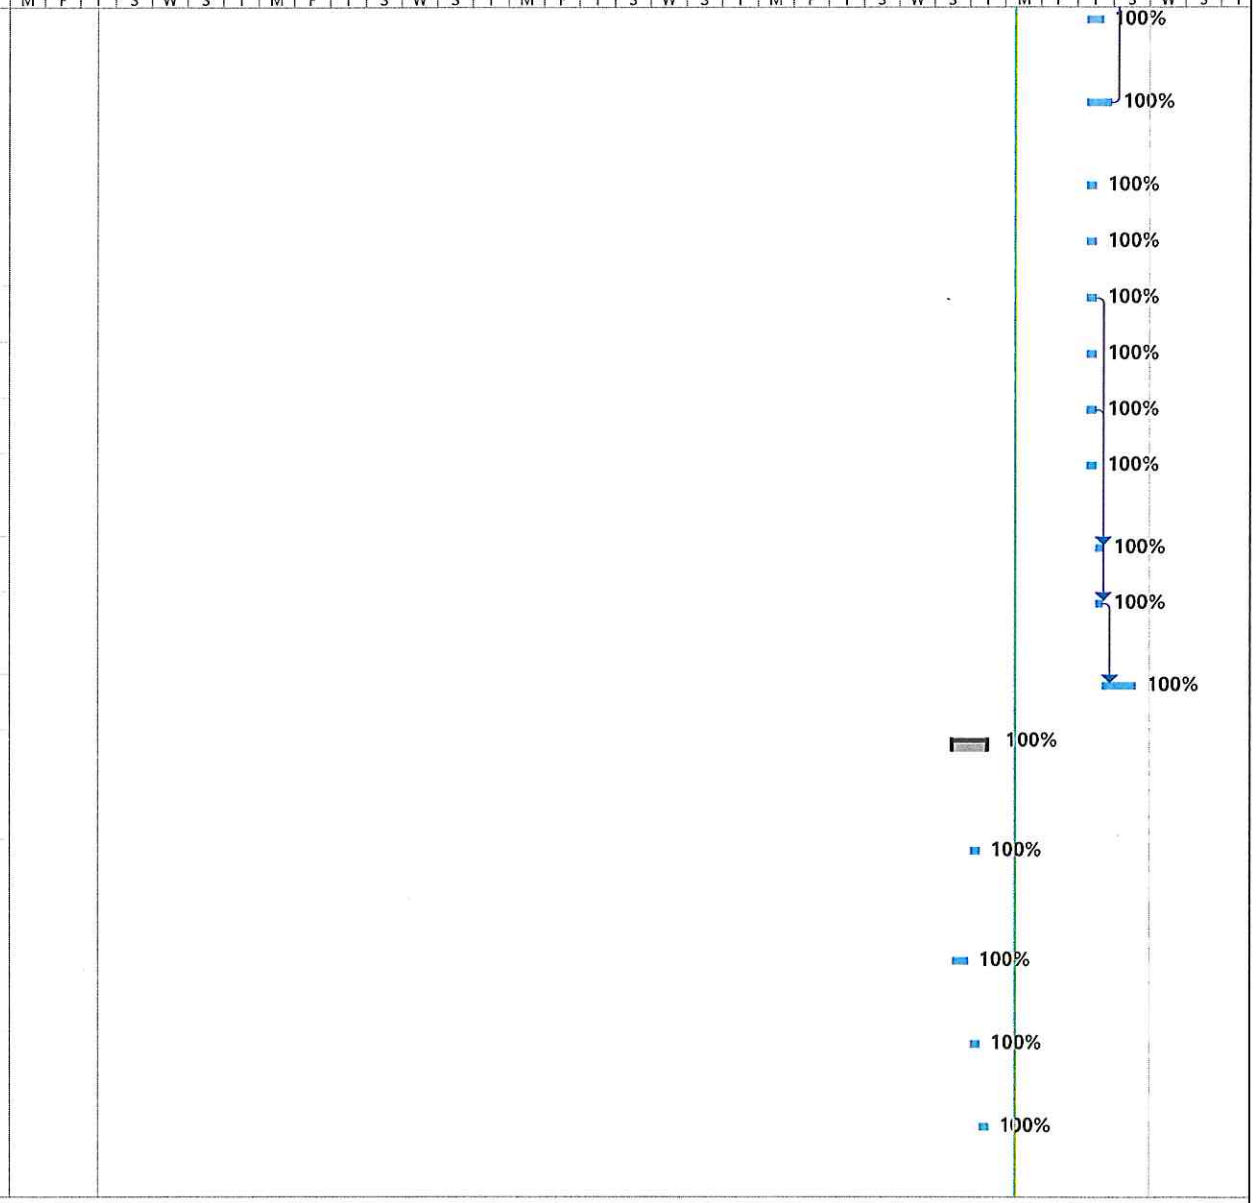


ProgramacionProject

	Duration	Start	Finish	Cost	Predecessors
S	**13.22 days?**	**Thu 11/09/25**	**Thu 25/09/25**	**$ 3,022,617.00**	
UAL MURO INCLUYE JE MANUAL TALACIÓN NA ALVEOLAR 6MM	1 day?	Thu 11/09/25	Thu 11/09/25	$ 3,579.00	
	1 day?	Sat 13/09/25	Mon 15/09/25	$ 233,642.00	
ERIAL MIXTO AR TAMAÑO RO, ACIÓN, Y IANUAL CON	2 days	Tue 16/09/25	Sat 20/09/25	$ 90,476.00	
N DE 0,60 X MPOSTERÍA COMÚN, CONCRETO CO EN ÁNGULO ISTRO Y	1 day?	Wed 17/09/25	Wed 17/09/25	$ 1,738,449.00	
LISO 0.20X0.20	1 day?	Thu 25/09/25	Thu 25/09/25	$ 956,471.00	
IOLA	**50.78 days?**	**Thu 05/06/25**	**Tue 05/08/25**	**$ 75,383,181.28**	
	13 days	**Thu 05/06/25**	**Thu 19/06/25**	**$ 3,229,155.50**	
PLANTEO BRA M2) NO TOPOGRAFICA	2 days	Thu 05/06/25	Fri 06/06/25	$ 940,387.50	
O RASO EN NCLUYE SITIO DE ACENAMIENTO	3 days	Fri 06/06/25	Wed 11/06/25	$ 1,550,000.00	38

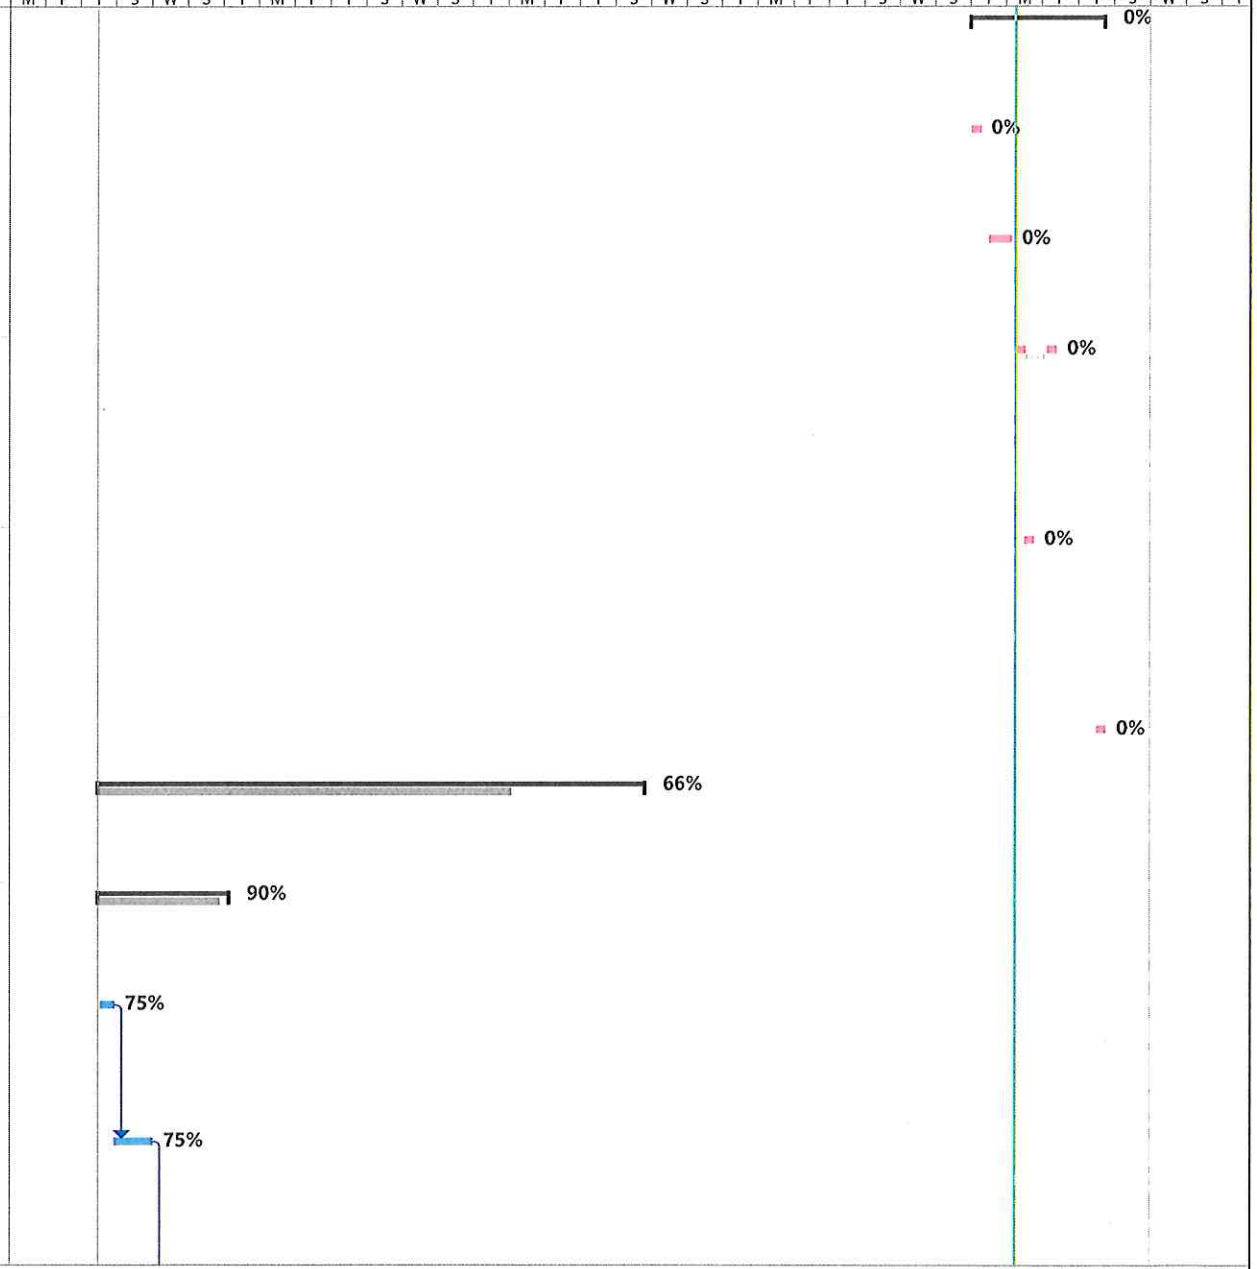


	Duration	Start	Finish	Cost	Predecessors
POSICIÓN FINAL SOBRANTES	5 days	Fri 13/06/25	Thu 19/06/25	$ 456,000.00	41
UAL MURO E DE ARCILLA. Y CARGUE	3 days	Wed 11/06/25	Fri 13/06/25	$ 282,768.00	39
TERIOR	**39.56 days**	**Thu 05/06/25**	**Wed 23/07/2**	**$ 55,321,415.78**	
TALACION DE	5 days	Thu 05/06/25	Wed 11/06/25	$ 30,243,978.00	
CORAZA S	3 days	Sat 19/07/25	Wed 23/07/25	$ 5,091,264.00	
FLEXA No. 4 MORTERO TIPO	1 day	Thu 19/06/25	Fri 20/06/25	$ 96,707.00	40
TERIORES UYE FILOS Y MINISTRO Y	4 days	Fri 20/06/25	Thu 26/06/25	$ 431,460.00	45
	6 days	Tue 01/07/25	Mon 07/07/2	$ 5,664,925.00	46
TALACIÓN CORREDIZA,	2 days	Thu 05/06/25	Fri 06/06/25	$ 2,941,763.78	
RD DOBLE AL 8 MM,	3 days	Wed 25/06/25	Tue 01/07/25	$ 6,894,558.00	
PO 1 S/MURO	10 days	Mon 07/07/25	Fri 18/07/25	$ 2,847,960.00	47
ACERO) ASTM A500 RO E	2 days	Sat 19/07/25	Tue 22/07/25	$ 1,108,800.00	
3	**3 days?**	**Fri 01/08/25**	**Tue 05/08/25**	**$ 16,832,610.00**	
A IKA MULTISEAL	1 day?	Fri 01/08/25	Fri 01/08/25	$ 141,115.00	

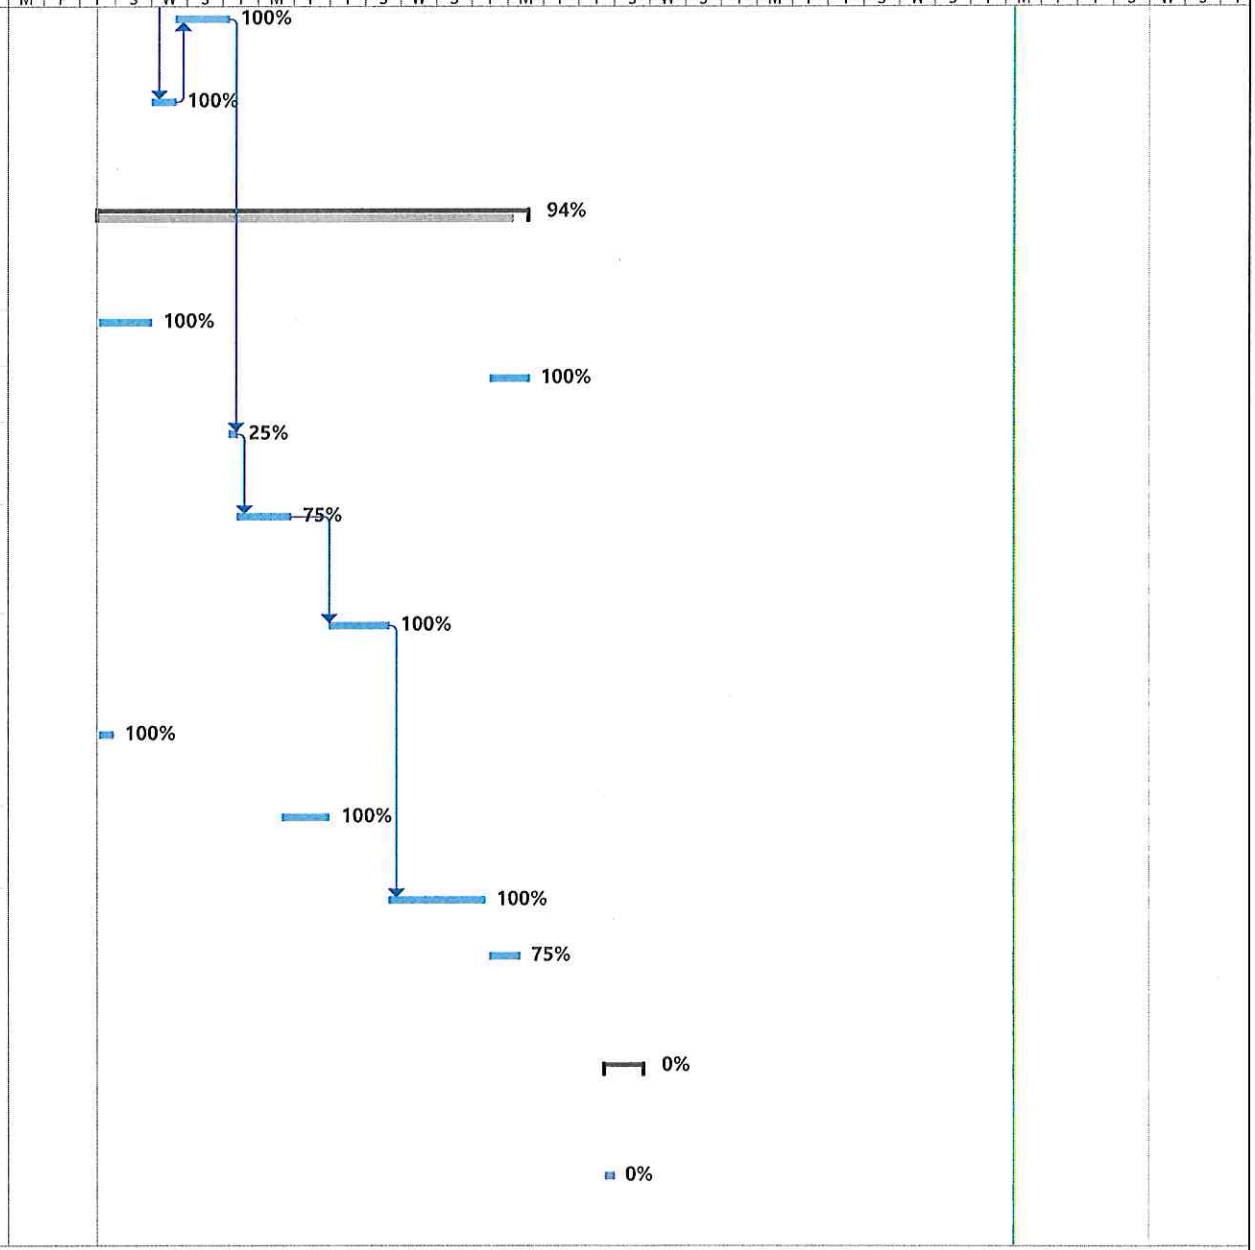

ProgramacionProject

	Duration	Start	Finish	Cost	Prede
DO 18 WATTS	2 days	Fri 01/08/25	Mon 04/08/2	$ 2,415,398.00	
RA LED TALACIÓN	3 days	Fri 01/08/25	Tue 05/08/25	$ 6,577,117.00	
O 20.7 MPa . EN OBRA.	1 day	Fri 01/08/25	Fri 01/08/25	$ 854,497.00	
ICRETO 20.7 ZCLA EN OBRA.	1 day	Fri 01/08/25	Fri 01/08/25	$ 886,417.00	
RTA CON DE ALTA ROJET	2 days	Fri 01/08/25	Mon 04/08/25	$ 3,291,270.00	
, SENDEROS O OJET	2 days	Fri 01/08/25	Mon 04/08/25	$ 1,176,224.00	
UAL ENCHAPE . INCLUYE JE MANUAL	2 days	Fri 01/08/25	Mon 04/08/25	$ 73,564.00	
ICACIÓN O A CANAL EN Pa (3000 PSI)	2 days	Fri 01/08/25	Mon 04/08/25	$ 342,543.00	
ICACIÓN AMINA 18,LD=0.30 M	1 day?	Fri 01/08/25	Fri 01/08/25	$ 578,201.00	
TALACIÓN CORRIDO LAMINA COLL 0,80 M	2 days	Fri 01/08/25	Mon 04/08/25	$ 280,614.00	
PULIDO	1 day?	Fri 01/08/25	Fri 01/08/25	$ 215,650.00	
	0 days	Sat 30/08/25	Sat 30/08/25	$ 0.00	

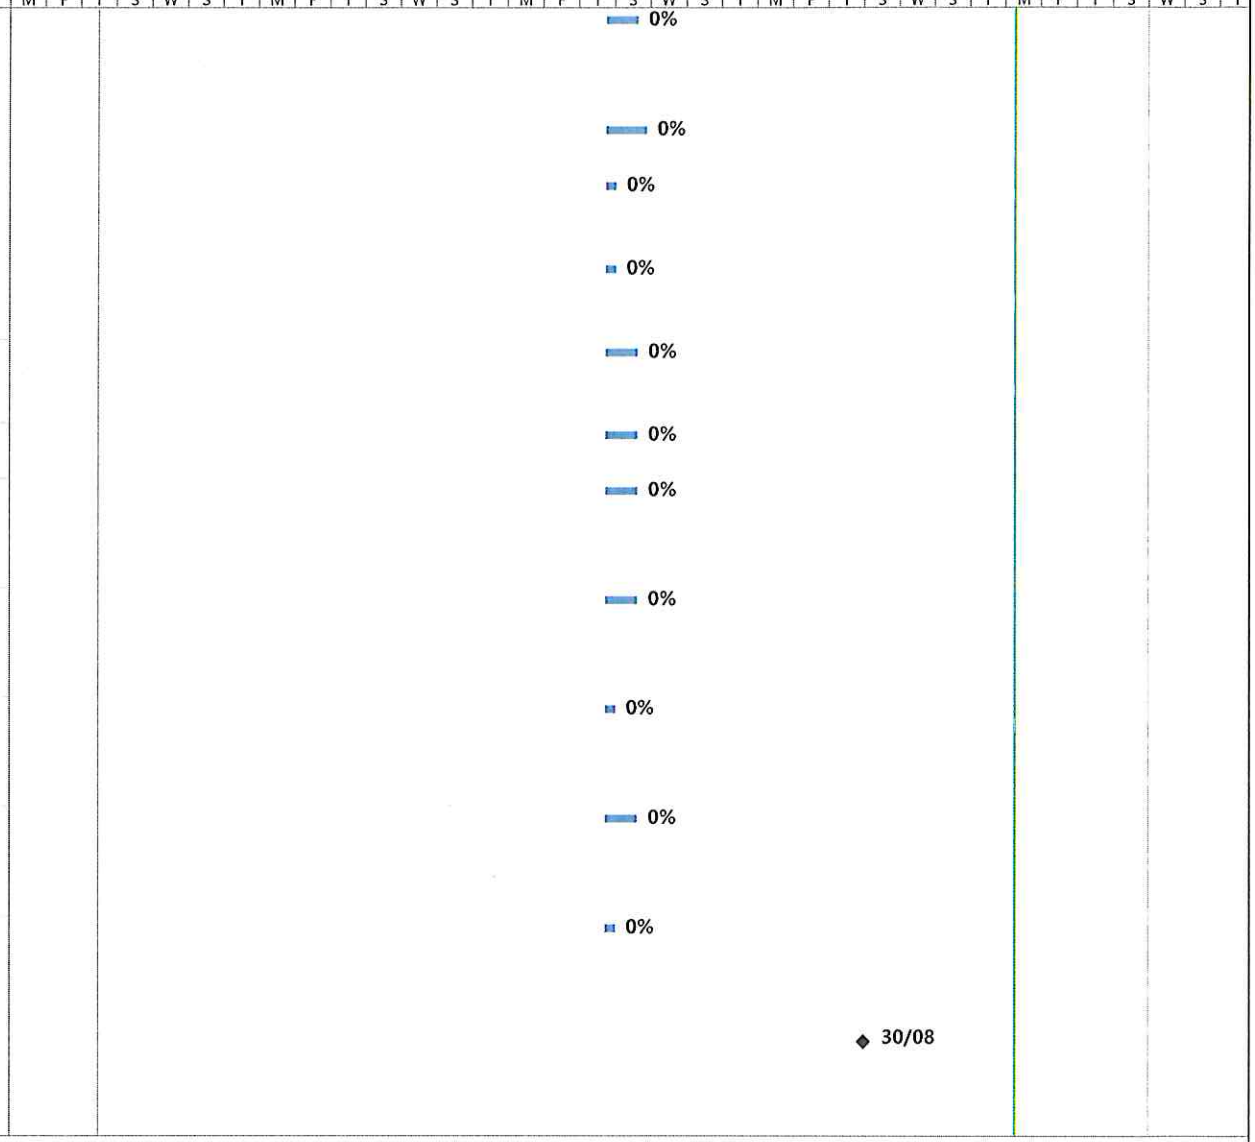

CONDICIONES HIDROMETEOROLÓGICAS ACTUALES

IDEAM

ca al Sistema Nacional
del Riesgo de
iRD) y al Sistema
ntal (SINA).

de septiembre de 2025
ación 06:00 HLC

etín No.

0716

CONTENIDO

- Condiciones Meteorológicas.
- Pronóstico de precipitación para las próximas seis (6) horas.
- Alertas Hidrológicas.
- Seguimiento y Pronóstico de las Amenazas por Deslizamientos
- Seguimiento y Pronóstico de las Amenazas por Incendios Alertas.
- Meteomarinas vigentes Mar Caribe Colombiano.
- Meteomarinas vigentes Océano Pacífico Nacional.

Alerta ROJA

PARA TOMAR ACCIÓN Advierte a los sistemas de prevención y atención de desastres sobre la amenaza que puede ocasionar un fenómeno con efectos adversos sobre la población, el cual requiere la atención inmediata por parte de la población y de los cuerpos de atención y socorro. Se emite una alerta sólo cuando la identificación de un evento extraordinario indique la probabilidad de amenaza inminente y cuando la gravedad del fenómeno implique la movilización de personas y equipos, interrumpiendo el normal desarrollo de sus actividades cotidianas.

Alerta NARANJA

PARA PREPARARSE Indica la presencia de un fenómeno. No implica amenaza inmediata y como tanto es catalogado como un mensaje para informarse y prepararse. El aviso implica vigilancia continua ya que las condiciones son propicias para el desarrollo de un fenómeno, sin que se requiera permanecer alerta.

Alerta AMARILLA

PARA INFORMARSE Es un mensaje oficial por el cual se difunde información. Por lo regular se refiere a eventos observados, registrados o registrados y puede contener algunos elementos de pronóstico a manera de orientación. Por sus características pretéritas y futuras difiere del aviso y de la alerta, y por lo general no está encaminado a alertar sino a informar

CONDICIONES NORMALES La información que se suministra se encuentra dentro de los rangos normales.

Alertas vigentes hasta: 15 de septiembre de 2025 12:00 HLC

www.ideam.gov.co

ones Hidrometeorológicas

IDEAM


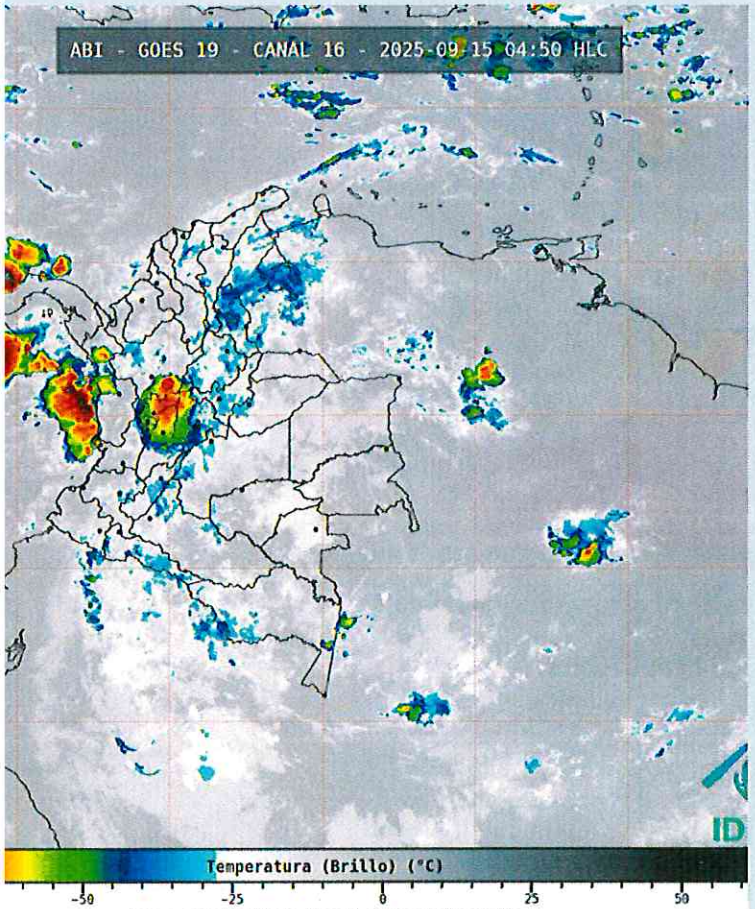


Imagen GOES 19 (East) Canal Infrarrojo
15 de septiembre de 2025 – Hora 23:40 HLC
Fuente: IDEAM – GOES 19

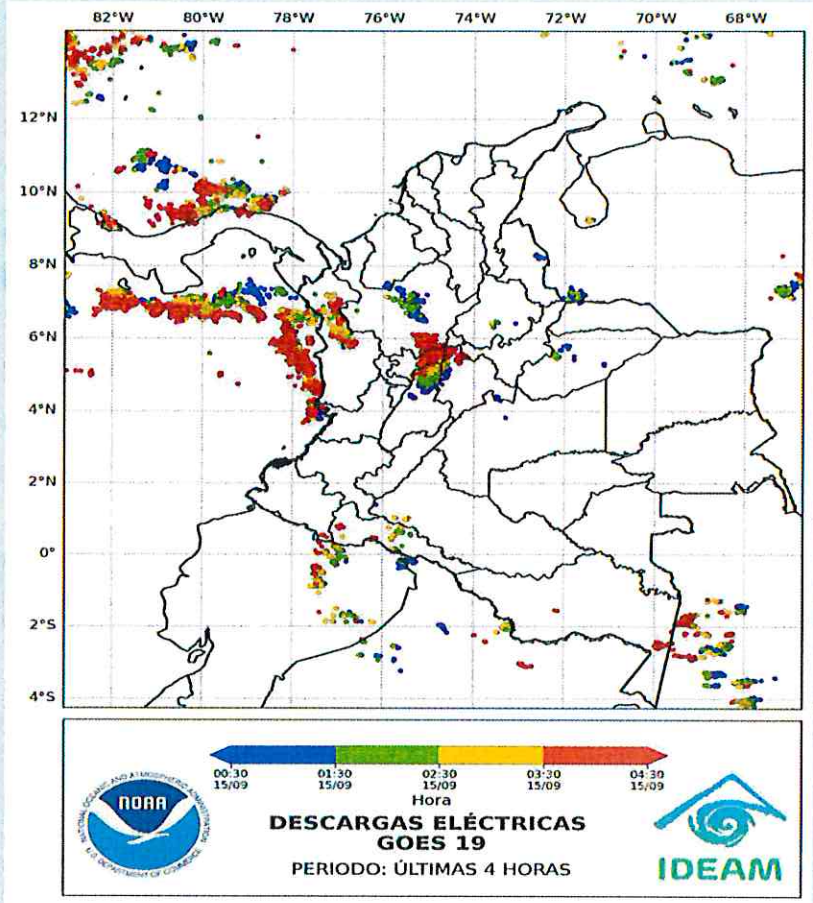


Descargas eléctricas (últimas horas)
15 de septiembre de 2025 – Hora 04:30 HLC
Fuente: NOAA - IDEAM

- La imagen del canal infrarrojo (10.3 µm) permite identificar nubes en cualquier período temporal a partir de la temperatura de brillo de la nube (ver escala de colores). De esta forma, se puede identificar, clasificar y caracterizar la nubosidad en una zona determinada.
- La imagen de las descargas eléctricas muestra los rayos nube-tierra que se han descargado en una zona en las últimas 4 horas (ver escala de colores)

ones Hidrometeorológicas

IDEAM

eorológicas en las últimas horas

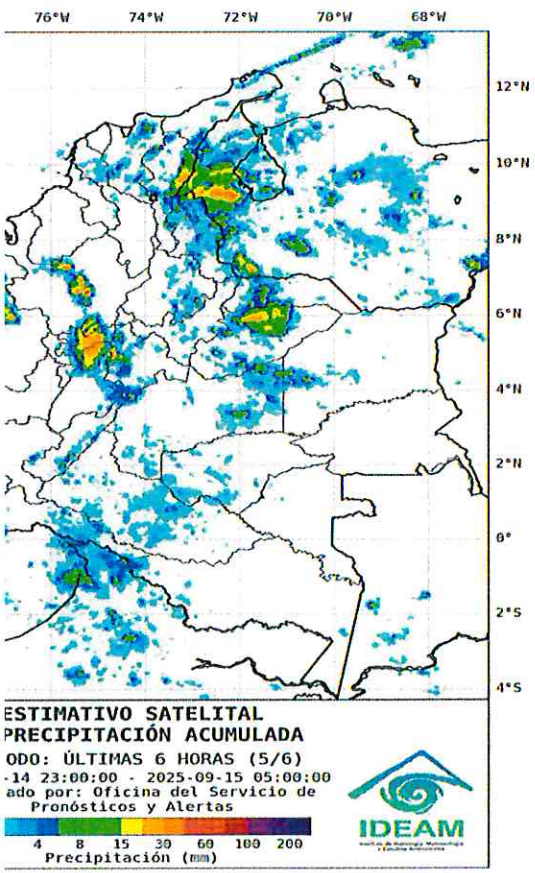

Lluvias destacadas en las últimas horas


Han estado bajo condiciones mayormente nubosas en las horas de la madrugada para el occidente de la Orinoquia, oriente del Caribe, oriente y centro de la Andina, occidente de la Amazonía y norte del Pacifico. Lluvias de mayor magnitud se han presentado en el centro de Chocó, Tolima, Caldas, Quindío y occidente de Cundinamarca; lloviznas y lluvias leves hacia el centro y oriente de Cundinamarca, Boyacá, Huila, centro de Antioquia, Cesar, área de la sierra nevada de Santa Marta, occidente del Meta, Casanare y de Arauca, incluyendo el piedemonte llanero, además, en el Norte de Santander, Santander, occidente del Caquetá y del Putumayo.

En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina ha estado con cielo parcialmente nublado con lluvias puntuales y espontaneas en la zona marítima.

etro de lluvia (1 mm) equivale a un litro (1 L) de lluvia que ha caído en un metro cuadrado (1 m^2). La lluvia acumulada es la suma de los milímetros de agua lluvia que se han registrado en un lapso de tiempo.

o de precipitación para nas seis (6) horas

IDEAM

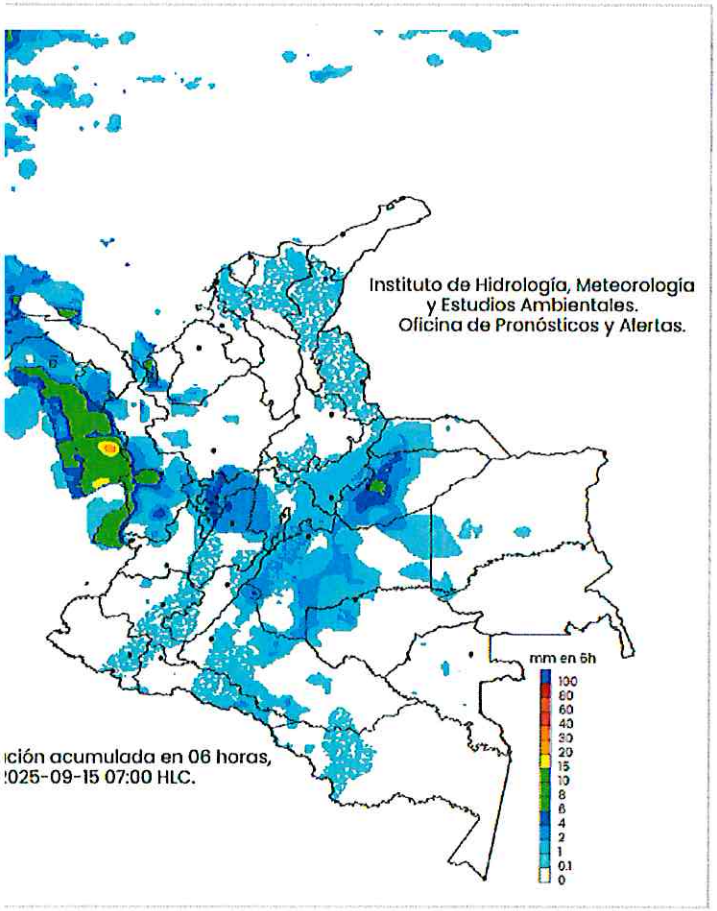

Se prevé precipitaciones de mayor intensidad con probabilidad de actividad eléctrica dispersa en el sur de Antioquia, Caldas, Quindío, norte de Tolima y norte del Chocó; lluvias ligeras y/o lloviznas en sectores de Boyacá, Cundinamarca, Huila, Norte de Santander, oriente de Santander, norte de Valle del Cauca y oriente de Nariño y del Cauca.

Se espera tiempo seco para las demás zonas del país.

En San Andrés, Providencia y Santa Catalina se estima cielo ligeramente nublado con tiempo seco.


- La resolución espacial del mapa de pronóstico es de 6.5 km aproximadamente. Por lo tanto, fenómenos meteorológicos inferiores a esta escala no están considerados en esta predicción.
- La escala de colores está asociada a un rango de precipitación en el intervalo de tiempo indicado, lo que implica que el pronóstico no es determinista (un valor exacto en una zona) sino corresponde a un pronóstico cuantitativo (un rango de valores en una zona).

S43

Alertas Hidrológicas

IDEAM

Actualización: 15 de septiembre de 2025 06:00 HLC

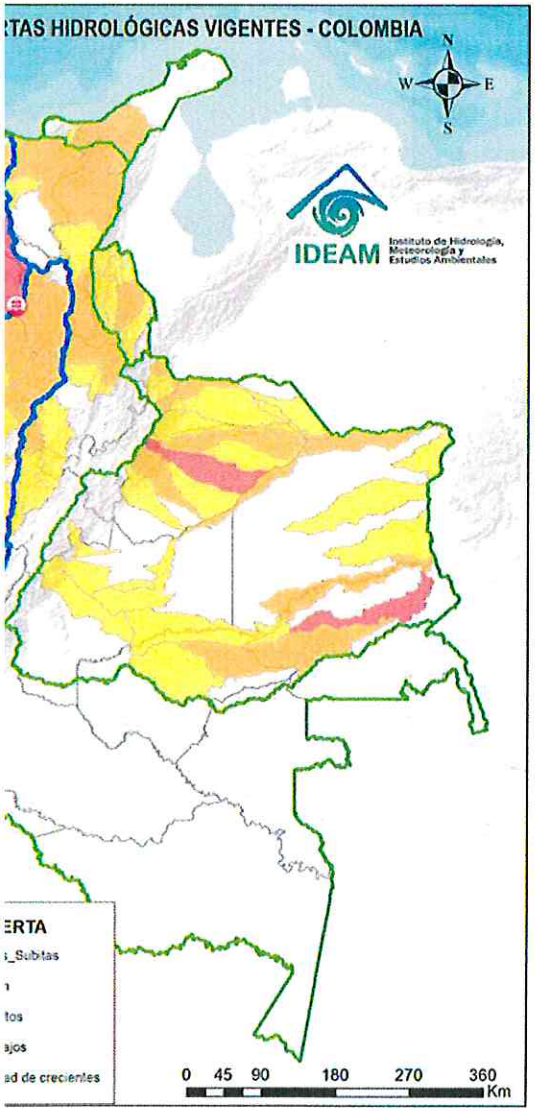



Caño Cristales el río de los cinco colores, paraíso tropical! (Sierra de La Macarena – Meta, Colombia). – Autor: Mcleods, 19 de Febrero de 1918
Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3e/Flashpacker_Connect_-_Cano_Cristales_.webp

FEWS COLOMBIA
Sistema de Pronósticos Hidrológicos y Alertas Tempranas

Consulte aquí el estado de los niveles en los ríos del país:

http://fews.ideam.gov.co/

Nota 1: Las alertas hidrológicas pueden ser corregidas y/o actualizadas en el futuro. No representa una certificación oficial del IDEAM.
Nota 2: Es probable que los eventos hidrológicos reportados en las alertas emitidas no se estén presentando sobre los ríos principales sino sobre sus afluentes.
Nota 3: El IDEAM le sugiere a la población ribereña estar muy atentos al comportamiento de los niveles de los ríos y atender las recomendaciones que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) emita para la implementación de medidas de contingencia ante posibles afectaciones por desbordamientos e inundaciones.
Nota 4: Dentro de las alertas emitidas no se contemplan aquellas asociadas a desabastecimientos. En caso de requerir información asociada a estos reportes consultar en contactenos@gestiondelriesgo.gov.co

LLUVIAS
NIVELES BAJOS
NIVELES ALTOS
CRECIENTE SUBITA
TRANSITO DE CRECIENTES
CRECIENTE POR DESEMBALSE
INUNDACIONES

Hidrológicas

IDEAM

CONVENCIONES	
Lluvias	Lluvias antecedentes intensas o continuas y/o pronóstico de las mismas, las cuales pueden generar crecientes súbitas en los ríos principales y sus afluentes.
Niveles bajos	Nivel de referencia del río cuyos valores iguales o inferiores pueden generar restricciones para navegabilidad, captación de agua para acueductos, actividades de pesca entre otros sectores que pudieran verse afectados por la disminución de los caudales.
Niveles altos	Nivel de referencia del río cuyos valores iguales o superiores pueden generar afectaciones en las zonas ribereñas.
Creciente súbita	Fenómeno natural que se presenta en los ríos de montaña como consecuencia de la ocurrencia de lluvias intensas o torrenciales en zonas de alta pendiente del cauce principal y sus afluentes.
Tránsito de crecientes	Es el desplazamiento de una onda de creciente de aguas arriba hacia aguas abajo de la corriente.
Creciente por desembalse	Proceso de tránsito del flujo de agua por descarga controlada desde un embalse.
Inundación	Aumento en los niveles y/o caudales de los ríos que superan la capacidad máxima de transporte o modificación de la sección transversal que la reduce, ocasionando el desbordamiento e inundación en zonas aledañas al cauce principal.




S45

n de Alertas Hidrológicas

IDEAM

Actualización: 15 de septiembre de 2025 06:00 HLC

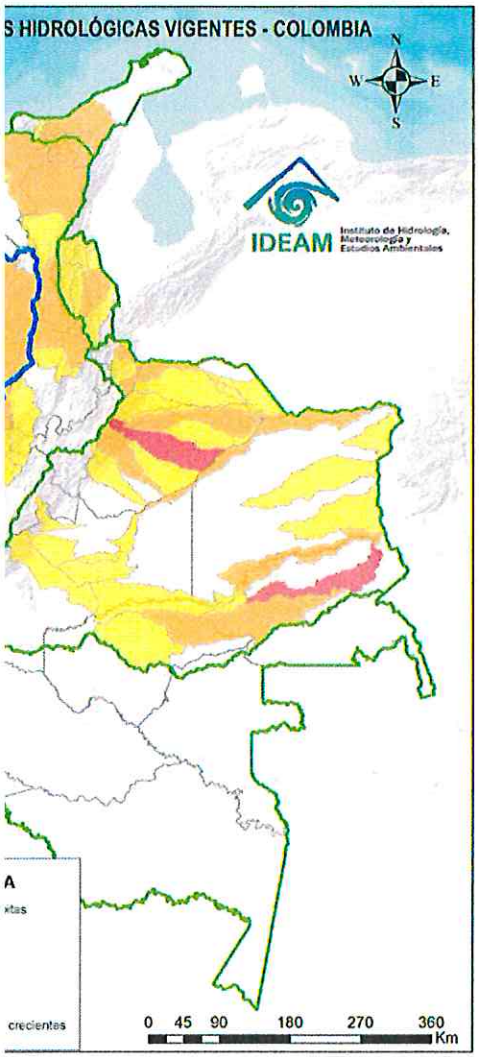

ALERTAS POR PROBABILIDAD DE CRECIENTES SÚBITAS Y/O INUNDACIONES

Área Hidrográfica	# de Subzonas
Orinoco	2
Magdalena Cauca	1
TOTAL	3

Área Hidrográfica	# de Subzonas
Caribe	24
Magdalena Cauca	17
Pacífico	13
Orinoco	10
TOTAL	64

Área Hidrográfica	# de Subzonas
Orinoco	19
Magdalena Cauca	15
Caribe	14
Pacífico	5
TOTAL	53

TOTAL ALERTAS HIDROLÓGICAS	120

ALERTAS PUNTUALES POR INUNDACIONES Y/O CRECIENTE SÚBITAS

Área Hidrográfica	# de Subzonas
Magdalena Cauca	1
TOTAL	1

ALERTAS PUNTUALES POR NIVELES BAJOS

Área Hidrográfica	# de Subzonas
TOTAL	0

Nota 1: Las alertas hidrológicas pueden ser corregidas y/o actualizadas en el futuro. No representa una certificación oficial del IDEAM.
Nota 2: Es probable que los eventos hidrológicos reportados en las alertas emitidas no se estén presentando sobre los ríos principales sino sobre sus afluentes.
Nota 3: El IDEAM le sugiere a la población ribereña estar muy atentos al comportamiento de los niveles de los ríos y atender las recomendaciones que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) emita para la implementación de medidas de contingencia ante posibles afectaciones por desbordamientos e inundaciones.
Nota 4: Dentro de las alertas emitidas no se contemplan aquellas asociadas a desabastecimientos. En caso de requerir información asociada a estos reportes consultar en contactenos@gestiondelriesgo.gov.co


FEWS COLOMBIA

Consulte aquí el estado de los niveles en los ríos del país:
https://fews.ideam.gov.co/visorfews/nacional/estacion

n de Alertas Hidrológicas

IDEAM

Actualización: 15 de septiembre de 2025 06:00 HLC

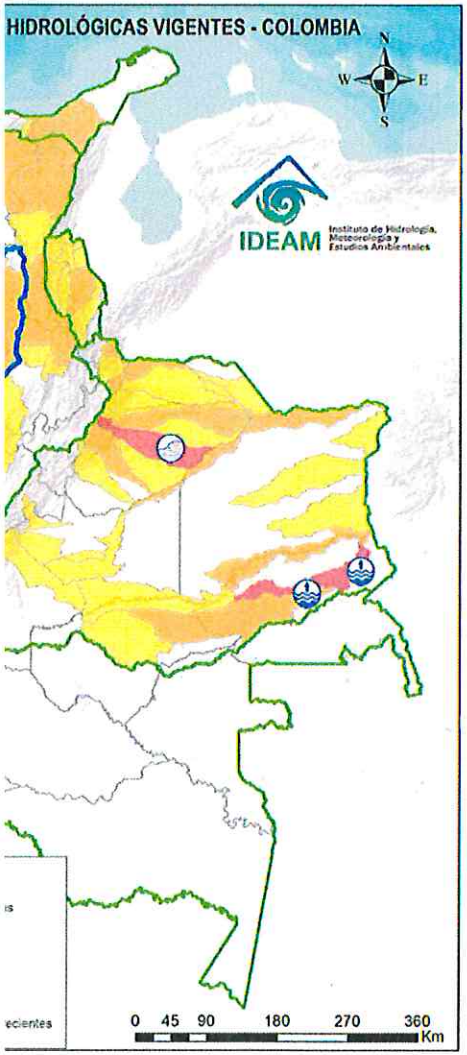


ÁREA HIDROGRÁFICA	SE DESTACAN LAS SIGUIENTES ALERTAS ROJAS POR NIVELES ALTOS, CRECIENTES SÚBITAS, DESBORDAMIENTOS Y/O INUNDACIONES:
Magdalena – Cauca	• **Alerta puntual:** Afectaciones por rompimiento del dique marginal del río Cauca en el sector Caregato a la altura de San Jacinto del Cauca (Bolívar). Se recomienda especial atención en La Región de La Mojana por transvase del caudal del río Cauca (06/05/2024). • Niveles altos del río San Jorge en el tramo Jegua - San Antonio y los sistemas de caños y ciénagas asociados. Adicionalmente, persisten las áreas inundadas en los municipios de San Jacinto del Cauca, Caimito, San Benito Abad, Ayapel, Guaranda, San Marcos y Sucre, asociadas al ingreso de agua del río Cauca a través del boquete en Caregato. **Notas: 1)** Se reportó el rompimiento del río San Jorge a la altura de las haciendas La Palmira y Monte Flor en el municipio de San Marcos (Sucre) (12/05/2025). **2)** Inundación en los corregimientos de Puerto Franco y San José Rivera del municipio de Galeras, Cesar (4/07/2025). **3)** Se reportan afectaciones en zona urbana y rural del municipio de Sahagún (Córdoba) por desbordamiento de diferentes canales (16/08/2025).
Orinoco	• Niveles altos en la parte baja del río Inírida a la altura del municipio de Inírida (Guainía). Especial atención en zonas ribereñas de dicho municipio. • Crecientes súbitas en el río Pauto y sus aportantes, como las quebradas Cañaverales y El Oso, y los ríos Curama y Pore. Igual condición, se espera en el río Guachiría y sus aportantes. Especial atención en los municipios de Chita, Pisba, Socotá (Boyacá), Támara, Pore, San Luis de Palenque y Trinidad (Casanare). **Nota: 1)** Se reportó desbordamiento de los ríos Pauto y Pore en las veredas El Garzón, La Plata, Brisas del Pauto y la Sequí parte baja en el municipio de Pore (Casanare) (08/09/2025). **2)** Se reporta desbordamiento de los ríos Curama y Pauto, en los municipios de Pore, San Luis de Palenque y Trinidad - Casanare (12/09/2025).

drográfica del Caribe

IDEAM

Actualización: 15 de septiembre de 2025 06:00 HLC

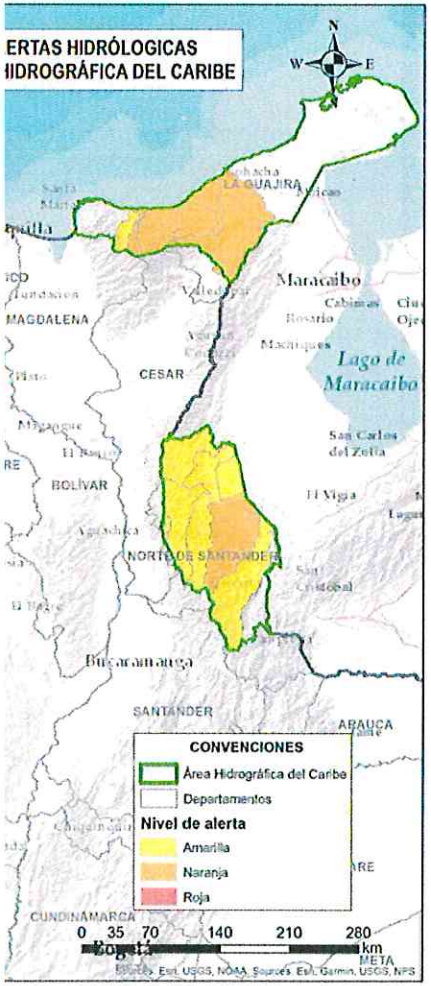

Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	Atrato - Darién	Cuenca alta del río Atrato	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca alta del río Atrato y sus afluentes, se recomienda especial atención en los municipios de El Carmen de Atrato, Lloró, Bagadó, Cértegui, Quibdó y Unión Panamericana (Animas).
⚠	Atrato - Darién	Cuenca del río Andágueda	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Andágueda y sus aportantes. Se recomienda especial atención en los municipios de Bagadó y Cértegui (Chocó).
⚠	Atrato - Darién	Cuenca del río Quito	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Quito. Especial atención en los municipios de Cantón de San Pablo, Unión Panamericana, Cértegui, Río Quito y Atrato (Chocó). **Nota:** Se presentó desbordamiento de la quebrada Las Animas, generando afectaciones por inundación en los sectores de Guatavita, Santander, Divino Niño, Porvenir, La Playita, San Joaquín, comunidad indígena Viento Libre y corregimiento de Quiado del municipio de Unión Panamericana, Choco (04/09/2025).
⚠	Atrato - Darién	Cuenca del río Cabí	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Cabí entre otros directos al río Atrato, así como en el río Atrato en su recorrido por el municipio de Quibdó. Especial atención en los municipios de Atrato y Quibdó (Chocó).
⚠	Atrato - Darién	Cuenca del río Bebaramá	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Bebaramá y otros Directos Atrato (md). Se recomienda especial atención al municipio de Medio Atrato y su cabecera municipal Beté (Chocó).
⚠	Atrato - Darién	Cuenca media río Atrato	Probabilidad de crecientes súbitas en la SZH Directos al Atrato entre los ríos Quito y Bojayá (mi), espacialmente los ríos Beté y Tanguí, en la zona rural del municipio Medio Atrato. Se recomienda especial atención en el río Atrato a la altura de Vigía de Fuerte (Antioquia).

drográfica del Caribe

IDEAM

Actualización: 15 de septiembre de 2025 06:00 HLC



Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	Atrato - Darién	Cuenca Media del Atrato	Probabilidad de crecientes súbitas de los afluentes directos al Atrato, entre Bebaramá y Murrí (md). Se recomienda especial atención en el municipio de Vigía del Fuerte y sus centros poblados (Antioquia).
⚠	Atrato – Darién	Cuenca del río Murrí	Probabilidad de crecientes súbitas del río Murrí y sus afluentes, especialmente el río Ocaidó entre otros directos a la parte media del río Atrato. Se recomienda especial atención en el municipio de Urrao y Vigía del Fuerte (Antioquia).
⚠	Atrato - Darién	Cuenca del río Bojayá	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Bojayá y sus afluentes. Especial atención en el municipio de Bojayá (Chocó).
⚠	Atrato – Darién	Cuenca del río Napipí – río Opogadó	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Napipí – río Opogadó y sus aportantes.
⚠	Atrato - Darién	Cuenca del río Murindó	Probabilidad de crecientes súbitas del río Murindó y sus afluentes. Especial atención en los municipios de Murindó, Vigía del Fuerte (Antioquia) y Carmen del Darién (Chocó).
⚠	Atrato – Darién	Cuenca del río Sucio	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Sucio y sus afluentes. Se recomienda especial atención en las quebradas San José de Urama, El Tigre, Agualinda, La Encalichada, Cañada Seca, Desmotadora, La Antigua, La Caracol y Potreros, y los ríos Mutatá, Urumita y Herradura. Especial atención en los municipios de Nuevo Belén de Bajira, Frontino, Abriaquí, Uramita, Dabeiba, Cañasgordas, Frontino y Mutatá (Antioquia).

drográfica del Caribe

IDEAM

Actualización: 15 de septiembre de 2025 06:00 HLC



Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	Atrato – Darién	Cuenca del río Salaquí	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Salaquí y Truandó, y sus aportantes a la cuenca baja del río Atrato, espacialmente el río Truandó en el municipio de Riosucio (Chocó).
⚠	Atrato – Darién	Cuenca del río Perancho	Probabilidad de incrementos súbitos en el nivel del río Perancho y sus afluentes, especialmente en el río Domingodó, aportante a la cuenca baja del río Atrato. Especial atención en los municipios Carmen de Darién y Riosucio (Chocó).
⚠	Atrato – Darién	Cuenca baja del río Atrato	Probabilidad de incrementos súbitos en la SZH Directos al Bajo Atrato entre río Sucio y Desembocadura al Mar Caribe. Especial atención en los municipios de Riosucio, Unguía (Chocó) y Turbo (Antioquia).
⚠	Atrato – Darién	Cuenca del río Tanela	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Tanela, aportante a la cuenca baja del río Atrato, se recomienda especial atención en el municipio de Unguía (Chocó).
⚠	Atrato – Darién	Cuenca del río Tolo	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Tolo y sus afluentes, especialmente la quebrada La Carolina entre otros directos al Caribe. Especial atención a la altura de los municipios de Acandí y Capurgana (Chocó).

drográfica del Caribe

IDEAM

Actualización: 15 de septiembre de 2025 06:00 HLC



Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	Caribe - Litoral	Cuenca del río León	Crecientes súbitas del río León y sus afluentes, los ríos Carepa, Chigorodó, Apartadó, Grande y Vijagual, los cuales desembocan al Golfo de Urabá. Especial atención en los municipios de Mutatá, Chigorodó, Carepa, Apartadó y Turbo (Antioquia).
⚠	Caribe - Litoral	Cuenca del río Mulatos	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Mulatos y sus afluentes, así como otros ríos directos al Caribe. Especial atención en los municipios de Turbo y Necoclí (Antioquia).
⚠	Caribe - Litoral	Cuenca del río San Juan	Probabilidad de crecientes súbitas en el río San Juan y sus afluentes, especialmente la quebrada El Guadal. Especial atención en los municipios de San Pedro de Urabá, Arboletes y San Juan de Urabá (Antioquia).
⚠	Caribe - Litoral	Cuenca del río Canalete	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Canalete y sus afluentes, entre otros arroyos directos al Caribe. Especial atención en el municipio de Arboletes (Antioquia) y Canalete (Córdoba).

drográfica del Caribe

IDEAM

Actualización: 15 de septiembre de 2025 06:00 HLC



Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	Sinú	Cuenca alta del río Sinú	Probabilidad de incrementos súbitos en los niveles del río Sinú y sus afluentes en la parte alta.
⚠	Sinú	Cuenca media del río Sinú	Probabilidad de incrementos súbitos en la parte media del río Sinú y sus afluentes (aguas abajo del Embalse de Urrá I). Se recomienda especial atención en los centros poblados de Tierralta y Valencia (Córdoba).
⚠	Sinú	Cuenca baja del río Sinú	Niveles altos en la parte baja del río Sinú y probabilidad de crecientes súbitas en sus afluentes en la cuenca baja. Se recomienda especial atención en los municipios de Cereté, Lorica, Montería, San Anteno, San Bernardo del Viento y San Pelayo (Córdoba). **Nota:** desbordamiento del Arroyo Chékere en el municipio de Lorica, Córdoba (02/09/2025).
⚠	Caribe - Litoral	Directos al Caribe Golfo de Morrosquillo	Probabilidad de crecientes súbitas en los aportantes directos al Mar Caribe en el Golfo de Morrosquillo, especialmente en los arroyos Amansa, Guapos, El Piru y Petrona. Especial atención en los municipios de San Onofre, Tolú, Coveñas, Palmito, Toluviejo, Chalán, Colosó, Morroa y Sincelejo.

Hidrográfica del Caribe

IDEAM

Actualización: 15 de septiembre de 2025 06:00 HLC



Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	Caribe - Litoral	Arroyos Directos al Caribe	Probabilidad de formación de arroyos en los directos al Mar Caribe, especialmente en los municipios Cartagena de Indias (ciudad de Cartagena) y Santa Catalina (Bolívar), Luruaco, Piojó, Juan de Acosta, Tubará y Puerto Colombia (Atlántico). Estar atentos a los arroyos Tigre.
⚠	Caribe - Guajira	Cuenca del río Don Diego	Probabilidad de incrementos súbitos en los niveles del río Don Diego.

drográfica del Caribe

IDEAM

Actualización: 15 de septiembre de 2025 06:00 HLC



Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	Caribe - Guajira	Cuenca del río Ancho	Probabilidad de crecientes súbitas del río Ancho y otros directos al Caribe como el río Palomino. Se recomienda especial atención en el municipio de Dibulla (Guajira) y zona rural de la parte oriental del municipio de Santa Marta.
⚠	Caribe - Guajira	Cuenca del río Tapias	Probabilidad de crecientes súbitas del río Tapias y sus afluentes como el río San Francisco, se recomienda especial atención en los municipios de Dibulla y Riohacha (Guajira).
⚠	Caribe - Guajira	Cuenca del río Camarones	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Camarones y sus afluentes, se recomienda especial atención en el municipio de Riohacha (Guajira).
⚠	Caribe - Guajira	Cuenca del río Ranchería	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Ranchería y sus afluentes, como arroyo Limón y los ríos Mastevan y La Yaya entre otros, especialmente en la cuenca alta. Especial atención en los municipios de Riohacha, Distracción, Fonseca, Albania, Barrancas y Hatonuevo, población de Manaure y comunidades indígenas en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, como La Laguna, La Peña de los Indios, Ulago, Loma del Potrero, Marocazzo y Caracolí.

lrográfica del Caribe

IDEAM

Actualización: 15 de septiembre de 2025 06:00 HLC



Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	Catatumbo	Cuenca del río Algodonal	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Algodonal y sus afluentes, especialmente en las quebradas Las Liscas, El Loro y El Carbón. Se recomienda especial atención en los municipios de Convención, Ábrego, Ocaña, Teorama Y San Calixto (Norte de Santander).
⚠	Catatumbo	Cuenca del río Tarra	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Tarra y sus tributarios, como la quebrada Grande. Especial atención en los municipios de Ábrego, Hacarí y El Tarra (Norte de Santander).
⚠	Catatumbo	Río del Suroeste y directos Río del Oro	Probabilidad de creciente súbitas en las cuencas de los ríos Suroeste y río del Oro. Especial atención en el municipio El Carmen (Norte de Santander).
⚠	Catatumbo	Bajo Catatumbo	Probabilidad de creciente súbitas en la cuenca baja del río Catatumbo. Especial atención a la altura del corregimiento de La Gabarra – Tibú.

Hidrográfica del Caribe

IDEAM

Actualización: 15 de septiembre de 2025 06:00 HLC




Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
	Catatumbo	Cuencas de los ríos Nuevo Presidente, Sardinata y Tibú	Crecientes súbitas en los ríos Tibú, Sardinata, Nuevo Presidente y sus aportantes. Especial atención a la altura de los municipios de Villa Caro, Bucarasica, Lourdes, Sardinata y Tibú (Norte de Santander).
	Catatumbo	Cuenca del río Socuavó	Probabilidad de creciente súbitas en la cuenca del río Socuavo. Especial atención en el municipio de Tibú (Norte de Santander).
	Catatumbo	Cuenca del río Zulia	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Zulia y sus afluentes, especialmente para las quebradas La Ocarena, La Desplayada, Siravita y La Floresta. Especial atención en los municipios de Mutiscua, Cucutilla, Arboledas, Salazar, Gramalote, Santiago, San Cayetano, El Zulia, Cúcuta y Puerto Santander (Norte de Santander).

Hidrográfica del Pacífico

IDEAM

Actualización: 15 de septiembre de 2025 06:00 HLC

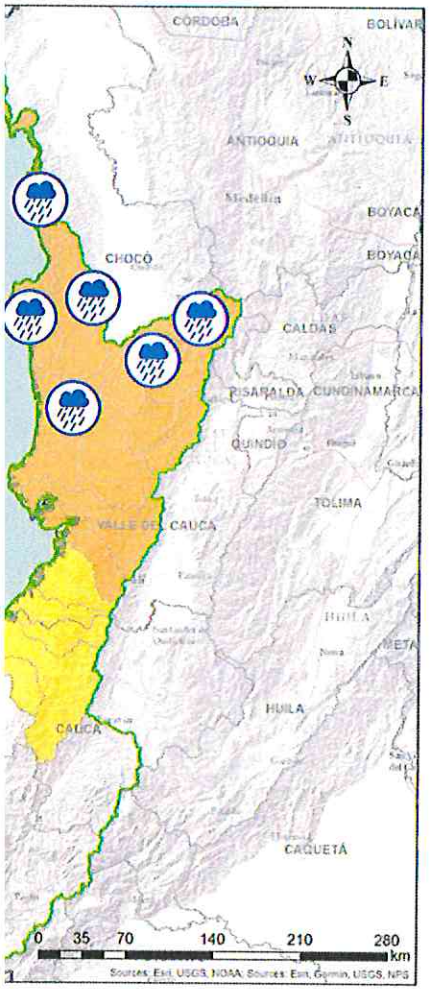

Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	Directos al Pacífico	Cuencas directas al Pacífico (Chocó)	Probabilidad de incrementos súbitos en el nivel de los ríos Valle, Jella, Chocolatal, Jurado, Piliza, Purricha, Catripe, Abaquia, y sus afluentes, entre otros directos al Océano Pacífico en el departamento de Chocó, se recomienda especial atención en los municipios de Bahía Solano y Juradó.
⚠	Baudó - Directos al Pacífico	Cuenca del río Baudó	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Baudó y sus afluentes, especialmente los ríos Dubaza Catrú Cedro, Ancosó Cuguchó Berreberre, Pepé, Misará, Torreidó, Pavasa Siguirisua y Purricha. Se recomienda especial atención en los corregimientos de Santa María, Miacorá, Divisa, Cohecho, Chachajo, Santa Rita, La Pureza, Nauca, Almendro, Bellavista y Puerto Elacio, en los municipios de Alto, Medio y Bajo Baudó.
⚠	Baudó - Directos al Pacífico	Cuenca del río Docampadó	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Docampadó, Orpúa, Ijuá, Capiro, Ordó, Sivirú y sus afluentes, entre otros directos al Océano Pacífico en el departamento de Chocó. Se recomienda especial atención en los municipios de Bajo Baudó y Litoral de San Juan (Chocó).
⚠	San Juan	Cuenca alta del río San Juan	Probabilidad de crecientes súbitas en el río San Juan Alto y sus afluentes, especialmente en los ríos Pureto y Muerto. Se recomienda especial atención en los municipios de Mistrató y Pueblo Rico (Risaralda), y Tadó y Istmina (Chocó).
⚠	San Juan	Cuenca del río Tamaná	Probabilidad de crecientes súbitas en las cuencas de los ríos Iró, Tamaná, Condoto, entre otros aportantes a la cuenca media del río San Juan. Especial atención a la altura de los municipios San José del Palmar, Rio Iró, Condoto, Novita y Medio San Juan (Chocó).

Hidrográfica del Pacífico

IDEAM

Actualización: 15 de septiembre de 2025 06:00 HLC



Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	San Juan	Cuenca del río Cajón	Probabilidad de incrementos en los niveles de las cuencas del río Cajón entre otros aportantes a la cuenca media del río San Juan. Especial atención a la altura de los municipios Nóvita y Medio San Juan.
⚠	San Juan	Cuenca del río Sipí	Probabilidad de incrementos en los niveles de la cuenca del río Sipí, especialmente en los ríos Taparal, San Agustín y Garrapatas, a la altura del municipio de Sipí (Chocó) y río Sanquinini, a la altura del municipio de Bolívar (Valle del Cauca).
⚠	San Juan	Cuenca media del río San Juan	Probabilidad de incrementos en los niveles en la parte media del río San Juan. Especial atención a la altura del municipio Medio San Juan e Istmina (Chocó).
⚠	San Juan	Cuenca del río Capoma	Probabilidad de incrementos en los niveles de la cuenca del río Capoma y otros directos al San Juan, tales como, el río Cucurrupí y la quebrada Fujadó al igual que sus aportantes.
⚠	San Juan	Cuenca del río Munguidó	Probabilidad de incrementos en los niveles de la cuenca del río Munguidó. Se recomienda especial atención en la vereda Las Delicias.
⚠	San Juan	Ríos Calima y Bajo San Juan	Probabilidad de crecientes súbitas en las cuencas de los ríos Calima y Bajo San Juan. Se recomienda especial atención a el municipio de Litoral de San Juan (Chocó) y los municipios Calima, Darién, Buenaventura y Bahía Málaga (Valle del Cauca).

Hidrográfica del Pacífico

IDEAM

Actualización: 15 de septiembre de 2025 06:00 HLC



Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
	Tapaje – Dagua – Directos	Cuenca del río Dagua	Probabilidad de creciente súbita en el río Dagua y sus afluentes, especialmente en el río Bitaco a la altura del municipio de La Cumbre (Valle del Cauca). Se recomienda especial atención en los municipios de Dagua, La Cumbre y Buenaventura (Valle del Cauca).
	Tapaje – Dagua – Directos	Cuenca del río Anchicayá	Probabilidad de creciente súbita en el río Anchicayá y sus afluentes, que drena sus aguas hacia el Océano Pacífico en el departamento del Valle del Cauca. Se recomienda especial atención en el municipio de Dagua y Buenaventura (Valle del Cauca).
	Tapaje – Dagua – Directos	Cuencas de los ríos Cajambre, Mayorquín y Raposo	Probabilidad de crecientes súbitas en los ríos Cajambre, Mayorquín, Raposo y sus afluentes, directos al Océano Pacífico en el departamento del Valle del Cauca. Se recomienda especial atención en el municipio de Buenaventura (Valle del Cauca).
	Tapaje – Dagua – Directos	Cuenca del río Naya – Yurumanguí	Probabilidad de crecientes súbitas en los ríos Naya – Yurumanguí y sus afluentes, especialmente el río San Francisco, a la altura del municipio de López de Micay – Cauca.
	Tapaje – Dagua – Directos	Cuenca del río San Juan de Micay	Probabilidad de crecientes súbitas en el río San Juan de Micay y sus afluentes, aportante directo al Océano Pacífico. Se recomienda especial atención en los municipios de Argelia, San Miguel y López de Micay (Cauca).
	Tapaje – Dagua – Directos	Cuenca del río Saija	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Saija y sus afluentes, aportante directo al Océano Pacífico.
	Patía	Cuenca del río Telembí	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Telembí y sus afluentes, especialmente el río Ispi. Se recomienda especial atención en los municipios de Roberto Payan, Barbacoas, Mallama y Tumaco (Nariño).

gráfica del Magdalena – Cauca
ta del Río Magdalena)

IDEAM

Actualización: 15 de septiembre de 2025 06:00 HLC




Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	Alto Magdalena	Cuenca del río Lagunilla	Probabilidad de crecientes súbitas en los ríos Lagunilla, Sabandija, Recio y Azufrado, afluentes del alto Magdalena como la quebrada Chocarí. Se recomienda especial atención en los municipios de Ambalema, Armero, Lérida, Líbano, Murillo, Santa Isabel, Venadillo, Villahermosa(Tolima).
⚠	Alto Magdalena	Cuenca del río Seco y otros directos al Magdalena	Probabilidad de incrementos moderados en el nivel del río Seco entre otros directos al Magdalena en este sector. Se recomienda especial atención en los municipios de Jerusalén y San Juan de Rioseco (Cundinamarca).

gráfica del Magdalena – Cauca
edia del Río Magdalena)

IDEAM

Actualización: 15 de septiembre de 2025 06:00 HLC

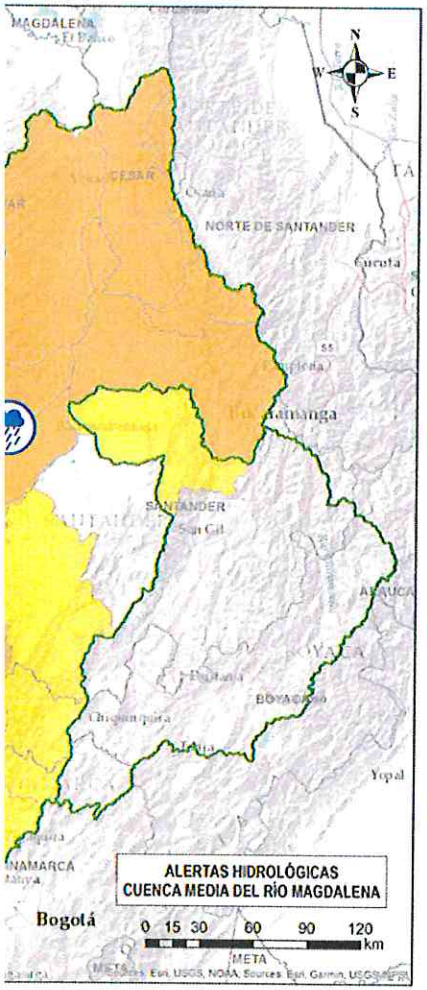


Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
	Medio Magdalena	Cuenca del río Gualí	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Gualí y sus afluentes, especialmente en el río San Juan. Especial atención en los municipios de Fresno (Tolima), Mariquita (Tolima), Pensilvania (Caldas), Casablanca (Tolima) y Samaná (Caldas).
	Medio Magdalena	Cuenca del río Guarinó	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Guarinó, especialmente en la quebrada San Antonio y el río Perrillo. Especial atención en el municipio de Manzanares (Caldas).
	Medio Magdalena	Cuenca del río La Miel (Samaná)	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río La Miel, especialmente en sus aportantes entre ellos el río Venus en el municipio de Nariño (Antioquia). Especial atención en los municipios de Argelia, Marquetalia, Nariño, Norcasia, Pensilvania, Samaná y Sonsón (Antioquia).
	Medio Magdalena	Cuenca del río Nare	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Nare y sus afluentes, especialmente en los ríos Samaná, Guatapé, Nus, Negro, Pantanillo y las quebradas Iraka (Natalia), San Roque, La Pereira, La Grande, Marinilla, El Arenal, La Mosca, Santa Gertrudis, Guayabal, La Chorrera, La Paisanita, La Aguada, La Cristalina, Bodegas, Tenería y La Reina. Se recomienda estar atentos en los municipios de Guarne, El Retiro, La Ceja, Cisneros, San German, San Roque, Caracolí, Santo Domingo, Concepción, Rionegro, Santuario, Marinilla, Cocorná, Granada, San Luis, Yolombó, Puerto Nare, San Francisco, San Carlos y San Rafael (Antioquia).
	Medio Magdalena	Cuenca del río San Bartolo	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río San Bartolo, especialmente en sus aportantes de la cuenca Media-Baja, estar atentos en los ríos Vegachi, Regla, La Cruz y El Volcán, las quebradas La Gallinera y La Malena, entre otros. Especial atención en los municipios de Yolombó, Vegachi, Maceo y Puerto Berrio (Antioquia). **Nota**: Creciente Súbita en la quebrada Malena, en la vereda Malena de Puerto Berrio, Antioquía (07/09/2025).
	Medio Magdalena	Cuenca del río Cimitarra	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Cimitarra y sus afluentes, especial atención en los municipios de Cantagallo (Bolívar), Yondó y Remedios (Antioquia).

gráfica del Magdalena – Cauca
edia del Río Magdalena)

IDEAM

Actualización: 15 de septiembre de 2025 06:00 HLC

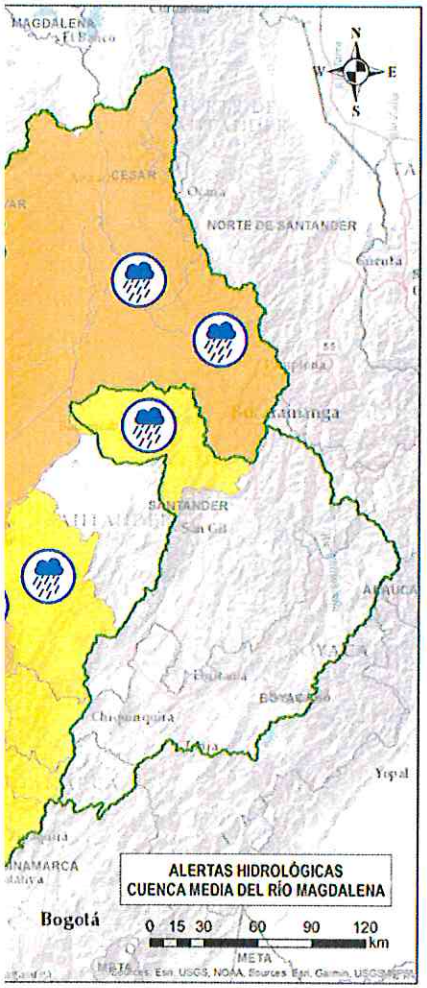


Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	Medio Magdalena	Cuenca del río Negro	Probabilidad de crecientes súbitas del río Negro y sus aportantes, se recomienda especial atención en los ríos Bunque, Contador, Guaguaqui, Las Cañas, Moras, Negro, Tobia, Villeta, y las quebradas Agua Clara, Amarilla, Furatena, Honduras, La Chorrera, La Negra, La Papaya, Las Margaritas, Reyes y Retama. Especial atención en los municipios de Caparrapí, Guaduas, La Peña, La Vega, Nimaima, Pacho, Quebradanegra, San Francisco, Sasaima, Supatá, Tobia, Útica, Villeta, Villagómez y Yacopí (Cundinamarca).
⚠	Medio Magdalena	Directos al Magdalena Medio entre ríos Negro y Carare	Probabilidad de crecientes súbitas en los directos al Medio Magdalena entre los ríos Negro y Carare, especialmente en los ríos Guaguaqui y Ermitaño, y el caño Loco. Se recomienda especial atención en el municipio de Puerto Boyacá (Boyacá).
⚠	Medio Magdalena	Cuenca del río Carare (Minero)	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Carare, especial atención a sus tributarios como el río Minero y la quebrada Guayabito. Estar atentos en los municipios de Pauna, Muzo, Otanche, Buenavista, San Pablo de Borbur, Quípama (Boyacá), así como Cimitarra y Puerto Parra (Santander).
⚠	Sogamoso	Cuenca del río Sogamoso	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Sogamoso y sus afluentes. Estar atentos a la altura de los municipios Piedecuesta, Los Santos, Girón y Zapatoca.
⚠	Medio Magdalena	Cuenca del río Lebrija	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Lebrija y sus aportantes, especialmente en las quebradas La Ruitoca, Zapamanga, Agua Blanca, Española, La Iglesia, Vega de Oro, Chirrerón, El Caraño, La Raya, La Lejía, San Alberto, El Palo y La Cascajera, y los ríos Frío, Hato, Cáchira, Río de Oro, Charta, Florida Blanca, San Pablo y El Playón. Especial atención en los municipios de Cáchira, La Esperanza (Norte de Santander), Floridablanca, Piedecuesta, Girón, Lebrija, Rionegro, Bucaramanga, Sabana de Torres y Puerto Wilches (Santander).

gráfica del Magdalena – Cauca
edia del Río Magdalena)

IDEAM

Actualización: 15 de septiembre de 2025 06:00 HLC

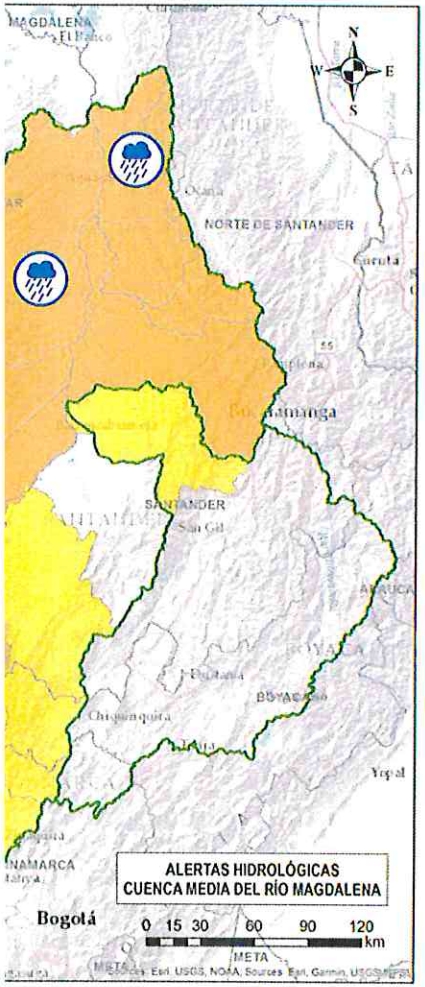


Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	Medio Magdalena	Directos al Magdalena (Brazo Morales)	Probabilidad de incremento en los niveles de los ríos directos al Magdalena en el Brazo Morales y sus aportantes, especialmente la quebrada Norosí en el municipio de Norosí (Bolívar).
⚠	Medio Magdalena	Quebrada El Carmen	Probabilidad de crecientes súbitas en la SZH de la Quebrada el Carmen, entre otros directos al Medio Magdalena, especialmente en los caños El Cristo y Pital, y quebrada Buturama. Especial atención en el municipio de Aguachica (Cesar).

ográfica del Magdalena – Cauca
lta del Río Cauca)

IDEAM

Actualización: 15 de septiembre de 2025 06:00 HLC

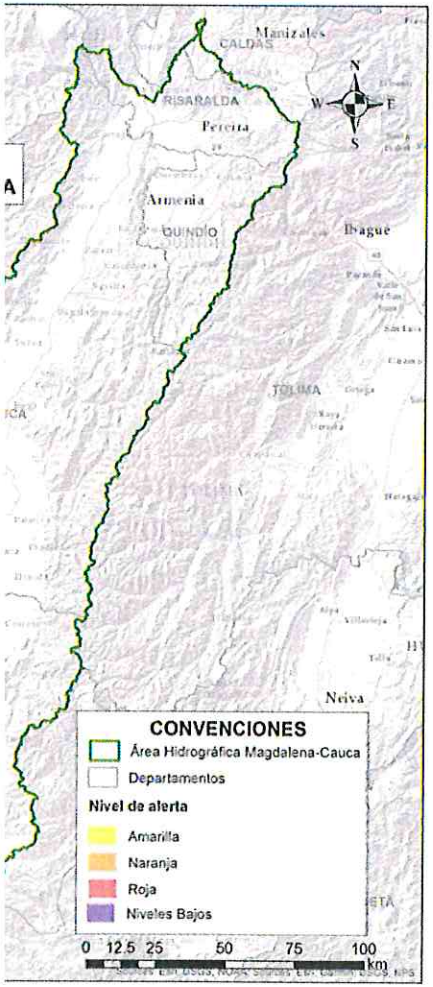


CONDICIONES NORMALES

ográfica del Magdalena – Cauca
Media del Río Cauca)

IDEAM

Actualización: 15 de septiembre de 2025 06:00 HLC

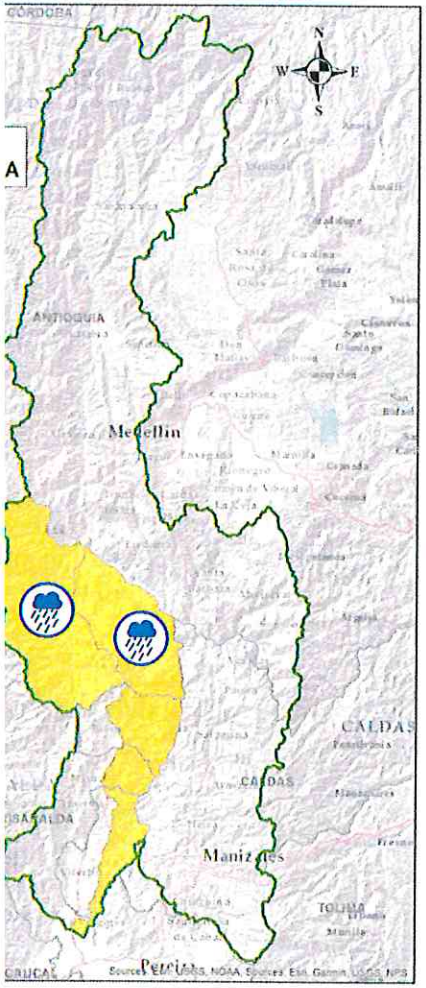


Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	Cauca	Cuenca del río Cartama y Otros Directos al Cauca	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Cartama y sus aportantes como los ríos Cartama (Antioquia) y Supía (Caldas) y las quebradas Cascabel y Pantanos. Especial atención en los municipios de Pueblorrico, Támesis y Valparaíso (Antioquia), Supía y Marmato (Caldas) y Quinchína (Risaralda).
⚠	Cauca	Cuenca del río San Juan	Probabilidad de crecientes súbitas en el río San Juan y sus afluentes, especialmente en los ríos Taparto y Bolívar, y las quebradas La Liboriana, Los Monos y La Linda, a la altura de los municipios de Andes, Betania, Salgar, Ciudad Bolívar y Pueblorrico (Antioquia).

ráfica del Magdalena – Cauca
ja del Río Cauca)

IDEAM

Actualización: 15 de septiembre de 2025 06:00 HLC

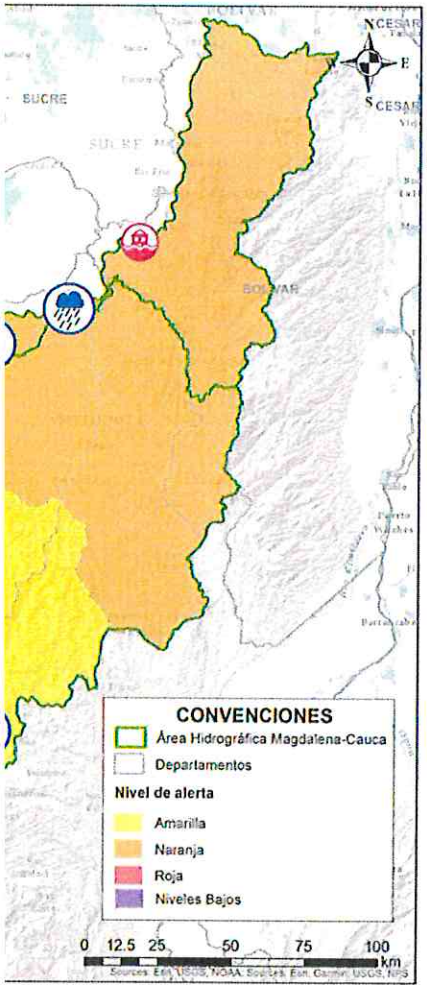


Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	Cauca	Cuenca del río Tarazá-Man	Probabilidad de crecientes súbitas en los ríos Tarazá, Man y sus afluentes, especialmente la quebrada La Pinta. Especial atención a la altura de los municipios de Tarazá, Cáceres y Caucasia (Antioquia). **Notas: 1)** Represamiento de agua lluvia en el sector Mina La Copa, poniendo en Riesgo de inundación a barrios aledaños y viviendas del municipio de Tarazá; Antioquía (05/09/2025). **2)** Se presentaron inundaciones por causa del rebose de caños urbanos en los Barrios Nuevo Milenio, Eduardo Correa y San Martín del municipio de Tarazá; Antioquía (05/09/2025).
⚠	Nechí	Cuenca Alta del río Porce (río Medellín)	Crecientes súbitas en el río Medellín y sus aportantes en el Valle de Aburra. Se recomienda estar atentos en las quebradas La Presidenta, La Muñoz, La Magdalena, La Santa Elena, La Iguana, La Madera, La Loca, La Picacha, Cafetal, El Sesteadero, Doña María, Jabalona – Aguacatala, La Honda, Olivares, AltaVista y el río Medellín, especial atención en los municipios de Barbosa, Caldas, Medellín, Girardota, Sabaneta, Itagüí, Copacabana, Bello y La Estrella (Antioquia).
⚠	Nechí	Cuenca del río Porce	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Porce y sus afluentes en los municipios de Gómez Plata, Santa Rosa de Osos, Donmatías y Amalfi (Antioquia). Especial atención en la cuenca del río Medellín y en sus aportantes en el Valle de Aburra, como las quebradas La Presidenta, La Muñoz, La Magdalena, La Santa Elena, La Iguana, La Madera, La Loca, Cafetal, El Sesteadero y Doña María.
⚠	Cauca	Directos al Cauca entre Pto. Valdivia y Nechí	Probabilidad de crecientes súbitas en los aportantes directos al río Cauca entre los municipios de Puerto Valdivia y Nechí. Especial atención a las comunidades ribereñas asentadas en la zona como Nuevo Mundo y Santillana.
⚠	Nechí	Alto Nechí	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Nechí y sus aportantes en la cuenca alta, especialmente en el río Anorí y la quebrada Caño Seco. Especial atención a los municipios de Angostura, Anorí, Campamento y Yarumal (Antioquia).

ráfica del Magdalena – Cauca
a del Río Cauca)

IDEAM

Actualización: 15 de septiembre de 2025 06:00 HLC

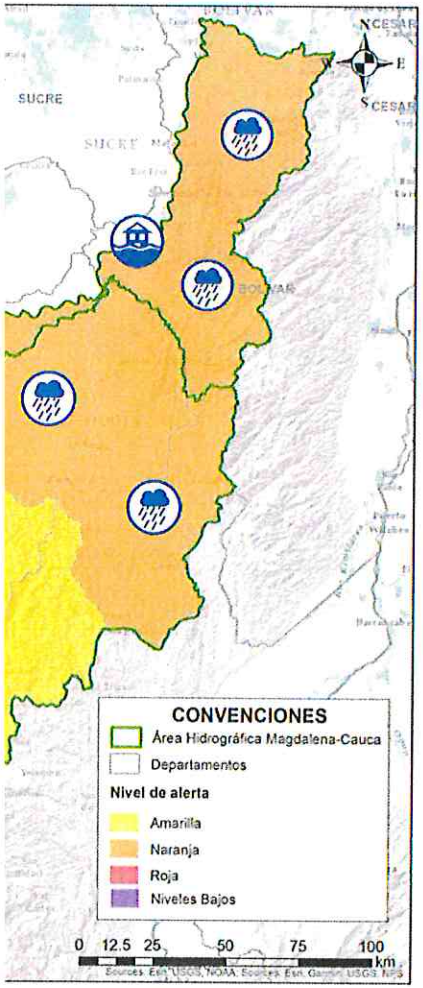


Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
	Nechí	Cuenca baja del río Nechí (mi y md) y sus aportantes	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Nechí y sus aportantes en la cuenca baja, especialmente las quebradas La Oca – Villa Mena, Villa - Puente Villa, Juan Vara y los ríos Tiguí y El Bagre. Se recomienda especial atención en los municipios de Zaragoza, Caucasia, El Bagre y Nechí (Antioquia).
	Cauca	Directos Bajo Cauca – Magdalena. Ciénaga La Raya entre Río Nechí y Brazo de Loba	Probabilidad de crecientes súbitas en los aportantes directos al Bajo Cauca – Ciénaga La Raya entre río Nechí y Brazo de Loba, con especial atención en las quebradas San Mateo, Claras, Montecristo, Bocachica y Manzanares; y los ríos Ariza y Caribona en el municipio de Montecristo (Bolívar).
	Cauca	Bajo río Cauca	**Alerta puntual:** Afectaciones por rompimiento del dique marginal del río Cauca en el sector Caregato a la altura de San Jacinto del Cauca (Bolívar). Se recomienda especial atención en La Región de La Mojana por transvase del caudal del río Cauca (06/05/2024).

ográfica del Magdalena – Cauca
aja del Río Magdalena)

IDEAM

Actualización: 15 de septiembre de 2025 06:00 HLC

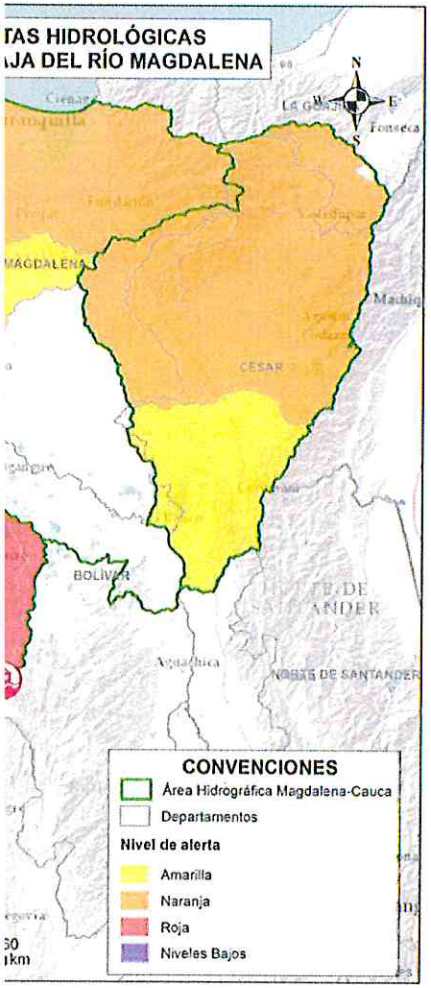


Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
	Bajo Magdalena – Cauca – San Jorge	Cuenca alta del río San Jorge	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca alta del río San Jorge, se recomienda especial atención en sus afluentes como las quebradas La Manuela y Morrojo, y los ríos San Pedro y Uré, así como en los municipios de Puerto Libertador y Montelíbano (Córdoba).
	Bajo Magdalena – Cauca – San Jorge	Bajo San Jorge – La Mojana	Niveles altos del río San Jorge en el tramo Jegua - San Antonio y los sistemas de caños y ciénagas asociados. Adicionalmente, persisten las áreas inundadas en los municipios de San Jacinto del Cauca, Caimito, San Benito Abad, Ayapel, Guaranda, San Marcos y Sucre, asociadas al ingreso de agua del río Cauca a través del boquete en Caregato. **Nota: 1)** Se reportó el rompimiento del río San Jorge a la altura de las haciendas La Palmira y Monte Flor en el municipio de San Marcos (Sucre) (12/05/2025). **2)** Inundación en los corregimientos de Puerto Franco y San José Rivera del municipio de Galeras, Cesar (04/07/2025). **3)** Se reportan afectaciones en zona urbana y rural del municipio de Sahagún (Cordoba) por desbordamiento de diferentes canales (16/08/2025).

...gráfica del Magdalena – Cauca ...aja del Río Magdalena)

IDEAM

Actualización: 15 de septiembre de 2025 06:00 HLC

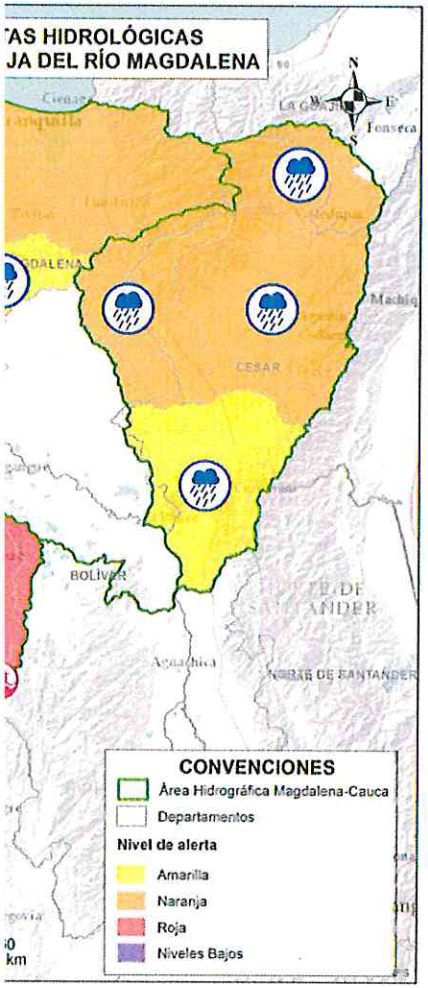


Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	Cesar	Cuenca alta del río Cesar	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca alta del río Cesar y sus afluentes. Se recomienda prestar especial atención a las riberas de los ríos Guatapurí y Badillo, en el municipio de Valledupar (Cesar), especialmente en sectores como los corregimientos de Chemesquemena y Vega Arriba. Igualmente, se recomienda vigilancia en la quebrada La Malena, a la altura del corregimiento de Patillal (Valledupar - Cesar). También se sugiere estar atentos en los municipios de San Juan del Cesar, El Molino y Villanueva (La Guajira).
⚠	Cesar	Cuenca del río Ariguaní	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Ariguaní y sus afluentes, especialmente para el río Ariguanicito. Se recomienda especial atención en los municipios de Pueblo Bello, El Copey, Bosconia (Cesar).
⚠	Cesar	Cuenca media del río Cesar	Probabilidad de crecientes en la cuenca media del río Cesar, especial atención en los ríos Sororia, Maracas, Santo Tomás y Tucuy, estos últimos en la Serranía del Perijá. Especial atención en los municipios de Valledupar, Pueblo Bello, Agustín Codazzi, La Paz, Becerril y La Jagua de Ibirico (Cesar).
⚠	Cesar	Cuenca Baja del río Cesar	Probabilidad de crecientes súbitas en ríos afluentes de la cuenca baja del río Cesar. Especial atención a la altura del municipio de Chimichagua y en el corregimiento Saloa (Cesar).
⚠	Bajo Magdalena	Directos al bajo Magdalena entre el Plato y Calamar	Probabilidad de incrementos súbitos en los niveles de los ríos directos al bajo Magdalena entre los municipios de Tenerife, Plato (Magdalena) y Calamar (Bolívar). Se recomienda especial atención en los centros poblados de El Carmen del Bolívar, Concordia, Real del Obispo, Pedraza (Magdalena), El Guamo y San Juan Nepomuceno. (Bolívar)

gráfica del Magdalena – Cauca
aja del Río Magdalena)

IDEAM

Actualización: 15 de septiembre de 2025 06:00 HLC

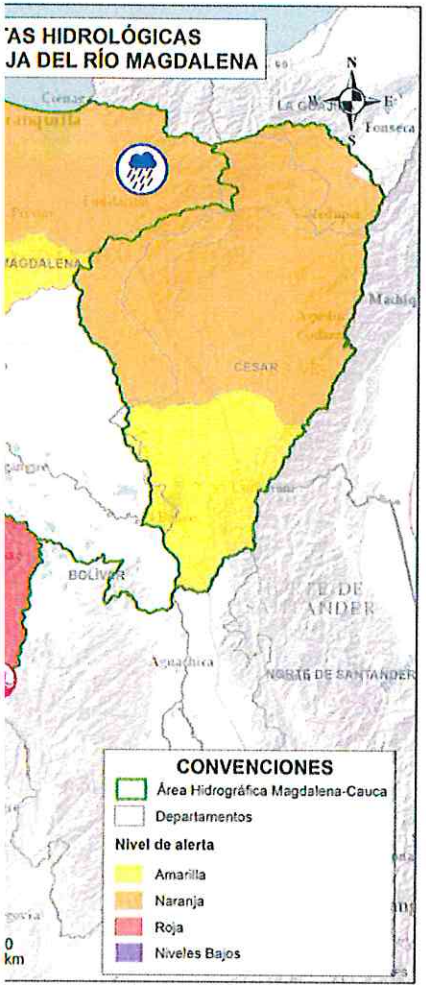


Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
	Bajo Magdalena	Ciénaga Grande de Santa Marta	Probabilidad de crecientes súbitas en los ríos que descienden de la Sierra Nevada de Santa Marta, tales como los ríos Sevilla, Tucurinca, Frio, Orihueca, Aracataca, Fundación y sus afluentes (en la parte occidente de la Sierra Nevada de Santa Marta). Se recomienda especial atención en los municipios de Ciénaga, Zona Bananera, Aracataca, Fundación y El Reten (Magdalena).
	Bajo Magdalena	Directos al Magdalena entre Calamar y desembocadura al mar Caribe	Probabilidad de incrementos de niveles en los directos al Magdalena entre Calamar y desembocadura al mar Caribe. Especial atención a los centros poblados de Suán y Campo de la Cruz, Cerro de San Antonio, El Piñón, Remolino y Sitio Nuevo. No se descartan posibles formaciones de arroyos en los municipios de Barranquilla, Soledad y Malambo (Atlántico).
	Bajo Magdalena	Ciénaga Mallorquín	Probabilidad de formación de arroyos en la ciudad de Barranquilla y Soledad (Atlántico). De igual forma, se recomienda estar atentos a los niveles de los arroyos aportantes a la Ciénaga de Mallorquín.

570

rográfica del Orinoco

IDEAM

Actualización: 15 de septiembre de 2025 06:00 HLC

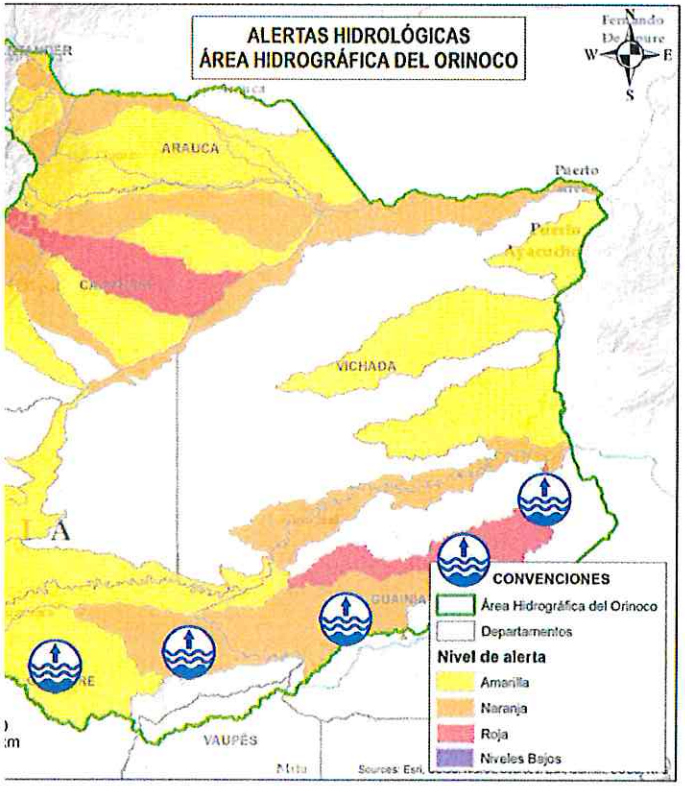


Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
	Inírida	Cuenca alta del río Inírida	Niveles altos en la parte alta del río Inírida, se recomienda especial atención en los municipios de San José del Guaviare, El Retorno y Miraflores (Guaviare).
	Inírida	Cuenca media del río Inírida	Niveles altos en la parte media del río Inírida, se recomienda especial atención en zonas ribereñas de los municipios de San José del Guaviare, El Retorno y Miraflores (Guaviare), Mapiripana, Morichal y Inírida (Guainía).
	Inírida	Cuenca baja del río Inírida	Niveles altos en la parte baja del río Inírida a la altura del municipio de Inírida (Guainía). Especial atención en zonas ribereñas de dicho municipio.

rográfica del Orinoco

IDEAM

Actualización: 15 de septiembre de 2025 06:00 HLC

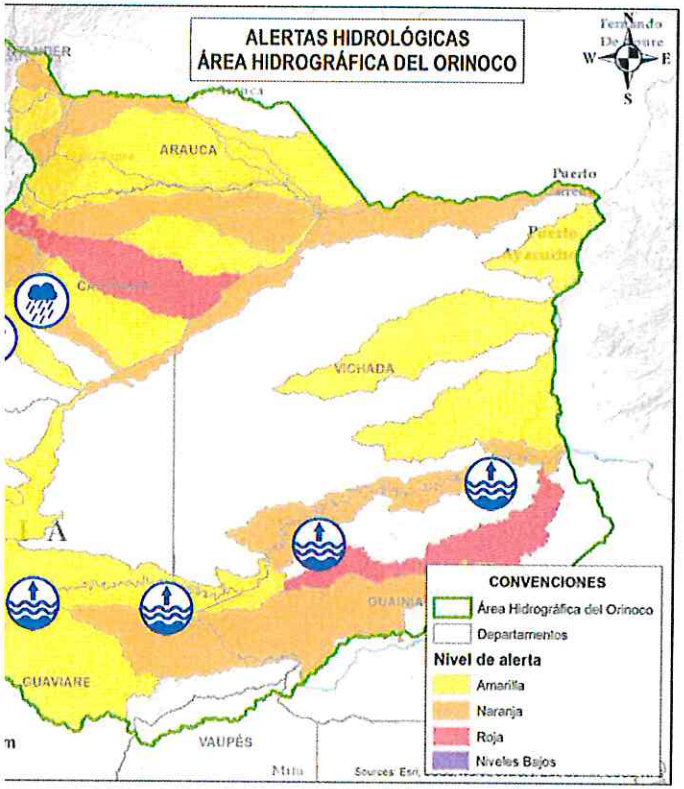


Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	Guaviare	Cuenca del río Ariari	Niveles altos y probabilidad de crecientes súbitas en el río Ariari y sus aportantes, principalmente en los caños Tapare, Irique, Gualas, Aguas Claras y Buenos Aires, y los ríos Guape, Viejo, Cubiullera, Urichare, Aguas Claras. Especial atención en los municipios de Lejanías, Cubarral, Puerto Rico, Fuente de Oro, El Dorado, Granda, Guamal, El Castillo, Puerto Lleras, San Juan de Arama, Vista Hermosa y Puerto Concordia (Meta).
⚠	Guaviare	Cuenca media del río Guaviare	Niveles altos en la cuenca media del río Guaviare. Se recomienda especial atención en los municipios de Mapiripán (Meta), San José del Guaviare (Guaviare) y Cumaribo (Vichada).
⚠	Guaviare	Cuenca baja del río Guaviare	Niveles altos en la parte baja del río Guaviare, se recomienda especial atención en los municipios de Cumaribo (Vichada), Mapiripana, Barranco Mina y Inírida (Guainía). **Nota:** Se reportó desbordamiento del río Guaviare a la altura de Puerto Bagre, Resguardo Siare Barranco Lindo, Vereda Titanio en el municipio de Cumaribo, Vichada (24/06/2025).
⚠	Meta	Cuencas de los ríos Metica, Guamal y Humadea	Probabilidad de crecientes súbitas en las cuencas de los ríos Metica, Guamal y Humadea y sus afluentes, aportantes a la cuenca alta del río Meta. Se recomienda prestar atención a los municipios de Castilla la Nueva, Guamal y Acacías del departamento de Meta.
⚠	Meta	Cuenca del río Guatiquía	Probabilidad de creciente súbita en el río Guatiquía y sus afluentes, especialmente los caños Maizaro, Grande, las quebradas Salina y La Cajones, y el río Ocoa. Se recomienda especial atención a la altura de San Juanito, Restrepo, Villavicencio y el municipio El Calvario (Meta). **Nota:** Se registra creciente súbita del rio Caney a la altura de la vereda Aguallanos del municipio de Restrepo, Meta (10/09/2025).

rográfica del Orinoco

IDEAM

Actualización: 15 de septiembre de 2025 06:00 HLC

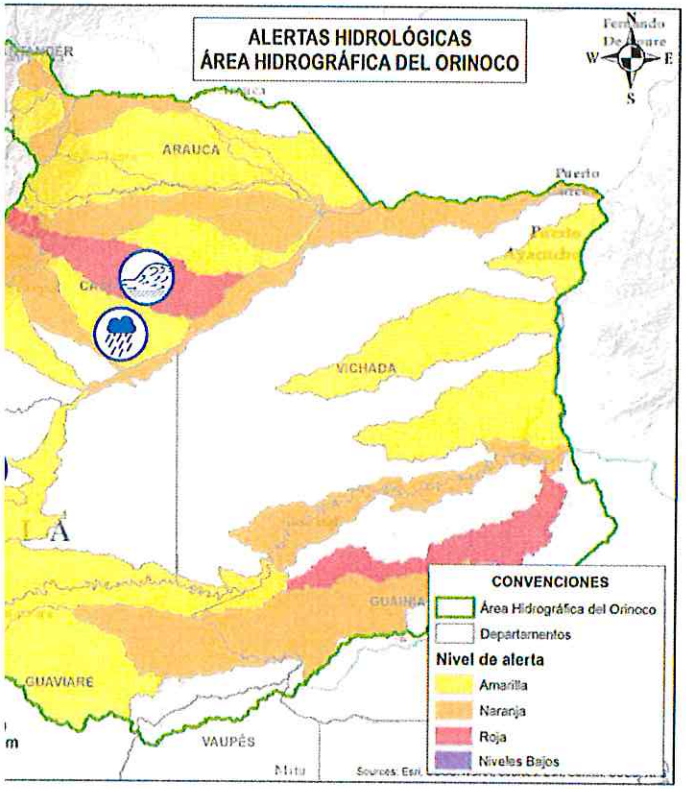


Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
	Meta	Cuenca del río Manacacías	Niveles altos del río Manacacías, aportante a la cuenca alta del río Meta. Especial atención en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
	Meta	Cuenca del caño Cumaral	Probabilidad de incrementos súbitos en las cuencas de los ríos caño Cumaral y sus afluentes, especial atención en el municipio de San Martín (Meta).
	Meta	Cuenca del río Cusiana	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Cusiana y sus tributarios, especialmente el río Unete y el río Charte. Se recomienda especial atención en los municipios de Pajarito y Aquitania (Boyacá), Tauramena, Recetor, Aguazul y Maní (Casanare).
	Meta	Cuenca del río Cravo Sur	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Cravo Sur y sus afluentes. Especial atención en los municipios de Labranzagrande (Boyacá), Yopal, Nunchía y Orocué (Casanare).
	Meta	Caño Guanápalo	Probabilidad de crecientes súbitas en el caño Guanápalo. Especial atención a la altura de los municipios de Nunchía, San Luis de Palenque y Orocué (Casanare).
	Meta	Cuenca del río Pauto	Crecientes súbitas en el río Pauto y sus aportantes, como las quebradas Cañaverales y El Oso, y los ríos Curama y Pore. Igual condición, se espera en el río Guachiría y sus aportantes. Especial atención en los municipios de Chita, Pisba, Socotá (Boyacá), Támara, Pore, San Luis de Palenque y Trinidad (Casanare). **Nota: 1)** Se reportó desbordamiento de los ríos Pauto y Pore en las veredas El Garzón, La Plata, Brisas del Pauto y la Sequí parte baja en el municipio de Pore (Casanare) (08/09/2025). **2)** Se reporta desbordamiento de los ríos Curama y Pauto, en los municipios de Pore, San Luis de Palenque y Trinidad - Casanare (12/09/2025).

rográfica del Orinoco

IDEAM

Actualización: 15 de septiembre de 2025 06:00 HLC

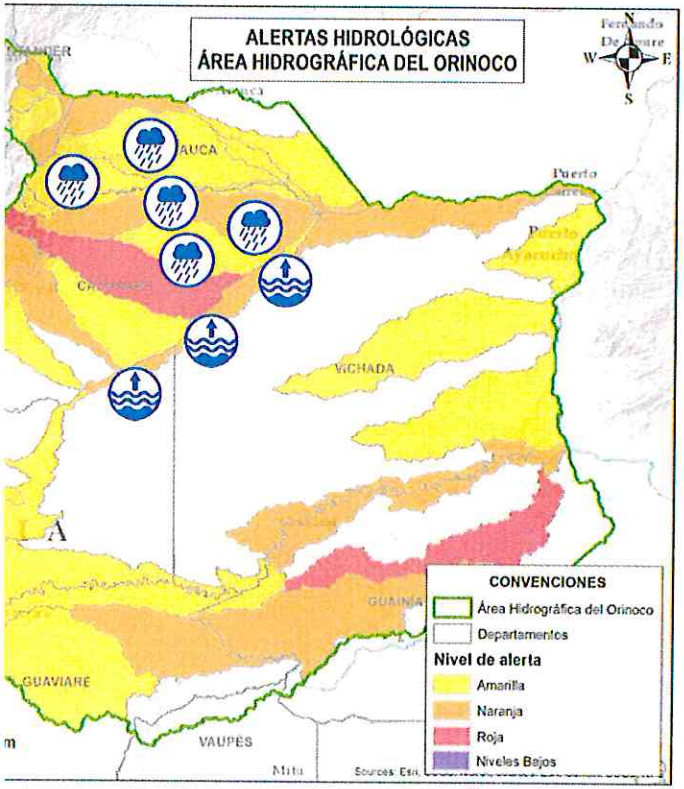


Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	Meta	Directos al río Meta entre ríos Cusiana y Casanare	Niveles altos en la parte media del río Meta, entre los municipios de Orocué hasta Paz de Ariporo (Casanare). Se recomienda especial atención en los municipios de Santa Rosalía, Orocué, Paz de Ariporo (Casanare) y La Primavera (Vichada).
⚠	Meta	Directos al río Meta entre ríos Pauto y Agua Clara (mi)	Probabilidad de crecientes súbitas en los ríos directos al río Meta entre ríos Pauto y Agua Clara (mi).
⚠	Casanare	Caño Agua Clara	Probabilidad de crecientes súbitas en el caño Agua Clara y sus afluentes.
⚠	Casanare	Cuenca del río Ariporo	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Ariporo y sus aportantes, como el río Muese y caño Barrosa. Especial atención en los municipios de Paz de Ariporo y Hato Corozal.
⚠	Casanare	Cuenca del río Casanare	Probabilidad de crecientes súbitas en la parte alta del río Casanare y sus afluentes, especialmente las quebradas Las Guamas y Sacamita. Especial atención en los municipios de Chita (Boyacá), Hato Corozal, La Salina, Sácama (Casanare) y Tame (Arauca).
⚠	Casanare	Cuenca del río Cravo Norte	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Cravo Norte y sus afluentes como el río Ele, en sectores del piedemonte a la altura del municipio de los municipios Fortul, Tame y Arauquita (Arauca).

rográfica del Orinoco

IDEAM

Actualización: 15 de septiembre de 2025 06:00 HLC

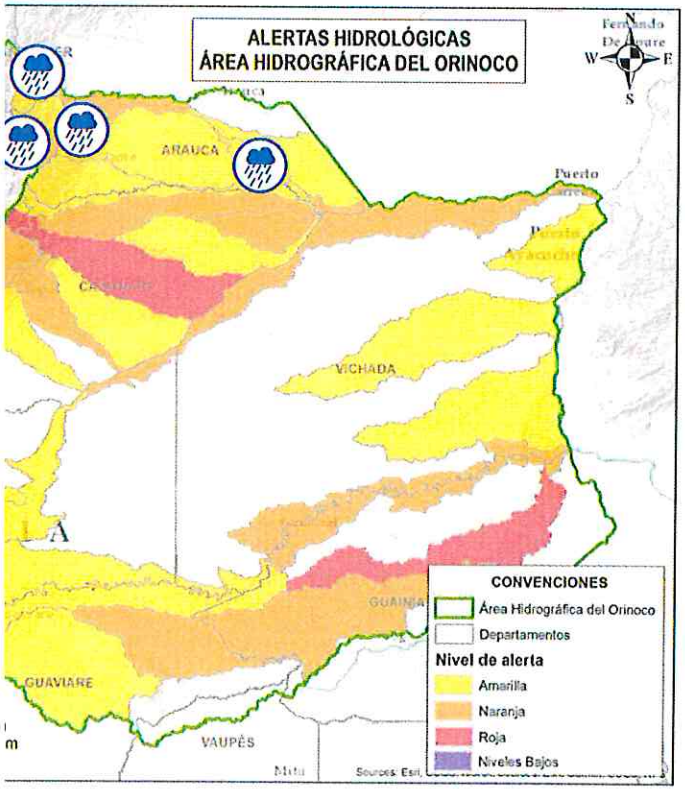


Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	Arauca	Cuenca del río Alto Apure	Probabilidad de crecientes súbitas en aportantes de la cuenca alta del río Apure.
⚠	Arauca	Cuenca del río Margua	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Margua. Especial atención en el municipio de Toledo (Norte de Santander).
⚠	Arauca	Río Cobugón – Río Covaría	Probabilidad de crecientes súbitas en los ríos Cobugón, Covaría y sus afluentes. Especial atención en el municipio de Cubará (Boyacá).
⚠	Arauca	Cuenca del río Bojabá	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Bojabá y sus afluentes. Se recomienda especial atención en los municipios de Cubará (Boyacá) y Saravena (Arauca).
⚠	Arauca	Cuenca del río Banadia y otros directos al Arauca	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Arauca a la altura del municipio de Arauquita (Arauca) y sus afluentes como son Cusay o Ele y caño Caranal; así mismo, probabilidad de incrementos súbitos de sus aportantes, tales como, el río Banadía. Se recomienda especial atención en los municipios de Arauquita, Saravena, Fortul y el centro poblado de Puerto Nariño del municipio de Saravena, como a las demás poblaciones ribereñas al río Arauca.
⚠	Orinoco Directos	Caño Samuco	Probabilidad de incrementos moderados en el nivel del Caño Samuco en Arauca.
⚠	Orinoco Directos	Cuenca del río Cinaruco	Probabilidad de incrementos moderados en el nivel del río Cinaruco y sus afluentes.

rográfica del Orinoco

IDEAM

Actualización: 15 de septiembre de 2025 06:00 HLC

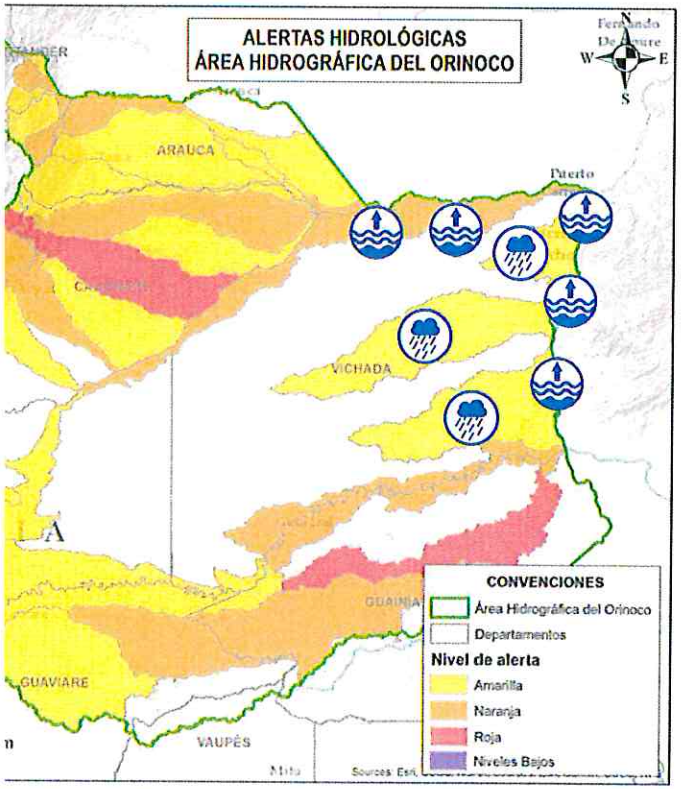


Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	Meta	Directos Bajo Meta entre los ríos Casanare y Orinoco	Niveles altos del río Meta en su parte baja entre los ríos Casanare y Orinoco a la altura del municipio de Puerto Carreño (Vichada).
⚠	Orinoco Directos	Caño Matavén y Otros Directos al Orinoco (mi)	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Matavén y sus afluentes. Especial atención en el Resguardo Indígena unificado de la selva de Matavén, en el municipio de Cumaribo (Vichada).
⚠	Orinoco Directos	Río Tuparro y Otros Directos al Orinoco (mi)	Probabilidad de crecientes súbitas en el río El Tuparro y sus afluentes. Especial atención en el Resguardo Indígena Santa Teresita del Tuparro en el municipio de Cumaribo, Vichada. **Notas: 1)** Se reportan inundaciones en el sector Caño El Rinconcito Resguardo indígena Santa Teresita y Cumaribo - Vichada (30/06/2025). **2)** Se reportan afectaciones por inundaciones en la cabecera municipal y zona rural del municipio de Cumaribo – Vichada y se decreta calamidad pública No. 089 del 30 de junio de 2025 por 6 meses (22/06/2025).
⚠	Orinoco Directos	Directos Orinoco entre ríos Tomo y Meta	Probabilidad de incremento en los niveles de los ríos Caño Mesetas, Caño Dagua, entre otros aportantes directos al río Orinoco entre los ríos Tomo y Vita; y sus afluentes. Especial atención en el corregimiento de Casuarito en el municipio de Puerto Carreño (Vichada).
⚠	Orinoco Directos	Río Orinoco	Niveles altos del río Orinoco desde la desembocadura del río Guaviare y su recorrido por los municipios de Cumaribo y Puerto Carreño (Vichada). **Notas**: **1)** Se reportó desbordamiento del río Orinoco en la Inspección de Puerto Nariño, municipio de Cumaribo (Vichada) (24/06/2025). **2)** Se reportaron inundaciones en Barrio Santa Teresita, Inspección Aceitico, Verturosa, Esmeralda, Puerto Murillo, Garcitas, Casuarito en el municipio de Puerto Carreño (Vichada), decretan calamidad pública No. 074 del 25 de junio de 2025 por 6 meses (22/06/2025).

Hidrográfica del Amazonas

IDEAM

Actualización: 15 de septiembre de 2025 06:00 HLC

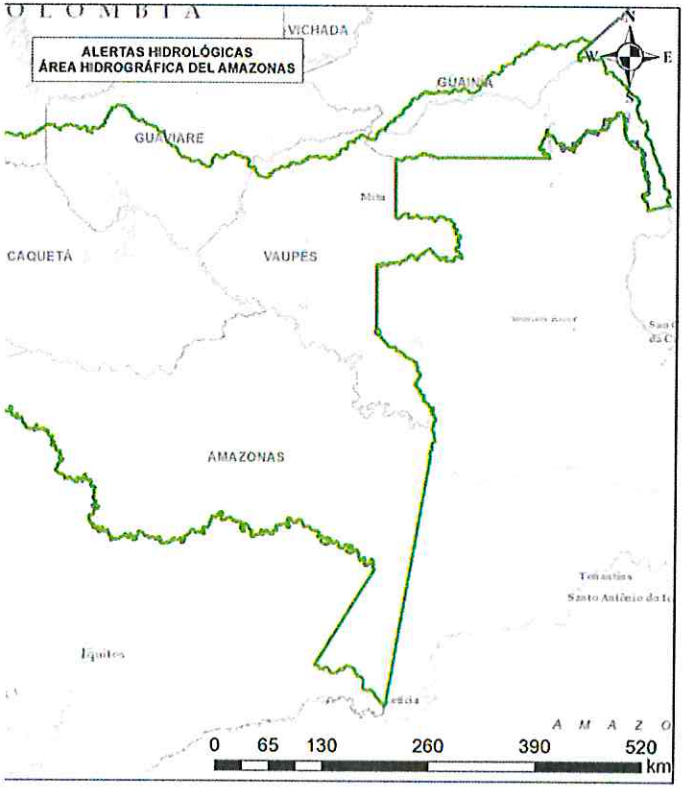

CONDICIONES NORMALES

ico de la Amenaza por
mientos de Tierra

IDEAM

RESUMEN

precipitaciones de los últimos días, se presenta saturación de los suelos, que dan origen a diferentes niveles de probabilidad encia de deslizamientos de tierra, en zonas de ladera y alta


: Para algunos municipios de los departamentosAntioquia, ır, Boyacá, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Norte de Santander, lle del Cauca y Huila.

erada: Para algunos municipios de los departamentos de ı, Antioquia, Arauca, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Cesar, ba, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, 'alle del Cauca.

: Para algunos municipios de las regiones Andina, Orinoquía, ɔnía y Pacífico.

o específico de este informe para cada región, se encuentra etallada de los niveles de alerta en cada municipio.


Mapa de Pronóstico de la Amenaza por Deslizamientos de Tierra

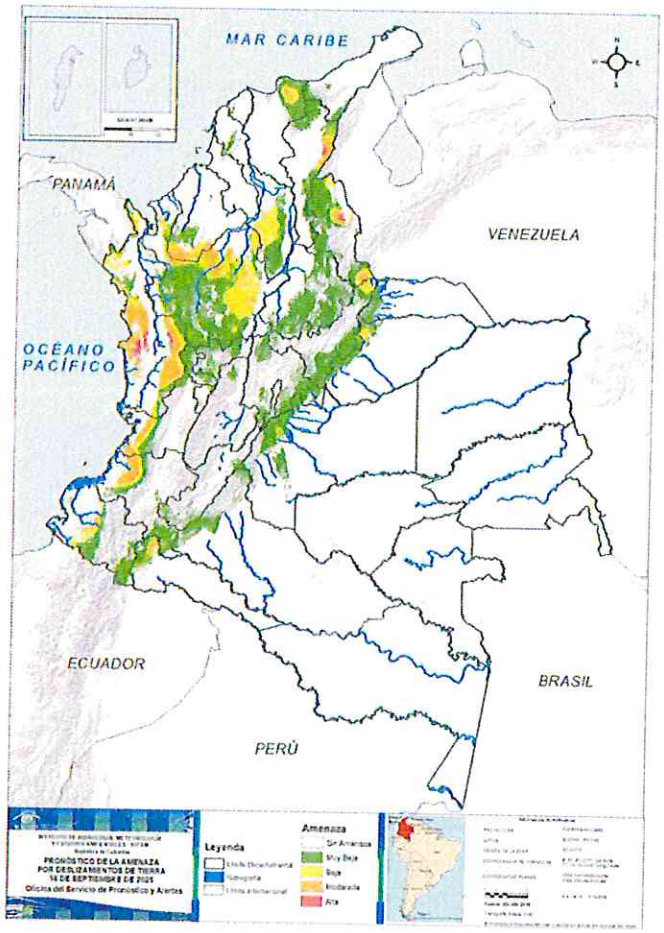

ico de la Amenaza por
nientos de Tierra

IDEAM

Gráfica de seguimiento de alertas por pronóstico de la amenaza de deslizamientos de tierra para Colombia durante los últimos 30 días

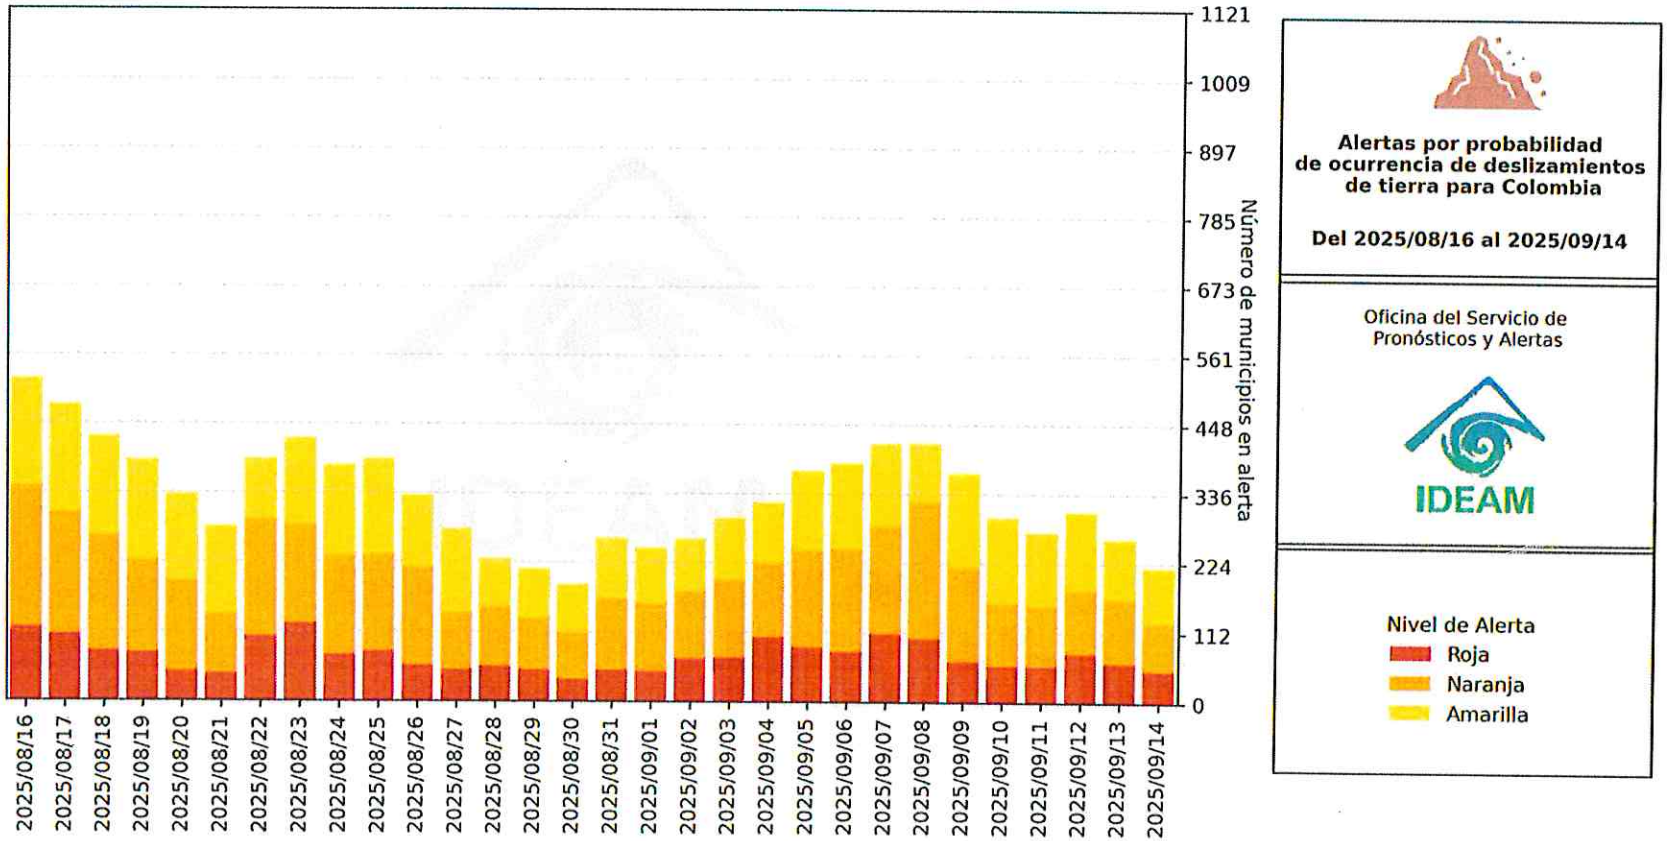


esenta la fecha de evaluación de las alertas, el eje vertical izquierdo el porcentaje de municipios* en alerta y el eje vertical derecho el número total de éstos; categorizando las alertas en una barra
vel de amenaza: alta (rojo), moderada (naranja) y baja (amarillo).
registrados por el DANE representado el 100% (1121 municipios) a la fecha.


ico de la Amenaza por nientos de Tierra

IDEAM

14 de septiembre de 2025 | 18:00 HLC

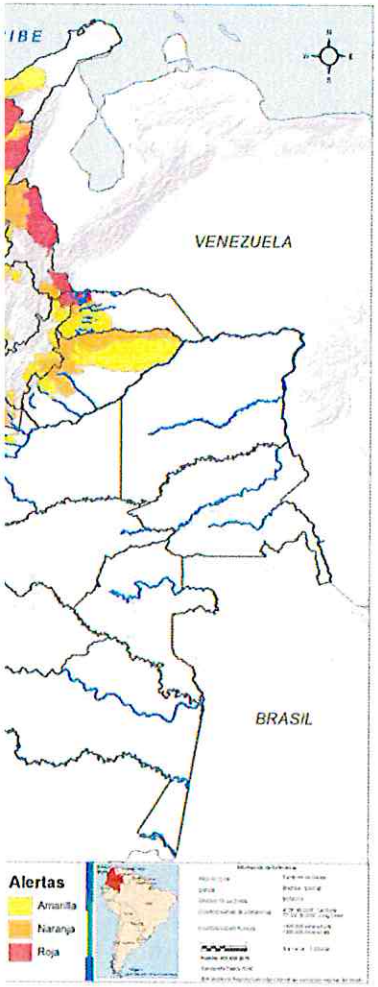

Municipios por regiones:

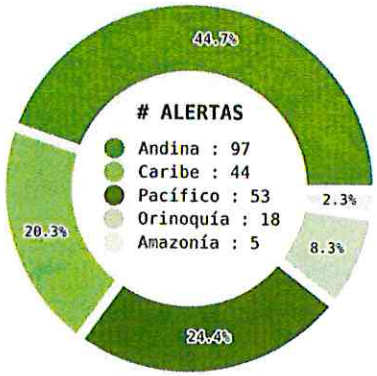

TOTAL MUNICIPIOS : 217
FECHA : 2025-09-14

DEPARTAMENTO	#
CHOCÓ	18
ANTIOQUIA	10
CESAR	5
NORTE DE SANTANDER	5
BOLÍVAR	2
CAUCA	2
CÓRDOBA	2
PUTUMAYO	2
VALLE DEL CAUCA	2
ARAUCA	1
BOYACÁ	1
HUILA	1
TOTAL	51


DEPARTAMENTO	#
ANTIOQUIA	28
CHOCÓ	8
NORTE DE SANTANDER	7
BOLÍVAR	6
CASANARE	5
NARIÑO	5
BOYACÁ	2
CAUCA	2
CESAR	2
CÓRDOBA	2
CUNDINAMARCA	2
MAGDALENA	2
META	2
ARAUCA	1
PUTUMAYO	1
VALLE DEL CAUCA	1
SANTANDER	1
TOTAL	77

DEPARTAMENTO	#
ANTIOQUIA	21
BOLÍVAR	13
BOYACÁ	9
NARIÑO	9
SANTANDER	8
META	5
CESAR	4
CAUCA	3
CASANARE	3
LA GUAJIRA	3
PUTUMAYO	2
VALLE DEL CAUCA	2
ARAUCA	1
CHOCÓ	1
CÓRDOBA	1
NORTE DE SANTANDER	1
MAGDALENA	1
RISARALDA	1
SUCRE	1
TOTAL	89

ico de la Amenaza por
nientos de Tierra

REGIÓN CARIBE

IDEAM

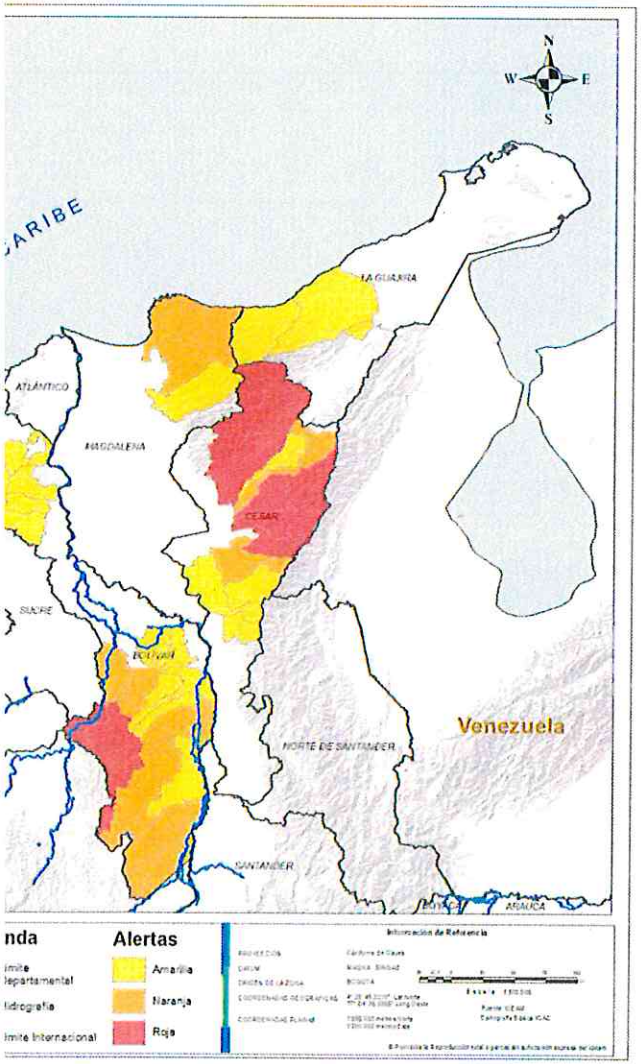


ALERTA	SITIOS PARA LOS CUALES SE GENERA LA ALERTA
	BOLÍVAR : Montecristo, San Jacinto Del Cauca. CESAR : Agustín Codazzi, Becerril, La Jagua De Ibirico, Pueblo Bello, Valledupar. CÓRDOBA : San José De Uré, Tierralta.
	BOLÍVAR : Achí, Cantagallo, Morales, San Pablo, Santa Rosa Del Sur, Tiquisio. CESAR : Chiriguaná, La Paz. CÓRDOBA : Montelíbano, Puerto Libertador. MAGDALENA : Ciénaga, Santa Marta.
	BOLÍVAR : Altos Del Rosario, Arenal, Barranco De Loba, Calamar, El Carmen De Bolívar, Mahates, María La Baja, Norosí, Río Viejo, San Jacinto, San Juan Nepomuceno, San Martín De Loba, Simití. CESAR : Chimichagua, Curumaní, Pailitas, San Diego. CÓRDOBA : Valencia. LA GUAJIRA : Dibulla, Hatonuevo, Riohacha. MAGDALENA : Aracataca. SUCRE : San Onofre.

ico de la Amenaza por
nientos de Tierra

REGIÓN ANDINA

IDEAM

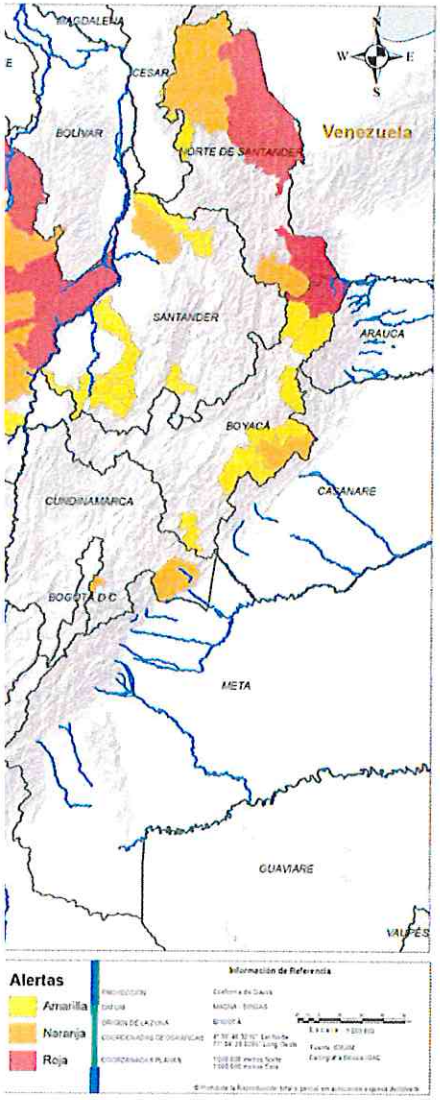


ALERTA	SITIOS PARA LOS CUALES SE GENERA LA ALERTA
	ANTIOQUIA : Briceño, El Bagre, Nechí, Puerto Berrío, Remedios, San Rafael, Tarazá, Valdivia, Yolombó, Yondó. BOYACÁ : Cubará. HUILA : Pitalito. NORTE DE SANTANDER : El Zulia, San José De Cúcuta, Sardinata, Tibú, Toledo.
	ANTIOQUIA : Alejandría, Amalfi, Anorí, Apartadó, Campamento, Caracolí, Carolina, Cisneros, Cocorná, Cáceres, Gómez Plata, Ituango, Maceo, Mutatá, Puerto Nare, San Carlos, San Francisco, San Luis, San Roque, Santo Domingo, Segovia, Turbo, Urrao, Vegachí, Vigía Del Fuerte, Yalí, Yarumal, Zaragoza. BOYACÁ : Labranzagrande, Paya. CUNDINAMARCA : Chipaque, Medina. NORTE DE SANTANDER : Chitagá, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, San Calixto, Teorama. SANTANDER : Sabana De Torres.
	ANTIOQUIA : Barbosa, Carepa, Chigorodó, Concepción, Dabeiba, Donmatías, El Carmen De Viboral, Girardota, Granada, Guadalupe, Guarne, Guatapé, Necoclí, Peñol, San Andrés De Cuerquía, San Pedro De Los Milagros, San Pedro De Urabá, San Vicente Ferrer, Santa Rosa De Osos, Sonsón, Toledo. BOYACÁ : Aquitania, Chiscas, Chita, Güicán De La Sierra, Macanal, Mongua, Pajarito, Pisba, Santa María. NORTE DE SANTANDER : Ocaña. RISARALDA : Pueblo Rico. SANTANDER : Bolívar, El Peñón, Guadalupe, Landázuri, Puerto Parra, Rionegro, Suaita, Sucre.

ico de la Amenaza por
mientos de Tierra

REGIÓN PACÍFICO

IDEAM

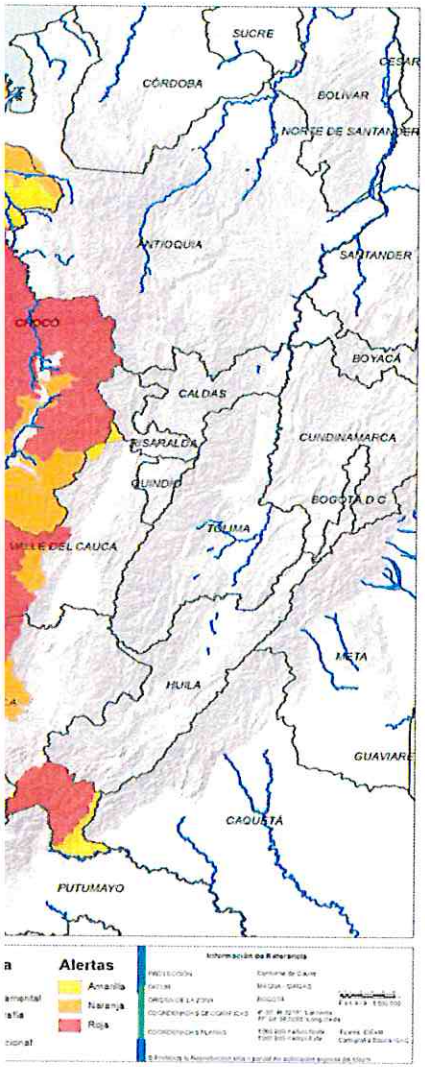


ALERTA	SITIOS PARA LOS CUALES SE GENERA LA ALERTA
	CAUCA : López De Micay, Santa Rosa. CHOCÓ : Alto Baudó, Bagadó, Bahía Solano, Bajo Baudó, Bojayá, Condoto, El Cantón Del San Pablo, El Carmen De Atrato, Lloró, Medio Atrato, Medio Baudó, Nuquí, Nóvita, Quibdó, Río Iró, Río Quito, San José Del Palmar, Tadó. VALLE DEL CAUCA : Buenaventura, Calima.
	CAUCA : El Tambo, Timbiquí. CHOCÓ : Acandí, Cértegui, El Litoral Del San Juan, Istmina, Juradó, Riosucio, Sipí, Unguía. NARIÑO : Barbacoas, El Charco, Los Andes, Magüí, San Andrés De Tumaco. VALLE DEL CAUCA : Dagua.
	CAUCA : Argelia, Guapi, Piamonte. CHOCÓ : Carmen Del Darién. NARIÑO : Córdoba, Funes, Ipiales, La Llanada, Pasto, Potosí, Puerres, Ricaurte, Santa Bárbara. VALLE DEL CAUCA : El Cairo, El Águila.

ico de la Amenaza por
nientos de Tierra

REGIÓN ORINOQUÍA

IDEAM

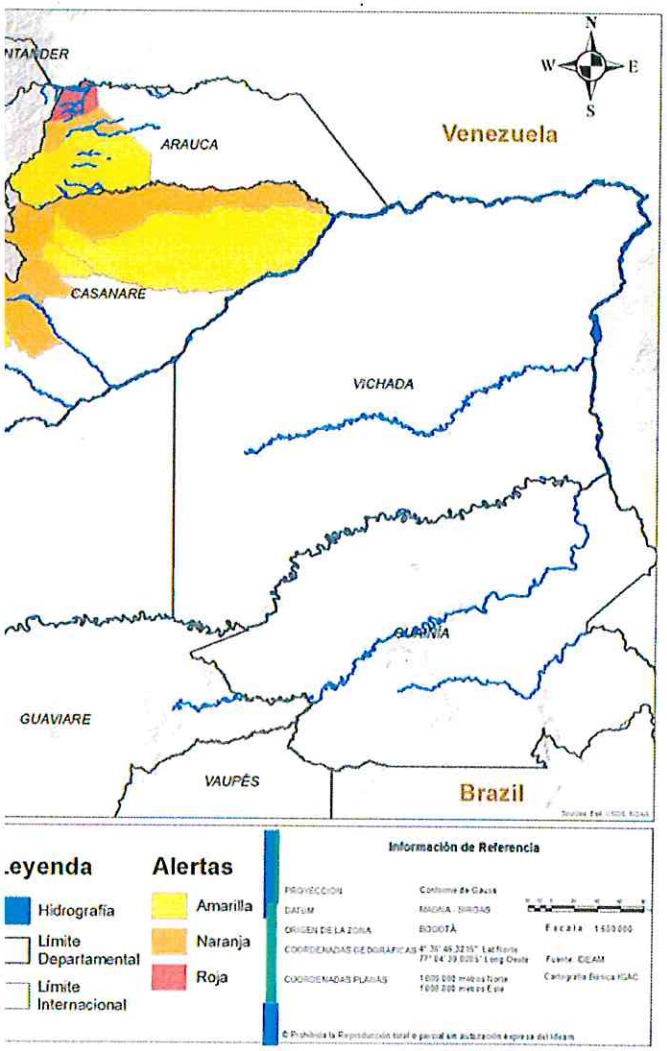


ALERTA	SITIOS PARA LOS CUALES SE GENERA LA ALERTA
⚠	ARAUCA : Saravena.
⚠	ARAUCA : Fortul. CASANARE : Hato Corozal, Nunchía, Sácama, Támara, Yopal. META : Cubarral, Restrepo.
⚠	ARAUCA : Tame. CASANARE : Aguazul, Paz De Ariporo, Pore. META : Acacías, El Castillo, Lejanías, San Juan De Arama, Villavicencio.

ico de la Amenaza por
mientos de Tierra

REGIÓN AMAZONÍA


IDEAM

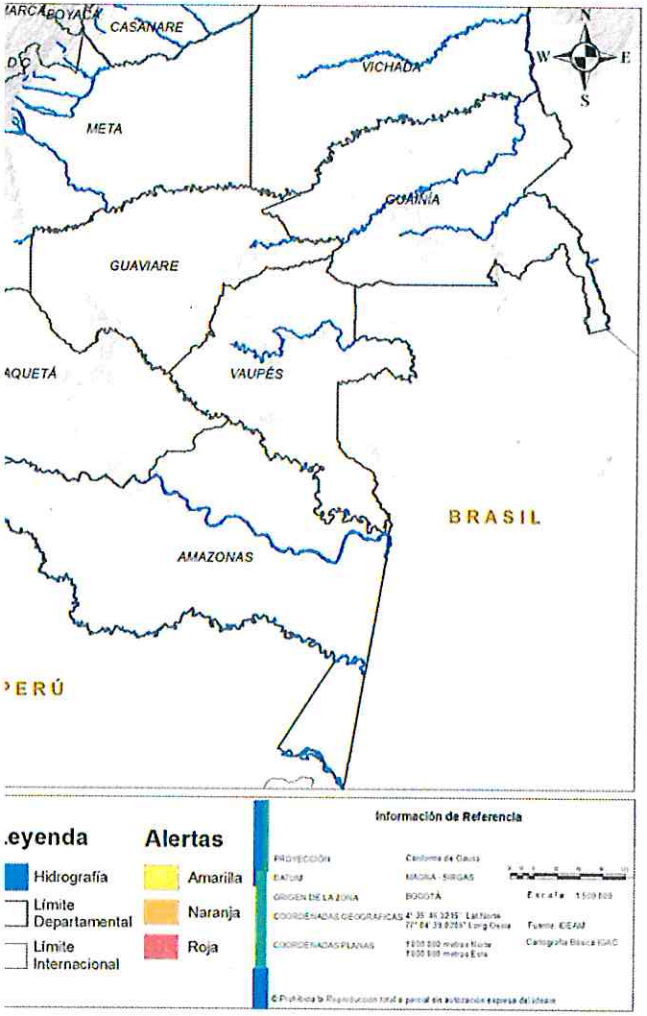

ALERTA	SITIOS PARA LOS CUALES SE GENERA LA ALERTA
	PUTUMAYO : Mocoa, Orito.
	PUTUMAYO : San Francisco.
	PUTUMAYO : Santiago, Villagarzón.

IDEAM

CIONES Y RECOMENDACIONES

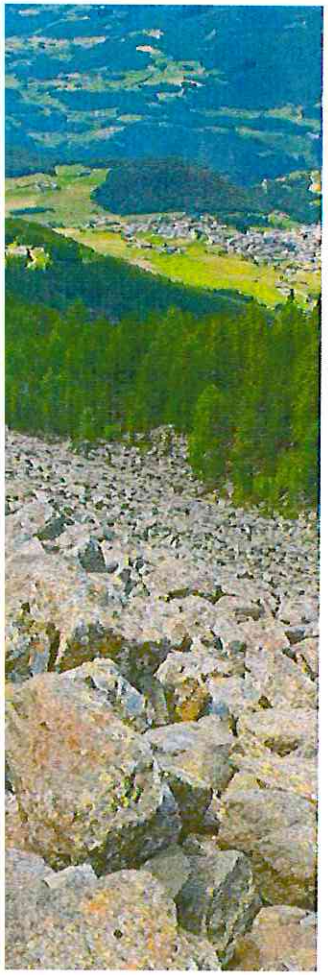

DEFINICIONES	RECOMENDACIONES
DERRUMBE: Término común para referirse a diversos tipos de movimientos en masa, particularmente caídas y deslizamientos. **DESLIZAMIENTO:** Movimiento ladera abajo de una masa de suelo o roca cuyo desplazamiento ocurre predominantemente a lo largo de una superficie de falla, o de zonas relativamente delgadas con gran deformación cortante. **TIPOS DE DESLIZAMIENTOS:** Deslizamientos: Incluye movimientos tipo deslizamiento rotacional o deslizamiento traslacional en suelo o roca. En este grupo se pueden incluir los procesos en laderas tipo flujo que hacen parte de la zona de alimentación de flujos de detritos o flujos de lodo. **Caídas:** Incluye movimientos tipo caída en suelos o rocas. Se pueden incluir también en este tipo los movimientos tipo volcamiento. **Flujos:** En este tipo se incluyen los procesos tipo flujo de detritos, flujo de lodos o avenida torrencial (Ver numeral 1.2). **Reptación:** Término utilizado para describir movimientos lentos Y extremadamente lentos (Hungr et al., 2014).	• Construya o habite en zonas seguras. • Proteja los bosques. • Evite la tala de árboles y la quema de estos. • Identifique las áreas con amenazas de deslizamientos o derrumbes. • Realice un plan de emergencia familiar. • Estudie rutas alternativas para su evacuación. • No permita que el agua se filtre en el interior de las montañas: abra zanjas, alcantarillas y cuencas firmes que permita el desagüe de agua adecuado. • Evite la acumulación de basura o desechos en suelos ya que esta no permite que el agua filtre por donde debe hacerlo, lo que hace que el terreno se desestabilice.

o de la Amenaza por
de la Cobertura Vegetal

IDEAM

RESUMEN


precipitación y temperatura máxima que se han últimos días, se presentan condiciones de:

En algunos municipios de los departamentos de dinamarca, Huila, Norte de Santander y Tolima.

rada: En algunos municipios de los departamentos Cundinamarca, Bogotá, D.C., Boyacá, Huila, La e de Santander, Tolima y Valle del Cauca.

En algunos departamentos de las regiones Andina, ribe.


Mapa de Pronóstico de la Amenaza por Incendios de la Cobertura Vegetal

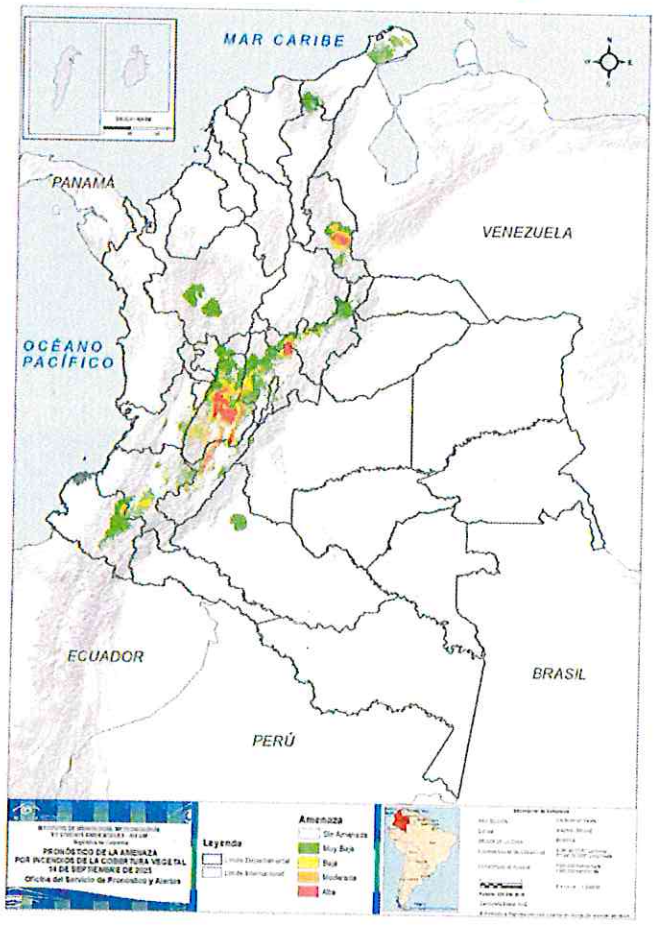

de la Amenaza por
de la Cobertura Vegetal

IDEAM

ca de seguimiento de alertas por pronóstico de la amenaza de incendios de la cobertura vegetal para Colombia durante los últimos 30 días

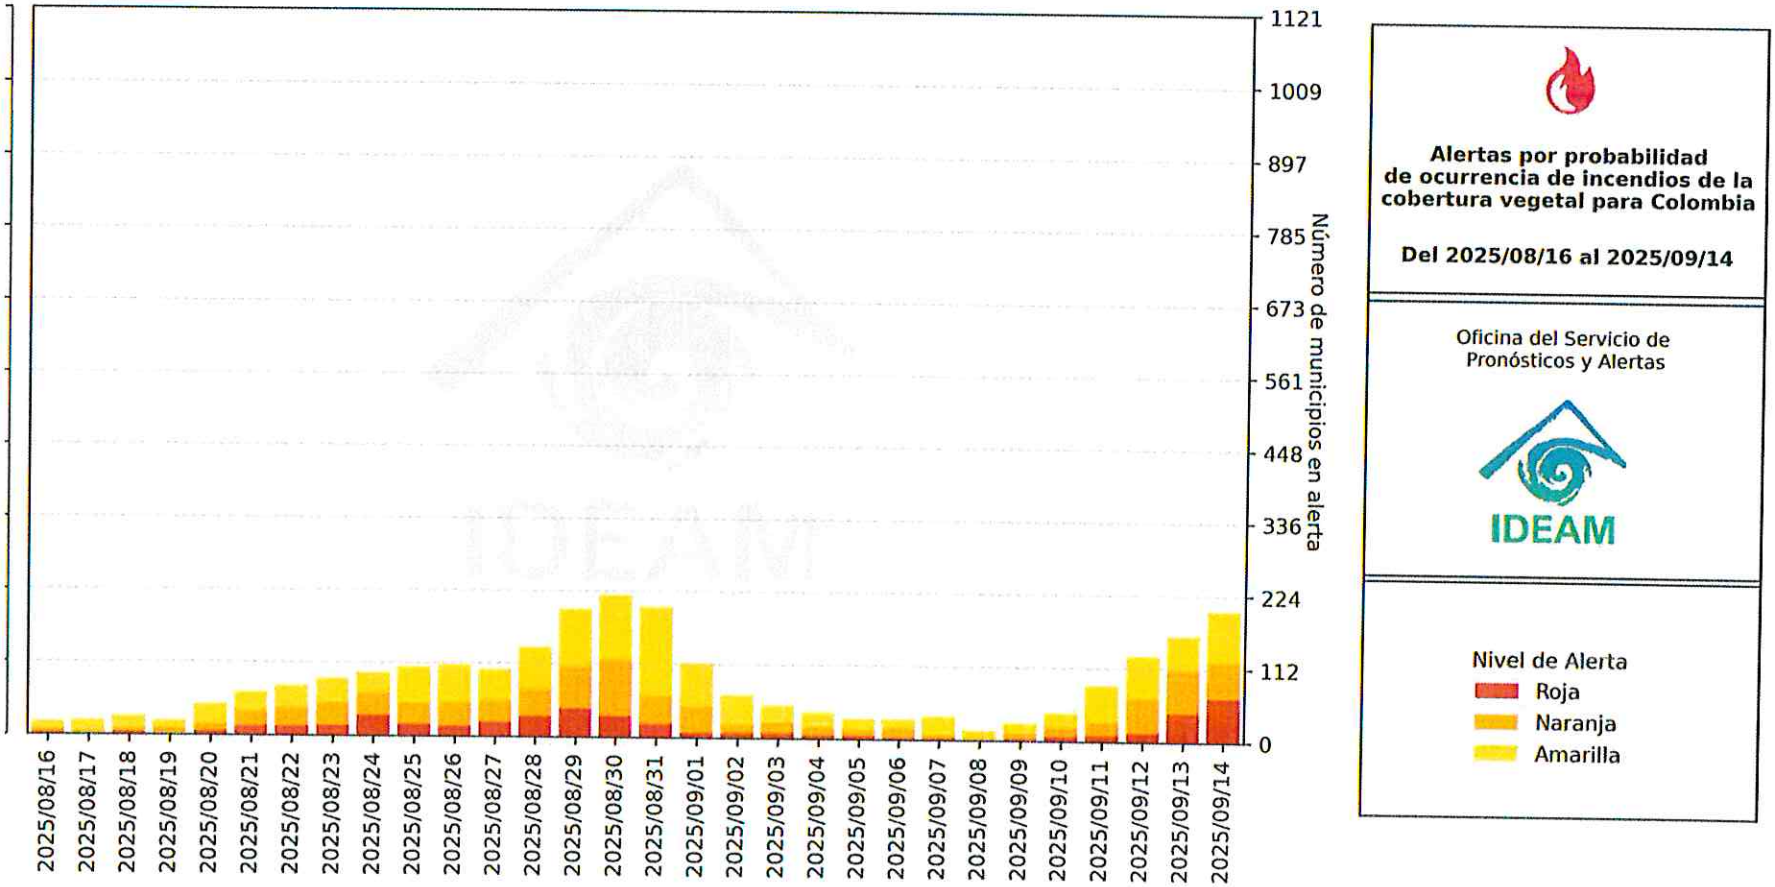


esenta la fecha de evaluación de las alertas, el eje vertical izquierdo el porcentaje de municipios* en alerta y el eje vertical derecho el número total de éstos; categorizando las alertas en una barra
vel de amenaza: alta (rojo), moderada (naranja) y baja (amarillo).
registrados por el DANE representado el 100% (1121 municipios) a la fecha.


de la Amenaza por de la Cobertura Vegetal

n: 14 de septiembre de 2025 | 18:00 HLC

IDEAM

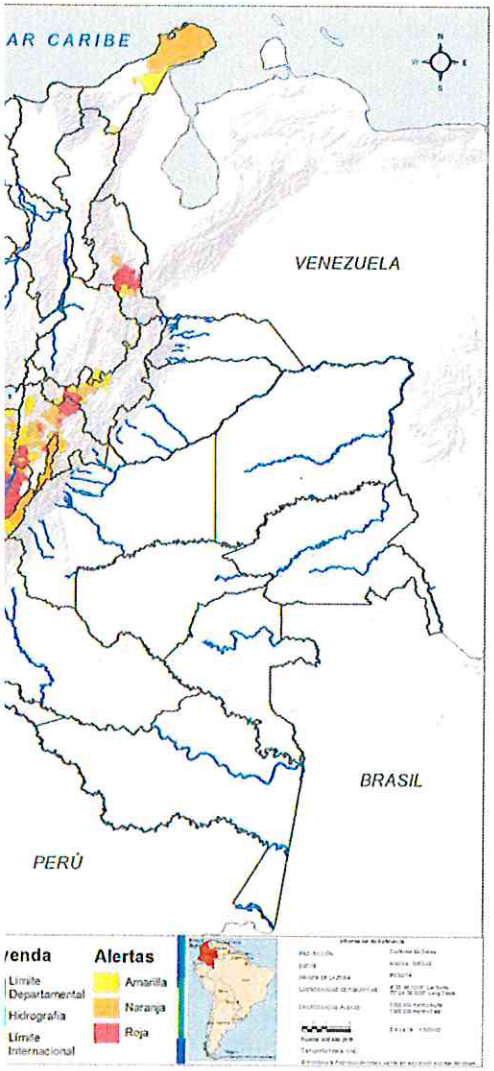

Municipios por regiones:

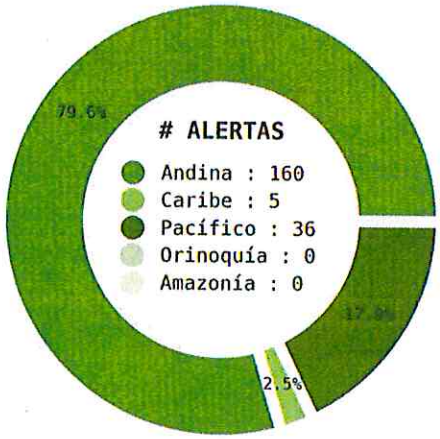

TOTAL MUNICIPIOS : 201
FECHA : 2025-09-14

DEPARTAMENTO	#
TOLIMA	23
CUNDINAMARCA	20
NORTE DE SANTANDER	11
HUILA	8
BOYACÁ	5
TOTAL	67


DEPARTAMENTO	#
CUNDINAMARCA	21
TOLIMA	11
BOYACÁ	6
HUILA	6
CAUCA	5
VALLE DEL CAUCA	3
NORTE DE SANTANDER	2
LA GUAJIRA	1
BOGOTÁ, D.C.	1
TOTAL	56

DEPARTAMENTO	#
CUNDINAMARCA	17
NARIÑO	14
CAUCA	12
BOYACÁ	9
HUILA	7
TOLIMA	6
NORTE DE SANTANDER	2
LA GUAJIRA	2
SANTANDER	2
VALLE DEL CAUCA	2
ANTIOQUIA	1
CALDAS	1
CÓRDOBA	1
QUINDÍO	1
SUCRE	1
TOTAL	78

de la Amenaza por
de la Cobertura Vegetal

REGIÓN CARIBE

IDEAM

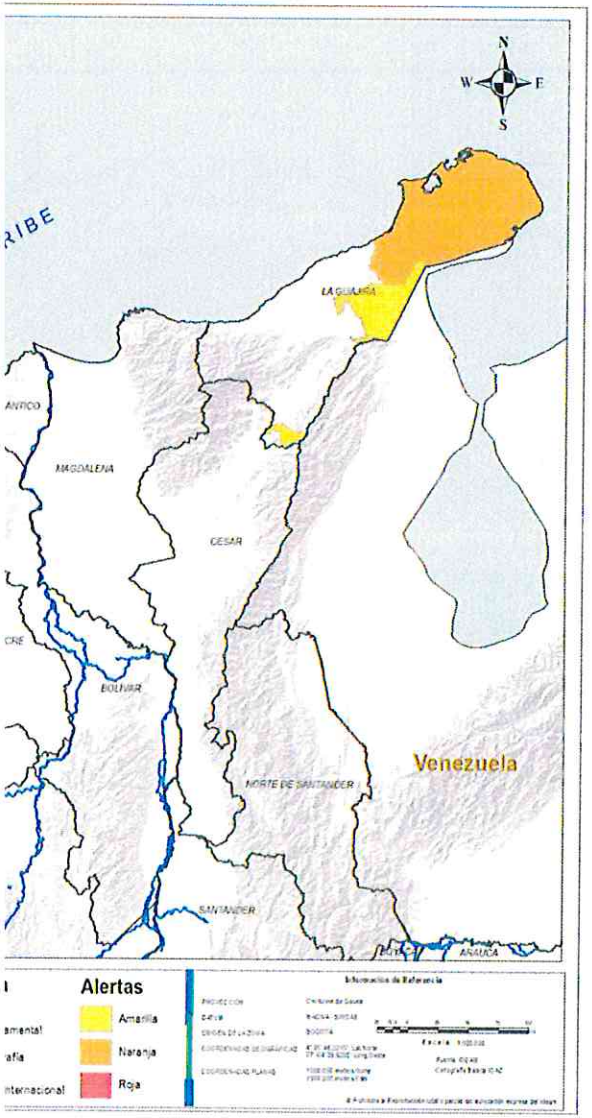


ALERTA	SITIOS PARA LOS CUALES SE GENERA LA ALERTA
⚠	LA GUAJIRA : Uribia.
⚠	CÓRDOBA : Ciénaga De Oro. LA GUAJIRA : Maicao, Urumita. SUCRE : Sampués.

de la Amenaza por de la Cobertura Vegetal

REGIÓN ANDINA

IDEAM

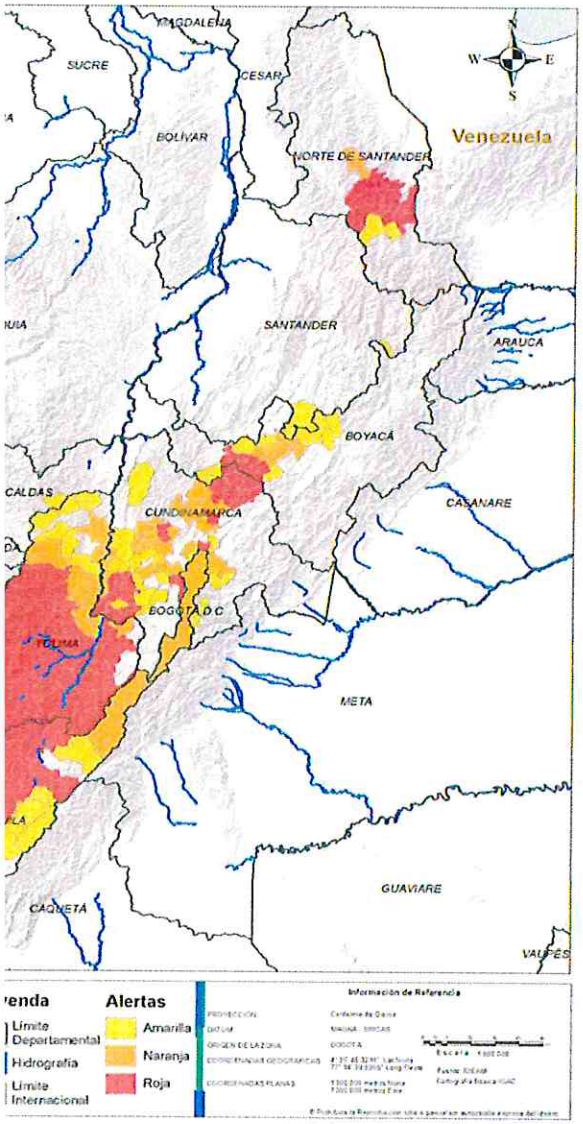


ALERTA	SITIOS PARA LOS CUALES SE GENERA LA ALERTA
⚠	BOYACÁ : Caldas, Chiquinquirá, Ráquira, San Miguel De Sema, Tinjacá. CUNDINAMARCA : Apulo, Carmen De Carupa, Chía, Cogua, Cucunubá, Fúquene, Girardot, Guachetá, Jerusalén, La Vega, Lenguazaque, Nariño, Ricaurte, Simijaca, Soacha, Susa, Sutatausa, Tocaima, Villa De San Diego De Ubaté, Nilo. HUILA : Aipe, Neiva, Palermo, Santa María, Teruel, Villavieja, Yaguará, Íquira. NORTE DE SANTANDER : Arboledas, Bochalema, Chinácota, Durania, Gramalote, Los Patios, Ragonvalia, Salazar, San Cayetano, Santiago, Villa Del Rosario. TOLIMA : Alpujarra, Anzoátegui, Ataco, Cajamarca, Carmen De Apicalá, Chaparral, Coyaima, Cunday, Dolores, Guamo, Ibagué, Natagaima, Ortega, Prado, Purificación, Rioblanco, Roncesvalles, Rovira, Saldaña, San Antonio, San Luis, Suárez, Valle De San Juan.
⚠	BOGOTÁ, D.C. : Bogotá, D.C.. BOYACÁ : Arcabuco, Chíquiza, Cómbita, Sutamarchán, Sáchica, Villa De Leyva. CUNDINAMARCA : La Mesa, Albán, Beltrán, Bituima, Bojacá, Facatativá, Guataquí, Guayabal De Síquima, La Calera, Mosquera, Nocaima, Pacho, San Cayetano, San Francisco, Sasaima, Tausa, Tena, Tenjo, Viani, Villeta, Zipaquirá. HUILA : Agrado, Colombia, La Plata, Paicol, Pital, Tesalia. NORTE DE SANTANDER : Bucarasica, Lourdes. TOLIMA : Alvarado, Ambalema, Armero, Coello, Espinal, Flandes, Melgar, Murillo, Piedras, Planadas, Santa Isabel.

de la Amenaza por
de la Cobertura Vegetal

REGIÓN ANDINA

IDEAM

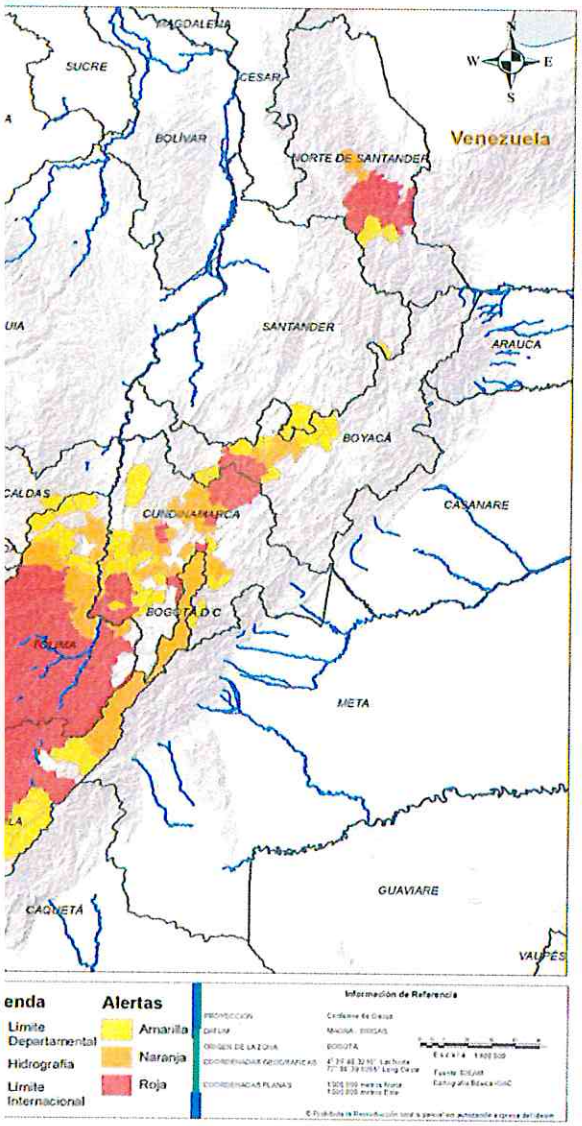


ALERTA	SITIOS PARA LOS CUALES SE GENERA LA ALERTA
⚠	ANTIOQUIA : Fredonia. BOYACÁ : Buenavista, Coper, Duitama, Gachantivá, Paipa, Saboyá, Samacá, Santa Sofía, Sotaquirá. CALDAS : Manzanares. CUNDINAMARCA : Agua De Dios, Anapoima, Anolaima, Caparrapí, Chaguaní, Choachí, Cota, Pulí, Quipile, San Antonio Del Tequendama, San Juan De Rioseco, Silvania, Sopó, Tibacuy, Une, Viotá, Zipacón. HUILA : Algeciras, Baraya, Campoalegre, Gigante, Hobo, Nátaga, Rivera. NORTE DE SANTANDER : Cucutilla, Pamplonita. QUINDÍO : Génova. SANTANDER : Capitanejo, Gámbita. TOLIMA : Fresno, Herveo, Líbano, San Sebastián De Mariquita, Venadillo, Villahermosa.

de la Amenaza por
de la Cobertura Vegetal

REGIÓN PACÍFICO

IDEAM

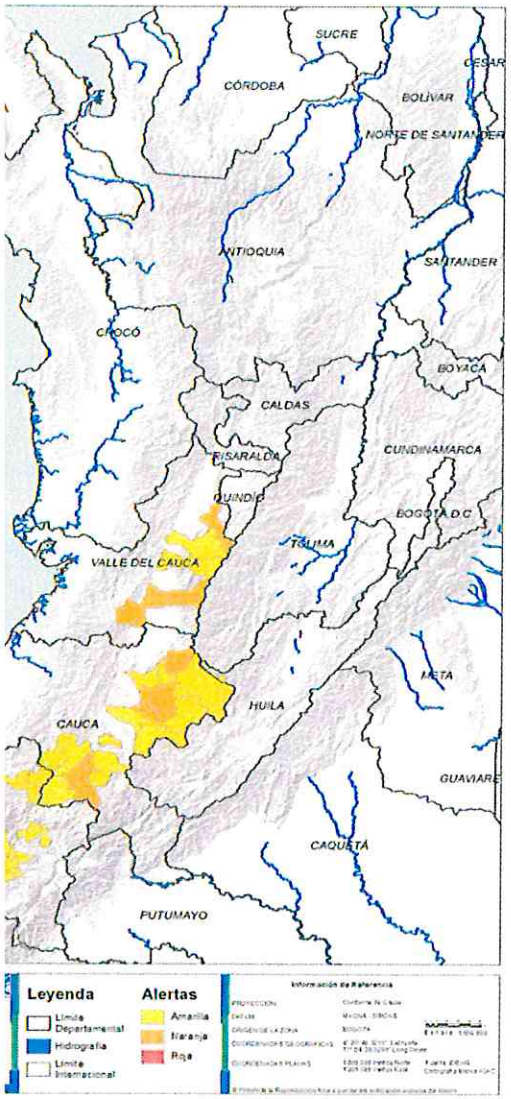


ALERTA	SITIOS PARA LOS CUALES SE GENERA LA ALERTA
⚠	CAUCA : Toribío, Bolívar, Silvia, Sucre, Totoró. VALLE DEL CAUCA : Palmira, Sevilla, Santiago De Cali.
⚠	CAUCA : Almaguer, Balboa, Caldono, Inzá, Jambaló, La Vega, Mercaderes, Patía, Popayán, Puracé, Páez, Rosas. NARIÑO : Ancuya, Chachagüí, Consacá, El Rosario, El Tambo, Guaitarilla, Imués, Leiva, Mallama, Ospina, Providencia, Samaniego, Santacruz, Túquerres. VALLE DEL CAUCA : Guadalajara De Buga, Tuluá.

de la Amenaza por
de la Cobertura Vegetal

REGIÓN ORINOQUÍA

IDEAM

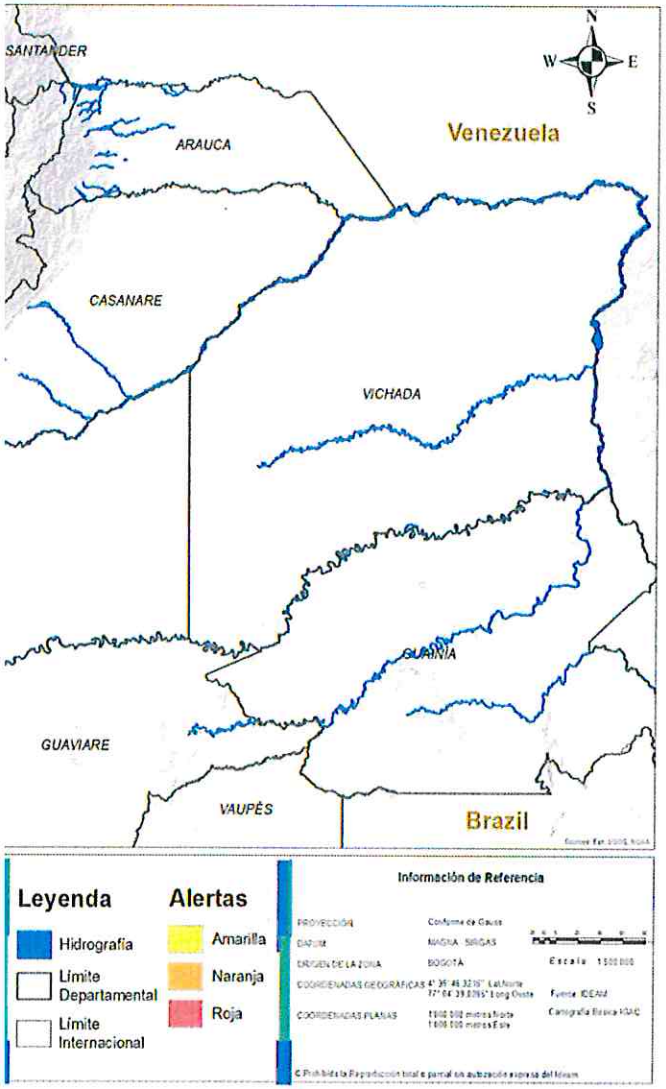

CONDICIONES NORMALES

de la Amenaza por
de la Cobertura Vegetal

REGIÓN AMAZONIA

IDEAM





CONDICIONES NORMALES

IDEAM


CIONES Y RECOMENDACIONES



DEFINICIONES	RECOMENDACIONES
Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales (Ley 1523 de 2012). Conato (Incendio): Fuego de origen natural o antrópico que afecta o destruye una extensión inferior a 5.000 m2, de cualquier tipo de cobertura vegetal, ya sea en zona urbana o rural. Incendio de la cobertura vegetal: Fuego sobre la cobertura vegetal de origen natural o antrópico que se propaga sin control, que causa perturbaciones ecológicas afectando o destruyendo una extensión superior a 5.000 m2, ya sea en zona urbana o rural, que responde al tipo de vegetación, cantidad de combustible, oxígeno, condiciones meteorológicas, topografía, actividades humanas, entre otras. Incendio forestal: Un incendio forestal es un "fuego que, cualquiera sea su origen, se propaga sin control en terrenos rurales a través de vegetación leñosa, arbustiva o herbácea, ya sea viva o muerta". Es decir, no solo se queman los árboles, sino que se destruye todo un ecosistema de especies vegetales silvestres y también animales que habitan en estos terrenos. (Conaf, 2019)	A la comunidad en general, a los turistas y caminantes apagar debidamente las fogatas y no dejar residuos tipo vidrio que sirvan como elementos concentradores de la radiación solar e igualmente reportar a las autoridades en caso de ocurrencia de incendios. A los consejos departamentales y municipales, las autoridades ambientales regionales y locales, mantener activos los planes de prevención y atención de incendios con el fin de evitar la ocurrencia y propagación de los mismos especialmente en áreas de reserva forestal y del Sistema Nacional de Parques Nacionales Naturales. A los sistemas regionales y locales de bomberos disponer de los elementos necesarios para la atención oportuna de eventos de incendio de la cobertura vegetal

Meteomarinas Vigentes
be Colombiano

IDEAM

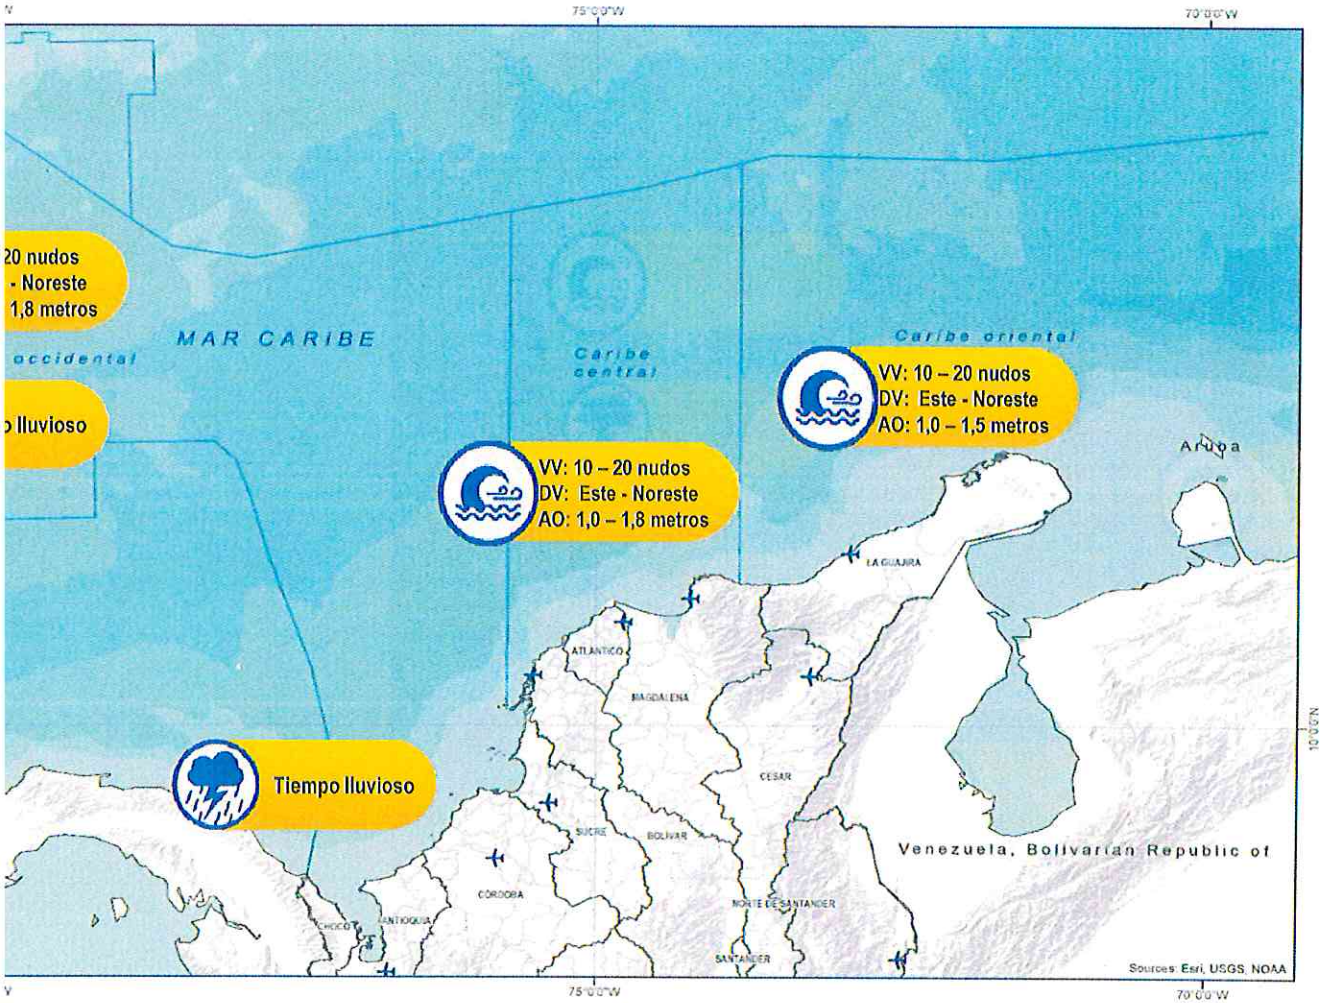

Abreviaturas

VV – Velocidad del viento máxima probable.
DV – Dirección predominante del viento.
AO – Altura significativa de la ola.

Convenciones

Tiempo Lluvioso
Probabilidad de lluvias moderadas a fuertes, en algunos casos con posibilidad de tormentas eléctricas y rachas de viento.

Sugerencia o recomendación
A las embarcaciones de poco calado, consultar con las Capitanías de puerto antes de zarpar en zonas de inminente tempestad.

A los bañistas y habitantes costeros, estar atentos a la evolución de las condiciones meteorologicas y a los avisos de las autoridades locales.

Pleamar
La marea alcanzará su máximo nivel en el intervalo de tiempo establecido.

Sugerencia o recomendación
Se sugiere a los habitantes costeros estar atentos a la evolución del fenómeno.

Viento y oleaje
Velocidad del viento y altura del oleaje con valores por encima de lo normal para la época.

Sugerencia o recomendación
A los bañistas y habitantes costeros, estar atentos a la evolución del fenómeno y a las indicaciones de las autoridades locales.

A las embarcaciones de poco calado, consultar con las Capitanías de puerto antes de zarpar.

* La altura significativa de la ola, representa la media del tercio más alto de las olas, por lo cual la altura máxima posible puede ser incluso superior al doble de este valor.

Meteomarinas Vigentes
Pacifico Nacional

IDEAM



Abreviaturas

VV – Velocidad del viento máxima probable.
DV – Dirección predominante del viento.
AO – Altura significativa de la ola.

Convenciones

Tiempo Lluvioso
Probabilidad de lluvias moderadas a fuertes, en algunos casos con posibilidad de tormentas eléctricas y rachas de viento.

Sugerencia o recomendación
A las embarcaciones de poco calado, consultar con las Capitanías de puerto antes de zarpar en zonas de inminente tempestad.

A los bañistas y habitantes costeros, estar atentos a la evolución de las condiciones meteorológicas y a los avisos de las autoridades locales.

Pleamar
La marea alcanzará su máximo nivel en el intervalo de tiempo establecido.

Sugerencia o recomendación
Se sugiere a los habitantes costeros estar atentos a la evolución del fenómeno.

Viento y oleaje
Velocidad del viento y altura del oleaje con valores por encima de lo normal para la época.

Sugerencia o recomendación
A los bañistas y habitantes costeros, estar atentos a la evolución del fenómeno y a las indicaciones de las autoridades locales.

A las embarcaciones de poco calado, consultar con las Capitanías de puerto antes de zarpar.

* La altura significativa de la ola, representa la media del tercio más alto de las olas, por lo cual la altura máxima posible puede ser incluso superior al doble de este valor.

598

IDEAM

:IONES
METEOROLÓGICAS
.ES

:verry Prieto | Directora General
a Fernández| Jefe (E) Oficina del Servicio de Pronóstico y Alertas

‹o Navarrete (Meteorología)
a Rojas Garzón (Hidrología)
iña Saavedra (Deslizamientos de tierra)
ıcia Monroy (Incendios de la cobertura vegetal)
a Burgos (Datos hidrometeorológicos)

SERVICIO DE PRONÓSTICO Y ALERTAS
:am.gov.co
ónicos: servicio@ideam.gov.co , alertas@ideam.gov.co
B - 70, piso 3. Bogotá, D.C.
27160 ext. 1334 -1336.

VISITA NUESTRAS REDES SOCIALES

InstitutoIDEAM

@IDEAMColombia

IdeamColombia

Ideam.Instituto

IDEAM

dos Celsius
tros sobre el nivel del mar
ostationary Operational Environmental
ellites (Satélite Geoestacionario Operacional Ambiental)
tros
metros por hora

GOES-16: localizado en 75°W sobre el ecuador geográfico
mm: milimetros
HLC: hora local colombiana
PNN: parque nacional natural
SFF: Santuario de Fauna y Flora

RY PRIETO

ndez
Servicio de Pronósticos y Alertas

ción:
ACIONES

v.co
servicio@ideam.gov.co, alertas@ideam.gov.co
70. Bogotá D.C.
0 ext. 1334-1336.

DEAM @IDEAMColombia

ombia Ideam.Instituto

Alerta ROJA

PARA TOMAR ACCIÓN Advierte a los sistemas de prevención y atención de desastres sobre la amenaza que puede ocasionar un fenómeno con efectos adversos sobre la población, el cual requiere la atención inmediata por parte de la población y de los cuerpos de atención y socorro. Se emite una alerta sólo cuando la identificación de un evento extraordinario indique la probabilidad de amenaza inminente y cuando la gravedad del fenómeno implique la movilización de personas y equipos, interrumpiendo el normal desarrollo de sus actividades cotidianas.

Alerta NARANJA

PARA PREPARARSE Indica la presencia de un fenómeno. No implica amenaza inmediata y como tanto es catalogado como un mensaje para informarse y prepararse. El aviso implica vigilancia continua ya que las condiciones son propicias para el desarrollo de un fenómeno, sin que se requiera permanecer alerta.

Alerta AMARILLA

PARA INFORMARSE Es un mensaje oficial por el cual se difunde información. Por lo regular se refiere a eventos observados, registrados o registrados y puede contener algunos elementos de pronóstico a manera de orientación. Por sus características pretéritas y futuras difiere del aviso y de la alerta, y por lo general no está encaminado a alertar sino a informar

CONDICIONES NORMALES La información que se suministra se encuentra dentro de los rangos normales.

600

Villavicencio-Meta, 16 de septiembre del 2025

Señores

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO

Dr. JUAN CARLOS AGUILAR VASQUEZ

SECRETARIO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES - TIC

Ciudad Villavicencio - Meta

ASUNTO: SOLICITUD PRORROGA 02 AL CONTRATO 1692-2025

Respetados Señores:

En mi calidad de contratista del Contrato de Obra No. 1692 de 2025, cuyo objeto es **"MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REFORMAS A LAS INSTALACIONES DE LOS PUNTOS VIVE DIGITAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO – META"**, me permito solicitar formalmente la prórroga No. 2 del plazo de ejecución de prórroga No. 1 del mencionado contrato, con el fin de garantizar la correcta culminación de las actividades pactadas y el cumplimiento integral del objeto contractual.

1. Situación actual del proyecto

Al corte de este informe, el avance físico del contrato refleja un progreso significativo en varios ítems, pero este ha sido alcanzado bajo un esquema de trabajo intermitente y adaptativo. La ejecución ha estado condicionada por la disponibilidad real de los espacios de intervención, por las condiciones climáticas y por la incorporación de actividades no previstas en el alcance inicial.

En términos operativos, se han presentado jornadas de trabajo en las que ha sido necesario reorganizar los frentes de obra de manera constante para optimizar el uso del tiempo disponible y evitar interferencias con el funcionamiento de las instituciones educativas y comunitarias que operan en los Puntos Vive Digital.

Durante los meses de agosto y septiembre de 2025 en la ciudad de Villavicencio se presentaron constantes precipitaciones que afectaron de manera directa las actividades programadas, tales como las excavaciones para el suministro de las tuberías de desagües y suministro.

En consecuencia, esta situación redujo las horas efectivas de trabajo diario, generando atrasos acumulados en el desarrollo de las labores contempladas dentro del cronograma. Cabe resaltar que se trata de circunstancias ajenas a la voluntad del contratista, de carácter climático y de fuerza mayor, que impactaron directamente en la productividad y el normal desarrollo de la obra.

2. Impacto de los factores identificados en el cronograma

La concurrencia de los factores antes descritos ha ocasionado que, si bien las metas parciales se han ido alcanzando, el ritmo general de avance no se ajuste al plan original. La ejecución ha debido reorganizarse en múltiples ocasiones, generando un esquema de trabajo no lineal que, aunque funcional, no permite concluir la totalidad de las intervenciones dentro del plazo contractual vigente.

- Las condiciones meteorológicas son imprevisibles y constituyen un factor de fuerza mayor.

En virtud de lo anterior, solicito muy respetuosamente la autorización de una prórroga en el plazo contractual siguiente a la prórroga No. 1, por el término de doce (12) días calendario, a partir del 19 de septiembre del año 2025, hasta el treinta (30) de septiembre del año 2025, a fin de culminar las obras conforme a las especificaciones técnicas y contractuales, asegurando la entrega en óptimas condiciones.

Agradezco la atención prestada y quedo atento a la respuesta que se sirva emitir.

Cordialmente,

CARLOS AUGUSTO GIRALDO RENGIFO

Representante Legal

MEGA PROYECTOS E INVERSIONES SAS

Anexo:

Informe justificación prórroga

602

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	Código: GCT-F-27
	PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN	Versión: V1
		Fecha: 29/04/2025
	FORMATO INFORME DE SUPERVISOR	Página 1 de 9

Villavicencio, 17/09/2025

Doctor(a):
ALBA AURORA COLINA
Jefe Oficina de Contratación
Alcaldía Municipal de Villavicencio
Ciudad.

Ref.: SOLICITUD DE PRÓRROGA No 2 DEL CONTRATO N°1692 DE 2025, N°. DEL PROCESO EN SECOP: SMC-066 DE 2025

OBJETIVO DEL INFORME: Informe para la solicitud de prorroga No 2. Llevar a cabo las tareas de vigilancia de la ejecución contractual e informar al municipio de Villavicencio acerca del desarrollo del mismo verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales a lo largo de su ejecución en desarrollo de las obligaciones legales contenidas en los artículos 83, 84 y siguientes de la Ley 1474 de 2011 y demás normativa aplicable.

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No. Y FECHA DEL CONTRATO (incluir el número del proceso en SECOP)	1692 DE 2025 No PROCESO EN SECOP II: (066 DE 2025)
PUBLICADO EN (Marque con X)	SECOP I _____ Ó SECOP II ____X___
CLASE DE CONTRATO:	SMC (OBRA)
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	MEGA PROYECTOS E INVERSIONES SAS R/L CARLOS AUGUSTO GIRALDO RENGIFO
No. DE IDENTIFICACIÓN	Nit. 901.744.193-4
OBJETO:	"MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REFORMAS A LAS INSTALACIONES DE LOS PUNTOS VIVE DIGITAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO"
NOMBRE DEL SUPERVISOR CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: (De todos los que haya tenido, empezando por el vigente)	Arq. DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
FECHA DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN: (De todos los que haya tenido, en orden empezando por el vigente)	03/06/2025
CONDICIONES INICIALES	
VALOR DEL CONTRATO (letras y número):	CIENTO VEINTE MILLONES SETECIENTOS VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS $ 120.721.957,42
PLAZO DE EJECUCIÓN:	75 DIAS
FECHA DE INICIO:	5/06/2025

FECHA DE TERMINACIÓN:	19/08/2025		
MODIFICACIONES:			
CESIÓN:	N.A. O NOMBRE DEL NUEVO CONTRATISTA	FECHA:	DIA/MES/AÑO
VALOR DE ADICIÓN:	$_____ Ó N. A.	FECHA:	DIA/MES/AÑO
NUEVO VALOR DEL CONTRATO: (INICIAL + ADICIÓN)	$		
PRORROGAS	_____ 30 DÍAS	FECHA:	19/08/2025
TOTAL PLAZO DE EJECUCIÓN (INICIAL + PRÓRROGAS)	105 DIAS		
SUSPENSIONES	FECHA:		
REINICIOS:	____MESES Ó N. A.	FECHA:	DIA/MES/AÑO
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	30/09/2025		

2. **DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** Teniendo en cuenta que mediante acto administrativo del 11/06/2025, notificado personalmente 03/06/2025 y en plataforma SECOP II del 13/06/2025, se me designó como SUPERVISOR del contrato de la referencia, me permito presentar el informe del desarrollo del objeto contractual correspondiente a la Solicitud Prorroga No.2 de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Interventoría y Supervisión adoptado mediante Decreto No. 1000-21/293, vigente desde el 19 de julio de 2016.

3 GARANTIA DE POLIZAS

Las pólizas aprobadas corresponden a la compañía aseguradora seguros mundiales las cuales están a favor del MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, las siguientes pólizas fueron expedidas con la firma del contrato:

ASEGURADORA	No POLIZA CERTIFICADO	AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	VIGENTE
			DESDE	HASTA		
SEGUROS DEL ESTADO S. A	30-44-101064160	Cumplimiento del contrato	5/06/2025	19/12/2025	$ 24.144.391,49	SI
		Prestaciones Sociales Legales	5/06/2025	19/08/2028	$ 6.036.097,87	SI
		Estabilidad y calidad de la obra	SI AMPARA 5 AÑOS ,0 MESES Y 1 DIAS		$ 24.144.391,48	SI
	30-40-101024067	Responsabilidad Civil Extracontractual	5/06/2025	18/08/2025	$ 284.700.000,00	SI
TOTAL ASEGURADO					$ 339.024.880,84	

GARANTÍA ÚNICA PÓLIZAS SEGÚN PRORROGA No. 01

ASEGURADORA	No POLIZA CERTIFICADO	AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	VIGENTE
			DESDE	HASTA		
SEGUROS DEL ESTADO S. A	30-44-101064160	Cumplimiento del contrato	5/06/2025	18/01/2026	$ 24.144.391,49	SI
		Prestaciones Sociales Legales	5/06/2025	19/09/2028	$ 6.036.097,87	SI
		Estabilidad y calidad de la obra	SI AMPARA 5 AÑOS ,0 MESES Y 1 DIAS		$ 24.144.391,48	SI
	30-40-101024067	Responsabilidad Civil Extracontractual	5/06/2025	18/09/2025	$ 284.700.000,00	SI
TOTAL, ASEGURADO					$ 339.024.880,84	

4 LOCALIZACIÓN DE LA OBRA OBJETO DE INTERVENTORÍA

El municipio de Villavicencio está ubicado al noroccidente del departamento del Meta, en el piedemonte de la cordillera Oriental, en la margen izquierda del río Guatiquía. Geográficamente localizado en 4°08'33" N y 73°97'46" O, con temperatura promedio de 27°C

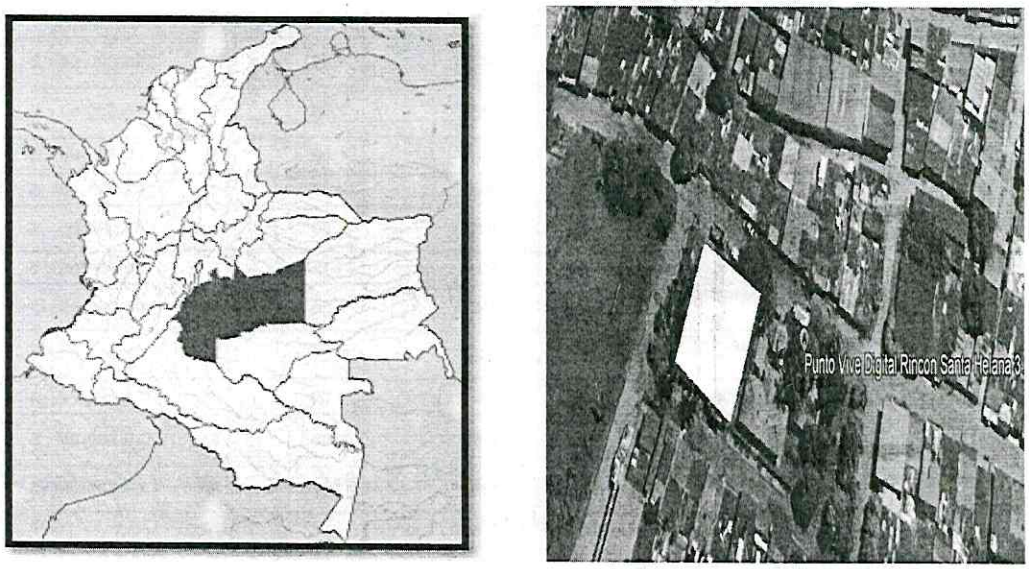


Ilustración 01 *Calle 42ª # 17b-27 Imagen tomada de la aplicación Google earth pro*

El proyecto a ejecutar dentro del objeto del contrato de obra N°1692 de 2025 se encuentra ubicado en la zona urbana en la calle 42ª # 17b-27, Vive Digital Villa Fabiola, en el Municipio de Villavicencio.

5. CONDICIONES CONTRACTUALES

Condiciones contractuales iniciales

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	PUNTO VIVE DIGITAL LA MADRID				
1	PRELIMINARES				
1,01	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	178,75	$ 3.630,00	$ 648.862,50
1,02	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	69,34	$ 73.000,00	$ 5.061.820,00
1,03	DEMOLICION MANUAL BALDOSA PISO E= 0.07 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	9,69	$ 23.500,00	$ 227.715,00
1,04	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	2,00	$ 228.000,00	$ 456.000,00
	SUBTOTAL				$ 6.394.397,50
2	OBRAS INTERIORES				
2,01	MURO TOLETE RECOCIDO COMUN 0.20X0.10X0.06, MORTERO TIPO 1:3	M2	24,42	$ 76.900,00	$ 1.877.898,00
2,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA TABLERO CORRIDO MARCO, PASADOR LAMINA COLL ROLLED CAL 20 2 X 0.80 M	UND	2,00	$ 280.500,00	$ 561.000,00
2,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJA TIPO BANCO CUADRADO 1" CAL 18	M2	15,10	$ 127.800,00	$ 1.929.780,00
2,04	PERFIL CUADR. NEGRO 100X100X4 MM ASTM A-500	ML	7,00	$ 133.300,00	$ 933.100,00
2,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ALUMINIO CORREDIZA, CON VIDRIO 4 MM	M2	4,71	$ 993.800,00	$ 4.680.798,00
2,06	MURO SUPER BOARD DOBLE CARA, E=0.11 M, CAL 8 MM, INCLUYE PINTURA	M2	7,49	$ 178.200,00	$ 1.334.718,00
2,07	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	4,50	$ 28.400,00	$ 127.800,00
2,08	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 2"	UND	2,00	$ 67.700,00	$ 135.400,00
2,09	SALIDA SANITARIA SANITARIO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	2,00	$ 82.900,00	$ 165.800,00
2,10	TUBERIA PVCL 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	21,00	$ 35.900,00	$ 753.900,00
2,11	TUBERÍA CPVC 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	7,50	$ 63.200,00	$ 474.000,00
2,12	VALVULA CHEQUE CORTINA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	2,00	$ 67.800,00	$ 135.600,00
2,13	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA	UND	2,00	$ 389.600,00	$ 779.200,00
2,14	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UND	2,00	$ 520.800,00	$ 1.041.600,00
2,15	PISO EN CERAMICA LISO 0.20X0.20 LINEA DUROTECH	M2	14,80	$ 66.500,00	$ 984.200,00
	SUBTOTAL				$ 15.914.794,00

Página 1

3	OBRAS ELECTRICAS						
3,01	CANALETA PLASTICA	ML	16,15	$	67.900,00	$	1.096.585,00
3,02	ACOMETIDA PARCIAL 3 No6+1 No12 DUCTO 1" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	16,15	$	60.400,00	$	975.460,00
3,03	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	4,00	$	117.900,00	$	471.600,00
3,04	REFLECTOR LED 200W IP 65 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	2,00	$	345.200,00	$	690.400,00
					SUBTOTAL	$	3.234.045,00
	PUNTO VIVE DIGITAL VILAL FABIOLA						
4	PRELIMINARES						
4,01	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	363,95	$	3.630,00	$	1.321.138,50
4,02	DESMONTE DE CIELO RASO EN LAMINA LIVIANA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	356,00	$	6.200,00	$	2.207.200,00
4,03	TRANSPORTE Y DISPOSICI Ó N FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	2,00	$	228.000,00	$	456.000,00
4,04	DEMOLICION MANUAL MURO DIVISORIO BLOQUE DE ARCILLA. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	21,92	$	12.900,00	$	282.768,00
4,05	DESMONTE DE TEJA ASBESTO CEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	90,00	$	20.600,00	$	1.854.000,00
					SUBTOTAL	$	6.121.106,50

Página 2


5	OBRA INTERIOR Y EXTERIOR						
5,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC	M2	157,98	$	114.900,00	$	18.151.902,00
5,02	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	194,88	$	14.400,00	$	2.806.272,00
5,03	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 M(MORTERO TIPO S 1:3)	M2	12,46	$	55.900,00	$	696.514,00
5,04	PA Ñ ETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	24,92	$	27.000,00	$	672.840,00
5,05	ESTUCO PLASTICO	M2	24,92	$	17.500,00	$	436.100,00
5,06	SUMINISTRO E INSTALACI Ó N PUERTA ALUMINIO CORREDIZA, CON VIDRIO 4 MM	M2	2,80	$	993.800,00	$	2.782.640,00
5,07	MURO SUPER BOARD DOBLE CARA, E=0.11 M, CAL 8 MM, INCLUYE PINTURA	M2	37,51	$	178.200,00	$	6.684.282,00
5,08	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	125,86	$	12.000,00	$	1.510.320,00
5,09	SUMINISTRO E INSTALACI Ó N CUBIERTA TIPO SANDWICH 333C CAL. 26 PREPINTADA. INCLUYE POLIURETANO O MATERIAL SIMILAR. NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	90,00	$	222.300,00	$	20.007.000,00
5,10	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	36,00	$	30.800,00	$	1.108.800,00
5,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREAS EN MADERA INMUNIZADA DE 0.14X0.04X3M INCLUYE TORNILLERIA ROTHOBLAAS Y ACCESORIOS DE INSTALACION	UND	30,00	$	119.000,00	$	3.570.000,00
					SUBTOTAL	$	58.426.670,00
					COSTO DIRECTO	$	90.091.013,00

6. INFORME TÉCNICO

AVANCE FÍSICO CONTRATO DE OBRA NO 1692 DE 2025

PROGRAMADO	EJECUTADO	ATRASO
80 %	64 %	16%

El cuadro anterior relaciona el valor y avance programado con corte a 13 de agosto de 2025, avance ejecutado de obra, de mostrando con ello que mientras la línea de programación empieza a tener una pendiente mayor, la ejecución va disminuyendo, presentando un atraso en obra cercano al 16.43 %

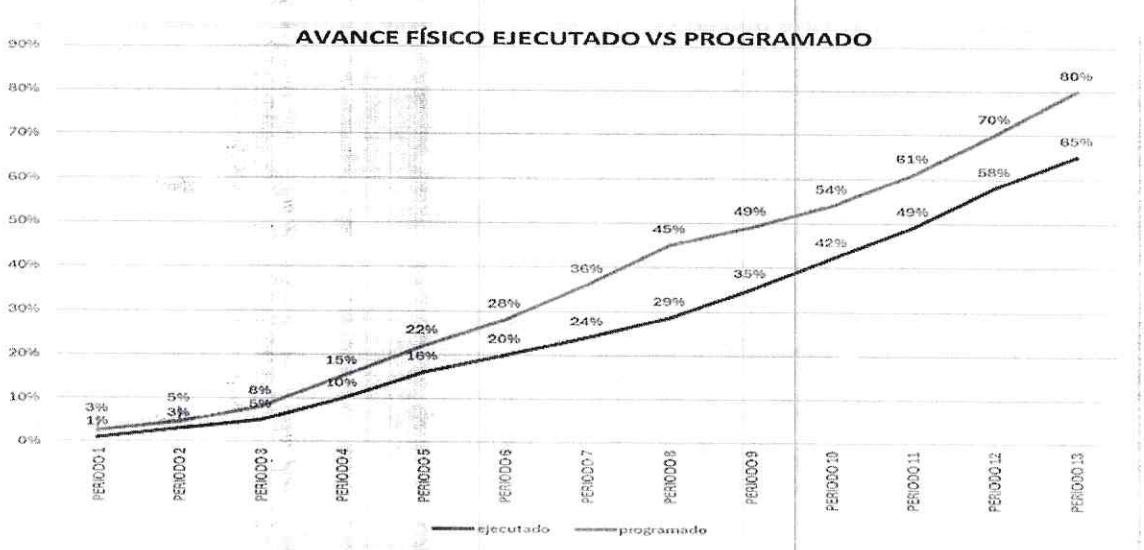

7. AVANCE FINANCIERO Y CONTROL PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA NO 1692 DE 2025

Valor inicial del contrato	**$ 120.721.957,42**
Valor actual del contrato	**$ 120.721.957,42**
Valor ejecutado del contrato (acumulado)	**$ 57.257.840,30**
Valor ejecutado programado	**$ 72.072.810,40**
Porcentaje programado acumulado del contrato	**80%**
Porcentaje ejecutado del contrato (acumulado)	**64 %**

Control presupuestal

El valor del contrato se encuentra amparado de acuerdo con el certificado de disponibilidad presupuestal No 2123 del 11 de abril de 2025 y registro presupuestal No 3047 de 3 de junio de 2025

CDP.No	FECHA	DENOMINACIÓN	VIGENCIA	RUBRO	PRESUPUESTO ASIGNADO
2123	11/04/2025	Implementación, optimización y sostenibilidad operativa de los puntos vive digital en el municipio de Villavicencio meta.	libre destinación	0401-2-3,23,01,0400,011	$ 120.882.609,60

RP.No	FECHA	DENOMINACIÓN	VIGENCIA	RUBRO	PRESUPUESTO ASIGNADO
3047	3/06/2025	Implementación, optimización y sostenibilidad operativa de los puntos vive digital en el municipio de Villavicencio meta.	libre destinación	0401-2-3,23,01,0400,011	$ 120.721.957,42

8. SOLICITUD DE PRORROGA No. 2

El contratista del contrato 1692 de 2025, el señor Carlos Augusto Giraldo Rengifo, radico el 16 de septiembre de 2025 en la secretaria de Infraestructura, los documentos para la solicitud de prorroga No 2 por doce (12) días, requería para continuar con su gestión y garantizar la calidad del proceso constructivo de la obra y demás factores de carácter técnico, legal, administrativo y financiero.
La solicitud de prorroga No 2 presentada por el contratista de obra fue revisada y avalada por la supervisión, con base en las siguientes consideraciones:

1. Situación actual del proyecto

Al corte de este informe, el avance físico del contrato refleja un progreso significativo en varios ítems, pero este ha sido alcanzado bajo un esquema de trabajo intermitente y adaptativo. La ejecución ha estado condicionada por la disponibilidad real de los espacios de intervención, por las condiciones climáticas y por la incorporación de actividades no previstas en el alcance inicial.
En términos operativos, se han presentado jornadas de trabajo en las que ha sido necesario reorganizar los frentes de obra de manera constante para optimizar el uso del tiempo disponible y evitar interferencias con el funcionamiento de las instituciones educativas y comunitarias que operan en los Puntos Vive Digital.
Durante los meses de agosto y septiembre de 2025 en la ciudad de Villavicencio se presentaron constantes precipitaciones que afectaron de manera directa las actividades programadas, tales como las excavaciones para el suministro de las tuberías de desagües y suministro.

En consecuencia, esta situación redujo las horas efectivas de trabajo diario, generando atrasos acumulados en el desarrollo de las labores contempladas dentro del cronograma. Cabe resaltar que se trata de circunstancias ajenas a la voluntad del contratista, de carácter climático y de fuerza mayor, que impactaron directamente en la productividad y el normal desarrollo de la obra.

2. Impacto de los factores identificados en el cronograma

La concurrencia de los factores antes descritos ha ocasionado que, si bien las metas parciales se han ido alcanzando, el ritmo general de avance no se ajuste al plan original. La ejecución ha debido reorganizarse en múltiples ocasiones, generando un esquema de trabajo no lineal que, aunque funcional, no permite concluir la totalidad de las intervenciones dentro del plazo contractual vigente.

3. Fundamentación de la solicitud

Técnica y administrativamente, resulta procedente la solicitud de prórroga del Contrato de Obra No. 1692 de 2025, dado que:
Las condiciones meteorológicas son imprevisibles y constituyen un factor de fuerza mayor.

9. JUSTIFICACIÓN DE LA PRORROGA No 2

En consideración del contexto anteriormente expuesto, en el cual el contratista relaciona los motivos técnicos, legales, administrativos y financieros para solicitar la prórroga al contrato de obra No 1692 de 2025, con la finalidad de promover la ejecución satisfactoria del contrato, evitando perjuicios a la entidad.

Esta solicitud de prorroga No 2 por un tiempo de doce (12) días para el contrato de obra No 1692 de 2025 cuyo objeto es : "MANTENIMIENTO , ADECUACIONES Y REFORMAS A LAS INSTALACIONES DE LOS PUNTOS VIVE DIGITAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO " fue estudiada por la SUPERVISION , quien teniendo en cuenta las causales expuestas por el contratista y la correspondiente justificación , considera pertinente solicitar al ordenador del gasto la aprobación de la prórroga No 2 por doce (12) días al contrato de obra No 1692 de 2025 , a partir del 19 de septiembre de 2025, teniendo como nueva fecha prevista de terminación el 30 de septiembre de 2025.

10. CONCLUSIONES

1. La supervisión estudio la solicitud de la prórroga No 2 por doce (12) días al contrato de obra No 1692 de 2025, presentada el 16 de septiembre de 2025 por el contratista Carlos Augusto Giraldo Rengifo, teniendo en cuenta las causales expuestas en si informe de solicitud y la correspondiente justificación.

2. Con el fin de dar continuidad a las labores de control y seguimiento al contrato de obra, fundamentalmente para poder garantizar el cumplimiento del objeto contractual y poder entregar el proyecto ejecutado en su totalidad a la entidad contratante, cumpliendo con los estándares de calidad establecidos, se requiere continuar con la ejecución por parte

del contratista Carlos Augusto Giraldo Rengifo a través del contrato 1692 de 2025.

3. Por lo anterior expuesto, esta SUPERVISION solicita al ordenador del gasto la aprobación de la Prorroga No 2 por doce (12) días al contrato de obra No 1692 de 2025, a partir del 19 de septiembre de 2025, teniendo como nueva fecha prevista de terminación el 30 de septiembre de 2025.

4. El contratista debe ampliar los plazos del amparo de la garantía única de cumplimiento y del anexo de responsabilidad civil extracontractual.

ANEXOS:
Soportes de pago de la planilla seguridad social
CD. (si aplica, si no, eliminar)
Otros que considere necesarios.

SUPERVISOR: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
CARGO DEL SUPERVISOR: DIRECTOR DE OBRAS CIVILES
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
TELÉFONO DEL SUPERVISOR: 3208613106

Nota: Los datos completos del supervisor son obligatorios, ya que será la persona contacto en caso de alguna modificación al informe.

GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripción de la presente acta de solicitud de adición o prórroga **N°. 02**, el contratista e interventor (y/o supervisor cuando aplique) asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información relacionada con:
- Avance físico ejecutado de la obra
- Valor actual del contrato
- Valor facturado hasta la fecha
- Valor anticipo, si lo hubo
- Valor anticipo amortizado
- Valor anticipo por amortizar
- Condiciónes técnicas y económicas que justifiquen plenamente la necesidad de la adición o prórroga del contrato.

2) El secretario o jefe del sector solicitante y el Supervisor de Contrato velará porque las razones por las cuales se solicita la adición o prórroga del contrato, estén plenamente justificadas ante la administración
3) El Responsable de la dependencia respectiva revisará que la información incluida en el acta sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar estar

A. ANTECEDENTES

CONTRATO No. 1692 (Número de contrato) DE 2025 (Año de suscripción)

NÚMERO DEL PROCESO EN SECOP SMC-066
(Indique en este espacio la identificación de la licitación pública o contratación directa efectuada)

OBJETO DEL CONTRATO:

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REFORMAS A LAS INSTALACIONES DE LOS PUNTOS VIVE DIGITAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 75 días
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 5 (Día) DE Junio (Mes) DE 2025 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO 19 (Día) DE Agosto (Mes) DE 2025 (Año)

PRORROGAS

CONTRATO ADICIONAL No.	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)	FECHA
PRORROGA	TREINTA (30) DÍAS	19/08/2025

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

ACTAS No.	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA DEL CONTRATO 18 (Día) DE Septiembre (Mes) DE 2025 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 120,721,957.42
(Indique el valor del contrato suscrito en números)

VALOR ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL No.	VALOR ($)

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 120,721,957.42
(Indique el valor del contrato suscrito en números)

CONTRATISTA MEGA PROYECTOS E INVERSIONES SAS
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N.A.
(Escriba el nombre o razón social del Interventor del contrato)

SUPERVISOR DELEGADO DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
(Indique el nombre del funcionario designado para ser Supervisor del contrato)

SECRETARIO O JEFE SECTOR SOLICITANTE JUAN CARLOS AGUILAR VASQUEZ
(Escriba el nombre del secretario)

B. OBJETO

El presente documento tiene por objeto solicitar al Municipio de Villavicencio, una prorroga al contrato anterioremente citado de 12 DIAS y una adicion de recursos de $ -

NUEVO PLAZO DE EJECUCION SEGÚN SOLICITUD 117 días
(Indique el tiempo según plazo solicitado)

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 30 de Septiembre de 2025
(Indique la nueva fecha de terminación del contrato según solicitud)

NUEVO VALOR SEGÚN SOLICITUD $ 120,721,957.42
(Indique el nuevo valor del contrato según solicitud)

C. AVANCE FISICO

Hasta el 16 (Dia de corte) del mes SEPTIEMBRE del 2025 el contrato presentaba un avance fisico ejecutado del 64% % contra un avance fisico programado del 80 %

D. ESTADO FINANCIERO

Valor actual del contrato	$ 120,721,957.42	Valor anticipo	
Valor facturado a la fecha	$ -	Valor anticipo amortizado	$ -
Valor por facturar	$ 120,721,957.42	Valor anticipo por amortizar	$ -

E. CAUSALES DE LA SOLICITUD

En términos operativos, se han presentado jornadas de trabajo en las que ha sido necesario reorganizar los frentes de obra de manera constante para optimizar el uso del tiempo disponible y evitar interferencias con el funcionamiento de las instituciones educativas y comunitarias que operan en los Puntos Vive Digital.
Durante los meses de agosto y septiembre de 2025 en la ciudad de Villavicencio se presentaron constantes precipitaciones que afectaron de manera directa las actividades programadas, tales como las excavaciones para el suministro de las tuberías de desagües y suministro.
En consecuencia, esta situación redujo las horas efectivas de trabajo diario, generando atrasos acumulados en el desarrollo de las labores contempladas dentro del cronograma. Cabe resaltar que se trata de circunstancias ajenas a la voluntad del contratista, de carácter climático y de fuerza mayor, que impactaron directamente en la productividad y el normal desarrollo de la obra.

Nota: Cuando se trate de solicitud de adición, debe colocarse en el anexo el acta de modificación de cantidades de obra, el análisis de precios unitarios, el acta de fijacion de precios no previstos, las memorias de calculo de cantidades y el informe de modificatoria todo debidamente suscrito y viabilizado por interventoria y supervision; cuando se trate de solicitud, de prórroga, la reprogramación de obra, los oficios de viabilidad de interventoria e informes. Asi como todos los documentos que sean considerados necesarios por el Municipio y/o supervisor y/o Interventor.

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORIA ACERCA DE LA SOLICITUD
N.A.
