

Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras	Costo	CPTR
1			**CONTRATO GGC-132-2024 ICA CAQUETA**	**139,38 días**	**vie 29/11/24**	**mar 1/04/25**			**$ 350.346.124,00**	**$ 72.135.172,94**
2			INICIO	0 días	vie 29/11/24	vie 29/11/24		9;3;27FC+15 días	$ 0,00	$ 0,00
3			TRAMITES ADMINISTRATIVOS	5 días	vie 29/11/24	mar 3/12/24	2	9	$ 0,00	$ 0,00
4			SUSPENSION No 01	23 días	lun 23/12/24	lun 13/01/25	9FC+18 días	5FC+1 día	$ 0,00	$ 0,00
5			PRORROGA A LA SUSPENSIÓN No 01	51 días	mar 14/01/25	vie 28/02/25	4FC+1 día	6FC+1 día	$ 0,00	$ 0,00
6			REINICIO No 01	2 días	sáb 1/03/25	lun 3/03/25	5FC+1 día	29;18;20;21;22;2	$ 0,00	$ 0,00
7			FINALIZACION INICIAL DEL CONTRATO	0 días	mié 5/03/25	mié 5/03/25	6FC+3 días		$ 0,00	$ 0,00
8		**1**	**PRELIMINARES**	**9 días**	**mar 3/12/24**	**mié 11/12/24**			**$ 8.112.999,00**	**$ 8.112.999,00**
9		1.1	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN POLISOMBRA VERDE O SIMILAR ALTURA 2M	5 días	mar 3/12/24	sáb 7/12/24	2;3	10;4FC+18 días	$ 4.808.500,00	$ 4.808.500,00
10		1.2	CAMPAMENTO CONTENEDOR O SIMILAR	4 días	sáb 7/12/24	mié 11/12/24	9	28;30;33;36;38;5 días	$ 3.304.499,00	$ 3.304.499,00
11		**2**	**MANTENIMIENTO DE PUERTAS EXTERIORES**	**6 días**	**jue 27/03/25**	**mar 1/04/25**			**$ 962.876,00**	**$ 0,00**
12		2.1	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	6 días	jue 27/03/25	mar 1/04/25	67FC+2 días	115	$ 266.256,00	$ 0,00
13		2.2	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL	6 días	jue 27/03/25	mar 1/04/25	67FC+2 días	115	$ 696.620,00	$ 0,00
14		**3**	**MANTENIMIENTO DE MUROS Y FACHADAS EXTERIORES**	**120,38 días**	**dom 15/12/24**	**mar 1/04/25**			**$ 14.206.926,00**	**$ 606.960,00**
15		3.1	KORAZA DOB VIDA SUPERF.REPELLO [3M]	8 días	mar 25/03/25	mar 1/04/25	67	115	$ 10.506.344,00	$ 0,00
16		3.2	PINTURA EN TEJA ASBESTO- FIBRO CEMENTO - BOARD	9 días	dom 15/12/24	lun 23/12/24	10FC+5 días	115	$ 606.960,00	$ 606.960,00
17		3.3	DESMONTE LUMINARIAS	8 días	mar 25/03/25	mar 1/04/25	67	18FC-2 días	$ 522.844,00	$ 0,00
18		3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTORES LED 100W	2 días	lun 31/03/25	mar 1/04/25	17FC-2 días;6	115	$ 2.570.778,00	$ 0,00
19		**4**	**VENTANERIA**	**8 días**	**mar 25/03/25**	**mar 1/04/25**			**$ 14.258.341,00**	**$ 0,00**
20		4.1	PELICULA CONTROL SOLAR-POLARIZADO	2 días	lun 31/03/25	mar 1/04/25	21FC-1 día;6	115	$ 13.458.159,00	$ 0,00
21		4.2	DESMONTE VENTANA EXISTENTE	7 días	mar 25/03/25	lun 31/03/25	67;6	22FC-2 días;20FC-1 día	$ 33.863,00	$ 0,00
22		4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUM.FIJA C.50-20. INCL MARCO	3 días	dom 30/03/25	mar 1/04/25	21FC-2 días;6	115	$ 442.984,00	$ 0,00
23		4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO TRANSPARENTE 4MM CELOSIA (Dimensiones 90x15 cm)	6 días	mié 26/03/25	lun 31/03/25	24FC-2 días;6	115	$ 38.910,00	$ 0,00
24		4.5	DESMONTE VIDRIO	2 días	mié 26/03/25	vie 28/03/25	67FC+1 día;6	23FC-2 días;25FC	$ 29.979,00	$ 0,00
25		4.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO MARTILLADO 4 MM	4 días	mar 25/03/25	sáb 29/03/25	24FC-3 días;6	115	$ 254.446,00	$ 0,00
26		**5**	**CUBIERTAS**	**116 días**	**jue 12/12/24**	**mar 25/03/25**			**$ 81.281.833,00**	**$ 33.001.907,94**
27		5.1	RECORRIDO Y REVISIÓN DE CUBIERTA TEJA A/C	13 días	jue 12/12/24	lun 23/12/24	2FC+15 días		$ 3.865.120,00	$ 3.865.120,00
28		5.2	DESMONTE CUBIERTA FIBRO CEMENTO	10 días	mié 5/03/25	jue 13/03/25	10;54;55;56;60;6		$ 5.758.272,00	$ 4.606.617,60

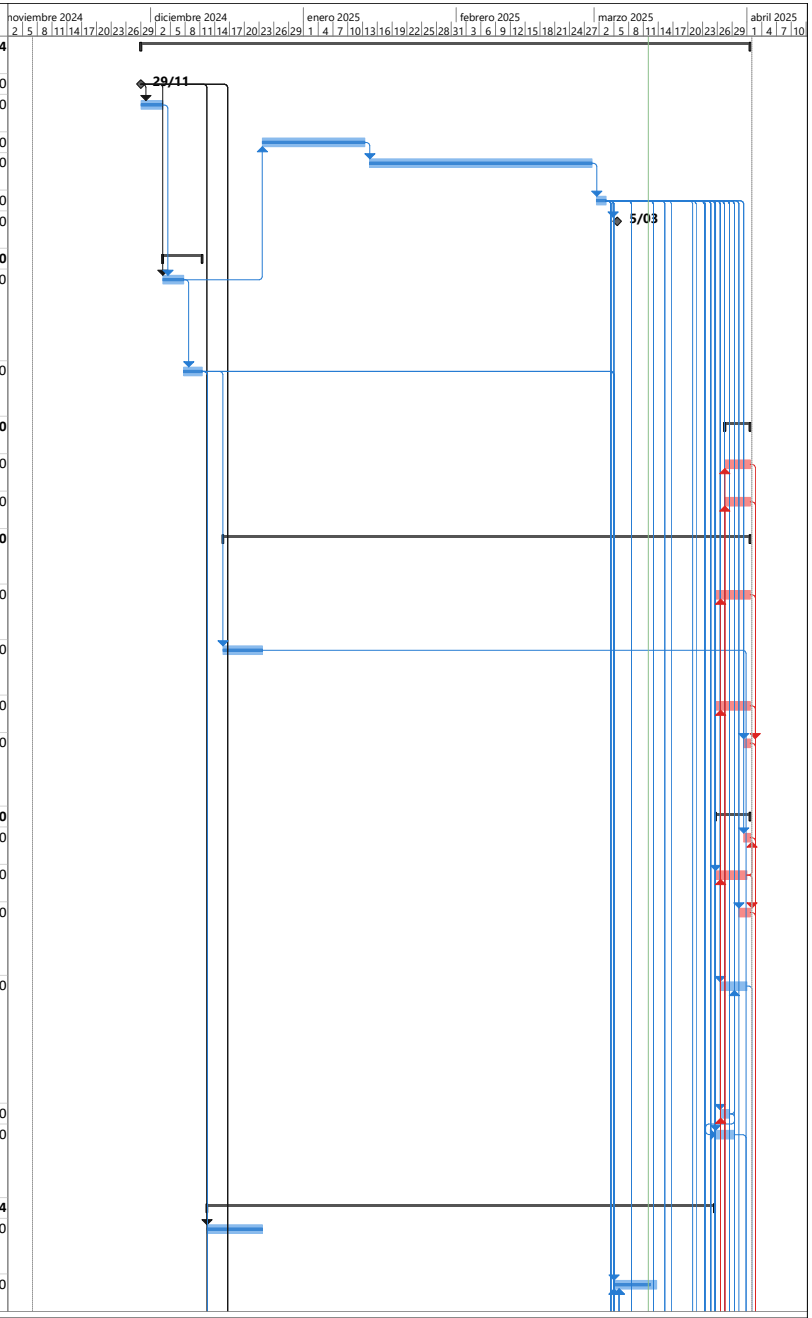

Proyecto:
programacion ica caquta v.5
Fecha: mié 12/03/25

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite	Progreso manual		
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Tareas críticas			
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	División crítica			
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	Progreso			


Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras	Costo	CPTR
29		5.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA FIBRO CEMENTO	25 días	lun 3/03/25	mar 25/03/25	6		$ 49.737.889,00	$ 19.895.155,60
30		5.4	DESM.CUBIERTA ACRILICO-POLICARBON	4 días	mié 5/03/25	sáb 8/03/25	10;54;55;56;60;6	32	$ 17.304,00	$ 17.304,00
31		5.5	LAMINA POLICARBONATO ALVEOLAR 4MM	6 días	dom 16/03/25	sáb 22/03/25	32FC-2 días;6FC+15 días	72;67;69	$ 2.452.654,00	$ 0,00
32		5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO ESTRUCTURAL 100x100x2.5MM	3 días	sáb 8/03/25	mar 18/03/25	30;6FC+15 días	31FC-2 días	$ 12.594.888,00	$ 862.663,56
33		5.7	DEMOL.LOSA CONCRETO E<=20CMS	4 días	mié 5/03/25	sáb 8/03/25	10;54;55;56;60;6	34	$ 64.665,00	$ 64.665,00
34		5.8	EXCAVACION MANUAL Y RETIRO	3 días	sáb 8/03/25	mar 11/03/25	33;6	35FC-3 días	$ 32.332,00	$ 32.332,00
35		5.9	PEDESTAL CONCRETO 3100 PSI 21.0 MPA	14 días	sáb 8/03/25	jue 20/03/25	34FC-3 días;6	72;67;69	$ 228.672,00	$ 65.334,86
36		5.10	DESMONTE BAJANTE	7 días	mié 5/03/25	mar 11/03/25	10;54;55;56;60;6	37	$ 42.810,00	$ 42.810,00
37		5.11	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4	14 días	sáb 8/03/25	dom 23/03/25	36	72;67;69	$ 1.430.814,00	$ 164.606,92
38		5.12	DESMONTE CORREA METALICA	4 días	mié 5/03/25	sáb 8/03/25	10;54;55;56;60;6	39	$ 63.308,00	$ 63.308,00
39		5.13	CORREA MET. TRIANGULAR L=3.00-4.00 MTS	5 días	sáb 8/03/25	mié 12/03/25	38;6	41;40;42;43	$ 4.152.488,00	$ 3.321.990,40
40		5.14	CANAL AMAZONAS PVC AGUAS LLUVIAS (Ala alta:13.5cm x Ala baja: 9.6cm x Base: 12cm)	10 días	jue 13/03/25	vie 21/03/25	39;6	72;67;69	$ 450.743,00	$ 0,00
41		5.15	ACCESORIO (UNION-CODO) BAJANTE CANAL AMAZONA. Tubo cuadrado 64.77x61.21 mm)	9 días	jue 13/03/25	jue 20/03/25	39;6	72;67;69	$ 183.880,00	$ 0,00
42		5.16	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC (Tubo cuadrado 64.77x61.21 mm)	10 días	jue 13/03/25	vie 21/03/25	39;6	72;67;69	$ 183.174,00	$ 0,00
43		5.17	TAPA EXTERNA CANAL AMAZONAS PVC (Dimensiones 94.9x162.3x142.3mm)	10 días	jue 13/03/25	vie 21/03/25	39;6	72;67;69;90;98;1	$ 22.820,00	$ 0,00
44		**6**	**AREAS COMUNES**	**9 días**	**dom 23/03/25**	**lun 31/03/25**			**$ 16.836.057,00**	**$ 0,00**
45		6.1	DEMOL.PAVIMENTO FLEXIBLE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO)	3 días	mar 25/03/25	vie 28/03/25	67;6	47FC-2 días	$ 728.422,00	$ 0,00
46		6.2	ALISTADO PISO 4CM	4 días	dom 23/03/25	mié 26/03/25	72FC-2 días;6	75FC-2 días;78FC	$ 1.846.728,00	$ 0,00
47		6.3	LOSA CONCRETO 15CM 3000 PSI PARQUEADERO VEHICULAR	3 días	mié 26/03/25	sáb 29/03/25	45FC-2 días;6	115	$ 7.829.730,00	$ 0,00
48		6.4	LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE-EQ.PRESION	3 días	mié 26/03/25	sáb 29/03/25	115FF-4 días;6		$ 285.521,00	$ 0,00
49		6.5	REJILLA HIERRO D=1/2" E=1/2 1.50x.40MTS	2 días	sáb 29/03/25	lun 31/03/25	115FF-2 días;6		$ 1.654.136,00	$ 0,00
50		6.6	RETIRO PRADO MALEZA	2 días	sáb 29/03/25	lun 31/03/25	115FF-2 días		$ 123.530,00	$ 0,00
51		6.7	EMPRADIZACIÓN (PRADO FINO O PRADO CHINO)	2 días	sáb 29/03/25	lun 31/03/25	115FF-2 días;6		$ 4.367.990,00	$ 0,00
52		**7**	**CERRAMIENTO**	**125,38 días**	**mié 11/12/24**	**mar 1/04/25**			**$ 52.180.422,00**	**$ 28.445.007,00**

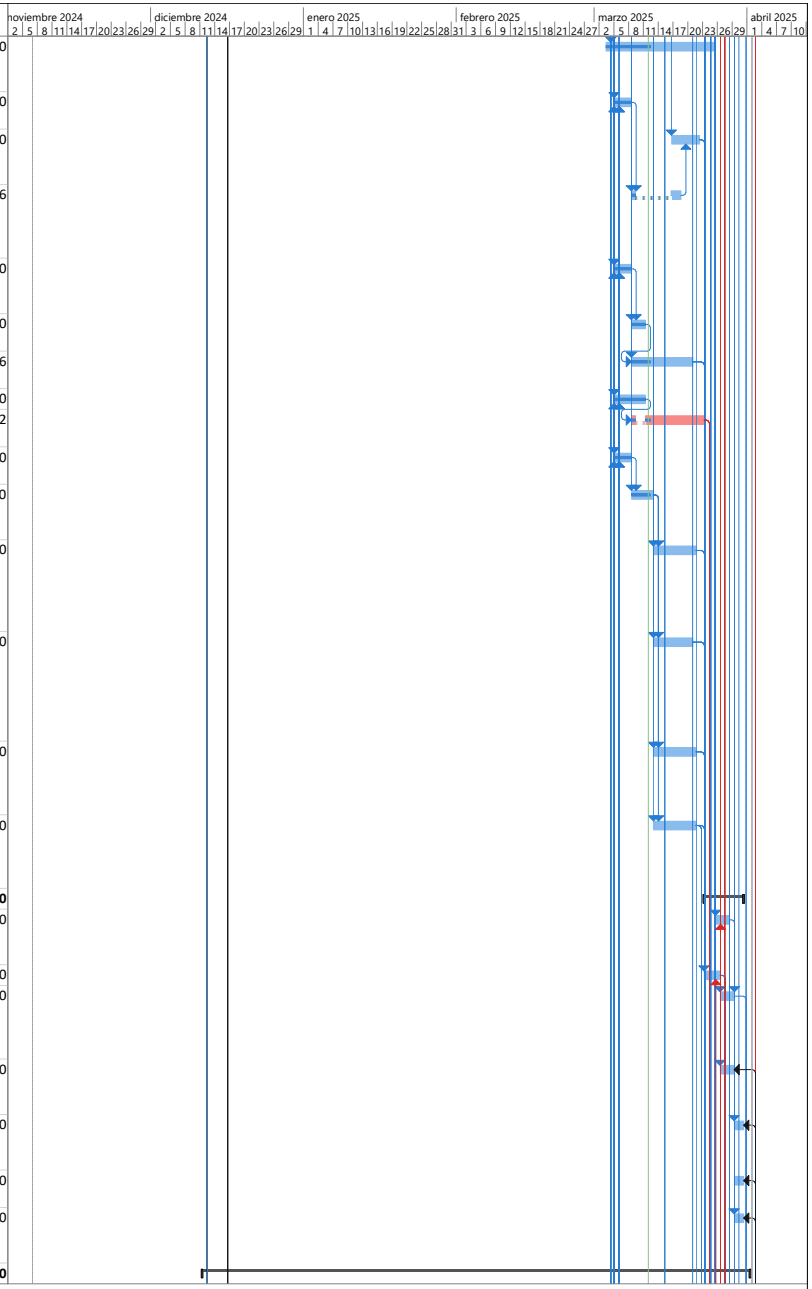

Proyecto:
programacion ica caquta v.5
Fecha: mié 12/03/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras	Costo	CPTR
53		7.1	LIMPIEZA - ASEO MALLA ESLABONADA	7 días	mié 11/12/24	mar 17/12/24	10	54FC-3 días;55FC-3	$ 482.632,00	$ 482.632,00
54		7.2	ESMALTE MALLA ESLABONADA 2 CARAS	2 días	lun 3/03/25	mar 4/03/25	53FC-3 días;59FC-3 días;61FC-3	38;36;33;30;28	$ 2.955.992,00	$ 2.955.992,00
55		7.3	ESMALTE MARCO METALICO	2 días	lun 3/03/25	mar 4/03/25	53FC-3 días;59FC-3	38;36;33;30;28	$ 3.989.024,00	$ 3.989.024,00
56		7.4	ESMALTE PARALES METALICOS	2 días	lun 3/03/25	mar 4/03/25	53FC-3 días;59FC-3	38;36;33;30;28	$ 1.186.851,00	$ 1.186.851,00
57		7.5	DEMOL.SARDINEL CONCRETO (30x15)	4 días	lun 24/03/25	vie 28/03/25	72;6	58FC-2 días	$ 89.820,00	$ 0,00
58		7.6	SARDINEL EN CONCRETO 30X15	4 días	mié 26/03/25	dom 30/03/25	57FC-2 días;6	115	$ 1.373.360,00	$ 0,00
59		7.7	LIMPIEZA - ASEO REJA EXTERIOR	7 días	mié 11/12/24	mar 17/12/24	10	54FC-3 días;55FC-3	$ 176.778,00	$ 176.778,00
60		7.8	ESMALTE REJA (PARALES VERT. 1,2M HORIZ. 2,5 M)	6 días	dom 15/12/24	vie 20/12/24	53FC-3 días;59FC-3 días;61FC-3 días	38;36;33;30;28	$ 5.016.430,00	$ 5.016.430,00
61		7.9	LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE-EQ.PRESION	7 días	mié 11/12/24	mar 17/12/24	10	54FC-3 días;55FC-3 días;56FC-3	$ 2.082.237,00	$ 2.082.237,00
62		7.10	KORAZA DOB VIDA SUPERF.REPELLO [3M]	6 días	dom 15/12/24	vie 20/12/24	61FC-3 días;53FC-3 días;59FC-3 días	38;36;33;30;28	$ 12.555.063,00	$ 12.555.063,00
63		7.11	TAPA CAJA MARCO ANGULO 80X80	5 días	vie 28/03/25	mar 1/04/25	115FF;6		$ 200.200,00	$ 0,00
64		7.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARAL METALICO 2" PARA CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA H. 2,8 M	5 días	vie 28/03/25	mar 1/04/25	115FF;6		$ 533.010,00	$ 0,00
65		7.13	Suministro e instalcion de CONCERTINA DE ø 14" DE SEGURIDAD 3 lineas (incluye todo lo necesario para su correcta instalacion)	5 días	vie 28/03/25	mar 1/04/25	115FF;6		$ 21.539.025,00	$ 0,00
66		**8**	**PAREDES Y TECHOS**	**11 días**	**dom 23/03/25**	**mar 1/04/25**			**$ 73.529.441,00**	**$ 0,00**
67		8.1	LIMPIEZA GENERAL MUROS INTERNOS	3 días	dom 23/03/25	mar 25/03/25	43;42;41;40;37;3	68;45;12FC+2 días;13FC+2	$ 2.686.659,00	$ 0,00
68		8.2	ESTUCO Y VINILO MURO TIPO 1 [3M]	8 días	mar 25/03/25	mar 1/04/25	69;67;6	115	$ 41.437.908,00	$ 0,00
69		8.3	RASQUETEADA-LIJADA	3 días	dom 23/03/25	mar 25/03/25	43;42;41;40;37;3	68;101	$ 154.631,00	$ 0,00
70		8.4	DESM.DIVISION PANEL LAMINA YESO-BOARD	3 días	lun 24/03/25	jue 27/03/25	72;6	71FC-2 días	$ 1.991.892,00	$ 0,00
71		8.5	SUMINISTRO E NSTALACIÓN DE CIELO RASO EN BOARD INCL. PINTURA	8 días	mar 25/03/25	mar 1/04/25	70FC-2 días;6	115	$ 25.404.903,00	$ 0,00
72		8.6	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE CERAMICO.	2 días	dom 23/03/25	lun 24/03/25	43;42;41;40;37;3	73FC-2 días;81;70;57;74	$ 56.757,00	$ 0,00
73		8.7	REPELLO O REVOQUE DE MURO CON MORTERO 1:3	5 días	dom 23/03/25	jue 27/03/25	72FC-2 días;6	75FC-2 días;78FC-2 días	$ 102.967,00	$ 0,00
74		8.8	EXCAVACION MANUAL Y RETIRO	5 días	lun 24/03/25	sáb 29/03/25	72;6		$ 48.948,00	$ 0,00
75		8.9	ENCHAPE CERAMICA 20X20 -1 CALIDAD	8 días	mar 25/03/25	mar 1/04/25	73FC-2 días;46FC-2	115	$ 612.530,00	$ 0,00
76		8.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE. Long. 2 m y 3 soportes	3 días	dom 30/03/25	mar 1/04/25	115FF;6		$ 1.032.246,00	$ 0,00

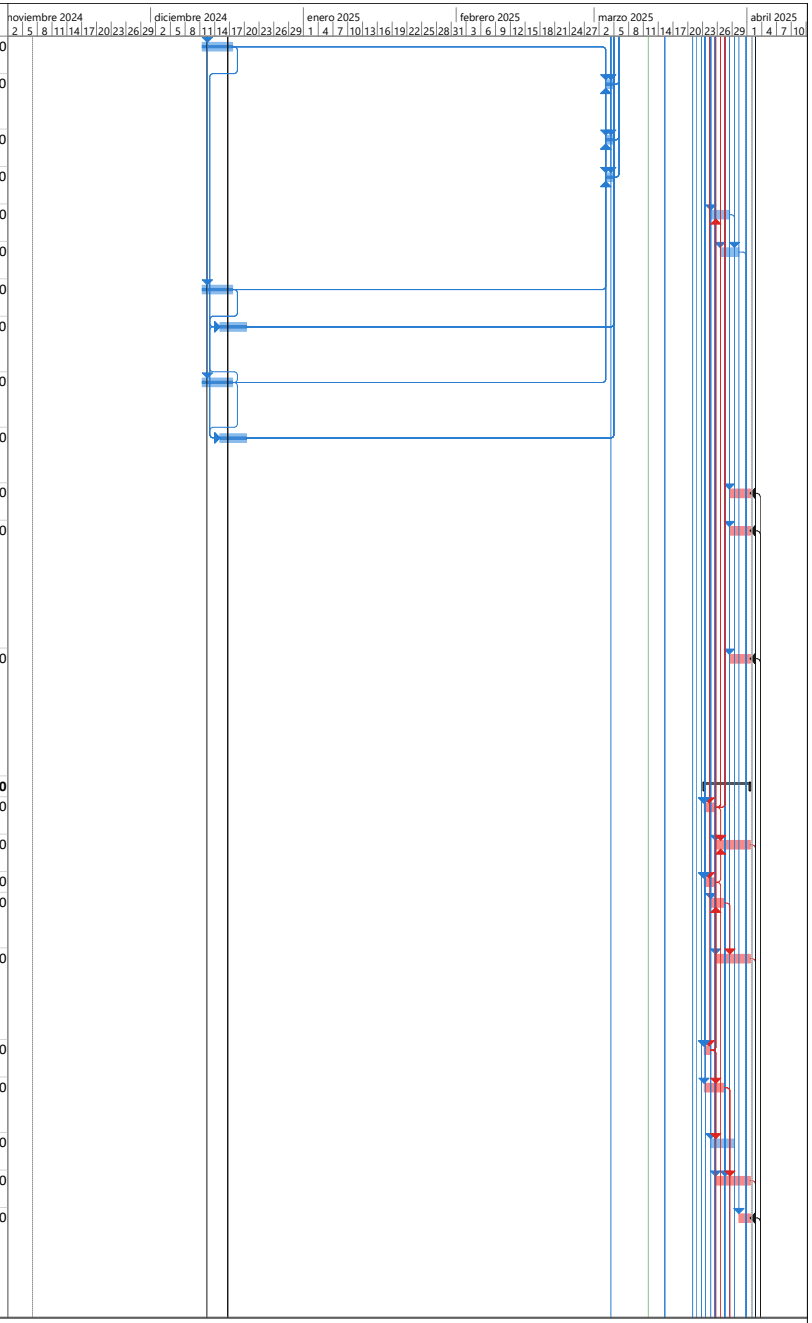

Proyecto:
programacion ica caquta v.5
Fecha: mié 12/03/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras	Costo	CPTR
77		**9**	**PISOS**	**8 días**	**mar 25/03/25**	**mar 1/04/25**			**$ 67.311,00**	**$ 0,00**
78		9.1	CERAMICA PISO-PARED 20-50X20-50CM	8 días	mar 25/03/25	mar 1/04/25	73FC-2 días;46FC-2 días;6	115	$ 67.311,00	$ 0,00
79		**10**	**BAÑOS**	**119,38 días**	**lun 16/12/24**	**mar 1/04/25**			**$ 8.809.251,00**	**$ 90.635,00**
80		10.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA (NAVE LAM.LLENA BAT.+CERRADURA.+PIN CAL.20 (2.05X0.7))	5 días	vie 28/03/25	mar 1/04/25	81;6	115	$ 414.437,00	$ 0,00
81		10.2	DESMONTE DE DIVISION EN LAMINA DE BAÑOS	4 días	lun 24/03/25	vie 28/03/25	72;6	80;82;83;84	$ 71.248,00	$ 0,00
82		10.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISION METALICA BAÑO LAMINA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE18	5 días	vie 28/03/25	mar 1/04/25	81;6	115	$ 7.775.108,00	$ 0,00
83		10.4	MUEBLE-TAPA SANITARIO PVC	5 días	vie 28/03/25	mar 1/04/25	81;6	115	$ 49.540,00	$ 0,00
84		10.5	DIV.BANO A.INOX ORINAL 96X46CM C.18	5 días	vie 28/03/25	mar 1/04/25	81;6	115	$ 408.283,00	$ 0,00
85	✓	10.6	REUBICACIÓN ORINAL	8 días	lun 16/12/24	lun 23/12/24	2FC+20 días	115	$ 90.635,00	$ 90.635,00
86		**11**	**MOBILIARIO**	**124 días**	**jue 12/12/24**	**mar 1/04/25**			**$ 6.371.134,00**	**$ 177.707,00**
87	✓	11.1	DESMONTE DIVISIONES DE OFICINA	7 días	jue 12/12/24	mié 18/12/24	2FC+15 días	88	$ 177.707,00	$ 177.707,00
88		11.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN VIDRIO TEMPLADO 8 MM ALTURA 2M	13 días	vie 21/03/25	mar 1/04/25	87;6FC+20 días	115	$ 6.193.427,00	$ 0,00
89		**12**	**OTROS**	**119 días**	**lun 16/12/24**	**mar 1/04/25**			**$ 8.852.323,00**	**$ 1.699.957,00**
90		12.1	DESMONTE MUEBLE BAJO MADERA	2 días	vie 21/03/25	dom 23/03/25	43;6	94	$ 1.773.771,00	$ 0,00
91		12.2	ESTUCO Y VINILO MURO TIPO 1 [3M]	6 días	jue 27/03/25	mar 1/04/25	97;96;94;95;6	115	$ 1.073.215,00	$ 0,00
92	✓	12.3	DEMOLICION DE MESON EN CONCRETO Y GRANITO	8 días	lun 16/12/24	lun 23/12/24	2FC+20 días	96FC-5 días;97FC-5 días;94	$ 88.689,00	$ 88.689,00
93	✓	12.4	DESMONTE DE GRIFERIA LAVAPLATOS (GRIFO, LLAVE, ACCESORIOS, TUBERIA)	8 días	lun 16/12/24	lun 23/12/24	2FC+20 días	96FC-5 días;97FC-5 días;94;95	$ 28.066,00	$ 28.066,00
94		12.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COCINA INTEGRAL ACERO INOX. 2.10M	4 días	dom 23/03/25	jue 27/03/25	93;90;92;6	91	$ 3.277.060,00	$ 0,00
95	✓	12.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFERIA LAVAPLATOS SENC	4 días	lun 3/03/25	jue 6/03/25	93;6	91	$ 34.153,00	$ 34.153,00
96	✓	12.7	DESAGUE PARA LAVAPLATOS. (INCL. DEMOLICIÓN DE PISO, EXCAVACIÓN, REGATA EN PARED, RESANE, ESTUCO, PINTURA, INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE DESAGUE 4", RELLENO Y REPOSICIÓN DE PISO)	5 días	jue 19/12/24	lun 23/12/24	93FC-5 días;92FC-5 días	91	$ 1.457.796,00	$ 1.457.796,00

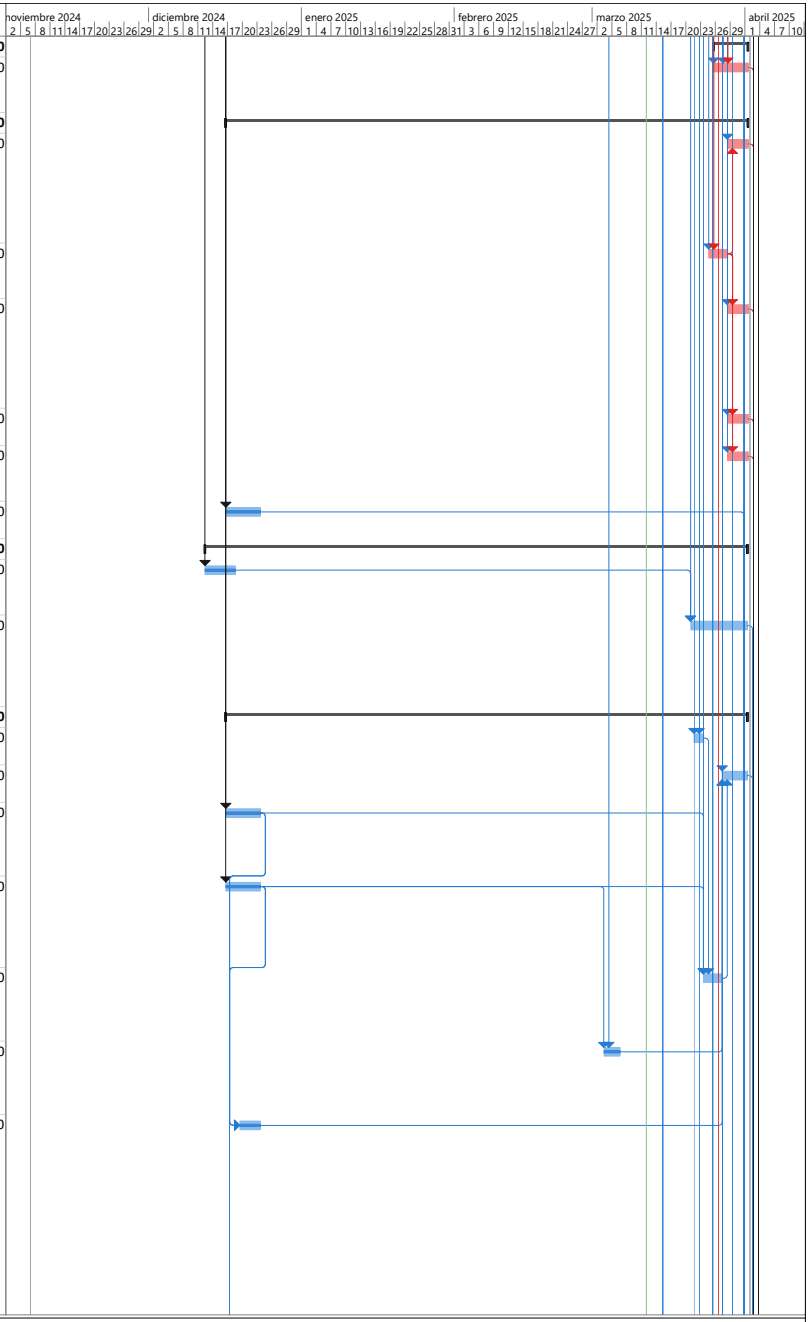

Proyecto:
programacion ica caquta v.5
Fecha: mié 12/03/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras	Costo	CPTR
97		12.8	SELLADO DE DESAGUE	5 días	jue 19/12/24	lun 23/12/24	93FC-5 días;92FC-5 días	91	$ 91.253,00	$ 91.253,00
98		12.9	DEMOLICIÓN MURO EN MAMPOSTERÍA E = 0,15 m	4 días	vie 21/03/25	mar 25/03/25	43;6	99	$ 442.577,00	$ 0,00
99		12.10	CONSTRUCCIÓN MURO EN MAMPOSTERÍA E = 0,15 m	8 días	mar 25/03/25	mar 1/04/25	98;6	115	$ 585.743,00	$ 0,00
100		**13**	**ELECTRICO Y LUMINARIAS**	**12,38 días**	**vie 21/03/25**	**mar 1/04/25**			**$ 56.635.460,00**	**$ 0,00**
101		13.1	RETIRO LAMPARA	4 días	mar 25/03/25	sáb 29/03/25	69	102;103	$ 148.316,00	$ 0,00
102		13.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMPARA TIPO LED 1.20X0.2. M INCL. BALASTO Y CARCASA	4 días	sáb 29/03/25	mar 1/04/25	101;6	115	$ 1.625.580,00	$ 0,00
103		13.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMPARA TIPO PANEL LED 0.60X0.60 M	4 días	sáb 29/03/25	mar 1/04/25	101;6	115	$ 384.036,00	$ 0,00
104		13.4	DESMONTE AIRE ACONDICIONADO	4 días	vie 21/03/25	mar 25/03/25	43	106FC-1 día;110;111;107	$ 1.496.870,00	$ 0,00
105		13.5	SUMINISTRO E NSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU/H	2 días	mar 25/03/25	jue 27/03/25	106FC-2 días;6	115;107;108;109	$ 42.895.180,00	$ 0,00
106		13.6	SALIDA ELÉCTRICA PARA AIRE ACONDICIONADO	3 días	lun 24/03/25	jue 27/03/25	104FC-1 día	105FC-2 días	$ 957.350,00	$ 0,00
107		13.7	SALIDA VOZ Y DATOS	6 días	jue 27/03/25	mar 1/04/25	104;105;6	115	$ 1.455.480,00	$ 0,00
108		13.8	Revisión red de voz y datos y de CCTV, redes, panel de control, camaras y monitores para áreas administrativas y de laboratorio)	6 días	jue 27/03/25	mar 1/04/25	104;105;6	115	$ 4.889.400,00	$ 0,00
109		13.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA MALLA PORTACABLE 60X100mm	6 días	jue 27/03/25	mar 1/04/25	104;105;6	115	$ 876.266,00	$ 0,00
110		13.10	SALIDA ELÉCTRICA (COCINA)	6 días	jue 27/03/25	mar 1/04/25	104;105;6	115	$ 173.362,00	$ 0,00
111		13.11	REVISIÓN Y REPOSICIÓN DE TOMAS ELÉCTRICOS	6 días	jue 27/03/25	mar 1/04/25	104;105;6	115	$ 1.733.620,00	$ 0,00
112		**14**	**MANEJO AMBIENTAL**	**20 días**	**sáb 15/03/25**	**mar 1/04/25**			**$ 8.241.750,00**	**$ 0,00**
113		14.1	GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN (CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS Y MATERIAL SOBRANTE) viaje 6 m3	20 días	sáb 15/03/25	mar 1/04/25	115FF;6		$ 4.589.175,00	$ 0,00
114		14.2	RETIRO DE INSERVIBLES DE LA SEDE (MATERIAL APROVECHABLE) Viaje 6m3	20 días	sáb 15/03/25	mar 1/04/25	115FF;6		$ 3.652.575,00	$ 0,00
115			FIN	0 días	mar 1/04/25	mar 1/04/25	88;78;75;91;99;8	76FF;63FF;64FF;1	$ 0,00	$ 0,00

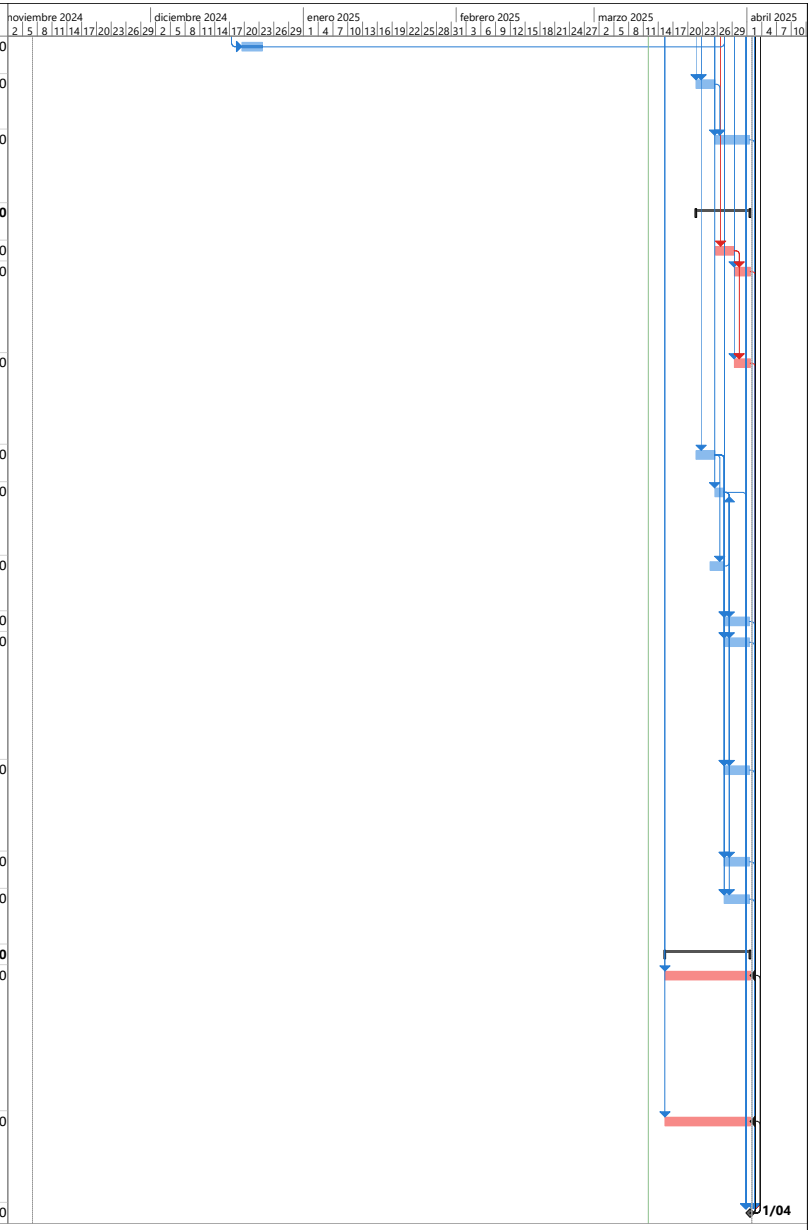

Proyecto:
programacion ica caquta v.5
Fecha: mié 12/03/25

Tarea | Resumen del proyecto | Tarea manual | solo el comienzo | Fecha límite | Progreso manual
División | Tarea inactiva | solo duración | solo fin | Tareas críticas
Hito | Hito inactivo | Informe de resumen manual | Tareas externas | División crítica
Resumen | Resumen inactivo | Resumen manual | Hito externo | Progreso

YURY YOHANA SUAREZ
R INGENIERÍA Y CONSTRUCCI N S.A.S

KATHERINE GARCÍA PLAZAS
ARGOK INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
