Instituto de Cultura y Turismo de Yopal

NIT. 901403046-7

ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA

FO-GJ-21
2025-06-09
V.01

FECHA:	DD	MM	AA	CONTRATO No. 118-2025
	14	5	2025	

INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE YOPAL - ICTY

ACTA No. 1 DE TERMINACION DE CONTRATO POR

VENCIMIENTO DE PLAZO ☑ **CUMPLIMIENTO OBJETO CONTRACTUAL** ☐

OBRA TERMINADA ☐

INTERVENTORIA ☐ **CONSULTORIA** ☐ **OBRA** ☑

TIPO DE CONSULTORIA

CONTRATO No 118 DE 2025

VIGENCIA 2025

LICITACION PUBLICA ☐ **CONCURSO DE MERITOS** ☐

CONTRATACION DIRECTA ☐

OBJETO DELCONTRATO

REALIZAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE ARCHIVO AREA DE DANZAS Y LA ADECUACIÓN DE UNA NUEVA OFICINA MULTIPLE DENTRO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 6 No. 19 – 55 DEL MUNICIPIO DE YOPAL, LUGAR DONDE FUNCIONA Y OPERA EL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE YOPAL.

LOCALIZACION DEL PROYECTO Sede Administrativa Instituto de Cultura y Turismo de Yopal - ICTY, ubicada en la Calle 6 #19-55.

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO UN (1) MES

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 14 (Día) **DE** 4 (Mes) **DE** 2025 (Año)

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 13 (Día) **DE** 5 (Mes) **DE** 2025 (Año)

FECHA TERMINACIÓN CON PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES: N/A

VALOR DEL CONTRATO $ 35.647.087,00
VALOR ADICIONAL $ 4.161.685,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO $ 39.808.772,00

TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE.

CONTRATISTA	INTER - ESTELAR CONSTRUCCIONES S.A.S. R/L LUIS DARIO BLANCO LIZARAZO
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	ANA MALENA CORREA GUERRA

En Yopal, a los catorce (14) días del mes de mayo de 2025, se reunieron LUIS DARIO BLANCO LIZARAZO representante legal de INTER - ESTELAR CONSTRUCCIONES S.A.S. en calidad de contratista de obra y ANA MALENA CORREA GUERRA Subdirectora administrativa y financiera del ICTY en calidad de Supervisor, con el fin de terminar el contrato de obra No. 118 de 2025, dado que el Contratista de obra CUMPLIÓ con el objeto contractual.

A.TRABAJO EJECUTADO

OBSERVACIONES

Las cantidades finales se establecen en el acta de recibo final.

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA SOBRE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

Describa aspectos referentes a la calidad de los trabajos realizados,

La supervisión verifica que las actividades contratadas se hayan ejecutado y cuyas modificaciones se hayan estipulado en su momento y estén debidamente autorizadas y aprobadas, cumpliendo a cabalidad con el objeto contractual, quedando únicamente por verificar lo estipulado en "B. TRABAJO FALTANTE" el cual hace parte de la presente acta.

Nota: Las obras y trabajos que presentan observaciones por parte de la interventoria estan relacionadas en en esta acta y se tendran en cuenta para la liquidación del contrato de obra de acuerdo con la cláusula No. QUINTA del contrato anteriormente citado.

B. TRABAJO FALTANTE

SI ☐ **NO** ☑

Los trabajos descritos son el soporte para que EL INSTITUTO inicie las acciones legales tendientes al reconocimiento y pago de las multas previstas en la cláusula No. SEPTIMA del contrato.

(Indique el número de la cláusula del contrato que establece multas por incumplimiento del contratista)

La terminación de los trabajos, no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia y las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener las garantias de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 14 días del mes de mayo de 2025

Firma

INTER - ESTELAR CONSTRUCCIONES S.A.S.
R/L LUIS DARIO BLANCO LIZARAZO
Contratista

Firma N/A

Nombre
Interventor

Firma

ANA MALENA CORREA GUERRA
Subdirectora administrativa y financiera - ICTY
Supervisor

Original Oficina Juridica y copias para interventoria, supervision y dependencia responsable

	LIQUIDACIÓN **MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	**INTER-ESTELAR CONSTRUCCIONES S.A.S.**


CONTRATISTA: INTER-ESTELLAR CONSTRUCCIONES S.A.S.

OBJETO: REALIZAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE ARCHIVO AREA DE DANZAS Y LA ADECUACIÓN DE UNA NUEVA OFICINA MULTIPLE DENTRO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 6 No. 19 – 55 DEL MUNICIPIO DE YOPAL, LUGAR DONDE FUNCIONA Y OPERA EL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE YOPAL.

CAPITULO 1 - ARCHIVO GENERAL


Item	Unidad	Descripción	INFORME LIQUIDACIÓN
1.1	m	Reparación de cubiertas con cinta de aluminio bituminosa a=0.15 m, para sello de juntas o fisuras	

















DESCRIPCIÓN	LONG.	ANCHO	ALTO	CANT.	SUB TOTAL
Muro culata posterior oficinas y archivo	12.56			1.00	12.56
Resane anclaje de cubierta oficina de archivo	1.00			1.00	1.00

UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD EJECUTADA	13.56
m		

RENATO DARIO BLANCO LIZARAZO
INTERESTELAR CONSTRUCCIONES S.A.S.


	LIQUIDACIÓN MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA	INTER-ESTELAR CONSTRUCCIONES S.A.S.

CONTRATISTA: INTER-ESTELLAR CONSTRUCCIONES S.A.S.

OBJETO: REALIZAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE ARCHIVO AREA DE DANZAS Y LA ADECUACIÓN DE UNA NUEVA OFICINA MULTIPLE DENTRO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 6 No. 19 – 55 DEL MUNICIPIO DE YOPAL, LUGAR DONDE FUNCIONA Y OPERA EL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE YOPAL.

CAPITULO 1 - ARCHIVO GENERAL

Item	Unidad	Descripción	INFORME ADICIONAL No. 1
1.2	m2	Limpieza y mantenimiento de muros internos y externos, lavado, resanes, y pintura (3 manos)	

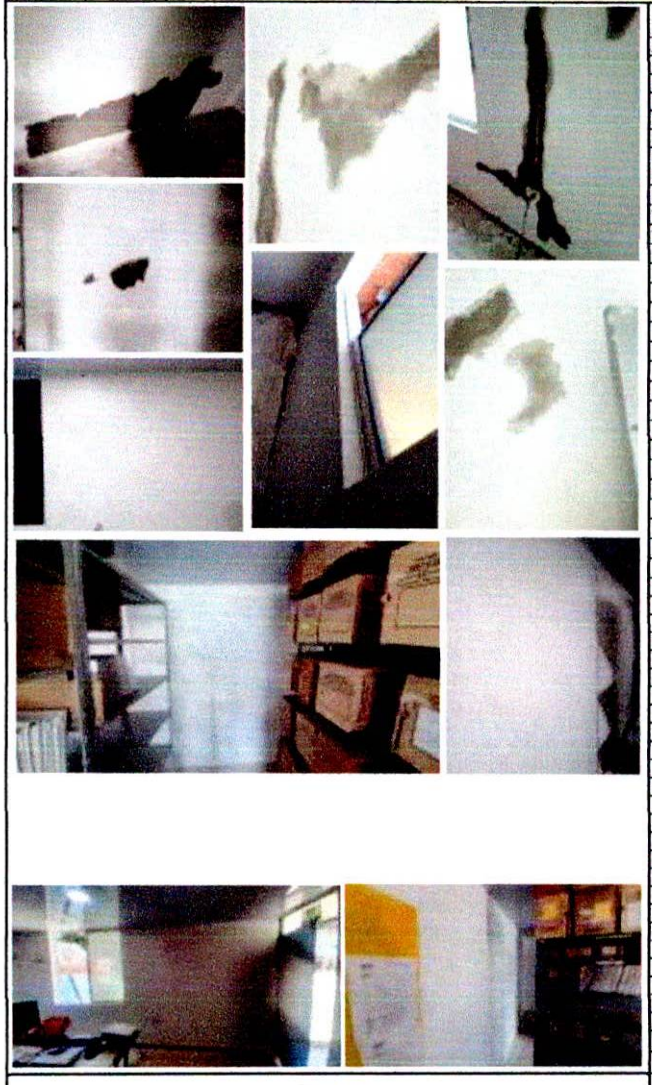

DESCRIPCIÓN	LONG.	ANCHO	ALTO	CANT.	SUB TOTAL
AREA ARCHIVO					
Muro interno		5.01	2.26	1.00	11.32
Muro interno		5.01	2.26	1.00	11.32
Muro interno		5.35	2.26	1.00	12.09
Muro interno		5.35	2.26	1.00	12.09
Muro externo		5.01	2.33	1.00	11.67
Muro externo fachada lateral		5.35	0.14	1.00	0.75
		5.35	0.13	1.00	0.70
Descuentos					
Vano puerta		0.96	2.33	-1.00	-2.24
Vano ventana		1.50	1.50	-2.00	-4.50
UNIDAD DE MEDIDA m2		CANTIDAD EJECUTADA			53.21

R/L LUIS DARIO BLANCO LIZARAZO
INTER-ESTELAR CONSTRUCCIONES S.A.S.

	LIQUIDACIÓN MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA	INTER-ESTELAR CONSTRUCCIONES S.A.S.


CONTRATISTA: INTER-ESTELLAR CONSTRUCCIONES S.A.S.

OBJETO: REALIZAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE ARCHIVO AREA DE DANZAS Y LA ADECUACIÓN DE UNA NUEVA OFICINA MULTIPLE DENTRO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 6 No. 19 – 55 DEL MUNICIPIO DE YOPAL, LUGAR DONDE FUNCIONA Y OPERA EL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE YOPAL.

CAPITULO 2 - ADECUACION OFICINAS

Item	Unidad	Descripción	INFORME LIQUIDACIÓN
2.1	m2	Ventana con marco en aluminio corrediza (Sistema 8025) mate con montante y vidrio crudo de 6 mm. Suministro e Instal.	

VENTANAS NUEVA OFICINA

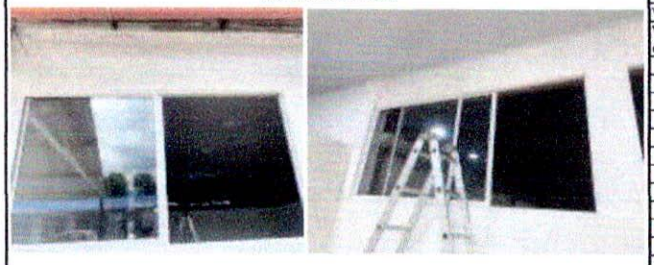

VENTANA ACCESO AREA DE DANZAS



DESCRIPCIÓN	LONG.	ANCHO	ALTO	CANT.	SUB TOTAL
Ventana oficina nueva		2.48	1.20	1.00	2.98
Ventana oficina nueva		2.48	1.20	1.00	2.98
Ventana acceso area danzas		1.71	1.60	1.00	2.74

UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD EJECUTADA	8.69
m2		

WILLIS DARIO BLANCO LIZARAZO
INTER-ESTELAR CONSTRUCCIONES S.A.S.

	LIQUIDACIÓN MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA	INTER-ESTELAR CONSTRUCCIONES S.A.S.

CONTRATISTA: INTER-ESTELLAR CONSTRUCCIONES S.A.S.

OBJETO: REALIZAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE ARCHIVO AREA DE DANZAS Y LA ADECUACIÓN DE UNA NUEVA OFICINA MULTIPLE DENTRO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 6 No. 19 – 55 DEL MUNICIPIO DE YOPAL, LUGAR DONDE FUNCIONA Y OPERA EL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE YOPAL.

CAPITULO 2 - ADECUACION OFICINAS

Item	Unidad	Descripción	INFORME LIQUIDACIÓN
2.2	m2	Muro en bloque No. 4 arcilla estándar de 0.10 m (30 x 10 x 20)	





DESCRIPCIÓN	LONG.	ANCHO	ALTO	CANT.	SUB TOTAL
Muro antepecho nueva oficina		5.25	1.00	1.00	5.25

UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD EJECUTADA	5.25
m2		

PX. LUIS DARIO BLANCO LIZARAZO
INTER-ESTELAR CONSTRUCCIONES S.A.S.

	LIQUIDACIÓN MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA	INTER-ESTELAR CONSTRUCCIONES S.A.S.

CONTRATISTA: INTER-ESTELLAR CONSTRUCCIONES S.A.S.

OBJETO: REALIZAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE ARCHIVO AREA DE DANZAS Y LA ADECUACIÓN DE UNA NUEVA OFICINA MULTIPLE DENTRO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 6 No. 19 – 55 DEL MUNICIPIO DE YOPAL, LUGAR DONDE FUNCIONA Y OPERA EL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE YOPAL.

CAPITULO 2 - ADECUACION OFICINAS

Item	Unidad	Descripción	INFORME LIQUIDACIÓN
2.3	m2	Pintura exterior acrílica tipo koraza o similar sobre muros 3 manos, incluye andamio colgante	



DESCRIPCIÓN	LONG.	ANCHO	ALTO	CANT.	SUB TOTAL
Culata muro lateral exterior		5.35	1.40	1.00	3.75
Nota: El muro tiene forma triangular por lo que se divide el area en dos.					
UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD EJECUTADA			3.75
m2					

R/L LUIS DARIO BLANCO LIZARAZO
INTER-ESTELAR CONSTRUCCIONES S.A.S.

INTER-ESTELAR CONSTRUCCIONES S.A.S.	**LIQUIDACIÓN** **MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	**INTER-ESTELAR CONSTRUCCIONES S.A.S.**

CONTRATISTA: INTER-ESTELLAR CONSTRUCCIONES S.A.S.

OBJETO: REALIZAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE ARCHIVO AREA DE DANZAS Y LA ADECUACIÓN DE UNA NUEVA OFICINA MULTIPLE DENTRO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 6 No. 19 – 55 DEL MUNICIPIO DE YOPAL, LUGAR DONDE FUNCIONA Y OPERA EL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE YOPAL.

CAPITULO 2 - ADECUACION OFICINAS

Item	Unidad	Descripción	INFORME LIQUIDACIÓN
2.4	m2	Pañete interior impermeabilizado 1:4, espesor 1.5 cm	





DESCRIPCIÓN	LONG.	ANCHO	ALTO	CANT.	SUB TOTAL
Muro nuevo en mamposteria		5.25	1.00	2.00	10.50

UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD EJECUTADA	
m2		10.50

ING. LUIS DARIO BLANCO LIZARAZO
INTER-ESTELAR CONSTRUCCIONES S.A.S.

INTER-ESTELAR CONSTRUCCIONES S.A.S.	**LIQUIDACIÓN** **MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	**INTER-ESTELAR CONSTRUCCIONES S.A.S.**

CONTRATISTA: INTER-ESTELLAR CONSTRUCCIONES S.A.S.

OBJETO: REALIZAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE ARCHIVO AREA DE DANZAS Y LA ADECUACIÓN DE UNA NUEVA OFICINA MULTIPLE DENTRO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 6 No. 19 – 55 DEL MUNICIPIO DE YOPAL, LUGAR DONDE FUNCIONA Y OPERA EL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE YOPAL.

CAPITULO 2 - ADECUACION OFICINAS

Item	Unidad	Descripción	INFORME LIQUIDACIÓN
2.5	m	Filos y dilataciones 1:4	





DESCRIPCIÓN	LONG.	ANCHO	ALTO	CANT.	SUB TOTAL
Vano inferior nuevas ventanas		5.25		1.00	5.25

UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD EJECUTADA	
m		5.25

VB/ LUIS DARIO BLANCO LIZARAZO
INTER-ESTELAR CONSTRUCCIONES S.A.S.


	LIQUIDACIÓN MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA	INTER-ESTELAR CONSTRUCCIONES S.A.S.

CONTRATISTA: INTER-ESTELLAR CONSTRUCCIONES S.A.S.

OBJETO: REALIZAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE ARCHIVO AREA DE DANZAS Y LA ADECUACIÓN DE UNA NUEVA OFICINA MULTIPLE DENTRO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 6 No. 19 – 55 DEL MUNICIPIO DE YOPAL, LUGAR DONDE FUNCIONA Y OPERA EL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE YOPAL.

CAPITULO 2 - ADECUACION OFICINAS

Item	Unidad	Descripción	INFORME LIQUIDACIÓN
2.6	m2	Estuco plástico, vinilo 1 mano y acabado en 2 manos pintura tipo koraza para exteriores o similar.	

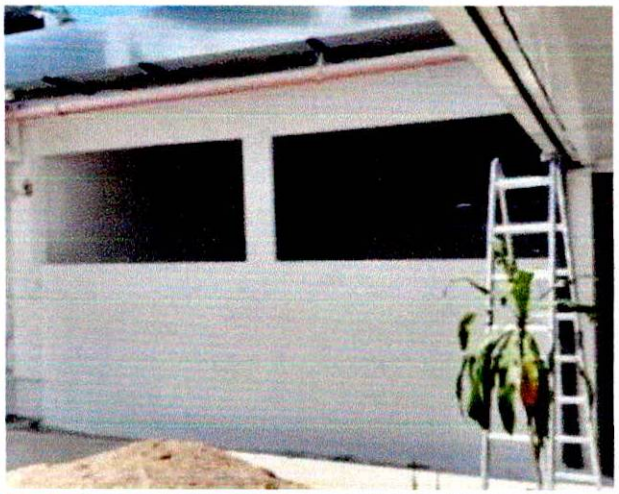



DESCRIPCIÓN	LONG.	ANCHO	ALTO	CANT.	SUB TOTAL
		5.25	0.88	1.00	4.62
Antepecho existente externo		5.25	1.00	1.00	5.25
Nuevo muro externo					
UNIDAD DE MEDIDA			CANTIDAD EJECUTADA		9.87
m2					

ING. LUIS DARIO BLANCO LIZARAZO
INTER-ESTELAR CONSTRUCCIONES S.A.S.



INTER-ESTELAR CONSTRUCCIONES S.A.S.	**LIQUIDACIÓN** **MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	**INTER-ESTELAR CONSTRUCCIONES S.A.S.**



CONTRATISTA: INTER-ESTELLAR CONSTRUCCIONES S.A.S.

OBJETO: REALIZAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE ARCHIVO AREA DE DANZAS Y LA ADECUACIÓN DE UNA NUEVA OFICINA MULTIPLE DENTRO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 6 No. 19 – 55 DEL MUNICIPIO DE YOPAL, LUGAR DONDE FUNCIONA Y OPERA EL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE YOPAL.

CAPITULO 2 - ADECUACION OFICINAS

Item	Unidad	Descripción	INFORME LIQUIDACIÓN
2.7	m2	Estuco plástico muros. Suministro e instal.	

DESCRIPCIÓN	LONG.	ANCHO	ALTO	CANT.	SUB TOTAL
MUROS NUEVA OFICINA					
Antepecho existente interno		5.25	0.88	1.00	4.62
Nuevo muro interno		5.25	1.00	1.00	5.25
Muro superior proyectado interno y externo		5.25	0.30	2.00	3.15
Separador ventanas interno y externo		0.30	1.20	2.00	0.72
Muros nueva oficina externos		9.99	2.50	1.00	24.98
Muros nueva oficina internos		9.89	2.50	1.00	24.73
Muros recepción externos		3.19	2.50	1.00	7.98
Muros recepción internos		2.99	2.50	1.00	7.48
Muro mampostería existente de la nueva oficina		6.13	3.33	1.00	20.41
UNIDAD DE MEDIDA		**CANTIDAD EJECUTADA**			**99.32**
m2					

B/L LUIS DARIO BLANCO LIZARAZO
INTER-ESTELAR CONSTRUCCIONES S.A.S.


	LIQUIDACIÓN **MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	**INTER-ESTELAR CONSTRUCCIONES S.A.S.**

CONTRATISTA: INTER-ESTELLAR CONSTRUCCIONES S.A.S.

OBJETO:	**REALIZAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE ARCHIVO AREA DE DANZAS Y LA ADECUACIÓN DE UNA NUEVA OFICINA MULTIPLE DENTRO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 6 No. 19 – 55 DEL MUNICIPIO DE YOPAL, LUGAR DONDE FUNCIONA Y OPERA EL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE YOPAL.**

CAPITULO 2 - ADECUACION OFICINAS


Item	Unidad	Descripción	INFORME LIQUIDACIÓN
2.8	m2	Muro en Super Board doble cara 10 mm pintado con viniltex o similar calidad.	











DESCRIPCIÓN	LONG.	ANCHO	ALTO	CANT.	SUB TOTAL
MUROS NUEVA OFICINA					
Muro superior proyectado		5.25	0.3	1.00	1.58
Separador ventanas		0.30	1.2	1.00	0.36
Muros nueva oficina		9.99	2.5	1.00	24.98
Muros recepción		3.09	2.5	1.00	7.73
UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD EJECUTADA			34.65
m2					

R/L LUIS DARIO BLANCO LIZARAZO
INTER-ESTELAR CONSTRUCCIONES S.A.S.

	LIQUIDACIÓN **MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	**INTER-ESTELAR CONSTRUCCIONES S.A.S.**

CONTRATISTA: INTER-ESTELLAR CONSTRUCCIONES S.A.S.

OBJETO: REALIZAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE ARCHIVO AREA DE DANZAS Y LA ADECUACIÓN DE UNA NUEVA OFICINA MULTIPLE DENTRO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 6 No. 19 – 55 DEL MUNICIPIO DE YOPAL, LUGAR DONDE FUNCIONA Y OPERA EL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE YOPAL.

CAPITULO 2 - ADECUACION OFICINAS

Item	Unidad	Descripción	INFORME LIQUIDACIÓN
2.9	m2	Alistado de pisos e= 0.04 m, en mortero 1:3	





DESCRIPCIÓN	LONG.	ANCHO	ALTO	CANT.	SUB TOTAL
Piso nueva oficina	6.12	5.52		1.00	33.78
Cocina	2.88	2.55		1.00	7.34
Vano puerta cocina	0.75	0.10		1.00	0.08
Oficina de Control Interno	5.08	2.58		1.00	13.11
Vano puerta oficina C.I.	0.70	0.10		1.00	0.07

NOTA: Por proceso constructivo, primero se hace el alistado incluyendo el espacio que ocupará el muro en superboard, por ende, solo a las medidas de la nueva oficina, se les suma el espesor final del muro.

UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD EJECUTADA	
m2		54.38

ING. LUIS DARIO BLANCO LIZARAZO
INTER-ESTELAR CONSTRUCCIONES S.A.S.

INTER-ESTELAR CONSTRUCCIONES S.A.S.	**LIQUIDACIÓN** **MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	**INTER-ESTELAR CONSTRUCCIONES S.A.S.**

CONTRATISTA: INTER-ESTELLAR CONSTRUCCIONES S.A.S.

OBJETO: REALIZAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE ARCHIVO AREA DE DANZAS Y LA ADECUACIÓN DE UNA NUEVA OFICINA MULTIPLE DENTRO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 6 No. 19 – 55 DEL MUNICIPIO DE YOPAL, LUGAR DONDE FUNCIONA Y OPERA EL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE YOPAL.

CAPITULO 2 - ADECUACION OFICINAS

Item	Unidad	Descripción	INFORME LIQUIDACIÓN
2,10.	m2	Enchape de piso en cerámica antideslizante 45 x 45	







DESCRIPCIÓN	LONG.	ANCHO	ALTO	CANT.	SUB TOTAL
Piso nueva oficina	6.12	5.52		1.00	33.78
Cocina	2.88	2.55		1.00	7.34
Vano puerta cocina	0.75	0.10		1.00	0.08
Oficina de Control Interno	5.08	2.58		1.00	13.11
Vano puerta oficina C.I.	0.70	0.10		1.00	0.07

NOTA: Por proceso constructivo, primero se hace el alistado y posteriormente se instala la ceramica incluyendo el espacio que ocupará el muro en superboard, por ende, solo a las medidas de la nueva oficina, se les suma el espesor final del muro.

UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD EJECUTADA	54.38
m2		

R/L LUIS DARIO BLANCO LIZARAZO
INTER-ESTELAR CONSTRUCCIONES S.A.S.

	LIQUIDACIÓN MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA	INTER-ESTELAR CONSTRUCCIONES S.A.S.

CONTRATISTA: INTER-ESTELLAR CONSTRUCCIONES S.A.S.

OBJETO: REALIZAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE ARCHIVO AREA DE DANZAS Y LA ADECUACIÓN DE UNA NUEVA OFICINA MULTIPLE DENTRO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 6 No. 19 – 55 DEL MUNICIPIO DE YOPAL, LUGAR DONDE FUNCIONA Y OPERA EL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE YOPAL.

CAPITULO 2 - ADECUACION OFICINAS

Item	Unidad	Descripción	INFORME LIQUIDACIÓN
2.11	m2	Puerta con marco y tablero inferior en aluminio y vidrio incoloro 5 mm y chapa. Suministro e Instal.	



DESCRIPCIÓN	LONG.	ANCHO	ALTO	CANT.	SUB TOTAL
Acceso area de danzas		1.00	2.48	1.00	2.48

R/L LUIS DARIO BLANCO LIZARAZO
INTER-ESTELAR CONSTRUCCIONES S.A.S.

UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD EJECUTADA	
m2		2.48

	LIQUIDACIÓN **MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	**INTER-ESTELAR CONSTRUCCIONES S.A.S.**


CONTRATISTA: INTER-ESTELLAR CONSTRUCCIONES S.A.S.

OBJETO: REALIZAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE ARCHIVO AREA DE DANZAS Y LA ADECUACIÓN DE UNA NUEVA OFICINA MULTIPLE DENTRO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 6 No. 19 – 55 DEL MUNICIPIO DE YOPAL, LUGAR DONDE FUNCIONA Y OPERA EL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE YOPAL.

CAPITULO 2 - ADECUACION OFICINAS

Item	Unidad	Descripción	INFORME LIQUIDACIÓN
2.12	und	Salida para tomacorriente doble con polo a tierra. Incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre aislado, caja plastica 5800 o 2400, terminales de derivación, no incluye aparato	









DESCRIPCIÓN	LONG.	ANCHO	ALTO	CANT.	SUB TOTAL
Nueva oficina				9.00	9.00
Recepción				3.00	3.00
Oficina control interno				1.00	1.00

UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD EJECUTADA	13.00
und		

ING. LUIS DARIO BLANCO LIZARAZO
INTER-ESTELAR CONSTRUCCIONES S.A.S.

	LIQUIDACIÓN MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA	INTER-ESTELAR CONSTRUCCIONES S.A.S.


CONTRATISTA: INTER-ESTELLAR CONSTRUCCIONES S.A.S.


OBJETO: REALIZAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE ARCHIVO AREA DE DANZAS Y LA ADECUACIÓN DE UNA NUEVA OFICINA MULTIPLE DENTRO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 6 No. 19 – 55 DEL MUNICIPIO DE YOPAL, LUGAR DONDE FUNCIONA Y OPERA EL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE YOPAL.

CAPITULO 2 - ADECUACION OFICINAS

Item	Unidad	Descripción	INFORME LIQUIDACIÓN
2.13	und	Tomacorriente doble, polo a tierra, 15 A, 125 V, NEMA 5-15R grado comercial. Suministro e instalacion	









DESCRIPCIÓN	LONG.	ANCHO	ALTO	CANT.	SUB TOTAL
Nueva oficina				9.00	9.00
Recepción				3.00	3.00
Oficina control interno				1.00	1.00

UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD EJECUTADA	13.00
und		

ING. LUIS DARIO BLANCO LIZARAZO
INTER-ESTELAR CONSTRUCCIONES S.A.S.


INTER-ESTELAR CONSTRUCCIONES S.A.S.	**LIQUIDACIÓN** **MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	**INTER-ESTELAR CONSTRUCCIONES S.A.S.**

CONTRATISTA: INTER-ESTELLAR CONSTRUCCIONES S.A.S.

OBJETO: REALIZAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE ARCHIVO AREA DE DANZAS Y LA ADECUACIÓN DE UNA NUEVA OFICINA MULTIPLE DENTRO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 6 No. 19 – 55 DEL MUNICIPIO DE YOPAL, LUGAR DONDE FUNCIONA Y OPERA EL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE YOPAL.

CAPITULO 2 - ADECUACION OFICINAS

Item	Unidad	Descripción	INFORME LIQUIDACIÓN
2.14	Und	Breaker tipo riel 1x20A, 10 kA. Suministro e instalacion	

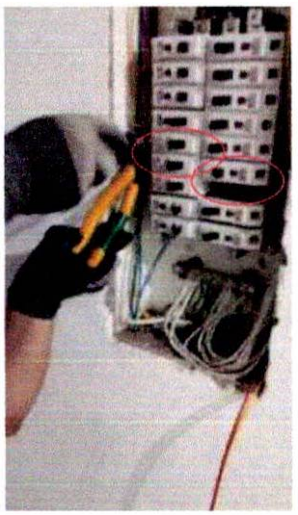



DESCRIPCIÓN	LONG.	ANCHO	ALTO	CANT.	SUB TOTAL
Tablero electrico existente				3.00	3.00

UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD EJECUTADA	3.00
Und		

ING. LUIS DARIO BLANCO LIZARAZO
INTER-ESTELAR CONSTRUCCIONES S.A.S.


INTER-ESTELAR CONSTRUCCIONES S.A.S.	**LIQUIDACIÓN** **MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	**INTER-ESTELAR CONSTRUCCIONES S.A.S.**


CONTRATISTA: INTER-ESTELLAR CONSTRUCCIONES S.A.S.


OBJETO: REALIZAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE ARCHIVO AREA DE DANZAS Y LA ADECUACIÓN DE UNA NUEVA OFICINA MULTIPLE DENTRO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 6 No. 19 – 55 DEL MUNICIPIO DE YOPAL, LUGAR DONDE FUNCIONA Y OPERA EL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE YOPAL.

CAPITULO 2 - ADECUACION OFICINAS

Item	Unidad	Descripción	INFORME LIQUIDACIÓN
2.15	m	Regata en muro, mamposteria tipo ladrillo o bloque para tuberias diametros menores a 1". (Incluye corte y retiro)	







DESCRIPCIÓN	LONG.	ANCHO	ALTO	CANT.	SUB TOTAL
Tablero a piso			1.45	1.00	1.45
Entre puntos electricos nuevos	1.50			2.00	3.00
Punto electrico nuevo a piso			0.55	1.00	0.55

UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD EJECUTADA	5.00
m		

RA. LUIS DARIO BLANCO LIZARAZO
INTER-ESTELAR CONSTRUCCIONES S.A.S.

INTER-ESTELAR CONSTRUCCIONES S.A.S.	**LIQUIDACIÓN** **MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	**INTER-ESTELAR CONSTRUCCIONES S.A.S.**

CONTRATISTA: INTER-ESTELLAR CONSTRUCCIONES S.A.S.

OBJETO: REALIZAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE ARCHIVO AREA DE DANZAS Y LA ADECUACIÓN DE UNA NUEVA OFICINA MULTIPLE DENTRO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 6 No. 19 – 55 DEL MUNICIPIO DE YOPAL, LUGAR DONDE FUNCIONA Y OPERA EL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE YOPAL.

CAPITULO 2 - ADECUACION OFICINAS

Item	Unidad	Descripción	INFORME LIQUIDACIÓN
2.16	und	Luminaria led aplique 18W, 110 V. Suministro e instalacion	







DESCRIPCIÓN	LONG.	ANCHO	ALTO	CANT.	SUB TOTAL
Punto electricos existentes en techo pvc				15.00	15.00

UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD EJECUTADA	
und		15.00

RA. LUIS DARIO BLANCO LIZARAZO
INTER-ESTELAR CONSTRUCCIONES S.A.S.

INTER-ESTELAR CONSTRUCCIONES S.A.S.	**LIQUIDACIÓN** **MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	**INTER-ESTELAR CONSTRUCCIONES S.A.S.**

CONTRATISTA: INTER-ESTELLAR CONSTRUCCIONES S.A.S.

OBJETO:	**REALIZAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE ARCHIVO AREA DE DANZAS Y LA ADECUACIÓN DE UNA NUEVA OFICINA MULTIPLE DENTRO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 6 No. 19 – 55 DEL MUNICIPIO DE YOPAL, LUGAR DONDE FUNCIONA Y OPERA EL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE YOPAL.**

CAPITULO 2 - ADECUACION OFICINAS

Item	Unidad	Descripción	INFORME LIQUIDACIÓN
2.17	und	Mobiliario interno con plataforma en madera o similar, con soportes metalicos. Suministro e instal.	





DESCRIPCIÓN	LONG.	ANCHO	ALTO	CANT.	SUB TOTAL
Oficina nueva				2.00	2.00

R/L LUIS DARIO BLANCO LIZARAZO
INTER-ESTELAR CONSTRUCCIONES S.A.S.

UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD EJECUTADA	
und		2.00

INTER-ESTELAR CONSTRUCCIONES S.A.S.	**LIQUIDACIÓN** **MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	**INTER-ESTELAR CONSTRUCCIONES S.A.S.**

CONTRATISTA: INTER-ESTELLAR CONSTRUCCIONES S.A.S.

OBJETO: REALIZAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE ARCHIVO AREA DE DANZAS Y LA ADECUACIÓN DE UNA NUEVA OFICINA MULTIPLE DENTRO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 6 No. 19 – 55 DEL MUNICIPIO DE YOPAL, LUGAR DONDE FUNCIONA Y OPERA EL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE YOPAL.

CAPITULO 2 - ADECUACION OFICINAS

Item	Unidad	Descripción	INFORME LIQUIDACIÓN
2.18	m	Corte en concreto	





DESCRIPCIÓN	LONG.	ANCHO	ALTO	CANT.	SUB TOTAL
Tablero a muros de oficina	6.00			1.00	6.00
nueva	4.90			1.00	4.90

UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD EJECUTADA	10.90
m		

P/L LUIS DARIO BLANCO LIZARAZO
INTER-ESTELAR CONSTRUCCIONES S.A.S.

	LIQUIDACIÓN MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA	INTER-ESTELAR CONSTRUCCIONES S.A.S.

CONTRATISTA: INTER-ESTELLAR CONSTRUCCIONES S.A.S.


OBJETO: REALIZAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE ARCHIVO AREA DE DANZAS Y LA ADECUACIÓN DE UNA NUEVA OFICINA MULTIPLE DENTRO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 6 No. 19 – 55 DEL MUNICIPIO DE YOPAL, LUGAR DONDE FUNCIONA Y OPERA EL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE YOPAL.


CAPITULO 2 - ADECUACION OFICINAS

Item	Unidad	Descripción	INFORME LIQUIDACIÓN
2.19	m	Resane en mortero 1:4 A = 0.10, E = 1.5 cm	











DESCRIPCIÓN	LONG.	ANCHO	ALTO	CANT.	SUB TOTAL
Tablero a piso			1.4	1.00	1.40
Entre puntos electricos nuevos		1.50		2.00	3.00
Punto electrico nuevo a piso			0.6	1.00	0.60
Tablero a muros de oficina	8.00			1.00	8.00
nueva	2.90			1.00	2.9

UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD EJECUTADA	15.90
m		

R/ LUIS DARIO BLANCO LIZARAZO
INTER-ESTELAR CONSTRUCCIONES S.A.S.

INTER-ESTELAR CONSTRUCCIONES S.A.S.	**LIQUIDACIÓN** **MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	**INTER-ESTELAR CONSTRUCCIONES S.A.S.**

CONTRATISTA: INTER-ESTELLAR CONSTRUCCIONES S.A.S.

OBJETO: REALIZAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE ARCHIVO AREA DE DANZAS Y LA ADECUACIÓN DE UNA NUEVA OFICINA MULTIPLE DENTRO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 6 No. 19 – 55 DEL MUNICIPIO DE YOPAL, LUGAR DONDE FUNCIONA Y OPERA EL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE YOPAL.

CAPITULO 2 - ADECUACION OFICINAS

Item	Unidad	Descripción	INFORME LIQUIDACIÓN
2,20.	m	Desmonte flanche metalico	





DESCRIPCIÓN	LONG.	ANCHO	ALTO	CANT.	SUB TOTAL
Muro posterior area archivo	6.00			1.00	6.00
UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD EJECUTADA			6.00
m					

ING. LUIS DARIO BLANCO LIZARAZO
INTER-ESTELAR CONSTRUCCIONES S.A.S.

INTER-ESTELAR CONSTRUCCIONES S.A.S.	**LIQUIDACIÓN** **MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	**INTER-ESTELAR CONSTRUCCIONES S.A.S.**

CONTRATISTA: INTER-ESTELLAR CONSTRUCCIONES S.A.S.


OBJETO: REALIZAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE ARCHIVO AREA DE DANZAS Y LA ADECUACIÓN DE UNA NUEVA OFICINA MULTIPLE DENTRO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 6 No. 19 – 56 DEL MUNICIPIO DE YOPAL, LUGAR DONDE FUNCIONA Y OPERA EL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE YOPAL.

CAPITULO 2 - ADECUACION OFICINAS


Item	Unidad	Descripción	INFORME LIQUIDACIÓN
2.21	und	Desmonte y traslado a bodega de luminaria	











DESCRIPCIÓN	LONG.	ANCHO	ALTO	CANT.	SUB TOTAL
Punto electricos existentes en techo pvc				15.00	15.00

UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD EJECUTADA	
und		15.00

C/L LUIS DARIO BLANCO LIZARAZO
INTER-ESTELAR CONSTRUCCIONES S.A.S.

	LIQUIDACIÓN MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA	INTER-ESTELAR CONSTRUCCIONES S.A.S.

CONTRATISTA: INTER-ESTELLAR CONSTRUCCIONES S.A.S.

OBJETO: REALIZAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE ARCHIVO AREA DE DANZAS Y LA ADECUACIÓN DE UNA NUEVA OFICINA MULTIPLE DENTRO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 6 No. 19 – 55 DEL MUNICIPIO DE YOPAL, LUGAR DONDE FUNCIONA Y OPERA EL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE YOPAL.

CAPITULO 2 - ADECUACION OFICINAS

Item	Unidad	Descripción	INFORME LIQUIDACIÓN
2.22	m	Flanche lamina galvanizada cal. 22 A=0.30 m incluye regata con pulidora, remate en mortero imp. 1:4.	



DESCRIPCIÓN	LONG.	ANCHO	ALTO	CANT.	SUB TOTAL
Muro culata posterior oficinas y archivo	12.56			1.00	12.56

UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD EJECUTADA	12.56
m		

ING. LUIS DARIO BLANCO LIZARAZO
INTER-ESTELAR CONSTRUCCIONES S.A.S.

INTER-ESTELAR CONSTRUCCIONES S.A.S.	**LIQUIDACIÓN** **MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	**INTER-ESTELAR CONSTRUCCIONES S.A.S.**


CONTRATISTA: INTER-ESTELLAR CONSTRUCCIONES S.A.S.

OBJETO: REALIZAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE ARCHIVO AREA DE DANZAS Y LA ADECUACIÓN DE UNA NUEVA OFICINA MULTIPLE DENTRO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 6 No. 19 – 55 DEL MUNICIPIO DE YOPAL, LUGAR DONDE FUNCIONA Y OPERA EL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE YOPAL.

CAPITULO 3 - MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS Y VENTILADORES


Item	Unidad	Descripción	INFORME LIQUIDACIÓN
3.1	und	Mantenimiento, limpieza y recarga de gas de Aire Acondicionado existente	









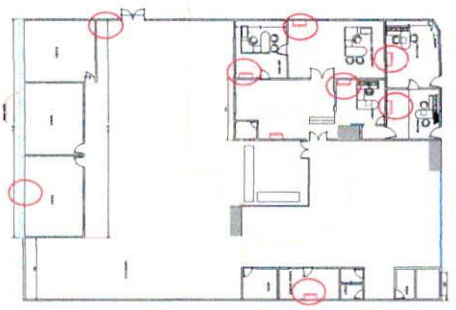

DESCRIPCIÓN	LONG.	ANCHO	ALTO	CANT.	SUB TOTAL
Area nueva oficina, Recepción y sala de espera				8.00	8.00

RICARDO DARIO BLANCO LIZARAZO
INTER-ESTELAR CONSTRUCCIONES S.A.S.

UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD EJECUTADA	
und		8.00

	LIQUIDACIÓN MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA	INTER-ESTELAR CONSTRUCCIONES S.A.S.

CONTRATISTA: INTER-ESTELLAR CONSTRUCCIONES S.A.S.

OBJETO: REALIZAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE ARCHIVO AREA DE DANZAS Y LA ADECUACIÓN DE UNA NUEVA OFICINA MULTIPLE DENTRO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 6 No. 19 – 55 DEL MUNICIPIO DE YOPAL, LUGAR DONDE FUNCIONA Y OPERA EL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE YOPAL.

CAPITULO 3 - MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS Y VENTILADORES

Item	Unidad	Descripción	INFORME LIQUIDACIÓN
3.2	und	Mantenimiento, limpieza de ventilador de techo existente	











DESCRIPCIÓN	LONG.	ANCHO	ALTO	CANT.	SUB TOTAL
Area nueva oficina, Recepción y sala de espera				5.00	5.00

UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD EJECUTADA	
und		5.00

ING. LUIS DARIO BLANCO LIZARAZO
INTER-ESTELAR CONSTRUCCIONES S.A.S.

	LIQUIDACIÓN **MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	**INTER-ESTELAR CONSTRUCCIONES S.A.S.**

CONTRATISTA: INTER-ESTELLAR CONSTRUCCIONES S.A.S.

OBJETO: REALIZAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE ARCHIVO AREA DE DANZAS Y LA ADECUACIÓN DE UNA NUEVA OFICINA MULTIPLE DENTRO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 6 No. 19 – 55 DEL MUNICIPIO DE YOPAL, LUGAR DONDE FUNCIONA Y OPERA EL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE YOPAL.

CAPITULO 4 - ITEM NO PREVISTOS

Item	Unidad	Descripción	INFORME LIQUIDACIÓN
N.P. 1	m	Guardaescoba en ceramica duropiso 33 x 7 cm. Suministro e instalacion	

NUEVA OFICINA MULTIPLE



OFICINA CONTROL INTERNO



COCINA



DESCRIPCIÓN	LONG.	ANCHO	ALTO	CANT.	SUB TOTAL
Nueva oficina	21.50			1.00	21.50
Oficina de Control Interno	14.62			1.00	14.62
Cocina	10.11			1.00	10.11
Muro meson cocina	0.60			2.00	1.20

UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD EJECUTADA	47.43
m		

R/L LUIS DARIO BLANCO LIZARAZO
INTER-ESTELAR CONSTRUCCIONES S.A.S.

	LIQUIDACIÓN MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA	INTER-ESTELAR CONSTRUCCIONES S.A.S.


CONTRATISTA: INTER-ESTELLAR CONSTRUCCIONES S.A.S.

OBJETO: REALIZAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE ARCHIVO AREA DE DANZAS Y LA ADECUACIÓN DE UNA NUEVA OFICINA MULTIPLE DENTRO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 6 No. 19 – 55 DEL MUNICIPIO DE YOPAL, LUGAR DONDE FUNCIONA Y OPERA EL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE YOPAL.

CAPITULO 4 - ITEM NO PREVISTOS

Item	Unidad	Descripción	INFORME LIQUIDACIÓN
N.P. 2	m2	Pintura vinilo interior sobre pañete 2 manos	

NUEVA OFICINA MULTIPLE





COCINA





OFICINA CONTROL INTERNO





DESCRIPCIÓN	ANCHO	ALTO	AREA	CANT.	SUB TOTAL
Muro mampostería existente Nueva oficina	6.13	3.33	20.41	1.00	20.41
Muros internos Cocina	10.86	3.31	35.95	1.00	35.95
Descuento puerta cocina	0.75	1.83	1.37	-1.00	-1.37
Muros internos Oficina de Control Interno	15.32	3.22	49.33	1.00	49.33
Descuento puerta oficina Control Interno	0.70	2.00	1.40	-1.00	-1.40

UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD EJECUTADA	
m2		102.92

R/L LUIS DARIO BLANCO LIZARAZO
INTER-ESTELAR CONSTRUCCIONES S.A.S.

	LIQUIDACIÓN **MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	**INTER-ESTELAR CONSTRUCCIONES S.A.S.**


CONTRATISTA: INTER-ESTELLAR CONSTRUCCIONES S.A.S.

OBJETO: REALIZAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE ARCHIVO AREA DE DANZAS Y LA ADECUACIÓN DE UNA NUEVA OFICINA MULTIPLE DENTRO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 6 No. 19 – 55 DEL MUNICIPIO DE YOPAL, LUGAR DONDE FUNCIONA Y OPERA EL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE YOPAL.

CAPITULO 4 - ITEM NO PREVISTOS

Item	Unidad	Descripción	INFORME LIQUIDACIÓN
N.P. 3	m	Rejilla metalica para carcamo A = 0.37 m, en angulo1 1/4" x 1/8" y varilla lisa 1/2", incluye: marco, contramarco, anticorrosivo, pintura. Suministro e Insta.	

PARTE POSTERIOR NUEVA OFICINA

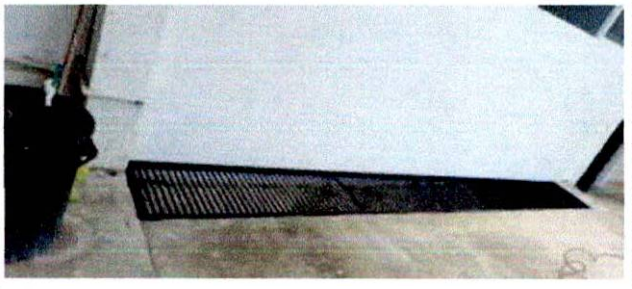

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	AREA	CANT.	SUB TOTAL
Carcamo existente	5.00			1.00	5.00

UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD EJECUTADA	5.00
m		

ING. LUIS DARIO BLANCO LIZARAZO
INTER-ESTELAR CONSTRUCCIONES S.A.S.

INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE YOPAL

NIT: 901403046 - 7
OFICINA ALMACEN GENERAL
ENTRADA DE ALMACEN Nª: 2025000004

YOPAL LUNES, 09 JUNIO 2025 **FACTURA N°: MC20**
ORDEN DE COMPRA: N° DEL , **REMISIÓN N°: 0**
TERCERO: INTER-ESTELAR CONSTRUCCIONES SAS **NIT: 901206760 3**
DIRECCIÓN: CL 28 17A 04 BRR PROVIVIENDA **TELEFONO: 3144746853**
DESCRIPCIÓN: Item 2.17 Mobiliario interno con plataforma en madera o similar, con soportes metálicos. Contrato Obra 118-2025 Realizar adecuación a las instalaciones de archivo, área de danzas y de una nueva oficina múltiple dentro del bien inmueble ubicado en la calle 6 # 19-55 del municipio de Yopal, lugar donde funciona y opera el ICTY

Nª	CODIGO	NOMBRE ELEMENTO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
1	2166503001	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	Unidad	2.00	1.200.000,00	2,400,000.00
TOTAL						**2.400.000,00**

RESUMEN	
GRUPO	**TOTAL**
21665	2.400.000,00

LISTADO DE DEVOLUTIVOS			
ELEMENTO PLAN	**PLACA**	**VALOR**	**DESCRIPCIÓN**
2166503001 - MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1	1.200.000,00	Marca: NA Referencia: Mobiliario Interno con plataforma en madera o similar con soportes metalicos Generacion: NA Especificaciones: Mesa modular en estructura metalica y lamina tipo RH de 5 mts x 0.80 mts Procedencia: Contrato Obra 118 de 2025
2166503001 - MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1	1.200.000,00	Marca: NA Referencia: Mobiliario Interno con plataforma en madera o similar con soportes metalicos Generacion: NA Especificaciones: Mesa modular en estructura metalica y lamina tipo RH de 5 mts x 0.80 mts Procedencia: Contrato Obra 118 de 2025
TOTAL		**2.400.000,00**	

OBSERVACIONES:	
SON:	**DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS 00 M.C.**

ANA MALENA CORREA GUERRA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE YOPAL

NIT: 901403046 - 7
OFICINA ALMACEN GENERAL
SALIDA N° 2025000127

YOPAL LUNES, 09 JUNIO 2025

ENTRADA ALMACEN: ENT N° 2025000004 DEL LUNES, 09 JUNIO 2025
CENTRO COSTO: VARIOS **DEPENDENCIA: DIRECCION GENERAL**

SOLICITANTE: GLADYS YIRLANDY PEREZ VEGA **CÉDULA CIUDADANÍA: 47395806**
DESCRIPCIÓN: Item 2.17 Mobiliario interno con plataforma en madera o similar, con soportes metálicos. Contrato Obra 118-2025 Realizar adecuación a las instalaciones de archivo, área de danzas y de una nueva oficina múltiple dentro del bien inmueble ubicado en la calle 6 # 19-55 del municipio de Yopal, lugar donde funciona y opera el ICTY

OBSERVACIONES: 2 Mesas modulares en estructura metálica y lamina tipo RH de 5 mts x 0.80 mts

N°	CODIGO	NOMBRE PLAN INV	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2166503001	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	Unidad	2.00000	1.200.000,00	2.400.000,00

TOTAL:	2.400.000,00

RESUMEN	
GRUPO	TOTAL
21665	2.400.000,00

LISTADO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

ELEMENTO PLAN	PLACA	VALOR	DESCRIPCIÓN
2166503001 - MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	18081	1.200.000,00	Marca: NA Referencia: Mobiliario interno con plataforma en madera o similar con soportes metalicos Generacion: NA Especificaciones: Mesa modular en estructura metalica y lamina tipo RH 5mts x 0.80 mts Procedencia: Contrato Obra 118 de 2025
2166503001 - MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	18082	1.200.000,00	Marca: NA Referencia: Mobiliario interno con plataforma en madera o similar con soportes metalicos Generacion: NA Especificaciones: Mesa modular en estructura metalica y lamina tipo RH 5mts x 0.80 mts Procedencia: Contrato Obra 118 de 2025

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS 00 M.C.

GLADYS YIRLANDY PEREZ VEGA
RESPONSABLE

[redacted]

ICT Instituto de Cultura y Turismo de Ibagué	**ACTA ENTREGA DE ELEMENTOS**	ACTA DE ENTREGA DE ELEMENTOS FO-GD-22 2025-02-26 V 02

NIT. 901403046-7

AREA O DEPENDENCIA: Almacen.

CÓDIGO ALMACÉN	CANTIDAD	DESCRIPCION ELEMENTO	OBSERVACIONES	OTROS
	15	luminarias redondas tipo Led Blancas 18W	Mal estado	

FECHA DE ENTREGA:	Mayo 27/2025
FECHA DE DEVOLUCION:	

Quien Entrega:	Quien recibe:	Quien recibe:
Firma: _____ Nombre: Elkin Hernandez Cargo: Arquitecto - Apoyo.	Firma: Leyla Lorena Nieto R. Nombre: Leyla Lorena Nieto R Cargo: Profesional contratado	Firma: _____ Nombre: Cargo:

Powered by CamScanner
