Nombre del proyecto:	CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA 2 DE LA PLAZA CAMPESINA, DE ARTESANOS Y GASTRONOMIA EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ
Localización del proyecto (municipio / departamento):	PLAZA CAMPESINA MUNICIPIO DE CAJICA
Nombre del contratista que ejecuta el proyecto:	UNION TEMPORAL PLAZA CAMPESINA
Numero del contrato:	COP-008-2024
Fecha del registro fotográfico:	1 AL 31 DE JULIO 2025


















Instalación de malla electrosoldada: Durante el periodo se realizó la instalación de malla electrosoldada A620-7.5-7.5 en las zonas de placa, según especificaciones estructurales. La malla fue dispuesta sobre la base con separadores plásticos de 2.5 cm para asegurar el recubrimiento de concreto. Se garantizó la traslapación mínima reglamentaria (30 diámetros), la correcta alineación y fijación entre paños. La actividad fue ejecutada bajo supervisión técnica, quedando lista para la fundida de concreto en la siguiente fase.








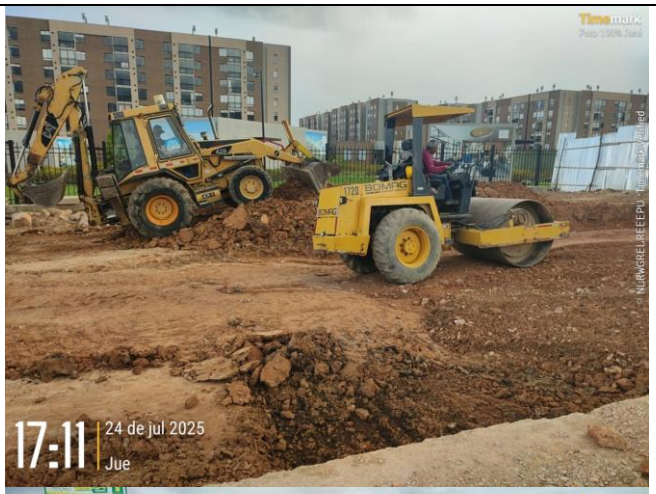





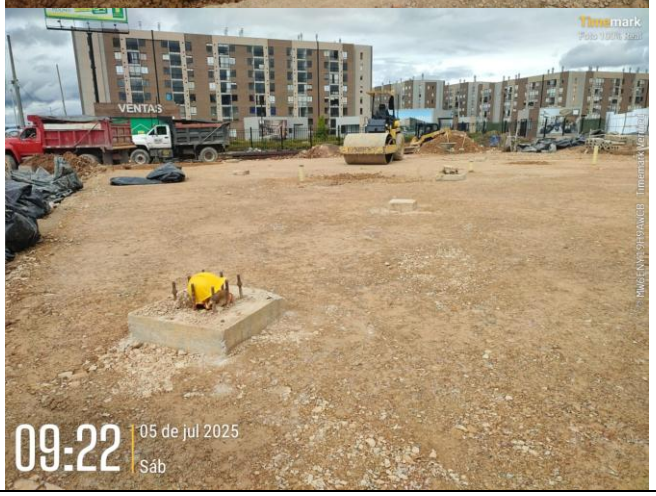

Suministro e instalación de base granular: Durante el mes se ejecutó el suministro, extendido y compactación de base granular en zonas de circulación peatonal y de placa. El material utilizado cumple con las especificaciones del proyecto (granulometría, CBR y contenido de finos). La instalación se realizó en capas de 20 cm compactadas al 95% Proctor modificado, verificadas mediante ensayos de campo. Se mantuvo control topográfico para garantizar cotas y pendientes de diseño.




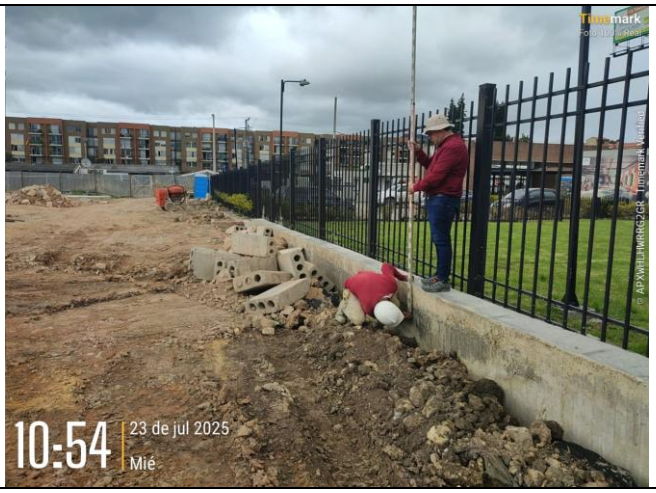

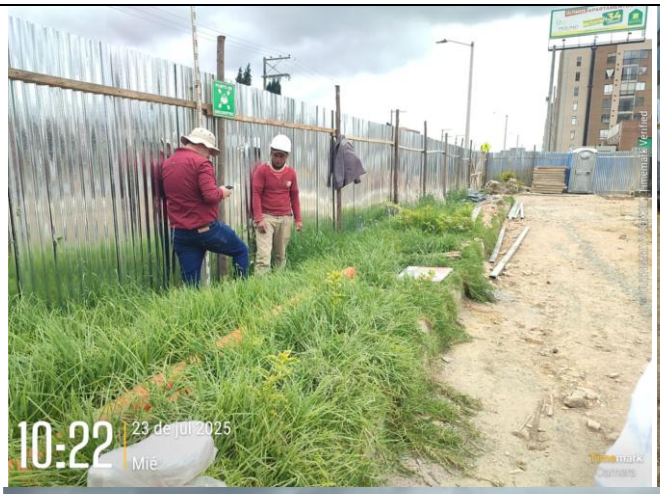





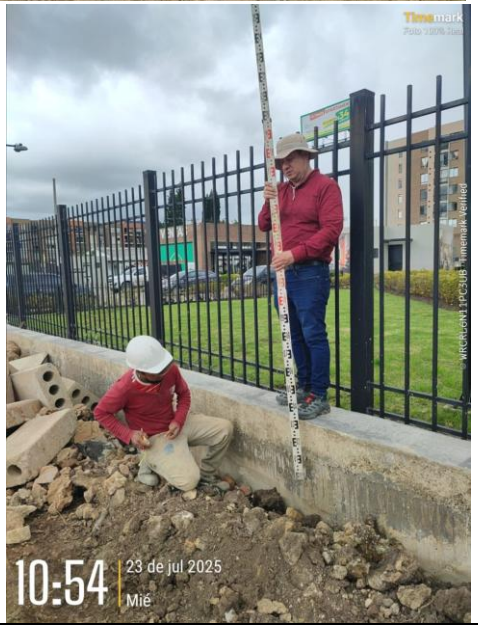

Topografía de obra en sitio: Durante el periodo se realizaron labores de topografía en sitio para replanteo de ejes, verificación de cotas, niveles y alineaciones en las áreas de cimentación, placas y redes. Se empleó estación total y nivel automático, asegurando precisión en el trazado y cumplimiento de los planos constructivos. La información obtenida sirvió de base para el control geométrico de las actividades ejecutadas.


Timemark
07:51
15 de jul 2025
Mar


Timemark
Foto 100% Real
16:43
15 de jul 2025
Mar


Timemark
Foto 100% Real
16:43
15 de jul 2025
Mar


Timemark
07:51
15 de jul 2025
Mar









Muro en concreto ciclópeo: Durante el periodo se ejecutó la construcción de muro en concreto ciclópeo, conformado por mezcla de concreto estructural con inclusión de piedra rajón en proporción controlada. El muro fue fundido en sitio dentro de formaleta cerrada, garantizando compactación adecuada y continuidad del vertido. Esta solución se implementó como elemento de contención y estabilización, conforme a planos y especificaciones técnicas del proyecto.







Suministro e instalación de subbase granular: Durante el mes se ejecutó el suministro, extendido y compactación de subbase granular en las zonas de placa y circulación. El material fue colocado en capas de 20 cm y compactado al 95% de la densidad máxima Proctor, cumpliendo con los criterios de granulometría, resistencia y contenido de finos establecidos en el diseño. Se realizaron controles topográficos y ensayos de campo para validar espesores y niveles.



Timemark
Foto 100% Real
14:03
24 de jul 2025
Jue
Timemark Verified


Timemark
Foto 100% Real
08:54
25 de jul 2025
Vie
Timemark Verified

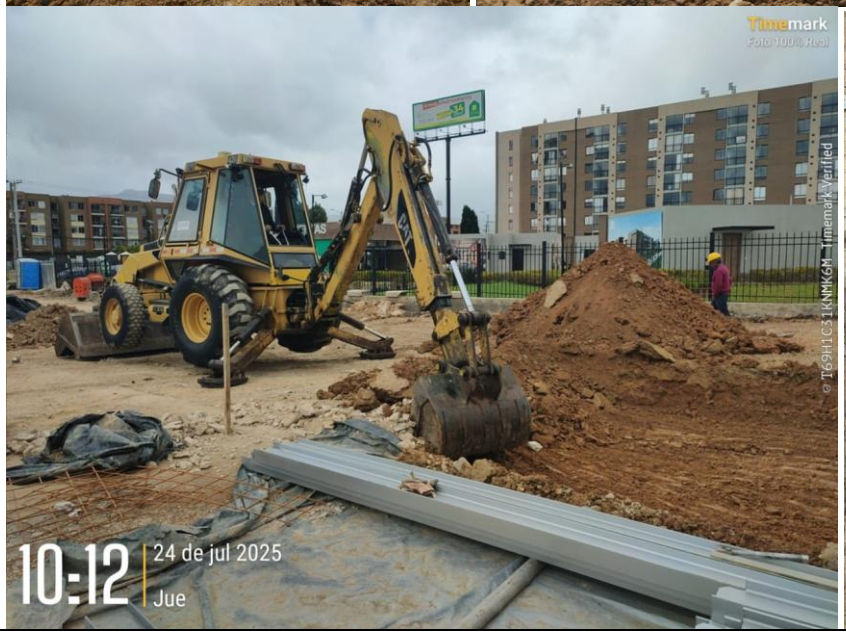
Timemark
Foto 100% Real
10:12
24 de jul 2025
Jue
Timemark Verified


Timemark
10:49
24 de jul 2025
Jue

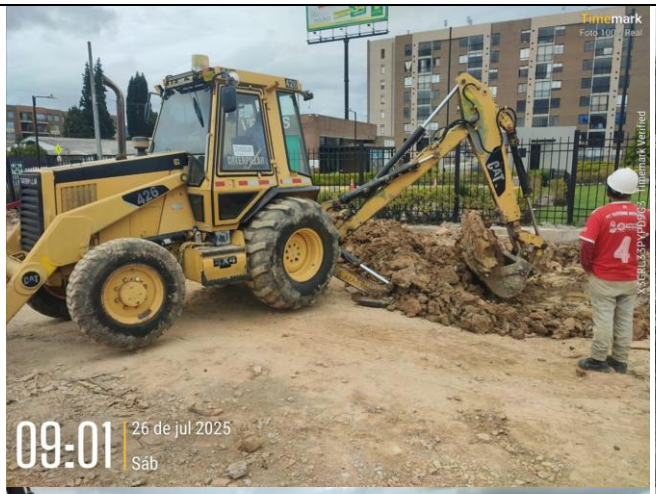
Timemark
09:01
26 de jul 2025
Sáb

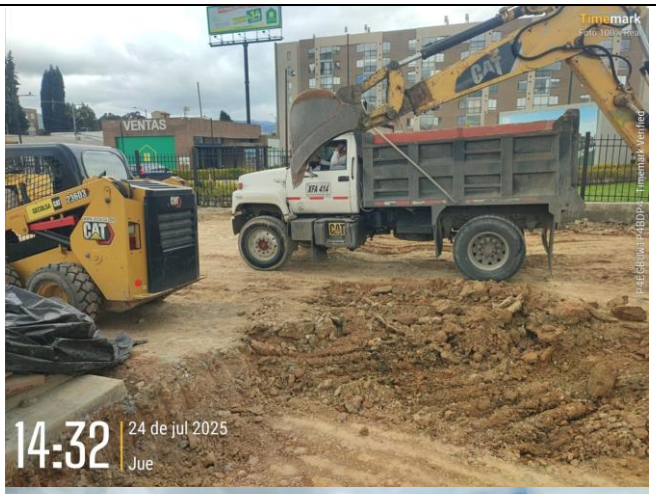
Timemark
VENTAS
14:32
24 de jul 2025
Jue



Timemark
11:00
24 de jul 2025
Jue


Timemark
14:32
24 de jul 2025
Jue


Timemark
14:42
28 de jul 2025
Lun





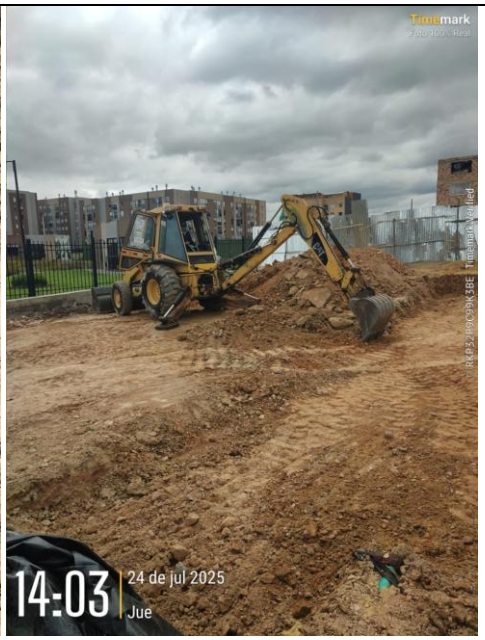

Excavaciones varias a máquina sin clasificar: Durante el periodo se realizaron excavaciones a máquina en diferentes frentes de obra, sin clasificación de material, para conformación de niveles, apertura de zanjas y adecuación general del terreno. Las actividades se ejecutaron conforme a los planos de diseño y bajo control topográfico, garantizando el retiro oportuno del material producto de la excavación y la estabilidad de los taludes durante el proceso.



