






Transporte de materiales prov. de explanación, canales, prestamos, sobre acarreos y derrumbes: Durante el periodo se realizó el transporte de materiales sueltos generados por excavaciones, explanación, limpieza de canales, cortes en préstamos y manejo de derrumbes. El material fue movilizado mediante volquetas hacia botaderos autorizados o áreas de disposición temporal dentro del proyecto. Se incluyeron recorridos por sobre acarreos según necesidades de la obra, garantizando continuidad operativa y limpieza de frentes activos.



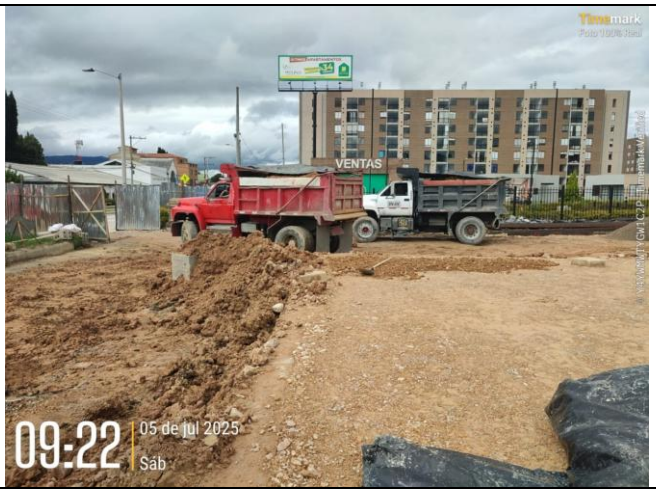

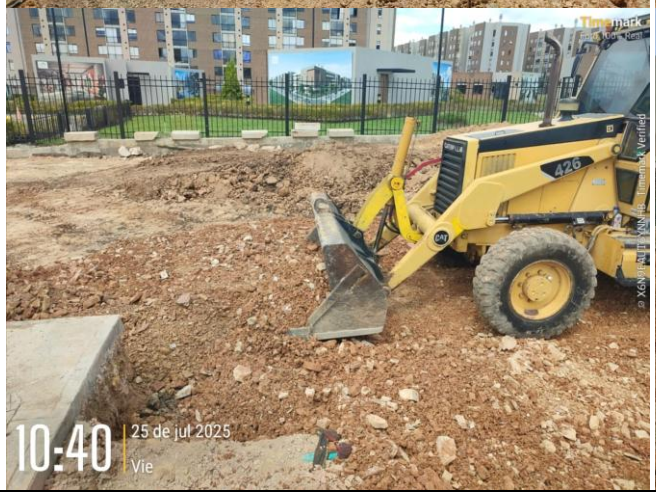

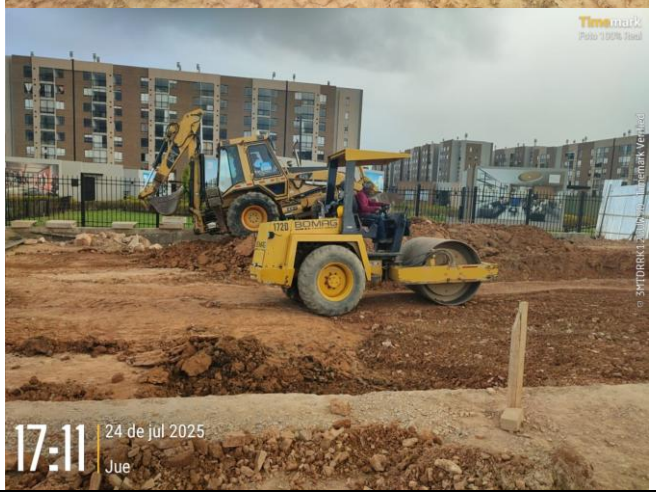





Relleno con material del sitio compactado mecánicamente: Durante el periodo se ejecutaron labores de relleno utilizando material proveniente del mismo sitio, previamente seleccionado y libre de orgánicos. El material fue colocado en capas sucesivas y compactado mecánicamente con equipos adecuados, alcanzando una densidad mínima del 95% Proctor modificado. Esta actividad se realizó en zonas de cimentación, estructuras y adecuación de terreno, garantizando estabilidad y soporte para fases constructivas posteriores.





Preparación de terreno






Timemark
Foto 100% Real
11:59
25 de jul 2025
Vie
Timemark Verified


Timemark
17:00
21 de jul 2025
Lun


Timemark
Foto 100% Real
13:15
16 de jul 2025
Mié
Timemark Verified




Timemark
13:15
16 de jul 2025
Mié


Timemark
11:59
25 de jul 2025
Vie


Timemark
17:00
21 de jul 2025
Lun


Timemark
13:15
16 de jul 2025
Mié


Timemark
VENTAS
13:15
16 de jul 2025
Mié


Timemark
08:45
26 de jul 2025
Sáb


Timemark
16:28
25 de jul 2025
Vie


Timemark
08:55
03 de jul 2025
Jue





Estructura metálica: Durante el periodo se llevó a cabo la fabricación en sitio de la estructura metálica correspondiente a la Plaza de Artesanos. La actividad incluyó el corte, armado, soldadura y montaje de perfiles estructurales tipo IPN y tubulares, conforme a los planos aprobados y especificaciones técnicas del proyecto. Se implementaron controles de trazabilidad, alineación y verticalidad en obra, garantizando la correcta ejecución de uniones soldadas y la preparación de puntos de anclaje sobre pedestales previamente fundidos.










Compactación de material: Durante el periodo se realizó la compactación de material proveniente de excavaciones y rellenos con equipo liviano y/o pesado, según el tipo de zona y especificaciones técnicas. La actividad se ejecutó en capas sucesivas, controlando humedad óptima y alcanzando una densidad mínima del 95% Proctor modificado, verificada mediante ensayos de campo. Esta labor fue fundamental para garantizar la estabilidad del terreno y la capacidad portante requerida para estructuras posteriores.







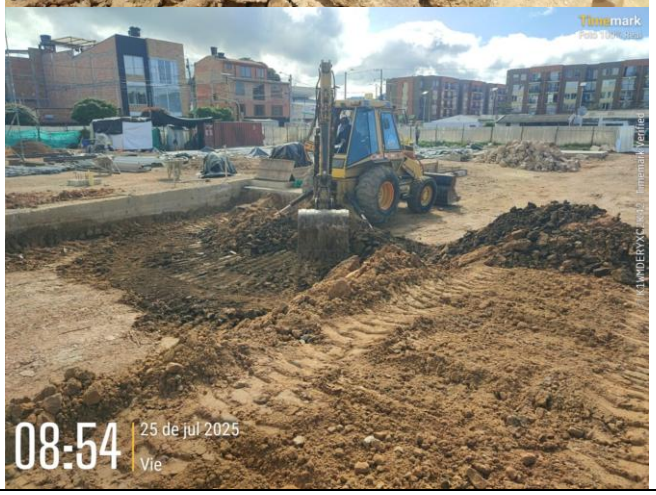

Transporte de materiales prov. de explanación, canales, prestamos, sobre acarreos y derrumbes: Durante el periodo se realizó el transporte de materiales sueltos generados por excavaciones, explanación, limpieza de canales, cortes en préstamos y manejo de derrumbes. El material fue movilizado mediante volquetas hacia botaderos autorizados o áreas de disposición temporal dentro del proyecto. Se incluyeron recorridos por sobre acarreos según necesidades de la obra,

garantizando continuidad operativa y limpieza de frentes activos.












Toma de Muestras de Densidad – Interventoría: Durante el periodo, la interventoría realizó la toma de muestras de

densidad en sitio mediante ensayos de campo (cono de arena), con el fin de verificar el grado de compactación del material colocado en rellenos, subbase y base granular. Las pruebas fueron ejecutadas en zonas previamente intervenidas, y los resultados permitieron validar el cumplimiento del 95% de la densidad Proctor modificado exigida por las especificaciones técnicas del proyecto.

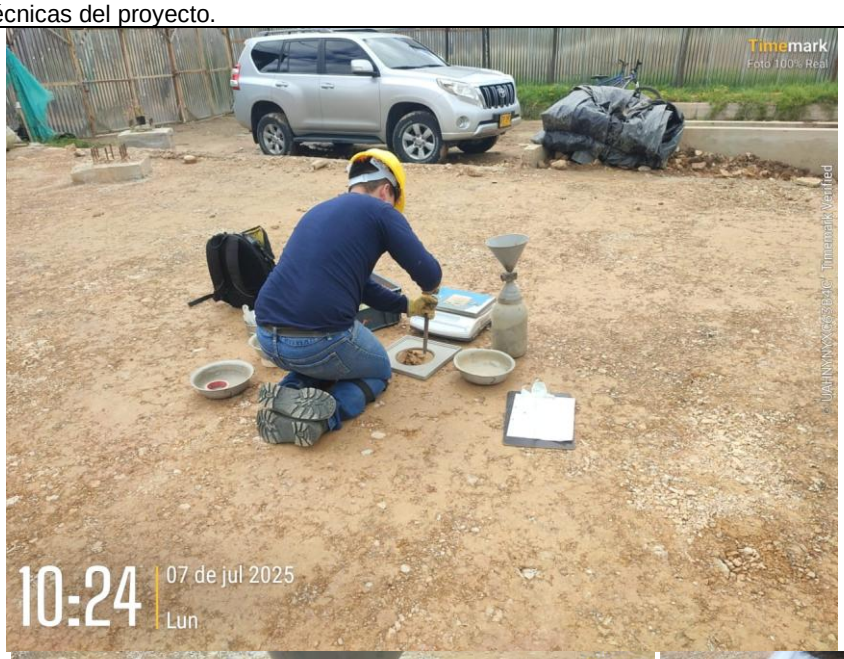












Toma de Muestras de Densidad – Obra: Durante el periodo se realizaron ensayos de campo por parte del equipo técnico de obra para verificar el grado de compactación de materiales utilizados en rellenos, subbase y base granular. Las muestras fueron tomadas mediante el método del cono de arena y/o densímetro, asegurando que cada capa cumpliera con el mínimo del 95% de la densidad máxima Proctor modificado, conforme a las especificaciones técnicas. Los resultados sirvieron como soporte para la liberación de frentes y avance controlado de las siguientes actividades.









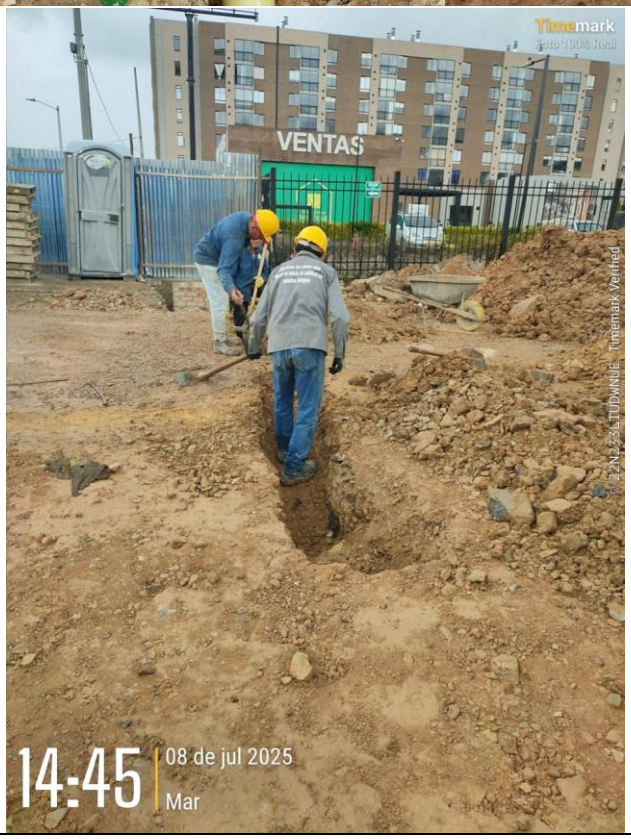



Excavación manual en material común: Durante el periodo se ejecutaron excavaciones manuales en material común para conformación de zanjas, fundaciones y ajustes de detalle en áreas de difícil acceso. Esta actividad se realizó con herramientas menores, permitiendo mayor precisión en profundidad, alineación y ubicación de elementos estructurales y redes. Se controlaron cotas y se garantizó la adecuada disposición del material excavado conforme a las especificaciones del proyecto.
