TABLA DE CONTENIDO

Informe de calidad No. 7	426
Anexo A. Actividades del periodo	448
Anexo B. Control de actividades	454
a. Actas de entrega Parques	454
a.a. Puesta en servicio Américas Occidental	455
b. Ingreso de materiales	460
c. Instalaciones de materiales	466
Anexo C. Actas de comité	496
Anexo D. Control de documentos	513
a. Listado maestro de documentos	514
Anexo E. Compras	517
a. Américas Occidental	518
b. Alfonso Lopez	522
c. El Recreo	526
d. Los Ejidos	529
e. Luces Villarica	532
f. Porvenir	535
g. Santa Isabel	538
h. Chicala	541
i. Villa Mayor	545
j. Campos Naturales	548
Anexo F. Certificados de calidad	551
a. Alfonso Lopez	552
b. Americas Occidental	560
c. El Recreo	567
d. Los Ejidos	574
e. Luces Villarica	581
f. Porvenir	588
g. Santa Isabel	595
h. Chicala	602
i. Villa Mayor	610
j. Campos Naturales	617
k. Control de materiales con certificados de conformidad	620
Anexo G. Inspección y ensayos	622
Anexo H. Medición	639
Anexo I. Salidas no conformes	647
Anexo J. Auditoria	678
Anexo K. Control de cambios	682
Anexo L. Bitácora de obra	692

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
Fecha de firmado: 2025.07.21 10:48:40 COT
Firmado digitalmente desde SGD-OrfeoJADE

1. INFORME COMPONENTE DE CALIDAD No. 7 – JUNIO 2025

INFORME DE CALIDAD Nro. 7
v2

CONSORCIO INNOVAPARQUES

OBJETO DEL CONTRATO:

"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

Lote 1/grupo 1 CAMPOS DEPORTIVOS, tiene el siguiente alcance: "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS"

OBRA PUBLICA 4041 DE 2024 CON EL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE IDRD DE BOGOTA

Bogotá D.C., junio de 2025

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Fecha: 24/06/2025	Fecha: 25/06/2025	Fecha: 25/06/2025
Nombre: Ing. John Jairo Marín López Ing. QA-QC	Nombre: Ing. Brayan Stivens García Ing. Residente.	Nombre: Ing. Javier Linares Director de Obra

427

VERSIÓN NO.	FECHA DE MODIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1	10/06/2025	Se elabora el Documento
2	25/06/2025	Ajustes al Documento

TABLA DE CONTENIDO

1. ESTADO CONTRACTUAL Y DE GESTIÓN 5
2. SEGUIMIENTO A INDICADORES DE GESTIÓN 5
3. CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL RECURSO HUMANO 7
4. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PROYECTO 7
5. Seguimiento al cumplimiento de plan de calidad 8
5.1 Control a las actividades ejecutadas en el proyecto 8
6. SEGUIMIENTO A LAS COMUNICACIONES 9
6.1 Actas de Comité 9
Correspondencia enviada 9
6.2 Correspondencia recibida 10
6.3 Bitácora. 11
7. Seguimiento de la información documentada 11
8. PLAN DE ADQUISICIONES 11
9. INFRAESRUCTURA Y PRESERVACION 12
10. Control de calidad de materiales 14
10.1 Control y seguimiento de la trazabilidad de los materiales certificados por proveedor ... 15
10.2 Cumplimiento al Plan de Inspección y ensayo del proyecto 16
11. Control y seguimiento de los Equipos de Inspección, medición y ensayo 18
12. CONTROL DE LA GESTION 18
12.1 Control de Cambios 19
12.2 Salidas no conformes 19
Para el presente informe no se registra salida no conforme, ... 20
13. Auditorías internas 20
14. Listado de Anexos 21

LISTADO DE TABLAS

Tabla Nro. 1 Estado del contrato 5
Tabla Nro. 2 Ejecución de indicadores Avance físico y en tiempo 6
Tabla Nro. 3 Personal del contrato 7
Tabla Nro. 4 Correspondencia enviada 9
Tabla Nro. 5 Correspondencia recibida 10
Tabla Nro. 6 Tabla de adquisiciones 11
Tabla Nro. 7 Materiales certificados por proveedor 15
Tabla Nro. 8 Materiales controlados por inspección y ensayos 17
Tabla Nro.9 Equipos de medición utilizados en la ejecución del contrato 18
Tabla Nro.10 Consolidado de control de cambios 19
Tabla Nro. 11 Consolidado de salidas no conformes 20
Tabla Nro. 12 Consolidado de Auditorías realizadas 20

ILUSTRACIONES

Ilustración 1.Unidad del Salitre – Cepillado 13
Ilustración 2. Florida 5 – Corte de campo 13
Ilustración 3. Alfonso López -Pegue de grama 13
Ilustración 4.Américas Occidental – Pegue de grama. 13
Ilustración 5. Gaitana- Bordeo 14
Ilustración 6. Chicala – Mto Area Perimetral 14
Ilustración 7. Victorita Norte – Desmonte de grama 14

1. ESTADO CONTRACTUAL Y DE GESTIÓN

El contrato formalizado con el Instituto Distrital De Recreación y Deporte corresponde a la siguiente información:

Tabla Nro. 1 Estado del contrato

CONTRATO DE OBRA IDRD No.	*4041 - 2024*
CONTRATISTA	*CONSORCIO INNOVAPARQUES*
OBJETO	*"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD".* *Lote 1/grupo 1 CAMPOS DEPORTIVOS, tiene el siguiente alcance: "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS"*
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	***GRUPO 1. CAMPOS DEPORTIVOS.*** *Las obras por ejecutar se realizarán en los campos deportivos administrados por el IDRD en grama natural, sintética y de arena, los cuales se encuentran en un listado preliminar, sin perjuicio del ingreso de nuevos campos deportivos a cargo del IDRD, los cuales podrán ser sujeto de intervención conforme a las necesidades del Instituto, definidos en los comités de obra.*
FECHA DE INICIO	*Noviembre 20 de 2024*
FECHA FINAL INICIAL	*Julio 19 de 2025*
PLAZO INICIAL	*8 meses*
ADICION EN TIEMPO	*3 meses Total 11 meses*
NUEVA FECHA FINAL CONTRATO	*Octubre 19 de 2025*
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	*$ 5.200.000.000,00*
VALOR ADICION DEL CONTRATO	*$2.847.000.000*
NUEVO VALOR DEL CONTRATO	***$8.047.000.000***
INTERVENTORÍA	*CONSORCIO SANTA TERESA 28*
SUPERVISOR	*RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO*

2. SEGUIMIENTO A INDICADORES DE GESTIÓN

Durante la ejecución del contrato se realizó el seguimiento al porcentaje de avance que se fue presentando de acuerdo con el desarrollo y condiciones particulares detectadas, el cual es reportado en el presente informe nro. 7. Es importante mencionar que el 15 de mayo de 2025 el contrato tuvo una adición en dinero por un valor de **$2.847.000.000** generando un cambio en el nuevo valor del contrato el cual se fija en **$8.047.000.000 así como en tiempo por 3 meses para un total de 11 meses,** afectando el indicador de avance en el tiempo, financiero y entrega de productos el cual cambiaria a un total de 65 productos por entregar. Para el corte Nro. 7 el desempeño generado de los indicadores del contrato para el cierre de este son los siguientes:

Tabla Nro. 2 Ejecución de indicadores Avance físico y en tiempo

NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA	RESULTADOS	FRECUENCIA	META	EJECUTADO Periodo 5
Porcentaje de avance en el tiempo	Nro. De Meses de Ejecución Acumulado x 100 / Meses de ejecución contractual.	6.33 x 100 = **58%** / 11	Mensual	100% en el tiempo de ejecución del proyecto	Del 100% del plazo de ejecución con la adición del tiempo del proyecto, el nuevo valor es del **58 %** de tiempo utilizado.
Porcentaje de avance Financiero	Valor ejecutado en el periodox100 / Valor total del Contrato	1.372.224.616 x 100= **17.1 %** / 8.047.000.000	Mensual	100% del presupuesto	Del 100% del presupuesto con la adición presupuestal en el periodo se ejecutó un **17.1%** y un acumulado del **69.3% sobre el valor total del contrato**
Porcentaje de Avance Físico	Nro. De actividades ejecutadas acumulado periodo x100 / Nro. De actividades planeadas periodo.	20 x 100= 100% / 20	Mensual	100% de las actividades de la programación	Del 100 % de las actividades planeadas en el periodo se ejecutó el **100%**.
Entrega de Productos	#Entrega de productos presentados aprobados /#Productos presentados) *100%	36 x 100= 63% / 57	Inicio del Proyecto y mensualmente	Aprobación del 100% de los productos entregados.	De **57** productos proyectados con la adición del contrato para aprobación en el contrato, se han aprobado el **63.%**. A corte de 30 de mayo de 2025

Nota: El indicador de entrega de productos, tiene como base 13 planes iniciales entregados y aprobados. Para cada periodo va sumando 4 informes que corresponden al técnico, calidad, SST y ambiental. Los datos serán con base a las aprobaciones del informe anterior. F**alta la aprobación del informe de calidad nro. 6.**
De noviembre de 2024 a octubre de 2025 se tienen proyectado entregar 65 productos

432

3. CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL RECURSO HUMANO

Durante la ejecución del contrato, el Consorcio INNOVAPARQUES dio cumplimiento con el personal mínimo requerido en los requisitos contractuales obteniendo de las respectivas aprobaciones para el área de calidad del contrato por parte de la interventoría. No se registra novedades de personal en el periodo nro. 7.

A continuación, se relaciona el personal contractual de obra que estuvo durante el periodo, el cual contó con la respectiva aprobación por parte de la interventoría:

Tabla Nro. 3 Personal del contrato

No.	DATOS DEL PROFESIONAL CONTRACTUAL						APROBACION INTERVENTORIA
	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	PROFESION	DEDICACION	CONSECUTIVO DE CORRESPONDENCIA PARA APROBACION	
1	EDWIN JAVIER LINARES GARCIA	1.013.623.379	DIRECTOR DE OBRA	Ing. Civil	22.4%	**CINNOVAPARQUES-CE-001**	IDRD-4080-G1-2024-030
2	JAVIER GUTIERREZ PINEDA	79.455.166	AGRONOMO	Ing. Agrónomo	60%	**CINNOVAPARQUES-CE-001**	IDRD-4080-G1-2024-030
3	ANDREA MARCELA LOPEZ ECHEVERRY	1.018.422.772	PROFESIONAL SEGURIDAD INDUSTRIAL	Ing. Ambiental	34%	**CINNOVAPARQUES-CE-001**	IDRD-4080-G1-2024-030
4	JHONY FERNEY DIAZ DAZA	1.013.632.556	INSPECTOR	Ing. Civil	100%	**CINNOVAPARQUES-CE-001**	IDRD-4080-G1-2024-030
5	OSCAR MAURICIO ACEVEDO BERNAL	1.115.913.000	INSPECTOR	Tecnólogo en obras civiles	100%	**CINNOVAPARQUES-CE-001**	IDRD-4080-G1-2024-030
6	CAROL GISELLE LOPEZ FIGUEROA	**1.022.443.543**	INSPECTOR	Ing. Civil	100%	**CINNOVAPARQUES-CE-093**	**IDRD-4080-G1-2024-132**
7	ALEANDRO STEVE SARAY HERNANDEZ	80.050.329	TOPOGRAFO	Tecnólogo en topografía	12%	**CINNOVAPARQUES-CE-001**	IDRD-4080-G1-2024-030
8	JUAN CARLOS SANABRIA NUNZABA	79.698.876	CADENERO	NA	12%	**CINNOVAPARQUES-CE-001**	IDRD-4080-G1-2024-030
9	DEASSI MAGALY VELASQUEZ QUEVEDO	1.023.865.830	SECRETARIA	Técnico en gestión de aerolíneas y agencias de viajes	5%	**CINNOVAPARQUES-CE-001**	IDRD-4080-G1-2024-030
10	BRAYAN STIVENS GARCIA GARCIA	1.024.488.768	RESIENTE DE OBRA	Ing. Civil	100%	**CINNOVAPARQUES-CE-061**	**IDRD-4080-G1-2024-081**

Fuente: Elaboración Consorcio Innova parques

4. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PROYECTO

Dentro de las actividades realizadas por el CONSORCIO en las diferentes canchas, alcance del contrato, se encuentran las siguientes:

ITEM	ACTIVIDADES DEL PERIODO
1	02 Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **
2	04 BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO
3	05 Cepillado de Campo Sintético**
4	10 Reparación divots -trozos cesped- (est.atl. UDS)**
5	12 CORTE CAMPO DE POLO (COUNTRY = 46100m2) **
6	14 Corte césped canchas fútbol
7	03 Relleno en arena de rio suelta**
8	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso).
9	02 Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **
10	03 Equipo Top-dressing + ayudante **
11	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **
12	06 FERTILIZANTE QUÍMICO GRANULADO, FOLIAR Y ORGANICO
13	08 Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **
14	02 Mantenimiento de arcos (porterias) de futbol
15	03 Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)
16	04 Mallas profesionales Cal.8 Futbol (Sumin e Instal)
17	04 MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)
18	05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasiego) Mantenimiento correctivo
19	02 GRAMA SINT MONOFIL.60MM-FIFAPRinc arena+caucho+ins
20	06 GRAMA SINT. DESMONTE+RETIRO+DISPOSICION FINAL

El consolidado de las actividades realizadas en todas las canchas se encuentran registradas en el ***anexo A***

5. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE PLAN DE CALIDAD

Dentro de las actividades de cumplimiento del plan de calidad las cuales se describen en el presente documento se encuentran entre otras la siguiente:

- Seguimiento a los indicadores del proyecto en el periodo.
- Seguimiento a las comunicaciones
- Control de ensayos de materiales
- Control y medición de equipos
- Control de los cambios existente en el proyecto.
- Auditorías internas las cuales se realizarán según la programación aprobada.
- Mejora continua.

5.1 Control a las actividades ejecutadas en el proyecto

Dentro de las actividades que se realizan para el control del proyecto se encuentran las siguientes las cuales y se pueden observar en el ***anexo B***:

- PS-F-11 Formato de verificación instalaciones v3.
- PS-F-08 Formato de control de llegada de materiales semanal
- Acta de entrega para puesta en servicio del parque en formato IDRD.
- Supervisión y control de las actividades realizadas

Para el periodo se cuenta con el acta de entrega de Puesta en Servicio de la canchas de Américas Occidental

6. SEGUIMIENTO A LAS COMUNICACIONES

6.1 Actas de Comité

Teniendo en cuenta los temas tratados en los comités de obra los cuales se realizan cada 8 días, se establecen compromisos de dichos temas a fin de dar cumplimiento a los compromisos adquiridos del contrato. El resumen y seguimiento de los temas tratados se encuentran registrados en el ***anexo C***.

Para el presente informe se anexan y registra el seguimiento del acta 23 correspondiente al comité del 8/05/2025, quedan pendientes el envió por parte de la interventoría de las actas 24, 25 y 26. Así mismo se actualiza el seguimiento con algunas actas de abril que fueron enviadas por la interventoría como la Nro. 19 y 22 faltando la 20.

A continuación, se relacionan las comunicaciones que fueron enviadas entre el 1 de mayo al 31 de mayo de 2025, tiempo que comprende el 7 informe de la siguiente manera:

Correspondencia enviada

Tabla Nro. 4 Correspondencia enviada

FECHA	CONSECUTIVO No	ASUNTO	DESTINATARIO
2/05/2025	CINNOVAPARQUES-CE-174	Entrega acta de pago No. 6 - abril 2025	CONSORCIO SANTA TERESA 28
2/05/2025	CINNOVAPARQUES-CE-175	Envío programación ejecución mantenimientos rutinarios mes de mayo del 2025	CONSORCIO SANTA TERESA 28
5/05/2025	CINNOVAPARQUES-CE-176	Envío informe técnico No. 6 - Abril 2025	CONSORCIO SANTA TERESA 28
7/05/2025	CINNOVAPARQUES-CE-177	Presupuestos canchas Alqueria, Chicalá, Serena, La Igualdad, Gilma Jimenez y Alfonso Lopez	CONSORCIO SANTA TERESA 28
8/05/2025	CINNOVAPARQUES-CE-178	Engtrega física informe técnico No. 5 - Marzo 2025	CONSORCIO SANTA TERESA 28
8/05/2025	CINNOVAPARQUES-CE-179	Entrega física informe mensual SST No. 6 - Abril 2025	CONSORCIO SANTA TERESA 28
8/05/2025	CINNOVAPARQUES-CE-180	Entrega física informe mensual ambiental No. 6 - Abril 2025	CONSORCIO SANTA TERESA 28
8/05/2025	CINNOVAPARQUES-CE-181	Entrega subsanación informe mensual de calidad No. 5 - Marzo 2025	CONSORCIO SANTA TERESA 28
14/05/2025	CINNOVAPARQUES-CE-182	Entrega informe de calidad No. 6 - Abril 2025	CONSORCIO SANTA TERESA 28
14/05/2025	CINNOVAPARQUES-CE-183	Entrega física informe de calidad No. 5 - Marzo 2025	CONSORCIO SANTA TERESA 28
14/05/2025	CINNOVAPARQUES-CE-184	Presupuestos canchas Nuevo Muzu, Américas Occidental, Fontanar F5, Fontanar F11, Fontanar Mini Beisbol, Villas del Madrigal y Cafam Suba Gavilanes	CONSORCIO SANTA TERESA 28

435

FECHA	CONSECUTIVO No	ASUNTO	DESTINATARIO
20/05/2025	CINNOVAPARQUES-CE-185	Presentacia aves migratorias tipo Alcaravan en el parque Marsella - Línea de tiempo y acciones ejecutadas	CONSORCIO SANTA TERESA 28
20/05/2025	CINNOVAPARQUES-CE-186	Entrega física informe técnico No. 6 - Abril 2025	CONSORCIO SANTA TERESA 28
20/05/2025	CINNOVAPARQUES-CE-187	Respuesta IDRD-4080-G1-2024-217 Respuesta al comunicado CINNOVAPARQUES-CE-165 INFORME DE IMPREVISTOS No. 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28
22/05/2025	CINNOVAPARQUES-CE-188	Presupuestos canchas Vilanova y PRD	CONSORCIO SANTA TERESA 28
23/05/2025	CINNOVAPARQUES-CE-189	Respuesta IDRD-4080-G1-2024-234 Solicitud soportes plan de inspección y ensayos y certificaciones de materiales e IDRD-4080-G1-2024-245 Reiteración soportes plan de inspección y ensayos y certificaciones de materiales	CONSORCIO SANTA TERESA 28
28/05/2025	CINNOVAPARQUES-CE-190	Respuesta IDRD-4080-G1-2024-247 Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-187- Revisión informe de imprevistos No. 1 subsanado	CONSORCIO SANTA TERESA 28
28/05/2025	CINNOVAPARQUES-CE-191	Respuesta IDRD-4080-G1-2024-246 Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-167- Entrega informe de imprevistos No. 2 diciembre 2024 y CINNOVAPARQUES-CE-168 Entrega de imprevistos No. 3 - Enero 2025	CONSORCIO SANTA TERESA 28
28/05/2025	CINNOVAPARQUES-CE-192	Entrega informes de imprevistos No. 4 - Febrero 2025, No. 5 - Marzo 2025 y No. 6 - Abril 2025	CONSORCIO SANTA TERESA 28
28/05/2025	CINNOVAPARQUES-CE-193	Entrega programación frente de obra priorizados adición	CONSORCIO SANTA TERESA 28
29/05/2025	CINNOVAPARQUES-CE-194	Subsanación informe de calidad No. 6 - Abril 2025	CONSORCIO SANTA TERESA 28
30/05/2025	CINNOVAPARQUES-CE-195	Entrega acta de pago No. 7 - Mayo 2025	CONSORCIO SANTA TERESA 28
31/05/2025	CINNOVAPARQUES-CE-196	Envio programación ejecución mantenimientos rutinarios mes de junio 2025	CONSORCIO SANTA TERESA 28

6.2 Correspondencia recibida

Tabla Nro. 5 Correspondencia recibida

FECHA	CONSECUTIVO No	ASUNTO	REMITENTE
2/05/2025	IDRD-4080-G1-2024-217	Respuesta al comunicado CINNOVAPARQUES-CE-165 Observaciones informe de imprevistos No. 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28
2/05/2025	IDRD-4080-G1-2024-218	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-173 Reporte de materiales	CONSORCIO SANTA TERESA 28
2/05/2025	IDRD-4080-G1-2024-221	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-153 Presupuestos Recreo y Pradera Sur	CONSORCIO SANTA TERESA 28
2/05/2025	IDRD-4080-G1-2024-222	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-171 Presupuestos Villa Mayor	CONSORCIO SANTA TERESA 28
7/05/2025	IDRD-4080-G1-2024-228	IDRD.4080-G1-2024-228 Respuesta sobre ubicación instalación de bicicleteros oferta cto 4041-2024	CONSORCIO SANTA TERESA 28
7/05/2025	IDRD-4080-G1-2024-230	Reiteración comunicado IDRD-4080-G1-2024-207 Revisión informe de calidad No. 5 V1	CONSORCIO SANTA TERESA 28
12/05/2025	IDRD-4080-G1-2024-232	Revisión informe de calidad No. 5 V2	CONSORCIO SANTA TERESA 28
13/05/2025	IDRD-4080-G1-2024-234	Solicitud soportes plan de inspección y ensayos y certificaciones de materiales	CONSORCIO SANTA TERESA 28
13/05/2025	IDRD-4080-G1-2024-235	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-177 Revisión de presupuestos	CONSORCIO SANTA TERESA 28
13/05/2025	IDRD-4080-G1-2024-236	Solicitud ejecución actividad polvo de ladrillo en campos de arena	CONSORCIO SANTA TERESA 28
14/05/2025	IDRD-4080-G1-2024-237	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-176 Revisión informe mensual componente técnico No. 6	CONSORCIO SANTA TERESA 28
14/05/2025	IDRD-4080-G1-2024-238	Requerimiento remisión informe mensual de calidad No. 6	CONSORCIO SANTA TERESA 28
16/05/2025	IDRD-4080-G1-2024-240	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-184 Revisión de presupuestos	CONSORCIO SANTA TERESA 28
16/05/2025	IDRD-4080-G1-2024-243	Solicitud entrega presupuesto y programación campos a intervenir con prorroga y adición No. 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28
19/05/2025	IDRD-4080-G1-2024-244	Observaciones informe de calidad No. 6 V1	CONSORCIO SANTA TERESA 28
21/05/2025	IDRD-4080-G1-2024-245	Reiteración soportes plan de inspección y ensayo y certificaciones de materiales	CONSORCIO SANTA TERESA 28

436

FECHA	CONSECUTIVO No	ASUNTO	REMITENTE
22/05/2025	IDRD-4080-G1-2024-246	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-167 Informe de imprevistos No. 2 - diciembre 2024 y CINNOVAPARQUES-CE-168 Entrega informe de imprevistos No. 3 - enero 2025	CONSORCIO SANTA TERESA 28
22/05/2025	IDRD-4080-G1-2024-247	Respuesta INNOVAPARQUES-CE-187 Revisión informe de imprevistos No. 1 subsanado	CONSORCIO SANTA TERESA 28
27/05/2025	IDRD-4080-G1-2024-248	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-188 Revisión de presupuestos PRD y Vilanova	CONSORCIO SANTA TERESA 28
30/05/2025	IDRD-4080-G1-2024-251	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-189 Solicitud planes de inspección y ensayos	CONSORCIO SANTA TERESA 28

6.3 Bitácora.

La bitácora se constituyó como el instrumento para el registro del control y supervisión de obra se usa para ir haciendo las anotaciones en el libro o libreta que contiene el formato con las especificaciones necesarias requeridas en el Consorcio Innova parques la cual contó con las siguientes características:

Fechado: Todas las notas de bitácora deben estar fechadas en el día en que se efectúa el registro.
Escritura de la bitácora: Los asientos deben efectuarse con tinta indeleble, nunca con tinta que pueda borrarse, mucho menos con lápiz. Es importante además tener cuidado en escribir con letra fácilmente legible y sin abreviaturas. Cualquier persona debe ser capaz de leer todo lo escrito.
Errores en la escritura de la bitácora: Cuando se comete un error de redacción, de intención o de ortografía, la nota debe anularse acompañada de una leyenda que diga "Esta nota se anula por tener error". De inmediato se abre la siguiente nota repitiendo lo asentado, esta vez sin errores. En lo posible se debe evitar el tener que proceder como se indica, pero llegado el caso es imprescindible hacerlo. Ese registro se encuentra disponible en el ***anexo M***

7. SEGUIMIENTO DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA

La información documentada del Consorcio Innova parques durante la ejecución del contrato corresponde a los siguientes documentos:

- Informe técnico
- Informe de Seguridad y Salud en el trabajo
- Informe de Calidad
- Actas de reuniones y comités de seguimiento

Las firmas autorizadas para el proceso de elaboración revisión y aprobación corresponden a los profesionales aprobados por la interventoría para la elaboración, en algunos casos la revisión y para la probación corresponde al director y /o representante legal del contratista e interventoría. En el periodo no se requiere actualizar el listado maestro de documentos conservándose el 20250430 HSEQ-F-38 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS registrado en el *anexo E.*

8. PLAN DE ADQUISICIONES

Esta actividad nos permite verificar el control de compra de los materiales necesarios para la ejecución del contrato, a fin de identificación los tiempos, el consecutivo de órdenes de compra y proveedor o aleados estratégicos. A continuación, se **actualiza** el plan de adquisiciones, realizándose un resumen de las ordenes de servicio del periodo, donde algunas las cuales se pueden también visualizar, en el ***anexo F***, así como los materiales utilizados en los siguientes parques:

Tabla Nro. 6 Tabla de adquisiciones

PARQUE	MATERIALES	REMISION NRO.	PROVEEDOR	FECHA
PORVENIR 1	MALLA CERRRAMIENTO	4140 -04-16	MALLAS NM	24/04/2025
	MALLA CALIBRE 4	4140 -04-16	MALLAS NM	24/04/2025
	MALLA CERRAMIENTO/PORVENIR MINI	4140 -04-16	MALLAS NM	24/04/2025
	MALLA CALIBRE 4/PORVENIR MINI	4140 -04-16	MALLAS NM	24/04/2025
PARQUE INDUSTRIAL LOS EJIDOS	MALLA CERRAMIENTO	4140 -04-17	MALLAS NM	25/04/2025
	MALLA CALIBRE 4	4140 -04-17	MALLAS NM	25/04/2025
	MALLA CALIBRE 8	4140 -04-17	MALLAS NM	25/04/2025
AMERICAS OCCIDENTAL	MALLA CERRAMIENTO	4140 -04-18	MALLAS NM	28/04/2025
	MALLA CALIBRE 4	4140 -04-18	MALLAS NM	28/04/2025
	MALLA CALIBRE 8	4140 -04-18	MALLAS NM	28/04/2025
URBANIZACION CHICALA	GRAMA SINTETICA	4140 -04-19	CUPERZ	29/04/2025
	CAUCHO SBR / REPARACIONES	4140 -04-19	ECO TIRE GREEN SAS	29/04/2025
	ARENA SILICE	4140 -04-19	BEPE	29/04/2025
	CINTAS UNIONES	4140 -04-19	MALLAS NM	29/04/2025
	PEGANTE BICOMPONENTE	4140 -04-19	SELLECO	29/04/2025
	CAUCHO SBR/TOP DRESSING	4140 -04-19	ECO TIRE GREEN SAS	29/04/2025
SANTA ISABEL F8 F5	MALLA CERRAMIENTO / F8	4140 -04-20	MALLAS NM	29/04/2025
	MALLA CALIBRE 4	4140 -04-20	MALLAS NM	29/04/2025
	MALLA CALIBRE 8	4140 -04-20	MALLAS NM	29/04/2025
	MALLA CERRAMIENTO / F5	4140 -04-20	MALLAS NM	29/04/2025
	MALLA CALIBRE 4 /F5	4140 -04-20	MALLAS NM	29/04/2025
EL RECREO	MALLA CERRAMIENTO	4140 -04-21	MALLAS NM	29/04/2025
	MALLA CALIBRE 4	4140 -04-21	MALLAS NM	29/04/2025
	MALLA CALIBRE 8	4140 -04-21	MALLAS NM	29/04/2025
CAMPOS NATURALES	VINILO TIPO 2	4140 -001-05	TITO PABON	2/05/2025
LUCES VILLA RICA	MALLA CERRAMIENTO	4140 -002-05	MALLAS NM	5/05/2025
	MALLA CALIBRE 4	4140 -002-05	MALLAS NM	5/05/2025
	MALLA CALIBRE 8	4140 -002-05	MALLAS NM	5/05/2025
ALFONSO LOPEZ	PEGANTE BICOMPONENTE	4140 -003-05	SELLECO	8/05/2025
	CINTA UNIONES	4140 -003-05	MALLAS Y GRAMAS	8/05/2025
	GRAMA SINTETICA	4140 -003-05	CUPERZ	8/05/2025
	CAUCHO SBR	4140 -003-05	ECO TIRE GREEN SAS	8/05/2025
	ARENA SILICE	4140 -003-05	BEPE	8/05/2025
	CAUCHO SBR	4140 -003-05	ECO TIRE GREEN SAS	8/05/2025
URBANIZACION CHICALA	MALLA CERRAMIENTO	4140 -004-05	MALLAS NM	9/05/2025
ALFONSO LOPEZ	MALLA CERRAMIENTO	4140 -005-05	MALLAS NM	14/05/2025
VILLA MAYOR	MALLA CERRAMIENTO	4140 -006-05	MALLAS NM	15/05/2025
	MALLA CALIBRE 4	4140 -006-05	MALLAS NM	15/05/2025
	MALLA CALIBRE 8	4140 -006-05	MALLAS NM	15/05/2025
AMERICAS OCCIDENTAL	PEGANTE BICOMPONENTE	4140 -007-05	SELLECO	26/05/2025
	CINTA UNIONES	4140 -007-05	MALLAS Y GRAMAS	26/05/2025
	GRAMA MONOFILAMENTO	4140 -007-05	CUPERZ	26/05/2025
	CAUCHO SBR	4140 -007-05	ECO TIRE GREEN SAS	26/05/2025
	ARENA SILICE	4140 -007-05	BEPE	26/05/2025

9. INFRAESRUCTURA Y PRESERVACION

Para la ejecución del proyecto se hizo uso de los siguientes recursos de infraestructura:

- ✓ Oficina de control de proyecto: Calle 51 Nro. 71ª-18
- ✓ Baños fijos en oficina y parques.
- ✓ Equipos y maquinaria como Vibro compactadores, minicargadores, Sopladoras de pasto.
- ✓ Herramientas manuales.
- ✓ Vallas móviles.
- ✓ Suministro de agua potable.

- ✓ Energía eléctrica
- ✓ Equipos de comunicación.



Ilustración 1.Unidad del Salitre – Cepillado

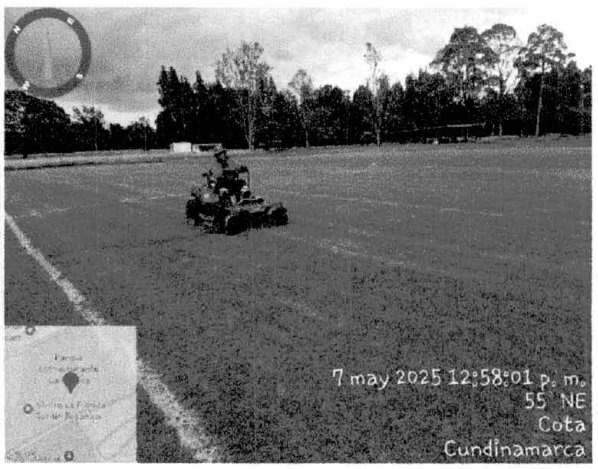


Ilustración 2. Florida 5 – Corte de campo



Ilustración 3. Alfonso López -Pegue de grama



Ilustración 4.Américas Occidental – Pegue de grama.

489



Ilustración 5. Gaitana- Bordeo



Ilustración 6. Chicala – Mto Area Perimetral

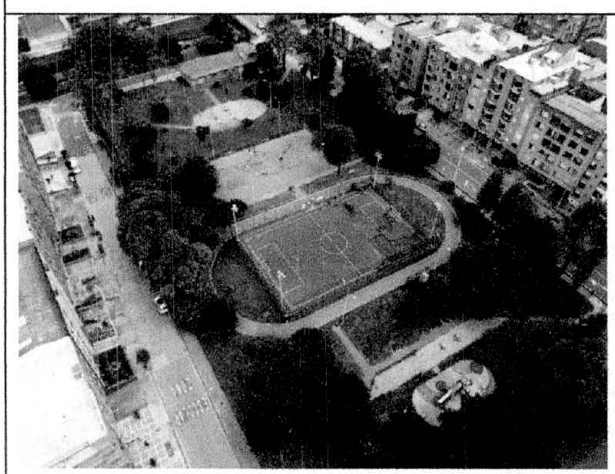


Ilustración 7. Victorita Norte – Desmonte de grama

10. CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES

Durante la ejecución del contrato, el Consorcio Innovaparques estableció e implementó las medidas necesarias para controlar la calidad de las actividades de obra ejecutadas y los equipos de medición utilizados así como los materiales utilizados en cada una de estas, para lo cual, de conformidad con el plan de calidad aprobado por la interventoría, realizó el control a los materiales certificados por los proveedores, verificando que los mismos cumplieran con las características requeridas por el contrato .

10.1 Control y seguimiento de la trazabilidad de los materiales certificados por proveedor

Los controles implementados por el Consorcio Innovaparques permitieron tener la trazabilidad de los materiales utilizados en obra, asegurando que los proveedores proveedor han proporcionado bajo los estándares de calidad requerido permitiendo identificar la conformidad de los productos bajo parámetros establecidos por normas nacionales o internacionales de acuerdo con las particularidades de cada material y cuyos resultados se muestran en los certificados de calidad emitidos por el mismo proveedor los cuales no varían en el periodo de febrero dado que la compra de estos materiales es en grandes cantidades ***ver anexo G.***

En la ejecución del contrato, se recibieron materiales con certificado de conformidad como se listan en la siguiente tabla resumen por mes de ejecución:

Tabla Nro. 7 Materiales certificados por proveedor

MATERIAL	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NORMA A CUMPLIR	# CERTIFICADO PRESENTADO	ENTDAD CERTIFICADORA
Caucho	NTC 5176	EN 933-1 EN 1097-3 EN 14955	N. E	CAUCHOS DINAMICOS
Vinilo Basico Tipo 2 Blanco	MNI 125,0- MAX 130,0	NTC 559	1561	TITO PABON
Grama / FLASHBLADE 1.409 gr /Palermo SUR 24N525-E581B, 24N525AE581B, 24N525BE581B, 24N524-E020B, 24N526-E581B, 24N526AE581B	FIFA	ASTM 3776	N. E	CUPERZ
24N321-E81AB, 24N321A-E81AB, 24N321B-E81AB, 24N322-E81AB, 24N322A-E81AB, 24N322B-E81AB	FIFA	ASTM 3776	N. E	CUPERZ
ULTRACORROSIVO	N. E	N. E	95468	ULTRA PINTURAS
ESMALTE SINTETICO	N. E	N. E	95742	ULTRA PINTURAS
CINTA DE UNION DE CESPED	IDRD	N. E	CGQ-0345	MALLAS Y GRAMAS
MALLA DE CERRAMIENTO	IDRD	N.E.	1224-032	TRENZACOL
NYLON #4	IDRD	N.E.	1224-023	TRENZACOL
NYLON #8	IDRD	N.E.	1224-017	TRENZACOL
Grama / FLASHBLADE 1.409 gr / Pijaos Lotes 24N530-E581B, 24N530AE581B,	FIFA	ASTM 3776	N. E	CUPERZ

MATERIAL	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NORMA A CUMPLIR	# CERTIFICADO PRESENTADO	ENTDAD CERTIFICADORA
24N531-E581B, 24N531AE581B, 24N532-E581B, 24N532AE581B, 24N529-E581B, 24N529AE581B, 24N528-E020B, 24N533-E581B, 24N533AE581B, 24N534-E581B, 24N534AE581B, 24N538-E581B, 24N538AE581B, 24N536-E581B, 24N536AE581B, 24N535-E581B, 24N535AE581B, 24N546-E581B, 24N546AE581B, 24N537-E581B, 24N537AE581B, 24N545-E581B				

Fuente: Informes mensuales Consorcio Innovaparques

En el periodo se instaló un lote nuevo de grama, donde el certificado será entregado en el informe 8.

10.2 Cumplimiento al Plan de Inspección y ensayo del proyecto

Durante el desarrollo del contrato se hace necesario hacer uso de materiales pétreos a los cuales para verificación del cumplimiento de los parámetros requeridos de calidad se les realiza algún tipo de ensayo de laboratorio.

Lo que permite evaluar la conformidad del grupo de materiales que son entregados como parte de la obra ejecutada, correspondiendo a las actividades técnicas, tipos de inspección, frecuencia, criterios de aceptación, lo que permite asegurar la calidad y el cumplimiento de los requisitos de calidad, y que en caso de que alguno de estos no cumpla con los parámetros establecidos, se realizara el tratamiento de producto no conforme por calidad en los materiales proporcionados.

Los puntos de control y verificación son realizados de manera constante en obra al recibo de los materiales y documentados como parte de los informes mensuales dejando la trazabilidad registrada en el anexo del plan de inspección y ensayos de cada informe, los cuales son aprobados por la interventoría. En el periodo 7 se recepcionan las muestras tomadas en el mes de abril por CONCRELAB nuevamente, cuyos resultados se estima salgan en el mes de junio debido a retrasos relacionados con la no aceptación por parte de la interventoría de los ensayos por parte del laboratorio de PSI hechos en abril, por ende, fue necesario reenviar la muestra
Ver anexo H.

Tabla Nro. 8 Materiales controlados por inspección y ensayos

FECHA	MATERIAL	CANTIDAD DE MATERIAL	LABORATORIO	ENSAYO A REALIZAR	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	ANALISIS DE RESULTADOS		
						CUMPLE		OBSERVACIONES
						SI	NO	
21/11/2024	ARENA CILICE	N/A	Centro desarrollo Tecnológico Minero ENERGETICO SAS	análisis por tamizado de los agregados finos y gruesos para agregados	NTC - 77	X		NO
8/07/2024	CAUCHO	N/A	ACOUSTO SCAN LATAM	CURVA DE CLASIFICACIÓN DE PARTÍCULAS DE RELLENO DE RENDIMIENTO*TAMAÑO DE PARTÍCULA*DENSIDAD*FORMA	IDRD	X		NO
5/03/2025	ARENA DE PEÑA	N/A	CONCRELAB	DETERMINACIÓN DE LOS TAMAÑOS DE LAS PARTÍCULAS DE LOS SUELOS. (ANÁLISIS POR TAMIZADO)	IDRD	X		Ver comunicado 145-CE-CINNOVAPARQUES Ensayos de laboratorio
		N/A	CONCRELAB	DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO ORGÁNICO DE UN SUELO MEDIANTE EL ENSAYO DE PÉRDIDA POR IGNICIÓN.	IDRD	X		Ver comunicado 145-CE-CINNOVAPARQUES Ensayos de laboratorio
	CAUCHO	N/A	CONCRELAB	DETERMINACIÓN DE LOS TAMAÑOS DE LAS PARTÍCULAS DE LOS SUELOS. (ANÁLISIS POR TAMIZADO)	IDRD	X		Ver comunicado 145-CE-CINNOVAPARQUES Ensayos de laboratorio
9/04/2025	Arena sílice, color amarillo	N/A	PSI INGENIERIA Y LABORATORIO	INFORME DE RESULTADOS: ANALISIS GRANULOMÉTRICO DE LOS AGREGADOS GRUESO Y FINO	IDRD	X		VER INFORME SA-2624-25-001.
9/04/2025		N/A	PSI INGENIERIA Y LABORATORIO	INFORME DE RESULTADOS: DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO ORGÁNICO DE UN SUELO MEDIANTE EL ENSAYO DE PÉRDIDA POR IGNICIÓN	IDRD	X		VER INFORME SA-2624-25-001.
9/04/2025	Arena de río.	N/A	PSI INGENIERIA Y LABORATORIO	INFORME DE RESULTADOS: ANALISIS GRANULOMÉTRICO DE LOS AGREGADOS GRUESO Y FINO	SIN ESPECIFICACION	X		VER INFORME SA-2624-25-002.
9/04/2025		N/A	PSI INGENIERIA Y LABORATORIO	INFORME DE RESULTADOS: DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO ORGÁNICO DE UN SUELO MEDIANTE EL ENSAYO DE PÉRDIDA POR IGNICIÓN	IDRD	X		VER INFORME SA-2624-25-002.

FECHA	MATERIAL	CANTIDAD DE MATERIAL	LABORATORIO	ENSAYO A REALIZAR	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	ANALISIS DE RESULTADOS		
						CUMPLE		OBSERVACIONES
						SI	NO	
9/04/2025	Caucho Granular.	N/A	PSI INGENIERIA Y LABORATORIO	INFORME DE RESULTADOS: ANALISIS GRANULOMÉTRICO DE LOS AGREGADOS GRUESO Y FINO	IDRD	X		VER INFORME SA-2624-25-003

11. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO

Durante el presente periodo, se realizó el control para el aseguramiento de las óptimas condiciones y confiabilidad de las lecturas tomadas por los equipos de topografía para las actividades de obra permitiendo la conformidad del producto y/o revisión con respecto a los requisitos de cliente y según fue el caso, los cuales fueron calibrados y verificados con el formato de control de equipos de topografía del IDRD garantizando que los datos obtenidos fueran conformes. ***VER ANEXO I***

Durante el periodo se realiza la verificación del Nivel TOP CON:

Tabla Nro.9 Equipos de medición utilizados en la ejecución del contrato

INFORME	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	NRO. DE CERTIFICADO	FECHA DE VERIFICACION	FECHA DE VENCIMIENTO
3	NIVEL	Top con	AT – B4	JZ40615	C5798	15/01/2025 27/01/2025	9/06/2025
4	NIVEL	Top con	AT – B4	JZ40615	C5798	11/02/2025 26/02/2025	9/06/2025
5	NIVEL	Top con	AT – B4	JZ40615	C5798	13/03/2025 28/03/2025	9/06/2025
5	Tamiz	Sin especificar	Sin especificar	Ver certificado 14-LAC-055 /	Ver certificado 14-LAC-055 / CONCRELAB	16/02/2024	29/09/2027
6	TAMIZ	Sin especificar	Sin especificar	Ver certificado 20-LAB-008	Ver certificado 20-LAB-008	19/02/2024	11/02/2029
6	NIVEL	Top con	AT – B4	JZ40615	C5798	12/04/2025 28/04/2025	9/06/2025
7	NIVEL	Top con	AT – B4	JZ40615	C5798	12/05/2025 28/05/2025	9/06/2025

12. CONTROL DE LA GESTION

12.1 Control de Cambios

Durante el periodo el proyecto se presenta un cambio relacionado con la adición del contrato en cuanto a presupuesto y tiempo el cual se describe en la tabla nro. 10. Esta actividad asegura cualquier cambio del proceso constructivo de manera efectiva y con las partes interesadas desde el punto de vista técnico y legal en el alcance del contrato.

Cuando se suscitan estos cambios se llevan a cabo de la siguiente manera planificada:

a) el propósito de los cambios y sus consecuencias potenciales;
b) la integridad del proyecto;
c) la disponibilidad de recursos.
d) la asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades.
e) La concertación con la interventoría y con el cliente.

Tabla Nro.10 Consolidado de control de cambios

COMPILADO DE CAMBIOS DEL PROYECTO		
1	ACTIVIDAD DEL CAMBIO	
No	DESCRIPCIÓN	OBSERVACION
1	Cambio de la programación v4	Inclusión de nuevos parques con base a la información suministrada por el cliente. San Andrés F11 y F5, Florencia tronquitos, la Europa, Normandía, villas del madrigal y Marsella F5
2	Plan de inspección y ensayo cambia a V5	Se remite en comunicado 136-CE-CINNOVAPARQUES Respuesta IDRD-4080-G1-2024-171 Plan de inspección y ensayos
3	Cambio de la programación v5	Se adiciona las canchas de UDS playa, UDS Softbol, PRD playa, Complejo Acuático, UDS Beisbol, Gaitana voley playa, Ciudad Montes vóley playa, Ciudad Montes Softbol, Tunal Softbol, Hayuelos, Carvajal, Nuevo Muzu, Porvenir, Lombardía, Jazmín, Gorgonzola, Pradera sur, Parque Industrial Los Ejidos, Milenta Tejar, Santa Isabel, Américas Occidental, Fontanar mini Beisbol, Luces Villa Rica, Chicala y Alfonso López
4	Adición 001 y prorroga 001	"adición y prórroga del mismo, por un valor de dos mil ochocientos cuarenta y siete millones pesos m/cte ($ 2.847.000.000.00) y por un periodo de tres (3) meses, a partir del 20 de julio de 2025 hasta el 19 de octubre de 2025" (adición 001 y prorroga 001) para cubrir el mantenimiento de los parques Victoria norte, valle de refous, Primavera, Esperanza, Carlos lleras, Modelia, gimnasio del norte y luna park ; posteriormente se excluyen estos 2 últimos parques por solicitud del cliente para construir una cancha de PADEL.

Se incluye la prórroga del contrato en el **anexo L.**

12.2 Salidas no conformes

El consorcio durante el contrato realizó seguimiento a la conformidad del cliente, con relación a los productos suministrados establecidos donde se presenta una salida no conforme, relacionada con el cumplimiento del indicador, la cual se documenta, estableciendo la acción de mejora respectiva, buscando la calidad en la implementación de las actividades constructivas con base a los lineamientos de los manuales técnicos del IDRD, como se muestra a continuación:

Tabla Nro. 11 Consolidado de salidas no conformes

Informe No.	Fuente	Descripción	Estado
2	Requisitos de Cliente	No se ha realizado la presentación de las caracterizaciones iniciales de los materiales pétreos correspondientes con base a las especificaciones TECNICAS del Contrato.	Cerrada
3	Requisitos de Cliente	No se encuentra evidencia objetiva de la aprobación de los informes mensuales afectando el indicador de entrega de productos.	Cerrada
4	Auditoría Interna / Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo SG-SST	No se encuentra evidencia objetiva de la inspección pre Operacional del camión Inspecciones de Seguridad / informe diario y revisión preoperacional de vehículos y equipos mayores en concordancia del Numeral 4.3.3.3 Inspecciones de Seguridad / informe diario y revisión preoperacional de vehículos y equipos mayores.	Cerrada
6	Proceso de Prestación del Servicio	No se observa trazabilidad objetiva del envió de la programación V5 mediante comunicado a la interventoría, ni con fecha que identifique su elaboración según lo descrito en "7. CONTROL DE DOCUMENTOS, DATOS Y REGISTROS" y 10. PLAN DE COMUNICACIONES del Plan de Calidad v2.	Cerrada
7	PLAN DE CALIDAD	No se observa realización de los ensayos de materiales (caucho y arena) con la frecuencia establecida en el plan de ensayos V5	Abierta

Para el presente informe se cierra la salida no conforme registrada en el periodo 6 relacionada con la aprobación de la programación V5. De igual manera se registra una salida no conforme la cual se encuentra descrita en la tabla 11 que corresponde al presente informe Nro. 7. Ambos registros se encuentran incluidos en **el anexo J**

13. AUDITORÍAS INTERNAS

En cumplimiento del plan de calidad presentado por el consorcio, se podrán adelantar Auditorías Internas por parte de un profesional asignado por una de las empresas consorciadas cuyo propósito es evaluar de manera objetiva el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias referentes a los componentes: ambiental, de salud y seguridad en el trabajo, calidad, urbanismo, aspectos técnicos, económicos y jurídicos. En el periodo no se tenían planeadas auditorías internas.

Tabla Nro. 12 Consolidado de Auditorías realizadas

Mes de reporte	No. Informe	No. Auditoría Interna	Hallazgos (No conformidades u observaciones)
4	4	1	No se encuentra evidencia objetiva de la inspección pre Operacional del camión Inspecciones de Seguridad / informe diario y revisión preoperacional de vehículos y equipos mayores en concordancia del Numeral 4.3.3.3 Inspecciones de Seguridad / informe diario y revisión preoperacional de vehículos y equipos mayores. ***Cerrada.***
5	5	2	Programada para el 29 de abril de 2025
6	6	2	No se observa trazabilidad objetiva del envió de la programación V5 mediante comunicado a la interventoría, ni con fecha que identifique su elaboración según lo descrito en "7. CONTROL DE DOCUMENTOS, DATOS Y REGISTROS" y 10. PLAN DE COMUNICACIONES del Plan de Calidad v2.

Según el resultado de las auditorias se implementarán los controles y acciones de mejora que permitan la optimización de la gestión del Consorcio y el mejoramiento continuo en las actividades desarrolladas, y estas serán entregadas en los informes respectivo-mensuales permitiendo cerrar los hallazgos identificados. Para este periodo se cierra la salida no conforme de la auditoría realizada en abril. Ver anexo K

14. LISTADO DE ANEXOS

AA Actividades Periodo
AB Control actividades
AC Actas de Comité
AD Bitácora
AE Control de Documentos
AF Compras
AG Certificados de Calidad
AH Inspección y Ensayos
AI Medición
AJ Salidas no conformes.
AK Auditoria.
AL Control de cambios.

2. ANEXO A
ACTIVIDADES DEL PERIODO

CONTRATO DE OBRA No.: 4041-2024
CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO INNOVAPARQUES

OBJETO: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1. "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS

INTERVENTORIA: CONSORCIO SANTA TERESA 28
CONTRATO DE INT No.: 4080-2024

CUADRO RESUMEN DE OBRA CORTE No. 7. - 1 DE MAYO DEL 2025 AL 31 DE MAYO DEL 2025 - CAMPOS NATURALES RUTINARIOS

	PARQUE	CÓDIGO	DIRECCIÓN	COSTO DIRECTO MES	AU (38.48%)	COSTO TOTAL	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
1	PRD ESTADIO	12-091	Transversal 48 N°63-65	$ -	$ -	$ -	
2	PRD ALTERNA 3	12-091	Transversal 48 N°63-65	$ 1.064.898,18	$ 409.772,82	$ 1.474.671,00	Demarcación, bordeo y corte de cesped
3	TABORA	10-192	Carrera 76 y Carrera 77A con entre Calle 74 y Calle 75A	$ -	$ -	$ -	
4	EL CAJÓN ATAHUALPA	09-104	Av. Carrera 116 y Carrera 113 con entre Av. Calle 24 y Calle 23B	$ 1.064.898,18	$ 409.772,82	$ 1.474.671,00	Demarcación, bordeo y corte de cesped
5	TIMIZA ESTADIO	08-219	Carrera 113 Calle 23 B	$ -	$ -	$ -	
6	TUNAL FUTBOL	06-063	Cra 24 A Cll 4B Sur Av. Boyacá	$ 3.015.979,92	$ 1.160.549,08	$ 4.176.529,00	Demarcación, bordeo, corte de cesped y corte de cesped
7	SAN CRISTOBAL	04-127	Carrera 4 y Carrera 6 E con entre Calle 17A S y Calle 14 S	$ 1.064.898,18	$ 409.772,82	$ 1.474.671,00	Demarcación, bordeo y corte de cesped
8	SERENA	10-223	Av. Carrera 86 y Carrera 76 con entre Calle 90A y Calle 91	$ 1.064.898,18	$ 409.772,82	$ 1.474.671,00	Demarcación, bordeo y corte de cesped
9	PARQUE NACIONAL	03-035	Carrera 7 Calle 36	$ 1.597.346,91	$ 614.659,09	$ 2.212.006,00	Demarcación, bordeo y corte de cesped
10	COUNTRY	01-1000	Av. Calle 127 con Carrera 11C	$ 14.622.201,04	$ 5.626.622,96	$ 20.248.824,00	Corte de campo de polo
11	UDS BEISBOL	10-290	Av. Carrera 68 y con entre Av Calle 63	$ 1.632.508,67	$ 628.189,33	$ 2.260.698,00	Demarcación, bordeo y corte de cesped
12	UDS SOFTBOL	10-290	Av. Carrera 68 y con entre Av Calle 63	$ 1.345.831,89	$ 517.876,11	$ 1.863.708,00	Demarcación, bordeo y corte de cesped
13	UDS ATLETISMO MARTE	10-290	Av. Carrera 68 y con entre Av Calle 63	$ 629.163,78	$ 242.102,22	$ 871.266,00	Demarcación, bordeo y corte de cesped
14	UDS ATLETISMO	10-290	Av. Carrera 68 y con entre Av Calle 63	$ 629.163,78	$ 242.102,22	$ 871.266,00	Demarcación, bordeo y corte de cesped
15	MILENTA TEJAR	16-099	Transversal 53 y Carrera 52 con entre Calle 19S y Calle 22S	$ 1.064.898,18	$ 409.772,82	$ 1.474.671,00	Demarcación, bordeo y corte de cesped
16	CIUDAD MONTES FUTBOL	16-112	Carrera 40 y Carrera 38 con entre Calle 10S y Diagonal 16S	$ 1.064.898,18	$ 409.772,82	$ 1.474.671,00	Demarcación, bordeo y corte de cesped
17	CIUDAD MONTES VOLEY	16-112	Carrera 40 y Carrera 38 con entre Calle 10S y Diagonal 16S	$ 20.023,83	$ 7.705,17	$ 27.729,00	Bordeo con guadaña
18	TUNAL SOFTBOL	06-063	Carrera 24 y Carrera 19C con entre Calle 48C S y Calle 58A S	$ 1.300.124,21	$ 500.287,79	$ 1.800.412,00	Demarcación, bordeo y corte de cesped
19	PAVCO	07-152	Av. Calle 57R S y Calle 57K S con entre Carrera 72A y Av. Carrera 71B	$ 629.163,78	$ 242.102,22	$ 871.266,00	Bordeo y corte de cesped
20	PRD PLAYA	12-091	Transversal 48 N°63-65	$ 72.661,03	$ 27.959,97	$ 100.621,00	Bordeo con guadaña
21	UDS VOLEY PLAYA	10-290	Av. Carrera 68 y con entre Av Calle 63	$ 29.568,89	$ 11.378,11	$ 40.947,00	Bordeo con guadaña
22	COMPLEJO ACUÁTICO	12-1000	Calle 63 con Av. 68	$ 29.711,15	$ 11.432,85	$ 41.144,00	Bordeo con guadaña
23	BOCHICA	16-037	Calle 37 Calle 1H	$ 1.064.898,18	$ 409.772,82	$ 1.474.671,00	Demarcación, bordeo y corte de cesped
24	MARSELLA	08-066	Carrera 69 Calle 8	$ 11.286.019,64	$ 4.342.860,36	$ 15.628.880,00	Demarcación, bordeo, corte de cesped y suministro de arena de rio
25	JUAN AMARILLO NATURAL	10-171	Carrera 111A Calle 90	$ 1.911.928,80	$ 735.710,20	$ 2.647.639,00	Demarcación, bordeo y corte de cesped
26	FLORIDA 1	10-311	Cl 78 C y canal Maranta con entre el Rio Juan Amarillo	$ 2.662.245,09	$ 1.024.431,91	$ 3.686.677,00	Demarcación, bordeo y corte de cesped
27	FLORIDA 2	10-311	Cl 78 C y canal Maranta con entre el Rio Juan Amarillo	$ 2.662.245,09	$ 1.024.431,91	$ 3.686.677,00	Demarcación, bordeo y corte de cesped
28	FLORIDA 3	10-311	Cl 78 C y canal Maranta con entre el Rio Juan Amarillo	$ 2.662.245,09	$ 1.024.431,91	$ 3.686.677,00	Demarcación, bordeo y corte de cesped
29	FLORIDA 4	10-311	Cl 78 C y canal Maranta con entre el Rio Juan Amarillo	$ 2.662.245,09	$ 1.024.431,91	$ 3.686.677,00	Demarcación, bordeo y corte de cesped
30	FLORIDA 5	10-311	Cl 78 C y canal Maranta con entre el Rio Juan Amarillo	$ 2.662.245,09	$ 1.024.431,91	$ 3.686.677,00	Demarcación, bordeo y corte de cesped
31	ESTADIO ALQUERIA	16-024	Carrera 52B Calle 42 b sur	$ 5.363.893,70	$ 2.064.026,30	$ 7.427.920,00	Bordeo, corte de cesped, fumigación, reparación de divots y aplicación de fertilizante químico
32	CIUDAD MONTES SOFTBOL	07-152	Calle 10 sur N° 39-29	$ 1.312.697,86	$ 505.126,14	$ 1.817.824,00	Demarcación, bordeo y corte de cesped
33	NUEVO MUZU NATURAL	16-112	Carrera 59 Diagonal 52B sur	$ 1.064.898,18	$ 409.772,82	$ 1.474.671,00	Demarcación, bordeo y corte de cesped
34	LA GAITANA PLAYA	16-112	Carrera 125B Calle 131A	$ -	$ -	$ -	
35	LA GAITANA NATURAL	11-205	Carrera 125B Calle 131A	$ 2.118.692,95	$ 815.273,05	$ 2.933.966,00	Demarcación, bordeo y corte de cesped
36	RINCON DE LOS ANGELES	08-108	Cra 78. #6f-91	$ 1.064.898,18	$ 409.772,82	$ 1.474.671,00	Demarcación, bordeo y corte de cesped
			TOTAL	**$ 70.441.991,00**	**$ 27.106.078,00**	**$ 97.548.069,00**	

CUADRO RESUMEN DE OBRA CORTE No. 7. - 1 DE MAYO DEL 2025 AL 31 DE MAYO DEL 2025 - CAMPOS SINTÉTICOS CORRECTIVOS

	PARQUE	CÓDIGO	DIRECCIÓN	COSTO DIRECTO MES	AU (38.48%)	COSTO TOTAL	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
1	SERVITA F11	01-023	Carrera 7H Calle 165	$ 373.383,16	$ 143.677,84	$ 517.061,00	Cepillado y fumigación
2	SERVITA F5	01-023	Carrera 7H Calle 165	$ 358.196,13	$ 137.833,87	$ 496.030,00	Cepillado y fumigación
3	CABRERA JAPON	02-007	Av. Carrera 11 Calle 87	$ 358.726,89	$ 138.038,11	$ 496.765,00	Cepillado y fumigación
4	CANTALEJO	11-036	Carrera 55 Calle 160	$ 357.983,82	$ 137.752,18	$ 495.736,00	
5	PRADO PINZON	11-109	Calle 143 Carrera 49	$ 466.592,29	$ 179.544,71	$ 646.137,00	Bordeo, cepillado, fumigación y poda de zonas verdes
6	MAZUREN	11-161	Calle 152 Carrera 50	$ 360.319,90	$ 138.651,10	$ 498.971,00	Cepillado y fumigación
7	VILANOVA	11-668	Carrera 54 D Calle 186	$ 358.726,89	$ 138.038,11	$ 496.765,00	Cepillado y fumigación
8	VERBENAL	11-313	Calle 187 Transversal 18 B	$ 359.257,65	$ 138.242,35	$ 497.500,00	Cepillado y fumigación
9	UDS SINT	10-290	CALLE63 CARRERA AV 68	$ 705.855,72	$ 271.613,28	$ 977.469,00	Bordeo, cepillado, fumigación y poda de zonas verdes
10	EDUARDO SANTOS	14-030	Cra.19 y cra.18 b entre cl 5 A y cl 4 A bis	$ 360.532,21	$ 138.732,79	$ 499.265,00	Cepillado y fumigación
11	GUSTAVO RESTREPO	18-009	Calle 28 Sur Carrera 15A	$ 358.726,89	$ 138.038,11	$ 496.765,00	Cepillado y fumigación
12	VENECIA 1	06-006	Cra.53 A y Cra.53 B entre Diagonal 47 A S y Diagonal 49 S	$ 359.046,07	$ 138.160,93	$ 497.207,00	Cepillado y fumigación
13	VENECIA 2	06-006	Cra.53 A y Cra.53 B entre Diagonal 47 A S y Diagonal 49 S	$ 359.046,07	$ 138.160,93	$ 497.207,00	Cepillado y fumigación
14	LAGUNETA	06-005	Cra 55 Diagonal 49 sur	$ 362.762,85	$ 139.591,15	$ 502.354,00	Cepillado y fumigación
15	SAN JOSE CENTRO	18-429	Calle 26 Sur y Av. 1 de Mayo con Cra 12 D	$ 357.770,80	$ 137.670,20	$ 495.441,00	Cepillado y fumigación
16	PARQUE OLAYA HERRERA	18-207	Carrera 21 25-35 Sur	$ 371.535,24	$ 142.966,76	$ 514.502,00	Cepillado y fumigación
17	PIJAOS	18-090	Av Cra 10 Calle 35 sur	$ -	$ -	$ -	
18	CEDRITOS	01-031	Carrera 9 Calle 145	$ 708.214,18	$ 272.520,82	$ 980.735,00	Bordeo, cepillado, fumigación y poda de zonas verdes
19	CALLE 170	01-540	Carrera 17 Calle 175	$ 458.976,03	$ 176.613,97	$ 635.590,00	Bordeo, cepillado, fumigación y poda de zonas verdes
20	BACHUE	10-117	Carrera 95 Calle 90 A	$ 371.790,15	$ 143.064,85	$ 514.855,00	Cepillado y fumigación
21	AURORA	05-002	Calle 71 F sur Carrera 14 V (Av Boyaca)	$ 952.372,18	$ 366.472,82	$ 1.318.845,00	Bordeo, cepillado, fumigación y poda de zonas verdes
22	VALLES DEL CAFAM	05-003	Calle 92 sur Carrera 14 I	$ 360.532,21	$ 138.732,79	$ 499.265,00	Cepillado y fumigación
23	VILLA ALEMANA	05-087	Carrera 5 este (Aup Llano) Calle 100 sur	$ 359.046,07	$ 138.160,93	$ 497.207,00	Cepillado y fumigación
24	MIRAVALLE F8-1	05-042	Carrera 14 H Bis Calle 74 D sur	$ 423.471,98	$ 162.952,02	$ 586.424,00	Bordeo, cepillado, fumigación y poda de zonas verdes
25	MIRAVALLE F8-2	05-042	Carrera 14 H Bis Calle 74 D sur	$ -	$ -	$ -	
26	MIRAVALLE F5	05-042	Carrera 14 H Bis Calle 74 D sur	$ 358.726,89	$ 138.038,11	$ 496.765,00	Cepillado y fumigación
27	ALFONSO LOPEZ	05-141	Carrera 5 G Calle 93 sur	$ 28.048.459,71	$ 10.793.047,29	$ 38.841.507,00	Desmonte de grama, suministro de grama, suministro de caucho, mantenimiento malla de cerramiento y cepillado
28	NUEVO USME	05-459	Carrera 14 A Calle 137 B sur	$ 358.726,89	$ 138.038,11	$ 496.765,00	Cepillado y fumigación
29	MOLINOS	18-055	Transversal 5 Calle 48 L sur	$ 858.038,71	$ 330.173,29	$ 1.188.212,00	Bordeo, cepillado, fumigación y poda de zonas verdes
30	PALERMO SUR	18-035	Carrera 1 Este Calle 49 C sur	$ 359.296,65	$ 138.257,35	$ 497.554,00	Bordeo, cepillado, fumigación y poda de zonas verdes
31	MARRUECOS	18-041	Calle 48 P sur Carrera 5L	$ 361.593,73	$ 139.141,27	$ 500.735,00	Cepillado y fumigación
32	EL TUNAL 1	06-063	Cra 24 A Cll 4B Sur Av Boyacá	$ 364.854,85	$ 140.396,15	$ 505.251,00	Cepillado y fumigación
33	EL TUNAL 2	06-063	Cra 24 A Cll 4B Sur Av Boyacá	$ 364.854,85	$ 140.396,15	$ 505.251,00	Cepillado y fumigación
34	EL TUNAL 3	06-063	Cra 24 A Cll 4B Sur Av Boyacá	$ 363.261,84	$ 139.783,16	$ 503.045,00	Cepillado y fumigación
35	EL TUNAL ALTERNA	06-063	Cra 24 A Cll 4B Sur Av Boyacá	$ 368.710,28	$ 141.879,72	$ 510.590,00	Cepillado y fumigación
36	NUEVO MUZU	06-017	Diagonal 52 B sur Cra 61B	$ 972.393,85	$ 374.177,15	$ 1.346.571,00	Bordeo, cepillado, fumigación y poda de zonas verdes
37	SANTA LUCIA 1	18-073	Carrera 14 Calle 41 B sur	$ 363.240,90	$ 139.775,10	$ 503.016,00	Cepillado y fumigación
38	SANTA LUCIA 2	18-073	Carrera 14 Calle 41 B sur	$ 365.151,65	$ 140.510,35	$ 505.662,00	Cepillado y fumigación
39	URB TUNJUELITO	06-012	Cra 12 Calle 59 sur	$ 367.754,19	$ 141.511,81	$ 509.266,00	Cepillado y fumigación
40	NUEVO MILENIO 1	05-476	Carrera 11 Calle 67 A Bis sur	$ 358.620,74	$ 137.997,26	$ 496.618,00	Cepillado y fumigación
41	NUEVO MILENIO 2	05-476	Carrera 11 Calle 67 A Bis sur	$ 357.983,82	$ 137.752,18	$ 495.736,00	Cepillado y fumigación
42	ALTOS DE LA ESTANCIA 1	19-756	Carrera 76 C Diagonal 67 a sur	$ 358.302,28	$ 137.874,72	$ 496.177,00	Cepillado y fumigación
43	ALTOS DE LA ESTANCIA 2	19-756	Carrera 76 C Diagonal 67 a sur	$ 358.302,28	$ 137.874,72	$ 496.177,00	Cepillado y fumigación
44	ILLIMANI F11	19-346	Calles 71 P Sur Transversal 27 H	$ 755.280,18	$ 290.631,82	$ 1.045.912,00	Bordeo, cepillado, fumigación y poda de zonas verdes
45	ILLIMANI F5	19-346	Calles 71 P Sur Transversal 27 H	$ 358.726,89	$ 138.038,11	$ 496.765,00	Cepillado y fumigación
46	ILLIMANI EL MIRADOR	19-788	Carrera 27 C Diagonal 70 U Bis sur	$ 358.726,89	$ 138.038,11	$ 496.765,00	Cepillado y fumigación
47	EL TALLER EL ENSUEÑO	19-348	Carrera 75A Diagonal 68 A	$ 361.541,02	$ 139.120,98	$ 500.662,00	Cepillado y fumigación
48	ESTANCIA	19-231	Calle 58 C sur Carrera 74 C	$ 360.956,82	$ 138.896,18	$ 499.853,00	Cepillado y fumigación
49	PARAISO	19-490	Cra 27 Q Calle 71 K sur	$ 357.240,03	$ 137.465,97	$ 494.706,00	Cepillado y fumigación
50	LA JOYA	19-349	Carrera 18 I Calle 80 B sur	$ 359.789,14	$ 138.446,86	$ 498.236,00	Cepillado y fumigación
51	DOMINGO LAIN	19-032	Calle 64 C sur Transv 17N	$ 357.240,03	$ 137.465,97	$ 494.706,00	Cepillado y fumigación
52	ARBOLIZADORA ALTA	19-058	Diagonal 73 A sur Transversal 36 B	$ 357.240,03	$ 137.465,97	$ 494.706,00	Cepillado y fumigación
53	CARACOLI	19-710	Carrera 74 B Calle 77 sur	$ 358.993,36	$ 138.140,64	$ 497.134,00	Cepillado y fumigación
54	BALMORA GUADALUPE	19-750	Autopista sur Carrera 71	$ 360.000,72	$ 138.528,28	$ 498.529,00	Cepillado y fumigación
55	LA VICTORIA 1	04-122	Diagonal 38 Sur No. 1F - 05	$ 358.089,98	$ 137.793,02	$ 495.883,00	Cepillado y fumigación
56	LA VICTORIA 2	04-122	Diagonal 38 Sur No. 1F - 05	$ 358.089,98	$ 137.793,02	$ 495.883,00	Cepillado y fumigación
57	SAN CRISTOBAL 1	04-127	Calle 13 sur N.° 2- 50 este	$ 368.581,74	$ 141.830,26	$ 510.412,00	Cepillado y fumigación
58	SAN CRISTOBAL 2	04-127	Calle 13 sur N.° 2- 50 este	$ 370.696,13	$ 142.643,87	$ 513.340,00	Cepillado y fumigación
59	ANTIOQUIA	04-038	Transversal 8a este Calle 50 b sur	$ 357.664,64	$ 137.629,36	$ 495.294,00	Cepillado y fumigación
60	GAITAN CORTÉS	04-103	Calle 31A S y Diagonal 31C S con entre Carrera 7E y Carrera 4E	$ 748.201,18	$ 287.907,82	$ 1.036.109,00	Bordeo, cepillado, fumigación y poda de zonas verdes

61	NARANJOS	07-035	Carrera 80 J Calle 70 A sur	$ 380.343,73	$ 146.356,27	$ 526.700,00	Bordeo, cepillado y fumigación
62	VILLA DEL RIO	07-036	Carrera 65 Calle 55 A sur	$ 373.170,13	$ 143.595,87	$ 516.766,00	Cepillado y fumigación
63	EL RECREO	07-260	Calle 69 A Sur 93D - 45	$ 7.807.434,29	$ 3.004.300,71	$ 10.811.735,00	Cepillado, fumigación, suministro de mallas de arcos y mantenimiento de malla de cerramiento en nylon
64	LA TINGUA TIBANICA	07-274	Calle 73 D Sur Carrera 78 A hasta la 82 A Bis	$ 367.222,70	$ 141.307,30	$ 508.530,00	Cepillado y fumigación
65	EL PORVENIR 1	07-391	Av 1° de Mayo con Av Long de Occ	$ 4.396.486,14	$ 1.691.767,86	$ 6.088.254,00	Cepillado, fumigación, suministro de mallas de arcos y mantenimiento de malla de cerramiento en nylon
66	EL PORVENIR 2	07-391	Av 1° de Mayo con Av Long de Occ	$ 361.912,91	$ 139.264,09	$ 501.177,00	Cepillado y fumigación
67	EL PORVENIR 3	07-391	Av 1° de Mayo con Av Long de Occ	$ 361.912,91	$ 139.264,09	$ 501.177,00	Cepillado y fumigación
68	EL PORVENIR 4	07-391	Av 1° de Mayo con Av Long de Occ	$ 360.150,20	$ 138.585,80	$ 498.736,00	Cepillado y fumigación
69	EL PORVENIR 5	07-391	Av 1° de Mayo con Av Long de Occ	$ 360.150,20	$ 138.585,80	$ 498.736,00	Cepillado y fumigación
70	EL PORVENIR MINI	07-391	Av 1° de Mayo con Av Long de Occ	$ 3.884.589,83	$ 1.494.790,17	$ 5.379.380,00	Cepillado, fumigación, suministro de mallas de arcos y mantenimiento de malla de cerramiento en nylon
71	SAN JOSE DE MARYLAND	07-164	Carrera 86 Calle 73 G sur	$ 364.511,12	$ 140.263,88	$ 504.775,00	Cepillado y fumigación
72	LUCES VILLA RICA	08-533	Carrera 77 H Calle 52 A sur	$ 8.058.186,74	$ 3.100.790,26	$ 11.158.977,00	Cepillado, fumigación, suministro de mallas de arcos y mantenimiento de malla de cerramiento en nylon
73	LA ALEJANDRA	08-568	Carrera 72J y Carrera 72I con entre Calle 42B S y Calle 42 S	$ 360.745,23	$ 138.814,77	$ 499.560,00	Cepillado y fumigación
74	AMERICAS OCCIDENTAL	08-127	Calle 2A S y Av. Calle 5 S con entre Carrera 72C y Av. Carrera 72	$ 7.332.204,65	$ 2.821.432,35	$ 10.153.637,00	Cepillado, fumigación, suministro de mallas de arcos y mantenimiento de malla de cerramiento en nylon
75	VILLA DE LOS SAUCES	08-180	Carrera 17A y Carrera 17 con entre Calle 175 y Calle 173	$ 1.748.542,75	$ 672.839,25	$ 2.421.382,00	Cepillado, fumigación, y mantenimiento de arcos
76	CARVAJAL	08-040	Cra 70 B Calle 24 A sur	$ 1.756.189,34	$ 675.781,66	$ 2.431.971,00	Cepillado, fumigación, y mantenimiento de arcos
77	TIMIZA F8	08-219	Carrera 72 P Calle 40 H sur	$ 361.912,91	$ 139.264,09	$ 501.177,00	Cepillado y fumigación
78	TIMIZA 11	08-219	Carrera 72 P Calle 40 H sur	$ 371.790,15	$ 143.064,85	$ 514.855,00	Cepillado y fumigación
79	LA IGUALDAD	08-212	Carrera 68A entre Calle 2	$ 370.675,19	$ 142.635,81	$ 513.311,00	Cepillado y fumigación
80	CASTILLA	08-200	Carrera 74 Calle 8A Bis	$ 374.397,02	$ 144.067,98	$ 518.465,00	Cepillado y fumigación
81	LAGO TIMIZA	08-626	Carrera 17A y Carrera 17 con entre Calle 175 y Calle 173	$ 361.593,73	$ 139.141,27	$ 500.735,00	Cepillado y fumigación
82	LAS CRUCES	03-036	Cra.4 y Cra.5 A entre cl 1 b bis y cl 1 c bis	$ 360.850,66	$ 138.855,34	$ 499.706,00	Cepillado y fumigación
83	LACHES	03-148	Diagonal 4B Cra 8 E	$ 365.098,93	$ 140.490,07	$ 505.589,00	Cepillado y fumigación
84	TERCER MILENIO 1 F5	03-085	Carrera 14 Calle 7	$ 359.152,22	$ 138.201,78	$ 497.354,00	Cepillado y fumigación
85	TERCER MILENIO 2 F5	03-085	Carrera 14 Calle 7	$ 359.152,22	$ 138.201,78	$ 497.354,00	Cepillado y fumigación
86	TERCER MILENIO 3 F11	03-085	Carrera 14 Calle 7	$ 371.046,36	$ 142.778,64	$ 513.825,00	Cepillado y fumigación
87	LOURDES	03-122	Carrera 1A Este Calle 3	$ 357.133,88	$ 137.425,12	$ 494.559,00	Cepillado y fumigación
88	DINDALITO	08-144	Carrera 94 C Calle 42 sur	$ 365.524,26	$ 140.653,74	$ 506.178,00	Cepillado y fumigación
89	CAYETANO CAÑIZARES	08-241	Av.cra.80 y cra.80 d bis ente cl 42 A S y cl 39	$ 922.759,24	$ 355.077,76	$ 1.277.837,00	Bordeo, cepillado, fumigación y poda de zonas verdes
90	GILMA F11	08-552	Transversal 85 A Calle 49 sur	$ 369.877,96	$ 142.329,04	$ 512.207,00	Cepillado y fumigación
91	GILMA F8	08-552	Transversal 85 A Calle 49 sur	$ 362.019,06	$ 139.304,94	$ 501.324,00	Cepillado y fumigación
92	GILMA F5 1	08-552	Transversal 85 A Calle 49 sur	$ 359.682,99	$ 138.406,01	$ 498.089,00	Cepillado y fumigación
93	GILMA F5 2	08-552	Transversal 85 A Calle 49 sur	$ 359.682,99	$ 138.406,01	$ 498.089,00	Cepillado y fumigación
94	GILMA MINI	08-552	Transversal 85 A Calle 49 sur	$ 355.116,26	$ 136.648,74	$ 491.765,00	Cepillado y fumigación
95	GORGONZOLA	16-126	Carrera 41 A Calle 5	$ 1.748.032,93	$ 672.643,07	$ 2.420.676,00	Cepillado, fumigación y mantenimiento de arcos
96	MARSELLA F11	08-066	Carrera 69 Calle 8	$ 368.284,95	$ 141.716,05	$ 510.001,00	Cepillado y fumigación
97	MARSELLA F5	08-066	Carrera 69 Calle 8	$ 361.632,73	$ 139.156,27	$ 500.789,00	Cepillado y fumigación
98	SANTA ISABEL 1	15-021	Calle 8 Sur con Carrera 27	$ 9.425.228,91	$ 3.626.828,09	$ 13.052.057,00	Cepillado, fumigación, suministro de mallas de arcos y mantenimiento de malla de cerramiento en nylon
99	SANTA ISABEL 2	15-021	Calle 8 Sur con Carrera 27	$ 3.376.153,96	$ 1.299.144,04	$ 4.675.298,00	Cepillado, fumigación, suministro de mallas de arcos y mantenimiento de malla de cerramiento en nylon
100	JUAN AMARILLO F5 1	10-171	Carrera 111A Av. Calle 90	$ 358.407,71	$ 137.915,29	$ 496.323,00	Cepillado y fumigación
101	JUAN AMARILLO F5 2	10-171	Carrera 111A Av. Calle 90	$ 358.407,71	$ 137.915,29	$ 496.323,00	Cepillado y fumigación
102	JUAN AMARILLO F5 3	10-171	Carrera 111A Av. Calle 90	$ 358.407,71	$ 137.915,29	$ 496.323,00	Cepillado y fumigación
103	JUAN AMARILLO F5 4	10-171	Carrera 111A Av. Calle 90	$ 358.407,71	$ 137.915,29	$ 496.323,00	Cepillado y fumigación
104	JUAN AMARILLO F8 1	10-171	Carrera 111A Av. Calle 90	$ 361.912,91	$ 139.264,09	$ 501.177,00	Cepillado y fumigación
105	JUAN AMARILLO F8 2	10-171	Carrera 111A Av. Calle 90	$ 361.912,91	$ 139.264,09	$ 501.177,00	Cepillado y fumigación
106	LA EUROPA	10-045	Carrera 71D y Carrara 71 con entre Calle 68B y Calle 67B	$ 359.789,14	$ 138.446,86	$ 498.236,00	Cepillado y fumigación
107	LA EUROPA MINI	10-045	Carrera 71D y Carrara 71 con entre Calle 68B y Calle 67B	$ 356.072,36	$ 137.016,64	$ 493.089,00	Cepillado y fumigación
108	METROPOLIS	12-035	Carrera 66 Calle 84	$ 359.789,14	$ 138.446,86	$ 498.236,00	Cepillado y fumigación
109	BONANZA	10-215	Carrera 70 F Calle 75	$ 372.344,74	$ 143.278,26	$ 515.623,00	Cepillado y fumigación
110	SAN ANDRES F5	10-234	Calle 82 y Calle 80A con entre Carrera 102 y Carrera 100A	$ 361.944,69	$ 139.276,31	$ 501.221,00	Cepillado y fumigación
111	SAN ANDRES F11	10-234	Calle 82 y Calle 80A con entre Carrera 102 y Carrera 100A	$ 371.577,12	$ 142.982,88	$ 514.560,00	Cepillado y fumigación
112	EL CARMELO F5	10-169	Av. Calle 72 y Calle 70 con entre Carrera 101A y Carrera 104C	$ 361.616,12	$ 139.149,88	$ 500.766,00	Cepillado y fumigación
113	EL CARMELO F11	10-169	Av. Calle 72 y Calle 70 con entre Carrera 101A y Carrera 104C	$ 865.865,83	$ 333.185,17	$ 1.199.051,00	Bordeo, cepillado, fumigación y poda de zonas verdes
114	VILLA LUZ F5	10-018	Carrera 77A y Carrara 80A con entre Calle 63F BIS y Calle 64C	$ 361.912,91	$ 139.264,09	$ 501.177,00	Cepillado y fumigación
115	VILLA LUZ F11	10-018	Carrera 77A y Carrara 80A con entre Calle 63F BIS y Calle 64C	$ 369.867,13	$ 142.324,87	$ 512.192,00	Cepillado y fumigación
116	VILLAS DEL MADRIGAL	10-002	Calle 75 C Carrera 99 B	$ 360.850,66	$ 138.855,34	$ 499.706,00	Cepillado y fumigación

117	FLORENCIA LOS TRONQUITOS	10-028	Carrera 91A y Carrara 90 BIS con entre Calle 76 BIS y Calle 75C	$ 360.213,75	$ 138.610,25	$ 498.824,00	Cepillado y fumigación
118	PAVCO	07-152	Av. Calle 57R S y Calle 57K S con entre Carrera 72A y Av. Carrera 71B	$ 682.834,34	$ 262.754,66	$ 945.589,00	Bordeo, cepillado, fumigación y poda de zonas verdes
119	JAZMIN	16-204	Av. Carrera 50 y Carrera 40B con entre Calle 1D y Calle 1H	$ 370.621,03	$ 142.614,97	$ 513.236,00	Cepillado y fumigación
120	PEPITA	14-008	Carrera 26 y Carrera 25A con entre Calle 11 y Calle 10	$ 358.765,89	$ 138.053,11	$ 496.819,00	Cepillado y fumigación
121	CIUDAD MONTES 1	16-112	Carrera 40 y Carrera 38 con entre Calle 10S y Diagonal 16S	$ 357.133,88	$ 137.425,12	$ 494.559,00	Cepillado y fumigación
122	CIUDAD MONTES 2	16-112	Carrera 40 y Carrera 38 con entre Calle 10S y Diagonal 16S	$ 357.133,88	$ 137.425,12	$ 494.559,00	Cepillado y fumigación
123	SIERRA MORENA 1	19-190	Transversal 73B y Transversal 60 entre Calle 75A S y Diagonal 73C S	$ 358.726,89	$ 138.038,11	$ 496.765,00	Cepillado y fumigación
124	SIERRA MORENA 2	19-190	Transversal 73B y Transversal 60 entre Calle 75A S y Diagonal 73C S	$ 358.726,89	$ 138.038,11	$ 496.765,00	Cepillado y fumigación
125	CASA BLANCA	11-069	Calle 146A con entre Carrera 80 y Carrera 76	$ 363.081,31	$ 139.713,69	$ 502.795,00	Cepillado y fumigación
126	FONTANAR DEL RIO F11	11-368	Av. Calle 145 y Calle 146 con entre Diagonal 147 y Carrera 138A	$ 369.453,35	$ 142.165,65	$ 511.619,00	Cepillado, fumigación y suminitro de mallas
127	FONTANAR DEL RIO F5	11-368	Av. Calle 145 y Calle 146 con entre Diagonal 147 y Carrera 138A	$ 358.726,89	$ 138.038,11	$ 496.765,00	Cepillado, fumigación y suminitro de mallas
128	FONTANAR MINI BESIBOL	11-368	Av. Calle 145 y Calle 146 con entre Diagonal 147 y Carrera 138A	$ 365.800,12	$ 140.759,88	$ 506.560,00	Cepillado y fumigación
129	LA GAITANA	11-205	Tranversal 126 y Carrera 124C con entre Diagonal 135B y Calle 132B	$ 365.524,26	$ 140.653,74	$ 506.178,00	Cepillado y fumigación
130	URB LOMBARDIA	11-052	Calle 143 y Calle 142A con entre Carrera 106B y Av. Carrera 104	$ 358.726,89	$ 138.038,11	$ 496.765,00	Cepillado y fumigación
131	CIUDADELA CAFAM	11-008	Carrera 113C con entre Calle 142 y Calle 142A	$ 361.062,97	$ 138.937,03	$ 500.000,00	Cepillado y fumigación
132	BERLIN	11-015	Calle 142 y Calle 139 con entre Carrera 145B y Carrera 144A	$ 360.213,75	$ 138.610,25	$ 498.824,00	Cepillado y fumigación
133	TIBABUYES 1	11-084	Calle 130C y Calle 129D con entre Carrera 123 y Carrera 121C	$ 362.338,24	$ 139.427,76	$ 501.766,00	Cepillado y fumigación
134	TIBABUYES 2	11-084	Calle 130C y Calle 129D con entre Carrera 123 y Carrera 121C	$ 364.036,68	$ 140.081,32	$ 504.118,00	Cepillado y fumigación
135	CAFAM LOS GAVILANTES	11-1101	Calle 142F y Calle 142A con entre Carrera 146 y Carrera 143	$ 369.347,20	$ 142.124,80	$ 511.472,00	Cepillado y fumigación
136	LA ESPERANZA	07-273	Carrera 80J y Carrera 79 con entre Calle 76A S y Calle 75BIS S	$ 149.174.072,07	$ 57.402.182,93	$ 206.576.255,00	Cepillado ,fumigación y suministro de grama sintética
137	CLARELANDIA F11	07-163	Calle 58C S y Calle 59 S con entre Carrera 80I y Carrera 80B	$ 379.919,12	$ 146.192,88	$ 526.112,00	Cepillado y fumigación
138	CLARELANDIA MINI	07-163	Calle 58C S y Calle 59 S con entre Carrera 80I y Carrera 80B	$ 371.634,89	$ 143.005,11	$ 514.640,00	Cepillado y fumigación
139	TEJAR	16-099	Transversal 53 y Carrera 52 con entre Calle 19S y Calle 22S	$ 369.558,78	$ 142.206,22	$ 511.765,00	Cepillado y fumigación
140	CHICALA	07-292	Calle 54C S y Calle 55 S con entre Av. Carrera 86 y Carrera 86C	$ 36.808.695,12	$ 14.163.985,88	$ 50.972.681,00	Desmonte de grama, suministro de grama, suministro de caucho, mantenimiento malla de cerramiento y cepillado
141	ATALAYAS	07-321	Carrera 99C y Carrera 98A con entre Calle 59B S y Calle 61A S	$ 363.282,78	$ 139.791,22	$ 503.074,00	Cepillado y fumigación
142	PORTAL DEL SOL	07-403	Carrera 98B y Carrera 95A con entre Calle 74 S y Calle 75 S	$ 368.284,95	$ 141.716,05	$ 510.001,00	Cepillado y fumigación
143	CAMPO VERDE 1	07-436	CARRERA 91 N 83 85 SUR	$ 363.825,10	$ 139.999,90	$ 503.825,00	Cepillado y fumigación
144	CAMPO VERDE 2	07-436	CARRERA 91 N 83 85 SUR	$ 363.399,77	$ 139.836,23	$ 503.236,00	Cepillado y fumigación
145	CAMPO VERDE 3	07-436	CARRERA 91 N 83 85 SUR	$ 358.620,74	$ 137.997,26	$ 496.618,00	Cepillado y fumigación
146	SANTA CLARA	13-015	Carrera 47 y Carrera 45 con entre Calle 22A y Calle 22 BIS	$ 363.209,13	$ 139.762,87	$ 502.972,00	Cepillado y fumigación
147	HAYUELOS F8	09-200	Carrera 81B y Carrara 80A con entre Calle 19A y Av. Calle 22	$ 365.470,83	$ 140.633,17	$ 506.104,00	Cepillado y fumigación
148	HAYUELOS F5	09-200	Carrera 81B y Carrara 80A con entre Calle 19A y Av. Calle 22	$ 360.745,23	$ 138.814,77	$ 499.560,00	Cepillado y fumigación
149	NORMANDIA	10-190	Carrera 73A y Carrera 73 con entre Calle 52A y Calle 51	$ 369.134,89	$ 142.043,11	$ 511.178,00	Cepillado, fumigación y suminitro de mallas
150	VILLEMAR			$ 723.801,99	$ 278.519,01	$ 1.002.321,00	Cepillado y fumigación
151	PRADERA SUR	16-153	Av. Calle 3 y Calle 4B con entre Carrera 66 y Carrera 65	$ 432.047,95	$ 166.252,05	$ 598.300,00	Bordeo, cepillado, fumigación y poda de zonas verdes
152	PARQUE INDUSTRIAL LOS EJIDOS	16-416	Calle 12 y Calle11A con entre Av. Carrera 36 y Carrera 37	$ 6.801.995,23	$ 2.617.407,77	$ 9.419.403,00	Cepillado, fumigación, suministro de mallas de arcos y mantenimiento de malla de cerramiento en nylon
153	PARQUE INDUSTRIAL EL NECTAR	16-415	Calle 12 y Calle11A con entre Av. Carrera 36 y Carrera 37	$ 359.895,29	$ 138.487,71	$ 498.383,00	Cepillado y fumigación
154	TOBERIN	01-079	Av. Carrera 9 y Carrera 11 con entre Calle 145 y Calle 146	$ 663.056,04	$ 255.143,96	$ 918.200,00	Bordeo, cepillado, fumigación y poda de zonas verdes
155	ESTRELLA NORTE	01-189	Calle 160 y Calle 159A con entre Carrera 21 y Carrera 19B	$ 456.826,98	$ 175.787,02	$ 632.614,00	Bordeo, cepillado, fumigación y poda de zonas verdes
156	BURGOS BRITALIA 1	11-058	Av. Carrera 72 y Carrera 74 con entre Calle 160 y Calle 163	$ 484.930,68	$ 186.601,32	$ 671.532,00	Bordeo, cepillado, fumigación y poda de zonas verdes
157	BURGOS BRITALIA 2	11-058	Av. Carrera 72 y Carrera 74 con entre Calle 160 y Calle 163	$ 510.504,04	$ 196.441,96	$ 706.946,00	Bordeo, cepillado, fumigación y poda de zonas verdes
158	LINDARAJA	11-309	Calle 128 y Diagonal 127B con entre Carrera 79 y Carrera 78	$ 358.726,89	$ 138.038,11	$ 496.765,00	Cepillado y fumigación
159	COMETAS	11-204	Calle 127C y Calle 127A con entre Carrera 81 y Carrera 87A	$ 361.912,91	$ 139.264,09	$ 501.177,00	Cepillado y fumigación
160	PTAR	10-531	Carrera 119 y Roi Bogota con entre Calle 80A Bis y Calle 86	$ 371.896,30	$ 143.105,70	$ 515.002,00	Cepillado y fumigación
161	PRD 1	12-091	Av. Carrera 68 y Av. Carrera 60 con entre Av. Calle 63	$ 632.468,23	$ 243.373,77	$ 875.842,00	Bordeo, cepillado, fumigación y poda de zonas verdes
162	PRD 2	12-091	Av. Carrera 68 y Av. Carrera 60 con entre Av. Calle 63	$ 372.107,89	$ 143.187,11	$ 515.295,00	Bordeo, cepillado y fumigación

163	GIMNASIO DEL NORTE	12-023	Carrera 28 y Carrera 27A con entre Calle 63C y Calle 63B	$ 409.394,86	$ 157.535,14	$ 566.930,00	Bordeo, cepillado, fumigación y poda de zonas verdes
164	FRAGUA	15-040	Carrera 31 N.° 14 B 57 sur	$ 805.532,21	$ 309.968,79	$ 1.115.501,00	Bordeo, cepillado, fumigación y poda de zonas verdes
165	VILLA MAYOR	15-036	Calle 32 A sur Carrera 34 C	$ 9.903.071,20	$ 3.810.701,80	$ 13.713.773,00	Cepillado, fumigación, mantenimiento de artcos, suministro de mallas de arcos y mantenimiento de malla de cerramiento en nylon
166	CIUDAD HONDA	10-153	Carrera 68H y Carrera 68D con entre Calle 64H y Calle 65	$ 475.046,94	$ 182.798,06	$ 657.845,00	Bordeo, cepillado, fumigación y poda de zonas verdes
167	VILLA ALSACIA	08-065	Carrera 72 B Calle 11 A BIS	$ 370.408,72	$ 142.533,28	$ 512.942,00	Cepillado y fumigación
168	DESARROLLO BILBAO	11-074	Calle 142 C Carrera 151 A	$ 357.070,34	$ 137.400,66	$ 494.471,00	Cepillado y fumigación
169	CANDELARIA MINI	17-028	Calle 12 f #3-27	$ 356.390,81	$ 137.139,19	$ 493.530,00	Cepillado y fumigación
170	CARLOS LLERAS EL FUEGO	09-048	Av. Carrera 72 y Carrara 69F con entre Av. Calle 22 y AV. Calle 24	$ 159.859.817,30	$ 61.514.057,70	$ 221.373.875,00	Cepillado ,fumigación y suministro de grama sintética
171	MODELIA	09-016	Carrera 81C y Carrara 81 con entre Calle 24C y Calle 24F	$ 105.860.400,06	$ 40.735.081,94	$ 146.595.482,00	Cepillado ,fumigación y suministro de grama sintética
172	PRIMAVERA	08-770	Carrera 91C y Carrara 90A con entre Calle 2 y Calle 4	$ 108.695.945,98	$ 41.826.200,02	$ 150.522.146,00	Cepillado ,fumigación y suministro de grama sintética
173	VALLE DE REFOUS	11-686	Calle 150A con entre Carrera 102B y Carrera 101	$ 115.400.145,15	$ 44.405.975,85	$ 159.806.121,00	Cepillado ,fumigación y suministro de grama sintética
174	VICTORIA NORTE	11-162	Carrera 54 y Carrera 53 con entre Calle 150 y Calle 149	$ 88.473.445,26	$ 34.044.581,74	$ 122.518.027,00	Cepillado ,fumigación y suministro de grama sintética
			COSTO DIRECTO	**$ 920.476.998,00**	**$ 354.199.549,00**	**$ 1.274.676.547,00**	
			SUMA TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 990.918.989,00**	**$ 381.305.627,00**	**$ 1.372.224.616,00**	

OSCAR RENAN VELÁSQUEZ VIGOYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA

3. ANEXO B
CONTROL DE ACTIVIDADES

3.1. PUESTA EN SERVICIO AMERICAS OCCIDENTAL

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE ENTREGA PARA PUESTA EN SERVICIO

En Bogotá, a los 02 días del mes de Mayo de 2025, se reunieron, los profesionales del Área de Administración de Escenarios, Subdirección Técnica de Parques y los PROFESIONALES/FUNCIONARIOS O TERCERO delegados por INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD, con el fin de efectuar la ENTREGAR Y RECIBIR PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA PUESTA EN SERVICIO de la infraestructura que se describe a continuación.

1. INFORMACIÓN GENERAL

CÓDIGO PARQUE O ESCENARIO: 08-127

NOMBRE DEL PARQUE / ESCENARIO: Cancha sintética Americas Occidental

DIRECCIÓN: Av. Boyacá Calle 2 sur **LOCALIDAD:** Kennedy

1.1. ALCANCE DE LA INTERVENCIÓN

El detalle de la infraestructura objeto de la presente entrega, hace parte del alcance de los contratos a continuación relacionados:

1. CANCHA DE FÚTBOL: Desmonte parcial y reemplazo de grama sintética, mantenimiento correctivo a gránulo de caucho SBR, mantenimiento y pintura a arcos de fútbol, suministro e instalación de mallas para arcos de fútbol y mantenimiento de la malla de protección en Nylon.

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 - "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS"

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	20 *(Día)*	DE	Noviembre *(Mes)*	DE	2024 *(Año)*			
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	19 *(Día)*	DE	Julio *(Mes)*	DE	2025 *(Año)*			
FECHA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO	19 *(Día)*	DE	Julio *(Mes)*	DE	2025 *(Año)*			
CONTRATISTA	CONSORCIO INNOVAPARQUES *(Escriba el nombre o razón social del contratista)*			CONTRATO No	4041 *(Número Contrato)*	DE	2024 *(Año)*	
INTERVENTOR	CONSORCIO SANTA TERESA 28 *(Escriba el nombre o razón social del contratista)*			CONTRATO No	4080 *(Número de Contrato)*	DE	2024 *(Año)*	
PROFESIONAL QUIEN ENTREGA	CONSORCIO INNOVAPARQUES *(Escriba el nombre o razón social del contratista)*							

1.2. CONSIDERACIONES GENERALES

La entidad que entrega informa sobre las condiciones actuales del proyecto, las cuales se describen a continuación:

1. CANCHA DE FÚTBOL: Reemplazo de grama sintética en zona afectada, mantenimiento correctivo a gránulo de caucho SBR, arcos de fútbol pintados, mallas para arcos de fútbol nuevas, mantenimiento a malla de protección en Nylon y suministro de arcos de microfutbol.

entidad que entrega está a cargo de hacer seguimiento al plazo de la garantía de estabilidad de obra, toda novedad derivada del proceso de construcción se notificara a la Subdirección Técnica de Parques y esta a su vez informara lo respectivo.

2. CONDICIONES DE LA ENTREGA

2.2. ALCANCE GENERAL DE LA INTERVENCIÓN

2.2.1. CANCHA DE FÚTBOL

ZONA DE LA CANCHA

















2.2.2. DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS Y/O ZONAS CONSTRUIDOS

ZONAS	DESCRIPCIÓN	TIPO DE ACABADO DE PISO	ÁREA	%
1	CANCHA DE FÚTBOL (área total 2800 m2): Desmonte parcial de grama sintética, suministro e instalación de grama sintética, descompactación caucho SBR, mantenimiento correctivo caucho granulado SBR, suministro e instalación de mallas semiprofesionales para arcos de fútbol, mantenimiento de arcos y mantenimiento de malla de protección en Nylon.	GRAMA SINTÉTICA Y GRANULO DE CAUCHO SBR	83,99 m2	3,00%
		TOTAL, ÁREA INTERVENIDA	**83,99 m2**	**3,00%**

2.2.3. INVENTARIO DE DOTACIÓN Y/O MOBILIARIO GENERAL

Código CIO	DESCRIPCIÓN y UBICACIÓN	UND	CANTIDAD	OBSERVACIONES DE ENTREGA
16812	02 GRAMA SINT MONOFIL.60MM-FIFAPRinc arena+caucho+ins	M2	83,99	Nueva
13548	Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	JGO	2	Nueva
13549	04 Mallas profesionales Cal.8 Futbol (Sumin e Instal)	JGO	1	Nueva
15237	MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	M2	140	Mantenimiento
12480	02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	JGO	3	Mantenimiento y pintura
10639	05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasiego) Mantenimiento correctivo	KG	5000	Nuevo

2.2.4. DOCUMENTOS QUE DEBEN COMPLETAR EL ACTA

N.A. INVENTARIO DE ALMACEN IDRD (Si aplica) Folios: _____

Comentarios: No Aplica

N.A. ENTREGA DE RECIBOS Y PAZ Y SALVOS SERVICIOS PUBLICOS (Anexar un documento por entidad)

E.A.A.B _____ **ENEL** _____ **VANTI** _____

UAESP ALUMBRADO _____ **UAESP PODA CESPED** _____

Comentarios: No Aplica

N.A. MANUAL DE MANTENIMIENTO:

Comentarios: No aplica

N.A. OTROS (indicar cuales)

Comentarios: No aplica

3. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD	CONTACTO	FIRMA
Liliana Barbosa - Apoyo a la supervisión del IDRD	IDRD	3203409620	
Oscar Renan Velásquez - Representante legal	Consorcio Innovaparques	3183545567	
Director de obra - Javier Linares García	Consorcio Innovaparques	3142513079	
Brayan Garcia - Residente de obra	Consorcio Innovaparques	3107181601	
Raúl Orlando Delgado - Representante legal/Director de Interventoría	Consorcio Santa Teresa 28	3213980386	
María Claudia Mahecha - Residente de Interventoría	Consorcio Santa Teresa 28	3102623167	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en Bogotá D.C., a los:

Dos	(2)	Mayo	2025
(día en letras)	*(día en números)*	*(mes en letras)*	*(Año)*

días del mes de ____ de ____

Entrega:

(Firma)

(Nombre) Raúl Orlando Delgado

CARGO Director de interventoría

Área Técnica

Entidad Consorcio Santa Teresa 28

Recibe:

(Firma)

(Nombre) Liliana Paola Barbosa Barrera

CARGO Apoyo a la Supervisión

Área Subdirección Técnica de Parques

Entidad IDRD

3.2. INGRESO DE MATERIALES

CONSORCIO INNOVAPARQUES	REPORTE SEMANAL INGRESO DE MATERIALES A CAMPOS DEPORTIVOS	Codigo:	PS-F-08
		Version:	1
		Fecha:	20/11/2024

I. INFORMACIÓN GENERAL

FECHA DEL REGISTRO 25 de Abril de 2025
RESPONSABLE Daniel Sabogal
PERIODO del 21 al 25 de abril de 2025

II. DETALLE DEL MATERIAL

N°	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	CAMPO DEPORTIVO
1	24/04/2025	MALLAS NM	MALLA DE CERRAMIENTO	219,6	M2	PORVENIR 1
2	24/04/2025	MALLAS NM	MALLA DE ARCOS CAL 4	1	JUEGO	PORVENIR 1
3	24/04/2025	MALLAS NM	MALLA DE CERRAMIENTO	62	M2	PORVENIR MINI
4	24/04/2025	MALLAS NM	MALLA DE ARCOS CAL 4	1	JUEGO	PORVENIR MINI
5	25/04/2025	MALLAS NM	MALLA DE CERRAMIENTO	180	M2	PARQUE INDUSTRIAL LOS EJIDOS
6	25/04/2025	MALLAS NM	MALLA DE ARCOS CAL 4	2	JUEGO	PARQUE INDUSTRIAL LOS EJIDOS
7	25/04/2025	MALLAS NM	MALLA DE ARCOS CAL 8	1	JUEGO	PARQUE INDUSTRIAL LOS EJIDOS
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						


III. OBSERVACIONES

IV. FIRMA APROBACIÓN

JUAN MANUEL SABOGAL
CONTRATISTA - CMC

EDWIN JAVIER LINARES GARCIA
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO INNOVAPARQUES

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO

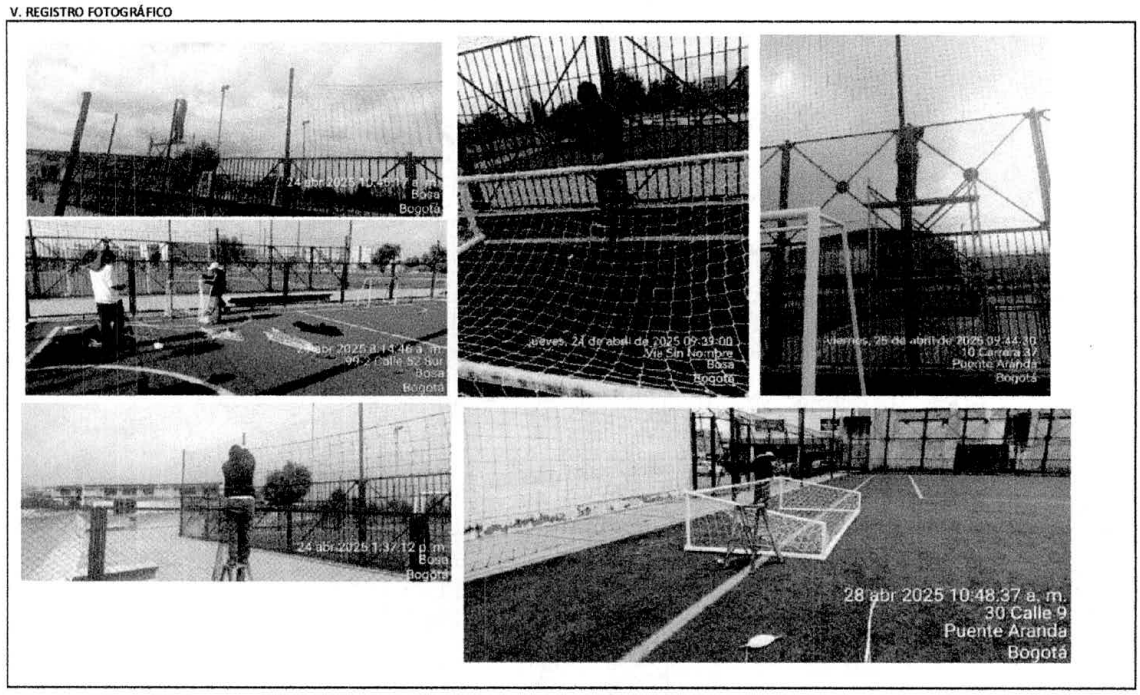

CONSORCIO INNOVAPARQUES	REPORTE SEMANAL INGRESO DE MATERIALES A CAMPOS DEPORTIVOS	Codigo:	PS-F-08
		Version:	1
		Fecha:	20/11/2024

I. INFORMACIÓN GENERAL

FECHA DEL REGISTRO	02 de Mayo de 2025
RESPONSABLE	Daniel Sabogal
PERIODO	del 28 de arbil al 02 de mayo de 2025

II. DETALLE DEL MATERIAL

N°	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	CAMPO DEPORTIVO
1	28/04/2025	MALLAS NM	MALLA DE CERRAMIENTO	224,4	M2	AMERICAS OCCIDENTAL
2	28/04/2025	MALLAS NM	MALLA DE ARCOS CAL 4	2	JUEGO	AMERICAS OCCIDENTAL
3	28/04/2025	MALLAS NM	MALLA DE ARCOS CAL 8	1	JUEGO	AMERICAS OCCIDENTAL
4	29/04/2025	SELLECO	PEGANTE BICOMPONENTE	3	CANECA	URB CHICALA
5	29/04/2025	MALLAS Y GRAMAS	CINTA DE UNION	62	ML	URB CHICALA
6	29/04/2025	CUPERZ	GRAMA MONOFILAMENTO	59,94	ML	URB CHICALA
7	29/04/2025	ECO TIRE GREEN SAS	CAUCHO GRANULAR	5000	KILOS	URB CHICALA
8	29/04/2025	ECO TIRE GREEN SAS	CAUCHO GRANULAR	1080	KILOS	URB CHICALA
9	29/04/2025	BEPE	ARENA SILICE	1080	KILOS	URB CHICALA
10	29/04/2025	MALLAS NM	MALLA DE CERRAMIENTO	398,75	M2	SANTA ISABEL F8
11	29/04/2025	MALLAS NM	MALLA DE ARCOS CAL 4	2	JUEGO	SANTA ISABEL F8
12	29/04/2025	MALLAS NM	MALLA DE ARCOS CAL 8	1	JUEGO	SANTA ISABEL F8
13	29/04/2025	MALLAS NM	MALLA DE CERRAMIENTO	135	M2	SANTA ISABEL F5
14	29/04/2025	MALLAS NM	MALLA DE ARCOS CAL 4	1	JUEGO	SANTA ISABEL F5
15	29/04/2025	MALLAS NM	MALLA DE CERRAMIENTO	263,75	M2	EL RECREO
16	29/04/2025	MALLAS NM	MALLA DE ARCOS CAL 4	2	JUEGO	EL RECREO
17	29/04/2025	MALLAS NM	MALLA DE ARCOS CAL 8	1	JUEGO	EL RECREO
18	2/05/2025	TITO PABON	PINTURA TIPO 2	75	CANECAS	CANCHAS NATURALES
19						
20						


III. OBSERVACIONES

IV. FIRMA APROBACIÓN

JUAN MANUEL SABOGAL
CONTRATISTA - CMC


EDWIN JAVIER TINARES GARCIA
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO INNOVAPARQUES


V. REGISTRO FOTOGRÁFICO

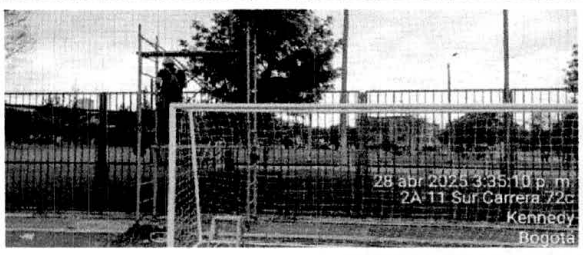





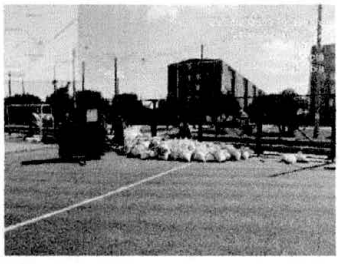

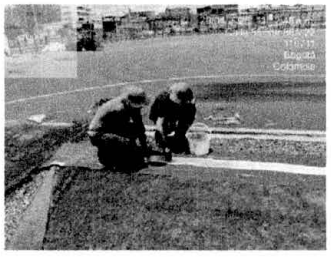



CONSORCIO INNOVAPARQUES	REPORTE SEMANAL INGRESO DE MATERIALES A CAMPOS DEPORTIVOS	Codigo:	PS-F-08
		Version:	1
		Fecha:	20/11/2024

I. INFORMACIÓN GENERAL

FECHA DEL REGISTRO	09 de Mayo de 2025
RESPONSABLE	Daniel Sabogal
PERIODO	del 05 al 09 de mayo de 2025

II. DETALLE DEL MATERIAL

N°	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	CAMPO DEPORTIVO
1	5/05/2025	MALLAS NM	MALLA DE CERRAMIENTO	284,69	M2	LUCES VILLA RICA
2	5/05/2025	MALLAS NM	MALLA DE ARCOS CAL 4	2	JUEGO	LUCES VILLA RICA
3	5/05/2025	MALLAS NM	MALLA DE ARCOS CAL 8	1	JUEGO	LUCES VILLA RICA
4	8/05/2025	SELLECO	PEGANTE BICOMPONENTE	3	CANECA	ALFONSO LOPEZ
5	8/05/2025	MALLAS Y GRAMAS	CINTA DE UNION	64	ML	ALFONSO LOPEZ
6	8/05/2025	CUPERZ	GRAMA MONOFILAMENTO	61,05	ML	ALFONSO LOPEZ
7	8/05/2025	ECO TIRE GREEN SAS	CAUCHO GRANULAR	3000	KILOS	ALFONSO LOPEZ
8	8/05/2025	ECO TIRE GREEN SAS	CAUCHO GRANULAR	1100	KILOS	ALFONSO LOPEZ
9	8/05/2025	BEPE	ARENA SILICE	1100	KILOS	ALFONSO LOPEZ
10	9/05/2025	MALLAS NM	MALLA DE CERRAMIENTO	223,25	M2	URB CHICALA
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

III. OBSERVACIONES

IV. FIRMA APROBACIÓN


JUAN MANUEL SABOGAL
CONTRATISTA - CMC

EDWIN JAVIER LINARES GARCIA
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO INNOVAPARQUES

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO






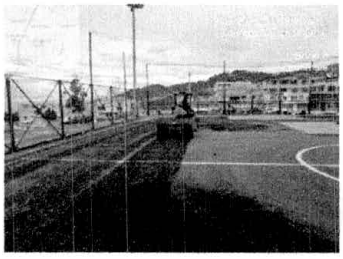









CONSORCIO INNOVAPARQUES	REPORTE SEMANAL INGRESO DE MATERIALES A CAMPOS DEPORTIVOS	Codigo:	PS-F-08
		Version:	1
		Fecha:	20/11/2024

I. INFORMACIÓN GENERAL

FECHA DEL REGISTRO 16 de Mayo de 2025
RESPONSABLE Daniel Sabogal
PERIODO del 12 al 16 de mayo de 2025

II. DETALLE DEL MATERIAL

N°	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	CAMPO DEPORTIVO
1	14/05/2025	MALLAS NM	MALLA DE CERRAMIENTO	487,77	M2	ALFONSO LOPEZ
2	15/05/2025	MALLAS NM	MALLA DE CERRAMIENTO	322,5	M2	VILLA MAYOR
3	15/05/2025	MALLAS NM	MALLA DE ARCOS CAL 4	2	JUEGO	VILLA MAYOR
4	15/05/2025	MALLAS NM	MALLA DE ARCOS CAL 8	1	JUEGO	VILLA MAYOR
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

III. OBSERVACIONES

IV. FIRMA APROBACIÓN

JUAN MANUEL SABOGAL
CONTRATISTA - CMC


EDWIN JAVIER LINARES GARCIA
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO INNOVAPARQUES

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO







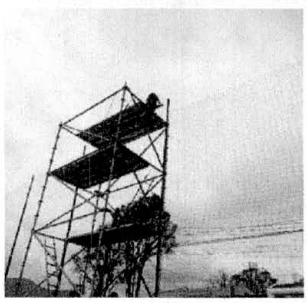



CONSORCIO INNOVAPARQUES	REPORTE SEMANAL INGRESO DE MATERIALES A CAMPOS DEPORTIVOS	Codigo:	PS-F-08
		Version:	1
		Fecha:	20/11/2024

I. INFORMACIÓN GENERAL

FECHA DEL REGISTRO: 30 de Mayo de 2025
RESPONSABLE: Daniel Sabogal
PERIODO: del 26 al 30 de mayo de 2025

II. DETALLE DEL MATERIAL

N°	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	CAMPO DEPORTIVO
1	26/05/2025	SELLECO	PEGANTE BICOMPONENTE	3	CANECA	AMERICAS OCCIDENTAL
2	26/05/2025	MALLAS Y GRAMAS	CINTA DE UNION	28	ML	AMERICAS OCCIDENTAL
3	26/05/2025	CUPERZ	GRAMA MONOFILAMENTO	22,46	ML	AMERICAS OCCIDENTAL
4	26/05/2025	ECO TIRE GREEN SAS	CAUCHO GRANULAR	400	KILOS	AMERICAS OCCIDENTAL
5	26/05/2025	BEPE	ARENA SILICE	400	KILOS	AMERICAS OCCIDENTAL
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						


III. OBSERVACIONES


IV. FIRMA APROBACIÓN

JUAN MANUEL SABOGAL
CONTRATISTA - CMC

EDWIN JAVIER LINARES GARCIA
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO INNOVAPARQUES

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO

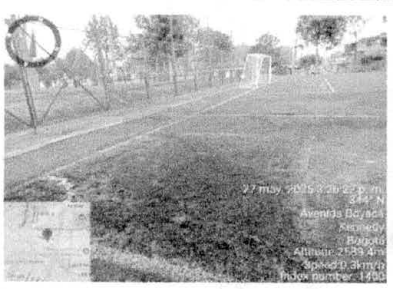

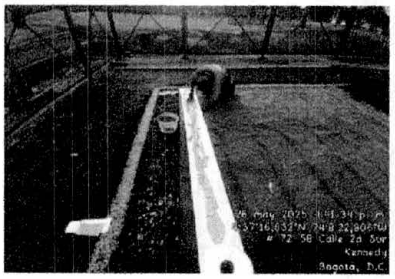
3.3. INSTALACION DE MATERIALES

CONSORCIO NUEVOS PARQUES	VERIFICACION INSTALACION MATERIALES	Codigo	PS-F-11-M
		Version	3
		Fecha:	17/02/2025

1. Información General del Proyecto:	
Fecha de Verificación:	29-04-25
Ubicación:	Urb Chicala
Inspector que verifica	Carol Lopez
Tipo de uso del césped:	Deportivo - Campo Futbol
Nro de Lote Instalado	Z4N322B - EPIAB

2. Detalles del Césped Sintético:			
Marca	Cuperz	Material del Cesped	Recapelamiento Polie
Color del Césped:	Verde/Blanco	Altura de las fibras: [Medida en cm)	6cm

3. Condiciones de la Superficie Base:			
	No aplica	Adecuada Si/No	Observaciones
Nivelación del Terreno:		Si	
Compactación de la Base:		Si	
Pendientes para Drenaje:		Si	
Verificación de Drenaje Adecuado:		Si	
Tipo de Base Utilizada:		Si	

4. Proceso de Instalación del Césped:			
	No aplica	Correcto Si/No	Observaciones
Colocación del Césped:		Si	
Unión de Paños (Costuras):		Si	
Pegado de Costuras:		Si	
Fijación a la Base:		Si	
Nivel de Tensión del Césped (sin arrugas o pliegues):		Si	
Alineación y Corte Preciso en los Bordes:		Si	

5. Instalación de Relleno (si aplica):			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Tipo de Relleno Utilizado: [Caucho)		Si	
Cantidad de Relleno Aplicado: [Suficiente)		OK	
Distribución Uniforme del Relleno: [Uniforme)		OK	
Altura del Relleno Respecto a las Fibras: [Adecuado)		OK	

6. Verificación de Seguridad y Calidad:			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Superficie Segura y Nivelada (sin hundimientos o bultos):[Si, no]		OK	
Lineas de Marcado: (correcta)		OK	
Verificación de Costuras (sin bordes levantados): (correcta)		OK	
Libre de Objetos Extraños o Residuos: (correcta)		OK	
Verificación de Impacto/Absorción (si es necesario):Adecuada		OK	

7. Aprobación y Firma CONTRATISTA:	
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]	
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]	Carol Giselle Lopez Figueroa
Fecha de Aprobación: [Fecha]	29-04-2025
8. Aprobación y Firma INTERVENTOR:	
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]	
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]	
Fecha de Aprobación: [Fecha]	

CONSORCIO INNOVAPARQUES	VERIFICACION INSTALACION MATERIALES	Codigo	PS-F-11-M
		Version	3
		Fecha:	17/02/2025

1. Información General del Proyecto:				
Fecha de Verificación:	24-04-25			
Ubicación:	Peñuela 1			
Inspector que verifica	Oscar A. Bernal			
ubicación Porteria : (Norte , Sur , Occ, Occi)	N-S			
Nro de certificado de calidad del Hilo	1224-023			
Uso de la malla (marque una x)	CERRAMIENTO		ARCOS PORTERIA	1 y 4

2. Detalles de las redes			
Marca	Ivenzacal	Material de la Red	Nylon #4
Tamaño de la malla	N/A	Dimensiones de la red: [Medida en m.] Alto por Ancho	3 x 2 m

3. Condicion de la Red instalada			
	No aplica	Adecuada Si/No	Observaciones
Condicion General:		Si	
Estado de cuerdas o amarres		Si	
Presencia de Roturas en la malla		No	
Tension de la Red		Si	
4. Fijacion de la Red a la Porteria			
	No aplica	Correcto Si/No	Observaciones
Sistema de Fijacion		Si	
Estado de sistema de fijacion		Si	
Presencia de espacios libres o zonas sueltas en la union a la porteria.		No	
5. Seguridad y Funcionalidad			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Posibles Riesgos (enganches, roturas peligrosas, etc.)		No	
Altura y Cobertura Completa de la Red (sin espacios por donde pase el balón) cumple?		Si	OK VB.
6. Aprobación y Firma CONTRATISTA:			
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]			
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]		Oscar Mauricio Acevedo Bernal	
Fecha de Aprobación: [Fecha]		24-04-2025	
6. Aprobación y Firma INTERVENTOR:			
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]			
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]			
Fecha de Aprobación: [Fecha]			

CONSORCIO INNOVAPARQUES	VERIFICACION INSTALACION MATERIALES	Codigo	PS-F-11-M
		Version	3
		Fecha:	17/02/2025

1. Información General del Proyecto:				
Fecha de Verificación:	24-04-25			
Ubicación:	Porvenir 1			
Inspector que verifica	Oscar A. Bernal			
ubicación Porteria : (Norte , Sur , Occ, Occi)	Occidente			
Nro de certificado de calidad del Hilo	17 24-032			
Uso de la malla (marque una x)	CERRAMIENTO	X	ARCOS PORTERIA	

2. Detalles de las redes			
Marca	Trenzaco	Material de la Red	Nylon #2
Tamaño de la malla	N/A	Dimensiones de la red: (Medida en m.) Alto por Ancho	219.60 m²

3. Condicion de la Red instalada			
	No aplica	Adecuada SI/No	Observaciones
Condicion General:		SI	
Estado de cuerdas o amarres		SI	
Presencia de Roturas en la malla		NO	
Tension de la Red		SI	
4. Fijacion de la Red a la Porteria			
	No aplica	Correcto SI/No	Observaciones
Sistema de Fijacion		SI	
Estado de sistema de fijacion		SI	
Presencia de espacios libres o zonas sueltas en la union a la porteria.	X		
5. Seguridad y Funcionalidad			
	No aplica	SI/No	Observaciones
Posibles Riesgos (enganches, roturas peligrosas, etc.)		NO	
Altura y Cobertura Completa de la Red (sin espacios por donde pase el balón) cumple?	X		
6. Aprobación y Firma CONTRATISTA:			
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]			
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]		Oscar Mauricio Acevedo Bernal	
Fecha de Aprobación: [Fecha]		24-04-2025	
6. Aprobación y Firma INTERVENTOR:			
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]			
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]			
Fecha de Aprobación: [Fecha]			

CONSORCIO INNOVAPARQUES	VERIFICACION INSTALACION MATERIALES	Codigo	PS-F-11-M
		Version	3
		Fecha:	17/02/2025

1. Información General del Proyecto:				
Fecha de Verificación:	24-04-25			
Ubicación:	Porvenir Mini			
Inspector que verifica	Oscar A Bernal			
ubicación Porteria : (Norte , Sur , Occ, Occl)	Perimetral			
Nro de certificado de calidad del Hilo	1224-032			
Uso de la malla (marque una x)	CERRAMIENTO	x	ARCOS PORTERIA	

2. Detalles de las redes			
Marca	Trenzacol	Material de la Red	Nylon #2
Tamaño de la malla	N/A	Dimensiones de la red: [Medida en m.) Alto por Ancho	61,6 m²

3. Condicion de la Red instalada			
	No aplica	Adecuada Si/No	Observaciones
Condicion General:		Si	
Estado de cuerdas o amarres		Si	
Presencia de Roturas en la malla		No	
Tension de la Red		Si	
4. Fijacion de la Red a la Porteria			
	No aplica	Correcto Si/No	Observaciones
Sistema de Fijacion		Si	
Estado de sistema de fijacion		Si	
Presencia de espacios libres o zonas sueltas en la union a la porteria.	x		
5. Seguridad y Funcionalidad			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Posibles Riesgos (enganches, roturas peligrosas, etc.)		No	
Altura y Cobertura Completa de la Red (sin espacios por donde pase el balón) cumple?	x		

6. Aprobación y Firma CONTRATISTA:	
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]	
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]	Oscar Mauricio Acevedo Bernal
Fecha de Aprobación: [Fecha]	24-04-2025
6. Aprobación y Firma INTERVENTOR:	
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]	
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]	
Fecha de Aprobación: [Fecha]	

CONSORCIO INNOVAPARQUES	VERIFICACION INSTALACION MATERIALES	Codigo	PS-F-11-M
		Version	3
		Fecha:	17/02/2025

1. Información General del Proyecto:				
Fecha de Verificación:	24-04-25			
Ubicación:	Porvenir Mini...			
Inspector que verifica	Oscar A - Berna			
ubicación Porteria : (Norte , Sur , Occ, Occi)	N - S			
Nro de certificado de calidad del Hilo	1224-023			
Uso de la malla (marque una x)	CERRAMIENTO		ARCOS PORTERIA	X

2. Detalles de las redes			
Marca	Ventacol	Material de la Red	Nylon #4
Tamaño de la malla	N/A	Dimensiones de la red: [Medida en m.] Alto por Ancho	Banquitos

3. Condicion de la Red instalada			
	No aplica	Adecuada Si/No	Observaciones
Condicion General:		Si	
Estado de cuerdas o amarres		Si	
Presencia de Roturas en la malla		No	
Tension de la Red		Si	
4. Fijacion de la Red a la Porteria			
	No aplica	Correcto Si/No	Observaciones
Sistema de Fijacion		Si	
Estado de sistema de fijacion		Si	
Presencia de espacios libres o zonas sueltas en la union a la porteria.		No	
5. Seguridad y Funcionalidad			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Posibles Riesgos (enganches, roturas peligrosas, etc.)		No	
Altura y Cobertura Completa de la Red (sin espacios por donde pase el balón) cumple?		Si	OK VBo
6. Aprobación y Firma CONTRATISTA:			
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]			
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]		Oscar Mauricio Acevedo Berna	
Fecha de Aprobación: [Fecha]		24-04-2025	
6. Aprobación y Firma INTERVENTOR:			
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]			
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]			
Fecha de Aprobación: [Fecha]			

CONSORCIO INNOVAPARQUES	VERIFICACION INSTALACION MATERIALES	Codigo	PS-F-11-M
		Version	3
		Fecha:	17/02/2025

1. Información General del Proyecto:				
Fecha de Verificación:	Parque Industrial las Ejidas			
Ubicación:	25-04-25			
Inspector que verifica	Carol Lopez T.			
ubicación Porteria : (Norte , Sur , Occ, Occi)	Occidente			
Nro de certificado de calidad del Hilo	1224-032			
Uso de la malla (marque una x)	CERRAMIENTO		ARCOS PORTERIA	

2. Detalles de las redes			
Marca	Tenzacel	Material de la Red	Nylon #2
Tamaño de la malla	N/A	Dimensiones de la red: [Medida en m.] Alto por Ancho	180 m²

3. Condicion de la Red instalada			
	No aplica	Adecuada Si/No	Observaciones
Condicion General:		Si	
Estado de cuerdas o amarres		Si	
Presencia de Roturas en la malla		No	
Tension de la Red		Si	
4. Fijacion de la Red a la Porteria			
	No aplica	Correcto Si/No	Observaciones
Sistema de Fijacion		Si	
Estado de sistema de fijacion		Si	
Presencia de espacios libres o zonas sueltas en la union a la porteria.	NA		
5. Seguridad y Funcionalidad			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Posibles Riesgos (enganches, roturas peligrosas, etc.)		No	
Altura y Cobertura Completa de la Red (sin espacios por donde pase el balón) cumple?	N/A		

6. Aprobación y Firma CONTRATISTA:	
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]	
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]	Carol Giselle Lopez Figueroa
Fecha de Aprobación: [Fecha]	25-04-2025
6. Aprobación y Firma INTERVENTOR:	
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]	
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]	
Fecha de Aprobación: [Fecha]	

CONSORCIO INNOVAPARQUES	VERIFICACION INSTALACION MATERIALES	Codigo	PS-F-11-M
		Version	3
		Fecha:	17/02/2025

1. Información General del Proyecto:				
Fecha de Verificación:	25-04-25.			
Ubicación:	Parque industrial los Ejidos.			
Inspector que verifica	Carol Lopez T.			
ubicación Porteria : (Norte , Sur , Occ, Occi)	E-W			
Nro de certificado de calidad del Hilo	17.24-023			
Uso de la malla (marque una x)	CERRAMIENTO		ARCOS PORTERIA	2 Jgo.

2. Detalles de las redes			
Marca	Trenzacol	Material de la Red	Nylon #2
Tamaño de la malla	N/A.	Dimensiones de la red: (Medida en m.) Alto por Ancho	5 x 2 m

3. Condicion de la Red Instalada			
	No aplica	Adecuada Si/No	Observaciones
Condicion General:		Si	
Estado de cuerdas o amarres		Si	
Presencia de Roturas en la malla		No	
Tension de la Red		Si	
4. Fijacion de la Red a la Porteria			
	No aplica	Correcto Si/No	Observaciones
Sistema de Fijacion		Si	
Estado de sistema de fijacion		Si	
Presencia de espacios libres o zonas sueltas en la union a la porteria.		No	
5. Seguridad y Funcionalidad			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Posibles Riesgos (enganches, roturas peligrosas, etc.)		No	
Altura y Cobertura Completa de la Red (sin espacios por donde pase el balón) cumple?		Si	ok KB
6. Aprobación y Firma CONTRATISTA:			
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]			
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]		Carol Giselle Lopez Figueroa	
Fecha de Aprobación: [Fecha]		25-04-2025	
6. Aprobación y Firma INTERVENTOR:			
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]			
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]			
Fecha de Aprobación: [Fecha]			

CONSORCIO INNOVAPARQUES	VERIFICACION INSTALACION MATERIALES	Codigo	PS-F-11-M
		Version	3
		Fecha:	17/02/2025

1. Información General del Proyecto:				
Fecha de Verificación:	25-04-25			
Ubicación:	Parque industrial los Ejidos			
Inspector que verifica	Carol Lopez T.			
ubicación Porteria : (Norte , Sur , Occ, Occi)	N-S			
Nro de certificado de calidad del Hilo	1774-077			
Uso de la malla (marque una x)	CERRAMIENTO		ARCOS PORTERIA	1 Jgo

2. Detalles de las redes			
Marca	Tenzacol	Material de la Red	Nylon #8
Tamaño de la malla	N/A	Dimensiones de la red: [Medida en m.] Alto por Ancho	7.4 x 2.4 m

3. Condicion de la Red instalada			
	No aplica	Adecuada Si/No	Observaciones
Condicion General:		Si	
Estado de cuerdas o amarres		Si	
Presencia de Roturas en la malla		No	
Tension de la Red		Si	
4. Fijacion de la Red a la Porteria			
	No aplica	Correcto Si/No	Observaciones
Sistema de Fijacion		Si	
Estado de sistema de fijacion		Si	
Presencia de espacios libres o zonas sueltas en la union a la porteria.		No	
5. Seguridad y Funcionalidad			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Posibles Riesgos (enganches, roturas peligrosas, etc.)		No	
Altura y Cobertura Completa de la Red (sin espacios por donde pase el balón) cumple?		Si	OKVB
6. Aprobación y Firma CONTRATISTA:			
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]		[signature]	
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]		Carol Giselle Lopez Figueroa	
Fecha de Aprobación: [Fecha]		25-04-2025	
6. Aprobación y Firma INTERVENTOR:			
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]			
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]			
Fecha de Aprobación: [Fecha]			

CONSORCIO INNOVAPARQUES	VERIFICACION INSTALACION MATERIALES	Codigo	PS-F-11-M
		Version	3
		Fecha:	17/02/2025

1. Información General del Proyecto:				
Fecha de Verificación:	28-04-25			
Ubicación:	Americas Occidental			
Inspector que verifica	Oscar Arevedo Beinal			
ubicación Porteria : (Norte , Sur , Occ, Occi)	Perimetral			
Nro de certificado de calidad del Hilo	1724-032			
Uso de la malla (marque una x)	CERRAMIENTO	~	ARCOS PORTERIA	

2. Detalles de las redes			
Marca	Treated	Material de la Red	Nylon #2
Tamaño de la malla	NA	Dimensiones de la red: (Medida en m.) Alto por Ancho	224,40 m2

3. Condicion de la Red instalada			
	No aplica	Adecuada Si/No	Observaciones
Condicion General:		Si	
Estado de cuerdas o amarres		Si	
Presencia de Roturas en la malla		No	
Tension de la Red		Si	
4. Fijacion de la Red a la Porteria			
	No aplica	Correcto Si/No	Observaciones
Sistema de Fijacion		Si	
Estado de sistema de fijacion		Si	
Presencia de espacios libres o zonas sueltas en la union a la porteria.	N/A		
5. Seguridad y Funcionalidad			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Posibles Riesgos (enganches, roturas peligrosas, etc.)		No	
Altura y Cobertura Completa de la Red (sin espacios por donde pase el balón) cumple?	N/A	Si	
6. Aprobación y Firma CONTRATISTA:			
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]			
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]		Oscar Mauricio Acevedo Beinal	
Fecha de Aprobación: [Fecha]		28-04-2025	
6. Aprobación y Firma INTERVENTOR:			
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]			
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]			
Fecha de Aprobación: [Fecha]			

CONSORCIO INNOVAPARQUES	VERIFICACION INSTALACION MATERIALES	Codigo	PS-F-11-M
		Version	3
		Fecha:	17/02/2025

1. Información General del Proyecto:				
Fecha de Verificación:	28-04-25			
Ubicación:	Américas Occidental			
Inspector que verifica	Oscar A Bernal			
ubicación Porteria : (Norte , Sur , Occ, Occi)	N-S			
Nro de certificado de calidad del Hilo	1224-023			
Uso de la malla (marque una x)	CERRAMIENTO		ARCOS PORTERIA	X

2. Detalles de las redes			
Marca	Trenzacol	Material de la Red	Nylon #4
Tamaño de la malla	N/A	Dimensiones de la red: [Medida en m.] Alto por Ancho	3 x 2 m

3. Condicion de la Red instalada			
	No aplica	Adecuada Si/No	Observaciones
Condicion General:		Si	
Estado de cuerdas o amarres		Si	
Presencia de Roturas en la malla		No	
Tension de la Red		Si	
4. Fijacion de la Red a la Porteria			
	No aplica	Correcto Si/No	Observaciones
Sistema de Fijacion		Si	
Estado de sistema de fijacion		Si	
Presencia de espacios libres o zonas sueltas en la union a la porteria.		No	
5. Seguridad y Funcionalidad			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Posibles Riesgos (enganches, roturas peligrosas, etc.)		No	
Altura y Cobertura Completa de la Red (sin espacios por donde pase el balón) cumple?		Si	OK.
6. Aprobación y Firma CONTRATISTA:			
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]			
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]		Oscar Mauricio Acevedo Bernal	
Fecha de Aprobación: [Fecha]		28-04-2025	
6. Aprobación y Firma INTERVENTOR:			
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]			
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]			
Fecha de Aprobación: [Fecha]			

CONSORCIO INNOVAPARQUES	VERIFICACION INSTALACION MATERIALES	Codigo	PS-F-11-M
		Version	3
		Fecha:	17/02/2025

1. Información General del Proyecto:				
Fecha de Verificación:	28-04-25			
Ubicación:	Americas Occidental			
Inspector que verifica	Oscar A. Bernal			
ubicación Porteria : (Norte , Sur , Occ, Occi)	E-W			
Nro de certificado de calidad del Hilo	1774-027			
Uso de la malla (marque una x)	CERRAMIENTO		ARCOS PORTERIA	Lyso

2. Detalles de las redes			
Marca	Twenzaco	Material de la Red	Nylon # 8
Tamaño de la malla	N/A	Dimensiones de la red: [Medida en m.] Alto por Ancho	7 x 2.3 m

3. Condicion de la Red instalada			
	No aplica	Adecuada Si/No	Observaciones
Condicion General:		Si	
Estado de cuerdas o amarres		Si	
Presencia de Roturas en la malla		No	
Tension de la Red		Si	
4. Fijacion de la Red a la Porteria			
	No aplica	Correcto Si/No	Observaciones
Sistema de Fijacion		Si	
Estado de sistema de fijacion		Si	
Presencia de espacios libres o zonas sueltas en la union a la porteria.		No	
5. Seguridad y Funcionalidad			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Posibles Riesgos (enganches, roturas peligrosas, etc.)		No	
Altura y Cobertura Completa de la Red (sin espacios por donde pase el balón) cumple?		Si	OK

6. Aprobación y Firma CONTRATISTA:	
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]	
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]	Oscar Mauricio Acevedo Bernal
Fecha de Aprobación: [Fecha]	28-04-2025
6. Aprobación y Firma INTERVENTOR:	
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]	
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]	
Fecha de Aprobación: [Fecha]	

CONSORCIO INNOVAPARQUES	VERIFICACION INSTALACION MATERIALES	Codigo	PS-F-11-M
		Version	3
		Fecha:	17/02/2025

1. Información General del Proyecto:				
Fecha de Verificación:	24-04-25			
Ubicación:	Santa Isabel F8			
Inspector que verifica	Oscar A. Bernal			
ubicación Porteria : (Norte , Sur , Occ, Occi)	Perimetral			
Nro de certificado de calidad del Hilo	1724-032			
Uso de la malla (marque una x)	CERRAMIENTO	X	ARCOS PORTERIA	

2. Detalles de las redes			
Marca	Tramaca	Material de la Red	Nylon #2
Tamaño de la malla	N/A	Dimensiones de la red: [Medida en m.] Alto por Ancho	348,75 m²

3. Condicion de la Red instalada			
	No aplica	Adecuada Si/No	Observaciones
Condicion General:		Si	
Estado de cuerdas o amarres		Si	
Presencia de Roturas en la malla		No	
Tension de la Red		Si	
4. Fijacion de la Red a la Porteria			
	No aplica	Correcto SI/No	Observaciones
Sistema de Fijacion		Si	
Estado de sistema de fijacion		Si	
Presencia de espacios libres o zonas sueltas en la union a la porteria.	N/A		
5. Seguridad y Funcionalidad			
	No aplica	SI/No	Observaciones
Posibles Riesgos (enganches, roturas peligrosas, etc.)		No	
Altura y Cobertura Completa de la Red (sin espacios por donde pase el balón) cumple?	N/A		
6. Aprobación y Firma CONTRATISTA:			
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]		[signature]	
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]		Oscar Mauricio Acevedo Bernal	
Fecha de Aprobación: [Fecha]		29-04-2025	
6. Aprobación y Firma INTERVENTOR:			
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]			
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]			
Fecha de Aprobación: [Fecha]			

CONSORCIO NUEVA PARQUES	VERIFICACION INSTALACION MATERIALES	Codigo	PS-F-11-M
		Version	3
		Fecha:	17/02/2025

1. Información General del Proyecto:				
Fecha de Verificación:	29-04-25			
Ubicación:	Santa Isabel #8			
Inspector que verifica	Oscar A Bernal			
ubicación Porteria : (Norte , Sur , Occ, Occi)	N-S			
Nro de certificado de calidad del Hilo	1774-023			
Uso de la malla (marque una x)	CERRAMIENTO		ARCOS PORTERIA	Juego

2. Detalles de las redes			
Marca	Trenzacol	Material de la Red	Nylon #4
Tamaño de la malla	N/A	Dimensiones de la red: (Medida en m.) Alto por Ancho	5 x 2 m.

3. Condicion de la Red instalada			
	No aplica	Adecuada Si/No	Observaciones
Condicion General:		Si	
Estado de cuerdas o amarres		Si	
Presencia de Roturas en la malla		No	
Tension de la Red		Si	
4. Fijacion de la Red a la Porteria			
	No aplica	Correcto Si/No	Observaciones
Sistema de Fijacion		Si	
Estado de sistema de fijacion		Si	
Presencia de espacios libres o zonas sueltas en la union a la porteria.		No	
5. Seguridad y Funcionalidad			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Posibles Riesgos (enganches, roturas peligrosas, etc.)		No	
Altura y Cobertura Completa de la Red (sin espacios por donde pase el balón) cumple?		Si	OK
6. Aprobación y Firma CONTRATISTA:			
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]			
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]		Oscar Mauricio Acevedo Bernal	
Fecha de Aprobación: [Fecha]		29-04-2025	
6. Aprobación y Firma INTERVENTOR:			
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]			
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]			
Fecha de Aprobación: [Fecha]			

CONSORCIO NUEVA PARQUES	VERIFICACION INSTALACION MATERIALES	Codigo	PS-F-11-M
		Version	3
		Fecha:	17/02/2025

1. Información General del Proyecto:				
Fecha de Verificación:	29-04-25			
Ubicación:	Santa Isabel 78			
Inspector que verifica	Oscar A. Bernal			
ubicación Porteria : (Norte , Sur , Occ, Occi)	E-W			
Nro de certificado de calidad del Hilo	17.24-027			
Uso de la malla (marque una x)	CERRAMIENTO		ARCOS PORTERIA	Xx

2. Detalles de las redes			
Marca	Trenzacol	Material de la Red	Nylon #8
Tamaño de la malla	N/A	Dimensiones de la red: [Medida en m.] Alto por Ancho	7,30 x 24 m

3. Condicion de la Red instalada			
	No aplica	Adecuada Si/No	Observaciones
Condicion General:		Si	
Estado de cuerdas o amarres		Si	
Presencia de Roturas en la malla		No	
Tension de la Red		Si	
4. Fijacion de la Red a la Porteria			
	No aplica	Correcto Si/No	Observaciones
Sistema de Fijacion		Si	
Estado de sistema de fijacion		Si	
Presencia de espacios libres o zonas sueltas en la union a la porteria.		No	
5. Seguridad y Funcionalidad			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Posibles Riesgos (enganches, roturas peligrosas, etc.)		No	
Altura y Cobertura Completa de la Red (sin espacios por donde pase el balón) cumple?		Si	OK KB

6. Aprobación y Firma CONTRATISTA:	
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]	
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]	Oscar Mauricio Acevedo Bernal
Fecha de Aprobación: [Fecha]	29-04-2025
6. Aprobación y Firma INTERVENTOR:	
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]	
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]	
Fecha de Aprobación: [Fecha]	

CONSORCIO INNOVAPARQUES	VERIFICACION INSTALACION MATERIALES	Codigo	PS-F-11-M
		Version	3
		Fecha:	17/02/2025

1. Información General del Proyecto:				
Fecha de Verificación:	29-04-25			
Ubicación:	Santa Isabel FS			
Inspector que verifica	Oscar A. Bernal			
ubicación Porteria : (Norte , Sur , Occ, Occi)	Occidental			
Nro de certificado de calidad del Hilo	1224-032			
Uso de la malla (marque una x)	CERRAMIENTO	x	ARCOS PORTERIA	

2. Detalles de las redes			
Marca	Ventaco	Material de la Red	Nylon #2
Tamaño de la malla	N/A	Dimensiones de la red: [Medida en m.] Alto por Ancho	135 m².

3. Condicion de la Red instalada			
	No aplica	Adecuada Si/No	Observaciones
Condicion General:		Si	
Estado de cuerdas o amarres		Si	
Presencia de Roturas en la malla		No	
Tension de la Red		Si	
4. Fijacion de la Red a la Porteria			
	No aplica	Correcto Si/No	Observaciones
Sistema de Fijacion		Si	
Estado de sistema de fijacion		Si	
Presencia de espacios libres o zonas sueltas en la union a la porteria.	N/A		
5. Seguridad y Funcionalidad			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Posibles Riesgos (enganches, roturas peligrosas, etc.)		No	
Altura y Cobertura Completa de la Red (sin espacios por donde pase el balón) cumple?	N/A		
6. Aprobación y Firma CONTRATISTA:			
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]		[signature]	
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]		Oscar Mauricio Acevedo Bernal	
Fecha de Aprobación: [Fecha]		29-04-2025	
6. Aprobación y Firma INTERVENTOR:			
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]			
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]			
Fecha de Aprobación: [Fecha]			

CONSORCIO INNOVAPARQUES	VERIFICACION INSTALACION MATERIALES	Codigo	PS-F-11-M
		Version	3
		Fecha:	17/02/2025

1. Información General del Proyecto:				
Fecha de Verificación:	29-04-25			
Ubicación:	Santa Isabel F5			
Inspector que verifica	Oscar A Bernal			
ubicación Porteria : (Norte , Sur , Occ, Occi)	N-S			
Nro de certificado de calidad del Hilo	1724-023			
Uso de la malla (marque una x)	CERRAMIENTO		ARCOS PORTERIA	Juego

2. Detalles de las redes			
Marca	Ivertacol	Material de la Red	Nylon #4
Tamaño de la malla	N/A	Dimensiones de la red: [Medida en m.] Alto por Ancho	8x2.

3. Condicion de la Red Instalada			
	No aplica	Adecuada Si/No	Observaciones
Condicion General:		Si	
Estado de cuerdas o amarres		Si	
Presencia de Roturas en la malla		No	
Tension de la Red		Si	
4. Fijacion de la Red a la Porteria			
	No aplica	Correcto Si/No	Observaciones
Sistema de Fijacion		Si.	
Estado de sistema de fijacion		Si	
Presencia de espacios libres o zonas sueltas en la union a la porteria.		No	
5. Seguridad y Funcionalidad			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Posibles Riesgos (enganches, roturas peligrosas, etc.)		No	
Altura y Cobertura Completa de la Red (sin espacios por donde pase el balón) cumple?		Si	OK
6. Aprobación y Firma CONTRATISTA:			
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]		[signature]	
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]		Oscar Mauricio Acevedo Bernal	
Fecha de Aprobación: [Fecha]		29-04-2025	
6. Aprobación y Firma INTERVENTOR:			
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]			
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]			
Fecha de Aprobación: [Fecha]			

CONSORCIO INNOVAPARQUES	VERIFICACION INSTALACION MATERIALES	Codigo	PS-F-11-M
		Version	3
		Fecha:	17/02/2025

1. Información General del Proyecto:				
Fecha de Verificación:	29-04-25.			
Ubicación:	El Recreo			
Inspector que verifica	Carol G. Lopez			
ubicación Porteria : (Norte , Sur , Occ, Occl)	Perimetral			
Nro de certificado de calidad del Hilo	1774-032.			
Uso de la malla (marque una x)	CERRAMIENTO	X	ARCOS PORTERIA	

2. Detalles de las redes			
Marca	Tenzacol	Material de la Red	Nylon #2
Tamaño de la malla	N/A	Dimensiones de la red: [Medida en m.] Alto por Ancho	263,75 m²

3. Condicion de la Red instalada			
	No aplica	Adecuada Si/No	Observaciones
Condicion General:		Si	
Estado de cuerdas o amarres		Si	
Presencia de Roturas en la malla		No	
Tension de la Red		Si	
4. Fijacion de la Red a la Porteria			
	No aplica	Correcto Si/No	Observaciones
Sistema de Fijacion		Si	
Estado de sistema de fijacion		Si	
Presencia de espacios libres o zonas sueltas en la union a la porteria.	NA		
5. Seguridad y Funcionalidad			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Posibles Riesgos (enganches, roturas peligrosas, etc.)		No	
Altura y Cobertura Completa de la Red (sin espacios por donde pase el balón) cumple?	NA		
6. Aprobación y Firma CONTRATISTA:			
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]			
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]		Carol Giselle Lopez Figueroa	
Fecha de Aprobación: [Fecha]		29-04-2025	
6. Aprobación y Firma INTERVENTOR:			
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]			
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]			
Fecha de Aprobación: [Fecha]			

CONSORCIO INNOVAPARQUES	VERIFICACION INSTALACION MATERIALES	Codigo	PS-F-11-M
		Version	3
		Fecha:	17/02/2025

1. Información General del Proyecto:				
Fecha de Verificación:	29-04-25			
Ubicación:	El Rancho			
Inspector que verifica	Carol G Lopez			
ubicación Porteria : (Norte , Sur , Occ, Occi)	E-W			
Nro de certificado de calidad del Hilo	1224-023			
Uso de la malla (marque una x)	CERRAMIENTO		ARCOS PORTERIA	ZJG

2. Detalles de las redes			
Marca	Trenzacol	Material de la Red	Nylon #4
Tamaño de la malla	N/A	Dimensiones de la red: (Medida en m.) Alto por Ancho	5x 2.2 m

3. Condicion de la Red instalada			
	No aplica	Adecuada Si/No	Observaciones
Condicion General:		Si	
Estado de cuerdas o amarres		Si	
Presencia de Roturas en la malla		No	
Tension de la Red		Si	
4. Fijacion de la Red a la Porteria			
	No aplica	Correcto Si/No	Observaciones
Sistema de Fijacion		Si	
Estado de sistema de fijacion		Si	
Presencia de espacios libres o zonas sueltas en la union a la porteria.		No	
5. Seguridad y Funcionalidad			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Posibles Riesgos (enganches, roturas peligrosas, etc.)		No	
Altura y Cobertura Completa de la Red (sin espacios por donde pase el balón) cumple?		Si	OKVB
6. Aprobación y Firma CONTRATISTA:			
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]			
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]		Carol Gisselle Lopez Figueroa	
Fecha de Aprobación: [Fecha]		29-04-2025	
6. Aprobación y Firma INTERVENTOR:			
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]			
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]			
Fecha de Aprobación: [Fecha]			

CONSORCIO INNOVAPARQUES	VERIFICACION INSTALACION MATERIALES	Codigo	PS-F-11-M
		Version	3
		Fecha:	17/02/2025

1. Información General del Proyecto:				
Fecha de Verificación:	29-04-25			
Ubicación:	El Recreo			
Inspector que verifica	Carol G. Lopez			
ubicación Porteria : (Norte , Sur , Occ, Occi)	N-S			
Nro de certificado de calidad del Hilo	1224-027			
Uso de la malla (marque una x)	CERRAMIENTO		ARCOS PORTERIA	Ijg.

2. Detalles de las redes			
Marca	Trenzacol	Material de la Red	Nylon #8
Tamaño de la malla	N/A	Dimensiones de la red: [Medida en m.] Alto por Ancho	7 x 2.4

3. Condicion de la Red instalada			
	No aplica	Adecuada Si/No	Observaciones
Condicion General:		Si	
Estado de cuerdas o amarres		Si	
Presencia de Roturas en la malla		No	
Tension de la Red		Si	
4. Fijacion de la Red a la Porteria			
	No aplica	Correcto Si/No	Observaciones
Sistema de Fijacion		Si	
Estado de sistema de fijacion		Si	
Presencia de espacios libres o zonas sueltas en la union a la porteria.		No	
5. Seguridad y Funcionalidad			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Posibles Riesgos (enganches, roturas peligrosas, etc.)		No	
Altura y Cobertura Completa de la Red (sin espacios por donde pase el balón) cumple?		Si	ALVB
6. Aprobación y Firma CONTRATISTA:			
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]			
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]		Carol Giselle Lopez Figueroa	
Fecha de Aprobación: [Fecha]		29-04-2025	
6. Aprobación y Firma INTERVENTOR:			
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]			
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]			
Fecha de Aprobación: [Fecha]			

CONSORCIO INNOVAPARQUES	VERIFICACION INSTALACION MATERIALES	Codigo	PS-F-11-M
		Version	3
		Fecha:	17/02/2025

1. Información General del Proyecto:				
Fecha de Verificación:	Lunes Villa Rica			
Ubicación:	05-05-25			
Inspector que verifica	Carol G lopez			
ubicación Porteria : (Norte , Sur , Occ, Occi)	Perimetral			
Nro de certificado de calidad del Hilo	1774-032			
Uso de la malla (marque una x)	CERRAMIENTO	x	ARCOS PORTERIA	

2. Detalles de las redes			
Marca	Twentacel	Material de la Red	Nylon #2
Tamaño de la malla	N/A	Dimensiones de la red: [Medida en m.] Alto por Ancho	284,64 m²

3. Condicion de la Red instalada			
	No aplica	Adecuada Si/No	Observaciones
Condicion General:		Si	
Estado de cuerdas o amarres		Si	
Presencia de Roturas en la malla		No	
Tension de la Red		Si	
4. Fijacion de la Red a la Porteria			
	No aplica	Correcto Si/No	Observaciones
Sistema de Fijacion		Si	
Estado de sistema de fijacion		Si	
Presencia de espacios libres o zonas sueltas en la union a la porteria.	N/A		
5. Seguridad y Funcionalidad			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Posibles Riesgos (enganches, roturas peligrosas, etc.)		No	
Altura y Cobertura Completa de la Red (sin espacios por donde pase el balón) cumple?	N/A		
6. Aprobación y Firma CONTRATISTA:			
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]			
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]		(a10) Gisselle Lopez Figueroa	
Fecha de Aprobación: [Fecha]		05-05-25	
6. Aprobación y Firma INTERVENTOR:			
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]			
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]			
Fecha de Aprobación: [Fecha]			

CONSORCIO INNOVAPARQUES	VERIFICACION INSTALACION MATERIALES	Codigo	PS-F-11-M
		Version	3
		Fecha:	17/02/2025

1. Información General del Proyecto:				
Fecha de Verificación:	05-05-25			
Ubicación:	Luces Villa Rica			
Inspector que verifica	Carol G. Lopez			
ubicación Porteria : (Norte , Sur , Occ, Occi)	N-S			
Nro de certificado de calidad del Hilo	1274-023			
Uso de la malla (marque una x)	CERRAMIENTO		ARCOS PORTERIA	2

2. Detalles de las redes			
Marca	Ivenzacol	Material de la Red	Nylon #4
Tamaño de la malla	N/A	Dimensiones de la red: [Medida en m.] Alto por Ancho	3 x 2 mts

3. Condicion de la Red instalada			
	No aplica	Adecuada Si/No	Observaciones
Condicion General:		Si	
Estado de cuerdas o amarres		Si	
Presencia de Roturas en la malla		No	
Tension de la Red		Si	
4. Fijacion de la Red a la Porteria			
	No aplica	Correcto Si/No	Observaciones
Sistema de Fijacion		Si	
Estado de sistema de fijacion		Si	
Presencia de espacios libres o zonas sueltas en la union a la porteria.		No	
5. Seguridad y Funcionalidad			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Posibles Riesgos (enganches, roturas peligrosas, etc.)		No	
Altura y Cobertura Completa de la Red (sin espacios por donde pase el balón) cumple?		Si	ok
6. Aprobación y Firma CONTRATISTA:			
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]			
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]		Carol Giselle Lopez Figueroa	
Fecha de Aprobación: [Fecha]		05-05-2025	
6. Aprobación y Firma INTERVENTOR:			
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]			
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]			
Fecha de Aprobación: [Fecha]			

CONSORCIO INNOVAPARQUES	VERIFICACION INSTALACION MATERIALES	Codigo	PS-F-11-M
		Version	3
		Fecha:	17/02/2025

1. Información General del Proyecto:				
Fecha de Verificación:	05-05-25			
Ubicación:	Luces Villa Rica			
Inspector que verifica	Carol G Lopez.			
ubicación Porteria : (Norte , Sur , Occ, Occi)	E-W			
Nro de certificado de calidad del Hilo	1224-027			
Uso de la malla (marque una x)	CERRAMIENTO		ARCOS PORTERIA	1 Jgo.

2. Detalles de las redes			
Marca	Tventacol	Material de la Red	Nylon #8
Tamaño de la malla	N/A	Dimensiones de la red: (Medida en m.) Alto por Ancho	7.3 x 2.3 m.

3. Condicion de la Red instalada			
	No aplica	Adecuada Si/No	Observaciones
Condicion General:		Si	
Estado de cuerdas o amarres		Si	
Presencia de Roturas en la malla		No	
Tension de la Red		Si	
4. Fijacion de la Red a la Porteria			
	No aplica	Correcto Si/No	Observaciones
Sistema de Fijacion		Si	
Estado de sistema de fijacion		Si	
Presencia de espacios libres o zonas sueltas en la union a la porteria.		No	
5. Seguridad y Funcionalidad			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Posibles Riesgos (enganches, roturas peligrosas, etc.)		No	
Altura y Cobertura Completa de la Red (sin espacios por donde pase el balón) cumple?		Si	Ok KB
6. Aprobación y Firma CONTRATISTA:			
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]		[signature]	
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]		Carol Giselle Lopez Figueroa	
Fecha de Aprobación: [Fecha]		05-05-2025	
6. Aprobación y Firma INTERVENTOR:			
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]			
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]			
Fecha de Aprobación: [Fecha]			

CONSORCIO INNOVAPARQUES	VERIFICACION INSTALACION MATERIALES	Codigo	PS-F-11-M
		Version	3
		Fecha:	17/02/2025

1. Información General del Proyecto:	
Fecha de Verificación:	08-05-25
Ubicación:	Alfonso Lopez Bernal
Inspector que verifica	Oscar A Bernal
Tipo de uso del césped:	Deportivo Campo de Futbol
Nro de Lote instalado	24N.3728 - EBIRB

2. Detalles del Césped Sintético:			
Marca	Cupers	**Material del Cesped**	Monofilamento Polipropileno
Color del Césped:	Verde / Blanco	**Altura de las fibras:** [Medida en cm]	6cm

3. Condiciones de la Superficie Base:			
	No aplica	**Adecuada Si/No**	**Observaciones**
Nivelación del Terreno:		Si	
Compactación de la Base:		Si	
Pendientes para Drenaje:		Si	
Verificación de Drenaje Adecuado:		Si	
Tipo de Base Utilizada:		Si	

4. Proceso de Instalación del Césped:			
	No aplica	**Correcto Si/No**	**Observaciones**
Colocación del Césped:		Si	
Unión de Paños (Costuras):		Si	
Pegado de Costuras:		Si	
Fijación a la Base:		Si	
Nivel de Tensión del Césped (sin arrugas o pliegues):		Si	
Alineación y Corte Preciso en los Bordes:		Si	

5. Instalación de Relleno (si aplica):			
	No aplica	**Si/No**	**Observaciones**
Tipo de Relleno Utilizado: [Caucho]		Si	
Cantidad de Relleno Aplicado: [Suficiente]		OK	
Distribución Uniforme del Relleno: [Uniforme]		OK	
Altura del Relleno Respecto a las Fibras: [Adecuado]		OK	

6. Verificación de Seguridad y Calidad:			
	No aplica	**Si/No**	**Observaciones**
Superficie Segura y Nivelada (sin hundimientos o bultos):[Sí, no]		OK	
Líneas de Marcado: (correcta)		OK	
Verificación de Costuras (sin bordes levantados): (correcta)		OK	
Libre de Objetos Extraños o Residuos: (correcta)		OK	
Verificación de Impacto/Absorción (si es necesario): Adecuada		OK	

7. Aprobación y Firma CONTRATISTA:	
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]	
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]	Oscar Mauricio Acevedo Bernal
Fecha de Aprobación: [Fecha]	08-05-2025
8. Aprobación y Firma INTERVENTOR:	
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]	
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]	
Fecha de Aprobación: [Fecha]	

CONSORCIO INNOVAPARQUES	VERIFICACION INSTALACION MATERIALES	Codigo	PS-F-11-M
		Version	3
		Fecha:	17/02/2025

1. Información General del Proyecto:				
Fecha de Verificación:	09-05-25			
Ubicación:	Tyba Chicala			
Inspector que verifica	Oscar M. Bernal			
ubicación Porteria : (Norte , Sur , Occ, Occi)	Perimetral			
Nro de certificado de calidad del Hilo	1774-032			
Uso de la malla (marque una x)	**CERRAMIENTO**	X	**ARCOS PORTERIA**	

2. Detalles de las redes			
Marca	Ivantad	**Material de la Red**	Nylon #2
Tamaño de la malla	N/A	**Dimensiones de la red:** [Medida en m.] **Alto por Ancho**	223.25m²

3. Condicion de la Red instalada			
	No aplica	**Adecuada Si/No**	**Observaciones**
Condicion General:		Si	
Estado de cuerdas o amarres		Si	
Presencia de Roturas en la malla		No	
Tension de la Red		Si	
4. Fijacion de la Red a la Porteria			
	No aplica	**Correcto Si/No**	**Observaciones**
Sistema de Fijacion		Si	
Estado de sistema de fijacion		Si	
Presencia de espacios libres o zonas sueltas en la union a la porteria.	N/A		
5. Seguridad y Funcionalidad			
	No aplica	**Si/No**	**Observaciones**
Posibles Riesgos (enganches, roturas peligrosas, etc.)		No	
Altura y Cobertura Completa de la Red (sin espacios por donde pase el balón) cumple?	N/A		

6. Aprobación y Firma CONTRATISTA:	
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]	
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]	Oscar Mauricio Acevedo Bernal
Fecha de Aprobación: [Fecha]	09-05-2025
6. Aprobación y Firma INTERVENTOR:	
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]	
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]	
Fecha de Aprobación: [Fecha]	

CONSORCIO INNOVAPARQUES	VERIFICACION INSTALACION MATERIALES	Codigo	PS-F-11-M
		Version	3
		Fecha:	17/02/2025

1. Información General del Proyecto:				
Fecha de Verificación:	14-05-25			
Ubicación:	Al paso Lopez			
Inspector que verifica	Oscar A Bernal			
ubicación Porteria : (Norte , Sur , Occ, Occl)	E-W-N-S			
Nro de certificado de calidad del Hilo	1774-032			
Uso de la malla (marque una x)	CERRAMIENTO	X	ARCOS PORTERIA	

2. Detalles de las redes			
Marca	Frenzacol	Material de la Red	Nylon #2
Tamaño de la malla	N/A	Dimensiones de la red: [Medida en m.] Alto por Ancho	487,77 m^2

3. Condicion de la Red instalada			
	No aplica	Adecuada Si/No	Observaciones
Condicion General:		Si	
Estado de cuerdas o amarres		Si	
Presencia de Roturas en la malla		No	
Tension de la Red		Si	
4. Fijacion de la Red a la Porteria			
	No aplica	Correcto Si/No	Observaciones
Sistema de Fijacion		Si	
Estado de sistema de fijacion		Si	
Presencia de espacios libres o zonas sueltas en la union a la porteria.	N/A		
5. Seguridad y Funcionalidad			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Posibles Riesgos (enganches, roturas peligrosas, etc.)		No	
Altura y Cobertura Completa de la Red (sin espacios por donde pase el balón) cumple?	N/A		

6. Aprobación y Firma CONTRATISTA:	
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]	
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]	Oscar Mauricio Acevedo Bernal
Fecha de Aprobación: [Fecha]	14-05-2025
6. Aprobación y Firma INTERVENTOR:	
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]	
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]	
Fecha de Aprobación: [Fecha]	

CONSORCIO INNOVAPARQUES	VERIFICACION INSTALACION MATERIALES	Codigo	PS-F-11-M
		Version	3
		Fecha:	17/02/2025

1. Información General del Proyecto:				
Fecha de Verificación:	15-05-25			
Ubicación:	Villa Mayor			
Inspector que verifica	Carol Se. Lopez			
ubicación Porteria : (Norte , Sur , Occ, Occi)	N-S			
Nro de certificado de calidad del Hilo	1774-027			
Uso de la malla (marque una x)	CERRAMIENTO		ARCOS PORTERIA	X

2. Detalles de las redes			
Marca	Tenaccol	Material de la Red	Nylon # 8
Tamaño de la malla	N/A	Dimensiones de la red: [Medida en m.] Alto por Ancho	7,43 x 2,14 mts

3. Condicion de la Red instalada			
	No aplica	Adecuada Si/No	Observaciones
Condicion General:		Si	
Estado de cuerdas o amarres		Si	
Presencia de Roturas en la malla		No	
Tension de la Red		Si	
4. Fijacion de la Red a la Porteria			
	No aplica	Correcto Si/No	Observaciones
Sistema de Fijacion		Si	
Estado de sistema de fijacion		Si	
Presencia de espacios libres o zonas sueltas en la union a la porteria.		No	
5. Seguridad y Funcionalidad			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Posibles Riesgos (enganches, roturas peligrosas, etc.)		No	
Altura y Cobertura Completa de la Red (sin espacios por donde pase el balón) cumple?		Si	ok VB
6. Aprobación y Firma CONTRATISTA:			
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]		[signature]	
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]		Carol Giselle Lopez Figueroa	
Fecha de Aprobación: [Fecha]		15-05-2025	
6. Aprobación y Firma INTERVENTOR:			
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]			
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]			
Fecha de Aprobación: [Fecha]			

CONSORCIO INNOVAPARQUES	VERIFICACION INSTALACION MATERIALES	Codigo	PS-F-11-M
		Version	3
		Fecha:	17/02/2025

1. Información General del Proyecto:				
Fecha de Verificación:	15-05-25			
Ubicación:	Villa Maya			
Inspector que verifica	Carol G. Lopez			
ubicación Porteria : (Norte , Sur , Occ, Occi)	E-W			
Nro de certificado de calidad del Hilo	1274-023			
Uso de la malla (marque una x)	**CERRAMIENTO**		**ARCOS PORTERIA**	Xy

2. Detalles de las redes			
Marca	Trenzacol	**Material de la Red**	Nylon #4
Tamaño de la malla	N/A	**Dimensiones de la red:** [Medida en m.] **Alto por Ancho**	5 x 2,2 mts

3. Condicion de la Red instalada			
	No aplica	**Adecuada Si/No**	**Observaciones**
Condicion General:		Si	
Estado de cuerdas o amarres		Si	
Presencia de Roturas en la malla		No	
Tension de la Red		Si	
4. Fijacion de la Red a la Porteria			
	No aplica	**Correcto SI/No**	**Observaciones**
Sistema de Fijacion		Si	
Estado de sistema de fijacion		Si	
Presencia de espacios libres o zonas sueltas en la union a la porteria.		No	
5. Seguridad y Funcionalidad			
	No aplica	**SI/No**	**Observaciones**
Posibles Riesgos (enganches, roturas peligrosas, etc.)		No	
Altura y Cobertura Completa de la Red (sin espacios por donde pase el balón) cumple?		Si	OK VB
6. Aprobación y Firma CONTRATISTA:			
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]			
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]		Oscar Mauricio Acevedo Beinal	
Fecha de Aprobación: [Fecha]		15-05-2025	
6. Aprobación y Firma INTERVENTOR:			
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]			
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]			
Fecha de Aprobación: [Fecha]			

CONSORCIO INNOVAPARQUES	VERIFICACION INSTALACION MATERIALES	Codigo	PS-F-11-M
		Version	3
		Fecha:	17/02/2025

1. Información General del Proyecto:				
Fecha de Verificación:	15-05-25			
Ubicación:	Villa Mayor.			
Inspector que verifica	Carol Giselle Lopez			
ubicación Porteria : (Norte , Sur , Occ, Occi)	Perimetral			
Nro de certificado de calidad del Hilo	1774-032			
Uso de la malla (marque una x)	**CERRAMIENTO**	X	**ARCOS PORTERIA**	

2. Detalles de las redes			
Marca	Tenaccol	**Material de la Red**	Nylon #2
Tamaño de la malla	N/A	**Dimensiones de la red:** [Medida en m.] **Alto por Ancho**	322.5 m²

3. Condicion de la Red instalada			
	No aplica	**Adecuada Si/No**	**Observaciones**
Condicion General:		Si	
Estado de cuerdas o amarres		Si	
Presencia de Roturas en la malla		No	
Tension de la Red		Si	
4. Fijacion de la Red a la Porteria			
	No aplica	**Correcto Si/No**	**Observaciones**
Sistema de Fijacion		Si	
Estado de sistema de fijacion		Si	
Presencia de espacios libres o zonas sueltas en la union a la porteria.	N/A		
5. Seguridad y Funcionalidad			
	No aplica	**SI/No**	**Observaciones**
Posibles Riesgos (enganches, roturas peligrosas, etc.)		No	
Altura y Cobertura Completa de la Red (sin espacios por donde pase el balón) cumple?	N/A		

6. Aprobación y Firma CONTRATISTA:	
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]	
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]	Carol Giselle Lopez Iguerna
Fecha de Aprobación: [Fecha]	15-05-2025
6. Aprobación y Firma INTERVENTOR:	
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]	
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]	
Fecha de Aprobación: [Fecha]	

CONSORCIO INNOVAPARQUES	VERIFICACION INSTALACION MATERIALES	Codigo	PS-F-11-M
		Version	3
		Fecha:	17/02/2025

1. Información General del Proyecto:	
Fecha de Verificación:	27-05-25.
Ubicación:	Americas Occidental
Inspector que verifica	Oscar A. Beinal
Tipo de uso del césped:	Deportivo - Campo Futbol
Nro de Lote Instalado	ZHN3228 - E81 AB

2. Detalles del Césped Sintético:			
Marca	Cuperz	**Material del Cesped**	Monofilamento Polet.
Color del Césped:	Verde/Blanco	**Altura de las fibras:** [Medida en cm)	6cm

3. Condiciones de la Superficie Base:			
	No aplica	**Adecuada Si/No**	**Observaciones**
Nivelación del Terreno:		Si	
Compactación de la Base:		Si	
Pendientes para Drenaje:		Si	
Verificación de Drenaje Adecuado:		Si	
Tipo de Base Utilizada:		Si	

4. Proceso de Instalación del Césped:			
	No aplica	**Correcto Si/No**	**Observaciones**
Colocación del Césped:		Si	
Unión de Paños (Costuras):		Si	
Pegado de Costuras:		Si	
Fijación a la Base:		Si	
Nivel de Tensión del Césped (sin arrugas o pliegues):		Si	
Alineación y Corte Preciso en los Bordes:		Si	

5. Instalación de Relleno (si aplica):			
	No aplica	**Si/No**	**Observaciones**
Tipo de Relleno Utilizado: [Caucho]		Si	
Cantidad de Relleno Aplicado: [Suficiente]		Ok	
Distribución Uniforme del Relleno: [Uniforme]		Ok	
Altura del Relleno Respecto a las Fibras: [Adecuado]		Ok	

6. Verificación de Seguridad y Calidad:			
	No aplica	**Si/No**	**Observaciones**
Superficie Segura y Nivelada (sin hundimientos o bultos):[Si, no]		Ok	
Líneas de Marcado: (correcta)		Ok	
Verificación de Costuras (sin bordes levantados): (correcta)		Ok	
Libre de Objetos Extraños o Residuos: (correcta)		Ok	
Verificación de Impacto/Absorción (si es necesario): Adecuada		Ok	

7. Aprobación y Firma CONTRATISTA:	
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]	
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]	Oscar Mauricio Acevedo Beinal
Fecha de Aprobación: [Fecha]	27-05-2025
8. Aprobación y Firma INTERVENTOR:	
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]	
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]	
Fecha de Aprobación: [Fecha]	

4. ANEXO C
ACTAS DE COMITÉ

ACTA DE COMITÉ NRO.	FECHA DE REUNIÓN	COMPROMISOS	SEGUIMIENTO	FECHA DE SEGUIMIENTO
18		Subsanacion informe de imprevistos : Noviembre y Diciembre	Abierto	3/04/2025 Comité 19
		Subsanacion del informe TECNICO Nro 4	Cerrado	
		Radicacion informe de calidad Nro 4	Abierto	
		Remision informe SST Nro 5	Cerrado	
		Remision informe tecnico Nro 5	Abierto	
		Remision informe de caidad Nro 5	Abierto	
		Remision informe ambiental	Cerrado	
ACTA DE COMITÉ NRO.	**FECHA DE REUNIÓN**	**COMPROMISOS**	**SEGUIMIENTO**	**FECHA DE SEGUIMIENTO**
19	3/04/2025	Subsanacion informe de Imprevistos		
		Subsanacion informe de calidad		
		Remision informe TECNICO Nro 5		
		Remision informe CALIDAD Nro 5		
		Subsanacion de programacion y prsupuestos		
		Subsanacion informe SST Nro 5		
ACTA DE COMITÉ NRO.	**FECHA DE REUNIÓN**	**COMPROMISOS**	**SEGUIMIENTO**	**FECHA DE SEGUIMIENTO**
20		Subsanciones de informes de imprevistos	Compromiso cumplido	25/04/2025 comité 21
		Definir donde instalar los bicicleteros de criterio ponderable	Abierto/Pendiente por definir	
		Remitir plan de auditoria al 70%	Compromiso cumplido	
		Justificacción del polvo de ladrillo	Abierto	
ACTA DE COMITÉ NRO.	**FECHA DE REUNIÓN**	**COMPROMISOS**	**SEGUIMIENTO**	**FECHA DE SEGUIMIENTO**
21	25/04/2025	Justificación del polvo de ladrillo	Abierto	30/04/2025 comité 22
		subsanación informe de calidad	Abierto	
		Radicación acta parcial	cerrado en revision por interventoria	
		Definición donde instalar bicicleteros	Abierto / por definir	
		Reporte de ingresos de material	cerrado en revision por interventoria	
ACTA DE COMITÉ NRO.	**FECHA DE REUNIÓN**	**COMPROMISOS**	**SEGUIMIENTO**	**FECHA DE SEGUIMIENTO**
22	30/04/2025	Justificación del polvo de Ladrillo	Abierto	8/05/2025 comité 23
		subsanación informe de calidad	Abierto	
		Realizar reporte de materia:	Se remitio reporte del mes de abril / ´parcialmente cumplido	
		Remision Informe de auditoria	Cumplimiento parcial / se hizo la auditoria , falta enviar informe	
		Definicion de instalacion de los bicicleteros	Cerrado. Informacion entregada al contratista .	
ACTA DE COMITÉ NRO.	**FECHA DE REUNIÓN**	**COMPROMISOS**	**SEGUIMIENTO**	**FECHA DE SEGUIMIENTO**
23	8/05/2025	Subsanacion Informe de caidad Nro 5		
		Radicacion informe Tecnicc Nro 6		
		Radicacion informe SST Nro 6		
		Remision informe de calidad Nro 6.		
		Presentacion del Informe de Auditoria.		

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN: Comité de seguimiento #19 COP-1041-24	DD	MM	AA
ACTA No.		03	04	2025

LUGAR: Virtual HORA DE INICIO: 9:00 HORA FIN:

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Se anexa lista de asistencia		

ORDEN DEL DIA

1. Revisión de compromisos pactados.	4.
2.	5.
3.	6.

TEMAS TRATADOS

1. Revisión de compromisos pactados.
   - 1.1 Subsanación de informes de imprevistos: Noviembre y Diciembre.
     - No se cumplió.
   - 1.2 Subsanación del informe técnico #4
     - Se cumplió.
   - 1.3 Radicación informe de calidad #4
     - No se cumplió
   - 1.4. Remisión informe SST #5:
     - Se cumplió
   - 1.5. Remisión informe técnico #5:
     - No se cumplió.
   - 1.6. Remisión informe de calidad # 5.
     - No llegó.
   - 1.7 Remisión informe ambiental #5:
     - Se cumplió.

TEMAS TRATADOS

2. Componente Tecnico:

- A corte del 30 de marzo se tiene:

  Programado: 65,4 Avance: 1,5%

  Ejecutado: 66,9

- Se remitieron observaciones a la programación del contratista. y en espera de la subsanación de la programación.
- La entidad solicita que sean radicadas las programaciones y presupuestos.

- Se avanzó en intervenciones en Hayuelos 1 y 2, y están pendientes los arcos y las mallas.
- Se finalizó Marsella (cancha sintética), ciudad Montes (Plaza, Softbol), Tintal (Softbol)
- Gramas Naturales: Gaitana y Alquería: Se aplicó fertilizante y la indicación dada fue esperar dos semanas para esperar el comportamiento de ese fertilizante.

- Avance en Villa de los Sauces, pendiente mallas y arcos
- Lombardía: Pendiente mallas y arcos.
- Calam Suba Gavilanes: Pendiente mallas y arcos.

La entidad solicita la radicación de las actas de puesta en servicio de las canchas terminadas.

3 Componente SST:

- Se recibió el informe SST #5 del contratista y se remitieron observaciones.

El contratista indica que hoy remite las subsanaciones.

4. Componente Ambiental:

- Durante el periodo del reporte se evidencia que el contratista mantiene la implementación de medidas ambientales con la instalación del punto ecológico, instalación de materiales durante la

TEMAS TRATADOS

Jornada para evitar el acopio en los frentes de obra e identificación de sustancias químicas

- El día de hoy, la profesional ambiental del contratista realizará visita al campo de Marsella para verificar el estado de los huevos de Alcaraván.
- El día 30 de marzo el contratista remite el informe ambiental del mes de marzo. Está en revisión.

5. Componente Calidad:

- Se solicita la remisión del informe de calidad # 4.
- Se solicita programar la auditoria, teniendo en cuenta que se está cerca del 70% de avance de la obra.
- Se solicita al contratista realizar la entrega del reporte de materiales.
- Se solicita programar la toma de muestra de materiales, de acuerdo a lo indicado en el plan de inspección y ensayos.
- Tener en cuenta las notas de la lista de chequeo del informe de calidad # 4, que se deben atender en el informe # 5.

6. Temas Varios:

- El día de ayer la entidad solicitó la reparación de un hueco en la cancha del recreo y unos arreglos en Pradera Sur, para que los mismos sean tenidos en cuenta y se incluyan en los presupuestos, y finalmente revisar el estado presupuestal del contrato.

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Subsanación informes de imprevistos	Contratista	10-04-2025
Subsanación informe de calidad	contratista	04-04-2025
Remisión informe técnico # 5	Contratista	04-04-2025
Remisión informe Calidad # 5	Contratista	04-04-2025
Subsanación de programación y presupuesto	contratista	03-04-2025
Subsanacion informe SST # 5 c	contratista	03-04-2025

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO	
Observaciones				

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA	Diego Gale	
NOMBRE		NOMBRE	Diego Andres Gale	
CARGO		CARGO	Inspector interventoria.	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Diego Andres Gale F.

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA

EVENTO: Comite de seguimiento # 19 COP-4041-2024/CIN-4080-24 RESPONSABLE DEL EVENTO

FECHA 03 04 2025 HORA INICIAL 9:00 HORA FINAL 9:30 LUGAR Virtual - Plataforma

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
						ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Javier Linares		Director Obra	Contratista		C. Innovapark		
2	Reidy Cortes		Apoyo	Contratista		C. Innovapark		
3	Jorge Madero.		Subdirección	IDRD		IDRD		
4	Antonio Rojas		Supervisión	IDRD		IDRD.		
5	Claudia Mahecha		Residente	Interventoria		CST 28		
6	Margarita Herrera		Coordinadora	Interventoria		CST 28		
7	Sergio Pedreros		Inspectos	Interventoria		CST 28		
8	Sofia Fernandez		SST.	Interventoria		CST 28		
9	Diego Gale		Inspectos	Interventoria		CST 28		
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/normativa/politicas-lineamientos-manuales

502

BOGOTÁ

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN: Comité de seguimiento #22. COP-4041-2024 / CIN-4080-2024	DD	MM	AA
ACTA No.		30	04	2025.

LUGAR: IDRD - Administración de escenarios HORA DE INICIO: 9:30 HORA FIN:

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Se anexa lista de asistencia.		

ORDEN DEL DIA

1. Revisión de compromisos pactados.	4.
2.	5.
3.	6.

TEMAS TRATADOS

1. Revision de compromisos pactados:

1.1. Definición donde instalar los bicicletenos ponderables.
- Pendiente por definir

1.2. Remitir justificación del polvo de ladrillo.
- No se cumplió.

1.3. Subsanación informe de calidad:
- No se cumplió.

1.4. Realizar reporte de material
- Se cumplió, en revisión.

1.5. Remisión acta parcial.
- 30 de abril.

TEMAS TRATADOS

2. Componente técnico:
   - Programado: 79,85%
   - Ejecutado: 81,00% → De acuerdo al acta # 6.
   - Diferencia: 1,15%

- Se avanza con intervenciones en Chicala, demarcación de Alqueria para el viernes.
- Se recuerda al contratista que deben contar con una persona en Alqueria los días sábado y domingo para el evento que se va a realizar allí.

La entidad solicita otra fertilización en Alqueria. De igual manera solicita suspender el riego en esta cancha, desde el día jueves y se retome el domingo en la noche o lunes a primera hora. Las podas se realizaran martes y jueves.

- En Marsella los huevos siguen allí y a la fecha no han eclosionado.

Teniendo en cuenta que la Secretaria de Ambiente solicitó actividades de protección de los polluelos, se tuvieron en cuenta dichas recomendaciones y se han mantenido de acuerdo a lo solicitado.

La profesional ambiental va a realizar trazabilidad del estado de los polluelos (la ambiental del contratista).

De igual manera, interventoría va a ir a revisar si los huevos están allí dentro del cerramiento de la protección.

- Se recibieron presupuestos de Villa Mayor por $10' aprox. de mallas y arcos. Se encuentran en revisión por parte de interventoría.
- De Americas occidental se despegó uno de los pegues de grama y se tienen observaciones de los mantenimientos de los arcos. Hay fisuras en las esquinas de los arcos que se deben soldar, y dicha cancha está abierta porque el cerramiento está dañado.

La malla contra impacto se encuentra dañada y por esto es que la cancha se encuentra abierta.

TEMAS TRATADOS

- La entidad solicita que en las actas de recibo tambien se incluyan fotos de las actividades realizadas, garantizando que las actividade se realizaron en sitio.

- Respecto a la modificación, se envia a legalización y para la proxima semana se espera que ya este listo.

3 Componente SST:

- Se recibió el informe SST # 6 del contratista, el cual está en revisión por parte de interventoría.
- El informe de interventoría se va a remitir la proxima semana.

4. Componente Ambiental:

- Durante el periodo de reporte, se realiza seguimiento a la implementación de medidas de manejo ambiental por parte del contratista, verificando que estas se desarrollan acorde a lo establecido en el plan.
- Asi las cosas se mantienen la instalación del punto ecológico y segregación de residuos sólidos convencionales, identificación de sustancias químicas y capacitación del personal.
- Teniendo en cuenta los polígonos intervenidos, no se implementa la protección de individuos arbóreos ni de sumideros
- Se mantiene la protección del nido ubicado en la cancha de Marsella.

5. Componente Calidad:

- A la fecha el contratista no ha subsanado el informe # 5.
- No se realiza reporte semanal de materiales, lo que no permite realizar seguimiento y trazabilidad de los mismos. de forma adecuada.
- El día de ayer se tenía programada la auditoria interna, la cuál se realizó de forma adecuada, del cual el contratista remitirá el informe correspondiente.

Se realizara recorrido la proxima semana.

COMPROMISOS		
TEMA	**RESPONSABLE**	**FECHA LÍMITE** PARA SU REALIZACIÓN
Definición donde instalar bicicleteros	IDRD	02-05-2025
Remitir justificación de polvo de ladrillo	Contratista	Pendiente.
Subsanación informe de calidad	contratista	30-04-2025
Remisión acta parcial	Contratista	30-04-2025
Remitir programación de actividades de mayo	Contratista	02-05-2025

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	**SI**	X	**NO**	
Observaciones				

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		**SECRETARIO (S)** Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		**FIRMA**	Diego Gale	
NOMBRE		**NOMBRE**	Diego Andres Gale F.	
CARGO		**CARGO**	Inspectos Interventoría	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Diego Andres Gale F.

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA

EVENTO: Comite de seguimiento # 22. RESPONSABLE DEL EVENTO

FECHA 30 04 2025 HORA INICIAL 9:30 HORA FINAL LUGAR IDRD- Administración de escenarios.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
						ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Keidy Mayerli Cortés Roto	1192725099	Apoyo contratista	consorcio innovaparques	Keidy Y Cortés	consorcio innovaparq.	consorcioinnovaparq-ues24@gmail.com	3112543461
2	Bayan Yhuen García	1024488768	RESIDENTE	consorcio innovap		consorcio innovaparques	" " "	3117181601
3	JORGE MADERO G.	79424228	CONTRATISTA	STP		IDRD		
4	Liliana P. Barbosa B	52690947	Contratista	STP-FE		IDRD	liipaatab@gmail.com	3203409620
5	MARGARITA HERRERA GARCIS	52539792	COORDINADORA PROYECTOS	CST 28.		CST 28		3143396020
6	Diego Andres Gale	1019049949	Inspector	Interventoria		CST 28	proyectos2@soli-ing.com	
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/normativa/politicas-lineamientos-manuales

BOGOTÁ

Si no maneja consecutivo cologue N.A.	COMITÉ/REUNIÓN: Recorrido y Comite de seguimiento #123	DD	MM	AA
ACTA No. 23		08	05	2025

LUGAR: Varios parques HORA DE INICIO: HORA FIN:

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Se anexa listado de asistencia.		

ORDEN DEL DIA

1. Revisión de compromisos.	4. Componente calidad
2. Componente técnico	5. Componente ambiental
3. Componente SST	6.

TEMAS TRATADOS

1. Revisión de compromisos pactados.

1.1. Remitir justificación de polvo de ladrillo

El contratista envia infosmación para revisión por parte de la interventoria, sin embargo no se acuerda realizar pagos por encima de los precios contractuales.
La entidad es clara al indicar que es necesario ejecutar dicha actividad, de manera urgente, además de que ya van varios años donde no se ha realizado.
El contratista solicita realizar mesa de trabajo con interventoria para acordar el precio de la actividad

1.2. Subsanación del informe de calidad:

- No se cumplió, se le remitió reiteración al contratista para la subsanación.

1.3. Realizar reporte de material.

- Remitieron reporte del mes de abril.

TEMAS TRATADOS

1.1. Remisión del informe de auditoria:

- Se realizó la auditoria, no han enviado el informe.

1.5. Definir donde instalar los bicicleteros de criterios ponderables.

- La entidad ya envió la ubicación y tipo de bicicleteros a instalar. De igual manera, se le trasladó al contratista.

2. Componente técnico:

- Programado: 81 %
  Ejecutado: 83%

- Se están interviniendo las canchas de Chicala y están pendientes por terminar Alfonso Lopez y Chicala.

- De Palermo está pendiente por aplicar la mitad de caucho.

- Esta a la espera el cargue de la modificación del contrato.

3. Componente SST:

- Se recibió el informe SST N°6 del contratista, el cual fue revisado y aprobado por interventoría mediante el comunicado IDRD-4080-G1-2024-216 el día 30-04-2025.

4. Componente Calidad:

- Se reiteró al contratista remitir la subsanación del informe de calidad # 5.
- Se requiere reporte semanal de materiales, lo cual no han reportado durante el mes de mayo
- Se requiere la presentación del informe de calidad #6.

TEMAS TRATADOS

- Se requiere presentación del informe de auditoria, la cual ya se realizó.

5. Componente ambiental:
   - Durante el periodo de reporte se revisa la primera versión del informe ambiental, a partir de lo cual se remiten observaciones pertinentes.
   - De igual manera se reitera la necesidad de presentar las certificaciones pendientes de materiales, especificamente grano de caucho y arena que se han utilizado para el proyecto hasta el corte.
   - Finalmente se realiza seguimiento de las medidas de manejo ambiental aplicables al proyecto, evidenciando que el contratista ha dado cumplimiento a lo relacionado con el manejo de residuos, capacitaciones y manejo de sustancias químicas.
   - Respecto al nido de alcaraván, se evidencia que el contratista mantiene la protección acorde a lo requerido po la SDA, sin presentar eclosión de los huevos. No se presentan novedades en el periodo.

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Subsanación informe calidad #5	Contratista	08-05-2025
Radicación informe técnico #5	contratista	08-05-2025
Radicación informe SST #6	Contratista	08-05-2025.
Remisión informe de calidad #6	Contratista	09-05-2025
Presentación del informe de auditoria	Contratista	Pendiente.

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO	
Observaciones				

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA	Diego Gale	
NOMBRE		NOMBRE	Diego Andres Gale	
CARGO		CARGO	Inspector de Interventoria	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Diego Andres Gale F.

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA

EVENTO: Recorrido - Comite de seguimiento 23 CIN - 4080-24 COP-4061-24 RESPONSABLE DEL EVENTO

FECHA 08 05 2025 HORA INICIAL 8:00 HORA FINAL LUGAR

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
						ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Cristhian Correa Noriega	1020793791	Agrónomo	STP		IDRD	cristhian.correa@idrd.gov.co	3017384474
2	Liliana P. Barbosa B.	52690984	Apd. Contratista	STP-IE		IDRD	liliana.barbosa@idrd.gov.co	3124019620
3	Hana Claudia Molmenca Montes	1121934579	Residente	Interventoría		CST28	proyecto32@sdinversion	3107623167
4	Brandon Given Garcia	1014488983	Residente	INNOVAPARQUES		CONTRATISTA	consorcioinnovaparques@gmail.com	3147816110
5	Keidy Mayerli Cortés Rozo	1192785049	Apoyo	CONSORCIO INNOVAPARQUES		CONSORCIO INNOVAPARQUES	consorcioinnovaparques@gmail.com	3112542461
6	Diego Andres Gale F	1019049944	Inspector	CST 28		Interventoría	proyecto28@stinsa.com	—
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/normativa/politicas-lineamientos-manuales

S18

5. ANEXO D
CONTROL DE DOCUMENTOS

5.1. LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

CONSORCIO INNOVAPARQUES

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS INTERNOS Y EXTERNOS

CÓDIGO	HSEQ-F-38
VERSIÓN	1
FECHA	26/11/2024

Fecha de actualización del contenido del registro: **25/04/2026**

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS / CONTROL DE REGISTROS

ID	Documento	Código	Versión	Fecha de Revisión	Entregado a:	Almacenamiento protección	Recuperación	Retención	Disposición
	GESTIÓN SG SST								
1	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	C-CA-SGSST	0	7/11/2024	PROFESIONAL SG SST	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	20 años	Destruccion
2	Política Integral de Seguridad, Salud en el Trabajo, Medio Ambiente y Calidad	PL-SST-01	2	24/5/2024	PROFESIONAL SG SST	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	20 años	Destruccion
3	Cronograma actividades ambientales	F AMB-1	0	12/12/2024	PROFESIONAL SG SST	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	20 años	Destruccion
4	Matriz Legal MA	M AMB-12	1	11/12/2024	PROFESIONAL SG SST	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	20 años	Destruccion
5	Matriz de Aspectos e Impactos ambientales	M AMB-13	1	12/12/2024	PROFESIONAL SG SST	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	20 años	Destruccion
6	Lista de asistencia	FT-SST-03	1	25/11/2022	PROFESIONAL SG SST	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	20 años	Destruccion
7	Inpeccion ambiental de obra	AMB-FO.001	0	12/12/2022	PROFESIONAL SG SST	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	20 años	Destruccion
8	Bitacora de residuos peligrosos y electrónicos	F AMB-8	1	15/8/2024	PROFESIONAL SG SST	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	20 años	Destruccion
9	Procedimiento para atencion de derrames	PR-MA-03	1	11/11/2024	PROFESIONAL SG SST	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	20 años	Destruccion
10	Plan de manejo ambiental	PR-MA-02	1	12/12/2024	PROFESIONAL SG SST	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	20 años	Destruccion
11	Informe ambiental	IN-MA-01	1	11/11/2024	PROFESIONAL SG SST	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	20 años	Destruccion
12	Politica prevencion de acoso laboral	PL-SST-03	2	27/5/2024	PROFESIONAL SG SST	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	20 años	Destruccion
13	Politica de prevención del consumo de alcohol, drogas y tabaco	PL-SST-02	2	24/5/2024	PROFESIONAL SG SST	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	20 años	Destruccion
14	Matriz legal SST	MT-SST-03	1	15/8/2021	PROFESIONAL SG SST	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	20 años	Destruccion
15	Plan de trabajo anual SG-SST	FT-SST-05	1	10/5/2021	PROFESIONAL SG SST	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	20 años	Destruccion
16	Formato inspección y control de extintores	FT-SST-21	1	17/8/2021	PROFESIONAL SG SST	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	20 años	Destruccion
17	Inspección y control botequines	FT-SST-24	1	17/8/2021	PROFESIONAL SG SST	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	20 años	Destruccion
18	Matriz de peligros y riesgos SST	MT-SST-01	1	15/7/2021	PROFESIONAL SG SST	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	20 años	Destruccion
19	Matriz de elementos de protección individual	MT-SST-13	1	2/9/2021	PROFESIONAL SG SST	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	20 años	Destruccion
20	Conformación de COPASST	FT-SST-04	1	24/11/2020	PROFESIONAL SG SST	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	20 años	Destruccion
21	Conformación del comité de convivencia laboral	FT-SST-06	1	25/11/2020	PROFESIONAL SG SST	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	20 años	Destruccion
22	Reglamento H&S	DG-SG-08	1	9/8/2021	PROFESIONAL SG SST	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	20 años	Destruccion
23	Matriz de capacitaciones	FT-TH-14	1	20/8/2021	PROFESIONAL SG SST	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	20 años	Destruccion
24	Perfiles de cargo	FO-TH-004	3	4/6/2024	PROFESIONAL SG SST	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	20 años	Destruccion
25	Objetivos y metas SST	SG-SST-01	2	27/5/2024	PROFESIONAL SG SST	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	20 años	Destruccion
24	Formanto de inducción y reinducción	FT-SST-07	1	24/7/2024	PROFESIONAL SG SST	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	20 años	Destruccion
25	Perfil socio demográfico	MT-SST-16	1	10/5/2022	PROFESIONAL SG SST	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	20 años	Destruccion
26	Programa de estilo de vida saludable	PG-SST-01	1	5/10/2021	PROFESIONAL SG SST	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	20 años	Destruccion
27	Profesiograma	MT-SST-21	1	18/11/2024	PROFESIONAL SG SST	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	20 años	Destruccion
28	Procedimiento para la atención, reporte e investigación de accidentes de trabajo	PR-SST-02	1	23/7/2021	PROFESIONAL SG SST	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	20 años	Destruccion
29	Reporte de investigación de accidente e insidentes de trabajo	FT-SST36	1	27/8/2021	PROFESIONAL SG SST	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	20 años	Destruccion
30	Indicadores del SG-SST	MT-SG-08	0	1/8/2020	PROFESIONAL SG SST	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	20 años	Destruccion
31	Procedimiento trabajo seguro de alturas	PR-SST-01	1	11/11/2024	PROFESIONAL SG SST	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	20 años	Destruccion
32	Permiso de alturas	SG-FO-24	2	25/9/2020	PROFESIONAL SG SST	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	20 años	Destruccion
33	Programa de auditoria interna y externa	PR-SST-15	01	17/8/2021	PROFESIONAL SG SST	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	20 años	Destruccion
34	Informe mensual SST	IN-SST-01	1	11/11/2024	PROFESIONAL SG SST	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	20 años	Destruccion
	GESTION AMBIENTAL								
1	Plan de Manejo Ambiental	PR-MA-02	1	12/12/2024	PROFESIONAL AMBIENTAL	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	5 años	Destruccion
2	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES	F AMB-1	0	12/12/2022	PROFESIONAL AMBIENTAL	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	5 años	Destruccion
3	LISTA DE ASISTENCIA	FT-SST-03	1	25/11/2021	PROFESIONAL AMBIENTAL	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	5 años	Destruccion
4	MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES	F-AMB-2	0	12/12/2024	PROFESIONAL AMBIENTAL	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	5 años	Destruccion
5	MATRIZ LEGAL AMBIENTAL	F-AMB-3	0	12/12/2024	PROFESIONAL AMBIENTAL	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	5 años	Destruccion
6	BITACORA DE RESIDUOS PELIGROSOS Y ELECTRICOS	F-AMB-4	0	12/12/2024	PROFESIONAL AMBIENTAL	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	5 años	Destruccion
7	INSPECCION AMBIENTAL	F-AMB-5	0	12/12/2022	PROFESIONAL AMBIENTAL	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	5 años	Destruccion
8	Procedimiento en Caso de Derrame	PR-MA-03	1	11/11/2024	PROFESIONAL AMBIENTAL	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	5 años	Destruccion
9	Programa de Manejo Ambiental RCD	PR-SST-01	1	11/11/2024	PROFESIONAL AMBIENTAL	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	5 años	Destruccion
	GESTION SOCIAL								
1	PLAN DE GESTIÓN SOCIAL	G-S-M-01	2	10/12/2024	PROFESIONAL SOCIAL	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	5 años	Destruccion

515

CONSORCIO INNOVAPARQUES

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS INTERNOS Y EXTERNOS

CÓDIGO	HSEQ-F-38
VERSIÓN	1
FECHA	26/11/2024

Fecha de actualización del contenido del registro: **25/04/2026**

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS						CONTROL DE REGISTROS			
ID	Documento	Código	Versión	Fecha de Revisión	Entregado a:	Almacenamiento protección	Recuperación	Retención	Disposición
PRESTACIÓN DEL SERVICIO									
1	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	TR-M-01	2	9/01/2026	ESPECIALISTA DE TRANSITO	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	5 años	Destruccion
2	CONTROL DE CORRESPONDENCIA	RH-F-16-E	1	13/10/2021	ING. RESIDENTE	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	5 años	Destruccion
3	PLAN DE INSPECCION Y ENSAYOS	PS-F-06	5	9/03/2025	ING. RESIDENTE	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	5 años	Destruccion
4	MATRIZ DE ADQUISICIONES	N/A	N/A	N/A	N/A	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	5 años	Destruccion
5	Control de materiales con Certif. Conformidad	PS-F-05	1	28/04/2021	ING. RESIDENTE	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	5 años	Destruccion
6	PROCEDIMIENTO DE COMPRAS	CO-F-01	1	15/11/2024	COMPRAS	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	5 años	Destruccion
7	CONTROL PROPIEDAD DEL CLIENTE	PS-F-07	1	19/12/2012	ING. RESIDENTE	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	5 años	Destruccion
8	REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA	HSEQ-F-06	3	18/02/2022	CALIDAD	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	5 años	Destruccion
9	PROGRAMA DE AUDITORIAS	HSEQ-F-08	1	10/04/2027	CALIDAD	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	5 años	Destruccion
10	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS INTERNOS Y EXTERNOS	HSEQ-F-38	1	26/11/2024	CALIDAD	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	5 años	Destruccion
11	PLAN DE CALIDAD	HSEQ-P-01	2	27/11/2024	CALIDAD	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	5 años	Destruccion
12	PLAN DE TOPOGRAFIA	TR-M-02	1	16/12/2024	ING. RESIDENTE	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	5 años	Destruccion
13	PLAN DE GEOTECNIA	TR-M-03	1	11/2024	ING. RESIDENTE	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	5 años	Destruccion
14	PLAN DE SERVICIOS PUBLICOS	TR-M-04	1	11/2024	ING. RESIDENTE	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	5 años	Destruccion
15	PLAN ESTRUCTURAL	TR-M-05	2	11/2024	ING. RESIDENTE	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	5 años	Destruccion
16	PLAN HIDROSANITARIO	TR-M-06	2	11/2024	ING. RESIDENTE	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	5 años	Destruccion
17	PLAN SUDS - Grupo 1. Gramas	TR-M-07	2	11/2024	ING. RESIDENTE	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	5 años	Destruccion
18	Plan de construcción y coordinación logistica	TR-M-08	2	12/2024	ING. RESIDENTE	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	5 años	Destruccion
19	Registros de cantidad de Materiales	PS-F-09	3	17/02/2025	ING. RESIDENTE	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	5 años	Destruccion
20	Formato de verificacion instalaciones	PS-F-11	1	20/11/2024	ING. RESIDENTE	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	5 años	Destruccion
21	Oferta economica	LP-SG-IDRD-017-2024	0	17/09/2024	ING. RESIDENTE	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por fecha y Version	5 años	Destruccion
22	Programacion	N/A	4	5/02/2025	ING. RESIDENTE	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por fecha y Version	8 años	Destruccion
23	Balance	N/A	3	18/03/2025	ING. RESIDENTE	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por fecha y Version	8 años	Destruccion
DOCUMENTACIÓN EXTERNA									
1	Matriz 2 - Riesgos / IDRD	CCE-EICP-FM-118	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	REVISIÓN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - PLAN DE GESTIÓN RCD / DRD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	CONTROL DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA / IDRD	N/A	N/A	N/A	TOPOGRAFO	consorcioinnovaparques24@gmail.com	N/A	N/A	N/A

516

6. ANEXO E COMPRAS

6.1. AMÉRICAS OCCIDENTAL

CONSORCIO INNOVAPARQUES	"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". Lote 1/grupo 1 CAMPOS DEPORTIVOS, tiene el siguiente alcance: "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS"

Matriz de Adquisiciones

CONTRATISTA	CONSORCO IMNOVAPARQUES
CONTRATANTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE IDRD
ALCANCE DEL CONTRATO	"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". Lote 1/grupo 1 CAMPOS DEPORTIVOS, tiene el siguiente alcance: "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS"
NRO DEL	CONTRATO DE OBRA IDRD CTO / Proceso de Contratación IDRD-SG-LP-017-2024
PERIODO	DESDE EL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025
PARQUE	AMERICA OCCIDENTAL

Código EDT	Estructura de la EDT	Tipo de Adquisición	Fechas Estimadas		PROVEEDOR	SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL SEGUIMIENTO
			Inicio	Fin		
1	BASES Y RELLENOS		1/12/2024	31/01/2025		
	Grava Trituradas 1" -3/4	compra				
	Arena	compra			BEPE	4140-007-05
2	MANTENIMIENTO CESPED NATURAL		7/06/2025	7/08/2025		
	Empradización (Cesped,sacapantas, M.O, Herrnta)	compra				
	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	compra				
	FERTILIZANTE ORGANICO TIPO HUMUS (aplicacion)	compra				
	FERTILIZANTE QUÍMICO GRANULADO, FOLIAR Y ORGANICO	compra				
3	DOTACION Y MANTENIMIENTOS		7/05/2025	7/08/2025		
	Estruc. minifutbol con malla (Sum+Inst)	compra				
	Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	compra			MALLAS NM	4140-04-18
	Mallas profesionales Cal.8 Futbol (Sumin e Instal)	compra			MALLAS NM	4140-04-18
	Banderines Estaca+banderin Futbol(Sum+Inst)	compra				
	MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	compra			MALLAS NM	4140-04-18
4	RED DE RIEGO MANUAL		7/03/2025	7/07/2025		
	Manguera Riego Manual d=3"(Sum+Inst.)	compra				
	Manguera Riego Manual d=2"(Sum+Inst.)	compra				
	Manguera Riego Manual d=11/2"(Sum+Inst.)	compra				
	Manguera Riego Manual d=1"(Sum+Inst.)	compra				
	Manguera Riego Manual d=3/4"(Sum+Inst.)	compra				
	Manguera Riego Manual d=1/2"(Sum+Inst.)	compra				
	REGISTRO DE CORTINA Ø3" (Sum + Inst)	compra				
	REGISTRO 2"(Cortina) NAPOLI	compra				
	REGISTRO 1"(Cortina) RED WHITE O SIMILAR	compra				
	REGISTRO CORTINA 1/2" (Incluye ACCS)	compra				
	Sumin e Instal Tripode Metalic.para Aspersor H=1.5	compra				
	Aspersor Metalico Bronce Ø=1"(Sum+Instal)"	compra				
	Aspersor Metálico Bronce Ø=3/4"(Sum+Instal)	compra				
	Aspersor Metálico Bronce Ø= 1/2"(Sum+Instal)	compra				
	CAJA INSPECCION(.60x.60x.60) ESPEC-IDRD	compra				
5	RED DE RIEGO AUTOMATICO		7/03/2025	7/07/2025		
	Tuberia PVCP 3 " RDE 21	compra				
	Tuberia PVC.P d=2"(RDE-21)	compra				
	Tuberia PVC.P d=1.1/2"	compra				
	Tuberia PVCP 1 " RDE 21 excav mec. relleno tie	compra				
	Aspersor Rotor Turbina (Sum+Instal)r=21m**	compra				
	Valvula Selenoide 2" (Sum+Inst)**	compra				
	Controlador Electrón.SistemaRiego Automat.(Sum+Ins	compra				
6	RED DRENAJES		7/02/2025	7/06/2025		
	01 Tuberia drenaje d=200mm Exca+ relleno Tierr+Geot.	compra				
	02 Tuberia drenaje d=160mm Exca+ relleno Tierr+Geot.	compra				
	03 Tuberia drenaje 4" d=100mm Exca+ relleno Tierr+Geot.	compra				
	04 Caja de inspeccion .80x.80 h=1.0**	compra				
	05 CAJA INSPECCION(.80x.80x.80) ESPEC-IDRD	compra				
	06 TUBERIA NOVAFORT D= 250MM	compra				
7	CAMPOS GRAMA SINTETICA		7/02/2025	7/06/2025		
	05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasiego)	compra			ECO TIRE GREEN SAS	4140-007-05
	PEGANTE	compra			SELLECO	4140-007-05
	PINTURA VINILO	compra				
	02 GRAMA SINT MONOFIL.60MM-FIFAPRinc arena+caucho+ins	compra			CUPERZ	4140-007-05
	03 GRAMA SINT MONOFIL.50MM-FIFAPRinc arena+caucho+ins	compra				
	CINTA	compra			MALLAS Y GRAMAS	4140-007-05
	04 Sardinel prefab.A-10 a=0.20 h=0.50L=0.8 Sin atraqu	compra				

INGENIERIA CMC S.A.S

REM_4140_INN: 014-18

CLIENTE: INNOVAPARQUES

FECHA: 28-04-25

CONTRATO: 4041-2024

CAMPO DESTINO Americas Occidental

ITEM	DECRIPCION	CANTIDAD	UND	OBSERVACIONES
1	Malla Ceramiento	224.40	m^2	
2	Malla Cal 4	2	Jgo	
3	Malla Cal 8	1	Jgo	

OBSERVACIONES: _____

Entrega: _____

Recibe: _____

CMC S.A.S

REM_4140_INN: 007-05

CLIENTE: INNOVAPARQUES

FECHA: 26-05-25

CONTRATO: 4041-2024

CAMPO DESTINO Americas Occidental

ITEM	DECRIPCION	CANTIDAD	UND	OBSERVACIONES
1	Reagente Bicomp	3	Canecas	
2	Cinta Union	28	mL.	
3	Grama Hard	22,46	m^2.	
4	Caucho SBR	400	Kg	Reparacion
5	Arena Silice	400	Kg.	Reparacion

OBSERVACIONES.

Entrega:

Recibe:

6.2. ALFONSO LOPEZ

CONSORCIO INNOVAPARQUES

"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". Lote 1/grupo 1 CAMPOS DEPORTIVOS, tiene el siguiente alcance: "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS"

Matriz de Adquisiciones

CONTRATISTA	CONSORCO IMNOVAPARQUES
CONTRATANTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE IDRD
ALCANCE DEL CONTRATO	"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". Lote 1/grupo 1 CAMPOS DEPORTIVOS, tiene el siguiente alcance: "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS"
NRO DEL	CONTRATO DE OBRA IDRD CTO / Proceso de Contratación IDRD-SG-LP-017-2024
PERIODO	DESDE EL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025
PARQUE	ALFONSO LOPEZ

Código EDT	Estructura de la EDT	Tipo de Adquisición	Fechas Estimadas		PROVEEDOR	SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL SEGUIMIENTO
			Inicio	Fin		
1	BASES Y RELLENOS		1/12/2024	31/01/2025		
	Grava Trituradas 1" -3/4	compra				
	Arena	compra			BEPE	4140-003-05
2	MANTENIMIENTO CESPED NATURAL		7/06/2025	7/08/2025		
	Empradización (Cesped,sacapantas, M.O, Herrnta)	compra				
	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	compra				
	FERTILIZANTE ORGANICO TIPO HUMUS (aplicacion)	compra				
	FERTILIZANTE QUÍMICO GRANULADO, FOLIAR Y ORGANICO	compra				
3	DOTACION Y MANTENIMIENTOS		7/05/2025	7/08/2025		
	Estruc. minifutbol con malla (Sum+Inst)	compra				
	Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	compra				
	Mallas profesionales Cal.8 Futbol (Sumin e Instal)	compra				
	Banderines Estaca+banderin Futbol(Sum+Inst)	compra				
	MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	compra			MALLAS NM	4140-005-05
4	RED DE RIEGO MANUAL		7/03/2025	7/07/2025		
	Manguera Riego Manual d=3"(Sum+Inst.)	compra				
	Manguera Riego Manual d=2"(Sum+Inst.)	compra				
	Manguera Riego Manual d=11/2"(Sum+Inst.)	compra				
	Manguera Riego Manual d=1"(Sum+Inst.)	compra				
	Manguera Riego Manual d=3/4"(Sum+Inst.)	compra				
	Manguera Riego Manual d=1/2"(Sum+Inst.)	compra				
	REGISTRO DE CORTINA Ø3" (Sum + Inst)	compra				
	REGISTRO 2"(Cortina) NAPOLI	compra				
	REGISTRO 1"(Cortina) RED WHITE O SIMILAR	compra				
	REGISTRO CORTINA 1/2" (Incluye ACCS)	compra				
	Sumin e Instal Tripode Metalic.para Aspersor H=1.5	compra				
	Aspersor Metalico Bronce Ø=1"(Sum+Instal)"	compra				
	Aspersor Metálico Bronce Ø=3/4"(Sum+Instal)	compra				
	Aspersor Metálico Bronce Ø= 1/2"(Sum+Instal)	compra				
	CAJA INSPECCION(.60x.60x.60) ESPEC-IDRD	compra				
5	RED DE RIEGO AUTOMATICO		7/03/2025	7/07/2025		
	Tuberia PVCP 3 " RDE 21	compra				
	Tuberia PVC.P d=2"(RDE-21)	compra				
	Tuberia PVC.P d=1.1/2"	compra				
	Tuberia PVCP 1 " RDE 21 excav mec. relleno tie	compra				
	Aspersor Rotor Turbina (Sum+Instal)r=21m**	compra				
	Valvula Selenoide 2" (Sum+Inst)**	compra				
	Controlador Electrón.SistemaRiego Automat.(Sum+Ins	compra				
6	RED DRENAJES		7/01/2025	7/06/2025		
	01 Tuberia drenaje d=200mm Exca+ relleno Tierr+Geot.	compra				
	02 Tuberia drenaje d=160mm Exca+ relleno Tierr+Geot.	compra				
	03 Tuberia drenaje 4" d=100mm Exca+ relleno Tierr+Geot.	compra				
	04 Caja de inspeccion .80x.80 h=1.0**	compra				
	05 CAJA INSPECCION(.80x.80x.80) ESPEC-IDRD	compra				
	06 TUBERIA NOVAFORT D= 250MM	compra				
7	CAMPOS GRAMA SINTETICA		7/01/2025	7/06/2025		
	05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasiego)	compra			ECO TIRE GREEN SAS	
	PEGANTE	compra			SELLECO	4140-003-05
	PINTURA VINILO	compra				
	02 GRAMA SINT MONOFIL.60MM-FIFAPRinc arena+caucho+ins	compra			CUPERZ	4140-003-05
	03 GRAMA SINT MONOFIL.50MM-FIFAPRinc arena+caucho+ins	compra				
	CINTA	compra			MALLAS Y GRAMAS	4140-003-05
	04 Sardinel prefab.A-10 a=0.20 h=0.50L=0.8 Sin atraqu	compra				

CMC S.A.S

REM_4140_INN: 003-05

CLIENTE: INNOVAPARQUES

FECHA: 08-05-25

CONTRATO: 4041-2024

CAMPO DESTINO Alfonso Lopez

ITEM	DECRIPCION	CANTIDAD	UND	OBSERVACIONES
1	Pegante Bicomp.	3	Caneca	
2	Cinta Vrames	64	ml	
3	Grama Sintetico	61.05	m²	
4	Caucho SBR	1100	Kg	Reparacion
5	Arena Silice	1100	Kg	Reparacion
6	Caucho SBR	3000	Kg	Top. Dressing

OBSERVACIONES: _____

Entrega: _____

Recibe: _____

CMC S.A.S

REM_4140_INN: 005-05

CLIENTE: INNOVAPARQUES

FECHA: 14-05-25

CONTRATO: 4041-2024

CAMPO DESTINO Alfonso Lopez

ITEM	DECRIPCION	CANTIDAD	UND	OBSERVACIONES
1	Malla Cerramiento	487,77	m2	Perimetro Techo

OBSERVACIONES:

Entrega:

Recibe:

525

6.3. EL RECREO

CONSORCIO INNOVAPARQUES

"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD".
Lote 1/grupo 1 CAMPOS DEPORTIVOS, tiene el siguiente alcance: "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS"

Matriz de Adquisiciones

CONTRATISTA	CONSORCO IMNOVAPARQUES
CONTRATANTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE IDRD
ALCANCE DEL CONTRATO	"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". Lote 1/grupo 1 CAMPOS DEPORTIVOS, tiene el siguiente alcance: "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS"
NRO DEL	CONTRATO DE OBRA IDRD CTO / Proceso de Contratación IDRD-SG-LP-017-2024
PERIODO	DESDE EL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025
PARQUE	EL RECREO

Código EDT	Estructura de la EDT	Tipo de Adquisición	Fechas Estimadas		PROVEEDOR	SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL SEGUIMIENTO
			Inicio	Fin		
1	BASES Y RELLENOS		1/12/2024	31/01/2025		
	Grava Trituradas 1" -3/4	compra				
	Arena	compra				
2	MANTENIMIENTO CESPED NATURAL		7/06/2025	7/08/2025		
	Empradización (Cesped,sacapantas, M.O, Herrnta)	compra				
	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	compra				
	FERTILIZANTE ORGANICO TIPO HUMUS (aplicacion)	compra				
	FERTILIZANTE QUÍMICO GRANULADO, FOLIAR Y ORGANICO	compra				
3	DOTACION Y MANTENIMIENTOS		7/05/2025	7/08/2025		
	Estruc. minifutbol con malla (Sum+Inst)	compra				
	Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	compra			MALLAS NM	4140-04-21
	Mallas profesionales Cal.8 Futbol (Sumin e Instal)	compra			MALLAS NM	4140-04-21
	Banderines Estaca+banderin Futbol(Sum+Inst)	compra				
	MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	compra			MALLAS NM	4140-04-21
4	RED DE RIEGO MANUAL		7/03/2025	7/07/2025		
	Manguera Riego Manual d=3"(Sum+Inst.)	compra				
	Manguera Riego Manual d=2"(Sum+Inst.)	compra				
	Manguera Riego Manual d=11/2"(Sum+Inst.)	compra				
	Manguera Riego Manual d=1"(Sum+Inst.)	compra				
	Manguera Riego Manual d=3/4"(Sum+Inst.)	compra				
	Manguera Riego Manual d=1/2"(Sum+Inst.)	compra				
	REGISTRO DE CORTINA Ø3" (Sum + Inst)	compra				
	REGISTRO 2"(Cortina) NAPOLI	compra				
	REGISTRO 1"(Cortina) RED WHITE O SIMILAR	compra				
	REGISTRO CORTINA 1/2" (Incluye ACCS)	compra				
	Sumin e Instal Tripode Metalic.para Aspersor H=1.5	compra				
	Aspersor Metalico Bronce Ø=1"(Sum+Instal)"	compra				
	Aspersor Metálico Bronce Ø=3/4"(Sum+Instal)	compra				
	Aspersor Metálico Bronce Ø= 1/2"(Sum+Instal)	compra				
	CAJA INSPECCION(.60x.60x.60) ESPEC-IDRD	compra				
5	RED DE RIEGO AUTOMATICO		7/03/2025	7/07/2025		
	Tuberia PVCP 3 " RDE 21	compra				
	Tuberia PVC.P d=2"(RDE-21)	compra				
	Tuberia PVC.P d=1.1/2"	compra				
	Tuberia PVCP 1 " RDE 21 excav mec. relleno tie	compra				
	Aspersor Rotor Turbina (Sum+Instal)r=21m**	compra				
	Valvula Selenoide 2" (Sum+Inst)**	compra				
	Controlador Electrón.SistemaRiego Automat.(Sum+Ins	compra				
6	RED DRENAJES		7/01/2025	7/06/2025		
	01 Tuberia drenaje d=200mm Exca+ relleno Tierr+Geot.	compra				
	02 Tuberia drenaje d=160mm Exca+ relleno Tierr+Geot.	compra				
	03 Tuberia drenaje 4" d=100mm Exca+ relleno Tierr+Geot.	compra				
	04 Caja de inspeccion .80x.80 h=1.0**	compra				
	05 CAJA INSPECCION(.80x.80x.80) ESPEC-IDRD	compra				
	06 TUBERIA NOVAFORT D= 250MM	compra				
7	CAMPOS GRAMA SINTETICA		7/01/2025	7/06/2025		
	05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasiego)	compra				
	PEGANTE	compra				
	PINTURA VINILO	compra				
	02 GRAMA SINT MONOFIL.60MM-FIFAPRinc arena+caucho+ins	compra				
	03 GRAMA SINT MONOFIL.50MM-FIFAPRinc arena+caucho+ins	compra				
	CINTA	compra				
	04 Sardinel prefab.A-10 a=0.20 h=0.50L=0.8 Sin atraqu	compra				

INGENIERIA CMC S.A.S

REM_4140_INN: 04-21

CLIENTE: INNOVAPARQUES

FECHA: 29-01-25

CONTRATO: 4041-2024

CAMPO DESTINO El Recreo

ITEM	DECRIPCION	CANTIDAD	UND	OBSERVACIONES
1	Malla Cerramiento	263,75	m2	
2	Malla Cal 4	2	Dgo	
3	Malla Cal 8	1	Dgo	

OBSERVACIONES: _____

Entrega:

Recibe:

528

6.4. LOS EJIDOS

CONSORCIO INNOVAPARQUES

"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". Lote 1/grupo 1 CAMPOS DEPORTIVOS, tiene el siguiente alcance: "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS"

Matriz de Adquisiciones

CONTRATISTA	CONSORCO IMNOVAPARQUES
CONTRATANTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE IDRD
ALCANCE DEL CONTRATO	"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". Lote 1/grupo 1 CAMPOS DEPORTIVOS, tiene el siguiente alcance: "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS"
NRO DEL	CONTRATO DE OBRA IDRD CTO / Proceso de Contratación IDRD-SG-LP-017-2024
PERIODO	DESDE EL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025
PARQUE	PARQUE INDUSTRIAL LOS EJIDOS

Código EDT	Estructura de la EDT	Tipo de Adquisición	Fechas Estimadas		PROVEEDOR	SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL SEGUIMIENTO
			Inicio	Fin		
1	BASES Y RELLENOS		1/12/2024	31/01/2025		
	Grava Trituradas 1" -3/4	compra				
	Arena	compra				
2	MANTENIMIENTO CESPED NATURAL		7/06/2025	7/08/2025		
	Empradización (Cesped,sacapantas, M.O, Herrnta)	compra				
	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	compra				
	FERTILIZANTE ORGANICO TIPO HUMUS (aplicacion)	compra				
	FERTILIZANTE QUÍMICO GRANULADO, FOLIAR Y ORGANICO	compra				
3	DOTACION Y MANTENIMIENTOS		7/05/2025	7/08/2025		
	Estruc. minifutbol con malla (Sum+Inst)	compra				
	Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	compra			MALLAS NM	4140-04-17
	Mallas profesionales Cal.8 Futbol (Sumin e Instal)	compra			MALLAS NM	4140-04-17
	Banderines Estaca+banderin Futbol(Sum+Inst)	compra				
	MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	compra			MALLAS NM	4140-04-17
4	RED DE RIEGO MANUAL		7/03/2025	7/07/2025		
	Manguera Riego Manual d=3"(Sum+Inst.)	compra				
	Manguera Riego Manual d=2"(Sum+Inst.)	compra				
	Manguera Riego Manual d=11/2"(Sum+Inst.)	compra				
	Manguera Riego Manual d=1"(Sum+Inst.)	compra				
	Manguera Riego Manual d=3/4"(Sum+Inst.)	compra				
	Manguera Riego Manual d=1/2"(Sum+Inst.)	compra				
	REGISTRO DE CORTINA Ø3" (Sum + Inst)	compra				
	REGISTRO 2"(Cortina) NAPOLI	compra				
	REGISTRO 1"(Cortina) RED WHITE O SIMILAR	compra				
	REGISTRO CORTINA 1/2" (Incluye ACCS)	compra				
	Sumin e Instal Tripode Metalic.para Aspersor H=1.5	compra				
	Aspersor Metalico Bronce Ø=1"(Sum+Instal)"	compra				
	Aspersor Metálico Bronce Ø=3/4"(Sum+Instal)	compra				
	Aspersor Metalico Bronce Ø= 1/2"(Sum+Instal)	compra				
	CAJA INSPECCION(.60x.60x.60) ESPEC-IDRD	compra				
5	RED DE RIEGO AUTOMATICO		7/03/2025	7/07/2025		
	Tuberia PVCP 3 " RDE 21	compra				
	Tuberia PVC.P d=2"(RDE-21)	compra				
	Tuberia PVC.P d=1.1/2"	compra				
	Tuberia PVCP 1 " RDE 21 excav mec. relleno tie	compra				
	Aspersor Rotor Turbina (Sum+Instal)r=21m**	compra				
	Valvula Selencide 2" (Sum+Inst)**	compra				
	Controlador Electrón.SistemaRiego Automat.(Sum+Ins	compra				
6	RED DRENAJES		7/01/2025	7/06/2025		
	01 Tuberia drenaje d=200mm Exca+ relleno Tierr+Geot.	compra				
	02 Tuberia drenaje d=160mm Exca+ relleno Tierr+Geot.	compra				
	03 Tuberia drenaje 4" d=100mm Exca+ relleno Tierr+Geot.	compra				
	04 Caja de inspeccion .80x.80 h=1.0**	compra				
	05 CAJA INSPECCION(.80x.80x.80) ESPEC-IDRD	compra				
	06 TUBERIA NOVAFORT D= 250MM	compra				
7	CAMPOS GRAMA SINTETICA		7/01/2025	7/06/2025		
	05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasiego)	compra				
	PEGANTE	compra				
	PINTURA VINILO	compra				
	02 GRAMA SINT MONOFIL.60MM-FIFAPRinc arena+caucho+ins	compra				
	03 GRAMA SINT MONOFIL.50MM-FIFAPRinc arena+caucho+ins	compra				
	CINTA	compra				
	04 Sardinel prefab.A-10 a=0.20 h=0.50L=0.8 Sin atraqu	compra				

INGENIERIA CMC S.A.S

REM_4140_INN: 04-17

CLIENTE: INNOVAPARQUES

FECHA: 25-04-25

CONTRATO: 4041-2024

CAMPO DESTINO: Parque industrial los ejidos

ITEM	DECRIPCION	CANTIDAD	UND	OBSERVACIONES
1	Malla Cerramiento	180	m^2	
2	Malla Cal 4	2	Jgo	
3	Malla Cal 8	1	Jgo	

OBSERVACIONES: _____

Entrega:

Recibe:

6.5. LUCES VILLARICA

CONSORCIO INNOVAPARQUES

"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". Lote 1/grupo 1 CAMPOS DEPORTIVOS, tiene el siguiente alcance: "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS"

Matriz de Adquisiciones

CONTRATISTA	CONSORCO IMNOVAPARQUES
CONTRATANTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE IDRD
ALCANCE DEL CONTRATO	"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". Lote 1/grupo 1 CAMPOS DEPORTIVOS, tiene el siguiente alcance: "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS"
NRO DEL	CONTRATO DE OBRA IDRD CTO / Proceso de Contratación IDRD-SG-LP-017-2024
PERIODO	DESDE EL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025
PARQUE	AFQUISICIONES VILLA RICA

Código EDT	Estructura de la EDT	Tipo de Adquisición	Fechas Estimadas		PROVEEDOR	SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL SEGUIMIENTO
			Inicio	Fin		
1	BASES Y RELLENOS		1/12/2024	31/01/2025		
	Grava Trituradas 1" -3/4	compra				
	Arena	compra				
2	MANTENIMIENTO CESPED NATURAL		7/06/2025	7/08/2025		
	Empradización (Cesped,sacapantas, M.O, Herrnta)	compra				
	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	compra				
	FERTILIZANTE ORGANICO TIPO HUMUS (aplicacion)	compra				
	FERTILIZANTE QUÍMICO GRANULADO, FOLIAR Y ORGÁNICO	compra				
3	DOTACION Y MANTENIMIENTOS		7/05/2025	7/08/2025		
	Estruc. minifutbol con malla (Sum+Inst)	compra				
	Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	compra			MALLAS NM	4140-002-05
	Mallas profesionales Cal.8 Futbol (Sumin e Instal)	compra			MALLAS NM	4140-002-05
	Banderines Estaca+banderin Futbol(Sum+Inst)	compra				
	MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	compra			MALLAS NM	4140-002-05
4	RED DE RIEGO MANUAL		7/03/2025	7/07/2025		
	Manguera Riego Manual d=3"(Sum+Inst.)	compra				
	Manguera Riego Manual d=2"(Sum+Inst.)	compra				
	Manguera Riego Manual d=11/2"(Sum+Inst.)	compra				
	Manguera Riego Manual d=1"(Sum+Inst.)	compra				
	Manguera Riego Manual d=3/4"(Sum+Inst.)	compra				
	Manguera Riego Manual d=1/2"(Sum+Inst.)	compra				
	REGISTRO DE CORTINA Ø3" (Sum + Inst)	compra				
	REGISTRO 2"(Cortina) NAPOLI	compra				
	REGISTRO 1"(Cortina) RED WHITE O SIMILAR	compra				
	REGISTRO CORTINA 1/2" (Incluye ACCS)	compra				
	Sumin e Instal Tripode Metalic.para Aspersor H=1.5	compra				
	Aspersor Metalico Bronce Ø=1"(Sum+Instal)"	compra				
	Aspersor Metálico Bronce Ø=3/4"(Sum+Instal)	compra				
	Aspersor Metálico Bronce Ø= 1/2"(Sum+Instal)	compra				
	CAJA INSPECCION(.60x.60x.60) ESPEC-IDRD	compra				
5	RED DE RIEGO AUTOMATICO		7/03/2025	7/07/2025		
	Tuberia PVCP 3 " RDE 21	compra				
	Tuberia PVC.P d=2"(RDE-21)	compra				
	Tuberia PVC.P d=1.1/2"	compra				
	Tuberia PVCP 1 " RDE 21 excav mec. relleno tie	compra				
	Aspersor Rotor Turbina (Sum+Instal)r=21m**	compra				
	Valvula Selenoide 2" (Sum+Inst)**	compra				
	Controlador Electrón.SistemaRiego Automat.(Sum+Ins	compra				
6	RED DRENAJES		7/01/2025	7/06/2025		
	01 Tuberia drenaje d=200mm Exca+ relleno Tierr+Geot.	compra				
	02 Tuberia drenaje d=160mm Exca+ relleno Tierr+Geot.	compra				
	03 Tuberia drenaje 4" d=100mm Exca+ relleno Tierr+Geot.	compra				
	04 Caja de inspeccion .80x.80 h=1.0**	compra				
	05 CAJA INSPECCION(.80x.80x.80) ESPEC-IDRD	compra				
	06 TUBERIA NOVAFORT D= 250MM	compra				
7	CAMPOS GRAMA SINTETICA		7/01/2025	7/06/2025		
	05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasiego)	compra				
	PEGANTE	compra				
	PINTURA VINILO	compra				
	02 GRAMA SINT MONOFIL.60MM-FIFAPRinc arena+caucho+ins	compra				
	03 GRAMA SINT MONOFIL.50MM-FIFAPRinc arena+caucho+ins	compra				
	CINTA	compra				
	04 Sardinel prefab.A-10 a=0.20 h=0.50L=0.8 Sin atraqu	compra				

INGENIERIA CMC S.A.S

REM_4140_INN: 002-05

CLIENTE: INNOVAPARQUES

FECHA: 05-05-25

CONTRATO: 4041-2024

CAMPO DESTINO Luces Villa Rica

ITEM	DECRIPCION	CANTIDAD	UND	OBSERVACIONES
1	Malla Cerramiento	284,69	m²	
2	Malla Cal 4	2	Jgo	
3	Malla Cal 8	1	Jgo	

OBSERVACIONES: _____

Entrega:

Recibe:

6.6. PORVENIR

CONSORCIO INNOVAPARQUES

"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD".
Lote 1/grupo 1 CAMPOS DEPORTIVOS, tiene el siguiente alcance: "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS"

Matriz de Adquisiciones

CONTRATISTA	CONSORCO IMNOVAPARQUES
CONTRATANTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE IDRD
ALCANCE DEL CONTRATO	"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". Lote 1/grupo 1 CAMPOS DEPORTIVOS, tiene el siguiente alcance: "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS"
NRO DEL	CONTRATO DE OBRA IDRD CTO / Proceso de Contratación IDRD-SG-LP-017-2024
PERIODO	DESDE EL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025
PARQUE	PORVENIR

Código EDT	Estructura de la EDT	Tipo de Adquisición	Fechas Estimadas		PROVEEDOR	SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL SEGUIMIENTO
			Inicio	Fin		
1	BASES Y RELLENOS		1/12/2024	31/01/2025		
	Grava Trituradas 1" -3/4	compra				
	Arena	compra				
2	MANTENIMIENTO CESPED NATURAL		7/06/2025	7/08/2025		
	Empradización (Cesped,sacapantas, M.O, Herrnta)	compra				
	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	compra				
	FERTILIZANTE ORGANICO TIPO HUMUS (aplicacion)	compra				
	FERTILIZANTE QUÍMICO GRANULADO, FOLIAR Y ORGANICO	compra				
3	DOTACION Y MANTENIMIENTOS		7/05/2025	7/08/2025		
	Estruc. minifutbol con malla (Sum+Inst)	compra				
	Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	compra			MALLAS NM	4140-04-16
	Mallas profesionales Cal.8 Futbol (Sumin e Instal)	compra				
	Banderines Estaca+banderin Futbol(Sum+Inst)	compra				
	MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	compra			MALLAS NM	4140-04-16
4	RED DE RIEGO MANUAL		7/03/2025	7/07/2025		
	Manguera Riego Manual d=3"(Sum+Inst.)	compra				
	Manguera Riego Manual d=2"(Sum+Inst.)	compra				
	Manguera Riego Manual d=1 1/2"(Sum+Inst.)	compra				
	Manguera Riego Manual d=1"(Sum+Inst.)	compra				
	Manguera Riego Manual d=3/4"(Sum+Inst.)	compra				
	Manguera Riego Manual d=1/2"(Sum+Inst.)	compra				
	REGISTRO DE CORTINA Ø3" (Sum + Inst)	compra				
	REGISTRO 2"(Cortina) NAPOLI	compra				
	REGISTRO 1"(Cortina) RED WHITE O SIMILAR	compra				
	REGISTRO CORTINA 1/2" (Incluye ACCS)	compra				
	Sumin e Instal Tripode Metalic.para Aspersor H=1.5	compra				
	Aspersor Metalico Bronce Ø=1"(Sum+Instal)"	compra				
	Aspersor Metálico Bronce Ø=3/4"(Sum+Instal)	compra				
	Aspersor Metálico Bronce Ø= 1/2"(Sum+Instal)	compra				
	CAJA INSPECCION(.60x.60x.60) ESPEC-IDRD	compra				
5	RED DE RIEGO AUTOMATICO		7/03/2025	7/07/2025		
	Tuberia PVCP 3 " RDE 21	compra				
	Tuberia PVC.P d=2"(RDE-21)	compra				
	Tuberia PVC.P d=1.1/2"	compra				
	Tuberia PVCP 1 " RDE 21 excav mec. relleno tie	compra				
	Aspersor Rotor Turbina (Sum+Instal)r=21m**	compra				
	Valvula Selenoide 2" (Sum+Inst)**	compra				
	Controlador Electrón.SistemaRiego Automat.(Sum+Ins	compra				
6	RED DRENAJES		7/01/2025	7/06/2025		
	01 Tuberia drenaje d=200mm Exca+ relleno Tierr+Geot.	compra				
	02 Tuberia drenaje d=160mm Exca+ relleno Tierr+Geot.	compra				
	03 Tuberia drenaje 4" d=100mm Exca+ relleno Tierr+Geot.	compra				
	04 Caja de inspeccion .80x.80 h=1.0**	compra				
	05 CAJA INSPECCION(.80x.80x.80) ESPEC-IDRD	compra				
	06 TUBERIA NOVAFORT D= 250MM	compra				
7	CAMPOS GRAMA SINTETICA		7/01/2025	7/06/2025		
	05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasiego)	compra				
	PEGANTE	compra				
	PINTURA VINILO	compra				
	02 GRAMA SINT MONOFIL.60MM-FIFAPRinc arena+caucho+ins	compra				
	03 GRAMA SINT MONOFIL.50MM-FIFAPRinc arena+caucho+ins	compra				
	CINTA	compra				
	04 Sardinel prefab.A-10 a=0.20 h=0.50L=0.8 Sin atraqu	compra				

INGENIERIA CMC S.A.S

REM_4140_INN: 04-16

CLIENTE: INNOVAPARQUES

FECHA: 24-04-25

CONTRATO: 4041-2024

CAMPO DESTINO Porvenir 1 - Porvenir Mini

ITEM	DECRIPCION	CANTIDAD	UND	OBSERVACIONES
1	Malla Cerramiento	219,60	m^2	Porvenir 1
2	Malla Cal 4	1	Lgo	Porvenir 1
3	Malla Cerramiento	61,60	m^2	Porvenir Mini
4	Malla Cal 4	2	Lgo	Porvenir Mini

OBSERVACIONES: _____

Entrega: _____

Recibe: _____

6.7. SANTA ISABEL

CONSORCIO INNOVAPARQUES

"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". Lote 1/grupo 1 CAMPOS DEPORTIVOS, tiene el siguiente alcance: "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS"

Matriz de Adquisiciones

CONTRATISTA	CONSORCO IMNOVAPARQUES
CONTRATANTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE IDRD
ALCANCE DEL CONTRATO	"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". Lote 1/grupo 1 CAMPOS DEPORTIVOS, tiene el siguiente alcance: "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS"
NRO DEL	CONTRATO DE OBRA IDRD CTO / Proceso de Contratación IDRD-SG-LP-017-2024
PERIODO	DESDE EL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025
PARQUE	SANTA ISABEL F8 F5

Código EDT	Estructura de la EDT	Tipo de Adquisición	Fechas Estimadas		PROVEEDOR	SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL SEGUIMIENTO
			Inicio	Fin		
1	BASES Y RELLENOS		1/12/2024	31/01/2025		
	Grava Trituradas 1" -3/4	compra				
	Arena	compra			BEPE	4140-04-19
2	MANTENIMIENTO CESPED NATURAL		7/06/2025	7/08/2025		
	Empradización (Cesped,sacapantas, M.O, Herrnta)	compra				
	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	compra				
	FERTILIZANTE ORGANICO TIPO HUMUS (aplicacion)	compra				
	FERTILIZANTE QUÍMICO GRANULADO, FOLIAR Y ORGANICO	compra				
3	DOTACION Y MANTENIMIENTOS		7/05/2025	7/08/2025		
	Estruc. minifutbol con malla (Sum+Inst)	compra				
	Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	compra			MALLAS NM	4140-04-20
	Mallas profesionales Cal.8 Futbol (Sumin e Instal)	compra			MALLAS NM	4140-04-20
	Banderines Estaca+banderin Futbol(Sum+Inst)	compra				
	MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	compra			MALLAS NM	4140-04-20
4	RED DE RIEGO MANUAL		7/03/2025	7/07/2025		
	Manguera Riego Manual d=3"(Sum+Inst.)	compra				
	Manguera Riego Manual d=2"(Sum+Inst.)	compra				
	Manguera Riego Manual d=11/2"(Sum+Inst.)	compra				
	Manguera Riego Manual d=1"(Sum+Inst.)	compra				
	Manguera Riego Manual d=3/4"(Sum+Inst.)	compra				
	Manguera Riego Manual d=1/2"(Sum+Inst.)	compra				
	REGISTRO DE CORTINA Ø3" (Sum + Inst)	compra				
	REGISTRO 2"(Cortina) NAPOLI	compra				
	REGISTRO 1"(Cortina) RED WHITE O SIMILAR	compra				
	REGISTRO CORTINA 1/2" (Incluye ACCS)	compra				
	Sumin e Instal Tripode Metalic.para Aspersor H=1.5	compra				
	Aspersor Metalico Bronce Ø=1"(Sum+Instal)"	compra				
	Aspersor Metálico Bronce Ø=3/4"(Sum+Instal)	compra				
	Aspersor Metálico Bronce Ø= 1/2"(Sum+Instal)	compra				
	CAJA INSPECCION(.60x.60x.60) ESPEC-IDRD	compra				
5	RED DE RIEGO AUTOMATICO		7/03/2025	7/07/2025		
	Tuberia PVCP 3 " RDE 21	compra				
	Tuberia PVC.P d=2"(RDE-21)	compra				
	Tuberia PVC.P d=1.1/2"	compra				
	Tuberia PVCP 1 " RDE 21 excav mec. relleno tie	compra				
	Aspersor Rotor Turbina (Sum+Instal)r=21m**	compra				
	Valvula Selenoide 2" (Sum+Inst)**	compra				
	Controlador Electrón.SistemaRiego Automat.(Sum+Ins	compra				
6	RED DRENAJES		7/01/2025	7/06/2025		
	01 Tuberia drenaje d=200mm Exca+ relleno Tierr+Geot.	compra				
	02 Tuberia drenaje d=160mm Exca+ relleno Tierr+Geot.	compra				
	03 Tuberia drenaje 4" d=100mm Exca+ relleno Tierr+Geot.	compra				
	04 Caja de inspeccion .80x.80 h=1.0**	compra				
	05 CAJA INSPECCION(.80x.80x.80) ESPEC-IDRD	compra				
	06 TUBERIA NOVAFORT D= 250MM	compra				
7	CAMPOS GRAMA SINTETICA		7/01/2025	7/06/2025		
	05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasiego)	compra			ECO TIRE GREEN SAS	4140-04-19
	PEGANTE	compra			SELLECO	4140-04-19
	PINTURA VINILO	compra				
	02 GRAMA SINT MONOFIL.60MM-FIFAPRinc arena+caucho+ins	compra			CUPERZ	4140-04-19
	03 GRAMA SINT MONOFIL.50MM-FIFAPRinc arena+caucho+ins	compra				
	CINTA	compra			MALLAS Y GRAMAS	4140-04-19
	04 Sardinel prefab.A-10 a=0.20 h=0.50L=0.8 Sin atraqu	compra				

INGENIERIA CMC S.A.S

REM_4140_INN: 04-20

CLIENTE: INNOVAPARQUES

FECHA: 29-04-25

CONTRATO: 4041-2024

CAMPO DESTINO Santa Isabel FB-FS

ITEM	DECRIPCION	CANTIDAD	UND	OBSERVACIONES
1.	Malla Cerramiento	398,75	m^2.	Campo FB
2	Malla Cal 4	2	Jgo	Campo FB
3	Malla Cal 8	1	Jgo	Campo FB
4	Malla Cerramiento	135.	m^2	Campo FS
5	Malla Cal 4.	1	Jgo.	Campo FS

OBSERVACIONES: _____

Entrega: _____

Recibe: _____

6.8. CHICALÁ

CONSORCIO INNOVAPARQUES

"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD".
Lote 1/grupo 1 CAMPOS DEPORTIVOS, tiene el siguiente alcance: "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS"

Matriz de Adquisiciones

CONTRATISTA	CONSORCO IMNOVAPARQUES
CONTRATANTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE IDRD
ALCANCE DEL CONTRATO	"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". Lote 1/grupo 1 CAMPOS DEPORTIVOS, tiene el siguiente alcance: "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS"
NRO DEL	CONTRATO DE OBRA IDRD CTO / Proceso de Contratación IDRD-SG-LP-017-2024
PERIODO	DESDE EL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025
PARQUE	URBANIZACIÓN CHICALA

Código EDT	Estructura de la EDT	Tipo de Adquisición	Fechas Estimadas		PROVEEDOR	SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL SEGUIMIENTO
			Inicio	Fin		
1	BASES Y RELLENOS		1/12/2024	31/01/2025		
	Grava Trituradas 1" -3/4	compra				
	Arena	compra			BEPE	4140-04-19
2	MANTENIMIENTO CESPED NATURAL		7/06/2025	7/08/2025		
	Empradización (Cesped,sacapantas, M.O, Herrnta)	compra				
	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	compra				
	FERTILIZANTE ORGANICO TIPO HUMUS (aplicacion)	compra				
	FERTILIZANTE QUÍMICO GRANULADO, FOLIAR Y ORGANICO	compra				
3	DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS		7/05/2025	7/08/2025		
	Estruc. minifutbol con malla (Sum+Inst)	compra				
	Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	compra				
	Mallas profesionales Cal.8 Futbol (Sumin e Instal)	compra				
	Banderines Estaca+banderin Futbol(Sum+Inst)	compra				
	MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	compra			MALLAS NM	4140-004-05
4	RED DE RIEGO MANUAL		7/03/2025	7/07/2025		
	Manguera Riego Manual d=3"(Sum+Inst.)	compra				
	Manguera Riego Manual d=2"(Sum+Inst.)	compra				
	Manguera Riego Manual d=11/2"(Sum+Inst.)	compra				
	Manguera Riego Manual d=1"(Sum+Inst.)	compra				
	Manguera Riego Manual d=3/4"(Sum+Inst.)	compra				
	Manguera Riego Manual d=1/2"(Sum+Inst.)	compra				
	REGISTRO DE CORTINA Ø3" (Sum + Inst)	compra				
	REGISTRO 2"(Cortina) NAPOLI	compra				
	REGISTRO 1"(Cortina) RED WHITE O SIMILAR	compra				
	REGISTRO CORTINA 1/2" (Incluye ACCS)	compra				
	Sumin e Instal Tripode Metalic.para Aspersor H=1.5	compra				
	Aspersor Metalico Bronce Ø=1"(Sum+Instal)"	compra				
	Aspersor Metálico Bronce Ø=3/4"(Sum+Instal)	compra				
	Aspersor Metálico Bronce Ø= 1/2"(Sum+Instal)	compra				
	CAJA INSPECCION(.60x.60x.60) ESPEC-IDRD	compra				
5	RED DE RIEGO AUTOMATICO		7/03/2025	7/07/2025		
	Tuberia PVCP 3 " RDE 21	compra				
	Tuberia PVC.P d=2"(RDE-21)	compra				
	Tuberia PVC.P d=1.1/2"	compra				
	Tuberia PVCP 1 " RDE 21 excav mec. relleno tie	compra				
	Aspersor Rotor Turbina (Sum+Instal)r=21m**	compra				
	Valvula Selenoide 2" (Sum+Inst)**	compra				
	Controlador Electrón.SistemaRiego Automat.(Sum+Ins	compra				
6	RED DRENAJES		7/01/2025	7/06/2025		
	01 Tuberia drenaje d=200mm Exca+ relleno Tierr+Geot.	compra				
	02 Tuberia drenaje d=160mm Exca+ relleno Tierr+Geot.	compra				
	03 Tuberia drenaje 4" d=100mm Exca+ relleno Tierr+Geot.	compra				
	04 Caja de inspeccion .80x.80 h=1.0**	compra				
	05 CAJA INSPECCION(.80x.80x.80) ESPEC-IDRD	compra				
	06 TUBERIA NOVAFORT D= 250MM	compra				
7	CAMPOS GRAMA SINTETICA		7/01/2025	7/06/2025		
	05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasiego)	compra			ECO TIRE GREEN SAS	4140-04-19
	PEGANTE	compra			SELLECO	4140-04-19
	PINTURA VINILO	compra				
	02 GRAMA SINT MONOFIL.60MM-FIFAPRinc arena+caucho+ins	compra			CUPERZ	4140-04-19
	03 GRAMA SINT MONOFIL.50MM-FIFAPRinc arena+caucho+ins	compra				
	CINTA	compra			MALLAS Y GRAMAS	4140-04-19
	04 Sardinel prefab.A-10 a=0.20 h=0.50L=0.8 Sin atraqu	compra				

INGENIERIA CMC S.A.S

REM_4140_INN: 04-19

CLIENTE: INNOVAPARQUES

FECHA: 29-04-25

CONTRATO: 4041-2024

CAMPO DESTINO Urb. Chicala

ITEM	DECRIPCION	CANTIDAD	UND	OBSERVACIONES
1	Grama manipiloma.	59,94	m^2	
2	Caucho SBR	1080	Kg	Reparaciones
3	Arena Silice	1080	Kg	Reparaciones
4	Cinta Uniones	62	mL	
5	Pegante Bicomp.	3	Caneca	
6	Caucho SBR	5000	Kg	Top Dressing

OBSERVACIONES: _____

Entrega:

Recibe:

INGENIERIA CMC S.A.S

REM_4140_INN: 004-05

CLIENTE: INNOVAPARQUES

FECHA: 09-05-25

CONTRATO: 4041-2024

CAMPO DESTINO Urb. Chicala

ITEM	DECRIPCION	CANTIDAD	UND	OBSERVACIONES
1	Malla Cerramiento	223.75	m^2	Perimetral

OBSERVACIONES: _____

Entrega:

Recibe:

6.9. VILLA MAYOR

CONSORCIO INNOVAPARQUES

"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". Lote 1/grupo 1 CAMPOS DEPORTIVOS, tiene el siguiente alcance: "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS"

Matriz de Adquisiciones

CONTRATISTA	CONSORCO IMNOVAPARQUES
CONTRATANTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE IDRD
ALCANCE DEL CONTRATO	"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". Lote 1/grupo 1 CAMPOS DEPORTIVOS, tiene el siguiente alcance: "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS"
NRO DEL	CONTRATO DE OBRA IDRD CTO / Proceso de Contratación IDRD-SG-LP-017-2024
PERIODO	DESDE EL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025
PARQUE	VILLAMAYOR

Código EDT	Estructura de la EDT	Tipo de Adquisición	Fechas Estimadas		PROVEEDOR	SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL SEGUIMIENTO
			Inicio	Fin		
1	BASES Y RELLENOS		1/12/2024	31/01/2025		
	Grava Trituradas 1" -3/4	compra				
	Arena	compra				
2	MANTENIMIENTO CESPED NATURAL		7/06/2025	7/08/2025		
	Empradización (Cesped,sacapantas, M.O, Herrnta)	compra				
	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	compra				
	FERTILIZANTE ORGANICO TIPO HUMUS (aplicacion)	compra				
	FERTILIZANTE QUÍMICO GRANULADO, FOLIAR Y ORGANICO	compra				
3	DOTACION Y MANTENIMIENTOS		7/05/2025	7/08/2025		
	Estruc. minifutbol con malla (Sum+Inst)	compra				
	Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	compra			MALLAS NM	4140-006-05
	Mallas profesionales Cal.8 Futbol (Sumin e Instal)	compra			MALLAS NM	4140-006-05
	Banderines Estaca+banderin Futbol(Sum+Inst)	compra				
	MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	compra			MALLAS NM	4140-006-05
4	RED DE RIEGO MANUAL		7/03/2025	7/07/2025		
	Manguera Riego Manual d=3"(Sum+Inst.)	compra				
	Manguera Riego Manual d=2"(Sum+Inst.)	compra				
	Manguera Riego Manual d=11/2"(Sum+Inst.)	compra				
	Manguera Riego Manual d=1"(Sum+Inst.)	compra				
	Manguera Riego Manual d=3/4"(Sum+Inst.)	compra				
	Manguera Riego Manual d=1/2"(Sum+Inst.)	compra				
	REGISTRO DE CORTINA Ø3" (Sum + Inst)	compra				
	REGISTRO 2"(Cortina) NAPOLI	compra				
	REGISTRO 1"(Cortina) RED WHITE O SIMILAR	compra				
	REGISTRO CORTINA 1/2" (Incluye ACCS)	compra				
	Sumin e Instal Tripode Metalic.para Aspersor H=1.5	compra				
	Aspersor Metalico Bronce Ø=1"(Sum+Instal)"	compra				
	Aspersor Metálico Bronce Ø=3/4"(Sum+Instal)	compra				
	Aspersor Metálico Bronce Ø= 1/2"(Sum+Instal)	compra				
	CAJA INSPECCION(.60x.60x.60) ESPEC-IDRD	compra				
5	RED DE RIEGO AUTOMATICO		7/03/2025	7/07/2025		
	Tuberia PVCP 3 " RDE 21	compra				
	Tuberia PVC.P d=2"(RDE-21)	compra				
	Tuberia PVC.P d=1.1/2"	compra				
	Tuberia PVCP 1 " RDE 21 excav mec. relleno tie	compra				
	Aspersor Rotor Turbina (Sum+Instal)r=21m**	compra				
	Valvula Selenoide 2" (Sum+Inst)**	compra				
	Controlador Electrón.SistemaRiego Automat.(Sum+Ins	compra				
6	RED DRENAJES		7/01/2025	7/06/2025		
	01 Tuberia drenaje d=200mm Exca+ relleno Tierr+Geot.	compra				
	02 Tuberia drenaje d=160mm Exca+ relleno Tierr+Geot.	compra				
	03 Tuberia drenaje 4" d=100mm Exca+ relleno Tierr+Geot.	compra				
	04 Caja de inspeccion .80x.80 h=1.0**	compra				
	05 CAJA INSPECCION(.80x.80x.80) ESPEC-IDRD	compra				
	06 TUBERIA NOVAFORT D= 250MM	compra				
7	CAMPOS GRAMA SINTETICA		7/01/2025	7/06/2025		
	05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasiego)	compra				
	PEGANTE	compra				
	PINTURA VINILO	compra				
	02 GRAMA SINT MONOFIL.60MM-FIFAPRinc arena+caucho+ins	compra				
	03 GRAMA SINT MONOFIL.50MM-FIFAPRinc arena+caucho+ins	compra				
	CINTA	compra				
	04 Sardinel prefab.A-10 a=0.20 h=0.50L=0.8 Sin atraqu	compra				

INGENIERIA CMC S.A.S

REM_4140_INN: 006-05

CLIENTE: INNOVAPARQUES

FECHA: 15-05-25

CONTRATO: 4041-2024

CAMPO DESTINO Villa Mayor

ITEM	DECRIPCION	CANTIDAD	UND	OBSERVACIONES
1	Malla Cerramiento	322,5	m2.	
2	Malla Cal 4	2	Jgo	
3	Malla Cal 8	1	Jgo.	

OBSERVACIONES: _____

Entrega:

Recibe:

6.10. CAMPOS NATURALES

CONSORCIO INNOVAPARQUES	"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". Lote 1/grupo 1 CAMPOS DEPORTIVOS, tiene el siguiente alcance: "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS"

Matriz de Adquisiciones

CONTRATISTA	CONSORCO IMNOVAPARQUES
CONTRATANTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE IDRD
ALCANCE DEL CONTRATO	"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". Lote 1/grupo 1 CAMPOS DEPORTIVOS, tiene el siguiente alcance: "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS"
NRO DEL	CONTRATO DE OBRA IDRD CTO / Proceso de Contratación IDRD-SG-LP-017-2024
PERIODO	DESDE EL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025
PARQUE	CAMPOS NATURALES

Código EDT	Estructura de la EDT	Tipo de Adquisición	Fechas Estimadas		PROVEEDOR	SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL SEGUIMIENTO
			Inicio	Fin		
1	BASES Y RELLENOS		1/12/2024	31/01/2025		
	Grava Trituradas 1" -3/4	compra				
	Arena	compra				
2	MANTENIMIENTO CESPED NATURAL		7/06/2025	7/08/2025		
	Empradización (Cesped,sacapantas, M.O, Herrnta)	compra				
	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	compra				
	FERTILIZANTE ORGANICO TIPO HUMUS (aplicacion)	compra				
	FERTILIZANTE QUÍMICO GRANULADO, FOLIAR Y ORGANICO	compra				
3	DOTACION Y MANTENIMIENTOS		7/05/2025	7/08/2025		
	Estruc. minifutbol con malla (Sum+Inst)	compra				
	Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	compra				
	Mallas profesionales Cal.8 Futbol (Sumin e Instal)	compra				
	Banderines Estaca+banderin Futbol(Sum+Inst)	compra				
	MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	compra				
4	RED DE RIEGO MANUAL		7/03/2025	7/07/2025		
	Manguera Riego Manual d=3"(Sum+Inst.)	compra				
	Manguera Riego Manual d=2"(Sum+Inst.)	compra				
	Manguera Riego Manual d=11/2"(Sum+Inst.)	compra				
	Manguera Riego Manual d=1"(Sum+Inst.)	compra				
	Manguera Riego Manual d=3/4"(Sum+Inst.)	compra				
	Manguera Riego Manual d=1/2"(Sum+Inst.)	compra				
	REGISTRO DE CORTINA Ø3" (Sum + Inst)	compra				
	REGISTRO 2"(Cortina) NAPOLI	compra				
	REGISTRO 1"(Cortina) RED WHITE O SIMILAR	compra				
	REGISTRO CORTINA 1/2" (Incluye ACCS)	compra				
	Sumin e Instal Tripode Metalic.para Aspersor H=1.5	compra				
	Aspersor Metalico Bronce Ø=1"(Sum+Instal)"	compra				
	Aspersor Metálico Bronce Ø=3/4"(Sum+Instal)	compra				
	Aspersor Metálico Bronce Ø= 1/2"(Sum+Instal)	compra				
	CAJA INSPECCION(.60x.60x.60) ESPEC-IDRD	compra				
5	RED DE RIEGO AUTOMATICO		7/03/2025	7/07/2025		
	Tuberia PVCP 3 " RDE 21	compra				
	Tuberia PVC.P d=2"(RDE-21)	compra				
	Tuberia PVC.P d=1.1/2"	compra				
	Tuberia PVCP 1 " RDE 21 excav mec. relleno tie	compra				
	Aspersor Rotor Turbina (Sum+Instal)r=21m**	compra				
	Valvula Selenoide 2" (Sum+Inst)**	compra				
	Controlador Electrón.SistemaRiego Automat.(Sum+Ins	compra				
6	RED DRENAJES		7/01/2025	7/06/2025		
	01 Tuberia drenaje d=200mm Exca+ relleno Tierr+Geot.	compra				
	02 Tuberia drenaje d=160mm Exca+ relleno Tierr+Geot.	compra				
	03 Tuberia drenaje 4" d=100mm Exca+ relleno Tierr+Geot.	compra				
	04 Caja de inspeccion .80x.80 h=1.0**	compra				
	05 CAJA INSPECCION(.80x.80x.80) ESPEC-IDRD	compra				
	06 TUBERIA NOVAFORT D= 250MM	compra				
7	CAMPOS GRAMA SINTETICA		7/01/2025	7/06/2025		
	05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasiego)	compra				
	PEGANTE	compra				
	PINTURA VINILO	compra			TITO PABON	4140-001-05
	02 GRAMA SINT MONOFIL.60MM-FIFAPRinc arena+caucho+ins	compra				
	03 GRAMA SINT MONOFIL.50MM-FIFAPRinc arena+caucho+ins	compra				
	CINTA	compra				
	04 Sardinel prefab.A-10 a=0.20 h=0.50L=0.8 Sin atraqu	compra				

INGENIERIA CMC S.A.S

REM_4140_INN: 001-05

CLIENTE: INNOVAPARQUES
CONTRATO: 4041-2024
CAMPO DESTINO Campos Naturales

FECHA: 22-05-25

ITEM	DECRIPCION	CANTIDAD	UND	OBSERVACIONES
1	Vinilo Tipo 2	75	Cancha	Demarcacion.

OBSERVACIONES: Demarcacion Campos Naturales segun cronograma del mes de Mayo 2025

Entrega:

Recibe:

7. ANEXO F
CERTIFICADOS DE CALIDAD

7.1. ALFONSO LOPEZ

Revisado 12/2024

CERTIFICADO DE CALIDAD No. CGQ-0345

CINTA DE UNIÓN CÉSPED ARTIFICIAL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

Nombre:	Cinta de unión de césped artificial
Marca:	MG
Componentes:	Polipropileno
Concentración:	100 %
Color:	Blanco
Código de barras:	7709599238155

PRUEBAS Y ENSAYOS

ÍTEM	PARÁMETRO	MEDICIÓN	EVALUACIÓN			
ELONGACIÓN	< 12 µm/m	10 µm/m	OPTIMO	X	RECHAZADO	
COLOR BLANCO	BLANCO	N/A	OPTIMO	X	RECHAZADO	
TORSIÓN	Min 10 N/m	12,4 N/m	OPTIMO	X	RECHAZADO	
PERMEABILIDAD	>3.6e+7 mm/hr	4,8 e+7 mm/hr	OPTIMO	X	RECHAZADO	

El producto CINTA DE UNIÓN CÉSPED ARTIFICIAL Marca MG se le han realizado pruebas físicas en espacios designados por la compañía, dando como resultado Buena resistencia: al rasgado, a la tensión, a la humedad, al lodo, altas temperaturas, por lo cual damos constancia de ser un producto confiable para ser utilizado en la unión interna de tapetes de césped artificial.

Expedido el 02 de diciembre de 2024.

Héctor Hernán Naranjo Noreña
Gerente


Mallas y Gramas / Teléfonos: (6)8899130 - 3175670640 - 3138706125/ Correo: mallasygramasmzls@gmail.com – mallasygramasusa@gmail.com / Dirección: Manizales: Sede Campestre la Uribe, Kilometro 2, Vía Panamericana – Bogotá: Carrera 58 # 119 A 49

Revisado 11/2024

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CINTA DE UNIÓN CESPED ARTIFICIAL

1. **FOTOS DEL PRODUCTO**






2. **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO**

Nombre:	Cinta de unión de césped artificial
Marca:	MG
Componentes:	Polipropileno
Concentración:	100 %
Color:	Blanco
Código de barras:	7709599238155

3. **CARACTERÍSTICAS**

- **Cinta de Polipropileno (PP):** Alta capacidad de adhesión, diseñada para mantener el volumen del adhesivo aplicado y evitar filtraciones, lo que mejora el rendimiento en las uniones de alfombra artificial.
- **Tela No Tejida:** Material resistente al agua, al moho y a la humedad. Soporta temperaturas de hasta 130°C, y tiene una alta resistencia a condiciones climáticas extremas, incluyendo lluvias intensas y calor excesivo.
- **Propiedades Físicas:** La cinta presenta una elongación moderada tanto en dirección longitudinal como transversal. Es permeable al vapor, no tóxica, de secado rápido, duradera y reciclable.
- **Instrucciones de Almacenaje:** Se recomienda almacenar en lugares cubiertos, en un rango de temperatura entre **–20°C y 130°C**, para mantener sus propiedades intactas.

4. INSTRUCCIONES DE USO

- **Preparación:** Una vez alineadas y conectadas las juntas de los tapetes de césped artificial, ábralos para instalar la cinta de unión en la base de la cancha.
- **Aplicación del Adhesivo:** Vierta el adhesivo sobre la cinta de unión y, utilizando una llana o espátula dentada, esparza de manera uniforme.
- **Cierre de Juntas:** Cierre las juntas y presione firmemente durante unos minutos para asegurar una correcta unión.
- **Uso Recomendado:** Esta cinta de unión está diseñada para la unión interna de tapetes de césped artificial en aplicaciones como canchas sintéticas, parques recreativos, campos deportivos, terrazas y jardines.

5. DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Ancha: 15 /30 cm
Larga: 50 /100 metros

6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Propiedades	Unidade	Valore
Densidad	g/m^2	150
Resistencia a la tensión longitudinal	N	228.6
Resistencia a la tensión transversal	N	162.3
Elongación de ruptura longitudinal	%	126.4
Elongación de ruptura transversal	%	137.3

neoflex
ADHESIVES coim

AENOR ER Empresa Registrada ER - 1085/2/00

CERTIFIED IQNet QUALITY SYSTEM

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Product: ADIFLEX 2964 B

Charge: 95105

Brookfield viscosity (25°C , 30 r.p.m., Sp.2) :..... 228 mPa.s

Limits: 160-240

SIGNATURE: María Murcia Caracena

The information on this sheet is provided for information only and does not exempt the recipient from the need for the mandatory examination / verification for acceptance on delivery.

556

neoflex
ADHESIVES coim

AENOR ER Empresa Registrada ER - 1085/2/00

CERTIFIED IQNet QUALITY SYSTEM

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Product: ADIFLEX 2964 B

Charge: 97336

Order number: 317

Brookfield viscosity (25°C , 30 r.p.m., Sp.2) :..... 232 mPa.s

Limits: 160-240

SIGNATURE: María Murcia Caracena

The information on this sheet is provided for information only and does not exempt the recipient from the need for the mandatory examination / verification for acceptance on delivery.

557

NEOPUR 2964

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

Adhesivo de poliuretano de dos componentes libre de disolventes.

APLICACIÓN


Neopur 2964 se ha de mezclar con Adiflex 2964B.

Este adhesivo se usa para el pegado de parquet, pavimentos de goma, césped artificial y recubrimientos de PVC en exteriores.

Se presenta envasado en forma de kit con las cantidades preparadas para su mezcla.

Sistema de aplicación	Espátula dentada.
Consumo	200-600 g/m^2 (en función de los materiales)
Sistema de limpieza	Disolvente A





PROCESO APLICACIÓN

Las superficies a pegar deben estar secas, libres de polvo, suciedad u otros materiales extraños. Un lijado superficial es recomendable en muchas aplicaciones.

Neopur 2964 se ha de mezclar a fondo con Adiflex 2964B, para cantidades grandes se recomienda un agitador mecánico. Una vez mezclado, la viscosidad aumenta, consiguiéndose una pasta ideal para aplicación con espátula dentada.

Aplicar la mezcla sobre las superficies a pegar con una espátula dentada. Durante el wet life, superponer las superficies a unir y mantenerlas en contacto.

El tiempo de fraguado disminuye con la temperatura aplicada en la película de adhesivo. En caso de materiales gruesos y aislantes del calor, se requiere un tiempo extra para que el calor penetre en la junta adhesiva. No es recomendable endurecer por encima de 60ºC materiales con grandes diferencias en los coeficientes de dilatación térmica.

Neopur 2964 endurece muy bien incluso a bajas temperaturas, aunque el tiempo de fraguado aumenta considerablemente.

La temperatura mínima para el reticulado es de 5°C. Por debajo de esta temperatura, la mezcla difícilmente reticula.

Los residuos de adhesivo, herramientas y maquinaria deben ser limpiados, antes de que el adhesivo endurezca, con Disolvente A.

Los usuarios deben realizar sus propios test para determinar la adecuación de nuestros productos a sus necesidades concretas. Consulte con nuestro servicio técnico para mayor información al respecto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto (Dos opciones)	Pasta de color verde Pasta de color beige
Viscosidad[1]	400.000 ± 100.000 mPa·s /20°C
Viscosidad mezcla[1]	115.000 ± 35.000 mPa·s /20°C
Densidad	1.70 g/mL (25°C)
Densidad mezcla	1.65 g/mL (25°C)
Endurecedor	Adiflex 2964B
Proporción mezcla Neopur 2964 : Adiflex 2964B	En peso 100 : 9,5
Pot life[2]	40min
Wet life[2]	70min
Tiempo fraguado	Aprox. 24h (25°C; 50% hr)
Tiempo de endurecimiento	Aprox. 5-8h a 20-22°C

- **No inflamable.**
- **Sin disolventes.**

[1] Los valores de viscosidad se controlan en el momento de la producción, pequeñas variaciones son posibles.
[2] 25°C; 50% hr. Método interno.

ALMACENAMIENTO

Debe almacenarse en recipientes originales herméticamente cerrados a temperaturas de 15-30°C.

El tiempo máximo de almacenamiento en las condiciones anteriormente descritas es de 12 meses.

SEGURIDAD

Seguir las instrucciones que contiene la **Ficha de Seguridad** de este producto, adoptando las medidas necesarias para su uso.

INFORMACIÓN ADICIONAL

La información que contiene esta hoja técnica está basada en nuestro conocimiento de los productos, mediante ensayos realizados en nuestro laboratorio. No deben tomarse como garantía para el aplicador sino como referencias orientativas y con valor informativo.

Cada aplicador debe realizar sus correspondientes test para comprobar la idoneidad del producto en las condiciones y proceso usado en cada caso particular.

La aplicación, uso y procesamiento de nuestros productos están fuera de nuestro control y por tanto quedan bajo la responsabilidad del instalador.

neoflex
ADHESIVES coim

AENOR ER Empresa Registrada ER - 1085/2/00

CERTIFIED IQNet QUALITY SYSTEM

HOJA DE ANÁLISIS

Producto: **NEOPUR 2964 VERDE**

N.º de Lote: 97001

RESULTADO DEL ANÁLISIS

Viscosidad de mezcla (100 gr NEOPUR 2964 Verde + 9,5 gr COMPONENTE B)

(Brookfield, 20º C, 6 r.p.m, Sp, 6):.....111.500 c.p.s.

Límites: 80.000-150.000 c.p.s

FIRMA: María Murcia Caracena

Los datos de esta hoja se facilitan únicamente a título informativo y no eximen al receptor de la necesidad del preceptivo examen/comprobación para su aceptación a la entrega.

559

7.2. AMERICAS OCCIDENTAL

TRENZACOL®
¡Productos por Siempre!

CERTIFICADO TÉCNICO DE CALIDAD 1224-032

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO		
PRODUCTO Nylon # 2	**CALIBRE** 2 mm	**PRESENTACIÓN** 500 m / Rollo
MATERIAL Nylon	**REFERENCIA** 49687	**FECHA** Diciembre de 2024
CLIENTE Consorcio Innova parques	**CANTIDAD** 100 Rollos	**LOTE DE TEJIDO** 6536755-1224

ÍTEM	PARÁMETRO	MEDICIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE
Diámetro	2 mm (+/- 0,5 mm)	2,2 mm	OK	-
Gramos por metro. Aprox.	12 (g/m) (+/-2.5%)	11,9 g/m	OK	-
Masa De La Funda	32,5 % (+/- 2.5%)	32,1%	OK	-
Masa Del Alma	67.5 % (+/- 2.5%)	67,9%	OK	-
Materiales que la Constituyen	Nylon	N/A	OK	-

RAUL ANIBAL ARANGO ARBELAEZ
LIDER SGC

KM 37 Autopista Medellín Bogotá, Parque Empresarial
Fabricato, Bodega 2A Rionegro, Antioquia - Colombia
PBX: (574) + 444 3000 | 310 835 92 00
www.trenzacol.com

TRENZACOL®
¡Productos por Siempre!

FICHA TECNICA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO		
PRODUCTO Nylon #2	**CALIBRE** 2 mm	**PRESENTACIÓN** 500 m
MATERIAL Nylon	**REFERENCIA** 49687	**FECHA** Diciembre de 2024

ITEM	DESCRIPCIÓN
Diámetro	2 mm (+/- 0.5 mm)
Gramos por metro. Aprox.	12 (g/m) +/-2.5%
Masa De La Funda	32.5 %
Masa Del Alma	67.5 %
Materiales que la Constituyen	Nylon

RAUL ANIBAL ARANGO ARBELAEZ
LIDER SGC

KM 37 Autopista Medellín Bogotá, Parque Empresarial
Fabricato, Bodega 2A Rionegro, Antioquia - Colombia
PBX: (574) + 444 3000 | 310 835 92 00
www.trenzacol.com

562

TRENZACOL®
¡Productos por Siempre!

CERTIFICADO TÉCNICO DE CALIDAD 1224-023

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO		
PRODUCTO Nylon # 4	**CALIBRE** 4 mm	**PRESENTACIÓN** 500 m / Rollo
MATERIAL Nylon	**REFERENCIA** 63064	**FECHA** Diciembre de 2024
CLIENTE Consorcio Innova parques	**CANTIDAD** 50 Rollos	**LOTE DE TEJIDO** 1199612-1124

ÍTEM	PARÁMETRO	MEDICIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE
Diámetro	4 mm (+/- 0,5 mm)	4,1 mm	OK	-
Gramos por metro. Aprox.	24 (g/m) (+/-2.5%)	23,7 g/m	OK	-
Masa De La Funda	32,5 % (+/- 2.5%)	32,2%	OK	-
Masa Del Alma	67.5 % (+/- 2.5%)	67,8%	OK	-
Materiales que la Constituyen	Nylon	N/A	OK	-

RAUL ANIBAL ARANGO ARBELAEZ
LIDER SGC

KM 37 Autopista Medellín Bogotá, Parque Empresarial
Fabricato, Bodega 2A Rionegro, Antioquia - Colombia
PBX: (574) + 444 3000 | 310 835 92 00
www.trenzacol.com

TRENZACOL®
¡Productos por Siempre!

FICHA TECNICA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO		
PRODUCTO Nylon #4	**CALIBRE** 4 mm	**PRESENTACIÓN** 500 m
MATERIAL Nylon	**REFERENCIA** 63064	**FECHA** Diciembre de 2024

ITEM	DESCRIPCIÓN
Diámetro	4 mm (+/- 0.5 mm)
Gramos por metro. Aprox.	24 (g/m) +/-2.5%
Masa De La Funda	32.5 %
Masa Del Alma	67.5 %
Materiales que la Constituyen	Nylon

RAUL ANIBAL ARANGO ARBELAEZ
LIDER SGC

KM 37 Autopista Medellín Bogotá, Parque Empresarial
Fabricato, Bodega 2A Rionegro, Antioquia - Colombia
PBX: (574) + 444 3000 | 310 835 92 00
www.trenzacol.com

TRENZACOL®
¡Productos por Siempre!

CERTIFICADO TÉCNICO DE CALIDAD 1224-017

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO		
PRODUCTO Nylon # 8	**CALIBRE** 8 mm	**PRESENTACIÓN** 500 m / Rollo
MATERIAL Nylon	**REFERENCIA** 52622	**FECHA** Diciembre de 2024
CLIENTE Consorcio Innova parques	**CANTIDAD** 40 Rollos	**LOTE DE TEJIDO** 4126985-1224

ÍTEM	PARÁMETRO	MEDICIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE
Diámetro	8 mm (+/- 0,5 mm)	8,2 mm	OK	-
Gramos por metro. Aprox.	42 (g/m) (+/-2.5%)	41,7 g/m	OK	-
Masa De La Funda	32,5 % (+/- 2.5%)	31,8%	OK	-
Masa Del Alma	67.5 % (+/- 2.5%)	68,2%	OK	-
Materiales que la Constituyen	Nylon	N/A	OK	-

RAUL ANIBAL ARANGO ARBELAEZ
LIDER SGC

KM 37 Autopista Medellín Bogotá, Parque Empresarial
Fabricato, Bodega 2A Rionegro, Antioquia - Colombia
PBX: (574) + 444 3000 | 310 835 92 00
www.trenzacol.com

TRENZACOL®
¡Productos por Siempre!

FICHA TECNICA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO		
PRODUCTO Nylon #8	**CALIBRE** 8 mm	**PRESENTACIÓN** 500 m
MATERIAL Nylon	**REFERENCIA** 52622	**FECHA** Diciembre de 2024

ITEM	DESCRIPCIÓN
Diámetro	8 mm (+/- 0.5 mm)
Gramos por metro. Aprox.	42 (g/m) +/-2.5%
Masa De La Funda	32.5 %
Masa Del Alma	67.5 %
Materiales que la Constituyen	Nylon

RAUL ANIBAL ARANGO ARBELAEZ
LIDER SGC

KM 37 Autopista Medellín Bogotá, Parque Empresarial
Fabricato, Bodega 2A Rionegro, Antioquia - Colombia
PBX: (574) + 444 3000 | 310 835 92 00
www.trenzacol.com

7.3. EL RECREO

TRENZACOL®
¡Productos por Siempre!

CERTIFICADO TÉCNICO DE CALIDAD 1224-032

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO		
PRODUCTO Nylon # 2	**CALIBRE** 2 mm	**PRESENTACIÓN** 500 m / Rollo
MATERIAL Nylon	**REFERENCIA** 49687	**FECHA** Diciembre de 2024
CLIENTE Consorcio Innova parques	**CANTIDAD** 100 Rollos	**LOTE DE TEJIDO** 6536755-1224

ÍTEM	PARÁMETRO	MEDICIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE
Diámetro	2 mm (+/- 0,5 mm)	2,2 mm	OK	-
Gramos por metro. Aprox.	12 (g/m) (+/-2.5%)	11,9 g/m	OK	-
Masa De La Funda	32,5 % (+/- 2.5%)	32,1%	OK	-
Masa Del Alma	67.5 % (+/- 2.5%)	67,9%	OK	-
Materiales que la Constituyen	Nylon	N/A	OK	-

RAUL ANIBAL ARANGO ARBELAEZ
LIDER SGC

KM 37 Autopista Medellín Bogotá, Parque Empresarial
Fabricato, Bodega 2A Rionegro, Antioquia - Colombia
PBX: (574) + 444 3000 | 310 835 92 00
www.trenzacol.com

TRENZACOL®
¡Productos por Siempre!

FICHA TECNICA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO		
PRODUCTO Nylon #2	**CALIBRE** 2 mm	**PRESENTACIÓN** 500 m
MATERIAL Nylon	**REFERENCIA** 49687	**FECHA** Diciembre de 2024

ITEM	DESCRIPCIÓN
Diámetro	2 mm (+/- 0.5 mm)
Gramos por metro. Aprox.	12 (g/m) +/-2.5%
Masa De La Funda	32.5 %
Masa Del Alma	67.5 %
Materiales que la Constituyen	Nylon

RAUL ANIBAL ARANGO ARBELAEZ
LIDER SGC

KM 37 Autopista Medellín Bogotá, Parque Empresarial
Fabricato, Bodega 2A Rionegro, Antioquia - Colombia
PBX: (574) + 444 3000 | 310 835 92 00
www.trenzacol.com

TRENZACOL®
¡Productos por Siempre!

CERTIFICADO TÉCNICO DE CALIDAD 1224-023

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO		
PRODUCTO Nylon # 4	**CALIBRE** 4 mm	**PRESENTACIÓN** 500 m / Rollo
MATERIAL Nylon	**REFERENCIA** 63064	**FECHA** Diciembre de 2024
CLIENTE Consorcio Innova parques	**CANTIDAD** 50 Rollos	**LOTE DE TEJIDO** 1199612-1124

ÍTEM	PARÁMETRO	MEDICIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE
Diámetro	4 mm (+/- 0,5 mm)	4,1 mm	OK	-
Gramos por metro. Aprox.	24 (g/m) (+/-2.5%)	23,7 g/m	OK	-
Masa De La Funda	32,5 % (+/- 2.5%)	32,2%	OK	-
Masa Del Alma	67.5 % (+/- 2.5%)	67,8%	OK	-
Materiales que la Constituyen	Nylon	N/A	OK	-

RAUL ANIBAL ARANGO ARBELAEZ
LIDER SGC

KM 37 Autopista Medellín Bogotá, Parque Empresarial
Fabricato, Bodega 2A Rionegro, Antioquia - Colombia
PBX: (574) + 444 3000 | 310 835 92 00
www.trenzacol.com

570

TRENZACOL®
¡Productos por Siempre!

FICHA TECNICA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO		
PRODUCTO Nylon #4	**CALIBRE** 4 mm	**PRESENTACIÓN** 500 m
MATERIAL Nylon	**REFERENCIA** 63064	**FECHA** Diciembre de 2024

ITEM	DESCRIPCIÓN
Diámetro	4 mm (+/- 0.5 mm)
Gramos por metro. Aprox.	24 (g/m) +/-2.5%
Masa De La Funda	32.5 %
Masa Del Alma	67.5 %
Materiales que la Constituyen	Nylon

RAUL ANIBAL ARANGO ARBELAEZ
LIDER SGC

KM 37 Autopista Medellín Bogotá, Parque Empresarial
Fabricato, Bodega 2A Rionegro, Antioquia - Colombia
PBX: (574) + 444 3000 | 310 835 92 00
www.trenzacol.com

571

TRENZACOL®
¡Productos por Siempre!

CERTIFICADO TÉCNICO DE CALIDAD 1224-017

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO		
PRODUCTO Nylon # 8	**CALIBRE** 8 mm	**PRESENTACIÓN** 500 m / Rollo
MATERIAL Nylon	**REFERENCIA** 52622	**FECHA** Diciembre de 2024
CLIENTE Consorcio Innova parques	**CANTIDAD** 40 Rollos	**LOTE DE TEJIDO** 4126985-1224

ÍTEM	PARÁMETRO	MEDICIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE
Diámetro	8 mm (+/- 0,5 mm)	8,2 mm	OK	-
Gramos por metro. Aprox.	42 (g/m) (+/-2.5%)	41,7 g/m	OK	-
Masa De La Funda	32,5 % (+/- 2.5%)	31,8%	OK	-
Masa Del Alma	67.5 % (+/- 2.5%)	68,2%	OK	-
Materiales que la Constituyen	Nylon	N/A	OK	-

RAUL ANIBAL ARANGO ARBELAEZ
LIDER SGC

KM 37 Autopista Medellín Bogotá, Parque Empresarial
Fabricato, Bodega 2A Rionegro, Antioquia - Colombia
PBX: (574) + 444 3000 | 310 835 92 00
www.trenzacol.com

592

TRENZACOL®
¡Productos por Siempre!

FICHA TECNICA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO		
PRODUCTO Nylon #8	**CALIBRE** 8 mm	**PRESENTACIÓN** 500 m
MATERIAL Nylon	**REFERENCIA** 52622	**FECHA** Diciembre de 2024

ITEM	DESCRIPCIÓN
Diámetro	8 mm (+/- 0.5 mm)
Gramos por metro. Aprox.	42 (g/m) +/-2.5%
Masa De La Funda	32.5 %
Masa Del Alma	67.5 %
Materiales que la Constituyen	Nylon

RAUL ANIBAL ARANGO ARBELAEZ
LIDER SGC

KM 37 Autopista Medellín Bogotá, Parque Empresarial
Fabricato, Bodega 2A Rionegro, Antioquia - Colombia
PBX: (574) + 444 3000 | 310 835 92 00
www.trenzacol.com

573

7.4. LOS EJIDOS

TRENZACOL®
¡Productos por Siempre!

CERTIFICADO TÉCNICO DE CALIDAD 1224-032

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO		
PRODUCTO Nylon # 2	**CALIBRE** 2 mm	**PRESENTACIÓN** 500 m / Rollo
MATERIAL Nylon	**REFERENCIA** 49687	**FECHA** Diciembre de 2024
CLIENTE Consorcio Innova parques	**CANTIDAD** 100 Rollos	**LOTE DE TEJIDO** 6536755-1224

ÍTEM	PARÁMETRO	MEDICIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE
Diámetro	2 mm (+/- 0,5 mm)	2,2 mm	OK	-
Gramos por metro. Aprox.	12 (g/m) (+/-2.5%)	11,9 g/m	OK	-
Masa De La Funda	32,5 % (+/- 2.5%)	32,1%	OK	-
Masa Del Alma	67.5 % (+/- 2.5%)	67,9%	OK	-
Materiales que la Constituyen	Nylon	N/A	OK	-

RAUL ANIBAL ARANGO ARBELAEZ
LIDER SGC

KM 37 Autopista Medellín Bogotá, Parque Empresarial
Fabricato, Bodega 2A Rionegro, Antioquia - Colombia
PBX: (574) + 444 3000 | 310 835 92 00
www.trenzacol.com

595

TRENZACOL®
¡Productos por Siempre!

FICHA TECNICA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO		
PRODUCTO Nylon #2	**CALIBRE** 2 mm	**PRESENTACIÓN** 500 m
MATERIAL Nylon	**REFERENCIA** 49687	**FECHA** Diciembre de 2024

ITEM	DESCRIPCIÓN
Diámetro	2 mm (+/- 0.5 mm)
Gramos por metro. Aprox.	12 (g/m) +/-2.5%
Masa De La Funda	32.5 %
Masa Del Alma	67.5 %
Materiales que la Constituyen	Nylon

RAUL ANIBAL ARANGO ARBELAEZ
LIDER SGC

KM 37 Autopista Medellín Bogotá, Parque Empresarial
Fabricato, Bodega 2A Rionegro, Antioquia - Colombia
PBX: (574) + 444 3000 | 310 835 92 00
www.trenzacol.com

TRENZACOL®
¡Productos por Siempre!

CERTIFICADO TÉCNICO DE CALIDAD 1224-023

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO		
PRODUCTO Nylon # 4	**CALIBRE** 4 mm	**PRESENTACIÓN** 500 m / Rollo
MATERIAL Nylon	**REFERENCIA** 63064	**FECHA** Diciembre de 2024
CLIENTE Consorcio Innova parques	**CANTIDAD** 50 Rollos	**LOTE DE TEJIDO** 1199612-1124

ÍTEM	PARÁMETRO	MEDICIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE
Diámetro	4 mm (+/- 0,5 mm)	4,1 mm	OK	-
Gramos por metro. Aprox.	24 (g/m) (+/-2.5%)	23,7 g/m	OK	-
Masa De La Funda	32,5 % (+/- 2.5%)	32,2%	OK	-
Masa Del Alma	67.5 % (+/- 2.5%)	67,8%	OK	-
Materiales que la Constituyen	Nylon	N/A	OK	-

RAUL ANIBAL ARANGO ARBELAEZ
LIDER SGC

KM 37 Autopista Medellín Bogotá, Parque Empresarial
Fabricato, Bodega 2A Rionegro, Antioquia - Colombia
PBX: (574) + 444 3000 | 310 835 92 00
www.trenzacol.com

TRENZACOL®
¡Productos por Siempre!

FICHA TECNICA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO		
PRODUCTO Nylon #4	**CALIBRE** 4 mm	**PRESENTACIÓN** 500 m
MATERIAL Nylon	**REFERENCIA** 63064	**FECHA** Diciembre de 2024

ITEM	DESCRIPCIÓN
Diámetro	4 mm (+/- 0.5 mm)
Gramos por metro. Aprox.	24 (g/m) +/-2.5%
Masa De La Funda	32.5 %
Masa Del Alma	67.5 %
Materiales que la Constituyen	Nylon

RAUL ANIBAL ARANGO ARBELAEZ
LIDER SGC

KM 37 Autopista Medellín Bogotá, Parque Empresarial
Fabricato, Bodega 2A Rionegro, Antioquia - Colombia
PBX: (574) + 444 3000 | 310 835 92 00
www.trenzacol.com

578

TRENZACOL®
¡Productos por Siempre!

CERTIFICADO TÉCNICO DE CALIDAD 1224-017

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO		
PRODUCTO Nylon # 8	**CALIBRE** 8 mm	**PRESENTACIÓN** 500 m / Rollo
MATERIAL Nylon	**REFERENCIA** 52622	**FECHA** Diciembre de 2024
CLIENTE Consorcio Innova parques	**CANTIDAD** 40 Rollos	**LOTE DE TEJIDO** 4126985-1224

ÍTEM	PARÁMETRO	MEDICIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE
Diámetro	8 mm (+/- 0,5 mm)	8,2 mm	OK	-
Gramos por metro. Aprox.	42 (g/m) (+/-2.5%)	41,7 g/m	OK	-
Masa De La Funda	32,5 % (+/- 2.5%)	31,8%	OK	-
Masa Del Alma	67.5 % (+/- 2.5%)	68,2%	OK	-
Materiales que la Constituyen	Nylon	N/A	OK	-

RAUL ANIBAL ARANGO ARBELAEZ
LIDER SGC

KM 37 Autopista Medellín Bogotá, Parque Empresarial
Fabricato, Bodega 2A Rionegro, Antioquia - Colombia
PBX: (574) + 444 3000 | 310 835 92 00
www.trenzacol.com

TRENZACOL®
¡Productos por Siempre!

FICHA TECNICA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO		
PRODUCTO Nylon #8	**CALIBRE** 8 mm	**PRESENTACIÓN** 500 m
MATERIAL Nylon	**REFERENCIA** 52622	**FECHA** Diciembre de 2024

ITEM	DESCRIPCIÓN
Diámetro	8 mm (+/- 0.5 mm)
Gramos por metro. Aprox.	42 (g/m) +/-2.5%
Masa De La Funda	32.5 %
Masa Del Alma	67.5 %
Materiales que la Constituyen	Nylon

RAUL ANIBAL ARANGO ARBELAEZ
LIDER SGC

KM 37 Autopista Medellín Bogotá, Parque Empresarial
Fabricato, Bodega 2A Rionegro, Antioquia - Colombia
PBX: (574) + 444 3000 | 310 835 92 00
www.trenzacol.com

580

7.5. LUCES VILLARICA

TRENZACOL®
¡Productos por Siempre!

CERTIFICADO TÉCNICO DE CALIDAD 1224-032

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO		
PRODUCTO Nylon # 2	**CALIBRE** 2 mm	**PRESENTACIÓN** 500 m / Rollo
MATERIAL Nylon	**REFERENCIA** 49687	**FECHA** Diciembre de 2024
CLIENTE Consorcio Innova parques	**CANTIDAD** 100 Rollos	**LOTE DE TEJIDO** 6536755-1224

ÍTEM	PARÁMETRO	MEDICIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE
Diámetro	2 mm (+/- 0,5 mm)	2,2 mm	OK	-
Gramos por metro. Aprox.	12 (g/m) (+/-2.5%)	11,9 g/m	OK	-
Masa De La Funda	32,5 % (+/- 2.5%)	32,1%	OK	-
Masa Del Alma	67.5 % (+/- 2.5%)	67,9%	OK	-
Materiales que la Constituyen	Nylon	N/A	OK	-

RAUL ANIBAL ARANGO ARBELAEZ
LIDER SGC

KM 37 Autopista Medellín Bogotá, Parque Empresarial
Fabricato, Bodega 2A Rionegro, Antioquia - Colombia
PBX: (574) + 444 3000 | 310 835 92 00
www.trenzacol.com

582

TRENZACOL®
¡Productos por Siempre!

FICHA TECNICA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO		
PRODUCTO Nylon #2	**CALIBRE** 2 mm	**PRESENTACIÓN** 500 m
MATERIAL Nylon	**REFERENCIA** 49687	**FECHA** Diciembre de 2024

ITEM	DESCRIPCIÓN
Diámetro	2 mm (+/- 0.5 mm)
Gramos por metro. Aprox.	12 (g/m) +/-2.5%
Masa De La Funda	32.5 %
Masa Del Alma	67.5 %
Materiales que la Constituyen	Nylon

RAUL ANIBAL ARANGO ARBELAEZ
LIDER SGC

KM 37 Autopista Medellín Bogotá, Parque Empresarial
Fabricato, Bodega 2A Rionegro, Antioquia - Colombia
PBX: (574) + 444 3000 | 310 835 92 00
www.trenzacol.com

TRENZACOL®
¡Productos por Siempre!

CERTIFICADO TÉCNICO DE CALIDAD 1224-023

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO		
PRODUCTO Nylon # 4	**CALIBRE** 4 mm	**PRESENTACIÓN** 500 m / Rollo
MATERIAL Nylon	**REFERENCIA** 63064	**FECHA** Diciembre de 2024
CLIENTE Consorcio Innova parques	**CANTIDAD** 50 Rollos	**LOTE DE TEJIDO** 1199612-1124

ÍTEM	PARÁMETRO	MEDICIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE
Diámetro	4 mm (+/- 0,5 mm)	4,1 mm	OK	-
Gramos por metro. Aprox.	24 (g/m) (+/-2.5%)	23,7 g/m	OK	-
Masa De La Funda	32,5 % (+/- 2.5%)	32,2%	OK	-
Masa Del Alma	67.5 % (+/- 2.5%)	67,8%	OK	-
Materiales que la Constituyen	Nylon	N/A	OK	-

RAUL ANIBAL ARANGO ARBELAEZ
LIDER SGC

KM 37 Autopista Medellín Bogotá, Parque Empresarial
Fabricato, Bodega 2A Rionegro, Antioquia - Colombia
PBX: (574) + 444 3000 | 310 835 92 00
www.trenzacol.com

TRENZACOL®
¡Productos por Siempre!

FICHA TECNICA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO		
PRODUCTO Nylon #4	**CALIBRE** 4 mm	**PRESENTACIÓN** 500 m
MATERIAL Nylon	**REFERENCIA** 63064	**FECHA** Diciembre de 2024

ITEM	DESCRIPCIÓN
Diámetro	4 mm (+/- 0.5 mm)
Gramos por metro. Aprox.	24 (g/m) +/-2.5%
Masa De La Funda	32.5 %
Masa Del Alma	67.5 %
Materiales que la Constituyen	Nylon

RAUL ANIBAL ARANGO ARBELAEZ
LIDER SGC

KM 37 Autopista Medellín Bogotá, Parque Empresarial
Fabricato, Bodega 2A Rionegro, Antioquia - Colombia
PBX: (574) + 444 3000 | 310 835 92 00
www.trenzacol.com

TRENZACOL®
¡Productos por Siempre!

CERTIFICADO TÉCNICO DE CALIDAD 1224-017

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO		
PRODUCTO Nylon # 8	**CALIBRE** 8 mm	**PRESENTACIÓN** 500 m / Rollo
MATERIAL Nylon	**REFERENCIA** 52622	**FECHA** Diciembre de 2024
CLIENTE Consorcio Innova parques	**CANTIDAD** 40 Rollos	**LOTE DE TEJIDO** 4126985-1224

ÍTEM	PARÁMETRO	MEDICIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE
Diámetro	8 mm (+/- 0,5 mm)	8,2 mm	OK	-
Gramos por metro. Aprox.	42 (g/m) (+/-2.5%)	41,7 g/m	OK	-
Masa De La Funda	32,5 % (+/- 2.5%)	31,8%	OK	-
Masa Del Alma	67.5 % (+/- 2.5%)	68,2%	OK	-
Materiales que la Constituyen	Nylon	N/A	OK	-

RAUL ANIBAL ARANGO ARBELAEZ
LIDER SGC

KM 37 Autopista Medellín Bogotá, Parque Empresarial
Fabricato, Bodega 2A Rionegro, Antioquia - Colombia
PBX: (574) + 444 3000 | 310 835 92 00
www.trenzacol.com

TRENZACOL®
¡Productos por Siempre!

FICHA TECNICA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO		
PRODUCTO Nylon #8	**CALIBRE** 8 mm	**PRESENTACIÓN** 500 m
MATERIAL Nylon	**REFERENCIA** 52622	**FECHA** Diciembre de 2024

ITEM	DESCRIPCIÓN
Diámetro	8 mm (+/- 0.5 mm)
Gramos por metro. Aprox.	42 (g/m) +/-2.5%
Masa De La Funda	32.5 %
Masa Del Alma	67.5 %
Materiales que la Constituyen	Nylon

RAUL ANIBAL ARANGO ARBELAEZ
LIDER SGC

KM 37 Autopista Medellín Bogotá, Parque Empresarial
Fabricato, Bodega 2A Rionegro, Antioquia - Colombia
PBX: (574) + 444 3000 | 310 835 92 00
www.trenzacol.com

587

7.6. PORVENIR

TRENZACOL®
¡Productos por Siempre!

CERTIFICADO TÉCNICO DE CALIDAD 1224-032

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO		
PRODUCTO Nylon # 2	**CALIBRE** 2 mm	**PRESENTACIÓN** 500 m / Rollo
MATERIAL Nylon	**REFERENCIA** 49687	**FECHA** Diciembre de 2024
CLIENTE Consorcio Innova parques	**CANTIDAD** 100 Rollos	**LOTE DE TEJIDO** 6536755-1224

ÍTEM	PARÁMETRO	MEDICIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE
Diámetro	2 mm (+/- 0,5 mm)	2,2 mm	OK	-
Gramos por metro. Aprox.	12 (g/m) (+/-2.5%)	11,9 g/m	OK	-
Masa De La Funda	32,5 % (+/- 2.5%)	32,1%	OK	-
Masa Del Alma	67.5 % (+/- 2.5%)	67,9%	OK	-
Materiales que la Constituyen	Nylon	N/A	OK	-

RAUL ANIBAL ARANGO ARBELAEZ
LIDER SGC

KM 37 Autopista Medellín Bogotá, Parque Empresarial
Fabricato, Bodega 2A Rionegro, Antioquia - Colombia
PBX: (574) + 444 3000 | 310 835 92 00
www.trenzacol.com

TRENZACOL®
¡Productos por Siempre!

FICHA TECNICA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO		
PRODUCTO Nylon #2	**CALIBRE** 2 mm	**PRESENTACIÓN** 500 m
MATERIAL Nylon	**REFERENCIA** 49687	**FECHA** Diciembre de 2024

ITEM	DESCRIPCIÓN
Diámetro	2 mm (+/- 0.5 mm)
Gramos por metro. Aprox.	12 (g/m) +/-2.5%
Masa De La Funda	32.5 %
Masa Del Alma	67.5 %
Materiales que la Constituyen	Nylon

RAUL ANIBAL ARANGO ARBELAEZ
LIDER SGC

KM 37 Autopista Medellín Bogotá, Parque Empresarial
Fabricato, Bodega 2A Rionegro, Antioquia - Colombia
PBX: (574) + 444 3000 | 310 835 92 00
www.trenzacol.com

590

TRENZACOL®
¡Productos por Siempre!

CERTIFICADO TÉCNICO DE CALIDAD 1224-023

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO		
PRODUCTO Nylon # 4	**CALIBRE** 4 mm	**PRESENTACIÓN** 500 m / Rollo
MATERIAL Nylon	**REFERENCIA** 63064	**FECHA** Diciembre de 2024
CLIENTE Consorcio Innova parques	**CANTIDAD** 50 Rollos	**LOTE DE TEJIDO** 1199612-1124

ÍTEM	PARÁMETRO	MEDICIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE
Diámetro	4 mm (+/- 0,5 mm)	4,1 mm	OK	-
Gramos por metro. Aprox.	24 (g/m) (+/-2.5%)	23,7 g/m	OK	-
Masa De La Funda	32,5 % (+/- 2.5%)	32,2%	OK	-
Masa Del Alma	67.5 % (+/- 2.5%)	67,8%	OK	-
Materiales que la Constituyen	Nylon	N/A	OK	-

RAUL ANIBAL ARANGO ARBELAEZ
LIDER SGC

KM 37 Autopista Medellín Bogotá, Parque Empresarial
Fabricato, Bodega 2A Rionegro, Antioquia - Colombia
PBX: (574) + 444 3000 | 310 835 92 00
www.trenzacol.com

591

TRENZACOL®
¡Productos por Siempre!

FICHA TECNICA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO		
PRODUCTO Nylon #4	**CALIBRE** 4 mm	**PRESENTACIÓN** 500 m
MATERIAL Nylon	**REFERENCIA** 63064	**FECHA** Diciembre de 2024

ITEM	DESCRIPCIÓN
Diámetro	4 mm (+/- 0.5 mm)
Gramos por metro. Aprox.	24 (g/m) +/-2.5%
Masa De La Funda	32.5 %
Masa Del Alma	67.5 %
Materiales que la Constituyen	Nylon

RAUL ANIBAL ARANGO ARBELAEZ
LIDER SGC

KM 37 Autopista Medellín Bogotá, Parque Empresarial
Fabricato, Bodega 2A Rionegro, Antioquia - Colombia
PBX: (574) + 444 3000 | 310 835 92 00
www.trenzacol.com

592

TRENZACOL®
¡Productos por Siempre!

CERTIFICADO TÉCNICO DE CALIDAD 1224-017

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO		
PRODUCTO Nylon # 8	**CALIBRE** 8 mm	**PRESENTACIÓN** 500 m / Rollo
MATERIAL Nylon	**REFERENCIA** 52622	**FECHA** Diciembre de 2024
CLIENTE Consorcio Innova parques	**CANTIDAD** 40 Rollos	**LOTE DE TEJIDO** 4126985-1224

ÍTEM	PARÁMETRO	MEDICIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE
Diámetro	8 mm (+/- 0,5 mm)	8,2 mm	OK	-
Gramos por metro. Aprox.	42 (g/m) (+/-2.5%)	41,7 g/m	OK	-
Masa De La Funda	32,5 % (+/- 2.5%)	31,8%	OK	-
Masa Del Alma	67.5 % (+/- 2.5%)	68,2%	OK	-
Materiales que la Constituyen	Nylon	N/A	OK	-

RAUL ANIBAL ARANGO ARBELAEZ
LIDER SGC

KM 37 Autopista Medellín Bogotá, Parque Empresarial
Fabricato, Bodega 2A Rionegro, Antioquia - Colombia
PBX: (574) + 444 3000 | 310 835 92 00
www.trenzacol.com

TRENZACOL®
¡Productos por Siempre!

FICHA TECNICA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO		
PRODUCTO Nylon #8	**CALIBRE** 8 mm	**PRESENTACIÓN** 500 m
MATERIAL Nylon	**REFERENCIA** 52622	**FECHA** Diciembre de 2024

ITEM	DESCRIPCIÓN
Diámetro	8 mm (+/- 0.5 mm)
Gramos por metro. Aprox.	42 (g/m) +/-2.5%
Masa De La Funda	32.5 %
Masa Del Alma	67.5 %
Materiales que la Constituyen	Nylon

RAUL ANIBAL ARANGO ARBELAEZ
LIDER SGC

KM 37 Autopista Medellín Bogotá, Parque Empresarial
Fabricato, Bodega 2A Rionegro, Antioquia - Colombia
PBX: (574) + 444 3000 | 310 835 92 00
www.trenzacol.com

7.7. SANTA ISABEL

TRENZACOL®
¡Productos por Siempre!

CERTIFICADO TÉCNICO DE CALIDAD 1224-032

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO		
PRODUCTO Nylon # 2	**CALIBRE** 2 mm	**PRESENTACIÓN** 500 m / Rollo
MATERIAL Nylon	**REFERENCIA** 49687	**FECHA** Diciembre de 2024
CLIENTE Consorcio Innova parques	**CANTIDAD** 100 Rollos	**LOTE DE TEJIDO** 6536755-1224

ÍTEM	PARÁMETRO	MEDICIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE
Diámetro	2 mm (+/- 0,5 mm)	2,2 mm	OK	-
Gramos por metro. Aprox.	12 (g/m) (+/-2.5%)	11,9 g/m	OK	-
Masa De La Funda	32,5 % (+/- 2.5%)	32,1%	OK	-
Masa Del Alma	67.5 % (+/- 2.5%)	67,9%	OK	-
Materiales que la Constituyen	Nylon	N/A	OK	-

RAUL ANIBAL ARANGO ARBELAEZ
LIDER SGC

KM 37 Autopista Medellín Bogotá, Parque Empresarial
Fabricato, Bodega 2A Rionegro, Antioquia - Colombia
PBX: (574) + 444 3000 | 310 835 92 00
www.trenzacol.com

TRENZACOL®
¡Productos por Siempre!

FICHA TECNICA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO		
PRODUCTO Nylon #2	**CALIBRE** 2 mm	**PRESENTACIÓN** 500 m
MATERIAL Nylon	**REFERENCIA** 49687	**FECHA** Diciembre de 2024

ITEM	DESCRIPCIÓN
Diámetro	2 mm (+/- 0.5 mm)
Gramos por metro. Aprox.	12 (g/m) +/-2.5%
Masa De La Funda	32.5 %
Masa Del Alma	67.5 %
Materiales que la Constituyen	Nylon

RAUL ANIBAL ARANGO ARBELAEZ
LIDER SGC

KM 37 Autopista Medellín Bogotá, Parque Empresarial
Fabricato, Bodega 2A Rionegro, Antioquia - Colombia
PBX: (574) + 444 3000 | 310 835 92 00
www.trenzacol.com

TRENZACOL®
¡Productos por Siempre!

CERTIFICADO TÉCNICO DE CALIDAD 1224-023

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO		
PRODUCTO Nylon # 4	**CALIBRE** 4 mm	**PRESENTACIÓN** 500 m / Rollo
MATERIAL Nylon	**REFERENCIA** 63064	**FECHA** Diciembre de 2024
CLIENTE Consorcio Innova parques	**CANTIDAD** 50 Rollos	**LOTE DE TEJIDO** 1199612-1124

ÍTEM	PARÁMETRO	MEDICIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE
Diámetro	4 mm (+/- 0,5 mm)	4,1 mm	OK	-
Gramos por metro. Aprox.	24 (g/m) (+/-2.5%)	23,7 g/m	OK	-
Masa De La Funda	32,5 % (+/- 2.5%)	32,2%	OK	-
Masa Del Alma	67.5 % (+/- 2.5%)	67,8%	OK	-
Materiales que la Constituyen	Nylon	N/A	OK	-

RAUL ANIBAL ARANGO ARBELAEZ
LIDER SGC

KM 37 Autopista Medellín Bogotá, Parque Empresarial
Fabricato, Bodega 2A Rionegro, Antioquia - Colombia
PBX: (574) + 444 3000 | 310 835 92 00
www.trenzacol.com

598

TRENZACOL®
¡Productos por Siempre!

FICHA TECNICA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO		
PRODUCTO Nylon #4	**CALIBRE** 4 mm	**PRESENTACIÓN** 500 m
MATERIAL Nylon	**REFERENCIA** 63064	**FECHA** Diciembre de 2024

ITEM	DESCRIPCIÓN
Diámetro	4 mm (+/- 0.5 mm)
Gramos por metro. Aprox.	24 (g/m) +/-2.5%
Masa De La Funda	32.5 %
Masa Del Alma	67.5 %
Materiales que la Constituyen	Nylon

RAUL ANIBAL ARANGO ARBELAEZ
LIDER SGC

KM 37 Autopista Medellín Bogotá, Parque Empresarial
Fabricato, Bodega 2A Rionegro, Antioquia - Colombia
PBX: (574) + 444 3000 | 310 835 92 00
www.trenzacol.com

599

TRENZACOL®
¡Productos por Siempre!

CERTIFICADO TÉCNICO DE CALIDAD 1224-017

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO		
PRODUCTO Nylon # 8	**CALIBRE** 8 mm	**PRESENTACIÓN** 500 m / Rollo
MATERIAL Nylon	**REFERENCIA** 52622	**FECHA** Diciembre de 2024
CLIENTE Consorcio Innova parques	**CANTIDAD** 40 Rollos	**LOTE DE TEJIDO** 4126985-1224

ÍTEM	PARÁMETRO	MEDICIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE
Diámetro	8 mm (+/- 0,5 mm)	8,2 mm	OK	-
Gramos por metro. Aprox.	42 (g/m) (+/-2.5%)	41,7 g/m	OK	-
Masa De La Funda	32,5 % (+/- 2.5%)	31,8%	OK	-
Masa Del Alma	67.5 % (+/- 2.5%)	68,2%	OK	-
Materiales que la Constituyen	Nylon	N/A	OK	-

RAUL ANIBAL ARANGO ARBELAEZ
LIDER SGC

KM 37 Autopista Medellín Bogotá, Parque Empresarial
Fabricato, Bodega 2A Rionegro, Antioquia - Colombia
PBX: (574) + 444 3000 | 310 835 92 00
www.trenzacol.com

TRENZACOL®
¡Productos por Siempre!

FICHA TECNICA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO		
PRODUCTO Nylon #8	**CALIBRE** 8 mm	**PRESENTACIÓN** 500 m
MATERIAL Nylon	**REFERENCIA** 52622	**FECHA** Diciembre de 2024

ITEM	DESCRIPCIÓN
Diámetro	8 mm (+/- 0.5 mm)
Gramos por metro. Aprox.	42 (g/m) +/-2.5%
Masa De La Funda	32.5 %
Masa Del Alma	67.5 %
Materiales que la Constituyen	Nylon

RAUL ANIBAL ARANGO ARBELAEZ
LIDER SGC

KM 37 Autopista Medellín Bogotá, Parque Empresarial
Fabricato, Bodega 2A Rionegro, Antioquia - Colombia
PBX: (574) + 444 3000 | 310 835 92 00
www.trenzacol.com

7.8. CHICALA

Revisado 12/2024

CERTIFICADO DE CALIDAD No. CGQ-0345

CINTA DE UNIÓN CÉSPED ARTIFICIAL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

Nombre:	Cinta de unión de césped artificial
Marca:	MG
Componentes:	Polipropileno
Concentración:	100 %
Color:	Blanco
Código de barras:	7709599238155

PRUEBAS Y ENSAYOS

ÍTEM	PARÁMETRO	MEDICIÓN	EVALUACIÓN			
ELONGACIÓN	< 12 µm/m	10 µm/m	OPTIMO	X	RECHAZADO	
COLOR BLANCO	BLANCO	N/A	OPTIMO	X	RECHAZADO	
TORSIÓN	Min 10 N/m	12,4 N/m	OPTIMO	X	RECHAZADO	
PERMEABILIDAD	>3.6e+7 mm/hr	4,8 e+7 mm/hr	OPTIMO	X	RECHAZADO	

El producto CINTA DE UNIÓN CÉSPED ARTIFICIAL Marca MG se le han realizado pruebas físicas en espacios designados por la compañía, dando como resultado Buena resistencia: al rasgado, a la tensión, a la humedad, al lodo, altas temperaturas, por lo cual damos constancia de ser un producto confiable para ser utilizado en la unión interna de tapetes de césped artificial.

Expedido el 02 de diciembre de 2024.

Héctor Hernán Naranjo Noreña
Gerente


Mallas y Gramas / Teléfonos: (6)8899130 - 3175670640 - 3138706125/ Correo: mallasygramasmzls@gmail.com – mallasygramasusa@gmail.com / Dirección: Manizales: Sede Campestre la Uribe, Kilometro 2, Vía Panamericana – Bogotá: Carrera 58 # 119 A 49

Revisado 11/2024

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CINTA DE UNIÓN CESPED ARTIFICIAL

1. **FOTOS DEL PRODUCTO**






2. **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO**

Nombre:	Cinta de unión de césped artificial
Marca:	MG
Componentes:	Polipropileno
Concentración:	100 %
Color:	Blanco
Código de barras:	7709599238155

3. **CARACTERÍSTICAS**

- **Cinta de Polipropileno (PP):** Alta capacidad de adhesión, diseñada para mantener el volumen del adhesivo aplicado y evitar filtraciones, lo que mejora el rendimiento en las uniones de alfombra artificial.
- **Tela No Tejida:** Material resistente al agua, al moho y a la humedad. Soporta temperaturas de hasta 130°C, y tiene una alta resistencia a condiciones climáticas extremas, incluyendo lluvias intensas y calor excesivo.
- **Propiedades Físicas:** La cinta presenta una elongación moderada tanto en dirección longitudinal como transversal. Es permeable al vapor, no tóxica, de secado rápido, duradera y reciclable.
- **Instrucciones de Almacenaje:** Se recomienda almacenar en lugares cubiertos, en un rango de temperatura entre **–20°C y 130°C**, para mantener sus propiedades intactas.

4. INSTRUCCIONES DE USO

- **Preparación:** Una vez alineadas y conectadas las juntas de los tapetes de césped artificial, ábralos para instalar la cinta de unión en la base de la cancha.
- **Aplicación del Adhesivo:** Vierta el adhesivo sobre la cinta de unión y, utilizando una llana o espátula dentada, esparza de manera uniforme.
- **Cierre de Juntas:** Cierre las juntas y presione firmemente durante unos minutos para asegurar una correcta unión.
- **Uso Recomendado:** Esta cinta de unión está diseñada para la unión interna de tapetes de césped artificial en aplicaciones como canchas sintéticas, parques recreativos, campos deportivos, terrazas y jardines.

5. DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Ancha: 15 /30 cm
Larga: 50 /100 metros

6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Propiedades	Unidade	Valore
Densidad	g/m^2	150
Resistencia a la tensión longitudinal	N	228.6
Resistencia a la tensión transversal	N	162.3
Elongación de ruptura longitudinal	%	126.4
Elongación de ruptura transversal	%	137.3

neoflex
ADHESIVES coim

AENOR ER Empresa Registrada ER - 1085/2/00

CERTIFIED IQNet QUALITY SYSTEM

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Product: ADIFLEX 2964 B

Charge: 95105

Brookfield viscosity (25°C , 30 r.p.m., Sp.2) :..... 228 mPa.s

Limits: 160-240

SIGNATURE: María Murcia Caracena

The information on this sheet is provided for information only and does not exempt the recipient from the need for the mandatory examination / verification for acceptance on delivery.

606

neoflex
ADHESIVES coim

AENOR ER Empresa Registrada ER - 1085/2/00

CERTIFIED IQNet QUALITY SYSTEM

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Product: ADIFLEX 2964 B

Charge: 97336

Order number: 317

Brookfield viscosity (25°C , 30 r.p.m., Sp.2) :..... 232 mPa.s

Limits: 160-240

SIGNATURE: María Murcia Caracena

The information on this sheet is provided for information only and does not exempt the recipient from the need for the mandatory examination / verification for acceptance on delivery.

607

NEOPUR 2964

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

Adhesivo de poliuretano de dos componentes libre de disolventes.

APLICACIÓN


Neopur 2964 se ha de mezclar con Adiflex 2964B.

Este adhesivo se usa para el pegado de parquet, pavimentos de goma, césped artificial y recubrimientos de PVC en exteriores.

Se presenta envasado en forma de kit con las cantidades preparadas para su mezcla.

Sistema de aplicación	Espátula dentada.
Consumo	200-600 g/m^2 (en función de los materiales)
Sistema de limpieza	Disolvente A





PROCESO APLICACIÓN

Las superficies a pegar deben estar secas, libres de polvo, suciedad u otros materiales extraños. Un lijado superficial es recomendable en muchas aplicaciones.

Neopur 2964 se ha de mezclar a fondo con Adiflex 2964B, para cantidades grandes se recomienda un agitador mecánico. Una vez mezclado, la viscosidad aumenta, consiguiéndose una pasta ideal para aplicación con espátula dentada.

Aplicar la mezcla sobre las superficies a pegar con una espátula dentada. Durante el wet life, superponer las superficies a unir y mantenerlas en contacto.

El tiempo de fraguado disminuye con la temperatura aplicada en la película de adhesivo. En caso de materiales gruesos y aislantes del calor, se requiere un tiempo extra para que el calor penetre en la junta adhesiva. No es recomendable endurecer por encima de 60ºC materiales con grandes diferencias en los coeficientes de dilatación térmica.

Neopur 2964 endurece muy bien incluso a bajas temperaturas, aunque el tiempo de fraguado aumenta considerablemente.

La temperatura mínima para el reticulado es de 5°C. Por debajo de esta temperatura, la mezcla difícilmente reticula.

Los residuos de adhesivo, herramientas y maquinaria deben ser limpiados, antes de que el adhesivo endurezca, con Disolvente A.

Los usuarios deben realizar sus propios test para determinar la adecuación de nuestros productos a sus necesidades concretas. Consulte con nuestro servicio técnico para mayor información al respecto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto (Dos opciones)	Pasta de color verde Pasta de color beige
Viscosidad[1]	400.000 ± 100.000 mPa·s /20°C
Viscosidad mezcla[1]	115.000 ± 35.000 mPa·s /20°C
Densidad	1.70 g/mL (25°C)
Densidad mezcla	1.65 g/mL (25°C)
Endurecedor	Adiflex 2964B
Proporción mezcla Neopur 2964 : Adiflex 2964B	En peso 100 : 9,5
Pot life[2]	40min
Wet life[2]	70min
Tiempo fraguado	Aprox. 24h (25°C; 50% hr)
Tiempo de endurecimiento	Aprox. 5-8h a 20-22°C

- **No inflamable.**
- **Sin disolventes.**

[1] Los valores de viscosidad se controlan en el momento de la producción, pequeñas variaciones son posibles.
[2] 25°C; 50% hr. Método interno.

ALMACENAMIENTO

Debe almacenarse en recipientes originales herméticamente cerrados a temperaturas de 15-30°C.

El tiempo máximo de almacenamiento en las condiciones anteriormente descritas es de 12 meses.

SEGURIDAD

Seguir las instrucciones que contiene la **Ficha de Seguridad** de este producto, adoptando las medidas necesarias para su uso.

INFORMACIÓN ADICIONAL

La información que contiene esta hoja técnica está basada en nuestro conocimiento de los productos, mediante ensayos realizados en nuestro laboratorio. No deben tomarse como garantía para el aplicador sino como referencias orientativas y con valor informativo.

Cada aplicador debe realizar sus correspondientes test para comprobar la idoneidad del producto en las condiciones y proceso usado en cada caso particular.

La aplicación, uso y procesamiento de nuestros productos están fuera de nuestro control y por tanto quedan bajo la responsabilidad del instalador.

neoflex
ADHESIVES coim

AENOR
ER
Empresa Registrada
ER - 1085/2/00

IQNet
CERTIFIED QUALITY SYSTEM

HOJA DE ANÁLISIS

Producto: **NEOPUR 2964 VERDE**

N.º de Lote: 97001

RESULTADO DEL ANÁLISIS

Viscosidad de mezcla (100 gr NEOPUR 2964 Verde + 9,5 gr COMPONENTE B)

(Brookfield, 20º C, 6 r.p.m, Sp, 6):.....111.500 c.p.s.

Límites: 80.000-150.000 c.p.s

FIRMA: María Murcia Caracena

Los datos de esta hoja se facilitan únicamente a título informativo y no eximen al receptor de la necesidad del preceptivo examen/comprobación para su aceptación a la entrega.

609

7.9. VILLA MAYOR

TRENZACOL®
¡Productos por Siempre!

CERTIFICADO TÉCNICO DE CALIDAD 1224-032

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO		
PRODUCTO Nylon # 2	**CALIBRE** 2 mm	**PRESENTACIÓN** 500 m / Rollo
MATERIAL Nylon	**REFERENCIA** 49687	**FECHA** Diciembre de 2024
CLIENTE Consorcio Innova parques	**CANTIDAD** 100 Rollos	**LOTE DE TEJIDO** 6536755-1224

ÍTEM	PARÁMETRO	MEDICIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE
Diámetro	2 mm (+/- 0,5 mm)	2,2 mm	OK	-
Gramos por metro. Aprox.	12 (g/m) (+/-2.5%)	11,9 g/m	OK	-
Masa De La Funda	32,5 % (+/- 2.5%)	32,1%	OK	-
Masa Del Alma	67.5 % (+/- 2.5%)	67,9%	OK	-
Materiales que la Constituyen	Nylon	N/A	OK	-

RAUL ANIBAL ARANGO ARBELAEZ
LIDER SGC

KM 37 Autopista Medellín Bogotá, Parque Empresarial
Fabricato, Bodega 2A Rionegro, Antioquia - Colombia
PBX: (574) + 444 3000 | 310 835 92 00
www.trenzacol.com

TRENZACOL®
¡Productos por Siempre!

FICHA TECNICA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO		
PRODUCTO Nylon #2	**CALIBRE** 2 mm	**PRESENTACIÓN** 500 m
MATERIAL Nylon	**REFERENCIA** 49687	**FECHA** Diciembre de 2024

ITEM	DESCRIPCIÓN
Diámetro	2 mm (+/- 0.5 mm)
Gramos por metro. Aprox.	12 (g/m) +/-2.5%
Masa De La Funda	32.5 %
Masa Del Alma	67.5 %
Materiales que la Constituyen	Nylon

RAUL ANIBAL ARANGO ARBELAEZ
LIDER SGC

KM 37 Autopista Medellín Bogotá, Parque Empresarial
Fabricato, Bodega 2A Rionegro, Antioquia - Colombia
PBX: (574) + 444 3000 | 310 835 92 00
www.trenzacol.com

612

TRENZACOL®
¡Productos por Siempre!

CERTIFICADO TÉCNICO DE CALIDAD 1224-023

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO		
PRODUCTO Nylon # 4	**CALIBRE** 4 mm	**PRESENTACIÓN** 500 m / Rollo
MATERIAL Nylon	**REFERENCIA** 63064	**FECHA** Diciembre de 2024
CLIENTE Consorcio Innova parques	**CANTIDAD** 50 Rollos	**LOTE DE TEJIDO** 1199612-1124

ÍTEM	PARÁMETRO	MEDICIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE
Diámetro	4 mm (+/- 0,5 mm)	4,1 mm	OK	-
Gramos por metro. Aprox.	24 (g/m) (+/-2.5%)	23,7 g/m	OK	-
Masa De La Funda	32,5 % (+/- 2.5%)	32,2%	OK	-
Masa Del Alma	67.5 % (+/- 2.5%)	67,8%	OK	-
Materiales que la Constituyen	Nylon	N/A	OK	-

RAUL ANIBAL ARANGO ARBELAEZ
LIDER SGC

KM 37 Autopista Medellín Bogotá, Parque Empresarial
Fabricato, Bodega 2A Rionegro, Antioquia - Colombia
PBX: (574) + 444 3000 | 310 835 92 00
www.trenzacol.com

TRENZACOL®
¡Productos por Siempre!

FICHA TECNICA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO		
PRODUCTO Nylon #4	**CALIBRE** 4 mm	**PRESENTACIÓN** 500 m
MATERIAL Nylon	**REFERENCIA** 63064	**FECHA** Diciembre de 2024

ITEM	DESCRIPCIÓN
Diámetro	4 mm (+/- 0.5 mm)
Gramos por metro. Aprox.	24 (g/m) +/-2.5%
Masa De La Funda	32.5 %
Masa Del Alma	67.5 %
Materiales que la Constituyen	Nylon

RAUL ANIBAL ARANGO ARBELAEZ
LIDER SGC

KM 37 Autopista Medellín Bogotá, Parque Empresarial
Fabricato, Bodega 2A Rionegro, Antioquia - Colombia
PBX: (574) + 444 3000 | 310 835 92 00
www.trenzacol.com

TRENZACOL®
¡Productos por Siempre!

CERTIFICADO TÉCNICO DE CALIDAD 1224-017

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO		
PRODUCTO Nylon # 8	**CALIBRE** 8 mm	**PRESENTACIÓN** 500 m / Rollo
MATERIAL Nylon	**REFERENCIA** 52622	**FECHA** Diciembre de 2024
CLIENTE Consorcio Innova parques	**CANTIDAD** 40 Rollos	**LOTE DE TEJIDO** 4126985-1224

ÍTEM	PARÁMETRO	MEDICIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE
Diámetro	8 mm (+/- 0,5 mm)	8,2 mm	OK	-
Gramos por metro. Aprox.	42 (g/m) (+/-2.5%)	41,7 g/m	OK	-
Masa De La Funda	32,5 % (+/- 2.5%)	31,8%	OK	-
Masa Del Alma	67.5 % (+/- 2.5%)	68,2%	OK	-
Materiales que la Constituyen	Nylon	N/A	OK	-

RAUL ANIBAL ARANGO ARBELAEZ
LIDER SGC

KM 37 Autopista Medellín Bogotá, Parque Empresarial
Fabricato, Bodega 2A Rionegro, Antioquia - Colombia
PBX: (574) + 444 3000 | 310 835 92 00
www.trenzacol.com

TRENZACOL®
¡Productos por Siempre!

FICHA TECNICA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO		
PRODUCTO Nylon #8	**CALIBRE** 8 mm	**PRESENTACIÓN** 500 m
MATERIAL Nylon	**REFERENCIA** 52622	**FECHA** Diciembre de 2024

ITEM	DESCRIPCIÓN
Diámetro	8 mm (+/- 0.5 mm)
Gramos por metro. Aprox.	42 (g/m) +/-2.5%
Masa De La Funda	32.5 %
Masa Del Alma	67.5 %
Materiales que la Constituyen	Nylon

RAUL ANIBAL ARANGO ARBELAEZ
LIDER SGC

KM 37 Autopista Medellín Bogotá, Parque Empresarial
Fabricato, Bodega 2A Rionegro, Antioquia - Colombia
PBX: (574) + 444 3000 | 310 835 92 00
www.trenzacol.com

7.10. CAMPOS NATURALES

PINTURAS Tito Pabon	**CERTIFICADO DE CALIDAD**	**CODIGO:** F-QAQC-018 **FECHA:** 15-04-2024 **VERSION:** 00 **PAGINA:** 1 De 1

PINTURAS TITO PABON SAS
NIT: 830075451-1

RESULTADOS DE ANALISIS

PRODUCTO: Vinilo Básico Tipo 2 Blanco
FECHA FAB: 05 Noviembre 2024
LOTE: 1561
ANALISTA: Brian Cuellar – Diana Velosa

PRUEBA	ESPECIFICACION TECNICA	VALOR REAL	METODO DE ANALISIS
VISCOSIDAD KU	MIN 125.0 - MAX 130.0	125.1 KU	NTC 559
pH	MIN 8.5 – MAX 9.5	9.12	CRITERIO DE ACEPTACION
PODER DE CUBRIMIENTO	MIN 97%	98.46 %	NTC 4974
BLANCURA	MIN 80.00	82.39	CRITERIO DE ACEPTACION
AMARILLAMIENTO	MAX 5.00	2.85	CRITERIO DE ACEPTACION
DELTA E* Δ	MAX 1.00	0.12	ASTM D224
FINURA DE DISPERSIÓN Hg	MIN 4 Hg	4 Hg	NTC 557
BRILLO ESPECULAR 60°	MAX 10.0	2.5	NTC 592
DENSIDAD	5.10 – 5.50 Kg/g	5.46 kg/g	CRITERIO DE ACEPTACION
TIEMPO DE SECADO	MAX 4 HORAS	4 Horas	NTC 598

ELABORO	REVISO	APROBO	SELLO
Diana	Carolina T	Carolina T	PRODUCTO LIBERADO

Fin de informe

Scanned with CamScanner

FICHA TECNICA
VINILO TIPO 2 BASICO
D-DES-014 (V_02)

Descripción

Producto vinilacrilico modificado con veova con acabado mate especialmente diseñado para aplicaciones sobre drywall, debido a su acabado mate, el cual cubre los imperfectos de las uniones de las láminas. También se caracteriza por su rápido secado, excelente cubrimiento, rendimiento y uniformidad en la aplicación.

Este producto es de fácil manejo y se encuentra únicamente en blanco.

Pintura al agua, tipo emulsión, Tipo 2.

Pintura Ecológica No Contiene Plomo ni Cromo. Bajo VOC. Viscosidad (≤120KU)

Contenido: 1 Galón de Pintura – 3.785 litros

Consultar la Ficha Técnica del Producto antes de su Uso

Uso

Además del uso recomendado para drywall, es ideal para techos.

Preparación de la superficie

La superficie debe estar seca, libre de polvo, mugre, grasa y pinturas deterioradas.

Antes de pintar resane con cemento y arena las grietas y otros defectos que puedan afectar el acabado. Los acabados deteriorados cales, carburos y humedades se deben eliminar completamente.

Sobre las superficies muy alcalinas (en pH>10) es recomendable neutralizar con una solución de hipoclorito de sodio al 3% en agua, dejar actuar 10 minutos, frotar con cepillo de cerdas duras, enjuagar con abundante agua y dejar secar.

Las superficies en buen estado se deben limpiar con una escoba en seco retirando residuos ligeros.

Preparación y Aplicación

Agite muy bien el producto con una espátula limpia hasta lograr uniformidad completa.

Diluya únicamente la cantidad a aplicar de acuerdo a los siguientes parámetros:

Dilución para Acabado con	Preparación		N° de Manos	Tiempo de secado
	Tipo 2 Basico	Agua		
Brocha o Rodillo	1 galón	1ª. Mano 10 - 15% 2ª. Mano 5 -10%	Mínimo 2 Manos	Entre manos 1 hora, Para 2da. Mano 2 horas. Para limpiar con jabón de tocador 20 a 30 días. Condiciones ambientales: 25°C y 60% de humedad relativa.
Pistola convencional	1 galón	20 – 25%	Mínimo 2 Manos	
Pistola Airless	1 galón	7 al 10%	Mínimo 2 Manos	

Después de uso lave los equipos de aplicación con agua sin dejar secar la pintura.

Almacenamiento

Los recipientes deben estar perfectamente cerrados, con el fin de evitar evaporaciones y deben reposar preferiblemente sobre una plataforma de madera. Debe almacenarlo bajo techo, a temperatura entre 4 °C y 35 °C por periodo no superior a un año.

Rendimientos aproximados:	
En obra nueva sobre revoque	8 a 10 m² por galón.
En repinte sobre color diferente	20 a 25 m² por galón.
En repinte sobre color igual o similar	30 a 35 m² por galón.

Nota: Para el cálculo de rendimiento práctico se deben tener en cuenta las pérdidas de la pintura durante la mezcla y aplicación.

Precauciones

Evite todo contacto con la piel o los ojos usando equipos de seguridad adecuados.

Se recomienda asegurar una ventilación apropiada al aplicar el producto.

Mantenga fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua. En caso de ingestión, beber abundante agua y buscar asesoría médica.

En caso de escape o derrame recoja el material en recipiente para evitar la contaminación de fuentes de agua o alcantarillados. Los envases vacios deben ser reciclados.

El Vinilo Tipo 2 basico como pintura al agua, ha sido evaluado y controlado en laboratorio para garantizar la información técnica y sugerencias de uso, preparación, aplicación y precauciones.

Producto Fabricado en Colombia por PINTURAS TITO PABON & CIA S EN C.
Carrera 27 N°78 – 44 Teléfono: 6606631 - 3115917
www.pinturastitopabon.com

7.11. CONTROL DE MATERIALES CON CERTIFICADOS DE CONFIRMIDAD

CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONTROL DE MATERIALES CON CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	Codigo:	PS-F-05
		Version	1
		Fecha	28/04/2021

CONTRATO No.	4041 DE 2024
TIPO DE CONTRATO	OBRA PUBLICA
OBJETO	"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". Lote 1/grupo 1 CAMPOS DEPORTIVOS, tiene el siguiente alcance: "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS"
CONTRATISTA	CONSORCIO INNOVAPARQUES
INTERVENTOR	CONSORCIO SANTA TERESA 28
SUPERVISOR	RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO

ITEM	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NORMA A CUMPLIR	# CERTIFICADO PRESENTADO	FECHA DE EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO	FECHA DE VIGENCIA	ENTDAD CERTIFICADORA	ACEPTADO (SI / No)	OBSERVACIONES
1	Caucho	NTC 5176	EN 933-1 EN 1097-3 EN 14955	N.E	14/11/2024	N.E	CAUCHOS DINAMICOS	SI	**CONFORMIDAD**
2	Vinilo Basico Tipo 2 Blanco	MNI 125,0- MAX 130,0	NTC 559	1561	5/11/2024	N.E	TITO PABON	SI	**CONFORMIDAD**
3	Grama / FLASHBLADE 1.409 gr /Palermo SUR 24N525-E581B, 24N525AE581B, 24N525BE581B, 24N524-E020B, 24N526-E581B, 24N526AE581B	FIFA	ASTM 3776	N.E	23/12/2024	N.E	CUPERZ	SI	**CONFORMIDAD**
4	24N321-E81AB, 24N321A-E81AB, 24N321B-E81AB, 24N322-E81AB, 24N322A-E81AB, 24N322B-E81AB	FIFA	ASTM 3776	N.E	16/08/2024	N.E	CUPERZ	SI	**CONFORMIDAD**
5	ULTRACORROSIVO	N.E	N.E	95468	may-23	2 AÑOS	ULTRA PINTURAS	SI	**CONFORMIDAD**
6	ESMALTE SINTETICO	N.E	N.E	95742	ene-25	1 AÑO	ULTRA PINTURAS	SI	**CONFORMIDAD**
7	CINTA DE UNION DE CESPED	IDRD	N.E	CGQ-0345	2/12/2024	N.E	MALLAS Y GRAMAS	SI	**CONFORMIDAD**
8	MALLA DE CERRAMIENTO	IDRD	N.E.	1224-032	Diciembre de 2024	N.E	TRENZACOL	SI	**CONFORMIDAD**
9	NYLON #4	IDRD	N.E.	1224-023	Diciembre de 2024	N.E	TRENZACOL	SI	**CONFORMIDAD**
10	NYLON #8	IDRD	N.E.	1224-017	Diciembre de 2024	N.E	TRENZACOL	SI	**CONFORMIDAD**
11	Grama / FLASHBLADE 1.409 gr / Pijaos Lotes 24N530-E581B, 24N530AE581B, 24N531-E581B, 24N531AE581B, 24N532-E581B, 24N532AE581B, 24N529-E581B, 24N529AE581B, 24N528-E020B, 24N533-E581B, 24N533AE581B, 24N534-E581B, 24N534AE581B, 24N538-E581B, 24N538AE581B, 24N536-E581B, 24N536AE581B, 24N535-E581B, 24N535AE581B, 24N546-E581B, 24N546AE581B, 24N537-E581B, 24N537AE581B, 24N545-E581B	FIFA	ASTM 3776	N.E	23/12/2024	N.E	CUPERZ	SI	**CONFORMIDAD**

APOBADO POR:

Fecha:31/05/2025

8. ANEXO G
INSPECCIÓN Y ENSAYOS

Bogotá D.C., 17 de marzo de 2025.

Señor(es),
CONSORCIO SANTA TERESA 28
R.L. RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Proyectos2@soliunsas.com
Teléfono: 6017653016
Carrera 70 C 48 - 55
Bogotá, D.C.

CINNOVAPARQUES-CE-145
Al responder cite este consecutivo

Referencia: Contrato de Obra No. 4041 de 2024, cuyo objeto es "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS".

Asunto: Entrega ensayos de laboratorio arena sílice y caucho granulado

Respetado(s) Señor(es),

El suscrito, **OSCAR RENAN VELASQUEZ VIGOYA**, identificado con cédula de ciudadanía No.79.969.768, obrando en su calidad de representante legal, con amplias atribuciones al efecto, de **CONSORCIO INNOVAPARQUES**. Por medio de la presente se realiza entrega de los resultados de laboratorio de análisis granulométrico para la arena sílice y el granulo de caucho. Se aclara que tanto los resultados de arena como de caucho se encuentran dentro de los límites establecidos en las **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS IDRD** ítem Nuevas dotaciones complementarias deportivas, numeral 2. Canchas de grama sintética, dentro el apartado *grama sintética FIFA prefer* donde se establece "...Arena tipo sílice con granulometría entre 0.2mm y 0.8mm, en cantidad de 15 – 17kg/m2. Caucho molido tipo SBR, con granulometría de 0.5-2.0mm en cantidad de 15 – 17kg/m2...". Sin embargo, se evidencia que para el ensayo del caucho granulado no se dispone de un tamiz especifico que se ajuste a los parámetros para la fracción de 0.5 mm, lo que genera una leve discontinuidad en la curva granulométrica.

Para cerrar la curva de distribución de partículas en la gráfica, se observa un pequeño porcentaje de material retenido en el tamiz No. 4. No obstante, este material no logra pasar dicho tamiz, lo que indica que la granulometría del caucho

mantiene su coherencia dentro de los parámetros esperados y no representa una desviación significativa respecto a los requisitos técnicos del proyecto. En conclusión, la distribución de tamaños de partículas del caucho es adecuada y cumple con las especificaciones establecidas, a pesar de la ausencia del tamiz de 0.5 mm en el análisis, sin embargo, para los futuros ensayos nos encontramos en la búsqueda de un laboratorio que cuente con el tamiz No. 35, con el fin de evitar esta desviación.

Cabe resaltar que los resultados de nuestro ensayo difieren de los obtenidos por la interventoría, debido a que realizamos las pruebas directamente sobre el caucho aplicado en los campos deportivos, mientras que la interventoría efectuó el análisis sobre el material contenido en los bultos. A pesar de esta diferencia en el muestreo, nuestros ensayos cumplen con las especificaciones técnicas y coinciden con la inspección visual realizada tanto por la interventoría como por la supervisión del proyecto.

Quedamos atentos a cualquier comentario y/o solicitud adicional. Agradecemos de antemano su atención.

Cordialmente,

OSCAR RENAN VELASQUEZ VIGOYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES
