CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES N°.05 DEL CONTRATO DE OBRA 481 DE 2024 PERIODO DEL 21 DE JULIO DEL 2025 AL 31 DE JULIO DE 2025



CONTRATO DE OBRA 481 DE 2024

OBJETO:
"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

ELABORADO POR:
CONSORCIO RIO BANADIA
R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA

ENTREGADO A:
CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN
R/L. JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON

MUNICIPIO DE SARAVENA
2025

CL 25 N 11 – 70 BRR ALFONSO LOPEZ
CORREO: consorcioriobanadia@gmail.com
CELULAR: 3202395534

Contenido

INTRODUCCIÓN 6
1. ASPECTOS CONTRACTUALES 7
1.1. PROCESO DE SELECCIÓN 7
1.2. CELEBRACION DEL CONTRATO 7
2. ANTECEDENTES Y REVISIÓN DEL PROYECTO 7
2.1. DESCRIPCION GENERAL 7
2.2. LOCALIZACIÓN 8
2.3. ALCANCE DEL PROYECTO 9
3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 10
3.1. GENERALIDADES DEL CONTRATO 10
3.1.1. Informe Contractual – Ficha Técnica del contrato de obra. 10
3.2. GARANTÍAS DEL CONTRATO 11
3.3. IMPOSICIÓN DE MULTAS Y SANCIONES 15
3.4. ACTOS ADMINISTRATIVOS 15
3.4.1. Modificación y /o adiciones al contrato 16
3.4.2. Compensación de mayores y menores cantidades 17
3.5. ACTAS DE COMITÉ TÉCNICOS 17
3.6. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA. 17
3.7. BITACORA DIARIA DE OBRA 19
3.8. CONTROL SOCIAL DE LA OBRA 19
3.8.1. Socialización De La Obra. 19
3.8.2. Conformación De La Veeduría Ciudadana 20
3.8.3. Actas de reuniones suscritas por la veeduría 21
3.9. VINCULACION DEL PERSONAL Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES 21
3.9.1. Personal Administrativo 21
3.9.2. Personal Operativo De La Obra 22
3.9.3. Pagos Salariales Y Liquidación Del Personal 22
3.10. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 23
3.10.1. Dotación Del Personal 23
3.10.2. Señalización De La Obra 24

3.10.3 Valla Informativa del Proyecto 25
3.10.4 Accidentalidad En La Obra. 25
3.10.5 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 25
3.11 PERMISOS Y LICENCIAS 26
3.12 CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA 27
4 ASPECTOS TECNICOS 37
4.10 CONDICIONES CONTRACTUALES 37
4.11 CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA 37
4.12 AVANCE DE LA OBRA 39
4.12.4 Avance Físico De La Obra 39
4.12.5 Avance Del Plazo Contractual 39
4.13 ACTIVIDADES DE OBRAS EJECUTADAS 40
4.14 IMPREVISTOS PRESENTADOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA 42
4.15 ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADA 42
4.16 CONTROL DE CALIDAD DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS 47
5 ASPECTOS FINANCIEROS 48
5.10 MANEJO DEL ANTICIPO 48
6 ASPECTOS AMBIENTALES 49
6.1 SEGUIMIENTO A PERMISOS Y/O LICENCIAS AMBIENTALES 49
6.2 SEGUIMIENTO AL PMA 50
6.3 IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL 50
7 CONCLUSIONES 52
8 ANEXOS 53
LISTADO DE ANEXOS 53

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1 coordenadas del proyecto 8
Tabla 2 ficha técnica 10
Tabla 3 póliza de contrato de obra anexo 0 11
Tabla 4 póliza de contrato de obra anexo 1 12
Tabla 5 póliza de contrato de obra anexo 2 12
Tabla 6 póliza de cumplimiento suspensión anexo 3 13
Tabla 7 póliza de cumplimiento prorroga anexo 4 14
Tabla 8 póliza de cumplimiento reinicio anexo 5 15
Tabla 9 actos administrativos contrato de obra 481 de 2024 16
Tabla 10 actas de comité 17
Tabla 11 Relación de correspondencia enviada por la Interventoría del Contrato de Obra No. 481 de 2024 17
Tabla 12 Relación de correspondencia recibida por la Interventoría del Contrato de Obra No481 de 2024 18
Tabla 13 Conformación de la veeduría ciudadana para el control social del contrato de obra No. 481 del 2024 20
Tabla 14 Personal administrativo del contrato de obra No. 481 de 2024 en el mes de julio de 2025 21
Tabla 15 Personal operativo del contrato de obra No. 481 de 2024 en el mes de julio de 2025 22
Tabla 16 Dotación del personal en obra de elementos de protección-Contrato de Obra No. 481 de 2024 23
Tabla 17 Señalización instalada en la obra por el contratista- Contrato de Obra No. 481 de 2024 24
Tabla 18 Seguimiento y control de la maquinaria y equipos utilizado en la ejecución del contrato del contrato No. 481 del 2024 36
Tabla 19 presupuesto contractual 37
Tabla 20 Porcentaje de avance de obra Programado Vs Ejecutado del Contrato de Obra No. 481 de 2024. 40
Tabla 21 Manejo de Anticipo 48
Tabla 22 Presupuesto de la mitigación o control ambiental del contrato de obra No. 481 del 2024. 50

LISTADO DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Localización especifica.....9
Ilustración 2 socialización del contrato 481 de 2024 20
Ilustración 3 entrega de dotacion al personal.....23
Ilustración 4 señalización de la obra. 24
Ilustración 5 valla informativa. 25
Ilustración 6 Equipo tipo volqueta 28
Ilustración 7 Equipo tipo volqueta 2 29
Ilustración 8 equipo tipo volqueta 3.....29
Ilustración 9 Equipo tipo volqueta 4 30
Ilustración 10 Equipo tipo retroexcavadora 1 31
Ilustración 11 Equipo retroexcavadora 2 32
Ilustración 12 Equipo retroexcavadora 3 32
Ilustración 13 equipo retroexcavadora 4.....33
Ilustración 14 equipo motoniveladora 34
Ilustración 15 equipo vibrocompactador.....35
Ilustración 16 Equipo carrotanque 36
Ilustración 17 grafica avance de obra 39
Ilustración 18 Avance financiero programado Vs avance Ejecutado del Contrato de Obra No. 481 de 2024 41
Ilustración 19 Avance físico programado Vs Ejecutado del Contrato de Obra No. 481 de 2024.....41
Ilustración 20 CONFORMACIÓN DE BARRERA TIPO JARILLÓN.....43
Ilustración 21 GEOTEXTIL NT 2400.....44
Ilustración 22 GEOTEXTIL NT 3000.....45
Ilustración 23 GEOTEXTIL TEJIDO 2100 46
ilustración 24 manejo de aguas.....47
Ilustración 25 seguimiento de las plantas 51

INTRODUCCIÓN

El presente informe detalla el avance de la obra correspondiente al contrato número 481 de 2024, titulado "**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RÍO BANADÍA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**", ejecutado por el **CONSORCIO RÍO BANADÍA** (NIT: 901.902.273-3) representado legalmente por JEISSON RENE VILLARREAL ROA con cedula de ciudadanía N.º 1.018.444.460, de Bogotá D.C. Y supervisado por el CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN representado legalmente por JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCÓN a través del contrato 473 de 2024 cuyo objeto es **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADÍA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.**

El objetivo principal del proyecto es la ejecución de obras de protección que permitan la reducción del riesgo de inundaciones en la zona del río Banadía, mejorando la seguridad hídrica y la estabilidad del terreno mediante la implementación de soluciones técnicas de infraestructura.

A la fecha del presente informe desde el día 21 de julio del 2025 hasta el 31 de julio del 2025 han transcurrido 124 días los cuales equivalen al **68.13%** del avance en tiempo, el avance físico acumulado del proyecto es del **20.39%,** y el avance del presente mes de del **14.95%** con la ejecución de diversas actividades en cumplimiento con el cronograma previsto. Entre las tareas realizadas destacan la conformación de barrera tipo Jarillón, instalación de geotextiles nt 2400, nt 3000 y tejido 2100 así como el manejo adecuado de aguas pluviales para mitigar el riesgo de erosión y desbordamientos. El avance financiero del presente informe es del **40.00%** del valor total del proyecto, Este informe presenta el estado detallado de las actividades realizadas, las cuales se están ejecutando conforme a las especificaciones técnicas y dentro de los plazos establecidos en el plan de contingencia, garantizando la correcta evolución del proyecto hacia sus objetivos de protección y prevención.

1. ASPECTOS CONTRACTUALES

1.1. PROCESO DE SELECCIÓN

El Departamento de Arauca adelantó el proceso de selección del contratista mediante la licitación de obra pública número LO-02-RE-001-2024, de conformidad con lo establecido en la Ley 80/93, numeral 1 del art. 2 de la ley 1150 de 2007, art 14 y 15 del decreto 2474 de 2008 y demás normatividad concordante, para lo cual la Gerencia de Contratación realizó oportunamente las publicaciones pertinentes en la página WEB www.contratos.gov.co, Departamento de Arauca, llevándose a cabo el cierre del proceso de selección de acuerdo al cronograma y realizando la respectiva evaluación de las ofertas presentadas por los proponentes por parte del Comité Evaluador. Una vez se llevó a cabo las evaluaciones jurídicas, técnica y financiera de las propuestas y se estableció el orden de elegibilidad, se procedió a adjudicar el contrato al CONSORCIO RIO BANADIA, representado legalmente por JHONN FREDY GARCIA BELTRAN, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.098.752. 791 expedida en Bucaramanga mediante Resolución No. 4877 del 31 de diciembre de 2024.

1.2. CELEBRACION DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta la Resolución de Adjudicación No. 4877 del 31 de diciembre de 2024, se procedió a la suscripción del contrato de obra (No. 481 de 2024 el día 31 de diciembre de 2024 entre la doctora y la firma CONSORCIO RIO BANADIA, representada por JHONN FREDY GARCIA BELTRAN, el cual tiene por objeto CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RÍO BANADÍA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA, con un plazo de ejecución de seis (06) meses y un valor de CATORCE MIL TRESCIENTOS DOCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($14.312.241.291,66).

2. ANTECEDENTES Y REVISIÓN DEL PROYECTO

2.1. DESCRIPCION GENERAL

El Río Banadía cuenta con aproximadamente 30.6 kilómetros de longitud de los cuales el 100% pueden catalogarse como susceptibles a inundación. En el área de estudio se ha identificado un sector crítico en la vereda Bajo Banadía, en el cual se presenta vulnerabilidad al riesgo de inundación por desbordamiento debido al fenómeno creciente de lluvias torrenciales que se ha intensificado por fenómenos antrópicos y naturales como el fenómeno de la niña, lo que sumado a los procesos erosivos y de socavación ha afectado a las comunidades de la zona, un (1) puesto de salud en Puerto Nariño, una (1) institución educativa en Puerto Nariño, una (1) vía secundaria en caño Tigre entre Puerto Nariño y la Esmeralda. El punto donde se presenta la problemática es un sector crítico ubicado en un meandro pronunciado

sobre el rio Banadía en el Municipio de Saravena, en áreas de la vereda Bajo Banadía. En este sector es crítico por razones dinámicas propias del comportamiento hidráulico del cauce del rio, lo cual ha provocado la degradación de la margen izquierda aguas abajo y perdida de la bancada natural por el fenómeno de socavación lateral y la constante sedimentación que ha acumulado bancos de arena en la sección del cauce, disminuyendo su capacidad hidráulica y ocasionando el desbordamiento del afluente en temporada de lluvias.
Que la alternativa de solución viabilizada es el "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA, DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA". La cual beneficiara a las veredas aledañas a dicho proyecto en especial el centro poblado de Puerto Nariño.

2.2. LOCALIZACIÓN

El proyecto se encuentra localizado en zona rural en territorio del municipio de Saravena en el Departamento de Arauca, y está definido por las siguientes coordenadas

Tabla 1 coordenadas del proyecto

Id	Coordenadas geográficas WGS84		Coordenadas planas-Magna-SIRGAS Origen Este - Norte		Coordenadas origen nacional CTM12	
	Latitud	**Longitud**	**Norte**	**Este**	**Norte**	**Este**
Inicio estructura colineal tipo / Jarillón flexocreto	6°59'14.76"N	71° 46' 56.00"O	1264494,527	922128,435	2330273,985	5134464,468
Fin estructura colineal tipo / Jarillón flexocreto	6°59'20.11"N	71° 46' 30.07"O	1264657,704	922924,630	2330440,303	5135259,474
Inicio estructura colineal tipo / Jarillón con sección escalonada flexocreto	6°59'8.76"N	71° 47' 1.78"O	1264310,461	921950,734	2330089,316	5134287,635
Fin estructura colineal tipo / Jarillón con sección escalonada flexocreto	6°59'14.76"N	71° 46' 56.00"O	1264494,527	922128,435	2330273,985	5134464,468

Ilustración 1 Localización especifica



2.3. ALCANCE DEL PROYECTO

En virtud del citado Plan Participativo de Desarrollo Departamental de Arauca 2024-2027, en el eje estratégico recursos naturales sostenibilidad ambiental ecosistemas estratégicos y gestión del riesgo, se estableció como metas e indicadores "obras de infraestructura para mitigación y atención a desastres realizadas", mediante la iniciativa priorizada "construcción de obras de protección contra inundaciones y erosión de los cuerpos hídricos en el departamento de Arauca" para la construcción de obras de protección en el Departamento de Arauca y dar solución a la problemática planteada.

Obras de infraestructura para mitigación y atención a desastres realizadas Con la intervención, el Departamento de Arauca mediante el presente proceso de selección y la consecuente celebración del contrato de obra pública para la "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA, DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA", busca mejorar las condiciones de protección de la ronda hídrica del rio Banadía, para el desarrollo económico y social del municipio de Saravena, Departamento de Arauca, impactando a 1.220 personas según lo descrito en el documento MGA del presente proyecto "Población afectada y objetivo".

3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

3.1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

3.1.1. Informe Contractual – Ficha Técnica del contrato de obra.

Tabla 2 ficha técnica

FICHA TECNICA DEL CONTRATO	
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO	
ENTIDAD CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE ARAUCA
INTERVENTOR EXTERNO:	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN
SUPERVISOR:	CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO RESOLUCION 001 DE 2025 DEL 03 DE ENERO 2025
CONTRATO No:	481 DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
CONTRATISTA:	CONSORCIO RIO BANADIA
REPRESENTANTE LEGAL:	JEISSON RENE VILLARREAL ROA R/L
NIT. No:	901.902.273-3
VALOR DEL CONTRATO:	$ 14.312.241.291,66
PLAZO CONTRACTUAL:	SEIS (6) MESES
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	SGR202324-00420 DE 11/12/2024 SGR202324-00422 DE 11/12/2024
REGISTRO PRESUPUESTAL	SGR202324-00401 DE 31/12/2024 SGR202324-00402 DE 31/12/2024
FECHA INICIO:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	30 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE SUSPENSION N° 1	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA PRORROGA SUSPENSION N° 1	22 DE MAYO DE 2025
FECHA PRORROGA SUSPENSION N° 2	20 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE REINICIO	21 DE JULIO DE 2025
FECHA DE TERMINACION DEFINITIVA	27 DE SEPTIEMBRE DE 2025
PERIODO DEL INFORME	
FECHA DE CORTE DEL INFORME:	DEL 21/07/2025 AL 31/07/2025
DIAS TRANSCURRIDOS:	124

Anexo 1 acta de suspensión N° 1 contrato 481-2024

Anexo 2 acta de suspensión N° 1 y prologa N° 1 y N° 2 contrato 481-2024

Anexo 3 acta de reinicio N° 1 contrato 481-2024

(Contrato De Obra 481 De 2024 reposa en el anexo 1 del informe 1)

(Acta de inicio reposa en el anexo 2 del informe 1)

(Resolución De Asignación Del Supervisor reposa en el anexo 3 del informe 1)

(Solicitud Y Aceptación De Cambio De Representante Legal reposa en el anexo 1 del informe 2)

3.2. GARANTÍAS DEL CONTRATO

De acuerdo con las garantías exigidas por el Departamento de Arauca en el Contrato de Obra No. 481 de 2024, se suscribe con la compañía de seguros ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO, las siguientes garantías teniendo en cuenta los amparos en valor y plazo estipulados en la minuta contractual en la CLÁUSULA 18 del Contrato así:

3.2.1.1. Pólizas de Legalización

Las pólizas iniciales fueron expedidas el 31/12/2024) por la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A, tomadas por CONSORCIO RIO BANADIA y como beneficiario el Departamento de Arauca. Dichas pólizas fueron aprobadas por la Gerencia Técnica de Contratación Administrativa, mediante certificación firmada por la Gerente de Contratación LUZ LILIANA MARCHENA PINZON el 31/12/2024.

(Póliza Del Contrato De Obra Anexo 0 Y Aprobación reposa en el anexo 5 del informe 1)

Tabla 3 póliza de contrato de obra anexo 0

Anexo	FECHA EXPEDICION	NOMBRE / TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA	OBSERVACIONES
0	31/12/2024	BUEN MANEJO E INVERSIÓN DEL ANTICIPO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	49-44-101035208	$5.724.896.516,66	31/12/2024	31/12/2025	POLIZA APROBADA POR LA GERENTE DE CONTRATACION EL 31/12/2024
		CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			$ 2.862.448.258,33	31/12/2024	31/12/2025	
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA			$2.862.448.258.33	30/06/2025	30/06/2027	

		SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES			$ 2.146.836.193.75	31/12/2024	30/06/2028	
0	*31/12/2024*	Responsabilidad civil extracontractual	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	49-40-101011266	$715,612,064.58	31/12/2024	30/06/2025	PÓLIZA APROBADA POR EL GERENTE DE CONTRATACIÓN EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

3.2.2. Ampliaciones a las pólizas

3.2.2.1. Pólizas Ampliadas Según Acta de Inicio

Las pólizas fueron ampliadas según acta de inicio del (31/12/2024) por la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A, y aprobadas por la Gerente de Contratación Administrativa mediante certificación firmada por el Gerente de Contratación LUZ LILIANA MARCHENA PINZON el 19/03/2025

Tabla 4 póliza de contrato de obra anexo 1

ANEXO	FECHA EXPEDICION	NOMBRE / TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA	OBSERVACIONES
1	*31/12/2024*	BUEN MANEJO E INVERSIÓN DEL ANTICIPO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	49-44-101035208	$5.724.896.516,66	31/12/2024	31/12/2025	POLIZA APROBADA POR LA GERENTE DE CONTRATACION EL 19/03/2025
		CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			$ 2.862.448.258,33	31/12/2024	31/12/2025	
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA			$2.862.448.258.33	30/06/2025	30/06/2027	
		SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES			$ 2.146.836.193.75	31/12/2024	30/06/2028	

Las pólizas fueron ampliadas según acta de inicio del (31/12/2024) por la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Tabla 5 póliza de contrato de obra anexo 2

Anexo	FECHA EXPEDICION	NOMBRE / TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA	OBSERVACIONES
2	*13/03/2025*	BUEN MANEJO E INVERSIÓN DEL ANTICIPO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	49-44-101035208	$5.724.896.516,66	31/12/2024	31/12/2025	

		CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			$2.862.448.258,33	31/12/2024	31/12/2025	POLIZA APROBADA POR LA GERENTE DE CONTRATACION EL 13/03/2025
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA			$2.862.448.258.33	30/06/2025	30/06/2027	
		SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES			$ 2.146.836.193.75	31/12/2024	30/06/2028	
2	*13/03/2025*	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO	49-40-101011266	$715,612,064.58	31/12/2024	30/06/2025	PÓLIZA APROBADA POR EL GERENTE DE CONTRATACIÓN EL *13/03/2025*

Aclaración: En el presente anexo se aclara integrantes del consorcio rio banadia identificado con Nit: 901902273-3 según cesión del contrato de fecha 27/02/2025 Participantes del consorcio: Fundación nueva castellana con Nit:901358987-1 participación 45% Proyectos y servicios integrales Psi S.A.S identificado con Nit:900827849-0 participación 45% BCH ENGINEERING S.A.S identificado con Nit:901393606-7 participación del 10% Todos los demás términos y condiciones no modificados por el presente anexo continúan en vigor.

(Actualizacion de pólizas reposa en el anexo 1 del informe 3)

Tabla 6 póliza de cumplimiento suspensión anexo 3

Anexo	FECHA EXPEDICION	NOMBRE / TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA	OBSERVACIONES
3	*02/07/2025*	BUEN MANEJO E INVERSIÓN DEL ANTICIPO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	49-44-10 1035208	$5.724.896.516,66	31/12/2024	31/12/2025	La póliza de suspensión no fue aprobada, debido a que, al momento de su presentación, no se contaba con el acta de reinicio del contrato
		CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			$ 2.862.448.258,33	31/12/2024	31/12/2025	
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA			$2.862.448.258.33	30/06/2025	30/06/2027	
		SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES			$ 2.146.836.193.75	31/12/2024	30/06/2028	

3	*02/07/2025*	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO	49-40-101011266	$715,612,064.58	31/12/2024	30/06/2025	La póliza de suspensión no fue aprobada, debido a que, al momento de su presentación, no se contaba con el acta de reinicio del contrato

Aclaración: En el presente anexo se amplían las vigencias según acta de suspensión número 1 de fecha 22/04/2025, prorroga número 01 al acta de suspensión número 1 de fecha 22/05/2025 y prorroga número 02 al acta de suspensión número 1 de fecha 20/06/2025.

Todos los demás términos y condiciones no modificados por el presente anexo continúan en vigor.

Anexo 4 póliza según suspensión

Anexo 5 póliza extracontractual suspensión

Tabla 7 póliza de cumplimiento prorroga anexo 4

ANEXO	FECHA EXPEDICION	NOMBRE / TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA	OBSERVACIONES
4	*03/07/2025*	BUEN MANEJO E INVERSIÓN DEL ANTICIPO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	49-44-101035208	$5.724.896.516,66	31/12/2024	31/03/2026	La póliza de prorroga no fue aprobada, debido a que, al momento de su presentación, no se contaba con el acta de reinicio del contrato
		CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			$ 2.862.448.258,33	31/12/2024	31/03/2026	
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA			$2.862.448.258.33	30/06/2025	30/06/2027	
		SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES			$ 2.146.836.193.75	31/12/2024	30/09/2028	

Aclaración: En el presente anexo se amplían las vigencias según acta de suspensión número 1 de fecha 22/04/2025, prorroga número 01 al acta de suspensión número 1 de fecha 22/05/2025 y prorroga número 02 al acta de suspensión número 1 de fecha 20/06/2025.
Todos los demás términos y condiciones no modificados por el presente anexo continúan en vigor.

Anexo 6 póliza de cumplimiento de suspensión prorroga

Tabla 8 póliza de cumplimiento reinicio anexo 5

Anexo	FECHA EXPEDICION	NOMBRE / TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA	OBSERVACIONES
5	22/07/2025	Buen Manejo e Inversión del Anticipo	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	49-44-101035208	$5.724.896.516,66	31/12/2024	31/03/2026	POLIZA APROBADA POR LA GERENTE DE CONTRATACION EL 12/08/2025
		CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			$ 2.862.448.258,33	31/12/2024	31/12/2025	
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA			$2.862.448.258.33	30/06/2025	30/06/2027	
		SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES			$ 2.146.836.193.75	31/12/2024	30/06/2028	
5	22/07/2025	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO	49-40-101011266	$715,612,064.58	31/12/2024	30/09/2025	PÓLIZA APROBADA POR EL GERENTE DE CONTRATACIÓN EL 12/08/2025

en el presente anexo se aclara acta de reinicio número 1 de fecha 21/07/2025. todos los demás términos y condiciones no modificados por el presente anexo continúan en vigor.

Anexo 7 póliza de cumplimiento reinicio

Anexo 8 póliza extracontractual de reinicio

3.3. IMPOSICIÓN DE MULTAS Y SANCIONES

Hasta la fecha del presente informe no se han impuesto multas y sanciones al consorcio Rio Banadia.

3.4. ACTOS ADMINISTRATIVOS

Durante la ejecución del contrato de obra con corte a la fecha del presente informe, se han suscrito los siguientes actos administrativos:

Tabla 9 actos administrativos contrato de obra 481 de 2024

FECHA	ACTO ADMINISTRATIVO	MOTIVO DEL ACTO ADMINISTRATIVO	SUSCRITA POR
31/12/2024	Resolución 4877 de 2024" Por medio del cual la administración departamental ordena la adjudicación del contrato resultante del proceso de licitación pública N°LO-02-RE-001-2024 y su publicación en la página web" *(resolución reposa en el anexo 6 del informe 1)*	*Celebración del contrato de obra 481 de 2024*	*LUZ LILIANA MERCHENA PINZON GERENTE DE CONTRATACIÓN JHONN FREDY GARCIA BELTRAN R/L. CONSORCIO RIO BANADIA*
31/12/2024	ACTA DE INICIO *(acta de inicio reposa en el anexo 2 del informe1)*	*SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA DE INICIO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CITADO CONTRATO*	*NASSER CRUZ MATUS SECRETARIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA DEPARTAMENTAL JHONN FREDY GARCIA BELTRAN R/L. CONSORCIO RIO BANADIA JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON R/L. CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION*
22/04/2025	ACTA DE SUSPENSIÓN *(acta de suspensión reposa en el anexo 1 del presente informe)*	*ACTA DE SUSPENSIÓN N° 1 CONTRATO DE OBRA NO. 431-2024*	*NASSER CRUZ MATUS SECRETARIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA DEPARTAMENTAL JEISSON RENE VILLAREAL ROA R/L. CONSORCIO RIO BANADIA JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON R/L. CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001 DEL 03/01/2025*
22/05/2025	PRORROGA No. 01 AL ACTA DE SUSPENSION No. 1 CONTRATO DE OBRA No. 481.2024 *(acta de prorroga No.1 reposa en el anexo 2 del presente informe)*	*PRORROGA No. 1*	*GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA DEPARTAMENTAL JEISSON RENE VILLAREAL ROA R/L. CONSORCIO RIO BANADIA JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON R/L. CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001 DEL 03/01/2025*
20/06/2025	PRORROGA No. 02 AL ACTA DE SUSPENSION No. 1 CONTRATO DE OBRA No. 481.2024 *(acta de prorroga No.2 reposa en el anexo 2 del presente informe)*	*PRORROGA No. 2*	*GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA DEPARTAMENTAL JEISSON RENE VILLAREAL ROA R/L. CONSORCIO RIO BANADIA JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON R/L. CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001 DEL 03/01/2025*
21/07/2025	ACTA DE REINICIO No. 01 AL CONTRATO DE OBRA No. 481.2024 *(acta de reinicio No.3 reposa en el anexo 2 del presente informe)*	*ACTA DE REINICIO No.1*	*GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA DEPARTAMENTAL JEISSON RENE VILLAREAL ROA R/L. CONSORCIO RIO BANADIA JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON R/L. CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001 DEL 03/01/2025*

3.4.1. Modificación y /o adiciones al contrato

Durante el periodo del 21 de julio al 31 de julio de 2025 no se han presentado modificación y/o adiciones a las condiciones contractuales del contrato N°481/2024.

3.4.2. Compensación de mayores y menores cantidades

No se han presentado actas de mayores y menores cantidades durante el periodo del presente informe.

3.5. ACTAS DE COMITÉ TÉCNICOS

Durante la ejecución del contrato de obra con corte a la fecha del presente informe, se han realizado las siguientes actas de comités técnicos.

Tabla 10 actas de comité

FECHA	No. DE ACTA DE COMITE	TEMAS TRATADOS	PARTICIPANTES DEL COMITÉ
22/07/2025	6	ACTA DE REINICIO N°01	*NASSER CRUZ MATUS* (SECRETARIO DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL) JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON R/L. CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION (INTERVENTOR EXTERNO) JEISSON RENE VILLAREAL ROA. (CONTRATISTA DE OBRA) CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO (COORDINADOR DE OFICINA DE GESTION DEL RIESGO) JAIRO ALEXANDER BARRAGAN MENDOZA (ESPECIALISTA HIDRAULICO)

(Acta de reinicio reposa en el anexo 3 del presente informe)

Anexo 9 acta de comité

3.6. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA.

Durante la ejecución del contrato de obra con corte a la fecha del presente informe, se ha enviado y recibido la siguiente correspondencia entre la Interventoría, el contratista.

Tabla 11 Relación de correspondencia enviada por la Interventoría del Contrato de Obra No. 481 de 2024

FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	DESCRIPCION
06/05/2025	CONSORCIO RIO BANADIA	INTERVENTORIA EXTERNA	ENTREGA DE INFORME MES DE ABRIL 2025.
09/05/2025	CONSORCIO RIO BANADIA	INTERVENTORIA EXTERNA	ENTREGA DE INFORME MES DE MARZO 2025.

FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	DESCRIPCION
20/06/2025	CONSORCIO RIO BANADIA	INTERVENTORIA EXTERNA	SOLICITUD DE SEGUNDA PRORROGA A LA SUSPENSIÓN.
08/07/2025	CONSORCIO RIO BANADIA	INTERVENTORIA EXTERNA	SOLICITUD DE PÓLIZAS ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE SUSPENSIÓN 1, ACTAS DE PRÓRROA 1 Y 2 A LA SUSPENSIÓN 1.
23/07/2025	CONSORCIO RIO BANADIA	INTERVENTORIA EXTERNA	SOLICITUD DE PÓLIZAS ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE REINICIO.
04/08/2025	CONSORCIO RIO BANADIA	INTERVENTORIA EXTERNA	ACTUALIZACIÓN DE INFORMES ENTREGADOS - SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES

Tabla 12 Relación de correspondencia recibida por la Interventoría del Contrato de Obra No481 de 2024

FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	DESCRIPCION
21/05/2025	INTERVENTORIA EXTERNA	CONSORCIO RIO BANADIA	AVANCE Y ESTADO DEL TRAMITE ADMINISTRATIVO DE PERMISOS AMBIENTALES
02/07/02	INTERVENTORIA EXTERNA	CONSORCIO RIO BANADIA	SOLICITUD DE PÓLIZAS ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE INICIO, ACTAS DE PRÓRROGA 1 Y 2 A LA SUSPENSIÓN 1.
03/07/02	INTERVENTORIA EXTERNA	CONSORCIO RIO BANADIA	SOLICITUD DE PÓLIZAS ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE INICIO, ACTAS DE PRÓRROGA 1 Y 2 A LA SUSPENSIÓN 1.
08/07/02	INTERVENTORIA EXTERNA	CONSORCIO RIO BANADIA	SOLICITUD DE PÓLIZAS ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE INICIO, ACTAS DE PRÓRROGA 1 Y 2 A LA SUSPENSIÓN 1.
19/07/2025	INTERVENTORIA EXTERNA	CONSORCIO RIO BANADIA	INVITACIÓN COMITÉ ACTA DE REINICIO 01.
21/07/2025	SECRETARIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA	CONSORCIO RIO BANADIA	INVITACIÓN COMITÉ ACTA DE REINICIO 01.
22/07/2025	INTERVENTORIA EXTERNA	CONSORCIO RIO BANADIA	SOLICITUD DE PÓLIZAS ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE REINICIO

FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	DESCRIPCION
30/07/2025	INTERVENTORIA EXTERNA	CONSORCIO RIO BANADIA	SOLICITUD DE REPROGRAMACION Y PLAN DE CONTINGENCIA

Anexo 10 Correspondencia enviada Y recibida.

3.7. BITACORA DIARIA DE OBRA

La bitácora de obra correspondiente al contrato número 481 de 2024 será gestionada y actualizada de manera periódica por los residentes de obra y el director de obra, quienes se encargarán de registrar de forma detallada todas las actividades realizadas, los avances de obra, los problemas presentados y las incidencias que puedan surgir durante el proceso de ejecución. El residente de interventoría y el director de interventoría serán responsables de realizar la supervisión y validación de los registros en la bitácora, asegurando que se cumpla con las especificaciones técnicas, los plazos establecidos y las normativas aplicables. La coordinación entre los equipos de obra e interventoría garantizará la correcta documentación y trazabilidad de la obra, permitiendo un seguimiento adecuado del desarrollo del proyecto y su cumplimiento conforme a los estándares establecidos.
Es relevante señalar que el día 20 de enero de 2025, se dio apertura formal al proyecto del contrato número 481 de 2024, marcando el inicio de las actividades correspondientes para la ejecución de las obras.

Anexo 11 Bitácoras De Obra Del 21 De julio De 2025 Al 31 De julio De 2025

3.8. CONTROL SOCIAL DE LA OBRA

3.8.1. Socialización De La Obra.


El 18/01/2025, se realizó la socialización del proyecto para la CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA, en el sitio de obra en la vereda bajo Banadia del municipio de Saravena departamento de Arauca, previa convocatoria realizada por el Departamento de Arauca a través de la Secretaría de Gobierno.
En dicha reunión participaron representantes de la gobernación de Arauca, de la firma contratista de la obra, de la Interventoría externa y de la comunidad beneficiada con el proyecto, a quienes se les dio a conocer el alcance físico y financiero del contrato, el plazo de ejecución del mismo y el cronograma de la obra presentado por el contratista; de igual forma se atendieron las observaciones e inquietudes de los participantes y se presentaron los profesionales que van a estar frente a la ejecución del proyecto por parte del contratista, la Interventoría externa y la supervisión del Departamento de Arauca.

En la socialización de la obra correspondiente al contrato número 481 de 2024, se recogió información relevante del acta de socialización de la obra. Durante esta reunión, se llevó a cabo la conformación de la veeduría ciudadana, permitiendo la participación activa de la comunidad en el seguimiento y control del proyecto. En la reunión se levantó como soporte el Acta de Socialización de la obra, la cual se presenta en el ANEXO 9 del informe 1.
(Acta De Socialización reposa en el anexo 9 del informe 1)

Ilustración 2 socialización del contrato 481 de 2024

3.8.2. Conformación De La Veeduría Ciudadana



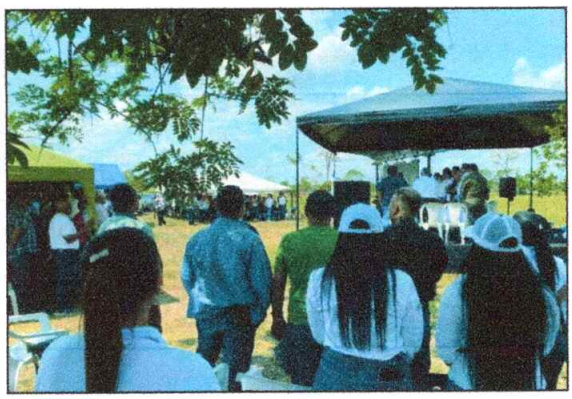

Fuente 1 autor propio

En la reunión de socialización del proyecto se llevó a cabo por parte de la comunidad que asistió a la convocatoria, el nombramiento de las personas que hacen parte de la veeduría ciudadana y que serán los voceros de la comunidad durante toda la etapa de ejecución de la obra ante el contratista, la Interventoría externa, entidad contratante, entes de control y demás instituciones.

(Resolución de conformación de veeduría ciudadana reposa en el anexo 10 del informe 1)

Tabla 13 Conformación de la veeduría ciudadana para el control social del contrato de obra No. 481 del 2024

VEEDURIA CIUDADANA					
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	TELEFONO	CARGO	VEREDA/BARRIO
1	*OSCAR JAVIER RIOS GOMEZ.*	*1.115.722.421*	*3195035254*	*VOCERO*	*Bajo Banadia*
2	*WILLIAM PEÑALOZA PEÑALOZA*	*96.185.880*	*3058818465*	*VEEDOR*	*Puerto Nariño*
3	*LEIRA NAYARIT PEDRAZA URIBE*	*1.115.744.872*	*3022027500*	*VEEDOR*	*Puerto Nariño*

La veeduría ciudadana fue reconocida por el Ministerio Público del Municipio de Saravena, mediante Resolución No. 005 del (28/01/2025) siendo nombrado como

VOCERO o representante del Comité Veedor al señor OSCAR JAVIER RIOS GOMEZ.

3.8.3. Actas de reuniones suscritas por la veeduría

A la fecha del presente informe no se han suscrito ningún acta de reunión.

3.8.3.1. Acta de veeduría de inicio de obra.

Con el fin de dar inicio a la ejecución física de las obras, el (20/01/2025) se suscribe con la veeduría ciudadana del contrato de obra No. 481 del 2024, el acta de veeduría de inicio de obra, en la cual se da a conocer por parte del contratista y la Interventoría externa aspectos como el cronograma de trabajo, vinculación del personal, acopio de materiales, fecha prevista para la terminación de las actividades, entre otros.

(acta de inicio de veeduría reposa en el anexo 11 del informe 1)

3.9. VINCULACION DEL PERSONAL Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES

El contratista vinculó el personal requerido para la administración y ejecución de los trabajos de acuerdo al alcance de la obra, realizando previamente la afiliación al sistema de seguridad social integral y riesgos laborales. La Interventoría antes del ingreso del personal a la obra verificó las respectivas afiliaciones, así como el pago mensual de los aportes a salud, pensión, riesgos y aportes parafiscales conforme a las planillas de pago entregadas por el contratista.

Anexo 12 exámenes de ingreso y afiliaciones

3.9.1. Personal Administrativo

El personal profesional y administrativo que laboró en la obra para el periodo del presente informe, es el mismo que fue ofertado por el contratista en el proceso de selección y no ha sido modificado hasta la fecha.
A continuación, se relaciona el personal administrativo del contratista:

Tabla 14 Personal administrativo del contrato de obra No. 481 de 2024 en el mes de julio de 2025

DATOS GENERALES										
	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	CC	CARGO	SALARIO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	FECHA REINGRESO	DIAS LABORADOS
1	VILLAREAL	ROA	JEISSON RENE	1.018.444.460	REPRESENTANTE LEGAL	$1.423.500	14-2-2024	22/04/2025	21/07/2025	79
2	VILA	SARABIA	JAIR LEANDRO	1.091.659.018	DIRECTOR DE OBRA	$ 8.000.000	31-12-2024	22/04/2025	21/07/2025	124
3	BARRAGAN	MENDOZA	JAIRO ALEXANDER	80.109.920	ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA	$ 2.250.000	31-12-2024	22/04/2025	21/07/2025	124
4	GARCIA	BELTRAN	JHONNATHAN ALEXIS	1.098.716.716	ING RESIDENTE	$ 5.000.000	31-12-2024	22/04/2025	21/07/2025	124
5	GARCIA	BELTRAN	JHONN FREDY	1.098.752.791	ING RESIDENTE	$ 5.000.000	31-12-2024	22/04/2025	21/07/2025	124
6	OLAYA	BAYONA	LAURA CRISTINA	1.094.283.275	ING AMBIENTAL	$ 5.000.000	31-12-2024	22/04/2025	21/07/2025	124

DATOS GENERALES										
7	BOTIA	CHONA	MARLYN YVETTE	1.020.810.816	PROFESIONAL SOCIAL	$ 3.000.000	31-12-2024	22/04/2025	21/07/2025	124
8	GARRIDO	RIVERO	CAMILO ANDRES	1.094.269.468	HSEQ	$ 3.000.000	31-12-2024	22/04/2025	21/07/2025	124
9	GUTIERREZ	VACCA	HORLEYDA	1.116.496.517	CONTADOR	$ 1.500.000	31-12-2024	22/04/2025	21/07/2025	124
10	PAEZ	GARCÍA	FERNEY	1.098.684.323	INSPECTOR DE OBRA	$ 3.000.000	31-12-2024	22/04/2025	21/07/2025	124
11	OCHOA		JESSICA LILIBETH	1.098.658.689	SECRETARIA	$ 2.000.000	31-12-2024	22/04/2025	21/07/2025	124
12	DELGADO	MONTAGUT	JOAQUIN EDUARDO	88.215.089	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	$2.750.000	31-12-2024	22/04/2025	21/07/2025	124

3.9.2. Personal Operativo De La Obra

El contratista utilizó mano de obra no calificada de la región con lo cual fue posible generar empleo en la zona de influencia del proyecto. Así mismo vinculó mano de obra calificada para dirigir las actividades de acuerdo a los requerimientos técnicos de la obra.
A continuación, se relaciona el personal operativo del contratista.

Tabla 15 Personal operativo del contrato de obra No. 481 de 2024 en el mes de julio de 2025.

DATOS GENERALES										
	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	CC	CARGO	SALARIO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	FECHA REINGRESO	DIAS LABORADOS
1	QUINTERO	VILLAMIZAR	JUAN VICENTE	9.466.736	OFICIAL	$ 1.755.000	20-01-2025	22/04/2025	21/07/2025	104
2	JOYA	TAMARA	EDWIN GABRIEL	1.119.185.219	OFICIAL	$ 1.755.000	21/07/2025	- - - -	- - - -	11
3	CASTAÑEDA	MENDOZA	NELSON ARLEY	1.115.722.498	AYUDANTE	$ 1.423.500	20-01-2025	22/04/2025	21/07/2025	104
4	MONCADA	CORONEL	JESUS ANTONIO	1.125.760.100	AYUDANTE	$ 1.423.500	18/02/2025	22/04/2025	21/07/2025	75
5	GELVIS	PEÑALOZA	DERIAN	1.148.703.169	AYUDANTE	$ 1.423.500	18/02/2025	22/04/2025	21/07/2025	75
6	TORREZ	VELANDIA	DAVISON	1.115.740.780	AYUDANTE	$ 1.423.500	18/02/2025	22/04/2025	21/07/2025	75
7	RIVERO	VILLAMIZAR	JOSE PABLO	88.311.695	AYUDANTE	$ 1.423.500	18/02/2025	22/04/2025	21/07/2025	75
8	ZAPATA		ALEXANDER	96.194.216	AYUDANTE	$ 1.423.500	27/02/2025	22/04/2025	21/07/2025	66
9	ORTEGA	CONTRERAS	CARLOS	88.219.552	AYUDANTE	$ 1.423.500	27/02/2025	22/04/2025	21/07/2025	66
10	BERNAL	RODRIGUEZ	JESUS GUILLERMO	1.115.742.269	AYUDANTE	$ 1.423.500	21/07/2025	- - - -	- - - -	11
11	PABON	GOMEZ	DAVINSON ANDRES	1.234.339.637	AYUDANTE	$ 1.423.500	21/07/2025	- - - -	- - - -	11
12	MEDINA	GOMEZ	DIEGO ANDRES	1.006.407.775	AYUDANTE	$ 1.423.500	21/07/2025	- - - -	- - - -	11

Anexo 13 Planillas De Seguridad Social del mes de Julio 2025

3.9.3. Pagos Salariales Y Liquidación Del Personal

El contratista realizó los pagos salariales de los trabajadores vinculados a la ejecución de la obra, conforme al contrato laboral (verbal o escrito) entre las fechas comprendidas del 21 de julio al 31 de julio 2025;

Anexo 14 Nóminas De Pagos Mensual mes de julio 2025

3.10. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

3.10.1. Dotación Del Personal

La firma contratista llevó a cabo la dotación del personal que labora en la obra con los elementos de protección requeridos en el desarrollo de sus labores diarias, de acuerdo a las necesidades de cada trabajador, haciendo entrega de los siguientes elementos:

Tabla 16 Dotación del personal en obra de elementos de protección-Contrato de Obra No. 481 de 2024

ELEMENTOS DE PROTECCION	ENTREGADOS		ESTADO			BENEFICIARIOS
	Si	No	Bueno	Regular	Malo	
CASCO	X		X			Ingenieros, operarios, Oficiales, ayudantes.
GUANTES	X		X			Oficiales, ayudantes.
BOTAS DE SEGURIDAD	X		X			Ingenieros, operarios, Oficiales, ayudantes.
BOTAS DE CAUCHO						
GAFAS DE PROTECCION	X		X			Ingenieros, operarios, Oficiales, ayudantes.
OVEROL/CAMISA/PANTALON	X		X			Ingenieros, operarios, Oficiales, ayudantes.
TAPA BOCAS	X		X			Ingenieros, operarios, Oficiales, ayudantes.
MASCARA						

La Interventoría verificó diariamente en campo la utilización de los elementos de protección por parte del personal en obra, haciendo los respectivos requerimientos a los trabajadores que en determinado momento no los estaban usando. En obra se firmaron actas de entrega de EPP que reposan en el ANEXO 15. del presente informe del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo del mes de enero (SG-SST).

Ilustración 3 entrega de dotacion al personal





3.10.2. Señalización De La Obra

En la ejecución de los trabajos, se implementaron las señalizaciones requeridas para el aislamiento de las zonas de trabajo, así como la instalación de las señales preventivas y vallas necesarias en la ejecución de la obra.


Tabla 17 Señalización instalada en la obra por el contratista- Contrato de Obra No. 481 de 2024

ELEMENTOS DE SEÑALIZACION	INSTALADOS		ESTADO			LOCALIZACION EN OBRA
	Si	No	Bueno	Regular	Malo	
AVISOS PREVENTIVOS	x		x			
AVISOS INFORMATIVOS	x		x			

La Interventoría diariamente verificó que dichas señales se encontraran debidamente instaladas en todos los frentes de trabajo de la obra y en buen estado, haciendo las recomendaciones del caso al contratista para subsanar cualquier inconveniente frente a la falta de señalización o mal estado de la misma.

Ilustración 4 señalización de la obra.



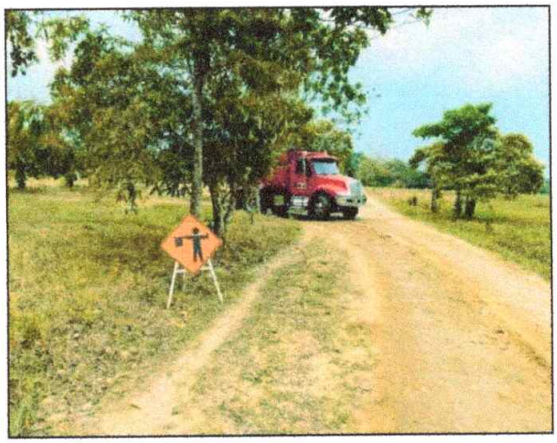

Fuente 2 autor propio

3.10.3 Valla Informativa del Proyecto

En cumplimiento de la normatividad vigente y como parte de las medidas de señalización, se instaló la valla informativa en el acceso principal al área de intervención. Esta contiene la información general del contrato (número, objeto,

plazo y valor), así como los datos de la entidad contratante, contratista e interventoría, asegurando la visibilidad y transparencia hacia la comunidad.

Ilustración 5 valla informativa.



3.10.4 Accidentalidad En La Obra.

El profesional idóneo por parte de obra e interventoría estuvieron muy atentos, lo cual hizo posible que dentro el transcurso del presente informe no se presentara ningún accidente laboral dentro de la obra. cabe destacar que durante este periodo tampoco se vieron involucrados terceras personas en ningún tipo de accidente.

3.10.5 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

Teniendo en cuenta la normatividad vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo (Decreto 1072 de 2015) establecida por el Ministerio de Trabajo, todos los empleadores deben implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) el cual "consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua, lo cual incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en los espacios laborales.

Anexo 15 Informe del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST)

3.11 PERMISOS Y LICENCIAS

Ante la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía – CORPORINOQUIA, se gestionaron y obtuvieron los permisos necesarios, los cuales fueron expedidos mediante Resolución No. 700.36.25.0082 del 18 de julio de 2025, comprendiendo:

- Permiso de ocupación de cauces, playas y lechos: autoriza la intervención en áreas de dominio público hídrico, bajo condiciones técnicas y ambientales específicas para prevenir impactos negativos sobre los ecosistemas acuáticos.

- Concesión de aguas superficiales: habilita el uso de recurso hídrico proveniente de fuentes naturales, con fines constructivos y de operación, garantizando un aprovechamiento sostenible y controlado, conforme a los volúmenes y términos establecidos en la resolución otorgada.

La obtención de estos permisos no solo es requisito legal, sino que asegura que las actividades del proyecto se desarrollen dentro de un marco de legalidad, sostenibilidad y responsabilidad ambiental, bajo la supervisión de la autoridad competente.

En coherencia con lo anterior, y en cumplimiento de las obligaciones derivadas de los permisos, se ha verificado que las actividades constructivas que requieren el uso de materiales como arena se abastecen exclusivamente de canteras autorizadas en la región, respaldadas con documentación legal vigente. Esta medida garantiza la trazabilidad y legalidad en la adquisición de recursos, minimizando riesgos ambientales y evitando sanciones administrativas.

Trazabilidad de los permisos ambientales

- Mediante comunicado oficial N° 700.11.25-0637 del 09 de mayo de 2025 la Corporación autónoma Regional de la Orinoquia Corporinoquia informo al departamento de Arauca el costo del servicio de evaluación de la solicitud de Concesión de aguas superficiales y Ocupación de cauce.

- En consecuencia el día 13 de mayo bajo radicado No. 700.11.25-063 el departamento de Arauca solicito la expedición de la factura por los servicios de evaluación.

- La corporación autónoma regional de la Orinoquia mediante comunicado No. 700.1125.06-78 del 14 de mayo de 2025 allegó con destino al departamento de Arauca factura SAFE No. 5405 del 14 del 14 de mayo de 2025

- A través del radicado No. AR-2025-01330 de 05 de junio de 2025 el departamento de Arauca allegó soporte de pago

- Que la Corporación autónoma regional de la Orinoquia Corporinoquia Mediante auto No. 700.6.25-0227 del 05 de junio de 2025 dio inicio al trámite administrativo de carácter ambiental la evaluación de la solicitud de autorización de los permisos ambientales

- El acto administrativo fue notificado mediante correo el día 09 de junio de 2025 y publicado en la página web, seguido se designaron en la corporación profesionales de dirección territorial para realizar el proceso de evaluación y llevar a cabo la visita técnica el día 26 de junio de 2025

Como consecuencia de la evaluación documental y de la información recopilada de la visita técnica se suscribió el concepto técnico No. 700.8.2.25-0191 de 17 de julio de 2025 el cual consolida como soporte técnico para el presente acto administrativo

3.12 CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA

La interventoría verificó que el contratista utilizara en la ejecución de las actividades del contrato, la maquinaria y equipos requeridos según los APU y especificaciones técnicas del proyecto. Así mismo constató el estado físico y de operación de la maquinaria y equipo solicitando al contratista sustituirlo por mal estado o realizarle mantenimiento preventivo y/o correctivo, cada vez que fue necesario.

Anexo 16 Hojas de vida de los equipos y documentación maquinaria, vehículos

La maquinaria y equipo que el contratista utilizó durante el periodo del presente informe fue el siguiente:

Tipo:	VOLQUETA
Marca:	CHEVROLET
Referencia:	KODIAK
Días en obra:	104
Estado:	*BUENO*
Regularidad del mantenimiento:	MENSUAL
Vibraciones/ Ruidos:	NO PRESENTA
Idoneidad de operarios:	IDONEO



Ilustración 6 Equipo tipo volqueta

Tipo:	VOLQUETA
Marca:	INTERNATIONAL
Días en obra:	104
Estado:	*BUENO*
Regularidad del mantenimiento:	MENSUAL
Vibraciones/ Ruidos:	NO PRESENTA
Idoneidad de operarios:	IDONEO

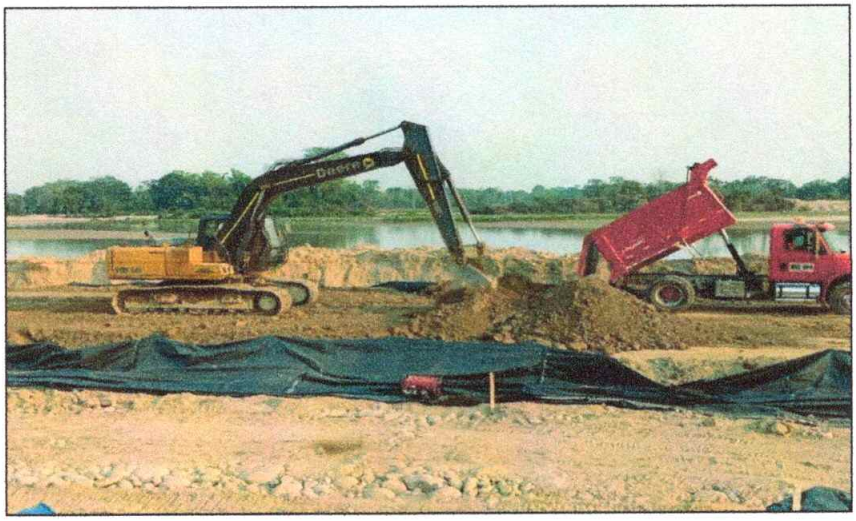


Ilustración 7 Equipo tipo volqueta 2

Tipo:	VOLQUETA
Marca:	FORD
Referencia:	F 600
Días en obra:	11
Estado:	*BUENO*
Regularidad del mantenimiento:	MENSUAL
Vibraciones/ Ruidos:	NO PRESENTA
Idoneidad de operarios:	IDONEO



Ilustración 8 equipo tipo volqueta 3

Tipo:	VOLQUETA
Marca:	DODGE
Referencia:	D 600
Días en obra:	11
Estado:	*BUENO*
Regularidad del mantenimiento:	MENSUAL
Vibraciones/ Ruidos:	NO PRESENTA
Idoneidad de operarios:	IDONEO



Ilustración 9 Equipo tipo volqueta 4

Tipo:	RETROEXCAVADORA
Marca:	CATERPILLAR
Referencia:	320D3GC
Días en obra:	104
Estado:	*BUENO*
Regularidad del mantenimiento:	QUINCENAL
Vibraciones/ Ruidos:	NO PRESENTA
Idoneidad de operarios:	IDONEO



Ilustración 10 Equipo tipo retroexcavadora 1

Tipo:	RETROEXCAVADORA
Marca:	JHON DEERE
Referencia:	160LC
Días en obra:	104
Estado:	*BUENO*
Regularidad del mantenimiento:	QUINCENAL
Vibraciones/ Ruidos:	NO PRESENTA



Ilustración 11 Equipo retroexcavadora 2

Tipo:	RETROEXCAVADORA
Marca:	KOMASUT
Referencia:	PC200
Días en obra:	11
Estado:	*BUENO*
Regularidad del mantenimiento:	QUINCENAL
Vibraciones/ Ruidos:	NO PRESENTA

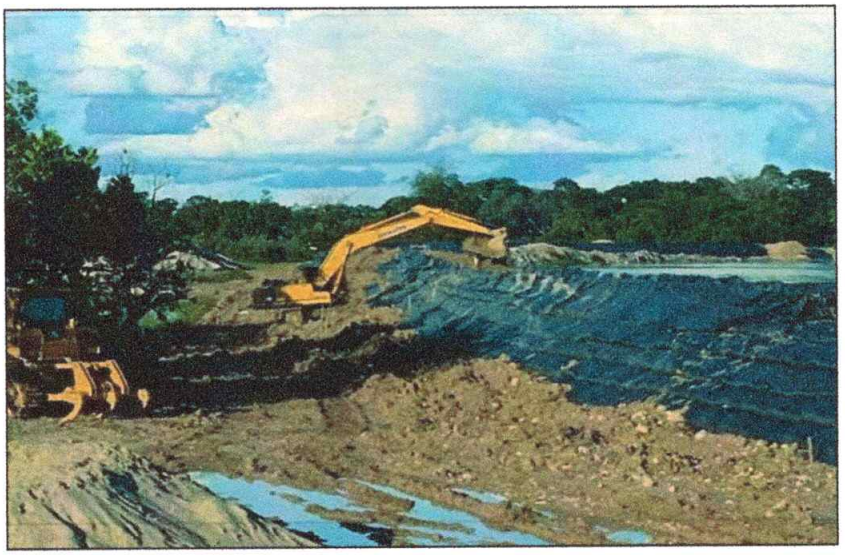


Ilustración 12 Equipo retroexcavadora 3

Tipo:	RETROEXCAVADORA
Marca:	CATERPILLAR
Referencia:	320D3GC
Días en obra:	11
Estado:	*BUENO*
Regularidad del mantenimiento:	QUINCENAL
Vibraciones/ Ruidos:	NO PRESENTA
Idoneidad de operarios:	IDONEO



Ilustración 13 equipo retroexcavadora 4

Tipo:	MOTONIVELADORA
Marca:	CATERPILLAR
Referencia:	120C
Días en obra:	11
Estado:	*BUENO*
Regularidad del mantenimiento:	QUINCENAL
Vibraciones/ Ruidos:	NO PRESENTA
Idoneidad de operarios:	IDONEO



Ilustración 14 equipo motoniveladora

Tipo:	VIBROCOMPATADOR
Marca:	DYNAPAC
Referencia:	CA 25 D
Días en obra:	104
Estado:	*BUENO*
Regularidad del mantenimiento:	QUINCENAL
Vibraciones/ Ruidos:	NO PRESENTA
Idoneidad de operarios:	IDONEO



Ilustración 15 equipo vibrocompactador

Tipo:	CARROTANQUE
Días en obra:	11
Estado:	*BUENO*
Regularidad del mantenimiento:	QUINCENAL
Vibraciones/ Ruidos:	NO PRESENTA
Idoneidad de operarios:	IDONEO



Ilustración 16 Equipo carrotanque

Por otro lado, la interventoría realizó un seguimiento y control a la maquinaria y equipos propios y/o alquilados por el contratista verificando que los seguros se encuentren vigentes.

(Contratos De Equipos Utilizados Reposa en el anexo 17 del informe 1)

Tabla 18 Seguimiento y control de la maquinaria y equipos utilizado en la ejecución del contrato del contrato No. 481 del 2024

ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO				OBSERVACIONES
	MES 1				
	SI	NO	SI	NO	
El contratista cuenta con los contratos de alquiler de la maquinaria y equipo que no son de su propiedad debidamente suscritos con terceros.	x				NINGUNA
Los vehículos maquinaria y equipo que el contratista tiene en la obra cumplen con los siguientes requisitos: • SOAT • Tarjeta de propiedad • Licencia de conducción de la persona responsable	x				NINGUNA

Anexo 17 Preoperacionales Equipos mes de julio del 2025

4 ASPECTOS TECNICOS

4.10 CONDICIONES CONTRACTUALES

El contrato de obra suscrito entre el Departamento de Arauca y la firma contratista CONSORCIO RIO BANADIA contempla las siguientes actividades a desarrollar dentro del plazo contractual establecido de 06 (SEIS) meses.

Tabla 19 presupuesto contractual

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**OBRAS DE PROTECCIÓN RIO BANADIA**				
1,1	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN CONGLOMERADO ENTRE 0-2 m DE PROFUNDIDAD	M3	16.298,68	$ 19.239,00	$ 313.570.304,52
1,2	ACARREO MATERIAL INTERNO NO MAYOR A 2 KM PARA REFORZAMIENTO DEL TALUD NATURAL	M3	16.298,68	$ 23.478,00	$ 382.660.409,04
1,3	CONFORMACIÓN DE BARRERA TIPO JARILLÓN	M3	25.673,470	$127.588,00	$ 3.275.626.690,36
1,4	GEOTEXTIL NT 2400	M2	91.742,40	$ 19.172,00	$ 1.758.885.292,80
1,5	GEOTEXTIL NT 3000	M2	10.858,40	$ 23.242,00	$ 252.370.932,80
1,6	GEOTEXTIL TEJIDO 2100	M2	20.420,44	$ 17.337,00	$ 354.029.168,28
1,7	MANEJO DE AGUAS	MES	6,00	$ 4.293.354,00	$ 25.760.124,00
1,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLEXOCRETO	M2	19.944,00	$ 127.609,00	$ 2.545.033.896,00
1,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSACRETO	M3	3.722,88	$ 940.227,00	$ 3.500.352.293,76
1,10	Filtro o Dren Frances PVC 100 mm (0.6x0.8) m	M	1.108,00	$ 249.909,00	$ 276.899.172,00
1,11	RELLENOS TALUD DERECHO ANCLAJE DIQUE	M3	13.674,94	$ 118.615,00	$ 1.622.053.008,10
				SUB-TOTAL COSTO OBRA FÍSICA (INCLUYE A.I.U)	**$ 14.307.241.291,66**
				APLICACIÓN AL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA - PUEA	**$ 5.000.000,00**
				TOTAL, OBRA FÍSICA	**$ 14.312.241.291,66**

4.11 CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA

Para el periodo del presente informe de obra comprendido del 21 de julio del 2025 al 31 de julio del 2025, se han ejecutado las siguientes cantidades para cada uno de los ítems del contrato:


ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD PRESENTE INFORME	VALOR PRESENTE INFORME	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL ACUMULADO
1	OBRAS DE PROTECCIÓN RIO BANADIA								
1,1	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN CONGLOMERADO ENTRE 0-2 m DE PROFUNDIDAD	M3	16.298,68	$ 19.239,00	$ 313.570.304,52	0,00	0,00	14268,68	$274.515.219,30
1,2	ACARREO MATERIAL INTERNO NO MAYOR A 2 KM PARA REFORZAMIENTO DEL TALUD NATURAL	M3	16.298,68	$ 23.478,00	$ 382.660.409,04	0,00	0,00	14.268,70	$ 335.000.538,60
1,3	CONFORMACIÓN DE BARRERA TIPO JARILLÓN	M3	25.673,47	$ 127.588,00	$ 3.275.626.690,36	9731,82	$ 1.241.663.450,16	9731,82	$ 1.241.663.450,16
1,4	GEOTEXTIL NT 2400	M2	91.742,40	$ 19.172,00	$ 1.758.885.292,80	34776,00	$666.725.472,00	34776,00	$ 666.725.472,00
1,5	GEOTEXTIL NT 3000	M2	10.858,40	$ 23.242,00	$ 252.370.932,80	4.116,00	$ 95.664.072,00	4.166,00	$ 95.664.072,00
1,6	GEOTEXTIL TEJIDO 2100	M2	20.420,44	$ 17.337,00	$ 354.029.168,28	7.740,60	$ 134.198.782,20	7.740,60	$ 134.198.782,20
1,7	MANEJO DE AGUAS	MES	6,00	$ 4.293.354,00	$ 25.760.124,00	0,37	$1.588.540,98	4,10	$17.602.751,40
1,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLEXOCRETO	M2	19.944,00	$ 127.609,00	$ 2.545.033.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSACRETO	M3	3.722,88	$ 940.227,00	$ 3.500.352.293,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1,10	Filtro o Dren Frances PVC 100 mm (0.6x0.8)m	M	1.108,00	$ 249.909,00	$ 276.899.172,00	0,00	0,00	600,00	$149.945.400,00
1,11	RELLENOS TALUD DERECHO ANCLAJE DIQUE	M3	13.674,94	$ 118.615,00	$ 1.622.053.008,10	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL COSTO OBRA FÍSICA (INCLUYE A.I.U)					$ 14.307.241.291,66		$2.139.840.317,34		$2.915.315.685,66
APLICACIÓN AL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA - PUEA					$ 5.000.000,00		$ 305.547,00		$3.444.349,00
TOTAL, OBRA FÍSICA					$ 14.312.241.291,66		$ 2.140.145.864,34		$ 2.918.760.034,066

4.12 AVANCE DE LA OBRA

4.12.4 Avance Físico De La Obra

De acuerdo a las cantidades de obra ejecutadas en el periodo del presente informe No. 5 del 21 de julio del 2025 al 31 de julio del 2025, se presenta un avance de ejecución del 14.95% y un avance de obra acumulado del 20.39%, haciendo falta por ejecutar un 79.61% para completar la totalidad de las actividades establecidas en la minuta del contrato.

Ilustración 17 grafica avance de obra

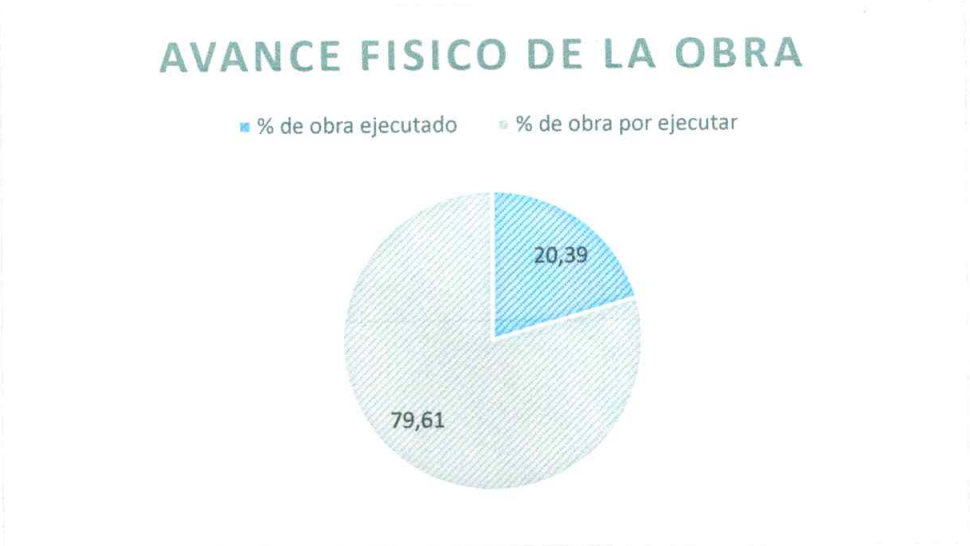

Fuente 3 autor propio

4.12.5 Avance Del Plazo Contractual

Con respecto al plazo contractual, de los 06 meses establecidos en la minuta del contrato, han transcurrido 4 meses Y 3 días desde la fecha de inicio hasta la fecha de corte del presente informe, lo cual equivale a un 68.13% del total del plazo contractual, restando 02 meses y 9 días para finalizar las actividades del contrato y proceder a entregar las obras al DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

PLAZO CONTRACTUAL	*SEIS (06) MESES*
TIEMPO SUSPENDIDO	*NOVENTA (90) DIAS*
PLAZO ADICIONADO	*N/A*
PLAZO EJECUTADO	*CUATRO (04) MESES Y 3 DIAS*
PLAZO POR EJECUTAR	*UNO (1) MES Y 27 DIAS*
% PLAZO EJECUTADO	*68.13%*


4.13 ACTIVIDADES DE OBRAS EJECUTADAS

Para el control de la programación, el contratista presentó a la Interventoría el respectivo cronograma de trabajo con cada uno de los ítems a ejecutar, con el cual se hizo seguimiento semanal y mensual al avance en la ejecución de todas las actividades y del contrato en general; A continuación, se presenta la siguiente tabla con los % de obra ejecutada a la fecha de corte del presente informe, comparando lo programado con lo ejecutado.

Tabla 20 Porcentaje de avance de obra Programado Vs Ejecutado del Contrato de Obra No. 481 de 2024.

SEMANAS			% AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO	% AVANCE EJECUTADO	% AVANCE EJECUTADO ACUMULADO
INICIO	SEM 1	31-12-2024 AL 05-01-2025	0,12%	0,12%	0,00%	0,00%
	SEM 2	06-01-2025 AL 12-01-2025	0,12%	0,24%	0,00%	0,00%
	SEM 3	13-01-2025 AL 19-01-2025	0,12%	0,36%	0,00%	0,00%
	SEM 4	20-01-2025 AL 26-01-2025	0,12%	0,48%	0,59%	0,59%
	SEM 5	27-01-2025 AL 31-01-2025	0,12%	0,60%	0,59%	1,18%
	SEM 6	01-02-2025 AL 09-02-2025	0,36%	0,96%	0,34%	1,52%
	SEM 7	10-02-2025 AL 16-02-2025	0,35%	1,31%	0,35%	1,87%
	SEM 8	17-02-2025 AL 23-02-2025	0,36%	1,67%	0,35%	2,22%
	SEM 9	24-02-2025 AL 28-02-2025	0,35%	2,02%	0,34%	2,56%
	SEM 10	01-03-2025 AL 09- 03-2025	5,56%	7,58%	0,64%	3,20%
	SEM 11	10-03-2025 AL 16- 03-2025	5,56%	13,14%	0,63%	3,83%
	SEM 12	17-03-2025 AL 23- 03-2025	5,55%	18,69%	0,64%	4,47%
	SEM 13	24-03-2025 AL 31- 03-2025	5.56%	24,25%	0,64%	5,11%
	SEM 14	01-04-2025 AL 06-04-2025	7,74%	31,99%	0,08%	5,19%
	SEM 15	07-04-2025 AL 13 -04-2025	7,73%	39,72%	0,08%	5,27%
	SEM 16	14-04-2025 AL 20-04-2025	7,74%	47,46%	0,09%	5,36%
	SEM 17	21-04-2025 AL 22-04-2025	7,73%	55,19%	0,08%	5,44%
	SEM 18	21-07-2025 AL 27-07-2025	7,17%	62,36%	9,52%	14,96%
CORTE DE INFORME	SEM 19	28-07-2025 AL 31-07-2025	4,1%	66,46%	5,43%	20,39%

Ilustración 18 Avance financiero programado Vs avance Ejecutado del Contrato de Obra No. 481 de 2024

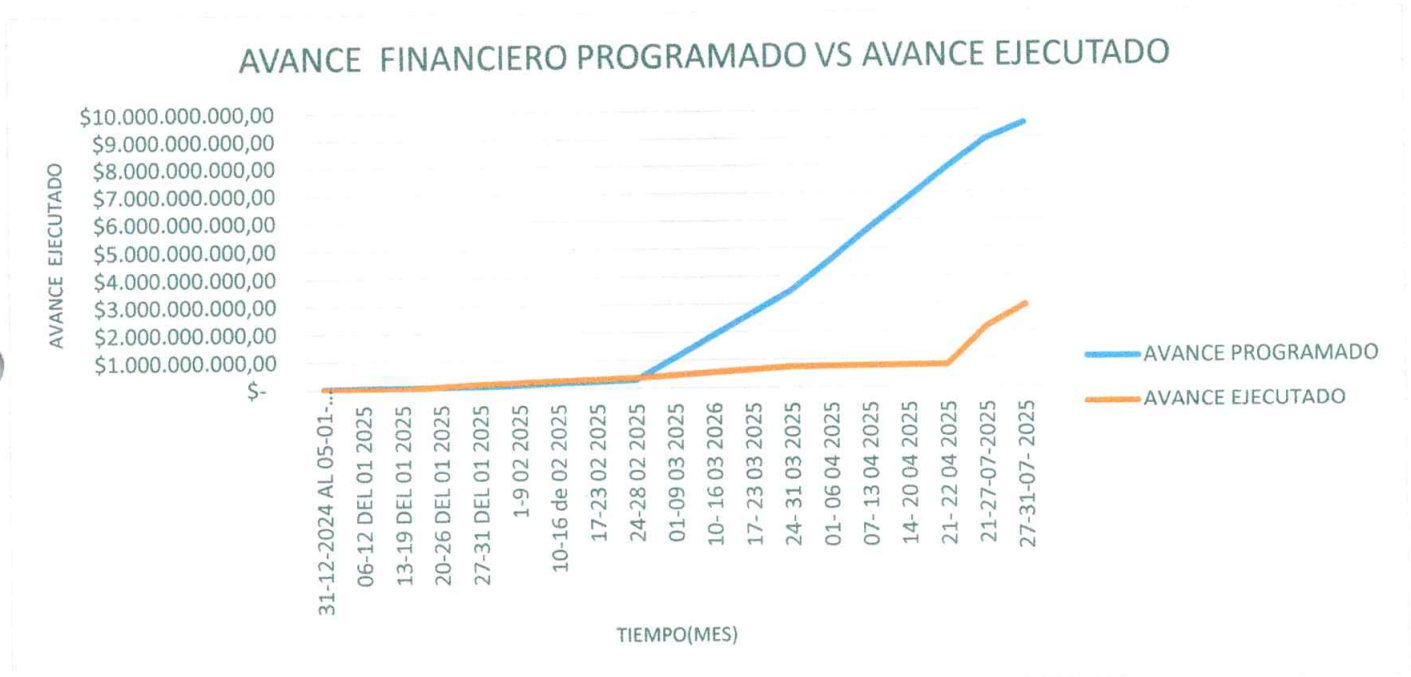

Fuente 4 autor propio

Ilustración 19 Avance físico programado Vs Ejecutado del Contrato de Obra No. 481 de 2024



Fuente 5 autor propio

Nota: Durante el mes de julio se tenía programado un avance del **66,46%**; sin embargo, el avance ejecutado alcanzó el **15,24%**, presentándose una diferencia del **51,22%** por debajo de lo previsto.

Acciones para mejorar el rendimiento y recuperar el atraso:

- Implementar jornadas extendidas o turnos adicionales en días con clima favorable para recuperar el atraso.

Compromiso: Con la implementación de estas medidas se espera nivelar el desfase y aumentar el rendimiento en los próximos meses, garantizando el cumplimiento de la programación general del proyecto.

4.14 IMPREVISTOS PRESENTADOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA

A la fecha del presente informe del 21 de julio de 2025 al 31 de julio de 2025 no se han presentado imprevistos.

4.15 ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADA

Para el periodo del presente informe comprendido entre el 21/07/2025 y 31/07/2025, la firma contratista bajo la supervisión y control de la Interventoría externa, ha ejecutado las siguientes actividades de los ítems del contrato:

ITEM 1.3 CONFORMACIÓN DE BARRERA TIPO JARILLÓN

La actividad de conformación de barrera tipo Jarillón consiste en la ejecución de un elemento de contención longitudinal, conformado principalmente por material de préstamo (tierra compactada), dispuesto en forma de talud trapezoidal, con el propósito de controlar, encauzar o contener el flujo de aguas, especialmente en zonas propensas a inundaciones.

La construcción del Jarillón se realiza mediante el acopio, transporte, extendido y compactación de material seleccionado, cumpliendo con los parámetros de estabilidad y resistencia definidos en los diseños técnicos y normativas vigentes. El talud debe contar con pendientes estables, berma superior, altura adecuada y sistema de drenaje, si aplica, para garantizar su funcionalidad y durabilidad.

Previo a su conformación, se ejecutan labores de limpieza y preparación del terreno de fundación, retiro de material orgánico, y se asegura una correcta compacidad en capas sucesivas, según especificaciones geotécnicas.

Esta estructura puede incluir protección superficial con grama, geotextiles u otros elementos, dependiendo del tipo de proyecto, condiciones del suelo y régimen hídrico del área intervenida.

Materiales utilizados: Arena fina y/o Arena Limosa (cantera)
Equipos y Maquinaria: retroexcavadoras 200 y 320, volqueta 14m3 y 7 m3, carrotanque y motoniveladora
Personal: ayudantes.

ACTIVIDAD:	CONFORMACIÓN DE BARRERA TIPO JARILLÓN		
ITEM: 1.3		UNIDAD: M3	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	25.673,24	CANTIDAD ACUMULADA:	9731,82
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	9731,82	CANTIDAD POR EJECUTAR:	15.941,42
PORCENTAJE EJECUTADO:	37,91%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	62,09%



Ilustración 20 CONFORMACIÓN DE BARRERA TIPO JARILLÓN

ITEM 1.4 GEOTEXTIL NT 2400

El Geotextil NT 2400 es un geotextil no tejido fabricado a base de filamentos continuos de polipropileno, unidos mecánicamente por punzonado con aguja. Presenta una estructura porosa, altamente resistente, diseñada para permitir el paso del agua mientras retiene partículas finas del suelo, lo que lo hace ideal para

funciones de filtración, separación y protección en obras civiles, hidráulicas y de control de erosión.

Este material posee una resistencia mecánica y química adecuada para aplicaciones en contacto directo con suelos, agua y materiales de construcción, conservando su integridad estructural a lo largo del tiempo. Su presentación en rollos facilita el transporte, manipulación e instalación en campo.

Materiales utilizados: geotextil nt 2400
Equipos y Maquinaria: herramientas menores
Personal: ayudantes.

ACTIVIDAD:	GEOTEXTIL NT 2400		
ITEM: 1.4		UNIDAD: M2	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	91.742,40	CANTIDAD ACUMULADA:	34776,00
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	34776,00	CANTIDAD POR EJECUTAR:	56.966,4
PORCENTAJE EJECUTADO:	37,91%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	62,09%



Ilustración 21 GEOTEXTIL NT 2400

ITEM 1.5 GEOTEXTIL NT 3000

El Geotextil NT 3000 es un geotextil no tejido, elaborado a partir de filamentos continuos de polipropileno, unidos mecánicamente mediante proceso de punzonado por aguja (needle punched). Este material presenta una alta resistencia mecánica y una excelente capacidad de filtración y separación, lo que lo hace ideal para

aplicaciones en proyectos de infraestructura vial, hidráulica, control de erosión y geotecnia.

Este geotextil posee una mayor densidad y espesor en comparación con otras referencias (como el NT 2400), proporcionando mayor resistencia al punzonado y tracción, lo que lo hace adecuado para condiciones de carga más exigentes o suelos con mayores exigencias de refuerzo y protección.

Materiales utilizados: geotextil nt 3000
Equipos y Maquinaria: herramientas menores
Personal: ayudantes.

ACTIVIDAD:	GEOTEXTIL NT 3000		
ITEM: 1.5		UNIDAD: M2	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	10.858,40	CANTIDAD ACUMULADA:	4.116,00
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	4.116,00	CANTIDAD POR EJECUTAR:	6.742,40
PORCENTAJE EJECUTADO:	37,91%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	62,09%

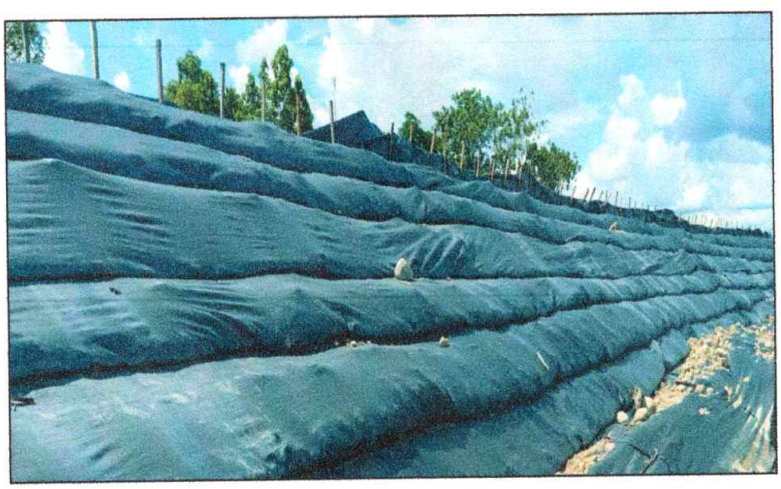


Ilustración 22 GEOTEXTIL NT 3000

ITEM 1.6 GEOTEXTIL TEJIDO 2100

El Geotextil Tejido 2100 es un geotextil de alta resistencia, conformado por cintas planas de polipropileno entrelazadas mediante un proceso de tejido en patrón

regular. Este tipo de geotextil se caracteriza por su alta resistencia a la tracción y su baja elongación, lo que lo hace especialmente adecuado para aplicaciones donde se requiere refuerzo, estabilización de suelos y confinamiento estructural.

A diferencia de los geotextiles no tejidos, el Geotextil Tejido 2100 posee una estructura cerrada con menor permeabilidad, por lo que su uso está orientado principalmente a la separación y refuerzo, más que a la filtración.

ACTIVIDAD:	GEOTEXTIL TEJIDO 2100		
ITEM: 1.6		UNIDAD: M2	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	20.420,44	CANTIDAD ACUMULADA:	7.740,60
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	7.740,60	CANTIDAD POR EJECUTAR:	12.679,84
PORCENTAJE EJECUTADO:	37,91%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	62,09%



Ilustración 23 GEOTEXTIL TEJIDO 2100

ITEM 1.7 MANEJO DE AGUAS

Durante la preparación del terreno para la conformación del Jarillón, se implementó el manejo de aguas subterráneas mediante el uso de motobombas, con el fin de controlar el nivel freático en la zona de intervención. Las motobombas fueron instaladas en puntos estratégicos del área afectada para extraer el agua acumulada y reducir el nivel freático a un rango seguro que permitiera las excavaciones y trabajos de cimentación. El proceso consistió en la extracción continua del agua, la cual fue dirigida hacia sistemas de drenaje temporales establecidos previamente

para evitar inundaciones y garantizar un ambiente de trabajo seco y estable. Este manejo de aguas fue monitoreado de manera constante por el equipo técnico y supervisado por la interventoría, quienes aseguraron que las motobombas operaran de manera eficiente y en conformidad con las normas de seguridad y ambientales vigentes. La correcta gestión del agua permitió el avance seguro de las actividades de excavación.

Materiales utilizados: no se utilizaron materiales.
Equipos y Maquinaria: moto bomba 4"
Personal: ayudantes.

ACTIVIDAD:	MANEJO DE AGUAS		
ITEM: 1.7		UNIDAD: MES	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	6,00	CANTIDAD ACUMULADA:	4,10
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	0,37	CANTIDAD POR EJECUTAR:	1,9
PORCENTAJE EJECUTADO:	68.33%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	31.67%

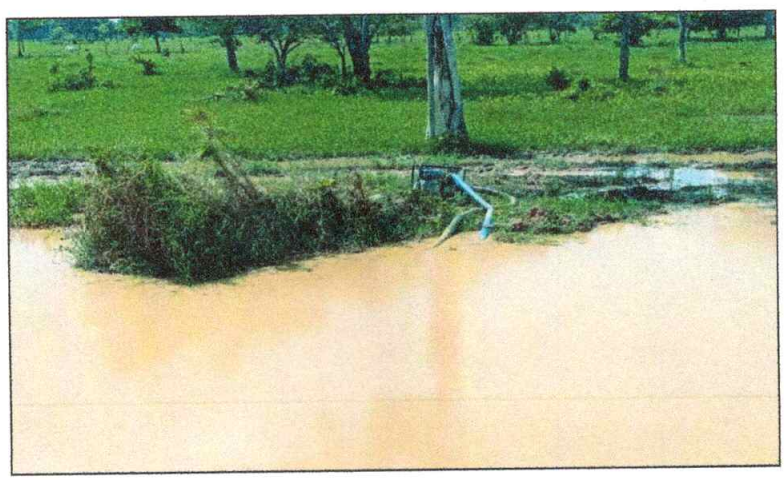


ilustración 24 manejo de aguas

4.16 CONTROL DE CALIDAD DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

Durante el desarrollo de las actividades de conformación de la barrera tipo jarillón, se implementaron procedimientos de control de calidad con el fin de garantizar la seguridad, estabilidad y correcta ejecución de los trabajos. Se verificó de manera permanente que la maquinaria empleada (retroexcavadoras, vibrocompactador, motoniveladora y carrotanque) se encontrara en óptimas condiciones de funcionamiento, y que la conformación del jarillón se realizara conforme a los planos y a las especificaciones técnicas establecidas. Asimismo, se efectuó la instalación de geotextiles NT 2400, NT 3000 y tejido 2100, bajo la supervisión de la

interventoría, la cual validó que los procedimientos de instalación cumplieran con los requerimientos técnicos. Adicionalmente, se llevaron a cabo inspecciones periódicas para asegurar que las condiciones del terreno no representaran riesgos para la estabilidad de la obra, garantizando un manejo adecuado de las aguas pluviales con el propósito de mitigar procesos de erosión y posibles desbordamientos.

5 ASPECTOS FINANCIEROS

5.10 MANEJO DEL ANTICIPO

Hasta la fecha del presente informe del 21 de julio del 2025 al 31 de julio del 2025, se ha tramitado el plan de manejo del anticipo con la entidad contratante de la siguiente manera.

Tabla 21 Manejo de Anticipo

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA	
ENTIDAD CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE ARAUCA
CONTRATISTA	CONSORCIO RIO BANADIA NIT:901.902.273-3
CONTRATO DE OBRA N°	481 DE 2024
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN NIT. 901.901.368-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	473 DE 2024
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$14.312.241.291,66
PORCENTAJE DEL ANTICIPO	40%
VALOR TOTAL DEL ANTICIPO	$5.724.896.516,66

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR	%
1	MATERIALES E INSUMOS	$ 3.721.182.735,00	65,00%
2	EQUIPOS Y MAQUINARIA	$ 300.000.000,66	5,24%
3	TRANSPORTE	$ 1.302.971.025,00	22,76%
4	NOMINA Y SEGURIDAD SOCIAL	$ 400.742.756,00	7,00%

TOTAL	$ 5.724.896.516,66	100%
SON: CINCO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECISÉIS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS MCTE		

Nombre producto	ACCION FIDUCIARIA PATRIMONIOS AUTONOMOS FA 6449 FIDEICOMISO ANTICIPO RIO BANADIA
NIT:	805012921
Tipo producto	AHORROS
No. producto	04000010797
Fecha apertura	18/03/2025
Estado	ACTIVA
Código sucursal	40 - CENTRO 93

6 ASPECTOS AMBIENTALES

6.1 SEGUIMIENTO A PERMISOS Y/O LICENCIAS AMBIENTALES

Ante la Autoridad Ambiental Regional CORPORINOQUIA se obtuvieron los permisos ambientales necesarios para el desarrollo del proyecto, conforme a lo dispuesto en la Resolución No. 700.36.250082 del 18 de julio de 2025, en cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y con el fin de asegurar la legalidad y sostenibilidad de las actividades proyectadas. Los permisos obtenidos corresponden a:

- **Permiso de ocupación de cauces, playas y lechos:** Se cuenta con la autorización correspondiente para intervenir y hacer uso de los cauces, playas y lechos de cuerpos de agua, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución No. 700.36.250082 del 18 de julio de 2025, cumpliendo con las disposiciones técnicas y ambientales exigidas por la entidad competente.

- **Concesión de aguas superficiales:** Se cuenta con el derecho de uso y aprovechamiento de aguas provenientes de fuentes superficiales, conforme a la

Resolución No. 700.36.250082 del 18 de julio de 2025, en cumplimiento de los parámetros técnicos y ambientales establecidos por la autoridad competente.

6.2 SEGUIMIENTO AL PMA

El documento PMA que hace parte integral del proyecto, que reposa en el anexo 19 del informe 1, y el informe detallado con cada uno de los soportes, se presenta en el ANEXO 8. **INFORME DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DEL PMA/PAGA**, de acuerdo al documento ambiental entregado por el DEPARTAMENTO DE ARAUCA al contratista y a la interventoría externa, para la ejecución del contrato de obra No. 481 del 2024, cuyo objeto corresponde a: **"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA, DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".**

(Documento PAGA reposa en el anexo 19 del informe 1)

Anexo 18 Informe de seguimiento implementación del PMA/PAGA

6.3 IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL

De acuerdo al cuadro de costos del proyecto y PMA, se deben implementar las siguientes actividades como medidas de mitigación o compensación ambiental:

Tabla 22 Presupuesto de la mitigación o control ambiental del contrato de obra No. 481 del 2024.

1	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. PARCIAL
SIEMBRA DE ESPECIES FORESTALES NATIVAS					
1	Realizar siembra de especies nativas (tamaño mínimo de 70cm)	Plántula	250	$16,590	$4,147,423
2	Servicio de monitoreo a las acciones implementadas	Und.	1	$852,577	$ 852,577
COSTO TOTAL					**$5,000,000**

Fuente 6 Autor propio

Nota: "En el mes de julio se mantuvo el proceso de seguimiento y cuidado de las especies nativas sembradas (samán y bucare), evidenciándose un crecimiento progresivo y una adecuada adaptación al área de intervención. Durante este periodo se realizaron labores de control de malezas, limpieza del terreno y verificación del estado fitosanitario de las plantas.

Asimismo, se observó el fortalecimiento de los tallos y la emisión de nuevas ramas y follaje, lo que refleja un desarrollo positivo y sostenido de los ejemplares establecidos..



Ilustración 25 seguimiento de las plantas

7 CONCLUSIONES

- Se hizo la respectiva revisión de los diseños del contrato de obra No.481 de 2024 los cuales se ejecutaron dentro de los parámetros técnicos requeridos, dando cumplimiento a las especificaciones técnicas generales del Contrato, garantizando así, la calidad de cada una de las actividades de obra ejecutadas.

- Se aseguró el cumplimiento de todas las normativas vigentes tanto técnicas como de seguridad, lo cual fue fundamental para mantener la integridad del proyecto y evitar contratiempos en su desarrollo. El control de calidad en cada etapa de las actividades permitió que el proceso constructivo se realizara de manera eficiente y conforme a los estándares establecidos.

- La correcta ejecución de las excavaciones y el manejo adecuado del material excavado contribuyeron al avance seguro del proyecto, garantizando la estabilidad del terreno y el óptimo funcionamiento del sistema de drenaje, asegurando la efectividad de las obras y el adecuado cumplimiento de los plazos.

- Avance en tiempo (68,13 %)
- Avance físico general (20,39%)
- Avance Financiero (40,00%)

ING. JEISSON RENE VILLARREAL ROA
R/L CONSORCIO RIO BANADIA

8 ANEXOS

LISTADO DE ANEXOS

Anexo 1 acta de suspensión N° 1 contrato 481-2024 11
Anexo 2 acta de suspensión N° 1 y prologa N° 1 y N° 2 contrato 481-2024 11
Anexo 3 acta de reinicio N° 1 contrato 481-2024 11
Anexo 4 póliza según suspensión 14
Anexo 5 póliza extracontractual suspensión 14
Anexo 6 póliza de cumplimiento de suspensión prorroga 14
Anexo 7 póliza de cumplimiento reinicio 15
Anexo 8 póliza extracontractual de reinicio 15
Anexo 9 acta de comité 17
Anexo 10 Correspondencia enviada Y recibida. 19
Anexo 11 Bitácoras De Obra Del 21 De julio De 2025 Al 31 De julio De 2025 19
Anexo 12 exámenes de ingreso y afiliaciones 21
Anexo 13 Planillas De Seguridad Social del mes de Julio 2025 22
Anexo 14 Nóminas De Pagos Mensual mes de julio 2025 22
Anexo 15 Informe del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) 25
Anexo 16 Hojas de vida de los equipos y documentación maquinaria, vehículos 27
Anexo 17 Preoperacionales Equipos mes de julio del 2025 36
Anexo 18 Informe de seguimiento implementación del PMA/PAGA 50

Aprobación del Informe:	
Elaboró: JAIR LEANDRO VILA SARABIA *DIRECTOR DE OBRA* TP:	Aprobó: JEISSON RENE VILLARREAL ROA R/L CONSORCIO RIO BANADIA

ANEXO 1

ACTA DE SUSPENSIÓN N° 1

CONTRATO 481-2024

CL 25 N 11 – 70 BRR ALFONSO LOPEZ
CORREO: consorcioriobanadia@gmail.com
CELULAR: 3202395534

GOBERNACIÓN DE ARAUCA

ACTA DE SUSPENSION No 1
CONTRATO DE OBRA No. 481-2024

CONTRATISTA:	CONSORCIO RIO BANADIA R/L JEISSON RENE VILLAREAL ROA
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.
PLAZO PACTADO:	SEIS (6) MESES
VALOR DEL CONTRATO:	$ 14.312.241.291,66
REGISTRO PRESUPUESTAL:	2025-11525 2025-11425 2025-00181
FECHA DE INICIO:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE JUNIO DE 2025

En Arauca, a los veintidós (22) días de abril de 2025, se reunieron las siguientes personas: **NASSER CRUZ MATUS** Secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana Departamental, el Ingeniero **CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO,** Supervisor del Contrato de Interventoría No. 473 de 2024, según Resolución No. 001 de 2025, el Señor **JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON** Representante Legal del **CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN,** en calidad de Interventor Externo y el Señor **JEISSON RENE VILLAREAL ROA** Representante Legal del **CONSORCIO RIO BANADIA,** en calidad de Contratista de Obra, con el fin de suscribir la presente Acta de Suspensión No. 1 del Contrato de Obra de la referencia en atención a las siguientes consideraciones:

PRIMERA. Las obras objeto del presente proyecto consisten en la "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RÍO BANADÍA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".

GOBERNACIÓN DE ARAUCA
Calle 20 Carrera 21 Esquina, Telefax 8851946; Código Postal 810001
Arauca-Arauca (Colombia). E-mail: archivogeneral@arauca.gov.co
NIT. 800102838 - 5

SEGUNDA: El Contrato tuvo inicio el día 31 de diciembre del año 2024, con la suscripción del Acta de Inicio del mismo día, donde se reunieron las siguientes personas: **NASSER CRUZ MATUS** Secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana Departamental, **JHONN FREDY GARCIA BELTRAN,** para esa fecha fungiendo como Representante Legal del **CONSORCIO RIO BANADIA** como Contratista de Obra. La ejecución física del Contrato inició con las actividades de prealistamiento consistentes en las adecuaciones, campamento, valla informativa, movimiento de equipos, EXCAVACIÓN MECÁNICA EN CONGLOMERADO ENTRE 02 M DE PROFUNDIDAD, ACARREO MATERIAL INTERNO NO MAYOR A 2 KM PARA REFORZAMIENTO DEL TALUD NATURAL, MANEJO DE AGUAS, FILTRO O DREN FRANCES PVC 100 MM (0.6X0.8) entre otras, actividades acordadas según el Cronograma de Trabajo o Programación de Obra para la ejecución física. Estas actividades se adelantan mientras se surten los procesos iniciados por la administración departamental sobre el permiso de concesión de aguas y ocupación de cauce para las actividades que requieran de la utilización del recurso natural.

TERCERA: Que el día 25 de noviembre de 2024, la unidad ejecutora solicito permisos ambientales de OCUPACIÓN DE CAUCE Y CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES ante la autoridad ambiental Corporinoquia para el proyecto objeto del contrato de obra 481 de 2024, Que a la fecha la corporación autónoma regional no se ha pronunciado con respecto a la solicitud elevada por parte de la administración departamental, situación por el cual se hace necesario suspender el contrato teniendo en cuanta la culminación de las actividades que no requerían la utilización de los recursos naturales y quedando por ejecutar actividades que si requieren como actividades que contienen la ejecución de concretos, morteros y rellenos entre otros ; dichas actividades no se pueden ejecutar hasta tanto o se obtenga la autorización por parte de la corporación.

CUARTA: Que mediante comité técnico de obra realizado el día 22 de abril presente año, se analizo entre las partes intervinientes del contrato de obra 481 de 2024, unidad ejecutora, firma contratista e interventoría externa, el avance del proceso administrativo ante la corporación de la solicitud de los permisos ambientales, y se pudo determinar que se presenta una demora en dicho proceso.

Por lo anterior se concluye entre los participantes del comité, realizar acta de suspensión del contrato de referencia en un periodo de treinta (30) días calendario a partir de la firma del presente comité.

QUINTA: Una vez verificado los motivos expuestos en el comité técnico de obra No. 05, la interventoría externa del contrato de obra 481 de 2024, considera viable y procedente efectuar la suspensión respectiva.

SESTA: En virtud de lo expuesto, las partes consideran prudente suspender el contrato de obra No. 481 de 2024, por el término de (30) días o antes si se superan las motivaciones expuestas.

SÉPTIMA: Se deja expresa constancia que queda vigente para las partes, las obligaciones adquiridas por ellas en el contrato original. Las actividades se reiniciarán oportunamente en el término establecido o antes si son superados los inconvenientes que motivaron la suspensión, para lo cual, se suscribirá de manera inmediata la respectiva acta de reinicio en donde se hará constar la nueva fecha de terminación y se procederá a la actualización de las garantías por los términos establecidos en la minuta del contrato, con vigencia a partir de la fecha.

Para constancia se firma la presente acta, por los que en ella intervinieron a los veintidós (22) días de abril de 2024.

Para constancia, se firma la presente acta de suspensión No 1 por quienes en ella intervinieron.

JEISSON RENE VILLAREAL ROA
R/ CONSORCIO RIO BANADIA
Contratista De Obra

CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO
Supervisor Contrato de Interventoría No. 473/2024
Resolución No. 001 del 03/01/2025

JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON
R/ Consorcio Inter Obras De Protección
Interventor Externo

NASSER CRUZ MATUS
Secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana
Dptal

GOBERNACIÓN DE ARAUCA

MESA TÉCNICA 005

Fecha: 22 de abril del 2025
Hora: 10:00 am
Lugar: Sala de juntas de la Secretaría de Gobierno Departamental

1. *Verificación del Quorum.*
2. *Inicio por parte del Supervisor – Cristian Alexander Murillo Osorio*
3. *Control y seguimiento de la ejecución de CTO 481-2024 y 473-2024:* ***"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIÓN SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA".***
4. Proposiciones, varios
5. Conclusiones y cierre.

participantes:

1. Supervisor del contrato según Resolución N° 001-2025. **CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO**
2. Equipo de Profesionales de la Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana Departamental
3. CONTRATISTA DE OBRA **CONSORCIO RIO BANADIA - R/L JEISSON RENE VILLAREAL ROA**
4. INTERVENTORÍA **CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN - R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCÓN**
5. PROFESIONALES DE APOYO de la Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana Departamental
6. Delegados de la secretaria de planeación departamental

Muy buenos días para todos yo CRISTIAN ALEXANDER MURILLO con función de Supervisor del Contrato de Interventoría473-2024, según Resolución No. 001-2025 y en representación del Secretario de Gobierno doy inicio a la mesa técnica número 005 con respecto al Control y Seguimiento de la ejecución de CTO 481-2024 y 473-2024.

Planeación: reiteramos la función de nuestra área con respecto al proyecto, que es de control, ya en el oficio remitido manifestamos nuestra visión ante el proceso.

Interventoría: buenos días para todos, nosotros como interventoría tenemos puntos específicos a tratar en este comité, los cuales son la aclaración del oficio emitido por planeación, la proposición nuevamente de suspender los contratos en ejecución que nos atañe, aclarando que los permisos se encuentran en trámite, por lo cual aun no se lograra avanzar en las actividades descritas en el documento técnico.

Contratista: sí, se requieren los permisos ambientales, para avanzar con las actividades que lo ameritan, nosotros estamos de acuerdo en suspender, ya que comprendemos en el entendido que debemos ejecutar obras que requieren la utilización de los recursos naturales.

Secretaría de gobierno: Según el ajuste informado que se presentó ante la oficina de planeación departamental y la revisión del proyecto, si cuenta con presupuesto y fase de planeación para los permisos ambientales; se ha realizado la solicitud ante la Corporación Autónoma Regional de La Orinoquia – CORPORINOQUIA y el proceso se encuentra en espera de la liquidación.

Ahora bien, comprendemos la necesidad de suspender para dar espera a que se cuente con los permisos ambientales.

Planeación: normativamente y con relación a la parte técnica es una acción que, en caso de un disciplinario, por más que lo sustente debe ser muy claro, recomendamos seguir los lineamientos y reprogramar en Gesproy.

Interventoría: nuevamente tomamos la palabra para que sea suspendido este contrato de obra ya que, hay actividades que requieren estos permisos ambientales y licencias y no vamos a incurrir en sanciones por ello.


Supervisión: desde la supervisión se solicitan las correcciones de los informes hasta la fecha con respecto a los avances de ejecución, así mismo, veo viable y prudente la recomendación de la interventoría, quienes sugieren la suspensión de los contratos de obra e interventoría, dejando como justificación que, a la fecha, sin los permisos ambientales no se validará la continuación en la ejecución de las actividades del Contrato de Obra No. 481 de 2024.


Para concluir concordamos en trabajar de manera conjunta para agilizar los trámites pertinentes. Y cómo compromisos tenemos:

1. Suscripción el día de hoy, del Acta de Suspensión No. 01 al Contrato de Obra No. 481 de 2024 y al Contrato de Interventoría No. 473 de 2024.
2. Subsanar las observaciones realizadas a los informes de interventoría y seguimiento de obra.

Siendo las 11:50 am damos por finalizada esta reunión, muchas gracias por haber asistido.

SE ADJUNTA FORMATO DE ASISTENCIA PARA CONFORMIDAD DE LOS ASISTENTES

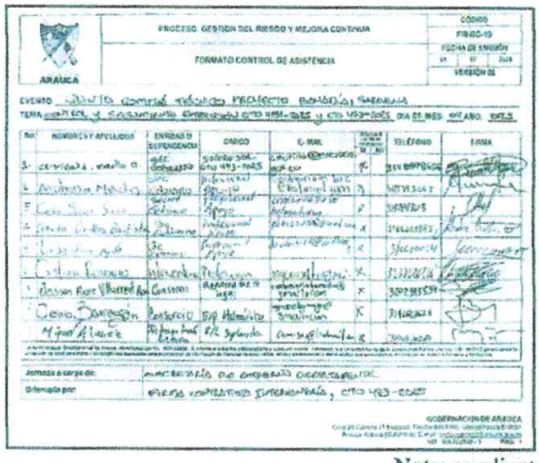

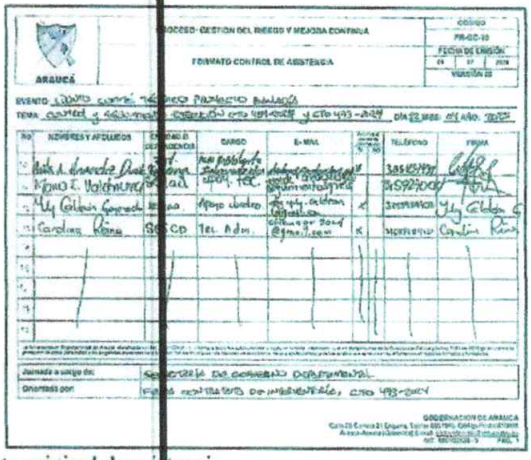

Nota: se adjunta formato original de asistencia.

Proyectó: Yesika Carolina Reina Hurtado
Técnico Administrativo - CTO 095 de 2025

CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION
NIT. 901.901.368-1

Arauca 21 de abril de 2025

Señores:
SECRETARIA DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL
ATTE. CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO
Supervisor SGSCD – Dirección de Gestión del Riesgo y Cambio Climático
CONSORCIO RIO BANADIA
R/L JEISON VILLAREAL
Ciudad

Referencia: Contrato de Interventoría No. 473-2024 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".

Asunto: Solicitud comité técnico de obra presencial

Respetuoso saludo,

En aras de garantizar el correcto cumplimiento de nuestra labor como interventores externos del contrato de Obra No. 481 de 2024, cuyo objeto es: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA, nos permitimos convocar a comité técnico de obra en donde se socialice el avance y estado de la solicitud de licencias y permisos ambientales ante la corporación CORPORINOQUIA del contrato de obra nombrado anteriormente, por parte de la secretaria ejecutora. Esto con el fin de analizar y llevar a cabo los posibles actos administrativos que dieran lugar ante el mismo.

Extendemos la invitación para la realización del comité técnico de manera presencial para el día **martes 22 de abril a las 10:00 am en instalaciones de la sala de junta de la secretaria de gobierno y seguridad ciudadana departamental**.

Agradeciendo su puntual asistencia. Cordialmente,

JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON
R/L CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN
Interventoría Externa

GOBERNACIÓN DE
ARAUCA

Arauca, 21 de abril de 2025

Señores
CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN
R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCÓN
Calle 20 No. 19-35 Barrio Centro Oficina 07
Cel. 3114430280
interobrasdeproteccion1@gmail.com
Arauca - Arauca

Ref.: Ejecución del Contrato de Interventoría No. 473-2024 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA" y del Contrato de Obra No. 481-2024 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".

Asunto: Confirmación de Asistencia a Invitación del Quinto Comité Técnico programado para el 22/04/2025.

Cordial Saludo;

Por medio del presente, en calidad de Supervisor del Contrato de Interventoría No. 473 de 2024, nombrado mediante Resolución No. 001 del 03 de enero de 2025, deseo confirmar asistencia de la Administración Departamental al desarrollo del Tercer Comité Técnico del proyecto "CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION PARA LA REDUCCION DEL RIESGO Y PREVENCION DE INUNDACION SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA", el cual se desarrollará el día martes 22 de abril de 2025, a las 10:00 am en las instalaciones de la sala de junta de la Secretaría de Gobierno Departamental.

Cordialmente,

ING. CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO
Supervisor SGSCD – Dirección de Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

CONSORCIO RIO BANADIA

NIT 901.902.273

CRONOGRAMA DEL CONTRATO DE OBRA N° 481 DE 2024

CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	FECHA INICIO	FECHA FINAL	31/12/2024 - 19/01/2025	20/01/2025 - 26/01/2025	27/01/2025 - 02/02/2025	03/02/2025 - 09/02/2025	10/02/2025 - 16/02/2025	17/02/2025 - 23/02/2025	24/02/2025 - 02/04/2025	03/03/2025 - 09/03/2025	10/03/2025 - 16/03/2025	17/03/2025 - 23/03/2025
PRELIMINARES (consolidación de la información contractual técnica, localización y replanteo topográfico, socialización, verificación de las propiedades de los suelos presentes en obra y tramite ambiental.		GLB	31/12/2024	19/01/2025										
CAP 1.	OBRAS DE PROTECCION RIO BANADIA													
1.01	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN CONGLOMERADO ENTRE 0-2 m DE PROFUNDIDAD	M3	20/01/2025	4/05/2025										
1.02	ACARREO MATERIAL INTERNO NO MAYOR A 2 KM PARA REFORZAMIENTO DEL TALUD NATURAL	M3	20/01/2025	4/05/2025										
1.03	CONFORMACIÓN DE BARRERA TIPO JARILLÓN	M3	5/03/2025	15/06/2025										
1.04	GEOTEXTIL NT 2400	M2	5/03/2025	31/05/2025										
1.05	GEOTEXTIL NT 3000	M2	5/03/2025	15/06/2025										
1.06	GEOTEXTIL TEJIDO 2100	M2	5/03/2025	15/06/2025										
1.07	MANEJO DE AGUAS	MES	3/01/2025	30/06/2025										
1.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLEXOCRETO	M2	15/03/2025	18/06/2025										
1.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSACRETO	M3	20/03/2025	20/06/2025										
1.10	FILTRO O DREN FRANCES PVC 100 MM (0.6X0.8 M)	M	24/02/2025	15/06/2025										
1.11	RELLENOS TALUD DERECHO ANCLAJE DIQUE	M3	5/03/2025	15/06/2025										
APLICACIÓN AL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA - PUEA		GLB	31/12/2024	30/06/2025										

ING JAIR LEANDRO VILA SARABIA
Director de Obra
CONSORCIO RIO BANADIA

ING JHON NATHAN ALEXIS GARCIA BARRERA
Residente de Obra
CONSORCIO RIO BANADIA

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

CRONOGRAMA DEL CONTRATO DE OBRA N° 481 DE 2024

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	FECHA INICIO	FECHA FINAL	02/06/2025 09/06/2025	09/06/2025 15/06/2025	16/06/2025 22/06/2025	23/06/2025 30/06/2025
CAP 1.	OBRAS DE PROTECCION RIO BANADIDA							
1.01	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO ENTRE 0-2 m DE PROFUNDIDAD	M3	20/01/2025	4/05/2025				
1.02	ACARREO MATERIAL INTERNO NO MAYOR A 2 KM PARA REFORZAMIENTO DEL TALUD NATURAL	M3	20/01/2025	4/05/2025				
1.03	CONFORMACIÓN DE BARRERA TIPO JARILLÓN	M3	5/03/2025	15/06/2025				
1.04	GEOTEXTIL NT 2400	M2	5/03/2025	31/05/2025				
1.05	GEOTEXTIL NT 3000	M2	5/03/2025	15/06/2025				
1.06	GEOTEXTIL TEJIDO 2300	M2	5/03/2025	15/06/2025				
1.07	MANEJO DE AGUAS	MES	3/01/2025	30/06/2025				
1.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLEXOCRETO	M2	15/03/2025	18/06/2025				
1.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSACRETO	M3	20/03/2025	20/06/2025				
1.10	FILTRO O DREN FRANCES PVC 100 MM (0.6X0.8 M)	M	24/02/2025	15/06/2025				
1.11	RELLENOS TALUD DERECHO ANCLAJE DIQUE	M3	5/03/2025	15/06/2025				
APLICACIÓN AL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA - PUEA		GLB	31/12/2024	30/06/2025				

ING JAIR LEANDRO VILA SARABIA
Director de Obra
CONSORCIO RIO BANADIA

ING JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN
Residente de Obra
CONSORCIO RIO BANADIA

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

CRONOGRAMA DEL CONTRATO DE OBRA N° 481 DE 2024

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	FECHA INICIO	FECHA FINAL	24/02/2025 - 30/03/2025	31/03/2025 - 06/04/2025	07/04/2025 - 13/04/2025	14/04/2025 - 20/04/2025	21/04/2025 - 27/04/2025	28/04/2025 - 04/05/2025	05/05/2025 - 11/05/2025	12/05/2025 - 18/05/2025	19/05/2025 - 25/05/2025	26/05/2025 - 01/06/2025
CAP 1.	**OBRAS DE PROTECCION RIO BANADIDA**													
1.01	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN CONGLOMERADO ENTRE 0-2 m DE PROFUNDIDAD	M3	20/01/2025	4/05/2025										
1.02	ACARREO MATERIAL INTERNO NO MAYOR A 2 KM PARA REFORZAMIENTO DEL TALUD NATURAL	M3	20/01/2025	4/05/2025										
1.03	CONFORMACIÓN DE BARRERA TIPO JARILLÓN	M3	5/03/2025	15/06/2025										
1.04	GEOTEXTIL NT 2400	M2	5/03/2025	31/05/2025										
1.05	GEOTEXTIL NT 3000	M2	5/03/2025	15/06/2025										
1.06	GEOTEXTIL TEJIDO 2100	M2	5/03/2025	15/06/2025										
1.07	MANEJO DE AGUAS	MES	3/01/2025	30/06/2025										
1.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLEXOCRETO	M2	15/03/2025	18/06/2025										
1.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSACRETO	M3	20/03/2025	20/06/2025										
1.10	FILTRO O DREN FRANCES PVC 100 MM (0.6X0.8 M)	M	24/02/2025	15/06/2025										
1.11	RELLENOS TALUD DERECHO ANCLAJE DIQUE	M3	5/03/2025	15/06/2025										
	APLICACIÓN AL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA - PUEA	GLB	31/12/2024	30/06/2025										

ING JAIR LEANDRO VILA SARABIA
Director de Obra
CONSORCIO RIO BANADIA

ING JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN
Residente de Obra
CONSORCIO RIO BANADIA

ANEXO 2

ACTA DE SUSPENSIÓN N° 1 Y PROLOGA N° 1 CONTRATO 481-2024

CL 25 N 11 – 70 BRR ALFONSO LOPEZ
CORREO: consorcioriobanadia@gmail.com
CELULAR: 3202395534

PRORROGA No. 01 AL ACTA DE SUSPENSION No. 1
CONTRATO DE OBRA No. 481-2024

CONTRATISTA:	CONSORCIO RIO BANADIA R/L JEISSON RENE VILLAREAL ROA
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.
PLAZO PACTADO:	SEIS (6) MESES
VALOR DEL CONTRATO:	$ 14.312.241.291,66
REGISTRO PRESUPUESTAL:	2025-11525 2025-11425 2025-00181
FECHA DE INICIO:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE JUNIO DE 2025

En Arauca, a los veintidós (22) días de mayo de 2025, se reunieron las siguientes personas: **NASSER CRUZ MATUS** Secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana Departamental, el Ingeniero **CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO,** Supervisor del Contrato de Interventoría No. 473 de 2024, según Resolución No 001 de 2025, el Señor **JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON** Representante Legal del **CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN,** en calidad de Interventor Externo y el Señor **JEISSON RENE VILLAREAL ROA** Representante Legal del **CONSORCIO RIO BANADIA,** en calidad de Contratista de Obra, con el fin de suscribir la presente Prorroga al Acta de Suspensión No. 1 del Contrato de Obra de la referencia en atención a las siguientes consideraciones:

PRIMERA. Las obras objeto del presente proyecto consisten en la "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RÍO BANADÍA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".

SEGUNDA: Que mediante comité técnico de obra realizado el día 22 de abril presente año, se analizó entre las partes intervinientes del contrato de obra 481 de 2024, unidad ejecutora, firma contratista e interventoría externa, el avance del proceso administrativo ante la corporación de la solicitud de los permisos ambientales, y se pudo determinar que se presenta una demora en dicho proceso.

Por lo anterior se concluyó entre los participantes del comité, realizar acta de suspensión No. 01 del contrato de referencia en un periodo de treinta (30) días calendario a partir del 22 de abril de 2025.

TERCERA: Que mediante comunicación 700.11.25-0637 de fecha 09 de mayo de 2025, la autoridad ambiental competente Corporinoquia, envía oficio de cobro de servicios ambientales a la administración departamental para el proyecto CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

CUARTO: Que mediante correo electrónico de fecha 14 de mayo de 2025, la secretaria de gobierno y convivencia ciudadana, solicita de manera formal la factura electrónica para el pago de los servicios ambientales, para los permisos al proyecto CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

QUINTA: Que la autoridad ambiental Corporinoquia, mediante comunicación 700.11.25-0678 del 14 de mayo de 2025 expide la factura de cobro N° SAFE-5405 de fecha 14 de mayo de 2025, por un valor de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 59.675.777,00).

SEXTA: Que actualmente la secretaria de Gobierno y convivencia ciudadana se encuentra realizando los tramites internos administrativos para realizar los pagos correspondientes a la N° SAFE-5405 de fecha 14 de mayo de 2025, por un valor de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 59.675.777,00) a la autoridad ambiental – Corporinoquia.

SEPTIMA: En virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta los tramites internos de la administración departamental y Corporinoquia, y con base en el decreto 1076 de 2015 por medio del cual "Esta versión incorpora las modificaciones introducidas al Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible", no se contempla términos establecidos para la entrega de los permisos ambientales las partes consideraron viable la Prorroga la Suspensión No. 01 del Contrato No. 481 de 2024 por un treinta (30) días o antes, si las condiciones lo permiten, para superar las circunstancias que generaron la prórroga de la suspensión de las actividades objeto del contrato.

OCTAVA: Mediante comunicación de fecha veinte (20) de mayo de 2025, enviada mediante correo electrónico al señor **CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCÓN**, esta secretaria de gobierno departamental solicita la presencia de los dos representantes legales de la firma contratista e interventoría a una reunión el día 22 de mayo de 2025 a las 9:00 a.m, en las instalaciones de la secretaria de gobierno departamental, con el objeto de suscribir acta de prorroga a la suspensión del contrato de obra 481-2024 cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA" y el contrato de obra No. 481-2024 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN

DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".

NOVENA: Se deja expresa constancia que queda vigente para las partes, las obligaciones adquiridas por ellas en el contrato original. Las actividades se reiniciarán oportunamente en el término establecido o antes si son superados los inconvenientes que motivaron la suspensión, para lo cual, se suscribirá de manera inmediata la respectiva acta de reinicio en donde se hará constar la nueva fecha de terminación y se procederá a la actualización de las garantías por los términos establecidos en la minuta del contrato, con vigencia a partir de la fecha.

Para constancia se firma la presente acta de Prorroga No. 1 a la suspensión No 1, por los que en ella intervinieron a los veintidós (22) días de mayo de 2025.

JEISSON RENE VILLAREAL ROA
R/ CONSORCIO RIO BANADIA
Contratista De Obra

Coordinador encargado
CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO
Supervisor Contrato de Interventoría No. 473/2024
Resolución No. 001 del 03/01/2025

JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON
R/ Consorcio Inter Obras De Protección
Interventor Externo

NASSER CRUZ MATUS
Secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana
Dptal

ANEXO 3

ACTA DE REINICIO N° 1

CONTRATO 481-2024

CL 25 N 11 – 70 BRR ALFONSO LOPEZ
CORREO: consorcioriobanadia@gmail.com
CELULAR: 3202395534

GOBERNACIÓN DE ARAUCA

ACTA DE REINICIO No 1
CONTRATO DE OBRA No. 481 DEL 2024

CONTRATISTA	CONSORCIO RIO BANADIA R/L JEISSON RENE VILLAREAL ROA
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
PLAZO PACTADO	SEIS (06) MES
VALOR DEL CONTRATO	$ 14.312.241.291,66
FECHA DE INICIO	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	30 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE SUSPENSION Nº 1	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA PRORROGA SUSPENSION N 1	22 DE MAYO DE 2024
FECHA PRORROGA SUSPENSION N 2	20 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE REINICIO	21 DE JULIO DE 2025
FECHA DE TERMINACION DEFINITIVA	27 DE SEPTIEMBRE DE 2025

En Arauca, a los veintiún (21) días del mes de julio de 2025, se reunieron las siguientes personas: **NASSER ANTONIO CRUZ MATUS** Secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana Departamental, Ingeniero **CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO** como Supervisor del Contrato de Interventoría 473 del 2024 mediante resolución 001 de 2025, el señor **JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON** como representante legal del **CONSORCIO INTEROBRAS DE PROTECCION,** en calidad de Interventor Externo, y el señor **JEISSON RENE VILLAREAL ROA** como Represéntate Legal del **CONSORCIO RIO BANADIA** con el fin de suscribir la presente Acta de Reinicio No 1 del contrato de la referencia, debido a las siguientes consideraciones:

PRIMERO: Que una vez analizadas por la Supervisión, las causas que dieron lugar a la Suspensión Nº 1, así como sus respectivas prórrogas del Contrato de Obra No 481 de 2024, se superaron, por tanto, ya se puede dar reinicio a la ejecución contractual del mismo.

GOBERNACIÓN DE
ARAUCA

ACTA DE REINICIO No 1
CONTRATO DE OBRA No. 481 DEL 2024

SEGUNDO: Con la firma de la presente Acta, el contratista se compromete a modificar y actualizar las vigencias de las garantías contractuales por los términos indicados en la presente.

Para constancia se firma la presente acta por los que intervinieron,

JEISSON RENE VILLAREAL ROA
CONSORCIO RIO BANADIA
Contratista De Obra

JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON
CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN
Contratista De Interventoría

CRISTIAN ALEXANDER MURILLO
Supervisor - Resolución 001 de 2025
del Contrato de Interventoría No. 473/2024

NASSER ANTONIO CRUZ MATUS
Secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana
Departamental

Proyecto: Juan Sebastián Ayala Imbett
Apoyo a la Supervisión vinculado mediante el Contrato No. 142 de 2025

ANEXO 4

PÓLIZA SEGÚN SUSPENSIÓN

CL 25 N 11 – 70 BRR ALFONSO LOPEZ
CORREO: consorcioriobanadia@gmail.com
CELULAR: 3202395534

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO PÓLIZA	ANEXO
CUCUTA	AGENCIA CUCUTA	49	49-44-101035208	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
02	07	2025	31	12	2024	00:00	30	09	2028	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO RIO BANADIA	NIT: 901.902.273-3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 30 NRO. 8 - 49 BARRIO SAN LUIS	SARAVENA, ARAUCA	3202395534

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DE ARAUCA	NIT: 800.102.838-5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 20 CARRERA 21 PISO 1	ARAUCA, ARAUCA	8856998

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN LA EJECUCION DEL CONTRATO NUMERO 481-2024 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION PARA LA REDUCCION DEL RIESGO Y PREVENCION DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31/12/2024	31/03/2026	$2,862,448,258.33	$2,862,448,258.33
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	31/12/2024	31/12/2025	$5,724,896,516.66	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	30/06/2025	30/06/2027	$2,862,448,258.33	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	31/12/2024	30/06/2028	$2,146,836,193.75	

ACLARACIONES

EN EL PRESENTE ANEXO SE AMPLIAN LAS VIGENCIAS SEGUN ACTA DE SUSPENSION NUMERO 1 DE FECHA 22/04/2025, PRORROGA NUMERO 01 AL ACTA DE SUSPENSION NUMERO 1 DE FECHA 22/05/2025 Y PRORROGA NUMERO 02 AL ACTA DE SUSPENSION NUMERO 1 DE FECHA 20/06/2025.

TODOS LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINUAN EN VIGOR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ***13,596,629,227.07	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART	VALOR ASEGURADO
MARIA CAROLINA DURAN SANABRIA	153566	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AV. 1E NO. 17 - 88 - TELEFONO: 5835460 - CUCUTA

49-44-101035208

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CUCUTA	AGENCIA CUCUTA	49	49-44-101035208	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
02	07	2025	31	12	2024	00:00	30	09	2028	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO RIO BANADIA		NIT: 901.902.273-3
DIRECCIÓN: CL 30 NRO. 8 - 49 BARRIO SAN LUIS	**CIUDAD:** SARAVENA, ARAUCA	**TELÉFONO:**	3202395534

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	DEPARTAMENTO DE ARAUCA		NIT: 800.102.838-5
DIRECCIÓN: CALLE 20 CARRERA 21 PISO 1	**CIUDAD:** ARAUCA, ARAUCA	**TELÉFONO:**	8856998

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
PROYECTOS Y SERVICIOS INTEGRALES PSI S.A.S	900827849-0	45.00
FUNDACION NUEVA CASTELLANA	901358987-1	45.00
BCH ENGINEERING S.A.S	901393606-7	10.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AV. 1E NO. 17 - 88 - TELEFONO: 5835460 - CUCUTA

49-44-101035208

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO 5

PÓLIZA EXTRACONTRACTUAL SUSPENSIÓN

CL 25 N 11 – 70 BRR ALFONSO LOPEZ
CORREO: consorcioriobanadia@gmail.com
CELULAR: 3202395534

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CUCUTA	AGENCIA CUCUTA	49	49-40-101011266	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
02	07	2025	31	12	2024	00:00	30	09	2025	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO RIO BANADIA	NIT: 901.902.273-3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 30 NRO. 8 - 49 BARRIO SAN LUIS	SARAVENA, ARAUCA	3202395534

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DE ARAUCA	NIT: 800.102.838-5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 20 CARRERA 21 PISO 1	ARAUCA, ARAUCA	8856998

BENEFICIARIO: 800102838 - DEPARTAMENTO DE ARAUCA

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE LA EJECUCION DEL CONTRATO NUMERO 481-2024 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION PARA LA REDUCCION DEL RIESGO Y PREVENCION DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV	31/12/2024	30/09/2025	$715,612,064.58	$715,612,064.58
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV	31/12/2024	30/09/2025	$715,612,064.58	$715,612,064.58
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV	31/12/2024	30/09/2025	$715,612,064.58	$715,612,064.58

ACLARACIONES

EN EL PRESENTE ANEXO SE AMPLIAN LAS VIGENCIAS SEGUN ACTA DE SUSPENSION NUMERO 1 DE FECHA 22/04/2025, PRORROGA NUMERO 01 AL ACTA DE SUSPENSION NUMERO 1 DE FECHA 22/05/2025 Y PRORROGA NUMERO 02 AL ACTA DE SUSPENSION NUMERO 1 DE FECHA 20/06/2025.

TODOS LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINUAN EN VIGOR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****450,933.00	$ *******3,000.00	$ ******86,247.00	$ **********540,181.00	$ ******715,612,064.58	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARIA CAROLINA DURAN SANABRIA	153566	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AV. 1E NO. 17 - 88 - TELEFONO: 5835460 - CUCUTA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

49-40-101011266

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
CUCUTA	AGENCIA CUCUTA	49	49-40-101011266	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
02	07	2025	31	12	2024	00:00	30	09	2025	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO RIO BANADIA		NIT: 901.902.273-3
DIRECCIÓN: CL 30 NRO. 8 - 49 BARRIO SAN LUIS	**CIUDAD:** SARAVENA, ARAUCA	**TELÉFONO:**	3202395534

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	DEPARTAMENTO DE ARAUCA		NIT: 800.102.838-5
DIRECCIÓN: CALLE 20 CARRERA 21 PISO 1	**CIUDAD:** ARAUCA, ARAUCA	**TELÉFONO:**	8856998

BENEFICIARIO: 800102838 - DEPARTAMENTO DE ARAUCA

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV	31/12/2024	30/09/2025	$715,612,064.58	$715,612,064.58
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV	31/12/2024	30/09/2025	$715,612,064.58	$715,612,064.58
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV	31/12/2024	30/09/2025	$715,612,064.58	$715,612,064.58

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AV. 1E NO. 17 - 88 - TELEFONO: 5835460 - CUCUTA

49-40-101011266

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CUCUTA	AGENCIA CUCUTA	49	49-40-101011266	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
02	07	2025	31	12	2024	00:00	30	09	2025	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO RIO BANADIA		NIT: 901.902.273-3
DIRECCIÓN: CL 30 NRO. 8 - 49 BARRIO SAN LUIS	**CIUDAD:** SARAVENA, ARAUCA		**TELÉFONO:** 3202395534

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	DEPARTAMENTO DE ARAUCA		NIT: 800.102.838-5
DIRECCIÓN: CALLE 20 CARRERA 21 PISO 1	**CIUDAD:** ARAUCA, ARAUCA		**TELÉFONO:** 8856998

BENEFICIARIO: 800102838 - DEPARTAMENTO DE ARAUCA

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
PROYECTOS Y SERVICIOS INTEGRALES PSI S.A.S	900827849-0	45.00
FUNDACION NUEVA CASTELLANA	901358987-1	45.00
BCH ENGINEERING S.A.S	901393606-7	10.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AV. 1E NO. 17 - 88 - TELEFONO: 5835460 - CUCUTA

49-40-101011266

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO 6

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO DE SUSPENSIÓN PRORROGA

CL 25 N 11 – 70 BRR ALFONSO LOPEZ
CORREO: consorcioriobanadia@gmail.com
CELULAR: 3202395534

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CUCUTA	AGENCIA CUCUTA	49	49-44-101035208	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
03	07	2025	31	12	2024	00:00	30	09	2028	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO RIO BANADIA	NIT: 901.902.273-3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 30 NRO. 8 - 49 BARRIO SAN LUIS	SARAVENA, ARAUCA	3202395534

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DE ARAUCA	*NIT: 800.102.838-5*

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 20 CARRERA 21 PISO 1	ARAUCA, ARAUCA	8856998

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN LA EJECUCION DEL CONTRATO NUMERO 481-2024 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION PARA LA REDUCCION DEL RIESGO Y PREVENCION DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31/12/2024	31/03/2026	$2,862,448,258.33	$2,862,448,258.33
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	31/12/2024	31/03/2026	$5,724,896,516.66	$5,724,896,516.66
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	30/06/2025	30/06/2027	$2,862,448,258.33	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	31/12/2024	30/09/2028	$2,146,836,193.75	$2,146,836,193.75

ACLARACIONES

EN EL PRESENTE ANEXO SE AMPLIAN LAS VIGENCIAS SEGUN ACTA DE SUSPENSION NUMERO 1 DE FECHA 22/04/2025, PRORROGA NUMERO 01 AL ACTA DE SUSPENSION NUMERO 1 DE FECHA 22/05/2025 Y PRORROGA NUMERO 02 AL ACTA DE SUSPENSION NUMERO 1 DE FECHA 20/06/2025.

TODOS LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINUAN EN VIGOR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***3,514,929.00	$ *******8,000.00	$ *****669,356.00	$ *********4,192,286.00	$ ***13,596,629,227.07	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARIA CAROLINA DURAN SANABRIA	153566	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AV. 1E NO. 17 - 88 - TELEFONO: 5835460 - CUCUTA

49-44-101035208

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CUCUTA	AGENCIA CUCUTA	49	49-44-101035208	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
03	07	2025	31	12	2024	00:00	30	09	2028	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO RIO BANADIA		NIT: 901.902.273-3
DIRECCIÓN: CL 30 NRO. 8 - 49 BARRIO SAN LUIS	**CIUDAD:** SARAVENA, ARAUCA		**TELÉFONO:** 3202395534

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	DEPARTAMENTO DE ARAUCA		NIT: 800.102.838-5
DIRECCIÓN: CALLE 20 CARRERA 21 PISO 1	**CIUDAD:** ARAUCA, ARAUCA		**TELÉFONO:** 8856998

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
PROYECTOS Y SERVICIOS INTEGRALES PSI S.A.S	900827849-0	45.00
FUNDACION NUEVA CASTELLANA	901358987-1	45.00
BCH ENGINEERING S.A.S	901393606-7	10.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AV. 1E NO. 17 - 88 - TELEFONO: 5835460 - CUCUTA

49-44-101035208

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO 7

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO REINICIO

CL 25 N 11 – 70 BRR ALFONSO LOPEZ
CORREO: consorcioriobanadia@gmail.com
CELULAR: 3202395534

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CUCUTA	AGENCIA CUCUTA	49	49-44-101035208	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
22	07	2025	31	12	2024	00:00	30	09	2028	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: CONSORCIO RIO BANADIA

IDENTIFICACIÓN NIT: 901.902.273-3

DIRECCIÓN: CL 30 NRO. 8 - 49 BARRIO SAN LUIS

CIUDAD: SARAVENA, ARAUCA

TELÉFONO: 3202395534

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: DEPARTAMENTO DE ARAUCA

IDENTIFICACIÓN NIT: 800.102.838-5

DIRECCIÓN: CALLE 20 CARRERA 21 PISO 1

CIUDAD: ARAUCA, ARAUCA

TELÉFONO 8856998

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU0108, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN LA EJECUCION DEL CONTRATO NUMERO 481-2024 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION PARA LA REDUCCION DEL RIESGO Y PREVENCION DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31/12/2024	31/03/2026	$2,862,448,258.33	$2,862,448,258.33
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	31/12/2024	31/03/2026	$5,724,896,516.66	$5,724,896,516.66
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	30/06/2025	30/06/2027	$2,862,448,258.33	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	31/12/2024	30/09/2028	$2,146,836,193.75	$2,146,836,193.75

ACLARACIONES

EN EL PRESENTE ANEXO SE ACLARA ACTA DE REINICIO NUMERO 1 DE FECHA 21/07/2025.

TODOS LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINUAN EN VIGOR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ***13,596,629,227.07	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
MARIA CAROLINA DURAN SANABRIA	153566	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA; POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AV. 1E NO. 17 - 68 - TELEFONO: 5835450 - CUCUTA

49-44-101035208

FIRMA AUTORIZADA: Juan Luis Ojeda - Vicepresidente de Finanzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
CUCUTA	AGENCIA CUCUTA	49	49-44-101035208	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
22	07	2025	31	12	2024	00:00	30	09	2028	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO RIO BANADIA		NIT: 901.902.273-3
DIRECCIÓN: CL 30 NRO. 8 - 49 BARRIO SAN LUIS	CIUDAD: SARAVENA, ARAUCA	TELÉFONO:	3202395534

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	DEPARTAMENTO DE ARAUCA		NIT: 800.102.838-5
DIRECCIÓN: CALLE 20 CARRERA 21 PISO 1	CIUDAD: ARAUCA, ARAUCA	TELÉFONO:	8855998

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
PROYECTOS Y SERVICIOS INTEGRALES PSI S.A.S	900827849-0	45.00
FUNDACION NUEVA CASTELLANA	901358987-1	45.00
BCH ENGINEERING S.A.S	901393606-7	10.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AV. 1E NO. 17 - 88 - TELEFONO: 5835460 - CUCUTA

49-44-101035208

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DLF153568A

ANEXO 8

PÓLIZA EXTRACONTRACTUAL DE REINICIO

CL 25 N 11 – 70 BRR ALFONSO LOPEZ
CORREO: consorcioriobanadia@gmail.com
CELULAR: 3202395534

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT: 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CUCUTA	AGENCIA CUCUTA	49	49-40-101011266	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
22	07	2025	31	12	2024	00:00	30	09	2025	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO RIO BANADIA	NIT: 901.902.273-3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 30 NRO. 8 - 49 BARRIO SAN LUIS	SARAVENA, ARAUCA	3202395534

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DE ARAUCA	NIT: 800.102.838-5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 20 CARRERA 21 PISO 1	ARAUCA, ARAUCA	8856998

BENEFICIARIO: 800102838 - DEPARTAMENTO DE ARAUCA

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-0012-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE LA EJECUCION DEL CONTRATO NUMERO 481-2024 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION PARA LA REDUCCION DEL RIESGO Y PREVENCION DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	31/12/2024	30/09/2025	$715,612,064.58	$715,612,064.58
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	31/12/2024	30/09/2025	$715,612,064.58	$715,612,064.58
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	31/12/2024	30/09/2025	$715,612,064.58	$715,612,064.58

ACLARACIONES

EN EL PRESENTE ANEXO SE ACLARA ACTA DE REINICIO NUMERO 1 DE FECHA 21/07/2025.

TODOS LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINUAN EN VIGOR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ******715,612,064.58	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
MARIA CAROLINA DURAN SANABRIA	153566	100.00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AV. 1E NO. 17 - 88 - TELEFONO: 5835460 - CUCUTA

49-40-101011266

FIRMA AUTORIZADA: João Luís Olaia - Vicepresidente de Finanzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO
RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
CUCUTA	AGENCIA CUCUTA	49	49-40-101011266	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
22	07	2025	31	12	2024	00:00	30	09	2025	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSORCIO RIO BANADIA	NIT: 901.902.273-3
DIRECCIÓN: CL 30 NRO. 8 - 49 BARRIO SAN LUIS	**CIUDAD:** SARAVENA, ARAUCA	**TELÉFONO:** 3202395534

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
	DEPARTAMENTO DE ARAUCA	NIT: 800.102.838-5
DIRECCIÓN: CALLE 20 CARRERA 21 PISO 1	**CIUDAD:** ARAUCA, ARAUCA	**TELÉFONO:** 8856998

BENEFICIARIO: 800102838 - DEPARTAMENTO DE ARAUCA

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	31/12/2024	30/09/2025	$715,612,064.58	$715,612,064.58
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	31/12/2024	30/09/2025	$715,612,064.58	$715,612,064.58
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	31/12/2024	30/09/2025	$715,612,064.58	$715,612,064.58

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AV. 1E NO. 17 - 88 - TELEFONO: 5835460 - CUCUTA

49-40-101011266

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT: 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO
RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
CUCUTA	AGENCIA CUCUTA	49	49-40-101011266	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
22	07	2025	31	12	2024	00:00	30	09	2025	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO RIO BANADIA		NIT: 901.902.273-3
DIRECCIÓN: CL 30 NRO. 8 - 49 BARRIO SAN LUIS	CIUDAD: SARAVENA, ARAUCA	TELEFONO: 3202395534

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DE ARAUCA		NIT: 800.102.838-5
DIRECCIÓN: CALLE 20 CARRERA 21 PISO 1	CIUDAD: ARAUCA, ARAUCA	TELÉFONO: 8856998

BENEFICIARIO: 800102838 - DEPARTAMENTO DE ARAUCA

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL : NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
PROYECTOS Y SERVICIOS INTEGRALES PSI S.A.S	900827849-0	45.00
FUNDACION NUEVA CASTELLANA	901358987-1	45.00
BCH ENGINEERING S.A.S	901393606-7	10.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AV. 1E NO. 17 - 88 - TELEFONO: 5835460 - CUCUTA

49-40-101011266

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLP183566A 3

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO 9

ACTA DE COMITÉ

CL 25 N 11 – 70 BRR ALFONSO LOPEZ
CORREO: consorcioriobanadia@gmail.com
CELULAR: 3202395534

MESA TÉCNICA 006

Fecha: 22 de julio del 2025
Hora: *10:00* am
Lugar: Sala de juntas de la secretaría de gobierno departamental

1. *Verificación del Quorum.*
2. *Inicio por parte del supervisor CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO.*
3. *Reinicio de la ejecución de cto 481-2024 y 473-2024:* ***"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIÓN SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA".***
4. Proposiciones, varios
5. Conclusiones y cierre.

participantes:

1. Supervisor del contrato según resolución N° 001-2025. CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO
2. CONTRATISTA CONSORCIO RIO BANADIA - R/L JHONN FREDY GARCIA BELTRAN
3. INTERVENTORÍA CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN - R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCÓN
4. PROFESIONALES DE APOYO De La Secretaria De Gobierno Y Seguridad Ciudadana

Muy buenos días para todos yo CRISTIAN ALEXANDER MURILLO con función de Supervisor del contrato según resolución N° 001-2025 y en representación del secretario de gobierno doy inicio a la mesa técnica número 006 con respecto al reinicio de la ejecución de cto 481-2024 y 473-2024.

Interventoría: buenos días para todos nosotros como interventoría estamos dispuestos a trabajar para lograr con éxito la ejecución de las actividades descritas en el documento técnico.

Contratista: si, desde la obra estamos listos para iniciar con las actividades que quedaron suspendidas por motivos de permisos ambientales se requieren para avanzar con las actividades que ameritan los permisos ambientales.

Secretaria de gobierno: realizaremos una visita de inspección para verificar el estado de la obra y asimismo garantizar el avance óptimo de las actividades, recordar que nos quedan poco tiempo para finalizar los términos contractuales requerimos mucho compromiso con hacer llegar los informes de avance.

Para concluir concordamos en trabajar de manera conjunta para agilizar los trámites pertinentes.

Y cómo compromisos tenemos

1. Obra e interventoría se comprometen a presentar ante esta secretaria la actualización de las pólizas según reinicio n°1 el día 23 de julio.

2. Se presentará a esta secretaria el día lunes 28 de julio, el plan de contingencia por parte del contratista de obra.
3. La supervisión realizara una visita de campo a la obra el día 30 de julio.

Siendo las 11:15 am damos por finalizada esta reunión, muchas gracias por haber asistido

Se da por finalizada esta mesa técnica

SE ADJUNTA FORMATO DE ASISTENCIA PARA CONFORMIDAD DE LOS ASISTENTES

	PROCESO: GESTION DEL RIESGO Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO FR-GC-19
GOBERNACIÓN DE ARAUCA	FORMATO CONTROL DE ASISTENCIA	FECHA DE EMISIÓN 01 / 07 / 2024 VERSIÓN 05

EVENTO: COMITE TECNICO # DEL 22 DE julio DE 2025

TEMA: EJECUCION CTO 1481-2024 y CTO 493-2024 DÍA 22 MES: 07 AÑO: 2025

No	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	E- MAIL	Autoriza el uso de su información SI	NO	TELÉFONO	FIRMA
1.	CRISTIAN A. MURILLO	GOBERNACION ARAUCA	COORDINADOR GRGRD ARAUCA	cmurillo@arauca.gov.co	X		3148816656	
2.	Carlos A. Hernandez	Int. Externa	Ing. Residente		X		3133457434	
3	Juan Sebastian Ayala	Gobernacion	Apoyo alo supervision	juaninstant@outlook.com	X		3/662m971	
4	JOSSA Alexe Villamil R.	consorcio Rio Bandia	Representante legal		X		3202345534	
5	Jhon Freby Garcia	Consorcio Rio Bandia	Profesional de apoyo		X		3142780531	
6	Carolina Reina	Gobierno	Apoyo	oficinagrd2024@gmail.com	X		3163813412	

La Administración Departamental de Arauca, identificada con NIT. 800102838 - 5, informa a todos los colaboradores y visitantes externos, que en cumplimiento de la Constitución Política y la Ley 1581 de 2012 garantizamos la protección de datos personales, y las exigencias expedidas para la protección de información de menores de edad (niños, niñas y adolescentes) y de los adultos que autoricen su información en nuestros formatos y formularios.

Jornada a cargo de:	DIRECCIÓN GESTION DEL RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO – SEC. GOBIERNO
Orientada por:	CRISTIAN A. MURILLO OSORIO – COORDINADOR GRGRD DE ARAUCA

GOBERNACION DE ARAUCA
Calle 20 Carrera 21 Esquina, Telefax 8851946; Código Postal 810001
Arauca-Arauca (Colombia). E-mail: archivogeneral@arauca.gov.co
NIT. 800102838 - 5 PAG. 1

Nota: se adjunta formato original de asistencia.

Proyectó: Yesika Carolina Reina Hurtado
Técnico Administrativo - CTO 095 de 2025

ANEXO 10

CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

CL 25 N 11 – 70 BRR ALFONSO LOPEZ
CORREO: consorcioriobanadia@gmail.com
CELULAR: 3202395534

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

RECIBIDA

CL 25 N 11 – 70 BRR ALFONSO LOPEZ
CORREO: consorcioriobanadia@gmail.com
CELULAR: 3202395534

CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION
NIT. 901.901.368-1

Arauca 21 de mayo de 2025

Señores:
CONSORCIO RIO BANADIA
R/L JEISON VILLAREAL
Ciudad

Referencia: Contrato de Interventoría No. 473-2024 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".

Asunto: Solicitud acompañamiento a reunión de obra presencial

Respetuoso saludo,

En aras de garantizar el correcto cumplimiento de nuestra labor como interventores externos del contrato de Obra No. 481 de 2024, cuyo objeto es: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA, nos permitimos extenderla la invitación realizada por la Secretaria de Gobierno y Seguridad Ciudadana Departamental mediante comunicación del 20 de mayo del presente año, para dar a conocer el avance y estado del trámite administrativo de permisos ambientales ante la corporación Corporinoquia, y así mismo suscribir acto administrativo que dieron lugar a los contrato de obra 481 de 2024.

Hora y fecha; jueves 22 de mayo de 2025, 09:00 am, oficina de la secretaria de Gobierno Dptal.

Agradeciendo su puntual asistencia. Cordialmente,

JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON
R/L CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN
Interventoría Externa

Dirección comercial: Calle 20 No.19-35 Oficina 07 – celular. 3114430280
Email. interobrasdeproteccion1@gmail.com
Arauca-Arauca

CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION
NIT. 901.901.368-1

Arauca, miércoles 02 de julio de 2025.

Ing.
JEISSON RENE VILLARREAL ROA
R/L CONSORCIO RIO BANADIA
Ciudad

Referencia: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 481 DE 2024 cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".

Asunto: Solicitud de pólizas actualizadas según acta de suspensión y actas de prórrogas.

Cordial saludo,

Me dirijo a ustedes de manera respetuosa para solicitarle la póliza de cumplimiento estatal y la póliza de responsabilidad civil extracontractual, debidamente actualizadas según acta de suspensión 1, acta de prórroga 1 a la suspensión 1 y acta de prórroga 2 a la suspensión 1.
En virtud de lo establecido en el contrato, solicitamos que se nos proporcione las pólizas actualizadas que amparan los riesgos y responsabilidades asociadas a la obra.

Quedamos atentos a cualquier duda o comentario que puedan surgir respecto a los documentos mencionados.

Atentamente,

JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON
R/L CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN
NIT. 901.901.368-1

Gmail

Consorcio RIO BANADIA <consorcioriobanadia@gmail.com>

SOLICITUD DE PÓLIZAS ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE SUSPENSIÓN 1, ACTAS DE PRÓRROGA 1 Y 2 A LA SUSPENSIÓN 1.

1 mensaje

INTER OBRAS DE PROTECCION <interobrasdeproteccion1@gmail.com>
Para: consorcioriobanadia@gmail.com

3 de julio de 2025, 8:16

SOLICITUD DE PÓLIZAS ACT..pdf
146K

CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION
NIT. 901.901.368-1

Arauca, martes 08 de julio de 2025.

Ing.
JEISSON RENE VILLARREAL ROA
R/L CONSORCIO RIO BANADIA
Ciudad

Referencia: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 481 DE 2024 cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".

Asunto: Reiteración de Solicitud de pólizas actualizadas según acta de suspensión y actas de prórrogas.

Cordial saludo,

Me dirijo a ustedes de manera respetuosa para solicitarles la pólizas de cumplimiento estatal y de responsabilidad civil extracontractual debidamente actualizadas según acta de suspensión 1, acta de prórroga 1 a la suspensión 1 y acta de prórroga 2 a la suspensión 1.
En virtud de lo establecido en el contrato, solicitamos que se nos proporcione las pólizas actualizadas que amparan los riesgos y responsabilidades asociadas a la obra.

Quedamos atentos a cualquier duda o comentario que puedan surgir respecto a los documentos mencionados.

Atentamente,

JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON
R/L CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN
NIT. 901.901.368-1

Dirección comercial: Calle 21 No. 22-44 – celular. 3114430280
Email. interobrasdeprotección1@gmail.com
Arauca-Arauca

CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION
NIT. 901 901 368 1

Arauca, sábado 19 de julio de 2025.

Ing.
JEISSON RENE VILLARREAL ROA
R/L CONSORCIO RIO BANADIA
Ciudad

REF: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 481 DE 2024 cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".

Asunto: INVITACIÓN A COMITÉ DE REINICIO 01 A SUSPENSIÓN 01.

Cordial saludo,

En virtud que se ha superado las causales que han dado motivo a esta suspensión, los invitamos de manera cordial a la Oficina de la Dirección del Riesgo y Cambio Climático de la Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana Departamental, ubicada en el segundo piso del Palacio Departamental a las 2:30 pm del día 21 de Julio de 2025, este con el fin de suscribir la correspondiente acta de reinicio de las actividades contractuales del contrato en referencia.

Lo anterior descrito con el ánimo de llevar a feliz termino el proyecto y se pueda cumplir de la mejor manera las metas físicas propuesta.

JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON
R/L CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN
NIT. 901.901.368-1

Dirección comercial: Calle 21 No. 22-44 – celular. 3114430280
Email. interobrasdeprotección1@gmail.com
Arauca-Arauca

GOBERNACIÓN DE
ARAUCA

Arauca, 21 de julio de 2025

Señores
CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN
R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCÓN
Calle 20 No. 19-35 Barrio Centro Oficina 07
Cel. 3114430280
interobrasdeproteccion1@gmail.com
CONSORCIO RIO BANADIA
R/L JEISSON RENE VILLAREAL ROA
Calle No. 8-49 Barrio San Luis
consorcioriobanadia@gmail.com

Ref.: Ejecución del Contrato de Interventoría No. 473-2024 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA" y del Contrato de Obra No. 481-2024 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".

Asunto: Reprogramación Comité Técnico para el 22 de julio de 2025.

Cordial Saludo;

Por medio del presente, me permito invitarlos de manera presencial al Comité Técnico del proyecto "CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION PARA LA REDUCCION DEL RIESGO Y PREVENCION DE INUNDACION SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA", el cual se desarrollará el día martes 22 de julio de 2025, a las 10:00 am en las instalaciones de la sala de juntas de la Secretaría de Gobierno Departamental.

Es de indicar que la presencia es de carácter obligatorio, deberán asistir con el equipo técnico de cada una de las partes.

Agradezco su valiosa presencia.

Cordialmente,

NASSER ANTONIO CRUZ MATUS
Secretario de Gobierno y seguridad ciudadana.

Proyectó: **Ing. CRISTIAN ALEXANDER MURILLO**
Profesional Universitario

CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION
NIT. 901.901.368-1

Arauca, martes 22 de julio de 2025.

Ing.
JEISSON RENE VILLARREAL ROA
R/L CONSORCIO RIO BANADIA
Ciudad

Referencia: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 481 DE 2024 cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".

Asunto: SOLICITUD DE PÓLIZAS ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE REINICIO 1.

Cordial saludo,

Me dirijo a ustedes de manera respetuosa para solicitarle las pólizas debidamente actualizadas según el acta de reinicio 1 del contrato de obra N 481 de 2024, dado que fue uno de los compromisos pactados en el comité del día de hoy 22 de Julio de 2025.

En virtud de lo establecido en el contrato, esperamos respuesta a la solicitud de las pólizas actualizadas que amparan los riesgos y responsabilidades asociadas a la obra.

Quedamos atentos a cualquier duda que pueda surgir respecto a los documentos mencionados anteriormente.

Atentamente,

JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON
R/L CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN
NIT. 901.901.368-1

CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION
NIT. 901.901.368-1

Saravena, 30 de julio de 2025

Señores:
CONSORCIO RIO BANADIA
R/L JEISON VILLAREAL
Ciudad

Referencia: Contrato de Interventoría No. 473-2024 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".

Asunto: Solicitud de Reprogramación de Obra, Plan de Contingencia– Contrato de obra 481 del 2024

Respetuoso saludo,

En aras de garantizar el correcto cumplimiento de nuestra labor como interventores externos del contrato de Obra No. 481 de 2024, cuyo objeto es: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA, nos permitimos en atención a los compromisos establecidos durante el comité técnico realizado el día martes 22 de julio del presente año, de manera atenta y respetuosa, me permito recordar y solicitar la Reprogramación de la ejecución física de la Obra respaldado con su correspondiente Plan de Contingencia, en el marco de la ejecución del Contrato de Obra No. 481 de 2024 de acuerdo a los tiempos establecidos según acta de reinicio No. 01 del 21 de julio de 2025.

Para realizar la revisión técnica y posterior aprobación de dicha reprogramación y plan de contingencia se insta a la firma contratista hacer llegar a esta interventoría en un periodo no mayor a tres (3) días a partir de la fecha de esta comunicación dicha información.

Sin otro particular; atentamente.

JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON
R/L CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN
Interventoría Externa

Dirección comercial: Calle 20 No.19-35 Oficina 07 – celular. 3114430280
Email. interobrasdeproteccion1@gmail.com
Arauca-Arauca

ENVIADA

CL 25 N 11 – 70 BRR ALFONSO LOPEZ
CORREO: consorcioriobanadia@gmail.com
CELULAR: 3202395534

Gmail

Consorcio RIO BANADIA <consorcioriobanadia@gmail.com>

INFORME FINAL ENERO CTO 481 DE 2024.

1 mensaje

Consorcio RIO BANADIA <consorcioriobanadia@gmail.com> 5 de abril de 2025, 12:33
Para: INTER OBRAS DE PROTECCION <interobrasdeproteccion1@gmail.com>

Buen Dia

Adjuntamos informe del mes de Enero con las correciones enviadas desde la entidad contratante.


Quedamos atentos a sus solicitudes.

Atentamente,

informe Final Enero 481 de 2024..pdf

--

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273



Gmail

Consorcio RIO BANADIA <consorcioriobanadia@gmail.com>

INFORME MES DE MARZO

1 mensaje

Consorcio RIO BANADIA <consorcioriobanadia@gmail.com> 9 de abril de 2025, 10:00
Para: INTER OBRAS DE PROTECCION <interobrasdeproteccion1@gmail.com>

Buen día

Nos permitimos adjuntar el informe de obra del contrato N° 481 con objeto "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA", del periodo del 01 de marzo al 31 de marzo de 2025, me permito adjuntar el informe y sus anexos correspondientes.

informe 3 Marzo.pdf

Quedo atento a sus comentarios,

Cordialmente,

--

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

3202395534
consorcioriobanadia@gmail.com
Arauca

marzo.pdf
463K

Gmail

Consorcio RIO BANADIA <consorcioriobanadia@gmail.com>

Solicitud de segunda prorroga a la suspensión.

1 mensaje

Consorcio RIO BANADIA <consorcioriobanadia@gmail.com> 20 de junio de 2025, 14:34
Para: INTER OBRAS DE PROTECCION <interobrasdeproteccion1@gmail.com>

Cordial saludo,

En atención al acta de suspensión No 01 hasta el 22 de abril de 2025, para ejecución de actividades del contrato N°481 de 2024, y la prórroga número uno del 22 de mayo de 2025, le solicitamos se considere la segunda prórroga a la suspensión por el tiempo necesario ya que hasta la fecha no se han superado los motivos de la misma.

Agradecemos su atención, quedamos atentos a una pronta respuesta

Solicitud 2 prorroga a la suspensión.pdf
256K

Gmail Consorcio RIO BANADIA <consorcioriobanadia@gmail.com>

SOLICITUD DE PÓLIZAS ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE SUSPENSIÓN 1, ACTAS DE PRÓRROA 1 Y 2 A LA SUSPENSIÓN 1.

2 mensajes

INTER OBRAS DE PROTECCION <interobrasdeproteccion1@gmail.com> 8 de julio de 2025, 8:27
Para: consorcioriobanadia@gmail.com

SOLICITUD DE PÓLIZAS ACT.pdf
146K

Consorcio RIO BANADIA <consorcioriobanadia@gmail.com> 8 de julio de 2025, 16:54
Para: INTER OBRAS DE PROTECCION <interobrasdeproteccion1@gmail.com>

Buena tarde,


En atención a su solicitud, nos permitimos adjuntar actualizadas las pólizas debidamente firmadas para su aprobación, quedamos atentos.

cordialmente,

El mar, 8 jul 2025 a las 8:27, INTER OBRAS DE PROTECCION (<interobrasdeproteccion1@gmail.com>) escribió:

–

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273



4 adjuntos

POLIZA SEGUN SUSPENSION.pdf
747K

POLIZA EXTRACONTRACTUAL (1).pdf
1137K

POLIZA CUMPLIMIENTO.pdf
749K

OFICIO ENTREGA DE POLIZAS.pdf
255K

Gmail Consorcio RIO BANADIA <consorcioriobanadia@gmail.com>

SOLICITUD DE PÓLIZAS ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE REINICIO.

2 mensajes

INTER OBRAS DE PROTECCION <interobrasdeproteccion1@gmail.com> 22 de julio de 2025, 18:07
Para: consorcioriobanadia@gmail.com

SOLICITUD DE PÓLIZA ACT..pdf
238K

Consorcio RIO BANADIA <consorcioriobanadia@gmail.com> 23 de julio de 2025, 8:54
Para: INTER OBRAS DE PROTECCION <interobrasdeproteccion1@gmail.com>

Buen día

Adjunto pólizas actualizadas según acta de inicio N°01.

El mar, 22 jul 2025 a las 18:07, INTER OBRAS DE PROTECCION (<interobrasdeproteccion1@gmail.com>) escribió:

3 adjuntos

POLIZA RESPONSABILIDAD REINICIO 1.pdf
414K

POLIZA DE CUMPLIMIENTO REINICIO 1.pdf
259K

Oficio poliza reinicio.pdf
255K

Gmail Consorcio RIO BANADIA <consorcioriobanadia@gmail.com>

Actualización de informes entregados - Subsanación de observaciones

1 mensaje

Consorcio RIO BANADIA <consorcioriobanadia@gmail.com> 4 de agosto de 2025, 8:21
Para: INTER OBRAS DE PROTECCION <interobrasdeproteccion1@gmail.com>

4 adjuntos

- **INFORME DE OBRA ABRIL OK.pdf**
  3731K
- **INFORME DE OBRA ENERO OK (1).pdf**
  3321K
- **INFORME DE OBRA FEBRERO OK (1).pdf**
  3601K
- **INFORME DE OBRA MARZO OK (1).pdf**
  3724K

ANEXO 11

BITÁCORAS DE OBRA DEL 21 DE JULIO DE 2025 AL 31 DE JULIO DE 2025

CL 25 N 11 – 70 BRR ALFONSO LOPEZ
CORREO: consorcioriobanadia@gmail.com
CELULAR: 3202395534

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

BITACORA DE OBRA

CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION
NIT 901.901.368-1

CONTRATO DE OBRA N°:	481 DE 2024
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATISTA	CONSORCIO RIO BANADIA R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON

FECHA:	LUNES 21 DE JULIO DE 2025	FOLIO	114

RECURSO EQUIPO		RECURSO HUMANO		MATERIALES	ESTADO DEL TIEMPO		
EQUIPOS	CANT	PERSONAL	CANT	DESCRIPCION	ESTADO	MAÑANA	TARDE
		Director de Obra	1				
RETROEXCAVADORA	4	Residente de Obra	2				
VOLQUETA	4	Residente de Interventoria	1				
MOTONIVELADORA	1	Director interventoria	1		SOLEADO SECO	X	
BENITIN	1	Ingeniero Ambiental	1				
VIBROCOMPACTADOR	1	Profesional Social	1		NUBLADO SECO		X
CARROTANQUE	1	Profesional HSEQ	1				
		Inspector de obra (Técnico e	1		LLUVIAS PASAJERAS		
		Secretaria	1				
		Oficial	2		LLUVIA INTERMITENTE		
		Ayudante	10				
					LLUVIA FUERTE		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

SE INICIAN LABORES A LAS 7:00 AM
SE REALIZAN LOS PREOPERACIONALES DE LAS HERRAMIENTAS MENORES Y MAQUINAS
SE REALIZA EL MANEJO TEMPORAL DE AGUAS CON MOTOBOMBA
SE REALIZA LA CONFORMACIÓN DE BARRERA TIPO JARILLÓN
SE REALIZA INSTALACIÓN DE GEOTEXTILES NT 2400, NT 3000 Y TEJIDO 2100

SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS:

SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS:

VoBo:

ING. JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA
M.P. 54202-403896 NTS

VoBo:

ING JUAN GABRIEL HERNANDEZ MARIN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P. 54202-373584 NTS

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

BITACORA DE OBRA

CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION
NIT 901.901.269-1

CONTRATO DE OBRA N°:	481 DE 2024
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATISTA	CONSORCIO RIO BANADIA R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON

FECHA:	MARTES 22 DE JULIO DE 2025	FOLIO	115

RECURSO EQUIPO		RECURSO HUMANO		MATERIALES	ESTADO DEL TIEMPO		
EQUIPOS	CANT	PERSONAL	CANT	DESCRIPCION	ESTADO	MAÑANA	TARDE
		Director de Obra	1				
RETROEXCAVADORA	4	Residente de Obra	2				
VOLQUETA	4	Residente de Interventoria	1				
MOTONIVELADORA	1	Director interventoria	1		SOLEADO SECO		X
BENITIN	1	Ingeniero Ambiental	1				
VIBROCOMPACTADOR	1	Profesional Social	1		NUBLADO SECO	X	
CARROTANQUE	1	Profesional HSEQ	1				
		Inspector de obra (Técnico e	1		LLUVIAS PASAJERAS		
		Secretaria	1				
		Oficial	2		LLUVIA INTERMITENTE		
		Ayudante	10				
					LLUVIA FUERTE		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

SE INICIAN LABORES A LAS 7:00 AM
SE REALIZAN LOS PREOPERACIONALES DE LAS HERRAMIENTAS MENORES Y MAQUINAS
SE REALIZA EL MANEJO TEMPORAL DE AGUAS CON MOTOBOMBA
SE CONTINUA CON LA CONFORMACIÓN DE BARRERA TIPO JARILLÓN
SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN DE GEOTEXTILES NT 2400, NT 3000 Y TEJIDO 2100

SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS:

SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS:

VoBo:
ING. JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA
M.P. 54202-403896 NTS

VoBo:
ING JUAN GABRIEL HERNANDEZ MARIN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P. 54202-373584 NTS

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

BITACORA DE OBRA

CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION
NIT. 901.903.369-1

CONTRATO DE OBRA N°:	481 DE 2024

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATISTA	CONSORCIO RIO BANADIA R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON

FECHA:	MIERCOLES 23 DE JULIO DE 2025	FOLIO	116

RECURSO EQUIPO		RECURSO HUMANO		MATERIALES	ESTADO DEL TIEMPO		
EQUIPOS	CANT	PERSONAL	CANT	DESCRIPCION	ESTADO	MAÑANA	TARDE
		Director de Obra	1				
RETROEXCAVADORA	4	Residente de Obra	2				
VOLQUETA	4	Residente de Interventoria	1				
MOTONIVELADORA	1	Director interventoria	1		SOLEADO SECO		X
BENITIN	1	Ingeniero Ambiental	1				
VIBROCOMPACTADOR	1	Profesional Social	1		NUBLADO SECO	X	
CARROTANQUE	1	Profesional HSEQ	1				
		Inspector de obra (Técnico e	1		LLUVIAS PASAJERAS		
		Secretaria	1				
		Oficial	2		LLUVIA INTERMITENTE		
		Ayudante	10				
					LLUVIA FUERTE		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

SE INICIAN LABORES A LAS 7:00 AM
SE REALIZAN LOS PREOPERACIONALES DE LAS HERRAMIENTAS MENORES Y MAQUINAS
SE REALIZA EL MANEJO TEMPORAL DE AGUAS CON MOTOBOMBA
SE CONTINUA CON LA CONFORMACIÓN DE BARRERA TIPO JARILLÓN
SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN DE GEOTEXTILES NT 2400, NT 3000 Y TEJIDO 2100

SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS:

SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS:

VoBo:

ING. JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA
M.P. 54202-403896 NTS

VoBo:

ING JUAN GABRIEL HERNANDEZ MARIN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P. 54202-373584 NTS

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

BITACORA DE OBRA

CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION
NIT 901.901.368-1

CONTRATO DE OBRA N°:	481 DE 2024
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATISTA	CONSORCIO RIO BANADIA R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON

FECHA:	JUEVES 24 DE JULIO DE 2025	FOLIO	117

RECURSO EQUIPO		RECURSO HUMANO		MATERIALES	ESTADO DEL TIEMPO		
EQUIPOS	CANT	PERSONAL	CANT	DESCRIPCION	ESTADO	MAÑANA	TARDE
		Director de Obra	1				
RETROEXCAVADORA	4	Residente de Obra	2				
VOLQUETA	4	Residente de Interventoria	1				
MOTONIVELADORA	1	Director interventoria	1		SOLEADO SECO	X	X
BENITIN	1	Ingeniero Ambiental	1				
VIBROCOMPACTADOR	1	Profesional Social	1		NUBLADO SECO		
CARROTANQUE	1	Profesional HSEQ	1				
		Inspector de obra (Técnico e	1		LLUVIAS PASAJERAS		
		Secretaria	1				
		Oficial	2		LLUVIA INTERMITENTE		
		Ayudante	10				
					LLUVIA FUERTE		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

SE INICIAN LABORES A LAS 7:00 AM
SE REALIZAN LOS PREOPERACIONALES DE LAS HERRAMIENTAS MENORES Y MAQUINAS
SE REALIZA EL MANEJO TEMPORAL DE AGUAS CON MOTOBOMBA
SE CONTINUA CON LA CONFORMACIÓN DE BARRERA TIPO JARILLÓN
SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN DE GEOTEXTILES NT 2400, NT 3000 Y TEJIDO 2100

SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS:

SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS:

VoBo:

ING. JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA
M.P. 54202-403896 NTS

VoBo:

ING JUAN GABRIEL HERNANDEZ MARIN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P. 54202-373584 NTS

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

BITACORA DE OBRA

CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION
NIT. 901.901.268-1

CONTRATO DE OBRA N°:	481 DE 2024
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATISTA	CONSORCIO RIO BANADIA R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON

FECHA:	VIERNES 25 DE JULIO DE 2025	FOLIO	118

RECURSO EQUIPO		RECURSO HUMANO		MATERIALES	ESTADO DEL TIEMPO		
EQUIPOS	CANT	PERSONAL	CANT	DESCRIPCION	ESTADO	MAÑANA	TARDE
		Director de Obra	1				
RETROEXCAVADORA	4	Residente de Obra	2				
VOLQUETA	4	Residente de Interventoria	1				
MOTONIVELADORA	1	Director interventoria	1		SOLEADO SECO	X	X
BENITIN	1	Ingeniero Ambiental	1				
VIBROCOMPACTADOR	1	Profesional Social	1		NUBLADO SECO		
CARROTANQUE	1	Profesional HSEQ	1				
		Inspector de obra (Técnico e	1		LLUVIAS PASAJERAS		
		Secretaria	1				
		Oficial	2		LLUVIA INTERMITENTE		
		Ayudante	10				
					LLUVIA FUERTE		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

SE INICIAN LABORES A LAS 7:00 AM
SE REALIZAN LOS PREOPERACIONALES DE LAS HERRAMIENTAS MENORES Y MAQUINAS
SE REALIZA EL MANEJO TEMPORAL DE AGUAS CON MOTOBOMBA
SE CONTINUA CON LA CONFORMACIÓN DE BARRERA TIPO JARILLÓN
SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN DE GEOTEXTILES NT 2400, NT 3000 Y TEJIDO 2100

SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS:

SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS:

VoBo:

ING. JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA
M.P. 54202-403896 NTS

VoBo:

ING JUAN GABRIEL HERNANDEZ MARIN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P. 54202-373584 NTS

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

BITACORA DE OBRA

CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION
NIT 901.903.360-1

CONTRATO DE OBRA N°:	481 DE 2024

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATISTA	CONSORCIO RIO BANADIA R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON

FECHA:	SABADO 26 DE JULIO DE 2025	FOLIO	119

RECURSO EQUIPO		RECURSO HUMANO		MATERIALES	ESTADO DEL TIEMPO		
EQUIPOS	CANT	PERSONAL	CANT	DESCRIPCION	ESTADO	MAÑANA	TARDE
		Director de Obra	1				
RETROEXCAVADORA	4	Residente de Obra	2				
VOLQUETA	4	Residente de Interventoria	1				
MOTONIVELADORA	1	Director interventoria	1		SOLEADO SECO	X	X
BENITIN	1	Ingeniero Ambiental	1				
VIBROCOMPACTADOR	1	Profesional Social	1		NUBLADO SECO		
CARROTANQUE	1	Profesional HSEQ	1				
		Inspector de obra (Técnico e	1		LLUVIAS PASAJERAS		
		Secretaria	1				
		Oficial	2		LLUVIA INTERMITENTE		
		Ayudante	10				
					LLUVIA FUERTE		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

SE INICIAN LABORES A LAS 7:00 AM
SE REALIZAN LOS PREOPERACIONALES DE LAS HERRAMIENTAS MENORES Y MAQUINAS
SE REALIZA EL MANEJO TEMPORAL DE AGUAS CON MOTOBOMBA
SE CONTINUA CON LA CONFORMACIÓN DE BARRERA TIPO JARILLÓN
SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN DE GEOTEXTILES NT 2400, NT 3000 Y TEJIDO 2100

SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS:

SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS:

VoBo:

ING. IHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA
M.P. 54202-403896 NTS

VoBo:

ING JUAN GABRIEL HERNANDEZ MARIN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P. 54202-373584 NTS

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

BITACORA DE OBRA

CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION
NIT 901 902 360-1

CONTRATO DE OBRA N°:	481 DE 2024
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATISTA	CONSORCIO RIO BANADIA R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON

FECHA:	DOMINGO 27 DE JULIO DE 2025	FOLIO	120

RECURSO EQUIPO		RECURSO HUMANO		MATERIALES	ESTADO DEL TIEMPO		
EQUIPOS	CANT	PERSONAL	CANT	DESCRIPCION	ESTADO	MAÑANA	TARDE
		Director de Obra	1				
RETROEXCAVADORA	4	Residente de Obra	2				
VOLQUETA	4	Residente de Interventoria	1				
MOTONIVELADORA	1	Director interventoria	1		SOLEADO SECO	X	
BENITIN	1	Ingeniero Ambiental	1				
VIBROCOMPACTADOR	1	Profesional Social	1		NUBLADO SECO		X
CARROTANQUE	1	Profesional HSEQ	1				
		Inspector de obra (Técnico e	1		LLUVIAS PASAJERAS		
		Secretaria	1				
		Oficial	2		LLUVIA INTERMITENTE		
		Ayudante	10				
					LLUVIA FUERTE		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DE OBRA POR SER DIA DOMINICAL

SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS:

SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS:

VoBo:

ING. JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA
M.P. 54202-403896 NTS

VoBo:

ING JUAN GABRIEL HERNANDEZ MARIN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P. 54202-373584 NTS

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

BITACORA DE OBRA

CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION
NIT. 901.901.369-1

CONTRATO DE OBRA N°:	481 DE 2024
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATISTA	CONSORCIO RIO BANADIA R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON

FECHA:	LUNES 28 DE JULIO DE 2025	FOLIO	121

RECURSO EQUIPO		RECURSO HUMANO		MATERIALES	ESTADO DEL TIEMPO		
EQUIPOS	CANT	PERSONAL	CANT	DESCRIPCION	ESTADO	MAÑANA	TARDE
		Director de Obra	1				
RETROEXCAVADORA	4	Residente de Obra	2				
VOLQUETA	4	Residente de Interventoria	1				
MOTONIVELADORA	1	Director interventoria	1		SOLEADO SECO	X	
BENITIN	1	Ingeniero Ambiental	1				
VIBROCOMPACTADOR	1	Profesional Social	1		NUBLADO SECO		X
CARROTANQUE	1	Profesional HSEQ	1				
		Inspector de obra (Técnico e	1		LLUVIAS PASAJERAS		
		Secretaria	1				
		Oficial	2		LLUVIA INTERMITENTE		
		Ayudante	10				
					LLUVIA FUERTE		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

SE INICIAN LABORES A LAS 7:00 AM
SE REALIZAN LOS PREOPERACIONALES DE LAS HERRAMIENTAS MENORES Y MAQUINAS
SE REALIZA EL MANEJO TEMPORAL DE AGUAS CON MOTOBOMBA
SE REALIZA LA CONFORMACIÓN DE BARRERA TIPO JARILLÓN
SE REALIZA INSTALACIÓN DE GEOTEXTILES NT 2400, NT 3000 Y TEJIDO 2100

SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS:

SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS:

VoBo:

ING JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA
M.P. 54202-403896 NTS

VoBo:

ING JUAN GABRIEL HERNANDEZ MARIN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P. 54202-373584 NTS

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

BITACORA DE OBRA

CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION
NIT 901.901.260-1

CONTRATO DE OBRA N°:	481 DE 2024

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATISTA	CONSORCIO RIO BANADIA R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON

FECHA:	MARTES 29 DE JULIO DE 2025	FOLIO	122

RECURSO EQUIPO		RECURSO HUMANO		MATERIALES	ESTADO DEL TIEMPO		
EQUIPOS	CANT	PERSONAL	CANT	DESCRIPCION	ESTADO	MAÑANA	TARDE
		Director de Obra	1				
RETROEXCAVADORA	4	Residente de Obra	2				
VOLQUETA	4	Residente de Interventoria	1				
MOTONIVELADORA	1	Director interventoria	1		SOLEADO SECO		X
BENITIN	1	Ingeniero Ambiental	1				
VIBROCOMPACTADOR	1	Profesional Social	1		NUBLADO SECO	X	
CARROTANQUE	1	Profesional HSEQ	1				
		Inspector de obra (Técnico e	1		LLUVIAS PASAJERAS		
		Secretaria	1				
		Oficial	2		LLUVIA INTERMITENTE		
		Ayudante	10				
					LLUVIA FUERTE		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

SE INICIAN LABORES A LAS 7:00 AM
SE REALIZAN LOS PREOPERACIONALES DE LAS HERRAMIENTAS MENORES Y MAQUINAS
SE REALIZA EL MANEJO TEMPORAL DE AGUAS CON MOTOBOMBA
SE REALIZA LA CONFORMACIÓN DE BARRERA TIPO JARILLÓN
SE REALIZA INSTALACIÓN DE GEOTEXTILES NT 2400, NT 3000 Y TEJIDO 2100

SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS:

SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS:

VoBo:

ING. JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA
M.P. 54202-403896 NTS

VoBo:

ING JUAN GABRIEL HERNANDEZ MARIN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P. 54202-373584 NTS

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

BITACORA DE OBRA

CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION
NIT. 901 901 508 1

CONTRATO DE OBRA N°:	481 DE 2024

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATISTA	CONSORCIO RIO BANADIA R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON

FECHA:	MIERCOLES 30 DE JULIO DE 2025	FOLIO	123

RECURSO EQUIPO		RECURSO HUMANO		MATERIALES	ESTADO DEL TIEMPO		
EQUIPOS	CANT	PERSONAL	CANT	DESCRIPCION	ESTADO	MAÑANA	TARDE
		Director de Obra	1				
RETROEXCAVADORA	4	Residente de Obra	2				
VOLQUETA	4	Residente de Interventoria	1				
MOTONIVELADORA	1	Director interventoria	1		SOLEADO SECO	X	X
BENITIN	1	Ingeniero Ambiental	1				
VIBROCOMPACTADOR	1	Profesional Social	1		NUBLADO SECO		
CARROTANQUE	1	Profesional HSEQ	1				
		Inspector de obra (Técnico e	1		LLUVIAS PASAJERAS		
		Secretaria	1				
		Oficial	2		LLUVIA INTERMITENTE		
		Ayudante	10				
					LLUVIA FUERTE		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

SE INICIAN LABORES A LAS 7:00 AM
SE REALIZAN LOS PREOPERACIONALES DE LAS HERRAMIENTAS MENORES Y MAQUINAS
SE REALIZA EL MANEJO TEMPORAL DE AGUAS CON MOTOBOMBA
SE REALIZA LA CONFORMACIÓN DE BARRERA TIPO JARILLÓN
SE REALIZA INSTALACIÓN DE GEOTEXTILES NT 2400, NT 3000 Y TEJIDO 2100

SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS:

SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS:

VoBo:

ING. JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA
M.P. 54202-403896 NTS

VoBo:

ING JUAN GABRIEL HERNANDEZ MARIN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P. 54202-373584 NTS

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

BITACORA DE OBRA

CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN
NIT 901.901.368-1

CONTRATO DE OBRA N°:	481 DE 2024
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATISTA	CONSORCIO RIO BANADIA R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON

FECHA:	JUEVES 31 DE JULIO DE 2025	FOLIO	124

RECURSO EQUIPO		RECURSO HUMANO		MATERIALES	ESTADO DEL TIEMPO		
EQUIPOS	CANT	PERSONAL	CANT	DESCRIPCION	ESTADO	MAÑANA	TARDE
		Director de Obra	1				
RETROEXCAVADORA	4	Residente de Obra	2				
VOLQUETA	4	Residente de Interventoria	1				
MOTONIVELADORA	1	Director interventoria	1		SOLEADO SECO	X	X
BENITIN	1	Ingeniero Ambiental	1				
VIBROCOMPACTADOR	1	Profesional Social	1		NUBLADO SECO		
CARROTANQUE	1	Profesional HSEQ	1				
		Inspector de obra (Técnico e	1		LLUVIAS PASAJERAS		
		Secretaria	1				
		Oficial	2		LLUVIA INTERMITENTE		
		Ayudante	10				
					LLUVIA FUERTE		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

SE INICIAN LABORES A LAS 7:00 AM
SE REALIZAN LOS PREOPERACIONALES DE LAS HERRAMIENTAS MENORES Y MAQUINAS
SE REALIZA EL MANEJO TEMPORAL DE AGUAS CON MOTOBOMBA
SE REALIZA LA CONFORMACIÓN DE BARRERA TIPO JARILLÓN
SE REALIZA INSTALACIÓN DE GEOTEXTILES NT 2400, NT 3000 Y TEJIDO 2100

SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS:

SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS:

VoBo:
ING. JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA
M.P. 54202-403896 NTS

VoBo:
ING JUAN GABRIEL HERNANDEZ MARIN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P. 54202-373584 NTS

ANEXO 12

EXÁMENES DE INGRESO Y AFILIACIONES

CL 25 N 11 – 70 BRR ALFONSO LOPEZ
CORREO: consorcioriobanadia@gmail.com
CELULAR: 3202395534

IPS simedical S.A.S

SIMEDICAL SAS
NIT: 901625724-5
Cel: 311 866 3611
Dirección: Calle 28 # 20 a - 26
Correo: simedical.ips@gmail.com



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

N° 920

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
18 DÍA	**07** MES	**2025** AÑO	**SARAVENA (ARAUCA, COLOMBIA)** Ciudad	**EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO CON ENFASIS OSTEOMOSCULAR**

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

Nombre de la empresa	**Empresa en misión**
CONSORCIO RIO BANADIA	**CONSORCIO RIO BANADIA**

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

Apellidos y Nombres	Genero	Edad	Documento de Identificación	
VILA SARABIA JAIR LEANDRO	MASCULINO	37 AÑOS 01 MESES 25 DÍAS	Tipo: CC	Número: 1091659018

C[illegible] DIRECTOR DE OBRA

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

SIN RESTRICCIONES PARA EL CARGO ASIGNADO

Observaciones: *NO APLICA*

N/A NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos)

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL ✓	----------


RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
	OTROS.	DIETA BALANCEADA, HACER EJERCICIO.

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SE RECOMIENDA: CONTROL DE PESO Y REALIZAR CAMITAS MINIMO POR 30 MINUTOS, DIETA BALANCEADA, NO FUMAR.

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la c[illegible]ncialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y ver ídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he le ído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados entes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico



Firma:

Nombre: RIOS ESTEBAN LEIDY TATIANA

R. M.: 1098764381 **L.S.O.:** 0038

Código de Seguridad
N28012J3920

Aspirante o Trabajador



Firma:

Nombre: VILA SARABIA JAIR LEANDRO

CC: 1091659018

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 22/07/2025, el empleador CONSORCIO RIO BANADIA identificado con NIT número 901902273 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
9180374	22/07/2025	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1091659018	JAIR LEANDRO VILA SARABIA	8000000	DIRECTOR DE OBRA	2025-07-21

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 22 días del mes de Julio del año 2025.

Cordialmente,

GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva

Hacienda

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidenció **JAIR LEANDRO VILA SARABIA** identificado con CC No. **1091659018,** registra la siguiente información.

Datos del Empleador	Datos de la Relación Laboral
NI 901902273 CONSORCIO RIO BANADIA	Fecha de inicio de cobertura:19/07/2025 Estado Afiliación: ACTIVO Tipo Vinculación: TRABAJADOR DEPENDIENTE Clase de Riesgo: 5

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá. D.C. a los 19 días del mes de Julio de 2025.

Cordialmente,

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.
M.E.A.N

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

JAIR LEANDRO VILA SARABIA, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.091.659.018**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 15 de Agosto del 2025.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

IPS simedical S.A.S

SIMEDICAL SAS
NIT: 901625724-5
Cel: 311 866 3611
Dirección: Calle 28 # 20 a - 26
Correo: simedical.ips@gmail.com



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

N° 1233

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
18 DÍA	07 MES	2025 AÑO	SARAVENA (ARAUCA, COLOMBIA) Ciudad	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO CON ENFASIS OSTEOMOSCULAR

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

Nombre de la empresa	Empresa en misión
CONSORCIO RIO BANADIA	CONSORCIO RIO BANADIA

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

Apellidos y Nombres	Genero	Edad	Documento de Identificación	
DELGADO MONTAGUT JOAQUIN EDUARDO	MASCULINO	50 AÑOS 10 MESES 28 DÍAS	CC (Tipo)	88215089 (Número)

Cargo: PROFESIONAL ESPECIALISTA EN GEOTECNIA

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

SIN RESTRICCIONES PARA EL CARGO ASIGNADO

Observaciones: *NO APLICA*

N/A NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos)

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL ✓	----------

RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
	OTROS	DIETA BALANCEADA, ACTIVIDAD FÍSICA.

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SE RECOMIENDA: HABITOS DE VIDA Y ESTILO SALUDABLE, CONTROL DE PESO.

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados entes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico

Firma: Dra. Tatiana Rios Esteban

Nombre: RIOS ESTEBAN LEIDY TATIANA

R. M.: 1098764381 **L.S.O.:** 0038

Código de Seguridad N15742Z1233

Aspirante o Trabajador

Firma: Joaquin Eduardo M.

Nombre: DELGADO MONTAGUT JOAQUIN EDUARDO

CC: 88215089

Hacienda

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidenció **JOAQUIN EDUARDO DELGADO MONTAGUT** identificado con CC No. **88215089,** registra la siguiente información.

Datos del Empleador	Datos de la Relación Laboral
NI 901902273 CONSORCIO RIO BANADIA	Fecha de inicio de cobertura:19/07/2025 Estado Afiliación: ACTIVO Tipo Vinculación: TRABAJADOR DEPENDIENTE Clase de Riesgo: 5

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá. D.C. a los 19 días del mes de Julio de 2025.

Cordialmente,

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.
M.E.A.N

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 22/07/2025, el empleador CONSORCIO RIO BANADIA identificado con NIT número 901902273 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
9180378	22/07/2025	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	88215089	JOAQUIN EDUARDO DELGADO MONTAGUT	2750000	INGENIERO CIVIL	2025-07-21

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 22 días del mes de Julio del año 2025.

Cordialmente,

GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva

Protección

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.229.739

Hace constar que:

El(la) Señor(a) **DELGADO MONTAGUT JOAQUIN EDUARDO** identificado(a) con **CC** número **88.215.089** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 01 de febrero de 2022 y sus recursos se encuentran distribuidos como se enuncia a continuación, de conformidad con lo consagrado en el Decreto 2373 de 2010 así:

1. El 80% al FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MODERADO
2. El 20% al FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO

Esta constancia se expide a petición del(la) interesado(a) el día 15 de agosto de 2025.

Cordialmente,

Cesar Mauricio Aubad Echeverry
Equipo Soporte para Clientes

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:
Asesor Virtual Pronto en nuestro Portal Web www.proteccion.com y App o comunicarse con la Línea de Servicio en:
Bogotá **(601) 482 33 64** – Medellín **(604) 510 90 99** – Cali **(602) 386 00 80 -**
Barranquilla **(605) 319 79 99** – Cartagena **(605) 642 49 99** – WhatsApp **+57 310 220 5575**
o llámanos desde tu computador desde cualquier lugar del mundo ingresando a **https://customers.wolkvox.com/clicktocall/proteccion/**

IPS simedical S.A.S

SIMEDICAL SAS
NIT: 901625724-5
Cel: 311 866 3611
Dirección: Calle 28 # 20 a - 26
Correo: simedical.ips@gmail.com



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

N° 913

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
18 DÍA	07 MES	2025 AÑO	SARAVENA (ARAUCA, COLOMBIA) Ciudad	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO CON ENFASIS OSTEOMOSCULAR

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

CONSORCIO RIO BANADIA	CONSORCIO RIO BANADIA
Nombre de la empresa	Empresa en misión

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

OLAYA BAYONA LAURA CRISTINA	Genero	Edad	Documento de Identificación	
	FEMENINO	26 AÑOS 05 MESES 16 DIAS	CC	1094283275
Apellidos y Nombres			Tipo	Número

Cargo: INGENIERA AMBIENTAL RESIDENTE

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL: **SIN RESTRICCIONES PARA EL CARGO ASIGNADO**

Observaciones: *NO APLICA*

N/A NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos)

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL ✓	----------


RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
		ACTIVIDAD FISICA AEROBICA

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

EJERCICIO POR 30 MINUTOS TODOS LOS DIAS, HABITOS SALUDABLES, DIETA BALANCEADA, CAMINATA DIARIA.

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados entes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico



Firma:

Nombre: RIOS ESTEBAN LEIDY TATIANA

R. M.: 1098764381 L.S.O.: 0038

Código de Seguridad: N1526T4J913

Aspirante o Trabajador



Firma:

Nombre: OLAYA BAYONA LAURA CRISTINA

CC: 1094283275

Hacienda

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidenció **LAURA CRISTINA OLAYA BAYONA** identificado con CC No. **1094283275,** registra la siguiente información.

Datos del Empleador	Datos de la Relación Laboral
NI 901902273 CONSORCIO RIO BANADIA	Fecha de inicio de cobertura:19/07/2025 Estado Afiliación: ACTIVO Tipo Vinculación: TRABAJADOR DEPENDIENTE Clase de Riesgo: 5

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá. D.C. a los 19 días del mes de Julio de 2025.

Cordialmente,

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.
M.E.A.N

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 22/07/2025, el empleador CONSORCIO RIO BANADIA identificado con NIT número 901902273 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
9180378	22/07/2025	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1094283275	LAURA CRISTINA OLAYA BAYONA	5000000	INGENIERO AMBIENTAL	2025-07-21

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 22 días del mes de Julio del año 2025.

Cordialmente,

GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva

Comfiar
Sabemos lo que quieres

Línea gratuita de atención al cliente
018000945457

CERTIFICACIÓN No. 4087416 de 2025-08-14

LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE ARAUCA COMFIAR

CERTIFICA

Que el(la) señor(a) OLAYA BAYONA LAURA CRISTINA identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1094283275, se encuentra afiliado(a) a nuestra Entidad en la modalidad de SUBSIDIO por intermedio de la empresa CONSORCIO RIO BANADIA Nit No. 901902273, desde el 21 Julio de 2025 y actualmente es Categoría B.

Esta certificación tiene validez de 30 dias, se expide a solicitud del interesado.

Atentamente,

Pedro A Parada

PEDRO ANTONIO PARADA URIETA
Jefe Seccion Subsidio, Aportes y Fiscalización

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

LAURA CRISTINA OLAYA BAYONA, identificado(a) con cédula de ciudadanía 1.094.283.275, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 22 de Julio del 2025.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

IPS simedical S.A.S

SIMEDICAL SAS
NIT: 901625724-5
Cel: 311 866 3611
Dirección: Calle 28 # 20 a - 26
Correo: simedical.ips@gmail.com



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

N° 1286

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
18 DÍA	07 MES	2025 AÑO	SARAVENA (ARAUCA, COLOMBIA) Ciudad	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO CON ENFASIS OSTEOMOSCULAR

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

Nombre de la empresa	Empresa en misión
CONSORCIO RIO BANADIA	CONSORCIO RIO BANADIA

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

Apellidos y Nombres	Genero	Edad	Documento de Identificación	
BARRAGAN MENDOZA JAIRO ALEXANDER	MASCULINO	42 AÑOS 09 MESES 15 DÍAS	Tipo: CC	Número: 80109920

C[illegible] INGENIERO ESPECIALISTA EN HIDRAULICA

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

SIN RESTRICCIONES PARA EL CARGO ASIGNADO

Observaciones: *NO APLICA*

N/A	NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos)

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL ✓	----------


RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
	OTROS.	

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

RE RECOMIENDA HACER ACTIVIDAD FISICA, COMO CAMINATAS, NADAR Y LLEVAR UNA DIETA BALANCEADA.

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la c[illegible]encialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y ver ídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados entes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico



Firma:

Nombre: RIOS ESTEBAN LEIDY TATIANA

R. M.: 1098764381 **L.S.O.:** 0038

Código de Seguridad
N82X4JA1J1286

Aspirante o Trabajador



Firma:

Nombre: BARRAGAN MONDOZA JAIRO ALEXANDER

CC: 80109920

Hacienda

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidenció **JAIRO ALEXANDER BARRAGAN MENDOZA** identificado con CC No. **80109920,** registra la siguiente información.

Datos del Empleador	Datos de la Relación Laboral
NI 901902273 CONSORCIO RIO BANADIA	Fecha de inicio de cobertura:19/07/2025 Estado Afiliación: ACTIVO Tipo Vinculación: TRABAJADOR DEPENDIENTE Clase de Riesgo: 5

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá. D.C. a los 19 días del mes de Julio de 2025.

Cordialmente,

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.
M.E.A.N

Comfiar
Sabemos lo que quieres

Línea gratuita de atención al cliente
018000945457

CERTIFICACIÓN No. 4087430 de 2025-08-14

LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE ARAUCA COMFIAR

CERTIFICA

Que el(la) señor(a) BARRAGAN MENDOZA JAIRO ALEXANDER identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 80109920, se encuentra afiliado(a) a nuestra Entidad en la modalidad de SUBSIDIO por intermedio de la empresa CONSORCIO RIO BANADIA Nit No. 901902273, desde el 21 Julio de 2025 y actualmente es Categoría B.

Esta certificación tiene validez de 30 dias, se expide a solicitud del interesado.

Atentamente,

PEDRO ANTONIO PARADA URIETA
Jefe Seccion Subsidio, Aportes y Fiscalización

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

JAIRO ALEXANDER BARRAGAN MENDOZA, identificado(a) con cédula de ciudadanía **80.109.920**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 15 de Agosto del 2025.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

IPS simedical S.A.S

SIMEDICAL SAS
NIT: 901625724-5
Cel: 311 866 3611
Dirección: Calle 28 # 20 a - 26
Correo: simedical.ips@gmail.com



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

N° 1396

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
19 DÍA	07 MES	2025 AÑO	SARAVENA (ARAUCA, COLOMBIA) Ciudad	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO CON ENFASIS OSTEOMOSCULAR

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

CONSORCIO RIO BANADIA	CONSORCIO RIO BANADIA
Nombre de la empresa	Empresa en misión

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

DIEGO ANDRES MEDINA GOMEZ	Genero	Edad	Documento de Identificación	
	MASCULINO	23 AÑOS 6 MESES 13 DÍAS	CC	1006407775
Apellidos y Nombres			Tipo	Número

Ca OBRERO

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

SIN RESTRICCIONES PARA EL CARGO ASIGNADO

Observaciones: *NO APLICA*

N/A	NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos)

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL ✓	----------

RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

REALIZAR PAUSAS ACTIVAS Y MEJORAR POSTURAS EN EL LUGAR DE TRABAJO.

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la co ncialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y ver ídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislaci ón, igualmente para que remitan la Historia Cl ínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he le ído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados entes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico

Firma: Dra. Tatiana Rios Esteban

Nombre: RIOS ESTEBAN LEIDY TATIANA

R. M.: 1098764381 L.S.O.: 0038

Código de Seguridad
N1526T1Z1396

Aspirante o Trabajador

Firma: Diego Medina G

Nombre: DIEGO ANDRES MEDINA GOMEZ

CC: 1006407775

Comfiar
Sabemos lo que quieres

Línea gratuita de atención al cliente
018000 945457

CERTIFICACIÓN No. 3846802 de 2025-07-21

LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE ARAUCA COMFIAR

CERTIFICA

Que el(la) señor(a) MEDINA GOMEZ DIEGO ANDRES identificado(a) con cédula de ciudadaníaNo. 1006407775, se encuentra afiliado(a) a nuestra Entidad en la modalidad de SUBSIDIO por intermedio de la empresa CONSORCIO RIO BANADIA Nit No. 901902273, desde el 21 Julio de 2025 y actualmente es Categoría A.

Esta certificación tiene validez de 30 dias, se expide a solicitud del interesado.

Atentamente,

Pedro A Parada

PEDRO ANTONIO PARADA URIETA
Jefe Seccion Subsidio, Aportes y FiscalizaciÃ³n

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 22/07/2025, el empleador CONSORCIO RIO BANADIA 2025 identificado con NIT número 901902273 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
9186589	22/07/2025	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1006407775	DIEGO ANDRES MEDINA GOMEZ	1423500	AYUDANTE DE OBRA	2025-07-21

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 22 días del mes de Julio del año 2025.

Cordialmente,

GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva

Hacienda

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidenció **DIEGO ANDRES MEDINA GOMEZ** identificado con CC No. **1006407775,** registra la siguiente información.

Datos del Empleador	Datos de la Relación Laboral
NI 901902273 CONSORCIO RIO BANADIA	Fecha de inicio de cobertura:19/07/2025 Estado Afiliación: ACTIVO Tipo Vinculación: TRABAJADOR DEPENDIENTE Clase de Riesgo: 5

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá. D.C. a los 19 días del mes de Julio de 2025.

Cordialmente,

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.
M.E.A.N

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ARO_15_2_3_FR01 v_06

MIS_4_1_1_FR35 v_010

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

DIEGO ANDRES MEDINA GOMEZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.006.407.775**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 15 de Agosto del 2025.

Cordialmente,


Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

IPS simedical S.A.S

SIMEDICAL SAS
NIT: 901625724-5
Cel: 311 866 3611
Dirección: Calle 28 # 20 a - 26
Correo: simedical.ips@gmail.com



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

N° 1389

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
19 DÍA	07 MES	2025 AÑO	SARAVENA (ARAUCA, COLOMBIA) Ciudad	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO CON ENFASIS OSTEOMOSCULAR

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

Nombre de la empresa	Empresa en misión
CONSORCIO RIO BANADIA	CONSORCIO RIO BANADIA

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

Apellidos y Nombres	Genero	Edad	Documento de Identificación	
PABON GOMEZ DAVINSON ANDRES	MASCULINO	26 AÑOS 10 MESES 16 DÍAS	Tipo: CC	Número: 1234339637

Cargo: AYUDANTE DE OBRA

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

SIN RESTRICCIONES PARA EL CARGO ASIGNADO

Observaciones: *NO APLICA*

N/A | NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos)

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL ✓	----------

RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
VALORACION POR EPS: OFTALMOLOGIA		

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

REALIZAR PAUSAS ACTIVAS Y MEJORAR POSTURAS EN EL LUGAR DE TRABAJO.

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados entes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico



Firma:

Nombre: RIOS ESTEBAN LEIDY TATIANA

R. M.: 1098764381 **L.S.O.:** 0038

Código de Seguridad
N1526T1Z1389

Aspirante o Trabajador

Firma: Davinson Pabón

Nombre: JOYA TAMARA EDWIN GABRIEL

CC: 1234339637

Hacienda

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidenció **DAVINSON ANDRES PABON GOMEZ** identificado con CC No. **1234339637,** registra la siguiente información.

Datos del Empleador	Datos de la Relación Laboral
NI 901902273 CONSORCIO RIO BANADIA	Fecha de inicio de cobertura:19/07/2025 Estado Afiliación: ACTIVO Tipo Vinculación: TRABAJADOR DEPENDIENTE Clase de Riesgo: 5

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá. D.C. a los 19 días del mes de Julio de 2025.

Cordialmente,

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.
M.E.A.N

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA VIGILADO

ANO_13_2_2_FR01 v_08

MIS_4_1_1_FR35 v_010

Comfiar
Sabemos lo que quieres

Línea gratuita de atención al cliente
018000 945457

CERTIFICACIÓN No. 3984609 de 2025-07-21

LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE ARAUCA COMFIAR

CERTIFICA

Que el(la) señor(a) PABON GOMEZ DAVINSON ANDRES identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1234339637, se encuentra afiliado(a) a nuestra Entidad en la modalidad de SUBSIDIO por intermedio de la empresa CONSORCIO RIO BANADIA Nit No. 901902273,desde el 21 Julio de 2025 y actualmente es Categoría A.

Esta certificación tiene validez de 30 dias, se expide a solicitud del interesado.

Atentamente,

PEDRO ANTONIO PARADA URIETA
Jefe Seccion Subsidio, Aportes y FiscalizaciÃ³n

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 22/07/2025, el empleador CONSORCIO RIO BANADIA 2025 identificado con NIT número 901902273 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
9123499	22/07/2025	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1234339637	DAVINSON ANDRES PABON GOMEZ	1423500	AYUDANTE DE OBRA	2025-07-21

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 22 días del mes de Julio del año 2025.

Cordialmente,

GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

DAVINSON ANDRES PABON GOMEZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.234.339.637**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 15 de Agosto del 2025.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

IPS simedical S.A.S

SIMEDICAL SAS
NIT: 901625724-5
Cel: 311 866 3611
Dirección: Calle 28 # 20 a - 26
Correo: simedical.ips@gmail.com



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

N° 1362

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
19 DÍA	07 MES	2025 AÑO	SARAVENA (ARAUCA, COLOMBIA) Ciudad	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO CON ENFASIS OSTEOMOSCULAR

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

CONSORCIO RIO BANADIA	CONSORCIO RIO BANADIA
Nombre de la empresa	Empresa en misión

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

JOYA TAMARA EDWIN GABRIEL	Genero	Edad	Documento de Identificación	
	MASCULINO	28 AÑOS 10 MESES 29 DÍAS	CC	1119185219
Apellidos y Nombres			Tipo	Número

C OFICIAL

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

SIN RESTRICCIONES PARA EL CARGO ASIGNADO

Observaciones: *NO APLICA*

N/A	NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos)

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL ✓	----------

RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
VALORACION POR EPS: OFTALMOLOGIA		

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

REALIZAR PAUSAS ACTIVAS Y MEJORAR POSTURAS EN EL LUGAR DE TRABAJO.

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la co ncialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y ver ídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislaci ón, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he le ído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados entes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico

Firma: Dra. Tatiana Rios Esteban

Nombre: RIOS ESTEBAN LEIDY TATIANA

R. M.: 1098764381 **L.S.O.:** 0038

Código de Seguridad
N1526T1Z1362

Aspirante o Trabajador

Firma: YGabriel Joya.

Nombre: JOYA TAMARA EDWIN GABRIEL

CC: 1119185219

Comfiar
Sabemos lo que quieres

Linea gratuita de atención al cliente
018000 945457

CERTIFICACIÓN No. 3980160 de 2025-07-21

LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE ARAUCA COMFIAR

CERTIFICA

Que el(la) señor(a) JOYA TAMARA EDWIN GABRIEL identificado(a) con cédula de ciudadanía No.1119185219, se encuentra afiliado(a) a nuestra Entidad en la modalidad de SUBSIDIO porintermedio de la empresa CONSORCIO RIO BANADIA Nit No. 901902273, desde el 21 Julio de 2025 y actualmente es Categoría A.

Esta certificación tiene validez de 30 dias, se expide a solicitud del interesado.

Atentamente,

PEDRO ANTONIO PARADA URIETA
Jefe Seccion Subsidio, Aportes y Fiscalizacion

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 22/07/2025, el empleador CONSORCIO RIO BANADIA identificado con NIT número 901902273 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
9180396	22/07/2025	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1119185219	EDWIN GABRIEL JOYA TAMARA	1755000	OFICIAL DE OBRA	2025-07-21

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 22 días del mes de Julio del año 2025.

Cordialmente,

GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva

Hacienda

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidenció **EDWIN GABRIEL JOYA TAMARA** identificado con CC No. **1119185219,** registra la siguiente información.

Datos del Empleador	Datos de la Relación Laboral
NI 901902273 CONSORCIO RIO BANADIA	Fecha de inicio de cobertura:19/07/2025 Estado Afiliación: ACTIVO Tipo Vinculación: TRABAJADOR DEPENDIENTE Clase de Riesgo: 5

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá. D.C. a los 19 días del mes de Julio de 2025.

Cordialmente,

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.
M.E.A.N

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

APO_13_2_3_FR01 v_08

MIS_4_3_3_FR15 v_010

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

EDWIN GABRIEL JOYA TAMARA, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.119.185.219**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 15 de Agosto del 2025.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

IPS simedical S.A.S

SIMEDICAL SAS
NIT: 901625724-5
Cel: 311 866 3611
Dirección: Calle 28 # 20 a - 26
Correo: simedical.ips@gmail.com



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

N° 1393

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
19 DÍA	07 MES	2025 AÑO	SARAVENA (ARAUCA, COLOMBIA) Ciudad	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO CON ENFASIS OSTEOMOSCULAR

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

CONSORCIO RIO BANADIA	CONSORCIO RIO BANADIA
Nombre de la empresa	Empresa en misión

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

JESUS GUILLERMO BERNAL RODRIGUEZ	Genero	Edad	Documento de Identificación	
	MASCULINO	27 AÑOS 10 MESES 26 DÍAS	CC	1115742269
Apellidos y Nombres			Tipo	Número

Cargo: OBRERO

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

SIN RESTRICCIONES PARA EL CARGO ASIGNADO

Observaciones: *NO APLICA*

N/A	NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos)

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL	✓	----------

RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
VALORACION POR EPS: OFTALMOLOGIA		

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

REALIZAR PAUSAS ACTIVAS Y MEJORAR POSTURAS EN EL LUGAR DE TRABAJO.

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados entes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico



Firma:

Nombre: RIOS ESTEBAN LEIDY TATIANA

R. M.: 1098764381 L.S.O.: 0038

Código de Seguridad
N1526T1Z1393

Aspirante o Trabajador

Firma: Jesus Bernal

Nombre: BERNAL RODRIGUEZ JESUS GUILLERMO

CC: 1115742269

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 22/07/2025, el empleador CONSORCIO RIO BANADIA 2025 identificado con NIT número 901902273 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
9177679	22/07/2025	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1115742269	JESUS GUILLERMO BERNAL	1423500	AYUDANTE DE OBRA	2025-07-21

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 22 días del mes de Julio del año 2025.

Cordialmente,

GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva

Comfiar
Sabemos lo que quieres

Línea gratuita de atención al cliente
018000 945457

CERTIFICACIÓN No. 3984605 de 2025-07-21

LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE ARAUCA COMFIAR

CERTIFICA

Que el(la) señor(a) BERNAL RODRIGUEZ JESUS GUILLERMO identificado(a) con cédula deciudadanía No. 1115742269, se encuentra afiliado(a) a nuestra Entidad en la modalidad de SUBSIDIO por intermedio de la empresa CONSORCIO RIO BANADIA Nit No. 901902273,desde el 21 Julio de 2025 y actualmente es Categoría A.

Esta certificación tiene validez de 30 dias, se expide a solicitud del interesado.

Atentamente,

PEDRO ANTONIO PARADA URIETA
Jefe Seccion Subsidio, Aportes y FiscalizaciÃ³n

Hacienda

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidenció **JESUS GUILLERMO BERNAL RODRIGUEZ** identificado con CC No. **1115742269,** registra la siguiente información.

Datos del Empleador	Datos de la Relación Laboral
NI 901902273 CONSORCIO RIO BANADIA	Fecha de inicio de cobertura:19/07/2025 Estado Afiliación: ACTIVO Tipo Vinculación: TRABAJADOR DEPENDIENTE Clase de Riesgo: 5

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá. D.C. a los 19 días del mes de Julio de 2025.

Cordialmente,

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.
M.E.A.N

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

MIS_4_1_3_F815 v_010

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

JESUS GUILLERMO BERNAL RODRIGUEZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.115.742.269**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 15 de Agosto del 2025.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

IPS simedical S.A.S

SIMEDICAL SAS
NIT: 901625724-5
Cel: 311 866 3611
Dirección: Calle 28 # 20 a - 26
Correo: simedical.ips@gmail.com



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

N° 1361

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
19 DÍA	07 MES	2025 AÑO	SARAVENA (ARAUCA, COLOMBIA) Ciudad	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO CON ENFASIS OSTEOMOSCULAR

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

CONSORCIO RIO BANADIA	CONSORCIO RIO BANADIA
Nombre de la empresa	Empresa en misión

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

RIVERO VILLAMIZAR JOSE PABLO	Genero	Edad	Documento de Identificación	
	MASCULINO	42 AÑOS 2 MESES 10 DÍAS	CC	88311695
Apellidos y Nombres			Tipo	Número

C[illegible]
OBRERO

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

SIN RESTRICCIONES PARA LA ACTIVIDAD ASIGNADA

Observaciones: *NO APLICA*

N/A	NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos)

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL ✓	----------

RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
	USO DE EPP	HÁBITOS SALUDABLES
	OTROS	ACTIVIDAD FÍSICA AERÓBICA
		HACER DEPORTE
		DIETA BALANCEADA


OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

REALIZAR EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTO DE TRONCO, MIEMBROS SUPERIORES, E INFERIORES ANTE DE INICIAR SUS ACTIVIDADES LABORES Y AL CULMINAR LA JORNADA LABORAL. AYUDARA A MITIGAR ENFERMEDADES OSTEOMUSCULARES
B[illegible]A PRACTICA DE HIGIENE POSTURAL
USAR LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDOS PARA EL CARGO
EJERCICIO POR 30 MINUTOS TODOS LOS DIAS, CAMINAR ES UNA BUENA MANERA DE MANTENER SU CORAZÓN SALUDABLE Y SUS MÚSCULOS FUERTES O COMBINE EJERCICIO, COMO NADAR.

PAUTAS CORRECTA PARA EL MANEJO CARGA

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados entes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico



Firma:

Nombre: RIOS ESTEBAN LEIDY TATIANA

Aspirante o Trabajador

Jose Pablo

Firma:

Nombre: RIVERO VILLAMIZAR JOSE PABLO

R. M.:	1098764381	L.S.O.:	0038	Código de Seguridad	CC:	88311695
				N1526T1Z1361		

Hacienda

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidenció **JOSE PABLO RIVERO VILLAMIZAR** identificado con CC No. **88311395,** registra la siguiente información.

Datos del Empleador	Datos de la Relación Laboral
NI 901902273 CONSORCIO RIO BANADIA	Fecha de inicio de cobertura:19/07/2025 Estado Afiliación: ACTIVO Tipo Vinculación: TRABAJADOR DEPENDIENTE Clase de Riesgo: 5

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá. D.C. a los 19 días del mes de Julio de 2025.

Cordialmente,

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.
M.E.A.N

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
ANO_13_3_2_FR01 v_09
MIS_4_1_3_FR35 v_010

Comfiar
Sabemos lo que quieres

Linea gratuita de atención al cliente
018000 945457

CERTIFICACIÓN No. 3784603 de 2025-07-21

LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE ARAUCA COMFIAR

CERTIFICA

Que el(la) señor(a) RIVERO VILLAMIZAR JOSE PABLO identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 88311695, se encuentra afiliado(a) a nuestra Entidad en la modalidad de SUBSIDIO por intermedio de la empresa CONSORCIO RIO BANADIA Nit No. 901902273, desde el 21 Julio de 2025 y actualmente es Categoría A.

Esta certificación tiene validez de 30 dias, se expide a solicitud del interesado.

Atentamente,

PEDRO ANTONIO PARADA URIETA
Jefe Seccion Subsidio, Aportes y FiscalizaciÃ³n

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 22/07/2025, el empleador CONSORCIO RIO BANADIA 2025 identificado con NIT número 901902273 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
9158123	22/07/2025	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	88311695	JOSE PABLO RIVERO VILLAMIZAR	1423500	AYUDANTE DE OBRA	2025-07-21

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 22 días del mes de Julio del año 2025.

Cordialmente,

GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva

Protección

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.229.739

Hace constar que:

El(la) Señor(a) **RIVERO VILLAMIZAR JOSE PABLO** identificado(a) con **CC** número **88.311.695** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 01 de septiembre de 2008 y sus recursos se encuentran distribuidos como se enuncia a continuación, de conformidad con lo consagrado en el Decreto 2373 de 2010 así:

1. El 100% al FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO

Esta constancia se expide a petición del(la) interesado(a) el día 15 de agosto de 2025.

Cordialmente,

Cesar Mauricio Aubad Echeverry
Equipo Soporte para Clientes

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:
Asesor Virtual Pronto en nuestro Portal Web www.proteccion.com y App o comunicarse con la Línea de Servicio en:
Bogotá **(601) 482 33 64** – Medellín **(604) 510 90 99** – Cali **(602) 386 00 80** -
Barranquilla **(605) 319 79 99** – Cartagena **(605) 642 49 99** – WhatsApp **+57 310 220 5575**
o llámanos desde tu computador desde cualquier lugar del mundo ingresando a **https://customers.wolkvox.com/clicktocall/proteccion/**

IPS simedical S.A.S

SIMEDICAL SAS
NIT: 901625724-5
Cel: 311 866 3611
Dirección: Calle 28 # 20 a - 26
Correo: simedical.ips@gmail.com



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

N° 1354

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
19 DÍA	07 MES	2025 AÑO	SARAVENA (ARAUCA, COLOMBIA) Ciudad	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO CON ENFASIS OSTEOMOSCULAR

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

CONSORCIO RIO BANADIA	CONSORCIO RIO BANADIA
Nombre de la empresa	Empresa en misión

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

QUINTERO VILLAMIZAR JUAN VICENTE	Genero	Edad	Documento de Identificación	
	MASCULINO	50 AÑOS 1 MES 20 DÍAS	CC	9466736
Apellidos y Nombres			Tipo	Número

C[redacted]

OBRERO

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

SIN RESTRICCIONES PARA LA ACTIVIDAD ASIGNADA

Observaciones: *NO APLICA*

N/A	NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos)

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL ✓	----------

RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
	USO DE EPP	HÁBITOS SALUDABLES
	OTROS	FORTALECIMIENTO MUSCULAR
		ACTIVIDAD FÍSICA AERÓBICA
		HACER DEPORTE
		DIETA BALANCEADA

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

R[redacted]ZAR EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTO DE TRONCO, MIEMBROS SUPERIORES, E INFERIORES ANTE DE INICIAR SUS ACTIVIDADES LABORES Y [redacted]CULMINAR LA JORNADA LABORAL. AYUDARA A MITIGAR ENFERMEDADES OSTEOMUSCULARES
BUENA PRACTICA DE HIGIENE POSTURAL
USAR LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDOS PARA EL CARGO
EJERCICIO POR 30 MINUTOS TODOS LOS DIAS, CAMINAR ES UNA BUENA MANERA DE MANTENER SU CORAZÓN SALUDABLE Y SUS MÚSCULOS FUERTES O COMBINE EJERCICIO, COMO NADAR.

PAUTAS CORRECTA PARA EL MANEJO CARGA

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados entes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.


Médico



Firma:

Nombre: RIOS ESTEBAN LEIDY TATIANA

Aspirante o Trabajador



Firma:

Nombre: QUINTERO VILLAMIZAR JUAN VICENTE

R. M.:	1098764381	L.S.O.:	0038	Código de Seguridad	CC:	9466736

I1526O1U1354

COOSALUD
En Pos de tu bienestar

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

Para la atención de servicios de salud POS, el suscrito afiliado se encuentra registrado en la EPS con los siguientes datos.

Información del Cotizante y/o Cabeza de Familia										
Tipo Ident.	Número de Ident.	Nombres	Apellidos	Fecha de Afiliación	Departamento	Ciudad	Dirección	Teléfono	Regimen	Estado
CC	9466736	JUAN VICENTE	QUINTERO VILLAMIZAR	10/08/2021 12:00:00 a. m.	ARAUCA	SARAVENA	V BAJO BANADIAS	3124549148	Contributivo	Activo

Informacion del Aportante				
NIT/CC	Razon Social	Estado	Rango Cotizante	Fecha Vinculacion
901902273	CONSORCIO RIO BANADIA	A	A	21/07/2025

La anterior certificación se expide y firma, a los 21 días del mes de Julio de 2025, a solicitud del interesado y es válida hasta los 21 días del mes de Agosto de 2025

Cordialmente,

CARLOS TORRES SALAZAR
SUBDIRECTOR DE ASEGURAMIENTO NACIONAL

Hacienda

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidenció **JUAN VICENTE QUINTERO VILLAMIZAR** identificado con CC No. **9466736,** registra la siguiente información.

Datos del Empleador	Datos de la Relación Laboral
NI 901902273 CONSORCIO RIO BANADIA	Fecha de inicio de cobertura:19/07/2025 Estado Afiliación: ACTIVO Tipo Vinculación: TRABAJADOR DEPENDIENTE Clase de Riesgo: 5

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá. D.C. a los 19 días del mes de Julio de 2025.

Cordialmente,

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.
M.E.A.N

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFO_13_2_3_FR04 v_08

MIS_4_1_1_FR15 v_010

Comfiar
Sabemos lo que quieres

Línea gratuita de atención al cliente
018000 945457

CERTIFICACIÓN No. 3784604 de 2025-07-21

LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE ARAUCA COMFIAR

CERTIFICA

Que el(la) señor(a) QUINTERO VILLAMIZAR JUAN VICENTE identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 9466736, se encuentra afiliado(a) a nuestra Entidad en la modalidad de SUBSIDIO por intermedio de la empresa CONSORCIO RIO BANADIA Nit No. 901902273, desde el 21 Julio de 2025 y actualmente es Categoría A.

Esta certificación tiene validez de 30 dias, se expide a solicitud del interesado.

Atentamente,

PEDRO ANTONIO PARADA URIETA
Jefe Seccion Subsidio, Aportes y FiscalizaciÃ³n

SuperSubsidio
Cuidamos tu bienestar social

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

JUAN VICENTE QUINTERO VILLAMIZAR, identificado(a) con cédula de ciudadanía **9.466.736**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 15 de Agosto del 2025.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es fundamental que revise periódicamente su Historia Laboral, el capital ahorrado y las semanas que tiene registradas, si presenta inconsistencias, ingrese a www.porvenir.com.co *y actualice su Historia Laboral.*

IPS simedical S.A.S

SIMEDICAL SAS
NIT: 901625724-5
Cel: 311 866 3611
Dirección: Calle 28 # 20 a - 26
Correo: simedical.ips@gmail.com



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

N° 1365

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
19 DÍA	07 MES	2025 AÑO	SARAVENA (ARAUCA, COLOMBIA) Ciudad	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO CON ENFASIS OSTEOMOSCULAR

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

Nombre de la empresa	Empresa en misión
CONSORCIO RIO BANADIA	CONSORCIO RIO BANADIA

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

Apellidos y Nombres	Genero	Edad	Documento de Identificación	
ORTEGA CONTRERAS CARLOS	MASCULINO	49 AÑOS 2 MESES 16 DÍAS	CC (Tipo)	88219552 (Número)

AYUDANTE DE OBRA

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

SIN RESTRICCIONES PARA LA ACTIVIDAD ASIGNADA

Observaciones: *NO APLICA*

N/A NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos)

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL ✓	----------


RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
VALORACIÓN POR EPS : OFTALMOLOGIA	USO DE EPP	HABITOS SALUDABLES
	OTROS	CONTROL DE PESO
		ACTIVIDAD FÍSICA AERÓBICA
		HACER DEPORTE
		DIETA BALANCEADA

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

REALIZAR EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTO DE TRONCO, MIEMBROS SUPERIORES, E INFERIORES ANTE DE INICIAR SUS ACTIVIDADES LABORES Y CULMINAR LA JORNADA LABORAL. AYUDARA A MITIGAR ENFERMEDADES OSTEOMUSCULARES
BUENA PRACTICA DE HIGIENE POSTURAL
USAR LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDOS PARA EL CARGO
EJERCICIO POR 30 MINUTOS TODOS LOS DIAS, CAMINAR ES UNA BUENA MANERA DE MANTENER SU CORAZÓN SALUDABLE Y SUS MÚSCULOS FUERTES O COMBINE EJERCICIO, COMO NADAR.

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados entes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico



Firma:

Nombre: RIOS ESTEBAN LEIDY TATIANA

R. M.: 1098764381 L.S.O.: 0038

Código de Seguridad

Aspirante o Trabajador

carlos ortega

Firma:

Nombre: ORTEGA CONTRERAS CARLOS

CC: 88219552

Comfiar
Sabemos lo que quieres

Línea gratuita de atención al cliente
018000 945457

CERTIFICACIÓN No. 3801596 de 2025-07-21

LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE ARAUCA COMFIAR

CERTIFICA

Que el(la) señor(a) ORTEGA CONTRERAS CARLOS identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 88219552, se encuentra afiliado(a) a nuestra Entidad en la modalidad de SUBSIDIO por intermedio de la empresa CONSORCIO RIO BANADIA Nit No. 901902273, desde el 21 Julio de 2025 y actualmente es Categoría A.

Esta certificación tiene validez de 30 dias, se expide a solicitud del interesado.

Atentamente,

PEDRO ANTONIO PARADA URIETA
Jefe Seccion Subsidio, Aportes y FiscalizaciÃ³n

Hacienda

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidenció **CARLOS ORTEGA CONTRERAS** identificado con CC No. **88219552,** registra la siguiente información.

Datos del Empleador	Datos de la Relación Laboral
NI 901902273 CONSORCIO RIO BANADIA	Fecha de inicio de cobertura:19/07/2025 Estado Afiliación: ACTIVO Tipo Vinculación: TRABAJADOR DEPENDIENTE Clase de Riesgo: 5

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá. D.C. a los 19 días del mes de Julio de 2025.

Cordialmente,

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.
M.E.A.N

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

APO_15_2_2_FR01 v_09

MIS_4_1_3_FR15 v_010

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 22/07/2025, el empleador CONSORCIO RIO BANADIA 2025 identificado con NIT número 901902273 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
9165743	22/07/2025	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	88219552	CARLOS ORTEGA CONTRERAS	1423500	AYUDANTE DE OBRA	2025-07-21

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 22 días del mes de Julio del año 2025.

Cordialmente,

GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

CARLOS ORTEGA CONTRERAS, identificado(a) con cédula de ciudadanía **88.219.552**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 15 de Agosto del 2025.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es fundamental que revise periódicamente su Historia Laboral, el capital ahorrado y las semanas que tiene registradas, si presenta inconsistencias, ingrese a www.porvenir.com.co *y actualice su Historia Laboral.*

IPS simedical S.A.S

SIMEDICAL SAS
NIT: 901625724-5
Cel: 311 866 3611
Dirección: Calle 28 # 20 a - 26
Correo: simedical.ips@gmail.com



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

N° 1325

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
19 DÍA	07 MES	2025 AÑO	SARAVENA (ARAUCA, COLOMBIA) Ciudad	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO CON ENFASIS OSTEOMOSCULAR

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

Nombre de la empresa	Empresa en misión
CONSORCIO RIO BANADIA	CONSORCIO RIO BANADIA

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

Apellidos y Nombres	Genero	Edad	Documento de Identificación	
TORRES VELANDIA DAVINSON	MASCULINO	28 AÑOS 11MESES 13 DÍAS	CC (Tipo)	1115740780 (Número)

Ca[illegible]
OBRERO

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

SIN RESTRICCIONES PARA LA ACTIVIDAD ASIGNADA

Observaciones: *NO APLICA*

N/A NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos)

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL ✓ ----------

RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
	USO DE EPP	HÁBITOS SALUDABLES
	OTROS	CONTROL DE PESO
		ACTIVIDAD FÍSICA AERÓBICA
		HACER DEPORTE
		DIETA BALANCEADA

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

RE[illegible]AR EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTO DE TRONCO, MIEMBROS SUPERIORES, E INFERIORES ANTE DE INICIAR SUS ACTIVIDADES LABORES Y AL CULMINAR LA JORNADA LABORAL. AYUDARA A MITIGAR ENFERMEDADES OSTEOMUSCULARES
BUENA PRACTICA DE HIGIENE POSTURAL
USAR LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL REQUIERIDOS PARA EL CARGO
EJERCICIO POR 30 MINUTOS TODOS LOS DIAS, CAMINAR ES UNA BUENA MANERA DE MANTENER SU CORAZÓN SALUDABLE Y SUS MÚSCULOS FUERTES O COMBINE EJERCICIO, COMO NADAR.

PAUTAS CORRECTA PARA EL MANEJO CARGA

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados entes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico

Firma: Dra. Tatiana Rios Esteban

Nombre: RIOS ESTEBAN LEIDY TATIANA

Aspirante o Trabajador

Firma: DAVINSON TORRES

Nombre: TORRES VELANDIA DAVINSON

R. M.:	1098764381	L.S.O.:	0038	Código de Seguridad	CC:	1115740780
				H1526N1T1325		

Hacienda

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidenció **DAVINSON TORRES VELANDIA** identificado con CC No. **1115740780,** registra la siguiente información.

Datos del Empleador	Datos de la Relación Laboral
NI 901902273 CONSORCIO RIO BANADIA	Fecha de inicio de cobertura:19/07/2025 Estado Afiliación: ACTIVO Tipo Vinculación: TRABAJADOR DEPENDIENTE Clase de Riesgo: 5

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá. D.C. a los 19 días del mes de Julio de 2025.

Cordialmente,

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.
M.E.A.N

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

APO_13_2_2_FR01 v_08

MIS_4_3_3_FR35 v_010

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 22/07/2025, el empleador CONSORCIO RIO BANADIA 2025 identificado con NIT número 901902273 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
9192879	22/07/2025	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1115740780	DAVINSON TORRES VELANDIA	1423500	AYUDANTE DE OBRA	2025-07-21

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 22 días del mes de Julio del año 2025.

Cordialmente,

GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva

Comfiar
Sabemos lo que quieres

Línea gratuita de atención al cliente
018000 945457

CERTIFICACIÓN No. 3784599 de 2025-07-21

LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE ARAUCA COMFIAR

CERTIFICA

Que el(la) señor(a) TORRES VELANDIA DAVISON identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1115740780, se encuentra afiliado(a) a nuestra Entidad en la modalidad de SUBSIDIO por intermedio de la empresa CONSORCIO RIO BANADIA Nit No. 901902273, desde el 21 Julio de 2025 y actualmente es Categoría A.

Esta certificación tiene validez de 30 dias, se expide a solicitud del interesado.

Atentamente,

PEDRO ANTONIO PARADA URIETA
Jefe Seccion Subsidio, Aportes y FiscalizaciÃ³n

SuperSubsidio

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

DAVISON TORRES VELANDIA, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.115.740.780**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 15 de Agosto del 2025.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

IPS simedical S.A.S

SIMEDICAL SAS
NIT: 901625724-5
Cel: 311 866 3611
Dirección: Calle 28 # 20 a - 26
Correo: simedical.ips@gmail.com



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

N° 1322

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
18 DÍA	07 MES	2025 AÑO	SARAVENA (ARAUCA, COLOMBIA) Ciudad	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO CON ENFASIS OSTEOMOSCULAR

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

Nombre de la empresa	Empresa en misión
CONSORCIO RIO BANADIA	CONSORCIO RIO BANADIA

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

Apellidos y Nombres	Genero	Edad	Documento de Identificación	
GARCIA BELTRAN JHONNATHAN ALEXIS	MASCULINO	33 AÑOS 05 MESES 25 DÍAS	CC (Tipo)	1098716716 (Número)

Cargo: INGENIERO CIVIL

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL: **SIN RESTRICCIONES PARA EL CARGO ASIGNADO**

Observaciones: *NO APLICA*

N/A NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos)

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL	✓


RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
	OTROS.	HACER EJERCICIO, LLEVAR DIETA BALENCEADA.

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

EJERCICIO POR 30 MINUTOS TODOS LOS DIAS, CAMINAR ES UNA BUENA MANERA DE MANTENER SU CORAZÓN SALUDABLE, DIETA BALANCEADA

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados entes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico




Firma:

Nombre: RIOS ESTEBAN LEIDY TATIANA

R. M.: 1098764381 L.S.O.: 0038

Código de Seguridad N1482X4J1322

Aspirante o Trabajador



Firma:

Nombre: GARCIA BELTRAN JHONNATHAN ALEXIS

CC: 1098716716

Hacienda

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidenció **JHONNTHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN** identificado con CC No. **1098716716,** registra la siguiente información.

Datos del Empleador	Datos de la Relación Laboral
NI 901902273 CONSORCIO RIO BANADIA	Fecha de inicio de cobertura:19/07/2025 Estado Afiliación: ACTIVO Tipo Vinculación: TRABAJADOR DEPENDIENTE Clase de Riesgo: 5

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá. D.C. a los 19 días del mes de Julio de 2025.

Cordialmente,

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.
M.E.A.N

APO_13_2_2_FR01 v_19

MIS_4_1_3_FR15 v_010

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 22/07/2025, el empleador CONSORCIO RIO BANADIA identificado con NIT número 901902273 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
919387	22/07/2025	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1098716716	JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN	5000000	INGENIERO CIVIL	2025-07-21

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 22 días del mes de Julio del año 2025.

Cordialmente,

GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN** identificado/a con documento de identidad **Cédula de Ciudadanía** número **1098716716,** se encuentra afiliado/a desde **27/07/2010** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 15 de agosto de 2025.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Rosa Mercedes Nino Amaya
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

Comfiar
Sabemos lo que quieres

Línea gratuita de atención al cliente
018000945457

CERTIFICACIÓN No. 4087423 de 2025-08-14

LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE ARAUCA COMFIAR

CERTIFICA

Que el(la) señor(a) GARCIA BELTRAN JHONNATHAN ALEXIS identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1098716716, se encuentra afiliado(a) a nuestra Entidad en la modalidad de SUBSIDIO por intermedio de la empresa CONSORCIO RIO BANADIA Nit No. 901902273, desde el 21 Julio de 2025 y actualmente es Categoría B.

Esta certificación tiene validez de 30 dias, se expide a solicitud del interesado.

Atentamente,

PEDRO ANTONIO PARADA URIETA
Jefe Seccion Subsidio, Aportes y Fiscalización

IPS simedical S.A.S

SIMEDICAL SAS
NIT: 901625724-5
Cel: 311 866 3611
Dirección: Calle 28 # 20 a - 26
Correo: simedical.ips@gmail.com



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

N° 1355

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
18 DÍA	07 MES	2025 AÑO	SARAVENA (ARAUCA, COLOMBIA) Ciudad	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO CON ENFASIS OSTEOMOSCULAR

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

CONSORCIO RIO BANADIA	CONSORCIO RIO BANADIA
Nombre de la empresa	Empresa en misión

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

BOTIA CHONA MARLYN YVETTE	Genero	Edad	Documento de Identificación	
	FEMENINO	29 AÑOS 07 MESES 18 DÍAS	CC	1020810816
Apellidos y Nombres			Tipo	Número

Cargo: PROFESIONAL SOCIAL

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

SIN RESTRICCIONES PARA EL CARGO ASIGNADO

Observaciones: *NO APLICA*

N/A NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos)

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL ✓	----------

RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
	OTROS.	

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

REALIZAR PAUSAS ACTIVAS Y MEJORAR POSTURAS EN EL LUGAR DE TRABAJO.

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados entes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico



Firma:

Nombre: RIOS ESTEBAN LEIDY TATIANA

R. M.: 1098764381 L.S.O.: 0038

Código de Seguridad
N2524X1J1355

Aspirante o Trabajador

Marlyn Yvette Botia Chona

Firma:

Nombre: BOTIA CHONA MARLYN YVETTE

CC: 1020810816

Hacienda

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidenció **MARLIN YVETTE BOTIA CHONA** identificado con CC No. **1020810816,** registra la siguiente información.

Datos del Empleador	Datos de la Relación Laboral
NI 901902273 CONSORCIO RIO BANADIA	Fecha de inicio de cobertura:19/07/2025 Estado Afiliación: ACTIVO Tipo Vinculación: TRABAJADOR DEPENDIENTE Clase de Riesgo: 5

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá. D.C. a los 19 días del mes de Julio de 2025.

Cordialmente,

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.
M.E.A.N

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

MIS_4_1_3_FR35 v_010

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 22/07/2025, el empleador CONSORCIO RIO BANADIA identificado con NIT número 901902273 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
9180384	22/07/2025	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1020810816	MARLYN YVETTE BOTIA CHONA	3000000	PROFESIONAL SOCIAL	2025-07-21

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 22 días del mes de Julio del año 2025.

Cordialmente,

GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

MARLYN YVETTE BOTIA CHONA, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.020.810.816**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 15 de Agosto del 2025.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

Comfiar
Sabemos lo que quieres

Línea gratuita de atención al cliente
018000945457

CERTIFICACIÓN No. 4087411 de 2025-08-14

LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE ARAUCA COMFIAR

CERTIFICA

Que el(la) señor(a) BOTIA CHONA MARLYN YVETTE identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1020810816, se encuentra afiliado(a) a nuestra Entidad en la modalidad de SUBSIDIO por intermedio de la empresa CONSORCIO RIO BANADIA Nit No. 901902273, desde el 21 Julio de 2025 y actualmente es Categoría B.

Esta certificación tiene validez de 30 dias, se expide a solicitud del interesado.

Atentamente,

Pedro A. Parada

PEDRO ANTONIO PARADA URIETA
Jefe Seccion Subsidio, Aportes y Fiscalización

IPS simedical S.A.S

SIMEDICAL SAS
NIT: 901625724-5
Cel: 311 866 3611
Dirección: Calle 28 # 20 a - 26
Correo: simedical.ips@gmail.com



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

N° 1315

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
18 DÍA	07 MES	2025 AÑO	SARAVENA (ARAUCA, COLOMBIA) Ciudad	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO CON ENFASIS OSTEOMOSCULAR

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

Nombre de la empresa	Empresa en misión
CONSORCIO RIO BANADIA	CONSORCIO RIO BANADIA

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

Apellidos y Nombres	Genero	Edad	Documento de Identificación	
PAEZ GARCIA FERNEY ALFONSO	MASCULINO	35 AÑOS 04 MESES 10 DÍAS	Tipo: CC	Número: 1098684323

Cargo: INSPECTOR DE OBRAS

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL: **SIN RESTRICCIONES PARA EL CARGO ASIGNADO**

Observaciones: *NO APLICA*

N/A NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos)

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL ✓	----------


RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
	OTROS.	DIETA BALANCEADA, REALZIAR EJERCICIO DIARIO.

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

MEJORAR HABITOS DE ESTILO Y VIDA SALUDABLE, CONTROL DE PESO, REALIZAR ACTIVIDAD FISICA DIARIA.

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados entes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico



Firma:

Nombre: RIOS ESTEBAN LEIDY TATIANA

R. M.: 1098764381 L.S.O.: 0038

Código de Seguridad N1596T4J1315

Aspirante o Trabajador

Firma: Ferney A. Paez G

Nombre: PAEZ GARCIA FERNEY ALFONSO

CC: 1098684323

Hacienda

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidenció **FERNEY ALFONSO PAEZ GARCIA** identificado con CC No. **1098684323,** registra la siguiente información.

Datos del Empleador	Datos de la Relación Laboral
NI 901902273 CONSORCIO RIO BANADIA	Fecha de inicio de cobertura:19/07/2025 Estado Afiliación: ACTIVO Tipo Vinculación: TRABAJADOR DEPENDIENTE Clase de Riesgo: 5

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá. D.C. a los 19 días del mes de Julio de 2025.

Cordialmente,

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.
M.E.A.N

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 22/07/2025, el empleador CONSORCIO RIO BANADIA identificado con NIT número 901902273 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
9180382	22/07/2025	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1098684323	FERNEY ALFONSO PAEZ GARCIA	3000000	INSPECTOR DE OBRA	2025-07-21

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 22 días del mes de Julio del año 2025.

Cordialmente,

GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva

Comfiar
Sabemos lo que quieres

Línea gratuita de atención al cliente
018000945457

CERTIFICACIÓN No. 4087422 de 2025-08-14

LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE ARAUCA COMFIAR

CERTIFICA

Que el(la) señor(a) PAEZ GARCIA FERNEY ALFONSO identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1098684323, se encuentra afiliado(a) a nuestra Entidad en la modalidad de SUBSIDIO por intermedio de la empresa CONSORCIO RIO BANADIA Nit No. 901902273, desde el 21 Julio de 2025 y actualmente es Categoría B.

Esta certificación tiene validez de 30 dias, se expide a solicitud del interesado.

Atentamente,

PEDRO ANTONIO PARADA URIETA
Jefe Seccion Subsidio, Aportes y Fiscalización

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Colpensiones

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **FERNEY ALFONSO PAEZ GARCIA** identificado/a con documento de identidad **Cédula de Ciudadanía** número **1098684323,** se encuentra afiliado/a desde **24/06/2015** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 15 de agosto de 2025.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Rosa Mercedes Nino Amaya
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

Colpensiones
Dirección: Carrera 10 No.72 – 33 Torre B Piso 11, Bogotá D.C., Colombia Conmutador: (+57) 601 489 0909; Línea Gratuita: 01 8000 410909 www.colpensiones.gov.co

SIMEDICAL SAS
NIT: 901625724-5
Cel: 311 866 3611
Dirección: Calle 28 # 20 a - 26
Correo: simedical.ips@gmail.com



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

N°1300

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
18 DÍA	07 MES	2025 AÑO	SARAVENA (ARAUCA, COLOMBIA) Ciudad	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO CON ENFASIS OSTEOMOSCULAR

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

Nombre de la empresa	Empresa en misión
CONSORCIO RIO BANADIA	CONSORCIO RIO BANADIA

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

Apellidos y Nombres	Genero	Edad	Documento de Identificación	
GUTIERREZ VACCA HORLEYDA	FEMENINO	35 AÑOS 08 MESES 17 DÍAS	CC (Tipo)	1116496517 (Número)

Cargo: CONTADOR PUBLICO

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

SIN RESTRICCIONES PARA EL CARGO ASIGNADO

Observaciones: *NO APLICA*

N/A NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos)

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL ✓	----------

RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
	OTROS.	DIETA BALANCEADA.

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SE RECOMIENDA: REALIZAR PAUSAS ACTIVAS Y MEJORAR POSTURAS

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados entes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico



Firma:

Nombre: RIOS ESTEBAN LEIDY TATIANA

R. M.: 1098764381 L.S.O.: 0038

Código de Seguridad
N1549X1T1300

Aspirante o Trabajador

HORLEYDA GUTIERREZ V.

Firma:

Nombre: GUTIERREZ VACCA HORLEYDA

CC: 1116496517

Hacienda

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidenció **HORLEYDA GUTIERREZ VACCA** identificado con CC No. **1116496517,** registra la siguiente información.

Datos del Empleador	Datos de la Relación Laboral
NI 901902273 CONSORCIO RIO BANADIA	Fecha de inicio de cobertura:19/07/2025 Estado Afiliación: ACTIVO Tipo Vinculación: TRABAJADOR DEPENDIENTE Clase de Riesgo: 5

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá. D.C. a los 19 días del mes de Julio de 2025.

Cordialmente,

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.
M.E.A.N

MIS_4_1_3_FR15 v_010

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 22/07/2025, el empleador CONSORCIO RIO BANADIA identificado con NIT número 901902273 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
919385	22/07/2025	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1116496517	HORLEYDA GUTIERREZ VACCA	1500000	CONTADORA	2025-07-21

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 22 días del mes de Julio del año 2025.

Cordialmente,

GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Colpensiones

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **HORLEYDA GUTIERREZ VACCA** identificado/a con documento de identidad **Cédula de Ciudadanía** número **1116496517,** se encuentra afiliado/a desde **01/07/2022** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 15 de agosto de 2025.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Rosa Mercedes Nino Amaya
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

Colpensiones
Dirección: Carrera 10 No.72 – 33 Torre B Piso 11, Bogotá D.C., Colombia Conmutador: (+57) 601 489 0909; Línea Gratuita: 01 8000 410909 www.colpensiones.gov.co
