CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES N°.06 DEL CONTRATO DE OBRA 481 DE 2024 PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2025 AL 31 DE AGOSTO DE 2025



CONTRATO DE OBRA 481 DE 2024

OBJETO:
"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

ELABORADO POR:
CONSORCIO RIO BANADIA
R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA

ENTREGADO A:
CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN
R/L. JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON

MUNICIPIO DE SARAVENA
2025

CL 25 N 11 – 70 BRR ALFONSO LOPEZ
CORREO: consorcioriobanadia@gmail.com
CELULAR: 3202395534

Contenido

INTRODUCCIÓN 6
1. ASPECTOS CONTRACTUALES 7
1.1. PROCESO DE SELECCIÓN 7
1.2. CELEBRACION DEL CONTRATO 7
2. ANTECEDENTES Y REVISIÓN DEL PROYECTO 7
2.1. DESCRIPCION GENERAL 7
2.2. LOCALIZACIÓN 8
2.3. ALCANCE DEL PROYECTO 9
3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 10
3.1. GENERALIDADES DEL CONTRATO 10
3.1.1. Informe Contractual – Ficha Técnica del contrato de obra. 10
3.2. GARANTÍAS DEL CONTRATO 11
3.3. IMPOSICIÓN DE MULTAS Y SANCIONES 15
3.4. ACTOS ADMINISTRATIVOS 15
3.4.1. Modificación y /o adiciones al contrato 17
3.4.2. Compensación de mayores y menores cantidades 17
3.5. ACTAS DE COMITÉ TÉCNICOS 17
3.6. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA. 17
3.7. BITACORA DIARIA DE OBRA 18
3.8. CONTROL SOCIAL DE LA OBRA 19
3.8.1. Socialización De La Obra. 19
3.8.2. Conformación De La Veeduría Ciudadana 20
3.8.3. Actas de reuniones suscritas por la veeduría 21
3.9. VINCULACION DEL PERSONAL Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES 21
3.9.1. Personal Administrativo 21
3.9.2. Personal Operativo De La Obra 22
3.9.3. Pagos Salariales Y Liquidación Del Personal 22
3.10. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 23
3.10.1. Dotación Del Personal 23
3.10.2. Señalización De La Obra 24

3.10.3 Valla Informativa del Proyecto 24
3.10.4 Accidentalidad En La Obra. 25
3.10.5 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 25
3.11. PERMISOS Y LICENCIAS 25
3.12. CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA 26
4. ASPECTOS TECNICOS 35
4.1. CONDICIONES CONTRACTUALES 35
4.2. CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA 35
4.3. AVANCE DE LA OBRA 37
4.3.1. Avance Físico De La Obra 37
4.3.2. Avance Del Plazo Contractual 37
4.4. ACTIVIDADES DE OBRAS EJECUTADAS 38
4.5. IMPREVISTOS PRESENTADOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA 40
4.6. ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADA 40
4.7. CONTROL DE CALIDAD DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS 46
5. ASPECTOS FINANCIEROS 46
5.1. MANEJO DEL ANTICIPO 46
6. ASPECTOS AMBIENTALES 48
6.1 SEGUIMIENTO A PERMISOS Y/O LICENCIAS AMBIENTALES 48
6.2 SEGUIMIENTO AL PMA 48
6.3 IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL 48
7. CONCLUSIONES 50
8. ANEXOS 51
LISTADO DE ANEXOS 51

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1 coordenadas del proyecto 8
Tabla 2 ficha técnica 10
Tabla 3 póliza de contrato de obra anexo 0 11
Tabla 4 Relación de correspondencia enviada por la Interventoría del Contrato de Obra No. 481 de 2024 18
Tabla 5 Relación de correspondencia recibida por la Interventoría del Contrato de Obra No481 de 2024 18
Tabla 6 Conformación de la veeduría ciudadana para el control social del contrato de obra No. 481 del 2024 20
Tabla 7 Personal administrativo del contrato de obra No. 481 de 2024 en el mes de julio de 2025. 21
Tabla 8 Personal operativo del contrato de obra No. 481 de 2024 en el mes de julio de 2025. 22
Tabla 9 Dotación del personal en obra de elementos de protección-Contrato de Obra No. 481 de 2024 23
Tabla 10 Señalización instalada en la obra por el contratista- Contrato de Obra No. 481 de 2024 24
Tabla 11 Seguimiento y control de la maquinaria y equipos utilizado en la ejecución del contrato del contrato No. 481 del 2024 34
Tabla 12 presupuesto contractual 35
Tabla 13 Porcentaje de avance de obra Programado Vs Ejecutado del Contrato de Obra No. 481 de 2024. 38
Tabla 14 Manejo de Anticipo 46
Tabla 15 Presupuesto de la mitigación o control ambiental del contrato de obra No. 481 del 2024. 49

LISTADO DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Localización especifica 9
Ilustración 2 socialización del contrato 481 de 2024 20
Ilustración 3 entrega de epp 23
Ilustración 4 señalización de la obra. 24
Ilustración 5 valla informativa. 25
Ilustración 6 Equipo tipo volqueta 27
Ilustración 7 Equipo tipo volqueta 2 28
Ilustración 8 equipo tipo volqueta 3 28
Ilustración 9 Equipo tipo volqueta 4 29
Ilustración 10 Equipo tipo retroexcavadora 1 30
Ilustración 11 Equipo retroexcavadora 2 30
Ilustración 12 Equipo retroexcavadora 3 31
Ilustración 13 equipo retroexcavadora 4 32
Ilustración 14 equipo motoniveladora 32
Ilustración 15 equipo vibrocompactador 33
Ilustración 16 Equipo carrotanque 34
Ilustración 17 grafica avance de obra 37
Ilustración 18 Avance financiero programado Vs avance Ejecutado del Contrato de Obra No. 481 de 2024 39
Ilustración 19 Avance físico programado Vs Ejecutado del Contrato de Obra No. 481 de 2024 39
Ilustración 20 CONFORMACIÓN DE BARRERA TIPO JARILLÓN 41
Ilustración 21 GEOTEXTIL NT 2400 42
Ilustración 22 GEOTEXTIL NT 3000 43
Ilustración 23 GEOTEXTIL TEJIDO 2100 44
ilustración 24 manejo de aguas 45
Ilustración 25 Sequimiento de la plantas 49

INTRODUCCIÓN

El presente informe detalla el avance de la obra correspondiente al contrato número 481 de 2024, titulado "**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RÍO BANADÍA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**", ejecutado por el **CONSORCIO RÍO BANADÍA** (NIT: 901.902.273-3) representado legalmente por JEISSON RENE VILLARREAL ROA con cedula de ciudadanía N.º 1.018.444.460, de Bogotá D.C. Y supervisado por el CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN representado legalmente por JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCÓN a través del contrato 473 de 2024 cuyo objeto es **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADÍA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.**

El objetivo principal del proyecto es la ejecución de obras de protección que permitan la reducción del riesgo de inundaciones en la zona del río Banadía, mejorando la seguridad hídrica y la estabilidad del terreno mediante la implementación de soluciones técnicas de infraestructura.

A la fecha del presente informe desde el día 01 de agosto del 2025 hasta el 31 de agosto del 2025 han transcurrido 155 días los cuales equivalen al **85.16%** del avance en tiempo, el avance físico acumulado del proyecto es del **35.72%,** y el avance del presente mes de del **15.33%** con la ejecución de diversas actividades en cumplimiento con el cronograma previsto. Entre las tareas realizadas destacan la conformación de barrera tipo Jarillón, instalación de geotextiles nt 2400, nt 3000 y tejido 2100 así como el manejo adecuado de aguas pluviales para mitigar el riesgo de erosión y desbordamientos. El avance financiero del presente informe es del **40.00%** del valor total del proyecto, Este informe presenta el estado detallado de las actividades realizadas, las cuales se están ejecutando conforme a las especificaciones técnicas y dentro de los plazos establecidos en el plan de contingencia, garantizando la correcta evolución del proyecto hacia sus objetivos de protección y prevención.

1. ASPECTOS CONTRACTUALES

1.1. PROCESO DE SELECCIÓN

El Departamento de Arauca adelantó el proceso de selección del contratista mediante la licitación de obra pública número LO-02-RE-001-2024, de conformidad con lo establecido en la Ley 80/93, numeral 1 del art. 2 de la ley 1150 de 2007, art 14 y 15 del decreto 2474 de 2008 y demás normatividad concordante, para lo cual la Gerencia de Contratación realizó oportunamente las publicaciones pertinentes en la página WEB www.contratos.gov.co, Departamento de Arauca, llevándose a cabo el cierre del proceso de selección de acuerdo al cronograma y realizando la respectiva evaluación de las ofertas presentadas por los proponentes por parte del Comité Evaluador. Una vez se llevó a cabo las evaluaciones jurídicas, técnica y financiera de las propuestas y se estableció el orden de elegibilidad, se procedió a adjudicar el contrato al CONSORCIO RIO BANADIA, representado legalmente por JHONN FREDY GARCIA BELTRAN, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.098.752. 791 expedida en Bucaramanga mediante Resolución No. 4877 del 31 de diciembre de 2024.

1.2. CELEBRACION DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta la Resolución de Adjudicación No. 4877 del 31 de diciembre de 2024, se procedió a la suscripción del contrato de obra (No. 481 de 2024 el día 31 de diciembre de 2024 entre la doctora *LUZ LILIANA MARCHENA PINZON* y la firma CONSORCIO RIO BANADIA, representada por JHONN FREDY GARCIA BELTRAN, el cual tiene por objeto CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RÍO BANADÍA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA, con un plazo de ejecución de seis (06) meses y un valor de CATORCE MIL TRESCIENTOS DOCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($14.312.241.291,66).

2. ANTECEDENTES Y REVISIÓN DEL PROYECTO

2.1. DESCRIPCION GENERAL

El Río Banadía cuenta con aproximadamente 30.6 kilómetros de longitud de los cuales el 100% pueden catalogarse como susceptibles a inundación. En el área de estudio se ha identificado un sector crítico en la vereda Bajo Banadía, en el cual se presenta vulnerabilidad al riesgo de inundación por desbordamiento debido al fenómeno creciente de lluvias torrenciales que se ha intensificado por fenómenos antrópicos y naturales como el fenómeno de la niña, lo que sumado a los procesos erosivos y de socavación ha afectado a las comunidades de la zona, un (1) puesto de salud en Puerto Nariño, una (1) institución educativa en Puerto Nariño, una (1) vía secundaria en caño Tigre entre Puerto Nariño y la Esmeralda. El punto donde

se presenta la problemática es un sector crítico ubicado en un meandro pronunciado sobre el rio Banadía en el Municipio de Saravena, en áreas de la vereda Bajo Banadía. En este sector es crítico por razones dinámicas propias del comportamiento hidráulico del cauce del rio, lo cual ha provocado la degradación de la margen izquierda aguas abajo y perdida de la bancada natural por el fenómeno de socavación lateral y la constante sedimentación que ha acumulado bancos de arena en la sección del cauce, disminuyendo su capacidad hidráulica y ocasionando el desbordamiento del afluente en temporada de lluvias.
Que la alternativa de solución viabilizada es el "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA, DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA". La cual beneficiara a las veredas aledañas a dicho proyecto en especial el centro poblado de Puerto Nariño.

2.2. LOCALIZACIÓN

El proyecto se encuentra localizado en zona rural en territorio del municipio de Saravena en el Departamento de Arauca, y está definido por las siguientes coordenadas

Tabla 1 coordenadas del proyecto

Id	Coordenadas geográficas WGS84		Coordenadas planas-Magna-SIRGAS Origen Este - Norte		Coordenadas origen nacional CTM12	
	Latitud	**Longitud**	**Norte**	**Este**	**Norte**	**Este**
Inicio estructura colineal tipo / Jarillón flexocreto	6°59'14.76"N	71° 46' 56.00"O	1264494,527	922128,435	2330273,985	5134464,468
Fin estructura colineal tipo / Jarillón flexocreto	6°59'20.11"N	71° 46' 30.07"O	1264657,704	922924,630	2330440,303	5135259,474
Inicio estructura colineal tipo / Jarillón con sección escalonada flexocreto	6°59'8.76"N	71° 47' 1.78"O	1264310,461	921950,734	2330089,316	5134287,635
Fin estructura colineal tipo / Jarillón con sección escalonada flexocreto	6°59'14.76"N	71° 46' 56.00"O	1264494,527	922128,435	2330273,985	5134464,468

Ilustración 1 Localización especifica



2.3. ALCANCE DEL PROYECTO

En virtud del citado Plan Participativo de Desarrollo Departamental de Arauca 2024-2027, en el eje estratégico recursos naturales sostenibilidad ambiental ecosistemas estratégicos y gestión del riesgo, se estableció como metas e indicadores "obras de infraestructura para mitigación y atención a desastres realizadas", mediante la iniciativa priorizada "construcción de obras de protección contra inundaciones y erosión de los cuerpos hídricos en el departamento de Arauca" para la construcción de obras de protección en el Departamento de Arauca y dar solución a la problemática planteada.

Obras de infraestructura para mitigación y atención a desastres realizadas Con la intervención, el Departamento de Arauca mediante el presente proceso de selección y la consecuente celebración del contrato de obra pública para la "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA, DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA", busca mejorar las condiciones de protección de la ronda hídrica del rio Banadía, para el desarrollo económico y social del municipio de Saravena, Departamento de Arauca, impactando a 1.220 personas según lo descrito en el documento MGA del presente proyecto "Población afectada y objetivo".

3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

3.1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

3.1.1. Informe Contractual – Ficha Técnica del contrato de obra.

Tabla 2 ficha técnica

FICHA TECNICA DEL CONTRATO	
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO	
ENTIDAD CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE ARAUCA
INTERVENTOR EXTERNO:	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN
SUPERVISOR:	CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO RESOLUCION 001 DE 2025 DEL 03 DE ENERO 2025
CONTRATO No:	481 DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
CONTRATISTA:	CONSORCIO RIO BANADIA
REPRESENTANTE LEGAL:	JEISSON RENE VILLARREAL ROA R/L
NIT. No:	901.902.273-3
VALOR DEL CONTRATO:	$ 14.312.241.291,66
PLAZO CONTRACTUAL:	SEIS (6) MESES
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	SGR202324-00420 DE 11/12/2024 SGR202324-00422 DE 11/12/2024
REGISTRO PRESUPUESTAL	SGR202324-00401 DE 31/12/2024 SGR202324-00402 DE 31/12/2024
FECHA INICIO:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	30 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE SUSPENSION N° 1	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA PRORROGA SUSPENSION N° 1	22 DE MAYO DE 2025
FECHA PRORROGA SUSPENSION N° 2	20 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE REINICIO	21 DE JULIO DE 2025
FECHA DE TERMINACION DEFINITIVA	27 DE SEPTIEMBRE DE 2025
PERIODO DEL INFORME	
FECHA DE CORTE DEL INFORME:	DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025
DIAS TRANSCURRIDOS:	155

(acta de suspensión N° 1 contrato 481-2024 reposa en el anexo 1 del informe 5)

(acta de suspensión N° 1 y prologa N° 1 y N° 2 contrato 481-2024 reposa en el anexo 2 del informe 5)

(acta de reinicio N° 1 contrato 481-2024contrato 481-2024 reposa en el anexo 3 del informe 5)

(Contrato De Obra 481 De 2024 reposa en el anexo 1 del informe 1)

(Acta de inicio reposa en el anexo 2 del informe 1)

(Resolución De Asignación Del Supervisor reposa en el anexo 3 del informe 1)

(Solicitud Y Aceptación De Cambio De Representante Legal reposa en el anexo 1 del informe 2)

3.2. GARANTÍAS DEL CONTRATO

De acuerdo con las garantías exigidas por el Departamento de Arauca en el Contrato de Obra No. 481 de 2024, se suscribe con la compañía de seguros ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO, las siguientes garantías teniendo en cuenta los amparos en valor y plazo estipulados en la minuta contractual en la CLÁUSULA 18 del Contrato así:

3.2.1.1. Pólizas de Legalización

Las pólizas iniciales fueron expedidas el 31/12/2024) por la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A, tomadas por CONSORCIO RIO BANADIA y como beneficiario el Departamento de Arauca. Dichas pólizas fueron aprobadas por la Gerencia Técnica de Contratación Administrativa, mediante certificación firmada por la Gerente de Contratación LUZ LILIANA MARCHENA PINZON el 31/12/2024.

(Póliza Del Contrato De Obra Anexo 0 Y Aprobación reposa en el anexo 5 del informe 1)

Tabla 3 póliza de contrato de obra anexo 0

Anexo	FECHA EXPEDICION	NOMBRE / TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA	OBSERVACIONES
0	31/12/2024	BUEN MANEJO E INVERSIÓN DEL ANTICIPO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	49-44-101035208	$5.724.896.516,66	31/12/2024	31/12/2025	POLIZA APROBADA POR LA GERENTE DE CONTRATACION EL 31/12/2024
		CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			$ 2.862.448.258,33	31/12/2024	31/12/2025	
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA			$2.862.448.258.33	30/06/2025	30/06/2027	

		SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES			$ 2.146.836.193.75	31/12/2024	30/06/2028	
0	*31/12/2024*	Responsabilidad civil extracontractual	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	49-40-101011266	$715,612,064.58	31/12/2024	30/06/2025	PÓLIZA APROBADA POR EL GERENTE DE CONTRATACIÓN EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

3.2.2. Ampliaciones a las pólizas

3.2.2.1. Pólizas Ampliadas Según Acta de Inicio

Las pólizas fueron ampliadas según acta de inicio del (31/12/2024) por la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A, y aprobadas por la Gerente de Contratación Administrativa mediante certificación firmada por el Gerente de Contratación LUZ LILIANA MARCHENA PINZON el 19/03/2025

Tabla 4 póliza de contrato de obra anexo 1

ANEXO	FECHA EXPEDICION	NOMBRE / TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA	OBSERVACIONES
1	*31/12/2024*	BUEN MANEJO E INVERSIÓN DEL ANTICIPO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	49-44-101035208	$5.724.896.516,66	31/12/2024	31/12/2025	POLIZA APROBADA POR LA GERENTE DE CONTRATACION EL 19/03/2025
		CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			$ 2.862.448.258,33	31/12/2024	31/12/2025	
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA			$2.862.448.258.33	30/06/2025	30/06/2027	
		SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES			$ 2.146.836.193.75	31/12/2024	30/06/2028	

Las pólizas fueron ampliadas según acta de inicio del (31/12/2024) por la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Tabla 5 póliza de contrato de obra anexo 2

Anexo	FECHA EXPEDICION	NOMBRE / TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA	OBSERVACIONES
2	*13/03/2025*	BUEN MANEJO E INVERSIÓN DEL ANTICIPO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	49-44-101035208	$5.724.896.516,66	31/12/2024	31/12/2025	

		CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			$2.862.448.258,33	31/12/2024	31/12/2025	POLIZA APROBADA POR LA GERENTE DE CONTRATACION EL 13/03/2025
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA			$2.862.448.258.33	30/06/2025	30/06/2027	
		SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES			$ 2.146.836.193.75	31/12/2024	30/06/2028	
2	*13/03/2025*	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO	49-40-101011266	$715,612,064.58	31/12/2024	30/06/2025	PÓLIZA APROBADA POR EL GERENTE DE CONTRATACIÓN EL *13/03/2025*

Aclaración: En el presente anexo se aclara integrantes del consorcio rio banadia identificado con Nit: 901902273-3 según cesión del contrato de fecha 27/02/2025 Participantes del consorcio: Fundación nueva castellana con Nit:901358987-1 participación 45% Proyectos y servicios integrales Psi S.A.S identificado con Nit:900827849-0 participación 45% BCH ENGINEERING S.A.S identificado con Nit:901393606-7 participación del 10% Todos los demás términos y condiciones no modificados por el presente anexo continúan en vigor.

(Actualizacion de pólizas reposa en el anexo 1 del informe 3)

Tabla 6 póliza de cumplimiento suspensión anexo 3

Anexo	FECHA EXPEDICION	NOMBRE / TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA	OBSERVACIONES
3	*02/07/2025*	BUEN MANEJO E INVERSIÓN DEL ANTICIPO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	49-44-10 1035208	$5.724.896.516,66	31/12/2024	31/12/2025	La póliza de suspensión no fue aprobada, debido a que, al momento de su presentación, no se contaba con el acta de reinicio del contrato
		CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			$ 2.862.448.258,33	31/12/2024	31/12/2025	
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA			$2.862.448.258.33	30/06/2025	30/06/2027	
		SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES			$ 2.146.836.193.75	31/12/2024	30/06/2028	

3	*02/07/2025*	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO	49-40-101011266	$715,612,064.58	31/12/2024	30/06/2025	La póliza de suspensión no fue aprobada, debido a que, al momento de su presentación, no se contaba con el acta de reinicio del contrato

Aclaración: En el presente anexo se amplían las vigencias según acta de suspensión número 1 de fecha 22/04/2025, prorroga número 01 al acta de suspensión número 1 de fecha 22/05/2025 y prorroga número 02 al acta de suspensión número 1 de fecha 20/06/2025.

Todos los demás términos y condiciones no modificados por el presente anexo continúan en vigor.

(póliza según suspensión reposa en el anexo 4 del informe 5)

(póliza extracontractual suspensión reposa en el anexo 5 del informe 5)

Tabla 7 póliza de cumplimiento prorroga anexo 4

ANEXO	FECHA EXPEDICION	NOMBRE / TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA	OBSERVACIONES
4	*03/07/2025*	BUEN MANEJO E INVERSIÓN DEL ANTICIPO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	49-44-101035208	$5.724.896.516,66	31/12/2024	31/03/2026	La póliza de prorroga no fue aprobada, debido a que, al momento de su presentación, no se contaba con el acta de reinicio del contrato
		CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			$ 2.862.448.258,33	31/12/2024	31/03/2026	
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA			$2.862.448.258.33	30/06/2025	30/06/2027	
		SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES			$ 2.146.836.193.75	31/12/2024	30/09/2028	

Aclaración: En el presente anexo se amplían las vigencias según acta de suspensión número 1 de fecha 22/04/2025, prorroga número 01 al acta de suspensión número 1 de fecha 22/05/2025 y prorroga número 02 al acta de suspensión número 1 de fecha 20/06/2025.
Todos los demás términos y condiciones no modificados por el presente anexo continúan en vigor.

(póliza de cumplimiento de suspensión prorroga reposa en el anexo 6 del informe 5)

Tabla 8 póliza de cumplimiento reinicio anexo 5

Anexo	FECHA EXPEDICION	NOMBRE / TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA	OBSERVACIONES
5	*22/07/2025*	Buen Manejo e Inversión del Anticipo	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	49-44-101035208	$5.724.896.516,66	31/12/2024	31/03/2026	POLIZA APROBADA POR LA GERENTE DE CONTRATACION EL 12/08/2025
		CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			$ 2.862.448.258,33	31/12/2024	31/12/2025	
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA			$2.862.448.258.33	30/06/2025	30/06/2027	
		SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES			$ 2.146.836.193.75	31/12/2024	30/06/2028	
5	*22/07/2025*	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO	49-40-101011266	$715,612,064.58	31/12/2024	30/09/2025	PÓLIZA APROBADA POR EL GERENTE DE CONTRATACIÓN EL *12/08/2025*

en el presente anexo se aclara acta de reinicio número 1 de fecha 21/07/2025. todos los demás términos y condiciones no modificados por el presente anexo continúan en vigor.

(póliza de cumplimiento reinicio reposa en el anexo 7 del informe 5)

(póliza extracontractual de reinicio reposa en el anexo 8 del informe 5)

3.3. IMPOSICIÓN DE MULTAS Y SANCIONES

Hasta la fecha del presente informe no se han impuesto multas y sanciones al consorcio Rio Banadia.

3.4. ACTOS ADMINISTRATIVOS

Durante la ejecución del contrato de obra con corte a la fecha del presente informe, se han suscrito los siguientes actos administrativos:

Tabla 9 actos administrativos contrato de obra 481 de 2024

FECHA	ACTO ADMINISTRATIVO	MOTIVO DEL ACTO ADMINISTRATIVO	SUSCRITA POR
31/12/2024	Resolución 4877 de 2024" Por medio del cual la administración departamental ordena la adjudicación del contrato resultante del proceso de licitación pública N°LO-02-RE-001-2024 y su publicación en la página web" *(resolución reposa en el anexo 6 del informe 1)*	*Celebración del contrato de obra 481 de 2024*	*LUZ LILIANA MERCHENA PINZON GERENTE DE CONTRATACIÓN JHONN FREDY GARCIA BELTRAN R/L. CONSORCIO RIO BANADIA*
31/12/2024	ACTA DE INICIO *(acta de inicio reposa en el anexo 2 del informe1)*	*SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA DE INICIO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CITADO CONTRATO*	*NASSER CRUZ MATUS SECRETARIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA DEPARTAMENTAL JHONN FREDY GARCIA BELTRAN R/L. CONSORCIO RIO BANADIA JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON R/L. CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION*
22/04/2025	ACTA DE SUSPENSIÓN *(acta de suspensión reposa en el anexo 1 del informe 5)*	*ACTA DE SUSPENSIÓN N° 1 CONTRATO DE OBRA NO. 431-2024*	*NASSER CRUZ MATUS SECRETARIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA DEPARTAMENTAL JEISSON RENE VILLAREAL ROA R/L. CONSORCIO RIO BANADIA JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON R/L. CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001 DEL 03/01/2025*
22/05/2025	PRORROGA No. 01 AL ACTA DE SUSPENSION No. 1 CONTRATO DE OBRA No. 481.2024 *(acta de prorroga No.1 reposa en el anexo 2 del informe 5)*	*PRORROGA No. 1*	*GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA DEPARTAMENTAL JEISSON RENE VILLAREAL ROA R/L. CONSORCIO RIO BANADIA JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON R/L. CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001 DEL 03/01/2025*
20/06/2025	PRORROGA No. 02 AL ACTA DE SUSPENSION No. 1 CONTRATO DE OBRA No. 481.2024 *(acta de prorroga No.2 reposa en el anexo 2 del informe5)*	*PRORROGA No. 2*	*GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA DEPARTAMENTAL JEISSON RENE VILLAREAL ROA R/L. CONSORCIO RIO BANADIA JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON R/L. CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001 DEL 03/01/2025*
21/07/2025	ACTA DE REINICIO No. 01 AL CONTRATO DE OBRA No. 481.2024 *(acta de reinicio No.3 reposa en el anexo 2 del informe 5)*	*ACTA DE REINICIO No.1*	*GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA DEPARTAMENTAL JEISSON RENE VILLAREAL ROA R/L. CONSORCIO RIO BANADIA JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON R/L. CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001 DEL 03/01/2025*

3.4.1. Modificación y /o adiciones al contrato

Durante el periodo del 01 de agosto al 31 de agosto de 2025 no se han presentado modificación y/o adiciones a las condiciones contractuales del contrato N°481/2024.

3.4.2. Compensación de mayores y menores cantidades

No se han presentado actas de mayores y menores cantidades durante el periodo del presente informe.

3.5. ACTAS DE COMITÉ TÉCNICOS

Durante la ejecución del contrato de obra con corte a la fecha del presente informe, se han realizado las siguientes actas de comités técnicos.

Tabla 10 actas de comité

FECHA	No. DE ACTA DE COMITE	TEMAS TRATADOS	PARTICIPANTES DEL COMITÉ
22/08/2025	7	Seguimiento a la ejecución contractual y presentación de plan de contingencia	*NASSER CRUZ MATUS* (SECRETARIO DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL) JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON R/L. CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION (INTERVENTOR EXTERNO) JEISSON RENE VILLAREAL ROA. (CONTRATISTA DE OBRA) CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO (COORDINADOR DE OFICINA DE GESTION DEL RIESGO) JAIRO ALEXANDER BARRAGAN MENDOZA (ESPECIALISTA HIDRAULICO)

Anexo 1 acta de comité

3.6. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA.

Durante la ejecución del contrato de obra con corte a la fecha del presente informe, se ha enviado y recibido la siguiente correspondencia entre la Interventoría, el contratista.

Tabla 4 Relación de correspondencia enviada por la Interventoría del Contrato de Obra No. 481 de 2024

FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	DESCRIPCION
04/08/2025	CONSORCIO RIO BANADIA	INTERVENTORIA EXTERNA	ACTUALIZACIÓN DE INFORMES ENTREGADOS - SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES
13/08/2025	CONSORCIO RIO BANADIA	INTERVENTORIA EXTERNA	ACLARACIÓN ACTUALIZACIÓN PÓLIZAS SEGÚN ACTA DE INICIO.
19/08/2025	CONSORCIO RIO BANADIA	INTERVENTORIA EXTERNA	SOLICITUD DE REPROGRAMACIÓN DE COMITÉ TÉCNICO
21/08/2025	CONSORCIO RIO BANADIA	INTERVENTORIA EXTERNA	ENTREGA DE INFORMES Y PLAN DE CONTINGENCIA – CONTRATO 481 DE 2024
21/08/2025	CONSORCIO RIO BANADIA	SECRETARIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA	ENTREGA DE INFORMES Y PLAN DE CONTINGENCIA – CONTRATO 481 DE 2024

Tabla 5 Relación de correspondencia recibida por la Interventoría del Contrato de Obra No481 de 2024

FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	DESCRIPCION
12/08/2025	INTERVENTORIA EXTERNA	CONSORCIO RIO BANADIA	REITERACIÓN DE SOLICITUD DE REPROGRAMACIÓN DE OBRA, PLAN DE CONTINGENCIA– CONTRATO DE OBRA 481 DEL 2024
19/08/2025	INTERVENTORIA EXTERNA	CONSORCIO RIO BANADIA	SOLICITUD COMITÉ TÉCNICO DE OBRA PRESENCIAL
21/08/2025	INTERVENTORIA EXTERNA	CONSORCIO RIO BANADIA	REPROGRAMACIÓN DE COMITÉ TÉCNICO

Anexo 2 Correspondencia enviada Y recibida.

3.7. BITACORA DIARIA DE OBRA

La bitácora de obra correspondiente al contrato número 481 de 2024 será gestionada y actualizada de manera periódica por los residentes de obra y el director de obra, quienes se encargarán de registrar de forma detallada todas las actividades realizadas, los avances de obra, los problemas presentados y las incidencias que puedan surgir durante el proceso de ejecución. El residente de interventoría y el director de interventoría serán responsables de realizar la supervisión y validación

de los registros en la bitácora, asegurando que se cumpla con las especificaciones técnicas, los plazos establecidos y las normativas aplicables. La coordinación entre los equipos de obra e interventoría garantizará la correcta documentación y trazabilidad de la obra, permitiendo un seguimiento adecuado del desarrollo del proyecto y su cumplimiento conforme a los estándares establecidos.
Es relevante señalar que el día 20 de enero de 2025, se dio apertura formal al proyecto del contrato número 481 de 2024, marcando el inicio de las actividades correspondientes para la ejecución de las obras.

Anexo 3 Bitácoras De Obra Del 01 De Agosto De 2025 Al 31 De Agosto De 2025

3.8. CONTROL SOCIAL DE LA OBRA

3.8.1. Socialización De La Obra.

El 18/01/2025, se realizó la socialización del proyecto para la CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA, en el sitio de obra en la vereda bajo Banadia del municipio de Saravena departamento de Arauca, previa convocatoria realizada por el Departamento de Arauca a través de la Secretaría de Gobierno.
En dicha reunión participaron representantes de la gobernación de Arauca, de la firma contratista de la obra, de la Interventoría externa y de la comunidad beneficiada con el proyecto, a quienes se les dio a conocer el alcance físico y financiero del contrato, el plazo de ejecución del mismo y el cronograma de la obra presentado por el contratista; de igual forma se atendieron las observaciones e inquietudes de los participantes y se presentaron los profesionales que van a estar frente a la ejecución del proyecto por parte del contratista, la Interventoría externa y la supervisión del Departamento de Arauca.
En la socialización de la obra correspondiente al contrato número 481 de 2024, se recogió información relevante del acta de socialización de la obra. Durante esta reunión, se llevó a cabo la conformación de la veeduría ciudadana, permitiendo la participación activa de la comunidad en el seguimiento y control del proyecto. En la reunión se levantó como soporte el Acta de Socialización de la obra, la cual se presenta en el ANEXO 9 del informe 1.

(Acta De Socialización reposa en el anexo 9 del informe 1))

Ilustración 2 socialización del contrato 481 de 2024



Fuente 1 autor propio

3.8.2. Conformación De La Veeduría Ciudadana

En la reunión de socialización del proyecto se llevó a cabo por parte de la comunidad que asistió a la convocatoria, el nombramiento de las personas que hacen parte de la veeduría ciudadana y que serán los voceros de la comunidad durante toda la etapa de ejecución de la obra ante el contratista, la Interventoría externa, entidad contratante, entes de control y demás instituciones.

(Resolución de conformación de veeduría ciudadana reposa en el anexo 10 del informe 1)

Tabla 6 Conformación de la veeduría ciudadana para el control social del contrato de obra No. 481 del 2024

VEEDURIA CIUDADANA					
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	TELEFONO	CARGO	VEREDA/BARRIO
1	*OSCAR JAVIER RIOS GOMEZ.*	*1.115.722.421*	*3195035254*	*VOCERO*	*Bajo Banadia*
2	*WILLIAM PEÑALOZA PEÑALOZA*	*96.185.880*	*3058818465*	*VEEDOR*	*Puerto Nariño*
3	*LEIRA NAYARIT PEDRAZA URIBE*	*1.115.744.872*	*3022027500*	*VEEDOR*	*Puerto Nariño*

La veeduría ciudadana fue reconocida por el Ministerio Público del Municipio de Saravena, mediante Resolución No. 005 del (28/01/2025) siendo nombrado como VOCERO o representante del Comité Veedor al señor OSCAR JAVIER RIOS GOMEZ.

3.8.3. Actas de reuniones suscritas por la veeduría

A la fecha del presente informe no se han suscrito ningún acta de reunión.

3.8.3.1. Acta de veeduría de inicio de obra.

Con el fin de dar inicio a la ejecución física de las obras, el (20/01/2025) se suscribe con la veeduría ciudadana del contrato de obra No. 481 del 2024, el acta de veeduría de inicio de obra, en la cual se da a conocer por parte del contratista y la Interventoría externa aspectos como el cronograma de trabajo, vinculación del personal, acopio de materiales, fecha prevista para la terminación de las actividades, entre otros.

(acta de inicio de veeduría reposa en el anexo 11 del informe 1)

3.9. VINCULACION DEL PERSONAL Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES

El contratista vinculó el personal requerido para la administración y ejecución de los trabajos de acuerdo al alcance de la obra, realizando previamente la afiliación al sistema de seguridad social integral y riesgos laborales. La Interventoría antes del ingreso del personal a la obra verificó las respectivas afiliaciones, así como el pago mensual de los aportes a salud, pensión, riesgos y aportes parafiscales conforme a las planillas de pago entregadas por el contratista.

(exámenes de Ingreso y afiliaciones reposa en el anexo 12 del informe 5)

3.9.1. Personal Administrativo

El personal profesional y administrativo que laboró en la obra para el periodo del presente informe, es el mismo que fue ofertado por el contratista en el proceso de selección y no ha sido modificado hasta la fecha.
A continuación, se relaciona el personal administrativo del contratista:

Tabla 7 Personal administrativo del contrato de obra No. 481 de 2024 en el mes de julio de 2025.

DATOS GENERALES										
	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	CC	CARGO	SALARIO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	FECHA REINGRESO	DIAS LABORADOS
1	VILLAREAL	ROA	JEISSON RENE	1.018.444.460	REPRESENTANTE LEGAL	$1.423.500	14-2-2024	22/04/2025	21/07/2025	110
2	VILA	SARABIA	JAIR LEANDRO	1.091.659.018	DIRECTOR DE OBRA	$ 8.000.000	31-12-2024	22/04/2025	21/07/2025	155
3	BARRAGAN	MENDOZA	JAIRO ALEXANDER	80.109.920	ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA	$ 2.250.000	31-12-2024	22/04/2025	21/07/2025	155
4	GARCIA	BELTRAN	JHONNATHAN ALEXIS	1.098.716.716	ING RESIDENTE	$ 5.000.000	31-12-2024	22/04/2025	21/07/2025	155
5	GARCIA	BELTRAN	JHONN FREDY	1.098.752.791	ING RESIDENTE	$ 5.000.000	31-12-2024	22/04/2025	21/07/2025	155
6	OLAYA	BAYONA	LAURA CRISTINA	1.094.283.275	ING AMBIENTAL	$ 5.000.000	31-12-2024	22/04/2025	21/07/2025	155
7	BOTIA	CHONA	MARLYN YVETTE	1.020.810.816	PROFESIONAL SOCIAL	$ 3.000.000	31-12-2024	22/04/2025	21/07/2025	155

DATOS GENERALES										
8	GARRIDO	RIVERO	CAMILO ANDRES	1.094.269.468	HSEQ	$ 3.000.000	31-12-2024	22/04/2025	21/07/2025	155
9	GUTIERREZ	VACCA	HORLEYDA	1.116.496.517	CONTADOR	$ 1.500.000	31-12-2024	22/04/2025	21/07/2025	155
10	PAEZ	GARCÍA.	FERNEY	1.098.684.323	INSPECTOR DE OBRA	$ 3.000.000	31-12-2024	22/04/2025	21/07/2025	155
11	OCHOA		JESSICA LILIBETH	1.098.658.689	SECRETARIA	$ 2.000.000	31-12-2024	22/04/2025	21/07/2025	155
12	DELGADO	MONTAGUT	JOAQUIN EDUARDO	88.215.089	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	$2.750.000	31-12-2024	22/04/2025	21/07/2025	155

3.9.2. Personal Operativo De La Obra

El contratista utilizó mano de obra no calificada de la región con lo cual fue posible generar empleo en la zona de influencia del proyecto. Así mismo vinculó mano de obra calificada para dirigir las actividades de acuerdo a los requerimientos técnicos de la obra.
A continuación, se relaciona el personal operativo del contratista.

Tabla 8 Personal operativo del contrato de obra No. 481 de 2024 en el mes de julio de 2025.

DATOS GENERALES										
	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	CC	CARGO	SALARIO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	FECHA REINGRESO	DIAS LABORADOS
1	QUINTERO	VILLAMIZAR	JUAN VICENTE	9.466.736	OFICIAL	$ 1.755.000	20-01-2025	22/04/2025	21/07/2025	135
2	JOYA	TAMARA	EDWIN GABRIEL	1.119.185.219	OFICIAL	$ 1.755.000	21/07/2025	----	----	42
3	CASTAÑEDA	MENDOZA	NELSON ARLEY	1.115.722.498	AYUDANTE	$ 1.423.500	20-01-2025	22/04/2025	21/07/2025	135
4	MONCADA	CORONEL	JESUS ANTONIO	1.125.760.100	AYUDANTE	$ 1.423.500	18/02/2025	22/04/2025	21/07/2025	106
5	GELVIS	PEÑALOZA	DERIAN	1.148.703.169	AYUDANTE	$ 1.423.500	18/02/2025	22/04/2025	21/07/2025	106
6	TORREZ	VELANDIA	DAVISON	1.115.740.780	AYUDANTE	$ 1.423.500	18/02/2025	22/04/2025	21/07/2025	106
7	RIVERO	VILLAMIZAR	JOSE PABLO	88.311.695	AYUDANTE	$ 1.423.500	18/02/2025	22/04/2025	21/07/2025	106
8	ZAPATA		ALEXANDER	96.194.216	AYUDANTE	$ 1.423.500	27/02/2025	22/04/2025	21/07/2025	97
9	ORTEGA	CONTRERAS	CARLOS	88.219.552	AYUDANTE	$ 1.423.500	27/02/2025	22/04/2025	21/07/2025	97
10	BERNAL	RODRIGUEZ	JESUS GUILLERMO	1.115.742.269	AYUDANTE	$ 1.423.500	21/07/2025	----	----	42
11	PABON	GOMEZ	DAVINSON ANDRES	1.234.339.637	AYUDANTE	$ 1.423.500	21/07/2025	----	----	42
12	MEDINA	GOMEZ	DIEGO ANDRES	1.006.407.775	AYUDANTE	$ 1.423.500	21/07/2025	----	----	42

Anexo 4 Planillas De Seguridad Social del mes de Agosto 2025

3.9.3. Pagos Salariales Y Liquidación Del Personal

El contratista realizó los pagos salariales de los trabajadores vinculados a la ejecución de la obra, conforme al contrato laboral (verbal o escrito) entre las fechas comprendidas del 01 de agosto al 31 de agosto 2025;

Anexo 5 Nóminas De Pagos Mensual mes de Agosto 2025

3.10. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

3.10.1. Dotación Del Personal


La firma contratista llevó a cabo la dotación del personal que labora en la obra con los elementos de protección requeridos en el desarrollo de sus labores diarias, de acuerdo a las necesidades de cada trabajador, haciendo entrega de los siguientes elementos:

Tabla 9 Dotación del personal en obra de elementos de protección-Contrato de Obra No. 481 de 2024

ELEMENTOS DE PROTECCION	ENTREGADOS		ESTADO			BENEFICIARIOS
	Si	No	Bueno	Regular	Malo	
CASCO	X		X			Ingenieros, operarios, Oficiales, ayudantes.
GUANTES	X		X			Oficiales, ayudantes.
BOTAS DE SEGURIDAD	X		X			Ingenieros, operarios, Oficiales, ayudantes.
BOTAS DE CAUCHO						
GAFAS DE PROTECCION	X		X			Ingenieros, operarios, Oficiales, ayudantes.
OVEROL/CAMISA/PANTALON	X		X			Ingenieros, operarios, Oficiales, ayudantes.
TAPA BOCAS	X		X			Ingenieros, operarios, Oficiales, ayudantes.
MASCARA						

La Interventoría verificó diariamente en campo la utilización de los elementos de protección por parte del personal en obra, haciendo los respectivos requerimientos a los trabajadores que en determinado momento no los estaban usando. En obra se firmaron actas de entrega de dotación que reposan en el ANEXO 15. del informe N° 5 del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo del mes de Julio (SG-SST).

Ilustración 3 entrega de epp

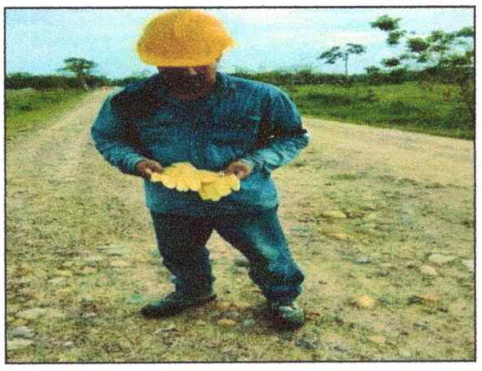



3.10.2. Señalización De La Obra

En la ejecución de los trabajos, se implementaron las señalizaciones requeridas para el aislamiento de las zonas de trabajo, así como la instalación de las señales preventivas y vallas necesarias en la ejecución de la obra.

Tabla 10 Señalización instalada en la obra por el contratista- Contrato de Obra No. 481 de 2024

ELEMENTOS DE SEÑALIZACION	INSTALADOS		ESTADO			LOCALIZACION EN OBRA
	Si	No	Bueno	Regular	Malo	
AVISOS PREVENTIVOS	x		x			
AVISOS INFORMATIVOS	x		x			

La Interventoría diariamente verificó que dichas señales se encontraran debidamente instaladas en todos los frentes de trabajo de la obra y en buen estado, haciendo las recomendaciones del caso al contratista para subsanar cualquier inconveniente frente a la falta de señalización o mal estado de la misma.

Ilustración 4 señalización de la obra.



Fuente 2 autor propio

3.10.3 Valla Informativa del Proyecto

En cumplimiento de la normatividad vigente y como parte de las medidas de señalización, se instaló la valla informativa en el acceso principal al área de intervención. Esta contiene la información general del contrato (número, objeto, plazo y valor), así como los datos de la entidad contratante, contratista e interventoría, asegurando la visibilidad y transparencia hacia la comunidad.



Ilustración 5 valla informativa.

3.10.4 Accidentalidad En La Obra.

El profesional idóneo por parte de obra e interventoría estuvieron muy atentos, lo cual hizo posible que dentro el transcurso del presente informe no se presentara ningún accidente laboral dentro de la obra. cabe destacar que durante este periodo tampoco se vieron involucrados terceras personas en ningún tipo de accidente.

3.10.5 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

Teniendo en cuenta la normatividad vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo (Decreto 1072 de 2015) establecida por el Ministerio de Trabajo, todos los empleadores deben implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) el cual "consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua, lo cual incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en los espacios laborales.

Anexo 6 Informe del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST)

3.11. PERMISOS Y LICENCIAS

Ante la Autoridad Ambiental Regional CORPORINOQUIA se obtuvieron los permisos ambientales necesarios para el desarrollo del proyecto, conforme a lo dispuesto en la Resolución No. 700.36.250082 del 18 de julio de 2025, en cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y con el fin de asegurar la

legalidad y sostenibilidad de las actividades proyectadas, Los permisos obtenidos de ocupación de cauce, y concepción de aguas

3.12. CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA

La interventoría verificó que el contratista utilizara en la ejecución de las actividades del contrato, la maquinaria y equipos requeridos según los APU y especificaciones técnicas del proyecto. Así mismo constató el estado físico y de operación de la maquinaria y equipo solicitando al contratista sustituirlo por mal estado o realizarle mantenimiento preventivo y/o correctivo, cada vez que fue necesario.

(Hojas de vida de los equipos y documentación adicional reposa en el anexo 16 del informe 1 e informe 5)

La maquinaria y equipo que el contratista utilizó durante el periodo del presente informe fue el siguiente:

Tipo:	VOLQUETA
Marca:	CHEVROLET
Referencia:	KODIAK
Días en obra:	135
Estado:	*BUENO*
Regularidad del mantenimiento:	MENSUAL
Vibraciones/ Ruidos:	NO PRESENTA
Idoneidad de operarios:	IDONEO



Ilustración 6 Equipo tipo volqueta

Tipo:	VOLQUETA
Marca:	INTERNATIONAL
Días en obra:	135
Estado:	*BUENO*
Regularidad del mantenimiento:	MENSUAL
Vibraciones/ Ruidos:	NO PRESENTA
Idoneidad de operarios:	IDONEO



Ilustración 7 Equipo tipo volqueta 2

Tipo:	VOLQUETA
Marca:	FORD
Referencia:	F 600
Días en obra:	42
Estado:	*BUENO*
Regularidad del mantenimiento:	MENSUAL
Vibraciones/ Ruidos:	NO PRESENTA
Idoneidad de operarios:	IDONEO



Ilustración 8 equipo tipo volqueta 3

Tipo:	VOLQUETA
Marca:	DODGE
Referencia:	D 600
Días en obra:	42
Estado:	*BUENO*
Regularidad del mantenimiento:	MENSUAL
Vibraciones/ Ruidos:	NO PRESENTA
Idoneidad de operarios:	IDONEO



Ilustración 9 Equipo tipo volqueta 4

Tipo:	RETROEXCAVADORA
Marca:	CATERPILLAR
Referencia:	320D3GC
Días en obra:	135
Estado:	*BUENO*
Regularidad del mantenimiento:	QUINCENAL
Vibraciones/ Ruidos:	NO PRESENTA
Idoneidad de operarios:	IDONEO



Ilustración 10 Equipo tipo retroexcavadora 1

Tipo:	RETROEXCAVADORA
Marca:	JHON DEERE
Referencia:	160LC
Días en obra:	135
Estado:	*BUENO*
Regularidad del mantenimiento:	QUINCENAL
Vibraciones/ Ruidos:	NO PRESENTA



Ilustración 11 Equipo retroexcavadora 2

Tipo:	RETROEXCAVADORA
Marca:	KOMASUT
Referencia:	PC200
Días en obra:	42
Estado:	*BUENO*
Regularidad del mantenimiento:	QUINCENAL
Vibraciones/ Ruidos:	NO PRESENTA



Ilustración 12 Equipo retroexcavadora 3

Tipo:	RETROEXCAVADORA
Marca:	CATERPILLAR
Referencia:	320D3GC
Días en obra:	42
Estado:	*BUENO*
Regularidad del mantenimiento:	QUINCENAL
Vibraciones/ Ruidos:	NO PRESENTA
Idoneidad de operarios:	IDONEO



Ilustración 13 equipo retroexcavadora 4

Tipo:	MOTONIVELADORA
Marca:	CATERPILLAR
Referencia:	120C
Días en obra:	42
Estado:	*BUENO*
Regularidad del mantenimiento:	QUINCENAL
Vibraciones/ Ruidos:	NO PRESENTA
Idoneidad de operarios:	IDONEO



Ilustración 14 equipo motoniveladora

Tipo:	VIBROCOMPATADOR
Marca:	DYNAPAC
Referencia:	CA 25 D
Días en obra:	135
Estado:	*BUENO*
Regularidad del mantenimiento:	QUINCENAL
Vibraciones/ Ruidos:	NO PRESENTA
Idoneidad de operarios:	IDONEO



Ilustración 15 equipo vibrocompactador

Tipo:	CARROTANQUE
Días en obra:	42
Estado:	*BUENO*
Regularidad del mantenimiento:	QUINCENAL
Vibraciones/ Ruidos:	NO PRESENTA
Idoneidad de operarios:	IDONEO



Ilustración 16 Equipo carrotanque

Por otro lado, la interventoría realizó un seguimiento y control a la maquinaria y equipos propios y/o alquilados por el contratista verificando que los seguros se encuentren vigentes.

(Contratos De Equipos Utilizados Reposa en el anexo 17 del informe 1)

Tabla 11 Seguimiento y control de la maquinaria y equipos utilizado en la ejecución del contrato del contrato No. 481 del 2024

ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO				OBSERVACIONES
	MES 1				
	SI	NO	SI	NO	
El contratista cuenta con los contratos de alquiler de la maquinaria y equipo que no son de su propiedad debidamente suscritos con terceros.	x				NINGUNA
Los vehículos maquinaria y equipo que el contratista tiene en la obra cumplen con los siguientes requisitos: • SOAT • Tarjeta de propiedad • Licencia de conducción de la persona responsable	x				NINGUNA

Anexo 7 Preoperacionales Equipos mes de Agosto del 2025

4. ASPECTOS TECNICOS

4.1. CONDICIONES CONTRACTUALES

El contrato de obra suscrito entre el Departamento de Arauca y la firma contratista CONSORCIO RIO BANADIA contempla las siguientes actividades a desarrollar dentro del plazo contractual establecido de 06 (SEIS) meses.

Tabla 12 presupuesto contractual

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**OBRAS DE PROTECCIÓN RIO BANADIA**				
1,1	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN CONGLOMERADO ENTRE 0-2 m DE PROFUNDIDAD	M3	16.298,68	$ 19.239,00	$ 313.570.304,52
1,2	ACARREO MATERIAL INTERNO NO MAYOR A 2 KM PARA REFORZAMIENTO DEL TALUD NATURAL	M3	16.298,68	$ 23.478,00	$ 382.660.409,04
1,3	CONFORMACIÓN DE BARRERA TIPO JARILLÓN	M3	25.673,470	$127.588,00	$ 3.275.626.690,36
1,4	GEOTEXTIL NT 2400	M2	91.742,40	$ 19.172,00	$ 1.758.885.292,80
1,5	GEOTEXTIL NT 3000	M2	10.858,40	$ 23.242,00	$ 252.370.932,80
1,6	GEOTEXTIL TEJIDO 2100	M2	20.420,44	$ 17.337,00	$ 354.029.168,28
1,7	MANEJO DE AGUAS	MES	6,00	$ 4.293.354,00	$ 25.760.124,00
1,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLEXOCRETO	M2	19.944,00	$ 127.609,00	$ 2.545.033.896,00
1,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSACRETO	M3	3.722,88	$ 940.227,00	$ 3.500.352.293,76
1,10	Filtro o Dren Frances PVC 100 mm (0.6x0.8) m	M	1.108,00	$ 249.909,00	$ 276.899.172,00
1,11	RELLENOS TALUD DERECHO ANCLAJE DIQUE	M3	13.674,94	$ 118.615,00	$ 1.622.053.008,10
				SUB-TOTAL COSTO OBRA FÍSICA (INCLUYE A.I.U)	**$ 14.307.241.291,66**
				APLICACIÓN AL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA - PUEA	**$ 5.000.000,00**
				TOTAL, OBRA FÍSICA	**$ 14.312.241.291,66**

4.2. CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA

Para el periodo del presente informe de obra comprendido del 01 de agosto del 2025 al 31 de agosto del 2025, se han ejecutado las siguientes cantidades para cada uno de los ítems del contrato:

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD PRESENTE INFORME	VALOR PRESENTE INFORME	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL ACUMULADO
1	**OBRAS DE PROTECCIÓN RIO BANADIA**								
1,1	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN CONGLOMERADO ENTRE 0-2 m DE PROFUNDIDAD	M3	16.298,68	$ 19.239,00	$ 313.570.304,52	0,00	0,00	14.268,68	$ 274.515.219,30
1,2	ACARREO MATERIAL INTERNO NO MAYOR A 2 KM PARA REFORZAMIENTO DEL TALUD NATURAL	M3	16.298,68	$ 23.478,00	$ 382.660.409,04	0,00	0,00	14.268,70	$ 335.000.538.60
1,3	CONFORMACIÓN DE BARRERA TIPO JARILLÓN	M3	25.673,47	$ 127.588,00	$ 3.275.626.690,36	9963,53	$ 1.271.266.865,64	19.695,35	$ 2.512.890.315,80
1,4	GEOTEXTIL NT 2400	M2	91.742,40	$ 19.172,00	$ 1.758.885.292,80	35.604,00	$ 682.599.888,00	70.380,00	$ 1.349.325.360,00
1,5	GEOTEXTIL NT 3000	M2	10.858,40	$ 23.242,00	$ 252.370.932,80	4.214,00	$ 97.941.788,00	8330,00	$ 193.605.860,00
1,6	GEOTEXTIL TEJIDO 2100	M2	20.420,44	$ 17.337,00	$ 354.029.168,28	7.924,90	$ 137.393.991,30	15665,50	$ 271.592.773,50
1,7	MANEJO DE AGUAS	MES	6,00	$ 4.293.354,00	$ 25.760.124,00	1,00	$ 4.293.354,00	5,10	$ 21.896.105,40
1,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLEXOCRETO	M2	19.944,00	$ 127.609,00	$ 2.545.033.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSACRETO	M3	3.722,88	$ 940.227,00	$ 3.500.352.293,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1,10	Filtro o Dren Frances PVC 100 mm (0.6x0.8) m	M	1.108,00	$ 249.909,00	$ 276.899.172,00	0,00	0,00	600,00	$149.945.400,00
1,11	RELLENOS TALUD DERECHO ANCLAJE DIQUE	M3	13.674,94	$ 118.615,00	$ 1.622.053.008,10	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL COSTO OBRA FÍSICA (INCLUYE A.I.U)					**$ 14.307.241.291,66**		$ 2.193.455.886,94		$ 5.108.711.572,60
APLICACIÓN AL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA - PUEA					**$ 5.000.000,00**				$3.444.349,00
TOTAL, OBRA FÍSICA					**$ 14.312.241.291,66**		**$ 2.193.455.886,94**		**$ 5.112.215.921,60**


CL 25 N 11 – 70 BRR ALFONSO LOPEZ
CORREO: consorcioriobanadia@gmail.com
CELULAR: 3202395534

4.3. AVANCE DE LA OBRA

4.3.1. Avance Físico De La Obra

De acuerdo a las cantidades de obra ejecutadas en el periodo del presente informe No. 6 del 01 de agosto del 2025 al 31 de agosto del 2025, se presenta un avance de ejecución del 15.33% y un avance de obra acumulado del 35.72%, haciendo falta por ejecutar un 64.28% para completar la totalidad de las actividades establecidas en la minuta del contrato.

Ilustración 17 grafica avance de obra

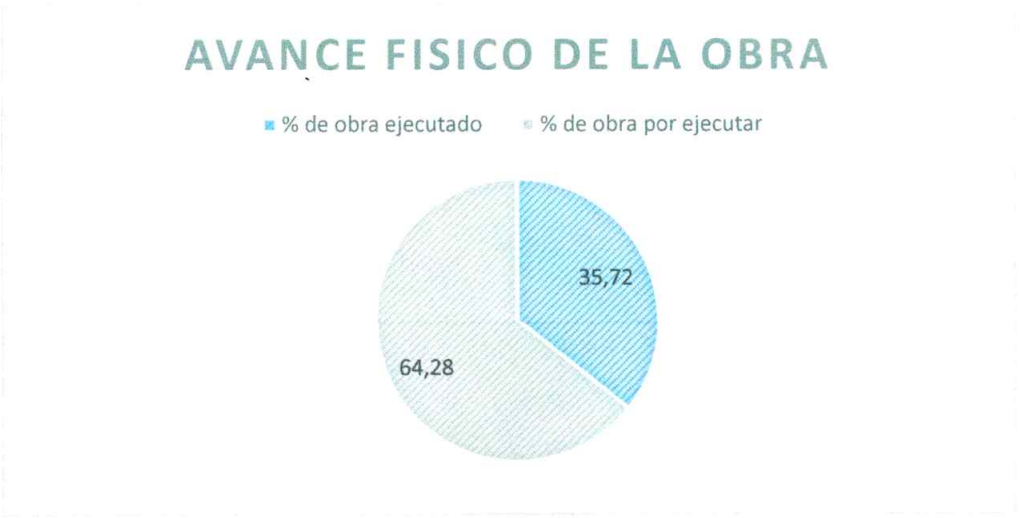

Fuente 3 autor propio

4.3.2. Avance Del Plazo Contractual

Con respecto al plazo contractual, de los 06 meses establecidos en la minuta del contrato, han transcurrido 5 meses Y 3 días desde la fecha de inicio hasta la fecha de corte del presente informe, lo cual equivale a un 85.16% del total del plazo contractual, restando 27 días para finalizar las actividades del contrato y proceder a entregar las obras al DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

PLAZO CONTRACTUAL	*SEIS (06) MESES*
TIEMPO SUSPENDIDO	*NOVENTA (90) DIAS*
PLAZO ADICIONADO	*N/A*
PLAZO EJECUTADO	*CINCO (05) MESES Y 3 DIAS*
PLAZO POR EJECUTAR	*VEINTISIETE (27) DIAS*
% PLAZO EJECUTADO	*85.16%*

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD PRESENTE INFORME	VALOR PRESENTE INFORME	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL ACUMULADO
1	**OBRAS DE PROTECCIÓN RIO BANADIA**								
1,1	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN CONGLOMERADO ENTRE 0-2 m DE PROFUNDIDAD	M3	16.298,68	$ 19.239,00	$ 313.570.304,52	0,00	0,00	14.268,68	$ 274.515.219,30
1,2	ACARREO MATERIAL INTERNO NO MAYOR A 2 KM PARA REFORZAMIENTO DEL TALUD NATURAL	M3	16.298,68	$ 23.478,00	$ 382.660.409,04	0,00	0,00	14.268,70	$ 335.000.538.60
1,3	CONFORMACIÓN DE BARRERA TIPO JARILLÓN	M3	25.673,47	$ 127.588,00	$ 3.275.626.690,36	9963,53	$ 1.271.266.865,64	19.695,35	$ 2.512.890.315,80
1,4	GEOTEXTIL NT 2400	M2	91.742,40	$ 19.172,00	$ 1.758.885.292,80	35.604,00	$ 682.599.888,00	70.380,00	$ 1.349.325.360,00
1,5	GEOTEXTIL NT 3000	M2	10.858,40	$ 23.242,00	$ 252.370.932,80	4.214,00	$ 97.941.788,00	8330,00	$ 193.605.860,00
1,6	GEOTEXTIL TEJIDO 2100	M2	20.420,44	$ 17.337,00	$ 354.029.168,28	7.924,90	$ 137.393.991,30	15665,50	$ 271.592.773,50
1,7	MANEJO DE AGUAS	MES	6,00	$ 4.293.354,00	$ 25.760.124,00	1,00	$ 4.293.354,00	5,10	$ 21.896.105,40
1,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLEXOCRETO	M2	19.944,00	$ 127.609,00	$ 2.545.033.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSACRETO	M3	3.722,88	$ 940.227,00	$ 3.500.352.293,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1,10	Filtro o Dren Frances PVC 100 mm (0.6x0.8) m	M	1.108,00	$ 249.909,00	$ 276.899.172,00	0,00	0,00	600,00	$149.945.400,00
1,11	RELLENOS TALUD DERECHO ANCLAJE DIQUE	M3	13.674,94	$ 118.615,00	$ 1.622.053.008,10	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL COSTO OBRA FÍSICA (INCLUYE A.I.U)					**$ 14.307.241.291,66**		$ 2.193.455.886,94		$ 5.108.711.572,60
APLICACIÓN AL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA - PUEA					**$ 5.000.000,00**				$3.444.349,00
TOTAL, OBRA FÍSICA					**$ 14.312.241.291,66**		**$ 2.193.455.886,94**		**$ 5.112.215.921,60**

CL 25 N 11 – 70 BRR ALFONSO LOPEZ
CORREO: consorcioriobanadia@gmail.com
CELULAR: 3202395534

4.4. ACTIVIDADES DE OBRAS EJECUTADAS


Para el control de la programación, el contratista presentó a la Interventoría el respectivo cronograma de trabajo con cada uno de los ítems a ejecutar, con el cual se hizo seguimiento semanal y mensual al avance en la ejecución de todas las actividades y del contrato en general; A continuación, se presenta la siguiente tabla con los % de obra ejecutada a la fecha de corte del presente informe, comparando lo programado con lo ejecutado.

Tabla 13 Porcentaje de avance de obra Programado Vs Ejecutado del Contrato de Obra No. 481 de 2024.

	SEMANAS		% AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO	% AVANCE EJECUTADO	% AVANCE EJECUTADO ACUMULADO
INICIO	SEM 1	31-12-2024 AL 05-01-2025	0,12%	0,12%	0,00%	0,00%
	SEM 2	06-01-2025 AL 12-01-2025	0,12%	0,24%	0,00%	0,00%
	SEM 3	13-01-2025 AL 19-01-2025	0,12%	0,36%	0,00%	0,00%
	SEM 4	20-01-2025 AL 26-01-2025	0,12%	0,48%	0,59%	0,59%
	SEM 5	27-01-2025 AL 31-01-2025	0,12%	0,60%	0,59%	1,18%
	SEM 6	01-02-2025 AL 09-02-2025	0,36%	0,96%	0,34%	1,52%
	SEM 7	10-02-2025 AL 16-02-2025	0,35%	1,31%	0,35%	1,87%
	SEM 8	17-02-2025 AL 23-02-2025	0,36%	1,67%	0,35%	2,22%
	SEM 9	24-02-2025 AL 28-02-2025	0,35%	2,02%	0,34%	2,56%
	SEM 10	01-03-2025 AL 09- 03-2025	5,56%	7,58%	0,64%	3,20%
	SEM 11	10-03-2025 AL 16- 03-2025	5,56%	13,14%	0,63%	3,83%
	SEM 12	17-03-2025 AL 23- 03-2025	5,55%	18,69%	0,64%	4,47%
	SEM 13	24-03-2025 AL 31- 03-2025	5.56%	24,25%	0,64%	5,11%
	SEM 14	01-04-2025 AL 06-04-2025	7,74%	31,99%	0,08%	5,19%
	SEM 15	07-04-2025 AL 13 -04-2025	7,73%	39,72%	0,08%	5,27%
	SEM 16	14-04-2025 AL 20-04-2025	7,74%	47,46%	0,09%	5,36%
	SEM 17	21-04-2025 AL 22-04-2025	7,73%	55,19%	0,08%	5,44%
	SEM 18	21-07-2025 AL 27-07-2025	7,17%	62,36%	9.52%	14,96%
	SEM 19	28-07-2025 AL 31-07-2025	4,1%	66,46%	5.43%	20,39%
	SEM 20	01-08-2025 AL 10-08-2025	3,66%	70,12%	3,83%	24,22%
	SEM 21	11-08-2025 AL 17-08-2025	3,65%	73,77%	3,84%	28,06%
	SEM 21	18-08-2025 AL 24-08-2025	3.66%	77,43%	3,83%	31,89%

CORTE DE INFORME	SEM 22	25-08-2025 AL 31-08-2025	3.65%	81,08%	3,83%	35,72%

Ilustración 18 Avance financiero programado Vs avance Ejecutado del Contrato de Obra No. 481 de 2024

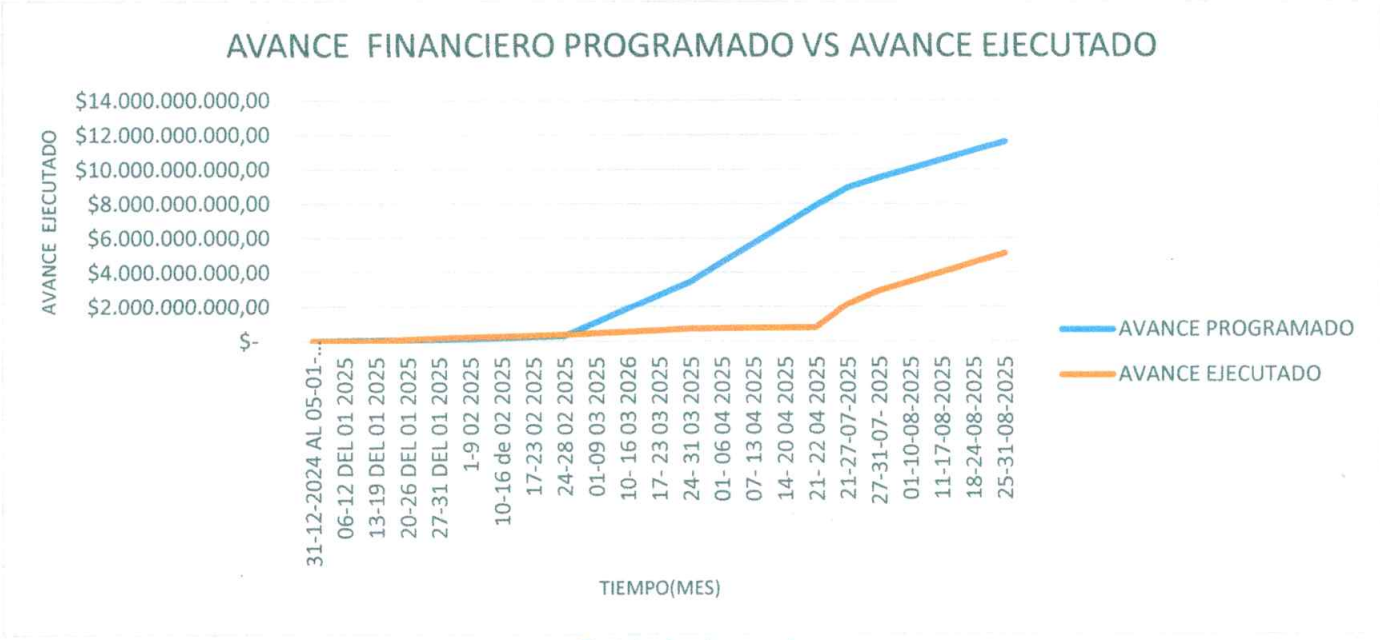

Fuente 4 autor propio

Ilustración 19 Avance físico programado Vs Ejecutado del Contrato de Obra No. 481 de 2024



Fuente 5 autor propio

Nota: Durante el mes de agosto se tenía programado un avance del **81,08%**; sin embargo, el avance ejecutado alcanzó el **35,72%**, presentándose una diferencia del **45,36%** por debajo de lo previsto.

Causas de la diferencia entre lo programado y lo ejecutado en agosto:

- Las actividades correspondientes a la conformación del Jarillón, rellenos, flexocreto y bolsacretos requieren trabajos dentro del cauce. Según lo establecido por el IDEAM, dichas actuaciones solo pueden ejecutarse con una lámina de agua menor a un (1) metro, condición que limitó la ejecución y generó retrasos en el avance programado.

Acciones para mejorar el rendimiento y recuperar el atraso:

- Reforzar los frentes de trabajo con mayor personal y maquinaria cuando las condiciones lo permitan, para acelerar la ejecución.

4.5. IMPREVISTOS PRESENTADOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA

A la fecha del presente informe del 01 de agosto de 2025 al 31 de agosto de 2025 no se han presentado imprevistos.

4.6. ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADA

Para el periodo del presente informe comprendido entre el 01/08/2025 y 31/08/2025, la firma contratista bajo la supervisión y control de la Interventoría externa, ha ejecutado las siguientes actividades de los ítems del contrato:

ITEM 1.3 CONFORMACIÓN DE BARRERA TIPO JARILLÓN

La actividad de conformación de barrera tipo Jarillón consiste en la ejecución de un elemento de contención longitudinal, conformado principalmente por material de préstamo (tierra compactada), dispuesto en forma de talud trapezoidal, con el propósito de controlar, encauzar o contener el flujo de aguas, especialmente en zonas propensas a inundaciones.

La construcción del Jarillón se realiza mediante el acopio, transporte, extendido y compactación de material seleccionado, cumpliendo con los parámetros de estabilidad y resistencia definidos en los diseños técnicos y normativas vigentes. El talud debe contar con pendientes estables, berma superior, altura adecuada y sistema de drenaje, si aplica, para garantizar su funcionalidad y durabilidad.

Previo a su conformación, se ejecutan labores de limpieza y preparación del terreno de fundación, retiro de material orgánico, y se asegura una correcta compacidad en capas sucesivas, según especificaciones geotécnicas.

Esta estructura puede incluir protección superficial con grama, geotextiles u otros elementos, dependiendo del tipo de proyecto, condiciones del suelo y régimen hídrico del área intervenida.

Materiales utilizados: Arena fina y/o Arena Limosa (cantera)
Equipos y Maquinaria: retroexcavadoras 200 y 320, volqueta 14m3 y 7 m3, carrotanque y motoniveladora
Personal: ayudantes.

ACTIVIDAD:	CONFORMACIÓN DE BARRERA TIPO JARILLÓN		
ITEM: 1.3		UNIDAD: M3	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	25.673,24	CANTIDAD ACUMULADA:	19.695,35
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	9963,53	CANTIDAD POR EJECUTAR:	5.977,89
PORCENTAJE EJECUTADO:	76,71%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	23,29%



Ilustración 20 CONFORMACIÓN DE BARRERA TIPO JARILLÓN

ITEM 1.4 GEOTEXTIL NT 2400

El Geotextil NT 2400 es un geotextil no tejido fabricado a base de filamentos continuos de polipropileno, unidos mecánicamente por punzonado con aguja. Presenta una estructura porosa, altamente resistente, diseñada para permitir el paso del agua mientras retiene partículas finas del suelo, lo que lo hace ideal para funciones de filtración, separación y protección en obras civiles, hidráulicas y de control de erosión.

Este material posee una resistencia mecánica y química adecuada para aplicaciones en contacto directo con suelos, agua y materiales de construcción, conservando su integridad estructural a lo largo del tiempo. Su presentación en rollos facilita el transporte, manipulación e instalación en campo.

Materiales utilizados: geotextil nt 2400
Equipos y Maquinaria: herramientas menores
Personal: ayudantes.

ACTIVIDAD:	GEOTEXTIL NT 2400		
ITEM: 1.4		UNIDAD: M2	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	91.742,40	CANTIDAD ACUMULADA:	70.380,00
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	35.604,00	CANTIDAD POR EJECUTAR:	21.362,40
PORCENTAJE EJECUTADO:	76,71%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	23,29%



Ilustración 21 GEOTEXTIL NT 2400

ITEM 1.5 GEOTEXTIL NT 3000

El Geotextil NT 3000 es un geotextil no tejido, elaborado a partir de filamentos continuos de polipropileno, unidos mecánicamente mediante proceso de punzonado por aguja (needle punched). Este material presenta una alta resistencia mecánica y una excelente capacidad de filtración y separación, lo que lo hace ideal para aplicaciones en proyectos de infraestructura vial, hidráulica, control de erosión y geotecnia. Este geotextil posee una mayor densidad y espesor en comparación con otras referencias (como el NT 2400), proporcionando mayor resistencia al punzonado y tracción, lo que lo hace adecuado para condiciones de carga más exigentes o suelos con mayores exigencias de refuerzo y protección.

Materiales utilizados: geotextil nt 3000
Equipos y Maquinaria: herramientas menores
Personal: ayudantes.

ACTIVIDAD:	GEOTEXTIL NT 3000		
ITEM: 1.5		UNIDAD: M2	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	10.858,40	CANTIDAD ACUMULADA:	8.330,00
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	4.214,00	CANTIDAD POR EJECUTAR:	2.528,4
PORCENTAJE EJECUTADO:	76,71%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	23,29%



Ilustración 22 GEOTEXTIL NT 3000

ITEM 1.6 GEOTEXTIL TEJIDO 2100

El Geotextil Tejido 2100 es un geotextil de alta resistencia, conformado por cintas planas de polipropileno entrelazadas mediante un proceso de tejido en patrón regular. Este tipo de geotextil se caracteriza por su alta resistencia a la tracción y su baja elongación, lo que lo hace especialmente adecuado para aplicaciones donde se requiere refuerzo, estabilización de suelos y confinamiento estructural.

A diferencia de los geotextiles no tejidos, el Geotextil Tejido 2100 posee una estructura cerrada con menor permeabilidad, por lo que su uso está orientado principalmente a la separación y refuerzo, más que a la filtración.

ACTIVIDAD:	GEOTEXTIL TEJIDO 2100		
ITEM: 1.6		UNIDAD: M2	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	20.420,44	CANTIDAD ACUMULADA:	15.665,50
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	7.924,90	CANTIDAD POR EJECUTAR:	4.754,94
PORCENTAJE EJECUTADO:	76,71%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	23,29%



Ilustración 23 GEOTEXTIL TEJIDO 2100

ITEM 1.7 MANEJO DE AGUAS

Durante la preparación del terreno para la conformación del Jarillón, se implementó el manejo de aguas subterráneas mediante el uso de motobombas, con el fin de controlar el nivel freático en la zona de intervención. Las motobombas fueron instaladas en puntos estratégicos del área afectada para extraer el agua acumulada y reducir el nivel freático a un rango seguro que permitiera las excavaciones y trabajos de cimentación. El proceso consistió en la extracción continua del agua, la cual fue dirigida hacia sistemas de drenaje temporales establecidos previamente para evitar inundaciones y garantizar un ambiente de trabajo seco y estable. Este manejo de aguas fue monitoreado de manera constante por el equipo técnico y supervisado por la interventoría, quienes aseguraron que las motobombas operaran de manera eficiente y en conformidad con las normas de seguridad y ambientales vigentes. La correcta gestión del agua permitió el avance seguro de las actividades de excavación.

Materiales utilizados: no se utilizaron materiales.
Equipos y Maquinaria: moto bomba 4"
Personal: ayudantes.

ACTIVIDAD:	MANEJO DE AGUAS		
ITEM: 1.7		UNIDAD: MES	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	6,00	CANTIDAD ACUMULADA:	5,10
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	1,00	CANTIDAD POR EJECUTAR:	0,90
PORCENTAJE EJECUTADO:	85.00%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	15.00%



ilustración 24 manejo de aguas

4.7. CONTROL DE CALIDAD DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

Durante el desarrollo de las actividades de conformación de la barrera tipo Jarillón, se implementaron procedimientos de control de calidad con el fin de garantizar la seguridad, estabilidad y correcta ejecución de los trabajos. Se verificó de manera permanente que la maquinaria empleada (retroexcavadoras, vibrocompactador, motoniveladora y carrotanque) se encontrara en óptimas condiciones de funcionamiento, y que la conformación del Jarillón se realizara conforme a los planos y a las especificaciones técnicas establecidas. Asimismo, se efectuó la instalación de geotextiles NT 2400, NT 3000 y tejido 2100, bajo la supervisión de la interventoría, la cual validó que los procedimientos de instalación cumplieran con los requerimientos técnicos. Adicionalmente, se llevaron a cabo inspecciones periódicas para asegurar que las condiciones del terreno no representaran riesgos para la estabilidad de la obra, garantizando un manejo adecuado de las aguas pluviales con el propósito de mitigar procesos de erosión y posibles desbordamientos.

5. ASPECTOS FINANCIEROS

5.1. MANEJO DEL ANTICIPO

Hasta la fecha del presente informe, se ha tramitado el plan de manejo del anticipo con la entidad contratante de la siguiente manera.

Tabla 14 Manejo de Anticipo

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA	
ENTIDAD CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE ARAUCA
CONTRATISTA	CONSORCIO RIO BANADIA NIT:901.902.273-3
CONTRATO DE OBRA N°	481 DE 2024
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN NIT. 901.901.368-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	473 DE 2024
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$14.312.241.291,66

PORCENTAJE DEL ANTICIPO	40%
VALOR TOTAL DEL ANTICIPO	$5.724.896.516,66

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR	%
1	MATERIALES E INSUMOS	$ 3.721.182.735,00	65,00%
2	EQUIPOS Y MAQUINARIA	$ 300.000.000,66	5,24%
3	TRANSPORTE	$ 1.302.971.025,00	22,76%
4	NOMINA Y SEGURIDAD SOCIAL	$ 400.742.756,00	7,00%
TOTAL		**$ 5.724.896.516,66**	**100%**

SON: CINCO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECISÉIS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS MCTE

Nombre producto	ACCION FIDUCIARIA PATRIMONIOS AUTONOMOS FA 6449 FIDEICOMISO ANTICIPO RIO BANADIA
NIT:	805012921
Tipo producto	AHORROS
No. producto	04000010797
Fecha apertura	18/03/2025
Estado	ACTIVA
Código sucursal	40 - CENTRO 93

6. ASPECTOS AMBIENTALES

6.1 SEGUIMIENTO A PERMISOS Y/O LICENCIAS AMBIENTALES

Ante la Autoridad Ambiental Regional CORPORINOQUIA se obtuvieron los permisos ambientales necesarios para el desarrollo del proyecto, conforme a lo dispuesto en la Resolución No. 700.36.250082 del 18 de julio de 2025, en cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y con el fin de asegurar la legalidad y sostenibilidad de las actividades proyectadas. Los permisos obtenidos corresponden a:

- **Permiso de ocupación de cauces, playas y lechos:** Se cuenta con la autorización correspondiente para intervenir y hacer uso de los cauces, playas y lechos de cuerpos de agua, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución No. 700.36.250082 del 18 de julio de 2025, cumpliendo con las disposiciones técnicas y ambientales exigidas por la entidad competente.

- **Concesión de aguas superficiales:** Se cuenta con el derecho de uso y aprovechamiento de aguas provenientes de fuentes superficiales, conforme a la Resolución No. 700.36.250082 del 18 de julio de 2025, en cumplimiento de los parámetros técnicos y ambientales establecidos por la autoridad competente.

6.2 SEGUIMIENTO AL PMA

El documento PMA que hace parte integral del proyecto, que reposa en el anexo 19 del informe 1, y el informe detallado con cada uno de los soportes, se presenta en el ANEXO 8. **INFORME DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DEL PMA/PAGA**, de acuerdo al documento ambiental entregado por el DEPARTAMENTO DE ARAUCA al contratista y a la interventoría externa, para la ejecución del contrato de obra No. 481 del 2024, cuyo objeto corresponde a: **"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA, DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".**
(Documento PAGA reposa en el anexo 19 del informe 1)

Anexo 8 Informe de seguimiento implementación del PMA/PAGA

6.3 IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL

De acuerdo al cuadro de costos del proyecto y PMA, se deben implementar las siguientes actividades como medidas de mitigación o compensación ambiental:

Tabla 15 Presupuesto de la mitigación o control ambiental del contrato de obra No. 481 del 2024.

1	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. PARCIAL
SIEMBRA DE ESPECIES FORESTALES NATIVAS					
1	Realizar siembra de especies nativas (tamaño mínimo de 70cm)	Plántula	250	$16,590	$4,147,423
2	Servicio de monitoreo a las acciones implementadas	Und.	1	$852,577	$ 852,577
COSTO TOTAL					$5,000,000

Fuente 6 Autor propio

Nota: "Durante el mes de agosto se avanzó en la consolidación del proceso de revegetalización con especies nativas (samán y bucare). Las observaciones realizadas permitieron evidenciar que los ejemplares presentan un desarrollo estable, mostrando buena adaptación a las condiciones locales y resistencia frente a las variaciones climáticas del periodo. Las actividades se enfocaron en labores de inspección, registro del crecimiento y mantenimiento básico, con el propósito de asegurar la continuidad del proceso de establecimiento de la cobertura vegetal.



Ilustración 25 Sequimiento de la plantas

7. CONCLUSIONES

- Se hizo la respectiva revisión de los diseños del contrato de obra No.481 de 2024 los cuales se ejecutaron dentro de los parámetros técnicos requeridos, dando cumplimiento a las especificaciones técnicas generales del Contrato, garantizando así, la calidad de cada una de las actividades de obra ejecutadas.

- Se aseguró el cumplimiento de todas las normativas vigentes tanto técnicas como de seguridad, lo cual fue fundamental para mantener la integridad del proyecto y evitar contratiempos en su desarrollo. El control de calidad en cada etapa de las actividades permitió que el proceso constructivo se realizara de manera eficiente y conforme a los estándares establecidos.

- La correcta ejecución de las excavaciones y el manejo adecuado del material excavado contribuyeron al avance seguro del proyecto, garantizando la estabilidad del terreno y el óptimo funcionamiento del sistema de drenaje, asegurando la efectividad de las obras y el adecuado cumplimiento de los plazos.

- Avance en tiempo (85,16 %)
- Avance físico general (35,72%)
- Avance Financiero (40,00%)

ING. JEISSON RENE VILLARREAL ROA
R/L CONSORCIO RIO BANADIA

8. ANEXOS

LISTADO DE ANEXOS

Anexo 1 acta de comité 17
Anexo 2 Correspondencia enviada Y recibida. 18
Anexo 3 Bitácoras De Obra Del 01 De Agosto De 2025 Al 31 De Agosto De 2025 ..19
Anexo 4 Planillas De Seguridad Social del mes de Agosto 2025 22
Anexo 5 Nóminas De Pagos Mensual mes de Agosto 2025.....22
Anexo 6 Informe del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) 25
Anexo 7 Preoperacionales Equipos mes de Agosto del 2025.....34
Anexo 8 Informe de seguimiento implementación del PMA/PAGA 48

Aprobación del Informe:	
Elaboró: JAIR LEANDRO VILA SARABIA *DIRECTOR DE OBRA* TP:	Aprobó: JEISSON RENE VILLARREAL ROA R/L CONSORCIO RIO BANADIA

ANEXO 1

ACTA DE COMITÉ

CL 25 N 11 – 70 BRR ALFONSO LOPEZ
CORREO: consorcioriobanadia@gmail.com
CELULAR: 3202395534

MESA TÉCNICA 007

Fecha: 22 de agosto del 2025
Hora: 10:00 am
Lugar: Sala de juntas de la secretaría de gobierno departamental

1. *Verificación del Quorum.*
2. *Inicio por parte de la interventoría de obra N°.473-2024*
3. *Observaciones de avances y seguimiento de cto 481-2024 y 473-2024: **"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIÓN SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA".***
4. Proposiciones, varios
5. Conclusiones y cierre.

participantes:

1. Supervisor del contrato según resolución N° 001-2025. CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO
2. CONTRATISTA CONSORCIO RIO BANADIA - R/L JHONN FREDY GARCIA BELTRAN
3. INTERVENTORÍA CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN - R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCÓN
4. PROFESIONALES DE APOYO De La secretaria De Gobierno Y Seguridad Ciudadana

Muy buenos días para todos yo CRISTIAN ALEXANDER MURILLO con función de Supervisor del contrato según resolución N° 001-2025 y en representación del secretario de gobierno doy inicio a la mesa técnica número 007 con respecto a las solicitudes echas por parte de la interventoría 473-2024.

Interventoría: buenos días para todos nosotros como interventoría tenemos presente que la obra se suspendió el 22 de abril y se reinició el 21 de julio, es decir, que ya tenemos un mes desde el reinicio y hasta la presente no tenemos la documentación al día por parte del contratista con respecto a los avances, otra sugerencia que traemos aquí, es que el avance en obra se debe plasmar adecuadamente en los informes para logra así tener evidenciade que si los tiempos coinciden con lo que nos queda de ejecución, teniendo un mes aproximadamente para terminar y es preocupante que no tenemos la información evidenciada en fisico.
La idea es solucionar esta situación, también, con referencia al plan de acción que presento la obra tenemos algunas observaciones y recomendaciones, hicimos el ejercicio y notamos que no se evidencia el análisis en los rendimientos de equipos y de cuadrillas para poder con certeza que actividades harían falta, no hay claridad en el cronograma, se requiere también una comparación de tiempo entre lo ejecutado vs lo programado que resta de ejecución la idea es que logremos subsanar y realizar una reprogramación estamos dispuestos a trabajar para lograr con éxito la ejecución de las actividades descritas en el documento técnico.

Contratista: si, desde la obra estamos listos realizando las actividades, en cuanto a cantidades no es tan fuerte el retraso como se tiene en la trazabilidad, damos a entender que nosotros tenemos actividades sin realizar ya que la lámina de agua no lo ha permitido, tuvimos un vendaval fuerte y sufrimos afectaciones en el campamento, tenemos actividades menore que ya se realizaron, pero si manifestamos que la lámina de agua no ha permitido el ingreso a la maquinaria, tenemos que retirar residuos que ya existían realizados por parte de la comunidad y eso nos ha entorpecido el avance, y hemos hecho los análisis que se requieren en tiempo lo cual ahce necesaria una nueva suspensión ya que las obras que requerimos culminar no se ha logrado por el nivel del rio para poder intervenir dentro de él, esa es nuestra principal preocupación, hemos buscado otras alternativas usando material granular pero no ha sido posible, por ello estamos requiriendo una suspensión.

Con respecto a los informes si hemos hecho llegar, creo que tenemos una falta de comunicación, de igual manera nosotros vamos a verificar hoy al llegar.

Supervisión: debemos evidenciar el avance de la obra física en los informes, además verificar el estado de la misma, ¿la interventoría cuando fue la última vez que estuvieron en la obra, en que estado se encuentra el suelo, que tan saturado estaba para las maquinas?

Interventoría: nosotros realizamos una visita el martes anterior (19 ago.) de manera superficiales veía seco, pero no era así a profundidad, nosotros requerimos que nos reunamos en conjunto con la obra para que verifiquemos que si estén en nuestras manos los informes que corresponde.

Supervisión: les recuerdo que por motivos de reinicio debemos reprogramar el GESPROY y por ellos les solicitamos nos alleguen los informes ya subsanados de las correcciones que se hicieron anteriormente, ya que es preocupante para nosotros que lleguemos a un incumplimiento

Contratista: entendemos las preocupaciones y haremos llegar las correcciones y los informes que no se encuentren con ustedes también.

Secretaria de gobierno: realizaremos una visita de inspección para verificar el estado de la obra y asimismo garantizar el avance óptimo de las actividades, así también se revisarán las condiciones de la obra según lo manifestado por la interventoría. recordar que nos quedan poco tiempo para finalizar los términos contractuales requerimos mucho compromiso con hacer llegar los informes de avance.

Para concluir concordamos en trabajar de manera conjunta para agilizar los trámites pertinentes.


Y cómo compromisos tenemos

1. Allegar el plan de contingencia corregido según las observaciones.
2. Allegar los informes corregidos.
3. La supervisión realizara una visita de campo a la obra el día martes 26 de agosto.

Siendo las 12:00 pm damos por finalizada esta reunión, muchas gracias por haber asistido

Se da por finalizada esta mesa técnica

SE ADJUNTA FORMATO DE ASISTENCIA PARA CONFORMIDAD DE LOS ASISTENTES

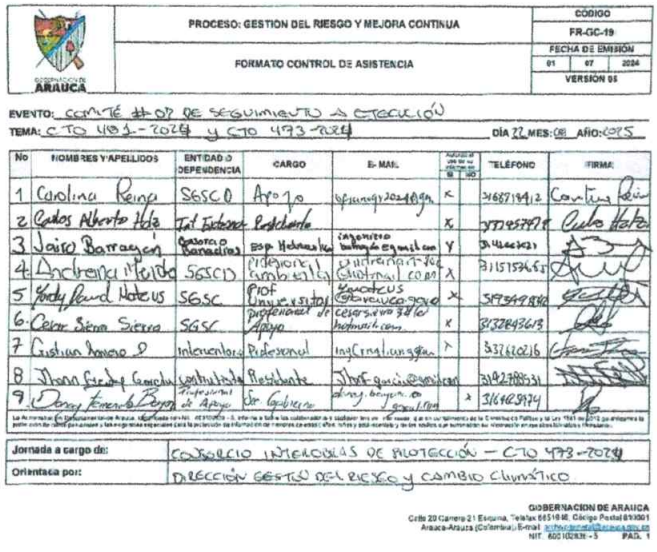


PROCESO: GESTION DEL RIESGO Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO FR-GC-19
FORMATO CONTROL DE ASISTENCIA	FECHA DE EMISIÓN 01 07 2024
	VERSIÓN 05

EVENTO: COMITÉ #07 DE SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN
TEMA: C TO 493 - 2024 y CTO 493-2024 DÍA 22 MES: 08 AÑO: 2025

No	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	E-MAIL	SI	NO	TELÉFONO	FIRMA
1	Carolina Reina	SGSCD	Apoyo	sfmunag2024@gm	X		3168719912	Carolina Reina
2	Carlos Alberto Hdz	Tal Tributaria	Profesional		X		3214557979	Carlos Hdz
3	Jaiso Barragan	Asesores Parroquiales	Esp. Hidraulica	cajonuevo bumanga@gmail.com	Y		3114446321	
4	Andreina Peñaloza	SGSCD	Profesional Contratista	andreinapeñaloza1704 @hotmail.com	X		3157536451	
5	Yady Paola Hdz	SGSC	Prof. Universitario Profesional de Apoyo	Yadacus @gobarauca.gov.co cesarsilva 9810 @hotmail.com	X		3159491896	
6	Cesar Silva Sierra	SGSC			X		3172893613	
7	Gustavo Amaya P	Interventor	Profesional	Ingcivilamaya@	X		3176202216	
8	Diana Sierra y Camacho	Contratista	Residente	Dianasierra@			3102788531	
9	Deny Fernando Reyes	Profesional de Apoyo	Sec Gobierno	deny.reyes.0 @gmail.com	X		3164659174	

Jornada a cargo de:	CONSORCIO INTERVENTORIAS DE PROTECCIÓN – CTO 493-2024
Orientada por:	DIRECCIÓN GESTIÓN DEL RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO

GOBERNACION DE ARAUCA
Calle 20 Carrera 21 Esquina, Telefax 8851946, Código Postal 810001
Arauca-Arauca (Colombia). E-mail: archivogeneral@arauca.gov.co
NIT. 800102838 - 5 PAG. 1

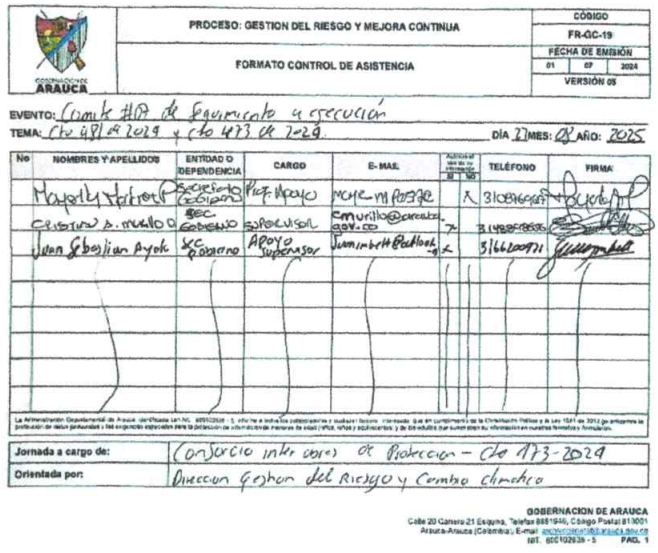

PROCESO: GESTION DEL RIESGO Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO FR-GC-19
FORMATO CONTROL DE ASISTENCIA	FECHA DE EMISIÓN 01 07 2024
	VERSIÓN 05

EVENTO: Comité #07 de Seguimiento y ejecución
TEMA: Cto 493 de 2024 y cto 493 de 2024 DÍA 22 MES: 08 AÑO: 2025

No	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	E-MAIL	SI	NO	TELÉFONO	FIRMA
	Mayerly Hernandez	Secretaria Gobierno	Prof. Apoyo	mche-m@hotmail	X		3108166467	
	Cristian D. Murillo O	Sec. Gobierno	Supervisor	cmurillo@arauca.gov.co	X		3148958886	
	Juan Sebastian Ayala	SC Arauca	Apoyo Supervisor	juanimbatt@outlook	X		3166200771	

Jornada a cargo de:	Consorcio Interventorias de Proteccion – Cto 493-2024
Orientada por:	Direccion Gestion del Riesgo y Cambio climatico

GOBERNACION DE ARAUCA
Calle 20 Carrera 21 Esquina, Telefax 8851946, Código Postal 810001
Arauca-Arauca (Colombia). E-mail: archivogeneral@arauca.gov.co
NIT. 800102838 - 5 PAG. 1

Nota: se adjunta formato original de asistencia.

Proyectó: Yesika Carolina Reina Hurtado
Técnico Administrativo - CTO 095 de 2025

ANEXO 2

CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

CL 25 N 11 – 70 BRR ALFONSO LOPEZ
CORREO: consorcioriobanadia@gmail.com
CELULAR: 3202395534

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

ENVIADA

CL 25 N 11 – 70 BRR ALFONSO LOPEZ
CORREO: consorcioriobanadia@gmail.com
CELULAR: 3202395534

Gmail

Consorcio RIO BANADIA <consorcioriobanadia@gmail.com>

Actualización de informes entregados - Subsanación de observaciones

1 mensaje

Consorcio RIO BANADIA <consorcioriobanadia@gmail.com> 4 de agosto de 2025, 8:21
Para: INTER OBRAS DE PROTECCION <interobrasdeproteccion1@gmail.com>

4 adjuntos

- **INFORME DE OBRA ABRIL OK.pdf**
  3731K
- **INFORME DE OBRA ENERO OK (1).pdf**
  3321K
- **INFORME DE OBRA FEBRERO OK (1).pdf**
  3601K
- **INFORME DE OBRA MARZO OK (1).pdf**
  3724K

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

Saravena, 13 de agosto de 2025

Señores:
CONSOCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN
Jairo Hernando Gómez Rincón
Interventoría externa

Ref: Actualización de póliza según acta de inicio del contrato de obra No. 481-2024 cuyo objeto es; "CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCIÒN PARA LA REDUCCIÒN DEL RIESGO Y PREVENCIÒN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA, DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".

De acuerdo con el acta de reinicio No. 1 a la suspensión 1 y suspensión 2, enviado el día 22 de julio de 2025 al correo de interventoría (interobrasdeproteccion1@gmail.com) con el adjunto de las pólizas actualizada según acta de inicio, permito aclarar que las fechas establecidas para cada amparo, son según su actualización y contrato, en el caso de "Estabilidad y calidad de la obra" tiene una vigencia de dos (2) años contados a partir del acta de entrega final, por esto, se toma hasta la fecha 30 de septiembre de 2027, elevando la consulta a la aseguradora nos manifiesta que "el amparo solo será ajustado una vez se reciba el acta de recibo final debidamente firmada por ambas partes", dado esto, nos ajustan la fecha de vigencia hasta soportar debidamente con ajustes desde la entidad contratante, quedamos atentos a cualquier otra inquietud.

Cordialmente,

JEISSON RENE VILLARREAL ROA
Representante Legal

CALLE 25 N °11-70 BRR ALFONSO LOPEZ
CORREO: consorcioriobanadia@gmail.com
CELULAR: 3202395534

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

Saravena, 19 de agosto de 2025

Señores
CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN
R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON
Arauca-Arauca

Asunto: Reprogramación de comité técnico

Respetuoso saludo,

En atención a la invitación realizada para la sesión del Comité Técnico de Obra del Contrato No. 481 de 2024, nos permitimos informar que el día **jueves 21 de agosto** contamos con un compromiso previamente adquirido, razón por la cual se nos dificulta asistir en la fecha propuesta.

Por lo anterior, solicitamos muy amablemente que el comité pueda ser reprogramado para el día **viernes 22 de agosto**, en el mismo lugar previamente señalado, con el fin de garantizar nuestra participación y el adecuado desarrollo de la agenda planteada. Consideramos que con este ajuste de fecha se podrá contar con la asistencia de todas las partes interesadas, lo que contribuirá a un análisis más completo y al logro de los objetivos previstos para la reunión.

Agradecemos de antemano la atención prestada y quedamos atentos a la confirmación de la nueva programación.

Cordialmente,

JEISSON RENE VILLAREAL ROA
Representante Legal
CONSORCIO RIO BANADIA

CL 25 N 11 – 70 BRR ALFONSO LOPEZ
CORREO: consorcioriobanadia@gmail.com
CELULAR: 3202395534

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

RECIBIDA

CL 25 N 11 – 70 BRR ALFONSO LOPEZ
CORREO: consorcioriobanadia@gmail.com
CELULAR: 3202395534

Gmail

Consorcio RIO BANADIA <consorcioriobanadia@gmail.com>

Reiteración de reprogramación y plan de contingencia

1 mensaje

INTER OBRAS DE PROTECCION <interobrasdeproteccion1@gmail.com> 12 de agosto de 2025, 16:46
Para: consorcioriobanadia@gmail.com

Saravena, 12 de agosto de 2025

Señores:
CONSORCIO RIO BANADIA
R/L JEISON VILLAREAL
Ciudad

Referencia: Contrato de Interventoría No. 473-2024 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".

Asunto: Reiteración de Solicitud de Reprogramación de Obra, Plan de Contingencia– Contrato de obra 481 del 2024

Respetuoso saludo,

En aras de garantizar el correcto cumplimiento de nuestra labor como interventores externos del contrato de Obra No. 481 de 2024, cuyo objeto es: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA, y teniendo en cuenta los tiempos contractuales establecidos para la ejecución del contrato de obra de referencia y que a fecha del presente oficio, no se nos ha llegado la reprogramación de las actividades de obra y la formulación del plan de choque o contingencia identificando la ruta crítica a seguir, teniendo como fecha de partida, la fecha del acta de reinicio No. 01 que es el 21 de julio 2025.

Desde esta interventoría nos permitimos incitar a la firma contratista CONSORCIO RIO BANADIA hacer llegar a esta interventoría en un periodo no mayor a tres (3) días a partir de la fecha de esta comunicación dicha información.

Dicha solicitud obedece a la necesidad de dar cumplimiento a los compromisos establecidos durante el comité técnico, en el cual se fijó como fecha límite de entrega el día 28 de julio. Dado que esta solicitud no fue atendida, se reiteró el requerimiento con un nuevo plazo, establecido para el 3 de agosto de 2025. Sin embargo, ante la falta de respuesta a ambos requerimientos, se procede a reiterar una nueva solicitud, en la que se solicita que la documentación mencionada sea remitida a más tardar el día 15 de agosto del presente año.

Sin otro particular; atentamente.

JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON
R/L CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN
Interventoría Externa
Con Copia; Supervisión SGSCD

Gmail Consorcio RIO BANADIA <consorcioriobanadia@gmail.com>

Solicitud Comité Técnico de Obra

2 mensajes

INTER OBRAS DE PROTECCION <interobrasdeproteccion1@gmail.com> 19 de agosto de 2025, 15:09
Para: consorcioriobanadia@gmail.com, cmurillo@arauca.gov.co

Saravena, 19 de agosto de 2025

Señores:
SECRETARIA DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL
ATTE. CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO
Supervisor SGSCD – Dirección de Gestión del Riesgo y Cambio Climático
CONSORCIO RIO BANADIA
R/L JEISON VILLAREAL
Ciudad

Referencia: Contrato de Interventoría No. 473-2024 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".

Asunto: Solicitud comité técnico de obra presencial

Respetuoso saludo,

En aras de garantizar el correcto cumplimiento de nuestra labor como interventores externos del contrato de Obra No. 481 de 2024, cuyo objeto es: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA, nos permitimos convocar a comité técnico de obra en donde se socialice el plan de contingencia, reprogramación de las actividades de obra y estado actual del proyecto. Esto con el fin de analizar y llevar a cabo los posibles actos administrativos que dieran lugar ante el mismo.

Extendemos la invitación para la realización del comité técnico de manera presencial para el día **jueves 21 de agosto a las 02:00 pm en instalaciones de la sala de junta de la secretaría de gobierno y seguridad ciudadana departamental**.

OFICIO COMITE 21-07-2025.pdf
106K

Consorcio RIO BANADIA <consorcioriobanadia@gmail.com> 19 de agosto de 2025, 17:00
Para: INTER OBRAS DE PROTECCION <interobrasdeproteccion1@gmail.com>

Saravena, 19 de agosto de 2025

Señores
CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN
R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON
Arauca-Arauca

Asunto: Reprogramación de comité técnico

Respetuoso saludo,

En atención a la invitación realizada para la sesión del Comité Técnico de Obra del Contrato No. 481 de 2024, nos permitimos informar que el día **jueves 21 de agosto** contamos con un compromiso previamente adquirido, razón por la cual se nos dificulta asistir en la fecha propuesta.

Por lo anterior, solicitamos muy amablemente que el comité pueda ser reprogramado para el día **viernes 22 de agosto**, en el mismo lugar previamente señalado, con el fin de garantizar nuestra participación y el adecuado desarrollo de la agenda planteada. Consideramos que con este ajuste de fecha se podrá contar con la asistencia de todas las partes interesadas, lo que contribuirá a un análisis más completo y al logro de los objetivos previstos para la reunión.

Agradecemos de antemano la atención prestada y quedamos atentos a la confirmación de la nueva programación.

Cordialmente,

JEISSON RENE VILLAREAL ROA
Representante Legal
CONSORCIO RIO BANADIA
[El texto citado está oculto]

OFICIO 19AGOSTO.pdf
428K

Gmail

Consorcio RIO BANADIA <consorcioriobanadia@gmail.com>

Entrega de Informes y Plan de Contingencia – Contrato 481 de 2024

1 mensaje

Consorcio RIO BANADIA <consorcioriobanadia@gmail.com>
Para: INTER OBRAS DE PROTECCION <interobrasdeproteccion1@gmail.com>
Cco: cmurillo@arauca.gov.co

21 de agosto de 2025, 11:06

6 adjuntos

- **INFORME JULIO REINICIO.pdf**
  4358K
- **PLAN DE CONTIGENCIA.pdf**
  2997K
- **INFORME DE OBRA ENERO.pdf**
  3310K
- **INFORME DE OBRA ABRIL.pdf**
  3728K
- **INFORME DE OBRA FEBRERO.pdf**
  3602K
- **INFORME DE OBRA MARZO.pdf**
  3718K

CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION
NIT. 901.901.368-1

Saravena, 21 de agosto de 2025

Señores:
SECRETARIA DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL
ATTE. CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO
Supervisor SGSCD – Dirección de Gestión del Riesgo y Cambio Climático
CONSORCIO RIO BANADIA
R/L JEISON VILLAREAL
Ciudad

Referencia: Contrato de Interventoría No. 473-2024 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".

Asunto: Modificación fecha comité técnico de obra presencial

Respetuoso saludo,

En atención a la solicitud presentada por la firma contratista CONSORIO RIO BANADIA ejecutora del contrato de Obra No. 481 de 2024, cuyo objeto es: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA, nos permitimos reagendar el comité técnico convocado para el día 21/08/2025, quedando para el día **viernes 22 de agosto a las 2:00 pm en las instalaciones de la sala de junta de la secretaria de gobierno y seguridad ciudadana departamental.** En donde se socialice el plan de contingencia, reprogramación de las actividades de obra y estado actual del proyecto. Esto con el fin de analizar y llevar a cabo los posibles actos administrativos que dieran lugar ante el mismo.

Agradeciendo su puntual asistencia. Cordialmente,

JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON
R/L CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN
Interventoría Externa

ANEXO 3

BITÁCORAS DE OBRA DEL 01 DE AGOSTO DE 2025 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

CL 25 N 11 – 70 BRR ALFONSO LOPEZ
CORREO: consorcioriobanadia@gmail.com
CELULAR: 3202395534

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

BITACORA DE OBRA

CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION
NIT 901.901.968-1

CONTRATO DE OBRA N°:	481 DE 2024
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATISTA	CONSORCIO RIO BANADIA R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON

FECHA:	VIERNES 01 DE AGOSTO DE 2025	FOLIO	125

RECURSO EQUIPO		RECURSO HUMANO		MATERIALES	ESTADO DEL TIEMPO		
EQUIPOS	CANT	PERSONAL	CANT	DESCRIPCION	ESTADO	MAÑANA	TARDE
		Director de Obra	1				
RETROEXCAVADORA	4	Residente de Obra	2				
VOLQUETA	4	Residente de Interventoria	1				
MOTONIVELADORA	1	Director interventoria	1		SOLEADO SECO	X	
BENITIN	1	Ingeniero Ambiental	1				
VIBROCOMPACTADOR	1	Profesional Social	1		NUBLADO SECO		X
CARROTANQUE	1	Profesional HSEQ	1				
		Inspector de obra (Técnico e	1		LLUVIAS PASAJERAS		
		Secretaria	1				
		Oficial	2		LLUVIA INTERMITENTE		
		Ayudante	10				
					LLUVIA FUERTE		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

SE INICIAN LABORES A LAS 7:00 AM
SE REALIZAN LOS PREOPERACIONALES DE LAS HERRAMIENTAS MENORES Y MAQUINAS
SE REALIZA EL MANEJO TEMPORAL DE AGUAS CON MOTOBOMBA
SE REALIZA LA CONFORMACIÓN DE BARRERA TIPO JARILLÓN
SE REALIZA INSTALACIÓN DE GEOTEXTILES NT 2400, NT 3000 Y TEJIDO 2100

SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS:

SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS:

VoBo:

ING. JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA
M.P. 54202-403896 NTS

VoBo:

ING JUAN GABRIEL HERNANDEZ MARIN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P. 54202-373584 NTS

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

BITACORA DE OBRA

CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION
NIT. 901.901.969.1

CONTRATO DE OBRA N°:	481 DE 2024
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATISTA	CONSORCIO RIO BANADIA R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON

FECHA:	SABADO 02 DE AGOSTO DE 2025	FOLIO	126

RECURSO EQUIPO		RECURSO HUMANO		MATERIALES	ESTADO DEL TIEMPO		
EQUIPOS	CANT	PERSONAL	CANT	DESCRIPCION	ESTADO	MAÑANA	TARDE
		Director de Obra	1				
RETROEXCAVADORA	4	Residente de Obra	2				
VOLQUETA	4	Residente de Interventoria	1				
MOTONIVELADORA	1	Director interventoria	1		SOLEADO SECO		X
BENITIN	1	Ingeniero Ambiental	1				
VIBROCOMPACTADOR	1	Profesional Social	1		NUBLADO SECO	X	
CARROTANQUE	1	Profesional HSEQ	1				
		Inspector de obra (Técnico e	1		LLUVIAS PASAJERAS		
		Secretaria	1				
		Oficial	2		LLUVIA INTERMITENTE		
		Ayudante	10				
					LLUVIA FUERTE		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

SE INICIAN LABORES A LAS 7:00 AM
SE REALIZAN LOS PREOPERACIONALES DE LAS HERRAMIENTAS MENORES Y MAQUINAS
SE REALIZA EL MANEJO TEMPORAL DE AGUAS CON MOTOBOMBA
SE REALIZA LA CONFORMACIÓN DE BARRERA TIPO JARILLÓN
SE REALIZA INSTALACIÓN DE GEOTEXTILES NT 2400, NT 3000 Y TEJIDO 2100

SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS:

SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS:

VoBo:

ING. JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA
M.P. 54202-403896 NTS

VoBo:

ING JUAN GABRIEL HERNANDEZ MARIN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P. 54202-373584 NTS

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

BITACORA DE OBRA

CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION
NIT 901.901.360-1

CONTRATO DE OBRA N°:	481 DE 2024
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATISTA	CONSORCIO RIO BANADIA R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON

FECHA:	DOMINGO 03 DE AGOSTO DE 2025	FOLIO	127

RECURSO EQUIPO		RECURSO HUMANO		MATERIALES	ESTADO DEL TIEMPO		
EQUIPOS	CANT	PERSONAL	CANT	DESCRIPCION	ESTADO	MAÑANA	TARDE
		Director de Obra	1				
RETROEXCAVADORA	4	Residente de Obra	2				
VOLQUETA	4	Residente de Interventoria	1				
MOTONIVELADORA	1	Director interventoria	1		SOLEADO SECO	X	X
BENITIN	1	Ingeniero Ambiental	1				
VIBROCOMPACTADOR	1	Profesional Social	1		NUBLADO SECO		
CARROTANQUE	1	Profesional HSEQ	1				
		Inspector de obra (Técnico e	1		LLUVIAS PASAJERAS		
		Secretaria	1				
		Oficial	2		LLUVIA INTERMITENTE		
		Ayudante	10				
					LLUVIA FUERTE		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DE OBRA POR SER DIA DOMINICAL

SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS:

SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS:

VoBo:

ING. JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA
M.P. 54202-403896 NTS

VoBo:

ING JUAN GABRIEL HERNANDEZ MARIN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P. 54202-373584 NTS

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

BITACORA DE OBRA

CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION
NIT. 901 901 309-1

CONTRATO DE OBRA N°:	481 DE 2024

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATISTA	CONSORCIO RIO BANADIA R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON

FECHA:	LUNES 04 DE AGOSTO DE 2025	FOLIO	128

RECURSO EQUIPO		RECURSO HUMANO		MATERIALES	ESTADO DEL TIEMPO		
EQUIPOS	CANT	PERSONAL	CANT	DESCRIPCION	ESTADO	MAÑANA	TARDE
		Director de Obra	1				
RETROEXCAVADORA	4	Residente de Obra	2				
VOLQUETA	4	Residente de Interventoria	1				
MOTONIVELADORA	1	Director interventoria	1		SOLEADO SECO	X	X
BENITIN	1	Ingeniero Ambiental	1				
VIBROCOMPACTADOR	1	Profesional Social	1		NUBLADO SECO		
CARROTANQUE	1	Profesional HSEQ	1				
		Inspector de obra (Técnico e	1		LLUVIAS PASAJERAS		
		Secretaria	1				
		Oficial	2		LLUVIA INTERMITENTE		
		Ayudante	10				
					LLUVIA FUERTE		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

SE INICIAN LABORES A LAS 7:00 AM
SE REALIZAN LOS PREOPERACIONALES DE LAS HERRAMIENTAS MENORES Y MAQUINAS
SE REALIZA EL MANEJO TEMPORAL DE AGUAS CON MOTOBOMBA
SE REALIZA LA CONFORMACIÓN DE BARRERA TIPO JARILLÓN
SE REALIZA INSTALACIÓN DE GEOTEXTILES NT 2400, NT 3000 Y TEJIDO 2100

SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS:

SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS:

VoBo:

ING. JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA
M.P. 54202-403896 NTS

VoBo:

ING JUAN GABRIEL HERNANDEZ MARIN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P. 54202-373584 NTS

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

BITACORA DE OBRA

CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION
NIT 901.901.368-1

CONTRATO DE OBRA N°:	481 DE 2024

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE

CONTRATISTA	CONSORCIO RIO BANADIA R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON

FECHA:	MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025	FOLIO	129

RECURSO EQUIPO		RECURSO HUMANO		MATERIALES	ESTADO DEL TIEMPO		
EQUIPOS	CANT	PERSONAL	CANT	DESCRIPCION	ESTADO	MAÑANA	TARDE
		Director de Obra	1				
RETROEXCAVADORA	4	Residente de Obra	2				
VOLQUETA	4	Residente de Interventoria	1				
MOTONIVELADORA	1	Director interventoria	1		SOLEADO SECO	X	X
BENITIN	1	Ingeniero Ambiental	1				
VIBROCOMPACTADOR	1	Profesional Social	1		NUBLADO SECO		
CARROTANQUE	1	Profesional HSEQ	1				
		Inspector de obra (Técnico e	1		LLUVIAS PASAJERAS		
		Secretaria	1				
		Oficial	2		LLUVIA INTERMITENTE		
		Ayudante	10				
					LLUVIA FUERTE		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

SE INICIAN LABORES A LAS 7:00 AM
SE REALIZAN LOS PREOPERACIONALES DE LAS HERRAMIENTAS MENORES Y MAQUINAS
SE REALIZA EL MANEJO TEMPORAL DE AGUAS CON MOTOBOMBA
SE REALIZA LA CONFORMACIÓN DE BARRERA TIPO JARILLÓN
SE REALIZA INSTALACIÓN DE GEOTEXTILES NT 2400, NT 3000 Y TEJIDO 2100

SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS:

SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS:

VoBo:

ING. JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA
M.P. 54202-403896 NTS

VoBo:

ING JUAN GABRIEL HERNANDEZ MARIN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P. 54202-373584 NTS

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

BITACORA DE OBRA

CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION
NIT 901.902.364-1

CONTRATO DE OBRA N°:	481 DE 2024
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE

CONTRATISTA	CONSORCIO RIO BANADIA R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON

FECHA:	MIERCOLES 06 DE AGOSTO DE 2025	FOLIO	130

RECURSO EQUIPO		RECURSO HUMANO		MATERIALES	ESTADO DEL TIEMPO		
EQUIPOS	CANT	PERSONAL	CANT	DESCRIPCION	ESTADO	MAÑANA	TARDE
		Director de Obra	1				
RETROEXCAVADORA	4	Residente de Obra	2				
VOLQUETA	4	Residente de Interventoria	1				
MOTONIVELADORA	1	Director interventoria	1		SOLEADO SECO	X	X
BENITIN	1	Ingeniero Ambiental	1				
VIBROCOMPACTADOR	1	Profesional Social	1		NUBLADO SECO		
CARROTANQUE	1	Profesional HSEQ	1				
		Inspector de obra (Técnico e	1		LLUVIAS PASAJERAS		
		Secretaria	1				
		Oficial	2		LLUVIA INTERMITENTE		
		Ayudante	10				
					LLUVIA FUERTE		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

SE INICIAN LABORES A LAS 7:00 AM
SE REALIZAN LOS PREOPERACIONALES DE LAS HERRAMIENTAS MENORES Y MAQUINAS
SE REALIZA EL MANEJO TEMPORAL DE AGUAS CON MOTOBOMBA
SE REALIZA LA CONFORMACIÓN DE BARRERA TIPO JARILLÓN
SE REALIZA INSTALACIÓN DE GEOTEXTILES NT 2400, NT 3000 Y TEJIDO 2100

SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS:

SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS:

VoBo:

ING. JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA
M.P. 54202-403896 NTS

VoBo:

ING JUAN GABRIEL HERNANDEZ MARIN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P. 54202-373584 NTS

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

BITACORA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N°:	**481 DE 2024**
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE

CONTRATISTA	CONSORCIO RIO BANADIA R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON

FECHA:	JUEVES 07 DE AGOSTO DE 2025	FOLIO	131

RECURSO EQUIPO		RECURSO HUMANO		MATERIALES	ESTADO DEL TIEMPO		
EQUIPOS	**CANT**	**PERSONAL**	**CANT**	**DESCRIPCION**	ESTADO	MAÑANA	TARDE
		Director de Obra	1		SOLEADO SECO	X	X
RETROEXCAVADORA	4	Residente de Obra	2		NUBLADO SECO		
VOLQUETA	4	Residente de Interventoria	1		LLUVIAS PASAJERAS		
MOTONIVELADORA	1	Director interventoria	1		LLUVIA INTERMITENTE		
BENITIN	1	Ingeniero Ambiental	1		LLUVIA FUERTE		
VIBROCOMPACTADOR	1	Profesional Social	1				
CARROTANQUE	1	Profesional HSEQ	1				
		Inspector de obra (Técnico e	1				
		Secretaria	1				
		Oficial	2				
		Ayudante	10				

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

SE INICIAN LABORES A LAS 7:00 AM
SE REALIZAN LOS PREOPERACIONALES DE LAS HERRAMIENTAS MENORES Y MAQUINAS
SE REALIZA EL MANEJO TEMPORAL DE AGUAS CON MOTOBOMBA
SE REALIZA LA CONFORMACIÓN DE BARRERA TIPO JARILLÓN
SE REALIZA INSTALACIÓN DE GEOTEXTILES NT 2400, NT 3000 Y TEJIDO 2100

SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS:

SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS:

VoBo:

ING. JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA
M.P. 54202-403896 NTS

VoBo:

ING JUAN GABRIEL HERNANDEZ MARIN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P. 54202-373584 NTS

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

BITACORA DE OBRA

CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION
NIT 901.903.360-3

CONTRATO DE OBRA N°:	481 DE 2024

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE

CONTRATISTA	CONSORCIO RIO BANADIA R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON

FECHA:	VIERNES 08 DE AGOSTO DE 2025	FOLIO	132

RECURSO EQUIPO		RECURSO HUMANO		MATERIALES	ESTADO DEL TIEMPO		
EQUIPOS	CANT	PERSONAL	CANT	DESCRIPCION	ESTADO	MAÑANA	TARDE
		Director de Obra	1				
RETROEXCAVADORA	4	Residente de Obra	2				
VOLQUETA	4	Residente de Interventoria	1				
MOTONIVELADORA	1	Director interventoria	1				
BENITIN	1	Ingeniero Ambiental	1		SOLEADO SECO	X	X
VIBROCOMPACTADOR	1	Profesional Social	1				
CARROTANQUE	1	Profesional HSEQ	1		NUBLADO SECO		
		Inspector de obra (Técnico e	1				
		Secretaria	1		LLUVIAS PASAJERAS		
		Oficial	2				
		Ayudante	10		LLUVIA INTERMITENTE		
					LLUVIA FUERTE		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

SE INICIAN LABORES A LAS 7:00 AM
SE REALIZAN LOS PREOPERACIONALES DE LAS HERRAMIENTAS MENORES Y MAQUINAS
SE REALIZA EL MANEJO TEMPORAL DE AGUAS CON MOTOBOMBA
SE REALIZA LA CONFORMACIÓN DE BARRERA TIPO JARILLÓN
SE REALIZA INSTALACIÓN DE GEOTEXTILES NT 2400, NT 3000 Y TEJIDO 2100

SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS:

SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS:

VoBo:

ING. JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA
M.P. 54202-403896 NTS

VoBo:

ING JUAN GABRIEL HERNANDEZ MARIN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P. 54202-373584 NTS

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

BITACORA DE OBRA

CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION
NIT 901.901.369-1

CONTRATO DE OBRA N°:	481 DE 2024

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE

CONTRATISTA	CONSORCIO RIO BANADIA R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON

FECHA:	SABADO 09 DE AGOSTO DE 2025	FOLIO	133

RECURSO EQUIPO		RECURSO HUMANO		MATERIALES	ESTADO DEL TIEMPO		
EQUIPOS	CANT	PERSONAL	CANT	DESCRIPCION	ESTADO	MAÑANA	TARDE
		Director de Obra	1				
RETROEXCAVADORA	4	Residente de Obra	2				
VOLQUETA	4	Residente de Interventoria	1				
MOTONIVELADORA	1	Director interventoria	1		SOLEADO SECO	X	X
BENITIN	1	Ingeniero Ambiental	1				
VIBROCOMPACTADOR	1	Profesional Social	1		NUBLADO SECO		
CARROTANQUE	1	Profesional HSEQ	1				
		Inspector de obra (Técnico e	1		LLUVIAS PASAJERAS		
		Secretaria	1				
		Oficial	2		LLUVIA INTERMITENTE		
		Ayudante	10				
					LLUVIA FUERTE		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

SE INICIAN LABORES A LAS 7:00 AM
SE REALIZAN LOS PREOPERACIONALES DE LAS HERRAMIENTAS MENORES Y MAQUINAS
SE REALIZA EL MANEJO TEMPORAL DE AGUAS CON MOTOBOMBA
SE REALIZA LA CONFORMACIÓN DE BARRERA TIPO JARILLÓN
SE REALIZA INSTALACIÓN DE GEOTEXTILES NT 2400, NT 3000 Y TEJIDO 2100

SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS:

SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS:

VoBo:

ING. JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA
M.P. 54202-403896 NTS

VoBo:

ING JUAN GABRIEL HERNANDEZ MARIN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P. 54202-373584 NTS

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

BITACORA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N°:	**481 DE 2024**
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE

CONTRATISTA	CONSORCIO RIO BANADIA R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON

FECHA:	DOMINGO 10 DE AGOSTO DE 2025	**FOLIO**	134

RECURSO EQUIPO		RECURSO HUMANO		MATERIALES	ESTADO DEL TIEMPO		
EQUIPOS	**CANT**	**PERSONAL**	**CANT**	**DESCRIPCION**	ESTADO	MAÑANA	TARDE
		Director de Obra	1				
P	4	Residente de Obra	2				
VOLQUETA	4	Residente de Interventoria	1				
MOTONIVELADORA	1	Director interventoria	1		SOLEADO SECO	X	X
BENITIN	1	Ingeniero Ambiental	1				
VIBROCOMPACTADOR	1	Profesional Social	1		NUBLADO SECO		
CARROTANQUE	1	Profesional HSEQ	1				
		Inspector de obra (Técnico e	1		LLUVIAS PASAJERAS		
		Secretaria	1				
		Oficial	2		LLUVIA INTERMITENTE		
		Ayudante	10				
					LLUVIA FUERTE		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DE OBRA POR SER DIA DOMINICAL

SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS:

SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS:

VoBo:

ING. JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA
M.P. 54202-403896 NTS

VoBo:

ING JUAN GABRIEL HERNANDEZ MARIN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P. 54202-373584 NTS

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

BITACORA DE OBRA

CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION
NIT 901 901 369 1

CONTRATO DE OBRA N°:	481 DE 2024

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATISTA	CONSORCIO RIO BANADIA R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON

FECHA:	LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025	FOLIO	135

RECURSO EQUIPO		RECURSO HUMANO		MATERIALES	ESTADO DEL TIEMPO		
EQUIPOS	CANT	PERSONAL	CANT	DESCRIPCION	ESTADO	MAÑANA	TARDE
		Director de Obra	1				
RETROEXCAVADORA	4	Residente de Obra	2				
VOLQUETA	4	Residente de Interventoria	1				
MOTONIVELADORA	1	Director interventoria	1		SOLEADO SECO	X	
BENITIN	1	Ingeniero Ambiental	1				
VIBROCOMPACTADOR	1	Profesional Social	1		NUBLADO SECO		X
CARROTANQUE	1	Profesional HSEQ	1				
		Inspector de obra (Técnico e	1		LLUVIAS PASAJERAS		
		Secretaria	1				
		Oficial	2		LLUVIA INTERMITENTE		
		Ayudante	10				
					LLUVIA FUERTE		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

SE INICIAN LABORES A LAS 7:00 AM
SE REALIZAN LOS PREOPERACIONALES DE LAS HERRAMIENTAS MENORES Y MAQUINAS
SE REALIZA EL MANEJO TEMPORAL DE AGUAS CON MOTOBOMBA
SE REALIZA LA CONFORMACIÓN DE BARRERA TIPO JARILLÓN
SE REALIZA INSTALACIÓN DE GEOTEXTILES NT 2400, NT 3000 Y TEJIDO 2100

SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS:

SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS:

VoBo:

ING. JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA
M.P. 54202-403896 NTS

VoBo:

ING JUAN GABRIEL HERNANDEZ MARIN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P. 54202-373584 NTS

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

BITACORA DE OBRA

CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION
NIT. 901.901.368-1

CONTRATO DE OBRA N°:	481 DE 2024
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATISTA	CONSORCIO RIO BANADIA R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON

FECHA:	MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025	FOLIO	136

RECURSO EQUIPO		RECURSO HUMANO		MATERIALES	ESTADO DEL TIEMPO		
EQUIPOS	CANT	PERSONAL	CANT	DESCRIPCION	ESTADO	MAÑANA	TARDE
		Director de Obra	1				
RETROEXCAVADORA	4	Residente de Obra	2				
VOLQUETA	4	Residente de Interventoria	1				
MOTONIVELADORA	1	Director interventoria	1		SOLEADO SECO		X
BENITIN	1	Ingeniero Ambiental	1				
VIBROCOMPACTADOR	1	Profesional Social	1		NUBLADO SECO	X	
CARROTANQUE	1	Profesional HSEQ	1				
		Inspector de obra (Técnico e	1		LLUVIAS PASAJERAS		
		Secretaria	1				
		Oficial	2		LLUVIA INTERMITENTE		
		Ayudante	10				
					LLUVIA FUERTE		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

SE INICIAN LABORES A LAS 7:00 AM
SE REALIZAN LOS PREOPERACIONALES DE LAS HERRAMIENTAS MENORES Y MAQUINAS
SE REALIZA EL MANEJO TEMPORAL DE AGUAS CON MOTOBOMBA
SE REALIZA LA CONFORMACIÓN DE BARRERA TIPO JARILLÓN
SE REALIZA INSTALACIÓN DE GEOTEXTILES NT 2400, NT 3000 Y TEJIDO 2100

SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS:

SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS:

VoBo:

ING. JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA
M.P. 54202-403896 NTS

VoBo:

ING JUAN GABRIEL HERNANDEZ MARIN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P. 54202-373584 NTS

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

BITACORA DE OBRA

CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION
NIT 901 001 3606 1

CONTRATO DE OBRA N°:	481 DE 2024

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATISTA	CONSORCIO RIO BANADIA R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON

FECHA:	MIERCOLES 13 DE AGOSTO DE 2025	FOLIO	137

RECURSO EQUIPO		RECURSO HUMANO		MATERIALES	ESTADO DEL TIEMPO		
EQUIPOS	CANT	PERSONAL	CANT	DESCRIPCION	ESTADO	MAÑANA	TARDE
		Director de Obra	1				
RETROEXCAVADORA	4	Residente de Obra	2				
VOLQUETA	4	Residente de Interventoria	1				
MOTONIVELADORA	1	Director interventoria	1		SOLEADO SECO	X	X
BENITIN	1	Ingeniero Ambiental	1				
VIBROCOMPACTADOR	1	Profesional Social	1		NUBLADO SECO		
CARROTANQUE	1	Profesional HSEQ	1				
		Inspector de obra (Técnico e	1		LLUVIAS PASAJERAS		
		Secretaria	1				
		Oficial	2		LLUVIA INTERMITENTE		
		Ayudante	10				
					LLUVIA FUERTE		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

SE INICIAN LABORES A LAS 7:00 AM
SE REALIZAN LOS PREOPERACIONALES DE LAS HERRAMIENTAS MENORES Y MAQUINAS
SE REALIZA EL MANEJO TEMPORAL DE AGUAS CON MOTOBOMBA
SE REALIZA LA CONFORMACIÓN DE BARRERA TIPO JARILLÓN
SE REALIZA INSTALACIÓN DE GEOTEXTILES NT 2400, NT 3000 Y TEJIDO 2100

SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS:

SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS:

VoBo:

ING. JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA
M.P. 54202-403896 NTS

VoBo:

ING JUAN GABRIEL HERNANDEZ MARIN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P. 54202-373584 NTS

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

BITACORA DE OBRA

CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION
NIT. 901.901.269 1

CONTRATO DE OBRA N°:	481 DE 2024

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATISTA	CONSORCIO RIO BANADIA R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON

FECHA:	JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025	FOLIO	138

RECURSO EQUIPO		RECURSO HUMANO		MATERIALES	ESTADO DEL TIEMPO		
EQUIPOS	CANT	PERSONAL	CANT	DESCRIPCION	ESTADO	MAÑANA	TARDE
		Director de Obra	1				
RETROEXCAVADORA	4	Residente de Obra	2				
VOLQUETA	4	Residente de Interventoria	1				
MOTONIVELADORA	1	Director interventoria	1		SOLEADO SECO	X	X
BENITIN	1	Ingeniero Ambiental	1				
VIBROCOMPACTADOR	1	Profesional Social	1		NUBLADO SECO		
CARROTANQUE	1	Profesional HSEQ	1				
		Inspector de obra (Técnico e	1		LLUVIAS PASAJERAS		
		Secretaria	1				
		Oficial	2		LLUVIA INTERMITENTE		
		Ayudante	10				
					LLUVIA FUERTE		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

SE INICIAN LABORES A LAS 7:00 AM
SE REALIZAN LOS PREOPERACIONALES DE LAS HERRAMIENTAS MENORES Y MAQUINAS
SE REALIZA EL MANEJO TEMPORAL DE AGUAS CON MOTOBOMBA
SE REALIZA LA CONFORMACIÓN DE BARRERA TIPO JARILLÓN
SE REALIZA INSTALACIÓN DE GEOTEXTILES NT 2400, NT 3000 Y TEJIDO 2100

SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS:

SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS:

VoBo:

ING. JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA
M.P. 54202-403896 NTS

VoBo:

ING JUAN GABRIEL HERNANDEZ MARIN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P. 54202-373584 NTS

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

BITACORA DE OBRA

CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION
NIT 901 902 268 1

CONTRATO DE OBRA N°:	481 DE 2024

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE

CONTRATISTA	CONSORCIO RIO BANADIA R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON

FECHA:	VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025	FOLIO	139

RECURSO EQUIPO		RECURSO HUMANO		MATERIALES	ESTADO DEL TIEMPO		
EQUIPOS	CANT	PERSONAL	CANT	DESCRIPCION	ESTADO	MAÑANA	TARDE
		Director de Obra	1				
RETROEXCAVADORA	4	Residente de Obra	2				
VOLQUETA	4	Residente de Interventoria	1				
MOTONIVELADORA	1	Director interventoria	1		SOLEADO SECO	X	X
BENITIN	1	Ingeniero Ambiental	1				
VIBROCOMPACTADOR	1	Profesional Social	1		NUBLADO SECO		
CARROTANQUE	1	Profesional HSEQ	1				
		Inspector de obra (Técnico e	1		LLUVIAS PASAJERAS		
		Secretaria	1				
		Oficial	2		LLUVIA INTERMITENTE		
		Ayudante	10				
					LLUVIA FUERTE		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

SE INICIAN LABORES A LAS 7:00 AM
SE REALIZAN LOS PREOPERACIONALES DE LAS HERRAMIENTAS MENORES Y MAQUINAS
SE REALIZA EL MANEJO TEMPORAL DE AGUAS CON MOTOBOMBA
SE REALIZA LA CONFORMACIÓN DE BARRERA TIPO JARILLÓN
SE REALIZA INSTALACIÓN DE GEOTEXTILES NT 2400, NT 3000 Y TEJIDO 2100

SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS:

SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS:

VoBo:

ING. JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA
M.P. 54202-403896 NTS

VoBo:

ING JUAN GABRIEL HERNANDEZ MARIN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P. 54202-373584 NTS

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

BITACORA DE OBRA

CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION
NIT 901.901.368 1

CONTRATO DE OBRA N°:	481 DE 2024

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE

CONTRATISTA	CONSORCIO RIO BANADIA R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON

FECHA:	SABADO 16 DE AGOSTO DE 2025	FOLIO	140

RECURSO EQUIPO		RECURSO HUMANO		MATERIALES	ESTADO DEL TIEMPO		
EQUIPOS	CANT	PERSONAL	CANT	DESCRIPCION	ESTADO	MAÑANA	TARDE
		Director de Obra	1				
RETROEXCAVADORA	4	Residente de Obra	2				
VOLQUETA	4	Residente de Interventoria	1				
MOTONIVELADORA	1	Director interventoria	1		SOLEADO SECO	X	X
BENITIN	1	Ingeniero Ambiental	1				
VIBROCOMPACTADOR	1	Profesional Social	1		NUBLADO SECO		
CARROTANQUE	1	Profesional HSEQ	1				
		Inspector de obra (Técnico e	1		LLUVIAS PASAJERAS		
		Secretaria	1				
		Oficial	2		LLUVIA INTERMITENTE		
		Ayudante	10				
					LLUVIA FUERTE		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

SE INICIAN LABORES A LAS 7:00 AM
SE REALIZAN LOS PREOPERACIONALES DE LAS HERRAMIENTAS MENORES Y MAQUINAS
SE REALIZA EL MANEJO TEMPORAL DE AGUAS CON MOTOBOMBA
SE REALIZA LA CONFORMACIÓN DE BARRERA TIPO JARILLÓN
SE REALIZA INSTALACIÓN DE GEOTEXTILES NT 2400, NT 3000 Y TEJIDO 2100

SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS:

SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS:

VoBo:

ING. JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA
M.P. 54202-403896 NTS

VoBo:

ING JUAN GABRIEL HERNANDEZ MARIN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P. 54202-373584 NTS

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

BITACORA DE OBRA

CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION
NIT 901.901.368-1

CONTRATO DE OBRA N°:	481 DE 2024

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE

CONTRATISTA	CONSORCIO RIO BANADIA R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON

FECHA:	DOMINGO 17 DE AGOSTO DE 2025	FOLIO	141

RECURSO EQUIPO		RECURSO HUMANO		MATERIALES	ESTADO DEL TIEMPO		
EQUIPOS	CANT	PERSONAL	CANT	DESCRIPCION	ESTADO	MAÑANA	TARDE
		Director de Obra	1				
RETROEXCAVADORA	4	Residente de Obra	2				
VOLQUETA	4	Residente de Interventoria	1				
MOTONIVELADORA	1	Director interventoria	1		SOLEADO SECO	X	X
BENITIN	1	Ingeniero Ambiental	1				
VIBROCOMPACTADOR	1	Profesional Social	1		NUBLADO SECO		
CARROTANQUE	1	Profesional HSEQ	1				
		Inspector de obra (Técnico e	1		LLUVIAS PASAJERAS		
		Secretaria	1				
		Oficial	2		LLUVIA INTERMITENTE		
		Ayudante	10				
					LLUVIA FUERTE		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DE OBRA POR SER DIA DOMINICAL

SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS:

SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS:

VoBo:

ING. JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA
M.P. 54202-403896 NTS

VoBo:

ING JUAN GABRIEL HERNANDEZ MARIN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P. 54202-373584 NTS

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

BITACORA DE OBRA

CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION
NIT 901.903.369-1

CONTRATO DE OBRA N°:	481 DE 2024
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATISTA	CONSORCIO RIO BANADIA R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON

FECHA:	LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025	FOLIO	142

RECURSO EQUIPO		RECURSO HUMANO		MATERIALES	ESTADO DEL TIEMPO		
EQUIPOS	CANT	PERSONAL	CANT	DESCRIPCION	ESTADO	MAÑANA	TARDE
		Director de Obra	1		SOLEADO SECO	X	
RETROEXCAVADORA	4	Residente de Obra	2		NUBLADO SECO		X
VOLQUETA	4	Residente de Interventoria	1		LLUVIAS PASAJERAS		
MOTONIVELADORA	1	Director interventoria	1		LLUVIA INTERMITENTE		
BENITIN	1	Ingeniero Ambiental	1		LLUVIA FUERTE		
VIBROCOMPACTADOR	1	Profesional Social	1				
CARROTANQUE	1	Profesional HSEQ	1				
		Inspector de obra (Técnico e	1				
		Secretaria	1				
		Oficial	2				
		Ayudante	10				

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

SE INICIAN LABORES A LAS 7:00 AM
SE REALIZAN LOS PREOPERACIONALES DE LAS HERRAMIENTAS MENORES Y MAQUINAS
SE REALIZA EL MANEJO TEMPORAL DE AGUAS CON MOTOBOMBA
SE REALIZA LA CONFORMACIÓN DE BARRERA TIPO JARILLÓN
SE REALIZA INSTALACIÓN DE GEOTEXTILES NT 2400, NT 3000 Y TEJIDO 2100

SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS:

SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS:

VoBo:

ING. JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA
M.P. 54202-403896 NTS

VoBo:

ING JUAN GABRIEL HERNANDEZ MARIN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P. 54202-373584 NTS

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

BITACORA DE OBRA

CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION
NIT 901.901.368-1

CONTRATO DE OBRA N°:	481 DE 2024

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATISTA	CONSORCIO RIO BANADIA R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON

FECHA:	MARTES 19 DE AGOSTO DE 2025	FOLIO	143

RECURSO EQUIPO		RECURSO HUMANO		MATERIALES	ESTADO DEL TIEMPO		
EQUIPOS	CANT	PERSONAL	CANT	DESCRIPCION	ESTADO	MAÑANA	TARDE
		Director de Obra	1				
RETROEXCAVADORA	4	Residente de Obra	2				
VOLQUETA	4	Residente de Interventoria	1				
MOTONIVELADORA	1	Director interventoria	1		SOLEADO SECO		X
BENITIN	1	Ingeniero Ambiental	1				
VIBROCOMPACTADOR	1	Profesional Social	1		NUBLADO SECO	X	
CARROTANQUE	1	Profesional HSEQ	1				
		Inspector de obra (Técnico e	1		LLUVIAS PASAJERAS		
		Secretaria	1				
		Oficial	2		LLUVIA INTERMITENTE		
		Ayudante	10				
					LLUVIA FUERTE		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

SE INICIAN LABORES A LAS 7:00 AM
SE REALIZAN LOS PREOPERACIONALES DE LAS HERRAMIENTAS MENORES Y MAQUINAS
SE REALIZA EL MANEJO TEMPORAL DE AGUAS CON MOTOBOMBA
SE REALIZA LA CONFORMACIÓN DE BARRERA TIPO JARILLÓN
SE REALIZA INSTALACIÓN DE GEOTEXTILES NT 2400, NT 3000 Y TEJIDO 2100

SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS:

SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS:

VoBo:
ING. JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA
M.P. 54202-403896 NTS

VoBo:
ING JUAN GABRIEL HERNANDEZ MARIN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P. 54202-373584 NTS

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

BITACORA DE OBRA

CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION
NIT: 901.901.269-1

CONTRATO DE OBRA N°:	481 DE 2024

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATISTA	CONSORCIO RIO BANADIA R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON

FECHA:	MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE 2025	FOLIO	144

RECURSO EQUIPO		RECURSO HUMANO		MATERIALES	ESTADO DEL TIEMPO		
EQUIPOS	CANT	PERSONAL	CANT	DESCRIPCION	ESTADO	MAÑANA	TARDE
		Director de Obra	1		SOLEADO SECO	X	X
RETROEXCAVADORA	4	Residente de Obra	2		NUBLADO SECO		
VOLQUETA	4	Residente de Interventoria	1		LLUVIAS PASAJERAS		
MOTONIVELADORA	1	Director interventoria	1		LLUVIA INTERMITENTE		
BENITIN	1	Ingeniero Ambiental	1		LLUVIA FUERTE		
VIBROCOMPACTADOR	1	Profesional Social	1				
CARROTANQUE	1	Profesional HSEQ	1				
		Inspector de obra (Técnico e	1				
		Secretaria	1				
		Oficial	2				
		Ayudante	10				

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

SE INICIAN LABORES A LAS 7:00 AM
SE REALIZAN LOS PREOPERACIONALES DE LAS HERRAMIENTAS MENORES Y MAQUINAS
SE REALIZA EL MANEJO TEMPORAL DE AGUAS CON MOTOBOMBA
SE REALIZA LA CONFORMACIÓN DE BARRERA TIPO JARILLÓN
SE REALIZA INSTALACIÓN DE GEOTEXTILES NT 2400, NT 3000 Y TEJIDO 2100

SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS:

SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS:

VoBo:

ING. JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA
M.P. 54202-403896 NTS

VoBo:

ING JUAN GABRIEL HERNANDEZ MARIN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P. 54202-373584 NTS

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

BITACORA DE OBRA

CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION
NIT 901 901 369-1

CONTRATO DE OBRA N°:	481 DE 2024

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATISTA	CONSORCIO RIO BANADIA R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON

FECHA:	JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2025	FOLIO	145

RECURSO EQUIPO		RECURSO HUMANO		MATERIALES	ESTADO DEL TIEMPO		
EQUIPOS	CANT	PERSONAL	CANT	DESCRIPCION	ESTADO	MAÑANA	TARDE
		Director de Obra	1				
RETROEXCAVADORA	4	Residente de Obra	2				
VOLQUETA	4	Residente de Interventoria	1				
MOTONIVELADORA	1	Director interventoria	1		SOLEADO SECO	X	X
BENITIN	1	Ingeniero Ambiental	1				
VIBROCOMPACTADOR	1	Profesional Social	1		NUBLADO SECO		
CARROTANQUE	1	Profesional HSEQ	1				
		Inspector de obra (Técnico e	1		LLUVIAS PASAJERAS		
		Secretaria	1				
		Oficial	2		LLUVIA INTERMITENTE		
		Ayudante	10				
					LLUVIA FUERTE		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

SE INICIAN LABORES A LAS 7:00 AM
SE REALIZAN LOS PREOPERACIONALES DE LAS HERRAMIENTAS MENORES Y MAQUINAS
SE REALIZA EL MANEJO TEMPORAL DE AGUAS CON MOTOBOMBA
SE REALIZA LA CONFORMACIÓN DE BARRERA TIPO JARILLÓN
SE REALIZA INSTALACIÓN DE GEOTEXTILES NT 2400, NT 3000 Y TEJIDO 2100

SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS:

SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS:

VoBo:

ING. JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA
M.P. 54202-403896 NTS

VoBo:

ING JUAN GABRIEL HERNANDEZ MARIN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P. 54202-373584 NTS

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

BITACORA DE OBRA

CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION
NIT 901.903.268-1

CONTRATO DE OBRA N°:	481 DE 2024

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE

CONTRATISTA	CONSORCIO RIO BANADIA R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON

FECHA:	VIERNES 22 DE AGOSTO DE 2025	FOLIO	146

RECURSO EQUIPO		RECURSO HUMANO		MATERIALES	ESTADO DEL TIEMPO		
EQUIPOS	CANT	PERSONAL	CANT	DESCRIPCION	ESTADO	MAÑANA	TARDE
		Director de Obra	1				
RETROEXCAVADORA	4	Residente de Obra	2				
VOLQUETA	4	Residente de Interventoria	1				
MOTONIVELADORA	1	Director interventoria	1		SOLEADO SECO	X	X
BENITIN	1	Ingeniero Ambiental	1				
VIBROCOMPACTADOR	1	Profesional Social	1		NUBLADO SECO		
CARROTANQUE	1	Profesional HSEQ	1				
		Inspector de obra (Técnico e	1		LLUVIAS PASAJERAS		
		Secretaria	1				
		Oficial	2		LLUVIA INTERMITENTE		
		Ayudante	10				
					LLUVIA FUERTE		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

SE INICIAN LABORES A LAS 7:00 AM
SE REALIZAN LOS PREOPERACIONALES DE LAS HERRAMIENTAS MENORES Y MAQUINAS
SE REALIZA EL MANEJO TEMPORAL DE AGUAS CON MOTOBOMBA
SE REALIZA LA CONFORMACIÓN DE BARRERA TIPO JARILLÓN
SE REALIZA INSTALACIÓN DE GEOTEXTILES NT 2400, NT 3000 Y TEJIDO 2100

SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS:

SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS:

VoBo:

ING. JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA
M.P. 54202-403896 NTS

VoBo:

ING JUAN GABRIEL HERNANDEZ MARIN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P. 54202-373584 NTS

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

BITACORA DE OBRA

CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION
NIT: 901.901.369 1

CONTRATO DE OBRA N°:	481 DE 2024

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE

CONTRATISTA	CONSORCIO RIO BANADIA R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON

FECHA:	SABADO 23 DE AGOSTO DE 2025	FOLIO	147

RECURSO EQUIPO		RECURSO HUMANO		MATERIALES	ESTADO DEL TIEMPO		
EQUIPOS	CANT	PERSONAL	CANT	DESCRIPCION	ESTADO	MAÑANA	TARDE
		Director de Obra	1				
RETROEXCAVADORA	4	Residente de Obra	2				
VOLQUETA	4	Residente de Interventoria	1				
MOTONIVELADORA	1	Director interventoria	1		SOLEADO SECO	X	X
BENITIN	1	Ingeniero Ambiental	1				
VIBROCOMPACTADOR	1	Profesional Social	1		NUBLADO SECO		
CARROTANQUE	1	Profesional HSEQ	1				
		Inspector de obra (Técnico e	1		LLUVIAS PASAJERAS		
		Secretaria	1				
		Oficial	2		LLUVIA INTERMITENTE		
		Ayudante	10				
					LLUVIA FUERTE		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

SE INICIAN LABORES A LAS 7:00 AM
SE REALIZAN LOS PREOPERACIONALES DE LAS HERRAMIENTAS MENORES Y MAQUINAS
SE REALIZA EL MANEJO TEMPORAL DE AGUAS CON MOTOBOMBA
SE REALIZA LA CONFORMACIÓN DE BARRERA TIPO JARILLÓN
SE REALIZA INSTALACIÓN DE GEOTEXTILES NT 2400, NT 3000 Y TEJIDO 2100

SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS:

SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS:

VoBo:

ING. JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA
M.P. 54202-403896 NTS

VoBo:

ING JUAN GABRIEL HERNANDEZ MARIN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P. 54202-373584 NTS

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

BITACORA DE OBRA

CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION
NIT: 901 901 360 1

CONTRATO DE OBRA N°:	481 DE 2024

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE

CONTRATISTA	CONSORCIO RIO BANADIA R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON

FECHA:	DOMINGO 24 DE AGOSTO DE 2025	FOLIO	148

RECURSO EQUIPO		RECURSO HUMANO		MATERIALES	ESTADO DEL TIEMPO		
EQUIPOS	CANT	PERSONAL	CANT	DESCRIPCION	ESTADO	MAÑANA	TARDE
		Director de Obra	1				
RETROEXCAVADORA	4	Residente de Obra	2				
VOLQUETA	4	Residente de Interventoria	1				
MOTONIVELADORA	1	Director interventoria	1		SOLEADO SECO	X	X
BENITIN	1	Ingeniero Ambiental	1				
VIBROCOMPACTADOR	1	Profesional Social	1		NUBLADO SECO		
CARROTANQUE	1	Profesional HSEQ	1				
		Inspector de obra (Técnico e	1		LLUVIAS PASAJERAS		
		Secretaria	1				
		Oficial	2		LLUVIA INTERMITENTE		
		Ayudante	10				
					LLUVIA FUERTE		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DE OBRA POR SER DIA DOMINICAL

SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS:

SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS:

VoBo:

ING. JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA
M.P. 54202-403896 NTS

VoBo:

ING JUAN GABRIEL HERNANDEZ MARIN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P. 54202-373584 NTS

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

BITACORA DE OBRA

CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION
NIT 901.901.369-1

CONTRATO DE OBRA N°:	481 DE 2024
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATISTA	CONSORCIO RIO BANADIA R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON

FECHA:	LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025	FOLIO	149

RECURSO EQUIPO		RECURSO HUMANO		MATERIALES	ESTADO DEL TIEMPO		
EQUIPOS	CANT	PERSONAL	CANT	DESCRIPCION	ESTADO	MAÑANA	TARDE
		Director de Obra	1				
RETROEXCAVADORA	4	Residente de Obra	2				
VOLQUETA	4	Residente de Interventoria	1				
MOTONIVELADORA	1	Director interventoria	1		SOLEADO SECO	X	
BENITIN	1	Ingeniero Ambiental	1				
VIBROCOMPACTADOR	1	Profesional Social	1		NUBLADO SECO		X
CARROTANQUE	1	Profesional HSEQ	1				
		Inspector de obra (Técnico e	1		LLUVIAS PASAJERAS		
		Secretaria	1				
		Oficial	2		LLUVIA INTERMITENTE		
		Ayudante	10				
					LLUVIA FUERTE		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

SE INICIAN LABORES A LAS 7:00 AM
SE REALIZAN LOS PREOPERACIONALES DE LAS HERRAMIENTAS MENORES Y MAQUINAS
SE REALIZA EL MANEJO TEMPORAL DE AGUAS CON MOTOBOMBA
SE REALIZA LA CONFORMACIÓN DE BARRERA TIPO JARILLÓN
SE REALIZA INSTALACIÓN DE GEOTEXTILES NT 2400, NT 3000 Y TEJIDO 2100

SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS:

SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS:

VoBo:

ING. JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA
M.P. 54202-403896 NTS

VoBo:

ING JUAN GABRIEL HERNANDEZ MARIN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P. 54202-373584 NTS

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

BITACORA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N°:	481 DE 2024
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATISTA	CONSORCIO RIO BANADIA R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON

FECHA:	MARTES 26 DE AGOSTO DE 2025	FOLIO	150

RECURSO EQUIPO		RECURSO HUMANO		MATERIALES	ESTADO DEL TIEMPO		
EQUIPOS	CANT	PERSONAL	CANT	DESCRIPCION	ESTADO	MAÑANA	TARDE
		Director de Obra	1				
RETROEXCAVADORA	4	Residente de Obra	2				
VOLQUETA	4	Residente de Interventoria	1				
MOTONIVELADORA	1	Director interventoria	1		SOLEADO SECO		X
BENITIN	1	Ingeniero Ambiental	1				
VIBROCOMPACTADOR	1	Profesional Social	1		NUBLADO SECO	X	
CARROTANQUE	1	Profesional HSEQ	1				
		Inspector de obra (Técnico e	1		LLUVIAS PASAJERAS		
		Secretaria	1				
		Oficial	2		LLUVIA INTERMITENTE		
		Ayudante	10				
					LLUVIA FUERTE		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

SE INICIAN LABORES A LAS 7:00 AM
SE REALIZAN LOS PREOPERACIONALES DE LAS HERRAMIENTAS MENORES Y MAQUINAS
SE REALIZA EL MANEJO TEMPORAL DE AGUAS CON MOTOBOMBA
SE REALIZA LA CONFORMACIÓN DE BARRERA TIPO JARILLÓN
SE REALIZA INSTALACIÓN DE GEOTEXTILES NT 2400, NT 3000 Y TEJIDO 2100

SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS:

SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS:

VoBo:

ING. JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA
M.P. 54202-403896 NTS

VoBo:

ING JUAN GABRIEL HERNANDEZ MARIN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P. 54202-373584 NTS

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

BITACORA DE OBRA

CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION
NIT 901.901.268-1

CONTRATO DE OBRA N°:	481 DE 2024

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATISTA	CONSORCIO RIO BANADIA R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON

FECHA:	MIERCOLES 27 DE AGOSTO DE 2025	FOLIO	151

RECURSO EQUIPO		RECURSO HUMANO		MATERIALES	ESTADO DEL TIEMPO		
EQUIPOS	CANT	PERSONAL	CANT	DESCRIPCION	ESTADO	MAÑANA	TARDE
		Director de Obra	1				
RETROEXCAVADORA	4	Residente de Obra	2				
VOLQUETA	4	Residente de Interventoria	1				
MOTONIVELADORA	1	Director interventoria	1		SOLEADO SECO	X	X
BENITIN	1	Ingeniero Ambiental	1				
VIBROCOMPACTADOR	1	Profesional Social	1		NUBLADO SECO		
CARROTANQUE	1	Profesional HSEQ	1				
		Inspector de obra (Técnico e	1		LLUVIAS PASAJERAS		
		Secretaria	1				
		Oficial	2		LLUVIA INTERMITENTE		
		Ayudante	10				
					LLUVIA FUERTE		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

SE INICIAN LABORES A LAS 7:00 AM
SE REALIZAN LOS PREOPERACIONALES DE LAS HERRAMIENTAS MENORES Y MAQUINAS
SE REALIZA EL MANEJO TEMPORAL DE AGUAS CON MOTOBOMBA
SE REALIZA LA CONFORMACIÓN DE BARRERA TIPO JARILLÓN
SE REALIZA INSTALACIÓN DE GEOTEXTILES NT 2400, NT 3000 Y TEJIDO 2100

SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS:

SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS:

VoBo:

ING. JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA
M.P. 54202-403896 NTS

VoBo:

ING JUAN GABRIEL HERNANDEZ MARIN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P. 54202-373584 NTS

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

BITACORA DE OBRA

CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION
NIT 901.903.368-1

CONTRATO DE OBRA N°:	481 DE 2024

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATISTA	CONSORCIO RIO BANADIA R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON

FECHA:	JUEVES 28 DE AGOSTO DE 2025	FOLIO	152

RECURSO EQUIPO		RECURSO HUMANO		MATERIALES	ESTADO DEL TIEMPO		
EQUIPOS	CANT	PERSONAL	CANT	DESCRIPCION	ESTADO	MAÑANA	TARDE
		Director de Obra	1				
RETROEXCAVADORA	4	Residente de Obra	2				
VOLQUETA	4	Residente de Interventoria	1				
MOTONIVELADORA	1	Director interventoria	1		SOLEADO SECO	X	X
BENITIN	1	Ingeniero Ambiental	1				
VIBROCOMPACTADOR	1	Profesional Social	1		NUBLADO SECO		
CARROTANQUE	1	Profesional HSEQ	1				
		Inspector de obra (Técnico e	1		LLUVIAS PASAJERAS		
		Secretaria	1				
		Oficial	2		LLUVIA INTERMITENTE		
		Ayudante	10				
					LLUVIA FUERTE		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

SE INICIAN LABORES A LAS 7:00 AM
SE REALIZAN LOS PREOPERACIONALES DE LAS HERRAMIENTAS MENORES Y MAQUINAS
SE REALIZA EL MANEJO TEMPORAL DE AGUAS CON MOTOBOMBA
SE REALIZA LA CONFORMACIÓN DE BARRERA TIPO JARILLÓN
SE REALIZA INSTALACIÓN DE GEOTEXTILES NT 2400, NT 3000 Y TEJIDO 2100

SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS:

SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS:

VoBo:
ING. JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA
M.P. 54202-403896 NTS

VoBo:
ING JUAN GABRIEL HERNANDEZ MARIN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P. 54202-373584 NTS

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

BITACORA DE OBRA

CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION
NIT. 901.961.369-1

CONTRATO DE OBRA N°:	481 DE 2024
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE

CONTRATISTA	CONSORCIO RIO BANADIA R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON

FECHA:	VIERNES 29 DE AGOSTO DE 2025	FOLIO	153

RECURSO EQUIPO		RECURSO HUMANO		MATERIALES	ESTADO DEL TIEMPO		
EQUIPOS	CANT	PERSONAL	CANT	DESCRIPCION	ESTADO	MAÑANA	TARDE
		Director de Obra	1				
RETROEXCAVADORA	4	Residente de Obra	2				
VOLQUETA	4	Residente de Interventoria	1				
MOTONIVELADORA	1	Director interventoria	1		SOLEADO SECO	X	X
BENITIN	1	Ingeniero Ambiental	1				
VIBROCOMPACTADOR	1	Profesional Social	1		NUBLADO SECO		
CARROTANQUE	1	Profesional HSEQ	1				
		Inspector de obra (Técnico e	1		LLUVIAS PASAJERAS		
		Secretaria	1				
		Oficial	2		LLUVIA INTERMITENTE		
		Ayudante	10				
					LLUVIA FUERTE		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

SE INICIAN LABORES A LAS 7:00 AM
SE REALIZAN LOS PREOPERACIONALES DE LAS HERRAMIENTAS MENORES Y MAQUINAS
SE REALIZA EL MANEJO TEMPORAL DE AGUAS CON MOTOBOMBA
SE REALIZA LA CONFORMACIÓN DE BARRERA TIPO JARILLÓN
SE REALIZA INSTALACIÓN DE GEOTEXTILES NT 2400, NT 3000 Y TEJIDO 2100

SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS:

SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS:

VoBo:

ING. JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA
M.P. 54202-403896 NTS

VoBo:

ING JUAN GABRIEL HERNANDEZ MARIN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P. 54202-373584 NTS

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

BITACORA DE OBRA

CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION
NIT 901.901.389-1

CONTRATO DE OBRA N°:	481 DE 2024

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE

CONTRATISTA	CONSORCIO RIO BANADIA R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON

FECHA:	SABADO 30 DE AGOSTO DE 2025	FOLIO	154

RECURSO EQUIPO		RECURSO HUMANO		MATERIALES	ESTADO DEL TIEMPO		
EQUIPOS	CANT	PERSONAL	CANT	DESCRIPCION	ESTADO	MAÑANA	TARDE
		Director de Obra	1				
RETROEXCAVADORA	4	Residente de Obra	2				
VOLQUETA	4	Residente de Interventoria	1				
MOTONIVELADORA	1	Director interventoria	1		SOLEADO SECO	X	X
BENITIN	1	Ingeniero Ambiental	1				
VIBROCOMPACTADOR	1	Profesional Social	1		NUBLADO SECO		
CARROTANQUE	1	Profesional HSEQ	1				
		Inspector de obra (Técnico e	1		LLUVIAS PASAJERAS		
		Secretaria	1				
		Oficial	2		LLUVIA INTERMITENTE		
		Ayudante	10				
					LLUVIA FUERTE		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

SE INICIAN LABORES A LAS 7:00 AM
SE REALIZAN LOS PREOPERACIONALES DE LAS HERRAMIENTAS MENORES Y MAQUINAS
SE REALIZA EL MANEJO TEMPORAL DE AGUAS CON MOTOBOMBA
SE REALIZA LA CONFORMACIÓN DE BARRERA TIPO JARILLÓN
SE REALIZA INSTALACIÓN DE GEOTEXTILES NT 2400, NT 3000 Y TEJIDO 2100

SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS:

SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS:

VoBo:

ING. JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA
M.P. 54202-403896 NTS

VoBo:

ING JUAN GABRIEL HERNANDEZ MARIN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P. 54202-373584 NTS

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

BITACORA DE OBRA

CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION
NIT. 901.901.368-1

CONTRATO DE OBRA N°:	481 DE 2024
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE

CONTRATISTA	CONSORCIO RIO BANADIA R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON

FECHA:	DOMINGO 31 DE AGOSTO DE 2025	FOLIO	155

RECURSO EQUIPO		RECURSO HUMANO		MATERIALES	ESTADO DEL TIEMPO		
EQUIPOS	CANT	PERSONAL	CANT	DESCRIPCION	ESTADO	MAÑANA	TARDE
		Director de Obra	1				
RETROEXCAVADORA	4	Residente de Obra	2				
VOLQUETA	4	Residente de Interventoria	1				
MOTONIVELADORA	1	Director interventoria	1		SOLEADO SECO	X	X
BENITIN	1	Ingeniero Ambiental	1				
VIBROCOMPACTADOR	1	Profesional Social	1		NUBLADO SECO		
CARROTANQUE	1	Profesional HSEQ	1				
		Inspector de obra (Técnico e	1		LLUVIAS PASAJERAS		
		Secretaria	1				
		Oficial	2		LLUVIA INTERMITENTE		
		Ayudante	10				
					LLUVIA FUERTE		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DE OBRA POR SER DIA DOMINICAL

SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS:

SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS:

VoBo:

ING. JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA
M.P. 54202-403896 NTS

VoBo:

ING JUAN GABRIEL HERNANDEZ MARIN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P. 54202-373584 NTS

ANEXO 4

PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE AGOSTO 2025

CL 25 N 11 – 70 BRR ALFONSO LOPEZ
CORREO: consorcioriobanadia@gmail.com
CELULAR: 3202395534

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 34593249
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-09-08

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONSORCIO RIO BANADIA	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901902273	D.V.	3	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 30 8 49	DEPARTAMENTO	ARAUCA	MUNICIPIO	SARAVENA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	CONSORCIORIOBANADIA@GMAIL.COM	TELÉFONO	3142788531
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1018444460	PRIMER APELLIDO	VILLARREAL	SEGUNDO APELLIDO	ROA
PRIMER NOMBRE	JEISSON	SEGUNDO NOMBRE	RENE		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 08	Año: 2025	Mes: 09	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
24		$60.168.500		34593249

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-80109920	01	No	No	No	81	736	5429001	Fijo	BARRAGAN MENDOZA JAIRO ALEXANDER	$2.750.000
CC-1115742269	01	No	No	No	81	736	5429001	Fijo	BERNAL RODRIGUEZ JESUS GUILLERMO	$1.423.500
CC-1020810816	01	No	No	No	81	736	5429001	Fijo	BOTIA CHONA MARLYN YVETTE	$3.000.000
CC-1115722498	01	No	No	No	81	736	5429001	Fijo	CASTAÑEDA MENDOZA NELSON ARLEY	$1.423.500
CC-88215089	01	No	No	No	81	736	5429001	Fijo	DELGADO MONTAGUT JOAQUIN EDUARDO	$2.750.000
CC-1098752791	01	No	No	No	81	736	5429001	Fijo	GARCIA BELTRAN JHONN FREDY	$5.000.000
CC-1098716716	01	No	No	No	81	736	5429001	Fijo	GARCIA BELTRAN JHONNATHAN ALEXIS	$5.000.000
CC-1094269468	01	No	No	No	81	736	5429001	Fijo	GARRIDO RIVERO CAMILO ANDRES	$3.000.000
CC-1148703169	01	No	No	No	81	736	5429001	Fijo	GELVIS PEÑALOZA DERIAN	$1.423.500
CC-1116496517	01	No	No	No	81	736	1711001	Fijo	GUTIERREZ VACCA HORLEYDA	$1.500.000
CC-1119185219	01	No	No	No	81	736	5429001	Fijo	JOYA TAMARA EDWIN GABRIEL	$1.755.000
CC-1006407775	01	No	No	No	81	736	5429001	Fijo	MEDINA GOMEZ DIEGO ANDRES	$1.423.500
CC-1125760100	01	No	No	No	81	736	5429001	Fijo	MONCADA CORONEL JESUS ANTONIO	$1.423.500
CC-1098658689	01	No	No	No	81	736	1711001	Fijo	OCHOA JESSICA LILIBETH	$2.000.000
CC-1094283275	01	No	No	No	81	736	5429001	Fijo	OLAYA BAYONA LAURA CRISTINA	$5.000.000
CC-88219552	01	No	No	No	81	736	5429001	Fijo	ORTEGA CONTRERAS CARLOS	$1.423.500
CC-1234339637	01	No	No	No	81	736	5429001	Fijo	PABON GOMEZ DAVINSON ANDRES	$1.423.500
CC-1098684323	01	No	No	No	81	736	5429001	Fijo	PAEZ GARCIA FERNEY ALFONSO	$3.000.000
CC-9466736	01	No	No	No	81	736	5429001	Fijo	QUINTERO VILLAMIZAR JUAN VICENTE	$1.755.000
CC-88311695	01	No	No	No	81	736	5429001	Fijo	RIVERO VILLAMIZAR JOSE PABLO	$1.423.500
CC-1115740780	01	No	No	No	81	736	5429001	Fijo	TORRES VELANDIA DAVISON	$1.423.500
CC-1091659018	01	No	No	No	81	736	5429001	Fijo	VILA SARABIA JAIR LEANDRO	$8.000.000
CC-1018444460	01	No	No	No	81	736	1711001	Fijo	VILLARREAL ROA JEISSON RENE	$1.423.500
CC-96194216	01	No	No	No	81	736	5429001	Fijo	ZAPATA ALEXANDER	$1.423.500

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 80109920																													0		
CC - 1115742269																													0		
CC - 1020810816																													0		
CC - 1115722498																													0		
CC - 88215089																													0		

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1098752791																													0		
CC - 1098716716																													0		
CC - 1094269468																													0		
CC - 1148703169																													0		
CC - 1116496517																													0		
CC - 1119185219																													0		
CC - 1006407775																													0		
CC - 1125760100																													0		
CC - 1098658689																													0		
CC - 1094283275																													0		
CC - 88219552																													0		
CC - 1234339637																													0		
CC - 1098684323																													0		
CC - 9466736																													0		
CC - 88311695																													0		
CC - 1115740780																													0		
CC - 1091659018																													0		
CC - 1018444460																													0		
CC - 96194216																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 80109920	PORVENIR	30	$2.750.000	0.1600000	$440.000	$0	$0	$440.000	$0	$0	$0
CC - 1115742269	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1020810816	PORVENIR	30	$3.000.000	0.1600000	$480.000	$0	$0	$480.000	$0	$0	$0
CC - 1115722498	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 88215089	PROTECCION	30	$2.750.000	0.1600000	$440.000	$0	$0	$440.000	$0	$0	$0
CC - 1098752791	PORVENIR	30	$5.000.000	0.1600000	$800.000	$0	$0	$800.000	$0	$0	$0
CC - 1098716716	COLPENSIONES	30	$5.000.000	0.1600000	$800.000	$0	$0	$800.000	$0	$0	$0
CC - 1094269468	PORVENIR	30	$3.000.000	0.1600000	$480.000	$0	$0	$480.000	$0	$0	$0
CC - 1148703169	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1116496517	COLPENSIONES	30	$1.500.000	0.1600000	$240.000	$0	$0	$240.000	$0	$0	$0
CC - 1119185219	PORVENIR	30	$1.755.000	0.1600000	$280.800	$0	$0	$280.800	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1006407775	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1125760100	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1098658689	PORVENIR	30	$2.000.000	0.1600000	$320.000	$0	$0	$320.000	$0	$0	$0
CC - 1094283275	PORVENIR	30	$5.000.000	0.1600000	$800.000	$0	$0	$800.000	$0	$0	$0
CC - 88219552	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1234339637	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1098684323	COLPENSIONES	30	$3.000.000	0.1600000	$480.000	$0	$0	$480.000	$0	$0	$0
CC - 9466736	PORVENIR	30	$1.755.000	0.1600000	$280.800	$0	$0	$280.800	$0	$0	$0
CC - 88311695	PROTECCION	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1115740780	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1091659018	PORVENIR	30	$8.000.000	0.1600000	$1.280.000	$0	$0	$1.280.000	$40.000	$40.000	$0
CC - 1018444460	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 96194216	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 80109920	SALUD TOTAL	30	$2.750.000	0.0400000	$110.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2.750.000	5429001	0.0696000	$191.400
CC - 1115742269	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	5429001	0.0696000	$99.100
CC - 1020810816	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$3.000.000	0.0400000	$120.000	$0	0	$0	0	$0	30	$3.000.000	5429001	0.0696000	$208.800
CC - 1115722498	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	5429001	0.0696000	$99.100
CC - 88215089	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$2.750.000	0.0400000	$110.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2.750.000	5429001	0.0696000	$191.400

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1098752791	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$5.000.000	0.0400000	$200.000	$0	0	$0	0	$0	30	$5.000.000	542900 1	0.0696000	$348.000
CC - 1098716716	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$5.000.000	0.0400000	$200.000	$0	0	$0	0	$0	30	$5.000.000	542900 1	0.0696000	$348.000
CC - 1094269468	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$3.000.000	0.0400000	$120.000	$0	0	$0	0	$0	30	$3.000.000	542900 1	0.0696000	$208.800
CC - 1148703169	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	542900 1	0.0696000	$99.100
CC - 1116496517	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.500.000	0.0400000	$60.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.500.000	171100 1	0.0052200	$7.900
CC - 1119185219	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.755.000	0.0400000	$70.200	$0	0	$0	0	$0	30	$1.755.000	542900 1	0.0696000	$122.200
CC - 1006407775	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	542900 1	0.0696000	$99.100
CC - 1125760100	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	542900 1	0.0696000	$99.100
CC - 1098658689	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$2.000.000	0.0400000	$80.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2.000.000	171100 1	0.0052200	$10.500
CC - 1094283275	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$5.000.000	0.0400000	$200.000	$0	0	$0	0	$0	30	$5.000.000	542900 1	0.0696000	$348.000

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 88219552	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	5429001	0.0696000	$99.100
CC - 1234339637	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	5429001	0.0696000	$99.100
CC - 1098684323	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$3.000.000	0.0400000	$120.000	$0	0	$0	0	$0	30	$3.000.000	5429001	0.0696000	$208.800
CC - 9466736	EPS-S COOSALUD	30	$1.755.000	0.0400000	$70.200	$0	0	$0	0	$0	30	$1.755.000	5429001	0.0696000	$122.200
CC - 88311695	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	5429001	0.0696000	$99.100
CC - 1115740780	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	5429001	0.0696000	$99.100
CC - 1091659018	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$8.000.000	0.0400000	$320.000	$0	0	$0	0	$0	30	$8.000.000	5429001	0.0696000	$556.800
CC - 1018444460	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1711001	0.0052200	$7.500
CC - 96194216	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	5429001	0.0696000	$99.100

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-80109920	COMFIAR	30	$2.750.000	0.0400000	$110.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1115742269	COMFIAR	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1020810816	COMFIAR	30	$3.000.000	0.0400000	$120.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1115722498	COMFIAR	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-88215089	COMFIAR	30	$2.750.000	0.0400000	$110.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1098752791	COMFIAR	30	$5.000.000	0.0400000	$200.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1098716716	COMFIAR	30	$5.000.000	0.0400000	$200.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1094269468	COMFIAR	30	$3.000.000	0.0400000	$120.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1148703169	COMFIAR	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1116496517	COMFIAR	30	$1.500.000	0.0400000	$60.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1119185219	COMFIAR	30	$1.755.000	0.0400000	$70.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1006407775	COMFIAR	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1125760100	COMFIAR	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1098658689	COMFIAR	30	$2.000.000	0.0400000	$80.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1094283275	COMFIAR	30	$5.000.000	0.0400000	$200.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-88219552	COMFIAR	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1234339637	COMFIAR	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1098684323	COMFIAR	30	$3.000.000	0.0400000	$120.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-9466736	COMFIAR	30	$1.755.000	0.0400000	$70.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-88311695	COMFIAR	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1115740780	COMFIAR	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1091659018	COMFIAR	30	$8.000.000	0.0400000	$320.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1018444460	COMFIAR	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-96194216	COMFIAR	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 08											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	3	$1.520.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.520.000
PORVENIR	19	$7.439.600	$0	$0	$40.000	$40.000	0	$0	$0	$0	$7.519.600
PROTECCION	2	$667.800	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$667.800

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	9	$612.200	$0	0	$0	0	$0	$612.200	0	$0	$0	$612.200	$0	0	$0	$0	$612.200	$0	$0	$612.200
NUEVA E.P.S. S.A.	13	$1.615.000	$0	0	$0	0	$0	$1.615.000	0	$0	$0	$1.615.000	$0	0	$0	$0	$1.615.000	$0	$0	$1.615.000
SALUD TOTAL	1	$110.000	$0	0	$0	0	$0	$110.000	0	$0	$0	$110.000	$0	0	$0	$0	$110.000	$0	$0	$110.000
EPS-S COOSALUD	1	$70.200	$0	0	$0	0	$0	$70.200	0	$0	$0	$70.200	$0	0	$0	$0	$70.200	$0	$0	$70.200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	24	$3.871.300	0	$0	$0	$3.871.300	0	$0	$3.871.300	0	$0	$0	$3.871.300

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFIAR	24	$2.407.400	0	$0	$2.407.400
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	4	$2.407.400
PENSIONES	3	$9.707.400
RIESGOS PROFESIONALES	1	$3.871.300
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$2.407.400
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$18.393.500

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 8637860082
REFERENCIA DE PAGO (PIN): 8637860082
Fecha Pago Planilla: 2025-09-05

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	LUIS AUGUSTO MUÑOZ GARCEZ	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	71684632	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CLL 9 # 24-36	DEPARTAMENTO	ARAUCA	MUNICIPIO	FORTUL
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4923	CORREO ELECTRÓNICO	CONSORCIORIOBANADIA@GMAIL.COM	TELÉFONO	3144832910
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	SINARP	Tipo de aportante	Administrador de pensiones

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 08	Año: 2025	Mes: 08	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$0		8637860082
