INFORME DE SUPERVISION FINAL
INVITACION PUBLICA N° MG-IMC-024-2025

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	MIGUEL ALEXIS RODRIGUEZ DURAN
Identificación	C.C. N° 1.053.326.589 expedida en Chiquinquirá
Fecha de suscripción del Contrato	20 DE JUNIO DE 2025
Objeto	EXCAVACIÓN A MÁQUINA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE LA RED PRINCIPAL DEL ACUEDUCTO DE LA CEBADA MUNICIPIO DE GARANTIVA BOYACÁ.
Plazo de Ejecución	TREINTA (30) DÍAS o hasta agotar el presupuesto oficial. El plazo iniciara a contarse a partir del acta de inicio.
Prorroga N° 01	QUINCE (15) DIAS
Fecha de inicio	20 DE JUNIO DE 2025
Fecha de Finalización	06 DE AGOSTO DE 2025

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor del Contrato	$ 25.900.000
Valor presente acta	$ 12.950.000
Valor pagado	$ 12.950.000
Valor faltante por ejecutar / valor pendiente por pagar	$ 0
Porcentaje de Ejecución	100%
Porcentaje por Ejecutar	0 %
Estado de la Garantía	N/A
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 09 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2025.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

OBLIGACIONES

ITEM	CANTIDAD/ HORAS	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	92.5	EXCAVACION PARA PASO DE ACUEDUCTO	$140.000	$ 12.950.000

Obligación de pago de seguridad social: Cumplir con el pago de sus obligaciones al sistema general de seguridad social (salud, pensión y arl), acreditando el pago de dichas obligaciones en los porcentajes establecidos por la ley.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha de Pago**
El contratista adjunta planilla de pago de seguridad social	planilla de pago N° 88894585	11/08/2025

3.2. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No. **MG-IMC-024-2025**, se encuentra EJECUTADO, con un porcentaje de CUMPLIMIENTO del **100** %.

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

5. LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA

Durante el presente período no se han presentado llamados de atención al contratista.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.

b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.

c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.

d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.

e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.

f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.


7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).




Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

8. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO


Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.


EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES

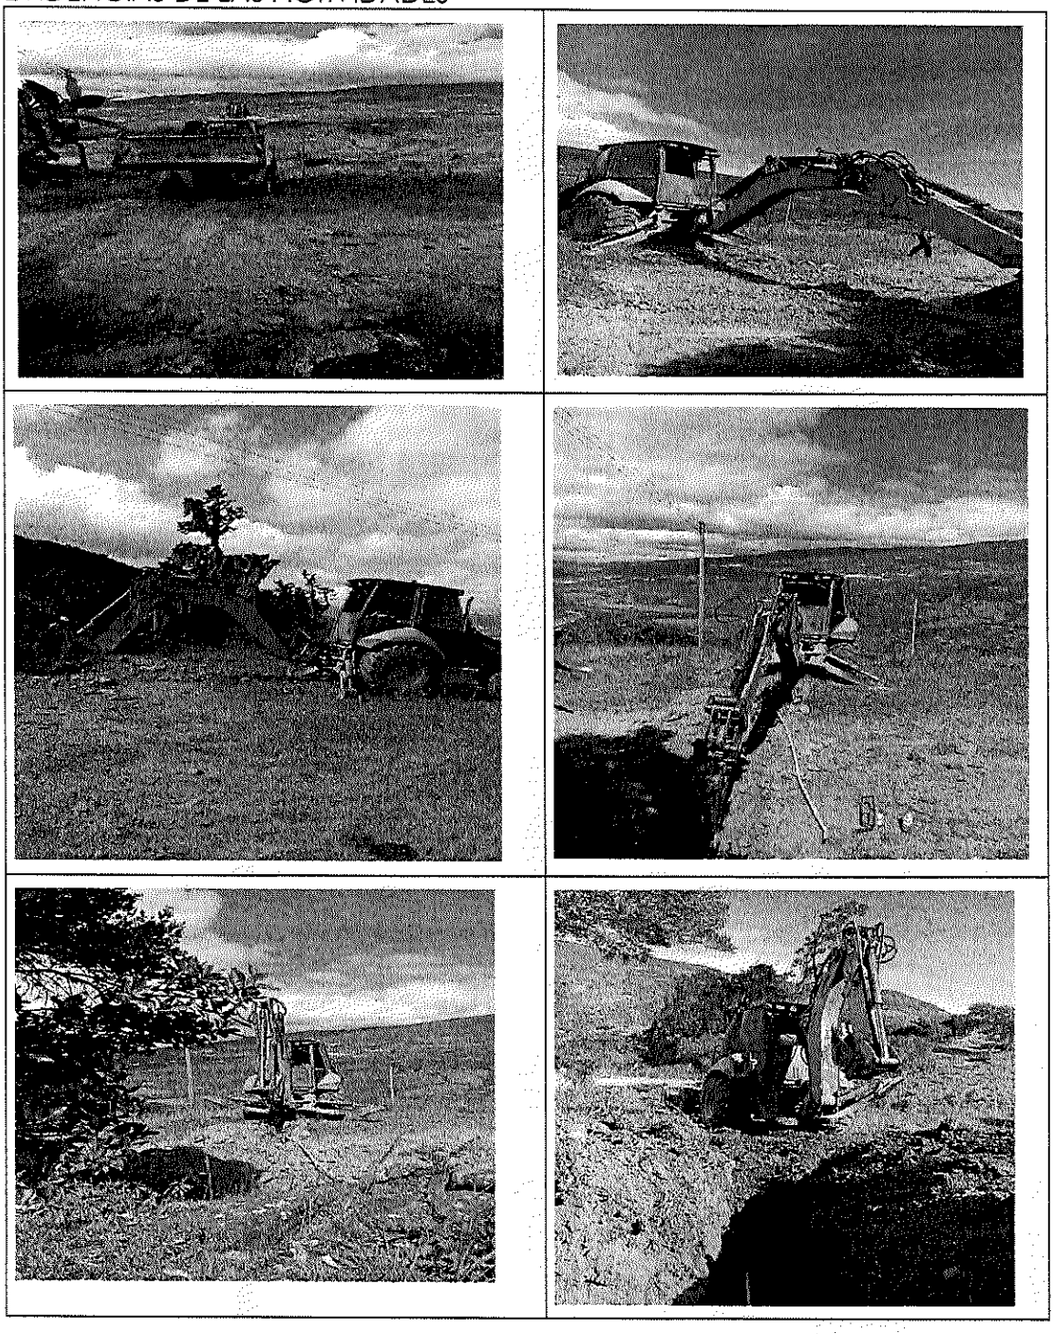

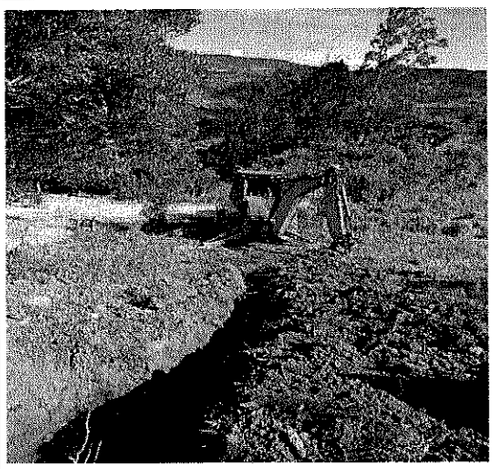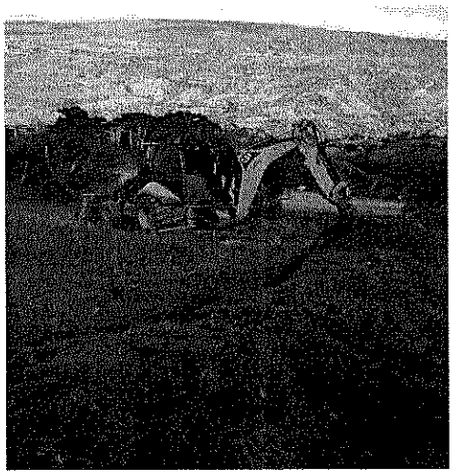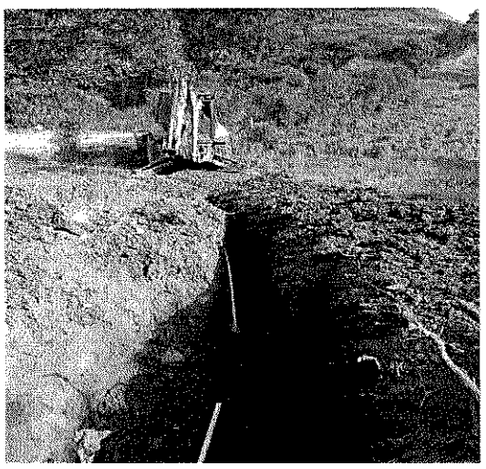

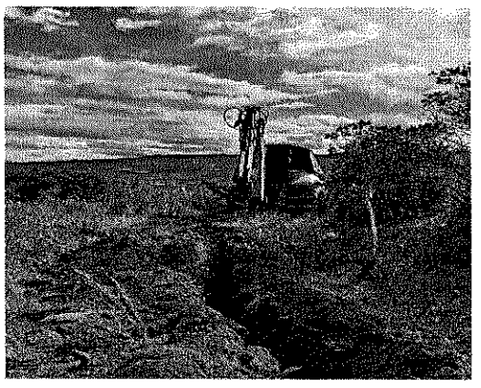

El presente informe se firma en Gachantivá Boyacá, a los once (11) días del mes de Agosto de 2025.

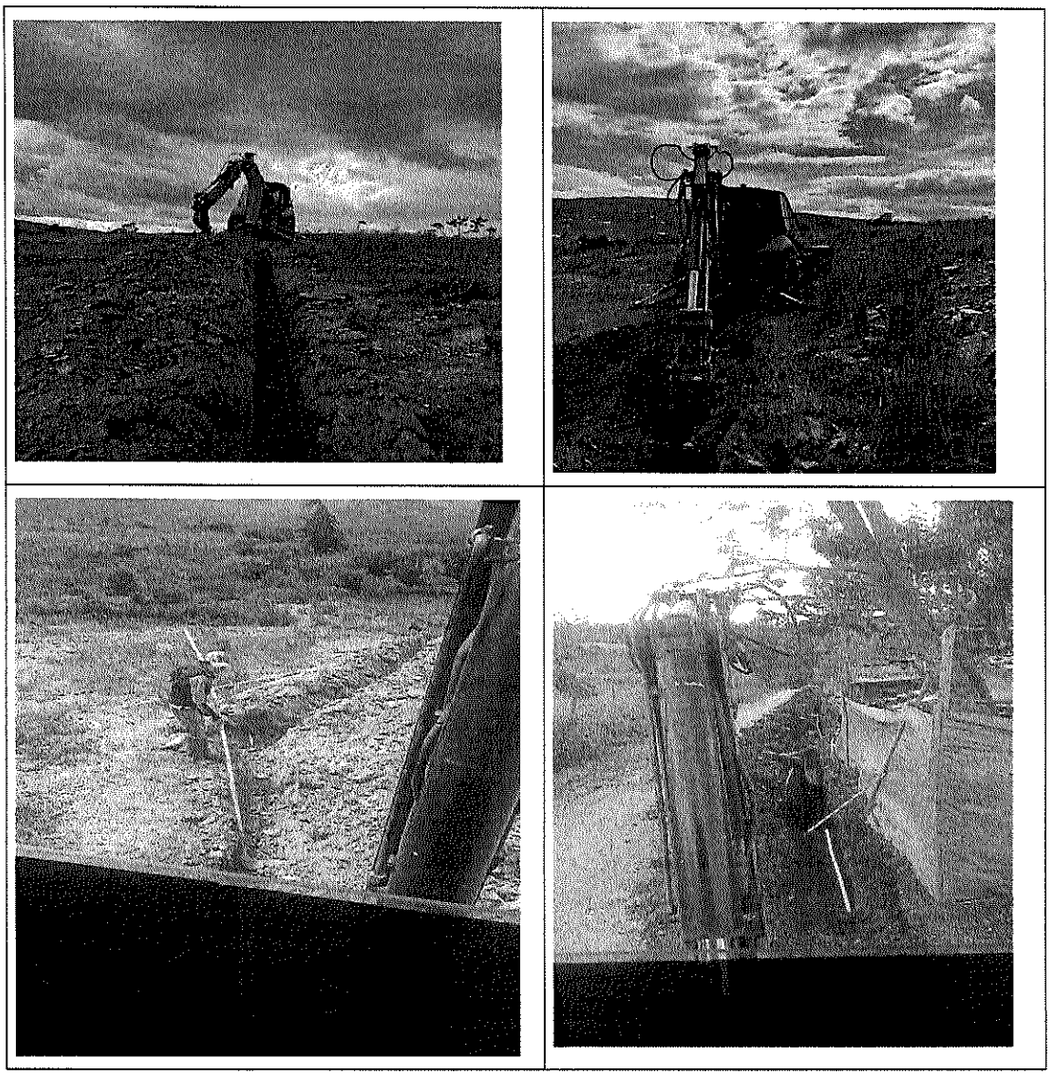Atentamente,

NATALIA BUITRAGO CAMARGO
Secretaria de Planeación, desarrollo e infraestructura
Supervisora del Contrato
N° MG-IMC-024-2025
