

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	**CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE Y EL DESARROLLO DEL TALENTO DEPORTIVO LOCAL, EN EL GRAN MALECÓN DEL RÍO Y SUS DESARROLLOS, EN EL DISTRITO DE**	**184 días**	**jue 20/03/25**	**lun 20/10/25**
2	**PRELIMINARES**	**150 días**	**jue 20/03/25**	**jue 11/09/25**
3	Nivelación replanteo y señalización	12 días	jue 20/03/25	jue 3/04/25
4	Desmonte de postes incluye retiro de materi	7 días	lun 31/03/25	lun 7/04/25
5	Desmonte de piso y retiro de material	150 días	jue 20/03/25	jue 11/09/25
6	Suministro e instalacion de cerramiento en lamina de fibrocemento, altura 2,40 mt	5 días	sáb 22/03/25	vie 28/03/25
7	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**	**145 días**	**mié 26/03/25**	**mié 10/09/25**
8	Excavacion Manual incluye Retiro de materia	141 días	lun 31/03/25	mié 10/09/25
9	Excavación a máquina y retiro de material sobrante	108 días	vie 9/05/25	mié 10/09/25
10	Relleno en material seleccionado Compactad	145 días	mié 26/03/25	mié 10/09/25
11	**ESTRUCTURA**	**141 días**	**mié 9/04/25**	**sáb 20/09/25**
12	SOLADO EN CONCRETO DE 2000 PSI	54 días	mié 9/04/25	vie 13/06/25
13	Concreto de 4000 psi para pisos y muros, no incluye acero de refuerzo, incluye formaleta	117 días	lun 5/05/25	lun 15/09/25
14	Superficies de concreto reforzado, premezclado de 4000 psi, incluye endurecedor tipo Euclid Diamond Hard de Toxement o similar, e: 0.15m, acabado pulido y brillado, mediante equipo mecanico y manual, no incluye acero de refuerzos.	86 días	lun 16/06/25	sáb 20/09/25
15	Tope llanta en concreto reforzado de 6000 psi Dim: 0.25mx0.20m, incluye acero de refuerzos y anclajes.	60 días	vie 11/07/25	mié 17/09/25
16	Acero de refuerzo Figurado	133 días	lun 21/04/25	sáb 20/09/25
17	**MAMPOSTERIA**	**127 días**	**lun 28/04/25**	**sáb 20/09/25**
18	Levante de muro en bloque abuzardado de 0.15 x 0.20 x 0.40 metros con celdas rellenas en concreto de 2500 psi, refuerzo central de d = 1/2" a cada 2.00 metros, mortero de	114 días	lun 28/04/25	vie 5/09/25
19	PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	13 días	vie 5/09/25	sáb 20/09/25
20	Filete o juntas con mortero 1:4	125 días	mar 29/04/25	vie 19/09/25

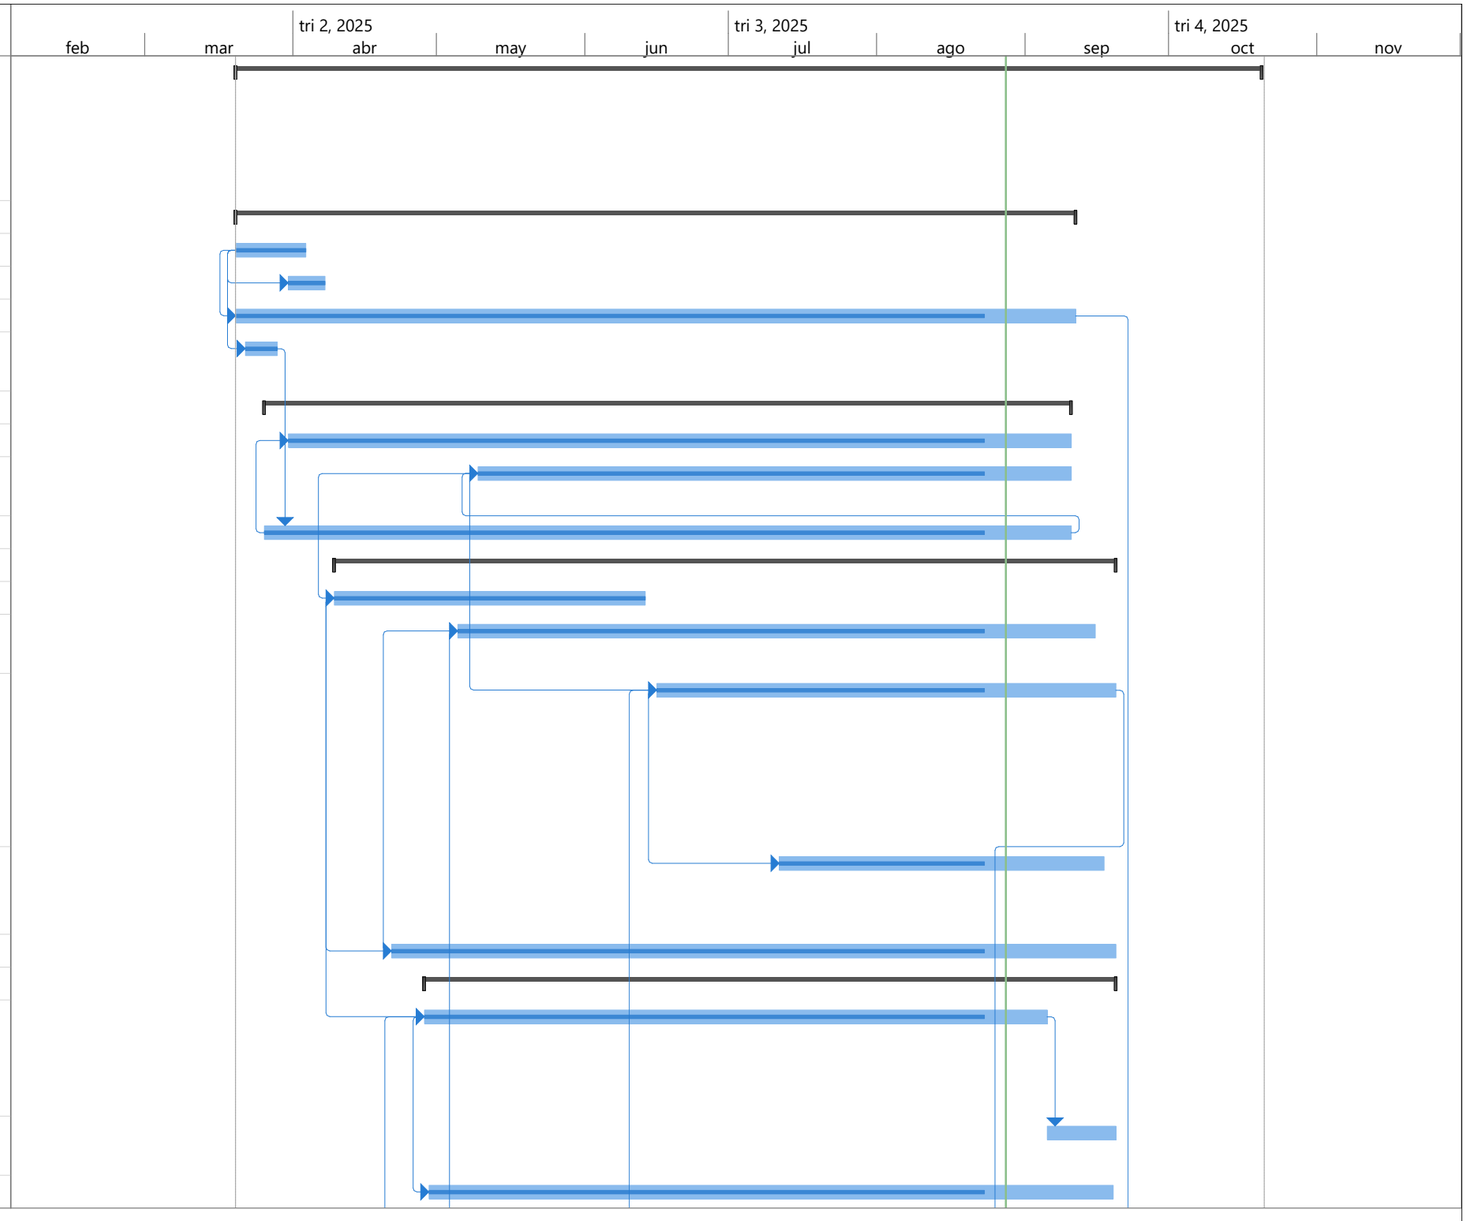

Proyecto: SKATE PARK project
Fecha: jue 28/08/25

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
21	Corte de concreto para juntas de dilatacion, incluye jumbolon y/o Sikarod 5mm y/o similar, ademas de elemento sellante para protección de junta Sika Flex 401 pavement	85 días	vie 13/06/25	jue 18/09/25
22	Suminsitro e instalacion de Barrera tipo New Jersy, prefabricada en concreto reforzado, perfil superior doble ala ALTURA = 0.80 METROS, BASE = 0.60 METROS, LONGITUD = 1.50 METROS, PESO 830 KG, TIPO TITAN O	20 días	vie 29/08/25	sáb 20/09/25
23	**HIDRAULICA, SANITARIA Y PLUVIALES**	**130 días**	**mié 23/04/25**	**vie 19/09/25**
24	Suministro e instalación de tuberia PVC, Sanitarias, para desagues Pluviales, incluye excavaciones y relleno con material proveniente de excavación, ademas de apisonado mecánico y atranques en concreto de 3000 psi dim:	115 días	mié 23/04/25	mié 3/09/25
25	Suministro e instalación de tapas de desagues diametro 6", acero galvanizado	20 días	jue 28/08/25	vie 19/09/25
26	Suminsitro e instalación de rejillas de desagues, en acero galvanizado, angulos de ajustes, dimesiones: 0.40mx0.40m	20 días	jue 28/08/25	vie 19/09/25
27	Construcción de cárcamo en concreto reforzado de 3000 psi, dimensiones 0.40mx0.40m, e:0.12m, incluye rejilla de acero galvanizado y Acero de refuerzos	36 días	mar 5/08/25	sáb 13/09/25
28	Construcción de Registros en concreto reforzado de 3000 psi, dimensiones 0.40mx0.40mx0.50m, incluye acero de refuerzos.	115 días	mié 23/04/25	mié 3/09/25
29	**CARPINTERIA METALICA**	**101 días**	**mié 28/05/25**	**sáb 20/09/25**
30	Suministro e instalación de tubería acero negro, tipo LIP 2 1/2" Schedule 40, sin costura, incluye pintura epoxica final, color a determinar y/o definir por entidad	101 días	mié 28/05/25	sáb 20/09/25
31	Suministro e instalación de tubería acero negro, tipo LIP 4" Schedule 40, sin costura, incluye pintura epoxica final, color a determinar y/o definir por entidad	101 días	mié 28/05/25	sáb 20/09/25
32	Suministro e instalación tubería cuadrada acero negro dim: 0.10mx0.10m, schedule 40, ASTM 53, incluye pintura epoxica final, color a determinar y/o definir por entidad	101 días	mié 28/05/25	sáb 20/09/25

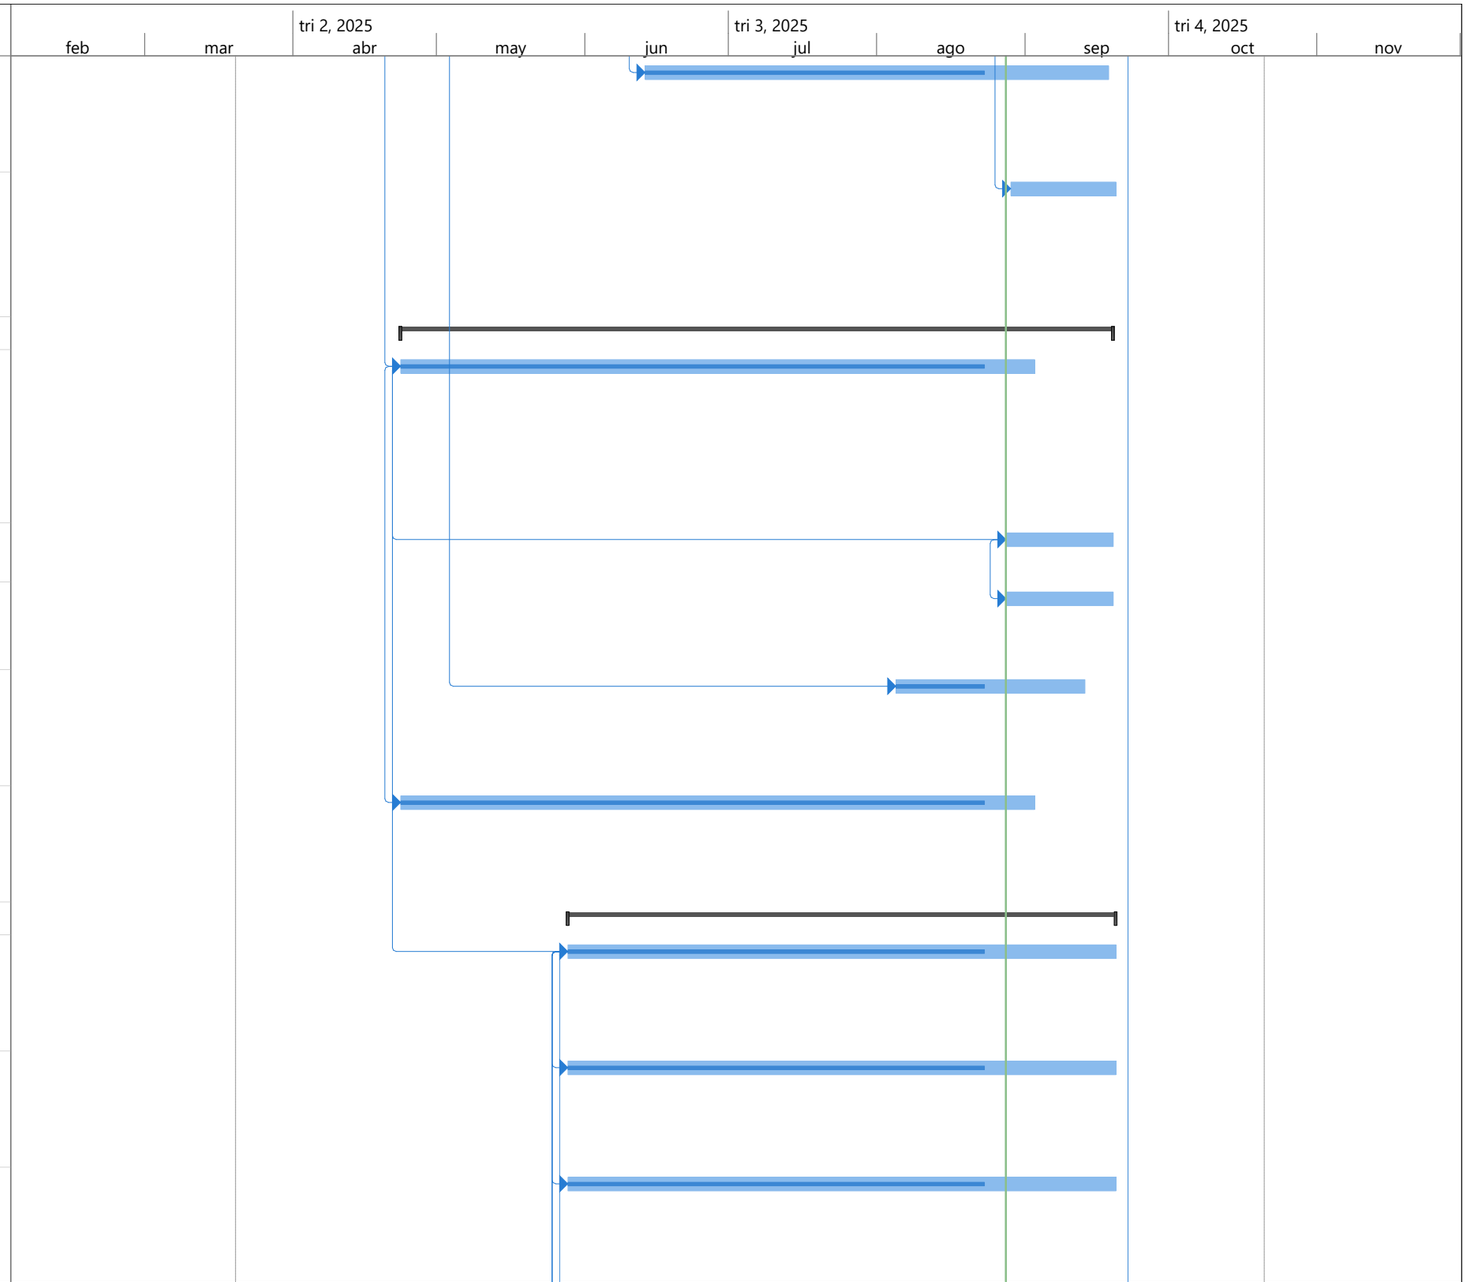

Proyecto: SKATE PARK project
Fecha: jue 28/08/25

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
33	Suministro e instalación tubería cuadrada acero negro dim: 0.20mx0.10m, schedule 40, ASTM 53, incluye pintura epoxica final, color a determinar y/o definir por entidad	101 días	mié 28/05/25	sáb 20/09/25
34	Suministro e instalación de perfil tipo C en acero negro, dim: 20x10x3, incluye pintura epoxica final, color a determinar y/o definir por entidad contratate.	101 días	mié 28/05/25	sáb 20/09/25
35	Suministro e instalación de codos acero de 2 1/2", schedule 40, conexión mediante buje y/o soldadura, incluye pintura epoxica final, color a determinar y/o definir por entidad	101 días	mié 28/05/25	sáb 20/09/25
36	Suministro e instalación de codos galvanziados de 4", schedule 40, conexión mediante buje y/o soldadura, incluye pintura epoxica final, color a determinar y/o	101 días	mié 28/05/25	sáb 20/09/25
37	Suministro e instalación de baranda metálica (ver diseño)	21 días	jue 28/08/25	sáb 20/09/25
38	Suministro e instalación de barandas con parales a cada 15 cm en tubo de 1-1/2 x 3 mm de espesor, pasamano en tubo rectangular DEW 150X150X4 mm de	21 días	jue 28/08/25	sáb 20/09/25
39	**URBANISMO**	**47 días**	**mié 30/07/25**	**sáb 20/09/25**
40	Loseta Plana de 400x400x60 Mm De Espesor Color institucionales, Colocada Sobre Capa De Mortero E= 3 Cms, Capa De Concreto de 3000 psi E= 10 Cms Y Capa De Subbase Granular E= 15cms, Colocada A Pique De Maceta Con Mortero, Todo Ello Realizado	47 días	mié 30/07/25	sáb 20/09/25
41	**PROVISION**	**158 días**	**jue 20/03/25**	**sáb 20/09/25**
42	PROVISION PMT, PGS, PMA	158 días	jue 20/03/25	sáb 20/09/25
43	**ITEMS NO PREVISTOS**	**25.38 días**	**lun 22/09/25**	**lun 20/10/25**
44	REGISTRO ELECTRICO DE 0.40 X 0.40 METROS CON MUROS , Y TAPA MACIZA EN CONCRETO DE 3000 PSI REFORZADO, Y	15 días	lun 29/09/25	mié 15/10/25
45	REGISTRO ELECTRICO DE 0.60 X 0.60 METROS CON MUROS , Y TAPA MACIZA EN CONCRETO DE 3000 PSI REFORZADO.	15 días	lun 29/09/25	mié 15/10/25
46	SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTERÍA CONDUIT PVC 2", INCLUYE ACCESORIOS Y CINTA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA	10 días	lun 22/09/25	jue 2/10/25

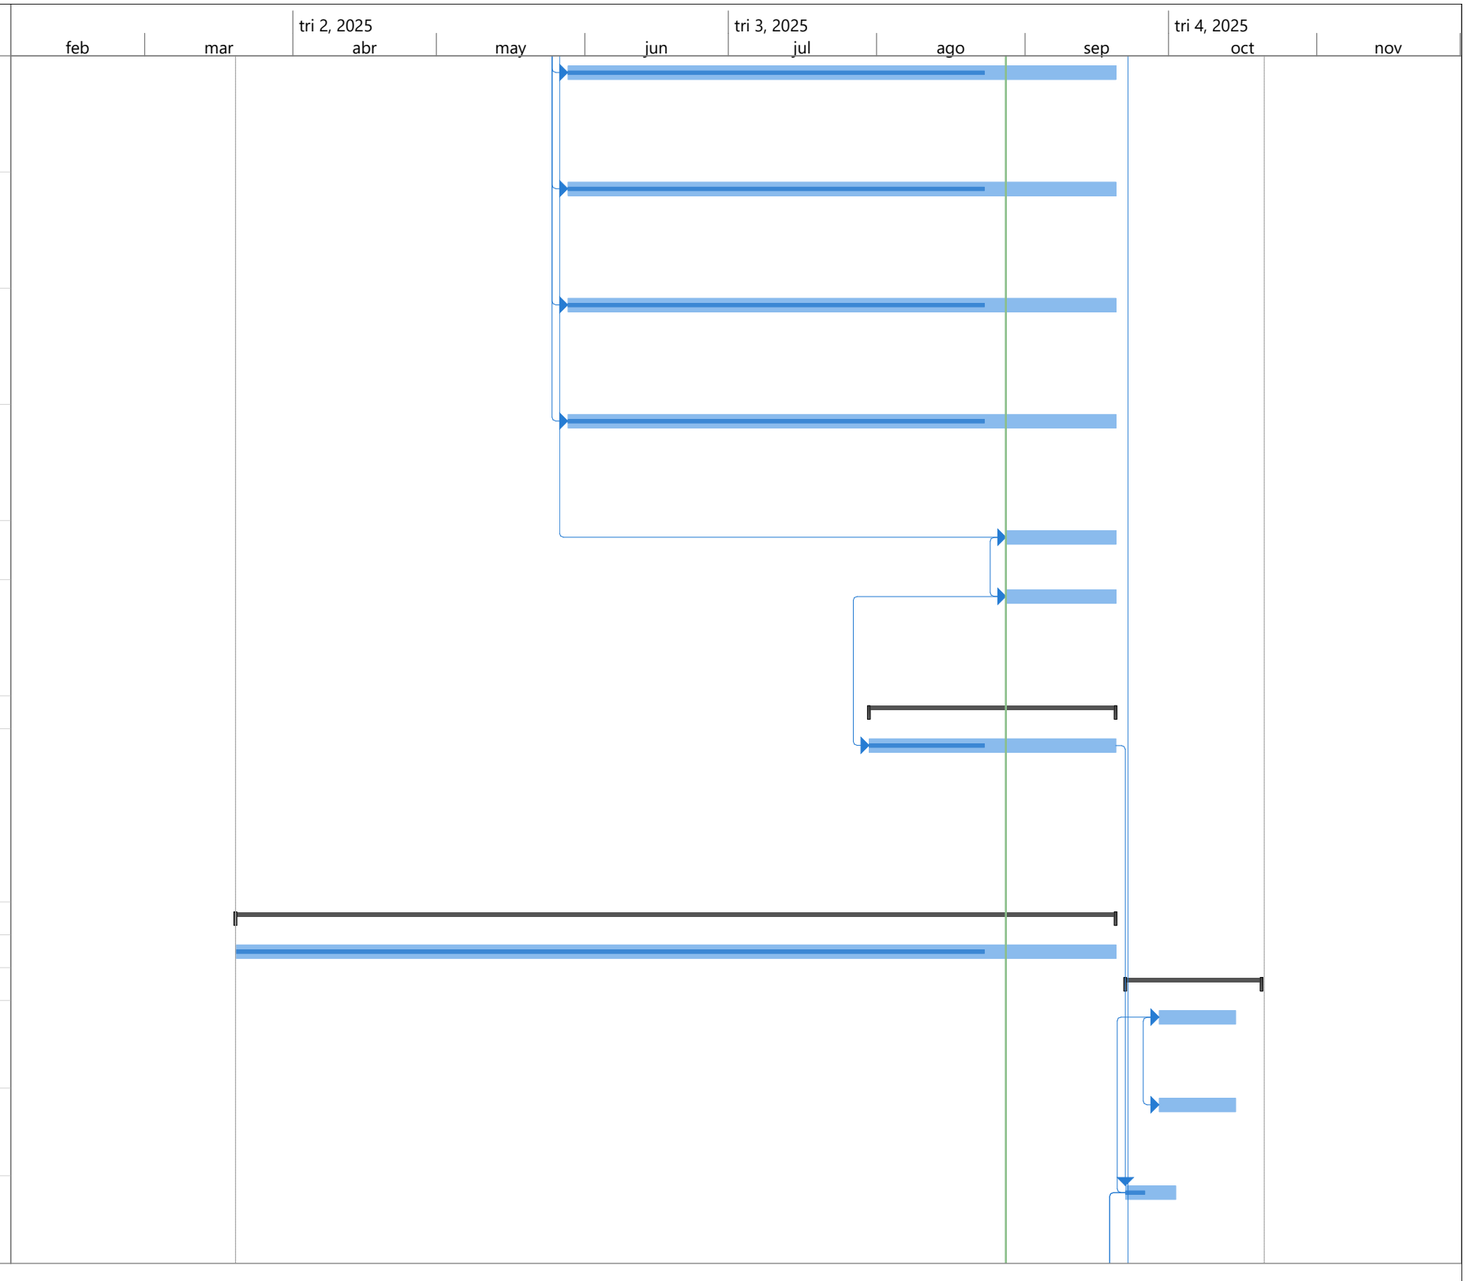

Proyecto: SKATE PARK project
Fecha: jue 28/08/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
47	RELLENO CON MATERIAL DE SITIO COMPACTADO	18 días	lun 22/09/25	sáb 11/10/25
48	PERFILACIÓN MANUAL DEL TERRENO	15 días	lun 22/09/25	mié 8/10/25
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEDRA FILTRANTE	17 días	mar 30/09/25	lun 20/10/25
50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PERFORADA 4"	17 días	mar 30/09/25	lun 20/10/25
51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NO TEJIDO NT 1600	17 días	mar 30/09/25	lun 20/10/25
52	ALIMENTADOR EN CABLE 1#2 AWG	17 días	mar 30/09/25	lun 20/10/25
53	ALIMENTADOR EN CABLE 1#6 AWG LIBRE DE HALOGENOS	17 días	mar 30/09/25	lun 20/10/25
54	REJILLA EN CONCRETO PARA CARCAMO, INCLUYE MORTERO DE NIVELACIÓN Y VIGA CINTA	10 días	lun 22/09/25	jue 2/10/25
55	Suministro instalacion de Pergola en estructura metalica incluye cubierta en la mina alveolar según diseño	20 días	vie 26/09/25	lun 20/10/25
56	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA EN PVC, DIAMETRO 4"	20 días	vie 26/09/25	lun 20/10/25
57	PUNTO SANITARIO EN PVC, DIAMETRO 4"	20 días	vie 26/09/25	lun 20/10/25
58	PUNTO DE AGUA POTABLE POTABLE EN PVC DE 2"	20 días	vie 26/09/25	lun 20/10/25
59	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PVC DE 2"	20 días	vie 26/09/25	lun 20/10/25
60	SUMINISTRO INSTACION DE POZO SEPTICO Integrado Septilisto 2.000 Litros o similar	20 días	vie 26/09/25	lun 20/10/25
61	MONTAJE DE ANDEN CON MATERIAL REUTILIZADO DEL DESMONDE DE PISO INCLUYE RESTAURACION DE SUELO CEMENTO INSTALACION DE LOSETA	25 días	lun 22/09/25	lun 20/10/25
62	**COSTO INDIRECTO**	**184 días**	**jue 20/03/25**	**lun 20/10/25**
63	**AIU (30%)**	**184 días**	**jue 20/03/25**	**lun 20/10/25**

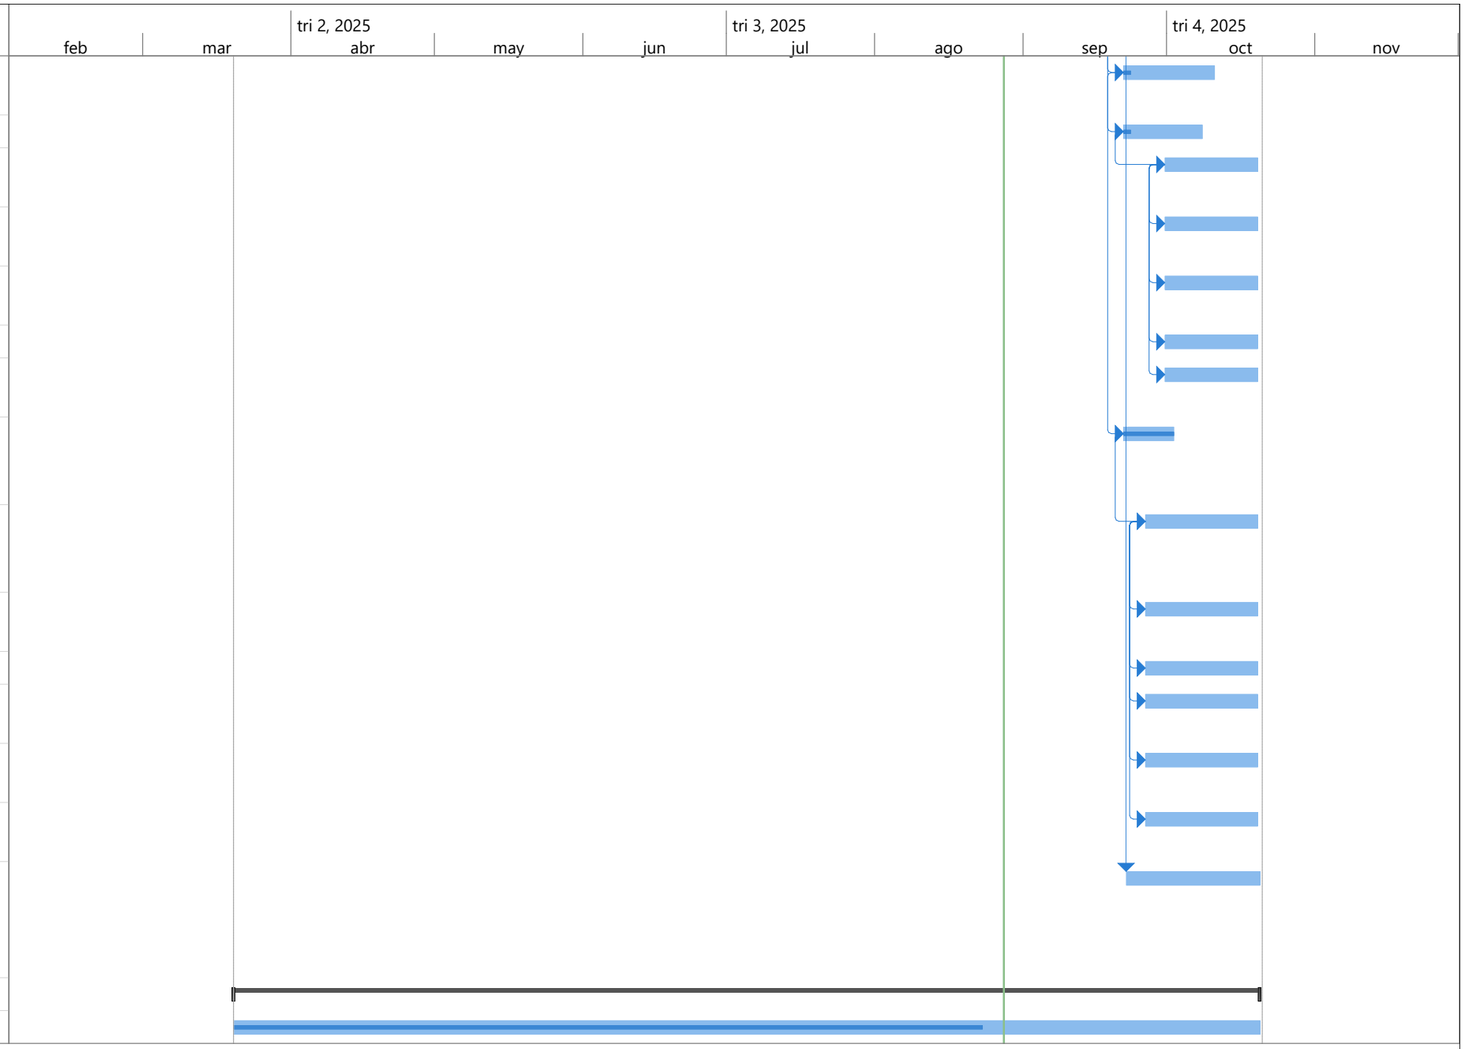

CONTRATISTA DE OBRA
JAVIER ANDRES TORRES MORE
REPRESENTANTE LEGAL
OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S

Proyecto: SKATE PARK project
Fecha: jue 28/08/25

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	
