
Gobernación de ARAUCA

INFORME MENSUAL N0. 01 DE INTERVENTORÍA PARA AVANCE DE OBRA

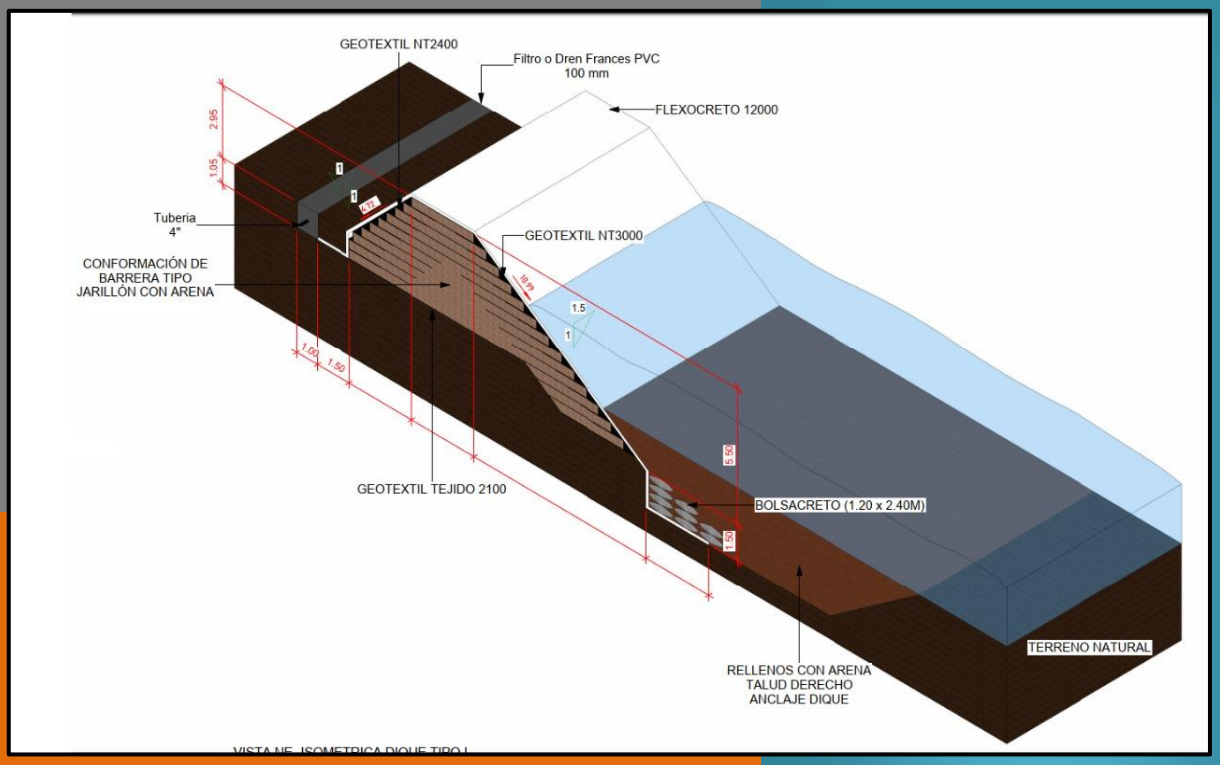

CONTRATO DE OBRA No.481 DE 2024

"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA."

SARAVENA, ENERO/2025

INFORME DE MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 01 DE SEGUIMIENTO DE OBRA

PERIODO: DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2025



CONTRATO DE OBRA No. 481 DE 2024

CONTRATISTA: CONSORCIO RIO BANADIA R/L. FERNEY ALFONSO PAEZ GARCIA BELTRAN

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 473 DE 2024

CONTRATISTA: CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN R/L. JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON

OBJETO: "INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".

SUPERVISOR: ING. CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO

SARAVENA, ENERO DE 2025

CONTENIDO

INTRODUCCION....5
1 ASPECTOS PRE Y CONTRACTUALES DE INTERVENTORIA....8
1.1 PROCESO DE SELECCIÓN....8
1.2 CELEBRACION DEL CONTRATO....8
1.3 ALCANCE DE LA INTERVENTORIA....8
1.3.1 Interventoria Técnica....9
1.3.2 Interventoria Administrativa....9
1.3.3 Interventoria Financiera....9
1.3.4 Interventoria Ambiental....9
1.4 GARANTIAS DEL CONTRATO....12
1.5 IMPOSICIÓN DE MULTAS Y SANCIONES....12
2 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERVENTORIA....13
2.1 ACTOS DE ADMINISTRACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 473 DE 2024 13
2.2 PERSONAL DE INTERVENTORIA....13
2.3 EQUIPOS....16
3 ASPECTOS FINANCIERO DE INTERVENTORIA....18
4 AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA....21
5 ASPECTOS PRECONTRACTUALES DEL CONTRATO DE OBRA....23
5.1 PROCESO DE SELECCIÓN....23
5.2 CELEBRACION DEL CONTRATO....23
6 ANTECEDENTES Y REVISION DEL PROYECTO....23
6.1 DESCRIPCION GENERAL....23
6.2 LOCALIZACION....24
6.3 ALCANCE....25
7 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORIA....25
7.1 GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA....25
7.1.1 Informe Contractual – Ficha Técnica del contrato de obra....25
7.2 GARANTIAS DEL CONTRATO CONTRATO DE OBRA 481/2024....28
7.2.1 Pólizas de Legalización....28
7.3 IMPOSICION DE MULTAS Y SANCIONES....28
7.4 ACTOS ADMINISTRATIVOS....29
7.4.1 Modificaciones y/o adiciones al contrato....29
7.4.2 Compensación de mayores y menores cantidades....29
7.5 ACTAS DE COMITÉ TECNICOS....29
7.6 CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA....29

7.7 BITACORA DIARIA DE OBRA 30
7.8 CONTROL SOCIAL DE LA OBRA 30
7.8.1 Socialización del proyecto 30
7.8.2 Conformación de la veeduría ciudadana 31
7.8.3 Actas y reuniones suscritas por la veeduría ciudadana 32
7.9 VINCULACION DEL PERSONAL Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES 32
7.9.1 Personal Administrativo 32
7.9.2 Personal Operativo 33
7.9.3 Pagos salariales y liquidación del personal 34
7.10 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 34
7.10.1 Dotación del personal 34
7.10.2 Señalización de la obra 35
7.10.3 Accidentalidad en la obra 36
7.10.4 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 36
7.10.5 Capacitaciones realizadas por el contratista de obra de (SG-SST) 37
7.11 CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA 38
8 ASPECTOS TECNICOS 41
8.1 CONDICIONES CONTRACTUALES 41
8.2 CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA 42
8.3 AVANCE DE LA OBRA 43
8.3.1 Avance Físico de las obras 43
8.3.2 Avance del plazo contractual 43
8.4 PROGRAMACION DE LA OBRA 44
8.5 IMPREVISTOS PRESENTADOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA 44
8.6 ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS 45
8.7 CONTROL DE CALIDAD DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS 49
9 ASPECTOS FINANCIEROS 50
9.1 MANEJO DEL ANTICIPO 50
10 ASPECTOS AMBIENTALES 50
10.1 SEGUIMIENTO A PERMISOS Y/O LICENCIAS AMBIENTALES 50
10.2 PERMISOS Y LICENCIAS 50
10.2.1 Licencia o permisos ambientales 50
10.2.2 Licencias y permisos para explotación de materiales de construcción 50
10.3 SEGUIMIENTO AL DOCUMENTO AMBIENTAL 50
11 CONCLUSIONES 51

LISTA DE TABLAS

TABLA No. 1 ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA.....10
TABLA No. 2 FICHA TECNICA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA.....11
TABLA No. 3 PÓLIZAS INICIALES CONTRATO DE INTERVENTORIA 473 DE 2024 12
TABLA No. 4 ACTOS ADMINISTRATIVOS 13
TABLA No. 5 COMPONENTE DE PERSONAL DE TRABAJO Y PORCENTAJES DE PARTICIPACION 14
TABLA No. 6 RESUMEN SEGURIDAD SOCIAL DE INTERVENTORIA.....14
TABLA No. 7 RELACION DEL PERSONAL DE INTERVENTORIA 15
TABLA No. 8 EQUIPOS 16
TABLA No. 9 AVANCE FINANCIERO 19
TABLA No. 10 TIEMPO 20
TABLA No. 11 AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 22
TABLA No. 12 COORDENADAS DEL PROYECTO.....25
TABLA No. 13 CONDICIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE OBRA 481 DE 2024. 27
TABLA No. 14 PÓLIZAS INICIALES DEL CONTRATO DE OBRA NO. 481 DE 2024.....28
TABLA No. 15 ACTOS ADMINISTRATIVOS CONTRATO DE OBRA NO. 481 DE 2024.....29
TABLA No. 16 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA DE LA FIRMA CONTRATISTA DE OBRA y/o SUPERVISOR ASIGNADO 30
TABLA No. 17 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A LA FIRMA CONTRATISTA DE OBRA y/o SUPERVISOR ASIGNADO 30
TABLA No. 18 CONFORMACIÓN DE LA VEEDURÍA CIUDADANA PARA EL CONTROL SOCIAL DEL CONTRATO DE OBRA NO. 481 DE 2024. 31
TABLA No. 19 PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO DE OBRA NO. 481/2024 CORTE 01 (31/12/2024 AL 31/01/2025) 32
TABLA No. 20 PERSONAL OPERATIVO DEL CONTRATO DE OBRA NO. 481 DE 2024 CORTE 01 (31/12/2024 AL 31/01/2025) 33
TABLA No. 21 COMPROMISOS LABORALES DEL CONTRATISTA - CONTRATO DE OBRA NO. 481 DE 2024. 34
TABLA No. 22 DOTACIÓN DEL PERSONAL EN OBRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CONTRATO DE OBRA NO. 481 DE 2024.....35
TABLA No. 23 SEÑALIZACIÓN INSTALADA EN LA OBRA POR EL CONTRATISTA DEL CONTRATO DE OBRA NO. 481 DE 2024. 36
TABLA No. 24 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS UTILIZADO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL CONTRATO NO. 481 DE 2024. 40
TABLA No. 25 CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES DEL CONTRATO DE OBRA NO. 481 DE 2024. 41
TABLA No. 26 CANTIDADES EJECUTADAS DEL CONTRATO DE OBRA NO. 481 DE 2024.....42
TABLA No. 27 PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO VS EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA NO. 481 DE 2024. 44

LISTA DE FOTOGRAFIAS

Fotografia No. 1 Oficina de interventoria.....17
Fotografia No. 2 Equipos de topografía.....17
Fotografia No. 3 Camioneta interventoria.....18
Fotografia No. 4 Socializacion del contrato de obra e interventoria.....31
Fotografia No. 5 entrega de dotacion interventoria.....35
Fotografia No. 6 Señalizacion de obra.....36
Fotografia No. 7 Capacitaciones.....37
Fotografia No. 8 Estacion total.....38
Fotografia No. 9 Nivel de precision.....38
Fotografia No. 10 Volqueta chevrolet.....39
Fotografia No. 11 Volqueta chevrolet.....39
Fotografia No. 12 Retroexcavadora cat.....39
Fotografia No. 13 Retroexcavadora komatsu.....40
Fotografia No. 14 Excavacion mecanica.....46
Fotografia No. 15 Acarreo de material.....47
Fotografia No. 16 Control de agua.....48

LISTA DE GRAFICOS

Grafico No. 1 Avance físico de interventoria.....19
Grafico No. 2 Avance del tiempo.....20
Grafico No. 3 Avance Físico del contrato de obra.....43
Grafico No. 4 Avance físico programado Vs Ejecutado del Contrato de Obra No. 481 de 2024 44

LISTA DE IMÁGENES

Imágen No. 1 Localizacion del proyecto.....24

LISTA DE ANEXOS

Anexo No. 1:.....12
Anexo No. 2:.....13
Anexo No. 3:.....14
Anexo No. 4:.....18
Anexo No. 5:.....30
Anexo No. 6:.....31
Anexo No. 7:.....37
Anexo No. 8:.....50

INTRODUCCION

El presente documento corresponde al Informe de interventoría al contrato de obra No 481 de 2024 como seguimiento a las actividades ejecutadas por parte del contratista de obra, el cual comprende el periodo entre el 31 de diciembre de 2024 hasta el 31 de enero de 2025. Contiene el resumen de las actividades ejecutadas durante el desarrollo del contrato de obra, celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE ARAUCA** y el **CONSORCIO RIO BANADIA R/ FERNEY ALFONZO PAEZ GARCIA**, identificado con NIT. 901.902.273-3, cuyo objeto es **"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA",** el cual está bajo la supervisión de la interventoría externa con contrato de consultoría No. 473 de 2024.

Entre la firma contratista **CONSORCIO RIO BANADIA** y el **DEPARTAMENTO DE ARAUCA** como entidad contratane se celebro el Contrato de obra No 481 de 2024, donde se establecieron las actividades contractuales y especificaciones técnicas que determian la línea de seguimiento, control y supervisión por parte de esta interventoria externa, lo que permiten presentar el presente Informe que resume las actividades ejecutadas, actos administrativos y técnicos acumulados durante el periodo de ejecución a corte de fecha del mismo.

En cumplimiento de las funciones del contrato de interventoría No. 473 de 2024 cuyo objeto es la **"INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".** Ejecutada por el **CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN R/L. JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON**, como es velar por la correcta ejecución del contrato de obra No. 481 de 2024, se realizó un seguimiento detallado de cada una de las actividades ejecutadas por el contratista. El presente informe contiene la ejecución técnica, administrativa, financiera y ambiental del contrato antes mencionado, de acuerdo a las exigencias de la entidad contratante, contenidas en las especificaciones técnicas, referidas en los siguientes aspectos:

- **Trabajos ejecutados:** Descripción general de las obras ejecutadas, evaluadas técnicamente de acuerdo a las especificaciones y diseños.
- **Recursos:** Relacionados con el personal, equipo y materiales del contratista empleado en el periodo correspondiente del informe.
- **Aspectos administrativos:** Modificaciones, actas, pólizas, problemas y soluciones adoptadas, y reuniones con la comunidad y comités técnicos de obra.

De esta forma se da cumplimiento a los requerimientos de seguimiento y medición en el aspecto técnico, administrativo, financiero y ambiental exigido por el departamento de Arauca, para la ejecución de obras con la calidad especificada en el proyecto.

1 ASPECTOS PRE Y CONTRACTUALES DE INTERVENTORIA

1.1 PROCESO DE SELECCIÓN

El Departamento de Arauca adelantó el proceso de selección del contratista mediante concurso de merito0s abierto **CM-02-RE-001-2024**, de conformidad con lo establecido en la Ley 80/93, numeral 1 del art. 2 de la ley 1150 de 2007, art 14 y 15 del decreto 2474 de 2008 y demás normatividad concordante, para lo cual la Gerencia de Contratación realizó oportunamente las publicaciones pertinentes en la página WEB www.contratos.gov.co, Departamento de Arauca, llevándose a cabo el cierre del proceso de selección de acuerdo al cronograma y realizando la respectiva evaluación de las ofertas presentadas por los proponentes por parte del Comité Evaluador. Una vez se llevó a cabo las evaluaciones jurídicas, técnica y financiera de las propuestas y se estableció el orden de elegibilidad, se procedió a adjudicar el contrato al **CONSORCIO INTER OBRAS PROTECCIÓN R/L. JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON** mediante Resolución No. 4748 del 26 de diciembre de 2024; la resolución hace parte del anexo uno del primer informe de cumplimiento.

1.2 CELEBRACION DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta la Resolución de Adjudicación No. 4748 del 26 de diciembre de 2024, se procedió a la suscripción del Contrato de interventoria No. 473 del 27 de diciembre de 2024 entre la gerente de contratación Dra. LUZ LILIANA MARCHENA PINZON del Departamento de Arauca y la firma contratista **CONSORCIO INTER OBRAS PROTECCION** representada por **JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON** el cual tiene por objeto **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADÍA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"**, con un plazo de ejecución de SEIS (06) MESES y un valor de **$ 507.281.339,60**

1.3 ALCANCE DE LA INTERVENTORIA

ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación CM-02-RE-001-2024.

El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta económica presentada y debidamente aceptada y con sus propios medios –materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las actividades propias de interventoría según lo establece la legislación vigente, el Pliego de Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercerá la interventoría.

El alcance de la interventoría incluye el fortalecimiento de la calidad de cada uno de los componentes del proyecto como son:

- Aseguramiento de la calidad de los materiales utilizados.
- Aseguramiento de la idoneidad profesional y técnica del personal vinculado a la ejecución del proyecto.
- Seriedad en la entrega y presentación de la información requerida por la administración municipal.

- Fluidez en los canales y medios de comunicación internos y externos establecidos con el contratista y la entidad contratante.
- Control de documentos y registros.

Conforme con el programa de trabajo formulado por la interventoría, fueron realizadas actividades administrativas, dejando registros que indiquen la calidad del servicio y de la obra en todas sus etapas, cumpliendo las exigencias de la administración departamental.

En este sentido se implantaron registros documentales como:

- Registro fotográfico.
- Informes de interventoría.
- Actas de ejecución (comités, contractuales, suspensión, prorroga, etc.).
- Comunicaciones internas y externas escritas.
- Acciones preventivas correctivas (mejoramiento continuo).

1.3.1 Interventoria Técnica

A través del contrato de consultoría No. 473 de 2024, corresponde a la **INTERVENTORÍA EXTERNA** ejercida por el **CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION** hacer control de calidad y cantidad de los materiales suministrados, según ítems contratados. Vigilar y hacer cumplir el cronograma de trabajo, entregado por la firma contratista de obra **CONSORCIO RIO BANADIA.**

1.3.2 Interventoria Administrativa

La interventoría realiza el control y vigilancia del personal, equipos y recursos que son utilizados para la ejecución del proyecto por parte del contratista, y exigir el cumplimiento de la normatividad en cuanto a incorporación del personal a los Sistemas de Seguridad Social. Además, adelantar los actos administrativos (actas, oficios, etc.), que sean correspondientes durante el transcurso de la ejecución del proyecto.

1.3.3 Interventoria Financiera

La interventoría realiza el control al plan de gastos o inversión mensual, revisar y comprobar que los soportes de gastos como facturas, comprobantes de egresos documentos equivalentes y demás, estén bien elaborados; efectuar un seguimiento permanente a los costos del proyecto lo cual incluye contrataciones y ejecuciones de cada uno. Mensualmente debe presentarse un informe detallado en el cual se incluya todos los movimientos financieros aprobados con la Fiducia.

1.3.4 Interventoria Ambiental

La interventoría ambiental abarca los aseguramientos de la ejecución por parte del contratista de las medidas de protección, mitigación y compensación ambiental a los impactos causados por la ejecución del proyecto; en cumplimiento del documento ambiental, facilitado por la Administración Departamental y aprobado por la Corporación Autónoma Regional De La Orinoquia CORPORINOQUIA. Adicionalmente realiza acompañamiento en todas las etapas de seguimiento y control hechas por parte de la autoridad ambiental al proyecto u obra en ejecución.

TABLA No. 1 ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

ENTIDAD CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE ARAUCA
CONTRATO DE CONSULTORIA	473 de 2024
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN	4748 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO CONTRACTUAL	SEIS (06) MESES
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADÍA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN, R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON
Nit. N°	901.901.368-1
VALOR CONTRACTUAL	QUINIENTOS SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE. ($507.281.339,60)
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	SGR202324-0043 11 – DIC - 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL	SGR202324 - 00408
VALOR ANTICIPO (40%)	DOSCIENTOS DOS MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS MCTE ($ 202.912.535,84)
SUPERVISOR DESIGNADO:	CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO
FECHA DE INICIO:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	30 DE JUNIO DE 2025
PERIODO DEL INFORME	
FECHA DE CORTE DE INFORME	DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2025
DIAS TRANSCURRIDOS CONSECUTIVOS	32

El contrato de Interventoria 473/2024, se contrata con las siguientes cantidades, y que hasta el presente informe no presenta modificación alguna:

TABLA No. 2 FICHA TECNICA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CANT.	CARGO / OFICIO	COSTOS DE PERSONAL	SUELDO Y/O JORNAL MENSUAL	PARTICIPACIÓN (h-mes)	VALOR PARCIAL ($)
(1)		(2)	(3)	(4)	(1)*(2)*(3)*(4) = (5)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL					
PERSONAL PROFESIONAL					
1	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	$ 8,000,000.00	6.00	50%	$ 24,000,000.00
1	RESIDENTE AMBIENTAL PROFESIONAL EN INGENIERÍA AMBIENTAL	$ 5,000,000.00	6.00	100%	$ 30,000,000.00
1	RESIDENTE CIVIL PROFESIONAL EN INGENIERÍA CIVIL	$ 5,000,000.00	6.00	100%	$ 30,000,000.00
1	PROFESIONAL HSEQ	$ 3,000,000.00	6.00	100%	$ 18,000,000.00
1	CONTADOR	$ 3,000,000.00	6.00	50%	$ 9,000,000.00
PERSONAL ADMINISTRATIVO					
1	SECRETARIA	$ 2,000,000.00	6.00	100%	$ 12,000,000.00
				SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)	$ 123,000,000.00
				FACTOR MULTIPLICADOR (7)	**2.20**
				SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)	**$ 270,600,000.00**

CANT.	CONCEPTO	UNIDAD	V. UNITARIO ($)	No. MESES	VALOR PARCIAL ($)
(8)			(9)	(10)	(8)*(9)*(10) = (11)
OTROS COSTOS DIRECTOS					
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA					
	COSTOS ALQUILER DE EQUIPOS				
1	ALQUILER CAMIONETA PICK UP. CILINDRAJE > 2000 CC. MODELO MAYOR A 6 ÚLTIMOS AÑOS.	UND	$ 10,490,880.00	6.00	$ 62,945,280.00
OTROS COSTOS					
1	REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS, PLANOS Y OTROS GASTOS	MES	$ 1,081,832.00	6.00	$ 6,490,992.00
1	ENSAYOS DE LABORATORIO (GRANULOMETRÍA DE BASES, SUBBASE Y CRUDOS (INVE-123), CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA (INVE-212), LIMITE LIQUIDO, LIMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD, PROCTOR MODIFICADO (INVIAS E-142) Y ÍNDICE DE COLAPSO (INV E-157))	MES	$ 29,141,560.00	1.00	$ 29,141,560.00
1	OFICINA (INCLUYE ARRENDAMIENTO, ENSERES Y SERVICIOS PUBLICOS)	MES	$ 2,000,000.00	6.00	$ 12,000,000.00
50%	COMISIÓN TOPOGRÁFICA (INCLUYE TOPÓGRAFO, CADENEROS, EQUIPO TOPOGRÁFICO, MOVILIZACIÓN)	MES	$ 15,036,336.00	6.00	$ 45,109,008.00
				SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)	**$ 155,686,840.00**
				SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)	**$ 426,286,840.00**
				VALOR TOTAL BÁSICO	**$ 426,286,840.00**
				IVA = 19% * (E) = (F)	**$ 80,994,499.60**
				COSTO TOTAL = (E) + (F)	**$ 507,281,339.60**

1.4 GARANTIAS DEL CONTRATO

Se relacionan las garantías adquiridas a favor del Departamento de Arauca, según los requerimientos hechos en la cláusula diecisiete del Contrato de interventoria No. 473 de 2024, suscritas con Asegurado Solidaria de Colombia, bajo las Póliza No. 49-44-101035207 del 31 de diciembre de 2024, en las cuales se encuentran relacionadas cada una de las garantías exigidas por la entidad contratante. Dichas Pólizas están revisadas y aprobadas por el Gerente Técnico de contratación Administrativa, de conformidad a lo dispuesto en la ley 80 de 1993.

Anexo No. 1:

Polizas y sus respectivas aprobaciones del contrato de interventoria 473/2024 se presentan como del presente informe de cumplimiento de interventoria.

1.4.1 Poliza de legalización

Las pólizas iniciales fueron expedidas el 31 de diciembre de 2024, por la aseguradora **SOLIDARIA DE COLOMBIA**, tomada por **CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN**, y como beneficiario el **DEPARTAMENTO DE ARAUCA**. Las cuales fueron aprobadas por la Gerencia Técnica De Contratación Administrativa, mediante certificación firmada por la Gerente De Contratación Dra LUZ LILIANA MARCHENA PINZON el 31/12/2024.

A continuación, se detalla la información de la póliza inicial:

TABLA No. 3 PÓLIZAS INICIALES CONTRATO DE INTERVENTORIA 473 DE 2024

REALACIÓN DE POLIZAS								
No.	FECHA	NOMBRE/TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA	OBS.
0	31/12/2024	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SOLIDARIA DE COLOMBIA	49-44-101035207	$ 101.456.267,92	30/12/2024	30/12/2025	Póliza aprobada por Gerencia Técnica De Contratación Departamento de Arauca
		BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO			$ 202.912.535,84	30/12/2024	30/12/2025	
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES			$ 76.092.200,94	30/12/2024	30/06/2028	
		CALIDAD DEL SERVICIO			$ 101.456.267,92	30/06/2025	30/12/2027	

1.5 IMPOSICIÓN DE MULTAS Y SANCIONES

Hasta la fecha del informe No. 01 comprendido entre el 31 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025, no se han impuesto multas ni sanciones al Consorcio Inter Obras De Proteccion.

2 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERVENTORIA

2.1 ACTOS DE ADMINISTRACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 473 DE 2024

La firma interventora **CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN**, inicio labores el día 31 de diciembre de 2024, una vez suministrada, revisada y aprobada la documentación requerida para suscribir acta de inicio. Al acto se presentó, el secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana Departamental Dr. NASSER CRUZ MATUS y el representante legal de la firma contratista CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN, R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON.

TABLA No. 4 ACTOS ADMINISTRATIVOS

FECHA	ACTO ADMINISTRATIVO	MOTIVO DEL ACTO ADMINISTRATIVO	SUSCRITA POR
27/12/2024	Celebración de contrato	Se firma la minuta del contrato de interventoria 473 de 2024 el 27 de diciembre de 2024, con lo cual se establece el alcance y obligaciones entre los firmantes.	LUZ LILIANA MARCHENA PINZON Gerente de Contratacion Delegacion de funciones mediante resolución 2585 de 2024 JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON. R/ Consorcio Inter Obras De Protección
31/12/2024	Acta de Inicio	Suscribir acta de inicio del contrato de consultoría No. 473 de 2024. Actualizar las pólizas de garantía por los términos establecidos en la minuta del contrato.	NASSER CRUZ MATUS Secretario Gobierno Y Seguridad Ciudadan Departamental JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON. R/L Consorcio Inter Obras De Protección

Anexo No. 2:

Los actos administrativos anteriormente relacionados se presentan como anexo del presente informe de cumplimiento de interventoria

2.2 PERSONAL DE INTERVENTORIA

Las actividades de la Interventoría en el periodo del presente informe No. 01 comprendido entre el 31 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025, fueron desarrolladas por el personal propuesto de acuerdo con las necesidades de la obra y requerimientos propios del proceso No. CM-02-RE-001-2024, la disponibilidad de los profesionales en campo se ejecuta de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico del concurso de méritos.

A continuación, se relaciona el personal y equipo puesto a disposición para las actividades propias de la interventoría externa al contrato de obra 481/2024.

TABLA No. 5 COMPONENTE DE PERSONAL DE TRABAJO Y PORCENTAJES DE PARTICIPACION

PERSONAL Y/O EQUIPO	CANTIDAD	DISPONIBILIDAD	PERIODO DE TRABAJO
PERSONAL DE INTERVENTORIA			
Director de interventoria	1	50%	Del 01 al 15 de enero de 2025
Ingeniero civil residente	1	100%	31 diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025
Ingeniero ambiental residente	1	100%	
Profesional ambiental especialista en gerencia de la seguridad y salud en el trabajo	1	100%	
Contador	1	50%	
Secretaria	1	100%	
Comisión Topográfica (Topógrafo - Cadenero)	1	100%	

TABLA No. 6 RESUMEN SEGURIDAD SOCIAL DE INTERVENTORIA

RESUMEN SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE INTERVENTORIA					
No.	No. PLANILLA	TIPO	MES	VALOR	# TRABAJADORES
1	77226611	E	DIC - 2024	$ 224.700,00	6
2	77227254	E	ENE - 2025	$ 5.191.100,00	6

Anexo No. 3:

Las planillas y soportes de pago de seguridad social del presente periodo del personal de interventoria se presentan como anexo del presente informe de cumplimiento de interventoria.

TABLA No. 7 RELACION DEL PERSONAL DE INTERVENTORIA

Mes: DICIEMBRE DE 2024											
DATOS GENERALES							AFILIADO A				No. DE PLANILLA
No.	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	CC	CARGO	SALARIO	SALUD	PENSION	RIESGOS	CAJA DE COMPENSACION	
1	GOMEZ	RINCON	JAIRO HERNANDO	1.018.410.660	REPRESENTANTE LEGAL	$1.300.000,00	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	COMFIAR	9479575905
2	PELAEZ	PRADA	CARLOS ALBERTO	1.116.794.960	ING DIRECTOR INTERVENTORIA	$8.000.000,00	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	COMFIAR	77226611
3	ROMRO	DUARTE	CRISTIAN	1.094.269.757	ING AMBIENTAL	$5.000.000,00	NUEVA EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	COMFIAR	77226611
4	HERNANDEZ	MARIN	JUAN GABRIEL	1.094.271.704	ING RESIDENE INTERVENTORIA	$5.000.000,00	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	COMFIAR	77226611
5	OROZCO	PEREZ	SINDY MILIYETH	1.116.797.364	HSEQ	$3.000.000,00	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	COMFIAR	77226611
6	MENDOZA	ROMERO	YONIER	86.079.305	CONTADOR	$3.000.000,00	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	COMFIAR	77226611
7	RINCON	BEDOYA	JENNIFER CARELLY	1.005.328.383	SECRETARIA	2.000.000,00	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	COMFIAR	77226611

Mes: ENERO DE 2025											
DATOS GENERALES							AFILIADO A				No. DE PLANILLA
No.	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	CC	CARGO	SALARIO	SALUD	PENSION	RIESGOS	CAJA DE COMPENSACION	
1	GOMEZ	RINCON	JAIRO HERNANDO	1.018.410.660	REPRESENTANTE LEGAL	$1.300.000,00	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	COMFIAR	9490208588
2	PELAEZ	PRADA	CARLOS ALBERTO	1.116.794.960	ING DIRECTOR INTERVENTORIA	$8.000.000,00	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	COMFIAR	77227254
3	ROMRO	DUARTE	CRISTIAN	1.094.269.757	ING AMBIENTAL	$5.000.000,00	NUEVA EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	COMFIAR	77227254
4	HERNANDEZ	MARIN	JUAN GABRIEL	1.094.271.704	ING RESIDENE INTERVENTORIA	$5.000.000,00	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	COMFIAR	77227254
5	OROZCO	PEREZ	SINDY MILIYETH	1.116.797.364	HSEQ	$3.000.000,00	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	COMFIAR	77227254
6	MENDOZA	ROMERO	YONIER	86.079.305	CONTADOR	$3.000.000,00	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	COMFIAR	77227254
7	RINCON	BEDOYA	JENNIFER CARELLY	1.005.328.383	SECRETARIA	2.000.000,00	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	COMFIAR	77226611

2.3 EQUIPOS


La firma interventora CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN, para la coordinación, supervisión y control de las actividades objeto del Contrato de Obra, dispone de recursos técnicos como mobiliario de oficina, unidades de cómputo, fotografía, y laboratorio de materiales, utilizados en el periodo suscrito del presente informe, así como el estado de operación, tiempo disponible y otros atributos indispensables para su manejo.

- **Equipo de Oficina:** El equipo de oficina disponible consta de los siguientes implementos que permiten la óptima ejecución de la interventoria:

TABLA No. 8 EQUIPOS

LISTADO DE EQUIPÓS				
DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS			ESTADO
	MARCA	MODELO	SERIE	
CAMARA FOTOGRAFICA	SAMSUMG	N/A	N/A	EXCELENTE
COMPUTADOR PORTATIL	ASUS	N/A	N/A	EXCELENTE
IMPRESORA	EPSON	N/A	N/A	EXCELENTE
OFICINA	CR 20 # 19-20 SARAVENA	N/A	N/A	EXCELENTE
EQUIPO DE LABORATORIO	LABSOILS SAS	N/A	N/A	EXCELENTE
CAMIONETA PICK UP. CILINDRAJE > 2000 CC	NISSAN	2020	NP 300 FRONTIER	EXCELENTE
COMISION TOPOGRAFICA	ESTACION TOTAL	N/A	GTS 105N	EXCELENTE
	NIVEL PRECISION		AT-B4	

- **Oficina:** Ubicada en la Carrera 17 No 23 - 85 Barrio Galan De Octubre del municipio de Saravena, Arauca, sede principal y el epicentro de ejecución del contrato de interventoria 473/2024.

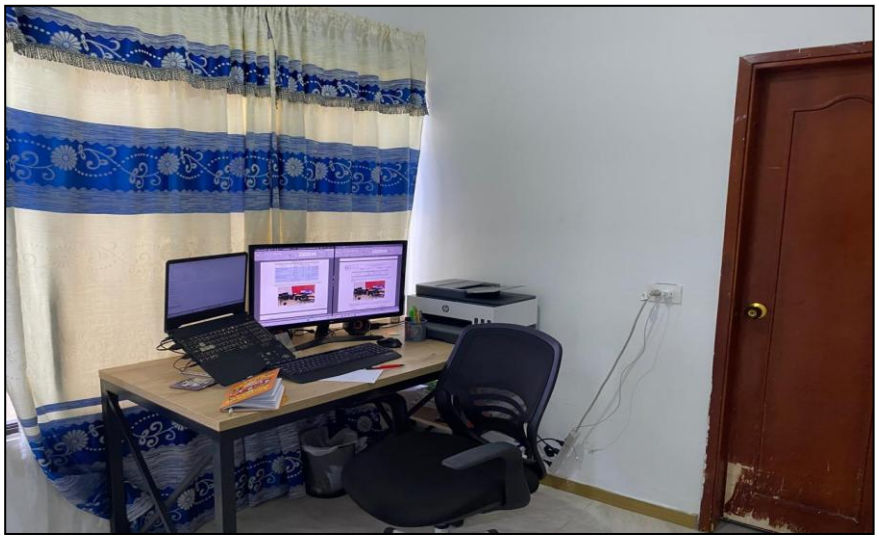

Fotografia No. 1 Oficina de interventoria

- **Comision topografica:** Se dispuso por parte de la firma contratista y de acuerdo a las actividades contractuales establecidas con la entidad contratante, una comisión topográfica compuesta por:

PERSONAL	CANTIDAD	DISPONIBILIDAD
Profesional - Topógrafo	1	100%
Auxiliar – Cadenero	1	100%
EQUIPOS	**CANTIDAD**	**DISPONIBILIDAD**
Estación total + trípode + prisma	1	100%
Nivel de precisión + mira	1	100%



Fotografia No. 2 Equipos de topografía

- **Camioneta PICK UP. CILINDRAJE > 2000 CC:** Se dispuso por parte de la firma contratista y de acuerdo a las actividades contractuales establecidas con la entidad contratante, una camioneta tipo Pick Up de cilindraje >2000 CC para el transporte del equipo técnico y equipos propios para el desarrollo del contrato de interventoria 473/2024.



Fotografia No. 3 Camioneta interventoria

Anexo No. 4:

Los respectivos contratos suscriptos entre el Consorcio Inter Obras De Protección y sus proveedores para la prestación de los servicios anteriormente descriptos hacen parte como anexo del presente informe de cumplimiento de interventoria.

3 ASPECTOS FINANCIERO DE INTERVENTORIA

3.1 MANEJO DEL ANTICIPO

Dando aplicación a lo estipulado en la Cláusula Sexta Anticipo, del Contrato de Interventoria No. 473 de 2024, "La entidad otorgara un anticipo del CUARENTA POR CIENTO (40%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, en calidad de Anticipo, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución del contrato, certificación bancaria de apertura de la cuenta y aprobación del plan de inversión del anticipo. El anticipo será amortizado de acuerdo con el avance de la intrerventroria. Es decir $ 202.912.535,60.

A fecha del presente informe el CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN no ah recibido el pago correspondiente a anticipo por parte de la entidad contratante.

3.2 PAGOS REALIZADOS A LA INTERVENTORIA

Hasta la fecha del presente informe, la entidad contratante NO ha realizado pago o desembolso a la firma contratista CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN correspondiente al pago del anticipo (40%) del contrato de interventoria 473/2024 por un valor de $ 202.912.535,60

3.3 AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

El avance a la fecha del Contrato de consultoría N° 473 de 2024, indica el 16.69% de ejecución y del tiempo contractual de 17.58% transcurrido.

TABLA No. 9 AVANCE FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA			
VALOR DEL CONTRATO	**PLAZO**	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACION INCIAL**
$ 507,281,339.60	SEIS (06) MESES	31 DE DICIEMBRE DE 2024	30 DE JUNIO DE 2025
% DE AVANCE FINACIERO 1 er CORTE			
16.69%			
ESTADO DEL AVANCE EN TIEMPO			
TIEMPO PROGRAMADO EN DIAS	182	TIEMPO TRANSCURRIDO (DIAS)	32
% TIEMPO TRANSCURRIDO EN DIAS		17.58%	
ESTADO DEL AVANCE FINANCIERO EJECUTADO ACUMULADO			
PERIODO	VALOR DEL CONTRATO	ACUMULADO A LA FECHA	% AVANCE FISICO
DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2025	$ 507,281,339.60	$ 84,663,557.00	16.69%

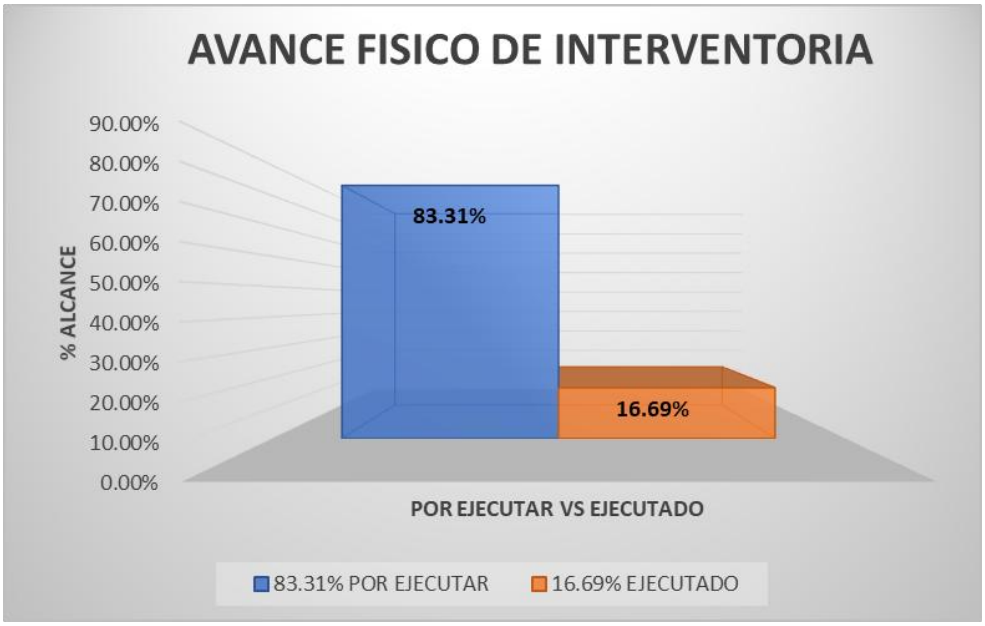


Grafico No. 1 Avance fínanciero de interventoria

3.4 TIEMPO

Para la ejecución del contrato de interventoria No. 473/2024 se dispone contractualmente de seis (06) meses, equivalente a 182 días calendario a partir de acta de inicio del 31 de diciembre de 2024, el siguiente grafico representa los días laborados durante el periodo de ejecución de las actividades de obra del presente informe.

TABLA No. 10 TIEMPO

RESUMEN DEL TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA			
ACTO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN		DURACIÓN (Días)
	Inicio	Finalización	
Inicio	31 – DIC – 2024	30 – 06 - 2025	182
Informe No. 01 De Avance	31 – DIC – 2024	31 – ENE – 2025	32
Tiempo Acomulado	**31 – DIC – 2024**	**31 – ENE – 2025**	**32**

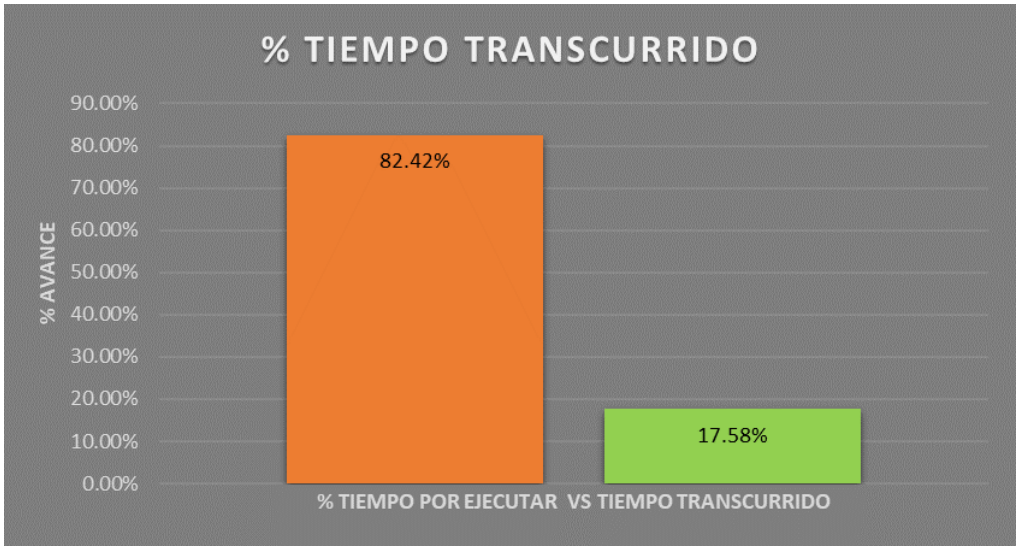


Grafico No. 2 Avance del tiempo.

4 AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Se establece la relación de las condiciones contractuales del contrato de interventoría respecto al personal, equipos dedicados al seguimiento y control de cada una de las actividades realizadas en el contrato de obra N° 481 de 2024 y los implementos empleados para el desarrollo de estas.

Se determina así mismo el periodo de ejecución de la interventoría por un tiempo contractual de seis (06) meses, equivalentes a 182 días a partir del acta de inicio firmada el 31 de diciembre de 2024 teniendo como fecha final inicial y demás actos administrativos propios de la interventoría.

Para efectos del presente informe se relaciona un avance acumulado, durante el periodo de actividad del contrato de obra, llevando a cabo las labores administrativas y técnicas, ejecutando supervisión técnica de actividades desarrolladas en obra, revisión y control de calidad de acuerdo a las especificaciones de diseño y procesos constructivos, acompañamiento, desarrollo y visto bueno de actos administrativas del contrato de obra ejecutada por la firma contratista CONSORCIO RIO BANADIA.

A continuación, se relaciona el personal y los componentes físicos utilizados por la interventoría para el periodo del presente informe. A corte del presente informe el contrato de interventoria presenta un avance físico del 16.69%, que de acuerdo a sus valores unitarios da la suma de $ 84,663,557.00.

TABLA No. 11 AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CANTIDADES CONTRACTUALES							CANTIDADES EJECUTAS DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2025	
CANT.	CARGO / OFICIO	UNIDAD	CANT.	VR. UNITARIO	TIEMPO DE DEDICACION TOTAL EN PORCENTAJE	VALOR PARCIAL $	TIEMPO	TOTAL
A	PERSONAL PROFESIONAL							
1	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	MES	6.00	$ 8,000,000.00	50.00%	$ 24,000,000.00	1.07	$ 4,280,000.00
1	RESIDENTE AMBIENTAL PROFESIONAL EN INGENIERÍA AMBIENTAL	MES	6.00	$ 5,000,000.00	100.00%	$ 30,000,000.00	1.07	$ 5,350,000.00
1	RESIDENTE CIVIL PROFESIONAL EN INGENIERÍA CIVIL	MES	6.00	$ 5,000,000.00	100.00%	$ 30,000,000.00	1.07	$ 5,350,000.00
1	PROFESIONAL HSEQ	MES	6.00	$ 3,000,000.00	100.00%	$ 18,000,000.00	1.07	$ 3,210,000.00
1	CONTADOR	MES	6.00	$ 3,000,000.00	50.00%	$ 9,000,000.00	1.07	$ 1,605,000.00
	PERSONAL ADMINISTRATIVO							
1	SECRETARIA	MES	6.00	2,000,000.00	100.00%	$ 12,000,000.00	1.07	$ 2,140,000.00
					SUBTOTALCOSTOS DEL PERSONAL	$ 123,000,000.00		$ 21,935,000.00
					VALOR FACTOR MULTIPLICADOR	2.20		2.20
					VALOR AFECTADO POR EL FACTOR MULTIPLICADOR	$ 270,600,000.00		$ 48,257,000.00
	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO		VALOR PARCIAL $		
	B. OTROS COSTOS DIRECTOS							
	COSTOS ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA							
1	ALQUILER CAMIONETA PICK UP. CILINDRAJE > 2000 CC. MODELO MAYOR A 6 ÚLTIMOS AÑOS.	MES	6.00	$ 10,490,880.00		$ 62,945,280.00	1.07	$ 11,225,241.60
	OTROS COSTOS							
1	REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS, PLANOS Y OTROS GASTOS	MES	6.00	$ 1,081,832.00		$ 6,490,992.00	1.07	$ 1,157,560.24
1	ENSAYOS DE LABORATORIO (GRANULOMETRÍA DE BASES, SUBBASE Y CRUDOS (INVE-123), CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA (INVE-212), LIMITE LIQUIDO, LIMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD, PROCTOR MODIFICADO (INVIAS E-142) Y ÍNDICE DE COLAPSO (INV E-157))	MES	1.00	$ 29,141,560.00		$ 29,141,560.00	0.01	$ 321,604.62
1	OFICINA (INCLUYE ARRENDAMIENTO, ENSERES Y SERVICIOS PUBLICOS)	MES	6.00	$ 2,000,000.00		$ 12,000,000.00	1.07	$ 2,140,000.00
0.5	COMISIÓN TOPOGRÁFICA (INCLUYE TOPÓGRAFO, CADENEROS, EQUIPO TOPOGRÁFICO, MOVILIZACIÓN)	MES	6.00	$ 15,036,336.00		$ 45,109,008.00	1.07	$ 8,044,439.76
					SUBTOTAL OTROS COSTOS INDIRECTOS	$ 155,686,840.00		$ 22,888,846.22
					SUB TOTAL (A + B)	$ 426,286,840.00		$ 71,145,846.22
					IVA (19%)	$ 80,994,499.60		$ 13,517,710.78
					VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORIA	$ 507,281,339.60	VALOR DE AVANCE	$ 84,663,557.00
							% DE AVANCE	16.69%
					AVANCE ACUMULADO PORCENTAJE Y VALOR		16.69%	$84,663,557.00

5 ASPECTOS PRECONTRACTUALES DEL CONTRATO DE OBRA

5.1 PROCESO DE SELECCIÓN

El Departamento de Arauca adelantó el proceso de selección del contratista mediante la licitación pública número **LO-02-RE-001-2024**, de conformidad con lo establecido en la Ley 80/93, numeral 1 del art. 2 de la ley 1150 de 2007, art 14 y 15 del decreto 2474 de 2008 y demás normatividad concordante, para lo cual la Gerencia de Contratación realizó oportunamente las publicaciones pertinentes en la página WEB www.contratos.gov.co, Departamento de Arauca, llevándose a cabo el cierre del proceso de selección de acuerdo al cronograma y realizando la respectiva evaluación de las ofertas presentadas por los proponentes por parte del Comité Evaluador. Una vez se llevó a cabo las evaluaciones jurídicas, técnica y financiera de las propuestas y se estableció el orden de elegibilidad, se procedió a adjudicar el contrato al **CONSORCIO RIO BANADIA R/L JHONN FREDY GARCIA BELTRAN** mediante Resolución No. 4877 del 31 de diciembre de 2024.

5.2 CELEBRACION DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta la Resolución de Adjudicación No. 4877 del 31 de diciembre de 2024, se procedió a la suscripción del Contrato de obra No. 481 del 31 de diciembre de 2024 entre la Dra. LUZ LILIANA MARCHENA PINZON gerente de contratacion del Departamento de Arauca y la firma contratista **CONSORCIO RIO BANADIA** representada por **JHONN FREDY GARCIA BELTRAN**, el cual tiene por objeto **"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RÍO BANADÍA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"**, con un plazo de ejecución de SEIS (06) MESES y un valor de **$ 14.312.241.291,66.**

6 ANTECEDENTES Y REVISION DEL PROYECTO

6.1 DESCRIPCION GENERAL

El Río Banadía cuenta con aproximadamente 30.6 kilómetros de longitud de los cuales el 100% pueden catalogarse como susceptibles a inundación. En el área de estudio se ha identificado un sector crítico en la vereda Bajo Banadía, en el cual se presenta vulnerabilidad al riesgo de inundación por desbordamiento debido al fenómeno creciente de lluvias torrenciales que se ha intensificado por fenómenos antrópicos y naturales como el fenómeno de la niña, lo que sumado a los procesos erosivos y de socavación ha afectado a las comunidades de la zona, un (1) puesto de salud en Puerto Nariño, una (1) institución educativa en Puerto Nariño, una (1) vía secundaria en caño Tigre entre Puerto Nariño y la Esmeralda.

El punto donde se presenta la problemática es un sector crítico ubicado en un meandro pronunciado sobre el rio Banadía en el Municipio de Saravena, en áreas de la vereda Bajo Banadía. En este sector es crítico por razones dinámicas propias del comportamiento hidráulico del cauce del rio, lo cual ha provocado la degradación de la margen izquierda aguas abajo y perdida de la bancada natural por el fenómeno de socavación lateral y la constante sedimentación que ha acumulado bancos de arena en la sección del cauce, disminuyendo su capacidad hidráulica y ocasionando el desbordamiento del afluente en temporada de lluvias.

Que la alternativa de solución viabilizada es el "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA, DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA". La cual beneficiara a las veredas aledañas a dicho proyecto en especial el centro poblado de Puerto Nariño.

6.2 LOCALIZACION

El Proyecto **"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA, DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".** se encuentra localizado en el Departamento de Arauca, en la zona rural del municipio de Saravena, definido por las coordenadas descriptas en la Tabla No. 01, se realizó una visita técnica por parte de la Interventoría verificando que el área intervenida correspondiese a la descrita en los estudios previos.

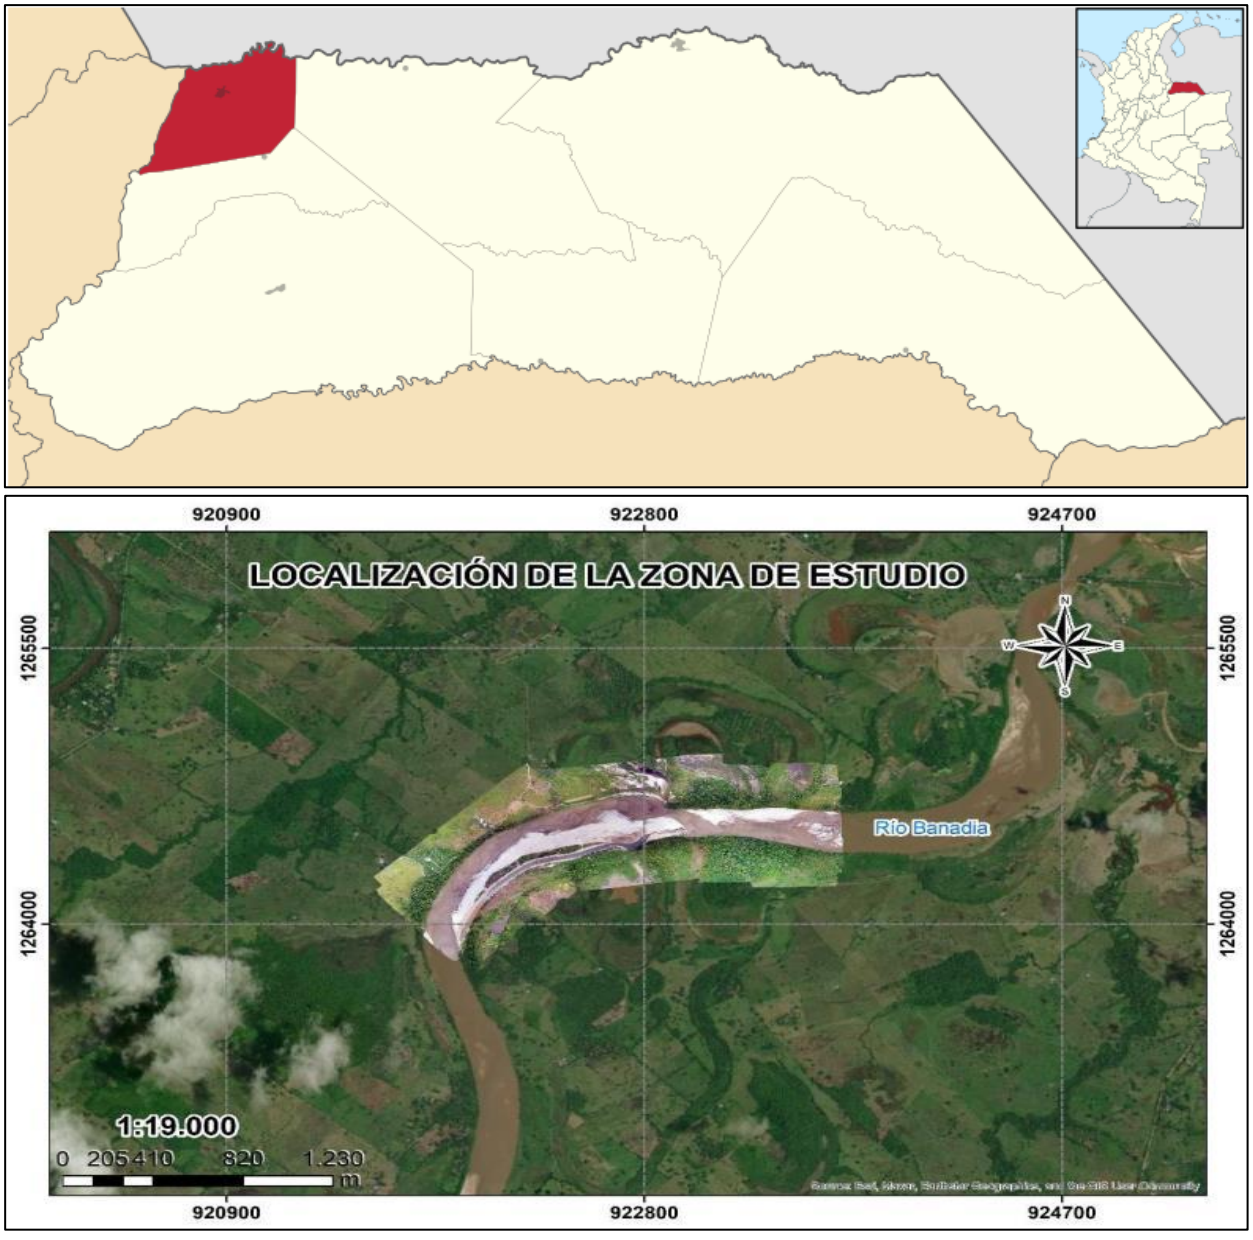


Imagen No. 1 Localizacion del proyecto

TABLA No. 12 COORDENADAS DEL PROYECTO.

Municipio	Saravena	Sector	Bajo Banadía
UBICACIÓN	COORDENADAS		UBICACIÓN
	NORTE	ESTE	
PUNTO DE INICIO	6°58'49.98"N	71°47'3.26"O	VDA.BAJO BANADÍA
PUNTO FINAL	6°59'15.10"N	71°46'04.14"O	VDA.BAJO BANADÍA
		Longitud a intervenir	1.108,00 m

6.3 ALCANCE

En virtud del citado Plan Participativo de Desarrollo Departamental de Arauca 2024-2027, en el eje estratégico recursos naturales sostenibilidad ambiental ecosistemas estratégicos y gestión del riesgo, se estableció como metas e indicadores "obras de infraestructura para mitigación y atención a desastres realizadas", mediante la iniciativa priorizada "construcción de obras de protección contra inundaciones y erosión de los cuerpos hídricos en el departamento de Arauca" para la construcción de obras de protección en el Departamento de Arauca y dar solución a la problemática planteada.

Obras de infraestructura para mitigación y atención a desastres realizadas Con la intervención, el Departamento de Arauca mediante el presente proceso de selección y la consecuente celebración del contrato de obra pública para la "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA, DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA", busca mejorar las condiciones de protección de la ronda hídrica del rio Banadía, para el desarrollo económico y social del municipio de Saravena, Departamento de Arauca, impactando a 1.220 personas según lo descrito en el documento MGA del presente proyecto "Población afectada y objetivo" numeral 01 y 02.

7 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORIA

7.1 GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

7.1.1 Informe Contractual – Ficha Técnica del contrato de obra

FICHA TECNICA DEL CONTRATO	
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO	
ENTIDAD CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE ARAUCA
INTERVENTOR EXTERNO:	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN
SUPERVISOR:	CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO
CONTRATO No:	481 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RÍO BANADÍA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
CONTRATISTA:	CONSORCIO RIO BANADIA

FICHA TECNICA DEL CONTRATO	
REPRESENTANTE:	JHONN FREDY GARCIA BELTRAN (desde el 31/12/2024 al 28/01/2025) FERNEY ALFONZO PAEZ GARCIA (desde el 29/01/2025)
NIT. No:	901.902.273-3
VALOR DEL CONTRATO:	$ 14.312.241.291,66
PLAZO CONTRACTUAL:	SEIS (06) MESES
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	SGR202324-00420 DEL 11/12/2024 SGR202324-00422 DEL 11/12/2024
REGISTRO PRESUPUESTAL:	SGR202324-00401 DEL 31/12/2024 SGR202324-00402 DEL 31/12/2024
FECHA INICIO:	31/12/2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	30/06/2025
PERIODO DEL INFORME	
FECHA DE CORTE DEL INFORME:	DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2025.
DIAS TRANSCURRIDOS:	32 DIAS

La Interventoría en cumplimiento de las actividades contractuales durante este periodo, utilizó el personal ofrecido y relacionado para un desarrollo adecuado de los propósitos que tienden a lograr el objetivo específico como es la "INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA". principalmente en:

Actividades Generales:

- Reuniones de Comités de Obra para tratar todo lo referente al estado del contrato, el avance de obra, la calidad de los materiales y en general todas las situaciones presentadas en la obra, buscando soluciones oportunas a las diferentes inquietudes.
- Atención a los requerimientos presentados por el contratista en aspectos técnicos y administrativos, manejo de anticipo, calidad y suministro de materiales.
- Verificación de la vigencia de las pólizas contractuales, de tal manera que la S.P.I.M. y/o la Alcaldía de Saravena permanezca protegida ante los eventos previstos en el contrato.
- Organización y planeación de las labores de la interventoría.
- Control de obra diario, por frente de obra y a nivel de actividades, insumos y maquinaria.
- Control de la calidad de la obra con base en las especificaciones de construcción.
- Supervisar, sugerir y solicitar el cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista.
- Control del alcance del contrato calculando semanalmente la ejecución de la obra y su presupuesto
- Exigencia al contratista del cumplimiento de la legislación ambiental, tanto en la Ley marco como la expresa para proyecto de acuerdo PAGA derivado del contrato.
- Manejo y archivo de todos los documentos legales y técnicos del contrato.

- Comunicación al contratista sobre las irregularidades e incumplimientos que se están produciendo en desarrollo del contrato.

Actividades Técnicas:

- Solicitud al contratista para que cumplan con lo establecido en pliegos y en el contrato en lo concerniente a:

1. Programa de trabajo.
2. Hojas de vida del personal profesional.
3. Propuesta económica.
4. Maquinaria y equipos

- Registro diario en el libro de obra de todos los aspectos relevantes de la obra, tales como: actividades realizadas, equipo, personal, insumos.
- Revisión y control de los diseños y planos del proyecto, para ejecutar la obra de acuerdo con ellos.
- Control permanente de la calidad y característica de los materiales.
- Verificación del equipo mínimo y su estado de funcionamiento.

La ejecución del Contrato de Obra No. 481 de 2024 tiene como objeto " CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA, DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA " que se encuentra localizado en la zona rural del municipio de Saravena, una vez terminados los trabajos y entregados a satisfacción se tendrá como resultado final la protección de la rivera del rio banadias mediante la construcción de un jarillon como obra de mitigación de riesgo de inundación de la comunidad aledaña y del centro poblado del Puerto Nariño.

Teniendo en cuenta las características del proyecto en construcción, se presenta a continuación la información contractual con las actividades referenciadas para llevar a cabo la realización de la obra.

TABLA No. 13 CONDICIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE OBRA 481 DE 2024.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	OBRAS DE PROTECCIÓN RIO BANADIA				
1,1	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN CONGLOMERADO ENTRE 0-2 m DE PROFUNDIDAD	M3	16.298,68	$ 19.239,00	$ 313.570.304,52
1,2	ACARREO MATERIAL INTERNO NO MAYOR A 2 KM PARA REFORZAMIENTO DEL TALUD NATURAL	M3	16.298,68	$ 23.478,00	$ 382.660.409,04
1,3	CONFORMACIÓN DE BARRERA TIPO JARILLÓN	M3	25.673,470	$127.588,00	$ 3.275.626.690,36
1,4	GEOTEXTIL NT 2400	M2	91.742,40	$ 19.172,00	$ 1.758.885.292,80
1,5	GEOTEXTIL NT 3000	M2	10.858,40	$ 23.242,00	$ 252.370.932,80
1,6	GEOTEXTIL TEJIDO 2100	M2	20.420,44	$ 17.337,00	$ 354.029.168,28
1,7	MANEJO DE AGUAS	MES	6,00	$ 4.293.354,00	$ 25.760.124,00
1,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLEXOCRETO	M2	19.944,00	$ 127.609,00	$ 2.545.033.896,00
1,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSACRETO	M3	3.722,88	$ 940.227,00	$ 3.500.352.293,76
1,10	Filtro o Dren Frances PVC 100 mm (0.6x0.8)m	M	1.108,00	$ 249.909,00	$ 276.899.172,00
1,11	RELLENOS TALUD DERECHO ANCLAJE DIQUE	M3	13.674,94	$ 118.615,00	$ 1.622.053.008,10
				SUB-TOTAL COSTO OBRA FÍSICA (INCLUYE A.I.U)	$ 14.307.241.291,66
				APLICACIÓN AL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA - PUEA	$ 5.000.000,00
				TOTAL, OBRA FÍSICA	$ 14.312.241.291,66

7.2 GARANTIAS DEL CONTRATO CONTRATO DE OBRA 481/2024

De acuerdo con las garantías exigidas por el Departamento de Arauca, en el Contrato de Obra No. 481 de 2024 se suscribe la póliza con compañía de seguros **ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO**. Las siguientes garantías se relacionan teniendo en cuenta los amparos en valor y plazo estipulados en la minuta contractual en la **CLÁUSULA DECIMA OCTAVA** del Contrato así:

7.2.1 Pólizas de Legalización

Las pólizas iniciales fueron expedidas el día 31 de diciembre de 2024 por la aseguradora **SEGUROS DEL ESTADO**, tomadas por el **CONSORCIO RIO BANADIA** y como beneficiario el Departamento de Arauca. Dichas pólizas fueron aprobadas por la Gerencia Técnica de Contratación Administrativa, mediante certificación firmada por la Gerente de Contratación **LUZ LILIANA MARCHENA PINZON** el día 31 de diciembre de 2024.

TABLA No. 14 PÓLIZAS INICIALES DEL CONTRATO DE OBRA NO. 481 DE 2024.

ANEXO	FECHA EXPEDICION	NOMBRE / TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA	OBSERVACIONES
	31 DE DICIEMBRE DE 2024	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	*SEGUROS DEL ESTADO*	9-44-101035208	$5,724,896,516.66	31/12/2024	31/12/2025	POLIZA APROBADA POR LA GERENTE DE CONTRATACION EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
		CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			$2,862,448,258.33	31/12/2024	31/12/2025	
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA			2,862,448,258.33	30/06/2025	30/06/2027	
		PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, INDEMNIZACION			$2,146,836,193.75	31/12/2024	30/06/2028	
	31 DE DICIEMBRE DE 2024	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	*SEGUROS DEL ESTADO*	*9-44-101035208*	$715,612,064.58	31/12/2024	30/06/2025	POLIZA APROBADA POR EL GERENTE DE CONTRATACION EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

Nota: Las polizas y sus respectivas aprobaciones del contrato de obra 481/2024, en documento físico reposan como anexo No. 5 en el informe de cumplimiento No. 01 del contrato de obra.

7.3 IMPOSICION DE MULTAS Y SANCIONES

El contratista **CONSORCIO RIO BANADIA** del contrato de obra No. 481 de 2024, hasta la fecha de corte del presente informe No. 01 comprendido entre el 31 de diciembre al 31 de enero de 2025, no ha sido multado o sancionado por ninguna entidad de la cual se tenga conocimiento por parte de la interventoría externa.

7.4 ACTOS ADMINISTRATIVOS

Durante la ejecución del contrato de obra, se suscribieron los siguientes actos administrativos:

TABLA No. 15 ACTOS ADMINISTRATIVOS CONTRATO DE OBRA NO. 481 DE 2024.

FECHA	ACTO ADMINISTRATIVO	MOTIVO DEL ACTO ADMINISTRATIVO	SUSCRITA POR
31/12/2024	Resolucion No. 4877 de 2024 de Adjudicación del contrato	Se firma la minuta del contrato de obra 481 de 2024 el 31 de diciembre de 2024, con lo cual se establece el alcance y obligaciones entre los firmantes.	LUZ LILIANA MARCHENA PINZON Gerente de Contratacion Delegacion de funciones mediante resolución 2585 de 2024 JHONN FREDY GARCIA BELTRAN R/L. Consorcio Rio Banadia
31/12/2024	Acta de inicio Construcción	El contratista de obra ha cumplido con todoen s requisitos para la suscripción del Acta de Inicio de prealistamiento del contrato de obra, con el fin de revisar los diseños iniciales.	NASSER CRUZ MATUS Secretario De Gobierno Y Seguridad Ciudadana Departamental. JHONN FREDY GARCIA BELTRAN R/L. Consorcio Rio Banadia JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON R/L. Consorcio Inter Obras De Proteccion

7.4.1 Modificaciones y/o adiciones al contrato

Para el presente periodo no se presentaron modificaciones y/o adiciones al contrato de obra referente al 481 de 2024.

7.4.2 Compensación de mayores y menores cantidades

Para el presente periodo no se presentaron actas compensatorias al contrato de obra referente al 481 de 2024.

7.5 ACTAS DE COMITÉ TECNICOS

Durante el periodo de ejecución del contrato de obra e interventoría a fecha del presente informe, no se suscribieron actas de comités técnicos desarrollados entre las partes.

7.6 CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

Durante el periodo general de ejecución del contrato de obra se envió y recibió la siguiente correspondencia entre la Interventoría, el contratista y el Departamento de Arauca:

TABLA No. 16 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA DE LA FIRMA CONTRATISTA DE OBRA y/o SUPERVISOR ASIGNADO

FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	DESCRIPCION
15/01/2025	CONSORCIO RIO BANADIA	INTERVENTORIA EXTERNA	Invitacion a socialización del contrato de obra
28/01/2025	CONSORCIO RIO BANADIA	INTERVENTORIA EXTERNA	Acta de cambio de representancion legal

TABLA No. 17 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A LA FIRMA CONTRATISTA DE OBRA y/o SUPERVISOR ASIGNADO

FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	DESCRIPCION
14/01/2025	INTERVENTORIA EXTERNA	CONSORCIO RIO BANADIA	Visita de inspección preliminar al área de intervención objeto del contrato de obra
29/01/2025	INTERVENTORIA EXTERNA	CONSORCIO RIO BANADIA	Reconocimiento a cambio de representación legal

7.7 BITACORA DIARIA DE OBRA

El libro de bitácora de obra fue tomado en medio magnetico. La fecha de apertura fue el 31 de diciembre de 2024, para el presente informe No. 01 comprendido entre el 31 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025, se relacionan las bitácoras suscritas desde la apertura hasta fecha del presente informe 31 de enero de 2025, permanece abierto ya que el contrato se mantiene activo.

Anexo No. 5:

Como anexo del presente informe de cumplimiento de interventoria se prersentan la bitácoras de obra suscriptas entre la firma contratista de obra e interventoria externa para el periodo del presente informe No. 01 . comprendido entre el 31 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025.

7.8 CONTROL SOCIAL DE LA OBRA

7.8.1 Socialización del proyecto

El día 18 de enero de 2024, se realizó la socialización del proyecto para la **CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA,** en el sitio de obra en la vereda bajo Banadia del municipio de Saravena departamento de Arauca, previa convocatoria realizada por el Departamento de Arauca a través de la Secretaría General de Gobierno y Seguridad Ciudadana.

En dicha reunión participaron representantes de la gobernación de Arauca, de la firma contratista de la obra, de la Interventoría externa y de la comunidad beneficiada con el proyecto, a quienes se les dio a conocer el alcance físico y financiero del contrato, el plazo de ejecución del mismo y el cronograma de la obra presentado por el contratista; de igual forma se atendieron las observaciones e inquietudes

de los participantes y se presentaron los profesionales que van a estar frente a la ejecución del proyecto por parte del contratista, la Interventoría externa y la supervisión del Departamento de Arauca.




Fotografia No. 4 Socializacion del contrato de obra e interventoria

Anexo No. 6:

Como anexo del presente informe de cumplimiento de interventoria se prersentan La respectiva acta de socialización del contrato de interventoria 473/2024.

Nota: *La respectiva acta de socialización del contrato de obra 481/2024 reposa como anexo No. 9 del primer informe de cumplimiento de obra 481/2024.*

7.8.2 Conformación de la veeduría ciudadana

En la reunión de socialización del proyecto, se llevó a cabo por parte de la comunidad que asistió a la convocatoria, el nombramiento de las personas que hacen parte de la veeduría ciudadana y que fueron los voceros de la comunidad durante toda la etapa de ejecución de la obra ante el contratista, la Interventoría externa, entidad contratante, entes de control y demás instituciones.

TABLA No. 18 CONFORMACIÓN DE LA VEEDURÍA CIUDADANA PARA EL CONTROL SOCIAL DEL CONTRATO DE OBRA NO. 481 DE 2024.

VEEDURIA CIUDADANA					
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	TELEFONO	CARGO	VEREDA/BARRIO
1	OSCAR JAVIER RIOS GOMEZ.	1.115.722.421	3195035254	VEEDOR	RIO BANADIA
2	WILLIAM PEÑALOZA PEÑALOZA	96.185.880	3058818465	VEEDOR	Puerto Nariño
3	LEIRA NAYARIT PEDRAZA URIBE	1.115.744.872	3022027500	VEEDOR	Puerto Nariño

La veeduría ciudadana fue reconocida por el Ministerio Público del Municipio de Saravena, mediante Resolución No. 005 del (28/01/2025) siendo nombrado como VOCERO o representante del Comité Veedor al señor OSCAR JAVIER RIOS GOMEZ.

Nota: La respectiva resolución de conformación de la veeduría reposa en el anexo No. 10 del primer informe de cumplimiento del contrato de obra 481/2024.

7.8.3 Actas y reuniones suscritas por la veeduría ciudadana

7.8.3.1 Acta de veeduría de inicio de obra

Con el fin de dar inicio a la ejecución física de las obras, el (20/01/2025) se suscribe con la veeduría ciudadana del contrato de obra No. 481 del 2024, el acta de veeduría de inicio de obra, en la cual se da a conocer por parte del contratista y la Interventoría externa aspectos como el cronograma de trabajo, vinculación del personal, acopio de materiales, fecha prevista para la terminación de las actividades, entre otros.

7.9 VINCULACION DEL PERSONAL Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES

El contratista vinculó el personal requerido para la administración y ejecución de los trabajos de acuerdo al alcance de la obra, realizando previamente la afiliación al sistema de seguridad social integral y riesgos laborales. La Interventoría antes del ingreso del personal a la obra verificó las respectivas afiliaciones, así como el pago mensual de los aportes a salud, pensión, riesgos y aportes parafiscales conforme a las planillas de pago entregadas por el contratista.

7.9.1 Personal Administrativo

El personal profesional y administrativo que laboró en la obra para este periodo de ejecución, es el mismo que fue ofertado por el contratista en el proceso de selección y no fue modificado durante el plazo contractual. A continuación, se relaciona el personal administrativo del contratista que laboró durante el mes de diciembre de 2024, y enero de 2025 el cual corresponde al periodo de ejecución del presente informe:

TABLA No. 19 PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO DE OBRA NO. 481/2024 CORTE 01 (31/12/2024 AL 31/01/2025)

	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	CC	CARGO	SALARIO	FECHA INGRESO	DIAS LABORADOS
1	VILA	SARABIA	JAIR LEANDRO	1.091.659.018	DIRECTOR DE OBRA	$ 8.000.000	31-12-2024	32
2	BARRAGAN	MENDOZA	JAIRO ALEXANDER	80.109.920	ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA	$ 2.750.000	31-12-2024	32
3	DELGADO	MONTAGUT	JOAQUIN EDUARDO	88.215.089	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	$ 2.750.000	31-12-2024	32
4	GARCIA	BELTRAN	JHONNATHAN ALEXIS	1.098.716.716	ING RESIDENTE	$ 5.000.000	31-12-2024	32
5	GARCIA	BELTRAN	JHONN FREDY	1.098.752.791	ING RESIDENTE	$ 5.000.000	31-12-2024	32
6	OLAYA	BAYONA	LAURA CRISTINA	1.094.283.275	ING AMBIENTAL	$ 5.000.000	31-12-2024	32

	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	CC	CARGO	SALARIO	FECHA INGRESO	DIAS LABORADOS
7	BOTIA	CHONA	MARLYN YVETTE	1.020.810.816	PROFESIONAL SOCIAL	$ 3.000.000	31-12-2024	32
8	GARRIDO	RIVERO	CAMILO ANDRES	1.094.269.468	HSEQ	$ 3.000.000	31-12-2024	32
9	GUTIERREZ	VACCA	HORLEYDA	1.116.496.517	CONTADOR	$ 1.500.000	31-12-2024	32
10	PAEZ	GARCÍA.	FERNEY	1.098.684.323	INSPECTOR DE OBRA	$ 3.000.000	31-12-2024	32
11	OCHOA		JESSICA LILIBETH	1.098.658.689	SECRETARIA	$ 2.000.000	31-12-2024	32

7.9.2 Personal Operativo

El contratista utilizó mano de obra no calificada de la región con lo cual fue posible generar empleo en la zona de influencia del proyecto. Así mismo vinculó mano de obra calificada para dirigir las actividades de acuerdo a los requerimientos técnicos de la obra.

A continuación, se relaciona el personal operativo del contratista que laboró durante la ejecución del presente informe:

TABLA No. 20 PERSONAL OPERATIVO DEL CONTRATO DE OBRA NO. 481 DE 2024 CORTE 01 (31/12/2024 AL 31/01/2025)

	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	CC	CARGO	SALARIO	FECHA INGRESO	DIAS LABORADOS
1	QUINTERO	VILLAMIZAR	JUAN VICENTE	9.466.736	OFICIAL	$ 1.755.000	20-01-2025	11
2	CASTAÑEDA	MENDOZA	NELSON ARLEY	1.115.722.498	AYUDANTE	$ 1.423.500	20-01-2025	11

Nota: *los respectivos exámenes de ingreso del personal administrativo y operativo del contrato de obra, reposan como anexo No. 12 del primer informe de cumplimiento periodo comprendido entre e 31/12/2024 al 31/01/2025 del contrato de obra 481/2024.*

Las planillas de pago de segurida social del personal administrativo y operativo correspondiente al presente periodo del 31/12/2024 al 31/01/2025 se presenta como anexo No. 13 del informe No. 01 de cumplimiento del contrato de obra 481/2024.

Para un mejor control del cumplimiento de las obligaciones que tiene el contratista con respecto al personal vinculado a la obra, la interventoría externa realiza seguimiento a los compromisos laborales del contratista verificando los siguientes aspectos:

TABLA No. 21 COMPROMISOS LABORALES DEL CONTRATISTA - CONTRATO DE OBRA NO. 481 DE 2024.

ACTIVIDAD	OBSERVACIONES		
	DICIEMBRE 2024 - ENERO 2025		
	SI	NO	
El contratista tiene al día las afiliaciones a seguridad social, Cajas de compensación, ARP de todo el personal.	X		Según la información entregada por el contratista de obra, la interventoría verifico el estado de afiliación de todo el personal de obra.
El contratista ha entregado a la Interventoría copia de las afiliaciones del personal.	X		Se entregó por parte del contratista de obra las afiliaciones del personal operativo vinvulado.
El contratista presenta oportunamente las planillas de pago de salarios de todo el personal.	X		El contratista presento la planilla de pagos de los trabajadores de los meses diciembre de 2024, enero de 2025.
Los reportes de tiempo de las planillas de pago de salarios corresponden con el tiempo real trabajado en campo.	X		El contratista de obra realizó el pago de los salarios al personal de obra mensualmente como se acordó desde el inicio de actividades.
Las liquidaciones del personal retirado cumplen con la reglamentación vigente.	N/ A		Hasta fecha del presente informe el contratsta mantiene a todo el personal inicialmente contratado
El contratista tiene al día el pago de seguridad social, ICBF, SENA, Cajas de compensación, ARP, FIC, fondos de pensiones, EPS de todo el personal.	X		El contratista presenta la planilla paga de los meses diciembre de 2024, enero de 2025., en la cual se puede observar estos pagos.

7.9.3 Pagos salariales y liquidación del personal

La interventoría verificó que el contratista de obra realizara los pagos salariales de los trabajadores vinculados a la ejecución de la obra, conforme al contrato laboral (verbal o escrito) correspondiente al periodo del 31 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025.

Nota: *Las planillas de pago salarial del personal administrativo y operativo correspondiente al presente periodo del 31/12/2024 al 31/01/2025 se presenta como anexo No. 14 del informe No. 01 de cumplimiento del contrato de obra 481/2024.*

7.10 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

7.10.1 Dotación del personal

La firma contratista llevó a cabo la dotación del personal que labora en la obra con los elementos de protección personal (EPP) requeridos en el desarrollo de sus labores diarias, de acuerdo a las necesidades de cada trabajador, haciendo entrega de los siguientes elementos:

TABLA No. 22 DOTACIÓN DEL PERSONAL EN OBRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CONTRATO DE OBRA NO. 481 DE 2024.

ELEMENTOS DE PROTECCION	ENTREGADOS		ESTADO			BENEFICIARIOS
	Si	No	Bueno	Regular	Malo	
CASCO	X		X			Ingeniero residente, Oficial, ayudantes.
GUANTES	X		X			Ingeniero residente, Oficial, ayudantes.
BOTAS DE SEGURIDAD		X				
BOTAS DE CAUCHO	X		X			Oficial, ayudantes.
GAFAS DE PROTECCION	X		X			Ingeniero residente, Oficial, ayudantes.
OVEROL/CAMISA/PANTALON	X		X			Ingeniero residente, Oficial, ayudantes.
TAPA BOCAS	X		X			Oficial, ayudantes.
MASCARA		X				



Fotografia No. 5 entrega de dotacion interventoria

Nota: En el informe No. 01 de cumplimiento de seguridad y salud del presente periodo, del 31 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025 de esta interventria, se relaciona el anexo del acta de entrega de los elementos de protección personal

La Interventoría verificó diariamente en campo la utilización de los elementos de protección personal (EPP) por parte del personal en obra.

7.10.2 Señalización de la obra

En la ejecución de los trabajos, el contratista implementó la señalización requerida para el aislamiento de las zonas de trabajo, así como la instalación de las señales informativas y preventivas y vallas necesarias en la ejecución de la obra.

TABLA No. 23 SEÑALIZACIÓN INSTALADA EN LA OBRA POR EL CONTRATISTA DEL CONTRATO DE OBRA NO. 481 DE 2024.

ELEMENTOS DE SEÑALIZACION	INSTALADOS		ESTADO			LOCALIZACION EN OBRA
	Si	No	Bueno	Regular	Malo	
CINTA REFLECTIVA	X		X			Área perimetral donde se construyeron pozos de inspección
AVISOS INFORMATIVOS	X		X			Valla informativa sobre la vía a la esmeralda frente a las lagunas de oxidación, se instaló al momento de transportar material de obra.

La Interventoría diariamente verificó que dichas señales se encontraran debidamente instaladas en todos los frentes de trabajo de la obra y en buen estado, haciendo las recomendaciones del caso al contratista para subsanar cualquier inconveniente frente a la falta de señalización o mal estado de la misma.



Fotografia No. 6 Señalizacion de obra

7.10.3 Accidentalidad en la obra

La Interventoría estuvo atenta al registro y atención de los accidentes laborales presentados en obra con el personal vinculado por el contratista. Para el periodo de ejecución del presente informe NO se presentaron accidentes laborales en la ejecución del contrato No. 481 de 2024.

Por otro lado, la Interventoría también estuvo pendiente de cualquier accidente que se hubiese podido ocasionar a terceros en razón de la ejecución de la obra. Para el periodo del presente informe NO se presentaron accidentes a terceros en la ejecución del contrato de obra No. 481 del 2024.

7.10.4 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

La interventoría estuvo atenta para que el contratista de obra tuviera en cuenta la normatividad vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo (Decreto 1072 de 2015) establecida por el Ministerio de Trabajo. Todos los empleadores deben implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en

el Trabajo (SG-SST) el cual "consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua, lo cual incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en los espacios laborales."

7.10.5 Capacitaciones realizadas por el contratista de obra de (SG-SST)

CAPACITACIONES			
TEMA	FECHA	REALIZADA	RESPONSABLE
Induccion Seguridad y salud en el trabajo	13/01/2025	SI	Camilo Garrido
Entrega de elementos de protección personal	13/01/2025	SI	
Socializacion de peligros y riesgos definidos	23/01/2025	SI	



Fotografia No. 7 Capacitaciones

Nota: En el informe No. 01 de cumplimiento de seguridad y salud del presente periodo del 31 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025de esta interventria, se relaciona el anexo del acta de registro de capacitaciones del personal.

Anexo No. 7:

Como anexo del presente informe de cumplimiento de interventoria se prersenta informe detallado de sistema de seguridad y salud en el trabajo por parte de esta interventoria externa.

7.11 CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA

La interventoría verificó que el contratista utilizara en la ejecución de las actividades del contrato la maquinaria y equipo requerido según los APU y especificaciones técnicas del proyecto. Así mismo constató el estado físico y de operación de la maquinaria y equipo solicitando al contratista sustituirlo por mal estado o realizarle mantenimiento preventivo y/o correctivo, cada vez que fue necesario.

La maquinaria y equipos que el contratista utilizó durante el periodo de ejecución de la obra desde el 31 de diciembre de 2024 hasta el 31 de enero de 2025 fue el siguiente:

Tipo:	Estación topográfica
Marca:	TOPCON
Referencia:	YK 0225
Días en obra:	120
Estado:	Bueno
Regularidad del mantenimiento:	Si
Vibraciones/ Ruidos:	Lo normal
Idoneidad de operarios:	idóneo



Fotografia No. 8 Estacion total

Tipo:	Nivel de precisión
Marca:	SOUTH
Referencia:	NL 32
Días en obra:	120
Estado:	Bueno
Regularidad del mantenimiento:	Si
Vibraciones/ Ruidos:	Lo normal
Idoneidad de operarios:	idóneo



Fotografia No. 9 Nivel de precision

Tipo:	Volqueta
Marca:	Chevrolet
Referencia:	Kodiak
Días en obra:	No aplica
Estado:	Bueno
Regularidad del mantenimiento:	mensual
Vibraciones/ Ruidos:	Lo normal
Idoneidad de operarios:	idóneo



Fotografia No. 10 Volqueta chevrolet

Tipo:	Volqueta
Marca:	Chevrolet
Referencia:	Kodiak
Días en obra:	No aplica
Estado:	Bueno
Regularidad del mantenimiento:	mensual
Vibraciones/ Ruidos:	Lo normal
Idoneidad de operarios:	idóneo



Fotografia No. 11 Volqueta chevrolet

Tipo:	Retroexcavadora
Marca:	caterpillar
Referencia:	
Días en obra:	No aplica
Estado:	Bueno
Regularidad del mantenimiento:	Quincenal
Vibraciones/ Ruidos:	Lo normal
Idoneidad de operarios:	idóneo



Fotografia No. 12 Retroexcavadora cat

Tipo:	Retroexcavadora
Marca:	Komatsu
Referencia:	PC-200-8
Días en obra:	No aplica
Estado:	Bueno
Regularidad del mantenimiento:	Quincenal
Vibraciones/ Ruidos:	Lo normal
Idoneidad de operarios:	idóneo



Fotografia No. 13 Retroexcavadora komatsu

Por otro lado, la interventoría realizó un seguimiento y control a la maquinaria y equipos propios dispuestos por el contratista verificando que los seguros se encuentren vigentes y que se haya realizado la respectiva afiliación de los operarios al sistema de seguridad social y ARL.

TABLA No. 24 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS UTILIZADO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL CONTRATO NO. 481 DE 2024.

ACTIVIDAD	OBSERVACIONES		
	MES 1		
	SI	NO	
El contratista cuenta con los contratos de alquiler de la maquinaria y equipo que no son de su propiedad debidamente suscritos con terceros.	X		Los vehículos que se vieron involucrados en el desarrollo de la obra, son de empresas de terceros que cuenta con toda la documentación de ley.
Los operadores de la maquinaria y equipos se encuentran debidamente afiliados al sistema de seguridad social integral y ARL.	X		Los operadores de los vehículos que entraron a sitio de la obra, son trabajadores de terceros, los cuales están subcontratados con todo los requerimientos de ley.
Los vehículos maquinaria y equipo que el contratista tiene en la obra cumplen con los siguientes requisitos: • SOAT • Seguro contra todo riesgo • Tarjeta de propiedad • Licencia de conducción de la persona responsable	X		Los vehículos que transportaron los materiales de construcción hasta el sitio de la obra, cuentan con la documentación necesario para su movilidad.

Nota: Los preoperaciones y fichas técnicas de los equipos implementados en el desarrollado de las actividades de obra reposan como anexo No. 18 del informe No. 01 de cumplimiento del contrato de obra 481/2024.

8 ASPECTOS TECNICOS

8.1 CONDICIONES CONTRACTUALES

El contrato de obra suscrito entre el Departamento de Arauca y la firma contratista **CONSORCIO RIO BANADIA** contempla las siguientes actividades a desarrollar dentro del plazo contractual establecido de **SEIS (06) MESES**.

TABLA No. 25 CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES DEL CONTRATO DE OBRA NO. 481 DE 2024.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	OBRAS DE PROTECCIÓN RIO BANADIA				
1,1	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN CONGLOMERADO ENTRE 0-2 m DE PROFUNDIDAD	M3	16.298,68	$ 19.239,00	$ 313.570.304,52
1,2	ACARREO MATERIAL INTERNO NO MAYOR A 2 KM PARA REFORZAMIENTO DEL TALUD NATURAL	M3	16.298,68	$ 23.478,00	$ 382.660.409,04
1,3	CONFORMACIÓN DE BARRERA TIPO JARILLÓN	M3	25.673,470	$127.588,00	$ 3.275.626.690,36
1,4	GEOTEXTIL NT 2400	M2	91.742,40	$ 19.172,00	$ 1.758.885.292,80
1,5	GEOTEXTIL NT 3000	M2	10.858,40	$ 23.242,00	$ 252.370.932,80
1,6	GEOTEXTIL TEJIDO 2100	M2	20.420,44	$ 17.337,00	$ 354.029.168,28
1,7	MANEJO DE AGUAS	MES	6,00	$ 4.293.354,00	$ 25.760.124,00
1,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLEXOCRETO	M2	19.944,00	$ 127.609,00	$ 2.545.033.896,00
1,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSACRETO	M3	3.722,88	$ 940.227,00	$ 3.500.352.293,76
1,10	Filtro o Dren Frances PVC 100 mm (0.6x0.8)m	M	1.108,00	$ 249.909,00	$ 276.899.172,00
1,11	RELLENOS TALUD DERECHO ANCLAJE DIQUE	M3	13.674,94	$ 118.615,00	$ 1.622.053.008,10
				SUB-TOTAL COSTO OBRA FÍSICA (INCLUYE A.I.U)	$ 14.307.241.291,66
				APLICACIÓN AL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA - PUEA	$ 5.000.000,00
				TOTAL, OBRA FÍSICA	$ 14.312.241.291,66

8.2 CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA

Para el periodo del presente informe No. 01 de ejecución del contrato del periodo del 31 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025, se han ejecutado las siguientes cantidades para cada uno de los ítems:

El cálculo de cantidades para los ítems que se ejecutaron durante el periodo del informe y que acumula las cantidades ya ejecutadas, se realizó mediante la verificación técnica de planos de diseño y medición manual realizada conjuntamente por el ingeniero residente de obra e interventoría.

TABLA No. 26 CANTIDADES EJECUTADAS DEL CONTRATO DE OBRA NO. 481 DE 2024.

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES						CANTIDADES EJECUTADAS PERIODO DEL 31 DICIEMBRE DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2025		
Item	ACTIVIDADES	Und	Cant	V/Unitario	V/Total	Cant	V/Total	% EJECUTADO
1	OBRAS DE PROTECCION RIO BANADIA							
1.1	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN CONGLOMERADO ENTRE 0-2 m DE PROFUNDIDAD	M3	16,298.68	$ 19,239.00	$ 313,570,304.52	2647.80	$ 50,941,024.20	16.25%
1.2	ACARREO MATERIAL INTERNO NO MAYOR A 2 KM PARA REFORZAMIENTO DEL TALUD NATURAL	M3	16,298.68	$ 23,478.00	$ 382,660,409.04	2647.80	$ 62,165,048.40	16.25%
1.3	CONFORMACIÓN DE BARRERA TIPO JARILLÓN	M3	25,673,470.00	$ 127,588.00	$ 3,275,626,690,360.00			
1.4	GEOTEXTIL NT 2400	M2	91,742.40	$ 19,172.00	$ 1,758,885,292.80			
1.5	GEOTEXTIL NT 3000	M2	10,858.40	$ 23,242.00	$ 252,370,932.80			
1.6	GEOTEXTIL TEJIDO 2100	M2	20,420.44	$ 17,337.00	$ 354,029,168.28			
1.7	MANEJO DE AGUAS	MES	6.00	$ 4,293,354.00	$ 25,760,124.00	1.00	$ 4,293,354.00	16.67%
1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLEXOCRETO	M2	19,944.00	$ 127,609.00	$ 2,545,033,896.00			
1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSACRETO	M3	3,722.88	$ 940,227.00	$ 3,500,352,293.76			
1.10	Filtro o Dren Frances PVC 100 mm (0.6x0.8)m	M	1,108.00	$ 249,909.00	$ 276,899,172.00	200.00	$ 49,981,800.00	18.05%
1.11	RELLENOS TALUD DERECHO ANCLAJE DIQUE	M3	13,674.94	$ 118,615.00	$ 1,622,053,008.10			
COSTO DIRECTO					$ 14,307,241,291.66		$ 167,381,226.60	
APLICACIÓN AL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA - PUEA					$ 5,000,000.00		$ 861,088.00	17.22%
TOTAL, OBRA FISICA					$ 14,312,241,291.66	EJECUTADO	$ 168,242,314.60	1.18%
AVANCE FINANCIERO ACUMULADO EN VALOR Y PORCENTAJE							$ 168,242,314.60	1.18%

8.3 AVANCE DE LA OBRA

8.3.1 Avance Físico de las obras

De acuerdo a las cantidades de obra ejecutadas dentro del periodo del presente informe No. 01 del periodo comprendido entre el 31/12/2024 al 31/01/2025, se obtuvo un avance de ejecución física de las obras del 1.18%. que de acuerdo a sus precios unitarios da la suma de $ 168,242,314.60

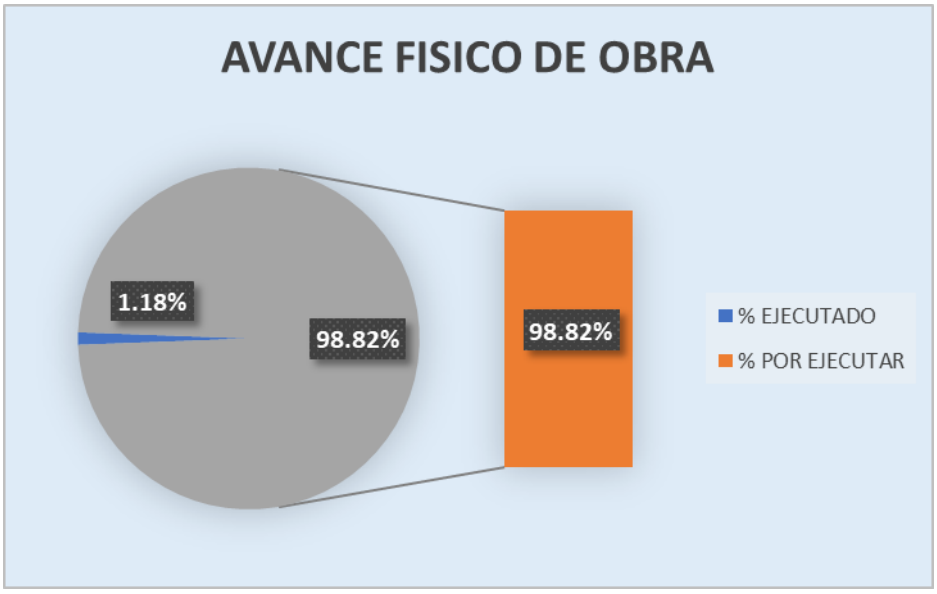


Grafico No. 3 Avance Físico del contrato de obra.

8.3.2 Avance del plazo contractual

Con respecto al plazo contractual, de los seis (06) meses establecidos en la minuta del contrato, ha transcurrido un (01) mes desde la fecha de inicio hasta la fecha del presente avance de la obra.

Durante el tiempo de ejecución del contrato de obra No. 481 del 2024, se ha realizados las actividades de acuerdo lo programado por la firma contratista y aprobado por esta interventpria externa y entidad contratante, por lo que se desarrolla las actividades en los tiempos establecidos sin contratiempo.

En el siguiente cuadro se presenta la información con respecto al plazo de ejecución del contrato.

PLAZO CONTRACTUAL INICIAL	SEIS (06) MESES
PLAZO ADICIONADO	CERO
PLAZO CONTRACTUAL FINAL	SEIS (06) MESES
TIEMPO SUSPENDIDO	00 DÍAS
PLAZO EJECUTADO	(01) MES
PLAZO SIN EJECUTAR	CINCO (05) MESES
% PLAZO EJECUTADO	17.58%

8.4 PROGRAMACION DE LA OBRA

Para el control de la programación, el contratista presentó a la Interventoría el respectivo cronograma de trabajo con cada uno de los ítems a ejecutar, con el cual se hizo seguimiento semanal y mensual al avance en la ejecución de todas las actividades y del contrato en general.

A continuación, se presenta la siguiente tabla que demuestra el porcentaje (%) de obra ejecutada a la fecha del presente informe, comparando lo reprogramado con lo ejecutado.

TABLA No. 27 PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO VS EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA NO. 481 DE 2024.

	SEMANAS		% AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO	% AVANCE EJECUTADO	% AVANCE EJECUTADO ACUMULADO
INICIO	CTE 1	31/12/2024 AL 31/01/2025	0.60%	0.60%	1.18%	1.18%
ACOMULADO				**0.60%**		**1.18%**

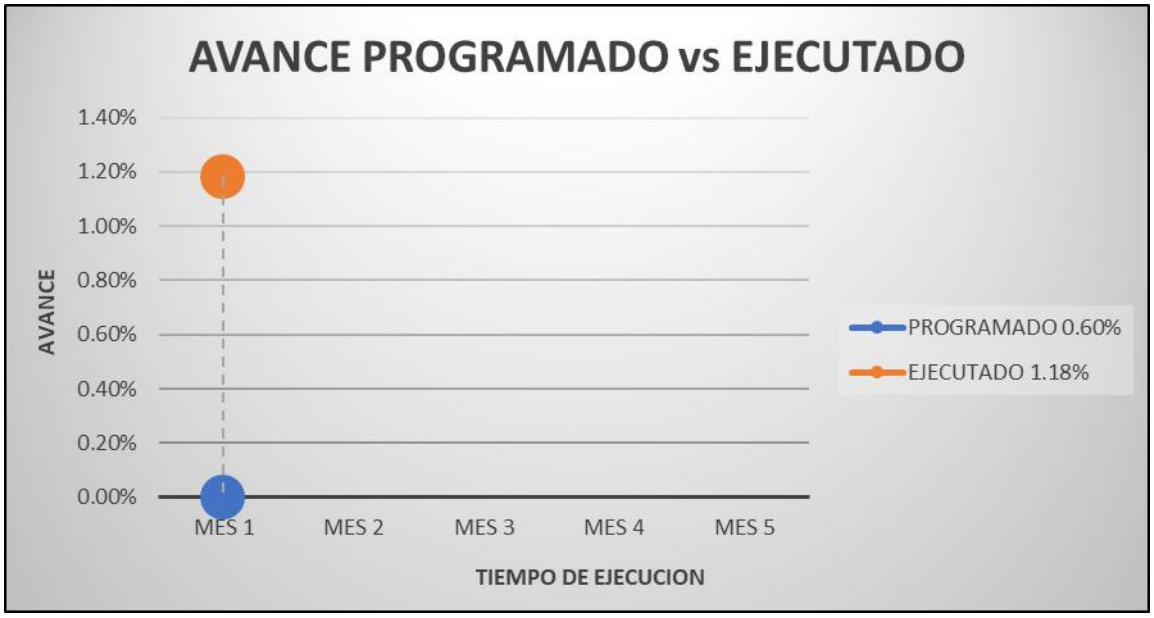


Grafico No. 4 Avance físico programado Vs Ejecutado del Contrato de Obra No. 481 de 2024

8.5 IMPREVISTOS PRESENTADOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA

Durante la ejecución del contrato de obra No 481 de 2024, hasta la fecha del presente informe, no se presentaron grandes inconvenientes que afectaron la ejecución del cronograma de actividades.

8.6 ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS

Para el periodo de ejecución del plazo contractual comprendido entre el 31 de diciembre de 2024 al 31 de diciembre de 2025, la firma contratista bajo la supervisión y control de la Interventoría externa, ejecutó las siguientes actividades de los ítems del contrato:

ITEM 1.1. EXCAVACIÓN MECÁNICA EN CONGLOMERADO ENTRE 0-2 m DE PROFUNDIDAD

Esta actividad comprendió la ejecución de la escavacion y remoción de material conglomerado hasta una profundida de 2.0 metros de acuerdo a los lineamientosy cotas establecidos en los planos de diseño, mediante la implementación de equipos de topografía para su control cuantificación, asi mismo el uso de maquinaria pesada como retroexcavadoras. Dicha actividad conto con la supervisión y aprobación técnica esta interventoria.

Garantizando asi el proceso constructivo y el desarrollo de las actividad segura de acuerdo a lo establecido en el proceso constructivo e implementación de las políticas de seguridad y salud en el trabajo.

Equipos y Maquinaria: Retroexcavadora 200 y Retroexcavadora 300
Materiales: N/A
Personal: Ayudantes de obra

Actividades de control y verificación de la Interventoría:

- Supervisión de la correcta aplicación de los métodos de trabajos aceptados.
- Cumplimiento de los programas de trabajo.
- Verificación de las cotas y pendientes requeridas en los planos y diseños.
- Diámetro de cada una de las excavaciones.
- Señalización de seguridad
- Uso de elementos de protección personal y afiliaciones del personal en obra
- Inspección de maquinaria implementada para la actividad

ACTIVIDAD:	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN CONGLOMERADO ENTRE 0-2 m DE PROFUNDIDAD		
ITEM: 1.1		UNIDAD: M3	
CANTIDAD CONTRACTUAL:	16.298,68	CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	2647,80
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	2647,80	CANTIDAD SIN EJECUTAR:	13650.88
PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO:	16.25%	PORCENTAJE SIN EJECUTAR:	83.75%



Fotografia No. 14 Excavacion mecanica

ITEM 1.2. ACARREO MATERIAL INTERNO NO MAYOR A 2 KM PARA REFORZAMIENTO DEL TALUD NATURAL

Trabajo referente al cargue, transporte, y disposición final a una distancia situada, del material extraído productos de las excvaciones, dejando despejadas las áreas intervenidas y libres para el tránsito vehicular y peatonal. Para tal fin se dio uso de equipos idóneos para la correcta ejecución de dichas tareas tales como volquetas, la inteventoria llevo acabo la supervisión de los trabajos mediante la revisión de documentos de los vehiculos y la idoniedad de los operadores, de igual forma que se ejecutaron con las medidas de seguridad.

Equipos y Maquinaria: Retroexcavadora 200 y Retroexcavadora 300, volquetas de 14 m3 y 7m3
Materiales: N/A
Personal: Ayudantes de obra

Actividades de control y verificación de la Interventoría:

- Supervisión de la correcta aplicación de los métodos de trabajos aceptados.
- Cumplimiento de los programas de trabajo.
- Verificación de las cotas y pendientes requeridas en los planos y diseños.
- Diámetro de cada una de las excavaciones.
- Señalización de seguridad
- Uso de elementos de protección personal y afiliaciones del personal en obra
- Inspección de maquinaria y vehículos implementados para la actividad

ACTIVIDAD:	**ACARREO MATERIAL INTERNO NO MAYOR A 2 KM PARA REFORZAMIENTO DEL TALUD NATURAL**		
ITEM: 1.2		UNIDAD: M3	
CANTIDAD CONTRACTUAL:	16.298,68	CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	2647,80
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	2647,80	CANTIDAD SIN EJECUTAR:	13650.88
PORCENTAJE EJECUTADO:	16.25%	PORCENTAJE SIN EJECUTAR:	83.75%



Fotografia No. 15 Acarreo de material

ITEM 1.7. MANEJO DE AGUAS

En esta actividad refiere al manejo del agua presente en el área de influencia de los trabajados ejecutados hasta la fecha, por presencia del nivel freatico superficial, mediante el uso de equipos a motor como motobombas, lo que se busca es traslado en sitio de las aguas subterráneas producto del nivel de las excavaciones. El proceso consistió en la extracción continua del agua, la cual fue dirigida hacia sistemas de drenaje temporales establecidos previamente para evitar inundaciones y garantizar un ambiente de trabajo seco y estable

Equipos y Maquinaria: Motobomba de 4”
Materiales: N/A
Personal: Ayudantes de obra

Actividades de control y verificación de la Interventoría:

- Supervisión de la correcta aplicación de los métodos de trabajos.
- Cumplimiento del cronograma de trabajo.
- Verificación y funcionamiento de los equipos disponibles para la ejecución de la actividad
- Uso de elementos de protección personal y afiliaciones del personal en obra

ACTIVIDAD:	**MANEJO DE AGUAS**		
ITEM: 1.7		UNIDAD: MES	
CANTIDAD CONTRACTUAL:	6.0	CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	1.0
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	1.0	CANTIDAD SIN EJECUTAR:	5.0
PORCENTAJE EJECUTADO:	16.67%	PORCENTAJE SIN EJECUTAR:	83.33%



Fotografia No. 16 Control de agua

ITEM 1.10. FILTRO O DREN FRANCES PVC 100 MM (0.6X0.8)M

Actividad referente a la construcción filtro francés con una zanja de 0.6 m de ancho por 0.8 m de profundidad, donde se colocó una capa de triturado 3/4" en el fondo, instalándose sobre esta tubería PVC perforada recubierta de material agregado ¾" como medida de drenaje del agua de acuerdo a las indicaciones preestablecidas en los planos de diseño de la obra.

Equipos y Maquinaria: Retroexcavadora
Materiales: Triturado ¾, tubería perforada en PVC de 4", geotextil.
Personal: Oficiales y Ayudantes de obra

Actividades de control y verificación de la Interventoría:

- Verificación del estado y funcionamiento de los equipos.
- Supervisión de la correcta aplicación de los métodos de trabajos aceptados.
- Cumplimiento de los programas de trabajo.
- Verificación de calidad de los materiales.
- Verificacion y chequeo de acuerdo a planos de diseño

ACTIVIDAD:	FILTRO O DREN FRANCES PVC 100 MM (0.6X0.8)M		
ITEM: 1.10		UNIDAD: M	
CANTIDAD CONTRACTUAL:	1.108,00	CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	400
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	200	CANTIDAD SIN EJECUTAR:	708.00
PORCENTAJE EJECUTADO:	36.10%	PORCENTAJE SIN EJECUTAR:	63.90%



Fotografia No. 17 Filtro frances

8.7 CONTROL DE CALIDAD DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

El seguimiento de la obra se realizó a diario con la presencia del ingeniero residente de Interventoría, el topógrafo de interventoría. El personal de la interventoría externa verifica el cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos en las especificaciones del contrato y solicitaron permanentemente al contratista la optimización de los procesos de ejecución y procedimientos constructivos a todos los ítems del proyecto. Dentro de las actividades de control a las obras, la interventoría realizó entre otras las siguientes:

- Registro diario en el libro de obra de todos los aspectos relevantes de la obra, tales como: actividades realizadas, equipo, personal, insumos, consumo de agua, estado del tiempo.
- Revisión, control y aprobación de los diseños y planos del proyecto, para ejecución de la obra de acuerdo a ellos.
- Verificación del equipo mínimo y su estado de funcionamiento. Los equipos utilizados por el contratista cuentan con los certificados de garantía de fábrica en la calidad, cantidad y oportunidad del uso de los mismos para instalación y puesta en marcha de los sistemas que le dieron funcionalidad al proyecto de obra.
- Control actividades complementarias: En el reporte diario de obra se registró la ejecución de cada una de las actividades constructivas que complementaron los ítems contractuales, así como el suministro de los materiales que realizó el contratista.
- Medición de ítems ejecutados los cuales se realizaron mediante levantamiento topográfico
- Verificación de la ejecución de los trabajos y actividades que se realizaron conforme a los términos de referencia de la propuesta técnico – económica, metodología y especificaciones pactadas en el contrato de obra.
- Control de la entrega de los elementos de protección personal a cada uno de los trabajadores.
- Supervisión y revisión de los ensayos de control de calidad de materiales.
- Control del correcto almacenamiento de los materiales de construcción.
- Registro fotográfico de las actividades ejecutadas.

- Seguimiento al pago correspondiente a los aportes de seguridad social y aportes parafiscales.

9 ASPECTOS FINANCIEROS

9.1 MANEJO DEL ANTICIPO

A fecha del presente informe la firma contratista no ah presento contrato fiduciario ni plan de manejo del anticipo de acuerdo las condiciones contractuales establecidas dentro del contrato de obra 481 de 2024.

10 ASPECTOS AMBIENTALES

10.1 SEGUIMIENTO A PERMISOS Y/O LICENCIAS AMBIENTALES

10.2 PERMISOS Y LICENCIAS

10.2.1 Licencia o permisos ambientales

Mediante radicado No. AR-2024 - 02709 del 26 de noviembre de 2024, la secretaria de Gobierno y Seguridad Ciudadana en Nombre de la Gobernación de Arauca tramita ante la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia CORPORINOQUIA seccional Arauca, Permiso de Ocupación De Cause Y Concesión De Aguas Superficiales del rio banadias, para el proyecto cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA, DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".

Nota: En el informe No. 01 de cumplimiento ambiental del presente periodo del 31 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025 de esta interventoria, se relaciona el anexo del radicado de solicitud de la entidad contratante ante la corporación.

10.2.2 Licencias y permisos para explotación de materiales de construcción

La firma contratista en el momento de ejecución de actividades que requieran del uso de materias pétreos deberá contar con un proveedor que cuente con los permisos, licencias ambientales o titulo minero de explotación de materiales pétreos de acuerdo a los establecido a las leyes 2250 de 2022, 2655 de 1985 y 685 de 2001.

10.3 SEGUIMIENTO AL DOCUMENTO AMBIENTAL

Como supervisión técnica ambiental ejercida por esta interventoria se presenta anexo al presente informe, el informe de seguiemiento ambiental producto del seguimiento en campo y administrativo por parte de nuestro profesionales.

Anexo No. 8:

Como anexo del presente informe de cumplimiento de interventoria se prersenta informe de seguimiento ambiental al contrato de obra 481/2024.

11 CONCLUSIONES

El presente informe es un resumen de las actividades de control y seguimiento ejecutadas al CONTRATO DE OBRA No.481 de 2024, con el fin de dar a conocer a quien interese aspectos tenidos en cuenta en el desarrollo de los trabajos en el periodo comprendido entre 31/12/2024 al 31/01/2025.

Se hizo la respectiva revisión de los diseños del contrato de obra No.481 de 2024 los cuales se ejecutaron dentro de los parámetros técnicos requeridos, dando cumplimiento a las especificaciones técnicas generales del Contrato, garantizando así, la calidad de cada una de las actividades de obra ejecutadas.

El CONTRATO DE OBRA No. 481 de 2024, alcanza un avance físico del 1.18% por valor DE CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS CON SESENTA CENTAVOS ($ 168,242,314.60) M/te,

El avance acumulado ejecutado por la firma contratista de obra CONSORCIORIO BANADIA se sustenta en la ejecución de los item 1.1 EXCAVACIÓN MECÁNICA EN CONGLOMERADO ENTRE 0-2 m DE PROFUNDIDAD, 1.2 ACARREO MATERIAL INTERNO NO MAYOR A 2 KM PARA REFORZAMIENTO DEL TALUD NATURAL, 1.7 MANEJO DE AGUAS, FILTRO O DREN FRANCÉS PVC 100 mm (0.60x0.8)m.

Hasta el presente informe se realizan los trabajos mediante el seguimiento técnico por parte de esta interventoria en campo mediante la presencia de los profesionales y comision topografica de acuerdo a los porcentajes de participación, el presente informe es muestra del cumpliminto del objeto contractual del contrato de interventoria 473 de 2024 INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Elaboró:

Juan Gabriel Hernandez Marin
Ingeniero Residente de Interventoría
M.P 54202-373584 NTS

Revisó:

Carlos Alberto pelaez prada
Ingeniero Director de Interventoría
M.P 17202-342227 CLD

Aprobó:

Jairo Hernando Gomez Rincon
R/L Consorcio interobras de proteccion
Contratista

ANEXO 1. PÓLIZAS Y APROBACIONES (INTERVENTORIA)

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CUCUTA	AGENCIA CUCUTA	49	49-44-101035207	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
31	12	2024	30	12	2024	00:00	30	06	2028	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION	NIT: 901.901.368-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 30 NRO. 13 - 149	ARAUCA, ARAUCA	3114430280

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DE ARAUCA	NIT: 800.102.838-5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 20 CARRERA 21 PISO 1	ARAUCA, ARAUCA	8856998

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECION A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LIMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN LA EJECUCION DEL CONTRATO NUMERO 473-2024 CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION PARA LA REDUCCION DEL RIESGO Y PREVENCION DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BARANOA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	30/12/2024	31/12/2025	$202,912,535.84
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/12/2024	31/12/2025	$101,456,267.92
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	30/12/2024	30/06/2028	$76,092,200.94
CALIDAD DEL SERVICIO	30/06/2025	30/06/2027	$101,456,267.92

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
DESARROLLADORA DE NEGOCIOS Y SUMINISTROS VAN SAS	900313660-1	60.00
CONSULTORES Y CONSTRUCTORES BCF SAS	900416673-0	10.00
CONSULTORIAS Y SUMINISTRO GOMEZ RINCON S.A.S.	900493258-2	30.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,703,992.00	$ ******20,000.00	$ *****327,558.00	$ *********2,051,551.00	$ ******481,917,272.62	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
MARIA CAROLINA DURAN SANABRIA	153566	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AV. 1E NO. 17 - 88 - TELEFONO: 5835460 - CUCUTA

49-44-101035207

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CUCUTA	AGENCIA CUCUTA	49	49-44-101035207	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
12	03	2025	30	12	2024	00:00	30	06	2028	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION	NIT: 901.901.368-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 30 NRO. 13 - 149	ARAUCA, ARAUCA	3114430280

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DE ARAUCA	NIT: 800.102.838-5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 20 CARRERA 21 PISO 1	ARAUCA, ARAUCA	8856998

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECION A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN LA EJECUCION DEL CONTRATO NUMERO 473-2024 CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION PARA LA REDUCCION DEL RIESGO Y PREVENCION DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR

ACLARACIONES

EN EL PRESENTE ANEXO SE ACLARAN LAS VIGENCIAS SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 31/12/2024.

TODOS LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINUAN EN VIGOR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *(1,703,992.00)	$ ****(20,000.00)	$ ***(327,558.00)	$ *******(2,051,551.00)	$ ****(481,917,272.62)	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
MARIA CAROLINA DURAN SANABRIA	153566	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AV. 1E NO. 17 - 88 - TELEFONO: 5835460 - CUCUTA

49-44-101035207

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CUCUTA	AGENCIA CUCUTA	49	49-44-101035207	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
12	03	2025	30	12	2024	00:00	30	06	2026	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION		NIT: 901.901.368-1
DIRECCIÓN: CR 30 NRO. 13 - 149	**CIUDAD:** ARAUCA, ARAUCA	**TELÉFONO:**	3114430280

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	DEPARTAMENTO DE ARAUCA		NIT: 800.102.838-5
DIRECCIÓN: CALLE 20 CARRERA 21 PISO 1	**CIUDAD:** ARAUCA, ARAUCA	**TELÉFONO:**	8856998

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
DESARROLLADORA DE NEGOCIOS Y SUMINISTROS CAM SAS	900313660-1	60.00
CONSULTORES Y CONSTRUCTORES HCP SAS	900416672-0	10.00
CONSULTORIAS Y SUMINISTRO GOMEZ RINCON S.A.S.	900493258-2	30.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AV. 1E NO. 17 - 88 - TELEFONO: 5835460 - CUCUTA

49-44-101035207

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CUCUTA	AGENCIA CUCUTA	49	49-44-101035207	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
12	03	2025	31	12	2024	00:00	01	07	2028	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION	NIT: 901.901.368-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 30 NRO. 13 - 149	ARAUCA, ARAUCA	3114430280

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DE ARAUCA	NIT: 800.102.838-5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 20 CARRERA 21 PISO 1	ARAUCA, ARAUCA	8856998

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN LA EJECUCION DEL CONTRATO NUMERO 475-2024 CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION PARA LA REDUCCION DEL RIESGO Y PREVENCION DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	31/12/2024	01/01/2026	$202,912,535.84	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31/12/2024	01/01/2026	$101,456,267.92	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	31/12/2024	01/07/2028	$76,092,200.94	
CALIDAD DEL SERVICIO	01/07/2025	01/07/2027	$101,456,267.92	

ACLARACIONES

EN EL PRESENTE ANEXO SE ACLARAN LAS VIGENCIAS SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 31/12/2024.

TODOS LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINUAN EN VIGOR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,703,992.00	$ ******20,000.00	$ *****327,558.00	$ *********2,051,551.00	$ ******481,917,272.62	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
MARIA CAROLINA DURAN SANABRIA	153566	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AV. 1E NO. 17 - 88 - TELEFONO: 5835460 - CUCUTA

49-44-101035207

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CUCUTA	AGENCIA CUCUTA	49	49-44-101035207	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
12	03	2025	31	12	2024	00:00	01	07	2028	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION		NIT: 901.901.368-1
DIRECCIÓN: CR 30 NRO. 13 - 149	**CIUDAD:** ARAUCA, ARAUCA	**TELÉFONO:**	3114430280

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	DEPARTAMENTO DE ARAUCA		NIT: 800.102.838-5
DIRECCIÓN: CALLE 20 CARRERA 21 PISO 1	**CIUDAD:** ARAUCA, ARAUCA	**TELÉFONO:**	8856998

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
DESARROLLADORA DE NEGOCIOS Y SUMINISTROS CAM SAS	900313660-1	60.00
CONSULTORES Y CONSTRUCTORES HCP SAS	900416672-0	10.00
CONSULTORIAS Y SUMINISTRO GOMEZ RINCON S.A.S.	900493258-2	30.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AV. 1E NO. 17 - 88 - TELEFONO: 5835460 - CUCUTA

49-44-101035207

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

GOBERNACIÓN DE ARAUCA

LA GERENTE DE CONTRATACIÓN

De conformidad con el Decreto N° 00367 del 29 de marzo del 2023

C E R T I F I C A


Que el contratista **CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN,** identificado con **Nit 9019013681** ha presentado a este Despacho la póliza expedida por **ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO,** que se describe a continuación para su respectiva aprobación:

Póliza No. 49-44-101035207 Anexo 0 , con fecha de expedición 31/12/2024, que garantiza el CUMPLIMIENTO, BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO, PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES Y CALIDAD DEL SERVICIO, **para la legalización** del **Contrato de Interventoría No. 473 de 2024**, cuyo objeto es: **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADÍA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"** del proceso (CM-02-RE-0001-2024) con vigencia de

CUMPLIMIENTO	Desde el 30/12/2024 hasta 31/12/2025
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	Desde el 30/12/2024 hasta 31/12/2025
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	Desde el 30/12/2024 hasta 30/06/2028
CALIDAD DEL SERVICIO	Desde el 30/12/2025 hasta 30/06/2027

Nota 1: La profesional de la Gerencia Técnica de Contratación Administrativa, deja constancia que la póliza mencionada fue consultada por medio de la página Web https://consultapoliza.segurosdelestado.com/consultapoliza/ y se adjunta soporte de verificación.

GOBERNACIÓN DE ARAUCA
Calle 20 Carrera 21 Esquina, Telefax 8851946; Código Postal 810001
Arauca-Arauca (Colombia). E-mail: sac@sedarauca.edu.co
NIT. 800102838 - 5

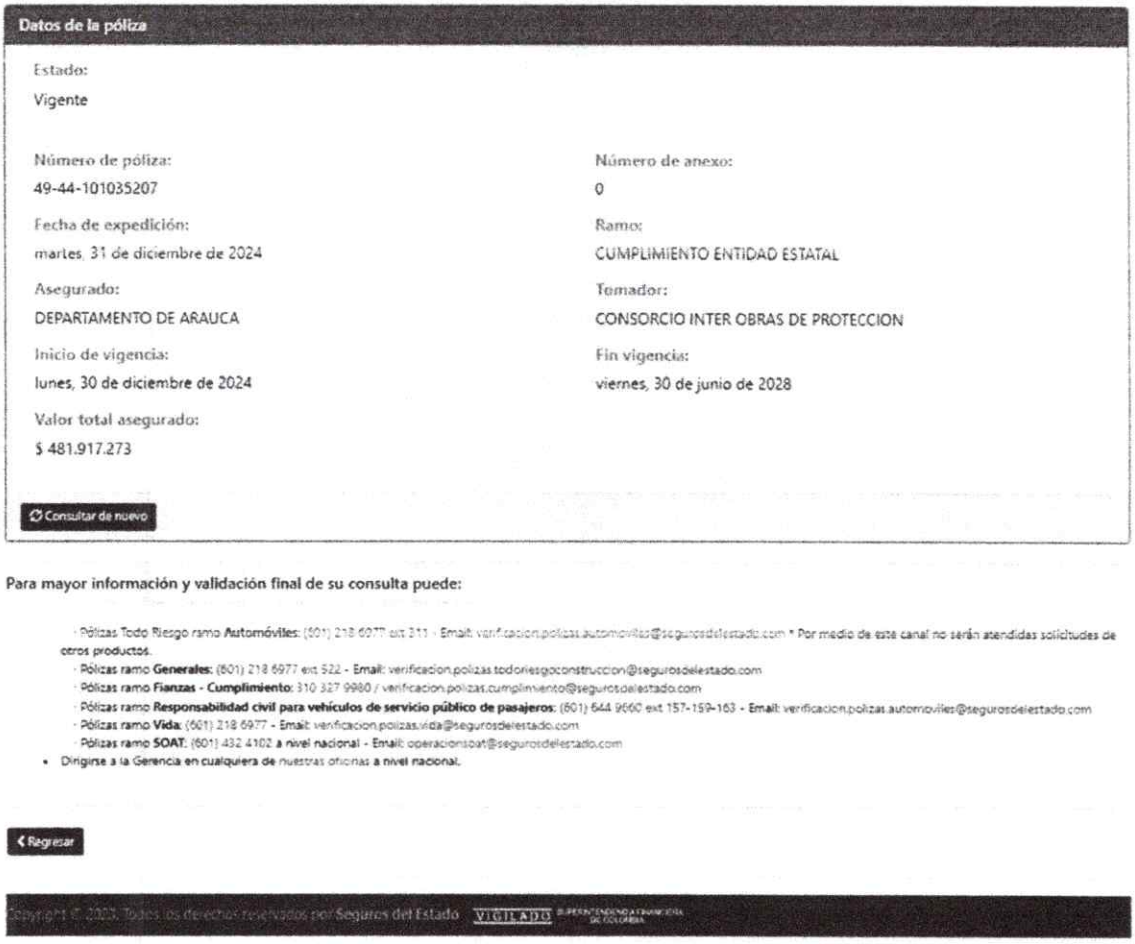

Datos de la póliza

Estado:
Vigente

Número de póliza:
49-44-101035207

Número de anexo:
0

Fecha de expedición:
martes, 31 de diciembre de 2024

Ramo:
CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Asegurado:
DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Tomador:
CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION

Inicio de vigencia:
lunes, 30 de diciembre de 2024

Fin vigencia:
viernes, 30 de junio de 2028

Valor total asegurado:
$ 481.917.273

Consultar de nuevo

Para mayor información y validación final de su consulta puede:

- Pólizas Todo Riesgo ramo **Automóviles**: (601) 218 6977 ext 211 - Email: verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com * Por medio de este canal no serán atendidas solicitudes de otros productos.
- Pólizas ramo **Generales**: (601) 218 6977 ext 522 - Email: verificacion.polizas.todoriesgoconstruccion@segurosdelestado.com
- Pólizas ramo **Fianzas - Cumplimiento**: 310 327 9980 / verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com
- Pólizas ramo **Responsabilidad civil para vehículos de servicio público de pasajeros**: (601) 644 9660 ext 157-159-163 - Email: verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com
- Pólizas ramo **Vida**: (601) 218 6977 - Email: verificacion.polizas.vida@segurosdelestado.com
- Pólizas ramo **SOAT**: (601) 432 4102 a nivel nacional - Email: operacionsoat@segurosdelestado.com
- Dirigirse a la Gerencia en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.

Regresar

Copyright © 2023. Todos los derechos reservados por Seguros del Estado VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Que la misma es aceptada y aprobada de conformidad a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, a los treinta y uno (31) días del mes de diciembre de 2024.

LUZ LILIANA MARCHENA PINZON
Gerente de Contratación

Datos de la póliza

Estado:

Vigente

Número de póliza:

49-44-101035207

Número de anexo:

0

Fecha de expedición:

martes, 31 de diciembre de 2024

Ramo:

CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Asegurado:

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Tomador:

CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION

Inicio de vigencia:

lunes, 30 de diciembre de 2024

Fin vigencia:

viernes, 30 de junio de 2028

Valor total asegurado:

$ 481.917.273

Consultar de nuevo

Para mayor información y validación final de su consulta puede:

· Pólizas Todo Riesgo ramo **Automóviles**: (601) 218 6977 ext 311 - Email: verificacion.polizas.automoviles@segurc

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CUCUTA	AGENCIA CUCUTA	49	49-44-101035207	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
31	12	2024	30	12	2024	00:00	30	06	2028	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION	NIT: 901.901.368-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 30 NRO. 13 - 149	ARAUCA, ARAUCA	3114430260

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO		IDENTIFICACIÓN
	DEPARTAMENTO DE ARAUCA	NIT: 800.182.838-5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELEFONO
CALLE 20 CARRERA 21 PISO 1	ARAUCA, ARAUCA	8850985

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECION A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA QUE SE ANEXAN ECUSIGN, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN LA EJECUCION DEL CONTRATO NUMERO 471-2024 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION PARA LA REDUCCION DEL RIESGO Y PREVENCION DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BARANTA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

COBERTURA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	30/12/2024	31/12/2025	$202,912,535.84
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/12/2024	31/12/2025	$101,456,267.92
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	30/12/2024	30/06/2028	$76,092,200.94
CALIDAD DEL SERVICIO	30/06/2025	30/06/2027	$101,456,267.92

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
DESARROLLADORA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION CAM SAS	901213640-1	60,00
CONSULTORES Y CONSTRUCTORES INT SAS	900804471-0	10,00
CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SOMOS GRUPO S.A.S.	900441356-0	30,00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,703,982.00	$ *****20,000.00	$ *****327,569.00	$ *********2,051,551.00	$ ******451,917,272.62	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARIA CAROLINA DURAN SARABIA	133548	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AV. 1E NO. 17 - 88 - TELEFONO: 5835460 - CUCUTA

49-44-101035207

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

GOBERNACIÓN DE
ARAUCA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

LA GERENTE DE CONTRATACION

De conformidad con el Decreto N° 765 de 2020, modificado por los Decretos N° 865 de 2022 y 367 de 2023

C E R T I F I C A

Que, **CONSORCION INTER OBRAS DE PROTECCION**, ha presentado a este despacho la póliza expedida por COMPAÑÍA DE SEGUROS, SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Anexo N° 2, Póliza No 49-44-101035207, de fecha 12 de marzo de 2025; que garantiza el CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES, CALIDAD DEL SERVICIO, con el presente anexo, se ajusta la vigencia de los amparos, según acta de inicio de fecha 31 de diciembre de 2024, correspondiente al Contrato de Interventoría No. 473 de 2024, cuyo objeto corresponde: **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADÍA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"** *del proceso (*CM-02-RE-001-2024*)*. Con Vigencia de:

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Desde el 31/12/2024 hasta el 01/01/2026
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	Desde el 31/12/2024 hasta el 01/01/2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	Desde el 31/12/2024 hasta el 01/07/2028
CALIDAD DEL SERVICIO	Desde el 01/07/2025 hasta el 01/07/2027

Nota 1: La profesional de la Gerencia Técnica de Contratación Administrativa, deja constancia que la póliza mencionada fue consultada por medio de la página web de SEGUROS DEL ESTADO S.A. https://consultapoliza.segurosdelestado.com/ConsultaPoliza/, verificando el pleno cumplimiento de los requisitos legales, por lo cual se procede a su aprobación.

En todo caso el amparo de CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO debe mantenerse vigente hasta la liquidación del contrato.

Que la misma es aceptada y aprobada de conformidad a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, el día cuatro (04) del mes de abril de dos mil veinticinco (2025).

LUZ LILIANA MARCHENA PINZÓN
Gerente de Contratación

SEGUROS DEVIDA DEL ESTADO — Consulta de pólizas

Datos de la póliza

Estado:
Vigente

Número de póliza:
49-44-101035207

Número de anexo:
2

Fecha de expedición:
miércoles, 12 de marzo de 2025

Ramo:
CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Asegurado:
DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Tomador:
CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION

Inicio de vigencia:
martes, 31 de diciembre de 2024

Fin vigencia:
sábado, 1 de julio de 2028

Valor total asegurado:
$ 461.917.273

GOBERNACIÓN DE ARAUCA – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Calle 20 Carrera 21 Esquina, Telefax 8851946; Código Postal 810001
Arauca-Arauca (Colombia). E-mail: sac@sedarauca.edu.co
NIT. 800102838 - 5

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CUCUTA	AGENCIA CUCUTA	49	49-44-101035207	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
12	03	2025	31	12	2024	00:00	01	07	2028	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION	NIT: 901.901.368-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 30 NRO. 13 - 149	ARAUCA, ARAUCA	3114430280

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DE ARAUCA	NIT: 800.102.838-5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 20 CARRERA 21 PISO 1	ARAUCA, ARAUCA	8856998

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN LA EJECUCION DEL CONTRATO NUMERO 473-2024 CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION PARA LA REDUCCION DEL RIESGO Y PREVENCION DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	31/12/2024	01/01/2026	$202,912,535.84	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31/12/2024	01/01/2026	$101,456,267.92	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	31/12/2024	01/07/2028	$76,092,200.94	
CALIDAD DEL SERVICIO	01/07/2025	01/07/2027	$101,456,267.92	

ACLARACIONES

EN EL PRESENTE ANEXO SE ACLARAN LAS VIGENCIAS SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 31/12/2024.

TODOS LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINUAN EN VIGOR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,703,992.00	$ ******20,000.00	$ *****327,558.00	$ *********2,051,551.00	$ ******481,917,272.62	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
MARIA CAROLINA DURAN SANABRIA	153566	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AV. 1E NO. 17 - 88 - TELEFONO: 5835460 - CUCUTA

49-44-101035207

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CUCUTA	AGENCIA CUCUTA	49	49-44-101035207	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
12	03	2025	31	12	2024	00:00	01	07	2028	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION		NIT: 901.901.368-1
DIRECCIÓN: CR 30 NRO. 13 - 149	**CIUDAD:** ARAUCA, ARAUCA	**TELÉFONO:**	3114430280

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	DEPARTAMENTO DE ARAUCA		NIT: 800.102.838-5
DIRECCIÓN: CALLE 20 CARRERA 21 PISO 1	**CIUDAD:** ARAUCA, ARAUCA	**TELÉFONO:**	8856998

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
DESARROLLADORA DE NEGOCIOS Y SUMINISTROS CAM SAS	900313660-1	60.00
CONSULTORES Y CONSTRUCTORES HCP SAS	900416672-0	10.00
CONSULTORIAS Y SUMINISTRO GOMEZ RINCON S.A.S.	900493258-2	30.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AV. 1E NO. 17 - 88 - TELEFONO: 5835460 - CUCUTA

49-44-101035207

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO 2.
ACTA DE INICIO Y CONTRATO FIRMADO (INTERVENTORIA)

GOBERNACIÓN DE ARAUCA

ACTA DE INICIO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 473 DE 2024

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ARAUCA
NIT. 800.102.838-5

CONTRATISTA: CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN
NIT. 901.901.368-1
R.L. JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON

OBJETO: "INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".

VALOR: $ 507.281.339,60 QUINIENTOS SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE.

REGISTRO PRESUPUESTAL: No. 4824 del 31 de diciembre de 2024 por valor de $ 507.281.339,60

FECHA DE LEGALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2024

PLAZO PACTADO: SEIS (6) MESES

FECHA DE INICIO: 31 DE DICIEMBRE DE 2024

FECHA DE TERMINACIÓN: 30 DE JUNIO DE 2025

En Arauca, a los treinta y un (31) días del mes de diciembre del año 2024, se reunieron: el Secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana Departamental, el Doctor **NASSER CRUZ MATUS** y, por otra parte, el ingeniero **JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON**, en calidad de representante legal de la firma contratista **CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN** identificada con Nit. 901.901.368-1, con el fin de suscribir la presente acta de inicio de las obligaciones derivadas del citado contrato.

Para constancia se firma la presenta acta de inicio, por quienes intervinieron.

NASSER CRUZ MATUS
Secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana Departamental

JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON
R/L. CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION
Interventor Externo

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7175542
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	4 días de tiempo transcurrido *(26/12/2024 6:26:03 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	473-2024
Objeto del contrato	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADÍA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	6 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	30/06/2025 12:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/07/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	31/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	1/07/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	31/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

DEPARTAMENTO DEL ARAUCA

COLOMBIA, Arauca

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION

COLOMBIA, Arauca
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON *Fecha de aprobación:* 30/12/2024 6:17:04 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: LUZ LILIANA MARCHENA PINZÓN *Fecha de aprobación:* 30/12/2024 6:46:49 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Si	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte (interventoría de obra pública)	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	-

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

Seriedad de la oferta etapas	☑Sí ☐No			
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
☑	Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
	☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	6 horas de tiempo transcurrido *(30/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑	Cumplimiento del contrato			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	6 horas de tiempo transcurrido *(30/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑	Pago de salarios			
	☑% del valor del contrato	15,00	Fecha de vigencia (desde)	6 horas de tiempo transcurrido *(30/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑	Calidad del servicio			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	6 horas de tiempo transcurrido *(30/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2030 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☐Sí ☑No			
Fecha límite para entrega de garantías:	17 horas para terminar *(31/12/2024 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías: -	

Garantías del proveedor:

de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.16004739	Seriedad de la oferta	-	50.728.135,00 COP	-	21/03/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7175542
Proveedor CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 20 CARRERA 21
Ubicación CO-ARA-81001 - Arauca
País COLOMBIA
Departamento Arauca
Municipio Arauca
Dirección CALLE 20 CARRERA 21
Código postal

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Saravena	COLOMBIA > Arauca > Saravena

1 CO1.PCCNTR.7175542

1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal		
		Precio total estimado 507.281.340,55	Incluya el precio como lo **indique la Entidad Estatal** 507.281.339,60

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	Anexo 5- Minuta del Contrato de Interventoria MINUTA.pdf	Anexo 5- Minuta del Contrato de Interventoria MINUTA.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor	Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalías - SGR	☑Sí ☐No *	507.281.339,6
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		507.281.339,6

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024005810056	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

	Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado	
☐	4224	2024005810056	CDP	Generado	507.281.340,55 COP	507.281.340,55 COP	507.281.339,6 COP	No se ha iniciado	-	Editar

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
	4224	CDP	No se ha iniciado		507.281.339,6 COP	00-00-000	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Saldo de compromisos CDP 0 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

ANEXO 3. PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL DE DICIEMBRE Y ENERO (INTERVENTORIA)

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-04-09, 11:07:57 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 77226611

Periodo Cotización: diciembre de 2024 **Periodo Servicio:** enero de 2025

PAGADO 09/04/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION		
Documento	NI901901368	**Dirección**	CR 30 #13 - 149 CENTRO
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	8859999
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	ARAUCA	**Departamento**	ARAUCA
Representante Legal	GOMEZ RINCON JAIRO HERNANDO	**Identificación**	CC 1018410660
Total Afiliados	6	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1005328383	JENIFER CARELLY RINCON BEDOYA	01	00	X																0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 66.667	$ 10.700	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 66.667	$ 2.700	0,522	$ 66.667	$ 400	(CCF67) COMFIAR	$ 66.667	$ 2.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.900
CC 1094269757	CRISTIAN MIGUEL ROMERO DUARTE	01	00	X																0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 166.667	$ 26.700	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 166.667	$ 6.700	0,522	$ 166.667	$ 900	(CCF67) COMFIAR	$ 166.667	$ 6.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41.000
CC 1094271704	JUAN GABRIEL HERNANDEZ MARIN	01	00	X																0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 166.667	$ 26.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 166.667	$ 6.700	0,522	$ 166.667	$ 900	(CCF67) COMFIAR	$ 166.667	$ 6.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41.000
CC 1116794960	CARLOS ALBERTO PELAEZ PRADA	01	00	X																0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 266.667	$ 42.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 266.667	$ 10.700	0,522	$ 266.667	$ 1.400	(CCF67) COMFIAR	$ 266.667	$ 10.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 65.900
CC 1116797364	SINDY MILIYETH OROZCO PEREZ	01	00	X																0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 100.000	$ 16.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 100.000	$ 4.000	0,522	$ 100.000	$ 500	(CCF67) COMFIAR	$ 100.000	$ 4.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.600
CC 88079305	YONIER FERNANDO ROMERO MENDOZA	01	00	X																0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 100.000	$ 16.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 100.000	$ 4.000	0,522	$ 100.000	$ 500	(CCF67) COMFIAR	$ 100.000	$ 4.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.600

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 866.668	$ 866.668	$ 866.668	$ 866.668	$ 138.800	$ 34.800	$ 4.800	$ 34.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 213.200	$ 11.500	$ 224.700

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-04-09, 11:01:33 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	diciembre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	enero de 2025
Empresa	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION
NIT	NI 901901368
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	77226611
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1399255062
Banco	(1013) - BANCO BBVA COLOMBIA S.A.
Valor	$ 224.700
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	5	$ 112.100	$ 5.900
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 26.700	$ 1.500
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	3	$ 14.700	$ 800
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	$ 10.700	$ 600
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	2	$ 9.400	$ 500
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPAÑIA DE SEG	6	$ 4.800	$ 300
N800219488	CCF67	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFIAR	6	$ 34.800	$ 1.900
		SubTotales:		$ 213.200	$ 11.500
		Total a Pagar:			$ 224.700

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-04-09, 11:07:59 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 77227254

Periodo Cotización: enero de 2025 **Periodo Servicio:** febrero de 2025

PAGADO 09/04/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION		
Documento	NI901901368	**Dirección**	CR 30 #13 - 149 CENTRO
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	8859999
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	ARAUCA	**Departamento**	ARAUCA
Representante Legal	GOMEZ RINCON JAIRO HERNANDO	**Identificación**	CC 1018410660
Total Afiliados	6	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1065328383	JENIFER CARELLY RINCON BEDOYA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 2.000.000	$ 80.000	0,522	$ 2.000.000	$ 10.500	(CCF57) COMFIAR	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 490.500
CC 1094269757	CRISTIAN MIGUEL ROMERO DUARTE	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 5.000.000	$ 800.000	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 5.000.000	$ 200.000	0,522	$ 5.000.000	$ 26.100	(CCF57) COMFIAR	$ 5.000.000	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.226.100
CC 1094271704	JUAN GABRIEL HERNANDEZ MARIN	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 5.000.000	$ 800.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 5.000.000	$ 200.000	0,522	$ 5.000.000	$ 26.100	(CCF57) COMFIAR	$ 5.000.000	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.226.100
CC 1116794960	CARLOS ALBERTO PELAEZ PRADA	01	00	X	X															0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 4.000.000	$ 640.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 4.000.000	$ 160.000	0,522	$ 4.000.000	$ 20.900	(CCF57) COMFIAR	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 980.900
CC 1116797364	SINDY MILIYETH OROZCO PEREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.000.000	$ 480.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 3.000.000	$ 120.000	0,522	$ 3.000.000	$ 15.700	(CCF57) COMFIAR	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 735.700
CC 86079305	YONIER FERNANDO ROMERO MENDOZA	01	00	X	X															0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 1.500.000	$ 240.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.500.000	$ 60.000	0,522	$ 1.500.000	$ 7.900	(CCF57) COMFIAR	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 367.900

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 20.500.000	$ 20.500.000	$ 20.500.000	$ 20.500.000	$ 3.280.000	$ 820.000	$ 107.200	$ 820.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.027.200	$ 163.900	$ 5.191.100

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-04-09, 11:05:03 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	enero de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	febrero de 2025
Empresa	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION
NIT	NI 901901368
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	77227254
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1399264020
Banco	(1013) - BANCO BBVA COLOMBIA S.A.
Valor	$ 5.191.100
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	5	$ 2.480.000	$ 80.700
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 800.000	$ 26.100
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	3	$ 380.000	$ 12.400
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	$ 160.000	$ 5.300
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	2	$ 280.000	$ 9.200
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPAÑIA DE SEG	6	$ 107.200	$ 3.500
N800219488	CCF67	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFIAR	6	$ 820.000	$ 26.700
		SubTotales:		$ 5.027.200	$ 163.900
		Total a Pagar:			$ 5.191.100

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

ANEXO 4.
CONTRATO OFICINA, CAMIONETA Y COMISIÓN TOPOGRAFICA (INTERVENTORIA)

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

Lugar y fecha celebración contrato:	ARAUCA – (ARAUCA) 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Arrendador:	MERLYS KATERINE CASTAÑO GUTIERREZ
Identificación arrendador:	CC. 1.116.795.716 DE ARAUCA (ARAUCA)
Arrendatario:	JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON
Identificación arrendatario:	C.C 1.018.410.660
Canon o precio:	UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000) M/CTE. MENSUAL
Término o duración:	SEIS MESES (6)
Fecha de Inicio:	31 DE DICIEMBRE DE 2024.
Fecha terminación:	31 DE JUNIO DE 2025.
Dirección de inmueble:	CALLE 20 N° 19– 45 B. CRISTO REY

Entre los suscritos a saber, MERLYS KATERINE CASTAÑO GUTIERREZ, con domicilio en la ciudad de Arauca, identificado con la cédula de ciudadanía número CC. 1.116.795.716 DE ARAUCA (ARAUCA) , quien obra en nombre propio y que para efectos de este contrato se denominará el "ARRENDADOR", por una parte, y por la otra, el señor **JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON** con domicilio en la ciudad de Arauca, identificado(a) con la cédula de ciudadanía número **1.018.410.660 EXPEDIDA EN BOGOTA**, quien para efectos de este contrato obra en nombre propio y se denominará el "ARRENDATARIO", manifestaron que han decidido celebrar un contrato de arrendamiento de bien inmueble destinado para local Comercial, en adelante el "contrato", el cual se rige por las siguientes cláusulas:

PRIMERA. – Objeto: Por medio del presente contrato, el ARRENDADOR alquila a título oneroso al ARRENDATARIO un local comercial ubicado en la Calle 20 N° 19 – 45, Barrio cristo rey, del Municipio de Arauca, destinado para OFICINA (uso administrativo) (en adelante, el "Inmueble").

SEGUNDA. – Obligaciones del arrendador: 1. Entregar al ARRENDATARIO en la fecha convenida (se hace entrega de las llaves y local a satisfaccion el día 31 de diciembre), o en el momento de la celebración del contrato, el inmueble dado en arrendamiento en buen estado de servicio, seguridad y sanidad y poner a su disposición los servicios, cosas o usos conexos y los adicionales convenidos. **2**. Mantener en el inmueble los servicios, las cosas y los usos conexos y adicionales en buen estado de servir para el fin convenido en el contrato. **3**. Suministrar tanto al ARRENDATARIO como al codeudor, cuando sea el caso, copia del contrato con firmas originales. **4**. El ARRENDADOR tiene, además, la obligación de mantener en adecuadas condiciones de funcionamiento, de seguridad y de sanidad las zonas o servicios de uso común y de efectuar por su cuenta las reparaciones y sustituciones necesarias, cuando no sean atribuibles a los ARRENDATARIOS, y de garantizar el mantenimiento del orden interno del local; **5**. Las demás obligaciones consagradas para los arrendadores en el Capítulo II, Título XXVI, Libro 4 del Código Civil.

TERCERA – Obligaciones del arrendatario. 1. Pagar el precio del arrendamiento dentro del plazo estipulado en el contrato, en el inmueble arrendado o en el lugar convenido. **2**. Cuidar el inmueble y las cosas recibidas en arrendamiento. En caso de daños o deterioros distintos a los derivados del uso normal o de la acción del tiempo y que fueren imputables al mal uso del inmueble o a su propia culpa, efectuar oportunamente y por su cuenta las reparaciones o sustituciones necesarias. **3**. Pagar a tiempo los servicios, cosas o usos conexos y adicionales, así como las expensas comunes en los casos en que haya lugar, de conformidad con lo establecido en el presente contrato. El arrendatario está obligado además a cuidar las zonas y servicios de uso común (fachada) y a efectuar por su cuenta las reparaciones o sustituciones

necesarias, cuando sean atribuibles a su propia culpa o, a la de sus dependientes, y **4**. Las demás obligaciones consagradas para los arrendatarios en el Capítulo III, Título XXVI, libro 4 del Código Civil.

CUARTA. -Vigencia: El arrendamiento tendrá una duración de seis **(6) meses**, contados a partir del **31 de diciembre 2024**, sin embargo, en caso de silencio entre las partes al expirar el plazo principal estipulado, éste se entenderá **prorrogado por el término inicial**, siempre que las partes cumplan con las obligaciones a su cargo, y que el ARRENDATARIO **se allane a los reajustes de la renta autorizados en la ley**. Lo anterior sin perjuicio de que las partes puedan darlo por terminado de común acuerdo en cualquier tiempo.

QUINTA. - Valor: El canon mensual o precio del arrendamiento del inmueble será la suma mensual de **un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000),** cuyo valor el ARRENDATARIO se compromete a pagar al ARRENDADOR por cada mes calendario, anticipadamente, el dia 1 de cada mes la respectiva mensualidad a la cuenta bancaria **(Cuenta depósito de bajo monto No. 3212321440 NEQUI, Titular: Merlys Katerine castaño gutierrez)**. El ARRENDATARIO dentro del mismo término allegará AL ARRENDADOR copia física o magnética del desprendible de pago durante todo el término de vigencia de este contrato, entendiéndose vigente mientras el ARRENDATARIO conserve el inmueble en su poder y no se haya entregado éste a satisfacción del ARRENDADOR.

Parágrafo primero: La tolerancia del ARRENDADOR en recibir el pago del canon de arrendamiento con posterioridad al plazo indicado para ello en esta cláusula, no podrá entenderse, en ningún caso, como ánimo del ARRENDADOR de modificar el término establecido en este contrato para el pago del canon.

SEXTA. – Entrega: El ARRENDATARIO en la fecha de suscripción de este documento declara haber recibido el Inmueble de manos del ARRENDADOR en perfecto estado de habitabilidad. El ARRENDATARIO **no podrá hacerle mejoras al inmueble sin autorización escrita del ARRENDADOR**; hecha sin ella acrecerá el inmueble, sin perjuicio de que el ARRENDADOR pueda exigir su retiro. En ningún caso el ARRENDATARIO tendrá derecho de retención sobre el inmueble por razones de mejoras, ni derecho a indemnización alguna.

SÉPTIMA. – **Reparaciones**: Los daños que se ocasionen al Inmueble por el ARRENDATARIO, por responsabilidad suya o de sus dependientes, serán reparados y cubiertos sus costos de reparación en su totalidad por el ARRENDATARIO. Igualmente, el ARRENDATARIO se obliga a cumplir con las obligaciones previstas en los artículos 2028, 2029 y 2030 del Código Civil, y no podrá realizar otras sin el consentimiento previo y escrito del ARRENDADOR.

Las mejoras al Inmueble serán del propietario del inmueble y no habrá lugar al reconocimiento del precio, costo o indemnización alguna al ARRENDATARIO por las mejoras realizadas. Las mejoras no podrán retirarse salvo que el ARRENDADOR lo exija por escrito, a lo que el Arrendatario accederá inmediatamente a su costa, dejando el inmueble en el mismo buen estado en que lo recibió del ARRENDADOR: **pintura, puertas, iluminacion, buen estado de los baños etc.; salvo el deterioro natural por el uso legítimo.**

Sin embargo, EL ARRENDADOR se obliga a reembolsar al ARRENDATARIO el costo de las reparaciones indispensables no locativas, que el ARRENDATARIO hiciera en el inmueble objeto del presente contrato, siempre que el ARRENDATARIO no las haya hecho necesarias por su culpa.

OCTAVA. – Destinación del inmueble: El ARRENDATARIO destinará el inmueble exclusivamente para uso comercial y/o administrativo como en este caso, se prohíbe su cesión o subarriendo total o parcial sin la autorización escrita del ARRENDADOR. El incumplimiento de esta obligación dará derecho al ARRENDADOR de gestionar la terminación del contrato con pretensiones indemnizatorias. En caso de cesión o subarriendo, el ARRENDADOR podrá celebrar un nuevo contrato de arriendo con los usuarios reales.

Igualmente queda prohibido el uso ilícito del inmueble y almacenar sustancias explosivas o perjudiciales para la seguridad, o conservación o higiene del inmueble. O cualquier tipo de sustancia ilictia. O venta de productos sin los registros estipulados por la ley.

NOVENA. – Servicios Públicos: El ARRENDATARIO pagará oportuna y totalmente los servicios públicos del Inmueble desde la fecha en que comience el arrendamiento hasta la restitución del Inmueble. Si el Arrendatario no paga los servicios públicos a su cargo, el ARRENDADOR podrá hacerlo para evitar que los servicios públicos sean suspendidos. El incumplimiento del Arrendatario en el pago oportuno de los servicios públicos del inmueble se tendrá como incumplimiento del Contrato y el ARRENDATARIO deberá cancelar de manera incondicional e irrevocable al ARRENDADOR las sumas que por este concepto haya tenido que pagar el ARRENDADOR, pago que deberá hacerse de manera inmediata por el ARRENDATARIO con la presentación de las facturas correspondientes por parte del ARRENDADOR. No obstante, lo anterior, el ARRENDADOR podrá abstenerse de pagar los servicios públicos a cargo del ARRENDATARIO, sin que por ello el ARRENDATARIO pueda alegar responsabilidad del ARRENDADOR. **"El codigo de ENELAR asignado para el local 2 comercial es: 115048. No se podran realizar abonos el no pago de un mes implica el corte del servicio de energia".**

Parágrafo primero: El ARRENDATARIO declara que ha recibido en perfecto estado de funcionamiento y de conservación las instalaciones para uso de los servicios públicos del Inmueble, **que se abstendrá de modificarlas sin permiso previo y escrito del ARRENDADOR** y que responderá por daños y/o violaciones de los reglamentos de las correspondientes empresas de servicios públicos, como sellos, medidores en la parte eléctrica o hidráulica la cual se entrega en perfecto estado.

Parágrafo segundo: El ARRENDATARIO reconoce que el ARRENDADOR en ningún caso y bajo ninguna circunstancia es responsable por la interrupción o deficiencia en la prestación de cualquiera de los servicios públicos del Inmueble. En caso de la prestación deficiente o suspensión de cualquiera de los servicios públicos del Inmueble, el ARRENDATARIO reclamará de manera directa a las empresas prestadoras del servicio y no al ARRENDADOR.

DÉCIMA. – Cesión: El ARRENDATARIO faculta al ARRENDADOR a ceder total o parcialmente este contrato y declara al cedente del contrato, es decir al ARRENDADOR, libre de cualquier responsabilidad como consecuencia de la cesión que haga de este contrato. EL ARRENDATARIO se obliga a cumplir sus obligaciones con el cesionario desde la fecha en que tal acto se le comunique.

DECIMA PRIMERA. – Terminación de Contrato: i) Bilateral. Las partes en cualquier tiempo podrán dar por terminado el presente contrato de común acuerdo. **ii) Unilateral**: son causales de terminación unilateral del contrato las establecidas en la ley 820 de 2003 y demás normas concordantes, en especial: **A) *Por parte del ARRENDADOR*: 1**. La no cancelación por parte del arrendatario de las rentas y reajustes dentro del término estipulado en el contrato. **2**. La no cancelación de los servicios públicos, que cause la desconexión o pérdida del servicio, o el pago de las expensas comunes cuando su pago estuviere a cargo del arrendatario. **3**. El subarriendo total o parcial del inmueble, la cesión del contrato o del goce del inmueble o el cambio de destinación del mismo por parte del arrendatario, sin expresa autorización del arrendador. **4**. La incursión reiterada del arrendatario en procederes que afecten la tranquilidad ciudadana de los vecinos, o la destinación del inmueble para actos delictivos o que impliquen contravención, debidamente comprobados ante la autoridad policiva. **5**. La realización de mejoras, cambios o ampliaciones del inmueble, sin expresa autorización del arrendador o la destrucción total o parcial del inmueble o área arrendada por parte del arrendatario. **6**. El arrendador podrá dar por terminado unilateralmente el contrato de arrendamiento durante

las prórrogas, previo aviso escrito dirigido al arrendatario a través del servicio postal autorizado, con una antelación no menor de dos (2) meses y el pago de una indemnización equivalente al precio de dos (2) meses de arrendamiento. Cumplidas estas condiciones el arrendatario estará obligado a restituir el inmueble. **7**. El arrendador podrá dar por terminado unilateralmente el contrato de arrendamiento a la fecha de vencimiento del término inicial o de sus prórrogas invocando cualquiera de las siguientes causales especiales de restitución, previo aviso escrito al arrendatario a través del servicio postal autorizado con una antelación no menor a dos (2) meses a la referida fecha de vencimiento: a) Cuando el propietario o poseedor del inmueble necesitare ocuparlo para su propia habitación, por un término no menor de un (1) año; b) Cuando el inmueble haya de demolerse para efectuar una nueva construcción, o cuando se requiere desocuparlo con el fin de ejecutar obras independientes para su reparación; c) Cuando haya de entregarse en cumplimiento de las obligaciones originadas en un contrato de compraventa; d) La plena voluntad de dar por terminado el contrato, siempre y cuando, el contrato de arrendamiento cumpliere como mínimo cuatro (4) años de ejecución. El arrendador deberá indemnizar al arrendatario con una suma equivalente al precio de uno punto cinco (1.5) meses de arrendamiento. Cuando se trate de las causales previstas en los literales a), b) y c), el arrendador acompañará al aviso escrito la constancia de haber constituido una caución en dinero, bancaria u otorgada por compañía de seguros legalmente reconocida, constituida a favor del arrendatario por un valor equivalente a seis (6) meses del precio del arrendamiento vigente, para garantizar el cumplimiento de la causal invocada dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de la restitución. Cuando se trate de la causal prevista en el literal d), el pago de la indemnización se realizará mediante el mismo procedimiento establecido en el artículo 23 la ley 820 de 2003. De no mediar constancia por escrito del preaviso, el contrato de arrendamiento se entenderá renovado automáticamente por un término igual al inicialmente pactado. **B) por parte del ARRENDATARIO: 1.** La suspensión de la prestación de los servicios públicos al inmueble, por acción premeditada del arrendador o porque incurra en mora en pagos que estuvieren a su cargo. En estos casos el arrendatario podrá optar por asumir el costo del restablecimiento del servicio y descontarlo de los pagos que le corresponda hacer como arrendatario. **2**. La incursión reiterada del arrendador en procederes que afecten gravemente el disfrute cabal por el arrendatario del inmueble arrendado, debidamente comprobada ante la autoridad policiva. **3**. El desconocimiento por parte del arrendador de derechos reconocidos al arrendatario por la Ley o contractualmente. **4**. El arrendatario podrá dar por terminado unilateralmente el contrato de arrendamiento dentro del término inicial o durante sus prórrogas, previo aviso escrito dirigido al arrendador a través del servicio postal autorizado, con una antelación no menor de tres (3) meses y el pago de una indemnización equivalente al precio de tres (3) meses de arrendamiento. Cumplidas estas condiciones el arrendador estará obligado a recibir el inmueble; si no lo hiciere, el arrendatario podrá hacer entrega provisional mediante la intervención de la autoridad competente, sin prejuicio de acudir a la acción judicial correspondiente. **5**. El arrendatario podrá dar por terminado unilateralmente el contrato de arrendamiento a la fecha de vencimiento del término inicial o de sus prórrogas, siempre y cuando dé previo aviso escrito al arrendador a través del servicio postal autorizado, con una antelación no menor de tres (3) meses a la referida fecha de vencimiento. En este caso el arrendatario no estará obligado a invocar causal alguna diferente a la de su plena voluntad, ni deberá indemnizar al arrendador. De no mediar constancia por escrito del preaviso, el contrato de arrendamiento se entenderá renovado automáticamente por un término igual al inicialmente pactado.

DECIMA SEGUNDA. -Restitución: terminado el contrato, el ARRENDATARIO (i) restituirá el Inmueble al ARRENDADOR en las mismas buenas condiciones en que lo recibió del ARRENDADOR, salvo el deterioro natural causado por el uso legítimo; y (ii) entregará al ARRENDADOR los ejemplares originales de las facturas de cobro por concepto de servicios públicos del Inmueble correspondientes a los últimos tres (3) meses, debidamente canceladas por el ARRENDATARIO, bajo el entendido que hará entrega de dichas facturas en el domicilio del ARRENDADOR, con una antelación de dos (2) días hábiles a la fecha fijada para la restitución material del Inmueble al ARRENDADOR.

Parágrafo: La responsabilidad del ARRENDATARIO subsistirá aún después de restituido el Inmueble, mientras el ARRENDADOR no haya entregado el paz y salvo correspondiente por escrito al ARRENDATARIO.

DECIMA TERCERA. – Renuncia: El ARRENDATARIO declara que (i) **NO HA TENIDO NI TIENE POSESIÓN DEL INMUEBLE,** y (ii) que renuncia en beneficio del ARRENDADOR o de su cesionario, a todo requerimiento para constituirlo en mora en el cumplimiento de las obligaciones a su cargo derivadas de este contrato.

DECIMA CUARTA. – Validez: El presente Contrato anula todo convenio anterior relativo al arrendamiento del mismo Inmueble y solamente podrá ser modificado por escrito suscrito por las Partes.

DÉCIMA QUINTA. – Merito Ejecutivo: El ARRENDATARIO declara de manera expresa que reconoce y acepta que este Contrato presta mérito ejecutivo para que el ARRENDADOR exija el pago de (i) los cánones de arrendamiento causados y no pagados por el ARRENDATARIO, (ii) las multas y sanciones que se causen por el incumplimiento del ARRENDATARIO de cualquiera de las obligaciones a su cargo en virtud de la ley o de este Contrato, (iii) las sumas causadas y no pagadas por el ARRENDATARIO por concepto de servicios públicos del inmueble y cualquier otra suma de dinero que por cualquier concepto deba ser pagada por el ARRENDATARIO; para lo cual bastará la sola afirmación bajo juramento [que se entenderá prestado con la sola presentación de la demanda] de incumplimiento del ARRENDATARIO hecha por el ARRENDADOR, afirmación que solo podrá ser desvirtuada por el ARRENDATARIO con la presentación de los respectivos recibos de pago.

DÉCIMA SEXTA. – Reajuste del valor del canon: Si por convenio entre las partes o prórroga automática el presente contrato alcanza los doce (12) meses de ejecución, el valor del canon será reajustado en un 100% en relación con el incremento que **haya tenido el índice de precios al consumidor en el año calendario inmediatamente anterior al del vencimiento del contrato o al de su prórroga.**

DÉCIMA SEPTIMA. – Cláusula Penal: En el evento de incumplimiento cualquiera de las partes a las obligaciones a su cargo contenidas en la ley o en este contrato, la parte incumplida deberá pagar a la otra parte una suma equivalente a un canon de arrendamiento vigente en la fecha del incumplimiento, a título de pena, sin menoscabo del canon y de los perjuicios que pudiera ocasionar el incumplimiento.

DECIMA OCTAVA. – **Notificaciones**: En cumplimiento del art. 12 de la ley 820 de 2003, para efectos de recibir notificaciones judiciales o extrajudiciales las partes indicamos las siguientes: a) ARRENDADOR: CALLE 20 N° 19 – 45 B. cristo rey – Arauca, *e-mail:* katterinegutierrez04@gmail.com, celular 3212321440; b) ARRENDATARIO: Cra 29 # 15 - 48 barrio guarataros en Arauca -, celular 3114430280. CODEUDOR: YEISON ALEXANDER SANCHEZ ALVARADO, CC. 1.116.804.057 DE ARAUCA, Celular: 3212345609 e-mail: cam.sas@hotmail.com

Para constancia el presente contrato es suscrito en la ciudad de Arauca (Arauca) el día 31 de diciembre de 2024, en dos (2) ejemplares de igual valor, cada uno de ellos con destino a cada una de las partes.

Merlys Castaño

MERLYS KATERINE CASTAÑO GUTIERREZ
CC. 1.116.795.716 DE ARAUCA
Celular: 3212321440
El Arrendador

JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON
CC. 1.018.410.660 EXPEDIDA EN BOGOTA
Celular: 3176492451
El Arrendatario

YEISON ALEXANDER SANCHEZ ALVARADO
CC. 1.116.804.057 DE ARAUCA
Celular: 3212345609
Codeudor

CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION
NIT. 901.901.368-1

CONTRATO ALQUILER VEHICULAR N.001

OBJETO	**ALQUILER DE UN VEHICULO TIPO CAMIONETA, para la ejecución del CONTRATO DE CONSULTORIA-MODALIDAD INTERVENTORIA No. 473 de 2024 cuyo objeto es "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RÍO BANADÍA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA""**
CONTRATISTA	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION
NIT	901.901.368-1
VALOR	SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS CON DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/L
PLAZO	SEIS (6) MESES
CONTRATANTE:	CONSTRUCCIONES MATERIALES Y SUMINISTROS S.A.S.
NIT:	900.203.195-4

Entre los suscritos a saber, **JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON**, mayor de edad y vecino de esta ciudad, identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.018.410.660. expedida en Bogotá, actuando en nombre y representación del **CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION** con el NIT No. 901.901.368-1, quien para los efectos del presente documento se denominado **EL CONTRATANTE**, por una parte y por la otra, el señor **ADONIAS ROMERO PABON**, mayor de edad, identificado con la cedula de ciudadanía No. 96.189.785 expedida en Saravena, actuando en nombre y representación de la empresa **CONSTRUCCIONES MATERIALES Y SUMINISTROS S.A.S.** con el NIT No. 900.203.195-4 y quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, se ha celebrado el contrato de **ALQUILER DE VEHICULO**, que se rige por la legislación comercial colombiana y además por las siguientes clausulas:

Clausula Primera: Valor: El contrato de alquiler de vehículo incluyendo el conductor será de SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS CON DOSCIENTOS OCHENTA CENTAVOS M/L ($62.945.280) incluido el IVA. **Clausula Segunda: Forma de pago:** El valor del presente contrato será cancelado de forma mensual por un valor de DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS OCHETA PESOS MCTE ($10.490.880) **Clausula cuarta: disponibilidad del vehículo:** El contratista dispondrá de un (01) vehículo con las siguientes características: Camioneta de servicio público, PICK-UP, doble cabina, modelo no superior a cinco (05) años, que deberán estar con un 100% de disponibilidad del contratante, en caso de que alguno de los vehículos tenga daños mecánicos

que no le permitan su normal funcionamiento, este deberá ser reemplazado por uno igual con las mismas condiciones y capacidades. **Clausula quinta: Responsabilidades del contratista:** Mientras este prestando los servicios de transporte, este será responsable por cualquier daño causado al vehículo automotor a terceras personas, por todas las infracciones al Código Nacional de Tránsito y Transporte, el conductor debe permanecer siempre con la documentación al día. **Parágrafo primero:** el contratante no se hace responsable por daños y perjuicios causados al vehículo por grupos al margen de la ley. **Clausula sexta: obligaciones:** Son obligaciones del CONTRATANTE: **a)** informar claramente los lugares de origen y destino, con el fin de asignar apropiadamente la ruta de transporte; **b)** informa por escrito, cualquier cambio de dirección con DOS días calendario de anticipación, con el objetivo de modificar la ruta de transporte; **c)** Cumplir con lo establecido en el presente contrato en forma oportuna, dentro de los términos establecidos y de conformidad con las calidades pactadas; **d)** Pagar el valor de la contraprestación en los términos y condiciones establecidas en este contrato; **e)** El valor del seguro del SOAT, corresponde su pago al contratista, el cual tiene la obligación de mantenerlo siempre vigente. PARAGRAFO: en caso de que el contratista deje vencer el SOAT, el contratante podrá comprarlo y su valor será descontado de su respectivo contrato de prestación de servicio de transporte; **f)** El conductor deberá contar con la afiliación y pago a las administradoras de seguridad social y la respectiva licencia de conducción con la categoría autorizada para este tipo de transporte; **g)** Cumplir con todos los requisitos para la libre circulación y prestación de servicio de transporte exigido por el Ministerio de Transporte, y demás entidades pertinentes. Este requisito es aplicable tanto para los vehículos y durante todo el trayecto; **h)** Garantizar la integridad física de los pasajeros del vehículo y durante todo el trayecto; **i)** Cumplir estrictamente con idoneidad y oportunidad en la ejecución del presente contrato. **Clausula séptima: Terminación del contrato:** El incumplimiento de cualquier obligación o prohibición descritas en este contrato, dará derecho al Contratista a cancelar de manera inmediata el contrato; o se podrá dar por terminado por común acuerdo entre las partes mediante previo aviso por escrito de no menos de CINCO (05) días de anticipación. Clausula octava: notificaciones: Se realizarán directamente en la empresa y notificara a donde el contratista lo designe.

Como constancia de aceptación de su contenido y de las obligaciones que dé el derivan para cada una de las partes, se suscribe el presente contrato en dos ejemplares de igual valor e idéntico tenor, con destino a cada una de las partes, en la ciudad de Arauca, el día treinta y uno (31) de diciembre de 2024.

JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON
C.C. 1.018.410.660 expedida en Bogotá
Representante Legal
CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION
Contratante

ADONIAS ROMERO PABON
C.C. 96.189.785 expedida en Saravena
Representante Legal
CONSTRUCCIONES MATERIALES Y SUMINISTROS S.A.S.
Contratista

ANEXO 5.
BITACORAS DE OBRA
01 DE ENERO DE 2025
AL 31 DE ENERO DE 2025

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

BITACORA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N°: 481 DE 2024

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATISTA	CONSORCIO RIO BANADIA R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON

FECHA:	MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024	FOLIO	1

RECURSO EQUIPO		RECURSO HUMANO		MATERIALES	ESTADO DEL TIEMPO		
EQUIPOS	CANT	PERSONAL	CANT	DESCRIPCION			
		Director de Obra	1				
		Residente de Obra	2				
		Residente de interventoria	1				
		Director interventoria	1		[illegible]	x	x
		Ingeniero Ambiental	1		[illegible]		
		Profesional Social	1		[illegible]		
		Profesional HSEQ	1		[illegible]		
		Inspector de obra (Técnico e	1		[illegible]		
		Secretaria	1		[illegible]		
					[illegible]		
					[illegible]		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

PREALISTAMIENTO
REVISION DE DOCUMENTOS TECNICOS

SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS:

SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS:

VoBo

ING. JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA
M.P. 54202-403896 NTS

VoBo

ING JUAN GABRIEL HERNANDEZ MARIN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P. 54202-271584 NTS

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.502.273

BITACORA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N°:	481 DE 2024
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATISTA	CONSORCIO RIO BANADIA R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON

FECHA:	MIERCOLES, 01 DE ENERO 2025	FOLIO	2

RECURSO EQUIPO		RECURSO HUMANO		MATERIALES	ESTADO DEL TIEMPO		
EQUIPOS	CANT	PERSONAL	CANT	DESCRIPCION			
		Director de Obra	1				
		Residente de Obra	1				
		Residente de Interventoria	1				
		Director interventoria	1				
		Ingeniero Ambiental	1				
		Profesional Social	1				
		Profesional HSEQ	1				
		Inspector de obra (Técnico o	1				
		Secretaria	1				

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

PREALISTAMIENTO

REVISION DE DOCUMENTOS TECNICOS

SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS:

SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS:

VoBo

ING. JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA
M.P. 54202-403866 NTS

VoBo

ING JUAN GABRIEL HERNANDEZ MARIN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P. 54202-373584 NTS

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

BITACORA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N°:	481 DE 2024

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATISTA	CONSORCIO RIO BANADIA R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON

FECHA:	JUEVES, 02 DE ENERO DE 2025	FOLIO	3

RECURSO EQUIPO		RECURSO HUMANO		MATERIALES	ESTADO DEL TIEMPO		
EQUIPOS	CANT	PERSONAL	CANT	DESCRIPCION			
		Director de Obra	1				
		Residente de Obra	1				
		Residente de Interventoria	1				
		Director interventona	1				
		Ingeniero Ambiental	1				
		Profesional Social	1				
		Profesional HSEQ	1				
		Inspector de obra (Técnico e	1				
		Secretaria	1				

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

PREALISTAMIENTO
REVISION DE DOCUMENTOS TECNICOS

SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS:

SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS:

VoBo

ING. JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA
M.P. 54202-403896 NTS

VoBo

ING JUAN GABRIEL FERNANDEZ MARIN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P. 54202-313584 NTS

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.502.273

BITACORA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N°:	481 DE 2024

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATISTA	CONSORCIO RIO BANADIA R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON

FECHA:	VIERNES, 03 DE ENERO DE 2025	FOLIO	4

RECURSO EQUIPO		RECURSO HUMANO		MATERIALES	ESTADO DEL TIEMPO		
EQUIPOS	CANT	PERSONAL	CANT	DESCRIPCION			
		Director de Obra	1				
		Residente de Obra	1				
		Residente de Interventoria	1				
		Director interventoria	1		[illegible]	X	X
		Ingeniero Ambiental	1				
		Profesional Social	1				
		Profesional HSEQ	1				
		Inspector de obra (Técnico e	1				
		Secretaria	1				

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

PREALISTAMIENTO
REVISION DE DOCUMENTOS TECNICOS

SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS:

SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS:

VoBo

ING. JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA
M.P. 54202-403898 NTS

VoBo

ING JUAN GABRIEL FERNANDEZ MARIN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P. 54202-373584 NTS

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

BITACORA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N°:	481 DE 2024
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATISTA	CONSORCIO RIO BANADIA R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON

FECHA:	SABADO, 04 DE ENERO DE 2025	FOLIO	5

RECURSO EQUIPO		RECURSO HUMANO		MATERIALES	ESTADO DEL TIEMPO		
EQUIPOS	CANT	PERSONAL	CANT	DESCRIPCION			
		Director de Obra	1				
		Residente de Obra	1				
		Residente de Interventoria	1				
		Director interventoria	1		[illegible]	X	X
		Ingeniero Ambiental	1		[illegible]		
		Profesional Social	1		[illegible]		
		Profesional HSEQ	1		[illegible]		
		Inspector de obra (Técnico e	1		[illegible]		
		Secretaria	1		[illegible]		
					[illegible]		
					[illegible]		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

PREALISTAMIENTO
REVISION DE DOCUMENTOS TECNICOS

SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS:

SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS:

VoBo

ING. JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA
M.P. 54202-403836 NTS

VoBo

ING JUAN GABRIEL HERNANDEZ MARIN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P. 54202-373584 NTS

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

BITACORA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N°:	481 DE 2024
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATISTA	CONSORCIO RIO BANADIA R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON

FECHA:	DOMINGO, 05 DE ENERO DE 2025	FOLIO	6

RECURSO EQUIPO		RECURSO HUMANO		MATERIALES	ESTADO DEL TIEMPO		
EQUIPOS	CANT	PERSONAL	CANT	DESCRIPCION			
		Director de Obra	1				
		Residente de Obra	1				
		Residente de Interventoria	1				
		Director interventoria	1		[illegible]	X	
		Ingeniero Ambiental	1		[illegible]		
		Profesional Social	1		[illegible]		
		Profesional HSEQ	1		[illegible]		
		Inspector de obra (Técnico e	1		[illegible]		
		Secretaria	1		[illegible]		
					[illegible]		
					[illegible]		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DE OBRA POR SER DIA DOMINICAL

SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS:

SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS:

VoBo

ING. JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA
M.P. 54202-483896 NTS

VoBo

ING JUAN GABRIEL [illegible]ANDEZ MARIN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P. 54202-373584 NTS

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

BITACORA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N°:	481 DE 2024
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATISTA	CONSORCIO RIO BANADIA R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON

FECHA:	LUNES 06 DE ENERO DE 2025	FOLIO	7

RECURSO EQUIPO		RECURSO HUMANO		MATERIALES	ESTADO DEL TIEMPO		
EQUIPOS	CANT	PERSONAL	CANT	DESCRIPCION			
		Director de Obra	1				
		Residente de Obra	2				
		Residente de interventoria	1				
		Director interventoria	1		[illegible]	x	x
		Ingeniero Ambiental	1				
		Profesional Social	1		[illegible]		
		Profesional HSEQ	1				
		Inspector de obra (Técnico e	1		[illegible]		
		Secretaria	1				
		Oficial	1		[illegible]		
		Ayudante	1				
					[illegible]		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

PREALISTAMIENTO
REVISION DE DOCUMENTOS TECNICOS

SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS:

SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS:

VoBo

ING. JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA
M.P. 54202-403896 NTS

VoBo

ING JUAN GABRIEL FERNANDEZ MARIN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P. 54202-373584 NTS

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901 302 273

BITACORA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N°:	481 DE 2024
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
CONTRATISTA	CONSORCIO RIO BANADIA R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON
FECHA:	MARTES 07 DE ENERO DE 2025
FOLIO	8

RECURSO EQUIPO		RECURSO HUMANO		MATERIALES	ESTADO DEL TIEMPO		
EQUIPOS	CANT	PERSONAL	CANT	DESCRIPCION			
		Director de Obra	1				
		Residente de Obra	2				
		Residente de Interventoria	1				
		Director interventoria	1				
		Ingeniero Ambiental	1				
		Profesional Social	1				
		Profesional HSEQ	1				
		Inspector de obra (Técnico e	1				
		Secretaria	1				
		Oficial	1				
		Ayudante	1				

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

PREALISTAMIENTO

REVISION DE DOCUMENTOS TECNICOS

SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS:

SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS:

VoBo

ING JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA
M.P. 54202-403896 NTS

VoBo

ING JUAN GABRIEL HERNANDEZ MARIN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P. 54202-373584 NTS

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.982.273

BITACORA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N°:	481 DE 2024

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATISTA	CONSORCIO RIO BANADIA R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON

FECHA:	MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025	FOLIO	9

RECURSO EQUIPO		RECURSO HUMANO		MATERIALES	ESTADO DEL TIEMPO		
EQUIPOS	CANT	PERSONAL	CANT	DESCRIPCION			
		Director de Obra	1				
		Residente de Obra	2				
		Residente de Interventona	1				
		Director interventoria	1				
		Ingeniero Ambiental	1				
		Profesional Social	1				
		Profesional HSEQ	1				
		Inspector de obra (Técnico e	1				
		Secretaria	1				
		Oficial	1				
		Ayudante	1				

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

PREALISTAMIENTO
REVISION DE DOCUMENTOS TECNICOS

SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS:

SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS:

VoBo

ING. JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA
M.P. 54202-403868 N.TS

VoBo

ING JUAN GABRIEL HERNANDEZ MARIN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P. 54202-373584 N.TS

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

BITACORA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N°:	481 DE 2024
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATISTA	CONSORCIO RIO BANADIA R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON

FECHA:	JUEVES 09 DE ENERO DE 2025	FOLIO	10

RECURSO EQUIPO		RECURSO HUMANO		MATERIALES	ESTADO DEL TIEMPO		
EQUIPOS	CANT	PERSONAL	CANT	DESCRIPCION			
		Director de Obra	1				
		Residente de Obra	2				
		Residente de Interventoria	1				
		Director interventoria	1		[illegible]	X	X
		Ingeniero Ambiental	1				
		Profesional Social	1				
		Profesional HSEQ	1				
		Inspector de obra (Técnico e	1				
		Secretaria	1				
		Oficial	1				
		Ayudante	1				

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

PREALISTAMIENTO
REVISION DE DOCUMENTOS TECNICOS

SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS:

SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS:

VoBo

ING. JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA
M.P. 54202-403866 NTS

VoBo

ING JUAN GABRIEL [illegible] HERNANDEZ MARIN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P. 54202-373584 NTS

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901 902 273

BITACORA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N°:	481 DE 2024
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATISTA	CONSORCIO RIO BANADIA R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON

FECHA:	VIERNES 10 DE ENERO DE 2025	FOLIO	11

RECURSO EQUIPO		RECURSO HUMANO		MATERIALES	ESTADO DEL TIEMPO		
EQUIPOS	CANT	PERSONAL	CANT	DESCRIPCION			
		Director de Obra	1				
		Residente de Obra	2				
		Residente de Interventoria	1				
		Director interventoria	1			X	X
		Ingeniero Ambiental	1				
		Profesional Social	1				
		Profesional HSEQ	1				
		Inspector de obra (Técnico e	1				
		Secretaria	1				
		Oficial	1				
		Ayudante	1				

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

PREALISTAMIENTO
REVISION DE DOCUMENTOS TECNICOS

SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS:

SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS:

VoBo

ING. JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA
M.P. 54202-403896 NTS

VoBo

ING JUAN GABRIEL FERNANDEZ MARIN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P. 54202-373584 NTS

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

BITACORA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N°:	481 DE 2024

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATISTA	CONSORCIO RIO BANADIA R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON

FECHA:	SABADO 11 DE ENERO DE 2025	FOLIO	12

RECURSO EQUIPO		RECURSO HUMANO		MATERIALES	ESTADO DEL TIEMPO		
EQUIPOS	CANT	PERSONAL	CANT	DESCRIPCION			
		Director de Obra	1				
		Residente de Obra	2				
		Residente de Interventoria	1				
		Director interventoria	1			X	
		Ingeniero Ambiental	1				
		Profesional Social	1				
		Profesional HSEQ	1				
		Inspector de obra (Tecnico e	1				
		Secretaria	1				
		Oficial	1				
		Ayudante	1				

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

PREALISTAMIENTO
REVISION DE DOCUMENTOS TECNICOS

SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS:

SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS:

VoBo

ING. JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA
M.P. 54202-403896 NTS

VoBo

ING JUAN GABRIEL [illegible]ERNANDEZ MARIN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P. 54202-373584 NTS

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901 902 273

BITACORA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N°:	481 DE 2024
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATISTA	CONSORCIO RIO BANADIA R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON

FECHA:	DOMINGO 12 DE ENERO DE 2025	FOLIO	13

RECURSO EQUIPO		RECURSO HUMANO		MATERIALES	ESTADO DEL TIEMPO		
EQUIPOS	CANT	PERSONAL	CANT	DESCRIPCION			
		Director de Obra	1				
		Residente de Obra	2				
		Residente de Interventoria	1				
		Director interventoria	1				
		Ingeniero Ambiental	1				
		Profesional Social	1				
		Profesional HSEQ	1				
		Inspector de obra (Técnico e	1				
		Secretaria	1				
		Ayudante	1				
		Oficial	1				
		Ayudante	1				

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DE OBRA POR SER DIA DOMINICAL

SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS:

SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS:

VoBo

ING. JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA
M.P. 54202-403896 NTS

VoBo

ING JUAN GABRIEL HERNANDEZ MARIN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P. 54202-373584 NTS

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

BITACORA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N°:	481 DE 2024
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATISTA	CONSORCIO RIO BANADIA R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON

FECHA:	LUNES 13 DE ENERO DE 2025	FOLIO	14

RECURSO EQUIPO		RECURSO HUMANO		MATERIALES	ESTADO DEL TIEMPO		
EQUIPOS	CANT	PERSONAL	CANT	DESCRIPCION			
		Director de Obra	1				
		Residente de Obra	2				
		Residente de Interventoria	1				
		Director interventoria	1		[illegible]	X	X
		Ingeniero Ambiental	1				
		Profesional Social	1		[illegible]		
		Profesional HSEQ	1				
		Inspector de obra (Técnico e	1		[illegible]		
		Secretaria	1				
		Oficial	1		[illegible]		
		Ayudante	1				
					[illegible]		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

PREALISTAMIENTO
REVISIÓN DE DOCUMENTOS TECNICOS

SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS:

SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS:

VoBo

ING. JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA
M.P. 54202-403696 NTS

VoBo

ING JUAN GABRIEL HERNANDEZ MARIN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P. 54202-373584 NTS

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

BITACORA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N°:	481 DE 2024

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATISTA	CONSORCIO RIO BANADIA R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON

FECHA:	MARTES 14 DE ENERO DE 2025	FOLIO	15

RECURSO EQUIPO		RECURSO HUMANO		MATERIALES	ESTADO DEL TIEMPO		
EQUIPOS	CANT	PERSONAL	CANT	DESCRIPCION			
		Director de Obra	1				
		Residente de Obra	2				
		Residente de Interventoria	1				
		Director interventoria	1				
		Ingeniero Ambiental	1				
		Profesional Social	1				
		Profesional HSEQ	1				
		Inspector de obra (Técnico e	1				
		Secretaria	1				
		Oficial	1				
		Ayudante	1				

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

PREALISTAMIENTO
REVISION DE DOCUMENTOS TECNICOS

SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS:

SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS:

VoBo

ING. JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA
M.P. 54202-403896 NTS

VoBo

ING JUAN GABRIEL HERNANDEZ MARIN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P. 54202-373584 NTS

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901 902 273

BITACORA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N°:	481 DE 2024
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATISTA	CONSORCIO RIO BANADIA R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON

FECHA:	MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025	FOLIO	16

RECURSO EQUIPO		RECURSO HUMANO		MATERIALES	ESTADO DEL TIEMPO		
EQUIPOS	CANT	PERSONAL	CANT	DESCRIPCION			
		Director de Obra	1				
		Residente de Obra	2				
		Residente de Interventoria	1				
		Director interventoria	1				
		Ingeniero Ambiental	1				
		Profesional Social	1				
		Profesional HSEQ	1				
		Inspector de obra (Técnico e	1				
		Secretaria	1				
		Oficial	1				
		Ayudante	1				

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

PREALISTAMIENTO
REVISION DE DOCUMENTOS TECNICOS

SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS:

SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS:

VoBo

ING. JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA
M.P. 54202-403696 NTS

VoBo

ING JUAN GABRIEL HERNANDEZ MARIN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P. 54202-373584 NTS

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

BITACORA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N°:	481 DE 2024
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATISTA	CONSORCIO RIO BANADIA R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON

FECHA:	JUEVES 16 DE ENERO DE 2025	FOLIO	17

RECURSO EQUIPO		RECURSO HUMANO		MATERIALES	ESTADO DEL TIEMPO		
EQUIPOS	CANT	PERSONAL	CANT	DESCRIPCION			
		Director de Obra	1				
		Residente de Obra	2				
		Residente de Interventoria	1				
		Director interventoria	1		[illegible]	X	X
		Ingeniero Ambiental	1				
		Profesional Social	1		[illegible]		
		Profesional HSEQ	1				
		Inspector de obra (Técnico e	1		[illegible]		
		Secretaria	1				
		Oficial	1		[illegible]		
		Ayudante	1				
					[illegible]		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

PREALISTAMIENTO
REVISION DE DOCUMENTOS TECNICOS

SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS:

SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS:

VoBo

ING. JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA
M.P. 54202-403896 NTS

VoBo

ING JUAN GABRIEL HERNANDEZ MARIN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P. 54202-373584 NTS

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.502.273

BITACORA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N°:	481 DE 2024

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATISTA	CONSORCIO RIO BANADIA R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON

FECHA:	VIERNES 17 DE ENERO DE 2025	FOLIO	18

RECURSO EQUIPO		RECURSO HUMANO		MATERIALES	ESTADO DEL TIEMPO		
EQUIPOS	CANT	PERSONAL	CANT	DESCRIPCION			
		Director de Obra	1				
		Residente de Obra	2				
		Residente de Interventoria	1				
		Director interventoria	1			X	X
		Ingeniero Ambiental	1				
		Profesional Social	1				
		Profesional HSEQ	1				
		Inspector de obra (Técnico é	1				
		Secretaria	1				
		Oficial	1				
		Ayudante	1				

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

PREALISTAMIENTO
REVISION DE DOCUMENTOS TECNICOS

SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS:

SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS:

VoBo

ING. JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA
M.P. 54202-403896 NTS

VoBo

ING JUAN GABRIEL HERNANDEZ MARIN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P. 54202-373584 NTS

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

BITACORA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N°:	481 DE 2024

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATISTA	CONSORCIO RIO BANADIA R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON

FECHA:	SABADO 18 DE ENERO DE 2025	FOLIO	19

RECURSO EQUIPO		RECURSO HUMANO		MATERIALES	ESTADO DEL TIEMPO		
EQUIPOS	CANT	PERSONAL	CANT	DESCRIPCION			
		Director de Obra	1				
		Residente de Obra	2				
		Residente de Interventoria	1				
		Director interventoria	1		SOLEADO	X	
		Ingeniero Ambiental	1				
		Profesional Social	1				
		Profesional HSEQ	1				
		Inspector de obra (Técnico e	1				
		Secretaria	1				
		Oficial	1				
		Ayudante	1				

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

SE REALIZO LA SOCIALIZACION DEL PROYECTO

SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS:

SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS:

VoBo

ING. JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA
M.P. 54202-403896 NTS

VoBo

ING JUAN GABRIEL FERNANDEZ MARIN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P. 54202-373584 NTS

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901 902 273

BITACORA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N°:	481 DE 2024

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATISTA	CONSORCIO RIO BANADIA R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON

FECHA:	DOMINGO 19 DE ENERO DE 2025	FOLIO	20

RECURSO EQUIPO		RECURSO HUMANO		MATERIALES	ESTADO DEL TIEMPO		
EQUIPOS	CANT	PERSONAL	CANT	DESCRIPCION			
		Director de Obra	1				
		Residente de Obra	2				
		Residente de interventoria	1				
		Director interventoria	1				
		Ingeniero Ambiental	1				
		Profesional Social	1				
		Profesional HSEQ	1				
		Inspector de obra (Técnico e	1				
		Secretaria	1				
		Oficial	1				
		Ayudante	1				

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DE OBRA POR SER DIA DOMINICAL

SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS:

SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS:

VoBo

ING. JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA
M.P. 54202-403896 NTS

VoBo

ING JUAN GABRIEL HERNANDEZ MARIN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P. 54202-373584 NTS

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

BITACORA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N°: 481 DE 2024

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATISTA	CONSORCIO RIO BANADIA R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON

FECHA:	LUNES 20 DE ENERO DE 2025	FOLIO	21

RECURSO EQUIPO		RECURSO HUMANO		MATERIALES	ESTADO DEL TIEMPO		
EQUIPOS	CANT	PERSONAL	CANT	DESCRIPCION			
RETROEXCAVADORA	2	Director de Obra	1				
VOLQUETA	2	Residente de Obra	2				
		Residente de Interventoria	1				
		Director interventoria	1			x	x
		Ingeniero Ambiental	1				
		Profesional Social	1				
		Profesional HSEQ	1				
		Inspector de obra (Técnico e	1				
		Secretaria	1				

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

SE INICIAN LABORES A LAS 7:00 AM
SE REALIZAN LOS PREOPERACIONALES DE LAS HERRAMIENTAS MENORES Y MAQUINAS
SE REALIZA EL MANEJO TEMPORAL DE AGUAS CON MOTOBOMBA
SE REALIZA EXCAVACIÓN MECÁNICA EN CONGLOMERADO ENTRE 0-2 m DE PROFUNDIDAD
SE REALIZA ACARREO MATERIAL INTERNO NO MAYOR A 2 KM PARA REFORZAMIENTO DEL TALUD NATURAL
SE REALIZA EL MANEJO TEMPORAL DE AGUAS CON MOTOBOMBA

SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS:

SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS

VoBo

ING. JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA
M.P. 54202-423696 NTS

VoBo

ING JUAN GABRIEL HERNANDEZ MARIN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P. 54202-373564 NTS

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901 902 273

BITACORA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N°:	481 DE 2024
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
CONTRATISTA	CONSORCIO RIO BANADIA R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON
FECHA:	MARTES 21 DE ENERO DE 2025
FOLIO	22

RECURSO EQUIPO		RECURSO HUMANO		MATERIALES	ESTADO DEL TIEMPO		
EQUIPOS	CANT	PERSONAL	CANT	DESCRIPCION			
RETROEXCAVADORA	2	Director de Obra	1				
VOLQUETA	2	Residente de Obra	2				
		Residente de Interventoria	1				
		Director interventoria	1		[illegible]	X	X
		Ingeniero Ambiental	1		[illegible]		
		Profesional Social	1		[illegible]		
		Profesional HSEQ	1		[illegible]		
		Inspector de obra (Técnico e	1		[illegible]		
		Secretaria	1		[illegible]		
		Oficial	1		[illegible]		
		Ayudante	1		[illegible]		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

SE INICIAN LABORES A LAS 7:00 AM
SE REALIZAN LOS PREOPERACIONALES DE LAS HERRAMIENTAS MENORES Y MAQUINAS
SE REALIZA EL MANEJO TEMPORAL DE AGUAS CON MOTOBOMBA
SE CONTINUA CON LA EXCAVACIÓN MECÁNICA EN CONGLOMERADO ENTRE 0-2 m DE PROFUNDIDAD
SE CONTINUA CON EL ACARREO MATERIAL INTERNO NO MAYOR A 2 KM PARA REFORZAMIENTO DEL TALUD NATURAL

SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS

SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS

VoBo

ING JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA
M.P. 54202-403898 NTS

VoBo

ING JUAN GABRIEL HERNANDEZ MARIN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P. 54202-373584 NTS

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.302.273

BITACORA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N°: 481 DE 2024

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATISTA	CONSORCIO RIO BANADIA R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON

FECHA:	MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025	FOLIO	23

RECURSO EQUIPO		RECURSO HUMANO		MATERIALES	ESTADO DEL TIEMPO		
EQUIPOS	CANT	PERSONAL	CANT	DESCRIPCION			
RETROEXCAVADORA	2	Director de Obra	1				
VOLQUETA	2	Residente de Obra	2				
		Residente de Interventoria	1				
		Director interventoria	1				
		Ingeniero Ambiental	1				
		Profesional Social	1			X	
		Profesional HSEQ	1				X
		Inspector de obra (Técnico e	1				
		Secretaria	1				
		Oficial	1				
		Ayudante	1				

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

SE INICIAN LABORES A LAS 7 00 AM
SE REALIZAN LOS PREOPERACIONALES DE LAS HERRAMIENTAS MENORES Y MAQUINAS
SE REALIZA EL MANEJO TEMPORAL DE AGUAS CON MOTOBOMBA
SE CONTINUA CON LA EXCAVACIÓN MECANICA EN CONGLOMERADO ENTRE 0-2 m DE PROFUNDIDAD
SE CONTINUA CON EL ACARREO MATERIAL INTERNO NO MAYOR A 2 KM PARA REFORZAMIENTO DEL TALUD NATURAL

SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS:

SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS:

VoBo

ING JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA
M.P. 54202-403896 NTS

VoBo

ING JUAN GABRIEL HERNANDEZ MARIN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P. 54202-373564 NTS

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

BITACORA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N°: 481 DE 2024

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATISTA	CONSORCIO RIO BANADIA R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON

FECHA:	JUEVES 23 DE ENERO DE 2025	**FOLIO**	24

RECURSO EQUIPO		RECURSO HUMANO		MATERIALES	ESTADO DEL TIEMPO		
EQUIPOS	**CANT**	**PERSONAL**	**CANT**	**DESCRIPCION**			
RETROEXCAVADORA	2	Director de Obra	1				
VOLQUETA	2	Residente de Obra	2				
		Residente de Interventoria	1				
		Director interventoria	1			X	X
		Ingeniero Ambiental	1				
		Profesional Social	1				
		Profesional HSEQ	1				
		Inspector de obra (Técnico e	1				
		Secretaria	1				
		Oficial	1				
		Ayudante	1				

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

SE INICIAN LABORES A LAS 7:00 AM
SE REALIZAN LOS PREOPERACIONALES DE LAS HERRAMIENTAS MENORES Y MAQUINAS
SE REALIZA EL MANEJO TEMPORAL DE AGUAS CON MOTOBOMBA
SE CONTINUA CON LA EXCAVACIÓN MECÁNICA EN CONGLOMERADO ENTRE 0-2 m DE PROFUNDIDAD
SE CONTINUA CON EL ACARREO MATERIAL INTERNO NO MAYOR A 2 KM PARA REFORZAMIENTO DEL TALUD NATURAL

SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS

SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS

VoBo

ING JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA
M.P. 54202-403898 N.S

VoBo

ING JUAN GABRIEL [illegible]NDEZ MARIN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P. 54202-373884 N.S

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.302.273

BITACORA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N°:	481 DE 2024
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
CONTRATISTA	CONSORCIO RIO BANADIA R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON
FECHA:	VIERNES 24 DE ENERO DE 2025
FOLIO	25

RECURSO EQUIPO		RECURSO HUMANO		MATERIALES	ESTADO DEL TIEMPO		
EQUIPOS	CANT	PERSONAL	CANT	DESCRIPCION			
RETROEXCAVADORA	2	Director de Obra	1				
VOLQUETA	2	Residente de Obra	2				
		Residente de Interventoria	1				
		Director interventoria	1		[illegible]	X	X
		Ingeniero Ambiental	1				
		Profesional Social	1				
		Profesional HSEQ	1				
		Inspector de obra (Tecnico e	1				
		Secretaria	1				
		Oficial	1				
		Ayudante	1				

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

SE INICIAN LABORES A LAS 7:00 AM
SE REALIZAN LOS PREOPERACIONALES DE LAS HERRAMIENTAS MENORES Y MAQUINAS
SE REALIZA EL MANEJO TEMPORAL DE AGUAS CON MOTOBOMBA
SE CONTINUA CON LA EXCAVACIÓN MECÁNICA EN CONGLOMERADO ENTRE 0-2 m DE PROFUNDIDAD
SE CONTINUA CON EL ACARREO MATERIAL INTERNO NO MAYOR A 2 KM PARA REFORZAMIENTO DEL TALUD NATURAL

SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS:

SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS:

VoBo

ING JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA
M.P. 54202-403866 NTS

VoBo

ING JUAN GABRIEL [illegible]NDEZ MARIN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P. 54202-373584 NTS

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.932.273

BITACORA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N°:	481 DE 2024
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATISTA	CONSORCIO RIO BANADIA R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON

FECHA:	SABADO 25 DE ENERO DE 2025	FOLIO	26

RECURSO EQUIPO		RECURSO HUMANO		MATERIALES	ESTADO DEL TIEMPO		
EQUIPOS	CANT	PERSONAL	CANT	DESCRIPCION			
RETROEXCAVADORA	2	Director de Obra	1				
VOLQUETA	2	Residente de Obra	2				
		Residente de Interventoria	1				
		Director interventoria	1		[illegible]	X	X
		Ingeniero Ambiental	1		[illegible]		
		Profesional Social	1		[illegible]		
		Profesional HSEQ	1		[illegible]		
		Inspector de obra (Técnico e	1		[illegible]		
		Secretaria	1		[illegible]		
		Oficial	1		[illegible]		
		Ayudante	1		[illegible]		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

SE INICIAN LABORES A LAS 7:00 AM
SE REALIZAN LOS PREOPERACIONALES DE LAS HERRAMIENTAS MENORES Y MAQUINAS
SE REALIZA EL MANEJO TEMPORAL DE AGUAS CON MOTOBOMBA
SE CONTINUA CON LA EXCAVACIÓN MECÁNICA EN CONGLOMERADO ENTRE 0-2 m DE PROFUNDIDAD
SE CONTINUA CON EL ACARREO MATERIAL INTERNO NO MAYOR A 2 KM PARA REFORZAMIENTO DEL TALUD NATURAL

SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS:

SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS:

VoBo

ING JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA
M.P. 54202-473896 NTS

VoBo

ING JUAN GABRIEL HERNANDEZ MARIN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P. 54202-373584 NTS

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.392.273

BITACORA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N°:	481 DE 2024
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATISTA	CONSORCIO RIO BANADIA R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON

FECHA:	DOMINGO 26 DE ENERO DE 2025	FOLIO	27

RECURSO EQUIPO		RECURSO HUMANO		MATERIALES	ESTADO DEL TIEMPO		
EQUIPOS	CANT	PERSONAL	CANT	DESCRIPCION			
RETROEXCAVADORA	2	Director de Obra	1				
VOLQUETA	2	Residente de Obra	2				
		Residente de Interventoria	1				
		Director interventoria	1		[illegible]	X	X
		Ingeniero Ambiental	1				
		Profesional Social	1		[illegible]		
		Profesional HSEQ	1				
		Inspector de obra (Técnico e	1		[illegible]		
		Secretaria	1				
		Oficial	1		[illegible]		
		Ayudante	1				
					[illegible]		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DE OBRA POR SER DIA DOMINICAL

SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS:

SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS:

VoBo

ING. JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA
M.P. 54202-403996 NTS

VoBo

ING JUAN GABRIEL FERNANDEZ MARIN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P. 54202-373584 NTS

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.302.273

BITACORA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N°:	481 DE 2024
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATISTA	CONSORCIO RIO BANADIA R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCION R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON

FECHA:	LUNES 27 DE ENERO DE 2025	FOLIO	28

RECURSO EQUIPO		RECURSO HUMANO		MATERIALES	ESTADO DEL TIEMPO		
EQUIPOS	CANT	PERSONAL	CANT	DESCRIPCION			
		Director de Obra	1				
RETROEXCAVADORA	2	Residente de Obra	2				
VOLQUETA	2	Residente de Interventoria	1				
		Director interventoria	1		[illegible]	x	x
		Ingeniero Ambiental	1				
		Profesional Social	1		[illegible]		
		Profesional HSEQ	1				
		Inspector de obra (Técnico e	1		[illegible]		
		Secretaria	1				
					[illegible]		
					[illegible]		

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

SE INICIAN LABORES A LAS 7:00 AM
SE REALIZAN LOS PREOPERACIONALES DE LAS HERRAMIENTAS MENORES Y MAQUINAS
SE REALIZA EL MANEJO TEMPORAL DE AGUAS CON MOTOBOMBA
SE INICIA CON LA INSTALACION DEL FILTRO DREN FRANCES PVC 100 MM (0.6x0.8)M
SE REALIZA EXCAVACIÓN MECÁNICA EN CONGLOMERADO ENTRE 0-2 m DE PROFUNDIDAD
SE REALIZA ACARREO MATERIAL INTERNO NO MAYOR A 2 KM PARA REFORZAMIENTO DEL TALUD NATURAL

SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS:

SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS:

VoBo

ING. JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA
M.P. 54202-403896 NTS

VoBo

ING JUAN GABRIEL FERNANDEZ MARIN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P. 54202-373584 NTS

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.502.273

BITACORA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N°:	481 DE 2024
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATISTA	CONSORCIO RIO BANADIA R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON

FECHA:	MARTES 28 DE ENERO DE 2025	FOLIO	29

RECURSO EQUIPO		RECURSO HUMANO		MATERIALES	ESTADO DEL TIEMPO		
EQUIPOS	CANT	PERSONAL	CANT	DESCRIPCION			
		Director de Obra	1				
RETROEXCAVADORA	2	Residente de Obra	2				
VOLQUETA	2	Residente de Interventoria	1				
		Director interventoria	1			X	X
		Ingeniero Ambiental	1				
		Profesional Social	1				
		Profesional HSEQ	1				
		Inspector de obra (Técnico e	1				
		Secretaria	1				
		Oficial	1				
		Ayudante	1				

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

SE INICIAN LABORES A LAS 7:00 AM
SE REALIZAN LOS PREOPERACIONALES DE LAS HERRAMIENTAS MENORES Y MAQUINAS
SE REALIZA EL MANEJO TEMPORAL DE AGUAS CON MOTOBOMBA
SE CONTINUA CON LA INSTALACION DEL FILTRO DREN FRANCES PVC 100 MM (0.6x0.8)M
SE CONTINUA CON LA EXCAVACIÓN MECÁNICA EN CONGLOMERADO ENTRE 0-2 m DE PROFUNDIDAD
SE CONTINUA CON EL ACARREO MATERIAL INTERNO NO MAYOR A 2 KM PARA REFORZAMIENTO DEL TALUD NATURAL

SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS:

SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS:

VoBo
ING JOHNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA
M.P. 54202-403696 NTS

VoBo
ING JUAN GABRIEL HERNANDEZ MARIN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P. 54202-373664 NTS

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

BITACORA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N°: 481 DE 2024

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATISTA	CONSORCIO RIO BANADIA R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON

FECHA:	MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025	**FOLIO**	30

RECURSO EQUIPO		**RECURSO HUMANO**		**MATERIALES**	**ESTADO DEL TIEMPO**		
EQUIPOS	**CANT**	**PERSONAL**	**CANT**	**DESCRIPCION**			
		Director de Obra	1				
RETROEXCAVADORA	2	Residente de Obra	2				
VOLQUETA	2	Residente de Interventoria	1				
		Director interventoria	1				
		Ingeniero Ambiental	1				
		Profesional Social	1			X	
		Profesional HSEQ	1				X
		Inspector de obra (Técnico e	1				
		Secretaria	1				
		Oficial	1				
		Ayudante	1				

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

SE INICIAN LABORES A LAS 7.00 AM
SE REALIZAN LOS PREOPERACIONALES DE LAS HERRAMIENTAS MENORES Y MAQUINAS
SE REALIZA EL MANEJO TEMPORAL DE AGUAS CON MOTOBOMBA
SE CONTINUA CON LA INSTALACION DEL FILTRO DREN FRANCES PVC 100 MM (0.6x0.8)M
SE CONTINUA CON LA EXCAVACIÓN MECANICA EN CONGLOMERADO ENTRE 0-2 m DE PROFUNDIDAD
SE CONTINUA CON EL ACARREO MATERIAL INTERNO NO MAYOR A 2 KM PARA REFORZAMIENTO DEL TALUD NATURAL

SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS:

SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS:

VoBo

ING. JHONATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA
M.P. 54202-403856 NTS

VoBo

ING JUAN GABRIEL HERNANDEZ MARIN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P. 54202-373584 NTS

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

BITACORA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N°:	481 DE 2024
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATISTA	CONSORCIO RIO BANADIA R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON

FECHA:	JUEVES 30 DE ENERO DE 2025	FOLIO	31

RECURSO EQUIPO		RECURSO HUMANO		MATERIALES	ESTADO DEL TIEMPO		
EQUIPOS	CANT	PERSONAL	CANT	DESCRIPCION			
		Director de Obra	1				
RETROEXCAVADORA	2	Residente de Obra	2				
VOLQUETA	2	Residente de Interventoria	1				
		Director interventoria	1		[illegible]	X	X
		Ingeniero Ambiental	1				
		Profesional Social	1				
		Profesional HSEQ	1				
		Inspector de obra (Técnico e	1				
		Secretaria	1				
		Oficial	1				
		Ayudante	1				

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

SE INICIAN LABORES A LAS 7:00 AM
SE REALIZAN LOS PREOPERACIONALES DE LAS HERRAMIENTAS MENORES Y MAQUINAS
SE REALIZA EL MANEJO TEMPORAL DE AGUAS CON MOTOBOMBA
SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN DEL FILTRO DREN FRANCES PVC 100 MM (0.6x0.8)M
SE CONTINUA CON LA EXCAVACIÓN MECÁNICA EN CONGLOMERADO ENTRE 0-2 m DE PROFUNDIDAD
SE CONTINUA CON EL ACARREO MATERIAL INTERNO NO MAYOR A 2 KM PARA REFORZAMIENTO DEL TALUD NATURAL

SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS:

SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS:

VoBo

ING. JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA
M.P. 54202-403896 NTS

VoBo

ING JUAN GABRIEL HERNANDEZ MARIN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P. 54202-373584 NTS

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901 902 273

BITACORA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N°:	481 DE 2024

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATISTA	CONSORCIO RIO BANADIA R/L JEISSON RENE VILLARREAL ROA	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON

FECHA:	VIERNES 31 DE ENERO DE 2025	FOLIO	32

RECURSO EQUIPO		RECURSO HUMANO		MATERIALES	ESTADO DEL TIEMPO		
EQUIPOS	CANT	PERSONAL	CANT	DESCRIPCION			
		Director de Obra	1				
RETROEXCAVADORA	2	Residente de Obra	2				
VOLQUETA	2	Residente de Interventoria	1				
		Director interventoria	1		X	X	
		Ingeniero Ambiental	1				
		Profesional Social	1				
		Profesional HSEQ	1				
		Inspector de obra (Técnico e	1				
		Secretaria	1				
		Oficial	1				
		Ayudante	1				

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

SE INICIAN LABORES A LAS 7:00 AM
SE REALIZAN LOS PREOPERACIONALES DE LAS HERRAMIENTAS MENORES Y MAQUINAS
SE REALIZA EL MANEJO TEMPORAL DE AGUAS CON MOTOBOMBA
SE CONTINUA CON LA INSTALACION DEL FILTRO DREN FRANCES PVC 100 MM (0.6x0.8)M
SE CONTINUA CON LA EXCAVACIÓN MECÁNICA EN CONGLOMERADO ENTRE 0-2 m DE PROFUNDIDAD
SE CONTINUA CON EL ACARREO MATERIAL INTERNO NO MAYOR A 2 KM PARA REFORZAMIENTO DEL TALUD NATURAL

SITUACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS:

SOLUCIONES PLANTEADAS O EJECUTADAS:

VoBo

ING JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA
M.P. 54202-407896 NTS

VoBo

ING JUAN GABRIEL [illegible] MARIN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P. 54202-[illegible]584 NTS

ANEXO 6.
INFORME MENSUAL SSET (ENERO)

INFORME MENSUAL No. 1

REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

CONTRATO No. 481 DE 2024

PERÍODO: Del 31 de diciembre del 2024 al 31 enero del 2025

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

31 - Enero / 2025

Dirección comercial: Calle 21 No. 22-44 celular. 3114430280
Email. interobrasdeprotección1@gmail.com
Arauca-Arauca

INFORME MENSUAL No. (1) DEL 31 DICIEMBRE DEL 2024 AL 31 ENERO DEL 2025

1 GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Como parte de la gestión para Salud y Seguridad en el Trabajo, SST; el CONSORCIO RÍO BANADÍA. presentó el Plan de Seguridad Operacional PESO mediante el cual se establece el proceso continuo para la identificación de peligros y gestión de los riesgos asociados con la ejecución del Contrato **No. 481 DE 2024** tanto en su fase de, **CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RÍO BANADÍA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA.**

Para el mes de enero de 2025 se revisó que cada trabajador esté en la planilla de seguridad social o en su defecto sus respectivos certificados de afiliación.

Cada trabajador realizó exámenes ocupacionales de ingreso.

El **CONSORCIO RÍO BANADÍA** envío en el informe mensual en los Anexo el pago de seguridad social con número de planilla con fecha de pago de enero de 2025. Ver Anexo 03. Pago de seguridad social

Durante el mes de enero de 2025 no se presentaron accidentes de trabajo ni ausentismo de ninguna índole.

INFORME MENSUAL No. (1) DEL 31 DICIEMBRE DEL 2024 AL 31 ENERO DEL 2025

Se realizaron inducciones, capacitaciones y charlas de seguridad relacionadas con temas de seguridad y salud en el trabajo. Anexo 08. Charlas y Capacitaciones.

Se realiza entrega y reposición de dotación y elementos de protección personal. Ver Anexo 09. Entrega EPP y dotación.

Diariamente se realizan preoperacionales a las máquinas y equipos. Ver Anexo 06. Preoperacionales.

Se realizan Inspecciones al punto de almacenamiento de sustancias químicas e inspección

de elementos de emergencias, punto ecológico de los residuos y su adecuado funcionamiento y disposición, Inspección a servicios sanitarios. Ver Anexo 05. Inspecciones.

Se les suministra agua de manera permanente en la zona de trabajo para evitar deshidratación.

Diariamente se hace acompañamiento por parte del área SST del contratista e interventoría a las actividades.

Se lleva a cabo la implementación del plan de seguridad operacional: se mantiene comunicación directa con el personal con objetivo de notificar movimientos de personal y planificación de actividades cerca de maquinaria en movimiento. Se ejecutan charlas y capacitaciones de sensibilización a los trabajadores y visitantes.

A continuación, se evidencia registro fotográfico de algunas actividades en obra

INFORME MENSUAL No. (1) DEL 31 DICIEMBRE DEL 2024 AL 31 ENERO DEL 2025



actividades de obra.







INFORME MENSUAL No. (1) DEL 31 DICIEMBRE DEL 2024 AL 31 ENERO DEL 2025

Ilustración. **Charlas de seguridad**







INFORME MENSUAL No. (1) DEL 31 DICIEMBRE DEL 2024 AL 31 ENERO DEL 2025

Ilustración. **Inspección de equipos y elementos de emergencia (camilla, botiquín y extintor)**

Se cuenta en el campamento y zona de trabajo con un equipo de atención de emergencias, el cual comprende una camilla, un botiquín equipado con todo lo necesario para atender una emergencia, extintor, al cual es inspeccionado una vez a la semana.



INFORME MENSUAL No. (1) DEL 31 DICIEMBRE DEL 2024 AL 31 ENERO DEL 2025

Ilustración. **Se realizan jornadas de orden y aseo y separación de residuos.**





INFORME MENSUAL No. (1) DEL 31 DICIEMBRE DEL 2024 AL 31 ENERO DEL 2025

Ilustración. **Aseo y mantenimiento a los servicios sanitarios**

Se cuenta con 01 baños portátiles (en la zona frente de obra) el cual se encuentran en buenas condiciones para el uso del personal operativo, se realiza desinfección diaria y limpieza dos o tres veces por semana.



Ilustración. **Uso correcto de EPP**

Se verifica en campo el uso constante y correcto de los elementos de protección personal de todos los empleados que hacen parte del proyecto.



Dirección comercial: Calle 21 No. 22-44 celular. 3114430280
Email. interobrasdeprotección1@gmail.com
Arauca-Arauca

INFORME MENSUAL No. (1) DEL 31 DICIEMBRE DEL 2024 AL 31 ENERO DEL 2025

Ilustración. **Entrega de elementos de protección personal (EPP)**

Se les entrega por primera vez a los nuevos y a los que se les deteriora se les hace reposición.









INFORME MENSUAL No. (1) DEL 31 DICIEMBRE DEL 2024 AL 31 ENERO DEL 2025

Ilustración. **Señalización en obra.**





Ilustración de señalización valla informativa



Ilustración. **Punto ecológico**

Se verifica diariamente la clasificación de los residuos y el orden y aseo de este punto para evitar proliferación de vectores.



INFORME MENSUAL No. (1) DEL 31 DICIEMBRE DEL 2024 AL 31 ENERO DEL 2025

PLAN DE GERENCIA ÁREA SST

Cada mes se ejerce seguimiento y control a las actividades que se realizan en obra, esto con el fin de mitigar y controlar los riesgos y peligros detectados, el plan de trabajo es llevado a cabo cumpliendo con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, el cronograma de capacitación es enfocado a los riesgos arrojados en la matriz de identificación de peligros y diariamente se realizan charlas de seguridad, pausas activas y 1 vez a la semana capacitación en temas SST.

En el informe de enero del 2025 se realizaron inspecciones donde se verifico las condiciones de operatividad de máquinas, equipos y herramientas del proyecto por medio de preoperacionales diligenciados diariamente antes de iniciar actividades, estos se hacen mientras la máquina este en uso, de igual forma se realiza inspección a las instalaciones, puntos de trabajo, servicios sanitarios, puntos ecológicos, elementos de emergencia como: botiquín, extintor, camilla. Para verificar que sus condiciones de seguridad sean las adecuadas y su estado sea óptimo para tener en obra y en el momento que se requiera hacer un buen uso de estos.

Todo personal que ingresa nuevo al proyecto recibe una inducción en seguridad y salud en el trabajo la cual es evaluada al finalizar dicha inducción.

Durante este periodo no se presentó ningún accidente de trabajo, en el área de SST. Certificado accidentalidad laboral, se adjunta un certificado emitido por la ARL donde certifica que en este periodo de enero 2025 no ocurrió ningún AT.

Dirección comercial: Calle 21 No. 22-44 celular. 3114430280
Email. interobrasdeprotección1@gmail.com
Arauca-Arauca

INFORME MENSUAL No. (1) DEL 31 DICIEMBRE DEL 2024 AL 31 ENERO DEL 2025

RECOMENDACIONES ÁREA SST

Se debe seguir fortaleciendo la cultura de prevención promoviendo campañas de concientización sobre la importancia del cumplimiento de las normas y políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo, fomentando la participación de todos los trabajadores.

Se debe actualizar y divulgar constantemente los procedimientos operativos y de emergencias.

Se debe verificar que la señalización este ubicada correctamente, sea visible y este en buenas condiciones en todas las áreas de trabajo, las condiciones en oficinas y frentes de obra deben ser inspeccionadas constantemente (mínimo una inspección por semana) se deben hacer las mejoras necesarias para garantizar lugares seguros de trabajo y minimizar o eliminar riesgos potenciales.

Se debe continuar realizando reuniones por lo menos una vez al mes del COPASST y trimestralmente el comité de convivencia laboral, brindando formación a sus integrantes y garantizando su participación en el cumplimiento del sistema de gestión y en la toma de decisiones sobre SST.

INFORME MENSUAL No. (1) DEL 31 DICIEMBRE DEL 2024 AL 31 ENERO DEL 2025

CONCLUSIONES ÁREA SST

En conclusión, el presente informe ha permitido evidenciar el compromiso del contratista con la prevención de accidentes y enfermedades laborales mediante la implementación de políticas, procedimientos y programas orientados al bienestar del personal, en este periodo no ocurrió ningún AT y se mejoró las condiciones de trabajo y la señalización de todas las áreas.

Es fundamental continuar con la mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en Trabajo (SG-SST) mediante un enfoque preventivo y colaborativo para así lograr minimizar los riesgos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y saludable.

INFORME MENSUAL No. (1) DEL 31 DICIEMBRE DEL 2024 AL 31 ENERO DEL 2025

ANEXOS.

- ANEXO 1: RELACIÓN DE PERSONAL MES ENERO
- ANEXO 2: REGISTRO DE INDUCCION Y REINDUCCION
- ANEXO 3: PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL ENERO
- ANEXO 4: EXAMENES LABORALES DE INGRESO
- ANEXO 5: PAGO DE NOMINA ENERO
- ANEXO 6: FORMATO DE DOTACIÓN Y ENTREGA DE EPP
- ANEXO 7: FORMATO DE INSPECCIÓN DE EXTINTORES
- ANEXO 8: FORMATO DE INSPECCIÓN BOTIQUÍN Y CAMILLA
- ANEXO 9: PREOPERACIONALES MAQUINARIA
- ANEXO 10: AFILIACIONES
- ANEXO 11: LISTADO DE ASISTENCIA CHARLA DE SEGURIDAD

ANEXO 1.
RELACION DE PERSONAL MES ENERO

INFORME MENSUAL No. (1) DEL 31 DICIEMBRE DEL 2024 AL 31 ENERO DEL 2025

Personal administrativo

DATOS GENERALES									
	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	CC	CARGO	SALARIO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	DIAS LABORADOS
1	GARCIA	BELTRAN	JHONN FREDDY	1.098.752.791	REPRESENTANTE LEGAL	$5.000.000	31-12-2024	29-01-2025	32

DATOS GENERALES									
2	VILA	SARABIA	JAIR LEANDRO	1.091.659.018	DIRECTOR DE OBRA	$ 8.000.000	31-12-2024		32
3	BARRAGAN	MENDOZA	JAIRO ALEXANDER	80.109.920	ESPECIALISTA EN HIDRAULICA	$ 2.750.000	31-12-2024		32
4	DELGADO	MONTAGUT	JOAQUIN EDUARDO	88.215.089	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	$2.750.000	31-12-2024		32
5	GARCIA	BELTRAN	JHONNATHAN ALEXIS	1.098.716.716	ING RESIDENTE	$ 5.000.000	31-12-2024		32
6	GARCIA	BELTRAN	JHONN FREDY	1.098.752.791	ING RESIDENTE	$ 5.000.000	31-12-2024		32
7	OLAYA	BAYONA	LAURA CRISTINA	1.094.283.275	ING AMBIENTAL	$ 5.000.000	31-12-2024		32
8	BOTIA	CHONA	MARLYN YVETTE	1.020.810.816	PROFESIONAL SOCIAL	$ 3.000.000	31-12-2024		32
9	GARRIDO	RIVERO	CAMILO ANDRES	1.094.269.468	HSEQ	$ 3.000.000	31-12-2024		32
10	GUTIERREZ	VACCA	HORLEYDA	1.116.496.517	CONTADOR	$ 1.500.000	31-12-2024		32
11	PAEZ	GARCIA	FERNEY	1.098.684.323	INSPECTOR DE OBRA	$ 3.000.000	31-12-2024		32
12	OCHOA		JESSICA LILIBETH	1.098.656.689	SECRETARIA	$ 2.000.000	31-12-2024		32

Personal Operativo

DATOS GENERALES									
	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	CC	CARGO	SALARIO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	DIAS LABORADOS
1	QUINTERO	VILLAMIZAR	JUAN VICENTE	9.466.736	OFICIAL	$ 1.755.000	20-01-2025		11
2	CASTAÑEDA	MENDOZA	NELSON ARLEY	1.115.722.498	AYUDANTE	$ 1.423.500	20-01-2025		11

ANEXO 2. REGISTRO DE INDUCCION Y REINDUCCION

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

REGISTRO INDUCCION - REINDUCCIÓN

FECHA: 13/01/2025 **INDUCCIÓN** [X] **REINDUCCIÓN** [ ]

NOMBRE: Juan Vicente Quintero **CEDULA:** _____

AREA: Operativa **CARGO:** Oficial de obra

Generalidades

Presentación de la empresa
Reglamento interno de trabajo
Políticas institucionales
Ruta de evacuación
Reglamento de higiene y seguridad industrial

SGSST

Generalidades (políticas, normas, procedimientos, protocolos y manuales) del sistema de seguridad, salud en el trabajo y ambiental

Manual de funciones del cargo

Responsabilidades del cargo

Formatos y registros

Normas de Seguridad

Manejo de elementos de protección personal E.P.P

Prevención de accidentes de trabajo / enfermedades laborales

Identificación de peligros y riesgos de su puesto de trabajo

COMPROMISO Y ACEPTACION

Yo, quien a pie de firma registro como trabajador de la empresa estoy comprometido con las normas y procedimientos de seguridad dados por la empresa para el desarrollo seguro de mi labor y Declaro que conozco el reglamento interno de trabajo, de Higiene y Seguridad Industrial, así mismo los estándares, procedimientos generales de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, me comprometo a cumplirlas e informar de inmediato cualquier condición que considere afecte mi salud y condiciones de trabajo, acepto la evaluación realizada y las exigencias de calificación en la misma.

Juan V Quintero V.

Firma del Trabajador
C.C.

Responsable del SG-SST
C.C.

Firma del área administrativa
C.C.

CL 25 N °11-70 BRR ALFONSO LOPEZ
CORREO: consorcioriobanadia@gmail.com
CELULAR: 3202395534

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

REGISTRO INDUCCION - REINDUCCIÓN

FECHA: 13/01/2025 **INDUCCIÓN** [X] **REINDUCCIÓN** [ ]

NOMBRE: Nelson Castañeda **CEDULA:** _____

AREA: Operativa **CARGO:** Ayudante de obra

Generalidades
Presentación de la empresa
Reglamento interno de trabajo
Políticas institucionales
Ruta de evacuación
Reglamento de higiene y seguridad industrial

SGSST
Generalidades (políticas, normas, procedimientos, protocolos y manuales) del sistema de seguridad, salud en el trabajo y ambiental
Manual de funciones del cargo
Responsabilidades del cargo
Formatos y registros
Normas de Seguridad
Manejo de elementos de protección personal E.P.P
Prevención de accidentes de trabajo / enfermedades laborales
Identificación de peligros y riesgos de su puesto de trabajo

COMPROMISO Y ACEPTACION

Yo, quien a pie de firma registro como trabajador de la empresa estoy comprometido con las normas y procedimientos de seguridad dados por la empresa para el desarrollo seguro de mi labor y Declaro que conozco el reglamento interno de trabajo, de Higiene y Seguridad Industrial, así mismo los estándares, procedimientos generales de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, me comprometo a cumplirlas e informar de inmediato cualquier condición que considere afecte mi salud y condiciones de trabajo, acepto la evaluación realizada y las exigencias de calificación en la misma.

Nelson Castañeda

Firma del Trabajador
C.C.

Responsable del SG-SST
C.C.

Firma del área administrativa
C.C.

CL 25 N °11-70 BRR ALFONSO LOPEZ
CORREO: consorcioriobanadia@gmail.com
CELULAR: 3202395534

ANEXO 3.
PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL
ENERO

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 32596830
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-02-27

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONSORCIO RIO BANADIA	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901902273	D.V.	3	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 30 8 49	DEPARTAMENTO	ARAUCA	MUNICIPIO	SARAVENA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	CONSORCIORIOBANADIA@GMAIL.COM	TELÉFONO	3142788531
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1098684323	PRIMER APELLIDO	PAEZ	SEGUNDO APELLIDO	GARCIA
PRIMER NOMBRE	FERNEY	SEGUNDO NOMBRE	ALFONSO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 12	Año: 2025	Mes: 01	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
11		$1.366.669		32596830

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-80109920	01	No	No	No	81	736	5429001	Fijo	BARRAGAN MENDOZA JAIRO ALEXANDER	$2.750.000
CC-1020810816	01	No	No	No	81	736	5429001	Fijo	BOTIA CHONA MARLYN YVETTE	$3.000.000
CC-88215089	01	No	No	No	81	736	5429001	Fijo	DELGADO MONTAGUT JOAQUIN EDUARDO	$2.750.000
CC-1098752791	01	No	No	No	81	736	5429001	Fijo	GARCIA BELTRAN JHONN FREDY	$5.000.000
CC-1098716716	01	No	No	No	81	736	5429001	Fijo	GARCIA BELTRAN JHONNATHAN ALEXIS	$5.000.000
CC-1094269468	01	No	No	No	81	736	5429001	Fijo	GARRIDO RIVERO CAMILO ANDRES	$3.000.000
CC-1116496517	01	No	No	No	81	736	1711001	Fijo	GUTIERREZ VACCA HORLEYDA	$1.500.000
CC-1098658689	01	No	No	No	81	736	1711001	Fijo	OCHOA JESSICA LILIBETH	$2.000.000
CC-1094283275	01	No	No	No	81	736	5429001	Fijo	OLAYA BAYONA LAURA CRISTINA	$5.000.000
CC-1098684323	01	No	No	No	81	736	5429001	Fijo	PAEZ GARCIA FERNEY ALFONSO	$3.000.000
CC-1091659018	01	No	No	No	81	736	5429001	Fijo	VILA SARABIA JAIR LEANDRO	$8.000.000

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 80109920	X	2024-12-31																											0		
CC - 1020810816	X	2024-12-31																											0		
CC - 88215089	X	2024-12-31																											0		
CC - 1098752791	X	2024-12-31																											0		
CC - 1098716716	X	2024-12-31																											0		
CC - 1094269468	X	2024-12-31																											0		
CC - 1116496517	X	2024-12-31																											0		
CC - 1098658689	X	2024-12-31																											0		
CC - 1094283275	X	2024-12-31																											0		
CC - 1098684323	X	2024-12-31																											0		
CC - 1091659018	X	2024-12-31																											0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 80109920	PORVENIR	1	$91.667	0.1600000	$14.700	$0	$0	$14.700	$0	$0	$0
CC - 1020810816	PORVENIR	1	$100.000	0.1600000	$16.000	$0	$0	$16.000	$0	$0	$0
CC - 88215089	PROTECCION	1	$91.667	0.1600000	$14.700	$0	$0	$14.700	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1098752791	PORVENIR	1	$166.667	0.1600000	$26.700	$0	$0	$26.700	$0	$0	$0
CC - 1098716716	COLPENSIONES	1	$166.667	0.1600000	$26.700	$0	$0	$26.700	$0	$0	$0
CC - 1094269468	PORVENIR	1	$100.000	0.1600000	$16.000	$0	$0	$16.000	$0	$0	$0
CC - 1116496517	COLPENSIONES	1	$50.000	0.1600000	$8.000	$0	$0	$8.000	$0	$0	$0
CC - 1098658689	PORVENIR	1	$66.667	0.1600000	$10.700	$0	$0	$10.700	$0	$0	$0
CC - 1094283275	PORVENIR	1	$166.667	0.1600000	$26.700	$0	$0	$26.700	$0	$0	$0
CC - 1098684323	COLPENSIONES	1	$100.000	0.1600000	$16.000	$0	$0	$16.000	$0	$0	$0
CC - 1091659018	PORVENIR	1	$266.667	0.1600000	$42.700	$0	$0	$42.700	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 80109920	SALUD TOTAL	1	$91.667	0.0400000	$3.700	$0	0	$0	0	$0	1	$91.667	542900 1	0.0696000	$6.400
CC - 1020810816	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$100.000	0.0400000	$4.000	$0	0	$0	0	$0	1	$100.000	542900 1	0.0696000	$7.000
CC - 88215089	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$91.667	0.0400000	$3.700	$0	0	$0	0	$0	1	$91.667	542900 1	0.0696000	$6.400
CC - 1098752791	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$166.667	0.0400000	$6.700	$0	0	$0	0	$0	1	$166.667	542900 1	0.0696000	$11.700
CC - 1098716716	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$166.667	0.0400000	$6.700	$0	0	$0	0	$0	1	$166.667	542900 1	0.0696000	$11.700
CC - 1094269468	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$100.000	0.0400000	$4.000	$0	0	$0	0	$0	1	$100.000	542900 1	0.0696000	$7.000

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1116496517	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$50.000	0.0400000	$2.000	$0	0	$0	0	$0	1	$50.000	17110001	0.0052200	$300
CC - 1098658689	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$66.667	0.0400000	$2.700	$0	0	$0	0	$0	1	$66.667	17110001	0.0052200	$400
CC - 1094283275	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$166.667	0.0400000	$6.700	$0	0	$0	0	$0	1	$166.667	54290001	0.0696000	$11.700
CC - 1098684323	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$100.000	0.0400000	$4.000	$0	0	$0	0	$0	1	$100.000	54290001	0.0696000	$7.000
CC - 1091659018	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$266.667	0.0400000	$10.700	$0	0	$0	0	$0	1	$266.667	54290001	0.0696000	$18.600

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-80109920	COMFIAR	1	$91.667	0.0400000	$3.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1020810816	COMFIAR	1	$100.000	0.0400000	$4.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-88215089	COMFIAR	1	$91.667	0.0400000	$3.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1098752791	COMFIAR	1	$166.667	0.0400000	$6.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1098716716	COMFIAR	1	$166.667	0.0400000	$6.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1094269468	COMFIAR	1	$100.000	0.0400000	$4.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1116496517	COMFIAR	1	$50.000	0.0400000	$2.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1098658689	COMFIAR	1	$66.667	0.0400000	$2.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1094283275	COMFIAR	1	$166.667	0.0400000	$6.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1098684323	COMFIAR	1	$100.000	0.0400000	$4.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1091659018	COMFIAR	1	$266.667	0.0400000	$10.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 12											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	7	$153.500	$0	$0	$0	$0	38	$3.900	$0	$0	$157.400
PROTECCION	1	$14.700	$0	$0	$0	$0	38	$400	$0	$0	$15.100
COLPENSIONES	3	$50.700	$0	$0	$0	$0	38	$1.300	$0	$0	$52.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	$6.700	$0	0	$0	0	$0	$6.700	38	$200	$0	$6.900	$0	0	$0	$0	$6.900	$0	$0	$6.900
SALUD TOTAL	1	$3.700	$0	0	$0	0	$0	$3.700	38	$100	$0	$3.800	$0	0	$0	$0	$3.800	$0	$0	$3.800
NUEVA E.P.S. S.A.	8	$44.500	$0	0	$0	0	$0	$44.500	38	$1.200	$0	$45.700	$0	0	$0	$0	$45.700	$0	$0	$45.700

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	11	$88.200	0	$0	$0	$88.200	38	$2.200	$90.400	0	$0	$904	$90.400

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFIAR	11	$54.900	38	$1.400	$56.300
SENA	0	$0	38	$0	$0
ICBF	0	$0	38	$0	$0
ESAP	0	$0	38	$0	$0
MinEdu	0	$0	38	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	$56.400
PENSIONES	3	$224.500
RIESGOS PROFESIONALES	1	$90.400
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$56.300
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$427.600

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 32639856
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-02-26

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONSORCIO RIO BANADIA	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901902273	D.V.	3	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 30 8 49	DEPARTAMENTO	ARAUCA	MUNICIPIO	SARAVENA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	CONSORCIORIOBANADIA@GMAIL.COM	TELÉFONO	3142788531
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1098684323	PRIMER APELLIDO	PAEZ	SEGUNDO APELLIDO	GARCIA
PRIMER NOMBRE	FERNEY	SEGUNDO NOMBRE	ALFONSO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 01	Año: 2025	Mes: 02	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
13		$42.165.450		32639856

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-80109920	01	No	No	No	81	736	5429001	Fijo	BARRAGAN MENDOZA JAIRO ALEXANDER	$2.750.000
CC-1020810816	01	No	No	No	81	736	5429001	Fijo	BOTIA CHONA MARLYN YVETTE	$3.000.000
CC-1115722498	01	No	No	No	81	736	5429001	Fijo	CASTAÑEDA MENDOZA NELSON ARLEY	$1.423.500
CC-88215089	01	No	No	No	81	736	5429001	Fijo	DELGADO MONTAGUT JOAQUIN EDUARDO	$2.750.000
CC-1098752791	01	No	No	No	81	736	5429001	Fijo	GARCIA BELTRAN JHONN FREDY	$5.000.000
CC-1098716716	01	No	No	No	81	736	5429001	Fijo	GARCIA BELTRAN JHONNATHAN ALEXIS	$5.000.000
CC-1094269468	01	No	No	No	81	736	5429001	Fijo	GARRIDO RIVERO CAMILO ANDRES	$3.000.000
CC-1116496517	01	No	No	No	81	736	1711001	Fijo	GUTIERREZ VACCA HORLEYDA	$1.500.000
CC-1098658689	01	No	No	No	81	736	1711001	Fijo	OCHOA JESSICA LILIBETH	$2.000.000
CC-1094283275	01	No	No	No	81	736	5429001	Fijo	OLAYA BAYONA LAURA CRISTINA	$5.000.000
CC-1098684323	01	No	No	No	81	736	5429001	Fijo	PAEZ GARCIA FERNEY ALFONSO	$3.000.000
CC-9466736	01	No	No	No	81	736	5429001	Fijo	QUINTERO VILLAMIZAR JUAN VICENTE	$1.755.000
CC-1091659018	01	No	No	No	81	736	5429001	Fijo	VILA SARABIA JAIR LEANDRO	$8.000.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 80109920																													0		
CC - 1020810816																													0		
CC - 1115722498	X	2025-01-20																											0		
CC - 88215089																													0		
CC - 1098752791																													0		
CC - 1098716716																													0		
CC - 1094269468																													0		
CC - 1116496517																													0		
CC - 1098658689																													0		
CC - 1094283275																													0		
CC - 1098684323																													0		
CC - 9466736	X	2025-01-20																											0		
CC - 1091659018																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 80109920	PORVENIR	30	$2.750.000	0.1600000	$440.000	$0	$0	$440.000	$0	$0	$0
CC - 1020810816	PORVENIR	30	$3.000.000	0.1600000	$480.000	$0	$0	$480.000	$0	$0	$0
CC - 1115722498	PORVENIR	11	$521.950	0.1600000	$83.600	$0	$0	$83.600	$0	$0	$0
CC - 88215089	PROTECCION	30	$2.750.000	0.1600000	$440.000	$0	$0	$440.000	$0	$0	$0
CC - 1098752791	PORVENIR	30	$5.000.000	0.1600000	$800.000	$0	$0	$800.000	$0	$0	$0
CC - 1098716716	COLPENSIONES	30	$5.000.000	0.1600000	$800.000	$0	$0	$800.000	$0	$0	$0
CC - 1094269468	PORVENIR	30	$3.000.000	0.1600000	$480.000	$0	$0	$480.000	$0	$0	$0
CC - 1116496517	COLPENSIONES	30	$1.500.000	0.1600000	$240.000	$0	$0	$240.000	$0	$0	$0
CC - 1098658689	PORVENIR	30	$2.000.000	0.1600000	$320.000	$0	$0	$320.000	$0	$0	$0
CC - 1094283275	PORVENIR	30	$5.000.000	0.1600000	$800.000	$0	$0	$800.000	$0	$0	$0
CC - 1098684323	COLPENSIONES	30	$3.000.000	0.1600000	$480.000	$0	$0	$480.000	$0	$0	$0
CC - 9466736	PORVENIR	11	$643.500	0.1600000	$103.000	$0	$0	$103.000	$0	$0	$0
CC - 1091659018	PORVENIR	30	$8.000.000	0.1600000	$1.280.000	$0	$0	$1.280.000	$40.000	$40.000	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 80109920	SALUD TOTAL	30	$2.750.000	0.0400000	$110.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2.750.000	542900 1	0.0696000	$191.400
CC - 1020810816	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$3.000.000	0.0400000	$120.000	$0	0	$0	0	$0	30	$3.000.000	542900 1	0.0696000	$208.800
CC - 1115722498	NUEVA E.P.S. S.A.	11	$521.950	0.0400000	$20.900	$0	0	$0	0	$0	11	$521.950	542900 1	0.0696000	$36.400
CC - 88215089	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$2.750.000	0.0400000	$110.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2.750.000	542900 1	0.0696000	$191.400
CC - 1098752791	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$5.000.000	0.0400000	$200.000	$0	0	$0	0	$0	30	$5.000.000	542900 1	0.0696000	$348.000

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1098716716	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$5.000.000	0.0400000	$200.000	$0	0	$0	0	$0	30	$5.000.000	5429001	0.0696000	$348.000
CC - 1094269468	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$3.000.000	0.0400000	$120.000	$0	0	$0	0	$0	30	$3.000.000	5429001	0.0696000	$208.800
CC - 1116496517	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.500.000	0.0400000	$60.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.500.000	1711001	0.0052200	$7.900
CC - 1098658689	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$2.000.000	0.0400000	$80.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2.000.000	1711001	0.0052200	$10.500
CC - 1094283275	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$5.000.000	0.0400000	$200.000	$0	0	$0	0	$0	30	$5.000.000	5429001	0.0696000	$348.000
CC - 1098684323	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$3.000.000	0.0400000	$120.000	$0	0	$0	0	$0	30	$3.000.000	5429001	0.0696000	$208.800
CC - 9466736	EPS-S COOSALUD	11	$643.500	0.0400000	$25.800	$0	0	$0	0	$0	11	$643.500	5429001	0.0696000	$44.800
CC - 1091659018	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$8.000.000	0.0400000	$320.000	$0	0	$0	0	$0	30	$8.000.000	5429001	0.0696000	$556.800

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-80109920	COMFIAR	30	$2.750.000	0.0400000	$110.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1020810816	COMFIAR	30	$3.000.000	0.0400000	$120.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1115722498	COMFIAR	11	$521.950	0.0400000	$20.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-88215089	COMFIAR	30	$2.750.000	0.0400000	$110.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1098752791	COMFIAR	30	$5.000.000	0.0400000	$200.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1098716716	COMFIAR	30	$5.000.000	0.0400000	$200.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1094269468	COMFIAR	30	$3.000.000	0.0400000	$120.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1116496517	COMFIAR	30	$1.500.000	0.0400000	$60.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1098658689	COMFIAR	30	$2.000.000	0.0400000	$80.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1094283275	COMFIAR	30	$5.000.000	0.0400000	$200.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1098684323	COMFIAR	30	$3.000.000	0.0400000	$120.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-9466736	COMFIAR	11	$643.500	0.0400000	$25.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1091659018	COMFIAR	30	$8.000.000	0.0400000	$320.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 01											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	9	$4.786.600	$0	$0	$40.000	$40.000	8	$25.500	$300	$300	$4.892.700
COLPENSIONES	3	$1.520.000	$0	$0	$0	$0	8	$8.100	$0	$0	$1.528.100
PROTECCION	1	$440.000	$0	$0	$0	$0	8	$2.400	$0	$0	$442.400

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESS COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	9	$1.350.900	$0	0	$0	0	$0	$1.350.900	8	$7.200	$0	$1.358.100	$0	0	$0	$0	$1.358.100	$0	$0	$1.358.100

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
EPS-S COOSALUD	1	$25.800	$0	0	$0	0	$0	$25.800	8	$200	$0	$26.000	$0	0	$0	$0	$26.000	$0	$0	$26.000
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	$200.000	$0	0	$0	0	$0	$200.000	8	$1.100	$0	$201.100	$0	0	$0	$0	$201.100	$0	$0	$201.100
SALUD TOTAL	1	$110.000	$0	0	$0	0	$0	$110.000	8	$600	$0	$110.600	$0	0	$0	$0	$110.600	$0	$0	$110.600

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA												
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	13	$2.709.600	0	$0	$0	$2.709.600	8	$14.400	$2.724.000	0	$0	$0	$2.724.000

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFIAR	13	$1.686.700	8	$9.000	$1.695.700
SENA	0	$0	8	$0	$0
ICBF	0	$0	8	$0	$0
ESAP	0	$0	8	$0	$0
MinEdu	0	$0	8	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	4	$1.695.800
PENSIONES	3	$6.863.200
RIESGOS PROFESIONALES	1	$2.724.000
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$1.695.700
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$12.978.700

ANEXO 4. EXAMENES LABORALES DE INGRESO

IPS simedical SAS

SIMEDICAL SAS
NIT: 901625724 - 5
Cel: 311 866 3611
Dirección: Calle 28 # 20 a - 26
Correo: simedical.ips@gmail.com



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

N° 824

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
16 DIA	01 MES	2025 AÑO	SARAVENA (ARAUCA, COLOMBIA) Ciudad	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO CON ENFASIS OSTEOMOSCULAR

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

Nombre de la empresa	Empresa en misión
CONSORCIO RIO BANADIA	CONSORCIO RIO BANADIA

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificacion CC: Cedula de Ciudadania, CE: Cedula de Extranjeria, TI: Tarjeta de Identidad, PT: Pasaporte)

Apellidos y Nombres	Genero	Edad	Documento de Identificación	
QUINTERO VILLAMIZAR JUAN VICENTE	MASCULINO	49 AÑOS 8 MESES 6 DIAS	CC (Tipo)	9466736 (Numero)

Cargo
OBRERO

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

SIN RESTRICCIONES PARA LA ACTIVIDAD ASIGNADA

Observaciones: NO APLICA

N/A	NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos)

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL ✓	----------

RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
	USO DE EPP OTROS	HABITOS SALUDABLES FORTALECIMIENTO MUSCULAR ACTIVIDAD FISICA AEROBICA HACER DEPORTE DIETA BALANCEADA

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

REALIZAR EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTO DE TRONCO, MIEMBROS SUPERIORES E INFERIORES ANTE DE INICIAR SUS ACTIVIDADES LABORES Y CULMINAR LA JORNADA LABORAL AYUDARA A MITIGAR ENFERMEDADES OSTEOMUSCULARES
BUENA PRACTICA DE HIGIENE POSTURAL
USAR LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL REQUIERIDOS PARA EL CARGO
EJERCICIO POR 30 MINUTOS TODOS LOS DIAS. CAMINAR ES UNA BUENA MANERA DE MANTENER SU CORAZÓN SALUDABLE Y SUS MÚSCULOS FUERTES O COMBINE EJERCICIO, COMO NADAR.

PAUTAS CORRECTA PARA EL MANEJO CARGA

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados antes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico

Firma:

Nombre: RIOS ESTEBAN LEIDY TATIANA

Aspirante o Trabajador

Firma: Juan V Quintero V

Nombre: QUINTERO VILLAMIZAR JUAN VICENTE

IPS simedical SAS

SIMEDICAL SAS
NIT: 901625724-5
Cel: 311 866 3611
Dirección: Calle 28 # 20 a - 26
Correo: simedical.ips@gmail.com



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

N° 849

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
17 DIA	01 MES	2025 AÑO	SARAVENA (ARAUCA, COLOMBIA) Ciudad	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO CON ENFASIS OSTEOMOSCULAR

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE	
CONSORCIO RIO BANADIA	CONSORCIO RIO BANADIA
Nombre de la empresa	Empresa en misión

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC: Cedula de Ciudadanía, CE: Cedula de Extranjeria, TI: Tarjeta de Identidad, PT: Pasaporte)

CASTAÑEDA MENDOZA NELSON ARLEY	Genero	Edad	Documento de Identificación	
	MASCULINO	20 AÑOS 2 MESES 28 DIAS	CC	1115722489
Apellidos y Nombres			Tipo	Número

Cargo
OBRERO

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

CON PATOLOGÍA QUE NO RESTRINGE LA LABOR ASIGNADA

Observaciones: *NO APLICA*

NO APLICA	PARA CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS
NO APLICA	PARA MANEJO DE ESTRÉS
NO APLICA	PARA MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS
NO APLICA	PARA MANIPULAR ALIMENTOS CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS
NO APLICA	PARA TRABAJAR EN ALTURAS
NO APLICA	PARA TRABAJAR EN ESPACIOS CONFINADOS

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL ✓	----------

RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
	USO DE EPP	HABITOS SALUDABLES
	CAPACITACIÓN	FORTALECIMIENTO MUSCULAR
		CONTROL DE PESO
		ACTIVIDAD FÍSICA AERÓBICA
		HACER DEPORTE
		DIETA BALANCEADA

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SE RECOMIENDA
-REALIZAR EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTO DE TRONCO, MIEMBROS SUPERIORES, E INFERIORES ANTE DE INICIAR SUS ACTIVIDADES LABORES Y AL CULMINAR LA JORNADA LABORAL. AYUDA A MITIGAR ENFERMEDADES OSTEOMUSCULARES
- BUENA PRACTICA DE HIGIENE POSTURAL
-USAR LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDOS PARA EL CARGO
-EJERCICIO POR 30 MINUTOS TODOS LOS DIAS CAMINAR ES UNA BUENA MANERA DE MANTENER SU CORAZÓN SALUDABLE Y SUS MÚSCULOS FUERTES O COMBINE EJERCICIO, COMO NADAR
-CONTROL DEL PESO

PAUTAS PARA LEVANTAR CORRECTAMENTE
- PLANIFIQUE POR ADELANTADO LO QUE QUIERE HACER Y NO SE APRESURE
- POSICIÓNESE CERCA DEL OBJETO QUE QUIERE LEVANTAR.
- SEPARE SUS PIES A UNA DISTANCIA DEL ANCHO DE SUS HOMBROS PARA DARSE A SÍ MISMO UNA BASE SÓLIDA DE APOYO
- DOBLE LAS RODILLAS
- APRIETE LOS MÚSCULOS DEL ESTÓMAGO
- LEVANTE CON LOS MÚSCULOS DE LAS PIERNAS A MEDIDA QUE SE PONE DE PIE
- NO INTENTE LEVANTAR POR SÍ MISMO UN OBJETO QUE SEA DEMASIADO PESADO O DE UN TAMAÑO RARO. PIDA AYUDA

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este

IPS simedical S.A.S

SIMEDICAL SAS
NIT: 901625724-5
Cel: 311 866 3611
Dirección: Calle 28 # 20 a - 26
Correo: simedical.ips@gmail.com



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

N° 683

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
03 DIA	01 MES	2025 AÑO	SARAVENA (ARAUCA, COLOMBIA) Ciudad	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO CON ENFASIS OSTEOMOSCULAR

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

Nombre de la empresa	Empresa en misión
CONSORCIO RIO BANADIA	CONSORCIO RIO BANADIA

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de identificación CC: Cedula de Ciudadanía, CE: Cedula de Extranjería, TI: Tarjeta de Identidad, PT: Pasaporte)

Apellidos y Nombres	Genero	Edad	Documento de Identificación	
GARCIA BELTRAN JHONN FREDY	MASCULINO	30 AÑOS 08 MESES 23 DIAS	Tipo: CC	Número: 1098752791

INGENIERO CIVIL

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

SIN RESTRICCIONES PARA EL CARGO ASIGNADO

Observaciones: *NO APLICA*

N/A NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos)

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL	✓

RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
VALORACION POR EPS: NUTRICION		DIETA BALANCEAADA, ACTIVIDAD FISICA,

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SE RECOMIENDA: REALIZAR ACTIVIADAD FISICA, LLEVAR DIETA BALANCEADA.

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mi en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados antes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico

Firma:

Nombre: RIOS ESTEBAN LEIDY TATIANA

R. M.: 1098764381 L.S.O.: 0038

Código de Seguridad
N1682T1C683

Aspirante o Trabajador

Firma:

Nombre: GARCIA BELTRAN JHONN FREDY

CC: 1098752791

IPS simedical SAS

SIMEDICAL SAS
NIT: 901625724-5
Cel: 311 866 3611
Dirección: Calle 28 # 20 a - 26
Correo: simedical.ips@gmail.com



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

N° 687

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
03 DIA	01 MES	2025 AÑO	SARAVENA (ARAUCA, COLOMBIA) Ciudad	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO CON ENFASIS OSTEOMOSCULAR

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

Nombre de la empresa	Empresa en misión
CONSORCIO RIO BANADIA	CONSORCIO RIO BANADIA

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC: Cedula de Ciudadania, CE: Cedula de Extranjeria, TI: Tarjeta de Identidad, PT: Pasaporte)

Apellidos y Nombres	Genero	Edad	Documento de Identificación	
VILA SARABIA JAIR LEANDRO	MASCULINO	36 AÑOS 07 MESES 11 DIAS	Tipo: CC	Número: 1091659018

DIRECTOR DE OBRA

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

SIN RESTRICCIONES PARA EL CARGO ASIGNADO

Observaciones: *NO APLICA*

N/A NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos)

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL ✓	

RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
	OTROS.	DIETA BALANCEADA, HACER EJERCICIO.

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SE RECOMIENDA: CONTROL DE PESO Y REALIZAR CAMITAS MINIMO POR 30 MINUTOS, DIETA BALANCEADA, NO FUMAR.

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados antes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico

Firma:

Nombre: RIOS ESTEBAN LEIDY TATIANA

R. M.: 1098764381 L.S.O.: 0038

Código de Seguridad
N28012J3687

Aspirante o Trabajador

Firma:

Nombre: VILA SARABIA JAIR LEANDRO

CC: 1091659018

IPS simedical SAS

SIMEDICAL SAS
NIT: 901625724-5
Cel: 311 866 3611
Dirección: Calle 28 # 20 a - 26
Correo: simedical.ips@gmail.com



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

N° 690

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
03 DÍA	01 MES	2025 AÑO	SARAVENA (ARAUCA, COLOMBIA) Ciudad	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO CON ENFASIS OSTEOMOSCULAR

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

CONSORCIO RIO BANADIA	CONSORCIO RIO BANADIA
Nombre de la empresa	Empresa en misión

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC: Cedula de Ciudadanía, CE: Cedula de Extranjeria, TI: Tarjeta de Identidad, PT: Pasaporte)

DELGADO MONTAGUT JOAQUIN EDUARDO	Genero	Edad	Documento de Identificación	
	MASCULINO	50 AÑOS 04 MESES 14 DIAS	CC	88215089
Apellidos y Nombres			Tipo	Número

PROFESIONAL ESPECIALISTA EN GEOTECNIA

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

SIN RESTRICCIONES PARA EL CARGO ASIGNADO

Observaciones: *NO APLICA*

N/A	NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos)

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL	✓

RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
	OTROS	DIETA BALANCEADA, ACTIVIDAD FÍSICA.

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SE RECOMIENDA: HABITOS DE VIDA Y ESTILO SALUDABLE, CONTROL DE PESO.

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados antes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico		Aspirante o Trabajador
Firma:		Firma:
Nombre: RIOS ESTEBAN LEIDY TATIANA		Nombre: DELGADO MONTAGUT JOAQUIN EDUARDO
R. M.: 1098764381 L.S.O.: 0038	Código de Seguridad N1574Z1690	CC: 88215089

IPS simedical S.A.S

SIMEDICAL SAS
NIT: 901625724-5
Cel: 311 866 3611
Dirección: Calle 28 # 20 a - 26
Correo: simedical.ips@gmail.com



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

N° 684

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
03 DÍA	01 MES	2025 AÑO	SARAVENA (ARAUCA, COLOMBIA) Ciudad	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO CON ENFASIS OSTEOMOSCULAR

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

Nombre de la empresa	Empresa en misión
CONSORCIO RIO BANADIA	CONSORCIO RIO BANADIA

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC: Cedula de Ciudadanía, CE: Cedula de Extranjería, TI: Tarjeta de Identidad, PT: Pasaporte)

Apellidos y Nombres	Genero	Edad	Documento de Identificación	
GARCIA BELTRAN JHONNATHAN ALEXIS	MASCULINO	32 AÑOS 11 MESES 11 DIAS	Tipo: CC	Numero: 1098716716

INGENIERO CIVIL

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

SIN RESTRICCIONES PARA EL CARGO ASIGNADO

Observaciones: *NO APLICA*

N/A NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos)

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL ✓	

RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
	OTROS:	HACER EJERCICIO, LLEVAR DIETA BALENCEADA.

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

EJERCICIO POR 30 MINUTOS TODOS LOS DIAS, CAMINAR ES UNA BUENA MANERA DE MANTENER SU CORAZÓN SALUDABLE, DIETA BALANCEADA

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados antes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico

Firma:

Nombre: RIOS ESTEBAN LEIDY TATIANA

R. M.: 1098764381 L.S.O.: 0038

Código de Seguridad
N1482X4J684

Aspirante o Trabajador

Firma:

Nombre: GARCIA BELTRAN JHONNATHAN ALEXIS

CC: 1098716716

IPS simedical S.A.S

SIMEDICAL SAS
NIT: 901625724-5
Cel: 311 866 3611
Dirección: Calle 28 # 20 a - 26
Correo: simedical.ips@gmail.com



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

N° 681

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
03 DÍA	01 MES	2025 AÑO	SARAVENA (ARAUCA, COLOMBIA) Ciudad	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO CON ENFASIS OSTEOMOSCULAR

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

Nombre de la empresa	Empresa en misión
CONSORCIO RIO BANADIA	CONSORCIO RIO BANADIA

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC: Cedula de Ciudadanía, CE: Cedula de Extranjeria, TI: Tarjeta de Identidad, PT: Pasaporte)

Apellidos y Nombres	Genero	Edad	Documento de Identificación	
BOTIA CHONA MARLYN YVETTE	FEMENINO	29 AÑOS 01 MESES 04 DIAS	Tipo: CC	Numero: 1020810816

PROFESIONAL SOCIAL

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

SIN RESTRICCIONES PARA EL CARGO ASIGNADO

Observaciones: *NO APLICA*

N/A | NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos)

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL ✓	----------

RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
	OTROS:	

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

REALIZAR PAUSAS ACTIVAS Y MEJORAR POSTURAS EN EL LUGAR DE TRABAJO.

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mi en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados antes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico

Firma: Dra. Tatiana Rios Esteban

Nombre: RIOS ESTEBAN LEIDY TATIANA

R. M.: 1098764381 L.S.O.: 0038

Código de Seguridad: N2524X1J681

Aspirante o Trabajador

Firma: Marlyn Yvette Botia Chona

Nombre: BOTIA CHONA MARLYN YVETTE

CC: 1020810816

Software para el sector salud - www.biofile.com.co

IPS simedical SAS

SIMEDICAL SAS
NIT: 901625724-5
Cel: 311 866 3611
Dirección: Calle 28 # 20 a - 26
Correo: simedical.ips@gmail.com



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

N° 722

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
03 DIA	01 MES	2025 AÑO	SARAVENA (ARAUCA, COLOMBIA) Ciudad	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO CON ENFASIS OSTEOMOSCULAR

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

Nombre de la empresa	Empresa en misión
CONSORCIO RIO BANADIA	CONSORCIO RIO BANADIA

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC: Cedula de Ciudadania, CE: Cedula de Extranjeria, TI: Tarjeta de Identidad, PT: Pasaporte)

Apellidos y Nombres	Genero	Edad	Documento de Identificación	
OLAYA BAYONA LAURA CRISTINA	FEMENINO	25 AÑOS 11 MESES 4 DIAS	Tipo: CC	Número: 1094283275

INGENIERA AMBIENTAL RESIDENTE

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

SIN RESTRICCIONES PARA EL CARGO ASIGNADO

Observaciones: *NO APLICA*

N/A NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos)

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL	✓

RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
		ACTIVIDAD FISICA AEROBICA

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

EJERCICIO POR 30 MINUTOS TODOS LOS DIAS, HABITOS SALUDABLES, DIETA BALANCEADA, CAMINATA DIARIA.

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mi en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados antes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico

Firma:

Nombre: RIOS ESTEBAN LEIDY TATIANA

R. M.: 1098764381 L.S.O.: 0038

Código de Seguridad
N1526T4J722

Aspirante o Trabajador

Firma:

Nombre: OLAYA BAYONA LAURA CRISTINA

CC: 1094283275

IPS simedical SAS

SIMEDICAL SAS
NIT: 901625724-5
Cel: 311 866 3611
Dirección: Calle 28 # 20 a - 26
Correo: simedical.ips@gmail.com



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

N° 710

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
03 DIA	01 MES	2025 AÑO	SARAVENA (ARAUCA, COLOMBIA) Ciudad	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO CON ENFASIS OSTEOMOSCULAR

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

CONSORCIO RIO BANADIA	CONSORCIO RIO BANADIA
Nombre de la empresa	Empresa en misión

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC: Cedula de Ciudadania, CE: Cedula de Extranjeria, TI: Tarjeta de Identidad, PT: Pasaporte)

Apellidos y Nombres	Genero	Edad	Documento de Identificación	
GARRIDO RIVERO CAMILO ANDRES	MASCULINO	32 AÑOS 03 MESES 28 DIAS	Tipo: CC	Numero: 1094269468

PROFESIONAL EN HSEQ

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

SIN RESTRICCIONES PARA EL CARGO ASIGNADO

Observaciones: *NO APLICA*

N/A | NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos)

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL	✓

RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
VALORACIÓN POR EPS : NUTRICION	USO DE EPP	HACER DEPORTE

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

REALIZAR EJERCICIO POR 30 MINUTOS TODOS LOS DIAS.

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mi en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados entes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico

Firma:

Nombre: RIOS ESTEBAN LEIDY TATIANA

R. M.: 1098764381 L.S.O.: 0038

Código de Seguridad
N1596T1X710

Aspirante o Trabajador

Firma:

Nombre: GARRIDO RIVERO CAMILO ANDRES

CC: 1094269468

Software para el sector salud - www.biofile.com.co

IPS simedical S.A.S

SIMEDICAL SAS
NIT: 901625724-5
Cel: 311 866 3611
Dirección: Calle 28 # 20 a - 26
Correo: simedical.ips@gmail.com



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

N° 680

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
03 DÍA	01 MES	2025 AÑO	SARAVENA (ARAUCA, COLOMBIA) Ciudad	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO CON ENFASIS OSTEOMOSCULAR

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

CONSORCIO RIO BANADIA	CONSORCIO RIO BANADIA
Nombre de la empresa	Empresa en misión

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC: Cedula de Ciudadanía, CE: Cedula de Extranjeria, TI: Tarjeta de Identidad, PT: Pasaporte)

PAEZ GARCIA FERNEY ALFONSO	Genero	Edad	Documento de Identificación	
	MASCULINO	34 AÑOS 09 MESES 27 DIAS	CC	1098684323
Apellidos y Nombres			Tipo	Número

INSPECTOR DE OBRAS

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

SIN RESTRICCIONES PARA EL CARGO ASIGNADO

Observaciones: *NO APLICA*

N/A	NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos)

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL ✓	----------

RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
	OTROS.	DIETA BALANCEADA, REALZIAR EJERCICIO DIARIO.

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

MEJORAR HABITOS DE ESTILO Y VIDA SALUDABLE, CONTROL DE PESO, REALIZAR ACTIVIDAD FISICA DIARIA.

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mi en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados entes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico

Firma: 

Nombre: RIOS ESTEBAN LEIDY TATIANA

R. M.: 1098764381 L.S.O.: 0038

Código de Seguridad N1596T4J680

Aspirante o Trabajador

Firma: Ferney A Paez G

Nombre: PAEZ GARCIA FERNEY ALFONSO

CC: 1098684323

IPS simedical SAS

SIMEDICAL SAS
NIT: 901625724-5
Cel: 311 866 3611
Dirección: Calle 28 # 20 a - 26
Correo: simedical.ips@gmail.com



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

N°682

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
03 DÍA	01 MES	2025 AÑO	SARAVENA (ARAUCA, COLOMBIA) Ciudad	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO CON ENFASIS OSTEOMOSCULAR

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

CONSORCIO RIO BANADIA	CONSORCIO RIO BANADIA
Nombre de la empresa	Empresa en misión

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC: Cedula de Ciudadanía, CE: Cedula de Extranjería, TI: Tarjeta de Identidad, PT: Pasaporte)

GUTIERREZ VACCA HORLEYDA	Genero	Edad	Documento de Identificación	
	FEMENINO	35 AÑOS 02 MESES 02 DIAS	CC	1116496517
Apellidos y Nombres			Tipo	Numero

CONTADOR PUBLICO

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

SIN RESTRICCIONES PARA EL CARGO ASIGNADO

Observaciones: *NO APLICA*

N/A	NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos)

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL	✓	----------

RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
	OTROS.	DIETA BALANCEADA.

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SE RECOMIENDA: REALIZAR PAUSAS ACTIVAS Y MEJORAR POSTURAS

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados antes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico

Firma:

Nombre: RIOS ESTEBAN LEIDY TATIANA

R. M.: 1098764381 L.S.O.: 0038

Código de Seguridad
N1549X1T682

Aspirante o Trabajador

HORLEYDA GUTIERREZ V.

Firma:

Nombre: GUTIERREZ VACCA HORLEYDA

CC: 1116496517

IPS simedical SAS

SIMEDICAL SAS
NIT: 901625724-5
Cel: 311 866 3611
Dirección: Calle 28 # 20 a - 26
Correo: simedical.ips@gmail.com



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

N° 709

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
03 DIA	01 MES	2025 AÑO	SARAVENA (ARAUCA, COLOMBIA) Ciudad	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO CON ENFASIS OSTEOMOSCULAR

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

Nombre de la empresa	Empresa en misión
CONSORCIO RIO BANADIA	CONSORCIO RIO BANADIA

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC: Cedula de Ciudadanía, CE: Cedula de Extranjeria, TI: Tarjeta de Identidad, PT: Pasaporte)

Apellidos y Nombres	Genero	Edad	Documento de Identificación	
OCHOA JESSICA LILIBETH	FEMENINO	36 AÑOS 05 MESES 01 DIAS	CC (Tipo)	1098658689 (Número)

SECRETARIA

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

SIN RESTRICCIONES PARA EL CARGO ASIGNADO

Observaciones: *NO APLICA*

N/A	NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos)

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL ✓	----------

RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
VALORACION POR EPS: OFTALMOLOGIA		

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

REALIZAR PAUSAS ACTIVAS Y MEJORAR POSTURAS EN EL LUGAR DE TRABAJO.

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados antes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico

Firma:

Nombre: RIOS ESTEBAN LEIDY TATIANA

R. M.: 1098764381 L.S.O.: 0038

Código de Seguridad
N1526T1Z709

Aspirante o Trabajador

Firma:

Nombre: OCHOA JESSICA LILIBETH

CC: 1098658689

ANEXO 5.
PAGO DE NOMINA
ENERO

CONSORCIO RIO BANADIA

NIT 901.902.273

salario minimo del año	2025	1.423.500
Auxilio de transporte		200.000

EMPLEADOS CONTRATO 481 DE 2024

PERIODO DE PAGO: 01 DE ENERO AL 30 DE ENERO 2025

NOMBRE	NUMERO DE IDENTIFICACION	CARGO	SUELDO BASICO	DIAS TRAB	DEVENGADO				TOTAL DEVENGADO	DEDUCCIONES		TOTAL DEDUCCION	NETO A PAGAR	FIRMA
					BASICO	H. EXTRAS	COMISIONES	AUX. TRANS.		SALUD	PENSION			
JAIR LEANDRO VILA SARABIA	1.091.659.015	DIRECTOR DE OBRA	$ 8.000.000	30	8.000.000			0	8.000.000	320.000	320.000	640.000	7.360.000	
JAIRO ALEXANDER BARRAGAN MENDOZA	80.109.920	ESP. EN HIDRAULICA	$ 2.750.000	30	2.750.000			200.000	2.950.000	110.000	110.000	220.000	2.730.000	
JOAQUIN EDUARDO DELGADO MONTAGUT	88.215.089	ESP. EN GEOTECNIA	$ 2.750.000	30	2.750.000			200.000	2.950.000	110.000	110.000	220.000	2.730.000	Joaquin E. Montagut.
JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN	1.098.716.716	INGENIERO CIVIL RESIDENTE	$ 5.000.000	30	5.000.000			0	5.000.000	200.000	200.000	400.000	4.600.000	
JHONN FREDY GARCIA BELTRAN	1.098.752.751	INGENIERO CIVIL RESIDENTE	$ 5.000.000	30	5.000.000			0	5.000.000	200.000	200.000	400.000	4.600.000	
LAURA CRISTINA OLAYA BAYONA	1.064.280.275	ING. AMBIENTAL RESIDENTE	$ 5.000.000	30	5.000.000			0	5.000.000	200.000	200.000	400.000	4.600.000	Laura Olaya.
MARLYN YVETTE BOTIA CHONA	1.020.810.816	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	$ 3.000.000	30	3.000.000			0	3.000.000	120.000	120.000	240.000	2.760.000	Marlyn Botia
CAMILO ANDRES GARRIDO GUERRERO	1.054.269.468	PROFESIONAL HSEQ	$ 3.000.000	30	3.000.000			0	3.000.000	120.000	120.000	240.000	2.760.000	
HORLEYDA GUTIERREZ VACCA	1.116.896.517	CONTADOR	$ 1.500.000	30	1.500.000			200.000	1.700.000	60.000	60.000	120.000	1.580.000	HORLEYDA GUTIERREZ.
FERNEY ALFONSO PAEZ GARCIA	1.098.684.323	INSPECTOR DE OBRAS	$ 3.000.000	30	3.000.000			0	3.000.000	120.000	120.000	240.000	2.760.000	Ferney Paez.
JUAN VICENTE QUINTERO VILLAMIZAR	9.466.736	OFICIAL	$ 1.755.000	11	643.500			73.333	716.833	25.740	25.740	51.480	665.353	Juan V. Quintero.
NELSON ARLEY CASTAÑEDA MENDOZA	1.115.722.498	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	11	521.950			73.333	595.283	20.878	20.878	41.756	553.527	Nelson Castañeda.
JESSICA LILIBETH OCHOA	1.098.658.889	SECRETARIA	$ 2.000.000	30	2.000.000			200.000	2.200.000	80.000	80.000	160.000	2.040.000	JESSICA OCHOA
TOTAL ADMINISTRACION				**352**	**42.165.450**	**0**	**0**	**946.666**	**43.112.116**	**1.686.618**	**1.686.618**	**3.373.236**	**39.738.880**	

APORTES SEGURIDAD SOCIAL		
42.165.450		VALOR
SALUD	4,0%	1.686.618
PENSION	16%	6.746.472
RIESGOS PROFESIONALES	0,522%	38.270
RIESGOS PROFESIONALES	6,960%	2.691.115

PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		
43.112.116		VALOR
CESANTIAS	8,33%	3.591.239
INT./CESANT	1%	431.122
PRIMA	8,33%	3.591.239
VACACIONES	4,17%	1.758.299

APORTES PARAFISCALES		
42.165.450		VALOR
SENA	0%	-
ICBF	0%	
CAJA COMPENSACIÓN	4%	1.686.618

NOTA: VACACIONES SIN AUX TRANSPORTE

PREPARO	REVISO	APROBO	CONTABILIZO	OBSERVACIONES

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

salario minimo del año	2.025	1.423.500
Auxilio de transporte		200.000

EMPLEADOS CONTRATO 481 DE 2024
PERIODO DE PAGO: 31 DE DICIEMBRE 2024

NOMBRE	NUMERO DE IDENTIFICACION	CARGO	SUELDO BASICO	DIAS TRAB	DEVENGADO				TOTAL DEVENGADO	DEDUCCIONES		TOTAL DEDUCCION	NETO A PAGAR	FIRMA
					BASICO	H. EXTRAS	COMISIONES	AUX. TRANS.		SALUD	PENSION			
JAIR LEANDRO VILA SARABIA	1.091.659.018	DIRECTOR DE OBRA	$ 8.000.000	1	266.667			0	266.667	10.667	10.667	21.334	245.333	
JAIRO ALEXANDER BARRAGAN MENDOZA	80.109.920	ESP. EN HIDRAULICA	$ 2.750.000	1	91.667			6.667	98.334	3.667	3.667	7.334	91.000	
JOAQUIN EDUARDO DELGADO MONTAGUT	88.215.089	ESP. EN GEOTECNIA	$ 2.750.000	1	91.667			6.667	98.334	3.667	3.667	7.334	91.000	
JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN	1.098.716.716	INGENIERO CIVIL RESIDENTE	$ 5.000.000	1	166.667			0	166.667	6.667	6.667	13.334	153.333	
JHONN FREDY GARCIA BELTRAN	1.098.752.791	INGENIERO CIVIL RESIDENTE	$ 5.000.000	1	166.667			0	166.667	6.667	6.667	13.334	153.333	
LAURA CRISTINA OLAYA BAYONA	1.064.283.275	ING. AMBIENTAL RESIDENTE	$ 5.000.000	1	166.667			0	166.667	6.667	6.667	13.334	153.333	
MARLYN YVETTE BOTIA CHONA	1.020.810.816	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	$ 3.000.000	1	100.000			0	100.000	4.000	4.000	8.000	92.000	
CAMILO ANDRES GARRIDO GUERRERO	1.094.289.468	PROFESIONAL HSEQ	$ 3.000.000	1	100.000			0	100.000	4.000	4.000	8.000	92.000	
HORLEYDA GUTIERREZ VACCA	1.116.496.517	CONTADOR	$ 1.500.000	1	50.000			6.667	56.667	2.000	2.000	4.000	52.667	
FERNEY ALFONSO PAEZ GARCIA	1.098.684.323	INSPECTOR DE OBRAS	$ 3.000.000	1	100.000			0	100.000	4.000	4.000	8.000	92.000	
JESSICA LILIBETH OCHOA	1.098.958.689	SECRETARIA	$ 2.000.000	1	66.667			6.667	73.334	2.667	2.667	5.334	68.000	
TOTAL ADMINISTRACION				**11**	**1.366.669**	**0**	**0**	**26.668**	**1.393.337**	**54.669**	**54.669**	**109.338**	**1.283.999**	

APORTES SEGURIDAD SOCIAL		
1.366.669		VALOR
SALUD	4,0%	54.667
PENSION	16%	218.667
RIESGOS PROFESIONALES	0,522%	69.60
RIESGOS PROFESIONALES	6,960%	87.928,00

APORTES PARAFISCALES		
1.366.669		VALOR
SENA	0%	
ICBF	0%	
CAJA COMPENSACION	4%	54.667

PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		
1.393.337		VALOR
CESANTIAS	8,33%	116.065
INT/CESANT	1%	426
PRIMA	8,33%	116.065
VACACIONES	4,17%	56.990

NOTA: VACACIONES SIN AUX TRANSPORTE

PREPARO	REVISO	APROBO	CONTABILIZO	OBSERVACIONES
			HORLEYDA GUTIERREZ	

DIRECCION CALLE 30 Nº 8- 49 Barrio San Luis Cel: 3142738531
e-mail: consorciorobanadia@gmail.com

ANEXO 6.
FORMATO DE DOTACION Y ENTREGA DE EPP

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

ACTA DE ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP

EL dia 20/01/2025 recibi de la empresa **CONSORCIO RIO BANADIA** La dotación personal que se describe a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TALLA
PROTECCIÓN DE CABEZA			
1	Casco	1	
PROTECCIÓN AUDITIVA			
2	Tapa oídos con inserción de goma	1	
3	Tapa oídos copa		
PROTECCIÓN VISUAL			
4	Gafas de seguridad	1	
PROTECCIÓN RESPIRATORIA			
5	Tapa bocas desechable E.P.P respiratorio	1	
6	EPP respiratorio		
PROTECCIÓN MANOS			
7	Guantes de vaqueta	1	
8	Guantes hilo		
9	Guantes (Caucho)		
10	Guantes (Carnaza)		
PROTECCIÓN PIES			
11	Botas de material (Punta de acero)	1	
12	Botas de caucho (Punta de acero)		
ROPA DE TRABAJO			
13	Pantalón jean	2	34
14	Camisa dotación	2	M
OTROS ELEMENTOS			
15	Chaleco reflectivo		
16	Protección facial		
17	Arnés		
18	Eslinga y posicionamiento		
19	Eslinga en Y		

El trabajador manifiesta haber recibido capacitación sobre el uso correcto y los riesgos para los cuales estos elementos lo van a cuidar, y se obliga a reportar de manera inmediata cualquier daño, pérdida o desgaste para proceder a su respectiva reposición, además se compromete a usarlo cuando esté desempeñando sus funciones en el trabajo (art. 85 literal B – Ley 09 de 1979, art. 3 literal B – Res 2400 de 1979), dándole el uso adecuado y a devolverle a la empresa los elementos desgastados o dañados para su reposición en caso de pérdida. He atendido a las normas y recomendaciones sobre el uso, utilización y mantenimiento de los elementos de protección personal.

CONOZCO Y SE UTILIZAR CADA UNO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL QUE ME HAN SIDO ENTREGADOS.

Quien recibe:

NOMBRE: Nelson Castañeda
C.C 1775722498
CARGO: Ayudante
FIRMA: Nelson castañeda

Quien entrega:

NOMBRE: CAMILO RIVERO
C.C 1094269468
CARGO: HSEQ
FIRMA:

CALLE N ° 8 – 49 BRR SAN LUIS
CORREO: cosungsas@gmail.com
CELULAR: 3142788531

Scanned with CamScanner

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

ACTA DE ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP

EL dia 20/01/2025 recibí de la empresa CONSORCIO RIO BANADIA La dotación personal que se describe a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TALLA
PROTECCIÓN DE CABEZA			
1	Casco	1	
PROTECCIÓN AUDITIVA			
2	Tapa oídos con inserción de goma	1	
3	Tapa oídos copa		
PROTECCIÓN VISUAL			
4	Gafas de seguridad	1	
PROTECCIÓN RESPIRATORIA			
5	Tapa bocas desechable E.P.P respiratorio	1	
6	EPP respiratorio		
PROTECCIÓN MANOS			
7	Guantes de vaqueta	1	
8	Guantes hilo		
9	Guantes (Caucho)		
10	Guantes (Carnaza)		
PROTECCIÓN PIES			
11	Botas de material (Punta de acero)	1	
12	Botas de caucho (Punta de acero)		
ROPA DE TRABAJO			
13	Pantalón jean	2	32
14	Camisa dotación	2	L
OTROS ELEMENTOS			
15	Chaleco reflectivo		
16	Protección facial		
17	Arnés		
18	Eslinga y posicionamiento		
19	Eslinga en Y		

El trabajador manifiesta haber recibido capacitación sobre el uso correcto y los riesgos para los cuales estos elementos lo van a cuidar, y se obliga a reportar de manera inmediata cualquier daño, pérdida o desgaste para proceder a su respectiva reposición, además se compromete a usarlo cuando esté desempeñando sus funciones en el trabajo (art. 85 literal B – Ley 09 de 1979, art. 3 literal B – Res 2400 de 1979), dándole el uso adecuado y a devolverle a la empresa los elementos desgastados o dañados para su reposición en caso de pérdida. He atendido a las normas y recomendaciones sobre el uso, utilización y mantenimiento de los elementos de protección personal.

CONOZCO Y SE UTILIZAR CADA UNO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL QUE ME HAN SIDO ENTREGADOS.

Quien recibe:

NOMBRE: Juan V. Quintero V.
C.C 9.866.736.
CARGO: Ayudante
FIRMA: Juan V. Quintero.

Quien entrega:

NOMBRE: CAMILO RIVERO
C.C 1.094.269.468
CARGO: HSEQ
FIRMA:

CALLE N ° 8 – 49 BRR SAN LUIS
CORREO: cosuingsas@gmail.com
CELULAR: 3142788531

Scanned with CamScanner

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

ACTA DE ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP

EL día 03-01-2025 recibí de la empresa **CONSORCIO RIO BANADIA** La dotación personal que se describe a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TALLA
PROTECCIÓN DE CABEZA			
1	Casco	1	
PROTECCIÓN AUDITIVA			
2	Tapa oídos con inserción de goma	1	
3	Tapa oídos copa		
PROTECCIÓN VISUAL			
4	Gafas de seguridad	1	
PROTECCIÓN RESPIRATORIA			
5	Tapa bocas desechable E.P.P respiratorio	1	
6	EPP respiratorio		
PROTECCIÓN MANOS			
7	Guantes de vaqueta	1	
8	Guantes hilo		
9	Guantes (Caucho)		
10	Guantes (Carnaza)		
PROTECCIÓN PIES			
11	Botas de material (Punta de acero)	1	41
12	Botas de caucho (Punta de acero)		
ROPA DE TRABAJO			
13	Pantalón jean	2	34
14	Camisa dotación	2	M
OTROS ELEMENTOS			
15	Chaleco reflectivo		
16	Protección facial		
17	Arnés		
18	Eslinga y posicionamiento		
19	Eslinga en Y		

El trabajador manifiesta haber recibido capacitación sobre el uso correcto y los riesgos para los cuales estos elementos lo van a cuidar, y se obliga a reportar de manera inmediata cualquier daño, pérdida o desgaste para proceder a su respectiva reposición, además se compromete a usarlo cuando esté desempeñando sus funciones en el trabajo (art. 85 literal B – Ley 09 de 1979, art. 3 literal B – Res 2400 de 1979), dándole el uso adecuado y a devolverle a la empresa los elementos desgastados o dañados para su reposición en caso de pérdida. He atendido a las normas y recomendaciones sobre el uso, utilización y mantenimiento de los elementos de protección personal.

CONOZCO Y SE UTILIZAR CADA UNO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL QUE ME HAN SIDO ENTREGADOS.

Quien recibe:

NOMBRE: Jair leandro Vila S.
C.C 1.091.659.018.
CARGO: Director Obra
FIRMA:

Quien entrega:

NOMBRE: CAMILO GARRIDO R.
C.C 1094269468
CARGO: HSEQ
FIRMA:

CALLE N ° 8 – 49 BRR SAN LUIS
CORREO: cosuingsas@gmail.com
CELULAR: 3142788531

Scanned with CamScanner

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

ACTA DE ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP

EL dia 03/04-2025 recibi de la empresa **CONSORCIO RIO BANADIA** La dotación personal que se describe a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TALLA
PROTECCIÓN DE CABEZA			
1	Casco	1	
PROTECCIÓN AUDITIVA			
2	Tapa oídos con inserción de goma	1	
3	Tapa oídos copa		
PROTECCIÓN VISUAL			
4	Gafas de seguridad	1	
PROTECCIÓN RESPIRATORIA			
5	Tapa bocas desechable E.P.P respiratorio	1	
6	EPP respiratorio		
PROTECCIÓN MANOS			
7	Guantes de vaqueta	1	
8	Guantes hilo		
9	Guantes (Caucho)		
10	Guantes (Carnaza)		
PROTECCIÓN PIES			
11	Botas de material (Punta de acero)	1	40
12	Botas de caucho (Punta de acero)		
ROPA DE TRABAJO			
13	Pantalón jean	2	36
14	Camisa dotación	2	2
OTROS ELEMENTOS			
15	Chaleco reflectivo		
16	Protección facial		
17	Arnés		
18	Eslinga y posicionamiento		
19	Eslinga en Y		

El trabajador manifiesta haber recibido capacitación sobre el uso correcto y los riesgos para los cuales estos elementos lo van a cuidar, y se obliga a reportar de manera inmediata cualquier daño, pérdida o desgaste para proceder a su respectiva reposición, además se compromete a usarlo cuando esté desempeñando sus funciones en el trabajo (art. 85 literal B – Ley 09 de 1979, art. 3 literal B – Res 2400 de 1979), dándole el uso adecuado y a devolverle a la empresa los elementos desgastados o dañados para su reposición en caso de pérdida. He atendido a las normas y recomendaciones sobre el uso, utilización y mantenimiento de los elementos de protección personal.

CONOZCO Y SE UTILIZAR CADA UNO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL QUE ME HAN SIDO ENTREGADOS.

Quien recibe:

NOMBRE: Thomas Juan Gomez B
C.C 1098316216
CARGO: Ing Residente
FIRMA:

Quien entrega:

NOMBRE: CAMILO GARZON R.
C.C 1044269468
CARGO: HSEQ
FIRMA:

CALLE N ° 8 – 49 BRR SAN LUIS
CORREO: cosungsas@gmail.com
CELULAR: 3142788531

Scanned with CamScanner

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

ACTA DE ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP

EL día 03-01-2025 recibí de la empresa CONSORCIO RIO BANADIA La dotación personal que se describe a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TALLA
PROTECCIÓN DE CABEZA			
1	Casco	1	
PROTECCIÓN AUDITIVA			
2	Tapa oídos con inserción de goma	1	
3	Tapa oídos copa		
PROTECCIÓN VISUAL			
4	Gafas de seguridad	1	
PROTECCIÓN RESPIRATORIA			
5	Tapa bocas desechable E.P.P respiratorio	1	
6	EPP respiratorio		
PROTECCIÓN MANOS			
7	Guantes de vaqueta	1	
8	Guantes hilo		
9	Guantes (Caucho)		
10	Guantes (Carnaza)		
PROTECCIÓN PIES			
11	Botas de material (Punta de acero)	1	41
12	Botas de caucho (Punta de acero)		
ROPA DE TRABAJO			
13	Pantalón jean	2	34
14	Camisa dotación	2	M
OTROS ELEMENTOS			
15	Chaleco reflectivo		
16	Protección facial		
17	Arnés		
18	Eslinga y posicionamiento		
19	Eslinga en Y		

El trabajador manifiesta haber recibido capacitación sobre el uso correcto y los riesgos para los cuales estos elementos lo van a cuidar, y se obliga a reportar de manera inmediata cualquier daño, pérdida o desgaste para proceder a su respectiva reposición, además se compromete a usarlo cuando esté desempeñando sus funciones en el trabajo (art. 85 literal B – Ley 09 de 1979, art. 3 literal B – Res 2400 de 1979), dándole el uso adecuado y a devolverle a la empresa los elementos desgastados o dañados para su reposición en caso de pérdida. He atendido a las normas y recomendaciones sobre el uso, utilización y mantenimiento de los elementos de protección personal.

CONOZCO Y SE UTILIZAR CADA UNO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL QUE ME HAN SIDO ENTREGADOS.

Quien recibe:

NOMBRE: Jairo A. Barragan
C.C 88.109.920
CARGO: ESP. Hidrogulca
FIRMA:

Quien entrega:

NOMBRE: CAMILO BARRERA R.
C.C 1094264468
CARGO: HSEQ
FIRMA:

CALLE N ° 8 - 49 BRR SAN LUIS
CORREO: cosuingsas@gmail.com
CELULAR: 3142788531

Scanned with CamScanner

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

ACTA DE ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP

EL dia 03-01-2025 recibí de la empresa CONSORCIO RIO BANADIA La dotación personal que se describe a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TALLA
PROTECCIÓN DE CABEZA			
1	Casco	1	
PROTECCIÓN AUDITIVA			
2	Tapa oídos con inserción de goma	1	
3	Tapa oídos copa		
PROTECCIÓN VISUAL			
4	Gafas de seguridad	1	
PROTECCIÓN RESPIRATORIA			
5	Tapa bocas desechable E.P.P respiratorio	1	
6	EPP respiratorio		
PROTECCIÓN MANOS			
7	Guantes de vaqueta	1	
8	Guantes hilo		
9	Guantes (Caucho)		
10	Guantes (Carnaza)		
PROTECCIÓN PIES			
11	Botas de material (Punta de acero)	1	39
12	Botas de caucho (Punta de acero)		
ROPA DE TRABAJO			
13	Pantalón jean	2	34
14	Camisa dotación	2	L
OTROS ELEMENTOS			
15	Chaleco reflectivo		
16	Protección facial		
17	Arnés		
18	Eslinga y posicionamiento		
19	Eslinga en Y		

El trabajador manifiesta haber recibido capacitación sobre el uso correcto y los riesgos para los cuales estos elementos lo van a cuidar, y se obliga a reportar de manera inmediata cualquier daño, pérdida o desgaste para proceder a su respectiva reposición, además se compromete a usarlo cuando esté desempeñando sus funciones en el trabajo (art. 85 literal B – Ley 09 de 1979, art. 3 literal B – Res 2400 de 1979), dándole el uso adecuado y a devolverle a la empresa los elementos desgastados o dañados para su reposición en caso de pérdida. He atendido a las normas y recomendaciones sobre el uso, utilización y mantenimiento de los elementos de protección personal.

CONOZCO Y SE UTILIZAR CADA UNO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL QUE ME HAN SIDO ENTREGADOS.

Quien recibe:

NOMBRE: Joaquin Montayut.
C.C 88.25.089
CARGO: Ep ecotelvia
FIRMA: Joaquin E.T.P.

Quien entrega:

NOMBRE: CAMILO GUERRO
CC 1094.269.408.
CARGO: HSEQ
FIRMA:

CALLE N ° 8 - 49 BRR SAN LUIS
CORREO: cosuingsas@gmail.com
CELULAR: 3142788531

Scanned with CamScanner

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

ACTA DE ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP

EL dia 03-01-2025 recibi de la empresa **CONSORCIO RIO BANADIA** La dotación personal que se describe a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TALLA
PROTECCIÓN DE CABEZA			
1	Casco	1	
PROTECCIÓN AUDITIVA			
2	Tapa oídos con inserción de goma	1	
3	Tapa oídos copa		
PROTECCIÓN VISUAL			
4	Gafas de seguridad	1	
PROTECCIÓN RESPIRATORIA			
5	Tapa bocas desechable E.P.P respiratorio	1	
6	EPP respiratorio		
PROTECCIÓN MANOS			
7	Guantes de vaqueta	1	
8	Guantes hilo		
9	Guantes (Caucho)		
10	Guantes (Carnaza)		
PROTECCIÓN PIES			
11	Botas de material (Punta de acero)	1	38
12	Botas de caucho (Punta de acero)		
ROPA DE TRABAJO			
13	Pantalón jean	2	14
14	Camisa dotación	2	M
OTROS ELEMENTOS			
15	Chaleco reflectivo		
16	Protección facial		
17	Arnés		
18	Eslinga y posicionamiento		
19	Eslinga en Y		

El trabajador manifiesta haber recibido capacitación sobre el uso correcto y los riesgos para los cuales estos elementos lo van a cuidar, y se obliga a reportar de manera inmediata cualquier daño, pérdida o desgaste para proceder a su respectiva reposición, además se compromete a usarlo cuando esté desempeñando sus funciones en el trabajo (art. 85 literal B – Ley 09 de 1979, art. 3 literal B – Res 2400 de 1979), dándole el uso adecuado y a devolverle a la empresa los elementos desgastados o dañados para su reposición en caso de pérdida. He atendido a las normas y recomendaciones sobre el uso, utilización y mantenimiento de los elementos de protección personal.

CONOZCO Y SE UTILIZAR CADA UNO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL QUE ME HAN SIDO ENTREGADOS.

Quien recibe:

NOMBRE: Marlyn Botta C.
C.C 1020840.848
CARGO: Auxiliar SST
FIRMA: Marlyn Botta

Quien entrega:

NOMBRE: CAMILO GARRIDO P.
CC 1094269.468
CARGO: HSEQ
FIRMA:

CALLE N ° 8 – 49 BRR SAN LUIS
CORREO: cosuingsas@gmail.com
CELULAR: 3142788531

Scanned with CamScanner

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

ACTA DE ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP

EL dia 03-01-2025 recibí de la empresa **CONSORCIO RIO BANADIA** La dotación personal que se describe a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TALLA
PROTECCIÓN DE CABEZA			
1	Casco	1	
PROTECCIÓN AUDITIVA			
2	Tapa oídos con inserción de goma	1	
3	Tapa oídos copa		
PROTECCIÓN VISUAL			
4	Gafas de seguridad	1	
PROTECCIÓN RESPIRATORIA			
5	Tapa bocas desechable E.P.P respiratorio	1	
6	EPP respiratorio		
PROTECCIÓN MANOS			
7	Guantes de vaqueta	1	
8	Guantes hilo		
9	Guantes (Caucho)		
10	Guantes (Carnaza)		
PROTECCIÓN PIES			
11	Botas de material (Punta de acero)	1	41
12	Botas de caucho (Punta de acero)		
ROPA DE TRABAJO			
13	Pantalón jean	2	36
14	Camisa dotación	2	L
OTROS ELEMENTOS			
15	Chaleco reflectivo		
16	Protección facial		
17	Arnés		
18	Eslinga y posicionamiento		
19	Eslinga en Y		

El trabajador manifiesta haber recibido capacitación sobre el uso correcto y los riesgos para los cuales estos elementos lo van a cuidar, y se obliga a reportar de manera inmediata cualquier daño, pérdida o desgaste para proceder a su respectiva reposición, además se compromete a usarlo cuando esté desempeñando sus funciones en el trabajo (art. 85 literal B – Ley 09 de 1979, art. 3 literal B – Res 2400 de 1979), dándole el uso adecuado y a devolverle a la empresa los elementos desgastados o dañados para su reposición en caso de pérdida. He atendido a las normas y recomendaciones sobre el uso, utilización y mantenimiento de los elementos de protección personal.

CONOZCO Y SE UTILIZAR CADA UNO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL QUE ME HAN SIDO ENTREGADOS.

Quien recibe:

NOMBRE: Ferney Ruiz
C.C 1.048.654.423
CARGO: Inspector SST
FIRMA: Ferney Ruiz.

Quien entrega:

NOMBRE: Camilo Barrios R.
C.C 1.094.269.465
CARGO: HSEQ.
FIRMA:

CALLE N ° 8 - 49 BRR SAN LUIS
CORREO: casuingsas@gmail.com
CELULAR: 3142788531

Scanned with CamScanner

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

ACTA DE ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP

EL dia 03-01-2025 recibi de la empresa **CONSORCIO RIO BANADIA** La dotación personal que se describe a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TALLA
PROTECCIÓN DE CABEZA			
1	Casco	1	
PROTECCIÓN AUDITIVA			
2	Tapa oídos con inserción de goma	1	
3	Tapa oídos copa		
PROTECCIÓN VISUAL			
4	Gafas de seguridad	1	
PROTECCIÓN RESPIRATORIA			
5	Tapa bocas desechable E.P.P respiratorio	1	
6	EPP respiratorio		
PROTECCIÓN MANOS			
7	Guantes de vaqueta	1	
8	Guantes hilo		
9	Guantes (Caucho)		
10	Guantes (Carnaza)		
PROTECCIÓN PIES			
11	Botas de material (Punta de acero)	1	40
12	Botas de caucho (Punta de acero)		
ROPA DE TRABAJO			
13	Pantalón jean	2	14
14	Camisa dotación	2	M
OTROS ELEMENTOS			
15	Chaleco reflectivo		
16	Protección facial		
17	Arnés		
18	Eslinga y posicionamiento		
19	Eslinga en Y		

El trabajador manifiesta haber recibido capacitación sobre el uso correcto y los riesgos para los cuales estos elementos lo van a cuidar, y se obliga a reportar de manera inmediata cualquier daño, pérdida o desgaste para proceder a su respectiva reposición, además se compromete a usarlo cuando esté desempeñando sus funciones en el trabajo (art. 85 literal B – Ley 09 de 1979, art. 3 literal B – Res 2400 de 1979), dándole el uso adecuado y a devolverle a la empresa los elementos desgastados o dañados para su reposición en caso de pérdida. He atendido a las normas y recomendaciones sobre el uso, utilización y mantenimiento de los elementos de protección personal.

CONOZCO Y SE UTILIZAR CADA UNO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL QUE ME HAN SIDO ENTREGADOS.

Quien recibe:

NOMBRE: Laura Clavijo Pavona
C.C 1094283275
CARGO: Tec. Ambiental
FIRMA:

Quien entrega:

NOMBRE: CAMILO GARRIDO
C.C 1122064768
CARGO: HSEQ
FIRMA:

CALLE N ° 8 – 49 BRR SAN LUIS
CORREO: cosuingsas@gmail.com
CELULAR: 3142788531

Scanned with CamScanner

ANEXO 7. FORMATO DE INSPECCION DE EXTINTORES

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

INSPECCIÓN DE EXTINTORES

Inspección realizada por: Camilo A Garrido Profesional HSEQ **Cargo:** Profesional HSEQ

Señale en cada casilla, según corresponda **B**= Buena, **M**=Mala

FECHA DE INSPECCIÓN	No	Área donde está ubicado el equipo	ESTADO DEL EXTINTOR																						AGENTE EXTINTOR	OBERVACIONES
			Fecha Vencimiento recarga		Manómetro		Pasador de seguridad		Boquilla		Manija		Cilindro		Pintura		Señalización		Ubicación		Visibilidad		Acceso al extintor			
			Mes	Año	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	ABC Multipropósito	
30/01/2025	1	Hangar Principal	Febrero	2026	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		Multiproposito	
	2																									
	3																									
	4																									

Firma responsable inspección

CL 25 N 11-70 BRR ALFONSO LOPEZ
CORREO: consorcioriobanadia@gmail.com
CELULAR: 3202395534

ANEXO 8.
FORMATO DE INSPECCION DE BOTIQUIN Y CAMILLA DE EMERGENCIAS

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

INSPECCIÓN DE BOTIQUIN Y CAMILLA DE EMERGENCIA					
RESPONSABLE:			Cumle A. Gamelo		
UBICACIÓN BOTIQUÍN:			Hangar Principal		
UBICACIÓN CAMILLA:			Hangar Principal.		
FECHA:		30/01/2025			
*PARA INTEGRIDAD DEL PAQUETE: BUENA (B) REGULAR (R) MALA (M)					
	TIPO DE ELEMENTO	**CANTIDAD REQUERIDA**	**CANTIDAD ENCONTRADA**	**FECHA DE VENCIMIENTO**	**OBSERVACIONES**
1	Tapabocas.	4	4	N/A	
2	Tijeras trauma cortatodo	1	1	N/A	
3	Monogafas	1	1	N/A	
4	Compresas	4 Unid	4	N/A	
5	Vendaje elástico 5" x 4"	3 Unid	3	Jun/27	
6	Vendajes triangulares	6 Unid	6	N/A	
7	Guantes Desechables (2 talla M y 2 talla L)	4 Unid	4	Feb/27	
8	Esparadrapo de tela	1 Unid	1	Feb/28	
9	Curitas adhesivos	20 und	20	N/A	
10	Apoditos oculares	4 und	4	N/A	
10	Gasa esterilizada	4 Unid	4	Jun/27	
11	Suero fisiológico	4 und	4		
12	Baja lenguas	1 PQ	1	Jun/27	
	CAMILLA				
13	Está bien ubicada		Si		
14	Está protegida y conservada		Si		
15	Tiene señalización		Si		
16	Inmovilizadores de la cabeza		NO		
17	Estado de las correas		Buena.		
Observaciones:					

Firma responsable: _____

CL 25 N 11-70 BRR ALFONSO LOPEZ
CORREO: consorcioriobanadia@gmail.com
CELULAR: 3202395534

ANEXO 9.
PREOPERACIONALES MAQUINARIA

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901 302 273

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

INSPECCION PREOPERACIONAL

RETROESCAVADORA CON URUGA

SEMANA DEL 20 Enero AL 26 Enero MARCA Komatsu PC200-8 MODELO 2008 SERIE C62420

OPERADOR Edwin Gonzales Rincon UBICACIÓN Rio Banadia PROYECTO 481 de 2024

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Cinturòn de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio 20 PQS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* **Indicadores (hidráulicos**-refrigerantes- 'horometro-corriente-aceite motor)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (Exhosto)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	* **Control de fugas hidráulicas**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Kit ambiental	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Tornameza)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Corona de tornameza en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* **Mando de estacionamiento**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* **Cilindros en buen estado**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos Inferiores-Superiores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA	FIRMA OPERADOR	Edwin Rincón													
	FIRMA SUPERVISOR AMBIENTAL														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.582.273

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

INSPECCION PREOPERACIONAL

RETROESCAVADORA CON URUGA

SEMANA DEL 27 Enero AL 02 Febrero MARCA Komatsu PC200-8 MODELO 2008 SERIE C62420

OPERADOR Edwin Gonzales Rincon UBICACIÓN Rio Banadia PROYECTO 481 de 2024

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Cinturón de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio 20 PQS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*** Indicadores (hidráulicos**-refrigerantes- 'horometro-corriente aceite motor)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (Exhosto)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	*** Control de fugas hidráulicas**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Kit ambiental	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Tornameza)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Corona de tornameza en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*** Mando de estacionamiento**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*** Cilindros en buen estado**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos Inferiores-Superiores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA	FIRMA OPERADOR	Edwin Rincón													
	FIRMA SUPERVISOR AMBIENTAL														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.502.273

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

INSPECCION PREOPERACIONAL

RETROESCAVADORA CON URUGA

SEMANA DEL 20 Enero AL 26 Enero MARCA Caterpillar 320D2L MODELO 2014 SERIE CAT0320DJSFM00436

OPERADOR Jesus Guillermo Bernal UBICACIÓN Rio Banadia. PROYECTO 481 de 2024

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Cinturón de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio 20 PQS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*** Indicadores (hidráulicos**-refrigerantes- 'horometro-corriente-aceite motor)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (Exhosto)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	*** Control de fugas hidráulicas**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Kit ambiental	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Tornameza)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Corona de tornameza en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*** Mando de estacionamiento**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*** Cilindros en buen estado**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos Inferiores-Superiores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA	FIRMA OPERADOR														
	FIRMA SUPERVISOR AMBIENTAL														

HALLAZGOS Y/SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901 502 273

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

INSPECCION PREOPERACIONAL

RETROESCAVADORA CON URUGA

SEMANA DEL 27 Enero AL 02 Febrero MARCA Caterpillar 320D2GC MODELO 2014 SERIE CAT0320DSJFM00436

OPERADOR Jesus Guillermo Bernal UBICACIÓN Rio Banadia PROYECTO 481 de 2024

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Cinturón de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio 20 PQS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* **Indicadores (hidráulicos**-refrigerantes- 'horometro-corriente aceite motor)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (Exhosto)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	* **Control de fugas hidráulicas**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Kit ambiental	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Tornameza)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Corona de tornameza en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* **Mando de estacionamiento**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* **Cilindros en buen estado**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos Inferiores-Superiores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA	FIRMA OPERADOR														
	FIRMA SUPERVISOR AMBIENTAL														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.502.273

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

INSPECCION PREOPERACIONAL

VOLQUETA

SEMANA DEL 20 Enero AL 26 Enero MARCA Chevrolet MODELO 2009 SERIE 96DN7HAC69B010163

OPERADOR Jorge Luis Ascanio S. UBICACIÓN Rio Banadia PROYECTO 481 de 2024

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Cinturón de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio 20 PQS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*** Indicadores (hidráulicos**-refrigerantes- 'horometro-corriente aceite motor)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (Exhosto)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	*** Control de fugas hidráulicas**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Kit ambiental	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Tornameza)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Corona de tornameza en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*** Mando de estacionamiento**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*** Cilindros en buen estado**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos Inferiores-Superiores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA	FIRMA OPERADOR	Jorge Luis Ascanio. S.													
	FIRMA SUPERVISOR AMBIENTAL														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.592.273

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

INSPECCION PREOPERACIONAL

VOLQUETA

SEMANA DEL 27 Enero AL 2 Febrero MARCA Chevrolet MODELO 2009 SERIE 9GDV7H4C098010163

OPERADOR Jorge Luis Ascanio S. UBICACIÓN Rio Banadia PROYECTO 481 de 2024

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CABINA	Cinturón de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Extintor de incendio 20 PQS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Asiento en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Vidrio panoramico en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* **Indicadores (hidráulicos**-refrigerantes- 'horometro-corriente aceite motor)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tubo de escape (Exhosto)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Alarma de retroceso-Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Escaleras y apoyos de acceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Bateria y cables	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO MECÁNICO	* **Control de fugas hidráulicas**	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Kit ambiental	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado pasadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Orugas tensionadas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mecanismo de giro (Tornameza)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Corona de tornameza en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mandos de avance	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* **Mando de estacionamiento**	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado general desgarrador (balde)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mandos de levante del brazo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* **Cilindros en buen estado**	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Compartimiento del motor aseado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Manguera de agua y de alta presión	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Zapatas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Rodillos Inferiores-Superiores	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FIRMA	FIRMA OPERADOR	Jorge Luis Ascanio S.													
	FIRMA SUPERVISOR AMBIENTAL														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.502.273

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

INSPECCION PREOPERACIONAL

VOLQUETA

SEMANA DEL 27 Enero AL 2 Febrero MARCA International MODELO 2019 SERIE 3HAMMMMR6KL374894

OPERADOR Jeyson Marcelo Garcia C. UBICACIÓN Rio Banadia PROYECTO 481 de 2024

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Cinturón de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio 20 PQS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* **Indicadores (hidráulicos**-refrigerantes- 'horometro-corriente-aceite motor)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (Exhosto)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	* **Control de fugas hidráulicas**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Kit ambiental	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Tornameza)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Corona de tornameza en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* **Mando de estacionamiento**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* **Cilindros en buen estado**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos Inferiores-Superiores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA	FIRMA OPERADOR														
	FIRMA SUPERVISOR AMBIENTAL														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.502.273

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

INSPECCION PREOPERACIONAL

VOLQUETA

SEMANA DEL 20 Enero AL 26 Enero. MARCA International MODELO 2019 SERIE 3HAMMMMR6KL374894

OPERADOR Jeyson Marcelo Garcia C. UBICACIÓN Rio Banadia PROYECTO 481 de 2024.

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Cinturón de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio 20 PQS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*** Indicadores (hidráulicos**-refrigerantes- 'horometro-corriente aceite motor)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (Exhosto)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	*** Control de fugas hidráulicas**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Kit ambiental	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Tornameza)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Corona de tornameza en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*** Mando de estacionamiento**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*** Cilindros en buen estado**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos Inferiores-Superiores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA	FIRMA OPERADOR														
	FIRMA SUPERVISOR AMBIENTAL														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

ANEXO 10.
AFILIACIONES

COLOMBIA VIDA

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 03/01/2025

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	901902273
Nombre:	CONSORCIO RIO BANADIA		
Dirección:	CL 30 B 49 BR SAN LUIS		
Departamento:	ARAUCA	**Municipio:**	SARAVENA
Correo electrónico:	consorcioriobanadia@gmail.com		
Teléfono:	3142788531	**Tarifa:**	6,96000
Actividad Económica:	5429001 CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO REFINERIAS, FABRICAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS, VÍAS DE NAVEGACIÓN, OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES, PUERT		

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Documento Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC - 1098752791	JHONN FREDY GARCIA BELTRAN

DATOS AFILIADOS RADICADOS

#	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	2025-01-012-113153	04/01/2025	CC 1098752791	JHONN FREDY GARCIA BELTRAN	5	6,96000	Dependiente

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor dirijase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuniquese con nuestra linea gratuita de atencion a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

Código: qeoZDRTLAbp9yCc4DfxSEw==

Certificado impreso el dia 03/01/2025 11:05:44 a. m. por el portal de empresas Edesk

POSITIVA

POSITIVA

EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Diríjase a la Institución Prestadora de Salud (**IPS**) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170** en Bogotá (**601**) **330 7000.**

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA DE TODOS LOS COLOMBIANOS

JHONN FREDY
GARCIA BELTRAN
CC - 1098752791

CONSORCIO RIO BANADIA
901902273

* 01B 00000000 *

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SISSS

nueva

C1892

06 02 2025

Garcia Beltran 1098752791 Jhonn Fredy

Colombiano Colombia Arauca Fortul 12 04 1994

Colpensiones 5000000 3123E51727 Cosetingsas@gmail.com Activo

Saravena San Luis Cll 30 # 8-49 Arauca

6376

nueva eps
Yuret Juan Diaz - C 1892
RECIBIDO PARA ESTUDIO
Cel: 321 4551634
10 - 02 - 2025

Consorcio Fichardo Cll 30 # 8-49 901902273-3 3142788531 Consorciofichardo@gmail.com Dependiente Saravena

Garcia 12 04 94 Beltran 1098752791 31 12 24 Jhonn Fredy

Jhon Fredy Garcia

FERNEY A. PAEZ GARCIA

Thom Freddy Garcia Beltran
1098752791 Bucaramanga

x

x

x

x

x

Thom Freddy Garcia
1098752791
06-02-2021
Cll 30 12-49
3123251727 Saravena
Arauca

YUREL DIAZ C1892

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

CERTIFICA QUE:

JHONN FREDY GARCIA BELTRAN, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.098.752.791**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 3 de Abril del 2025.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 03/01/2025

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	901902273
Nombre:	CONSORCIO RIO BANADIA		
Dirección:	CL 30 8 49 BR SAN LUIS		
Departamento:	ARAUCA	**Municipio:**	SARAVENA
Correo electrónico:	consorcioriobanadia@gmail.com		
Teléfono:	3142788531	**Tarifa:**	6,96000
Actividad Económica:	5429001 CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO REFINERÍAS, FÁBRICAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS, VÍAS DE NAVEGACIÓN, OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES, PUERT		

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Documento Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC - 1098752791	JHONN FREDY GARCIA BELTRAN

DATOS AFILIADOS RADICADOS

#	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	2025-01-012-112026	04/01/2025	CC 1091659018	JAIR LEANDRO VILA SARABIA	5	6,96000	Dependiente

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

Código: ZVB7YNdbcGL/ZIDYJz16nA==

Certificado impreso el día 03/01/2025 10:53:05 a. m. por el portal de empresas Edesk

POSITIVA

POSITIVA

EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Dirijase a la Institución Prestadora de Salud (**IPS**) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá **(601) 330 7000.**

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA DE TODOS LOS COLOMBIANOS

JAIR LEANDRO
VILA SARABIA
CC - 1091659018

CONSORCIO RIO BANADIA
901902273

018 00000000

FORMULARIO UNICO DE AFILIACION Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

nueva

C1892

CE 02 2025

x x x x x x x

Vila x Sarabia Jair Leandro

1091659018

Colombiano Colombia N. Santander Ocaña 23 05 1998

5 Persona x 200000 Cll 10 # 13-47 Residencia

Fortul 3163179657 jairleandrovila@hotmail.com Arauca

3238

nueva EPS
Jurel Juan Diaz - C 1892
RECIBIDO PARA ESTUDIO
Cel: 321 4551634
07/02/2025

Consultorio Jurídico x 901902773-3 Dependiente

Cll 3c # 8-49 3142788531 consultoriojuridico@gmail.com Arauca Saravena

x

Vila x Sarabia. Jair Leandro

1091 659 018

23 05 98 31 12 24

Jair Leandro Vila S FERNEY A PAEZ GARCIA

ENTREGA CARTA DE DERECHOS Y DEBERES
Y CARTA DE DESEMPEÑO

nueva

Autorización de mensajes de texto

Jair Leandro Vila Sarabia x
1091659018 Ocaña

x

x

x

x

x

Jair Leandro Vila S
CC. 1091659018
06-02-2025
Cll 10 # 13-47
3103976417 Tortu
Arauca

Autorizaciones

Aviso de privacidad

YUREL DIAZ C1892

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

CERTIFICA QUE:

JAIR LEANDRO VILA SARABIA, identificado(a) con cédula de ciudadania **1.091.659.018**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 28 de Enero del 2025.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

Línea gratuita de atención al cliente
018000 945457

CERTIFICACIÓN No. 3860005 de 2025-04-05

LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE ARAUCA COMFIAR

CERTIFICA

Que el (la) Señor (a) VILA SARABIA JAIR LEANDRO identificado (a) con cédula de ciudadanla No 1091659018, se encuentra afiliado (a) a nuestra corporación, su estado es A (Activo)

Esta certificación tiene validez de 30 dias, se expide a solicitud del interesado.

Atentamente,

PEDRO ANTONIO PARADA URIETA
Jefe Seccion Subsidio, Aportes y FiscalizaciÃ³n

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 03/01/2025

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	901902273
Nombre:	CONSORCIO RIO BANADIA		
Dirección:	CL 30 8 49 BR SAN LUIS		
Departamento:	ARAUCA	**Municipio:**	SARAVENA
Correo electrónico:	consorcioriobanadia@gmail.com		
Teléfono:	3142788531	**Tarifa:**	6,96000
Actividad Económica:	5429001 CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO REFINERÍAS, FÁBRICAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS, VÍAS DE NAVEGACIÓN, OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES, PUERT		

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Documento Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC - 1098752791	JHONN FREDY GARCIA BELTRAN

DATOS AFILIADOS RADICADOS

#	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	2025-01-012-112501	04/01/2025	CC 80109920	JAIRO ALEXANDER BARRAGAN MENDOZA	5	6.96000	Dependiente

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad economica de sus afiliados por favor dirijase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuniquese con nuestra linea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

Codigo. XnmrbgStNmkoY/MEI2Lznw== Certificado impreso el dia 03/01/2025 11:00:32 a. m. por el portal de empresas Edesk

POSITIVA

POSITIVA

EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Dirijase a la Institución Prestadora de Salud (**IPS**) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá (**601**) **330 7000.**

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA DE TODOS LOS COLOMBIANOS

JAIRO ALEXANDER
BARRAGAN MENDOZA
CC - 80109920

CONSORCIO RIO BANADIA
901902273

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

CERTIFICA QUE:

JAIRO ALEXANDER BARRAGAN MENDOZA, identificado(a) con cédula de ciudadania **80.109.920**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 28 de Enero del 2025.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, asi lograria recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

Comfiar
Sabemos lo que quieres

Linea gratuita de atención al cliente
018000 945457

CERTIFICACIÓN No. 3860015 de 2025-04-05

LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE ARAUCA COMFIAR

CERTIFICA

Que el (la) Señor (a) BARRAGAN MENDOZA JAIRO ALEXANDER identificado (a) con cédula de ciudadanla No 80109920, se encuentra afiliado (a) a nuestra corporación, su estado es A (Activo)

Esta certificación tiene validez de 30 dias, se expide a solicitud del interesado.

Atentamente,

PEDRO ANTONIO PARADA URIETA
Jefe Seccion Subsidio, Aportes y FiscalizaciÃ³n

COLOMBIA PENSIONES Y VIDA

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 03/01/2025

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	901902273
Nombre:	CONSORCIO RIO BANADIA		
Dirección:	CL 30 8 49 BR SAN LUIS		
Departamento:	ARAUCA	**Municipio:**	SARAVENA
Correo electrónico:	consorcioriobanadia@gmail.com		
Teléfono:	3142788531	**Tarifa:**	6,96000
Actividad Económica:	5429001 CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL. INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO REFINERÍAS, FÁBRICAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS, VÍAS DE NAVEGACIÓN, OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES, PUERT		

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Documento Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC - 1098752791	JHONN FREDY GARCIA BELTRAN

DATOS AFILIADOS RADICADOS

#	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	2025-01-012-112858	04/01/2025	CC 88215089	JOAQUIN EDUARDO DELGADO MONTAGUT	5	6,96000	Dependiente

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogota al 3307000.

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

Código: rdiFQSdZfmlSYoaS3gJNTQ==

Certificado impreso el día 03/01/2025 11:02:52 a. m. por el portal de empresas Edesk

POSITIVA

POSITIVA

EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Dirijase a la Institución Prestadora de Salud (**IPS**) asignada en la línea Positiva **01 8000 111170**, en Bogotá (**601**) **330 7000**.

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA DE TODOS LOS COLOMBIANOS

JOAQUIN EDUARDO
DELGADO MONTAGUT
CC - 88215089

CONSORCIO RIO BANADIA
901902273

FORMULARIO UNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SSSS

nueva

* 01B 00000000 *

C1892

06 02 2025

Delgado Montagut Joaquin Eduardo

88215.089

Colombiano Colombia N. Santander Cucuta 20 08 1974

6 Positivo

Colpensiones 2.750000 Cra 18 # 27-21

3132635714 Seincojedm@gmail.com Arauca

Saravena 6376

nueva eps
Jurel Juan Diaz - C 1892
RECIBIDO PARA ESTUDIO
Cel: 321 4551604
07 - 02 - 2025

Consorcio Rio Bordo 901.907.273-3 Dependiente

C/30 # 8-47 3142788531 consorciorioborde@gmail.com Saravena

Delgado Montagut Joaquin Eduardo

20 08 74 88.215.089 31 12 24

Joaquin Eduardo Delgado FERNEY A. PAEZ CAPLIA

ENTREGA CARTA DE DERECHOS Y DEBERES
Y CARTA DE DESEMPEÑO

nueva

Autorización de mensajes de texto

Joaquin Eduardo Delgado M.
88215.089 Cucuta

x

x

x

x

x

x

Joaquin E Delgado
CC 88215089
OE 02-2025
Cra 18 # 27-21
3138357314 Saravena
Arauca

Autorizaciones

Aviso de privacidad

YUREL DIAZ C1892

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Colpensiones

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **JOAQUIN EDUARDO DELGADO MONTAGUT** identificado/a con documento de identidad **Cédula de Ciudadanía** número **88215089,** estuvo afiliado/a al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES** y su estado es *TRASLADADO A OTRO FONDO.*

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 28 de enero de 2025.

Rosa Mercedes Nino Amaya
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 03/01/2025

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	901902273
Nombre:	CONSORCIO RIO BANADIA		
Dirección:	CL 30 8 49 BR SAN LUIS		
Departamento:	ARAUCA	**Municipio:**	SARAVENA
Correo electrónico:	consorcioriobanadia@gmail.com		
Teléfono:	3142788531	**Tarifa:**	6,96000
Actividad Económica:	5429001 CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO REFINERÍAS, FÁBRICAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS, VÍAS DE NAVEGACIÓN, OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES, PUERT		

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Documento Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC - 1098752791	JHONN FREDY GARCIA BELTRAN

DATOS AFILIADOS RADICADOS

#	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	2025-01-012-113019	04/01/2025	CC 1098716716	JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN	5	6,96000	Dependiente

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor dirijase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra linea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

Código: 4LNDy5RnHoZPnF17YTQHWw==

Certificado impreso el dia 03/01/2025 11:04:34 a. m. por el portal de empresas Edesk

POSITIVA

POSITIVA

EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Dirijase a la Institución Prestadora de Salud (**IPS**) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá (**601**) **330 7000.**

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA DE TODOS LOS COLOMBIANOS

JHONNATHAN ALEXIS
GARCIA BELTRAN
CC - 1098716716

CONSORCIO RIO BANADIA
901902273

FORMULARIO UNICO DE AFILIACION Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

nueva eps

01B 00000000

C1892

06 02 2025

Garcia Bethan Jhonathan Alexis

1098716716

Colombiano Colombia Arauca Fortul 23 01 1992

6 Positivo

Cdpensiva 500.000 Cll 8 # 27-28

3125715480 jhoalexgarcia@gmail.com Arauca

Fortul Milton bastos

3238

nueva eps
Juri Juan Diaz - C 1892
RECIBIDO PARA ESTUDIO
Cel: 321 4551694
10 - 02 - 2025

Consorcio Tributarios 901902273-3 Dependiente

Cll 3c #8-49 3147732531 Consorciotributarios@gmail.com Arauca Saravena

Garcia Bethan Jhonathan Alexis

23 01 92 1098716716 3 1 24

Jhonathan Garcia FURNEY A. AREZ. ENFER

ENTREGA CARTA DE DERECHOS Y DEBERES
Y CARTA DE DESEMPEÑO

nueva

Jhonathan Alexis Garcia x
1098716716 Bucaramanga

x

x

x

x

x

Jhonathan Garcia
CC 1098716716
06-02-2025
Cll 2 #27-27
3125715420 Fortul
Arauca

Autorizaciones

Aviso de privacidad

YUREL DIAZ C1892

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **JHONNATHAN ALEXIS GARCIA BELTRAN** identificado/a con documento de identidad **Cédula de Ciudadanía** número **1098716716,** se encuentra afiliado/a desde **27/07/2010** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 28 de enero de 2025.

Rosa Mercedes Nino Amaya
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

Colpensiones
Dirección: Carrera 10 No.72 - 33 Torre B Piso 11, Bogotá D.C., Colombia Conmutador: (+57) 601 489 0909; Línea Gratuita: 01 8000 410909 www.colpensiones.gov.co

Comfiar
Sabemos lo que quieres

Línea gratuita de atención al cliente
018000 945457

CERTIFICACIÓN No. 3860012 de 2025-04-05

LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE ARAUCA COMFIAR

CERTIFICA

Que el (la) Señor (a) GARCIA BELTRAN JHONNATHAN ALEXIS identificado (a) con cédula de ciudadanla No 1098716716, se encuentra afiliado (a) a nuestra corporación, su estado es A (Activo)

Esta certificación tiene validez de 30 dias, se expide a solicitud del interesado.

Atentamente,

PEDRO ANTONIO PARADA URIETA
Jefe Seccion Subsidio, Aportes y FiscalizaciÃ³n

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 03/01/2025

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	901902273
Nombre:	CONSORCIO RIO BANADIA		
Dirección:	CL 30 8 49 BR SAN LUIS		
Departamento:	ARAUCA	**Municipio:**	SARAVENA
Correo electrónico:	consorcioriobanadia@gmail.com		
Teléfono:	3142788531	**Tarifa:**	6,96000
Actividad Económica:	5429001 CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL. INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO REFINERÍAS, FABRICAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS, VÍAS DE NAVEGACIÓN, OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES, PUERT		

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Documento Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC - 1098752791	JHONN FREDY GARCIA BELTRAN

DATOS AFILIADOS RADICADOS

#	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	2025-01-012-113633	04/01/2025	CC 1020810816	MARLYN YVETTE BOTIA CHONA	5	6,96000	Dependiente

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor dirijase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra linea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

Código: q6hSMJmA8PG0neJnmNQIwQ== Certificado impreso el día 03/01/2025 11:10:32 a. m. por el portal de empresas Edesk

POSITIVA

POSITIVA

EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Diríjase a la Institución Prestadora de Salud (**IPS**) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá (**601**) **330 7000.**

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA DE TODOS LOS COLOMBIANOS

MARLYN YVETTE
BOTIA CHONA
CC - 1020810816

CONSORCIO RIO BANADIA
901902273

* 01B 00000000 *

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

nueva

C1892

06 02 2025

Botia Chona Martyn Yvette

1020.210.816

Colombiana Colombia Arauca Saraveno 30 11 1995

6 Positivo

Porvenir 3000000 Cra 27 #11 19

3114407405 marbo120@hotmail.com Arauca

Saraveno

6376

nueva eps

Yuret Juan Diaz - C 1892

RECIBIDO PARA ESTUDIO

Cel: 321 4551694

10 - 02 - 2025

Consorcio Barorta 901.902.773-3 Dependiente

Cll 30 #2-49 3142788531 Consorciobarorta@gmail.com Arauca Saravena.

Botia Chona Martyn yvette

30 11 95 1020210816 31 12 24

Martyn Yvette Botia C PERNEY N. PAEZ GARCIA.

ENTREGA CARTA DE DERECHOS Y DEBERES
Y CARTA DE DESEMPEÑO

nueva EPS

Autorizacion de manejo de tesis

Marlyn Yuette Bolia Ghana X
1020810816 Bogota

x

x

x

x

x

Marlyn Yuette Bolia
CC 1020810816
CE-02-2025
Cra 27 C 11 19
3114407465 Soacha Cund
Arauca

Autorizaciones

Aviso de privacidad

YUREL DIAZ C1892

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

CERTIFICA QUE:

MARLYN YVETTE BOTIA CHONA, identificado(a) con cédula de ciudadania **1.020.810.816**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 28 de Enero del 2025.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión. asi lograria recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

Comfiar
Sabemos lo que quieres

Linea gratuita de atención al cliente
018000 945457

CERTIFICACIÓN No. 3860000 de 2025-04-05

LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE ARAUCA COMFIAR

CERTIFICA

Que el (la) Señor (a) BOTIA CHONA MARLYN YVETTE identificado (a) con cédula de ciudadanla No 1020810816, se encuentra afiliado (a) a nuestra corporación, su estado es A (Activo)

Esta certificación tiene validez de 30 dias, se expide a solicitud del interesado.

Atentamente,

PEDRO ANTONIO PARADA URIETA
Jefe Seccion Subsidio, Aportes y FiscalizaciÃ³n

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 03/01/2025

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	901902273
Nombre:	CONSORCIO RIO BANADIA		
Dirección:	CL 30 8 49 BR SAN LUIS		
Departamento:	ARAUCA	**Municipio:**	SARAVENA
Correo electrónico:	consorcioriobanadia@gmail.com		
Teléfono:	3142788531	**Tarifa:**	6,96000
Actividad Económica:	5429001 CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE LA CONSTRUCCION, CONSERVACION Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO REFINERÍAS, FÁBRICAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS, VÍAS DE NAVEGACIÓN, OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES, PUERT		

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Documento Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC - 1098752791	JHONN FREDY GARCIA BELTRAN

DATOS AFILIADOS RADICADOS

#	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	2025-01-012-113401	04/01/2025	CC 1094283275	LAURA CRISTINA OLAYA BAYONA	5	6,96000	Dependiente

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor dirijase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuniquese con nuestra linea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

Código: 7qRs8olD8PRNOwOXZdrHmw== Certificado impreso el dia 03/01/2025 11:08:22 a. m. por el portal de empresas Edesk

POSITIVA

POSITIVA

EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Dirijase a la Institución Prestadora de Salud (**IPS**) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá (**601**) **330 7000.**

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA DE TODOS LOS COLOMBIANOS

LAURA CRISTINA
OLAYA BAYONA
CC - 1094283275

CONSORCIO RIO BANADIA
901902273

* 018 00000000 *

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

nueva eps

C1892

06 02 2025

x x x x x x

Olaya Bayona Laura Cristina

Colombia Arauca 1094283275 Saravena 29 01 1999

Colombiana Colombia Arauca Saravena

Preventiva 500.000 Activo Positivo

Preventiva 3224672395 Laura.Cristina.olaya@campusucc.edu.co Arauca

Saravena 6 de Octubre

nueva eps
Yuret Juan Díaz - E 1892
RECIBIDO PARA ESTUDIO
Cel: 321 4551694

Consorcio Labanda 901902 273-3 Dependiente

Cll 342-49 3142788531 Consorciolabanda@gmail.com Arauca Saravena

Olaya Bayona Laura Cristina

29 01 99 1094.283.275 31 12 24

Laura Cristina Olaya Bayona. FERNEY A. PAEZ GARCIA.

nueva eps

Autorizacion de manejo de datos

Jaira Cristina Olaya Bayona
1094 283 275 pamplona

x

x

x

x

x

1094283275
06-02-2025
Cra 17 # 25-10
3224672395 Sincelejo
Prueba

Autorizaciones

Aviso de privacidad

porvenir
solo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

CERTIFICA QUE:

LAURA CRISTINA OLAYA BAYONA, identificado(a) con cédula de ciudadania **1.094.283.275**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 28 de Enero del 2025.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

Comfiar
Sabemos lo que quieres

Línea gratuita de atención al cliente
018000 945457

CERTIFICACIÓN No. 3860008 de 2025-04-05

LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE ARAUCA COMFIAR

CERTIFICA

Que el (la) Señor (a) OLAYA BAYONA LAURA CRISTINA identificado (a) con cédula de ciudadanla No 1094283275, se encuentra afiliado (a) a nuestra corporación, su estado es A (Activo)

Esta certificación tiene validez de 30 dias, se expide a solicitud del interesado.

Atentamente,

PEDRO ANTONIO PARADA URIETA
Jefe Seccion Subsidio, Aportes y FiscalizaciÃ³n

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 04/02/2025

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	901902273
Nombre:	CONSORCIO RIO BANADIA		
Dirección:	CL 30 8 49 BR SAN LUIS		
Departamento:	ARAUCA	**Municipio:**	SARAVENA
Correo electrónico:	consorcioriobanadia@gmail.com		
Teléfono:	3142788531	**Tarifa:**	6,96000
Actividad Económica:	5429001 CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO REFINERIAS, FABRICAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS, VÍAS DE NAVEGACIÓN, OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES, PUERT		

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Documento Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC - 1098752791	JHONN FREDY GARCIA BELTRAN

DATOS AFILIADOS RADICADOS

#	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	2025-01-012-114056	05/02/2025	CC 1094269468	CAMILO ANDRES GARRIDO RIVERO	5	6,96000	Dependiente

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

Código: betEDYKrpcSp8MAt1UrbXw==

Certificado impreso el dia 04/02/2025 11:16:09 a. m. por el portal de empresas Edesk

POSITIVA

POSITIVA

EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Dirijase a la Institución Prestadora de Salud (**IPS**) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá (**601**) **330 7000.**

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA DE TODOS LOS COLOMBIANOS

CAMILO ANDRES
GARRIDO RIVERO
CC - 1094269468

CONSORCIO RIO BANADIA
901902273

01B 00000000

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

nueva

C1892

06 02 2025

Garrido Pinero 1094269468 Camilo Andres

Colombiano Colombia Cesar Valledupar 05 09 1992

6 Positiva

Porvenir 3000000 Avenida 4 # 1E

3202228716 camilogarridopinero@gmail.com Norte Santander

Cuota pescadero 12555

nueva eps

Jurel Juan Diaz - C 1892

RECIBIDO PARA ESTUDIO

Cel: 321 4551694

10 - 02 - 2025

Consorcio rio barroso 901.902.273-3 Defendiente.

C11 30 #8-49 3142788531 Consorciorioberoso@gmail.com Acacias Sucursal

Garrido Pinero 1094269468 Camilo Andres

05 09 92 31 1 2 4

Camilo A. Garrido. Pinero FERNEY A. PAEZ. GARCIA.

ENTREGA CARTA DE DERECHOS Y DEBERES
Y CARTA DE DESEMPEÑO

nueva

Camilo Andres Estrada Rivero
1094269468 Pamplona

x

x

x

x

x

Camilo Andres Estrada
CC 1094269468
06-02-2025
Cll 30 # 8-49
3142782531 Saravena
Arauca

Autorizaciones

Aviso de privacidad

YUREL DIAZ C1892

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

CERTIFICA QUE:

CAMILO ANDRES GARRIDO RIVERO, identificado(a) con cédula de ciudadania **1.094.269.468**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 28 de Enero del 2025.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

Línea gratuita de atención al cliente
018000 945457

CERTIFICACIÓN No. 3860007 de 2025-04-05

LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE ARAUCA COMFIAR

CERTIFICA

Que el (la) Señor (a) GARRIDO RIVERO CAMILO ANDRES identificado (a) con cédula de ciudadanla No 1094269468, se encuentra afiliado (a) a nuestra corporación, su estado es A (Activo)

Esta certificación tiene validez de 30 dias, se expide a solicitud del interesado.

Atentamente,

PEDRO ANTONIO PARADA URIETA
Jefe Seccion Subsidio, Aportes y FiscalizaciÃ³n

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 03/01/2025

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	901902273
Nombre:	CONSORCIO RIO BANADIA		
Dirección:	CL 30 8 49 BR SAN LUIS		
Departamento:	ARAUCA	**Municipio:**	SARAVENA
Correo electrónico:	consorcioriobanadia@gmail.com		
Teléfono:	3142788531	**Tarifa:**	6,96000
Actividad Económica:	5429001 CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO REFINERÍAS, FÁBRICAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS, VÍAS DE NAVEGACIÓN, OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES, PUERT		

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Documento Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC - 1098752791	JHONN FREDY GARCIA BELTRAN

DATOS AFILIADOS RADICADOS

#	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	2025-01-012-111193	04/01/2025	CC 1098684323	FERNEY ALFONSO PAEZ GARCIA	5	6,96000	Dependiente

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor dirijase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuniquese con nuestra linea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

Código: hsPJAux5dsajy7DJlwva2w==

Certificado impreso el día 03/01/2025 10:43:45 a. m. por el portal de empresas Edesk

POSITIVA

POSITIVA

EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Diríjase a la Institución Prestadora de Salud (**IPS**) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá (**601**) **330 7000.**

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA DE TODOS LOS COLOMBIANOS

FERNEY ALFONSO
PAEZ GARCIA
CC - 1098684323

CONSORCIO RIO BANADIA
901902273

* 01B 00000000 *

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

nueva eps

C1892

06 02 2025

Paez Garcia Ferney Alfonso

1098624323

Colombiano Colombia Santander Bucaramanga 02 03 1990

6 Positiva

Contributivo 3000.000 Cll 24 #17-45

3144063775 ferneypaezgarcia@hotmail.com Arauca

Saravena Galan 6376

nueva eps
Aurel Juan Diaz - C 1892
RECIBIDO PARA ESTUDIO
Cel: 321 4551604
07 - 02 - 2025

Consorciobarrios 901902273-3 dependiente

C#30 # 2-49 3142788531 consorciobarrios@gmail.com Arauca Saravena

Paez Garcia Ferney Alfonso

02 03 90 1098 684323

3112 24

FERNEY A. PAEZ GARCIA FERNEY A. PAEZ GARCIA

ENTREGA CARTA DE DERECHOS Y DEBERES
Y CARTA DE DESEMPEÑO

nueva eps

Autorizaciones de tratamiento de datos

Ferney Alfonso Rios Garcia
1098.624 323 Bucaramanga

x

x

x

x

x

Ferney A. Rios
CC 1098624323
06-02-2025
Cll 24# 11-45
3144063775 Sarabena.
Arauca

Autorizaciones

Aviso de privacidad

YUREL DIAZ C1892

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **FERNEY ALFONSO PAEZ GARCIA** identificado/a con documento de identidad **Cédula de Ciudadanía** número **1098684323,** se encuentra afiliado/a desde **24/06/2015** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 28 de enero de 2025.

Rosa Mercedes Nino Amaya
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

Comfiar
Sabemos lo que quieres

Línea gratuita de atención al cliente
018000 945457

CERTIFICACIÓN No. 3860011 de 2025-04-05

LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE ARAUCA COMFIAR

CERTIFICA

Que el (la) Señor (a) PAEZ GARCIA FERNEY ALFONSO identificado (a) con cédula de ciudadanla No 1098684323, se encuentra afiliado (a) a nuestra corporación, su estado es A (Activo)

Esta certificación tiene validez de 30 dias, se expide a solicitud del interesado.

Atentamente,

PEDRO ANTONIO PARADA URIETA
Jefe Seccion Subsidio, Aportes y FiscalizaciÃ³n

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 03/01/2025

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	901902273
Nombre:	CONSORCIO RIO BANADIA		
Dirección:	CL 30 8 49 BR SAN LUIS		
Departamento:	ARAUCA	**Municipio:**	SARAVENA
Correo electrónico:	consorcioriobanadia@gmail.com		
Teléfono:	3142788531	**Tarifa:**	0,52200
Actividad Económica:	1711001 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA, INCLUYE ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE ARQUITECTURA: DISEÑO DE EDIFICIOS Y DIBUJO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, PLANIFICACIÓN URBANA Y ARQUITECTURA PAISAJISTA, DISEÑ		

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Documento Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC - 1098752791	JHONN FREDY GARCIA BELTRAN

DATOS AFILIADOS RADICADOS

#	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	2025-01-012-110304	04/01/2025	CC 1116496517	HORLEYDA GUTIERREZ VACCA	1	0,52200	Dependiente

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor dirijase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuniquese con nuestra linea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañia de Seguros S.A.

Código: 32Nq/6NwimxwK8ZvXgFU+w== Certificado impreso el día 03/01/2025 10:30:00 a. m. por el portal de empresas Edesk

POSITIVA

POSITIVA

EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Diríjase a la Institución Prestadora de Salud (**IPS**) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá (**601**) **330 7000.**

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA DE TODOS LOS COLOMBIANOS

HORLEYDA
GUTIERREZ VACCA
CC - 1116496517

CONSORCIO RIO BANADIA
901902273

01B 00000000

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

nueva eps

C1892

06 02 2025

Gutierrez Vacca Horleyda

1116.496.517

Colombiana Colombia Arauca Arauquita 01 11 1989

6 Positiva

Colpensiones 1500000 Calle 4 # 2-53

3134032173 horleydagutierrezvacca@gmail.com Arauca

Arauquita 4754

nueva eps
Yurel Juan Diaz - C1892
RECIBIDO PARA ESTUDIO
Cel: 321 4551694
07 - 02 - 2025

Consorcio Rio Bracho 901.902.273-3 Dependiente

Cll 30 # 8-49 314-2782831 consorcioriobracho@gmail.com Arauca Saravena.

Gutierrez Vacca Horleyda

01 11 89 1116.496.517 31 12 24

HORLEYDA GUTIERREZ FERNEY A. PAEZ GARCIA

ENTREGA CARTA DE DERECHOS Y DEBERES
Y CARTA DE DESEMPEÑO

nueva

Autorización de mensajes de texto

Hayleyda Gutierrez Vacca
1116496517 Arauquita

x

x

x

x

x

Hayleyda Gutierrez
CC 1116496517
CE 02-2025
Cll 4 #12-53
3134032173 Arauquita
Arauca

Autorizaciones

Aviso de privacidad

YUREL DIAZ C1892

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Colpensiones

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **HORLEYDA GUTIERREZ VACCA** identificado/a con documento de identidad **Cédula de Ciudadanía** número **1116496517,** se encuentra afiliado/a desde **01/07/2022** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 28 de enero de 2025.

Rosa Mercedes Nino Amaya
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 03/01/2025

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	901902273
Nombre:	CONSORCIO RIO BANADIA		
Dirección:	CL 30 8 49 BR SAN LUIS		
Departamento:	ARAUCA	**Municipio:**	SARAVENA
Correo electrónico:	consorcioriobanadia@gmail.com		
Teléfono:	3142788531	**Tarifa:**	0,52200
Actividad Económica:	1711001 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA, INCLUYE ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE ARQUITECTURA: DISEÑO DE EDIFICIOS Y DIBUJO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN; PLANIFICACIÓN URBANA Y ARQUITECTURA PAISAJISTA; DISEÑ		

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Documento Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC - 1098752791	JHONN FREDY GARCIA BELTRAN

DATOS AFILIADOS RADICADOS

#	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	2025-01-012-111532	04/01/2025	CC 1098658689	JESSICA LILIBETH OCHOA	1	0,52200	Dependiente

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

Codigo: fogAGa2UjBuhJWaX37dENg==

Certificado impreso el día 03/01/2025 10:46:18 a. m. por el portal de empresas Edesk

POSITIVA

POSITIVA

EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Dirijase a la Institución Prestadora de Salud (**IPS**) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá (**601**) **330 7000.**

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA DE TODOS LOS COLOMBIANOS

JESSICA LILIBETH
OCHOA
CC - 1098658689

CONSORCIO RIO BANADIA
901902273

* 01B 00000000 *

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

nueva

C1892

06 01 25

OCHOA | JESSICA | ELIBETH

1098656689

Colombiana | Colombia | Arauca | Saravena | 02 08 1986

6 | Positivo

Porvenir | 2000.000

3219323042 jeskai722@hotmail.com | CRA 26 # 10-67 Arauca

Saravena

6376

nueva eps
Yuri Juan Díaz - C 1892
RECIBIDO PARA ESTUDIO
Cel: 321 4551624
07 - 02 - 2025

Comercio Pro Derecho | 901902.273-3 | Dependiente

CL30# 8-49 | 3142782531 Comerciolabarcha@gmail.com | Arauca | Saravena

OCHOA | JESSICA | ELIBETH

02 08 86 | 1098656689 | 31 12 24

JESSICA OCHOA

FERNEY A PAEZ GARCIA

ENTREGA CARTA DE DERECHOS Y DEBERES
Y CARTA DE DESEMPEÑO

nueva

Autorización de tratamiento de datos

Jessica Lisbeth Ochoa
1098532629 B/90

x
x
x
x
x

Jessica L. Ochoa
CC 1098532629
DE-02-1988
Cra 26 # 10-67
3217523042 Soacha

Autorizaciones

Aviso de privacidad

YUREL DIAZ C1892

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

CERTIFICA QUE:

JESSICA LILIBETH OCHOA, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.098.658.689**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 28 de Enero del 2025.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

Comfiar
Sabemos lo que quieres

Línea gratuita de atención al cliente
018000 945457

CERTIFICACIÓN No. 3860010 de 2025-04-05

LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE ARAUCA COMFIAR

CERTIFICA

Que el (la) Señor (a) OCHOA JESSICA LILIBETH identificado (a) con cédula de ciudadanla No 1098658689, se encuentra afiliado (a) a nuestra corporación, su estado es A (Activo)

Esta certificación tiene validez de 30 dias, se expide a solicitud del interesado.

Atentamente,

PEDRO ANTONIO PARADA URIETA
Jefe Seccion Subsidio, Aportes y FiscalizaciÃ³n

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 19/01/2025

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	901902273
Nombre:	CONSORCIO RIO BANADIA		
Dirección:	CL 30 8 49 BR SAN LUIS		
Departamento:	ARAUCA	**Municipio:**	SARAVENA
Correo electrónico:	consorcioriobanadia@gmail.com		
Teléfono:	3142788531	**Tarifa:**	6,96000
Actividad Económica:	5429001 CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO REFINERÍAS, FABRICAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS, VÍAS DE NAVEGACIÓN, OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES, PUERT		

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Documento Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC - 1098752791	JHONN FREDY GARCIA BELTRAN

DATOS AFILIADOS RADICADOS

#	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	2025-01-012-625114	20/01/2025	CC 1115722498	NELSON ARLEY CASTANEDA MENDOZA	5	6,96000	Dependiente

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

Código: 9jlevc9zhbZdWp7vf2/E9Q==

Certificado impreso el dia 19/01/2025 8:56:13 a. m. por el portal de empresas Edesk

01B 00000000

FORMULARIO UNICO DE AFILIACION Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

nueva

C1892

19 02 2025

CASTANEDA MENDOZA NELSON ARLEY

1.115.722.498

Colombiano Colombia Arauca Saravena 07 11 2004

6 POSITIVA

PORVENIR 1423500 Vereda Bajo banadia KM 15.6

3102178328 nelsoncastaneda@gmail.com ARAUCA

SARAVENA 6376

nueva eps
Yurel Juan Diaz - C 1892
RECIBIDO PARA ESTUDIO
Cel: 321 4551694

21 - 02 - 2025

Consorcio rio banadia 901902273-3 DEPENDIENTE

cll 30 # 8-49 3142788531 consorcioriobanadia@gmail.com ARAUCA SARAVENA

castaneda Mendoza Nelson Arley

1.115.722.498

07 11 2004 20 01 2025

Nelsón Castañeda M

FERNEY ALFONSO PAEZ G

ENTREGA CARTA DE DERECHOS Y DEBERES
Y CARTA DE DESEMPEÑO

nueva

Autorización de tratamiento de datos

NELSON ARLEY CASTAÑEDA MENDOZA
1115.722.498 Saravena

x

x

x

x

x

Nelson Castañeda M
CC 1115.722.498
19-02-2025
Puerto Nariño KM15.6
3102178328 Saravena
Arauca

Autorizaciones

Aviso de privacidad

YUREL DIAZ C1892

Comfiar
Sabemos lo que quieres

Línea gratuita de atención al cliente
018000 945457

CERTIFICACIÓN No. 3860013 de 2025-04-05

LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE ARAUCA COMFIAR

CERTIFICA

Que el (la) Señor (a) CASTANEDA MENDOZA NELSON ARLEY identificado (a) con cédula de ciudadanla No 1115722498, se encuentra afiliado (a) a nuestra corporación, su estado es A (Activo)

Esta certificación tiene validez de 30 dias, se expide a solicitud del interesado.

Atentamente,

PEDRO ANTONIO PARADA URIETA
Jefe Seccion Subsidio, Aportes y FiscalizaciÃ³n

porvenir

Sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

CERTIFICA QUE:

NELSON ARLEY CASTAÑEDA MENDOZA, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.115.722.498**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 5 de Abril del 2025.

Cordialmente,


Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados antes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico



Firma:

Nombre: GARAVITO MELON ZORAIDA

R. M.: 1116867172 **L.S.O.:** 810077

Código de Seguridad

H1526N1T849

Aspirante o Trabajador

No Contesto

Firma:

Nombre: CASTAÑEDA MENDOZA NELSON ARLEY

CC: 1115722489

Hacienda

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidenció que, **JUAN VICENTE QUINTERO VILLAMIZAR** identificado con **CC** No. **9466736**, registra la siguiente información.

Datos del Empleador	Datos de la Relación Laboral
CONSORCIO RIO BANADIA - NI. 901902273	**Fecha de inicio de cobertura :** 20/01/2025 **Estado Afiliación:** ACTIVO **Tipo Vinculación:** TRABAJADOR DEPENDIENTE **Clase de Riesgo:** 5

Para validar la información emitida en este certificado, visite nuestra página web y seleccione la opción 'VALIDAR CERTIFICADOS'. Ingrese el siguiente código (válido por un mes): 202501013612259.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los 20 días del mes de enero de 2025.

Cordialmente,

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

COOSALUD

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

Para la atención de servicios de salud POS, el suscrito afiliado se encuentra registrado en la EPS con los siguientes datos.

Información del Cotizante y/o Cabeza de Familia										
Tipo Ident.	Número de Ident.	Nombres	Apellidos	Fecha de Afiliación	Departamento	Ciudad	Dirección	Teléfono	Regimen	Estado
CC	9466736	JUAN VICENTE	QUINTERO VILLAMIZAR	10/08/2021 12:00:00 a. m.	ARAUCA	SARAVENA	V BAJO BANADIAS	3124549148	Contributivo	Activo

Informacion del Aportante				
NIT/CC	Razon Social	Estado	Rango Cotizante	Fecha Vinculacion
901902273	CONSORCIO RIO BANADIA	A	A	20/01/2025

La anterior certificación se expide y firma, a los 22 días del mes de Marzo de 2025, a solicitud del interesado y es válida hasta los 22 días del mes de Abril de 2025

Cordialmente,

CARLOS TORRES SALAZAR
SUBDIRECTOR DE ASEGURAMIENTO NACIONAL

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

CERTIFICA QUE:

JUAN VICENTE QUINTERO VILLAMIZAR, identificado(a) con cédula de ciudadanía **9.466.736**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 18 de Febrero del 2025.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es fundamental que revise periódicamente su Historia Laboral, el capital ahorrado y las semanas que tiene registradas, si presenta inconsistencias, ingrese a www.porvenir.com.co *y actualice su Historia Laboral.*

Línea gratuita de atención al cliente
018000 945457

CERTIFICACIÓN No. 3860016 de 2025-04-05

LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE ARAUCA COMFIAR

CERTIFICA

Que el (la) Señor (a) QUINTERO VILLAMIZAR JUAN VICENTE identificado (a) con cédula de ciudadanla No 9466736, se encuentra afiliado (a) a nuestra corporación, su estado es A (Activo)

Esta certificación tiene validez de 30 dias, se expide a solicitud del interesado.

Atentamente,

PEDRO ANTONIO PARADA URIETA
Jefe Seccion Subsidio, Aportes y FiscalizaciÃ³n

R. M.: 1098764381	L.S.O.: 0038	Código de Seguridad	CC: 9466736
		I1526Q1U824	

ANEXO 11.
LISTADO DE ASISTENCIA CHARLA DE SEGURIDAD

CONSORCIO RIO BANADIA
NIT 901.902.273

CONTRATO DE OBRA 481 DE 2024: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".

LISTA DE ASISTENCIA

TEMA TRATADO:	Identificación de Peligros y Riesgos		
LUGAR:	Almacen de Obra	**FECHA**	23/01/2025
RESPONSABLE:	**PROFESIONAL HSEQ**		

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CELULAR	FIRMA
1	Jhon Fredy Garcia B.	Ing. Residente II	3142788531	
2	Laura C. Olaya B	Ing Ambiental	3224678395	
3	Nelson Castañeda	ayudante	3102178328	Nelson C.
4	Jhonnathan Garcia B.	Ing. Residente I	3125715480	
5	Ferney Paez	inspector obra	3144063775	Ferney Paez
6	Juan V. Quintero Y.	oficial	3055384428	Juan Quintero.
7	Jair leandro Vila S.	Director Obra	3103179657	
8	Marlyn Yuette Botia C.	Profesional Social	3114407405	Marlyn Botia.
9				
10				

CAMILO ANDRES GARRIDO RIVERO
PROFESIONAL HSEQ
FIRMA CONTRATISTA



INFORME AMBIENTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 473 DE 2024

CONTRATISTA: CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓ
R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON.

OBJETO: "INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".

SARAVENA ARAUCA
ENERO DEL 2025

CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN 3

2. OBJETIVO 3

3 GENERALIDADES DEL PROYECTO 4

3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 4

3.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 5

3.3 GENERALIDADES DE LOS CONTRATOS. 6

4. ACTIVIDADES DE OBRAS EJECUTADAS 8

5 PROGRAMAS AMBIENTALES 12

5.1 PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL 13

5.2 CAPACITACIÓN EN GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL 15

5.3 CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS LEGALES 16

5.4 MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 17

5.5 MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 18

5.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 18

PERSONAL ADMINISTRATIVO 19

5.7 CONTROL DE RUIDO Y AIRE 20

5.8 MANEJO DE CONCRETOS 23

5.9 SEÑALIZACION DE FRENTTES DE OBRA Y SITIOS TEMPORALES 23

5.10 PROGRAMA DE GESTION HIDRICA 24

5.11 COMPENSACION AMBIENTAL 25

6. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 26

1 INTRODUCCIÓN

El presente informe Ambiental compila la verificación por parte de la interventoria a la gestión ambiental realizada por el contratista durante el periodo comprendido en tre el 31 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025 al contrato de obra cuyo objeto es "**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".**

El objetivo general del presente informe comprendido desde el 31 diciembre de 2024 hasta el día 31 de enero de 2025, es realizar la verificación al cumplimiento de los programas y proyectos ambientales establecidos en el documento ambiental denominado PAGA, el cual tiene por objetivo prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales negativos que puedan resultar de las actividades de construcción sobre los componentes físico- biótico y socioculturales en el área vereda Bajo Banadia municipio de Saravena Arauca.

La construcción de las obras está a cargo del **CONSORCIO RIO BANADIA** representada legalmente por el señor; **JHONN FREDY GARCIA BELTRAN**, mediante contrato de obra 481 de 2024 suscrito con el Departamento de Arauca y las labores de supervisión, vigilancia y control a cargo de la firma Interventora **CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN** representado legalmente por **JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON.**

2. Objetivo

Establecer y ejecutar las actividades necesarias para el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de la gestión ambiental del proyecto, con base en la identificación de aspectos ambientales de proyectos licenciados (sujeto a licencia ambiental) y No licenciados (sujeto a lineamientos establecidos por la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial expedido por el INVIAS, año 2011), así como en la identificación y verificación del cumplimiento de requisitos legales, y demás actividades contempladas en los planes y programas de manejo ambiental del contrato de obra No. 481 de 2024.

3 GENERALIDADES DEL PROYECTO

3.1 Descripción general

La solución propuesta consiste en la implementación de un sistema de contención hidráulica tipo *jarillón* (dique de tierra estabilizada), con una longitud total de **1.108 metros lineales (ml)**. De esta longitud, **850 ml** integrarán un núcleo granular compuesto por **capas de arena de trituración (material granular de tamaño controlado)**, confinadas mediante un **geotextil tejido de alta resistencia mecánica y baja permeabilidad (ASTM D5261)**. Adicionalmente, se aplicará un sistema de revestimiento anticrosivo de **flexocreto** sobre el talud y la corona del jarillón. Este sistema consiste en:

- Una **formaleta flexible de tela sintética de doble capa (polietileno de alta densidad o HDPE)**, diseñada para contener una mezcla fluida de **concreto lanzado (shotcrete) o mortero proyectado (relación agua/cemento ≤ 0.45)**.
- El flexocreto garantizará la **protección superficial contra erosión hidráulica y estabilidad geomorfológica** en condiciones de flujo crítico.

Parámetros geométricos del jarillón:

- **Corona**: 1.0 m de ancho, con pendiente transversal ≥ 2% para escurrimiento superficial.
- **Base**: 12.0 m de ancho, con taludes laterales diseñados bajo criterios de **estabilidad de pendientes (Factor de Seguridad ≥ 1.5 según método de Bishop simplificado)**.
- **Altura libre (freeboard)**: Definida según el nivel de aguas máximas extraordinarias (NAME) + resguardo por oleaje.

En el sector terminal de la estructura de cara a la corriente, se dispondrán **elementos de protección complementaria contra socavación**:


- **Bolsacretos (geocontenedores de geotextil rellenos de concreto ciclópeo)**, de dimensiones 1.20 m (alto) × 2.40 m (largo), anclados al lecho mediante estacas de acero. Su función es disipar la energía cinética del flujo y mitigar fenómenos de socavación localizada (criterio de diseño: profundidad de socavación estimada mediante ecuación de Colorado State University).


Consideraciones técnicas adicionales:

- El sistema de geotextil tejido cumplirá con propiedades de **resistencia a la tracción (≥ 50 kN/m según ASTM D4595)** y **apertura de poro (AOS ≤ 0.15 mm)** para evitar migración de finos.
- El flexocreto incorporará aditivos **superplastificantes y fibras de refuerzo (polipropileno)** para garantizar durabilidad frente a ciclos húmedo-seco.

- Se implementarán **zanjas de coronación y drenes subyacentes (grava lavada + tubería perforada)** para control de infiltraciones.

Este diseño cumple con los estándares de la **Norma ISO 13793** para estructuras de protección fluvial y se sustenta en un análisis hidrodinámico 2D (software HEC-RAS) para verificar la capacidad de descarga y estabilidad hidráulica.

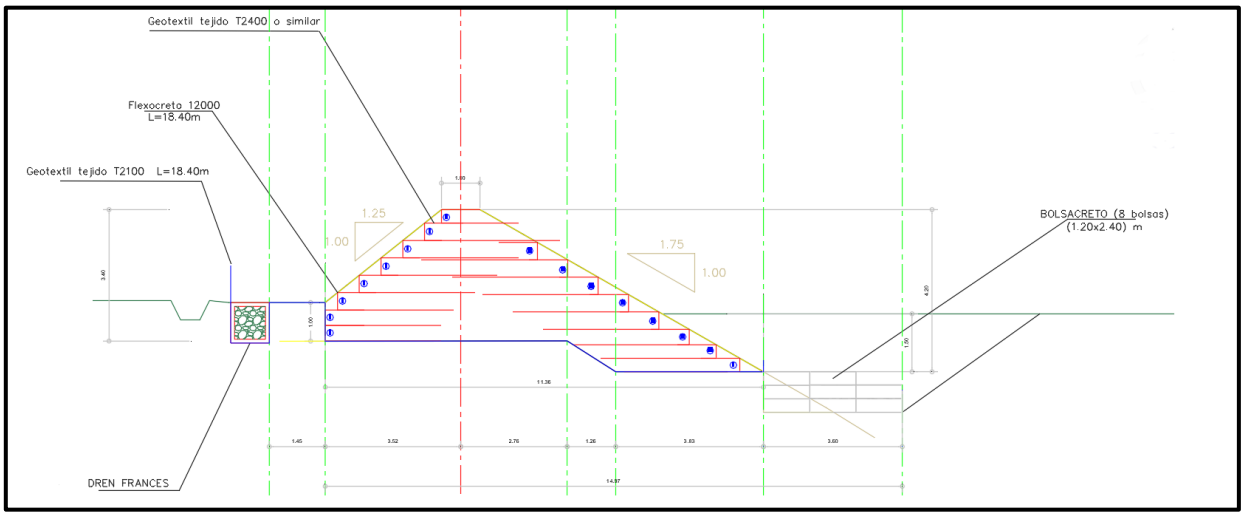

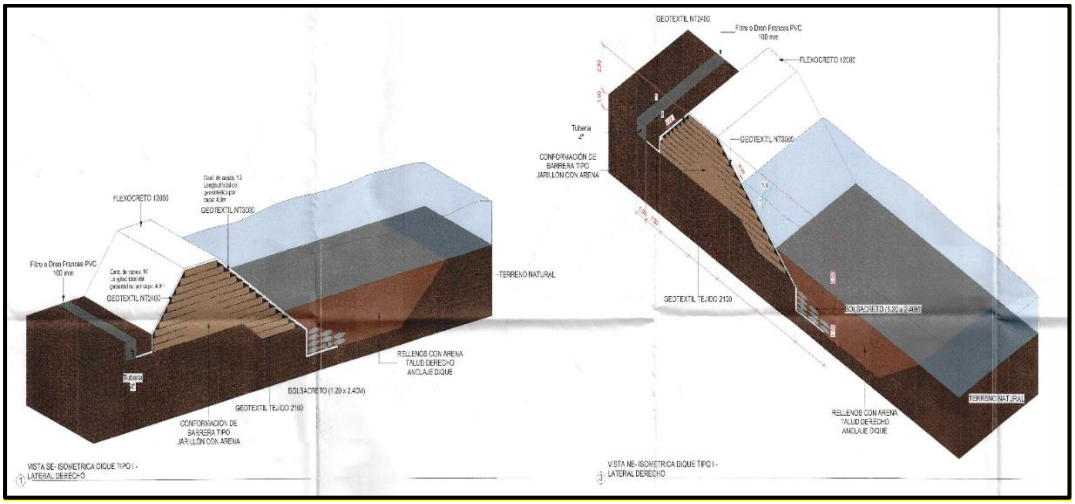

3.2 Localización del proyecto

El proyecto se desarrollará en el tramo de 1.108 metros, donde se construirá un Jarillón compuestos por capas de arena de trituración confinadas dentro de un geotextil tejido, revestido y/o recubierto con un flexocreto el cual esta está compuesta

por formaleta flexible de tela sintética de doble capa que cuando se llena de concreto o mortero fluido, se obtiene un sistema contra la erosión; dicho flexocreto será aplicado en el talud y corona del Jarillón, es de indicar que la estructura tendrá una corona de 1 metro y de base 12 metros.

Dicho proyecto estará ubicado en las siguientes coordenadas geográficas:

ESTRUCTURA JARILLON-FLEXOCRETO			
UBICACIÓN	COORDENADAS		UBICACIÓN
	NORTE	ESTE	
PUNTO DE INICIO	6°59'8.97"N	71°47'2.72"O	VDA.BAJO BANADÍA
PUNTO FINAL	6°59'19.78"N	71°46'31.01"O	VDA.BAJO BANADÍA



3.3 Generalidades de los contratos.

Información de contrato de obra N° 481 de 2024

FICHA TECNICA DEL CONTRATO	
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO	
ENTIDAD CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE ARAUCA

FICHA TECNICA DEL CONTRATO	
INTERVENTOR EXTERNO:	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓN
SUPERVISOR:	CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO
CONTRATO No:	481 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RÍO BANADÍA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
CONTRATISTA:	CONSORCIO RIO BANADIA
REPRESENTANTE:	JHONN FREDY GARCIA BELTRAN (desde el 31/12/2024 al 28/01/2025) FERNEY ALFONZO PAEZ GARCIA (desde el 29/01/2025)
NIT. No:	901.902.273-3
VALOR DEL CONTRATO:	$ 14.312.241.291,66
PLAZO CONTRACTUAL:	SEIS (06) MESES
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	SGR202324-00420 DEL 11/12/2024 SGR202324-00422 DEL 11/12/2024
REGISTRO PRESUPUESTAL:	SGR202324-00401 DEL 31/12/2024 SGR202324-00402 DEL 31/12/2024
FECHA INICIO:	31/12/2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	30/05/2025
PERIODO DEL INFORME	
FECHA DE CORTE DEL INFORME:	DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2025.
DIAS TRANSCURRIDOS:	32 DIAS

Información de contrato de Interventoria N° 473 del 2025.

DESCRIPCIÓN GENERAL INTERVENTORIA.	
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	473 DE 2024

OBJETO:	"INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTER OBRAS DE PROTECCIÓ. R/L JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON
NIT:	900.313.660-1
CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE ARAUCA
PLAZO DEL CONTRATO:	SEIS (6) MESES
VALOR DEL CONTRATO INICIAL:	$ 507.281.339,60
FECHA DE LEGALIZACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA ACTA DE INICIO:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE JUNIO DE 2025
PERIODO DEL INFORME	
FECHA DE CORTE DEL INFORME:	DEL 31/12/2024 AL 31/01/2025
DIAS TRANSCURRIDOS:	32 ÍAS

4. ACTIVIDADES DE OBRAS EJECUTADAS

Durante este periodo, la interventoria pudo verificar que el contratista realizo la ejecución de las siguientes actividades civiles:

- **EXCAVACIÓN MECÁNICA EN CONGLOMERADO ENTRE 0-2 m DE PROFUNDIDAD**

Esta actividad comprendió la ejecución de la excavación y remoción de material conglomerado hasta una profundida de 2.0 metros de acuerdo a los lineamientos cotas establecidos en los planos de diseño, mediante la implementación de equipos de topografía para su control cuantificación, asi mismo el uso de maquinaria pesada como retroexcavadoras. Dicha actividad conto con la supervisión y aprobación técnica esta interventoria.

Garantizando asi el proceso constructivo y el desarrollo de las actividad segura de acuerdo a lo establecido en el proceso constructivo e implementación de las políticas de seguridad y salud en el trabajo.

Equipos y Maquinaria: Retroexcavadora 200 y Retroexcavadora 300
Materiales: N/A
Personal: Ayudantes de obra

Actividades de control y verificación de la Interventoría:

- Supervisión de la correcta aplicación de los métodos de trabajos aceptados.
- Cumplimiento de los programas de trabajo.
- Verificación de las cotas y pendientes requeridas en los planos y diseños.
- Diámetro de cada una de las excavaciones.
- Señalización de seguridad
- Uso de elementos de protección personal y afiliaciones del personal en obra
- Inspección de maquinaria implementada para la actividad

ACTIVIDAD:	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN CONGLOMERADO ENTRE 0-2 m DE PROFUNDIDAD		
ITEM: 1.1		UNIDAD: M3	
CANTIDAD CONTRACTUAL:	16.298,68	CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	2647,80
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	2647,80	CANTIDAD SIN EJECUTAR:	13650.20
PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO:	16.25%	PORCENTAJE SIN EJECUTAR:	83.75%

- **ACARREO MATERIAL INTERNO NO MAYOR A 2 KM PARA REFORZAMIENTO DEL TALUD NATURAL**

Trabajo referente al cargue, transporte, y disposición final a una distancia situada, del material extraído productos de las excavaciones, dejando despejadas las áreas intervenidas y libres para el tránsito vehicular y peatonal. Para tal fin se dio uso de equipos idóneos para la correcta ejecución de dichas tareas tales como volquetas, la interventoria llevo a cabo la supervisión de los trabajos mediante la revisión de documentos de los vehículos y la idoneidad de los operadores, de igual forma que se ejecutaron con las medidas de seguridad.

Equipos y Maquinaria: Retroexcavadora 200 y Retroexcavadora 300, volquetas de 14 m3 y 7m3
Materiales: N/A

Personal: Ayudantes de obra

Actividades de control y verificación de la Interventoría:

- Supervisión de la correcta aplicación de los métodos de trabajos aceptados.
- Cumplimiento de los programas de trabajo.
- Verificación de las cotas y pendientes requeridas en los planos y diseños.
- Diámetro de cada una de las excavaciones.
- Señalización de seguridad
- Uso de elementos de protección personal y afiliaciones del personal en obra
- Inspección de maquinaria y vehículos implementados para la actividad

ACTIVIDAD:	**ACARREO MATERIAL INTERNO NO MAYOR A 2 KM PARA REFORZAMIENTO DEL TALUD NATURAL**		
ITEM: 1.2		UNIDAD: M3	
CANTIDAD CONTRACTUAL:	16.298,68	CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	2647,80
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	2647,80	CANTIDAD SIN EJECUTAR:	13650.20
PORCENTAJE EJECUTADO:	16.25%	PORCENTAJE SIN EJECUTAR:	83.75%

- **MANEJO DE AGUAS**

En esta actividad refiere al manejo del agua presente en el área de influencia de los trabajados ejecutados hasta la fecha, por presencia del nivel freatico superficial, mediante el uso de equipos a motor como motobombas, lo que se busca es traslado en sitio de las aguas subterráneas producto del nivel de las excavaciones. El proceso consistió en la extracción continua del agua, la cual fue dirigida hacia sistemas de drenaje temporales establecidos previamente para evitar inundaciones y garantizar un ambiente de trabajo seco y estable

Equipos y Maquinaria: Motobomba de 4”
Materiales: N/A
Personal: Ayudantes de obra

Actividades de control y verificación de la Interventoría:

- Supervisión de la correcta aplicación de los métodos de trabajos.
- Cumplimiento del cronograma de trabajo.

- Verificación y funcionamiento de los equipos disponibles para la ejecución de la actividad
- Uso de elementos de protección personal y afiliaciones del personal en obra

ACTIVIDAD:	**MANEJO DE AGUAS**		
ITEM: 1.7		UNIDAD: MES	
CANTIDAD CONTRACTUAL:	6.0	CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	1.0
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	1.0	CANTIDAD SIN EJECUTAR:	5.0
PORCENTAJE EJECUTADO:	16.67%	PORCENTAJE SIN EJECUTAR:	83.33%

- **FILTRO O DREN FRANCES PVC 100 MM (0.6X0.8)M**

Actividad referente a la construcción filtro francés con una zanja de 0.6 m de ancho por 0.8 m de profundidad, donde se colocó una capa de triturado 3/4" en el fondo, instalándose sobre esta tubería PVC perforada recubierta de material agregado ¾" como medida de drenaje del agua de acuerdo a las indicaciones preestablecidas en los planos de diseño de la obra.

Equipos y Maquinaria: Retroexcavadora
Materiales: Triturado ¾, tubería perforada en PVC de 4", geotextil.
Personal: Oficiales y Ayudantes de obra

Actividades de control y verificación de la Interventoría:

- Verificación del estado y funcionamiento de los equipos.
- Supervisión de la correcta aplicación de los métodos de trabajos aceptados.
- Cumplimiento de los programas de trabajo.
- Verificación de calidad de los materiales.
- Verificacion y chequeo de acuerdo a planos de diseño

ACTIVIDAD:	**FILTRO O DREN FRANCES PVC 100 MM (0.6X0.8)M**		
ITEM: 1.10		UNIDAD: M	
CANTIDAD CONTRACTUAL:	1.108,00	CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	400

CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	200	CANTIDAD SIN EJECUTAR:	708.00
PORCENTAJE EJECUTADO:	36.10%	PORCENTAJE SIN EJECUTAR:	63.90%





Registro fotográfico de las actividades de excavación mecánica





5 PROGRAMAS AMBIENTALES

La interventoría, realizo control y seguimiento a las actividades ambientales contempladas en el documento ambiental; dichas actividades ejecutadas por el contratista tienen por objetivo prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales negativos que puedan resultar de las actividades de construcción; en tal razón para este periodo se reportan las siguientes verificaciones conforme lo establecido en la siguiente tabla.

PROGRAMA	FICHA	NOMBRE DE LA FICHA
GESTION SOCIOAMBIENTAL	FMA-01	PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL
	FMA-02	CAPACITACIÓN EN GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL
	FMA-03	CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS LEGALES
	FMA-04	MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
	FMA-05	MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
	FMA-06	SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL
	FMA-07	CONTROL DE RUIDO Y AIRE
	FMA-08	MANEJO DE CONCRETOS
	FMA-09	SEÑALIZACION DE FRENTTES DE OBRA Y SITIOS TEMPORALES
	FMA-10	PROGRAMA DE GESTION HIDRICA
	FMA-11	COMPENSACION AMBIENTAL
	FMA-12	INTERVENTORIA AMBIENTAL

5.1 PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL

De acuerdo a las actividades contempladas en el documento ambiental, para el desarrollo de este programas, la interventoria pudo verificar, que le contratista realizo socialización el dia 18 de Enero de 2025 del proyecto ante la comunidad del Municipio de saravena, más específicamente a la población del área de influencia del proyecto; habitantes de la vereda Bajo banadias, puerto Nariño y demás comunidad, previa convocatoria realizada por el Departamento de Arauca a través de la Secretaría General de Gobierno y Seguridad Ciudadana.

En dicha reunión participaron representantes de la gobernación de Arauca, de la firma contratista de la obra, de la Interventoría externa y de la comunidad beneficiada con el proyecto, a quienes se les dio a conocer el alcance físico y financiero del contrato, el plazo de ejecución del mismo y el cronograma de la obra presentado por el contratista; de igual forma se atendieron las observaciones e inquietudes de los participantes y se presentaron los profesionales que van a estar frente a la ejecución del proyecto por parte del contratista, la Interventoría externa y la supervisión del Departamento de Arauca.





Registro fotográfico: Socialización del proyecto.	

Previo a la reunión de socialización del proyecto, se llevó a cabo por parte de la comunidad que asistió a la convocatoria, el nombramiento de las personas que hacen parte de la veeduría ciudadana y que fueron los voceros de la comunidad durante toda la etapa de ejecución de la obra ante el contratista, la Interventoría externa, entidad contratante, entes de control y demás instituciones.

CONFORMACIÓN DE LA VEEDURÍA CIUDADANA PARA EL CONTROL SOCIAL DEL CONTRATO DE OBRA NO. 481 DE 2024.

VEEDURIA CIUDADANA					
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	TELEFONO	CARGO	VEREDA/BARRIO
1	OSCAR JAVIER RIOS GOMEZ.	1.115.722.421	3195035254	VEEDOR	RIO BANADIA
2	WILLIAM PEÑALOZA PEÑALOZA	96.185.880	3058818465	VEEDOR	Puerto Nariño
3	LEIRA NAYARIT PEDRAZA URIBE	1.115.744.872	3022027500	VEEDOR	Puerto Nariño

La veeduría ciudadana fue reconocida por el Ministerio Público del Municipio de Saravena, mediante Resolución No. 005 del (28/01/2025) siendo nombrado como VOCERO o representante del Comité Veedor al señor OSCAR JAVIER RIOS GOMEZ.

Dentro de las actividades verificadas por la interventoria como actuaciones del contratista para dar a conocer el proyecto y atender cualquier tipo de inquietud y requerimiento de las comunidades, se cuenta con atención inmediata por parte de los profesionales en el punto donde se ejecuta el proyecto y con una oficina ubicada en la Calle 30 # 8-49 Barrio San Luis y correo electrónico consorcioriobanadia@gmail.com del municipio de Saravena.

Del mismo modo se da cumplimiento con información básica del proyecto la instalación de la valla informativa





Registro fotográfico: Valla informativa.

Anexo 9 – Informe técnico #1 de obra: Acta de socialización del proyecto
Anexo 10- Informe técnico #1 de obra: Resolución de conformación de veeduría.

5.2 CAPACITACIÓN EN GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL

Para el cumplimiento a este programa, la interventoria pudo verificar, que el contratista atraves de su profesional ambiental, realizo socialización del documento ambiental al personal del obra (administrativo- técnico y operativo); del mismo durante el mes se realizaron capacitaciones en el frente de trabajo, en temas relacionados con Inducción ambiental al personal profesional, Socialización de actividades de las fichas del plan de contingencia e Inducción al personal de mano de obra no calificada.

Tema	Número de asistentes	fecha	responsable
Inducción ambiental personal profesional	7	13/ 01/2025	Laura Cristina Olaya
Socialización de actividades de contigencia	8	30/01/2025	Laura Cristina Olaya
Induccion a mano de obra no calificada	2	20/01/2025	Laura Cristina Olaya

	
Registro fotográfico: Capacitaciones al personal	

Anexo 20- Informe técnico #1 de obra: anexo 3 del documento paga

5.3 CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS LEGALES

De acuerdo con lo estipulado en las fichas ambientales del Programa de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA), el propósito primordial de este subprograma radica en asegurar que el proyecto cuente con todos los permisos, autorizaciones, licencias y/o concesiones necesarias para la utilización y manipulación de los recursos naturales.

La interventoria pudo verificar los siguientes:

Mediante radicado No. 02709 del 26 de noviembre de 2024, la secretaria de Gobierno y Seguridad Ciudadana en Nombre de la Gobernación de Arauca tramita ante la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia CORPORINOQUIA seccional Arauca, Permiso de Ocupación De Cauce y Concesión De Aguas Superficiales del rio banadias, para el proyecto cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA, DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".

La interventoría pudo constatar que el trámite es realizado con sustentación técnica y jurídica, y que ha fecha del presente informe sigue su proceso administrativo ante la corporación; de igual manera insto al contratista de abstenerse de hacer utilización de los recursos naturales, previo a la autorización de la Corporación.

De acuerdo a las actividades que viene ejecutando la firma contratista CONSORCIO RIO BANADIA, y que como se evidencia en sus análisis de precios unitarios en el informe técnico de esta interventoria y específicamente en el apartado materiales, esta viene haciendo uso de material pétreo de cantera como lo es TRITURADO ¾,

y que de acuerdo a la información suministrada por el contratista y verificada por la interventoría, este presenta como proveedor la cantera ALFONSO SARMIENTO GONZALEZ con nit 17546051 y titulo minero No. RMN OGC-13281 Ubicado en el municipio de Saravena. La cual cuenta con las debidas licencias y permisos de explotación de materiales pétreos de acuerdo a los establecido a las leyes 2250 de 2022, 2655 de 1985 y 685 de 2001.

Anexo 20- Informe técnico #1 de obra: anexo 6 del Informe del documento paga

5.4 MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Para este periodo la interventoria pudo verificar que el manejo de material de construcción correspondió a la excavación y remoción de material conglomerado hasta una profundidad de 2.0 metros de 2647,80 m3 de acuerdo a los lineamientos cotas establecidos en los planos de diseño, mediante la implementación de equipos de topografía para su control cuantificación, asi mismo el uso de maquinaria pesada como retroexcavadoras. Dicha actividad conto con la supervisión y aprobación técnica esta interventoria.

Dicho material fue acopiado al costado izquierdo del rio, previniendo interacción con la lamina de agua, del mismo modo el transporte en sitio del material se hizo en volquetas que contaban con las condiciones tecno mecánicas al día, y debidamente carpadas.





Registro fotográfico: Excavación y transporte de material.

Es importante informar que durante este periodo no se adquirieron materiales como cemento, tubería o hierro.

En referencia al material utilizado en el dren Frances correspondiente a 200 m para este periodo, estos fueron adquiridos en la cantera ALFONSO SARMIENTO GONZALEZ con nit 17546051 y titulo minero No. RMN OGC-13281 Ubicado en el municipio de Saravena.

Anexo 20- Informe técnico #1 de obra: anexo 7 del Informe del documento paga

5.5 MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

Con respecto a los residuos convencionales generados en el frente de trabajo, esta interventoria pudo verificar que el frente de trabajo cuenta con la instalación de un punto ecológico, según lo reportado por el contratista se pudo verificar que dichos materiales son entregados a la respectiva empresa de servicios públicos para su respectiva disposición final, es de indicar que los residuos recolectados corresponden a bolsas de agua, desechables y empaques de paquetes.





Registro fotografico: Punto ecologico en el Frente de Trabajo

5.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

La interventoria pudo verificar que el contratista vinculó el personal requerido para la administración y ejecución de los trabajos de acuerdo al alcance de la obra, realizando previamente la afiliación al sistema de seguridad social integral y riesgos

laborales. La Interventoría antes del ingreso del personal a la obra verificó las respectivas afiliaciones, así como el pago mensual de los aportes a salud, pensión, riesgos y aportes parafiscales conforme a las planillas de pago entregadas por el contratista.

Es de indicar que el contratista cuenta con el siguiente personal:

Personal Administrativo

El personal profesional y administrativo que laboró en la obra para este periodo de ejecución, es el mismo que fue ofertado por el contratista en el proceso de selección y no fue modificado durante el plazo contractual. A continuación, se relaciona el personal administrativo del contratista que laboró durante los meses diciembre de 2024, enero, febrero y marzo de 2025 el cual corresponde al periodo de ejecución del presente informe:

	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	CC	CARGO	SALARIO	FECHA INGRESO	DIAS LABORADOS
1	VILA	SARABIA	JAIR LEANDRO	1.091.659.018	DIRECTOR DE OBRA	$ 8.000.000	31-12-2024	32
2	BARRAGAN	MENDOZA	JAIRO ALEXANDER	80.109.920	ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA	$ 2.750.000	31-12-2024	32
3	DELGADO	MONTAGUT	JOAQUIN EDUARDO	88.215.089	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	$ 2.750.000	31-12-2024	32
4	GARCIA	BELTRAN	JHONNATHAN ALEXIS	1.098.716.716	ING RESIDENTE	$ 5.000.000	31-12-2024	32
5	GARCIA	BELTRAN	JHONN FREDY	1.098.752.791	ING RESIDENTE	$ 5.000.000	31-12-2024	32
6	OLAYA	BAYONA	LAURA CRISTINA	1.094.283.275	ING AMBIENTAL	$ 5.000.000	31-12-2024	32
7	BOTIA	CHONA	MARLYN YVETTE	1.020.810.816	PROFESIONAL SOCIAL	$ 3.000.000	31-12-2024	32
8	GARRIDO	RIVERO	CAMILO ANDRES	1.094.269.468	HSEQ	$ 3.000.000	31-12-2024	32
9	GUTIERREZ	VACCA	HORLEYDA	1.116.496.517	CONTADOR	$ 1.500.000	31-12-2024	32
10	PAEZ	GARCÍA.	FERNEY	1.098.684.323	INSPECTOR DE OBRA	$ 3.000.000	31-12-2024	32
11	OCHOA		JESSICA LILIBETH	1.098.658.689	SECRETARIA	$ 2.000.000	31-12-2024	32

Para un mejor control del cumplimiento de las obligaciones que tiene el contratista con respecto al personal vinculado a la obra, la interventoría externa realiza

seguimiento a los compromisos laborales del contratista verificando los siguientes aspectos:

ACTIVIDAD	OBSERVACIONES		
	DICIEMBRE 2024 - ENERO 2025		
	SI	NO	
El contratista tiene al día las afiliaciones a seguridad social, Cajas de compensación, ARP de todo el personal.	X		Según la información entregada por el contratista de obra, la interventoría verifico el estado de afiliación de todo el personal de obra.
El contratista ha entregado a la Interventoría copia de las afiliaciones del personal.	X		Se entregó por parte del contratista de obra las afiliaciones del personal operativo de los meses de enero de 2025.
El contratista presenta oportunamente las planillas de pago de salarios de todo el personal.	X		El contratista presento la planilla de pagos a trabajadores de los meses diciembre de 2024, enero de 2025.
Los reportes de tiempo de las planillas de pago de salarios corresponden con el tiempo real trabajado en campo.	X		El contratista de obra realizó el pago de los salarios al personal de obra mensualmente como se acordó desde el inicio de actividades.
Las liquidaciones del personal retirado cumplen con la reglamentación vigente.			Hasta fecha del presente informe el contratista mantiene a todo el personal inicialmente contratado
El contratista tiene al día el pago de seguridad social, ICBF, SENA, Cajas de compensación, ARP, FIC, fondos de pensiones, EPS de todo el personal.	X		El contratista presenta la planilla paga de los meses diciembre de 2024, enero de 2025., en la cual se puede observar estos pagos.

Anexo 12- Informe técnico #1 de obra: Afiliaciones sistema de seguridad
Anexo 20- Informe técnico #1 de obra: anexo 8 lista de capacitación / del Informe del documento paga

5.7 CONTROL DE RUIDO Y AIRE

La interventoría verificó que el contratista utilizara en la ejecución de las actividades del contrato la maquinaria y equipo requerido según los APU y especificaciones técnicas del proyecto. Así mismo constató el estado físico y de operación de la

maquinaria y equipo solicitando al contratista sustituirlo por mal estado o realizarle mantenimiento preventivo y/o correctivo, cada vez que fue necesario.

La maquinaria y equipo que el contratista utilizó durante el periodo del presente informe fue el siguiente:

Tipo:	Estación topográfica
Marca:	TOPCON
Referencia:	YK 0225
Días en obra:	120
Estado:	Bueno
Regularidad del mantenimiento:	Si
Vibraciones/ Ruidos:	Lo normal
Idoneidad de operarios:	idóneo



Tipo:	Nivel de precisión
Marca:	SOUTH
Referencia:	NL 32
Días en obra:	120
Estado:	Bueno
Regularidad del mantenimiento:	Si
Vibraciones/ Ruidos:	Lo normal
Idoneidad de operarios:	idóneo
Tipo:	Volqueta
Marca:	Chevrolet
Referencia:	Kodiak
Días en obra:	No aplica
Estado:	Bueno





Regularidad del mantenimiento:	mensual
Vibraciones/ Ruidos:	Lo normal
Idoneidad de operarios:	idóneo

Tipo:	Volqueta
Marca:	Chevrolet
Referencia:	Kodiak
Días en obra:	No aplica
Estado:	Bueno
Regularidad del mantenimiento:	mensual
Vibraciones/ Ruidos:	Lo normal
Idoneidad de operarios:	idóneo



Tipo:	Retroexcavadora
Marca:	caterpillar
Referencia:	
Días en obra:	No aplica
Estado:	Bueno
Regularidad del mantenimiento:	Quincenal
Vibraciones/ Ruidos:	Lo normal
Idoneidad de operarios:	idóneo



Tipo:	Retroexcavadora
Marca:	Komatsu
Referencia:	PC-200-8



Días en obra:	No aplica
Estado:	Bueno
Regularidad del mantenimiento:	Quincenal
Vibraciones/ Ruidos:	Lo normal
Idoneidad de operarios:	idóneo

Por otro lado, la interventoría realizó un seguimiento y control a la maquinaria y equipos propios dispuestos por el contratista verificando que los seguros y las revisiones se encuentren vigentes y que se haya realizado la respectiva afiliación de los operarios al sistema de seguridad social y ARL.

Anexo 16- Informe técnico #1 de obra: Hoja de vida de los equipos y documentos adicionales

5.8 MANEJO DE CONCRETOS

Es de informar que, en este periodo, no se han ejecutado actividades que contengan manejo de concretos, debido a que la administración departamental se encuentra a la espera del pronunciamiento por parte de la autoridad ambiental Corporinoquia, en relación a la solicitud de permisos ambientales.

5.9 SEÑALIZACION DE FRENTTES DE OBRA Y SITIOS TEMPORALES

En la ejecución de los trabajos, el contratista implementó la señalización requerida para el aislamiento de las zonas de trabajo, así como la instalación de las señales informativas y preventivas y vallas necesarias en la ejecución de la obra.
De igual manera la interventoria diariamente verificó que dichas señales se encontraran debidamente instaladas en todos los frentes de trabajo de la obra y en buen estado, haciendo las recomendaciones del caso al contratista para subsanar cualquier inconveniente frente a la falta de señalización o mal estado de la misma.

Dentro de la señalización que se evidencio en este periodo se tiene:

ELEMENTOS DE SEÑALIZACION	INSTALADOS		ESTADO			LOCALIZACION EN OBRA
	Si	No	Bueno	Regular	Malo	
CINTA REFLECTIVA	X		X			Área perimetral donde se construyeron pozos de inspección
AVISOS INFORMATIVOS	X		X			Valla informativa sobre la vía a la esmeralda frente a las lagunas de

ELEMENTOS DE SEÑALIZACION	INSTALADOS		ESTADO			LOCALIZACION EN OBRA
	Si	No	Bueno	Regular	Malo	
						oxidación, se instaló al momento de transportar material de obra.





Registro fotográfico: Señalizacion

5.10 PROGRAMA DE GESTION HIDRICA

En referencia a este programa la interventoria, pudo verificar que en el frente de trabajo se evidencia la instalación de un baño portátil, el cual presta el servicios a los trabajadores del proyecto; es de indicar que este baño debe realizar el mantenimiento periódicamente, y que es el deber del profesional ambiental de la obra, verificar su adecuado funcionamiento; con el objeto de que los residuos líquidos no vayan a generar ningún tipo de contaminación del suelo o de la misma fuente hídrica; en tal sentido se deberá aportar el certificado de la disposición final del mismo

	
Registro fotografico: Baño Portatil en el frente de trabajo	

Anexo 20- Informe técnico #1 de obra: anexo 9 -contrato de prestación de servicios ecoservicios y ECAAAS.

5.11 COMPENSACION AMBIENTAL

Es de informar que, en este periodo, no se han ejecutado el cumplimiento de esta ficha, toda vez que manifiesta el contratista que las condiciones climáticas no garantizan que las plantas se adapten de una manera rápida y optima, es de indicar además que se recomienda al contratista hacerlas una vez entren las primeras lluvias al departamento de Arauca.

6. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- La vigilancia y seguimiento del contrato está a cargo del equipo técnico y profesional de obra, quien adelanta los respectivos programas y medidas de prevención, mitigación y control, tales como buenas prácticas de construcción, medidas de higiene y seguridad, cumpliendo con las regulaciones y normativas ambientales y técnicas, entre ellas el manejo y disposición final de sobrantes.

- Todas y cada una de las actividades realizadas por el contratista han sido controladas por la firma interventora, verificando el correspondiente cumplimiento a las condiciones estipuladas en el plan de manejo ambiental.

- Se señalizaron y aislaron las áreas intervenidas por las obras, esto ha ayudado a que no se presentaran ningún tipo de accidente en obra.

Elaboró:



CRISTIAN MIGUEL ROMERO DUARTE
Ingeniero Ambiental
M.P. No. 54238-373578 NTS
