CONSORCIO
SANTA TERESA 28

NIT. 901.888.461-1

IDRD-4080-G1-2024-306

Bogotá D. C., 21 de julio de 2025

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD
No. 20252100297582 Código Web 84ryIM
FECHA: 22-07-2025 10:16:58 FOLIOS: 537
RADICADOR: KATHERINE VANESSA CERON AVILA
DESTINO: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
REMITENTE: CONSORCIO SANTA TERESA 28 RAUL ORLANDO
ASUNTO: REMISIÓN INFORME MENSUAL NO 8 - JUNIO
Seguimiento de trámite consulte www.idrd.gov.co
Calle 63 No. 59A - 06 PBX: 660 5400

Señores:
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
Atn. RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
Subdirector técnico de parques
La ciudad

Referencia: Contrato de interventoría No. IDRD-SG-4080-2024, cuyo objeto es ***"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD".***

Asunto: **REMISIÓN INFORME MENSUAL No. 8 - JUNIO**
INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA 4041 DE 2024 – CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL, SINTÉTICA Y ARENA.

Cordial saludo

Por medio de la presente nos permitimos remitir los informes mensuales de interventoría No. 8, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de junio de 2025 al 30 de junio de 2025 para el contrato descrito en la referencia, lo cuales se relacionan a continuación:

INFORME	FOLIOS
COMPONENTE SST	1 – 114
COMPONENTE CALIDAD	115 – 177
COMPONENTE AMBIENTAL	178 – 223
COMPONENTE TECNICO	224 - 536

Lo anterior para su revisión y aprobación,

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal
Anexos: Lo referido en (536) folios en 5 tomos
Con copia: N/A
Elaboró: DG
Revisó: N/A

IDRD

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4080 DE 2024
CONSORCIO SANTA TERESA 28
DIRECCIÓN: CARRERA 70C No. 48 -55
TELÉFONO: 76530168 – 3013942384

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 - CAMPOS DEPORTIVOS"

INFORME MENSUAL No 8 – COMPONENTE SST
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

TOMO __1___ DE _____

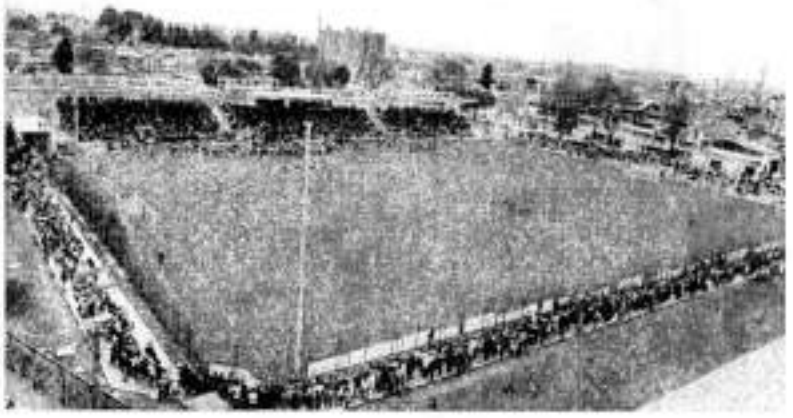


TABLA DE CONTROL

COPIA CONTROLADA	X	COPIA NO CONTROLADA	

	Nombre	Cargo	Firma
ELABORÓ	Laura Sofia Fernández	Residente SST de interventoria	
APROBÓ	Carlos Andrés Figueroa	Director de Interventoría	

JULIO DE 2025 / BOGOTÁ D.C.

CONTENIDO

CONDICIONES CONTRACTUALES 5
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS 15
1. OBJETIVOS 16
1.1 OBJETIVO GENERAL 16
1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 16
2. DOCUMENTACIÓN DEL PERSONAL 16
2.1. PERSONAL DEL CONTRATO Y VERIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES INTERVENTORÍA 16
3.1. LISTADO DE PERSONAL DEL CONTRATO Y VERIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES CONTRATISTA 18
2.2. CUMPLIMIENTO DE EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES 20
2.3. PERSONAL RETIRADO DE INTERVENTORÍA 20
2.4. PERSONAL RETIRADO DE CONTRATISTA 21
3. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS 21
4. INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD 22
5. ACCIDENTES DE TRABAJO 23
6. PROGRAMA DE CAPACITACIONES 23
7. COMITES 23
A. COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – COPASST 23
B. COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL – CONVILAB 24
8. REGISTRO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION 24
9. INSPECCIONES PLANEADAS 24
10. PERMISOS DE TRABAJO 25
11. MAQUINARIA Y VOLQUETAS 26
12. REPORTE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA 26
13. CONCLUSIONES 27

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1. Relación personal interventoría junio de 2025 17
Tabla 2. Relación de ingresos interventoría junio de 2025 18
Tabla 3. Relación personal operativo 18
Tabla 4. Relación personal retirado interventoría 21
Tabla 5. Relación personal retirado contratista 21
Tabla 6. Resúmenes indicadores de accidentalidad 22
Tabla 7. Resúmenes indicadores de accidentalidad contratista 22
Tabla 8:Relación inspecciones realizadas por la interventoría 25
Tabla 9. Relación maquinaria ingresada en el periodo 26
Tabla 10. Relación volquetas 26
Tabla 11. Reporte de actividades contratista de obra 27

LISTA DE ANEXOS

ANEXO 1. RELACION PERSONAL DE INTERVENTORIA
ANEXO 1.1. RELACION PERSONAL CONTRATISTA
ANEXO 2. MATRIZ RIESGOS INTERVENTORIA
ANEXO 2.1. MATRIZ DE RIESGOS CONTRATISTA
ANEXO 3. INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD
ANEXO 3.1. INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD CONTRTISTA
ANEXO 4. CONFORMACION COPASST Y CCL INTERVENTORIA
ANEXO 4.1. CONFORMACION COPASST Y CCL CONTRATISTA
ANEXO 5. CAPACITACIONES INTERVENTORIA
ANEXO 5.1. CAPACITACIONES CONTRATISTA
ANEXO 6. INSPECCIONES INTERVENTORIA
ANEXO 6.1. INSPECCIONES CONTRATISTA
ANEXO 7. ENTREGA EPP CONTRATISTA
ANEXO 8. PREOPERACIONALES
ANEXO 9. PERMISOS DE TRABAJO
ANEXO 10. PAZ Y SALVOS CONTRATISTA
ANEXO 10.1 PAZ Y SALVOS INTERVENTORIA
ANEXO 11. REGISTRO FOTOGRAFICO
ANEXO 12. DOCUMENTOS INGRESO INTERVENTORIA

INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde al seguimiento, verificación y control realizado por esta Interventoria en cumplimiento del contrato No. 4080 de 2024 suscrito entre CONSORCIO SANTA TERESA 28 y el INSTITUTO DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD, a las actividades ejecutadas por el Contratista de Obra: CONSORCIO INNOVAPARQUES de acuerdo con el contrato No. 4041 de 2024.

La revisión se efectuó para el periodo correspondiente al **octavo mes** de ejecución del contrato de obra definido desde el **01 al 30 de junio de 2025**, donde se tuvieron en cuentas los aspectos técnicos, administrativos, financieros, ambientales, SST y legales, según las condiciones contractuales establecidas; cabe resaltar que el seguimiento se realiza acorde con los lineamientos establecidos en el Anexo Técnico del contrato respectivo, así como lo indicado en la cartilla de lineamientos para el diseño de parques IDRD y el Manual de Interventoria del IDRD, entre otros aspectos.

De acuerdo con lo antes mencionado, dentro del presente informe se describen las labores realizadas por el Contratista en el periodo de tiempo enunciado anteriormente; así mismo, se presentan las observaciones, comentarios y recomendaciones a las actividades ejecutadas en el periodo reportado.

Finalmente, se resumen los estados de los Contratos de obra e interventoria, exponiendo al final del documento las respectivas conclusiones del estado del contrato de obra a la fecha de entrega de este reporte.

CONDICIONES CONTRACTUALES

OBJETO DEL CONTRATO

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

ALCANCE DEL CONTRATO

Los contratos objeto de interventoría son dos, considerando que la licitación pública para la adjudicación de las obras fue diseñada para la adjudicación en dos grupos, como se describe a continuación:

GRUPO 01: ***"MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS".***

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se desarrolla en varios campos deportivos, ubicados en la ciudad de Bogotá D.C., los cuales se enuncian a continuación:

CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA SINTÉTICA:

ITEM	TIPO DE CANCHA	PARQUE	CÓDIGO IDRD	LOCALIDAD	DIRECCIÓN
1	SINTETICA	Servitá	01-023	Usaquén	Carrera 7H Calle 165
2	SINTETICA	Servitá	01-023	Usaquén	Carrera 7H Calle 165
3	SINTETICA	Cedritos	01-031	Usaquén	Carrera 9 Calle 145
4	SINTETICA	Toberín	01-079	Usaquén	Calle 164 Carrera 16 C
5	SINTETICA	Estrella norte	01-189	Usaquén	Calle 160 Carrera 19 B
6	SINTETICA	Verbenal	01-313	Usaquén	Calle 187 Transversal 18 B
7	SINTETICA	Urb. Calle 170 / Alameda	01-540	Usaquén	Carrera 17 Calle 175
8	SINTETICA	La Cabrera (Japón)	02-007	Chapinero	Av Carrera 11 Calle 87
9	SINTETICA	Tercer milenio	03-085	Santafé	Carrera 14 Calle 7
10	SINTETICA	Tercer milenio	03-085	Santafé	Carrera 14 Calle 7
11	SINTETICA	Tercer milenio	03-085	Santafé	Carrera 14 Calle 7
12	SINTETICA	Desarrollo Lourdes	03-122	Santafé	Carrera 1A Este Calle 3
13	SINTETICA	Laches la mina	03-148	Santafé	Diagonal 4B Cra 8 E
14	SINTETICA	Urb. Antioquia	04-038	San Cristóbal	Transversal 8a este Calle 50 b sur

ITEM	TIPO DE CANCHA	PARQUE	CÓDIGO IDRD	LOCALIDAD	DIRECCIÓN
15	SINTETICA	Gaitán cortes	04-103	San Cristóbal	Carrera 5 a este Diagonal 31 C sur
16	SINTETICA	La Victoria	04-122	San Cristóbal	Diagonal 38 Sur No. 1F - 05
17	SINTETICA	La Victoria	04-122	San Cristóbal	Diagonal 38 Sur No. 1F - 05
18	SINTETICA	San Cristóbal 2	04-127	San Cristóbal	Calle 13 sur N.º 2- 50 este
19	SINTETICA	San Cristobal1	04-127	San Cristóbal	Calle 13 sur N.º 2- 50 este
20	SINTETICA	Miravalle	05-042	Usme	Carrera 14 H Bis Calle 74 D sur
21	SINTETICA	Miravalle	05-042	Usme	Carrera 14 H Bis Calle 74 D sur
22	SINTETICA	Miravalle	05-042	Usme	Carrera 14 H Bis Calle 74 D sur
23	SINTETICA	Alfonso López	05-141	Usme	Carrera 5 G Calle 93 sur
24	SINTETICA	Nuevo Usme	05-459	Usme	Carrera 14 A Calle 137 B sur
25	SINTETICA	Nuevo milenio	05-476	Usme	Carrera 11 Calle 67 A Bis sur
26	SINTETICA	Nuevo milenio	05-476	Usme	Carrera 11 Calle 67 A Bis sur
27	SINTETICA	Laguneta	06-005	Tunjuelito	Cra 55 Diagonal 49 sur
28	SINTETICA	Urb. Tunjuelito	06-012	Tunjuelito	Cra 12 Calle 59 sur
29	SINTETICA	Nuevo Muzu	06-017	Tunjuelito	Diagonal 52 B sur Cra 61B
30	SINTETICA	El Tunal	06-063	Tunjuelito	Cra 24 A Cll 4B Sur Av Boyacá
31	SINTETICA	El Tunal	06-063	Tunjuelito	Cra 24 A Cll 4B Sur Av Boyacá
32	SINTETICA	El Tunal	06-063	Tunjuelito	Cra 24 A Cll 4B Sur Av Boyacá
33	SINTETICA	Tunal Alterna	06-063	Tunjuelito	Cra 24 A Cll 4B Sur Av Boyacá
34	SINTETICA	Naranjos	07-035	Bosa	Carrera 80 J Calle 70 A sur
35	SINTETICA	Timiza Villa del rio	07-036	Bosa	Carrera 65 Calle 55 A sur
36	SINTETICA	Autopista Sur (Pavco)	07-152	Bosa	Av. Calle 57 R sur (Aut. Sur) Carrera 72
37	SINTETICA	Clarelandia	07-163	Bosa	Calle 58 J sur Cra 80 G
38	SINTETICA	Clarelandia mini	07-163	Bosa	Calle 58 J sur Cra 80 G
39	SINTETICA	El Recreo	07-260	Bosa	Calle 69 A Sur 93D - 45

ITEM	TIPO DE CANCHA	PARQUE	CÓDIGO IDRD	LOCALIDAD	DIRECCIÓN
40	SINTETICA	La Esperanza	07-273	Bosa	Calle 75 BIS Sur (Av. C de Cali) Cra 80J
41	SINTETICA	La Tingua Tibanica	07-274	Bosa	Calle 73 D Sur Carrera 78 A hasta la 82 A Bis
42	SINTETICA	Urb. Chicala	07-292	Bosa	Av Carrera 86 Calle 55 sur
43	SINTETICA	Santiago de Atalaya	07-321	Bosa	Carrera 98 B Calle 61 A sur
44	SINTETICA	El Porvenir	07-391	Bosa	Av 1° de Mayo con Av Long de Occ
45	SINTETICA	El Porvenir	07-391	Bosa	Av 1° de Mayo con Av Long de Occ
46	SINTETICA	El Porvenir	07-391	Bosa	Av 1° de Mayo con Av Long de Occ
47	SINTETICA	El Porvenir	07-391	Bosa	Av 1° de Mayo con Av Long de Occ
48	SINTETICA	El Porvenir	07-391	Bosa	Av 1° de Mayo con Av Long de Occ
49	SINTETICA	Portal del Sol	07-403	Bosa	Carrera 95 A Calle 73 sur
50	SINTETICA	Ciudadela Campo Verde	07-436	Bosa	Carrera 95 A Calle 75 sur
51	SINTETICA	Ciudadela Campo Verde	07-436	Bosa	Carrera 95 A Calle 75 sur
52	SINTETICA	Ciudadela Campo Verde	07-436	Bosa	Carrera 95 A Calle 75 sur
53	SINTETICA	Carvajal	08-040	Kennedy	Cra 70 B Calle 24 A sur
54	SINTETICA	Villa Alsacia	08-065	Kennedy	Carrera 72 B Calle 11 A BIS
55	SINTETICA	Marsella Sector Norte I Etapa	08-066	Kennedy	Carrera 69 Calle 8
56	SINTETICA	Marsella Sector Norte I Etapa	08-066	Kennedy	Carrera 69 Calle 8
57	SINTETICA	Américas Occidental	08-127	Kennedy	Av. Boyacá Calle 2 sur
58	SINTETICA	Villa de los Sauces	08-180	Kennedy	Carrera 77 Bis Calle 58 C sur
59	SINTETICA	La Igualdad	08-212	Kennedy	Carrera 68A entre Calle 2
60	SINTETICA	Timiza	08-219	Kennedy	Carrera 72 P Calle 40 H sur
61	SINTETICA	Timiza	08-219	KENNEDY	Carrera 72 P Calle 40 H sur
62	SINTETICA	Las Luces y Villa Rica	08-533	Kennedy	Carrera 77 H Calle 52 A sur
63	SINTETICA	Gilma f11	08-552	Kennedy	Transversal 85 A Calle 49 sur
64	SINTETICA	Gilma f8	08-552	Kennedy	Transversal 85 A Calle 49 sur

ITEM	TIPO DE CANCHA	PARQUE	CÓDIGO IDRD	LOCALIDAD	DIRECCIÓN
65	SINTETICA	Gilma f5	08-552	Kennedy	Transversal 85 A Calle 49 sur
66	SINTETICA	Gilma f5	08-552	Kennedy	Transversal 85 A Calle 49 sur
67	SINTETICA	La Alejandra	08-568	Kennedy	Carrera 72 I Diagonal 40 a sur
68	SINTETICA	Lago Timiza I Etapa	08-626	Kennedy	Carrera 73 Calle 43 sur
69	SINTETICA	Primavera	08-770	Kennedy	Calle 2 Carrera 91 C
70	SINTETICA	Modelia	09-016	Fontibon	Carrera 81 C N°24 c 50
71	SINTETICA	Villa Helena Villemar	09-026	Fontibón	Carrera 96 G N°20 A 35
72	SINTETICA	Carlos Lleras (El Fuego)	09-048	Fontibón	Carrera 70 Calle 23 C
73	SINTETICA	Urb. Ciudad Hayuelos	09-200	Fontibón	Calle 19 A Carrera 80 A
74	SINTETICA	Urb. Ciudad Hayuelos	09-200	Fontibón	Calle 19 A Carrera 80 A
75	SINTETICA	Villas del Madrigal	10-002	Engativá	Calle 75 C Carrera 99 B
76	SINTETICA	Villa Luz	10-018	Engativá	Carrera 77A 64B - 03
77	SINTETICA	Villa Luz	10-018	Engativá	Carrera 77A 64B - 03
78	SINTETICA	Florencia Los Tronquitos	10-028	Engativá	Carrera 91 A Calle 75 C
79	SINTETICA	La Europa	10-045	Engativá	Carrera 71 D Calle 67
80	SINTETICA	Villa de Granada	10-102	Engativá	Cra 111A Calle 75D
81	SINTETICA	Bachué	10-117	Engativá	Carrera 95 Calle 90 A
82	SINTETICA	Ciudad Honda	10-153	Engativá	Carrera 68 G Calle 64 H
83	SINTETICA	El Carmelo	10-169	Engativá	Carrera 101 A Calle 71B
84	SINTETICA	El Carmelo	10-169	Engativá	Carrera 101 A Calle 71B
85	SINTETICA	Juan Amarillo	10-171	Engativá	Carrera 111A Av Calle 90
86	SINTETICA	Juan Amarillo	10-171	Engativá	Carrera 111A Av Calle 90
87	SINTETICA	Juan Amarillo	10-171	Engativá	Carrera 111A Av Calle 90
88	SINTETICA	Juan Amarillo	10-171	Engativá	Carrera 111A Av Calle 90
89	SINTETICA	Juan Amarillo	10-171	Engativá	Carrera 111A Av Calle 90
90	SINTETICA	Juan Amarillo	10-171	Engativá	Carrera 111A Av Calle 90
91	SINTETICA	Normandía	10-190	Engativá	Carrera 73 Calle 51
92	SINTETICA	Bonanza	10-215	Engativá	Carrera 70 F Calle 75
93	SINTETICA	San Andrés	10-234	Engativá	Carrera 102 con Calle 79
94	SINTETICA	San Andrés	10-234	Engativá	CALLE 82 CARRARA 102

ITEM	TIPO DE CANCHA	PARQUE	CÓDIGO IDRD	LOCALIDAD	DIRECCIÓN
95	SINTETICA	Florencia	10-249	Engativá	Carrera 88 Calle 75
96	SINTETICA	UDS Unidad Deportiva El Salitre	10-290	Engativá	CALLE63 CARERA AV 68
97	SINTETICA	Petar Salitre	10-531	Engativá	Carrera 120 Calle 80 A Bis
98	SINTETICA	Ciudadela Cafam	11-008	Suba	Cra 113 C Calle 142 A
99	SINTETICA	Berlín	11-015	Suba	Calle 142 Carrera 145 B
100	SINTETICA	Cantalejo	11-036	Suba	Carrera 55 Calle 160
101	SINTETICA	Urb Lombardía (1 Etapa)	11-052	Suba	Calle 143 Carrera 107B
102	SINTETICA	Burgos britalia1	11-058	Suba	Carrera 73 Calle 160
103	SINTETICA	Burgos britalia2	11-058	Suba	Carrera 73 Calle 160
104	SINTETICA	Casa Blanca	11-069	Suba	Carrera 68 entre Calles 140 Y 141
105	SINTETICA	Bilbao	11-074	Suba	Calle 142 C Carrera 151 A
106	SINTETICA	Tibabuyes1	11-084	Suba	Carrera 121 C Calle 130 C
107	SINTETICA	Tibabuyes2	11-084	Suba	Carrera 121 C Calle 130 C
108	SINTETICA	Prado Pinzón	11-109	Suba	Calle 143 Carrera 49
109	SINTETICA	Cafam Suba II (Los Gavilanes)	11-1101	Suba	Carrera 143 Calle 142 A
110	SINTETICA	Urb. Mazurén I Sector	11-161	Suba	Calle 152 Carrera 50
111	SINTETICA	Victoria norte	11-162	Suba	Calle 150 Carrera 54
112	SINTETICA	Cometas	11-204	suba	Av Calle 127 Carrera 87 A
113	SINTETICA	Lindaraja	11-309	suba	Carrera 78 Calle 127 D
114	SINTETICA	Fontanar del Rio	11-368	Suba	Diagonal 145 Carrera 122
115	SINTETICA	Fontanar del Rio	11-368	Suba	Diagonal 145 Carrera 122
116	SINTETICA	Fontanar del Rio	11-368	Suba	Diagonal 145 Carrera 122
117	SINTETICA	Vilanova	11-668	suba	Carrera 54 D Calle 186
118	SINTETICA	Valle de Refous	11-686	Suba	Cra 101 calle 150a
119	SINTETICA	PRD 1	12-091	Barrios Unidos	Transversal 48 N°63-65
120	SINTETICA	PRD 2	12-091	Barrios Unidos	Transversal 48 N°63-65
121	SINTETICA	Santa Clara	13-015	Teusaquillo	Carrera 46 Calle 22 A
122	SINTETICA	Urb Salitre (Greco)	13-016	Teusaquillo	Carrera 66 B Calle 43

ITEM	TIPO DE CANCHA	PARQUE	CÓDIGO IDRD	LOCALIDAD	DIRECCIÓN
123	SINTETICA	Arena Movistar	13-128	Teusaquillo	Av Carrera 30 Diagonal 61 C
124	SINTETICA	Arena Movistar	13-128	Teusaquillo	Av Carrera 30 Diagonal 61 C
125	SINTETICA	La pepita	14-008	Mártires	Calle 10 Carrera 26
126	SINTETICA	Santa Isabel La Fragua	15-021	Antonio Nariño	Calle 8 Sur con Carrera 27
127	SINTETICA	Santa Isabel La Fragua	15-021	Antonio Nariño	Calle 8 Sur con Carrera 27
128	SINTETICA	Luna Park	15-029	Antonio Nariño	Carrera 14 Calle 13 sur
129	SINTETICA	Villa Mayor	15-036	Antonio Nariño	Calle 32 A sur Carrera 34 C
130	SINTETICA	Fragua	15-040	Antonio Nariño	Carrera 31 N.º 14 B 57 sur
131	SINTETICA	Champion Primavera	16-012	Pte Aranda	Transv 42 A Calle 5A
132	SINTETICA	Milenta tejar san eusebio	16-099	Pte Aranda	Carrera 52 B Calle 20 sur
133	SINTETICA	Montes 1	16-112	Pte Aranda	Calle 10 sur N°39 - 29
134	SINTETICA	Montes2	16-112	Pte Aranda	Calle 10 sur N°39 - 29
135	SINTETICA	Gorgonzola	16-126	Pte Aranda	Carrera 41 A Calle 5
136	SINTETICA	Pradera sur	16-153	Pte Aranda	Av calle 3 Carrera 66
137	SINTETICA	Jazmín	16-204	Pte Aranda	Av. Carrera 50 Calle 1 D
138	SINTETICA	Parque Industrial (El Nectar)	16-415	Pte Aranda	Cll 10 AV Cra 36
139	SINTETICA	Parque Industrial (El Nectar Polideportivo)	16-416	Pte Aranda	Cll 11 A AV Cra 36
140	SINTETICA	La Catedral - Candelaria	17-028	La Candelaria	Calle 12f No 3-27
141	SINTETICA	Urb. Gustavo Restrepo	18-009	Rafael Uribe	Calle 28 Sur Carrera 15A
142	SINTETICA	Bosque San Carlos	18-028	Rafael Uribe	Carrera 12 Bis
143	SINTETICA	Palermo Sur	18-035	Rafael Uribe	Carrera 1 Este Calle 49 C sur
144	SINTETICA	Marruecos	18-041	Rafael Uribe	Calle 48 P sur Carrera 5L
145	SINTETICA	Molinos	18-055	Rafael Uribe	Transversal 5 Calle 48 L sur
146	SINTETICA	Santa Lucia	18-073	Rafael Uribe	Carrera 14 Calle 41 B sur

ITEM	TIPO DE CANCHA	PARQUE	CÓDIGO IDRD	LOCALIDAD	DIRECCIÓN
147	SINTETICA	Santa Lucia	18-073	Rafael Uribe	Carrera 14 Calle 41 B sur
148	SINTETICA	Parque Olaya Herrera	18-207	Rafael Uribe	Carrera 21 25-35 Sur
149	SINTETICA	San José	18-429	Rafael Uribe	Calle 26 Sur y Av 1 de Mayo con Cra 12 D
150	SINTETICA	Domingo Lain	19-032	Ciudad Bolívar	Calle 64 C sur Transv 17N
151	SINTETICA	Arborizadora Alta	19-058	Ciudad Bolívar	Diagonal 73 A sur Transversal 36 B
152	SINTETICA	La Coruña	19-115	Ciudad Bolívar	Calle 58 Bsur Carrera 47
153	SINTETICA	Sierra Morena	19-190	Ciudad Bolívar	Transversal 73 B Calle 75A sur
154	SINTETICA	Sierra Morena	19-190	Ciudad Bolívar	Transversal 73 B Calle 75A sur
155	SINTETICA	Illimani (Paraíso)	19-346	Ciudad Bolívar	Calles 71 P Sur Transversal 27 H
156	SINTETICA	Ilimani	19-346	Ciudad Bolívar	Calles 71 P Sur Transversal 27 H
157	SINTETICA	Buenavista- Porvenir	19-347	Ciudad Bolívar	Carrera 17 F Calle 76 A sur
158	SINTETICA	El Taller- El Ensueño	19-348	Ciudad Bolívar	Carrera 75A Diagonal 68 A
159	SINTETICA	Paraíso	19-490	Ciudad Bolívar	Cra 27 Q Calle 71 K sur
160	SINTETICA	Caracolí	19-710	Ciudad Bolívar	Carrera 74 B Calle 77 sur
161	SINTETICA	Balmoral Guadalupe	19-750	Ciudad Bolívar	Autopista sur Carrera 71
162	SINTETICA	Altos de la Estancia	19-756	Ciudad Bolívar	Carrera 76 C Diagonal 67 a sur
163	SINTETICA	Altos de la Estancia	19-756	Ciudad Bolívar	Carrera 76 C Diagonal 67 a sur
164	SINTETICA	Mirador illimani	19-788	Ciudad Bolívar	Carrera 27 C Diagonal 70 U Bis sur
165	SINTETICA	San José Maryland	07-164	Bosa	Carrera 86 Calle 73 G sur
166	SINTETICA	Aurora	05-002	USME	Calle 71 F sur Carrera 14 V (Av Boyacá)

ITEM	TIPO DE CANCHA	PARQUE	CÓDIGO IDRD	LOCALIDAD	DIRECCIÓN
167	SINTETICA	Valles de Cafam	05-003	USME	Calle 92 sur Carrera 14 I
168	SINTETICA	Villa Alemana	05-087	USME	Carrera 5 este (Aup Llano) Calle 100 sur
169	SINTETICA	Pijaos	18-090	Rafael Uribe	Av Cra 10 Calle 35 sur
170	SINTETICA	Cruces	03-036	Santafé	Carrera 5 A Calle 1 B
171	SINTETICA	La Gaitana	11-205	SUBA	Carrera 125 B Calle 131 A
172	SINTETICA	Gimnasio del Norte	12-023	Barrios Unidos	Carrera 28 Calle 63 B
173	SINTETICA	Eduardo Santos	14-030	Mártires	Carrera 18 C Calle 4 A
174	SINTETICA	Dindalito	08-144	Kennedy	Carrera 94 C Calle 42 sur
175	SINTETICA	Castilla	08-200	Kennedy	Carrera 74 Calle 8A Bis
176	SINTETICA	Cayetano Cañizares	08-241	Kennedy	Carrera 80 Calle 40 C sur
177	SINTETICA	Estancia	19-231	Ciudad Bolívar	Calle 58 C sur Carrera 74 C
178	SINTETICA	La Joya	19-349	Ciudad Bolívar	Carrera 18 I Calle 80 B sur
179	SINTETICA	Urb Metrópolis	12-035	Barrios Unidos	Carrera 66 Calle 84
180	SINTETICA	Urb La Laguna 1 (Venecia)	06-006	Tunjuelito	Carrera 53 A Diagonal 47 A sur
181	SINTETICA	Urb La Laguna 2 (Venecia)	06-006	Tunjuelito	Carrera 53 A Diagonal 47 A sur

CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL:

ITEM	TIPO DE CANCHA	PARQUE	CÓDIGO IDRD	LOCALIDAD	DIRECCIÓN
1	NATURAL	EL TUNAL (Estadio)	06-063	Tunjuelito	Carrera 7H Calle 165
2	NATURAL	EL TUNAL (Softbol)	06-063	Tunjuelito	Carrera 7H Calle 165
3	NATURAL	TIMIZA (Estadio)	08-219	Kennedy	Carrera 9 Calle 145
4	NATURAL	ATAHUALPA (Estadio)	09-104	Fontibón	Calle 164 Carrera 16 C
5	NATURAL	SIMON BOLIVAR - Sector Parque Deportivo el Salitre (Estadio)	12-091	Barrios Unidos	Calle 160 Carrera 19 B

ITEM	TIPO DE CANCHA	PARQUE	CÓDIGO IDRD	LOCALIDAD	DIRECCIÓN
6	NATURAL	SIMON BOLIVAR - Sector Parque Deportivo el Salitre (Alterna 3)	12-091	Barrios Unidos	Calle 187 Transversal 18 B
7	NATURAL	SIMON BOLIVAR - Sector Parque Deportivo el Salitre (Playa - 1)	12-091	Barrios Unidos	Carrera 17 Calle 175
8	NATURAL	TABORA	10-192	Engativá	Av Carrera 11 Calle 87
9	NATURAL	EL COUNTRY (Club)	01-1000	Usaquén	Carrera 14 Calle 7
10	NATURAL	SIMON BOLIVAR - Sector Unidad Deportivo el Salitre (UDS Beisbol)	10-290	Engativá	Carrera 14 Calle 7
11	NATURAL	SIMON BOLIVAR - Sector Unidad Deportivo el Salitre (UDS Atletismo)	10-290	Engativá	Carrera 14 Calle 7
12	NATURAL	SIMON BOLIVAR - Sector Unidad Deportivo el Salitre (UDS Atletismo) MARTE	10-290	Engativá	Carrera 1A Este Calle 3
13	NATURAL	SIMON BOLIVAR - Sector Unidad Deportivo el Salitre (UDS Sotfbol)	10-290	Engativá	Diagonal 4B Cra 8 E
14	NATURAL	SIMON BOLIVAR - Sector Unidad Deportivo el Salitre (UDS Voleibol)	10-290	Engativá	Transversal 8a este Calle 50 b sur
15	NATURAL	SAN CRISTOBAL (Estadio)	04-127	San Cristóbal	Carrera 5 a este Diagonal 31 C sur
16	NATURAL	PARQUE NACIONAL (PM-2A) ENRIQUE OLAYA HERRERA (Sector Historico)	03-035	Santa Fé	Diagonal 38 Sur No. 1F - 05
17	NATURAL	CIUDAD MONTES	16-112	Puente Aranda	Diagonal 38 Sur No. 1F - 05
18	NATURAL	CIUDAD MONTES (Softbol)	16-112	Puente Aranda	Calle 13 sur N.º 2- 50 este
19	NATURAL	CIUDAD MONTES (2 de Playa)	16-112	Puente Aranda	Calle 13 sur N.º 2- 50 este
20	NATURAL	UNIDAD DEPORTIVA LA ALQUERIA	16-024	Puente Aranda	Carrera 14 H Bis Calle 74 D sur
21	NATURAL	MILENTA TEJAR SAN EUSEBIO	16-099	Puente Aranda	Carrera 14 H Bis Calle 74 D sur

ITEM	TIPO DE CANCHA	PARQUE	CÓDIGO IDRD	LOCALIDAD	DIRECCIÓN
22	NATURAL	NUEVO MUZU	06-017	Tunjuelito	Carrera 14 H Bis Calle 74 D sur
23	NATURAL	LA SERENA	10-223	Engativá	Carrera 5 G Calle 93 sur
24	NATURAL	URBANIZACION BOCHICA	16-037	Puente Aranda	Carrera 14 A Calle 137 B sur
25	NATURAL	URBANIZACION LOS ANGELES PRIMER SECTOR	10-186	Engativá	Carrera 11 Calle 67 A Bis sur
26	NATURAL	PARQUE JUAN AMARILLO	10-171	Engativá	Carrera 11 Calle 67 A Bis sur
27	NATURAL	ATAHUALPA I PREDIO - El Cajon Sector I	09-024	Fontibón	Cra 55 Diagonal 49 sur
28	NATURAL	MARSELLA SECTOR NORTE I ETAPA - Pinos de Marsella	08-066	Kennedy	Cra 12 Calle 59 sur
29	NATURAL	SIMON BOLIVAR - Sector Complejo Acuatico (1, 2,3 Playa)	12-1000	Barrios Unidos	Diagonal 52 B sur Cra 61B
30	NATURAL	LA GAITANA	11-205	Suba	Cra 24 A Cll 4B Sur Av Boyacá
31	NATURAL	LA FLORIDA 1	10-311	Engativá	Cra 24 A Cll 4B Sur Av Boyacá
32	NATURAL	LA FLORIDA 2	10-311	Engativá	Cra 24 A Cll 4B Sur Av Boyacá
33	NATURAL	LA FLORIDA 3	10-311	Engativá	Cra 24 A Cll 4B Sur Av Boyacá
34	NATURAL	LA FLORIDA 4	10-311	Engativá	Carrera 80 J Calle 70 A sur
35	NATURAL	LA FLORIDA 5	10-311	Engativá	Carrera 65 Calle 55 A sur
36	NATURAL	LA FLORIDA 6	10-311	Engativá	Av. Calle 57 R sur (Aut. Sur) Carrera 72
37	NATURAL	LA FLORIDA 7	10-311	Engativá	Calle 58 J sur Cra 80 G
38	NATURAL	LA FLORIDA 8	10-311	Engativá	Calle 58 J sur Cra 80 G
39	NATURAL	LA FLORIDA 9	10-311	Engativá	Calle 69 A Sur 93D - 45
40	NATURAL	LA FLORIDA MARACANA 1	10-311	Engativá	Calle 75 BIS Sur (Av. C de Cali) Cra 80J
41	NATURAL	LA FLORIDA MARACANA 2	10-311	Engativá	Calle 73 D Sur Carrera 78 A hasta la 82 A Bis
42	NATURAL	PARQUE DEL RIO (SAN JOSE DE MARYLAND)	07-164	Bosa	Av Carrera 86 Calle 55 sur
43	NATURAL	AUTOPISTA SUR (Pavco)	07-152	Bosa	Carrera 98 B Calle 61 A sur

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

CONTRATO DE OBRA

No. de contrato	4041 DE 2024
Contratista Consultoría y/obra	CONSORCIO INNOVAPARQUES
Objeto	*"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 - "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS".*
Plazo de la ejecución etapa de obra	OCHO (08) MESES
Plazo total del contrato	OCHO (08) MESES
Valor etapa de obra	$ 5.200.000.000,00
Valor total del contrato	$ 5.200.000.000,00
Fecha Inicio	20 de enero de 2025
Fecha de Terminación del contrato:	19 de julio de 2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

No. de contrato	4080 DE 2024
Contratista de Interventoría	CONSORCIO SANTA TERESA 28
Objeto	*"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2"*
Periodo etapa de obra	OCHO (08) MESES
Plazo de liquidación	UN (01) MES
Plazo total del contrato	NUEVE (09) MESES
Valor etapa de obra	$ 2.107.109.833,00
Valor total del contrato	$ 2.107.109.833,00
Fecha Inicio	20 de enero de 2025
Fecha de Terminación contrato:	19 de agosto de 2025

1. OBJETIVOS

1.1 OBJETIVO GENERAL

Describir las actividades SST, realizadas por el contratista y verificadas por esta interventoria durante el primer periodo de obra, que comprende el periodo del **01 al 30 de junio de 2025**, de acuerdo con los lineamientos SST para el contrato de obra.

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Representar al IDRD ejecución de los contratos tanto de Obra como de Interventoría con relación al componente SST.
- Informar de forma continua y periódica a través de los comités de obra, el avance, problemas y solución.
- Supervisar la ejecución y desarrollo de las actividades SST en obra
- Supervisar y controlar el cumplimiento de las obligaciones de pagos de salud, pensión. ARL y aportes a la caja de compensación familiar, ICBF y Sena, teniendo en cuenta la normatividad legal.
- Llevar el registro de maquinaria que ingresa a la obra.
- Llevar un estricto control de afiliaciones y pagos de seguridad social del personal que ingresa a la obra del contratista como la interventoría.
- Verificar el cumplimiento de entrega de dotación y elementos de protección personal al personal que labora en obra al igual el uso de los elementos de protección personal.

2. DOCUMENTACIÓN DEL PERSONAL

2.1. Personal del contrato y verificación de aportes parafiscales interventoría

Para la ejecución del contrato, en el mes de **junio de 2025**, la interventoría conto con el personal relacionado en la ilustración 1.

Ilustración 1. Organigrama Interventoría contrato 4080-2024



Fuente: Interventoría

• SEGUIMIENTO COMPONENTE SST

De acuerdo con lo establecido en el Anexo técnico y personal contractual mínimo requerido por CONSORCIO SANTA TERESA 028, realizo la radicación de las hojas de vida de los profesionales de la Interventoría a la entidad contratante.

Tabla 1. Relación personal interventoría junio de 2025

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	CARGO
1	CARLOS ANDRES FIGUEROA	1.049.629.534	DIRECTOR INTERVENTORIA
2	MARIA CLAUDIA MAHECHA	1.121.934.579	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
3	LAURA SOFIA FERNANDEZ	1.030.673.336	PROFESIONAL SST
4	JUAN CARLOS RAMIREZ	1.015.427.454	TOPOGRAFO
5	RUBEN DARIO MARQUEZ	1.015.393.327	CADENERO I
6	RAFAEL SANABRIA PIÑEROS	1.193.117.520	CADENERO II
7	LINA DEL PILAR RODRIGUEZ	53.107.341	ABOGADA
8	SOLBEY MAYERLY DUQUE	1.033.753.610	CONTADORA
9	LIZETH ALEIDA CASTILLO	1.022.956.705	SECRETARIA
10	ANDRES GIOVANNY CORDOBA	1.032.418.707	INSPECTOR 1
11	DIEGO ANDRES GALE	1.119.049.949	INSPECTOR 2
12	ANGIE ACERO	1.013.633.885	INSPECTOR 3
PERSONAL RETIRADO MAYO			
1	MARGARITA HERRERA	52.539.792	COORDINADORA DE INTERVENTORIA
PERSONAL RETIRADO JUNIO			
2	RAUL ORLANDO DELGADO	79.573.492	DIRECTOR DE OBRA
3	SERGIO ANDRES PEDREROS	1.010.161.283	INSPECTOR 3

Fuente: Interventoría

Tabla 2. Relación de ingresos interventoría junio de 2025

Total, Ingresos en el Periodo	**2**
Total, Retirados y/o trasladados	**2**
Total, Activos en el periodo	**12**

Fuente: interventoría

En el **ANEXO 1** del presente informe se allega el listado de personal de interventoría que participo en el periodo del informe, conjuntamente con las planillas de pago de Seguridad Social.

En el **ANEXO 12,** se adjuntan los documentos de ingreso del personal nuevo ingresado para el periodo de interventoría.

3.1. Listado de personal del contrato y verificación de aportes parafiscales Contratista

En el **ANEXO 1.1.**, se adjunta el listado de personal operativo activo y sus soportes de afiliación y pagos de seguridad social. Así mismo, se relaciona el personal ingresado en la siguiente tabla:

Tabla 3. Relación personal operativo

CONTRATISTA / SUBCONTRATISTA	NOMBRES	IDENTIFICACIÓN	CARGO
PERSONAL NUEVO			
NO SE PRESENTARON INGRESOS EN EL PERIODO			
PERSONAL ANTIGUO			
INGENIERIA CMC SAS	CAMPOS MARIN DAVID CAMILO	1000615938	AYUDANTE
INGENIERIA CMC SAS	ORTIZ COIME ALVARO LEONEL	1087198177	AYUDANTE
INGENIERIA CMC SAS	RAMIREZ RUBIO JHON ALEXANDER	1033760239	AYUDANTE
INGENIERIA CMC SAS	JIMENEZ MONDRAGON JHON ANDRES	80863671	AYUDANTE
INGENIERIA CMC SAS	PARRA CRISTIAN CAMILO	10127524042	AYUDANTE
INGENIERIA CMC SAS	CUBIDES GARZON LUIS CARLOS	1019005189	AYUDANTE

INGENIERIA CMC SAS	FORERO ORTEGA JULIO CESAR	79380454	AYUDANTE
INGENIERIA CMC SAS	CARDENAS CARDENAS HILARIO	3028150	CONDUCTOR
INGENIERIA CMC SAS	CERQUERA JOSELITO	12209313	AYUDANTE
INGENIERIA CMC SAS	GARZON PINEDA JOSE ALEJANDRO	1033692776	AYUDANTE
INGENIERIA CMC SAS	JIMENEZ LASSO WILBER DIOMEDES	5855002	CONDUCTOR
INGENIERIA CMC SAS	LOPEZ AYALA BRANDON SEBASTIAN	1233890527	ING RESIDENTE
INGENIERIA CMC SAS	MERCADO BASILIO LUIS GUILLERMO	1007195407	CONDUCTOR
INGENIERIA CMC SAS	MUÑOZ MACETO JESUS	1007289162	AYUDANTE
INGENIERIA CMC SAS	OVALLE BOLIVAR YEFERSON IVAN	1074414778	AYUDANTE
INGENIERIA CMC SAS	QUEVEDO LEGUIZAMON JHON ALEXANDER	1123116491	AYUDANTE
INGENIERA CMC SAS	SABOGAL CUERVO DANIEL STEBAN	1031803879	INSPECTOR
CONTRATISTA	GARCIA LINAREZ EDWIN JAVIER	1013623379	DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA	GUTIERREZ PINEDA JAVIER	79455166	ASESOR AGRONOMO
CONTRATISTA	LOPEZ ANDREA	1018422772	PROFECIONAL SST
CONTRATISTA	ACEVEDO BERNAL OSCR MAURICIO	1115913000	INSPECTOR DE OBRA
CONTRATISTA	GARCIA GARCIA BRAYAN STEVEN	10244488768	INSPECTOR DE OBRA
CONTRATISTA	DIAZ DAZA JONY FERNEY	1013632556	INGENIERO CIVIL
CONTRATISTA	SANABRIA JUAN CARLOS	79698876	CADENERO
CONTRATISTA	VELASQUES QUEVEDO DEASSI MAGALY	1023865830	SECRETARIA

INNOVAPARQUES	CAROL GISELLE LOPEZ	1022443543	INSPECTOR
PERSONAL RETIRADO			
INGENIERIA CMC SAS	YATE PARRA ANGEL GABRIEL	1010014125	AYUDANTE

2.2. Cumplimiento de exámenes médicos ocupacionales

CUMPLIMIENTO ENTREGA DE EXAMENES MEDICOS DE INGRESO

Durante el Periodo el contratista hizo entrega de todos los exámenes médicos realizados a cada uno de los trabajadores que ingresaron durante el periodo al proyecto. La interventoría realiza la revisión y verificación de dichos documentos.

De acuerdo con los resultados de los exámenes médicos ocupacionales de ingreso, se emitieron las siguientes recomendaciones médicas:

- Pausas activas.
- Uso de elementos de protección personal.
- Cita por nutrición EPS
- Uso de lentes permanente
- Control anula optometría
- Nutrición balanceada

CONSIDERACIONES LEGALES RELATIVAS A LOS EXAMENES MEDICOS DE INGRESO

Las resoluciones 2346 del 11 de julio de 2007 y 1918 de junio 5 de 2009 del Ministerio de la Protección Social (actualmente Ministerio de trabajo y de Salud y Protección Social) reglamentan la práctica y contenido de las evaluaciones medicas ocupacionales de ingreso.

Con el objeto de determinar la existencia de restricciones para el trabajo a desempeñar, acorde con los requerimientos definidos por el empleador en el perfil del cargo.

- **Interventoría:** Los soportes del personal ingresado, se adjuntan en el **ANEXO 12.**
- **Contratista:** No se registraron ingresos durante el periodo.

2.3. Personal Retirado de Interventoría

En el periodo del informe la interventoría, presento retiro de personal, a continuación, se relaciona el personal retirado y en el **ANEXO 10.1**, se adjunta soportes de paz y salvo.

Tabla 4. Relación personal retirado interventoría

PERSONAL RETIRADO JUNIO			
1	RAUL ORLANDO DELGADO	79.573.492	DIRECTOR DE OBRA
2	SERGIO ANDRES PEDREROS	1.010.161.283	INSPECTOR 3

2.4. Personal Retirado de contratista

En el periodo del informe el contratista, presento el retiro de personal, a continuación, se relaciona el personal retirado y en el **ANEXO 10**, se adjunta soportes de paz y salvo.

Tabla 5. Relación personal retirado contratista

PERSONAL RETIRADO			
INGENIERIA CMC SAS	YATE PARRA ANGEL GABRIEL	1010014125	AYUDANTE

3. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS

La matriz de riesgo, también conocida como matriz de probabilidad e impacto, se utiliza durante el análisis de riesgo, es una herramienta visual que le permite ver rápidamente que riesgos deben recibir la mayor atención, lo que hace que sea mucho más fácil para los equipos comprender y participar en el proceso.

Siguiendo los lineamientos establecidos en la GTC 45, la interventoría verifico cumplimiento de las medidas de identificación de peligros, durante el periodo se verifican avance de obra por tal razón el contratista actualiza matriz de riesgo de igual forma se le recomendó capacitar al personal para prevenir accidentes laborales.

Según las actividades constructivas y de Seguridad y Salud en el Trabajo se tienen en cuenta para llevar un control adecuado en la aplicación de la matriz de riesgo, procedimientos de trabajos seguros, programa de señalización, demarcación de áreas, uso de elementos de protección personal, inspecciones y capacitaciones, con el fin prevenir, controlar y evitar accidentes laborales y la implementación de los protocolos de Bioseguridad con el fin de prevenir el contagio del COVID19.

- **Interventoría:** La Matriz de riesgos que se implementa a la fecha y que se utiliza para el proceso de Notificación de riesgos al personal, es la adjuntada en el Plan de gestión de SST y se encuentra actualizada con fecha del 27 de enero de 2025, en el **ANEXO 2** del presente informe.

- **Contratista:** La matriz de riesgos del contratista de obra aprobada para el proyecto en el plan de gestión de seguridad y salud en el trabajo aprobado, se adjunta en el **ANEXO 2.1.**

4. INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD

Interventoría: Se realizo registro de los indicadores establecidos de accidentalidad, para el periodo del informe y en el cronograma del SG-SST de la interventoría, los cuales se allegan en el **ANEXO 3** del presente informe.


Tabla 6. Resúmenes indicadores de accidentalidad



Contratista: A continuación, se presentan los indicadores de accidentalidad del contratista de obra:

Tabla 7. Resúmenes indicadores de accidentalidad contratista

	Número de trabajadores en el mes								
dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	IF	IS	LL
22	24	30	24	23	26	25	0	0	0



5. ACCIDENTES DE TRABAJO

- Interventoría: No se presentaron accidentes de trabajo en la interventoría en el periodo del informe.
- Contratista: No se presentaron accidentes de trabajo por parte del contratista de obra en el periodo del informe.

6. PROGRAMA DE CAPACITACIONES.

La capacitación es una estrategia indispensable para alcanzar los objetivos propuestos en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se trata de lograr que todos los trabajadores de la empresa, de todos los niveles, adquieran los conocimientos, actitudes y prácticas necesarios para generar ambientes de trabajo sano, seguro y confortable. Por otra parte, de esta forma se da cumplimiento al artículo 62 del decreto 1295/94, que obliga a los empleadores a informar a sus trabajadores, a que riesgos pueden estar expuestos durante la ejecución de sus labores que tiene como objetivo proveer formalmente a los trabajadores el conocimiento necesario para desempeñar su trabajo en forma eficiente, cumpliendo con los estándares de Seguridad, calidad y satisfacción.

- Interventoría: Durante el periodo del presente informe, interventoría realizo la capacitación programada. Asi mismo en el **ANEXO 5** se anexa el plan de trabajo del SG-SST y soportes de la capacitación.
- *Contratista:* Durante el periodo del informe, el contratista de obra realizo capacitaciones al personal de obra. En el **ANEXO 5.1.** se adjuntan lo soportes.

7. COMITES

a. Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST

El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo es un organismo de promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de la empresa, a través de actividades e promoción, información y divulgación. Es decir, garantiza que los riesgos de enfermedad y accidentes derivados del trabajo se reduzcan al mínimo. Está regido por el Decreto 614 de 1984, Resolución 1016 de 1989, Decreto-Ley 1295 de 1994, Ley 1562 de 2012 y Decreto 1443 de 2014.

- Interventoría: Durante el periodo del informe, se realizó la reunión del COPASST el 27-06-2025. El soporte del acta se encuentra en el **ANEXO 4.**

- Contratista: Durante el periodo del informe, se realizó la reunión del COPASST el 30-06-2025. El soporte del acta se encuentra en el **ANEXO 4.1.**

b. Comité de Convivencia Laboral – CONVILAB

El Comité de convivencia Laboral es el organismo al que le corresponde velar por la prevención de las situaciones que configuren acoso laboral, forma parte de las estrategias que las empresas adoptan para crear mejores condiciones laborales para sus empleados. Se crea con el objetivo de solucionar los diferentes tipos de conflictos relacionados con el contexto laboral, que se pueda presentar con las personas que trabajan en una empresa.

- **Interventoría:** Durante el periodo del informe se llevó a cabo la reunión de CCL el día 27-06-2025..
- **Contratista:** Durante el periodo del informe N°8 (junio de 2025), se realizó la reunión del CCL. El contratista no adjunta acta por fines de confidencialidad.

8. REGISTRO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION

Los elementos de protección personal deben utilizarse como parte del programa de gestión y seguridad industrial de la empresa el cual abarca la evaluación completa de los peligros y el uso correcto de los equipos, su formación y la educación de los empleados que los deben de utilizar de las operaciones de mantenimiento, construcción y el compromiso de las directivas en busca de un resultado, los elementos de protección son esenciales, son elementos esenciales para el control de los riesgos laborales y se pueden utilizar eficazmente si se conocen bien el lugar que ocupan en la parte de seguridad y salud ocupacional.
Los elementos de protección personal (EPP) son equipos de seguridad, de uso individual, que tienen como finalidad proteger al trabajador de los peligros propios o derivados de la labor que se ejecuta. Su función no es eliminar el peligro, sino minimizar la exposición a éste en conjunto con la aplicación de controles.

- **Interventoría:** Durante el periodo del informe no se entregaron EPP al personal de interventoría.

- **Contratista:** Durante el periodo del informe, el contratista de obra realizo la entrega de EPP, en el **ANEXO 7.**, se adjuntan los soportes.

9. INSPECCIONES PLANEADAS

Corresponde a una serie de actividades que se realizan con el objeto de evaluar los riesgos existentes en los centros de trabajos o áreas de empresa, llevando una lista de verificación y determinar el cumplimiento de las condiciones de seguridad o peligro.

La Inspecciones de seguridad es una herramienta que permite descubrir y evaluar los problemas de salud y seguridad antes de que ocurran lesiones en las personas o pérdidas en los materiales y procesos.
Ayudan a:

- Identificar
- Analizar

- Controlar

- **Interventoría:** Para el periodo del informe la interventoría realizo las inspecciones, programadas dentro de su plan de trabajo SST:
- Inspecciones de extintor (27-06-2025)
- Inspecciones de botiquín. (27-06-2025)

De acuerdo a lo evidenciado en las inspecciones realizadas en el periodo se tienen los siguientes resultados:

Tabla 8:Relación inspecciones realizadas por la interventoría

TIPO DE INSPECCION	FECHA DE INSPECCION	OBSERVACIONES	ACCIONES CORRECTIVA, PREVENTIVAS O DE MEJORA	INSPECCION REALIZADA POR
Extintor	27-06-2025	Extintor multipropósito con vigencia hasta 2025-08	Ninguna	Sofia Fernández
Botiquín	27-06-2025	Botiquín tipo A instalado en campamento de interventoría. Sin consumo a la fecha.	Ninguna	Sofia Fernández

Fuente: Interventoría

Las inspecciones mencionadas, se allegan en el presente informe en el **ANEXO 6**

- **Contratista:** Durante el periodo del informe el contratista de obra desarrollo las siguientes inspecciones:
    - Inspección locativa (06-06-2025)
    - Inspección EPP (09-06-2025)

Las inspecciones mencionadas, se allegan en) el presente informe en el **ANEXO 6.1.**

10. PERMISOS DE TRABAJO

Un permiso de trabajo es un documento que especifica la tarea a realizar, los peligros asociados y las medidas de seguridad que deben adoptarse.
Permiso de trabajo: Es un mecanismo documentado que permite verificar y controlar todos los aspectos de seguridad que se deben tener en cuenta antes y durante la ejecución de trabajos de alto riesgo, con el fin de prevenir la ocurrencia de accidentes e incidentes.
Las empresas realizan esfuerzos considerables para garantizar la seguridad de sus operaciones y para proteger la salud y la seguridad de sus empleados. Entre las muchas medidas de control y prevención establecidas, el sistema de permisos de trabajo es una herramienta clave para la gestión de la seguridad en el lugar de trabajo.

- **Interventoria:** De acuerdo a lo consignado en el plan SST de la interventoría, se recuerda a la entidad que acorde a las actividades realizadas como parte del objeto del contrato, las cuales fueron evaluadas en la matriz de riesgos, el personal de interventoría no realiza ninguna actividad de alto riesgo, razón por la cual no se remiten soportes de realización de permisos de trabajo.

- **Contratista:** Durante el periodo del informe se desarrollaron actividades de alturas para el cambio o mantenimiento de mallas nylon. En el **ANEXO 9**, se adjuntan los permisos correspondientes.

11. MAQUINARIA Y VOLQUETAS

A continuación, se presenta la información de la maquinaria y volquetas aprobadas para contrato.

Tabla 9. Relación maquinaria ingresada en el periodo

TIPO DE VEHICULO	MARCA	SERIAL	COLOR	AÑO
Minicargador	DUMAQ	SL800	MARILLO NEGRO GRIS	2020
Retroexcavadora	SANY	BHL75	AMARILLO	2025
Excavadora	BOBCAT	E42	BLANCO NARANJA	2014

Fuente: Interventoría

Tabla 10. Relación volquetas

TIPO DE VEHICULO	PLACA	AÑO	COLOR	SOAT	RTM	PIN
VOLQUETA	TFU 761	2012	BLANCO NEGRO NARANJA	7/02/2025	12/01/2025	2191

Fuente: Interventoría

Se aclara que para el periodo de reporte ninguna de esta maquinaria estuvo desarrollando actividades en los parques intervenidos.

12. REPORTE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA

A continuación, se presenta el reporte de todas las actividades realizadas por el contratista durante el presente periodo:

Tabla 11. Reporte de actividades contratista de obra

ACTIVIDADES BASICAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATISTA	VERIFICACION DE DOCUMENTACION ENTREGADA POR EL CONTRATISTA Y VERIFICADA POR LA INTERVENTORIA
Personal de obra	Del informe del contratista y se adjunta en el **(Anexo 1.1)** del presente informe como reporte personal del contratista.
Pagos al sistema de SGSS	Durante el periodo el contratista reporta pagos de seguridad social del personal vinculado al proyecto que es antiguo ingresa con planilla esta documentación es reportada por correo y en el **(Anexo 1.1)** del informe mensual del contratista.
Afiliaciones al Sistema de Seguridad Social	El contratista cumple con la entrega de soportes de afiliaciones de seguridad social del personal vinculado al proyecto. Inicialmente son enviadas por correo y revisado y aprobadas para su respectivo ingreso. El contratista reporta esta información en el **(Anexo 1.1)** del informe mensual del contratista
Exámenes Médicos de ingreso	Durante el periodo el contratista no presento ingresos de personal, en caso de presentarse ingresos de personal los exámenes médicos al igual y son verificados, y adjuntados en el informe mensual del informe del contratista, cumpliendo con la entrega de la totalidad de exámenes médicos del personal que ingreso durante el periodo.
Entrega de Dotación	El contratista reporta en el **(Anexo 7)**, del informe mensual los registros de entrega de dotación, durante el primer periodo del Informe de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Inducción y Notificación de Riesgo.	No aplica para el periodo de reporte
Índice de Accidentalidad	El contratista reporta durante el presente periodo el formato de índice de accidentalidad con 0 accidentes laborales durante el mes de reporte.

13. CONCLUSIONES

- La interventoría da cumplimiento de las actividades básicas establecidas en el SG-SST
- La interventoría realiza el respectivo seguimiento a las obligaciones contractuales del contrato.
- El contratista dio cumplimiento a lo establecido en su SG-SST.
- No se presentaron accidentes de trabajo en el equipo de interventoría ni del contratista.
- Se adjunta registro fotográfico del componente SST en el **ANEXO 11.**

ANEXO 1. RELACIÓN PERSONAL INTERVENTORIA

CONSORCIO SANTA TERESA 19	BOGOTÁ	INTERVENTORIA
		REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD
		PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025 CONTRATO NO. 4080 DE 2024

RELACION DE PERSONAL DE INTERVENTORIA

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	GENERO	CEDULA	CARGO	EMPRESA APORTANTE	ARL	FECHA DE AFILIACIÓN O PAGO	E.P.S	FECHA DE ULTIMO PAGO	A.F.P.	FECHA DE ULTIMO PAGO
1	CARLOS ANDRES FIGUEROA	MASCULINO	1.049.629.534	DIRECTOR DE OBRA	SOLIUN INGENIERIA	SURA	3/06/2025	COMPENSAR	3/06/2025	PORVENIR	3/06/2025
2	MARIA CLAUDIA MAHECHA	FEMENINO	1.121.934.579	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	4D CONSTRUCTORES	SURA	11/06/2025	SANITAS	11/06/2025	COLPENSIONES	11/06/2025
3	LAURA SOFIA FERNANDEZ	FEMENINO	1.030.673.336	PROFESIONAL SST	SUSTENTABILIDAD EMPRESARIAL SAS	SURA	11/06/2025	SURA	11/06/2025	PORVENIR	11/06/2025
4	JUAN CARLOS RAMIREZ	MASCULINO	1.015.427.454	TOPOGRAFO	SOLIUN SAS	SURA	3/06/2025	FAMISANAR	3/06/2025	PROTECCION	3/06/2025
5	RUBEN DARIO MARQUEZ	MASCULINO	1.015.393.527	CADENERO I	4D CONSTRUCTORES	SURA	11/06/2025	SANITAS	11/06/2025	PORVENIR	11/06/2025
6	RAFAEL SANABRIA PIÑEROS	MASCULINO	1.193.117.520	CADENERO II	4D CONSTRUCTORES	SURA	11/06/2025	SANITAS	11/06/2025	PROTECCION	11/06/2025
7	LINA DEL PILAR RODRIGUEZ	FEMENINO	53.107.341	ABOGADA	SOLIUN SAS	SURA	10/06/2025	COMPENSAR	10/06/2025	COLPENSIONES	10/06/2025
8	SOLBEY MAYERLY DUQUE	FEMENINO	1.033.753.610	CONTADORA	4D CONSTRUCTORES	SURA	11/06/2025	SALUD TOTAL	11/06/2025	PORVENIR	11/06/2025
9	LIZETH ALEIDA CASTILLO	FEMENINO	1.022.956.705	SECRETARIA	4D CONSTRUCTORES	SURA	11/06/2025	COMPENSAR	11/06/2025	PORVENIR	11/06/2025
10	ANDRES GIOVANNY CORDOBA	MASCULINO	1.032.418.707	INSPECTOR 1	SOLIUN SAS	SURA	3/06/2025	SURA	3/06/2025	COLFONDOS	3/06/2025
11	DIEGO ANDRES GALE	MASCULINO	1.019.049.949	INSPECTOR 2	4D CONSTRUCTORES	SURA	11/06/2025	SANITAS	11/06/2025	COLPENSIONES	11/06/2025
12	ANGIE ACERO	FEMENINO	1.013.633.885	INSPECTOR 3	4D CONSTRUCTORES	SURA	11/06/2025	SANITAS	11/06/2025	PROTECCION	11/06/2025

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **SOLIUN INGENIERIA SAS**, identificada con **NI** número **901114547**, aportó por **CARLOS ANDRES FIGUEROA AYALA** identificado(a) con **CC** número **1049629534** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 05 - 2025 y 06 - 2025 de la siguiente forma.

CÓDIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	DÍAS COT.																										
14-11	ARL SURA	1																	0	30	$4,800,000	0.06960	$318,000	$0	$0	Mayo - 2025	86078169	03/06/2025	SI
CCF24	Compensar Caja de Compensación Fliar	1																	0	30	$4,800,000	0.04000	$183,600	$0	$0	Mayo - 2025	86078169	03/06/2025	SI
EPS009	Compensar EPS	1																	0	30	$4,800,000	0.04000	$183,600	$0	$0	Junio - 2025	86078169	03/06/2025	SI
230301	Porvenir	1																	0	30	$4,800,000	0.15000	$734,400	$0	$0	Mayo - 2025	86078169	03/06/2025	SI

El presente certificado se expide a los **2** días del mes **Julio** de **2025**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **4D CONSTRUCTORES SAS**, identificada con **NI** número **901141365**, aportó por **MARIA CLAUDIA MAHECHA MARTINEZ** identificado(a) con **CC** número **1121934579** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 05 - 2025 y 06 - 2025 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	ESTADO	DIAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACION OBLIGATORIA	VSP VOLUNTARIA	TAP RETENTIVA	PERIODO	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	AFINIDAD
	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1	0	30	$3,450,000	0.16000	$552,000	$0	$0	Mayo - 2025	87119827	11/06/2025	N
14-11	ARL SURA	1	0	30	$3,450,000	0.00980	$33,810	$0	$0	Mayo - 2025	87119827	11/06/2025	N
CCF24	Comfenalco Caja de Compensacion Filial	1	0	30	$3,450,000	0.04000	$138,000	$0	$0	Mayo - 2025	87119827	11/06/2025	N
EPS005	Sanitas EPS	1	0	30	$3,450,000	0.04000	$138,000	$0	$0	Mayo - 2025	87119827	11/06/2025	N

El presente certificado se expide a los 2 días del mes Julio de 2025

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **4D CONSTRUCTORES SAS**, identificada con **NI** número **901141365**, aportó por **RUBEN DARIO MARQUEZ ACUÑA** identificado(a) con **CC** número **1015393327** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 05 - 2025 y 06 - 2025 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	DIAS COTIZADOS	VSP	VST	SUS	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PRN	LMA	VACT	TDE	TAE	TDP	TAP	COTIZACION	MORA	IBC	SALARIO APORTE	COTIZACION FSI APORTE	AFP SOLIDARIDAD	AFP SUBSISTENCIA	PERIODO	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	ESTADO
14-11	ARL SURA	1																		0		30	$1,580,000	0.00000	$190,800	$0	$0	Mayo - 2025	87116827	11/06/2025	S
CCF24	Comfenalco Cota de Compensacion Fliar	1																		0		30	$1,580,000	0.04000	$62,700	$0	$0	Mayo - 2025	87116827	11/06/2025	S
ESI301	Fonasa	1																		0		30	$1,580,000	0.16000	$250,800	$0	$0	Mayo - 2025	87116827	11/06/2025	S
EPS085	Sanitas EPS	1																		0		30	$1,580,000	0.04000	$62,700	$0	$0	Junio - 2025	87116827	11/06/2025	S

El presente certificado se expide a los 2 días del mes Julio de 2025

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **Soliun S.A.S**, identificada con **NI** número **900768458**, aportó por **JUAN CARLOS RAMIREZ SOLANO** identificado(a) con **CC** número **1015427454** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 05 - 2025 y 06 - 2025 de la siguiente forma.

CÓDIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	INGRESO	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COT	FSP	VTE	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	DIAS COTIZADOS	DIAS LIQUIDADOS	IBC	TARIFA APORTES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	FSP NO PENSIONADO	APORTE VOLUNTARIO	PERIODO	PERIODO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	ESTADO
	ARL SURA	1																0	30	$2,860,000	0.00980	$199,100	$0	$0	Mayo - 2025	89818017	03/06/2025	S
CCF24	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	1																0	30	$2,860,000	0.04000	$114,400	$0	$0	Mayo - 2025	89818017	03/06/2025	S
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1																0	30	$2,860,000	0.04000	$114,400	$0	$0	Junio - 2025	89818017	03/06/2025	S
25201	Protección (Mó + Protección)	1																0	30	$2,860,000	0.16000	$457,600	$0	$0	Mayo - 2025	89818017	03/06/2025	S

El presente certificado se expide a los 2 días del mes Julio de 2025

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **SUSTENTABILIDAD EMPRESARIAL**, identificada con **NI** número **901331295**, aportó por **LAURA SOFIA FERNANDEZ FLECHAS** identificado(a) con **CC** número **1030673336** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 05 - 2025 y 06 - 2025 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	DIAS COTIZADOS	INGRESO	RETIRO	TRASLADO	SANCION	INCAPACIDAD	LICENCIA	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	COTIZACION	EXONERACION	TDP	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACION APORTE	VAP RETENIDA	VAP NO RETENIDA	PERIODO	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	SECUENCIA
14-11	ARL SURA	1																	0		30	$2,420,000	0.04960	$146,500	$0	$0	Mayo - 2025	87117145	11/06/2025	78
CCF20	Colsubsidio Caja de Compensacion Pilar	1																	0		30	$2,420,000	0.04800	$96,800	$0	$0	Mayo - 2025	87117145	11/06/2025	78
EPS010	EPS Sura	1																	0		30	$2,420,000	0.04000	$96,800	$0	$0	Junio - 2025	87117145	11/06/2025	78
25030	Porvenir	1																	0		30	$2,420,000	0.16000	$387,200	$0	$0	Mayo - 2025	87117145	11/06/2025	78

El presente certificado se expide a los 2 días del mes Julio de 2025

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **4D CONSTRUCTORES SAS**, identificada con **NI** número **901141365**, aportó por **SOLBEY MAYERLY DUQUE CADENA** identificado(a) con **CC** número **1033753610** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 05 - 2025 y 06 - 2025 de la siguiente forma.

| | | |

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **4D CONSTRUCTORES SAS**, identificada con **NI** número **901141365**, aportó por **RAFAEL RICARDO SANABRIA PIÑERES** identificado(a) con **CC** número **1193117520** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 05 - 2025 y 06 - 2025 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	DEPENDIENTE	0 A 10	11 A 15	16 A 19	20 A 22	23 A 25	26 A 28	29 A 31	32 A 34	35 A 37	38 A 40	41 A 43	44 A 46	47 A 49	50 A 52	53 A 55	>55	COTIZACION VOLUNTARIA	DIAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACION APORTE	VSP INCAPACIDAD	VSP LICENCIA MATERNIDAD	PERIODO	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	RETIRADO
14-11	ARL SURA	1																	0	30	$2,700,000	0.00522	$14,100	$0	$0	Mayo - 2025	87116527	11/06/2025	N
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1																	0	30	$2,700,000	0.04000	$108,000	$0	$0	Mayo - 2025	87116527	11/06/2025	N
230201	Proteccion (FNG + Proteccion)	1																	0	30	$2,700,000	0.16000	$432,000	$0	$0	Mayo - 2025	87116527	11/06/2025	N
EPS005	Sanitas EPS	1																	0	30	$2,700,000	0.04000	$108,000	$0	$0	Junio - 2025	87116527	11/06/2025	N

El presente certificado se expide a los 2 días del mes Julio de 2025

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **Soliun S.A.S**, identificada con **NI** número **900768458**, aportó por **LINA DEL PILAR RODRIGUEZ COBOS** identificado(a) con **CC** número **53107341** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, el periodo de pensión de 05 - 2025 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	DIAS COTIZADOS	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	COTIZACION	IBC	TRS	VALOR APORTE	VALOR AJUSTE APORTE	VALOR NO RETENIDO	VALOR SUSPENSION	PERIODO	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXTRANJERO
	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	30														0	30	$1,423,500	0.16000	$227,800	$0	$0	Mayo - 2025	87119701	19/06/2025	No
14-11	ARL SURA	30														0	30	$1,423,500	0.00522	$7,430	$0	$0	Mayo - 2025	87119701	19/06/2025	No
EPS008	Compensar EPS	30														0	30	$1,423,500	0.12500	$178,000	$0	$0	Mayo - 2025	87119701	19/06/2025	No

El presente certificado se expide a los **2** días del mes **Julio** de **2025**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **4D CONSTRUCTORES SAS**, identificada con **NI** número **901141365**, aportó por **DIEGO ANDRES GALE FUERTES** identificado(a) con **CC** número **1019049949** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 05 - 2025 y 06 - 2025 de la siguiente forma.

ENTIDAD	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	DIAS COTIZADOS	COTIZACIÓN	TARIFA	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN FSP APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXTEMPORANEO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1																0		$0	$2,520,000	0.16000	$403,200	$0	$0	Mayo - 2025	871 95827	11/06/2025	SI
14-11	ARL SURA	1																0		$0	$2,520,000	0.00960	$179,400	$0	$0	Mayo - 2025	871 95827	11/06/2025	SI
CCF24	Comfenalco Caja de Compensación Fliar	1																0		$0	$2,520,000	0.04000	$100,800	$0	$0	Mayo - 2025	871 95827	11/06/2025	SI
EPS035	Sanitas EPS	1																0		$0	$2,520,000	0.04000	$100,800	$0	$0	Junio - 2025	871 95827	11/06/2025	SI

El presente certificado se expide a los 2 días del mes Julio de 2025

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **4D CONSTRUCTORES SAS**, identificada con **NI** número **901141365**, aportó por **ANGIE VANESSA ACERO VACA** identificado(a) con **CC** número **1013633885** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 05 - 2025 y 06 - 2025 de la siguiente forma.

ID ENTIDAD	NOMBRE ADMINISTRADORA	FORMULARIO	DIAS COTIZADOS	DIAS MORA	DIAS VACACIONES	DIAS LICENCIA MATERNIDAD	DIAS LICENCIA NO REMUNERADA	DIAS INCAPACIDAD GENERAL	DIAS LICENCIA MATERNIDAD	DIAS INCAPACIDAD LABORAL	DIAS LICENCIA REMUNERADA	DIAS LICENCIA NO REMUNERADA	DIAS INCAPACIDAD GENERAL	DIAS LICENCIA MATERNIDAD	DIAS INCAPACIDAD LABORAL	COTIZACION	IBC	TARIFA APORTE	VALOR APORTE	VALOR ACTIVIDAD ALTO RIESGO	VALOR SOLIDARIDAD	PERIODO	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	DEPENDIENTE
	ARL SURA	1	X	X												3	28	$2,800,000	0.06080	$161,000	$0	$0	Mayo - 2025	97116827	11/06/2025	SI
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fiar	1	X	X												3	28	$2,704,167	0.04000	$108,200	$0	$0	Mayo - 2025	97116827	11/06/2025	SI
23231	Protección (RG + Protección)	1	X	X												3	28	$2,550,000	0.16000	$416,000	$0	$0	Mayo - 2025	97116827	11/06/2025	SI
EPS025	Sanitas EPS	1	X	X												3	28	$2,550,000	0.04000	$104,000	$0	$0	Junio - 2025	97116827	11/06/2025	SI

El presente certificado se expide a los 2 días del mes Julio de 2025

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **Soliun S.A.S**, identificada con **NI** número **900768458**, aportó por **ANDRES GIOVANNY CORDOBA RODRIGUEZ** identificado(a) con **CC** número **1032418707** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 05 - 2025 y 06 - 2025 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE																DIAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACION OBLIGATORIA	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	SECUENCIA
14-11	ARL SURA	1															0	30	$2,660,000	0.00960	$188,109	$0	$0	Mayo - 2025	88978317	03/06/2025	Si
23301	Colfondos	1															0	30	$2,660,000	0.16000	$457,600	$0	$0	Mayo - 2025	88978317	03/06/2025	Si
CCF24	Compensar Caja de Compensación Fliar	1															0	30	$2,660,000	0.04000	$114,400	$0	$0	Mayo - 2025	88978317	03/06/2025	Si
EPS013	EPS Sura	1															0	30	$2,600,000	0.04000	$114,400	$0	$0	Junio - 2025	88978317	03/06/2025	Si

El presente certificado se expide a los 2 días del mes Julio de 2025

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

ANEXO 1.1. RELACIÓN PERSONAL CONTRATISTA

CONSORCIO INNOVAPARQUES

RELACIÓN DE PERSONAL INFORME [illegible] No 4
CONTRATO 4041 de 2024
PERIODO: 01 de Junio Al 30 de Junio 2025

BOGOTÁ

PERSONAL VINCULADO EN EL PERIODO

No.	CONTRATISTA / SUBCONTRATISTA	NOMBRES	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FECHA INGRESO	ESTADO	FECHA DE RETIRO	ARL	FECHA DE ULTIMO PAGO Y/O AFILIACIÓN	EPS	FECHA DE ULTIMO PAGO Y/O AFILIACIÓN	AFP	FECHA DE ULTIMO PAGO Y/O AFILIACIÓN	FECHA IDRD
NO SE PRESENTARON INGRESOS														

PERSONAL ANTIGUO EL PERIODO

No.	CONTRATISTA / SUBCONTRATISTA	NOMBRES	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FECHA INGRESO	ESTADO	FECHA DE RETIRO	ARL	FECHA DE ULTIMO PAGO Y/O AFILIACIÓN	EPS	FECHA DE ULTIMO PAGO Y/O AFILIACIÓN	AFP		FECHA IDRD
1	INGENIERIA CMC SAS	CAMPOS MARIN DAVID CAMILO	1000613938	AYUDANTE	1/03/2025	ACTIVO	N.A	SURA	10/06/2025	FAMISANAR	10/06/2025	PORVENIR	10/06/2025	10/06/2025
2	INGENIERIA CMC SAS	CARDENAS CARDENAS HILMER	1020830	CONDUCTOR	17/02/2025	ACTIVO	N.A	SURA	10/06/2025	FAMISANAR	06/06/2025	PORVENIR	10/06/2025	10/06/2025
3	INGENIERIA CMC SAS	CEREZENA JOSELITO	11299313	AYUDANTE	21/01/2025	ACTIVO	N.A	SURA	10/06/2025	CAPITAL SALUD	10/06/2025	PORVENIR	10/06/2025	10/06/2025
4	INGENIERIA CMC SAS	GARZON PINEDA JOSE ALEJANDRO	1070852776	AYUDANTE	21/11/2024	ACTIVO	N.A	SURA	10/06/2025	CAPITAL SALUD	10/06/2025	PROTECCION	10/06/2025	10/06/2025
5	INGENIERIA CMC SAS	IBAÑEZ LEVIT NELSON DIOMEDES	5855883	CONDUCTOR	21/11/2024	ACTIVO	N.A	SURA	10/06/2025	SALUD TOTAL	10/06/2025	COLFONDOS	10/06/2025	10/06/2025
6	INGENIERIA CMC SAS	LOPEZ AVILA BRANDON LEONARDO	1152695527	ING RESIDENTE	21/11/2024	ACTIVO	N.A	SURA	10/06/2025	FAMISANAR	09/06/2025	PORVENIR	10/06/2025	10/06/2025
7	INGENIERIA CMC SAS	MERCADO BARRIOS LUIS GUILLERMO	1007586807	CONDUCTOR	21/11/2024	ACTIVO	N.A	SURA	10/06/2025	SANITAS	10/06/2025	PORVENIR	10/06/2025	10/06/2025
8	INGENIERIA CMC SAS	MUÑOZ MARCELO JOAN	1007399861	AYUDANTE	21/11/2024	ACTIVO	N.A	SURA	10/06/2025	FAMISANAR	10/06/2025	COLPENSIONES	10/06/2025	10/06/2025
9	INGENIERIA CMC SAS	VIVALLE BRAVAR YEFERSON IVAN	1070814778	AYUDANTE	21/11/2024	ACTIVO	N.A	SURA	10/06/2025	SALUD TOTAL	10/06/2025	COLPENSIONES	10/06/2025	10/06/2025
10	INGENIERIA CMC SAS	QUEVEDO ESQUIVIAN JHON ALEXANDER	1193124891	AYUDANTE	21/11/2024	ACTIVO	N.A	SURA	10/06/2025	FAMISANAR	10/06/2025	PORVENIR	10/06/2025	10/06/2025
11	INGENIERIA CMC SAS	SABORAL CESPEDES ISABEL STEBAN	1019884879	INSPECTOR	21/11/2024	ACTIVO	N.A	SURA	10/06/2025	FAMISANAR	10/06/2025	PORVENIR	10/06/2025	10/06/2025
12	INGENIERIA CMC SAS	ORTIZ GOMEZ ALVARO DIEGO	1087198177	AYUDANTE	16/05/2025	RADICADO	N.A.	SURA	30/06/2025	FAMISANAR	03/06/2025	PORVENIR	30/06/2025	30/06/2025
13	INGENIERIA CMC SAS	RAMIREZ RUBIO JHON ALEXANDER	1010765210	AYUDANTE	20/05/2025	RADICADO	N.A.	SURA	30/06/2025	CAPITAL SALUD	30/06/2025	COLPENSIONES	30/06/2025	30/06/2025
14	INGENIERIA CMC SAS	[illegible]	80816671	AYUDANTE	03/06/2025	RADICADO	N.A.	SURA	30/06/2025	FAMISANAR	03/06/2025	PORVENIR	30/06/2025	30/06/2025
15	INGENIERIA CMC SAS	RAMA CRISTIAN CAMILO	1013712404	AYUDANTE	03/06/2025	RADICADO	N.A.	SURA	30/06/2025	COMPENSAR	03/06/2025	COLPENSIONES	30/06/2025	30/06/2025
16	INGENIERIA CMC SAS	[illegible]	1019857188	AYUDANTE	21/05/2025	RADICADO	N.A.	SURA	30/06/2025	CAPITAL SALUD	03/06/2025	COLPENSIONES	30/06/2025	30/06/2025
17	CONTRATISTA	GARCIA LIBANEZ EDWIN JAVIER	1010615579	DIRECTOR DE OBRA	11/11/2024	ACTIVO	N.A	SURA	11/01/2024	SANITAS	11/01/2024	PROTECCION	11/01/2024	16/04/24
18	CONTRATISTA	GUTIERREZ PINEDA JAVIER	79455186	ASESOR AGRONOMO	11/11/2024	ACTIVO	NA	BOLSA	11/01/2024	SANITAS	11/01/2024	COLPENSIONES	11/01/2024	16/05/24
19	CONTRATISTA	LOPEZ ARDILA	1018622773	PROFESIONAL III	11/11/2024	ACTIVO	NA	SURA	11/05/2024	COMPENSAR	11/05/2024	COLPENSIONES	11/05/2024	20/05/24
20	CONTRATISTA	ACEVEDO BERNAL OSCR MAURICIO	1019913980	INSPECTOR DE OBRA	11/11/2024	ACTIVO	NA	SURA	11/05/2024	FAMISANAR	11/05/2024	COLPENSIONES	11/05/2024	14/06/24
21	CONTRATISTA	GARCIA GARCIA BRAYAN STEVEN	1014448764	INSPECTOR DE OBRA	11/11/2024	ACTIVO	NA	SURA	11/05/2024	SANITAS	11/05/2024	COLPENSIONES	11/05/2024	6/06/2024
22	CONTRATISTA	DIAZ DAZA JONY FERNEY	1018467056	INGENIERO CIVIL	11/11/2024	ACTIVO	NA	SURA	11/05/2024	SANITAS	12/05/2024	COLPENSIONES	11/05/2024	23/04/24
23	CONTRATISTA	SANABRIA AVILA CARLOS	79668476	TOPOGRAFO	11/11/2024	ACTIVO	NA	SURA	11/05/2024	COMPENSAR	11/05/2024	COLPENSIONES	11/05/2024	7/04/2024
24	CONTRATISTA	MELANGUEL QUEVEDO DIANA MIGUEL	1018456831	SECRETARIA	11/11/2024	ACTIVO	NA	SURA	1/01/2025	SURA	11/05/2024	PROTECCION	11/05/2024	20/12/24
25	INNOVAPARQUES	Carol Giselle Lopez	1033442543	Inspector	11/01/2025	ACTIVO	N.A	SURA	N.A.	Sanitas	N.A.	Protección	N.A.	N.A.

PERSONAL RETIRADO EN EL PERIODO

No.	CONTRATISTA / SUBCONTRATISTA	NOMBRES	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FECHA INGRESO	ESTADO	FECHA DE RETIRO	ARL	FECHA DE ULTIMO PAGO Y/O AFILIACIÓN	EPS	FECHA DE ULTIMO PAGO Y/O AFILIACIÓN	AFP		FECHA IDRD
1	INGENIERIA CMC SAS	SAIZ PARRA MIGUEL GABRIEL	1030041201	AYUDANTE	21/05/2025	RADICADO	26/06/2025	SURA	30/06/2025	CAPITAL SALUD	25/06/2025	PROTECCION	30/06/2025	30/06/2025

compensar | miplanilla.com

PLANIL NTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION I \PORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901287132 6	INGENIERIA CMC SAS		CALLE 148 A No. 95-47	7026536	cmcingenieriasas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					23	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-05	E	10/06/2025	87351906	$8.816.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	142.200	0		0		0	0	0	0	142.200	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	63.600	0		0		0	0	0	0	63.600	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	64.600	0		0		0	0	0	0	64.600	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	719.600	0		0		0	0	0	0	719.600	11
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	7.600	0		0		0	0	0	0	7.600	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-3	127.300	0		0		0	0	0	0	127.300	4
ESS002	ASMET SALUD EPS SAS	900935126-7	45.600	0		0		0	0	0	0	45.600	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230501	Protección (NG + Protección)	800230739-0	730.800	0	0	0	0	0	0		730.800	4
230901	Porvenir	800224808-6	2.160.000	0	0	0	0	0	0		2.160.000	12
231801	Colfondos	800227940-4	669.800	0	0	0	0	0	0		669.800	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	782.300	0	0	0	0	0	0		782.300	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	830362790-5	1.935.400				1.935.400	0	0	1.935.400			19.364	1.935.400	23

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.100.800	0	0	1.100.800	23

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901087133-6	INGENIERIA CMC SAS		CALLE 148 A No. 95-67	7026556	cmcingenierias@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B - menos de 250 a			BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	IRC
					23	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-05	E	10/06/2025	97301330	$6.978.000	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradores Reportadas	Valor aportes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	1.170.500	1.170.500
Pensión	4	4.679.300	4.679.300
Riesgos Laborales	1	1.935.400	1.935.400
CCF	1	1.190.800	1.190.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	13	8.976.000	8.976.000

PAGADA

Este documento está clasificado ıo PRIVADO por parte de Compensar Operador ıformación

compensar | miplanilla.com

PLANILI NTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION [APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	ERDNERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901087130-6	INGENIERIA CMC SAS		CALLE 148 A No. 85-67	7026556	cmcingenieriasas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	EPC
					23	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-06	E	10/06/2025	01301306	$3.970.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIONES						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colocar	Activo	Extranjero	Cotiza Pensión	Sede	IGE	IRL	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Independiente	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario c. Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Tipo de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000619958	CAMPOS MARIN DAVID DANIELO	1	0		0																	23/07	1.423.500	237.900	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
2	CC	1000728525	ARIAS PERALTA ANDERSON MAURICIO	1	0		0	X																25-14	1.136.000	182.396	0	0	0	0	EPS030	1.136.000	45.000	14-11	1.136.000	1	79.300	CCF24	1.360.233	54.000	0	0	0	0	0
3	CC	1010141128	YATE PARRA ANGEL GABRIEL	1	0		0	X																23/07	189.800	30.400	0	0	0	0	EPS037	189.800	7.600	14-11	189.800	1	13.300	CCF24	189.800	7.600	0	0	0	0	0
4	CC	1014388458	SABOGAL GUERVO EVA YURANY	1	0		0																	23/07	1.385.650	222.000	0	0	0	0	EPS017	1.385.650	55.700	14-11	1.385.650	1	9.200	CCF24	1.385.650	62.700	0	0	0	0	0
5	CC	1014566870	AVELLANEDA BOGANDOY LUIS MIGUEL	1	0		0	X																25-14	631.900	63.800	0	0	0	0	EPS002	631.900	25.300	14-11	631.900	1	36.400	CCF24	806.800	32.300	0	0	0	0	0
6	CC	1019661159	CUEVAS GARZON LUIS CARLOS	1	0		0	X																23/07	142.350	22.800	0	0	0	0	EPS034	142.350	5.700	14-11	142.350	1	10.000	CCF24	142.350	5.700	0	0	0	0	0
7	CC	1019662778	GARZON PINEDA JOSE ALEJANDRO	1	0		0																	23/07	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS034	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
8	CC	1030780239	RAMIREZ RUBIO JHON ALEXANDER	1	0		0	X																25-14	189.800	30.400	0	0	0	0	EPS034	189.800	7.600	14-11	189.800	1	13.300	CCF24	189.800	7.600	0	0	0	0	0
9	CC	1019788817	PALACIO ORDUZ EDNA ROCIO	1	0		0																	23/07	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	3	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
10	CC	1049188177	ORTIZ COMB ALVARO LEONEL	1	0		0	X																23/07	189.800	30.400	0	0	0	0	EPS017	189.800	7.600	14-11	189.800	4	13.300	CCF24	189.800	7.600	0	0	0	0	0
11	CC	1120518449	QUEVEDO LIZQUERRAGA JHON ALEXANDER	1	0		0																	23/07	1.388.000	240.800	0	0	0	0	EPS017	1.388.000	55.700	14-11	1.388.000	3	188.000	CCF24	1.388.000	55.700	0	0	0	0	0
12	CC	3008100	CARDENAS CARDENAS HILARIO	1	0		0																	23/07	1.520.500	243.300	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.520.500	3	199.100	CCF24	1.520.500	57.300	0	0	0	0	0
13	CC	80737972	SABOGAL GUERVO JOHN MANUEL	1	0		0																	23/07	4.500.000	720.000	0	0	0	0	EPS017	4.500.000	180.000	14-11	4.500.000	3	313.200	CCF24	4.500.000	180.000	0	0	0	0	0
14	CC	80863471	JIMENEZ MONDRAGON JOHN ANDRES	1	0		0	X																23/07	189.800	30.400	0	0	0	0	EPS017	189.800	7.600	14-11	189.800	3	13.300	CCF24	189.800	7.600	0	0	0	0	0
15	CC	5858602	JIMENEZ LADDO WILBER DIONISIO	1	0		0																	23/07	1.896.685	237.100	0	0	0	0	EPS002	1.896.685	94.900	14-11	1.896.685	3	111.900	CCF24	1.896.685	94.900	0	0	0	0	0
16	CC	1233886327	LOPEZ AVILA BRANDON SEBASTIAN	1	0		0																	23/07	2.700.000	440.000	0	0	0	0	EPS017	2.700.000	110.000	14-11	2.700.000	3	181.400	CCF24	2.700.000	110.000	0	0	0	0	0
17	CC	1027524042	PARRA CEBETAN CAMILO	1	0		0	X																25-14	189.800	30.400	0	0	0	0	EPS009	189.800	7.600	14-11	189.800	1	13.300	CCF24	189.800	7.600	0	0	0	0	0
18	CC	1007189407	MERCADO BASILIO LUIS GUILLERMO	1	0		0																	23/07	1.567.750	314.150	0	0	0	0	EPS009	1.567.750	63.000	14-11	1.567.750	1	116.400	CCF24	1.567.750	63.000	0	0	0	0	0
19	CC	1014653579	SABOGAL GUERVO DANIEL STEBAN	1	0		0																	23/07	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
20	CC	1001299152	MUÑOZ MACETO JESUS	1	0		0																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
21	CC	79086434	FORERO ORTEGA JULIO CESAR	1	0		0																	23/07	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	3	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
22	CC	1014614778	OVALLE BOLIVAR YEFERSEN IVAN	1	0		0																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	3	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
23	CC	12288113	CERQUERA VALDERRAMA JOSELITO	1	0		0																	23/07	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS034	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	3	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **IES INGENIEROS SAS**, identificada con **NI** número **900317964**, aportó por **DEASSI MAGALY VELASQUEZ QUEVEDO** identificado(a) con **CC** número **1023865830** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 05 - 2025 y 06 - 2025 de la siguiente forma.

CÓDIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	ESTADO
14-11	ARL SURA	1	0	30	$3,166,000	0.06960	$218,700	$0	$0	Mayo - 2025	88855887	04/06/2025	S
CCF32	Colsubsidio Caja de Compensacion Fliar	1	0	30	$3,166,000	0.04000	$126,500	$0	$0	Mayo - 2025	88855887	04/06/2025	S
EPS018	EPS Sura	1	0	30	$3,166,000	0.04000	$126,500	$0	$0	Junio - 2025	88855887	04/06/2025	S
230201	Proyección (ING + Proyección)	1	0	30	$3,166,000	0.18000	$569,000	$0	$0	Mayo - 2025	88855887	04/06/2025	S

El presente certificado se expide a los 2 días del mes Julio de 2025

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-06-18, 03:13:59 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1073469729

Periodo Cotización 202505 **Periodo Servicio** 202506

PAGADA 2025-06-18 15:10:28.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO QUALITY SAS				
Documento	NI 901715657	**Dirección**	AV 6 #16 - 21		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	4004072		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	7
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal	GONZALEZ LUIS	**Identificación**	CC 31176826		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1000336737						**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00	Residente		Exonerado	S	ARBOLEDA OROZCO HAROLD FERNANDO	95001000 - 95		GUAVIARE

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

| Novedades | | | | | |

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1013623378	EDWIN JAVIER LINARES GARCIA		TV52A 2A 21	3142513079	JAVOLINARES@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	1 – Independiente			BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2026-02	2026-02	1	03/07/2026	87674643	TOTAL A PAGAR	
					$1.583.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS039	Sanitas EPS	800251440-6	687.500	0		0		0	0	0	0	687.500	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Protección (ING + Proteccion)	800256739-0	880.000	0	0	0	0	0	0		880.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	382.800				382.800	0	0	382.800			3.828	382.800	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	33.000	0	0	33.000	1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, INP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	687.500	687.500
Pensión	1	880.000	880.000
Riesgos Laborales	1	382.800	382.800
CCF	1	33.000	33.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	1.983.300	1.983.300

Este documento está clasificado ıo PRIVADO por parte de Compensar Operador ıformación

compensar | miplanilla.com

PLANIL INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION I APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1013823379	EDWIN JAVIER LINARES GARCIA		TV52A 2A 21	3142513570	JAVOLINARES@GMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
UNICA	1 – Independiente			BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	GFC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-06	1	03/07/2025	87574643	$1.683.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES															PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Dotación	Ingreso	Retiro	Trasl. entrada	Trasl. salida	Sit. Ppal.	IGE	IRL	LMA	VAC	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	VSP	SLN	IRL	Cod. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Tipo de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1013823379	LINARES GARCIA EDWIN JAVIER	01	X				N													230201	5.500.000	660.000	0	0	0	0	EPS030	5.500.000	867.300	14-11	5.500.000	3	363.000	CCF24	5.500.000	33.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1010832568	JHONY FERNEY DIAZ DAZA		CALLE 86 BIS A 12	3037887	recursoshumanos.practicing@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	1 - Independiente			BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-08	1	03/09/2025	619144932	$2.080.369	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS035	Sanitas EPS	800251440-6	687.500	0		0		0	0	0	0	687.500	1

TOTALES PENSIÓN											
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
23-1001	Colfondos	800227940-4	880.000	0	0	0	0	0	0		880.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	860063700-5	382.800				382.800	0	0	382.800			3.828	382.800	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	110.000	0	0	110.000	1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	687.500	687.500
Pensión	1	880.000	880.000
Riesgos Laborales	1	382.800	382.800
CCF	1	110.000	110.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	2.060.300	2.060.300

Este documento está clasificado ıo PRIVADO por parte de Compensar Operador ıformación

compensar | miplanilla.com

PLANILL NTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION [APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1013932568	JHONY FERNEY DIAZ DAZA		CALLE 89 80A 12	3037687	recursoshumanos.proclimpio@outlook.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	1 – Independiente			BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	IBC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-08	1	03/09/2025	97874632	$2,060,300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES															PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Código	Ubicación	Extranjero	Colombiano en el exterior	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VST	SUS	IRL	Cotización	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario a Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Ent.Salud / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Nivel de riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1013932568	DIAZ DAZA JHONY FERNEY	57	9		N																	23-691	5.586.500	660.687	0	0	0	0	EPS005	5.586.000	667.500	14-11	3.000.000	5	382.800	CCF24	5.586.000	133.800	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901210980-5	ASSH TOPOGRAFIA E INGENIERIA SAS		CL 72 N 95-62	3105336310	ASSHTOPOGRAFIAENGINEERIA@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	E – marzo de 2003 o			BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-05	E	17/06/2025	87430153	$1.765.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS025	Sanitas EPS	800251440-6	57.000	0		0		0	1	100	0	57.100	1
EPS01T	Famisanar EPS	830003564-7	57.000	0		0		0	1	100	0	57.100	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	57.000	0		0		0	1	100	0	57.100	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	57.000	0		0		0	1	100	0	57.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	811.200	0	0	0	0	1	400	0	811.600	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otras Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	830031790-6	386.400				386.400	1	300	386.700			3.954	386.700	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	226.800	1	200	226.200	4

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	1	0	0	0
ICBF				
0	1	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, RP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	228.600	228.400
Pensión	1	811.200	811.600
Riesgos Laborales	1	386.400	386.700
CCF	1	226.800	226.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	1.753.600	1.765.100

PAGADA

Este documento está clasificado ıo PRIVADO por parte de Compensar Operador ıformación

compensar | miplanilla.com

PLANIL NTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION I PORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901219969-5	ASSH TOPOGRAFIA E INGENIERIA SAS		CL 72 N 66-12	3106336010	ASSHTOPOGRAFIAEINGENIERIA@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	D - menos de 200 a			BOGOTA, D.C.	BOGOTA, D.C.		N

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	IBC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-05	E	17/06/2025	97436153	$1,765,100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotiza	Extran	Extranjero sin cédula	Salario Integral	Suspensión temporal	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Cotizante exonerado	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Pobreza o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días a Cargo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1035579404	GARCIA HERNANDEZ SIMON STIVEN	1	0			0																																				
2	CC	1116570978	DIAZ ANGARITA DARWIN FELIPE	1	0			0																																				
3	CC	80050333	SARAY HERNANDEZ ALEJANDRO ESTEVE	1	0			0																																				
4	CC	80086761	OSORIO CANTE IVAN LEONARDO	1	0			0																																				

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901868635-2	CONSORCIO INNOVAPARQUES		CARRERA 70B # 125 33	9014325878	RECURSOSHUMANOS.PROCIVINO@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-06	E	01/07/2026	97721989	$2.823.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	137.000	0		0		0	0	0	0	137.000	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	114.000	0		0		0	0	0	0	114.000	2
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
23/201	Protección (ING + Protección)	800229739-0	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1
23/301	Porvenir	800224808-6	320.000	0	0	0	0	0	0		320.000	1
23/101	Colfondos	800227940-6	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1
25-14	Colpensiones	800138094-7	883.400	0	0	0	0	0	0		883.400	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	860063796-5	634.700				634.700	0	0	634.700			6.347	634.700	6

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	365.000	0	0	365.000	6

PAGADA

Este documento está clasificado ıo PRIVADO por parte de Compensar Operador ıformación

compensar | miplanilla.com **PLANIL NTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION I PORTES**

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901685635-2	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CARRERA 70B # 131 09	80143258/8	RECURSOSHUMANOS.PROCIVING@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 t			BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-06	E	01/07/2025	07721669	$2.823.700	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IBE, LMA, RP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	365.000	365.000
Pensión	4	1.459.000	1.459.000
Riesgos Laborales	1	634.700	634.700
CCF	1	365.000	365.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	2.823.700	2.823.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
N	901888636-2	CONSORCIO INNOVAPARQUES		CARRERA 7ª# 156-03	6014335878	RECURSOSHUMANOS.PROCIVING@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	R – resto de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 8 / IBC: 7
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-07	2025-06	E	01/07/2025	97721989	$2.023.700

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Actividad	Sueldo	Extranjero	Cotiza en otro país	Salario Integral	IGE	IRL	IVL	TDP	TAE	TDE	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días a Pagar	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1006888975	JIMENEZ HOYOS DAYANA CAROLINA	1	0			0																		230501	2.000.000	308.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	90.000	14-11	2.000.000	8	138.000	CCF24	2.000.000	60.000	0	0	0	0	0
2	CC	1016023772	LOPEZ SCHEMERRY ANDREA MARCELA	1	0			0																		25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	97.000	14-11	1.423.500	8	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
3	CC	1022443343	LOPEZ FIGUEROA CAROL ESTELLE	1	0			0																		230501	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	97.000	14-11	1.423.500	8	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
4	CC	1115511000	ACEVEDO BERNAL OSCAR MAURICIO	1	0			0																		230501	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	97.000	14-11	1.423.500	8	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
5	CC	1192729000	CORTES ROZO KEIDY MARELI	1	0			0																		25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS041	1.423.500	97.000	14-11	1.423.500	8	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
6	CC	79455168	GUTIERREZ PINEDA JAVIER	1	0			0																		25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	97.000	14-11	1.423.500	8	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado ...o PRIVADO por parte de Compensar Operador ...formación

compensar | miplanilla.com

PLANILI NTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION I PORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901686636-2	CONSORCIO INNOVAPARQUES		CARRERA 70B # 125 01	8014325878	RECURSOSHUMANOS.PROCIVING@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	8 – montos de 250 e			BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-05	2025-05	Y	03/06/2025	80920173	$297.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					

TOTALES PENSIÓN											
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otras Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	800362780-5	297.300				297.300	0	0	297.300			2.973	297.300	3

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, INP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	297.300	297.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	297.300	297.300

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901666636-2	CONSORCIO INNOVAPARQUES		CARRERA 7BB # 125 03	6014325876	RECURSOSHUMANOS.PROCIVING@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				3	0
					TOTAL A PAGAR	
2025-05	2025-05	Y	03/06/2025	86820173	$397.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF		PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Ubicación	Salario	Extranjero sin cédula	Colombiano en el exterior	Novedad	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	DIAS COTIZADOS	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario a Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Prop	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1013003370	LAMES GARCIA EDWIN JAVIER	59	0			N																30		0	0	0	0	0	0	0	14-11	1.423.500	5	30.100		0	0	0	0	0	0	0
2	CC	1013003590	DIAZ DAZA JHONY FORNEY	59	0			N																30		0	0	0	0	0	0	0	14-11	1.423.500	5	30.100		0	0	0	0	0	0	0
3	CC	1024488700	GARCIA GARCIA BRAYAN STIVENS	59	0			N																30		0	0	0	0	0	0	0	14-11	1.423.500	5	30.100		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado ıo PRIVADO por parte de Compensar Operador ıformación

compensar | miplanilla.com

PLANILI NTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION [.PORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1224455788	BRAYAN STIVENS GARCIA GARCIA		CARRERA 71B # 53-25 APTO 502	3117181601	[illegible]	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	1 – Independiente			BOGOTA, D. C.	BOGOTA, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-08	1	07/09/2025	88000815	$441.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (MG + Proteccion)	800229739-0	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	860063796-5	7.500				7.500	0	0	7.500			79	7.500	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	28.500	0	0	28.500	1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	178.000
Pensión	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	1	7.500	7.500
CCF	1	28.500	28.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	441.800	441.800

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1024466708	BRAYAN STIVENS GARCIA GARCIA		CARRERA 116 # 53-28 APTO 502	3117161601	bsgarciag@unal.edu.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	1 – Independiente			BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-08	1	07/09/2025	88033019	$441.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Dep.	Estilo	Extranjero	Cotiz. Alterno	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Fabricación	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario a Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1024466708	GARCIA GARCIA BRAYAN STIVENS	01	0			N																	230201	1.423.000	227.600	0	0	0	0	EPS048	1.423.000	170.000	14-11	1.423.000	1	7.000	CCF34	1.423.000	28.500	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado ...o PRIVADO por parte de Compensar Operador ...formación

compensar | miplanilla.com

PLANIL NTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION [PORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901021735-5	GRUPO COLOMBIA CIVIL SAS		CALLE 81 # 11A 18	3631867	[illegible]	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B - Resto de 200 o			BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.		N

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				2	0
					TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-06	E	03/06/2026	97029718	$147.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	104.100	0		0		0	0	0	0	104.100	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	416.100	0	0	0	0	0	0		416.100	1

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Mora Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	800820780-5	9.400				9.400	0	0	9.400			94	9.400	2

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	161.100	0	0	161.100	2

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, INP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	161.100	161.100
Pensión	1	416.100	416.100
Riesgos Laborales	1	9.400	9.400
CCF	1	161.100	161.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	5	747.700	747.700

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901821735-8	GRUPO COLOMBIA CIVIL SAS		CALLE 51 # 71A 18	3937937	facturacionfuncionarios.proximing@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-06	E	05/06/2025	97035718	$147.700	


DETALLE POR COTIZANTE


INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Actividad	Tarifa	Aportante Exonerado	Salario Integral	Tipo Cotizante	Sub Tipo	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Solidaridad Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1014000375	DIAZ PERILLA ANEYY SORELY	1	0		0																	25-14	340.667	65.500	0	0	0	0	EPS005	340.667	13.600	14-11	340.667	1	1.600	CCF24	340.667	13.600	0	0	0	0	0
2	CC	1014000375	DIAZ PERILLA ANEYY SORELY	1	0		0															X		25-14	2.283.334	360.000	0	0	0	0	EPS005	2.283.334	90.200	14-11	2.283.334	1	0	CCF24	2.283.334	90.200	0	0	0	0	0
3	CC	79888978	SAAVEDRA MURCIA JUAN CARLOS	1	1		0																		0	0	0	0	0	0	EPS009	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.300	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0


PAGADA


Este documento está clasificado ıo PRIVADO por parte de Compensar Operador ıformación

ANEXO 2. MATRIZ DE RIESGOS INTERVENTORIA

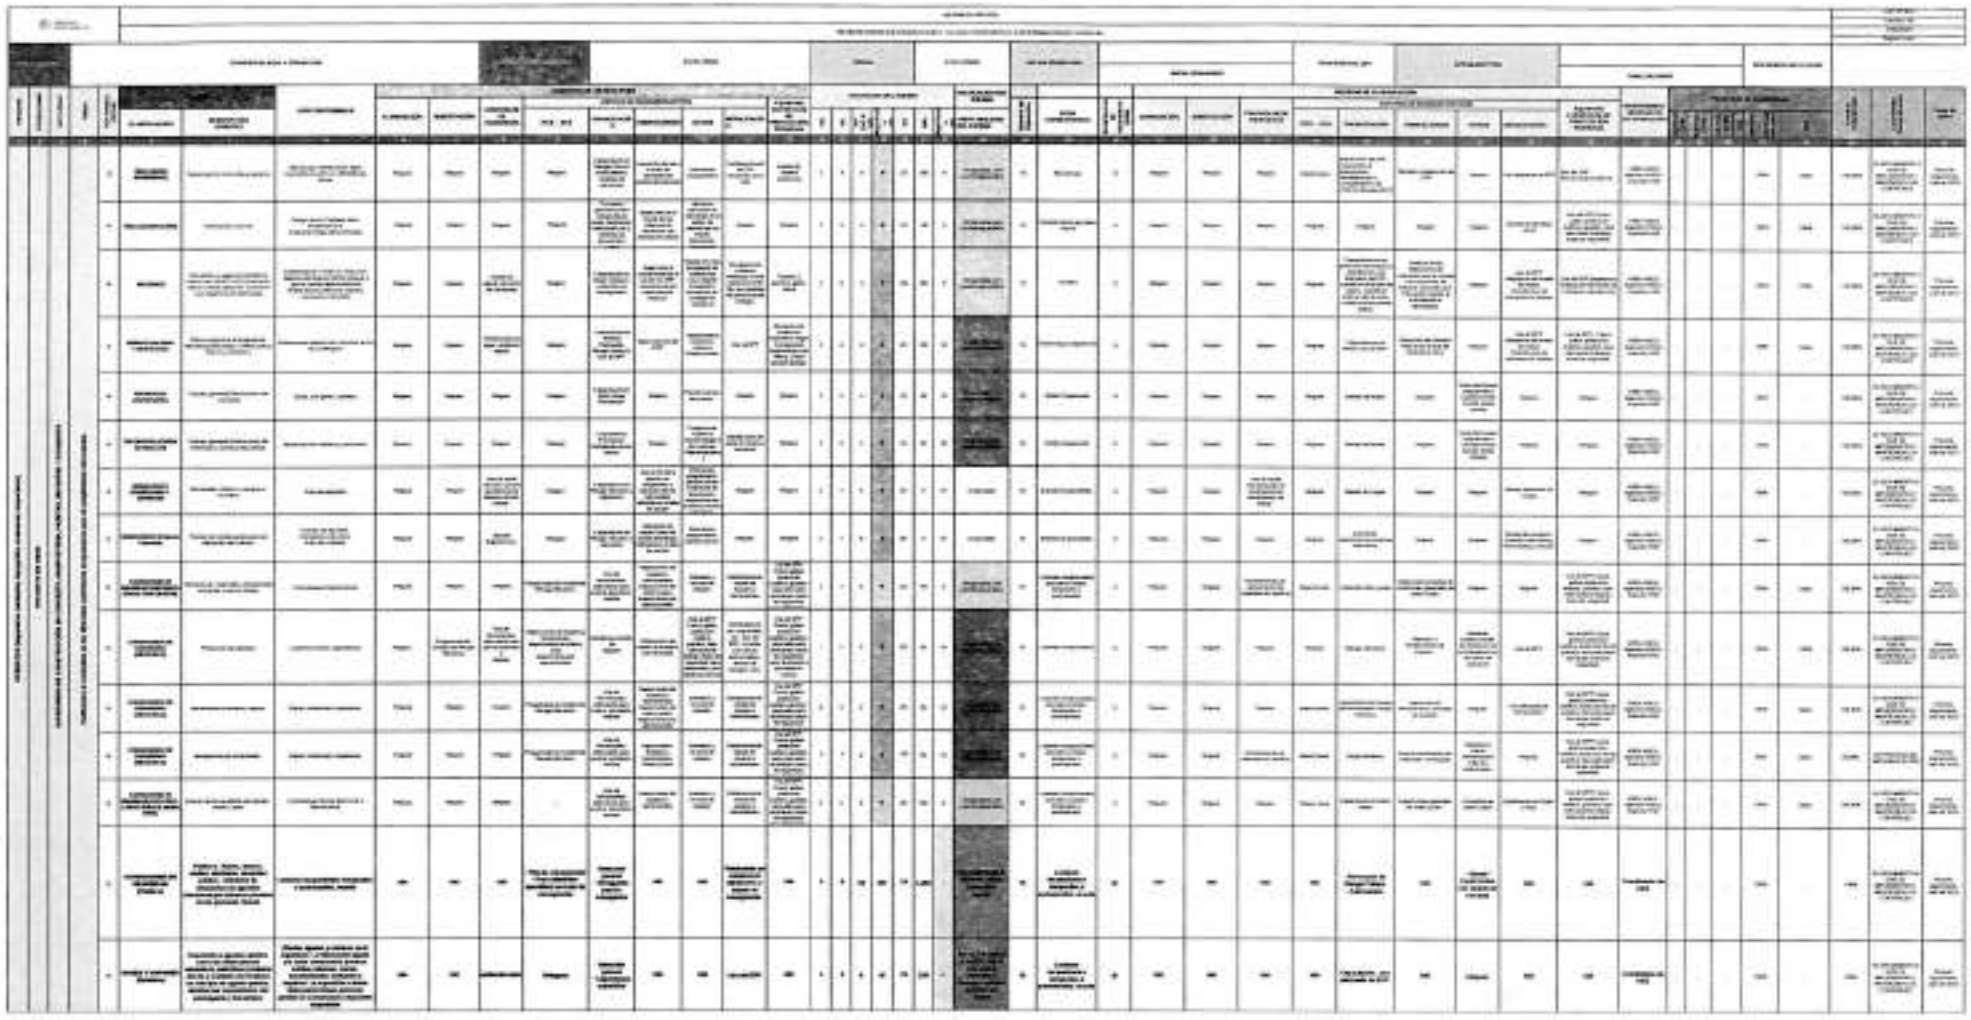

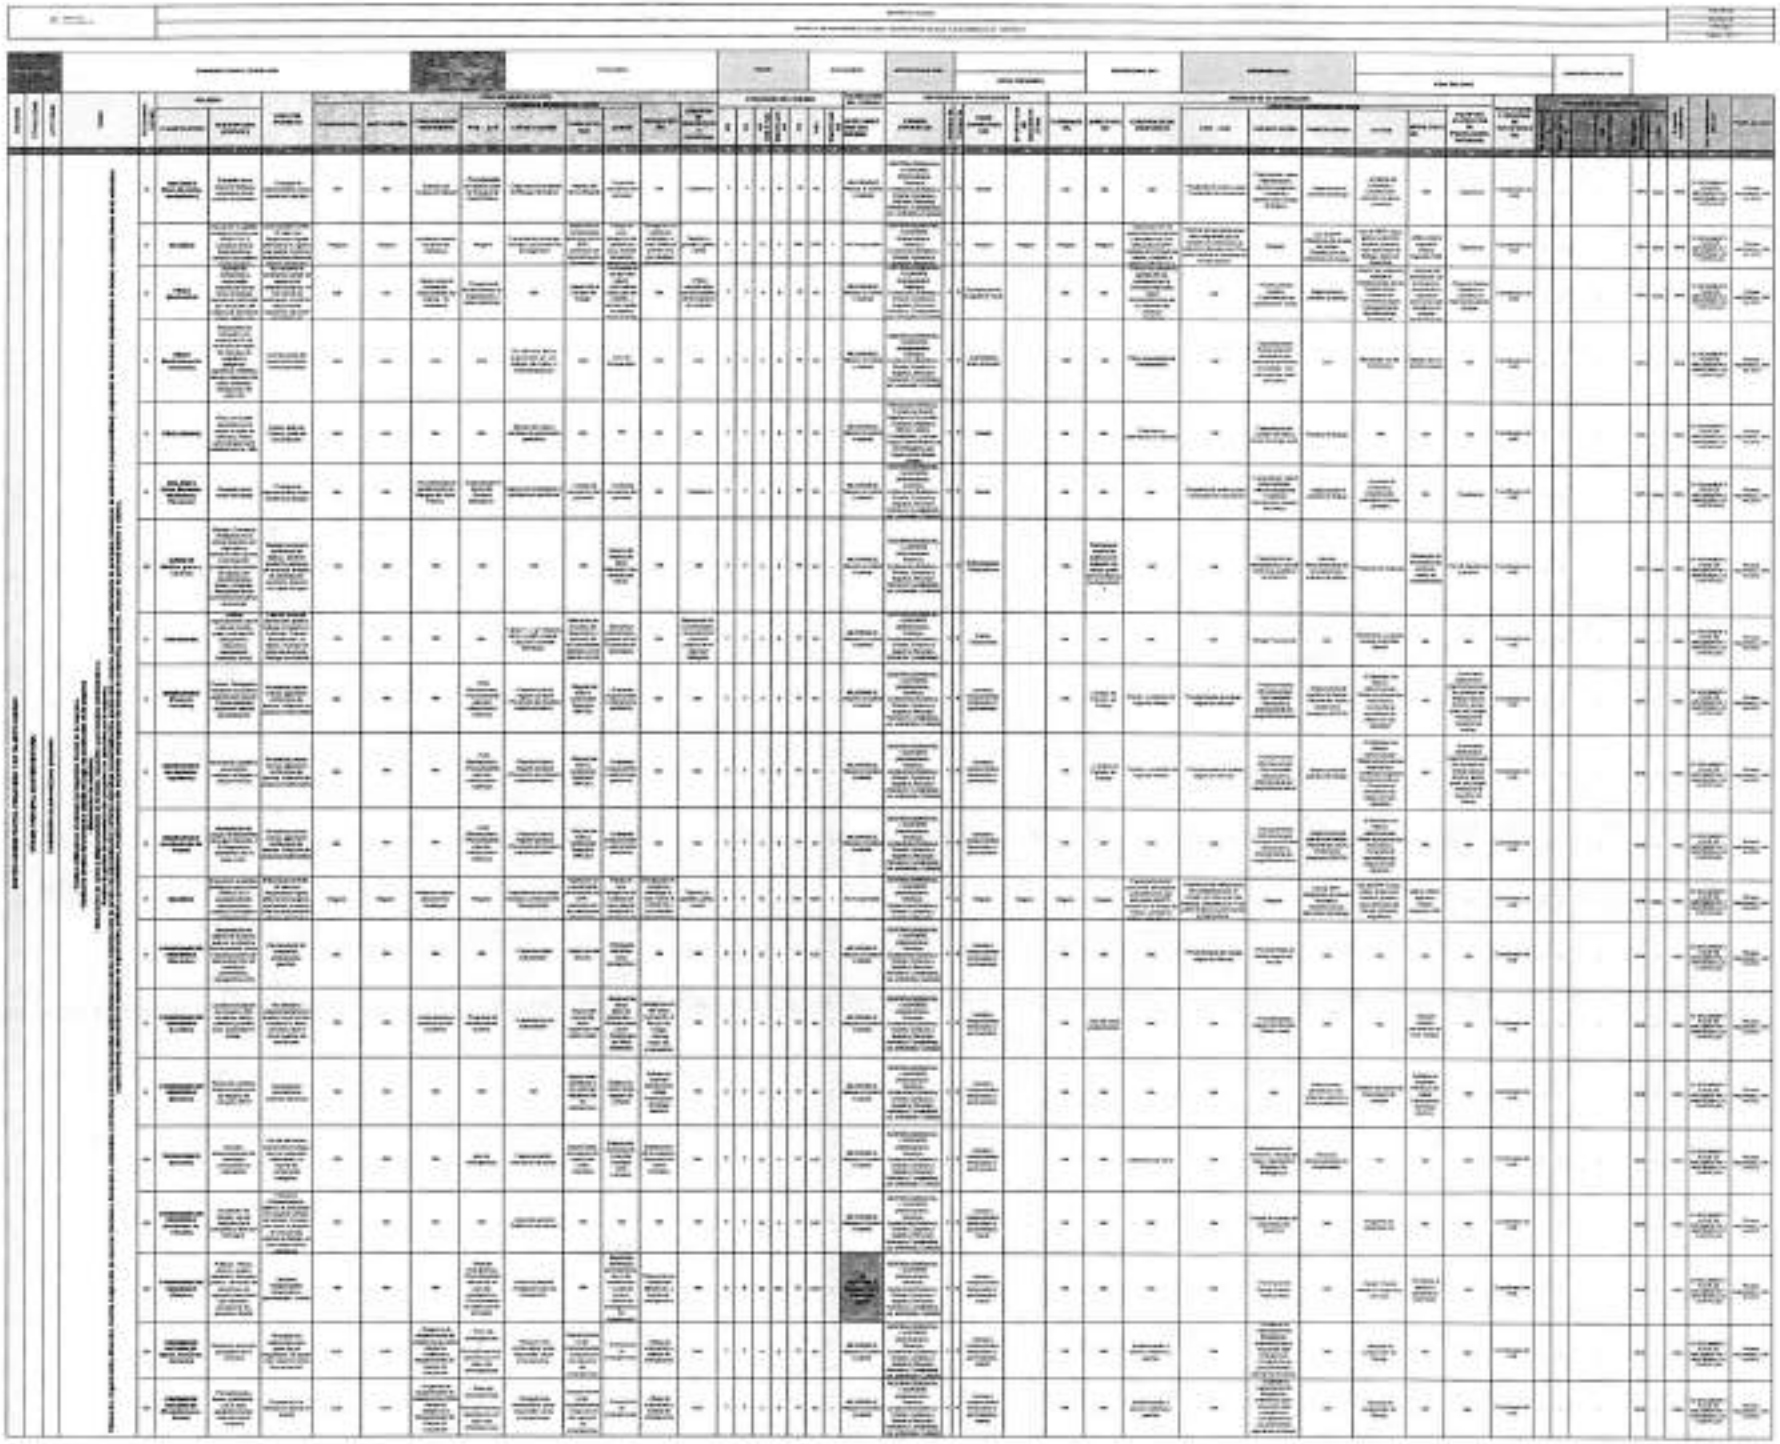

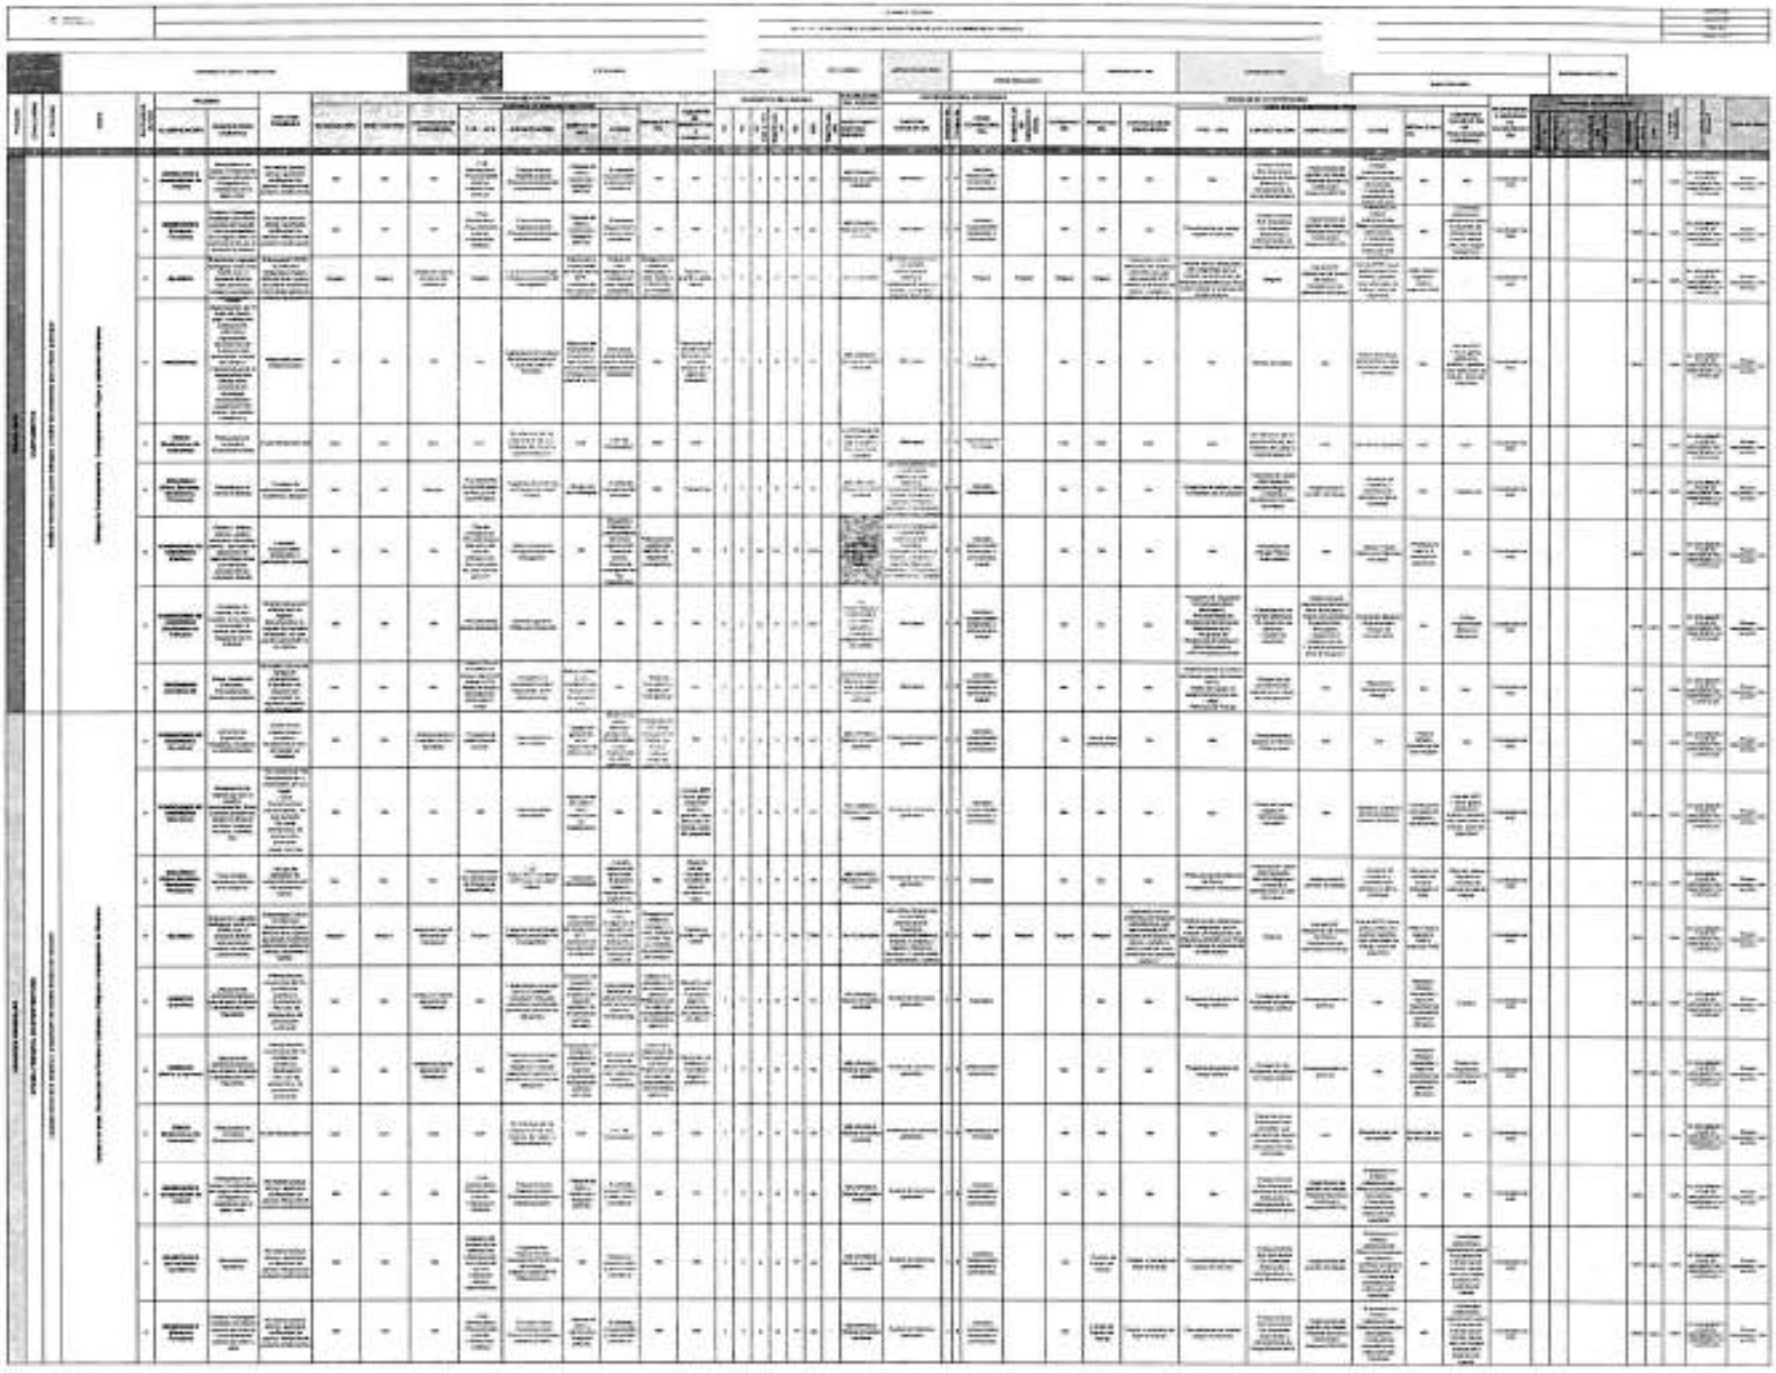

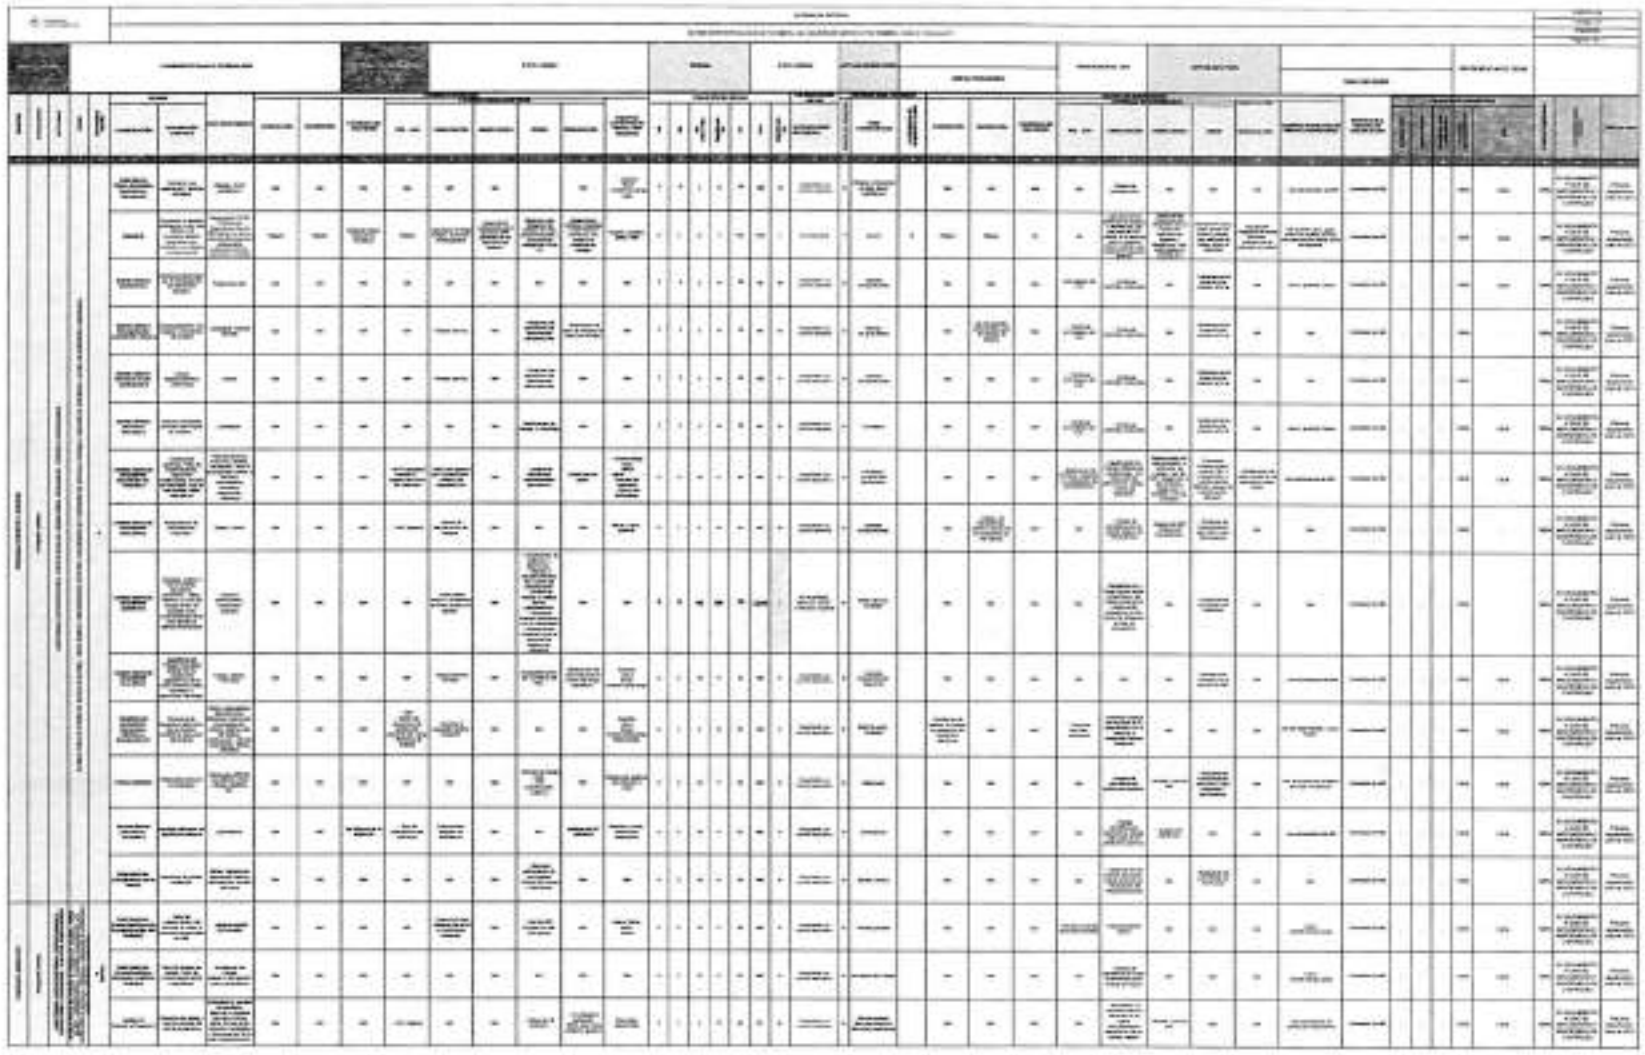

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

CONVENCIONES

EVALUACIÓN DEL RIESGO

Nivel de Deficiencia

El Nivel de deficiencia (ND) es la MAGNITUD de la relación esperable entre: 1) el conjunto de peligros detectados y su relación causal directa con posibles incidentes; y, 2) con la eficacia de las medidas preventivas existentes en un lugar de trabajo. (GTC 45:2012)

Nivel de Deficiencia	Valor de ND	Significado
Muy Alto (MA)	10	Se han detectado peligros que determinan como posible la generación de incidentes o consecuencias muy significativas, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo es nula, no existe o ambas.
Alto (A)	6	Se han detectado algunos peligros que pueden dar lugar a consecuencias significativas o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existente es baja o ambas.
Medio (M)	2	Se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias poco significativas o de menor importancia, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas es moderada o ambos.
Bajo (B)	No se asigna Valor	No se ha detectado consecuencia alguna, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es alta, o ambos, el riesgo esta controlado. Estos peligros se clasificación directamente en el nivel de riesgo y de intervención IV.

Nivel de Exposición

El Nivel de Exposición (NE) es la MAGNITUD relacionada con la situación de Exposición a un peligro que se presenta en un tiempo determinado durante la jornada laboral. (GTC 45:2012)

Nivel de Exposición	Valor de NE	Significado
Continua (EC)	4	La situación de exposición se presenta sin interrupción o varias veces con tiempo prolongado durante la jornada laboral.
Frecuente (EF)	3	La situación de exposición se presenta varias veces durante la jornada laboral por tiempos cortos.
Ocasional (EO)	2	La situación de exposición se presenta alguna vez durante la jornada laboral y por un periodo de tiempo corto.
Esporádica (EE)	1	La situación de exposición se presenta de manera eventual.

Nivel de Probabilidad

El Nivel de probabilidad (NP) es la MAGNITUD relacionada con la situación de Exposición a un peligro que se presenta en un tiempo determinado durante la jornada laboral. (GTC 45:2012)

Nivel de probabilidad	Valor de NP	Significado
Muy Alto (MA)	Entre 40 y 24	Situación deficiente con exposición continua, o muy deficiente con exposición frecuente. Normalmente la materialización del riesgo ocurre con frecuencia.
Alto (A)	Entre 20 y 10	Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o bien situación muy deficiente con exposición ocasional o esporádica. La materialización del riesgo es posible que suceda varias veces en la vida laboral.
Medio (M)	Entre 8 y 6	Situación deficiente con exposición esporádica o bien situación mejorable con exposición continua o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez.
Bajo (B)	Entre 4 y 2	Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, o situación sin anomalías destacables con cualquier nivel de exposición. No es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser concebible.

Nivel de Consecuencias

El Nivel de Consecuencia (NC) es la MAGNITUD de medida de la Severidad de las consecuencias. (GTC 45:2012)

Nivel de consecuencia	Valor de NC	Significado
		Daños Personales
Mortal o Catastrófico (M)	100	Muerte(s)
Muy Grave (MG)	60	Lesiones o enfermedades graves irreparables (Incapacidad Permanente Parcial o Invalidez)
Grave (G)	25	Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral Temporal (LT)
Leve (L)	10	Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad

EVALUACIÓN DEL RIESGO

Nivel de Riesgo e Intervención

El Nivel de Riesgo (NR) se refiere a la magnitud de un riesgo y es resultante del PRODUCTO del nivel de probabilidad (NP) por el nivel de consecuencia (NC). (GTC 45:2012)

NR = NP x NC

Nivel de Riesgo (NR = NP x NC)		Nivel de Probabilidad (NP)			
		40 - 24	20 - 10	8 - 6	4 - 2
Nivel de Consecuencia (NC)	100	I 4000 - 2400	I 2000 - 1000	I 800 - 600	II 400 - 200
	60	I 2400 - 1440	I 1200 - 600	II 480 - 360	II 240 - 120
	25	I 1000 - 600	II 500 - 250	II 200 - 150	III 100 - 50
	10	II 400 - 240	II 200 - 100	III 80 - 60	III 40 - IV 20

Interpretación Nivel de Riesgo

ESCALA PARA INTERPRETAR LOS RESULTADOS DE "NR"		
Nivel de Riesgo	Valor de NR	Significado
I	4000 - 600	Situación Crítica. Suspender Actividades hasta que el riesgo este bajo control. Intervención Urgente.
II	500 - 150	Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Sin embargo, suspender actividades si el nivel de riesgo esta por encima o igual de 360
III	120 - 40	Mejorar si es posible. Seria conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.
IV	20	Mantener las medidas de control existentes, pero se deberían considerar soluciones o mejoras y se deben hacer comprobaciones periódicas para asegurar que el riesgo aún es aceptable.

VALORACIÓN DEL RIESGO

Aceptabilidad del Riesgo

ESCALA PARA DEFINIR SI "NR" ES O NO ACEPTABLE		
Nivel de Riesgo	Significado	¿Actividad Crítica?
I	No aceptable	SI
II	No aceptable o Aceptable con control específico	SI
III	Aceptable	NO
IV	Aceptable	NO

A continuación se especifican los criterios de evaluación de los riesgos de salud:

	ILUMINACIÓN (R. FÍSICO)
MUY ALTO	Ausencia de luz natural o artificial
ALTO	Deficiencia de luz natural o artificial con sombras evidentes y dificultad para leer
MEDIO	Percepción de algunas sombras al ejecutar una actividad (ejemplo: escribir)
BAJO	Ausencia de sombras
	RUIDO (R. FÍSICO)
MUY ALTO	No escuchar una conversación a una intensidad normal a una distancia de menos de 50 cm
ALTO	Escuchar la conversación a una intensidad normal a una distancia de 1 m
MEDIO	Escuchar la conversación a una intensidad normal a una distancia de 2 m
BAJO	No hay dificultad para escuchar una conversación a una intensidad normal a mas de 2 m.
	VIBRACIÓN (R. FÍSICO)
MUY ALTO	Percibir notoriamente vibraciones en el puesto de trabajo
ALTO	Percibir sensiblemente vibraciones en el puesto de trabajo
MEDIO	Percibir moderadamente vibraciones en el puesto de trabajo
BAJO	Existencia de vibraciones que no son percibidas
	TEMPERATURAS EXTREMAS (R. FÍSICO)
MUY ALTO	Percepción subjetiva de calor o frío en forma inmediata en el sitio
ALTO	Percepción subjetiva de calor o frío luego de permanecer 5 minutos en el sitio
MEDIO	Percepción de algún disconfort con la temperatura luego de permanecer 15 minutos en el sitio
BAJO	Sensación de confort térmico
	RADIACIONES IONIZANTES (R. FÍSICO)
MUY ALTO	Exposición frecuente (una o más veces por jornada o turno)
ALTO	Exposición regular (una o más veces en la semana)
MEDIO	Ocasionalmente y/o vecindad
BAJO	Rara vez, casi nunca sucede la exposición
	RADIACIONES NO IONIZANTES (R. FÍSICO)
MUY ALTO	Ocho horas (8) o mas de exposición por jornada o turno
ALTO	Entre seis (6) y Ocho horas (8) por jornada o turno
MEDIO	Entre dos (2) y seis horas (6) por jornada o turno
BAJO	Menos de dos horas (2) por jornada o turno


	VIRUS, BACTERIAS, HONGOS Y OTROS (R. BIOLÓGICO)
MUY ALTO	Provocan una enfermedad grave y constituye un serio peligro para los trabajadores. Su riesgo de propagación es elevado y no se conoce tratamiento eficaz en la actualidad
ALTO	Pueden provocar una enfermedad grave y constituir un serio peligro para los trabajadores. Su riesgo de propagación es probable y generalmente existe tratamiento eficaz
MEDIO	Pueden causar una enfermedad y constituir un peligro para los trabajadores. Su riesgo de propagación es poco probable y generalmente existe tratamiento eficaz
BAJO	Poco probable, que cause una enfermedad. No hay riesgo de propagación y no se necesita tratamiento.


POSTURA (R. BIOMECÁNICO)	
MUY ALTO	Posturas con un riesgo extremo de lesión musculo esquelética. Deben tomarse medidas correctivas inmediatamente
ALTO	Posturas de trabajo con riesgo significativo de lesión. Se deben modificar las condiciones de trabajo tan pronto como sea posible
MEDIO	Posturas con riesgo moderado de lesión musculo esquelética sobre las que se precisa una modificación, aunque no inmediata
BAJO	Posturas que se consideran normales, con riesgo leve de lesiones musculo esqueléticas y en las que puede ser necesaria alguna acción
MOVIMIENTOS REPETITIVOS POSTURA (R. BIOMECÁNICO)	
MUY ALTO	Actividad que exige movimientos rápidos y continuos de cualquier segmento corporal, a un ritmo difícil de mantener (ciclos de trabajo menores a 30 s ó 1 min., o concentración de movimientos que utilizan pocos músculos durante mas del 50% del tiempo de trabajo)
ALTO	Actividad que exige movimientos rápidos y continuos de cualquier segmento corporal, con la posibilidad de realizar pausas ocasionales (ciclos de trabajo menores a 30 s ó 1 min, o concentración de movimientos que utilizan pocos músculos durante mas del 50% del tiempo de trabajo)
MEDIO	Actividad que exige movimientos lentos y continuos de cualquier segmento corporal con la posibilidad de realizar pausas cortas
BAJO	Actividad que involucra cualquier segmento corporal con exposición inferior al 50% del tiempo de trabajo en el cual hay pausas programadas
ESFUERZO POSTURA (R. BIOMECÁNICO)	
MUY ALTO	Actividad intensa en donde el esfuerzo es visible en la expresión facial del trabajador y/o la contracción muscular es visible
ALTO	Actividad pesada con resistencia
MEDIO	Actividad con esfuerzo moderado
BAJO	No hay esfuerzo aparente ni resistencia y existe libertad de movimientos
MANIPULACIÓN DE CARGAS POSTURA (R. BIOMECÁNICO)	
MUY ALTO	Manipulación manual de cargas con un riesgo extremo de lesión musculo esquelética. Deben tomarse medidas correctivas inmediatamente.
ALTO	Manipulación manual de cargas con riesgo significativo de lesión. Se deben modificar las condiciones de trabajo tan pronto como sea posible.
MEDIO	Manipulación manual de cargas con riesgo moderado de lesión musculo esquelética sobre las que se precisa una modificación, aunque no inmediata
BAJO	Manipulación manual de cargas con riesgo leve de lesiones musculo esqueléticas, puede ser necesaria alguna acción

PSICOSOCIALES	
MUY ALTO	Nivel de riesgo con alta posibilidad de asociarse a respuestas muy altas de estrés. Por consiguiente las dimensiones y dominios que se encuentran bajo esta categoría requieren intervención inmediata en el marco de un sistema de vigilancia epidemiológica.
ALTO	Nivel de riesgo que tiene una importante posibilidad de asociación con respuestas de estrés alto y por tanto, las dimensiones y dominios que se encuentran bajo esta categoría requieren intervención inmediata en el marco de un sistema de vigilancia epidemiológica.
MEDIO	Nivel de riesgo en el que se esperaría una respuesta de estrés moderada, las dimensiones y dominios que se encuentran bajo esta categoría ameritan observación y acciones sistemáticas de intervención para prevenir efectos perjudiciales en la salud.
BAJO	No se espera que los factores psicosociales que obtengan puntuaciones de este nivel estén relacionados con síntomas o respuestas de estrés significativas. Las dimensiones y dominios que se encuentran bajo esta categoría serán objeto de acciones o programas de intervención, con el fin de mantenerlos dentro de los niveles de riesgo más bajos posibles.

BIOLÓGICOS	FÍSICO	QUÍMICO	PSICOSOCIAL	BIOMECÁNICA	CONDICIONES DE SEGURIDAD	FENÓMENOS NATURALES
VIRUS	RUIDO (De impacto, intermitente, continuo)	POLVOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS	GESTIÓN ORGANIZACIONAL (Estilo de mando, pago, contratación, participación, inducción y capacitación, liderazgo social, evaluación del desempeño, manejo de cambios)	POSTURA (Prolongada, mantenida, forzada, anti gravitacional)	MECÁNICO (elementos o partes de máquinas, herramientas, equipos, plantas o trabajo, materiales procesados, sólidos o fluidos	SISMOS
BACTERIAS	ILUMINACIÓN (por exceso o deficiencia)	HUMO	CARACTERÍSTICAS DE LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO (Comunicación, Tecnología, Organización del trabajo, Demandas cualitativas y cuantitativas de la tarea)	ESFUERZO	ELÉCTRICO (alta y baja tensión, estática)	TORMENTAS
HONGOS	VIBRACIÓN (cuerpo entero, segmentario)	GASES ANORMALES Y NOCIVOS	CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO SOCIAL DE TRABAJO (relaciones, cohesión, calidad de las interacciones, trabajo en equipo)	MOVIMIENTO REPETITIVO	LOCATIVO (sistemas y medios de almacenamiento, superficies de trabajo irregulares deslizantes con diferencia de nivel, condiciones de orden y aseo, caídas de objetos)	VENDAVAL
RICKETSIAS	TEMPERATURAS EXTREMAS (Calor y Frío)	GASES Y VAPORES	CONDICIONES DE LA TAREA (carga mental, contenido de la tarea, demandas emocionales, sistemas de control, definición de roles, monotonía, etc.)	MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS	TECNOLÓGICO (explosión, fuga, derrame, incendio)	INUNDACIÓN
PARÁSITOS	PRESIÓN ATMOSFÉRICA (Normal o ajustada)	HUMOS METÁLICOS, NO METÁLICOS	INTERFASE PERSONA - TAREA (Conocimientos, habilidades en relación con la demanda de la tarea, iniciativa, autonomía y reconocimiento, identificación de la persona con la tarea y con la organización)	-	ACCIDENTES DE TRÁNSITO	DESLIZAMIENTO
PEDICULOS	RADIACIONES IONIZANTES (Rayos X, Rayos Gama, Beta y Alfa)	MATERIAL PARTICULADO	JORNADA DE TRABAJO (pausas, trabajo nocturno, rotación, horas extras, descansos)	-	PÚBLICO (robos, asaltos, atentados, actos terroristas, orden público, etc.)	PRECIPITACIONES (lluvias granizadas, heladas)
MORDEDORES	RADIACIONES NO IONIZANTES (Luz, Ultravioleta, Infrarroja, radiofrecuencia, microondas)	-	-	-	TRANSICIÓN ALTURAS	-
FLUIDOS O ESCREMENTOS	-	-	-	-	ESPACIOS CONFINADOS	-

ANEXO 2.1. MATRIZ DE RIESGOS CONTRATISTA

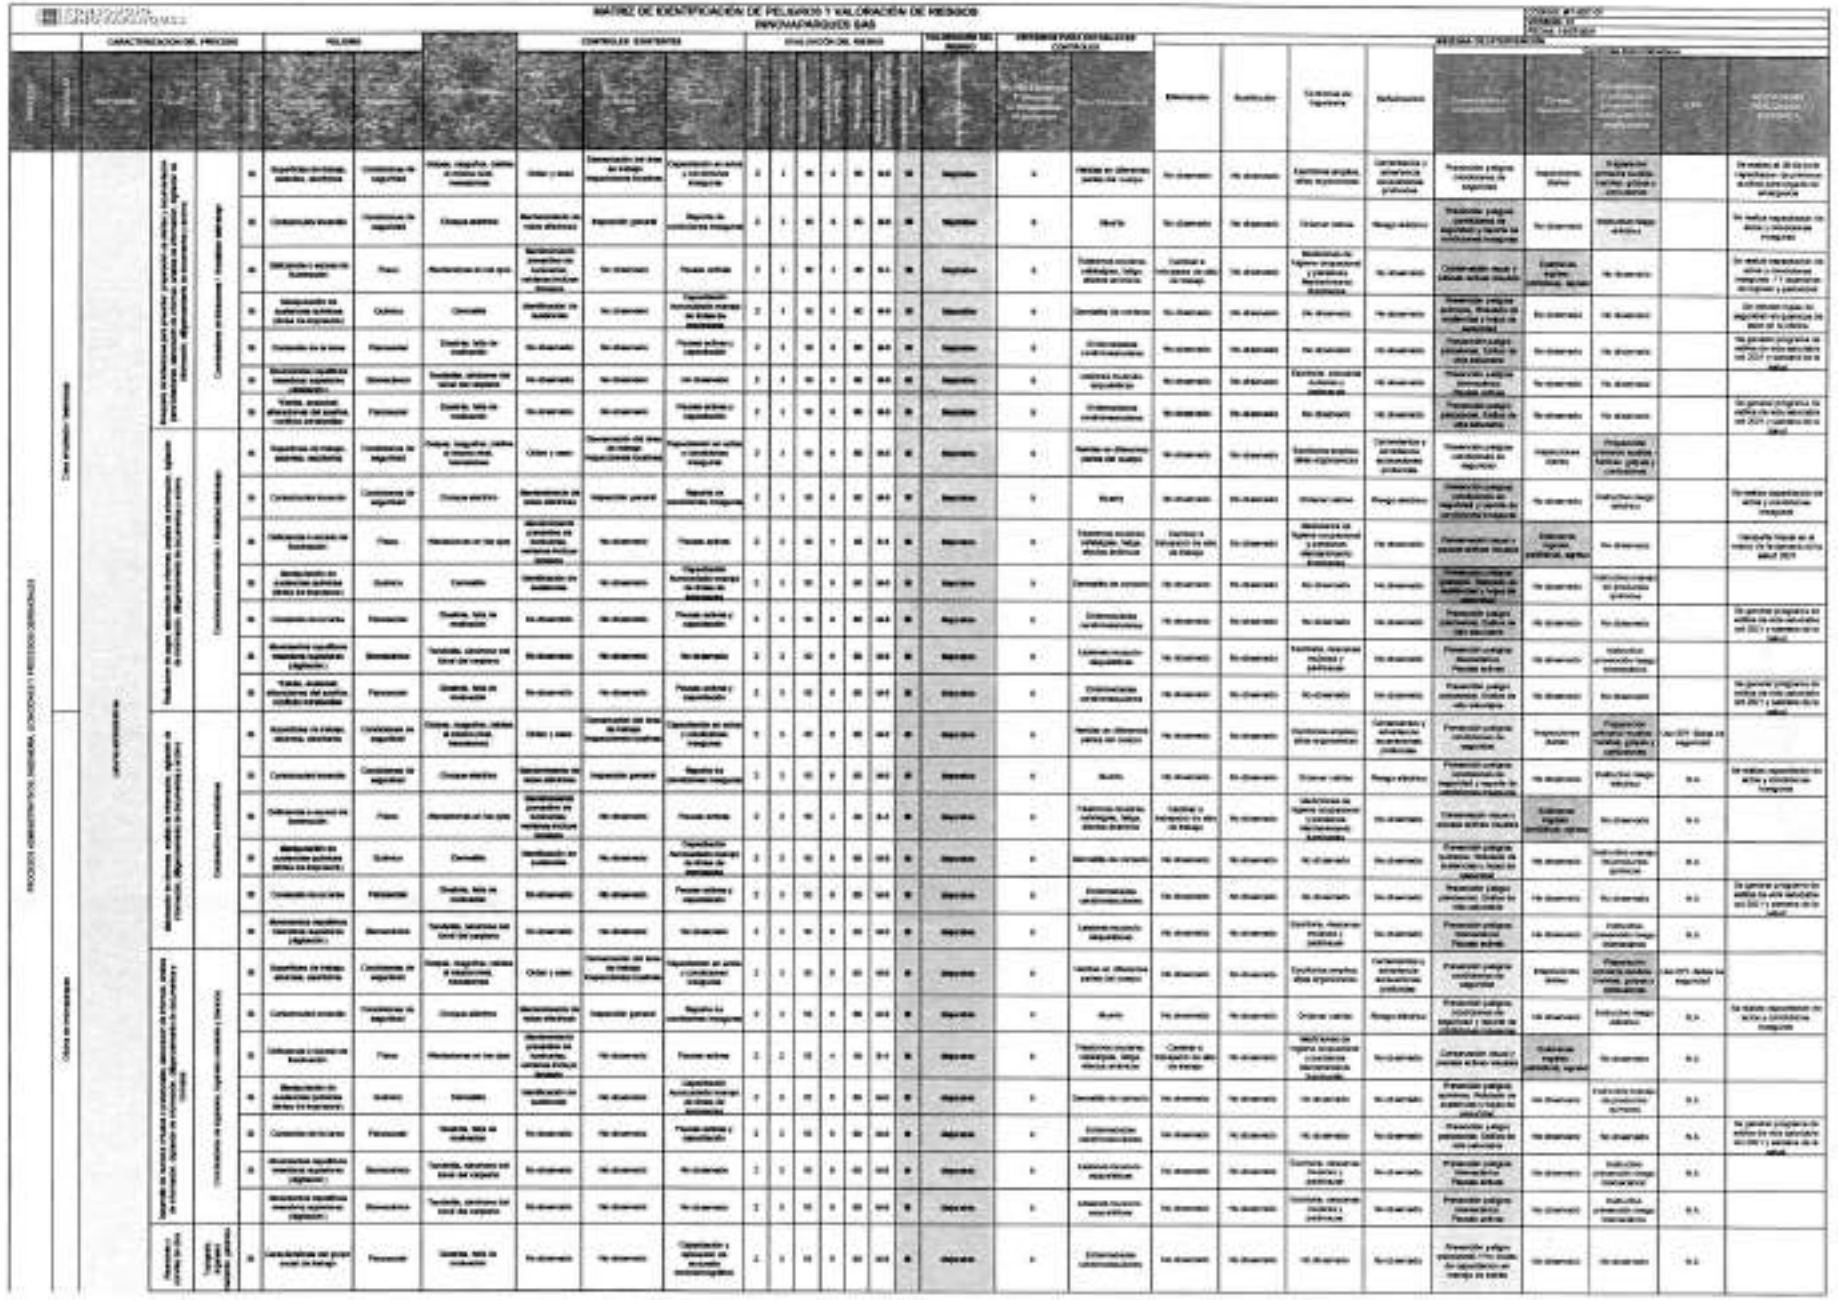

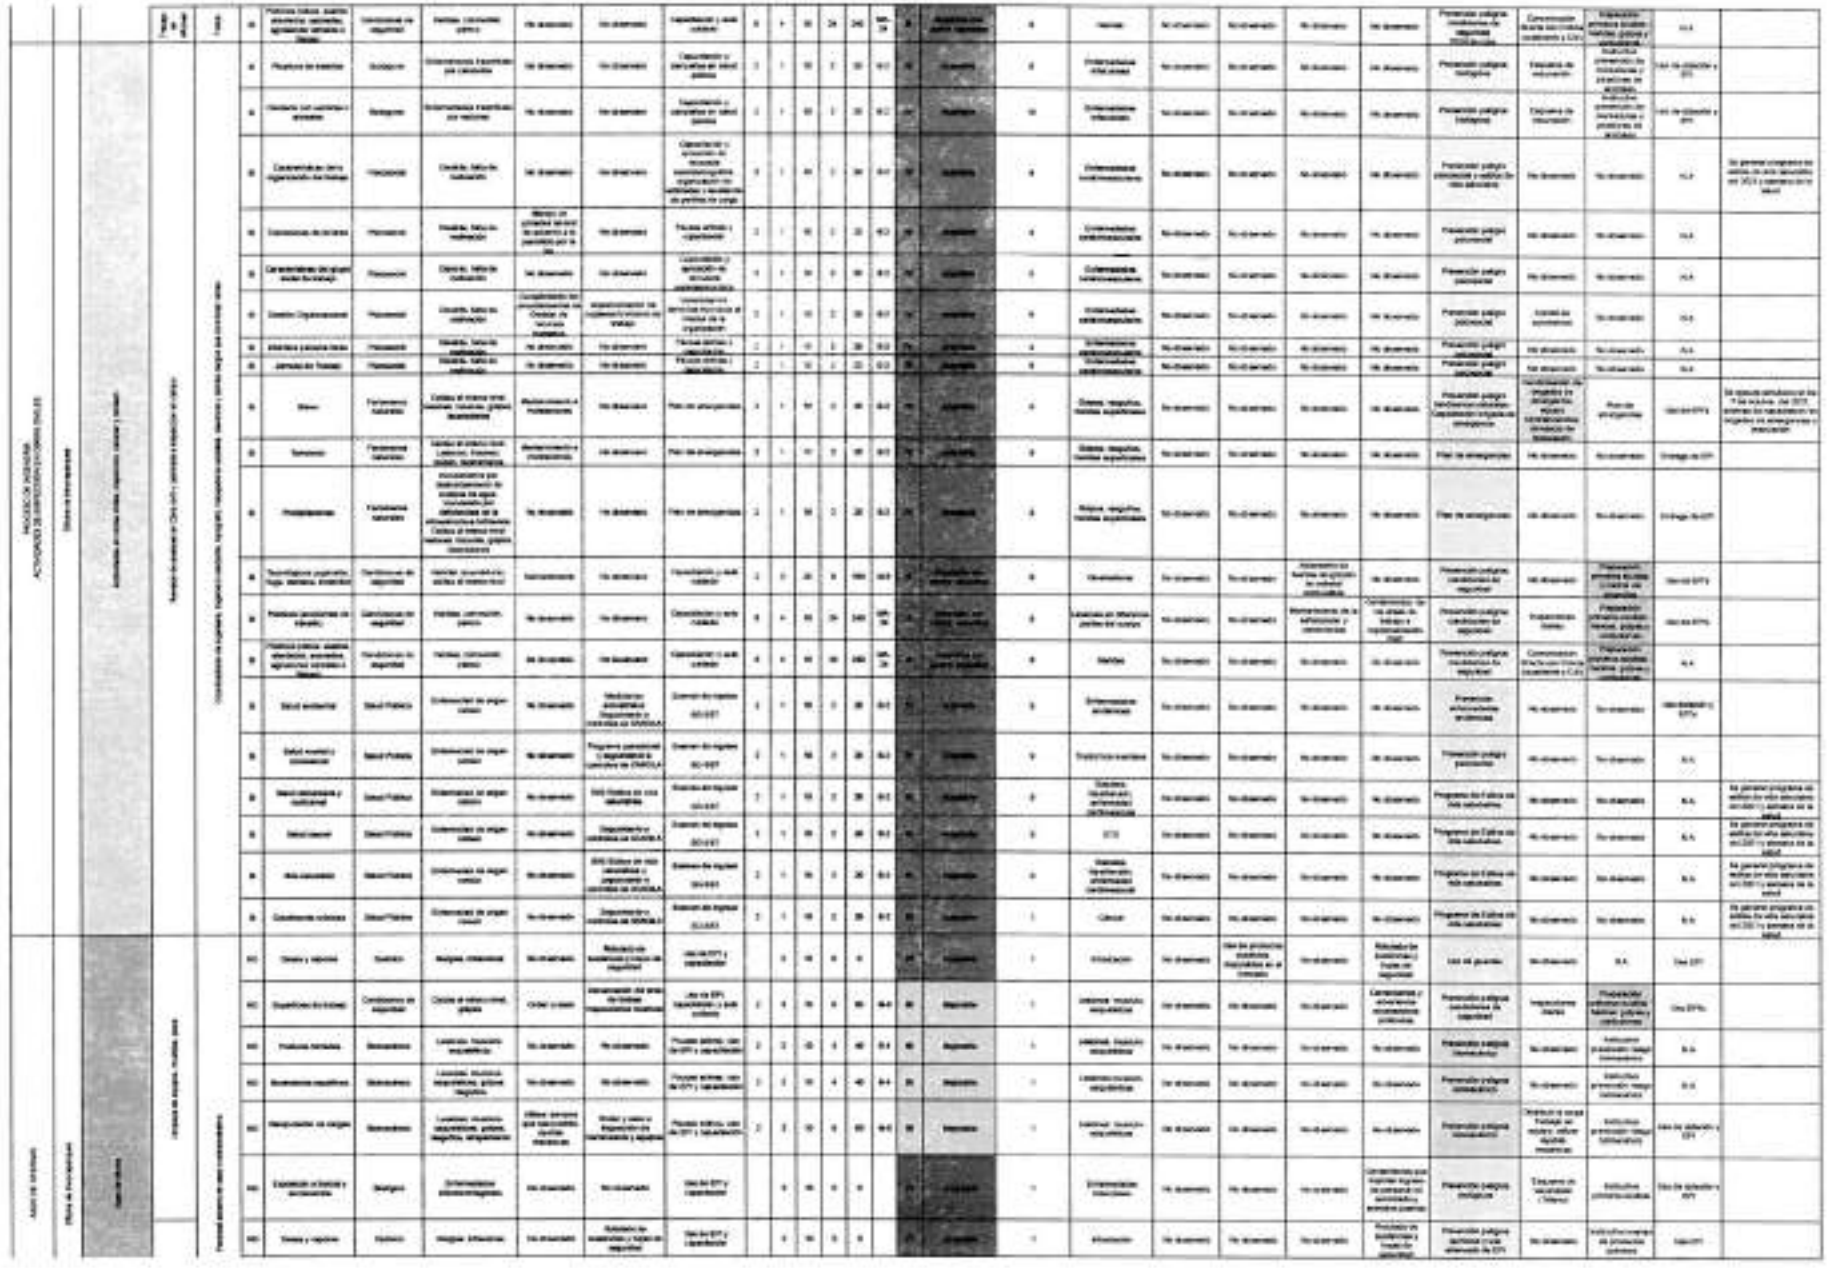

| | | |

ANEXO 3. INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD

CONSORCIO SANTA TERESA 28	INDICADORES RESOLUCIÓN 0312 DE 2019 CONSORCIO SANTA TERESA 028											
Nombre del indicador	**Definición**	**Formula**	**Periodicidad**	**MES 1**	**MES 2**	**MES 3**	**MES 4**	**MES 5**	**MES 6**	**MES 7**	**MES 8**	**MES 9**
Frecuencia de accidentalidad	Numero de veces que ocurre un accidente de trabajo en el mes	(Número de accidentes de trabajo que se presentan en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100	Mensual	0	0	0	0	0	0	0	0	
Severidad de accidentalidad	Numero de dias perdidos por accidentes de trabajo en el mes.	(Número de dias de incapacidad por accidente de trabajo en el mes + número de días cargados en el mes / Numero de trabajadores en el mes) * 100	Mensual	0	0	0	0	0	0	0	0	
Proporción de accidentes de trabajo mortales	Número de accidentes de trabajo mortales en el año.	(Número de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el año / Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el año) * 100	Anual									
Prevalencia de la enfermedad laboral	Número de casos de enfermedad laboral presentes en una población en un periodo de tiempo	(Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el periodo «Za / Promedio de trabajadores en el periodo «Zb) * 100.000	Anual									
Incidencia de la enfermedad laboral	Número de casos nuevos de enfermedad laboral en una población determinada en un periodo de tiempo	(Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo «Za / Promedio de trabajadores en el periodo «Zb) * 100.000	Anual									
Ausentismo por causa médica	Ausentismo es la no asistencia al trabajo, con incapacidad médica	(Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes / Número de días de trabajo programados en el mes) * 100	Mensual									

Datos										
	MES 1	**MES 2**	**MES 3**	**MES 4**	**MES 5**	**MES 6**	**MES 7**	**MES 8**	**MES 9**	**MES 10**
Numero de trabajadores	12	12	12	12	12	12	12	12		
Numero de accidentes de trabajo	0	0	0	0	0	0	0	0		
Numero de dias de incapacidad por accidente de trabajo	0	0	0	0	0	0	0	0		
Numero de dias de ausencia por incapacidad comun y/o laboral	0	0	0	0	0	0	0	0		

CONSORCIO SANTA TERESA 28

CONSORCIO SANTA TERESA 28

BOGOTÁ

CONTRATO No. 4080 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD."

FORMATO CONSOLIDADO INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD E INCIDENTES

PERIODO DEL INFORME DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

PERIODO	No. DE TRABAJADORES	HHT	No. DE ACCIDENTES	DIAS PERDIDOS O CARGADOS	I.F.	I.S.	I.L.I.	I.D.P.	TASA
01-12-2024 AL 31-12-2024	12	243	0	0	0,00	-	-	0	0,00
01-01-2025-31-01-2025	13	263	0	0	0,00	-	-	0	0,00
01-02-2025 - 28-02-2025	13	263	0	0	0,00	-	-	0	0,00
01-03-2025 - 31-03-2025	13	263	0	0	0,00	-	-	0	0,00
01-04-2025 - 30-04-2025	13	263	0	0	0,00	-	-	0	0,00
01-05-2025 - 31-05-2025	12	243	0	0	0,00	-	-	0	0,00
01-06-2025 - 30-06-2025	12	243	0	0	0,00	-	-	0	0,00

HHT: Horas hombre trabajadas (No.trabajadores*Horas dia trabajadas*Dias semana trabajadas*No. Semanas periodo trabajadas)

I.F.: Indice de frecuencia: No. de accidentes/HHT*K

I.S.: Indice de severidad: No. dias de perdidos ó Dias cargados/HHT*K

I.L.I :Indice de lesiones incapacitantes: IF*IS/1000

K : 200000

I.D.P. : Indice Medio de Dias Perdidos por Lesiones: No. Total de dias perdidos o cargados por lesiones /No. de casos con tiempo perdido

TASA: Tasa de accidentalidad: No. de accidentes ocurridos x100/ No. de Trabajadores

Sofia Fernández

Profesional SST de Interventoria

ANEXO 3.1. INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD CONTRATISTA

Medellin, 3 de julio de 2025

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. - ARL SURA S.A.

HACE CONSTAR

Que la empresa CONSORCIO INNOVAPARQUES, NIT N901885635, no presenta accidentes de trabajo desde el 01 de junio de 2025 hasta el 30 de junio de 2025.

La presente constancia se expide a solicitud de la empresa.

Para información adicional puede comunicarse con nuestra Linea de Atención 018000 51

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Atentamente,

Dirección de Higiene, Seguridad y Ambiente

Dirección IP: 186.30.132.158, 192.230.104.7, 172.16.42.57.

Medellín, 1 de julio de 2025

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. - ARL SURA S.A.

HACE CONSTAR

Que la empresa INGENIERIA CMC SAS, NIT N901087132, no presenta accidentes de trab desde el 01 de junio de 2025 hasta el 30 de junio de 2025.

La presente constancia se expide a solicitud de la empresa.

Para información adicional puede comunicarse con nuestra Línea de Atención 018000 51

Atentamente,

Dirección de Higiene, Seguridad y Ambiente

Dirección IP: 190.146.116.9, 198.143.41.38, 172.16.42.57.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO 4. CONFORMACIÓN COPASST Y CCL INTERVENTORIA

CONSORCIO SANTA TERESA 28	SISTEMA DE GESTIÓN	CÓDIGO	SST-FR-043
		VERSION	1
	ACTA REUNION COPASST	FECHA ELABORACIÓN	27/11/2024

REUNION No.	7	FECHA:	DD	27	MES	6	AAAA	2025

LUGAR DE REUNION: Oficina administrativa CONSORCIO SANTA TERESA 028

I. PROPOSITO DE LA REUNION - LECTURA ACTA ANTERIOR - VERIFICACION DE COMPROMISOS

Cordial Saludo, a los integrantes del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) del CONSORCIO SANTA TERESA 28
Durante el periodo los trabajadores contaron con puntos de Hidratación y punto ecológico. Asistieron de manera activa a las capacitaciones realizadas





II. TEMAS TRATADOS

Verificacion de Seguridad Social: Personal Dependiente e Independiente por Prestación de Servicios cumplen 100% con la entrega del pago

Se realiza inspección de Botiquín, extintor, EPP con el fin de dar con el cumplimiento al Plan de Trabajo SST y al (SG-SST) de la empresa

Durante el periodo se cumplio con la capacitación sobre HABITOS SALUDABLES enviada por el grupo de Whatsapp.

Durante el periodo 0 accidentes Laborales en la empresa, se realiza diligenciamiento de Formato de Accidentalidad

Se realizaron pausas activas durante las jornadas laborales

III. DECISIONES y/o COMPROMISOS PACTADOS	RESPONSABLES
Verificacion aportes seguridad social	SOFIA FERNANDEZ- SST INTERVENTORIA
Desarrollo capacitación correspondiente al periodo	SOFIA FERNANDEZ- SST INTERVENTORIA
Desarrollo inspecciones planteadas para el periodo	SOFIA FERNANDEZ- SST INTERVENTORIA

VI. PROXIMA REUNION

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en Bogotá D.C., a los

VEINTISIETE (día en letras)	27 (día en números)	JUNIO (mes en letras)	de	2025 (Año)

Proxima Reunion el dia 28 DE JULIO DE 2025

ASISTENTES	CARGO	FIRMA
Lizeth Castillo	Secretaria	Lizeth Castillo
Juan Carlos Ramirez	Topografo	
INVITADOS	**CARGO**	**FIRMA**
Sofia Fernández	Porfesional SST	Sofia Fernández

CONSORCIO SANTA TERESA 28	SISTEMA DE GESTIÓN	CODIGO	PAGINA 1 DE 1 SST-FR-051
		VERSION	1
	ACTA REUNION COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL	FECHA	27/11/2024

REUNION No.	3	FECHA:	DD	27	MES	6	AAAA	2025	

LUGAR DE REUNION: Oficina administrativa Consorcio Santa Teresa 028

I. PROPOSITO DE LA REUNION - LECTURA ACTA ANTERIOR - VERIFICACION DE COMPROMISOS

Conocer de manera clara los conceptos del Comité de Convivencia Laboral, tener encuenta los objetivos y propositos de la Reunión
En la reunion anterior no se presentaron quejas ni reclamos que tengan que ver con acoso laboral o temas manejados por el CCL
No hay reportes de conflictos dentro del CONSORCIO SANTA TERESA 028 durante el periodo anterior



II. TEMAS TRATADOS

Saludo de bienvenida a los integrantes del Comité de Convivencia Laboral del CONSORCIO SANTA TERESA 028
Llamado a lista a los integrantes de los Comité de Convivencia Laboral.
Socialización de ubicación de Buzon de Sugerencias (Oficina principal interventoria)
Se evidencia conocimiento de conceptos claros del Comité de Covivencia Laboral y como funciona dentro de una empresa y cual es el Objetivo

III. DECISIONES y/o COMPROMISOS PACTADOS	RESPONSABLES
Asistir a las Reuniones del Comité de Convivencia Laboral	Todos los representantes CCL
Programa de Bienestar Actividades de la Empresa	SOFIA FERNANDEZ JUNTO CON RRHH EMPRESA
Revisar los temas a tratar en la Proxima Reunion	SOFIA FERNANDEZ

VI. PROXIMA REUNION

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en Bogotá D.C., a los

VEINTISIETE (dia en letras)	27 (dia en números)	JUNIO (mes en letras)	de	2025 (Año)

Proxima Reunion el dia 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ASISTENTES	CARGO	FIRMA
Karen Algeciras	Inspector de obra	Karen Algeciras
Yaneth Duarte	Profesional ambiental	
INVITADOS	**CARGO**	**FIRMA**
Sofia Fernandez	Profesional SST	Sofia Fernández

ANEXO 4.1. CONFORMACIÓN COPASST Y CCL CONTRATISTA

CONSORCIO INNOVAPARQUES	**ACTA DE REUNIÓN**	**CÓDIGO:** FT-SST-07
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 21/06/2021
		PÁGINA: 1 de 3

ACTA DE REUNIÓN

Tema: Copasst

Fecha: 30-junio -2025	**Lugar: oficina principal**	
Hora Inicial: 8:30 am	**Hora Final: 9:15 am**	**Acta No. 6**

ASISTENTES:	CARGOS	FIRMA
Brandon López	Residente de Obra	
Yuramy Sabogal	Administrativa	
INVITADOS		
Andrea López	HSEQ	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- **Verificación del Quórum**

Se verificó la asistencia de los miembros del comité, cumpliendo con el quórum requerido para la sesión.

- **Lectura y Aprobación del Acta Anterior**

Se leyó el acta correspondiente al mes de abril de 2025, la cual fue aprobada sin observaciones.

- **Revisión de reporte de accidentalidad e incidentes – junio:**

Durante el mes de junio no se reportaron accidentes de trabajo ni incidentes por parte del contratista ni de los subcontratistas, lo cual es un reflejo del compromiso con la seguridad y prevención en el proyecto.

- **Seguimiento al estado de la brigada de emergencia:**

Se informa que la brigada de emergencia se encuentra activa y al día con su conformación y capacitación. No se han presentado novedades al respecto.

- **Comité de Convivencia:**

No se recibieron reportes ni solicitudes de intervención por parte del Comité de Convivencia Laboral durante el mes de junio.

- **Planeación del Día de la Salud:**

Se está adelantando la planificación del Día de la Salud, actividad que se realizará próximamente con el fin de promover hábitos saludables y el bienestar del personal. Próximamente se socializará la fecha y cronograma de actividades.

- **Ajuste del Reglamento Interno de Trabajo:**

Se informa que se encuentra en proceso de ajuste el Reglamento Interno de Trabajo, conforme a las disposiciones de la reforma laboral. Se tiene previsto divulgar el documento actualizado al personal durante el mes de julio.

- **Estado de entrega de dotación y elementos de protección personal (EPP):**

Se reporta que el suministro de dotación y EPP se encuentra al día, sin retrasos ni novedades. Todo el personal cuenta con sus elementos requeridos para el desarrollo de sus actividades en condiciones seguras.

- **Varios:**

Sin novedades adicionales para este punto.

5. DEFINICIÓN DE FECHA PRÓXIMA REUNIÓN.
Validar fecha la ultima semana de julio

ANEXO 5. CAPACITACIONES INTERVENTORIA

CONSORCIO SANTA TERESA 028

CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN
CONSORCIO SANTA TERESA 028

PROYECTOS IDRD

ITEM	ACTIVIDAD	PROGRAMADO/EJECUTADO	CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 4060 DE 2024									DIRIGIDO A PERSONAL		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
			MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	ADMINISTRATIVO	OBRA		
1	Inducción y notificación de riesgos y controles de obra - Política SST y Objetivos	PROGRAMADO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	x	x	Profesional SST	Anexos de informes mensuales de Gestión SST (Si ingresa personal)
		EJECUTADO													
2	Prevención de consumo de Alcohol y Drogas	PROGRAMADO		X								x	x	Profesional SST	Anexos de informes mensuales de Gestión SST
		EJECUTADO													
3	Plan de emergencias y contingencias	PROGRAMADO			X							x	x	Profesional SST	Anexos de informes mensuales de Gestión SST
		EJECUTADO													
4	Prevención de Accidentes Laborales	PROGRAMADO				X						x	x	Profesional SST	Anexos de informes mensuales de Gestión SST
		EJECUTADO													
5	Higiene postural	PROGRAMADO					X					x	x	Profesional SST	Anexos de informes mensuales de Gestión SST
		EJECUTADO													
6	Riesgo mecánico	PROGRAMADO						X				x	x	Profesional SST	Anexos de informes mensuales de Gestión SST
		EJECUTADO													
7	Riesgo físico	PROGRAMADO							X			x	x	Profesional SST	Anexos de informes mensuales de Gestión SST
		EJECUTADO													
8	Estilo de vida saludable	PROGRAMADO								X		x	x	Profesional SST	Anexos de informes mensuales de Gestión SST
		EJECUTADO													
9	Riesgo eléctrico	PROGRAMADO									X	x	x	Profesional SST	Anexos de informes mensuales de Gestión SST
		EJECUTADO													
SG-SST	Reunión COPASST	PROGRAMADO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	x	x	Profesional SST	Anexos de informes mensuales de Gestión SST
		EJECUTADO													
SG-SST	Reunión Comité de Convivencia Laboral	PROGRAMADO		X			X			X		x	x	Profesional SST	Anexos de informes mensuales de Gestión SST
		EJECUTADO													
Seguridad Industrial	Inspección de Botiquín	PROGRAMADO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	x	x	Profesional SST	Anexos de informes mensuales de Gestión SST
		EJECUTADO													
	Inspección de Extintor	PROGRAMADO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	x	x	Profesional SST	Anexos de informes mensuales de Gestión SST
		EJECUTADO													
	Inspección Locativa	PROGRAMADO			X			X			X	x	x	Profesional SST	Anexos de informes mensuales de Gestión SST
		EJECUTADO													

ELABORADO POR:	APROBADO POR:	FECHA ACTUALIZACIÓN
Laura Sofía Fernández	Raul Orlando Delgado	20/11/2024

Capacitación estilos de vida saludables 2025

* Indica que la pregunta es obligatoria

1. Nombre del trabajador *

2. Verdadero o falso. La alimentación, la actividad física, el amor propio y escuchar tu cuerpo son practicas saludables para ti y tu cuerpo. * 10 puntos

Marca solo un óvalo.

- Verdadero
- Falso

3. Verdadero o falso. Lavarse las manos, alimentarse de manera sana, realizar actividad física y sonreír son factores que nos ayudan a estar sanos. * 10 puntos

Marca solo un óvalo.

- Verdadero
- Falso

4. Verdadero o falso. Alimentarse de manera saludable marca la diferencia entre sentir bien y enérgico o estresado, cansado y amargado. * 10 puntos

Marca solo un óvalo.

- Verdadero
- Falso

5. Verdadero o falso. El uso de protector solar previene el cáncer de piel, las manchas y arrugas prematuras. * 10 puntos

Marca solo un óvalo.

- Verdadero
- Falso



Google no creó ni aprobó este contenido.

Google Formularios

Marca temporal	Puntuación	Nombre del trabajador	Verdadero o falso. La alimentación, la actividad física, el amor propio y escuchar tu cuerpo son practicas saludables para ti y tu cuerpo.	Verdadero o falso. Lavarse las manos, alimentarse de manera sana, realizar actividad física y sonreír son factores que nos ayudan a estar sanos.	Verdadero o falso. Alimentarse de manera saludable marca la diferencia entre sentir bien y enérgico o estresado, cansado y amargado.	Verdadero o falso. El uso de protector solar previene el cáncer de piel, las manchas y arrugas prematuras.
6/19/2025 14:37:52	40 / 40	CARLOS ANDRES FIGUEROA	Verdadero	Verdadero	Verdadero	Verdadero
6/19/2025 14:42:59	40 / 40	MARIA CLAUDIA MAHECHA	Verdadero	Verdadero	Verdadero	Verdadero
6/19/2025 14:43:10	40 / 40	LAURA SOFIA FERNANDEZ	Verdadero	Verdadero	Verdadero	Verdadero
6/19/2025 14:44:11	40 / 40	JUAN CARLOS RAMIREZ	Verdadero	Verdadero	Verdadero	Verdadero
6/19/2025 14:46:10	40 / 40	RUBEN DARIO MARQUEZ	Verdadero	Verdadero	Verdadero	Verdadero
6/19/2025 14:59:15	40 / 40	RAFAEL SANABRIA PIÑEROS	Verdadero	Verdadero	Verdadero	Verdadero
6/19/2025 15:08:09	40 / 40	LINA DEL PILAR RODRIGUEZ	Verdadero	Verdadero	Verdadero	Verdadero
6/19/2025 18:03:00	40 / 40	SOLBEY MAYERLY DUQUE	Verdadero	Verdadero	Verdadero	Verdadero
6/19/2025 21:57:16	40 / 40	LIZETH ALEIDA CASTILLO	Verdadero	Verdadero	Verdadero	Verdadero
6/20/2025 1:51:32	40 / 40	ANDRES GIOVANNY CORDOBA	Verdadero	Verdadero	Verdadero	Verdadero
6/20/2025 5:45:49	40 / 40	DIEGO ANDRES GALE	Verdadero	Verdadero	Verdadero	Verdadero
6/20/2025 9:40:05	40 / 40	ANGIE ACERO	Verdadero	Verdadero	Verdadero	Verdadero

ANEXO 5.1. CAPACITACIONES CONTRATISTA

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo
	FORMATO: FT-SST-014

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: ENERO 18 DE 2024
	Versión: 001
	Pagina 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
BOGOTA	PARQUES BOGOTA	6	5	2025

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		Protección para la cabeza
Charla de seguridad	x	
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	AVELLANEDA BOCANEGRA LUIS MIGUEL	1016593870	OPERARIO	Miguel Avellaneda
2	CAMPOS MARIN DAVID CAMILO	1012433979	OPERARIO	David Campos
3	CARDENAS CARDENAS HILARIO	3028150	CONDUCTOR	
4	CERQUERA VALDERRAMA JOSELITO	12209313	OPERARIO	Joselito
5	GARZON PINEDA JOSE ALEJANDRO	1033692776	OPERARIO	Alejandro Garzon
6	JIMENEZ LASSO WILBER DIOMEDES	5855002	OPERARIO	
7	LOPEZ AYALA BRANDON SEBASTIAN	1233890527	ING RESIDENTE	
8	MERCADO BASILIO LUIS GUILLERMO	1007195407	CONDUCTOR	Luis Mercado
9	MUÑOZ MACETO JESUS	1007289162	OPERARIO	Jesus M.
10	OVALLE BOLIVAR YEFERSON IVAN	1074414778	OPERARIO	Yeferson Ov
11	QUEVEDO LEGUIZAMON JHON ALEXANDER	1123116491	OPERARIO	
12	SABOGAL CUERVO DANIEL STEBAN	1031803879	INSPECTOR	
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre: ANDREA LOPEZ	Firma

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo
	FORMATO: FT-SST-014

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	**Fecha:** ENERO 18 DE 2024
	Versión: 001
	Pagina 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
BOGOTA	PARQUES BOGOTA	5	5	2025

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		Puntos ciegos en la operación de vehículos
Charla de seguridad	x	
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadania	Cargo	Firma
1	AVELLANEDA BOCANEGRA LUIS MIGUEL	1016593870	OPERARIO	
2	CAMPOS MARIN DAVID CAMILO	1012433979	OPERARIO	
3	CARDENAS CARDENAS HILARIO	3028150	CONDUCTOR	
4	CERQUERA VALDERRAMA JOSELITO	12209313	OPERARIO	
5	GARZON PINEDA JOSE ALEJANDRO	1033692776	OPERARIO	
6	JIMENEZ LASSO WILBER DIOMEDES	5855002	OPERARIO	
7	LOPEZ AYALA BRANDON SEBASTIAN	1233890527	ING RESIDENTE	
8	MERCADO BASILIO LUIS GUILLERMO	1007195407	CONDUCTOR	
9	MUÑOZ MACETO JESUS	1007289162	OPERARIO	
10	OVALLE BOLIVAR YEFERSON IVAN	1074414778	OPERARIO	
11	QUEVEDO LEGUIZAMON JHON ALEXANDER	1123116491	OPERARIO	
12	SABOGAL CUERVO DANIEL STEBAN	1031803879	INSPECTOR	
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre: ANDREA LOPEZ	**Firma**

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo
	FORMATO: FT-SST-014

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: ENERO 18 DE 2024
	Versión: 001
	Pagina 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
BOGOTA	PARQUES BOGOTA	7	5	2025

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		Tormentas y sus riesgos
Charla de seguridad	x	
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	AVELLANEDA BOCANEGRA LUIS MIGUEL	1016593870	OPERARIO	
2	CAMPOS MARIN DAVID CAMILO	1012433979	OPERARIO	
3	CARDENAS CARDENAS HILARIO	3028150	CONDUCTOR	
4	CERQUERA VALDERRAMA JOSELITO	12209313	OPERARIO	
5	GARZON PINEDA JOSE ALEJANDRO	1033692776	OPERARIO	
6	JIMENEZ LASSO WILBER DIOMEDES	5855002	OPERARIO	
7	LOPEZ AYALA BRANDON SEBASTIAN	1233890527	ING RESIDENTE	
8	MERCADO BASILIO LUIS GUILLERMO	1007195407	CONDUCTOR	
9	MUÑOZ MACETO JESUS	1007289162	OPERARIO	
10	OVALLE BOLIVAR YEFERSON IVAN	1074414778	OPERARIO	
11	QUEVEDO LEGUIZAMON JHON ALEXANDER	1123116491	OPERARIO	
12	SABOGAL CUERVO DANIEL STEBAN	1031803879	INSPECTOR	
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre: ANDREA LOPEZ	Firma

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo
	FORMATO: FT-SST-014

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: ENERO 18 DE 2024
	Versión: 001
	Pagina 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
BOGOTA	PARQUES BOGOTA	8	5	2025

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		Riesgo publico
Charla de seguridad	x	
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otro		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	AVELLANEDA BOCANEGRA LUIS MIGUEL	1016593870	OPERARIO	
2	CAMPOS MARIN DAVID CAMILO	1012433979	OPERARIO	
3	CARDENAS CARDENAS HILARIO	3028150	CONDUCTOR	
4	CERQUERA VALDERRAMA JOSELITO	12209313	OPERARIO	
5	GARZON PINEDA JOSE ALEJANDRO	1033692776	OPERARIO	
6	JIMENEZ LASSO WILBER DIOMEDES	5855002	OPERARIO	
7	LOPEZ AYALA BRANDON SEBASTIAN	1233890527	ING RESIDENTE	
8	MERCADO BASILIO LUIS GUILLERMO	1007195407	CONDUCTOR	
9	MUÑOZ MACETO JESUS	1007289162	OPERARIO	
10	OVALLE BOLIVAR YEFERSON IVAN	1074414778	OPERARIO	
11	QUEVEDO LEGUIZAMON JHON ALEXANDER	1123116491	OPERARIO	
12	SABOGAL CUERVO DANIEL STEBAN	1031803879	INSPECTOR	
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad	
Nombre: ANDREA LOPEZ	Firma

CONSORCIO INNOVAPARQUES

Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo

FORMATO: FT-SST-014

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha: ENERO 18 DE 2024
Versión: 001

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
BOGOTA	PARQUES BOGOTA	0	5	2025

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Induccion - Reinduccion		USO DE HERRAMIENTAS
Charla de seguridad		
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitacion especifica al cargo		
Otra	x	

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadania	Cargo	Firma
1	AVELLANEDA BOCANEGRA LUIS MIGUEL	1016593870	OPERARIO	Luis Miguel A.
2	CAMPOS MARIN DAVID CAMILO	1012433979	OPERARIO	CAMILO M.
3	CARDENAS CARDENAS HILARIO	3028150	CONDUCTOR	
4	CERQUERA VALDERRAMA JOSELITO	12209313	OPERARIO	Joselitoo
5	GARZON PiNEDA JOSE ALEJANDRO	1033692776	OPERARIO	Alejandro
6	JIMENEZ LASSO WILBER DIOMEDES	5855002	OPERARIO	Wilber Jimenez
7	LOPEZ AYALA BRANDON SEBASTIAN	1233890527	ING RESIDENTE	
8	MERCADO BASILIO LUIS GUILLERMO	1007195407	CONDUCTOR	Luis Mercado
9	MUÑOZ MACETO JESUS	1007289162	OPERARIO	Jesus M.
10	OVALLE BOLIVAR YEFERSON IVAN	1074414778	OPERARIO	Yeferson O
11	QUEVEDO LEGUIZAMON JHON ALEXANDER	1123116491	OPERARIO	
12	SABOGAL CUERVO DANIEL STEBAN	1031803879	INSPECTOR	
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad
Nombre: ANDREA LOPEZ

Firma

CONSORCIO INNOVAPARQUES

EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN

Nombre de la capacitación: USO DE HERRAMIENTAS	Fecha: 09/05/2025
Nombre y Apellidos: CAMPOS MARIN DAVID CAMILO	No CC: 1012433979
Cargo: Operario	

Pregunta 1: ¿Cuál es la forma más segura de usar una herramienta manual?

a) Usar cualquier herramienta disponible aunque no sea la indicada
b) Modificar la herramienta si no cumple su función
c) Usar la herramienta adecuada y en buen estado
d) Prestar herramientas a otros sin revisar su estado

Pregunta 2: ¿Qué elemento de protección es más importante al usar un martillo?

a) Protector solar
b) Tapones auditivos
c) Gafas de seguridad
d) Mascarilla

Pregunta 3: ¿Qué se debe hacer después de usar una herramienta?

a) Guardarla sin limpiarla
b) Prestarla sin revisarla
c) Tirarla si ya no se necesita
d) Limpiarla y guardarla en su lugar

CONSORCIO INNOVAPARQUES

EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN

Nombre de la capacitación: USO DE HERRAMIENTAS	Fecha: 09/05/2025
Nombre y Apellidos: QUEVEDO LEGUIZAMÓN JHON ALEXANDER	No CC: 1123116491
Cargo: Operario	

Pregunta 1: ¿Cuál es la forma más segura de usar una herramienta manual?

a) Usar cualquier herramienta disponible aunque no sea la indicada
b) Modificar la herramienta si no cumple su función
c) Usar la herramienta adecuada y en buen estado
d) Prestar herramientas a otros sin revisar su estado

Pregunta 2: ¿Qué elemento de protección es más importante al usar un martillo?

a) Protector solar
b) Tapones auditivos
c) Gafas de seguridad
d) Mascarilla

Pregunta 3: ¿Qué se debe hacer después de usar una herramienta?

a) Guardarla sin limpiarla
b) Prestarla sin revisarla
c) Tirarla si ya no se necesita
d) Limpiarla y guardarla en su lugar

CONSORCIO INNOVAPARQUES

EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN

Nombre de la capacitación: USO DE HERRAMIENTAS	Fecha: 09/05/2025
Nombre y Apellidos: OVALLE BOLIVAR YEFERSON IVAN	No CC: 1074414778
Cargo: Operario	

Pregunta 1: ¿Cuál es la forma más segura de usar una herramienta manual?

a) Usar cualquier herramienta disponible aunque no sea la indicada
b) Modificar la herramienta si no cumple su función
c) Usar la herramienta adecuada y en buen estado
d) Prestar herramientas a otros sin revisar su estado

Pregunta 2: ¿Qué elemento de protección es más importante al usar un martillo?

a) Protector solar
b) Tapones auditivos
c) Gafas de seguridad
d) Mascarilla

Pregunta 3: ¿Qué se debe hacer después de usar una herramienta?

a) Guardarla sin limpiarla
b) Prestarla sin revisarla
c) Tirarla si ya no se necesita
d) Limpiarla y guardarla en su lugar

CONSORCIO INNOVAPARQUES

EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN

Nombre de la capacitación: USO DE HERRAMIENTAS	Fecha: 09/05/2025
Nombre y Apellidos: MUÑOZ MACETO JESUS	No CC: 1007289162
Cargo: Operario	

Pregunta 1: ¿Cuál es la forma más segura de usar una herramienta manual?

a) Usar cualquier herramienta disponible aunque no sea la indicada
b) Modificar la herramienta si no cumple su función
c) Usar la herramienta adecuada y en buen estado
d) Prestar herramientas a otros sin revisar su estado

Pregunta 2: ¿Qué elemento de protección es más importante al usar un martillo?

a) Protector solar
b) Tapones auditivos
c) Gafas de seguridad
d) Mascarilla

Pregunta 3: ¿Qué se debe hacer después de usar una herramienta?

a) Guardarla sin limpiarla
b) Prestarla sin revisarla
c) Tirarla si ya no se necesita
d) Limpiarla y guardarla en su lugar

CONSORCIO INNOVAPARQUES

EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN

Nombre de la capacitación: USO DE HERRAMIENTAS	Fecha: 09/05/2025
Nombre y Apellidos: MERCADO BASILIO LUIS GUILLERMO	No CC: 1007195407
Cargo: Conductor	

Pregunta 1: ¿Cuál es la forma más segura de usar una herramienta manual?

a) Usar cualquier herramienta disponible aunque no sea la indicada
b) Modificar la herramienta si no cumple su función
c) Usar la herramienta adecuada y en buen estado
d) Prestar herramientas a otros sin revisar su estado

Pregunta 2: ¿Qué elemento de protección es más importante al usar un martillo?

a) Protector solar
b) Tapones auditivos
c) Gafas de seguridad
d) Mascarilla

Pregunta 3: ¿Qué se debe hacer después de usar una herramienta?

a) Guardarla sin limpiarla
b) Prestarla sin revisarla
c) Tirarla si ya no se necesita
d) Limpiarla y guardarla en su lugar

CONSORCIO INNOVAPARQUES

EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN

Nombre de la capacitación: USO DE HERRAMIENTAS	Fecha: 09/05/2025
Nombre y Apellidos: LOPEZ AYALA BRANDON SEBASTIAN	No CC: 1233890527
Cargo: Ing. Residente	

Pregunta 1: ¿Cuál es la forma más segura de usar una herramienta manual?

a) Usar cualquier herramienta disponible aunque no sea la indicada
b) Modificar la herramienta si no cumple su función
X c) Usar la herramienta adecuada y en buen estado
d) Prestar herramientas a otros sin revisar su estado

Pregunta 2: ¿Qué elemento de protección es más importante al usar un martillo?

a) Protector solar
b) Tapones auditivos
X c) Gafas de seguridad
d) Mascarilla

Pregunta 3: ¿Qué se debe hacer después de usar una herramienta?

a) Guardarla sin limpiarla
b) Prestarla sin revisarla
c) Tirarla si ya no se necesita
X d) Limpiarla y guardarla en su lugar

CONSORCIO INNOVAPARQUES

EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN

Nombre de la capacitación: USO DE HERRAMIENTAS	Fecha: 09/05/2025
Nombre y Apellidos: JIMENEZ LASSO WILBER DIOMEDES	No CC: 5855002
Cargo: Operario	

Pregunta 1: ¿Cuál es la forma más segura de usar una herramienta manual?

a) Usar cualquier herramienta disponible aunque no sea la indicada
b) Modificar la herramienta si no cumple su función
c) Usar la herramienta adecuada y en buen estado ✓
d) Prestar herramientas a otros sin revisar su estado

Pregunta 2: ¿Qué elemento de protección es más importante al usar un martillo?

a) Protector solar
b) Tapones auditivos
c) Gafas de seguridad ✓
d) Mascarilla

Pregunta 3: ¿Qué se debe hacer después de usar una herramienta?

a) Guardarla sin limpiarla
b) Prestarla sin revisarla
c) Tirarla si ya no se necesita ✓
d) Limpiarla y guardarla en su lugar

CONSORCIO INNOVAPARQUES

EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN

Nombre de la capacitación: USO DE HERRAMIENTAS	Fecha: 09/05/2025
Nombre y Apellidos: GARZON PINEDA JOSE ALEJANDRO	No CC: 1033692776
Cargo: Operario	

Pregunta 1: ¿Cuál es la forma más segura de usar una herramienta manual?

a) Usar cualquier herramienta disponible aunque no sea la indicada
b) Modificar la herramienta si no cumple su función
c) Usar la herramienta adecuada y en buen estado
d) Prestar herramientas a otros sin revisar su estado

Pregunta 2: ¿Qué elemento de protección es más importante al usar un martillo?

a) Protector solar
b) Tapones auditivos
c) Gafas de seguridad
d) Mascarilla

Pregunta 3: ¿Qué se debe hacer después de usar una herramienta?

a) Guardarla sin limpiarla
b) Prestarla sin revisarla
c) Tirarla si ya no se necesita
d) Limpiarla y guardarla en su lugar

CONSORCIO INNOVAPARQUES

EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN

Nombre de la capacitación: USO DE HERRAMIENTAS	Fecha: 09/05/2025
Nombre y Apellidos: CERQUERA VALDERRAMA JOSELITO	No CC: 12209313
Cargo: Operario	

Pregunta 1: ¿Cuál es la forma más segura de usar una herramienta manual?

a) Usar cualquier herramienta disponible aunque no sea la indicada
b) Modificar la herramienta si no cumple su función
c) Usar la herramienta adecuada y en buen estado
d) Prestar herramientas a otros sin revisar su estado

Pregunta 2: ¿Qué elemento de protección es más importante al usar un martillo?

a) Protector solar
b) Tapones auditivos
c) Gafas de seguridad
d) Mascarilla

Pregunta 3: ¿Qué se debe hacer después de usar una herramienta?

a) Guardarla sin limpiarla
b) Prestarla sin revisarla
c) Tirarla si ya no se necesita
d) Limpiarla y guardarla en su lugar

CONSORCIO INNOVAPARQUES

EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN

Nombre de la capacitación: USO DE HERRAMIENTAS	Fecha: 09/05/2025
Nombre y Apellidos: CARDENAS CARDENAS HILARIO	No CC: 3028150
Cargo: Conductor	

Pregunta 1: ¿Cuál es la forma más segura de usar una herramienta manual?

a) Usar cualquier herramienta disponible aunque no sea la indicada
b) Modificar la herramienta si no cumple su función
c) Usar la herramienta adecuada y en buen estado
d) Prestar herramientas a otros sin revisar su estado

Pregunta 2: ¿Qué elemento de protección es más importante al usar un martillo?

a) Protector solar
b) Tapones auditivos
c) Gafas de seguridad
d) Mascarilla

Pregunta 3: ¿Qué se debe hacer después de usar una herramienta?

a) Guardarla sin limpiarla
b) Prestarla sin revisarla
c) Tirarla si ya no se necesita
d) Limpiarla y guardarla en su lugar

CONSORCIO INNOVAPARQUES

EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN

Nombre de la capacitación: USO DE HERRAMIENTAS	Fecha: 09/05/2025
Nombre y Apellidos: AVELLANEDA BOCANEGRA LUIS MIGUEL	No CC: 1016593870
Cargo: Operario	

Pregunta 1: ¿Cuál es la forma más segura de usar una herramienta manual?

a) Usar cualquier herramienta disponible aunque no sea la indicada
b) Modificar la herramienta si no cumple su función
X c) Usar la herramienta adecuada y en buen estado
d) Prestar herramientas a otros sin revisar su estado

Pregunta 2: ¿Qué elemento de protección es más importante al usar un martillo?

a) Protector solar
b) Tapones auditivos
X c) Gafas de seguridad
d) Mascarilla

Pregunta 3: ¿Qué se debe hacer después de usar una herramienta?

a) Guardarla sin limpiarla
b) Prestarla sin revisarla
c) Tirarla si ya no se necesita
X d) Limpiarla y guardarla en su lugar

CONSORCIO INNOVAPARQUES

EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN

Nombre de la capacitación: USO DE HERRAMIENTAS	**Fecha: 09/05/2025**
Nombre y Apellidos: DANIEL SABOGAL	No CC: 1031803879
Cargo: Inspector	

Pregunta 1: ¿Cuál es la forma más segura de usar una herramienta manual?

a) Usar cualquier herramienta disponible aunque no sea la indicada
b) Modificar la herramienta si no cumple su función
c) Usar la herramienta adecuada y en buen estado
d) Prestar herramientas a otros sin revisar su estado

Pregunta 2: ¿Qué elemento de protección es más importante al usar un martillo?

a) Protector solar
b) Tapones auditivos
c) Gafas de seguridad
d) Mascarilla

Pregunta 3: ¿Qué se debe hacer después de usar una herramienta?

a) Guardarla sin limpiarla
b) Prestarla sin revisarla
c) Tirarla si ya no se necesita
d) Limpiarla y guardarla en su lugar

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo
	FORMATO: FT-SST-014

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: ENERO 18 DE 2024
	Versión: 001
	Pagina 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
BOGOTA	PARQUES BOGOTA	12	5	2025

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		Factores de riesgo psicosocial y cómo mitigarlos (burnout, acoso, fatiga).
Charla de seguridad	x	
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otro		

No	Nombre del Trabajador	Cedula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	CAMPOS MARIN DAVID CAMILO	1012433979	OPERARIO	
2	CARDENAS CARDENAS HILARIO	3028150	CONDUCTOR	
3	CERQUERA VALDERRAMA JOSELITO	12209313	OPERARIO	
4	GARZON PINEDA JOSE ALEJANDRO	1033692776	OPERARIO	
5	JIMENEZ LASSO WILBER DIOMEDES	5855002	OPERARIO	
6	LOPEZ AYALA BRANDON SEBASTIAN	1233890527	ING RESIDENTE	
7	MERCADO BASILIO LUIS GUILLERMO	1007195407	CONDUCTOR	
8	MUÑOZ MACETO JESUS	1007289162	OPERARIO	
9	OVALLE BOLIVAR YEFERSON IVAN	1074414778	OPERARIO	
10	QUEVEDO LEGUIZAMON JHON ALEXANDER	1123116491	OPERARIO	
11	SABOGAL CUERVO DANIEL STEBAN	1031803879	INSPECTOR	
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre: ANDREA LOPEZ	Firma

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo
	FORMATO: FT-SST-014

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: ENERO 18 DE 2024
	Versión: 001
	Pagina 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
BOGOTA	PARQUES BOGOTA	13	5	2025

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		Auditorias Internas
Charla de seguridad	x	
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	CAMPOS MARIN DAVID CAMILO	1012433979	OPERARIO	
2	CARDENAS CARDENAS HILARIO	3028150	CONDUCTOR	
3	CERQUERA VALDERRAMA JOSELITO	12209313	OPERARIO	
4	GARZON PINEDA JOSE ALEJANDRO	1033692776	OPERARIO	
5	JIMENEZ LASSO WILBER DIOMEDES	5855002	OPERARIO	
6	LOPEZ AYALA BRANDON SEBASTIAN	1233890527	ING RESIDENTE	
7	MERCADO BASILIO LUIS GUILLERMO	1007195407	CONDUCTOR	
8	MUÑOZ MACETO JESUS	1007289162	OPERARIO	
9	OVALLE BOLIVAR YEFERSON IVAN	1074414778	OPERARIO	
10	QUEVEDO LEGUIZAMON JHON ALEXANDER	1123116491	OPERARIO	
11	SABOGAL CUERVO DANIEL STEBAN	1031803879	INSPECTOR	
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre: ANDREA LOPEZ	Firma

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo
	FORMATO: FT-SST-014

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	**Fecha:** ENERO 18 DE 2024
	Versión: 001
	Pagina 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
BOGOTA	PARQUES BOGOTA	14	5	2025

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		Cómo influir en el comportamiento seguro en el trabajo
Charla de seguridad	x	
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cedula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	CAMPOS MARIN DAVID CAMILO	1012433979	OPERARIO	CAMILO
2	CARDENAS CARDENAS HILARIO	3028150	CONDUCTOR	
3	CERQUERA VALDERRAMA JOSELITO	12209313	OPERARIO	Joselito
4	GARZON PINEDA JOSE ALEJANDRO	1033692776	OPERARIO	Alejandro Garzon
5	JIMENEZ LASSO WILBER DIOMEDES	5855002	OPERARIO	
6	LOPEZ AYALA BRANDON SEBASTIAN	1233890527	ING RESIDENTE	
7	MERCADO BASILIO LUIS GUILLERMO	1007195407	CONDUCTOR	Luis Mercado
8	MUÑOZ MACETO JESUS	1007289162	OPERARIO	Jesus M.
9	OVALLE BOLIVAR YEFERSON IVAN	1074414778	OPERARIO	
10	QUEVEDO LEGUIZAMON JHON ALEXANDER	1123116491	OPERARIO	
11	SABOGAL CUERVO DANIEL STEBAN	1031803879	INSPECTOR	
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre: ANDREA LOPEZ	Firma

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo
	FORMATO: FT-SST-014

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	**Fecha:** ENERO 18 DE 2024
	Versión: 001
	Pagina 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
BOGOTA	PARQUES BOGOTA	15	5	2025

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		Evaluación de riesgos mecánicos, eléctricos y ergonómicos.
Charla de seguridad	x	
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	CAMPOS MARIN DAVID CAMILO	1012433979	OPERARIO	CAMILO
2	CARDENAS CARDENAS HILARIO	3028150	CONDUCTOR	
3	CERQUERA VALDERRAMA JOSELITO	12209313	OPERARIO	Joselito
4	GARZON PINEDA JOSE ALEJANDRO	1033692776	OPERARIO	Alejandro Garzon
5	JIMENEZ LASSO WILBER DIOMEDES	5855002	OPERARIO	
6	LOPEZ AYALA BRANDON SEBASTIAN	1233890527	ING RESIDENTE	
7	MERCADO BASILIO LUIS GUILLERMO	1007195407	CONDUCTOR	Luis Mercado
8	MUÑOZ MACETO JESUS	1007289162	OPERARIO	Jesus M.
9	OVALLE BOLIVAR YEFERSON IVAN	1074414778	OPERARIO	Yeferson OV.
10	QUEVEDO LEGUIZAMON JHON ALEXANDER	1123116491	OPERARIO	
11	SABOGAL CUERVO DANIEL STEBAN	1031803879	INSPECTOR	
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre: ANDREA LOPEZ	Firma

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo
	FORMATO: FT-SST-014

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: ENERO 18 DE 2024
	Versión: 001
	Pagina 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
BOGOTA	PARQUES BOGOTA	16	5	2025

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		Evaluación de riesgos mecánicos, eléctricos y ergonómicos.
Charla de seguridad		
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitacion especifica al cargo	x	
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	CAMPOS MARIN DAVID CAMILO	1012433979	OPERARIO	
2	CARDENAS CARDENAS HILARIO	3028150	CONDUCTOR	
3	CERQUERA VALDERRAMA JOSELITO	12209313	OPERARIO	
4	GARZON PINEDA JOSE ALEJANDRO	1033692776	OPERARIO	
5	JIMENEZ LASSO WILBER DIOMEDES	5855002	OPERARIO	
6	LOPEZ AYALA BRANDON SEBASTIAN	1233890527	ING RESIDENTE	
7	MERCADO BASILIO LUIS GUILLERMO	1007195407	CONDUCTOR	
8	MUÑOZ MACETO JESUS	1007289162	OPERARIO	
9	OVALLE BOLIVAR YEFERSON IVAN	1074414778	OPERARIO	
10	QUEVEDO LEGUIZAMON JHON ALEXANDER	1123116491	OPERARIO	
11	SABOGAL CUERVO DANIEL STEBAN	1031803879	INSPECTOR	
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre: ANDREA LOPEZ	Firma

CONSORCIO INNOVAPARQUES

EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN

Nombre de la capacitación: Capacitación Ambiental	Fecha: 16/05/2025
Nombre y Apellidos: CAMPOS MARIN DAVID CAMILO	No CC: 1012433979
Cargo: Operario	

EVALUACIÓN: SELECCIÓN MÚLTIPLE

1. ¿Por qué no es seguro refugiarse bajo un árbol durante una tormenta eléctrica?
A) Porque los rayos buscan los puntos más altos y pueden impactarlo.
B) Porque los árboles no ofrecen suficiente sombra.
C) Porque los árboles no protegen del viento.
D) Porque el agua de la lluvia puede mojarte más bajo un árbol.

2. ¿Cuál es la mejor opción si te sorprende una tormenta sin refugio cercano?
A) Correr rápidamente a cualquier lugar sin importar las condiciones.
B) Refugiarse bajo el árbol más grande que encuentres.
C) Acostarse en el suelo para evitar ser alcanzado por un rayo.
D) Mantenerse alejado de árboles y postes, adoptando una postura de seguridad en el suelo.

3. ¿Qué debes hacer después de que pase la tormenta?
A) Salir inmediatamente al aire libre para verificar si todo está en orden.
B) Esperar al menos 30 minutos después del último trueno antes de salir.
C) Volver a las actividades sin precauciones, ya que el peligro desaparece al dejar de llover.
D) Esconderse bajo un árbol hasta que todo esté seco.

CONSORCIO INNOVAPARQUES

EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN

Nombre de la capacitación: Capacitación Ambiental	Fecha: 16/05/2025
Nombre y Apellidos: CARDENAS CARDENAS HILARIO	No CC: 3028150
Cargo: Conductor	

EVALUACIÓN: SELECCIÓN MÚLTIPLE

1. ¿Por qué no es seguro refugiarse bajo un árbol durante una tormenta eléctrica?
A) Porque los rayos buscan los puntos más altos y pueden impactarlo.
B) Porque los árboles no ofrecen suficiente sombra.
C) Porque los árboles no protegen del viento.
D) Porque el agua de la lluvia puede mojarte más bajo un árbol.

2. ¿Cuál es la mejor opción si te sorprende una tormenta sin refugio cercano?
A) Correr rápidamente a cualquier lugar sin importar las condiciones.
B) Refugiarse bajo el árbol más grande que encuentres.
C) Acostarse en el suelo para evitar ser alcanzado por un rayo.
D) Mantenerse alejado de árboles y postes, adoptando una postura de seguridad en el suelo.

3. ¿Qué debes hacer después de que pase la tormenta?
A) Salir inmediatamente al aire libre para verificar si todo está en orden.
B) Esperar al menos 30 minutos después del último trueno antes de salir.
C) Volver a las actividades sin precauciones, ya que el peligro desaparece al dejar de llover.
D) Esconderse bajo un árbol hasta que todo esté seco.

CONSORCIO INNOVAPARQUES

EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN

Nombre de la capacitación: Capacitación Ambiental	Fecha: 16/05/2025
Nombre y Apellidos: CERQUERA VALDERRAMA JOSELITO	No CC: 12209313
Cargo: Operario	

EVALUACIÓN: SELECCIÓN MÚLTIPLE

1. ¿Por qué no es seguro refugiarse bajo un árbol durante una tormenta eléctrica?
A) Porque los rayos buscan los puntos más altos y pueden impactarlo.
B) Porque los árboles no ofrecen suficiente sombra.
C) Porque los árboles no protegen del viento.
D) Porque el agua de la lluvia puede mojarte más bajo un árbol.

2. ¿Cuál es la mejor opción si te sorprende una tormenta sin refugio cercano?
A) Correr rápidamente a cualquier lugar sin importar las condiciones.
B) Refugiarse bajo el árbol más grande que encuentres.
C) Acostarse en el suelo para evitar ser alcanzado por un rayo.
D) Mantenerse alejado de árboles y postes, adoptando una postura de seguridad en el suelo.

3. ¿Qué debes hacer después de que pase la tormenta?
A) Salir inmediatamente al aire libre para verificar si todo está en orden.
B) Esperar al menos 30 minutos después del último trueno antes de salir.
C) Volver a las actividades sin precauciones, ya que el peligro desaparece al dejar de llover.
D) Esconderse bajo un árbol hasta que todo esté seco.

CONSORCIO INNOVAPARQUES

EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN

Nombre de la capacitación: Capacitación Ambiental	Fecha: 16/05/2025
Nombre y Apellidos: GARZON PINEDA JOSE ALEJANDRO	No CC: 1033692776
Cargo: Operario	

EVALUACIÓN: SELECCIÓN MÚLTIPLE

1. ¿Por qué no es seguro refugiarse bajo un árbol durante una tormenta eléctrica?

A) Porque los rayos buscan los puntos más altos y pueden impactarlo.
B) Porque los árboles no ofrecen suficiente sombra.
C) Porque los árboles no protegen del viento.
D) Porque el agua de la lluvia puede mojarte más bajo un árbol.

2. ¿Cuál es la mejor opción si te sorprende una tormenta sin refugio cercano?

A) Correr rápidamente a cualquier lugar sin importar las condiciones.
B) Refugiarse bajo el árbol más grande que encuentres.
C) Acostarse en el suelo para evitar ser alcanzado por un rayo.
D) Mantenerse alejado de árboles y postes, adoptando una postura de seguridad en el suelo.

3. ¿Qué debes hacer después de que pase la tormenta?

A) Salir inmediatamente al aire libre para verificar si todo está en orden.
B) Esperar al menos 30 minutos después del último trueno antes de salir.
C) Volver a las actividades sin precauciones, ya que el peligro desaparece al dejar de llover.
D) Esconderse bajo un árbol hasta que todo esté seco.

CONSORCIO INNOVAPARQUES

EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN

Nombre de la capacitación: Capacitación Ambiental	Fecha: 16/05/2025
Nombre y Apellidos: JIMENEZ LASSO WILBER DIOMEDES	No CC: 5855002
Cargo: Operario	

EVALUACIÓN: SELECCIÓN MÚLTIPLE

1. ¿Por qué no es seguro refugiarse bajo un árbol durante una tormenta eléctrica?
A) Porque los rayos buscan los puntos más altos y pueden impactarlo.
B) Porque los árboles no ofrecen suficiente sombra.
C) Porque los árboles no protegen del viento.
D) Porque el agua de la lluvia puede mojarte más bajo un árbol.

2. ¿Cuál es la mejor opción si te sorprende una tormenta sin refugio cercano?
A) Correr rápidamente a cualquier lugar sin importar las condiciones.
B) Refugiarse bajo el árbol más grande que encuentres.
C) Acostarse en el suelo para evitar ser alcanzado por un rayo.
D) Mantenerse alejado de árboles y postes, adoptando una postura de seguridad en el suelo.

3. ¿Qué debes hacer después de que pase la tormenta?
A) Salir inmediatamente al aire libre para verificar si todo está en orden.
B) Esperar al menos 30 minutos después del último trueno antes de salir.
C) Volver a las actividades sin precauciones, ya que el peligro desaparece al dejar de llover.
D) Esconderse bajo un árbol hasta que todo esté seco.

CONSORCIO INNOVAPARQUES

EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN

Nombre de la capacitación: Capacitación Ambiental	Fecha: 16/05/2025
Nombre y Apellidos: LOPEZ AYALA BRANDON SEBASTIAN	No CC: 1233890527
Cargo: Ing. Residente	

EVALUACIÓN: SELECCIÓN MÚLTIPLE

1. ¿Por qué no es seguro refugiarse bajo un árbol durante una tormenta eléctrica?
A) Porque los rayos buscan los puntos más altos y pueden impactarlo.
B) Porque los árboles no ofrecen suficiente sombra.
C) Porque los árboles no protegen del viento.
D) Porque el agua de la lluvia puede mojarte más bajo un árbol.

2. ¿Cuál es la mejor opción si te sorprende una tormenta sin refugio cercano?
A) Correr rápidamente a cualquier lugar sin importar las condiciones.
B) Refugiarse bajo el árbol más grande que encuentres.
C) Acostarse en el suelo para evitar ser alcanzado por un rayo.
D) Mantenerse alejado de árboles y postes, adoptando una postura de seguridad en el suelo.

3. ¿Qué debes hacer después de que pase la tormenta?
A) Salir inmediatamente al aire libre para verificar si todo está en orden.
B) Esperar al menos 30 minutos después del último trueno antes de salir.
C) Volver a las actividades sin precauciones, ya que el peligro desaparece al dejar de llover.
D) Esconderse bajo un árbol hasta que todo esté seco.

CONSORCIO INNOVAPARQUES

EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN

Nombre de la capacitación: Capacitación Ambiental	Fecha: 16/05/2025
Nombre y Apellidos: MERCADO BASILIO LUIS GUILLERMO	No CC: 1007195407
Cargo: Conductor	

EVALUACIÓN: SELECCIÓN MÚLTIPLE

1. ¿Por qué no es seguro refugiarse bajo un árbol durante una tormenta eléctrica?
A) Porque los rayos buscan los puntos más altos y pueden impactarlo.
B) Porque los árboles no ofrecen suficiente sombra.
C) Porque los árboles no protegen del viento.
D) Porque el agua de la lluvia puede mojarte más bajo un árbol.

2. ¿Cuál es la mejor opción si te sorprende una tormenta sin refugio cercano?
A) Correr rápidamente a cualquier lugar sin importar las condiciones.
B) Refugiarse bajo el árbol más grande que encuentres.
C) Acostarse en el suelo para evitar ser alcanzado por un rayo.
D) Mantenerse alejado de árboles y postes, adoptando una postura de seguridad en el suelo.

3. ¿Qué debes hacer después de que pase la tormenta?
A) Salir inmediatamente al aire libre para verificar si todo está en orden.
B) Esperar al menos 30 minutos después del último trueno antes de salir.
C) Volver a las actividades sin precauciones, ya que el peligro desaparece al dejar de llover.
D) Esconderse bajo un árbol hasta que todo esté seco.

CONSORCIO INNOVAPARQUES

EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN

Nombre de la capacitación: Capacitación Ambiental	Fecha: 16/05/2025
Nombre y Apellidos: MUÑOZ MACETO JESUS	No CC: 1007289162
Cargo: Operario	

EVALUACIÓN: SELECCIÓN MÚLTIPLE

1. ¿Por qué no es seguro refugiarse bajo un árbol durante una tormenta eléctrica?
A) Porque los rayos buscan los puntos más altos y pueden impactarlo.
B) Porque los árboles no ofrecen suficiente sombra.
C) Porque los árboles no protegen del viento.
D) Porque el agua de la lluvia puede mojarte más bajo un árbol.

2. ¿Cuál es la mejor opción si te sorprende una tormenta sin refugio cercano?
A) Correr rápidamente a cualquier lugar sin importar las condiciones.
B) Refugiarse bajo el árbol más grande que encuentres.
C) Acostarse en el suelo para evitar ser alcanzado por un rayo.
D) Mantenerse alejado de árboles y postes, adoptando una postura de seguridad en el suelo.

3. ¿Qué debes hacer después de que pase la tormenta?
A) Salir inmediatamente al aire libre para verificar si todo está en orden.
B) Esperar al menos 30 minutos después del último trueno antes de salir.
C) Volver a las actividades sin precauciones, ya que el peligro desaparece al dejar de llover.
D) Esconderse bajo un árbol hasta que todo esté seco.

CONSORCIO INNOVAPARQUES

EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN

Nombre de la capacitación: Capacitación Ambiental	Fecha: 16/05/2025
Nombre y Apellidos: OVALLE BOLIVAR YEFERSON IVAN	No CC: 1074414778
Cargo: Operario	

EVALUACIÓN: SELECCIÓN MÚLTIPLE

1. ¿Por qué no es seguro refugiarse bajo un árbol durante una tormenta eléctrica?
A) Porque los rayos buscan los puntos más altos y pueden impactarlo.
B) Porque los árboles no ofrecen suficiente sombra.
C) Porque los árboles no protegen del viento.
D) Porque el agua de la lluvia puede mojarte más bajo un árbol.

2. ¿Cuál es la mejor opción si te sorprende una tormenta sin refugio cercano?
A) Correr rápidamente a cualquier lugar sin importar las condiciones.
B) Refugiarse bajo el árbol más grande que encuentres.
C) Acostarse en el suelo para evitar ser alcanzado por un rayo.
D) Mantenerse alejado de árboles y postes, adoptando una postura de seguridad en el suelo.

3. ¿Qué debes hacer después de que pase la tormenta?
A) Salir inmediatamente al aire libre para verificar si todo está en orden.
B) Esperar al menos 30 minutos después del último trueno antes de salir.
C) Volver a las actividades sin precauciones, ya que el peligro desaparece al dejar de llover.
D) Esconderse bajo un árbol hasta que todo esté seco.

CONSORCIO INNOVAPARQUES

EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN

Nombre de la capacitación: Capacitación Ambiental	Fecha: 16/05/2025
Nombre y Apellidos: QUEVEDO LEGUIZAMÓN JHON ALEXANDER	No CC: 1123116491
Cargo: Operario	

EVALUACIÓN: SELECCIÓN MÚLTIPLE

1. ¿Por qué no es seguro refugiarse bajo un árbol durante una tormenta eléctrica?
A) Porque los rayos buscan los puntos más altos y pueden impactarlo.
B) Porque los árboles no ofrecen suficiente sombra.
C) Porque los árboles no protegen del viento.
D) Porque el agua de la lluvia puede mojarte más bajo un árbol.

2. ¿Cuál es la mejor opción si te sorprende una tormenta sin refugio cercano?
A) Correr rápidamente a cualquier lugar sin importar las condiciones.
B) Refugiarse bajo el árbol más grande que encuentres.
C) Acostarse en el suelo para evitar ser alcanzado por un rayo.
D) Mantenerse alejado de árboles y postes, adoptando una postura de seguridad en el suelo.

3. ¿Qué debes hacer después de que pase la tormenta?
A) Salir inmediatamente al aire libre para verificar si todo está en orden.
B) Esperar al menos 30 minutos después del último trueno antes de salir.
C) Volver a las actividades sin precauciones, ya que el peligro desaparece al dejar de llover.
D) Esconderse bajo un árbol hasta que todo esté seco.

CONSORCIO INNOVAPARQUES

EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN

Nombre de la capacitación: Capacitación Ambiental	Fecha: 16/05/2025
Nombre y Apellidos: DANIEL SABOGAL	No CC: 1031803879
Cargo: Inspector	

EVALUACIÓN: SELECCIÓN MÚLTIPLE

1. ¿Por qué no es seguro refugiarse bajo un árbol durante una tormenta eléctrica?
A) Porque los rayos buscan los puntos más altos y pueden impactarlo.
B) Porque los árboles no ofrecen suficiente sombra.
C) Porque los árboles no protegen del viento.
D) Porque el agua de la lluvia puede mojarte más bajo un árbol.

2. ¿Cuál es la mejor opción si te sorprende una tormenta sin refugio cercano?
A) Correr rápidamente a cualquier lugar sin importar las condiciones.
B) Refugiarse bajo el árbol más grande que encuentres.
C) Acostarse en el suelo para evitar ser alcanzado por un rayo.
D) Mantenerse alejado de árboles y postes, adoptando una postura de seguridad en el suelo.

3. ¿Qué debes hacer después de que pase la tormenta?
A) Salir inmediatamente al aire libre para verificar si todo está en orden.
B) Esperar al menos 30 minutos después del último trueno antes de salir.
C) Volver a las actividades sin precauciones, ya que el peligro desaparece al dejar de llover.
D) Esconderse bajo un árbol hasta que todo esté seco.

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo
	FORMATO: FT-SST-014

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: ENERO 18 DE 2024
	Versión: 001
	Pagina 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
BOGOTA	PARQUES BOGOTA	19	5	2025

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		Prevención de accidentes por caídas a distinto nivel
Charla de seguridad	X	
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadania	Cargo	Firma
1	ARIAS PERALTA ANDERSON MAURICIO	1005726820	OPERARIO	Anderson Arias
2	CAMPOS MARIN DAVID CAMILO	1012433979	OPERARIO	CAMILO
3	CARDENAS CARDENAS HILARIO	3028150	CONDUCTOR	
4	CERQUERA VALDERRAMA JOSELITO	12209313	OPERARIO	Joselito
	FORERO ORTEGA JULIO CESAR	79380454	OPERARIO	
5	GARZON PINEDA JOSE ALEJANDRO	1033692776	OPERARIO	Alejandro Garzon
6	JIMENEZ LASSO WILBER DIOMEDES	5855002	OPERARIO	
7	LOPEZ AYALA BRANDON SEBASTIAN	1233890527	ING RESIDENTE	
8	MERCADO BASILIO LUIS GUILLERMO	1007195407	CONDUCTOR	Luis Mercado
9	MUÑOZ MACETO JESUS	1007289162	OPERARIO	Jesus M.
10	OVALLE BOLIVAR YEFERSON IVAN	1074414778	OPERARIO	Yeferson Ov.
11	QUEVEDO LEGUIZAMON JHON ALEXANDER	1123116491	OPERARIO	Jhon Quevedo
12	SABOGAL CUERVO DANIEL STEBAN	1031803879	INSPECTOR	
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre: ANDREA LOPEZ	Firma

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo
	FORMATO: FT-SST-014

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: ENERO 18 DE 2024
	Versión: 001
	Pagina 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
BOGOTA	PARQUES BOGOTA	20	5	2025

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		Gestión adecuada de residuos en obra: clasificación, almacenamiento y disposición final
Charla de seguridad	X	
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	ARIAS PERALTA ANDERSON MAURICIO	1005726820	OPERARIO	Anderson Arias
2	CAMPOS MARIN DAVID CAMILO	1012433979	OPERARIO	Camilo
3	CARDENAS CARDENAS HILARIO	3028150	CONDUCTOR	
4	CERQUERA VALDERRAMA JOSELITO	12209313	OPERARIO	Joselito
	FORERO ORTEGA JULIO CESAR	79380454	OPERARIO	
5	GARZON PINEDA JOSE ALEJANDRO	1033692776	OPERARIO	Alejandro Garzon
6	JIMENEZ LASSO WILBER DIOMEDES	5855002	OPERARIO	
7	LOPEZ AYALA BRANDON SEBASTIAN	1233890527	ING RESIDENTE	
8	MERCADO BASILIO LUIS GUILLERMO	1007195407	CONDUCTOR	Luis Mercado
9	MUÑOZ MACETO JESUS	1007289162	OPERARIO	Jesus M
10	OVALLE BOLIVAR YEFERSON IVAN	1074414778	OPERARIO	Yeferson Ov
11	QUEVEDO LEGUIZAMON JHON ALEXANDER	1123116491	OPERARIO	Jhon Quevedo
12	SABOGAL CUERVO DANIEL STEBAN	1031803879	INSPECTOR	
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre: ANDREA LOPEZ	Firma

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo
	FORMATO: FT-SST-014

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: ENERO 18 DE 2024
	Versión: 001
	Pagina 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
BOGOTA	PARQUES BOGOTA	22	5	2025

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		Uso correcto de Equipos de Protección Personal (EPP)
Charla de seguridad	X	
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	ARIAS PERALTA ANDERSON MAURICIO	1005726820	OPERARIO	Anderson Arias
2	CAMPOS MARIN DAVID CAMILO	1012433979	OPERARIO	CAMILO.
3	CARDENAS CARDENAS HILARIO	3028150	CONDUCTOR	
4	CERQUERA VALDERRAMA JOSELITO	12209313	OPERARIO	Joselito
	FORERO ORTEGA JULIO CESAR	79380454	OPERARIO	
5	GARZON PINEDA JOSE ALEJANDRO	1033692776	OPERARIO	Alejandro G.
6	JIMENEZ LASSO WILBER DIOMEDES	5855002	OPERARIO	Diomedes J
7	LOPEZ AYALA BRANDON SEBASTIAN	1233890527	ING RESIDENTE	
8	MERCADO BASILIO LUIS GUILLERMO	1007195407	CONDUCTOR	Luis Mercado
9	MUÑOZ MACETO JESUS	1007289162	OPERARIO	JESUS M.
10	OVALLE BOLIVAR YEFERSON IVAN	1074414778	OPERARIO	Yeferson Ov
11	QUEVEDO LEGUIZAMON JHON ALEXANDER	1123116491	OPERARIO	Jhon Quevedo
12	SABOGAL CUERVO DANIEL STEBAN	1031803879	INSPECTOR	
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre: ANDREA LOPEZ	Firma

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo
	FORMATO: FT-SST-014

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: ENERO 18 DE 2024
	Versión: 001
	Pagina 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
BOGOTA	PARQUES BOGOTA	21	5	2024

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		Uso correcto de Equipos de Protección Personal (EPP)
Charla de seguridad	X	
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otro		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	ARIAS PERALTA ANDERSON MAURICIO	1005726820	OPERARIO	
2	CAMPOS MARIN DAVID CAMILO	1012433979	OPERARIO	
3	CARDENAS CARDENAS HILARIO	3028150	CONDUCTOR	
4	CERQUERA VALDERRAMA JOSELITO	12209313	OPERARIO	
	FORERO ORTEGA JULIO CESAR	79380454	OPERARIO	
5	GARZON PINEDA JOSE ALEJANDRO	1033692776	OPERARIO	
6	JIMENEZ LASSO WILBER DIOMEDES	5855002	OPERARIO	
7	LOPEZ AYALA BRANDON SEBASTIAN	1233890527	ING RESIDENTE	
8	MERCADO BASILIO LUIS GUILLERMO	1007195407	CONDUCTOR	
9	MUÑOZ MACETO JESUS	1007289162	OPERARIO	
10	OVALLE BOLIVAR YEFERSON IVAN	1074414778	OPERARIO	
11	QUEVEDO LEGUIZAMON JHON ALEXANDER	1123116491	OPERARIO	
12	SABOGAL CUERVO DANIEL STEBAN	1031803879	INSPECTOR	
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre: ANDREA LOPEZ	Firma

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo
	FORMATO: FT-SST-014

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: ENERO 18 DE 2024
	Versión: 001
	Pagina 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
BOGOTA	PARQUES BOGOTA	23	5	2025

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		Trabajo seguro en alturas: requisitos y controles clave
Charla de seguridad	x	
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadania	Cargo	Firma
1	ARIAS PERALTA ANDERSON MAURICIO	1005726820	OPERARIO	Anderson Arias
2	CAMPOS MARIN DAVID CAMILO	1012433979	OPERARIO	
3	CARDENAS CARDENAS HILARIO	3028150	CONDUCTOR	
4	CERQUERA VALDERRAMA JOSELITO	12209313	OPERARIO	Joselito
	FORERO ORTEGA JULIO CESAR	79380454	OPERARIO	
5	GARZON PINEDA JOSE ALEJANDRO	1033692776	OPERARIO	Alejandro G
6	JIMENEZ LASSO WILBER DIOMEDES	5855002	OPERARIO	
7	LOPEZ AYALA BRANDON SEBASTIAN	1233890527	ING RESIDENTE	
8	MERCADO BASILIO LUIS GUILLERMO	1007195407	CONDUCTOR	Luis Mercado
9	MUÑOZ MACETO JESUS	1007289162	OPERARIO	Jesus M.
10	OVALLE BOLIVAR YEFERSON IVAN	1074414778	OPERARIO	Yeferson Ov
11	QUEVEDO LEGUIZAMON JHON ALEXANDER	1123116491	OPERARIO	Jhon Quevedo
12	SABOGAL CUERVO DANIEL STEBAN	1031803879	INSPECTOR	
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre: ANDREA LOPEZ	Firma

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo
	FORMATO: FT-SST-014

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: ENERO 18 DE 2024
	Versión: 001
	Pagina 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
BOGOTA	PARQUES BOGOTA	26	5	2025

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción Reinducción		prevención de enfermedades laborales
Charla de seguridad	x	
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	CAMPOS MARIN DAVID CAMILO	1012433979	OPERARIO	
2	CARDENAS CARDENAS HILARIO	3028150	OPERARIO	
3	CERQUERA VALDERRAMA JOSELITO	12209313	CONDUCTOR	
4	FORERO ORTEGA JULIO CESAR	79380454	OPERARIO	
5	GARZON PINEDA JOSE ALEJANDRO	1033692776	OPERARIO	
6	JIMENEZ LASSO WILBER DIOMEDES	5855002	CONDUCTOR	
7	LOPEZ AYALA BRANDON SEBASTIAN	1233890527	ING RESIDENTE	
8	MERCADO BASILIO LUIS GUILLERMO	1007195407	CONDUCTOR	
9	MUÑOZ MACETO JESUS	1007289162	CONDUCTOR	
10	OVALLE BOLIVAR YEFERSON IVAN	1074414778	OPERARIO	
11	QUEVEDO LEGUIZAMON JHON ALEXANDER	1123116491	OPERARIO	
12	SABOGAL CUERVO DANIEL STEBAN	1031803879	INSPECTOR	
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre: ANDREA LOPEZ	Firma

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	FORMATO: FT-SST-014	
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: ENERO 18 DE 2024	
	Versión: 001	
	Pagina 1 de 1	

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
BOGOTA	PARQUES BOGOTA	27	5	2025

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		Prevención de lesiones osteomusculares
Charla de seguridad	x	
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	CAMPOS MARIN DAVID CAMILO	1012433979	OPERARIO	
2	CARDENAS CARDENAS HILARIO	3028150	OPERARIO	
3	CERQUERA VALDERRAMA JOSELITO	12209313	CONDUCTOR	
4	FORERO ORTEGA JULIO CESAR	79380454	OPERARIO	
5	GARZON PINEDA JOSE ALEJANDRO	1033692776	OPERARIO	
6	JIMENEZ LASSO WILBER DIOMEDES	5855002	CONDUCTOR	
7	LOPEZ AYALA BRANDON SEBASTIAN	1233890527	ING RESIDENTE	
8	MERCADO BASILIO LUIS GUILLERMO	1007195407	CONDUCTOR	
9	MUÑOZ MACETO JESUS	1007289162	CONDUCTOR	
10	OVALLE BOLIVAR YEFERSON IVAN	1074414778	OPERARIO	
11	QUEVEDO LEGUIZAMON JHON ALEXANDER	1123116491	OPERARIO	
12	SABOGAL CUERVO DANIEL STEBAN	1031803879	INSPECTOR	
13	ORTIZ COIME ALVARO LEONEL	1087198177	OPERARIO	
14	RAMIREZ RUBIO JHON ALEXANDER	1033760239	OPERARIO	
15	YATE PARRA ANGEL GABRIEL	1010014125	OPERARIO	
16	JIMENEZ MONDRAGON JHON ANDRES	80863671	OPERARIO	
17	PARRA CRISTIAN CAMILO	10127524042	OPERARIO	
18				
19				
20				
21				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre: ANDREA LOPEZ	Firma

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo FORMATO: FT-SST-014

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: ENERO 18 DE 2024 Versión: 001 Pagina 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
BOGOTA	PARQUES BOGOTA	28	5	2025

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción Reinducción		huella ecológica
Charla de seguridad	x	
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	CAMPOS MARIN DAVID CAMILO	1012433979	OPERARIO	CAMILO
2	CARDENAS CARDENAS HILARIO	3028150	OPERARIO	
3	CERQUERA VALDERRAMA JOSELITO	12209313	CONDUCTOR	Joselito
4	FORERO ORTEGA JULIO CESAR	79380454	OPERARIO	
5	GARZON PINEDA JOSE ALEJANDRO	1033692776	OPERARIO	Alejandro G.
6	JIMENEZ LASSO WILBER DIOMEDES	5855002	CONDUCTOR	
7	LOPEZ AYALA BRANDON SEBASTIAN	1233890527	ING RESIDENTE	
8	MERCADO BASILIO LUIS GUILLERMO	1007195407	CONDUCTOR	Luis Mercado
9	MUÑOZ MACETO JESUS	1007289162	CONDUCTOR	JESUS M.
10	OVALLE BOLIVAR YEFERSON IVAN	1074414778	OPERARIO	YEFERSON OV
11	QUEVEDO LEGUIZAMON JHON ALEXANDER	1123116491	OPERARIO	
12	SABOGAL CUERVO DANIEL STEBAN	1031803879	INSPECTOR	
13	ORTIZ COIME ALVARO LEONEL	1087198177	OPERARIO	ALVARO.
14	RAMIREZ RUBIO JHON ALEXANDER	1033760239	OPERARIO	Jhon. R.
15	YATE PARRA ANGEL GABRIEL	1010014125	OPERARIO	
16	JIMENEZ MONDRAGON JHON ANDRES	80863671	OPERARIO	
17	PARRA CRISTIAN CAMILO	1012752404 2	OPERARIO	CRISTIAN
18	CUBIDES GARZON LUIS CARLOS	1019005189	OPERARIO	luis Cubides
19				
20				
21				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre: ANDREA LOPEZ	Firma

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo
	FORMATO: FT-SST-014

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: ENERO 18 DE 2024
	Versión: 001
	Pagina 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
BOGOTA	PARQUES BOGOTA	29	5	2025

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		Procedimiento de emergencia
Charla de seguridad	x	
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	CAMPOS MARIN DAVID CAMILO	1012433979	OPERARIO	CAMILO
2	CARDENAS CARDENAS HILARIO	3028150	OPERARIO	
3	CERQUERA VALDERRAMA JOSÉLITO	12209313	CONDUCTOR	Joselito
4	FORERO ORTEGA JULIO CESAR	79380454	OPERARIO	
5	GARZON PINEDA JOSE ALEJANDRO	1033692776	OPERARIO	Alejandro G
6	JIMENEZ LASSO WILBER DIOMEDES	5855002	CONDUCTOR	
7	LOPEZ AYALA BRANDON SEBASTIAN	1233890527	ING RESIDENTE	
8	MERCADO BASILIO LUIS GUILLERMO	1007195407	CONDUCTOR	Luis Mercado
9	MUÑOZ MACETO JESUS	1007289162	CONDUCTOR	Jesus M
10	OVALLE BOLIVAR YEFERSON IVAN	1074414778	OPERARIO	Yeferson Ov
11	QUEVEDO LEGUIZAMON JHON ALEXANDER	1123116491	OPERARIO	
12	SABOGAL CUERVO DANIEL STEBAN	1031803879	INSPECTOR	
13	ORTIZ COIME ALVARO LEONEL	1087198177	OPERARIO	ALVARO
14	RAMIREZ RUBIO JHON ALEXANDER	1033760239	OPERARIO	Jhon R.
15	YATE PARRA ANGEL GABRIEL	1010014125	OPERARIO	
16	JIMENEZ MONDRAGON JHON ANDRES	80863671	OPERARIO	
17	PARRA CRISTIAN CAMILO	10127524042	OPERARIO	Cristian
18	CUBIDES GARZON LUIS CARLOS	1019005189	OPERARIO	luis Cubides
19				
20				
21				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre: ANDREA LOPEZ	Firma

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo FORMATO: FT-SST-014

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha: ENERO 18 DE 2024
Versión: 001
Pagina 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
BOGOTA	PARQUES BOGOTA	30	5	2025

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		Higiene postural
Charla de seguridad	x	
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación específica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cedula de Ciudadania	Cargo	Firma
1	CAMPOS MARIN DAVID CAMILO	1012433979	OPERARIO	
2	CARDENAS CARDENAS HILARIO	3028150	OPERARIO	
3	CERQUERA VALDERRAMA JOSELITO	12209313	CONDUCTOR	
4	FORERO ORTEGA JULIO CESAR	79380454	OPERARIO	
5	GARZON PINEDA JOSE ALEJANDRO	1033692776	OPERARIO	
6	JIMENEZ LASSO WILBER DIOMEDES	5855002	CONDUCTOR	
7	LOPEZ AYALA BRANDON SEBASTIAN	1233890527	ING RESIDENTE	
8	MERCADO BASILIO LUIS GUILLERMO	1007195407	CONDUCTOR	
9	MUÑOZ MACETO JESUS	1007289162	CONDUCTOR	
10	OVALLE BOLIVAR YEFERSON IVAN	1074414778	OPERARIO	
11	QUEVEDO LEGUIZAMON JHON ALEXANDER	1123116491	OPERARIO	
12	SABOGAL CUERVO DANIEL STEBAN	1031803879	INSPECTOR	
13	ORTIZ COIME ALVARO LEONEL	1087198177	OPERARIO	
14	RAMIREZ RUBIO JHON ALEXANDER	1033760239	OPERARIO	
15	YATE PARRA ANGEL GABRIEL	1010014125	OPERARIO	
16	JIMENEZ MONDRAGON JHON ANDRES	80863671	OPERARIO	
17	PARRA CRISTIAN CAMILO	10127524042	OPERARIO	
18	CUBIDES GARZON LUIS CARLOS	1019005189	OPERARIO	
19				
20				
21				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre: ANDREA LOPEZ	Firma

ANEXO 6. INSPECCIONES INTERVENTORIA

CONSORCIO SANTA TERESA 28	INSPECCIÓN A BOTIQUIN			CÓDIGO:	SST-FR-021
				VERSIÓN:	2
				FECHA DE ELABORACIÓN:	27/11/2024
REALIZADO POR:	Sofia Fernández		**FIRMA:**		
BOTIQUIN:	TIPO A		**FECHA:**	viernes, 27 de junio de 2025	
ÁREA O PROYECTO:	Oficina administrativa CONSORCIO SANTA TERESA 28				
MEDICAMENTO	**CANTIDAD**	**ESTADO**	**ACCESO**	**FECHA VENCIMIENTO**	**OBSERVACION**
Gasas Esteriles Paquete	4 unidades	Bueno	SI	2027-02-29	
Aposito o Compresas					
Esparadrapo de Tela Rollo	1 unidad	Bueno	SI	6/08/2027	
Bajalenguas	2 unidades	Bueno	SI	N.A	
Aplicadores					
Vendas Elasticas 5*5"	1 rollo	Bueno	SI	2026-11	
Vendas Elasticas 2*5"					
Vendas de Algodón 3-5"					
Vendas Elasticas 5*5"					
Venda Triangular					
Curas	4 unidades	Bueno	SI	2027-05	
Vendas Oculares					
Isodine Espuma	1 unidad	Bueno	SI	8/23/2025	
Isodine Solucion					
Solucion Salina	1 unidad (sobre)	Bueno	SI	3/03/2026	
Guantes de Latex	1 par	Bueno	SI	2026-04	
Termometro					
Tijeras	1 unidad	Bueno	SI	N.A	
Linterna	1 unidad	Bueno	SI	N.A	
Pilas de Repuesto					
Inmovilizador de Cuello					
Tapabocas					
Yodopividona (Jabon					
Alcohol antiseptico					
Termometro					

CONSORCIO SANTA TERESA 28	FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES	CÓDIGO:	SST-FR-023
		VERSÓN:	1
		FECHA DE ELABORACIÓN:	27/11/2024

CONSORCIO SANTA TERESA 28

Lugar Donde esta Ubicado: Oficina Administrativa CONSORCIO SANTA TERESA 028	Proyecto: IDRD PARQUES
Inspección realizada por: Sofia Fernández	Nº Contrato: No.4080-2024

No	FECHA	ESTADO DEL EXTINTOR																				AGENTE EXTINTOR				Observaciones
		Fecha Vencimiento recarga		Manometro		Pasador de seguridad		Boquilla		Manija		Cilindro		Pintura		Señalización		Ubicación		Visibilidad		Acceso al extintor					
		Mes	Año	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	ABC Multiproposito	CO2	Solkaflam	Agua presurizada	
1	26/12/2024	8	2025	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
2	27/01/2025	8	2025	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
3	27/02/2025	8	2025	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
4	27/03/2025	8	2025	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
5	28/04/2025	8	2025	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
6	28/05/2025	8	2025	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
7	27/06/2025	8	2025	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
8																												
9																												
10																												
11																												

NOTA: MARQUE CON UNA X SEGÚN CORRESPONDA. LA INSPECCIÓN DEL EXTINTOR SE REALIZARÁ UNA VEZ AL MES

Sofia Fernández

Firma responsable inspección

ANEXO 6.1. INSPECCIONES CONTRATISTA

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	Código: DV-401.10.09
	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 01
	FORMATO DE INSPECCIÓN LOCATIVA	Fecha: 01-oct-2020

Item	Aspectos a inspeccionar	Si	No	N/A	Observaciones
1	SEÑALIZACIÓN				
1.1	Las rutas de evacuación se encuentran señalizadas	X			
1.2	Las salidas de emergencia se encuentran señalizadas	X			
1.3	Los elementos de atención de emergencia se encuentran señalizados	X			
1.4	La señalización es clara, legible y se encuentra en buen estado	X			
2	ORDEN Y ASEO				
2.1	Las áreas de trabajo están ordenadas y aseadas	X			
2.2	Los elementos se encuentran bien dispuestos en archivos o estantes	X			
2.3	Existen recipientes para disposición de residuos	X			
2.4	El nivel de iluminación es adecuado	X			
2.5	La ventilación es adecuada	X			
3	INSTALACIONES ELECTRICAS				
3.1	La instalación cuenta con polo a tierra	X			
3.2	Ausencia de empalmes defectuosos	X			
3.3	No existen cables sueltos en el piso	X			
3.4	Los interruptores y tomacorrientes se encuentran en buen estado	X			
3.5	Las bombillos y luminarias funcionan adecuadamente			X	
3.6	Tomas o multitomas recargadas			X	
4	EQUIPO DE EMERGENCIA				
4.1	Se cuenta con botiquines en un número suficiente				
4.2	Se cuenta con extintores en un número suficiente				
4.3	Se cuenta con un sistema de alarma en caso de emergencia				

Inspeccionó:	Daniel Obando
Nombre:	Daniel Obando
Firma:	
Cargo:	Inspector

Elaboró	Revisó y aprobó Andrea Cortez
Firma	Firma
Nombre	Nombre
Cargo	Cargo

	FORMATO DE INSPECCIÓN KIT DE DERRAMES	
	CODIGO: GTHU-S-FM-04	VERSION: 1
	FECHA DE APLICACION: ENERO DE 2015	

FECHA: 10-01-2015	SEDE: AREA LAVADO DE VEHICULOS CAMPOS SINTETICOS
RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Daniel Salazar	ACOMPAÑAMIENTO INSPECCION: Ing ANDREA LOPEZ
CARGO: Ingeniero Ambiental	KIT No. 1 ubicado según necesidad en campos sintéticos

Marque con una X cuando: NO (No cumple) o NA (No aplica)

Item	ASPECTOS A INSPECCIONAR	CANTIDAD	EXISTENCIA	OBSERVACIONES
1	Absorbente en cojín de longitud nominal 1.7 mts	1	C	
2	Barrera 3" x 4" de longitud (0.5 m + 1.00m)	1	C	
3	Bolsas plásticas rojas 70cm x 1mt con amarre plástico	1	C	
4	Cinturón reflectivo	1	C	
5	Cojines en forma cuadrados de material absorbente x 1 Und	1	C	
6	Guantes de Nitrilo par 1/2	1	C	
7	Limpión rectangular 50cm x 60	1	C	
8	Manta para kit de 5 galones (ancho 30cm, ancho 40cm x largo 2.5cm)	1	C	
9	Manta absorbente pequeña	1	C	
10	Polisombra universal Sistema 50cm x 100cm	5	C	
11	Señalización de Piso peligro	1	C	
12	Tapabocas N95	1	C	
13	Cinta de señalización x 100 Mts	1	C	
14	Overoles de tela	1	C	

ACCIONES DE MEJORA

#		ACTIVIDAD A DESARROLLAR	RESPONSABLE	FECHA
1		Pegado de tiras opaco.	Daniel Salazar	2/oct/15
2				
3				

CONSORCIO INNOVAPARQUES	INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SG-FO-1
		Versión	3
		Vigencia	25-03-2021

FECHA: 04. Junio 125.
PROYECTO: 1140 - 2024.
RESPONSABLE INSPECCION: Daniel Sabogal

NUMERO DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN 1031803879

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA Y CEDULA	DEBE USAR								USA		ESTADO		NO USA POR			MEDIDAS DE			
				A	B	C	D	E	F	G	H	SI	NO	B	M	NS	NP	NQ	1	2	3	4
1	CAMPOS MARIN DAVID CAMILO	auxiliar	1012433979			X	X	X	X	X		X		X								
2	CARDENAS CARDENAS HILARIO	conductor	3028150			X	X	X	X	X		X		X								
3	CERQUERA VALDERRAMA JOSELITO	auxiliar	12200313			X	X	X	X	X		X		X								
4	FORERO ORTEGA JULIO CESAR	auxiliar	79380454			X	X	X	X	X		X		X								
5	GARZON PINEDA JOSE ALEJANDRO	auxiliar	1033692776			X	X	X	X	X		X		X								
6	JIMENEZ LASSO WILBER DIOMEDES	conductor	5855002			X	X	X	X	X		X		X								
7	LOPEZ AYALA BRANDON SEBASTIAN	Ing. Residente	1233800527			X	X	X	X	X		X		X								
8	MERCADO BASILIO LUIS GUILLERMO	conductor	1007195407			X	X	X	X	X		X		X								
9	MUÑOZ MACETO JESUS	auxiliar	1007289162			X	X	X	X	X		X		X								
10	OVALLE BOLIVAR YEFERSÓN IVAN	auxiliar	1074414778			X	X	X	X	X		X		X								
11	QUEVEDO LEGUIZAMON JHON ALEXANDER	auxiliar	1123116491			X	X	X	X	X		X		X								
12	SABOGAL CUERVO DANIEL STEBAN	Inspector	1031803879			X	X	X	X	X		X		X								
13	ORTIZ COME ALVARO LEONEL	auxiliar	1087198177			X	X	X	X	X		X		X								
14	RAMIREZ RUBIO JHON ALEXANDER	auxiliar	1033760239			X	X	X	X	X		X		X								
15	JIMENEZ MONDRAGON JHON ANDRES	auxiliar	80863671			X	X	X	X	X		X		X								
16	PARRA CRISTIAN CAMILO	auxiliar	10127524042			X	X	X	X	X		X		X								
17	CUBIDES GARZON LUIS CARLOS	auxiliar	1019005389			X	X	X	X	X		X		X								

EPP FALTANTE POR PERSONA										
No	NOMBRE	A	B	C	D	E	F	G	H

DEBE USAR	ESTADO	NO USA POR MEDIDAS DE CONTROL	
A- OVEROL	B- BUENO	NS- NO SABE	1. INSTRUCCION
B- CASCO			
C- GUANTES			2. MOTIVACION
D- BOTAS			
E- PROTECCION RESPIRATORIA	R- REGULAR	NP- NO PUEDE	3. CAMBIO DE EPP
F- PROTECTORES AUDITIVOS			
G- GAFAS PROTECTORAS			4. OTRAS
H- OTRO			
¿Cual?	M- MALO	NQ- NO QUIERE	

OBSERVACIONES:

Daniel Sabogal
NOMBRE Y CÉDULA DEL INSPECTOR
REVISÓ

Andres Lopez
NOMBRE Y CÉDU
L COORDINADOR HSE
APROBÓ

ANEXO 7. ENTREGA EPP CONTRATISTA

CONSORCIO INNOVAPARQUES	INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SG-FO-1
		Versión	5
		Vigencia	29/05/2017

FECHA 09. Junio 125.
PROYECTO 140 - 2024.
RESPONSABLE INSPECCION Daniel Sabogal
NUMERO DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN 1031503597

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA Y CEDULA	DEBE USAR								USA		ESTADO		NO USA POR			MEDIDAS DE			
				A	B	C	D	E	F	G	H	SI	NO	B	M	NS	NP	NQ	1	2	3	4
1	CAMPOS MARIN DAVID CAMILO	auxiliar	1012433979			X	X	X	X	X		X		X								
2	CARDENAS CARDENAS HILARIO	conductor	3028150			X	X	X	X	X		X		X								
3	CERQUERA VALDERRAMA JOSELITO	auxiliar	12209313			X	X	X	X	X		X		X								
4	FORERO ORTEGA JULIO CESAR	auxiliar	79380454			X	X	X	X	X		X		X								
5	GARZON PINEDA JOSE ALEJANDRO	auxiliar	1013692776			X	X	X	X	X		X		X								
6	JIMENEZ LASSO WILBER DIOMEDES	conductor	5855002			X	X	X	X	X		X		X								
7	LOPEZ AYALA BRANDON SEBASTIAN	Ing. Residente	1233890527			X	X	X	X	X		X		X								
8	MERCADO BASILIO LUIS GUILLERMO	conductor	1007195407			X	X	X	X	X		X		X								
9	MUÑOZ MACETO JESUS	auxiliar	1007289162			X	X	X	X	X		X		X								
10	OVALLE BOLIVAR YEFERSON IVAN	auxiliar	1074414778			X	X	X	X	X		X		X								
11	QUEVEDO LEGUIZAMON JHON ALEXANDER	auxiliar	1123116491			X	X	X	X	X		X		X								
12	SABOGAL CUERVO DANIEL STEBAN	Inspector	1031803879			X	X	X	X	X		X		X								
13	ORTIZ COIME ALVARO LEONEL	auxiliar	1087198177			X	X	X	X	X		X		X								
14	RAMIREZ RUBIO JHON ALEXANDER	auxiliar	1033760239			X	X	X	X	X		X		X								
15	JIMENEZ MONDRAGON JHON ANDRES	auxiliar	80863671			X	X	X	X	X		X		X								
16	PARRA CRISTIAN CAMILO	auxiliar	10127524042			X	X	X	X	X		X		X								
17	CUBIDES GARZON LUIS CARLOS	auxiliar	1019005189			X	X	X	X	X		X		X								

EPP FALTANTE POR PERSONA										DEBE USAR	ESTADO	NO USA PORMEDIDAS DE CONTROL	
No	NOMBRE	A	B	C	D	E	F	G	H				
										A- OVEROL	B- BUENO	NS- NO SABE	1. INSTRUCCIÓN
										B- CASCO			
										C- GUANTES			2. MOTIVACION
										D- BOTAS			
										E- PROTECCION RESPIRATORIA	R- REGULAR	NP- NO PUEDE	3. CAMBIO DE EPP
										F- PROTECTORES AUDITIVOS			
										G- GAFAS PROTECTORAS			4. OTRAS
										H- OTRO			
										¿Cual?	M- MALO	NQ- NO QUIERE	

OBSERVACIONES:

Daniel Sabogal
NOMBRE Y CEDULA DEL INSPECTOR
REVISO

NOMBRE Y CEDU
COORDINADOR HSE
APROBO

ANEXO 8. PREOPERACIONALES

INGENIERIA CMC S.A.S

FICHA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO MAYOR Y/O VEHICULO

VEHICULO / MAQUINARIA: tractor MARCA: LTH MODELO: _____ PLACA: 7642

OPERADOR: Luis Mercado ESTADO: PROPIO ☐ ALQUILADO ☐

PROPIETARIO: Ingeniería CMC FRENTE / UBICACIÓN: _____

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A REALIZAR:	FRECUENCIA DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO
CAMBIO DE CORREA DE TRASLACION	SEGÚN USO
CAMBIO DE CORREAS DE LA UNIDAD DE CORTE	SEGÚN USO
CAMBIO DE CUCHILLAS O AFILADA DE CUCHILLAS	SEGÚN USO
CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTROS DE AIRE Y COMBUSTIBLE	CADA 60 HORAS
ENGRASE DE RODAMIENTOS	UNA VEZ POR SEMANA

MANTENIMIENTO					Observacion (Descripcion del Mantenimiento realizado)	Responsable
Fecha	Ultimo Horometro	Próximo Horometro	Correctivo	Preventivo		
12/04/25	2003.8	2063.8	-	-	20038 tractor Cambio de Aceite	Luis M.
09/04/25	-	-	-	-	tractor Cambio de empaque	Luis M.
15/04/25	-	-	-	-	tornillos tractor Apretado de motor	Luis M.
07/05/25					tractor Postura Del arranque	Luis M.
03/06/25	21024	27824	-	-	tractor Cambio de Aceite	Luis M.
07/06/2025	22027	22067			Fajo Cambio De Aceite	Luis M.
16/06/2025	23712			←	cambio Aceite	Luis M.

INGENIERIA CMC S.A.S

FICHA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO MAYOR Y/O VEHICULO

VEHICULO / MAQUINARIA: DZ4 MARCA: Ga MODELO: _____ PLACA: _____

OPERADOR: Luis Mercado ESTADO: PROPIO ☐ ALQUILADO ☐

PROPIETARIO: Ti Servicio CMC FRENTE / UBICACIÓN: _____

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A REALIZAR:	FRECUENCIA DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO
CAMBIO DE CORREA DE TRASLACION	SEGÚN USO
CAMBIO DE CORREAS DE LA UNIDAD DE CORTE	SEGÚN USO
CAMBIO DE CUCHILLAS O AFILADA DE CUCHILLAS	SEGÚN USO
CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTROS DE AIRE Y COMBUSTIBLE	CADA 60 HORAS
ENGRASE DE RODAMIENTOS	UNA VEZ POR SEMANA

MANTENIMIENTO					Observacion (Descripcion del Mantenimiento realizado)	Responsable
Fecha	Ultimo Horometro	Próximo Horometro	Correctivo	Preventivo		
31/05/2025	2888.82968.8			6	cambio de cuchillas y cambio de aceite	Luis M.
11/06/2025	2970.1	3030.1		6	cambio de llantas delanteras	Luis M.
22/06/2025	31601	31660		x	cambio aceite	Luis M.

CONSORCIO INNOVAPARQUES

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

FORMATO N°: FT-SST-040

FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES

Fecha: Septiembre 08 de 2025

Página 1 de 1

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: DIOMEDES JIMENEZ — HRS Inicial: 95798 — HRS Final: 95958

PLACA VEHÍCULO: EXZ 115 — Marca: JAC — Serie No: HFC1G3A68 — Función: MOVIL 1

Ubicación: CAMPOS NATURALES — Sección: RTO — Semana de: 7 Al: 6 — Mes de: JUNIO / 25

INSPECCIÓN

Ítem	Estándar	Aplica Si	Aplica No	Lun C	Lun NC	Mar C	Mar NC	Mier C	Mier NC	Jue C	Jue NC	Vie C	Vie NC	Sab C	Sab NC	Dom C	Dom NC
DOCUMENTOS																	
Licencia de tránsito	En Regla	x		x		x		x		x		x					
Revisión tecno mecánica	En Regla	x		x		x		x		x		x					
Seguro obligatorio	En Regla	x		x		x		x		x		x					
Seguro contractual	Vigente	x		x		x		x		x		x					
Seguro extracontractual	En Regla	x		x		x		x		x		x					
Licencia de conducción	En Regla	x		x		x		x		x		x					
Planos, mapas rutas, gps	En Regla	x		x		x		x		x		x					
Contactos de Emergencia	En Regla	x		x		x		x		x		x					
EQUIPO EMERGENCIAS																	
Linterna con pilas	En buen estado	x		x		x		x		x		x					
Botiquín	Completo	x		x		x		x		x		x					
Extintor	Pin de seguridad. Cargado, vigente	x		x		x		x		x		x					
PARTE EXTERNA																	
Espejos laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado	x		x		x		x		x		x					
Luces traseras	De freno: mínimo dos / de color rojo / Direccionales	x		x		x		x		x		x					
Llantas	Llenas de rasaduras y sin desgaste excesivo	x		x		x		x		x		x					
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente	x		x		x		x		x		x					
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos funcionando correctamente	x		x		x		x		x		x					
Lamparas Luces delanteras	Lentes sin roturas/ funcionando / de color blanco / amarillo	x		x		x		x		x		x					
Indicador luces de parqueo	Mínimo dos / funcionando correctamente	x		x		x		x		x		x					
Tanque de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y ajustada	x		x		x		x		x		x					
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR																	
Fuente de energía (BATERIA)	Sin ravaduras/ Anclaje adecuadamente	x		x		x		x		x		x					
Conexiones eléctricas	Firmes y en buen estado	x		x		x		x		x		x					
Nivel agua refrigeración / mangueras	Nivel correcto / mangueras sin fugas	x		x		x		x		x		x					
Estado de las llantas hidráulicas	Llantas sin fugas y en buen estado	x		x		x		x		x		x					
Niveles de aceite motor / hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante	x		x		x		x		x		x					
Cableado eléctrico	Anclado / sin roturas / ajustados	x		x		x		x		x		x					
Bateria de dirección / Nivel aceite	Sin fugas/ bien asegurado / nivel de acuerdo al fabricante	x		x		x		x		x		x					
INTERIOR DE LA CABINA																	
Espejos retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado	x		x		x		x		x		x					
Vidrio panoramico/ vidrios ventanas	Sin roturas / manchas / distorsiones	x		x		x		x		x		x					
Plumillas limpiaviadrio/ motor lavaparabrisas	Mínimo dos / limpiadas sin desgastes / funcionando / mínimo dos revoluciones	x		x		x		x		x		x					
Estado de la cabina	Protegido y en buen estado en general	x		x		x		x		x		x					
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible	x		x		x		x		x		x					
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor	x		x		x		x		x		x					
Silla/ Apoyo para la cabeza	Ajustadas al nivel apoyo para la cabeza asegurado	x		x		x		x		x		x					
Pedales freno / clutch / acelerador	Con tapo antideslizante / sin juego excesivo	x		x		x		x		x		x					
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente	x		x		x		x		x		x					
Equipo de carretera	Gato con capacidad para elevar el vehículo, una druceta, dos señales de carretera en forma de triangulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lamparas de señal de luz amarilla intermitente o de destello, dos tacos para bloquear el vehículo, caja de herramientas básica que como mínimo deberá contener alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas, llanta de repuesto, botiquín (Art 30 del código nacional de tránsito ley 769 de 2002)	x		x		x		x		x		x					
Cinturones de seguridad	De 3 puntos de apoyo	x		x		x		x		x		x					
Pito	Funcionando / que se oiga mínimo a 30 m	x		x		x		x		x		x					
Timón o volante	Funcionando en perfectas condiciones	x		x		x		x		x		x					
Frenos	Pedales con antideslizante/ nivel de liquido de acuerdo al fabricante	x		x		x		x		x		x					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Nombre y Firma del Tecnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-091
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES	Fecha	Septiembre 06 de 2019
	Pagina 1 de 1	

DATOS DE LA INSPECCION

Inspeccionado por: LUIS MERCADO			HRS Inicial	95336	HRS Final	95536
PLACA VEHICULO: EBZ 737			Marca: FOTON		Serie No: LVSDPVEJ0D1	Funcion: MOVIL 2
Ubicacion: CAMPOS NATURALES	Sector: MTO	Semana de:	2 - AL	6	Mes de:	2-10-2019

INSPECCION

Item	Estandar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Jue		Vie		Sab		Dom	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
DOCUMENTOS																	
Licencia de transito	En Regla	X		✓		✓		✓		✓		✓					
Revision tecnico mecanica	En Regla	X		✓		✓		✓		✓		✓					
Seguro obligatorio	En Regla	X		✓		✓		✓		✓		✓					
Seguro contractual	Vigente	X		✓		✓		✓		✓		✓					
Seguro extracontractual	En Regla	X		✓		✓		✓		✓		✓					
Licencia de conduccion	En Regla	X		✓		✓		✓		✓		✓					
Planos, mapas rutas, gps	En Regla	X		✓		✓		✓		✓		✓					
Contactos de Emergencias	En Regla	X		✓		✓		✓		✓		✓					
EQUIPO EMERGENCIAS																	
Extintor con cinta	En buen estado	X		✓		✓		✓		✓		✓					
Botiquin	Completo	X		✓		✓		✓		✓		✓					
Extintor	Pin de seguridad, Cargado, vigente	X		✓		✓		✓		✓		✓					
PARTE EXTERNA																	
Espejos laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado	X		✓		✓		✓		✓		✓					
Luces traseras	De freno, reversa, dos / de color rojo / Direccionales	X		✓		✓		✓		✓		✓					
Llantas	Libres de rajaduras y sin desgaste excesivo	X		✓		✓		✓		✓		✓					
Indicadores luces frontales altas	Funcionamos correctamente	X		✓		✓		✓		✓		✓					
Indicadores luces direccionales	Minimo dos funcionamos correctamente	X		✓		✓		✓		✓		✓					
Lamparas Luces de alturas	Lentes sin roturas funcionamos / de color blanco / amarillo	X		✓		✓		✓		✓		✓					
Indicador luces de parqueo	Minimo dos / funcionamos correctamente	X		✓		✓		✓		✓		✓					
Tanque de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y ajustada	X		✓		✓		✓		✓		✓					
COMPARTIMENTO DEL MOTOR																	
Fijacion de bateria (BATERIA)	Sin rajaduras / ajustada adecuadamente	X		✓		✓		✓		✓		✓					
Conexiones electricas	Firmes y en buen estado	X		✓		✓		✓		✓		✓					
Nivel agua refrigerante (Y RADIADOR)	Nivel correcto / mangueras sin fugas	X		✓		✓		✓		✓		✓					
Fajas en las poleas / tensores	Limpias sin fugas y en buen estado	X		✓		✓		✓		✓		✓					
Nivel de aceite motor / hidraulico	Nivel en de acuerdo al fabricante	X		✓		✓		✓		✓		✓					
Cableado electrico	Aislado / sin roturas / ajustado	X		✓		✓		✓		✓		✓					
Nivel de direccion / aceite motor	Sin fugas / en el nivel de acuerdo al fabricante	X		✓		✓		✓		✓		✓					
INTERIOR DE LA CABINA																	
Espejos vehiculo menor	Sin roturas / sin manchas / ajustado	X		✓		✓		✓		✓		✓					
Luz de retroceso / direccionales	Sin roturas / ajustado / funcionando	X		✓		✓		✓		✓		✓					
Pantalla Visibilidad Total (Parabrisas)	Sin rotura / limpia / sin rayones / funcionando (limpia brisas)	X		✓		✓		✓		✓		✓					
Estado de la cabina	Protegida y en buen estado en general	X		✓		✓		✓		✓		✓					
Indicador de combustible	La aguja o indicador debe mostrar el nivel de combustible	X		✓		✓		✓		✓		✓					
Indicador presion de aceite motor	Que no aumente o encienda el motor	X		✓		✓		✓		✓		✓					
Silla Apto para el cargo	Adecuadas para el cargo / sin roturas	X		✓		✓		✓		✓		✓					
Pedales freno / clutch / acelerador	Con forro antideslizante / sin juego excesivo	X		✓		✓		✓		✓		✓					
Alarma de retroceso	Funcionamos correctamente	X		✓		✓		✓		✓		✓					
Equipo de carretera	Cada con capacidad para manejar el vehículo, una cruceta, dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser ubicados en forma vertical a distancia de varios de luz amarilla intermitente o de destello, dos tacos para bloquear el vehículo, caja de herramientas básica que como mínimo deberá contener: alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas, llanta de repuesto. (norma: (Art 36 del código nacional de tránsito ley 769 de 2002)	X		✓		✓		✓		✓		✓					
Cinturones de seguridad	De 3 puntos de apoyo	X		✓		✓		✓		✓		✓					
Pito	Funcionando / que se oiga minimo a 50 m	X		✓		✓		✓		✓		✓					
Timon o volante	Funcionando en perfectas condiciones	X		✓		✓		✓		✓		✓					
Frenos	Pedales con antideslizante/ nivel de liquido de acuerdo al fabricante	X		✓		✓		✓		✓		✓					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Luis Mercado
Nombre y Firma del Tecnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES		Fecha: Septiembre 06 de 2019 Versión: 001 Pagina 1 de 1

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: Luis Mercado			HRS Inicial	56532.	HRS Final	56572.	
Maquina-Equipo: TRACTOR LTH 1842			Marca: HUSQVARNA		Serie No: 4133313063		Función: CEPILLAR
Ubicación: CAMPOS SINTETICOS	Sección:MTO	Semana de: 2	Al: 06	Mes de:	Junio /25		

INSPECCIÓN

TRACTOR LTH 1842	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	ACEITE MOTOR	x		x		x		x		x		x					
	FILTRO ACEITE	x		x		x		x		x		x					
	FILTRO COMBUSTIBLE	x		x		x		x		x		x					
	ACEITE HIDRAULICO	x		x		x		x		x		x					
	FILTRO DE AIRE	x		x		x		x		x		x					
	CABLES Y POLEAS	x		x		x		x		x		x					
	ENGRASE	x		x		x		x		x		x					
	CUCHILLAS	x		x		x		x		x		x					
	CEPILLO	x		x		x		x		x		x					
	CORREA TENSORA	x		x		x		x		x		x					
	CINTURON DE SEGURIDAD	x		x		x		x		x		x					
	MANDOS DE OPERACIÓN	x		x		x		x		x		x					
	FRENOS	x		x		x		x		x		x					
	LLANTAS	x		x		x		x		x		x					
	BATERIA	x		x		x		x		x		x					
	ENCENDIDO	x		x		x		x		x		x					
	SISTEMA DE ATRACCION	x		x		x		x		x		x					
	HORÓMETRO	x		x		x		x		x		x					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Luis Mercado
Nombre y Firma del Tecnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES		Fecha: Septiembre 08 de 2019 Versión: 001 Pagina 1 de 1

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: DIOMEDES JIMENES	HRS Inicial	3703	HRS Final	3963	
Maquina-Equipo: GIRO ZERO PZT-60	Marca: HUSQVARNA		Serie No: 9676698895		Función: PODADORA
Ubicación: Naturales	Sección: CAD	Semana de: 2	Al: 6	Mes de:	Junio / 2025

INSPECCIÓN

GIRO ZERO PZT-60	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	ACEITE MOTOR	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	FILTRO ACEITE	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	FILTRO COMBUSTIBLE	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	ACEITE HIDRAULICO	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	FILTRO DE AIRE	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	CABLES Y POLEAS	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	ENGRASE	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	CUCHILLAS	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	CORREA DECK	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	CORREA TENSORA	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	CINTURON DE SEGURIDAD	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	MANDOS DE OPERACIÓN	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	FRENOS	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	LLANTAS	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	BATERIA	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	ENCENDIDO	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	SISTEMA DE ATRACCION	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	HOROMETRO	x		✓		✓		✓		✓		✓					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Diomedes Jimenez
Nombre y Firma del Tecnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES		Fecha: Septiembre 08 de 2019 Versión: 001 Pagina 1 de 1

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: DIOMEDES JIMENEZ			HRS Inicial	7:00 a. m.	HRS Final	4:00 p. m.
Maquina-Equipo: GUADAÑADORA			Marca: HUSQVARNA		Serie No: T05920109854	Función:DESMALEZADORA
Ubicación: SINTETICOS	Sección: MTO	Semana de:	2	Al: 6	Mes de:	junio de 2025

INSPECCIÓN

GUADAÑA	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	ACEITE MOTOR	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO ACEITE	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO COMBUSTIBLE	X		X		X		X		X		X					
	ACEITE HIDRAULICO	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO DE AIRE	X		X		X		X		X		X					
	VALBULINA	X		X		X		X		X		X					
	ENGRASE	X		X		X		X		X		X					
	CUCHILLAS	X		X		X		X		X		X					
	YOYO	X		X		X		X		X		X					
	MANGO DE SEGURIDAD	X		X		X		X		X		X					
	ENCENDIDO ELECTRICO	X		X		X		X		X		X					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Nombre y Firma del Tecnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES	Fecha:	Septiembre 08 de 2019
	Versión:	001
	Pagina 1 de 1	

DATOS DE LA INSPECCIÓN						
Inspeccionado por: LUIS MERCADO			HRS Inicial	7:00 a. m.	HRS Final	4:00 p. m.
Maquina-Equipo: GUADAÑADORA			Marca: HUSQVARNA		Serie No: TT05920108642	Función:DESMALEZADORA
Ubicación: SINTETICOS	Sección: MTO	Semana de:	2	Al: 6	Mes de:	junio de 2025

INSPECCIÓN

GUADAÑA	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	ACEITE MOTOR	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO ACEITE	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO COMBUSTIBLE	X		X		X		X		X		X					
	ACEITE HIDRAULICO	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO DE AIRE	X		X		X		X		X		X					
	VALBULINA	X		X		X		X		X		X					
	ENGRASE	X		X		X		X		X		X					
	CUCHILLAS	X		X		X		X		X		X					
	YOYO	X		X		X		X		X		X					
	MANGO DE SEGURIDAD	X		X		X		X		X		X					
	ENCENDIDO ELECTRICO	X		X		X		X		X		X					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Luis Mercado
Nombre y Firma del Tecnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	F1-SST-005
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES		Fecha: Septiembre 06 de 2019
		Página 1 de 1

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: LUIS MERCADO			HRS Inicial	95650	HRS Final	97935
PLACA VEHICULO: EKZ 727			Marca: FOTON		Serial No: LJ1E03VJJD0-1	Función: MOVIL 2
Ubicación: CAMPOS NATURALES	Sección: NTO	Semana de:	Al:	26	Mes de:	12

INSPECCIÓN

Item	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Jue		Vie		Sab		Dom	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
DOCUMENTOS																	
Licencia de tránsito	En Regla	X															
Revisión técnico mecánica	En Regla	X															
Seguro obligatorio	En Regla	X															
Seguro contractual	Vigente	X															
Seguro extracontractual	En Regla	X															
Licencia de conducción	En Regla	X															
Planos, mapas rutas, otr.	En Regla	X															
Contactos de Emergencia	En Regla	X															
EQUIPO EMERGENCIAS																	
Linterna con pilas	En buen estado	X															
Botiquín	Completo	X															
Extintor	Pin de seguridad, Cargado, vigente	X															
PARTE EXTERNA																	
Espejos laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado	X															
Luces traseras	De freno mínimo dos / de color rojo / Direccionales	X															
Llantas	Libres de raspaduras y sin desgaste excesivo	X															
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente	X															
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos funcionando correctamente	X															
Lámparas Luces delanteras	Lentes sin roturas/ funcionando / de color blanco / amarillo	X															
Indicador luces de parqueo	Mínimo dos / funcionando correctamente	X															
Tanque de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y ajustada	X															
COMPARTIMENTO DEL MOTOR																	
Fuente de energía (BATERIA)	Sin repujados/ Ajustada adecuadamente	X															
Conexiones eléctricas	Firmes y en buen estado	X															
Nivel agua refrigeración / mangueras	Nivel correcto / mangueras sin fugas	X															
Estado de las llantas radiadoras	Limpias sin fugas y en buen estado	X															
Niveles de aceite motor / radiador	Niveles de acuerdo al fabricante	X															
Cableado eléctrico	Ajustado / sin roturas / ajustados	X															
Bomba de dirección / Nivel aceite	Sin fugas/ bien asegurado / nivel de aguardo al fabricante	X															
INTERIOR DE LA CABINA																	
Espejos retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado	X															
Vidrio parabrisas/ vidrios ventanas	Sin roturas / manchas / desprisiones	X															
Plumillas limpiavidrios/ motor lavaparabrisas	Mínimo dos / empaque sin desgastes / funcionando y mínimo dos revoluciones	X															
Estado de la cabina	Protegida y en buen estado en general	X															
Indicador de combustible	La aguja o indicador debe mostrar el nivel de combustible	X															
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor	X															
Sillas/ Apoyo para la cabeza	Atornilladas al piso/ apoyo para la cabeza ajustado	X															
Pedales freno / clutch / acelerador	Con forro antideslizante / sin juego excesivo	X															
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente	X															
Equipo de carretera	Gato con capacidad para elevar el vehículo, una cruceta, dos señales de carretera en forma de triangulo en material reflectivo y provistos de soportes para ser colocadas en forma vertical o compactas de serie de luz amarilla intermitentes o de destello, dos tacos para bloquear el vehículo, caja de herramientas básicas que como mínimo deberá contener alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas, llanta de repuesto, extintor, (Art 30 del código nacional de tránsito ley 769 de 2002)	X															
Cinturones de seguridad	De 3 puntos de apoyo	X															
Pito	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m	X															
Timón o volante	Funcionando en perfectas condiciones	X															
Frenos	Pedales con antideslizante/ nivel de líquido de acuerdo al fabricante	X															

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Luis Mercado
Nombre y Firma del Técnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-005
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES	Fecha:	Septiembre 08 de 2019
	Versión:	001
	Página 1 de 1	

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: DIOMEDES JIMENEZ			HRS Inicial	96111	HRS Final	96251.
PLACA VEHICULO: EXZ 115			Marca: JAC		Serie No: HFC1636KN	Parque: MOVIL 1
Ubicación:CAMPOS NATURALES	Sección: MTO	Semana de:	16	Al: 22	Mes de:	AGOSTO 2019

INSPECCIÓN

Item	Estandar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Jue		Vie		Sab		Dom	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
DOCUMENTOS																	
Licencia de tránsito	En Regla	x		✓		✓		✓		✓		✓					
Revisión tecnico mecanico	En Regla	x		✓		✓		✓		✓		✓					
Seguro obligatorio	En Regla	x		✓		✓		✓		✓		✓					
Seguro contractual	Vigente	x		✓		✓		✓		✓		✓					
Seguro extracontractual	En Regla	x		✓		✓		✓		✓		✓					
Licencia de conducción	En Regla	x		✓		✓		✓		✓		✓					
Platón, mapas rutas, gps	En Regla	x		✓		✓		✓		✓		✓					
Contactos de Emergencias	En Regla	x		✓		✓		✓		✓		✓					
EQUIPO EMERGENCIAS																	
Linterna con pilas	En buen estado	x		✓		✓		✓		✓		✓					
Botiquín	Completo	x		✓		✓		✓		✓		✓					
Extintor	Pin de seguridad, Cargado, vigente	x		✓		✓		✓		✓		✓					
PARTE EXTERNA																	
Espejos laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado	x		✓		✓		✓		✓		✓					
Luces traseras	De freno mínimo dos / de color rojo / Direccionales	x		✓		✓		✓		✓		✓					
Llantas	Libres de raaduras y sin desgaste excesivo	x		✓		✓		✓		✓		✓					
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente	x		✓		✓		✓		✓		✓					
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos funcionando correctamente	x		✓		✓		✓		✓		✓					
Lámparas Luces delanteras	Lentes sin roturas/ funcionando / de color blanco / amarillo	x		✓		✓		✓		✓		✓					
Indicador luces de parqueo	Mínimo dos / funcionando correctamente	x		✓		✓		✓		✓		✓					
Tanque de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y asegurada	x		✓		✓		✓		✓		✓					
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR																	
Fuente de energía (BATERÍA)	Sin raspaduras/ Anclado correctamente	x		✓		✓		✓		✓		✓					
Conexiones eléctricas	Fijadas y en Buen estado	x		✓		✓		✓		✓		✓					
Nivel agua refrigeración / mangueras	Nivel correcto / mangueras sin fugas	x		✓		✓		✓		✓		✓					
Estado de las Bandas Hidráulicas	Limpias sin fugas y en buen estado	x		✓		✓		✓		✓		✓					
Niveles de aceite motor / hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante	x		✓		✓		✓		✓		✓					
Cableado eléctrico	Anclado / sin roturas / ajustados	x		✓		✓		✓		✓		✓					
Bateria de direccion / Nivel aceite	Sin fugas/ bien asegurado / nivel de acuerdo al fabricante	x		✓		✓		✓		✓		✓					
INTERIOR DE LA CABINA																	
Espejo retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado	x		✓		✓		✓		✓		✓					
Vidrio panoramico/ vidrios laterales	Sin fisuras / manchas / estrellones	x		✓		✓		✓		✓		✓					
Puertas limpiavidrios/ motor limpiaparabrisas	Mínimo dos / empleados sin desgastes / funcionando / mínimo dos velocidades	x		✓		✓		✓		✓		✓					
Estado de la cabina	Protegido y en buen estado en general	x		✓		✓		✓		✓		✓					
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible	x		✓		✓		✓		✓		✓					
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor	x		✓		✓		✓		✓		✓					
Silla/ Apoyo para la cabeza	Ajustables al piso/ apoyo para la cabeza asegurado	x		✓		✓		✓		✓		✓					
Pedales freno , cluch / acelerador	Con forro antideslizante / sin golpes óxidos-vb	x		✓		✓		✓		✓		✓					
Alarma de reversa	Funcionando correctamente	x		✓		✓		✓		✓		✓					
Equipo de carretera	Gato con capacidad para elevar el vehículo, una muñeca, dos señales de carretera en forma de triangulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical, o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello, dos tacos para bloquear el vehículo, caja de herramientas básica que como mínimo deberá contener alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas, llanta de repuesto, inflada. (Art 30 del código nacional de tránsito ley 769 de 2002)	x		✓		✓		✓		✓		✓					
Cinturones de seguridad	De 3 puntos de apoyo	x		✓		✓		✓		✓		✓					
Pito	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m	x		✓		✓		✓		✓		✓					
Timón o volante	Funcionando en perfectas condiciones	x		✓		✓		✓		✓		✓					
Frenos	Pedales con antideslizante/ nivel de líquido de acuerdo al fabricante	x		✓		✓		✓		✓		✓					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Nombre y Firma del Técnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES		Fecha: Septiembre 06 de 2019 Versión: 001 Pagina 1 de 1

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: Luis Mercado.		HRS Inicial	56614.	HRS Final	56679.		
Maquina-Equipo: TRACTOR LTH 1842		Marca: HUSQVARNA		Serie No: 4133313063		Función: CEPILLAR	
Ubicación: CAMPOS SINTETICOS	Sección:MTO	Semana de: 16	Al: 20	Mes de:	Junio / 25.		

INSPECCIÓN

TRACTOR LTH 1842	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	ACEITE MOTOR	x		x		x		x		x		x					
	FILTRO ACEITE	x		x		x		x		x		x					
	FILTRO COMBUSTIBLE	x		x		x		x		x		x					
	ACEITE HIDRAULICO	x		x		x		x		x		x					
	FILTRO DE AIRE	x		x		x		x		x		x					
	CABLES Y POLEAS	x		x		x		x		x		x					
	ENGRASE	x		x		x		x		x		x					
	CUCHILLAS	x		x		x		x		x		x					
	CEPILLO	x		x		x		x		x		x					
	CORREA TENSORA	x		x		x		x		x		x					
	CINTURON DE SEGURIDAD	x		x		x		x		x		x					
	MANDOS DE OPERACIÓN	x		x		x		x		x		x					
	FRENOS	x		x		x		x		x		x					
	LLANTAS	x		x		x		x		x		x					
	BATERIA	x		x		x		x		x		x					
	ENCENDIDO	x		x		x		x		x		x					
	SISTEMA DE ATRACCION	x		x		x		x		x		x					
	HOROMETRO	x		x		x		x		x		x					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Luis Mercado

Nombre y Firma del Tecnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-055
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES	Fecha:	Septiembre 08 de 2019
	Versión:	001
		Pagina 1 de 1

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: LUIS MERCADO			HRS Inicial	7:00 a. m.	HRS Final	4:00 p. m.
Maquina-Equipo: GUADAÑADORA			Marca: HUSQVARNA		Serie No: TT05920108642	Función:DESMALEZADORA
Ubicación: SINTETICOS	Sección: MTO	Semana de:	16	Al: 20	Mes de:	junio de 2025

INSPECCIÓN

GUADAÑA	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		SI	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	ACEITE MOTOR	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO ACEITE	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO COMBUSTIBLE	X		X		X		X		X		X					
	ACEITE HIDRAULICO	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO DE AIRE	X		X		X		X		X		X					
	VALBULINA	X		X		X		X		X		X					
	ENGRASE	X		X		X		X		X		X					
	CUCHILLAS	X		X		X		X		X		X					
	YOYO	X		X		X		X		X		X					
	MANGO DE SEGURIDAD	X		X		X		X		X		X					
	ENCENDIDO ELECTRICO	X		X		X		X		X		X					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Luis Mercado.
Nombre y Firma del Tecnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES		Fecha: Septiembre 08 de 2019 Versión: 001 Pagina 1 de 1

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: DIOMEDES JIMENEZ			HRS Inicial	7:00 a. m.	HRS Final	4:00 p. m.
Maquina-Equipo: GUADAÑADORA			Marca: HUSQVARNA		Serie No: T05920109854	Función:DESMALEZADORA
Ubicación: SINTETICOS	Sección: MTO	Semana de:	16	Al: 20	Mes de:	junio de 2026

INSPECCIÓN

GUADAÑA	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	ACEITE MOTOR	X		✓		✓		✓		✓		✓					
	FILTRO ACEITE	X		✓		✓		✓		✓		✓					
	FILTRO COMBUSTIBLE	X		✓		✓		✓		✓		✓					
	ACEITE HIDRAULICO	X		✓		✓		✓		✓		✓					
	FILTRO DE AIRE	X		✓		✓		✓		✓		✓					
	VALBULINA	X		✓		✓		✓		✓		✓					
	ENGRASE	X		✓		✓		✓		✓		✓					
	CUCHILLAS	X		✓		✓		✓		✓		✓					
	YOYO	X		✓		✓		✓		✓		✓					
	MANGO DE SEGURIDAD	X		✓		✓		✓		✓		✓					
	ENCENDIDO ELECTRICO	X		✓		✓		✓		✓		✓					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Nombre y Firma del Tecnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES	Fecha	Septiembre 06 de 2019
	Versión	001
	Pagina 1 de 1	

DATOS DE LA INSPECCION

Inspeccionado por: DIOMEDES JIMENES	HRS Inicial	3796	HRS Final	3821		
Maquina-Equipo: GIRO ZERO PZT-60	Marca: HUSQVARNA		Serie No: 9676698895		Función: PODADORA	
Ubicación: / Sección: / Semana de:	16	Al: 20	Mes de:	Junio /23		

INSPECCIÓN

GIRO ZERO PZT-60	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	ACEITE MOTOR	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	FILTRO ACEITE	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	FILTRO COMBUSTIBLE	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	ACEITE HIDRAULICO	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	FILTRO DE AIRE	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	CABLES Y POLEAS	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	ENGRASE	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	CUCHILLAS	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	CORREA DECK	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	CORREA TENSORA	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	CINTURON DE SEGURIDAD	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	MANDOS DE OPERACIÓN	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	FRENOS	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	LLANTAS	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	BATERIA	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	ENCENDIDO	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	SISTEMA DE ATRACCION	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	HOROMETRO	x		✓		✓		✓		✓		✓					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Nombre y Firma del Tecnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES		Fecha: Septiembre 08 de 2019 Versión: 001 Pagina 1 de 2

DATOS DE LA INSPECCION

Inspeccionado por: BRANDON LOPEZ		HRS Inicial	7:00 AM	HRS Final	5 PM.	
Maquina-Equipo: TRACTOR 2320		Marca: KUBOTA		Serie No: B2320038295		Función: HALAR
Ubicación: Sabicas	Sección: Mantenimiento	Semana de:	16 Al: 20	Mes de:	Junio 25	

INSPECCIÓN

Item	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	BATERIA	x		x		x		x		x		x					
	TANQUE DE COMBUSTRIBLE	x		x		x		x		x		x					
	NEUMATICOS	x		x		x		x		x		x					
	DIRECCIÓN	x		x		x		x		x		x					
	TRANSMISIÓN	x		x		x		x		x		x					
	FRENO DE PARQUEO	x		x		x		x		x		x					
	RADIO DE VIRAJE	x		x		x		x		x		x					
	ASIENTO	x		x		x		x		x		x					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Nombre y Firma del Tecnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES

Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo

FORMATO N°: FT-SST-053

FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES

Fecha: Septiembre 09 de 2019
Versión: 001
Página 1 de 1

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: LUIS MERCADO — HRS Inicial: 95535 — HRS Final: 95963

PLACA VEHÍCULO: EXZ 737 — Marca: FOTON — Serie No: LJ1H3VYJJD0-1 — Función: MOVIL 2

Ubicación: CAMPOS NATURALES — Semana de: 24 al 27 — Mes de: JUNIO DE 2019

INSPECCIÓN

Item	Estandar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Jue		Vie		Sab		Dom	
		SI	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
DOCUMENTOS																	
Licencia de tránsito	En Regla	X				X		X		X		X					
Revisión técnico mecánica	En Regla	X				X		X		X		X					
Seguro obligatorio	En Regla	X				X		X		X		X					
Seguro contractual	Vigente	X				X		X		X		X					
Seguro extracontractual	En Regla	X				X		X		X		X					
Licencia de conducción	En Regla	X				X		X		X		X					
Polizas, maquinaria, etc	En Regla	X				X		X		X		X					
Contactos de Emergencia	En Regla	X				X		X		X		X					
EQUIPO EVERGENCIAS																	
Linterna con pilas	En buen estado	X				X		X		X		X					
Botiquin	Completo	X				X		X		X		X					
Extintor	Pin de seguridad, Cargado, vigente	X				X		X		X		X					
PARTE EXTERNA																	
Espejos laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado	X				X		X		X		X					
Luces traseras	De freno, mínimo dos (2) de color rojo / Direccionales	X				X		X		X		X					
Llantas	Libres de raduras y sin desgaste excesivo	X				X		X		X		X					
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente	X				X		X		X		X					
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos funcionando correctamente	X				X		X		X		X					
Lamparas Luces delanteras	Lentes sin roturas/ funcionando / de color blanco / amarillo	X				X		X		X		X					
Indicador luces de parqueo	Mínimo dos / funcionando correctamente	X				X		X		X		X					
Tapa del combustible	Sin fugas / ajustado / con tabla original y ajustada	X				X		X		X		X					
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR																	
Fuente de energía / Batería	Sin fugas/con carga / ubicada correctamente	X				X		X		X		X					
Cables electricos	Firmes y en buen estado	X				X		X		X		X					
Nivel aceite refrigeración / Hidráulico	A nivel correcto / manguera sin fugas	X				X		X		X		X					
Estado de las líneas hidráulicas	Líneas sin fugas y en buen estado	X				X		X		X		X					
Nivelas de aceite motor / hidráulico	Nivelado de acuerdo al fabricante	X				X		X		X		X					
Cableado electrico	Aislado / sin roturas / ajustados	X				X		X		X		X					
Sistema de dirección / Nivel aceite	Sin roturas/ ajustado / nivel de acuerdo al fabricante	X				X		X		X		X					
INTERIOR DE LA CABINA																	
Estado de limpieza interior	Sin roturas / sin manchas / aseado	X				X		X		X		X					
Vidrio y parabrisas con limpiavidrios	Sin roturas / manchas / Estropajos	X				X		X		X		X					
Pulverizador limpiavidrios con conductor	Mínimo dos compresores en servicio / funcionando / mínimo dos mangueras	X				X		X		X		X					
Sonido de la cabina	Amplificado y en buen estado en general	X				X		X		X		X					
Indicador de combustible	La aguja / indicador debe marcar un nivel de combustible	X				X		X		X		X					
Velocidad máxima de operación	Que no supere 5 kilometros x hora	X				X		X		X		X					
Sistema visual de alerta	Alarmas visuales de operación para la cabina operador	X				X		X		X		X					
Pedales freno / pulso / acelerador	Con tapa antideslizante / sin juego excesivo	X				X		X		X		X					
Palanca de retroceso	Funcionando correctamente	X				X		X		X		X					
Equipo de emergencia	Gato con capacidad para elevar el vehículo, una cruceta, dos señales de carretera en forma de triangulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser ubicadas en forma vertical a ambientes de señal de la cantidad mínimas a un metro, dos tacos para bloquear el vehículo, caja de herramientas básicas y como mínimo deberá contener un gato, destornilladores, llave de expansión y llaves tipo corta de tamaño universal (Art 20 del código nacional de tránsito ley 769 de 2002)	X				X		X		X		X					
Dispositivos de seguridad	De 3 puntos de apoyo	X				X		X		X		X					
Aire	Funcionando / que no exija mantenimiento	X				X		X		X		X					
Tomas de corriente	Funcionando en perfectas condiciones	X				X		X		X		X					
Frenos	Pedales con antideslizante / nivel de líquido de acuerdo al fabricante	X				X		X		X		X					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Luis Mercado
Nombre y Firma del Técnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

FORMATO N°: FT-SST-055

FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES

Fecha: Septiembre 08 de 2020
Versión: 001
Página 1 de 1

DATOS DE LA INSPECCION

Inspeccionado por: DIOMEDES JIMENEZ			HRS Inicial	96251	HRS Final	96355	
PLACA VEHICULO: EXZ 115			Marca: JAC		Serie No: HFC1035K6		Funcion: MOVIL 1
Ubicacion: CAMPOS NATURALES	Sector: MTO	Semana de:	24	Al: 27	Mes de:		

INSPECCION

Item	Estandar	Aplica Si	Aplica No	Lun C	Lun NC	Mar C	Mar NC	Mier C	Mier NC	Jue C	Jue NC	Vie C	Vie NC	Sab C	Sab NC	Dom C	Dom NC
DOCUMENTOS																	
Licencia de transito	En Regla	x		—		✓		✓		✓		✓					
Revision tecnico mecanica	En Regla	x		—		✓		✓		✓		✓					
Seguro del peltrol	En Regla	x		—		✓		✓		✓		✓					
Seguro contractual	Vigente	x		—		✓		✓		✓		✓					
Poliza extracontractual	En Regla	x		—		✓		✓		✓		✓					
Licencia de conduccion	En Regla	x		—		✓		✓		✓		✓					
Planos, mapas rutas, dos	En Regla	x		—		✓		✓		✓		✓					
Contactos de Emergencia	En Regla	x		—		✓		✓		✓		✓					
EQUIPO EMERGENCIAS																	
Linterna con pilas	En buen estado	x		—		✓		✓		✓		✓					
Botiquin	Completo	x		—		✓		✓		✓		✓					
Extintor	Pin de seguridad, Cargado, vigente	x				✓		✓		✓		✓					
PARTE EXTERNA																	
Espejos laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado	x		—		✓		✓		✓		✓					
Luces traseras	De freno, minimo dos / de color rojo / Direccionales	x		—		✓		✓		✓		✓					
Llantas	Libres de rasaduras y sin desgaste excesivo	x		—		✓		✓		✓		✓					
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente	x		—		✓		✓		✓		✓					
Indicadores luces direccionales	Minimo dos funcionando correctamente	x		—		✓		✓		✓		✓					
Lamparas Luces delanteras	Lentes sin roturas/ funcionando / de color blanco / ajustado	x		—		✓		✓		✓		✓					
Indicador nivel de tanque	Minimo dos / funcionando correctamente	x		—		✓		✓		✓		✓					
Tanque de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y ajustada	x		—		✓		✓		✓		✓					
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR																	
Puerta de arranque (BATERIA)	Sin roturas/ Anclada adecuadamente	x		—		✓		✓		✓		✓					
Conexiones electricas	Firmes y en buen estado	x		—		✓		✓		✓		✓					
Nivel agua refrigeracion / manguetas	Nivel correcto / mangueras sin fugas	x		—		✓		✓		✓		✓					
Estado de las Lineas hidraulicas	Lineas sin fugas y en buen estado	x		—		✓		✓		✓		✓					
Niveles de aceite motor / hidraulico	Niveles de acuerdo al fabricante	x		—		✓		✓		✓		✓					
Cableado electrico	Aislado / sin roturas / ajustados	x		—		✓		✓		✓		✓					
Bomba de direccion / Nivel Juego	Sin fugas/ bien asegurado / nivel de acuerdo al fabricante	x		—		✓		✓		✓		✓					
INTERIOR DE LA CABINA																	
Estatico retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado	x		—		✓		✓		✓		✓					
Vidrio parabrisas/ vidrios ventanas	Sin roturas / manchas / distorsiones	x		—		✓		✓		✓		✓					
Plumillas limpiaparabrisas/ motor limpiaparabrisas	Minimo dos / enfocque sin desgastes / funcionando / minimo dos velocidades	x		—		✓		✓		✓		✓					
Estado de la cabina	Protegida y en buen estado en general	x		—		✓		✓		✓		✓					
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible	x		—		✓		✓		✓		✓					
Indicador presion de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor	x		—		✓		✓		✓		✓					
Silla/ Apoyo para la cabeza	Acomodada al perfil apoyo para la cabeza asegurado	x		—		✓		✓		✓		✓					
Pedales freno / cluton / acelerador	Con forro antideslizante / sin juego excesivo	x		—		✓		✓		✓		✓					
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente	x		—		✓		✓		✓		✓					
Equipo de carretera	Gato con capacidad para elevar el vehiculo, una cruceta, dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lamparas de señal de luz amarilla intermitente o de destello, dos tacos para bloquear el vehiculo, caja de herramientas basica que como minimo debera contener alicate, destornilladores, llave de expansion y llaves fijas, llanta de repuesto, extintor (Art 30 del código nacional de tránsito ley 769 de 2002)	x		—		✓		X		✓		✓					
Cinturones de seguridad	De 3 puntos de apoyo	x		—		✓		✓		✓		✓					
Pito	Funcionando / que se oiga minimo a 50 m	x		✓		✓		✓		✓		✓					
Timón o volante	Funcionando sin señales corrodones	x		✓		✓		✓		✓		✓					
Frenos	Pedales con antideslizantes nivel de liquido de acuerdo al fabricante	x		—		✓		✓		✓		✓					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Nombre y Firma del Tecnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES	Fecha	Septiembre 08 de 2019
	Versión	001
	Pagina 1 de 1	

DATOS DE LA INSPECCION

Inspeccionado por: HILARIO CARDENAS			HRS Inicial	56679	HRS Final	56719.	
Maquina-Equipo: TRACTOR LTH 1842			Marca: HUSQVARNA		Serie No: 4133313063		Función: CEPILLAR
Ubicación: CAMPOS SINTETICOS	Sección:MTO	Semana de:	24	Al: 27	Mes de:	Junio /25	

INSPECCIÓN

TRACTOR LTH 1842	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	ACEITE MOTOR	x				x		x		x		x					
	FILTRO ACEITE	x				x		x		x		x					
	FILTRO COMBUSTIBLE	x				x		x		x		x					
	ACEITE HIDRAULICO	x				x		x		x		x					
	FILTRO DE AIRE	x				x		x		x		x					
	CABLES Y POLEAS	x				x		x		x		x					
	ENGRASE	x				x		x		x		x					
	CUCHILLAS	x				x		x		x		x					
	CEPILLO	x				x		x		x		x					
	CORREA TENSORA	x				x		x		x		x					
	CINTURON DE SEGURIDAD	x				x		x		x		x					
	MANDOS DE OPERACIÓN	x				x		x		x		x					
	FRENOS	x				x		x		x		x					
	LLANTAS	x				x		x		x		x					
	BATERIA	x				x		x		x		x					
	ENCENDIDO	x				x		x		x		x					
	SISTEMA DE ATRACCION	x				x		x		x		x					
	HOROMETRO	x				x		x		x		x					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Nombre y Firma del Tecnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
FORMATO N°:	FT-SST-065

FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES

Fecha	Septiembre 06 de 2019
Versión	001
	Pagina 1 de 1

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: LUIS GUILLERMO MERCADO			HRS Inicial	3654.	HRS Final	3696
Maquina-Equipo: GIRO ZERO MZ -54			Marca: HUSQVARNA		Serie No: 26412657682	Función: PODADORA
Ubicación: CANCHAS SINT	Sección: MTO	Semana de:	24 Al:	27	Mes de:	Junio 25

INSPECCIÓN

GIRO ZERO MZ 54	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	ACEITE MOTOR	x		—		x		x		x		x					
	FILTRO ACEITE	x		—		x		x		x		x					
	FILTRO COMBUSTIBLE	x		—		x		x		x		x					
	ACEITE HIDRAULICO	x		—		x		x		x		x					
	FILTRO DE AIRE	x		—		x		x		x		x					
	CABLES Y POLEAS	x		—		x		x		x		x					
	ENGRASE	x		—		x		x		x		x					
	CUCHILLAS	x		—		x		x		x		x					
	CORREA DECK	x		—		x		x		x		x					
	CORREA TENSORA	x		—		x		x		x		x					
	CINTURON DE SEGURIDAD	x		—		x		x		x		x					
	MANDOS DE OPERACIÓN	x		—		x		x		x		x					
	FRENOS	x		—		x		x		x		x					
	LLANTAS	x		—		x		x		x		x					
	BATERIA	x		—		x		x		x		x					
	ENCENDIDO	x		—		x		x		x		x					
	SISTEMA DE ATRACCION	x		—		x		x		x		x					
	HOROMETRO	x		—		x		x		x		x					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Luis Mercado
Nombre y Firma del Tecnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES	Fecha:	Septiembre 08 de 2019
	Versión:	001
	Pagina 1 de 1	

DATOS DE LA INSPECCION

Inspeccionado por: HILARIO CARDENAS			HRS Inicial	7:00 a. m.	HRS Final	4:00 p. m.
Maquina-Equipo: GUADAÑADORA			Marca: HUSQVARNA		Serie No: T24276023275	Función:DESMALEZADORA
Ubicación: SINTETICOS	Sección: MTO	Semana de:	27	Al: 27	Mes de:	may-25

INSPECCIÓN

GUADAÑA	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	ACEITE MOTOR	X															
	FILTRO ACEITE	X															
	FILTRO COMBUSTIBLE	X															
	ACEITE HIDRAULICO	X															
	FILTRO DE AIRE	X															
	VALBULINA	X															
	ENGRASE	X															
	CUCHILLAS	X															
	YOYO	X															
	MANGO DE SEGURIDAD	X															
	ENCENDIDO ELECTRICO	X															

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Nombre y Firma del Tecnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES	Fecha:	Septiembre 08 de 2019
	Versión:	001
		Pagina 1 de 1

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: LUIS MERCADO	HRS Inicial	7:00 a. m.	HRS Final	4:00 p. m.		
Maquina-Equipo: GUADAÑADORA	Marca: HUSQVARNA		Serie No: TT05920108642		Función:DESMALEZADORA	
Ubicación: SINTETICOS / Sección: MTO / Semana de: 29	Al: 2		Mes de:	junio de 2025		

INSPECCIÓN

GUADAÑA	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	ACEITE MOTOR	X															
	FILTRO ACEITE	X															
	FILTRO COMBUSTIBLE	X															
	ACEITE HIDRAULICO	X															
	FILTRO DE AIRE	X															
	VALBULINA	X															
	ENGRASE	X															
	CUCHILLAS	X															
	YOYO	X															
	MANGO DE SEGURIDAD	X															
	ENCENDIDO ELECTRICO	X															

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Luis Mercado
Nombre y Firma del Tecnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES		Fecha: Septiembre 08 de 2019 Versión: 001 Pagina 1 de 2

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: BRANDON LOPEZ			HRS Inicial	7:00 am	HRS Final	4:00 pm
Maquina-Equipo: TRACTOR 2320			Marca: KUBOTA		Serie No: B2320D38295	Función: HALAR
Ubicación:	Sección:	Semana de:	24	Al: 27	Mes de:	Junio 25

INSPECCIÓN

Item	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	BATERIA	x															
	TANQUE DE COMBUSTRIBLE	x															
	NEUMATICOS	x															
	DIRECCION	x															
	TRANSMISIÓN	x															
	FRENO DE PARQUEO	x															
	RADIO DE VIRAJE	x															
	ASIENTO	x															

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Nombre y Firma del Tecnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

FORMATO Nº: FT.SST.005

FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES

Fecha: Septiembre 09 de 2019

Página 1 de 1

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: DIOMEDES JIMENEZ | HRS Inicial: 95958. | HRS Final: 96111

PLACA VEHICULO: EXZ 118 | Marca: JAC | Serie No: HFC1025KN | Funcion: NIVEL 1

Ubicación: CAMPOS NATURALES | Bloque: MTO | Semana de: 9 al 13 | Mes de: Junio / 22

INSPECCIÓN

Item	Estándar	Aplica Si	Aplica No	Lun C	Lun NC	Mar C	Mar NC	Mier C	Mier NC	Juv C	Juv NC	Vie C	Vie NC	Sab C	Sab NC	Dom C	Dom NC
DOCUMENTOS																	
Licencia de tránsito	En Regla	x		x		x		x		x		x					
Revisión técnico mecánica	En Regla	x		x		x		x		x		x					
Seguro obligatorio	En Regla	x		x		x		x		x		x					
Seguro contractual	Vigente	x		x		x		x		x		x					
Seguro extracontractual	En Regla	x		x		x		x		x		x					
Licencia de conducción	En Regla	x		x		x		x		x		x					
Pluton, mapa ruta, SOI	En Regla	x		x		x		x		x		x					
Contactos de Emergencia	En Regla	x		x		x		x		x		x					
EQUIPO EMERGENCIAS																	
Linterna con pilas	En buen estado	x		x		x		x		x		x					
Botiquín	Completo	x		x		x		x		x		x					
Extintor	Pin de seguridad, Cargado, vigente	x		x		x		x		x		x					
PARTE EXTERNA																	
Espejos laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado	x		x		x		x		x		x					
Luces traseras	De freno, mínimo dos / de color rojo / Direccionales	x		x		x		x		x		x					
Llantas	Libres de rajaduras y sin desgaste excesivo	x		x		x		x		x		x					
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente	x		x		x		x		x		x					
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos funcionando correctamente	x		x		x		x		x		x					
Lamparas Luces delanteras	Lentes sin roturas/ funcionando / de color blanco / amarillo	x		x		x		x		x		x					
Indicador luces de parqueo	Mínimo dos / funcionando correctamente	x		x		x		x		x		x					
Tanque de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y ajustada	x		x		x		x		x		x					
COMPARTIMENTO DEL MOTOR																	
Puerto de interna (BATERIA)	Sin raspaduras/ Ajustada adecuadamente	x		x		x		x		x		x					
Conexiones eléctricas	Aisladas y en buen estado	x		x		x		x		x		x					
Nivel agua refrigeración / mangueras	Nivel correcto / mangueras sin fugas	x		x		x		x		x		x					
Estado de las líneas hidráulicas	Líneas sin fugas y en buen estado	x		x		x		x		x		x					
Niveles de aceite motor / hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante	x		x		x		x		x		x					
Cableado eléctrico	Aislado / sin roturas / ajustados	x		x		x		x		x		x					
Sistema de carabon / Nivel aceite	Sin fugas/ bien asegurado / nivel de acuerdo al fabricante	x		x		x		x		x		x					
INTERIOR DE LA CABINA																	
Espejo retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado	x		x		x		x		x		x					
Vidrio panorámicos/ vidrios ventanas	Sin roturas / manchas / distorsiones	x		x		x		x		x		x					
Plumillas limpiavidrio/ motor limpiaparabrisas	Mínimo dos / empaque sin desgastes / funcionando / mínimo dos revoluciones	x		x		x		x		x		x					
Estado de la cabina	Protegida y en buen estado en general	x		x		x		x		x		x					
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible	x		x		x		x		x		x					
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor	x		x		x		x		x		x					
Silla/ Apoya para la cabeza	Alturadas al piso/ apoya para la cabeza asegurado	x		x		x		x		x		x					
Pedales freno / clutch / acelerador	Con tapa antideslizante / sin juego excesivo	x		x		x		x		x		x					
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente	x		x		x		x		x		x					
Equipo de carretera	Gato con capacidad para elevar el vehículo, una cruceta, dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o cámaras de seña de luz amarilla intermitente o de destello, dos tacos para bloquear el vehículo, caja de herramientas básicas, tal como mínimo deberá contener alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas, llanta de repuesto inflada (Art 30 del código nacional de tránsito ley 769 de 2002)	x		x		x		x		x		x					
Cinturones de seguridad	De 3 puntos de apoyo	x		x		x		x		x		x					
Pito	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m	x		x		x		x		x		x					
Timón o volante	Funcionando en perfectas condiciones	x		x		x		x		x		x					
Frenos	Pedales con antideslizante/ nivel de líquido de acuerdo al fabricante	x		x		x		x		x		x					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Nombre y Firma del Tecnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES	Fecha	Septiembre 08 de 2016
	Versión	001
	Página 1 de 1	

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: LUIS MERCADO			HRS Inicial	95536	HRS Final	95686	
PLACA VEHICULO: EXZ 737			Marca: FOTON		Serie No: LJ1638WJJD3-1	Parqueo: MOVIL 2	
Ubicación CAMPOS NATURALES	Semana: MTO	Semana de:	9	Al: 13	Mes de:	JULIO / 16	

INSPECCION

Item	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
DOCUMENTOS																	
Licencia de manejo	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Revisión tecno mecánica	En Regla	X		X		X		X		X							
Seguro obligatorio	En Regla	X		X		X		X		X							
Seguro contractual	Vigente	X		X		X		X		X							
Seguro extracontractual	En Regla	X		X		X		X		X							
Licencia de conducción	En Regla	X		X		X		X		X							
Planos, mapas rutas, otro	En Regla	X		X		X		X		X							
Contactos de Emergencia	En Regla	X		X		X		X		X							
EQUIPO EMERGENCIAS																	
Linterna con pilas	En buen estado	X		X		X		X		X		X					
Botiquín	Completo	X		X		X		X		X		X					
Extintor	En de seguridad. Cargado, vigente	X		X		X		X		X		X					
PARTE EXTERNA																	
Espejos laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado	X		X		X		X		X		X					
Lucas traseras	De freno: mínimo dos / de color rojo / Direccionales	X		X		X		X		X		X					
Llantas	Libres de raduras y sin desgaste excesivo	X		X		X		X		X		X					
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente	X		X		X		X		X		X					
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos funcionando correctamente	X		X		X		X		X		X					
Lamparas Luces delanteras	Lentes sin roturas/ funcionando / de color blanco / amarillo	X		X		X		X		X		X					
Indicador luces de parqueo	Mínimo dos / funcionando correctamente	X		X		X		X		X		X					
Tanque de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y ajustada	X		X		X		X		X		X					
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR																	
Fuente de energía / BATERIA	Sin cauchos/ Ajustada adecuadamente	X		X		X		X		X		X					
Conexiones eléctricas	Firmes y en buen estado	X		X		X		X		X		X					
Nivel agua refrigeración / mangueras	Nivel correcto / mangueras sin fugas	X		X		X		X		X		X					
Estado de las líneas hidráulicas	Líneas sin fugas y en buen estado	X		X		X		X		X		X					
Niveles de aceite motor / hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante	X		X		X		X		X		X					
Cableado eléctrico	Ajustado / sin roturas / aislados	X		X		X		X		X		X					
Bomba de dirección / Nivel aceite	Sin fugas/ bien asegurado / nivel de acuerdo al fabricante	X		X		X		X		X		X					
INTERIOR DE LA CABINA																	
Espejos retrovisores interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado	X		X		X		X		X		X					
Vidrio panorámico/ vidrios verticales	Sin roturas / manchas / o distorsiones	X		X		X		X		X		X					
Plumillas limpiaparabrisas/ motor/ limpiabrisas	Mínimo dos / empaque sin desgastes / funcionando / mínimo dos revoluciones	X		X		X		X		X		X					
Estado de la cabina	Protegida y en buen estado en general	X		X		X		X		X		X					
Indicador de combustible	La cabina o indicador debe mostrar el nivel de combustible	X		X		X		X		X		X					
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor	X		X		X		X		X		X					
Silla / apoyo para la cabeza	Adecuadas al piloto/ apoyo para la cabeza ajustable	X		X		X		X		X		X					
Pedales freno / clutch / acelerador	Con forro antideslizante / sin juego excesivo	X		X		X		X		X		X					
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente	X		X		X		X		X		X					
Equipo de carretera	Gato con capacidad para elevar el vehículo, una cruceta, dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o dispositivo de señal de luz amarilla intermitente o de destello, dos tacos para bloquear el vehículo, caja de herramientas básica que como mínimo deberá contener alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas, llanta de repuesto, inflada. (Art 30 del código nacional de tránsito ley 769 de 2002)	X		X		X		X		X		X					
Cinturones de seguridad	De 3 puntos de apoyo	X		X		X		X		X		X					
Pito	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m	X		X		X		X		X		X					
Timón o volante	Funcionando en perfectas condiciones	X		X		X		X		X		X					
Frenos	Pedales con antideslizante/ nivel de líquido de acuerdo al fabricante	X		X		X		X		X		X					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Luis Mercado
Nombre y Firma del Técnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-055
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES	Fecha:	Septiembre 08 de 2019
	Versión	001
	Pagina 1 de 1	

DATOS DE LA INSPECCIÓN								
Inspeccionado por: Luis Mercado			HRS Inicial	56572	HRS Final	56614.		
Maquina-Equipo: TRACTOR LTH 1842			Marca: HUSQVARNA		Serie No: 4133313063		Función: CEPILLAR	
Ubicación: CAMPOS SINTETICOS	Sección:MTO	Semana de:	9	Al:	13	Mes de:	Junio /25.	

INSPECCIÓN

TRACTOR LTH 1842	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	ACEITE MOTOR	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	FILTRO ACEITE	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	FILTRO COMBUSTIBLE	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	ACEITE HIDRAULICO	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	FILTRO DE AIRE	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	CABLES Y POLEAS	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	ENGRASE	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	CUCHILLAS	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	CEPILLO	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	CORREA TENSORA	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	CINTURON DE SEGURIDAD	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	MANDOS DE OPERACIÓN	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	FRENOS	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	LLANTAS	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	BATERIA	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	ENCENDIDO	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	SISTEMA DE ATRACCION	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	HOROMETRO	x		✓		✓		✓		✓		✓					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Luis Mercado
Nombre y Firma del Tecnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES	Fecha: Septiembre 08 de 2019	
	Versión: 001	
	Pagina 1 de 1	

DATOS DE LA INSPECCION

Inspeccionado por: DIOMEDES JIMENES	HRS Inicial	3736	HRS Final	3776	
Maquina-Equipo: GIRO ZERO PZT-60	Marca: HUSQVARNA		Serie No: 9676698895		Función: PODADORA
Ubicación: Bellavista	Sección: MTO.	Semana de: 9	Al: 13	Mes de:	Junio /25

INSPECCIÓN

GIRO ZERO PZT-60	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	ACEITE MOTOR	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	FILTRO ACEITE	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	FILTRO COMBUSTIBLE	x		✓		✓		✓		✓		-					
	ACEITE HIDRAULICO	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	FILTRO DE AIRE	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	CABLES Y POLEAS	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	ENGRASE	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	CUCHILLAS	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	CORREA DECK	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	CORREA TENSORA	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	CINTURON DE SEGURIDAD	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	MANDOS DE OPERACIÓN	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	FRENOS	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	LLANTAS	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	BATERIA	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	ENCENDIDO	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	SISTEMA DE ATRACCION	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	HOROMETRO	x		✓		✓		✓		✓		✓					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Nombre y Firma del Tecnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES		Fecha: Septiembre 08 de 2019 Versión: 001 Pagina 1 de 1

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: LUIS MERCADO			HRS Inicial	7:00 a. m.	HRS Final	4:00 p. m.
Maquina-Equipo: GUADAÑADORA			Marca: HUSQVARNA		Serie No: TT05920108642	Función:DESMALEZADORA
Ubicación: SINTETICOS	Sección: MTO	Semana de:	9	Al: 13	Mes de:	junio de 2025

INSPECCIÓN

GUADAÑA	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	ACEITE MOTOR	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO ACEITE	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO COMBUSTIBLE	X		X		X		X		X		X					
	ACEITE HIDRAULICO	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO DE AIRE	X		X		X		X		X		X					
	VALBULINA	X		X		X		X		X		X					
	ENGRASE	X		X		X		X		X		X					
	CUCHILLAS	X		X		X		X		X		X					
	YOYO	X		X		X		X		X		X					
	MANGO DE SEGURIDAD	X		X		X		X		X		X					
	ENCENDIDO ELECTRICO	X		X		X		X		X		X					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Luis Mercado
Nombre y Firma del Tecnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES	Fecha:	Septiembre 08 de 2019
	Versión:	001
	Pagina 1 de 1	

DATOS DE LA INSPECCIÓN						
Inspeccionado por: DIOMEDES JIMENEZ	HRS Inicial	7:00 a. m.	HRS Final	4:00 p. m.		
Maquina-Equipo: GUADAÑADORA	Marca: HUSQVARNA		Serie No: T05920109854		Función:DESMALEZADORA	
Ubicación: SINTETICOS / Sección: MTO / Semana de:	9	Al: 13	Mes de:	junio de 2025		

GUADAÑA	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	ACEITE MOTOR	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO ACEITE	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO COMBUSTIBLE	X		X		X		X		X		X					
	ACEITE HIDRAULICO	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO DE AIRE	X		X		X		X		X		X					
	VALBULINA	X		X		X		X		X		X					
	ENGRASE	X		X		X		X		X		X					
	CUCHILLAS	X		X		X		X		X		X					
	YOYO	X		X		X		X		X		X					
	MANGO DE SEGURIDAD	X		X		X		X		X		X					
	ENCENDIDO ELECTRICO	X		X		X		X		X		X					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Nombre y Firma del Tecnico Operador


ANEXO 9. PERMISOS DE TRABAJO

CONSORCIO INNOVAPARQUES	INSPECCIÓN PRE-USO DE ANDAMIOS	FECHA: 05/12/2017 CODIGO: SG-FMT-011 VERSION: 001

TRABAJO: Mantenimiento Cerramiento FECHA: del 16 al 20 / Junio / 25.
UBICACIÓN: Parques Sintecos HORA: 7am a 5 pm
CONTRATISTA: Ingeniería CMC SAS USUARIO:

PARTES A EXAMINAR	ESTADO	OBSERVACIONES
Andamio es metálico y tubular	OK	
Todos los componentes del andamio sin daño	OK	
Bases niveladas, duras y rigidas	OK	
Andamio soporta 4 veces la carga que sostendrá	OK	
Estructura adecuadamente armada y asegurada (los seguros son de fábrica y no improvisados)	OK	
Andamio sujeto a una estructura estable (aplicable para andamios de 3 cuerpos a más)	OK	
No debe tener componentes mezclados de diferentes tipos de andamios	OK	
Plataformas resistentes y completas	OK	
Plataformas aseguradas y sin separaciones (no se deslizan)	OK	
Plataformas de madera se proyectan un mínimo de 30 cm. en cada extremo	OK	
Cuenta con baranda superior	OK	
Cuenta con baranda intermedia	OK	
Cuenta con rodapiés	OK	
CONCLUSIÓN: ANDAMIO APTO PARA SER USADO (SI) / (NO)		**JUSTIFICACIÓN:**
INPECCIÓN REALIZADA POR: Daniel Esteban Saboyal		**FIRMA:**

LEYENDA (ESTADO):	
V	Correcto
X	Incorrecto
NA	No Aplica

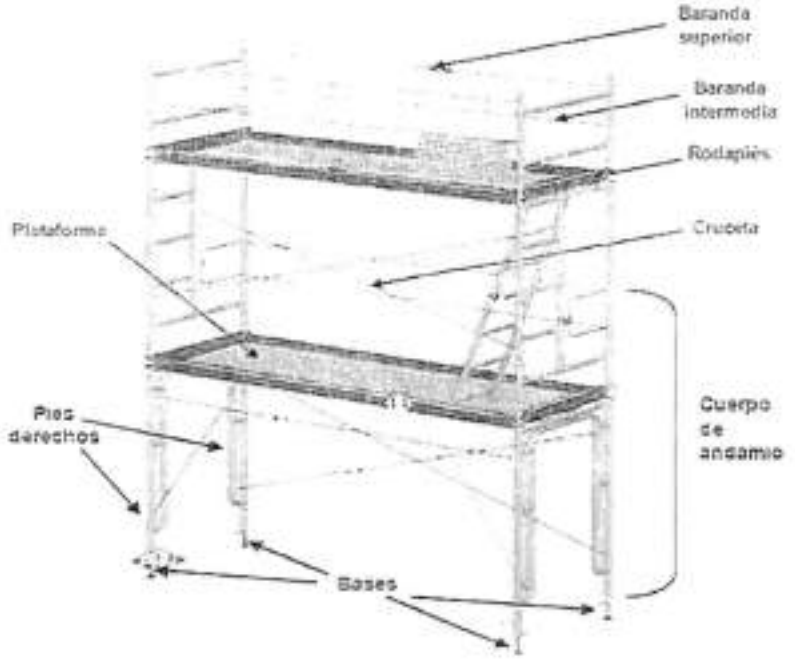

CONSORCIO AEROPARQUE	PROCESO DE CALIDAD	CODIGO	TS-AL-001
		PAGINA	1
	PERMISO DE TRABAJO E/V ALTURAS	FECHA	10/12/2019
		VERSION	1

1. ASPECTOS GENERALES

2. REQUERIMIENTO DE ELARGAD

ITEM	VARIABLE	TRABAJADOR 1	TRABAJADOR 2	TRABAJADOR 3	TRABAJADOR 4
LL	Longitud de la eslinga	ok			
DD	Distancia Desaceleración	ok			
ADH	Altura de Trabajo/Alt	ok			
C	Factor de Seguridad	ok			
AD	Distancia desde el Punto de Anclaje	ok			
		ok			
		ok			



3. LISTA DE CHEQUEO PARA PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS (Marcar con un X según corresponda)

ITEM	VERIFICACION INFORMACION	TRABAJADOR 1			TRABAJADOR 2			TRABAJADOR 3			TRABAJADOR 4		
		SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
1		X											
2		X											
3		X											
4		X											
5		X											
6		X											
7		X											
8		X											
9		X											
10		X											
11		X											
12		X											
13		X											
14		X											

4. EQUIPO DE PROTECCION CONTRA CAIDAS Y SISTEMAS DE ACCESO (Marcar con un X según corresponda)

ITEM	VERIFICACION	TRABAJADOR 1			TRABAJADOR 2			TRABAJADOR 3			TRABAJADOR 4		
		SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
1		X											
2		X											
3		X											
4		X											
5		X											
6		X											
7		X											
8		X											
9		X											
10				X									

5. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (Marcar con un X según corresponda)

ITEM	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN	TRABAJADOR 1			TRABAJADOR 2			TRABAJADOR 3			TRABAJADOR 4		
		SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
1	Casco con barbiquejo de 3 puntos	X											
2	Botas de seguridad	X											
3	Gafas de seguridad	X											
4	Protección auditiva			X									
5	Protección respiratoria			X									
6	Protección facial			X									
7	Guantes, Tipo _____	X											
8	Ropa de trabajo (overol)	X											
9	Otros cuales?			X									

5. PERSONAL AUTORIZADO PARA EJECUTAR					
ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	FECHA DEL CERTIFICADO DE ALTURAS	FIRMA
TRABAJADOR 1					
TRABAJADOR 2					
TRABAJADOR 3					
TRABAJADOR 4					

6. AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO		
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD (Jefe Área)	NOMBRE	
	FIRMA	
	CEDULA	
	CARGO	
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD (Líder Tarea)	NOMBRE	
	FIRMA	
	CEDULA	
	CARGO	
	FECHA DEL CURSO	
RESPONSABLE DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIA	NOMBRE	
	FIRMA	
	CEDULA	
	CARGO	
DESIGNACIÓN DE ALTERNATIVO DE NOMBRE SEGURIDAD	NOMBRE	
	FIRMA	
	CEDULA	

NOTA: La autorización de este trabajo es personal e intransferible y cubre solo una jornada de trabajo. ☐
cambio de turno y/o personal RESPONSABLE DEL TRABAJO REQUIERE UNA NUEVA AUTORIZACIÓN

CONSORCIO INNOVAPARQUES

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

CODIGO: FT-SST-067
VERSION: 02
13/06/2024

NOMBRE DE LA EMPRESA O CONTRATISTA	PROYECTO - ÁREA	FECHA DE ELABORACIÓN
CONSORCIO INNOVAPERQUES	MANTENIMIENTO DE CAMPOS DEPORTIVOS	DESDE: 2/06/2025
ACTIVIDAD A REALIZAR		HASTAS: 6/06/2025
MANTENIMIENTO DE CAMPOS DEPORTIVOS NATURALES Y SINTETICOS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO 4041-2024		HORA INICO: 7:00 a. m.
		HORA FIN: 4:00 p. m.

Tareas de alto riesgo a realizar				
	Si X	Trabajo en alturas		
	No	Otro	Cual	

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS Marque con X según corresponda

Cinta Metrica	X	Pica		Cincel		Palas	X	Rodillo Manual	X
Nivel	X	Asadon		Puntero		Carretillas	X	Rastrillo	
Palas	X	Palin	X	Rodillo Manual		Picadora		Escobas	
Fumigadora Manual	X	Titan	X	Tolva	X			Dingo	
Minicargador		Giro zero	X	Otra	Cual:				

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Marque con X segun corresponda

Casco Dielectrico		Protección auditiva de inserción	X	Protector respiratorio desechable	X	Guantes de nitrilo	X	Guantes de caucho	X
Barbuquejo		Protección auditiva de Copa		Protector respiratorio con filtro		Guantes de baqueta	X	Botas punta de acero	X
Otro		Cual:							

ANALISIS DE TRABAJO COMUNICADO A (Personal involucrado en la tarea)

	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	CAMPOS MARIN DAVID CAMILO	1012433979	CAMILO	CAMILO	CAMILO	CAMILO	CAMILO	----------	----------
2	CARDENAS CARDENAS HILARIO	3028150	Hilario	Hilario	Hilario	Hilario	Hilario	----------	----------
3	CERQUERA VALDERRAMA JOSELITO	12209313	Joselito	Joselito	Joselito	Joselito	Joselito	----------	----------
4	FORERO ORTEGA JULIO CESAR	79380454	Julio	Julio	Julio	Julio	Julio	----------	----------
5	GARZON PINEDA JOSE ALEJANDRO	1033692776	Alejandro G	Alejandro G	Alejandro G	Alejandro G	Alejandro G	----------	----------
6	JIMENEZ LASSO WILBER DIOMEDES	5855002	Diomedes Jimenez	Diomedes J.	Diomedes J.	Diomedes J.	Diomedes J.	----------	----------
7	LOPEZ AYALA BRANDON SEBASTIAN	1233890527	Brandon	Brandon	Brandon	Brandon	Brandon	----------	----------
8	MERCADO BASILIO LUIS GUILLERMO	1007195407	Luis Mercado	Luis Mercado	Luis Mercado	Luis Mercado	Luis Mercado	----------	----------
9	MUÑOZ MACETO JESUS	1007289162	Jesus M	Jesus M	Jesus M.	Jesus M	Jesus M	----------	----------
10	OVALLE BOLIVAR YEFERSON IVAN	1074414778	Yeferson O	Yeferson O	Yeferson O	Yeferson O	Yeferson O	----------	----------
11	QUEVEDO LEGUIZAMON JHON ALEXANDER	1123116491	Julio	Julio	Julio	Julio	Julio	----------	----------
12	SABOGAL CUERVO DANIEL STEBAN	1031803879	Daniel S.	Daniel S.	Daniel S.	Daniel S.	Daniel S.	----------	----------
13	ORTIZ COIME ALVARO LEONEL	1087198177	Leonel O	Leonel O	Leonel O	Leonel O	Leonel O	----------	----------
14	RAMIREZ RUBIO JHON ALEXANDER	1033760239	Jhon Alexander	Jhon Alexander	Jhon Alexander	Jhon Alexander	Jhon Alexander	----------	----------
15	YATE PARRA ANGEL GABRIEL	1010014125	Angel Yate	—	—	—	—	----------	----------
16	JIMENEZ MONDRAGON JHON ANDRES	80863671	Jhon Andres J.	Jhon Andres J.	Jhon Andres J.	Jhon Andres J.	Jhon Andres J.	----------	----------
17	PARRA CRISTIAN CAMILO	10127524042	Cristian	Cristian	Cristian	Cristian	Cristian	----------	----------
18	CUBIDES GARZON LUIS CARLOS	1019005189	Luis C. Cubides	Luis C. Cubides	Luis C. Cubides	Luis C. Cubides	Luis C. Cubides	----------	----------
INSPECTOR SST:		1018422772						----------	----------
OFICIAL / ENCARGADO:		1031803879	Daniel S.	Daniel S.	Daniel S.	Daniel S.	Daniel S.	----------	----------

	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO		
Actividad	**Peligros Identificados**	**Consecuencias Potenciales**	**Controles Recomendados**
MANTENIMIENTOS RUTINARIO			
CAMPOS NATURALES			
CORTE DE CESPED	Proyección de objetos (piedras, palos, escombros)	Golpes, lesiones oculares, cortes	Uso de gafas de seguridad, casco, ropa de trabajo y guantes
	Contacto con cuchillas o partes móviles de maquinaria	Cortes, amputaciones, lesiones graves	Verificación previa de equipos, uso de protectores y bloqueos. Capacitación en operación segura de maquinaria
	Ruido generado por el equipo de corte	Pérdida auditiva a largo plazo	Uso de protectores auditivos (tapones o casco). Capacitación sobre riesgos del ruido y cuidado de la audición
	Vibración de maquinaria manual (guadañas, cortadoras)	Fatiga, lesiones por vibración (síndrome mano-brazo)	Pausas activas, uso de equipo antivibración y ergonomía
	Riesgo de caídas o resbalón en terrenos irregulares	Fracturas, esguinces o torceduras	Inspección de área, uso de calzado antideslizante. Capacitación en reconocimiento de terrenos y técnicas para caminar en zonas irregulares
	Emisión de gases de motores de combustión	Problemas respiratorios por inhalación	Uso de EPP (mascarillas), mantenimiento adecuado de maquinaria
	Fatiga por exposición prolongada al sol	Insolación, quemaduras solares, deshidratación	Uso de bloqueador solar, hidratación constante y descansos. Capacitación sobre prevención de riesgos asociados al calor. Capacitación de sustancias químicas
	Manejo inadecuado de combustible	Incendios, quemaduras	Almacenamiento seguro y manejo adecuado del combustible
PODA	Proyección de objetos (piedras, escombros, residuos)	Lesiones oculares, cortes, contusiones	Uso obligatorio de gafas de seguridad, guantes y ropa de trabajo. Capacitación para inspección previa y limpieza de los bordes antes de la poda
	Contacto con partes móviles de guadañas o cortadoras	Cortes, amputaciones	Realizar pre-operacional y verificación del equipo antes de usar. Capacitación en manejo seguro de guadañas y cortadoras
	Riesgo de tropezos o caídas en superficies irregulares	Torceduras, esguinces, caídas	Uso de calzado antideslizante con protección. Capacitación en reconocimiento y marcación de terrenos peligrosos
	Vibración prolongada de guadañas o podadoras manuales	Síndrome mano-brazo, fatiga muscular	Uso de EPP, realizar de pausas activas y rotación de tareas. Capacitación en posturas ergonómicas
	Ruido generado por la podadora	Pérdida auditiva a largo plazo	Usodo EPP (obligatorio de protectores auditivos). Capacitación en riesgos por exposición a ruido y cuidado auditivo
	Exposición prolongada al sol y el calor	Insolación, quemaduras solares, deshidratación	Uso de bloqueador solar, ropa de protección UV y sombrero. Hidratación frecuente y pausas en zonas de sombra. Capacitación sobre prevención de golpes de calor e insolación
	Emisión de gases de maquinaria	Problemas respiratorios por inhalación	Uso de EPP. Mantenimiento periódico de la maquinaria, realizar preoperacional de la maquinaria a utilizar
	Manipulación inadecuada de combustible	Incendios, quemaduras, derrames	Uso de contenedores aprobados para almacenamiento y transporte. Capacitación en manejo seguro de combustibles y protocolos de emergencias
	Falta de atención a líneas eléctricas o zonas peligrosas	Electrocución, lesiones graves	Identificar y marcar áreas con líneas eléctricas antes de la actividad. Capacitación sobre riesgos eléctricos en exteriores
DEMARCACIÓN	Contacto con pinturas y solventes químicos	Irritación de la piel, ojos o vías respiratorias	Uso de EPP: guantes de nitrilo, mascarilla con filtro y gafas de seguridad. Capacitación en manejo seguro de productos químicos
	Derrames de pintura en la vía	Contaminación del suelo, resbalones	Uso de recipientes con tapa para almacenamiento y transporte. Capacitación en técnicas para manejo y limpieza de derrames
	Exposición prolongada al sol y calor	Insolación, quemaduras solares, deshidratación	Uso de bloqueador solar, ropa con protección UV y sombrero. Descansos periódicos en sombra e hidratación constante. Capacitación sobre prevención de golpes de calor e insolación
	Manipulación de equipos de pintura (máquinas o rodillos)	Fatiga muscular, lesiones por movimientos repetitivos	Uso de herramientas ergonómicas. Capacitación en posturas adecuadas y pausas activas
	Inhalación prolongada de vapores de pintura, solventes	Mareos, dolores de cabeza, intoxicación respiratoria	Uso obligatorio de mascarillas con filtros adecuados. Realizar la actividad en áreas bien ventiladas. Capacitación en riesgos por exposición a químicos químicos
	Riesgo de caídas o resbalones en superficies humedas	Fracturas, esguinces, lesiones	Uso de calzado antideslizante. Capacitación en identificación de superficies resbalosas y buenas prácticas de trabajo
	Uso de maquinaria pintadoras automáticas/semiautomáticas	Golpes, atrapamientos, cortes	Inspección previa de maquinaria y equipos. Capacitación en operación segura y mantenimiento de equipos de pintura/señalización
	Falta de señalización durante la actividad	Riesgo de interferencias con otras personas	Delimitar el área de trabajo con conos o cinta de seguridad. Capacitación en señalización temporal de áreas de trabajo
PODA DE ZONA VERDE	Proyección de objetos (piedras, ramas, residuos)	Lesiones oculares, golpes, cortes	Uso obligatorio de gafas de seguridad, casco y guantes resistentes. Inspección previa para retiro de objetos. Capacitación en identificación de riesgos en el entorno
	Contacto con cuchillas o partes móviles de herramientas	Cortes, amputaciones, lesiones graves	Verificación y mantenimiento periódico de herramientas y equipos cortadores. Capacitación en operación segura de guadañas y herramientas de corte
	Caídas o resbalones en terrenos irregulares	Fracturas, torceduras, esguinces	Uso de EPP, calzado antideslizante con punta reforzada. Marcación de terrenos irregulares o con desniveles. Capacitación en desplazamiento seguro en zonas irregulares
	Vibración prolongada de equipos manuales	Fatiga, síndrome mano-brazo, lesiones musculares	Escalonamiento de pausas activas y rotación de tareas. Capacitación en ergonomía y posturas correctas
	Ruido generado por guadañas o cortadoras	Pérdida auditiva a largo plazo	Uso obligatorio de protección auditiva (tapones o cascos). Capacitación sobre riesgos de exposición a ruido y cuidado auditivo

	Exposicion prolongada al sol y calor	Insolación, quemaduras solares, deshidratación	Uso de bloqueador solar, sombrero y ropa con protección UV. Pausas en zonas de sombra e hidratación constante. Capacitacion en prevención de lesiones por calor e insolacion
	Emision de gases de maquinaria	Problemas respiratorios, mareos	Uso de mascarillas filtrantes y mantenimiento de maquinaria para reducir emisiones.
	Riesgo de caida de ramas o árboles pequeños	Golpes, contusiones, heridas	Evaluación previa del estado de árboles y ramas. Uso de EPP. Capacitación en inspección y poda segura de zonas verdes.
	Manipulacion de combustible (para herramientas)	Incendios, quemaduras, derrames	Capacitación en almacenamiento, transporte y protocolos de emergencia ante derrames.
	Fatiga fisica por movimientos repetitivos y sobreesfuerzo	Dolores musculares, lesiones por esfuerzo	Rotacion de tareas y pausas activas. Capacitación en técnicas de trabajo seguro y prevención de fatiga.
CAMPOS SINTETICOS			
CEPILLADO DEL CAMPO	Atropellamiento por el minitractor o giro cero	Lesiones graves, fracturas o fatalidades	Capacitación en operación segura de minitractores y giro cero, inspección y delimitación del área de trabajo. Uso de señalización adecuada para restringir el acceso a terceros.
	Golpes por partes móviles del cepillo	Contusiones, atrapamientos, cortes	Capacitación en manejo seguro y procedimientos de parada de emergencia. Uso de EPP: guantes resistentes y gafas de seguridad.
	Caidas desde el minitractor	Fracturas, contusiones	Prohibición de subir o bajar con el equipo en movimiento. Capacitación en normas de seguridad al operar maquinaria.
	Proyección de objetos (caucho, residuos sintéticos)	Lesiones oculares, golpes	Inspección y limpieza previa del área de trabajo. Uso de gafas de seguridad y resa de trabajo adecuada. Capacitación sobre identificación y control de riesgos.
	Vuelco del minitractor o giro cero	Lesiones graves, atrapamiento	Inspección del terreno y prohibición de maniobras bruscas en pendientes. Capacitación sobre estabilidad del equipo y técnicas de conducción segura.
	Vibración prolongada del equipo	Fatiga, síndrome mano-brazo, lesiones musculares	Establecimiento de pausas activas y rotación de tareas. Capacitación en ergonomía y técnicas de manejo seguro.
	Ruido producido por el motor del equipo	Pérdida auditiva progresiva	Uso obligatorio de protección auditiva (tapones o cascos auditivos). Capacitación en riesgos por exposición a ruido. Uso de mascarillas con filtro adecuado.
	Inhalación de polvo o particulas de caucho sintético	Problemas respiratorios, irritación	Humidificación previa del área para reducir polvo en suspensión. Capacitación en prevención de riesgos respiratorios.
	Fatiga por jornadas prolongadas	Disminución de reflejos, errores operativos	Programación de pausas activas durante la jornada. Capacitación sobre técnicas de prevención de fatiga y hábitos saludables.
	Manejo de combustible o mantenimiento incorrecto	Incendios, derrames, contaminación ambiental	Uso seguro de contenedores para almacenamiento y recarga. Capacitación en manejo seguro de combustibles y respuesta a emergencias. Mantenimiento preventivo del equipo.
MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE MALLA DE CERRAMIENTO DEPORTIVO	Caidas desde alturas Colapso del andamio Deslizamiento o tropiezos Caida de herramientas o materiales Contacto con estructuras eléctricas cercanas Posturas inadecuadas Falta de uso de elementos de protección personal (EPP) Condiciones climáticas adversas Exposición a polvo y particulas Exposición a ruido	Fracturas, traumatismos o muerte por caidas.Lesiones leves a graves, como esguinces, fracturas o traumatismos. Dolores musculares, lesiones de espalda, fatiga, trastornos musculo-esqueléticos. Problemas respiratorios, irritación ocular, alergias. Irritación de las vías respiratorias, mareos, cefaleas, alergias respiratorias ,irritación cutánea, dermatitis, irritación ocular o reacciones alérgicas. Pérdida auditiva temporal o permanente, fatiga auditiva. Irritación por contacto en la piel Caida de la estructura del andamio o daño en la malla.	Realizar una evaluación de riesgos antes de iniciar. Asegurarse de que los trabajadores cuenten con certificacion en trabajos en alturas. Uso de andamios certificados y revisados antes de su uso. Inspeccion de andamio Inspeccion de Arnés de seguridad con sistema de anclaje. Uso de EPPCasco, guantes, botas antideslizantes y gafas de seguridad. Colocar señales de advertencia y evitar el acceso de personas no autorizadas Suspender trabajos en caso de viento fuerte, lluvia o cualquier condición que afecte la estabilidad. Asegurar que los trabajadores tengan formación vigente en trabajos en alturas. Contar con un permiso de trabajo en alturas y procedimientos claros. Revisar el equipo y los andamios antes y durante el trabajo.

CONSORCIO INNOVAPARQUES

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

CODIGO: FT-SST-067
VERSION: 02
13/08/2024

NOMBRE DE LA EMPRESA O CONTRATISTA	PROYECTO - ÁREA	FECHA DE ELABORACIÓN	
CONSORCIO INNOVAPERQUES	MANTENIMIENTO DE CAMPOS DEPORTIVOS	DESDE:	9/06/2025
ACTIVIDAD A REALIZAR		HASTAS:	13/06/2025
MANTENIMIENTO DE CAMPOS DEPORTIVOS NATURALES Y SINTETICOS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO 4041-2024		HORA INICO:	7:00 a. m.
		HORA FIN:	4:00 p. m.

Tareas de alto riesgo a realizar	Si	X	Trabajo en alturas		
	No		Otro	Cual	

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS Marque con X según corresponda

Cinta Metrica	X	Pica		Cincel		Palas	Rodillo Manual X
Nivel	X	Asadon		Puntero		Carretillas X	Rastrillo
Palas	X	Palin		Rodillo Manual		Picadora	Escobas
Fumigadora Manual	X	Titan	X	Tolva			Dingo
Minicargador		Giro zero	X	Otra	Cual:		

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Marque con X según corresponda

Casco Dielectrico		Protección auditiva de inserción	X	Protector respiratorio desechable	X	Guantes de nitrilo X	Guantes de caucho X
Barbuquejo		Protección auditiva de Copa		Protector respiratorio con filtro		Guantes de bagacilo	Botas punta de acero X
Otro		Cual:					

ANALISIS DE TRABAJO COMUNICADO A (Personal involucrado en la tarea)

	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	CAMPOS MARIN DAVID CAMILO	1012433979							
2	CARDENAS CARDENAS HILARIO	3028150							
3	CERQUERA VALDERRAMA JOSELITO	12200313							
4	FORERO ORTEGA JULIO CESAR	79380454							
5	GARZON PINEDA JOSE ALEJANDRO	1033092770							
6	JIMENEZ LASSO WILBER DIOMEDES	5855002							
7	LOPEZ AYALA BRANDON SEBASTIAN	1233890527							
8	MERCADO BASILIO LUIS GUILLERMO	1007195407							
9	MUÑOZ MACETO JESUS	1007289162							
10	OVALLE BOLIVAR YEFERSON IVAN	1074414778							
11	QUEVEDO LEGUIZAMON JHON ALEXANDER	1123116491							
12	SABOGAL CUERVO DANIEL STEBAN	1031803879							
13	ORTIZ COIME ALVARO LEONEL	1087198177							
14	RAMIREZ RUBIO JHON ALEXANDER	1033760239							
15	JIMENEZ MONDRAGON JHON ANDRES	80863671							
16	PARRA CRISTIAN CAMILO	10127524042							
17	CUBIDES GARZON LUIS CARLOS	1019005189							
18									
INSPECTOR SST:		1018422772							
OFICIAL / ENCARGADO:		3879							

FUNDACIÓN MINTRABAQUES	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	CÓDIGO: FT-SST-007	VERSIÓN: 01 14/01/2024

Actividad	Peligros Identificados	Consecuencias Potenciales	Controles Recomendados
MANTENIMIENTOS RUTINARIO			
CAMPOS NATURALES			
CORTE DE CESPED	Proyección de objetos (piedras, palos, escombros)	Golpes, lesiones oculares, cortes	Uso de gafas de seguridad, botas, ropa de trabajo y guantes
	Contacto con cuchillas o partes móviles de maquinaria	Cortes, amputaciones, lesiones graves	Verificación previa de equipos, uso de protectores y resguardos.Capacitación en operación segura de maquinaria
	Ruido generado por el equipo de corte	Pérdida auditiva a largo plazo	Uso de protectores auditivos (tapones o cascos). Capacitación sobre riesgos del ruido y cuidado de la audición
	Vibración de maquinaria manual (guadañas, cortacésped)	Fatiga, lesiones por vibración (síndrome mano-brazo)	Pausas activas, uso de equipo antivibración y ergonomía
	Riesgo de caída o resbalón en terrenos irregulares	Fracturas, esguinces o torceduras	Inspección del área, uso de calzado antideslizante. Capacitación en reconocimiento de terrenos y técnicas para caminar en zonas irregulares
	Emisión de gases de motores de combustión	Problemas respiratorios por inhalación	Uso de EPP (mascarillas), mantenimiento adecuado de maquinaria
	Fatiga por exposición prolongada al sol	Insolación, quemaduras solares, deshidratación	Uso de bloqueador solar, hidratación constante y descansos.Capacitación sobre prevención de riesgos asociados al calor. Capacitación de sustancias químicas
	Manejo inadecuado de combustible	Incendios, quemaduras	Almacenamiento seguro y manejo adecuado del combustible
PODA	Proyección de objetos (piedras, escombros, residuos)	Lesiones oculares, cortes, contusiones	Uso obligatorio de gafas de seguridad, guantes y ropa de trabajo. Capacitación para inspección previa y limpieza de los bordes antes de la poda
	Contacto con partes móviles de guadañas o cortadoras	Cortes, amputaciones	Realizar preoperacional y verificación del equipo antes de usar. Capacitación en manejo seguro de guadañas y cortadoras
	Riesgo de tropiezos o caídas en superficies irregulares	Torceduras, esguinces, caídas	Uso de calzado antideslizante con protección. Capacitación en reconocimiento y marcación de terrenos peligrosos
	Vibración prolongada de guadañas o podadora manual	Síndrome mano-brazo, fatiga muscular	Uso delEPP,realizar de pausas activas y rotación de tareas. Capacitación en posturas ergonómicas
	Ruido generado por la bordeadora	Pérdida auditiva a largo plazo	Usode EPP (obligatorio de protectores auditivos) . Capacitación en riesgos por exposición a ruido y cuidado auditivo
	Exposición prolongada al sol y al calor	Insolación, quemaduras solares, deshidratación	Uso de bloqueador solar, ropa de protección UV y sombrero. Hidratación frecuente y pausas en zonas de sombra. Capacitación sobre prevención de golpes de calor e insolación
	Emisión de gases de maquinaria	Problemas respiratorios por inhalación	Uso de EPP. Mantenimiento periódico de la maquinaria, realizar preoperacional de la maquinaria a usar
	Manipulación inadecuado de combustible	Incendios, quemaduras, derrames	Uso de contenedores aprobados para almacenamiento y transporte.Capacitación en manejo seguro de combustibles y protocolos de emergencias
	Falta de detección a líneas eléctricas o postes cercanos	Electrocución, lesiones graves	Identificar y marcar áreas con líneas eléctricas antes de la actividad.Capacitación sobre riesgos eléctricos en exteriores
DEMARCACIÓN	Contacto con pintura y solventes químicos	Irritación de la piel, ojos o vías respiratorias	Uso de EPP, guantes de nitrilo, mascarilla con filtro y gafas de seguridad.Capacitación en manejo seguro de productos químicos
	Derrames de pintura o solventes	Contaminación del suelo, resbalones	Uso de recipientes con tapa para almacenamiento y transporte.Capacitación en técnicas para manejo y limpieza de derrames
	Exposición prolongada al sol y calor	Insolación, quemaduras solares, deshidratación	Uso de bloqueador solar, ropa con protección UV y sombrero. Descansos periódicos en sombra e hidratación constante. Capacitación sobre prevención de golpes de calor e insolación
	Manipulación de equipos de pintura (manuales o rodillos)	Fatiga muscular, lesiones por movimientos repetitivos	Uso de herramientas ergonómicas. Capacitación en posturas adecuadas y pausas activas
	Inhalación prolongada de vapores de pintura o solventes	Mareos, dolores de cabeza, afectación respiratoria	Uso obligatorio de mascarillas con filtros adecuados. Realizar la actividad en áreas bien ventiladas. Capacitación en riesgos por exposición a vapores químicos
	Riesgo de caídas o resbalones en superficies humedas	Fracturas, esguinces, lesiones	Uso de calzado antideslizante, Capacitación en identificación de superficies peligrosas y buenas prácticas de trabajo
	Uso de maquinaria (pintadoras automáticas/manuales)	Golpes, atrapamientos, cortes	Inspección previa de maquinaria y equipos. Capacitación en operación segura y mantenimiento de equipos de demarcación
	Falta de señalización durante la actividad	Riesgo de interferencia con otras personas	Delimitar el área de trabajo con cintas o conos de seguridad. Capacitación en señalización temporal de áreas de trabajo
PODA DE ZONA VERDE	Proyección de objetos (piedras, ramas, escombros)	Lesiones oculares, golpes, cortes	Uso obligatorio de gafas de seguridad, casco y guantes resistentes. Inspección previa para retiro de objetos. Capacitación en identificación de riesgos en el terreno
	Contacto con cuchillas o partes móviles de herramientas	Cortes, amputaciones, lesiones graves	Verificación y mantenimiento periódico de herramientas y equipos (cortadoras). Capacitación en operación segura de guadañas y herramientas de corte
	Caídas o resbalones en terrenos irregulares	Fracturas, torceduras, esguinces	Uso de EPP (calzado antideslizante con punta reforzada). Marcación de terrenos irregulares o con desniveles. Capacitación en desplazamiento seguro en zonas irregulares
	Vibración prolongada de equipos manuales	Fatiga, síndrome mano-brazo, lesiones musculares	Establecimiento de pausas activas y rotación de tareas. Capacitación en ergonomía y posturas correctas
	Ruido generado por guadañas o cortadoras	Pérdida auditiva a largo plazo	Uso obligatorio de protección auditiva (tapones o cascos). Capacitación sobre riesgos de exposición a ruido y cuidado auditivo

	Exposición prolongada al sol y calor	Insolación, quemaduras solares, deshidratación	Uso de bloqueador solar, sombrero y ropa con protección UV. Pausas en zonas de sombra e hidratación constante. Capacitación en prevención de golpes de calor e insolación.
	Emisión de gases de maquinaria	Problemas respiratorios, mareos	Uso de mascarillas filtrantes y mantenimiento de maquinaria para reducir emisiones.
	Riesgo de caída de ramas o árboles pequeños	Golpes, contusiones, heridas	Evaluación previa del estado de árboles y ramas. Uso de EPP. Capacitación en inspección y poda segura de zonas verdes.
	Manipulación de combustible (para herramientas)	Incendios, quemaduras, derrames	Capacitación en almacenamiento, transporte y protocolos de emergencia ante derrames.
	Fatiga física por movimientos repetitivos y sobreesfuerzo	Dolores musculares, lesiones por esfuerzo	Rotación de tareas y pausas activas.Capacitación en técnicas de trabajo seguro y prevención de fatiga.
CAMPOS SINTETICOS			
CEPILLADO DEL CAMPO	**Atropellamiento por el minitractor o giro cero**	Lesiones graves, fracturas o fatalidades	Capacitación en operación segura de minitractores y giro cero. Inspección y delimitación del área de trabajo. Uso de señalización adecuada para restringir el acceso a terceros.
	Golpes por partes móviles del cepillo	Contusiones, atrapamientos, cortes	Capacitación en manejo seguro y procedimientos de parada de emergencia. Uso de EPP: guantes resistentes y botas de seguridad.
	Caídas desde el minitractor	Fracturas, contusiones	Prohibición de subir o bajar con el equipo en movimiento. Capacitación en normas de seguridad al operar maquinaria.
	Proyección de objetos (caucho, residuos sintéticos)	Lesiones oculares, golpes	Inspección y limpieza previa del área de trabajo. Uso de gafas de seguridad y ropa de trabajo adecuada. Capacitación sobre identificación y control de riesgos.
	Vuelco del minitractor o giro cero	Lesiones graves, atrapamiento	Inspección del terreno y prohibición de maniobras bruscas en pendientes. Capacitación sobre estabilidad del equipo y técnicas de conducción segura.
	Vibración prolongada del equipo	Fatiga, síndrome mano-brazo, lesiones musculares	Establecimiento de pausas activas y rotación de tareas. Capacitación en ergonomía y técnicas de manejo seguro.
	Ruido producido por el motor del equipo	Pérdida auditiva progresiva	Uso obligatorio de protección auditiva (tapones o cascos auditivos). Capacitación en riesgos por exposición a ruido. Uso de mascarillas con filtro adecuado.
	Inhalación de polvo o partículas de caucho sintético	Problemas respiratorios, irritación	Humedificación previa del área para reducir polvo en suspensión. Capacitación en prevención de riesgos respiratorios.
	Fatiga por jornadas prolongadas	Disminución de reflejos, errores operativos	Programación de pausas activas durante la jornada. Capacitación sobre técnicas de prevención de fatiga y hábitos saludables.
	Manejo de combustible o mantenimiento incorrecto	Incendios, derrames, contaminación ambiental	Uso seguro de contenedores para almacenamiento y recarga. Capacitación en manejo seguro de combustibles y respuesta a emergencias. Mantenimiento preventivo del equipo.
MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE MALLA DE CERRAMIENTO DEPORTIVO	Caídas desde alturas Colapso del andamio Desplazamiento o tropiezos **Caída de herramientas o materiales** Contacto con estructuras eléctricas cercanas Posturas inadecuadas **Falta de uso de elementos de protección personal (EPP)** **Condiciones climáticas adversas** **Exposición a polvo y partículas** **Exposición a ruido**	Fracturas, traumatismos o muerte por caídas,Lesiones leves a graves, como esguinces, fracturas o traumatismos. Dolores musculares, lesiones de espalda, fatiga, trastornos musculoesqueléticos. Problemas respiratorios, irritación ocular, alergias. Irritación de las vías respiratorias, mareos, cefaleas, alergias respiratorias ,irritación cutánea, dermatitis, irritación ocular o reacciones alérgicas. Pérdida auditiva temporal o permanente, fatiga auditiva. Irritación por contacto en la piel Caída de la estructura del andamio o daño en la malla.	Realizar una evaluación de riesgos antes de iniciar. Asegurarse de que los trabajadores cuenten con certificación en trabajos en alturas. Uso de andamios certificados y revisados antes de su uso. Inspección de andamio Inspección de Arnés de seguridad con sistema de anclaje. Uso de EPPCasco, guantes, botas antideslizantes y gafas de seguridad. Colocar señales de advertencia y evitar el acceso de personas no autorizadas. Suspender trabajos en caso de viento fuerte, lluvia o cualquier condición que afecte la estabilidad. Asegurar que los trabajadores tengan formación vigente en trabajos en alturas. Contar con un permiso de trabajo en alturas y procedimientos claros. Revisar el equipo y los andamios antes y durante el trabajo.

CONSORCIO INNOVAPARQUES	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	CODIGO: FT-SST-087 VERSION: 02' 13/08/2024
NOMBRE DE LA EMPRESA O CONTRATISTA	PROYECTO - ÁREA	FECHA DE ELABORACIÓN
CONSORCIO INNOVAPERQUES	MANTENIMIENTO DE CAMPOS DEPORTIVOS	DESDE: 24/06/2025
ACTIVIDAD A REALIZAR		HASTAS: 28/06/2025
MANTENIMIENTO DE CAMPOS DEPORTIVOS NATURALES Y SINTETICOS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO 4041-2024		HORA INICO: 7:00 a. m. HORA FIN: 4:00 p. m.

Tareas de alto riesgo a realizar	Si	Trabajo en alturas		
	No	Otro	Cual	

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS Marque con X segun corresponda

Cinta Metrica	X	Pica		Cincel		Palas		Rodillo Manual	X
Nivel		Asadon		Puntero		Carretillas	X	Rastrillo	
Palas	X	Palin	X	Rodillo Manual		Picadora		Escobas	
Fumigadora Manual		Titan		Tolva	X			Dingo	
Minicargador		Giro zero	X	Otra	Cual:				

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Marque con X según corresponda

Casco Dielectrico	Protección auditiva de inserción	Protector respiratorio desechable	Guantes de nitrilo	Guantes de caucho	
Barbuquejo	Protección auditiva de Copa	Protector respiratorio con filtro	Guantes de baqueta	Botas punta de acero	
Otro	Cual:				

ANALISIS DE TRABAJO COMUNICADO A (Personal involucrado en la tarea)

	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	CAMPOS MARIN DAVID CAMILO	1012433979	—	CAMILO	CAMILO	CAMILO	CAMILO	----	----
2	CARDENAS CARDENAS HILARIO	3028150	—	Hilario	Hilario	Hilario	Hilario	----	----
3	CERQUERA VALDERRAMA JOSELITO	12209313	—	Joselito	Joselito	Joselito	Joselito	----	----
4	FORERO ORTEGA JULIO CESAR	79380454	—					----	----
5	GARZON PINEDA JOSE ALEJANDRO	1033692776	—					----	----
6	JIMENEZ LASSO WILBER DIOMEDES	5855002	—	Alejandro	Alejandro	Alejandro	Alejandro	----	----
7	LOPEZ AYALA BRANDON SEBASTIAN	1233890527	—					----	----
8	MERCADO BASILIO LUIS GUILLERMO	1007195407	—	Luis Mercado	Luis Mercado	Luis Mercado	Luis Mercado	----	----
9	MUÑOZ MACETO JESUS	1007289162	—	Jesus M	Jesus M	Jesus M	Jesus M	----	----
10	OVALLE BOLIVAR YEFERSON IVAN	1074414778	—	Yeferson	Yeferson	Yeferson	Yeferson	----	----
11	QUEVEDO LEGUIZAMON JHON ALEXANDER	1123116491	—					----	----
12	SABOGAL CUERVO DANIEL STEBAN	1031803879	—					----	----
13	ORTIZ COIME ALVARO LEONEL	1087198177	—	Leonel.	Leonel.	Leonel.	Leonel.	----	----
14	RAMIREZ RUBIO JHON ALEXANDER	1033760239	—					----	----
15	JIMENEZ MONDRAGON JHON ANDRES	80863671	—					----	----
16	PARRA CRISTIAN CAMILO	1012752404 2	—	Cristian	Cristian	Cristian	Cristian	----	----
17	CUBIDES GARZON LUIS CARLOS	1019005189	—	Luis Cubides	Luis Cubides	Luis Cubides	Luis Cubides	----	----
18								----	----
INSPECTOR SST:		1018422772						----	----
OFICIAL / ENCARGADO:		1031803879	—					----	----

	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO		
Actividad	**Peligros Identificados**	**Consecuencias Potenciales**	**Controles Recomendados**
MANTENIMIENTOS RUTINARIO			
CAMPOS NATURALES			
CORTE DE CESPED	Proyección de objetos (piedras, palos, escombros)	Golpes, lesiones oculares, cortes	Uso de gafas de seguridad, casco, ropa de trabajo y guantes
	Contacto con cuchillas o partes móviles de maquinaria	Cortes, amputaciones, lesiones graves	Verificación previa de equipos, uso de protectores y protectores. Capacitación en operación segura de maquinaria
	Ruido generado por el equipo de corte	Pérdida auditiva a largo plazo	Uso de protectores auditivos (tapones o casco). Capacitación sobre riesgos del ruido y cuidado de la audición
	Vibración de maquinaria manual (guadañas, cortadoras)	Fatiga, lesiones por vibración (síndrome mano-brazo)	Pausas activas. Uso de equipo antivibración y ergonomía
	Riesgo de caída o resbalón en terrenos irregulares	Fracturas, esguinces o torceduras	Inspección del área, uso de calzado antideslizante. Capacitación en reconocimiento de terrenos y técnicas para caminar en zonas irregulares
	Emisión de gases de motores de combustión	Problemas respiratorios por inhalación	Uso de EPP (mascarillas), mantenimiento adecuado de maquinaria
	Fatiga por exposición prolongada al sol	Insolación, quemaduras solares, deshidratación	Uso de bloqueador solar, hidratación constante y descansos. Capacitación sobre prevención de riesgos asociados al calor. Capacitación de sustancias químicas
	Manejo inadecuado de combustible	Incendios, quemaduras	Almacenamiento seguro y manejo adecuado del combustible
PODA	Proyección de objetos (piedras, escombros, residuos)	Lesiones oculares, cortes, contusiones	Uso obligatorio de gafas de seguridad, guantes y ropa de trabajo. Capacitación para inspección previa y limpieza de los alrededores de la poda
	Contacto con partes móviles de guadañas o cortadoras	Cortes, amputaciones	Realizar preoperacionales y verificación del equipo antes de usar. Capacitación en manejo seguro de guadañas y cortadoras
	Riesgo de tropezos o caídas en superficies irregulares	Torceduras, esguinces, caídas	Uso de calzado antideslizante con protección. Capacitación en reconocimiento y marcación de terrenos peligrosos
	Vibración prolongada de guadañas o podadoras manuales	Síndrome mano-brazo, fatiga muscular	Uso de EPP, realizar pausas activas y rotación de tareas. Capacitación en posturas ergonómicas
	Ruido generado por la podadora	Pérdida auditiva a largo plazo	Uso de EPP (obligatorio de protectores auditivos). Capacitación en riesgos por exposición a ruido y cuidado auditivo
	Exposición prolongada al sol y al calor	Insolación, quemaduras, golpes de calor, deshidratación	Uso de bloqueador solar, ropa de protección UV y sombrero. Hidratación frecuente y pausas en áreas de sombra. Capacitación sobre prevención de golpes de calor e insolación
	Emisión de gases de maquinaria	Problemas respiratorios por inhalación	Uso de EPP. Mantenimiento periódico de la maquinaria, realizar preoperacional de la maquinaria a utilizar
	Manipulación inadecuada de combustible	Incendios, quemaduras, derrames	Uso de contenedores aprobados para almacenamiento y transporte. Capacitación en manejo seguro de combustibles y protocolos de emergencias
	Caída de objetos (ramas, troncos)	Golpes, contusiones, lesiones graves	Identificar y mapear áreas con ramas elevadas antes de la actividad. Capacitación sobre riesgos eléctricos en cableados
DEMARCACIÓN	Contacto con pintura y solventes químicos	Irritación de la piel, ojos o vías respiratorias	Uso de EPP: guantes de nitrilo, mascarilla con filtro y gafas de seguridad. Capacitación en manejo seguro de productos químicos
	Derrame de pintura o solventes	Contaminación del suelo e intoxicación	Uso de recipientes con tapa para almacenamiento y transporte. Capacitación en técnicas para limpieza y limpieza de derrames
	Exposición prolongada al sol y calor	Insolación, quemaduras solares, deshidratación	Uso de bloqueador solar, ropa con protección UV y sombrero. Descansos periódicos en sombra e hidratación constante. Capacitación sobre prevención de golpes de calor e insolación
	Manipulación de equipos de pintura (máquinas o rodillos)	Fatiga muscular, lesiones por movimientos repetitivos	Uso de herramientas ergonómicas. Capacitación en posturas adecuadas y pausas activas
	Inhalación prolongada de vapores de pintura o solventes	Mareos, dolores de cabeza, afectación respiratoria	Uso obligatorio de mascarillas con filtros adecuados. Realizar la actividad en áreas bien ventiladas. Capacitación en riesgos por vapores químicos
	Riesgo de caídas o resbalones en superficies húmedas	Fracturas, esguinces, lesiones	Uso de calzado antideslizante. Capacitación en identificación de superficies peligrosas y buenas prácticas de marcado
	Uso de maquinaria (pintadoras automáticas/manuales)	Golpes, atrapamientos, cortes	Inspección previa de maquinaria y equipos. Capacitación en correcto uso y mantenimiento de equipos de demarcación
	Falta de señalización durante la actividad	Riesgo de atropellamiento con otros vehículos	Delimitar el área de trabajo con conos de seguridad. Capacitación en señalización temporal de áreas de trabajo
PODA DE ZONA VERDE	Proyección de objetos (ramas, troncos)	Lesiones oculares, golpes, cortes	Uso obligatorio de gafas de seguridad, casco y guantes resistentes. Inspección previa para retiro de objetos. Capacitación en identificación de riesgos en el terreno
	Contacto con cuchillas o partes móviles de herramientas	Cortes, amputaciones, lesiones graves	Verificación y mantenimiento periódico de herramientas y equipos (cortadoras). Capacitación en operación segura de guadañas y herramientas de corte
	Caídas o tropezones en terrenos irregulares	Fracturas, torceduras, esguinces	Uso de EPP (calzado antideslizante con punta reforzada). Marcación de terrenos irregulares o con desniveles. Capacitación en desplazamiento seguro en zonas irregulares
	Vibración prolongada de equipos manuales	Fatiga, síndrome mano-brazo, lesiones musculares	Establecimiento de pausas activas y rotación de tareas. Capacitación en ergonomía y posturas correctas
	Ruido generado por guadañas o cortadoras	Pérdida auditiva a largo plazo	Uso obligatorio de protección auditiva (tapones o cascos). Capacitación sobre riesgos de exposición a ruido y cuidado auditivo

	Exposición prolongada al sol y calor	Insolación, quemaduras solares, deshidratación	Uso de bloqueador solar, sombrero y ropa con protección UV. Pausas en zonas de sombra e hidratación constante. Capacitación en prevención de golpes de calor e insolación
	Emisión de gases de maquinaria	Problemas respiratorios, mareos	Uso de mascarillas filtrantes y mantenimiento de maquinaria para reducir emisiones
	Riesgo de caída de ramas o árboles sacudidos	[illegible]	Evaluación previa del estado de árboles y ramas. Uso de EPP. Capacitación en inspección y poda segura de zonas verdes.
	Manipulación de combustible (para herramientas)	Incendios, quemaduras, derrames	Capacitación en almacenamiento, transporte y protocolos de emergencia ante derrames.
	Fatiga física por movimientos repetitivos y sobreesfuerzo	Dolores musculares, lesiones por esfuerzo	Rotación de tareas y pausas activas.Capacitación en técnicas de trabajo seguro y prevención de fatiga
CAMPOS SINTETICOS			
CEPILLADO DEL CAMPO	**Atropellamiento por el minitractor o giro cero**	Lesiones graves, fracturas o fatalidades	Capacitación en operación segura de minitractores y giro-cero, inspección y delimitación de área de trabajo. Uso de señalización adecuada para restringir el acceso a terceros.
	Golpes por partes móviles del cepillo	Contusiones, atrapamientos, cortes	Capacitación en manejo seguro y procedimientos de parada de emergencia. Uso de EPP: guantes resistentes y botas de seguridad.
	Caídas desde el minitractor	Fracturas, contusiones	Prohibición de subir o bajar con el equipo en movimiento. Capacitación en normas de seguridad al operar maquinaria.
	Proyección de objetos (caucho, residuos sintéticos)	Lesiones oculares, golpes	Inspección y limpieza previa del área de trabajo. Uso de gafas de seguridad y ropa de trabajo adecuada. Capacitación sobre identificación y control de riesgos.
	Vuelco del minitractor o giro cero	Lesiones graves, atrapamiento	Inspección del terreno y prohibición de maniobras bruscas en pendientes. Capacitación sobre estabilidad del equipo y técnicas de conducción segura.
	Vibración prolongada del equipo	Fatiga, síndrome mano-brazo, lesiones musculares	Establecimiento de pausas activas y rotación de tareas. Capacitación en ergonomía y técnicas de manejo seguro.
	Ruido producido por el motor del equipo	Pérdida auditiva progresiva	Uso obligatorio de protección auditiva (tapones o cascos auditivos). Capacitación en riesgos por exposición a ruido. Uso de mascarillas con filtro adecuado.
	Inhalación de polvo o partículas de caucho sintético	Problemas respiratorios, irritación	Humidificación previa del área para reducir polvo en suspensión. Capacitación en prevención de riesgos respiratorios
	Fatiga por jornadas prolongadas	Disminución de reflejos, errores operativos	Programación de pausas activas durante la jornada. Capacitación sobre técnicas de prevención de fatiga y hábitos saludables.
	Manejo de combustible o mantenimiento incorrecto	Incendios, derrames, contaminación ambiental	Uso seguro de contenedores para almacenamiento y recarga. Capacitación en manejo seguro de combustibles y respuesta a emergencias. Mantenimiento preventivo del equipo.
MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE MALLA DE CERRAMIENTO DEPORTIVO	**Caídas desde alturas** **Colapso del andamio** **Desfallecimiento o tropiezos** **Caída de herramientas o materiales** **Contacto con estructuras eléctricas cercanas** **Posturas inadecuadas** **Falta de uso de elementos de protección personal (EPP)** **Condiciones climáticas adversas** **Exposición a polvo y partículas** **Exposición a ruido**	Fracturas, traumatismos o muerte por caídas,Lesiones leves a graves, como esguinces, fracturas o traumatismos. Dolores musculares, lesiones de espalda, fatiga, trastornos musculoesqueléticos. Problemas respiratorios, irritación ocular, alergias. Irritación de las vías respiratorias, mareos, cefaleas, alergias respiratorias ,irritación cutánea, dermatitis, irritación ocular o reacciones alérgicas. Pérdida auditiva temporal o permanente, fatiga auditiva. Irritación por contacto en la piel Caída de la estructura del andamio o daño en la malla.	Realizar una evaluación de riesgos antes de iniciar. Asegurarse de que los trabajadores cuenten con certificación en trabajos en alturas. Uso de andamios certificados y revisados antes de su uso. Inspección de andamio Inspección de Arnés de seguridad con sistema de anclaje. Uso de EPPCasco, guantes, botas antideslizantes y gafas de seguridad. Colocar señales de advertencia y evitar el acceso de personas no autorizadas Suspender trabajos en caso de viento fuerte, lluvia o cualquier condición que afecte la estabilidad. Asegurar que los trabajadores tengan formación vigente en trabajos en alturas. Contar con un permiso de trabajo en alturas y procedimientos claros. Revisar el equipo y los andamios antes y durante el trabajo.

CONSORCIO INNOVAPARQUES	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	CODIGO: FT-SST-097 VERSION: 02 13/08/2024
NOMBRE DE LA EMPRESA O CONTRATISTA	PROYECTO - ÁREA	FECHA DE ELABORACIÓN
CONSORCIO INNOVAPERQUES	MANTENIMIENTO DE CAMPOS DEPORTIVOS	DESDE: 16/06/2025
ACTIVIDAD A REALIZAR		HASTAS: 20/06/2025
MANTENIMIENTO DE CAMPOS DEPORTIVOS NATURALES Y SINTETICOS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO 4041-2024		HORA INICO: 7:00 a. m. HORA FIN: 4:00 p. m.

Tareas de alto riesgo a realizar	Si	Trabajo en alturas		
	No	Otro	Cual	

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS Marque con X según corresponda

Cinta Metrica	X	Pica		Cincel		Palas	X	Rodillo Manual	
Nivel	X	Asadon		Puntero		Carretillas	X	Rastrillo	X
Palas	X	Palin	X	Rodillo Manual		Picadora		Escobas	X
Fumigadora Manual	X	Tilan	X	Tolva	X			Diego	
Minicargador		Giro zero	X	Otra	Cual:				

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Marque con X según corresponda

Casco Dielectrico		Protección auditiva de insercion	X	Protector respiratorio desechable		Guantes de nitrilo	X	Guantes de caucho	X
Barbuquejo		Protección auditiva de Copa		Protector respiratorio con filtro		Guantes de baqueta	X	Botas punta de acero	X
Otro		Cual:							

ANALISIS DE TRABAJO COMUNICADO A (Personal involucrado en la tarea)

	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	CAMPOS MARIN DAVID CAMILO	1012433979	CAMILO	CAMILO	CAMILO	CAMILO	CAMILO		
2	CARDENAS CARDENAS HILARIO	3028150	Hilario C.	Hilario C	Hilario C	Hilario C	Hilario C		
3	CERQUERA VALDERRAMA JOSELITO	12209313	Joselito	Joselito	Joselito	Joselito	Joselito		
4	FORERO ORTEGA JULIO CESAR	79380454							
5	GARZON PINEDA JOSE ALEJANDRO	1033692776	Alejandro G.	Alejandro G	Alejandro G	Alejandro G	Alejandro G		
6	JIMENEZ LASSO WILBER DIOMEDES	5855002							
7	LOPEZ AYALA BRANDON SEBASTIAN	1233890527							
8	MERCADO BASILIO LUIS GUILLERMO	1007195407	Luis Mercado	Luis Mercado	Luis Mercado	Luis Mercado	Luis Mercado		
9	MUÑOZ MACETO JESUS	1007289162	Jesus M	Jesus M	Jesus M	Jesus M	Jesus M		
10	OVALLE BOLIVAR YEFERSON IVAN	1074414778							
11	QUEVEDO LEGUIZAMON JHON ALEXANDER	1123116491							
12	SABOGAL CUERVO DANIEL STEBAN	1031803879							
13	ORTIZ COIME ALVARO LEONEL	1087198177	Leonel	Leonel	Leonel	Leonel	Leonel		
14	RAMIREZ RUBIO JHON ALEXANDER	1033760239							
15	JIMENEZ MONDRAGON JHON ANDRES	80863671							
16	PARRA CRISTIAN CAMILO	10127524042	Cristian	Cristian	Cristian	Cristian	Cristian		
17	CUBIDES GARZON LUIS CARLOS	1019005189							
18									
INSPECTOR SST:		1018422772							
OFICIAL / ENCARGADO:		1*******1879							

	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	CODIGO: FT-SST-087	VERSION: 01	18/01/2024

Actividad	Peligros Identificados	Consecuencias Potenciales	Controles Recomendados
MANTENIMIENTOS RUTINARIO			
CAMPOS NATURALES			
CORTE DE CESPED	Proyección de objetos (piedras, palos escondidos)	Golpes, lesiones oculares, cortes	Uso de gafas de seguridad, casco, ropa de trabajo y guantes
	Contacto con cuchillas o partes móviles de maquinaria	Cortes, amputaciones, lesiones graves	Verificación previa de equipos, uso de protectores y bloqueos.Capacitación en operación segura de maquinaria
	Ruido generado por el equipo de corte	Pérdida auditiva a largo plazo	Uso de protectores auditivos (tapones o casco). Capacitación sobre riesgos del ruido y cuidado de la audición
	Vibración de maquinaria manual (guadañas, cortacéspedes)	Fatiga, lesiones por vibración (síndrome mano-brazo)	Pausas activas, uso de equipo antivibración y ergonomía
	Riesgo de caída o resbalón en terrenos irregulares	Fracturas, esguinces o torceduras	Inspección del área, uso de calzado antideslizante. Capacitación en reconocimiento de terrenos y técnicas para caminar en zonas irregulares
	Emisión de gases de motores de combustión	Problemas respiratorios por inhalación	Uso de EPP (mascarilla), mantenimiento adecuado de maquinaria
	Fatiga por exposición prolongada al sol	Insolación, quemaduras solares, deshidratación	Uso de bloqueador solar, hidratación constante y descansos.Capacitación sobre prevención de riesgos asociados al calor. Capacitación de sustancias químicas
	Manejo inadecuado de combustible	Incendios, quemaduras	Almacenamiento seguro y manejo adecuado del combustible
PODA	Proyección de objetos (piedras, escombros, residuos)	Lesiones oculares, cortes contusiones	Uso obligatorio de gafas de seguridad, guantes y ropa de trabajo. Capacitación para inspección previa y limpieza de los bordes antes de la poda
	Contacto con partes móviles de guadañas o cortadoras	Cortes, amputaciones	Realizar preoperacional y verificación del equipo antes de usar. Capacitación en manejo seguro de guadañas y cortadoras
	Riesgo de tropiezos o caídas en superficies irregulares	Torceduras, esguinces, caídas	Uso de calzado antideslizante con protección. Capacitación en reconocimiento y marcación de terrenos peligrosos
	Vibración prolongada de guadañas o bordeadora manual	Síndrome mano-brazo, fatiga muscular	Uso delEPP, realizar de pausas activas y rotación de tareas. Capacitación en posturas ergonómicas
	Ruido generado por la bordeadora	Pérdida auditiva a largo plazo	Usodel EPP (obligatorio de protectores auditivos) . Capacitación en riesgos por exposición a ruido y cuidado auditivo
	Exposición prolongada al sol y al calor	Insolación, quemaduras solares deshidratación	Uso de bloqueador solar, ropa de protección UV y sombrero. Hidratación frecuente y pausas en zonas de sombra. Capacitación sobre prevención de golpes de calor e insolación
	Emisión de gases de maquinaria	Problemas respiratorios por inhalación	Uso de EPP. Mantenimiento periódico de la maquinaria, realizar preoperacional de la maquinaria a utilizar
	Manipulación inadecuado de combustible	Incendios, quemaduras, derrames	Uso de contenedores aprobados para almacenamiento y transporte.Capacitación en manejo seguro de combustibles y protocolos de emergencias
	Falta de atención a líneas eléctricas o postes peligrosos	Electrocución, lesiones graves	Identificar y marcar áreas con líneas eléctricas antes de la actividad.Capacitación sobre riesgos eléctricos en materias
DEMARCACIÓN	Contacto con pintura y solventes químicos	Irritación de la piel, ojos o vías respiratorias	Uso de EPP, guantes de nitrilo, mascarilla con filtro y gafas de seguridad.Capacitación en manejo seguro de productos químicos
	Derrames de pintura o solventes	Contaminación del suelo resbalones	Uso de recipientes con tapa para almacenamiento y transporte.Capacitación en técnicas para manejo y limpieza de derrames
	Exposición prolongada al sol y calor	Insolación, quemaduras solares, deshidratación	Uso de bloqueador solar, ropa con protección UV y sombrero. Descansos periódicos en sombra e hidratación constante. Capacitación sobre prevención de golpes de calor e insolación
	Manipulación de equipos de pintura (aplicadores y rodillos)	Fatiga muscular, lesiones por movimientos repetitivos	Uso de herramientas ergonómicas. Capacitación en posturas adecuadas y pausas activas
	Inhalación prolongada de vapores de pintura o solventes	Mareos, dolores de cabeza afectación respiratoria	Uso obligatorio de mascarillas con filtros adecuados. Realizar la actividad en áreas bien ventiladas. Capacitación en riesgos por exposición a vapores químicos
	Riesgo de caídas o resbalones en superficies húmedas	Fracturas, esguinces, lesiones	Uso de calzado antideslizante. Capacitación en identificación de superficies peligrosas y buenas prácticas de orden
	Uso de maquinaria (pintadoras automáticas/manuales)	Golpes, atrapamientos, cortes	Inspección previa de maquinaria y equipos. Capacitación en operación segura y mantenimiento de equipos de demarcación
	Falta de señalización durante la actividad	Riesgo de interferencia con otras personas	Delimitar el área de trabajo con cintas o conos de seguridad. Capacitación en señalización temporal de áreas de trabajo
PODA DE ZONA VERDE	Proyección de objetos (piedras, ramas escombros)	Lesiones oculares, golpes, cortes	Uso obligatorio de gafas de seguridad, casco y guantes resistentes. Inspección previa para retiro de objetos. Capacitación en identificación de riesgos en el terreno
	Contacto con cuchillas o partes móviles de herramientas	Cortes, amputaciones, lesiones graves	Verificación y mantenimiento periódico de herramientas y equipos (cortadoras). Capacitación en operación segura de guadañas y herramientas de corte
	Caídas o resbalones en terrenos irregulares	Fracturas, contusiones, esguinces	Uso de EPP (calzado antideslizante con punta reforzada). Marcación de terrenos irregulares o con desniveles. Capacitación en desplazamiento seguro en zonas irregulares
	Vibración prolongada de equipos manuales	Fatiga, síndrome mano-brazo, lesiones musculares	Establecimiento de pausas activas y rotación de tareas. Capacitación en ergonomía y posturas correctas
	Ruido generado por guadañas o cortadoras	Perdida audiova a largo plazo	Uso obligatorio de protección auditiva (tapones o cascos). Capacitación sobre riesgos de exposición a ruido y cuidado auditivo

	Exposición prolongada al sol y calor	Insolación, quemaduras solares, deshidratación	Uso de bloqueador solar, sombrero y ropa con protección UV. Pausas en zonas de sombra e hidratación constante. Capacitación en prevención de golpes de calor y insolación.
	Emisión de gases de maquinaria	Problemas respiratorios, mareos	Uso de mascarillas filtrantes y mantenimiento de maquinaria para reducir emisiones.
	Riesgo de caída de ramas o árboles pequeños	Golpes, contusiones, heridas	Evaluación previa del estado de árboles y ramas. Uso de EPP. Capacitación en inspección y poda segura de zonas verdes.
	Manipulación de combustible (para herramientas)	Incendios, quemaduras, derrames	Capacitación en almacenamiento, transporte y protocolos de emergencia ante derrames.
	Fatiga física por movimientos repetitivos y sobreesfuerzo	Dolores musculares, lesiones por esfuerzo	Rotación de tareas y pausas activas. Capacitación en técnicas de trabajo seguro y prevención de fatiga.
		CAMPOS SINTETICOS	
CEPILLADO DEL CAMPO	**Atropellamiento por el minitractor o giro cero**	Lesiones graves, fracturas o fatalidades	Capacitación en operación segura de minitractores y giro cero. Inspección y delimitación del área de trabajo. Uso de señalización adecuada para restringir el acceso a terceros.
	Golpes por partes móviles del cepillo	Contusiones, atrapamientos, cortes	Capacitación en manejo seguro y procedimientos de parada de emergencia. Uso de EPP: guantes resistentes y botas de seguridad.
	Caídas desde el minitractor	Fracturas, contusiones	Prohibición de subir o bajar con el equipo en movimiento. Capacitación en normas de seguridad al operar maquinaria.
	Proyección de objetos (caucho, residuos sintéticos)	Lesiones oculares, golpes	Inspección y limpieza previa del área de trabajo. Uso de gafas de seguridad y ropa de trabajo adecuada. Capacitación sobre identificación y control de riesgos.
	Vuelco del minitractor o giro cero	Lesiones graves, atrapamiento	Inspección del terreno y prohibición de maniobras bruscas en pendientes. Capacitación sobre estabilidad del equipo y técnicas de conducción segura.
	Vibración prolongada del equipo	Fatiga, síndrome mano-brazo, lesiones musculares	Establecimiento de pausas activas y rotación de tareas. Capacitación en ergonomía y técnicas de manejo seguro.
	Ruido producido por el motor del equipo	Pérdida auditiva progresiva	Uso obligatorio de protección auditiva (tapones o cascos auditivos). Capacitación en riesgos por exposición a ruido. Uso de mascarillas con filtro adecuado.
	Inhalación de polvo o partículas de caucho sintético	Problemas respiratorios, irritación	Humidificación previa del área para reducir polvo en suspensión. Capacitación en prevención de riesgos respiratorios.
	Fatiga por jornadas prolongadas	Disminución de reflejos, errores operativos	Programación de pausas activas durante la jornada. Capacitación sobre técnicas de prevención de fatiga y hábitos saludables.
	Manejo de combustible o mantenimiento incorrecto	Incendios, derrames, contaminación ambiental	Uso seguro de contenedores para almacenamiento y recarga. Capacitación en manejo seguro de combustibles y respuesta a emergencias. Mantenimiento preventivo del equipo.
MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE MALLA DE CERRAMIENTO DEPORTIVO	**Caídas desde alturas** **Colapso del andamio** **Deslizamiento o tropiezos** **Caída de herramientas o materiales** **Contacto con estructuras eléctricas cercanas** **Posturas inadecuadas** **Falta de uso de elementos de protección personal (EPP)** **Condiciones climáticas adversas** **Exposición a polvo y partículas** **Exposición a ruido**	Fracturas, traumatismos o muerte por caídas.Lesiones leves a graves, como esguinces, fracturas o traumatismos. Dolores musculares, lesiones de espalda, fatiga, trastornos musculo esqueléticos. Problemas respiratorios, irritación ocular, alergias. Irritación de las vías respiratorias, mareos, cefaleas, alergias respiratorias.Irritación cutánea, dermatitis, irritación ocular o reacciones alérgicas. Pérdida auditiva temporal o permanente, fatiga auditiva. Irritación por contacto en la piel Caída de la estructura del andamio o daño en la malla.	Realizar una evaluación de riesgos antes de iniciar. Asegurarse de que los trabajadores cuenten con certificación en trabajos en alturas. Uso de andamios certificados y revisados antes de su uso. Inspección de andamio Inspección de Arnés de seguridad con sistema de anclaje. Uso de EPPCasco, guantes, botas antideslizantes y gafas de seguridad. Colocar señales de advertencia y evitar el acceso de personas no autorizadas. Suspender trabajos en caso de viento fuerte, lluvia o cualquier condición que afecte la estabilidad. Asegurar que los trabajadores tengan formación vigente en trabajos en alturas. Contar con un permiso de trabajo en alturas y procedimientos claros. Revisar el equipo y los andamios antes y durante el trabajo.


CONSORCIO INNOVAPARQUES	INSPECCIÓN PRE-USO DE ANDAMIOS	FECHA: 05/12/2017 CODIGO: SG-FMT-011 VERSION: 001

TRABAJO: Reparación de Cerramiento
UBICACIÓN: Campus Salazar cc.
CONTRATISTA: Ingeniería cpc.

FECHA: del 02 al 06/ junio/25.
HORA: 3 - 4 pm.
USUARIO:

PARTES A EXAMINAR	ESTADO	OBSERVACIONES
Andamio es metálico y tubular	OL	
Todos los componentes del andamio sin daño	OL	
Bases niveladas, duras y rígidas	OL	
Andamio soporta 4 veces la carga que sostendrá	OL	
Estructura adecuadamente armada y asegurada (los seguros son de fábrica y no improvisados)	OL	
Andamio sujeto a una estructura estable (aplicable para andamios de 3 cuerpos a más)	OL	
No debe tener componentes mezclados de diferentes tipos de andamios	OL	
Plataformas resistentes y completas	OL	
Plataformas aseguradas y sin separaciones (no se deslizan)	OL	
Plataformas de madera se proyectan un mínimo de 30 cm. en cada extremo	OL	
Cuenta con baranda superior	OL	
Cuenta con baranda intermedia	OL	
Cuenta con rodapiés	OL	
CONCLUSIÓN: ANDAMIO APTO PARA SER USADO (SI) / (NO)		**JUSTIFICACIÓN:**
INPECCIÓN REALIZADA POR: Daniel Sabogal		**FIRMA:**

LEYENDA (ESTADO)	
V	Correcto
X	Incorrecto
NA	No Aplica

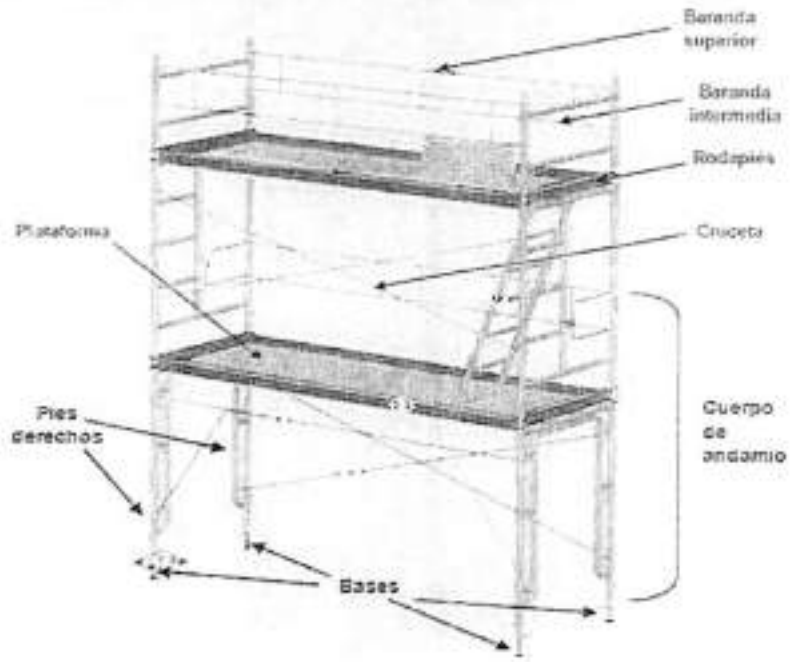

CONSORCIO [illegible]	PROCESO DE CALIDAD	CODIGO	TS-ALT01
		PAGINA	1
	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	FECHA	[illegible]
		VERSION	1

1. ASPECTOS GENERALES


ITEM					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

TIPO DE TRABAJO A REALIZAR	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
[illegible]	[illegible]

HERRAMIENTAS A UTILIZAR	MATERIALES
ACTIVIDADES PREVIAS A REALIZAR EN LA ZONA DE LA ACTIVIDAD	[illegible]

2. RECONOCIMIENTO DEL CLIENTE

ITEM	CRITERIO	TRABAJADOR 1	TRABAJADOR 2	TRABAJADOR 3	TRABAJADOR 4
LL	Longitud de la eslinga	OK			
DD	Distancia Desaceleracion	OL			
HH	Altura de Trabajo/Uso	OL			
C	Factor de Seguridad	OL			
RD	Distancia desde el Punto de Anclaje	OL			
	Altura total desde el nivel de piso hasta el punto de anclaje	OK			
	Espacio libre requerido	OK			



3. LISTA DE CHEQUEO PARA PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS (Marque con una X según corresponda)

ITEM	VERIFICACION MANTENIMIENTO	TRABAJADOR 1			TRABAJADOR 2			TRABAJADOR 3			TRABAJADOR 4		
		SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
1	[illegible]	OK											
2	[illegible]	OL											
3	[illegible]	OL											
4	[illegible]	OL											
5	[illegible]	OL											
6	[illegible]	OL											
7	[illegible]	OL											
8	[illegible]	OL											
9	[illegible]	OL											
10	[illegible]	OL											
11	[illegible]	OL											
12	[illegible]	OL											
13	[illegible]	OL											
14	[illegible]	OL											

4. EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS Y SISTEMAS DE ACCESO (Marque con una X según corresponda)

ITEM	ACTIVIDAD	TRABAJADOR 1			TRABAJADOR 2			TRABAJADOR 3			TRABAJADOR 4		
		SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
1	[illegible]	X											
2	[illegible]	X											
3	[illegible]	X											
4	[illegible]	X											
5	[illegible]	X											
6	[illegible]	X											
7	[illegible]	X											
8	[illegible]	X											
9	[illegible]	X											
10	[illegible]	X		X									

5. ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (Marque con una X según corresponda)

ITEM	ELEMENTO DE PROTECCION	TRABAJADOR 1			TRABAJADOR 2			TRABAJADOR 3			TRABAJADOR 4		
		SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
1	[illegible]	X											
2	[illegible]	X											
3	[illegible]	X											
4	[illegible]		X										
5	[illegible]		X										
6	[illegible]		X										
7	[illegible]	X											
8	[illegible]	X											
9	[illegible]			—									

5. PERSONAL AUTORIZADO PARA TRABAJAR

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	FECHA DEL CERTIFICADO DE ALTURAS	FIRMA
TRABAJADOR 1					
TRABAJADOR 2					
TRABAJADOR 3					
TRABAJADOR 4					

6. AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	NOMBRE	
	FIRMA	
	CEDULA	
	CARGO	
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	NOMBRE	
	FIRMA	
	CEDULA	
	CARGO	
	FECHA DEL PERMISO	
RESPONSABLE DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIA	NOMBRE	
	FIRMA	
	CEDULA	
	CARGO	
DESIGNACIÓN DE AYUDANTE DE HOMBRE SEGURIDAD	NOMBRE	
	FIRMA	
	CEDULA	

NOTA: La autorización de este trabajo es personal e intransferible y cubre solo una solicitud de trabajo. El
cambio de turno y/o persona RESPONSABLE DEL TRABAJO REQUIERE UNA NUEVA AUTORIZACIÓN.

CONSORCIO MUEBLES	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO
	FORMATO N... [illegible]

FORMATO DE INSPECCIÓN DE BOTIQUINES Y CAMILLAS		Fecha:	13/08/2024
		Versión:	01
NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA	DANIEL STEBAN SABOGAL	CARGO	INSPECTOR
OBRA	MUEBLES	CIUDAD	BOGOTA
FECHA DE INSPECCION	3/06/2025	FECHA DE INSPECCION	3/06/2025

INSPECCION DE BOTIQUINES

	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO DEL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	CANTIDAD	FECHA DE VENCIMIENTO (SI APLICA)
1	Estado del botiquin	X		3.	
2	Manual uso de botiquin	X		3	
3	Collar cervical	X		3	
4	Guantes de latex	X		3 cajas	
5	Lodopovidona solución	X		3	
6	Lodopovidona espuma	X		3	
7	Suero fisiologico	X		3	
8	Gasa esteril 10 x 10 cm	X		3	
9	Gasa esteril 3 x 3 cm	X		3	
10	Aposito de algodón esteril	X		3	
11	Venda triangular tipo cabestrillo	X		3	
12	Venda de algodón 2 x 5 yardas	X		3	
13	Venda de algodon 3 x 5 yardas	X		3	
14	Venda elastica 2 x 5 yardas	X		3	
15	Venda elastica 4 x 5 yardas	X		3	
16	Venda elastica 6 x 5 yardas	X		3	
17	Tapabocas	X		3 cajas	
18	Esparadrapo de tela	X		3	
19	Esparadrapo micropore	X		3	
20	Aplicadores de algodon	X		3	
21	Curas	X		3 cajas	
22	Bajalenguas	X		3	
23	Parches oculares	X		3	
24	Termometro	X		3	
25	Ureterina	X		3	
26	Ureterina para diagnostico	X		3	
27	Tijera trauma	X		3	
28	Mascara de reanimacion RCP	X		3	
29	Jabon quirurgico	X		3	
30	Alcohol asepticio	X		3	

INSPECCIÓN DE CAMILLA

	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	OBSERVACIONES
1	Instalacion (Sitio de ubicacion)	X		
2	Señalizacion	X		
3	Estado del soporte	X		
4	Correas de seguridad	X		
5	Sugetadores para agarre	X		
6	Juego de inmovilizadores de miembro inferior y superior	X		


OBSERVACIONES:

CONSORCIO INNOVAPARQUES	INSPECCIÓN PRE-USO DE ANDAMIOS	FECHA: 05/12/2017 CODIGO: SG-FMT-011 VERSION: 001

TRABAJO: Reparación de Cerramientos FECHA: del. 09/06/25 al 13/06/25.
UBICACIÓN: Campos Sintéticos HORA: 7:00 a 4 pm.
CONTRATISTA: Ingeniería CMC SAS USUARIO: _____

PARTES A EXAMINAR	ESTADO	OBSERVACIONES
Andamio es metálico y tubular	OK	
Todos los componentes del andamio sin daño	OK	
Bases niveladas, duras y rígidas	OK	
Andamio soporta 4 veces la carga que sostendrá	OK	
Estructura adecuadamente armada y asegurada (los seguros son de fábrica y no improvisados)	OK	
Andamio sujeto a una estructura estable (aplicable para andamios de 3 cuerpos a más)	OK	
No debe tener componentes mezclados de diferentes tipos de andamios	OK	
Plataformas resistentes y completas	OK	
Plataformas aseguradas y sin separaciones (no se deslizan)	OK	
Plataformas de madera se proyectan un mínimo de 30 cm. en cada extremo	OK	
Cuenta con baranda superior	OK	
Cuenta con baranda intermedia	OK	
Cuenta con rodapiés	OK	
CONCLUSIÓN: ANDAMIO APTO PARA SER USADO (X) / (NO)	**JUSTIFICACIÓN:**	
INPECCIÓN REALIZADA POR: Daniel Sobegal.	**FIRMA:**	

LEYENDA (ESTADO):	
√	Correcto
X	Incorrecto
NA	No Aplica

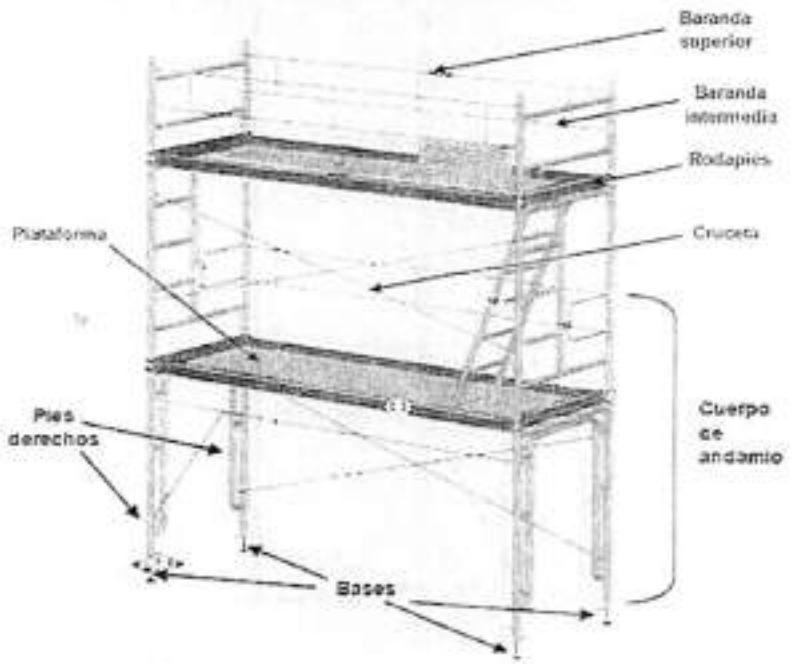


CONSORCIO INNOVADA	PROCESO DE CALIDAD	CODIGO	TS-AL-001
		PAGINA	1
	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	EDICION	SEGUNDA
		VERSION	1

1. ASPECTOS GENERALES

2. REQUERIMIENTO DE CLARIDAD

ITEM	VARIABLE	TRABAJADOR 1	TRABAJADOR 2	TRABAJADOR 3	TRABAJADOR 4
LE	Longitud de la cuerda	6 m			
DD	Distancia Descendentes	0 L			
BM	Altura de Trabajador	0 A			
C	Factor de Seguridad	0 L			
RD	Medidas desde el Punto de Anclaje	0 L			
		0 L			
		0 L			



3. LISTA DE CHEQUEO PARA PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

ITEM	VERIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN	TRABAJADOR 1			TRABAJADOR 2			TRABAJADOR 3			TRABAJADOR 4		
		SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
1		X											
2		X											
3		X											
4		X											
5		X											
6		X											
7		X											
8		X											
9		X											
10		X											
11		X											
12		X											
13		X											
14		X											

4. EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS Y SISTEMAS DE ACCESO

ITEM	IDENTIFICACIÓN	TRABAJADOR 1			TRABAJADOR 2			TRABAJADOR 3			TRABAJADOR 4		
		SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
1		X											
2		X											
3		X											
4		X											
5		X											
6		X											
7		X											
8		X											
9		X											
10				X									

5. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

ITEM	ELEMENTO DE PROTECCIÓN	TRABAJADOR 1			TRABAJADOR 2			TRABAJADOR 3			TRABAJADOR 4		
		SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
1		X											
2		X											
3		X											
4				X									
5				X									
6				X									
7		X											
8		X											
9				—									

5. PERSONAL AUTORIZADO PARA TRABAJAR					
ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	FECHA DEL CERTIFICADO DE ALTURAS	FIRMA
TRABAJADOR 1					Harold Arboleda
TRABAJADOR 2					
TRABAJADOR 3					
TRABAJADOR 4					

6. AUTORIZACION DEL TRABAJO		
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	NOMBRE	
	FIRMA	Harold Arboleda
	CEDULA	
	CARGO	
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	NOMBRE	
	FIRMA	Harold Arboleda
	CEDULA	
	CARGO	
	FECHA DEL CURSO	
RESPONSABLE DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIA	NOMBRE	
	FIRMA	
	CEDULA	
	CARGO	
DESIGNACIÓN DE AYUDANTE DE HOMBRE SEGURIDAD	NOMBRE	
	FIRMA	
	CEDULA	

NOTA: La autorización de este trabajo es personal e intransferible y cubre solo una solicitud de trabajo.
cambio de turno s/o personal RESPONSABLE DEL TRABAJO REQUIERE UNA NUEVA AUTORIZACIÓN.

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	Codigo: DV-401.16.09
	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 01
	FORMATO DE INSPECCIÓN LOCATIVA	Fecha: 01-oct-2020

Item	Aspectos a inspeccionar	SI	No	N/A	Observaciones
1	SEÑALIZACION				
1.1	Las rutas de evacuación se encuentran señalizadas	X			
1.2	Las salidas de emergencia se encuentran señalizadas	X			
1.3	Los elementos de atención de emergencia se encuentran señalizados	X			
1.4	La señalización es clara, legible y se encuentra en buen estado	X			
2	ORDEN Y ASEO				
2.1	Las áreas de trabajo están ordenadas y aseadas	X			
2.2	Los elementos se encuentran bien dispuestos en archivos o estantes	X			
2.3	Existen recipientes para disposición de residuos	X			
2.4	El nivel de iluminación es adecuado	X			
2.5	La ventilación es adecuada	X			
3	INSTALACIONES ELÉCTRICAS				
3.1	La instalación cuenta con polo a tierra	X			
3.2	Ausencia de empalmes defectuosos	X			
3.3	No existen cables sueltos en el piso	X			
3.4	Los interruptores y tomacorrientes se encuentran en buen estado	X			
3.5	Los bombillos y luminarias funcionan adecuadamente			X	
3.6	Tomas o multitomas recargadas			X	
4	EQUIPO DE EMERGENCIA				
4.1	Se cuenta con botiquines en un número suficiente				
4.2	Se cuenta con extintores en un número suficiente				
4.3	Se cuenta con un sistema de alarma en caso de emergencia				

Inspeccionó: Daniel Sabogal
Nombre: Daniel Sabogal
Firma:

Cargo: Inspector

Elaboró	Revisó y aprobó: Andrea Lopez
Firma	Firma
Nombre	Nombre
Cargo	Cargo

	FORMATO DE INSPECCIÓN KIT DE DERRAMES	
	CÓDIGO: STHU-S-F14-043	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: ENERO DE 2025	

FECHA: 13 de [illegible] 2025	SEDE: ÁREA USUARIO VEHÍCULO CAMPOS BATISTOS
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: [illegible]	ACOMPAÑAMIENTO INSPECCIÓN: Ing ANDREA LOPEZ
CARGO: Ingeniería Ambiental	HST N.A. Y obligado cargue de actividad en campos batisteros

Marque con una (X) cumple, NC no cumple o NA No aplica

Item	ASPECTOS A INSPECCIONAR	CANTIDAD	C / NC / NA	OBSERVACIONES
1	Absorbente (cuidado de origen mineral x 1 un)	1	C	
2	Barrera (1 x 3 unidades (dos / 2 un) x 1,20m)	2	C	
3	Bolsas rojas (50cm x 100 con cinta de cierre)	6	C	
4	Cinta de [illegible]	1	C	
5	Desengrasante biodegradable (x 1 un)	1	C	
6	Guantes de nitrilo de 12"	1	C	
7	Linterna recargable tipo LED	1	C	
8	Maletín para kit de 5 galones con 35cm, ancho x 40cm, largo (1un)	1	C	
9	Media silvestre pequeña	1	C	
10	Palas universal (Dallas 30cm x 40cm)	1	C	
11	Recogedor de mano (plástico)	1	C	
12	Tapabocas KN95	1	C	
13	Cinta de señalización x 100mt	1	C	
14	Instructivo de uso	1	C	

ACCIONES DE MEJORA

#		ACTIVIDAD A DESARROLLAR	RESPONSABLE	FECHA
1		Pegado de tiras grana.	Daniel Sabogal	2-Oct-25
2				
3				

CONSORCIO INNOVAPARQUES	INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SG-FO-1
		Versión	1
		Vigencia	25/03/2021

FECHA 09. Junio 125.
PROYECTO AIU - 2024.
RESPONSABLE INSPECCION Daniel Sabogal
NUMERO DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN 1031803879

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA Y CEDULA		DEBE USAR								USA		ESTADO		NO USA POR			MEDIDAS DE			
					A	B	C	D	E	F	G	H	SI	NO	B	M	NS	NP	NO	1	2	3	4
1	CAMPOS MARIN DAVID CAMILO	auxiliar	1012433979				X	X	X	X	X		X		X								
2	CARDENAS CARDENAS HILARIO	conductor	3028150				X	X	X	X	X		X		X								
3	CERQUERA VALDERRAMA JOSELITO	auxiliar	12209313				X	X	X	X	X		X		X								
4	FORERO ORTEGA JULIO CESAR	auxiliar	79390554				X	X	X	X	X		X		X								
5	GARZON PINEDA JOSE ALEJANDRO	auxiliar	1033602776				X	X	X	X	X		X		X								
6	JIMENEZ LASSO WILDER DIOMEDES	conductor	5855002				X	X	X	X	X		X		X								
7	LOPEZ AYALA BRANDON SEBASTIAN	Ing. Residente	1233870527				X	X	X	X	X		X		X								
8	MERCADO BASILIO LUIS GUILLERMO	conductor	1007195407				X	X	X	X	X		X		X								
9	MUÑOZ MACETO JESUS	auxiliar	1007289162				X	X	X	X	X		X		X								
10	OVALLE BOLIVAR YEFERSON IVAN	auxiliar	1074414338				X	X	X	X	X		X		X								
11	QUEVEDO LEGUIZAMON JHON ALEXANDER	auxiliar	1123116491				X	X	X	X	X		X		X								
12	SABOGAL CUERVO DANIEL STEBAN	Inspector	1031803879				X	X	X	X	X		X		X								
13	ORTIZ COIME ALVARO LEONEL	auxiliar	1087198177				X	X	X	X	X		X		X								
14	RAMIREZ RUBIO JHON ALEXANDER	auxiliar	1033760239				X	X	X	X	X		X		X								
15	JIMENEZ MONDRAGON JHON ANDRES	auxiliar	80863671				X	X	X	X	X		X		X								
16	PARRA CRISTIAN CAMILO	auxiliar	10127524042				X	X	X	X	X		X		X								
17	CUBIDES GARZON LUIS CARLOS	auxiliar	1019005189				X	X	X	X	X		X		X								

EPP FALTANTE POR PERSONA									
No	NOMBRE	A	B	C	D	E	F	G	H

DEBE USAR	ESTADO	NO USA POR MEDIDAS DE CONTROL	
A- OVEROL	B- BUENO	NS- NO SABE	1. INSTRUCCIÓN
B- CASCO			
C- GUANTES			2. MOTIVACION
D- BOTAS			
E- PROTECCION RESPIRATORIA	R- REGULAR	NP- NO PUEDE	3. CAMBIO DE EPP
F- PROTECTORES AUDITIVOS			
G- GAFAS PROTECTORAS			4. OTRAS
H- OTRO			
¿Cual?	M- MALO	NQ- NO QUIERE	

OBSERVACIONES

Daniel Sabogal
NOMBRE Y CÉDULA DEL INSPECTOR
REVISÓ

Andrea Lopez
NOMBRE Y CÉDULA DEL COORDINADOR HSE
APROBÓ

ANEXO 10. PAZ Y SALVOS CONTRATISTA

INGENIERIA CMC SAS
NIT:901.087.132-6

LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE:	YATE PARRA ANGEL GABRIEL
C.C.:	1.010.014.125
CARGO:	OPERARIO
CAUSA DE LA LIQUIDACIÓN:	Renuncia Voluntaria

PERIODO DE LIQUIDACIÓN		
FECHA TERMINACIÓN DE CONTRATO		02-06-2025
FECHA DE INICIO CONTRATO		20-05-2025
TIEMPO TOTAL LABORADO		13
VALOR HORAS EXTRAS PENDIENTE DE PAGO	$	-
DÍAS SALARIO PENDIENTES POR CANCELAR		0

SALARIO BASE DE LIQUIDACIÓN:		
SUELDO BÁSICO:	$	1.423.500
AUXILIO DE TRANSPORTE	$	200.000
PROMEDIO SALARIO VARIABLE	$	-
TOTAL BASE DE LIQUIDACIÓN:	**$**	**1.623.500**
SANCIONES EN DÍAS		0,00

PRIMA	
FECHA DE LICUIDACIÓN PRIMA	02-06-2025
FECHA DE CORTE PRIMA	20-05-2025
DÍAS PRIMA	**13,00**

CESANTÍAS	
FECHA DE LIQUIDACIÓN CESANTIAS	02-06-2025
FECHA DE CORTE CESANTÍAS	20-05-2025
DÍAS CESANTÍAS	**13,00**

VACACIONES	
FECHA DE LIQUIDACIÓN VACACIONES	02-06-2025
FECHA DE CORTE VACACIONES	20-05-2025
TOTAL DÍAS DE VACACIONES	0,54
DÍAS TOMADOS DE VACACIONES	-
DÍAS PENDIENTES	**0,54**

INTERESES A LAS CESANTÍAS	
FECHA DE LIQUIDACIÓN INTERESES	02-06-2025
FECHA DE CORTE INTERESES	20-05-2025
DÍAS INTERESES	**13,00**

RESUMEN LIQUIDACIÓN PAGOS									
CONCEPTO				**CALCULO**					**TOTAL**
DIAS DE VACACIONES PENDIENTES	$	1.423.500	/	30	X	0,54167		$	25.702
CESANTIAS	$	1.623.500	/	360	X	13		$	58.626
INTERESES DE CESANTIAS	$	58.626	/	360	X	13	X 12%	$	254
PRIMA SERVICIOS	$	1.623.500	/	360	X	13		$	58.626
SUELDO PENDIENTE POR CANCELAR	$	1.423.500	/	30	X	0		$	-
HORAS EXTRAS PENDIENTE POR CANCELAR:								$	-
BONIFICACIONES IND CONSTITUYEN SALARIO:	$	-						$	-
AUX. TRANSP. PENDIENTE POR CANCELAR	$	200.000	/	30	X	0		$	-
VACACIONES YA TOMADAS								$	-
TOTAL DEVENGOS								**$**	**143.209**

RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACIÓN				
CONCEPTO	**PORCENTAJE**		**BASE**	**TOTAL**
SALUD:	4%	$	-	$ -
PENSION:	4%	$	-	$ -
PRESTAMOS O ANTICIPOS:				$ -
TOTAL DEDUCCIONES				**$** -

VALOR LIQUIDACIÓN		$ 143.209
LA SUMA DE:	CIENTO CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS M/C	

SE HACE CONSTAR:

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidacion los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantias, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en si, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al cuedar extinguido el contrato de trabajo.
2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidacion, queda tramada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminacion de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

Angel Yate P.

YATE PARRA ANGEL GABRIEL
1010014125

JUAN MANUEL SABOGAL CUERVO
Representante Legal
INGENIERIA CMC SAS

Elaboró: YURANY SABOGAL
Fecha: Junio 03 de 2025

02

INGENIERIA CMC S.A.S
Especialistas en campos deportivos

PAZ Y SALVO LABORAL

INGENIERÍA CMC SAS.

Que. **YATE PARRA ANGEL GABRIEL**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1010014125, en calidad de TRABAJADOR y la empresa INGENIERÍA CMC SAS con N.I.T. 901.087.132-6 y domicilio en Bogotá, quien a través de su Representante Legal **JUAN MANUEL SABOGAL**, identificado con la cédula de ciudadanía número 80.757.973 de Bogotá persona mayor de edad, domiciliada y residente en Bogotá, por otra parte, quien se denominó EL EMPLEADOR, celebraron un contrato de obra labor el día 20 de Mayo de 2025.

Que, conforme al literal d) del artículo 61 del Codigo Sustantivo del Trabajo, el contrato de obra labor finalizo el día 02 de Junio de 2025, por la renuncia voluntaria del trabajador.

Que, se entrega **PAZ Y SALVO** del contrato de trabajo celebrado junto con la liquidación anexa por los conceptos derivados de la relación laboral.

Que, con la firma de la presente paz y salvo, **EL TRABAJADOR** afirma haber recibido a satisfacción los valores liquidados, y declara que **EL EMPLEADOR** no le adeuda ningún otro concepto y valor relacionado con el contrato de trabajo del cual se declara su terminación.

Para constancia de lo anterior, las partes suscriben el presente **PAZ Y SALVO** en la ciudad de Bogotá a los 03 días del mes de Junio del año dos mil veinticinco (2025).

EL EMPLEADOR	**EL TRABAJADOR**
JUAN MANUEL SABOGAL Representante Legal Ingeniería CMC SAS NIT 901.087.132-6	Angel. Yate P. **C.C.N°** 1010014125 **de** Bogotá

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
INGENIERIA CMC S.A.S	**FORMATO N°:**	FT-SST-047
	Estándar E3.1.4	
FORMATO CARTA ORDEN DE EXAMEN MÉDICO LABORAL DE EGRESO	**Fecha:** Julio 19 de 2019 **Versión:** 001 Página **1** de **1**	

Bogotá D.C, 03 de Junio de 2025

Señor:

YATE PARRA ANGEL GABRIEL
CARGO: Operario

Cordial saludo,

Con motivo de su desvinculación de la empresa **INGENIERIA CMC S.A.S,** le hacemos entrega de la **Orden de Examen Médico laboral de Egreso** para que se acerque al centro médico EXISALUD IPS, ubicado en Carrera 17 68 # 58 Chapinero, y se realice los exámenes médicos ocupacionales correspondientes según protocolo de la empresa; estos no tienen ningún costo para el trabajador. Cabe mencionar que esta evaluación médica queda expresamente bajo absoluta responsabilidad suya como trabajador. Por lo tanto, le solicitamos su confirmación marcando con una **X** su decisión:

SI: ____
NO: ____

Por lo expuesto dejamos constancia que la empresa cumple con su procedimiento interno para cumplimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y la normativa nacional vigente establecida en el Decreto 1295 de 1994 (Art. 21 y 56) y Resolución 6398 de 1991

Sin otro particular.

Gracias por la atención prestada.

Cordialmente,

JUAN MANUEL SABOGAL
Representante Legal
Ingenieria CMC S.A.S.

Angel Yate P.

YATE PARRA ANGEL GABRIEL
C.C. 1010014125

Elaboró: **YURANY SABOGAL C.** **Asistente Administrativo**	**Revisó:**	**Aprobó:**	**Código:** FR-SST-047 **Fecha de modificación:** Julio 19 de 2019

ANEXO 10. PAZ Y SALVOS INTERVENTORIA

CONSORCIO
SANTA TERESA 28

NIT. 901.888.461-1

PAZ Y SALVO

Yo **RAUL ORLANDO DELGADO** identificado con cedula de ciudadanía número 79.573.492, **CERTIFICO** que **CONSORCIO SANTA TERESA 28** identificado con NIT 901.888.461-1, se encuentra a **PAZ Y SALVO** por todo concepto con la cancelación a la fecha de todas sus obligaciones en la ejecución del contrato de interventoría No. 4080 DE 2024 cuyo objeto es *"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD".*

Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá a los (30) días del mes de JUNIO de 2025.

Atentamente,

ING. RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
DIRECTOR INTERVENTORIA

CONSORCIO
SANTA TERESA 28

NIT. 901.888.461-1

PAZ Y SALVO

Yo **SERGIO ANDRES PEDREROS** identificado con cedula de ciudadanía número 1.010.161.283, **CERTIFICO** que **CONSORCIO SANTA TERESA 28** identificado con NIT 901.888.461-1, se encuentra a **PAZ Y SALVO** por todo concepto con la cancelación a la fecha de todas sus obligaciones en la ejecución del contrato de interventoría No. 4080 DE 2024 cuyo objeto es *"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"*

Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá a los (30) días del mes de JUNIO de 2025.

Atentamente,

ING. RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL

SERGIO ANDRES PEDREROS
CC 1.010.161.283
INSPECTOR DE INTERVENTORIA

ANEXO 11. REGISTRO FOTOGRAFICO


REGISTRO FOTOGRAFICO

ACTIVIDADES DE OBRA





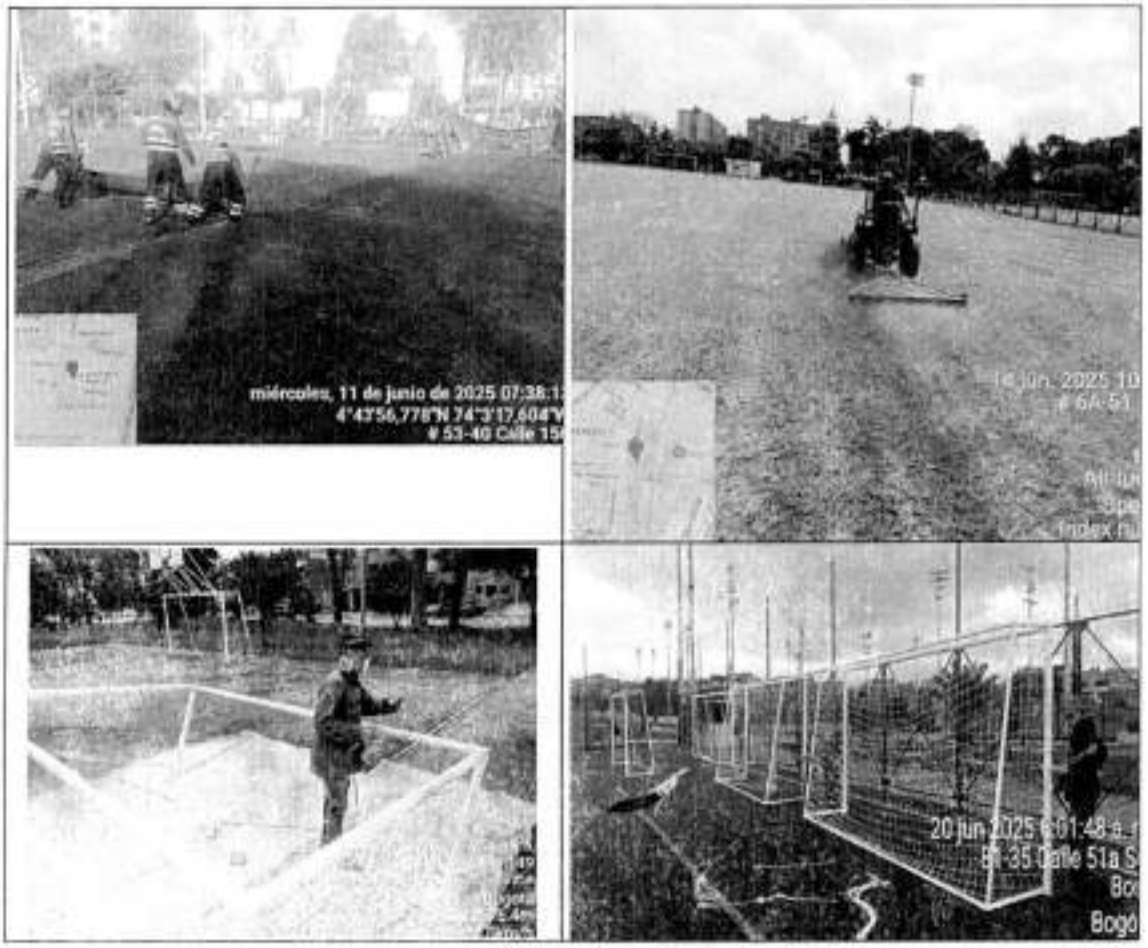


miércoles, 11 de junio de 2025 07:38:1
4°43'56.778"N 74°3'17.604"V
53-40 Calle 15
14 jun. 2025 10
6A-51
20 jun 2025 6:01:48 a.
81-35 Calle 51a S
Bogo



ANEXO 12. DOCUMENTOS INGRESO INTERVENTORIA

4D CONSTRUCTORES	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	Código	SST-FR-003
		Versión:	2
		Fecha elaboración:	26/11/2019

Nombre: Angie Vanessa Acero Vaca **Cargo:** Profesional de ingeniería
N° CC 1013683885 **Proyecto/área:**

1. **Descripción:** A continuación, se le notifican los riesgos a los cuales se encuentra expuesto relacionados con su cargo, ya sea profesional, ingeniero, inspector, coordinador, residente, director, apoyo, entre otros
2. **Elementos de Protección personal de** acuerdo al cargo: (marque con una "X", según corresponda)



3 Riesgos Existentes

Geológico		Físico		Químico		Psicosocial		Biomecánico		De Seguridad		Fenómenos Naturales *	
Virus		Ruido (impacto intermitente y continuo)	X	Polvos orgánicos inorgánicos	X	Gestión organizacional (estilo de mando, pago, contratación, participación, inducción y capacitación, bienestar social, evaluación del desempeño, manejo de cambios)		Postura (prolongada mantenida forzada, antigravitacional)	X	Mecánico (elementos de máquinas, herramientas, piezas a trabajar, materiales proyectados sólidos o fluidos		Sismo	X
Bacterias		Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia)	X	Fibras		Características de la organización del trabajo (comunicación, tecnología, organización del trabajo, demandas cualitativas y cuantitativas de la labor		Esfuerzo		Eléctrico (alta y baja tensión, estática)		Tsunamis	X
Hongos		Vibración (cuerpo entero, segmentaria)		Líquidos (nieblas y rocíos)		Características del grupo social del trabajo (relaciones, cohesión, calidad de interacciones, trabajo en equipo)		Movimiento repetitivo	X	Locativo (sistemas y medios de almacenamiento, superficies de trabajo (irregularidades, deslizantes, con diferencia del nivel) condiciones de orden y aseo, caídas de objeto)		Vendaval	
Rickettsias		Temperatura (extrema calor y frío)	X	Gases y vapores	X	Características de la tarea (carga mental, contenido de la tarea, demandas emocionales, sistemas de control, definición de roles, monotonía etc)		Manipulación manual de cargas		Tecnológico (explosión, fuga, incendio)		Inundación	
Parásitos		Presión atmosférica (normal y ajustada)		Humos metálicos, no metálicos		Interfaz persona tarea (conocimientos, habilidades con relación a la demanda de la tarea, iniciativa, autonomía y reconocimiento, identificación de la persona con la tarea y la organización				Accidentes de tránsito		Derrumbe	X
Picaduras	X	Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y				Jornada de trabajo (pausas, trabajo nocturno, rotación, horas extras, descansos)				Público (Robos, atracos, asaltos, asonadas, de orden público, etc)		Precipitaciones, (lluvias, granizadas, heladas)	X
Mordeduras	X	Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta		Material particulado						Trabajo en Alturas			
Fluidos o excrementos	X	Disconfort Térmico								Trabajo en Espacios Confinados			

* Tener en cuenta únicamente los peligros de fenómenos naturales que afectan la seguridad y bienestar de las personas en el desarrollo de una actividad. En el plan de emergencias de cada empresa se considerarán todos los fenómenos naturales que pudieran afectarla

Yo Angie Vanessa Acero Vaca identificado(a) con Cedula de ciudadanía 1013683885, declaro que he sido notificado de todos los riesgos a los cuales puedo estar expuesto durante la jornada laboral y me comprometo a cumplir las normas de seguridad y otras disposiciones establecidas, por la empresa para prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, de conformidad firmo este documento.

Firma del trabajador

05-05-2025.
Fecha

4D CONSTRUCTORES DE LA IDEA A LA REALIDAD	EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN SST-MA	CODIGO: SST-FR-002
		VERSION: 2
		FECHA DE ELABORACION:26/11/2019

Nombre: Angie Vanessa Acero Vaca
Fecha: 05-05-2025
Cargo: Profesional de ingeniería
Proyecto/área: Coordinación

1 La empresa 4D CONSTRUCTORES dentro de sus servicios ofrecidos se encuentran:
a. Interventoria, diseño y construcción de parques y escenarios deportivos.
b. Asesoría comercial y administrativa a empresas industriales.
c. Construcción de viviendas de interés social.

1. Nombre uno de los compromisos frente a seguridad y salud en el trabajo a los que se compromete la empresa: Velar por el bienestar de los trabajadores.

2. Marque con una X los elementos de protección personal que debe usar para ingresar a obra:



3. Al frente de cada definición escriba a cuál corresponde cada una, puede ser: Accidente, Incidente y Enfermedad Laboral.
1. Contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar: Enfermedad laboral.
2. Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, el cual NO produce lesión incidente
3. Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Accidente

5 cuando se presente un accidente y/o incidente de trabajo usted debe:
a Llamar al 911 de inmediato
b Comunicarse con sus acudientes
X Informar inmediatamente al residente SST o jefe inmediato.

6 con qué frecuencia se reúne el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST
X Una vez al mes
b. Al iniciar y/o finalizar cada proyecto
c. Una vez a la semana

7. Que es el comité de convivencia laboral
a. Es el grupo que se encarga de hacer los mantenimientos locativos de la empresa.
b Es el órgano que se encarga de controlar la hora de llegada de los trabajadores
X Es un grupo que busca contribuir a proteger a los trabajadores, contra los riesgos psicosociales, como estrés ocupacional y el ecoso laboral.

8. Nombre dos tipos de brigadas que existen:
a. Brigada de evacuación
b. Brigada de primeros auxilios

9.Cual de las siguientes acciones NO es una medida del Plan de Manejo Ambiental en obra:
a. Mantenimiento de baterías sanitarias.
X Prueba de Concretos
c. Protección de sumideros y árboles.

10. Un residuo de construcción y demolición -RCD es:
a. Residuos de tejidos, órganos, partes y fluidos corporales.
b. Son los que contienen una base mineral o sintética que se generan en labores de mantenimiento.
X Residuos generados en un proyecto de infraestructura que según sus características pueden ser o no susceptibles de aprovechamiento.

11. ¿Cuál es el porcentaje de aprovechamiento de los materiales?:
R: 40 - 50 %

4D CONSTRUCTORES DE LA IDEA A LA REALIDAD	PERFIL SOCIODEMOGRAFICO Y DE MORBILIDAD SENTIDA	Código:	SST -FR 001
		Versión:	2
		Fecha de elaboración:	26/11/2019

17. EN EL DESARROLLO DE SU LABOR ENCUENTRA LAS SIGUIENTES CONDICIONADOS:
NIVEL ADMINISTRATIVO

CONDICION	SI	NO	POR QUE / CUAL/ OBSERVACIONES
¿Conoce los riesgos a los que está expuesto en su lugar de trabajo?	X		
¿Ha recibido capacitación sobre el manejo de los riesgos a los que está expuesto?	X		
¿Considera que la iluminación de su puesto de trabajo es adecuada?	X		
¿La temperatura de su sitio de trabajo le ocasiona molestias?		X	
¿En su sitio de trabajo hay presencia de polvo en el ambiente?		X	
¿Considera que los pisos, techos, paredes, escaleras, presentan riesgo para su salud?		X	
¿Existen cables sin entubar, empalmes defectuosos, tomas eléctricas sobrecargados, trasformadores defectuosos?		X	
¿Los sitios destinados para el almacenamiento son suficientes, poseen despacio adecuado y los insumos y productos se encuentran bien apilados?	X		
¿Las tareas que desarrolla le exigen realizar movimientos repetitivos?	X		
¿Permanece en una misma posición (sentado o de pie) durante más del 60% de la jornada de trabajo?	X		
¿La altura de la superficie de trabajo es la adecuada a su estatura, la silla y la labor que realiza?	X		
¿Tiene espacio suficiente para variar la posición de las piernas y rodillas?	X		
¿La silla es cómoda y permite ajustarlo a su medida?	X		
¿En general dispone de espacio suficiente para realizar el trabajo con holgura?	X		
¿Su trabajo le exige mantenerse frente a la pantalla del computador más del 50% de la jornada?	X		
¿Al finalizar la jornada laboral, el cansancio que se siente podría calificarse de "normal"?	X		
¿Considera adecuada la distribución del horario de trabajo, de los turnos, de las horas de descanso, horas extras y pausas?	X		
¿El trabajo que desempeña le permite aplicar sus habilidades y conocimientos?	X		
¿Su jefe le pide opinión sobre asuntos relacionados con su trabajo?	X		
¿La empresa cuenta con agua potable?	X		
¿Existe buen manejo de basuras y desechos?	X		

18. INFORMACIÓN MEDEVAC

Tipo de Sangre y RH: O+

Alergias: Si ☐ No ☒ Cual?_

Medicamentos especiales No

Contacto en caso de emergencia: Angela Maria Vaca

Parentesco: Prima

No teléfono 3186228954

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Ley 1581 de 2012: de protección de datos personales, es una ley, que complementa la regulación vigente para la protección del derecho fundamental que tienen todas las personas naturales a autorizar la información personal que es almacenada en bases de datos o archivos, así como su posterior actualización y rectificación.

A. SI X
B. NO

Nombre: Angie Vanessa Acosa Vaca.

CC: 1013.633.885

Firma:

Fecha Diligenciamiento 05-05-2025.

4D CONSTRUCTORES DE LA IDEA A LA REALIDAD	PERFIL SOCIODEMOGRAFICO Y DE MORBILIDAD SENTIDA	Código:	SST -FR 001
		Versión:	2
		Fecha de elaboración:	26/11/2019

Nombre: Ange Vanessa Acero Vaca
Fecha: 05-05-2025
Cargo: Profesional de ingeniería
Proyecto/área: coordinación

Marque con una X:

1. EDAD
a. 18 – 27 años
X 28 – 37 años
c. 38 _ 47 años
d. 48 años o más

2. ESTADO CIVIL.
X Soltero (a)
b. Casado (a) /Unión libre
c. Separado (a) /Divorciado
d. Viudo (a)

3. SEXO
a. Hombre
X Mujer

4. NUMERO DE PERSONAS A CARGO
X Ninguna
b. 1 – 3 personas
c. 4 – 6 personas
d. Más de 6 personas

5. NIVEL DE ESCOLARIDAD
a. Primaria
b. Secundaria
c. Técnico / Tecnólogo
d. Universitario
X Posgrado

6. TENENCIA DE VIVIENDA
a. Propia
X Arrendada
c. Familiar
d. Compartida con otra(s) familias
e. Ninguna

7. USO DEL TIEMPO LIBRE
a. Otro trabajo
b. Labores domésticas
X Recreación y deporte
d. Estudio
e. Ninguno

8. PROMEDIO DE INGRES OS (SMMLV)
a. Mínimo Legal (S.M.L.)
X Entre 1 a 3 S.M.L.
c. Entre 4 a 6 S.M.L.
d. Más de 7 S.M.L.

9. ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA
X Menos de 1 año
b. De 1 a 5 años
c. De 5 a 10 años
d. De 10 a 15 años
e. Más de 15 años

10. ANTIGÜEDAD EN EL CARGO ACTUAL
a. Menos de 1 año
X De 1 a 5 años
c. De 5 a 10 años
d. De 10 a 15 años
e. Más de 15 años

11. HA PARTICIPADO EN ACIVIDADES DE SALUD REALIZADAS POR LA EMPRESA
a. Vacunación
b. Salud Oral
c. Exámenes de laboratorio y otros
d. Exámenes médicos anuales
X Ninguna

12. LE HAN DIAGNOSTICADO AL GUNA ENFERMEDAD
a. Si
X No
Cual:
Frecuencia:

13. CONSUME BEBIDAS ALCOHOLICAS
X Si
b. No
Frecuencia

___ Semanal
___ Quincenal
___ Mensual
X Ocasional

14. PRACTICA ALGUN DEPORTE
X Si
b. No
Cual ciclismo

15. FUMA
a. Si
X No
Promedio diario: _____

16. CUALES DE LAS SIGUIENTES MOLESTIAS HA SENTIDO CON FRECUENCIA EN LOS ULTIMOS SEIS (6) MESES

SINTOMA	SI	NO	EXPLIQUE
Dolor de cabeza		X	
Dolor de cuello, espalda y cintura		X	
Dolores musculares		X	
Dificultad para algún movimiento		X	
Tos frecuente		X	
Dificultad respiratoria		X	
Gastritis, ulcera		X	
Otras alteraciones del funcionamiento digestivo		X	
Alteraciones del sueño (insomnio, somnolencia)		X	
Dificultad para concentrarse		X	
Mal genio		X	
Nerviosismo		X	
Cansancio mental		X	
Palpitaciones		X	
Dolor en el pecho (angina)		X	
Cambios visuales		X	
Cansancio, fatiga, ardor o disconfor visual		X	
Pitos o ruidos continuos o intermitentes en los oidos		X	
Dificultad para oir		X	
Sensación permanente de cansancio		X	
Alteraciones en la piel		X	
Otras alteraciones no anotadas		X	

Cendiatra

CERTIFICADO EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE PRE INGRESO

SEDE: CENDIATRA CONNECTA
DIRECCIÓN: Av. Calle 26 # 92-32, Connecta Plaza 1-L04, Connecta 26
CIUDAD DE LA SEDE: BOGOTÁ
TELÉFONO: 6017424612 - 6017428691
EMAIL: citas.connecta@cendiatra.com
FECHA EXAMEN: 2025-05-05

Nombres y apellidos: ANGIE VANESSA ACERO VACA
Fecha de nacimiento: 23/07/1992
Empresa: 4D CONSTRUCTORES S.A.S
Empresa usuaria:
Cargo: PROFESIONAL EN INGENIERIA II

CC: 1013633885
Edad: 32 **Sexo:** FEMENINO
Fecha ingreso: 2025-05-05 / 08:12:23
Fecha salida: 2025-05-05 / 08:46:27



EXÁMENES REALIZADOS

- EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE PRE INGRESO
- AUDIOMETRIA OCUPACIONAL
- ENFASIS OSTEOMUSCULAR
- ESPIROMETRIA
- VISIOMETRIA

CONCEPTO DE APTITUD: APTO Y SIN RESTRICCIONES PARA EL CARGO

:

RECOMENDACIONES:
NUTRICIONALES - CAMBIOS DE ESTILOS DE VIDA:

La presente certificación se expide en base a la historia clínica ocupacional del trabajador, la cual tiene carácter confidencial y su manejo está regulado por la Resolución 1995 de 1999, Resolución 2346 de 2007, Resolución 1918 de 2009. Acepto las anteriores valoraciones Médicas realizadas, hago constar que la información suministrada sobre mi condición de salud es verdadera, y me comprometo a cumplir las recomendaciones y las restricciones a que haya lugar. Cualquier omisión o falsedad será causa justa de finalización del contrato. Artículo 62 CST. La firma ce este documento no significa aceptación de los conceptos médicos expresados y de su contenido. Sirve adicionalmente para constatar quien presento la valoración.

ELIAS JOSE BEYEH QUINTANA
RM: 1140818202
Firma y sello del médico

ANGIE VANESSA ACERO VACA
CC: 1013633885
Firma del paciente

Cendiatra

RECOMENDACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES

SEDE: CENDIATRA CONNECTA

DIRECCIÓN: Av. Calle 26 # 92-32, Connecta Plaza 1-L04, Connecta 26

CIUDAD DE LA SEDE: BOGOTÁ

TELÉFONO: 6017424612 - 6017428691

EMAIL: citas.connecta@cendiatra.com

FECHA EXAMEN: 2025-05-05

Nombres y apellidos: ANGIE VANESSA ACERO VACA
Fecha de nacimiento: 23/07/1992
Empresa: 4D CONSTRUCTORES S.A.S
Empresa usuaria:
Cargo: PROFESIONAL EN INGENIERIA II

CC: 1013633885
Edad: 32 **Sexo:** FEMENINO
Fecha ingreso: 2025-05-05 / 08:12:23
Fecha salida: 2025-05-05 / 08:46:27



Las presentes recomendaciones se expiden con base a su historial clínico ocupacional.
Recomendaciones generales, laborales y extralaborales:

1. NUTRICIONALES - CAMBIOS DE ESTILOS DE VIDA:

ELIAS JOSE BEYEH QUINTANA
RM: 1140818202
Firma y sello del médico

ANGIE VANESSA ACERO VACA
CC: 1013633885
Firma del paciente

Firma responsable del SG-SST de la empresa.

Nombre: CARLOS ANDRES FIGUEROA AYALA
Fecha: 20/06/2025
Cargo: DIRECTOR
Proyecto/área: IDRD 4080

Marque con una X:

1. EDAD
a. 18 – 27 años
b. 28 – 37 años
c. 38 _ 47 años
d. 48 años o más

2. ESTADO CIVIL.
a. Soltero (a)
b. Casado (a) /Unión libre
c. Separado (a) /Divorciado
d. Viudo (a)

3. SEXO
a. Hombre
b. Mujer

4. NUMERO DE PERSONAS A CARGO
a. Ninguna
b. 1 – 3 personas
c. 4 – 6 personas
d. Más de 6 personas

5. NIVEL DE ESCOLARIDAD
a. Primaria
b. Secundaria
c. Técnico / Tecnólogo
d. Universitario
e. Posgrado

6. TENENCIA DE VIVIENDA
a. Propia
b. Arrendada
c. Familiar
d. Compartida con otra(s) familias
e. Ninguna

7. USO DEL TIEMPO LIBRE
a. Otro trabajo
b. Labores domésticas
c. Recreación y deporte
d. Estudio
e. Ninguno

8. PROMEDIO DE INGRES OS (SMMLV)
a. Mínimo Legal (S.M.L.)
b. Entre 1 a 3 S.M.L.
c. Entre 4 a 6 S.M.L.
d. Más de 7 S.M.L.

9. ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA
a. Menos de 1 año
b. 1 a 5 años X
c. De 5 a 10 años
d. De 10 a 15 años
e. Más de 15 años

10. ANTIGÜEDAD EN EL CARGO ACTUAL
a. Menos de 1 año
b. De 1 a 5 años
c. De 5 a 10 años
d. De 10 a 15 años
e. Más de 15 años

11. HA PARTICIPADO EN ACTIVIDADES DE SALUD REALIZADAS POR LA EMPRESA
a. Vacunación
b. Salud Oral
c. Exámenes de laboratorio y otros
d. Exámenes médicos anuales
e. Ninguna

12. LE HAN DIAGNOSTICADO ALGUNA ENFERMEDAD
a. SI
b. No
Cual:
Frecuencia:

13. CONSUME BEBIDAS ALCOHOLICAS
a. Si
b. No
Frecuencia

___ Semanal
___ Quincenal
___ Mensual
___ Ocasional

14. PRACTICA ALGUN DEPORTE
a. SI X
b. No
Cual CICLISMO DE RUTA Y MTB

15. FUMA
a. SI
b. No
Promedio diario: _____

16. CUALES DE LAS SIGUIENTES MOLESTIAS HA SENTIDO CON FRECUENCIA EN LOS ULTIMOS SEIS (6) MESES

SINTOMA	SI	NO	EXPLIQUE
Dolor de cabeza		X	
Dolor de cuello, espalda y cintura		X	
Dolores musculares		X	
Dificultad para algún movimiento		X	
Tos frecuente		X	
Dificultad respiratoria		X	
Gastritis, ulcera		X	
Otras alteraciones del funcionamiento digestivo		X	
Alteraciones del sueño (Insomnio, somnolencia)		X	
Dificultad para concentrarse		X	
Mal genio		X	
Nerviosismo		X	
Cansancio mental		X	
Palpitaciones		X	
Dolor en el pecho (angina)		X	
Cambios visuales		X	
Cansancio, fatiga, ardor o disconfor visual		X X	
Pitos o ruidos continuos o intermitentes en los oídos		X X	
Dificultad para oír		X	
Sensación permanente de cansancio		X	
Alteraciones en la piel		X	
Otras alteraciones no anotadas		X	

7. EN EL DESARROLLO DE SU LABOR ENCUENTRA LAS SIGUIENTES CONDICIONADOS:
NIVEL ADMINISTRATIVO

CONDICION	SI	NO	POR QUE / CUAL/ OBSERVACIONES
¿Conoce los riesgos a los que está expuesto en su lugar de trabajo?	X		
¿Ha recibido capacitación sobre el manejo de los riesgos a los que está expuesto?	X		
¿Considera que la iluminación de su puesto de trabajo es adecuada?	X		
¿La temperatura de su sitio de trabajo le ocasiona molestias?	X		
¿En su sitio de trabajo hay presencia de polvo en el ambiente?	X		
¿Considera que los pisos, techos, paredes, escaleras, presentan riesgo para su salud?	X		
¿Existen cables sin entubar, empalmes defectuosos, tomas eléctricas sobrecargados, trasformadores defectuosos?		X	
¿Los sitios destinados para el almacenamiento son suficientes, poseen despacio adecuado y los insumos y productos se encuentran bien apilados?	X		
¿Las tareas que desarrolla le exigen realizar movimientos repetitivos?		X	
¿Permanece en una misma posición (sentado o de pie) durante más del 60% de la jornada de trabajo?		X	
¿La altura de la superficie de trabajo es la adecuada a su estatura, la silla y la labor que realiza?	X		
¿Tiene espacio suficiente para variar la posición de las piernas y rodillas?	X		
¿La silla es cómoda y permite ajustarlo a su medida?	X		
¿En general dispone de espacio suficiente para realizar el trabajo con holgura?	X		
¿Su trabajo le exige mantenerse frente a la pantalla del computador más del 50% de la jornada?		X	
¿Al finalizar la jornada laboral, el cansancio que se siente podría calificarse de "normal"?	X		
¿Considera adecuada la distribución del horario de trabajo, de los turnos, de las horas de descanso, horas extras y pausas?	X		
¿El trabajo que desempeña le permite aplicar sus habilidades y conocimientos?	X		
¿Su jefe le pide opinión sobre asuntos relacionados con su trabajo?	X		
¿La empresa cuenta con agua potable?	X		
¿Existe buen manejo de basuras y desechos?	X		

CONSENTIMIENTO INFORMADO
Ley 1581 de 2012: de protección de datos personales, es una ley que complementa la regulación vigente para la protección del derecho fundamental que tienen todas las personas naturales a autorizar la información personal que es almacenada en bases de datos o archivos, así como su posterior actualización y rectificación.

A. SI x
B. NO____

Nombre: CARLOS ANDRES FIGUEROA AYALA

CC: 1049629534

Firma:

Fecha Diligenciamiento 20/06/2025

EVALUACIÒN DE INDUCCIÒN Y REINDUCCIÒN SST – MA
SOLIUN SAS

CÒDIGO: SST-FR-002
VERSIÓN: 1
FECHA DE ELABORACIÒN: 24/01/2022

Nombre:
CARLOS ANDRES FIGUEROA AYALA

Fecha:
20/06/2025

Cargo:
DIRECTOR

Proyecto/área:
IDRD 4080

1. El Consorcio dentro de sus servicios ofrecidos se encuentran:

a. Interventoría, diseño y construcción de parques y escenarios deportivos.
b. Asesoría comercial y administrativa a empresas industriales.
c. Construcción de viviendas de interés social.

2. Nombre uno de los compromisos frente a seguridad y salud en el trabajo a los que se compromete la empresa: ENTREGAR EPP E IMPLEMENTAR SGSST

3. Marque con una X los elementos de protección personal que debe usar para ingresar a obra:



4. Al frente de cada definición escriba a cuál corresponde cada una, puede ser: Accidente, incidente y Enfermedad Laboral.

1. Contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar: Enfermedad Laboral
2. Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, el cual NO produce lesión Incidente
3. Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Accidente

5 cuando se presente un accidente y/o incidente de trabajo usted debe:

a Llamar al 911 de inmediato
b Comunicarse con sus acudientes
c Informar inmediatamente al residente SST o jefe inmediato.

6 con qué frecuencia se reúne el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST

a. Una vez al mes
b. Al iniciar y/o finalizar cada proyecto
c. Una vez a la semana

7. Que es el comité de convivencia laboral

a. Es el grupo que se encarga de hacer los mantenimientos locativos de la empresa.

b Es el órgano que se encarga de controlar la hora de llegada de los trabajadores

c. Es un grupo que busca contribuir a proteger a los trabajadores, contra los riesgos psicosociales, como estrés ocupacional y el acoso laboral.

8. Nombre dos tipos de brigadas que existen:

a.

Primeros Auxilios

b.

Evacuación

9. Cuál de las siguientes acciones NO es una medida del Plan de Manejo Ambiental en obra:

a. Mantenimiento de baterías sanitarias.

b. Prueba de Concretos

c. Protección de sumideros y árboles.

10. Un residuo de construcción y demolición -RCD es:

a. Residuos de tejidos, órganos, partes y fluidos corporales.

b. Son los que contienen una base mineral o sintética que se generan en labores de mantenimiento.

c. Residuos generados en un proyecto de infraestructura que según sus características pueden ser o no susceptibles de aprovechamiento.

11. ¿Cuál es el porcentaje de aprovechamiento de los materiales?:

R: 25%

REVISADO Y APROBADO

	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	SST-FR-003 Versión: 1 Fecha elaboración: 27/11/2023

Nombre: CARLOS ANDRES FIGUEROA AYALA **Cargo:** DIRECTOR

N° CC 1049629634 **Proyecto/área:** IDRD 4080

1. **Descripción:** A continuación, se le notifican los riesgos a los cuales se encuentra expuesto relacionados con su cargo, ya sea profesional, ingeniero, inspector, coordinador, residente, director, apoyo, entre otros
2. **Elementos de Protección personal de** acuerdo al cargo: (marque con una "X", según corresponda)



3 **Riesgos Existentes**

Biológico		Físico		Químico		Psicosocial		Biomecánico		De Seguridad		Fenómenos Naturales *	
Virus	X	Ruido (impacto intermitente y continuo)	X	Polvos orgánicos inorgánicos		Gestión organizacional (estilo de mando, pago, contratación, participación, inducción y capacitación, bienestar social, evaluación del desempeño, manejo de cambios)	X	Postura (prolongada mantenida, forzada, antigravitacional)		Mecánico (elementos de máquinas, herramientas, piezas a trabajar, materiales proyectados sólidos o fluidos)		Sismo	X
Bacterias		Iluminación (falta, exceso o deficiencia)	X	Fibras		Características de la organización del trabajo (comunicación, tecnología, organización del trabajo, demandas cualitativas y cuantitativas de la labor	X	Esfuerzo		Eléctrico (alta y baja tensión, estática)		Tormenta	X
Hongos		Vibración (cuerpo entero, segmentaria)		Líquidos (nieblas y rocíos)		Características del grupo social del trabajo (relaciones, cohesión, calidad de interacciones, trabajo en equipo)	X	Movimiento repetitivo		Locativo (sistemas y medios de almacenamiento, superficies de trabajo (irregularidades, deslizantes, con diferencia del nivel) condiciones de orden y aseo, (caídas de objeto)	X	Vendaval	
Ricketsias		Temperaturas extremas (calor y frío)	X	Gases y vapores		Características de la tarea (carga mental, contenido de la tarea, demandas emocionales, sistemas de control, definición de roles, monotonía, etc)	X	Manipulación manual de cargas		Tecnológico (explosión, fuga, derrame, incendio)		Inundación	X
Parásitos		Presión atmosférica (normal y ajustada)		Humos metálicos, no metálicos		Interfase persona tarea (conocimientos, habilidades con relación a la demanda de la tarea, iniciativa, autonomía y reconocimiento, identificación de la persona con la tarea y la organización				Accidentes de tránsito	X	Derrumbe	
Picaduras		Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y				Jornada de trabajo, pausas, trabajo nocturno, rotación, horas extras descansos)				Público (Robos, atracos, asaltos, atentados, de orden público, etc)	X	Precipitaciones, (lluvias granizadas, heladas)	X
Mordeduras		Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta		Material particulado	X					Trabajo en Alturas			
Plantas o exoesqueletos		Disconfort Térmico								Trabajo en Espacios Confinados			

* Tener en cuenta únicamente los peligros de fenómenos naturales que afectan la seguridad y bienestar de las personas en el desarrollo de una actividad. En el plan de emergencias de cada empresa, se consideraran todos los fenómenos naturales que pudieran afectarla.

Yo CARLOS FIGUEROA identificado(a) con Cedula de ciudadanía 1049629534, declaro que he sido notificado de todos los riesgos a los cuales puedo estar expuesto durante la jornada laboral y me comprometo a cumplir las normas de seguridad y otras disposiciones establecidas, por la empresa para prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, de conformidad firmo este documento.

Firma del trabajador

20/06/2025

Fecha

Cendiatra

CERTIFICADO EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL PERIODICO

SEDE: CENDIATRA CONNECTA
DIRECCIÓN: Av. Calle 26 # 92-32, Connecta Plaza 1-L04, Connecta 26
CIUDAD DE LA SEDE: BOGOTÁ
TELÉFONO: 6017424612 - 6017428691
EMAIL: citas.connecta@cendiatra.com
FECHA EXAMEN: 2023-12-11

Nombres y apellidos: CARLOS ANDRES FIGUEROA AYALA **CC:** 1049629534
Fecha de nacimiento: 04/05/1992 **Edad:** 31 **Sexo:** MASCULINO
Empresa: SOLIUN INGENIERIA S.A.S **Fecha ingreso:** 2023-12-11 / 10:27:41
Empresa usuaria: **Fecha salida:** 2023-12-11 / 11:19:55
Cargo: COORDINADOR DE PROYECTOS Y ESPECIALISTA EN VIAS



EXÁMENES REALIZADOS

- EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL PERIODICO
- ENFASIS OSTEOMUSCULAR
- VISIOMETRIA
- AUDIOMETRIA OCUPACIONAL

CONCEPTO DE APTITUD: SATISFACTORIO

:

INGRESO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA:
CONDICIÓN VISUAL:

CONTINUAR CON USO DE CORRECCION OPTICA PERMANENTES , SE RECOMIENDA ACTUALIZARLAS

CONTROL ANUAL

La presente certificación se expide en base a la historia clínica ocupacional del trabajador, la cual tiene carácter confidencial y su manejo está regulado por la Resolución 1995 de 1999, Resolución 2346 de 2007, Resolución 1918 de 2009. Acepto las anteriores valoraciones Médicas realizadas, hago constar que la información suministrada sobre mi condición de salud es verdadera, y me comprometo a cumplir las recomendaciones y las restricciones a que haya lugar. Cualquier omisión o falsedad será causa justa de finalización del contrato. Artículo 62 CST. La firma de este documento no significa aceptación de los conceptos médicos expresados y de su contenido. Sirve adicionalmente para constatar quien presento la valoración.

JUDITH MARIA CHICO GARRIDO
RM: 45554372
Firma y sello del médico

CARLOS ANDRES FIGUEROA AYALA
CC: 1049629534
Firma del paciente

IDRD

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4080 DE 2024
CONSORCIO SANTA TERESA 28
DIRECCIÓN: CARRERA 70C No. 48 -55
TELÉFONO: 76530168 – 3013942384

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 - CAMPOS DEPORTIVOS"

INFORME MENSUAL No 8 – COMPONENTE CALIDAD

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE JUNIO DE 2025 AL 30 DE JUNIO DE 2025

TOMO __1___ DE _____

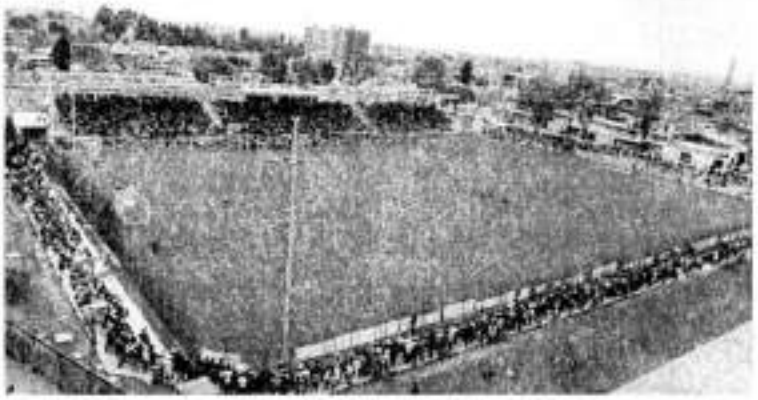


TABLA DE CONTROL

COPIA CONTROLADA	X	COPIA NO CONTROLADA	

	Nombre	Cargo	Firma
ELABORÓ	Vianney Leaño Urrego	Ingeniera Calidad Interventoría	
APROBÓ	Carlos Andres Figueroa	Director de Interventoría	

JUNIO DE 2025 / BOGOTÁ D.C.

CONTENIDO

1. CONDICIONES CONTRACTUALES 4
2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS 11
3. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS: 12
3.1. PERSONAL DE INTERVENTORIA: 12
3.2. PERSONAL DE CONTRATISTA 12
4. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CALIDAD 13
4.1. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DE CONTRATISTA 13
5. SEGUIMIENTO A LAS COMUNICACIONES: 14
5.1. ACTAS DE COMITÉ 14
5.2. CORRESPONDENCIA 14
5.2.1. CORRESPONDENCIA ENVIADA INTERVENTORÍA 14
5.2.2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA INTERVENTORÍA 16
5.3. BITÁCORA: 16
6. SEGUIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA Y PRESERVACIÓN 17
7. SEGUIMIENTO DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA 17
8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE ADQUISICIONES 17
9. SEGUIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y PRESERVACIÓN 17
10. CUMPLIMIENTO AL PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYO 18
10.1. CUMPLIMIENTO AL PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYO - INTERVENTORÍA 18
10.2. CUMPLIMIENTO AL PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYO - CONTRATISTA 18
11. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO 18
11.2. EQUIPOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO – INTERVENTORÍA 18
11.2. EQUIPOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO – CONTRATISTA 19
12. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA TRAZABILIDAD DE LOS MATERIALES 19
13. CONTROL DE CAMBIOS 36
14. SALIDAS NO CONFORMES 36
15. AUDITORIAS INTERNAS 36

LISTA DE ANEXOS

VER ANEXO 1. LISTADO DE DOCUMENTOS DE INTERVENTORÍA 17
VER ANEXO 2. LISTADO DE DOCUMENTOS DE CONTRATISTA 17
VER ANEXO 3. PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYO – INTERVENTORIA 18
VER ANEXO 4. PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYO – CONTRATISTA 18
VER ANEXO 5. SALIDAS NO CONFORMES 36
VER ANEXO 6. AUDITORIA INTERVENTORIA 36

INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde al seguimiento, verificación y control realizado por esta Interventoría en cumplimiento del contrato No. 4080 de 2024 suscrito entre CONSORCIO SANTA TERESA 28 y el INSTITUTO DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD, a las actividades ejecutadas por el Contratista de Obra: CONSORCIO INNOVAPARQUES de acuerdo con el contrato No. 4041 de 2024.

La revisión se efectuó para el periodo correspondiente al primer mes de ejecución del contrato de obra definido desde el **1 de JUNIO de 2025 hasta el 30 de JUNIO del 2025**, donde se tuvieron en cuentas los aspectos técnicos, administrativos, financieros, ambientales, SST y legales, según las condiciones contractuales establecidas; cabe resaltar que el seguimiento se realiza acorde con los lineamientos establecidos en el Anexo Técnico del contrato respectivo, así como lo indicado en la cartilla de lineamientos para el diseño de parques IDRD y el Manual de Interventoría del IDRD, entre otros aspectos.

De acuerdo con lo antes mencionado, dentro del presente informe se describen las labores realizadas por el Contratista en el periodo de tiempo enunciado anteriormente; así mismo, se presentan las observaciones, comentarios y recomendaciones a las actividades ejecutadas en el periodo reportado.

Finalmente, se resumen los estados de los Contratos de obra e interventoría, exponiendo al final del documento las respectivas conclusiones del estado del contrato de obra a la fecha de entrega de este reporte.

1. CONDICIONES CONTRACTUALES

1.1. OBJETO DEL CONTRATO

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

1.2. ALCANCE DEL CONTRATO

Los contratos objeto de interventoría son dos, considerando que la licitación pública para la adjudicación de las obras fue diseñada para la adjudicación en dos grupos, como se describe a continuación:

GRUPO 01: ***"MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS".***

1.3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se desarrolla en varios campos deportivos, ubicados en la ciudad de Bogotá D.C., los cuales se enuncian a continuación:

CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA SINTÉTICA:

ITEM	TIPO DE CANCHA	PARQUE	CÓDIGO IDRD	LOCALIDAD	DIRECCIÓN
1	SINTETICA	Servitá	01-023	Usaquén	Carrera 7H Calle 165
2	SINTETICA	Servitá	01-023	Usaquén	Carrera 7H Calle 165
3	SINTETICA	Cedritos	01-031	Usaquén	Carrera 9 Calle 145
4	SINTETICA	Toberín	01-079	Usaquén	Calle 164 Carrera 16 C
5	SINTETICA	Estrella norte	01-189	Usaquén	Calle 160 Carrera 19 B
6	SINTETICA	Verbenal	01-313	Usaquén	Calle 187 Transversal 18 B
7	SINTETICA	Urb. Calle 170 / Alameda	01-540	Usaquén	Carrera 17 Calle 175
8	SINTETICA	La Cabrera (Japón)	02-007	Chapinero	Av Carrera 11 Calle 87
9	SINTETICA	Tercer milenio	03-085	Santafé	Carrera 14 Calle 7
10	SINTETICA	Tercer milenio	03-085	Santafé	Carrera 14 Calle 7
11	SINTETICA	Tercer milenio	03-085	Santafé	Carrera 14 Calle 7
12	SINTETICA	Desarrollo Lourdes	03-122	Santafé	Carrera 1A Este Calle 3
13	SINTETICA	Laches la mina	03-148	Santafé	Diagonal 4B Cra 8 E
14	SINTETICA	Urb. Antioquia	04-038	San Cristóbal	Transversal 8a este Calle 50 b sur
15	SINTETICA	Gaitán cortes	04-103	San Cristóbal	Carrera 5 a este Diagonal 31 C sur
16	SINTETICA	La Victoria	04-122	San Cristóbal	Diagonal 38 Sur No. 1F - 05
17	SINTETICA	La Victoria	04-122	San Cristóbal	Diagonal 38 Sur No. 1F - 05
18	SINTETICA	San Cristóbal 2	04-127	San Cristóbal	Calle 13 sur N.º 2- 50 este
19	SINTETICA	San Cristobal1	04-127	San Cristóbal	Calle 13 sur N.º 2- 50 este

ITEM	TIPO DE CANCHA	PARQUE	CÓDIGO IDRD	LOCALIDAD	DIRECCIÓN
20	SINTETICA	Miravalle	05-042	Usme	Carrera 14 H Bis Calle 74 D sur
21	SINTETICA	Miravalle	05-042	Usme	Carrera 14 H Bis Calle 74 D sur
22	SINTETICA	Miravalle	05-042	Usme	Carrera 14 H Bis Calle 74 D sur
23	SINTETICA	Alfonso López	05-141	Usme	Carrera 5 G Calle 93 sur
24	SINTETICA	Nuevo Usme	05-459	Usme	Carrera 14 A Calle 137 B sur
25	SINTETICA	Nuevo milenio	05-476	Usme	Carrera 11 Calle 67 A Bis sur
26	SINTETICA	Nuevo milenio	05-476	Usme	Carrera 11 Calle 67 A Bis sur
27	SINTETICA	Laguneta	06-005	Tunjuelito	Cra 55 Diagonal 49 sur
28	SINTETICA	Urb. Tunjuelito	06-012	Tunjuelito	Cra 12 Calle 59 sur
29	SINTETICA	Nuevo Muzu	06-017	Tunjuelito	Diagonal 52 B sur Cra 61B
30	SINTETICA	El Tunal	06-063	Tunjuelito	Cra 24 A Cll 4B Sur Av Boyacá
31	SINTETICA	El Tunal	06-063	Tunjuelito	Cra 24 A Cll 4B Sur Av Boyacá
32	SINTETICA	El Tunal	06-063	Tunjuelito	Cra 24 A Cll 4B Sur Av Boyacá
33	SINTETICA	Tunal Alterna	06-063	Tunjuelito	Cra 24 A Cll 4B Sur Av Boyacá
34	SINTETICA	Naranjos	07-035	Bosa	Carrera 80 J Calle 70 A sur
35	SINTETICA	Timiza Villa del rio	07-036	Bosa	Carrera 65 Calle 55 A sur
36	SINTETICA	Autopista Sur (Pavco)	07-152	Bosa	Av. Calle 57 R sur (Aut. Sur) Carrera 72
37	SINTETICA	Clarelandia	07-163	Bosa	Calle 58 J sur Cra 80 G
38	SINTETICA	Clarelandia mini	07-163	Bosa	Calle 58 J sur Cra 80 G
39	SINTETICA	El Recreo	07-260	Bosa	Calle 69 A Sur 93D - 45
40	SINTETICA	La Esperanza	07-273	Bosa	Calle 75 BIS Sur (Av. C de Cali) Cra 80J
41	SINTETICA	La Tingua Tibanica	07-274	Bosa	Calle 73 D Sur Carrera 78 A hasta la 82 A Bis
42	SINTETICA	Urb. Chicala	07-292	Bosa	Av Carrera 86 Calle 55 sur
43	SINTETICA	Santiago de Atalaya	07-321	Bosa	Carrera 98 B Calle 61 A sur
44	SINTETICA	El Porvenir	07-391	Bosa	Av 1° de Mayo con Av Long de Occ
45	SINTETICA	El Porvenir	07-391	Bosa	Av 1° de Mayo con Av Long de Occ
46	SINTETICA	El Porvenir	07-391	Bosa	Av 1° de Mayo con Av Long de Occ
47	SINTETICA	El Porvenir	07-391	Bosa	Av 1° de Mayo con Av Long de Occ
48	SINTETICA	El Porvenir	07-391	Bosa	Av 1° de Mayo con Av Long de Occ
49	SINTETICA	Portal del Sol	07-403	Bosa	Carrera 95 A Calle 73 sur
50	SINTETICA	Ciudadela Campo Verde	07-436	Bosa	Carrera 95 A Calle 75 sur
51	SINTETICA	Ciudadela Campo Verde	07-436	Bosa	Carrera 95 A Calle 75 sur
52	SINTETICA	Ciudadela Campo Verde	07-436	Bosa	Carrera 95 A Calle 75 sur
53	SINTETICA	Carvajal	08-040	Kennedy	Cra 70 B Calle 24 A sur
54	SINTETICA	Villa Alsacia	08-065	Kennedy	Carrera 72 B Calle 11 A BIS
55	SINTETICA	Marsella Sector Norte I Etapa	08-066	Kennedy	Carrera 69 Calle 8
56	SINTETICA	Marsella Sector Norte I Etapa	08-066	Kennedy	Carrera 69 Calle 8
57	SINTETICA	Américas Occidental	08-127	Kennedy	Av. Boyacá Calle 2 sur

ITEM	TIPO DE CANCHA	PARQUE	CÓDIGO IDRD	LOCALIDAD	DIRECCIÓN
58	SINTETICA	Villa de los Sauces	08-180	Kennedy	Carrera 77 Bis Calle 58 C sur
59	SINTETICA	La Igualdad	08-212	Kennedy	Carrera 68A entre Calle 2
60	SINTETICA	Timiza	08-219	Kennedy	Carrera 72 P Calle 40 H sur
61	SINTETICA	Timiza	08-219	KENNEDY	Carrera 72 P Calle 40 H sur
62	SINTETICA	Las Luces y Villa Rica	08-533	Kennedy	Carrera 77 H Calle 52 A sur
63	SINTETICA	Gilma f11	08-552	Kennedy	Transversal 85 A Calle 49 sur
64	SINTETICA	Gilma f8	08-552	Kennedy	Transversal 85 A Calle 49 sur
65	SINTETICA	Gilma f5	08-552	Kennedy	Transversal 85 A Calle 49 sur
66	SINTETICA	Gilma f5	08-552	Kennedy	Transversal 85 A Calle 49 sur
67	SINTETICA	La Alejandra	08-568	Kennedy	Carrera 72 I Diagonal 40 a sur
68	SINTETICA	Lago Timiza I Etapa	08-626	Kennedy	Carrera 73 Calle 43 sur
69	SINTETICA	Primavera	08-770	Kennedy	Calle 2 Carrera 91 C
70	SINTETICA	Modelia	09-016	Fontibon	Carrera 81 C N°24 c 50
71	SINTETICA	Villa Helena Villemar	09-026	Fontibón	Carrera 96 G N°20 A 35
72	SINTETICA	Carlos Lleras (El Fuego)	09-048	Fontibón	Carrera 70 Calle 23 C
73	SINTETICA	Urb. Ciudad Hayuelos	09-200	Fontibón	Calle 19 A Carrera 80 A
74	SINTETICA	Urb. Ciudad Hayuelos	09-200	Fontibón	Calle 19 A Carrera 80 A
75	SINTETICA	Villas del Madrigal	10-002	Engativá	Calle 75 C Carrera 99 B
76	SINTETICA	Villa Luz	10-018	Engativá	Carrera 77A 64B - 03
77	SINTETICA	Villa Luz	10-018	Engativá	Carrera 77A 64B - 03
78	SINTETICA	Florencia Los Tronquitos	10-028	Engativá	Carrera 91 A Calle 75 C
79	SINTETICA	La Europa	10-045	Engativá	Carrera 71 D Calle 67
80	SINTETICA	Villa de Granada	10-102	Engativá	Cra 111A Calle 75D
81	SINTETICA	Bachué	10-117	Engativá	Carrera 95 Calle 90 A
82	SINTETICA	Ciudad Honda	10-153	Engativá	Carrera 68 G Calle 64 H
83	SINTETICA	El Carmelo	10-169	Engativá	Carrera 101 A Calle 71B
84	SINTETICA	El Carmelo	10-169	Engativá	Carrera 101 A Calle 71B
85	SINTETICA	Juan Amarillo	10-171	Engativá	Carrera 111A Av Calle 90
86	SINTETICA	Juan Amarillo	10-171	Engativá	Carrera 111A Av Calle 90
87	SINTETICA	Juan Amarillo	10-171	Engativá	Carrera 111A Av Calle 90
88	SINTETICA	Juan Amarillo	10-171	Engativá	Carrera 111A Av Calle 90
89	SINTETICA	Juan Amarillo	10-171	Engativá	Carrera 111A Av Calle 90
90	SINTETICA	Juan Amarillo	10-171	Engativá	Carrera 111A Av Calle 90
91	SINTETICA	Normandía	10-190	Engativá	Carrera 73 Calle 51
92	SINTETICA	Bonanza	10-215	Engativá	Carrera 70 F Calle 75
93	SINTETICA	San Andrés	10-234	Engativá	Carrera 102 con Calle 79
94	SINTETICA	San Andrés	10-234	Engativá	CALLE 82 CARRARA 102
95	SINTETICA	Florencia	10-249	Engativá	Carrera 88 Calle 75
96	SINTETICA	UDS Unidad Deportiva El Salitre	10-290	Engativá	CALLE63 CARERA AV 68
97	SINTETICA	Petar Salitre	10-531	Engativá	Carrera 120 Calle 80 A Bis
98	SINTETICA	Ciudadela Cafam	11-008	Suba	Cra 113 C Calle 142 A
99	SINTETICA	Berlín	11-015	Suba	Calle 142 Carrera 145 B

ITEM	TIPO DE CANCHA	PARQUE	CÓDIGO IDRD	LOCALIDAD	DIRECCIÓN
100	SINTETICA	Cantalejo	11-036	Suba	Carrera 55 Calle 160
101	SINTETICA	Urb Lombardía (1 Etapa)	11-052	Suba	Calle 143 Carrera 107B
102	SINTETICA	Burgos britalia1	11-058	Suba	Carrera 73 Calle 160
103	SINTETICA	Burgos britalia2	11-058	Suba	Carrera 73 Calle 160
104	SINTETICA	Casa Blanca	11-069	Suba	Carrera 68 entre Calles 140 Y 141
105	SINTETICA	Bilbao	11-074	Suba	Calle 142 C Carrera 151 A
106	SINTETICA	Tibabuyes1	11-084	Suba	Carrera 121 C Calle 130 C
107	SINTETICA	Tibabuyes2	11-084	Suba	Carrera 121 C Calle 130 C
108	SINTETICA	Prado Pinzón	11-109	Suba	Calle 143 Carrera 49
109	SINTETICA	Cafam Suba II (Los Gavilanes)	11-1101	Suba	Carrera 143 Calle 142 A
110	SINTETICA	Urb. Mazurén I Sector	11-161	Suba	Calle 152 Carrera 50
111	SINTETICA	Victoria norte	11-162	Suba	Calle 150 Carrera 54
112	SINTETICA	Cometas	11-204	suba	Av Calle 127 Carrera 87 A
113	SINTETICA	Lindaraja	11-309	suba	Carrera 78 Calle 127 D
114	SINTETICA	Fontanar del Rio	11-368	Suba	Diagonal 145 Carrera 122
115	SINTETICA	Fontanar del Rio	11-368	Suba	Diagonal 145 Carrera 122
116	SINTETICA	Fontanar del Rio	11-368	Suba	Diagonal 145 Carrera 122
117	SINTETICA	Vilanova	11-668	suba	Carrera 54 D Calle 186
118	SINTETICA	Valle de Refous	11-686	Suba	Cra 101 calle 150a
119	SINTETICA	PRD 1	12-091	Barrios Unidos	Transversal 48 N°63-65
120	SINTETICA	PRD 2	12-091	Barrios Unidos	Transversal 48 N°63-65
121	SINTETICA	Santa Clara	13-015	Teusaquillo	Carrera 46 Calle 22 A
122	SINTETICA	Urb Salitre (Greco)	13-016	Teusaquillo	Carrera 66 B Calle 43
123	SINTETICA	Arena Movistar	13-128	Teusaquillo	Av Carrera 30 Diagonal 61 C
124	SINTETICA	Arena Movistar	13-128	Teusaquillo	Av Carrera 30 Diagonal 61 C
125	SINTETICA	La pepita	14-008	Mártires	Calle 10 Carrera 26
126	SINTETICA	Santa Isabel La Fragua	15-021	Antonio Nariño	Calle 8 Sur con Carrera 27
127	SINTETICA	Santa Isabel La Fragua	15-021	Antonio Nariño	Calle 8 Sur con Carrera 27
128	SINTETICA	Luna Park	15-029	Antonio Nariño	Carrera 14 Calle 13 sur
129	SINTETICA	Villa Mayor	15-036	Antonio Nariño	Calle 32 A sur Carrera 34 C
130	SINTETICA	Fragua	15-040	Antonio Nariño	Carrera 31 N.º 14 B 57 sur
131	SINTETICA	Champion Primavera	16-012	Pte Aranda	Transv 42 A Calle 5A
132	SINTETICA	Milenta tejar san eusebio	16-099	Pte Aranda	Carrera 52 B Calle 20 sur
133	SINTETICA	Montes 1	16-112	Pte Aranda	Calle 10 sur N°39 - 29
134	SINTETICA	Montes2	16-112	Pte Aranda	Calle 10 sur N°39 - 29
135	SINTETICA	Gorgonzola	16-126	Pte Aranda	Carrera 41 A Calle 5
136	SINTETICA	Pradera sur	16-153	Pte Aranda	Av calle 3 Carrera 66

ITEM	TIPO DE CANCHA	PARQUE	CÓDIGO IDRD	LOCALIDAD	DIRECCIÓN
137	SINTETICA	Jazmín	16-204	Pte Aranda	Av. Carrera 50 Calle 1 D
138	SINTETICA	Parque Industrial (El Nectar)	16-415	Pte Aranda	Cll 10 AV Cra 36
139	SINTETICA	Parque Industrial (El Nectar Polideportivo)	16-416	Pte Aranda	Cll 11 A AV Cra 36
140	SINTETICA	La Catedral - Candelaria	17-028	La Candelaria	Calle 12f No 3-27
141	SINTETICA	Urb. Gustavo Restrepo	18-009	Rafael Uribe	Calle 28 Sur Carrera 15A
142	SINTETICA	Bosque San Carlos	18-028	Rafael Uribe	Carrera 12 Bis
143	SINTETICA	Palermo Sur	18-035	Rafael Uribe	Carrera 1 Este Calle 49 C sur
144	SINTETICA	Marruecos	18-041	Rafael Uribe	Calle 48 P sur Carrera 5L
145	SINTETICA	Molinos	18-055	Rafael Uribe	Transversal 5 Calle 48 L sur
146	SINTETICA	Santa Lucia	18-073	Rafael Uribe	Carrera 14 Calle 41 B sur
147	SINTETICA	Santa Lucia	18-073	Rafael Uribe	Carrera 14 Calle 41 B sur
148	SINTETICA	Parque Olaya Herrera	18-207	Rafael Uribe	Carrera 21 25-35 Sur
149	SINTETICA	San José	18-429	Rafael Uribe	Calle 26 Sur y Av 1 de Mayo con Cra 12 D
150	SINTETICA	Domingo Lain	19-032	Ciudad Bolívar	Calle 64 C sur Transv 17N
151	SINTETICA	Arborizadora Alta	19-058	Ciudad Bolívar	Diagonal 73 A sur Transversal 36 B
152	SINTETICA	La Coruña	19-115	Ciudad Bolívar	Calle 58 Bsur Carrera 47
153	SINTETICA	Sierra Morena	19-190	Ciudad Bolívar	Transversal 73 B Calle 75A sur
154	SINTETICA	Sierra Morena	19-190	Ciudad Bolívar	Transversal 73 B Calle 75A sur
155	SINTETICA	Illimani (Paraíso)	19-346	Ciudad Bolívar	Calles 71 P Sur Transversal 27 H
156	SINTETICA	Ilimani	19-346	Ciudad Bolívar	Calles 71 P Sur Transversal 27 H
157	SINTETICA	Buenavista- Porvenir	19-347	Ciudad Bolívar	Carrera 17 F Calle 76 A sur
158	SINTETICA	El Taller- El Ensueño	19-348	Ciudad Bolívar	Carrera 75A Diagonal 68 A
159	SINTETICA	Paraíso	19-490	Ciudad Bolívar	Cra 27 Q Calle 71 K sur
160	SINTETICA	Caracolí	19-710	Ciudad Bolívar	Carrera 74 B Calle 77 sur
161	SINTETICA	Balmoral Guadalupe	19-750	Ciudad Bolívar	Autopista sur Carrera 71
162	SINTETICA	Altos de la Estancia	19-756	Ciudad Bolívar	Carrera 76 C Diagonal 67 a sur
163	SINTETICA	Altos de la Estancia	19-756	Ciudad Bolívar	Carrera 76 C Diagonal 67 a sur
164	SINTETICA	Mirador illimani	19-788	Ciudad Bolívar	Carrera 27 C Diagonal 70 U Bis sur
165	SINTETICA	San José Maryland	07-164	Bosa	Carrera 86 Calle 73 G sur
166	SINTETICA	Aurora	05-002	USME	Calle 71 F sur Carrera 14 V (Av Boyacá)
167	SINTETICA	Valles de Cafam	05-003	USME	Calle 92 sur Carrera 14 I
168	SINTETICA	Villa Alemana	05-087	USME	Carrera 5 este (Aup Llano) Calle 100 sur
169	SINTETICA	Pijaos	18-090	Rafael Uribe	Av Cra 10 Calle 35 sur
170	SINTETICA	Cruces	03-036	Santafé	Carrera 5 A Calle 1 B
171	SINTETICA	La Gaitana	11-205	SUBA	Carrera 125 B Calle 131 A
172	SINTETICA	Gimnasio del Norte	12-023	Barrios Unidos	Carrera 28 Calle 63 B
173	SINTETICA	Eduardo Santos	14-030	Mártires	Carrera 18 C Calle 4 A
174	SINTETICA	Dindalito	08-144	Kennedy	Carrera 94 C Calle 42 sur

ITEM	TIPO DE CANCHA	PARQUE	CÓDIGO IDRD	LOCALIDAD	DIRECCIÓN
175	SINTETICA	Castilla	08-200	Kennedy	Carrera 74 Calle 8A Bis
176	SINTETICA	Cayetano Cañizares	08-241	Kennedy	Carrera 80 Calle 40 C sur
177	SINTETICA	Estancia	19-231	Ciudad Bolivar	Calle 58 C sur Carrera 74 C
178	SINTETICA	La Joya	19-349	Ciudad Bolivar	Carrera 18 I Calle 80 B sur
179	SINTETICA	Urb Metrópolis	12-035	Barrios Unidos	Carrera 66 Calle 84
180	SINTETICA	Urb La Laguna 1 (Venecia)	06-006	Tunjuelito	Carrera 53 A Diagonal 47 A sur
181	SINTETICA	Urb La Laguna 2 (Venecia)	06-006	Tunjuelito	Carrera 53 A Diagonal 47 A sur

CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL:

ITEM	TIPO DE CANCHA	PARQUE	CÓDIGO IDRD	LOCALIDAD	DIRECCIÓN
1	NATURAL	EL TUNAL (Estadio)	06-063	Tunjuelito	Carrera 7H Calle 165
2	NATURAL	EL TUNAL (Softbol)	06-063	Tunjuelito	Carrera 7H Calle 165
3	NATURAL	TIMIZA (Estadio)	08-219	Kennedy	Carrera 9 Calle 145
4	NATURAL	ATAHUALPA (Estadio)	09-104	Fontibón	Calle 164 Carrera 16 C
5	NATURAL	SIMON BOLIVAR - Sector Parque Deportivo el Salitre (Estadio)	12-091	Barrios Unidos	Calle 160 Carrera 19 B
6	NATURAL	SIMON BOLIVAR - Sector Parque Deportivo el Salitre (Alterna 3)	12-091	Barrios Unidos	Calle 187 Transversal 18 B
7	NATURAL	SIMON BOLIVAR - Sector Parque Deportivo el Salitre (Playa - 1)	12-091	Barrios Unidos	Carrera 17 Calle 175
8	NATURAL	TABORA	10-192	Engativá	Av Carrera 11 Calle 87
9	NATURAL	EL COUNTRY (Club)	01-1000	Usaquén	Carrera 14 Calle 7
10	NATURAL	SIMON BOLIVAR - Sector Unidad Deportivo el Salitre (UDS Beisbol)	10-290	Engativá	Carrera 14 Calle 7
11	NATURAL	SIMON BOLIVAR - Sector Unidad Deportivo el Salitre (UDS Atletismo)	10-290	Engativá	Carrera 14 Calle 7
12	NATURAL	SIMON BOLIVAR - Sector Unidad Deportivo el Salitre (UDS Atletismo) MARTE	10-290	Engativá	Carrera 1A Este Calle 3
13	NATURAL	SIMON BOLIVAR - Sector Unidad Deportivo el Salitre (UDS Sotfbol)	10-290	Engativá	Diagonal 4B Cra 8 E
14	NATURAL	SIMON BOLIVAR - Sector Unidad Deportivo el Salitre (UDS Voleibol)	10-290	Engativá	Transversal 8a este Calle 50 b sur

ITEM	TIPO DE CANCHA	PARQUE	CÓDIGO IDRD	LOCALIDAD	DIRECCIÓN
15	NATURAL	SAN CRISTOBAL (Estadio)	04-127	San Cristóbal	Carrera 5 a este Diagonal 31 C sur
16	NATURAL	PARQUE NACIONAL (PM-2A) ENRIQUE OLAYA HERRERA (Sector Historico)	03-035	Santa Fé	Diagonal 38 Sur No. 1F - 05
17	NATURAL	CIUDAD MONTES	16-112	Puente Aranda	Diagonal 38 Sur No. 1F - 05
18	NATURAL	CIUDAD MONTES (Softbol)	16-112	Puente Aranda	Calle 13 sur N.º 2- 50 este
19	NATURAL	CIUDAD MONTES (2 de Playa)	16-112	Puente Aranda	Calle 13 sur N.º 2- 50 este
20	NATURAL	UNIDAD DEPORTIVA LA ALQUERIA	16-024	Puente Aranda	Carrera 14 H Bis Calle 74 D sur
21	NATURAL	MILENTA TEJAR SAN EUSEBIO	16-099	Puente Aranda	Carrera 14 H Bis Calle 74 D sur
22	NATURAL	NUEVO MUZU	06-017	Tunjuelito	Carrera 14 H Bis Calle 74 D sur
23	NATURAL	LA SERENA	10-223	Engativá	Carrera 5 G Calle 93 sur
24	NATURAL	URBANIZACION BOCHICA	16-037	Puente Aranda	Carrera 14 A Calle 137 B sur
25	NATURAL	URBANIZACION LOS ANGELES PRIMER SECTOR	10-186	Engativá	Carrera 11 Calle 67 A Bis sur
26	NATURAL	PARQUE JUAN AMARILLO	10-171	Engativá	Carrera 11 Calle 67 A Bis sur
27	NATURAL	ATAHUALPA I PREDIO - El Cajon Sector I	09-024	Fontibón	Cra 55 Diagonal 49 sur
28	NATURAL	MARSELLA SECTOR NORTE I ETAPA - Pinos de Marsella	08-066	Kennedy	Cra 12 Calle 59 sur
29	NATURAL	SIMON BOLIVAR - Sector Complejo Acuatico (1, 2,3 Playa)	12-1000	Barrios Unidos	Diagonal 52 B sur Cra 61B
30	NATURAL	LA GAITANA	11-205	Suba	Cra 24 A Cll 4B Sur Av Boyacá
31	NATURAL	LA FLORIDA 1	10-311	Engativá	Cra 24 A Cll 4B Sur Av Boyacá
32	NATURAL	LA FLORIDA 2	10-311	Engativá	Cra 24 A Cll 4B Sur Av Boyacá
33	NATURAL	LA FLORIDA 3	10-311	Engativá	Cra 24 A Cll 4B Sur Av Boyacá
34	NATURAL	LA FLORIDA 4	10-311	Engativá	Carrera 80 J Calle 70 A sur
35	NATURAL	LA FLORIDA 5	10-311	Engativá	Carrera 65 Calle 55 A sur
36	NATURAL	LA FLORIDA 6	10-311	Engativá	Av. Calle 57 R sur (Aut. Sur) Carrera 72
37	NATURAL	LA FLORIDA 7	10-311	Engativá	Calle 58 J sur Cra 80 G
38	NATURAL	LA FLORIDA 8	10-311	Engativá	Calle 58 J sur Cra 80 G

ITEM	TIPO DE CANCHA	PARQUE	CÓDIGO IDRD	LOCALIDAD	DIRECCIÓN
39	NATURAL	LA FLORIDA 9	10-311	Engativá	Calle 69 A Sur 93D - 45
40	NATURAL	LA FLORIDA MARACANA 1	10-311	Engativá	Calle 75 BIS Sur (Av. C de Cali) Cra 80J
41	NATURAL	LA FLORIDA MARACANA 2	10-311	Engativá	Calle 73 D Sur Carrera 78 A hasta la 82 A Bis
42	NATURAL	PARQUE DEL RIO (SAN JOSE DE MARYLAND)	07-164	Bosa	Av Carrera 86 Calle 55 sur
43	NATURAL	AUTOPISTA SUR (Pavco)	07-152	Bosa	Carrera 98 B Calle 61 A sur

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

CONTRATO DE OBRA

No. de contrato	4041 DE 2024
Contratista Consultoría y/obra	CONSORCIO INNOVAPARQUES
Objeto	"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 - "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS".
Plazo de la ejecución etapa de obra	OCHO (08) MESES
Prorroga No. 1	TRES (03) MESES
Plazo total del contrato	ONCE (11) MESES
Valor etapa de obra	$ 5.200.000.000,00
Valor adición No. 1	$ 2.847.000.000,00
Valor total del contrato	$ 8.047.000.000,00
Fecha Inicio	20 de noviembre de 2024
Fecha de Terminación del actualizada:	19 de octubre de 2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

No. de contrato	4080 DE 2024
Contratista de Interventoría	CONSORCIO SANTA TERESA 28
Objeto	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2"
Periodo etapa de obra	OCHO (08) MESES
Plazo de liquidación	UN (01) MES
Prorroga No. 1	TRES (03) MESES
Plazo total del contrato	DOCE (12) MESES

Valor etapa de obra	$ 2.107.109.833,00
Adición No. 1	$ 322.109.701,00
Valor total del contrato	$ 2.429.219.534,00
Fecha Inicio	20 de noviembre de 2024
Fecha de terminación actualizada:	19 de noviembre de 2025

3. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS:

3.1. PERSONAL DE INTERVENTORIA:

Se relaciona en la siguiente tabla los profesionales contractuales correspondientes al contrato de interventoria, teniendo en cuenta que los resaltados en rojo salen del proyecto:

PERSONAL INTERVENTORÍA			
CARGO A DESEMPEÑAR	**NOMBRE**	**% DEDICACIÓN**	**RADICADO IDRD**
DIRECTOR DE OBRA	RAUL ORLANDO DELGADO	72%	IDRD-4080-G1-2024-004
DIRECTOR DE OBRA	CARLOS ANDRES FIGUEROA	72%	IDRD-4080-G1-2024-272
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARIA CLAUDIA MAHECHA	80%	IDRD-4080-G1-2024-004
PROFESIONAL SST	LAURA SOFIA FERNANDEZ	92%	IDRD-4080-G1-2024-004
TOPOGRAFO	JUAN CARLOS RAMIREZ	33%	IDRD-4080-G1-2024-004
CADENERO I	RUBEN DARIO MARQUEZ	33%	IDRD-4080-G1-2024-004
CADENERO II	RAFAEL SANABRIA PIÑEROS	20%	IDRD-4080-G1-2024-004
ABOGADA	LINA DEL PILAR RODRIGUEZ	3%	IDRD-4080-G1-2024-004
CONTADORA	SOLBEY MAYERLY DUQUE	3%	IDRD-4080-G1-2024-004
SECRETARIA	LIZETH ALEIDA CASTILLO	8%	IDRD-4080-G1-2024-004
INSPECTOR 1	ANDRES GIOVANNY CORDOBA	100%	IDRD-4080-G1-2024-004
INSPECTOR 2	DIEGO ANDRES GALE	100%	IDRD-4080-G1-2024-004
INSPECTOR 3	SERGIO ANDRES PEDREROS	100%	IDRD-4080-G1-2024-004
ASESOR AGRONOMO	HENRY ANANIAS CABEZA CEPEDA	60%	IDRD-4080-G1-2024-004

Tabla 1. Personal de interventoría

3.2. PERSONAL DE CONTRATISTA

Durante el periodo del presente informe, no se cuenta con cambios en los profesionales de contratista, lo cuales se encuentran descritos en la siguiente tabla:

PERSONAL CONTRATISTA				
CARGO A DESEMPEÑAR	NOMBRE	RADICADO	FECHA APROBACIÓN	DEDICACIÓN
Director del Proyecto	EDWIN JAVIER LINARES GARCIA	IDRD-4080-G1-2024-030	06 DE DICIEMBRE DE 2024	22,40%
Asesor agrónomo	JAVIER GUTIERREZ PINEDA	IDRD-4080-G1-2024-030	06 DE DICIEMBRE DE 2024	80%
Residente	CAMILO ANDRES ROJAS ZAPATA	IDRD-4080-G1-2024-030	06 DE DICIEMBRE DE 2024	60%
Profesional de seguridad industrial	ANDREA MARCELA LOPEZ ECHEVERRY	IDRD-4080-G1-2024-030	06 DE DICIEMBRE DE 2024	34%
Inspector	JHONY FERNEY DIAZ DAZA	IDRD-4080-G1-2024-030	06 DE DICIEMBRE DE 2024	100%
Inspector	OSCAR MAURICIO ACEVEDO BERNAL	IDRD-4080-G1-2024-030	06 DE DICIEMBRE DE 2024	100%
Inspector	BRAYAN STIVENS GARCIA GARCIA	IDRD-4080-G1-2024-030	06 DE DICIEMBRE DE 2024	100%
Topógrafo	ALEJANDRO ESTEVE SARAY HERNANDEZ	IDRD-4080-G1-2024-030	06 DE DICIEMBRE DE 2024	11,95%
Cadenero 1	JUAN CARLOS SANABRIA NUNZABA	IDRD-4080-G1-2024-030	06 DE DICIEMBRE DE 2024	11,95%
Secretaria	DEASSI MAGALY VELASQUEZ QUEVEDO	IDRD-4080-G1-2024-030	06 DE DICIEMBRE DE 2024	5%

Tabla 2. Personal de Contratista

4. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CALIDAD

4.1. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DE CONTRATISTA

Teniendo en cuenta el documento aprobado y las gestiones realizadas por el contratista en el desarrollo del periodo no se cuenta con las evidencias de cumplimiento del plan de calidad v.2 propuesto, ni los soportes de seguimiento y cumplimiento del Plan de Inspección y ensayo, esto dado a que las evidencias de cumplimiento deben ser reflejadas en los informes periódicos presentados.

Con base a lo anterior, se ha realizado por parte de esta interventoría las solicitudes y requerimientos:

- Se realiza la solicitud de entrega de reporte semanal materiales, lo cual no se presenta por parte del contratista
- Se solicita presentar la trazabilidad de ensayos de materiales de acuerdo a frecuencia aprobada en el plan de inspección y ensayos aprobado IDRD-4080-G1-2024-251 - Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-189 Solicitud Soportes Plan de Inspección y Ensayo, lo cual a la fecha no se ha surtido, dado esto

el contrasta realiza la documentación de acción correctiva en la cual en su plan de acción plantea realizar la presentación de la información en el informe del periodo N° 9

A la fecha de la presentación de este informe de interventoría, el informe N°8 no ha sido presentado por el contratista, y el Informe de Calidad N°7 en su segunda versión es aprobado por medio del oficio IDRD-4080-G1-2024-274, está pendiente su radicación a la entidad.

5. SEGUIMIENTO A LAS COMUNICACIONES:

Los mecanismos de comunicación con el cliente y el contratista son realizados por medio de actas de comité de obra, correspondencia enviada y recibida, correo electrónico y bitácora de obra.

Toda la correspondencia es controlada de tal forma que su trazabilidad y seguimiento se realice de forma adecuada y dentro de los tiempos requeridos por la entidad.

5.1. ACTAS DE COMITÉ

El control de las actas de comité se realiza por medio del seguimiento de los compromisos los cuales son consolidados para seguimiento en cada comité. Las actas que evidencian el cumplimento de los comités periódicos se encuentran anexas en el informe técnico de Interventoria.

De acuerdo con el proceso de ejecución de las labores realizadas para el periodo objeto del presente informe en el **(ANEXO 03 del Informe Técnico N°6)** se adjuntan las actas suscritas en el periodo.

ACTA DE SEGUIMIENTO	FECHA
Acta No. 27	05/06/2025
Acta No. 28	12/06/2025
Acta No. 29	25/06/2025

5.2. CORRESPONDENCIA

El control de la correspondencia enviada y recibida durante el periodo se realiza por medio del cuadro de control de correspondencia a cada uno de los contratos.

5.2.1. CORRESPONDENCIA ENVIADA INTERVENTORÍA

CONSECUTIVO CORRESPONDENCIA ENVIADA IDRD--4080-2024 - INTERVENTORÍA			
No. CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	DIRIGIDO A
IDRD-4080-G1-2024-252	martes, 3 de junio de 2025	Remisión acta de recibo parcial No. 7 - OBRA	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-253	martes, 3 de junio de 2025	Remision cronograma matenimientos rutinarios mes de junio 2025	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-254	miércoles, 4 de junio de 2025	Rta CINNOVAPARQUES-CE-190 Informe de imprevistos No. 1	CONSORCIO INNOVAPARQUES

CONSECUTIVO CORRESPONDENCIA ENVIADA IDRD--4080-2024 - INTERVENTORÍA			
No. CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	DIRIGIDO A
IDRD-4080-G1-2024-255	miércoles, 4 de junio de 2025	Rta CINNOVAPARQUES-CE-191 Informe de imprevistos No. 2 y 3	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-256	miércoles, 4 de junio de 2025	REMISION ACTA PARCIAL No. 7 DE INTERVENTORIA	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-257	miércoles, 4 de junio de 2025	TRASLADO COMUNICADO CINNOVAPARQUES-CE-197 - Notificación de medidas preventivas durante labores de mantenimiento en el Parque La Victoria Norte	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-258	jueves, 5 de junio de 2025	Rta CINNOVAPARQUES-CE-192 Revision programacion de obra adicion	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-259	jueves, 5 de junio de 2025	IDRD-4080-G1-2024-259 - Observaciones Informe de Calidad N° 6 V.2	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-260	jueves, 5 de junio de 2025	Aprobacion informe SST N°7	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-261	viernes, 6 de junio de 2025	Remisión informe semanal de interventoría No. 26	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-262	viernes, 6 de junio de 2025	Remisión informe semanal de interventoría No. 27	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-263	viernes, 6 de junio de 2025	Remisión informe semanal de interventoría No. 28	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-264	martes, 10 de junio de 2025	Rta CINNOVAPARQUES-CE-201 informe de imprevistos No. 1	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-265	miércoles, 11 de junio de 2025	Rta CINNOVAPARQUES-CE-202 Programacion de obra	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-266	miércoles, 11 de junio de 2025	REMISION PROGRAMACION CONTRATO 4041 VS4 Adicion	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-267	martes, 10 de junio de 2025	Rta CINNOVAPARQUES-CE-200 revision Informe Tecnico No. 7	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-268	miércoles, 11 de junio de 2025	Requerimiento informes mensuales de calidad	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-269	viernes, 13 de junio de 2025	Remisión informe semanal de interventoría No. 29	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-270	viernes, 13 de junio de 2025	Requerimiento entrega carteras topograficas cancha primavera y cancha esperanza	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-271	lunes, 16 de junio de 2025	Aprobación Informe de Calidad N° 6 V.3	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-272	lunes, 16 de junio de 2025	Remision cambio Director de Interventoria	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-273	lunes, 16 de junio de 2025	SOLICITUD DE PRESUPUESTOS CON LAS COTIZACIONES CANCHA DE PADEL	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-274	lunes, 16 de junio de 2025	Observaciones Informe de Calidad N° 7 V.1	CONSORCIO INNOVAPARQUES

CONSECUTIVO CORRESPONDENCIA ENVIADA IDRD--4080-2024 - INTERVENTORÍA			
No. CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	DIRIGIDO A
IDRD-4080-G1-2024-275	miércoles, 18 de junio de 2025	Rta CINNOVAPARQUES-CE-206 Observaciones cotizaciones cancha de padel	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-276	miércoles, 18 de junio de 2025	REMISION BALANCE PRESUPUESTAL MODIFICATORIO No.1 CONTRATO IDRD-SG-4041-2024	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-277	miércoles, 18 de junio de 2025	Rta CINNOVAPARQUES-CE-192 Informe de imprevistos No. 4, 5 y 6	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-278	jueves, 19 de junio de 2025	Solicitud entrega presupuestos actualizados conforme a solicitudes en recorrido de obra	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-279	jueves, 19 de junio de 2025	REMISION INFORME MENSUAL No. 6 - MARZO	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-280	jueves, 19 de junio de 2025	Solicitud toma de ensayos de granulometria	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-281	martes, 24 de junio de 2025	Rta CINNOVAPARQUES-CE-213 Observaciones cotizaciones placa de concreto cancha de padel	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-282	miércoles, 25 de junio de 2025	Remisión informe mensual No 7. mayo Interventoria	IDRD

Tabla 3. Correspondencia enviada interventoría

5.2.2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA INTERVENTORÍA

CONSECUTIVO CORRESPONDENCIA ENVIADA IDRD-4080-2024 - INTERVENTORÍA			
No. CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	OBSERVACIONES
CINNOVAPARQUES-CE-197	4/6/2025	Notificacion medidas preventivas	Se informan acciones ejecutadas
CINNOVAPARQUES-CE-198	4/5/2025	Reporte cantidades semanales	Se remite reporte
CINNOVAPARQUES-CE-200	9/6/2025	Envio informe tecnico 7 - mayo 2025	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-201	9/6/2025	Respuesta IDRD-408-G1-2024-254	Se da respuesta a lo solicitado
CINNOVAPARQUES-CE-202	11/6/2025	Entrega programacion de obra para adicion	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-213	18/6/2025	Entrega de cotizaciones construcción placa de concreto para cancha de Pádel - PRD	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-214	19/6/2025	Respuesta IDRD-4080-G1-2024-255	Se da respuesta a lo solicitado
CINNOVAPARQUES-CE-216	24/6/2025	Entrega NP'S	Se remite para revisión y aprobación

Tabla 4. Correspondencia recibida interventoría

5.3. BITÁCORA:

El control y seguimiento de las actividades y registros de obra se encuentran registrados en el libro de obra, la copia del mismo se encuentra en el informe técnico de interventoría, en el cual se evidencia el registro de la información diariamente **(ANEXO 07 del Informe Técnico N°6)**.

6. SEGUIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA Y PRESERVACIÓN

La interventoría cuenta con una oficina dotada con equipos de cómputo, impresora e internet para el control administrativo y técnico del proyecto en obra.

El manejo y control administrativo se adelanta desde la oficina principal ubicada en la Carrera 70C N° 48 – 55 Barrio Normandía, con los siguientes recursos:

- Equipos de cómputo para residentes e inspectores
- Impresora
- Internet
- Teléfonos celulares
- Baños

7. SEGUIMIENTO DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA

El control de la información documentada se realiza por medio del listado documentos, este permite establecer la vigencia y cambios realizados a cada uno de los documentos que afectan e inciden en el proyecto.

A la fecha del presente informe no se ha realizado la actualización o cambio de algún documento relacionado con el proyecto, por tanto, el listado adjunto corresponde a los incluidos en el plan de calidad del proyecto.

VER ANEXO 1. LISTADO DE DOCUMENTOS DE INTERVENTORÍA

El contratista realizó la presentación del control de la información documentada relacionada con el contrato de obra, en el que se incluye la información requerida por el cliente.

VER ANEXO 2. LISTADO DE DOCUMENTOS DE CONTRATISTA

8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE ADQUISICIONES

El seguimiento realizado a las adquisiciones realizadas por el contratista CONSORCIO INNOVAPARQUES con corte a 30 de junio de 2025 no ha sido presentado, dado a que a la fecha del presente informe no se cuenta con la primera versión del informe del periodo del contratista

9. SEGUIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y PRESERVACIÓN

La interventoría cuenta con una oficina dotada con equipos de cómputo, impresora e internet para el control administrativo y técnico del proyecto en obra.

El manejo y control administrativo se adelanta desde la oficina principal ubicada en la Carrera 70C N° 48 – 55 Barrio Normandía, con los siguientes recursos:

- Equipos de cómputo para residentes e inspectores
- Impresora
- Internet
- Teléfonos celulares
- Baños

10. CUMPLIMIENTO AL PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYO

10.1. CUMPLIMIENTO AL PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYO - INTERVENTORÍA

El Plan de inspección y ensayo, este será la herramienta para realizar la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas aplicables a los materiales e insumos que incidan en la calidad de proyecto, para el periodo se vio la necesidad de realizar contra muestreo a los materiales ingresados, enviando por parte de interventoría muestra de Granulo de Caucho y de Arena sílice, cuyos resultados son incluidos en el siguiente anexo.

VER ANEXO 3. PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYO – INTERVENTORIA

10.2. CUMPLIMIENTO AL PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYO - CONTRATISTA

Dadas las actividades realizadas en el periodo, se solicita al contratista suministre los ensayos de laboratorio, certificaciones y fichas técnicas que demuestran el cumplimiento de las especificaciones requeridas para el contrato IDRD-4080-G1-2024-251 - Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-189 Solicitud Soportes Plan de Inspección y Ensayo, lo cual no ha sido atendido y se realiza la documentación de acción correctiva por parte del contratista, en la cual si plan de acción es presentar dicha trazabilidad solicitada en el informe del periodo N°9, sin embargo, se presentan en el siguiente anexo los certificados y ensayos realizados en el periodo

VER ANEXO 4. PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYO – CONTRATISTA

11. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO

Para el desarrollo del proyecto se realizará el seguimiento a los equipos de inspección, medición y ensayo usados.

11.2. EQUIPOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO – INTERVENTORÍA

La interventoría contará con la contratación del laboratorio PSI Ingeniería para realizar las contra muestras de materiales cuando esto sea requerido, por frecuencia o por incertidumbre de los

resultados recibidos del contratista, este laboratorio cuenta con la acreditación de sus métodos de ensayo por lo cual se anexa el certificado emitido por ONAC, la certificación de acreditación, estos documentos fueron presentados a la entidad en el informe de calidad N°2 en el anexo 2

11.2. EQUIPOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO – CONTRATISTA

El CONSORCIO ejecuta sus actividades de topografía asegurando la validez y fiabilidad de sus resultados, por lo cual hace seguimiento al estado de conformidad de los equipos de topografía, se presenta el certificado de calibración del equipo usado; se realizó por parte de la las verificaciones periódicas a los mismos en campo bajo el acompañamiento del equipo técnico de interventoría.

El contratista realiza el chequeo de los equipos de topografía, sin embargo, y dado a que a la fecha del presente informe de interventoría el contratista no ha presentado su informe mensual N° 8 no se cuenta con los controles realizados en campo.

Los equipos de topografía usados en obra se encuentran descritos en la siguiente tabla:

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA CALIBRACIÓN	N° CERTIFICADO
Nivel automático	TOPCON	AT-B4A	JZ40615	09/12/2024	C5798

Con respecto a la información correspondiente al laboratorio acreditado, se realiza la contratación del laboratorio CONCRELAB el cual se encuentra acreditado en los métodos de ensayos requeridos para el proyecto. Esta documentación fue incluida en el anexo 6 del informe de calidad de interventoría N° 3.

12. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA TRAZABILIDAD DE LOS MATERIALES

Teniendo en cuenta que se requiere un control adecuado de los materiales en obra, con el fin de garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los mismos, se ha realizado solicitud al contratista la presentación de la información semanalmente para control y seguimiento del Plan de inspección ensayo, información que no ha sido suministrada con la frecuencia solicitada sino hasta la presentación del informe correspondiente del periodo, dado lo anterior no se cuenta con el control de materiales correspondiente al periodo, toda vez que a la fecha el contratista no ha realizado la presentación del informe del periodoCONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA TRAZABILIDAD DE LAS ACTIVIDADES

Las actividades realizadas en el periodo las cuales han contado con el seguimiento y supervisión de la interventoria son las siguientes:

CAMPOS EN GRAMA SINTÉTICA:

PARQUE	COD	DIRECCION	ACTIVIDAD EJECUTADA
LA FRAGUA	15-040	Carrera 31 N.º 14 B 57 sur	06-06-2025 cepillado, fumigación poda y bordeo
SANTA ISABEL LA FRAGUA F8	15-021	Calle 8 Sur con Carrera 27	13-06-2025 cepillado y fumigación
SANTA ISABEL LA FRAGUA F5	15-021	Calle 8 Sur con Carrera 27	13-06-2025 cepillado y fumigación
VILLA MAYOR CEMENTERIO DEL SUR	15-036	Calle 32 A sur Carrera 34 C	06-06-2025 cepillado y fumigación
GIMNASIO DISTRITAL DEL NORTE	12-023	Carrera 28 y Carrera 27A con entre Calle 63C y Calle 63B	06-06-2025 cepillado, fumigación, poda y bordeo
SIMON BOLIVAR - Sector Parque Deportivo el Salitre (PR1)	12-091	Av. Carrera 68 y Av. Carrera 60 con entre Av. Calle 63	06-06-2025 la Cancha 1 tiene programación tiene 2 Partidos
SIMON BOLIVAR - Sector Parque Deportivo el Salitre (PR2)	12-091	Av. Carrera 68 y Av. Carrera 60 con entre Av. Calle 63	06-06-2025 cepillado, fumigación, poda y bordeo 24-06-2025 cepillado, poda, bordeo
URBANIZACION METROPOLIS	12-035	Av. Carrera 68 y Carrera 65B con entre Calle 73 y Calle 78	13-06-2025 cepillado y fumigación
AUTOPISTA SUR (Pavco)	07-152	Av. Calle 57R S y Calle 57K S con entre Carrera 72A y Av. Carrera 71B	17-06-2025 cepillado, fumigación, poda, bordeo
CLARELANDIA F11	07-163	Calle 58C S y Calle 59 S con entre Carrera 80I y Carrera 80B	18-06-2025 cepillado, fumigación, poda y bordeo
CLARELANDIA F8	07-163	Calle 58C S y Calle 59 S con entre Carrera 80I y Carrera 80B	18-06-2025 cepillado y fumigación
EL PORVENIR	07-391	Calle 59 S y Calle 49 S con entre Carrera 92A y Carrera 102	11-06-2025 cepillado y fumigación
EL PORVENIR 2	07-391	Calle 59 S y Calle 49 S con entre Carrera 92A y Carrera 102	11-06-2025 cepillado y fumigación
EL PORVENIR 3	07-391	Calle 59 S y Calle 49 S con entre Carrera 92A y Carrera 102	11-06-2025 cepillado y fumigación
EL PORVENIR 4	07-391	Calle 59 S y Calle 49 S con entre Carrera 92A y Carrera 102	11-06-2025 cepillado y fumigación
EL PORVENIR 5	07-391	Calle 59 S y Calle 49 S con entre Carrera 92A y Carrera 102	11-06-2025 cepillado y fumigación
EL PORVENIR mini	07-391	Calle 59 S y Calle 49 S con entre Carrera 92A y Carrera 103	11-06-2025 cepillado y fumigación
EL RECREO	07-260	Carrera 106A y Carrera 93D con entre Calle 63 S y Calle 73 S	11-06-2025 instalación de guayas 11-06-2025 cepillado y fumigación

PARQUE	COD	DIRECCION	ACTIVIDAD EJECUTADA
URBANIZACION LA ESPERANZA	07-273	Carrera 80J y Carrera 79 con entre Calle 76A S y Calle 75BIS S	03-06-2025 desmonte de grama sintética
			25-06-2025 mantenimiento arcos
			25-06-2025 mantenimiento malla nylon
			27-06-2025 trasiego y nivelación de triturado
			28-06-2025 trasiego y nivelación de triturado
TIBANICA	07-274	Diagonal 73 y Carrera 77G con entre Calle 78I S y Calle 74 S	11-06-2025 cepillado y fumigación
NARANJOS	07-035	Carrera 80M Bis y Carrera 80I con entre Calle 70F S y Calle 68C S	11-06-2025 cepillado fumigación y bordeo
Parque Campo Verde F5	07-436	CARRERA 91 N 83 85 SUR	18-06-2025 no se realiza mantenimiento por que está ocupada y no dieron el espacio para ingresar
			24-06-2025 cepillado y fumigación
Parque Campo Verde F8	07-436	CARRERA 91 N 83 85 SUR	18-06-2025 no se realiza mantenimiento por que está ocupada y no dieron el espacio para ingresar
			24-06-2025 cepillado y fumigación
Parque Campo Verde F8	07-436	CARRERA 91 N 83 85 SUR	18-06-2025 no se realiza mantenimiento por que está ocupada y no dieron el espacio para ingresar
			24-06-2025 cepillado y fumigación
URBANIZACION PORTAL DEL SOL	07-403	Carrera 98B y Carrera 95A con entre Calle 74 S y Calle 75 S	18-06-2025 no se realiza mantenimiento por que está ocupada y no dieron el espacio para ingresar
			24-06-2025 cepillado y fumigación
URBANIZACION SANTIAGO DE ATALAYAS	07-321	Carrera 99C y Carrera 98A con entre Calle 59B S y Calle 61A S	18-06-2025 cepillado y fumigación
TIMIZA (Sector Villa del Rio)	07-036	Av. Carrera 71B y Carrera 64B con entre Calle 55A S y Rio Tunjuelito	11-06-2025 cepillado y fumigación
URBANIZACION CHICALA LOTE A	07-292	Calle 54C S y Calle 55 S con entre Av. Carrera 86 y Carrera 86C	18-06-2025 no se realiza mantenimiento por que está

PARQUE	COD	DIRECCION	ACTIVIDAD EJECUTADA
			ocupada y no dieron el espacio para ingresar
URBANIZACION CABRERA (Japón)	02-007	Av. Carrera 11 y Carrera 11A con entre Calle 86A y Calle 87	20-06-2025 No se realiza mantenimiento por que esta con candado y el promotor no tiene las llaves 24-06-2025 Cabrera Japón No se realiza mantenimiento por que esta con candado y no hay quien abra para ingresar
ALTOS DE LA ESTANCIA 1	19-756	Calle 64A S y Calle 75C S con entre Carrera 75F y Carrera 76C	10-06-2025 cepillado y fumigación
ALTOS DE LA ESTANCIA 2	19-756	Calle 64A S y Calle 75C S con entre Carrera 75F y Carrera 76C	10-06-2025 cepillado y fumigación
DESARROLLO ARBOLIZADORA ALTA	19-058	Transversal 40B y Carrera 36 con entre Diagonal 73A S y Diagonal 72A S	10-06-2025 cepillado y fumigación
URBANIZACION BALMORAL CESION GUADALUPE	19-750	Av.Calle 57R S y Calle 58A S con entre Carrera 71 y Av. Carrera 70C	17-06-2025 cepillado y fumigación
DESARROLLO CARACOLI	19-710	Calle 77S y Calle 77D S con entre Carrera 74B y Carrera 74D	10-06-2025 No se realiza mantenimiento porque está ocupada con la comunidad no dio el espacio 24-06-2025 cepillado y fumigación
DESARROLLO DOMINGO LAIN II (CONDOMINIO EL BOSQUE)	19-032	Calle 64A S y Calle 64 S entre Carrera 18L y Transversal 17N	10-06-2025 cepillado y fumigación
EL TALLER (EL ENSUEÑO)	19-348	Transversal 70C y Carrera 67 S con entre Av. Calle 68 S y Calle 68D BIS A S	17-06-2025 cepillado y fumigación
URBANIZACION LA ESTANCIA	19-231	Diagonal 57Z S y Calle 59A S con entre Carrera 74G y Carrera 74A	10-06-2025 cepillado y fumigación
ILLIMANI (PARAISO) f11	19-346	Calle 71P Sur y Calle 74B S con entre Carrera 27F y Carrera 27B	10-06-2025 cepillado fumigación poda y bordeo
ILLIMANI (PARAISO) f5	19-346	Calle 71P Sur y Calle 74B S con entre Carrera 27F y Carrera 27B	10-06-2025 cepillado y fumigación
MIRADOR ILLIMANI	19-788	Calle 71P Sur y Calle 74B S con entre Carrera 27F y Carrera 27B	10-06-2025 cepillado y fumigación
LA JOYA	19-349	Calle 80 B BIS S y Calle 80S con entre Carrera 18M y Transversal 18I	10-06-2025 cepillado y fumigación

PARQUE	COD	DIRECCION	ACTIVIDAD EJECUTADA
DESARROLLO EL PARAISO	19-490	Calle 71K S y Calle 71N S con entre Carrera 27P y Carrera 27Q	10-06-2025 cepillado y fumigación
SIERRA MORENA	19-190	Transversal 73B y Transversal 60 entre Calle 75A S y Diagonal 73C S	17-06-2025 cepillado y fumigación
SIERRA MORENA 2	19-190	Transversal 73B y Transversal 60 entre Calle 75A S y Diagonal 73C S	17-06-2025 cepillado y fumigación
URBANIZACION BACHUE PRIMERA ETAPA	10-117	Calle 90A y Calle 91A con entre Carrera 95D y Carrera 95	13-06-2025 cepillado y fumigación
URBANIZACION LA BONANZA	10-215	Transversal 70C Bis y Carrera 70C con entre Calle 75 y Calle 77	13-06-2025 cepillado y fumigación
URBANIZACION CIUDAD DE HONDA	10-153	Carrera 68H y Carrera 68D con entre Calle 64H y Calle 65	13-06-2025 cepillado, fumigación, poda y bordeo
EL CARMELO f11	10-169	Av. Calle 72 y Calle 70 con entre Carrera 101A y Carrera 104C	03-06-2025 cepillado fumigación poda y bordeo
EL CARMELO f8	10-169	Av. Calle 72 y Calle 70 con entre Carrera 101A y Carrera 104C	03-06-2025 cepillado y fumigación
FLORENCIA LOS TRONQUITOS	10-028	Carrera 91A y Carrara 90 BIS con entre Calle 76 BIS y Calle 75C	03-06-2025 cepillado y fumigación
PARQUE JUAN AMARILLO F5	10-171	Av. Calle 90 con entre Carrera 119 y Carrera 110	13-06-2025 cepillado y fumigación
PARQUE JUAN AMARILLO F8	10-171	Av. Calle 90 con entre Carrera 119 y Carrera 110	13-06-2025 cepillado y fumigación
PARQUE JUAN AMARILLO F5	10-171	Av. Calle 90 con entre Carrera 119 y Carrera 110	13-06-2025 cepillado y fumigación
PARQUE JUAN AMARILLO F5	10-171	Av. Calle 90 con entre Carrera 119 y Carrera 110	13-06-2025 cepillado y fumigación
PARQUE JUAN AMARILLO F8	10-171	Av. Calle 90 con entre Carrera 119 y Carrera 110	13-06-2025 cepillado y fumigación
PARQUE JUAN AMARILLO F5	10-171	Av. Calle 90 con entre Carrera 119 y Carrera 110	13-06-2025 cepillado y fumigación
URBANIZACION LA EUROPA F5	10-045	Carrera 71D y Carrara 71 con entre Calle 68B y Calle 67B	13-06-2025 cepillado y fumigación
URBANIZACION LA EUROPA mini	10-045	Carrera 71D y Carrara 71 con entre Calle 68B y Calle 67B	13-06-2025 cepillado y fumigación
URBANIZACION NORMANDIA I, II, II Y IV SECTOR	10-190	Carrera 73A y Carrera 73 con entre Calle 52A y Calle 51	19-06-2025 cepillado y fumigación
PLANTA DE TRATAMIENTO SALITRE (PETAR)	10-531	Carrera 119 y Roi Bogotá con entre Calle 80A Bis y Calle 86	06-06-2025 cepillado y fumigación
SAN ANDRES F8	10-234	Calle 82 y Calle 80A con entre Carrera 102 y Carrera 100A	03-06-2025 cepillado y fumigación

PARQUE	COD	DIRECCION	ACTIVIDAD EJECUTADA
SAN ANDRES F11	10-234	Calle 82 y Calle 80A con entre Carrera 102 y Carrera 100A	03-06-2025 cepillado y fumigación
SIMON BOLIVAR - Sector Unidad Deportivo el Salitre (UDS)	10-290	Av. Carrera 68 y con entre Av. Calle 63	19-06-2025 cepillado, poda, bordeo y fumigación
VILLA LUZ F11	10-018	Carrera 77A y Carrara 80A con entre Calle 63F BIS y Calle 64C	03-06-2025 cepillado y fumigación
VILLA LUZ F5	10-018	Carrera 77A y Carrara 80A con entre Calle 63F BIS y Calle 64C	03-06-2025 cepillado y fumigación
VILLAS DEL MADRIGAL	10-002	Calle 75 C Carrera 99 B	03-06-2025 cepillado y fumigación
URBANIZACION CARLOS LLERAS RESTREPO	09-048	Av. Carrera 72 y Carrara 69F con entre Av. Calle 22 y AV. Calle 24	24-06-2025 desmonte grama sintética
			25-06-2025 desmonte grama sintética
URBANIZACION CIUDAD HAYUELOS ETAPA II, III, IV Y V F5	09-200	Carrera 81B y Carrara 80A con entre Calle 19A y Av. Calle 22	19-06-2025 cepillado y fumigación
URBANIZACION CIUDAD HAYUELOS ETAPA II, III, IV Y V F8	09-200	Carrera 81B y Carrara 80A con entre Calle 19A y Av. Calle 22	19-06-2025 cepillado y fumigación
VILLA HELENA	09-026	Carrera 96H BIS y Carrara 96G con entre Calle 20A y Calle 20C	19-06-2025 cepillado, fumigación, poda y bordeo
LAS AMERICAS OCCIDENTAL IV ETAPA	08-127	Calle 2A S y Av. Calle 5 S con entre Carrera 72C y Av. Carrera 72	18-06-2025 cepillado y fumigación
CARVAJAL	08-040	Carrera 70B y Carrera 69C con entre Calle 24A S y Calle 25 S	18-06-2025 cepillado y fumigación
CASTILLA	08-200	Calle 8A y Calle 8B BIS con entre Carrera 75 y Carrera 73	18-06-2025 cepillado y fumigación
CAYETANO CAÑIZARES	08-241	Av. Carrera 80 y Carrera 80D BIS entre Calle 42A S y Calle 39 S	12-06-2025 No se realiza mantenimiento por orden de los vigilantes y de administración
			19-06-2025 cepillado, fumigación, poda y bordeo
BELLAVISTA-DINDALITO	08-144	Calle 40S y Calle 42A S con entre Carrera 96 y Carrera 94C	19-06-2025 cepillado y fumigación
LA MARGARITA (Gilma Jiménez) F11	08-552	Calle 49 S y Calle 51A S entre Transversal 85A y Carrera 81H	19-06-2025 cepillado y fumigación
			19-06-2025 mantenimiento de arcos de futbol
			20-06-2025 mantenimiento malla nylon y suministro de malla de arcos.

PARQUE	COD	DIRECCION	ACTIVIDAD EJECUTADA
LA MARGARITA (Gilma Jiménez) F8	08-552	Calle 49 S y Calle 51A S entre Transversal 85A y Carrera 81H	19-06-2025 cepillado y fumigación
LA MARGARITA (Gilma Jiménez) Mini	08-552	Calle 49 S y Calle 51A S entre Transversal 85A y Carrera 81H	19-06-2025 cepillado y fumigación
LA MARGARITA (Gilma Jiménez) F5	08-552	Calle 49 S y Calle 51A S entre Transversal 85A y Carrera 81H	19-06-2025 cepillado y fumigación
LA MARGARITA (Gilma Jiménez) F5	08-552	Calle 49 S y Calle 51A S entre Transversal 85A y Carrera 81H	19-06-2025 cepillado y fumigación
LA ALEJANDRA	08-568	Carrera 72J y Carrera 72I con entre Calle 42B S y Calle 42 S	18-06-2025 cepillado y fumigación
LA IGUALDAD	08-212	Carrera 68B BIS y Carrera 68F con entre Av. Calle 6 y Calle 2	18-06-2025 cepillado y fumigación
LAGO TIMIZA I ETAPA	08-626	Calle 43 entre Carrera 73C S y Carrera 73 S	18-06-2025 cepillado y fumigación
LAS LUCES Y VILLA RICA	08-533	Carrera 77K BIS y Carrera 77H entre Calle 52A S y Calle 51A S	18-06-2025 cepillado y fumigación
MARSELLA SECTOR NORTE I ETAPA, PINOS DE MARSELLA F11	08-066	Av. Calle 6 y Calle 9C con entre Carrera 69 y Carrera 68G	12-06-2025 cepillado y fumigación
MARSELLA SECTOR NORTE I ETAPA, PINOS DE MARSELLA F5	08-066	Av. Calle 6 y Calle 9C con entre Carrera 69 y Carrera 68G	12-06-2025 cepillado y fumigación
URBANIZACION PRIMAVERA	08-770	Carrera 91C y Carrara 90A con entre Calle 2 y Calle 4	13-06-2025 limpieza de cárcamo
			14-06-2025 limpieza de cárcamo
			20-06-2025 suministro y nivelación de gravilla
			24-06-2025 nivelación y vibricompactacion
			25-06-2025 mantenimiento malla nylon
			26-05-2025 imprimación asfáltica
TIMIZA F11	08-219	Calle 45 S y Call 40G S con entre Carrera 74 y Carrera 72J BIS	18-06-2025 cepillado y fumigación
TIMIZA F8	08-219	Calle 45 S y Call 40G S con entre Carrera 74 y Carrera 72J BIS	18-06-2025 cepillado y fumigación
VILLA DE LOS SAUCES	08-180	Carera 78 y Carrera 77H BIS con entre Calle 58C S y Calle 58B BIS S	18-06-2025 cepillado y fumigación

PARQUE	COD	DIRECCION	ACTIVIDAD EJECUTADA
EDUARDO SANTOS	14-030	Carrera 19 y Carrera 18B con entre Calle 5A y Calle 4A BIS	16-06-2025 cepillado y fumigación
BARRIO LA PEPITA	14-008	Carrera 26 y Carrera 25A con entre Calle 11 y Calle 10	17-06-2025 cepillado y fumigación
GORGONZOLA	16-126	Carrera 41A y Carrera 40 con entre Calle 5 y Calle 4F	19-06-2025 cepillado y fumigación
EL JAZMIN	16-204	Av. Carrera 50 y Carrera 40B con entre Calle 1D y Calle 1H	03-06-2025 cepillado y fumigación
MILENTA TEJAR SAN EUSEBIO	16-099	Transversal 53 y Carrera 52 con entre Calle 19S y Calle 22S	18-06-2025 cepillado y fumigación
CIUDAD MONTES 1	16-112	Carrera 40 y Carrera 38 con entre Calle 10S y Diagonal 16S	03-06-2025 cepillado y fumigación
CIUDAD MONTES 2	16-112	Carrera 40 y Carrera 38 con entre Calle 10S y Diagonal 16S	03-06-2025 cepillado y fumigación
PARQUE INDUSTRIAL (Los Ejidos)	16-416	Calle 12 y Calle11A con entre Av. Carrera 36 y Carrera 37	05-06-2025 cepillado y fumigación
PARQUE INDUSTRIAL (Los Ejidos Licorera)	16-415	Av. Carrera 36 y Carrera 37A con entre Calle 10 y Calle 9	05-06-2025 cepillado y fumigación
URBANIZACION LA PRADERA SUR (Antes Salazar-Gómez)	16-153	Av. Calle 3 y Calle 4B con entre Carrera 66 y Carrera 65	19-06-2025 cepillado, fumigación, poda y bordeo
URBANIZACION MARRUECOS II SECTOR	18-041	Calle 48P S y Calle 48Q S con entre Carrera 5L y Carrera 5C	09-06-2025 cepillado y fumigación
MOLINOS	18-055	Transversal 5 Calle 48 L sur	09-06-2025 cepillado fumigación poda y bordeo
DESARROLLO PALERMO SUR	18-035	Calle 50 S y Calle 52A S entre Carrera 18E y Transversal 2D BIS	09-06-2025 cepillado y fumigación
PARQUE ESTADIO OLAYA HERRERA	18-207	Carrera 24 y Carrera 21 entre Calle 22 S y Calle 27 S	16-06-2025 cepillado y fumigación
PIJAOS	18-090	Av. Cra 10 Calle 35 sur	20-06-2025 cepillado y aplicación de caucho borde.
SAN JOSE	18-429	Calle 22 S y Calle 26A S entre Carrera 12D S y Carrera 12D	11-06-2025 cepillado y fumigación 16-06-2025 cepillado y fumigación
SANTA LUCIA 1	18-073	Carrera 14 y Carrera 13D BIS entre Diagonal 45 BIS S y Calle 36 S	16-06-2025 cepillado y fumigación
SANTA LUCIA 2	18-073	Carrera 14 y Carrera 13D BIS entre Diagonal 45 BIS S y Calle 36 S	16-06-2025 cepillado y fumigación

PARQUE	COD	DIRECCION	ACTIVIDAD EJECUTADA
URBANIZACION GUSTAVO RESTREPO	18-009	Calle 28C S y Calle 28C BIS S entre Carrera 13A y Carrera 14	16-06-2025 cepillado y fumigación
GAITAN CORTES	04-103	Calle 31A S y Diagonal 31C S con entre Carrera 7E y Carrera 4E	17-06-2025 cepillado, fumigación, poda, bordeo
LA VICTORIA 1	04-122	Calle 37B BIS S y Calle 36D S con entre Carrera 2A y Carrera 1C E	17-06-2025 cepillado y fumigación
LA VICTORIA 2	04-122	Calle 37B BIS S y Calle 36D S con entre Carrera 2A y Carrera 1C E	17-06-2025 cepillado y fumigación
SAN CRISTOBAL 1	04-127	Carrera 4 y Carrera 6 E con entre Calle 17A S y Calle 14 S	17-06-2025 cepillado y fumigación
SAN CRISTOBAL 2	04-127	Carrera 4 y Carrera 6 E con entre Calle 17A S y Calle 14 S	17-06-2025 cepillado y fumigación
URBANIZACION ANTIOQUIA	04-038	Carrera 6 E y Carrera 6B E con entre Calle 48G S y Calle 48B S	17-06-2025 cepillado y fumigación
LAS CRUCES	03-036	Carrera 4 y Carrera 5A con entre Calle 1B BIS y Calle 1C BIS	12-06-2025 cepillado y fumigación
DESARROLLO LOURDES	03-122	Calle 3 y Calle 2B con entre Carrera 1E y Carrera 1A E	12-06-2025 cepillado y fumigación
DESARROLLO LOS LACHES (La Mina)	03-148	Carrera 7B E y Carrera 8B E con entre Diagonal 6 y Diagonal 5A	12-06-2025 cepillado y fumigación
TERCER MILENIO	03-085	Carrera 14 y Carrera 10 con entre Calle 6 y Calle 9	12-06-2025 cepillado y fumigación
TERCER MILENIO 2	03-085	Carrera 14 y Carrera 10 con entre Calle 6 y Calle 9	12-06-2025 cepillado y fumigación
TERCER MILENIO 3	03-085	Carrera 14 y Carrera 10 con entre Calle 6 y Calle 9	12-06-2025 cepillado y fumigación
BERLIN	11-015	Calle 142 y Calle 139 con entre Carrera 145B y Carrera 144A	04-06-2025 cepillado y fumigación
DESARROLLO BILBAO SEGUNDO SECTOR SECCIONES A, B, C, D, E (Hayeron)	11-607	Entre calle 143f y calle 144a con carrera 151 costado occidental	04-06-2025 cepillado y fumigación
URBANIZACION BURGOS (Britalia)	11-058	Av. Carrera 72 y Carrera 74 con entre Calle 160 y Calle 163	05-06-2025 cepillado, fumigación, poda y bordeo
URBANIZACION BURGOS (Britalia) 2	11-058	Av. Carrera 72 y Carrera 74 con entre Calle 160 y Calle 163	05-06-2025 cepillado, fumigación, poda y bordeo
PARQUE DEL INDIO O DE LAS COMETAS	11-204	Calle 127C y Calle 127A con entre Carrera 81 y Carrera 87A	05-06-2025 No se realiza mantenimiento por que no ahí acceso de vía
			20-06-2025 cepillado y fumigación
LA GAITANA	11-205	Transversal 126 y Carrera 124C con entre Diagonal 135B y Calle 132B	04-06-2025 cepillado y fumigación

PARQUE	COD	DIRECCION	ACTIVIDAD EJECUTADA
AGRUPACION DE VIVIENDA EL BALCON DE LINDARAJA	11-309	Calle 128 y Diagonal 127B con entre Carrera 79 y Carrera 78	05-06-2025 cepillado y fumigación
PRADO PINZON	11-109	Calle 144 y Calle 143 con entre Carrera 50 y Carrera 49	20-06-2025 cepillado, fumigación, poda y bordeo
URBANIZACION NUEVA TIBABUYES ETAPA I	11-084	Calle 130C y Calle 129D con entre Carrera 123 y Carrera 121C	04-06-2025 cepillado y fumigación
URBANIZACION NUEVA TIBABUYES ETAPA I 2	11-084	Calle 130C y Calle 129D con entre Carrera 123 y Carrera 121C	04-06-2025 cepillado y fumigación
URBANIZACION VALLE DE REFOUS SECTOR 1, 2, 3, 4, 5	11-686	Calle 150A con entre Carrera 102B y Carrera 101	06-06-2025 compactación grava e imprimación
			10-06-2025 inicia extendido de grama sintética y cosido de tapetes
			16-06-2025 pegue demarcación
			20-06-2025 mantenimiento malla nylon
URBANIZACION VICTORIA NORTE	11-162	Carrera 54 y Carrera 53 con entre Calle 150 y Calle 149	06-06-2025 compactación grava e imprimación
			11-06-2025 instalación de grama sintética, extendido de tapetes y costura
			12-06-2025 pegue demarcación
			13-06-2025 pegue demarcación
			14-06-2025 mantenimiento de arcos, fijación de bocines
			16-06-2025 mantenimiento malla nylon e instalación de mallas arcos
			20-06-2025 fumigación cuarto eléctrico
			26-06-2025 poda y bordeo cuarto eléctrico
URBANIZACION VILANOVA	11-668	Av. Calle 183 y Calle 187 con entre Carrera 55B y Carrera 54D	17-06-2025 mantenimiento de arcos
			19-06-2025 mantenimiento cerramiento perimetral y suministro mallas arcos
			20-06-2025 cepillado y fumigación
CIUDADELA CAFAM II (PREVIO LOS GAVILANES)	11-1101	Calle 142F y Calle 142A con entre Carrera 146 y Carrera 143	04-06-2025 cepillado y fumigación

PARQUE	COD	DIRECCION	ACTIVIDAD EJECUTADA
			06-06-2025 mantenimiento cerramiento mallas perimetral
DESARROLLO CANTALEJO	11-036	Calle 161 y Calle 160 con entre Carrera 55 y Carrera 55C	20-06-2025 cepillado y fumigación
CASA BLANCA	11-069	Calle 146A con entre Carrera 80 y Carrera 76	04-06-2025 cepillado y fumigación
URBANIZACION CIUDADELA CAFAM	11-008	Carrera 113C con entre Calle 142 y Calle 142A	04-06-2025 cepillado y fumigación
FONTANAR DEL RIO BEISBOL	11-368	Av. Calle 145 y Calle 146 con entre Diagonal 147 y Carrera 138A	04-06-2025 cepillado y fumigación
FONTANAR DEL RIO F11	11-368	Av. Calle 145 y Calle 146 con entre Diagonal 147 y Carrera 138A	04-06-2025 cepillado y fumigación
FONTANAR DEL RIO F5	11-368	Av. Calle 145 y Calle 146 con entre Diagonal 147 y Carrera 138A	04-06-2025 cepillado y fumigación
Urb. Lombardía (1 Etapa)	11-052	Calle 143 y Calle 142A con entre Carrera 106B y Av. Carrera 104	04-06-2025 cepillado y fumigación
URBANIZACION MAZUREN I SECTOR	11-161	Calle 152 con entre Carrera 53A y Carrera 50	20-06-2025 cepillado y fumigación
SANTA CLARA	13-015	Carrera 47 y Carrera 45 con entre Calle 22A y Calle 22 BIS	05-06-2025 cepillado y fumigación
EL TUNAL F8	06-063	Carrera 24 y Carrera 19C con entre Calle 48C S y Calle 58A S	16-06-2025 cepillado y fumigación
EL TUNAL 2 F8	06-063	Carrera 24 y Carrera 19C con entre Calle 48C S y Calle 58A S	16-06-2025 cepillado y fumigación
EL TUNAL 3 F8	06-063	Carrera 24 y Carrera 19C con entre Calle 48C S y Calle 58A S	16-06-2025 cepillado y fumigación
URBANIZACION LA LAGUNETA	06-005	Transversal 60 y Carrera 55A con entre Diagonal 49 S y Diagonal 51 S	16-06-2025 cepillado y fumigación
NUEVO MUZU	06-017	Transversal 60 y Carrera 61D con entre Diagonal 51A S y Carrera 53 S	16-06-2025 cepillado, poda, bordeo y fumigación
EL TUNAL ALTERNA F11	06-063	Carrera 24 y Carrera 19C con entre Calle 48C S y Calle 58A S	16-06-2025 No se realiza mantenimiento por que está ocupada y no me dieron el espacio
			20-06-2025 cepillado y fumigación
URBANIZACION LA LAGUNA (Venecia 1)	06-006	Carrera 53A y Carrera 53B con entre Diagonal 47A S y Diagonal 49 S	16-06-2025 cepillado y fumigación

PARQUE	COD	DIRECCION	ACTIVIDAD EJECUTADA
URBANIZACION LA LAGUNA (Venecia 2)	06-006	Carrera 53A y Carrera 53B con entre Diagonal 47A S y Diagonal 49 S	16-06-2025 cepillado y fumigación
URBANIZACION TUNJUELITO	06-012	Transversal 11A y Carrera 12D con entre Calle 58A S y Calle 59 S	16-06-2025 cepillado y fumigación
NUEVA URBANIZACION EL CEDRITOS	01-031	Av. Carrera 9 y Carrera 11 con entre Calle 145 y Calle 146	05-06-2025 No se realiza mantenimiento por que está ocupada y no dieron el espacio para ingresar
			24-06-2025 cepillado, fumigación, poda y bordeo
DESARROLLO ESTRELLA DEL NORTE	01-189	Calle 160 y Calle 159A con entre Carrera 21 y Carrera 19B	05-06-2025 cepillado, fumigación, poda y bordeo
			20-06-2025 fumigación cuarto eléctrico
SERVITA F11	01-023	Calle 165 con entre Carrera 7H	20-06-2025 cepillado y fumigación
SERVITA F5	01-023	Calle 165 con entre Carrera 7H	20-06-2025 cepillado y fumigación
URBANIZACION EL TOBERIN	01-079	Av. Carrera 9 y Carrera 11 con entre Calle 145 y Calle 146	05-06-25 cepillado, fumigación, poda y bordeo
VERBENAL	01-313	Calle 187 Transversal 18 B	20-06-2025 cepillado y fumigación
URBANIZACION CALLE 170 (Alameda)	01-540	Carrera 17A y Carrera 17 con entre Calle 175 y Calle 173	05-06-2025 cepillado, fumigación, poda y bordeo
ALFONSO LOPEZ (Sector la Arborada)	05-141	Calle 90A S y Calle 90D S con entre Carrera 5A E y Carrera 1	09-06-2025 cepillado y fumigación
LA AURORA II	05-002	Diagonal 69F S y Calle 73 S con entre Carrera 14V y Carrera 14L	09-06-2025 cepillado, fumigación, poda y bordeo
URBANIZACION MIRAVALLE I, II Y III ETAPAS, EL CORTIJO, SAN JUAN BAUTISTA Y SAN LUIS 1	05-042	Calle 73D BIS S Y Calle 77A S con entre Carrera 14C y Carrera 14V	09-06-2025 cepillado y fumigación

PARQUE	COD	DIRECCION	ACTIVIDAD EJECUTADA
URBANIZACION MIRAVALLE I, II Y III ETAPAS, EL CORTIJO, SAN JUAN BAUTISTA Y SAN LUIS 2	05-042	Calle 73D BIS S Y Calle 77A S con entre Carrera 14C y Carrera 14V	09-06-2025 instalación de guayas
			09-06-2025 cepillado y fumigación
URBANIZACION MIRAVALLE I, II Y III ETAPAS, EL CORTIJO, SAN JUAN BAUTISTA Y SAN LUIS 3	05-042	Calle 73D BIS S Y Calle 77A S con entre Carrera 14C y Carrera 14V	09-06-2025 cepillado y fumigación
CIUDAD NUEVO MILENIO I ETAPA I 1	05-476	Calle 67A S y Calle 67A BIS S con entre Carrera 11 y Carrera 7H	16-06-2025 cepillado y fumigación
CIUDAD NUEVO MILENIO I ETAPA I 2	05-476	Calle 67A S y Calle 67A BIS S con entre Carrera 11 y Carrera 7H	16-06-2025 cepillado y fumigación
NUEVO USME	05-459	Carrera 14 A Calle 137 B sur	09-06-2025 cepillado y fumigación
VALLES DE CAFAM	05-003	Calle 92 S y Calle 84 S con entre Carrera 14I y Carrera 14D	09-06-2025 cepillado y fumigación
VILLA ALEMANA	05-087	Carrera 1F y Carrera 1 con entre Calle 100 BIS S y Diagonal 102 S	09-06-2025 cepillado y fumigación
CANDELARIA	17-028	Calle 12 f # 3-27	12-06-2025 cepillado y fumigación
VILLA ALSACIA	08-065	calle 11a a carrera 72a	18-06-2025 cepillado y fumigación

CAMPOS EN GRAMA SINTETICA:

PARQUE	COD	DIRECCION	ACTIVIDADES EJECUTADAS
EL TUNAL (Estadio)	06-063	Carrera 24 y Carrera 19C con entre Calle 48C S y Calle 58A S	06-06-2025 poda, bordeo y demarcación
EL TUNAL (Softbol)	06-063	Carrera 24 y Carrera 19C con entre Calle 48C S y Calle 58A S	06-06-2025 poda, bordeo y demarcación
			20-06-2025 poda, bordeo, demarcación y fumigación
SIMON BOLIVAR - Sector Parque Deportivo el Salitre (Estadio)	12-091	Av. Carrera 68 y Av. Carrera 60 con entre Av. Calle 63	19-06-2025 bordeo y fumigación
SIMON BOLIVAR - Sector Parque Deportivo el Salitre (Alterna 3)	12-091	Av. Carrera 68 y Av. Carrera 60 con entre Av. Calle 63	09-06-2025 poda, bordeo y demarcación
			19-06-2025 poda, bordeo y demarcación
			24-06-2025 demarcación y bordeo
SIMON BOLIVAR - Sector Parque Deportivo el Salitre (Playa - 1)	12-091	Av. Carrera 68 y Av. Carrera 60 con entre Av. Calle 63	09-06-2025 bordeo

PARQUE	COD	DIRECCION	ACTIVIDADES EJECUTADAS
EL COUNTRY (Club)	01-1000	Av. Calle 127 con entre Carrera 11C	03-06-2025 poda
			05-06-2025 poda
			09-06-2025 poda
			13-06-2025 poda
			17-06-2025 poda
			24-06-2025 poda
			27-06-2025 poda
SIMON BOLIVAR - Sector Unidad Deportivo el Salitre (UDS Beisbol)	10-290	Av. Carrera 68 y con entre Av. Calle 63	06-06-2025 polvo de ladrillo
			09-06-2025 poda y bordeo
			24-06-2025 poda, bordeo, demarcación y fumigación
SIMON BOLIVAR - Sector Unidad Deportivo el Salitre (UDS Atletismo)	10-290	Av. Carrera 68 y con entre Av. Calle 63	09-06-2025 poda y bordeo
			24-06-2025 poda
SIMON BOLIVAR - Sector Unidad Deportivo el Salitre (UDS Atletismo) MARTE	10-290	Av. Carrera 68 y con entre Av. Calle 64	09-06-2025 poda y bordeo
			24-06-2025 poda
SIMON BOLIVAR - Sector Unidad Deportivo el Salitre (UDS Softbol)	10-290	Av. Carrera 68 y con entre Av. Calle 63	06-06-2025 polvo de ladrillo
			09-06-2025 poda, bordeo y demarcación
			24-06-2025 poda, bordeo, demarcación y fumigación
SIMON BOLIVAR - Sector Unidad Deportivo el Salitre (UDS Voleibol)	10-290	Av. Carrera 68 y con entre Av. Calle 63	09-06-2025 poda
			19-06-2025 poda y fumigación
SAN CRISTOBAL (Estadio)	04-127	Carrera 4 y Carrera 6 E con entre Calle 17A S y Calle 14 S	06-06-2025 poda, bordeo y demarcación
			20-06-2025 poda y demarcación
	03-035	Av. Carrera 7 y Carrera 1 con entre Calle 40A BIS y Calle 35	13-06-2025 poda, bordeo y demarcación

PARQUE	COD	DIRECCION	ACTIVIDADES EJECUTADAS
PARQUE NACIONAL (PM-2A) ENRIQUE OLAYA HERRERA (Sector Histórico)			27-06-2025 poda, bordeo y demarcación
CIUDAD MONTES	16-112	Carrera 40 y Carrera 38 con entre Calle 10S y Diagonal 16S	06-06-2025 poda, bordeo y demarcación
			19-06-2025 poda, bordeo y demarcación
CIUDAD MONTES (Softbol)	16-112	Carrera 40 y Carrera 38 con entre Calle 10S y Diagonal 16S	03-06-2025 polvo de ladrillo
			06-06-2025 poda, bordeo y demarcación
			19-06-2025 poda, bordeo, demarcación y fumigación
CIUDAD MONTES (2 de Playa)	16-112	Carrera 40 y Carrera 38 con entre Calle 10S y Diagonal 16S	06-06-2025 bordeo
			19-06-2025 bordeo y fumigación
UNIDAD DEPORTIVA LA ALQUERIA	16-024	Carrera 52C y Carrera 52 con entre Calle 43S y Calle 42 S	01-06-2025 demarcación y reparación de divots
			03-06-2025 poda y bordeo
			05-06-2025 poda y demarcación
			07-06-205 reparación de divots
			10-06-2025 poda y bordeo
			13-06-2025 poda, bordeo y demarcación
			16-06-2025 poda y bordeo
			18-06-2025 fertilización
			20-06-2025 poda, bordeo y demarcación
			25-06-2025 poda y bordeo
			27-06-2025 poda, bordeo y demarcación
MILENTA TEJAR SAN EUSEBIO	16-099	Transversal 53 y Carrera 52 con entre Calle 19S y Calle 22S	12-06-2025 poda, bordeo y demarcación
			26-06-2025 poda, borde y demarcación
NUEVO MUZU	06-017		12-06-2025 poda, bordeo y demarcación

PARQUE	COD	DIRECCION	ACTIVIDADES EJECUTADAS
		Diagonal 53 S y Diagonal 51A S con entre Carrera 61D y Carrera 60	26-06-2025 poda, bordeo y demarcación
LA SERENA	10-223	Av. Carrera 86 y Carrera 76 con entre Calle 90A y Calle 91	10-06-2025 poda, bordeo y demarcación
			25-06-2025 poda, bordeo y demarcación
URBANIZACION BOCHICA	16-037	Av. Carrera 36 y Carrera 37 con entre Calle 1H y Calle 2B	03-06-2025 poda, bordeo y demarcación
			16-06-2025 poda, bordeo y demarcación
PARQUE JUAN AMARILLO	10-171	Av. Calle 90 con entre Carrera 119 y Carrera 110	03-06-2025 poda, bordeo y demarcación
			10-06-2025 poda bordeo y demarcación
			17-06-2025 poda, bordeo y demarcación
			25-06-2025 poda, bordeo y demarcación
ATAHUALPA I PREDIO - El Cajón Sector I	09-024	Av. Carrera 116 y Carrera 114A con entre Calle 22J y Calle 22I	13-06-2025 poda, bordeo y demarcación
			27-06-2025 poda, bordeo y demarcación
MARSELLA SECTOR NORTE I ETAPA - Pinos de Marsella	08-066	Av. Calle 6 y Calle 9C con entre Carrera 69 y Carrera 68G	03-06-2025 poda
			04-06-2025 poda
			06-06-2025 acopio y retiro de pasto poda zona verde
			09-06-2025 verticutter
			10-06-2025 verticutter
			12-06-2025 aireación
			13-06-2025 top-dressing
			14-06-2025 top-dressing, cargue de césped y cepillado
			16-06-2025 poda y bordeo
			18-06-2025 fertilización
			25-06-2025 poda y bordeo

PARQUE	COD	DIRECCION	ACTIVIDADES EJECUTADAS
SIMON BOLIVAR - Sector Complejo Acuático (1, 2,3 Playa)	12-1000	Av. Calle 63 con entre Av. Carrera 50	09-06-2025 bordeo
			19-06-2025 bordeo y fumigación
LA GAITANA	11-205	Transversal 126 y Carrera 124C con entre Diagonal 135B y Calle 132B	03-06-2025 poda, bordeo y demarcación
			10-06-2025 poda, bordeo y demarcación
			17-06-205 poda, bordeo y demarcación
			25-06-2025 poda, bordeo y demarcación
LA FLORIDA 1	10-311	Calle 78C y Canal Maranta con entre el Rio Juan Amarillo	04-06-2025 poda, bordeo y demarcación
			11-06-2025 poda, bordeo y demarcación
			18-06-2025 poda, bordeo y demarcación
			25-06-2025 poda, bordeo y demarcación
LA FLORIDA 2	10-311	Calle 78C y Canal Maranta con entre el Rio Juan Amarillo	04-06-2025 poda, bordeo y demarcación
			11-06-2025 poda, bordeo y demarcación
			18-06-2025 poda, bordeo y demarcación
			25-06-2025 poda, bordeo y demarcación
LA FLORIDA 3	10-311	Calle 78C y Canal Maranta con entre el Rio Juan Amarillo	04-06-2025 poda, bordeo y demarcación
			11-06-2025 poda, bordeo y demarcación
			18-06-2025 poda, bordeo y demarcación
			25-06-2025 poda, bordeo y demarcación
LA FLORIDA 4	10-311	Calle 78C y Canal Maranta con entre el Rio Juan Amarillo	04-06-2025 poda, bordeo y demarcación
			11-06-2025 poda, bordeo y demarcación
			18-06-2025 poda, bordeo y demarcación
			25-06-2025 poda, bordeo y demarcación

PARQUE	COD	DIRECCION	ACTIVIDADES EJECUTADAS
LA FLORIDA 5	10-311	Calle 78C y Canal Maranta con entre el Rio Juan Amarillo	04-06-2025 poda, bordeo y demarcación
			11-06-2025 poda, bordeo y demarcación
			18-06-2025 poda, bordeo y demarcación
			25-06-2025 poda, bordeo y demarcación
AUTOPISTA SUR (Pavco)	07-152	Av. Calle 57R S y Calle 57K S con entre Carrera 72A y Av. Carrera 71B	12-06-2025 poda y bordeo
			26-06-2025 poda y bordeo
URB EL RINCON DE LOS ANGELES	08-108	Tv. 78c DG 6F	12-06-2025 poda, bordeo y demarcación
			26-06-2025 poda, bordeo y demarcación

El control y seguimiento de las actividades de obra por parte de la interventoría son soportadas con la liberación de actividades incluidas **(ANEXO 06 del Informe Técnico N°6)**

13. CONTROL DE CAMBIOS

A la fecha de corte del presente informe no se ha presentado ninguna solicitud de cambios, en dado caso que se presente alguna modificación será controlada de acuerdo a lo establecido en el Plan de Calidad propuesto por el contratista.

14. SALIDAS NO CONFORMES

En el periodo no se registraron salidas no conformes correspondientes al proceso de interventoría.

En el proceso de seguimiento del contrato de obra, se han identificado por parte de interventoría SNC las cuales son documentadas y registradas por el contratista, su seguimiento y cierre se realiza de acuerdo al plan de acción planteado

VER ANEXO 5. SALIDAS NO CONFORMES

15. AUDITORIAS INTERNAS

De acuerdo a lo requerido en el anexo técnico, se requiere programar auditoría interna cuando se presente un avance cercano al 30% y 70%, para el periodo se cumple con el avance del 70%, por tanto, se realiza la presentación por parte del contratista del plan y programa de auditoría, la cual fue ejecutada el 29 de abril de 2025.

Como interventoría se realiza la primera auditoria al contrato, informe que es incluido en el siguiente anexo

VER ANEXO 6. AUDITORIA INTERVENTORIA

ANEXO 1. LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS DE INTERVENTORIA

	LISTADO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS	CÓDIGO	SGC-FR-03
		VERSIÓN	3
		FECHA DE ELABORACIÓN	1/07/2023

Actualizado por: VIANNEY LEAÑO **Fecha Actualización:** 12/12/2024

Cargo: PROFESIONAL DE CALIDAD

CODIGO	NOMBRE	TIPO DE DOCUMENTO	VERSIÓN	FECHA DE VIGENCIA	ALMACENAMIENTO	OBSERVACIÓN	TIEMPO DE CONSERVACION
SGC-FR-01	TRATAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS PREVENTIVAS O DE MEJORA	FORMATO	1	10/11/2022	G:\Mi unidad\1. SIG - DOCUMENTOS\2. SIG\FORMATOS	N/A	DURACION DEL PROYECTO
SGC-FR-02	LISTADO DE DOCUMENTOS EXTERNOS	FORMATO	2	1/07/2023	G:\Mi unidad\1. SIG - DOCUMENTOS\2. SIG\FORMATOS	N/A	DURACION DEL PROYECTO
SGC-FR-03	LISTADO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS	FORMATO	3	1/07/2023	G:\Mi unidad\1. SIG - DOCUMENTOS\2. SIG\FORMATOS	N/A	DURACION DEL PROYECTO
SGC-FR-04	INFORME DE AUDITORIA	FORMATO	1	1/04/2023	G:\Mi unidad\1. SIG - DOCUMENTOS\2. SIG\FORMATOS	N/A	DURACION DEL PROYECTO
SGC-FR-05	PLAN DE AUDITORIA	FORMATO	1	1/04/2023	G:\Mi unidad\1. SIG - DOCUMENTOS\2. SIG\FORMATOS	N/A	DURACION DEL PROYECTO
SGC-FR-06	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA	FORMATO	1	1/07/2023	G:\Mi unidad\1. SIG - DOCUMENTOS\2. SIG\FORMATOS	N/A	DURACION DEL PROYECTO

ANEXO 2. LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS DE CONTRATISTA

CONSORCIO INNOVAPARQUES

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS INTERNOS Y EXTERNOS

CÓDIGO	[illegible]
VERSIÓN	1
FECHA	[illegible]

Fecha de actualización del contenido del registro: [illegible]

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS					CONTROL DE REGISTROS			
ID	Documento	Código	Versión	Fecha de Revisión	Entregado a:	Almacenamiento - protección	Recuperación	Retención	Disposición
	GESTIÓN SG-SST								
1	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	G-SST-0001	6	1/11/2024	PROFESIONAL SG-SST	[illegible]	Por versión	20 años	Destrucción
2	Profesiograma de Seguridad, Salud en el Trabajo, Medio Ambiente y Calidad	PL-SST-01	3	24/5/2024	PROFESIONAL SG-SST	[illegible]	Por versión	20 años	Destrucción
3	Cronograma actividades ambientales	F-AMB-1	6	22/10/2024	PROFESIONAL SG-SST	[illegible]	Por versión	20 años	Destrucción
4	Matriz Legal MA	M-AMB-02	1	11/10/2024	PROFESIONAL SG-SST	[illegible]	Por versión	20 años	Destrucción
5	Matriz de Aspectos e impactos ambientales	M-AMB-03	1	22/10/2024	PROFESIONAL SG-SST	[illegible]	Por versión	20 años	Destrucción
6	Uso de sanitarios	PT-SST-03	1	30/11/2022	PROFESIONAL SG-SST	[illegible]	Por versión	20 años	Destrucción
7	Inspección ambiental de obra	AMB-FO-001	3	02/12/2022	PROFESIONAL SG-SST	[illegible]	Por versión	20 años	Destrucción
8	Bitácora de residuos peligrosos y electrónicos	F-AMB-6	1	03/9/2024	PROFESIONAL SG-SST	[illegible]	Por versión	20 años	Destrucción
9	Procedimiento para atención de derrames	PR-MA-03	1	11/11/2024	PROFESIONAL SG-SST	[illegible]	Por versión	20 años	Destrucción
10	Plan de manejo ambiental	PR-MA-02	1	12/12/2024	PROFESIONAL SG-SST	[illegible]	Por versión	20 años	Destrucción
11	Informe ambiental	INAMB-01	1	11/12/2024	PROFESIONAL SG-SST	[illegible]	Por versión	20 años	Destrucción
12	Política prevención de acoso laboral	PL-SST-02	2	27/5/2024	PROFESIONAL SG-SST	[illegible]	Por versión	20 años	Destrucción
13	Política de prevención del consumo de alcohol, drogas y tabaco	PL-SST-02	2	24/5/2024	PROFESIONAL SG-SST	[illegible]	Por versión	20 años	Destrucción
14	Matriz legal SST	MT-SST-03	1	19/6/2021	PROFESIONAL SG-SST	[illegible]	Por versión	20 años	Destrucción
15	Plan de trabajo anual SG-SST	PT-SST-05	1	10/6/2021	PROFESIONAL SG-SST	[illegible]	Por versión	20 años	Destrucción
16	Formato inspección y control de extintores	PT-SST-01	1	11/6/2021	PROFESIONAL SG-SST	[illegible]	Por versión	20 años	Destrucción
17	Inspección y control botiquines	PT-SST-04	1	11/6/2021	PROFESIONAL SG-SST	[illegible]	Por versión	20 años	Destrucción
18	Matriz de peligros y riesgos SST	MT-SST-01	1	15/7/2021	PROFESIONAL SG-SST	[illegible]	Por versión	20 años	Destrucción
19	Matriz de elementos de protección individual	MT-SST-15	1	2/8/2021	PROFESIONAL SG-SST	[illegible]	Por versión	20 años	Destrucción
20	Conformación de COPASST	PT-SST-04	1	24/11/2020	PROFESIONAL SG-SST	[illegible]	Por versión	20 años	Destrucción
21	Conformación del comité de convivencia laboral	PT-HST-05	1	30/11/2020	PROFESIONAL SG-SST	[illegible]	Por versión	20 años	Destrucción
22	Reglamento SST	DG-SG-06	1	6/6/2021	PROFESIONAL SG-SST	[illegible]	Por versión	20 años	Destrucción
23	Matriz de capacitaciones	PT-TH-04	1	29/6/2021	PROFESIONAL SG-SST	[illegible]	Por versión	20 años	Destrucción
24	Perfiles de cargo	PG-TH-004	8	4/6/2024	PROFESIONAL SG-SST	[illegible]	Por versión	20 años	Destrucción
25	Objetivos y metas SST	SG-SST-01	2	27/5/2024	PROFESIONAL SG-SST	[illegible]	Por versión	20 años	Destrucción
26	Formato de inducción y reinducción	PT-SST-07	1	24/7/2024	PROFESIONAL SG-SST	[illegible]	Por versión	20 años	Destrucción
27	Perfil para emergencias	MT-SST-16	1	19/5/2021	PROFESIONAL SG-SST	[illegible]	Por versión	20 años	Destrucción
28	Programa de estilo de vida saludable	PG-SST-01	1	6/10/2021	PROFESIONAL SG-SST	[illegible]	Por versión	20 años	Destrucción
29	Profesiograma	MT-SST-21	1	19/11/2024	PROFESIONAL SG-SST	[illegible]	Por versión	20 años	Destrucción
30	Procedimiento para la atención, reporte e investigación de accidentes de trabajo	PR-SST-02	1	24/7/2021	PROFESIONAL SG-SST	[illegible]	Por versión	20 años	Destrucción
31	Reporte de investigación de accidente e incidentes de trabajo	PT-HST-06	1	27/8/2021	PROFESIONAL SG-SST	[illegible]	Por versión	20 años	Destrucción
32	Instructivo del PG-SST	MT-SST-02	0	19/8/20	PROFESIONAL SG-SST	[illegible]	Por versión	20 años	Destrucción
33	Procedimiento trabajo seguro en alturas	PR-SST-01	1	11/11/2024	PROFESIONAL SG-SST	[illegible]	Por versión	20 años	Destrucción
34	Permiso de alturas	SG-FO-24	3	29/8/2024	PROFESIONAL SG-SST	[illegible]	Por versión	20 años	Destrucción
35	Programa de auditoria interna y externa	PR-SST-10	01	1/10/2021	PROFESIONAL SG-SST	[illegible]	Por versión	20 años	Destrucción
36	Informe manual SST	IN-SST-01	1	11/11/2024	PROFESIONAL SG-SST	[illegible]	Por versión	20 años	Destrucción
	GESTION AMBIENTAL								
1	Plan de Manejo Ambiental	PR-MA-02	1	12/12/2024	PROFESIONAL AMBIENTAL	[illegible]	Por versión	5 años	Destrucción
2	PROGRAMA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES	F-AMB-1	6	12/12/2024	PROFESIONAL AMBIENTAL	[illegible]	Por versión	5 años	Destrucción
3	LISTA DE ASISTENCIA	FT-SST-01	1	30/11/2021	PROFESIONAL AMBIENTAL	[illegible]	Por versión	5 años	Destrucción
4	MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES	F-AMB-2	7	12/12/2024	PROFESIONAL AMBIENTAL	[illegible]	Por versión	5 años	Destrucción
5	MATRIZ LEGAL AMBIENTAL	F-AMB-3	5	12/12/2024	PROFESIONAL AMBIENTAL	[illegible]	Por versión	5 años	Destrucción
6	BITACORA DE RESIDUOS PELIGROSOS Y ELECTRICOS	F-AMB-4	5	12/12/2024	PROFESIONAL AMBIENTAL	[illegible]	Por versión	5 años	Destrucción
7	INSPECCION AMBIENTAL	F-AMB-5	5	12/12/2024	PROFESIONAL AMBIENTAL	[illegible]	Por versión	5 años	Destrucción
8	Procedimiento en Caso de Derrame	PR-MA-03	1	11/11/2024	PROFESIONAL AMBIENTAL	[illegible]	Por versión	5 años	Destrucción
9	Programa de Manejo Ambiental PMA	PR-SST-01	1	11/11/2024	PROFESIONAL AMBIENTAL	[illegible]	Por versión	5 años	Destrucción
	GESTION SOCIAL								
1	PLAN DE GESTION SOCIAL	GE-N-01	1	21/11/2024	PROFESIONAL SOCIAL	[illegible]	Por versión	5 años	Destrucción

CONSORCIO INNOVAPARQUES	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS INTERNOS Y EXTERNOS	CÓDIGO	HSEQ-P-06
		VERSIÓN	1
		FECHA	26/11/2024
	Fecha de actualización del contenido del registro:		26/04/2025

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS						CONTROL DE REGISTROS			
ID	Documento	Código	Versión	Fecha de Revisión	Elaborado por	Almacenamiento (ubicación)	Recuperación	Retención	Disposición
PRESTACIÓN DEL SERVICIO									
1	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	TRA-M-01	3	26/11/2024	COORDINADOR DE TRANSITO	[redacted]	Por version	5 años	Destrucción
2	CONTROL DE EMERGENCIAS	SST-F-19-E	1	13/12/2021	NO REGISTRO	[redacted]	Por version	5 años	Destrucción
3	PLAN DE INSPECCION Y ENSAYOS	PTS-P-05	5	30/05/2025	NO REGISTRO	[redacted]	Por version	5 años	Destrucción
4	MATRIZ DE ADQUISICIONES	N/A	N/A	N/A	N/A	[redacted]	Por version	5 años	Destrucción
5	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
6	ENROLAMIENTO DE COMPRAS	COM-P-01	1	15/11/2024	COMPRAS	[redacted]	Por version	5 años	Destrucción
7	CONTROL PROPIEDAD DEL CLIENTE	PTS-F-07	1	19/12/2012	NO REGISTRO	[redacted]	Por version	5 años	Destrucción
8	REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA	HSEQ-F-06	3	19/12/2012	CALIDAD	[redacted]	Por version	5 años	Destrucción
9	PROGRAMA DE AUDITORIAS	HSEQ-F-08	1	19/04/2021	CALIDAD	[redacted]	Por version	5 años	Destrucción
10	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS INTERNOS Y EXTERNOS	HSEQ-F-06	1	26/11/2024	CALIDAD	[redacted]	Por version	5 años	Destrucción
11	PLAN DE CALIDAD	HSEQ-P-01	2	26/11/2024	CALIDAD	[redacted]	Por version	5 años	Destrucción
12	PLAN DE TOPOGRAFIA	TR-M-02	1	18/12/2024	NO REGISTRO	[redacted]	Por version	5 años	Destrucción
13	PLAN DE SEÑALIZACION	TR-M-03	1	11/2024	NO REGISTRO	[redacted]	Por version	5 años	Destrucción
14	PLAN DE SEÑALIZACION Publicidad	TR-M-04	1	11/2024	NO REGISTRO	[redacted]	Por version	5 años	Destrucción
15	PLAN ESTRUCTURAL	TR-M-05	2	11/2024	NO REGISTRO	[redacted]	Por version	5 años	Destrucción
16	PLAN REDOSIFICACION	TR-M-06	2	11/2024	NO REGISTRO	[redacted]	Por version	5 años	Destrucción
17	PLAN SUDS - Simple 1 Scenario	TR-M-07	2	11/2024	NO REGISTRO	[redacted]	Por version	5 años	Destrucción
18	Plan de conservación y mantenimiento logístico	TR-M-08	2	12/2024	NO REGISTRO	[redacted]	Por version	5 años	Destrucción
19	Registro de calidad de fabricantes	PS-F-03	3	17/07/2015	NO REGISTRO	[redacted]	Por version	5 años	Destrucción
20	Formato de verificación instalaciones	PS-F-11	1	26/11/2024	NO REGISTRO	[redacted]	Por version	5 años	Destrucción
21	Oferta económica	LP-SG-CRO-2121-2024	0	17/09/2024	NO REGISTRO	[redacted]	Por fecha y version	5 años	Destrucción
22	Programación contractual inicial	N/A	0	9/04/2025	NO REGISTRO	[redacted]	Por fecha y version	5 años	Destrucción
23	Balance	N/A	0	9/04/2025	NO REGISTRO	[redacted]	Por fecha y version	5 años	Destrucción
DOCUMENTACIÓN EXTERNA									
1	RUES S - Riesgos / ERG	CGS-EICP-PM-118	3	N/A	ISM	N/A	N/A	10A	N/A
2	REVISIÓN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - PLAN DE GESTION RCD / DAS	N/A	N/A	N/A	ISM	N/A	N/A	N/A	N/A
3	CONTROL DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA (CDS)	N/A	N/A	N/A	TOPOGRAFO	[redacted]	N/A	N/A	N/A

ANEXO 3. PLAN INSPECCIÓN Y ENSAYOS – INTERVENTORÍA

NIT: 900.824.715-9

Bogotá, 27 de junio de 2025
SA-2552-25-003.

Señores:
SOLIUN S.A.S.
Obra: Infraestructura parques.
Atn. Ing. Vianney Leaño.
Ciudad

Ref.: Entrega informe de resultados

Cordial saludo

Anexo a la presente hacemos entrega de un total de un (01) folio, el cual contiene el resultado obtenido del ensayo efectuado a la muestra relacionada a continuación:

- Muestra 1: Arena tipo Sílice. Fuente: No suministrada

Los ensayos se efectuaron de acuerdo con los procedimientos indicados en las normas de ensayo INVIAS 2013.

Cordialmente

NELSON JAVIER MENDEZ
Dirección Técnica
direcciontecnica@psiingenieria.com

PSI INGENIERIA & LABORATORIOS — ONAC ACREDITADO — ISO / IEC 17025:2017 — 20 - LAB - 800

INFORME DE RESULTADOS:
ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS GRUESO Y FINO
INV E 213 - 13

Teléfono 6750913
Calle 72A No. 66-11
Bogotá D.C. Colombia
www.psilaboratorio.com

F-T-016
Revisión 05
2024-11-26

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Compañía	SOLIUN S.A.S.	Dirección	Carrera 70C No. 48-55, Bogotá.
Obra	INFRAESTRUCTURA PARQUES.	Dirigido a:	Ing. Vianney Leaño.

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA

Descripción	Arena silice, color amarillo.	Tipo de muestra	Arena tipo Silice.
Localización	Cancha Refous. Soliun: Grama Canchas 2560. Fecha de toma: 2025-06-18.	Fuente	Materiales y Suministros Bepe S.A.S.

Identificación informe	Orden de trabajo No.	Muestra No.	Fecha de recepción	Fecha de ejecución	Fecha de emisión
SA-2552 -25-GRADA- 003 -1	12497	1	2025-06-19	2025-06-21	2025-06-27

Masa Inicial (g)			501,0
Tamiz	Masa retenida (g)	% Retenido	% Pasa
3"	0,0	0,0	**100,0**
2 1/2"	0,0	0,0	**100,0**
2"	0,0	0,0	**100,0**
1 1/2"	0,0	0,0	**100,0**
1"	0,0	0,0	**100,0**
3/4"	0,0	0,0	**100,0**
1/2"	0,0	0,0	**100,0**
3/8"	0,0	0,0	**100,0**
No. 4	0,0	0,0	**100,0**
No. 8	0,0	0,0	**100,0**
No. 10	0,0	0,0	**100,0**
No. 16	0,0	0,0	**100,0**
No. 30	121,5	24,3	**75,7**
No. 40	120,5	24,1	**51,7**
No. 50	110,5	22,1	**29,6**
No. 100	73,5	14,7	**15,0**
No. 200	22,5	4,5	**10,5**

CLASIFICACIÓN DE SUELOS POR TAMIZADO (SUCS) INV-181-13

Grava (Pasa 3" - Ret. No.4)		
Arena (Pasa No.4 - Ret. No.200)	Arena gruesa (Pasa No.4 - Ret. No.10)	
	Arena media (Pasa No.10 - Ret. No.40)	
90%	Arena fina (Pasa No.40 - Ret. No.200)	41%
Limo y Arcilla combinados (Pasa Tamiz No. 200)		10%


OBSERVACIONES:

Especificación IDRD. Grama sintético FIFA Prefer:

Granulometria entre 0,5 y 0,8 mm.

CLIENTE SOLICITA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD:	NO

CURVA GRANULOMETRICA

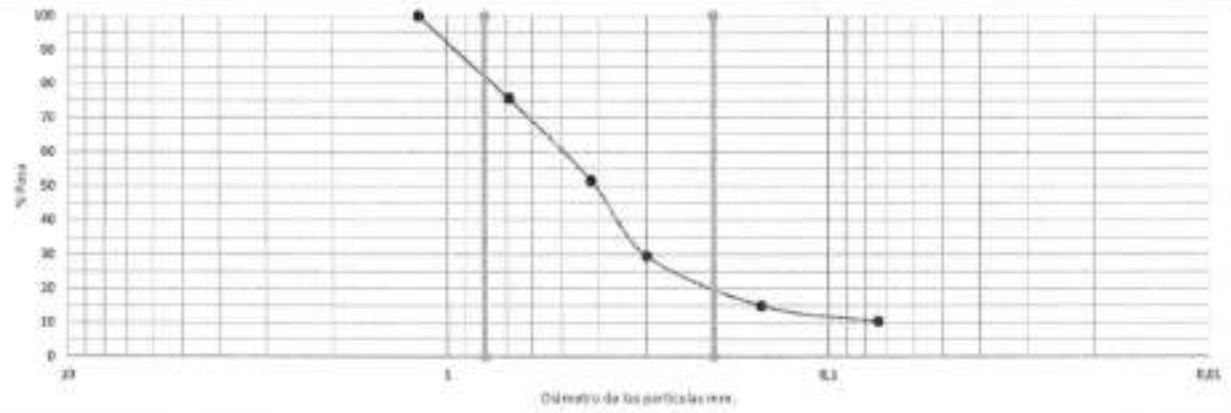

Comentarios:

- Datos suministrados por el cliente: Localización, Tipo de Muestra, Fuente y Especificación.
- El laboratorio no se hace responsable por la información suministrada por el cliente que impacte en la validez de los resultados obtenidos, así como las decisiones tomadas frente a los mismos
- Este informe solo puede ser reproducido en su totalidad con autorización escrita del laboratorio que lo realiza.
- Los resultados que contiene este informe pertenecen al item ensayado en las condiciones en los cuales ingresa al laboratorio, expresando en su totalidad el resultado de las mediciones obtenidas.

APROBADO POR

NELSON JAVIER MENDEZ
DIRECCION TECNICA

FIN DEL INFORME

NIT: 900.824.715-9

Bogotá, 27 de junio de 2025
SA-2412-25-004.

Señores:
SOLIUN S.A.S.
Obra: Infraestructura Parques.
Atn. Ing. Vianney Leaño.
Ciudad

Ref.: Entrega informe de resultados

Cordial saludo

Anexo a la presente hacemos entrega de un total de un (01) folio, el cual contiene lo resultados obtenidos del ensayo efectuado a la muestra relacionada a continuación:

- Muestra 2: Caucho. Fuente: Ecotire Green.

Los ensayos se efectuaron de acuerdo con los procedimientos indicados en las normas de ensayo INVIAS 2013.

Cordialmente

NELSON JAVIER MENDEZ
Dirección Técnica
direcciontecnica@psiingenieria.com

PSI INGENIERÍA AL SERVICIO DEL SUELO	INFORME DE RESULTADOS: ANALISIS GRANULOMÉTRICO DE LOS AGREGADOS GRUESO Y FINO INV E 213 - 13	
ONAC ACREDITADO NA / RC 17025:2017 22 - LAB - 068	Teléfono 6750913 Calle 72A No. 66-11 Bogotá D.C. Colombia	www.psiingenieria.com
		F-T-016 Revisión 05 2024-11-26

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			
Compañía	SOLIUN S.A.S.	Dirección	Carrera 70C No. 48-55, Bogotà.
Obra	INFRAESTRUCTURA PARQUES.	Dirigido a:	Ing. Vianney Leaño.

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA			
Descripción	Caucho sintètico, color negro.	Tipo de muestra	Caucho Molido tipo SBR
Localización	Cancha Refous. Soliun: Gramas Canchas 2560. Fecha de toma: 2025-06-18.	Fuente	Ecotire Green.

Identificación informe	Orden de trabajo No.	Muestra No.	Fecha de recepción	Fecha de ejecución	Fecha de emisión
SA-2552 -25-GRADA- 003 -1	12497	2	2025-06-19	2025-06-21	2025-06-27

Masa Inicial (g)			307,0
Tamiz	Masa retenida (g)	% Retenido	% Pasa
3"	0,0	0,0	100,0
2 1/2"	0,0	0,0	100,0
2"	0,0	0,0	100,0
1 1/2"	0,0	0,0	100,0
1"	0,0	0,0	100,0
3/4"	0,0	0,0	100,0
1/2"	0,0	0,0	100,0
3/8"	0,0	0,0	100,0
No. 4	0,0	0,0	100,0
No. 8	0,0	0,0	100,0
No. 10	56,5	18,4	81,6
No. 16	166,5	54,2	27,4
No. 30	59,5	19,4	8,0
No. 40	10,0	3,3	4,7
No. 50	5,5	1,8	2,9
No. 100	6,5	2,1	0,8
No. 200	2,5	0,8	0,0

CLASIFICACIÓN DE SUELOS POR TAMIZADO (SUCS) INV-181-13

Grava (Pasa 3" - Ret. No.4)		
Arena (Pasa No.4 - Ret. No.200)	Arena gruesa (Pasa No.4 - Ret. No.10)	
	Arena media (Pasa No.10 - Ret. No.40)	77%
100%	Arena fina (Pasa No.40 - Ret. No.200)	5%
Limo y Arcilla combinados (Pasa Tiz. 200)	0%	


OBSERVACIONES:

Especificación IDRD. Grama sintética FIFA Prefer:

Granulometria entre 0,5 y 2,0 mm.

CLIENTE SOLICITA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD:	NO

CURVA GRANULOMETRICA

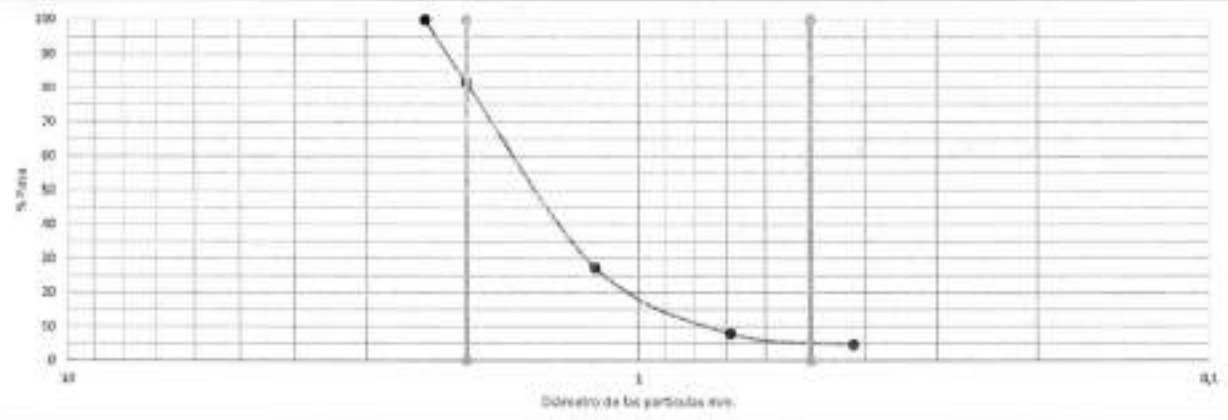

Comentarios:

- Datos suministrados por el cliente: Localización, Tipo de Muestra, Fuente y Especificación.
- El laboratorio no se hace responsable por la información suministrada por el cliente que impacte en la validez de los resultados obtenidos, así como las decisiones tomadas frente a los mismos.
- Este informe solo puede ser reproducido en su totalidad con autorización escrita del laboratorio que lo realiza.
- Los resultados que contiene este informe pertenecen al ítem ensayado en las condiciones en las cuales ingresa al laboratorio, expresando en su totalidad el resultado de las mediciones obtenidas.

APROBADO POR

NELSON JAVIER MENDEZ
DIRECCION TECNICA

FIN DEL INFORME

ANEXO 4 PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS - CONTRATISTA

FICHA TÉCNICA

HILO NYLON BONDEADO





Material: Nylon bondeado hecho de filamento continuo de nylon 6.6 estabilizado. Corta limpiamente sin separación de capa y provee resistencia a la abrasión superior en el producto cosido, resistente a rayos UV.

Presentación: 454 grs metros: 5,000 mts. Tex210 Origen: EEUU

Usos principales: Calzado de piel, tapicería de muebles, automotriz, equipaje y bienes de viaje, bienes de exterior, malla sombra, calzado de protección, filtración, lonas, inflables, bolsas de aire (automotriz).

Características y Beneficios

- Nylon 6.6 de alta tenacidad para fuerza y durabilidad sobresaliente.
- Química única de bondeado y tecnología exclusiva de recubrimiento que produce un hilo fuerte y flexible sin pérdida de torcido, sin escamas y sin cambio de color al estar cosido
- Lubricante especialmente formulado para resistir altas temperaturas y una suave operación a través del ojo de la aguja sin pausas, saltos o tensión
- Características de estiramiento controlado para formación de un buen bucle y puntadas balanceadas firmes y apretadas
- Cumple con la lista de sustancias restringidas.

Propiedades Fisicas y Quimicas

Propiedades Térmicas	
Punto de fusión a 250°C, se pega a 229°C	
Propiedades Químicas	
Ácidos minerales	• Se descompone con fuertes ácidos minerales; resistente a ácidos débiles
Solventes orgánicos	• Generalmente sin afectaciones
Blanqueado	• Sin afectaciones. Deterioro dependiente de condiciones
Insectos / Micro-organismos (moho, podredumbre)	• Sin afectaciones
Lavado / lavado en seco	Sin afectaciones
Recuperación de humedad	Aproximadamente 4.5%

Estos grados de solidez representan los niveles mínimos de desempeño, y en la práctica, la mayoria de los matices excederán estos niveles

Ya que las condiciones y aplicaciones varian considerablemente en el uso del hilo, el usuario debe asegurarse mediante pruebas preliminares de que el hilo es adecuado para el uso final planeado.

VIDEOS

https://www.youtube.com/watch?v=OOyKACPU_H0

Multi Asfaltos
EMULSIONES ASFALTICAS
NIT. 900.520.766-9

Carrera 18 Bis # 60 G-79 Sur - Barrio Meissen
Teléfono (300) 912 4225 - (312) 670 1465
E-mail: sindy.alvarado@multiasfaltos.com
ventas@multiasfaltos.com
BOGOTA D.C.

CONTROL DE CALIDAD

FECHA	6 de junio de 2025	**TANQUE**	01
PRODUCTO	**EMULSION ASFALTICA CRL-1**	**PLACAS**	
CLIENTE	GREGORIO VARGAS	**COCHADA**	**MA011-25**
NIT.	0		

ENSAYO	METODO	ESPECIFICACION		RESULTADO
		Min	Max	
Viscosidad Saybolt Furol a 25ºC	INV E-763	20,0	200,0	28,0
Contenido de agua en volúmen	INV E-761	-	43,0	40,0
Estabilidad almacenamiento a 5 dias	INV E-764	-	5,0	4,3
Contenido de Asfalto Residual	INV E-762	57,0	-	60,0
Tamizado retenido Tamiz # 20	INV E-765	-	0,10	0,0
Carga Partícula	INV E-767	Positiva		Positiva
Ph	INV E-768	-	6,0	4,4

RESIDUO DE DESTILACION

Penetración	25ºC 100 gr 5 seg 0.1 mm	INV E-706	60,0	100,0	69,0
Ductilidad (5º C, 5cm/m) cm		INV E-702	40,0	-	80,0
Solubilidad en tricloroetileno %		INV E-713	97,5	-	99,0

OBSERVACIONES: 1) SE HACE ENTREGA DEL PRODUCTO DESPACHADO Y SE ACLARA QUE EN NUESTRAS INSTALACIONES QUEDA UNA CONTRA-MUESTRA COMO TESTIGO EN CASO DE FUTUROS RECLAMOS POR PARTE DEL CLIENTE, LA CUAL SE CONSERVARA POR UN TIEMPO NO MAYOR A DOS (2) MESES A PARTIR DE LA FECHA DE DESPACHO. **2)** SE RECOMIENDA RECIRCULAR EL PRODUCTO ANTES DE SU APLICACION, DE IGUAL MANERA, SI ESTE NO SE UTILIZA EN SU TOTALIDA Y SE VA A DEJAR EN ALMACENAMIENTO, SE DEBE RECIRCULAR O AGITAR MINIMO CADA (3) O (4) DIAS PARA EVITAR SE SEDIMENTE. **3) EL BUEN USO Y MANEJO APROPIADO DE NUESTRO PRODUCTO ES RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE.**

V°B° Laboratorio

ROZA-GRAPISA
WWW.ROZAGRAPISA.COM
comercial@rozagrapi.com
San Vicente Mártir, 20 28043 MADRID Tlf +34 914166614 / +34 914167626 Fax +34 915193075
Ana María, 47 33209 GIJON Tlf +34 985162833 Fax +34 985146622

MÁQUINA DE COSER PORTÁTIL PARA CERRADO DE SACOS MARCA YAO HAN MODELO N600A

Cosedora de sacos llenos para condiciones de trabajo normales y cierre de todo tipo de sacos para productos agrícolas, harinas, fertilizantes, semillas, productos químicos, etc.



Características:

- Alta velocidad de cosido
- Cadeneta de un solo hilo que facilita la apertura del saco y ahorro de hilo.
- Mecanismos de funcionamiento sencillos y eficaces
- Mango ortopédico aislante.
- **Engrase semiautomático** mediante bomba de aceite a presión, con conductos de aceite directos a las principales partes en movimiento
- Corte de hilo automático
- Mantenimiento, vibraciones y ruido mínimos





Características técnicas:

- **Producción: 250 – 350 sacos/hora**
- **Motor:** 90W 50/60 hz. monofásico, 220 V,
- **Peso:** 5, 3 Kg. sin cono de hilo
- **Aguja:** FD5
- **Hilo:** 12/3, tres cabos trenzados a izquierdas
- **Puntada:** 7,2 mm



El equilibrador de resorte y el volvedor para ribeteado son accesorios opcionales

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

Bogotá D.C., 2025 junio 05

Ingeniero
BRAYAN GARCIA
CONSORCIO INNOVAPARQUES
Obra: CANCHAS SINTÉTICAS
Código de obra: 25607
Bogotá D.C

Asunto: Entrega de informes de resultados.

Apreciado Ingeniero

De manera atenta nos permitimos hacer entrega de los informes con referencia DGP 2564-25-1 al DGP 2564-25-3 en los cuales se presentan los resultados del ensayo relacionado a continuación:

NORMA DE ENSAYO	
Determinación de los tamaños de las partículas de los suelos.	INV E 123:2013

Muestra No.	Descripción del material
1	Arena sílice
2	Caucho granulado
3	Arena río

Los ensayos se realizaron conforme a los procedimientos establecidos en la norma relacionada; los resultados reportados corresponden exclusivamente a las características de las muestras ensayadas.

Nota: Este consolidado de informes DGP 2564-25-1 a DGP 2564-25-3, anula y reemplaza el consolidado de informes DGP 2333-25-1 a DGP 2333-25-3, emitido el 29 de mayo del 2025, debido al ajuste en la gráfica de la granulometria - muestra #2.

Cordialmente;



Firmado digitalmente por LAURA LILIANA CUERVO GIRALDO
Fecha: 2025.06.05 10:54:31 -05'00'

Laura Cuervo Giraldo
Jefe de Geotecnia
geotecnia@concrelab.com
OV. 154088 – OT. 79520
E. PALACIOS

INFORME DE ENSAYO

DETERMINACIÓN DE LOS TAMAÑOS DE LAS PARTÍCULAS DE LOS SUELOS. (ANÁLISIS POR TAMIZADO) INV E 123:2013

NÚMERO DE INFORME: DGP-2564-25-1

***CLIENTE:**	CONSORCIO INNOVAPARQUES
***CÓDIGO DE OBRA:**	25607
***OBRA:**	CANCHAS SINTÉTICAS
***DIRECCIÓN Y CIUDAD DEL CLIENTE:**	CL 51 A 71 A 18
***DESCRIPCIÓN CLIENTE:**	ARENA SILICE
DESCRIPCIÓN LABORATORIO:	VISUAL: MATERIAL ARENOSO, COLOR: MARRÓN MUY PÁLIDO, CONDICIÓN DE HUMEDAD: HÚMEDA
***NÚMERO DE LA MUESTRA:**	1
***PROCEDENCIA:**	NO SUMINISTRADA
***LOCALIZACIÓN TOMA DE MUESTRA:**	NO SUMINISTRADA
SITIO DE ENSAYO:	LABORATORIO DE ENSAYOS
FECHA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS:	2025-05-19
FECHA DE EJECUCIÓN DE ENSAYO:	2025-05-26
FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME:	2025-06-05
ENSAYO EJECUTADO POR:	S. QUINTERO
ORDEN DE TRABAJO N°:	79520 - OV. 154088
NÚMERO DE PÁGINAS DEL INFORME:	Dos (2)

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
* La información registrada en los campos identificados con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

AUTORIZADO POR:



Laura Cuervo Giraldo
Jefe de Geotecnia
geotecnia@concrelab.com


INFORME DE ENSAYO

DETERMINACIÓN DE LOS TAMAÑOS DE LAS PARTÍCULAS DE LOS SUELOS. (ANÁLISIS POR TAMIZADO) INV E 123:2013

NÚMERO DE INFORME: DGP-2564-25-1

Masa total seca (g):		2701,7		Tamaño máximo:	No. 10	Masa seca pasa tamiz 2 mm (N°10) (g):	118,2	
Tamiz		Masa retenida (g)	% Retenido	% Que pasa	% Que pasa N° 10	% Pasa unificado	* Límite Inferior	* Límite Superior
mm	Alterno							
125,00	5"			100		100		
100,00	4"			100		100		
76,20	3"			100		100		
64,00	2 ½"			100		100		
50,00	2"			100		100		
37,50	1 ½"			100		100		
25,40	1"			100		100		
19,00	3/4"			100		100		
12,70	1/2"			100		100		
9,52	3/8"			100		100		
4,75	No 4			100		100		
2,38	No 8			100		100		
2,00	No. 10			100		100		
1,19	No. 16	0	0		100	100		
0,60	No. 30	0	0		100	100		
0,43	No. 40	72,3	61,2		38,8	38,8		
0,30	No. 50	45,9	38,8		0	0		
0,18	No.80	0	0		0	0		
0,15	No. 100	0	0		0	0		
0,08	No. 200	0	0		0	0		

Nota: La información registrada en los campos identificados con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

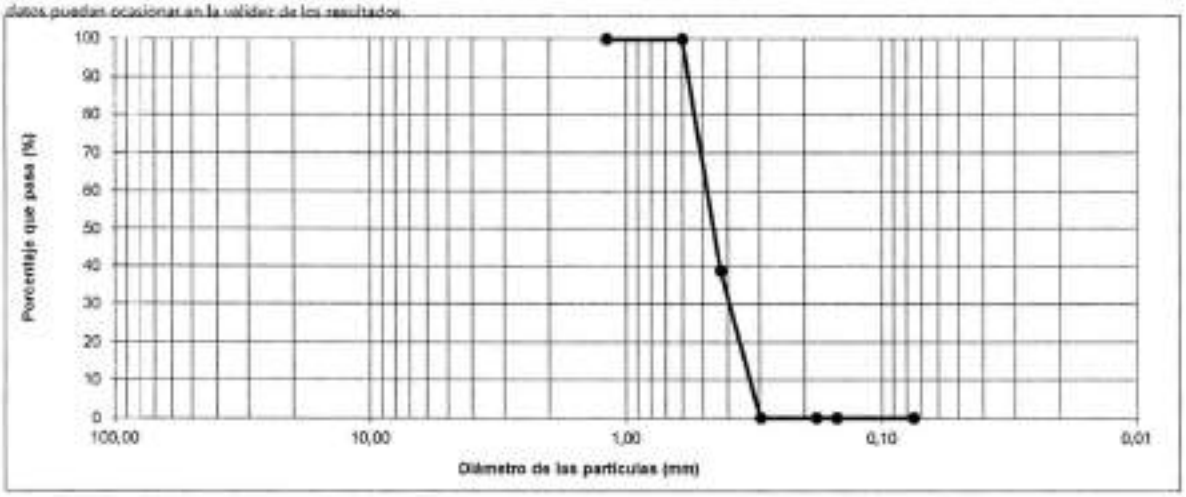

OBSERVACIONES:

"De acuerdo al servicio aprobado por el cliente, se realiza únicamente el ensayo de granulometría por tamizado y se excluye el ensayo por sedimentación (Hidrometría)"

Este informe DGP 2564-25-1, anula y reemplaza el informe DGP 2333-25-1, emitido el 29 de mayo del 2025, debido al ajuste en la gráfica de la granulometría - muestra #2.

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

INFORME DE ENSAYO

DETERMINACIÓN DE LOS TAMAÑOS DE LAS PARTÍCULAS DE LOS SUELOS. (ANÁLISIS POR TAMIZADO) INV E 123:2013

NÚMERO DE INFORME: DGP-2564-25-2

***CLIENTE:**	CONSORCIO INNOVAPARQUES
***CÓDIGO DE OBRA:**	25607
***OBRA:**	CANCHAS SINTÉTICAS
***DIRECCIÓN Y CIUDAD DEL CLIENTE:**	CL 51 A 71 A 18
***DESCRIPCIÓN CLIENTE:**	CAUCHO GRANULADO
DESCRIPCIÓN LABORATORIO:	VISUAL: MATERIAL CAUCHO GRANULADO, COLOR: NEGRO, CONDICIÓN DE HUMEDAD: SECA
***NÚMERO DE LA MUESTRA:**	2
***PROCEDENCIA:**	NO SUMINISTRADA
***LOCALIZACIÓN TOMA DE MUESTRA:**	NO SUMINISTRADA
SITIO DE ENSAYO:	LABORATORIO DE ENSAYOS
FECHA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS:	2025-05-19
FECHA DE EJECUCIÓN DE ENSAYO:	2025-05-26
FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME:	2025-06-05
ENSAYO EJECUTADO POR:	S. QUINTERO
ORDEN DE TRABAJO N°:	79520 - OV. 154088
NÚMERO DE PÁGINAS DEL INFORME:	Dos (2)

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
* La información registrada en los campos identificados con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

AUTORIZADO POR:



Laura Cuervo Giraldo
Jefe de Geotecnia
geotecnia@concrelab.com


INFORME DE ENSAYO

DETERMINACIÓN DE LOS TAMAÑOS DE LAS PARTÍCULAS DE LOS SUELOS. (ANÁLISIS POR TAMIZADO) INV E 123:2013

NÚMERO DE INFORME: DGP-2564-25-2

Masa total seca (g):		1022		Tamaño máximo:	No. 10	Masa seca para tamiz 2 mm (N°10) (g):	111,2	
Tamiz		Masa retenida (g)	% Retenido	% Que pasa	% Que pasa N° 10	% Pasa unificado	* Límite Inferior	* Límite Superior
mm	Alterno							
125,00	5"			100		100		
100,00	4"			100		100		
76,20	3"			100		100		
64,00	2 ½"			100		100		
50,00	2"			100		100		
37,50	1 ½"			100		100		
25,40	1"			100		100		
19,00	3/4"			100		100		
12,70	1/2"			100		100		
9,52	3/8"			100		100		
4,75	No 4			100		100		
2,38	No 8			100		100		
2,00	No. 10			100		100		
1,19	No. 16	54,5	49		51	51		
0,60	No. 30	47,7	43		8	8		
0,43	No. 40	7,2	6		2	2		
0,30	No. 50	1,5	2		2	2		
0,18	No. 80	0	0		0	0		
0,15	No. 100	0	0		0	0		
0,08	No. 200	0	0		0	0		

Nota: La información registrada en los campos identificados con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

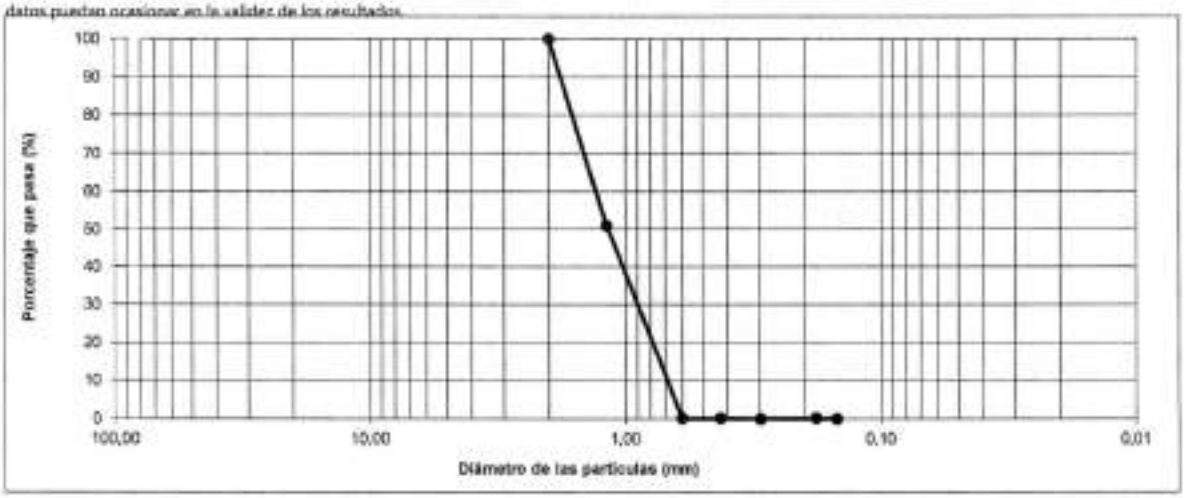

OBSERVACIONES:

"De acuerdo al servicio aprobado por el cliente, se realiza únicamente el ensayo de granulometría por tamizado y se excluye el ensayo por sedimentación (Hidrometría)"

Este informe DGP 2564-25-2, anula y reemplaza el informe DGP 2333-25-2, emitido el 29 de mayo del 2025, debido al ajuste en la gráfica de la granulometría - muestra #2.

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

INFORME DE ENSAYO

DETERMINACIÓN DE LOS TAMAÑOS DE LAS PARTÍCULAS DE LOS SUELOS. (ANÁLISIS POR TAMIZADO) INV E 123:2013

NÚMERO DE INFORME: DGP-2564-25-3

***CLIENTE:**	CONSORCIO INNOVAPARQUES
***CÓDIGO DE OBRA:**	25607
***OBRA:**	CANCHAS SINTÉTICAS
***DIRECCIÓN Y CIUDAD DEL CLIENTE:**	CL 51 A 71 A 18
***DESCRIPCIÓN CLIENTE:**	ARENA RÍO
DESCRIPCIÓN LABORATORIO:	VISUAL: MATERIAL ARENOSO, COLOR: GRIS, CONDICIÓN DE HUMEDAD: HÚMEDA
***NÚMERO DE LA MUESTRA:**	3
***PROCEDENCIA:**	NO SUMINISTRADA
***LOCALIZACIÓN TOMA DE MUESTRA:**	NO SUMINISTRADA
SITIO DE ENSAYO:	LABORATORIO DE ENSAYOS
FECHA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS:	2025-05-19
FECHA DE EJECUCIÓN DE ENSAYO:	2025-05-26
FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME:	2025-06-05
ENSAYO EJECUTADO POR:	S. QUINTERO
ORDEN DE TRABAJO Nº:	79520 - OV. 154088
NÚMERO DE PÁGINAS DEL INFORME:	Dos (2)

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
* La información registrada en los campos identificados con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

AUTORIZADO POR:



Laura Cuervo Giraldo
Jefe de Geotecnia
geotecnia@concrelab.com

INFORME DE ENSAYO

DETERMINACIÓN DE LOS TAMAÑOS DE LAS PARTÍCULAS DE LOS SUELOS. (ANÁLISIS POR TAMIZADO) INV E 123:2013

NÚMERO DE INFORME: DGP-2564-25-3

Masa total seca (g):		3283		Tamaño máximo:	No. 10	Masa seca pasa tamiz 2 mm (N°10) (g):	117,0	
Tamiz		Masa retenida (g)	% Retenido	% Que pasa	% Que pasa N° 10	% Pasa unificado	* Límite Inferior	* Límite Superior
mm	Alterno							
125,00	5"			100		100		
100,00	4"			100		100		
76,20	3"			100		100		
64,00	2 ½"			100		100		
50,00	2"			100		100		
37,50	1 ½"			100		100		
25,40	1"			100		100		
19,00	3/4"			100		100		
12,70	1/2"			100		100		
9,52	3/8"			100		100		
6,35	1/4"			100		100		
4,75	No 4			100		100		
2,38	No 8			100		100		
2,00	No. 10			100		100		
1,19	No. 16	0,1	0		100	100		
0,60	No. 30	0,8	1		99	99		
0,43	No. 40	11,9	10		89	89		
0,30	No. 50	41,6	36		54	54		
0,18	No. 80	28,8	25		29	29		
0,15	No. 100	5,4	5		24	24		
0,08	No. 200	20,1	17		7	7,1		

Nota: La información registrada en los campos identificados con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.



OBSERVACIONES:

"De acuerdo al servicio aprobado por el cliente, se realiza únicamente el ensayo de granulometría por tamizado y se excluye el ensayo por sedimentación (Hidrometría)"

Este informe DGP 2564-25-3, anula y reemplaza el informe DGP 2333-25-3, emitido el 29 de mayo del 2025, debido al ajuste en la gráfica de la granulometría - muestra #2.

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

Bogotá D.C., 2025 junio 26

Ingeniero
BRAYAN GARCIA
CONSORCIO INNOVAPARQUES
Obra: CANCHAS SINTÉTICAS
Código de obra: 25607
Bogotá D.C

Asunto: Entrega de informes de resultados.

Apreciado Ingeniero

De manera atenta nos permitimos hacer entrega de los informes con referencia DGP 2904-25-1 al DGP 2904-25-2 en los cuales se presentan los resultados del ensayo relacionado a continuación:

NORMA DE ENSAYO	
Determinación de los tamaños de las particulas de los suelos.	INV E 123:2013

Muestra No.	Descripción del material
M1	Grano caucho
M2	Arena

Los ensayos se realizaron conforme a los procedimientos establecidos en la norma relacionada; los resultados reportados corresponden exclusivamente a las características de las muestras ensayadas.

Cordialmente;

Firmado digitalmente por LAURA LILIANA CUERVO GIRALDO
Fecha: 2025.06.26 15:11:38 -05'00'

Laura Cuervo Giraldo
Jefe de Geotecnia
geotecnia@concrelab.com
OV. 157447 – OT. 80216
E. PALACIOS

1404

INFORME DE ENSAYO

DETERMINACIÓN DE LOS TAMAÑOS DE LAS PARTÍCULAS DE LOS SUELOS. (ANÁLISIS POR TAMIZADO) INV E 123:2013

NÚMERO DE INFORME: DGP-2504-25-1

***CLIENTE:**	CONSORCIO INNOVAPARQUES
***CÓDIGO DE OBRA:**	25607
***OBRA:**	CANCHAS SINTÉTICAS
***DIRECCIÓN Y CIUDAD DEL CLIENTE:**	CL 51 A 71 A 18
***DESCRIPCIÓN CLIENTE:**	GRANO CAUCHO
DESCRIPCIÓN LABORATORIO:	VISUAL: CAUCHO GRANULADO, COLOR: NEGRO, CONDICIÓN DE HUMEDAD: HÚMEDA
***NÚMERO DE LA MUESTRA:**	M1
***PROCEDENCIA:**	NO SUMINISTRADA
***LOCALIZACIÓN TOMA DE MUESTRA:**	NO SUMINISTRADA
SITIO DE ENSAYO:	LABORATORIO DE ENSAYOS
FECHA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS:	2025-06-17
FECHA DE EJECUCIÓN DE ENSAYO:	2025-06-20
FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME:	2025-06-26
ENSAYO EJECUTADO POR:	S. QUINTERO
ORDEN DE TRABAJO Nº:	80216 - OV. 157447
NÚMERO DE PÁGINAS DEL INFORME:	Dos (2)

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
* La información registrada en los campos identificados con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

AUTORIZADO POR:



Laura Cuervo Giraldo
Jefe de Geotecnia
geotecnia@concrelab.com

INFORME DE ENSAYO

DETERMINACIÓN DE LOS TAMAÑOS DE LAS PARTÍCULAS DE LOS SUELOS.
(ANÁLISIS POR TAMIZADO) INV E 123:2013

NÚMERO DE INFORME: DGP-2904-25-1

Masa total seca (g):		115,4		Tamaño máximo:	No. 10	Masa seca pasa tamiz 2 mm (N°10) (g):	115,4	
Tamiz		Masa retenida (g)	% Retenido	% Que pasa	% Que pasa N° 10	% Pasa unificado	* Límite Inferior	* Límite Superior
mm	Alterno							
125,00	5"			100		100		
100,00	4"			100		100		
76,20	3"			100		100		
64,00	2 ½"			100		100		
50,00	2"			100		100		
37,50	1 ½"			100		100		
25,40	1"			100		100		
19,00	3/4"			100		100		
12,70	1/2"			100		100		
9,52	3/8"			100		100		
4,75	No 4			100		100		
2,38	No 8			100		100		
2,00	No. 10			100		100		
1,19	No. 16	56,9	49		51	51		
0,60	No. 30	52,8	51		0	0		
0,43	No. 40	0	0		0	0		
0,30	No. 50	0	0		0	0		
0,15	No. 100							
0,08	No. 200							

Nota: La información registrada en los campos identificados con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.



OBSERVACIONES:

"De acuerdo al servicio aprobado por el cliente, se realiza únicamente el ensayo de granulometría por tamizado y se excluye el ensayo por sedimentación (Hidrometría)"

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

INFORME DE ENSAYO

DETERMINACIÓN DE LOS TAMAÑOS DE LAS PARTÍCULAS DE LOS SUELOS. (ANÁLISIS POR TAMIZADO) INV E 123:2013

NÚMERO DE INFORME: DGP-2904-25-2

***CLIENTE:**	CONSORCIO INNOVAPARQUES
***CÓDIGO DE OBRA:**	25607
***OBRA:**	CANCHAS SINTÉTICAS
***DIRECCIÓN Y CIUDAD DEL CLIENTE:**	CL 51 A 71 A 18
***DESCRIPCIÓN CLIENTE:**	ARENA
DESCRIPCIÓN LABORATORIO:	VISUAL: MATERIAL ARENOSO, COLOR: MARRÓN MUY PÁLIDO, CONDICIÓN DE HUMEDAD: HÚMEDA
***NÚMERO DE LA MUESTRA:**	M2
***PROCEDENCIA:**	NO SUMINISTRADA
***LOCALIZACIÓN TOMA DE MUESTRA:**	NO SUMINISTRADA
SITIO DE ENSAYO:	LABORATORIO DE ENSAYOS
FECHA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS:	2025-06-17
FECHA DE EJECUCIÓN DE ENSAYO:	2025-06-20
FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME:	2025-06-26
ENSAYO EJECUTADO POR:	S. QUINTERO
ORDEN DE TRABAJO N°:	80216 - OV. 157447
NÚMERO DE PÁGINAS DEL INFORME:	Dos (2)

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
* La información registrada en los campos identificados con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

AUTORIZADO POR:



Laura Cuervo Giraldo
Jefe de Geotecnia
geotecnia@concrelab.com


INFORME DE ENSAYO

DETERMINACIÓN DE LOS TAMAÑOS DE LAS PARTÍCULAS DE LOS SUELOS. (ANÁLISIS POR TAMIZADO) INV E 123:2013

NÚMERO DE INFORME: DGP-2904-25-2

Masa total seca (g):		121,6		Tamaño maximo:	No. 16	Masa seca pasa tamiz 2 mm (N°10) (g):	121,6	
Tamiz		Masa retenida (g)	% Retenido	% Que pasa	% Que pasa N° 10	% Pasa unificado	* Limite Inferior	* Limite Superior
mm	Alterno							
125,00	5"			100		100		
100,00	4"			100		100		
76,20	3"			100		100		
64,00	2 ½"			100		100		
50,00	2"			100		100		
37,50	1 ½"			100		100		
25,40	1"			100		100		
19,00	3/4"			100		100		
12,70	1/2"			100		100		
9,52	3/8"			100		100		
4,75	No 4			100		100		
2,38	No 8			100		100		
2,00	No. 10			100		100		
1,19	No. 16				100	100		
0,60	No. 30	0	0		100	100		
0,43	No. 40	75,2	62		38	38		
0,30	No. 50	46,4	38		0	0		
0,15	No. 100	0	0		0	0		
0,08	No. 200	0	0		0	0		

Nota: La información registrada en los campos identificados con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

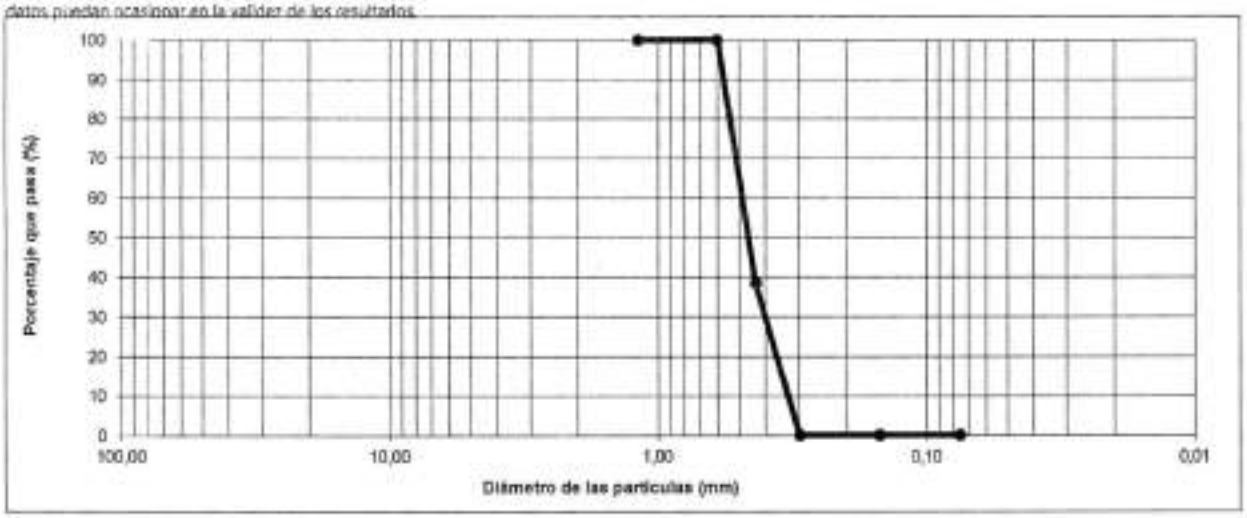

OBSERVACIONES:

"De acuerdo al servicio aprobado por el cliente, se realiza únicamente el ensayo de granulometría por tamizado y se excluye el ensayo por sedimentación (Hidrometría)"

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

146

YAO HAN


手提式縫口袋機

MODEL

N600A(ONE THREAD 單線)
N602A(TWO THREAD 雙線)
N600H(ONE THREAD, HIGH SPEED 單線，高速)
N602H(TWO THREAD, HIGH SPEED 雙線，高速)

PORTABLE BAG CLOSER

PARTS BOOK 零件本

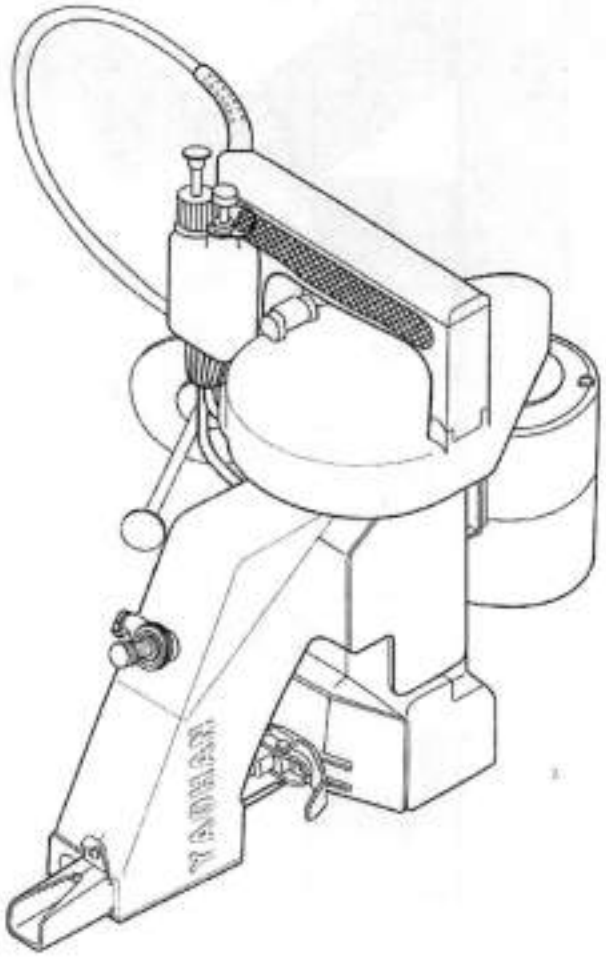

耀瀚股份有限公司
YAO HAN INDUSTRIES CO., LTD.

201210



N320A

規 格 Specification

機種 Model	縫速 Speed	縫距 Stitch	使用針 Needle	切線 Cutter	線數 No. of thread	重量 Weight	馬達 Drive motor
F300A	300~400 Bags/Hour	7.2mm	FD-5 #24.25	自動切線裝置 Automatic thread cutter	1	5.5kg	90W 50/60Hz, 1ph 12V, 24V, 110V, 220V or 240V （標準規定） (Please specify one when order/req)
N600A	250~350 Bags/Hour	7.2mm (8.2mm)	DN X 1 #25			6kg	
N600H	350~450 Bags/Hour						
F302A	300~400 Bags/Hour	7.2mm	FD-5 #24.25		2	6.6kg	
N602A	250~350 Bags/Hour	7.2mm (8.2mm)	DN X 1 #25			6.3kg	
N602H	350~450 Bags/Hour						
N320A	150~230 Bags/Hour	6.5mm				6.4kg	




N600A 單線 N600H 單線高速

DOUBLE THREAD CHAIN STITCH
with one each needle and looper
雙線鏈縫



N602A 雙線 N602H 雙線高速

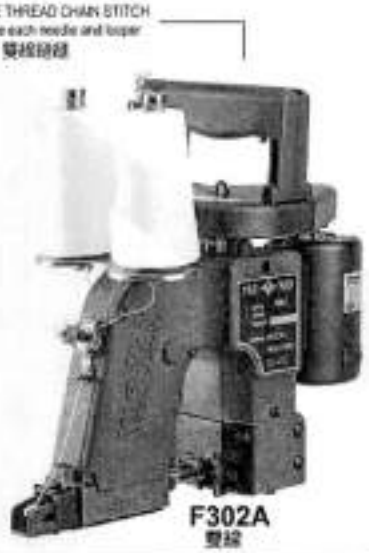

F302A 雙線








MN600A MF300A

活動式縫袋口機 Moved bag closing machine.

用途:可用於紙袋、麻袋、塑膠編織袋、麵粉袋、棉袋、PP袋和PE袋等
For : Bag closing all kinds of paper, cotton PP/PE, hessian, jute, etc.


- 本機輕巧，操作方便，可任意移動工作地點，設有選擇性腳踏開關，方便起動及停止機械。
- This machine is very easy to handle and convenience to move a place when you need.
- An optional foot switch is availabe to control sewing head start and stop functions.
- Can increase more production.

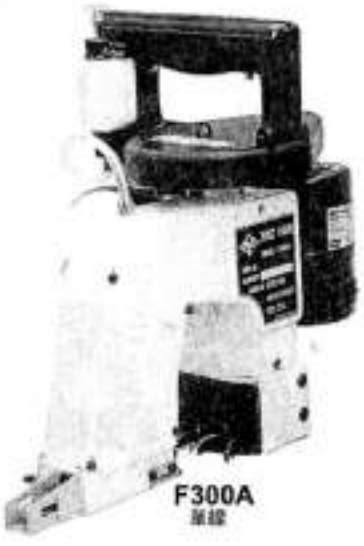

F300A 單線

- 超高速度1600~1800spm
- 高效性技術革命
- 特殊材料安全手把
- 高壓強力自動加油系統
- 自動切線
- 低音轉動
- 維護費用低
- 可用於紙袋、麻袋、塑膠編織袋、PP袋和PE袋等

- Max sewing speed 1600~1800spm
- More effective for techanical revolution
- Special material for safety plastic handle
- Superior powerful lubricator
- Automatic thread trimmer
- Lower noise
- Minimum Maintenance
- For bag closing all kinds of paper, cotton, pp/pe, heesian, jute, etc.



強力高壓自動加油系統，油管將能各傳動工件，機械運轉與縫袋工作更加順暢。
Oil pump lubrication system, oil line direct lubricant to main moving parts.

ORDERING PARTS

The parts list showing all the parts used in the machine is included in this book.

Check the list, and specify parts numbers and quantities required clearly.

Send your order to the naerest agent, distributor or one of our branch offices.

1. Description of each part and its stamp number is described in this parts list. Screws and nuts for parts are shown adjacent to the relevant parts. When ordering parts, describe clearly stamp number with its name of part.
2. The parts which have no Ref. Number can not be delivered independentiy; always order it as an assembly.
3. A set of assembled parts is represented by the stamp number of its main parts.
4. The last figure in the parts stamp number advances on each improvement of the parts.

*The part list is subject to change without prior notice.

訂購零件須知:

機器裡所有零件，皆已列在零件本上。


如果有需要訂購零件，請告知我們零件號碼及所需數量，並注意下列事項：

1. 每一個零件都有特定的號碼及品名，訂購時請依零件號碼訂購。
2. 若有零件標示在零件本上但是卻沒有號碼或品名，這代表他是整組販售，不零賣。
3. 整組販售的零件，零件上標明的號碼是整組的零件號碼。

CONTENTS

(1) THREAD TENSION AND COVER PARTS..... 10
(2) BUSHINGS, OILINGS AND HANDLE PARTS..... 12
(3) NEEDLE BAR, PRESSER BAR AND DRIVING PARTS..... 14
(4) LOOPER DRIVING PARTS..... 16
(5) FEED DRIVING AND THREAD CUTTER PARTS..... 18
(6) MOTOR PARTS (For Totally Enclosed Type Motor)..... 20
(8) CRAPE TAPE BINDING AND CUTTER PARTS (Special Order Parts)..... 24
(9) N602A, N602H THREAD STAND AND THREAD TENSION PARTS..... 26
(10) N602A, N602H FEED DRIVING AND THREAD CUTTER PARTS..... 28
(11) MN600A, MN602A PARTS 30
(12) FN600A, FN602A PARTS 32
(13) ACCESSORY BAG PARTS 34
(14) MOTOR PARTS 36


(1) THRED TENSION AND COVER PARTS

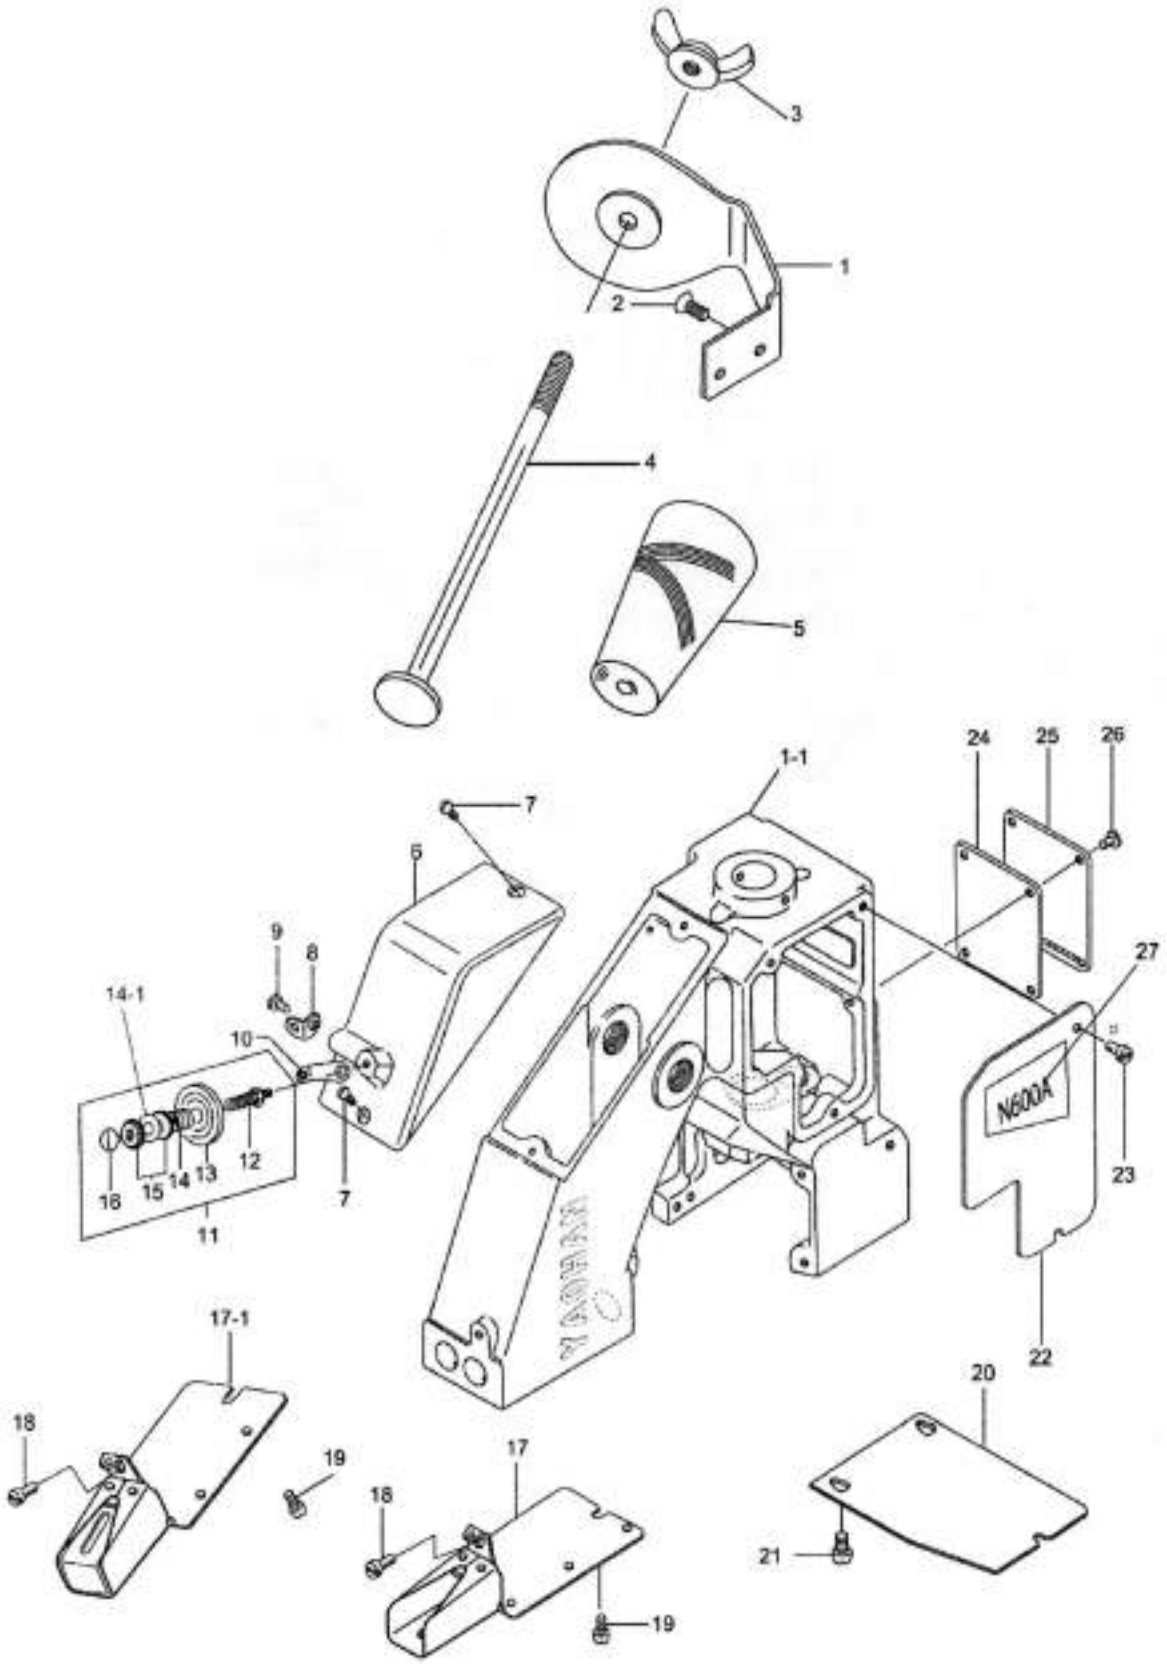



(1) THRED TENSION AND COVER PARTS

ITEM	PART NO.	DESCRIPTION		Q'ty	REMARKS
1	6001001	THREAD STAND	線架	1	
1-1	6001001-1	MAIN FRAME	本體		
2	6001002	SCREW, FOR 6001001	螺絲	2	
3	3001641	NUT, FOR 6001004, FOR YAO HAN ONLY	蝴蝶螺帽	2	
4	3001634	THREAD CONE CLAMPING ROD, FOR YAO HAN ONLY	線柱	1	
5	6001005	THREAD	線	1	
6	6001006	TOP COVER	機台三角蓋	1	
7	6001007	SCREW, FOR 6001006	螺絲	2	
8	6001008	THREAD EYELET	穿線孔架	1	
9	6001009	SCREW, FOR 6001008	螺絲	1	
10	6001010	THREAD TENSION EYELET	沙拉組過線	1	
11	6001011	THREAD TENSION ASSEMBLY	沙拉組	1	
12	6001012	TENSION POST	沙拉組軸	1	
13	6001013	TENSION DISC	壓線盤	2	
14	6001014	TENSION SPRING	彈簧	1	
14-1	6001014-1	WASHER	華司		
15	6001015	TENSION NUT	調整螺帽	1	
16	6001016	SCREW, FOR 6001011	螺絲	2	
17	6001017	NEEDLE BAR GUARD	針棒護板	1	
17-1	6001017-1	NEEDLE BAR GUARD FOR "CE" TYPE	針棒護板(CE)	1	
18	6001009	SCREW, FOR 6001017	螺絲	1	
19	6001023	SCREW, FOR 6001017	螺絲	1	
20	6001020	LOOPER COVER	彎針蓋板	2	
21	6001019	SCREW, FOR 6001020	螺絲	1	
22	6001022	SLIDE PLATE	飾面板	3	
23	6001023	SCREW, FOR 6001022	螺絲	1	
24	6001024	GASKET	防油墊片	3	
25	6001025	INSIDE COVER	蓋板	1	
26	6001023	SCREW, FOR 6001025	螺絲	1	
27	6001027	NAMEPLATE	N600A鋁牌(黑底)	1	

(2) BUSHINGS, OILINGS AND HANDLE PARTS

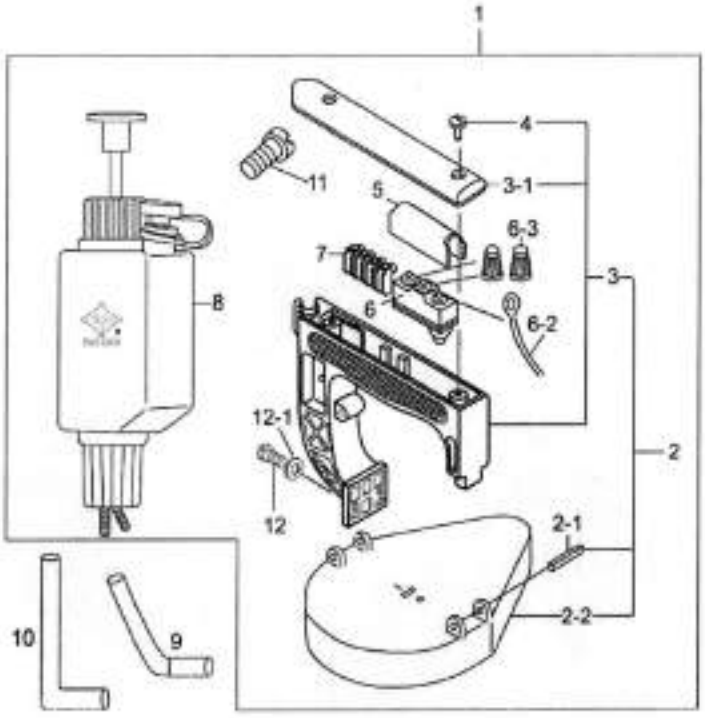

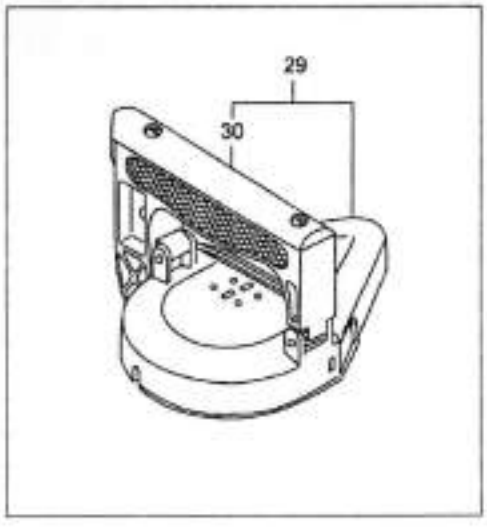


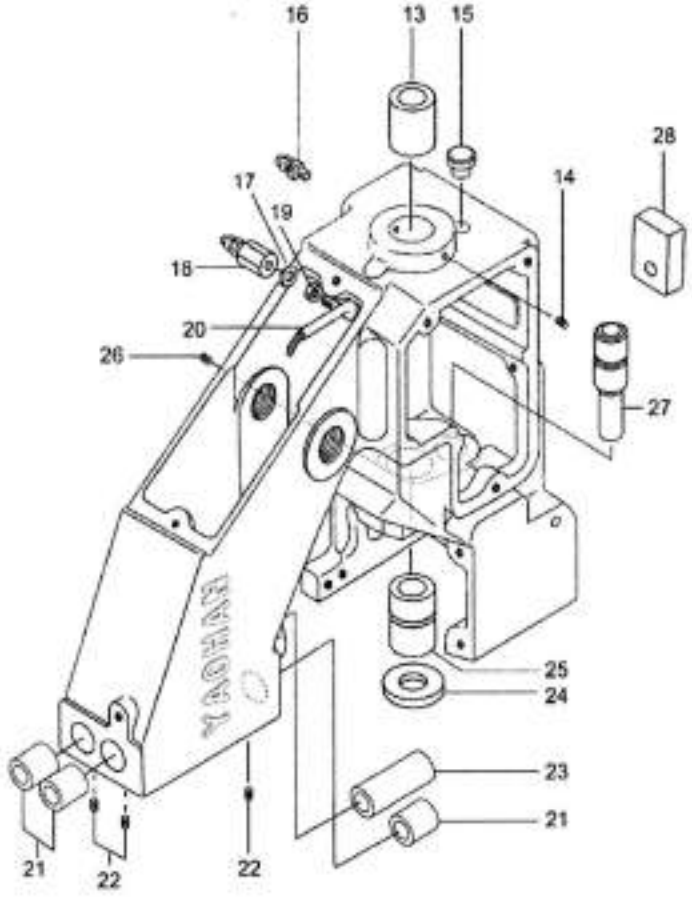

(2) BUSHINGS, OILINGS AND HANDLE PARTS

ITEM	PART NO.	DESCRIPTION		Q'ty	REMARKS
1	6001201	HANDLE ASSEMBLY WITH OILER SWITCH	手把整組含泵浦開關	1	
2	6001202	HANDLE ASSEMBLY	把手組	1	
2-1	6001202-1	PIN	握把銷	2	
2-2	6001202-2	COVER	皮帶蓋	1	
3	6001203	HANDLE	把手	1	
3-1	6001203-1	COVER HANDLE	手把蓋	1	
4	6001016	SCREW, FOR 6001202	螺絲	2	
5	6001205	MICRO SWITCH COVER CE	微動開關CE蓋板	1	
6	6001206	MICRO SWITCH (Z-15GK655-B)	微動開關	1	
6-2	6001206-2	END PLUG WIRE	接線端子台	1	
6-3	6001206-3	NUT WIRE	電線	2	
7	6001207	FLEXIBLE TERMINAL BLOCK (ML-S-1, 4P) CE	電線	1	
8	6001208N	OILER	油泵浦整組	1	
9	6001209	OIL TUBE, WITH OIL FELT (ϕ 6x95 L)	油管	1	
10	6001210	OIL TUBE, WITH OIL FELT (ϕ 6x100 L)	油管	1	
11	6001430	SCREW, FOR 6001208	螺絲	1	
12	6001212	SCREW, FOR 6001202S	螺絲	2	
12-1	6001212-1	WASHER	華司	2	
13	6001213	MAIN SHAFT BUSHING, REAR	主軸	1	
14	6001214	SCREW, FOR 6001213	螺絲	1	
15	6001215	RUBBER BUSHING	橡膠頭	1	
16	6001216	JOINT	油嘴(BN-5-6)	2	
17	6001217	WASHER	華司	1	
18	6001218	JOINT	接頭	1	
19	6001219	NUT	螺帽	1	
20	6001220	OIL PIPE	油管	3	
21	6001221	BUSHING FOR PRESSER BAR NEEDLE BAR, UPPER	襯套環	3	
22	6001222	SCREW, FOR 6001221	螺絲	5	
23	6001223	PRESSER BAR BUSHING, LOWER	押棒套筒下	1	
24	6001224	OIL FELT	油棉	1	
25	6001225	MAIN SHAFT BUSHING, REAR	主軸	1	
26	6001222	SCREW, FOR 6001225	螺絲	1	
27	6001227	LOOPER ROCKER SHAFT BUSHING	彎針帶動組襯套	1	
28	6001228	OIL FELT	油棉	(1)	
29	6001229	HANDLE ASSEMBLY AND SWITCH	手把整組含開關	(1)	
30	6001230	HANDLE AND SWITCH	手把含開關		


(3) NEEDLE BAR, PRESSER BAR AND DRIVING PARTS

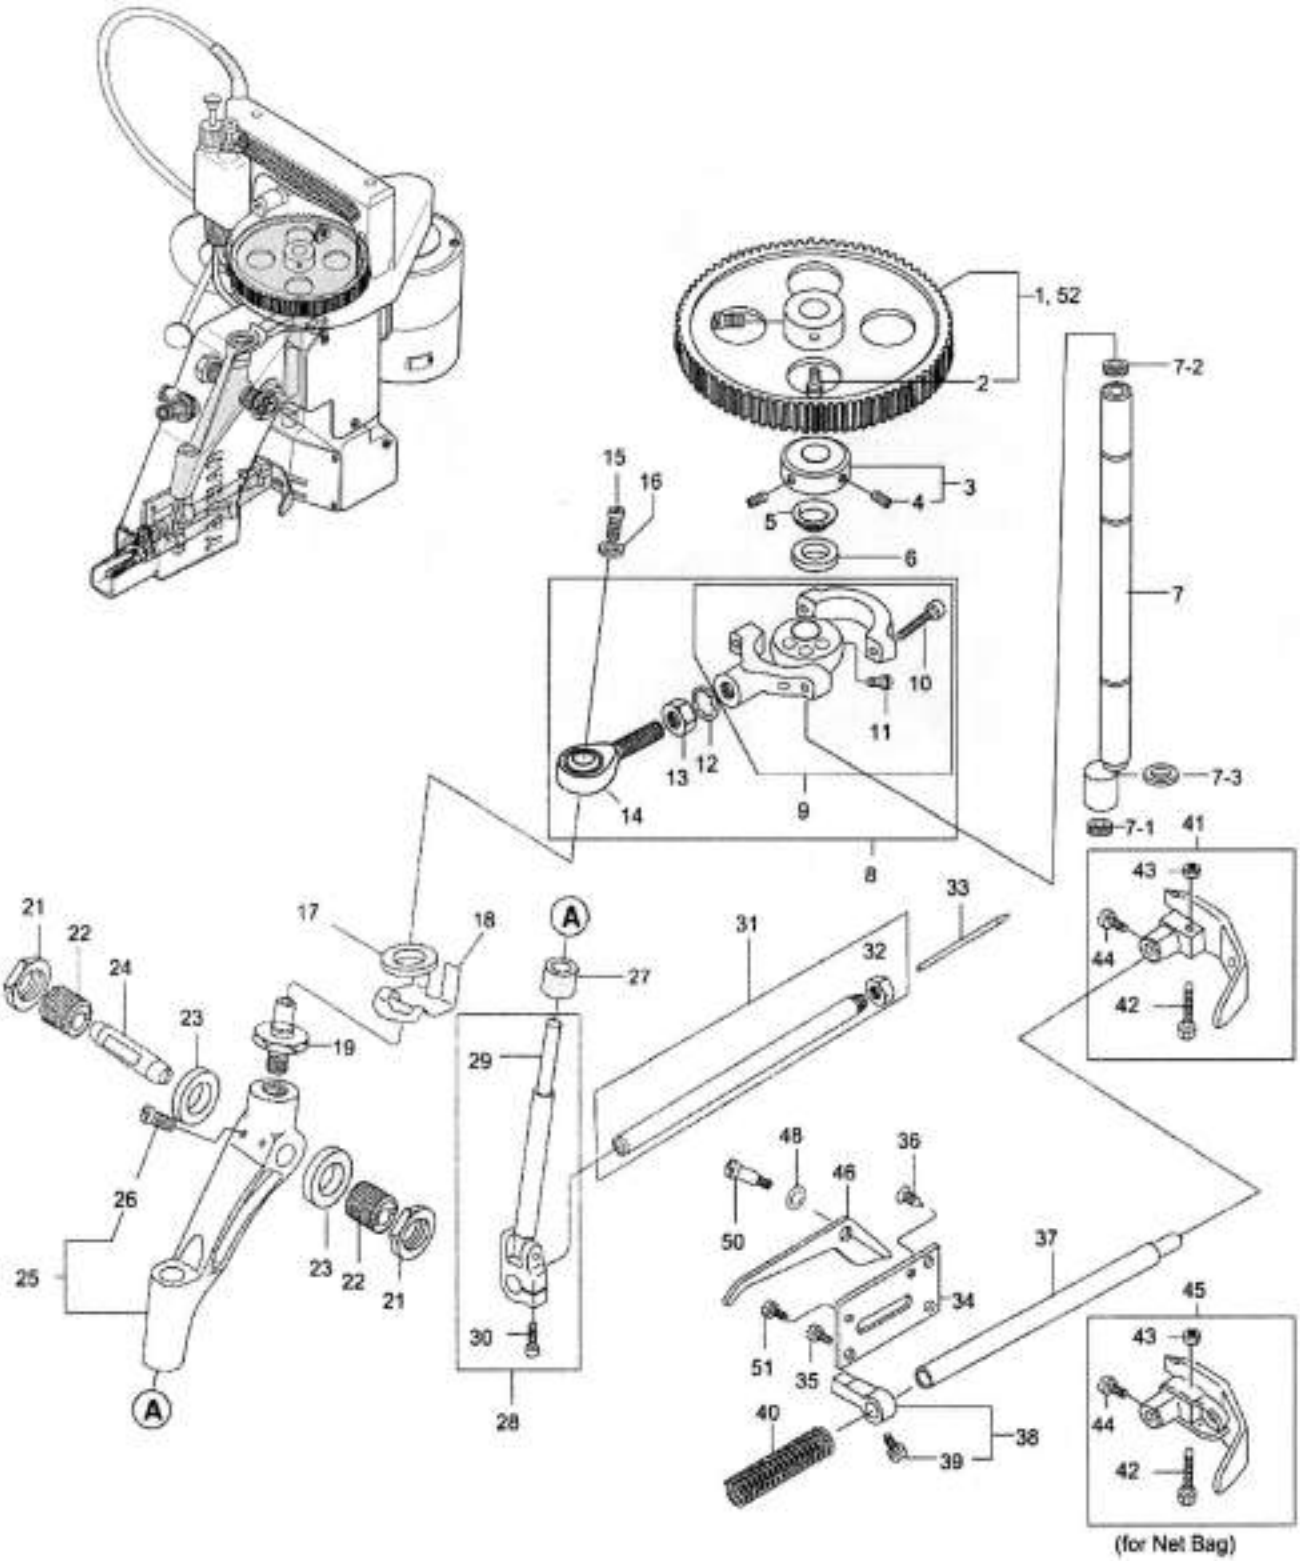



(3) NEEDLE BAR, PRESSER BAR AND DRIVING PARTS

ITEM	PART NO.	DESCRIPTION		Q'ty	REMARKS
1	6001401	SYNCHRO PULLEY (70 TEETH) FOR N600A,N602A	皮帶輪(70T)	1	
2	6001402	SCREW, FOR 6001401	螺絲	2	
3	6001403	RETAINING COLLAR	固定環	1	
4	6001404	SCREW, FOR 6001403	固定環待頭螺絲	2	
5	6001405	SPACRER	螺絲	1	
6	6001224	OIL FELT	套環	1	
7	6001407	MAIN SHAFT	油棉	1	
7-1	6001407-1	SCREW	主軸	1	
7-2	6001407-2	SCREW	螺絲	1	
7-3	6001407-3	OIL FELT	螺絲	1	
8	6001408	CONNECTING ROD ASSEMBLY	羊毛氈墊片	1	
9	6001409	CONNECTING ROD SUB-ASSEMBLY	連接桿	1	
10	6001410	SCREW, FOR CONNECTING ROD CAP	偏心珠仔組	2	
11	6001411	SCREW, FOR ECCENTRIC CAM	螺絲	1	
12	6001412	WASHER, FOR 6001408	螺絲	1	
13	6001413	NUT, FOR 6001408 (A-8-S)	華司	1	
14	6001414	ROD END (POS-8)	蝶帽	1	
15	6001415	SCREW, FOR 6001419	魚眼軸承(POS-8)	1	
16	6001416	WASHER, FOR 6001419	螺絲	1	
17	6001417	OIL FELT	華司	1	
18	6001418	SPRING	油棉	1	
19	6001419	ROD END STUD	固定片	2	
21	6001421	NUT, FOR 6001422	珠仔軸	2	
22	6001422	ADJUSTING STUD	螺帽	2	
23	6001423	OIL FELT	調整柄	2	
24	6001424	NEEDLE BAR LEVER STUD	油棉	1	
25	6001425	NEEDLE BAR LEVER ASSEMBLY	針棒拉基支架軸	2	
26	6001426	SCREW, FOR 6001425	針棒拉基支架	1	
27	6001427	OIL FELT	螺絲	1	
28	6001428	NEEDLE BAR CONNECTION ASSEMBLY	油棉	1	
29	6001429	OIL TUBE	針棒拉基組	1	
30	6001430	SCREW, FOR 6001428	油棉	1	
31	6001431	NEEDLE BAR WITH NUT	螺絲	1	
32	6001432	NEEDLE CLAMP NUT	針棒組	1	
33	6001433	NEEDLE (DNX1 #25)	針棒螺帽	1	
34	6001434	PRESSER FOOT LIFTER BASE	針(DNX1#25)	1	
35	6001435	SCREW, FOR 6001434	押腳上下基座	1	
36	6001436	SCREW, FOR 6001434	螺絲	2	
37	6001437	PRESSER BAR	螺絲	1	
38	6001438	PRESSER BAR CONNECTION	押棒	1	
39	6001439	SCREW, FOR 6001438	押棒拉基	1	
40	6001440	PRESSER SPRING	螺絲	1	
41	6001441	PRESSER FOOT ASSEMBLY	押棒彈簧	1	
42	6001442	SCREW	押腳組	1	
43	6001443	NUT SM 9/64"-40	螺絲	1	
44	6001444	SCREW, FOR 6001441, 6001445	押腳螺帽	1	
45	6001445	PRESSER FOOT ASSEMBLY (FOR CE)	螺絲	1	
46	6001446	PRESSER FOOT LIFTER	押腳組	(1)	
48	6001448	"O" RING	押腳上下把手	(1)	
50	6001450	SCREW, FOR 6001446	O型油環	(1)	
51	6001451	SCREW, FOR LIFTER STOPPER	螺絲	(1)	
52	6001452	SYNCHRO PULLEY (60 TEETH) FOR N600H,N602H	螺絲	(1)	
			皮帶輪		

(4) LOOPER DRIVING PARTS

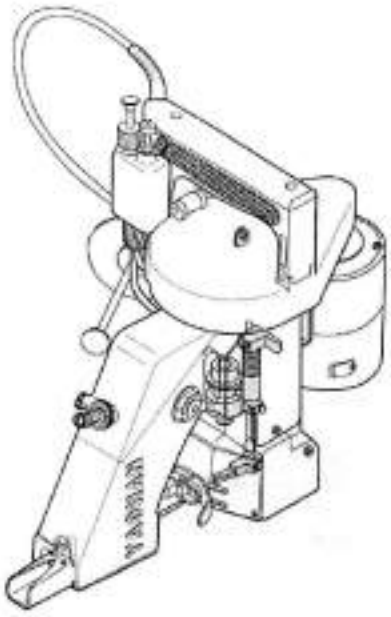

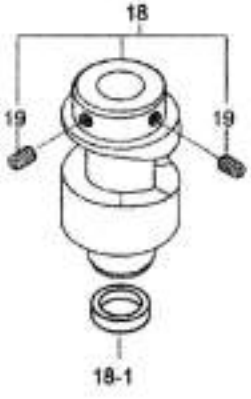

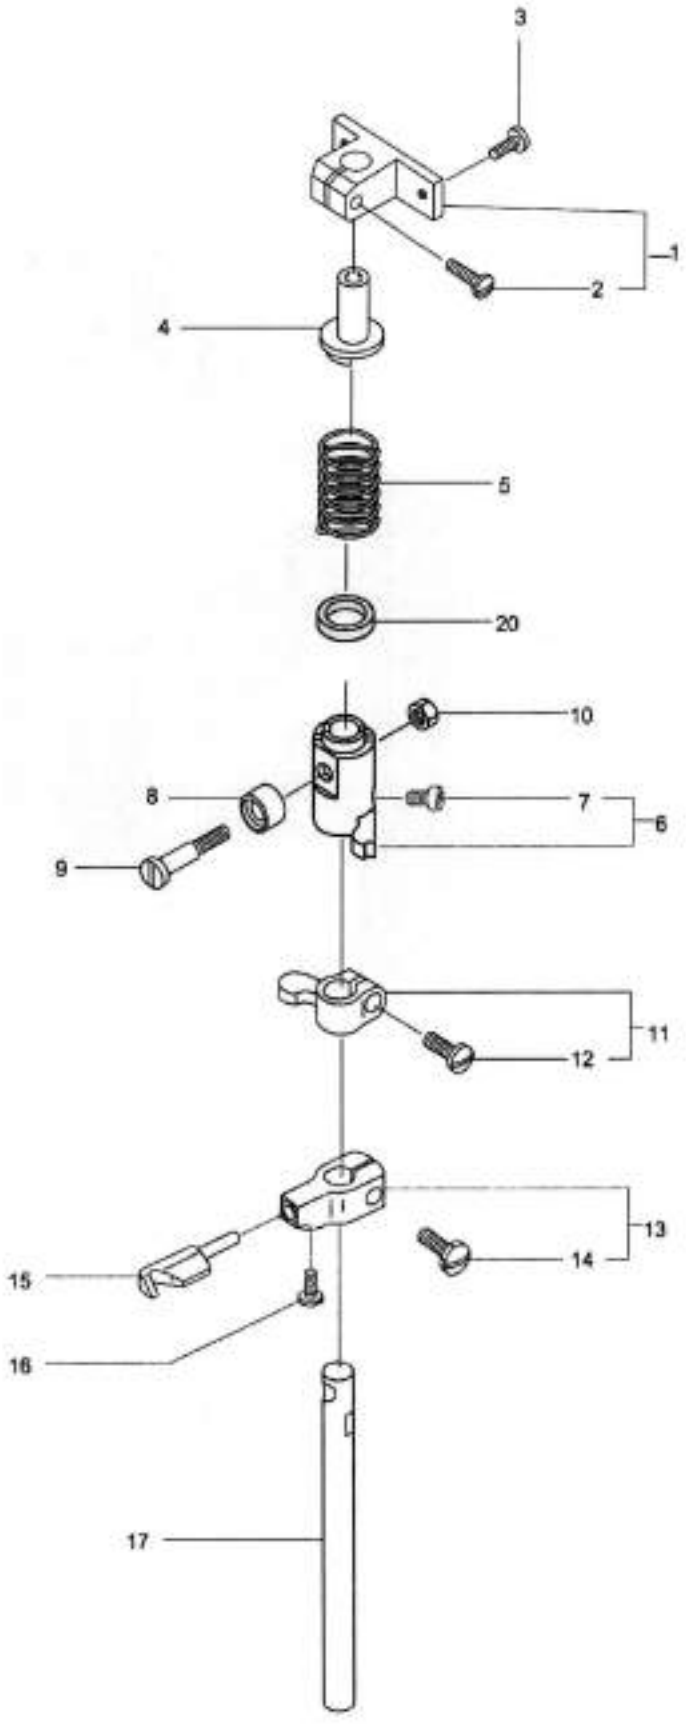


151

(4) LOOPER DRIVING PARTS

ITEM	PART NO.	DESCRIPTION		Q'ty	REMARKS
1	6001601	SPRING SUPPORTER BLOCK	彈簧調整架	1	(2)
2	6001602	SCREW, FOR 6001601	螺絲	1	
3	6001023	SCREW, FOR 6001601	螺絲	2	
4	6001604	SPRING SUPPORTER	彈簧擋塊	1	
5	6001605	SPRING	彈簧	1	
6	6001606	LOOPER ROCKER SHAFT ARM (A)	彎針搖動臂	1	(7)
7	6001435	SCREW, FOR 6001606	螺絲	1	
8	6001608	ROLLER	凸輪珠仔	1	
9	6001609	ROLLER STUD SCREW	螺絲	1	
10	6001610	NUT, FOR 6001609	螺帽	1	
11	6001611	LOOPER ROCKER SHAFT ARM (B)	彎針搖動臂	1	(12)
12	6001612	SCREW, FOR 6001611	螺絲	1	
13	6001613	LOOPER ROCKER	彎針台	1	
14	6001415	SCREW, FOR 6001613	螺絲	1	(14)
15	6001615	LOOPER	彎針	1	
16	6001451	SCREW, FOR 6001415	螺絲	1	
17	6001617	LOOPER ROCKER SHAFT	彎針帶動軸	1	
18	6001618	LOOPER DRIVE CAM	凸輪	1	(19)
18-1	6001618-1	WASHER	華司	2	
19	6001619	SCREW, FOR 6001618	螺絲	2	
20	6001224	OIL FELT	油棉	1	


(5) FEED DRIVING AND THREAD CUTTER PARTS

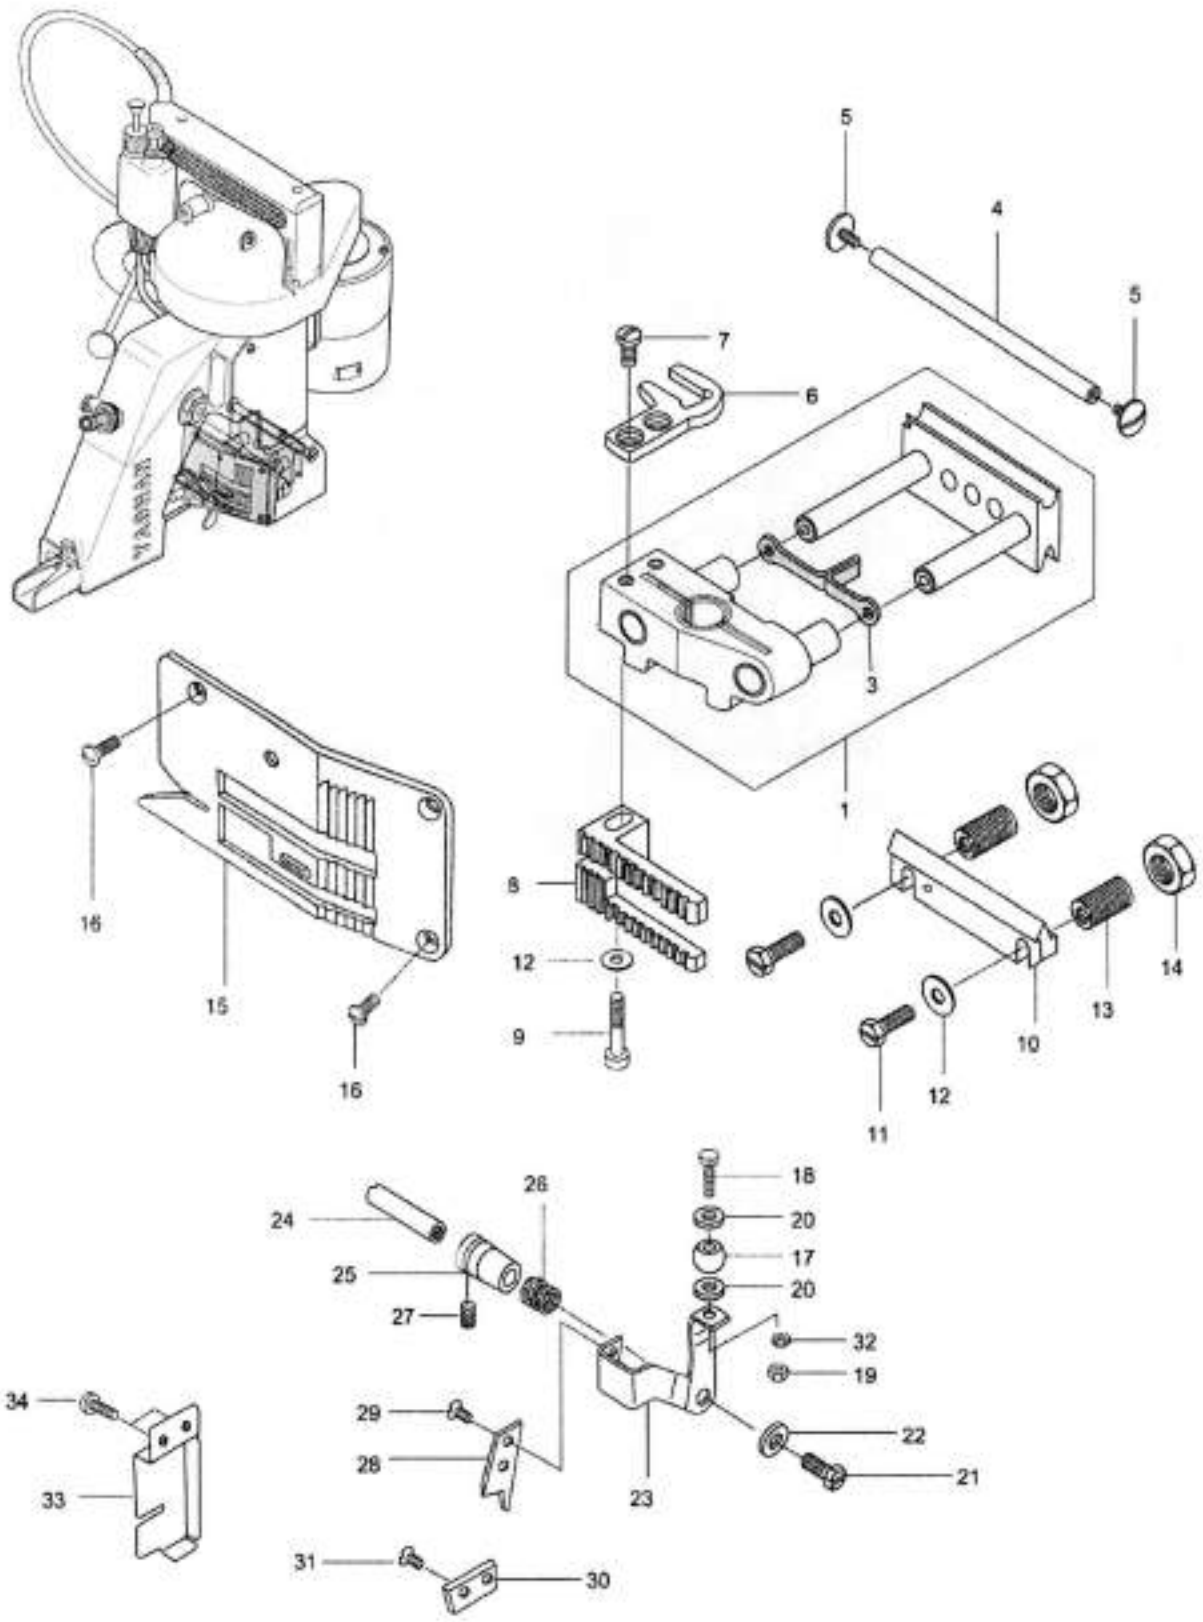

(5) FEED DRIVING AND THREAD CUTTER PARTS

ITEM	PART NO.	DESCRIPTION		Q'ty	REMARKS
1	6001801	FEED DOG CARRIER BLOCK ASSEMBLY	狗齒座	1	(2,3)
3	6001803	OIL FELT	油棉	1	
4	6001804	SLIDE BLOCK GUIDE STUD	滑棒	1	
5	6001016	SCREW, FOR 6001804	螺絲	2	
6	6001806	KNIFE BRACKET EXTENSION	自動切線滑塊板	1	
7	6001807	SCREW, FOR 6001806	螺絲	2	
8	6001808	FEED DOG	狗齒	1	
9	6001809	SCREW, FOR 6001808	螺絲	1	
10	6001810	SLIDE BLOCK ADJUSTING	滑塊	1	
11	6001811	LOCK BOLT, FOR 6001813	外六角螺絲	2	
12	6001416	WASHER, FOR 6001813	華司	3	
13	6001813	STUD SLIDE BLOCK ADJUSTING SUPPORT	調整螺絲	2	
14	6001814	LOCK NUT, FOR 6001813	螺帽	2	
15	6001815	THROAT PLATE	針板	1	
16	6001007	SCREW, FOR 6001815	螺絲	3	
17	6001817	BALL	珠仔	1	
18	6001818	BOLT, FOR 6001817 (M3X0.5X12 L)	內六角承窩螺絲	1	
19	6001819	NUT, FOR 6001817 (M3X0.5)	螺帽	1	
20	6001820	WASHER, FOR 6001817 (M3)	華司	2	
21	6001821	SCREW, FOR 6001823	螺絲	1	
22	6001416	WASHER, FOR 6001823	華司	1	
23	6001823	KNIFE BRACKET	切刀托架	1	
24	6001824	KNIFE BRACKET PIN	切線銷	1	
25	6001825	BUSHING, FOR 6001824	襯套頭	1	
26	6001826	KNIFE TENSION SPRING	切刀架彈簧	1	
27	6001222	SCREW, FOR 6001825	螺絲	1	
28	6001828	KNIFE MOVING	外切刀	1	
29	6001829	SCREW, 6001828	螺絲	2	
30	6001830	KNIFE STATIONARY	內切刀	1	
31	6001829	SCREW, FOR 6001830	螺絲	2	
32	6001832	SPRING LOCK WASHER (M3)	扣環M3	1	
33	6001833	KNIFE COVER	刀片蓋	1	
34	6002017	SCREW, FOR 6001833	螺絲	2	

(6) MOTOR, PARTS (For Totally Enclosed Type motor)

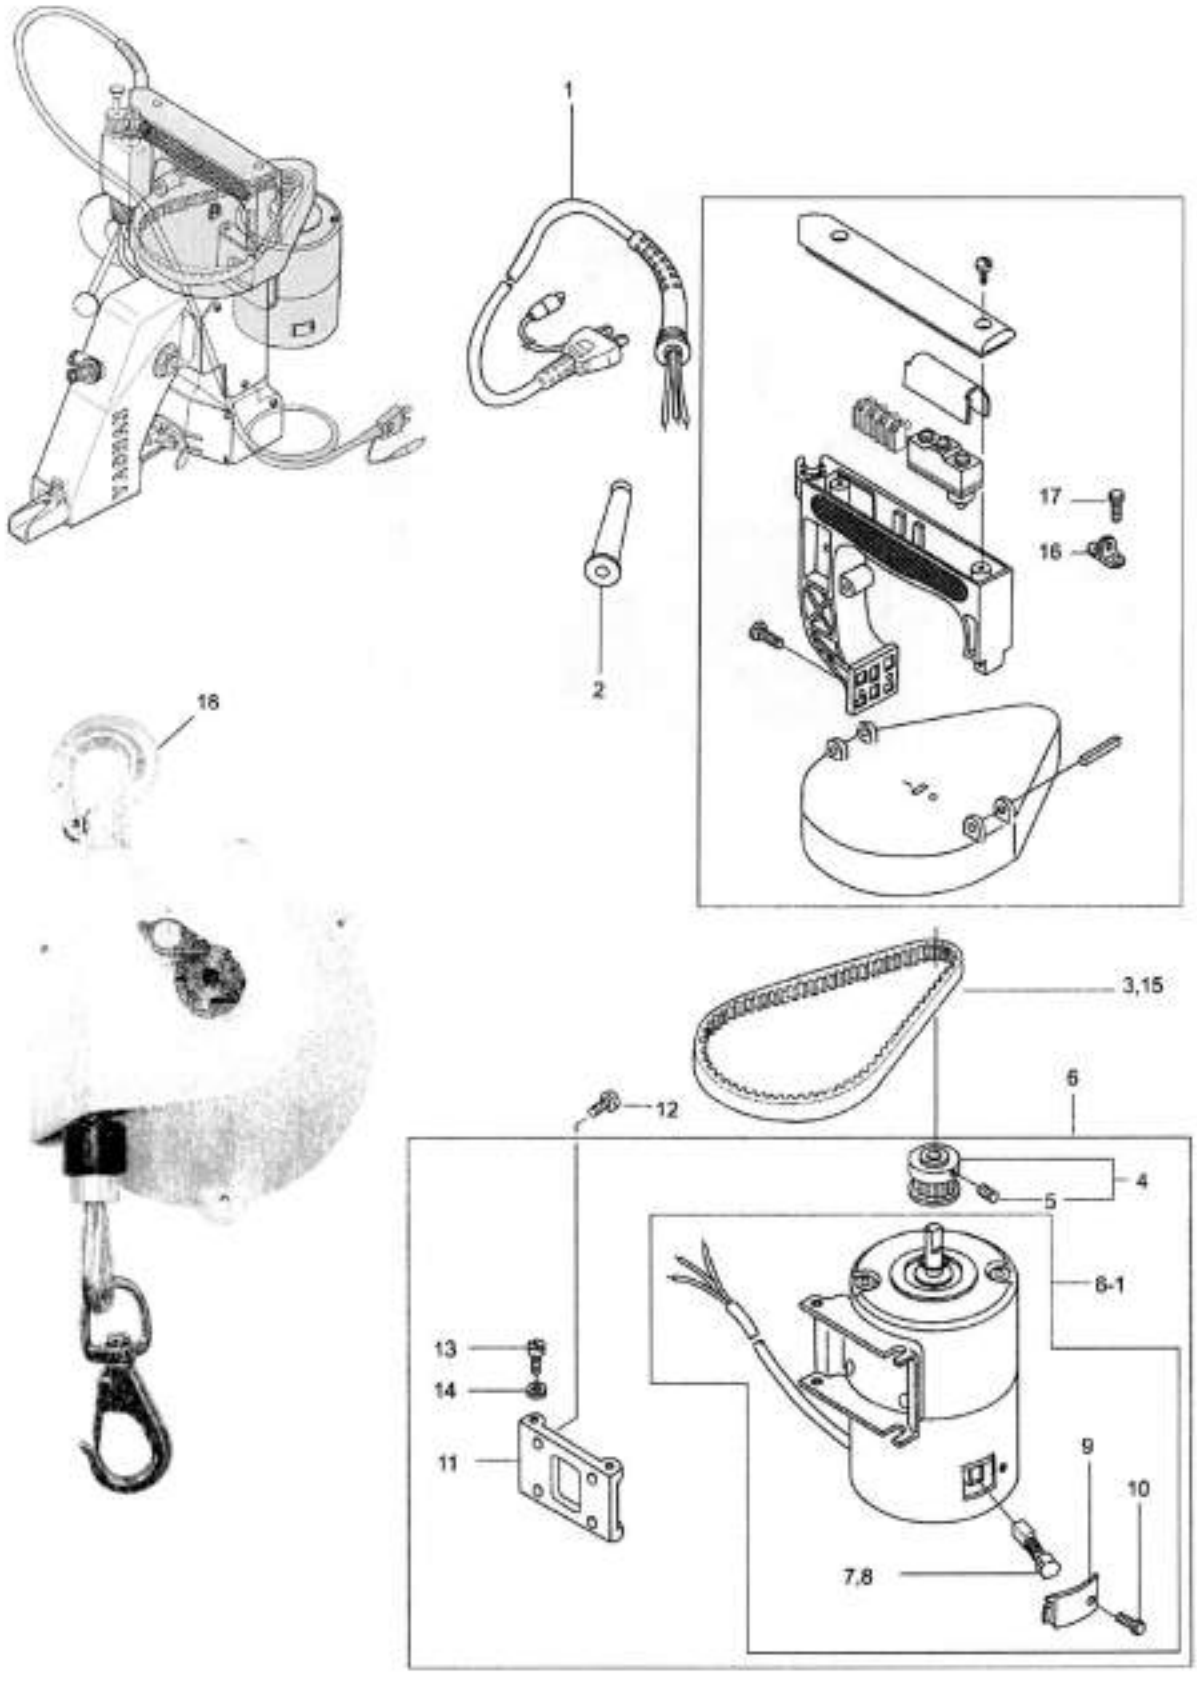


153

(6) MOTOR, PARTS (For Totally Enclosed Type motor)

ITEM	PART NO.	DESCRIPTION		Q'ty	REMARKS
1	6002001	CABTYER CORD, WITH PLUG (PLANE TYPE) 110V	電源線	1	
	6002001-1	CABTYER CORD, WITH PLUG "CE"	電源線	1	
	6002001-2	CABTYER CORD, 220V	電源線	1	
	6002001-3	CABTYER CORD, WITH PLUG 12V	電源線		
2	6002002	RUBBER BUSHING	橡膠頭	1	
3	6002003	TIMING BELT (160XL FOR N600H & N602H)	皮帶	1	
4	6002004	MOTOR PULLEY	馬達普里	1	
5	6002005	SCREW, FOR 241063	螺絲	2	
6	6002006	UNIVERSAL MOTOR ASM.(110V)	馬達組	1	
	6002006-1	UNIVERSAL MOTOR ASM.(220V)	馬達組	1	
	6002006-2	UNIVERSAL MOTOR ASM.(240V)	馬達組	1	
	6002006-3	UNIVERSAL MOTOR ASM.(24V)	馬達組	1	
	6002006-4	UNIVERSAL MOTOR ASM.(12V)	馬達組	1	(5)
	6002006-5	UNIVERSAL MOTOR ASM.(110V SMALL)	小馬達組		
6-1	6002006M	UNIVERSAL MOTOR (110V)	馬達	1	
	6002006-1M	UNIVERSAL MOTOR (220V)	馬達	1	
	6002006-2M	UNIVERSAL MOTOR (240V)	馬達	1	
	6002006-3M	UNIVERSAL MOTOR (24V)	馬達	1	
	6002006-4M	UNIVERSAL MOTOR (12V)	馬達	1	(5)
	6002006-5M	UNIVERSAL MOTOR (110V SMALL)	小馬達		
7	6002007	CARBON BRUSH, FOR AC MOTOR (SIZE:6X8X15)	碳刷	2	(7,9,10)
8	6002008	CARBON BRUSH, FOR DC MOTOR 12V/24V (SIZE:6X8X15)	碳刷	2	(7,9,10)
9	6002009	CAP	碳刷蓋	1	(8-10)
10	6002010	SCREW (WITH WASHER)	螺絲	1	(8-10)
11	6002011-1	MOTOR BASE B FOR N600A & N602A	馬達座	1	
	6002011-2	MOTOR BASE B FOR N600H & N602H (HIGH SPEED)	馬達座(高速)	1	
12	6001212	SCREW	螺絲	4	
13	6001415	SCREW	螺絲	4	
14	6002014	WASHER, FOR MOTOR	華司	4	
15	6002015	TIMING BELT (170XL FOR N600A & N602A)	皮帶	1	
16	6002016	HANGER HOOK	吊鉤	1	
17	6002017	SCREW, FOR 6002016	螺絲	2	
*18	SB-5K	SPRING BALANCE FOR 3-5KGS.	吊車	1	
	SB-7K	SPRING BALANCE FOR 5-7KGS.	吊車	1	
	SB-9K	SPRING BALANCE FOR 7-9KGS.	吊車	1	

*SPECIAL ORDER

(8) CRAPE TAPE BINDING AND CUTTER PART (Special Order Parts)

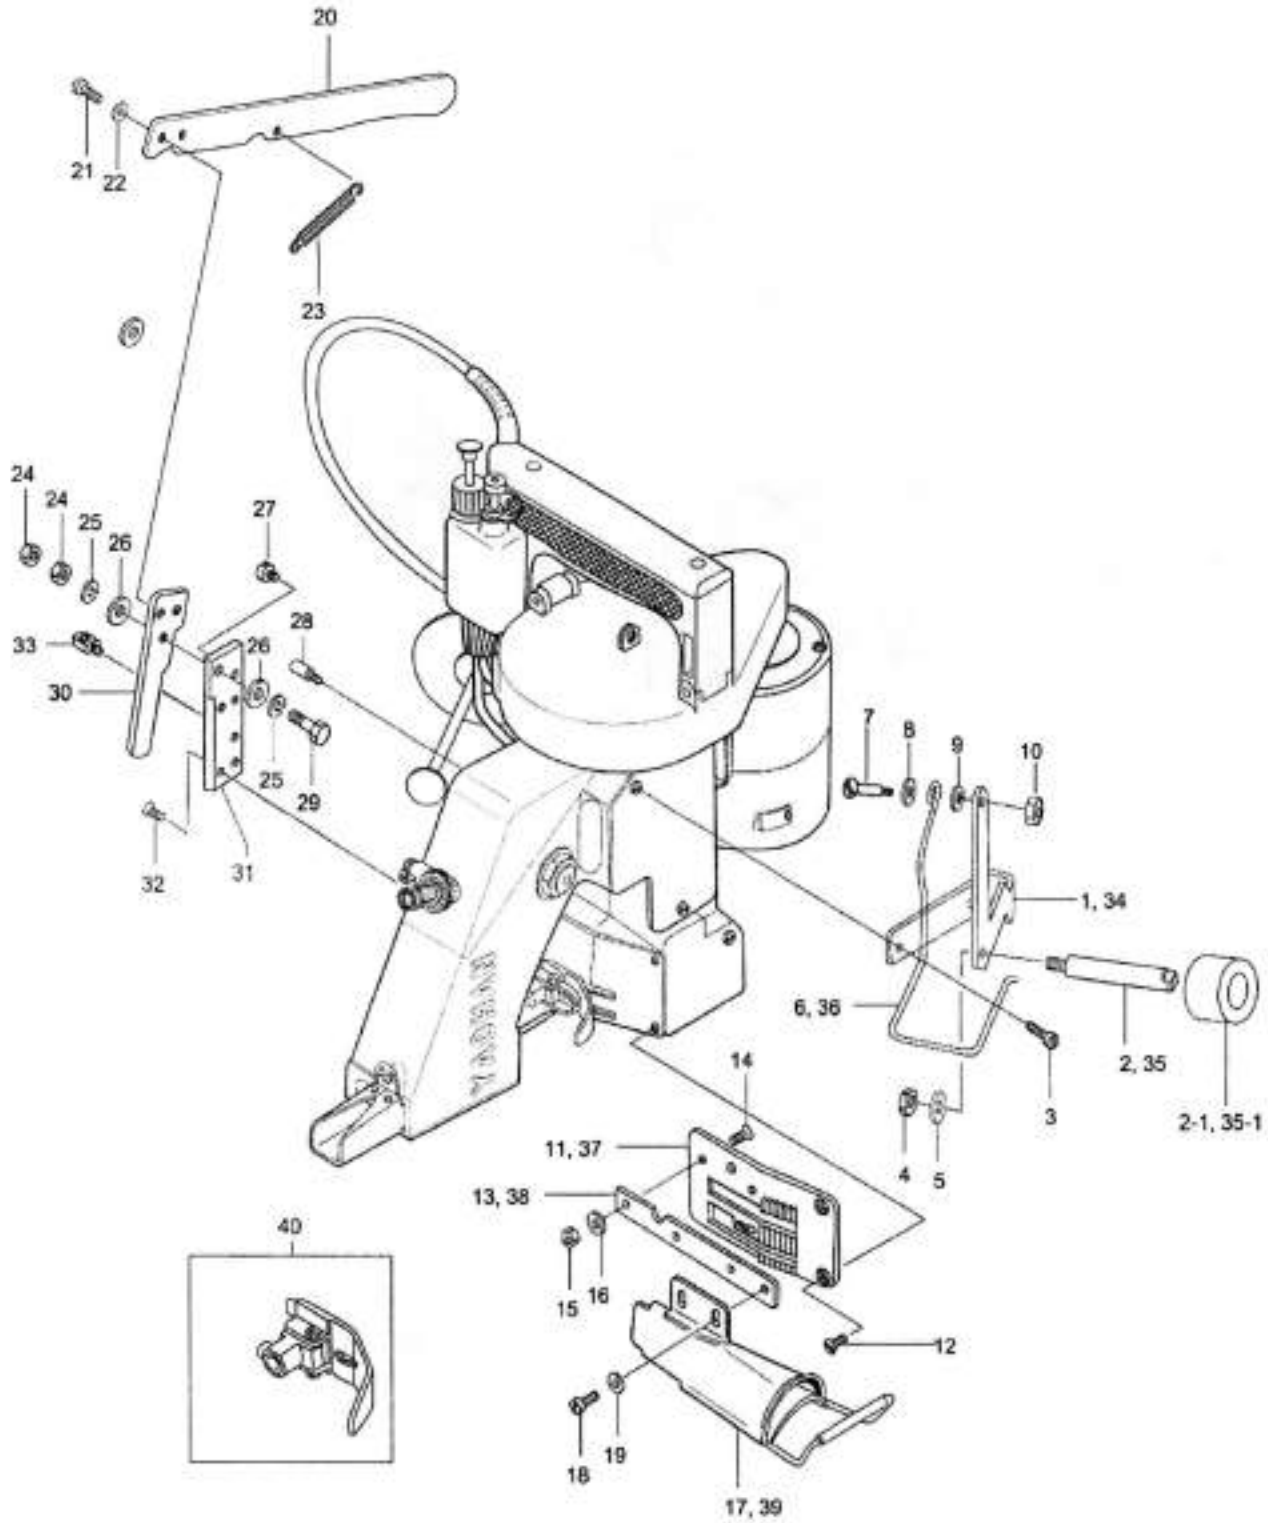


154

(8) CRAPE TAPE BINDING AND CUTTER PART (Special Order Parts)

ITEM	PART NO.	DESCRIPTION		Q'ty	REMARKS
1	6002401	CRAPE TAPE BRACKET FOR 50MM	紙帶捲架	1	
2	6002402	CRAPE TAPE HANGER STUD FOR 50MM	紙帶捲軸	1	
2-1	6002402-1	PAPER BANI FOR 50MM	紙帶捲	1	
3	6001602	SCREW, FOR 6002401	螺絲	2	
4	6002404	NUT, FOR 6002402 15/64"-28	螺帽	1	
5	6002405	WASHER, FOR 6002402 (M6)	華司	1	
6	6002406	CRAPE TAPE SUPPORTER FOR 50MM	支撐架	1	
7	6001450	SCREW, FOR 6002401	螺絲	1	
8	6002408	SPRING WASHER, FOR 6002401	華司	1	
9	6002409	WASHER, FOR 6002401	華司	1	
10	6002410	NUT, FOR 6002401	螺帽	1	
11	6002411	THROAT PLATE ,FOR CRAPE TAPE WIDTH 50MM	喇叭針板	1	
12	6001007	SCREW, FOR 6002411	螺絲	3	
13	6002413	HOLDER,FOR CRAPE TAPE WIDTH 50MM	喇叭座	1	
14	6001007	SCREW, FOR 6002413	螺絲	2	
15	6001443	NUT, FOR 6002413	螺帽	2	
16	6002416	WASHER, FOR 6002413 (M4)	華司	2	
17	6002417	CRAPE TAPE BINDER, FOR CRAPE TAPE WIDTH 50MM	喇叭	1	
18	6002418	SCREW, FOR 6002417	螺絲	2	
19	6002416	WASHER, FOR 6002417 (M4)	華司	2	
20	6002420	CUTTER LEVER	切斷桿	1	
21	6002421	SCREW, FOR 6002430	螺絲	2	
22	6002014	WASHER, FOR 6002430	華司	2	
23	6002423	SPRING, FOR 6002420	彈簧	1	
24	6002404	NUT, FOR 6002429 15/64"-28	螺帽	2	
25	6002425	SPRING LOCK WASHER, FOR 6002429 (M6)	華司	2	
26	6002405	WASHER, FOR 6002429 (M6)	華司	2	
27	6002427	STOPPER SCREW, FOR 6002430	螺絲	1	
28	6002428	STOPPER SCREW, FOR 6002420	螺絲	1	
29	6002429	HINGE PIN	後鉸梢	1	
30	6002430	KNIFE, MOVING	移動刀	1	
31	6002431	KNIFE, SATIONARY	固定刀	1	
32	6001829	SCREW, FOR 6002431	螺絲	4	
33	6002433	SPRING HOOK	彈簧固定座	1	
34	6002434	CRAPE TAPE BRACKET, FOR CRAPE TAPE WIDTH 70MM	帶料支架	(1)	For Crape Tape width 70mm
35	6002435	CRAPE TAPE HANGER STUD, FOR CRAPE TAPE WIDTH 70MM	勾栓	(1)	
35-1	6002435-1	PAPER BANI, FOR CRAPE TAPE WIDTH 70MM	紙帶卷	(1)	
36	6002436	CRAPE TAPE SUPPORTER, FOR CRAPE TAPE WIDTH 70MM	支撐架	(1)	
37	6002437	THROAT PLATE, FOR CRAPE TAPE WIDTH 70MM	喇叭針板	(1)	
38	6002438	HOLDER, FOR CRAPE TAPE BINDER, FOR CRAPE TAPE WIDTH 70MM	喇叭支架	(1)	
39	6002439	CRAPE TAPE BINDER, FOR CRAPE TAPE WIDTH 70MM	喇叭	(1)	
40	6002440	PRESSER FOOT ASSM, FOR CRAPE TAPE WIDTH 70MM	押腳組	(1)	


(9) THREAD STAND AND THREAD TENSION PARTS FOR N602A N602H

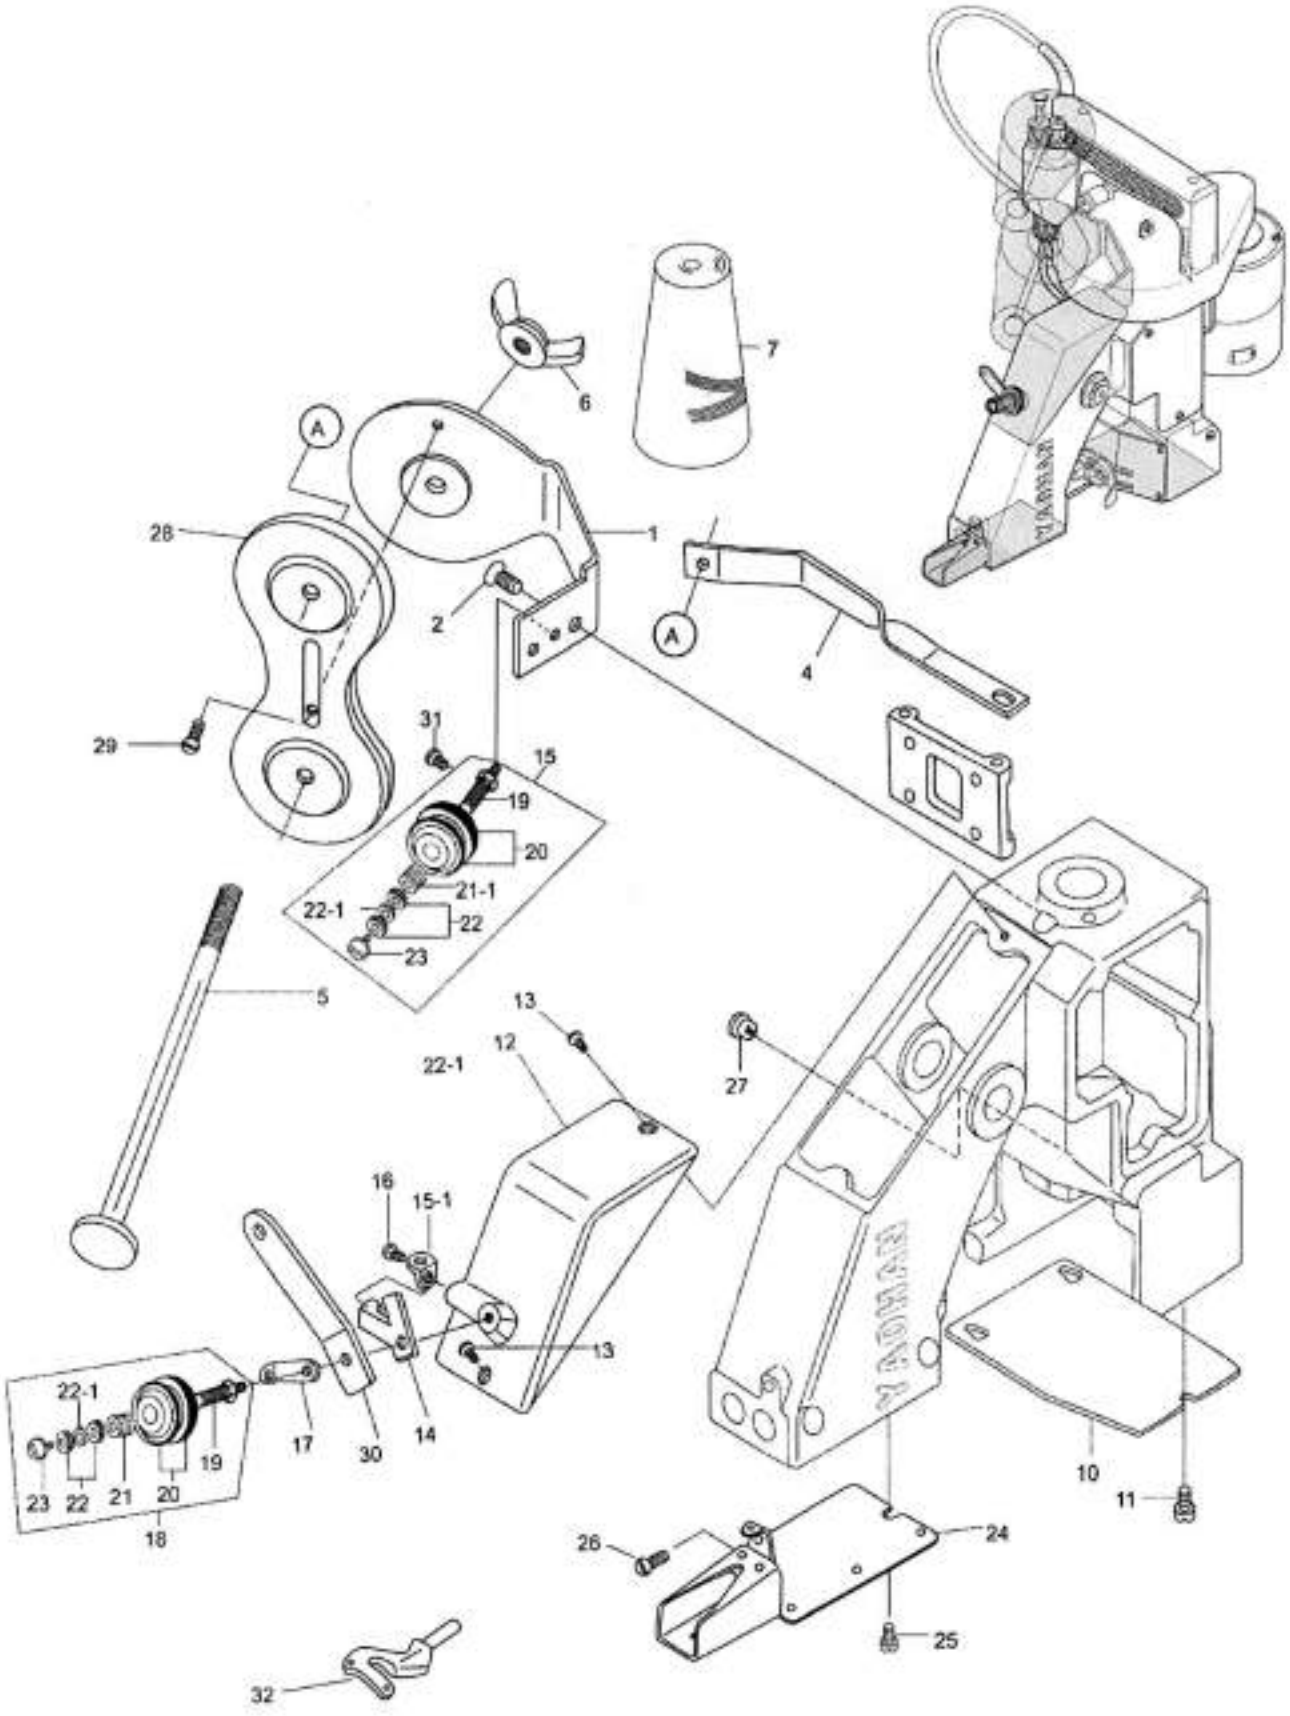

(9) THREAD STAND AND THREAD TENSION PARTS FOR N602A N602H

ITEM	PART NO.	DESCRIPTION		Q'ty	REMARKS
1	6022601-1	THREAD STAND BASE	線架	1	
2	6001002	SCREW, FOR 6001001	螺絲	2	
4	6022601	SUPPORT FOR TWO THREAD	支架(雙線)	1	Special Order
5	3001634	THREAD CONE CLAMPING ROD	線架螺栓	2	
6	3001641	NUT	锥線螺帽	2	
7	6001005	THREAD	線	4	
10	6001020	LOOPER COVER	彎針蓋	1	
11	6001019	SCREW, FOR 6001020	螺絲	3	
12	6001006	TOP COVER	機台上蓋	1	
13	6001007	SCREW, FOR 6001006	螺絲	2	
14	6022602	THREAD EYELET HOLDER FOR TWO THREAD	過線	1	
15	6022615	THREAD TENSION ASSEMBLY	沙拉組	2	(19-23)
15-1	6001008	THREAD EYELET	穿線	1	
16	6001009	SCREW, FOR 6001008	螺絲	1	
17	6001010	THREAD TENSION EYELET	沙拉組線	1	
18	6001011	THREAD TENSION ASSEMBLY	沙拉組	1	
19	6001012	TENSION POST	沙拉組軸	1	
20	6001013	TENSION DISC	壓線盤	2	
21	6001014	TENSION SPRING	彈簧	1	
21-1	6002621-1	TENSION SPRING	彈簧	2	
22	6001015	TENSION NUT	調整螺帽	1	
22-1	6002622-1	WASHER	華司	1	
23	6001016	SCREW, FOR 6001011	螺絲	1	
24	6001017	NEEDLE BAR GUARD	針棒護板	2	
25	6001023	SCREW, FOR 6001017	螺絲	2	
26	6001009	SCREW, FOR 6001017	螺絲	1	
27	6022603	THREAD GUIDE BUSHING FOR TWO THREAD	過線栓	1	
28	6022604	THREAD STAND FOR TWO THREAD	置線盤	1	
29	6001402	SCREW, FOR 6022604	螺絲	1	
30	6022606	THREAD EYELET FOR TWO THREAD	過線(雙線)	1	
31	6001009	SCREW, FOR 6001008	螺絲	1	
32	6022607	LOOPER FOR TWO THREAD	彎針(雙線)	1	


(10) FEED DRIVING AND THREAD CUTTER PARTS FOR N602A N602H

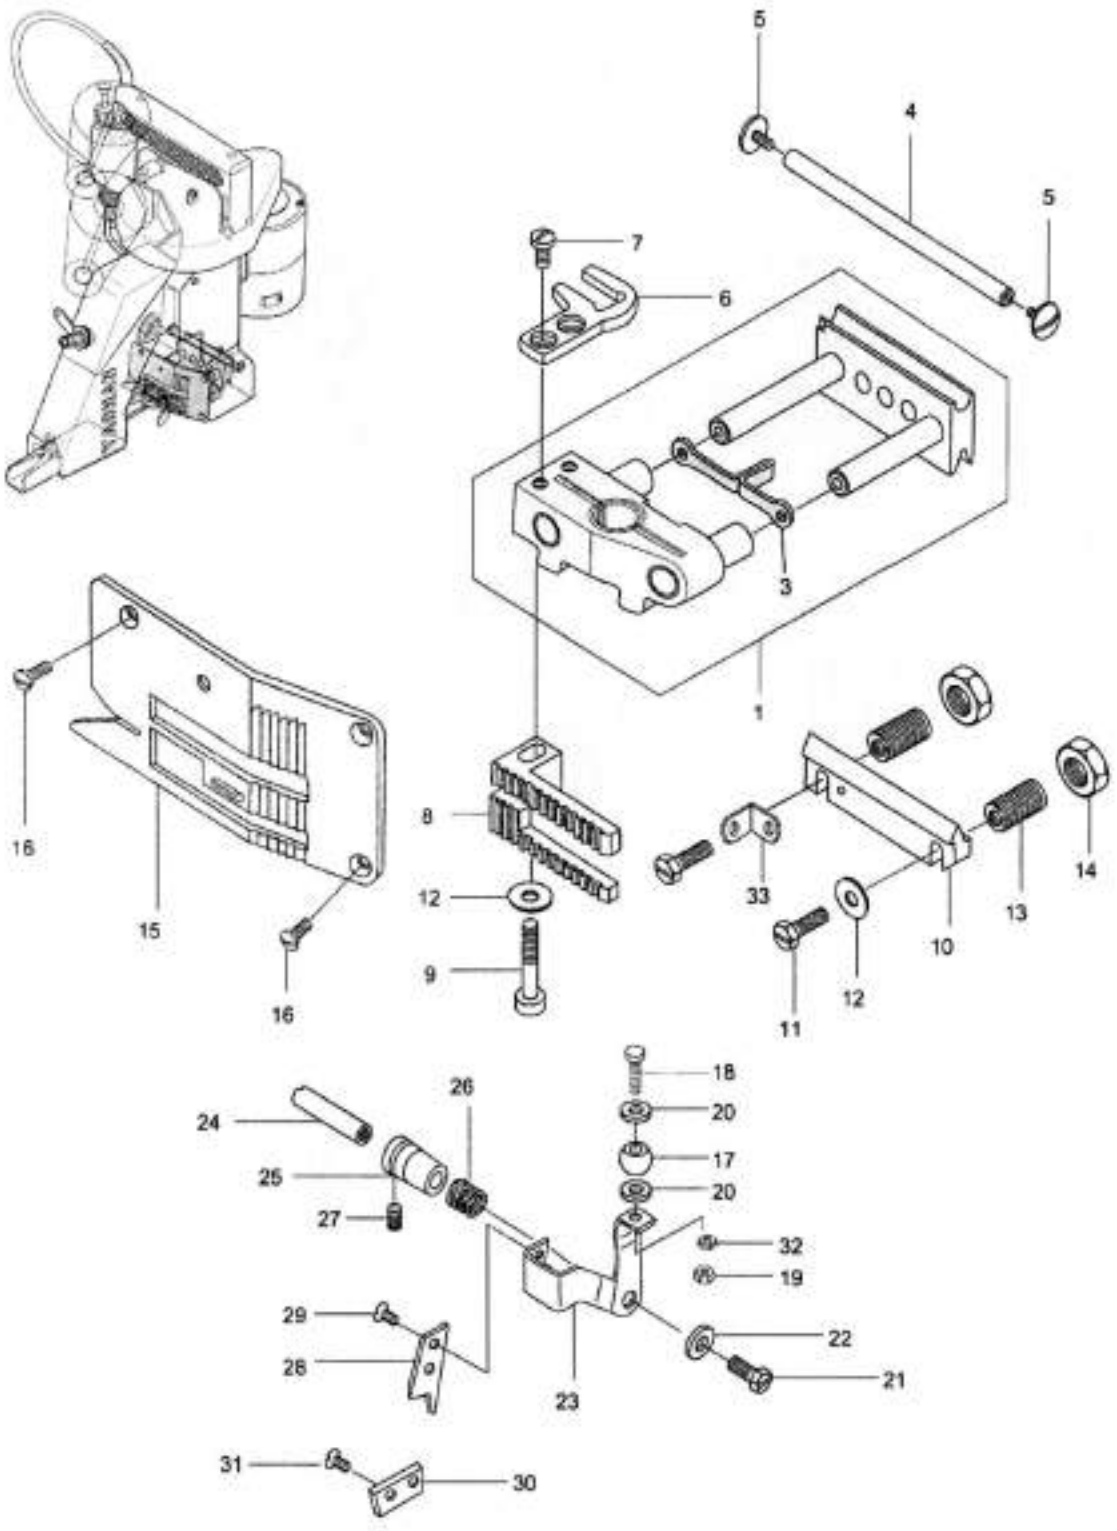

(10) FEED DRIVING AND THREAD CUTTER PARTS FOR N602A N602H

ITEM	PART NO.	DESCRIPTION		Q'ty	REMARKS
1	6203812	FEED DOG CARRIER BLOCK ASSEMBLY	狗齒座	1	(2,3)
3	6001803	OIL FELT	油棉	1	
4	6001804	SLIDE BLOCK GUIDE STUD	滑棒	1	
5	6001016	SCREW, FOR 6001804	螺絲	2	
6	6001806	KNIFE BRACKET EXTENSION	自動切線滑塊板	1	
7	6001807	SCREW, FOR 6001806	螺絲	2	
8	6022801	FEED DOG FOR TWO THREAD	狗齒	1	
9	6001809	SCREW, FOR 6022801	螺絲	1	
10	6001810	SLIDE BLOCK ADJUSTING	滑塊	1	
11	6001811	LOCK BOLT FOR 6001813	外六角螺絲	2	
12	6001416	WASHER, FOR 6001813	華司	1	
13	6001813	STUD SLIDE BLOCK ADJUSTING SUPPORT	調整螺絲	2	
14	6001814	LOCK NUT, FOR 6001813	螺帽	2	
15	6022802	THROAT PLATE FOR TWO THREAD	針板	1	
16	6001007	SCREW	螺絲	3	
17	6001817	BALL	珠仔	1	
18	6001818	BOLT, FOR 6001817	內六角承窩螺絲	1	
19	6001819	NUT, FOR 6001817	螺帽	1	
20	6001820	WASHER, FOR 6001817	華司	2	
21	6001821	SCREW, FOR 6001823	螺絲	1	
22	6001416	WASHER, FOR 6001823	華司	1	
23	6001823	KNIFE BRACKET	切刀托架	1	
24	6001824	KNIFE BRACKET PIN	切線銷	1	
25	6001825	BUSHING, FOR 6001824	襯套環	1	
26	6001826	KNIFE TENSION SPRING	切刀架彈簧	1	
27	6001222	SCREW, FOR 6001825	螺絲	1	
28	6001828	KNIFE MOVING	外切刀	1	
29	6001829	SCREW, FOR 6001828	螺絲	2	
30	6001830	KNIFE STATIONARY	內切刀	1	
31	6001829	SCREW, FOR 6001830	螺絲	2	
32	6001832	SPRING LOCK WASHER	扣環	1	
33	6001008	THREAD EYELET	穿線孔架	1	

(11) MN600A, MN602A PARTS

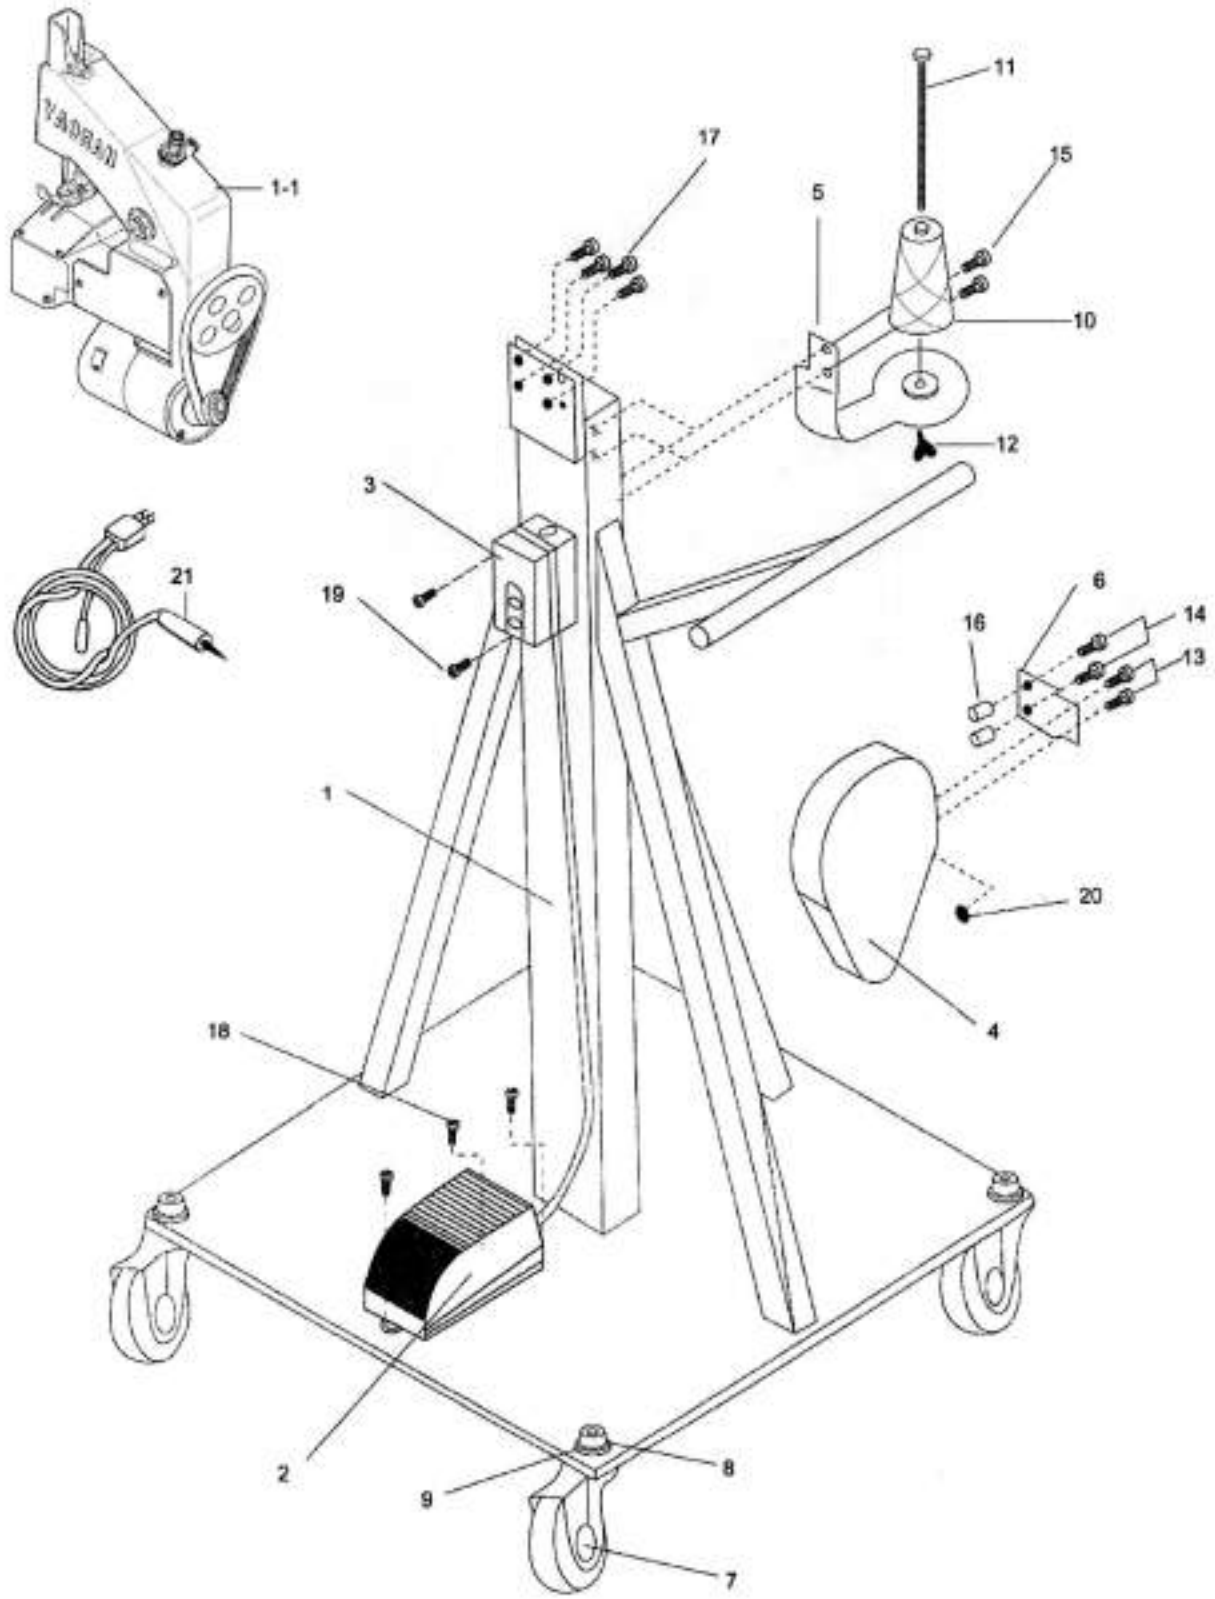


157

(11) MN600A, MN602A PARTS

ITEM	PART NO.	DESCRIPTION		Q'ty	REMARKS
1	MN6003001	MOVED FRAME	主架(含配件)	1	
1-1	MN6003001-1	BAG CLOSER MACHINE FOR MN600A-110V	車體	1	
	MN6003001-2	BAG CLOSER MACHINE FOR MN600A-220V	車體		
	MN6003001-3	BAG CLOSER MACHINE FOR MN600A-240V	車體		
	MN6003001-4	BAG CLOSER MACHINE FOR MN602A-110V	車體		
	MN6003001-5	BAG CLOSER MACHINE FOR MN602A-220V	車體		
	MN6003001-6	BAG CLOSER MACHINE FOR MN602A-240V	車體		
2	MN6003002	FOOT PEDAL	腳踏開關	1	
3	MN6003003	PUSH BUTTON SWITCH	二段式開關	1	
4	MN6003004	BELT COVER	皮帶蓋	1	
5	6001001	THREAD STAND	線架	1	
6	MN6003006	FIXED PLATE	固定板	1	
7	MN6003007	RUBBER WHEEL	輪子	4	
8	MN6003008	NUT	螺帽	8	
9	MN6003009	WASHER	華司	4	
10	6001005	THREAD	線	1	
11	6001004	BOLT THREAD CLAMPING	線柱	1	
12	6001003	NUT WING 1/4"-20N.C.	蝴蝶螺帽	1	
13	MN6003013	SCREW	螺絲	2	
14	6001212	SCREW	螺絲	2	
15	6001002	SCREW	螺絲	2	
16	MN6003016	BUSHING	套環	2	
17	6001212	SCREW	螺絲	4	
18	6001402	SCREW	螺絲	3	
19	6001402	SCREW	螺絲	2	
20	MN6003020	NUT	螺帽	2	
21	6002001	CORD, SET FOR 110V	電源線	1	
	6002001-1	CORD,SET FOR"CE"	電源線		
	6002001-2	CORD,SET FOR 220V, 240V	電源線		

(12) PARTS FOR FN600A FN602A

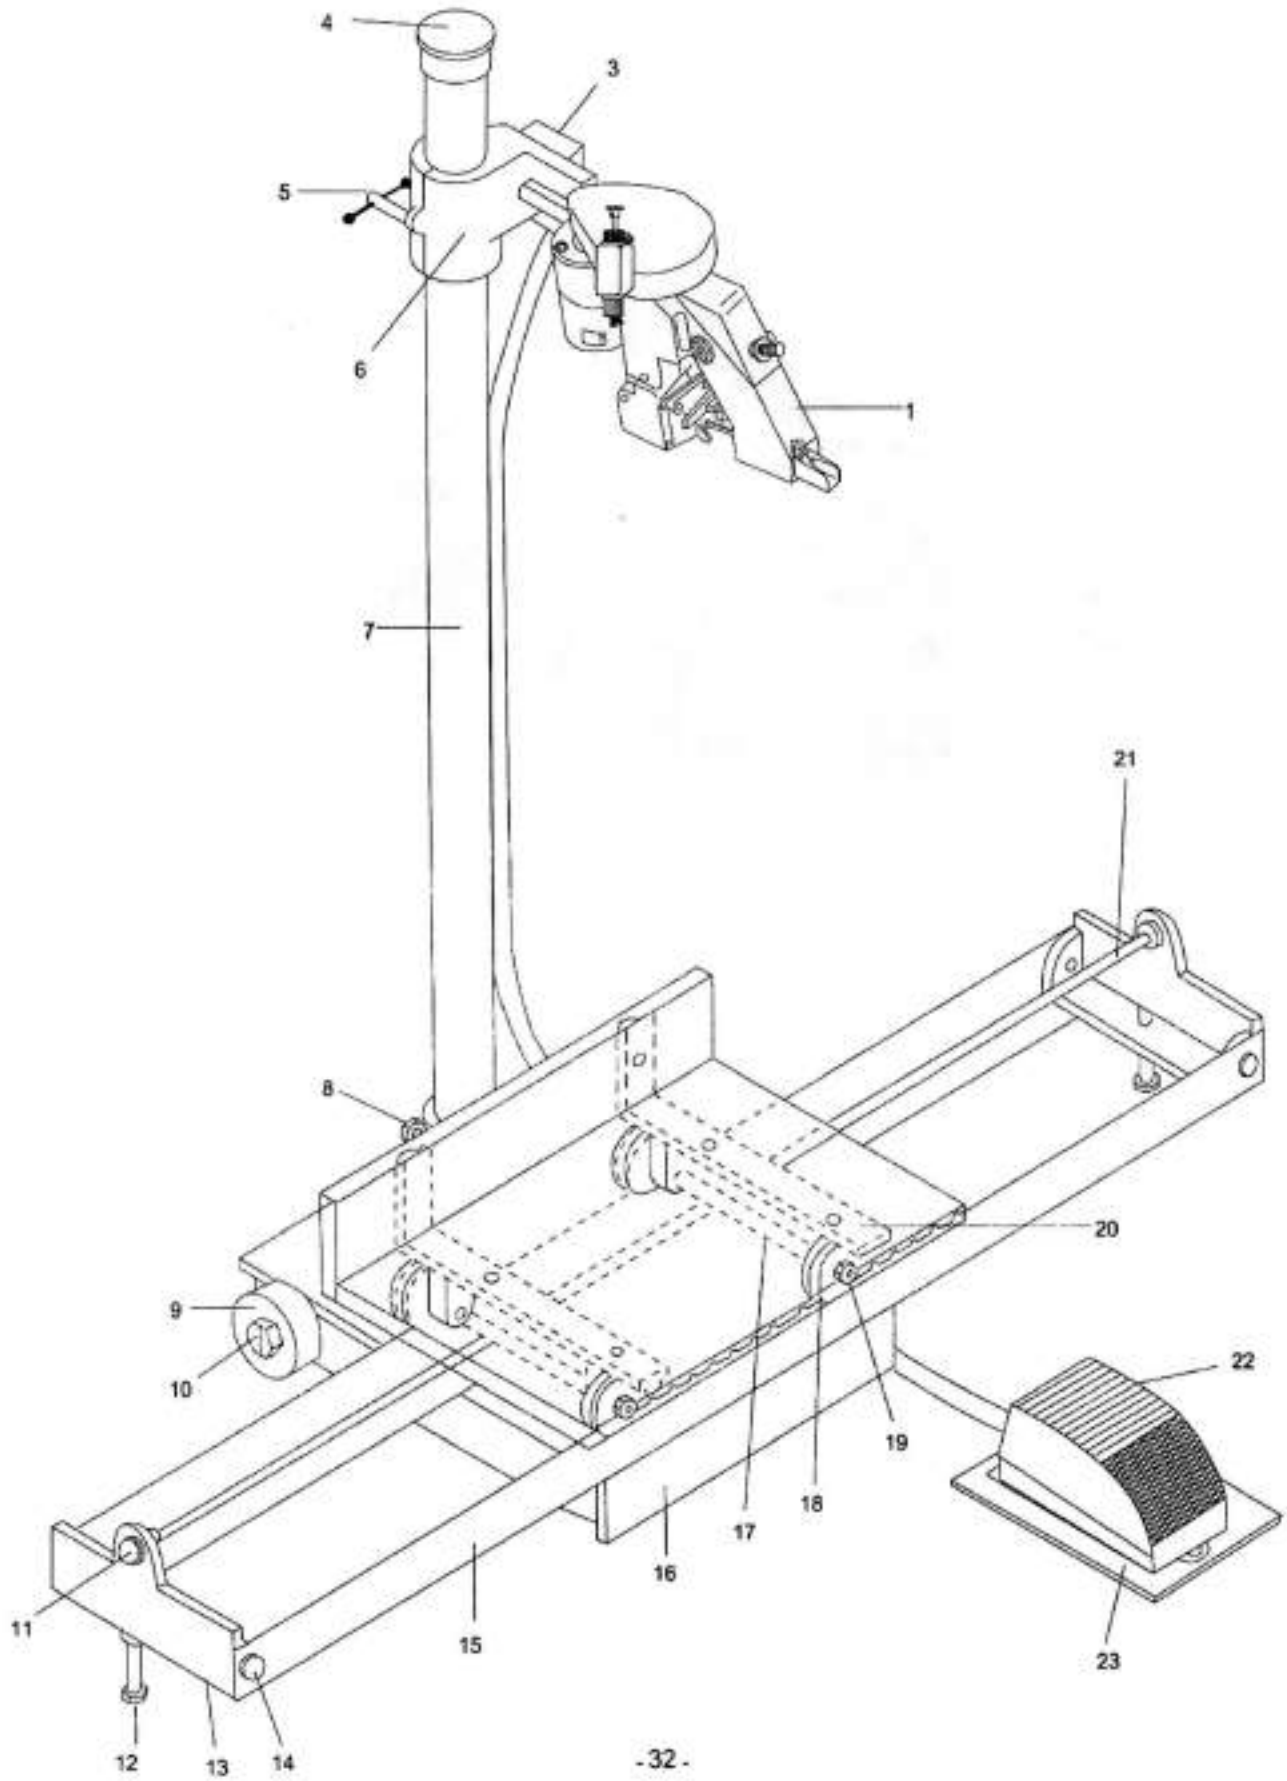


158

(12) PARTS FOR FN600A FN602A

ITEM	PART NO.	DESCRIPTION		Q'ty	REMARKS
1	FN6003201	BAG CLOSER MACHINE FOR FN600A-110V	車體		
	FN6003201-1	BAG CLOSER MACHINE FOR FN600A-220V	車體		
	FN6003201-2	BAG CLOSER MACHINE FOR FN600A-240V	車體		
	FN6003201-3	BAG CLOSER MACHINE FOR FN602A-110V	車體		
	FN6003201-4	BAG CLOSER MACHINE FOR FN602A-220V	車體		
	FN6003201-5	BAG CLOSER MACHINE FOR FN602A-240V	車體		
2	FN6003202	BELT COVER	皮帶蓋		
3	FN6003203	PUSH BOTTON SWITCH	二段式開關		
4	FN6003204	PLASTIC CAP	塑膠蓋		
5	FN6003205	HANDLE	把手		
6	FN6003206	ADJUSTABLE CRANK SET	可調整軸組		
7	FN6003207	MAIN SHAFT	主軸		
8	FN6003208	SCREW	螺絲		
9	FN6003209	STEEL WHEEL	鋼輪		
10	FN6003210	BOLT	螺栓		
11	FN6003211	NUT	螺帽		
12	FN6003212	SCREW	螺絲		
13	FN6003213	FRAME SET	機架組		
14	FN6003214	SCREW	螺絲		
15	FN6003215	SLIDE FRAME SET	滑機架		
16	FN6003216	BASE SET	底座		
17	FN6003217	SCREW	螺絲		
18	FN6003218	SLIDE WHEEL	滑鋼輪		
19	FN6003219	NUT	螺帽		
20	FN6003220	FIXED SET	支架組		
21	FN6003221	SCREW SHAFT	螺軸		
22	FN6003222	PEDAL SWITCH	踏板開關		
23	FN6003223	PEDAL BASE	踏踏板座		

(13) ACCESSORY BAG

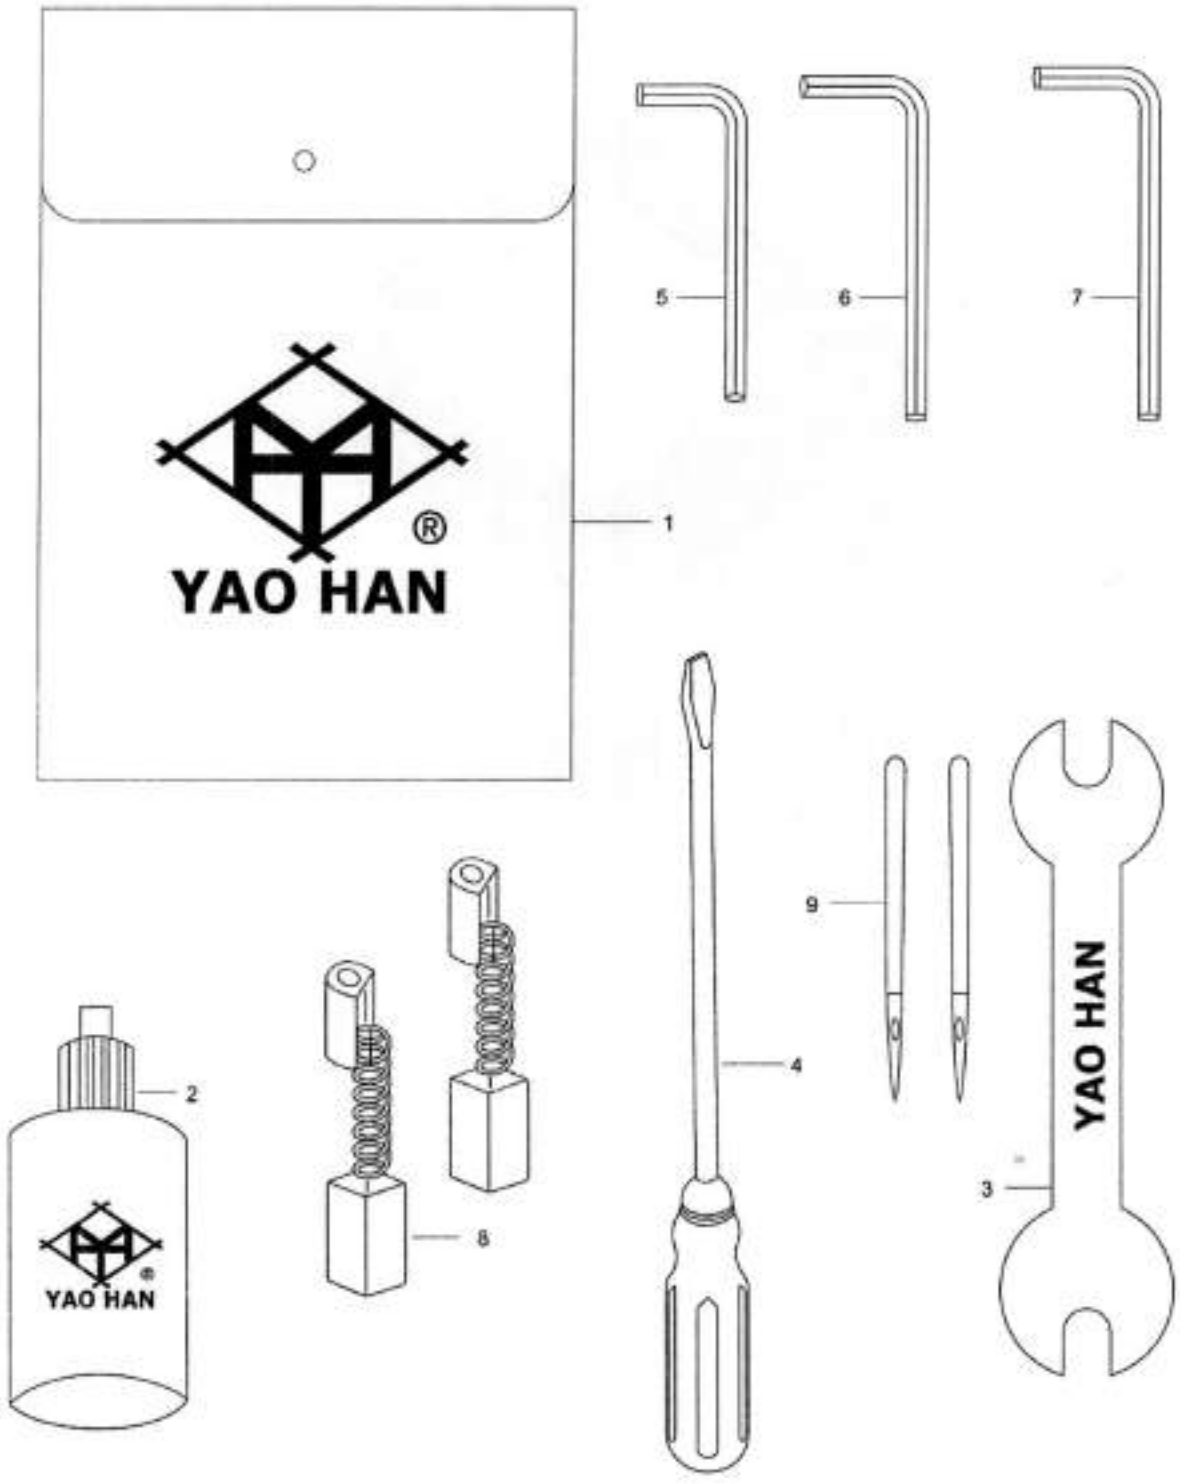


159

(13) ACCESSORY BAG

ITEM	PART NO.	DESCRIPTION		Q'ty	REMARKS
1	6003401	ACCESSORY BAG	工具袋	1	
2	6003402	OILER	油壺(含計車油)	1	
3	6003403	SPANNER	開口板手	1	
4	6003404	SCREW DRIVER	螺絲起子	1	
5	6003405	HEX WRENCH 2.0 MM	六角板手	1	
6	6003406	HEX WRENCH 2.5 MM	六角板手	1	
7	6003407	HEX WRENCH 3.0 MM	六角板手	1	
8	6002007	CARBON BRUSH FOR AC MOTOR (SIZE:6 X 8 X 15)	碳刷	2	
	6002008	CARBON BRUSH, FOR DC MOTOR 12V/24V (SIZE:6X8X15)	碳刷		
9	6001433	NEEDLE (DNX1 #25)	針	2	

(14) MOTOR PARTS

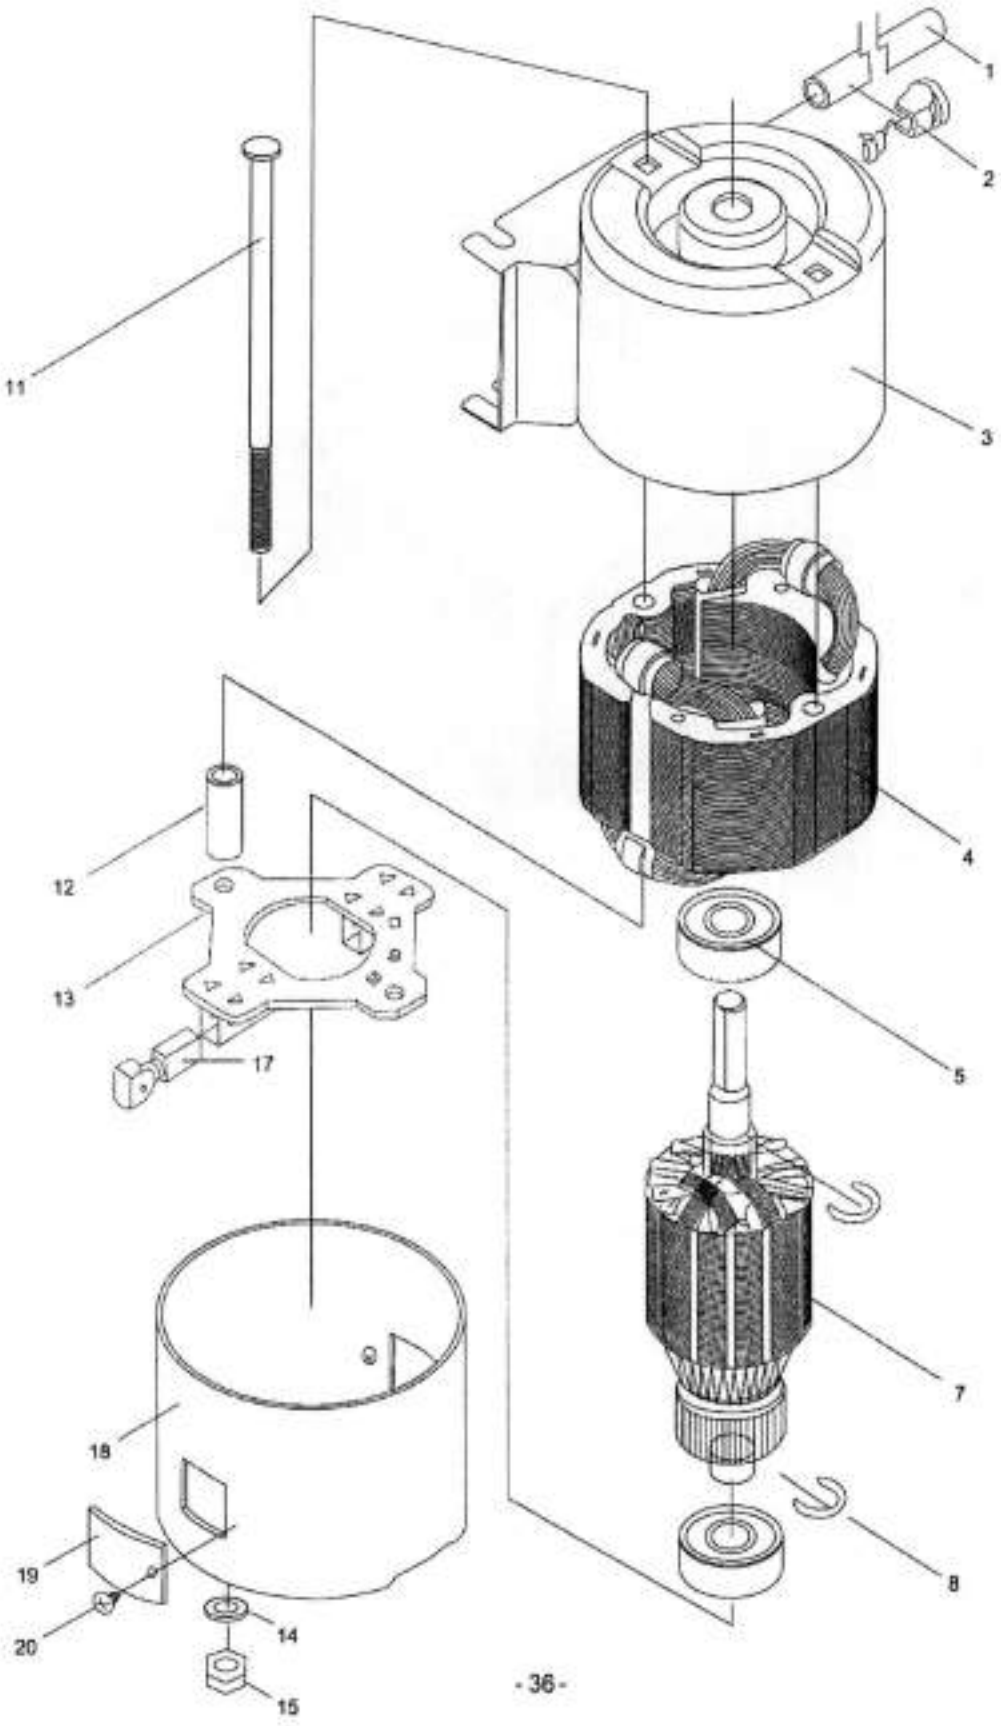

(14) MOTOR PARTS

ITEM	PART NO.	DESCRIPTION		Q'ty	REMARKS
1	6003601	CORD	電線		
2	6003602	STRAIN RELIFE BUSHINGS	絕緣套		
3	6003603	CASE A	馬達殼		
4	6003604	STATOR ASSY FOR 110V	馬達線		
	6003604-1	STATOR ASSY FOR 220V	馬達線		
	6003604-2	STATOR ASSY FOR 240V	馬達線		
	6003604-3	STATOR ASSY FOR 12V	馬達線		
	6003604-4	STATOR ASSY FOR 24V	馬達線		
5	6003605	BALL BEARING	滾珠軸承		
7	6003607	ARMATURE ASSY FOR 110V	馬達轉子		
	6003607-1	ARMATURE ASSY FOR 220V	馬達轉子		
	6003607-2	ARMATURE ASSY FOR 240V	馬達轉子		
	6003607-3	ARMATURE ASSY FOR 12V	馬達轉子		
	6003607-4	ARMATURE ASSY FOR 24V	馬達轉子		
8	6003608	C RING	C型扣環		
10	6003610	BRACKET	螺絲		
11	6003611	SCREW	導管		
12	6003612	PIPE	PC基板		
13	6003613	PC PLATE	華司		
14	6003614	WASHER	螺帽		
15	6003615	NUT	碳刷		
17	6002007	CARBON BRUSH FOR AC MOTOR	碳刷		
	6002008	CARBON BRUSH FOR DC MOTOR	馬達殼B		
18	6003618	CASE B	碳刷蓋		
19	6002009	CAP FOR MOTOR	螺絲		
20	6002010	SCREW			



耀 瀚 股 份 有 限 公 司
YAO HAN INDUSTRIES CO., LTD.

9/06/2025

FORMATO DE REMISION

cuperz

CUPERZ SAS NIT: 860032932-7

CLIENTE:	CONSORCIO INNOVAPARQUES	NIT:	901885635-2	REMISION No:	4860169
FECHA:	05/06/2025	CODIGO CLIENTE:	10813	PEDIDO No:	15878
VENDEDOR (es):	NELSONO LOPEZ			HORA:	10:00 a. m.
Dirección de Entrega:	CALLE 150 A CON CARRERA 101 VALLE DE REFOUS				
Persona que Recibe:					
Teléfono de Contacto:					

CODIGO	NOMBRE	LOTE	UM	CANTIDAD
T301600207	GR DIAMONDBLADE VERDE 13200 60MM 13 5/8 1445G/M2	25N225-1720B	1	100
		25N225AE720B	1	100
		25N225BE720B	1	100
		25N225CE720B	1	100
		25N225DE720B	1	100
		25N225EE720B	1	100
		25N225FE720B	1	100
		25N225GE720B	1	100
		25N225HE720B	1	100
		25N225IE720B	1	100
		25N226-1641'0	1	50
			Total Unidades entregadas:	1050

MATERIAL DESPACHADO:				ENVIADO POR:	
TOTAL ROLLOS:	11	TOTAL TAPETES:		TRANSPORTADORA:	
TOTAL CAJAS:		TOTAL IB:		TRANSPORTE CUPERZ:	
TOTAL CANECAS:		TOTAL ROLLOS PADDING:		FLETE A CARGO:	

PAGO CONTRA ENTREGA: SI: NO:

RECIBIDO POR:	ENTREGADO POR:
NOMBRE:	NOMBRE:
FIRMA:	PLACA VEHICULO:
CÉDULA:	FECHA RECIBIDO:

Manifiesto haber recibido manual de mantenimiento y garantía del producto

OBSERVACIONES:

ANEXO 5 SALIDAS NO CONFORMES CONTRATISTA

REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA

Nro.	Fecha	Tipo de registro			Origen	Descripción del hallazgo	Proceso	Descripción del hallazgo / causa raíz / análisis de causas / riesgo	Corrección / acción inmediata	Acciones a tomar (plan de acción propuesto)	Acciones a tomar (plan de acción propuesto)	Análisis y eficacia de las acciones tomadas (¿se resolvió el problema? ¿se requiere seguimiento?)	Fecha de cierre de la acción	Responsable	Fecha Programada	Fecha Cumplimiento	Estado	Cierre (para uso de la calidad)		
		Calidad	Mejora	Otro														Sí	No	Adjuntar
1	29/1/2025	X			REQUISITOS DEL CLIENTE	No se ha realizado la presentación de las comunicaciones mediante de los materiales gráficos correspondientes con base a las especificaciones TECNICAS del Contrato.	PRESTACION DEL SERVICIO	1. Por que no ha dado inicio al contrato por la premura de la entidad contratante. 2. Se omitió el registro por parte de compras al presupuesto y aun no fue informado oportunamente por parte del interesado. 3. Por condiciones comerciales con el laboratorio fuera demasa en la elección del mejor afiombre para este ambiente	Concesion para incumplimiento al cliente comunicar	Solicitar al proveedor la caracterización exacta de los materiales correspondientes a la obra.	Comunicar a los representantes legales del Consorcio diferencias de estos faltantes , hasta tanto no se cumpla con los requisitos contractuales con la entidad contratante. *Avisar cuando diferencias que cumplan con requisitos del cliente en cuanto al envío de caracterizaciones mezclas, cumpliendo con el procedimiento de compras en los tiempos establecidos.	N/A	N/A	N/A	N/A	Ing. Residente, Fiscalizadores Legal, Compras	15/01/2025	31/03/2025	*Informe de Laboratorio (FRM-LOJT-1004-20 (CM1440)(0 - 2)1.75)(04) *SIAF-03 ACTA ISSUANCE CERTIFICATE PLAN DEFICIENCIAS *LIBRO CRISTOVAPARQUES (Ordenes de Subsistencia F.)	X		
2	29/1/2025	X			REQUISITOS DEL CLIENTE	No se encuentra evidencia objetiva de la ejecución de los informes mensuales, afectando el indicador de entrega de productos.	PRESTACION DEL SERVICIO	1. Por que no existen mecanismos que el indicador tenga en alcance solo para los productos preliminares que exist 13, los cuales son ejecutados aprobados. 2. Por que algunos registros del informe (1 de octubre) no han podido cerrar. 3. Por que no se han establecido mesas de trabajo entre el Consorcio y la interventoría para la consecución de los informes.	Concesion para incumplimiento al cliente comunicar	Comunicar a las partes interesadas encargados de cada componente, la entrega oportuna de sus informes	Solicitar una reunion con la profesional de Calidad de la interventoría para sobre las observaciones realizadas en el informe 2. *Adjuntar los registros fotograficos de los informes de avances a los patrimonios establecidos en contrat .	N/A	N/A	N/A	N/A	Ing. Residente, Profesional de Calidad	14/01/2025	03/03/2025	*Registro de foto datos de la reunion sostenid con la interventoria y resumen de los temas tratados por la profesional de Calidad de la interventoria. *Aprobacion de los informes 2 y 3 de calidad	X		
3	29/01/2025	X			AUDITORIA INTERNA	No se encuentra evidencia objetiva de la inspección por Contratista del cumplimiento Inspecciones de Seguridad / informe diario y semanal preventivo de verificación y equipos mayores en concordancia del numeral 4.3.3.3 Inspecciones de Seguridad / informe diario y semanal preventivo de verificación y equipos mayores.	3X1 557	1 Por que? El subcontratista no hizo el seguimiento respectivo sobre la realización diaria de la inspección Pre Ocupacional. 2.Por que? El personal operativo no cumple con los informes ante el SG-SST delimitando. 3.Por que?El personal no tiene claro la importancia de la realizacion de estas actividades diarias.	Accidentes de trabajo			N/A	N/A	N/A	N/A	Profesional SG-SST	13/01/2025	31/03/2025	*SIAF-03 ACTA ISSUANCE MANOMPAPARQUES I DMS *Capacitacion de SUSCRI importancia y Uso de Pre Operacionales al personal *NO INSPECCION DEL OPERACIONALES DE EQUIPOS	X		
4	29/01/2025	X			AUDITORIA INTERNA	No se encuentra evidencia objetiva del envio de la programación VS mediante comunicación a la interventoria para seguimiento y cumplidad , y cambio de fecha que identifique su aprobación segun lo reporta en "2. CONTROL DE DOCUMENTOS, DATOS Y REGISTROS" y "5 PLAN DE COMUNICACIONES del Plan de Calidad v2.	3X1 557	2 Por que? No fue efectivo la inducción de calidad al resto mismo sobre los elementos del plan de Calidad 2.Por que? Se envio la ultima version enviada de Whatsapp. 3. Por que? No se asegura el seguimiento de la intervención del envio formal de este documento.	Indicadores de trabajo por perno de entrega no cumplido en el cuentro de actividades del proyecto en mantenido			N/A	N/A	N/A	N/A	Ing. Residente, Profesional de Calidad	29/01/2025			X		
		4	0	0														3	1	

Fuente:

Bogotá D.C., 17 de marzo de 2025.

Señor(es),
CONSORCIO SANTA TERESA 28
R.L. RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Proyectos2@soliunsas.com
Teléfono: 6017653016
Carrera 70 C 48 - 55
Bogotá, D.C.

CINNOVAPARQUES-CE-145
Al responder cite este consecutivo

Referencia: Contrato de Obra No. 4041 de 2024, cuyo objeto es "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS".

Asunto: Entrega ensayos de laboratorio arena sílice y caucho granulado

Respetado(s) Señor(es),

El suscrito, **OSCAR RENAN VELASQUEZ VIGOYA**, identificado con cédula de ciudadanía No.79.969.768, obrando en su calidad de representante legal, con amplias atribuciones al efecto, de **CONSORCIO INNOVAPARQUES**. Por medio de la presente se realiza entrega de los resultados de laboratorio de análisis granulométrico para la arena sílice y el granulo de caucho. Se aclara que tanto los resultados de arena como de caucho se encuentran dentro de los límites establecidos en las **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS IDRD** ítem Nuevas dotaciones complementarias deportivas, numeral 2. Canchas de grama sintética, dentro el apartado *grama sintética FIFA prefer* donde se establece "...Arena tipo sílice con granulometría entre 0.2mm y 0.8mm, en cantidad de 15 – 17kg/m2. Caucho molido tipo SBR, con granulometría de 0.5-2.0mm en cantidad de 15 – 17kg/m2...". Sin embargo, se evidencia que para el ensayo del caucho granulado no se dispone de un tamiz especifico que se ajuste a los parámetros para la fracción de 0.5 mm, lo que genera una leve discontinuidad en la curva granulométrica.

Para cerrar la curva de distribución de partículas en la gráfica, se observa un pequeño porcentaje de material retenido en el tamiz No. 4. No obstante, este material no logra pasar dicho tamiz, lo que indica que la granulometría del caucho

mantiene su coherencia dentro de los parámetros esperados y no representa una desviación significativa respecto a los requisitos técnicos del proyecto. En conclusión, la distribución de tamaños de partículas del caucho es adecuada y cumple con las especificaciones establecidas, a pesar de la ausencia del tamiz de 0.5 mm en el análisis, sin embargo, para los futuros ensayos nos encontramos en la búsqueda de un laboratorio que cuente con el tamiz No. 35, con el fin de evitar esta desviación.

Cabe resaltar que los resultados de nuestro ensayo difieren de los obtenidos por la interventoría, debido a que realizamos las pruebas directamente sobre el caucho aplicado en los campos deportivos, mientras que la interventoría efectuó el análisis sobre el material contenido en los bultos. A pesar de esta diferencia en el muestreo, nuestros ensayos cumplen con las especificaciones técnicas y coinciden con la inspección visual realizada tanto por la interventoría como por la supervisión del proyecto.

Quedamos atentos a cualquier comentario y/o solicitud adicional. Agradecemos de antemano su atención.

Cordialmente,

OSCAR RENAN VELASQUEZ VIGOYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

Bogotá D.C., 2025 marzo 05

Señor
BRAYAN GARCIA
CONSORCIO INNOVAPARQUES
Obra: CANCHAS SINTÉTICAS
Código de obra: 25607
Bogotá D.C

Asunto: Entrega de informes de resultados.

Apreciado Señor

De manera atenta nos permitimos hacer entrega de los informes con referencia DGP 1086-25-1 al DGP 1086-25-3 en los cuales se presentan los resultados de los ensayos relacionados a continuación:

NORMA DE ENSAYO	
Determinación del contenido orgánico de un suelo mediante el ensayo de pérdida por ignición.	INV E 121:2013
Determinación de los tamaños de las partículas de los suelos.	INV E 123:2013

Muestra No.	Descripción del material
M1	Arena Peña
M2	Caucho

Los ensayos se realizaron conforme a los procedimientos establecidos en las normas relacionadas; los resultados reportados corresponden exclusivamente a las características de la muestra ensayada.

Cordialmente;

Laura Cuervo Giraldo
Jefe de Geotecnia
geotecnia@concrelab.com
OV 144829. – OT 75304.
E. NUÑEZ.

164

INFORME DE ENSAYO

DETERMINACIÓN DE LOS TAMAÑOS DE LAS PARTÍCULAS DE LOS SUELOS. (ANÁLISIS POR TAMIZADO) INV E 123:2013

NÚMERO DE INFORME: DGP-1086-25-1
PÁGINAS: 1 DE 2

***CLIENTE:**	CONSORCIO INNOVAPARQUES
***CÓDIGO DE OBRA:**	25607
***OBRA:**	CANCHAS SINTÉTICAS
***DIRECCIÓN Y CIUDAD DEL CLIENTE:**	CL 51 A 71 A 18
***DESCRIPCIÓN CLIENTE:**	ARENA PEÑA
DESCRIPCIÓN LABORATORIO:	VISUAL: MATERIAL ARENOSO, COLOR: MARRÓN MUY PÁLIDO, CONDICIÓN DE HUMEDAD: HÚMEDA
***NÚMERO DE LA MUESTRA:**	1
***PROCEDENCIA:**	NO SUMINISTRADA
***LOCALIZACIÓN TOMA DE MUESTRA:**	NO SUMINISTRADA
SITIO DE ENSAYO:	LABORATORIO DE ENSAYOS
FECHA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS:	2025-02-20
FECHA DE EJECUCIÓN DE ENSAYO:	2025-02-27
FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME:	2025-03-05
ENSAYO EJECUTADO POR:	H. RODRIGUEZ.
ORDEN DE TRABAJO N°:	75304 - OV 144829
NÚMERO DE PÁGINAS DEL INFORME:	Dos (2)

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se sequen de contexto.
* La información registrada en los campos identificados con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

AUTORIZADO POR:

Laura Cuervo Giraldo
Jefe de Geotecnia
geotecnia@concrelab.com


INFORME DE ENSAYO

DETERMINACIÓN DE LOS TAMAÑOS DE LAS PARTÍCULAS DE LOS SUELOS. (ANÁLISIS POR TAMIZADO) INV E 123:2013

NÚMERO DE INFORME: DGP-1086-25-1

Masa total seca (g):		442.9		Tamaño máximo:	No. 10	Masa seca pasa tamiz 2 mm (N°10) (g):	120.1	
Tamiz		Masa retenida (g)	% Retenido	% Que pasa	% Que pasa N° 10	% Pasa unificado	* Límite Inferior	* Límite Superior
mm	Alterno							
125,00	5"			100		100		
100,00	4"			100		100		
76,20	3"			100		100		
64,00	2 ½"			100		100		
50,00	2"			100		100		
37,50	1 ½"			100		100		
25,40	1"			100		100		
19,00	3/4"			100		100		
12,70	1/2"			100		100		
9,52	3/8"			100		100		
4,75	No 4			100		100		
2,38	No 8			100		100		
2,00	No. 10			100		100		
1,19	No. 16	0,1	0		100	100		
0,60	No. 30	30,5	25		75	75		
0,43	No. 40	43,3	36		38	38		
0,30	No. 50	19,8	16		22	22		
0,15	No. 100	16,4	14		8	8		
0,08	No. 200	2,2	2		7	6,5		

Nota: La información registrada en los campos identificados con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

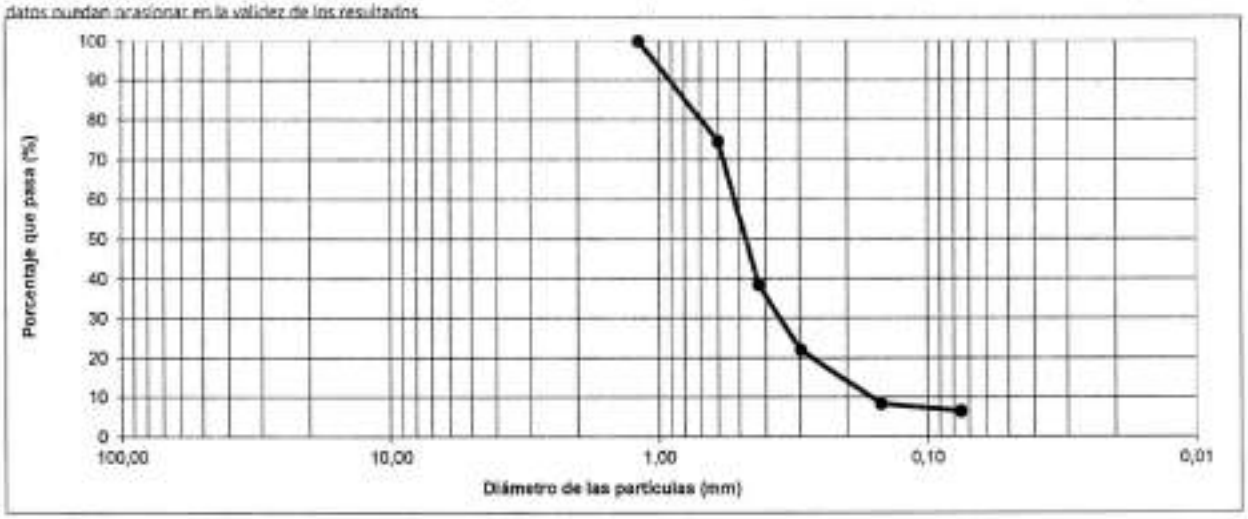

OBSERVACIONES:

"De acuerdo al servicio aprobado por el cliente, se realiza únicamente el ensayo de granulometría por tamizado y se excluye el ensayo por sedimentación (Hidrometría)"

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

INFORME DE ENSAYO

DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO ORGÁNICO DE UN SUELO MEDIANTE EL ENSAYO DE PÉRDIDA POR IGNICIÓN. INV E 121:2013

NÚMERO DE INFORME: DGP-1086-25-2
PÁGINAS: 1 DE 2

***CLIENTE:**	CONSORCIO INNOVAPARQUES
***CÓDIGO DE OBRA:**	25607
***OBRA:**	CANCHAS SINTÉTICAS
***DIRECCIÓN Y CIUDAD DEL CLIENTE:**	CL 51 A 71 A 18
***DESCRIPCIÓN CLIENTE:**	ARENA PEÑA
DESCRIPCIÓN LABORATORIO:	VISUAL: MATERIAL ARENOSO, COLOR: MARRÓN MUY PÁLIDO, CONDICIÓN DE HUMEDAD: HÚMEDA
***NÚMERO DE LA MUESTRA:**	1
***PROCEDENCIA:**	NO SUMINISTRADA
***LOCALIZACIÓN TOMA DE MUESTRA:**	NO SUMINISTRADA
SITIO DE ENSAYO:	LABORATORIO DE ENSAYOS
FECHA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS:	2025-02-20
FECHA DE EJECUCIÓN DE ENSAYO:	2025-02-27
FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME:	2025-03-05
ENSAYO EJECUTADO POR:	H. RODRIGUEZ.
ORDEN DE TRABAJO N°:	75304 - OV 144829
NÚMERO DE PÁGINAS DEL INFORME:	Dos (2)

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
* La información registrada en los campos identificados con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

AUTORIZADO POR:



Laura Cuervo Giraldo
Jefe de Geotecnia
geotecnia@concrelab.com

INFORME DE ENSAYO

DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO ORGÁNICO DE UN SUELO MEDIANTE EL ENSAYO DE PÉRDIDA POR IGNICIÓN. INV E 121:2013

NÚMERO DE INFORME: DGP-1086-25-2
PÁGINAS: 2 DE 2

MUESTRA	N° 1
* Procedencia de la Muestra:	NO SUMINISTRADA
Clasificación:	N/A
* Utilización Resultado del Ensayo:	N/A
Crisol de evaporación número:	1
C: Masa crisol de evaporación. (g)	30,66
A: Masa crisol + suelo seco antes de ignición. (g)	66,25
B: Masa crisol + suelo seco después de ignición. (g)	66,19
Contenido de materia orgánica. (%)	**0,2**

Nota: La información registrada en los campos identificados con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

OBSERVACIONES:

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

INFORME DE ENSAYO

DETERMINACIÓN DE LOS TAMAÑOS DE LAS PARTÍCULAS DE LOS SUELOS. (ANÁLISIS POR TAMIZADO) INV E 123:2013

NÚMERO DE INFORME: DGP-1086-25-3
PÁGINAS: 1 DE 2

***CLIENTE:**	CONSORCIO INNOVAPARQUES
***CÓDIGO DE OBRA:**	25607
***OBRA:**	CANCHAS SINTÉTICAS
***DIRECCIÓN Y CIUDAD DEL CLIENTE:**	CL 51 A 71 A 18
***DESCRIPCIÓN CLIENTE:**	CAUCHO
DESCRIPCIÓN LABORATORIO:	VISUAL: CAUCHO TRITURADO, COLOR: NEGRO, CONDICIÓN DE HUMEDAD: SECA
***NÚMERO DE LA MUESTRA:**	2
***PROCEDENCIA:**	NO SUMINISTRADA
***LOCALIZACIÓN TOMA DE MUESTRA:**	NO SUMINISTRADA
SITIO DE ENSAYO:	LABORATORIO DE ENSAYOS
FECHA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS:	2025-02-20
FECHA DE EJECUCIÓN DE ENSAYO:	2025-02-27
FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME:	2025-03-05
ENSAYO EJECUTADO POR:	H. RODRIGUEZ.
ORDEN DE TRABAJO N°:	75304 - OV 144829
NÚMERO DE PÁGINAS DEL INFORME:	Dos (2)

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
* La información registrada en los campos identificados con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

AUTORIZADO POR:



Laura Cuervo Giraldo
Jefe de Geotecnia
geotecnia@concrelab.com


INFORME DE ENSAYO

DETERMINACIÓN DE LOS TAMAÑOS DE LAS PARTÍCULAS DE LOS SUELOS. (ANÁLISIS POR TAMIZADO) INV E 123:2013

NÚMERO DE INFORME: DGP-1086-25-3

Masa total seca (g):		2952		Tamaño maximo:	No. 10	Masa seca pasa tamiz 2 mm (N°10) (g):	115,3	
Tamiz		Masa retenida (g)	% Retenido	% Que pasa	% Que pasa N° 10	% Pasa unificado	* Limite Inferior	* Limite Superior
mm	Alterno							
125,00	5"			100		100		
100,00	4"			100		100		
76,20	3"			100		100		
64,00	2 ½"			100		100		
50,00	2"			100		100		
37,50	1 ½"			100		100		
25,40	1"			100		100		
19,00	3/4"			100		100		
12,70	1/2"			100		100		
9,52	3/8"			100		100		
4,75	No 4			100		100		
2,38	No 8			100		100		
2,00	No. 10			100		100		
1,19	No. 16	47,0	41		59	59		
0,60	No. 30	51,6	45		14	14		
0,43	No. 40	14,4	12		2	2		
0,30	No. 50	1,4	1		1	1		
0,15	No. 100	0,3	0		1	1		
0,08	No. 200	0,2	0		0	0,3		

Nota: La información registrada en los campos identificados con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

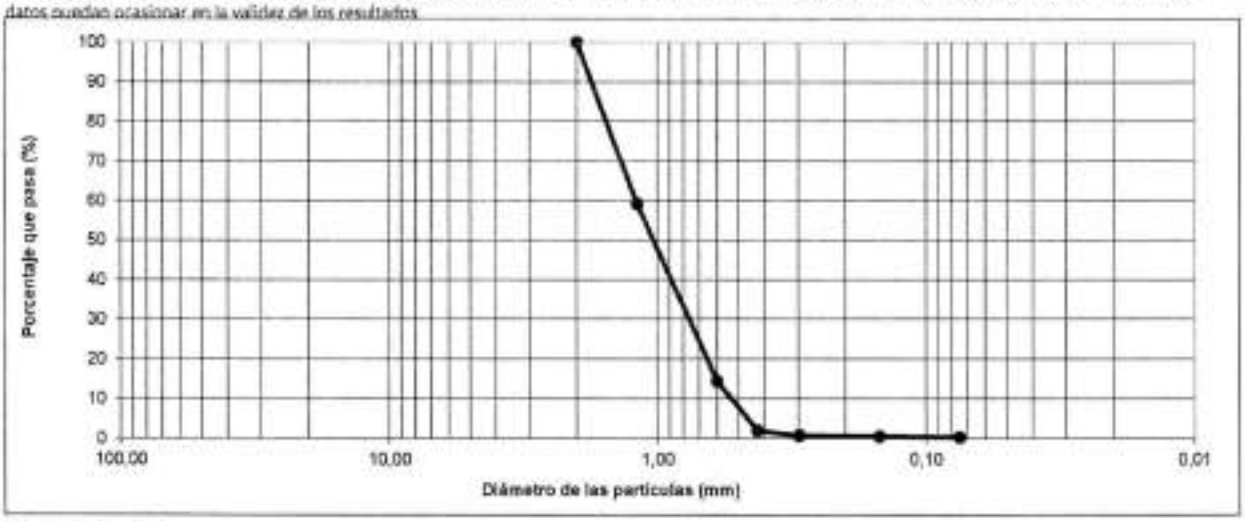

OBSERVACIONES:



"De acuerdo al servicio aprobado por el cliente, se realiza únicamente el ensayo de granulometría por tamizado y se excluye el ensayo por sedimentación (Hidrometría)"

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

CONSORCIO INNOVAPARQUES	**ACTA DE REUNION**	CODIGO:GG-F-03
		VERSIÓN:01
		FECHA: 15/01/2010

NOMBRE EMPRESA / CONSORCIO:	INNOVAPARQUES

Fecha	Hora Inicio	Hora Finalizacion	Lugar
16/1/2025	8:00 a. m.	9:00 a. m.	Oficna Consorcio

Participantes	Empresa	Cargos	Firma
Javier Linares	C. Innovaparques	Director de Obra	
Brayan Stivens García	C. Innovaparques	Ing. Residente	
John Jairo Marin Lopez	IES INGENIEROS	P. Calidad	

Objetivo de la reunion:	**Cierre Plan de Accion Salida No conforme Materiales**

Temas a tratar
Cierre Plan de Accion Salida No conforme Materiales

Desarrollo
El Ing Javier Linares , indica que dado la premura de inciciar el proyecto , no se coordino oportunamente la realizacion de los ensayos de materiales como la arena (granulomeria) y gravilla , lo cual era requisito contractual , incumpliendo con el anexo tecnico de la entidad contratante. El ing Brayan , determina que se coordino con compras , la contatacion de los ensayos con CONCRELAB , pero que hubo demora en el proceso de compras para la eleccion del proveedor mas pertinente. John Marin recomienda que los materiales deben contar con sus certificados de conformidad , asi como los ensayos resepectivos de los materiales sencibles en la ejecucion del proyecto. Por ultimo Javier Linares indica , que la accion de mejora esta siendo tratada para subsanar y cerrar la no conformidad.

PLAN DE ACCION

Actividad a desarrollar	Responsable	Fecha propuesta
Coordinar la recolección de los materiales para entrega a laboratorio	Brayan Stivens García	21/01/2025
Realizar el sguimiento y documentar el cierre de la no conformidad	John Marin	29/01/2025
Aprobar la orden de compra	Javier Linares	16/01/2025

Compromisos
Los establecidos en el acta



P2 Proyectos 2 <proyectos2@soluriasas.com>

Para: soluri.calidad3@gmail.com; consorcioinnovaparques24@gmail.com; @ SSTQ; hseq171@gmail.com

Responder | Responder a todos | Reenviar

Mié 12/03/2025 15:19

Invitación
Ver

Unirme con Google Meet

Enlace de la reunión
meet.google.com/rgn-ukzy-fer

Unirse por teléfono
(CO) +57 601 8936088
PIN: 183 480 020#

Más números de teléfono

Se coordina reunion con contratista INNOVAPARQUES, con el fin de revisar las observaciones realizadas a los informes de calidad observados por interventoria

Cuándo
Viernes 14 de feb de 2025 - 9am – 10am (Hora estándar de Colombia)

Invitados
Proyectos 2: organizador

RA Read Assistant <executiveassistant@ai.read.ai>

Para: @ SSTQ

Responder | Responder a todos | Reenviar

Vie 14/02/2025 10:01

Parte del contenido de esta mensaje se ha bloqueado porque el remitente no está en la lista de remitentes seguros. Remitente de confianza | Mostrar contenido bloqueado

Hse acaba invitado a ver este informe porque Proyectos 2 añadió Read a la reunión y quería compartir el resumen contigo.

REVISIÓN OBSERVACIONES INFORMES DE CALIDAD CONTRATISTA

February 14, 2026

Se abordaron las observaciones a los informes de calidad presentados por el contratista, centrándose en la necesidad de un control más riguroso de las actividades y materiales. Se revisaron los ajustes en los indicadores de gestión y se enfatizó la importancia de incluir registros específicos en los informes, así como... ver más

Acceder a más ajustes de la reunión

Su equipo y cuentas de correo. Solo en la versión personal, por favor no reenvíes este correo a otros.

Resumen

Resumen

Capítulos & Temas

- Revisión de Observaciones a Informes de Calidad del Contratista
  - Revisión de las observaciones de los informes anteriores
  - Tema de seguimiento a los informes de calidad
- Ver todos los 5 capítulos →

Tareas

- Clau grabará la reunión para dejar trazabilidad a la información revisada.
- Sst consorcio Rivera enviará el informe número 2 y el informe número 3 el lunes.

Ver todos los 5 capítulos →

Preguntas clave

- ¿Cuál registros se deben incluir para cumplir con el numeral 5 del informe?
- ¿Dónde se encuentran las especificaciones técnicas de los materiales?

Ver todas las 3 preguntas clave →

Revisar notas

CONSORCIO
SANTA TERESA 28

NIT. 901.888.461-1

IDRD-4080-G1-2024-162

Bogotá D. C., 20 febrero de 2025

Señores:
CONSORCIO INNOVAPARQUES
Atn. OSCAR RENÁN VELÁSQUEZ VIGOYA
Representante Legal
La ciudad

Referencia: Contrato No. IDRD-SG-4041-2024, cuyo objeto es **"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD."**

Asunto: **Respuesta comunicado CINNOVAPARQUES-CE-119 - informe Calidad N°2 V.2**

Cordial saludo,

En cumplimiento de nuestras obligaciones, y luego de hacer revisión del **informe Calidad N°2 V.2** remitido mediante el comunicado CINNOVAPARQUES-CE-119 del 17 de febrero de 2025 por medio de la presente nos permitimos adjuntar la lista de chequeo correspondiente a la revisión de dicho informe, dado lo anterior solicitamos se realice la radicación del documento aprobado.

Atentamente,

RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal

Anexos: Lista de Chequeo tres (3) folios
Con copia: N/A
Elaboró: VLU
Revisó: N/A

LISTA DE CHEQUEO INFORME
COMPONENTE DE CALIDAD - CONTRATISTA
INFORME MENSUAL - ETAPA DE OBRA

Contrato N.	4041-2024	**Parque:**	CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS
Objeto contractual:	"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 - "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS"		
Revisa:	ING VIANNEY LEAÑO	**N° Informe:**	2 — **Versión:** 2,0 — **Revisión** 2
Periodo del Informe:	Entre: 1-dic.-25 al 31-dic.-25	**Fecha Revisión:**	jueves, 20 de febrero de 2025
Concepto de revisión:	PRE APROBADO	APROBADO	X — NO APROBADO

DOCUMENTO	%Cumplimiento N/A	0%	50%	100%	OBSERVACIONES
ESTADO CONTRACTUAL Y DE GESTIÓN					
Descripción del estado del contrato Se solicita incluir datos contractuales vigentes: * **Suspensiones**, consecutivo y plazo de suspensión * **Adiciones**, consecutivo y valor de la adición * **Prorrogas**, consecutivo y Plazo de adición * Gestión de incumplimientos (si aplica)				X	PLAZO DE EJECUCIÓN PROYECTO *Fecha de Inicio:* miércoles, 20 de noviembre de 2024 *Fecha Final:* viernes, 19 de julio de 2024 *Plazo Actual:* 8 meses *Contratista:* CONSORCIO INNOVAPARQUES *Interventoría:* CONSORCIO SANTA TERESA 28
Seguimiento a indicadores de gestión Presentar el porcentaje de avance del periodo. Se debe evidenciar el control a los indicadores de gestión conforme los requisitos contractuales, incluir entre otros: Cumplimiento de cronograma, entrega de productos, ejecución de presupuesto, y demás indicadores propuestos en el plan de calidad. Establecer metas de cumplimiento y plan de acción.				X	Cumple lo mínimo requerido
Control y seguimiento de los recursos humanos Describir el cumplimiento de los profesionales (claves - mínimos) requeridos en el contrato por parte de contratista durante el periodo ejecutado. Se debe presentar un cuadro donde se relacione: Nombre, cargo, % dedicación, fecha y N° radicados de aprobación por parte del responsable en cada contrato asociado y los cambios de personal en el periodo. Se debe presentar la relación de las de firmas autorizadas para el proceso de elaboración revisión y aprobación del presente informe.				X	*Personal mínimo OBRA* Cumple lo mínimo requerido
Seguimiento al cumplimiento del plan de calidad Describir actividades realizadas para dar cumplimiento al Plan de Calidad propuesto y aprobado por la interventoría				X	Cumple lo mínimo requerido
Seguimiento a las comunicaciones **ACTAS DE COMITÉ:** Presentar cuadro de seguimiento al cumplimiento de los compromisos, y anexar las actas generadas en el periodo. **CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA:** Presentar cuadro de seguimiento de la correspondencia enviada y recibida durante el periodo en ejecución. **BITÁCORA**: Anexar registro de bitácora con número de consecutivo o numeración ordenada entre el primer y último día del periodo reportado				X	*Seguimiento a Actas de Comité* Cumple lo mínimo requerido *Correspondencia enviada y recibida* Cumple lo mínimo requerido *Bitácora de obra* Cumple lo mínimo requerido
Seguimiento de la información documentada Reportar los cambios de versión generados en el periodo, fecha de actualización y cambios generados de los documentos contractuales; planes, programas, formatos, planos, programación, balance, etc.; según los documentos relacionados en el listado maestro de documentos del plan de calidad aprobado.				X	Cumple lo mínimo requerido
Seguimiento al Plan de adquisiciones Evidenciar el cumplimiento de lo propuesto en el plan de adquisiciones para el periodo de reporte en comparación con lo ejecutado. Presentar los registros que evidencien la ejecución del plan.				X	Cumple lo mínimo requerido
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO					
Seguimiento a la Infraestructura y Preservación Descripción de los recursos dispuestos en obra durante el periodo para el desarrollo de cada etapa en el contrato del contratista según lo establecido en cada plan de calidad.				X	Cumple lo mínimo requerido

LISTA DE CHEQUEO INFORME
COMPONENTE DE CALIDAD - CONTRATISTA
INFORME MENSUAL - ETAPA DE OBRA

Contrato N.	4041-2024	**Parque:**	CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS
Objeto contractual:	"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 - "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS"		
Revisa:	ING VIANNEY LEAÑO	**N° Informe:**	2
Versión:	2,0	**Revisión**	2
Periodo del Informe:	Entre: 1-dic.-25 al 31-dic.-25	**Fecha Revisión:**	jueves, 20 de febrero de 2025

Concepto de revisión:	PRE APROBADO		APROBADO	X	NO APROBADO	

DOCUMENTO	%Cumplimiento N/A	0%	50%	100%	OBSERVACIONES
Cumplimiento al Plan de inspección y ensayo del proyecto Presentar evidencia de cumplimiento del plan de inspección y ensayo del plan de calidad de cada contrato asociado. *Evidenciar el cumplimiento del plan de inspección y ensayos del contratista ejecutor presentando un análisis de los resultados obtenidos				X	***Plan de inspección y ensayo OBRA*** Cumple lo mínimo requerido
Control y seguimiento de los Equipos de Inspección, medición y ensayo *Evidenciar la verificación de los laboratorios acreditados ante ONAC, proveedor de cada contrato asociado. * Entregar los registros de verificación de idoneidad de los equipos de inspección, medición y ensayo (topografía, densímetros, termómetros, entre otros utilizados) certificados de calibración, frecuencia de chequeo o verificación, metodología usada de acuerdo al plan de calidad aprobado				X	***Equipos de medición y ensayo OBRA*** Cumple lo mínimo requerido
Control y seguimiento de la trazabilidad de los materiales Presentar información de los materiales e insumos recibidos en el periodo que inciden en la calidad de la obra con los certificados de calidad o ensayos de laboratorio correspondientes, y registros de liberación por parte de interventoría.				X	Se presenta en anexo AB listado de materiales del periodo
Control y seguimiento de las actividades *Presentar evidencia del control y seguimiento realizado a las actividades de obra ejecutadas en el periodo. Todos los registros deben ser coherentes con el cumplimiento al Plan de Inspección de las actividades ejecutadas.				X	Cumple lo mínimo requerido
CONTROL DE LA GESTIÓN					
Control de cambios Se debe documentar la identificación, análisis y control de todos los cambios generados durante el desarrollo del objeto contractual, describiendo claramente la justificación y los impactos derivados de dicho cambio, incluyendo los registros que lo soporten y relacionando los documentos que cambian de versión.	X				No aplica
Salidas no conformes Presentar un cuadro resumen de las salidas no conformes del proyecto por parte de interventoría (informes, productos, planes, evidencias de inspecciones en campo, materiales que no cumplan con especificaciones de calidad, etc.) donde se especifique fecha, componente, tratamiento y cierre. Reportar en el informe, las salidas no conformes por parte del contratista (indicar fecha, componente, tratamiento y cierre).				X	***SNC. PROYECTO*** Cumple lo mínimo requerido
Auditorías internas Seguimiento a la planificación (Programa y plan de auditoria) y el informe de auditoria interna de acuerdo a la programación establecida en los requisitos contractuales de cada contrato asociado.	X				***Auditoría Interna OBRA*** No aplica

LISTA DE CHEQUEO INFORME
COMPONENTE DE CALIDAD - CONTRATISTA
INFORME MENSUAL - ETAPA DE OBRA

Contrato N.	4041-2024	*Parque:*	CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS
Objeto contractual:	"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 - "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS"		
Revisa:	ING VIANNEY LEAÑO	N° Informe: 2	Versión: 2,0 Revisión 2
Periodo del Informe:	Entre: 1-dic.-25 al 31-dic.-25	Fecha Revisión:	jueves, 20 de febrero de 2025

Concepto de revisión:	PRE APROBADO		APROBADO	X	NO APROBADO	

DOCUMENTO	%Cumplimiento N/A	0%	50%	100%	OBSERVACIONES
ANEXOS (Copias y Originales)					
Documentos incluidos en documento objeto de la presente revisión:					
AA Actividades Periodo					
AB Control actividades					
AC Actas de Comite					
AD Bitacora					
AE Control de Documentos					
AF Compras					
AG Certificados de Calidad					
AH Inspeccion y Ensayos					
AI Medicion					
AJ Salidas no Conformes					

CONSORCIO
SANTA TERESA 28

NIT. 901.888.461-1

IDRD-4080-G1-2024-170

Bogotá D. C., 24 de febrero de 2025

Señores:
CONSORCIO INNOVAPARQUES
Atn. OSCAR RENÁN VELÁSQUEZ VIGOYA
Representante Legal
La ciudad

Referencia: Contrato No. IDRD-SG-4041-2024, cuyo objeto es **"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD."**

Asunto: **Respuesta comunicado CINNOVAPARQUES-CE-125- Informe Calidad N°3 V.2**

Cordial saludo,

En cumplimiento de nuestras obligaciones, y luego de hacer revisión del **informe Calidad N°3 V.2** remitido mediante el comunicado CINNOVAPARQUES-CE-125 del 20 de febrero de 2025 por medio de la presente nos permitimos adjuntar la lista de chequeo correspondiente a la revisión de dicho informe, dado lo anterior solicitamos se realice la radicación del documento aprobado.

Atentamente,

RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal

Anexos: Lista de Chequeo tres (3) folios
Con copia: N/A
Elaboró: VLU
Revisó: N/A

LISTA DE CHEQUEO INFORME
COMPONENTE DE CALIDAD - CONTRATISTA
INFORME MENSUAL - ETAPA DE OBRA

Contrato N.	**4041-2024**	**Parque:**	CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS				
Objeto contractual:	"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 - "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS"						
Revisa:	ING VIANNEY LEAÑO			**N° Informe:**	3	**Versión:** 2,0	**Revisión** 2
Periodo del Informe:	Entre: 1-ene.-25 al 31-ene.-25	**Fecha Revisión:**	lunes, 24 de febrero de 2025				
Concepto de revisión:	PRE APROBADO		APROBADO X		NO APROBADO		

DOCUMENTO	%Cumplimiento N/A	0%	50%	100%	OBSERVACIONES
ESTADO CONTRACTUAL Y DE GESTIÓN					
Descripción del estado del contrato Se solicita incluir datos contractuales vigentes: * **Suspensiones**, consecutivo y plazo de suspensión * **Adiciones**, consecutivo y valor de la adición * **Prorrogas**, consecutivo y Plazo de adición * Gestión de incumplimientos (si aplica)				X	PLAZO DE EJECUCIÓN PROYECTO *Fecha de inicio:* miércoles, 20 de noviembre de 2024 *Fecha Final:* viernes, 19 de julio de 2024 *Plazo Actual:* 8 meses *Contratista:* CONSORCIO INNOVAPARQUES *Interventoría:* CONSORCIO SANTA TERESA 26
Seguimiento a indicadores de gestión Presentar el porcentaje de avance del periodo. Se debe evidenciar el control a los indicadores de gestión conforme los requisitos contractuales, incluir entre otros: Cumplimiento de cronograma, entrega de productos, ejecución de presupuesto, y demás indicadores propuestos en el plan de calidad. Establecer metas de cumplimiento y plan de acción.				X	Cumple lo mínimo requerido
Control y seguimiento de los recursos humanos Describir el cumplimiento de los profesionales (claves - mínimos) requeridos en el contrato por parte de contratista durante el periodo ejecutado. Se debe presentar un cuadro donde se relacione: Nombre, cargo, % dedicación, fecha y N° radicados de aprobación por parte del responsable en cada contrato asociado y los cambios de personal en el periodo. Se debe presentar la relación de las de firmas autorizadas para el proceso de elaboración revisión y aprobación del presente informe.				X	***Personal mínimo OBRA*** Cumple lo mínimo requerido
Seguimiento al cumplimiento del plan de calidad Describir actividades realizadas para dar cumplimiento al Plan de Calidad propuesto y aprobado por la interventoría				X	Cumple lo mínimo requerido
Seguimiento a las comunicaciones **ACTAS DE COMITÉ:** Presentar cuadro de seguimiento al cumplimiento de los compromisos, y anexar las actas generadas en el periodo. **CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA:** Presentar cuadro de seguimiento de la correspondencia enviada y recibida durante el periodo en ejecución. **BITÁCORA**: Anexar registro de bitácora con número de consecutivo o numeración aplicada entre el primer y último día del periodo reportado.				X	***Seguimiento a Actas de Comité*** Cumple lo mínimo requerido ***Correspondencia enviada y recibida*** Cumple lo mínimo requerido ***Bitácora de obra*** Cumple lo mínimo requerido
Seguimiento de la información documentada Reportar los cambios de versión generados en el periodo, fecha de actualización y cambios generados de los documentos contractuales; planes, programas, formatos, planos, programación, balance, etc.; según los documentos relacionados en el listado maestro de documentos del plan de calidad aprobado.				X	Reportar los cambios de versión generados en el periodo, fecha de actualización y cambios generados de los documentos contractuales; planes, programas, formatos, planos, programación, balance, etc.; según los documentos relacionados en el listado maestro de documentos del plan de calidad aprobado. No se cuenta con el registro de la información programación, balance en el listado de documentos y registros presentado
Seguimiento al Plan de adquisiciones Evidenciar el cumplimiento de lo propuesto en el plan de adquisiciones para el periodo de reporte en comparación con lo ejecutado. Presentar los registros que evidencien la ejecución del plan.				X	No se presenta el plan de adquisiciones revisado y aprobado para el periodo por interventoría, en el cual se evidencie su implementación y seguimiento con los documentos que lo soporten
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO					
Seguimiento a la Infraestructura y Preservación Descripción de los recursos dispuestos en obra durante el periodo para el desarrollo de cada etapa en el contrato del contratista según lo establecido en cada plan de calidad.				X	Cumple lo mínimo requerido

LISTA DE CHEQUEO INFORME
COMPONENTE DE CALIDAD - CONTRATISTA
INFORME MENSUAL - ETAPA DE OBRA

Contrato N. 4041-2024 **Parque:** CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS

Objeto contractual: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD", GRUPO 1 - "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS"

Revisa:	ING VIANNEY LEAÑO			**N° Informe:**	3	**Versión:**	2,0	**Revisión**	2

Periodo del Informe: Entre 1-ene.-25 al 31-ene.-25 **Fecha Revisión:** lunes, 24 de febrero de 2025

Concepto de revisión:	PRE APROBADO		APROBADO	X	NO APROBADO	

DOCUMENTO	%Cumplimiento N/A	0%	50%	100%	OBSERVACIONES
Cumplimiento al Plan de inspección y ensayo del proyecto Presentar evidencia de cumplimiento del plan de inspección y ensayo del plan de calidad de cada contrato asociado. *Evidenciar el cumplimiento del plan de inspección y ensayos del contratista ejecutor presentando un análisis de los resultados obtenidos				X	***Plan de inspección y ensayo OBRA*** Pendiente la entrega de resultados de laboratorio, de acuerdo a las muestras enviadas a Concrelab
Control y seguimiento de los Equipos de Inspección, medición y ensayo *Evidenciar la verificación de los laboratorios acreditados ante ONAC, proveedor de cada contrato asociado. * Entregar los registros de verificación de idoneidad de los equipos de Inspección, medición y ensayo (topografía, densímetros, termómetros, entre otros utilizados) certificados de calibración, frecuencia de chequeo o verificación, metodología usada de acuerdo al plan de calidad aprobado				X	***Equipos de medición y ensayo OBRA*** Cumple lo mínimo requerido
Control y seguimiento de la trazabilidad de los materiales Presentar información de los materiales e insumos recibidos en el periodo que inciden en la calidad de la obra con los certificados de calidad o ensayos de laboratorio correspondientes, y registros de liberación por parte de interventoría.				X	cumple lo mínimo requerido
Control y seguimiento de las actividades *Presentar evidencia del control y seguimiento realizado a las actividades de obra ejecutadas en el periodo. Todos los registros deben ser coherentes con el cumplimiento al Plan de inspección de las actividades ejecutadas.				X	cumple lo mínimo requerido
CONTROL DE LA GESTIÓN					
Control de cambios Se debe documentar la identificación, análisis y control de todos los cambios generados durante el desarrollo del objeto contractual, describiendo claramente la justificación y los impactos derivados de dicho cambio, incluyendo los registros que lo soporten y relacionando los documentos que cambian de versión.	X				No aplica
Salidas no conformes Presentar un cuadro resumen de las salidas no conformes del proyecto por parte de interventoría (informes, productos, planes, evidencias de inspecciones en campo, materiales que no cumplan con especificaciones de calidad, etc.) donde se especifique fecha, componente, tratamiento y cierre. Reportar en el informe, las salidas no conformes por parte del contratista (indicar fecha, componente, tratamiento y cierre).				X	***SNC. PROYECTO*** Cumple lo mínimo requerido
Auditorías internas Seguimiento a la planificación (Programa y plan de auditoría) y el informe de auditoría interna de acuerdo a la programación establecida en los requisitos contractuales de cada contrato asociado.				X	***Auditoría interna OBRA*** Cumple lo mínimo requerido

LISTA DE CHEQUEO INFORME
COMPONENTE DE CALIDAD - CONTRATISTA
INFORME MENSUAL - ETAPA DE OBRA

Contrato N.	4041-2024	Parque:	CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS
Objeto contractual:	"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 - "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS"		
Revisa:	ING VIANNEY LEAÑO	N° Informe: 3	Versión: 2,0 Revisión: 2
Periodo del Informe:	Entre: 1-ene.-25 al 31-ene.-25	Fecha Revisión:	lunes, 24 de febrero de 2025

Concepto de revisión:	PRE APROBADO		APROBADO	X	NO APROBADO	

DOCUMENTO	%Cumplimiento N/A	0%	50%	100%	OBSERVACIONES
ANEXOS (Copias y Originales)					
Documentos incluidos en documento objeto de la presente revisión:					
AA Actividades Periodo					
AB Control actividades					
AC Actas de Comite					
AD Bitacora					
AE Control de Documentos					
AF Compras					
AG Certificados de Calidad					
AH Inspeccion y Ensayos					
AI Medicion					
AJ Salidas no Conformes					
AK Auditoria					

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestion de la Seguridad Y Salud en el Trabajo
	FORMATO: FT-SST-014

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: ENERO 18 DE 2024
	Versión: 001
	Pagina 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
BOGOTA	PARQUES BOGOTA	11	3	2025

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		Importancia y Uso de los Preperacionales
Charla de seguridad	X	
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	AVELLANEDA BOCANEGRA LUIS MIGUEL	1016593870	OPERARIO	Miguel A
2	ARIAS PERALTA ANDERSON MAURICIO	1005726820	OPERARIO	Anderson
3	CAMPOS MARIN DAVID CAMILO	10006159388	OPERARIO	David Campos
4	LASSO CORTES DAWSON	80763102	CONDUCTOR	Dawson L.
5	MERCADO BASILIO LUIS GUILLERMO	1007195407	CONDUCTOR	Luis M
6	MUÑOZ MACETO JESUS	1007289162	OPERARIO	Jesus M
7	CARDENAS CARDENAS HILARIO	3028150	CONDUCTOR	H. Cardenas
8	OVALLE BOLIVAR YEFERSON IVAN	1074414778	OPERARIO	Yeferson
9	CERQUERA VALDERRAMA JOSELITO	12209313	OPERARIO	Joselito
10	SABOGAL CUERVO DANIEL STEBAN	1031803879	INSPECTOR	Daniel S.
11	RONDON FABERSON RONDON	1005848699	OPERARIO	Faberson
12	GARZON PINEDA JOSE ALEJADRO	1033692776	OPERARIO	Alejandro
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre: ANDREA LOPEZ	Firma

CONSORCIO INNOVAPARQUES	ACTA DE REUNION	CODIGO:GG-F-03
		VERSIÓN:01
		FECHA: 15/01/2010

NOMBRE EMPRESA / CONSORCIO:	INNOVAPARQUES

Fecha	Hora Inicio	Hora Finalizacion	Lugar
11/3/2025	9:00 a. m.	10:30 a. m.	Oficna Consorcio

Participantes	Empresa	Cargos	Firma
Andrea Lopez	C. Innovaparques	Profesional SST	
Yuranny Sabogal	CMC	Aux. Administrativa	

Objetivo de la reunion:	Cierre Plan de Accion Salida No conforme pre operacional vehiculo

Temas a tratar

Socializar y formalizar la obligatoriedad del diligenciamiento de los pre-operacionales de equipos, vehículos y maquinaria como parte fundamental del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y su implementación continua durante la ejecución del contrato.

Desarrollo

En el marco de la auditoría realizada recientemente, se identificó una no conformidad relacionada con la operación de un vehículo sin el diligenciamiento del formato pre-operacional correspondiente. Este hallazgo evidencia la necesidad de reforzar el cumplimiento de este procedimiento dentro del SG-SST.

Por lo anterior, INOVAPARQUES S.A.S. ha reiterado a CMC (Subcontratista) que el diligenciamiento de los pre-operacionales de todos los equipos, vehículos y maquinaria es un requisito obligatorio dentro del sistema de gestión, y su cumplimiento debe ser continuo durante toda la ejecución del contrato.

En consecuencia, las partes acuerdan lo siguiente:

Obligatoriedad: CMC se compromete a diligenciar los formatos pre-operacionales de todos los equipos y vehículos antes de su uso diario, como parte de los procedimientos de seguridad establecidos en el SG-SST.

Supervisión y control: INOVAPARQUES S.A.S. implementará controles periódicos para verificar el cumplimiento de esta actividad y reportar cualquier incumplimiento.

Capacitación: Se realizará una sensibilización dirigida a los operarios y responsables de los equipos para reforzar la importancia y el impacto del diligenciamiento de los formatos pre-operacionales.

PLAN DE ACCION

Actividad a desarrollar	Responsable	Fecha propuesta
Diligenciamiento inmediato del pre-operacional del vehículo en el momento de la auditoría.	Conductor del vehiculo DAWSON LASSO	26/02/2025
Socialización de la importancia de realizar pre-operacionales previo al inicio de la jornada laboral con el personal operativo.	Profesional SST Andrea Lopez	11/03/2025
Reunión con el subcontratista CMC para formalizar el compromiso de cumplimiento del procedimiento de pre-operacionales.	Profesional SST andrea lopez (Innovaparques)- Yuranny Sabogal Aux. Admiistrativa (CMC)	11/03/2025

Compromisos

Los establecidos en el acta

CONSORCIO INNOVAPARQUES

Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo

FORMATO N°: FT-SST-055

FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES

Fecha: Septiembre 05 de 2019

Página 1 de 1

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: DAWSON LASSO — HRS Inicial: 94547 — HRS Final: 94687

PLACA VEHICULO: EKE 717 — Marca: FOTON — Serie No: BJ1539VJJD3-1 — Funcion: MOVIL 2

Ubicación: CAMPOS NATURALES — Sección: MTO — Semana de: 24 Al: 28 — Mes de: Febrero 2025.

INSPECCIÓN

Item	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Jue		Vie		Sab		Dom	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
DOCUMENTOS																	
Licencia de tránsito	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Revision tecnico mecanica	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Seguro obligatorio	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Seguro contractual	Vigente	X		X		X		X		X		X					
Seguro extracontractual	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Licencia de conducción	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Planos, mapas ruteo, cpis	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Contactos de Emergencia	En Regla	X		X		X		X		X		X					
EQUIPO EMERGENCIAS																	
Linterna con pilas	En buen estado	X		X		X		X		X		X					
Botiquin	Completo	X		X		X		X		X		X					
Extintor	Pin de seguridad. Cargado, vigente	X		X		X		X		X		X					
PARTE EXTERNA																	
Espejos laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado	X		X		X		X		X		X					
Luces traseras	De freno, minimo dos / de color rojo / Direccionales	X		X		X		X		X		X					
Llantas	Libres de rasaduras y sin desgaste excesivo	X		X		X		X		X		X					
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente	X		X		X		X		X		X					
Indicadores luces direccionales	Minimo dos funcionando correctamente.	X		X		X		X		X		X					
Lamparas Luces delanteras	Lentes sin roturas/ funcionando / de color blanco / amarillo	X		X		X		X		X		X					
Indicador luces de parqueo	Minimo dos / funcionando correctamente	X		X		X		X		X		X					
Tanque de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y asegurada	X		X		X		X		X		X					
COMPARTIMENTO DEL MOTOR																	
Fuente de energia (BATERIA)	Sin rajaduras/ Anclado adecuadamente	X		X		X		X		X		X					
Conexiones electricas	Fijas y en buen estado	X		X		X		X		X		X					
Nivel agua refrigeracion / transuerga	Nivel correcto / mangueras sin fugas	X		X		X		X		X		X					
Estado de las lineas hidraulicas	Lineas sin fugas y en buen estado	X		X		X		X		X		X					
Niveles de aceite motor / hidraulico	Niveles de acuerdo al fabricante	X		X		X		X		X		X					
Cableado electrico	Anclado / sin roturas / ajustados	X		X		X		X		X		X					
Bomba de direccion / nivel aceite	Sin fugas/ bien asegurada / nivel de acuerdo a fabricante	X		X		X		X		X		X					
INTERIOR DE LA CABINA																	
Espejos retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado	X		X		X		X		X		X					
Vidrio panoramico/ vidrios ventanas	Sin roturas / manchas / distorsiones	X		X		X		X		X		X					
Plumillas limpiaventos/ motor limpiaparabrisas	Minimo dos / enfocadas sin desgastes / funcionando / minimo dos revoluciones	X		X		X		X		X		X					
Asiento de la cabina	Protegido y en buen estado en general	X		X		X		X		X		X					
Indicador de combustible	La aguja o indicador debe mostrar el nivel de combustible	X		X		X		X		X		X					
Indicador presion de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor	X		X		X		X		X		X					
Sitio/ Apoyo para la cabeza	Adecuadas al proporcionar apoyo para la cabeza asegurado	X		X		X		X		X		X					
Pedales freno / clutch / acelerador	Con tapa antideslizante / sin juego excesivo	X		X		X		X		X		X					
Alarma de reversa	Funcionando correctamente	X		X		X		X		X		X					
Equipo de carretera	Gato con capacidad para elevar el vehiculo, una rueda, dos señales de carretera en forma de triangulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocados en forma vertical o lamparas de color de luz amarilla intermitentes o de destello, dos tacos para bloquear el vehiculo, caja de herramientas basica que como minimo debera contener alicate, destornilladores, llave de expansion y llaves fijas, llanta de repuesto, inconia, (Art 30 del codigo nacional de transito ley 769 de 2002)	X		X		X		X		X		X					
Cinturones de seguridad	De 3 puntos de apoyo	X		X		X		X		X		X					
Pito	Funcionando / que se oiga minimo a 50 m	X		X		X		X		X		X					
Timon o volante	Funcionando en perfectas condiciones	X		X		X		X		X		X					
Frenos	Pedales con antideslizante/ nivel de liquido de acuerdo al fabricante	X		X		X		X		X		X					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Nombre y Firma del Técnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES	Fecha:	Septiembre 08 de 2019
	Versión:	001
	Pagina 1 de 1	

DATOS DE LA INSPECCIÓN																			
Inspeccionado por: Dawsen Lasso.			HRS Inicial	3355,8				HRS Final	3355,8.										
Maquina-Equipo: GIRO ZERO Z560X			Marca: HUSQVARNA					Serie No: 96766970301						Función: PODADORA					
Ubicación: Campos	Sección:	Semana de:	24	Al:	28			Mes de:	Febrero del 2025.										
INSPECCIÓN																			
GIRO ZERO Z560X	Estándar		Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom		
			Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
	ACEITE MOTOR		X		X		X		X		X		X						
	FILTRO ACEITE		X		X		X		X		X		X						
	FILTRO COMBUSTIBLE		X		X		X		X		X		X						
	ACEITE HIDRAULICO		X		X		X		X		X		X						
	FILTRO DE AIRE		X		X		X		X		X		X						
	CABLES Y POLEAS		X		X		X		X		X		X						
	ENGRASE		X		X		X		X		X		X						
	CUCHILLAS		X		X		X		X		X		X						
	CORREA DECK		X		X		X		X		X		X						
	CORREA TENSORA		X		X		X		X		X		X						
	CINTURON DE SEGURIDAD		X		X		X		X		-		X						
	MANDOS DE OPERACIÓN		X		X		X		X		X		X						
	FRENOS		X		X		X		X		X		X						
	LLANTAS		X		X		X		X		X		X						
	BATERIA		X		X		X		X		X		X						
	ENCENDIDO		X		X		X		X		X		X						
	SISTEMA DE ATRACCION		X		X		X		X		X		X						
	HOROMETRO		X		X		X		X		X		X						

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Nombre y Firma del Tecnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES	Fecha:	Septiembre 08 de 2019
	Versión:	002
		Pagina 1 de 2

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: Yeferson Ovalle.

Marca: Husqvarna **Serie No:** 2022220924 2.

Ubicación: Canchas deportivas. **Semana de:** 24 al 28 de febrero

INSPECCIÓN

Marque con un X según corresponda C: CUMPLE - NC: NO CUMPLE

GUADAÑADORA	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	ACEITE MOTOR	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO ACEITE	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO COMBUSTIBLE	X		X		X		X		X		X					
	ACEITE HIDRAULICO	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO DE AIRE	X		X		X		X		X		X					
	VALVULINA	X		X		X		X		X		X					
	ENGRASE	X		X		X		X		X		X					
	CUCHILLAS	X		X		X		X		X		X					
	CORREA DECK	X		X		X		X		X		X					
	CORREA TENSORA	X		X		X		X		X		X					

Recomendaciones / Observaciones

Ruiz.

Visto Bueno Supervisor

Yefferson O.

Nombre y Firma del Tecnico Operador

115

ANEXO 6 AUDITORIA INTERVENTORIA

	PLAN DE AUDITORIA	CÓDIGO:	SGC-FR-05
		VERSIÓN:	1
		FECHA DE ELABORACIÓN	01/04/2023

Objetivos de la Auditoria	Conocer el grado de conformidad y cumplimiento de obligaciones contractuales de acuerdo al desarrollo del contrato de interventoria 4080 de 2024, el cual supervisa la ejecución de actividades de los contratos de obra IDRD 4041 de 2024 y IDRD 4060 de 2024
Alcance de la Auditoria	Contrato de interventoria No. IDRD-SG-4080-2024, cuyo objeto es "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD."
Criterios de Auditoria	Los criterios para la realización de estas auditorias incluyen: Documentos como registros, informes, listas de verificacion, requisitos legales y en general requisitos contractuales propios del contrato en ejecución.
Riesgos de Auditoria	Riesgos documentales y de informacion, uso de version obsoletas, errores en control de cambios.

CRONORAMA DE EJECUCIÓN

REUNIÓN DE APERTURA	9:00 a. m.	**REUNION DE CIERRE**	**4:00 p. m.**

PROCESO A AUDITAR	AUDITADO(S)	AUDITOR(ES) DESIGNADO(S)	LUGAR	FECHA	HORA
Componente tecnico	Ronald Lozano	Sofia Fernández	Oficina principal Consorcio Santa Teresa 28	24/06/2025	9:30 a. m.
Componente calidad	Vianney Leaño	Sofia Fernández	Oficina principal Consorcio Santa Teresa 28	24/06/2025	11:00 a. m.
Componente ambiental	Natali Espinosa	Sofia Fernández	Oficina principal Consorcio Santa Teresa 28	24/06/2025	3:00 p. m.
RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN	Recursos humanos, recursos tecnologicos.				

	INFORME DE AUDITORÍA	CÓDIGO:	SGC-FR-04
		VERSIÓN:	1
		FECHA DE ELABORACIÓN	01/04/2023

CONTRATO: IDRD 4080 DE 2024

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: Conocer el grado de conformidad y cumplimiento de obligaciones contractuales de acuerdo al desarrollo del contrato de interventoria 4080 de 2024, el cual supervisa la ejecución de actividades de los contratos de obra IDRD 4041 de 2024 y IDRD 4060 de 2024

1. *Cronograma de ejecución de auditoria*

PROCESO A AUDITAR	AUDITADO(S)	AUDITOR(ES) DESIGNADO(S)	LUGAR	FECHA	HORA
Componente Técnico	Ronald Lozano	Sofia Fernández	Oficina principal Consorcio Santa Teresa 28	24-06-2025	**9:30 am**
Componente calidad	Vianney Leaño	Sofia Fernández	Oficina principal Consorcio Santa Teresa 28	24-06-2025	**11:00 am**
Componente ambiental	Natali Espinosa	Sofia Fernández	Oficina principal Consorcio Santa Teresa 28	24-06-2025	**3:00 pm**

2. *Fortalezas:*
   - Se evidenció un alto nivel de compromiso y conocimiento del personal sobre los procesos y sus responsabilidades.
   - Gestión documental eficaz, se evidenció un adecuado control de versiones de documentos y registros.
   - La documentación del sistema de gestión de calidad se encuentra organizada, actualizada y disponible para los usuarios.
   - La organización realiza un seguimiento constante y estructurado a los indicadores de calidad, lo que permite una adecuada toma de decisiones.
   - La organización realiza controles de calidad eficaces durante las etapas del proceso, las cuales están alineadas al plan de calidad.

3. *Observaciones*

   - Aunque los registros están disponibles, algunos formatos presentados por el contratista tienen enmendaduras sin justificación.

- Se recomienda tener actualizados los certificados de calidad de los materiales y juegos suministrados en el contrato.

4. *No Conformidades*:
   - No *se evidenciaron no conformidades por parte del auditoria.*

5. *Equipo auditor*

NOMBRE	***FIRMA***
Laura Sofia Fernández Flechas	

IDRD

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4080 DE 2024
CONSORCIO SANTA TERESA 28
DIRECCIÓN: CARRERA 70C No. 48 -55
TELÉFONO: 76530168 – 3013942384

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 - CAMPOS DEPORTIVOS"

INFORME MENSUAL No 8 – COMPONENTE AMBIENTAL
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE JUNIO Y EL 30 DE JUNIO DE 2025

TOMO __1___ DE _____

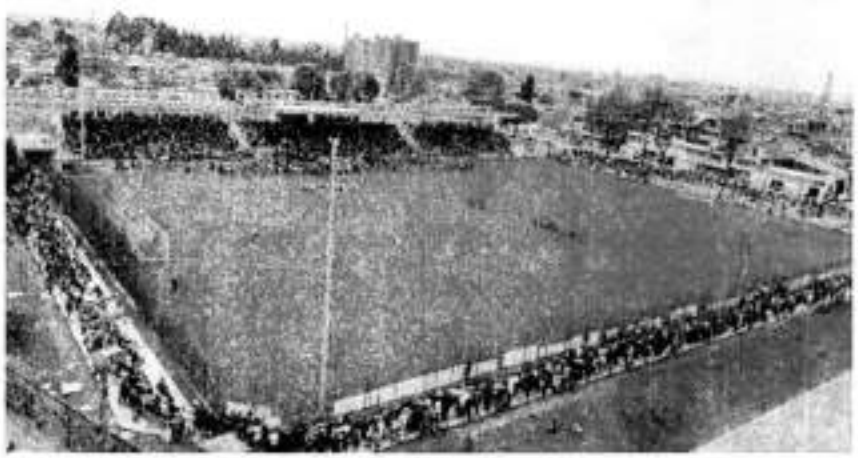


TABLA DE CONTROL

COPIA CONTROLADA	X	COPIA CONTROLADA NO	
	Nombre	**Cargo**	**Firma**
ELABORÓ	Natali Espinosa Sierra	Especialista Ambiental	
APROBÓ	Carlos Andres Figueroa	Director de Interventoría	

JUNIO DE 2025 / BOGOTÁ D.C.

CONTENIDO

1. CONDICIONES CONTRACTUALES 4
2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS 12
3. INFORME GENERAL DE GESTIÓN AMBIENTAL 13
3.1. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PLANES DE GESTIÓN 13
3.2. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE INFORMES MENSUALES 14
3.3. TRÁMITES Y PERMISOS AMBIENTALES 14
3.4. MANEJO DE CAMPAMENTO Y MATERIALES 14
3.5. MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS 16
3.6. MANEJO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS 18
3.7. MANEJO EFICIENTE DEL AGUA 18
3.8. MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS 18
3.9. MANEJO DE FLORA Y FAUNA 19
3.10. CAPACITACIÓN 19

TABLA DE ANEXOS

Anexo 1 Correo aprobación informe 7
Anexo 2 Risiones materiales
Anexo 3 Hojas de seguridad
Anexo 4 Mantenimiento equipos
Anexo 5 Asistencia capacitaciones

INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde al seguimiento, verificación y control realizado por esta Interventoria en cumplimiento del contrato No. 4080 de 2024 suscrito entre CONSORCIO SANTA TERESA 28 y el INSTITUTO DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD, a las actividades ejecutadas por el Contratista de Obra: CONSORCIO INNOVAPARQUES de acuerdo con el contrato No. 4041 de 2024.

La revisión se efectuó para el periodo de ejecución del contrato de obra definido desde **el 01 de junio de 2025 al 30 de junio de 2025**, donde se tuvieron en cuentas los aspectos técnicos, administrativos, financieros, ambientales, SST y legales, según las condiciones contractuales establecidas; cabe resaltar que el seguimiento se realiza acorde con los lineamientos establecidos en el Anexo Técnico del contrato respectivo, así como lo indicado en la cartilla de lineamientos para el diseño de parques IDRD y el Manual de Interventoría del IDRD, entre otros aspectos.

De acuerdo con lo antes mencionado, dentro del presente informe se describen las labores realizadas por el Contratista en el periodo de tiempo enunciado anteriormente; así mismo, se presentan las observaciones, comentarios y recomendaciones a las actividades ejecutadas en el periodo reportado.

Finalmente, se resumen los estados de los Contratos de obra e interventoría, exponiendo al final del documento las respectivas conclusiones del estado del contrato de obra a la fecha de entrega de este reporte.

1. CONDICIONES CONTRACTUALES

1.1. OBJETO DEL CONTRATO

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

1.2. ALCANCE DEL CONTRATO

Los contratos objeto de interventoría son dos, considerando que la licitación pública para la adjudicación de las obras fue diseñada para la adjudicación en dos grupos, como se describe a continuación:

GRUPO 01: ***"MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS".***

1.3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se desarrolla en varios campos deportivos, ubicados en la ciudad de Bogotá D.C., los cuales se enuncian a continuación:

CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA SINTÉTICA:

ITEM	TIPO DE CANCHA	PARQUE	CÓDIGO IDRD	LOCALIDAD	DIRECCIÓN
1	SINTETICA	Servitá	01-023	Usaquén	Carrera 7H Calle 165
2	SINTETICA	Servitá	01-023	Usaquén	Carrera 7H Calle 165
3	SINTETICA	Cedritos	01-031	Usaquén	Carrera 9 Calle 145
4	SINTETICA	Toberín	01-079	Usaquén	Calle 164 Carrera 16 C
5	SINTETICA	Estrella norte	01-189	Usaquén	Calle 160 Carrera 19 B
6	SINTETICA	Verbenal	01-313	Usaquén	Calle 187 Transversal 18 B
7	SINTETICA	Urb. Calle 170 / Alameda	01-540	Usaquén	Carrera 17 Calle 175
8	SINTETICA	La Cabrera (Japón)	02-007	Chapinero	Av Carrera 11 Calle 87
9	SINTETICA	Tercer milenio	03-085	Santafé	Carrera 14 Calle 7
10	SINTETICA	Tercer milenio	03-085	Santafé	Carrera 14 Calle 7
11	SINTETICA	Tercer milenio	03-085	Santafé	Carrera 14 Calle 7
12	SINTETICA	Desarrollo Lourdes	03-122	Santafé	Carrera 1A Este Calle 3
13	SINTETICA	Laches la mina	03-148	Santafé	Diagonal 4B Cra 8 E
14	SINTETICA	Urb. Antioquia	04-038	San Cristóbal	Transversal 8a este Calle 50 b sur
15	SINTETICA	Gaitán cortes	04-103	San Cristóbal	Carrera 5 a este Diagonal 31 C sur
16	SINTETICA	La Victoria	04-122	San Cristóbal	Diagonal 38 Sur No. 1F - 05

ITEM	TIPO DE CANCHA	PARQUE	CÓDIGO IDRD	LOCALIDAD	DIRECCIÓN
17	SINTETICA	La Victoria	04-122	San Cristóbal	Diagonal 38 Sur No. 1F - 05
18	SINTETICA	San Cristóbal 2	04-127	San Cristóbal	Calle 13 sur N.º 2- 50 este
19	SINTETICA	San Cristobal1	04-127	San Cristóbal	Calle 13 sur N.º 2- 50 este
20	SINTETICA	Miravalle	05-042	Usme	Carrera 14 H Bis Calle 74 D sur
21	SINTETICA	Miravalle	05-042	Usme	Carrera 14 H Bis Calle 74 D sur
22	SINTETICA	Miravalle	05-042	Usme	Carrera 14 H Bis Calle 74 D sur
23	SINTETICA	Alfonso López	05-141	Usme	Carrera 5 G Calle 93 sur
24	SINTETICA	Nuevo Usme	05-459	Usme	Carrera 14 A Calle 137 B sur
25	SINTETICA	Nuevo milenio	05-476	Usme	Carrera 11 Calle 67 A Bis sur
26	SINTETICA	Nuevo milenio	05-476	Usme	Carrera 11 Calle 67 A Bis sur
27	SINTETICA	Laguneta	06-005	Tunjuelito	Cra 55 Diagonal 49 sur
28	SINTETICA	Urb. Tunjuelito	06-012	Tunjuelito	Cra 12 Calle 59 sur
29	SINTETICA	Nuevo Muzu	06-017	Tunjuelito	Diagonal 52 B sur Cra 618
30	SINTETICA	El Tunal	06-063	Tunjuelito	Cra 24 A Cll 4B Sur Av Boyacá
31	SINTETICA	El Tunal	06-063	Tunjuelito	Cra 24 A Cll 4B Sur Av Boyacá
32	SINTETICA	El Tunal	06-063	Tunjuelito	Cra 24 A Cll 4B Sur Av Boyacá
33	SINTETICA	Tunal Alterna	06-063	Tunjuelito	Cra 24 A Cll 4B Sur Av Boyacá
34	SINTETICA	Naranjos	07-035	Bosa	Carrera 80 J Calle 70 A sur
35	SINTETICA	Timiza Villa del rio	07-036	Bosa	Carrera 65 Calle 55 A sur
36	SINTETICA	Autopista Sur (Pavco)	07-152	Bosa	Av. Calle 57 R sur (Aut. Sur) Carrera 72
37	SINTETICA	Clarelandia	07-163	Bosa	Calle 58 J sur Cra 80 G
38	SINTETICA	Clarelandia mini	07-163	Bosa	Calle 58 J sur Cra 80 G
39	SINTETICA	El Recreo	07-260	Bosa	Calle 69 A Sur 93D - 45
40	SINTETICA	La Esperanza	07-273	Bosa	Calle 75 BIS Sur (Av. C de Cali) Cra 80J
41	SINTETICA	La Tingua Tibanica	07-274	Bosa	Calle 73 D Sur Carrera 78 A hasta la 82 A Bis
42	SINTETICA	Urb. Chicala	07-292	Bosa	Av Carrera 86 Calle 55 sur
43	SINTETICA	Santiago de Atalaya	07-321	Bosa	Carrera 98 B Calle 61 A sur
44	SINTETICA	El Porvenir	07-391	Bosa	Av 1° de Mayo con Av Long de Occ

ITEM	TIPO DE CANCHA	PARQUE	CÓDIGO IDRD	LOCALIDAD	DIRECCIÓN
45	SINTETICA	El Porvenir	07-391	Bosa	Av 1° de Mayo con Av Long de Occ
46	SINTETICA	El Porvenir	07-391	Bosa	Av 1° de Mayo con Av Long de Occ
47	SINTETICA	El Porvenir	07-391	Bosa	Av 1° de Mayo con Av Long de Occ
48	SINTETICA	El Porvenir	07-391	Bosa	Av 1° de Mayo con Av Long de Occ
49	SINTETICA	Portal del Sol	07-403	Bosa	Carrera 95 A Calle 73 sur
50	SINTETICA	Ciudadela Campo Verde	07-436	Bosa	Carrera 95 A Calle 75 sur
51	SINTETICA	Ciudadela Campo Verde	07-436	Bosa	Carrera 95 A Calle 75 sur
52	SINTETICA	Ciudadela Campo Verde	07-436	Bosa	Carrera 95 A Calle 75 sur
53	SINTETICA	Carvajal	08-040	Kennedy	Cra 70 B Calle 24 A sur
54	SINTETICA	Villa Alsacia	08-065	Kennedy	Carrera 72 B Calle 11 A BIS
55	SINTETICA	Marsella Sector Norte I Etapa	08-066	Kennedy	Carrera 69 Calle 8
56	SINTETICA	Marsella Sector Norte I Etapa	08-066	Kennedy	Carrera 69 Calle 8
57	SINTETICA	Américas Occidental	08-127	Kennedy	Av. Boyacá Calle 2 sur
58	SINTETICA	Villa de los Sauces	08-180	Kennedy	Carrera 77 Bis Calle 58 C sur
59	SINTETICA	La Igualdad	08-212	Kennedy	Carrera 68A entre Calle 2
60	SINTETICA	Timiza	08-219	Kennedy	Carrera 72 P Calle 40 H sur
61	SINTETICA	Timiza	08-219	KENNEDY	Carrera 72 P Calle 40 H sur
62	SINTETICA	Las Luces y Villa Rica	08-533	Kennedy	Carrera 77 H Calle 52 A sur
63	SINTETICA	Gilma f11	08-552	Kennedy	Transversal 85 A Calle 49 sur
64	SINTETICA	Gilma f8	08-552	Kennedy	Transversal 85 A Calle 49 sur
65	SINTETICA	Gilma f5	08-552	Kennedy	Transversal 85 A Calle 49 sur
66	SINTETICA	Gilma f5	08-552	Kennedy	Transversal 85 A Calle 49 sur
67	SINTETICA	La Alejandra	08-568	Kennedy	Carrera 72 I Diagonal 40 a sur
68	SINTETICA	Lago Timiza I Etapa	08-626	Kennedy	Carrera 73 Calle 43 sur
69	SINTETICA	Primavera	08-770	Kennedy	Calle 2 Carrera 91 C
70	SINTETICA	Modelia	09-016	Fontibon	Carrera 81 C N°24 c 50
71	SINTETICA	Villa Helena Villemar	09-026	Fontibón	Carrera 96 G N°20 A 35
72	SINTETICA	Carlos Lleras (El Fuego)	09-048	Fontibón	Carrera 70 Calle 23 C
73	SINTETICA	Urb. Ciudad Hayuelos	09-200	Fontibón	Calle 19 A Carrera 80 A
74	SINTETICA	Urb. Ciudad Hayuelos	09-200	Fontibón	Calle 19 A Carrera 80 A
75	SINTETICA	Villas del Madrigal	10-002	Engativá	Calle 75 C Carrera 99 B
76	SINTETICA	Villa Luz	10-018	Engativá	Carrera 77A 64B - 03

ITEM	TIPO DE CANCHA	PARQUE	CÓDIGO IDRD	LOCALIDAD	DIRECCIÓN
77	SINTETICA	Villa Luz	10-018	Engativá	Carrera 77A 64B - 03
78	SINTETICA	Florencia Los Tronquitos	10-028	Engativá	Carrera 91 A Calle 75 C
79	SINTETICA	La Europa	10-045	Engativá	Carrera 71 D Calle 67
80	SINTETICA	Villa de Granada	10-102	Engativá	Cra 111A Calle 75D
81	SINTETICA	Bachué	10-117	Engativá	Carrera 95 Calle 90 A
82	SINTETICA	Ciudad Honda	10-153	Engativá	Carrera 68 G Calle 64 H
83	SINTETICA	El Carmelo	10-169	Engativá	Carrera 101 A Calle 71B
84	SINTETICA	El Carmelo	10-169	Engativá	Carrera 101 A Calle 71B
85	SINTETICA	Juan Amarillo	10-171	Engativá	Carrera 111A Av Calle 90
86	SINTETICA	Juan Amarillo	10-171	Engativá	Carrera 111A Av Calle 90
87	SINTETICA	Juan Amarillo	10-171	Engativá	Carrera 111A Av Calle 90
88	SINTETICA	Juan Amarillo	10-171	Engativá	Carrera 111A Av Calle 90
89	SINTETICA	Juan Amarillo	10-171	Engativá	Carrera 111A Av Calle 90
90	SINTETICA	Juan Amarillo	10-171	Engativá	Carrera 111A Av Calle 90
91	SINTETICA	Normandía	10-190	Engativá	Carrera 73 Calle 51
92	SINTETICA	Bonanza	10-215	Engativá	Carrera 70 F Calle 75
93	SINTETICA	San Andrés	10-234	Engativá	Carrera 102 con Calle 79
94	SINTETICA	San Andrés	10-234	Engativá	CALLE 82 CARRARA 102
95	SINTETICA	Florencia	10-249	Engativá	Carrera 88 Calle 75
96	SINTETICA	UDS Unidad Deportiva El Salitre	10-290	Engativá	CALLE63 CARERA AV 68
97	SINTETICA	Petar Salitre	10-531	Engativá	Carrera 120 Calle 80 A Bis
98	SINTETICA	Ciudadela Cafam	11-008	Suba	Cra 113 C Calle 142 A
99	SINTETICA	Berlín	11-015	Suba	Calle 142 Carrera 145 B
100	SINTETICA	Cantalejo	11-036	Suba	Carrera 55 Calle 160
101	SINTETICA	Urb Lombardía (1 Etapa)	11-052	Suba	Calle 143 Carrera 107B
102	SINTETICA	Burgos britalia1	11-058	Suba	Carrera 73 Calle 160
103	SINTETICA	Burgos britalia2	11-058	Suba	Carrera 73 Calle 160
104	SINTETICA	Casa Blanca	11-069	Suba	Carrera 68 entre Calles 140 Y 141
105	SINTETICA	Bilbao	11-074	Suba	Calle 142 C Carrera 151 A
106	SINTETICA	Tibabuyes1	11-084	Suba	Carrera 121 C Calle 130 C
107	SINTETICA	Tibabuyes2	11-084	Suba	Carrera 121 C Calle 130 C
108	SINTETICA	Prado Pinzón	11-109	Suba	Calle 143 Carrera 49
109	SINTETICA	Cafam Suba II (Los Gavilanes)	11-1101	Suba	Carrera 143 Calle 142 A
110	SINTETICA	Urb. Mazurén I Sector	11-161	Suba	Calle 152 Carrera 50
111	SINTETICA	Victoria norte	11-162	Suba	Calle 150 Carrera 54
112	SINTETICA	Cometas	11-204	suba	Av Calle 127 Carrera 87 A
113	SINTETICA	Lindaraja	11-309	suba	Carrera 78 Calle 127 D
114	SINTETICA	Fontanar del Rio	11-368	Suba	Diagonal 145 Carrera 122
115	SINTETICA	Fontanar del Rio	11-368	Suba	Diagonal 145 Carrera 122
116	SINTETICA	Fontanar del Rio	11-368	Suba	Diagonal 145 Carrera 122

ITEM	TIPO DE CANCHA	PARQUE	CÓDIGO IDRD	LOCALIDAD	DIRECCIÓN
117	SINTETICA	Vilanova	11-668	suba	Carrera 54 D Calle 186
118	SINTETICA	Valle de Refous	11-686	Suba	Cra 101 calle 150a
119	SINTETICA	PRD 1	12-091	Barrios Unidos	Transversal 48 N°63-65
120	SINTETICA	PRD 2	12-091	Barrios Unidos	Transversal 48 N°63-65
121	SINTETICA	Santa Clara	13-015	Teusaquillo	Carrera 46 Calle 22 A
122	SINTETICA	Urb Salitre (Greco)	13-016	Teusaquillo	Carrera 66 B Calle 43
123	SINTETICA	Arena Movistar	13-128	Teusaquillo	Av Carrera 30 Diagonal 61 C
124	SINTETICA	Arena Movistar	13-128	Teusaquillo	Av Carrera 30 Diagonal 61 C
125	SINTETICA	La pepita	14-008	Mártires	Calle 10 Carrera 26
126	SINTETICA	Santa Isabel La Fragua	15-021	Antonio Nariño	Calle 8 Sur con Carrera 27
127	SINTETICA	Santa Isabel La Fragua	15-021	Antonio Nariño	Calle 8 Sur con Carrera 27
128	SINTETICA	Luna Park	15-029	Antonio Nariño	Carrera 14 Calle 13 sur
129	SINTETICA	Villa Mayor	15-036	Antonio Nariño	Calle 32 A sur Carrera 34 C
130	SINTETICA	Fragua	15-040	Antonio Nariño	Carrera 31 N.º 14 B 57 sur
131	SINTETICA	Champion Primavera	16-012	Pte Aranda	Transv 42 A Calle 5A
132	SINTETICA	Milenta tejar san eusebio	16-099	Pte Aranda	Carrera 52 B Calle 20 sur
133	SINTETICA	Montes 1	16-112	Pte Aranda	Calle 10 sur N°39 - 29
134	SINTETICA	Montes2	16-112	Pte Aranda	Calle 10 sur N°39 - 29
135	SINTETICA	Gorgonzola	16-126	Pte Aranda	Carrera 41 A Calle 5
136	SINTETICA	Pradera sur	16-153	Pte Aranda	Av calle 3 Carrera 66
137	SINTETICA	Jazmín	16-204	Pte Aranda	Av. Carrera 50 Calle 1 D
138	SINTETICA	Parque Industrial (El Nectar)	16-415	Pte Aranda	Cll 10 AV Cra 36
139	SINTETICA	Parque Industrial (El Nectar Polideportivo)	16-416	Pte Aranda	Cll 11 A AV Cra 36
140	SINTETICA	La Catedral - Candelaria	17-028	La Candelaria	Calle 12f No 3-27
141	SINTETICA	Urb. Gustavo Restrepo	18-009	Rafael Uribe	Calle 28 Sur Carrera 15A
142	SINTETICA	Bosque San Carlos	18-028	Rafael Uribe	Carrera 12 Bis
143	SINTETICA	Palermo Sur	18-035	Rafael Uribe	Carrera 1 Este Calle 49 C sur
144	SINTETICA	Marruecos	18-041	Rafael Uribe	Calle 48 P sur Carrera 5L

ITEM	TIPO DE CANCHA	PARQUE	CÓDIGO IDRD	LOCALIDAD	DIRECCIÓN
145	SINTETICA	Molinos	18-055	Rafael Uribe	Transversal 5 Calle 48 L sur
146	SINTETICA	Santa Lucia	18-073	Rafael Uribe	Carrera 14 Calle 41 B sur
147	SINTETICA	Santa Lucia	18-073	Rafael Uribe	Carrera 14 Calle 41 B sur
148	SINTETICA	Parque Olaya Herrera	18-207	Rafael Uribe	Carrera 21 25-35 Sur
149	SINTETICA	San José	18-429	Rafael Uribe	Calle 26 Sur y Av 1 de Mayo con Cra 12 D
150	SINTETICA	Domingo Lain	19-032	Ciudad Bolívar	Calle 64 C sur Transv 17N
151	SINTETICA	Arborizadora Alta	19-058	Ciudad Bolívar	Diagonal 73 A sur Transversal 36 B
152	SINTETICA	La Coruña	19-115	Ciudad Bolívar	Calle 58 Bsur Carrera 47
153	SINTETICA	Sierra Morena	19-190	Ciudad Bolívar	Transversal 73 B Calle 75A sur
154	SINTETICA	Sierra Morena	19-190	Ciudad Bolívar	Transversal 73 B Calle 75A sur
155	SINTETICA	Illimani (Paraíso)	19-346	Ciudad Bolívar	Calles 71 P Sur Transversal 27 H
156	SINTETICA	Ilimani	19-346	Ciudad Bolívar	Calles 71 P Sur Transversal 27 H
157	SINTETICA	Buenavista- Porvenir	19-347	Ciudad Bolívar	Carrera 17 F Calle 76 A sur
158	SINTETICA	El Taller- El Ensueño	19-348	Ciudad Bolívar	Carrera 75A Diagonal 68 A
159	SINTETICA	Paraíso	19-490	Ciudad Bolívar	Cra 27 Q Calle 71 K sur
160	SINTETICA	Caracolí	19-710	Ciudad Bolívar	Carrera 74 B Calle 77 sur
161	SINTETICA	Balmoral Guadalupe	19-750	Ciudad Bolívar	Autopista sur Carrera 71
162	SINTETICA	Altos de la Estancia	19-756	Ciudad Bolívar	Carrera 76 C Diagonal 67 a sur
163	SINTETICA	Altos de la Estancia	19-756	Ciudad Bolívar	Carrera 76 C Diagonal 67 a sur
164	SINTETICA	Mirador illimani	19-788	Ciudad Bolívar	Carrera 27 C Diagonal 70 U Bis sur
165	SINTETICA	San José Maryland	07-164	Bosa	Carrera 86 Calle 73 G sur
166	SINTETICA	Aurora	05-002	USME	Calle 71 F sur Carrera 14 V (Av Boyacá)

ITEM	TIPO DE CANCHA	PARQUE	CÓDIGO IDRD	LOCALIDAD	DIRECCIÓN
167	SINTETICA	Valles de Cafam	05-003	USME	Calle 92 sur Carrera 14 I
168	SINTETICA	Villa Alemana	05-087	USME	Carrera 5 este (Aup Llano) Calle 100 sur
169	SINTETICA	Pijaos	18-090	Rafael Uribe	Av Cra 10 Calle 35 sur
170	SINTETICA	Cruces	03-036	Santafé	Carrera 5 A Calle 1 B
171	SINTETICA	La Gaitana	11-205	SUBA	Carrera 125 B Calle 131 A
172	SINTETICA	Gimnasio del Norte	12-023	Barrios Unidos	Carrera 28 Calle 63 B
173	SINTETICA	Eduardo Santos	14-030	Mártires	Carrera 18 C Calle 4 A
174	SINTETICA	Dindalito	08-144	Kennedy	Carrera 94 C Calle 42 sur
175	SINTETICA	Castilla	08-200	Kennedy	Carrera 74 Calle 8A Bis
176	SINTETICA	Cayetano Cañizares	08-241	Kennedy	Carrera 80 Calle 40 C sur
177	SINTETICA	Estancia	19-231	Ciudad Bolívar	Calle 58 C sur Carrera 74 C
178	SINTETICA	La Joya	19-349	Ciudad Bolívar	Carrera 18 I Calle 80 B sur
179	SINTETICA	Urb Metrópolis	12-035	Barrios Unidos	Carrera 66 Calle 84
180	SINTETICA	Urb La Laguna 1 (Venecia)	06-006	Tunjuelito	Carrera 53 A Diagonal 47 A sur
181	SINTETICA	Urb La Laguna 2 (Venecia)	06-006	Tunjuelito	Carrera 53 A Diagonal 47 A sur

CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL:

ITEM	TIPO DE CANCHA	PARQUE	CÓDIGO IDRD	LOCALIDAD	DIRECCIÓN
1	NATURAL	EL TUNAL (Estadio)	06-063	Tunjuelito	Carrera 7H Calle 165
2	NATURAL	EL TUNAL (Softbol)	06-063	Tunjuelito	Carrera 7H Calle 165
3	NATURAL	TIMIZA (Estadio)	08-219	Kennedy	Carrera 9 Calle 145
4	NATURAL	ATAHUALPA (Estadio)	09-104	Fontibón	Calle 164 Carrera 16 C
5	NATURAL	SIMON BOLIVAR - Sector Parque Deportivo el Salitre (Estadio)	12-091	Barrios Unidos	Calle 160 Carrera 19 B
6	NATURAL	SIMON BOLIVAR - Sector Parque Deportivo el Salitre (Alterna 3)	12-091	Barrios Unidos	Calle 187 Transversal 18 B
7	NATURAL	SIMON BOLIVAR - Sector Parque Deportivo el Salitre (Playa - 1)	12-091	Barrios Unidos	Carrera 17 Calle 175
8	NATURAL	TABORA	10-192	Engativá	Av Carrera 11 Calle 87
9	NATURAL	EL COUNTRY (Club)	01-1000	Usaquén	Carrera 14 Calle 7

ITEM	TIPO DE CANCHA	PARQUE	CÓDIGO IDRD	LOCALIDAD	DIRECCIÓN
10	NATURAL	SIMON BOLIVAR - Sector Unidad Deportivo el Salitre (UDS Beisbol)	10-290	Engativá	Carrera 14 Calle 7
11	NATURAL	SIMON BOLIVAR - Sector Unidad Deportivo el Salitre (UDS Atletismo)	10-290	Engativá	Carrera 14 Calle 7
12	NATURAL	SIMON BOLIVAR - Sector Unidad Deportivo el Salitre (UDS Atletismo) MARTE	10-290	Engativá	Carrera 1A Este Calle 3
13	NATURAL	SIMON BOLIVAR - Sector Unidad Deportivo el Salitre (UDS Sotfbol)	10-290	Engativá	Diagonal 4B Cra 8 E
14	NATURAL	SIMON BOLIVAR - Sector Unidad Deportivo el Salitre (UDS Voleibol)	10-290	Engativá	Transversal 8a este Calle 50 b sur
15	NATURAL	SAN CRISTOBAL (Estadio)	04-127	San Cristóbal	Carrera 5 a este Diagonal 31 C sur
16	NATURAL	PARQUE NACIONAL (PM-2A) ENRIQUE OLAYA HERRERA (Sector Historico)	03-035	Santa Fé	Diagonal 38 Sur No. 1F - 05
17	NATURAL	CIUDAD MONTES	16-112	Puente Aranda	Diagonal 38 Sur No. 1F - 05
18	NATURAL	CIUDAD MONTES (Softbol)	16-112	Puente Aranda	Calle 13 sur N.º 2- 50 este
19	NATURAL	CIUDAD MONTES (2 de Playa)	16-112	Puente Aranda	Calle 13 sur N.º 2- 50 este
20	NATURAL	UNIDAD DEPORTIVA LA ALQUERIA	16-024	Puente Aranda	Carrera 14 H Bis Calle 74 D sur
21	NATURAL	MILENTA TEJAR SAN EUSEBIO	16-099	Puente Aranda	Carrera 14 H Bis Calle 74 D sur
22	NATURAL	NUEVO MUZU	06-017	Tunjuelito	Carrera 14 H Bis Calle 74 D sur
23	NATURAL	LA SERENA	10-223	Engativá	Carrera 5 G Calle 93 sur
24	NATURAL	URBANIZACION BOCHICA	16-037	Puente Aranda	Carrera 14 A Calle 137 B sur
25	NATURAL	URBANIZACION LOS ANGELES PRIMER SECTOR	10-186	Engativá	Carrera 11 Calle 67 A Bis sur
26	NATURAL	PARQUE JUAN AMARILLO	10-171	Engativá	Carrera 11 Calle 67 A Bis sur
27	NATURAL	ATAHUALPA I PREDIO - El Cajon Sector I	09-024	Fontibón	Cra 55 Diagonal 49 sur

ITEM	TIPO DE CANCHA	PARQUE	CÓDIGO IDRD	LOCALIDAD	DIRECCIÓN
28	NATURAL	MARSELLA SECTOR NORTE I ETAPA - Pinos de Marsella	08-066	Kennedy	Cra 12 Calle 59 sur
29	NATURAL	SIMON BOLIVAR - Sector Complejo Acuatico (1, 2,3 Playa)	12-1000	Barrios Unidos	Diagonal 52 B sur Cra 61B
30	NATURAL	LA GAITANA	11-205	Suba	Cra 24 A Cll 4B Sur Av Boyacá
31	NATURAL	LA FLORIDA 1	10-311	Engativá	Cra 24 A Cll 4B Sur Av Boyacá
32	NATURAL	LA FLORIDA 2	10-311	Engativá	Cra 24 A Cll 4B Sur Av Boyacá
33	NATURAL	LA FLORIDA 3	10-311	Engativá	Cra 24 A Cll 4B Sur Av Boyacá
34	NATURAL	LA FLORIDA 4	10-311	Engativá	Carrera 80 J Calle 70 A sur
35	NATURAL	LA FLORIDA 5	10-311	Engativá	Carrera 65 Calle 55 A sur
36	NATURAL	LA FLORIDA 6	10-311	Engativá	Av. Calle 57 R sur (Aut. Sur) Carrera 72
37	NATURAL	LA FLORIDA 7	10-311	Engativá	Calle 58 J sur Cra 80 G
38	NATURAL	LA FLORIDA 8	10-311	Engativá	Calle 58 J sur Cra 80 G
39	NATURAL	LA FLORIDA 9	10-311	Engativá	Calle 69 A Sur 93D - 45
40	NATURAL	LA FLORIDA MARACANA 1	10-311	Engativá	Calle 75 BIS Sur (Av. C de Cali) Cra 80J
41	NATURAL	LA FLORIDA MARACANA 2	10-311	Engativá	Calle 73 D Sur Carrera 78 A hasta la 82 A Bis
42	NATURAL	PARQUE DEL RIO (SAN JOSE DE MARYLAND)	07-164	Bosa	Av Carrera 86 Calle 55 sur
43	NATURAL	AUTOPISTA SUR (Pavco)	07-152	Bosa	Carrera 98 B Calle 61 A sur

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

CONTRATO DE OBRA

No. de contrato	4041 DE 2024
Contratista Consultoría y/obra	CONSORCIO INNOVAPARQUES
Objeto	*"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 - "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS".*

Plazo de la ejecución etapa de obra	OCHO (08) MESES
Plazo total del contrato	OCHO (08) MESES
Valor etapa de obra	$ 5.200.000.000,00
Valor total del contrato	$ 5.200.000.000,00
Fecha Inicio	20 de noviembre de 2024
Fecha de Terminación del contrato:	19 de julio de 2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

No. de contrato	4080 DE 2024
Contratista de Interventoría	CONSORCIO SANTA TERESA 28
Objeto	*"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2"*
Periodo etapa de obra	OCHO (08) MESES
Plazo de liquidación	UN (01) MES
Plazo total del contrato	NUEVE (09) MESES
Valor etapa de obra	$ 2.107.109.833,00
Valor total del contrato	$ 2.107.109.833,00
Fecha Inicio	20 de noviembre de 2024
Fecha de Terminación contrato:	19 de agosto de 2025

3. INFORME GENERAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

3.1. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PLANES DE GESTIÓN

La revisión y aprobación del Plan de Manejo Ambiental, y del Programa de Manejo Ambiental RCD, fue llevada a cabo acorde a la trazabilidad que se presenta en la siguiente tabla:

Tabla 1 Trazabilidad aprobación PMA-RCD y PMA

Documento	Versión	Fecha de revisión	Estado
PMA-RCD	1	29-11-2024	No aprobado
PMA-RCD	2	03-12-2024	No aprobado
PMA-RCD	3	07-12-2024	Parcialmente aprobado
PMA-RCD	4	17-12-2024	Aprobado
PMA	1	30-12-2024	No aprobado
PMA	2	08-01-2025	No aprobado
PMA	3	10-01-2025	Aprobado

Como soporte del desarrollo de la actividad se emitió al contratista en el informe 3, el formato de revisión por parte de la interventoría y los correos notificando la aprobación de los productos.

3.2. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE INFORMES MENSUALES

Durante el periodo de reporte se revisó el informe ambiental mensual correspondiente al mes de mayo, quedando aprobado el día 12/06/2025 el documento en su versión tres (3). La trazabilidad de la aprobación se presenta en la siguiente tabla:

Tabla 2 Trazabilidad aprobación informes mensuales

Informe	Versión	Fecha de revisión	Estado
1 noviembre	1	09/12/2024	No aprobado
1 noviembre	2	17/12/2024	Aprobado
2 Diciembre	1	14/01/2025	No aprobado
2 Diciembre	2	17/01/2025	No aprobado
2 Diciembre	3	20/01/2025	Aprobado
3 Enero	1	29/01/2025	No aprobado
3 Enero	2	03/02/2025	Aprobado
4 Febrero	1	03/03/2025	No aprobado
4 Febrero	2	05/03/2025	No aprobado
4 Febrero	3	10/03/2025	No aprobado
4 Febrero	4	10/03/2025	Aprobado
5 Marzo	1	01/04/2025	No aprobado
5 Marzo	2	07/04/2025	Aprobado
6 Abril	1	02/05/2025	No aprobado
6 Abril	2	07/05/2025	Aprobado
7 Mayo	1	05/06/2025	No aprobado
7 Mayo	2	11/06/2025	No aprobado
7 Mayo	3	12/06/2025	Aprobado

El soporte de la aprobación del informe siete (7) correspondiente al mes de mayo de 2025, se presenta en el Anexo 1.

3.3. TRÁMITES Y PERMISOS AMBIENTALES

Teniendo en cuenta el objeto del contrato y actividades a desarrollar por el contratista en el marco de su ejecución, se determinó en el Plan de Manejo Ambiental que no se requiere adelantar trámites u obtener autorizaciones de la autoridad ambiental competente.

Así mismo, en comité del 02-01-2025, en el que participaron representantes del contratista, la interventoría y la entidad contratante, el profesional ambiental de la entidad contratante manifestó que no era necesaria la inscripción de la obra ya que por las características de los RCD que se generarán en el proyecto, estos no son objeto de seguimiento por parte de la autoridad ambiental competente. La copia del acta se presentó como anexo del informe tres (3).

3.4. MANEJO DE CAMPAMENTO Y MATERIALES

Durante el periodo de reporte se verificó el cumplimiento del programa de manejo de campamento y materiales establecido en el PMA del proyecto, el cual contempla entre otras las siguientes medias:

- Ubicación de puntos de acopio temporal
- Protección de materiales granulares
- Orden y aseo

Con base en lo anterior, se verificó que no se requirió la instalación de campamentos temporales, ni acopios de materiales granulares debido a que estos fueron instalados al llegar a los frentes durante la jornada de trabajo. De igual manera se verificó que los frentes cumplían con las condiciones de orden y aseo.

Respecto al control de materiales, durante el periodo de reporte se verificó el ingreso de los siguientes materiales:

Tabla 3 Control de materiales

Mes	Tipo de Material	Volumen (m3)	Masa (Ton)	PROVEEDOR
Noviembre	Arena	35,5	64	Materiales y suministros
Noviembre	Caucho granular	100	30	Cauchos Dinámicos
Diciembre	Arena	41,6	75	Materiales y suministros
Diciembre	Caucho granular	20,8	6,25	Cauchos Dinámicos
Enero	Arena	0,17	0,27	Materiales y suministros
Enero	Caucho granular	11,52	9,21	Cauchos Dinámicos
Enero	Pegante	1.61	2,42	Ferretería
Enero	Pintura aceite	0,32	0,84	Ferretería
Febrero	Arena	6,18	9,89	Materiales y suministros
Febrero	Caucho granular	40,11	36,89	Cauchos Dinámicos
Febrero	Pegante	0,075	0,13	Ferretería
Febrero	Pintura aceite	0,76	0,98	Ferretería
Marzo	Arena	0,66	0,99	Materiales y suministros
Marzo	Caucho granular	30,5	36,6	Cauchos Dinámicos
Marzo	Pintura aceite	0,95	1,23	Ferretería
Abril	Arena	4,09	6,55	Materiales y suministros
Abril	Caucho granular	45,06	51,82	Cauchos Dinámicos
Abril	Pintura	1,14	1,14	Ferretería
Mayo	Arena	3,71	5,58	Materiales y suministros
Mayo	Caucho granular	9,2	10,58	Cauchos Dinámicos
Junio	Arena	22,49	32,38	Materiales y suministros
Junio	Caucho granular	28,16	32,38	Cauchos Dinámicos
Junio	Pintura	1,25	1,62	Ferretería
Junio	Polvo de ladrillo	24	32	Ingeniería CMC

Se aclara que a la fecha de corte del presente informe el contratista se encuentra gestionando los certificados de caucho, por lo que estos se remitirán una vez sean entregados por el contratista. No obstante, se adjunta en el Anexo 2 las remisiones entregadas por el contratista para el periodo de reporte.

Para el proyecto se cuenta con los siguientes proveedores aprobados, de los cuales el contratista remitió la respectiva documentación ambiental en el PMA:

Tabla 4 Proveedores aprobados

Material	Proveedor	NIT	Permiso minero	Permiso ambiental
Pétreos	Materiales y suministros BEPE	900708640-9	EXP. 1329-15	Res. 865 del 12-09-2008
Grano de caucho	Cauchos Dinámicos	900776838-1	No aplica	Registro gestor llantas usadas No. RLL.009

Con relación al manejo de sustancias químicas (adhesivo y herbicida), se verificó que el contratista mantiene la disponibilidad de fichas de seguridad en los puntos de almacenamiento o uso, así mismo se verificó la instalación de un kit para el control de derrames, al igual que la identificación y señalización de sustancias químicas. En el Anexo 3 se presentan las hojas de seguridad de los productos químicos empleados en el periodo.



Foto 1 Identificación de sustancias químicas y hojas de seguridad

3.5. MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS

De acuerdo con el programa para el manejo integral de residuos aprobado, el contratista establece entre otras las siguientes medidas:

- Puntos ecológicos
- Acopios señalizados y demarcados
- Disposición final adecuada

A partir de lo anterior, se verificó durante el periodo de reporte que el contratista mantiene la instalación de un (1) punto ecológico que cumple con el código de colores establecido por la Resolución 2184 de 2019, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.



Foto 2 Punto ecológico

En la siguiente tabla se presenta el consolidado de residuos gestionados a la fecha:

Tabla 5 Residuos gestionados

Mes	Residuos /Cantidad	Gestor	Certificado
Noviembre	N/A	N/A	N/A
Diciembre	N/A	N/A	N/A
Enero	Grama sintética / 1,04 Ton	Grupo Terraza	CRSS - N° 3286 del 28 de enero de 2025
Febrero	N/A	N/A	N/A
Marzo	N/A	N/A	N/A
Abril	N/A	N/A	N/A
Mayo	Césped natural / 70 m^3	Donación (Juan Basilio)	Certificado de donación del 30/05/2025
Junio	N/A	N/A	N/A

Durante el periodo de reporte, se verificó que el contratista continúa manejado mediante devolución posconsumo al proveedor, los envases de pintura y adhesivo, por lo que a la fecha no se ha realizado disposición final de este tipo de residuo. El certificado de devolución posconsumo de envases de pintura y pegante se presentó como anexo del informe 6.

De igual manera se verifica que el contratista realiza el retiro y acopio de grama sintética, la cual de acuerdo con lo indicado será llevada a disposición final una vez se cuente con la cantidad requerida por el gestor para su recolección.

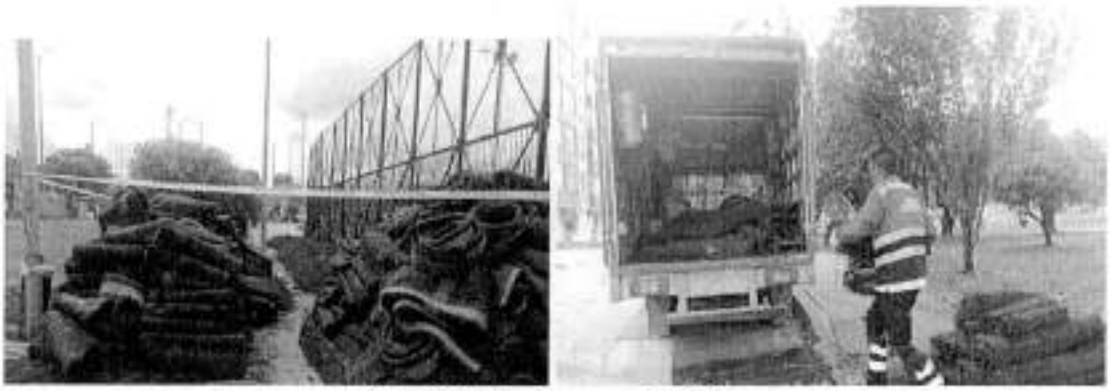


Foto 3 Retiro de grama sintética

3.6. MANEJO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS

Para el manejo de emisiones el PMA incluye el programa de control de emisiones, que establece entre otras medidas las siguientes:

- Protección de frentes con polisombra
- Control de vehículos empleados en la obra
- Implementación de medidas para la prevención y control de ruido

En concordancia con las medidas de manejo ambiental formuladas, durante el periodo de reporte se verificó que el contratista mantiene el seguimiento de los certificados de gases de los vehículos utilizados. Con relación a la protección de materiales granulares o susceptibles de generar aportes de material particulado por suspensión, se verificó que durante el periodo el contratista realizó su instalación durante la jornada de trabajo, evitando sí el acopio de estos.

3.7. MANEJO EFICIENTE DEL AGUA

Para el manejo eficiente de agua el PMA aprobado cuenta con el respectivo programa, enfocado al uso eficiente del recurso y protección de cuerpos de agua. Con base en lo anterior, durante el periodo de reporte se verificó que las actividades desarrolladas por el contratista no generaron vertimientos o consumo de agua diferente a la de consumo humano por parte de los colaboradores. De igual manera se verificó que en los frentes intervenidos no existe presencia de cuerpos de agua o sumideros.

3.8. MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS

Con relación a este numeral se aprobó dentro del PMA el programa de operación de maquinaria y equipos, a través del cual se formularon entre otras, las siguientes medidas de manejo ambiental:

- Control en el almacenamiento de combustibles
- Seguimiento y control de equipos especializados y vehículos

Con base en lo anterior, durante el periodo de reporte se verificó que el contratista no realizó almacenamiento de combustibles. De igual manera se verificó el seguimiento realizado por su parte a la maquinaria (cortadoras) y vehículos empleados durante el periodo, los cuales se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 6 Seguimiento vehículos

Placa	Vigencia técnico-mecánica (RTM)
EXY115	14/12/2025
EXZ737	19/12/2025
EYX154	14/12/2025

La documentación de los vehículos se presenta como anexo del informe SST. Los soportes de preoperacionales y control de mantenimiento se presenta en el Anexo 4.

3.9. MANEJO DE FLORA Y FAUNA

Para el manejo de vegetación se cuenta con el respectivo programa, el cual contiene las acciones formuladas por el contratista para el manejo de la vegetación que se pueda encontrar en los polígonos que serán objeto de intervención, de manera que se prevengan, minimicen y controlen los impactos producidos a esta. No obstante, durante el periodo de reporte se verificó que, en el área intervenida no existe presencia de vegetación que pueda ser afectada por las actividades desarrolladas.

3.10. CAPACITACIÓN

Durante el periodo de reporte se verifico que el contratista llevó a cabo charlas y capacitaciones al personal de obra, en las que se abordaron los siguientes temas:

Tabla 7 Charlas y capacitaciones

Tema	Fecha
Ciclo reciclaje	03/06/2025
Consumo racional de agua	20/06/2025
Riesgos ambientales	26/06/2025

Los soportes de participación presentados por el contratista se encuentran en el Anexo 5.

CONCLUSIONES

1. Se realizó revisión y aprobación del informe ambiental siete (7) en su versión tres (3).

2. Se realiza seguimiento a la implementación de las medidas de manejo ambiental formuladas en los diferentes programas contenidos en el PMA, encontrando que el contratista dio cumplimiento a lo establecido acorde su aplicación.

Gmail

SS Consultoria Ambiental Soluciones Sostenibles
<ss.solucionessostenibles@gmail.com>

Informe mensual ambiental mayo 2025-INNOVAPARQUES

9 mensajes

Andrea Lopez <coordinacionhse.prociving@gmail.com> 4 de junio de 2025, 10:59
Para: SS Consultoria Ambiental Soluciones Sostenibles <ss.solucionessostenibles@gmail.com>, Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>
Cc: consorcio innovaparques <consorcioinnovaparques24@gmail.com>

Ing. Nataly
Cordial Saludo

Por medio de la presente adjunto informe mensual ambiental correspondiente al mes de mayo 2025

Atenta a comentarios
Gracias

INFO MA MAYO V1.rar

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com> 4 de junio de 2025, 14:07
Para: SS Consultoria Ambiental Soluciones Sostenibles <ss.solucionessostenibles@gmail.com>

[El texto citado está oculto]
--
CORDIALMENTE

SOLIUN | DEPARTAMENTO DE PROYECTOS


Tel: (031) 765 3086. Cel: 301 3842384.
Cra. 70 C # 48-55, Bogotá D.C. / www.soliunsas.com

AVISO LEGAL
Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Está prohibida su retención, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.

SS Consultoria Ambiental Soluciones Sostenibles <ss.solucionessostenibles@gmail.com> 5 de junio de 2025, 13:37
Para: Andrea Lopez <coordinacionhse.prociving@gmail.com>
Cc: Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>, consorcio innovaparques <consorcioinnovaparques24@gmail.com>

Cordial saludo Ing. Andrea,

De manera atenta solicito comprimir nuevamente el informe y sus anexos ya que el archivo recibido me reporta errores al desplegarlo y al abrir algunos archivos, motivo por el que no ha sido posible culminar la revisión. Adicionalmente no se encuentra la totalidad de anexos.

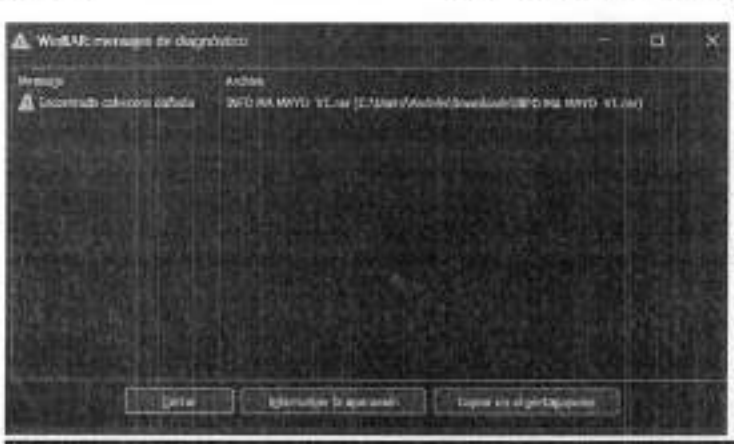





Atte

--

Ing. Natali Espinosa Sierra

MsC Gestión y Auditorías Ambientales

[E: texto citado está oculto]

Andrea Lopez <coordinacionhse.prociving@gmail.com> 5 de junio de 2025, 14:29
Para: SS Consultoria Ambiental Soluciones Sostenibles <ss.solucionessostenibles@gmail.com>
Cc: Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>, consorcio innovaparques <consorcioinnovaparques24@gmail.com>

Ing. Nataly
Cordial Saludo

Adjunt nuevamente

INFO MA MAYO V1.rar

Atenta a comentarios
Gracias
[El texto citado está oculto]

SS Consultoria Ambiental Soluciones Sostenibles <ss.solucionessostenibles@gmail.com> 5 de junio de 2025, 15:23
Para: Andrea Lopez <coordinacionhse.prociving@gmail.com>
Cc: Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>, consorcio innovaparques <consorcioinnovaparques24@gmail.com>

Cordial saludo Ing. Andrea,

De manera atenta se informa que una vez recibido el informe ambiental correspondiente al mes de mayo de 2025, se presentan las siguientes observaciones:

- Se debe verificar la densidad utilizada para la conversión de volumen a masa de la arena, ya que la cantidad en toneladas no es coherente con las conversiones y reporte en los meses anteriores.
- En el anexo 1-Cantidades ejecutadas, y en el registro fotográfico presentado en el informe se evidencia la actividad de corte de césped. Por lo anterior, se debe indicar la gestión realizada con el material vegetal generado.
- Incluir registro fotográfico del manejo de sustancias químicas
- Se reporta una capacitación del día 16/05/2025, de la cual se anexan los formatos de evaluación. No obstante, se debe incluir el registro de asistencia con las firmas del personal.

Con base en lo anterior, el informe ambiental siete (7) en su versión uno (1), queda en estado no aprobado.

Quedo atenta a cualquier inquietud.

Atte

--

Ing. Natali Espinosa Sierra

MsC Gestión y Auditorías Ambientales

[El texto citado está oculto]

Andrea Lopez <coordinacionhse.prociving@gmail.com> 9 de junio de 2025, 8:20
Para: SS Consultoria Ambiental Soluciones Sostenibles <ss.solucionessostenibles@gmail.com>
Cc: Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>, consorcio innovaparques <consorcioinnovaparques24@gmail.com>

Ing. Nataly
Cordial Saludo

Por medio de la presente adjunto subsanación de informe ambiental correspondiente al mes de mayo 02025 v2 , acorde a observaciones

- Se debe verificar la densidad utilizada para la conversión de volumen a masa de la arena, ya que la cantidad en toneladas no es coherente con las conversiones y reporte en los meses anteriores
- RTA : sea tiende observación , se ajusta masa de materiales - ver programa 1
- En el anexo 1-Cantidades ejecutadas, y en el registro fotográfico presentado en el informe se evidencia la actividad de corte de césped. Por lo anterior, se debe indicar la gestión realizada con el material vegetal generado.
- RTA: se atiende observación , se relaciona la gestión ejecutada con residus se cesped ver item del numeral 5.1
- Incluir registro fotográfico del manejo de sustancias químicas
- RTA: se atiende observación , se adjunta registro fotográfico ver programa 2
- Se reporta una capacitación del día 16/05/2025, de la cual se anexan los formatos de evaluación. No obstante, se debe incluir el registro de asistencia con las firmas del personal.
- RTA se atiende observación se adjunta soporte ver anexo 3

Atenta a comentarios
Gracias

INFO MA MAYO V2.rar

[El texto citado está oculto]

SS Consultoria Ambiental Soluciones Sostenibles <ss.solucionessostenibles@gmail.com> 11 de junio de 2025, 11:35
Para: Andrea Lopez <coordinacionhse.prociving@gmail.com>
Cc: Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>, consorcio innovaparques <consorcioinnovaparques24@gmail.com>

Cordial saludo Ing. Andrea,

De manera atenta se informa que una vez revisado el informe ambiental siete (7) en su versión dos (2), se presentan las siguientes observaciones:

- No se ajustó en su totalidad el dato de toneladas de arena en el informe

Material	M3	Tonelada
Arena	3,715	2,58

- En el registro de asistencia incluido como soporte de la capacitación del día 16/05/2025, no se relaciona el tema de la capacitación. Adicional el registro presenta enmendaduras.

	Lugar	DD	MM	AA
	PARQUES BOGOTA	16	5	2025
TEMAS TRATADOS				
CAPACITACIÓN AMBIENTAL.				

Con base en lo anterior, el informe ambiental siete (7) en su versión dos (2), queda en estado no aprobado.

Atte

--

Ing. Natali Espinosa Sierra

MsC Gestión y Auditorías Ambientales

[El texto citado está oculto]

Andrea Lopez <coordinacionhse.prociving@gmail.com> 12 de junio de 2025, 10:58
Para: SS Consultoria Ambiental Soluciones Sostenibles <ss.solucionessostenibles@gmail.com>
Cc: Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>, consorcio innovaparques <consorcioinnovaparques24@gmail.com>

Ing. Nataly
Cordial saludo

Adjunto informe v3 subsanado acorde a observaciones

- No se ajustó en su totalidad el dato de toneladas de arena en el informe
- RTA , se actualiza valor en tabla de informe
- En el registro de asistencia incluido como soporte de la capacitación del día 16/05/2025, no se relaciona el tema de la capacitación. Adicional el registro presenta enmendaduras.
- RTA: se cambia registro

Atenta a comentarios
Gracias

INFO MA MAYO V3}.rar

[El texto citado está oculto]

SS Consultoria Ambiental Soluciones Sostenibles <ss.solucionessostenibles@gmail.com> 12 de junio de 2025, 14:54
Para: Andrea Lopez <coordinacionhse.prociving@gmail.com>
Cc: Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>, consorcio innovaparques <consorcioinnovaparques24@gmail.com>

Cordial saludo Ing. Andrea,

De manera atenta se informa que una vez revisado el informe ambiental siete (7) en su versión tres (3), se evidencia que las observaciones fueron atendidas en su totalidad. Por lo anterior, el informe ambiental siete (7) en su versión tres (3), queda en estado aprobado.

Atte

--

Ing. Natali Espinosa Sierra

MsC Gestión y Auditorías Ambientales

[El texto citado está oculto]

INGENIERIA CMC S.A.S

REM_4140_INN: 018-05

CLIENTE: INNOVAPARQUES

FECHA: 26-05-25

CONTRATO: 4041-2024

CAMPO DESTINO Fontanar del Rio FII

ITEM	DECRIPCION	CANTIDAD	UND	OBSERVACIONES
1.	Retiro Cerramiento	257,5	m^2	Cerramiento Perimetral

OBSERVACIONES: _____

Entrega:

Recibe:

INGENIERIA CMC S.A.S

REM_4140_INN: 009-05

CLIENTE: INNOVAPARQUES
CONTRATO: 4041-2024
CAMPO DESTINO Fontanar del Rio Mini Beisbol

FECHA: 30-05-25

ITEM	DECRIPCION	CANTIDAD	UND	OBSERVACIONES
1	Malla Cerramiento	602.75	m^2	Fontanar Mini beisbol Cerramiento Perimetral

OBSERVACIONES: _____

Entrega:

Recibe:

INGENIERIA CMC S.A.S

REM_4140_INN: 06-01

CLIENTE: INNOVAPARQUES

FECHA: 03-06-25

CONTRATO: 4041-2024

CAMPO DESTINO

ITEM	DECRIPCION	CANTIDAD	UND	OBSERVACIONES
1	Vinilo balanco tipo 2	66	Caneca	Demarcación

OBSERVACIONES: _____

Entrega:

Recibe:

INGENIERIA CMC S.A.S

REM_4140_INN: 06-02

CLIENTE: INNOVAPARQUES

FECHA: 03-06-25

CONTRATO: 4041-2024

CAMPO DESTINO Ciudad Cartes Softbol

ITEM	DECRIPCION	CANTIDAD	UND	OBSERVACIONES
1	Polvo ladrillo	8.	m^3	Campo Softbol

OBSERVACIONES: _____

Entrega:

Recibe:

INGENIERIA CMC S.A.S

REM_4140_INN: 06-03

CLIENTE: INNOVAPARQUES
CONTRATO: 4041-2024
CAMPO DESTINO UDS

FECHA: 06-06-25

ITEM	DECRIPCION	CANTIDAD	UND	OBSERVACIONES
1	Polvo ladrillo	8	m^3	UDS Campo Beisbol
2	Polvo Ladrillo	8	m^3	UDS Campo Softbol

OBSERVACIONES:

Entrega:

Recibe:

CMC S.A.S

REM_4140_INN 0600 4

CLIENTE: INNOVAPARQUES
CONTRATO: 4041-2024
CAMPO DESTINO Victoria Norte.

FECHA: 06 de junio/25

ITEM	DECRIPCION	CANTIDAD	UND	OBSERVACIONES
1.	Impermeacion Asfaltica	805	Mt	Impermeante.

OBSERVACIONES: _____

Entrega:

Recibe:

INGENIERIA CMC S.A.S

REM_4140_INN: 06 006

CLIENTE: INNOVAPARQUES

FECHA: 06/06/2025

CONTRATO: 4041-2024

CAMPO DESTINO

ITEM	DECRIPCION	CANTIDAD	UND	OBSERVACIONES
1	Imprimación Asfaltica.	1050	Mz.	Imprimante.

OBSERVACIONES: _____

Entrega: _____

Recibe: _____

INGENIERIA CMC S.A.S

REM_4140_INN: 06-006

CLIENTE: INNOVAPARQUES

FECHA: 06-06-25

CONTRATO: 4041-2024

CAMPO DESTINO Sha Qavilanes

ITEM	DECRIPCION	CANTIDAD	UND	OBSERVACIONES
1.	Malla Cerramiento	98,75	m^2	Cerramiento Perimetral

OBSERVACIONES: _____

Entrega:

Recibe:

INGENIERIA CMC S.A.S

REM_4140_INN: 06-07

CLIENTE: INNOVAPARQUES
CONTRATO: 4041-2024
CAMPO DESTINO: Victoria Norte.

FECHA: 16-06-25

ITEM	DECRIPCION	CANTIDAD	UND	OBSERVACIONES
1	Malla Cal 4	1	Jgo	Malla Arcos
2	Malla Cerramiento	284,75	m2	Cerramiento Perimetral

OBSERVACIONES:

Entrega:

Recibe:

INGENIERIA CIVIC S.A.S

REM_4140_INN: 06 08

CLIENTE: INNOVAPARQUES

FECHA: 17-06-25

CONTRATO: 4041-2024

CAMPO DESTINO Vilanova

ITEM	DECRIPCION	CANTIDAD	UND	OBSERVACIONES
1	Malla Cal 4	1	Jgo	Malla Arcos
2	Malla Cerramiento	133.50	m2	Cerramiento Perimetral

OBSERVACIONES: _____

Entrega: _____

Recibe: _____

INGENIERIA CWC S.A.S

REM_4140_INN: 06-09

CLIENTE: INNOVAPARQUES

FECHA: 19-06-25

CONTRATO: 4041-2024

CAMPO DESTINO Palma FII

ITEM	DECRIPCION	CANTIDAD	UND	OBSERVACIONES
1	Malla Cerramiento	2150	m^2	Cerramiento Perimetral
2	Malla Cal 8	1	Ujo	Accos Principales
3	Malla Cal 4	2	Ujo	Accos Aux

OBSERVACIONES: _____

Entrega: _____

Recibe: _____

INGENIERIA CMC S.A.S

REM_4140_INN: 06-10

CLIENTE: INNOVAPARQUES

FECHA: 20-06-25

CONTRATO: 4041-2024

CAMPO DESTINO Valle de Reposo

ITEM	DECRIPCION	CANTIDAD	UND	OBSERVACIONES
1	Malla Cerramiento	233,75	m^2	Cerramiento Perimetral

OBSERVACIONES: _____

Entrega: _____

Recibe: _____

neoflex
ADHESIVES coim

AENOR ER Empresa Registrada

HOJA DE ANÁLISIS

Producto: **NEOPUR 2964 VERDE**

N.º de Lote: 97001

RESULTADO DEL ANÁLISIS

Viscosidad de mezcla (100 gr NEOPUR 2964 Verde + 9,5 gr COMPONENTE B)

(Brookfield, 20º C, 6 r.p.m, Sp, 6):.....111.500 c.p.s.

Límites: 80.000-150.000 c.p.s

FIRMA: María Murcia Caracena

Los datos de esta hoja se facilitan únicamente a título informativo y no eximen al receptor de la necesidad del preceptivo examen/comprobación para su aceptación a la entrega.

198

neoflex
ADHESIVES coim

AENOR
ER
Empresa Registrada
ER - 1085/98

CERTIFIED IQNet QUALITY SYSTEM

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Product: ADIFLEX 2964 B

Charge: 97336

Order number: 317

Brookfield viscosity (25°C , 30 r.p.m., Sp.2) :..... 232 mPa.s

Limits: 160-240

SIGNATURE: María Murcia Caracena



The information on this sheet is provided for information only and does not exempt the recipient from the need for the mandatory examination / verification for acceptance on delivery.

NEOPUR 2964

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

Adhesivo de poliuretano de dos componentes libre de disolventes.

APLICACIÓN

Neopur 2964 se ha de mezclar con Adiflex 2964B.
Este adhesivo se usa para el pegado de parquet, pavimentos de goma, césped artificial y recubrimientos de PVC en exteriores.
Se presenta envasado en forma de kit con las cantidades preparadas para su mezcla.

Sistema de aplicación	Espátula dentada.
Consumo	200-600 g/m² (en función de los materiales)
Sistema de limpieza	Disolvente A





PROCESO APLICACIÓN

Las superficies a pegar deben estar secas, libres de polvo, suciedad u otros materiales extraños. Un lijado superficial es recomendable en muchas aplicaciones.
Neopur 2964 se ha de mezclar a fondo con Adiflex 2964B, para cantidades grandes se recomienda un agitador mecánico. Una vez mezclado, la viscosidad aumenta, consiguiéndose una pasta ideal para aplicación con espátula dentada.
Aplicar la mezcla sobre las superficies a pegar con una espátula dentada. Durante el wet life, superponer las superficies a unir y mantenerlas en contacto.
El tiempo de fraguado disminuye con la temperatura aplicada en la película de adhesivo. En caso de materiales gruesos y aislantes del calor, se requiere un tiempo extra para que el calor penetre en la junta adhesiva. No es recomendable endurecer por encima de 60ºC materiales con grandes diferencias en los coeficientes de dilatación térmica.
Neopur 2964 endurece muy bien incluso a bajas temperaturas, aunque el tiempo de fraguado aumenta considerablemente.
La temperatura mínima para el reticulado es de 5ºC. Por debajo de esta temperatura, la mezcla difícilmente reticula.
Los residuos de adhesivo, herramientas y maquinaria deben ser limpiados, antes de que el adhesivo endurezca, con Disolvente A.
Los usuarios deben realizar sus propios test para determinar la adecuación de nuestros productos a sus necesidades concretas. Consulte con nuestro servicio técnico para mayor información al respecto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto (Dos opciones)	Pasta de color verde Pasta de color beige
Viscosidad[1]	400.000 ± 100.000 mPa·s /20ºC
Viscosidad mezcla[1]	115.000 ± 35.000 mPa·s /20ºC
Densidad	1.70 g/mL (25ºC)
Densidad mezcla	1.65 g/mL (25ºC)
Endurecedor	Adiflex 2964B
Proporción mezcla Neopur 2964 : Adiflex 2964B	En peso 100 : 9,5
Pot life[2]	40min
Wet life[2]	70min
Tiempo fraguado	Aprox. 24h (25ºC; 50% hr)
Tiempo de endurecimiento	Aprox. 5-8h a 20-22ºC

- **No inflamable.**
- **Sin disolventes.**

[1] Los valores de viscosidad se controlan en el momento de la producción, pequeñas variaciones son posibles.
[2] 25ºC; 50% hr. Método interno.

ALMACENAMIENTO

Debe almacenarse en recipientes originales herméticamente cerrados a temperaturas de 15-30ºC.
El tiempo máximo de almacenamiento en las condiciones anteriormente descritas es de 12 meses.

SEGURIDAD

Seguir las instrucciones que contiene la **Ficha de Seguridad** de este producto, adoptando las medidas necesarias para su uso.

INFORMACIÓN ADICIONAL

La información que contiene esta hoja técnica está basada en nuestro conocimiento de los productos, mediante ensayos realizados en nuestro laboratorio. No deben tomarse como garantía para el aplicador sino como referencias orientativas y con valor informativo.
Cada aplicador debe realizar sus correspondientes test para comprobar la idoneidad del producto en las condiciones y proceso usado en cada caso particular.
La aplicación, uso y procesamiento de nuestros productos están fuera de nuestro control y por tanto quedan bajo la responsabilidad del instalador.

FICHA TÉCNICA

Concentrado Soluble (SL)
Glifosato: 363 g/L de ácido glifosato de formulación a 20°C, equivalente a 446 g/L de sal potásica de N-(fosfonometil)-glicina.
Herbicida
Uso agrícola
Registro Nacional No. 476
Titular del registro: Bayer S.A.



COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingredientes activos:
Glifosato: 363 g/L de ácido glifosato de formulación a 20°C, equivalente a 446 g/L de sal potásica de N-(fosfonometil)-glicina.
Ingredientes aditivos:
c.s.p. 1 litro

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

CONSULTE UN INGENIERO AGRÓNOMO

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN:

ROUNDUP® ACTIVO es un herbicida no selectivo, de aplicación post-emergente y acción sistémica, recomendado para el control de la mayoría de malezas anuales y perennes en crecimiento activo. El herbicida que cae al suelo es inactivado inmediatamente mediante una reacción que ocurre con las arcillas sin dejar residuos que pueden afectar las siembras inmediatas ni tampoco penetrar por las raíces de cultivos ya establecidos.

Para mejores controles realice la aplicación sobre especies maleza que se encuentren en crecimiento activo. Si la lluvia es inminente antes de 1 hora, suspenda la aplicación para evitar el lavado del producto. Realice el tratamiento a las especies de malezas con la dosis recomendada de acuerdo al tipo predominante de maleza y nivel de infestación.

CULTIVO	TIPO DE APLICACIÓN	TIPO / MALEZA	DOSIS (l/ha)*	DOSIS t/cm*	P.C.	P.R.
BANANO	Antes de siembra post-emergente, aplicación dirigida a las malezas entre surcos.	Siempre viva (*Commelina diffusa*), Cortadera (*Cyperus odoratus*), Alemoncillo (*Panicum antidotale*), Canutillo (*Cadaba cordifolia*), Tripa de pollo (*Euphorbia hirta*)	3.0-5.0	300-500	No aplica	Cero horas
PAPA	Antes de siembra o inmediatamente después de la siembra directa, mínima labranza ó cero labranza	Kikuyo (*Pennisetum clandestinum*), Trigullo (*Bromus catharticus*), Lengua de vaca (*Rumex crispus*), Cerraja (*Sonchus oleraceus*), Altamisa (*Ambrosia artemisiifolia*), Verónica (*Verónica persica*), Cilantro (*Coriandrum sativum*), Remolacha de mesa (*Beta vulgaris*), Pategallina (*Poa annua*), Barbasco (*Polygonum hydropiperoides*)	3.0-5.0	300-500	No aplica	Cero horas

FICHA TÉCNICA

Roundup Activo

CULTIVO	TIPO DE APLICACIÓN	TIPO / MALEZA	DOSIS (l/ha)*	DOSIS l/cm³ (Por cantidad de producto en 20 litros de agua)	P.C.	P.R.
ALGODÓN, ARROZ, MAÍZ, SORGO, SOYA.	Antes de siembra o inmediatamente después de la siembra directa, mínima labranza ó cero labranza	Anuales y Perennes	3.0-5.0	300-500	No aplica	Cero horas
PLÁTANO	Antes de siembra post-emergente, aplicación dirigida a las malezas entre surcos.	Pirilla (*Anoxelema muliflora*), Seledonia (*Peperomia pelucida*), Frito (*Ruella sp*), Siempre viva/Suelda (*Commelina diffusa*), Alambrito (*Panicum antidotale*), Caminadora (*Rottboella exaltata*), Guardarrocio (*Digitaria sanguinalis*).	3.0-5.0	300-500	No aplica	Cero horas
PALMA AFRICANA	Antes de siembra post-emergente, aplicación dirigida a las malezas entre surcos.	Braquiaria (*Brachiaria Decumbens*), Batatilla (*Ipomoea spp*), Heliotropo (*Heliotropum indicum*), Cortadera/ Coquito (*Cyperus rotundus*), Escoba (*Sida acuta*), Kudzu (*Pueraria phaseoloides*).	3.0-5.0	300-500	No aplica	Cero horas

Nota: No se recomienda como desecante para cultivos destinados a la producción de semilla.
P.C. (Periodo de Carencia)
P.R. (Periodo de Reentrada)
* Utilice la dosis baja para controlar malezas anuales y perennes de fácil control. Utilice la dosis alta en presencia de altas poblaciones de malezas y/o para controlar malezas perennes de difícil control.

MALEZAS QUE CONTROLA:

Gramíneas: Cadillo (*Cenchrus echinatus*), Guardarrocio (*Digitaria sanguinalis*), Liendrepuerco (*Echinochloa colonum*), Maíz espontáneo (*Zea mays*), Pajas (*Paspalum spp*), Pategallina (*Eleusine indica*), Pajamora (*Leptochloa filiformis*), Pasto argentina (*Cynodon dactylon*), Pasto Jhonson (*Sorghum halepense*)*, Caminadora (*Rottboellia cochinchinensis*)*.

Hoja ancha: Añil (*Indigofera hirsuta*), Bledo (*Amaranthus dubius*), Botoncillo (*Eclipta alba*), Suelda consuelda - Siempre viva (*Commelina difusa*), Corchorus (*Corchorus orinocensis*), Pega-pega (*Desmodium tortuosum*), Verdolaga (*Portulaca oleracea*), Batatilla (*Ipomoea spp*)*, Falsa altamisa (*Parthenium hysterophorus*)*, Escoba (*Sida acuta*)*.

Ciperáceas: Coquito (*Cyperus rotundus*)*.
* Malezas con difícil control

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Para mejores controles realice la aplicación sobre las malezas que se encuentren en crecimiento activo y no superen los 30 centímetros de altura. Si su experiencia en la zona le indica que la lluvia es inminente antes de 1 hora, suspenda la aplicación para evitar el lavado del producto. Realice el tratamiento a las malezas con la dosis recomendada de acuerdo al tipo predominante de maleza y nivel de infestación.

Cultivos Semestrales: Aplique antes de la siembra del cultivo para el control de malezas difíciles y otras especies perennes.

Cultivos Semestrales y Perennes: Para el control de malezas entre los surcos de cultivos semestrales y perennes ya establecidos, aplique el producto dirigido hacia las malezas entre los surcos, mediante el uso de pantallas y evitando el contacto con las partes verdes del tallo y hojas del cultivo.

Áreas no Agrícolas: Para el control de malezas en bordes de carretera, vías férreas, áreas industriales: seleccione la dosis de acuerdo con el tipo predominante de especie de maleza y nivel de infestación.



FICHA TÉCNICA

EQUIPOS Y VOLUMENES DE MEZCLA:

Para aplicación terrestre: mezcla ROUNDUP® ACTIVO en volúmenes bajos de agua, como 100 a 200 litros por hectárea, acoplando boquillas de abanico plano como TJ-8001 y TJ-8002 y presión regulada entre 24 a 30 PSI. Utilice agua limpia. Calibre el equipo de aspersión antes de la aplicación para conseguir una distribución uniforme de la dosis recomendada.

Para aplicación aérea: volumen: 50-75 L/ha; tamaño de gota: 250-400 micras; número de gotas: para un producto sistémico como ROUNDUP® ACTIVO es preferible pocas gotas grandes, alrededor de 20 gotas/cm2; boquilla y micronaire: no deben superar el 75% de la envergadura de las alas para evitar el desplazamiento de las gotas por el vórtice de las alas; presión del equipo: 20-30 PSI; altura de vuelo: 2 m sobre el cultivo (alturas mayores favorecen el riesgo de deriva y aumentan la evaporación de la mezcla aplicada); ancho de pasada: depende de la aeronave y del equipos utilizado (entre 14 y 16 m); boquillas: D-12 difusor 45 ó 56 en ángulo de 135° hacia atrás ó boquillas de abanico 6504, 8004, 1104 (Spraying System).

Condiciones ambientales: Temperatura: no mayor a 29°C; Humedad relativa: mayor al 60%; velocidad del viento: menor a 7 km/hora (1,94 m/segundo). Aplicar cuando se esté seguro de que no existen inversiones térmicas (diferentes temperaturas entresuelo y aire).

EFECTOS SOBRE OTROS CULTIVOS Y CULTIVOS SUCESIVOS:

ROUNDUP® ACTIVO no es fitotóxico a los cultivos indicados si se utiliza de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta. Se debe evitar el contacto del producto con el follaje de plantas no objeto de control para no causar efectos fitotóxicos. El compuesto activo no se bioacumula y es degradado por los microorganismos del suelo.

VARIEDADES SUSCEPTIBLES:

ROUNDUP® ACTIVO es un herbicida no selectivo, de aplicación post-emergente y acción sistémica, recomendado para el control de la mayoría de malezas anuales y perennes en crecimiento activo. No es fitotóxico a los cultivos si se aplica dirigido a las malezas y se tiene cuidado de evitar el contacto del producto con el follaje de las plantas no objetivo.

NÚMERO MÁXIMO DE APLICACIONES SUCESIVAS:

ROUNDUP® ACTIVO se aplica dirigido a la maleza y el número y frecuencia de aplicaciones dependen del tipo de maleza y nivel de infestación.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

No mezcle ROUNDUP® ACTIVO con herbicidas de contacto. Las mezclas de tanque con herbicidas residuales formulados como polvos mojables o suspensiones concentradas y con herbicidas hormonales pueden reducir el control, sobre todo de gramíneas perennes. ROUNDUP® ACTIVO usado de acuerdo con las indicaciones y recomendaciones de la etiqueta no causa ningún efecto adverso a los cultivos donde se recomienda su uso.

LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

NINGUN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO

Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. Este producto puede ser mortal si se ingiere.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

Peligroso si es inhalado. Evite respirar vapor o aspersión. Causa daño temporal a los ojos. Evitar contacto con la piel y la ropa.

FICHA TÉCNICA

Roundup Activo

ALMACENAMIENTO:

No almacenar en casa de habitación. No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. Utilice el equipo de protección durante la mezcla y aplicación (overol de dos piezas sobre la ropa de trabajo, botas de protección, peto o delantal sobre la ropa de trabajo, respirador o máscara, guantes de protección) y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas. No debe transportarse con productos de consumo humano o animal. Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado. No re envasar o depositar el contenido en otros envases. Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS Y ROPA PROTECTORA:

Para realizar mezcla, cargar y calibrar los equipos y realizar las aplicaciones: utilice overol de dos piezas sobre la ropa de trabajo, botas de protección, peto o delantal sobre la ropa de trabajo, respirador o máscara, guantes de protección.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:


- Baja toxicidad para aves y peces. Evite que la mezcla de aplicación sea arrastrada por el viento hacia cultivos no objetivo.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para tal fin. No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- **Lleve el envase al centro de acopio más cercano del programa campo limpio, luego de realizar el triple lavado.**

INSTRUCCIONES PARA EL MANEJO DE DERRAMES:

En caso de derrame, absorba, recoja con aserrín o tierra seca, y deposite en sitios destinados por las autoridades para este fin.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, DERRAME O INCENDIO COMUNICARSE CON CISPROQUIM:

LÍNEA 01 8000 916012 ATENCIÓN 24 HORAS, O EN BOGOTÁ AL TEL. (091) 2 88 60 12.
LÍNEA BAYER S.A DE SERVICIO AL CLIENTE: 01 8000 111212.

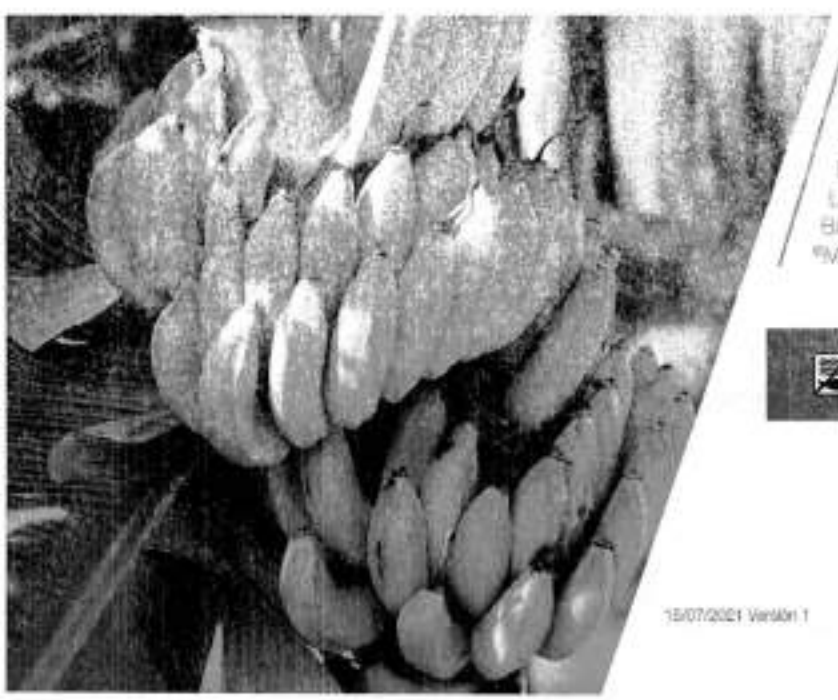

Categoría toxicológica: III - Ligeramente peligroso
Clasificación Recomendada por la Organización Mundial de la Salud.
Formulado por:
Bayer S.A.S. Bayer CropScience
Línea 018000111212
Bogotá, D.C. Colombia
®Marca Registrada

15/07/2021 Versión 1

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA

1.1 Identificador del producto

Nombre comercial	ROUNDUP FULL II
Código del producto (UVP)	62288564

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso	Herbicida

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Proveedor	Bayer S.A. Luis Alberto de Herrera 1248 WTC; Torre 3 Unidad 2074/2075 CP 11300 Montevideo Uruguay
Teléfono	(005982) 1922300 / 08002104
Telefax	(005982) 1922316
Departamento Responsable	Seguridad de Producto / Calidad, Seguridad y Medio Ambiente Cono Sur

1.4 Teléfono de emergencia

En caso de intoxicaciones	Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico (CIAT) 1722
En caso de emergencias químicas	(00598) 9964 6457 (24 horas del día)

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación según la legislación Nacional e Internacional y Convenios Multilaterales vigentes al momento de su confección para clasificación, empaque y etiquetado de sustancias y mezclas.

Irritación cutáneas : Categoría 3
H316 Provoca una leve irritación cutánea.

Irritación ocular : Categoría 2
H319 Provoca irritación ocular grave.

Toxicidad acuática aguda : Categoría 2
H401 Tóxico para los organismos acuáticos.

Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático : Categoría 2
H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

2.2 Elementos de la etiqueta

Etiquetado según la legislación Nacional e Internacional y Convenios Multilaterales vigentes al momento de su confección para clasificación, empaque y etiquetado de sustancias y mezclas.

Símbolo(s)



Palabra de advertencia: Atención

Indicaciones de peligro

H316	Provoca una leve irritación cutánea.
H319	Provoca irritación ocular grave.
H411	Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

Consejos de prudencia

P264	Lavarse la piel concienzudamente tras la manipulación.
P280	Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P305 + P351 + P338	EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P337 + P313	Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
P332 + P313	En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
P391	Recoger el vertido.
P501	Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con la normativa local.

2.3 Otros peligros

No se conocen peligros adicionales además de los mencionados.

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

3.2 Mezclas

Naturaleza química

Concentrado soluble (SL)
Potassium salt of Glyphosate 662 g/l

Componentes peligrosos

Nombre	No. CAS	Conc. [%]
Sal potásica de glifosato	70901-12-1	48,72
Alcoholes, éteres de alquilo C12-16, propoxilados, aminados, etoxilados	176022-82-5	> 1,00 – < 10,00

Otros datos

Alcoholes, éteres de alquilo C12-16, propoxilados, aminados, etoxilados	176022-82-5	Factor-M: 1 (acute), 1 (chronic)

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS

4.1 Descripción de los primeros auxilios

Recomendaciones generales	Retire a la persona de la zona peligrosa. Acostar y transportar al afectado en posición lateral estable. Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y retirarla de forma controlada.
Inhalación	Trasladarse a un espacio abierto. Mantener al paciente en reposo y abrigado. Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica.
Contacto con la piel	Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Quítese inmediatamente la ropa y zapatos contaminados. Consultar a un médico si aparece y persiste una irritación.
Contacto con los ojos	Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados, al menos durante 15 minutos. Después de los primeros 5 minutos retirar las lentillas, si presentes, y continuar enjuagando el ojo. Consultar a un médico si aparece y persiste una irritación.
Ingestión	Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica. Enjuagar la boca y dar a beber agua en pequeños sorbos. NO provocar el vómito al menos de hacerlo bajo el control de un médico o del centro de control de envenenamiento. Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente. No dejar el afectado sin vigilancia.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Síntomas	Hasta la fecha, no se conocen síntomas.

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Riesgos	El producto no es un inhibidor de colinesterasa.
Tratamiento	El tratamiento con atropina y oximas no está indicado. Se recomienda el tratamiento sintomático y adecuado a la condición del paciente. No existe antídoto específico.

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1 Medios de extinción

Adecuados	Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, polvo seco o dióxido de carbono.
Inadecuados	Chorro de agua de gran volumen

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla	En caso de incendio puede(n) desprenderse:, Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO2), Óxidos de nitrógeno (NOx), Oxidos de fósforo

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios	En caso de incendio o de explosión, no respire los humos. En caso de fuego, protéjase con un equipo respiratorio autónomo.
Información adicional	Contener la expansión de las aguas de extinción. No permitir que el producto entre en contacto directo con el agua.

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Precauciones	Evitar el contacto con los productos derramados o las superficies contaminadas. Utilícese equipo de protección individual.

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza

Métodos de limpieza	Recoger con un producto absorbente inerte (por ejemplo, arena, diatomita, fijador de ácidos, fijador universal, serrín). Recoger y traspasar el producto a contenedores correctamente etiquetados y herméticamente cerrados. Observando las normas de protección del medio ambiente, limpiar a fondo todos los utensilios y el suelo contaminados.
6.4 Referencia a otras secciones	Indicaciones relativas a manipulación segura, ver sección 7. Indicaciones relativas al equipo de protección individual, ver sección 8. Indicaciones relativas a eliminación de residuos, ver sección 13.

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

7.1 Precauciones para una manipulación segura

Consejos para una manipulación segura	Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. Asegúrese una ventilación apropiada.
Medidas de higiene	Lavarse las manos cuidadosamente con agua y jabón antes de comer, beber, mascar chicle, consumir tabaco, ir al aseo o aplicar cosméticos. Quitar inmediatamente el equipo de protección individual (PPE) después de la manipulación de este producto. Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y reutilizar la ropa solamente después de una limpieza a fondo. Lavarse a fondo y ponerse ropa limpia. Mantenga separadas las ropas de trabajo del resto del vestuario. Destruir (quemar) la ropa que no puede limpiarse.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Exigencias técnicas para almacenes y recipientes	Almacenar en el envase original. Almacenar en ambiente fresco y seco evitando la contaminacion cruzada con otros productos fitosanitarios, fertilizantes, alimentos y forraje. Almacenar en un lugar accesible sólo a personas autorizadas. Reacciona con acero galvanizado o acero blando sin revestimiento produciendo hidrógeno, un gas altamente inflamable que puede explotar. Proteger contra las heladas. Una cristalización parcial puede suceder al cabo de un almacenamiento prolongado bajo la temperatura mínima para éste. La congelación afectara el aspecto físico pero no dañará el material. Descongelar y mezclar antes de utilizar.
Indicaciones para el almacenamiento conjunto	Manténgase separado de alimentos, bebidas y piensos.

SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL

8.1 Parámetros de control

No se conocen valores límite oficiales de exposición profesional.

8.2 Controles de la exposición

Protección personal
En condiciones normales de uso y manipulación referirse a las instrucciones de la etiqueta y/o el prospecto. En el resto de casos deberán aplicarse las siguientes recomendaciones.

Protección respiratoria	No es necesaria protección respiratoria en las condiciones de exposición previstas. La protección respiratoria debe ser usada solo para evitar el riesgo residual de actividades de corta duración, cuando todas las medidas posibles para reducir la exposición en la fuente hayan sido tomadas, p.e. contención o extracción y ventilación local. Seguir siempre las instrucciones del fabricante del equipo de protección respiratoria en cuanto a utilización y mantenimiento.
Protección de las manos	Por favor, observe las instrucciones en cuanto a la permeabilidad y el tiempo de adelanto que son provistos por el proveedor de los guantes. También tener en cuenta las condiciones locales específicas bajo las cuales el producto es utilizado, tal como el peligro de cortes, de abrasión y el tiempo de contacto. Lavar los guantes si están contaminados. Eliminarlos si están contaminados de dentro, si son perforados o si la contaminación exterior no puede ser eliminada.

Material	Caucho nitrilo
Tasa de permeabilidad	> 480 min
Espesor del guante	> 0,4 mm
Directiva	Guantes de protección cumpliendo con la EN 374.

Protección de los ojos	Utilice gafas de protección (conformes con la EN166, campo de uso = 5 u homologación equivalente).
Protección de la piel y del cuerpo	Utilizar un mono estándar y ropa de protección de categoría 3 tipo 6. En caso de riesgo de exposición significativa, considerar un tipo superior de ropa de protección.

Llevar dos capas de ropa siempre que sea posible. Un mono de algodón o de poliéster/algodón debería llevarse bajo el traje de protección química y debería ser lavado profesionalmente de manera frecuente.
Si el traje de protección química es salpicado, rociado o contaminado significativamente, descontaminar todo lo posible y quitárselo cuidadosamente. Eliminar según las indicaciones del fabricante.

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Forma	Líquido, claro
Color	ámbar claro a marrón claro
Olor	inodoro
Umbral olfativo	Sin datos disponibles
pH	4,4 - 5,0 (5,9 %) (23 °C) (agua demineralizada)
Punto/intervalo de fusión	Sin datos disponibles
Punto /intervalo de ebullición	No aplicable
Punto de inflamación	no se inflama
Inflamabilidad	Sin datos disponibles
Temperatura de auto-inflamación	Sin datos disponibles
Descomposición térmica	Sin datos disponibles
Energía mínima de ignición	Sin datos disponibles
Temperatura de descomposición autoacelerada (TDAA)	Sin datos disponibles
Límite superior de explosividad	Sin datos disponibles
Límites inferior de explosividad	Sin datos disponibles
Presión de vapor	Sin volatilidad significativa.
Tasa de evaporación	Sin datos disponibles
Densidad relativa del vapor	No aplicable
Densidad relativa	1,356
Densidad	aprox. 1,36 g/cm³ (20 °C)
Solubilidad en agua	soluble
Coeficiente de reparto n-octanol/agua	Sal de potassio de glifosato: log Pow: < -3,2 (25 °C)

Viscosidad, dinámica	Sin datos disponibles
Viscosidad, cinemática	No aplicable
Propiedades comburentes	Sin datos disponibles
Explosividad	No explosivo
9.2 Otra información	No se conocen más datos físico-químicos relevantes para la seguridad.

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1 Reactividad	Estable en condiciones normales.
10.2 Estabilidad química	Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.
10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas	Reacciona con acero galvanizado o acero blando sin revestimiento produciendo hidrógeno, un gas altamente inflamable que puede explotar.
10.4 Condiciones que deben evitarse	Temperaturas extremas y luz directa del sol.
10.5 Materiales incompatibles	Acero galvanizado, Acero al carbono, Acero dulce no recubierto Almacenar solamente en el contenedor original.
10.6 Productos de descomposición peligrosos	Productos de combustión peligrosos: ver sección 5.

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad oral aguda	DL50 (Rata) > 5.000 mg/kg Se realizó el ensayo con un producto formulado de características similares.
Toxicidad aguda por inhalación	CL50 (Rata) Tiempo de exposición: 4 h No relevante Aerosoles inhalables no se forman en las aplicaciones actuales y previstas. Ninguna mortalidad. Se realizó el ensayo con un producto formulado de características similares.
Toxicidad cutánea aguda	DL50 (Rata) > 5.000 mg/kg Se realizó el ensayo con un producto formulado de características similares.
Corrosión o irritación	Ligeramente irritante - no requiere etiqueta por este concepto. (Conejo)

cutáneas	Se realizó el ensayo con un producto formulado de características similares.
Lesiones o irritación ocular graves	Irrita los ojos. (Conejo) Se realizó el ensayo con un producto formulado de características similares.
Sensibilización respiratoria o cutánea	Piel: No sensibilizante. (Conejillo de indias) OCDE Línea Directriz de Prueba 406, Prueba de Buehler Se realizó el ensayo con un producto formulado de características similares.

Evaluación toxicidad especifica en determinados órganos (STOT) - exposición única

Sal de potassio de glifosato: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Evaluación toxicidad especifica en determinados órganos (STOT) - exposiciones repetidas

Sal de potassio de glifosato no causó toxicidad especifica en órganos diana durante los estudios experimentales con animales.

Evaluación de la mutagénicidad

Sal de potassio de glifosato no está considerado mutagéno.

Evaluación de la toxicidad para la reproducción

Sal de potassio de glifosato: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Evaluación de toxicidad del desarrollo

Sal de potassio de glifosato: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Peligro de aspiración

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

12.1 Toxicidad

Toxicidad para los peces	CL50 (Oncorhynchus mykiss (Trucha irisada)) 18 mg/l Ensayo estático; Tiempo de exposición: 96 h Se realizó el ensayo con un producto formulado de características similares.
Toxicidad crónica para peces	Oncorhynchus mykiss (Trucha irisada) Ensayo dinámico NOEC: >= 9,63 mg/l El valor indicado corresponde a la materia activa técnica glifosato.
Toxicidad para los invertebrados acuáticos	CL50 (Daphnia magna (Pulga acuática grande)) 52 mg/l Ensayo estático; Tiempo de exposición: 48 h Se realizó el ensayo con un producto formulado de características similares.
Toxicidad crónica para	CE50 (Daphnia magna (Pulga acuática grande)): 12,5 mg/l

invertebrados acuáticos	Tiempo de exposición: 21 d El valor indicado corresponde a la materia activa técnica glifosato.
Toxicidad para las plantas acuáticas	CE50r (Algas) 1,4 mg/l Se realizó el ensayo con un producto formulado de características similares.

12.2 Persistencia y degradabilidad

Biodegradabilidad	Sal de potassio de glifosato: No es fácilmente biodegradable.
Koc	Sal de potassio de glifosato: Koc: 884

12.3 Potencial de bioacumulación

Bioacumulación	Sal de potassio de glifosato: Factor de bioconcentración (FBC) < 1

12.4 Movilidad en el suelo

Movilidad en el suelo	Sal de potassio de glifosato: Variable, depende de la temperatura, tipo de suelo, humedad del suelo, pH del suelo y contenido de materia orgánica.

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

Valoración PBT y MPMB	Sal de potassio de glifosato: Esta sustancia no se considera que sea persistente, bioacumulable y tóxica (PBT). Esta sustancia no se considera que sea muy persistente y muy bioacumulable (vPvB).

12.6 Otros efectos adversos

Información ecológica complementaria	No hay más información ecológica disponible.

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

Producto	Observando las normas en vigor y, en caso necesario, después de haber consultado al responsable de la eliminación y a la autoridad competente, el producto puede ser llevado a un vertedero o a una planta incineradora.
Envases contaminados	Los envases con restos de producto deberán ser eliminados como residuos peligrosos.

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

ADR/RID/ADN

14.1 Número ONU	**3082**
14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas	SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (GLYPHOSATE POTASSIUM SALT, ALCOHOLS, C12-16-ALKYL ETHERS, PROPOXYLATED, AMINATED, ETHOXYLATED SOLUTION)

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte	9
14.4 Grupo de embalaje	III
14.5 Marca de peligroso para el medio ambiente	SI
No. de peligro	90
Código de Túnel	-

En principio esta clasificación no es válida para el transporte en buque cisterna por vías interiores navegables. Por favor, consulte al fabricante para obtener más información.

IMDG

14.1 Número ONU	**3082**
14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (GLYPHOSATE POTASSIUM SALT, ALCOHOLS, C12-16-ALKYL ETHERS, PROPOXYLATED, AMINATED, ETHOXYLATED SOLUTION)
14.3 Clase(s) de peligro para el transporte	9
14.4 Grupo de embalaje	III
14.5 Contaminante marino	SI

IATA

14.1 Número ONU	**3082**
14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (GLYPHOSATE POTASSIUM SALT, ALCOHOLS, C12-16-ALKYL ETHERS, PROPOXYLATED, AMINATED, ETHOXYLATED SOLUTION)
14.3 Clase(s) de peligro para el transporte	9
14.4 Grupo de embalaje	III
14.5 Marca de peligroso para el medio ambiente	SI

14.6 Precauciones particulares para los usuarios
Ver secciones 6 a 8 de la presente Ficha de Datos de Seguridad.

14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol y del Código IBC
No transportar a granel de acuerdo con el Código IBC.

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Información adicional

Clasificación OMS: U (Es poco probable que se presenten riesgos agudos durante su uso normal)

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN

Abreviaturas y acrónimos

ADN	Acuerdo Europeo sobre el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Vía Navegable
ADR	Acuerdo Europeo sobre el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera
CAS-Nr.	Número del Chemical Abstracts Service
CEx	Concentración efectiva de x%
CIx	Concentración de inhibición de x%
CLx	Concentración letal de x%
Conc.	Concentración
DLx	Dosis letal de x%
EINECS	Inventario Europeo de Sustancias Comerciales Existentes
ELINCS	Lista Europea de Sustancias Químicas Notificadas
EN/NE	Norma Europea
ETA	Estimación de la toxicidad aguda
EU/UE	Unión Europea
IATA	International Air Transport Association: Asociación de Transporte Aéreo Internacional
IBC	International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk (IBC Code) - Código internacional para la construcción y el equipo de buques que transporten productos químicos peligrosos a granel (Código CIQ)
IMDG	International Maritime Dangerous Goods: Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas
LOEC/LOEL	Menor concentración/nivel con efecto observado
MARPOL	MARPOL: International Convention for the prevention of marine pollution from ships: Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques
MPT	Media ponderada en el tiempo
N.O.S./N.E.P	Not otherwise specified / No especificado en otra parte
NOEC/NOEL	Concentración/nivel sin efecto observable
No. CE	Número de la Comunidad Europea
OCDE	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
OMS	Organización Mundial de la Salud
RID	Reglamento relativo al Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril
UN	Naciones Unidas

La información contenida en esta Ficha de Datos de Seguridad es conforme a las disposiciones del Reglamento (UE) 1907/2006 y el Reglamento (UE) 2015/830 que modifica el Reglamento (UE) 1907/2006 (y posteriores enmiendas). Esta ficha de datos de seguridad complementa las instrucciones técnicas para el usuario, pero no las reemplaza. Los datos que contiene están basados en el conocimiento disponible sobre el producto referido en la fecha de revisión indicada. Se advierte encarecidamente a los usuarios de los posibles riesgos que supone usar un producto con propósitos distintos a aquellos para los que ha sido creado. La información proporcionada es conforme a las disposiciones reglamentarias comunitarias en vigor. Se requiere de los destinatarios de esta ficha que observen cualquier requisito reglamentario nacional adicional.

Razon para la revisión: Las siguientes secciones han sido revisadas: Sección 2: Identificación de los peligros. Sección 11: Información toxicológica. Sección 12. Información ecológica. Sección 14: Información relativa al transporte.

Los cambios desde la última versión serán destacados en el margen. Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores.

INGENIERIA CMC S.A.S

FICHA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO MAYOR Y/O VEHICULO

VEHICULO / MAQUINARIA: tractor MARCA: LTH MODELO: _____ PLACA: 7642

OPERADOR: Luis Mercado ESTADO: PROPIO ☐ ALQUILADO ☐

PROPIETARIO: Ingeniería CMC FRENTE / UBICACIÓN: _____

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A REALIZAR:	FRECUENCIA DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO
CAMBIO DE CORREA DE TRASLACION	SEGÚN USO
CAMBIO DE CORREAS DE LA UNIDAD DE CORTE	SEGÚN USO
CAMBIO DE CUCHILLAS O AFILADA DE CUCHILLAS	SEGÚN USO
CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTROS DE AIRE Y COMBUSTIBLE	CADA 60 HORAS
ENGRASE DE RODAMIENTOS	UNA VEZ POR SEMANA

MANTENIMIENTO					Observacion (Descripcion del Mantenimiento realizado)	Responsable
Fecha	Ultimo Horometro	Próximo Horometro	Correctivo	Preventivo		
12/04/25	2003.8	2063.8	-	-	20038 tractor Cambio de Aceite	Luis M.
09/04/25	-	-	-	-	tractor Cambio de empaque	Luis M.
15/04/25	-	-	-	-	tornillos tractor Apriete de motor	Luis M.
09/05/25					tractor Postura del arranque	Luis M.
03/06/25	21024	21824	-	-	tractor Cambio de Aceite	Luis M.
04/06/2025	22027	22067			Fuga Cambio De Aceite	Luis M.
16/06/2025	23712				cambio Aceite	Luis M.

INGENIERIA CMC S.A.S

FICHA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO MAYOR Y/O VEHICULO

VEHICULO / MAQUINARIA: 027 MARCA: Go MODELO: _____ PLACA: _____

OPERADOR: Luis Mercado ESTADO: PROPIO ☐ ALQUILADO ☐

PROPIETARIO: Ingeniería CMC FRENTE / UBICACIÓN: _____

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A REALIZAR:	FRECUENCIA DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO
CAMBIO DE CORREA DE TRASLACION	SEGÚN USO
CAMBIO DE CORREAS DE LA UNIDAD DE CORTE	SEGÚN USO
CAMBIO DE CUCHILLAS O AFILADA DE CUCHILLAS	SEGÚN USO
CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTROS DE AIRE Y COMBUSTIBLE	CADA 60 HORAS
ENGRASE DE RODAMIENTOS	UNA VEZ POR SEMANA

MANTENIMIENTO						
Fecha	Ultimo Horometro	Próximo Horometro	Correctivo	Preventivo	Observacion (Descripcion del Mantenimiento realizado)	Responsable
31/05/2025	2888.82968.8		G		cambio de cuchillas y cambio de aceite	Luis M.
11/06/2025	2970.1	3050.1	G		cambio de llantes delanteros	Luis M.
20/06/2025	31601	31660		X	cambio aceite	Luis M.

CONSORCIO INNOVAPARQUES

Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo

FORMATO N°: FT-SST-003

FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES

Fecha: Septiembre 08 de 2019
Versión: 001
Página 1 de 1

DATOS DE LA INSPECCION

Inspeccionado por: DIOMEDES JIMENEZ			HRS Inicial	95798	HRS Final	95958	
PLACA VEHICULO: EXZ 115			Marca: JAC		Serie No: HFC1035AN		Función: MOVIL 1
Ubicación: CAMPOS NATURALES	Sección: MTO	Semana de:	2	Al: 6	Mes de:	JUNIO /25	

INSPECCION

Item	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Jue		Vie		Sab		Dom	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
DOCUMENTOS																	
Licencia de tránsito	En Regla	x		x		x		x		x		x					
Revision tecnico mecanica	En Regla	x		x		x		x		x		x					
Seguro obligatorio	En Regla	x		x		x		x		x		x					
Seguro contractual	Vigente	x		x		x		x		x		x					
Seguro extracontractual	En Regla	x		x		x		x		x		x					
Licencia de conduccion	En Regla	x		x		x		x		x		x					
Planos, mapas viales, gps	En Regla	x		x		x		x		x		x					
Contactos de Emergencia	En Regla	x		x		x		x		x		x					
EQUIPO EMERGENCIAS																	
Linterna con pilas	En buen estado	x		x		x		x		x		x					
Botiquin	Completo	x		x		x		x		x		x					
Extintor	Pin de seguridad, Cargado, vigente	x		x		x		x		x		x					
PARTE EXTERNA																	
Espejos laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado	x		x		x		x		x		x					
Luces traseras	De freno, mínimo dos / de color rojo / Direccionales	x		x		x		x		x		x					
Llantas	Libres de rajaduras y sin desgaste excesivo	x		x		x		x		x		x					
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente	x		x		x		x		x		x					
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos funcionando correctamente	x		x		x		x		x		x					
Lamparas Luces delanteras	Lentes sin roturas/ funcionando / de color blanco / amarillo	x		x		x		x		x		x					
Indicador luces de parqueo	Mínimo dos / funcionando correctamente	x		x		x		x		x		x					
Tanque de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y ajustada	x		x		x		x		x		x					
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR																	
Fuente de energía (BATERIA)	Sin roturas/ Anclada adecuadamente	x		x		x		x		x		x					
Conexiones eléctricas	Firmes y en buen estado	x		x		x		x		x		x					
Nivel agua refrigeración / mangueras	Nivel correcto / mangueras sin fugas	x		x		x		x		x		x					
Estado de las líneas hidráulicas	Limpias sin fugas y en buen estado	x		x		x		x		x		x					
Niveles de aceite motor / hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante	x		x		x		x		x		x					
Carcasa exterior	Anclada / sin roturas / ajustados	x		x		x		x		x		x					
Bomba de dirección / Nivel aceite	Sin fugas/ bien asegurada / Nivel de acuerdo al fabricante	x		x		x		x		x		x					
INTERIOR DE LA CABINA																	
Espejos retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado	x		x		x		x		x		x					
Vidrio panoramico y ventanas laterales	Sin roturas / manchas / adecuado	x		x		x		x		x		x					
Plumillas limpiavidrios/ motor levadizo eléctrico	Mínimo dos / empuque sin desgastes / funcionando / mínimo dos revoluciones	x		x		x		x		x		x					
Estado de la cabina	Protegida y en buen estado en general	x		x		x		x		x		x					
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible	x		x		x		x		x		x					
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor	x		x		x		x		x		x					
Silla/ Apoyo para la cabeza	Acomodable al piloto/ apoyo para la cabeza asegurado	x		x		x		x		x		x					
Pedales freno / clutch / acelerador	Con buen antideslizante / sin juego excesivo	x		x		x		x		x		x					
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente	x		x		x		x		x		x					
Equipo de carretera	Gato con capacidad para elevar el vehículo, una cruceta, dos señales de carretera en forma de triangulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocados en forma vertical o lamparas de señal de luz amarilla intermitente o de destello, dos tacos para bloquear el vehículo, caja de herramientas básica que como mínimo deberá contener alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas, llanta de repuesto. (Inferno (Art 30 del código nacional de tránsito ley 769 de 2002)	x		x		x		x		x		x					
Cinturones de seguridad	De 3 puntos de apoyo	x		x		x		x		x		x					
Pito	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m	x		x		x		x		x		x					
Timon o volante	Funcionando en perfectas condiciones	x		x		x		x		x		x					
Frenos	Pedales con antideslizante/ nivel de liquido de acuerdo al fabricante	x		x		x		x		x		x					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Nombre y Firma del Tecnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES		Fecha: Septiembre 06 de 2019 Versión: 001 Página 1 de 1

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: LUIS MERCADO			HRS Inicial	95356	HRS Final	95536	
PLACA VEHICULO: EXZ 737			Marca: FOTON		Serie No: BJ1039V3JD3-1		Función: MOVIL 2
Ubicado en:CAMPOS NATURALES	Sección: MTO	Semana de:	2 Jul	6	Mes de:	Julio de 2019	

INSPECCIÓN

Item	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Jue		Vie		Sab		Dom	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
DOCUMENTOS																	
Licencia de tránsito	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Revisión tecnico mecánica	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Seguro obligatorio	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Seguro contractual	Vigente	X		X		X		X		X		X					
Seguro extracontractual	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Licencia de conducción	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Planos, mapas rutas, gps	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Contactos de Emergencia	En Regla	X		X		X		X		X		X					
EQUIPO EMERGENCIAS																	
Linterna con pilas	En buen estado	X		X		X		X		X		X					
Botiquin	Completo	X		X		X		X		X		X					
Extintor	Con de seguridad. Cargado. vigente	X		X		X		X		X		X					
PARTE EXTERNA																	
Espejos laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado	X		X		X		X		X		X					
Luces traseras	De freno, mínimo dos / de color roja / Direccionales	X		X		X		X		X		X					
Llantas	Libres de rajaduras y sin desgaste excesivo	X		X		X		X		X		X					
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente	X		X		X		X		X		X					
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos funcionando correctamente	X		X		X		X		X		X					
Lámparas Luces delanteras	Lentes sin roturas/ funcionando / de color blanco / amarillo	X		X		X		X		X		X					
Indicador luces de parqueo	Mínimo dos / funcionando correctamente	X		X		X		X		X		X					
Tanque de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y ajustada	X		X		X		X		X		X					
COMPARTIMENTO DEL MOTOR																	
Fuente de energía (BATERIA)	Sin rajaduras/ Ajustada adecuadamente	X		X		X		X		X		X					
Conexiones eléctricas	Firmes y en buen estado	X		X		X		X		X		X					
Nivel agua refrigeración / mangueras	Nivel correcto / mangueras sin fugas	X		X		X		X		X		X					
Estado de las líneas hidraulicas	Líneas sin fugas y en buen estado	X		X		X		X		X		X					
Niveles de aceite motor / hidraulico	Niveles de acuerdo al fabricante	X		X		X		X		X		X					
Cableado eléctrico	Ajustado / sin roturas / aislados	X		X		X		X		X		X					
Botella de dirección / Nivel aceite	Sin fugas/ Bien asegurado / nivel de acuerdo al fabricante	X		X		X		X		X		X					
INTERIOR DE LA CABINA																	
Espejo retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado	X		X		X		X		X		X					
Vidrio delantero/ vidrios ventanales	Sin roturas / manchas / distorsiones	X		X		X		X		X		X					
Pedales embrague/ freno/ motor levadizos/fijos	Mínimo dos / empaque sin desgastes / funcionando / mínimo dos revoluciones	X		X		X		X		X		X					
Estado de la cabina	Protegida y en buen estado en general	X		X		X		X		X		X					
Indicador de combustible	La aguja o indicador debe marcar el nivel de combustible	X		X		X		X		X		X					
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor	X		X		X		X		X		X					
Silla/ Apoya para la cabeza	Atornillada al piso/ firme para la cabeza asegurado	X		X		X		X		X		X					
Pedales freno / clutch / acelerador	Con forro antideslizante / sin juego excesivo	X		X		X		X		X		X					
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente	X		X		X		X		X		X					
Equipo de carretera	Gato con capacidad para elevar el vehículo, una cruceta, dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello, dos tacos para bloquear el vehículo, caja de herramientas básicos que como mínimo deberá contener alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas, llanta de repuesto. (norma (Art 30 del código nacional de tránsito ley 769 de 2002)	X		X		X		X		X		X					
Cinturones de seguridad	De 3 puntos de apoyo	X		X		X		X		X		X					
Pito	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m	X		X		X		X		X		X					
Timon o volante	Funcionando en perfectas condiciones	X		X		X		X		X		X					
Frenos	Pedales con antideslizante/ nivel de líquido de acuerdo al fabricante	X		X		X		X		X		X					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Luis Mercado

Nombre y Firma del Tecnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES		Fecha: Septiembre 08 de 2019 Versión: 001 Pagina 1 de 1

DATOS DE LA INSPECCIÓN								
Inspeccionado por: Luis Mercado			HRS Inicial	56532.		HRS Final	56572.	
Maquina-Equipo: TRACTOR LTH 1842			Marca: HUSQVARNA		Serie No: 4133313063		Función: CEPILLAR	
Ubicación: CAMPOS SINTETICOS	Sección:MTO	Semana de:	2	Al:	06	Mes de:	Junio /25.	

INSPECCIÓN

TRACTOR LTH 1842	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	ACEITE MOTOR	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	FILTRO ACEITE	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	FILTRO COMBUSTIBLE	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	ACEITE HIDRAULICO	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	FILTRO DE AIRE	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	CABLES Y POLEAS	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	ENGRASE	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	CUCHILLAS	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	CEPILLO	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	CORREA TENSORA	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	CINTURON DE SEGURIDAD	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	MANDOS DE OPERACIÓN	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	FRENOS	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	LLANTAS	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	BATERIA	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	ENCENDIDO	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	SISTEMA DE ATRACCION	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	HOROMETRO	x		✓		✓		✓		✓		✓					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Luis Mercado
Nombre y Firma del Tecnico Operador

CONSORCIO DINOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES	Fecha:	Septiembre 08 de 2019
	Versión:	001
	Pagina 1 de 1	

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: DIOMEDES JIMENES	HRS Inicial	3703.	HRS Final	3763	
Maquina-Equipo: GIRO ZERO PZT-60	Marca: HUSQVARNA		Serie No: 9676698895		Función: PODADORA
Ubicación: Naturales. Sección: MTO Semana de: 2	Al: 6	Mes de:	Junio / 2025		

INSPECCIÓN

GIRO ZERO PZT-60	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	ACEITE MOTOR	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	FILTRO ACEITE	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	FILTRO COMBUSTIBLE	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	ACEITE HIDRAULICO	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	FILTRO DE AIRE	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	CABLES Y POLEAS	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	ENGRASE	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	CUCHILLAS	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	CORREA DECK	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	CORREA TENSORA	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	CINTURON DE SEGURIDAD	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	MANDOS DE OPERACIÓN	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	FRENOS	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	LLANTAS	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	BATERIA	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	ENCENDIDO	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	SISTEMA DE ATRACCION	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	HOROMETRO	x		✓		✓		✓		✓		✓					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Diomedes Jimenez
Nombre y Firma del Tecnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES		Fecha: Septiembre 08 de 2019 Versión: 001 Pagina 1 de 1

DATOS DE LA INSPECCIÓN						
Inspeccionado por: DIOMEDES JIMENEZ			HRS Inicial	7:00 a. m.	HRS Final	4:00 p. m.
Maquina-Equipo: GUADAÑADORA			Marca: HUSQVARNA		Serie No: T05920109854	Función:DESMALEZADORA
Ubicación: SINTETICOS	Sección: MTO	Semana de:	2	Al: 6	Mes de:	junio de 2025

INSPECCIÓN

GUADAÑA	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	ACEITE MOTOR	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO ACEITE	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO COMBUSTIBLE	X		X		X		X		X		X					
	ACEITE HIDRAULICO	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO DE AIRE	X		X		X		X		X		X					
	VALBULINA	X		X		X		X		X		X					
	ENGRASE	X		X		X		X		X		X					
	CUCHILLAS	X		X		X		X		X		X					
	YOYO	X		X		X		X		X		X					
	MANGO DE SEGURIDAD	X		X		X		X		X		X					
	ENCENDIDO ELECTRICO	X		X		X		X		X		X					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Nombre y Firma del Tecnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-055
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES	Fecha:	Septiembre 08 de 2019
	Versión:	001
	Pagina 1 de 1	

DATOS DE LA INSPECCIÓN						
Inspeccionado por: LUIS MERCADO	HRS Inicial	7:00 a. m.	HRS Final	4:00 p. m.		
Maquina-Equipo: GUADAÑADORA	Marca: HUSQVARNA		Serie No: TT05920108642		Función:DESMALEZADORA	
Ubicación: SINTETICOS / Sección: MTO / Semana de:	2	Al: 6	Mes de:	junio de 2025		

INSPECCIÓN

GUADAÑA	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	ACEITE MOTOR	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO ACEITE	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO COMBUSTIBLE	X		X		X		X		X		X					
	ACEITE HIDRAULICO	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO DE AIRE	X		X		X		X		X		X					
	VALBULINA	X		X		X		X		X		X					
	ENGRASE	X		X		X		X		X		X					
	CUCHILLAS	X		X		X		X		X		X					
	YOYO	X		X		X		X		X		X					
	MANGO DE SEGURIDAD	X		X		X		X		X		X					
	ENCENDIDO ELECTRICO	X		X		X		X		X		X					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Luis Mercado
Nombre y Firma del Tecnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

FORMATO N°: FT-SST-068

FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES

Fecha: Septiembre 08 de 2019

Página 1 de 1

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: DIOMEDES JIMENEZ — HRS Inicial: 95958 — HRS Final: 96111

PLACA VEHICULO: EXZ 115 — Marca: JAC — Serie No: HFC1633KN — Parque: MOVIL 1

Ubicación: CAMPOS NATURALES — Sector: HTO — Semana de: 4 Al: 12 — Mes de: Junio / 19

INSPECCIÓN

Item	Estándar	Aplica Si	Aplica No	Lun C	Lun NC	Mar C	Mar NC	Mier C	Mier NC	Juv C	Juv NC	Vie C	Vie NC	Sab C	Sab NC	Dom C	Dom NC
DOCUMENTOS																	
Licencia de tránsito	En Regla	x		x		x		x		x		x					
Revisión tecno mecanica	En Regla	x		x		x		x		x		x					
Seguro obligatorio	En Regla	x		x		x		x		x		x					
Seguro contractual	Vigente	x		x		x		x		x		x					
Seguro extracontractual	En Regla	x		x		x		x		x		x					
Licencia de conducción	En Regla	x		x		x		x		x		x					
Planos, mapas rutas, ppt	En Regla	x		x		x		x		x		x					
Contactos de Emergencia	En Regla	x		x		x		x		x		x					
EQUIPO EMERGENCIAS																	
Linterna con pilas	En buen estado	x		x		x		x		x		x					
Botiquin	Completo	x		x		x		x		x		x					
Extintor	Pin de seguridad, Cargado, vigente	x		x		x		x		x		x					
PARTE EXTERNA																	
Espejos laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado	x		x		x		x		x		x					
Luces traseras	De freno, mínimo dos / de color rojo / Direccionales	x		x		x		x		x		x					
Llantas	Libres de rajaduras y sin desgaste excesivo	x		x		x		x		x		x					
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente	x		x		x		x		x		x					
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos funcionando correctamente	x		x		x		x		x		x					
Lamparas Luces delanteras	Lentes sin roturas/ funcionando / de color blanco / amarillo	x		x		x		x		x		x					
Indicador luces de parqueo	Mínimo dos / funcionando correctamente	x		x		x		x		x		x					
Tanque de combustible	Sin fugas / asutado / con tapa original y ajustada	x		x		x		x		x		x					
COMPARTIMENTO DEL MOTOR																	
Fuente de energía (BATERIA)	Sin raspaduras/ Asiada adecuadamente	x		x		x		x		x		x					
Conexiones eléctricas	Firmes y en buen estado	x		x		x		x		x		x					
Nivel agua refrigeración / monguetas	Nivel correcto / mangueras sin fugas	x		x		x		x		x		x					
Estado de las correas hidráulicas	Limpias sin fugas y en buen estado	x		x		x		x		x		x					
Nuentes de motor / monguitos	Nuentes de acuerdo al fabricante	x		x		x		x		x		x					
Cableado eléctrico	Asiado / sin roturas / aislados	x		x		x		x		x		x					
Bomba de dirección / Nivel aceite	Sin fugas/ bien asegurado / nivel de acuerdo al fabricante	x		x		x		x		x		x					
INTERIOR DE LA CABINA																	
Espejo retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado	x		x		x		x		x		x					
Vidrio panorámico vidrios laterales	Sin roturas / manchas / deformaciones	x		x		x		x		x		x					
Pruebas encendido/ motor/ electrónicos	Mínimo dos / arranque sin desgastes / funcionamiento / mínimo dos revoluciones	x		x		x		x		x		x					
Estado de la cabina	Protegida y en buen estado en general	x		x		x		x		x		x					
Indicador de combustible	La aguja o indicador debe mostrar el nivel de combustible	x		x		x		x		x		x					
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor	x		x		x		x		x		x					
Silla/ Apoyo para la cabeza	Adecuadas al piso/ apoyo para la cabeza asegurado	x		x		x		x		x		x					
Pedales freno / clutch / acelerador	Con forza antideslizante / sin juego excesivo	x		x		x		x		x		x					
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente	x		x		x		x		x		x					
Equipo de carretera	Gato con capacidad para elevar el vehículo. Una cruceta, dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello, dos tacos para bloquear el vehículo. Caja de herramientas básica que como mínimo deberá contener alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas, llanta de repuesto. Extintor. (Art 30 del código nacional de tránsito ley 769 de 2002)	x		x		x		x		x		x					
Cinturones de seguridad	De 3 puntos de apoyo	x		x		x		x		x		x					
Pito	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m.	x		x		x		x		x		x					
Timón o volante	Funcionando en perfectas condiciones	x		x		x		x		x		x					
Frenos	Probados con antideslizante nivel de líquido de acuerdo al fabricante	x		x		x		x		x		x					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Nombre y Firma del Tecnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

FORMATO N°: PT-SST-005

FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES

Fecha: Septiembre 06 de 2019

Página 1 de 1

DATOS DE LA INSPECCION

Inspeccionado por: LUIS MERCADO — HRS Inicial: 95536 — HRS Final: 95636

PLACA VEHICULO: EXZ 737 — Marca: FOTON — Serie No: BJ1039V5JD3-1 — Furgon: MOVIL 2

Ubicación CAMPOS NATURALES — Semana de: 02 Al: 13 — Mes de: AGOSTO / 2019

INSPECCIÓN

Item	Estándar	Aplica Si	Aplica No	Lun C	Lun NC	Mar C	Mar NC	Mier C	Mier NC	Jue C	Jue NC	Vie C	Vie NC	Sab C	Sab NC	Dom C	Dom NC
DOCUMENTOS																	
Licencia de tránsito	En Regla	X		X		X		X		X		X		-			
Revisión tecnico mecánica	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Seguro obligatorio	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Seguro contractual	Vigente	X		X		X		X		X		X					
Seguro extracontractual	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Licencia de conducción	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Planos, mapas rutas, gps	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Contactos de Emergencia	En Regla	X		X		X		X		X		X					
EQUIPO EMERGENCIAS																	
Linterna con pilas	En buen estado	X		X		X		X		X		X					
Botiquin	Completo	X		X		X		X		X		X					
Extintor	Pin de seguridad. Cargado, vigente	X		X		X		X		X		X					
PARTE EXTERNA																	
Espejos laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado	X		X		X		X		X		X					
Luces traseras	De freno mínimo dos / de color roja / Direccionales	X		X		X		X		X		X					
Llantas	Libres de rajaduras y sin desgaste excesivo	X		X		X		X		X		X					
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente	X		X		X		X		X		X					
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos funcionando correctamente	X		X		X		X		X		X					
Lamparas Luces delanteras	Lentes sin roturas/ funcionando / de color blanco / amarillo	X		X		X		X		Y		X					
Indicador luces de parqueo	Mínimo dos / funcionando correctamente	X		X		X		X		X		X					
Tanque de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y asegurada	X		X		X		X		X		X					
COMPARTIMENTO DEL MOTOR																	
Fuente de energía (BATERIA)	Sin raspaduras/ Asegurada adecuadamente	X		X		X		X		X		X					
Conexiones eléctricas	Firmes y en buen estado	X		X		X		X		X		X					
Nivel agua refrigeración / mangueras	Nivel correcto / mangueras sin fugas	X		X		X		X		X		X					
Estado de las líneas hidráulicas	Limpias sin fugas y en buen estado	X		X		X		X		X		X					
Niveles de aceite motor / hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante	X		X		X		X		X		X					
Cableado eléctrico	Asidos / sin roturas / ajustados	X		X		X		X		X		X					
Bomba de dirección / Nivel aceite	Sin fugas/ bien asegurado / nivel de acuerdo al lubricante	X		X		X		X		X		X					
INTERIOR DE LA CABINA																	
Espejos retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado	X		X		X		X		X		X					
Vidrio panorámicos/ vidrios ventanas	Sin roturas / manchas / deformidades	X		X		X		X		X		X					
Plumillas limpiaparabrisas/ motor limpiaparabrisas	Mínimo dos / enlaces sin desgastes / funcionando / mínimo dos revoluciones	X		X		X		X		X		X					
Estado de la cabina	Protegida y en buen estado en general	X		X		X		X		X		X					
Indicador de combustible	La aguja o indicador debe mostrar el nivel de combustible	X		X		X		X		X		X					
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor	X		X		X		X		X		X					
Silla/ Apoyo para la cabeza	Adecuadas al piloto/ apoyo para la cabeza asegurado	X		X		X		X		X		X					
Pedales freno / clutch / acelerador	Con forro antideslizante / sin juego excesivo	X		X		X		X		X		X					
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente	X		X		X		X		X		X					
Equipo de carretera	Gato con capacidad para elevar el vehículo, una cruceta, dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o dispositivo de señal de luz amarilla intermitente o de destello, dos tacos para bloquear el vehículo, caja de herramientas básica que como mínimo deberá contener alicate, destornilladores, llave de expansión y movil-grip, tornillo de repuesto, linterna. (Art 30 del código nacional de tránsito ley 769 de 2002)	X		X		X		X		X		X					
Cinturones de seguridad	De 3 puntos de apoyo	X		X		X		X		X		X					
Pito	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m.	X		X		X		X		X		X					
Timón o volante	Funcionando en perfectas condiciones	X		X		X		X		X		X					
Frenos	Pedales con antideslizante/ nivel de líquido de acuerdo al fabricante	X		X		X		X		X		X					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Luis Mercado
Nombre y Firma del Tecnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES	Fecha:	Septiembre 08 de 2019
	Versión:	001
		Pagina 1 de 1

DATOS DE LA INSPECCION

Inspeccionado por: Luis Mercado			HRS Inicial	56572	HRS Final	56614.	
Maquina-Equipo: TRACTOR LTH 1842			Marca: HUSQVARNA		Serie No: 4133313063		Función: CEPILLAR
Ubicación: CAMPOS SINTETICOS	Sección: MTO	Semana de: 9	Al: 13	Mes de:	Junio /25.		

INSPECCIÓN

TRACTOR LTH 1842	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	ACEITE MOTOR	x		x		x		x		x		x					
	FILTRO ACEITE	x		x		x		x		x		x					
	FILTRO COMBUSTIBLE	x		x		x		x		x		x					
	ACEITE HIDRAULICO	x		x		x		x		x		x					
	FILTRO DE AIRE	x		x		x		x		x		x					
	CABLES Y POLEAS	x		x		x		x		x		x					
	ENGRASE	x		x		x		x		x		x					
	CUCHILLAS	x		x		x		x		x		x					
	CEPILLO	x		x		x		x		x		x					
	CORREA TENSORA	x		x		x		x		x		x					
	CINTURON DE SEGURIDAD	x		x		x		x		x		x					
	MANDOS DE OPERACIÓN	x		x		x		x		x		x					
	FRENOS	x		x		x		x		x		x					
	LLANTAS	x		x		x		x		x		x					
	BATERIA	x		x		x		x		x		x					
	ENCENDIDO	x		x		x		x		x		x					
	SISTEMA DE ATRACCION	x		x		x		x		x		x					
	HOROMETRO	x		x		x		x		x		x					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Luis Mercado
Nombre y Firma del Tecnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES		Fecha: Septiembre 06 de 2019 Versión: 001 Pagina 1 de 1

DATOS DE LA INSPECCIÓN																		
Inspeccionado por: DIOMEDES JIMENES				HRS Inicial	3736			HRS Final	3776									
Maquina-Equipo: GIRO ZERO PZT-60				Marca: HUSQVARNA				Serie No: 9676698895				Función: PODADORA						
Ubicación: Bucaramanga		Sección: MTO.	Semana de:	9	Al:	13		Mes de:	Junio /23									
INSPECCIÓN																		
GIRO ZERO PZT-60	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom		
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
	ACEITE MOTOR	x		✓		✓		✓		✓		✓						
	FILTRO ACEITE	x		✓		✓		✓		✓		✓						
	FILTRO COMBUSTIBLE	x		✓		✓		✓		✓		✓						
	ACEITE HIDRAULICO	x		✓		✓		✓		✓		✓						
	FILTRO DE AIRE	x		✓		✓		✓		✓		✓						
	CABLES Y POLEAS	x		✓		✓		✓		✓		✓						
	ENGRASE	x		✓		✓		✓		✓		✓						
	CUCHILLAS	x		✓		✓		✓		✓		✓						
	CORREA DECK	x		✓		✓		✓		✓		✓						
	CORREA TENSORA	x		✓		✓		✓		✓		✓						
	CINTURON DE SEGURIDAD	x		✓		✓		✓		✓		✓						
	MANDOS DE OPERACIÓN	x		✓		✓		✓		✓		✓						
	FRENOS	x		✓		✓		✓		✓		✓						
	LLANTAS	x		✓		✓		✓		✓		✓						
	BATERIA	x		✓		✓		✓		✓		✓						
	ENCENDIDO	x		✓		✓		✓		✓		✓						
	SISTEMA DE ATRACCION	x		✓		✓		✓		✓		✓						
	HOROMETRO	x		✓		✓		✓		✓		✓						

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Nombre y Firma del Tecnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES	Fecha	Septiembre 08 de 2019
	Versión	001
	Pagina 1 de 1	

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: LUIS MERCADO			HRS Inicial	7:00 a. m.	HRS Final	4:00 p. m.
Maquina-Equipo: GUADAÑADORA			Marca: HUSQVARNA		Serie No: TT06920108642	Función:DESMALEZADORA
Ubicación: SINTETICOS	Sección: MTO	Semana de:	9	Al: 13	Mes de:	junio de 2025

INSPECCIÓN

GUADAÑA	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	ACEITE MOTOR	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO ACEITE	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO COMBUSTIBLE	X		X		X		X		X		X					
	ACEITE HIDRAULICO	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO DE AIRE	X		X		X		X		X		X					
	VALBULINA	X		X		X		X		X		X					
	ENGRASE	X		X		X		X		X		X					
	CUCHILLAS	X		X		X		X		X		X					
	YOYO	X		X		X		X		X		X					
	MANGO DE SEGURIDAD	X		X		X		X		X		X					
	ENCENDIDO ELECTRICO	X		X		X		X		X		X					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Luis Mercado
Nombre y Firma del Tecnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES	Fecha:	Septiembre 08 de 2019
	Versión:	001
	Pagina 1 de 1	

DATOS DE LA INSPECCION

Inspeccionado por: DIOMEDES JIMENEZ	HRS Inicial	7:00 a. m.	HRS Final	4:00 p. m.		
Maquina-Equipo: GUADAÑADORA	Marca: HUSQVARNA		Serie No: T05920109854		Función:DESMALEZADORA	
Ubicación: SINTETICOS / Sección: MTO / Semana de:	9	Al: 13	Mes de:	junio de 2025		

INSPECCIÓN

GUADAÑA	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	ACEITE MOTOR	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO ACEITE	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO COMBUSTIBLE	X		X		X		X		X		X					
	ACEITE HIDRAULICO	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO DE AIRE	X		X		X		X		X		X					
	VALBULINA	X		X		X		X		X		X					
	ENGRASE	X		X		X		X		X		X					
	CUCHILLAS	X		X		X		X		X		X					
	YOYO	X		X		X		X		X		X					
	MANGO DE SEGURIDAD	X		X		X		X		X		X					
	ENCENDIDO ELECTRICO	X		X		X		X		X		X					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Nombre y Firma del Tecnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES		Fecha: Septiembre 26 de 2019
		Página 1 de 1

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: LUIS MERCADO			HRS Inicial	95656	HRS Final	95835
PLACA VEHICULO: EXE737			Marca: FOTON		Serie No: 9J1183WJJD3-1	Version: MOVIL 2
Ubicación: CAMPOS NATURALES	Sección: MTO	Semana de:	Lu:	Al:	Mes de:	

INSPECCIÓN

Item	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Jue		Vie		Sab		Dom	
		SI	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
DOCUMENTOS																	
Licencia de tránsito	En Regla	X															
Revisión tecnico mecanica	En Regla	X															
Seguro obligatorio	En Regla	X															
Seguro contractual	Vigente	X															
Seguro extracontractual	En Regla	X															
Licencia de conducción	En Regla	X															
Planos, mapas rutas, cpis	En Regla	X															
Contactos de Emergencia	En Regla	X															
EQUIPO EMERGENCIAS																	
Linterna con pilas	En buen estado	X															
Botiquin	Completo	X															
Extintor	Pin de seguridad. Cargado, vigente	X															
PARTE EXTERNA																	
Espejos laterales	Sin rasuras, sin manchas y ajustado	X															
Luces traseras	De freno: minimo dos / de color rojo / Direccionales	X															
Llantas	Libres de raspaduras y sin desgaste excesivo	X															
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente	X															
Indicadores luces direccionales	Minimo dos funcionando correctamente	X															
Lamparas Luces delanteras	Lentes sin roturas/ funcionando / de color blanco / amarillo	X															
Indicador luces de parqueo	Minimo dos / funcionando correctamente	X															
Tanque de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y ajustada	X															
COMPARTIMENTO DEL MOTOR																	
Fuente de energia (BATERIA)	Sin raspaduras/ Ajustado correctamente	X															
Conexiones eléctricas	Firmes y en buen estado	X															
Nivel agua refrigeración / mangueras	Nivel correcto / mangueras sin fugas	X															
Estado de las Llaves neblineros	Libres sin fugas y en buen estado	X															
Niveles de aceite motor / hidraulico	Niveles de aceite de acuerdo al fabricante	X															
Cableado electrico	Asegurado / sin roturas / ajustados	X															
Bateria de emision / Nivel acido	Sin fugas/ bien acolchonado / nivel de acuerdo al fabricante	X															
INTERIOR DE LA CABINA																	
Espejo retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado	X															
Vidrio panoramico/ vidrios ventanas	Sin roturas / manchas / descripciones	X															
Plumillas limpiavidrios/ motor limpiaparabrisas	Minimo dos / empaque sin desgastes / funcionando / minimo dos velocidades	X															
Estado de la cabina	Protegida y en buen estado en general	X															
Indicador de combustible	La aguja o indicador debe indicar el nivel de combustible	X															
Indicador tablero de abordo motor	Que se ilumine al encender el motor	X															
Sillas/ Apoyo para la cabeza	Asentados al piso/ apoyo para la cabeza asegurado	X															
Pedales freno / clutch / acelerador	Con forro antideslizante / sin juego excesivo	X															
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente	X															
Equipo de carretera	Gato con capacidad para elevar el vehiculo, una cruceta, dos señales de carretera en forma de triangulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lamparas de señal de luz amarilla intermitente o de destello, dos tacos para bloquear el vehiculo, caja de herramientas basica que como minimo debera contener alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas, llanta de repuesto, inflarla (Art 30 del codigo nacional de tránsito ley 769 de 2002)	X															
Cinturones de seguridad	De 3 puntos de apoyo	X															
Pito	Funcionando / que se oiga minimo a 50 m	X															
Timón o volante	Funcionando en optimas condiciones	X															
Frenos	Pedales con anclaje ajuste/ nivel de liquido de acuerdo al fabricante	X															

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Luis Mercado
Nombre y Firma del Técnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-035
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES		Fecha: Septiembre 08 de 2019
		Página 1 de 1

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: DIOMEDES JIMENEZ			HRS Inicial:	96111	HRS Final:	96251
PLACA VEHICULO: EXZ 115			Marca: JAC		Serie No: HFC1035H1N	Función: MOVIL 1
Ubicación: CAMPOS NATURALES	Sección: NTO	Semana de:	Año: 20		Mes de:	

INSPECCIÓN

Item	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Jue		Vie		Sab		Dom	
		SI	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
DOCUMENTOS																	
Licencia de tránsito	En Regla	x		x		x		x		x		x					
Revisión tecnico mecánica	En Regla	x		x		x		x		x		x					
Seguro obligatorio	En Regla	x		x		x		x		x		x					
Seguro contractual	Vigente	x		x		x		x		x		x					
Seguro extracontractual	En Regla	x		x		x		x		x		x					
Licencia de conducción	En Regla	x		x		x		x		x		x					
Planos, mapas rutas, pos.	En Regla	x		x		x		x		x		x					
Contactos de Emergencia	En Regla	x		x		x		x		x		x					
EQUIPO EMERGENCIAS																	
Linterna con pilas	En buen estado	x		x		x		x		x		x					
Botiquin	Completo	x		x		x		x		x		x					
Extintor	Pin de seguridad. Cargado, vigente	x		x		x		x		x		x					
PARTE EXTERNA																	
Espejos laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado	x		x		x		x		x		x					
Luces traseras	De fleno: mínimo dos / de color rojo / Direccionales	x		x		x		x		x		x					
Llantas	Libres de rasaduras y sin desgaste excesivo	x		x		x		x		x		x					
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente	x		x		x		x		x		x					
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos funcionando correctamente	x		x		x		x		x		x					
Lámparas Luces delanteras	Lentes sin roturas/ funcionando / de color blanco / amarillo	x		x		x		x		x		x					
Indicador luces de parqueo	Mínimo dos / funcionando correctamente	x		x		x		x		x		x					
Tanque de combustible	Sin fugas / asegurado / con tapa original y ajustada	x		x		x		x		x		x					
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR																	
Fuente de energía (BATERIA)	Sin rasaduras. Aislada adecuadamente	x		x		x		x		x		x					
Conexiones eléctricas	Firmes y en buen estado	x		x		x		x		x		x					
Nivel agua refrigeración / mangueras	Nivel correcto / mangueras sin fugas	x		x		x		x		x		x					
Estado de las líneas hidráulicas	Líneas sin fugas y en buen estado	x		x		x		x		x		x					
Niveles de aceite motor / hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante	x		x		x		x		x		x					
Cableado eléctrico	Aislado / sin roturas / asegurado	x		x		x		x		x		x					
Botella de dirección / Nivel aceite	Sin fugas/ bien asegurado / nivel de acuerdo al tipo aceite	x		x		x		x		x		x					
INTERIOR DE LA CABINA																	
Espejos retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado	x		x		x		x		x		x					
Vidrio parabrisas/ vidrios ventanas	Sin roturas / manchas / distorsiones	x		x		x		x		x		x					
Plumillas limpiaparbrisa/ motor lavaparbrisas	Mínimo dos / empaque sin desgastes / funcionando / mínimo dos revoluciones	x		x		x		x		x		x					
Estado de la cabina	Protegida y en buen estado en general	x		x		x		x		x		x					
Indicador de combustible	La aguja o indicador debe mostrar el nivel de combustible	x		x		x		x		x		x					
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor	x		x		x		x		x		x					
Silla/ Apoyo para la cabeza	Atornillada al piso/ apoyo para la cabeza asegurado	x		x		x		x		x		x					
Pedales freno / clutch / acelerador	Con forro antideslizante / sin juego excesivo	x		x		x		x		x		x					
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente	x		x		x		x		x		x					
Equipo de carretera	Gato con capacidad para elevar el vehículo, una cruceta, dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello, dos tacos para bloquear el vehículo, caja de herramientas básica que como mínimo deberá contener alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas, llanta de repuesto, extintor (Art 30 del código nacional de tránsito ley 769 de 2002)	x		x		x		x		x		x					
Cinturones de seguridad	De 3 puntos de apoyo	x		x		x		x		x		x					
Pito	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m	x		x		x		x		x		x					
Timón o volante	Funcionando en perfectas condiciones	x		x		x		x		x		x					
Frenos	Pedales con antideslizante/ nivel de líquido de acuerdo al fabricante	x		x		x		x		x		x					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Nombre y Firma del Técnico/Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES		Fecha: Septiembre 08 de 2019 Versión: 001 Pagina 1 de 1

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: Luis Mercado.	HRS Inicial	566.14.	HRS Final	56679.		
Maquina-Equipo: TRACTOR LTH 1842	Marca: HUSQVARNA		Serie No: 4133313063		Función: CEPILLAR	
Ubicación: CAMPOS SINTETICOS / Sección: MTO / Semana de: 16 / Al: 20	Mes de: Junio / 25.					

INSPECCIÓN

TRACTOR LTH 1842	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	ACEITE MOTOR	x		x		x		x		x		x					
	FILTRO ACEITE	x		x		x		c		x		x					
	FILTRO COMBUSTIBLE	x		x		x		x		x		x					
	ACEITE HIDRAULICO	x		x		x		x		x		x					
	FILTRO DE AIRE	x		x		x		x		x		x					
	CABLES Y POLEAS	x		x		x		x		x		x					
	ENGRASE	x		x		x		x		x		x					
	CUCHILLAS	x		x		x		x		x		x					
	CEPILLO	x		x		x		x		x		x					
	CORREA TENSORA	x		x		x		x		x		x					
	CINTURON DE SEGURIDAD	x		x		x		x		x		x					
	MANDOS DE OPERACIÓN	x		x		x		x		x		x					
	FRENOS	x		x		x		x		x		x					
	LLANTAS	x		x		x		x		x		x					
	BATERIA	x		x		x		x		x		x					
	ENCENDIDO	x		x		x		x		x		x					
	SISTEMA DE ATRACCION	x		x		x		x		x		x					
	HOROMETRO	x		x		x		x		x		x					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Luis Mercado
Nombre y Firma del Tecnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES	Fecha:	Septiembre 08 de 2019
	Versión:	001
	Pagina 1 de 1	

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: LUIS MERCADO	HRS Inicial	7:00 a. m.	HRS Final	4:00 p. m.		
Maquina-Equipo: GUADAÑADORA	Marca: HUSQVARNA		Serie No: TT05920108042		Función:DESMALEZADORA	
Ubicación: SINTETICOS / Sección: MTO / Semana de: 16	Al: 20	Mes de:	junio de 2025			

INSPECCIÓN

GUADAÑA	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	ACEITE MOTOR	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO ACEITE	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO COMBUSTIBLE	X		X		X		X		X		X					
	ACEITE HIDRAULICO	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO DE AIRE	X		X		X		X		X		X					
	VALBULINA	X		X		X		X		X		X					
	ENGRASE	X		X		X		X		X		X					
	CUCHILLAS	X		X		X		X		X		X					
	YOYO	X		X		X		X		X		X					
	MANGO DE SEGURIDAD	X		X		X		X		X		X					
	ENCENDIDO ELECTRICO	X		X		X		X		X		X					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Luis Mercado.
Nombre y Firma del Tecnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES	Fecha	Septiembre 08 de 2019
	Versión	001
	Pagina 1 de 1	

DATOS DE LA INSPECCIÓN						
Inspeccionado por: DIOMEDES JIMENEZ	HRS Inicial	7:00 a. m.	HRS Final	4:00 p. m.		
Maquina-Equipo: GUADAÑADORA	Marca: HUSQVARNA		Serie No: T05920109854		Función:DESMALEZADORA	
Ubicación: SINTETICOS / Sección: MTO / Semana de:	16	Al:	20	Mes de:	junio de 2025	

INSPECCIÓN

GUADAÑA	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	ACEITE MOTOR	X		✓		✓		✓		✓		✓					
	FILTRO ACEITE	X		✓		✓		✓		✓		✓					
	FILTRO COMBUSTIBLE	X		✓		✓		✓		✓		✓					
	ACEITE HIDRAULICO	X		✓		✓		✓		✓		✓					
	FILTRO DE AIRE	X		✓		✓		✓		✓		✓					
	VALBULINA	X		✓		✓		✓		✓		✓					
	ENGRASE	X		✓		✓		✓		✓		✓					
	CUCHILLAS	X		✓		✓		✓		✓		✓					
	YOYO	X		✓		✓		✓		✓		✓					
	MANGO DE SEGURIDAD	X		✓		✓		✓		✓		✓					
	ENCENDIDO ELECTRICO	X		✓		✓		✓		✓		✓					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Nombre y Firma del Tecnico Operador

212

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES	Fecha:	Septembre 08 de 2019
	Versión:	001
	Pagina 1 de 1	

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: DIOMEDES JIMENES	HRS Inicial	3796	HRS Final	3821		
Maquina-Equipo: GIRO ZERO PZT-60	Marca: HUSQVARNA		Serie No: 9676698895		Función: PODADORA	
Ubicación: / Sección: / Semana de:	16	Al: 20	Mes de:	Junio /25		

INSPECCIÓN

GIRO ZERO PZT-60	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	ACEITE MOTOR	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	FILTRO ACEITE	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	FILTRO COMBUSTIBLE	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	ACEITE HIDRAULICO	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	FILTRO DE AIRE	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	CABLES Y POLEAS	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	ENGRASE	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	CUCHILLAS	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	CORREA DECK	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	CORREA TENSORA	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	CINTURON DE SEGURIDAD	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	MANDOS DE OPERACIÓN	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	FRENOS	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	LLANTAS	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	BATERIA	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	ENCENDIDO	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	SISTEMA DE ATRACCION	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	HOROMETRO	x		✓		✓		✓		✓		✓					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Nombre y Firma del Tecnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES		Fecha: Septiembre 08 de 2015 Versión: 001 Pagina 1 de 2

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: BRANDON LOPEZ	HRS Inicial	7:00 AM	HRS Final	5 PM.	
Maquina-Equipo: TRACTOR 2320	Marca: KUBOTA		Serie No: B2320038295		Función: HALAR
Ubicación: Sinchecus / Sección: Mantenimiento / Semana de:	16	Al: 20	Mes de:	Junio 25	

INSPECCIÓN

Item	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		SI	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	BATERIA	x		x		x		x		x		x					
	TANQUE DE COMBUSTRIBLE	x		x		x		x		x		x					
	NEUMATICOS	x		x		x		x		x		x					
	DIRECCIÓN	x		x		x		x		x		x					
	TRANSMISIÓN	x		x		x		x		x		x					
	FRENO DE PARQUEO	x		x		x		x		x		x					
	RADIO DE VIRAJE	x		x		x		x		x		x					
	ASIENTO	x		x		x		x		x		x					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Nombre y Firma del Tecnico Operador

812

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES	Fecha	Septiembre 09 de 2019
	Versión	001
	Página 1 de 1	

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: LUIS MERCADO	HRS Inicial	95335	HRS Final	95965	
PLACA VEHICULO: EBZ 737	Marca: FOTON		Serie No: LDTI63WJJD01		Función: MOVIL 2
Ubicación CAMPOS NATURALES	Semana de:	24	Al	27	Mes de: JUNIO - 125

INSPECCIÓN

Item	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Jue		Vie		Sab		Dom	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
DOCUMENTOS																	
Licencia de tránsito	En Regla	X				X		X		X		X					
Revisión técnico mecánica	En Regla	X				X		X		X		X					
Seguro obligatorio	En Regla	X				X		X		X		X					
Seguro contractual	Vigente	X				X		X		X		X					
Seguro extracontractual	En Regla	X				X		X		X		X					
Licencia de conducción	En Regla	X				X		X		X		X					
Planos, mapas rutas, ops	En Regla	X				X		X		X		X					
Contactos de Emergencias	En Regla	X				X		X		X		X					
EQUIPO EMERGENCIAS																	
Linterna con pilas	En buen estado	X				X		X		X		X					
Botiquín	Completo	X				X		X		X		X					
Extintor	Pin de seguridad. Cargado. vigente	X				X		X		X		X					
PARTE EXTERNA																	
Espejos laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado	X				X		X		X		X					
Luces traseras	De freno, mínimo dos / de color roja / Direccionales	X				X		X		X		X					
Llantas	Libres de raspaduras y sin desgaste excesivo	X				X		X		X		X					
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente	X				X		X		X		X					
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos funcionando correctamente	X				X		X		X		X					
Lámparas Luces delanteras	Lentes sin roturas/ funcionando / de color blanco / amarillo	X				X		X		X		X					
Indicador luces de parqueo	Mínimo dos / funcionando correctamente	X				X		X		X		X					
Tanque de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y ajustado	X				X		X		X		X					
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR																	
Fuente de energía (BATERIA)	Sin raspaduras/ Anclada adecuadamente	X				X		X		X		X					
Conexiones eléctricas	Firmes y en buen estado	X				X		X		X		X					
Nivel agua refrigeración / mangueras	Nivel correcto / mangueras sin fugas	X				X		X		X		X					
Estado de las líneas hidráulicas	Limpias sin fugas y en buen estado	X				X		X		X		X					
Niveles de aceite motor / hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante	X				X		X		X		X					
Cableado eléctrico	Aislado / sin roturas / ajustados	X				X		X		X		X					
dotella de dirección / Nivel aceite	Sin fugas/ bien cableado / nivel de acuerdo al fabricante	X				X		X		X		X					
INTERIOR DE LA CABINA																	
Espejos retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado	X				X		X		X		X					
Vidrio panorámico/ vidrios ventanas	Sin roturas / manchas / distorsiones	X				X		X		X		X					
Plumillas limpiavidrios/ motor limpiaparabrisas	Mínimo dos / empaque sin desgastes / funcionando / mínimo dos revoluciones	X				X		X		X		X					
Estado de la cabina	Protegida y en buen estado en general	X				X		X		X		X					
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible	X				X		X		X		X					
Indicador presión de aceite motor	Luz de fulmino al encender el motor	X				X		X		X		X					
Sillas/ Apoya pies la cabina	Atornillados al piso/ apoya pies la cabina inexistente	X				X		X		X		X					
Pedales freno / clutch / acelerador	Con forro antideslizante / sin juego excesivo	X				X		X		X		X					
Alarma de reconeso	Funcionando correctamente	X				X		X		X		X					
Equipo de carretera	Gato con capacidad para elevar el vehículo, una cruceta, dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de color de luz amarilla intermitentes o de destello, dos tacos para bloquear el vehículo, caja de herramientas básica que como mínimo deberá contener alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas, llanta de repuesto. Inferma (Art 30 del código nacional de tránsito ley 769 de 2002)	X				X		X		X		X					
Cinturones de seguridad	De 3 puntos de apoyo	X				X		X		X		X					
Pito	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m	X				X		X		X		X					
Timón o volante	Funcionando en perfectas condiciones	X				X		X		X		X					
Frenos	Pedales con antideslizante/ nivel de líquido de acuerdo al fabricante	X				X		X		X		X					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Luis Mercado
Nombre y Firma del Técnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES

Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo

FORMATO N°: FT-SST-065

FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES

Fecha: Septiembre 08 de 2010
Versión: 004

DATOS DE LA INSPECCION

Inspeccionado por: DIOMEDES JIMENEZ | HRS Inicial: 96251 | HRS Final: 96359

PLACA VEHICULO: ESZ 115 | Marca: JAC | Serie No: HFC1638KN | Puntales: MOVIL 1

Ubicación: CAMPOS NATURALES | Seccion: MTO | Semana de: 24 | Al: 27 | Mes de: Junio / 2015

INSPECCION

Item	Estándar	Aplica Si	Aplica No	Lun C	Lun NC	Mar C	Mar NC	Mier C	Mier NC	Jue C	Jue NC	Vie C	Vie NC	Sab C	Sab NC	Dom C	Dom NC
DOCUMENTOS																	
Licencia de tránsito	En Regla	x		—		✓		✓		✓		✓					
Revisión técnico mecánica	En Regla	x		—		✓		✓		✓		✓					
Seguro obligatorio	En Regla	x		—		✓		✓		✓		✓					
Seguro contractual	Vigente	x		—		✓		✓		✓		✓					
Seguro extracontractual	En Regla	x		—		✓		✓		✓		✓					
Licencia de conducción	En Regla	x		—		✓		✓		✓		✓					
Planos, mapas rutas, tips	En Regla	x		—		✓		✓		✓		✓					
Contactos de Emergencia	En Regla	x		—		✓		✓		✓		✓					
EQUIPO EMERGENCIAS																	
Llanteria con pua	En buen estado	x		—		✓		✓		✓		✓					
Rotaplin	Completo	x		—		✓		✓		✓		✓					
Extintor	En de seguridad, Cargado, vigente	x				✓		✓		✓		✓					
PARTE EXTERNA																	
Espejos laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado	x		—		✓		✓		✓		✓					
Luces traseras	De freno, mínimo dos / de color rojo / Direccionales	x		—		✓		✓		✓		✓					
Llantas	Libres de raspaduras y sin desgaste excesivo	x		—		✓		✓		✓		✓					
Indicadores Luces frontales altas	Funcionando correctamente	x		—		✓		✓		✓		✓					
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos funcionando correctamente	x		—		✓		✓		✓		✓					
Lamparas Luces delanteras	Lentes sin roturas/ funcionando / de color blanco / amarillo	x		—		✓		✓		✓		✓					
Indicador luces de parqueo	Mínimo dos / funcionando correctamente	x		—		✓		✓		✓		✓					
Tanque de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y ajustado	x		—		✓		✓		✓		✓					
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR																	
Fuente de energía (BATERIA)	Sin rasaduras/ Aislada adecuadamente	x		—		✓		✓		✓		✓					
Conexiones eléctricas	Firmes y en buen estado	x		—		✓		✓		✓		✓					
Nivel agua refrigeración / mantuviente	Nivel correcto / mangueras sin fugas	x		—		✓		✓		✓		✓					
Estado de las líneas hidráulicas	Líneas sin fugas y en buen estado	x		—		✓		✓		✓		✓					
Nivelen de aceite motor / hidráulico	Niveles de acuerdo a fabricante	x		—		✓		✓		✓		✓					
Cableado eléctrico	Aislado / sin roturas / ajustado	x		—		✓		✓		✓		✓					
Bateria de operación / Nivel aceite	Sin fugas, bien asegurado / nivel de acuerdo al fabricante	x		—		✓		✓		✓		✓					
INTERIOR DE LA CABINA																	
Extintor / Ubicado, interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado	x		—		✓		✓		✓		✓					
Vidrio panorámico/ vidrios ventanas	Sin roturas / manchas / distorsiones	x		—		✓		✓		✓		✓					
Pumillas / Instructivo / mapa / cinturones	Mínimo dos / ampaque sin desgastes / funcionales y mínimo dos revoluciones	x		—		✓		✓		✓		✓					
Estado de la cabina	Protegida y en buen estado en general	x		—		✓		✓		✓		✓					
Indicador de combustible	La bomba o indicador debe mostrar el nivel de combustible	x		—		✓		✓		✓		✓					
Indicador presion de aceite motor	Que se apruebe al encender el motor	x		—		✓		✓		✓		✓					
Silla/ Asiento para la cabeza	Acomodable al piso/ apoyo para la cabeza seguridad	x		—		✓		✓		✓		✓					
Pedales freno / clutch / acelerador	Con forro antideslizante / sin juego excesivo	x		—		✓		✓		✓		✓					
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente	x		—		✓		✓		✓		✓					
Equipo de carretera	Gato con capacidad para elevar el vehículo, una cruceta, dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz ámbar (si cumplen la misma función) o de destello, dos tacos para bloquear el vehículo, caja de herramientas básica que como mínimo debera contener alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas, llanta de repuesto. (Inferna. (Art 30 del código nacional de tránsito ley 769 de 2002)	x		—		✓		✓		✓		✓					
Cinturones de seguridad	De 3 puntos de apoyo	x		—		✓		✓		✓		✓					
Pito	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m.	x		—		✓		✓		✓		✓					
Timón o volante	Funcionando en perfectas condiciones	x		—		✓		✓		✓		✓					
Frenos	Pedales con antideslizantes/ nivel de liquido de acuerdo al fabricante	x		—		✓		✓		✓		✓					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Nombre y Firma del Tecnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-055
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES	Fecha	Septiembre 08 de 2019
	Versión	001
	Pagina 1 de 1	

DATOS DE LA INSPECCION

Inspeccionado por: HILARIO CARDENAS			HRS Inicial	56679	HRS Final	56719.	
Maquina-Equipo: TRACTOR LTH 1842			Marca: HUSQVARNA		Serie No: 4133313063		Función: CEPILLAR
Ubicación: CAMPOS SINTETICOS	Sección:MTO	Semana de:	24	Al: 27.	Mes de:	Junio /25.	

INSPECCIÓN

TRACTOR LTH 1842	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	ACEITE MOTOR	x				x		x		x		x					
	FILTRO ACEITE	x				x		x		x		x					
	FILTRO COMBUSTIBLE	x				x		x		x		x					
	ACEITE HIDRAULICO	x				x		x		x		x					
	FILTRO DE AIRE	x				x		x		x		x					
	CABLES Y POLEAS	x				x		x		x		x					
	ENGRASE	x				x		x		x		x					
	CUCHILLAS	x				x		x		x		x					
	CEPILLO	x				x		x		x		x					
	CORREA TENSORA	x				x		x		x		x					
	CINTURON DE SEGURIDAD	x				x		x		x		x					
	MANDOS DE OPERACIÓN	x				x		x		x		x					
	FRENOS	x				x		x		x		x					
	LLANTAS	x				x		x		x		x					
	BATERIA	x				x		x		x		x					
	ENCENDIDO	x				x		x		x		x					
	SISTEMA DE ATRACCION	x				x		x		x		x					
	HOROMETRO	x				x		x		x		x					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Nombre y Firma del Tecnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES	Fecha	Septiembre 08 de 2019
	Versión	001
	Pagina 1 de 1	

DATOS DE LA INSPECCION

Inspeccionado por: LUIS GUILLERMO MERCADO			HRS Inicial	3654.	HRS Final	3696
Maquina-Equipo: GIRO ZERO MZ -54			Marca: HUSQVARNA		Serie No: 26412657682	Función: PODADORA
Ubicación: CANCHAS SINT	Sección: MTO	Semana de:	21 Al:	27	Mes de:	JUNIO /25

INSPECCIÓN

GIRO ZERO MZ 54	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	ACEITE MOTOR	x		—		x		x		x		x					
	FILTRO ACEITE	x		—		x		x		x		x					
	FILTRO COMBUSTIBLE	x		—		x		x		x		x					
	ACEITE HIDRAULICO	x		—		x		x		x		x					
	FILTRO DE AIRE	x		—		x		x		x		x					
	CABLES Y POLEAS	x		—		x		x		x		x					
	ENGRASE	x		—		x		x		x		x					
	CUCHILLAS	x		—		x		x		x		x					
	CORREA DECK	x		—		x		x		x		x					
	CORREA TENSORA	x		—		x		x		x		x					
	CINTURON DE SEGURIDAD	x		—		x		x		x		x					
	MANDOS DE OPERACIÓN	x		—		x		x		x		x					
	FRENOS	x		—		x		x		x		x					
	LLANTAS	x		—		x		x		x		x					
	BATERIA	x		—		x		x		x		x					
	ENCENDIDO	x		—		x		x		x		x					
	SISTEMA DE ATRACCION	x		—		x		x		x		x					
	HOROMETRO	x		—		x		x		x		x					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Luis Mercado
Nombre y Firma del Tecnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-005
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES	Fecha:	Septiembre 08 de 2019
	Versión:	001
	Pagina 1 de 1	

DATOS DE LA INSPECCION

Inspeccionado por: HILARIO CARDENAS	HRS Inicial	7:00 a. m.	HRS Final	4:00 p. m.		
Maquina-Equipo: GUADAÑADORA	Marca: HUSQVARNA		Serie No: T24276023275		Función:DESMALEZADORA	
Ubicación: SINTETICOS / Sección: MTO / Semana de: 24	Al: 27	Mes de:	may-25			

INSPECCIÓN

GUADAÑA	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	ACEITE MOTOR	X				✓		✓		✓		✓					
	FILTRO ACEITE	X				✓		✓		✓		✓					
	FILTRO COMBUSTIBLE	X				✓		✓		✓		✓					
	ACEITE HIDRAULICO	X				✓		✓		✓		✓					
	FILTRO DE AIRE	X				✓		✓		✓		✓					
	VALBULINA	X				✓		✓		✓		✓					
	ENGRASE	X				✓		✓		✓		✓					
	CUCHILLAS	X				✓		✓		✓		✓					
	YOYO	X				✓		✓		✓		✓					
	MANGO DE SEGURIDAD	X				✓		✓		✓		✓					
	ENCENDIDO ELECTRICO	X				✓		✓		✓		✓					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Nombre y Firma del Tecnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES	Fecha	Septiembre 08 de 2019
	Versión	001
	Pagina 1 de 1	

DATOS DE LA INSPECCIÓN						
Inspeccionado por: LUIS MERCADO	HRS Inicial	7:00 a. m.	HRS Final	4:00 p. m.		
Maquina-Equipo: GUADAÑADORA	Marca: HUSQVARNA		Serie No: TT05920108642		Función:DESMALEZADORA	
Ubicación: SINTETICOS / Sección: MTO / Semana de: 24	Al: 27		Mes de:	junio de 2025		

GUADAÑA	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	ACEITE MOTOR	X				٢٠		٢٠		٢٠		٢٠					
	FILTRO ACEITE	X				٢١		٢١		٢١		٢١					
	FILTRO COMBUSTIBLE	X				٢٢		٢٢		٢٢		٢٢					
	ACEITE HIDRAULICO	X				٢٣		٢٣		٢٣		٢٣					
	FILTRO DE AIRE	X				٢٤		٢٤		٢٤		٢٤					
	VALBULINA	X				٢٥		٢٥		٢٥		٢٥					
	ENGRASE	X				٢٦		٢٦		٢٦		٢٦					
	CUCHILLAS	X				٢٧		٢٧		٢٧		٢٧					
	YOYO	X				٢٨		٢٨		٢٨		٢٨					
	MANGO DE SEGURIDAD	X				٢٩		٢٩		٢٩		٢٩					
	ENCENDIDO ELECTRICO	X				٣٠		٣٠		٣٠		٣٠					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Luis Mercado
Nombre y Firma del Tecnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES	Fecha:	Septiembre 08 de 201
	Versión:	001
	Pagina 1 de 2	

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: BRANDON LOPEZ			HRS Inicial	7:00 am	HRS Final	4:00 pm	
Maquina-Equipo: TRACTOR 2320			Marca: KUBOTA		Serie No: B2320D38295		Función: HALAR
Ubicación:	Sección:	Semana de:	24	Al: 27	Mes de:	JUNIO/25	

INSPECCIÓN

Item	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	BATERIA	x				✓		✓		✓		✓					
	TANQUE DE COMBUSTRIBLE	x				✓		✓		✓		✓					
	NEUMATICOS	x				✓		✓		✓		✓					
	DIRECCIÓN	x				✓		✓		✓		✓					
	TRANSMISIÓN	x				✓		✓		✓		✓					
	FRENO DE PARQUEO	x				✓		✓		✓		✓					
	RADIO DE VIRAJE	x				✓		✓		✓		✓					
	ASIENTO	x				✓		✓		✓		✓					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Nombre y Firma del Tecnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo
	FORMATO: FT-SST-014

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: ENERO 18 DE 2024
	Versión: 001
	Pagina 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
BOGOTA	PARQUES BOGOTA	3	6	2025

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		Ciclo de Reciclaje
Charla de seguridad	x	
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	CAMPOS MARIN DAVID CAMILO	1012433979	OPERARIO	
2	CARDENAS CARDENAS HILARIO	3028150	OPERARIO	
3	CERQUERA VALDERRAMA JOSELITO	12209313	CONDUCTOR	
4	FORERO ORTEGA JULIO CESAR	79380454	OPERARIO	
5	GARZON PINEDA JOSE ALEJANDRO	1033692776	OPERARIO	
6	JIMENEZ LASSO WILBER DIOMEDES	5855002	CONDUCTOR	
7	LOPEZ AYALA BRANDON SEBASTIAN	1233890527	ING RESIDENTE	
8	MERCADO BASILIO LUIS GUILLERMO	1007195407	CONDUCTOR	
9	MUÑOZ MACETO JESUS	1007289162	CONDUCTOR	
10	OVALLE BOLIVAR YEFERSON IVAN	1074414778	OPERARIO	
11	QUEVEDO LEGUIZAMON JHON ALEXANDER	1123116491	OPERARIO	
12	SABOGAL CUERVO DANIEL STEBAN	1031803879	INSPECTOR	
13	ORTIZ COIME ALVARO LEONEL	1087198177	OPERARIO	
14	RAMIREZ RUBIO JHON ALEXANDER	1033760239	OPERARIO	
15	JIMENEZ MONDRAGON JHON ANDRES	80863671	OPERARIO	
16	PARRA CRISTIAN CAMILO	10127524042	OPERARIO	
17	CUBIDES GARZON LUIS CARLOS	1019005189	OPERARIO	
18				
19				
20				
21				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre: ANDREA LOPEZ	Firma

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo
	FORMATO: FT-SST-014

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: ENERO 18 DE 2024
	Versión: 001
	Pagina 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
BOGOTA	PARQUES BOGOTA	20	6	2025

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		comunicación asertiva importancia del consumo racional de agua
Charla de seguridad	x	
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otro		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	CAMPOS MARIN DAVID CAMILO	1012433979	OPERARIO	CAMILO
2	CARDENAS CARDENAS HILARIO	3028150	OPERARIO	
3	CERQUERA VALDERRAMA JOSELITO	12209313	CONDUCTOR	Joselito
4	FORERO ORTEGA JULIO CESAR	79380454	OPERARIO	
5	GARZON PINEDA JOSE ALEJANDRO	1033692776	OPERARIO	Alejandro
6	JIMENEZ LASSO WILBER DIOMEDES	5855002	CONDUCTOR	
7	LOPEZ AYALA BRANDON SEBASTIAN	1233890527	ING RESIDENTE	
8	MERCADO BASILIO LUIS GUILLERMO	1007195407	CONDUCTOR	Luis Mercado
9	MUÑOZ MACETO JESUS	1007289162	CONDUCTOR	Jesus M.
10	OVALLE BOLIVAR YEFERSON IVAN	1074414778	OPERARIO	Yeferson O.
11	QUEVEDO LEGUIZAMON JHON ALEXANDER	1123116491	OPERARIO	
12	SABOGAL CUERVO DANIEL STEBAN	1031803879	INSPECTOR	
13	ORTIZ COIME ALVARO LEONEL	1087198177	OPERARIO	Leonel.
14	RAMIREZ RUBIO JHON ALEXANDER	1033760239	OPERARIO	Jhon Alexander
15	JIMENEZ MONDRAGON JHON ANDRES	80863671	OPERARIO	
16	PARRA CRISTIAN CAMILO	10127524042	OPERARIO	Cristian.
17	CUBIDES GARZON LUIS CARLOS	1019005189	OPERARIO	
18				
19				
20				
21				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre: ANDREA LOPEZ	Firma

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo FORMATO: FT-SST-014

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: ENERO 18 DE 2024 Versión: 001 Pagina 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
BOGOTA	PARQUES BOGOTA	26	6	2025

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		Riesgos ambientales
Charla de seguridad	x	
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	CAMPOS MARIN DAVID CAMILO	1012433979	OPERARIO	
2	CARDENAS CARDENAS HILARIO	3028150	CONDUCTOR	
3	CERQUERA VALDERRAMA JOSELITO	12209313	OPERARIO	
4	FORERO ORTEGA JULIO CESAR	79380454	OPERARIO	
5	GARZON PINEDA JOSE ALEJANDRO	1033692776	OPERARIO	
6	JIMENEZ LASSO WILBER DIOMEDES	5855002	CONDUCTOR	
7	LOPEZ AYALA BRANDON SEBASTIAN	1233890527	ING RESIDENTE	
8	MERCADO BASILIO LUIS GUILLERMO	1007195407	CONDUCTOR	
9	MUÑOZ MACETO JESUS	1007289162	OPERARIO	
10	OVALLE BOLIVAR YEFERSON IVAN	1074414778	OPERARIO	
11	QUEVEDO LEGUIZAMON JHON ALEXANDER	1123116491	OPERARIO	
12	SABOGAL CUERVO DANIEL STEBAN	1031803879	INSPECTOR	
13	ORTIZ COIME ALVARO LEONEL	1087198177	OPERARIO	
14	RAMIREZ RUBIO JHON ALEXANDER	1033760239	OPERARIO	
15	JIMENEZ MONDRAGON JHON ANDRES	80863671	OPERARIO	
16	PARRA CRISTIAN CAMILO	10127524042	OPERARIO	
17	CUBIDES GARZON LUIS CARLOS	1019005189	OPERARIO	
18				
19				
20				
21				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre: ANDREA LOPEZ	Firma

IDRD

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4080 DE 2024
CONSORCIO SANTA TERESA 28
DIRECCIÓN: CARRERA 70C No. 48 -55
TELÉFONO: 76530168 – 3013942384

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 - CAMPOS DEPORTIVOS"

INFORME MENSUAL No 8 – COMPONENTE TÉCNICO
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

TOMO _____ DE _____

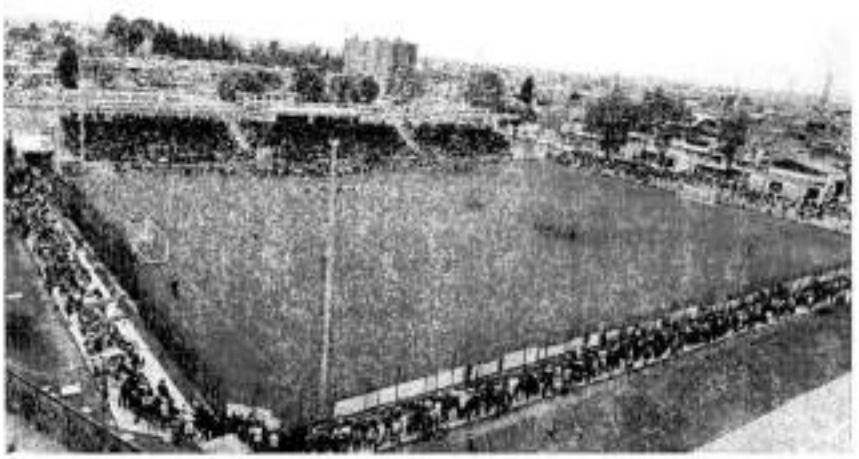


TABLA DE CONTROL

COPIA CONTROLADA	X	COPIA NO CONTROLADA	
	Nombre	**Cargo**	**Firma**
ELABORÓ	María Claudia Mahecha	Residente de Interventoría	
APROBÓ	Carlos Andrés Figueroa	Director de Interventoría	

JULIO DE 2025 / BOGOTÁ D.C.

CONTENIDO

1. CONDICIONES CONTRACTUALES 5
2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS 14
3. ESTADO INICIAL DEL PROYECTO: 15
4. ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO: 15
5. SEGUIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO 16
5.1 SEGUIMIENTO A MODIFICACIONES CONTRACTUALES 16
5.2 SEGUIMIENTO A LAS PÓLIZAS CONTRACTUALES 16
6. INFORME GENERAL DE GESTIÓN TÉCNICA: 18
6.1 ANTECEDENTES DEL CONTRATO 18
6.2. SEGUIMIENTO A PLANES Y PROGRAMAS 18
6.3. ACTIVIDADES EJECUTADAS: 19
7. PROGRAMACION DE OBRA 35
8. AREAS PROBLEMÁTICAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS 35
9. CLIMATOLOGÍA: 36
10. REUNIONES DE SEGUIMIENTO: 36
11. RELACIÓN DE INFORMES SEMANALES PERIODO DEL INFORME: 36
12. REGISTRO FOTOGRÁFICO 36
13. TRAZABILIDAD DE LAS LABORES EJECUTADAS 37
14. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONTRACTUALES 37
15. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS 37
16. AVANCE FINANCIERO Y CONTROL PRESUPUESTAL 37
17. BITÁCORA 38
18. CORRESPONDENCIA 38
19. CONCLUSIONES 39

TABLA DE ANEXOS

ANEXO 1. PÓLIZAS
ANEXO 2. CONTROL CLIMATOLÓGICO
ANEXO 3. COPIA ACTAS DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE OBRA
ANEXO 4. INFORMES SEMANALES
ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRÁFICO
ANEXO 6. FORMATO TRAZABILIDAD DE ACTIVIDADES
ANEXO 7. BITÁCORA DE OBRA
ANEXO 8. COMUNICACIONES ENVIADAS Y RECIBIDAS
ANEXO 9. CUADRO DE CANTIDADES EJECUTADAS

INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde al seguimiento, verificación y control realizado por esta Interventoría en cumplimiento del contrato No. 4080 de 2024 suscrito entre CONSORCIO SANTA TERESA 28 y el INSTITUTO DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD, a las actividades ejecutadas por el Contratista de Obra: CONSORCIO INNOVAPARQUES de acuerdo con el contrato No. 4041 de 2024.

La revisión se efectuó para el periodo correspondiente al octavo mes de ejecución del contrato de obra definido desde el 01 de junio de 2025 hasta el 30 de junio del 2025, donde se tuvieron en cuentas los aspectos técnicos, administrativos, financieros, ambientales, SST y legales, según las condiciones contractuales establecidas; cabe resaltar que el seguimiento se realiza acorde con los lineamientos establecidos en el Anexo Técnico del contrato respectivo, así como lo indicado en la cartilla de lineamientos para el diseño de parques IDRD y el Manual de Interventoría del IDRD, entre otros aspectos.

De acuerdo con lo antes mencionado, dentro del presente informe se describen las labores realizadas por el Contratista en el periodo de tiempo enunciado anteriormente; así mismo, se presentan las observaciones, comentarios y recomendaciones a las actividades ejecutadas en el periodo reportado.

Finalmente, se resumen los estados de los Contratos de obra e interventoría, exponiendo al final del documento las respectivas conclusiones del estado del contrato de obra a la fecha de entrega de este reporte.

1. CONDICIONES CONTRACTUALES

1.1. OBJETO DEL CONTRATO

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

1.2. ALCANCE DEL CONTRATO

Los contratos objeto de interventoría son dos, considerando que la licitación pública para la adjudicación de las obras fue diseñada para la adjudicación en dos grupos, como se describe a continuación:

GRUPO 01: ***"MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS".***

1.3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se desarrolla en varios campos deportivos, ubicados en la ciudad de Bogotá D.C., los cuales se enuncian a continuación:

CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA SINTÉTICA:

ITEM	TIPO DE CANCHA	PARQUE	CÓDIGO IDRD	LOCALIDAD	DIRECCIÓN
1	SINTETICA	Servitá	01-023	Usaquén	Carrera 7H Calle 165
2	SINTETICA	Servitá	01-023	Usaquén	Carrera 7H Calle 165
3	SINTETICA	Cedritos	01-031	Usaquén	Carrera 9 Calle 145
4	SINTETICA	Toberín	01-079	Usaquén	Calle 164 Carrera 16 C
5	SINTETICA	Estrella norte	01-189	Usaquén	Calle 160 Carrera 19 B
6	SINTETICA	Verbenal	01-313	Usaquén	Calle 187 Transversal 18 B
7	SINTETICA	Urb. Calle 170 / Alameda	01-540	Usaquén	Carrera 17 Calle 175
8	SINTETICA	La Cabrera (Japón)	02-007	Chapinero	Av Carrera 11 Calle 87
9	SINTETICA	Tercer milenio	03-085	Santafé	Carrera 14 Calle 7
10	SINTETICA	Tercer milenio	03-085	Santafé	Carrera 14 Calle 7
11	SINTETICA	Tercer milenio	03-085	Santafé	Carrera 14 Calle 7
12	SINTETICA	Desarrollo Lourdes	03-122	Santafé	Carrera 1A Este Calle 3
13	SINTETICA	Laches la mina	03-148	Santafé	Diagonal 4B Cra 8 E
14	SINTETICA	Urb. Antioquia	04-038	San Cristóbal	Transversal 8a este Calle 50 b sur
15	SINTETICA	Gaitán cortes	04-103	San Cristóbal	Carrera 5 a este Diagonal 31 C sur
16	SINTETICA	La Victoria	04-122	San Cristóbal	Diagonal 38 Sur No. 1F - 05

ITEM	TIPO DE CANCHA	PARQUE	CÓDIGO IDRD	LOCALIDAD	DIRECCIÓN
17	SINTETICA	La Victoria	04-122	San Cristóbal	Diagonal 38 Sur No. 1F - 05
18	SINTETICA	San Cristóbal 2	04-127	San Cristóbal	Calle 13 sur N.º 2- 50 este
19	SINTETICA	San Cristobal1	04-127	San Cristóbal	Calle 13 sur N.º 2- 50 este
20	SINTETICA	Miravalle	05-042	Usme	Carrera 14 H Bis Calle 74 D sur
21	SINTETICA	Miravalle	05-042	Usme	Carrera 14 H Bis Calle 74 D sur
22	SINTETICA	Miravalle	05-042	Usme	Carrera 14 H Bis Calle 74 D sur
23	SINTETICA	Alfonso López	05-141	Usme	Carrera 5 G Calle 93 sur
24	SINTETICA	Nuevo Usme	05-459	Usme	Carrera 14 A Calle 137 B sur
25	SINTETICA	Nuevo milenio	05-476	Usme	Carrera 11 Calle 67 A Bis sur
26	SINTETICA	Nuevo milenio	05-476	Usme	Carrera 11 Calle 67 A Bis sur
27	SINTETICA	Laguneta	06-005	Tunjuelito	Cra 55 Diagonal 49 sur
28	SINTETICA	Urb. Tunjuelito	06-012	Tunjuelito	Cra 12 Calle 59 sur
29	SINTETICA	Nuevo Muzu	06-017	Tunjuelito	Diagonal 52 B sur Cra 61B
30	SINTETICA	El Tunal	06-063	Tunjuelito	Cra 24 A Cll 4B Sur Av Boyacá
31	SINTETICA	El Tunal	06-063	Tunjuelito	Cra 24 A Cll 4B Sur Av Boyacá
32	SINTETICA	El Tunal	06-063	Tunjuelito	Cra 24 A Cll 4B Sur Av Boyacá
33	SINTETICA	Tunal Alterna	06-063	Tunjuelito	Cra 24 A Cll 4B Sur Av Boyacá
34	SINTETICA	Naranjos	07-035	Bosa	Carrera 80 J Calle 70 A sur
35	SINTETICA	Timiza Villa del rio	07-036	Bosa	Carrera 65 Calle 55 A sur
36	SINTETICA	Autopista Sur (Pavco)	07-152	Bosa	Av. Calle 57 R sur (Aut. Sur) Carrera 72
37	SINTETICA	Clarelandia	07-163	Bosa	Calle 58 J sur Cra 80 G
38	SINTETICA	Clarelandia mini	07-163	Bosa	Calle 58 J sur Cra 80 G
39	SINTETICA	El Recreo	07-260	Bosa	Calle 69 A Sur 93D - 45
40	SINTETICA	La Esperanza	07-273	Bosa	Calle 75 BIS Sur (Av. C de Cali) Cra 80J
41	SINTETICA	La Tingua Tibanica	07-274	Bosa	Calle 73 D Sur Carrera 78 A hasta la 82 A Bis
42	SINTETICA	Urb. Chicalá	07-292	Bosa	Av Carrera 86 Calle 55 sur
43	SINTETICA	Santiago de Atalaya	07-321	Bosa	Carrera 98 B Calle 61 A sur

ITEM	TIPO DE CANCHA	PARQUE	CÓDIGO IDRD	LOCALIDAD	DIRECCIÓN
44	SINTETICA	El Porvenir	07-391	Bosa	Av 1° de Mayo con Av Long de Occ
45	SINTETICA	El Porvenir	07-391	Bosa	Av 1° de Mayo con Av Long de Occ
46	SINTETICA	El Porvenir	07-391	Bosa	Av 1° de Mayo con Av Long de Occ
47	SINTETICA	El Porvenir	07-391	Bosa	Av 1° de Mayo con Av Long de Occ
48	SINTETICA	El Porvenir	07-391	Bosa	Av 1° de Mayo con Av Long de Occ
49	SINTETICA	Portal del Sol	07-403	Bosa	Carrera 95 A Calle 73 sur
50	SINTETICA	Ciudadela Campo Verde	07-436	Bosa	Carrera 95 A Calle 75 sur
51	SINTETICA	Ciudadela Campo Verde	07-436	Bosa	Carrera 95 A Calle 75 sur
52	SINTETICA	Ciudadela Campo Verde	07-436	Bosa	Carrera 95 A Calle 75 sur
53	SINTETICA	Carvajal	08-040	Kennedy	Cra 70 B Calle 24 A sur
54	SINTETICA	Villa Alsacia	08-065	Kennedy	Carrera 72 B Calle 11 A BIS
55	SINTETICA	Marsella Sector Norte I Etapa	08-066	Kennedy	Carrera 69 Calle 8
56	SINTETICA	Marsella Sector Norte I Etapa	08-066	Kennedy	Carrera 69 Calle 8
57	SINTETICA	Américas Occidental	08-127	Kennedy	Av. Boyacá Calle 2 sur
58	SINTETICA	Villa de los Sauces	08-180	Kennedy	Carrera 77 Bis Calle 58 C sur
59	SINTETICA	La Igualdad	08-212	Kennedy	Carrera 68A entre Calle 2
60	SINTETICA	Timiza	08-219	Kennedy	Carrera 72 P Calle 40 H sur
61	SINTETICA	Timiza	08-219	KENNEDY	Carrera 72 P Calle 40 H sur
62	SINTETICA	Las Luces y Villa Rica	08-533	Kennedy	Carrera 77 H Calle 52 A sur
63	SINTETICA	Gilma f11	08-552	Kennedy	Transversal 85 A Calle 49 sur
64	SINTETICA	Gilma f8	08-552	Kennedy	Transversal 85 A Calle 49 sur
65	SINTETICA	Gilma f5	08-552	Kennedy	Transversal 85 A Calle 49 sur
66	SINTETICA	Gilma f5	08-552	Kennedy	Transversal 85 A Calle 49 sur
67	SINTETICA	La Alejandra	08-568	Kennedy	Carrera 72 I Diagonal 40 a sur
68	SINTETICA	Lago Timiza I Etapa	08-626	Kennedy	Carrera 73 Calle 43 sur
69	SINTETICA	Primavera	08-770	Kennedy	Calle 2 Carrera 91 C
70	SINTETICA	Modelia	09-016	Fontibon	Carrera 81 C N°24 c 50

ITEM	TIPO DE CANCHA	PARQUE	CÓDIGO IDRD	LOCALIDAD	DIRECCIÓN
71	SINTETICA	Villa Helena Villemar	09-026	Fontibón	Carrera 96 G N°20 A 35
72	SINTETICA	Carlos Lleras (El Fuego)	09-048	Fontibón	Carrera 70 Calle 23 C
73	SINTETICA	Urb. Ciudad Hayuelos	09-200	Fontibón	Calle 19 A Carrera 80 A
74	SINTETICA	Urb. Ciudad Hayuelos	09-200	Fontibón	Calle 19 A Carrera 80 A
75	SINTETICA	Villas del Madrigal	10-002	Engativá	Calle 75 C Carrera 99 B
76	SINTETICA	Villa Luz	10-018	Engativá	Carrera 77A 64B - 03
77	SINTETICA	Villa Luz	10-018	Engativá	Carrera 77A 64B - 03
78	SINTETICA	Florencia Los Tronquitos	10-028	Engativá	Carrera 91 A Calle 75 C
79	SINTETICA	La Europa	10-045	Engativá	Carrera 71 D Calle 67
80	SINTETICA	Villa de Granada	10-102	Engativá	Cra 111A Calle 75D
81	SINTETICA	Bachué	10-117	Engativá	Carrera 95 Calle 90 A
82	SINTETICA	Ciudad Honda	10-153	Engativá	Carrera 68 G Calle 64 H
83	SINTETICA	El Carmelo	10-169	Engativá	Carrera 101 A Calle 71B
84	SINTETICA	El Carmelo	10-169	Engativá	Carrera 101 A Calle 71B
85	SINTETICA	Juan Amarillo	10-171	Engativá	Carrera 111A Av Calle 90
86	SINTETICA	Juan Amarillo	10-171	Engativá	Carrera 111A Av Calle 90
87	SINTETICA	Juan Amarillo	10-171	Engativá	Carrera 111A Av Calle 90
88	SINTETICA	Juan Amarillo	10-171	Engativá	Carrera 111A Av Calle 90
89	SINTETICA	Juan Amarillo	10-171	Engativá	Carrera 111A Av Calle 90
90	SINTETICA	Juan Amarillo	10-171	Engativá	Carrera 111A Av Calle 90
91	SINTETICA	Normandía	10-190	Engativá	Carrera 73 Calle 51
92	SINTETICA	Bonanza	10-215	Engativá	Carrera 70 F Calle 75
93	SINTETICA	San Andrés	10-234	Engativá	Carrera 102 con Calle 79
94	SINTETICA	San Andrés	10-234	Engativá	CALLE 82 CARRARA 102
95	SINTETICA	Florencia	10-249	Engativá	Carrera 88 Calle 75
96	SINTETICA	UDS Unidad Deportiva El Salitre	10-290	Engativá	CALLE63 CARERA AV 68
97	SINTETICA	Petar Salitre	10-531	Engativá	Carrera 120 Calle 80 A Bis
98	SINTETICA	Ciudadela Cafam	11-008	Suba	Cra 113 C Calle 142 A
99	SINTETICA	Berlín	11-015	Suba	Calle 142 Carrera 145 B
100	SINTETICA	Cantalejo	11-036	Suba	Carrera 55 Calle 160
101	SINTETICA	Urb Lombardía (1 Etapa)	11-052	Suba	Calle 143 Carrera 107B
102	SINTETICA	Burgos britalia1	11-058	Suba	Carrera 73 Calle 160
103	SINTETICA	Burgos britalia2	11-058	Suba	Carrera 73 Calle 160

ITEM	TIPO DE CANCHA	PARQUE	CÓDIGO IDRD	LOCALIDAD	DIRECCIÓN
104	SINTETICA	Casa Blanca	11-069	Suba	Carrera 68 entre Calles 140 Y 141
105	SINTETICA	Bilbao	11-074	Suba	Calle 142 C Carrera 151 A
106	SINTETICA	Tibabuyes1	11-084	Suba	Carrera 121 C Calle 130 C
107	SINTETICA	Tibabuyes2	11-084	Suba	Carrera 121 C Calle 130 C
108	SINTETICA	Prado Pinzón	11-109	Suba	Calle 143 Carrera 49
109	SINTETICA	Cafam Suba II (Los Gavilanes)	11-1101	Suba	Carrera 143 Calle 142 A
110	SINTETICA	Urb. Mazurén I Sector	11-161	Suba	Calle 152 Carrera 50
111	SINTETICA	Victoria norte	11-162	Suba	Calle 150 Carrera 54
112	SINTETICA	Cometas	11-204	suba	Av Calle 127 Carrera 87 A
113	SINTETICA	Lindaraja	11-309	suba	Carrera 78 Calle 127 D
114	SINTETICA	Fontanar del Rio	11-368	Suba	Diagonal 145 Carrera 122
115	SINTETICA	Fontanar del Rio	11-368	Suba	Diagonal 145 Carrera 122
116	SINTETICA	Fontanar del Rio	11-368	Suba	Diagonal 145 Carrera 122
117	SINTETICA	Vilanova	11-668	suba	Carrera 54 D Calle 186
118	SINTETICA	Valle de Refous	11-686	Suba	Cra 101 calle 150a
119	SINTETICA	PRD 1	12-091	Barrios Unidos	Transversal 48 N°63-65
120	SINTETICA	PRD 2	12-091	Barrios Unidos	Transversal 48 N°63-65
121	SINTETICA	Santa Clara	13-015	Teusaquillo	Carrera 46 Calle 22 A
122	SINTETICA	Urb Salitre (Greco)	13-016	Teusaquillo	Carrera 66 B Calle 43
123	SINTETICA	Arena Movistar	13-128	Teusaquillo	Av Carrera 30 Diagonal 61 C
124	SINTETICA	Arena Movistar	13-128	Teusaquillo	Av Carrera 30 Diagonal 61 C
125	SINTETICA	La pepita	14-008	Mártires	Calle 10 Carrera 26
126	SINTETICA	Santa Isabel La Fragua	15-021	Antonio Nariño	Calle 8 Sur con Carrera 27
127	SINTETICA	Santa Isabel La Fragua	15-021	Antonio Nariño	Calle 8 Sur con Carrera 27
128	SINTETICA	Luna Park	15-029	Antonio Nariño	Carrera 14 Calle 13 sur
129	SINTETICA	Villa Mayor	15-036	Antonio Nariño	Calle 32 A sur Carrera 34 C

ITEM	TIPO DE CANCHA	PARQUE	CÓDIGO IDRD	LOCALIDAD	DIRECCIÓN
130	SINTETICA	Fragua	15-040	Antonio Nariño	Carrera 31 N.º 14 B 57 sur
131	SINTETICA	Champion Primavera	16-012	Pte Aranda	Transv 42 A Calle 5A
132	SINTETICA	Milenta tejar san eusebio	16-099	Pte Aranda	Carrera 52 B Calle 20 sur
133	SINTETICA	Montes 1	16-112	Pte Aranda	Calle 10 sur N°39 - 29
134	SINTETICA	Montes2	16-112	Pte Aranda	Calle 10 sur N°39 - 29
135	SINTETICA	Gorgonzola	16-126	Pte Aranda	Carrera 41 A Calle 5
136	SINTETICA	Pradera sur	16-153	Pte Aranda	Av calle 3 Carrera 66
137	SINTETICA	Jazmín	16-204	Pte Aranda	Av. Carrera 50 Calle 1 D
138	SINTETICA	Parque Industrial (El Nectar)	16-415	Pte Aranda	Cll 10 AV Cra 36
139	SINTETICA	Parque Industrial (El Nectar Polideportivo)	16-416	Pte Aranda	Cll 11 A AV Cra 36
140	SINTETICA	La Catedral - Candelaria	17-028	La Candelaria	Calle 12f No 3-27
141	SINTETICA	Urb. Gustavo Restrepo	18-009	Rafael Uribe	Calle 28 Sur Carrera 15A
142	SINTETICA	Bosque San Carlos	18-028	Rafael Uribe	Carrera 12 Bis
143	SINTETICA	Palermo Sur	18-035	Rafael Uribe	Carrera 1 Este Calle 49 C sur
144	SINTETICA	Marruecos	18-041	Rafael Uribe	Calle 48 P sur Carrera 5L
145	SINTETICA	Molinos	18-055	Rafael Uribe	Transversal 5 Calle 48 L sur
146	SINTETICA	Santa Lucia	18-073	Rafael Uribe	Carrera 14 Calle 41 B sur
147	SINTETICA	Santa Lucia	18-073	Rafael Uribe	Carrera 14 Calle 41 B sur
148	SINTETICA	Parque Olaya Herrera	18-207	Rafael Uribe	Carrera 21 25-35 Sur
149	SINTETICA	San José	18-429	Rafael Uribe	Calle 26 Sur y Av 1 de Mayo con Cra 12 D
150	SINTETICA	Domingo Lain	19-032	Ciudad Bolívar	Calle 64 C sur Transv 17N
151	SINTETICA	Arborizadora Alta	19-058	Ciudad Bolívar	Diagonal 73 A sur Transversal 36 B
152	SINTETICA	La Coruña	19-115	Ciudad Bolívar	Calle 58 Bsur Carrera 47
153	SINTETICA	Sierra Morena	19-190	Ciudad Bolívar	Transversal 73 B Calle 75A sur

ITEM	TIPO DE CANCHA	PARQUE	CÓDIGO IDRD	LOCALIDAD	DIRECCIÓN
154	SINTETICA	Sierra Morena	19-190	Ciudad Bolívar	Transversal 73 B Calle 75A sur
155	SINTETICA	Illimani (Paraíso)	19-346	Ciudad Bolívar	Calles 71 P Sur Transversal 27 H
156	SINTETICA	Ilimani	19-346	Ciudad Bolívar	Calles 71 P Sur Transversal 27 H
157	SINTETICA	Buenavista- Porvenir	19-347	Ciudad Bolívar	Carrera 17 F Calle 76 A sur
158	SINTETICA	El Taller- El Ensueño	19-348	Ciudad Bolívar	Carrera 75A Diagonal 68 A
159	SINTETICA	Paraíso	19-490	Ciudad Bolívar	Cra 27 Q Calle 71 K sur
160	SINTETICA	Caracolí	19-710	Ciudad Bolívar	Carrera 74 B Calle 77 sur
161	SINTETICA	Balmoral Guadalupe	19-750	Ciudad Bolívar	Autopista sur Carrera 71
162	SINTETICA	Altos de la Estancia	19-756	Ciudad Bolívar	Carrera 76 C Diagonal 67 a sur
163	SINTETICA	Altos de la Estancia	19-756	Ciudad Bolívar	Carrera 76 C Diagonal 67 a sur
164	SINTETICA	Mirador illimani	19-788	Ciudad Bolívar	Carrera 27 C Diagonal 70 U Bis sur
165	SINTETICA	San José Maryland	07-164	Bosa	Carrera 86 Calle 73 G sur
166	SINTETICA	Aurora	05-002	USME	Calle 71 F sur Carrera 14 V (Av Boyacá)
167	SINTETICA	Valles de Cafam	05-003	USME	Calle 92 sur Carrera 14 I
168	SINTETICA	Villa Alemana	05-087	USME	Carrera 5 este (Aup Llano) Calle 100 sur
169	SINTETICA	Pijaos	18-090	Rafael Uribe	Av Cra 10 Calle 35 sur
170	SINTETICA	Cruces	03-036	Santafé	Carrera 5 A Calle 1 B
171	SINTETICA	La Gaitana	11-205	SUBA	Carrera 125 B Calle 131 A
172	SINTETICA	Gimnasio del Norte	12-023	Barrios Unidos	Carrera 28 Calle 63 B
173	SINTETICA	Eduardo Santos	14-030	Mártires	Carrera 18 C Calle 4 A
174	SINTETICA	Dindalito	08-144	Kennedy	Carrera 94 C Calle 42 sur
175	SINTETICA	Castilla	08-200	Kennedy	Carrera 74 Calle 8A Bis
176	SINTETICA	Cayetano Cañizares	08-241	Kennedy	Carrera 80 Calle 40 C sur

ITEM	TIPO DE CANCHA	PARQUE	CÓDIGO IDRD	LOCALIDAD	DIRECCIÓN
177	SINTETICA	Estancia	19-231	Ciudad Bolivar	Calle 58 C sur Carrera 74 C
178	SINTETICA	La Joya	19-349	Ciudad Bolivar	Carrera 18 I Calle 80 B sur
179	SINTETICA	Urb Metrópolis	12-035	Barrios Unidos	Carrera 66 Calle 84
180	SINTETICA	Urb La Laguna 1 (Venecia)	06-006	Tunjuelito	Carrera 53 A Diagonal 47 A sur
181	SINTETICA	Urb La Laguna 2 (Venecia)	06-006	Tunjuelito	Carrera 53 A Diagonal 47 A sur

CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL:

ITEM	TIPO DE CANCHA	PARQUE	CÓDIGO IDRD	LOCALIDAD	DIRECCIÓN
1	NATURAL	EL TUNAL (Estadio)	06-063	Tunjuelito	Carrera 7H Calle 165
2	NATURAL	EL TUNAL (Softbol)	06-063	Tunjuelito	Carrera 7H Calle 165
3	NATURAL	TIMIZA (Estadio)	08-219	Kennedy	Carrera 9 Calle 145
4	NATURAL	ATAHUALPA (Estadio)	09-104	Fontibón	Calle 164 Carrera 16 C
5	NATURAL	SIMON BOLIVAR - Sector Parque Deportivo el Salitre (Estadio)	12-091	Barrios Unidos	Calle 160 Carrera 19 B
6	NATURAL	SIMON BOLIVAR - Sector Parque Deportivo el Salitre (Alterna 3)	12-091	Barrios Unidos	Calle 187 Transversal 18 B
7	NATURAL	SIMON BOLIVAR - Sector Parque Deportivo el Salitre (Playa - 1)	12-091	Barrios Unidos	Carrera 17 Calle 175
8	NATURAL	TABORA	10-192	Engativá	Av Carrera 11 Calle 87
9	NATURAL	EL COUNTRY (Club)	01-1000	Usaquén	Carrera 14 Calle 7
10	NATURAL	SIMON BOLIVAR - Sector Unidad Deportivo el Salitre (UDS Beisbol)	10-290	Engativá	Carrera 14 Calle 7
11	NATURAL	SIMON BOLIVAR - Sector Unidad Deportivo el Salitre (UDS Atletismo)	10-290	Engativá	Carrera 14 Calle 7
12	NATURAL	SIMON BOLIVAR - Sector Unidad Deportivo el Salitre (UDS Atletismo) MARTE	10-290	Engativá	Carrera 1A Este Calle 3

ITEM	TIPO DE CANCHA	PARQUE	CÓDIGO IDRD	LOCALIDAD	DIRECCIÓN
13	NATURAL	SIMON BOLIVAR - Sector Unidad Deportivo el Salitre (UDS Sotfbol)	10-290	Engativá	Diagonal 4B Cra 8 E
14	NATURAL	SIMON BOLIVAR - Sector Unidad Deportivo el Salitre (UDS Voleibol)	10-290	Engativá	Transversal 8a este Calle 50 b sur
15	NATURAL	SAN CRISTOBAL (Estadio)	04-127	San Cristóbal	Carrera 5 a este Diagonal 31 C sur
16	NATURAL	PARQUE NACIONAL (PM-2A) ENRIQUE OLAYA HERRERA (Sector histórico)	03-035	Santa Fé	Diagonal 38 Sur No. 1F - 05
17	NATURAL	CIUDAD MONTES	16-112	Puente Aranda	Diagonal 38 Sur No. 1F - 05
18	NATURAL	CIUDAD MONTES (Softbol)	16-112	Puente Aranda	Calle 13 sur N.º 2- 50 este
19	NATURAL	CIUDAD MONTES (2 de Playa)	16-112	Puente Aranda	Calle 13 sur N.º 2- 50 este
20	NATURAL	UNIDAD DEPORTIVA LA ALQUERIA	16-024	Puente Aranda	Carrera 14 H Bis Calle 74 D sur
21	NATURAL	MILENTA TEJAR SAN EUSEBIO	16-099	Puente Aranda	Carrera 14 H Bis Calle 74 D sur
22	NATURAL	NUEVO MUZU	06-017	Tunjuelito	Carrera 14 H Bis Calle 74 D sur
23	NATURAL	LA SERENA	10-223	Engativá	Carrera 5 G Calle 93 sur
24	NATURAL	URBANIZACION BOCHICA	16-037	Puente Aranda	Carrera 14 A Calle 137 B sur
25	NATURAL	URBANIZACION LOS ANGELES PRIMER SECTOR	10-186	Engativá	Carrera 11 Calle 67 A Bis sur
26	NATURAL	PARQUE JUAN AMARILLO	10-171	Engativá	Carrera 11 Calle 67 A Bis sur
27	NATURAL	ATAHUALPA I PREDIO - El cajón Sector I	09-024	Fontibón	Cra 55 Diagonal 49 sur
28	NATURAL	MARSELLA SECTOR NORTE I ETAPA - Pinos de Marsella	08-066	Kennedy	Cra 12 Calle 59 sur
29	NATURAL	SIMON BOLIVAR - Sector Complejo acuático (1, 2,3 Playa)	12-1000	Barrios Unidos	Diagonal 52 B sur Cra 61B
30	NATURAL	LA GAITANA	11-205	Suba	Cra 24 A Cll 4B Sur Av Boyacá
31	NATURAL	LA FLORIDA 1	10-311	Engativá	Cra 24 A Cll 4B Sur Av Boyacá

ITEM	TIPO DE CANCHA	PARQUE	CÓDIGO IDRD	LOCALIDAD	DIRECCIÓN
32	NATURAL	LA FLORIDA 2	10-311	Engativá	Cra 24 A Cll 4B Sur Av Boyacá
33	NATURAL	LA FLORIDA 3	10-311	Engativá	Cra 24 A Cll 4B Sur Av Boyacá
34	NATURAL	LA FLORIDA 4	10-311	Engativá	Carrera 80 J Calle 70 A sur
35	NATURAL	LA FLORIDA 5	10-311	Engativá	Carrera 65 Calle 55 A sur
36	NATURAL	LA FLORIDA 6	10-311	Engativá	Av. Calle 57 R sur (Aut. Sur) Carrera 72
37	NATURAL	LA FLORIDA 7	10-311	Engativá	Calle 58 J sur Cra 80 G
38	NATURAL	LA FLORIDA 8	10-311	Engativá	Calle 58 J sur Cra 80 G
39	NATURAL	LA FLORIDA 9	10-311	Engativá	Calle 69 A Sur 93D - 45
40	NATURAL	LA FLORIDA MARACANA 1	10-311	Engativá	Calle 75 BIS Sur (Av. C de Cali) Cra 80J
41	NATURAL	LA FLORIDA MARACANA 2	10-311	Engativá	Calle 73 D Sur Carrera 78 A hasta la 82 A Bis
42	NATURAL	PARQUE DEL RIO (SAN JOSE DE MARYLAND)	07-164	Bosa	Av Carrera 86 Calle 55 sur
43	NATURAL	AUTOPISTA SUR (Pavco)	07-152	Bosa	Carrera 98 B Calle 61 A sur

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

CONTRATO DE OBRA

No. de contrato	4041 DE 2024
Contratista Consultoria y/obra	CONSORCIO INNOVAPARQUES
Objeto	*"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 - "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS".*
Plazo de la ejecución etapa de obra	OCHO (08) MESES
Prorroga No. 1	TRES (03) MESES
Plazo total del contrato	ONCE (11) MESES
Valor etapa de obra	$ 5.200.000.000,00
Valor adición No. 1	$ 2.847.000.000,00
Valor total del contrato	$ 8.047.000.000,00
Fecha Inicio	20 de noviembre de 2024
Fecha de Terminación del actualizada:	19 de octubre de 2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

No. de contrato	4080 DE 2024
Contratista de Interventoría	CONSORCIO SANTA TERESA 28
Objeto	*"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2"*
Periodo etapa de obra	OCHO (08) MESES
Plazo de liquidación	UN (01) MES
Prorroga No. 1	TRES (03) MESES
Plazo total del contrato	DOCE (12) MESES
Valor etapa de obra	$ 2.107.109.833,00
Adición No. 1	$ 322.109.701,00
Valor total del contrato	$ 2.429.219.534,00
Fecha Inicio	20 de noviembre de 2024
Fecha de terminación actualizada:	19 de noviembre de 2025

3. ESTADO INICIAL DEL PROYECTO:

Lo primero que se realizó fue un reconocimiento de algunas de las zonas a intervenir, en compañía de funcionarios del IDRD, representantes de la Interventoría CONSORCIO SANTA TERESA 28 y representantes del contratista CONSORCIO INNOVAPARQUES.

En las visitas realizadas se identificaron los escenarios a intervenir dentro del alcance del presente contrato.

4. ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO:

A la fecha del presente informe N°8, se realiza la atención de priorizaciones establecidas por la entidad definidas a lo largo del contrato y durante recorridos y comités de seguimiento semanales y se continúan realizando mantenimientos rutinarios y correctivos en gramas naturales y sintéticas.

El Contratista y la Interventoría ha venido realizando revisiones preliminares de las actividades a ejecutar en cada zona de trabajo priorizada; igualmente durante el periodo se realizaron actividades de campo complementarias con las de oficina, tales como: medidas en terreno, diagnósticos, elaboración de presupuestos y programaciones de obra. Por parte de la Interventoría se realizó acompañamiento en terreno para todas estas las actividades mencionadas, así como la revisión de coordinación de reuniones y comités de obra, elaboración de informes mensuales y semanales, revisión de pólizas, revisión de presupuestos y programaciones y demás documentos inherentes a los contratos para el buen desarrollo de las obras.

5. SEGUIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO

Para el periodo del presente informe, el contrato de obra pública No. 4041 de 2024 se ha venido desarrollando en concordancia con los términos legales establecidos contractualmente, sin presentar a la fecha ningún tipo de hechos u omisiones, que puedan conllevar a un presunto incumplimiento por parte del contratista.

De acuerdo con lo anterior y con los lineamientos establecidos en la naturaleza del contrato, el pliego de condiciones, documentos previos, y en especial las contenidas en el anexo técnico, en lo referente a las obligaciones del contratista, a continuación, se presenta un breve resumen del estado actual en los siguientes aspectos:

5.1 SEGUIMIENTO A MODIFICACIONES CONTRACTUALES

Durante el periodo del presente informe se realiza la suscripción de la modificación contractual para el contrato de obra No. IDRD-SG-4041-2024, el cual es prorrogado por tres (03) meses y adicionado con $2.847.000.000 y se realiza la suscripción de modificación contractual de contrato de interventoría No. IDRD-SG-4080-2024, el cual es prorrogado por tres (03) meses y adicionado con $322.109.701.

Los documentos soporte de las presentes modificaciones se encuentran cargados en la plataforma Secop II.

5.2 SEGUIMIENTO A LAS PÓLIZAS CONTRACTUALES

Se revisa el estado actual de las pólizas de los contratos de obra e interventoría, y se evidencia que los mismos a la fecha están debidamente actualizados según las condiciones establecidas contractualmente a nivel de las garantías.

De acuerdo con lo antes descrito, a continuación, se presenta la evidencia del cumplimiento a los parámetros establecidos al respecto: **ANEXO 1**

5.2.1. CONTRATO DE OBRA: COMPAÑÍA ASEGURADORA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Pólizas Suscripción Contrato

AMPARO		Emisión inicial		
		VALOR (Bruto)	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO No. 360 47 994000035672 ANEXO 0	Cumplimiento	$1.040.000.000,00	20/11/2024	20/01/2026
	Salarios y Prestaciones Sociales	$260.000.000,00	20/11/2024	20/07/2028
	Estabilidad de la obra	$1.040.000.000.00		
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 360 74 994000009608 ANEXO 1		$520.000.000,00	12/07/2025	20/07/2025

Pólizas Acta de Inicio

AMPARO		Emisión inicial		
		VALOR (Bruto)	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO No. 360 47 994000035672 ANEXO 1	Cumplimiento	$1.040.000.000,00	20/11/2024	20/01/2026
	Salarios y Prestaciones Sociales	$260.000.000,00	20/11/2024	20/07/2028
	Estabilidad de la obra	$1.040.000.000.00	Dos años	
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 360 74 994000009608 ANEXO 2		$520.000.000,00	12/07/2025	20/07/2025

Pólizas Prorroga No. 1 y Adición No. 1

AMPARO		Emisión inicial		
		VALOR (Bruto)	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO No. 360 47 994000035672 ANEXO 3	Cumplimiento	$1.609.400.000,00	20/11/2024	20/04/2026
	Salarios y Prestaciones Sociales	$402.350.000,00	20/11/2024	20/10/2028
	Estabilidad de la obra	$1.609.400.000,00	Dos años	
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 360 74 994000009608 ANEXO 3		$520.000.000,00	12/07/2025	20/10/2025

5.2.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA: COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL

Pólizas Suscripción Contrato

AMPARO		Actualización acta de inicio		
		VALOR (Bruto)	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO No. 100355905 ANEXO 0	Cumplimiento	$421.421.966,60	14/11/2024	14/12/2025
	Salarios y Prestaciones Sociales	$105.355.491,65	14/11/2024	14/08/2024
	Calidad de servicio	$421.421.966,60	14/08/2025	14/08/2030

Pólizas Acta de Inicio

AMPARO		Actualización acta de inicio		
		VALOR (Bruto)	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO No. 100355905 ANEXO 2	Cumplimiento	$421.421.966,60	20/11/2024	20/12/2025
	Salarios y Prestaciones Sociales	$105.355.491,65	20/11/2024	20/08/2024
	Calidad de servicio	$421.421.966,60	20/08/2025	20/08/2030

Pólizas Prorroga No. 1 y Adición No. 1

AMPARO		Actualización acta de inicio		
		VALOR (Bruto)	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO No. 100355905 ANEXO 2	Cumplimiento	$485.843.908,00	20/11/2024	19/05/2026
	Salarios y Prestaciones Sociales	$121.460.977,00	20/11/2024	19/11/2028
	Calidad de servicio	$485.843.908,00	20/08/2025	19/11/2030

6. INFORME GENERAL DE GESTIÓN TÉCNICA:

6.1 ANTECEDENTES DEL CONTRATO

El IDRD realiza la presentación de las obras inicialmente priorizadas, se hace verificación en campo y se procede a establecer las actividades que se realizarán de acuerdo con el diagnóstico.

6.2. SEGUIMIENTO A PLANES Y PROGRAMAS

Se informa que el contratista de obra cumplió con la entrega todos los planes y programas de los distintos componentes, como se muestra a continuación:

PLAN	ESTADO	COMUNICADO	FECHA	RADICADO
1.Plan de construcción y coordinación logística	APROBADO	IDRD-4080-G1-2024-116	15/01/2025	20252100013922
2.Plan de seguridad y salud en el trabajo SST	APROBADO	IDRD-4080-G1-2024-027	05/12/2024	20242100417002
3.Plan de gestión social	APROBADO	IDRD-4080-G1-2024-068	26/12/2024	20242100439302
4.Plan de calidad	APROBADO	IDRD-4080-G1-2024-028	05/12/2024	20242100417012
5.Plan de geotecnia	APROBADO	IDRD-4080-G1-2024-084	03/01/2025	20252100002632
6.Plan estructural y elementos no estructurales (ENE)	APROBADO	IDRD-4080-G1-2024-104	09/01/2025	20252100006342
7.Plan topografía	APROBADO	IDRD-4080-G1-2024-105	09/01/2025	20252100006332

PLAN	ESTADO	COMUNICADO	FECHA	RADICADO
8.Plan de Manejo Ambiental – PMA (incluye componentes Forestal, Fauna y Paisajismo)	APROBADO	IDRD-4080-G1-2024-114	15/01/2025	20252100013942
9.Plan hidrosanitario	APROBADO	IDRD-4080-G1-2024-087	03/01/2025	20252100002642
10.Plan de servicios públicos energía	APROBADO	IDRD-4080-G1-2024-106	09/01/2025	20252100006322
11.Programa de manejo ambiental de RCD	APROBADO	IDRD-4080-G1-2024-085	03/01/2025	20252100002672
12.Plan de manejo de tránsito – PMT	APROBADO	IDRD-4080-G1-2024-115	15/01/2025	20252100013932
13. Plan de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible SUDS	APROBADO	IDRD-4080-G1-2024-086	03/01/2025	2025210002662

6.3. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

CAMPOS EN GRAMA SINTETICA:

PARQUE	COD	DIRECCION	ACTIVIDAD EJECUTADA
LA FRAGUA	15-040	Carrera 31 N.º 14 B 57 sur	06-06-2025 cepillado, fumigación poda y bordeo
SANTA ISABEL LA FRAGUA F8	15-021	Calle 8 Sur con Carrera 27	13-06-2025 cepillado y fumigación
SANTA ISABEL LA FRAGUA F5	15-021	Calle 8 Sur con Carrera 27	13-06-2025 cepillado y fumigación
VILLA MAYOR CEMENTERIO DEL SUR	15-036	Calle 32 A sur Carrera 34 C	06-06-2025 cepillado y fumigación
GIMNASIO DISTRITAL DEL NORTE	12-023	Carrera 28 y Carrera 27A con entre Calle 63C y Calle 63B	06-06-2025 cepillado, fumigación, poda y bordeo
SIMON BOLIVAR - Sector Parque Deportivo el Salitre (PR1)	12-091	Av. Carrera 68 y Av. Carrera 60 con entre Av. Calle 63	06-06-2025 la Cancha 1 tiene programación tiene 2 Partidos
SIMON BOLIVAR - Sector Parque Deportivo el Salitre (PR2)	12-091	Av. Carrera 68 y Av. Carrera 60 con entre Av. Calle 63	06-06-2025 cepillado, fumigación, poda y bordeo 24-06-2025 cepillado, poda, bordeo
URBANIZACION METROPOLIS	12-035	Av. Carrera 68 y Carrera 65B con entre Calle 73 y Calle 78	13-06-2025 cepillado y fumigación
AUTOPISTA SUR (Pavco)	07-152	Av. Calle 57R S y Calle 57K S con entre Carrera 72A y Av. Carrera 71B	17-06-2025 cepillado, fumigación, poda, bordeo
CLARELANDIA F11	07-163	Calle 58C S y Calle 59 S con entre Carrera 80I y Carrera 80B	18-06-2025 cepillado, fumigación, poda y bordeo

PARQUE	COD	DIRECCION	ACTIVIDAD EJECUTADA
CLARELANDIA F8	07-163	Calle 58C S y Calle 59 S con entre Carrera 80I y Carrera 80B	18-06-2025 cepillado y fumigación
EL PORVENIR	07-391	Calle 59 S y Calle 49 S con entre Carrera 92A y Carrera 102	11-06-2025 cepillado y fumigación
EL PORVENIR 2	07-391	Calle 59 S y Calle 49 S con entre Carrera 92A y Carrera 102	11-06-2025 cepillado y fumigación
EL PORVENIR 3	07-391	Calle 59 S y Calle 49 S con entre Carrera 92A y Carrera 102	11-06-2025 cepillado y fumigación
EL PORVENIR 4	07-391	Calle 59 S y Calle 49 S con entre Carrera 92A y Carrera 102	11-06-2025 cepillado y fumigación
EL PORVENIR 5	07-391	Calle 59 S y Calle 49 S con entre Carrera 92A y Carrera 102	11-06-2025 cepillado y fumigación
EL PORVENIR mini	07-391	Calle 59 S y Calle 49 S con entre Carrera 92A y Carrera 103	11-06-2025 cepillado y fumigación
EL RECREO	07-260	Carrera 106A y Carrera 93D con entre Calle 63 S y Calle 73 S	11-06-2025 instalación de guayas
			11-06-2025 cepillado y fumigación
URBANIZACION LA ESPERANZA	07-273	Carrera 80J y Carrera 79 con entre Calle 76A S y Calle 75BIS S	03-06-2025 desmonte de grama sintética
			25-06-2025 mantenimiento arcos
			25-06-2025 mantenimiento malla nylon
			27-06-2025 trasiego y nivelación de triturado
			28-06-2025 trasiego y nivelación de triturado
TIBANICA	07-274	Diagonal 73 y Carrera 77G con entre Calle 78I S y Calle 74 S	11-06-2025 cepillado y fumigación
NARANJOS	07-035	Carrera 80M Bis y Carrera 80I con entre Calle 70F S y Calle 68C S	11-06-2025 cepillado fumigación y bordeo
Parque Campo Verde F5	07-436	CARRERA 91 N 83 85 SUR	18-06-2025 no se realiza mantenimiento por que está ocupada y no dieron el espacio para ingresar
			24-06-2025 cepillado y fumigación
Parque Campo Verde F8	07-436	CARRERA 91 N 83 85 SUR	18-06-2025 no se realiza mantenimiento por que está ocupada y no dieron el espacio para ingresar
			24-06-2025 cepillado y fumigación
Parque Campo Verde F8	07-436	CARRERA 91 N 83 85 SUR	18-06-2025 no se realiza mantenimiento por que está

PARQUE	COD	DIRECCION	ACTIVIDAD EJECUTADA
			ocupada y no dieron el espacio para ingresar
			24-06-2025 cepillado y fumigación
URBANIZACION PORTAL DEL SOL	07-403	Carrera 98B y Carrera 95A con entre Calle 74 S y Calle 75 S	18-06-2025 no se realiza mantenimiento por que está ocupada y no dieron el espacio para ingresar
			24-06-2025 cepillado y fumigación
URBANIZACION SANTIAGO DE ATALAYAS	07-321	Carrera 99C y Carrera 98A con entre Calle 59B S y Calle 61A S	18-06-2025 cepillado y fumigación
TIMIZA (Sector Villa del Rio)	07-036	Av. Carrera 71B y Carrera 64B con entre Calle 55A S y Rio Tunjuelito	11-06-2025 cepillado y fumigación
URBANIZACION CHICALA LOTE A	07-292	Calle 54C S y Calle 55 S con entre Av. Carrera 86 y Carrera 86C	18-06-2025 no se realiza mantenimiento por que está ocupada y no dieron el espacio para ingresar
URBANIZACION CABRERA (Japón)	02-007	Av. Carrera 11 y Carrera 11A con entre Calle 86A y Calle 87	20-06-2025 No se realiza mantenimiento por que esta con candado y el promotor no tiene las llaves
			24-06-2025 Cabrera Japón No se realiza mantenimiento por que esta con candado y no hay quien abra para ingresar
ALTOS DE LA ESTANCIA 1	19-756	Calle 64A S y Calle 75C S con entre Carrera 75F y Carrera 76C	10-06-2025 cepillado y fumigación
ALTOS DE LA ESTANCIA 2	19-756	Calle 64A S y Calle 75C S con entre Carrera 75F y Carrera 76C	10-06-2025 cepillado y fumigación
DESARROLLO ARBOLIZADORA ALTA	19-058	Transversal 40B y Carrera 36 con entre Diagonal 73A S y Diagonal 72A S	10-06-2025 cepillado y fumigación
URBANIZACION BALMORAL CESION GUADALUPE	19-750	Av.Calle 57R S y Calle 58A S con entre Carrera 71 y Av. Carrera 70C	17-06-2025 cepillado y fumigación
DESARROLLO CARACOLI	19-710	Calle 77S y Calle 77D S con entre Carrera 74B y Carrera 74D	10-06-2025 No se realiza mantenimiento porque está ocupada con la comunidad no dio el espacio
			24-06-2025 cepillado y fumigación

PARQUE	COD	DIRECCION	ACTIVIDAD EJECUTADA
DESARROLLO DOMINGO LAIN II (CONDOMINIO EL BOSQUE)	19-032	Calle 64A S y Calle 64 S entre Carrera 18L y Transversal 17N	10-06-2025 cepillado y fumigación
EL TALLER (EL ENSUEÑO)	19-348	Transversal 70C y Carrera 67 S con entre Av. Calle 68 S y Calle 68D BIS A S	17-06-2025 cepillado y fumigación
URBANIZACION LA ESTANCIA	19-231	Diagonal 57Z S y Calle 59A S con entre Carrera 74G y Carrera 74A	10-06-2025 cepillado y fumigación
ILLIMANI (PARAISO) f11	19-346	Calle 71P Sur y Calle 74B S con entre Carrera 27F y Carrera 27B	10-06-2025 cepillado fumigación poda y bordeo
ILLIMANI (PARAISO) f5	19-346	Calle 71P Sur y Calle 74B S con entre Carrera 27F y Carrera 27B	10-06-2025 cepillado y fumigación
MIRADOR ILLIMANI	19-788	Calle 71P Sur y Calle 74B S con entre Carrera 27F y Carrera 27B	10-06-2025 cepillado y fumigación
LA JOYA	19-349	Calle 80 B BIS S y Calle 80S con entre Carrera 18M y Transversal 18I	10-06-2025 cepillado y fumigación
DESARROLLO EL PARAISO	19-490	Calle 71K S y Calle 71N S con entre Carrera 27P y Carrera 27Q	10-06-2025 cepillado y fumigación
SIERRA MORENA	19-190	Transversal 73B y Transversal 60 entre Calle 75A S y Diagonal 73C S	17-06-2025 cepillado y fumigación
SIERRA MORENA 2	19-190	Transversal 73B y Transversal 60 entre Calle 75A S y Diagonal 73C S	17-06-2025 cepillado y fumigación
URBANIZACION BACHUE PRIMERA ETAPA	10-117	Calle 90A y Calle 91A con entre Carrera 95D y Carrera 95	13-06-2025 cepillado y fumigación
URBANIZACION LA BONANZA	10-215	Transversal 70C Bis y Carrera 70C con entre Calle 75 y Calle 77	13-06-2025 cepillado y fumigación
URBANIZACION CIUDAD DE HONDA	10-153	Carrera 68H y Carrera 68D con entre Calle 64H y Calle 65	13-06-2025 cepillado, fumigación, poda y bordeo
EL CARMELO f11	10-169	Av. Calle 72 y Calle 70 con entre Carrera 101A y Carrera 104C	03-06-2025 cepillado fumigación poda y bordeo
EL CARMELO f8	10-169	Av. Calle 72 y Calle 70 con entre Carrera 101A y Carrera 104C	03-06-2025 cepillado y fumigación
FLORENCIA LOS TRONQUITOS	10-028	Carrera 91A y Carrara 90 BIS con entre Calle 76 BIS y Calle 75C	03-06-2025 cepillado y fumigación
PARQUE JUAN AMARILLO F5	10-171	Av. Calle 90 con entre Carrera 119 y Carrera 110	13-06-2025 cepillado y fumigación
PARQUE JUAN AMARILLO F8	10-171	Av. Calle 90 con entre Carrera 119 y Carrera 110	13-06-2025 cepillado y fumigación
PARQUE JUAN AMARILLO F5	10-171	Av. Calle 90 con entre Carrera 119 y Carrera 110	13-06-2025 cepillado y fumigación
PARQUE JUAN AMARILLO F5	10-171	Av. Calle 90 con entre Carrera 119 y Carrera 110	13-06-2025 cepillado y fumigación

PARQUE	COD	DIRECCION	ACTIVIDAD EJECUTADA
PARQUE JUAN AMARILLO F8	10-171	Av. Calle 90 con entre Carrera 119 y Carrera 110	13-06-2025 cepillado y fumigación
PARQUE JUAN AMARILLO F5	10-171	Av. Calle 90 con entre Carrera 119 y Carrera 110	13-06-2025 cepillado y fumigación
URBANIZACION LA EUROPA F5	10-045	Carrera 71D y Carrara 71 con entre Calle 68B y Calle 67B	13-06-2025 cepillado y fumigación
URBANIZACION LA EUROPA mini	10-045	Carrera 71D y Carrara 71 con entre Calle 68B y Calle 67B	13-06-2025 cepillado y fumigación
URBANIZACION NORMANDIA I, II, II Y IV SECTOR	10-190	Carrera 73A y Carrera 73 con entre Calle 52A y Calle 51	19-06-2025 cepillado y fumigación
PLANTA DE TRATAMIENTO SALITRE (PETAR)	10-531	Carrera 119 y Roi Bogotá con entre Calle 80A Bis y Calle 86	06-06-2025 cepillado y fumigación
SAN ANDRES F8	10-234	Calle 82 y Calle 80A con entre Carrera 102 y Carrera 100A	03-06-2025 cepillado y fumigación
SAN ANDRES F11	10-234	Calle 82 y Calle 80A con entre Carrera 102 y Carrera 100A	03-06-2025 cepillado y fumigación
SIMON BOLIVAR - Sector Unidad Deportivo el Salitre (UDS)	10-290	Av. Carrera 68 y con entre Av. Calle 63	19-06-2025 cepillado, poda, bordeo y fumigación
VILLA LUZ F11	10-018	Carrera 77A y Carrara 80A con entre Calle 63F BIS y Calle 64C	03-06-2025 cepillado y fumigación
VILLA LUZ F5	10-018	Carrera 77A y Carrara 80A con entre Calle 63F BIS y Calle 64C	03-06-2025 cepillado y fumigación
VILLAS DEL MADRIGAL	10-002	Calle 75 C Carrera 99 B	03-06-2025 cepillado y fumigación
URBANIZACION CARLOS LLERAS RESTREPO	09-048	Av. Carrera 72 y Carrara 69F con entre Av. Calle 22 y AV. Calle 24	24-06-2025 desmonte grama sintética 25-06-2025 desmonte grama sintética
URBANIZACION CIUDAD HAYUELOS ETAPA II, III, IV Y V F5	09-200	Carrera 81B y Carrara 80A con entre Calle 19A y Av. Calle 22	19-06-2025 cepillado y fumigación
URBANIZACION CIUDAD HAYUELOS ETAPA II, III, IV Y V F8	09-200	Carrera 81B y Carrara 80A con entre Calle 19A y Av. Calle 22	19-06-2025 cepillado y fumigación
VILLA HELENA	09-026	Carrera 96H BIS y Carrara 96G con entre Calle 20A y Calle 20C	19-06-2025 cepillado, fumigación, poda y bordeo
LAS AMERICAS OCCIDENTAL IV ETAPA	08-127	Calle 2A S y Av. Calle 5 S con entre Carrera 72C y Av. Carrera 72	18-06-2025 cepillado y fumigación
CARVAJAL	08-040	Carrera 70B y Carrera 69C con entre Calle 24A S y Calle 25 S	18-06-2025 cepillado y fumigación
CASTILLA	08-200	Calle 8A y Calle 8B BIS con entre Carrera 75 y Carrera 73	18-06-2025 cepillado y fumigación

PARQUE	COD	DIRECCION	ACTIVIDAD EJECUTADA
CAYETANO CAÑIZARES	08-241	Av. Carrera 80 y Carrera 80D BIS entre Calle 42A S y Calle 39 S	12-06-2025 No se realiza mantenimiento por orden de los vigilantes y de administración
			19-06-2025 cepillado, fumigación, poda y bordeo
BELLAVISTA-DINDALITO	08-144	Calle 40S y Calle 42A S con entre Carrera 96 y Carrera 94C	19-06-2025 cepillado y fumigación
LA MARGARITA (Gilma Jiménez) F11	08-552	Calle 49 S y Calle 51A S entre Transversal 85A y Carrera 81H	19-06-2025 cepillado y fumigación
			19-06-2025 mantenimiento de arcos de futbol
			20-06-2025 mantenimiento malla nylon y suministro de malla de arcos.
LA MARGARITA (Gilma Jiménez) F8	08-552	Calle 49 S y Calle 51A S entre Transversal 85A y Carrera 81H	19-06-2025 cepillado y fumigación
LA MARGARITA (Gilma Jiménez) Mini	08-552	Calle 49 S y Calle 51A S entre Transversal 85A y Carrera 81H	19-06-2025 cepillado y fumigación
LA MARGARITA (Gilma Jiménez) F5	08-552	Calle 49 S y Calle 51A S entre Transversal 85A y Carrera 81H	19-06-2025 cepillado y fumigación
LA MARGARITA (Gilma Jiménez) F5	08-552	Calle 49 S y Calle 51A S entre Transversal 85A y Carrera 81H	19-06-2025 cepillado y fumigación
LA ALEJANDRA	08-568	Carrera 72J y Carrera 72I con entre Calle 42B S y Calle 42 S	18-06-2025 cepillado y fumigación
LA IGUALDAD	08-212	Carrera 68B BIS y Carrera 68F con entre Av. Calle 6 y Calle 2	18-06-2025 cepillado y fumigación
LAGO TIMIZA I ETAPA	08-626	Calle 43 entre Carrera 73C S y Carrera 73 S	18-06-2025 cepillado y fumigación
LAS LUCES Y VILLA RICA	08-533	Carrera 77K BIS y Carrera 77H entre Calle 52A S y Calle 51A S	18-06-2025 cepillado y fumigación
MARSELLA SECTOR NORTE I ETAPA, PINOS DE MARSELLA F11	08-066	Av. Calle 6 y Calle 9C con entre Carrera 69 y Carrera 68G	12-06-2025 cepillado y fumigación
MARSELLA SECTOR NORTE I ETAPA, PINOS DE MARSELLA F5	08-066	Av. Calle 6 y Calle 9C con entre Carrera 69 y Carrera 68G	12-06-2025 cepillado y fumigación
URBANIZACION PRIMAVERA	08-770	Carrera 91C y Carrara 90A con entre Calle 2 y Calle 4	13-06-2025 limpieza de cárcamo
			14-06-2025 limpieza de cárcamo
			20-06-2025 suministro y nivelación de gravilla
			24-06-2025 nivelación y vibricompactacion

PARQUE	COD	DIRECCION	ACTIVIDAD EJECUTADA
			25-06-2025 mantenimiento malla nylon
			26-05-2025 imprimación asfáltica
TIMIZA F11	08-219	Calle 45 S y Call 40G S con entre Carrera 74 y Carrera 72J BIS	18-06-2025 cepillado y fumigación
TIMIZA F8	08-219	Calle 45 S y Call 40G S con entre Carrera 74 y Carrera 72J BIS	18-06-2025 cepillado y fumigación
VILLA DE LOS SAUCES	08-180	Carera 78 y Carrera 77H BIS con entre Calle 58C S y Calle 58B BIS S	18-06-2025 cepillado y fumigación
EDUARDO SANTOS	14-030	Carrera 19 y Carrera 18B con entre Calle 5A y Calle 4A BIS	16-06-2025 cepillado y fumigación
BARRIO LA PEPITA	14-008	Carrera 26 y Carrera 25A con entre Calle 11 y Calle 10	17-06-2025 cepillado y fumigación
GORGONZOLA	16-126	Carrera 41A y Carrera 40 con entre Calle 5 y Calle 4F	19-06-2025 cepillado y fumigación
EL JAZMIN	16-204	Av. Carrera 50 y Carrera 40B con entre Calle 1D y Calle 1H	03-06-2025 cepillado y fumigación
MILENTA TEJAR SAN EUSEBIO	16-099	Transversal 53 y Carrera 52 con entre Calle 19S y Calle 22S	18-06-2025 cepillado y fumigación
CIUDAD MONTES 1	16-112	Carrera 40 y Carrera 38 con entre Calle 10S y Diagonal 16S	03-06-2025 cepillado y fumigación
CIUDAD MONTES 2	16-112	Carrera 40 y Carrera 38 con entre Calle 10S y Diagonal 16S	03-06-2025 cepillado y fumigación
PARQUE INDUSTRIAL (Los Ejidos)	16-416	Calle 12 y Calle11A con entre Av. Carrera 36 y Carrera 37	05-06-2025 cepillado y fumigación
PARQUE INDUSTRIAL (Los Ejidos Licorera)	16-415	Av. Carrera 36 y Carrera 37A con entre Calle 10 y Calle 9	05-06-2025 cepillado y fumigación
URBANIZACION LA PRADERA SUR (Antes Salazar-Gómez)	16-153	Av. Calle 3 y Calle 4B con entre Carrera 66 y Carrera 65	19-06-2025 cepillado, fumigación, poda y bordeo
URBANIZACION MARRUECOS II SECTOR	18-041	Calle 48P S y Calle 48Q S con entre Carrera 5L y Carrera 5C	09-06-2025 cepillado y fumigación
MOLINOS	18-055	Transversal 5 Calle 48 L sur	09-06-2025 cepillado fumigación poda y bordeo
DESARROLLO PALERMO SUR	18-035	Calle 50 S y Calle 52A S entre Carrera 18E y Transversal 2D BIS	09-06-2025 cepillado y fumigación

PARQUE	COD	DIRECCION	ACTIVIDAD EJECUTADA
PARQUE ESTADIO OLAYA HERRERA	18-207	Carrera 24 y Carrera 21 entre Calle 22 S y Calle 27 S	16-06-2025 cepillado y fumigación
PUAOS	18-090	Av. Cra 10 Calle 35 sur	20-06-2025 cepillado y aplicación de caucho borde.
SAN JOSE	18-429	Calle 22 S y Calle 26A S entre Carrera 12D S y Carrera 12D	11-06-2025 cepillado y fumigación
			16-06-2025 cepillado y fumigación
SANTA LUCIA 1	18-073	Carrera 14 y Carrera 13D BIS entre Diagonal 45 BIS S y Calle 36 S	16-06-2025 cepillado y fumigación
SANTA LUCIA 2	18-073	Carrera 14 y Carrera 13D BIS entre Diagonal 45 BIS S y Calle 36 S	16-06-2025 cepillado y fumigación
URBANIZACION GUSTAVO RESTREPO	18-009	Calle 28C S y Calle 28C BIS S entre Carrera 13A y Carrera 14	16-06-2025 cepillado y fumigación
GAITAN CORTES	04-103	Calle 31A S y Diagonal 31C S con entre Carrera 7E y Carrera 4E	17-06-2025 cepillado, fumigación, poda, bordeo
LA VICTORIA 1	04-122	Calle 37B BIS S y Calle 36D S con entre Carrera 2A y Carrera 1C E	17-06-2025 cepillado y fumigación
LA VICTORIA 2	04-122	Calle 37B BIS S y Calle 36D S con entre Carrera 2A y Carrera 1C E	17-06-2025 cepillado y fumigación
SAN CRISTOBAL 1	04-127	Carrera 4 y Carrera 6 E con entre Calle 17A S y Calle 14 S	17-06-2025 cepillado y fumigación
SAN CRISTOBAL 2	04-127	Carrera 4 y Carrera 6 E con entre Calle 17A S y Calle 14 S	17-06-2025 cepillado y fumigación
URBANIZACION ANTIOQUIA	04-038	Carrera 6 E y Carrera 6B E con entre Calle 48G S y Calle 48B S	17-06-2025 cepillado y fumigación
LAS CRUCES	03-036	Carrera 4 y Carrera 5A con entre Calle 1B BIS y Calle 1C BIS	12-06-2025 cepillado y fumigación
DESARROLLO LOURDES	03-122	Calle 3 y Calle 2B con entre Carrera 1E y Carrera 1A E	12-06-2025 cepillado y fumigación
DESARROLLO LOS LACHES (La Mina)	03-148	Carrera 7B E y Carrera 8B E con entre Diagonal 6 y Diagonal 5A	12-06-2025 cepillado y fumigación
TERCER MILENIO	03-085	Carrera 14 y Carrera 10 con entre Calle 6 y Calle 9	12-06-2025 cepillado y fumigación
TERCER MILENIO 2	03-085	Carrera 14 y Carrera 10 con entre Calle 6 y Calle 9	12-06-2025 cepillado y fumigación
TERCER MILENIO 3	03-085	Carrera 14 y Carrera 10 con entre Calle 6 y Calle 9	12-06-2025 cepillado y fumigación
BERLIN	11-015	Calle 142 y Calle 139 con entre Carrera 145B y Carrera 144A	04-06-2025 cepillado y fumigación
DESARROLLO BILBAO SEGUNDO SECTOR SECCIONES A, B, C, D, E (Hayeron)	11-607	Entre calle 143f y calle 144a con carrera 151 costado occidental	04-06-2025 cepillado y fumigación

PARQUE	COD	DIRECCION	ACTIVIDAD EJECUTADA
URBANIZACION BURGOS (Britalia)	11-058	Av. Carrera 72 y Carrera 74 con entre Calle 160 y Calle 163	05-06-2025 cepillado, fumigación, poda y bordeo
URBANIZACION BURGOS (Britalia) 2	11-058	Av. Carrera 72 y Carrera 74 con entre Calle 160 y Calle 163	05-06-2025 cepillado, fumigación, poda y bordeo
PARQUE DEL INDIO O DE LAS COMETAS	11-204	Calle 127C y Calle 127A con entre Carrera 81 y Carrera 87A	05-06-2025 No se realiza mantenimiento por que no ahí acceso de vía
			20-06-2025 cepillado y fumigación
LA GAITANA	11-205	Transversal 126 y Carrera 124C con entre Diagonal 135B y Calle 132B	04-06-2025 cepillado y fumigación
AGRUPACION DE VIVIENDA EL BALCON DE LINDARAJA	11-309	Calle 128 y Diagonal 127B con entre Carrera 79 y Carrera 78	05-06-2025 cepillado y fumigación
PRADO PINZON	11-109	Calle 144 y Calle 143 con entre Carrera 50 y Carrera 49	20-06-2025 cepillado, fumigación, poda y bordeo
URBANIZACION NUEVA TIBABUYES ETAPA I	11-084	Calle 130C y Calle 129D con entre Carrera 123 y Carrera 121C	04-06-2025 cepillado y fumigación
URBANIZACION NUEVA TIBABUYES ETAPA I 2	11-084	Calle 130C y Calle 129D con entre Carrera 123 y Carrera 121C	04-06-2025 cepillado y fumigación
URBANIZACION VALLE DE REFOUS SECTOR 1, 2, 3, 4, 5	11-686	Calle 150A con entre Carrera 102B y Carrera 101	06-06-2025 compactación grava e imprimación
			10-06-2025 inicia extendido de grama sintética y cosido de tapetes
			16-06-2025 pegue demarcación
			20-06-2025 mantenimiento malla nylon
URBANIZACION VICTORIA NORTE	11-162	Carrera 54 y Carrera 53 con entre Calle 150 y Calle 149	06-06-2025 compactación grava e imprimación
			11-06-2025 instalación de grama sintética, extendido de tapetes y costura
			12-06-2025 pegue demarcación
			13-06-2025 pegue demarcación
			14-06-2025 mantenimiento de arcos, fijación de bocines
			16-06-2025 mantenimiento malla nylon e instalación de mallas arcos

PARQUE	COD	DIRECCION	ACTIVIDAD EJECUTADA
			20-06-2025 fumigación cuarto eléctrico
			26-06-2025 poda y bordeo cuarto eléctrico
URBANIZACION VILANOVA	11-668	Av. Calle 183 y Calle 187 con entre Carrera 55B y Carrera 54D	17-06-2025 mantenimiento de arcos
			19-06-2025 mantenimiento cerramiento perimetral y suministro mallas arcos
			20-06-2025 cepillado y fumigación
CIUDADELA CAFAM II (PREVIO LOS GAVILANES)	11-1101	Calle 142F y Calle 142A con entre Carrera 146 y Carrera 143	04-06-2025 cepillado y fumigación
			06-06-2025 mantenimiento cerramiento mallas perimetral
DESARROLLO CANTALEJO	11-036	Calle 161 y Calle 160 con entre Carrera 55 y Carrera 55C	20-06-2025 cepillado y fumigación
CASA BLANCA	11-069	Calle 146A con entre Carrera 80 y Carrera 76	04-06-2025 cepillado y fumigación
URBANIZACION CIUDADELA CAFAM	11-008	Carrera 113C con entre Calle 142 y Calle 142A	04-06-2025 cepillado y fumigación
FONTANAR DEL RIO BEISBOL	11-368	Av. Calle 145 y Calle 146 con entre Diagonal 147 y Carrera 138A	04-06-2025 cepillado y fumigación
FONTANAR DEL RIO F11	11-368	Av. Calle 145 y Calle 146 con entre Diagonal 147 y Carrera 138A	04-06-2025 cepillado y fumigación
FONTANAR DEL RIO F5	11-368	Av. Calle 145 y Calle 146 con entre Diagonal 147 y Carrera 138A	04-06-2025 cepillado y fumigación
Urb. Lombardía (1 Etapa)	11-052	Calle 143 y Calle 142A con entre Carrera 106B y Av. Carrera 104	04-06-2025 cepillado y fumigación
URBANIZACION MAZUREN I SECTOR	11-161	Calle 152 con entre Carrera 53A y Carrera 50	20-06-2025 cepillado y fumigación
SANTA CLARA	13-015	Carrera 47 y Carrera 45 con entre Calle 22A y Calle 22 BIS	05-06-2025 cepillado y fumigación
EL TUNAL F8	06-063	Carrera 24 y Carrera 19C con entre Calle 48C S y Calle 58A S	16-06-2025 cepillado y fumigación
EL TUNAL 2 F8	06-063	Carrera 24 y Carrera 19C con entre Calle 48C S y Calle 58A S	16-06-2025 cepillado y fumigación
EL TUNAL 3 F8	06-063	Carrera 24 y Carrera 19C con entre Calle 48C S y Calle 58A S	16-06-2025 cepillado y fumigación
URBANIZACION LA LAGUNETA	06-005	Transversal 60 y Carrera 55A con entre Diagonal 49 S y Diagonal 51 S	16-06-2025 cepillado y fumigación

PARQUE	COD	DIRECCION	ACTIVIDAD EJECUTADA
NUEVO MUZU	06-017	Transversal 60 y Carrera 61D con entre Diagonal 51A S y Carrera 53 S	16-06-2025 cepillado, poda, bordeo y fumigación
EL TUNAL ALTERNA F11	06-063	Carrera 24 y Carrera 19C con entre Calle 48C S y Calle 58A S	16-06-2025 No se realiza mantenimiento por que está ocupada y no me dieron el espacio
			20-06-2025 cepillado y fumigación
URBANIZACION LA LAGUNA (Venecia 1)	06-006	Carrera 53A y Carrera 53B con entre Diagonal 47A S y Diagonal 49 S	16-06-2025 cepillado y fumigación
URBANIZACION LA LAGUNA (Venecia 2)	06-006	Carrera 53A y Carrera 53B con entre Diagonal 47A S y Diagonal 49 S	16-06-2025 cepillado y fumigación
URBANIZACION TUNJUELITO	06-012	Transversal 11A y Carrera 12D con entre Calle 58A S y Calle 59 S	16-06-2025 cepillado y fumigación
NUEVA URBANIZACION EL CEDRITOS	01-031	Av. Carrera 9 y Carrera 11 con entre Calle 145 y Calle 146	05-06-2025 No se realiza mantenimiento por que está ocupada y no dieron el espacio para ingresar
			24-06-2025 cepillado, fumigación, poda y bordeo
DESARROLLO ESTRELLA DEL NORTE	01-189	Calle 160 y Calle 159A con entre Carrera 21 y Carrera 19B	05-06-2025 cepillado, fumigación, poda y bordeo
			20-06-2025 fumigación cuarto eléctrico
SERVITA F11	01-023	Calle 165 con entre Carrera 7H	20-06-2025 cepillado y fumigación
SERVITA F5	01-023	Calle 165 con entre Carrera 7H	20-06-2025 cepillado y fumigación
URBANIZACION EL TOBERIN	01-079	Av. Carrera 9 y Carrera 11 con entre Calle 145 y Calle 146	05-06-25 cepillado, fumigación, poda y bordeo
VERBENAL	01-313	Calle 187 Transversal 18 B	20-06-2025 cepillado y fumigación
URBANIZACION CALLE 170 (Alameda)	01-540	Carrera 17A y Carrera 17 con entre Calle 175 y Calle 173	05-06-2025 cepillado, fumigación, poda y bordeo

PARQUE	COD	DIRECCION	ACTIVIDAD EJECUTADA
ALFONSO LOPEZ (Sector la Arborada)	05-141	Calle 90A S y Calle 90D S con entre Carrera 5A E y Carrera 1	09-06-2025 cepillado y fumigación
LA AURORA II	05-002	Diagonal 69F S y Calle 73 S con entre Carrera 14V y Carrera 14L	09-06-2025 cepillado, fumigación, poda y bordeo
URBANIZACION MIRAVALLE I, II Y III ETAPAS, EL CORTIJO, SAN JUAN BAUTISTA Y SAN LUIS 1	05-042	Calle 73D BIS S Y Calle 77A S con entre Carrera 14C y Carrera 14V	09-06-2025 cepillado y fumigación
URBANIZACION MIRAVALLE I, II Y III ETAPAS, EL CORTIJO, SAN JUAN BAUTISTA Y SAN LUIS 2	05-042	Calle 73D BIS S Y Calle 77A S con entre Carrera 14C y Carrera 14V	09-06-2025 instalación de guayas
			09-06-2025 cepillado y fumigación
URBANIZACION MIRAVALLE I, II Y III ETAPAS, EL CORTIJO, SAN JUAN BAUTISTA Y SAN LUIS 3	05-042	Calle 73D BIS S Y Calle 77A S con entre Carrera 14C y Carrera 14V	09-06-2025 cepillado y fumigación
CIUDAD NUEVO MILENIO I ETAPA I 1	05-476	Calle 67A S y Calle 67A BIS S con entre Carrera 11 y Carrera 7H	16-06-2025 cepillado y fumigación
CIUDAD NUEVO MILENIO I ETAPA I 2	05-476	Calle 67A S y Calle 67A BIS S con entre Carrera 11 y Carrera 7H	16-06-2025 cepillado y fumigación
NUEVO USME	05-459	Carrera 14 A Calle 137 B sur	09-06-2025 cepillado y fumigación
VALLES DE CAFAM	05-003	Calle 92 S y Calle 84 S con entre Carrera 14I y Carrera 14D	09-06-2025 cepillado y fumigación
VILLA ALEMANA	05-087	Carrera 1F y Carrera 1 con entre Calle 100 BIS S y Diagonal 102 S	09-06-2025 cepillado y fumigación
CANDELARIA	17-028	Calle 12 f # 3-27	12-06-2025 cepillado y fumigación
VILLA ALSACIA	08-065	calle 11a a carrera 72a	18-06-2025 cepillado y fumigación

CAMPOS EN GRAMA SINTETICA:

PARQUE	COD	DIRECCION	ACTIVIDADES EJECUTADAS
EL TUNAL (Estadio)	06-063	Carrera 24 y Carrera 19C con entre Calle 48C S y Calle 58A S	06-06-2025 poda, bordeo y demarcación
EL TUNAL (Softbol)	06-063	Carrera 24 y Carrera 19C con entre Calle 48C S y Calle 58A S	06-06-2025 poda, bordeo y demarcación
			20-06-2025 poda, bordeo, demarcación y fumigación

PARQUE	COD	DIRECCION	ACTIVIDADES EJECUTADAS
SIMON BOLIVAR - Sector Parque Deportivo el Salitre (Estadio)	12-091	Av. Carrera 68 y Av. Carrera 60 con entre Av. Calle 63	19-06-2025 bordeo y fumigación
SIMON BOLIVAR - Sector Parque Deportivo el Salitre (Alterna 3)	12-091	Av. Carrera 68 y Av. Carrera 60 con entre Av. Calle 63	09-06-2025 poda, bordeo y demarcación
			19-06-2025 poda, bordeo y demarcación
			24-06-2025 demarcación y bordeo
SIMON BOLIVAR - Sector Parque Deportivo el Salitre (Playa - 1)	12-091	Av. Carrera 68 y Av. Carrera 60 con entre Av. Calle 63	09-06-2025 bordeo
EL COUNTRY (Club)	01-1000	Av. Calle 127 con entre Carrera 11C	03-06-2025 poda
			05-06-2025 poda
			09-06-2025 poda
			13-06-2025 poda
			17-06-2025 poda
			24-06-2025 poda
			27-06-2025 poda
SIMON BOLIVAR - Sector Unidad Deportivo el Salitre (UDS Beisbol)	10-290	Av. Carrera 68 y con entre Av. Calle 63	06-06-2025 polvo de ladrillo
			09-06-2025 poda y bordeo
			24-06-2025 poda, bordeo, demarcación y fumigación
SIMON BOLIVAR - Sector Unidad Deportivo el Salitre (UDS Atletismo)	10-290	Av. Carrera 68 y con entre Av. Calle 63	09-06-2025 poda y bordeo
			24-06-2025 poda
SIMON BOLIVAR - Sector Unidad Deportivo el Salitre (UDS Atletismo) MARTE	10-290	Av. Carrera 68 y con entre Av. Calle 64	09-06-2025 poda y bordeo
			24-06-2025 poda
SIMON BOLIVAR - Sector Unidad Deportivo el Salitre (UDS Softbol)	10-290	Av. Carrera 68 y con entre Av. Calle 63	06-06-2025 polvo de ladrillo
			09-06-2025 poda, bordeo y demarcación

PARQUE	COD	DIRECCION	ACTIVIDADES EJECUTADAS
			24-06-2025 poda, bordeo, demarcación y fumigación
SIMON BOLIVAR - Sector Unidad Deportivo el Salitre (UDS Voleibol)	10-290	Av. Carrera 68 y con entre Av. Calle 63	09-06-2025 poda
			19-06-2025 poda y fumigación
SAN CRISTOBAL (Estadio)	04-127	Carrera 4 y Carrera 6 E con entre Calle 17A S y Calle 14 S	06-06-2025 poda, bordeo y demarcación
			20-06-2025 poda y demarcación
PARQUE NACIONAL (PM-2A) ENRIQUE OLAYA HERRERA (Sector Histórico)	03-035	Av. Carrera 7 y Carrera 1 con entre Calle 40A BIS y Calle 35	13-06-2025 poda, bordeo y demarcación
			27-06-2025 poda, bordeo y demarcación
CIUDAD MONTES	16-112	Carrera 40 y Carrera 38 con entre Calle 10S y Diagonal 16S	06-06-2025 poda, bordeo y demarcación
			19-06-2025 poda, bordeo y demarcación
CIUDAD MONTES (Softbol)	16-112	Carrera 40 y Carrera 38 con entre Calle 10S y Diagonal 16S	03-06-2025 polvo de ladrillo
			06-06-2025 poda, bordeo y demarcación
			19-06-2025 poda, bordeo, demarcación y fumigación
CIUDAD MONTES (2 de Playa)	16-112	Carrera 40 y Carrera 38 con entre Calle 10S y Diagonal 16S	06-06-2025 bordeo
			19-06-2025 bordeo y fumigación
UNIDAD DEPORTIVA LA ALQUERIA	16-024	Carrera 52C y Carrera 52 con entre Calle 43S y Calle 42 S	01-06-2025 demarcación y reparación de divots
			03-06-2025 poda y bordeo
			05-06-2025 poda y demarcación
			07-06-205 reparación de divots
			10-06-2025 poda y bordeo
			13-06-2025 poda, bordeo y demarcación
			16-06-2025 poda y bordeo
			18-06-2025 fertilización

PARQUE	COD	DIRECCION	ACTIVIDADES EJECUTADAS
			20-06-2025 poda, bordeo y demarcación
			25-06-2025 poda y bordeo
			27-06-2025 poda, bordeo y demarcación
MILENTA TEJAR SAN EUSEBIO	16-099	Transversal 53 y Carrera 52 con entre Calle 19S y Calle 22S	12-06-2025 poda, bordeo y demarcación
			26-06-2025 poda, borde y demarcación
NUEVO MUZU	06-017	Diagonal 53 S y Diagonal 51A S con entre Carrera 61D y Carrera 60	12-06-2025 poda, bordeo y demarcación
			26-06-2025 poda, bordeo y demarcación
LA SERENA	10-223	Av. Carrera 86 y Carrera 76 con entre Calle 90A y Calle 91	10-06-2025 poda, bordeo y demarcación
			25-06-2025 poda, bordeo y demarcación
URBANIZACION BOCHICA	16-037	Av. Carrera 36 y Carrera 37 con entre Calle 1H y Calle 2B	03-06-2025 poda, bordeo y demarcación
			16-06-2025 poda, bordeo y demarcación
PARQUE JUAN AMARILLO	10-171	Av. Calle 90 con entre Carrera 119 y Carrera 110	03-06-2025 poda, bordeo y demarcación
			10-06-2025 poda bordeo y demarcación
			17-06-2025 poda, bordeo y demarcación
			25-06-2025 poda, bordeo y demarcación
ATAHUALPA I PREDIO - El Cajón Sector I	09-024	Av. Carrera 116 y Carrera 114A con entre Calle 22J y Calle 22I	13-06-2025 poda, bordeo y demarcación
			27-06-2025 poda, bordeo y demarcación
MARSELLA SECTOR NORTE I ETAPA - Pinos de Marsella	08-066	Av. Calle 6 y Calle 9C con entre Carrera 69 y Carrera 68G	03-06-2025 poda
			04-06-2025 poda
			06-06-2025 acopio y retiro de pasto poda zona verde
			09-06-2025 verticutter
			10-06-2025 verticutter

PARQUE	COD	DIRECCION	ACTIVIDADES EJECUTADAS
			12-06-2025 aireación
			13-06-2025 top-dressing
			14-06-2025 top-dressing, cargue de césped y cepillado
			16-06-2025 poda y bordeo
			18-06-2025 fertilización
			25-06-2025 poda y bordeo
SIMON BOLIVAR - Sector Complejo Acuático (1, 2,3 Playa)	12-1000	Av. Calle 63 con entre Av. Carrera 50	09-06-2025 bordeo
			19-06-2025 bordeo y fumigación
LA GAITANA	11-205	Transversal 126 y Carrera 124C con entre Diagonal 135B y Calle 132B	03-06-2025 poda, bordeo y demarcación
			10-06-2025 poda, bordeo y demarcación
			17-06-205 poda, bordeo y demarcación
			25-06-2025 poda, bordeo y demarcación
LA FLORIDA 1	10-311	Calle 78C y Canal Maranta con entre el Rio Juan Amarillo	04-06-2025 poda, bordeo y demarcación
			11-06-2025 poda, bordeo y demarcación
			18-06-2025 poda, bordeo y demarcación
			25-06-2025 poda, bordeo y demarcación
LA FLORIDA 2	10-311	Calle 78C y Canal Maranta con entre el Rio Juan Amarillo	04-06-2025 poda, bordeo y demarcación
			11-06-2025 poda, bordeo y demarcación
			18-06-2025 poda, bordeo y demarcación
			25-06-2025 poda, bordeo y demarcación
LA FLORIDA 3	10-311	Calle 78C y Canal Maranta con entre el Rio Juan Amarillo	04-06-2025 poda, bordeo y demarcación
			11-06-2025 poda, bordeo y demarcación

PARQUE	COD	DIRECCION	ACTIVIDADES EJECUTADAS
			18-06-2025 poda, bordeo y demarcación
			25-06-2025 poda, bordeo y demarcación
LA FLORIDA 4	10-311	Calle 78C y Canal Maranta con entre el Rio Juan Amarillo	04-06-2025 poda, bordeo y demarcación
			11-06-2025 poda, bordeo y demarcación
			18-06-2025 poda, bordeo y demarcación
			25-06-2025 poda, bordeo y demarcación
LA FLORIDA 5	10-311	Calle 78C y Canal Maranta con entre el Rio Juan Amarillo	04-06-2025 poda, bordeo y demarcación
			11-06-2025 poda, bordeo y demarcación
			18-06-2025 poda, bordeo y demarcación
			25-06-2025 poda, bordeo y demarcación
AUTOPISTA SUR (Pavco)	07-152	Av. Calle 57R S y Calle 57K S con entre Carrera 72A y Av. Carrera 71B	12-06-2025 poda y bordeo
			26-06-2025 poda y bordeo
URB EL RINCON DE LOS ANGELES	08-108	Tv. 78c DG 6F	12-06-2025 poda, bordeo y demarcación
			26-06-2025 poda, bordeo y demarcación

7. PROGRAMACION DE OBRA

Teniendo en cuenta la modificación contractual realizada del contrato de obra, por medio del comunicado IDRD-4080-G1-2024-266 del 11 de junio de 2025 con radicado IDRD No. 20252100233572 se remite la programación de obra VS4 ajustada de acuerdo a la modificación contractual, validada por la interventoría para el seguimiento del avance del contrato.

Mediante el comunicado **IDRD-4080-G1-2024-253** del 03 de junio de 2025, con radicado IDRD 20252100219212 se remite el cronograma de mantenimientos rutinarios del mes de junio.

8. AREAS PROBLEMÁTICAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS

Al ser un contrato de mantenimiento, se presentan ocasionalmente emergencias en los distintos escenarios, las cuales se deben atender de manera oportuna.

Para el presente periodo no se registra emergencias y/o problemática.

9. CLIMATOLOGÍA:

Se ha llevado el control del estado del tiempo durante el presente periodo, el cual está registrado en los formatos de calidad establecidos para tal fin. De acuerdo con el proceso de ejecución de las labores realizadas para el periodo comprendido entre el 01 de junio de 2025 hasta el 30 de junio de 2025; en el (**ANEXO 02**) se adjunta formato de control de lluvias.

10. REUNIONES DE SEGUIMIENTO:

De acuerdo con el proceso de ejecución de las labores realizadas para el periodo comprendido entre 01 de junio de 2025 hasta el 30 de junio de 2025 objeto del presente informe en el **(ANEXO 03)** se adjuntan las actas suscritas en el periodo.

ACTA DE SEGUIMIENTO	FECHA
Acta No. 27	05/06/2025
Acta No. 28	12/06/2025
Acta No. 29	25/06/2025

11. RELACIÓN DE INFORMES SEMANALES PERIODO DEL INFORME:

A continuación, se relacionan los informes semanales realizados por la interventoría en el periodo que se está reportando. **(ANEXO 04)**

RELACIÓN DE INFORME SEMANALES	
Número	**Periodo**
Informe semanal No. 29	02/06/2025 – 08/06/2025
Informe semanal No. 30	09/06/2025 – 15/06/2025
Informe semanal No. 31	16/06/2025 – 22/06/2025
Informe semanal No. 32	23/06/2025 – 29/06/2025

12. REGISTRO FOTOGRÁFICO

En el **(ANEXO 05)** del presente informe se incluye el registro fotográfico efectuado por esta interventoría donde se registran las principales actividades de obra realizadas por el contratista dentro del periodo comprendido entre el 01 de junio de 2025 hasta el 30 de junio de 2025.

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
1. Ciudad montes 16-112 - polvo de ladrillo	2. Esperanza 7-273 - desmonte de grama
3. Marsella 8-066 - poda	4. Uds softbol y beisbol 10-290- polvo de ladrillo
5. Subsa cafam gavilanes 11-1101- mantenimiento malla nylon	6. Marsella 08-066 - recoleccion cesped podado
7. Victoria norte 11-162- compactacion gravilla	8. Victoria norte 11-162 - imprimacion asfaltica
9. Valle de refous 11-686 - compactacion gravilla	10. Valle de refous 11-686 - imprimacion asfaltica

11. Valle de refous 11-686 - llegada grama sintetica	12. Valle de refous 11-686 - extendido e instalacion de grama
13. Victoria norte 11-162 - llegada grama sintetica	14. Victoria norte 11-162 - extendido e instalacion de grama
15. Victoria norte 11-162 - corte y demarcacion	16. Victoria norte 11-162 - corte y demarcacion
17. Marsella 8-066 -verticutter	18. Marsella 8-066 - top-dressing
19. Primavera 8-770 - limpieza de carcamo	20. Vicotria norte 11-162 - mantenimiento de arcos
21. Refous 11-686 - corte y demarcacion	22. Refous 11-686 - aplicación de rellenos
23. Vilanova 11-668 - mantenimiento de mallas de nylon	24. Vilanova 11-668 - mantenimiento de arcos
25. Primavera 8-770 - suministro y nivelacion de gravilla	26. Primavera 8-770 - mantenimiento mallas nylon
27. Gilma jimenez 08-552 - mantenimiento de arcos	28. Carlos lleras 09-048- desmonte de grama
29. Esperanza 7-273 - mantenimiento de arcos	30. Esperanza 7-273 - mantenimiento de malla nylon

13. TRAZABILIDAD DE LAS LABORES EJECUTADAS

En el **ANEXO 6** se presentan los formatos correspondientes a la trazabilidad de las labores ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 01 de junio de 2025 hasta el 30 de junio de 2025.

14. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONTRACTUALES

Durante el periodo del presente informe no se presentan novedades respecto a los análisis de precios unitarios contractuales. Estos fueron remitidos mediante el comunicado IDRD-4080-G1-2024-113 del 15 de enero de 2025 20252100013952.

15. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

Durante el periodo de corte del presente informe no se presentó la creación de análisis de precios unitarios no previstos.

16. AVANCE FINANCIERO Y CONTROL PRESUPUESTAL

De acuerdo con el proceso de ejecución de las labores realizadas para el periodo comprendido el 01 de junio de 2025 hasta el 30 de junio de 2025 objeto del presente informe.

CONTRATO DE OBRA 4041 – 2024					
CONCEPTO	**PERIODO**	**COSTO DIRECTO**	**AIU**	**TOTAL**	**% EJECUCIÓN**
PARCIAL 1 OBRA	Noviembre 2024	$ 84.663.938	$33.425.323	$118.089.261	1.47%
PARCIAL 2 OBRA	Diciembre 2024	$ 915.531.916,00	$ 361.452.000,00	$ 1.276.983.916,00	15.87%
PARCIAL 3 OBRA	Enero 2025	$ 645.430.013,00	$ 254.815.769,00	$ 900.245.782,00	11.19%
PARCIAL 4 OBRA	Febrero 2025	$ 398.937.309,00	$ 153.511.076,00	$ 552.448.385,00	6.87%

CONTRATO DE OBRA 4041 – 2024					
CONCEPTO	PERIODO	COSTO DIRECTO	AIU	TOTAL	% EJECUCIÓN
PARCIAL 5 OBRA	Marzo 2025	$ 458.901.757,00	$ 176.585.396,00	$ 635.487.153,00	7.90%
PARCIAL 6 OBRA	Abril 2025	$ 520.410.471,00	$ 200.253.949,00	$ 720.664.420,00	8.96%
PARCIAL 7 OBRA	Mayo 2025	$ 990.918.989,00	$ 381.305.627,00	$ 1.372.224.616,00	17.05%
PARCIAL 8 OBRA	Junio 2025	$ 413.299.704,00	$ 159.037.726,00	$ 572.337.430,00	7.11%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 8.047.000.000,00				
ACUMULADO	$ 6.148.480.963,00				
SALDO A FAVOR CONTRATISTA	$ 1.898.519.037,00				

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 4080 - 2024					
CONCEPTO	PERIODO	VALOR BRUTO	IVA	TOTAL	% EJECUCIÓN
PARCIAL 1 INTERVENTORIA	Noviembre 2024	$27.833.700	$5.288.403	$33.122.103	1.36%
PARCIAL 2 INTERVENTORIA	Diciembre 2024	$105.987.269,00	$20.137.581,00	$126.124.850,00	5.19%
PARCIAL 3 INTERVENTORIA	Enero 2025	$212.368.629,00	$40.350.040,00	$252.718.669,00	10.40%
PARCIAL 4 INTERVENTORIA	Febrero 2025	$148.501.719,00	$28.215.327,00	$176.717.046,00	7.27%
PARCIAL 5 INTERVENTORIA	Marzo 2025	$180.477.731,00	$34.290.769,00	$214.768.500,00	8.84%
PARCIAL 6 INTERVENTORIA	Abril 2025	$188.836.760,00	$35.878.984,00	$224.715.744,00	9.25%
PARCIAL 7 INTERVENTORIA	Mayo 2025	$276.700.338,00	$52.573.064,00	$329.273.402,00	13.55%
PARCIAL 8 INTERVENTORIA	Junio 2025	$177.626.336,00	$33.749.004,00	$211.375.340,00	8.70%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 2.429.219.534,00				
ACUMULADO	$ 1.568.815.654,00				
SALDO A FAVOR INTERVENTORIA	$ 860.403.880,00				

17. BITÁCORA

De acuerdo con el proceso de ejecución de las labores realizadas para el periodo comprendido entre el 01 de junio de 2025 hasta el 30 de junio de 2025, objeto del presente informe en el **(ANEXO 07)** se adjunta copia de la Bitácora de los mantenimientos correctivos realizados durante el periodo.

18. CORRESPONDENCIA

De acuerdo con el proceso de ejecución de las labores realizadas para el periodo comprendido entre el 01 de junio de 2025 hasta el 30 de junio de 2025 objeto del presente informe en el **(ANEXO 8)** se adjuntan los soportes correspondientes a la correspondencia enviada y recibida.

19. CONCLUSIONES

- La Interventoría CONSORCIO SANTA TERESA 28, ejerce control técnico, administrativo, ambiental contable, financiero y jurídico, para cada uno de los procesos constructivos que se llevan a cabo en cada uno de los frentes priorizados, para garantizar el normal desarrollo de la obra.

- Se coordina y se establece en campo junto con Contratista, Interventoría e IDRD, las diferentes actividades a ejecutar de acuerdo con el diagnóstico que se presentan en los diferentes frentes de obra dando soluciones acordes, según los lineamientos y especificaciones técnicas a que haya lugar.

- Para el buen desempeño de las actividades que se desarrollan en los frentes de trabajo, se coordina además con los administradores de los Escenarios y con los Supervisores de la Entidad.

- Durante el periodo, se continúan atendiendo los mantenimientos rutinarios programados por el contratista de obra y se ha realizado el seguimiento por parte de la interventoría.

- Durante el periodo se entrega la programación de obra actualizada conforme a la adición y prórroga del contrato de obra, la cual contiene todos los campos priorizados por el IDRD, para el correcto seguimiento del contrato.

- De acuerdo con el informe semanal #32 el contratista presenta un porcentaje de avance ejecutado de 76.52% vs. avance programado de 74.59%, arrojando como resultado un porcentaje de avance del 1.93%.

- Durante el periodo, se llevaron a cabo los Comités de obra semanales, con la participación de los profesionales de la Entidad IDRD, Contratista e Interventoría.

ANEXO 1. PÓLIZAS

Aseguradora Solidaria de Colombia

NIT. 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
3606124190

PÓLIZA No: 360-47-994000035672 ANEXO: 0

AGENCIA EXPEDIDORA: **SANTA PAULA** COD AGENCIA: 360 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
15	11	2024	15	11	2024

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: **CONSORCIO INNOVAPARQUES** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.885.635-2**

DIRECCIÓN: CR 70 B # 125 - 03 CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 6014325878

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE- IDRD** IDENTIFICACIÓN: NIT **860.061.099-1**

BENEFICIARIO: **INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE- IDRD** IDENTIFICACIÓN: NIT **860.061.099-1**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	12/11/2024	12/01/2026	1,040,000,000.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	12/11/2024	12/07/2028	260,000,000.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		VER NOTA ACLARATORIA	1,040,000,000.00

UNIÓN TEMPORAL Y CONSORCIOS

NIT 901621735 - GRUPO COLOMBIA CIVIL SAS - PART: 50.00%
NIT 900317964 - IES INGENIEROS S.A.S - PART: 50.00%

BENEFICIARIOS
NIT 860061099 - INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE- IDRD

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONTRATO NO.IDRD-SG-4041-2024 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD GRUPO 1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ *2,340,000,000.00	$ ********6,795,047	$****11,000.00	$ ****1,293,149	$ ********8,099,195

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
ALIRIO OSORIO CUENCA	3644	100.00			

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS PERSONALES Y PERSONALES HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/es_digital/activeforlife/

MEDIANTE LA SUSCRITO Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIEN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA AUTORIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLICAN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN: HTTPS://WWW.SOLIDARIA.COM.CO/ES/LAS-ES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

LAS CONDICIONES GENERALES DE SU PÓLIZA SE PUEDEN DESCARGAR DE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. ASEGURADORA SOLIDARIA COMUNICA EN SU TRANSMISIÓN, LO INVITA A VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007003360612419

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

CODE207E0E0DF67F56

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Manuel Guillermo Rueda Serpa * Celular: 312 343 6239 * Correo electrónico: defensorsolidaria@gmail.com
Defensor del Consumidor Financiero – Suplente: Jorge Humberto Martínez Luna * Celular: 315 223 4304 * Correo electrónico: martinezlunaabogados@gmail.com
Dirección: Carrera 13A# 29-24 oficina 201, Bogotá * Teléfono: (601) 791 91 90 * Fax: (601) 791 91 60 * Horario: Lunes a Viernes de 8:30 a.m. a 12:00 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Para mayor información le invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web: https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2023/Servicios/FOLLETO-DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-30-01-2023.pdf

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia cr la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en c se será contactado para realizar el procedimiento
GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/03 - RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE
Compañía de Seguros

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: SANTA PAULA COD. AGENCIA: 360 RAMO: 47 No PÓLIZA: **994000035672** ANEXO: 0

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **CONSORCIO INNOVAPARQUES** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.885.635-2**

ASEGURADO: **INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE- IDRD** IDENTIFICACIÓN: NIT **860.061.099-1**

BENEFICIARIO: **INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE- IDRD** IDENTIFICACIÓN: NIT **860.061.099-1**

TEXTO ITEM 1

*** NOTA ACLARATORIA ***

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE 2 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

CLIENTE

CONDICIONES GENERALES GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082 DE 2015

CAPITULO 1 AMPAROS Y EXCLUSIONES

1. AMPAROS

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA, OTORGA A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE, A TRAVÉS DEL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO SIN EXCEDER EL VALOR ASEGURADO, COBERTURA PARA LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARATULA DE LA PRESENTE PÓLIZA, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1088 DEL CÓDIGO DE COMERCIO SEGÚN EL CUAL EL CONTRATO DE SEGURO ES DE MERA INDEMNIZACION Y JAMAS PODRÁ SER FUENTE DE ENRIQUECIMIENTO. ESTA PÓLIZA CUBRE LOS PERJUICIOS DIRECTOS CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES DE LA PRESENTE PÓLIZA, EN SU ALCANCE Y CONTENIDO, SEGÚN LAS DEFINICIONES QUE EN ADELANTE SE ESTIPULAN:

LA COBERTURA DEL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO O SUS ANEXOS NO CONSTITUYE UNA FIANZA, NI ES SOLIDARIA, NI INCONDICIONAL, SU EXIGIBILIDAD ESTÁ CONDICIONADA A LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y LA DEMOSTRACIÓN DE LA CUANTÍA. EL AMPARO ESTA CIRCUNSCRITO A LOS PERJUICIOS CAUSADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA SIEMPRE QUE EL MISMO SE AJUSTE AL VALOR ASEGURADO, VIGENCIA DE LAS COBERTURAS Y EXCLUSIONES, Y LA RECLAMACIÓN SE EFECTÚE DENTRO DE LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL ART. 1081 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

1.1 AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA

LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUBRIRÁ A LA ENTIDAD ESTATAL POR LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES AL PROPONENTE DERIVADAS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

1.1.1 LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.
1.1.2 LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE OFERTA CUANDO EL TÉRMINO PREVISTO EN LOS PLIEGOS PARA LA ADJUDICACIÓN O PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRÓRROGAS NO EXCEDAN EL TERMINO DE TRES (3) MESES.
1.1.3 LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO, DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.
1.1.4 EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL TÉRMINO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.

1.2 AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS DIRECTOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LAS OBLIGACIONES NACIDAS DEL CONTRATO, ASÍ COMO DE SU CUMPLIMIENTO TARDÍO O DE SU CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO, CUANDO ELLOS SON IMPUTABLES AL CONTRATISTA GARANTIZADO, LOS DAÑOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA POR ENTREGAS PARCIALES DE LA OBRA, CUANDO EL CONTRATO NO PREVÉ ENTREGAS PARCIALES, ADEMÁS DE ESOS RIESGOS, ESTE AMPARO COMPRENDERÁ EL PAGO DEL VALOR DE LAS MULTAS Y DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE HAYAN PACTADO EN EL CONTRATO GARANTIZADO.

1.3 AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN AL ANTICIPO

EL AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE, DE LOS PERJUICIOS SUFRIDOS CON OCASIÓN DE (I) LA NO INVERSIÓN DEL ANTICIPO, (II) EL USO INDEBIDO DEL ANTICIPO Y (III) LA APROPIACIÓN INDEBIDA QUE EL CONTRATISTA GARANTIZADO HAGA DE LOS DINEROS O BIENES QUE SE LE HAYAN ENTREGADO EN CALIDAD DE ANTICIPO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. CUANDO SE TRATE DE BIENES ENTREGADOS COMO ANTICIPO, ÉSTOS DEBERÁN TASARSE EN DINERO EN EL CONTRATO.

LA GARANTIA DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO DEBE ESTAR VIGENTE HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO O HASTA LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO, DE ACUERDO CON LO QUE DETERMINE LA ENTIDAD ESTATAL. EL VALOR DE LA GARANTIA COMPRENDERA EL 100% DE LA SUMA ESTABLECIDA COMO ANTICIPO, YA SEA EN DINERO O EN ESPECIE.

1.4 AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGOS ANTICIPADOS

EL AMPARO DE DEVOLUCIÓN DEL PAGO ANTICIPADO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS SUFRIDOS POR LA NO DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL, POR PARTE DEL CONTRATISTA, DE LOS DINEROS QUE LE FUERON ENTREGADOS A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO, CUANDO A ELLO HUBIERE LUGAR. LA GARANTIA DE

PAGO ANTICIPADO DEBE ESTAR VIGENTE HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO O HASTA QUE LA ENTIDAD ESTATAL VERIFIQUE EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS ACTIVIDADES O LA ENTREGA DE TODOS LOS BIENES O SERVICIOS ASOCIADOS AL PAGO ANTICIPADO, DE ACUERDO CON LO QUE DETERMINE LA ENTIDAD ESTATAL. EL VALOR DE LA GARANTIA COMPRENDERA EL 100% DEL MONTO PAGADO DE FORMA ANTICIPADA, YA SEA ESTE EN DINERO O EN ESPECIE.

1.5 AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES
EL AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES, CUBRIRÁ A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE OCASIONEN COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES A QUE ESTE OBLIGADO EL CONTRATISTA GARANTIZADO, DERIVADAS DE LA CONTRATACION DEL PERSONAL UTILIZADO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO AMPARADO EN EL TERRITORIO NACIONAL.

ESTA GARANTIA NO SE APLICARA PARA LOS CONTRATOS QUE SE EJECUTEN FUERA DELTERRITORIO NACIONAL POR PERSONAL CONTRATADO BAJO UN REGIMEN JURIDICO DIFERENTE AL COLOMBIANO.

1.6 AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA
EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, CUBRIRÁ A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR CUALQUIER TIPO DE DAÑO O DETERIORO, IMPUTABLE AL CONTRATISTA, SUFRIDO POR LA OBRA ENTREGADA A SATISFACCIÓN.

PARAGRAFO: LA COBERTURA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA INICIA SU VIGENCIA A PARTIR DEL RECIBO SATISFACCION DE LA OBRA POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE.

1.7 CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS
EL AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS CUBRIRÁ A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA GARANTIZADO, (I) DERIVADOS DE LA MALA CALIDAD O DEFICIENCIAS TÉCNICAS DE LOS BIENES O EQUIPOS POR EL SUMINISTRADOS, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O (II) POR EL INCUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS O NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS PARA EL RESPECTIVO BIEN O EQUIPO, UNA VEZ SEAN RECIBIDOS POR LA ENTIDAD.

1.8 AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO
EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA GARANTIZADO QUE SE DERIVEN DE (I) LA MALA CALIDAD O INSUFICIENCIA DE LOS PRODUCTOS ENTREGADOS CON OCASIÓN DE UN CONTRATO DE CONSULTORÍA, O (II) DE LA MALA CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO, TENIENDO EN CUENTA LAS CONDICIONES PACTADAS EN EL CONTRATO.

PARAGRAFO PRIMERO.
EN VIRTUD DE LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY 610 DE 2000, LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CUBRIRÁ LOS PERJUICIOS CAUSADOS A LA ENTIDAD ESTATAL COMO CONSECUENCIA DE LA CONDUCTA DOLOSA O CULPOSA O DE LA RESPONSABILIDAD IMPUTABLE A LOS PARTICULARES, DERIVADOS DE UN PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL.

PARÁGRAFO SEGUNDO.
LOS AMPAROS DE LA PÓLIZA SERÁN INDEPENDIENTES UNOS DE OTROS RESPECTO DE SUS RIESGOS Y DE SUS VALORES ASEGURADOS. LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA NO PODRÁ RECLAMAR O TOMAR EL VALOR DE UN AMPARO PARA CUBRIR O INDEMNIZAR EL VALOR DE OTROS. ESTOS NO SON ACUMULABLES Y SON EXCLUYENTES ENTRE SÍ.

PARÁGRAFO TERCERO.
ANTES DEL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SERA RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD CONTRATANTE APROBAR LA GARANTIA. LA APROBACION COMPRENDERA LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA POLIZA.

2. EXCLUSIONES
LOS AMPAROS PREVISTOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO OPERARAN EN LOS SIGUIENTES CASOS:

2.1 CAUSA EXTRAÑA, ESTO ES LA FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, EL HECHO DE UN TERCERO O LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VICTIMA.
2.2 DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA A LOS BIENES DE LA ENTIDAD NO DESTINADOS AL CONTRATO.
2.3 EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE ESTÉ OBLIGADA LA ENTIDAD CONTRATANTE.
2.4 EL DEMÉRITO O DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS BIENES ENTREGADOS CON OCASIÓN DEL CONTRATO

GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL MERO TRANSCURSO DEL TIEMPO.

CAPITULO II - DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
Para efectos de este contrato de seguro las expresiones o vocablos relacionados a continuación, tendrán el siguiente significado.

2.1 Tomador
Es la persona natural o jurídica que contrata el seguro y se hace responsable del pago de la prima y quien ha celebrado un contrato con la entidad estatal contratante, cuyas obligaciones se encuentran garantizadas con la presente póliza.

2.2 Asegurado
Es la entidad estatal contratante que por tener interés asegurable figura como tal en la carátula de la póliza.

2.3 Beneficiario
Es la entidad estatal contratante que ha sufrido un perjuicio amparado, o en el amparo de salarios el trabajador vinculado al contratista mediante contrato de trabajo.

2.4 Siniestro
Es la realización del riesgo asegurado por un hecho imputable al contratista, ocurrido durante la vigencia consignada en la carátula de la póliza, que ha causado un perjuicio indemnizable a la entidad estatal contratante.

2.5 Acto Administrativo
Es el medio a través del cual la entidad estatal en uso de su función administrativa manifiesta su voluntad encaminada a producir ciertos efectos jurídicos de carácter particular.

2.6 Acto Administrativo Ejecutoriado
Es la manifestación de la entidad estatal contratante que puede producir los efectos previstos en el acto, por haber cumplido con los requisitos establecidos del artículo 62 del código contencioso administrativo, y Aseguradora Solidaria de Colombia en calidad de garante ha ejercido su derecho a la defensa.

CAPITULO III - CONDICIONES APLICABLES A TODO EL CONTRATO

1. SUMA ASEGURADA
LA SUMA ASEGURADA DETERMINADA PARA CADA AMPARO EN LA CARÁTULA DE ESTA PÓLIZA, DELIMITA LA RESPONSABILIDAD MÁXIMA DE LA ASEGURADORA EN CASO DE SINIESTRO.

2. VIGENCIA
LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA PRESENTE PÓLIZA SE HARÁ CONSTAR EN LA CARÁTULA DE LA POLIZA Y/O EN SUS ANEXOS Y/O CERTIFICADOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA.

3. EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA
DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 1077 DEL CÓDIGO DE COMERCIO LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA DEBERÁ DEMOSTRAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y ACREDITAR LA CUANTÍA DE LA PÉRDIDA, PREVIO AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE AUDIENCIA DEL CONTRATISTA Y DEL GARANTE, DE LA SIGUIENTE FORMA:

3.1 EN CASO DE CADUCIDAD, UNA VEZ AGOTADO EL DEBIDO PROCESO Y GARANTIZADOS LOS DERECHOS DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN DEL CONTRATISTA Y DE SU GARANTE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011 LA ENTIDAD ESTATAL PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EN EL CUAL, ADEMÁS DE LA DECLARATORIA DE CADUCIDAD, PROCEDERÁ A HACER EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL O A CUANTIFICAR EL MONTO DEL PERJUICIO Y A ORDENAR SU PAGO TANTO AL CONTRATISTA COMO AL GARANTE. EL ACTO ADMINISTRATIVO DE CADUCIDAD CONSTITUYE SINIESTRO.
3.2 EN CASO DE APLICACIÓN DE MULTAS, UNA VEZ AGOTADO EL DEBIDO PROCESO Y GARANTIZADOS LOS DERECHOS DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN DEL CONTRATISTA Y DE SU GARANTE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011 LA ENTIDAD ESTATAL, PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EN EL CUAL IMPONDRÁ LA MULTA Y ORDENARÁ SU PAGO TANTO AL CONTRATISTA COMO AL GARANTE. EL ACTO ADMINISTRATIVO CONSTITUYE SINIESTRO.
3.3 EN LOS DEMÁS CASOS DE INCUMPLIMIENTO, UNA VEZ AGOTADO EL DEBIDO PROCESO Y GARANTIZADOS LOS DERECHOS DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN DEL CONTRATISTA Y DE SU GARANTE PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EN EL CUAL DECLARARÁ EL INCUMPLIMIENTO Y CUANTIFICARA EL MONTO DE LA PÉRDIDA Y/O HARA EFECTIVA LA CLÁUSULA

PENAL, SI ELLA ESTÁ PACTADA Y ORDENARA SU PAGO TANTO AL CONTRATISTA COMO AL GARANTE.

4. REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN
SI EL ASEGURADO O BENEFICIARIO, AL MOMENTO DE TENER CONOCIMIENTO DEL INCUMPLIMIENTO O CON POSTERIORIDAD A ÉSTE Y ANTERIOR AL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, FUERE DEUDOR DEL CONTRATISTA POR CUALQUIER CONCEPTO, SE APLICARÁ LA COMPENSACIÓN Y LA INDEMNIZACIÓN SE DISMINUIRÁ EN EL MONTO DE LAS ACREENCIAS, SEGÚN LA LEY, DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS 1714 Y SUBSIGUIENTES DEL CÓDIGO CIVIL.

IGUALMENTE SE DISMINUIRÁ DEL VALOR DE LA INDEMNIZACIÓN EN EL DE LOS BIENES QUE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA HAYA OBTENIDO DEL CONTRATISTA, JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE, EN EJERCICIO DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO CUYO CUMPLIMIENTO SE GARANTIZA CON LA PRESENTE PÓLIZA.

5. PAGO DEL SINIESTRO
LA ASEGURADORA PAGARÁ EL VALOR DEL SINIESTRO, ASÍ:

5.1. PARA EL CASO PREVISTO EN EL NUMERAL 3.1., DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA COMUNICACIÓN ESCRITA QUE CON TAL FIN HAGA LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE PARA RECLAMAR EL PAGO, ACOMPAÑADA DEL ACTO ADMINISTRATIVO DEBIDAMENTE EJECUTORIADO Y DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO O DE LA RESOLUCIÓN EJECUTORIADA QUE ACOJA LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL.

5.2 PARA EL CASO DEL NUMERAL 3.2, DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA COMUNICACIÓN ESCRITA QUE HAGA L. ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE, ACOMPAÑADA DEL ACTO ADMINISTRATIVO DEBIDAMENTE EJECUTORIADO, JUNTO CON LA CONSTANCIA DE LA ENTIDAD ESTATAL DE LA NO EXISTENCIA DE SALDOS A FAVOR DEL CONTRATISTA RESPECTO DE LOS CUALES SE PUEDA APLICAR LA COMPENSACIÓN DE QUE TRATA LA CONDICIÓN CUARTA DE ESTE CLAUSULADO O EN LA QUE CONSTE LA DISMINUCIÓN EN EL VALOR A INDEMNIZAR EN VIRTUD DE TAL COMPENSACIÓN.

PARAGRAFO.
LA ASEGURADORA PODRÁ OPTAR POR CUMPLIR SU PRESTACIÓN MEDIANTE EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN O CONTINUANDO LA EJECUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1102 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

6. VIGILANCIA SOBRE EL CONTRATISTA EN LA EJECUCION DEL CONTRATO
LA ASEGURADORA TIENE DERECHO A EJERCER LA VIGILANCIA SOBRE EL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, PARA LO CUAL LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE LE PRESTARÁ LA COLABORACIÓN NECESARIA.

7. SUBROGACION
EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN LA ASEGURADORA SE SUBROGA HASTA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN TODOS LOS DERECHOS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE TENGA CONTRA EL CONTRATISTA.

LA ENTIDAD ESTATAL NO PUEDE RENUNCIAR EN NINGÚN MOMENTO A SUS DERECHOS CONTRA EL CONTRATISTA Y SI LO HICIERE PERDERÁ EL DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN.
EL CONTRATISTA SE OBLIGA A REEMBOLSAR INMEDIATAMENTE A LA ASEGURADORA, LA SUMA QUE ÉSTA LLEGARE A PAGAR A LA ENTIDAD ESTATAL, CON OCASIÓN DE LA PRESENTE PÓLIZA, INCREMENTADA CON LOS INTERÉSES MÁXIMOS LEGALES VIGENTES AL MOMENTO DEL REEMBOLSO, CALCULADOS DESDE QUE LA ASEGURADORA EFECTÚE EL PAGO RESPECTIVO, SIN NECESIDAD DE REQUERIMIENTOS PREVIOS.

8. CESION DEL CONTRATO
EN EL EVENTO QUE POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA EL ASEGURADOR RESOLVIERA CONTINUAR, COMO CESIONARIO, CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ESTUVIESE DE ACUERDO CON ELLO, EL CONTRATISTA ACEPTA DESDE AHORA LA CESIÓN DEL CONTRATO A FAVOR DEL ASEGURADOR.

EN TAL EVENTO LAS PARTES SUSCRIBIRÁN EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, Y ASEGURADORA SOLIDARIA PRESENTARÁ GARANTÍAS EN LOS TÉRMINOS EXIGIDOS POR LA LICITACIÓN O CONTRATO.

9. NO EXPIRACION POR FALTA DE PAGO DE PRIMA E IRREVOCABILIDAD

LA PRESENTE PÓLIZA NO EXPIRARÁ POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA NI POR REVOCACIÓN UNILATERAL.

10. NOTIFICACIONES Y RECURSOS
LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE DEBERÁ NOTIFICAR A LA ASEGURADORA LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS ATINENTES A LA EFECTIVIDAD DE LA PÓLIZA, PREVIO AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE AUDIENCIA DEL CONTRATISTA Y DEL GARANTE.

11. PROHIBICION DE LA TRANSFERENCIA
NO SE PERMITE HACER CESIÓN O TRANSFERENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO DE LA ASEGURADORA. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE ESTA DISPOSICIÓN, EL AMPARO TERMINA AUTOMÁTICAMENTE Y LA ASEGURADORA SOLO SERÁ RESPONSABLE POR LOS ACTOS DE INCUMPLIMIENTO QUE HAYAN OCURRIDO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA DE LA CESIÓN O TRANSFERENCIA.

12. COEXISTENCIA DE SEGUROS
EN CASO DE EXISTIR, AL MOMENTO DEL SINIESTRO, OTRO SEGURO DE CUMPLIMIENTO CON RELACIÓN AL MISMO CONTRATO, EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAYA LUGAR, SE DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN A LAS CUANTÍAS DE SUS RESPECTIVOS SEGUROS, SIN QUE EXISTA SOLIDARIDAD ENTRE LAS ASEGURADORAS PARTICIPANTES Y SIN EXCEDER DE LA SUMA ASEGURADA BAJO EL CONTRATO DE SEGURO.

13. LLAMAMIENTO EN GARANTIA
CUANDO SE AMPAREN CONTRATOS EN LOS CUALES SE HA SUSCRITO CLAUSULA COMPROMISORIA, DE CONFORMIDAD CON O PREVISTO EN EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY 1563 DE 2012, LA ASEGURADORA QUEDARA VINCULADA A LOS EFECTOS DEL MISMO.

14. PROCESOS CONCURSALES LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA SE OBLIGA A HACER VALER SUS DERECHOS DENTRO DE CUALQUIER PROCESO CONCURSAL O PRECONCURSAL O LOS PREVISTOS EN LA LEY 550 DE 1999, LEY 1116 Y SUS NORMAS COMPLEMENTARIAS, EN EL QUE LLEGARE A SER ADMITIDO EL CONTRATISTA GARANTIZADO, EN LA FORMA EN QUE DEBERÍA HACERLO SI CARECIESE DE LA GARANTÍA OTORGADA POR LA PRESENTE PÓLIZA, SUS CERTIFICADOS DE APLICACIÓN Y SUS AMPAROS, DANDO AVISO A LA ASEGURADORA DE TAL CONDUCTA.

15. PRESCRIPCIÓN LAS ACCIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO, SE SUJETAN A LOS TÉRMINOS DE PRESCRIPCIÓN DISPUESTOS EN EL ARTÍCULO 1081 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y DEMÁS NORMAS QUE LO ADICIONEN Y/O MODIFIQUEN.

16. DOMICILIO SIN PERJUICIO DE LAS DISPOSICIONES PROCESALES, PARA LOS EFECTOS RELACIONADOS CON EL PRESENTE CONTRATO SE FIJA EL DOMICILIO EN LA CIUDAD DE BOGOTA EN LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.

TOMADOR

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT. 000.524.054-2

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
3606124240

PÓLIZA No: 360 -74 - 994000009608 ANEXO:1

AGENCIA EXPEDIDORA: SANTA PAULA — COD AGE: 360 — RAMO: 74 — PAP:

FECHA DE EXPEDICIÓN (DIA / MES / AÑO)	VIGENCIA DE LA PÓLIZA	VIGENCIA DESDE (DIA / MES / AÑO / HORAS)	VIGENCIA HASTA (DIA / MES / AÑO / HORAS / DIAS)	FECHA DE IMPRESIÓN (DIA / MES / AÑO)
19 / 11 / 2024		19 / 11 / 2024 / 23:59	12 / 07 / 2025 / 23:59 / 235	19 / 11 / 2024

MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL — TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO: MODIFICACION

VIGENCIA DEL ANEXO	VIGENCIA DESDE (DIA / MES / AÑO / HORAS)	VIGENCIA HASTA (DIA / MES / AÑO / HORAS / DIAS)
	19 / 11 / 2024 / 23:59	12 / 07 / 2025 / 23:59 / 235

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: CONSORCIO INNOVAPARQUES — IDENTIFICACIÓN: NIT 901.885.635-2
DIRECCIÓN: CR 70 B # 125 - 03 — CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL — TELÉFONO: 6014325878

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: CONSORCIO INNOVAPARQUES — IDENTIFICACIÓN: NIT 901.885.635-2
DIRECCIÓN: CR 70 B # 125 - 03 — CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL — TELÉFONO: 6014325878
BENEFICIARIO: TERCEROS APECTADOS — IDENTIFICACIÓN: NIT 001-8

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: CONSORCIO INNOVAPARQUES NIT : 901885635

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: DISTRITO CAPITAL CIUDAD: BOGOTÁ, D.C.

DIRECCION: AVENIDA No. - LUGAR DONDE SE EJECUTE EL CONTRATO

ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: ESTATAL MANZANA: AV.-0

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO		$ 0.00		
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	520,000,000.00		
	RCE PATRONAL	520,000,000.00		
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	520,000,000.00		
	GASTOS MEDICOS	104,000,000.00		
	RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	520,000,000.00		

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 5.00 SMMLV en CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS/RCE PATRONAL/VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS/RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA

BENEFICIARIOS
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS
NIT 860061099 - INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE- IDRD
NOTA ACLARATORIA
POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE REALIZA INCLUSION DE SUBAMPAROS DE PLO Y SE INDICA QUE DAÑOS EMERGENTES, LUCRO CESANTE, PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES HACEN PARTE INTEGRAL DEL AMPARO BASICO DE PLO - PREDIOS LABORES Y OPERACIONES, SE ENCUENTRA DESCRITO EN EL CONDICIONADO.
DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS PERMANECEN VIGENTES
MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA, DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO IDRD-SG-4041-2024 REFERENTE A CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD GRUPO 1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS.
BENEFICIARIOS Y/O ASEGURADOS:
- TERCEROS AFECTADOS

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR PRIMA	GASTOS EXPEDICION	IVA	TOTAL A PAGAR
$ **********0.00	$ **********0	$*********0.00	$ **********0	$ **********0

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	%PART
ALIRIO OSORIO CUENCA	3644	100.00

COASEGURO CEDIDO

NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000370003806124 34

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

RAMVARGAS 0

CD0B207E0B0CFD7F56

CLIENTE

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

EGTUAR RETENCION EN LA FUENTE

Compañía de Seguros

RAMO CONTRIBUYENTE RES.2509 DI — REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: SANTA PAULA COD. AGENCIA: 360 RAMO: 74 No PÓLIZA: **994000009608** ANEXO: 1

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **CONSORCIO INNOVAPARQUES** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.885.635-2**

ASEGURADO: **CONSORCIO INNOVAPARQUES** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.885.635-2**

BENEFICIARIO: **TERCEROS AFECTADOS** IDENTIFICACIÓN: NIT **001-8**

TEXTO ITEM 1

- INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE IDRD NIT.860061099-1

CLIENTE

LISTADO DE ASEGURADOS

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA PÓLIZA

No. POLIZA: 994000009608 ANEXO: 1 TIPO DE MOVIMIENTO: 0 PAGINA: 3

TOMADOR: CONSORCIO INNOVAPARQUES IDENTIFICACION: 901.885.635-2

ASEGURADOS

ITEM	ASEGURADO	C.C. Ó NIT	UBICACION DEL PREDIO	CIUDAD	VALOR ASEGURADO	PRIMA SIN IVA	PRIMA CON IVA
1	CONSORCIO INNOVAPARQUES	901885635-2	AVENIDA No. - LUGAR DONDE SE E	BOGOTÁ, D.C.	$.00	0	0

PRIMA TOTAL SIN IVA	PRIMA TOTAL CON IVA
0	0

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA (DECRETO 1082 DE 2015)

CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO DE LA COBERTURA.

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA SE OBLIGA, BAJO LAS CONDICIONES DE ESTA PÓLIZA, A INDEMNIZAR LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL CONTRATISTA ASEGURADO DERIVADA DE SUS ACTUACIONES, HECHOS U OMISIONES CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA. ESTA PÓLIZA TIENE COMO PROPÓSITO EL RESARCIMIENTO DE LA VÍCTIMA LA CUAL, EN TAL VIRTUD, SE CONSTITUYE EN BENEFICIARIA DE LA INDEMNIZACIÓN.

1. COBERTURA BÁSICA SEGÚN DECRETO 1082 DE 2015.

LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL CUENTA CON UN AMPARO BÁSICO.

1.1 AMPARO PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES.
1.2 AMPARO CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS SALVO EN EL EVENTO EN QUE EL SUBCONTRATISTA TENGA SU PROPIO SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.
1.3 AMPARO VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS.
1.4 AMPARO PATRONAL.
1.5 AMPARO GASTOS MÉDICOS.
1.6 AMPARO GASTOS DE DEFENSA.
1.7 AMPARO PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.
1.8 AMPARO DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE.

TODAS LAS COBERTURAS QUE SE INDICAN ESTÁN CONTEMPLADAS DENTRO DE LA SUMA ASEGURADA DEL AMPARO BÁSICO, CUYO VALOR SERÁ EL LÍMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA.

2. AMPAROS ADICIONALES.

MEDIANTE ACUERDO EXPRESO Y PAGO DE PRIMA ADICIONAL CORRESPONDIENTE, CONSIGNADO EN CADA UNO DE LOS ANEXOS QUE A CONTINUACIÓN RELACIONAMOS Y CON SUJECIÓN A LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y LÍMITES DE VALOR ASEGURADO CONVENIDOS Y DETALLADOS EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA, ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA PODRÍA INDEMNIZAR LOS PERJUICIOS CAUSADOS POR:

2.1 RCE CONTAMINACIÒN ACCIDENTAL, SÚBITA E IMPREVISTA.
2.2 RCE PARQUEADEROS.
2.3 RCE PRODUCTOS Y TRABAJOS TERMINADOS.
2.4 RCE CRUZADA.
2.5 RCE POR BIENES BAJO CUIDADO, TENENCIA Y CONTROL.

CLÁUSULA SEGUNDA. EXCLUSIONES.

LA PRESENTE PÓLIZA NO AMPARA:

1. LA RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL DEL ASEGURADO.
2. LAS LESIONES PERSONALES O DAÑOS MATERIALES CAUSADOS A TERCERAS PERSONAS CON DOLO DEL ASEGURADO.
3. LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES CAUSADOS AL ASEGURADO MISMO, SU CÓNYUGE O SUS PARIENTES HASTA EL CUARTO GRADO DE CONSANGUINIDAD, SEGUNDO GRADO DE AFINIDAD O PRIMERO CIVIL. LA MISMA EXCLUSIÓN OPERA CON RESPECTO A LOS SOCIOS DEL ASEGURADO, DIRECTORES, REPRESENTANTES LEGALES O TRABAJADORES AL SERVICIO DE LA PERSONA JURÍDICA ASEGURADA. TAMPOCO AMPARA LOS ACCIDENTES DE TRABAJO.
4. EL EXTRAVIÓ O PÉRDIDA DE BIENES DEL ASEGURADO.

5. CUALQUIER EVENTO AMPARADO POR ESTE SEGURO CUANDO OCURRA FUERA DEL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.
6. RECLAMACIONES POR DAÑOS A CONSECUENCIA DE ACTOS QUE EL ASEGURADO O PERSONA ENCARGADA POR ÉL, HAYA OCASIONADO, MEDIANTE EL USO DE UNA EMBARCACIÓN O UNA AERONAVE; O BIEN RECLAMACIONES QUE LE SEAN PRESENTADAS EN SU CALIDAD DE PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DE DICHOS VEHÍCULOS ACUÁTICOS O AÉREOS, ASÍ MISMO SE EXCLUYEN LOS DAÑOS A NAVES Y AERONAVES.
7. LOS DAÑOS CAUSADOS POR EL ASEGURADO O PERSONA ENCARGADA POR ÉL MEDIANTE EL USO DE VEHÍCULOS, EN SU CALIDAD DE PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR CUANDO DICHOS DAÑOS ESTÉN AMPARADOS BAJO PÓLIZAS DE AUTOMÓVILES.
8. LOS DAÑOS OCASIONADOS POR PRODUCTOS FABRICADOS, ENTREGADOS O SUMINISTRADOS POR EL ASEGURADO O BIEN POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS O POR CUALQUIER OTRA CLASE DE SERVICIOS PRESTADOS, EN LOS EVENTOS EN QUE SEA CONTRATADA LA COBERTURA - SI LOS DAÑOS SE PRODUJEREN DESPUÉS DE LA ENTREGA, DEL SUMINISTRO, DE LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO O DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. (RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL PRODUCTOS U OPERACIONES TERMINADAS).
9. MUERTE, LESIONES PERSONALES O DAÑOS MATERIALES CAUSADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR GUERRAS, INVASIÓN, HUELGA, MOTINES, CONMOCIÓN CIVIL, PERTURBACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO, COACCIÓN, MANIFESTACIONES PÚBLICAS, TUMULTOS, DECOMISO O DESTRUCCIÓN DE BIENES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES, DISTURBIOS POLÍTICOS Y SABOTAJES CON EXPLOSIVOS O ACTIVIDADES GUERRILLERAS, ACTOS MAL INTENCIONADOS DE TERCEROS (AMIT) Y TERRORISMO.
10. LESIONES PERSONALES O DAÑOS MATERIALES CAUSADOS POR OPERACIONES EN LAS QUE SE EMPLEEN PROCESOS DE FUSIÓN NUCLEAR DE MATERIALES RADIOACTIVOS.
11. LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL ASEGURADO PROVENIENTES DE LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS DEL DERECHO LABORAL, Y AQUELLAS QUE SEAN A CONSECUENCIA DE RECLAMACIONES BASADAS EN EL ARTÍCULO 216 DEL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO.
12. RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL.
13. DAÑOS CAUSADOS POR DESLIZAMIENTOS DE TIERRAS, FALLAS GEOLÓGICAS, ASENTAMIENTOS Y/O HUNDIMIENTOS, CAMBIOS EN LOS NIVELES DE TEMPERATURA O AGUA, INCONSISTENCIA DEL SUELO O SUBSUELO, LLUVIAS, INUNDACIONES, O CUALQUIER OTRA PERTURBACIÓN ATMOSFÉRICA O DE LA NATURALEZA, INCLUYENDO TERREMOTO, TEMBLOR Y ERUPCIÓN VOLCÁNICA. ASÍ COMO LA POLUCIÓN Y CONTAMINACIÓN PRODUCIDAS DE MANERA GRADUAL Y/O PAULATINA.
14. LA RESPONSABILIDAD QUE PUEDA RECLAMARSE ENTRE ASEGURADOS DE LA MISMA PÓLIZA.
15. LESIONES PRODUCIDAS POR EL CONTAGIO DE UNA ENFERMEDAD PADECIDA POR EL ASEGURADO, ASÍ COMO LOS DAÑOS DE CUALQUIER NATURALEZA CAUSADOS POR ENFERMEDADES DE ANIMALES PERTENECIENTES AL ASEGURADO VENDIDOS O SUMINISTRADOS POR EL MISMO; IGUALMENTE, QUEDAN, EXCLUIDOS LOS DAÑOS GENÉTICOS OCASIONADOS A PERSONAS O ANIMALES.
16. DAÑOS ORIGINADOS POR CONTAMINACIÓN U OTRAS VARIACIONES PERJUDICIALES DEL AGUA, AIRE, SUELO, SUBSUELO O BIEN POR RUIDOS QUE NO SEAN CONSECUENCIA DE UN ACONTECIMIENTO ACCIDENTAL, REPENTINO O IMPREVISTO.
17. MULTAS Y CUALQUIER CLASE DE ACCIONES O SANCIONES PENALES Y POLICIVAS.
18. DAÑOS A CAUSA DE LA INOBSERVANCIA DE DISPOSICIONES LEGALES, DE ÓRDENES IMPARTIDAS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE O DE INSTRUCCIONES Y ESTIPULACIONES CONTRACTUALES.
19. RECLAMACIONES POR DAÑOS A TERCEROS A CONSECUENCIA DE ACTOS DE LA VIDA PRIVADA O FAMILIAR DEL ASEGURADO.
20. RECLAMACIONES A CAUSA DE DAÑOS OCASIONADOS A BIENES AJENOS, QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS AL ASEGURADO EN ARRENDAMIENTO, COMODATO, DEPÓSITO O CUSTODIA.
21. DAÑOS A BIENES INTANGIBLES O PERJUICIOS QUE NO SEAN CONSECUENCIA DIRECTA DE DAÑOS MATERIALES Y/O PERSONALES AMPARADOS POR LA PÓLIZA.
22. LESIONES PERSONALES, HURTO SIMPLE Y CALIFICADO, PÉRDIDA O DAÑOS SOBRE LAS PERTENENCIAS DEL ASEGURADO, SU CONYUGUE O SUS PARIENTES HASTA EL CUARTO GRADO DE CONSANGUINIDAD, SEGUNDO GRADO DE AFINIDAD O PRIMERO CIVIL. LA MISMA EXCLUSIÓN OPERA CON RESPECTO A LOS SOCIOS DEL ASEGURADO, DIRECTORES Y REPRESENTANTES LEGALES DE LA PERSONA JURÍDICA ASEGURADA, SI SE TRATA DE UNA SOCIEDAD DE PERSONAS Y DE LOS TRABAJADORES A SU SERVICIO.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

23. RECLAMACIONES A CAUSA DE DAÑOS A TERCEROS DERIVADAS DEL HURTO SIMPLE Y HURTO CALIFICADO.
24. DERRUMBE Y OPERACIONES BAJO TIERRA.
25. DAÑOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LABORES DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS O INSTALACIONES O DESMONTE DE MAQUINARIA, A NO SER QUE TALES ACTIVIDADES CONSTITUYAN EL OBJETO DEL CONTRATO AMPARADO.
26. PERJUICIOS DERIVADOS DE OPERACIONES QUE HAYAN SIDO DEFINITIVAMENTE TERMINADAS O ABANDONADAS POR EL ASEGURADO.
27. PERJUICIOS DERIVADOS DE OPERACIÓN DE DESAGÜE, DISPERSIÓN, O ESCAPE DE HUMO, VAPORES, HOLLÍN, ÁCIDOS, ÁLCALIS, Y EN GENERAL PRODUCTOS QUÍMICOS TÓXICOS LÍQUIDOS O GASEOSOS, DESPERDICIOS Y DEMÁS MATERIAS CONTAMINANTES, ASÍ COMO RUIDO DENTRO O SOBRE LA TIERRA, ATMOSFERA, RÍOS, LAGOS O SIMILARES.
28. DAÑOS A CONSECUENCIA DEL USO, TRANSPORTE O ALMACENAMIENTO DE EXPLOSIVOS, CUANDO SEA ACTIVIDAD PRINCIPAL DEL ASEGURADO.
29. RESPONSABILIDAD DE ESTIBADORES Y OPERACIONES EN DIQUES, MUELLES, DESEMBARCADEROS, RESPONSABILIDAD DE ASTILLEROS.
30. DAÑOS CAUSADOS A BIENES O MERCANCÍAS DURANTE SU TRANSPORTE.
31. LÍNEAS AÉREAS, AVIONES, LA RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AEROPUERTOS, INCLUSIVE LAS EMPRESAS DE CATERING, LA RESPONSABILIDAD DE LA TORRE DE CONTROL, Y EL ABASTECIMIENTO Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA AVIONES.
32. TRABAJOS SUBACUÁTICOS, MINERÍA SUBTERRÁNEA.
33. DAÑOS DERIVADOS DE LA EXTRACCIÓN, FABRICACIÓN, MANIPULACIÓN Y USO DE ASBESTO, O SUSTANCIAS QUE TENGAN EN SU COMPOSICIÓN DICHA MATERIA.
34. BANCOS DE SANGRE, HEPATITIS, CONTAMINACIÓN BIOLÓGICA, FORMADEHIDO.
35. RIESGOS MARÍTIMOS, P&I, RIESGOS PORTUARIOS, TRABAJOS DE DRAGADOS.
36. OPERACIÓN DE PLATAFORMAS Y POZOS DE PERFORACIÓN A MAR ABIERTO.
37. DAÑOS FINANCIEROS PUROS.
38. DEPÓSITOS Y VERTEDEROS DE BASURAS.
39. DAÑOS A ESTRUCTURAS O PROPIEDADES ADYACENTES.
40. RECLAMACIONES DIRECTA O INDIRECTAMENTE DERIVADAS DEL CONTAGIO POR COVID, INCLUYENDO ACCIÓN U OMISIÓN DE LOS PROTOCOLOS PARA EL MANEJO DEL MISMO.

CLÁUSULA TERCERA. DEFINICIÓN DE AMPAROS BÁSICOS.

1. AMPARO PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES.

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA CON SUJECIÓN A LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y LÍMITES DE VALOR ASEGURADO CONSIGNADOS EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA, INDEMNIZARÁ LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DEL ASEGURADO, POR LOS PERJUICIOS QUE SE OCASIONEN COMO CONSECUENCIA DE SINIESTROS OCURRIDOS DURANTE EL PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, CAUSADOS A TERCEROS DIRECTAMENTE POR:

LA POSESIÒN, EL USO O EL MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS EN LOS CUALES SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD OBJETO DE ESTE SEGURO.

LAS OPERACIONES QUE LLEVE A CABO EL ASEGURADO, EN LOS PREDIOS ASEGURADOS Y EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA.

LAS ACTIVIDADES QUE RAZONABLEMENTE FORMAN PARTE DEL RIESGO ASEGURADO Y QUE SON INHERENTES AL DESARROLLO DEL GIRO NORMAL DE LOS NEGOCIOS ESPECIFICADOS EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA Y QUE COMPRENDEN:

1.1. EL USO DE ASCENSORES Y ESCALERAS AUTOMÁTICAS UTILIZADAS PARA CONECTAR PISOS, DISEÑADOS PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAS, SIEMPRE Y CUANDO FORMEN PARTE DE LOS EDIFICIOS DESCRITOS EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA.
1.2. LA RCE DERIVADA DE INCENDIO Y/O EXPLOSIÓN EN LOS PREDIOS ASEGURADOS.
1.3. EL USO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE TRABAJO DE CARGUE, DESCARGUE Y TRANSPORTE DENTRO DE LOS PREDIOS ASEGURADOS.
1.4. LOS AVISOS Y VALLAS INSTALADOS POR EL ASEGURADO.

1.5. EL USO DE INSTALACIONES SOCIALES Y DEPORTIVAS DENTRO DE LOS PREDIOS DEL ASEGURADO.
1.6. LA RCE DERIVADA DE EVENTOS SOCIALES ORGANIZADOS POR EL ASEGURADO.
1.7. LOS VIAJES DE FUNCIONARIOS DEL ASEGURADO DENTRO DEL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, EN DESARROLLO DE ACTIVIDADES INHERENTES AL ASEGURADO.
1.8. LA PARTICIPACIÓN DEL ASEGURADO EN FERIAS Y EXPOSICIONES NACIONALES.
1.9. LA VIGILANCIA DE LOS PREDIOS ASEGURADOS POR PERSONAL DEL ASEGURADO Y POR PERROS GUARDIANES DEBIDAMENTE DIRIGIDOS POR PERSONAL CAPACITADO.
1.10. LA POSESIÓN Y USO DE LOS DEPÓSITOS, TANQUES Y TUBERÍA DENTRO DEL PREDIO ASEGURADO.

2. AMPARO CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS.

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA CON SUJECIÓN A LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y LÍMITES DE VALOR ASEGURADO CONSIGNADOS EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA, INDEMNIZARÁ LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DEL ASEGURADO, POR LESIONES A TERCERAS PERSONAS, O DAÑOS A PROPIEDADES DE TERCEROS, QUE LE SEAN IMPUTABLES A CONSECUENCIA DE LABORES REALIZADAS EN LOS PREDIOS DEL ASEGURADO POR CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS INDEPENDIENTES A SU SERVICIO, PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO SEÑALADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA.

LA PRESENTE COBERTURA OPERA EN EXCESO DE LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL INDIVIDUAL QUE TENGA EL CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, ESTE O NO CONTRATADO.

2.1. EXCLUSIONES DEL ANEXO DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS.

2.1.1. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE LOS PREDIOS, MAQUINARIA O EQUIPO DEL ASEGURADO.
2.1.2. TRABAJOS DE AMPLIACIÓN O MODIFICACIÓN EN LOS EDIFICIOS O ESTRUCTURAS DEL LOCAL Y PREDIOS DEL ASEGURADO.
2.1.3. RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA ENTRE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS, ES DECIR, LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES O EXTRAPATRIMONIALES QUE SE CAUSEN ESTAS PERSONAS ENTRE SÍ.
2.1.4. TRABAJADORES DEL CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA INDEPENDIENTEMENTE CUANDO NO ESTÉN EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.

3. AMPARO VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS.

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA CON SUJECIÓN A LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y LÍMITES DE VALOR ASEGURADO CONSIGNADOS EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA, INDEMNIZARÁ LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DEL ASEGURADO, POR LOS PERJUICIOS QUE SE OCASIONEN COMO CONSECUENCIA DE EVENTOS OCURRIDOS DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO O TRABAJO CONTRATADO POR EL USO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES TERRESTRES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES O NEGOCIOS ASEGURADOS.

LA PRESENTE COBERTURA SE EXTIENDE A LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DEL ASEGURADO DERIVADA DEL USO DE LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DEL ASEGURADO Y LOS TOMADOS EN CONDICIÓN DE ARRIENDO, USUFRUCTO O COMODATO MIENTRAS SEAN UTILIZADOS EN EL GIRO NORMAL DE LA ACTIVIDAD ASEGURADA.

ESTE AMPARO OPERA ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE EN EXCESO DE LAS PRESTACIONES OTORGADAS EN EL SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO – SOAT Y EN EXCESO DE LOS MÁXIMOS LÍMITES Y COBERTURAS OTORGADOS EN EL SEGURO DE AUTOMÓVILES INDEPENDIENTEMENTE SI EL VEHÍCULO TIENE O NO COBERTURA BAJO ESTOS SEGUROS.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

3.1. EXCLUSIONES PARTICULARES DEL AMPARO.

3.1.1. LA UTILIZACIÓN DE CUALQUIER VEHÍCULO AUTOMOTOR EN LABORES DE SERVICIO PÚBLICO.
3.1.2. HURTO SIMPLE Y HURTO CALIFICADO O DAÑOS QUE SE CAUSEN A LOS OBJETOS TRANSPORTADOS POR LOS AUTOMOTORES MATERIA DEL PRESENTE SEGURO, INCLUYENDO CARGUE Y DESCARGUE DE LOS MISMOS.
3.1.3. HURTO Y HURTO CALIFICADO QUE SE CAUSEN A LOS VEHÍCULOS MATERIA DE ESTE SEGURO.
3.1.4. HURTO Y HURTO CALIFICADO QUE SE CAUSEN A LAS PARTES DE LOS VEHÍCULOS Y A SUS CONTENIDOS.
3.1.5. DAÑOS QUE SE CAUSEN A LOS VEHÍCULOS MATERIA DEL PRESENTE SEGURO.
3.1.6. DAÑOS QUE SE CAUSEN A LOS VEHÍCULOS DE LOS SOCIOS, FUNCIONARIOS O EMPLEADOS DEL ASEGURADO.
3.1.7. DAÑOS QUE PUEDAN SER CUBIERTOS POR OTRO SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, ESPECIALMENTE EL QUE SE INCLUYE EN LAS PÓLIZAS DE SEGUROS DE AUTOS. ESTA EXCLUSIÓN OPERARÁ SIEMPRE QUE EL VEHÍCULO QUE CAUSA EL DAÑO TENGA CONTRATADA ESA COBERTURA, CASO EN EL CUAL, EL PRESENTE AMPARO OPERARÁ EN EXCESO DE LOS VALORES CUBIERTOS POR DICHA PÓLIZA.
3.1.8. DAÑOS CAUSADOS POR VEHÍCULOS QUE NO TENGAN PERMISO DE CIRCULACIÓN VIGENTE.
3.1.9. DAÑOS CAUSADOS POR VEHÍCULOS QUE NO TENGAN VIGENTE EL CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA EXIGIDO POR LAS AUTORIDADES DE TRÁNSITO.
3.1.10. DAÑOS CAUSADOS POR TRACTORES, GRÚAS, MONTACARGAS Y, EN GENERAL, TODOS AQUELLOS VEHÍCULOS NO DISEÑADOS ESPECIALMENTE PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAS O BIENES POR VÍA PÚBLICA.
3.1.11. DAÑOS QUE HAYAN SIDO CUBIERTOS O DEBIERAN SER CUBIERTOS POR EL SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO (SOAT).
3.1.12. DAÑOS CUBIERTOS POR LA PÓLIZA DE AUTOMÓVILES DEL VEHÍCULO AFECTADO.

4. AMPARO PATRONAL.

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA CON SUJECIÓN A LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y LÍMITES DE VALOR ASEGURADO CONSIGNADOS EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA, INDEMNIZARÁ LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DEL ASEGURADO, POR LOS PERJUICIOS CAUSADOS A PERSONAS AL SERVICIO DEL ASEGURADO, ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR ACCIDENTES DE TRABAJO, SIEMPRE Y CUANDO EL EMPLEADO HAYA CUMPLIDO CON LAS PRESCRIPCIONES CONTENIDAS EN EL REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD.

ESTE AMPARO OPERA EN EXCESO DE LAS PRESTACIONES OTORGADAS POR LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE CUALQUIER OTRO SEGURO INDIVIDUAL O COLECTIVO A FAVOR DE LOS EMPLEADOS.

4.1. EXCLUSIONES PARTICULARES DEL AMPARO

4.1.1. RELACIONADAS CON ENFERMEDADES PROFESIONALES ENDÉMICAS O EPIDÉMICAS.
4.1.2. POR ACCIDENTES DE TRABAJO QUE HAYAN SIDO PROVOCADOS DELIBERADAMENTE O POR DOLO O CULPA GRAVE DEL TRABAJADOR.
4.1.3. PERJUICIOS OCASIONADOS POR EL ASEGURADO CUANDO NO SE TENGA AFILIADOS A TODOS LOS TRABAJADORES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL ESPECIALMENTE ARL.

5. AMPARO GASTOS MÉDICOS.

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA CON SUJECIÓN A LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y LÍMITES DE VALOR ASEGURADO CONSIGNADOS EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA, REEMBOLSARÁ LOS GASTOS RAZONABLES QUE EN LA PRESTACIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS INMEDIATOS, SE CAUSEN POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS MÉDICOS, QUIRÚRGICOS, DE AMBULANCIA Y MEDICAMENTOS DEBIDO A LESIONES CORPORALES A TERCEROS CAUSADAS EN

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL NEGOCIO ASEGURADO, EN LOS PREDIOS EXPRESAMENTE DETALLADOS EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA.

6. AMPARO GASTOS DE DEFENSA.

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA CON SUJECIÓN A LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y LÍMITES DE VALOR ASEGURADO CONSIGNADOS EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA, INDEMNIZARÁ LOS HONORARIOS PROFESIONALES DE ABOGADOS QUE APODEREN AL ASEGURADO EN EL PROCESO PENAL, CIVIL O INCIDENTE DE REPARACIÓN INTEGRAL, QUE SE INICIE COMO CONSECUENCIA DIRECTA Y EXCLUSIVA DE UN HECHO AMPARADO EN LA PÓLIZA.

ESTE AMPARO COMPRENDE:

6.1 LA PRESENTACIÓN DE CAUCIONES A QUE HAYA LUGAR, EN RAZÓN DE LOS EMBARGOS DECRETADOS JUDICIALMENTE CONTRA EL ASEGURADO POR LAS DEMANDAS PROMOVIDAS EN SU CONTRA, COMO CONSECUENCIA DE PERJUICIOS PATRIMONIALES Y EXTRAPATRIMONIALES CAUSADOS A TERCEROS EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES AMPARADAS BAJO LA PRESENTE PÓLIZA. ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA NO SE OBLIGA, SIN EMBARGO, A OTORGAR DIRECTAMENTE TALES CAUCIONES.

6.2 LAS COSTAS DEL PROCESO QUE LA VÍCTIMA O SUS CAUSAHABIENTES PROMUEVAN EN CONTRA DE ASEGURADORA SOLIDARIA, ENTIDAD COOPERATIVA O DEL ASEGURADO, EXCEPTO EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

a. SI LA RESPONSABILIDAD PROVIENE DE UN HECHO DOLOSO O EXCLUIDO DE LA PÓLIZA.
b. SI EL ASEGURADO AFRONTA EL PROCESO CONTRA ORDEN EXPRESA DE ASEGURADORA SOLIDARIA, ENTIDAD COOPERATIVA.
c. SI LOS PERJUICIOS OCASIONADOS A TERCEROS EXCEDEN EL LÍMITE ASEGURADO, ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA SOLO RESPONDERÁ POR LAS COSTAS EN PROPORCIÓN A LA CUOTA QUE LE CORRESPONDA EN LA INDEMNIZACIÓN.

6.3 LOS DEMÁS GASTOS RAZONABLES EN QUE HAYA INCURRIDO EL ASEGURADO EN RELACIÓN CON EL SINIESTRO AMPARADO, SIEMPRE Y CUANDO HAYA MEDIADO AUTORIZACIÓN PREVIA DE ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA.

7. AMPARO DE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA CON SUJECIÓN A LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y LÍMITES DE VALOR ASEGURADO CONSIGNADOS EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA COMO AMPARO BÁSICO, CUBRE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DEL ASEGURADO Y/O TOMADOR DERIVADA DE DAÑOS Y PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES CAUSADOS POR EL, DIRECTA Y EXCLUSIVAMENTE AL TERCERO AFECTADO, SIEMPRE Y CUANDO SEAN PROVENIENTES DE UN DAÑO FÍSICO, Y SEAN DEMOSTRADOS Y CUANTIFICADOS EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1077 Y 1133 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

8. AMPARO DE LUCRO CESANTE.

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA CON SUJECIÓN A LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y LÍMITES DE VALOR ASEGURADO CONSIGNADOS EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA COMO AMPARO BÁSICO, CUBRE AL ASEGURADO Y/O TOMADOR POR EL LUCRO CESANTE CAUSADO POR ÉL, EXCLUSIVA Y DIRECTAMENTE AL TERCERO AFECTADO, SIEMPRE Y CUANDO SEA DEMOSTRADO Y CUANTIFICADO EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 1077 Y 1133 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

LA PRESENTE COBERTURA EXCLUYE EL LUCRO CESANTE DEL ASEGURADO, SUS FILIALES Y/O SUBORDINADAS.

CLÁUSULA CUARTA. DEFINICIÓN DE AMPAROS ADICIONALES.

4.1 RCE POR CONTAMINACIÓN ACCIDENTAL, SÚBITA E IMPREVISTA.
4.2 RCE POR PARQUEADEROS.
4.3 RCE DERIVADA DE PRODUCTOS Y TRABAJOS TERMINADOS.
4.4 RCE CRUZADA.
4.5 RCE POR BIENES BAJO CUIDADO, TENENCIA Y CONTROL.

4.1 RC POR CONTAMINACIÓN AMBIENTAL, SÚBITA E IMPREVISTA.

4.1.1. COBERTURA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA CON SUJECIÓN A LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y LÍMITES DE VALOR ASEGURADO CONSIGNADOS EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA, CUBRE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DEL ASEGURADO Y/O TOMADOR SOBRE EL DAÑO EMERGENTE CAUSADOS A TERCERAS PERSONAS O PROPIEDADES DE TERCEROS, QUE SE MANIFIESTEN DURANTE EL PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, COMO CONSECUENCIA DE:

VARIACIONES REPENTINAS, ACCIDENTALES O IMPREVISTAS EN LA COMPOSICIÓN DEL AGUA, DE LA ATMÓSFERA, DEL SUELO O DEL SUBSUELO SIEMPRE QUE SEAN PROVENIENTES DE PREDIOS Y LOCALES AL SERVICIO DEL ASEGURADO, DEBIDAMENTE INCLUIDOS EN EL AMPARO DE ESTE SEGURO. RUIDO PRODUCIDO DE MANERA REPENTINA, ACCIDENTAL O IMPREVISTA SIEMPRE QUE SEAN PROVENIENTES DE LOCALES O PREDIOS AL SERVICIO DEL ASEGURADO DEBIDAMENTE INCLUIDAS EN EL SEGURO.

4.1.2. EXCLUSIONES PARTICULARES AL AMPARO DE RC POR CONTAMINACIÓN AMBIENTAL.

ADEMÁS DE LAS EXCLUSIONES GENERALES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA SEGUNDA, EL PRESENTE ANEXO NO AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DEL ASEGURADO Y/O GASTOS MÉDICOS POR LESIONES A TERCERAS PERSONAS O DAÑOS A PROPIEDADES DE TERCEROS, COMO CONSECUENCIA DE:

4.1.2.1. LA INOBSERVANCIA DE INSTRUCCIONES O RECOMENDACIONES ESCRITAS PARA LAS INSPECCIÓN, CONTROL O MANTENIMIENTO DADOS POR LOS FABRICANTES DE ARTEFACTOS O INSTALACIONES RELACIONADAS CON LA PREVENCIÓN O EL CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.
4.1.2.2. LA OMISIÓN DE LAS REPARACIONES NECESARIAMENTE INMEDIATAS DE LOS ARTEFACTOS O INSTALACIONES ARRIBA MENCIONADOS.
4.1.2.3. LESIONES GENÉTICAS A PERSONAS O ANIMALES.
4.1.2.4. DAÑOS OCASIONADOS POR AGUAS NEGRAS, BASURAS O SUSTANCIAS RESIDUALES.
4.1.2.5. LA INOBSERVANCIA DE LEYES, NORMAS, RESOLUCIONES Y DECRETOS DE LAS AUTORIDADES U ORGANISMOS PÚBLICOS QUE SE REFIEREN A LA PROTECCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
4.1.2.6. DAÑOS RELACIONADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE CON DIOXINAS, CLOROS FENOLES, O DE CUALQUIER PRODUCTO QUE LA CONTENGA.
4.1.2.7. DAÑO ECOLÓGICO.
4.1.2.8. DAÑOS POR LA INFLUENCIA PAULATINA DE MATERIAS Y SUSTANCIAS CONTAMINANTES (CONTAMINACIÓN PAULATINA).
4.1.2.9. LA EXPLOTACIÓN Y PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO EN EL MAR.

4.2 RCE POR PARQUEADEROS.

4.2.1. COBERTURA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA CON SUJECIÓN A LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y LÍMITES DE VALOR ASEGURADO CONSIGNADOS EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA, CUBRE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA POR DAÑOS DE VEHÍCULOS A TERCEROS PARQUEADOS DENTRO DEL PREDIO DEL ASEGURADO.

ESTÁ AMPARADA BAJO ESTE SEGURO LA RESPONSABILIDAD RELATIVA A AQUELLOS VEHÍCULOS QUE ESTÉN APARCADOS ÚNICAMENTE DENTRO DE LOS LINDEROS QUE CONFORMAN LOS PREDIOS DEL PARQUEADERO.

EL SIMPLE HECHO DE QUE EL VEHÍCULO ESTE DENTRO DEL PARQUEADERO SUFRA DAÑOS A CONSECUENCIA DE UN CHOQUE, NO ES MOTIVO DE INDEMNIZACIÓN BAJO LA PRESENTE PÓLIZA, SINO QUE ADEMÁS DE OCURRIR EL HECHO, DEBERÁ DEDUCIRSE UNA RESPONSABILIDAD CIVIL PARA EL ASEGURADO DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA PÓLIZA.

SI EL DAÑO SOBREVIENE DE MOVER EL VEHÍCULO CON FUERZA MOTRIZ DENTRO DE ESTOS MISMOS PREDIOS, EXISTIRÁ AMPARO SOLO SI EL CONDUCTOR ES EMPLEADO DEL ASEGURADO Y POSEE EL RESPECTIVO PASE DE CONDUCCIÓN VIGENTE.

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 1097 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL ASEGURADO NO PODRÁ RECONOCER O SATISFACER UNA RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD CIVIL, SEA TOTAL O PARCIAL O POR VÍA DE TRANSACCIÓN, SIN EL CONSENTIMIENTO PREVIO DE LA COMPAÑÍA, SI PROCEDIERE DE OTRA MANERA, LA COMPAÑÍA QUEDA LIBRE DE SU OBLIGACIÓN DE INDEMNIZAR.

4.2.2. GARANTÍAS DEL AMPARO DE RCE PARQUEADEROS.

4.2.2.1. MANTENER VIGILANCIA, POR LO MENOS CON UN CELADOR, DURANTE EL TIEMPO EN QUE EL ESTABLECIMIENTO ESTÉ PRESTANDO SERVICIO.

4. 2.2.2 LA EXISTENCIA DE ESTE SEGURO DEBE TRATARSE EN FORMA CONFIDENCIAL Y POR NINGÚN MOTIVO PUEDE SER ARGUMENTO DE PROPAGANDA PARA CON LOS CLIENTES DEL PARQUEADERO. EN LO POSIBLE EL ASEGURADO DEBERÁ PROCURAR NO ENTERAR DE SU EXISTENCIA AL PERSONAL QUE TRABAJA PARA ÉL.

4.2.2.3. ENTREGAR AL DUEÑO DEL AUTOMOTOR UN RECIBO DEBIDAMENTE NUMERADO Y FECHADO, EN DONDE CONSTE LA HORA DE ENTRADA Y LA PLACA DEL VEHÍCULO, Y QUE EL AFECTADO PUEDA PRESENTAR ESTE RECIBO COMO CONSTANCIA DE SU ESTADÍA EN EL PARQUEADERO PARA EFECTOS DE LA RECLAMACIÓN.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL ASEGURADO DE CUALQUIERA DE LAS GARANTÍAS DESCRITAS, LA COBERTURA OTORGADA POR EL PRESENTE AMPARO SE DARÁ POR TERMINADA DESDE EL MOMENTO DE LA INFRACCIÓN.

4.2.3. EXCLUSIONES PARTICULARES DEL AMPARO.

4.2.3.1. DAÑOS, PÉRDIDA O EL EXTRAVÍO DE VEHÍCULOS SITUADOS FUERA DE LOS PREDIOS A QUE SE REFIERE ESTE SEGURO.

4.2.3.2. DAÑOS, PÉRDIDA O EXTRAVÍO DE ACCESORIOS O PARTES DE LOS VEHÍCULOS, DE SU CONTENIDO O CARGA.

4.2.3.3. DAÑOS O PERJUICIOS CAUSADOS POR HURTO SIMPLE Y CALIFICADO DE LOS VEHÍCULOS, SUS PARTES, ACCESORIOS, CONTENIDOS O CARGA.

4.2.3.4. DAÑOS O PERJUICIOS CAUSADOS POR ACTOS DE INFIDELIDAD DE LOS EMPLEADOS DEL ASEGURADO.

4.3 RCE DERIVADA DE PRODUCTOS Y TRABAJOS TERMINADOS.

4.3.1. COBERTURA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA CON SUJECIÓN A LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y LÍMITES DE VALOR ASEGURADO CONSIGNADOS EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA, CUBRE LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ASEGURADO POR LESIONES A TERCERAS PERSONAS O DAÑOS A PROPIEDADES DE TERCEROS QUE LE SEAN IMPUTABLES A CONSECUENCIA DE:

4.3.1.1. USO, MANEJO O CONSUMO DE PRODUCTOS, CONTENIDO Y/O EMPAQUE, QUE EL ASEGURADO ELABORE O DISTRIBUYA EN DESARROLLO DEL CONTRATO SEÑALADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA, SIEMPRE Y CUANDO TALES PRODUCTOS SE HALLEN FUERA DE SU POSESIÓN FÍSICA. CUSTODIA O CONTROL Y QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS DEFINITIVAMENTE A TERCERAS PERSONAS.

4.3.1.2. TRABAJOS Y OPERACIONES COMPLETAMENTE TERMINADOS O EJECUTADOS POR EL ASEGURADO, EXIGIDOS EN DESARROLLO DEL CONTRATO SEÑALADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA, SIEMPRE Y CUANDO LAS LESIONES A PERSONAS O DAÑOS A PROPIEDADES DE TERCEROS SE PRODUZCAN DURANTE EL PERÍODO DE VIGENCIA DEL SEGURO.

4.3.2. EXCLUSIONES PARTICULARES.

4.3.2.1. DAÑOS O DEFECTOS SOBRE EL MISMO PRODUCTO, TRABAJO U OPERACIÓN REALIZADA.

4.3.2.2. GASTOS O INDEMNIZACIONES POR RETIRAR DEL MERCADO, O POR INSPECCIÓN, REPARACIÓN, SUSTRACCIÓN O PÉRDIDA DEL USO DEL PRODUCTO, TRABAJO U OPERACIÓN REALIZADA.

4.3.2.3. DAÑOS O PERJUICIOS CAUSADOS A LOS USUARIOS DE LOS PRODUCTOS, Y/O TRABAJOS, QUE SE GENEREN COMO CONSECUENCIA QUE ESTOS NO PUEDA DESEMPEÑAR LA FUNCIÓN PARA LA QUE ESTÁN DESTINADOS O NO RESPONDAN A LAS CUALIDADES ANUNCIADAS POR LOS FABRICANTES. ESTAS DEBERÁN CONSTAR POR ESCRITO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

4.3.2.4. DAÑOS OCASIONADOS POR PRODUCTOS, TRABAJOS U OPERACIONES QUE NO HAYAN SIDO PROBADOS O EXPERIMENTADOS ADECUADAMENTE, CONFORME A LAS REGLAS Y TÉCNICAS RECONOCIDAS.

4.3.2.5. DAÑOS POR PRODUCTOS, TRABAJOS U OPERACIONES CUYA DEFICIENCIA SEA CONOCIDA POR EL ASEGURADO.

4.3.2.6. DAÑOS POR PRODUCTOS, OBRAS TRABAJOS U OPERACIONES DESTINADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE A LA INDUSTRIA DE LA AVIACIÓN, AUTOMÓVILES Y/O COMPONENTES DE LA AVIACIÓN.

4.3.2.7. DAÑOS POR PRODUCTOS, TRABAJOS O SERVICIOS, CUYA FABRICACIÓN, ENTREGA O EJECUCIÓN CAREZCAN DE LOS PERMISOS O LICENCIAS EXIGIDOS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

4.3.2.8. DAÑOS POR ASBESTO EN ESTADO NATURAL O POR SUS FIBRAS DE AMIANTO.

4.3.2.9. DAÑOS A PRODUCTOS AJENOS FABRICADOS MEDIANTE MEZCLA, TRANSFORMACIÓN O SUSTITUCIÓN DE PRODUCTOS DEL ASEGURADO, O FABRICADOS POR MAQUINAS, MONTADOS O MANTENIDOS POR EL ASEGURADO, ASÍ COMO LOS GASTOS DE REEMBALAJE, TRASVASE Y REEMPAQUETADO DE PRODUCTOS DEBIDO AL DEFECTO DEL ENVASE, EMBALAJE, TAPÓN O TAPA SUMINISTRADA POR EL ASEGURADO.

4.3.2.10. SINIESTROS OCURRIDOS FUERA DEL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA.

4.3.2.11. DAÑOS OCASIONADOS CON PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.

4.3.3. GARANTÍAS PARTICULARES DEL AMPARO.

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 1061 DEL CÓDIGO DE COMERCIO EL ASEGURADO SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LA SIGUIENTE GARANTÍA, SO PENA DE ANULARSE O DARSE POR TERMINADO EL PRESENTE AMPARO Y QUEDARSE SIN LA COBERTURA CORRESPONDIENTE.

EL ASEGURADO SE OBLIGA A DAR ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES, INSTRUCCIONES DE USO, ALMACENAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O MANIPULACIÓN SEÑALADAS POR EL FABRICANTE, ASÍ COMO LAS DEMÁS RECOMENDACIONES DE CONOCIMIENTO PÚBLICO QUE SE DEBAN TENER SOBRE LOS PRODUCTOS ENTREGADOS.

4.4. RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA.

4.4.1. COBERTURA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA CON SUJECIÓN A LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y LÍMITES DE VALOR ASEGURADO CONSIGNADOS EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA, CUBRIRÁ LOS PERJUICIOS PROVENIENTES DEL DAÑO EMERGENTE SUFRIDO Y OCASIONADO POR CONTRATISTAS Y/O SUBCONTRATISTAS ENTRE SÍ.

ESTA COBERTURA OPERA EN EXCESO DE LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL INDIVIDUAL QUE TENGA EL CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, ESTE O NO CONTRATADO, Y APLICA SIEMPRE QUE SEAN SOLIDARIAMENTE RESPONSABLES CON EL OBJETO AMPARADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA.

4.4.2. EXCLUSIONES PARTICULARES.

4.4.2.1. DAÑOS CAUSADOS A LA OBRA QUE CADA UNO DE LOS CONTRATISTAS Y/O SUBCONTRATISTAS ESTE EJECUTANDO.
4.4.2.2. DAÑOS O LESIONES A LOS CONTRATISTAS Y/O SUBCONTRATISTAS FUERA DEL HORARIO DE TRABAJO Y/O FUERA DEL PREDIO ASEGURADO.

4.5. RCE POR BIENES BAJO CUIDADO, TENENCIA Y CONTROL.

4.5.1. COBERTURA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, CON SUJECIÓN A LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y LÍMITES DE VALOR ASEGURADO CONSIGNADOS EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA, CUBRE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DEL ASEGURADO Y/O TOMADOR COMO CONSECUENCIA DE LOS SIGUIENTES HECHOS:

DAÑO EMERGENTE CAUSADO A BIENES DE TERCEROS CON OCASIÓN DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL ASEGURADO DONDE IMPLIQUE TENER BAJO CUIDADO TENENCIA Y CONTROL DETERMINADOS BIENES, DENTRO O FUERA DEL PREDIO LOCAL DEL ASEGURADO, SIEMPRE QUE LA ACTIVIDAD ESTÉ DEBIDAMENTE AMPARADA EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA.

4.5.2. EXCLUSIONES PARTICULARES DEL AMPARO.

SE EXCLUYE EL HURTO SIMPLE Y CALIFICADO A LOS BIENES DE TERCEROS QUE ESTÈN BAJO CUIDADO, TENENCIA Y CONTROL DEL ASEGURADO.

Cláusula Quinta. Definición de Términos.

Para efectos de este seguro las expresiones o vocablos relacionados a continuación tendrán el siguiente significado.

1. Asegurado:
Es la persona natural o jurídica, bajo esa denominación figura en la carátula de esta póliza o por anexo, además de este, todos los funcionarios a su servicio, mientras se encuentran en el desempeño de las labores a su cargo, pero únicamente con respecto a su responsabilidad como tal.

2. Calidad En Que Actúa el Tomador:
Salvo estipulación en contrario, en todos los casos en que el "tomador" sea persona distinta a la especificada en la carátula de esta póliza como asegurado, se entenderá que actúa por cuenta y riesgo del asegurado, sin perjuicio de las obligaciones que le corresponden cumplir de acuerdo con la ley.

3. Victima:
Tercero que padece el daño a causa de la responsabilidad civil del asegurado, no se considera víctima el asegurado, sus funcionarios o personas que lo representen.

4. Beneficiarios:
Es la persona que tiene derecho legalmente a recibir la prestación asegurada, ya sea la víctima, sus causahabientes designados por la ley, o la entidad estatal contratante, según el caso.

5. Deducible:
Es la suma o porcentaje, indicado en la carátula de la póliza, que se deduce del monto de cada indemnización por siniestro y que siempre queda a cargo del asegurado.

6. **Vigencia del Seguro:**
La vigencia de la póliza es el período de seguro estipulado en la carátula de la presente póliza.

7. **Accidente de Trabajo:**
Para efectos del amparo patronal, se entiende por accidente de trabajo todo suceso accidental, imprevisto y repentino que sobrevenga durante la realización única y exclusivamente de las funciones asignadas contractualmente al empleado y que le produzca lesión orgánica, perturbación emocional o muerte.

8. **Empleado:**
Toda persona vinculada al asegurado mediante contrato de trabajo que le preste un servicio personal, remunerado, bajo supervisión directa y en desarrollo de las obras y/o contratos de los cuales se deriva la responsabilidad civil extracontractual.

9. **Vehículos Propios y No Propios:**
Para efectos del amparo de vehículos propios y no propios, se entiende por vehículo automotor terrestre, todo tipo de artefacto destinado al transporte de personas y cosas que se mueven sin intervención de una fuerza exterior en vías públicas o privadas destinadas al tránsito.

10. **Bienes Ajenos:**
Son todos aquellos bienes materiales que no son de propiedad del asegurado.

11. **Predios:**
Son los bienes inmuebles donde se ejecuta el contrato celebrado entre la entidad estatal contratante y el contratista.

12. **Contratistas y/o Subcontratistas:**
Para efectos del amparo de contratistas y subcontratistas, se entiende por contratistas independientes toda persona natural o jurídica que, en virtud de convenios o contratos de carácter estrictamente comercial, presta sus servicios al asegurado en procura del desarrollo de las actividades o negocios objeto de este seguro.

CLÁUSULA SEXTA. OBLIGACIONES DEL ASEGURADO.

SIN PERJUICIO DE OTRAS OBLIGACIONES QUE POR LEY LE CORRESPONDA AL ASEGURADO, TENDRÁ LAS SIGUIENTES:

1. **EVITAR EL SINIESTRO:**
   EL ASEGURADO SE OBLIGA A TENER TODA DILIGENCIA Y CUIDADO PARA EVITAR ACCIDENTES QUE PUEDAN DAR ORIGEN A RECLAMACIONES POR RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.

2. **AVISO DE SINIESTRO:**
   EL ASEGURADO DEBERÁ DAR AVISO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA SOBRE LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO DENTRO DEL TÉRMINO LEGAL DE TRES (3) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYA CONOCIDO O DEBIÓ CONOCER LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO, DE IGUAL FORMA EN EL MENCIONADO TERMINO DEBERÁ NOTIFICAR SOBRE TODA RECLAMACIÓN, DEMANDA O CITACIÓN QUE LE SEA FORMULADA EN RELACIÓN CON LOS HECHOS QUE TENGAN QUE VER EN ALGUNA FORMA CON LA COBERTURA OTORGADA MEDIANTE EL PRESENTE SEGURO.

3. **APORTE DE DOCUMENTOS POR PARTE DEL ASEGURADO:**
   EL ASEGURADO O BENEFICIARIO ESTÁN OBLIGADOS A ACREDITAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y LA CUANTÍA DE LA PÉRDIDA, DE CONFORMIDAD CON LO ORDENADO POR EL ARTÍCULO 1077 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

   ASÍ MISMO, EL ASEGURADO TENDRÁ A DISPOSICIÓN DE LA COMPAÑÍA, TODOS LOS DETALLES, LIBROS, RECIBOS, FACTURAS, DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS, ACTAS Y CUALQUIER INFORME QUE LA COMPAÑÍA ESTÉ EN DERECHO DE EXIGIRLE EN RELACIÓN CON LA OCURRENCIA Y CUANTÍA DEL SINIESTRO.

   IGUALMENTE, ESTÁ OBLIGADO A FACILITAR LA ATENCIÓN DE CUALQUIER DEMANDA, DEBIENDO ASISTIR A LAS AUDIENCIAS O CITACIONES A QUE HAYA LUGAR, SUMINISTRANDO PRUEBAS, CONSIGUIENDO LA ASISTENCIA DE TESTIGOS Y PRESENTANDO TODA LA COLABORACIÓN NECESARIA EN EL CURSO DE TALES PROCESOS.

4. **TRANSACCIONES Y GASTOS:**
   EL ASEGURADO ESTÁ OBLIGADO A SOLICITAR AUTORIZACIÓN POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA PARA EFECTUAR TRANSACCIONES O INCURRIR EN GASTOS DISTINTOS DE LOS ESTRICTAMENTE NECESARIOS PARA PRESTAR AUXILIOS MÉDICOS
