INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA CORRESPONDIENTE AL ACTA DE COSTOS No. 30 CONTRATO NÚMERO 1053 DE 2022

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 2.

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME ENTRE EL 25 Y EL 31 DE MARZO DE 2025

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

Tabla de contenido

Tabla de contenido 1

1. INTRODUCCIÓN 19

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 21

2.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 22

2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 24

2.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA 29

2.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 54

3. INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA 60

3.1. CONTRATO DE OBRA LP-OP-001- 2022 – MUNICIPIO DE SANTIAGO 61

3.1.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas 61

3.1.1.1. Actividades Administrativas 61

3.1.1.2. Actividades Técnicas 63

3.1.1.3. Actividades ambientales 65

3.1.1.4. Actividades sociales 65

3.1.1.5. Actividades SST 65

3.1.1.6. Etapa de Actualización Estudios y Diseños 65

3.2. CONTRATO DE OBRA 146 DE 2022 – MUNICIPIO DE HERRÁN 66

3.2.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas 67

3.2.1.1. Actividades Administrativas 67

3.2.1.2. Actividades ambientales 69

3.2.1.3. Actividades Sociales 69

3.2.1.4. Actividades SST 70

3.2.1.5. Etapa de Actualización Estudios y Diseños 70

3.2.1.6. Etapa de Construcción 70

3.3. CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.3879052 – MUNICIPIO DE OCAÑA-1758 71

3.3.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas 72

3.3.1.1. Actividades Administrativas 72

..... 74

3.3.1.2. Actividades ambientales 74

3.3.1.3. Actividades Sociales 74

3.3.1.4. Actividades SST 74

3.3.2.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños 74

3.4. CONTRATO DE OBRA 160 DE 2022 – MUNICIPIO DE CÁCHIRA 77

3.4.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas 77

3.4.1.1. Actividades Administrativas 78

3.4.1.2. Actividades Técnicas 78

3.4.1.3. Actividades ambientales 81

3.4.1.4. Actividades Sociales 81

3.4.1.5. Actividades SST 81

3.4.2. Seguimiento Ítems No Previstos 81
3.4.3. Estado de avance del proyecto 81
3.5. CONTRATO DE OBRA 252 DE 2022 – MUNICIPIO DE ABREGO 83
3.5.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas 84
3.5.1.1. Actividades Administrativas 85
3.5.1.2. Actividades Técnicas. 85
3.5.1.3. Actividades ambientales 86
3.5.1.4. Actividades Sociales 86
3.5.1.5. Actividades SST 86
3.5.1.6. Seguimiento Ítems No Previstos 87
3.5.2. Estado de avance del proyecto 87
3.5.2.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños 87
3.5.2.2. Etapa de Construcción 90
4.6 CONTRATO DE OBRA LP-004 DE 2022 – MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELÉN .. 91
3.6.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas 91
3.6.1.1 Actividades Administrativas 92
3.6.1.2. Actividades Técnicas 92
3.6.1.3. Actividades ambientales 95
3.6.2. Seguimiento Ítems No Previstos 95
3.6.3. Estado de avance del proyecto. 95
3.6.3.2. Etapa de Actualización Estudios y Diseños. 95

3.6.3.3. Etapa de Construcción 96
3.7. CONTRATO DE OBRA 202 DE 2022 – MUNICIPIO DE PAMPLONITA 98
3.7.1 Descripción de las Actividades Ejecutadas 98
3.7.1.1. Actividades Administrativas 98
3.7.1.2. Actividades Técnicas 99
3.7.1.3. Actividades ambientales 101
3.7.1.4. Actividades sociales 101
3.7.1.5. Actividades SST 101
3.7.1.6. Etapa de Actualización Estudios y Diseños 101
3.7.1.7. Etapa de Construcción 102
3.8. CONTRATO DE OBRA 02590 DE 2022 – GOBERNACIÓN 1943 103
3.8.1 Descripción de las Actividades Ejecutadas 104
3.8.1.1. Actividades Administrativas 104
3.8.1.2. Actividades Técnicas 106
3.8.1.3. Actividades Ambientales 107
3.8.1.4. Actividades Sociales 109
3.8.1.5. Actividades SST 109
3.8.2. Seguimiento Ítems No Previstos 116
3.8.2.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños. 116
3.8.2.2. Etapa de Construcción 135
3.6. Acciones a seguir por parte de la Interventoría. 136

3.9. CONTRATO DE OBRA 02332 DE 2022 – GOBERNACIÓN 2052 153
3.9.1 Descripción de las Actividades Ejecutadas 153
3.9.1.1. Actividades Administrativas 153
3.9.1.2. Actividades Técnicas 154
3.9.1.3. Actividades ambientales 157
3.9.1.4. Actividades Sociales 157
3.9.1.5. Actividades SST 157
3.9.2. Seguimiento Ítems No Previstos 157
3.9.3. Estado de avance del proyecto 157
3.9.3.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños 157
3.9.3.2. Etapa de Construcción 158
3.10. CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.4352407 – OCAÑA 1814 160
3.10.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas 160
3.10.1.1. Actividades Administrativa 161
3.10.1.2. Actividades Técnicas 161
3.10.1.3. Actividades ambientales 163
3.10.1.4. Actividades Sociales 163
3.10.1.5. Actividades SST 163
3.10.2. Seguimiento Ítems No Previstos 163
El contrato de obra se encuentra liquidado desde el 24 de diciembre de 2024 163
3.10.3. Estado de avance del proyecto 163

3.10.3.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños 163

3.10.3.2. Etapa de Construcción 164

3.11. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164 DE 2022 – EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S. 166

3.11.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas 166

3.11.1.1. Actividades Administrativas 166

..... 199

3.11.1.2. Actividades Técnicas 199

3.7.1.1. Actividades ambientales 209

3.7.1.2. ACTIVIDADES SOCIALES 213

3.7.1.3. Actividades SST 216

3.7.1.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños. 219

3.7.1.2. Etapa de Construcción 244

3.7. Acciones a seguir por parte de la Interventoría. 283

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATOS DE OBRA: 284

4.1. PROYECTO MUNICIPIO DE SANTIAGO 285

4.2. PROYECTO MUNICIPIO DE HERRÁN 286

4.2. PROYECTO MUNICIPIO DE OCAÑA 1758 287

4.3. PROYECTO MUNICIPIO DE CACHIRA 289

4.3.1. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra 289

4.4. PROYECTO MUNICIPIO DE ABREGO 289

4.5. PROYECTO MUNICIPIO DE LA PLAYA 291
4.6. PROYECTO MUNICIPIO DE PAMPLONITA 291
4.7. PROYECTO GOBERNACIÓN 1943 292
..... 307
4.8. PROYECTO GOBERNACIÓN 2052 307
4.9. PROYECTO OCAÑA 1814 308
4.10. PROYECTO FARO DEL CATATUMBO, GOBERNACIÓN 2033 308
4.10.1. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra 310
5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 313
5.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 313
5.2. Descripción de las actividades realizadas por el Interventor 313
5.2.1 Municipio De Santiago - Contrato No. LP-OP-01-2022. 313
5.2.2. Municipio De Herrán - Contrato No. 146 de 2022 314
5.2.3. Municipio De Ocaña - Contrato No. CO1.PCCNTR.3879052 314
5.2.5. Municipio De Cáchira - Contrato No. 160 de 2022 315
5.2.5. Municipio De Abrego - Contrato No. 252 de 2022 315
5.2.6. Municipio De La Playa - Contrato No. MP-LP-004-2022 316
5.2.7. Municipio De Pamplonita - Contrato No. 202 de 2022 316
5.2.8. Gobernación 1943 - Contrato No. 02590 DE 2022 316
5.2.9. Gobernación 2052 - Contrato No. 02332 del 2022 318
5.2.10. Ocaña 1814 - Contrato No. CO1.PCCNTR.4352407 319

5.2.11. Gobernación 2033 - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164 DE 2022 319

5.2.9. Instituto Nacional De Vías - INVIAS 321

5.2.10. Actividades administrativas 321

5.2.11. Actividades técnicas 322

5.2.12. Actividades financieras 322

5.2.13. Informes especialistas y profesionales 324

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 324

6.1. Equipo y vehículos Contrato de Interventoría 324

6.2. Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría 325

6.3. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría 325

6.4. Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría 327

6.5. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría 328

6.6. Bitácora de Obra 328

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 328

8. ANEXOS 333

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 Municipios a ejecutar dentro del objeto del Contrato 23

Tabla 2 Beneficios de los Municipios a ejecutar 26

Tabla 3 Meta Física Final de los Municipios a ejecutar 27

Tabla 4 Características Técnicas del proyecto por Municipio en Ejecución 59
Tabla 5 Información del estado de los Contratos de Obra 60
Tabla 6 Condiciones del contrato – Municipio de Santiago 61
Tabla 7 Estado Documentos pre construcción Municipio de Santiago 62
Tabla 8 Cantidades Ejecutadas Municipio de Santiago 63
Tabla 9 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de Santiago 66
Tabla 10 Condiciones del contrato - Municipio de Herrán 67
Tabla 11 Estado Documentos pre construcción Municipio de Herrán 68
Tabla 12 Cantidades Ejecutadas Municipio de Herrán 69
Tabla 13 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de Herrán 70
Tabla 14 Condiciones del contrato - Municipio de Ocaña-1758 72
Tabla 15 Estado Documentos pre construcción Municipio de Ocaña-1758 72
Tabla 16 Cantidades Ejecutadas Municipio de Ocaña - 1758 74
Tabla 17 Condiciones del contrato - Municipio de Cáchira 77
Tabla 18 Estado Documentos pre construcción Municipio de Cáchira 78
Tabla 19 Cantidades Ejecutadas Municipio de Cáchira 81
Tabla 20 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de Cáchira 82
Tabla 21 Cantidades a la fecha ejecutadas 82
Tabla 22 Condiciones para el contrato - Municipio de Abrego 84
Tabla 23 Estado Documentos pre construcción Municipio de Abrego 85
Tabla 24 Cantidades Ejecutadas Municipio de Abrego 86

Tabla 26 Cantidades a la fecha ejecutadas. 90
Tabla 25 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de Abrego 90
Tabla 27 Condiciones del contrato - Municipio de La Playa 91
Tabla 28 Estado Documentos pre construcción Municipio de La Playa 92
Tabla 29 Cantidades Ejecutadas Municipio de La Playa 95
Tabla 30 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de La Playa 96
Tabla 31 Condiciones del contrato - Municipio de Pamplonita 98
Tabla 32 Estado Documentos pre construcción Municipio de Pamplonita 99
Tabla 33 Cantidades Ejecutadas Municipio de Pamplonita 101
Tabla 34 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de Pamplonita 102
Tabla 35 Condiciones del contrato - Gobernación 1943 103
Tabla 36 Estado Documentos pre construcción Gobernación 1943 105
Tabla 37 Trazabilidad Estudios y Diseños Gobernación 1943 135
Tabla 38 Cantidades de placa huella ejecutada a la fecha – Gobernación 1943 136
Tabla 39 Condiciones del contrato - Gobernación 2052 153
Tabla 40 Estado Documentos pre construcción Gobernación 2052 154
Tabla 41 Cantidades Ejecutadas Municipio de Gobernación 2052 157
Tabla 42 Cantidades realizadas en el periodo 159
Tabla 43 Condiciones del contrato - Municipio de Ocaña 1814 160
Tabla 44 Estado Documentos pre construcción – Ocaña 1814 161
Tabla 45 Cantidades Ejecutadas Municipio de Ocaña 1814 163

Tabla 46 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio Ocaña 1814 164

Tabla 47 Condiciones del contrato - Gobernación 2033..... 166

Tabla 48 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Cacota Gobernación 2033 169

Tabla 49 Estado Documentos pre construcción –Municipio de El Zulia Gobernación 2033 171

Tabla 50 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Pamplona Gobernación 2033 172

Tabla 51 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Salazar de las Palmas Gobernación 2033 174

Tabla 52 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Silos Gobernación 2033 176

Tabla 53 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Villa de Rosario Gobernación 2033 178

Tabla 54 Estado Documentos pre construcción –Municipio de San Cayetano Gobernación 2033 180

Tabla 55 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Cáchira Gobernación 2033 182

Tabla 56 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Lourdes Gobernación 2033 184

Tabla 57 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Puerto Santander Gobernación 2033 186

Tabla 58 Estado Documentos pre construcción –Municipio Cúcuta Gobernación 2033 . 188

Tabla 59 Estado Documentos pre construcción –Municipio Pamplonita Gobernación 2033 189

Tabla 60 Estado Documentos pre construcción –Municipio Herrán Gobernación 2033 . 192

Tabla 61 Estado Documentos pre construcción –Municipio Mutiscua Gobernación 2033 194

Tabla 62 Estado Documentos pre construcción –Municipio Santiago Gobernación 2033 196

Tabla 63 Estado Documentos pre construcción –Municipio Gramalote Gobernación 2033 197

Tabla 64 Estado Documentos pre construcción –Municipio Gramalote Gobernación 2033 199

Tabla 65 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-065-2023..... 220

Tabla 66 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-055-2023..... 222

Tabla 67 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-070-2023..... 224

Tabla 68 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-074-2023..... 226

Tabla 69 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-072-2023..... 229

Tabla 70 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-062-2023..... 231

Tabla 71 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-079-2023..... 233

Tabla 72 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-067-2023..... 234

Tabla 73 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-060-2023..... 236

Tabla 74 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-077-2023..... 237

Tabla 75 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-056-2023..... 237

Tabla 76 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-082-2023..... 238

Tabla 77 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-081-2023..... 240

Tabla 78 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-064-2023..... 241

Tabla 79 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-058-2023..... 242

Tabla 80 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-081-2023..... 243
Tabla 81 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-049-2023..... 243
Tabla 82 Cantidades ejecutadas en el municipio de Cacota 246
Tabla 83 Cantidades ejecutadas en el municipio de El Zulia..... 249
Tabla 84 Cantidades ejecutadas en el municipio de Salazar de Las Palmas 254
Tabla 85 Cantidades ejecutadas en el municipio de Silos..... 256
Tabla 86 Cantidades ejecutadas en el municipio de Villa del Rosario..... 258
Tabla 87 Cantidades ejecutadas en el municipio de San Cayetano 261
Tabla 88 Cantidades ejecutadas en el municipio de Lourdes..... 264
Tabla 89 Cantidades ejecutadas en el municipio de Cáchira 266
Tabla 90 Cantidades ejecutadas en el municipio de Puerto Santander..... 268
Tabla 91 Cantidades ejecutadas en el municipio de Cúcuta 270
Tabla 92 Cantidades ejecutadas en el municipio de Pamplonita..... 272
Tabla 93 Cantidades ejecutadas en el municipio de Mutiscua 274
Tabla 94 Cantidades ejecutadas en el municipio de Herrán 276
Tabla 95 Cantidades ejecutadas en el municipio de Santiago 278
Tabla 96 Cantidades ejecutadas en el municipio de Gramalote..... 280
Tabla 97 Cantidades ejecutadas en el municipio de Villa Caro 282
Tabla 98 Garantías Municipio de Santiago 286
Tabla 99 Garantías Municipio de Herrán..... 287
Tabla 100 Garantías Municipio de Ocaña 288

Tabla 101 Garantías Municipio de Cáchira 289
Tabla 102 Garantías Municipio de Abrego 290
Tabla 103 Garantías Municipio de La Playa 291
Tabla 104 Garantías Municipio de Pamplonita 292
Tabla 105 Reporte informes semanales Gobernación 1943 292
Tabla 106 Maquinaría y Equipo Gobernación 1943 293
Tabla 107 Reporte afiliaciones a seguridad social Gobernación 1943 303
Tabla 108 Estado Financiero y Presupuestal Gobernación 1943 304
Tabla 109 Garantías Gobernación 1943 306
Tabla 110 Actas de Comité u/o Reunión Gobernación 1943 307
Tabla 111 Garantías Gobernación 2052 308
Tabla 112 Garantías Municipio de Ocaña 1814 308
Tabla 113 Garantías Gobernación 2033 311
Tabla 114 Información Contrato de Interventoría 1053 de 2022. 313
Tabla 115 Trazabilidad oficios enviados del municipio de Santiago 314
Tabla 116 Trazabilidad oficios enviados del municipio de Herrán 314
Tabla 117 Trazabilidad oficios enviados del municipio de Ocaña - 1758 314
Tabla 118 Trazabilidad oficios enviados del municipio de Cáchira 315
Tabla 119 Trazabilidad oficios enviados al contratista del municipio de Abrego 315
Tabla 120 Trazabilidad oficios enviados del municipio de La Playa 316
Tabla 121 Trazabilidad oficios enviados del municipio de Pamplonita 316

Tabla 122 Trazabilidad oficios enviados al contratista Gobernación 1943 317

Tabla 123 Trazabilidad oficios enviados a la Gobernación 2052..... 319

Tabla 124 Trazabilidad oficios enviados al municipio de Ocaña - 1814 319

Tabla 125 Trazabilidad oficios enviados de la Gobernación 2033..... 320

Tabla 126 Trazabilidad oficios enviados al INVIAS 321

Tabla 127 Información Financiera Contrato de Interventoría 1053 de 2022. 324

Tabla 128 Vehículos Contrato de Interventoría 1053 de 2022. 324

Tabla 129 Personal Contrato de Interventoría 1053 de 2022. 325

Tabla 130 Seguimiento Financiero Interventoría..... 326

Tabla 131 Garantías Contrato de Interventoría 1053 de 2022. 327

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Ubicación general de los municipios del Proyecto en el Departamento de Norte de Santander 24

Ilustración 2 Comités de seguimiento y control de actividades de campo 107

LISTA DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Santiago..... 29

Fotografía 2 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Herrán..... 30

Fotografía 3 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Ocaña 31

Fotografía 4 Estado actual del corredor vial a intervenir PH – Municipio de Ocaña 32

Fotografía 5 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Cáchira..... 33

Fotografía 6 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Abrego 34

Fotografía 7 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de La Playa 35

Fotografía 8 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Pamplonita 36

Fotografía 9 Estado actual del corredor vial a intervenir – Ocaña - 1814 37

Fotografía 10 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-1943- Arboledas 38

Fotografía 11 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-1943- Gramalote 39

Fotografía 12 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-1943- Los Patios 40

Fotografía 13 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2052- Los Patios 41

Fotografía 14 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 - El Zulia 42

Fotografía 15 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Villa del Rosario 43

Fotografía 16 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Pamplona 44

Fotografía 17 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Silos.... 45

Fotografía 18 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Salazar de las Palmas 46

Fotografía 19 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Cacota 47

Fotografía 20 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – San Cayetano 48

Fotografía 21 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Lourdes48

Fotografía 22 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Santiago 49

Fotografía 23 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Mutiscua 50

Fotografía 24 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Herrán. 50

Fotografía 25 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Pamplonita..... 51

Fotografía 26 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Ricaurte 51

Fotografía 27 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Puerto Santander 52

Fotografía 28 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Cáchira 52

Fotografía 29 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Gramalote 53

Fotografía 30 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Villa Caro 53

Fotografía 32 Maquinarias y Equipos Gobernación 1943... **¡Error! Marcador no definido.**

Fotografía 33 Equipos de Emergencia Gobernación 1943. **¡Error! Marcador no definido.**

Fotografía 34 Implementación protocolo de bioseguridad.. **¡Error! Marcador no definido.**

LISTA DE GRAFICAS

Gráfico 1 Avance Financiero Municipio de Santiago 66

Gráfico 2 Avance Financiero Municipio de Herrán 71

Gráfico 3 Avance Financiero Municipio de Ocaña-1758..... 76

Gráfico 4 Avance Financiero Municipio de Cáchira 83
Gráfico 5 Avance Financiero Municipio de Abrego 90
Gráfico 6 Avance Financiero Municipio de La Playa 97
Gráfico 7 Avance Financiero Municipio de Pamplonita 102
Gráfico 8 Avance Financiero Municipio de Gobernación 1943 137
Gráfico 9 Avance Financiero Municipio de Gobernación 2052 159
Gráfico 10 Avance Financiero Municipio de Ocaña 1814 165
Gráfico 11 Avance Financiero Municipio de Cacota 247
Gráfico 12 Avance Financiero Municipio del Zulia 249
Gráfico 13 Avance Financiero Municipio de Pamplona 252
Gráfico 14 Avance Financiero Municipio de Salazar de las Palmas 254
Gráfico 15 Avance Financiero Municipio de Silos 257
Gráfico 16 Avance Financiero Municipio de Villa del Rosario 259
Gráfico 17 Avance Financiero Municipio de San Cayetano 262
Gráfico 18 Avance Financiero Municipio de Lourdes 264
Gráfico 19 Avance Financiero Municipio de Cáchira 266
Gráfico 20 Avance Financiero Municipio de Puerto Santander 268
Gráfico 21 Avance Financiero Municipio de Cúcuta 270
Gráfico 22 Avance Financiero Municipio de Pamplonita 272
Gráfico 23 Avance Financiero Municipio de Mutiscua 274
Gráfico 24 Avance Financiero Municipio de Herrán 276

Gráfico 25 Avance Financiero Municipio de Santiago 278

Gráfico 26 Avance Financiero Municipio de Gramalote..... 280

Gráfico 27 Avance Financiero Municipio de Villa Caro..... 282

1. INTRODUCCIÓN

Con el presente informe, GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES, en su calidad de Interventor, con el contrato No. 1053 DE 2022, cuyo objeto es “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL” LOTE 2.” adjudicado previo Concurso de Méritos No CMA-DTE-SEP-197-2021, reporta a la entidad el cumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas por los contratistas a cargo de los contratos de obra que se desarrollan dentro del marco del programa “COLOMBIA RURAL” Mantenimiento y Mejoramiento De la Red Terciaria 2019 – 2022, cuyas obras tienen como objetivos: mantener y mejorar el tránsito y accesibilidad a la red vial rural del país, priorizando corredores viales estratégicos que incrementen la productividad del campo en las regiones, ejecutando obras en los mismos, mediante actividades de mantenimiento y mejoramiento.

A través de este informe se presenta a la entidad contratante, INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS, el seguimiento a los once convenios Interadministrativos suscritos entre el INVIAS y municipios del Departamento de Norte de Santander y sus contratos de obra derivados que se relacionan a continuación: Municipio de Ocaña: Convenio Interadministrativo 1758-2021, Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.3879052 adjudicado a CONSORCIO OK 2022 por valor de $ 1.711.146.620,00. Municipio de Santiago: Convenio Interadministrativo 1821-2021, Contrato de Obra No. LP-OP-01-2022 adjudicado a UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLAS SANTIAGO 2022 por valor de $ 4.430.879.655,00. Municipio de Herrán: Convenio Interadministrativo 1861-2021, Contrato de Obra No. 146 de 2022 adjudicado a UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLAS HERRÁN 2022 por valor de $ 1.781.999.648,00. Municipio de Cáchira: Convenio Interadministrativo 1859-2021, Contrato de Obra No. 160 de 2022 adjudicado a CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA por valor de $ 2.658.435.877,00. Municipio de Abrego: Convenio Interadministrativo 1791-2021, adjudicado a CONSORCIO AD VÍAS por valor de $ 4.494.012.623,00. Municipio de Ocaña: Convenio Interadministrativo 1814-2021, Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.4352407 adjudicado a UNIÓN TEMPORAL OCAÑA GBE 2022 por valor de $ 2.700.000.000,00, Municipio de la Playa de Belén: Convenio Interadministrativo 1863-2021, Contrato de Obra No. LP-004-2022 adjudicado a CONSORCIO LA PLAYA 2022 por valor de $ 2.268.620.424,00. Municipio de Pamplonita: Convenio Interadministrativo 1878-2021 Contrato de Obra No. 202 de 2022 adjudicado a UNIÓN TEMPORAL COLOMBIA por valor de $ 1.703.523.226,00. Gobernación: Convenios Interadministrativos 1943-2021, adjudicado a UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590 por valor de $ 24.463.027.326,00,

Convenio Interadministrativo 2033-2021 adjudicado a EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO DEL NIVEL DEPARTAMENTAL FARO DEL CATATUMBO S.A.S. por valor de $ 10.000.000.000,00 y, Convenio Interadministrativo 2052-2021, Contrato de Obra No. 02332 DEL 2022 adjudicado a UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022 por valor de $ 6.045.781.859,50.

Para el control y vigilancia el INVIAS designó al Ingeniero LEONEL VALERO ESCALANTE como Supervisor del Contrato de Interventoría. Así mismo, el INVIAS designó a la Ingeniero.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Para el gobierno nacional y en consecuencia para la gestión del Instituto Nacional de Vías – INVIAS es de gran importancia brindar una red vial segura para los usuario y que contribuya al desarrollo sostenible e integración del país a través de vías terciarias eficientes, cómodas y seguras, para el cumplimiento de este el INVIAS ejecuta diferentes actividades a través de cada una de sus Unidades Ejecutoras; por lo tanto con la ejecución de este proyecto, se busca el cumplimiento de mantener y mejorar la transitabilidad y accesibilidad a la red vial rural del país, priorizando corredores viales estratégicos que incrementen la productividad del campo en las regiones, ejecutando obras en los mismos, mediante actividades de mantenimiento y mejoramiento.

Para dar cumplimiento al objetivo del proyecto el INVIAS a suscrito convenios Interadministrativos con los municipios de Ocaña, Abrego, Santiago, Cáchira, Herrán, La Playa de Belén, Pamplonita, y 3 convenios con la Gobernación de Norte de Santander. Teniendo en cuenta lo anterior, los Entes Territoriales adelantaron procesos contractuales bajo la modalidad de Licitación Pública tendiente a contratar las obras que se deriven de cada uno de los Convenios Interadministrativos suscritos a fin de llevar a cabo la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 2.

De acuerdo al objeto del contrato de Interventoría se requiere realizar labores de control y seguimiento a los contratos de obra derivados de los convenios Interadministrativos que se suscribieron entre el INVIAS y Municipios del Departamento de Norte de Santander.

Entre las Principales actividades por ejecutar que serán supervisadas, controladas, Verificadas y aprobadas en el desarrollo del proyecto se encuentran las siguientes:

ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO

Construcción de Placa Huella.
Pavimentos Convencionales.
Construcción y/o reparación de obras de drenaje, muros de contención, pontones y puentes.
Construcción de Filtros y/o cunetas.
Bases Estabilizadas.
Tecnologías Alternativas.

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO

Conformación de la calzada existente.
Mejoramiento de la subrasante con adición de material.
Suministro e instalación de afirmado.

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas.
Rocería.
Reparación de baches.
Limpieza de alcantarillas y descoles.
Remoción de derrumbes menores (sin maquinaria y/o equipo) únicamente con herramienta menor.
Perfilado y/o reconstrucción de cunetas y/o reconstrucción de zanjas de coronación, que no requieran maquinaria y/o equipo, encoles y descoles.

ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA

Caracterización vial e inventario vial del corredor productivo seleccionado, de acuerdo a la Resolución 1321 del 2018 o la legislación vigente emitida por el Ministerio de Transporte.

Implementación y adaptación de los diseños tipo de la CARTILLA OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES PROGRAMA COLOMBIA RURAL a las obras a ejecutar en el corredor postulado.

Para la ejecución de las obras se realizará el control con base en el Manual de Mantenimiento de Carreteras y especificaciones generales de mantenimiento de carreteras y a las especificaciones particulares para su ejecución y a las Normas de Ensayo de Materiales del Instituto Nacional de Vías.

2.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Dentro del Objeto del proyecto se realizará seguimiento y control a 11 convenios Interadministrativos con el Departamento de Norte de Santander, los cuales cuentan con la ejecución de 29 Municipios los cuales se detallan a continuación:

No.	CONVENIO CON	No. CONVENIO	MUNICIPIO
1	ABREGO	1791-2021	ABREGO
2	LA PLAYA	1863-2021	LA PLAYA
3	OCAÑA	1814-2021	OCAÑA
4	OCAÑA	1758-2021	OCAÑA
5	CACHIRA	1859-2021	CACHIRA
6	HERRÁN	1861-2021	HERRÁN
7	PAMPLONITA	1878-2021	PAMPLONITA
8	SANTIAGO	1821-2021	SANTIAGO
9	GOBERNACIÓN	1943-2021	ARBOLEDAS
			GRAMALOTE
			LOS PATIOS (Vía principal acceso vereda california)
10	GOBERNACIÓN	2052-2021	LOS PATIOS (La Mutis)
11	GOBERNACIÓN	2033-2021	VILLA CARO
			PAMPLONITA
			HERRÁN
			El ZULIA
			GRAMALOTE
			LOURDES
			MUTISCUA
			PAMPLONA
			PUERTO SANTANDER
			CACOTA
			SALAZAR DE LAS PALMAS
			CACHIRA
			CÚCUTA
			VILLA DEL ROSARIO
			SAN CAYETANO
			SANTIAGO
			SILOS

Tabla 1 Municipios a ejecutar dentro del objeto del Contrato

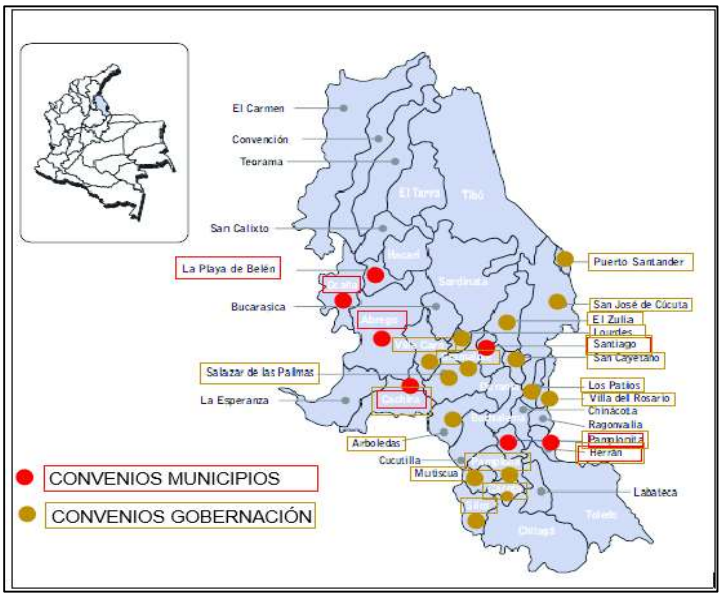


Ilustración 1 Ubicación general de los municipios del Proyecto en el Departamento de Norte de Santander

2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este contrato por ser supervisión a un contrato multiproyecto se divide en 29 municipios que serán beneficiados dentro del programa "COLOMBIA RURAL", los cuales se describe su ejecución inicial a continuación:

CORREDOR A INTERVENIR	MUNICIPIO	BENEFICIOS
VÍA LAS BRISAS DEL TARRA-LA ARENOSA VÍA SANTA LUCÍA - CANOAS	ABREGO	Construcción de 1320 mts de placa huella y 9 alcantarillas entre el Tramo de SANTA LUCÍA-CANOAS y Construcción de 1285 mts de placa huella y 28 alcantarillas entre el Tramo de BRISAS DEL TARRA-LA ARENOSA
LLANO GRANDE – SAN PEDRO, ESPERANZA – ESPERANCITA – CLAVELLINOS	LA PLAYA DE BELEN	Construcción de 800 mts de placa huella y 4 alcantarillas en el tramo LLANO GRANDE – SAN PEDRO y Construcción de 600 mts de placa huella y 7 alcantarillas en el tramo ESPERANZA – ESPERANCITA – CLAVELLINOS.

CORREDOR A INTERVENIR	MUNICIPIO	BENEFICIOS
CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA	OCAÑA - 1814	Construcción de 1890 mts de placa huella y 10 alcantarillas y 2 muros de gavión.
CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRISON	OCAÑA -1758	Construcción de 730 m3 de parcheo, 692 mts de placa huella, 4 alcantarillas y 4 muros de gavión.
CORREDORES EL LUCERO-ALTO DE LA PAZ, LA CARRERA - EL CARBÓN Y EL LLANO Y LA CARAMBA	CACHIRA	corredor El Lucero- Alto de la Paz: construcción de 7 alcantarillas y construcción de 600 metros lineales de placa huellas. corredor La Carrera - El Carbón: construcción de 2 alcantarillas y construcción de 200 metros lineales de placa huellas. Corredor El Llano y La Caramba: construcción de 8 alcantarillas y construcción de 566 metros lineales de placa huellas.
VÍA TERCIARIA VEREDA EL RAMAL	HERRÁN	Construcción de 1.717 mts de placa huella y 6 alcantarillas.
MUNICIPIO DE PAMPLONITA-ZONA RURAL – VEREDA BATAGA	PAMPLONITA	Construcción de 2.140 mts de Placa Huella y 4 unidades de Alcantarillas.
VIA RURAL CUPERENA – AZUL ALTO	SANTIAGO	Construcción de 4.997 mts de placa huella y 12 alcantarillas.
VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE ARBOLEDAS, GRAMALOTE Y LOS PATIOS	GOBERNACIÓN-1943	Arboledas con una longitud de 6.970 metros lineales de placa huella, comprendidos en 8 tramos ubicados en las veredas Santo Domingo- Volcán – Potreros- Chicagua Bajo- La Rinconada-Cinera- El Helechar - Juan Bueno, 51 Und de alcantarillas de 7 ml de diámetro 36”, Municipio de Gramalote con una longitud de 4.543 metros lineales de placa huella, comprendidos en 3 tramos ubicados en la vereda Boyacá – San Isidro – Santa Anita, 18 Und de alcantarillas de 7 ml de diámetro 36” y Municipio de Los Patios con una longitud de 4.500 metros lineales de placa huella, comprendidos en 5 tramos ubicados en la vereda Corozal -California, 15 Und de

CORREDOR A INTERVENIR	MUNICIPIO	BENEFICIOS
		alcantarillas de 7 ml de diámetro 36” y 50 m3 de muro en gaviones.
LOS MANGOS LA CARRER. VÍA CHINÁVEGA. PASO DE LOS RÍOS - RICAURTE, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA LAS DELICIAS-EL MAMÓN LA GARZA-ZUMBADOR HERRÁN-SIBERIA LOURDES-CAMPORICO MUTISCUA - MINAS DE CAL - LA ARAÑITA - LA MESETA VÍA LA UNIÓN VÍA PÁRAMO - PICA PICA PUENTE ISABEL CELIS HASTA EL DAVE SAN ANTONIO- LA QUINTA-ALTO DE SAN ANTONIO ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADUAS-TABIRO-PUENTE ZULIA LA LAJA - CUPERENA - CACAHUALA - ALTO FRIO LOS RINCÓN - LA COPITA VÍA EL MOLINO PUERTO RICO CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO	GOBERNACIÓN-2033	Adelantar las actividades de Mejoramiento en la vía 1) LOS MANGOS LA CARRER. 2) VÍA CHINÁVEGA. 3) PASO DE LOS RÍOS - RICAURTE, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA 4) LAS DELICIAS-EL MAMÓN 5) LA GARZA-ZUMBADOR 6) HERRÁN-SIBERIA 7) LOURDES-CAMPORICO 8) MUTISCUA - MINAS DE CAL - LA ARAÑITA - LA MESETA 9) VÍA LA UNIÓN 10) VÍA PÁRAMO - PICA PICA 11) PUENTE ISABEL CELIS HASTA EL DAVE 12) SAN ANTONIO- LA QUINTA-ALTO DE SAN ANTONIO 13) ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADUAS-TABIRO-PUENTE ZULIA 14) LA LAJA - CUPERENA - CACAHUALA - ALTO FRIO 15) LOS RINCÓN - LA COPITA 16) VÍA EL MOLINO PUERTO RICO 17) CORREDOR VIAL LA PARADA- JUAN FRIO.
LA VÍA LA GARITA – LA MUTIS EN EL TRAMO PR0+000 – PR 12+900, CUYA INTERVENCIÓN ES DE 12.90 KM DE LONGITUD.	GOBERNACIÓN-2052	Construcción de 6.180 mts de placa huella y 25 alcantarillas y 60 M3 de muros de gavión

Tabla 2 Beneficios de los Municipios a ejecutar

Luego de dar aprobación por parte de la interventoría a la Actualización de Estudios y Diseños para cada uno de los convenios interadministrativos, se realiza un balance de acuerdo a los Diseños obtenidos y/o creación de Ítems No Previstos de acuerdo a necesidades propias de cada uno de los Contrato de Obra, por lo cual para los Proyectos de Ocaña 1758, Santiago, Abrego, Herrán, Pamplonita, La Playa, Cáchira, Ocaña 1814 y Gobernación 2052. se tiene la siguiente meta física a ejecutar, de acuerdo al Balance de acuerdo a Estudios y Diseños:

CORREDOR A INTERVENIR	MUNICIPIO	BENEFICIOS
VÍA LAS BRISAS DEL TARRA-LA ARENOSA VÍA SANTA LUCÍA - CANOAS.	ABREGO	Construcción de 1150 mts de placa huella y 6 alcantarillas entre el Tramo de SANTA LUCÍA-CANOAS y Construcción de 1251.35 mts de placa huella y 13 alcantarillas entre el proyecto.
CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRISON	OCAÑA -1758	Construcción de 572,69 m3 de parcheo, 520 mts de placa huella y 4 alcantarillas.
VIA RURAL CUPERENA – AZUL ALTO	SANTIAGO	Construcción de 3.300 mts de placa huella y 16 alcantarillas.
VÍA TERCIARIA VEREDA EL RAMAL	HERRÁN	Construcción de 1.200 mts de placa huella y 4 alcantarillas.
MUNICIPIO DE PAMPLONITA-ZONA RURAL – VEREDA BATAGA	PAMPLONITA	Construcción de 1.766 mts de Placa Huella y 4 Alcantarillas.
LLANO GRANDE – SAN PEDRO, ESPERANZA – ESPERANCITA – CLAVELLINOS	LA PLAYA	Construcción de 630 mts de placa huella y 2 alcantarillas en el tramo LLANO GRANDE – SAN PEDRO y Construcción de 545 mts de placa huella y 3 alcantarillas en el tramo ESPERANZA – ESPERANCITA – CLAVELLINOS.
CORREDORES EL LUCERO-ALTO DE LA PAZ, LA CARRERA - EL CARBÓN Y EL LLANO Y LA CARAMBA	CÁCHIRA	corredor El Lucero- Alto de la Paz: 7 alcantarillas y 633 metros de placa huellas. corredor La Carrera - El Carbón 2 alcantarillas y 264 metros de placa huellas. Corredor El Llano y La Caramba 8 alcantarillas y 566 metros de placa huellas.
CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA	OCAÑA - 1814	Construcción de 1550 mts de placa huella y 10 alcantarillas.
LA VÍA LA GARITA – LA MUTIS EN EL TRAMO PR0+000 – PR 12+900, CUYA INTERVENCIÓN ES DE 12.90 KM DE LONGITUD.	GOBERNACIÓN-2052	Construcción de 4003 mts de placa huella y 22 alcantarillas.

Tabla 3 Meta Física Final de los Municipios a ejecutar

Gracias a la intervención de estos proyectos se logrará mejorar las condiciones de vida de los habitantes aledaños a los corredores viales de los municipios, obteniendo beneficios de crecimiento económico; dentro del cual los campesinos se verán beneficiados al obtener mejores condiciones para el transporte de sus productos y beneficios de crecimiento social; dentro del cual se mejoran las condiciones de movilidad mejorando de esta forma su calidad

de vida y por otro lado permitiendo el fácil acceso de los sistemas de salud y educación del sector.

2.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA


A la fecha de corte del presente informe, se tienen adjudicados la totalidad de los convenios suscritos entre el INVIAS y el departamento de Norte de Santander. De los cuales se encuentra en ejecución el correspondiente al de la GOBERNACIÓN 1943 y se encuentran terminados 9 de los municipios de GOBERNACIÓN 2033, ABREGO, PAMPLONITA, OCAÑA-1814, GOBERNACIÓN 2052, OCAÑA 1758, HERRÁN, SANTIAGO, CACHIRA y LA PLAYA que a su vez se encuentran liquidados, a continuación, se presenta el estado inicial de los corredores que intervinieron en cada uno de los convenios ejecutados.

2.3.1. Inventarío y Estado Inicial de la Vía en el Municipio de Santiago.

	
Vía Rural Cuperena – Azul Alto	Vía Rural Cuperena – Azul Alto
	

Fotografía 1 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Santiago

2.3.2. Inventarío y Estado Inicial de la Vía en el Municipio de Herrán.

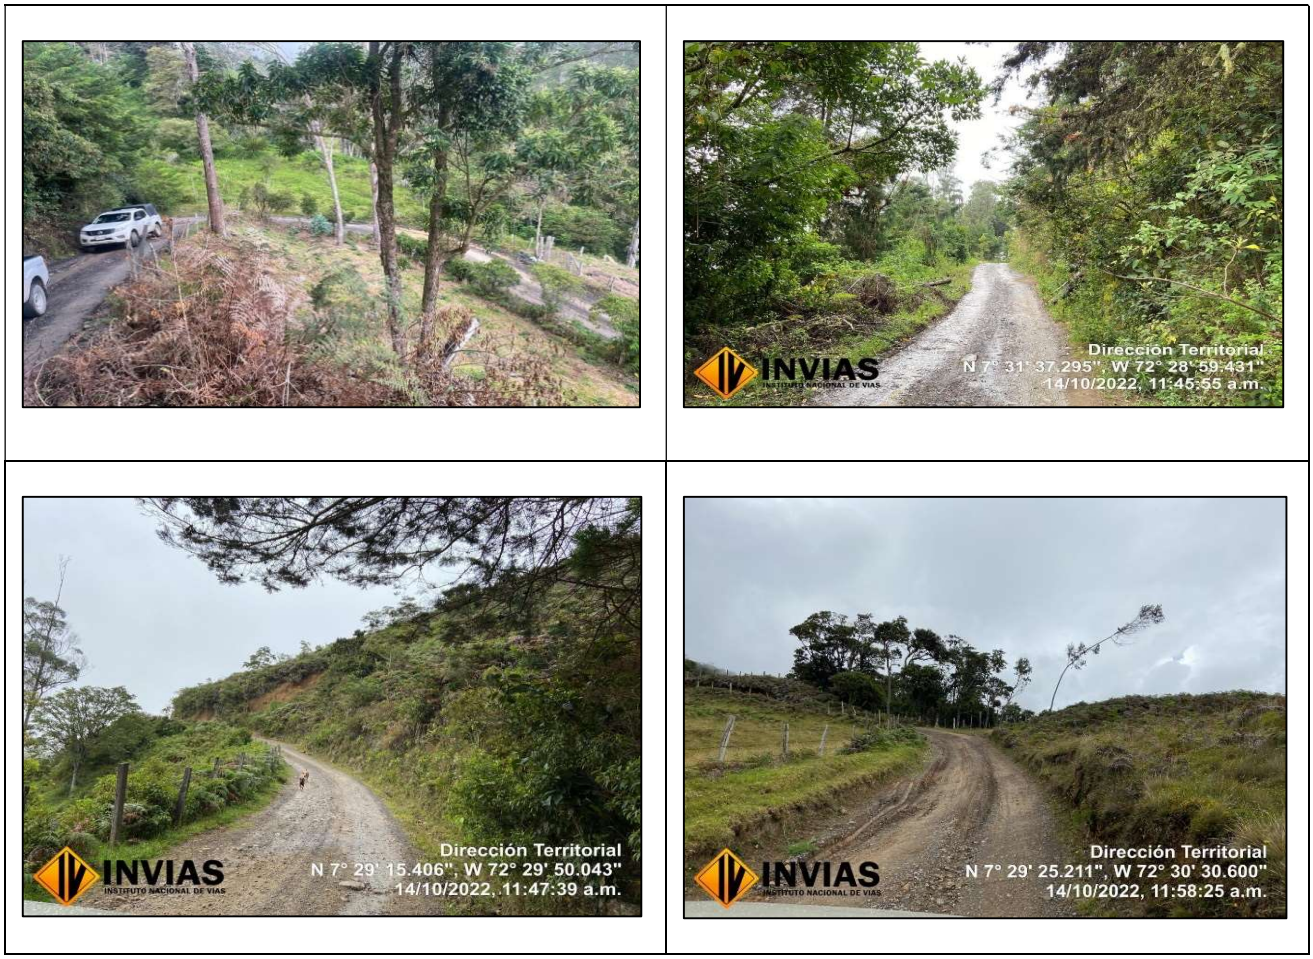

Fotografía 2 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Herrán

2.3.3. Inventarío y Estado Inicial de la Vía en el Municipio de Ocaña 1758.

Sector 1: Avenida Francisco Fernández de Contreras, pasando por el sector del lago en la cual ser requiere de intervenciones de parcheo desde el punto PR 00+0070 hasta el punto PR 06+0180.



Fotografía 3 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Ocaña

Sector 2: Vía terciaria limites- Morrison hasta el punto PR 18+0200.

	
	
PR 15+400, Corredor la Samaritana	PR 18+300, Corredor la Samaritana

Fotografía 4 Estado actual del corredor vial a intervenir PH – Municipio de Ocaña

2.3.4. Inventarío y Estado Inicial de la Vía en el Municipio de Cáchira.



Fotografía 5 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Cáchira

2.3.5. Inventario y Estado Inicial de la Vía en el Municipio de Abrego.



Fotografía 6 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Abrego

2.3.6. Inventario y Estado Inicial de la Vía en el Municipio de La Playa.

	
Corredor Corral Viejo – Llano Grande	Corredor 2 - Clavelinas
	

Fotografía 7 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de La Playa

2.3.7. Inventario y Estado Inicial de la Vía en el Municipio de Pamplonita.

	
Vereda Bataga	Vereda Bataga
	
Vereda Bataga	Vereda Bataga

Fotografía 8 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Pamplonita

2.3.8. Inventarío y Estado Inicial de la Vía en el Municipio de Ocaña 1814.

	
Tramo 1 Avícola	Tramo 2 Placa Huella Ext.
	
Tramo 3 Alto Grande	Tramo 4 Buenavista
	
Tramo 5 Bosquecito	Tramo 7 Curvon

Fotografía 9 Estado actual del corredor vial a intervenir – Ocaña - 1814

2.3.9. Inventario y Estado Inicial de las Vías del contrato de la Gobernación-1943.

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Arboledas.






Fotografía 10 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-1943- Arboledas

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Gramalote.






Fotografía 11 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-1943-Gramalote

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Los Patios.









Fotografía 12 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-1943- Los Patios

2.3.10. Inventario y Estado Inicial de las Vías del contrato de la Gobernación-2052.

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de los Patios.






Fotografía 13 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2052- Los Patios

2.3.11. Inventario y Estado Inicial de las Vías del contrato de la Gobernación-2033.

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de El Zulia.



Fotografía 14 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 - El Zulia

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Villa del Rosario.



Fotografía 15 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Villa del Rosario

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Pamplona.



Fotografía 16 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Pamplona

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Silos.



Fotografía 17 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Silos

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Salazar de las Palmas.









Fotografía 18 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Salazar de las Palmas

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Cacota.









Fotografía 19 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Cacota

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de San Cayetano.





Fotografía 20 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – San Cayetano

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Lourdes.





Fotografía 21 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Lourdes

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Santiago.





Fotografía 22 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Santiago

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Mutiscua.





Fotografía 23 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Mutiscua

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Herrán.





Fotografía 24 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Herrán

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Pamplonita.





Fotografía 25 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Pamplonita

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Ricaurte.





Fotografía 26 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Ricaurte

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Puerto Santander.





Fotografía 27 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Puerto Santander

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Puerto Cáchira.





Fotografía 28 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Cáchira

A continuación, se presente el registro fotográfico para el corredor del municipio de Gramalote.





Fotografía 29 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Gramalote

A continuación, se presente el registro fotográfico para el corredor del municipio de Villa Caro.





Fotografía 30 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Villa Caro

2.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

A la fecha de corte del presente informe se tienen adjudicados la totalidad de los convenios suscritos entre el Invias y el departamento de Norte de Santander, de los cuales está en ejecución uno (01) correspondiente a GOBERNACIÓN 1943 y terminados los convenios con los municipios de ABREGO, OCAÑA-1758, HERRÁN, SANTIAGO, OCAÑA-1814, LA PLAYA, PAMPLONITA, GOBERNACIÓN 2033, GOBERNACIÓN 2052 y CACHIRA su plazo contractual finalizo. A continuación, se presentan sus características técnicas.

MUNICIPIO	CORREDOR VIAL	CARACTERÍSTICAS
SANTIAGO	CUPERENA – AZUL ALTO	Existen actualmente 7 Kilómetros de vía en condiciones de mal estado, por la cual las comunidades del sector utilizan para sacar sus productos provenientes de las actividades agropecuarias en vehículos. La superficie de rodadura actual es en afirmado en mal estado de conservación por falta de mantenimiento y drenajes insuficientes. A rais de la ola invernal de los últimos años en el país, el corredor no permite un tránsito vehicular adecuado, incrementando los tiempos de recorrido, el riesgo de accidentalidad e interrupción del flujo vehicular. Es por esto, que se hace necesario la intervención de 4.997 mts de placa huella y 12 alcantarillas para mejorar las condiciones actuales del corredor vial.
HERRÁN	VÍA TERCIARIA VEREDA EL RAMAL	La red vial del municipio de Herrán está conformada en su mayoría por vías terciarias, las cuales se encuentran en material de afirmado, sin mejoramiento definitivo con pavimentación en alguna de sus modalidades. A rais de la ola invernal de los últimos años en el país, el corredor no permite un tránsito vehicular adecuado, incrementando los tiempos de recorrido, el riesgo de accidentalidad e interrupción del flujo vehicular. Es por esto que se hace necesario el mejoramiento de la vía en la vereda El Ramal, en el cual se establece la construcción de 1.717 mts de placa huella y 6 alcantarillas.

MUNICIPIO	CORREDOR VIAL	CARACTERÍSTICAS
OCAÑA	OCAÑA-LIMITES-MORRISON	En la vía a intervenir se presenta bajo nivel de servicio en la en la vía rural que comunica en este punto la zona rural con la cabecera municipal, debido a un alto deterioro de la superficie de rodadura, deficiente drenaje superficial, con una superficie desgastada por la escorrentía de las aguas lluvia y el paso de vehículos pesados. Ante esta situación se observa la necesidad de construir sobre la vía en menciones tramos de placa huella con señalización, además de la construcción de alcantarillas para el manejo de la escorrentía y la construcción de muros en gaviones con el fin de estabilizar la banca en algunos tramos críticos.
CÁCHIRA	CORREDORES EL LUCERO- ALTO DE LA PAZ, LA CARRERA - EL CARBÓN Y EL LLANO Y LA CARAMBA	Algunos tramos de los corredores viales presentan puntos críticos que condicionan el tránsito de vehículos debido a fenómenos de remoción en masa, deslizamientos, el deterioro en el tiempo de la calzada, perdida y afectación de cunetas, el deterioro y/o colapso de tuberías de paso o alcantarillas, le erosión laminar y por surcos; también la perdida de la bancada de algunos tramos y la baja frecuencia de mantenimiento rutinarios. Por lo anteriormente mencionado el municipio estableció que se requieren intervenciones y obras especificas tales como placa huellas y alcantarillas que permitan el mejoramiento de tramos de vías terciarias.
ABREGO	VÍA LAS BRISAS DEL TARRA-LA ARENOSA VÍA SANTA LUCÍA - CANOAS.	El municipio de Abrego cuenta con una precaria infraestructura vial terciaria acorde a las necesidades de competitividad que se requiere para su desarrollo socioeconómico y para realizar mejoras en el nivel de vida de sus habitantes. Las vías terciarias se encuentran principalmente sin capa de rodadura o en estado regular a malo, dificultando el tránsito y movilidad rural, generando espacios que afectan la calidad de vida de los habitantes, así mismo, la atención de las vías se dificulta

MUNICIPIO	CORREDOR VIAL	CARACTERÍSTICAS
		puesto que no se cuenta con información sobre las condiciones de la red vial. La vía Brisas del Tarra- La Arenosa y la vía Santa lucia-Canoas, se encuentra destapada, que en épocas de fuertes precipitaciones se dificulta el acceso, generando el aumento en recorridos, dificultas de traslado a servicios médicos, inasistencia de estudiantes a los centros educativos e incremento en los costos de transporte de carga y pasajeros. Por lo anteriormente mencionado el municipio estableció que se requieren intervenciones y obras especificas tales como placa huellas y alcantarillas que permitan el mejoramiento de tramos de vías terciarias.
LA PLAYA DE BELÉN	LLANO GRANDE – SAN PEDRO ESPERANZA – ESPERANCITA - CLAVELLINOS	En los últimos años, las inclemencias del clima y el paso del tiempo han causado daños en la malla vial terciaria del municipio, afectando con ello el tránsito por las diferentes carreteras que unen las veredas de nuestro municipio con el casco urbano y/o con la vía nacional, dificultando sobre todo en tiempos de lluvias el tránsito vehicular por estas vías y afectándose consecuentemente a las diferentes familias que a lo largo de nuestro territorio rural residen y que requieren de esta red vial para diferentes fines como por ejemplo sacar sus productos con el fin de comercializarlos, desplazarse a adquirir bienes y/o servicios a nuestro casco urbano o a los demás municipios del departamento. Es por ello que para mejorar el transito seguro y más cómodo por estas vías terciarias, se suscribió en el año 2021 el convenio No 1863 con el Instituto Nacional de Vías – INVIAS
PAMPLONITA	VÍA TERCIARIA VEREDA BATAGA	En los últimos años, las inclemencias del clima y el paso del tiempo han causado daños en la malla vial terciaria del municipio, afectando con ello la transitabilidad por las diferentes carreteras que unen las veredas de nuestro municipio con el casco urbano y/o con la vía nacional, dificultando sobre todo en tiempos de lluvias el tránsito vehicular por estas vías y

MUNICIPIO	CORREDOR VIAL	CARACTERÍSTICAS
		afectándose consecuentemente a las diferentes familias que a lo largo de nuestro territorio rural residen y que requieren de esta red vial para diferentes fines como por ejemplo sacar sus productos con el fin de comercializarlos, desplazarse a adquirir bienes y/o servicios a nuestro casco urbano o a los demás municipios del departamento, etc. Es por ello que para mejorar le transito seguro y más cómodo por estas vías terciarias, se suscribió en el año 2021 el convenio No 1878 con el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, convenio con el cual se busca intervenir de manera puntual la vía terciaria ubicada en la VEREDA BATAGA EN UNA LONGITUD APROXIMADA DE 6.4 Km específicamente en los sectores BATAGA – LA VIRGEN iniciando del PR 0 + 000 al PR 3 + 300 y BATAGA – CUENCA iniciando del PR 0 + 000 al PR 3 + 100
OCAÑA 1814	CORREDOR VIAL PRINCIPAL DEL CORREGIMIENTO DE BUENAVISTA	Actualmente se presenta dificultad en la movilidad y bajo nivel de servicio en la vía rural que comunica todo el corregimiento de Buenavista, debido a un alto deterioro de la superficie de rodadura, deficiente drenaje superficial, con una superficie desgastada por la escorrentía de las aguas lluvias y el paso de vehículos pesados. Con el presente proyecto se pretende mejorar las vías rurales del municipio de Ocaña corregimiento de Buenavista, en una longitud de 1890 ml de placa huella, construcción de 10 Alcantarillas de 36” y 2 Muros de contención.
GOBERNACIÓN 1943	VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIO DE ARBOLEDAS, GRAMALOTE Y LOS PATIOS	Con el presente proyecto se pretende mejorar las vías rurales en los municipios de Arboledas, Gramalote y Los Patios del Departamento Norte de Santander, distribuidos de la siguiente manera: Municipio de Arboledas en una longitud de 6.970 metros lineales de placa huella, comprendidos en 8 tramos ubicados en las veredas Santo Domingo- Volcán – Potreros- Chicagua Bajo- La Rinconada- Cinera- El Helechar - Juan

MUNICIPIO	CORREDOR VIAL	CARACTERÍSTICAS
		Bueno, 51 Und de alcantarillas de 7 ml de diámetro 36", Municipio de Gramalote en una longitud de 4.543 metros lineales de placa huella, comprendidos en 3 tramos ubicados en la vereda Boyacá – San Isidro – Santa Anita, 18 Und de alcantarillas de 7 ml de diámetro 36" y Municipio de Los Patios en una longitud de 4.500 metros lineales de placa huella, comprendidos en 5 tramos ubicados en la vereda Corozal -California, 15 Und de alcantarillas de 7 ml de diámetro 36" y 50 m3 de muro en gaviones.
GOBERNACIÓN 2052	VÍA TERCERÍA EN LA ZONA SUR QUE CONECTA LAS VEREDAS DE LA GARITA- LA MUTIS	Actualmente esta vía tercería en la zona sur que conecta las veredas de La Garita- La Mutis cuenta con tramos en placa huella y afirmado, durante el recorrido se evidencian algunos problemas como la falta de intervención para el mejoramiento, mantenimiento y condiciones de drenaje inadecuadas, existen cambio del ancho de la vía, erosión en algunos costados generados por mal manejo de agua. Con el presente proyecto se pretende mejorar las vías rurales del municipio de la Mutis, en las veredas La Garita – La Mutis, en una longitud de 6180 ml de placa huella, construcción de 25 Alcantarillas de 36" y 2 Muros de contención.
GOBERNACIÓN 2033	LOS MANGOS LA CARRER. VÍA CHINÁVEGA. PASO DE LOS RÍOS - RICAURTE, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA LAS DELICIAS-EL MAMÓN LA GARZA-ZUMBADOR HERRÁN-SIBERIA LOURDES-CAMPORICO MUTISCUA - MINAS DE CAL - LA ARAÑITA - LA MESETA	Debido a las olas invernales presentadas en los últimos años, las vías han presentado un gran deterioro. Estas afectaciones sumado a diseños inadecuados, desatención a sitios críticos (bancas deterioradas e inestabilidad de los taludes) poca presencia de obras de arte, deterioro de la capa de rodadura y poca inversión han dificultado la intercomunicación terrestre de la población rural y urbana aislando sitios de producción y comercialización de las diferentes regiones del departamento, provocando grandes pérdidas en las cosechas, poco desarrollo social, bajo desarrollo productivo, incremento en los valores de productos, aumento en los tiempos

MUNICIPIO	CORREDOR VIAL	CARACTERÍSTICAS
	VÍA LA UNIÓN VÍA PÁRAMO - PICA PUENTE ISABEL CELIS HASTA EL DAVE SAN ANTONIO- LA QUINTA- ALTO DE SAN ANTONIO ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADUAS-TABIRO-PUENTE ZULIA LA LAJA - CUPERENA - CACAHUALA - ALTO FRIO LOS RINCÓN - LA COPITA VÍA EL MOLINO PUERTO RICO CORREDOR VIAL LA PARADA- JUAN FRIO	de viaje, aumento en los costos de transporte, poco acceso a los servicios sociales y deserción escolar., poco acceso a los servicios sociales y deserción escolar. Por estas razones es prioritario mejorar las condiciones de circulación vehicular a fin de asegurar el acceso a los servicios sociales, reducir tiempos de viaje, costos de transporte, reducir número de accidentes, reducir costos de mercancía y mejorar el comercio y las comunicaciones en general. Es por esto que se da la necesidad de intervenir los corredores viales objeto del contrato interadministrativo No. 4164-2022. Con una longitud total de 8.663 ml de Placa Huella y 59 Alcantarillas.

Tabla 4 Características Técnicas del proyecto por Municipio en Ejecución

3. INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA

El contrato se encuentra distribuido en 11 convenios interadministrativos con el INVIAS, de los cuales se realizará mejoramiento y mantenimiento de corredores viales en 29 Municipios del Departamento de Norte de Santander, a la fecha ya se encuentran adjudicados la totalidad de los convenios, derivados en 11 contratos de obra, en la siguiente tabla se presenta el detalle del proceso de adjudicación de los convenios y su estado actual.

Municipio	Estado contrato de obra	No. Convenio y No. Contrato de obra	Contratista
Abrego	Adjudicado En liquidación	1791-2021 Contrato de Obra No. 252 de 2022	CONSORCIO AD VÍAS
La Playa de Belén	Adjudicado Liquidado	1863-2021 Contrato de Obra No. LP-004 de 2022	CONSORCIO LA PLAYA 2022
Ocaña	Adjudicado Liquidado	1758-2021 Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.3879052	CONSORCIO OK 2022
Ocaña	Adjudicado Liquidado	1814-2021 Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.4352407	UNIÓN TEMPORAL OCAÑA GBE 2022
Cáchira	Adjudicado Liquidado	1859-2021 Contrato de Obra No.160 De 2022	CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA
Herrán	Adjudicado Liquidado	1861-2021 Contrato de Obra No.146 De 2022	UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLAS HERRÁN 2022
Pamplonita	Adjudicado Liquidado	1878-2021 Contrato de Obra No. 202 de 2022	UNIÓN TEMPORAL COLOMBIA
Santiago	Adjudicado Liquidado	1821-2021 Contrato de Obra No. LP-OP-001-2022	UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLAS SANTIAGO 2022
Gobernación-1943	Adjudicado En Ejecución	1943-2021 Contrato de Obra No. 02590 DE 2022	UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590
Gobernación-2033	Adjudicado Liquidado	2033-2021 Contrato de Obra Interadministrativo No. 4164 DE 2022	EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO DEL NIVEL DEPARTAMENTAL FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
Gobernación-2052	Adjudicado En liquidación	2052-2021 Contrato de Obra No. 02332 DE 2022	UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022

Tabla 5 Información del estado de los Contratos de Obra

3.1. CONTRATO DE OBRA LP-OP-001- 2022 – MUNICIPIO DE SANTIAGO

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	LP-OP-001- 2022
Objeto:	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VÍA RURAL CUPERENA - ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER.
Contratista:	UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLAS SANTIAGO 2022
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	29 de julio de 2022
Valor Inicial:	$ 4.430.879.655,00 M/CTE
Fecha de inicio:	18 de octubre de 2022
Fecha de terminación inicial:	17 de junio de 2023
Fecha de Suspensión:	15 de marzo de 2023
Fecha de Reinicio:	30 de marzo de 2023
Fecha Terminación Prorroga 1:	6 meses hasta el 31 de diciembre de 2023
Fecha Terminación Prorroga 2:	4 meses hasta el 30 de abril de 2024
Fecha Terminación Prorroga 3:	1.5 meses hasta el 15 de junio de 2024
Fecha de terminación Final:	15 de junio de 2024

Tabla 6 Condiciones del contrato – Municipio de Santiago

3.1.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas

El día 10 de diciembre de 2024 se firma acta de liquidación del contrato de obra.

3.1.1.1. Actividades Administrativas

Dentro de las actividades administrativas el Contratista ha realizado la entrega de la totalidad de los documentos de pre construcción, a la fecha el contratista tiene todos los documentos aprobados por parte de la Interventoría.

A continuación, se presenta el estado de los documentos de pre construcción presentados por el Contratista.

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o Observaciones
Plan de Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-110-22 del 20-Dic-22
Protocolo de Bioseguridad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-168-22 del 06-Ene-23
Hojas de Vida	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-043-22 del 17-Nov-22
Programa de Obra	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1010-24 del 10-May-24
Flujo de Caja	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1010-24 del 10-May-24
Programa de Generación de Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-066-22 del 28-Nov-22
Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-701-22 del 20-Jun-23
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-073-22 del 29-Nov-22
Instalaciones Provisionales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-066-22 del 28-Nov-22
Plan de Manejo de Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-218-22 del 24-Ene-23
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1172-22- 11-Oct-23
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-226-22 del 30-Ene-23
Fuente de Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-645-22 del 09-May-23
Certificado de Disponibilidad de Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-231-22 del 30-Ene-23
Diseño de Mezcla	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-347-22 del 08-Mar-23
Caracterización Material Granular	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-313-22 del 27-Feb-23
Plan De Gerencia	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-191-22 del 18-Ene-23

Tabla 7 Estado Documentos pre construcción Municipio de Santiago









3.1.1.2. Actividades Técnicas

El presente contrato de obra se encuentra liquidado.

A continuación, se presenta el resumen de las cantidades ejecutadas en el proyecto.

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA					
1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	2436,42	$ 81.316,00	$ 198.119.929,00
2	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	2140,56	$ 729.305,00	$ 1.561.121.111,00
3	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	136013,88	$ 8.217,83	$ 1.117.738.943,00
4	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	2071,85	$ 163.747,00	$ 339.259.222,00
5	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPa (G) - CICLÓPEO	m3	723,77	$ 380.604,00	$ 275.469.757,00
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS					
6	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	716,3	$ 81.316,00	$ 58.246.651,00
7	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	103,35	$ 729.305,00	$ 75.373.672,00
8	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPa (F)	m3	20,55	$ 518.332,00	$ 10.651.723,00
9	Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	261,44	$ 35.105,00	$ 9.177.851,00
10	TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 600 mm DE DIÁMETRO INTERIOR	m	85	$ 818.747,00	$ 69.593.495,00
11	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	8680,05	$ 8.217,83	$ 71.331.175,00
TRANSPORTES					
12	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	0	$ 1.927,00	$ -
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD					
13	SEÑAL SI-04 (Poste de referencia)	unid	6	$ 613.816,50	$ 3.682.899,00
ÍTEMS NO PREVISTOS					
NP01	TRANSPORTES INTERNOS DE MATERIALES PÉTREOS	m3	6990,78	$ 69.400,00	$ 485.160.132,00
NP02	TRANSPORTES INTERNOS DE MATERIALES DE PESO	Kg	151928,61	$ 648,00	$ 98.449.739,00
VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA					**$ 4.373.376.298,00**
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS					$ -
COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS					$ 44.118.966,00
IVA A ESTUDIOS Y DISEÑOS (19%)					$ 8.382.604,00
VALOR TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS					$ 52.501.570,00
PROVISIÓN IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD (INCLUYE IVA)					$ -
AJUSTE					$ 1.786,00

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
VALOR TOTAL PROYECTO					$ 4.425.879.654,00

3.1.1.3. Actividades ambientales

El día 10 de diciembre de 2024 se firma acta de liquidación del contrato de obra.

3.1.1.4. Actividades sociales

El día 10 de diciembre de 2024 se firma acta de liquidación del contrato de obra.

3.1.1.5. Actividades SST

El día 10 de diciembre de 2024 se firma acta de liquidación del contrato de obra.

3.1.1.6. Etapa de Actualización Estudios y Diseños

A la fecha el Contratista cuenta con aprobación de la totalidad de los Estudios y Diseños.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
Informe de suelos y Geotecnia	- GIC-INVIAS-NTS-388-22 del 17-Mar-23 - **APROBADO**
TOPOGRAFÍA	- GIC-INVIAS-NTS-223-22 del 26-Ene-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES**
DISEÑO GEOMÉTRICO DE PLACA HUELLAS	- GIC-INVIAS-NTS-391-22 del 21-Mar-23 - **APROBADO**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	- GIC-INVIAS-NTS-388-22 del 17-Mar-23 - GIC-INVIAS-NTS-1001-22 del 05-Sept-23 - **RESPUESTA A CONTRATISTA DE LA SUBBASE**

Informe estructural	- GIC-INVIAS-NTS-1212-22 del 20-Oct-23 - **APROBACIÓN VALIDACIÓN CUANTÍA DE ACEROS**
Informe hidráulico	- GIC-INVIAS-NTS-410-22 del 28-Mar-23 - **APROBADO**

Etapa de Construcción
En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.

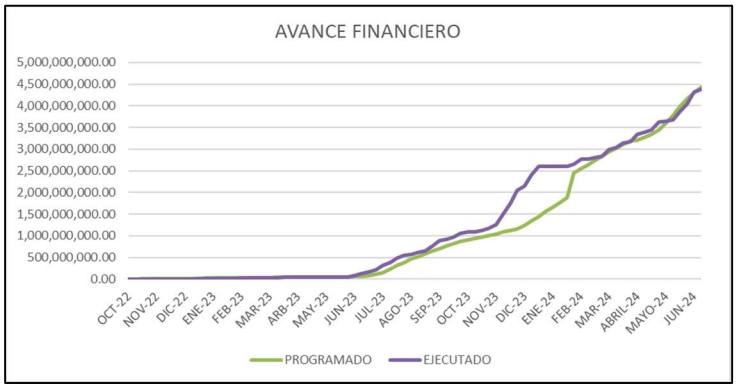


Gráfico 1 Avance Financiero Municipio de Santiago

3.2. CONTRATO DE OBRA 146 DE 2022 – MUNICIPIO DE HERRÁN

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	146 de 2022
Objeto:	MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HERRÁN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL.
Contratista:	UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLAS HERRÁN 2022
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	27 de septiembre de 2022
Valor Inicial:	$ 1.781.999.648,00 M/CTE

CONDICIONES INICIALES	
Fecha de inicio:	19 de octubre de 2022
Fecha de Suspensión:	10 de marzo de 2023
Fecha de Reinicio:	10 de junio de 2023
Fecha Terminación Prorroga 1:	4 meses hasta el 30 de abril de 2023
Fecha Terminación Prorroga 2:	5 meses hasta el 30 de diciembre de 2023
Fecha de Terminación Inicial:	31 de diciembre de 2022
Fecha de terminación Final:	30 de diciembre de 2023

Tabla 10 Condiciones del contrato - Municipio de Herrán

3.2.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas

El presente contrato de obra firmo acta de liquidación el 15 de diciembre de 2024.


3.2.1.1. Actividades Administrativas

Dentro de las actividades administrativas el contratista hace entrega de los documentos de pre construcción.

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o Observaciones
Plan de Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-111-22 del 20-Dic-22
Protocolo de Bioseguridad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-199-22 del 23-Ene-23
Hojas de Vida	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-324-22 del 06-Mar-22
Programa de Obra	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1426-22 del 28-Nov-23
Flujo de Caja	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1426-22 del 28-Nov-23
Programa de Generación de Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-067-22 del 28-Nov-22
Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-648-22 del 09-Jun-23
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-075-22 del 30-Nov-22
Instalaciones Provisionales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-067-22 del 28-Nov-22
Plan de Manejo de Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-234-22 del 31-Ene-23
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1187-22 del 13-Oct-23
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-230-22 del 30-Ene-23
Fuente de Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-717-22 del 26-Jun-23

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o Observaciones
Certificado de Disponibilidad de Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-300-22 del 23-Feb-23
Diseño de Mezcla	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-216-22 del 24-Ene-23
Caracterización Material Granular	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-315-22 del 27-Feb-23

Tabla 11 Estado Documentos pre construcción Municipio de Herrán
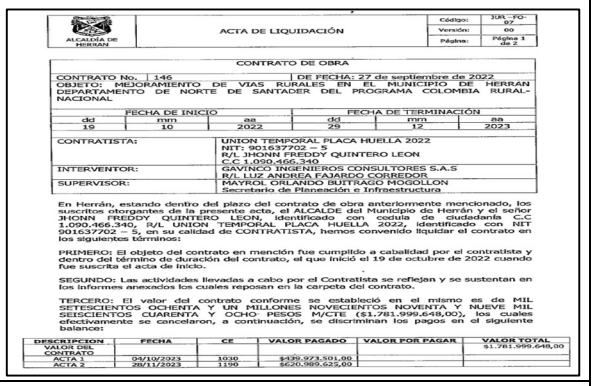
<table>
<tr>
<td>
</td>
<td>
ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE OBRA
CONTRATO No. 146 | DE FECHA: 27 de septiembre de 2022
OBJETO: MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HERRAN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTADER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL- NACIONAL
FECHA DE INICIO: dd 19 | mm 10 | aa 2022 — FECHA DE TERMINACIÓN: dd 29 | mm 12 | aa 2023
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PLACA HUELLA 2022 NIT: 901637702 – 5 R/L JHONN FREDDY QUINTERO LEON C.C 1.090.466.340
INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S R/L LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR
SUPERVISOR: MAYROL ORLANDO BUITRAGO MOGOLLON Secretario de Planeación e Infraestructura
En Herrán, estando dentro del plazo del contrato de obra anteriormente mencionado, los suscritos otorgantes de la presente acta, el ALCALDE del Municipio de Herrán y el señor JHONN FREDDY QUINTERO LEON, identificado con cedula de ciudadanía C.C 1.090.466.340, R/L UNION TEMPORAL PLACA HUELLA 2022, identificado con NIT 901637702 – 5, en su calidad de CONTRATISTA, hemos convenido liquidar el contrato en los siguientes términos:
PRIMERO: El objeto del contrato en mención fue cumplido a cabalidad por el contratista y dentro del término de duración del contrato, el que inició el 19 de octubre de 2022 cuando fue suscrita el acta de inicio.
SEGUNDO: Las actividades llevadas a cabo por el Contratista se reflejan y se sustentan en los informes anexocios los cuales reposan en la carpeta del contrato.
TERCERO: El valor del contrato conforme se estableció en el mismo es de MIL SETESCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($1.781.999.648,00), los cuales efectivamente se cancelaron, a continuación, se discriminan los pagos en el siguiente balance:
DESCRIPCION | FECHA | CE | VALOR PAGADO | VALOR POR PAGAR | VALOR TOTAL
VALOR DEL CONTRATO — $1.781.999.648,00
ACTA 1 — 04/10/2023 — 1030 — $439.973.501,00
ACTA 2 — 28/11/2023 — 1190 — $620.989.625,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Proyecto finalizado</td>
<td>Acta de liquidación</td>
</tr>
</table>

Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

A continuación, se presenta el resumen de las cantidades ejecutadas.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PLACA HUELLA					
1	Excavaciones varias sin clasificar	m3	2025,74	$ 42.047,00	$ 85.176.290,00
2	Concreto resistencia 21 Mpa (d) - mezcla in	m3	751,29	$ 857.957,00	$ 644.574.515,00
3	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	kg	50800,94	$ 7.255,89	$ 368.606.033,00
4	Subbase granular clase c SBG-50	m3	918,01	$ 274.215,00	$ 251.732.112,00
5	Concreto ciclópea resistencia 14 Mpa (g)	m3	273,84	$ 494.679,00	$ 135.462.897,00
ESTRUCTURA HIDRÁULICA DE DRENAJE					
6	Excavaciones manuales sin clasificar	m3	238,14	$ 42.047,00	$ 10.013.073,00

7	Concreta resistencia 21 Mpa (d) - mezcla in situ	m3	31,36	$ 857.957,00	$ 26.905.532,00
8	Concreto liviano resistencia 14 Mpa (f) - mezcla in situ	m3	12,4	$ 650.737,00	$ 8.069.139,00
9	Relleno para estructuras con material de excavación	m3	87,57	$ 33.094,00	$ 2.898.042,00
10	Tubería de concreto reforzado, clase ii de 900mm de Diámetro interior	und	24	$ 812.424,00	$ 19.498.176,00
11	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	kg	2314,68	$ 7.255,89	$ 16.795.063,00
TRANSPORTES					
12	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	m3/km	10089,5	$ 2.249,00	$ 22.691.286,00
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD					
13	Señal vertical de tránsito tipo si-04 (postes de referencia), reflectivo tipo IX (1,25m x 0,45m	und	9	$ 611.676,00	$ 5.505.084,00
ÍTEMS NO PREVISTOS					
NP01	Transportes internos de materiales pétreos	m3	2912,6	$ 39.871,64	$ 116.130.139,00
NP02	Transportes internos de materiales de peso	kg	55771,4	$ 445,65	$ 24.854.524,00
VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA					**$ 1.738.911.905,00**
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS (B					**$ -**
VALOR TOTAL BÁSICO (A)+(B) = (C					**$ 1.738.911.905,00**
COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS (D)					**$ 17.389.174,00**
VALOR IVA (19%) AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS					**$ 3.303.943,00**
PROVISIÓN IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD (INCLUYE IVA) (F)					**$ -**
AJUSTE AL PESO					**$ -**
VALOR TOTAL (C+D+E+F) AIU 30% (A 20%, U 5%, I 5%)					**$ 1.759.605.022,00**

Tabla 12 Cantidades Ejecutadas Municipio de Herrán

3.2.1.2. Actividades ambientales

Se firmó acta de liquidación el 15 de diciembre de 2024.

3.2.1.3. Actividades Sociales

Se firmó acta de liquidación el 15 de diciembre de 2024.

3.2.1.4. Actividades SST

Se firmó acta de liquidación el 15 de diciembre de 2024.

3.2.1.5. Etapa de Actualización Estudios y Diseños

El Contratista ya tiene aprobados la totalidad de los Estudios y Diseños.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental del estado al finalizar el contrato de obra de los componentes a Estudios y Diseños que se encuentran observados y/o aprobados por la Interventoría.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
Informe de suelos y Geotecnia	- GIC-INVIAS-NTS-328-22 del 06-Mar-23 - APROBADO
TOPOGRAFÍA	- GIC-INVIAS-NTS-229-22 del 30-Ene-23 - APROBADO CON OBSERVACIONES - GIC-INVIAS-NTS-1396-24 del 10-Oct-2024 - APROBADO
DISEÑO GEOMÉTRICO DE PLACA HUELLAS	- GIC-INVIAS-NTS-310-22 del 24-Feb-23 - APROBADO CON OBSERVACIONES - GIC-INVIAS-NTS-1396-24 del 10-Oct-2024 - APROBADO
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	- GIC-INVIAS-NTS-328-22 del 06-Mar-23 - APROBADO
Informe estructural	- GIC-INVIAS-NTS-224-22 del 26-Ene-23 - APROBADO
Informe hidráulico	- GIC-INVIAS-NTS-322-22 del 03-Mar-23 - APROBADO

Tabla 13 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de Herrán

3.2.1.6. Etapa de Construcción

El contratista dio por terminada la ejecución del 100% del proyecto.

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.

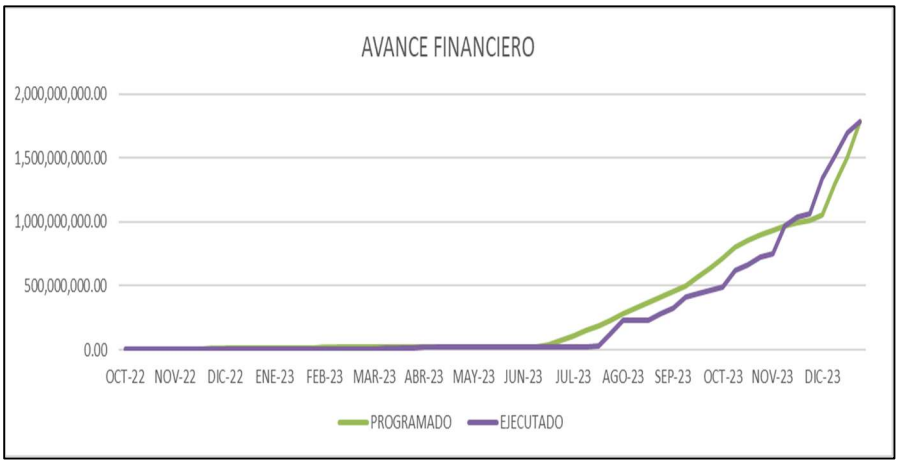


Gráfico 2 Avance Financiero Municipio de Herrán

Se firmó acta de liquidación el 15 de diciembre de 2024

3.3. CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.3879052 – MUNICIPIO DE OCAÑA-1758

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	CO1.PCCNTR.3879052
Objeto:	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRISON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
Contratista:	CONTRATISTA OK 2022
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	10 de agosto del 2022
Valor Inicial:	$ 1.711.146.620,00 M/CTE
Fecha de inicio:	01 de noviembre de 2022
Fecha de terminación inicial:	30 de abril de 2023
Fecha finalización Prorroga 1:	2 meses hasta el 30 de junio de 2023

CONDICIONES INICIALES	
Fecha finalización Prorroga 2:	1 mes hasta el 30 de julio de 2023
Fecha Nueva de terminación:	30 de julio de 2023

Tabla 14 Condiciones del contrato - Municipio de Ocaña-1758

3.3.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas

Se firmo acta de liquidación el 06 de septiembre de 2024.

3.3.1.1. Actividades Administrativas

A continuación, se describe la trazabilidad administrativa de documentación.

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o Observaciones
Plan de Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-179-22 del 16-Ene-23
Protocolo de Bioseguridad	Aprobado con observaciones	GIC-INVIAS-NTS-165-22 del 06-Ene-23
Hojas de Vida	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-056-22 del 24-Nov-22
Programa de Obra	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-538-22 12-May-2023
Flujo de Caja	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-098-22 del 16-Dic-22
Programa de Generación de Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-121-22 del 22-Dic-22
Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-497-22 del 05-May-23
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-058-22 del 24-Nov-22
Instalaciones Provisionales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-178-22 del 13-Ene-23
Plan de Manejo de Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-057-22 del 24-Nov-22
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado con Observaciones	GIC-INVIAS-NTS-1219-22 del 23-Oct-2023
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-252A-22 del 06-Feb-23
Fuente de Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-403-22 del 27-Mar-23
Certificado de Disponibilidad de Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-112-22 del 20-Dic-22
Diseño de Mezcla	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-397-22 del 24-Mar-22
Caracterización Material Granular	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-385-22 del 17-Mar-22

Tabla 15 Estado Documentos pre construcción Municipio de Ocaña-1758

Actividades Técnicas

A continuación, se presenta el resumen de las cantidades ejecutadas a la fecha de terminación del contrato de obra.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PLACA HUELLA					
1	Excavaciones varias sin clasificar	m3	645,44	$ 40.896,00	$ 26.395.914,24
2	Concreto resistencia 21 Mpa (d)	m3	301,21	$ 697.659,00	$ 210.141.867,39
3	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	kg	13986,12	$ 7.674,00	$ 107.329.484,88
4	Subbase granular clase C	m3	390	$ 180.365,00	$ 70.342.350,00
5	Concreto ciclópea resistencia 14 Mpa (G)	m3	131,22	$ 377.182,00	$ 49.493.822,04
6	Sello de Juntas	ml	4536	$ 14.021,00	$ 63.599.256,00
ESTRUCTURA HIDRÁULICA DE DRENAJE					
7	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	31,22	$ 40.896,00	$ 1.276.773,12
8	Concreto Resistencia 21 MPa (D)	m3	6,52	$ 697.659,00	$ 4.548.736,68
9	Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	15,4	$ 33.692,00	$ 518.856,80
10	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	m	5	$ 780.444,00	$ 3.902.220,00
11	Concreto liviano resistencia 14 Mpa (f)	m3	0,95	$ 502.830,00	$ 477.688,50
12	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	kg	852,13	$ 7.674,00	$ 6.539.245,62
PARCHEO Y/O BACHEO					
19	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	5794,05	$ 1.711,00	$ 9.913.619,55
20	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 (Incluye transporte)	m3	560,83	$ 680.033,00	$ 381.382.907,39
21	Fresado de pavimento asfaltico	m2	0	$ 178.747,00	$ -
22	Excavación para Reparación de Pavimento Asfáltico existente Incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas subyacentes	m3	3194,35	$ 101.820,00	$ 325.248.717,00
23	SUB-BASE GRANULAR CLASE A SBG-50	m3	869,12	$ 156.888,00	$ 136.354.498,56
24	BASE GRANULAR CLASE A GRADACIÓN FINA	m3	869,72	$ 173.590,00	$ 150.974.694,80
25	Demolición de estructuras	m3	0	$ 113.357,00	$ -
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD					

26	Poste de referencia	und	0	$ 356.982,00	$ -
ÍTEMS NO PREVISTOS					
27	Terraplén	m3	1063,41	$ 106.535,00	$ 113.290.384,35
VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA					**$ 1.661.731.037,00**
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS (B					**$ -**
VALOR TOTAL BÁSICO (A)+(B) = (C					**$ 1.661.731.037,00**
COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS (D)					**$ 10.436.640,00**
VALOR IVA (19%) AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS					**$ 1.982.962,00**
PROVISIÓN Y IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD (INCLUYE IVA) (F)					**$ 2.572.834,00**
AJUSTE AL PESO					**$ -**
VALOR TOTAL (C+D+E+F) AIU 30% (A 20%, U 5%, I 5%)					**$ 1.676.723.473,00**

Tabla 16 Cantidades Ejecutadas Municipio de Ocaña - 1758

3.3.1.2. Actividades ambientales

Se firmó acta de liquidación el 06 de septiembre de 2024.

3.3.1.3. Actividades Sociales

Se firmó acta de liquidación el 06 de septiembre de 2024.

3.3.1.4. Actividades SST

Se firmó acta de liquidación el 06 de septiembre de 2024.

3.3.2.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños

A la fecha el Contratista ya tiene aprobados la totalidad de los Estudios y Diseños.
En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental entregados y aprobados por la Interventoría.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	- GIC-INVIAS-NTS-346-22 del 08-Mar-2023 - **APROBACIÓN JUAN 23-PAV FLEX** - GIC-INVIAS-NTS-451-22 del 17-Abr-2023 - **APROBACIÓN PH**
TOPOGRAFÍA	- Hace entrega con el comunicado OK-169-2022 del 14-Jun-2024 (PLANOS RÉCORD) - Hace entrega con el comunicado OK-174-2022 del 16-Jul-2024 (PLANOS RÉCORD) - GIC-INVIAS-NTS-1152-24 del 16-Ago-2024 - **APROBACIÓN DE PLANOS RÉCORD**
DISEÑO GEOMÉTRICO DE PLACA HUELLAS	- GIC-INVIAS-NTS-539-22 del 12-May-2023
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	- GIC-INVIAS-NTS-346-22 del 08-Mar-2023 - APROBACIÓN JUAN 23-PAV FLEX - GIC-INVIAS-NTS-451-22 del 17-Abr-2023 - APROBACIÓN PH
INFORME HIDRÁULICO	- GIC-INVIAS-NTS-274-22 del 17-Feb-23 - APROBADO (D. Alcantarilla) - GIC-INVIAS-NTS-455-22 del 18-Abr-23 – APROBADO OBSERVACIONES PH - GIC-INVIAS-NTS-746-22 del 30-Jun-23 – **OBSERVACIONES** - Hace entrega con el comunicado OK-108-2022 del 05-Jul-23 – Cuneta - GIC-INVIAS-NTS-771-22 del 10-Jul-23 – **OBSERVACIONES** - Se mantiene al contratista que se mantiene las observaciones de la cuneta Samaritana.

Etapa de Construcción.

Se firmó acta de liquidación el 06 de septiembre de 2024

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.

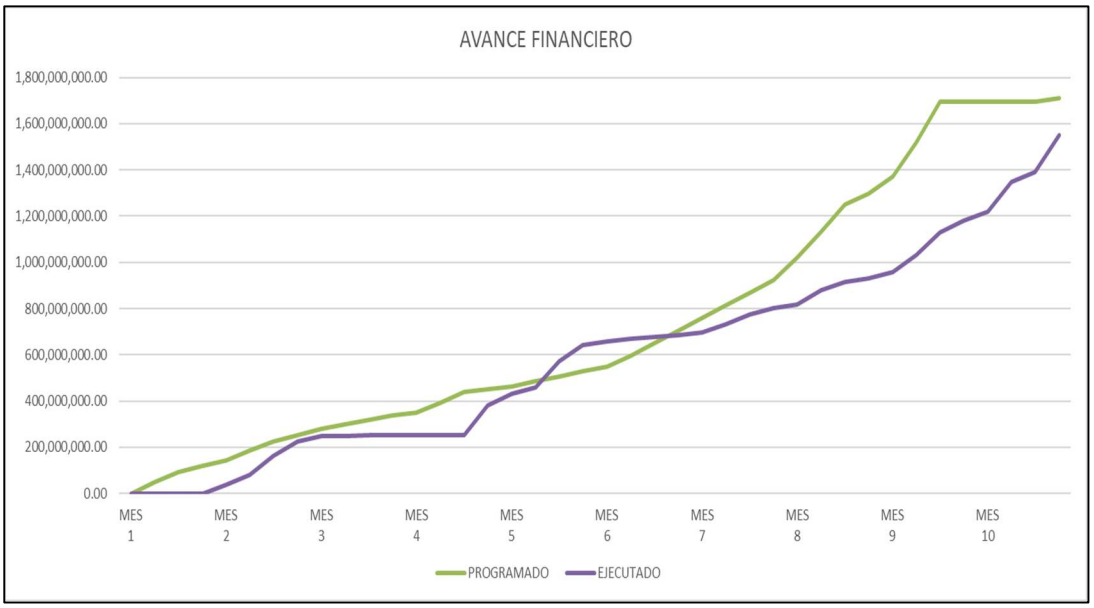


Gráfico 3 Avance Financiero Municipio de Ocaña-1758

Se ejecuto el 100% de las actividades contractuales.

3.4. CONTRATO DE OBRA 160 DE 2022 – MUNICIPIO DE CÁCHIRA

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	160 DE 2022
Objeto:	MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VÍAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER
Contratista:	CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	04 de octubre de 2022
Valor Inicial:	$ 2.658.435.877,00 M/CTE
Fecha de inicio:	16 de noviembre de 2022
Fecha de terminación inicial:	15 de marzo de 2023
Fecha de Suspensión 1:	10 de marzo de 2023
Fecha de Reinicio:	05 de julio de 2023
Fecha de terminación Prorroga 1:	4 meses hasta el 10 de noviembre de 2023
Fecha de terminación Prorroga 2:	1.70 meses hasta el 31 de diciembre de 2023
Fecha de terminación Prorroga 3:	3 meses hasta el 31 de marzo de 2024
Fecha de terminación Prorroga 4:	3 meses hasta el 30 de junio de 2024
Fecha de terminación Prorroga 5:	1 meses hasta el 30 de julio de 2024
Fecha Suspensión 2:	30 de julio de 2024
Fecha de terminación Final:	30 de julio de 2024

Tabla 17 Condiciones del contrato - Municipio de Cáchira

3.4.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas

A la fecha de corte del presente informe, el contrato de obra su tiempo contractual finalizo.

A continuación, se describen las actividades realizadas durante este periodo.

3.4.1.1. Actividades Administrativas

Dentro de las actividades administrativas el contratista hace entrega de los documentos de pre construcción, a continuación, se presenta el estado de los documentos presentados por el Contratista a corte del 30 de noviembre de 2024.

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o Observaciones
Plan de Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-152-22 del 28-Dic-22
Protocolo de Bioseguridad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-201-22 del 23-Ene-23
Hojas de Vida	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-150-22 del 28-Dic-22
Programa de Obra	Entregado	Entregado documento con oficio MATI-CACHI-067 del 10/01/24
Flujo de Caja	Entregado	Entregado documento con oficio MATI-CACHI-067 del 10/01/24
Programa de Generación de Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-304-22 del 23-Feb-23
Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-856-22 del 03-Ago-23
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	Entrega documento con oficio MATI-CACHI-083-24 del 21-Jun-24 – (Balance)
Instalaciones Provisionales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-312-22 del 24-Feb-23
Plan de Manejo de Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-291-22 del 21-Feb-23
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-581-24 del 15-Abr-24
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-227-22 del 30-Ene-23
Fuente de Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-823-22 del 25-Jul-23
Certificado de Disponibilidad de Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-302-22 del 23-Feb-23
Diseño de Mezcla	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-349-22 del 08-Mar-22
Caracterización Material Granular	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-349-22 del 08-Mar-22

Tabla 18 Estado Documentos pre construcción Municipio de Cáchira

3.4.1.2. Actividades Técnicas

El presente contrato de obra finalizo su tiempo contractual.

A continuación, se presenta el resumen de las cantidades ejecutadas a la fecha.

MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VÍAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER							
No.	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	GRAL.	PART					
CORREDOR 1: CACAOS - EL LUCERO - ALTO DE LA PAZ							
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA							
1	600.1.2.1		Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	$ 50.374,00	45,01	$ 2.267.334,00
2	630.4.1		Concreto Resistencia 21 MPa (D)	m3	$ 813.055,00	35,42	$ 28.798.408,00
3	640		Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	$ 8.166,00	2398,86	$ 19.589.091,00
4	320.3.2		Sub - Base Granular clase C	m3	$ 236.999,00	40,5	$ 9.598.460,00
5	630.7		Concreto Resistencia 14 MPa (G) (Ciclópeo)	m3	$ 455.564,00	10,96	$ 4.992.981,00
6	410.1	410.1P	Sello de Juntas	m	$ 14.837,00		$ -
SUB TOTAL							$ 65.246.274,00
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS (7 UND)							
7	600.1.2.1		Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	$ 50.374,00	175,170	$ 8.824.014,00
8	630.4.1		Concreto Resistencia 21 MPa (D)	m3	$ 813.055,00	33,060	$ 26.882.851,00
9		610.1P	Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	$ 35.653,00	69,550	$ 2.479.666,00
10	-		Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm	m	$ 872.886,00	24,000	$ 20.949.264,00
11	630.4		Concreto Resistencia 14 MPa (F)	m3	$ 602.283,00	2,460	$ 1.478.605,00
12	640		Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	m	$ 8.166,00	2297,280	$ 18.759.588,00
SUB TOTAL							$ 79.373.988,00
CORREDOR 2: LA CARRERA - EL CARBÓN							
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA							
1	600.1.2.1		Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	$ 50.374,00	214,87	$ 10.823.861,00
2	630.4.1		Concreto Resistencia 21 MPa (D)	m3	$ 953.275,00	201,31	$191.903.790,00
3	640		Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	$ 8.209,00	12822,39	$105.259.000,00
4	320.3.2		Sub - Base Granular clase C	m3	$ 347.000,00	198,8	$ 68.981.865,00
5	630.7		Concreto Resistencia 14 MPa (G) (Ciclópeo)	m3	$ 455.564,00	33	$ 15.033.612,00
6	410.1	410.1P	Sello de Juntas	m	$ 14.837,00		$ -
SUB TOTAL							$392.002.128,00
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS (2 UND)							
7	600.1.2.1		Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	$ 50.374,00	122,540	$ 6.172.830,00

MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VÍAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER							
No.	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	GRAL.	PART					
8	630.4.1		Concreto Resistencia 21 MPa (D)	m3	$ 953.275,00	14,010	$ 13.357.289,00
9		610.1P	Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	$ 35.653,00	38,240	$ 1.363.371,00
10	-		Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm	m	$ 872.886,00	12,000	$ 10.474.632,00
11	630.4		Concreto Resistencia 14 MPa (F)	m3	$ 602.283,00	1,990	$ 1.200.350,00
12	640		Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	m	$ 8.209,00	1151,880	$ 9.455.783,00
SUB TOTAL							$ 42.024.255,00
CORREDOR 3: EL LLANO - LA CARAMBA							
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA							
1	600.1.2.1		Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	$ 50.374,00	494,18	$ 24.893.622,00
2	630.4.1		Concreto Resistencia 21 MPa (D)	m3	$ 998.507,00	171,95	$ 171.690.034,00
3	640		Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	$ 8.220,00	12014,15	$ 98.756.313,00
4	320.3.2		Sub - Base Granular clase C	m3	$ 382.000,00	446,1	$ 170.410.200,00
5	630.7		Concreto Resistencia 14 MPa (G) (Ciclópeo)	m3	$ 455.564,00	32,55	$ 14.828.608,00
6	410.1	410.1P	Sello de Juntas	m	$ 14.837,00	1142,19	$ 16.946.673,00
SUB TOTAL							$ 497.525.450,00
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS (2 UND)							
7	600.1.2.1		Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	$ 50.374,00	218,960	$ 11.029.891,00
8	630.4.1		Concreto Resistencia 21 MPa (D)	m3	$ 998.507,00	41,330	$ 41.268.294,00
9		610.1P	Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	$ 35.653,00	86,940	$ 3.099.672,00
10	-		Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm	m	$ 872.886,00	30,000	$ 26.186.580,00
11	630.4		Concreto Resistencia 14 MPa (F)	m3	$ 602.283,00	3,160	$ 1.903.214,00
12	640		Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	m	$ 8.220,00	2871,600	$ 23.604.552,00
SUB TOTAL							$ 107.092.203,00
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD							
13	720.8	720.8P	Postes de referencia - Corredor 1	unid	$ 377.759,00	0	$ -
14	720.8	720.8P	Postes de referencia - Corredor 2	unid	$ 377.759,00	6	$ 2.266.554,00
15	720.8	720.8P	Postes de referencia - Corredor 3	unid	$ 377.759,00	2	$ 755.518,00
SUB TOTAL							$ 3.022.072,00
TOTAL, EJECUTADO							
VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA= (A)							$ 1.186.286.370

MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VÍAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER							
No.	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	GRAL.	PART					
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS = (B)							$ 4.677.209,70
VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA= (A) + (B) = (C)							$ 1.190.963.579
COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS (D)							$ 10.667.408,00
VALOR IVA (19%) AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS = (E)							$ 2.026.808,00
VALOR TOTAL= C+D+E AIU = 30% - (A = 20%, I = 5%, U = 5%)							$ 1.203.657.795
PROVISIÓN IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD (INCLUYE IVA)							$ 1.502.967,06
TOTAL, EJECUTADO							$ 1.205.160.763

Tabla 19 Cantidades Ejecutadas Municipio de Cáchira

3.4.1.3. Actividades ambientales

Se firmó acta de liquidación el 27 de diciembre de 2024

3.4.1.4. Actividades Sociales

Se firmó acta de liquidación el 27 de diciembre de 2024

3.4.1.5. Actividades SST

Se firmó acta de liquidación el 27 de diciembre de 2024

3.4.2. Seguimiento Ítems No Previstos

Se firmó acta de liquidación el 27 de diciembre de 2024

3.4.3. Estado de avance del proyecto

Se firmó acta de liquidación el 27 de diciembre de 2024

Etapa de Actualización Estudios y Diseños

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
Informe de suelos e Informe geotécnico	- GIC-INVIAS-NTS-708-22 del 23-Jun-2023 - **APROBADO**
TOPOGRAFÍA	- Entrega documento con MATICCES - CACHI – 045 -2022 del 22-Jun-23 - GIC-INVIAS-NTS-731-22 del 27-Jun-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES**
DISEÑO GEOMÉTRICO DE PLACA HUELLAS	- Entrega documento con MATICCES-CACHI-040-2022 del 16- Jun-23 - GIC-INVIAS-NTS-748-22 del 04-Jul-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	- Entrega documento con Oficio MATI-CACHI-056 Y 58-22 del 03-Ago-23 - GIC-INVIAS-NTS-872-22 del 09-Ago-2023 - **APROBADO**
INFORME ESTRUCTURAL	- Entrega documento con Oficio MATI-CACHI-056 Y 58-22 del 03-Ago-23 - GIC-INVIAS-NTS-872-22 del 09-Ago-2023 - **APROBADO**
INFORME HIDRÁULICO	- GIC-INVIAS-NTS-727-22 del 27-Jun-22 - **APROBADO**

Tabla 20 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de Cáchira

Etapa de Construcción

Se firmó acta de liquidación el 27 de diciembre de 2024

A continuación, se relacionan las cantidades de ejecución de placa huella a la fecha del presente informe.

MUNICIPIO	ALCANCE INICIAL PROYECTO	CORREDOR VIAL	EJECUTADO A LA FECHA	TOTAL, MUNICIPIO	CANTIDAD POR EJECUTAR
CACHIRA	633	CORREDOR 1: CACAOS - EL LUCERO - ALTO DE LA PAZ	54	54	579
	264	CORREDOR 2: LA CARRERA - EL CARBÓN	264	264	0
	566	CORREDOR 3: EL LLANO - LA CARAMBA	224.10	224.10	341.90
TOTAL	1.463		**TOTAL**	542.10	920.90

Tabla 21 Cantidades a la fecha ejecutadas

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.



Gráfico 4 Avance Financiero Municipio de Cáchira

3.5. CONTRATO DE OBRA 252 DE 2022 – MUNICIPIO DE ABREGO

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	252 DE 2022
Objeto:	MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL
Contratista:	CONSORCIO AD VÍAS
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	24 de noviembre de 2022
Valor Inicial:	$ 4.314.324.054,00 M/CTE
Adicción 1:	$ 179.688.569,00 M/CTE
Valor Total:	$ 4.494.012.623,00 M/CTE

CONDICIONES INICIALES	
Fecha de inicio:	16 de enero de 2023
Fecha de terminación inicial:	16 de septiembre de 2023
Fecha de terminación Prorroga 1:	3 meses hasta el 15 de diciembre de 2023
Fecha de terminación Prorroga 2:	5 meses hasta el 29 de junio de 2024
Fecha de terminación Prorroga 3:	3 meses hasta el 11 de noviembre de 2024
Fecha de terminación Prorroga 4:	1.3 meses hasta el 20 de diciembre de 2024
Fecha de terminación Prorroga 5:	Hasta el 31 de diciembre de 2024
Suspensión 1:	14 de diciembre de 2023
Reinicio 1:	29 de enero de 2024
Suspensión 2:	28 de mayo de 2024
Reinicio 2:	11 de julio de 2024
Fecha Nueva de terminación:	31 de diciembre de 2024

Tabla 22 Condiciones para el contrato - Municipio de Abrego

3.5.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas

A la fecha de corte del presente informe, se han realizado las siguientes actividades en el desarrollo del Proyecto.

3.5.1.1. Actividades Administrativas

Dentro de las actividades administrativas el contratista tiene aprobados la totalidad de documentos de pre construcción, a continuación, se presenta el estado de los documentos:

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o Observaciones
Plan de Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-314-22 del 27-Feb-23
Protocolo de Bioseguridad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-244-22 del 12-Feb-23
Hojas de Vida	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-959-22 del 29-Ago-23
Programa de Obra	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-990-22 del 01-Sept-23
Flujo de Caja	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-990-22 del 01-Sept-23
Programa de Generación de Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-259-22 del 09-Feb-23
Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-290-22 del 21-Feb-23
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-240-22 del 01-Feb-23
Instalaciones Provisionales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-250-22 del 03-Feb-23
Plan de Manejo de Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-255-22 del 07-Feb-23
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1118-22 del 29-Sept-2023
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-278-22 del 17-Feb-23
Fuente de Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-635-22 del 08-Jun-23
Certificado de Disponibilidad de Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1237-22 del 26-Oct-23
Diseño de Mezcla	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-373-22 del 15-Mar-23
Caracterización Material Granular	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-373-22 del 15-Mar-23

Tabla 23 Estado Documentos pre construcción Municipio de Abrego

3.5.1.2. Actividades Técnicas.

A continuación, se presenta el resumen de las cantidades ejecutadas a la fecha de terminación del contrato de obra.

MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL 1: SANTA - LUCIA Y DEL CORREO VIAL 2: BRISAS DEL TARRA - LA ARENOSA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE ABREGO, NORTE DE SANTANDER						
No	DESCRIPCION	UND	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
CORREDOR 1: SANTA LUCIA - CANOAS					EJECUTADO A 30/NOVIEMBRE/2024	
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:					$	1,752,862,689.760
1	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	$ 50,374.00	$ 135,458,439.00	2,699.90	$ 136,004,762.60
2	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	$ 721,260.00	$ 511,745,326.00	757.21	$ 546,145,284.60
3	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	$ 8,128.00	$ 521,881,063.00	63,071.31	$ 512,643,632.06
4	Sub - Base Granular clase C	m3	$ 150,062.00	$ 259,053,816.00	2,064.58	$ 309,815,003.96
5	Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclopeo)	m3	$ 400,909.00	$ 106,889,385.00	261.76	$ 104,941,939.84
6	Sello de Juntas	m	$ 14,837.00	$ 146,506,473.00	9,659.10	$ 143,312,066.70
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:					$	134,540,680
7	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	$ 50,374.00	$ 15,063,282.00	352.76	$ 17,769,932
8	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	$ 721,260.00	$ 39,999,204.00	50.43	$ 36,373,142
9	Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	$ 35,653.00	$ 3,189,728.00	115.19	$ 4,106,869
10	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diametro interior	m	$ 832,991.00	$ 34,985,622.00	42.00	$ 34,985,622
11	Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	$ 534,825.00	$ 3,627,397.00	25.39	$ 13,579,207
12	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	$ 8,128.00	$ 27,727,534.00	3,411.16	$ 27,725,908
CORREDOR 2: BRISAS DEL TARRA - LA ARENOSA						
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:					$	1,371,145,986
1	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	$ 50,374.00	$ 145,851,329.00	2,225.52	$ 112,108,344
2	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	$ 749,647.00	$ 589,641,797.00	595.84	$ 446,669,668
3	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	$ 8,128.00	$ 572,099,840.00	43,656.40	$ 354,839,219
4	Sub - Base Granular clase C	m3	$ 188,607.00	$ 350,791,532.00	1,409.63	$ 265,866,085
5	Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclopeo)	m3	$ 441,176.00	$ 127,143,361.00	183.65	$ 81,021,972
6	Sello de Juntas	m	$ 14,837.00	$ 141,185,925.00	7,457.08	$ 110,640,696
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:					$	126,102,097
7	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	$ 50,374.00	$ 35,147,658.00	249.20	$ 12,553,201
8	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	$ 780,529.00	$ 101,000,921.00	55.45	$ 43,280,333
9	Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	$ 35,653.00	$ 7,862,734.00	94.51	$ 3,369,565
10	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diametro i	m	$ 925,603.00	$ 90,709,094.00	38.00	$ 35,172,914
11	Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	$ 590,380.00	$ 9,343,118.00	6.78	$ 4,002,776
12	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	$ 8,128.00	$ 64,697,580.00	3,410.84	$ 27,723,308
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD					$	2,266,554
13	Postes de referencia corredor1	und	377,759.00	$ 2,266,554	6.00	$ 2,266,554
14	Postes de referencia corredor 2	und	377,759.00	$ 3,777,590	-	$ -
ITEM NO PREVISTO					$	270,261,977
15	Transporte a distancia adicional a la contractual			$ 409,487,845.00	0.46	$ 270,261,977
				VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA	$	3,657,179,984

Tabla 24 Cantidades Ejecutadas Municipio de Abrego

3.5.1.3. Actividades ambientales

El contrato finalizó el 31 de diciembre de 2024, se encuentra en proceso de liquidación

3.5.1.4. Actividades Sociales

El contrato finalizó el 31 de diciembre de 2024, se encuentra en proceso de liquidación

3.5.1.5. Actividades SST

El contrato finalizó el 31 de diciembre de 2024, se encuentra en proceso de liquidación

3.5.1.6. Seguimiento Ítems No Previstos

A la fecha se ha presentado ítem con actividad no prevista en el proyecto la cual es:

- Sobre acarreos por un valor $409,487.845 a razón de:

*"(…) Desde la firma del convenio en referencia, la entidad territorial municipio de Abrego N.S ha adelantado acciones en búsqueda de fuentes de material de cantera y de arrastre sobre los cauces o lechos de los ríos aledaños al proyecto, en especial al corredor 2, encontrando calidad en la deficiente calidad del material en posibles canteras y dejando como única alternativa el material del arrastre sobre el cauce del rio El Tarra; fuente hídrica que desde el mes de noviembre del año anterior (2022) se encuentra altamente contaminada a raiz de movimientos de remoción en masa presentados aguas arriba en límites con el municipio de Villa Caro N.S y que ha ocasionado altas afectaciones ambientales de flora y fauna; situación que a la fecha imposibilita cualquier tipo de acceso y extracción, así como trámite de licenciamiento ambiental y que **deja como única alternativa el acarreo de material desde la planta con permisos ambientales y legales vigentes**.(…)" (negrilla y subrayado fuera de texto original)*

3.5.2. Estado de avance del proyecto

El proyecto se divide en dos etapas fundamentales las cuales se describe su avance a continuación.

3.5.2.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños

A la fecha el Contratista ya tiene aprobados los Estudios y Diseños del corredor 1; dentro de los cuales quedaron con algunas observaciones de forma el componente de Topografía, Diseño Geométrico, Diseño de Pavimentos para lo cual se espera sean subsanados para revisión y aprobación definitiva de la Interventoría. En cuanto al Corredor 2, se tiene aprobado el componente Estructural e Hidráulico y, los componentes de Diseño de Pavimentos, Diseño Geométrico y Topografía aprobado con observaciones.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
Informe de suelos e Informe geotécnico	- GIC-INVIAS-NTS-797-22 del 17-Jul-23 - **APROBADO**
TOPOGRAFÍA	- Entrega con correo electrónico del 04-Feb-23 - MESA DE TRABAJO 06-02-2023 - Entrega con OFC-CADV-GIC-012-2023 del 15-Feb-23 - CORREDOR 1, T 1, 2, 3, 4

	- GIC-INVIAS-NTS-276-22 del 17-Feb-23 - **OBSERVACIONES** - Entrega con OFC-CADV-GIC-019-2023 del 22-Feb-23 - CORREDOR 1, T 1, 2, 3, 4 - GIC-INVIAS-NTS-311-22 del 24-Feb-23 - **OBSERVACIONES CORREDOR 1** - Entrega con OFC-CADV-GIC-022-2023 del 25-Feb-23 - CORREDOR 2 - Entrega con OFC-CADV-GIC-027-2023 del 03-Mar-23 - CORREDOR 2 - Entrega con OFC-CADV-GIC-026-2023 del 03-Mar-23 - CORREDOR 1 - GIC-INVIAS-NTS-331-22 del 06-Mar-23 - **OBSERVACIONES CORREDOR 2** - GIC-INVIAS-NTS-353-22 del 10-Mar-23 - **OBSERVACIONES CORREDOR 1** - Entrega con OFC-CADV-GIC-033-2023 del 14-Mar-23 - CORREDOR 1 - GIC-INVIAS-NTS-383-22 del 16-Mar-23 - **OBSERVACIONES CORREDOR 1** - Entrega con OFC-CADV-GIC-034-2023 del 21-Mar-23 - CORREDOR 2 - Entrega con OFC-CADV-GIC-039-2023 del 22-Mar-23 - CORREDOR 1 - GIC-INVIAS-NTS-402-22 del 24-Mar-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES CORREDOR 2** - GIC-INVIAS-NTS-409-22 del 27-Mar-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES CORREDOR 1** - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-078-2023 del 24-May-2023 - CORREDOR 2 - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-077-2023 del 24-May-2023 - CORREDOR 1 - GIC-INVIAS-NTS-583-22 del 26-May-2023 - **OBSERVACIONES** - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-137-2023 del 18-Sep-2023 - CORREDOR 1 - GIC-INVIAS-NTS-1102-22 del 25-Sept-23 - **OBSERVACIONES** - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-153-2023 del 19-Oct-2023 - GIC-INVIAS-NTS-1214-22 del 20-Oct-23 - APROBADO CORREDOR 1 - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-006-2024 del 31-Ene-2024 - CORREDOR 2 - GIC-INVIAS-NTS-220-24 del 06-Feb-24 – OBSERVADO - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-039-2024 del 28-mayo-2024 PLANOS RÉCORDS - GIC-INVIAS-NTS-863-24 del 07-Jun-24 - OBSERVADO PLANOS RÉCORDS - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-044-2024 del 19-Jun-2024 - PLANOS RÉCORDS - OFC-CADV-GIC-089-2024 - ENTREGA OBSERVACIONES TRAMO 2 - 21/11/2024 - OFC-CADV-GIC-100-2024 - TOPOGRAFÍA - 11/12/2024
DISEÑO GEOMÉTRICO DE PLACA HUELLAS	- GIC-INVIAS-NTS-649-22 del 09-Jun-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES CORREDOR 1 (corredor 1 y 2)** - GIC-INVIAS-NTS-778-22 del 11-Jul-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES CORREDOR 2** - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-085-2024 ENTREGA OBSERVACIONES DISEÑO GEOMÉTRICO CORREDOR 1 – 15/11/2024 - OFC-CADV-GIC-094 -2024 ENTREGA OBSERVACIONES DISEÑO GEOMÉTRICO CORREDOR 1 CHORRO 1 Y 2 - 03/12/2024

	- GIC-INVIAS-NTS-1711-24 del 19/12/2024 – **APROBADO** - OFC-CADV-GIC-095 -2024 ENTREGA **OBSERVACIONES DISEÑO GEOMÉTRICO CORREDOR 2** - 06/12/2024 - GIC-INVIAS-NTS-1732-24 - 24/12/2024 - **APROBADO**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	- Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-014-2023 del 17-Feb-23 CORREDOR 1 - GIC-INVIAS-NTS-296-22 del 22-Feb-23 **- OBSERVACIONES CORREDOR 1** - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-017-2023 del 22-Feb-23 CORREDOR 2 - GIC-INVIAS-NTS-345-22 del 08-Mar-23 - **OBSERVACIONES CORREDOR 2** - GIC-INVIAS-NTS-797-22 del 17-Jul-23 - **OBSERVACIONES - CONCEPTO DE LOS TALUDES**
INFORME ESTRUCTURAL	- Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-025-2023 del 02-Mar-23 - GIC-INVIAS-NTS-323-22 del 03-Mar-23 **- APROBADO CORREDOR 1** - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-074-2023 del 18-May-2023 - CORREDOR 2 - GIC-INVIAS-NTS-574-22 del 25-May-23 - **APROBADO CORREDOR 2** - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-139-2023 del 18-Sept-23 solicitud alcantarilla EL CHORRO 1-2 - GIC-INVIAS-NTS-460-22 del 25-Sept-23 **OBSERVACIONES** - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-140-2023 del 22-Sept-23 solicitud alcantarilla EL CHORRO 1-2 - GIC-INVIAS-NTS-1109-22 del 25-Sept-23 **APROBADO CON OBSERVACIONES CHORRO 1 Y 2**
INFORME HIDRÁULICO	- GIC-INVIAS-NTS-413-22 del 29-Mar-23 - **APROBADO CORREDOR 1** - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-049-2023 del 04-Abr-23 CORREDOR 2 - GIC-INVIAS-NTS-454-22 del 18-Abr-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES CORREDOR 2** - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-054-2023 del 18-Abr-23 CORREDOR 2 - GIC-INVIAS-NTS-464-22 del 24-Abr-23 - **APROBADO CORREDOR 2** - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-099-2023 del 30-Jun-23 solicitud alcantarilla PR7+410 La Yee - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-110-2023 del 04-Sept-23 solicitud alcantarilla PR7+410 La Yee - GIC-INVIAS-NTS-904-22 del 15-Ago-23 **OBSERVACIONES ALCANTARILLA PR 7+410** - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-128-2023 del 04-Sept-23 solicitud alcantarilla PR7+410 La Yee - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-139-2023 del 18-Sept-23 solicitud alcantarilla El Chorro 1-2 - GIC-INVIAS-NTS-1109-22 del 25-Sept-23 - A**PROBADO MURO ALCANTARILLA CHORRO 1 Y 2**
PLANOS RÉCORD	- Entrega documento con OFC-CADV-GIC-091-2023 del 23/11/2024 – ENTREGA PLANOS RÉCORDS – TRAMO SAN VICENTE CORREDOR 2 - GIC-INVIAS-NTS-1688-24 de 16/12/2024 - **OBSERVACIONES**

3.5.2.2. Etapa de Construcción

El contrato finalizó el 31 de diciembre de 2024, se encuentra en proceso de liquidación

A continuación, se relacionan las cantidades de placa huella a la fecha del presente informe.

MUNICIPIO	ALCANCE INICIAL PROYECTO	CORREDOR VIAL	EJECUTADO A LA FECHA	TOTAL, MUNICIPIO	CANTIDAD POR EJECUTAR
ABREGO	2401.35	CORREDOR 1 VEREDA SANTA LUCIA - CANOAS	1150	2401,00	0
		CORREDOR 2 VEREDA BRISAS DEL TARRA – LA RENOSA	1251		

Tabla 25 Cantidades a la fecha ejecutadas.

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.

Tabla 26 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de Abrego

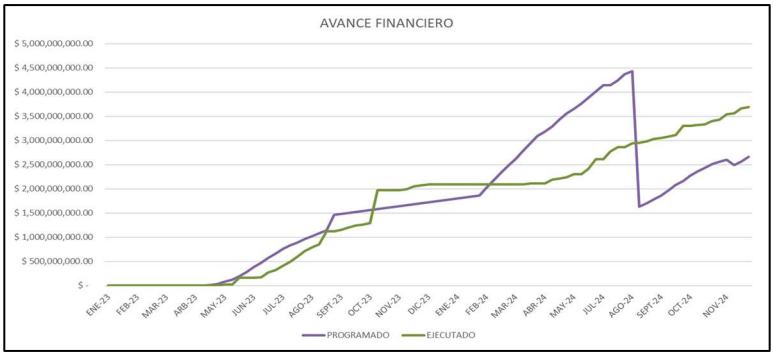


Gráfico 5 Avance Financiero Municipio de Abrego

Se da por terminado actividades en el tramo de San Juan con una ejecución de 300 m, San Vicente con una ejecución de 415 m.

La Vega del Tigre con un avance de 191.62 m

En el tramo San Luis finalizo la construcción de 298.93 m

En la vereda Milagros finalizo la construcción de 61.32 m

4.6 CONTRATO DE OBRA LP-004 DE 2022 – MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELÉN

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	LP-004 DE 2022
Objeto:	MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO LA PLAYA DE BELEN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME A CONVENIO No. 1863 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS.
Contratista:	CONSORCIO LA PLAYA 2022
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	27 de enero de 2023
Valor Inicial:	$ 2.203.091.392,21 M/CTE
Adicional No. 1:	$ 65.529.031,39 M/CTE
Valor total:	$ 2.268.620.424,00 M/CTE
Fecha de inicio:	06 de marzo de 2023
Fecha de terminación inicial:	06 de septiembre de 2023
Fecha de terminación Prorroga 1:	3.5 meses hasta el 21 de diciembre de 2023
Fecha de terminación Prorroga 2:	4 meses hasta el 18 de abril de 2024
Fecha de terminación Prorroga 3:	1.5 meses hasta el 02 de junio de 2024
Fecha de terminación Prorroga 4:	01 meses hasta el 06 de julio de 2024
Fecha de terminación Prorroga 5:	01 meses hasta el 06 de agosto de 2024
Fecha de Suspensión 1:	31 de julio de 2024
Fecha de Reinicio 1:	19 de agosto de 2024
Fecha de terminación Final:	26 de agosto de 2024

Tabla 27 Condiciones del contrato - Municipio de La Playa

3.6.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas

El día 23 de diciembre de 2024 se firma acta de liquidación del contrato de obra.

3.6.1.1 Actividades Administrativas

Dentro de las actividades administrativas el contratista al finalizar el contrato se encontró al día con los documentos de pre construcción como se presenta a continuación:

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan de Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-433-22 del 10-Abr-23
Protocolo de Bioseguridad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-435-22 del 10-Abr-23
Hojas de Vida	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-580-24 del 15-Mar-24
Programa de Obra	Aprobado	Hace entrega con comunicado OFC-CLP-GIC-053-2024 del 06-07-2024 (Prorroga 5) GIC-INVIAS-NTS-1012-24 del 09-Jul-24 - **APROBADO PRORROGA**
Flujo de Caja	Aprobado	Hace entrega con comunicado OFC-CLP-GIC-053-2024 del 06-07-2024 (Prorroga 5) GIC-INVIAS-NTS-1012-24 del 09-Jul-24 - **APROBADO PRORROGA**
Programa de Generación de Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-365-22 del 14-Mar-23
Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-366-22 del 14-Mar-23
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-386-22 del 17-Mar-23
Instalaciones Provisionales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-367-22 del 14-Mar-23
Plan de Manejo de Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-370-22 del 14-Mar-23
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1165-22 del 11-Oct-23
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-434-22 del 10-Abr-23
Fuente de Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-636-22 del 08-Jun-23
Certificado de Disponibilidad de Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-427-22 del 03-Abr-23
Diseño de Mezcla	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-473-22 del 28-Abr-23 OFC-CLP-GIC-028-2023 del 25-May-2023 – Entrega documentación

Tabla 28 Estado Documentos pre construcción Municipio de La Playa

3.6.1.2. Actividades Técnicas

El día 23 de diciembre de 2024 se firma acta de liquidación del contrato de obra.





Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

A continuación, se presenta el resumen de cantidades ejecutadas a la fecha.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 630 MTS					
1	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	1600,99487	$ 44.400,00	$ 71.084.172,00
2	Concreto Resistencia 21 MPa (D)	m3	491,31	$ 775.000,00	$ 380.766.515,00
3	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	41686,36	$ 8.020,00	$ 334.324.599,00
4	Sub - Base Granular clase C	m3	1003,73	$ 201.000,00	$ 201.749.509,00
5	Concreto Resistencia 14 MPa (G) (Ciclópeo)	m3	67,32	$ 420.000,00	$ 28.275.877,00
6	Sello de Juntas	m	4546,35	$ 13.200,00	$ 60.011.820,00
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: (2) UND					
7	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	99,68	$ 44.400,00	$ 4.425.628,00
8	Concreto Resistencia 21 MPa (D)	m3	18,49	$ 775.000,00	$ 14.326.495,00
9	Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	31,51	$ 30.000,00	$ 945.150,00
10	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	m	12	$ 850.000,00	$ 10.200.000,00
11	Concreto Resistencia 14 MPa (F)	m3	2,26	$ 550.000,00	$ 1.234.440,00
12	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	1137,12	$ 8.020,00	$ 9.119.702,00
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 545 MTS					
1	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	1376,64	$ 44.400,00	$ 61.122.696,12

2	Concreto Resistencia 21 MPa (D)	m3	446,65	$	775.000,00	$ 346.157.838,13
3	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	36584,2	$	8.020,00	$ 293.405.261,44
4	Sub - Base Granular clase C	m3	922,69	$	201.000,00	$ 185.446.814,17
5	Concreto Resistencia 14 MPa (G) (Ciclópeo)	m3	49,25	$	420.000,00	$ 20.686.428,00
6	Sello de Juntas	m	3647,3	$	13.200,00	$ 48.144.360,00
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: (3) UND						
7	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	174,95	$	44.400,00	$ 7.767.616,00
8	Concreto Resistencia 21 MPa (D)	m3	33,77	$	775.000,00	$ 26.170.045,00
9	Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	63,7	$	30.000,00	$ 1.910.850,00
10	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	m	18	$	850.000,00	$ 15.300.000,00
11	Concreto Resistencia 14 MPa (F)	m3	3,64	$	550.000,00	$ 2.003.320,00
12	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	2294,09	$	8.020,00	$ 18.398.595,00
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD						
13	Postes de referencia corredor 1	und	7	$	350.000,00	$ 2.450.000,00
14	Postes de referencia corredor 2	und	6	$	350.000,00	$ 2.100.000,00
ITEMS NO PREVISTO:						
15	Transporte a distancia adicional a la contractual	Gl	1	$	57.577.010,00	$ 57.577.010,00
16	Suministro E Instalación De Tubería PVC 6" Drenaje Sin Filtro	m	115,66	$	46.361,00	$ 5.362.113,00
17	Construcción De Filtro A Cualquier Profundidad Con Material Filtrante Según Norma Invias, Sin Excavación, Incluye Geotextil Nt 2000	m	115,66	$	275.909,00	$ 31.911.635,00
VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA						**$ 2.242.378.488,80**
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS (B						**$ -**
VALOR TOTAL BÁSICO (A)+(B) = (C						**$ 2.242.378.488,80**
COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS (D)						**$ 10.318.519,00**
VALOR IVA (19%) AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS						**$ 1.960.519,00**
PROVISIÓN IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD (INCLUYE IVA) (F)						**$ 3.635.378,00**

AJUSTE AL PESO	**$ -**
VALOR TOTAL (C+D+E+F) AIU 30% (A 20%, U 5%, I 5%)	**$ 2.258.292.904,80**

Tabla 29 Cantidades Ejecutadas Municipio de La Playa

3.6.1.3. Actividades ambientales

El día 23 de diciembre de 2024 se firma acta de liquidación del contrato de obra.

Actividades Sociales

El día 23 de diciembre de 2024 se firma acta de liquidación del contrato de obra.

Actividades SST

El día 23 de diciembre de 2024 se firma acta de liquidación del contrato de obra.

3.6.2. Seguimiento Ítems No Previstos

Se presentaron los ítems con actividades no previstas en el proyecto, de sobre acarreo e instalación de un filtro.

3.6.3. Estado de avance del proyecto.

El proyecto se dividió en dos etapas fundamentales las cuales se describe su avance a continuación.

3.6.3.2. Etapa de Actualización Estudios y Diseños.

El contratista a la fecha ha realizado entregas de los componentes de estudios y diseños a revisar del corredor de Buenavista Municipio de La Playa de Belén, donde se han emitido su aprobación y observaciones por los especialistas.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
Informe de suelos e Informe geotécnico	- Hace entrega con comunicado OFC-CLP-GIC-033-2023 del 02-Jun-2023 CORREDOR 1 y 2 - GIC-INVIAS-NTS-630-22 del 08-Jun-23 - **APROBADO**
TOPOGRAFÍA	- GIC-INVIAS-NTS-644-22 del 09-Jun-23 - **APROBADO CORREDOR 1 Y 2**
DISEÑO GEOMÉTRICO DE PLACA HUELLAS	- GIC-INVIAS-NTS-743-22 del 29-Jun-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES CORREDOR 2**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	- Hace entrega con comunicado OFC-CLP-GIC-033-2023 del 02-Jun-2023 CORREDOR 1 y 2 - GIC-INVIAS-NTS-630-22 del 08-Jun-23 - **APROBADO**
INFORME ESTRUCTURAL	- Hace entrega con comunicado OFC-CLP-GIC-031-2023 del 24-May-2023 C 1 Y 2 - GIC-INVIAS-NTS-602-22 del 30-May-23 - APROBADO CORREDOR 1 Y 2 - Hace entrega con comunicado OFC-CLP-GIC-024-2024 del 11-03-2024 MURO ESPERANCITA - GIC-INVIAS-NTS-509-24 del 04-Abr-2024 – APROBADO MURO ESPERANCITA
INFORME HIDRÁULICO	- Hace entrega con comunicado OFC-CLP-GIC-017-2023 del 21-Abr-2023 CORREDOR 1 - GIC-INVIAS-NTS-466-22 del 24-Abr-23 - **APROBADO CORREDOR 1** - Hace entrega con comunicado OFC-CLP-GIC-036-2023 del 05-Jun-2023 CORREDOR 2 - GIC-INVIAS-NTS-670-22 del 13-Jun-13 - **APROBADO CORREDOR 1**

Tabla 30 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de La Playa

3.6.3.3. Etapa de Construcción

En el presente periodo el contratista se encuentra con la totalidad de estudios y diseños aprobados por parte de la interventoría, se finalizaron las actividades de construcción y el contrato de obra se encuentra liquidado.

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.

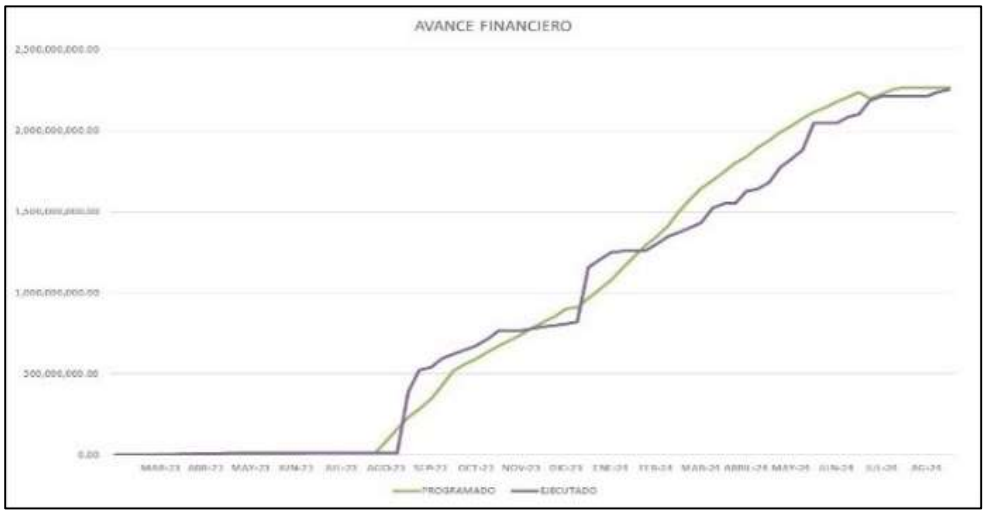


Gráfico 6 Avance Financiero Municipio de La Playa

3.7. CONTRATO DE OBRA 202 DE 2022 – MUNICIPIO DE PAMPLONITA

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	202 DE 2022
Objeto:	MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME A CONVENIO NO. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS.
Contratista:	UNIÓN TEMPORAL COLOMBIA
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	21 de noviembre de 2022
Valor Inicial:	$ 1.703.523.226,00 M/CTE
Fecha de inicio:	14 de abril de 2023
Fecha de terminación inicial:	13 de octubre de 2023
Fecha de terminación Prorroga 1:	2.67 meses hasta el 31 de diciembre de 2023
Fecha de terminación Prorroga 2:	3 meses hasta el 31 de marzo de 2024
Fecha de terminación Prorroga 3:	02 meses hasta el 30 de mayo de 2024
Fecha de terminación Final:	30 de mayo de 2024

Tabla 31 Condiciones del contrato - Municipio de Pamplonita

3.7.1 Descripción de las Actividades Ejecutadas

El presente contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación.

3.7.1.1. Actividades Administrativas

Dentro de las actividades administrativas el contratista se encuentra adelantando la elaboración de los documentos de pre construcción para revisión de la Interventoría, a continuación, se presenta el estado de los documentos presentados por el contratista:

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan de Calidad	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-789-22 del 14-Jul-2023
Protocolo de Bioseguridad	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-697-22 del 20-Jun-2023
Programa de Obra	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-1445-22 del 29-Nov-2023
Flujo de Caja	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-1445-22 del 29-Nov-2023
Programa de Generación de Empleo	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-621-22 del 05-Jun-2023
Equipo Mínimo Obligatorio	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-673-22 del 13-Jun-2023
Análisis de Precios Unitarios		En Revisión de Interventoría
Instalaciones Provisionales	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-620 del 05- Jun-2023
Plan de Manejo de Transito - PMT	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-765-22 del 07-Jul-2023
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-082-24 del 12-Ene-2024
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-989-22 del 01-Sep-2023
Fuente de Materiales	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-699-22 del 20-Jun-2023
Certificado de Disponibilidad de Laboratorio	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-623-22 del 06-Jun-2023

Tabla 32 Estado Documentos pre construcción Municipio de Pamplonita

3.7.1.2. Actividades Técnicas

En el presente contrato de obra, se ejecutó el 100% del objeto contractual, el contrato se liquidó el 08 de enero de 2025.

Al presente informe se anexa registro fotográfico correspondiente a la finalización de las actividades desarrolladas en el proyecto.




A continuación, se presenta el resumen de actividades ejecutadas a la fecha.

Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:					
1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	1.474,64	$ 33.000,00	$ 48.663.120,00
2	CONCRETO RESISTENCIA 2 1 MPA (D) - MEZCLA IN SITU	M3	1.071,61	$ 670.000,00	$ 717.978.700,00
3	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	KG	65.636,94	$ 8.300,00	$ 544.786.602,00
4	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	1.288,96	$ 120.000,00	$ 154.675.200,00
5	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA (G) - CICLÓPEO	M3	317,12	$ 360.000,00	$ 114.163.200,00
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:					
7	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	194,70	$ 33.000,00	$ 6.425.100,00
8	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA (D) - MEZCLA IN SITU	M3	28,48	$ 670.000,00	$ 19.081.600,00
9	CONCRETO RESISTENCIA 1 4 MPA (F)	M3	6,19	$ 520.000,00	$ 3.218.800,00
10	RELLENOS PARA ESTRUCTURA CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	77,66	$ 32.000,00	$ 2.485.120,00
11	TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 600 MM DE DIÁMETRO INTERIOR	M	24,00	$ 550.000,00	$ 13.200.000,00
12	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	KG	2314,68	$ 8.300,00	$ 19.211.844,00
TRANSPORTES					
13	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 M)	M3/KM	6.298,90	$ 1.900,00	$ 11.967.910,00

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD					
14	SEÑAL SI-04 (POSTE DE REFERENCIA)	UNID	7,00	$ 600.000,00	$ 4.200.000,00
VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA					**$ 1.660.057.196,00**
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS = (B)					
VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA= (A) + (B) = (C)					$ 1.660.057.196,00
COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS (D)					$ 17.565.318,00
VALOR IVA (19%) AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS = (F)					$ 3.337.410,00
PROVISIÓN IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD (INCLUYE IVA) = (G)					$ -
AJUSTE					$ 104,00
COSTO TOTAL					**$ 1.680.960.028,00**

Tabla 33 Cantidades Ejecutadas Municipio de Pamplonita

3.7.1.3. Actividades ambientales

El contrato de obra se encuentra liquidado desde el 08 de enero de 2025.

3.7.1.4. Actividades sociales

El contrato de obra se encuentra liquidado desde el 08 de enero de 2025.

3.7.1.5. Actividades SST

El contrato de obra se encuentra liquidado desde el 08 de enero de 2025.

3.7.1.6. Etapa de Actualización Estudios y Diseños

El Contratista cuenta con aprobación de los documentos correspondientes a los estudios y diseños.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría.


ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
Informe de suelos e Informe geotécnico	- Hace entrega con comunicado PHP2022 – 008 – 2023 del 02-Jun-2023 - GIC-INVIAS-NTS-631-22 del 08-Jun-2023 - **APROBADO**

TOPOGRAFÍA	- Hace entrega con comunicado PHP2022 – 018– 2023 del 20-Jun-2023 - GIC-INVIAS-NTS-706-22 del 22-Jun-2023 - **APROBADO**
DISEÑO GEOMÉTRICO DE PLACA HUELLAS	- Hace entrega con comunicado PHP2022 – 022 – 2023 del 04-Jul-2023 - GIC-INVIAS-NTS-762-22 del 07-Jul-2023 - **APROBADO CON OBSERVACIONES**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	- Hace entrega con comunicado PHP2022 – 003 – 2023 del 18-05-2023 - GIC-INVIAS-NTS-590-22 del 26-May-2023 – **OBSERVACIONES** - Hace entrega con comunicado PHP2022 – 025 – 2023 del 19-07-2023 - GIC-INVIAS-NTS-821-22 del 25-Jul-2023 – **OBSERVACIONES** - Hace entrega con comunicado PHP2022 – 029– 2023 del 08-Ago-2023 - GIC-INVIAS-NTS-907-22 del 15-Ago-2023 - **OBSERVACIONES**
INFORME ESTRUCTURAL	- Hace entrega con comunicado PHP2022 – 003 – 2023 del 18-05-2023 - GIC-INVIAS-NTS-605-22 del 31-May-2023 - **APROBADO** - Entrega documentación con PHP2022-034 y 035-2022 del 20-Sept-23 – Validación cuantía de aceros
INFORME HIDRÁULICO	- Hace entrega con comunicado PHP2022 – 020 – 2023 del 23-Jun-2023 - GIC-INVIAS-NTS-770-22 del 10-Jul-2023 - **OBSERVACIONES** - Hace entrega de concepto puente con comunicado PHP2022 – 024 – 2023 del 10-Jul-2023 - GIC-INVIAS-NTS-830-22 del 27-Jul-2023 - **OBSERVACIONES** - Hace entrega de concepto puente con comunicado PHP2022 – 027 – 2023 del 03-Ago-2023 - GIC-INVIAS-NTS-908-22 del 15-Ago-2023 - **APROBADO**

Tabla 34 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de Pamplonita

3.7.1.7. Etapa de Construcción

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.

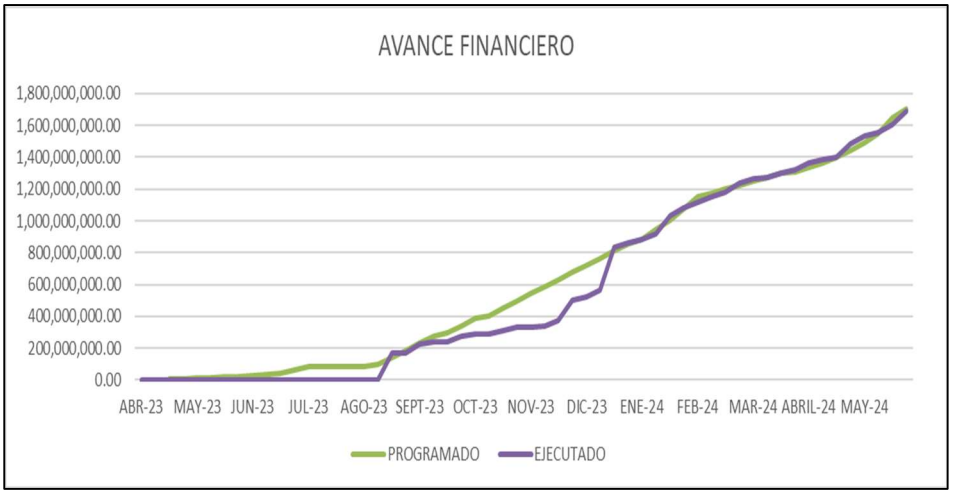

Gráfica 7 Avance Financiero Municipio de Pamplonita

A corte del 31 de mayo de 2024, se dio por finalizada la ejecución de actividades del contrato.

3.8. CONTRATO DE OBRA 02590 DE 2022 – GOBERNACIÓN 1943

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	02590 DE 2022
Objeto:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS
Contratista:	UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	23 de diciembre de 2022
Valor Inicial:	$ 16.898.027.326,00 M/CTE
Fecha de inicio:	10 de abril de 2023
Fecha de terminación inicial:	09 de diciembre de 2023
Plazo Inicial:	Ocho (8) meses
Prorroga 1:	Seis (6) meses
Suspensión 1:	20 de diciembre de 2023 hasta 15 de enero de 2024
Prorroga suspensión 1:	16 de enero hasta 04 de febrero de 2024
Prorroga suspensión 2:	05 de febrero hasta el 20 de febrero de 2024
Prorroga y Adicional No2:	Hasta el 31 de diciembre de 2024
Prorroga y Adicional No3:	Hasta el 28 de febrero de 2025
Suspensión 2:	20 de febrero de 2025 hasta 24 de marzo de 2025
Fecha de reanudación:	25 de marzo de 2026
Fecha de vencimiento contrato:	02 de abril de 2025
Plazo total:	20 meses y 20 Días
Valor adicionado al contrato:	$ 7.565.000.000
Valor total del contrato:	$ 24.463.027.326

Tabla 35 Condiciones del contrato - Gobernación 1943

3.8.1 Descripción de las Actividades Ejecutadas

Hasta la finalización de este informe, el contratista de obra sigue llevando a cabo actividades administrativas y técnicas relacionadas con la ejecución del contrato de obra 2590 de 2022, con el objetivo de cumplir con las obligaciones contractuales. A continuación, se detallan las acciones realizadas y su importancia para el avance del proyecto.

3.8.1.1. Actividades Administrativas

En relación con las actividades administrativas, se expone el estado actual de los documentos de preconstrucción entregados por el contratista, incluyendo un resumen de su avance y cumplimiento, aspectos fundamentales para el desarrollo del proyecto.

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan de Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1423-22 del 24-Nov-23
Protocolo de Bioseguridad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-643-22 del 08-Jun-23
Hojas de Vida	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-475-22 del 28-Abr-23
Programa de Obra	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-0043-25 del 28-Ene-2025
Flujo de Caja	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-0043-25 del 28-Ene-2025
Programa de Generación de Empleo	Aprobado	
Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-825-22 del 25-Jul-23
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	
Instalaciones Provisionales	Aprobado con observaciones	GIC-INVIAS-NTS-1069-22 del 18-Sep-23 GIC-INVIAS-NTS-1070-22 del 18-Sep-23
Plan de Manejo de Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1179-22 del 12-Oct-23 GIC-INVIAS-NTS-1180-22 del 12-Oct-23 GIC-INVIAS-NTS-1256-22 del 27-Oct-23
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1635-22 del 28-Dic-23
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-876-22 del 09-Ago-23
Fuente de Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-824-22 del 25-Jul-23
Certificado de Disponibilidad de Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-766-22 del 07-Jul-23
Diseño de Mezcla	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1126-22 del 02-Oct-23
Caracterización Material Granular	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1126-22 del 02-Oct-23

Tabla 36 Estado Documentos pre construcción Gobernación 1943

Cabe destacar que dentro de las actividades administrativas realizadas en el mes también se encuentran las siguiente:

- Teniendo en cuenta las solicitudes realizadas por los diferentes maestros en campo de que el contratista de obra adeudaba algunos pagos, la interventoría solicita al contratista mediante el comunicado GIC-INVIAS-NTS-148-25 del 06 de marzo de 2025 la entrega de remisión de soportes de pago realizados a maestros de obra, trabajadores y proveedores en los Municipios de los patios, Arboledas y Gramalote.
- Mediante el comunicado GIC-INVIAS-NTS-138-25 del 07 de marzo de 2025 se le solicita al contratista dar respuesta a solicitud de incumplimiento contractual contrato 02590 – 2022 de acuerdo al comunicado recibido referente al proceso administrativo por incumplimiento contractual, debido al incumplimiento en pago de obligaciones asumidas por el contratista.
- Mediante el comunicado GIC-INVIAS-NTS-139-25 del 10 de marzo de 2025 se da respuesta a la veeduría ciudadana del municipio de los patios en el oficio 029 donde se solicita aclaración referente a la suspensión del contrato del contrato de obra 02590.
- Teniendo en cuenta que en visita técnica realizada a campo al Municipio de Los Patios se evidencio el taponamiento de un descole por parte de la comunidad, la interventoría emite concepto mediante el oficio GIC-INVIAS-NTS-146-25 del 12 de marzo de 2025 enviado a la entidad contratante, junta de acción comunal y personería del municipio de los patios la presente alerta evidenciada.
- Teniendo en cuenta que el contratista de obra no daba respuesta a las solicitudes antes realizadas referentes a pagos de proveedores, mediante el comunicado GIC-INVIAS-NTS-147-25 del 15 de marzo de 2025 se reitera la entrega de remisiones y relación de pagos realizados a los maestros de obra, trabajadores y proveedores en los Municipio de Los Patios, Arboledas y Gramalote.
- Mediante el comunicado GIC-INVIAS-NTS-153-25 del 25 de marzo de 2025 se le solicita al contratista de obra el reinicio de actividades del contrato en campo.
  Se realiza registro de actividades evidenciadas en campo y la no ejecución de la mismas en la bitácora de obra para el seguimiento y control del contrato de obra 02590.

3.8.1.2. Actividades Técnicas

Teniendo en cuenta que la ejecución del contrato de obra fue retomada el 25 de marzo de 2025, se constató que el contratista llevó a cabo algunas actividades en campo el municipio de Arboledas (Veredas Santo Domingo, Volcán y Helechar). No obstante, al realizar el seguimiento correspondiente en el municipio de Los Patios, no se identificó ninguna actividad ejecutada por parte del contratista durante el período comprendido entre el 25 y el 31 del mismo mes.

Municipio de los Patios

Vereda Corozal – California
El contratista durante el periodo no ejecuto actividades de obra en ninguno de los tramos de placa huella que se tienen pendientes por ejecutar, por parte de la interventoría se requirió el inicio inmediato con el fin de dar cumplimiento en los plazos contractuales.

Municipio de Arboledas
Durante el periodo del mes de marzo desde el reinicio del contrato hasta el día 31 de marzo, el contratista de obra solo ha mantenido en ejecución únicamente aquellas labores relacionadas con obras hidráulicas orientadas al mejoramiento vial, no se evidencia avance los metros lineales de placa huella faltantes.

Vereda Santo Domingo

- Se realizan actividades de resanes en algunos elementos de alcantarilla poceta de encole y cabezote de descole que se tienen ejecutados.
- Se realiza armado de formaleta de madera para modulación de elementos de alcantarillas pendientes (poceta de encole y cabezote de descole).
- Teniendo en cuenta que se tienen pendiente algunos vaciados de bordillos de acceso a elementos de alcantarilla, se realiza instalación de formaleta a lo largo de los mismo y se deja pendiente para vaciado de los mismos.

Vereda Volcán

- Se realizan actividades de resanes en algunos elementos de alcantarilla poceta de encole y cabezote de descole que se tienen ejecutados.
- Se realiza armado de formaleta de madera para modulación de elementos de alcantarillas pendientes (poceta de encole y cabezote de descole).

- El contratista realiza acopio de material pétreo (arena y triturado) para la continuidad del vaciado de elementos de encole y descole pendientes.

Vereda Helechar

- Se realizan actividades de adecuación de elementos de cuneta y bordillo hacia alcantarillas con el fin de descolar en elementos de poceta y/o cabezote de descole.
- Se realiza vaciado de concreto de 21 Mpa para bordillos pendiente a lo largo del tramo No1.



Ilustración 2 Comités de seguimiento y control de actividades de campo

3.8.1.3. Actividades Ambientales

El contratista al finalizar este mes de marzo de 2025, No cumple con la entrega de la información de las actividades realizadas durante el 26 al 31 de este mes en mención.

El PAGA (Plan de Adaptación de la Guía Ambiental) consta de cinco (5) Programas de Manejo Ambiental que a su vez se encuentran constituidos por proyectos.

De un total de 13 proyectos, todos se han implementado, los frentes de obra del municipio de Gramalote, en la parte constructiva ya termino:

PROGRAMA DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL:

FICHAS DE MANEJO AMBIENTAL
SUBPROGRAMA 1.1: CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
CÓDIGO SM-DAGA- 1.1-01
OBJETIVO
Garantizar el cumplimiento y desarrollo eficaz de las acciones propuestas en cada programa del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental, PAGA, a través de la gestión de los profesionales responsables de la actualización e implementación del documento.

IDENTIFICACIÓN DE APLICABILIDAD DE LA FICHA POR LA COMPLEJIDAD DEL PROYECTO
BAJA MEDIA-ALTA
MEDIA-BAJA X ALTA
ACTIVIDADES PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO
La formulación del documento PAGA es la esencia de la gestión socioambiental del proyecto, por lo cual los profesionales deben realizar la gestión necesaria (formulación, ajuste, aprobación y radicación del documento) para obtener la aprobación del documento por parte de la interventoría, previo al inicio de las actividades constructivas.
Se requiere contar con el equipo mínimo de profesionales que puedan realizar la supervisión e implementación de las medidas de manejo durante el desarrollo del proyecto, atendiendo las obligaciones y/o recomendaciones que sean suscitas por las autoridades ambientales y propiciar ante la dirección del proyecto, el suministro de elementos necesarios para el desarrollo de cada uno de los subprogramas. Evidenciar mediante la formulación de informes de gestión, la implementación de cada una de las medidas de manejo del documento PAGA y el cumplimiento de las obligaciones adquiridas ante las autoridades ambientales de forma general o específicamente en cada uno de los actos administrativos que se hayan generado para la autorización del uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales.

PERIODICIDAD EN LA IMPLEMENTACIÓN
ACTIVIDAD MOMENTO
Seguimiento a la formulación del documento PAGA, aprobación de la interventoría y radicación del documento ante la entidad contratante.
Antes de inicio de las actividades constructivas Validación de los insumos y elementos necesarios para implementar las medidas de manejo Durante el desarrollo.
Realizar el control y seguimiento a las acciones de capacitación e inducción del personal asociado a las actividades constructivas durante el desarrollo del proyecto.

IDENTIFICACIÓN DE APLICABILIDAD DE LA FICHA POR LA COMPLEJIDAD DEL PROYECTO
BAJA MEDIA-ALTA
MEDIA-BAJA X ALTA
ACTIVIDADES PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO
El equipo de gestión socioambiental del proyecto se encuentra a cargo de realizar las inducciones y capacitaciones de todas las personas vinculadas al proyecto, especialmente las que de una u otra forma puedan aportar en el cumplimiento de las medidas de manejo ambiental propuestas para el proyecto. Dentro del control y seguimiento, se verificará la realización de las siguientes actividades:
• Talleres de inducción al personal programados.
• Capacitaciones para la prevención y control de contingencias.
• Capacitaciones en educación ambiental a los trabajadores del proyecto.

3.8.1.4. Actividades Sociales

El contratista al finalizar este mes de marzo de 2025, No cumple con la entrega de la información de las actividades realizadas durante el 25 al 31 de este mes en mención.

3.8.1.5. Actividades SST

Durante este periodo el contratista de obra no realiza ninguna actividad con maquinaria amarilla de igual manera no se evidencia avance en actividades representativas de obra.

1. Contratación del personal

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESO	EGRESO	SS	MUNICIPIO
1	WILLIAM PABÓN QUINTERO	DIRECTOR DE OBRA	13278653	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO

2	LEIDY YULIANA JAIME	AUXILIAR INGENIERA	1091664068	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
3	FRANKLYN AARON GIRALDO	LOGISTICA	79685180	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
4	GUSTAVO NIÑO GARCIA	COMPRAS	1090497738			UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
5	NATALIA HURTADO	COORDINADOR SST	1090506478			UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
6	CARLOS ALBERTO PINEDA	AUX TOPOGRAFIA	1007909639			UT EDIVIAL TROJA	GRAMALOTE
7	CESAR ANDRES CARDENAS COLL	RESIDENTE DE OBRA	1090393766	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
8	DARLY JUDITH RODRIGUEZ GALVIS	RESIDENTE SST	1090393766	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
9	DAYANA MELINA SALAZAR ORTEGA	INGENIERA AMBIENTAL	88261502	ACTIVO		INDEPENDIENTE	TODO EL PROYECTO

10	HECTOR ACOSTA	AUXILIAR CONTABLE	1090423766	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
11	FREDIS JOSE SUAREZ VILLALBA	TOPOGRAFO	1101387669	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
12	ALVARO ROJAS	AUXILIAR DE INGENIERIA	1094427632	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
13	ANGIE STELLA DUARTE	AUX CONTABLE	1090508619	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
14	DANIEL STEVEN CARDENAS	AYUDANTE DE OBRA	1005036929	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	PATIOS
15	ALVARO ROJAS	AUXILIAR DE INGENIERIA	1094427632	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS

Afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social

UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590- Gobernación 1943 se entregan las afiliaciones y seguridad del mes vencido por temas de fechas de pago.

Política de Seguridad Y salud en el Trabajo
La UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590- Cuenta con la política de seguridad y salud en el trabajo y es verificada en los documentos iniciales.

Marco legal en seguridad y salud en el trabajo
La UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590- cuentan con la matriz de requisitos legales y es verificada en los documentos iniciales.

Reglamento de Higiene y seguridad Industrial
UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590-
cuentan con un reglamento de higiene y seguridad industrial el cual, fue evidenciado y aprobado al previo inicio de las actividades de obra.

Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST
La UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590-
Cuentan con los formatos de conformación y actas de reunión los cuales fueron evidenciado y aprobados al previo inicio de las actividades de obra.

Comité de Convivencia Laboral
La UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590, cuentan con los formatos de conformación y actas de reunión los cuales fueron evidenciado y aprobados al previo inicio de las actividades de obra.

Diagnóstico inicial de condiciones de Trabajo.
UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590, se identificaron y priorizaron los diferentes riesgos presentes en las actividades, a través de la MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, este documento se aprobó en la etapa de preliminares.

IMPLEMENTACION SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Programa medicina preventiva y del Trabajo

EXAMENES DE INGRESO
UNION TEMPORAL EDIVIAL- TROJA 2590 Registran el ingreso de personal y sus respectivos exámenes médicos ocupacionales.
El contratista UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590 no realizo exámenes de ingreso de personal.

Ausentismo Laboral
Para el periodo del presente informe no se registran ausentismos por causa de enfermedades laborales o accidentes laborales.

CONTRATISTA	MUNICIPIO DE EJECUCION	DIAS PERDIDOS
UNION TEMPORAL EDIVIAL -TROJA 2590	GOBERNACION 1943 ARBOLEDAS, GRAMALOTE, PATIOS	0

Procedimiento de trabajos seguros

Se realiza el seguimiento a los procedimientos de seguridad ejecutados en cada una de las obras que se encuentran en ejecución.
La UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590- se continua con actividades de mejoramiento y trabajos con maquinaria, se continua con actividades constructivas, se realiza visita de obra para la verificación de la ejecución del SG-SST

Dotación elementos de protección personal

El contratista para el presente informe no realizo entrega de dotación y elementos de protección personal

UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590-



Maquinaria y Equipo

La interventoría hace revisión documental de la maquinaria previo al inicio y durante la ejecución de las obras, las obras que en estos momentos no realizan trabajo con maquinaria y volquetas para transporte de material.
El contratista para el presente informe no realizo actividades con maquinaria y equipos



UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590-

La interventoría hace revisión documental de la maquinaria previo al inicio y durante la ejecución de las obras, las obras que en estos momentos no realizan trabajo con maquinaria y volquetas para transporte de material

PLAN DE EMERGENCIA

Todas las obras cuentan con un documento de plan de emergencia evidenciado y aprobado en la revisión documental del SG-SST no se registran las evidencias fotográficas de quienes están en etapa de ejecución Para la ejecución de este componente, se debe tener en obra:

- Camilla de emergencia
- Botiquín de primeros auxilios
- Inmovilizadores de cuello y extremidades.
- Extintor multipropósito.

Se debe realizar las respectivas inspecciones mensuales, para la verificación de las condiciones en las que se encuentran y en caso de una eventualidad la atención sea oportuna.
El contratista para el presente informe no realizo inspecciones

EQUIPOS DE EMERGENCIA UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590

Para el presente informe el contratista no presenta registro fotográfico
ESTADISTICAS SST
Todas las contratistas cuentan con un procedimiento para el reporte de accidentes laborales, documento que fue aprobado en la etapa preliminar. Para el periodo del presente informe, no se registran los datos de las obras que están en ejecución.

CONTRATISTA	MUNICPIO DE EJECUCION	MES	FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD	INCIDENCIA ENFERMEDAD LABORAL	AUSENTISMOS POR CAUSA MEDICAS
UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590	(Arboledas, Gramalote, Patios)	MAR	0	0	0

INDUCCION Y CAPACITACION

Se realizo verificación documental corroborando que los contratistas, cumplieran con las inducciones correspondientes al periodo de marzo 2025 según ingresos en obra.
El contratista para el presente informe no realizo actividades de charlas e inducción

CONTRATISTA	MUNICPIO DE EJECUCION	MES	INDUCCIONES	CHARLAS SST
UT EDIVIAL TROJA 2590	Arboledas	MAR	0	0
	Patios			0

IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

Todas las contratistas, cuentan con un Protocolo de bioseguridad el cual fue aprobado en etapa preliminar, de entrega de documentación. Dentro de las actividades implementadas se encuentra el lavado de manos, cuidados ante infecciones respiratorias y uso de tapabocas en caso de síntomas gripales.

CONTRATISTA	MUNICPIO DE EJECUCION	MES	CASOS COVID 19
UT EDIVIAL TROJA-2590	(Arboledas, Gramalote, Patios)	MAR	0

Se realiza el control de seguimiento al cumplimiento del protocolo de bioseguridad para lo cual se exige y recomienda un baño dependiendo del lugar de ejecución, para el lavado de manos y a su vez, cumpla con el requerimiento de servicio higiénico dentro de las obras.

UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590-

Para el presente informe el contratista no presenta registro fotográfico, protocolo COVID-lavado de manos

3.8.2. Seguimiento Ítems No Previstos

Durante este período, no se tiene ítems no previstos.

Estado de avance del proyecto.

El proyecto se divide en dos etapas fundamentales las cuales se describe su avance a continuación.

3.8.2.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños.

Durante el periodo, la interventoría ha emitido su concepto técnico sobre varios estudios y diseños pendientes de revisión. Este análisis permitió evaluar el estado actual de los documentos y emitir observaciones clave para su ajuste.

MUNICIPIO	VEREDA	COMPONENTES DE ESTUDIOS Y DISEÑO				
		TOPOGRAFIA	DISEÑO GEOMETRICO	ESTUDIO DE SUELOS	DISEÑO DE PAVIMENTO	DISEÑO HIDRAULICO
ARBOLEDAS	Santo Domingo	APROBADO	APROBADO CON OBSERVACIONES	APROBADO	APROBADO	APROBADO
	Volcan	APROBADO	APROBADO CON OBSERVACIONES	APROBADO	APROBADO CON OBSERVACIONES	APROBADO
	Potreros	APROBADO	OBSERVADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO
	Chicagua	APROBADO	APROBADO CON OBSERVACIONES	APROBADO	APROBADO	APROBADO
	Rinconada	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO
	Cinera	APROBADO	APROBADO CON OBSERVACIONES	APROBADO	APROBADO	APROBADO
	Juan Bueno	APROBADO	OBSERVADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO
	Helechal	APROBADO	APROBADO CON OBSERVACIONES	APROBADO	APROBADO	APROBADO
GRAMALOTE	Boyaca	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO
	San Isidro	APROBADO	APROBADO CON OBSERVACIONES	APROBADO CON OBSERVACIONES	APROBADO	APROBADO
	Santan Anita	APROBADO	APROBADO	APROBADO CON OBSERVACIONES	APROBADO	APROBADO
LOS PATIOS	Corozal-California	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO
TOTALES	12	12	10	12	12	8

Convenciones

49		APROBADO FINAL
2		OBSERVACIONES EN MANOS DEL CONTRATISTA
9		APROBADO CON OBSERVACIONES EN MANOS DEL CONTRATISTA
2		NO HA PRESENTADO

Durante este período del 25 al 31 de marzo del presente año, el contratista mantiene el estado actual del componente de estudios y diseños, se esta a la espera de la presentación de observaciones faltantes.

A continuación, se presenta el avance de la subsanación de estudios y diseños pendientes de aprobación definitiva, con base en las observaciones realizadas.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS		COMUNICACIÓN
Informe de suelos e Informe geotécnico		
TOPOGRAFIA	Se solicita con el Comunicado GIC-INVIAS-NTS-024-22 del 18/10/2022	Entrega documento con comunicado UTET-02590-017 del 06-Jun-2023 - la vereda de RINCONADA del municipio de Arboledas. Entrega documento con comunicado UTET-02590-021 del 22-Jun-2023 - la vereda de SANTO DOMINGO del municipio de Arboledas. Entrega documento con comunicado UTET-02590-023 del 25-Jun-2023 - VEREDA CHICAGUA ALTO Y BAJO MUNICIPIO DE ARBOLEDAS GIC-INVIAS-NTS-734-22 del 29-Jun-2023 - OBSERVADO SANTO DOMINGO Entrega documento con comunicado UTET-02590-026 del 29-Jun-2023 - la vereda de RINCONADA del municipio de Arboledas. Entrega documento con comunicado UTET-02590-026 del 29-Jun-2023 - la vereda de RINCONADA del municipio de Arboledas. Entrega documento con CORREO del 09-Jul-2023 - municipio de los Patios. Entrega documento con CORREO del 10-Jul-2023 - municipio de los Patios. Entrega documento con comunicado UTET-02590-030 del 13-Jul-2023 - vereda Santa Anita Municipio Gramalote GIC-INVIAS-NTS-795-22 del 17-Jul-2023 - APROBADO CON OBSERVACIONES - LOS PATIOS Entrega documento con comunicado UTET-02590-037 del 20-Jul-2023 - vereda San Isidro Municipio Gramalote OBSERVACIONES EN LLAMADA DEL 24-07-2023 - VEREDA SANTA ANITA Entrega documento con comunicado UTET-02590-040 del 24-Jul-2023 - vereda Santa Anita Municipio Gramalote GIC-INVIAS-NTS-828-22 del 26-Jul-2023 - APROBADO CON OBSERVACIONES - SANTA ANITA Entrega documento con comunicado UTET-02590-041 del 26-Jul-2023 - vereda Santa Anita Municipio Gramalote Entrega documento con comunicado UTET-02590-042 del 26-Jul-2023 - municipio de los Patios. GIC-INVIAS-NTS-834-22 del 26-Jul-2023 - APROBADO - SANTA ANITA Entrega documento con comunicado UTET-02590-044 del 28-Jul-2023 - la vereda de SANTO DOMINGO del municipio de Arboledas.
	• Plano de perfil longitudinal de la vía a intervenir.	
	• Plano en planta de la vía a intervenir.	
	• Archivos de puntos en formato CSV.	
	• Plano en AutoCAD de las curvas y levantamiento general del proyecto.	

		Entrega documento con comunicado UTET-02590-048 del 31-Jul-2023 - la vereda de BOYACA del municipio de Gramalote. GIC-INVIAS-NTS-854-22 del 03-Ago-2023 - OBSERVACIONES SAN ISIDRO Entrega documento con comunicado UTET-02590-049 del 02-Ago-2023 - la vereda de CHICAGUA del municipio de Arboledas. GIC-INVIAS-NTS-860-22 del 04-Ago-2023 - APROBADO CON OBSERVACIONES - LOS PATIOS GIC-INVIAS-NTS-867-22 del 04-Ago-2023 - OBSERVACIONES SANTO DOMINGO Entrega documento con comunicado UTET-02590-058 del 08-Ago-2023 - municipio de LOS PATIOS. Entrega documento con comunicado UTET-02590-057 del 08-Ago-2023 - la vereda de SANTO DOMINGO del municipio de Arboledas. Entrega documento con comunicado UTET-02590-052 del 04-Ago-2023 - VEREDA POTREROS del municipio de Arboledas. GIC-INVIAS-NTS-871-22 del 09-Ago-2023 - OBSERVACIONES BOYACA Entrega documento con comunicado UTET-02590-063 del 11-Ago-2023 - VEREDA SAN ISIDRO del municipio de Gramalote. Entrega documento con comunicado UTET-02590-062 del 11-Ago-2023 - VEREDA SAN ISIDRO del municipio de Gramalote. Entrega documento con comunicado UTET-02590-061 del 11-Ago-2023 - VEREDA RINCONADA del municipio de Arboledas. GIC-INVIAS-NTS-909-22 del 15-Ago-2023 - APROBADO - SAN ISIDRO Entrega documento con comunicado UTET-02590-067 del 16-Ago-2023 - la vereda de CHICAGUA del municipio de Arboledas. Entrega documento con comunicado UTET-02590-069 del 16-Ago-2023 - la vereda de VOLCAN del municipio de Arboledas. GIC-INVIAS-NTS-927-22 del 17-Ago-2023 - OBSERVACIONES POTREROS GIC-INVIAS-NTS-935-22 del 18-Ago-2023 - APROBADO LOS PATIOS Entrega documento con comunicado UTET-02590-074 del 18-Ago-2023 - la vereda de BOYACA del municipio de Gramalote. GIC-INVIAS-NTS-938-22 del 22-Ago-2023 - APROBADO SANTO DOMINGO GIC-INVIAS-NTS-941-22 del 24-Ago-23 - OBSERVACIONES RINCONADA GIC-INVIAS-NTS-942-22 del 24-Ago-23 - OBSERVACIONES CHICAGUA BAJO Entrega documento con comunicado UTET-02590-092 del 25-Ago-2023 - la vereda de CHICAGUA del municipio de Arboledas. Entrega documento con comunicado UTET-02590-093 del 25-Ago-2023 - VEREDA RINCONADA del municipio de Arboledas. Entrega documento con comunicado UTET-02590-094 del 25-Ago-2023 - VEREDA POTREROS del municipio de Arboledas. GIC-INVIAS-NTS-957-22 del 29-Ago-23 - APROBADO CON OBSERVACIONES VOLCAN

		GIC-INVIAS-NTS-968-22 del 30-Ago-23 - APROBADO CON OBSERVACIONES BOYACA Entrega documento con comunicado UTET-02590-098 del 30-Ago-2023 - VEREDA HELECHAR del municipio de Arboledas. Entrega documento con comunicado UTET-02590-099 del 30-Ago-2023 - VEREDA VOLCAN del municipio de Arboledas. Entrega documento con comunicado UTET-02590-0100 del 30-Ago-2023 - la vereda de BOYACA del municipio de Gramalote. GIC-INVIAS-NTS-977-22 del 31-Ago-23 - APROBADO VOLCAN GIC-INVIAS-NTS-1021-22 del 08-sep-2023 - APROBACION CHICAGUA (500 M) GIC-INVIAS-NTS-1024-22 del 08-sep-2023 - APROBACION RINCONADA GIC-INVIAS-NTS-1025-22 del 08-sep-2023 - APROBACION POTREROS GIC-INVIAS-NTS-1026-22 del 08-sep-2023 - OBSERVACIONES EL HELECHAR Entrega documento con comunicado UTET-02590-116 del 13-Sept-2023 - JUAN BUENO Entrega documento con comunicado UTET-02590-126 del 25-Sept-2023 - HELECHAR GIC-INVIAS-NTS-1100-22 del 25-Sep-23 - APROBADO CON OBSERVACIONES JUAN BUENO GIC-INVIAS-NTS-1119-22 del 29-sep-2023 - OBSERVACIONES EL HELECHAR Entrega documento con comunicado UTET-02590-152 del 10-Oct-2023 - CINERA Entrega documento con comunicado UTET-02590-132 del 05-Oct-2023 - TRAMO ADICIONAL 2 Y 3 - SANTO DOMINGO GIC-INVIAS-NTS-1150-22 del 10-Oct-2023 - APROBADO BOYACA Entrega documento con comunicado UTET-02590-154 del 10-Oct-2023 - JUAN BUENO GIC-INVIAS-NTS-1193-22 del 13-Oct-2023 - APROBADO CINERA GIC-INVIAS-NTS-1204-22 del 18-Oct-2023 - APROBADO JUAN BUENO GIC-INVIAS-NTS-1203-22 del 18-Oct-2023 - OBSERVACIONES SANTO DOMINGO TRAMOS ADICIONALES Entrega documento con comunicado UTET-02590-172 del 20-Oct-2023 – HELECHAR Entrega documento con comunicado UTET-02590-173 del 20-Oct-2023 - TRAMO ADICIONAL 2 Y 3 SANTO DOMINGO GIC-INVIAS-NTS-1240-22 del 30-Oct-23 - APROBADO CON OBSERVACIONES HELECHAR GIC-INVIAS-NTS-1293-22 del 02-Nov-23 - APROBACION TRAMO 2 Y 3 SANTO DOMINGO Entrega documento con comunicado UTET-02590-217 del 06-Dic-2023 - HELECHAR GIC-INVIAS-NTS-1540-22 del 12-Dic-23 - APROBADO HELECHAR

		GIC-INVIAS-NTS-1268-24 DE FECHA 06 DE SEPTIEMRE DE 2024 OBSERVACIONES TOPOGRAFÍA VEREDA SANTO DOMINGO TRAMO 5 MUNICIPIO DE ARBOLEDAS. GIC-INVIAS-NTS-1279-24 DE FECHA 09 DE SEPTIEMRE DE 2024 OBSERVACIONES TOPOGRAFÍA VEREDA VOLCÁN TRAMO 5 MUNICIPIO DE ARBOLEDAS. GIC-INVIAS-NTS-0017-25- 16/01/2025 - OBSERVACIONES
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS		Entrega documento con comunicado UTET-02590-013 del 15-May-2023 - Vía de la vereda de Santo Domingo del municipio de Arboledas. GIC-INVIAS-NTS-567-22 del 23-May-2023 - OBSERVADO Entrega documento con comunicado UTET-02590-014 del 23-May-2023 - Vía de la Helechal Entrega documento con comunicado UTET-02590-015 del 01-Jun-2023 - la vereda de CHICAGUA ALTO Y BAJO del municipio de Arboledas. Entrega documento con comunicado UTET-02590-017 del 06-Jun-2023 - la vereda de RINCONADA del municipio de Arboledas. Entrega documento con comunicado UTET-02590-021 del 22-Jun-2023 - la vereda de SANTO DOMINGO del municipio de Arboledas. Entrega documento con comunicado UTET-02590-023 del 25-Jun-2023 - VEREDA CHICAGUA ALTO Y BAJO MUNICIPIO DE ARBOLEDAS GIC-INVIAS-NTS-734-22 del 29-Jun-2023 - OBSERVADO SANTO DOMINGO Entrega documento con comunicado UTET-02590-026 del 29-Jun-2023 - la vereda de RINCONADA del municipio de Arboledas. GIC-INVIAS-NTS-755-22 del 05-Jul-2023 - OBSERVADO CHICAGUA ALTO Y BAJO Entrega documento con CORREO del 09-Jul-2023 - municipio de los Patios. Entrega documento con comunicado UTET-02590-030 del 13-Jul-2023 - vereda Santa Anita Municipio Gramalote MESA DE TRABAJO 17-07-2023 GIC-INVIAS-NTS-802-22 del 17-Jul-2023 - OBSERVACIONES TRAMO 1 - LOS PATIOS Entrega documento con comunicado UTET-02590-037 del 20-Jul-2023 - vereda San Isidro Municipio Gramalote GIC-INVIAS-NTS-822-22 del 25-Jul-2023 - OBSERVACIONES TRAMO 2 al 12 - LOS PATIOS GIC-INVIAS-NTS-843-22 del 31-Jul-2023 - APROBADO CON OBSERVACIONES SANTA ANITA - GRAMALOTE Entrega documento con comunicado UTET-02590-044 del 28-Jul-2023 - la vereda de SANTO DOMINGO del municipio de Arboledas. Entrega documento con comunicado UTET-02590-048 del 31-Jul-2023 - la vereda de BOYACA del municipio de Gramalote. Entrega documento con comunicado UTET-02590-049 del 02-Ago-2023 - la vereda de CHICAGUA ALTO Y BAJO del municipio de Arboledas.

	GIC-INVIAS-NTS-867-22 del 04-Ago-2023 - OBSERVACIONES SANTO DOMINGO Entrega documento con comunicado UTET-02590-053 del 04-Ago-2023 - Vía de la HELECHAR del municipio de Arboledas. Entrega documento con comunicado UTET-02590-051 del 04-Ago-2023 - vereda SANTA ANITA Municipio Gramalote Entrega documento con comunicado UTET-02590-056 del 08-Ago-2023 - la vereda de BOYACA del municipio de Gramalote. GIC-INVIAS-NTS-892-22 del 11-Ago-2023 - OBSERVACIONES BOYACA Entrega documento con comunicado UTET-02590-065 del 16-Ago-2023 - la vereda de BOYACA del municipio de Gramalote. Entrega documento con comunicado UTET-02590-068 del 16-Ago-2023 - LOS PATIOS T1 A T5. GIC-INVIAS-NTS-926-22 del 17-Ago-2023 - APROBADO T1 Y T1-A Y APROBADO CON OBSERVACIONES T2 SANTA ANITA - GRAMALOTE GIC-INVIAS-NTS-932-22 del 18-Ago-2023 - OBSERVACIONES HELECHAR Entrega documento con comunicado UTET-02590-087 del 24-Ago-2023 - LOS PATIOS T6 AL 12 GIC-INVIAS-NTS-956-22 del 29-Ago-2023 - OBSERVACIONES BOYACA GIC-INVIAS-NTS-1019-22 del 07-Sep-2023 - OBSERVACIONES CHICAGUA BAJO Entrega documento con comunicado UTET-02590-115 del 12-Sept-2023 - SANTO DOMINGO GIC-INVIAS-NTS-1037-22 del 07-Sep-2023 - APROBADO CON OBSERVACIONES LOS PATIOS Entrega documento con comunicado UTET-02590-123 del 18-Sept-2023 - BOYACA Entrega documento con comunicado UTET-02590-124 del 25-Sept-2023 - RINCONADA Entrega documento con comunicado UTET-02590-125 del 25-Sept-2023 - LOS PATIOS GIC-INVIAS-NTS-1104-22 del 25-Sep-2023 - APROBADO CON OBSERVACIONES T1 A T3 Y OBSERVACIONES T4 - BOYACA GIC-INVIAS-NTS-1101-22 del 26-Sep-2023 - OBSERVACIONES SANTO DOMINGO GIC-INVIAS-NTS-1121-22 del 29-Sep-2023 - APROBACION CON OBSERVACIONES RINCONADA Entrega documento con comunicado UTET-02590-129 del 30-Sept-2023 - SAN ISIDRO GIC-INVIAS-NTS-1123-22 del 29-Sep-2023 - OBSERVACIONES HELECHAR Entrega documento con comunicado UTET-02590-133 del 05-Oct-2023 - BOYACA GIC-INVIAS-NTS-1144-22 del 09-Oct-2023 - APROBACION LOS PATIOS

	Entrega documento con comunicado UTET-02590-158 del 11-Oct-2023 - CHICAGUA BAJO GIC-INVIAS-NTS-1183-22 del 12-Oct-2023 - APROBACION BOYACA Entrega documento con comunicado UTET-02590-167 del 13-Oct-2023 - LOS PATIOS Entrega documento con comunicado UTET-02590-168 del 14-Oct-2023 - POTREROS GIC-INVIAS-NTS-1195-22 del 17-Oct-2023 - APROBACION T4 Y OBS T1,2,3 Y 5 VEREDA SAN ISIDRO Entrega documento con comunicado UTET-02590-170 del 20-Oct-2023 - POTREROS Entrega documento con comunicado UTET-02590-171 del 20-Oct-2023 - VOLCAN GIC-INVIAS-NTS-1213-22 del 20-Oct-2023 - APROBACION CON OBSERVACIONES CHICAGUA BAJO GIC-INVIAS-NTS-1239-22 del 26-Oct-2023 - APROBACION CON OBSERVACIONES LOS PATIOS GIC-INVIAS-NTS-1285-22 del 31-Oct-2023 - OBSERVACIOBES VEREDA POTREROS GIC-INVIAS-NTS-1286-22 del 31-Oct-2023 - APROBACION CON OBSERVACIONES T1 Y OBS T2 VEREDA VOLCAN Entrega documento con comunicado UTET-02590-193 del 02-Nov-2023 - HELECHAR GIC-INVIAS-NTS-1349-22 del 16-Nov-2023 - APROBACION CON OBSERVACIONES HELECHAR Entrega documento con comunicado UTET-02590-205 del 10-Nov-2023 - RINCONADA GIC-INVIAS-NTS-1376-22 del 20-Nov-2023 - APROBACION RINCONADA Entrega documento con comunicado UTET-02590-207 del 20-Nov-2023 - SANTO DOMINGO GIC-INVIAS-NTS-1429-22 del 28-Nov-2023 - APROBACION CON OBS T1 SANTO DOMINGO Entrega documento con comunicado UTET-02590-245 del 24-Ene-2024 - LOS PATIOS Entrega documento con comunicado UTET-02590-247 del 25-Ene-2024 - SAN ISIDRO GIC-INVIAS-NTS-210-24 del 05-Feb-2024 - OBSERVACIONES LOS PATIOS GIC-INVIAS-NTS-238-24 del 07-Feb-2024 - REVISION SAN ISIDRO Entrega documento con comunicado UTET-02590-262 del 07-Feb-2024 - LOS PATIOS GIC-INVIAS-NTS-353-24 del 28-FEB-20234 - APROBACION CON OBSERVACIONES LOS PATIOS Entrega documento con comunicado UTET-02590-307 del 15-Abril-2024 - CINERA GIC-INVIAS-NTS-623-24 del 22-Abril-2024 - OBSERVACIONES CINERA

	Entrega documento con comunicado UTET-02590-337 del 15-Jul-2024 - JUAN BUENO UTET-02590-439 - 27/12/2024 - CHICAGUA BAJO – ARBOLEDAS UTET-02590-440 - 27/12/2024 - HELECHAL – ARBOLEDAS Entrega documento con comunicado UTET-02590-459 del 05-feb-2025 – SAN ISIDRO GIC-INVIAS-NTS-0085-25 del 06-Feb-2025 - OBSERVACIONES CHICAGUA BAJO GIC-INVIAS-NTS-0087-25 del 07-Feb-2025 - OBSERVACIONES HELECHAR
ESTUDIO GEOLÓGICO, GEOTÉCNICO E INFORME DE SUELOS	Entrega documento con comunicado UTET-02590-073 del 18-Ago-2023 - RINCONADA Entrega documento con comunicado UTET-02590-072 del 18-Ago-2023 - SANTO DOMINGO Entrega documento con comunicado UTET-02590-077 del 21-Ago-2023 - CHICAGUA BAJO Entrega documento con comunicado UTET-02590-078 del 21-Ago-2023 - VOLCAN Entrega documento con comunicado UTET-02590-079 del 21-Ago-2023 - HELECHAR Entrega documento con comunicado UTET-02590-082 del 22-Ago-2023 - POTREROS Entrega documento con comunicado UTET-02590-083 del 23-Ago-2023 - CINERA Entrega documento con comunicado UTET-02590-084 del 22-Ago-2023 - JUAN B UENO Entrega documento con comunicado UTET-02590-096 del 28-Ago-2023 - LOS PATIOS Entrega documento con comunicado UTET-02590-097 del 30-Ago-2023 - BOYACA GIC-INVIAS-NTS-971-22 del 31-Ago-2023 - OBSERVACIONES CINERA GIC-INVIAS-NTS-972-22 del 31-Ago-2023 - OBSERVACIONES JUAN BUENO GIC-INVIAS-NTS-973-22 del 31-Ago-2023 - OBSERVACIONES RINCONADA GIC-INVIAS-NTS-976-22 del 31-Ago-2023 - OBSERVACIONES SANTO DOMINGO Entrega documentos con comunicado UTET-02590-106 del 02-Sept-2023 - RINCONADA Y SANTO DOMINGO GIC-INVIAS-NTS-1003-22 del 05-Sept-2023 - OBSERVACIONES CHICAGUA GIC-INVIAS-NTS-1005-22 del 05-Sept-2023 - OBSERVACIONES POTREROS GIC-INVIAS-NTS-1006-22 del 05-Sept-2023 - OBSERVACIONES HELECHAR GIC-INVIAS-NTS-1007-22 del 05-Sept-2023 - OBSERVACIONES VOLCAN GIC-INVIAS-NTS-1009-22 del 06-Sept-2023 - OBSERVACIONES

	BOYACA GIC-INVIAS-NTS-1008-22 del 06-Sept-2023 - OBSERVACIONES COROZAL CALIFORNIA Entrega documentos con comunicado UTET-02590-112 del 11-Sept-2023 - SAN ISIDRO Entrega documentos con comunicado UTET-02590-113 del 11-Sept-2023 - SANTA ANITA Entrega documentos con comunicado UTET-02590-109 del 08-Sept-2023 - COROZAL- CALIFORNIA GIC-INVIAS-NTS-1047-22 del 13-Sept-2023 - OBSERVACIONES COROZAL CALIFORNIA GIC-INVIAS-NTS-1051-22 del 13-Sept-2023 - OBSERVACIONES SAN ISIDRO GIC-INVIAS-NTS-1052-22 del 13-Sept-2023 - OBSERVACIONES SANTA ANITA GIC-INVIAS-NTS-1084-22 del 18-Sept-2023 - OBSERVACIONES RINCONADA Entrega documento con comunicado UTET-02590-137 del 06-Oct-2023 - SANTO DOMINGO Entrega documento con comunicado UTET-02590-139 del 06-Oct-2023 - RINCONADA Entrega documento con comunicado UTET-02590-140 del 06-Oct-2023 - LOS PATIOS Entrega documento con comunicado UTET-02590-141 del 06-Oct-2023 - CHICAGUA BAJO Entrega documento con comunicado UTET-02590-142 del 06-Oct-2023 - JUAN BUENO Entrega documento con comunicado UTET-02590-143 del 06-Oct-2023 - CINERA Entrega documento con comunicado UTET-02590-144 del 06-Oct-2023 - HELECHAR Entrega documento con comunicado UTET-02590-145 del 06-Oct-2023 - VOLCAN Entrega documento con comunicado UTET-02590-146 del 06-Oct-2023 - POTREROS Entrega documento con comunicado UTET-02590-147 del 06-Oct-2023 - BOYACA Entrega documento con comunicado UTET-02590-148 del 06-Oct-2023 - SAN ISIDRO Entrega documento con comunicado UTET-02590-149 del 06-Oct-2023 - SANTA ANITA GIC-INVIAS-NTS-1151-22 del 10-Oct-2023 - APROBACION RINCONADA GIC-INVIAS-NTS-1166-22 del 11-Oct-2023 - OBSERVACIONES JUAN BUENO GIC-INVIAS-NTS-1167-22 del 11-Oct-2023 - OBSERVACIONES HELECHAR GIC-INVIAS-NTS-1168-22 del 11-Oct-2023 - OBSERVACIONES POTREROS

	GIC-INVIAS-NTS-1169-22 del 10-Oct-2023 - APROBACION CON OBSERVACIONES SAN ISIDRO GIC-INVIAS-NTS-1169-22 del 10-Oct-2023 - APROBACION CON OBSERVACIONES SANTA ANITA GIC-INVIAS-NTS-1174-22 del 11-Oct-2023 - OBSERVACIONES VOLCAN GIC-INVIAS-NTS-1173-22 del 11-Oct-2023 - OBSERVACIONES CINERA GIC-INVIAS-NTS-1159-22 del 11-Oct-2023 - APROBADO SANTO DOMINGO GIC-INVIAS-NTS-1158-22 del 11-Oct-2023 - APROBADO BOYACA GIC-INVIAS-NTS-1160-22 del 11-Oct-2023 - APROBADO CHICAGUA GIC-INVIAS-NTS-1113-22 del 26-Sep-2023 - OBSERVACIONES LOS PATIOS Entrega documento con comunicado UTET-02590-251 del 31-Ene-2024 - VOLCAN Entrega documento con comunicado UTET-02590-253 del 01-Feb-2024 - JUAN BUENO GIC-INVIAS-NTS-241-22 del 07-Feb-2024 - OBSERVACIONES VOLCAN GIC-INVIAS-NTS-240-22 del 07-Feb-2024 - OBSERVACIONES JUAN BUENO GIC-INVIAS-NTS-608-24 del 19-Abril-2024 - APROBACION CON OBSERVACIONES CINERA GIC-INVIAS-NTS-609-24 del 19-Abril-2024 - APROBACION CON OBSERVACIONES JUAN BUENO GIC-INVIAS-NTS-610-24 del 19-Abril-2024 - APROBACION CON OBSERVACIONES POTREROS GIC-INVIAS-NTS-611-24 del 19-Abril-2024 - APROBACION CON OBSERVACIONES VOLCAN UTET-02590-379 - ESTUDIOS DE GEOTECNIA, DISEÑO Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO PARA TRAMO 1 ANCHO DE 7.00 m VEREDA COROZAL. - 05/10/2024 GIC-INVIAS-NTS-1390-24 - 10/10/2024 - APROBACIÓN TRAMO 1 COROZAL UTET-02590-395 - 09/11/2024 - Vereda Corozal GIC-INVIAS-NTS-1534-24 - 15/11/2024 - APROBACIÓN CON OBSERVACIONES. Entrega documento con comunicado UTET-02590-396 del 13/11/2024- CINERA ARBOLEDAS Entrega documento con comunicado UTET-02590-397 del 13/11/2024- JUAN BUENO ARBOLEDAS Entrega documento con comunicado UTET-02590-398 del 13/11/2024 - SAN ISIDRO GRAMALOTE Entrega documento con comunicado UTET-02590-399 del 13/11/2024 - SANTA ANITA GRAMALOTE Entrega documento con comunicado UTET-02590-400 del 13/11/2024 - POTREROS ARBOLEDAS

	GIC-INVIAS-NTS-1538-24 - 18/11/2024 - CINERA ARBOLEDAS – APROBACIÓN GIC-INVIAS-NTS-1539-24 del 18/11/2024 - JUAN BUENO ARBOLEDAS - APROBACIÓN GIC-INVIAS-NTS-1540-24 - 18/11/2024 - SAN ISIDRO GRAMALOTE - APROBACIÓN GIC-INVIAS-NTS-1541-24 - 18/11/2024 - SANTA ANITA GRAMALOTE - APROBACIÓN GIC-INVIAS-NTS-1542-24 - 18/11/2024 - POTREROS ARBOLEDAS – APROBACIÓN UTET-02590-415 del 06/12/2024 ESTUDIOS DE GEOTECNIA, DISEÑO Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LA VEREDA SANTO DOMINGO TRAMOS 2, 3, 4 Y 5 MUNICIPIO DE ARBOLEDAS. GIC-INVIAS-NTS-1690-24- GEO Y PAV - ARBOLEDAS - APROBACION UTET-02590-416 del 06/12/2024 ESTUDIOS DE GEOTECNIA, DISEÑO Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LA VEREDA CHICAGUA BAJO TRAMOS 3, 4 Y 5 MUNICIPIO DE ARBOLEDAS. GIC-INVIAS-NTS-1691-24- GEO Y PAV - ARBOLEDAS - APROBACION UTET-02590-417 del 06/12/2024 ESTUDIOS DE GEOTECNIA, DISEÑO Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LA VEREDA POTREROS TRAMOS 3 Y 4 MUNICIPIO DE ARBOLEDAS. GIC-INVIAS-NTS-1692-24- GEO Y PAV - ARBOLEDAS - APROBACION UTET-02590-420 del 10/12/2024 ESTUDIOS DE GEOTECNIA, DISEÑO Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LA VEREDA VOLCÁN TRAMOS 3, 4 Y 5 MUNICIPIO DE ARBOLEDAS. GIC-INVIAS-NTS-1693-24- GEO Y PAV - ARBOLEDAS - APROBACION UTET-02590-421 - 12/12/2024 - COMUNICACION GIC-INVIAS-NTS-1534-24 DE FECHA 15 DE NOVIEMRE DE 2024 OBSERVACIONES ESTUDIO DE GEOTECNIA Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS VEREDA VOLCÁN MUNICIPIO DE ARBOLEDA UTET-02590-422 - 12/12/2024 ESTUDIOS DE GEOTECNIA, DISEÑO Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LA VEREDA JUAN BUENO TRAMO 1A MUNICIPIO DE ARBOLEDAS. GIC-INVIAS-NTS-1694-24- GEO Y PAV - ARBOLEDAS - APROBACION UTET-02590-424 - 14/12/2024 ESTUDIOS DE GEOTECNIA, DISEÑO Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LA VEREDA RINCONADA TRAMO 1A MUNICIPIO DE ARBOLEDAS. GIC-INVIAS-NTS-1695-24- GEO Y PAV - ARBOLEDAS - APROBACION
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	Entrega documento con comunicado UTET-02590-073 del 18-Ago-2023 - RINCONADA Entrega documento con comunicado UTET-02590-072 del 18-Ago-2023 - SANTO DOMINGO

	Entrega documento con comunicado UTET-02590-077 del 21-Ago-2023 - CHICAGUA BAJO Entrega documento con comunicado UTET-02590-078 del 21-Ago-2023 - VOLCAN Entrega documento con comunicado UTET-02590-079 del 21-Ago-2023 - HELECHAR Entrega documento con comunicado UTET-02590-082 del 22-Ago-2023 - POTREROS Entrega documento con comunicado UTET-02590-083 del 23-Ago-2023 - CINERA Entrega documento con comunicado UTET-02590-084 del 22-Ago-2023 - JUAN B UENO Entrega documento con comunicado UTET-02590-096 del 28-Ago-2023 - LOS PATIOS Entrega documento con comunicado UTET-02590-097 del 30-Ago-2023 - BOYACA GIC-INVIAS-NTS-971-22 del 31-Ago-2023 - OBSERVACIONES CINERA GIC-INVIAS-NTS-972-22 del 31-Ago-2023 - OBSERVACIONES JUAN BUENO GIC-INVIAS-NTS-973-22 del 31-Ago-2023 - OBSERVACIONES RINCONADA GIC-INVIAS-NTS-976-22 del 31-Ago-2023 - OBSERVACIONES SANTO DOMINGO Entrega documentos con comunicado UTET-02590-106 del 02-Sept-2023 - RINCONADA Y SANTO DOMINGO GIC-INVIAS-NTS-1003-22 del 05-Sept-2023 - OBSERVACIONES CHICAGUA GIC-INVIAS-NTS-1005-22 del 05-Sept-2023 - OBSERVACIONES POTREROS GIC-INVIAS-NTS-1006-22 del 05-Sept-2023 - OBSERVACIONES HELECHAR GIC-INVIAS-NTS-1007-22 del 05-Sept-2023 - OBSERVACIONES VOLCAN GIC-INVIAS-NTS-1009-22 del 06-Sept-2023 - OBSERVACIONES BOYACA GIC-INVIAS-NTS-1008-22 del 06-Sept-2023 - OBSERVACIONES COROZAL CALIFORNIA Entrega documentos con comunicado UTET-02590-112 del 11-Sept-2023 - SAN ISIDRO Entrega documentos con comunicado UTET-02590-113 del 11-Sept-2023 - SANTA ANITA Entrega documentos con comunicado UTET-02590-109 del 08-Sept-2023 - COROZAL- CALIFORNIA GIC-INVIAS-NTS-1047-22 del 13-Sept-2023 - OBSERVACIONES COROZAL CALIFORNIA GIC-INVIAS-NTS-1051-22 del 13-Sept-2023 - OBSERVACIONES SAN ISIDRO GIC-INVIAS-NTS-1052-22 del 13-Sept-2023 - OBSERVACIONES

	SANTA ANITA GIC-INVIAS-NTS-1084-22 del 18-Sept-2023 - OBSERVACIONES RINCONADA Entrega documento con comunicado UTET-02590-137 del 06-Oct-2023 - SANTO DOMINGO Entrega documento con comunicado UTET-02590-139 del 06-Oct-2023 - RINCONADA Entrega documento con comunicado UTET-02590-140 del 06-Oct-2023 - LOS PATIOS Entrega documento con comunicado UTET-02590-141 del 06-Oct-2023 - CHICAGUA BAJO Entrega documento con comunicado UTET-02590-142 del 06-Oct-2023 - JUAN BUENO Entrega documento con comunicado UTET-02590-143 del 06-Oct-2023 - CINERA Entrega documento con comunicado UTET-02590-144 del 06-Oct-2023 - HELECHAR Entrega documento con comunicado UTET-02590-145 del 06-Oct-2023 - VOLCAN Entrega documento con comunicado UTET-02590-146 del 06-Oct-2023 - POTREROS Entrega documento con comunicado UTET-02590-147 del 06-Oct-2023 - BOYACA Entrega documento con comunicado UTET-02590-148 del 06-Oct-2023 - SAN ISIDRO Entrega documento con comunicado UTET-02590-149 del 06-Oct-2023 - SANTA ANITA GIC-INVIAS-NTS-1151-22 del 10-Oct-2023 - APROBACION RINCONADA GIC-INVIAS-NTS-1166-22 del 11-Oct-2023 - OBSERVACIONES JUAN BUENO GIC-INVIAS-NTS-1167-22 del 11-Oct-2023 - OBSERVACIONES HELECHAR GIC-INVIAS-NTS-1168-22 del 11-Oct-2023 - OBSERVACIONES POTREROS GIC-INVIAS-NTS-1169-22 del 10-Oct-2023 - APROBACION CON OBSERVACIONES SAN ISIDRO GIC-INVIAS-NTS-1169-22 del 10-Oct-2023 - APROBACION CON OBSERVACIONES SANTA ANITA GIC-INVIAS-NTS-1174-22 del 11-Oct-2023 - OBSERVACIONES VOLCAN GIC-INVIAS-NTS-1173-22 del 11-Oct-2023 - OBSERVACIONES CINERA GIC-INVIAS-NTS-1159-22 del 11-Oct-2023 - APROBADO SANTO DOMINGO GIC-INVIAS-NTS-1158-22 del 11-Oct-2023 - APROBADO BOYACA GIC-INVIAS-NTS-1160-22 del 11-Oct-2023 - APROBADO CHICAGUA GIC-INVIAS-NTS-1113-22 del 26-Sep-2023 - OBSERVACIONES LOS PATIOS

	GIC-INVIAS-NTS-1459-22 del 30-Nov-2023 - APROBADO LOS PATIOS Entrega documento con comunicado UTET-02590-251 del 31-Ene-2024 - VOLCAN Entrega documento con comunicado UTET-02590-253 del 01-Feb-2024 - JUAN BUENO Entrega documento con comunicado UTET-02590-255 del 07-Feb-2024 - POTREROS Entrega documento con comunicado UTET-02590-256 del 07-Feb-2024 - CINERA Entrega documento con comunicado UTET-02590-258 del 07-Feb-2024 - SAN ISIDRO Entrega documento con comunicado UTET-02590-259 del 07-Feb-2024 - SANTA ANITA GIC-INVIAS-NTS-240-24 del 07-Feb-2024 - OBSERVACIONES JUAN BUENO GIC-INVIAS-NTS-241-24 del 07-Feb-2024 - OBSERVACIONES VOLCAN Entrega documento con comunicado UTET-02590-254 del 07-Feb-2024 - HELECHAR GIC-INVIAS-NTS-282-24 del 12-Feb-2024 - APROBADO HELECHAR GIC-INVIAS-NTS-284-24 del 12-Feb-2024 - APROBACION CON OBSERVACIONES SANTA ANITA GIC-INVIAS-NTS-285-24 del 12-Feb-2024 - APROBACION CON OBSERVACIONES SAN ISIDRO GIC-INVIAS-NTS-286-24 del 12-Feb-2024 - OBSERVACIONES POTREROS GIC-INVIAS-NTS-287-24 del 12-Feb-2024 - OBSERVACIONES CINERA UTET-02590-379 - ESTUDIOS DE GEOTECNIA, DISEÑO Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO PARA TRAMO 1 ANCHO DE 7.00 m VEREDA COROZAL. - 05/10/2024 GIC-INVIAS-NTS-1390-24 - 10/10/2024 - APROBACIÓN TRAMO 1 COROZAL UTET-02590-395 - 09/11/2024 - Vereda Corozal Entrega documento con comunicado UTET-02590-396 del 13/11/2024- CINERA ARBOLEDAS Entrega documento con comunicado UTET-02590-397 del 13/11/2024- JUAN BUENO ARBOLEDAS Entrega documento con comunicado UTET-02590-398 del 13/11/2024 - SAN ISIDRO GRAMALOTE Entrega documento con comunicado UTET-02590-399 del 13/11/2024 - SANTA ANITA GRAMALOTE Entrega documento con comunicado UTET-02590-400 del 13/11/2024 - POTREROS ARBOLEDAS GIC-INVIAS-NTS-1538-24 - 18/11/2024 - CINERA ARBOLEDAS - APROBACIÓN GIC-INVIAS-NTS-1539-24 del 18/11/2024 - JUAN BUENO ARBOLEDAS - APROBACIÓN

	GIC-INVIAS-NTS-1540-24 - 18/11/2024 - SAN ISIDRO GRAMALOTE - APROBACIÓN GIC-INVIAS-NTS-1541-24 - 18/11/2024 - SANTA ANITA GRAMALOTE - APROBACIÓN GIC-INVIAS-NTS-1542-24 - 18/11/2024 - POTREROS ARBOLEDAS - APROBACIÓN UTET-02590-415 del 06/12/2024 ESTUDIOS DE GEOTECNIA, DISEÑO Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LA VEREDA SANTO DOMINGO TRAMOS 2, 3, 4 Y 5 MUNICIPIO DE ARBOLEDAS. GIC-INVIAS-NTS-1690-24- GEO Y PAV - ARBOLEDAS - APROBACION UTET-02590-416 del 06/12/2024 ESTUDIOS DE GEOTECNIA, DISEÑO Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LA VEREDA CHICAGUA BAJO TRAMOS 3, 4 Y 5 MUNICIPIO DE ARBOLEDAS. GIC-INVIAS-NTS-1691-24- GEO Y PAV - ARBOLEDAS - APROBACION UTET-02590-417 del 06/12/2024 ESTUDIOS DE GEOTECNIA, DISEÑO Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LA VEREDA POTREROS TRAMOS 3 Y 4 MUNICIPIO DE ARBOLEDAS. GIC-INVIAS-NTS-1692-24- GEO Y PAV - ARBOLEDAS - APROBACION UTET-02590-420 del 10/12/2024 ESTUDIOS DE GEOTECNIA, DISEÑO Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LA VEREDA VOLCÁN TRAMOS 3, 4 Y 5 MUNICIPIO DE ARBOLEDAS. GIC-INVIAS-NTS-1693-24- GEO Y PAV - ARBOLEDAS - APROBACION UTET-02590-421 - 12/12/2024 - COMUNICACION GIC-INVIAS-NTS-1534-24 DE FECHA 15 DE NOVIEMRE DE 2024 OBSERVACIONES ESTUDIO DE GEOTECNIA Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS VEREDA VOLCÁN MUNICIPIO DE ARBOLEDA UTET-02590-422 - 12/12/2024 ESTUDIOS DE GEOTECNIA, DISEÑO Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LA VEREDA JUAN BUENO TRAMO 1A MUNICIPIO DE ARBOLEDAS. GIC-INVIAS-NTS-1694-24- GEO Y PAV - ARBOLEDAS - APROBACION UTET-02590-424 - 14/12/2024 ESTUDIOS DE GEOTECNIA, DISEÑO Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LA VEREDA RINCONADA TRAMO 1A MUNICIPIO DE ARBOLEDAS. GIC-INVIAS-NTS-1695-24- GEO Y PAV - ARBOLEDAS - APROBACION
INFORME ESTRUCTURAL	Entrega documentos con comunicado UTET-02590-118 del 13-Sept-2023 LOS PATIOS GIC-INVIAS-NTS-1106-22 del 25-Sept-2023 – OBSERVACIONES Entrega documentos con comunicado UTET-02590-130 del 04-Oct-2023 GIC-INVIAS-NTS-1130-22 del 11-Oct-2023 - OBSERVACIONES Entrega documentos con comunicado UTET-02590-306 del 11-Abri-2024 GIC-INVIAS-NTS-719-24 del 10-May-2024 - OBSERVACIONES

	Entrega documentos con comunicado UTET-02590-315 del 23-May-2024 GIC-INVIAS-NTS-839-24 del 29-May-2024 – OBSERVACIONES Entrega documentos con comunicado UTET-02590-324 del 13-Jun-2024 GIC-INVIAS-NTS-906-24 del 14-Jun-2024 – APROBACION UTET-02590-379 - ESTRUCTURAL TRAMO 1 COROZAL GIC-INVIAS-NTS-1417-24 - 18/10/2024 – OBSERVACIONES. UTET-02590-415 del 06/12/2024 ESTUDIOS DE GEOTECNIA, DISEÑO Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LA VEREDA SANTO DOMINGO TRAMOS 2, 3, 4 Y 5 MUNICIPIO DE ARBOLEDAS. GIC-INVIAS-NTS-1676-24- ESTRUCTURAL - ARBOLEDAS - OBSERVACIONES - 11/12/2024 UTET-02590-416 del 06/12/2024 ESTUDIOS DE GEOTECNIA, DISEÑO Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LA VEREDA CHICAGUA BAJO TRAMOS 3, 4 Y 5 MUNICIPIO DE ARBOLEDAS. GIC-INVIAS-NTS-1677-24- ESTRUCTURAL - ARBOLEDAS - OBSERVACIONES - 11/12/2024 UTET-02590-417 del 06/12/2024 ESTUDIOS DE GEOTECNIA, DISEÑO Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LA VEREDA POTREROS TRAMOS 3 Y 4 MUNICIPIO DE ARBOLEDAS. GIC-INVIAS-NTS-1678-24- ESTRUCTURAL - ARBOLEDAS - OBSERVACIONES - 11/12/2024 UTET-02590-420 del 10/12/2024 ESTUDIOS DE GEOTECNIA, DISEÑO Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LA VEREDA VOLCÁN TRAMOS 3, 4 Y 5 MUNICIPIO DE ARBOLEDAS. GIC-INVIAS-NTS-1681-24- ESTRUCTURAL - ARBOLEDAS - OBSERVACIONES - 12/12/2024 UTET-02590-422 - 12/12/2024 ESTUDIOS DE GEOTECNIA, DISEÑO Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LA VEREDA JUAN BUENO TRAMO 1A MUNICIPIO DE ARBOLEDAS. GIC-INVIAS-NTS-1684-24- ESTRUCTURAL - ARBOLEDAS - OBSERVACIONES - 16/12/2024 UTET-02590-424 - 14/12/2024 ESTUDIOS DE GEOTECNIA, DISEÑO Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LA VEREDA RINCONADA TRAMO 1A MUNICIPIO DE ARBOLEDAS. GIC-INVIAS-NTS-1707-24- ESTRUCTURAL - ARBOLEDAS - OBSERVACIONES - 18/12/2024 UTET-02590-430 17/12/2024 INFORME DISEÑO ESTRUCTURAL TRAMOS ADICIONALES MUNICIPIO DE ARBOLEDAS. GIC-INVIAS-NTS-1714-24- ESTRUCTURAL - ARBOLEDAS - OBSERVACIONES - 19/12/2024
INFORME HIDRÁULICO	ENTREGA SOLICITUD CAMBIO TUB 36" ALCANTARILAS EL XXX GIC-INVIAS-NTS-495-22 del 05-May-2023 - CONCEPTO NO ACEPTADO Entrega documento con comunicado UTET-02590-043 del 26-Jul-2023 - VEREDAS SANTO DOMINGO Y RINCONADA DEL MUNICIPIO DE ARBOLEDAS.

	Entrega documento con comunicado UTET-02590-045 del 28-Jul-2023 - VEREDAS CHICAGUA ALTO Y BAJO DE MUNICIPIO DE ARBOLEDAS GIC-INVIAS-NTS-887-22 del 11-Ago-2023 - OBSERVACIONES SANTO DOMINGO Y RINCONADA GIC-INVIAS-NTS-891-22 del 11-Ago-2023 - OBSERVACIONES CHICAGUA BAJO Entrega documento con comunicado UTET-02590-080 del 22-Ago-2023 - VEREDAS CHICAGUA ALTO Entrega documento con comunicado UTET-02590-081 del 22-Ago-2023 - VEREDAS CHICAGUA BAJO Entrega Alcance al documento con comunicado UTET-02590-086 del 23-Ago-2023 - VEREDAS CHICAGUA BAJO Entrega Alcance al documento con comunicado UTET-02590-107 del 06-Sep-2023 - VEREDA SANTO DOMINGOGIC-INVIAS-NTS-1044-22 del 14-Sep-2023 - OBSERVACIONES CHICAGUA BAJOEntrega Alcance al documento con comunicado UTET-02590-127 del 26-Sep-2023 - MUNICIPIO LOS PATIOS GIC-INVIAS-NTS-1122A-22 del 02-Oct-2023 - OBSERVACIONES SANTO DOMINGO GIC-INVIAS-NTS-1146-22 del 06-Oct-2023 - OBSERVACIONES LOS PATIOS Entrega Alcance al documento con comunicado UTET-02590-150 del 06-Oct-2023 - VEREDA SANTO DOMINGO GIC-INVIAS-NTS-1171-22 del 11-Oct-2023 - APROBACION SANTO DOMINGO Entrega Alcance al documento con comunicado UTET-02590-174 del 20-Oct-2023 -LOS PATIOS GIC-INVIAS-NTS-1257-22 del 27-Oct-2023 - APROBACION RINCONADA Entrega documento con comunicado UTET-02590-186 del 28-Oct-2023 - BOYACA Entrega documento con comunicado UTET-02590-195 del 04-Nov-2023 - CHICAGUA BAJO Entrega documento con comunicado UTET-02590-196 del 04-Nov-2023 – RINCONADA GIC-INVIAS-NTS-1321-22 del 09-Nov-2023 - APROBACION LOS PATIOS GIC-INVIAS-NTS-1322-22 del 09-Nov-2023 - APROBACION RINCONADA GIC-INVIAS-NTS-1323-22 del 09-Nov-2023 - OBSERVACIONES CHICAGUA BAJO Entrega documento con comunicado UTET-02590-200 del 11-Nov-2023 – HELECHAR Entrega documento con comunicado UTET-02590-208 del 20-Nov-2023 - CHICAGUA Entrega documento con comunicado UTET-02590-209 del 20-Nov-2023 - SAN ISIDRO

	Entrega documento con comunicado UTET-02590-213 del 24-Nov-2023 – BOYACA Entrega documento con comunicado UTET-02590-214 del 24-Nov-2023 - SANTA ANITA GIC-INVIAS-NTS-1397-22 del 22-Nov-2023 - APROBACION CON OBSERVACIONES HELECHAR Entrega documento con comunicado UTET-02590-222 del 11-Dic-2023 – HELECHAR GIC-INVIAS-NTS-1570-22 del 18-Dic-2023 - APROBACION CON OBSERVACIONES SANTA ANITA GIC-INVIAS-NTS-1571-22 del 18-Dic-2023 - APROBACION BOYACA GIC-INVIAS-NTS-1572-22 del 18-Dic-2023 - APROBACION CON OBSERVACIONES SAN ISIDRO GIC-INVIAS-NTS-1573-22 del 18-Dic-2023 - APROBACION CON OBSERVACIONES CHICAGUA BAJO Entrega documento con comunicado UTET-02590-237 del 21-Dic-2023 – VOLCAN Entrega documento con comunicado UTET-02590-237 del 21-Dic-2023 – VOLCAN GIC-INVIAS-NTS-104-22 del 17-Ene-2024 - APROBACION HELECHAR GIC-INVIAS-NTS-118-24 del 18-Ene-2024 - APROBACION VOLCAN Entrega documento con comunicado UTET-02590-244 del 24-Ene-2024 - CONCEPTO ALCANTARILLA EXISTETE LOS PATIOS Entrega documento con omunicado UTET-02590-260 del 07-Feb-2024 - CHICAGUA BAJO Entrega documento con omunicado UTET-02590-261 del 07-Feb-2024 - SANTA ANITA GIC-INVIAS-NTS-288-24 del 13-Feb-2024 - APROBACION POTRETOS GIC-INVIAS-NTS-333-24 del 22-Feb-2024 - APROBACION CON OBSERVACIONES CHICAGUA BAJO Entrega documento con omunicado UTET-02590-273 del 22-Feb-2024 - SAN ISIDRO GIC-INVIAS-NTS-371-24 del 01-Mar-2024 - OBSERVACIONES ALCANTARILLAS LOS PATIOS GIC-INVIAS-NTS-383-24 del 05-Mar-2024 - APROBACION SANTA ANITA GIC-INVIAS-NTS-384-24 del 05-Mar-2024 - APROBACION SANTA ANITA Entrega documento con omunicado UTET-02590-286 del 07-Mar-2024 - CHICAGUA BAJO GIC-INVIAS-NTS-384-24 del 05-Mar-2024 - APROBACION SAN ISIDRO Entrega documento con omunicado UTET-02590-286 del 07-Mar-2024 - CHICAGUA BAJO GIC-INVIAS-NTS-512-24 del 02-Abril-2024 - APROBACION CHICAGURA BAJO

	Entrega documento con omunicado UTET-02590-314 del 23-May-2024 – CINERA GIC-INVIAS-NTS-991-24 del 28-Jun-2024 – OBSERVACIONES Entrega documento con comunicado UTET-02590-338 del 18-Jul-2024 - JUAN BUENO DISEÑO HIDRAULICO VEREDA CINERA MUNICIPIO DE ARBOLEDAS. - GIC-INVIAS-NTS-1326-24 - 17/09/2024 – APROBACIÓN UTET-02590-381 -18-10-2024 - DISEÑO HIDRAULICO DESCOLES TRAMO 1 VEREDA COROZAL MUNICIPIO DE LOS PATIOS UTET-02590-385 - 28/10/2024 - DISEÑO HIDRAULICO DESCOLES TRAMO 1 VEREDA COROZAL MUNICIPIO DE LOS PATIOS GIC-INVIAS-NTS-1458-24 - 29/10/2024 – OBSERVACIONES UTET-02590-401 - 13/11/2024 - DISEÑO HIDRAULICO DESCOLES TRAMO 1 VEREDA COROZAL MUNICIPIO DE LOS PATIOS GIC-INVIAS-NTS-1535-24 - 15/11/2024 – APROBACIÓN UTET-02590-431 18/12/2024 AJUSTE DISEÑO HIDRAULICO DESCOLE PR0+630 TRAMO 1 VEREDA COROZAL MUNICIPIO DE LOS PATIOS. UTET-02590-432 19/12/2024 COMUNICACION GIC-INVIAS-NTS-1649-24 DE FECHA 09 DE DICIEMRE DE 2024 CONCEPTO GENERAL CAMBIO OBRAS TRANSVERSALES.

Tabla 37 Trazabilidad Estudios y Diseños Gobernación 1943

3.8.2.2. Etapa de Construcción

Actualmente, el contrato presenta un avance físico del 88,33% en la ejecución del proyecto, de acuerdo con lo reportado en el informe semanal No. 91. Durante el periodo del 25 al 31 de marzo no se evidencia un avance significativo en la ejecución de las actividades faltantes, lo cual continua el mismo avance.

MUNICIPIO	ALCANCE PROYECTO NUEVO	CORREDOR VIAL	EJECUTADO A LA FECHA	TOTAL, MUNICIPIO	CANTIDAD POR EJECUTAR
ARBOLEDAS	6929	VEREDA SANTA DOMINGO	1595	6787	142
		VEREDA RINCONADA	464		
		VEREDA HELECHAR	534		
		VEREDA VOLCAN	812		
		VEREDA CHICAGUA BAJO	796		
		VEREDA JUAN BUENO	835		
		VEREDA CINERA	1140		
		VEREDA PORTREROS	611		

GRAMALOTE	3054	VEREDA BOYACA	1466	3054	0
		VEREDA SAN ISIDRO	1028		
		VEREDA SANTA ANITA	560		
LOS PATIOS	4554	COROZAL - CALIFORNIA	3900,2	3900,2	653,8
TOTAL	14537		**TOTAL**	13741,2	795,8

Tabla 38 Cantidades de placa huella ejecutada a la fecha – Gobernación 1943

3.6. Acciones a seguir por parte de la Interventoría.

Entre las acciones a seguir por parte de la interventoría se tienen las siguientes:

1. Realizar mesas de trabajo con los especialistas del Contratista con el fin de no generar más de 1 versión en la elaboración y revisión de estudios y diseños.

2. Realizar comités de seguimiento a los contratos de obra, con el fin de generar compromisos y que sean cumplidos en un periodo no superior a 8 días calendario.
3. Realizar la revisión de los documentos entregados por los contratistas de obra y de encontrarse de acuerdo al pliego de condiciones dar concepto aprobatorio.

4. Realizar gestiones en el Invias para llevar a feliz término los contratos de obra.

5. Realizar recorridos de obra en los corredores a intervenir con el fin de tener una visual general del proyecto y poder culminarlo en pro de beneficiar a la comunidad del sector.

6. Realizar seguimiento, control y vigilancia a los contratos de obra con el fin de cumplir con el Manual y las Especificaciones Generales de Mantenimiento de Carreteras.

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.

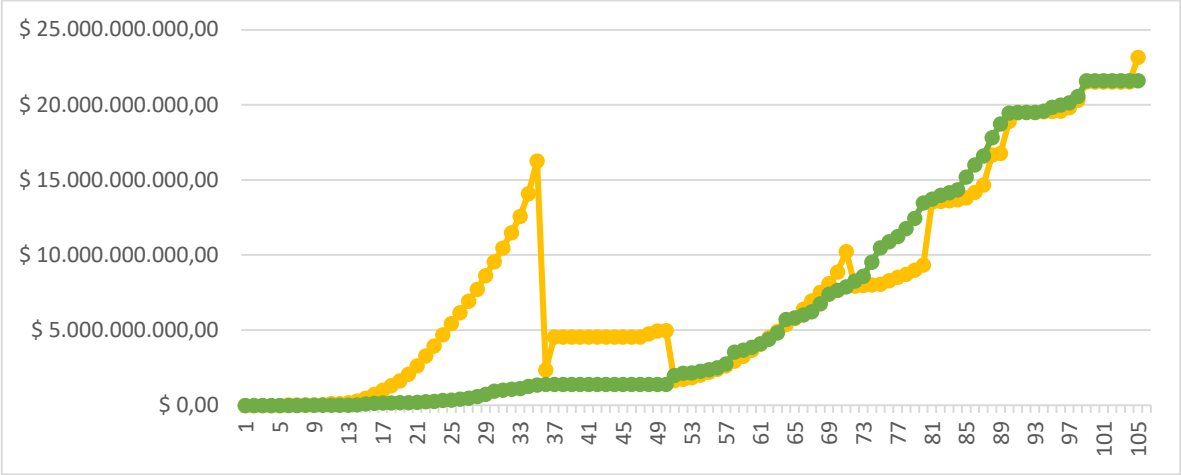


Gráfico 8 Avance Financiero Municipio de Gobernación 1943

Con corte al 27 de enero de 2025, el estado de avance ejecutado equivalente en pesos a $ 21.608.272.385,16 vs un programado equivalente en pesos a $ 23.162.828.337,02

CRONOGRAMA DE OBRA Y FLUJO DE CAJA MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS					
ITEM DE PAGO	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR OBRA PROGRAMADA**
	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SOBRE TRAMOS DE LA VEREDA CALIFORNIA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER				
1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	8189,50	$ 26.251,00	$ 214.982.486,04
1.2	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	M3	2782,61	$ 807.348,00	$ 2.246.536.822,26
1.3	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	127139,73	$ 9.279,00	$ 1.179.729.554,67
1.4	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	7540,21	$ 170.537,00	$ 1.285.884.792,77
1.5	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (G) - CICLÓPEO	M3	1147,58	$ 423.017,00	$ 485.445.848,86

1.6	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU, INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	0,00	$ 697.707,00	$ 0,00
2.1	GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1; RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO)	M3	90,00	$ 302.839,00	$ 27.255.510,00
3.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	965,69	$ 26.251,00	$ 25.350.328,19
3.2	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	M3	195,50	$ 807.348,00	$ 157.836.534,00
3.3	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	M3	15,46	$ 573.756,00	$ 8.870.267,76
3.4	RELLENOS PARA ESTRUCTURA CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	357,05	$ 36.448,00	$ 13.013.758,40
3.5	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	ML	0,00	$ 915.776,00	$ 0,00
3.6	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	15299,11	$ 9.279,00	$ 141.960.441,69
3,7	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA (G) - CICLOPEO	M3	0,00	$ 423.017,00	$ 0,00
4.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	M3/KM	105957,53	$ 2.050,00	$ 217.212.944,70
5.1	SEÑAL SI-04 (POSTE DE REFERENCIA)	UND	0,00	$ 729.960,00	$ 0,00
6.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	15236,68	$ 1.445,00	$ 22.017.002,60
6.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES	M2	0,00	$ 3.041,00	$ 0,00
NP1	TUBERIA DE PLÁSTICO TIPO PVC DIÁMETRO 36"/900 MM	M	58,00	$ 1.530.542,00	$ 88.771.436,00
NP2	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	UND	8,00	$ 650.789,00	$ 5.206.312,00
NP9	GEOTEXTIL TEJIDO 2400 N PARA ESTABILIZACIÓN DE LA SUBRASANTE	M2	25.114,06	$ 17.565,00	$ 441.128.463,90
NP10	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	M3	82,23	$ 307.133,00	$ 25.255.546,59

NP11	DEMOLICION DE ROCA	M3	61,33	$ 295.305,00	$ 18.111.055,65
NP 12	DREN TIPO FRANCES (SECCION 1,0X0,6M) (LOS PATIOS)	ML	0,00	$ 149.477,00	$ 0,00
NP15	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA PARA SUUMIDERO	ML	11,00	$ 1.765.471,00	$ 19.420.181,00
	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SOBRE TRAMOS DE VEREDA SANTO DOMINGO UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ARBOLEDAS, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER				
7.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	1.079,96	$ 67.314,00	$ 72.696.427,44
7.2	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	M3	975,69	$ 1.004.718,00	$ 980.293.305,42
7.3	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	46.440,88	$ 9.371,00	$ 435.197.486,48
7.4	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	0,00	$ 357.666,00	$ 0,00
7.5	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (G) - CICLÓPEO	M3	168,36	$ 610.918,00	$ 102.854.154,48
8.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	433,70	$ 67.314,00	$ 29.194.081,80
8.2	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	M3	34,60	$ 1.004.718,00	$ 34.763.242,80
8.3	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	M3	3,17	$ 797.129,00	$ 2.526.898,93
8.4	RELLENOS PARA ESTRUCTURA CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	211,86	$ 38.182,00	$ 8.089.238,52
8.5	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	ML	0,00	$ 989.156,00	$ 0,00
8.6	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	2.899,72	$ 9.371,00	$ 27.173.276,12
9.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	M3/KM	21.390,09	$ 2.227,00	$ 47.635.730,43
10.1	SEÑAL SI-04 (POSTE DE REFERENCIA)	UND	0,00	$ 749.983,00	$ 0,00
11.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	0,00	$ 1.954,00	$ 0,00

11.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES	M2	11.573,35	$ 4.424,00	$ 51.200.500,40
NP1	TUBERIA DE PLÁSTICO TIPO PVC DIÁMETRO 36"/900 MM	M	63,50	$ 1.530.542,00	$ 97.189.417,00
NP3	SUMINISTRO MATERIAL DE MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE (ARBOLEDAS)	M3	683,96	$ 302.603,00	$ 206.968.347,88
NP5	SUBRASANTE ESTABILIZADA CON CEMENTO (INCLUYE SUMINISTRO DEL CEMENTO)	M3	1.024,89	$ 69.619,00	$ 71.351.816,91
NP11	DEMOLICION DE ROCA	M3	1,26	$ 295.305,00	$ 372.084,30
NP16	REMOCION DE DERRUMBES	M3	796,95	$ 22.786,00	$ 18.159.302,70
	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SOBRE TRAMOS DE VEREDA VOLCAN UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ARBOLEDAS, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER				
12.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	778,66	$ 67.314,00	$ 52.414.719,24
12.2	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	M3	481,58	$ 1.004.718,00	$ 483.857.100,88
12.3	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	23.257,37	$ 9.371,00	$ 217.944.814,27
12.4	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	124,38	$ 357.666,00	$ 44.486.497,08
12.5	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (G) - CICLÓPEO	M3	118,34	$ 610.918,00	$ 72.296.036,12
13.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	323,64	$ 67.314,00	$ 21.785.502,96
13.2	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	M3	36,56	$ 1.004.718,00	$ 36.732.490,08
13.3	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	M3	4,42	$ 797.129,00	$ 3.523.310,18
13.4	RELLENOS PARA ESTRUCTURA CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	162,31	$ 38.182,00	$ 6.197.320,42
13.5	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	ML	0,00	$ 989.156,00	$ 0,00
13.6	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	3.051,28	$ 9.371,00	$ 28.593.544,88

14.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	M3/KM	12.871,89	$ 2.227,00	$ 28.665.699,03
15.1	SEÑAL SI-04 (POSTE DE REFERENCIA)	UND	0,00	$ 749.983,00	$ 0,00
16.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	0,00	$ 1.954,00	$ 0,00
16.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES	M2	10.767,35	$ 4.424,00	$ 47.634.756,40
NP1	TUBERIA DE PLÁSTICO TIPO PVC DIÁMETRO 36"/900 MM	M	49,80	$ 1.530.542,00	$ 76.220.991,60
NP2	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	UND	0,00	$ 650.789,00	$ 0,00
NP3	SUMINISTRO MATERIAL DE MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE (ARBOLEDAS)	M3	119,96	$ 302.603,00	$ 36.300.255,88
NP6	SUBRASANTE ESTABILIZADA CON CAL (INCLUYE SUMINISTRO DE CAL)	M2	0,00	$ 26.893,00	$ 0,00
NP7	PEDRAPLEN COMPACTO (ARBOLEDAS)	M3	17,40	$ 358.436,00	$ 6.236.786,40
NP 12	DREN TIPO FRANCES (SECCION 1,0X0,6M) (ARBOLEDAS)	ML	80,00	$ 222.293,00	$ 17.783.440,00
NP16	REMOCION DE DERRUMBES	M3	328,96	$ 22.786,00	$ 7.495.682,56
	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SOBRE TRAMOS DE VEREDA POTREROS UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ARBOLEDAS, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER				
17.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	723,73	$ 67.314,00	$ 48.717.161,22
17.2	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	M3	356,21	$ 1.004.718,00	$ 357.890.598,78
17.3	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	17.200,07	$ 9.371,00	$ 161.181.855,97
17.4	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	480,47	$ 357.666,00	$ 171.847.783,02
17.5	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (G) - CICLÓPEO	M3	168,99	$ 610.918,00	$ 103.239.032,82

18.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	419,85	$ 67.314,00	$ 28.261.782,90
18.2	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	M3	48,99	$ 1.004.718,00	$ 49.221.134,82
18.3	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	M3	4,92	$ 797.129,00	$ 3.921.874,68
18.4	RELLENOS PARA ESTRUCTURA CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	189,48	$ 38.182,00	$ 7.234.725,36
18.5	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	ML	0,00	$ 989.156,00	$ 0,00
18.6	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	4.076,31	$ 9.371,00	$ 38.199.101,01
19.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	M3/KM	10.094,39	$ 2.227,00	$ 22.480.206,53
20.1	SEÑAL SI-04 (POSTE DE REFERENCIA)	UND	0,00	$ 749.983,00	$ 0,00
21.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	0,00	$ 1.954,00	$ 0,00
21.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES	M2	6.145,90	$ 4.424,00	$ 27.189.461,60
NP1	TUBERIA DE PLÁSTICO TIPO PVC DIÁMETRO 36"/900 MM	M	55,10	$ 1.530.542,00	$ 84.332.864,20
NP3	SUMINISTRO MATERIAL DE MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE (ARBOLEDAS)	M3	140,00	$ 302.603,00	$ 42.364.420,00
NP6	SUBRASANTE ESTABILIZADA CON CAL (INCLUYE SUMINISTRO DE CAL)	M2	15,00	$ 26.893,00	$ 403.395,00
	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SOBRE TRAMOS DE VEREDA CHICAGUA BAJO UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ARBOLEDAS, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER				
22.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	618,85	$ 67.314,00	$ 41.657.268,90
22.2	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	M3	510,19	$ 1.004.718,00	$ 512.600.109,92
22.3	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	24.152,81	$ 9.371,00	$ 226.335.982,51

22.4	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	462,75	$ 357.666,00	$ 165.509.941,50
22.5	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (G) - CICLÓPEO	M3	68,33	$ 610.918,00	$ 41.744.026,94
23.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	337,67	$ 67.314,00	$ 22.729.918,38
23.2	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	M3	52,14	$ 1.004.718,00	$ 52.385.996,52
23.3	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	M3	4,29	$ 797.129,00	$ 3.419.683,41
23.4	RELLENOS PARA ESTRUCTURA CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	167,30	$ 38.182,00	$ 6.387.848,60
23.5	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	ML	0,00	$ 989.156,00	$ 0,00
23.6	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	4.558,91	$ 9.371,00	$ 42.721.545,61
24.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	M3/KM	6.928,35	$ 2.227,00	$ 15.429.429,88
25.1	SEÑAL SI-04 (POSTE DE REFERENCIA)	UND	0,00	$ 749.983,00	$ 0,00
26.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	0,00	$ 1.954,00	$ 0,00
26.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES	M2	6.028,72	$ 4.424,00	$ 26.671.057,28
NP1	TUBERIA DE PLÁSTICO TIPO PVC DIÁMETRO 36"/900 MM	M	51,30	$ 1.530.542,00	$ 78.516.804,60
NP2	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	UND	3,00	$ 650.789,00	$ 1.952.367,00
NP3	SUMINISTRO MATERIAL DE MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE (ARBOLEDAS)	M3	170,69	$ 302.603,00	$ 51.651.306,07
NP6	SUBRASANTE ESTABILIZADA CON CAL (INCLUYE SUMINISTRO DE CAL)	M2	5,00	$ 26.893,00	$ 134.465,00
NP7	PEDRAPLEN COMPACTO (ARBOLEDAS)	M3	3,15	$ 358.436,00	$ 1.129.073,40
NP10	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	M3	0,00	$ 307.133,00	$ 0,00

NP11	DEMOLICION DE ROCA		39,00	$ 295.305,00	$ 11.516.895,00
	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SOBRE TRAMOS DE VEREDA LA RINCONADA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ARBOLEDAS, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER				
27.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	319,23	$ 67.314,00	$ 21.488.648,22
27.2	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	M3	285,22	$ 1.004.718,00	$ 286.566.018,90
27.3	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	13.830,82	$ 9.371,00	$ 129.608.655,45
27.4	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	0,00	$ 357.666,00	$ 0,00
27.5	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (G) - CICLÓPEO	M3	106,25	$ 610.918,00	$ 64.912.481,17
28.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	48,55	$ 67.314,00	$ 3.268.094,70
28.2	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	M3	13,66	$ 1.004.718,00	$ 13.724.447,88
28.3	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	M3	1,64	$ 797.129,00	$ 1.307.291,56
28.4	RELLENOS PARA ESTRUCTURA CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	40,57	$ 38.182,00	$ 1.549.043,74
28.5	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	ML	0,00	$ 989.156,00	$ 0,00
28.6	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	1.097,36	$ 9.371,00	$ 10.283.360,56
29.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	M3/KM	3.783,93	$ 2.227,00	$ 8.426.812,11
30.1	SEÑAL SI-04 (POSTE DE REFERENCIA)	UND	0,00	$ 749.983,00	$ 0,00
31.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	0,00	$ 1.954,00	$ 0,00
31.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES	M2	13.360,95	$ 4.424,00	$ 59.108.842,80
NP1	TUBERIA DE PLÁSTICO TIPO PVC DIÁMETRO 36"/900 MM	M	11,90	$ 1.530.542,00	$ 18.213.449,80

NP2	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	UND	1,00	$ 650.789,00	$ 650.789,00
NP3	SUMINISTRO MATERIAL DE MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE (ARBOLEDAS)	M3	156,57	$ 302.603,00	$ 47.378.551,71
NP10	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	M3	1,61	$ 307.133,00	$ 494.484,13
	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SOBRE TRAMOS DE VEREDA CINERA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ARBOLEDAS, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER				
32.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	1.228,99	$ 67.314,00	$ 82.728.232,86
32.2	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	M3	772,56	$ 1.004.718,00	$ 776.204.938,08
32.3	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	36.595,45	$ 9.371,00	$ 342.935.961,95
32.4	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	0,00	$ 357.666,00	$ 0,00
32.5	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (G) - CICLÓPEO	M3	180,32	$ 610.918,00	$ 110.160.733,76
33.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	312,63	$ 67.314,00	$ 21.044.375,82
33.2	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	M3	46,94	$ 1.004.718,00	$ 47.161.462,92
33.3	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	M3	4,40	$ 797.129,00	$ 3.507.367,60
33.4	RELLENOS PARA ESTRUCTURA CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	159,98	$ 38.182,00	$ 6.108.356,36
33.5	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	ML	0,00	$ 989.156,00	$ 0,00
33.6	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	4.072,34	$ 9.371,00	$ 38.161.898,14
34.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	M3/KM	14.424,32	$ 2.227,00	$ 32.122.949,51
35.1	SEÑAL SI-04 (POSTE DE REFERENCIA)	UND	0,00	$ 749.983,00	$ 0,00
36.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	0,00	$ 1.954,00	$ 0,00

36.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES	M2	10.755,00	$ 4.424,00	$ 47.580.120,00
NP1	TUBERIA DE PLÁSTICO TIPO PVC DIÁMETRO 36"/900 MM	M	44,80	$ 1.530.542,00	$ 68.568.281,60
NP2	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	UND	3,00	$ 650.789,00	$ 1.952.367,00
NP3	SUMINISTRO MATERIAL DE MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE (ARBOLEDAS)	M3	285,08	$ 302.603,00	$ 86.266.063,24
NP 5	SUBRASANTE ESTABILIZADA CON CEMENTO (INCLUYE SUMINISTRO DEL CEMENTO)	M3	834,34	$ 69.619,00	$ 58.085.916,46
NP12	DREN TIPO FRANCES (SECCION 1,0X0,6M) (ARBOLEDAS)	ML	85,00	$ 222.293,00	$ 18.894.905,00
NP10	DEMOLICION DE ESTRUCTURA	M3	7,00	$ 307.133,00	$ 2.149.931,00
	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SOBRE TRAMOS DE VEREDA EL HELECHAR UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ARBOLEDAS, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER				
37.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	540,45	$ 67.314,00	$ 36.379.851,30
37.2	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	M3	329,31	$ 1.004.718,00	$ 330.863.684,58
37.3	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	15.867,40	$ 9.371,00	$ 148.693.405,40
37.4	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	0,00	$ 357.666,00	$ 0,00
37.5	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (G) - CICLÓPEO	M3	88,39	$ 610.918,00	$ 53.999.042,02
38.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	87,34	$ 67.314,00	$ 5.879.204,76
38.2	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	M3	11,24	$ 1.004.718,00	$ 11.297.307,38
38.3	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	M3	1,64	$ 797.129,00	$ 1.307.291,56
38.4	RELLENOS PARA ESTRUCTURA CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	40,52	$ 38.182,00	$ 1.547.134,64
38.5	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	ML	0,00	$ 989.156,00	$ 0,00

38.6	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	582,33	$ 9.371,00	$ 5.457.060,83
39.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	M3/KM	9.820,83	$ 2.227,00	$ 21.870.988,41
40.1	SEÑAL SI-04 (POSTE DE REFERENCIA)	UND	0,00	$ 749.983,00	$ 0,00
41.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	0,00	$ 1.954,00	$ 0,00
41.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES	M2	10.218,38	$ 4.424,00	$ 45.206.113,12
NP1	TUBERIA DE PLÁSTICO TIPO PVC DIÁMETRO 36"/900 MM	M	11,00	$ 1.530.542,00	$ 16.835.962,00
NP2	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	UND	6,00	$ 650.789,00	$ 3.904.734,00
NP3	SUMINISTRO MATERIAL DE MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE (ARBOLEDAS)	M3	200,27	$ 302.603,00	$ 60.602.302,81
NP 5	SUBRASANTE ESTABILIZADA CON CEMENTO (INCLUYE SUMINISTRO DEL CEMENTO)	M3	363,24	$ 69.619,00	$ 25.288.405,56
NP 10	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	M3	0,00	$ 307.133,00	$ 0,00
NP16	REMOCION DE DERRUMBES	M3	324,00	$ 22.786,00	$ 7.382.664,00
	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SOBRE TRAMOS DE VEREDA JUAN BUENO UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ARBOLEDAS, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER				
42.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	1.269,80	$ 67.314,00	$ 85.475.317,20
42.2	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	M3	567,20	$ 1.004.718,00	$ 569.871.813,30
42.3	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	26.699,64	$ 9.371,00	$ 250.202.326,44
42.4	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	0,00	$ 357.666,00	$ 0,00
42.5	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (G) - CICLÓPEO	M3	60,84	$ 610.918,00	$ 37.168.251,12

43.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	306,12	$ 67.314,00	$ 20.606.161,68
43.2	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	M3	48,08	$ 1.004.718,00	$ 48.306.841,44
43.3	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	M3	5,50	$ 797.129,00	$ 4.384.209,50
43.4	RELLENOS PARA ESTRUCTURA CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	153,35	$ 38.182,00	$ 5.855.209,70
43.5	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	ML	0,00	$ 989.156,00	$ 0,00
43.6	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	4.072,33	$ 9.371,00	$ 38.161.804,43
44.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	M3/KM	19.925,13	$ 2.227,00	$ 44.373.264,51
45.1	SEÑAL SI-04 (POSTE DE REFERENCIA)	UND	0,00	$ 749.983,00	$ 0,00
46.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	0,00	$ 1.954,00	$ 0,00
46.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES	M2	8.998,80	$ 4.424,00	$ 39.810.691,20
NP1	TUBERIA DE PLÁSTICO TIPO PVC DIÁMETRO 36"/900 MM	M	40,80	$ 1.530.542,00	$ 62.446.113,60
NP3	SUMINISTRO MATERIAL DE MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE (ARBOLEDAS)	M3	133,14	$ 302.603,00	$ 40.288.563,42
NP 5	SUBRASANTE ESTABILIZADA CON CEMENTO (INCLUYE SUMINISTRO DEL CEMENTO)	M3	565,86	$ 69.619,00	$ 39.394.434,84
NP16	REMOCION DE DERRUMBES	M3	375,00	$ 22.786,00	$ 8.544.750,00
	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SOBRE TRAMO DE VEREDA BOYACA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE GRAMALOTE, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER				

47.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	1.503,18	$ 50.209,00	$ 75.473.164,62
47.2	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	M3	852,09	$ 858.595,00	$ 731.601.953,11
47.3	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	41.621,62	$ 9.276,00	$ 386.082.175,23
47.4	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	0,00	$ 213.373,00	$ 0,00
47.5	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (G) - CICLÓPEO	M3	410,32	$ 473.617,00	$ 194.332.892,51
48.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	486,90	$ 50.209,00	$ 24.446.762,10
48.2	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	M3	61,92	$ 858.595,00	$ 53.164.202,40
48.3	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	M3	9,16	$ 636.830,00	$ 5.833.362,80
48.4	RELLENOS PARA ESTRUCTURA CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	194,13	$ 38.182,00	$ 7.412.271,66
48.5	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	ML	0,00	$ 962.935,00	$ 0,00
48.6	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	5.288,40	$ 9.276,00	$ 49.055.198,40
49.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	M3/KM	20.583,65	$ 2.227,00	$ 45.839.788,55
50.1	SEÑAL SI-04 (POSTE DE REFERENCIA)	UND	0,00	$ 743.614,00	$ 0,00
51.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	0,00	$ 1.954,00	$ 0,00
51.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES	M2	19.237,00	$ 4.424,00	$ 85.104.488,00
NP1	TUBERIA DE PLÁSTICO TIPO PVC DIÁMETRO 36"/900 MM	M	72,00	$ 1.530.542,00	$ 110.199.024,00
NP2	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	UND	3,00	$ 650.789,00	$ 1.952.367,00
NP4	SUMINISTRO MATERIAL DE MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE (GRAMALOTE)	M3	117,96	$ 184.614,00	$ 21.777.067,44

NP 5	SUBRASANTE ESTABILIZADA CON CEMENTO (INCLUYE SUMINISTRO DEL CEMENTO)	M3	1.109,48	$ 69.619,00	$ 77.240.888,12
NP 10	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	M3	64,43	$ 307.133,00	$ 19.789.092,95
	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SOBRE TRAMO DE VEREDA SAN ISIDRO UBICADA EN EL MUNICIPIO DE GRAMALOTE, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER				
52.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	1.553,85	$ 50.209,00	$ 78.017.254,65
52.2	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	M3	597,10	$ 858.595,00	$ 512.667.074,50
52.3	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	28.713,00	$ 9.276,00	$ 266.341.833,55
52.4	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	0,00	$ 213.373,00	$ 0,00
52.5	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (G) - CICLÓPEO	M3	263,55	$ 473.617,00	$ 124.821.760,35
53.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	391,22	$ 50.209,00	$ 19.642.764,98
53.2	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	M3	82,10	$ 858.595,00	$ 70.490.649,50
53.3	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	M3	7,82	$ 636.830,00	$ 4.980.010,60
53.4	RELLENOS PARA ESTRUCTURA CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	175,88	$ 38.182,00	$ 6.715.450,16
53.5	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	ML	0,00	$ 962.935,00	$ 0,00
53.6	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	7.070,00	$ 9.276,00	$ 65.581.320,00
54.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	M3/KM	27.275,50	$ 2.227,00	$ 60.742.538,50
55.1	SEÑAL SI-04 (POSTE DE REFERENCIA)	UND	0,00	$ 743.614,00	$ 0,00
56.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	0,00	$ 1.954,00	$ 0,00
56.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES	M2	15.573,65	$ 4.424,00	$ 68.897.827,60

NP1	TUBERIA DE PLÁSTICO TIPO PVC DIÁMETRO 36"/900 MM	M	53,50	$ 1.530.542,00	$ 81.883.997,00
NP4	SUMINISTRO MATERIAL DE MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE (GRAMALOTE)	M3	106,00	$ 184.614,00	$ 19.569.084,00
NP 5	SUBRASANTE ESTABILIZADA CON CEMENTO (INCLUYE SUMINISTRO DEL CEMENTO)	M3	766,82	$ 69.619,00	$ 53.385.241,58
NP 8	PEDRAPLEN COMPACTO (GRAMALOTE)	M3	0,00	$ 260.269,00	$ 0,00
NP 10	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	M3	12,37	$ 307.133,00	$ 3.799.235,21
NP13	DREN TIPO FRANCES (SECCION 1,0X0,6M) (GRAMALOTE)	ML	126,00	$ 180.222,00	$ 22.707.972,00
NP16	REMOCION DE DERRUMBES	M3	589,80	$ 22.786,00	$ 13.439.182,80
	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SOBRE TRAMOS DE VEREDA SANTA ANITA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE GRAMALOTE, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER				
57.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	505,66	$ 50.209,00	$ 25.388.682,94
57.2	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	M3	324,90	$ 858.595,00	$ 278.957.515,50
57.3	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	15.730,14	$ 9.276,00	$ 145.912.778,64
57.4	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	423,30	$ 213.373,00	$ 90.320.790,90
57.5	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (G) - CICLÓPEO	M3	159,41	$ 473.617,00	$ 75.499.285,97
58.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	0,00	$ 50.209,00	$ 0,00
58.2	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	M3	1,37	$ 858.595,00	$ 1.176.275,15
58.3	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	M3	0,00	$ 636.830,00	$ 0,00
58.4	RELLENOS PARA ESTRUCTURA CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	0,00	$ 38.182,00	$ 0,00
58.5	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	ML	0,00	$ 962.935,00	$ 0,00

58.6	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	0,00	$ 9.276,00	$ 0,00
59.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	M3/KM	6.108,68	$ 2.227,00	$ 13.604.030,36
60.1	SEÑAL SI-04 (POSTE DE REFERENCIA)	UND	0,00	$ 743.614,00	$ 0,00
61.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	0,00	$ 1.954,00	$ 0,00
61.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES	M2	9.536,01	$ 4.424,00	$ 42.187.308,24
NP1	TUBERIA DE PLÁSTICO TIPO PVC DIÁMETRO 36"/900 MM	M	0,00	$ 1.530.542,00	$ 0,00
NP2	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	UND	5,00	$ 650.789,00	$ 3.253.945,00
NP4	SUMINISTRO MATERIAL DE MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE (GRAMALOTE)	M3	19,23	$ 184.614,00	$ 3.550.127,22
NP6	SUBRASANTE ESTABILIZADA CON CAL (INCLUYE SUMINISTRO DE CAL)	M2	2.822,00	$ 26.893,00	$ 75.892.046,00
NP 8	PEDRAPLEN COMPACTO (GRAMALOTE)	M3	0,00	$ 260.269,00	$ 0,00
NP 10	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	M3	19,67	$ 307.133,00	$ 6.041.306,11
	OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS				**$ 137.498.274,40**
	COMPLEMENTACION Y AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS				**$ 348.235.294,92**
	VALOR IVA (19%) AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS				**$ 66.164.706,03**
16	**PROVISIÓN IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD (INCLUYE IVA)**				**$ 2.779.819,00**
	COSTO TOTAL PROYECTO:				**$ 21.608.272.485,13**

3.9. CONTRATO DE OBRA 02332 DE 2022 – GOBERNACIÓN 2052

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	02332 DE 2022
Objeto:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS
Contratista:	UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	23 de diciembre de 2022
Valor Inicial:	$ 5.159.028.732,00 M/CTE
Fecha de inicio:	11 de mayo de 2023
Fecha de terminación inicial:	10 de noviembre de 2023
Fecha de terminación Prorroga 1:	1.70 meses hasta el 31 de diciembre de 2023
Fecha de terminación Prorroga 2:	03 meses hasta el 31 de marzo de 2024
Fecha de terminación Prorroga 3:	05 meses hasta el 30 de agosto de 2024
Fecha de terminación Final:	30 de agosto de 2024

Tabla 39 Condiciones del contrato - Gobernación 2052

3.9.1 Descripción de las Actividades Ejecutadas

A la fecha de corte del presente informe, el contratista de obra ejecuto el 100% el proyecto, se encuentra en proceso de liquidación el contrato de obra.

3.9.1.1. Actividades Administrativas

Dentro de las actividades administrativas se detallan los documentos de pre construcción presentados por el contratista de obra al finalizar el contrato:

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan de Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-652-22 del 09-Jun-23
Protocolo de Bioseguridad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-895-22 14-Ago-23

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Hojas de Vida	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-726-22 del 27-Jun-23
Programa de Obra	Aprobado	PHM2022-062-2024 del 03-Abr-2024
Flujo de Caja	Aprobado	PHM2022-062-2024 del 03-Abr-2024
Programa de Generación de Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-688-22 del 14-Jun-23
Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-728-22- 27-Jun-23 Aprobado Vibro compactador
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	PHM2022-064-2024 del 25-Abr-2024
Instalaciones Provisionales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-741-22- 29-Jun-23
Plan de Manejo de Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-764-22- 07-Jul-23
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-084-24 del 12-Ene-2024
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-983-22- 04-Sep-23
Fuente de Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-700-22- 20-Jun-23
Certificado de Disponibilidad de Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-739-22- 29-Jun-23

Tabla 40 Estado Documentos pre construcción Gobernación 2052

3.9.1.2. Actividades Técnicas

La obra se ejecutó al 100% de su programación, encontrándose en proceso de liquidación, la interventoría y el contratista de obra se encuentran gestionando la documentación pertinente.

A continuación, se presenta el resumen de actividades ejecutadas por el contratista de obra:

ACTA NO.1					
No. ORDEN	**DESCRIPCIÓN ÍTEM**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL EJECUTADO**
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA					
1	Excavaciones varias sin clasificar	m3	2168,72	$ 46.761,00	$ 101.411.394,34
2	Concreta resistencia 21 Mpa (d)	m3	236,68	$ 673.567,00	$ 159.417.072,57
3	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	kg	14031,06	$ 8.013,00	$ 112.430.894,20

4	Subbase granular clase C	m3	4328,85	$ 123.502,00	$ 534.621.632,70
5	Concreto ciclópea resistencia 14 Mpa (G)	m3	60,1	$ 332.272,00	$ 19.971.108,88
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS					
6	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	0	$ 46.761,00	$ -
7	Concreto Resistencia 21 MPa (D)	m3	0	$ 673.567,00	$ -
8	Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	0	$ 456.117,00	$ -
9	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	m	0	$ 32.313,00	$ -
10	Concreto liviano resistencia 14 Mpa (f)	m3	0	$ 764.951,00	$ -
11	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	kg	0	$ 8.013,00	$ -
TRANSPORTES					
12	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m)	m3/km	0	$ 1.396,00	$ -
SEÑALIZACIÓN					
13	SEÑAL SI-04 (POSTE DE REFERENCIA)	Und	0	$ 592.436,00	$ -
PERFILADO Y CUNETEO					
14	CONFORMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE	m2	33444,81	$ 1.427,00	$ 47.725.751,00
CONSTRUCCIÓN DE MURO EN GAVIONES					
15	GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1;	m3	0	$ 226.932,00	$ -
VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA					**$ 975.577.853,68**
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS (B					**$ -**
VALOR TOTAL BÁSICO (A)+(B) = (C					**$ 975.577.853,68**
COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS (D)					**$ 45.000.000,00**
VALOR IVA (19%) AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS					**$ 8.550.000,00**
PROVISIÓN IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD (INCLUYE IVA) (F)					**$ -**
AJUSTE AL PESO					**$ -**
VALOR TOTAL (C+D+E+F) AIU 30% (A 20%, U 5%, I 5%)					**$ 1.029.127.853,68**

ACTA NO. 2 - 3 -4 Y FINAL					
No. ORDEN	**DESCRIPCIÓN ÍTEM**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL EJECUTADO**
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA					
1	Excavaciones varias sin clasificar	m3	1269,28	$ 64.025,10	$ 81.265.778,93
2	Concreta resistencia 21 Mpa (d)	m3	2665,82	$ 815.453,87	$ 2.173.853.235,72
3	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	kg	172187,13	$ 9.339,24	$ 1.608.096.931,98
4	Subbase granular clase C	m3	2061,77	$ 184.946,36	$ 381.316.856,66
5	Concreto ciclópea resistencia 14 Mpa (G)	m3	660,68	$ 431.783,38	$ 285.270.643,50
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS					
6	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	893	$ 64.025,10	$ 57.174.414,30
7	Concreto Resistencia 21 MPa (D)	m3	171,9	$ 815.453,87	$ 140.176.520,25
8	Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	27,8	$ 579.546,98	$ 16.111.406,04
9	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	m	345,7	$ 35.312,15	$ 12.207.409,43
10	Concreto liviano resistencia 14 Mpa (f)	m3	129	$ 849.590,51	$ 109.597.175,79
11	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	kg	12589,2	$ 9.339,24	$ 117.573.560,21
TRANSPORTES					
12	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	0	$ 1.989,00	$ -
SEÑALIZACIÓN					
13	SEÑAL SI-04 (POSTE DE REFERENCIA)	Und	9	$ 654.882,77	$ 5.893.944,93
PERFILADO Y CUNETEO					
14	CONFORMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE	m2	0	$ 1.427,00	$ -
CONSTRUCCIÓN DE MURO EN GAVIONES					
15	GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1; RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO)	m3	40,98	$ 338.205,44	$ 13.860.958,08
VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA					**$ 5.002.398.835,82**
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS (B					**$ -**
VALOR TOTAL BÁSICO (A)+(B) = (C					**$ 5.002.398.835,82**
COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS (D)					**$ 7.777.454,00**
VALOR IVA (19%) AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS					**$ 1.477.715,00**

PROVISIÓN IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD (INCLUYE IVA) (F)	
AJUSTE AL PESO	**$ -**
VALOR TOTAL (C+D+E+F) AIU 30% (A 20%, U 5%, I 5%)	**$ 5.011.654.004,82**
VALOR TOTAL (C+D+E+F) AIU 30% (A 20%, U 5%, I 5%) ACTA No. 1 + ACTA No. 2 + ACTA No. 3 + ACTA No. 4	**$ 6.040.781.858,50**

Tabla 41 Cantidades Ejecutadas Municipio de Gobernación 2052

3.9.1.3. Actividades ambientales

El presente contrato se encuentra en etapa de liquidación.

3.9.1.4. Actividades Sociales

El presente contrato de obra, se encuentra en proceso de liquidación.

3.9.1.5. Actividades SST

El contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación.

3.9.2. Seguimiento Ítems No Previstos

No se presentaron ITEMs no previstos.

3.9.3. Estado de avance del proyecto

El proyecto se divide en dos etapas fundamentales las cuales se describen a continuación:

3.9.3.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
Informe de suelos e Informe geotécnico	- Hace entrega con documento PHM-023-2022 el 18-Jul-2023 - GIC-INVIAS-NTS-835-22- 27-Jul-23 - **APROBADO**
TOPOGRAFÍA	- Hace entrega con comunicado PHM2022 – 009 – 2022 del 08-Jun-2023 - GIC-INVIAS-NTS-659-22- 09-Jun-23 – OBSERVACIONES - Hace entrega con documento PHM2022-013-2022 el 20-JUN-2023

	- GIC-INVIAS-NTS-723-22- 27-Jun-23 – OBSERVACIONES - GIC-INVIAS-NTS-1584-24 25/11/2024 - **APROBACIÓN**
DISEÑO GEOMÉTRICO DE PLACA HUELLAS	- Hace entrega con documento PHM2022-020-2022 el 27-JUN-2023 - GIC-INVIAS-NTS-776-22- 11-Jul-23 **– OBSERVACIONES** - Hace entrega con documento PHM2022-026 y 27-2022 el 01-Ago-2023 - GIC-INVIAS-NTS-893-22- 14-Ago-23 – **OBSERVACIONES** - Hace entrega con documento PHM2022-035-2022 el 07-Sept-2023 - Hace entrega con documento PHM2022-036-2022 el 07-Sept-2023 - GIC-INVIAS-NTS-1030-22- 11-Sept-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	- Hace entrega con documento PHM-006-2022 el 02-Jun-2023 - GIC-INVIAS-NTS-642-22- 08-Jun-23 – **OBSERVACIONES** - Hace entrega con documento PHM-023-2022 el 18-Jul-2023 - GIC-INVIAS-NTS-835-22- 27-Jul-23 – **OBSERVACIONES** - Hace entrega con documento PHM-029-2022 el 08-Ago-2023 - GIC-INVIAS-NTS-906-22- 15-Ago-23 – **OBSERVACIONES** - Hace entrega con documento PHM-037-2022 el 12-SEPT-2023 - GIC-INVIAS-NTS-1062-22- 15-Sept-23 – **OBSERVACIONES** - GIC-INVIAS-NTS-1458-22- 30-Nov-23 – APROBADO
INFORME ESTRUCTURAL	- Hace entrega con documento PHM-006-2022 el 02-Jun-2023 - GIC-INVIAS-NTS-646-22- 09-Jun-23 – APROBADO
INFORME HIDRÁULICO	- Hace entrega con documento PHM-039-2022 el 01-Oct-2023 - GIC-INVIAS-NTS-1145-22- 06-10-23 – **OBSERVACIONES** - Hace entrega con documento PHM-043-2022 el 19-Oct-2023 - GIC-INVIAS-NTS-1329-22- 09-Nov-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES**

3.9.3.2. Etapa de Construcción

A continuación, se presenta un resumen detallado del total de metros de placa huella que se ejecutaron en el contrato de obra:

TRAMO	EJECUTADO	POR EJECUTAR	TOTAL
TRAMO No1	238,60	0	238,60
TRAMO No2	1411	0	1411

TRAMO 3A	518,3	0	518,3
TRAMO 3B	790,2	0	790,2
TRAMO 4	701,2	0	701,2
TRAMO 5	344,8	0	344,8
TOTAL	4004	0	4004

Tabla 42 Cantidades realizadas en el periodo

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.

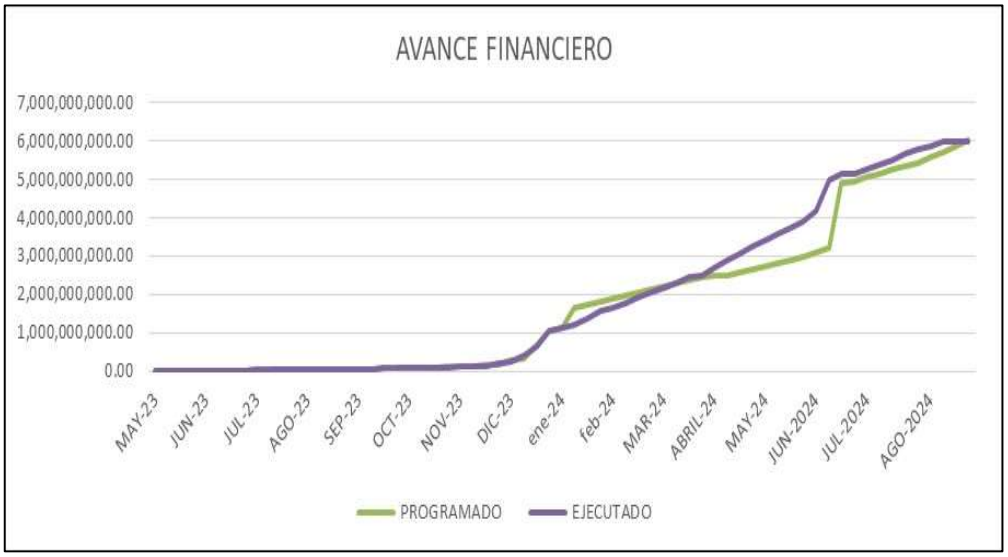


Gráfico 9 Avance Financiero Municipio de Gobernación 2052

3.10. CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.4352407 – OCAÑA 1814

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	CO1.PCCNTR.4352407
Objeto:	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.
Contratista:	UNIÓN TEMPORAL OCAÑA GBE 2022
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	27 de diciembre de 2022
Valor Inicial:	$ 2.499.989.139,00 M/CTE
Fecha de inicio:	02 de mayo de 2023
Fecha de terminación inicial:	01 de septiembre de 2023
Fecha Terminación Prorroga 1:	3.50 meses hasta el 17 de diciembre de 2023
Fecha Terminación Prorroga 2:	01 mes hasta el 17 de enero de 2024
Fecha Terminación Prorroga 3:	02 meses hasta el 17 de marzo de 2024
Fecha Terminación Prorroga 4:	01 mes hasta el 17 de abril de 2024
Fecha Terminación Prorroga 5:	1.5 meses hasta el 01 de junio de 2024
Fecha Terminación Prorroga 6:	1.5 meses hasta el 24 de agosto de 2024
Fecha Suspensión No. 1:	27/05/2024
Fecha Prorroga No. 1 Suspensión 1:	17/06/2024
Fecha Reinicio No. 1:	05/07/2024
Fecha de terminación Final:	24/08/2024

Tabla 43 Condiciones del contrato - Municipio de Ocaña 1814

3.10.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas

A la fecha de corte del presente informe, el contrato se encuentra en proceso de liquidación y se detallan las actividades desarrolladas durante la ejecución del Proyecto.

3.10.1.1. Actividades Administrativa

Dentro de las actividades administrativas el contratista presentó los documentos de pre construcción y a continuación se relaciona su estado al finalizar el contrato de obra:

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan de Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-558-22 del 23-May-23
Protocolo de Bioseguridad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-675-22 del 13-Jun-23
Hojas de Vida	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-961-22 del 29-Ago-23
Programa de Obra	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1322-24 del 17-Sept-24
Flujo de Caja	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1000-22 del 05-Sept-23
Programa de Generación de Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-560-22 del 23-May-23
Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-684-22 del 14-Jun-23
Análisis de Precios Unitarios	En Revisión	Hace entrega con comunicado GBE-002-2022 del 24-Mar-2023
Instalaciones Provisionales		No ha presentado
Plan de Manejo de Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-768-22 del 07-Jul-23
Instalación de valla		Interventoría envía instructivo 2023 al Contratista el 03-05-2023 Contratista realizo entrega del arte al INVIAS EL 10-May-23
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-141-24 del 23-Ene-24
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-896-22 del 04-Ago-23
Fuente de Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-463-22 del 20-Abr-23
Certificado de Disponibilidad de Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-767-22 del 07-Jun-23
Diseño de Mezcla	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-705-22 del 22-Jun-23
Caracterización Material Granular	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-656-22 del 13-Jun-23

Tabla 44 Estado Documentos pre construcción – Ocaña 1814

3.10.1.2. Actividades Técnicas

El contrato de obra se encuentra liquidado desde el 24 de diciembre de 2024.





Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

A continuación, se presenta el resumen de actividades ejecutadas.

No. ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA					
1	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	4729,59	$ 40.038,00	$ 189.363.324,42
2	Concreto Resistencia 21 MPa (D)	m3	1176,64	$ 652.033,00	$ 767.208.109,12
3	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	kg	97952,61	$ 7.513,00	$ 735.917.958,93
4	Sub - Base Granular clase C	m3	2671,76	$ 147.033,00	$ 394.307.218,08
5	Concreto Resistencia 14 MPa (G) (Ciclópeo)	m3	388,46	$ 340.636,00	$ 132.323.460,56
6	Sello de Juntas	m	15319,26	$ 13.727,00	$ 210.287.517,13
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: (8) UND					
7	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	71,23	$ 40.038,00	$ 2.851.906,74
8	Concreto Resistencia 21 MPa (D)	m3	81,03	$ 652.033,00	$ 52.873.355,97
9	Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	264,97	$ 32.986,00	$ 8.740.300,42
10	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	m	55	$ 764.092,00	$ 42.025.060,00
11	Concreto Resistencia 14 MPa (F)	m3	51,19	$ 458.877,00	$ 23.489.913,63
12	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	5800,3	$ 7.513,00	$ 43.577.640,00
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN (GAVIÓN): (4) UND					
13	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	0	$ 40.038,00	$ -
14	GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1; RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO)	m3	0	$ 256.795,00	$ -
15	Concreto Resistencia 14 MPa (F)	m3	0	$ 458.877,00	$ -
16	Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	0	$ 32.986,00	$ -
17	RELLENO CON GRAVILLA	m3	0	$ 101.941,00	$ -
18	GEOTEXTIL TIPO NT - 2500 O SIMILAR NO TEJIDO	m	0	$ 9.261,00	$ -
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD					
19	POSTE DE REFERENCIA	und	8	$ 349.502,00	$ 2.796.016,00

ÍTEMS NO PREVISTOS					
20	TERRAPLÉN	m3	522,5	$ 129.177,00	$ 67.494.983,00
VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA					**$ 2.673.256.764,00**
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS (B					**$ -**
VALOR TOTAL BÁSICO (A)+(B) = (C					**$ 2.673.256.764,00**
COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS (D)					**$ 10.680.939,00**
VALOR IVA (19%) AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS					**$ 2.029.378,00**
PROVISIÓN IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD (INCLUYE IVA) (F)					
AJUSTE AL PESO					**$ -**
VALOR TOTAL (C+D+E+F) AIU 30% (A 20%, U 5%, I 5%)					**$ 2.685.967.081,00**

Tabla 45 Cantidades Ejecutadas Municipio de Ocaña 1814

3.10.1.3. Actividades ambientales

El contrato de obra se encuentra liquidado desde el 24 de diciembre de 2024

3.10.1.4. Actividades Sociales

El contrato de obra se encuentra liquidado desde el 24 de diciembre de 2024

3.10.1.5. Actividades SST

El contrato de obra se encuentra liquidado desde el 24 de diciembre de 2024

3.10.2. Seguimiento Ítems No Previstos

El contrato de obra se encuentra liquidado desde el 24 de diciembre de 2024

3.10.3. Estado de avance del proyecto

El proyecto se divide en dos etapas fundamentales las cuales se describen a continuación.

3.10.3.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños

El contratista realizó la entrega de los componentes de estudios y diseños del corredor de Buenavista Municipio de Ocaña, donde se han emitido su aprobación y/u observaciones por los especialistas.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	- Hace entrega con comunicado GBE-015-2022 del 02-Jun-2023 - GIC-INVIAS-NTS-641-22 del 08-Jun-23 - **APROBADO**
TOPOGRAFÍA	- Hace entrega con comunicado GBE-058-2022 del 08-Sep-2023 - GIC-INVIAS-NTS-1046-22 del 13-Sept-23 - **APROBADO**
DISEÑO GEOMÉTRICO DE PLACA HUELLAS	- Hace entrega con comunicado GBE-059-2022 del 11-Sept-2023 - GIC-INVIAS-NTS-1154-22 del 10-Oct-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	- Hace entrega con comunicado GBE-072-2022 del 24-Oct-2023 - GIC-INVIAS-NTS-1283-22 del 31-Oct-23 - APROBADO
INFORME ESTRUCTURAL	- GIC-INVIAS-NTS-879-22 del 09-Ago-23 **– OBSERVACIONES** - Hace entrega con comunicado GBE-046-2022 del 23-Ago-2023 - GIC-INVIAS-NTS-1161-22 del 10-Oct-23 – **OBSERVACIONES** - Hace entrega con comunicado GBE-072-2022 del 24-Oct-2023 - GIC-INVIAS-NTS-510-24 del 02-Abr-24 – **OBSERVACIONES** - GIC-INVIAS-NTS-650-24 del 26-Abr-24 – **OBSERVACIONES** - GBE-238-2022 - 16/12/2024 - ENTREGA OBS GRADA DISIPADORA - GIC-INVIAS-NTS-1712-24 del 19/12/2024 – **APROBADO** - GBE-239-2022 - 18/12/2024 - ENTREGA OBS DIS ESTRUCTURAL ALCANTARILLA
INFORME HIDRÁULICO	- Hace entrega con comunicado GBE-021-2022 del 22-Jun-2023 T1, 4, 5, 7 Y 9 - GIC-INVIAS-NTS-747-22 del 16-Jun-23 - **APROBADO**

Tabla 46 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio Ocaña 1814

3.10.3.2. Etapa de Construcción

Se finalizo con la actividad de construcción de la placa huella.

MUNICIPIO	ALCANCE INICIAL PROYECTO	CORREDOR VIAL	EJECUTADO A LA FECHA	TOTAL, MUNICIPIO	CANTIDAD POR EJECUTAR
OCAÑA	1550	BUENAVISTA	1692	1692	0
OCAÑA	8	BUENAVISTA	8	8	0
TOTAL	1550		**TOTAL**	1692	0

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.

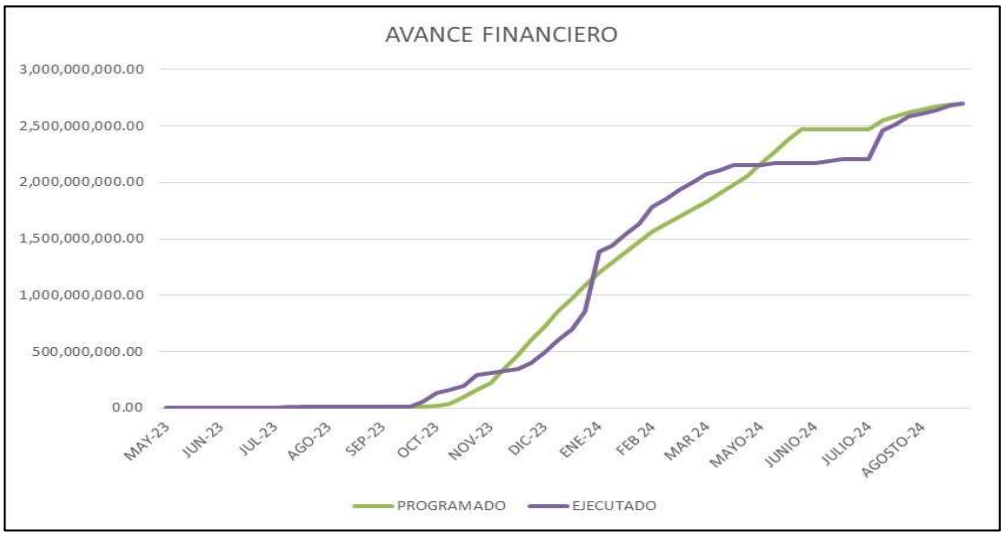


Gráfico 10 Avance Financiero Municipio de Ocaña 1814

El contratista de obra ejecuto la totalidad del valor del contrato $2.700.000.000.

3.11. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164 DE 2022 – EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	4164 DE 2022
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL
Contratista:	EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	29 octubre de 2021
Valor Inicial:	$ 10.000.000.000,00 M/CTE
Fecha de inicio:	07 de noviembre de 2023
Fecha de terminación inicial:	07 febrero de 2024
Fecha de terminación Final:	31 diciembre de 2024

Tabla 47 Condiciones del contrato - Gobernación 2033

3.11.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas

A la fecha de corte del presente informe, se han realizado las siguientes actividades en el desarrollo del Proyecto.

3.11.1.1. Actividades Administrativas

Conforme al contrato interadministrativo No. 4164-2022, celebrado entre la GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER y la EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S., se da acta de inicio a los siguientes contratos.

NOMBRE	CONTRATO	ACTA INICIO
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA CHINAVEGA, MUNICIPIO DE CACOTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-065-2023	7/11/2023
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LAS DELICIAS-EL MAMON, MUNICIPIO DEL ZULIA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-055-2023	7/11/2023
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA LA UNIÓN, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-070-2023	7/11/2023
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SAN ANTONIO-LA QUINTA-ALTOS DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-074-2023	7/11/2023
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA LOS RINCÓN-LA COPITA, MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-072-2023	7/11/2023
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-062-2023	7/11/2023
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADAS-TABIRO-PUENTE ZULIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-079-2023	7/11/2023
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LOS MANGOS-LA CARRERA, MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-067-2023	21/02/2024
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO DE LOURDES, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-060-2023	22/01/2024
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES PUENTE ISABEL CELIS-DAVE, MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-056-2023	08/04/2024
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES PASO DE LOS RÍOS-RICAURTE, MUNICIPIO DE CÚCUTA, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-077-2023	08/04/2024
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA PARAMO – PICA PICA, MUNICIPIO DE PAMPLONITA, NORTE DE SANTANDER	CD-FC-064-2023	22/04/2024
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRÁN, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-082-2023	14/05/2024
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES MINAS DE CAL – LA ARAÑITA – LA MESA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-081-2023	17/05/2024

MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA – CUPERENA – CACAHUALA – ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-058-2023	14/06/2024
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA GARZA – ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER	CD-FC-071-2023	05/08/2024
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SAN JUAN – AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER	CD-FC-049-2024	18/10/2024

Dentro de las actividades administrativas el contratista realizó la entrega de los siguientes documentos. A continuación, se presenta el estado de los documentos de preconstrucción y de estudios, diseños presentados por el Contratista a la fecha.

3.11.1.1.1. CD-FC-065-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA CHINAVEGA, MUNICIPIO DE CACOTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-003 del 12-Dic-2023 - **REVISIÓN** GIC-INVIAS-NTS-525-24 del 02-Abr-2024 – **OBSERVACIONES** CD-FC-065-2023-030 el 12-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-596-24 del 16-Abr-24 - **APROBADO**
Protocolo De Bioseguridad	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-003 del 26-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-360-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Hojas de vida	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-003 del 12-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1566-22 del 19-Dic-2023 - **APROBADO**
Programa De Obra	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-003 del 12-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1566-22 del 19-Dic-2023 - **APROBADO** Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-014 del 07-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-360-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Flujo De Caja	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-003 del 12-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1566-22 del 19-Dic-2023 - **APROBADO** Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-014 del 07-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-360-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Programa De Generación De Empleo	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-003 del 12-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1566-22 del 19-Dic-2023 - **APROBADO**

Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-003 del 12-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1566-22 del 19-Dic-2023 - **APROBADO**
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	Se realiza por parte de interventoría la solicitud mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-1577-22 del 19-Dic-2023 – **SOLICITUD** Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-012 del 07-Feb-2024 – **REVISIÓN** GIC-INVIAS-NTS-514-22 del 02-Abr-2024 **- APROBADO**
Instalaciones Provisionales	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-022 del 07-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-422-24 del 08-Mar-2024 - **APROBADO**
Plan De Manejo De Transito - PMT	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-020 del 28-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-360-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado con observaciones	Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-017 del 13-Feb-2024 - **REVISIÓN** Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-021 del 11-Mar-2024. **REVISIÓN** GIC-INVIAS-NTS-742-24 del 16-May-2024 – **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-744-24 del 16-May-2024 – **REMISIÓN A INVIAS**
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-360-24 del 28-Feb-2024 - **APROBADO**
Fuente De Materiales	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-003 del 12-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-309-24 del 15-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-018 del 26-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-424-24 del 08-Mar-2024 - **APROBADO**
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-023 del 08-Mar-2024. **REVISIÓN** GIC-INVIAS-NTS-514-22 del 02-Abr-2024 - **APROBADO**
Diseño de Mezcla	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-011 del 03-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-360-24 del 28-Feb-2024 - **APROBADO**

Tabla 48 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Cacota Gobernación 2033

3.11.1.1.2. CD-FC-055-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LAS DELICIAS-EL MAMON, MUNICIPIO DEL ZULIA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-005 del 12- Dic – 2023 - **REVISIÓN** GIC-INVIAS-NTS-219-24 del 06-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-039 del 10-Abr– 2024 GIC-INVIAS-NTS-594-24 del 16-Abr-24 - **APROBADO**
Protocolo De Bioseguridad	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-030 del 28-Feb– 2024 GIC-INVIAS-NTS-356-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Hojas de vida	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-005 del 12- Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1576-22 del 18-Dic-2023 - **APROBADO**
Programa De Obra	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-005 del 12- Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1576-22 del 18-Dic-2023 – **APROBADO** Contratista hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-024 del 07-Feb-2024 - GIC-INVIAS-NTS-356-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Flujo De Caja	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-005 del 12- Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1576-22 del 18-Dic-2023 - **APROBADO** Contratista hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-024 del 07-Feb-2024 – OBSERVADO GIC-INVIAS-NTS-356-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Programa De Generación De Empleo	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-005 del 12- Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1576-22 del 18-Dic-2023 - **APROBADO**
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-005 del 12- Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1576-22 del 18-Dic-2023 - **APROBADO**
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1582-22 del 19-Dic-2023 - SOLICITUD Contratista hace entrega con oficio SCCVN-CD-FC-055-2023-010 del 10-Ene-2023 – REVISIÓN GIC-INVIAS-NTS-356-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**

Instalaciones Provisionales	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio SCCVN-CD-FC-055-2023-032 del 29-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-408-24 del 07-Mar-2024 - **APROBADO**
Plan De Manejo De Transito - PMT	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio SCCVN-CD-FC-055-2023-030 del 28-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-356-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Instalación De Valla	Aprobado	APROBADO POR EL INVIAS 02/02/2024
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-005 del 12-Dic – 2023 - **REVISIÓN** CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-033 del 11-Mar– 2024 – **REVISIÓN** GIC-INVIAS-NTS-653-24 del 26-Abr-24 – **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-732-24 del 14-May-24 – **REVISIÓN AL INVIAS**
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Aprobado	Se envió mediante correo electrónico el 15-agosto-2024 GIC-INVIAS-NTS-356-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Fuente De Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1645-22 del 29-Dic-2023 - **APROBADO**
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-030 del 28-Feb– 2024 GIC-INVIAS-NTS-356-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Diseño de Mezcla	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-014 del 15-Ene–2024 GIC-INVIAS-NTS-356-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**

Tabla 49 Estado Documentos pre construcción –Municipio de El Zulia Gobernación 2033

3.11.1.1.3. CD-FC-070-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA LA UNIÓN, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	Sin entregar	
Protocolo De Bioseguridad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-476-24 18-Mar-24 - **APROBADO**
Hojas de vida	Aprobado	El contratista hace entrega con oficio por correo del 08-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-300-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Programa De Obra	Aprobado	Hace entrega con oficio por correo del 02-Ene-24 – REVISIÓN GIC-INVIAS-NTS-367-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Flujo De Caja	Aprobado	Hace entrega con oficio por correo del 02-Ene-24- REVISIÓN GIC-INVIAS-NTS-367-24 del 29-Feb-2024 – **APROBADO** GIC-INVIAS-NTS-476-24 18-Mar-24 - **APROBADO**
Programa De Generación De Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-476-24 18-Mar-24 - **APROBADO**
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-476-24 18-Mar-24 - **APROBADO**
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1579-22 del 19-Dic-2023 - SOLICITUD Hace entrega con oficio por correo del 03-Ene-24 REVISIÓN GIC-INVIAS-NTS-367-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Instalaciones Provisionales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-606-24 del 18-Abr-2024 - **APROBADO**
Plan De Manejo De Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-476-24 18-Mar-24 - **APROBADO**
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-662-24 del 29-Abr-2024 – **APROBADO CON OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-748-24 del 16-May-2024 – **REMISIÓN INVIAS**
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-606-24 del 18-Abr-2024 - **APROBADO**
Fuente De Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-545-24 del 08-Abr-2024 – **APROBADO**
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-476-24 18-Mar-24 - **APROBADO**
Diseño de Mezcla	Aprobado	El contratista hace entrega de oficio por correo del 26-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-367-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**

Tabla 50 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Pamplona Gobernación 2033

3.11.1.1.4. CD-FC-074-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SAN ANTONIO-LA QUINTA-ALTOS DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con correo del 16 - Ene - 2024 GIC-INVIAS-NTS-166-24 del 25-Ene-2024 – OBSERVACIONES CONTRATISTA hace entrega con N° 020-CD-FC-074-2023 del 12-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-359-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Protocolo De Bioseguridad	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con correo del 16 - Ene – 2024 GIC-INVIAS-NTS-369-24 del 01-Mar-2024 - **APROBADO**
Hojas de vida	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con correo del 16 - Ene – 2024- REVISIÓN GIC-INVIAS-NTS-369-24 del 01-Mar-2024 – **APROBADO** GIC-INVIAS-NTS-572-24 del 12-Abr-2024 - **APROBADO**
Programa De Obra	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con correo del 16 - Ene – 2024- REVISIÓN GIC-INVIAS-NTS-369-24 del 01-Mar-2024 – **APROBADO** No. 049-CD-FC-074-2023 del 10-May-2024 – Prorroga 2 GIC-INVIAS-NTS-760-24 del 20-May-2024 - **APROBADO**
Flujo De Caja	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con correo del 16 - Ene – 2024- REVISIÓN GIC-INVIAS-NTS-369-24 del 01-Mar-2024 – **APROBADO** No. 049-CD-FC-074-2023 del 10-May-2024 – Prorroga 2 GIC-INVIAS-NTS-760-24 del 20-May-2024 - **APROBADO**
Programa De Generación De Empleo	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con correo del 16 - Ene – 2024- REVISIÓN GIC-INVIAS-NTS-407-24 del 07-Mar-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-589-24 del 17-Abr-2024 - **APROBADO**
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-407-24 del 07-Mar-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-589-24 del 17-Abr-2024 - **APROBADO**

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	Se realiza por parte de interventoría la solicitud mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-1580-22 del 19-Dic-2023 – SOLICITUD CONTRATISTA hace entrega con N° 021-CD-FC-074-2023 del 19-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-369-24 del 01-Mar-2024 - **APROBADO**
Instalaciones Provisionales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-407-24 del 07-Mar-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-589-24 del 17-Abr-2024 - **APROBADO**
Plan De Manejo De Transito - PMT	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con correo del 16 - Ene – 2024- **REVISIÓN** GIC-INVIAS-NTS-589-24 del 17-Abr-2024 - **APROBADO**
Instalación De Valla	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-407-24 del 07-Mar-2024 – **SOLICITUD**
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con correo del 16 - Ene – 2024- REVISIÓN CONTRATISTA hace entrega con N° 028-CD-FC-074-2023 del 01-Mar-2024 – **REVISIÓN** GIC-INVIAS-NTS-736-24 del 14-May-2024 - **APROBADO** GIC-INVIAS-NTS-737-24 del 14-May-2024 – REVISIÓN AL INVIAS
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-870-24 del 11-Jul-2024 - **APROBADO**
Fuente De Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-311-24 del 15-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con N° 026-CD-FC-074-2023 del 23-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-446-24 del 12-Mar-2024 - **APROBADO**
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-589-24 del 17-Abr-2024 - **APROBADO**

Tabla 51 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Salazar de las Palmas Gobernación 2033

3.11.1.1.5. CD-FC-072-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA LOS RINCÓN-LA COPITA, MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	Aprobado	Contratista hace entrega con Oficio No. 034 de 2024 del 01-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-597-24 del 16-Abr-2024 - **APROBADO**
Protocolo De Bioseguridad	Aprobado	Contratista hace entrega con Oficio No. 034 de 2024 del 01-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-515-24 del 01-Abr-2024 - **APROBADO**
Hojas de vida	Aprobado	Contratista hace entrega por correo el 14-12-2023- REVISIÓN GIC-INVIAS-NTS-412-24 del 07-Mar-2024 – **APROBADO**
Programa De Obra	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio No. 017-2024 el 07-Feb-2024 Contratista hace entrega con oficio No. 021-2024 el 14-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-412-24 del 07-Mar-2024 – **APROBADO** Contratista hace entrega con oficio No. 033-2024 el 01-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-515-24 del 01-Abr-2024 – **APROBADO**
Flujo De Caja	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio No. 017-2024 el 07-Feb-2024 Contratista hace entrega con oficio No. 021-2024 el 14-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-412-24 del 07-Mar-2024 – **APROBADO** Contratista hace entrega con oficio No. 033-2024 el 01-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-515-24 del 01-Abr-2024 – **APROBADO**
Programa De Generación De Empleo	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio No. 034-2024 el 01-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-515-24 del 01-Abr-2024 – **APROBADO**
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-515-24 del 01-Abr-2024 – **APROBADO**
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	Se realiza por parte de interventoría la solicitud mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-1581-22 del 19-Dic-2023 – SOLICITUD Contratista hace entrega con oficio No. 020-2024 el 12-Feb-2024

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
		GIC-INVIAS-NTS-412-24 del 07-Mar-2024 – **APROBADO**
Instalaciones Provisionales	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio No. 034-2024 el 01-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-515-24 del 01-Abr-2024 – **APROBADO**
Plan De Manejo De Transito - PMT	Entregado	Contratista hace entrega por correo el 14-12-2023- REVISIÓN
Instalación De Valla	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio No. 034-2024 el 01-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-515-24 del 01-Abr-2024 – **APROBADO**
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	Contratista hace entrega por correo el 14-12-2023- REVISIÓN GIC-INVIAS-NTS-755-24 del 17-May-2024 – **APROBADO CON OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-756-24 del 17-May-2024 – **REMISIÓN INVIAS**
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio No. 034-2024 el 01-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-515-24 del 01-Abr-2024 – **APROBADO**
Fuente De Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-578-24 del 14-Abr-2024 - **APROBADO**
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio No. 034-2024 el 01-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-515-24 del 01-Abr-2024 – **APROBADO**

Tabla 52 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Silos Gobernación 2033

3.11.1.1.6. CD-FC-062-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-005 del 12 - Dic – 2023 **REVISIÓN** GIC-INVIAS-NTS-218-24 del 06-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-029 del 12-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-523-24 del 02-Abr-2024 – **OBSERVACIONES** Contratista entrega oficio RAOT-CD-FC-039 del 20-May-2024 GIC-INVIAS-NTS-835-24 del 29-May-2024 - **APROBADO**
Protocolo De Bioseguridad	Aprobado	Contratista entrega oficio RAOT-CD-FC-039 del 26-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-579-24 del 20-May-2024 - **APROBADO**
Hojas de vida	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-005 del 12 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1566-22 del 15-Dic-2023 – **APROBADO**
Programa De Obra	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-005 del 12 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1566-22 del 15-Dic-2023 – **APROBADO** CONTRATISTA hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-018 del 07 - Feb – 2024 GIC-INVIAS-NTS-579-24 del 20-May-2024 - **APROBADO**
Flujo De Caja	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-005 del 12 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1566-22 del 15-Dic-2023 – **APROBADO** CONTRATISTA hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-018 del 07 - Feb – 2024 GIC-INVIAS-NTS-579-24 del 20-May-2024 - **APROBADO**
Programa De Generación De Empleo	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-005 del 12 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1566-22 del 15-Dic-2023 - **APROBADO**
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	Se realiza por parte de interventoría la solicitud mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-1583-22 del 19-Dic-2023 - SOLICITUD CONTRATISTA hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-007 del 11- Ene- 2024-REVISIÓN GIC-INVIAS-NTS-579-24 del 20-May-2024 - **APROBADO**
Instalaciones Provisionales	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-025 del 01-Maro-2024 GIC-INVIAS-NTS-410-24 del 07-Mar-2024 - **APROBADO**
Plan De Manejo De Transito - PMT	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-024 del 28-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-579-24 del 20-May-2024 - **APROBADO**

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-005 del 12 - Dic – 2023-REVISIÓN CONTRATISTA hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-026 del 11 - Mar – 2024 – REVISIÓN GIC-INVIAS-NTS-746-24 del 16-May-2024 – **APROBADO CON OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-747-24 del 16-May-2024 – **REMISIÓN A INVIAS**
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Aprobado	Contratista entrega oficio RAOT-CD-FC-062-023 del 26-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-579-24 del 20-May-2024 - **APROBADO**
Fuente De Materiales	Entregado	CONTRATISTA hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-005 del 12 - Dic – 2023-REVISIÓN
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-027 del 07 - Mar – 2024 GIC-INVIAS-NTS-410-24 del 07-Mar-2024 - **APROBADO**
Diseño de Mezcla	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-017 del 07 - Feb – 2024 – REVISIÓN GIC-INVIAS-NTS-579-24 del 20-05-2024 - **APROBADO**

Tabla 53 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Villa de Rosario Gobernación 2033

3.11.1.1.7. CD-FC-079-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADAS-TABIRO-PUENTE ZULIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	Aprobado	Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-031 el 13-Mar-2024 (Seguimiento Plan de Calidad) GIC-INVIAS-NTS-525-24 del 02-Abr-2024 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-033 el 10-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-595-24 del 17-Abr-2024 – **APROBADO**
Protocolo De Bioseguridad	Aprobado	Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-023 el 27-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-362-24 del 29-Feb-2024 – **APROBADO**
Hojas de vida	Aprobado	Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-002 el 12-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1565-22 del 15-Dic-2023 – **APROBADO**
Programa De Obra	Aprobado	Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-002 el 12-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1565-22 del 15-Dic-2023 – **APROBADO**
Flujo De Caja	Aprobado	Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-002 el 12-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1565-22 del 15-Dic-2023 – **APROBADO**
Programa De Generación De Empleo	Aprobado	Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-002 el 12-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1565-22 del 15-Dic-2023 – **APROBADO**
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-002 el 12-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1565-22 del 15-Dic-2023 – **APROBADO**
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	Se realiza por parte de interventoría la solicitud mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-1584-22 del 19-Dic-2023 – SOLICITUD GIC-INVIAS-NTS-409-24 del 07-Mar-2024 – **APROBADO**
Instalaciones Provisionales	Aprobado	Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-025 el 01-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-409-24 del 07-Mar-2024 – **APROBADO**
Plan De Manejo De Transito - PMT	Aprobado	Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-024 el 28-Feb-2024

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
		GIC-INVIAS-NTS-409-24 del 07-Mar-2024 - **APROBADO**
Instalación De Valla	Sin entregar	
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-002 el 12-Dic-2023 REVISIÓN Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-026 el 11-Mar-2024 – REVISIÓN GIC-INVIAS-NTS-654-24 del 26-Abr-2024 – **APROBADO** GIC-INVIAS-NTS-741-24 del 16-May-2024 – **REMISIÓN A INVIAS**
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-362-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	Aprobado	Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-024 el 28-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-409-24 del 07-Mar-2024 - **APROBADO**

Tabla 54 Estado Documentos pre construcción –Municipio de San Cayetano Gobernación 2033

3.11.1.1.8. CD-FC-067-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LOS MANGOS-LA CARRERA, MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	Aprobado	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-431-24 del 08-Mar-2024 – **SOLICITUD** El contratista hace entrega por oficio OBR-CACH-006 el 08-Abr-2024 – **REVISIÓN** GIC-INVIAS-NTS-592-24 del 17-Abr-2024 – **OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-1361-24 del 02-Oct-2024 - **APROBACIÓN**
Protocolo De Bioseguridad	N/A	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-431-24 del 08-Mar-2024 – **SOLICITUD** **NO APLICA – NO SE CUENTA CON EL RUBRO**
Hojas de vida	Aprobado	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-431-24 del 08-Mar-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-548-24 del 08-abril-2024 - **APROBACIÓN**
Programa De Obra	Aprobado	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-431-24 del 08-Mar-2024 – **SOLICITUD** Contratista envía por medio de correo 21-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-548-24 del 08-Abr-2024 - **APROBACIÓN**
Flujo De Caja	Aprobado	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-431-24 del 08-Mar-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-548-24 del 08-Abr-2024 - **APROBACIÓN**
Programa De Generación De Empleo	Aprobado	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-431-24 del 08-Mar-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-548-24 del 08-Abr-2024 - **APROBACIÓN**
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-431-24 del 08-Mar-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-548-24 del 08-Abr-2024 - **APROBACIÓN**
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-431-24 del 08-Mar-2024 – **SOLICITUD** Contratista envía por medio de correo 21-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-548-24 del 08-Abr-2024 **OBSERVADO** Contratista envía oficio OBR-CACH-006 del 02-May-2024 Contratista envía oficio OBR-CACH-024 del 24-May-2024 GIC-INVIAS-NTS-1418-24 del 21-Oct-2024 - **APROBACIÓN**
Plan De Manejo De Transito - PMT	Aprobado	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-431-24 del 08-Mar-2024 – **SOLICITUD**

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
		GIC-INVIAS-NTS-548-24 del 08-Abr-2024 - **APROBADO**
Instalación De Valla	Entregado	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-431-24 del 08-Mar-2024 – **SOLICITUD** El contratista hace entrega por oficio OBR-CACH-013 el 10-Abr-2024 - **OBSERVADO**
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-431-24 del 08-Mar-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-1405 del 15-Oct-2024 - APROBADO
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Aprobado	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-431-24 del 08-Mar-2024 – **SOLICITUD** Contratista envía por medio de correo 21-Mar-2024
Fuente De Materiales	Aprobado	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-431-24 del 08-Mar-2024 – **SOLICITUD** OBR-CACH-019 del 15-May-2024 GIC-INVIAS-NTS-750-24 del 16-May-2024 - **APROBADO**
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	Solicitud	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-431-24 del 08-Mar-2024 - **SOLICITUD**
Diseño de Mezcla	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-548-24 del 08-Abr-2024 - **APROBADO**

Tabla 55 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Cáchira Gobernación 2033

3.11.1.1.9. CD-FC-060-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO DE LOURDES, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	Aprobado	Contratista presenta oficio MATTICCES-LOURDES-012-2024 del 06-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-448-24 del 12-Mar-2024 - **APROBADO**
Protocolo De Bioseguridad	Aprobado	Contratista presenta oficio MATTICCES-LOURDES-012-2024 del 06-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-467-24 del 19-Mar-2024 - **APROBADO**
Hojas de vida	Aprobado	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-376-24 del 04-Mar-2024 Contratista presenta oficio MATTICCES-LOURDES-012-2024 del 06-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-473-24 del 19-Mar-2024 – **OBSERVADO** GIC-INVIAS-NTS-564-24 del 09-Abr-2024 – **AVAL RESIDENTE**
Programa De Obra	Aprobado	Contratista presenta oficio MATTICCES-LOURDES-012-2024 del 06-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-399-24 del 06-Mar-2024 – **APROBADO** Contratista presenta oficio MATTICCES-LOURDES-019-2024 del 03-May-2024
Flujo De Caja	Aprobado	Contratista presenta oficio MATTICCES-LOURDES-012-2024 del 06-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-399-24 del 06-Mar-2024 – **APROBADO** Contratista presenta oficio MATTICCES-LOURDES-019-2024 del 02-May-2024 IC-INVIAS-NTS-987-24 del 03-MAY-2024 - **APROBADO**
Programa De Generación De Empleo	Aprobado	Contratista presenta oficio MATTICCES-LOURDES-012-2024 del 06-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-474-24 del 19-Mar-2024 – **APROBADO** GIC-INVIAS-NTS-993-24 de 14-May-2024 - **APROBADO**
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	Contratista presenta oficio MATTICCES-LOURDES-012-2024 del 06-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-993-24 de 14-May-2024 - **APROBADO**
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-565-24 del 09-Abr-2024 – **OBSERVADO** GIC-INVIAS-NTS-568-24 del 09-Abr-2024 – **SOLICITUD**

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
		Contratista presenta oficio MATTICCES-LOURDES-018-2024 del 18-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-988-24 de 15-May-2024 – **APROBADO** GIC-INVIAS-NTS-993-24 de 14-May-2024 – **APROBADO**
Instalaciones Provisionales	Aprobado	Contratista presenta con oficio MATICCES-LOURDES-012-2024 el 06-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-467-24 del 19-Mar-2024 - **APROBADO**
Plan De Manejo De Transito - PMT	Aprobado	Contratista presenta oficio MATTICCES-LOURDES-012-2024 del 06-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-398-24 del 06-Mar-2024 – **APROBADO** GIC-INVIAS-NTS-993-24 del 14-May-2024 – **APROBADO**
Instalación De Valla	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-563-24 del 09-Abr-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-568-24 del 09-Abr-2024 – **SOLICITUD**
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-733-24 del 14-May-2024 – **REMISIÓN INVIAS** GIC-INVIAS-NTS-734-24 del 14-May-2024 - **APROBADO**
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-568-24 del 09-Abr-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-467-24 del 19-Mar-2024 - **APROBADO**
Fuente De Materiales	Aprobado	Contratista presenta oficio MATTICCES-LOURDES-012-2024 del 06-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-425-24 del 08-Mar-2024 – **APROBADO** GIC-INVIAS-NTS-993-24 del 14-May-2024 – **APROBADO**
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	Sin entregar	GIC-INVIAS-NTS-568-24 del 09-Abr-2024 – **SOLICITUD**
Diseño de Mezcla	Aprobado	Contratista presenta oficio MATTICCES-LOURDES-06-2024 del 30-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-566-24 del 19-Abr-2024 – **OBSERVADO** Contratista presenta oficio MATTICCES-LOURDES-018-2024 del 18-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-988-24 del 15-May-2024 - **APROBADO**

Tabla 56 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Lourdes Gobernación 2033

3.11.1.1.10. CD-FC-056-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES PUENTE ISABEL CELIS-DAVE, MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-570-24 del 10-Abr-2024 - SOLICITUD CONTRATISTA hace entrega por correo 22-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-706-24 del 06-May-2024 - **APROBADO**
Protocolo De Bioseguridad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-570-24 del 10-Abr-2024 - SOLICITUD CONTRATISTA hace entrega por correo 22-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-627-24 del 22-Abr-2024 – **APROBADO**
Hojas de vida	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-570-24 del 10-Abr-2024 - SOLICITUD CONTRATISTA hace entrega por correo 22-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-627-24 del 22-Abr-2024 - **APROBADO**
Programa De Obra	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-570-24 del 10-Abr-2024 - SOLICITUD CONTRATISTA hace entrega por correo 22-04-2024
Flujo De Caja	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-570-24 del 10-Abr-2024 - SOLICITUD CONTRATISTA hace entrega por correo 22-04-2024
Programa De Generación De Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-570-24 del 10-Abr-2024 - SOLICITUD CONTRATISTA hace entrega por correo 22-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-627-24 del 22-Abr-2024 - **APROBADO**
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-570-24 del 10-Abr-2024 - SOLICITUD CONTRATISTA hace entrega por correo 22-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-627-24 del 22-Abr-2024 - **APROBADO**
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-570-24 del 10-Abr-2024 - SOLICITUD CONTRATISTA hace entrega por correo 22-04-2024
Instalaciones Provisionales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-570-24 del 10-Abr-2024 - SOLICITUD CONTRATISTA hace entrega por correo 22-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-627-24 del 22-Abr-2024 - **APROBADO**
Plan De Manejo De Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-570-24 del 10-Abr-2024 - SOLICITUD CONTRATISTA hace entrega por correo 22-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-627-24 del 22-Abr-2024 - **APROBADO**

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Instalación De Valla	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-570-24 del 10-Abr-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-1150-24 del 15-Ago-2024 - **SOLICITUD**
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-570-24 del 10-Abr-2024 – **SOLICITUD** Se reitera la solicitud de documento PAGA con el oficio GIC-INVIAS-NTS-1150-24 del 15-Oct-2024
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-570-24 del 10-Abr-2024 - **SOLICITUD**
Fuente De Materiales	Observación	GIC-INVIAS-NTS-570-24 del 10-Abr-2024 - SOLICITUD CONTRATISTA hace entrega por correo 22-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-635-24 del 24-Abr-2024 - **OBSERVACIONES**
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-570-24 del 10-Abr-2024 - SOLICITUD CONTRATISTA hace entrega por correo 22-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-627-24 del 22-Abr-2024 - **APROBADO**
Diseño de Mezcla	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-570-24 del 10-Abr-2024 - SOLICITUD CONTRATISTA hace entrega por correo 22-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-627-24 del 22-Abr-2024 - **APROBADO**

Tabla 57 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Puerto Santander Gobernación 2033

3.11.1.1.11. CD-FC-077-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES PASO DE LOS RÍOS-RICAURTE, MUNICIPIO DE CÚCUTA, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	Aprobado	El Contratista hace entrega Por oficio SCCVN-009-2024 el 04-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-593-24 del 17-Abr-2024 – **OBSERVACIONES** CCVN-014-2024 - 18/04/2024 - ATIENDE OBSERVACIONES GIC-INVIAS-NTS-1591-24 del 27/11/2024 - **APROBADO**
Protocolo De Bioseguridad	Aprobado	El Contratista hace entrega Por oficio SCCVN-009-2024 el 04-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-605-24 del 18-Abr-2024 - **APROBADO**
Hojas de vida	Aprobado	El Contratista hace entrega Por oficio SCCVN-001-2024 el 03-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-603-24 del 18-Abr-2024 - **APROBADO** GIC-INVIAS-NTS-655-24 del 26-Abr-2024 - **APROBADO**
Programa De Obra	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-568-24 del 9-ABRIL-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-981-24 del 26-Jun-2024 - **APROBADO**
Flujo De Caja	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-568-24 del 9-ABRIL-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-981-24 del 26-Jun-2024 - **APROBADO**
Programa De Generación De Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-568-24 del 9-ABRIL-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-981-24 del 26-Jun-2024 - **APROBADO**
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-568-24 del 9-ABRIL-2024 - **SOLICITUD** El Contratista hace entrega Por oficio SCCVN-013-2024 el 18-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-981-24 del 26-Jun-2024 - **APROBADO**
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	El Contratista hace entrega Por oficio SCCVN-009-2024 el 04-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-605-24 del 18-Abr-2024 - **APROBADO**
Instalaciones Provisionales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-721-24 del 10-05-2024 - **APROBADO**
Plan De Manejo De Transito - PMT	Aprobado	El Contratista hace entrega Por oficio SCCVN-001-2024 el 03-04-2024

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
		GIC-INVIAS-NTS-656-24 del 26-Abr-2024 - OBSERVACIONES El Contratista hace entrega Por oficio SCCVN-020-2024 el 29-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-660-24 del 29-Abr-2024 - **APROBADO**
Instalación De Valla	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-568-24 del 9-ABRIL-2024 - **SOLICITUD** El Contratista hace entrega Por oficio SCCVN-012-2024 el 16-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-599-24 del 16-ABRIL-2024 - **SOLICITUD**
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-568-24 del 9-ABRIL-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-1148-24 del 13-agosto-2024 – **SOLICITUD** El contratista mediante SSVN-028-2024 – del 05-Sept-2024 Entrega documento PAGA y anexos GIC-INVIAS-NTS-1282-24 del 09-Sept-2024 – **OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-1599-24 - **APROBADO**
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-568-24 del 9-ABR-2024 - SOLICITUD El Contratista hace entrega Por oficio SCCVN-012-2024 el 16-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-660-24 del 29-Abr-2024 - **APROBADO**
Fuente De Materiales	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-568-24 del 9-ABRIL-2024 - **SOLICITUD**
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-568-24 del 9-ABRIL-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-981-24 del 26-Jun-2024 - **APROBADO**
Diseño de Mezcla	Aprobado	El Contratista hace entrega Por oficio SCCVN-009-2024 el 04-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-656-24 del 26-Abr-2024 - **APROBADO**

Tabla 58 Estado Documentos pre construcción –Municipio Cúcuta Gobernación 2033

3.11.1.1.12. CD-FC-064-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA PARAMO – PICA PICA, MUNICIPIO DE PAMPLONITA, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	No entregado	
Protocolo De Bioseguridad	No entregado	
Hojas de vida	Aprobado	Contratista envía por correo el 16-05-2024 GIC-INVIAS-NTS-785-24 del 22-May-2024 – **OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-918-24 del 18-Jun-2024 - **APROBADO**
Programa De Obra	Aprobado	Contratista envía por correo el 16-05-2024 GIC-INVIAS-NTS-785-24 del 22-May-2024 - **APROBADO**
Flujo De Caja	Aprobado	Contratista envía por correo el 16-05-2024 GIC-INVIAS-NTS-785-24 del 22-May-2024 - **APROBADO**
Programa De Generación De Empleo	Aprobado	Contratista envía por correo el 16-05-2024 GIC-INVIAS-NTS-785-24 del 22-May-2024 - **APROBADO**
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	Contratista envía por correo el 16-05-2024 GIC-INVIAS-NTS-785-24 del 22-May-2024 - **APROBADO**
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	Contratista envía por correo el 16-05-2024 GIC-INVIAS-NTS-785-24 del 22-May-2024 - **APROBADO**
Instalaciones Provisionales	No entregado	
Plan De Manejo De Transito - PMT	Aprobado	Contratista envía por correo el 16-05-2024 GIC-INVIAS-NTS-772-24 del 21-May-2024 - **APROBADO**
Instalación De Valla	No entregado	Contratista envía por correo el 16-05-2024
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1419-24 del 21-Oct-2024 - **APROBADO**
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Aprobado	Contratista envía por correo el 16-05-2024 GIC-INVIAS-NTS-772-24 del 21-May-2024 - **APROBADO**
Fuente De Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-860-24 de l07-Jun-2024 - **APROBADO**
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	No entregado	
Diseño de Mezcla	No entregado	

Tabla 59 Estado Documentos pre construcción –Municipio Pamplonita Gobernación 2033

3.11.1.1.13. CD-FC-082-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRÁN, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-825-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-834-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD** Contratista hace entrega por medio de oficio N° 010-CD-FC-082-2023 el 06-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-903-24 del 13-Jun-2024 - **APROBADO**
Protocolo De Bioseguridad	Enviado	GIC-INVIAS-NTS-825-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-834-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD** Contratista hace entrega por medio de oficio N° 010-CD-FC-082-2023 el 06-06-2024
Hojas de vida	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-825-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** Contratista presenta por medio de oficio N007-CD-FC-082-2023 el 24/05/2024 - DIRECTOR DE OBRA Contratista presenta por medio de oficio N014-CD-FC-082-2023 el 17/06/2024 – RESIDENTE DE OBRA GIC-INVIAS-NTS-996-24 del 02-Jul-2024 - APROBACIÓN RESIDENTE GIC-INVIAS-NTS-1078-24 del 28-MAY2024 - **APROBACIÓN DIRECTORA**
Programa De Obra	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-825-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-834-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD** Contratista hace entrega por medio de oficio N° 010-CD-FC-082-2023 el 06-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-996-24 del 02-Jul-2024 - **APROBACIÓN**
Flujo De Caja	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-825-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** Contratista hace entrega por medio de oficio N° 010-CD-FC-082-2023 el 06-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-996-24 del 02-Jul-2024 - **APROBACIÓN**
Programa De Generación De Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-825-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-834-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD** Contratista hace entrega por medio de oficio N° 010-CD-FC-082-2023 el 06-06-2024

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
		GIC-INVIAS-NTS-996-24 del 02-Jul-2024 - **APROBACIÓN**
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-825-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-834-24 del 28-May-2024 – **SOLICITUD** Contratista hace entrega por medio de oficio N010-CD-FC-082-2023 el 12-06-2024 Contratista hace entrega por medio de oficio N013-CD-FC-082-2023 el 17-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-996-24 del 02-Jul-2024 - **APROBACIÓN**
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-825-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-834-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD** Contratista hace entrega por medio de oficio N010-CD-FC-082-2023 el 12-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-996-24 del 02-Jul-2024 - **APROBACIÓN**
Instalaciones Provisionales	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-825-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-834-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD**
Plan De Manejo De Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-825-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-834-24 del 28-May-2024 – **SOLICITUD** Contratista hace entrega por medio de oficio N°010-CD-FC-082-2023 el 12-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-917-24 del 18-Jun-2024 - **APROBACIÓN**
Instalación De Valla	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-825-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-834-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD**
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-825-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-834-24 del 28-May-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-1468-24 del 29-Oct-2024 - **APROBACIÓN**
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-825-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-834-24 del 28-May-2024 – **SOLICITUD** Contratista hace entrega por medio de oficio N010-CD-FC-082-2023 el 12-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-917-24 del 18-Jun-2024 - **APROBACIÓN**

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Fuente De Materiales	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-825-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-834-24 del 28-May-2024 – **SOLICITUD** Contratista entrega por medio de oficio SCCVN-CD-FC-081-2023-0010 - 18-07-2024
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-825-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-834-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD** Contratista hace entrega por medio de oficio N°010-CD-FC-082-2023 el 06-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-996-24 del 02-Jul-2024 - **APROBACIÓN**
Diseño de Mezcla	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-825-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-834-24 del 28-May-2024 – **SOLICITUD** Contratista hace entrega por medio de oficio N°015-CD-FC-082-2023 el 18-07-2024

Tabla 60 Estado Documentos pre construcción –Municipio Herrán Gobernación 2033

3.11.1.1.14. CD-FC-081-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES MINAS DE CAL – LA ARAÑITA – LA MESA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-826-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-833-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD** Contratista hace entrega por oficio SCCVN-CD-FC-081-2023-006 el 07-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-904-24 del 13-Jun-2024 - **APROBADO**
Protocolo De Bioseguridad	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-826-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-833-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD** Contratista hace entrega por oficio SCCVN-CD-FC-081-2023-006 el 07-06-2024
Hojas de vida	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-826-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** Contratista presenta por medio de oficio SCCVN-CD-FC-081-2023-002 el 24/05/2024 - DIRECTOR DE OBRA
Programa De Obra	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-826-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-833-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD** Contratista hace entrega por oficio SCCVN-CD-FC-081-2023-006 el 07-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-921-24 del 18-Jun-2024 - **APROBADO**
Flujo De Caja	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-826-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-833-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD** Contratista hace entrega por oficio SCCVN-CD-FC-081-2023-006 el 07-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-921-24 del 18-Jun-2024 - **APROBADO**
Programa De Generación De Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-826-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-833-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD** Contratista hace entrega por oficio SCCVN-CD-FC-081-2023-006 el 07-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-921-24 del 18-Jun-2024 - **APROBADO**
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-826-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-833-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD** Contratista hace entrega por oficio SCCVN-CD-FC-081-2023-008 el 12-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-921-24 del 18-Jun-2024 - **APROBADO**
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-826-24 del 23-May-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-833-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD** Contratista hace entrega por oficio SCCVN-CD-FC-081-2023-006 el 07-06-2024
Instalaciones Provisionales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-826-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-833-24 del 28-May-2024 – **SOLICITUD** Contratista hace entrega por oficio SCCVN-CD-FC-081-2023-009 el 10-07-2024 GIC-INVIAS-NTS-1391-24 del 26-Ago-2024 - **APROBADO**
Plan De Manejo De Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-826-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-833-24 del 28-May-2024 – **SOLICITUD**

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
		GIC-INVIAS-NTS-916-24 del 28-May-2024 - **APROBADO**
Instalación De Valla	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-826-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-833-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD**
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-826-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-833-24 del 28-May-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-1465-24 del 29-Oct-2024 - **APROBADO**
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-826-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-833-24 del 28-May-2024 – **SOLICITUD** Contratista hace entrega oficio SCCVN-CD-FC-081-2023-008 el 12-Jun-2024 Contratista hace entrega por oficio SCCVN-CD-FC-081-2023-009 el 10-07-2024 GIC-INVIAS-NTS-916-24 del 28-May-2024 - **APROBADO**
Fuente De Materiales	No entregado	
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-826-24 del 23-May-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-833-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD** Contratista hace entrega por oficio SCCVN-CD-FC-081-2023-006 el 07-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-921-24 del 18-Jun-2024 - **APROBADO**
Diseño de Mezcla	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-826-24 del 23-May-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-833-24 del 28-May-2024 – **SOLICITUD** Contratista hace entrega por oficio SCCVN-CD-FC-081-2023-009 el 10-07-2024

Tabla 61 Estado Documentos pre construcción –Municipio Mutiscua Gobernación 2033

3.11.1.1.15. CD-FC-058-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA – CUPERENA – CAGUALA – ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	**Aprobado**	SE SOLICITA POR MEDIO DE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-985-24 EL 27-06- CONTRATISTA HACE ENVÍO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-003 DEL 02-07-2024 GIC-INVIAS-NTS-1064-24 del 17-JUL-2024 – **OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-1171-24 DEL 22/08/2024 **APROBACIÓN**
Protocolo De Bioseguridad	**Aprobado**	SE SOLICITA POR MEDIO DE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-985-24 EL 27-06-2024 CONTRATISTA HACE ENVÍO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-003 DEL 02-07-2024 GIC-INVIAS-NTS-1001-24 del 04-JUL-2024 - **APROBACIÓN**
Hojas de vida	**Aprobado**	SE SOLICITA POR MEDIO DE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-985-24 EL 27-06-2024 CONTRATISTA HACE ENVÍO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-003 DEL 02-07-2024 GIC-INVIAS-NTS-1001-24 del 04-JUL-2024 - **APROBACIÓN**
Programa De Obra	**Aprobado**	SE SOLICITA POR MEDIO DE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-985-24 EL 27-06-2024 CONTRATISTA HACE ENVÍO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-003 DEL 02-07-2024 GIC-INVIAS-NTS-1001-24 del 04-JUL-2024 – **APROBACIÓN** Reprogramación No. 1 por prórroga y Modificación de cantidades No.01 - WRGR-CD-FC-058-2023-013 GIC-INVIAS-NTS-1321-24 - 17/09/2024 – **OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-1377-24 del 08-Oct-2024 - **APROBACIÓN**
Flujo De Caja	**Aprobado**	SE SOLICITA POR MEDIO DE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-985-24 EL 27-06-2024 CONTRATISTA HACE ENVÍO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-003 DEL 02-07-2024 GIC-INVIAS-NTS-1001-24 del 04-JUL-2024 - **APROBACIÓN**
Programa De Generación De Empleo	**Aprobado**	SE SOLICITA POR MEDIO DE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-985-24 EL 27-06-2024 CONTRATISTA HACE ENVÍO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-003 DEL 02-07-2024 GIC-INVIAS-NTS-1001-24 del 04-JUL-2024 - **APROBACIÓN**
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	**Aprobado**	SE SOLICITA POR MEDIO DE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-985-24 EL 27-06-2024 CONTRATISTA HACE ENVÍO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-003 DEL 02-07-2024 GIC-INVIAS-NTS-1001-24 del 04-JUL-2024 - **APROBACIÓN**
Análisis de Precios Unitarios	**Aprobado**	SE SOLICITA POR MEDIO DE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-985-24 EL 27-06-2024 CONTRATISTA HACE ENVÍO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-003 DEL 02-07-2024

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
		GIC-INVIAS-NTS-1001-24 del 04-JUL-2024 - **APROBACIÓN**
Instalaciones Provisionales	**Aprobado**	SE SOLICITA POR MEDIO DE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-985-24 EL 27-06-2024 CONTRATISTA HACE ENVÍO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-
Plan De Manejo De Transito - PMT	**Aprobado**	SE SOLICITA POR MEDIO DE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-985-24 EL 27-06-2024 CONTRATISTA HACE ENVÍO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-003 DEL 02-07-2024 GIC-INVIAS-NTS-1001-24 del 04-JUL-2024 - **APROBACIÓN**
Instalación De Valla	Solicitud	SE SOLICITA POR MEDIO DE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-985-24 EL 27-06-2024
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	**Aprobado**	SE SOLICITA POR MEDIO DE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-985-24 EL 27-06-2024 CONTRATISTA HACE ENVÍO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-005 DEL 22-07-2024 Mediante oficio WRGR-CD-FC-058-2023-016 del 30-Sep-2024 – REVISIÓN GIC-INVIAS-NTS-1478-24 del 05-nov-2024 - **APROBACIÓN**
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Entregado	SE SOLICITA POR MEDIO DE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-985-24 EL 27-06-2024 Entrega el contratista por medio WRGR-CD-FC-058-2023-019 del 09-Oct-2024
Fuente De Materiales	**Aprobado**	SE SOLICITA POR MEDIO DE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-985-24 EL 27-06-2024 CONTRATISTA HACE ENVÍO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-005 DEL 22-07-2024 GIC-INVIAS-NTS-1086-24 del 22-JUL-2024 - **APROBACIÓN**
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	**Aprobado**	SE SOLICITA POR MEDIO DE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-985-24 EL 27-06-2024 CONTRATISTA HACE ENVÍO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-005 DEL 22-07-2024 GIC-INVIAS-NTS-1086-24 del 22-JUL-2024 - **APROBACIÓN**
Diseño de Mezcla	**Aprobado**	SE SOLICITA POR MEDIO DE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-985-24 EL 27-06-2024 CONTRATISTA HACE ENVÍO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-005 DEL 22-07-2024 GIC-INVIAS-NTS-1086-24 del 22-JUL-2024 - **APROBACIÓN**

Tabla 62 Estado Documentos pre construcción –Municipio Santiago Gobernación 2033

3.11.1.1.16. CD-FC-081-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA GARZA - ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1172-24 DEL 22/08/2024 - **APROBADO**
Protocolo De Bioseguridad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1180-24 - **APROBADO**
Hojas de vida	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1180-24 - **APROBADO**
Programa De Obra	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1180-24 - **APROBADO**
Flujo De Caja	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1180-24 - **APROBADO**
Programa De Generación De Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1180-24 - **APROBADO**
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1180-24 - **APROBADO**
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1180-24 - **APROBADO**
Instalaciones Provisionales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1180-24 - **APROBADO**
Plan De Manejo De Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1180-24 - **APROBADO**
Instalación De Valla		
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	Mediante oficio SCCY-071-009 del 22-Oct-2024 se envía documento para su revisión GIC-INVIAS-NTS-1576-24 del 05-nov-2024 - **APROBADO**
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1180-24 - **APROBADO**
Fuente De Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1180-24 - **APROBADO**
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1180-24 - **APROBADO**
Diseño de Mezcla	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1180-24 - **APROBADO**

Tabla 63 Estado Documentos pre construcción –Municipio Gramalote Gobernación 2033

3.11.1.1.17. CD-FC-049-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SAN JUAN – AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1456-24 29/10/2024 - SOLICITUD G&P-CD-FC-049-2024-004 - 01/11/2024 - ENTREGA GIC-INVIAS-NTS-1503-24 12/11/2024 - **APROBADO**
Protocolo De Bioseguridad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1456-24 29/10/2024 - SOLICITUD G&P-CD-FC-049-2024-004 - 01/11/2024 - ENTREGA GIC-INVIAS-NTS-1532-24 - 15/11/2024 - **APROBADO**
Hojas de vida	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1456-24 29/10/2024 - SOLICITUD G&P-CD-FC-049-2024-004 - 01/11/2024 - ENTREGA GIC-INVIAS-NTS-1537-24 - 18/11/2024 - **APROBADO**
Programa De Obra	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1456-24 29/10/2024 - SOLICITUD G&P-CD-FC-049-2024-004 - 01/11/2024 - ENTREGA GIC-INVIAS-NTS-1537-24 - 18/11/2024 - **APROBADO**
Flujo De Caja	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1456-24 29/10/2024 - SOLICITUD G&P-CD-FC-049-2024-004 - 01/11/2024 - ENTREGA GIC-INVIAS-NTS-1537-24 - 18/11/2024 - **APROBADO**
Programa De Generación De Empleo	Entregado	GIC-INVIAS-NTS-1456-24 29/10/2024 - SOLICITUD G&P-CD-FC-049-2024-004 - 01/11/2024 - ENTREGA
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1456-24 29/10/2024 - SOLICITUD G&P-CD-FC-049-2024-004 - 01/11/2024 - ENTREGA GIC-INVIAS-NTS-1537-24 - 18/11/2024 - **APROBADO**
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1471-24 01/11/2024 - SOLICITUD G&P-CD-FC-049-2024-004 - 01/11/2024 - ENTREGA GIC-INVIAS-NTS-1537-24 - 18/11/2024 - **APROBADO**
Instalaciones Provisionales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1456-24 29/10/2024 - SOLICITUD G&P-CD-FC-049-2024-004 - 01/11/2024 - ENTREGA GIC-INVIAS-NTS-1537-24 - 18/11/2024 - **APROBADO**
Plan De Manejo De Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1456-24 29/10/2024 - SOLICITUD G&P-CD-FC-049-2024-004 - 01/11/2024 - ENTREGA GIC-INVIAS-NTS-1532-24 - 15/11/2024 - **APROBADO**
Instalación De Valla		GIC-INVIAS-NTS-1457-24 29/10/2024 - SOLICITUD
Plan De Manejo Ambiental - PAGA		GIC-INVIAS-NTS-1456-24 29/10/2024 - SOLICITUD
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1471-24 01/11/2024 - SOLICITUD G&P-CD-FC-049-2024-004 - 01/11/2024 - ENTREGA GIC-INVIAS-NTS-1532-24 - 15/11/2024 - **APROBADO**

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Fuente De Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1471-24 01/11/2024 - SOLICITUD G&P-CD-FC-049-2024-004 - 01/11/2024 - ENTREGA GIC-INVIAS-NTS-1537-24 - 18/11/2024 - **APROBADO**
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1471-24 01/11/2024 - SOLICITUD G&P-CD-FC-049-2024-004 - 01/11/2024 - ENTREGA GIC-INVIAS-NTS-1537-24 - 18/11/2024 - **APROBADO**
Diseño de Mezcla	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1471-24 01/11/2024 - SOLICITUD G&P-CD-FC-049-2024-004 - 01/11/2024 - ENTREGA GIC-INVIAS-NTS-1537-24 - 18/11/2024 - **APROBADO**

Tabla 64 Estado Documentos pre construcción –Municipio Gramalote Gobernación 2033

3.11.1.2. Actividades Técnicas

Dentro de las actividades desarrolladas durante la ejecución del proyecto están:

3.11.1.2.1. CD-FC-065-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA CHINAVEGA, MUNICIPIO DE CACOTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El presente contrato de obra se encuentra liquidado con firma de su acta de liquidación el día 03 de septiembre de 2024.

Sus actividades de obra culminaron en el mes de febrero, ejecutándose 237 metros lineales de placa huella y 15204 m^2 de actividades de mantenimiento periódico en el corredor vial.





Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

3.11.1.2.2 CD-FC-055-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LAS DELICIAS-EL MAMON, MUNICIPIO DEL ZULIA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El presente contrato de obra se encuentra liquidado con firma de su acta de liquidación el día 12 de julio de 2024.

Sus actividades de obra culminaron en el mes de febrero, ejecutándose 320 metros lineales de placa huella y dos (02) alcantarillas en el corredor vial.



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

3.11.1.2.3 CD-FC-070-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA LA UNIÓN, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El presente contrato de obra se encuentra liquidado con firma de su acta de liquidación el día 12 de septiembre de 2024.

Sus actividades de obra culminaron en el mes de febrero, ejecutándose 279 metros lineales de placa huella y una (01) alcantarilla en el corredor vial.



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

3.11.1.2.4 CD-FC-074-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SAN ANTONIO-LA QUINTA-ALTOS DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El presente contrato de obra se encuentra liquidado con firma de su acta de liquidación el día 13 de julio de 2024.

Sus actividades de obra culminaron en el mes de mayo, ejecutándose 296 metros lineales de placa huella y tres (03) alcantarilla en el corredor vial.



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

3.11.1.2.5 CD-FC-072-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA LOS RINCÓN-LA COPITA, MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El presente contrato de obra se encuentra liquidado con firma de su acta de liquidación el día 12 de septiembre de 2024.

Sus actividades de obra culminaron en el mes de febrero, ejecutándose 375 metros lineales de placa huella, tres (03) alcantarillas y el mantenimiento periódico de 19948,80 m^2 en el corredor vial.



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

3.11.1.2.6 CD-FC-062-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El presente contrato de obra se encuentra liquidado con firma de su acta de liquidación el día 02 de septiembre de 2024.

Sus actividades de obra culminaron en el mes de febrero, ejecutándose 157 metros lineales de placa huella y una (01) alcantarilla en el corredor vial.



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

3.11.1.2.7 CD-FC-079-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADAS-TABIRO-PUENTE ZULIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El presente contrato de obra se encuentra liquidado con firma de su acta de liquidación el día 12 de julio de 2024.

Sus actividades de obra culminaron en el mes de febrero, ejecutándose 279 metros lineales de placa huella y 16224,69 m^2 de mantenimiento periódico en el corredor vial.





Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

3.11.1.2.8 CD-FC-067-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LOS MANGOS-LA CARRERA, MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El presente contrato de obra se encuentra liquidado con firma de su acta de liquidación el día 03 de diciembre de 2024.

Sus actividades de obra culminaron en el mes de febrero, ejecutándose 385 metros lineales de placa huella, 01 alcantarilla y 14387.23 m^2 de mantenimiento en el corredor vial.





Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

3.11.1.2.9 CD-FC-060-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO DE LOURDES, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El presente contrato de obra se encuentra liquidado con firma de su acta de liquidación el día 03 de diciembre de 2024

Sus actividades de obra culminaron en el mes de junio, ejecutándose 320 metros lineales de placa huella y 14387.23 m^2 de mantenimiento en el corredor vial y una alcantarilla.



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

3.11.1.2.10 CD-FC-056-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES PUENTE ISABEL CELIS-DAVE, MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El presente contrato de obra se encuentra liquidado con firma de su acta de liquidación el día 13 de diciembre de 2024

Sus actividades de obra culminaron en el mes de junio, ejecutándose 179.37 metros de placa huella y 13803.10 m^2 de mantenimiento en el corredor vial y una alcantarilla.



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

3.11.1.2.11 CD-FC-077-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES PASO DE LOS RÍOS-RICAURTE, MUNICIPIO DE CÚCUTA, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El presente contrato de obra se encuentra liquidado con firma de su acta de liquidación el día 09 de diciembre de 2024

Sus actividades de obra culminaron en el mes de julio, ejecutándose 270 metros lineales de placa huella y 12350.14 m^2 de mantenimiento periódico en el corredor vial.



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

3.11.1.2.12 CD-FC-082-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA PARAMO – PICA PICA, MUNICIPIO DE PAMPLONITA, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El presente contrato de obra se encuentra liquidado con firma de su acta de liquidación el día 15 de octubre de 2024

Sus actividades de obra culminaron en el mes de agosto, ejecutándose 296 metros lineales de placa huella, 16699.60 m^2 de mantenimiento y 02 alcantarillas en el corredor vial.





Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

3.11.1.2.13 CD-FC-077-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRÁN, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El presente contrato de obra se encuentra liquidado con firma de su acta de liquidación el día 27 de diciembre de 2024

Se ejecutaron 280 metros lineales de placa huella, 13441.69 m^2 de mantenimiento periódico y 02 alcantarillas en el corredor vial. El contrato entra en proceso de liquidación.









Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

3.11.1.2.14 CD-FC-081-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES MINAS DE CAL – LA ARAÑITA – LA MESA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El presente contrato de obra se encuentra liquidado con firma de su acta de liquidación el día 27 de diciembre de 2024

Se ejecutaron 295 metros lineales de placa huella, 16201.11 m^2 de mantenimiento periódico y 02 alcantarillas en el corredor vial. El contrato entra en proceso de liquidación.



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

3.11.1.2.14 CD-FC-058-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA – CUPERENA – CAGUALA – ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El presente contrato de obra se encuentra liquidado con firma de su acta de liquidación el día 29 de noviembre de 2024

Sus actividades de obra culminaron en el mes de octubre, con 390 metros lineales de placa huella, 16964.05 m^2 de mantenimiento periódico y 03 alcantarillas en el corredor vial.





Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

3.11.1.2.16 CD-FC-081-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA GARZA – ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El presente contrato de obra se encuentra liquidado con firma de su acta de liquidación el día 06 de diciembre de 2024

Sus actividades de obra culminaron en noviembre, con 360 metros lineales de placa huella, 15460.91 m^2 de mantenimiento periódico y 04 alcantarillas en el corredor vial.





Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

3.11.1.2.17 CD-FC-081-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SAN JUAN – AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El presente contrato de obra se encuentra liquidado con firma de su acta de liquidación el día 26 de diciembre de 2024

Se ejecutaron 267 metros lineales de placa huella y una alcantarilla.



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

3.7.1.1. Actividades ambientales

Las actividades realizadas en el componente ambiental fueron las siguientes:

3.7.1.1.1. D-FC-065-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA CHINAVEGA, MUNICIPIO DE CACOTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El contrato de obra se encuentra liquidado, no se adelantaron actividades del componente ambiental.

3.7.1.1.2. CD-FC-055-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LAS DELICIAS-EL MAMON, MUNICIPIO DEL ZULIA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El contrato de obra se encuentra liquidado, no se adelantaron actividades del componente ambiental.

3.7.1.1.3. CD-FC-070-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA LA UNIÓN, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El contrato de obra se encuentra liquidado, no se adelantaron actividades del componente ambiental.

3.7.1.1.4. CD-FC-074-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SAN ANTONIO-LA QUINTA-ALTOS DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El contrato de obra se encuentra liquidado, no se adelantaron actividades del componente ambiental.

3.7.1.1.5. CD-FC-072-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA LOS RINCÓN-LA COPITA, MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El contrato de obra se encuentra liquidado, no se adelantaron actividades del componente ambiental.

3.7.1.1.6. CD-FC-062-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El contrato de obra se encuentra liquidado, no se adelantaron actividades del componente ambiental.

3.7.1.1.7. CD-FC-079-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADAS-TABIRO-PUENTE ZULIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El contrato de obra se encuentra liquidado, no se adelantaron actividades del componente ambiental.

3.7.1.1.8. CD-FC-060-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO LOURDES, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Con comunicado No. GIC-INVIAS-NTS-0047-25 se da respuesta comunicados 2024S-VBOG-050170 y 2024S-VBOG-044343; entrega informes mensuales, trimestral y balance de estado del proyecto Lourdes - aprobación, componente social y ambiental.

3.7.1.1.9. CD-FC-062-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LOS MANGOS – LA CARRERA, MUNICIPIO CACHIRA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Se radica oficio GIC-INVIAS-NTS-0011-25 dando respuesta a comunicado 2024S-VBOG-099982 subsanación de la documentación solicitada del componente ambiental y social correspondiente al contrato NO. CD-FC-067-2023 OBJETO: “MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LOS MANGOS - LA CARRERA, MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER

3.7.1.1.10. CD-FC-056-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES PUENTE ISABEL CELIS - DAVE, MUNICIPIO PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El contrato de obra se encuentra liquidado, no se adelantaron actividades del componente ambiental.

3.7.1.1.11. CD-FC-077-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES PASOS DE LOS RÍOS-RICAURTE, MUNICIPIO DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Se remite comunicado No. GIC-INVIAS-NTS-0007-25 donde se subsana la documentación solicitada del componente ambiental, correspondiente al contrato NO. CD-FC-077-2023, “MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES PASO DE LOS RÍOS - RICAURTE, MUNICIPIO DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER”

3.11.1.2.12 CD-FC-082-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA PARAMO – PICA PICA, MUNICIPIO DE PAMPLONITA, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El contrato de obra se encuentra liquidado, no se adelantaron actividades del componente ambiental.

3.11.1.2.13 CD-FC-077-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRÁN, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El contrato de obra se encuentra liquidado, no se adelantaron actividades del componente ambiental.

3.11.1.2.14 CD-FC-081-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES MINAS DE CAL – LA ARAÑITA – LA MESA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

Mediante comunicado No. GIC-INVIAS-NTS-0044-25 se da respuesta COMUNICADO 2024S-VBOG-099071 subsanando la documentación solicitada del componente ambiental y social correspondiente al contrato No. CD-FC-081-2023 OBJETO: "MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES MINAS DE CAL – LA ARADITA - LA MESETA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, NORTE DE SANTANDER".

3.11.1.2.15 CD-FC-058-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA – CUPERENA – CAGUALA – ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El contrato de obra se encuentra liquidado, no se adelantaron actividades del componente ambiental.

3.11.1.2.16 CD-FC-071-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA GARZA - ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

Se remite comunicado No. GIC-INVIAS-NTS-0013-25 dando respuesta comunicado 2024S-VBOG-100430 - subsanación de la documentación solicitada del componente ambiental y social. correspondiente al contrato CD-FC-071-2023 "MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES – GARZA -ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE NORTE DE SANTANDER".

3.11.1.2.17 CD-FC-049-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SAN JUAN – AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El contrato de obra se encuentra liquidado, no se adelantaron actividades del componente ambiental.

3.7.1.2. ACTIVIDADES SOCIALES

La Interventoría se encuentra a la espera del envió por parte de cada uno de los contratistas de los proyectos correspondientes al Convenio 2033, del documento PAGA con los ajustes requeridos por la interventoría conforme a la Guía de Manejo Ambiental del INVIAS, actas de vecindad y demás documentación de terminación de obra, para la respectiva revisión y aprobación de los mismos.

3.7.1.2.1. CD-FC-065-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA CHINAVEGA, MUNICIPIO DE CACOTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El contrato de obra se encuentra liquidado, no se adelantaron actividades del componente social.

3.7.1.2.2. CD-FC-055-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LAS DELICIAS-EL MAMON, MUNICIPIO DEL ZULIA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El contrato de obra se encuentra liquidado, no se adelantaron actividades del componente social.

3.7.1.2.3. CD-FC-070-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA LA UNIÓN, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El contrato de obra se encuentra liquidado, no se adelantaron actividades del componente social.

3.7.1.2.4. CD-FC-074-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SAN ANTONIO-LA QUINTA-ALTOS DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022-

El contrato de obra se encuentra liquidado, no se adelantaron actividades del componente social.

3.7.1.2.5. CD-FC-072-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA LOS RINCÓN-LA COPITA, MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El contrato de obra se encuentra liquidado, no se adelantaron actividades del componente social.

3.7.1.2.6. CD-FC-062-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El contrato de obra se encuentra liquidado, no se adelantaron actividades del componente social.

3.7.1.2.7. CD-FC-079-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADAS-TABIRO-PUENTE ZULIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El contrato de obra se encuentra liquidado, no se adelantaron actividades del componente social.

3.7.1.2.8. CD-FC-060-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO LOURDES, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Con comunicado No. GIC-INVIAS-NTS-0047-25 se da respuesta comunicados 2024S-VBOG-050170 y 2024S-VBOG-044343; entrega informes mensuales, trimestral y balance de estado del proyecto Lourdes - aprobación, componente social y ambiental.

3.7.1.2.9. CD-FC-062-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LOS MANGOS – LA CARRERA, MUNICIPIO CACHIRA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Se radica oficio GIC-INVIAS-NTS-0011-25 dando respuesta a comunicado 2024S-VBOG-099982 subsanación de la documentación solicitada del componente ambiental y social correspondiente al contrato NO. CD-FC-067-2023 OBJETO: “MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LOS MANGOS - LA CARRERA, MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**CD-FC-056-2023**

3.7.1.2.10. MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES PUENTE ISABEL CELIS - DAVE, MUNICIPIO PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El contrato de obra se encuentra liquidado, no se adelantaron actividades del componente social.

3.7.1.2.11. CD-FC-077-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES PASOS DE LOS RÍOS - RICAURTE, MUNICIPIO DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Se remite comunicado No. GIC-INVIAS-NTS-0007-25 donde se subsana la documentación solicitada del componente ambiental, correspondiente al contrato NO. CD-FC-077-2023, “MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES PASO DE LOS RÍOS - RICAURTE, MUNICIPIO DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER”

3.7.1.2.12. CD-FC-082-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA PARAMO – PICA PICA, MUNICIPIO DE PAMPLONITA, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El contrato de obra se encuentra liquidado, no se adelantaron actividades del componente social.

3.7.1.2.13. CD-FC-081-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES MINAS DE CAL – LA ARAÑITA – LA MESA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

Mediante comunicado No. GIC-INVIAS-NTS-0044-25 se da respuesta COMUNICADO 2024S-VBOG-099071 subsanando la documentación solicitada del componente ambiental y social correspondiente al contrato No. CD-FC-081-2023 OBJETO: “MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES MINAS DE CAL – LA ARADITA - LA MESETA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, NORTE DE SANTANDER”.

3.11.1.2.15 CD-FC-058-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA – CUPERENA – CAGUALA – ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El 27 de diciembre se da aprobación al asunto RESPUESTA OFICIO SCCY-071-018 CON ASUNTO ENTREGA DE BALANCE TRIMESTRAL COMPONENTE SOCIOAMBIENTAL – APROBACIÓN con oficio GIC-INVIAS-NTS-1743-24

3.11.1.2.16 CD-FC-081-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA GARZA – ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

Se remite comunicado No. GIC-INVIAS-NTS-0013-25 dando respuesta comunicado 2024S-VBOG-100430 - subsanación de la documentación solicitada del componente ambiental y social. correspondiente al contrato CD-FC-071-2023 “MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES – GARZA -ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE NORTE DE SANTANDER”.

3.11.1.2.17 CD-FC-049-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SAN JUAN-AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El contrato de obra se encuentra liquidado, no se adelantaron actividades del componente social.

3.7.1.3. Actividades SST

Durante este periodo se ha reportado por parte del contratista el inicio de actividades de obra de los siguientes municipios, dentro de las actividades ejecutadas se encuentran las siguientes:

3.7.1.3.1. CD-FC-065-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA CHINAVEGA, MUNICIPIO DE CACOTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El contrato de obra se encuentra liquidado, no se adelantaron actividades del componente SST.

3.7.1.3.2. CD-FC-055-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LAS DELICIAS-EL MAMON, MUNICIPIO DEL ZULIA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El contrato de obra se encuentra liquidado, no se adelantaron actividades del componente SST.

3.7.1.3.3. CD-FC-070-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA LA UNIÓN, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El contrato de obra se encuentra liquidado, no se adelantaron actividades del componente SST.

3.7.1.3.4. CD-FC-074-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SAN ANTONIO-LA QUINTA-ALTOS DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS

PALMAS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El contrato de obra se encuentra liquidado, no se adelantaron actividades del componente SST.

3.7.1.3.5. CD-FC-072-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA LOS RINCÓN-LA COPITA, MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El contrato de obra se encuentra liquidado, no se adelantaron actividades del componente SST.

3.7.1.3.6. CD-FC-062-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El contrato de obra se encuentra liquidado, no se adelantaron actividades del componente SST.

3.7.1.3.7. CD-FC-079-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADAS-TABIRO-PUENTE ZULIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El contrato de obra se encuentra liquidado, no se adelantaron actividades del componente SST.

3.7.1.3.8. CD-FC-079-2023 CD-FC-060-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO LOURDES, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El contrato de obra se encuentra liquidado, no se adelantaron actividades del componente SST.

3.7.1.3.9. CD-FC-062-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LOS MANGOS – LA CARRERA, MUNICIPIO CACHIRA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El contrato de obra se encuentra liquidado, no se adelantaron actividades del componente SST.

3.7.1.3.10. CD-FC-056-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES PUENTE ISABEL CELIS - DAVE, MUNICIPIO PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El contrato de obra se encuentra liquidado, no se adelantaron actividades del componente SST.

3.7.1.3.11. CD-FC-077-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES PASOS DE LOS RÍOS - RICAURTE, MUNICIPIO DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El contrato de obra se encuentra liquidado, no se adelantaron actividades del componente SST.

3.7.1.3.12. CD-FC-064-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA PARAMO – PICA PICA, MUNICIPIO DE PAMPLONITA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El contrato de obra se encuentra liquidado, no se adelantaron actividades del componente SST.

3.7.1.3.13. CD-FC-082-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRÁN, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El contrato de obra se encuentra liquidado, no se adelantaron actividades del componente SST.

3.7.1.3.14. CD-FC-081-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES MINAS DE CAL – LA ARAÑITA – LA MESA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El contrato de obra se encuentra liquidado, no se adelantaron actividades del componente SST

3.7.1.3.15. CD-FC-058-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA – CUPERENA – CACAHUALA – ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE

SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El contrato de obra se encuentra liquidado, no se adelantaron actividades del componente SST.

3.7.1.3.16. CD-FC-081-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA GARZA - ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El contrato de obra se encuentra liquidado, no se adelantaron actividades del componente SST.

3.7.1.3.17. CD-FC-049-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SAN JUAN – AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El contrato de obra se encuentra liquidado, no se adelantaron actividades del componente SST.

3.7.1.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños.

3.7.1.1.1. CD-FC-065-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA CHINAVEGA, MUNICIPIO DE CACOTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El contratista cuenta con la APROBACIÓN de los estudios y diseños de los diversos componentes.
En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1380-22 del 21-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-001 del 01 de dic de 2023 GIC-INVIAS-NTS-1508-22 del 21-Dic-2023 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-919-24 del 18-Jun- 2024 - **APROBACIÓN**

TOPOGRAFÍA	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1352-22 del 17 - Nov- 2023 - OBSERVACIONES Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-002 del 01 de dic de 2023 GIC-INVIAS-NTS-1503-22 del 05- Dic- 2023 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-005 del 19 de Ene de 2023 GIC-INVIAS-NTS-188-24 del 31-ene-2024- **APROBACIÓN**
DISEÑO GEOMÉTRICO DE PLACA HUELLAS	**Aprobación**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1353-22 del 17-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-004 del 01 de dic de 2023 GIC-INVIAS-NTS-085-24 del 15-Ene-2024 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-006 del 24 de Ene de 2024 GIC-INVIAS-NTS-249-24 del 08-feb-2024- **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-029 del 22-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-571-24 del 11-Abr-2024- **APROBACIÓN**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1380-22 del 21-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-001 del 01 de dic de 2023 GIC-INVIAS-NTS-1508-22 del 21-Dic-2023 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-919-24 del 18-Jun- 2024 - **APROBACIÓN**
INFORME ESTRUCTURAL	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1357-22 del 17-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-001 del 01 de dic de 2023 GIC-INVIAS-NTS-1537-22 del 12-Dic-2023 – **APROBACIÓN**
INFORME HIDRÁULICO	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1403-22 del 17-Nov-2023 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-026 del 13-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-541-24 del 05-Abr-2024 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-031 del 12-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-708-24 del 07-May-2024 – **APROBACIÓN**

Tabla 65 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-065-2023.

3.7.1.1.2. CD-FC-055-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LAS DELICIAS-EL MAMON, MUNICIPIO DEL ZULIA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El Contratista cuenta con la APROBACIÓN de los estudios y diseños de los diversos componentes.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1383-22 del 21-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-012 12-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-091-24 del 17-Ene-2024 – **APROBADO**
TOPOGRAFÍA	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1388-22 del 21-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con correo del 04- Dic - 2023 CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-004 del 05- Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1511-22 del 06-Dic-2023 – **APROBADO**
DISEÑO GEOMÉTRICO DE PLACA HUELLAS	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1389-22 del 21-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-004 del 05- Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1517-22 del 07-Dic-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-006 del 05- Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-049-24 del 10-Ene-24- **APROBADO CON OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-013 15-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-105-24 del 17-Ene-24- **APROBADO**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1383-22 del 21-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-012 12-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-091-24 del 17-Ene-2024 - **APROBADO**

INFORME ESTRUCTURAL	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1358-22 del 17-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con correo del 04- Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1538-22 del 12-Dic-2023 - **APROBADO**
INFORME HIDRÁULICO	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1484-22 del 03-Dic-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-012 12-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-119-24 del 18-Ene-2024 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-017 25-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-319-24 del 20-feb-24 - **APROBADO CON OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-037 del 18-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-542-24 del 05-Abr-24 - **APROBADO CON OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-040 del 12-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-542-24 del 05-Abr-24 – **APROBADO** CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-040 12-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-696-24 del 03- May - 2024 - **APROBACIÓN**

Tabla 66 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-055-2023.

3.7.1.1.3. CD-FC-070-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA LA UNIÓN, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El Contratista cuenta con la APROBACIÓN de los estudios y diseños de los diversos componentes. Teniendo solo observado el PLANO RÉCORD del componente de topografía, se espera que el contratista de obra subsane dichas observaciones.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1382-22 del 21-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con correo del 11 - Dic - 2023

		GIC-INVIAS-NTS-1556-22 del 14-Dic-2023 – **APROBACIÓN**
TOPOGRAFÍA	**Aprobación con observaciones**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1354-22 del 17-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con correo del 11 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1597-22 del 21-Dic-2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con correo del 25 - Ene – 2024 GIC-INVIAS-NTS-250-24 del 08-feb-2024 **– APROBACIÓN** Contratista hace entrega por correo PLANOS RÉCORDS EL 21-05-2024 GIC-INVIAS-NTS-809-24 del 24-May-2024 - **OBSERVACIONES**
DISEÑO GEOMÉTRICO DE PLACA HUELLAS	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1363-22 del 17 - Nov - 2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con correo del 11 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1625-22 del 27-Dic-2023 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con correo del 07 - Feb - 2024 GIC-INVIAS-313-24 del 16-feb-2024 - **APROBACIÓN**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1382-22 del 21-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con correo del 11 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1556-22 del 14-Dic-2023 – **APROBACIÓN**
INFORME ESTRUCTURAL	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1356-22 del 17 - Nov - 2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con correo del 11 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-120-24 del 18 - Ene - 2024 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con correo del 22 - Ene - 2023 GIC-INVIAS-NTS-203-24 del 02 - Feb - 2024 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con correo 20-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-511-24 del 02-Abr-2024 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con correo del 10 - Abr - 2024 GIC-INVIAS-NTS-648-22 del 26-Abr-2024 – **APROBACIÓN**
INFORME HIDRÁULICO	**Aprobado con observaciones**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1405-22 del 23 - Nov - 2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con correo del 11 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-060-24 del 12 - Ene - 2024 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con correo del 07 - Feb - 2024

		GIC-INVIAS-NTS-318-24 del 20 - Feb - 2024 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con correo 03-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-669-24 del 30-Abr-2024 – **APROBADO CON OBSERVACIONES**

Tabla 67 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-070-2023.

3.7.1.1.4. CD-FC-074-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SAN ANTONIO-LA QUINTA-ALTOS DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El Contratista cuenta con la APROBACIÓN de los estudios y diseños de los diversos componentes.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1381-22 del 21-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con correo del 04- DIC - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1552-22 del 12-Dic-2023 - **OBSERVACIONES** El CONTRATISTA hace entrega con N°010- CD-FC-074-2023 DEL 22-ENE-2024 GIC-INVIAS-NTS-1A-22 del 23-Ene-2024 - OBSERVACIONES El CONTRATISTA hace entrega con N°013- CD-FC-074-2023 DEL 25-ENE-2024 GIC-INVIAS-NTS-165-22 del 25-Ene-2024 - **OBSERVACIONES** El CONTRATISTA hace entrega con N°015- CD-FC-074-2023 DEL 31-ENE-2024-**REVISIÓN.** GIC-INVIAS-NTS-221-24 del 06-Feb-2024 - **APROBACIÓN**
TOPOGRAFÍA	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1348-22 del 17-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** El CONTRATISTA hace entrega con correo del 05 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1539-22 del 12-Dic-2023 - **OBSERVACIONES** El CONTRATISTA hace entrega con N° 008- CD-FC-074-2023 DEL 19-ENE-2024-**OBSERVACIONES**

		El CONTRATISTA hace entrega con N°017- CD-FC-074-2023 DEL 06-FEB-2024 (AJUSTADA) El CONTRATISTA hace entrega con N°017- CD-FC-074-2023 DEL 08-FEB-2024 (AJUSTADA) GIC-INVIAS-NTS-272-24 del 09-Feb-2024 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** El CONTRATISTA hace entrega con N° 043- CD-FC-074-2023 DEL 23-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-643-24 del 26-Abr-2024 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** El CONTRATISTA hace entrega con N°045- CD-FC-074-2023 DEL 30-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-743-24 del 16-May-2024 - **APROBACIÓN**
DISEÑO GEOMÉTRICO DE PLACA HUELLAS	**Aprobación con observaciones**	El contratista hace entrega con correo del 04 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-061-24 del 12-Ene-2024 - **OBSERVACIONES** El CONTRATISTA hace entrega con N°014- CD-FC-074-2023 DEL 25-ENE-2024- **OBSERVADO** El CONTRATISTA hace entrega con N°022- CD-FC-074-2023 DEL 19-FEB-2024 (AJUSTADA) GIC-INVIAS-NTS-394-24 del 05-Mar-2024 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** El CONTRATISTA hace entrega con N°043- CD-FC-074-2023 DEL 23-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-644-24 del 26-Abr-2024 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Aprobado**	El CONTRATISTA hace entrega con N° 008- CD-FC-074-2023 DEL 19-ENE-2024 El CONTRATISTA hace entrega con N°010- CD-FC-074-2023 DEL 22-ENE-2024 GIC-INVIAS-NTS-139A-22 del 23-Ene-2024 - **OBSERVACIONES** El CONTRATISTA hace entrega con N°013- CD-FC-074-2023 DEL 25-ENE-2024 GIC-INVIAS-NTS-165-22 del 25-Ene-2024 - **OBSERVACIONES** El CONTRATISTA hace entrega con N°015- CD-FC-074-2023 DEL 31-ENE-2024 GIC-INVIAS-NTS-221-24 del 06 – Feb – 2024 - **APROBACIÓN**
INFORME ESTRUCTURAL	**Aprobado**	El contratista hace entrega con N°008- CD-FC-074-2023 DEL 22-ENE-2024-**REVISIÓN** GIC-INVIAS-NTS-205-24 del 02-Feb-2024 - **APROBACIÓN**

INFORME HIDRÁULICO	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1404-22 del 23-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con correo del 04- DIC - 2023 GIC-INVIAS-NTS-088-24 del 16-Ene-2024 - **OBSERVACIONES** El CONTRATISTA hace entrega con N°011- CD-FC-074-2023 DEL 22-ENE-2024 GIC-INVIAS-NTS-209-24 del 05-Feb-2024 - **OBSERVACIONES** El CONTRATISTA hace entrega con N°019- CD-FC-074-2023 DEL 12-FEB-2024 GIC-INVIAS-NTS-385-24 del 05-Mar-2024 - **APROBACIÓN**

Tabla 68 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-074-2023.

3.7.1.1.5. CD-FC-072-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA LOS RINCÓN-LA COPITA, MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El Contratista presentó los estudios y diseños, en la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1394-22 del 22-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con coreo del 04-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1513-22 del 06-Dic-2023 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 013-2024 del 23-Ene-24 GIC-INVIAS-NTS-164-24 del 06 - Feb- 2024 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 018-2024 del 07-Feb-24 GIC-INVIAS-NTS-283-24 del 12-Feb- 2024 - **OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-346-24 del 27-Feb- 2024 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 035-2024 del 23-Abr-24 GIC-INVIAS-NTS-642-24 del 26-Abr- 2024 - **OBSERVACIONES**

		EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 039-2024 del 30-Abr-24 GIC-INVIAS-NTS-671-24 del 30 - Abr- 2024 – **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 046-2024 del 23-May-24 GIC-INVIAS-NTS-807-24 del 24 - May- 2024 – **OBSERVACIONES** Contratista envía subsanaciones el 19-06-2024 Se envían observaciones por WhatsApp el 20-Jun-2024 Contratista envía subsanaciones el 24-Jun-2024 Se aprobó componente no se ha enviado oficio aprobatorio 26/06/2024
TOPOGRAFÍA	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1430-22 del 28-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA HACE ENTREGA EL 14-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1612-22 del 26-Dic-2023 - **APROBADO CON OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 042-2024 del 14-May-24 - PLANOS RÉCORD GIC-INVIAS-NTS-758-24 del 20- May - 2024 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 044-2024 del 23-May-24 - PLANOS RÉCORD GIC-INVIAS-NTS-831-24 del 28- May - 2024 – **OBSERVACIONES** Se envía **APROBADO CON OBSERVACIONES** por WhatsApp el 25-Jun-2024 Se aprobó componente no se ha enviado oficio aprobatorio 12/07/2024 GIC-INVIAS-NTS-1158-24 - SE EMITE CORREO DE APROBACIÓN DE LOS PLANOS RÉCORD 20/08/2024 - ING. JAIRO
DISEÑO GEOMÉTRICO DE PLACA HUELLAS	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1431-22 del 28-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA HACE ENTREGA EL 14-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1613-22 del 26-Dic-2023 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 013-2024 del 23-Ene-24 EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 019-2024 del 07-Feb-24 EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 019-2024 del 08-Ene-24 GIC-INVIAS-NTS-268-24 del 09-Feb-2024 - **APROBADO CON OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 041-2024 del 14-May-24 GIC-INVIAS-NTS-752-24 del 17-May-2024 - **APROBADO CON OBSERVACIONES**

		EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 045-2024 del 23-May-24 Se envía **APROBADO CON OBSERVACIONES** por WhatsApp el 25-Jun-2024
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1394-22 del 22-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con coreo del 04-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1513-22 del 06-Dic-2023 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 013-2024 del 23-Ene-24 GIC-INVIAS-NTS-164-24 del 25-Ene-2024 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 018-2024 del 07-Feb-24 GIC-INVIAS-NTS-283-24 del 12-Feb-2024 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 023-2024 del 22-Feb-24 GIC-INVIAS-NTS-346-24 del 27-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 035-2024 del 23-Abr-24 GIC-INVIAS-NTS-642-24 del 26-Abr- 2024 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 039-2024 del 30-Abr-24 GIC-INVIAS-NTS-671-24 del 30 - Abr- 2024 – **OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-671-24 del 30 -Abr- 2024 - OBSERVACIONES EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 046-2024 del 23-May-24 GIC-INVIAS-NTS-807-24 del 24 - May- 2024 – **OBSERVACIONES** Contratista envía subsanaciones el 19-06-2024 Se envían observaciones por WhatsApp el 20-06-2024 Contratista envía subsanaciones el 24-06-2024 Se aprobó componente no se ha enviado oficio aprobatorio 26/06/2024
INFORME ESTRUCTURAL	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1360-22 del 17- Nov - 2023 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con coreo del 30-11-2023 GIC-INVIAS-NTS-1536-22 del 12- Dic - 2023 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con coreo del 15-12-2023 GIC-INVIAS-NTS-121-24 del 18 - Ene - 2024 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 013-2024 del 23-Ene-24

		GIC-INVIAS-NTS-401-24 del 06 - Mar - 2024 – **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 037-2024 del 18-Abr-24 GIC-INVIAS-NTS-649-24 del 26-Abr-2024 - **APROBADO**
INFORME HIDRÁULICO	**Observado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1509-22 del 06-Dic - 2023 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con coreo del 012-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1587-22 del 19-Dic - 2023 – **OBSERVACIONES** El contratista hace entrega con oficio No. 030-2024 del 20-Mar-24 GIC-INVIAS-NTS-534-24 del 04-Abr- 2024 – **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 038-2024 del 23-Abr-24 GIC-INVIAS-NTS-757-24 del 20- May - 2024 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 047-2024 del 27-MAY-24 Especialista envía observaciones el 28-06-2024 se envían por WhatsApp al contratista Especialista envía observaciones el 17-07-2024 se envían por WP al contratista Especialista envía observaciones el 29-08-2024 se envían por WP al contratista.

Tabla 69 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-072-2023

3.7.1.1.6. CD-FC-062-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El Contratista cuenta con APROBACIÓN de los diferentes componentes de los estudios y diseños.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1395-22 del 22-Nov-2023 - **OBSERVACIONES**

		CONTRATISTA hace entrega con correo del 4 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1512-22 del 06-Dic-2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-004 del 14-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1562-22 del 06-Dic-2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-009 del 18-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-138-24 del 22-Ene-2024 - **APROBADO**
TOPOGRAFÍA	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1485-22 del 01-Dic-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con correo del 4 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1518-22 del 07-Dic-2023 – **APROBADO**
DISEÑO GEOMÉTRICO DE PLACA HUELLAS	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1510-22 del 06-Dic-2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-003 del 14-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-089-24 del 16- Ene - 2024 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-010 del 25-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-244-24 del 08- Feb - 2024 - **APROBADO**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1395-22 del 22-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con correo del 4 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1512-22 del 06-Dic-2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-004 del 14-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1562-22 del 06-Dic-2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-009 del 18-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-138-24 del 22-Ene-2024 - **APROBADO**
INFORME ESTRUCTURAL	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1361-22 del del 17- Nov - 2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-009 del 18-Ene-2024- **REVISIÓN** GIC-INVIAS-NTS-204-24 del 02-Feb-2024 - **APROBADO**
INFORME HIDRÁULICO	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1586-22 del del 19- Dic - 2023 – **OBSERVACIONES**

		Contratista hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-009 del 13-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-332-24 del 22- Feb – 2024 – **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-028 del 08-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-513-24 del 02-Abr-2024 Contratista hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-036 del 15-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-695-24 del 03- May - 2024 - **APROBADO**

Tabla 70 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-062-2023.

3.7.1.1.7. CD-FC-079-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADAS-TABIRO-PUENTE ZULIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El Contratista se encuentra realizando los estudios y diseños, a los cuales se han dado APROBACIÓN a los diversos componentes.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1393-22 del 22-Nov-2023 - OBSERVACIONES EL CONTRATISTA hace entrega con oficio CD-FC-079-2023-010 del 18- Ene- 2024 GIC-INVIAS-NTS-130-24 del 19-Ene-2024 – **APROBACIÓN**
TOPOGRAFÍA	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1439-22 del 28-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con oficio CD-FC-079-2023-008 del 16- Ene- 2024 GIC-INVIAS-NTS-129-24 del 19-Ene-2024 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con oficio CD-FC-079-2023-011 del 23- Ene- 2024 GIC-INVIAS-NTS-170-24 del 29-Ene-2024 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con oficio CD-FC-079-2023-028 del 07- Mar- 2024

		GIC-INVIAS-NTS-449-24 del 13-Mar-2024 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con oficio CD-FC-079-2023-032 del 15- Mar- 2024 - **APROBACIÓN**
DISEÑO GEOMÉTRICO DE PLACA HUELLAS	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1439-22 del 28-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-003 el 12-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-019-24 del 04-Ene-2024 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con oficio CD-FC-079-2023-009 del 17- Ene- 2024 GIC-INVIAS-NTS-174-24 del 31-Ene-2024 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con oficio CD-FC-079-2023-012 del 31- Ene- 2024 GIC-INVIAS-NTS-292-24 del 14-Feb-2024 – **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con oficio CD-FC-079-2023-029 del 07- Mar – 2024 GIC-INVIAS-NTS-529-24 del 03-Abr-2024 – **APROBACIÓN**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Aprobado**	. El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1393-22 del 22-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con oficio CD-FC-079-2023-010 del 18- Ene- 2024 GIC-INVIAS-NTS-130-24 del 19-Ene-2024 - **APROBACIÓN**
INFORME ESTRUCTURAL	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1359-22 del 17 -Nov-2023 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con oficio CD-FC-079-2023-008 del 16- Ene- 2024 GIC-INVIAS-NTS-124-24 del 18 - Ene - 2024 – **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con oficio CD-FC-079-2023-037 del 30- Abr- 2024 GIC-INVIAS-NTS-717-24 del 09 -MAYO - 2024 - **APROBACIÓN**
INFORME HIDRÁULICO	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1486-22 del 01 -Dic-2023 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con oficio CD-FC-079-2023-010 del 18- Ene- 2024 GIC-INVIAS-NTS-179-24 del 30 -Ene-2024 – **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con oficio CD-FC-079-2023-027 del 07- Mar- 2024 GIC-INVIAS-NTS-433-24 del 11-Mar-2024 - **APROBACIÓN**

Tabla 71 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-079-2023

3.7.1.1.8. CD-FC-067-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LOS MANGOS – LA CARRERA, MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El Contratista se encuentra realizando los estudios y diseños, a los cuales se han dado APROBACIÓN al componente geotécnico, topografía y pavimentos, quedando con OBSERVACIÓN los demás componentes.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobación con observaciones**	El contratista hace entrega por correo el 08-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-339-24 del 22-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-494-24 del 22-Mar-2024 – **REITERACIÓN** El Contratista hace entrega Por oficio OBR-CACH-013 el 16-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-607-24 del 19-Abr-2024 – **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES**
TOPOGRAFÍA	**Aprobación con observaciones**	El contratista hace entrega por correo el 08-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-337-24 del 22-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** El contratista hace entrega por correo el 20-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-497-24 del 22-Mar-2024 – **OBSERVACIONES** El Contratista hace entrega Por oficio OBR-CACH-031 el 06-09-2024 GIC-INVIAS-NTS-1312-24 del 16/09/2024 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES**
DISEÑO GEOMÉTRICO DE PLACA HUELLAS	**Aprobación**	El contratista hace entrega por correo el 08-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-338-24 del 22-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-493-24 del 22-Mar-2024 – **REITERACIÓN** El contratista hace entrega por oficio OBR-CACH-008 el 02-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-540-24 del 05-Abr-2024 – **OBSERVACIONES** El contratista hace entrega por oficio OBR-CACH-012 el 08-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-622-24 del 22-Abr-2024 – **OBSERVACIONES**

		El Contratista hace entrega Por oficio OBR-CACH-21 el 15-05-2024 GIC-INVIAS-NTS-771-24 del 21-May-2024 – **OBSERVACIONES** El contratista hace entrega por oficio OBR-CACH-032 el 06-Sept-2024 Ing. JAIRO solicita reunión 30/09/2023 - Tramo 1: K0+000 – K0+136.06 – **OBSERVACIONES**. Tramo 2: K3+695.92 – K3+825.92 – **OBSERVACIONES**. Tramo 3: K5+269.35 – K5+399.35 – **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES**. Entrega planos de OBR-CACH-045 -3/10/2024 OBR-CACH-048 ATIENDE OBSERVACIONES - 08/10/2024 GIC-INVIAS-NTS-1424-24 - 22/10/2024 **APROBACIÓN**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**APROBACIÓN CON OBSERVACIONES**	El contratista hace entrega por correo el 08-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-339-24 del 22-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-494-24 del 22-Mar-2024 – **REITERACIÓN** El Contratista hace entrega Por oficio OBR-CACH-013 el 16-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-607-24 del 19-Abr-2024 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES**
INFORME ESTRUCTURAL	**Observado**	El contratista hace entrega por correo el 08-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-341-24 del 22-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-495-24 del 22-Mar-2024 – **REITERACIÓN** OBRA-CACH-035 del 10/09/2024 - Hace entrega de observaciones GIC-INVIAS-NTS-1319-24 - 17/09/2024 – **OBSERVACIONES** OBR-CACH-049 - 08/10/2024 - Entrega observaciones GIC-INVIAS-NTS-1604-24 - 29/11/2024 - **OBSERVACIONES**
INFORME HIDRÁULICO	**Aprobación**	El contratista hace entrega por correo el 08-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-342-24 del 22-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-496-24 del 22-Mar-2024 – **REITERACIÓN** El contratista hace entrega por oficio OBR-CACH-009 el 08-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-740-24 del 15-May-2024 **– OBSERVACIONES** El Contratista hace entrega Por oficio OBR-CACH-043 el 18-09-2024 GIC-INVIAS-NTS-1378-24 del 08/10/2024 - OBSERVACIONES Entrega planos de OBR-CACH-050 -9/10/2024 GIC-INVIAS-NTS-1506-24 del 07/11/2024 - **APROBACIÓN**

Tabla 72 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-067-2023

3.7.1.1.9. CD-FC-060-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO DE LOURDES, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El Contratista se encuentra realizando los estudios y diseños, se ha dado APROBADO a diferentes componentes.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobado**	El contratista hace entrega con comunicado MATICCES – LOURDES – 06-2024 del 30-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-239-24 del 07-Feb-2024 - **OBSERVACIONES** El contratista hace entrega con comunicado MATICCES – LOURDES – 11-2024 del 21-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-336-24 del 22-Feb-2024 - **APROBACIÓN**
TOPOGRAFÍA	**Aprobado**	El contratista hace entrega con comunicado MATICCES – LOURDES – 06-2024 del 30-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-207-24 del 05-Feb-2024 - **OBSERVACIONES** El contratista hace entrega con comunicado MATICCES – LOURDES – 07-2024 del 19-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-330-24 del 22-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** El Contratista hace entrega con comunicado MATICCES - LOURDES – 022 -2024 EL 21-05-2024 GIC-INVIAS-NTS-795-24 del 22-May-2024 – **OBSERVACIONES** El contratista hace entrega con comunicado MATICCES – LOURDES – 026 - 2024 del 12/08/2024 GIC-INVIAS-NTS-1158-24 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIÓN** 20/08/2024
DISEÑO GEOMÉTRICO DE PLACA HUELLAS	**Aprobado**	El contratista hace entrega con comunicado MATICCES – LOURDES – 06-2024 del 30-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-208-24 del 05-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** El contratista hace entrega con comunicado MATICCES – LOURDES – 07-2024 del 19-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-208-24 del 05-Feb-2024 – **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** El Contratista hace entrega con comunicado MATICCES - LOURDES – 07 -2024 del 19-Feb-24 GIC-INVIAS-NTS-331-24 del 22-Feb-2024 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** El Contratista hace entrega con comunicado MATICCES - LOURDES – 022 -2024 EL 21-05-2024 GIC-INVIAS-NTS-794-24 del 22-May-2024 - **APROBACIÓN**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Aprobado**	El contratista hace entrega con comunicado MATICCES – LOURDES – 06-2024 del 30-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-239-24 del 07-Feb-2024 – **OBSERVACIONES**

		El contratista hace entrega con comunicado MATICCES – LOURDES – 11-2024 del 21-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-336-24 del 22-Feb-2024 – **APROBACIÓN**
INFORME ESTRUCTURAL	**Aprobado**	El contratista hace entrega con comunicado MATICCES – LOURDES – 06-2024 del 30-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-202-24 del 02-Feb-2024 – **APROBACIÓN**
INFORME HIDRÁULICO	**Aprobado**	El contratista hace entrega con comunicado MATICCES – LOURDES – 06-2024 del 30-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-327-24 del 21-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** El contratista hace entrega con comunicado MATICCES-LOURDES-25-2024 del 28-Jun-24 El contratista hace entrega con comunicado MATICCES – LOURDES – 026 - 2024 del 12/08/2024 GIC-INVIAS-NTS-1378-24 del 08/10/2024 - OBSERVACIONES El contratista hace entrega de subsanaciones con comunicado MATICCES – LOURDES – 028 - 2024 del 18/09/2024 Atiene observaciones MATICCES – LOURDES – 031 - 2024 - 09/10/2024 GIC-INVIAS-NTS-1415-24 - 17/10/2024 - **APROBACIÓN**

Tabla 73 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-060-2023

3.7.1.1.10. CD-FC-077-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES PASO DE LOS RÍOS-RICAURTE, MUNICIPIO DE CÚCUTA, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El Contratista se encuentra realizando los estudios y diseños, se ha dado APROBADO a diferentes componentes.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobado**	El contratista hace entrega por correo el 05-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-281-24 del 12-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** El contratista hace entrega por correo el 13-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-455-24 del 13-Mar-2024 – **APROBADO**
TOPOGRAFÍA	**Aprobado con observaciones**	El contratista hace entrega por correo el 05-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-279-24 del 12-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** El contratista hace entrega por correo el 28-Feb-2024

		GIC-INVIAS-NTS-386-24 del 05-Mar-2024 – **APROBADO CON OBSERVACIONES**
DISEÑO GEOMÉTRICO DE PLACA HUELLAS	**Aprobado con observaciones**	El contratista hace entrega por correo el 05-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-280-24 del 12-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** El contratista hace entrega por correo el 28-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-393-24 del 05-Mar-2024 – **OBSERVACIONES** El Contratista hace entrega Por oficio SCCVN-011-2024 el 13-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-628-24 del 23-abr-2024 – **OBSERVACIONES** El Contratista hace entrega Por oficio SCCVN-021-2024 el 30-05-2024 GIC-INVIAS-NTS-928-24 del 19-Jun-2024 – **OBSERVACIONES** El Contratista hace entrega Por oficio SCCVN-026-2024 el 03-07-2024 Se aprueba con observaciones se envía por WHATSAPP el 22-07-2024
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Aprobado**	El contratista hace entrega por correo el 05-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-281-24 del 12-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** El contratista hace entrega por correo el 13-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-455-24 del 13-Mar-2024 – **APROBADO**
INFORME ESTRUCTURAL	**Aprobado**	El contratista hace entrega por correo el 05-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-316-24 del 16-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-1605-24 del 29/11/2024 - **APROBADO**
INFORME HIDRÁULICO	**Aprobado**	El contratista hace entrega por correo el 05-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-301-24 del 14-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** El contratista hace entrega por correo el 03-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-670-24 del 30-Abr-2024 - **APROBADO**

Tabla 74 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-077-2023

3.7.1.1.11. CD-FC-056-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES PUENTE ISABEL CELIS-DAVE, MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El Contratista se encuentra realizando los estudios y diseños, se ha dado APROBADO a diferentes componentes, quedando con OBSERVACIONES diseño geométrico, estructural.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 26/04/2024 GIC-INVIAS-NTS-667-24 del 30-Abr-2024 - **APROBADO**
TOPOGRAFÍA	**Aprobado con observaciones**	Contratista hace entrega por correo el 26/04/2024 GIC-INVIAS-NTS-720-24 del 10-May-2024 - **APROBADO CON OBSERVACIONES**
DISEÑO GEOMÉTRICO DE PLACA HUELLAS	**Observado**	Contratista hace entrega por correo el 26/04/2024 GIC-INVIAS-NTS-735-24 del 14-May-2024 - **OBSERVACIONES**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 26/04/2024 GIC-INVIAS-NTS-667-24 del 30-Abr-2024 - **APROBADO**
INFORME ESTRUCTURAL	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 26/04/2024 GIC-INVIAS-NTS-716-24 del 09-May-2024 - **APROBADO**
INFORME HIDRÁULICO	**Observado**	Contratista hace entrega por correo el 26/04/2024 GIC-INVIAS-NTS-808-24 del 24-May-2024 - **OBSERVACIONES**

3.7.1.1.12. CD-FC-082-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRÁN, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

En el presente contrato, se cuenta con APROBACIÓN en la mayoría de sus componentes.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 20/05/2024 GIC-INVIAS-NTS-796-24 del 23-May-2024 - **APROBADO**
TOPOGRAFÍA	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 20/05/2024 GIC-INVIAS-NTS-802-24 del 23-May-2024 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega mediante comunicado No. 016-CD-FC-082-2023 del 31/07/2024 GIC-INVIAS-NTS-1223-24 - 29/08/204 - **APROBADO**
DISEÑO GEOMÉTRICO DE PLACA HUELLAS	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 20/05/2024 GIC-INVIAS-NTS-824-24 del 23-May-2024 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** Contratista hace entrega mediante comunicado No. 016-CD-FC-082-2023 del 31/07/2024 GIC-INVIAS-NTS-1259-24 del 04/09/2024 - **APROBADO**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 20/05/2024 GIC-INVIAS-NTS-796-24 del 23-May-2024 - **APROBADO**

Tabla 76 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-082-2023

INFORME ESTRUCTURAL	**Aprobado con observaciones**	Contratista hace entrega por correo el 20/05/2024 GIC-INVIAS-NTS-838-24 del 29-May-2024 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** Contratista hace entrega mediante comunicado No. 016-CD-FC-082-2023 del 31/07/2024
INFORME HIDRÁULICO	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 20/05/2024 GIC-INVIAS-NTS-830-24 del 28-May-2024 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega mediante comunicado No. 016-CD-FC-082-2023 del 31/07/2024 **APROBACIÓN** – 17-Sep-2024

CD-FC-081-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES MINAS DE CAL – LA ARAÑITA – LA MESA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

En el presente contrato, se cuenta con APROBACIÓN en todos los componentes.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 23/05/2024 GIC-INVIAS-NTS-810-24 del 25-May-2024 - **APROBADO**
TOPOGRAFÍA	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 23/05/2024 GIC-INVIAS-NTS-854-24 del 04-Jun-2024 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega mediante SCCVN-CD-FC-081-2023-0011 el 31/07/2024 GIC-INVIAS-NTS-1173-24ª del 26/08/2024 - **APROBADO**
DISEÑO GEOMÉTRICO DE PLACA HUELLAS	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 23/05/2024 GIC-INVIAS-NTS-849-24 del 31-May-2024 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega mediante SCCVN-CD-FC-081-2023-0011 el 31/07/2024 GIC-INVIAS-NTS-1194-24 del 26/08/2024 - **APROBADO**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 23/05/2024 GIC-INVIAS-NTS-810-24 del 25-May-2024 - **APROBADO**
INFORME ESTRUCTURAL	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 23/05/2024 GIC-INVIAS-NTS-840-24 del 29-May-2024 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** Contratista hace entrega mediante SCCVN-CD-FC-081-2023-0011 el 31/07/2024 Se envían observaciones a las alcantarillas mediante comunicado No. GIC-INVIAS-NTS-1195-24 del 26/08/2024

INFORME HIDRÁULICO	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 23/05/2024 GIC-INVIAS-NTS-990-24 del 28-Jun-2024 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** Contratista hace entrega mediante SCCVN-CD-FC-081-2023-0011 el 31/07/2024

3.7.1.1.13. CD-FC-064-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA PARAMO – PICA PICA, MUNICIPIO DE PAMPLONITA, NORTE DE SANTANDER CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

En el presente contrato, se cuenta con APROBACIÓN en todos los componentes.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 26/04/2024 GIC-INVIAS-NTS-731-24 del 14-May-2024 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega por correo el 17/07/2024 GIC-INVIAS-NTS-1068-24 del 19-julio-2024 - **APROBADO**
TOPOGRAFÍA	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 26/04/2024 GIC-INVIAS-NTS-676-24 del 02-May-2024 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega por correo el 08/05/2024 GIC-INVIAS-NTS-763-24 del 20-May-2024 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega por correo el 13/06/2024 GIC-INVIAS-NTS-1000-24 del 04-julio-2024 - **APROBADO**
DISEÑO GEOMÉTRICO DE PLACA HUELLAS	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 26/04/2024 GIC-INVIAS-NTS-711-24 del 09-May-2024 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega por correo el 15/07/2024 GIC-INVIAS-NTS-1136-24 DEL 13/08/2024 APROBADO CON OBSERVACIONES Contratista hace entrega por correo 14/08/2024 GIC-INVIAS-NTS-1167-24 del 22-agosto-2024 - **APROBADO**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 26/04/2024 GIC-INVIAS-NTS-731-24 del 14-May-2024 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega por correo el 17/07/2024 GIC-INVIAS-NTS-1068-24 del 19-julio-2024 - **APROBADO**
INFORME ESTRUCTURAL	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 26/04/2024

Tabla 77 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-081-2023

		GIC-INVIAS-NTS-715-24 del 09-May-2024 - **APROBADO**
INFORME HIDRÁULICO	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 26/04/2024 GIC-INVIAS-NTS-806-24 del 25-May-2024 - **APROBADO**

3.7.1.1.14. CD-FC-058-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA – CUPERENA – CACAHUALA – ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

En el presente contrato, se cuenta con APROBACIÓN en todos los componentes.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobado**	CONTRATISTA HACE ENVÍO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-002 DEL 24-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-983-24 del 27-JUN-2024 - **APROBADO**
TOPOGRAFÍA	**Aprobado**	CONTRATISTA HACE ENVÍO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-002 DEL 24-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-989-24 del 28-JUN-2024 – **OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-1035-24 del 12-JUL-2024 - REITERACIÓN Contratista hace envió por medio de oficio WRGR-CD-FC-058-2023-004 DEL 17-07-2024 **OBSERVACIONES** Correo 27/08/2024 - REMITE CORRECCIÓN A OBSERVACIONES GIC-INVIAS-NTS-1302-24- 10/09/2024 - **APROBADO**
DISEÑO GEOMÉTRICO DE PLACA HUELLAS	**Aprobado**	CONTRATISTA HACE ENVÍO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-002 DEL 24-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-995-24 del 28-JUN-2024 – **OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-1035-24 del 12-JUL-2024 – REITERACIÓN CONTRATISTA HACE ENVÍO CON COMUNICADO NO. WRGR-CD-FC-058-2023-009 DEL 09/08/2024 GIC-INVIAS-NTS-1156-24- **APROBACIÓN CON OBSERVACIÓN** 20/08/2024
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Aprobado**	CONTRATISTA HACE ENVÍO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-002 DEL 24-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-983-24 del 27-JUN-2024 - **APROBACIÓN**
INFORME ESTRUCTURAL	**Aprobado**	CONTRATISTA HACE ENVÍO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-002 DEL 24-06-2024

Tabla 78 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-064-2023

		GIC-INVIAS-NTS-998-24 del 02-JUL-2024 - OBSERVACIONES GIC-INVIAS-NTS-1035-24 del 12-JUL-2024 – REITERACIÓN CONTRATISTA ENVÍA COMUNICADO NO. WRGR-CD-FC-058-2023-009 DEL 09/08/2024 GIC-INVIAS-NTS-1222-24 del 28/08/2024 - **APROBACIÓN**
INFORME HIDRÁULICO	**Aprobado**	CONTRATISTA HACE ENVÍO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-002 DEL 24-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-992-24 del 28-JUN-2024 – **OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-1035-24 del 12-JUL-2024 - REITERACIÓN CONTRATISTA HACE ENVÍO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-006 DEL 22-07-2024 GIC-INVIAS-NTS-1190-24 del 26/08/2024 **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** WRGR-CD-FC-058-2023-015 DEL 23/09/2024 - SUBSANACIÓN INFORME

Tabla 79 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-058-2023

3.7.1.1.15. CD-FC-081-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA GARZA - ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

En el presente contrato, se cuenta con APROBACIÓN a los componentes.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobado**	Se envían observaciones mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-1260-24 del 04/09/2024 SCCY-071-006 contratista entrega observaciones 01/10/2024 Se envían observaciones mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-1373-24 del 04/10/2024 - OBSERVACIONES SCCY-071-010 contratista entrega atendiendo observaciones 25/10/2024 GIC-INVIAS-NTS-1509-24 - 12/11/2024 - OBSERVACIONES SCCY-071-016 - ENTREGA OBSERVACIONES 20/11/2024 GIC-INVIAS-NTS-1578-24 - 25/11/2024 - **APROBADO**

TOPOGRAFÍA	**Aprobado**	SCCY-CD-FC-071-2023-001 Contratista entrega Topografía 21/08/2024 Se da aprobación con observaciones mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-1191-24 del 26/08/2024 SCCY-071-005 del 30/09/2024 GIC-INVIAS-NTS-1519-24 del 14/11/2024- **APROBADO**
DISEÑO GEOMÉTRICO DE PLACA HUELLAS	**Aprobado con observaciones**	SCCY-CD-FC-071-2023-001 Contratista entrega 21/08/2024 Se envían observaciones mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-1193-24 del 26/08/2024 - OBSERVACIONES SCC-071-007 Contratista entrega 07/10/2024 **ROBACIÓN** SCCY-071-022 contratista entrega 27/11/2024
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Aprobado**	GIC-INVIAS-NTS-1260-24 del 04/09/2024 – **OBSERVACIONES** SCCY-071-016 - ENTREGA OBSERVACIONES 20/11/2024 GIC-INVIAS-NTS-1578-24 - 25/11/2024 - **APROBADO**
INFORME ESTRUCTURAL	**Aprobado con observaciones**	SCCY-CD-FC-071-2023-001 Contratista entrega 21/08/2024 Se da aprobación con observaciones mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-1192-24 del 26/08/2024 SCCY-071-016 - ENTREGA OBSERVACIONES 20/11/2024
INFORME HIDRÁULICO	**Observado**	SCCY-CD-FC-071-2023-002 contratista entrega 21/08/2024 Se envían observaciones mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-1363-24 del 03/10/2024 – **OBSERVACIONES** SCC-071-015 Contratista envía correcciones - 19/11/2024

Tabla 80 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-081-2023

3.7.1.1.16. CD-FC-049-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SAN JUAN – AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

En el presente contrato, se cuenta con los estudios y diseños aprobados.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobado**	G&P-CD-FC-049-2024-002 - 28/10/2024 - Contratista hace entrega GIC-INVIAS-NTS-1510-24 - 12/11/2024 – **OBSERVACIONES**

Tabla 81 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-049-2023

		G&P-CD-FC-049-2024-016 - 19/12/2024 - **ENTREGA OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-1718-24 - 20/12/2024 - **APROBADO**
TOPOGRAFÍA	**Aprobado con observaciones**	G&P-CD-FC-049-2024-002 - 28/10/2024 - Contratista hace entrega GIC-INVIAS-NTS-1459-24 - 29/10/2024 - **APROBADO CON OBSERVACIONES**
DISEÑO GEOMÉTRICO DE PLACA HUELLAS	**Aprobado con observaciones**	G&P-CD-FC-049-2024-002 - 28/10/2024 - Contratista hace entrega GIC-INVIAS-NTS-1523-24 - 14/11/2024 - **APROBADO CON OBSERVACIONES**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Aprobado**	G&P-CD-FC-049-2024-002 - 28/10/2024 - Contratista hace entrega GIC-INVIAS-NTS-1510-24 - 12/11/2024 – **OBSERVACIONES** G&P-CD-FC-049-2024-016 - 19/12/2024 - **ENTREGA OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-1718-24 - 20/12/2024 - **APROBADO**
INFORME ESTRUCTURAL	**Aprobado**	G&P-CD-FC-049-2024-002 - 28/10/2024 - Contratista hace entrega GIC-INVIAS-NTS-1459-24 - 29/10/2024 - **APROBADO PARA TRAFICO LIVIANO**
INFORME HIDRÁULICO	**Aprobado**	G&P-CD-FC-049-2024-003 - 01/11/2024 - contratista hace entrega GIC-INVIAS-NTS-1616-24 - 02/12/2024 - **APROBADO**

3.7.1.2. Etapa de Construcción

En el presente mes se finalizan las actividades de construcción de placa huella en el municipio de Villa Caro correspondiente al convenio administrativo No. 4164 – 2022, con actividades de encofrado, corte, figurado e instalación de acero para placa huella, viga riostra, cuneta y bordillo.

A continuación, se presenta el avance de cada uno de los contratos de obra por municipio derivados del contrato interadministrativo No. 4164-2022, celebrado entre la GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER y la EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.

3.7.1.2.1. D-FC-065-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA CHINAVEGA, MUNICIPIO DE CACOTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El presente contrato finalizo el seis (06) de febrero de 2024, ejecutando el 100% de las actividades de obra.

MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VIA CHINAVEGA, MUNICIPIO CACOTA, NORTE DE SANTANDER. GOBERNACIÓN 2033					
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO					
No	**DESCRIPCION**	**UND**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA					
1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	$ 34.270,00	626,17	$ 21.458.846,00
2	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	$ 1.019.553,00	196,28	$ 200.119.826,00
3	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	$ 10.197,00	9809,00	$ 100.022.373,00
4	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	$ 332.576,00	366,48	$ 121.882.452,00
5	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (G)	m3	$ 582.411,00	70,56	$ 41.094.920,00
SUB TOTAL					**$ 484.578.417,00**
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS					
7	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	$ 51.383,00	0,00	$ -
8	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	$ 1.019.563,00	0,00	$ -
9	CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14MPa (F) - MEZCLA IN SITU	m3	$ 806.769,00	0,00	$ -
10	Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	$ 39.452,00	0,00	$ -
11	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	m	$ 1.134.794,00	0,00	$ -
12	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	$ 10.197,00	0,00	$ -
SUB TOTAL					**$ -**
TRANSPORTES					
13	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	$ 2.959,00	4674,48	$ 13.831.778,00
SUB TOTAL					**$ 13.831.778,00**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD					
14	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI-04 (POSTES DE REFERENCIA), REFLECTIVO TIPO IX (1,25m X 0,45m)	unid	$ 708.315,00	15	$ 10.624.725,00

SUB TOTAL					**$ 10.624.725,00**
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO					
16	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	$ 1.879,00	15204,12	$ 28.568.534,00
SUB TOTAL					$ 28.568.534,00
TOTAL, EJECUTADO					
VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA= (A)					**$ 537.603.454,00**
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS = (B)					**$ -**
VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA= (A) + (B) = (C)					**$ 537.603.454,00**
COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS (D)					**$ 5.376.210,00**
VALOR IVA (19%) AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS = (E)					**$ 1.021.480,00**
VALOR TOTAL= C+D+E AIU = 30% - (A = 20%, I = 5%, U = 5%)					**$ 544.001.144,00**
GERENCIA INTEGRAL SOCIOAMBIENTAL Y DE PROYECTOS (GISAP)					**$ 15.232.032,03**
TOTAL EJECUTADO					**$ 559.233.176,03**

Tabla 82 Cantidades ejecutadas en el municipio de Cacota

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.

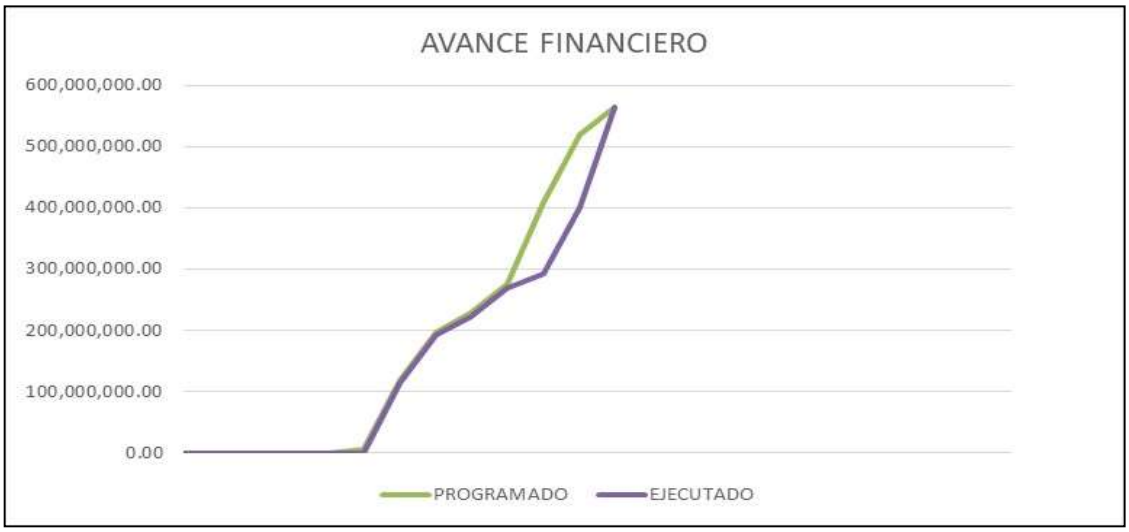


Gráfico 11 Avance Financiero Municipio de Cacota

Se ejecutaron $564.759.919,91 dando el 100,00% de la inversión.

3.7.1.2.2. CD-FC-055-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LAS DELICIAS-EL MAMON, MUNICIPIO DEL ZULIA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El presente contrato finalizo el seis (06) de febrero de 2024, ejecutando el 100% de las actividades de obra.

No	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA					
1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	$ 34.681,00	782,45	$ 27.136.096,00
2	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	$ 868.631,00	254,49	$ 221.057.903,00
3	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	$ 10.186,00	12724,00	$ 129.606.664,00
4	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	$ 187.535,00	498,36	$ 93.459.943,00
5	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPa (G)	m3	$ 449.357,00	107,46	$ 48.287.903,00

SUB TOTAL					**$ 519.548.509,00**
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS					
7	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	$ 49.585,00	88,23	$ 4.374.885,00
8	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	$ 868.631,00	15,60	$ 13.550.644,00
9	CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14 MPa (F) - MEZCLA IN SITU	m3	$ 626.377,00	1,61	$ 1.008.467,00
10	Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	$ 40.248,00	43,45	$ 1.748.776,00
11	TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIÁMETRO INTERIOR	m	$ 967.003,00	12	$ 11.604.036,00
12	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	$ 10.186,00	1159,38	$ 11.809.445,00
SUB TOTAL					**$ 44.096.253,00**
TRANSPORTES					
13	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	$ 2.655,00	11522,46	$ 30.592.134,00
SUB TOTAL					**$ 30.592.134,00**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD					
14	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI-04 (POSTES DE REFERENCIA), REFLECTIVO TIPO IX (1,25m X 0,45m)	unid	$ 705.224,00	5	$ 3.526.120,00
SUB TOTAL					**$ 3.526.120,00**
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO					
16	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	$ 1.934,00	17919,81	$ 34.656.910,00
SUB TOTAL					$ 34.656.910,00
ITEMS NO PREVISTOS					
17	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RÍGIDOS	m2	$ 1177,20	22.179,00	$ 26.109.119,00
TOTAL, EJECUTADO					
VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA= (A)					**$ 658.529.045,00**
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS = (B)					
VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA= (A) + (B) = (C)					**$ 658.529.045,00**
COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS (D)					**$ 6.521.959,00**
VALOR IVA (19%) AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS = (E)					**$ 1.239.172,00**

VALOR TOTAL= C+D+E AIU = 30% - (A= 20%, I = 5%, U = 5%)	**$ 666.290.176,00**
GERENCIA INTEGRAL SOCIOAMBIENTAL Y DE PROYECTOS (GISAP)	$ 18.656.125,00
VALOR TOTAL DE OBRA	$ 684.946.301,00

Tabla 83 Cantidades ejecutadas en el municipio de El Zulia

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.



Gráfico 12 Avance Financiero Municipio del Zulia

3.7.1.2.3. CD-FC-070-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA LA UNIÓN, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El presente contrato finalizo el seis (06) de febrero de 2024, ejecutando el 100,00% de las actividades de obra.

SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO					
No	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA					
1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	$ 34.605,00	327,66	$ 11.338.560,00
2	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	$ 931.262,00	194,43	$ 181.065.271,00
3	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	$ 10.167,00	9.744,60	$ 99.073.348,00
4	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	$ 256.347,00	223,05	$ 57.178.198,00
5	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPa (G)	m3	$ 504.912,00	56,79	$ 28.673.952,00
SUB TOTAL					**$ 377.329.329,00**
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS					
7	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	$ 51.382,00	89,00	$ 4.572.998,00
8	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	$ 931.262,00	8,00	$ 7.450.096,00
9	CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14 MPa (F) - MEZCLA IN SITU	m3	$ 714.548,00	0,80	$ 571.638,00
10	Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	$ 39.451,00	25,00	$ 986.275,00
11	TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIÁMETRO INTERIOR	m	$ 1.134.780,00	6,00	$ 6.808.680,00
12	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	$ 10.167,00	580,00	$ 5.896.860,00
SUB TOTAL					**$ 26.286.547,00**
TRANSPORTES					

13	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	$ 2.954,00	1.552,44	$ 4.585.908,00
SUB TOTAL					**$ 4.585.908,00**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD					
14	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI-04 (POSTES DE REFERENCIA), REFLECTIVO TIPO IX (1,25m X 0,45m)	unid	$ 708.305,00	5	$ 3.541.525,00
SUB TOTAL					**$ 3.541.525,00**
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO					
15	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	$ 1.876,00	12988,38	$ 24.366.203,00
SUB TOTAL					$ 24.366.203,00
TOTAL EJECUTADO					
VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA= (A)					**$ 436.109.512,00**
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS = (B)					
VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA= (A) + (B) = (C)					**$ 436.109.512,00**
COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS (D)					**$ 4.317.916,00**
VALOR IVA (19%) AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS = (E)					**$ 820.404,00**
VALOR TOTAL= C+D+E+F AIU = 30% - (A = 20%, I = 5%, U = 5%)					**$ 441.247.832,00**
GERENCIA INTEGRAL SOCIOAMBIENTAL Y DE PROYECTOS (GISAP)					**$ 12.354.939,30**
TOTAL EJECUTADO					**$ 453.602.771,30**

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.



Gráfico 13 Avance Financiero Municipio de Pamplona

3.7.1.2.4. CD-FC-074-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SAN ANTONIO-LA QUINTA-ALTOS DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

A continuación, se muestran los avances en las actividades de obra a corte 31 de mayo de 2024.

SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO					
No	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA					
1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	$ 39.920,00	540,04	$ 21.558.397,00
2	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	$ 1.031.028,00	181,03	$ 186.646.999,00
3	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	$ 10.215,00	11.742,52	$ 119.949.842,00
4	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	$ 345.406,00	304,20	$ 105.072.505,00
5	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPa (G)	m3	$ 608.531,00	77,71	$ 47.288.943,21

SUB TOTAL					**$ 480.516.686,21**
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS					
7	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	50928,485	183,67	$ 9.354.035,00
8	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	1031028	15,87	$ 16.362.414,00
9	CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14 MPa (F) - MEZCLA IN SITU	m3	816269	4,29	$ 3.501.794,00
10	Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	42165	111,09	$ 4.684.110,00
11	TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIÁMETRO INTERIOR	m	1054707	18,00	$ 18.984.726,00
12	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	10215	1751,30	$ 17.889.530,00
SUB TOTAL					**$ 70.776.609,00**
TRANSPORTES					
13	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	$ 3.397,00	5.610,07	$ 19.057.407,79
SUB TOTAL					**$ 19.057.407,79**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD					
14	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI-04 (POSTES DE REFERENCIA), REFLECTIVO TIPO IX (1,25m X 0,45m)	unid	$ 716.148,00	7	$ 5.013.036,00
SUB TOTAL					**$ 5.013.036,00**
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO					
15	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	$ 2.181,00	15246,17	$ 33.251.900,00
SUB TOTAL					**$ 33.251.900,00**
ITEMS NO PREVISTOS					
16	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	M2	$ 222.924,00	7,99	$ 1.781.163,00
17	REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS	**M**	$ 80.445,00	21,08	$ 1.696.151,00
18	FILTRO CON GEOTEXTIL NO TEJIDO	**M**	$ 209.271,00	65,00	$ 13.602.615,00
SUB TOTAL					**$ 17.079.929,00**
TOTAL, EJECUTADO					
VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA= (A)					**625.695.568,00**
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS = (B)					

VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA= (A) + (B) = (C)	**625.695.568,00**
COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS (D)	**6.257.556,00**
VALOR IVA (19%) AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS = (E)	**1.188.936,00**
VALOR TOTAL= C+D+E AIU = 30% - (A = 20%, I = 5%, U = 5%)	**633.142.060,00**
GERENCIA INTEGRAL SOCIOAMBIENTAL Y DE PROYECTOS (GISAP)	**17.727.977,68**
TOTAL, EJECUTADO	**650.870.037,68**

Tabla 84 Cantidades ejecutadas en el municipio de Salazar de Las Palmas

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.

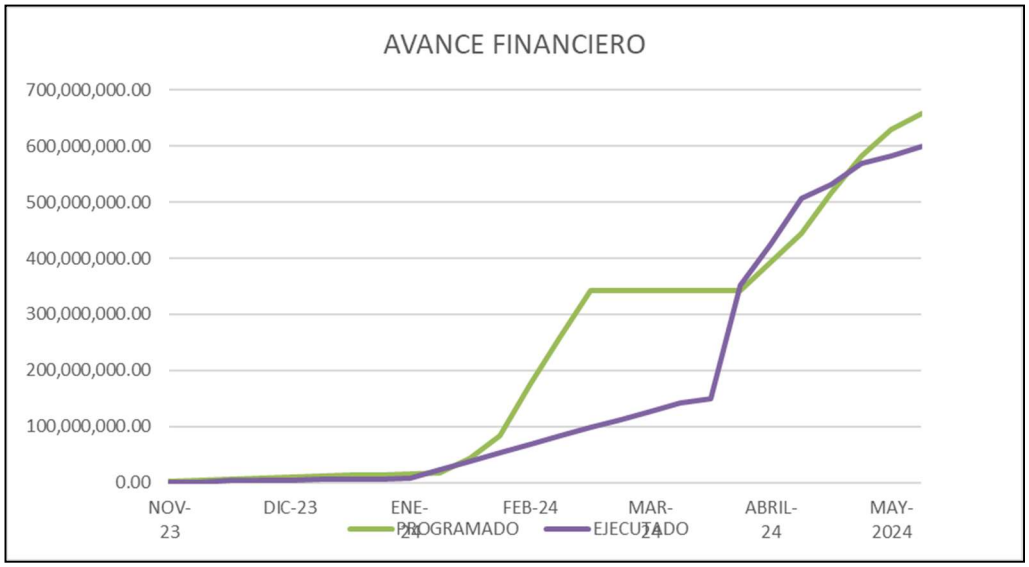


Gráfico 14 Avance Financiero Municipio de Salazar de las Palmas

3.7.1.2.5. CD-FC-072-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA LOS RINCÓN-LA COPITA, MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

A continuación, se muestran los avances en las actividades de obra a corte 06 de abril de 2024.

SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO					
No	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA					
1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	$ 34.583,00	2.048,16	$ 70.831.517,00
2	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	$ 1.066.119,00	248,78	$ 265.229.085,00
3	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	$ 10.205,00	13.252,54	$ 135.242.236,00
4	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	$ 373.147,00	51,23	$ 19.116.321,00
5	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPa (G)	m3	$ 623.489,00	94,95	$ 59.200.281,00
SUB TOTAL					**$ 549.619.440,00**
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS					
7	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	$ 51.347,00	170,00	$ 8.728.990,00
8	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	$ 1.066.119,00	23,41	$ 24.954.861,00
9	CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14 MPa (F) - MEZCLA IN SITU	m3	$ 855.574,00	2,40	$ 2.053.378,00
10	Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	$ 39.424,00	26,40	$ 1.040.794,00
11	TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIÁMETRO INTERIOR	m	$ 1.134.000,00	18,00	$ 20.412.000,00
12	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	$ 10.205,00	1736,70	$ 17.723.024,00
SUB TOTAL					**$ 74.913.047,00**
TRANSPORTES					
13	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	$ 2.957,00	4.455,97	$ 13.176.303,00
SUB TOTAL					**$ 13.176.303,00**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD					
14	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI-04 (POSTES DE REFERENCIA), REFLECTIVO TIPO IX (1,25m X 0,45m)	und	$ 707.819,00	5	$ 3.539.095,00
SUB TOTAL					**$ 3.539.095,00**

SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO					
15	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	$ 1.878,00	19939,82	$ 37.446.989,00
SUB TOTAL					$ 37.446.989,00
ÍTEM NO PREVISTOS					
16	SUELO CEMENTO 0.15 M DE ESPESOR	M3	$ 70.974,00	300,48	$ 21.326.268,00
17	DEMOLICIÓN DE PLACA HUELLA EXISTENTE 0,20 M	M2	$ 43.836,00	265,00	$ 11.616.540,00
TOTAL, EJECUTADO					
VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA= (A)					**$ 711.637.682,00**
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS = (B)					
VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA= (A) + (B) = (C)					**$ 711.637.682,00**
COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS (D)					**$ 7.045.918,00**
VALOR IVA (19%) AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS = (E)					**$ 1.338.724,00**
VALOR TOTAL= C+D+E AIU = 30% - (A = 20%, I = 5%, U = 5%)					**$ 720.022.324,00**
GERENCIA INTEGRAL SOCIOAMBIENTAL Y DE PROYECTOS (GISAP)					**$ 20.160.625,00**
TOTAL, EJECUTADO					**$ 740.182.949,00**

Tabla 85 Cantidades ejecutadas en el municipio de Silos

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.



Gráfico 15 Avance Financiero Municipio de Silos

3.7.1.2.6. CD-FC-062-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

A continuación, se muestran los avances en las actividades de obra a corte 06 de febrero de 2024.

SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO					
No	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA					
1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	$ 34.681,00	862,70	$ 29.919.299,00
2	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	$ 859.170,00	90,65	$ 77.883.761,00
3	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	$ 10.195,00	4405,13	$ 44.910.300,00
4	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	$ 178.648,00	620,00	$ 110.761.760,00
5	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPa (G)	m3	$ 441.054,00	40,57	$ 17.893.561,00
SUB TOTAL					**$ 281.368.681,00**
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS					
7	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	$ 49.585,00	45,28	$ 2.245.209,00
8	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	$ 859.170,0	5,78	$ 4.966.003,00
9	CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14 MPa (F) - MEZCLA IN SITU	m3	$ 616.497,00	1,61	$ 992.560,00
10	Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	$ 40.248,00	22,15	$ 891.493,00
11	TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIÁMETRO INTERIOR	m	$ 962.999,00	6,00	$ 5.777.994,00
12	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	$ 10.195,00	782,70	$ 7.979.627,00
SUB TOTAL					**$ 22.852.886,00**
TRANSPORTES					

13	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	$ 2.655,00	5650,81	$ 15.002.900,00
SUB TOTAL					**$ 15.002.900,00**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD					
14	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI-04 (POSTES DE REFERENCIA), REFLECTIVO TIPO IX (1,25m X 0,45m)	unid	$ 705.224,00	5	$ 3.526.120,00
SUB TOTAL					**$ 3.526.120,00**
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO					
16	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	$ 1.934,00	11381,50	$ 22.011.821,00
SUB TOTAL					$ 22.011.821,00
APUS NO PREVISTOS					
16	PEDRAPLÉN COMPACTADO	M2	$ 159.313,00	237,50	$ 37.836.838,00
17	FILTRO PARA GEOTEXTIL	**M**	$ 165.593,00	190,00	$ 31.462.670,00
SUB TOTAL					$ 69.299.508,00
TOTAL, EJECUTADO					
VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA= (A)					**$ 414.061.916,00**
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS = (B)					
VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA= (A) + (B) = (C)					**$ 414.061.916,00**
COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS (D)					**$ 4.142.326,00**
VALOR IVA (19%) AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS = (E)					**$ 787.042,00**
VALOR TOTAL= C+D+E AIU = 30% - (A = 20%, I = 5%, U = 5%)					**$ 418.991.284,00**
GERENCIA INTEGRAL SOCIOAMBIENTAL Y DE PROYECTOS (GISAP)					**$ 11.731.755,95**
TOTAL, EJECUTADO					**$ 430.723.039,95**

Tabla 86 Cantidades ejecutadas en el municipio de Villa del Rosario

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.

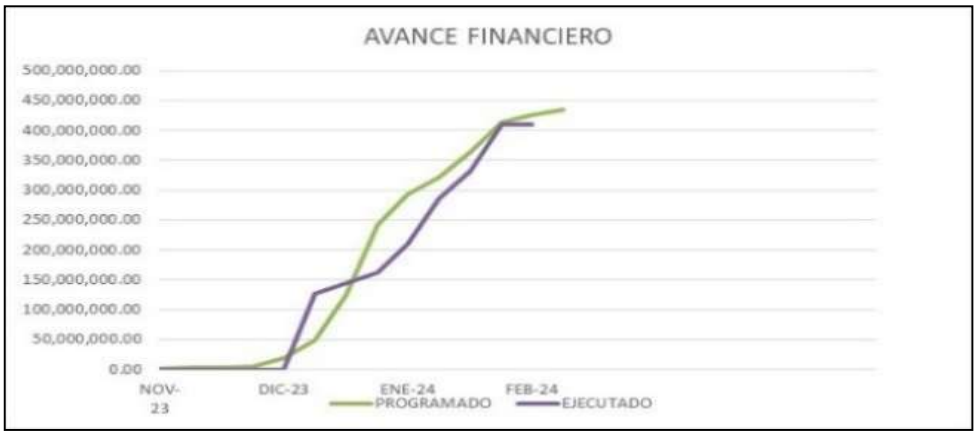


Gráfico 16 Avance Financiero Municipio de Villa del Rosario

3.7.1.2.7. CD-FC-079-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADAS-TABIRO-PUENTE ZULIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

A continuación, se muestran los avances en las actividades de obra a corte 06 de febrero de 2024.

SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO					
No	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA					
1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	$ 34.681,00	829,31	$ 28.761.300,00
2	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	$ 859.170,00	293,70	$ 252.338.229,00
3	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	$ 10.190,00	14780,00	$ 150.608.200,00
4	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	$ 179.368,00	485,51	$ 87.085.603,00
5	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPa (G)	m3	$ 441.054,00	50,40	$ 22.229.122,00
SUB TOTAL					**$ 541.022.454,00**

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS					
7	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	$ -		$ -
8	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	$ -		$ -
9	CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14 MPa (F) - MEZCLA IN SITU	m3	$ -		$ -
10	Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	$ -		$ -
11	TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIÁMETRO INTERIOR	m	$ -		$ -
12	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	$ -		$ -
SUB TOTAL					**$ -**
TRANSPORTES					
13	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	$ 2.655,00	7154,55	$ 18.995.343,00
SUB TOTAL					**$ 18.995.343,00**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD					
14	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI-04 (POSTES DE REFERENCIA), REFLECTIVO TIPO IX (1,25m X 0,45m)	unid	$ 705.224,00	7,00	$ 4.936.568,00
SUB TOTAL					**$ 4.936.568,00**
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO					
16	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	$ 1.934,00	16224,69	$ 31.378.553,00
SUB TOTAL					$ 31.378.553,00
TOTAL, EJECUTADO					
VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA= (A)					$ 596.332.918,00
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS = (B)					
VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA= (A) + (B) = (C)					$ 596.332.918,00
COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS (D)					$ 5.905.017,00
VALOR IVA (19%) AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS = (E)					$ 1.121.953,00
VALOR TOTAL= C+D+E AIU = 30% - (A = 20%, I = 5%, U = 5%)					$ 603.359.888,00
GERENCIA INTEGRAL SOCIOAMBIENTAL Y DE PROYECTOS (GISAP)					$ 16.894.076,86

TOTAL, EJECUTADO	**$ 620.253.964,86**

Tabla 87 Cantidades ejecutadas en el municipio de San Cayetano

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.



Gráfico 17 Avance Financiero Municipio de San Cayetano

3.7.1.2.8. CD-FC-060-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO DE LOURDES, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

A continuación, se muestran los avances en las actividades de obra a corte 30 de junio de 2024.

SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO					
No	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA					
1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	$ 38.000,00	286,52	$ 10.887.760,00
2	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	$ 1.015.260,00	235,91	$ 239.509.987,00
3	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	$ 10.210,00	14.915,94	$ 152.291.747,00
4	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	$ 331.796,00	229,22	$ 76.054.279,00
5	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPa (G)	m3	$ 594.692,00	63,46	$ 37.739.154,00
SUB TOTAL					**$ 516.482.927,00**
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS					

7	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	$ 51.383,00	47,55	$ 2.443.262,00
8	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	$ 1.015.260,00	6,01	$ 6.101.713,00
9	CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14 MPa (F) - MEZCLA IN SITU	m3	$ 799.801,00	1,03	$ 823.795,00
10	Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	$ 42.165,00	21,40	$ 902.331,00
11	TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIÁMETRO INTERIOR	m	$ 1.048.033,00	6,00	$ 6.288.198,00
12	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	$ 10.210,00	550,86	$ 5.624.281,00
SUB TOTAL					**$ 22.183.580,00**
TRANSPORTES					
13	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	$ 3.397,00	0,00	$ -
SUB TOTAL					**$ -**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD					
14	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI-04 (POSTES DE REFERENCIA), REFLECTIVO TIPO IX (1,25m X 0,45m)	unid	$ 715.621,00	11,0	$ 7.871.831,00
SUB TOTAL					**$ 7.871.831,00**
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO					
15	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	$ 2.181,00	14387,00	$ 31.378.047,00
SUB TOTAL					**$ 31.378.047,00**
APUS NO PREVISTOS					
16	DEMOLICIÓN CONCRETO RÍGIDO	M2	$ 25.785,00	243,9	$ 6.288.962,00
17	RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE	M	$ 115.133,00	105	$ 12.088.965,00
SUB TOTAL					**$ 18.377.927,00**
TOTAL, EJECUTADO					
VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA= (A)					**$ 596.294.312,00**
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS = (B)					
VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA= (A) + (B) = (C)					**$ 596.294.312,00**
COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS (D)					**$ 5.903.942,00**

VALOR IVA (19%) AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS = (E)	**$ 1.121.748,98**
VALOR TOTAL= C+D+E+F AIU = 30% - (A = 20%, I = 5%, U = 5%)	**$ 603.320.002,98**
GERENCIA INTEGRAL SOCIOAMBIENTAL Y DE PROYECTOS (GISAP)	**$ 16.893.067,63**
AJUSTE AL PESO	**$ 3.841,02**
TOTAL, EJECUTADO	**$ 620.216.911,63**

Tabla 88 Cantidades ejecutadas en el municipio de Lourdes

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.

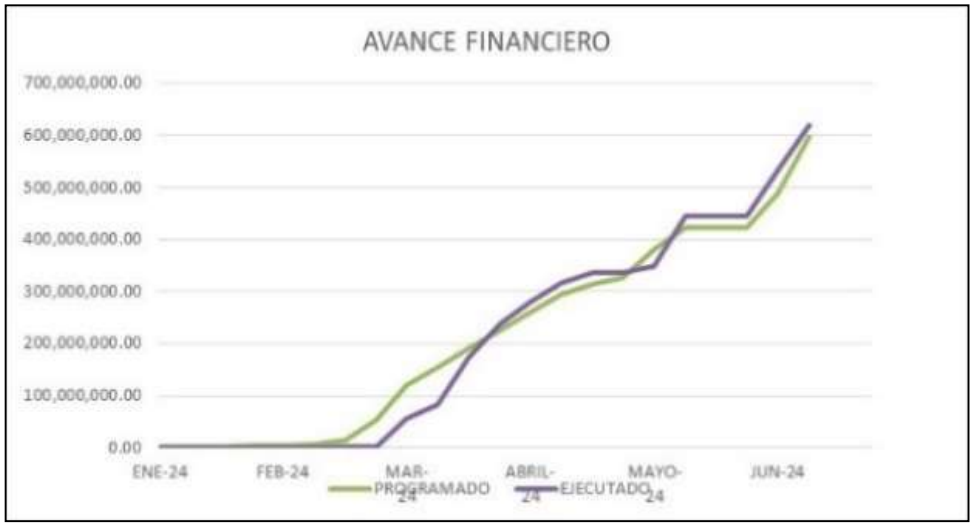


Gráfico 18 Avance Financiero Municipio de Lourdes

3.7.1.2.9. CD-FC-067-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LOS MANTOS-LA CARRERA, MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

A continuación, se muestran las actividades a realzarse en el proyecto.

SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO					
No	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**

CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA					
1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	$ 38.121,00	317,33	$ 12.097.032,23
2	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	$ 1.138.016,00	230,93	$ 262.802.034,87
3	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	$ 10.242,00	11675,22	$ 119.577.603,24
4	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	$ 428.491,00	299,39	$ 128.285.920,49
5	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPa (G)	m3	$ 677.827,00	116,68	$ 79.088.854,36
SUB TOTAL					**$ 601.851.445,19**
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS					
7	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	$ 49.585,00	51,77	$ 2.567.015,45
8	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	$ 1.138.016,00	7,83	$ 8.910.665,28
9	CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14 MPa (F) - MEZCLA IN SITU	m3	$ 890.664,00	0,80	$ 712.531,20
10	Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	$ 64.380,00	11,88	$ 764.834,40
11	TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIÁMETRO INTERIOR	m	$ 1.090.746,00	6,00	$ 6.544.476,00
12	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	$ 10.242,00	578,68	$ 5.926.840,56
SUB TOTAL					**$ 25.426.362,89**
TRANSPORTES					
13	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	$ 3.397,00	11.344,01	$ 38.535.618,78
SUB TOTAL					**$ 38.535.618,78**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD					
14	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI-04 (POSTES DE REFERENCIA), REFLECTIVO TIPO IX (1,25m X 0,45m)	unid	$ 719.407,00	7,0	$ 5.035.849,00
SUB TOTAL					**$ 5.035.849,00**
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO					
15	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	$ 2.181,00	17393,52	$ 37.935.265,81
SUB TOTAL					$ 37.935.265,81
ÍTEM NO PREVISTO					

15	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RÍGIDOS Y FLEXIBLES	M3	$ 30.271,00	402,97	$ 12.198.304,87
SUB TOTAL					$ 12.198.304,87
AJUSTE AL PESO					**$ 358,33**
VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA= (A)					**$ 720.983.204,88**
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS = (B)					
VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA= (A) + (B) = (C)					**$ 720.983.204,88**
COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS (D)					**$ 7.138.448,00**
VALOR IVA (19%) AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS = (E)					**$ 1.356.305,12**
VALOR TOTAL= C+D+E+F AIU = 30% - (A = 20%, I = 5%, U = 5%)					**$ 729.477.958,00**
GERENCIA INTEGRAL SOCIO AMBIENTAL Y DE PROYECTOS (GISAP)					**$ 20.245.383,00**
TOTAL					**$ 749.723.341,00**

Tabla 89 Cantidades ejecutadas en el municipio de Cáchira

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.

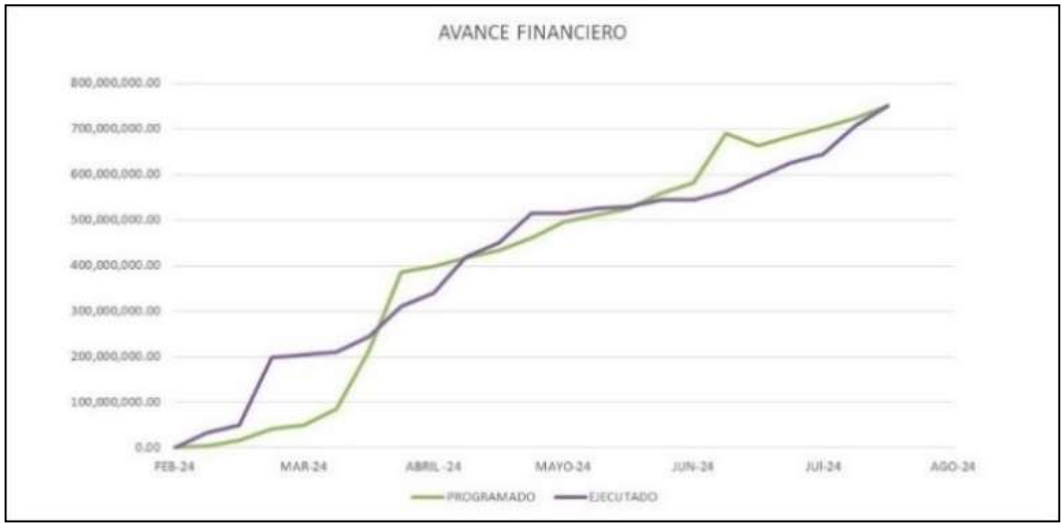


Gráfico 19 Avance Financiero Municipio de Cáchira

Se ha ejecutado el 100% de las actividades en el proyecto.

3.7.1.2.10. CD-FC-056-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES PUENTE ISABEL, MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El presente contrato finalizo su ejecución física de obra al 100%, se encuentra en proceso de liquidación.

SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO					
No	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA					
1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	$ 34.681,00	587,42	$ 20.372.313,00
2	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	$ 985.313,00	218,21	$ 215.005.150,00
3	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	$ 10.234,00	11.115,00	$ 113.750.910,00
4	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	$ 288.254,00	344,59	$ 99.329.446,00
5	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPa (G)	m3	$ 551.760,00	30,24	$ 16.685.222,00
SUB TOTAL					**$ 465.143.041,00**
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS					
7	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	$ 49.585,00	0,00	$ -
8	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	$ 985.313,00	0,00	$ -
9	CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14 MPa (F) - MEZCLA IN SITU	m3	$ 748.239,00	0,00	$ -
10	Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	$ 40.248,00	0,00	$ -
11	TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIÁMETRO INTERIOR	m	$ 1.016.390,00	0,00	$ -
12	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	$ 10.234,00	0,00	$ -
SUB TOTAL					**$ -**
TRANSPORTES					
13	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	$ 2.655,00	3.997,77	$ 10.614.088,00
SUB TOTAL					**$ 10.614.088,00**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD					

14	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI-04 (POSTES DE REFERENCIA), REFLECTIVO TIPO IX (1,25m X 0,45m)	unid	$ 705.224,00	7	$ 4.936.568,00
SUB TOTAL					**$ 4.936.568,00**
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO					
15	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	$ 1.920,00	13803,10	$ 26.501.944,00
SUB TOTAL					**$ 26.501.944,00**
TOTAL, EJECUTADO					
VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA= (A)					**$ 507.195.641,00**
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS = (B)					
VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA= (A) + (B) = (C)					**$ 507.195.641,00**
COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS (D)					**$ 5.021.739,00**
VALOR IVA (19%) AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS = (E)					**$ 954.130,00**
VALOR TOTAL= C+D+E+F AIU = 30% - (A = 20%, I = 5%, U = 5%)					**$ 513.171.510,00**
GERENCIA INTEGRAL SOCIOAMBIENTAL Y DE PROYECTOS (GISAP)					**$ 14.368.802,28**
TOTAL, EJECUTADO					**$ 527.540.312,28**

Tabla 90 Cantidades ejecutadas en el municipio de Puerto Santander

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.

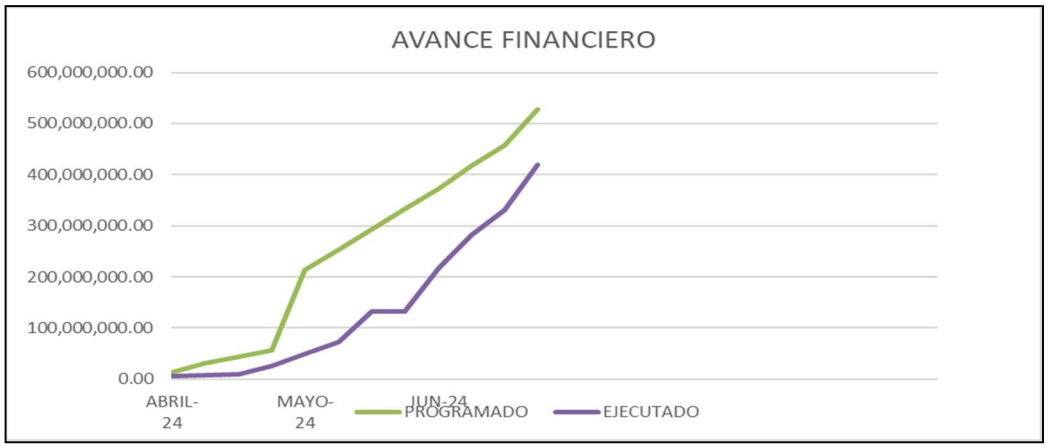


Gráfico 20 Avance Financiero Municipio de Puerto Santander

3.7.1.2.11. CD-FC-077-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES PASO DE LOS RÍOS - RICAURTE, MUNICIPIO DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El presente contrato finalizo su ejecución física de obra al 100%, se encuentra en proceso de liquidación.

SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO					
No	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA					
1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	$ 34.664,00	325,69	$ 11.289.718,00
2	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	$ 890.261,000	171,85	$ 152.991.353,00
3	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	10.200,00	12.848,65	$ 131.056.230,00
4	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	$ 206.487,00	281,33	$ 58.090.988,00
5	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPa (G)	m3	$ 468.497,00	63,03	$ 29.529.366,00
SUB TOTAL					**$ 382.957.655,00**
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS					
7	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	49.560,00	16,15	$ 800.394,00
8	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	$ 890.261,00	0,65	$ 578.670,00
9	CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14 MPa (F) - MEZCLA IN SITU	m3	$ 649.107,00	10,15	$ 6.588.436,00
10	Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	$ 40.228,00	1,70	$ 68.388,00
11	TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIÁMETRO INTERIOR	m	$ 975.859,00	3,00	$ 2.927.577,00
12	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	$ 10.200,00	76,49	$ 780.198,00
SUB TOTAL					**$ 11.743.663,00**
TRANSPORTES					
13	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	$ 2.654,00	3.758,55	$ 9.975.201,00
SUB TOTAL					**$ 9.975.201,00**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD					

14	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI-04 (POSTES DE REFERENCIA), REFLECTIVO TIPO IX (1,25m X 0,45m)	unid	$ 704.871,00	12,0	$ 8.458.452,00
SUB TOTAL					**$ 8.458.452,00**
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO					
15	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	$ 1.933,00	12350,14	$ 23.872.817,00
SUB TOTAL					**$ 23.872.817,00**
16	LIMPIEZA DE ALCANTARILLA	M	$ 127.707,00	21,00	$ 2.681.847,00
TOTAL, EJECUTADO					
VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA= (A)					**$ 439.689.635,00**
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS = (B)					
VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA= (A) + (B) = (C)					**$ 439.689.635,00**
COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS (D)					**$ 4.492.630,00**
VALOR IVA (19%) AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS = (E)					**$ 853.600,00**
VALOR TOTAL= C+D+E AIU = 30% - (A = 20%, I = 5%, U = 5%)					**$ 445.035.865,00**
GERENCIA INTEGRAL SOCIOAMBIENTAL Y DE PROYECTOS (GISAP)					**$ 12.461.004,22**
TOTAL, EJECUTADO					**$ 457.496.869,22**

Tabla 91 Cantidades ejecutadas en el municipio de Cúcuta

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.

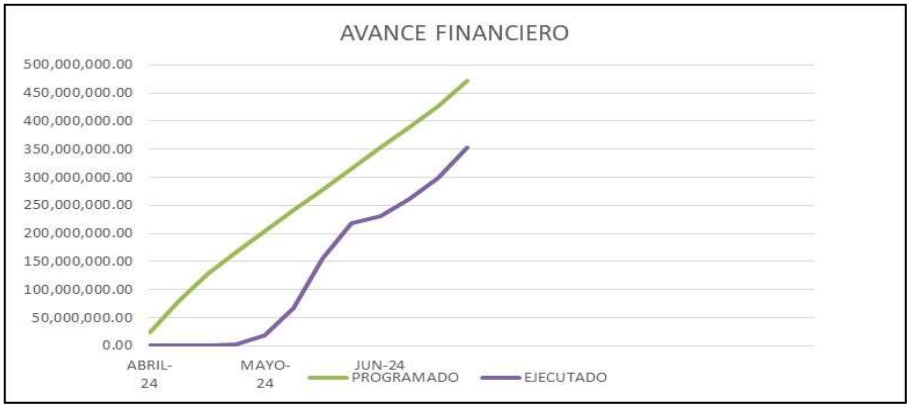


Gráfico 21 Avance Financiero Municipio de Cúcuta

3.7.1.2.12. CD-FC-077-2023 CD-FC-082-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA PARAMO – PICA, MUNICIPIO DE PAMPLONITA, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

A continuación, se muestran las actividades que se realizaron en el proyecto.

SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO					
No	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA					
1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	$ 34.600,00	531,33	$ 18.384.156,00
2	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	$ 884.000,00	229,58	$ 202.950.311,00
3	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	$ 10.200,00	15301,52	$ 156.075.517,00
4	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	$ 215.500,00	446,67	$ 96.258.032,00
5	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPa (G)	m3	$ 463.400,00	52,05	$ 24.118.116,00
SUB TOTAL					**$ 497.786.132,00**
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS					
7	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	$ 51.000,00	88,00	$ 4.488.000,00
8	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	$ 884.000,00	16,00	$ 14.144.000,00
9	CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14 MPa (F) - MEZCLA IN SITU	m3	$ 665.000,00	1,60	$ 1.064.000,00
10	Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	$ 40.000,00	50,00	$ 2.000.000,00
11	TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIÁMETRO INTERIOR	m	$ 1.134.000,00	12,00	$ 13.608.000,00
12	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	$ 10.200,00	1160,00	$ 11.832.000,00
SUB TOTAL					**$ 47.136.000,00**
TRANSPORTES					
13	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	$ 2.900,00	5180,94	$ 15.024.724,00
SUB TOTAL					**$ 15.024.724,00**

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD					
14	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI-04 (POSTES DE REFERENCIA), REFLECTIVO TIPO IX (1,25m X 0,45m)	unid	$ 706.480,00	8,00	$ 5.651.840,00
SUB TOTAL					**$ 5.651.840,00**
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO					
15	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	$ 1.840,00	16.699,60	$ 30.727.268,00
SUB TOTAL					**$ 30.727.268,00**
TOTAL, EJECUTADO					
VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA= (A)					**$ 596.325.964,00**
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS = (B)					
VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA= (A) + (B) = (C)					**$ 596.325.964,00**
COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS (D)					**$ 5.904.217,00**
VALOR IVA (19%) AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS = (E)					**$ 1.121.801,00**
VALOR TOTAL= C+D+E+F AIU = 30% - (A = 20%, I = 5%, U = 5%)					**$ 603.351.982,00**
GERENCIA INTEGRAL SOCIOAMBIENTAL Y DE PROYECTOS (GISAP)					**$ 16.893.855,49**
TOTAL, EJECUTADO					**$ 620.245.837,49**

Tabla 92 Cantidades ejecutadas en el municipio de Pamplonita

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.

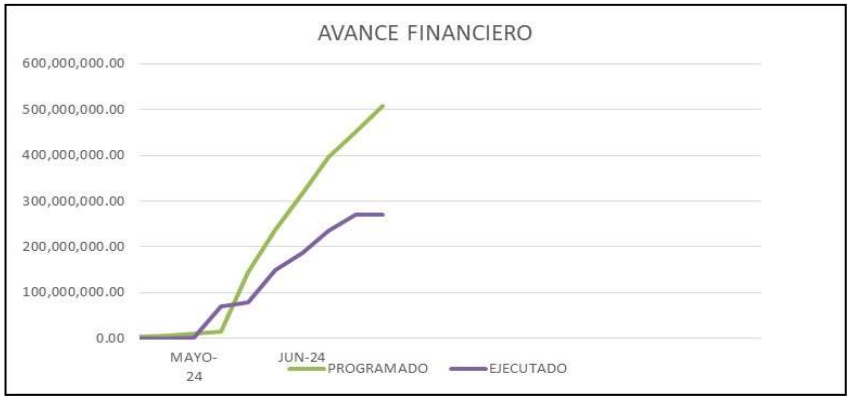


Gráfico 22 Avance Financiero Municipio de Pamplonita

3.7.1.2.13. CD-FC-081-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES MINAS DE CAL – LA ARAÑITA – LA MESA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

A continuación, se muestran las actividades que se realizaron en el proyecto.

SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO					
No	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA					
1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	$ 34.607,00	296,15	$ 10.248.863,00
2	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	$ 994.334,00	211,47	$ 210.269.280,00
3	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	$ 10.189,00	14.538,270	$ 148.130.433,00
4	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	$ 310.651,00	272,72	$ 84.720.741,00
5	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPa (G)	m3	$ 560.269,00	41,98	$ 23.520.093,00
SUB TOTAL					**$ 476.889.410,00**
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS					
7	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	$ 51.383,00	148,66	$ 7.638.597,00
8	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	$ 994.334,00	20,94	$ 20.821.354,00
9	CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14 MPa (F) - MEZCLA IN SITU	m3	$ 780.421,00	1,58	$ 1.233.065,00
10	Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	$ 39.452,00	70,8	$ 2.793.202,00
11	TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIÁMETRO INTERIOR	m	$ 1.134.794,00	9	$ 10.213.146,00
12	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	$ 10.189,00	1510,21616	$ 15.387.592,00
SUB TOTAL					**$ 58.086.956,00**
TRANSPORTES					
13	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	$ 2.959,00	1.090,15	$ 3.225.754,00
SUB TOTAL					**$ 3.225.754,00**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD					

14	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI-04 (POSTES DE REFERENCIA), REFLECTIVO TIPO IX (1,25m X 0,45m)	unid	$ 708.315,00	14	$ 9.916.410,00
SUB TOTAL					**$ 9.916.410,00**
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO					
15	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	$ 1.879,00	16202,18	$ 30.443.887,00
SUB TOTAL					**$ 30.443.887,00**
TOTAL, EJECUTADO					
VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA= (A)					$ 578.562.417,00
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS = (B)					
VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA= (A) + (B) = (C)					$ 578.562.417,00
COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS (D)					$ 5.728.748,00
VALOR IVA (19%) AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS = (E)					$ 1.088.462,00
VALOR TOTAL= C+D+E AIU = 30% - (A = 20%, I = 5%, U = 5%)					$ 585.379.627,00
GERENCIA INTEGRAL SOCIOAMBIENTAL Y DE PROYECTOS (GISAP)					$ 16.390.629,56
TOTAL, EJECUTADO					$ 601.770.256,56

Tabla 93 Cantidades ejecutadas en el municipio de Mutiscua

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.

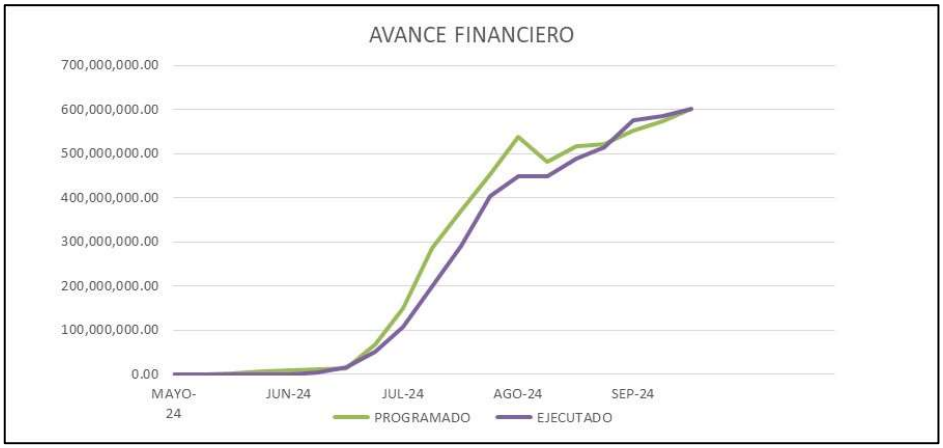


Gráfico 23 Avance Financiero Municipio de Mutiscua

3.7.1.2.14. CD-FC-082-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRÁN, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

A continuación, se muestran las actividades a realzarse en el proyecto.

SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO					
No	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA					
1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	$ 35.953,00	469,55	$ 16.881.731,00
2	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	$ 1.025.581,00	159,80	$ 163.887.844,00
3	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	$ 10.194,00	10500,91	$ 107.046.277,00
4	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	$ 327.669,00	292,21	$ 95.748.158,00
5	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPa (G)	m3	$ 571.437,00	70,37	$ 40.212.022,00
SUB TOTAL					**$ 423.776.032,00**
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS					
7	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	$ 49.585,00	129,68	$ 6.430.183,00
8	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	$ 1.025.581,00	11,50	$ 11.794.182,00
9	CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14 MPa (F) - MEZCLA IN SITU	m3	$ 788.692,00	1,80	$ 1.419.646,00
10	Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	$ 41.886,00	83,70	$ 3.505.858,00
11	TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIÁMETRO INTERIOR	m	$ 1.023.650,00	11,00	$ 11.260.150,00
12	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	$ 10.194,00	1381,18	$ 14.079.749,00
SUB TOTAL					**$ 48.489.768,00**
TRANSPORTES					
13	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	$ 3.271,00	1114,76	$ 3.646.380,00
SUB TOTAL					**$ 3.646.380,00**

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD					
14	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI-04 (POSTES DE REFERENCIA), REFLECTIVO TIPO IX (1,25m X 0,45m)	unid	$ 705.522,00	7,00	$ 4.938.654,00
SUB TOTAL					**$ 4.938.654,00**
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO					
16	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	$ 1.986,00	13340,997	$ 26.495.220,00
SUB TOTAL					**$ 26.495.220,00**
TOTAL, EJECUTADO					
VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA= (A)					**$ 507.346.054,00**
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS = (B)					
VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA= (A) + (B) = (C)					**$ 507.346.054,00**
COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS (D)					**$ 5.023.671,00**
VALOR IVA (19%) AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS = (E)					**$ 954.497,00**
VALOR TOTAL= C+D+E AIU = 30% - (A = 20%, I = 5%, U = 5%)					**$ 513.324.222,00**
GERENCIA INTEGRAL SOCIOAMBIENTAL Y DE PROYECTOS (GISAP)					**$ 14.373.078,22**
TOTAL, EJECUTADO					**$ 527.697.300,22**

Tabla 94 Cantidades ejecutadas en el municipio de Herrán

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.

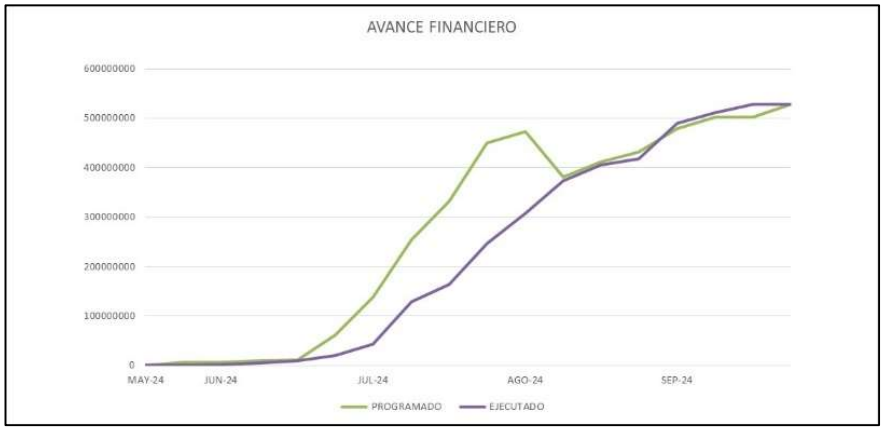


Gráfico 24 Avance Financiero Municipio de Herrán

3.7.1.2.15. CD-FC-058-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA – CUPERENA – CACAHUALA – ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

A continuación, se muestran las actividades a realzarse en el proyecto.

SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO					
No	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA					
1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	$ 39.920,00	744,48	$ 29.719.642,00
2	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	$ 920.653,00	299,25	$ 275.505.410,00
3	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	$ 10.181,00	14458,91	$ 147.206.163,00
4	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	$ 250.131,00	408,96	$ 102.293.574,00
5	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPa (G)	m3	$ 511.663,00	34,97	$ 17.892.855,00
SUB TOTAL					**$ 572.617.644,00**
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS					
7	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	$ 51.383,00	131,84	$ 6.774.335,00
8	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	$ 920.653,00	23,52	$ 21.653.759,00
9	CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14 MPa (F) - MEZCLA IN SITU	m3	$ 700.995,00	2,40	$ 1.682.388,00
10	Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	$ 42.165,00	65,92	$ 2.779.517,00
11	TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIÁMETRO INTERIOR	m	$ 1.007.990,00	18,00	$ 18.143.820,00
12	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	$ 10.181,00	1743,33	$ 17.748.843,00
SUB TOTAL					**$ 68.782.662,00**
TRANSPORTES					
13	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m)	m3/km	$ 3.397,00	4784,60	$ 16.253.286,00

	MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)				
SUB TOTAL					**$ 16.253.286,00**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD					
14	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI-04 (POSTES DE REFERENCIA), REFLECTIVO TIPO IX (1,25m X 0,45m)	unid	$ 712.462,00	12	$ 8.549.544,00
SUB TOTAL					**$ 8.549.544,00**
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO					
15	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	$ 2.173,00	16964,05	$ 36.862.881,00
SUB TOTAL					**$ 36.862.881,00**
TOTAL, EJECUTADO					
VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA= (A)					**$ 703.066.017,00**
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS = (B)					
VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA= (A) + (B) = (C)					**$ 703.066.017,00**
COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS (D)					**$ 6.961.275,00**
VALOR IVA (19%) AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS = (E)					**$ 1.322.642,00**
VALOR TOTAL= C+D+E AIU = 30% - (A = 20%, I = 5%, U = 5%)					**$ 711.349.934,00**
GERENCIA INTEGRAL SOCIOAMBIENTAL Y DE PROYECTOS (GISAP)					**$ 19.917.798,15**
TOTAL, EJECUTADO					**$ 731.267.732,15**

Tabla 95 Cantidades ejecutadas en el municipio de Santiago

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.

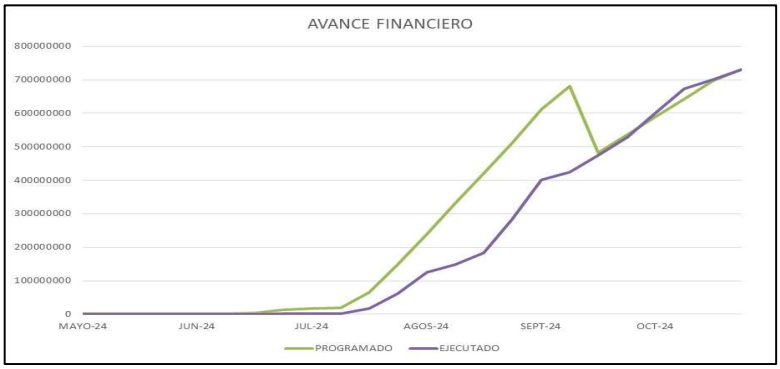


Gráfico 25 Avance Financiero Municipio de Santiago

3.7.1.2.16. CD-FC-71-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA GARZA - ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

A continuación, se muestran las actividades a realzarse en el proyecto.

SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO					
No	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA					
1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	$ 39.920,00	553,54	$ 22.097.516,00
2	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	$ 983.725,00	222,85	$ 219.223.116,00
3	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	$ 10.197,00	11024	$ 112.411.728,00
4	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	$ 304.574,00	319,28	$ 97.213.929,00
5	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPa (G)	m3	$ 567.016,00	81,05	$ 45.956.647,00
SUB TOTAL					**$ 496.902.936,00**
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS					
7	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	$ 51.383,00	176,000	$ 9.043.408,00
8	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	$ 983.725,00	31,200	$ 30.692.220,00
9	CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14 MPa (F) - MEZCLA IN SITU	m3	$ 766.866,00	3,200	$ 2.453.971,00
10	Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	$ 42.165,00	55,000	$ 2.319.075,00
11	TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIÁMETRO INTERIOR	m	$ 1.034.686,00	24,000	$ 24.832.464,00
12	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	$ 10.197,00	2316,000	$ 23.616.252,00
SUB TOTAL					**$ 92.957.390,00**
TRANSPORTES					
13	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	$ 3.397,00	4.034,14	$ 13.703.988,00
SUB TOTAL					**$ 13.703.988,00**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD					

14	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI-04 (POSTES DE REFERENCIA), REFLECTIVO TIPO IX (1,25m X 0,45m)	unid	$ 714.568,00	5	$ 3.572.840,00
SUB TOTAL					**$ 3.572.840,00**
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO					
15	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	$ 2.181,00	15460,91	$ 33.720.236,00
SUB TOTAL					**$ 33.720.236,00**
TOTAL, EJECUTADO					
VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA= (A)					**$ 640.857.390,00**
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS = (B)					
VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA= (A) + (B) = (C)					**$ 640.857.390,00**
COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS (D)					**$ 6.345.690,00**
VALOR IVA (19%) AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS = (E)					**$ 1.205.681,00**
VALOR TOTAL= C+D+E AIU = 30% - (A = 20%, I = 5%, U = 5%)					**$ 648.408.761,00**
GERENCIA INTEGRAL SOCIOAMBIENTAL Y DE PROYECTOS (GISAP)					**$ 18.155.445,31**
TOTAL, EJECUTADO					**$ 666.564.206,31**

Tabla 96 Cantidades ejecutadas en el municipio de Gramalote

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.

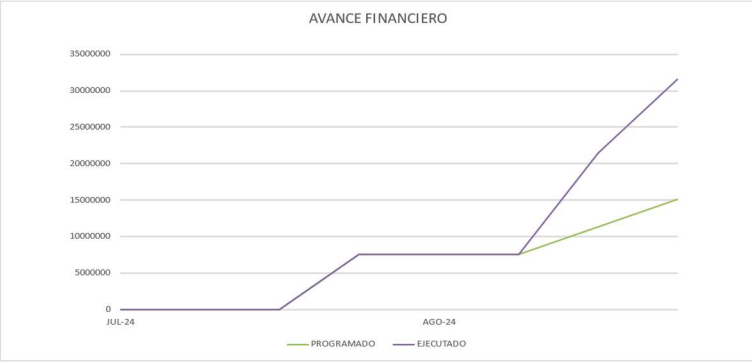


Gráfico 26 Avance Financiero Municipio de Gramalote

3.7.1.2.17. CD-FC-49-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SAN JUAN – AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE VILLA CARO, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022


A continuación, se muestran las actividades a realzarse en el proyecto.

SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO					
No	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA					
1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	$ 43.214,00	581,82	$ 25.142.769,00
2	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	$ 1.135.605,00	193,43	$ 219.660.075,00
3	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	$ 7.568,00	9514,19	$ 72.003.390,00
4	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	$ 423.543,00	353,06	$ 149.536.091,00
5	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPa (G)	m3	$ 698.305,00	33,87	$ 23.651.590,00
SUB TOTAL					**$ 489.993.915,00**
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS					
7	EXCAVACIONES MANUAL SIN CLASIFICAR	m3	$ 43.214,00	43,950	$ 1.899.255,00
8	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	$ 1.135.605,00	8,240	$ 9.357.385,00
9	CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14 MPa (F) - MEZCLA IN SITU	m3	$ 907.833,00	0,800	$ 726.266,00
10	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	m3	$ 47.432,00	21,990	$ 1.043.029,00
11	TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIÁMETRO INTERIOR	m	$ 925.669,00	6,000	$ 5.554.014,00
12	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	$ 7.568,00	581,110	$ 4.397.840,00
SUB TOTAL					**$ 22.977.789,00**
TRANSPORTES					
13	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	$ 3.208,00	4.738,23	$ 15.200.237,00
SUB TOTAL					**$ 15.200.237,00**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD					

14	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI-04 (POSTES DE REFERENCIA), REFLECTIVO TIPO IX (1,25m X 0,45m)	unid	$ 1.052.084,00	13	$ 13.677.092,00
SUB TOTAL					**$ 13.677.092,00**
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO					
15	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	$ 20.934,00	1682,76	$ 35.226.872,00
SUB TOTAL					**$ 35.226.872,00**
TOTAL, EJECUTADO					
VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA= (A)					**$ 577.075.904,00**
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS = (B)					**$ -**
VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA= (A) + (B) = (C)					**$ 577.075.904,00**
COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS (D)					**$ 9.324.387,00**
VALOR IVA (19%) AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS = (E)					**$ 1.771.634,00**
VALOR TOTAL= C+D+E AIU = 30% - (A = 20%, I = 5%, U = 5%)					**$ 588.171.925,00**
GERENCIA INTEGRAL SOCIOAMBIENTAL Y DE PROYECTOS (GISAP)					**$ 16.468.813,90**
TOTAL, EJECUTADO					**$ 604.640.738,90**

Tabla 97 Cantidades ejecutadas en el municipio de Villa Caro

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.

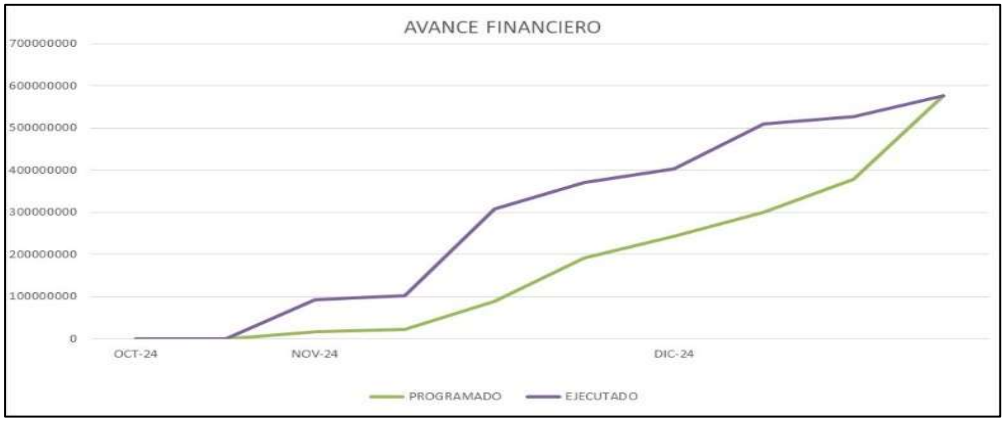

3.7. Acciones a seguir por parte de la Interventoría.

Entre las acciones a seguir por parte de la interventoría se tienen las siguientes:

1. Realizar comités de seguimiento a los contratos de obra, con el fin de generar compromisos y que sean cumplidos en un periodo no superior a 8 días calendario.

2. Realizar la revisión de los documentos entregados por los contratistas de obra y de encontrarse de acuerdo al pliego de condiciones dar concepto aprobatorio.

3. Realizar gestiones en el Invias para llevar a feliz término los contratos de obra.

4. Realizar recorridos de obra en los corredores a intervenir con el fin de tener una visual general del proyecto y poder culminarlo en pro de beneficiar a la comunidad del sector.

5. Realizar seguimiento, control y vigilancia a los contratos de obra con el fin de cumplir con el Manual y las Especificaciones Generales de Mantenimiento de Carreteras.

6. Continuar solicitando al contratista de obra, la entrega inmediata de la reprogramación de obra y flujos de caja, a la fecha no ha entregado la información solicitada, y por parte de la interventoría se requiere continuar haciendo un seguimiento estricto a las actividades programadas y ejecutadas.

7. Continuar verificando las distintas actas de modificación de los contratos que conforman el convenio.

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATOS DE OBRA:

A la fecha de corte del presente Informe, se han finalizado 10 convenios su ejecución de obras y se tienen en ejecución 01 de los 11 Convenios interadministrativos suscritos con el INVIAS, el convenio de Gobernación 1943 se encuentra en etapa de ejecución de actividades de obra de placa huella y alcantarillas. Los convenios de Abrego 1791 y Gobernación 2033 (Villa Caro), finalizaron el 31 de diciembre de 2024.

El convenio de Ocaña 1758, su ejecución termino el 31 de julio de 2023, por lo cual para el presente informe no se presenta reporte de ejecución. Se firmó el acta de liquidación el 06 de septiembre de 2024.

El convenio de Herrán 1861, su ejecución termino el 30 de diciembre de 2023, por lo cual para el presente informe no se presenta reporte de ejecución. Se firmo acta de liquidación el 15 de octubre de 2024.

El convenio de Pamplonita 1878, su ejecución termino el 30 de mayo de 2024, por lo cual para el presente informe no se presenta reporte de ejecución, se firmó acta de liquidación el 08 de enero de 2025.

El convenio de Santiago 1821, su ejecución termino el 15 de junio de 2024, por lo cual para el presente informe no se presenta reporte de ejecución, se firmó acta de liquidación el 05 de diciembre de 2025.

El convenio de Ocaña 1814, su ejecución termino satisfactoriamente el 24 de agosto de 2024, por lo cual para el presente informe no se presenta reporte de ejecución, se firmó acta de liquidación el 24 de diciembre de 2025.

El convenio de La Playa de Belén 1863, su ejecución termino satisfactoriamente el 26 de agosto de 2024, por lo cual para el presente informe no se presenta reporte de ejecución, se firmó acta de liquidación el 23 de diciembre de 2025.

El convenio de Abrego 1971, su ejecución termino satisfactoriamente el 31 de diciembre de 2024, por lo cual para el presente informe no se presenta reporte de ejecución, está en proceso de liquidación.

El convenio de Gobernación 2052, su ejecución termino el 30 de agosto de 2024, por lo cual el presente informe no se presenta reporte de ejecución.

El convenio de Cáchira 1859, finalizo su tiempo contractual el 30 de julio de 2024, por lo cual para el presente informe no se presenta reporte de ejecución, se firmó acta de liquidación el 27 de diciembre de 2025.

Del convenio Gobernación 2033, los contratos de los municipios de Gramalote, Santiago, Herrán, Mutiscua, Pamplonita, Cáchira, Puerto Santander, Ricaurte, Lourdes, Salazar de Las Palmas, Silos, Cacota, Pamplona, San Cayetano, Villa del Rosario, El Zulia, Villa Caro finalizaron las actividades de obra.

Por lo anterior, únicamente se presentan reportes de obra para los contratos del municipio Gobernación-1943.

4.1. PROYECTO MUNICIPIO DE SANTIAGO

El día 18 de octubre de 2022, se suscribe el acta de inicio del contrato de obra No. LP-OP-001- 2022, cuyo objeto es CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VÍA RURAL CUPERENA - ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER y su ejecución finalizo el 15 de junio de 2024. El contrato se encuentra en proceso de liquidación.

Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de obra con la compañía aseguradora SOLIDARIA DE COLOMBIA No. Póliza 475 47 994000054633 y 475 74 994000009416.

Contrato			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 443.087.965,50	29/07/2022	29/03/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 443.087.965,50	29/07/2022	29/03/2026
Calidad del servicio	$ 443.087.965,50	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 400.000.000	29/07/2022	29/03/2023
Suspensión y Reinicio 1.			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 443.087.965,50	18/10/2022	02/07/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 443.087.965,50	18/10/2022	02/07/2026

Calidad del servicio	$ 443.087.965,50	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 400.000.000	18/10/2022	03/07/2023
Prorroga 1			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 443.087.965,50	18/10/2022	02/01/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 443.087.965,50	18/10/2022	02/01/2027
Calidad del servicio	$ 443.087.965,50	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 400.000.000	03/07/2023	03/01/2024
Prorroga 2			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 443.087.965,00	18/10/2022	03/05/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 443.087.965,00	18/10/2022	03/05/2027
Calidad del servicio	$ 443.087.965,50	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 400.000.000	18/10/2022	03/05/2024

Tabla 98 Garantías Municipio de Santiago

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-12 - Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra.

4.2. PROYECTO MUNICIPIO DE HERRÁN

El día 19 de octubre de 2022, se suscribe el acta de inicio del contrato de obra No. 146 de 2022, cuyo objeto es MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HERRÁN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL, y su ejecución finalizo el 30 de diciembre de 2024. El acta de liquidación se firmó el 15 de octubre de 2015.

Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de obra con la compañía aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A No. Póliza 49-40-101009041 y 49-44-101028950.

Igualmente, a la fecha del presente informe, el contrato está en proceso de liquidación, y se deberá ajustar las garantías con fechas finales de actas de cobro y recibido a satisfacción por parte de la entidad contratante.

Contrato			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 356.399.929,60	27/09/2022	27/06/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 89.099.982,40	27/09/2022	27/12/2025
Calidad del servicio	$ 356.399.929,60	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 200.000.000	27/09/2022	30/12/2022
Prorroga 1			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 356.399.929,60	19/10/2022	19/11/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 89.099.982,40	19/10/2022	18/05/2026
Calidad del servicio	$ 356.399.929,60	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 200.000.000	19/10/2022	21/05/2023
Prorroga 2			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 356.399.929,60	19/10/2022	19/07/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 89.099.982,40	19/10/2022	18/01/2027
Calidad del servicio	$ 356.399.929,60	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 200.000.000	19/10/2022	21/01/2024

Tabla 99 Garantías Municipio de Herrán

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-12 - Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra.

4.2. PROYECTO MUNICIPIO DE OCAÑA 1758

El día 01 de noviembre de 2022, se suscribe el acta de inicio del contrato de obra No. CO1.PCCNTR.3879052, cuyo objeto es MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRISON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER, y su ejecución finalizo el 30 de julio de 2024. Se firmo acta de liquidación el día 06 de septiembre de 2024.

Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de obra con la compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL No. Póliza CG-1037616 y No. CG-1008105.

Pólizas Contrato			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 171.114.662,00	10/08/2022	10/06/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 89.099.982,40	10/08/2022	10/02/2026
Calidad del servicio	$ 171.114.662,00	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 200.000.000,00	10/08/2022	10/02/2023
Pólizas Inicio Contrato			
Cumplimiento	$ 171.114.662,00	10/08/2022	10/02/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 89.099.982,40	10/08/2022	10/02/2026
Calidad del servicio	$ 171.114.662,00	5 años a partir del acta de recibo 10/02/2028	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 200.000.000,00	10/08/2022	10/02/2023
Prorroga 1			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 171.114.662,00	27/04/2023	30/10/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 89.099.982,40	27/04/2023	30/06/2026
Calidad del servicio	$ 171.114.662,00	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 200.000.000,00	10/08/2022	30/06/2023
Prorroga 2			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 171.114.662,00	20/06/2023	01/11/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 89.099.982,40	27/04/2023	01/08/2026
Calidad del servicio	$ 171.114.662,00	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 200.000.000,00	10/08/2022	30/07/2023

Tabla 100 Garantías Municipio de Ocaña

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-12 - Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra.

4.3. PROYECTO MUNICIPIO DE CACHIRA

El día 16 de noviembre de 2022, se suscribe el acta de inicio del contrato de obra No. 160-2022, cuyo objeto es MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VÍAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER, durante el periodo se adelantan actividades de construcción de placa huella. El presente contrato se liquidó el 27 de diciembre de 2024.

4.3.1. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de obra con la compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL No. Póliza 1000227435 y 100052635.

Contrato			
Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 531.687.175,40	04/10/2022	04/06/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 132.921.793,85	04/10/2022	04/02/2026
Calidad del servicio	$ 797.530.763,10	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 200.000.000	16/11/2022	16/03/2023
Prorroga 1			
Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 531.687.175,40	05/07/2023	10/11/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 132.921.793,85	05/07/2023	10/07/2026
Calidad del servicio	$ 797.530.763,10	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 200.000.000	10/10/2022	10/11/2023

Tabla 101 Garantías Municipio de Cáchira

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-12 - Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra.

4.4. PROYECTO MUNICIPIO DE ABREGO

El día 16 de enero de 2023, se suscribe el acta de inicio del contrato de obra No. 252-2022, cuyo objeto es MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL. Se encuentra en liquidación, finalizó el 31 de diciembre de 2024.

Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de obra con la compañía aseguradora SEGUROS DEL ESTADO No. Póliza 21-44-101400517 y 21-40-101201370.

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 431.432.405,40	24/11/2022	24/11/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 862.864.810,80	24/11/2022	24/07/2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 862.864.810,80	24/11/2022	24/07/2026
Calidad del servicio	$ 1.294.297.216,20	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 400.000.000	24/11/2022	24/07/2023
Prorroga 1 y Adicción 1			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 449.401.262,30	16/01/2023	16/04/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 898.802.524,60	16/01/2023	16/04/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 898.802.524,60	16/01/2023	15/12/2026
Calidad del servicio	$ 1.294.297.216,20	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 464.000.000	16/01/2023	15/12/2023
Suspensión 1 y Reinicio 1			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 449.401.262,30	16/01/2023	31/05/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 898.802.524,60	16/01/2023	31/05/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 898.802.524,60	16/01/2023	29/01/2027
Estabilidad y calidad de la obra	$ 1.348.203.786,90	15/09/2023	15/09/2028
Calidad del servicio	$ 4.545.300,90	15/09/2023	15/09/2028
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 464.000.000	16/01/2023	31/01/2024
Modificatorio 2			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 449.401.262,30	16/01/2023	31/10/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 898.802.524,60	16/01/2023	31/10/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 898.802.524,60	16/01/2023	30/06/2027
Estabilidad y calidad de la obra	$ 1.348.203.786,90	15/09/2023	15/09/2028
Calidad del servicio	$ 4.545.300,90	15/09/2023	15/09/2028
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 520.000.000	16/01/2023	31/06/2024

Tabla 102 Garantías Municipio de Abrego

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-12 - Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra.

4.5. PROYECTO MUNICIPIO DE LA PLAYA

El día 06 de marzo de 2023, se suscribe el acta de inicio del contrato de obra LP-004-2022, cuyo objeto es MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME A CONVENIO NO. 1863 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS. El contrato de obra finalizo el 26 de agosto de 2024 y se liquido el 23 de diciembre de 2024.

Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de obra con la compañía aseguradora HDI SEGUROS No. Póliza 4001580 y 4007857.

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 220.309.139.30	27/02/2023	27/12/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 220.309.139.30	27/02/2023	27/08/2028
Calidad del servicio	$ 220.309.139.30	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	232.000.000	27/01/2023	27/08/2023

Tabla 103 Garantías Municipio de La Playa

4.6. PROYECTO MUNICIPIO DE PAMPLONITA

El día 14 de abril de 2023, se suscribe el acta de inicio del contrato de obra 202 DE 2022, cuyo objeto es MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO N° 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS. El contrato de obra finalizo el 30 de mayo de 2024 y se encuentra en proceso de liquidación.

Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de obra con la compañía aseguradora NACIONAL DE SEGUROS No. Póliza 400047393 y 400047383.

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 180.000.000,00	14/04/2023	15/10/2023

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 90.000.000,00	14/04/2023	15/10/2023
Calidad del servicio	$ 180.000.000,00	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 348.000.000,00	14/04/2023	15/10/2023
PRORROGA No. 02			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 180.000.000,00	27/02/2024	30/09/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 90.000.000,00	27/02/2024	30/09/2027
Calidad del servicio	$ 180.000.000,00	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 348.000.000,00	27/02/2024	30/09/2024

Tabla 104 Garantías Municipio de Pamplonita

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-12 - Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra.

4.7. PROYECTO GOBERNACIÓN 1943

El día 25 de marzo de 2025, se suscribe el acta de reinicio del contrato de obra 02590 DE 2022, cuyo objeto es MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS. Se encuentran activos todos los frentes de obra.

Reporte Informe Semanal

Se adjunta al presente informe, el MEPI-MN1-IN-15-FR-3 – Reporte informe semanal, de acuerdo a la siguiente tabla.

No. De Informe Semanal	Periodo
91	25/03/2025 a 27/03/2025

Tabla 105 Reporte informes semanales Gobernación 1943

Reporte de Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe la maquinaria presentada por el contratista se encuentra aprobada con el comunicado GIC-INVIAS-NTS-825-22 del 25 de julio de 2023.

DESCRIPCIÓN		CAPACIDAD

	MARCA / MODELO	
Dumper AUSA	D600APG	6000 KG

Tabla 106 Maquinaría y Equipo Gobernación 1943

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-4 - Maquinaria y Equipo Contrato de Obra.

Reporte de Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe dentro del contrato se tienen afiliado al personal que se relaciona a continuación.

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESO	EGRESO	SS	MUNICIPIO
1	WILLIAM PABÓN QUINTERO	DIRECTOR DE OBRA	13278653	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
2	LEIDY YULIANA JAIME	AUXILIAR INGENIERA	1091664068	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
3	FRANKLIN AARON GIRALDO	LOGÍSTICO	79685180	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
4	GUSTAVO NIÑO GARCÍA	COMPRAS	1090497738			UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
5	NATALIA HURTADO	COORDINADOR SST	1090506478			UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
6	JONATAN ALEXIS HERNÁNDEZ	OPERADOR DE MAQUINARIA	1004877143			UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
8	ARISTÓBULO ZABALA	CONDUCTOR VOLQUETA	5439750	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
9	CARLOS ALBERTO PINEDA	AUX TOPOGRAFIA	1007909639			UT EDIVIAL TROJA	GRAMALOTE

10	SERGIO ALBERTO LAGUADO	OPERADOR DE MAQUINARIA	1093766200	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
12	CESAR ANDRES CARDENAS COLL	RESIDENTE DE OBRA	1090393766	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
13	EDWAR HERNANDEZ RENGIFO	OPERADOR DE MAQUINARIA	88261502	RETIRADO		UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
14	DARLY JUDITH RODRIGUEZ GALVIS	RESIDENTE SST	1090393766	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
15	DAYANA MELINA SALAZAR ORTEGA	INGENIERA AMBIENTAL	88261502	ACTIVO		INDEPENDIENTE	TODO EL PROYECTO
16	HÉCTOR ACOSTA	AUXILIAR CONTABLE	1090423766	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
17	FREDIS JOSÉ SUAREZ VILLALBA	TOPOGRAFO	1101387669	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
18	LUIS EDUARDO GARCÍA PALACIO	OPERADOR DE MAQUINARIA	1093761965	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
19	ELIAN ALEXIS CARRILLO	OPERADOR	1007953522	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
20	WILLIAM JOEL FLORES	OPERADOR DE MAQUINARIA	1005543179	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
21	ALVARO ROJAS	AUXILIAR DE INGENIERÍA	1094427632	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
22	ANGELICA CAROLINA LOPEZ	INSPECTOR DE OBRA	1093773719	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	PATIOS
23	ANGIE STELLA DUARTE	AUX CONTABLE	1090508619	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO

24	DANIEL STEVEN CARDENAS	AYUDANTE DE OBRA	1005036929	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	PATIOS
25	FERNANDO SOTO	OPERADOR DE MAQUINARIA	1093789563	ACTIVVO		UT EDIVIAL TROJA	GRAMALOTE
27	CARLOS ALBERTO LAGUADO RODRIGUEZ	OPERADOR DE MAQUINARIA	1092646457	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	GRAMALOTE
28	ALVARO ROJAS	AUXILIAR DE INGENIERIA	1094427632	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS

ARBOLEDAS Y PATIOS

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESO	EGRESO	SS	MUNICIPIO DONDE EJECUTA SU LABOR
1	DOUGLA URIBE TORRES	AYUDANTE DE OBRA	1093889177	ACTIVO		SUBCONTRATISTA CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS
2	EUGENIO URIBE MACHADO	AYUDANTE DE OBRA	7618618	13/06/2024		SUBCONTRATISTA CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS
3	HEILER PEREZ	AYUDANTE DE OBRA	PT1168414	ACTIVO		SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
4	JESUS SIERRA	AYUDANTE DE OBRA	1007444967	RETIRADO		SUBCONTRATISTA CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS

ARBOLEDAS Y PATIOS							
N°	**NOMBRE**	**CARGO**	**CEDULA**	**INGRESO**	**EGRESO**	**SS**	**MUNICIPIO DONDE EJECUTA SU LABOR**
5	ALVARO CRUZ	AYUDANTE DE OBRA	13413081	19/08/2024		SUBCONTRATISTA CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS
6	ANGEL MARIA JAIMES	AYUDANTE DE OBRA	13412578	19/08/2024		SUBCONTRATISTA CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS
7	DOUGLAS URIBE	AYUDANTE DE OBRA	1093889177	14/08/2024		SUBCONTRATISTA CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS
8	RONALD SALCEDO	AYUDANTE DE OBRA	1092644428	1/08/2024		SUBCONTRATISTA CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS
9	YOSSER CARVAJAL	AYUDANTE DE OBRA	1004941773	19/08/2024		SUBCONTRATISTA CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS
10	DIEGO JESUS BOHADA	AYUDANTE DE OBRA	1092644511	19/08/2024		SUBCONTRATISTA CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS
11	LUIS ANGEL ANTOLINES	AYUDANTE DE OBRA	1092645613	19/08/2024		SUBCONTRATISTA CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS
12	FABIO URIBE	AYDANTE DE OBRA	1098621938	ACTIVO		SUBCONTRATISTA CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS

ARBOLEDAS Y PATIOS							
N°	**NOMBRE**	**CARGO**	**CEDULA**	**INGRESO**	**EGRESO**	**SS**	**MUNICIPIO DONDE EJECUTA SU LABOR**
13	FRANCISCO SANDOVAL	AYUDANTE DE OBRA	1090462244	ACTIVO		SUBCONTRATISTA CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS
14	RAMON GELVEZ	AYUDANTE DE OBRA	1092647522	ACTIVO		SUBCONTRATISTA CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS
15	EUGENIO MARTINEZ MACHADO	AYUDANDE DE OBRA	7618618	ACTIVO		SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
16	EDWIN ENRIQUE HOYOS	AYUDANDE DE OBRA	1096183008	ACTIVO		SUBCONTRATISTA CONSTUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS
17	FRANKI BRAVO DIAZ	AYUDANDE DE OBRA	1068577126	ACTIVO		SUBCONTRATISTA CONTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS
19	CRISTIAN ANDRES BRAVO	AYUDANDE DE OBRA	1003066670	ACTIVO		SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
21	CARLOS ANDRES BAUTISTA	AYUDANDE DE OBRA	1093414104	17/06/2024		SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS

ARBOLEDAS Y PATIOS							
N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESO	EGRESO	SS	MUNICIPIO DONDE EJECUTA SU LABOR
23	EDWIN SANTIAGO VEGA	AYUDANDE DE OBRA	1092644912	ACTIVO		SUBCONTRATISTA EDUAR CARRILLO	ARBOLEDAS
25	JOSE FERNANDO CONTRERAS	AYUDANDE DE OBRA	1007444989	ACTIVO		SUBCONTRATISTA EDUAR CARRILLO	ARBOLEDAS
26	JOSE GREGORIO MOYA	AYUDANDE DE OBRA	7175554	ACTIVO		SUBCONTRATISTA EDUAR CARRILLO	ARBOLEDAS
27	JUAN CARLOS VEGA	AYUDANDE DE OBRA	88168922	ACTIVO		SUBCONTRATISTA EDUAR CARRILLO	ARBOLEDAS
29	EDUARD CARRILO	AYUDANDE DE OBRA	1092646081	ACTIVO		SUBCONTRATISTA EDUAR CARRILLO	ARBOLEDAS
31	AUGUSTO MEDINA	AYUDANDE DE OBRA	1653558	08/06/2024		SUBCONTRATISTA CARLOS CARRILLO	ARBOLEDAS
33	JAVIER COLMENARES	AYUDANDE DE OBRA	4535674	08/06/2024		SUBCONTRATISTA CARLOS CARRILLO	ARBOLEDAS
34	JHON DIAZ	AYUDANDE DE OBRA	1092644442	08/06/2024		SUBCONTRATISTA CARLOS CARRILLO	ARBOLEDAS

ARBOLEDAS Y PATIOS							
N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESO	EGRESO	SS	MUNICIPIO DONDE EJECUTA SU LABOR
35	MANUEL BUSTOS	AYUDANDE DE OBRA	13412179	08/06/2024		SUBCONTRATISTA CARLOS CARRILLO	ARBOLEDAS
36	ADRIAN ROJAS	AYUDANDE DE OBRA	1092644875	08/06/2024		SUBCONTRATISTA CARLOS CARRILLO	ARBOLEDAS
37	LUIS ALBERTO RUIZ	AYUDANDE DE OBRA	1092645020	08/07/2024		CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS
38	JESUS DIAZ GALVIS	AYUDANTE DE OBRA	1092644524	22/08/2024		SUBCONTRATISTA CARLOS CARRILLO	ARBOLEDAS
39	GERMAN ALIRIO GELVEZ ORTEGA	AYUDANTE DE OBRA	1094242516			SUBCONTRATISTA ERIKSON GARCIA	ARBOLEDAS
40	JOSE RICARDO LAGUADO LAGUADO	AYUDANTE DE OBRA	88179263			SUBCONTRATISTA ERIKSON GARCIA	ARBOLEDAS
41	HUGO RAMON PEÑALOZA	AYUDANTE DE OBRA	1004941337			SUBCONTRATISTA ERIKSON GARCIA	ARBOLEDAS

ARBOLEDAS Y PATIOS							
N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESO	EGRESO	SS	MUNICIPIO DONDE EJECUTA SU LABOR
42	ABEL ANTONIO CARVAJAL PABON	AYUDANTE DE OBRA	1004941319			SUBCONTRATISTA ERIKSON GARCIA	ARBOLEDAS
43	JOSE NICASIO VILLAMIZAR LAGUADO	AYUDANTE DE OBRA	13411728			SUBCONTRATISTA ERIKSON GARCIA	ARBOLEDAS
44	DIOMEDES BAUTISTA PADILLA	AYUDANTE DE OBRA	1092646678			SUBCONTRATISTA ERIKSON GARCIA	ARBOLEDAS
45	HEYSON CONTRERAS CRUZ	AYUDANTE DE OBRA	1004941117			SUBCONTRATISTA ERIKSON GARCIA	ARBOLEDAS
46	ERIKSON FABIAN GARCIA PARADA	MAESTRO DE OBRA	1093884815			SUBCONTRATISTA ERIKSON GARCIA	ARBOLEDAS
47	BISMARK MORA	AYUDANTE DE OBRA	1095799437	05/04/2024		SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
48	ERASMO MORA BELEÑO	AYUDANTE DE OBRA	73583603	05/04/2024		SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS

ARBOLEDAS Y PATIOS							
N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESO	EGRESO	SS	MUNICIPIO DONDE EJECUTA SU LABOR
49	JHON JAIRO BELEÑO	AYUDANTE DE OBRA	1085100485	05/04/2024		SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
50	JOSE ANTONIO MORA	AYUDANTE DE OBRA	1051747008	05/04/2024		SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
51	JOSE DE JESUS MORA	AYUDANTE DE OBRA	1002426166	05/04/2024		SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
52	JOSE DE LOS SANTOS MORA	AYUDANTE DE OBRA	1131359803	05/04/2024		SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
53	JOSE BELEÑOGUTIERRES	AYUDANTE DE OBRA	1049894465	05/04/2024		SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
54	LUIS FERNANDO ARENILLA	AYUDANTE DE OBRA	1131359342	05/04/2024		SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
74	LUIS FERNANDO GUTIERREZ	AYUDANTE DE OBRA	1002304255	05/04/2024		SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS

ARBOLEDAS Y PATIOS							
N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESO	EGRESO	SS	MUNICIPIO DONDE EJECUTA SU LABOR
75	RAFAEL MORA BELEÑO	AYUDANTE DE OBRA	73584569	05/04/2024		SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
76	SATURNINO MORA	AYUDANTE DE OBRA	73592013	05/04/2024		SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
77	JOSE DE LA HOS BELEÑO	AYUDANTE DE OBRA	1127055805	10/04/2024		SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
78	YULIS PAOLA BEÑEO	AYUDANTE DE OBRA	1065660929	10/04/2024		SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
79	JOSE DEL CARMEN VILLAMIZAR	AYUDANTE DE OBRA	13481520	18/04/2024		SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
80	YOMEL FERNANDEZ	AYUDANTE DE OBRA	6202934	18/04/2024		SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
81	YONATHAN HERNANDEZ	AYUDANTE DE OBRA	1127055805	10/04/2024		SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
82	ANGELICA	INSPECTOR DE OBRA	1093773719	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA2590	PATIOS

ARBOLEDAS Y PATIOS							
N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESO	EGRESO	SS	MUNICIPIO DONDE EJECUTA SU LABOR
	CAROLINA LOPEZ						
83	ANGIE STELLA DUARTE	AUX CONTABLE	1090508619	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA 2590	PATIOS
84	DANIEL STEVEN CARDENAS	AYUDANTE DE OBRA	1005036929	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA 2590	PATIOS
86	JORGE ELIECER GOMEZ	AYUDANTE DE OBRA	1115793688	ACTIVO		SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
87	JUAN CARLOS GALINDO	AYUDANTE DE OBRA	1116791522	ACTIVO		SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
88	JHOAN SEBASTIAN OSPINO	AYUDANTE DE OBRA	1098699992	ACTIVO		SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
89	EDER VANEGAS ARENILLA	AYUDANTE DE OBRA	1051743874	10/08/2024		SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
90	CRISTIAN DANIEL FULEDAS	AYUDANTE DE OBRA	1007883115	10/08/2024		SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS

Tabla 107 Reporte afiliaciones a seguridad social Gobernación 1943

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-6 - Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra.

Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

A la fecha el Contratista ha prestado cuatro actas de recibo parcial de obra.

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA						
ACTA No.	**TIPO DE ACTA**	**MES-AÑO**	**VALOR ACTA SIN IVA**	**VALOR IVA**	**VALOR TOTAL EJECUTADO**	**VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO**
1	PARCIAL	abr-24	$ 2.057.114.694,00	$ 30.400.000,00	$ 2.087.514.694,00	$ 2.087.514.694,00
2	PARCIAL	may-24	$ 1.410.068.530,00		$ 1.410.068.530,00	$ 3.497.583.224,00
3	PARCIAL	jun-24	$ 2.160.465.319,00		$ 2.160.465.319,00	$ 5.658.048.543,00
4	PARCIAL	jul-24	$ 1.565.952.191,00		$ 1.565.952.191,00	$ 7.224.000.734,00
5	PARCIAL	ago-24	$ 3.061.424.966,00		$ 3.061.424.966,00	$ 10.285.425.700,00
6	PARCIAL	oct-24	$ 3.030.122.314,00		$ 3.030.122.314,00	$ 13.315.548.014,00
7	PARCIAL	nov-24	$ 2.711.691.954,77	$15.168.067,23	$ 2.726.860.022,00	$ 16.042.408.036,00
8	PARCIAL	dic-24	$ 3.066.810.473,77	$15.168.067,23	$ 3.081.978.541,00	$ 19.124.386.577,00
9	PARCIAL	feb-25	$ 2.371.546.752,90	$5.415.724,10	$ 2.376.962.477,00	$ 21.501.349.054,00
TOTAL			$ 21.435.197.195,44	$ 66.151.858,56	$ 21.501.349.054,00	$ 21.501.349.054,00

Tabla 108 Estado Financiero y Presupuestal Gobernación 1943

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-8 - Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra.

Reporte del Estado General del Tiempo

Durante el periodo del presente informe se presentaron periodos de tiempo seco y algunos periodos de lluvia moderada.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-10 - Estado General del Tiempo.

Resumen Ensayos de Laboratorio

Para el presente informe no se adjuntan ensayos de laboratorio a la espera de la entrega por parte del contratista y el laboratorio de la Interventoría.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-11 - Ensayos de Laboratorio.

Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de obra con la compañía aseguradora SEGUROS DEL ESTADO SA No. Póliza 21-44-101403451 y 21-40-101203708.

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 1.689.802.732,60	10/04/2023	12/04/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 1.689.802.732,60	10/04/2023	12/12/2026
Calidad del servicio	$ 1.689.802.732,60	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 844,901,366.30	10/04/2023	12/12/2023
Prorroga 01			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 1.689.802.732,60	10/04/2023	12/10/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 1.689.802.732,60	10/04/2023	12/06/2027
Calidad del servicio	$ 1.689.802.732,60	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 844,901,366.30	10/04/2023	12/06/2024
Prorroga 01 Modificación 01			
Valor Asegurado	**Valor Asegurado**	**Valor Asegurado**	**Valor Asegurado**
Cumplimiento	$ 1.689.802.732,60	10/04/2023	11/12/2024

Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 1.689.802.732,60	10/04/2023	11/08/2027
Calidad del servicio	$ 1.689.802.732,60	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 844,901,366.30	10/04/2023	12/08/2024
Prorroga 02			
Valor Asegurado	**Valor Asegurado**	**Valor Asegurado**	**Valor Asegurado**
Cumplimiento	$ 2.446.302.732,60	10/04/2023	30/04/2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 4.892.605.465,20	10/04/2023	31/12/2027
Calidad del servicio	$ 7.338.908.197,80	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 1.223.151.366,3	10/04/2023	28/02/2025
Prorroga 03			
Valor Asegurado	**Valor Asegurado**	**Valor Asegurado**	**Valor Asegurado**
Cumplimiento	$ 2.446.302.732,60	10/04/2023	28/06/2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 4.892.605.465,20	10/04/2023	28/02/2028
Calidad del servicio	$ 7.338.908.197,80	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 1.223.151.366,30	10/04/2023	28/02/2025

Tabla 109 Garantías Gobernación 1943

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-12 - Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra.

Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

El Plan de Calidad se encuentra aprobado con comunicado GIC-INVIAS-NTS-1423-22 del 24 de noviembre de 2023.

Se anexa MEPI-MN-1IN-15-FR-14 - Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra.

Seguimiento Programa de Inversiones

Programación de obra aprobada con el comunicado GIC-INVIAS-NTS-566-22 del 23 mayo de 2023.

Se anexa MEPI-MN-IN-6-FR-1 y MEPI-MN-IN-6-FR-2.

Actas de Comité y/o Reunión de Obra

Durante el periodo no se realizaron actas de comité y reunion.

Acta de Reunión	Fecha
N/A	N/A

Tabla 110 Actas de Comité u/o Reunión Gobernación 1943

4.8. PROYECTO GOBERNACIÓN 2052

Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de obra con la compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL No. Póliza CCT-100004561 y CCT-100001101.

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 515.902.873,20	28/12/2022	28/12/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 515.902.873,20	28/12/2022	28/06/2026
Calidad del servicio	$ 515.902.873,20	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 400.000.000,00	28/12/2022	28/06/2023
Adicional No. 01			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 515.902.873,20	10/11/2023	30/06/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 515.902.873,20	10/11/2023	31/12/2026
Calidad del servicio	$ 515.902.873,20	5 años a partir del acta de recibo	

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 400.000.000,00	11/05/2023	31/12/2023

Tabla 111 Garantías Gobernación 2052

4.9. PROYECTO OCAÑA 1814

El día 02 de mayo de 2023, se suscribe el acta de inicio del contrato de obra No. CO1.PCCNTR.4352407, cuyo objeto es MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER. El contrato finalizo el 24 de agosto de 2024 y liquido el día 24 de diciembre de 2024.

Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de obra con la compañía aseguradora SEGUROS DEL ESTADO SA No. Póliza 21-44-101403960 y 21-40-101204283.

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 249.998.913,90	29/12/2022	28/08/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 124.999.456,95	29/12/2022	28/04/2026
Calidad del servicio	$ 249.998.913,90	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 232.000.000,00	29/12/2022	29/04/2023

Tabla 112 Garantías Municipio de Ocaña 1814

4.10. PROYECTO FARO DEL CATATUMBO, GOBERNACIÓN 2033

Conforme al contrato interadministrativo No. 4164 – 2022, celebrado entre la gobernación de Norte de Santander y la Empresa Industrial y Comercial del Estado FARO del Catatumbo S.A.S., se da acta de inicio a los siguientes contratos:

NOMBRE	CONTRATO	ACTA INICIO

MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA CHINAVEGA, MUNICIPIO DE CACOTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-065-2023	7/11/2023
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LAS DELICIAS-EL MAMON, MUNICIPIO DEL ZULIA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-055-2023	7/11/2023
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA LA UNIÓN, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-070-2023	7/11/2023
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SAN ANTONIO-LA QUINTA-ALTOS DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-074-2023	7/11/2023
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA LOS RINCÓN-LA COPITA, MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-072-2023	7/11/2023
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-062-2023	7/11/2023
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADAS-TABIRO-PUENTE ZULIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-079-2023	7/11/2023
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LOS MANGOS-LA CARRERA, MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-067-2023	21/02/2024
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO DE LOURDES, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-060-2023	22/01/2024
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES PUENTE ISABEL CELIS-DAVE, MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-056-2023	08/04/2024
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES PASO DE LOS RÍOS-RICAURTE, MUNICIPIO DE CÚCUTA, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-077-2023	08/04/2024
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA PARAMO – PICA PICA, MUNICIPIO DE PAMPLONITA, NORTE DE SANTANDER	CD-FC-064-2023	22/04/2024
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRÁN, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-082-2023	14/05/2024

MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES MINAS DE CAL – LA ARAÑITA – LA MESA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-081-2023	17/05/2024
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA – CUPERENA – CACAHUALA – ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-058-2023	14/06/2024
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA GARZA – ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER	CD-FC-071-2023	05/08/2024
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SAN JUAN – AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER	CD-FC-049-2024	18/10/2024

4.10.1. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se relacionan las garantías para los contratos de obra.

CD-FC-055-2023 - MUNICIPIO DEL ZULIA			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 205.483.890,30	7/11/2023	07/06/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 205.483.890,30	7/11/2023	07/06/2024
Calidad del servicio	$ 205.483.890,30	5 AÑOS	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 232.000.000,00	1/08/2023	07/02/2024
CD-FC-062-2023 - MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 130.494.405,32	07/11/2023	07/02/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 130.494.405,32	07/11/2023	07/02/2024
Calidad del servicio	$ 130.494.405,32	5 AÑOS	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 232.000.000,00	03/08/2023	07/02/2024
CD-FC-065-2023 - MUNICIPIO DE CACOTA			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 169.427.975,97	7/11/2023	07/06/2024

Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 169.427.975,97	7/11/2023	07/06/2024
Calidad del servicio	$ 169.427.975,97	5 AÑOS	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 232.000.000,00	1/08/2023	07/02/2024
CD-FC-070-2023 - , MUNICIPIO DE PAMPLONA			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 136.080.831,39	7/11/2023	07/06/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 136.080.831,39	7/11/2023	07/02/2024
Calidad del servicio	$ 136.080.831,39	5 AÑOS	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 232.000.000,00	03/11/2023	03/02/2024
CD-FC-072-2023 - MUNICIPIO DE SILOS			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 222.054.884,72	07/11/2023	07/06/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 222.054.884,72	07/11/2023	07/06/2024
Calidad del servicio	$ 222.054.884,72	5 AÑOS	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 232.000.000,00	07/11/2023	27/02/2024
CD-FC-074-2023 - MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 197.190.841,58	16/08/2023	16/03/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 197.190.841,58	16/08/2023	16/11/2026
Calidad del servicio	$ 197.190.841,58	5 AÑOS	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 232.000.000,00	17/08/2023	17/11/2023
CD-FC-079-2023 - MUNICIPIO DE SAN CAYETANO			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 186.076.189,46	07/11/2023	07/06/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 186.076.189,46	07/11/2023	07/02/2027
Calidad del servicio	$ 186.076.189,46	5 AÑOS	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 232.000.000,00	07/11/2023	07/02/2024

Tabla 113 Garantías Gobernación 2033

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	1053 de 2022
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 2.
Contratista:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Representante legal	LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR
Fecha de Inicio:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
Prorroga:	HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2025
Plazo acumulado:	VEINTISIETE (27) MESES
Valor Inicial:	$ 4.288.164.910,00 M/CTE
Adición No. 1	$ 268.536.435,20 M/CTE
Adición No. 2	$ 500.000.000,00 M/CTE
Adición No. 3	$ 99.924.300
Valor Total:	$ 5.156.625.645,20 M/CTE
Nueva de terminación:	02 DE ABRIL DE 2025

Tabla 114 Información Contrato de Interventoría 1053 de 2022.

5.2. Descripción de las actividades realizadas por el Interventor

A continuación, se muestra un resumen detallado de las actividades realizadas por el interventor por cada municipio, correspondiente a este periodo.

5.2.1 Municipio De Santiago - Contrato No. LP-OP-01-2022.

En este periodo el interventor ha sido insistente por todos los medios con el contratista de obra, exigiéndole respetuosamente el cumplimiento de la entrega de los documentos

necesarios para la liquidación del convenio, a continuación, se hace un resumen detallado de la correspondencia enviada por el interventor a la entidad durante el presente periodo:

CONSECUTIVO	FECHA	OBSERVACIÓN
GIC-INVIAS-NTS-0110-25	19-feb-25	SOLICITUD ENTREGA DOCUMENTOS FINALIZACIÓN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1821 de 2021, SUSCRITO ENTRE INVIAS Y MUNICIPIO DE SANTIAGO

Tabla 115 Trazabilidad oficios enviados del municipio de Santiago

Durante la ejecución física del proyecto la interventoría realizó actividades de seguimiento y control de las obras técnicas en campo.

5.2.2. Municipio De Herrán - Contrato No. 146 de 2022

En este periodo el interventor ha sido insistente por todos los medios con el contratista de obra, exigiéndole respetuosamente el cumplimiento de la entrega de los documentos necesarios para la liquidación del convenio, a continuación, se hace un resumen detallado de la correspondencia enviada por el interventor a la entidad durante el presente periodo:

CONSECUTIVO	FECHA	OBSERVACIÓN
GIC-INVIAS-NTS-0116-25	20-feb-25	SOLICITUD ENTREGA DOCUMENTOS FINALIZACIÓN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1861 de 2021, SUSCRITO ENTRE INVIAS Y EL MUNICIPIO DE HERRÁN.

Tabla 116 Trazabilidad oficios enviados del municipio de Herrán

Durante la ejecución física del proyecto la interventoría ha realizado actividades de seguimiento y control de las obras técnicas en campo.

5.2.3. Municipio De Ocaña - Contrato No. CO1.PCCNTR.3879052

En este periodo el interventor ha sido insistente por todos los medios con el contratista de obra, exigiéndole respetuosamente el cumplimiento de la entrega de los documentos necesarios para la liquidación del convenio, a continuación, se hace un resumen detallado de la correspondencia enviada por el interventor a la entidad durante el presente periodo:

CONSECUTIVO	FECHA	OBSERVACIÓN
GIC-INVIAS-NTS-0106-25	19-feb-25	SOLICITUD ENTREGA DOCUMENTOS FINALIZACIÓN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1758 de 2021, SUSCRITO ENTRE INVIAS Y MUNICIPIO DE OCAÑA.

Tabla 117 Trazabilidad oficios enviados del municipio de Ocaña - 1758

Durante la ejecución física del proyecto la interventoría ha realizado actividades de seguimiento y control de las obras técnicas en campo.

5.2.5. Municipio De Cáchira - Contrato No. 160 de 2022

En este periodo el interventor ha sido insistente por todos los medios con el contratista de obra, exigiéndole respetuosamente el cumplimiento de la entrega de los documentos necesarios para la ejecución de las obras, a continuación, se hace un resumen detallado de la correspondencia enviada por el interventor al contratista de obra durante el presente periodo:

CONSECUTIVO	FECHA	OBSERVACIÓN
N/A	N/A	N/A

Tabla 118 Trazabilidad oficios enviados del municipio de Cáchira

Durante la ejecución física del proyecto la interventoría ha realizado actividades de seguimiento y control de las obras técnicas en campo.

5.2.5. Municipio De Abrego - Contrato No. 252 de 2022

En este periodo el interventor ha sido insistente por todos los medios con el contratista de obra, exigiéndole respetuosamente el cumplimiento de la entrega de los documentos necesarios para la ejecución de las obras, a continuación, se hace un resumen detallado de la correspondencia enviada por el interventor al contratista de obra durante el presente periodo:

CONSECUTIVO	FECHA	OBSERVACIÓN
N/A	N/A	N/A

Tabla 119 Trazabilidad oficios enviados al contratista del municipio de Abrego

Durante la ejecución física del proyecto la interventoría ha realizado actividades de seguimiento y control de las obras técnicas en campo.

5.2.6. Municipio De La Playa - Contrato No. MP-LP-004-2022

En este periodo el interventor ha sido insistente por todos los medios con el contratista de obra, exigiéndole respetuosamente el cumplimiento de la entrega de los documentos necesarios para la liquidación del convenio, a continuación, se hace un resumen detallado de la correspondencia enviada por el interventor a la entidad durante el presente periodo:

CONSECUTIVO	FECHA	OBSERVACIÓN
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

Tabla 120 Trazabilidad oficios enviados del municipio de La Playa

Durante la ejecución física del proyecto la interventoría ha realizado actividades de seguimiento y control de las obras técnicas en campo.

5.2.7. Municipio De Pamplonita - Contrato No. 202 de 2022

En este periodo el interventor ha sido insistente por todos los medios con el contratista de obra, exigiéndole respetuosamente el cumplimiento de la entrega de los documentos necesarios para la liquidación del convenio, a continuación, se hace un resumen detallado de la correspondencia enviada por el interventor a la entidad durante el presente periodo:

CONSECUTIVO	FECHA	OBSERVACIÓN
N/A	N/A	N/A

Tabla 121 Trazabilidad oficios enviados del municipio de Pamplonita

Durante la ejecución física del proyecto la interventoría ha realizado actividades de seguimiento y control de las obras técnicas en campo.

5.2.8. Gobernación 1943 - Contrato No. 02590 DE 2022

En este periodo el interventor ha sido insistente por todos los medios con el contratista de obra, exigiéndole respetuosamente el cumplimiento de la entrega de los documentos necesarios para el inicio de las obras a ejecutar, a continuación, se hace un resumen de las Actividades desarrolladas en el periodo.

CONSECUTIVO	FECHA	OBSERVACIÓN
GIC-INVIAS-NTS-0137-25	6-marzo-25	SOLICITUD REMISIÓN SOPORTES DE PAGOS REALIZADOS A MAESTROS DE OBRA, TRABAJADORES Y PROVEEDORES EN LOS MUNICIPIOS DE LOS PATIOS, ARBOLEDAS Y GRAMALOTE.
GIC-INVIAS-NTS-0138-25	7-marzo-25	RESPUESTA SOLICITUD INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL CONTRATO 02590-2022 - SOLICITUD DE INICIO PROCESO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL, DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO EN PAGO DE OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL CONTRATISTA POR CONCEPTO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSIONES, RIESGOS Y APORTES PARAFISCALES DE CONTRATO A LA FECHA
GIC-INVIAS-NTS-0139-25	10-marzo-25	RESPUESTA COMUNICADO 029, SUSPENSIÓN DE CONTRATO 2590 DE 2022
GIC-INVIAS-NTS-0146-25	12-marzo-25	ALERTA POR TAPONAMIENTO DESCOLE DE AGUAS LLUVIAS K0+630 TRAMO No. 1 – VEREDA COROZAL MUNICIPIO DE LOS PATIOS.
GIC-INVIAS-NTS-0147-25	15-marzo-25	REITERACIÓN OFICIO GIC-INVIAS-NTS-137-25, SOLICITUD REMISIÓN SOPORTES DE PAGOS REALIZADOS A MAESTROS DE OBRA, TRABAJADORES Y PROVEEDORES EN LOS MUNICIPIOS DE LOS PATIOS, ARBOLEDAS Y GRAMALOTE.
GIC-INVIAS-NTS-0148-25	17-marzo-25	RESPUESTA OFICIO UTET-02590-478 CON ASUNTO: RESPUESTA COMUNICACIÓN GIC-INVIAS-NTS-0089-25 Y OFICIO 4000, SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO ECONOMICO DEL CONTRATO POR AJUSTE DE PRECIOS DEBIDO A CAMBIOS DE VIGENCIA 2023 2024 Y 2024 A 2025 – OBSERVACIONES
GIC-INVIAS-NTS-0153-25	25-marzo-25	SOLICITUD REINICIO DE ACTIVIDADES CONTRATO DE OBRA.

Tabla 122 Trazabilidad oficios enviados al contratista Gobernación 1943

5.2.8.1. Actividades técnicas

En el periodo del presente informe, la interventoría realizó las siguientes actividades técnicas:

- ✓ **REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS** El contratista continua realizado entrega y/o subsanaciones de los 6 componentes de diseño a revisar Topografía (Veredas Santo Domingo, Volcán, Potreros, Chicagua, Rinconada, Cinera, Juan bueno, Helechar, Boyacá, San Isidro, Santa Anita, Corozal – California) Diseño Geométrico (Veredas Santo Domingo, Volcán, Potreros, Chicagua, Rinconada, Cinera, Helechar, Boyacá, San Isidro, Santa Anita, Corozal – California , Estudio de suelos y pavimentos (Veredas Santo Domingo, Volcán, Potreros, Chicagua, Rinconada, Cinera, Juan bueno, Helechar, Boyacá, San Isidro, Santa Anita, Corozal –

California), Diseño estructural (Vereda Rinconada), Informe hidráulico (Santo Domingo, Chicagua, Rinconada, Corozal - California), a la fecha continúa avalando las aprobaciones a los mismos una vez revisado por parte de los especialistas.

- ✓ Asistencia a los comités técnicos de seguimiento semanales, con la supervisión, Municipio, contratista, y la interventoría.
- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos semanales
- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos mensuales.
- ✓ Elaboración de las actas de comités.
- ✓ Seguimiento de las actividades de campo.
- ✓ Chequeos diarios de cantidades ejecutadas.
- ✓ Control de personal en obra.
- ✓ Diligenciamiento Bitácora.
- ✓ Toma de ensayos de Laboratorio.

Durante la ejecución física del proyecto la interventoría ha realizado actividades de seguimiento y control de las obras técnicas en campo, durante este periodo la Interventoría ha dispuesto de un Inspector de Obra para el municipio de Arboledas y Los Patios con dedicación del 100% quien realiza el seguimiento de acuerdo a las especificaciones técnicas del INVIAS.

5.2.9. Gobernación 2052 - Contrato No. 02332 del 2022

En este periodo el interventor ha sido insistente por todos los medios con el contratista de obra, exigiéndole respetuosamente el cumplimiento de la entrega de los documentos necesarios para la liquidación del convenio, a continuación, se hace un resumen detallado de la correspondencia enviada por el interventor a la entidad durante el presente periodo:

CONSECUTIVO	FECHA	OBSERVACIÓN
N/A	N/A	N/A

Tabla 123 Trazabilidad oficios enviados a la Gobernación 2052

Durante la ejecución física del proyecto la interventoría ha realizado actividades de seguimiento y control de las obras técnicas en campo.

5.2.10. Ocaña 1814 - Contrato No. CO1.PCCNTR.4352407

En este periodo el interventor ha sido insistente por todos los medios con el contratista de obra, exigiéndole respetuosamente el cumplimiento de la entrega de los documentos necesarios para la liquidación del convenio, a continuación, se hace un resumen detallado de la correspondencia enviada por el interventor a la entidad durante el presente periodo:

CONSECUTIVO	FECHA	OBSERVACIÓN
N/A	N/A	N/A

Tabla 124 Trazabilidad oficios enviados al municipio de Ocaña - 1814

Durante la ejecución física del proyecto la interventoría ha realizado actividades de seguimiento y control de las obras técnicas en campo

5.2.11. Gobernación 2033 - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164 DE 2022

En este periodo el interventor ha sido insistente por todos los medios con el contratista de obra, exigiéndole respetuosamente el cumplimiento de la entrega de los documentos necesarios para el inicio de las obras a ejecutar, a continuación, se hace un resumen de las Actividades desarrolladas en el periodo.

No.	FECHA	ASUNTO	DIRIGIDO A
GIC-INVIAS-NTS-0140-25	10-marzo-25	CERTIFICACIÓN DE NO PASIVOS AMBIENTALES CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-056-2023 “MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES PUENTE ISABEL CELIS - DAVE, MUNICIPIO PUERTO SANTANDER, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.	Doctor Jairo Fernando Arguello Urrego Subdirección de sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GIC-INVIAS-NTS-0141-25	09-marzo-25	ENTREGA FORMATOS E INFORMES TRIMESTRAL 1ER, 2DO, 3ER, 4TO, 5TO, Y 6TO, BALANCES DE ESTADO SOCIAL CON ANEXOS - APROBACIÓN.	Doctor **HUGO PEREZ ALVAREZ** Representante Legal Constructora Maticces P&B LTDA Contratista Norte de Santander
GIC-INVIAS-NTS-0142-25	10-marzo-25	APROBACIÓN FORMATOS E INFORME TRIMESTRAL Y BALANCE DE ESTADO SOCIAL CON ANEXOS C.O NO. 160-2022 OBJETO: "MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.	Doctor **Jairo Fernando Arguello Urrego** Subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
GIC-INVIAS-NTS-0143-25	10-marzo-25	CERTIFICACIÓN DE NO PASIVOS AMBIENTALES CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-055-2023 "MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LAS DELICIAS - EL MAMÓN, MUNICIPIO EL ZULIA, SANTANDER, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.	Doctor **Jairo Fernando Arguello Urrego** Subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
GIC-INVIAS-NTS-0144-25	10-marzo-25	INFORME MENSUAL DE DICIEMBRE DEL COMPONENTE AMBIENTAL - APROBACIÓN	Señor **SERGIO ANDRÉS ARIAS ANZOLA** Representante Legal CONSORCIO AD VÍAS Contratista Abrego – Norte de Santander
GIC-INVIAS-NTS-0145-25	11-marzo-25	CERTIFICACIÓN DE NO PASIVOS AMBIENTALES CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-062-2023 "MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LA PARADA – JUAN FRÍO, MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.	Doctor **Jairo Fernando Arguello Urrego** Subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Tabla 125 Trazabilidad oficios enviados de la Gobernación 2033

Durante la ejecución física del proyecto la interventoría ha realizado actividades de seguimiento y control de las obras técnicas en campo

5.2.9. Instituto Nacional De Vías - INVIAS

A continuación, se muestra un resumen detallado de la correspondencia enviada por el interventor, al Instituto Nacional De Vías - INVIAS.

No.	FECHA	ASUNTO	DIRIGIDO A
GIC-INVIAS-NTS-0152-25	25-marzo-25	SOLICITUD ACTIVACIÓN PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.	Ingeniero **JUAN GABRIEL CORREDOR HERRERA** Gestor Proyectos INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

Tabla 126 Trazabilidad oficios enviados al INVIAS

5.2.10. Actividades administrativas

Durante el periodo del presente informe las actividades administrativas realizadas por la Interventoría fueron:

- ✓ Presencia permanente del Personal de la interventoría (director, Residentes), realizando labores administrativas y técnicas, atendiendo las solicitudes del contratista, entidad contratante y Municipio.
- ✓ Seguimiento y control de la correspondencia enviada y recibida por el contratista de obra.
- ✓ Elaboración de informes semanales y presentados al INVIAS.
- ✓ Coordinación de reuniones y mesas de trabajo con el Contratista, Especialista e INVIAS.
- ✓ Elaboración de Informes semanales, mensuales y Actas de costos.

5.2.11. Actividades técnicas

En el periodo del presente informe, la Interventoría realizó las siguientes actividades técnicas:

- ✓ La Interventoría ha realizado revisión a Estudios y Diseños de los Municipios de Gobernación 1943.
- ✓ La Interventoría ha realizado seguimiento a las actividades realizadas en campo en los municipios del convenio de la Gobernación 1943.
- ✓ Asistencia a los comités técnicos de seguimiento semanales, con la supervisión, Municipio, contratista, y la interventoría.
- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos semanales
- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos mensuales
- ✓ Elaboración de las actas de comités.
- ✓ Supervisión a las actividades de obra de los municipios del convenio de la Gobernación 1943 en la construcción de Placa Huella y Alcantarillas.
- ✓ Cuantificación de cantidades de las obras que se encuentran en ejecución a la fecha de corte del presente informe.
- ✓ Reporte de bitácora para el contrato en ejecución.
- ✓ Seguimiento de calidad de los materiales a través de ensayos de laboratorio los cuales deben cumplir con las especificaciones del INVIAS.

5.2.12. Actividades financieras

El contrato de Interventoría a la fecha del presente informe, ha presentado al INVIAS las cuentas que se describen en la siguiente tabla.

CONTROL FINANCIERO							
Acta No.	PERIODO	VALOR FACTURA	RADICADO INVIAS	RADICADO INVIAS EN CUENTAS POR PAGAR	ESTADO	No. FACTURA	FECHA DE PAGO
1	Sep-22	$ -	-	-		-	
2	oct-22	$ 18.224.516,80	126144 DE 21-11-2022	135914 de 13/12/2022	PAGA	FE 402 del 06/12/2023	7/02/2023
3	nov-22	$ 21.768.789,00	133999 del 7/12/2022	138491 de 16/12/2022	PAGA	FE 407 del 13/12/2022	14/02/2023
4	dic-22	$ -	-	30405 de 28/03/2023		-	
5	ene-23	$ 133.892.136,00	25494 del 15/03/2023	30405 de 28/03/2023	PAGA	FE 472 del 23/03/2023	24/04/2023
6	feb-23	$ 143.926.977,60	31127 del 29/03/2023	51262 de 24/05/2023	PAGA	FE 514 (nota crédito)- 24/05/2023 FE 516 (RADICADA)- 26/05/2023	21/07/2023
7	mar-23	$ 188.412.604,80	V0 - 46080 del 10/05/2023 V1 - 59596 del 20/06/2023	80426 de 22/08/2023	PAGA	FE 556 del 18/08/2023	30/08/2023
8	abr-23	$ 143.904.748,40	V0 - 59624 del 20/06/2023 V1 - 65006 del 05/07/2023	80425 de 22/08/2023(Glosada) 82649 de 05/10/2023	PAGA	FE 557 del 18/08/2023	17/10/2023
9	may-23	$ 127.024.217,60	71779 del 24/07/2023	81576 de 13/09/2023	PAGA	FE 571 del 12/09/2023	20/09/2023
10	jun-23	$ 152.688.662,00	V0 - 23/08/2023 V1 - 06/09/2023 V2 - 03/10/2023	82864 el 10/10/2023	PAGA	FE 594 del 09/10/2023	13/10/2023
11	jul-23	$ 163.215.045,00	2023E-VUVRAZ-009683 - 15/09/2023 V1 - 03/10/2023	83561 el 24/10/2023	PAGA	FE 599 del 24/10/2023	7/11/2023
12	ago-23	$ 165.630.388,00	2023E-VUVRAZ-014289 - 29/09/2023	83750 el 27/10/2023	PAGA	FE 603 del 27/10/2023	2/11/2023
13	Sep-23	$ 179.467.708,00	2023E-VUVRAZ-022099 - 25/10/2023 V1 - 2023E-VUVRAZ-025631 - 07/11/2023	84658 el 10/11/2023	PAGA	FE 618 del 10/11/2023	21/11/2023
14	oct-23	$ 198.631.706,00	2023E-VUVRAZ-028858 - 16/11/2023 V1 - 2023E-VUVRAZ-031862 - 27/11/2023	86428 el 04/12/2023	PAGA	FE 640 del 04/12/2023	20/12/2023
15	nov-23	$ 173.212.500,80	2023E-VUVRAZ-033952 - 1/12/2023	87087 el 07/12/2023	PAGA	FE 650 del 07/12/2023	20/12/2023
16	dic-23	$ 268.536.436,00	2023E-VUVRAZ-040497 - 21-12-2023	89506 el 21/12/2023	PAGA	FEM 666 del 21/12/2023	
17	ene-24	$ 271.165.700,41	2024E-VUVRAZ-025474 - 2024-03-20	3738 el 07/05/2024	PAGA	FEM 712 24/04/2024	

18	feb-24	$	261.502.976,00	2024E-VUVRAZ-026211 - 2024-03-21	3735 el 07/05/2024	PAGA	FEM 713 24/04/2024	
19	mar-24	$	230.895.621,60	2024E-VUVRAZ-034008 - 17-04-2024	4794 el 27/05/2024	PAGA	FEM 719 24/05/2024	
20	abr-24	$	239.569.064,38	2024E-VUVRAZ-045350 - 21-05-2024	5332 el 06/06/2024	PAGA	FEM 722 05/06/2024	
21	may-24	$	278.413.692,20	2024E-VUVRAZ-054894 18-06-2024	6645 el 27/06/2024	PAGA	FEM 738 26/06/2024	
22	jun-24	$	262.954.801,89	2024E-VUVRAZ-063264 11-07-2024	7888 el 25/07/2024	PAGA	FEM 749 24/07/2024	
23	jul-24	$	262.954.801,89	2024E-VUVRAZ-075481	10236 el 04/09/2024	PAGA	FEM 764 02/09/2024	
24	Ago-24	$	234.430.238,00	5 septiembre de 2024	13096 el 16/10/2024	FACTURA DEFINITIVA	FEM 775 16/09/2024	
25	Sep-24	$	226.761.640,00	2024E-VUVRAZ-098214 05-10-24	14397 el 05/11/2024	FACTURA DEFINITIVA	FEM 809 05/11/2024	
26	Oct-24	$	205.905.652,40	2024E-VUVRAZ-11088106/11/24	16969 el 02/12/2024	FACTURA DEFINITIVA	FEM 809 05/11/2024	
27	Nov-24	$	190.809.360,00	2024E-VUVRAZ-123154 04/12/24		FACTURA DEFINITIVA	FEM 809 05/12/2024	
28	Dic-24	$	157.984.400,00	2024E-VUVRAZ-12421705/12/24		FACTURA DEFINITIVA	FEM 843 13/12/2024	
29	Ene-25	$	76.019.580,00					
30	Feb-25	$	62.410.977,99					
31	Mar-25	$	11.555.772,65					
	TOTAL	$	5.035.228.538,72					

Tabla 127 Información Financiera Contrato de Interventoría 1053 de 2022.

5.2.13. Informes especialistas y profesionales

A la fecha del presente informe, se ha adelantado revisión a estudios y diseños, para este mes el contrato de obra no contaba con los recursos para la continuidad de sus especialistas.

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

6.1. Equipo y vehículos Contrato de Interventoría

La Interventoría a la fecha cuenta con los siguientes vehículos en el proyecto:

Vehículo	Placa	Oficio Aprobación Invias	Dedicación
Renault Duster Dynamique	ENM-086	DT-NSA 75845 -08-12-2022	100%
Motocicleta	HPS38F	DT-NSA 30822 -31-05-2023	100%

Tabla 128 Vehículos Contrato de Interventoría 1053 de 2022.

Se anexa al informe el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5.

6.2. Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría

La Interventoría cuenta con el siguiente personal en el Proyecto:

PERSONAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA ACTIVO EN EL MES DE MARZO DE 2025		
Profesional	**Especialidad**	**Dedicación**
Jairo Andrés Quintero Gómez	Director de Interventoría	17%
José Hildebrando Torres Suarez	Residente Interventoría	7%
Cristian Rivera Cáceres	Inspector	17%
Juan Alex Díaz	Profesional Ambiental	17%
Shirle Adriana Lizarazo Rincón	Inspectora SST	7%
Paola Pérez Jiménez	Secretaria	17%
Paola Andrea León Pacheco	Profesional Social	17%

Tabla 129 Personal Contrato de Interventoría 1053 de 2022.

Se anexa al informe el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7.

6.3. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría

A continuación, se hace un resumen del estado financiero y presupuestal del contrato de Interventoría.

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato
1	sep.-22	$ -	$ -	$ -	931422 - 2022/08/22	$ 40.000.000,00	$5.056.701.345,20
2	oct.-22	$ 15.314.720,00	$ 2.909.796,80	$ 18.224.516,80	931422 - 2022/08/22	$ 1.775.483,20	$5.038.476.828,40
3	nov.-22	$ 18.293.100,00	$ 3.475.689,00	$ 21.768.789,00	931422 - 2022/08/22	$ 6.694,20	$5.016.708.039,40

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato
4	dic.-22	$ -	$ -	$ -	931422 - 2022/08/22	$ 6.694,20	$5.016.708.039,40
5	ene.-23	$ 5.625,38	$ 1.068,82	$ 6.694,20	931422 - 2022/08/22	$ -	$5.016.701.345,20
5	ene.-23	$ 112.508.774,62	$ 21.376.667,18	$ 133.885.441,80	148423 - 2023/02/14	$ 1.636.114.558,20	$4.882.815.903,40
6	feb.-23	$ 120.947.040,00	$ 22.979.937,60	$ 143.926.977,60	148423 - 2023/02/14	$ 1.492.187.580,60	$4.738.888.925,80
7	mar.-23	$ 158.329.920,00	$ 30.082.684,80	$ 188.412.604,80	148423 - 2023/02/14	$ 1.303.774.975,80	$4.550.476.321,00
8	abr.-23	$ 120.928.360,00	$ 22.976.388,40	$ 143.904.748,40	148423 - 2023/02/14	$ 1.159.870.227,40	$4.406.571.572,60
9	may.-23	$ 106.743.040,00	$ 20.281.177,60	$ 127.024.217,60	148423 - 2023/02/14	$ 1.032.846.009,80	$4.279.547.355,00
10	jun.-23	$ 128.309.800,00	$ 24.378.862,00	$ 152.688.662,00	148423 - 2023/02/14	$ 880.157.347,80	$4.126.858.693,00
11	jul.-23	$ 137.155.500,00	$ 26.059.545,00	$ 163.215.045,00	148423 - 2023/02/14	$ 716.942.302,80	$3.963.643.648,00
12	ago.-23	$ 139.185.200,00	$ 26.445.188,00	$ 165.630.388,00	148423 - 2023/02/14	$ 551.311.914,80	$3.798.013.260,00
13	sep.-23	$ 150.813.200,00	$ 28.654.508,00	$ 179.467.708,00	148423 - 2023/02/14	$ 371.844.206,80	$3.618.545.552,00
14	oct.-23	$ 166.917.400,00	$ 31.714.306,00	$ 198.631.706,00	148423 - 2023/02/14	$ 173.212.500,80	$3.419.913.846,00
15	nov.-23	$ 145.556.723,36	$ 27.655.777,44	$ 173.212.500,80	148423 - 2023/02/14	$ -	$3.246.701.345,20
16	dic.-23	$ 225.660.869,92	$ 42.875.565,28	$ 268.536.435,20	1408823 - 2023/12/20	$ 268.536.435,20	$2.978.164.910,00
17	ene.-24	$ 227.870.336,48	$ 43.295.363,93	$ 271.165.700,41	218724 - 2024/03/15	$ 2.206.999.209,59	$2.706.999.209,59
18	feb.-24	$ 219.750.400,00	$ 41.752.576,00	$ 261.502.976,00	218724 - 2024/03/15	$ 1.945.496.233,59	$2.445.496.233,59
19	mar.-24	$ 194.029.934,12	$ 36.865.687,48	$ 230.895.621,60	218724 - 2024/03/15	$ 1.714.600.611,99	$2.214.600.611,99
20	abr.-24	$ 201.318.541,50	$ 38.250.522,88	$ 239.569.064,38	218724 - 2024/03/15	$ 1.475.031.547,61	$1.975.031.547,61
21	may.-24	$ 233.961.085,88	$ 44.452.606,32	$ 278.413.692,20	218724 - 2024/03/15	$ 1.196.617.855,41	$1.696.617.855,41
22	jun.-24	$ 220.970.421,76	$ 41.984.380,13	$ 262.954.801,89	218724 - 2024/03/15	$ 933.663.053,52	$1.433.663.053,52
23	jul.-24	$ 208.967.800,00	$ 39.703.882,00	$ 248.671.682,00	218724 - 2024/03/15	$ 684.991.371,52	$1.184.991.371,52
24	ago-24	$ 197.000.200,00	$ 37.430.038,00	$ 234.430.238,00	218724 - 2024/03/15	$ 452.920.189,52	$ 952.920.189,52
25	sep-24	$ 190.556.000,00	$ 36.205.640,00	$ 226.761.640,00	218724 - 2024/03/15	$ 226.158.549,52	$ 726.158.549,52
26	oct-24	$ 173.029.960,00	$ 32.875.692,40	$ 205.905.652,40	218724 - 2024/03/15	$ 20.252.897,12	$ 520.252.897,12
27	Nov-24	$17.019.241,27	$3.233.655,84	$ 20.252.897,12	218724 - 2024/03/15	$-	$500.000.000,00
27	nov-24	$143.324.758,73	$27.231.704,16	$ 170.556.462,88	510624 - 2024/06/05	$ 329.443.537,12	$329.443.537,12
28	Dic-24	$132.760.000,00	$25.224.400,00	$ 157.984.400,00	510624 - 2024/06/05	$ 171.459.137,12	$275.695.997,12
29	Ene-25	$63.882.000,00	$12.137.580,00	$ 76.019.580,00	510624 - 2024/06/05	$ 95.439.557,12	$199.676.417,12
30	Feb-25	$52.446.199,99	$9.964.778,00	$ 62.410.977,99	510624 - 2024/06/05	$ 33.028.579.13	$137.265.439,13
31	Mar-25	$1.845.039,00	$9.710.733,32	$ 11.555.772,65,00		$ 121.397.106,48	$125.709.666.48
TOTALES		**$4.105.245.553,02**	**$779.996.655,07**	**$4.885.242.208,08**			

Tabla 130 Seguimiento Financiero Interventoría

Se anexa al informe el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9.

6.4. Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de interventoría con la compañía aseguradora SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A. No. Póliza 140991.

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento	$ 428.816.491	24/06/2022	30/06/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 857.632.982	24/06/2022	30/06/2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 857.632.982	24/06/2022	31/12/2027
Calidad del servicio	$ 1.286.449.473	31/12/2024	31/12/2029
Amparo	**Valor Asegurado**	**VIGENCIA**	
		DESDE	**DESDE**
ADICIÓN No.1			
Cumplimiento	$ 505.670.134,52	24/06/2022	30/06/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 857.616.760,14	24/06/2022	30/06/2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 1.011.340.269,04	24/06/2022	31/12/2027
Calidad del servicio	$ 1.517.010.403,56	24/06/2022	31/12/2029
PRORROGA No.1			
Cumplimiento	$ 505.670.134,52	24/06/2022	28/08/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 857.616.760,14	24/06/2022	28/08/2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 1.011.340.269,04	24/06/2022	28/02/2028
Calidad del servicio	$ 1.517.010.403,56	28/02/2025	28/02/2030

Tabla 131 Garantías Contrato de Interventoría 1053 de 2022.

Se anexa al informe el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13.

6.5. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría

La Interventoría hace entrega para revisión y aprobación del INVIAS el Plan de Calidad mediante el comunicado GIC-INVIAS-NTS-282-22 del pasado 20 de febrero de 2023.

Se anexa al informe el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-15.

6.6. Bitácora de Obra

Durante el presente periodo se han adelantado trabajos de obra en los municipios del convenio de la Gobernación 1943.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Para el actual periodo, correspondiente al mes número 30 de ejecución, se informa que dentro del marco contractual se han ejecutado y finalizado 10 de los 11 convenios interadministrativos planificados. Estos convenios involucran a los municipios de Santiago, Herrán, Ocaña-1758, Cáchira, Abrego, La Playa de Belén, Pamplonita, Ocaña-1814, Gobernación 2052 y Gobernación 2033. Dejando solo en etapa de construcción al convenio GOBERNACIÓN 1943.

En el municipio de Ocaña 1758, se firmó el acta de inicio el 01 de noviembre de 2022, y el contrato concluyó el 31 de julio de 2023 con la exitosa construcción de 1 alcantarilla, 520 metros lineales de Placa Huella y el parcheo de 572.69 m2. Se llevaron a cabo actividades de Parcheo y Bacheo en el sector de Juan XXIII. El acta de liquidación se firmó el día 06 de septiembre de 2024.

En Herrán, donde se firmó el acta de inicio el 19 de octubre de 2022, el contrato concluyó el 31 de diciembre de 2023, termino con éxito la ejecución de 1200 metros lineales de placa huella y 4 alcantarillas. El acta de liquidación se firmó el día 15 de octubre de 2024.

En Pamplonita, se firmó el acta de inicio el 14 de abril, el contrato concluyo el 30 de mayo de 2024, se ejecutó en su 100%, terminando con éxito la ejecución de 1770 metros lineales de placa huella y 4 alcantarillas. El acta de liquidación se firmó el día 08 de noviembre de 2025.

En Santiago, se firmó el acta de inicio el 18 de octubre de 2022 y a la fecha del presente informe, se ejecutó su 100%, terminando con éxito la ejecución de 3309 metros lineales de placa huella y 15 alcantarillas. Se firmó acta de liquidación el 10 de diciembre de 2024.

En Cáchira, el acta de inicio se firmó el 16 de noviembre de 2022. Cuenta con todos los componentes aprobados. El contrato finalizó con un atraso del 52.21% debido al inicio tardío de actividades por parte del contratista y a las precipitaciones constantes en la zona del proyecto, adicional que al presentarse el presunto hurto cibernético no se contaba con la totalidad de los recursos para pagarle al contratista las actividades por parte de la Alcaldía de Cachira, se ejecutaron 542 metros lineales de placa huella y 8 alcantarillas. El presente contrato finalizo su tiempo contractual el día 30 de julio de 2024, y se firmó acta de liquidación el 27 de diciembre de 2024.

En La Playa de Belén, se firmó el acta de inicio el 06 de marzo de 2023 y a la fecha del presente informe, se ejecutó su 100%, terminando con éxito la ejecución de 1175 metros lineales de placa huella y 5 alcantarillas. Se firma acta de liquidación el 23 de diciembre de 2024.

En el contrato de la Gobernación 2052, firmado el 11 de mayo de 2023. A la fecha de este informe, el contrato termina su ejecución al 100% de su programación. Ejecutando 4004 metros lineales de Placa Huella, 22 alcantarillas terminadas y 33444.82 de mejoramiento periódico. El contratista de obra, inicia con el proceso de liquidación.

En Ocaña 1814, se firmó el acta de inicio el 02 de mayo de 2023 y a la fecha del presente informe, se ejecutó su 100%, terminando con éxito la ejecución de 1692 metros lineales de placa huella y 8 alcantarillas. Se firma acta de liquidación el 24 de diciembre de 2024.

En el contrato de la Gobernación 1943, firmado el 10 de abril de 2023, el contratista cuenta con la aprobación de la mayoría de los estudios y diseños. La terminación del contrato está proyectada para el 02 de abril de 2025. El contratista Durante el periodo no ejecuta actividades representativas para avance de palca huella, en los cuales al corte del presente informe se puede mencionar:

Municipio de Arboledas: 6568 metros lineales, 60451.44 m2 de mejoramiento periódico y 34 alcantarillas.

Municipio de Gramalote: 2900 metros lineales, 39276.66 m2 de mejoramiento periódico y 14 alcantarillas. Dando el 100% de ejecución de los tramos de placa huella.

Municipio de Los Patios: 3784,4 metros lineales, 15236.68 m2 de mejoramiento periódico y 9 alcantarillas.

En Abrego, se firmó el acta de inicio el 16 de enero de 2023 y a la fecha del presente informe se ha construido en el tramo de Santa Lucia – Canoas 1150 metros de placa huella y en el

tramo 2 906.82 metros de placa huella, 13 alcantarillas en total en el proyecto, se adelanta el proceso de liquidación del contrato.

En cuanto al contrato del convenio interadministrativo de la Gobernación 2033, se cuenta con la finalización de todos los contratos de obra.

Se cuentan liquidados con todos los contratos de obra de los municipios de: Gramalote, Santiago, Cúcuta, Lourdes, Pamplonita, Cáchira, Salazar de Las Palmas, Silos, Cacota, Pamplona, San Cayetano, Villa del Rosario, El Zulia, Villa Caro, Herrán, Mutiscua y Puerto Santander.

En Zulia, donde se firmó el acta de inicio el 07 de noviembre de 2023, A la fecha de este informe, finalizo las actividades de obra dando un 100% de ejecución, correspondiendo a 325 m de placa huella y la construcción de 2 alcantarillas y el mantenimiento de 17919.81 m2 de vía. Se firmo acta de liquidación el 12 de julio de 2024.

En Cacota, donde se firmó el acta de inicio el 07 de noviembre de 2023, A la fecha de este informe, finalizo las actividades de obra dando un 100% de ejecución, correspondiendo a 237 m de placa huella y el mantenimiento de 15204 m2 de vía. Se firmo acta de liquidación el 03 de septiembre de 2024.

En Salazar, donde se firmó el acta de inicio el 07 de noviembre de 2023, el contrato se prorroga 30 días, fijándose como fecha final el 16 de mayo del 2024, a fecha del presente informe, finalizo las actividades de obra dando un 100% de ejecución, correspondiendo a 296 m de placa huella, 3 alcantarillas y 15246.17 de mejoramiento periódico. Se firmo acta de liquidación el 31 de julio de 20240.

En Pamplona, donde se firmó el acta de inicio el 07 de noviembre de 2023, A la fecha de este informe, finalizo las actividades de obra dando un 100% de ejecución, correspondiendo a 279 m de placa huella y la construcción de 1 alcantarilla y el mantenimiento de 12213.14 m2 de vía. Se firmo acta de liquidación el 12 de septiembre de 2024.

En Villa del Rosario, donde se firmó el acta de inicio el 07 de noviembre de 2023, A la fecha de este informe, finalizo las actividades de obra dando un 100% de ejecución, correspondiendo a 157 m de placa huella y la construcción de 1 alcantarilla y el mantenimiento de 11468.63 m2 de vía. Se firmo acta de liquidación el 02 de septiembre de 2024.

En San Cayetano, donde se firmó el acta de inicio el 07 de noviembre de 2023, A la fecha de este informe, finalizo las actividades de obra dando un 100% de ejecución,

correspondiendo a 279 m de placa huella y mantenimiento de 16224.69 m2 de vía. Se firmo acta de liquidación el 12 de julio de 2024.

En Silos, donde se firmó el acta de inicio el 07 de noviembre de 2023, A la fecha de este informe, finalizo las actividades de obra dando un 100% de ejecución, correspondiendo a 375 m de placa huella, 3 alcantarillas y mantenimiento de 19948.8 m2. Se firmo acta de liquidación el 12 de septiembre de 2024.

En Lourdes, donde se firmó el acta de inicio el 22 de enero de 2024, a la fecha de este informe, finalizo las actividades de obra dando un 100% de ejecución, correspondiendo a 320 m de placa huella, 1 alcantarilla y mantenimiento de 14387.23 m2. Se firmo acta de liquidación el 03 de diciembre de 2024.

En Ricaurte, donde se firmó el acta de inicio el 08 de abril de 2024, a la fecha de este informe, finalizo las actividades de obra dando un 100% de ejecución, correspondiendo a 270 m de placa huella y mantenimiento de 12350.14 m2. Se firmo acta de liquidación el 09 de diciembre de 2024.

En Puerto Santander, donde se firmó el acta de inicio el 08 de abril de 2024, a la fecha de este informe, finalizo las actividades de obra dando un 100% de ejecución, correspondiente a 179.37 m de placa huella y mantenimiento de 13803.10 m2. Se firmo acta de liquidación el 13 de diciembre de 2024.

En Cáchira, donde se firmó el acta de inicio el 21 de febrero de 2024, a la fecha de este informe, finalizo las actividades de obra dando un 100% de ejecución, correspondiente a 385 m de placa huella, 1 alcantarilla y mantenimiento de 14387.23 m2. Se firmo acta de liquidación el 03 de diciembre de 2024.

En Pamplonita, donde se firmó el acta de inicio el 22 de abril de 2024, a la fecha de este informe, finalizo las actividades de obra dando un 100% de ejecución, correspondiente a 296 m de placa huella, 2 alcantarillas y mantenimiento de 16699.60 m2. Se firma acta de liquidación el 15 de octubre 2024

En Mutiscua, donde se firmó el acta de inicio el 17 de mayo de 2024, a la fecha de este informe, finalizo las actividades de obra dando un 100% de ejecución, correspondiente a 295 m de placa huella, 2 alcantarillas y 16201.11 m2 de mejoramiento periódico. Se firma acta de liquidación el 27 de diciembre 2024

En Herrán, donde se firmó el acta de inicio el 14 de mayo de 2024, a la fecha de este informe, finalizo las actividades de obra dando un 100% de ejecución, correspondiente a

280 m de placa huella, 2 alcantarillas y 13441.69 m2 de mejoramiento periódico. Se firma acta de liquidación el 27 de diciembre 2024

En Santiago, donde se firmó el acta de inicio el 14 de junio de 2024, a la fecha de este informe, finalizo las actividades de obra dando un 100% de ejecución, correspondiente a 390 m de placa huella, 3 alcantarillas y 16964.05 m2 de mejoramiento. Se firmo acta de liquidación el 29 de noviembre de 2024.

En Gramalote, donde se firmó el acta de inicio el 05 de agosto de 2024, a la fecha de este informe, finalizo las actividades de obra dando un 100% de ejecución, correspondiente a 360 m de placa huella, 4 alcantarillas y 15460.91 m2 de mejoramiento. Se firmo acta de liquidación el 06 de diciembre de 2024.

En Villa Caro, donde se firmó el acta de inicio el 18 de octubre de 2024, finalizó las actividades de obra dando un 100% de ejecución, correspondiendo a 267 m de placa huella y la construcción de 1 alcantarilla. Se firmo acta de liquidación el 26 de diciembre de 2024.

8. ANEXOS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. N.A **Contratista:** N.A

Contrato de Interventoría No. 1053 DE 2022 **Interventoría:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

Objeto Contrato de Obra:

INFORME MENSUAL No. **MES O PERIODO:** MARZO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	
1	**INTRODUCCIÓN**		
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		
2.1	Localización		
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		
2.4	Características técnicas del proyecto		
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		
3.1	Información general del contrato		
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
5.1	Información general del contrato		
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		
5.3	Informes especialistas y profesionales		
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		
5.5	Informe matriz de riesgos.		
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	
7	**Conclusiones y recomendaciones**		
8	**Anexos**		
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firmado digitalmente por VALERO ESCALANTE LEONEL

Firma:

Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Resolución de designación No. ____3036___ de fecha _____19/08/2022____

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 25 Y EL 31 DE MARZO DE 2025

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/03/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **PERIODO MES:** MARZO

CONTRATO DE OBRA No.: 02590 DE 2022

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 02590

PLAZO INICIAL: 8 MESES
FECHA DE INICIO: 10/04/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 20/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 25/03/2025
FECHA DE VENCIMIENTO: 2/04/2025
PLAZO ACUMULADO: 20 MESES Y 20 DIAS

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 16.898.027.326,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ 7.565.000.000,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 24.463.027.326,00
ANTICIPO CONCEDIDO:
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1053 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LEONEL VALERO ESCALANTE

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	14.537,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento	Conformacion	m2	150.715,56
	Mejoramiento	m2	145.885,47
	Remocion de derrumbes	m3	3.215,79
Otros (Especificar cuales)	Alcantarillas	Und	73
	Boxculvert	Und	7
	Gavion	m3	210

Se actualiza alcance fisico de acuerdo a Modificacion No5.

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	0	13726,20
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento	Conformacion	m2	0	15236,68
	mejoramiento	m2	0,00	116.094,69
	Remocion de derrumbes	m3	0,00	2.414,71
Otros (Especificar cuales)	Alcantarillas	Und	0,00	66,00
	Boxculvert	Und	0,00	6,00
	Gavion	m3	0	90

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 23.770.799.444,00		$ 23.770.799.444,00
OBRAS DE COMPLEMENTACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 171.872.843,00		$ 171.872.843,00
COMPLEMENTACION Y AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 386.852.974,00	$ 73.502.065,00	$ 460.355.039,00
PROVISION IMPLEMENTACION PROTOCOLO BIOSEGURIDAD	$ 60.000.000,00		$ 60.000.000,00
			$ -
			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 24.389.525.261,00	$ 73.502.065,00	**$ 24.463.027.326,00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ -		$ -	$ 21.034.174.109,78
OBRAS DE COMPLEMENTACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ -		$ -	$ 137.498.274,40
COMPLEMENTACION Y AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -	$ 414.400.000,98
PROVISION IMPLEMENTACION PROTOCOLO BIOSEGURIDAD				$ 22.200.000,00
VALOR EJECUTADO			$ -	**$ 21.608.272.385,16**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 24.463.027.326,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 21.608.272.385,16
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): **88,33%**

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 7
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 23
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 7
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **30**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/03/2025 (Día / Mes / Año)

REGISTRO FOTOGRÁFICO



VISTA GENERAL SECCION ALCANTARILLA



VISTA ACTIVIDADES EN ALCANTARILLA



VISTA ACABADO DE CONCRETO ELEMENTOS DE ALCANTARILLA



VISTA GENERAL DE OBRA SIN ACTIVIDADES - MUNICIPIO DE LOS PATIOS

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN

Firma
Nombre JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoria
Matricula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/03/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: MARZO **PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

CONTRATO No. 02590 DE 2022 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTORÍA:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Retroexcavadora sobre llantas	Caterpilar-2016	7855 kg	Patios, Gramalote y Arboledas																									I	I	I	I	I		I
Motoniveladora	Caterpilar-2015	13500 kg	Patios, Gramalote y Arboledas																									I	I	I	I	I		I
Bulldozer	Komatsu d61ex 2006	3,8 M3	Patios, Gramalote y Arboledas																									I	I	I	I	I		I
Bobcat	S570- 2018	947 kg	Patios, Gramalote y Arboledas																									I	I	I	I	I		I
Compactador min 7 Ton	Caterpilar-2015	7 TON	Patios, Gramalote y Arboledas																									I	I	I	I	I		I
Dumper AUSA	D600APG	6000 KG	Patios, Gramalote y Arboledas																									A	A	A	A	A		A
Volqueta 1	Internacional 2012	6 M3	Patios, Gramalote y Arboledas																									I	I	I	I	I		I
Volqueta 2		6 M3	Patios, Gramalote y Arboledas																									I	I	I	I	I		I
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																									8	8	8	8	8		8
			TOTAL ACTIVO																									1	1	1	1	1		1
			TOTAL EN REPARACIÓN																									0	0	0	0	0		0
			TOTAL INACTIVO																									7	7	7	7	7		7

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	48	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	6	13%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	42	88%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: WILLIAM QUINTERO PABON
Director de obra
Matrícula Profesional No.: 54202-230225 NTS

Firma Jose H. Torres Suarez.
Nombre: JOSE HILDEBRANDO TORRES SUAREZ
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-275992 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/03/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 02590 DE 2022 **CONTRATISTA:** UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL -TROJA 2590

MES INFORME MENSUAL: MARZO **PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.		INVIAS Y GOBERNACION	02590 DE 2022	$ 16.898.027.326	
2024	4624	MEJORAMIENTO VIAS TERCEARIAS		INVIAS Y GOBERNACION	ADICIONAL No2 TIEMPO Y VALOR	$ 7.565.000.000	
			TOTAL			$ 24.463.027.326	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 24.463.027.326,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	PARCIAL	abr-24	$ 2.057.114.694,00	$ 30.400.000,00	$ 2.087.514.694,00						$ 22.375.512.632,00				
2	PARCIAL	may-24	$ 1.410.068.530,00	$ -	$ 1.410.068.530,00						$ 20.965.444.102,00				
3	PARCIAL	jun-24	$ 2.160.465.319,00	$ -	$ 2.160.465.319,00						$ 18.804.978.783,00				
4	PARCIAL	jul-24	$ 1.565.952.191,00	$ -	$ 1.565.952.191,00						$ 17.239.026.592,00				
5	PARCIAL	sep-24	$ 3.061.424.966,00	$ -	$ 3.061.424.966,00						$ 14.177.601.626,00				
6	PARCIAL	oct-24	$ 3.030.122.314,00	$ -	$ 3.030.122.314,00						$ 11.147.479.312,00				
7	PARCIAL	nov-24	$ 2.711.691.954,77	$ 15.168.067,23	$ 2.726.860.022,00						$ 8.420.619.290,00				
8	PARCIAL	dic-24	$ 3.066.810.473,77	$ 15.168.067,23	$ 3.081.978.541,00						$ 5.338.640.749,00				
9	PARCIAL	feb-25	$ 2.371.546.752,90	$ 5.415.724,10	$ 2.376.962.477,00						$ 2.961.678.272,00				
TOTALES			**$21.435.197.195,44**	**$66.151.858,56**	**$ 21.501.349.053,00**					**$ -**	**$ 2.961.678.272,00**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 20.949.531.244,44		$ 20.949.531.244,44
OBRAS DE COMPLEMENTACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 137.498.274,40		$ 137.498.274,40
COMPLEMENTACION Y/O AJUSTES A DISEÑOS	$ 348.167.676,60	$ 66.151.858,56	$ 414.319.535,16
PROVISION IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD			
			$ -
VALOR TOTAL	$ 21.435.197.195,44	$ 66.151.858,56	**$ 21.501.349.053,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: William Quintero Patón
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-230225 NTS

Firma
Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/03/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 02590 de 2022 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MARZO **PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES (ARBOLEDAS)**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744
Lluvias moderadas																																0
Lluvias intensas																																0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES (GRAMALOTE)**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744
Lluvias moderadas																																0
Lluvias intensas																																0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES (LOS PATIOS)**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744
Lluvias moderadas																																0
Lluvias intensas																																0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.
Nota: El Registro pluviométrico del IDEAM anexo a este documento, es el correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto

OBSERVACIONES:
El contratista no ejecuta actividades durante el periodo

Firma
Nombre: WILLIAM QUINTERO PABON
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-230225 NTS

Firma
Nombre: JOSE HILDEBRANDO TORRES SUAREZ
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-275992 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 31/03/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No.: 02590 DE 2022 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2022

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MARZO **PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER , MUNICIPIOS DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

Teniendo en cuenta que el cotrato se reanudo el dia 25 de Marzo de 2025 para el presente periodo no tienen ensayos.

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma

Nombre: William Quintero Pabon
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-230225 NTS

Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 3 (Mes) 2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 02590 DE 2022 **CONTRATISTA:** UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

FECHA DE INICIO: 10/04/2023

PLAZO INICIAL: 8 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 2/04/2025
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 16.898.027.326,00

VALOR ACUMULADO: $ 16.898.027.326,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 204.519.914,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 204.519.914,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022, **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 1.689.802.732,00	10/4/2023	12/4/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 1.689.802.732,00	10/4/2023	12/12/2026
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 1.689.802.732,00	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101403451

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 12/04/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 844.901.366,00	10/4/2023	12/12/2023
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 21-40-101203708 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 12/04/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 1.689.802.732,00	10	4	2023	12	5	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 1.689.802.732,00	10	4	2023	12	1	2027
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 1.689.802.732,00	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101403451

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 844.901.366,00	10	4	2023	12	6	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 21-44-101403451 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 4
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 1.689.802.732,00	10	4	2023	12	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 1.689.802.732,00	10	4	2023	12	6	2027
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 1.689.802.732,00	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101403451

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 844.901.366,00	10	4	2023	12	6	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 21-44-101203708 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 4

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** 1 **SUSPENSION No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 1.689.802.732,00	10	4	2023	11	12	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 1.689.802.732,00	10	4	2023	11	8	2027
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 1.689.802.732,00	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101403451

Certificado de modificación o anexo No.: 7

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 844.901.366,00	10	4	2023	12	8	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 21-44-101403451 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No. 7

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 2 **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSION No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 2.446.302.732,60	10	4	2023	30	4	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 4.892.665.465,20	10	4	2023	31	12	2027
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 7.388.908.197,80	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101403451

Certificado de modificación o anexo No.: 13

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: 2 **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 1.223.151.366,30	10	4	2023	12	8	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 21-44-101403451 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No. 9

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 3 **PRÓRROGA No.:** 3 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSION No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 2.446.302.732,60	10	4	2023	28	6	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 4.892.665.465,20	10	4	2023	28	2	2028
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 7.338.908.197,80	12	12	2023	12	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101403451

Certificado de modificación o anexo No.: 14

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: 3 **PRÓRROGA No.:** 3 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 1.223.151.366,30	10	4	2023	28	2	2025
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 21-44-101403451 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No. 10

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 20/12/2024

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros

Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

MUNICIPIO DE SANTIAGO

CONTRATO DE OBRA No. LP-OP-001-2022

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME ENTRE EL 25 Y EL 31 DE MARZO DE 2025

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 443.087.965,00	18	10	2022	2	7	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 443.087.965,00	18	10	2022	2	7	2026
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 443.087.965,00	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 475- 47-994000054633

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 1

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 400.000.000,00	18	6	2023	3	7	2023
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 475- 74-994000009416 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 5
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 443.087.965,00	18	10	2022	2	1	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 443.087.965,00	18	10	2022	2	1	2027
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 443.087.965,00	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 475- 47-994000054633

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 400.000.000,00	3	7	2023	3	1	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 475- 74- 994000009416 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 6

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 443.087.965,00	18	10	2022	3	5	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 443.087.965,00	18	10	2022	3	5	2027
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 443.087.965,00	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 475- 47- 994000054633

Certificado de modificación o anexo No.: 5

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 400.000.000,00	18	10	2022	3	5	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 475- 74- 994000009416 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 7

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

Observaciones: Los anexos de la actualización de garantias fueron enviados a la entidad contratante para la respectiva revisión y aprobación.

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados



Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

MUNICIPIO DE HERRAN

CONTRATO DE OBRA No. 146 DE 2022

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME ENTRE EL 25 Y EL 31 DE MARZO DE 2025

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	31	1	2025
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 146 DE 2022 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS HERRAN 2022

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HERRAN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL.

FECHA DE INICIO: 19/10/2022

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/12/2023
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1.781.999.648,00

VALOR ACUMULADO: $ 1.781.999.648,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 20.693.117,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 20.693.117,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022, **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 356.399.929,60	27/9/2022	27/6/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 89.099.982,40	27/9/2022	27/12/2025
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 356.399.929,60	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 49-44-101028950.

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 200.000.000,00	27/9/2022	30/12/2022
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 49-40-101009041 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 356.399.929,60	19	10	2022	19	11	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 89.099.982,40	19	10	2022	18	5	2023
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 356.399.929,60	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 49-44-101028950.

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 200.000.000,00	19	10	2022	21	5	2023
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 49-40-101009041 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 5
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 356.399.929,60	19	10	2022	19	2	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 89.099.982,40	19	10	2022	18	8	2026
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 356.399.929,60	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 49-44-101028950.

Certificado de modificación o anexo No.: 7
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 1

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232.000.000,00	19	10	2022	21	8	2023
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 49-40-101009041 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 6

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTIA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 356.399.929,60	19	10	2022	19	7	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 89.099.982,40	19	10	2022	18	1	2027
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 356.399.929,60	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 49-44-101028950.

Certificado de modificación o anexo No.: 8

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232.000.000,00	19	10	2022	21	1	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 49-40-101009041 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 7

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros



Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

MUNICIPIO DE OCAÑA

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.3879052

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 25 Y EL 31 DE MARZO DE 2025

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 1 (Mes) 2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.3879052 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO OK 2022

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRINSON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER

FECHA DE INICIO: 1/11/2022

PLAZO INICIAL: 6 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/07/2023
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1.711.146.620,00

VALOR ACUMULADO: $ 1.711.146.620,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 12.419.602,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 12.419.602,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022, **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 171.114.662,00	10/8/2022	10/6/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 85.557.331,00	10/8/2022	10/2/2026
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 171.114.662,00	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CG-1037616

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 11/10/2022

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 200.000.000,00	10/8/22	10/2/23
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CG-1008105 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 12/10/2022

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 171.114.662,00	10/8/2022	31/8/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 85.557.331,00	10/8/2022	30/4/2026
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 171.114.662,00	30/04/2023	30/04/2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CG-1037616

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 200.000.000,00	10/8/22	10/2/23
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CG-1008105 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 12/10/2022

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 171.114.662,00	10/8/2022	30/10/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 85.557.331,00	10/8/2022	30/6/2026
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 171.114.662,00	30/06/2023	30/06/2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CG-1037616

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232.000.000,00	10/8/22	30/6/23
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CG-1008105 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 171.114.662,00	10/8/2022	1/12/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 85.557.331,00	10/8/2022	1/8/2026
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 171.114.662,00	1/08/2023	1/08/2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CG-1037616

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232.031.481,67	10/8/22	30/7/23
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CG-1008105 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 171.114.662,00	10/8/2022	1/12/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 85.557.331,00	10/8/2022	1/8/2026
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 171.114.662,00	31/07/2023	31/07/2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CG-1037616

Certificado de modificación o anexo No.: 5 - Terminación
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 27/02/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)				
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros



Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

MUNICIPIO DE CACHIRA

CONTRATO DE OBRA No. 160 DE 2022

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME ENTRE EL 25 Y EL 31 DE MARZO DE 2025

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) | 1 (Mes) | 2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 160 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER

FECHA DE INICIO: 16/11/2022

PLAZO INICIAL: 4 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/06/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 2.658.435.877,00

VALOR ACUMULADO: $ 2.658.435.877,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 10.667.408,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 10.667.408,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 531,687,175,40	4 10 2022	4 6 2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 132,921,793,85	4 10 2022	4 2 2026
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 797,530,763,10	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100227435

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 11/10/2022

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 200.000.000,00	4 10 22	4 2 23
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB- 100052635 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 12/10/2022

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 531,687,175,40	4	10	2022	10	11	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 132,921,793,85	4	10	2022	10	7	2026
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 797,530,763,10	10	7	2023	10	7	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100227435

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	$ 232,000,000	4	10	2022	10	7	2023
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100052635 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros



Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

MUNICIPIO DE ABREGO

CONTRATO DE OBRA No. 252 DE 2022

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME ENTRE EL 25 Y EL 31 DE MARZO DE 2025

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) | 1 (Mes) | 2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 252 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO AD VIAS

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL

FECHA DE INICIO: 16/01/2023

PLAZO INICIAL: 8 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 4.314.324.054,00

VALOR ACUMULADO: $ 4.494.012.623,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 18.029.694,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 18.029.694,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022, **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 431.432.405,40	24/11/2022	24/11/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 862.864.810,80	24/11/2022	24/7/2026
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 4.545.300,90	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101400517

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 13/12/2022

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 400.000.000,00	24/11/2022	24/7/2023
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100052635 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 13/12/2022

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 1 **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** 1 **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 449.401.262,30	16 1 2023	31 5 2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 898.802.524,60	16 1 2023	16 4 2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 898.802.524,60	16 1 2023	15 12 2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 1.348.203,90	15 9 2023	15 9 2028
Calidad de Servicio		$ 4.545.300,90	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101400517

Certificado de modificación o anexo No.: 4

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: 1 **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 464.000.000,00	16 1 2023	15 12 2023
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 21-40-1012011370 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No. 4

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 449.401.262,30	16 1 2023	20 4 2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 898.802.524,60	16 1 2023	20 4 2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 898.802.524,60	16 1 2023	20 12 2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 1.348.203.786,90	15 9 2023	15 9 2029
Calidad de Servicio		$ 4.545.300,90	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101400517

Certificado de modificación o anexo No.: 12

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 520.000.000,00
Otros		

VIGENCIA						
Desde				Hasta		
16	1	2023		20	12	2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 21-40-1012011370 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 11

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros



Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

MUNICIPIO DE LA PLAYA

CONTRATO DE OBRA No. LP-004-2022

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME ENTRE EL 25 Y EL 31 DE MARZO DE 2025

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÌAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) | 1 (Mes) | 2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. LP-004 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO LA PLAYA 2022

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL

FECHA DE INICIO: 6/03/2023

PLAZO INICIAL: 6 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 26/08/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 2.203.091.392,61

VALOR ACUMULADO: $ 2.203.091.392,61
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 12.279.037,61

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 12.279.037,61

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 220.309.139,30	27 1 2023	27 11 2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 220.309.139,30	27 1 2023	27 7 2026
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 220.309.139,30	27 1 2023	27 1 2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 4007857

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: HDI SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 14/03/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232.000.000,00	27 1 2023	27 7 2023
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 4001580 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: HDI SEGUROS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 220.309.139,30	27	2	2023	27	12	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 220.309.139,30	27	2	2023	27	8	2026
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 220.309.139,30	27	1	2023	27	1	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 4007857

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: HDI SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 14/03/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232.000.000,00	27	1	2023	27	8	2023
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 4001580 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: HDI SEGUROS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** 1 **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 440.618.278,60	6	3	2023	19	4	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 440.618.278,60	6	3	2023	19	12	2026
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 440.618.278,60	27	1	2023	27	1	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 4007857

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: HDI SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	$ 232.000.000,00	27	1	2023	29	12	2023
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 4001580 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: HDI SEGUROS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 453.724.084,80	6	3	2023	26	12	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 453.724.084,80	6	3	2023	26	8	2027
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 453.724.084,80	27	1	2023	27	1	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 4007857

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: HDI SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	$ 232.000.000,00	27	1	2023	29	4	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 4001580 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 4
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: HDI SEGUROS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 453.724.084,80	6	3	2023	6	12	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 453.724.084,80	6	3	2023	6	8	2027
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 453.724.084,80	27	1	2023	27	1	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 4007857

Certificado de modificación o anexo No.: 7
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: HDI SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 260.000.000,00	27	1	2023	6	8	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 4001580 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No.: 7
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: HDI SEGUROS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 14/05/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 453.724.084,80	6	3	2023	26	12	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 453.724.084,80	6	3	2023	26	8	2027
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 453.724.084,80	27	1	2023	27	1	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 4007857

Certificado de modificación o anexo No.: 8
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: HDI SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 1

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	$ 260.000.000,00
Otros		

VIGENCIA						
Desde				Hasta		
27	1	2023		26	8	2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 4001580 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 8

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: HDI SEGUROS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

Contrato de obra suspendido

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros



Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

MUNICIPIO DE PAMPLONITA

CONTRATO DE OBRA No. 202 DE 2022

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME ENTRE EL 25 Y EL 31 DE MARZO DE 2025

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 1 (Mes) 2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 202 de 2022 **CONTRATISTA:** UNIÓN TEMPORAL COLOMBIA

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

FECHA DE INICIO: 14/04/2023

PLAZO INICIAL: 6 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/05/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1.703.523.226,00

VALOR ACUMULADO: $ 1.703.523.226,00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 20.902.728,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 20.902.728,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022, **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 180.000.000,00	29	3	2023	29	9	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 90.000.000,00	29	3	2023	29	9	2026
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 180.000.000,00	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 400047393

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 13/04/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 348.000.000,00	29	3	2023	29	9	2023
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 400047383 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 13/12/2022

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 180.000.000,00	14	4	2023	15	10	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 90.000.000,00	14	4	2023	15	10	2023
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 180.000.000,00	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 400047393

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 348.000.000,00	14	4	2023	15	10	2023
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 400047383 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 180.000.000,00	27	2	2024	30	9	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 90.000.000,00	27	2	2024	30	9	2027
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 180.000.000,00	30	9	2024	30	9	2029
			5 AÑOS					

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 400047393

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 348.000.000,00	14	4	2023	30	9	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 400047383 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 4

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

Se ha solicitado al contratista de obra, realizar la actualización de polizas de acuerdo con la Prorroga de Tiempo (2 meses), que se suscribio el 22 de Marzo 2024, a la fecha el contratista de obra, no ha entregada la actualización de polizas para aprobación por parte de la entidad contratante.

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros



Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

GOBERNACIÓN 2052

CONTRATO DE OBRA No. 2332 DE 2023

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME ENTRE EL 25 Y EL 31 DE MARZO DE 2025

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 1 (Mes) 2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 2332 DE 2023 **CONTRATISTA:** UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO DE LOS PATIOS.

FECHA DE INICIO: 11/05/2023

PLAZO INICIAL: 6 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 5.159.028.732,00

VALOR ACUMULADO: $ 5.159.028.732,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 62.805.170,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 62.805.170,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022, **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 515.902.873,20	28 12 2022	28 12 2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 515.902.873,20	28 12 2022	28 6 2026
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 515.902.873,20	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCT-100004561

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 13/04/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 400.000.000,00	28 12 2022	28 6 2023
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCT-100001101 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 13/04/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 515.902.873,20	10	11	2023	30	6	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 515.902.873,20	10	11	2023	31	12	2026
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 515.902.873,20	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCT-100004561

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 400.000.000,00	11	5	2023	31	12	2023
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCT-100001101 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 3 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 515.902.873,20	10	11	2023	31	5	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 515.902.873,20	10	11	2023	30	11	2027
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 515.902.873,20	30	11	2024	30	11	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCT-100004561

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 400.000.000,00	11	5	2023	30	11	2029
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCT-100004561 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 5
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** 1 **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 515.902.873,20	10	11	2023	31	5	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 515.902.873,20	10	11	2023	30	11	2027
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 515.902.873,20	30	5	2024	30	11	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCT-100004561

Certificado de modificación o anexo No.: 6
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 520.000.000,00	11	5	2023	30	11	2029
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCT-100004561 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 6
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

Teniendo en cuenta OTROSÍ MODIFICATORIO No. 01 AL CONTRATO ELECTRONICO DE OBRA PÚBLICA N° 02332 DE 2022 por ajuste de precios se incrementa el valor asegurado.

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros



Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

MUNICIPIO DE OCAÑA 1814

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4352407

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 25 Y EL 31 DE MARZO DE 2025

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 1 (Mes) 2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4352407 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

FECHA DE INICIO: 2/05/2023

PLAZO INICIAL: 4 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 24/08/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 2.499.989.139,00

VALOR ACUMULADO: $ 2.700.000.000,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 12.710.317,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 12.710.317,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 249.998.913,90	29 12 2022	28 8 2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 124.999.456,95	29 12 2022	29 4 2026
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 249.998.913,90	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101403960

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232.000.000,00	29 12 22	29 4 23
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 21-40-101204283 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** 1 **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 270.000.000,00	2 5 2023	20 1 2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 135.000.000,00	2 5 2023	20 9 2027
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 270.000.000,00	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101403960

Certificado de modificación o anexo No.: 11

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 16/08/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 260.000.000,00	29 12 22	20 9 24
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 21-40-101204283 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No.: 9

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 16/08/2024

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros



Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No. 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-055-2023 MUNICIPIO DE EL ZULIA

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 25 Y EL 31 DE MARZO DE 2025

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	31 (Día)	1 (Mes)	25 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-055-2023 **CONTRATISTA:** SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO:
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LAS DELICIAS-EL MANON, MUNICIPIO DE EL ZULIA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

FECHA DE INICIO: 7/11/2023

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 17/02/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 684.946.301,00

VALOR ACUMULADO: $ 684.946.301,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 6.521.959,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 6.521.959,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento contrato	30%	$ 205.483.890,30	1/8/2023	1/3/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	$ 205.483.890,30	1/8/2023	1/11/2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 205.483.890,30	5 ANOS	5 ANOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **49-44-101031209**

Certificado de modificación o anexo No.: **0**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	1/8/2023	1/11/2023
Daño emergente y lucro cesante	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	1/8/2023	1/11/2023
Perjuicios extra patronales	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	1/8/2023	1/11/2023

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **49-40-101009942** **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: **0**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento contrato	30%	$ 205.483.890,30	1 8 2023	1 3 2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	$ 205.483.890,30	1 8 2023	1 11 2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 205.483.890,30	5 ANOS	5 ANOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 49-44-101031209

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	1 8 2023	1 2 2024
Daño emergente y lucro cesante	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	1 8 2023	7 2 2024
Perjuicios extra patronales	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	1 8 2023	7 2 2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 49-40-101009942 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento contrato	30%	$ 205.483.890,30	7 11 2023	7 6 2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	$ 205.483.890,30	7 11 2023	7 2 2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 205.483.890,30	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 49-44-101031209

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	1 8 2023	17 2 2024
Daño emergente y lucro cesante	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	1 8 2023	17 2 2024
Perjuicios extra patronales	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	1 8 2023	17 2 2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 49-40-101009942 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento contrato	30%	$ 205.483.890,30	7 11 2023	17 6 2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	$ 205.483.890,30	7 11 2023	17 2 2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 205.483.890,30	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **49-44-101031209**

Certificado de modificación o anexo No.: **4**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS SEGUN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	1 8 2023	17 2 2024
Daño emergente y lucro cesante	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	1 8 2023	17 2 2024
Perjuicios extra patronales	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	1 8 2023	17 2 2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **49-40-101009942** **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No.: **3**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento contrato	30%	$ 205.483.890,30	7 11 2023	17 6 2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	$ 205.483.890,30	7 11 2023	17 2 2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 205.483.890,30	16 2 2024	16 2 2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **49-44-101031209**

Certificado de modificación o anexo No.: **7**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	1 8 2023	17 2 2024
Daño emergente y lucro cesante	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	1 8 2023	17 2 2024
Perjuicios extra patronales	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	1 8 2023	17 2 2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **49-40-101009942** **OTRAS PÓLIZAS No.** .....


Certificado de modificación o anexo No.: **3**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el



Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-062-2023 MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME ENTRE EL 25 Y EL 31 DE MARZO DE 2025

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 1 (Mes) 2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-062-2023 **CONTRATISTA:** RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES

OBJETO DEL CONTRATO:
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

FECHA DE INICIO: 7/11/2023

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 7/02/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 434.981.351,08

VALOR ACUMULADO: $ 434.981.351,08 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 4.929.368,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 4.929.368,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento contrato	30%	$ 130.494.405,32	3 8 2023	3 3 2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	$ 130.494.405,32	3 8 2023	3 11 2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 130.494.405,32	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **49-44-101031244**

Certificado de modificación o anexo No.: **0**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	3 8 2023	3 11 2023
Daño emergente y lucro cesante	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	3 8 2023	3 11 2023
Perjuicios extrapatrimoniales	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	3 8 2023	3 11 2023

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **49-40-101009947** **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: **0**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento contrato	30%	$ 130.494.405,32	7 11 2023	7 6 2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	$ 130.494.405,32	7 11 2023	7 2 2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 130.494.405,32	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **49-44-101031244**

Certificado de modificación o anexo No.: **2**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	3 8 2023	7 2 2024
Daño emergente y lucro cesante	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	3 8 2023	7 2 2024
Perjuicios extrapatrimoniales	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	3 8 2023	7 2 2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **49-40-101009947** **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No.: **1**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento contrato	30%	$ 130.494.405,32	7 11 2023	7 6 2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	$ 130.494.405,32	7 11 2023	7 2 2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 130.494.405,32	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **49-44-101031244**

Certificado de modificación o anexo No.: **3**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	3	8	2023	7	2	2024
Daño emergente y lucro cesante	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	3	8	2023	7	2	2024
Perjuicios extrapatrimoniales	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	3	8	2023	7	2	2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 49-40-101009947 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento contrato	30%	$ 130.494.405,32	7	11	2023	7	6	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	$ 130.494.405,32	7	11	2023	7	2	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 130.494.405,32	6	2	2024	6	2	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 49-44-101031244

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	3	8	2023	7	2	2024
Daño emergente y lucro cesante	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	3	8	2023	7	2	2024
Perjuicios extrapatrimoniales	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	3	8	2023	7	2	2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 49-40-101009947 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el



Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-070-2023 MUNICIPIO DE PAMPLONA

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME ENTRE EL 25 Y EL 31 DE MARZO DE 2025

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 1 (Mes) 2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-070-2023 **CONTRATISTA:** JOSE ERNESTO RICO OSORIO.

OBJETO DEL CONTRATO:

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LA UNION, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

FECHA DE INICIO: 7/11/2023

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 7/02/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 453.602.771,30

VALOR ACUMULADO: $ 453.602.771,30 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 820.404,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 820.404,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento del contrato	30%	$ 136.080.831,39	3 8 2023	3 3 2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	$ 136.080.831,39	3 8 2023	3 11 2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 136.080.831,39	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **49-44-101031270**

Certificado de modificación o anexo No.: **0**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	3 8 2023	3 11 2023
Responsabilidad civil cruzada	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	3 8 2023	3 11 2023
Gastos médicos	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	3 8 2023	3 11 2023

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **49-40-101009953** **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento del contrato	30%	$ 136.080.831,39	7	11	2023	30	6	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	$ 136.080.831,39	7	11	2023	5	3	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 136.080.831,39	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **49-44-101031270**

Certificado de modificación o anexo No.: **3**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 260.000.000,00	3	11	2023	5	3	2024
Responsabilidad civil cruzada	200 SMMLV	$ 260.000.000,00	3	11	2023	5	3	2024
Gastos médicos	200 SMMLV	$ 260.000.000,00	3	11	2023	5	3	2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **49-40-101009953** **OTRAS PÓLIZAS No.** .....


Certificado de modificación o anexo No.: 6
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el



Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-072-2023 MUNICIPIO DE SILOS

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME ENTRE EL 25 Y EL 31 DE MARZO DE 2025

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 1 (Mes) 2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-072-2023 **CONTRATISTA:** G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO:
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LOS RINCON-LA COPITA, MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

FECHA DE INICIO: 7/11/2023

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 6/04/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 740.182.949,07

VALOR ACUMULADO: $ 740.182.949,07
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 8.390.413,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 8.390.413,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento contrato	30%	$ 222.054.884,72	9 8 2023	9 3 2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	$ 222.054.884,72	9 8 2023	9 11 2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 222.054.884,72	5 ANOS	5 ANOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 460-47--994000067941

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Predios, labores y operaciones		$ 232.000.000,00	9 8 2023	9 11 2023
Contratistas y subcontratistas		$ 232.000.000,00	9 8 2023	9 11 2023
RCE paronal		$ 232.000.000,00	9 8 2023	9 11 2023
Vehiculos propios y no propios		$ 232.000.000,00	9 8 2023	9 11 2023

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 460-74-994000006724 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento contrato	30%	$ 222.054.884,72	7 11 2023	10 7 2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	$ 222.054.884,72	7 11 2023	10 3 2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 222.054.884,72	5 ANOS	5 ANOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 460-47--994000067941

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Predios, labores y operaciones		$ 232.000.000,00	7	11	2023	27	2	2024
Contratistas y subcontratistas		$ 232.000.000,00	7	11	2023	27	2	2024
RCE paronal		$ 232.000.000,00	7	11	2023	27	2	2024
Vehiculos propios y no propios		$ 232.000.000,00	7	11	2023	27	2	2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 460-74-994000006724 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento contrato	30%	$ 222.054.884,72	7	11	2023	7	8	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	$ 222.054.884,72	7	11	2023	7	4	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 222.054.884,72	5 ANOS			5 ANOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 460-47--994000067941

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Predios, labores y operaciones		$ 260.000.000,00	7	11	2023	10	3	2024
Contratistas y subcontratistas		$ 260.000.000,00	7	11	2023	10	3	2024
RCE paronal		$ 260.000.000,00	7	11	2023	10	3	2024
Vehiculos propios y no propios		$ 260.000.000,00	7	11	2023	10	3	2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 460-74-994000006724 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 8
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el



Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-079-2023 MUNICIPIO DE SAN CAYETANO

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME ENTRE EL 25 Y EL 31 DE MARZO DE 2025

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 1 (Mes) 2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-079-2023 **CONTRATISTA:** SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO:

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADUAS-TABIRO-PUENTE ZULIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

FECHA DE INICIO: 7/11/2023

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 29/02/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 620.253.964,86

VALOR ACUMULADO: $ 620.253.964,86
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 7.026.970,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 7.026.970,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento contrato	30%	$ 186.076.189,46	29/8/2023	29/3/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	$ 186.076.189,46	29/8/2023	29/11/2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 186.076.189,46	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **49-44-101031628**

Certificado de modificación o anexo No.: **0**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	29/8/2023	29/11/2023
Daño emergente y lucro cesante	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	29/8/2023	29/11/2023
Perjuicios extrapatrimoniales	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	29/8/2023	29/11/2023

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **49-40-101010036** **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: **0**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento contrato	30%	$ 186.076.189,46	7 11 2023	7 6 2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	$ 186.076.189,46	7 11 2023	7 2 2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 186.076.189,46	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **49-44-101031628**

Certificado de modificación o anexo No.: **2**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	7 11 2023	7 2 2024
Daño emergente y lucro cesante	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	7 11 2023	7 2 2024
Perjuicios extrapatrimoniales	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	7 11 2023	7 2 2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **49-40-101010036** **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No.: **2**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento contrato	30%	$ 186.076.189,46	7 11 2023	10 8 2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	$ 186.076.189,46	7 11 2023	10 4 2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 186.076.189,46	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **49-44-101031628**

Certificado de modificación o anexo No.: **4**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	7 11 2023	10 4 2024
Daño emergente y lucro cesante	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	7 11 2023	10 4 2024
Perjuicios extrapatrimoniales	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	7 11 2023	10 4 2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **49-40-101010036** **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No.: **4**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 2

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento contrato	30%	$ 186.076.189,46	7	11	2023	10	8	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	$ 186.076.189,46	7	11	2023	10	4	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 186.076.189,46	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **49-44-101031628**

Certificado de modificación o anexo No.: **7**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	7	11	2023	10	4	2024
Daño emergente y lucro cesante	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	7	11	2023	10	4	2024
Perjuicios extrapatrimoniales	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	7	11	2023	10	4	2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **49-40-101010036** **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No.: **4**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el



Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-065-2023 MUNICIPIO DE CACOTA

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME ENTRE EL 25 Y EL 31 DE MARZO DE 2025

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 1 (Mes) 2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-065-2023 **CONTRATISTA:** SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO:
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA CHINAVEGA, MUNICIPIO DE CACOTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

FECHA DE INICIO: 7/11/2023

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 7/02/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 564.759.919,91

VALOR ACUMULADO: $ 564.759.919,91
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 6.397.690,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 6.397.690,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento contrato	30%	$ 169.427.975,97	7/11/2023	7/6/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	$ 169.427.975,97	7/11/2023	7/2/2024
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 169.427.975,97	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **49-44-101031211**

Certificado de modificación o anexo No.: **2**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	1/8/2023	7/2/2024
Daño emergente y lucro cesante	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	1/8/2023	7/2/2024
Perjuicios extra patronales	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	1/8/2023	7/2/2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **49-40-10101009940** **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: **1**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 169.427.975,97	7 11 2023	7 6 2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 169.427.975,97	7 11 2023	7 2 2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 169.427.975,97	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 49-44-101031211

Certificado de modificación o anexo No.: 4

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)				
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por

Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-067-2023 MUNICIPIO DE CACHIRA

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME ENTRE EL 25 Y EL 31 DE MARZO DE 2025

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) | 1 (Mes) | 2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-067-2023 **CONTRATISTA:** CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LOS MANGOS - LA CARRERA, MUNICIPIO CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.

FECHA DE INICIO: 21/02/2024

PLAZO INICIAL: 4,5 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 5/08/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 749.903.341,00

VALOR ACUMULADO: $ 749.903.341,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 10.667.408,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 10.667.408,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022, **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	30%	$ 224.971.002,30	21	2	24	21	9	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e	30%	$ 224.971.002,30	21	2	24	21	5	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 224.971.002,30	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 460-747-994000068033

Certificado de modificación o anexo No.: ANEXO 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLITARIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 23/02/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	35%	$ 260.000.000,00	16	11	23	21	5	24
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: ANEXO 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLITARIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: **23/02/204**

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	30,00%	$ 224.971.002,30	21	2	24	6	11	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30,00%	$ 224.971.002,30	21	2	24	6	7	27
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30,00%	$ 224.971.002,30	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 460-747-994000068033

Certificado de modificación o anexo No.: ANEXO 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLITARIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 23/05/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	35%	$ 224.971.002,00	24	5	2024	5	7	24
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. ANEXO 4
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLITARIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 23/05/2024

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros



Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-060-2023 MUNICIPIO DE LOURDES

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 25 Y EL 31 DE MARZO DE 2025

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	31	1	2025
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-060-2023 **CONTRATISTA:** CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA

OBJETO DEL CONTRATO:

MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO LOURDES, NORTE DE SANTANDER.

FECHA DE INICIO: 22/01/2024

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 6/06/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 620.216.911,63

VALOR ACUMULADO: $ 620.216.911,63
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 7.026.970,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 7.026.970,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 186.065.073,49	27	7	2023	24	2	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 186.065.073,49	24	7	2023	24	10	2026
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 186.065.073,49	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 460-47-994000067697

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 smmlv	$ 232.000.000,00	24	7	2023	24	10	2023
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 460-47-994000006685 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 186.065.073,49	22	1	2024	22	8	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 186.065.073,49	22	1	2024	22	4	2027
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 186.065.073,49	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 460-47-994000067697

Certificado de modificación o anexo No.: 1

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 smmlv	$ 260.000.000,00	24	10	2023	22	4	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 460-47-994000067697 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No.: 2

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

Pendiente pólizas actualizadas a terminación del contrato de obra

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros



Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-056-2023 MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 25 Y EL 31 DE MARZO DE 2025

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	31 (Día)	1 (Mes)	2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-056-2023 **CONTRATISTA:** WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ

OBJETO DEL CONTRATO:

MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES PUENTE ISABEL CELIS-DAVE, MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER.

FECHA DE INICIO: 8/04/2024

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 8/07/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 527.540.312,28

VALOR ACUMULADO: $ 527.540.312,28
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 5.975.869,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 5.975.869,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 158.262.093,60	22/11/2023	22/6/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 158.262.093,60	22/11/2023	22/2/2027
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 158.262.093,60	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 49-44-101032677

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 smmlv	$ 232.000.000,00	22/11/2023	22/2/2024
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 49-40-101010371 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

Pendiente pólizas actualizadas a terminación del contrato de obra

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros

Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-077-2023 MUNICIPIO DE CUCUTA

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 25 Y EL 31 DE MARZO DE 2025

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 1 (Mes) 2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-077-2023 **CONTRATISTA:** YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA

OBJETO DEL CONTRATO:

MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES PASO DE LOS RIOS-RICAURTE, MUNICIPIO DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER.

FECHA DE INICIO: 8/04/2024

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 8/07/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 471.956.681,24

VALOR ACUMULADO: $ 471.956.681,24
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 5.346.230,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 5.346.230,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 141.587.004,37	18 8 2023	18 3 2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 141.587.004,37	18 8 2023	18 11 2026
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 141.587.004,37	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 49-44-101031483

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 smmlv	$ 232.000.000,00	18 8 2023	18 11 2023
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 49-40-101009985 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 141.587.004,37	18 8 2023	18 3 2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 141.587.004,37	18 8 2023	18 11 2026
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 141.587.004,37	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 49-44-101031483

Certificado de modificación o anexo No.: 1

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 smmlv	$ 232.000.000,00	18 8 2023	18 11 2023
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 49-40-101009985 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No.: 1

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 141.587.004,37	8 4 2024	7 11 2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 141.587.004,37	8 4 2024	10 7 2027
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 141.587.004,37	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 49-44-101031483

Certificado de modificación o anexo No.: 3

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 smmlv	$ 260.000.000,00	8	4	2024	10	7	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 49-40-101010643 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No.: 2

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)


Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros

Firma 

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-054-2023 MUNICIPIO DE PAMPLONITA

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 25 Y EL 31 DE MARZO DE 2025

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 1 (Mes) 2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-054-2023 **CONTRATISTA:** JOSE ERNESTO RICO OSORIO

OBJETO DEL CONTRATO:

MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VIA PARAMO PICA PICA, MUNICIPIO DE PAMPLONITA, NORTE DE SANTANDER.

FECHA DE INICIO: 22/04/2024

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 22/07/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 620.245.837,49

VALOR ACUMULADO: $ 620.245.837,49
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 5.904.217,77

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 5.904.217,77

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022, **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 186.073.751,10	22	4	2024	22	11	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 186.073.751,10	22	4	2024	23	7	2027
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 186.073.751,10	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 49-44-10103320 4

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 260.000.000,00	22	4	2024	23	7	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 49-40-101010560 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros



Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-082-2023 MUNICIPIO DE HERRAN

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 25 Y EL 31 DE MARZO DE 2025

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	31 (Día)	1 (Mes)	2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-082-2023 **CONTRATISTA:** RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES

OBJETO DEL CONTRATO:

MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRAN, NORTE DE SANTANDER.

FECHA DE INICIO: 14/05/2024

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/09/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 527.697.300,71

VALOR ACUMULADO: $ 527.697.300,71
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 5.023.671,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 5.023.671,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 158.309.190,30	20/11/2023	1/7/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 158.309.190,30	20/11/2023	1/3/2027
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 158.309.190,30	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 49-44-101032676

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232.000.000,00	20/11/2023	1/3/2024
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 49-40-101010370 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRORROGA No.:** ..... **MODIFICACION No.:** ..... **SUSPENSION No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento contrato	30%	$ 158.309.190,30	20	11	2023	1	7	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	$ 158.309.190,30	20	11	2023	1	3	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 158.309.190,30	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **49-44-101032676**

Certificado de modificación o anexo No.: **0**

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	20	11	2023	1	3	2024
Daño emergente y lucro cesante	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	20	11	2023	1	3	2024
Perjuicios extra patronales	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	20	11	2023	1	3	2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **49-40-101010370** **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No.: **1**

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros



Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-081-2023 MUNICIPIO DE MUTISCUA

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 25 Y EL 31 DE MARZO DE 2025

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 1 (Mes) 2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-081-2023 **CONTRATISTA:** YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA

OBJETO DEL CONTRATO:

MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES MINAS DE CAL- LA ARAÑITA-LA MESA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, NORTE DE SANTANDER.

FECHA DE INICIO: 17/05/2024

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 17/09/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 601.770.256,56

VALOR ACUMULADO: $ 601.770.256,56
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 5.728.748,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 5.728.748,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 180.531.077,10	20/11/2023	1/7/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 180.531.077,10	20/11/2023	1/3/2027
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 180.531.077,10	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 49-11-101032680

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232.000.000,00	20/11/2023	1/3/2024
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 49-40-101010373 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-058-2023 MUNICIPIO DE SANTIAGO

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME ENTRE EL 25 Y EL 31 DE MARZO DE 2025

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 1 (Mes) 2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-058-2023 **CONTRATISTA:** WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ

OBJETO DEL CONTRATO:

MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA - CUPERENA - CACAHUALA, ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.

FECHA DE INICIO: 14/06/2024

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 25/10/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 731.291.151,02

VALOR ACUMULADO: $ 731.291.151,02
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 8.283.917,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 8.283.917,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022, **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 219.387.345,30	22	11	2023	22	6	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 219.387.345,30	22	11	2023	22	2	2027
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 219.387.345,30	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 49-44-101032678

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232.000.000,00	22	11	2023	22	2	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 49-40-101010372 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 219.387.345,30	24	6	2024	23	1	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 219.387.345,30	24	6	2024	25	9	2027
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 219.387.345,30	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 49-44-101032678

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232.000.000,00	22	11	2023	14	9	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 49-10-101010372 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 219.387.345,30	24	6	2024	23	1	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 219.387.345,30	24	6	2024	25	9	2027
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 219.387.345,30	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 49-44-101032678

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232.000.000,00	22	11	2023	14	9	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 49-10-101010372 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 2

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 219.387.345,30	24	6	2024	23	1	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 219.387.345,30	24	6	2024	25	9	2027
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 219.387.345,30	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 49-44-101032678

Certificado de modificación o anexo No.: 4

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232.000.000,00	22	11	2023	14	9	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 49-10-101010372 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 3

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 219.387.345,30	24	6	2024	23	1	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 219.387.345,30	24	6	2024	25	9	2027
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 219.387.345,30	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 49-44-101032678

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 260.000.000,00	22	11	2023	14	9	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 49-10-101010372 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 4
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 219.387.345,30	24	6	2024	23	1	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 219.387.345,30	24	6	2024	25	9	2027
Calidad del servicio		$ 219.387.345,30	24	6	2024	25	9	2029
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 219.387.345,30	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 49-44-101032678

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 260.000.000,00	22	11	2023	14	9	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 49-10-101010372 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 4

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros

Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-071-2023 MUNICIPIO DE GRAMALOTE

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 25 Y EL 31 DE MARZO DE 2025

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	31 (Día)	1 (Mes)	2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-071-2023 **CONTRATISTA:** SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO:

MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA GARZA-ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER.

FECHA DE INICIO: 5/08/2024

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 5/11/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 666.564.206,31

VALOR ACUMULADO: $ 666.564.206,31
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 7.551.371,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 7.551.371,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022, **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 199.969.261,89	8	8	2023	8	3	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 199.969.261,89	8	8	2023	8	11	2026
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 199.969.261,89	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 49-44-10-1031289

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232.000.000,00	8	8	2023	8	11	2023
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 49-40-101009956 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 199.969.261,89	5	8	2024	3	8	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 199.969.261,89	8	8	2024	6	11	2027
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 199.969.261,89	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 49-44-10-1031289

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232.000.000,00	8	8	2023	5	11	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 49-40-101009956 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 199.969.261,89	5	8	2024	3	8	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 199.969.261,89	8	8	2024	6	11	2027
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 199.969.261,89	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 49-44-10-1031289

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232.000.000,00	8	8	2023	5	11	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 49-40-101009956 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No.: 2

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 199.969.261,89	5	8	2024	3	8	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 199.969.261,89	8	8	2024	6	11	2027
Calidad del servicio		$ 199.969.261,89	4	11	2024	4	11	2029
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 199.969.261,89	4	11	2024	4	11	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 49-44-10-1031289

Certificado de modificación o anexo No.: 5

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)


Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros



Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-049-2023 MUNICIPIO DE VILLA CARO

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 25 Y EL 31 DE MARZO DE 2025

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) / 1 (Mes) / 2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-049-2024 **CONTRATISTA:** SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCIONES G&P COMPANY S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO:
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES SAN JUAN - AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER.

FECHA DE INICIO: 18/10/2024

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 500.200.540,23

VALOR ACUMULADO: $ 604.640.738,90
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 11.096.021,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 11.096.021,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 150.060.162,07	15/10/2024	15/5/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 150.060.162,07	15/10/2024	15/1/2028
Calidad del servicio		$ 150.060.162,07	15/1/2025	15/1/2030
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 150.060.162,07	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 49-44-101034623

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 260.000.000,00	15/10/2024	15/1/2025
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 49-40-101011058 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 150.060.162,07	18	11	2024	18	6	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 150.060.162,07	18	11	2024	18	2	2028
Calidad del servicio		$ 150.060.162,07	18	2	2025	18	2	2030
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 150.060.162,07	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 49-44-101034623

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 260.000.000,00	18	10	2024	18	1	2025
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 49-40-101011058 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 150.060.162,07	18	11	2024	30	4	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 150.060.162,07	18	11	2024	31	12	2027
Calidad del servicio		$ 150.060.162,07	18	2	2025	18	2	2030
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 150.060.162,07	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 49-44-101034623

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 260.000.000,00	18	10	2024	31	12	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 49-40-101011058 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 3

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros



Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ACTAS DE REUNIÓN Y COMITÉ

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 25 Y EL 31 DE MARZO DE 2025

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

INFORMES SEMANALES

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 25 Y EL 31 DE MARZO DE 2025

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 28/03/25 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 91 del 25/03/25 al 27/03/25 | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JEAN ARIEL CURMEN

GOBERNACIÓN - 1943

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
PLACA HUELLA EN LA VÍAS DE PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

PLACA HUELLA EN LA VÍAS DE PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590				
INTEGRANTES:					
CONTRATO No.	0260 DE 2023	VALOR INICIAL:	$	16.898.027.326,00	
FECHA DE INICIO:	10 DE ABRIL DE 2023	VALOR ADICIONES:	$	7.565.000.000,00	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	9 DE DICIEMBRE DE 2023	VALOR ACUMULADO:	$	24.463.027.326,00	
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	02 DE ABRIL DE 2025		$	-	
			$	-	
			$		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S				
INTEGRANTES:					
CONTRATO No.	1063 DE 2022	VALOR INICIAL:	$	4.288.164.910,00	
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$	268.536.435,20	
		VALOR ADICIONES:	$	500.000.000,00	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$	5.056.701.345,20	
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	02 DE ABRIL DE 2025	VALOR ANTICIPO:		N/A	
		VALOR AMORTIZADO:		N/A	
		SALDO POR AMORTIZAR:		N/A	

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 16.898.027.326,00		$ 24.463.027.326	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 16.898.027.326,00		$ 24.463.027.326	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	40.000.000,000	2.038.536.435,200	2.978.164.910,000	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	40.000.000,000	2.038.536.436,000	2.806.705,773	
	SALDO DE VIGENCIA	-	(0,800)	171.459.137	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$	24.463.027.326,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	23.162.828.337,02	94,69%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	21.934.174.109,78	85,98%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	(2.139.654.227,261)	-8,70%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$	574.098.275,36	82,93%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	23.162.828.337,02	94,69%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	21.908.272.385,16	89,33%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	(1.554.555.951,871)	-6,36%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	1.635.301.412,34	6,68%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	-	0,00%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: FEUT-12 - FEUT-13, del 19/02/2025
PERIODO FACTURADO: feb-25
VALOR FACTURA: $ 2.376.962.477,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	5.043.870.764,13	99,75%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	4.885.242.208,09	96,61%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	9.622.935,00	0,19%
INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA	$	9.622.935,00	0,19%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 16966 el 02/12/2024
PERIODO FACTURADO: oct-24
VALOR FACTURA: $ 205.905.662,40

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 94,64%
Meta Física Ejecutada %: 88,00%
Avance o Atraso Físico %: -6,64%

MUNICIPIO DE ARBOLEDAS

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base / Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo RINCONADA	Tramo SANTO DOMINGO	Tramo VOLCÁN	Tramo CHICAGUA BAJO	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	98,50%				98,50%	1,85%
					Ejec	90,02%				90,02%	1,69%
Construcción De Placa Huella	ML	3692			Prog	455	1600	820	796	3671	19,37%
					Ejec	464	1595	812	796,00	3667	19,35%
Obras de drenaje (Alcantarilla Sencilla (24), Alcantarillas Doble (2).	UND	26			Prog	2	7	6	7	22	2,48%
					Ejec	2	6	5	8	21	2,36%
Mantenimiento Periódico (Mejoramiento/ Conformación)	M2	123574,88			Prog	23780,00	10250,00	15340,00	12300,00	61670,00	1,20%
					Ejec	13360,95	9204,78	9873,90	6028,72	38468,34	0,75%
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia _____**	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**Tramo POTREROS**	**Tramo CINERA**	**Tramo HELECHAR**	**Tramo JUAN BUENO**	**Total**	**%**
Estudios y diseños	UND				Prog	0					
					Ejec	0,00					
Construcción De Placa Huella	ML	3237			Prog	611	1248	534	840	3233	18,01%
					Ejec	611	1140	534	835	3120	17,38%
Obras de drenaje (Alcantarilla Sencilla (23), Alcantarillas Doble (1).	UND	24			Prog	8	7	2	7	24	2,70%
					Ejec	7	7	1	7	22	2,48%
Mantenimiento Periódico (Mejoramiento/ Conformación)	M2	125315,13			Prog	15340,00	13210,00	22310,00	13420,00	64280,00	1,18%
					Ejec	6145,90	10755,00	9908,35	8998,80	35808,05	0,66%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	0
Motoniveladora	1	0
Compactador mín 7 Ton	1	0
Volquetas	2	0
Bulldozer		0
Bobcat (Minicargador)		0
Dumper		1
Total	5	1

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

MUNICIPIO GRAMALOTE

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base / Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo BOYACÁ	Tramo SAN ISIDRO	Tramo SANTA ANITA	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	UND				Prog	0					
					Ejec	0,00					
Construcción De Placa Huella	ML	3054			Prog	1466	1028	560		3054	14,02%
					Ejec	1466,00	1028,00	560		3054	14,02%
Obras de drenaje (Alcantarilla Sencilla (15), Alcantarillas Doble (2), Box Culvert 2X2 (1).	UND	18,00			Prog	9,00	8,00	0,00		17	1,95%
					Ejec	9	8	0		17	1,95%
Mantenimiento Periódico (Mejoramiento/ Conformación)	M2	52602,95			Prog	21200,00	15800,00	13210,00		50210,00	0,96%
					Ejec	19237,00	13045,29	9536,01		41818,30	0,80%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	0
Motoniveladora	1	0
Compactador mín 7 Ton	1	0
Volquetas	2	0
Bulldozer		0
Bobcat (Minicargador)		0
Dumper		0
Total	5	0

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

MUNICIPIO DE LOS PATIOS

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base / Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo LOS PATIOS				Total	%
Estudios y diseños	UND				Prog	0					
					Ejec	0,00					
Construcción De Placa Huella	ML	4554			Prog	4530,00				4530	28,49%
					Ejec	3900,00				3900	24,53%
(Alcantarilla Sencilla (5), Alcantarillas Doble (2), Box Culvert 1,5x1,5 (2), Box Culvert 2x2 (4).	UND	13			Prog	10				10	2,07%
					Ejec	12,00				12	2,48%
Mantenimiento Periódico (Mejoramiento/ Conformación)	M2	150715,56			Prog	58120,00				58120,00	0,34%
					Ejec	15236,68				15236,68	0,09%

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	0
Excavadora hidráulica 320	0	0
Motoniveladora	1	0
Compactador mín 7 Ton	1	0
Volquetas	2	0
Bulldozer		0
Bobcat (Minicargador)		0
Dumper		
Total	5	0

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 28/03/25 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 91 del 25/03/25 al 27/03/25 | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JEAN ARIEL CURMEN | GOBERNACIÓN - 1943

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).
Se realiza correccion en ejecutado ml de placa huella Los patios, por error de digitacion no se incluyo el valor real el cual es a la fecha 2987,10

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN: Municipio, El Zulia – CONCRETOS Y TRITURADOS EL ZULIA S.A.S	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN: Quebrada La Amarilla con la vía que conduce a Cúcuta al Municipio de Santiago – MATERIALES LA AMARILLA	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	

OBSERVACIONES: La interventoría recibió por parte del contratista los requerimientos legales como Contrato de concesión para la exploración y explotación de yacimiento de materiales de construcción, permiso o titulo minero y licencia ambiental, se da aprobación mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-824-22

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Aprobado mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-1635-22, Fecha: 28-Diciembre-2023

OBSERVACIONES

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	30	10
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	10
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	23	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 40

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Vereda Corozal, cinera.

OBSERVACIONES:
Se tienen puntos de atencion al usuario en cada uno de los Municipios, Los Patios, Gramalote y Los patios.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Durante la semana se realiza verificacion de informacion que tiene que ver con el componente de estudios y diseños subsanacion de observaciones y estado actual a la fecha.
Durante la semana la interventoria realiza la revision documental de las observaciones realizadas al contratista de obra mediante el comunicado GIC-INVIAS-NTS-0153-25 del 18 de marzo de 2025, referente a la solicitud de desequilibrio economico con el fin de emitir concepto al mismo.
Se realiza verificaccion documental referente a los componentes ambiental y social con el fin de emitir concepto de faltantes a la fecha.

ACTIVIDADES TÉCNICAS

1 MUNICIPIO DE ARBOLEDAS

Obras Hidraulicas - Vereda Santo Domingo

El contratista realiza actividades de resane de elementos de concreto de encole y descole de alcantarillas fundidas.
Se realiza armado de formaleta de madera para bordillos acceso de cunetas a elementos de encole y descole a lo largo del tramo 1C.
Se realiza vaciado de elemento de bordillo de cunetas para acceso de encole y descole a alcantarillas.

Obras Hidraulicas - Vereda Volcan
El contratista realiza actividades de resane de elementos de concreto, encole y descole en alcantarilla en ejecucion.
Se realiza armado de formaleta de madera para la modulacion de elementos de descole alcantarilla doble tramo No1.
Se realiza acopio de material petreo, arena y triturado y demas faltante para continuacion de actvidades pendientes en alcantarilla.

Obras hidraulicas - Vereda Helechar
Se realizan actividades de adecuacion de cunetas y bordillos para descole hacia alcantarillas.
Se realiza vaciado de concreto de 21 Mpa elaborado en obra de bordillos pendientes a lo largo del tramo No1.

3 MUNICIPIO DE LOS PATIOS

Sin ejecucion de actividades -Vereda Corozal - California
El contratista de obra no ejecuta actividades en campo en ninguno de los tramos de placa huella que se tienen pendiente a la fecha.

ACTIVIDADES SOCIALES

Durante la semana se realizan actividades administrativa de verificacion documental del presente componente en aras de observar lo pendiente.

ACTIVIDADES SST

Se realiza verificacion en campo en el Municipio de Los Patios donde se evidencio la no presencia de personal.


ACTIVIDADES AMBIENTALES

Se siguen llevando a cabo actividades de verificación del Plan de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA) correspondiente a este contrato, con el propósito de validar la información.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Según lo expresado por el contratista, está previsto el inicio de actividades en el municipio de Los Patios, así como la continuación de las labores que se vienen ejecutando en Arboledas.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

ARBOLEDAS



RESANE DE ELEMENTOS DE ALCANTARILLA VEREDA SANTO DOMINGO



VISTA DE ADECUACION DE DESCOLE ALCANTARILLA



VISTA GENERAL SECCION TRANVERSAL ALCANTARILLA



VISTA GENERAL DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CAMPO PARA ALCANTARILLA EN EJECUCION



VISTA GENERAL DE CABEZOTE DESCOLE ALCANTARILLA



VISTA GENERAL DE ACTIVIDADES EN ALCANTARILLA







	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 28/03/25 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 91 del 25/03/25 al 27/03/25 | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JEAN ARIEL CURMEN | **GOBERNACIÓN - 1943**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

VISTA DE ACTIVIDADES EN CAMPO VEREDA HELECHAR

LOS PATIOS



VISTA GENERAL NO EJECUCION DE ACTIVIDADES DE CAMPO

VISTA GENERAL SECCION TRANSVERSAL DE PLACA HUELLA



VISTA GENERAL NO EJECUCION DE ACTIVIDADES DE CAMPO

VISTA GENERAL DE ARMADO DE FORMALETA



REUNION EN CAMPO CON LA COMUNIDAD

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Por parte de la interventoría durante el periodo se han enviado las siguientes comunicaciones con el fin exigirle al contratista de obra UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590 el complimiento de las obligaciones de manera ágil y oportuna:

1. Mediante el comunicado GIC-INVIAS-NTS-137-25 del 06 de marzo de 2025 se solicita la remision de soportes de pago realizados al maestro de obra, trabajadores y proveedores en el Municipio de Los Patios, Arboledas y Gramalote.
2. Mediante el comunicado GIC-INVIAS-NTS-138-25 del 07 de marzo de 2025 se da respuesta solcitud incumplimiento contractual contrato 02590-2022 - solicitud de inicio proceso administrativo por incumplimiento contractual, debido al incumplimiento en pago de obligaciones asumidas por el contratista por concepto de aportes de seguridad social, pensiones, riesgos y aportes parafiscales de contrato a la fecha.
3. Mediante el comunicado GIC-INVIAS-NTS-139-25 del 10 de marzo de 2025 se da respuesta al oficio 029, suspension contrato de obra 2590 a la veeduría ciudadana del Municipio de Los Patios.
4. Mediante el comunicado GIC-INVIAS-NTS-146-25 del 12 de marzo de 2025 se emite comunicado referente a alerta de taponamiento descole de aguas lluvias K0+630 tramo 1 - Vereda Corozal, Municipio de los patios.
5. Mediante el comunicado GIC-INVIAS-NTS-147-25 del 15 de marzo de 2025 se le reitera al contratista de obra la remision de soportes de pago realizados al maestro de obra, trabajadores y proveedores en el Municipio de Los Patios, Arboledas y Gramalote.
6. Mediante el comunicado GIC-INVIAS-NTS-148-25 del 17 de marzo de 2025 se da respuesta al oficio utet-02590-478 con asunto: respuesta comunicación gic-invias-nts-0089-25 y oficio 4000, solcitud de restablecimiento económico del contrato por ajuste de precios debido a cambios de vigencia 2023 2024 y 2024 a 2025 – observaciones
7. Mediante el comunicado GIC-INVIAS-NTS-0153-25 del 25 de marzo de 2025 se le solicita al contratista de obra reinicio de actividades del contrato de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JAIRO ANDRÉS QUINTERO GÓMEZ

Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 25 Y EL 31 DE MARZO DE 2025

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/03/25 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: Mar-25

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 2.

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2021

INTERVENTORÍA: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

CONTRATOS DE OBRA No. Contratos derivados de los convenios interadministrativos 1791-2021 (ABREGO), 1863-2021 (LA PLAYA DE BELEN), 1814-2021 y 1758 -2021 (OCAÑA), 1859-2021 (CACHIRA), 1861-2021 (HERRAN), 1878-2021 (PAMPLOMITA), 1821-2021 (PAMPLONITA, 1943-2021, 2052-2021 y 2033-2021 (GOBERNACION DE NTS)

CONTRATISTAS: N/A

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																												
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	**9**	10	11	12	13	14	15	**16**	17	18	19	20	21	22	**23**	24	25	26	27	28	29	30	31
VEHÍCULO	Renault Duster ENM-086																									A	A	A	A	A		A
MOTOCICLETA	XR150L Honda HPS38F																									A	A	A	A	A		A

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

SOAT VEHÍCULO EMN 086 : Desde 07-06-2024 hasta el 06-06-2025.
TECNOMECANICA: Desde 30-10-2024 hasta el 30-10-2025
SOAT MOTOCICLETA HPS 38F : Desde 20-03-2024 hasta el 19-03-2025.
TECNOMECANICA: Desde 20-03-2024 hasta el 20-03-2025

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:

1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Firmado digitalmente por VALERO ESCALANTE LEONEL

Firma

Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 28/02/25 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 2.

FECHA DE INICIO: 26/09/22

PLAZO INICIAL: 27 MESES Y 17 DÍAS

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 02/0/24 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 4.288.164.910,00

VALOR ADICIONES $ 268.536.435,20
VALOR ADICIONES $ 500.000.000,00
VALOR ACUMULADO: $ 5.056.701.345,20 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 428.816.491,00	24	6	2022	30	6	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 857.632.982,00	24	6	2022	30	6	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 857.632.982,00	24	6	2022	31	12	2027
Calidad del servicio		$ 1.286.449.473,00	31	12	2024	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 140991

Certificado de modificación o anexo No.: 4110039402
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUREXPO BANCOLDEX-CESCE

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 26/08/22

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ACTA DE INICIO N.A

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 428.816.491,00	24	6	2022	30	6	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 857.632.982,00	24	6	2022	30	6	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 857.632.982,00	24	6	2022	31	12	2027
Calidad del servicio		$ 1.286.449.473,00	31	12	2024	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 140991

Certificado de modificación o anexo No.: ANEXO 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUREXPO BANCOLDEX-CESCE

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 20/10/22

ADICION No. 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 455.670.134,50	24	6	2022	30	6	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 857.616.760,14	24	6	2022	30	6	2025

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 28/02/25 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 2.

			VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 911.340.270,00	24	6	2022	31	12	2027
Calidad del servicio		$ 1.367.101.404,00	31	12	2024	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 140991

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUREXPO BANCOLDEX-CESCE

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 21/03/24

ADICION No. 2

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 505.670.134,52	24	6	2022	30	6	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 857.616.760,14	24	6	2022	30	6	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 1.011.340.269,04	24	6	2022	31	12	2027
Calidad del servicio		$ 1.517.010.403,56	31	12	2024	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 140991

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUREXPO BANCOLDEX-CESCE

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 13/06/24

PRORROGA No. 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 505.670.134,52	24	6	2022	28	8	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 857.616.760,14	24	6	2022	28	8	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 1.011.340.269,04	24	6	2022	28	2	2028
Calidad del servicio		$ 1.517.010.403,56	28	2	2025	28	2	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 140991

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUREXPO BANCOLDEX-CESCE

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

PRORROGA No. 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 505.670.134,52	24	6	2022	28	8	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 857.616.760,14	24	6	2022	28	8	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 1.011.340.269,04	24	6	2022	28	2	2028

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 28/02/25 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 2.

Calidad del servicio		$ 1.517.010.403,56		28	2	2025		28	2	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 140991

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUREXPO BANCOLDEX-CESCE

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el

Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Firmado digitalmente por VALERO ESCALANTE LEONEL

Firma

Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN1-IN-15-FR-15
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 28/02/25 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 2.

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

FECHA DE INICIO: 26/09/22 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 27 MESES Y 17 DÍAS **FECHA DE VENCIMIENTO:** 28/02/25 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE OBRA No: Contratos derivados de los convenios interadministrativos 1791-2021 (ABREGO), 1863-2021 (LA PLAYA DE BELÉN), 1814-2021 y 1758 -2021 (OCAÑA), 1859-2021 (CACHIRA), 1861-2021 (HERRÁN), 1878-2021 (PAMPLONITA), 1821-2021 (PAMPLONITA, 1943-2021, 2052-2021 y 2033-2021 (GOBERNACIÓN DE NTS) (Indicar número y año)

CONTRATISTA: N.A

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI x NO _____ APROBADO: SI _____ NO _____ X VERSIÓN No. 0 FECHA DE VERSIÓN: **17/01/23**

OBSERVACIONES:
Se remite Plan de Calidad al INVIAS con comunicado GIC-INVIAS-NTS-282-22 del 20 de febrero de 2023. No se ha tenido respuesta de parte del Instituto.

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI _____ NO x
PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI _____ NO x
No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: 0
No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: 0
FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA:
FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA:

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI x NO _____ APROBADO: SI _____ NO X FECHA DE APROBACIÓN:

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _____ No. TOTAL DE ENSAYOS EJECUTADOS EN EL MES:

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI _____ x NO _____

OBSERVACIONES:
Se remite Plan de Calidad al INVIAS con comunicado GIC-INVIAS-NTS-282-22 del 20 de febrero de 2023. No se ha tenido respuesta de parte del Instituto.

El plan de Inspección, medición y ensayo de la Interventoría corresponde al control de calidad efectuado de manera independiente al PIMyE desarrollado como autocontrol de calidad por parte del Contratista de Obra.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en el PIMyE aplicado por el Contratista de obra durante el mes.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0
No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes: 0
No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0
No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato: 0
No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

OBSERVACIONES:
No se han generado no conformidades

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0
No. De quejas y reclamos atendidas en el mes: 0
No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0
No. Acumulado de quejas y reclamos recibidas por el contrato: 0
No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 0
No. Acumulado de quejas y reclamos atendidas en el contrato: 0

OBSERVACIONES:
No se han presentado quejas y/o reclamos

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =	100%	Nº de Informes entregados en el período, sin reclamaciones debido a la fecha de entrega / Nº de Informes entregados en el período *100
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1	Maquina de los Ángeles	Arcinge	1022019	1/08/22	6/09/22		
2	Maquina de ensayos a Compresión	No presenta	PSGS-01	1/08/22	6/08/22		
3	Manómetro Humedometro	Vincicol	No presenta	1/08/22	6/09/22		
4	Instrumento de Pesaje no automático	Mavin	2018010102	1/08/22	5/08/22		
5	Instrumento de Pesaje no automatice	Trumax	3202085057	1/08/22	5/08/22		
6	Instrumento de Pesaje no automático	OHAUS	B337764871	1/08/22	5/08/22		
7	MÁQUINA SEMIAUTOMÁTICA DIGITAL PARA ENSAYOS MARSHALL Y CBR	VINCICOL INGENIERÍA S.A.S.	140219 // J180911306	1/08/22	6/08/22		

OBSERVACIONES:

NOTA:
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre: JAIRO ANDRÉS QUINTERO GÓMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Firma
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No

Firmado digitalmente por VALERO ESCALANTE LEONEL

Firma
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 25 Y EL 31 DE MARZO DE 2025

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

GOBERNACIÓN 1943

CONTRATO DE OBRA No. 02590 DE 2022

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 25 Y EL 31 DE MARZO DE 2025

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**25 AL 27 MARZO 2025**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo Domingo.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general de descole alcantarilla.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**25 AL 27 MARZO 2025**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo Domingo.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general poceta de encole.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**25 AL 27 MARZO 2025**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo Domingo.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general poceta de encole.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**25 AL 27 MARZO 2025**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo Domingo.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general de acabado de poceta de encole.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**25 AL 27 MARZO 2025**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo Domingo.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Poceta de encole.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**25 AL 27 MARZO 2025**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo Domingo.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general de cabezote descole.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**25 AL 27 MARZO 2025**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo Domingo.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista adecuaciones y resanes.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**25 AL 27 MARZO 2025**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo Domingo.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general de alcantarilla terminada.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**25 AL 27 MARZO 2025**

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo Domingo.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista ubicación alcantarilla faltante elementos de encole y descole.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**25 AL 27 MARZO 2025**

FOTOGRAFÍA (10)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Volcán.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general acceso a tramo No1.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**25 AL 27 MARZO 2025**

FOTOGRAFÍA (11)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Volcán.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: finalización tramo 1.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**25 AL 27 MARZO 2025**

FOTOGRAFÍA (12)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Volcán.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general de actividades de actividades alcantarilla.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**25 AL 27 MARZO 2025**

FOTOGRAFÍA (13)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Volcán.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista alcantarilla elementos de encole y descole.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**25 AL 27 MARZO 2025**

FOTOGRAFÍA (14)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Volcán.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista de elementos de encole y descole.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**25 AL 27 MARZO 2025**

FOTOGRAFÍA (15)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Volcán.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista de acabado de cabezote alcantarilla.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**25 AL 27 MARZO 2025**

FOTOGRAFÍA (16)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Volcán.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Acero de refuerzo para cabezote alcantarilla doble.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**25 AL 27 MARZO 2025**

FOTOGRAFÍA (18)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Helechar.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista sección transversal de placa huella tramo No1.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**25 AL 27 MARZO 2025**

FOTOGRAFÍA (18)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Helechar.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de formaleta.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**25 AL 27 MARZO 2025**

FOTOGRAFÍA (18)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Helechar.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista de cabezote de descole alcantarilla.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**25 AL 27 MARZO 2025**

FOTOGRAFÍA (39)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Corozal - California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general – No ejecución de actividades.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**25 AL 27 MARZO 2025**

FOTOGRAFÍA (40)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Corozal - California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general – No ejecución de actividades.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**25 AL 27 MARZO 2025**

FOTOGRAFÍA (41)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Corozal - California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general – No ejecución de actividades.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**25 AL 27 MARZO 2025**

FOTOGRAFÍA (42)



UBICACIÓN: Municipio de Patios – Vereda California -Tramo 2
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general – No ejecución de actividades.

CONTROL CORRESPONDENCIA

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 25 Y EL 31 DE MARZO DE 2025

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

RECIBIDA

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 25 Y EL 31 DE MARZO DE 2025

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

BITACORA

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 25 Y EL 31 DE MARZO DE 2025

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

Jueves 20 de Febrero de 2025
Clima = Soleado sin precipitaciones.
Nota = Se realiza suspensión del contrato de obra, hasta el día 25 de marzo de 2025.

Director de Obra

José H. Torres Suarez
Residente de Interventoría

Martes 25 de Marzo de 2025
Clima = Soleado
Nota = El contratista de obra el día de hoy no realiza actividades en campo, se encontraba en logística de materiales.

Director de Obra

José H. Torres Suarez
Residente de Interventoría

Miercoles 26 de Marzo de 2025
Clima = Soleado
Nota = El contratista de obra el día de hoy continua sin ejecutar actividades de obra, no hay personal de obra se encuentra en logística de materiales y personal.

Director de Obra

José H. Torres Suarez
Residente de Interventoría

Jueves 27 de Marzo de 2025
Clima = Parcialmente nublado.
Nota = El contratista de obra continua sin ejecutar actividades en campo el día de hoy no hay personal de obra se encuentra en logística de materiales y personal

Director de Obra

José H. Torres Suarez
Residente de Interventoría

Viernes 28 de Marzo de 2025
Clima = nublado, parcialmente soleado
Nota = El contratista de obra continua sin ejecutar actividades en campo, no se evidencia personal de obra se encuentra en logística de materiales, maquinaria y personal.

Director.

José H. Torres Suarez
Residente de Interventoría

Sabado 29 de marzo de 2025
Clima = Soleado, parcialmente nublado
Nota = El día de hoy el contratista no realizo actividades de obra en campo, no se evidencian personal se encuentra en logística de material, maquinaria y personal y espera de contestación de ajuste de precios por cambio de anualidad.

Director de Obra

José H. Torres Suarez
Residente de Interventoría

Domingo 30 de marzo de 2025
Clima = Soleado sin precipitaciones
Nota = No se presento personal de obra debido a que aun en dia festivo.

Director de Obra.

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

Lunes 31 de marzo de 2025
Clima = Soleado sin precipitaciones
Nota = El contratista de obra continua sin realizar actividades de obra en campo, a su mismo no se evidencia personal en sitio. se realiza reunion con maestro de obra para retomar actividades, el contratista continúa a la espera de respuesta de interventoria de solicitud de ajuste por cambio de anualidad.

Director de Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

25 de Marzo de 2025
Vereda Santo Domingo. Clima: Soleado
El Dia de hoy se reinicia Contrato de Obra 0259-2022 y el Contratista realiza Algunos resanes y Adecuaciones de Accesos de Cuentas a elementos de Alcantarillas (Pozetas de entrada y Descoles).
• Personal de obra: Ingeniero Residente, Residente de Interventoria, 1 Maestro, (2) Ayudantes.
• Maquinaria y/o Equipo: Mezcladora.

Director de Obra

José H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

26 de Marzo de 2025
Vereda Santo Domingo Clima: Soleado
• Personal de obra: Ingeniero Residente, Residente de Interventoria, 1 Maestro, (3) Ayudantes,
• Maquinaria y/o equipo: Mezcladora
• Actividades ejecutadas.
Se Continuan Actividades de Resane de elementos de Alcantarilla (Pozeta de entrada y Descole), de Igual Manera Se Realiza Armado de formaleta para Bordillos para Adecuacion de Accesos (descole) Alcantarillas.

Vereda Volcan Clima. Soleado
• Personal de obra: Ingeniero Residente, Residente de Interventoria, 1 Maestro, (3) Ayudantes
• Maquinaria y/o Equipo. Mezcladora.

Actividades ejecutadas.
El Dia de Hoy se Realizan Actividades de instalacion de formaleta para Modulacion de Alcantarilla Doble y se Procede al Retranque de la Misma de Pacata de encole.
Se Realiza Acopio de Material Petreo (Arena y Triturado) para Alcantarilla.

Vereda Helechar Clima: Soleado
· Personal de Obra: Ingeniero Residente, Residente de Interventoria, (1) Maestro, (1) Ayudante, (3) Ayudantes.
· Maquinaria y/o Equipo: Mezcladora.
· Actividades ejecutadas:
Se Realizan Instalacion de formaleta para elementos de Bordillo y, se Realiza Vaciado de Bordillos pendientes.

Director de Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

27 de Marzo de 2025
· Vereda Santa Domingo Clima: Soleado
· Personal de Obra: Ingeniero Residente, Residente de Interventoria, (1) Maestro, (3) Ayudantes
· Maquinaria y/o Equipo: Mezcladora de Concreta.
· Actividades ejecutadas.
Se Continua con Adecuacion de Cuneta y Bordillos de Accesos a elementos de encole y Descole de Alcantarillas

• Vereda Volcan Clima: Soleado
• Personal de obra: Ingeniero Residente, Residente de interventoria, (1) Maestro (3) Ayudantes.
• Maquinaria y/o equipo: Mezcladora.
• Actividades ejecutadas
El dia de hoy solo se Realizan Actividades de Armado de formaleta para Cabezote de descole Alcantarilla.
Se Realiza Acopio de Materiales petreos y se espera la llegada de Cemento.

Vereda Helechar Clima: Soleado
• Personal de Obra: Ingeniero Residente, Residente de Interventoria, (1) Maestro, (3) Ayudante, (1) Oficial.
• Maquinaria y/o equipo, Mezcladora
• Actividades ejecutadas
Se Realizo Adecuaciones de elementos de Cuneta para descole hacia Alcantarilla existente pendientes.

Director de obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria.

28 de Marzo de 2025
• Vereda Santo Domingo Clima: Soleado
• Personal de Obra: Ingeniero Residente, Residente de interventoria (1) Maestro (3) Ayudantes
• Maquinaria y/o Equipo: Mezcladora de Concreto.
• Actividades ejecutadas.

El día de hoy solo se realizan Actividades de Resane en Alcantarillas, Elementos de encole y Descole de los Mismos.
Se Realiza Acopio de Materiales en Campo.

Vereda Volcan Clima: Soleado
• Personal de Obra: Ingeniero, Residente, Residente de Interventoria, (1) Maestro, 3 Ayudantes
• Maquinaria y/o Equipo: Mezcladora de Concreto
• Actividades Ejecutadas
El día de hoy solo se realiza Acopio de Materiales Petreos, de igual Manera se traslada Madera faltante para Armado de Elemento de Alcantarilla.

Vereda Helechal Clima: Soleado
• Personal de Obra: Ingeniero, Residente, Residente de Interventoria, (1) Maestro, (1) Oficial, (3) Ayudantes,
• Maquinaria y/o Equipo: Mezcladora, Dumper
• Actividades Ejecutadas
Se continua con la instalacion de formaleta para Adecuacion de Descole de elementos hacia Alcantarilla.
Se Realiza Acopio de Materiales Petreos con Dumper.

Director de Obra

José H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

29 de Marzo de 2025
El día de hoy solo se realizan Actividades de Traslado de Materiales Pétreos y Arena hacia los frentes donde se realizan Actividades.

Director de Obra

José H. Torres Suarez
Residente de Interventoría

30 de Marzo de 2025
Día no laboral No se ejecutan Actividades en planta.

Director de Obra

José H. Torres Suarez
Residente de Interventoría.

31 de Marzo de 2025
Vereda Santo Domingo Clima: Soleado
• Personal de obra: Ingeniero Residente, Residente de Interventoría, (1) Maestro, (1) Oficial, (3) Ayudantes
• Maquinaria y/o Equipo: Mezcladora
• Actividades ejecutadas
El día de hoy se continuan Actividades de Obras de Drenaje Alcantarillas en la que tiene que ver al figurado de Acero de 1/2" y 3/8" para elementos pendientes.

Vereda Volcan Clima: Soleado
• Personal de obra: Ingeniero Residente, Residente de Interventoría, (1) Maestro, (1) Oficial, (3) Ayudantes
• Maquinaria y/o Equipo: Mezcladora.

líder

Actividades Ejecutadas:
Se finaliza Armado de Elementos de encole y Descole de Alcantarilla y se procede a Realizar el Vaciado de las Mismas en Concreto de 21Mpa elaborado en obra.

Vereda Helechar Clima: Soleado
- Personal de Obra: Ingeniero Residente, Residente de Interventoria, (1) Maestra, (1) Oficial y (3) Ayudantes
- Maquinaria y/o Equipo: Mezcladora de Concreto, Bomber
- Actividades ejecutadas
Se Continua con Adecuacion de Cuneta hacia Accesos a Alcantarillas, se esta a la espera de Cemento para Vaciado de Acceso de Cunetas Pendientes.

Director de obra.

Jose H. Tarres Suarez
Residente de Interventoria.
