SEPTIEMBRE 2025 INFORME PARCIAL DE OBRA

INERCIA S.A.S

MUNICIPIO DE VALPARAISO

RECIBIDO

FECHA: 23/09/2025

HORA: 02:33 PM

OFICINA CONTRATACIÓN

Valparaíso – Caquetá, 08 de septiembre de 2025

Ingeniera
YESSIKA ADRIANA JIMENEZ FORERO
Secretaria de Planeación
Supervisor Contrato CO-003-2025
Alcaldía de Valparaíso

REF: Contrato CO-003-2025 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DE LAS VEREDAS EL AGUILA, BUENAVISTA, LA RICO Y LOS CENTROS POBLADOS DE PLAYA RICA Y KILOMETRO 18 DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO CAQUETA."."

ASUNTO: INFORME PARCIAL DE OBRA. Periodo comprendido entre el 16 de junio de 2025 al 31 de julio de 2025.

Respetuosamente presento el informe del contrato de obra de la referencia, cumpliendo con las designaciones enmarcadas en el contrato.

Cordialmente;

DIANA MARCELA QUIROGA DIAZ
INERCIA S.A.S
INGENIEROS CONSULTORES
Representante Legal

Anexo: 253 *Folios*

ACTA DE SUPERVISIÓN 1

En las instalaciones de la Secretaria de Planeación, Desarrollo e Infraestructura del Palacio Municipal, se reunieron, por un lado, en representación del Municipio de Valparaíso:

SUPERVISOR	YESSIKA ADRIANA JIMÉNEZ FORERO
TIPO Y No. IDENTIFICACIÓN	C.C. 1.117.522.940 de Florencia - Caquetá
CARGO	SECRETARIA DE PLANEACION DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA ALCALDIA VALPARAISO - CAQUETA

Y por el otro:

CONTRATISTA:	INERCIA S.A.S
TIPO Y No. IDENTIFICACIÓN	Numero de Identificación Tributaria NIT: 901.048.151-1
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	DIANA MARCELA QUIROGA DIAS
TIPO Y No. IDENTIFICACIÓN	C.C. 26.427.423

Una vez recepcionado el informe de ejecución de actividades presentado por parte de INERCIA S.A.S referente al Contrato De Obra No. 003 Del 03 de junio de 2025:

TIPO	CONTRATO DE OBRA
No.	C.O-003-2025
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DE LAS VEREDAS EL AGUILA, BUENAVISTA, LA RICO Y LOS CENTROS POBLADOS DE PLAYA RICA Y KILOMETRO 18 DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO CAQUETA
FECHA DE CELEBRACIÓN	3/06/2025
PLAZO	El plazo de ejecución del contrato será de tres (03) mes, contados a partir de la suscripción del acta de inicio de actividades, en todo caso sin superar el 30 de diciembre de 2025.

VALOR	CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS ($ 181.172.282) M/CTE.
FORMA DE PAGO	El municipio realizara pagos parciales mediante el sistema de precio unitario por entregas parciales de obra y recibidas a satisfacción, hasta completar el monto del noventa por ciento (90%) del valor total del contrato previa certificación de cumplimiento expedida por el supervisor externo del contrato, acompañadas de la certificación de pago de obligaciones asumidas por parte del contratista por concepto de salud, pensión, riesgos profesionales, aportes a cajas de compensación familiar, ICBF y SENA. Un último pago, correspondiente al diez (10%) del valor total del contrato de obra, de acuerdo con las cantidades realmente ejecutadas y recibidas a satisfacción, este desembolso se realizará previa suscripción del acta de recibo final de las obras a satisfacción por parte del supervisor y el Municipio, así como de la aprobación de las garantías correspondientes señaladas, parafiscales y demás requisitos y una vez se haya liquidado el contrato.
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD INICIAL	CDP No. 2025000183 del 22 de abril de 2025
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD ADICIONAL	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL	RP NO. 235 del 03 de Junio de 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL	N/A
ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA NIT: 860.524.654-6
No. GARANTÍA	Cumplimiento: 560 47 994000190540 R.C.E. 560 74 994000035217
FECHA DE APROBACION	11 DE JUNIO DE 2025
MODIFICACIONES A LA GARANTÍA	ANEXO 0-CONTRACTUAL ANEXO 1-ACTA DE INICIO

FECHA DE INICIO	16/06/2025		
PLAZO INICIAL	TRES (3) MESES		
ACTA No. 01 MODIFICACION DEL CONTRATO	23 DE JUNIO DE 2025		
PRORROGRA	NA		
PLAZO FINAL	TRES (03) MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	15/09/2025		
FECHA TERMINACIÓN FINAL	15/09/2025		
VALOR EJECUTADO	CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS M/CTE. ($ 134.940.316.oo)		
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($ 46.231.966.oo)		
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$0.00		
VALOR PAGADO	$0.00		
VALOR A PAGAR	CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS M/CTE. ($ 134.940.316.oo)		
PERIODO EJECUTADO:	Desde el 16/06/25 AL 31/07/25		
INFORMACIÓN ANTICIPO			
% ANTICIPO	_____%	VALOR:	
FECHA DE DESEMBOLSO			
	No. ACTA	VALOR	
AMORTIZACIÓN REALIZADA	NA	NA	
	NA	NA	
	Total mortizado:	NA	
VALOR POR AMORTIZAR EN ESTA ACTA	NA		
SALDO POR AMORTIZAR	NA		

RL= Representante Legal; NA= No Aplica; ND= No Disponible

La Supervisora manifiesta que ha adelantado el ejercicio de la supervisión las siguientes actividades:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES				MODIFICACION No. 01		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 01	
		UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
1	IE. RURAL LA MUÑOZ SEDE ESPERANZA TROCHA 5								
1.1	DEMOLICION PISO Y/O ANDEN E=0.08	M2	96,00	$ 9.908,15	$ 951.182,00	82,32	$ 815.639,00	82,32	$ 815.639,00
1.2	PISO Y/O ANDEN EN CONCRETO 8 CM 3000 PSI	M2	96,00	$ 62.981,47	$ 6.046.221,00	82,32	$ 5.184.635,00	82,32	$ 5.184.635,00
1.3	DESMONTE DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA MET., GALV., ZINC, FIBROCEMENTO , ETERNIT O SIMILAR, PAGADO EN M2	M2	120,00	$ 16.039,21	$ 1.924.705,00	130,00	$ 2.085.097,00	130,00	$ 2.085.097,00
1.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA	M	96,00	$ 50.030,37	$ 4.802.916,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1.5	SUM. E INST. CUBIERTA TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2.5MM BLANCO O SIMILAR (NO INCL. ENTRAMADO NI CABALLETE, INCL. TORNILLO)	M2	120,00	$ 92.372,05	$ 11.084.646,00	0,00	$ -	0,00	$ -

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES				MODIFICACION No. 01		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 01	
		UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
1.6	CABALLETE UPVC	M	10,00	$ 71.052,20	$ 710.522,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1.7	ESTUCO PLASTICO MURO [PASTA]	M2	64,00	$ 16.016,95	$ 1.025.085,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1.8	PINTURA VINILO TOPO 1	M2	192,00	$ 13.706,52	$ 2.631.652,00	81,80	$ 1.121.193,00	77,80	$ 1.066.367,00
SUBTOTAL CAP. 1 IE. RURAL LA MUÑOZ SEDE ESPERANZA TROCHA 5					**$ 29.176.929,00**		**$ 9.206.564,00**		**$ 9.151.738,00**
2	**IE. RURAL LA RICO KM30 SEDE BUENAVISTA**								
2.1	PISO Y/O ANDEN EN CONCRETO 8 CM 3000 PSI	M2	32,00	$ 62.981,47	$ 2.015.407,00	60,00	$ 3.778.888,00	0,00	$ -
2.2	COLUMNA CONCRETO 3000 PSI	M3	1,54	$1.096.793,69	$ 1.689.062,00	0,75	$ 822.595,00	0,00	$ -
2.3	VIGA CIMIENTACION CONCRETO 3000 PSI	M3	1,45	$ 990.196,17	$ 1.435.784,00	2,85	$ 2.822.059,00	0,00	$ -
2.4	VIGA CONCRETO AEREA 3000 PSI	M3	1,45	$1.266.558,45	$ 1.836.510,00	0,72	$ 911.922,00	0,00	$ -
2.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA	M	42,00	$ 50.030,37	$ 2.101.276,00	0,00	$ -	0,00	$ -
2.6	SUM. E INST. CUBIERTA TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2.5MM BLANCO O SIMILAR (NO INCL. ENTRAMADO NI CABALLETE, INCL. TORNILLO)	M2	60,00	$ 92.372,05	$ 5.542.323,00	0,00	$ -	0,00	$ -
2.7	CABALLETE UPVC	M	5,00	$ 70.635,28	$ 353.176,00	0,00	$ -	0,00	$ -

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES				MODIFICACION No. 01		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 01	
		UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
2.8	MAMPOSTERÍA EN BLOQUE N°4	M2	60,00	$ 64.684,00	$ 3.881.040,00	72,00	$ 4.657.248,00	0,00	$ -
2.9	ESTUCO PLASTICO MURO [PASTA]	M2	120,00	$ 15.600,03	$ 1.872.004,00	144,00	$ 2.246.404,00	0,00	$ -
2.10	PINTURA VINILO TOPO 1	M2	120,00	$ 13.382,25	$ 1.605.870,00	144,00	$ 1.927.044,00	0,00	$ -
2.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO ELECTRICO ELECTRO BOMBA	UND	1,00	$1.051.690,52	$ 1.051.691,00	0,00	$ -	0,00	$ -
SUBTOTAL CAP. 2 IE. RURAL LA RICO KM30 SEDE BUENAVISTA					**$ 23.384.143,00**		**$ 17.166.160,00**		**$ -**
3	**IE. RURAL LA RICO KM30 SEDE LA RICO**								
3,1	DESMONTE DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA MET., GALV., ZINC, FIBROCEMENTO, ETERNIT O SIMILAR, PAGADO EN M2	M2	94,50	$ 16.039,21	$ 1.515.705,00	106,09	$ 1.701.600,00	106,09	$ 1.701.600,00
3,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA	M	76,00	$ 50.030,37	$ 3.802.308,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,3	SUM. E INST. CUBIERTA TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2.5MM BLANCO O SIMILAR (NO INCL. ENTRAMADO NI CABALLETE, INCL. TORNILLO)	M2	94,50	$ 92.372,05	$ 8.729.159,00	0,00	$ -	0,00	$ -

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES				MODIFICACION No. 01		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 01	
		UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
3,4	CABALLETE UPVC	M	9,00	$ 70.635,28	$ 635.718,00	0,00	$ -	0,00	$ -
SUBTOTAL CAP. 3 IE. RURAL LA RICO KM30 SEDE LA RICO					**$ 14.682.890,00**		**$ 1.701.600,00**		**$ 1.701.600,00**
4	**IE. RURAL NIEVES ARRIBA**								
4,1	COLUMNA CONCRETO 3000 PSI	M3	2,30	$ 1.084.093,14	$ 2.493.414,00	0,00	$ -	0,00	$ -
4,2	VIGA CIMIENTO CONCRETO 3000 PSI	M3	3,60	$ 982.197,51	$ 3.535.911,00	0,00	$ -	0,00	$ -
4,3	VIGA CONCRETO AEREA 3000 PSI	M3	3,60	$ 1.266.558,45	$ 4.559.610,00	0,00	$ -	0,00	$ -
4,4	DESMONTE DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA MET., GALV., ZINC, FIBROCEMENTO, ETERNIT O SIMILAR, PAGADO EN M2	M2	182,00	$ 16.039,21	$ 2.919.136,00	185,00	$ 2.967.254,00	185,00	$ 2.967.254,00
4,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA	M	168,00	$ 50.030,37	$ 8.405.102,00	0,00	$ -	0,00	$ -

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES				MODIFICACION No. 01		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 01	
		UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
4,6	SUM. E INST. CUBIERTA TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2.5MM BLANCO O SIMILAR (NO INCL. ENTRAMADO NI CABALLETE, INCL. TORNILLO)	M2	182,00	$ 92.372,05	$ 16.811.713,00	0,00	$ -	0,00	$ -
4,7	CABALLETE UPVC	M	24,00	$ 70.635,28	$ 1.695.247,00	0,00	$ -	0,00	$ -
4,8	ESTUCO PLASTICO MURO [PASTA]	M2	192,00	$ 15.600,03	$ 2.995.206,00	0,00	$ -	0,00	$ -
4,9	PINTURA VINILO TOPO 1	M2	192,00	$ 13.382,25	$ 2.569.392,00	244,78	$ 3.275.707,00	244,78	$ 3.275.707,00
SUBTOTAL CAP. 4 IE. RURAL NIEVES ARRIBA					**$ 45.984.731,00**		**$ 6.242.961,00**		**$ 6.242.961,00**
5	**IE. RURAL PLAYA RICA**								
5,1	COLUMNA CONCRETO 3000 PSI	M3	0,75	$1.084.093,14	$ 813.070,00	0,29	$ 314.387,00	0,29	$ 314.387,00
5,2	VIGA CIMIENTO CONCRETO 3000 PSI	M3	1,8	$ 982.197,51	$ 1.767.956,00	0,60	$ 589.319,00	0,60	$ 589.319,00
5,3	DESMONTE DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA MET., GALV., ZINC, FIBROCEMENTO, ETERNIT O SIMILAR, PAGADO EN M2	M2	60,00	$ 16.039,21	$ 962.353,00	56,00	$ 898.196,00	56,00	$ 898.196,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES				MODIFICACION No. 01		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 01	
		UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
5,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA	M	60,00	$ 50.030,37	$ 3.001.822,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5,5	SUM. E INST. CUBIERTA TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2.5MM BLANCO O SIMILAR (NO INCL. ENTRAMADO NI CABALLETE, INCL. TORNILLO)	M2	60,00	$ 92.372,05	$ 5.542.323,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5,6	MAMPOSTERÍA EN BLOQUE N°4	M2	70,00	$ 64.684,00	$ 4.527.880,00	2,64	$ 170.766,00	2,64	$ 170.766,00
5,7	CABALLETE UPVC	M	6,00	$ 70.635,28	$ 423.812,00	0,00	$ -	0,00	$ -
	SUBTOTAL CAP. 5 IE. RURAL PLAYA RICA				**$ 17.039.216,00**		**$ 1.972.668,00**		**$ 1.972.668,00**
6	**TRANSPORTE DE MATERIAL**								
6,1	TRANSPORTE MATERIALES PETREOS DESDE O HACIA LA OBRA ZONA RURAL	M3-KM	2616,91	$ 2.000,00	$ 5.233.820,00	291,84	$ 583.680,00	0,00	$ -
6,2	TRANSPORTE DE MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO DESDE CASCO URBANO HASTA LA OBRA ZONA RURAL	VIAJE	7,00	$ 250.000,00	$ 1.750.000,00	5,00	$ 1.250.000,00	0,00	$ -
SUBTOTAL CAP. 6 IE. TRANSPORTE DE MATERIAL					**$ 6.983.820,00**		**$ 1.833.680,00**		**$ -**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES				MODIFICACION No. 01		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 01	
		UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
IP 1	**IE. RURAL PLAYA RICA**								
IP 1.1	VIGA CONCRETO AEREA 3000 PSI	M3	-	$1.266.558,45	$ -	0,22	$ 278.643,00	0,22	$ 278.643,00
IP 1.2	PISO Y/O ANDEN EN CONCRETO 8 CM 3000 PSI	M2	-	$ 62.981,47	$ -	2,00	$ 125.963,00	2,00	$ 125.963,00
IP 1.3	DEMOLICION PISO Y/O ANDEN E=0.08	M2	-	$ 9.908,15	$ -	2,00	$ 19.816,00	2,00	$ 19.816,00
IP 1.4	PINTURA VINILO TOPO 1	M2	-	$ 13.382,25	$ -	175,02	$ 2.342.161,00	175,02	$ 2.342.161,00
SUBTOTAL ITEM PREVISTOS IE. RURAL PLAYA RICA					**$ -**		**$ 2.766.583,00**		**$ 2.766.583,00**
NP	**NO PREVISTOS**								
NP 1	**IE. RURAL LA MUÑOZ SEDE ESPERANZA TROCHA 5**								
NP 1.1	MANTENIMIENTO DE MUROS (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES, LIMPIEZA, RESANE Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE)	M2	-	$ 14.542,00	$ -	15,00	$ 218.130,00	0,00	$ -
NP 1.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO RECTANGULAR 100 X 40 X 2.0MM	KG	-	$ 13.504,00	$ -	802,47	$ 10.836.555,00	802,47	$ 10.836.555,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES				MODIFICACION No. 01		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 01	
		UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
NP 1.3	SUM. E INST. CUBIERTA MET. GALV. CAL. 26 PREPINTADA POR AMBAS CARAS POR EL FABRICANTE, TIPO M-1000 O SIMILAR (NO INCL. ENTRAMADO NI CABALLETE, INCL. TORNILLO), PAGADO EN m2	M2	-	$ 79.771,00	$ -	130,00	$ 10.370.230,00	130,00	$ 10.370.230,00
NP 1.4	SUM. E INST. CABALLETE MET. GALV. CAL. 26 PARA CUBIERTA M-1000 O SIMILAR, PREPINTADO POR AMBAS CARAS POR EL FABRICANTE, PAGADO EN m	M	-	$ 69.972,20	$ -	30,20	$ 2.113.160,00	30,20	$ 2.113.160,00
NP 1.5	BORDILLO EN CONCRETO 3000 PSI 10 X 20 CM	M	-	$ 34.687,62	$ -	44,30	$ 1.536.662,00	44,30	$ 1.536.662,00
SUBTOTAL CAP. NP 1 IE. RURAL LA MUÑOZ SEDE ESPERANZA TROCHA 5					**$ -**		**$ 25.074.737,00**		**$ 24.856.607,00**
NP 2	**IE. RURAL LA RICO KM 30 SEDE LA RICO**								

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES				MODIFICACION No. 01		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 01	
		UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
NP 2.1	MANTENIMIENTO DE MUROS (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES, LIMPIEZA, RESANE Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE)	M2	-	$ 14.542,00	$ -	70,00	$ 1.017.940,00	0,00	$ -
NP 2.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20	M	-	$ 128.843,00	$ -	10,10	$ 1.301.314,00	10,10	$ 1.301.314,00
NP 2.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO RECTANGULAR 100 X 40 X 2.0MM	KG	-	$ 13.504,00	$ -	509,30	$ 6.877.587,00	509,30	$ 6.877.587,00
NP 2.4	SUM. E INST. CUBIERTA MET. GALV. CAL. 26 PREPINTADA POR AMBAS CARAS POR EL FABRICANTE, TIPO M-1000 O SIMILAR (NO INCL. ENTRAMADO NI CABALLETE, INCL. TORNILLO), PAGADO EN m2	M2	-	$ 79.771,00	$ -	106,09	$ 8.462.905,00	106,09	$ 8.462.905,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES				MODIFICACION No. 01		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 01	
		UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
NP 2.5	SUM. E INST. CABALLETE MET. GALV. CAL. 26 PARA CUBIERTA M-1000 O SIMILAR, PREPINTADO POR AMBAS CARAS POR EL FABRICANTE, PAGADO EN m	M	-	$ 69.972,20	$ -	10,30	$ 720.714,00	10,30	$ 720.714,00
SUBTOTAL CAP. NP 2 IE. RURAL LA RICO KM 30 SEDE LA RICO					**$ -**		**$ 18.380.460,00**		**$ 17.362.520,00**
NP 3	**IE. RURAL NIEVES ARRIBA**								
NP 3.1	MANTENIMIENTO DE MUROS (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES, LIMPIEZA, RESANE Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE)	M2	-	$ 14.542,00	$ -	123,35	$ 1.793.756,00	0,00	$ -
NP 3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO RECTANGULAR 100 X 40 X 2.0MM	KG	-	$ 13.504,00	$ -	769,05	$ 10.385.251,00	769,05	$ 10.385.251,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES				MODIFICACION No. 01		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 01	
		UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
NP 3.3	SUM. E INST. CUBIERTA MET. GALV. CAL. 26 PREPINTADA POR AMBAS CARAS POR EL FABRICANTE, TIPO M-1000 O SIMILAR (NO INCL. ENTRAMADO NI CABALLETE, INCL. TORNILLO), PAGADO EN m2	M2	-	$ 79.771,00	$ -	185,00	$ 14.757.635,00	185,00	$ 14.757.635,00
NP 3.4	SUM. E INST. CABALLETE MET. GALV. CAL. 26 PARA CUBIERTA M-1000 O SIMILAR, PREPINTADO POR AMBAS CARAS POR EL FABRICANTE, PAGADO EN m	M	-	$ 69.972,20	$ -	10,00	$ 699.722,00	10,00	$ 699.722,00
NP 3.5	PAÑETE 1:4 (INCL. FILOS Y DILATACIONES), PAGADO EN m2	M2	-	$ 40.615,00	$ -	23,50	$ 954.453,00	23,50	$ 954.453,00
SUBTOTAL CAP. NP 2 IE. RURAL NIEVES ARRIBA					**$ -**		**$ 28.590.817,00**		**$ 26.797.061,00**
NP 4	**IE. RURAL PLAYA RICA**								
NP 4.1	MANTENIMIENTO DE MUROS (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES, LIMPIEZA, RESANE Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE)	M2	-	$ 14.542,00	$ -	40,55	$ 589.622,00	0,00	$ -

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES				MODIFICACION No. 01		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 01	
		UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
NP 4.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO RECTANGULAR 100 X 40 X 2.0MM	KG	-	$ 13.504,00	$ -	272,55	$ 3.680.515,00	272,55	$ 3.680.515,00
NP 4.3	SUM. E INST. CUBIERTA MET. GALV. CAL. 26 PREPINTADA POR AMBAS CARAS POR EL FABRICANTE, TIPO M-1000 O SIMILAR (NO INCL. ENTRAMADO NI CABALLETE, INCL. TORNILLO), PAGADO EN m2	M2	-	$ 79.771,00	$ -	56,00	$ 4.467.176,00	56,00	$ 4.467.176,00
NP 4.4	SUM. E INST. CABALLETE MET. GALV. CAL. 26 PARA CUBIERTA M-1000 O SIMILAR, PREPINTADO POR AMBAS CARAS POR EL FABRICANTE, PAGADO EN m	M	-	$ 69.972,20	$ -	8,00	$ 559.778,00	8,00	$ 559.778,00
NP 4.5	PAÑETE 1:4 (INCL. FILOS Y DILATACIONES), PAGADO EN m2	M2	-	$ 40.615,00	$ -	9,00	$ 365.535,00	9,00	$ 365.535,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES				MODIFICACION No. 01		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 01	
		UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
NP 4.6	SUM. E INST. DE ACERO ESTRUCTURAL ASTM A - 572, A - 500 G, A - 36, A - 706 (GRADO B ó C9, A - 36) O SIMILAR, (INCL. BASE ANTICORROSIVA TIPO WASH PRIMER, PINTURA ACABADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO), PAGADO EN kg	KG	-	$ 15.488,00	$ -	146,51	$ 2.269.147,00	146,51	$ 2.269.147,00
NP 4.7	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	M3	-	$ 31.423,30	$ -	1,07	$ 33.623,00	1,07	$ 33.623,00
SUBTOTAL CAP. NP 2 IE. RURAL PLAYA RICA					**$ -**		**$ 11.965.396,00**		**$ 11.375.774,00**
NP 5	**IE. RURAL LA RICO KM30 SEDE BUENAVISTA**								
NP 5.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO RECTANGULAR 100 X 40 X 2.0MM	KG	-	$ 13.504,00	$ -	312,48	$ 4.219.730,00	0,00	$ -

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES				MODIFICACION No. 01		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 01	
		UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
NP 5.2	SUM. E INST. CUBIERTA MET. GALV. CAL. 26 PREPINTADA POR AMBAS CARAS POR EL FABRICANTE, TIPO M-1000 O SIMILAR (NO INCL. ENTRAMADO NI CABALLETE, INCL. TORNILLO), PAGADO EN m2	M2	-	$ 79.771,00	$ -	60,00	$ 4.786.260,00	0,00	$ -
NP 5.3	SUM. E INST. CABALLETE MET. GALV. CAL. 26 PARA CUBIERTA M-1000 O SIMILAR, PREPINTADO POR AMBAS CARAS POR EL FABRICANTE, PAGADO EN m	M	-	$ 69.972,20	$ -	6,00	$ 419.833,00	0,00	$ -
NP 5.4		M2	-	$ 40.615,00	$ -	72,00	$ 2.924.280,00	0,00	$ -

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES				MODIFICACION No. 01		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 01	
		UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
	PAÑETE 1:4 (INCL. FILOS Y DILATACIONES), PAGADO EN m2								
SUBTOTAL CAP. NP 2 IE. RURAL LA RICO KM30 SEDE BUENAVISTA					**$ -**		**$ 12.350.103,00**		**$ -**
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 137.251.729,00**		**$ 137.251.729,00**		**$ 102.227.512,00**
	ADMINISTRACCIÓN			**28%**	**$ 38.430.484,00**	**28%**	**$ 38.430.484,00**	**28%**	**$ 25.556.878,00**
	IMPREVISTOS			**1%**	**$ 1.372.517,00**	**1%**	**$ 1.372.517,00**	**1%**	**$ 2.044.550,00**
	UTILIDAD			**3%**	**$ 4.117.552,00**	**3%**	**$ 4.117.552,00**	**3%**	**$ 5.111.376,00**
	VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS			**32%**	**$ 43.920.553,00**	**32%**	**$ 43.920.553,00**	**32%**	**$ 32.712.804,00**
	VALOR TOTAL OBRA FÍSICA			**100%**	**$ 181.172.282,00**	**100%**	**$ 181.172.282,00**	**100%**	**$ 134.940.316,00**

Ejecutadas durante el periodo del 16 de junio de 2025 hasta el 31 de julio de 2025.

De otra parte, la Supervisora efectúo la verificación del cumplimiento de las referentes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales, y se corrobora el pago de la seguridad social del mes de junio y julio de 2025, así:

Periodo pagado:	Junio de 2025	
No. Planilla	4618461609	Empresa liquidadora: SOI
Salud	NUEVA EPS-SANITAS S.A.	$163.200
Pensión	PORVENIR-COLFONDOS	$234.400
Riesgos Profesionales	POSITIVA	$102.100
CCF		$0.00
SENA		$0.00
ICBF		$0.00
	Total:	$519.700

Periodo pagado:	Junio de 2025	
No. Planilla	4618479303	Empresa liquidadora: SOI
Salud	NUEVA EPS-SANITAS S.A.	$124.800
Pensión	PORVENIR-COLFONDOS	$498.600
Riesgos Profesionales	POSITIVA	$217.100
CCF	COMFACA	$124.80
SENA		$0.00
ICBF		$0.00
	Total:	$965.300

Periodo pagado:	Julio de 2025	
No. Planilla	4618330814	Empresa liquidadora: SOI
Salud	NUEVA EPS-SANITAS S.A.	$501.100
Pensión	PORVENIR-COLFONDOS	$641.200
Riesgos Profesionales	POSITIVA	$279.000
CCF		$0.00
SENA		$0.00
ICBF		$0.00
	Total:	$1.421.300

Periodo pagado:	Julio de 2025	
No. Planilla	4619287114	Empresa liquidadora: SOI
Salud	NUEVA EPS-SANITAS S.A.	$245.400
Pensión	PORVENIR-COLFONDOS	$980.700
Riesgos Profesionales	POSITIVA	$426.700
CCF	COMFACA	$245.400
SENA		$0.00
ICBF		$0.00
	Total:	$1.898.200

Teniendo en cuenta lo anterior, se suscribe la presente acta en aval del cumplimiento de las actividades desarrolladas a satisfacción del Municipio y se autoriza el pago de esta en cuantía de: **CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS M/CTE. ($ 134.940. 316.oo)** del informe no. 1 comprendido desde 16 de junio de 2025 hasta el 31 de julio de 2025, adjuntándose copia del informe a la presente acta.

Para constancia de lo anterior, firman por quién en ella intervienen.

Dada en la ciudad de Valparaíso, Departamento del Caquetá, a los 10 días del mes de septiembre de 2025.

YESSIKA ADRIANA JIMENEZ FORERO	**INERCIA S.A.S NIT: 901.048.151-1**
Secretaria de Planeación, Desarrollo e Infraestructura	R/ Diana Marcela Quiroga Dias C.C 26.427.423
Supervisor	Contratista

LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA EN CALIDAD DE SUPERVISORA

CERTIFICA:

El recibo a satisfacción de las actividades ejecutadas del siguiente contrato:

No.	C.O-003-2025
Tipo	CONTRATO DE OBRA
Contratista	INERCIA S.A.S
Tipo Y No. Identificación	Numero de Identificación Tributaria NIT: 901.048.151-1
Nombre Representante Legal	DIANA MARCELA QUIROGA DIAS
Tipo Y No. Identificación	C.C. 26.427.423
Objeto	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DE LAS VEREDAS EL AGUILA, BUENAVISTA, LA RICO Y LOS CENTROS POBLADOS DE PLAYA RICA Y KILOMETRO 18 DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO CAQUETA
Fecha de celebración	3/06/2025
Plazo	El plazo de ejecución del contrato será de tres (03) mes, contados a partir de la suscripción del acta de inicio de actividades, en todo caso sin superar el 30 de diciembre de 2025.
Fecha de inicio	16/06/2025
Acta No. 01 Modificación	23 DE JUNIO DE 2025
Prórroga	NA
Plazo Final	TRES (03) MESES
Fecha de terminación	15/09/2025
Valor ejecutado	CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS M/CTE. ($ 134.940.316.oo)
VALOR A PAGAR	CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS M/CTE. ($ 134.940.316.oo)
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	CERO PESOS ($ 0.00) MCTE

A continuación, se relacionan las actividades ejecutadas:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES				MODIFICACION No. 01		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 01	
		UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
A	OBRA CIVIL								
1	IE. RURAL LA MUÑOZ SEDE ESPERANZA TROCHA 5								
1.1	DEMOLICION PISO Y/O ANDEN E=0.08	M2	96,00	$ 9.908,15	$ 951.182,00	82,32	$ 815.639,00	82,32	$ 815.639,00
1.2	PISO Y/O ANDEN EN CONCRETO 8 CM 3000 PSI	M2	96,00	$ 62.981,47	$ 6.046.221,00	82,32	$ 5.184.635,00	82,32	$ 5.184.635,00
1.3	DESMONTE DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA MET., GALV., ZINC, FIBROCEMENTO, ETERNIT O SIMILAR, PAGADO EN M2	M2	120,00	$ 16.039,21	$ 1.924.705,00	130,00	$ 2.085.097,00	130,00	$ 2.085.097,00
1.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA	M	96,00	$ 50.030,37	$ 4.802.916,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1.5	SUM. E INST. CUBIERTA TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2.5MM BLANCO O SIMILAR (NO INCL. ENTRAMADO NI CABALLETE, INCL. TORNILLO)	M2	120,00	$ 92.372,05	$ 11.084.646,00	0,00	$ -	0,00	$ -

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES				MODIFICACION No. 01		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 01	
		UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
1.6	CABALLETE UPVC	M	10,00	$ 71.052,20	$ 710.522,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1.7	ESTUCO PLASTICO MURO [PASTA]	M2	64,00	$ 16.016,95	$ 1.025.085,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1.8	PINTURA VINILO TOPO 1	M2	192,00	$ 13.706,52	$ 2.631.652,00	81,80	$ 1.121.193,00	77,80	$ 1.066.367,00
SUBTOTAL CAP. 1 IE. RURAL LA MUÑOZ SEDE ESPERANZA TROCHA 5					**$ 29.176.929,00**		**$ 9.206.564,00**		**$ 9.151.738,00**
2	**IE. RURAL LA RICO KM30 SEDE BUENAVISTA**								
2.1	PISO Y/O ANDEN EN CONCRETO 8 CM 3000 PSI	M2	32,00	$ 62.981,47	$ 2.015.407,00	60,00	$ 3.778.888,00	0,00	$ -
2.2	COLUMNA CONCRETO 3000 PSI	M3	1,54	$1.096.793,69	$ 1.689.062,00	0,75	$ 822.595,00	0,00	$ -
2.3	VIGA CIMIENTACION CONCRETO 3000 PSI	M3	1,45	$ 990.196,17	$ 1.435.784,00	2,85	$ 2.822.059,00	0,00	$ -
2.4	VIGA CONCRETO AEREA 3000 PSI	M3	1,45	$1.266.558,45	$ 1.836.510,00	0,72	$ 911.922,00	0,00	$ -
2.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA	M	42,00	$ 50.030,37	$ 2.101.276,00	0,00	$ -	0,00	$ -
2.6	SUM. E INST. CUBIERTA TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2.5MM BLANCO O SIMILAR (NO INCL. ENTRAMADO NI CABALLETE, INCL. TORNILLO)	M2	60,00	$ 92.372,05	$ 5.542.323,00	0,00	$ -	0,00	$ -

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES				MODIFICACION No. 01		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 01	
		UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
2.7	CABALLETE UPVC	M	5,00	$ 70.635,28	$ 353.176,00	0,00	$ -	0,00	$ -
2.8	MAMPOSTERÍA EN BLOQUE N°4	M2	60,00	$ 64.684,00	$ 3.881.040,00	72,00	$ 4.657.248,00	0,00	$ -
2.9	ESTUCO PLASTICO MURO [PASTA]	M2	120,00	$ 15.600,03	$ 1.872.004,00	144,00	$ 2.246.404,00	0,00	$ -
2.10	PINTURA VINILO TOPO 1	M2	120,00	$ 13.382,25	$ 1.605.870,00	144,00	$ 1.927.044,00	0,00	$ -
2.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO ELECTRICO ELECTRO BOMBA	UND	1,00	$1.051.690,52	$ 1.051.691,00	0,00	$ -	0,00	$ -
SUBTOTAL CAP. 2 IE. RURAL LA RICO KM30 SEDE BUENAVISTA					**$ 23.384.143,00**		**$ 17.166.160,00**		**$ -**
3	**IE. RURAL LA RICO KM30 SEDE LA RICO**								
3,1	DESMONTE DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA MET., GALV., ZINC, FIBROCEMENTO, ETERNIT O SIMILAR, PAGADO EN M2	M2	94,50	$ 16.039,21	$ 1.515.705,00	106,09	$ 1.701.600,00	106,09	$ 1.701.600,00
3,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA	M	76,00	$ 50.030,37	$ 3.802.308,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,3	SUM. E INST. CUBIERTA TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2.5MM BLANCO O SIMILAR (NO INCL. ENTRAMADO NI CABALLETE, INCL. TORNILLO)	M2	94,50	$ 92.372,05	$ 8.729.159,00	0,00	$ -	0,00	$ -

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES				MODIFICACION No. 01		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 01	
		UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
3,4	CABALLETE UPVC	M	9,00	$ 70.635,28	$ 635.718,00	0,00	$ -	0,00	$ -
SUBTOTAL CAP. 3 IE. RURAL LA RICO KM30 SEDE LA RICO					**$ 14.682.890,00**		**$ 1.701.600,00**		**$ 1.701.600,00**
4	**IE. RURAL NIEVES ARRIBA**								
4,1	COLUMNA CONCRETO 3000 PSI	M3	2,30	$ 1.084.093,14	$ 2.493.414,00	0,00	$ -	0,00	$ -
4,2	VIGA CIMIENTO CONCRETO 3000 PSI	M3	3,60	$ 982.197,51	$ 3.535.911,00	0,00	$ -	0,00	$ -
4,3	VIGA CONCRETO AEREA 3000 PSI	M3	3,60	$ 1.266.558,45	$ 4.559.610,00	0,00	$ -	0,00	$ -
4,4	DESMONTE DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA MET., GALV., ZINC, FIBROCEMENTO, ETERNIT O SIMILAR, PAGADO EN M2	M2	182,00	$ 16.039,21	$ 2.919.136,00	185,00	$ 2.967.254,00	185,00	$ 2.967.254,00
4,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA	M	168,00	$ 50.030,37	$ 8.405.102,00	0,00	$ -	0,00	$ -
4,6	SUM. E INST. CUBIERTA TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2.5MM BLANCO O SIMILAR (NO INCL. ENTRAMADO NI CABALLETE, INCL. TORNILLO)	M2	182,00	$ 92.372,05	$ 16.811.713,00	0,00	$ -	0,00	$ -

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES				MODIFICACION No. 01		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 01	
		UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
4,7	CABALLETE UPVC	M	24,00	$ 70.635,28	$ 1.695.247,00	0,00	$ -	0,00	$ -
4,8	ESTUCO PLASTICO MURO [PASTA]	M2	192,00	$ 15.600,03	$ 2.995.206,00	0,00	$ -	0,00	$ -
4,9	PINTURA VINILO TOPO 1	M2	192,00	$ 13.382,25	$ 2.569.392,00	244,78	$ 3.275.707,00	244,78	$ 3.275.707,00
SUBTOTAL CAP. 4 IE. RURAL NIEVES ARRIBA					**$ 45.984.731,00**		**$ 6.242.961,00**		**$ 6.242.961,00**
5	**IE. RURAL PLAYA RICA**								
5,1	COLUMNA CONCRETO 3000 PSI	M3	0,75	$1.084.093,14	$ 813.070,00	0,29	$ 314.387,00	0,29	$ 314.387,00
5,2	VIGA CIMIENTO CONCRETO 3000 PSI	M3	1,8	$ 982.197,51	$ 1.767.956,00	0,60	$ 589.319,00	0,60	$ 589.319,00
5,3	DESMONTE DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA MET., GALV., ZINC, FIBROCEMENTO, ETERNIT O SIMILAR, PAGADO EN M2	M2	60,00	$ 16.039,21	$ 962.353,00	56,00	$ 898.196,00	56,00	$ 898.196,00
5,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA	M	60,00	$ 50.030,37	$ 3.001.822,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5,5	SUM. E INST. CUBIERTA TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2.5MM BLANCO O SIMILAR (NO INCL. ENTRAMADO NI CABALLETE, INCL. TORNILLO)	M2	60,00	$ 92.372,05	$ 5.542.323,00	0,00	$ -	0,00	$ -

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES				MODIFICACION No. 01		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 01	
		UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
5,6	MAMPOSTERÍA EN BLOQUE N°4	M2	70,00	$ 64.684,00	$ 4.527.880,00	2,64	$ 170.766,00	2,64	$ 170.766,00
5,7	CABALLETE UPVC	M	6,00	$ 70.635,28	$ 423.812,00	0,00	$ -	0,00	$ -
	SUBTOTAL CAP. 5 IE. RURAL PLAYA RICA				**$ 17.039.216,00**		**$ 1.972.668,00**		**$ 1.972.668,00**
6	**TRANSPORTE DE MATERIAL**								
6,1	TRANSPORTE MATERIALES PETREOS DESDE O HACIA LA OBRA ZONA RURAL	M3-KM	2616,91	$ 2.000,00	$ 5.233.820,00	291,84	$ 583.680,00	0,00	$ -
6,2	TRANSPORTE DE MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO DESDE CASCO URBANO HASTA LA OBRA ZONA RURAL	VIAJE	7,00	$ 250.000,00	$ 1.750.000,00	5,00	$ 1.250.000,00	0,00	$ -
SUBTOTAL CAP. 6 IE. TRANSPORTE DE MATERIAL					**$ 6.983.820,00**		**$ 1.833.680,00**		**$ -**
IP 1	**IE. RURAL PLAYA RICA**								
IP 1.1	VIGA CONCRETO AEREA 3000 PSI	M3	-	$1.266.558,45	$ -	0,22	$ 278.643,00	0,22	$ 278.643,00
IP 1.2	PISO Y/O ANDEN EN CONCRETO 8 CM 3000 PSI	M2	-	$ 62.981,47	$ -	2,00	$ 125.963,00	2,00	$ 125.963,00
IP 1.3	DEMOLICION PISO Y/O ANDEN E=0.08	M2	-	$ 9.908,15	$ -	2,00	$ 19.816,00	2,00	$ 19.816,00
IP 1.4	PINTURA VINILO TOPO 1	M2	-	$ 13.382,25	$ -	175,02	$ 2.342.161,00	175,02	$ 2.342.161,00
SUBTOTAL ITEM PREVISTOS IE. RURAL PLAYA RICA					**$ -**		**$ 2.766.583,00**		**$ 2.766.583,00**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES				MODIFICACION No. 01		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 01	
		UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
NP	NO PREVISTOS								
NP 1	IE. RURAL LA MUÑOZ SEDE ESPERANZA TROCHA 5								
NP 1.1	MANTENIMIENTO DE MUROS (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES, LIMPIEZA, RESANE Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE)	M2	-	$ 14.542,00	$ -	15,00	$ 218.130,00	0,00	$ -
NP 1.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO RECTANGULAR 100 X 40 X 2.0MM	KG	-	$ 13.504,00	$ -	802,47	$ 10.836.555,00	802,47	$ 10.836.555,00
NP 1.3	SUM. E INST. CUBIERTA MET. GALV. CAL. 26 PREPINTADA POR AMBAS CARAS POR EL FABRICANTE, TIPO M-1000 O SIMILAR (NO INCL. ENTRAMADO NI CABALLETE, INCL. TORNILLO), PAGADO EN m2	M2	-	$ 79.771,00	$ -	130,00	$ 10.370.230,00	130,00	$ 10.370.230,00
NP 1.4	SUM. E INST. CABALLETE MET. GALV. CAL. 26 PARA CUBIERTA M-1000 O SIMILAR, PREPINTADO POR AMBAS CARAS POR EL FABRICANTE, PAGADO EN m	M	-	$ 69.972,20	$ -	30,20	$ 2.113.160,00	30,20	$ 2.113.160,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES				MODIFICACION No. 01		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 01	
		UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
NP 1.5	BORDILLO EN CONCRETO 3000 PSI 10 X 20 CM	M	-	$ 34.687,62	$ -	44,30	$ 1.536.662,00	44,30	$ 1.536.662,00
SUBTOTAL CAP. NP 1 IE. RURAL LA MUÑOZ SEDE ESPERANZA TROCHA 5					**$ -**		**$ 25.074.737,00**		**$ 24.856.607,00**
NP 2	**IE. RURAL LA RICO KM 30 SEDE LA RICO**								
NP 2.1	MANTENIMIENTO DE MUROS (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES, LIMPIEZA, RESANE Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE)	M2	-	$ 14.542,00	$ -	70,00	$ 1.017.940,00	0,00	$ -
NP 2.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20	M	-	$ 128.843,00	$ -	10,10	$ 1.301.314,00	10,10	$ 1.301.314,00
NP 2.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO RECTANGULAR 100 X 40 X 2.0MM	KG	-	$ 13.504,00	$ -	509,30	$ 6.877.587,00	509,30	$ 6.877.587,00
NP 2.4	SUM. E INST. CUBIERTA MET. GALV. CAL. 26 PREPINTADA POR AMBAS CARAS POR EL FABRICANTE, TIPO M-1000 O SIMILAR (NO INCL. ENTRAMADO NI CABALLETE, INCL. TORNILLO), PAGADO EN m2	M2	-	$ 79.771,00	$ -	106,09	$ 8.462.905,00	106,09	$ 8.462.905,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES				MODIFICACION No. 01		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 01	
		UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
NP 2.5	SUM. E INST. CABALLETE MET. GALV. CAL. 26 PARA CUBIERTA M-1000 O SIMILAR, PREPINTADO POR AMBAS CARAS POR EL FABRICANTE, PAGADO EN m	M	-	$ 69.972,20	$ -	10,30	$ 720.714,00	10,30	$ 720.714,00
SUBTOTAL CAP. NP 2 IE. RURAL LA RICO KM 30 SEDE LA RICO					**$ -**		**$ 18.380.460,00**		**$ 17.362.520,00**
NP 3	**IE. RURAL NIEVES ARRIBA**								
NP 3.1	MANTENIMIENTO DE MUROS (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES, LIMPIEZA, RESANE Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE)	M2	-	$ 14.542,00	$ -	123,35	$ 1.793.756,00	0,00	$ -
NP 3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO RECTANGULAR 100 X 40 X 2.0MM	KG	-	$ 13.504,00	$ -	769,05	$ 10.385.251,00	769,05	$ 10.385.251,00
NP 3.3	SUM. E INST. CUBIERTA MET. GALV. CAL. 26 PREPINTADA POR AMBAS CARAS POR EL FABRICANTE, TIPO M-1000 O SIMILAR (NO INCL. ENTRAMADO NI CABALLETE, INCL. TORNILLO), PAGADO EN m2	M2	-	$ 79.771,00	$ -	185,00	$ 14.757.635,00	185,00	$ 14.757.635,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES				MODIFICACION No. 01		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 01	
		UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
NP 3.4	SUM. E INST. CABALLETE MET. GALV. CAL. 26 PARA CUBIERTA M-1000 O SIMILAR, PREPINTADO POR AMBAS CARAS POR EL FABRICANTE, PAGADO EN m	M	-	$ 69.972,20	$ -	10,00	$ 699.722,00	10,00	$ 699.722,00
NP 3.5	PAÑETE 1:4 (INCL. FILOS Y DILATACIONES), PAGADO EN m2	M2	-	$ 40.615,00	$ -	23,50	$ 954.453,00	23,50	$ 954.453,00
SUBTOTAL CAP. NP 2 IE. RURAL NIEVES ARRIBA					**$ -**		**$ 28.590.817,00**		**$ 26.797.061,00**
NP 4	**IE. RURAL PLAYA RICA**								
NP 4.1	MANTENIMIENTO DE MUROS (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES, LIMPIEZA, RESANE Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE)	M2	-	$ 14.542,00	$ -	40,55	$ 589.622,00	0,00	$ -
NP 4.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO RECTANGULAR 100 X 40 X 2.0MM	KG	-	$ 13.504,00	$ -	272,55	$ 3.680.515,00	272,55	$ 3.680.515,00
NP 4.3	SUM. E INST. CUBIERTA MET. GALV. CAL. 26 PREPINTADA POR AMBAS CARAS POR EL FABRICANTE, TIPO M-1000 O SIMILAR (NO INCL. ENTRAMADO NI CABALLETE, INCL. TORNILLO), PAGADO EN m2	M2	-	$ 79.771,00	$ -	56,00	$ 4.467.176,00	56,00	$ 4.467.176,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES				MODIFICACION No. 01		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 01	
		UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
NP 4.4	SUM. E INST. CABALLETE MET. GALV. CAL. 26 PARA CUBIERTA M-1000 O SIMILAR, PREPINTADO POR AMBAS CARAS POR EL FABRICANTE, PAGADO EN m	M	-	$ 69.972,20	$ -	8,00	$ 559.778,00	8,00	$ 559.778,00
NP 4.5	PAÑETE 1:4 (INCL. FILOS Y DILATACIONES), PAGADO EN m2	M2	-	$ 40.615,00	$ -	9,00	$ 365.535,00	9,00	$ 365.535,00
NP 4.6	SUM. E INST. DE ACERO ESTRUCTURAL ASTM A - 572, A - 500 G, A - 36, A - 706 (GRADO B ó C9, A - 36) O SIMILAR, (INCL. BASE ANTICORROSIVA TIPO WASH PRIMER, PINTURA ACABADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO), PAGADO EN kg	KG	-	$ 15.488,00	$ -	146,51	$ 2.269.147,00	146,51	$ 2.269.147,00
NP 4.7	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	M3	-	$ 31.423,30	$ -	1,07	$ 33.623,00	1,07	$ 33.623,00
SUBTOTAL CAP. NP 2 IE. RURAL PLAYA RICA					**$ -**		**$ 11.965.396,00**		**$ 11.375.774,00**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES				MODIFICACION No. 01		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 01	
		UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
NP 5	**IE. RURAL LA RICO KM30 SEDE BUENAVISTA**								
NP 5.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO RECTANGULAR 100 X 40 X 2.0MM	KG	-	$ 13.504,00	$ -	312,48	$ 4.219.730,00	0,00	$ -
NP 5.2	SUM. E INST. CUBIERTA MET. GALV. CAL. 26 PREPINTADA POR AMBAS CARAS POR EL FABRICANTE, TIPO M-1000 O SIMILAR (NO INCL. ENTRAMADO NI CABALLETE, INCL. TORNILLO), PAGADO EN m2	M2	-	$ 79.771,00	$ -	60,00	$ 4.786.260,00	0,00	$ -
NP 5.3	SUM. E INST. CABALLETE MET. GALV. CAL. 26 PARA CUBIERTA M-1000 O SIMILAR, PREPINTADO POR AMBAS CARAS POR EL FABRICANTE, PAGADO EN m	M	-	$ 69.972,20	$ -	6,00	$ 419.833,00	0,00	$ -

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES				MODIFICACION No. 01		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 01	
		UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
NP 5.4	PAÑETE 1:4 (INCL. FILOS Y DILATACIONES), PAGADO EN m2	M2	-	$ 40.615,00	$ -	72,00	$ 2.924.280,00	0,00	$ -
SUBTOTAL CAP. NP 2 IE. RURAL LA RICO KM30 SEDE BUENAVISTA					**$ -**		**$ 12.350.103,00**		**$ -**
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 137.251.729,00**		**$ 137.251.729,00**		**$ 102.227.512,00**
	ADMINISTRACCIÓN			**28%**	**$ 38.430.484,00**	**28%**	**$ 38.430.484,00**	**28%**	**$ 25.556.878,00**
	IMPREVISTOS			**1%**	**$ 1.372.517,00**	**1%**	**$ 1.372.517,00**	**1%**	**$ 2.044.550,00**
	UTILIDAD			**3%**	**$ 4.117.552,00**	**3%**	**$ 4.117.552,00**	**3%**	**$ 5.111.376,00**
	VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS			**32%**	**$ 43.920.553,00**	**32%**	**$ 43.920.553,00**	**32%**	**$ 32.712.804,00**
	VALOR TOTAL OBRA FÍSICA			**100%**	**$ 181.172.282,00**	**100%**	**$ 181.172.282,00**	**100%**	**$ 134.940.316,00**

La presente certificación se expide para dar trámite al proceso del primer (01) pago, en consideración a lo dispuesto en el "Manual de Contratación" del municipio de Valparaíso, adoptado mediante la Resolución No. 471 del 27 de diciembre de 2024.

Dada a los 10 días del mes de septiembre de 2025.

YESSIKA ADRIANA JIMENEZ FORERO
SECRETARIA DE PLANEACION DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA
ALCALDIA VALPARAISO – CAQUETA
SUPERVISORA

Valparaíso – Caquetá, 08 de septiembre de 2025

Ingeniera
YESSIKA ADRIANA JIMENEZ FORERO
Secretaria de Planeación
Supervisor Contrato CO-003-2025
Alcaldía de Valparaíso

REF: Contrato CO-003-2025 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DE LAS VEREDAS EL AGUILA, BUENAVISTA, LA RICO Y LOS CENTROS POBLADOS DE PLAYA RICA Y KILOMETRO 18 DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO CAQUETA."."

ASUNTO: INFORME PARCIAL DE OBRA. Periodo comprendido entre el 16 de junio de 2025 al 31 de julio de 2025.

Respetuosamente presento el informe del contrato de obra de la referencia, cumpliendo con las designaciones enmarcadas en el contrato.

Cordialmente;

DIANA MARCELA QUIROGA DIAZ
INERCIA S.A.S
INGENIEROS CONSULTORES
Representante Legal

Anexo: 235 *Folios*

SEPTIEMBRE 2025

INFORME PARCIAL DE OBRA

INERCIA S.A.S
INGENIEROS
CONSULTORES

NIT: 901.048.151-1

INERCIA S.A.S
INGENIEROS CONSULTORES

INERCIA S.A.S
INGENIEROS CONSULTORES
NIT: 901.048.151-1

INFORME PARCIAL DE OBRA
16 de junio al 2025 al 31 de julio de 2025
No. De contrato CO-003-2025
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DE LAS VEREDAS EL AGUILA, BUENAVISTA, LA RICO Y LOS CENTROS POBLADOS DE PLAYA RICA Y KILOMETRO 18 DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO CAQUETA.".

Carrera 15 No 06-25 B/ JUAN XXIII
EMAIL: inerciaingenierosas@gmail.com
Florencia-Caquetá

TABLA DE CONTENIDO

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA 4

1.1 FICHA TECNICA DE LA OBRA 4

1.2 DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: 6

2. GARANTÍAS 8

3. INFORMACIÓN TÉCNICA DE LO EJECUTADO 9

3.1 ACTIVIDADES REALIZADAS 9

3.1.2 DESCRIPCIÓN DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS 9

3.2 CANTIDADES MODIFICADAS 53

3.3 CANTIDADES EJECUTADAS 69

3.4 AVANCE FISICO Y AVANCE EN TIEMPO 93

4 INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA 95

5 INFORMACION DE CALIDAD 95

6 INFORMACIÓN FINACIERA 95

REGISTRO FOTOGRAFICO 96

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA

1.1 FICHA TECNICA DE LA OBRA

CONTRATO No.	CO-003-2025
CONTRATANTE	ALCALDÍA MUNICIPAL VALPARAÍSO NIT: 800.050.407-1
CONTRATISTA	INERCIA S.A.S NIT: 901.048.151-1
OBJETO	"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DE LAS VEREDAS EL AGUILA, BUENAVISTA, LA RICO Y LOS CENTROS POBLADOS DE PLAYA RICA Y KILOMETRO 18 DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO CAQUETA."
VALOR INICIAL	CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS ($ 181.172.282) M/CTE
VALOR TOTAL	CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS ($ 181.172.282) M/CTE
CDP	N° 229 del 01/07/2022
RP	N° 235 del 03 de junio de 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO ES DE TRES (03) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, EN TODO CASO SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025.
PLAZO FINAL	El plazo de ejecución del contrato será de tres (03) mes, contados a partir de la suscripción del acta de inicio de actividades, en todo caso sin superar el 30 de diciembre de 2025
FORMA DE PAGO	El municipio realizara pagos parciales mediante el sistema de precio unitario por entregas parciales de obra y recibidas a satisfacción, hasta completar el monto del noventa por ciento (90%) del valor total del contrato previa certificación de cumplimiento expedida por el supervisor externo del contrato, acompañadas de la certificación de pago de obligaciones asumidas por parte del contratista por concepto de salud, pensión, riesgos profesionales, aportes a cajas de compensación familiar, ICBF y SENA. Un último pago, correspondiente al diez (10%) del valor total del contrato de obra, de acuerdo con las cantidades realmente ejecutadas y recibidas a satisfacción, este desembolso se realizará previa suscripción del acta de recibo final de las obras a satisfacción por parte del supervisor y el Municipio, así como

de la aprobación de las garantías correspondientes señaladas, parafiscales y demás requisitos y una vez se haya liquidado el contrato.

La firma adicional que refrenda las Actas; como la del ordenador del gasto del Municipio, permiten autorizar el pago del Acta al Contratista, sin adquirir responsabilidad por las cantidades y valores en ellas expresadas.

El pago sólo se hará, previa Presentación del informe de ejecución del contrato por parte del contratista, el cual deberá ir acompañado del recibido a satisfacción del supervisor del contrato, de igual manera deberá acreditar el cumplimiento de pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social y parafiscales según el caso, por parte del contratista, así como la respectiva presentación de cuenta de cobro y/o facturas.

El Contratista deberá informar al Municipio la cuenta bancaria (corriente o de ahorros), abierta a su nombre, en la cual le serán consignados o transferidos electrónicamente, los pagos que por este concepto le efectúe el Municipio

Sistema de Pago

El sistema de pago aplicable al contrato es por precio unitario. En consecuencia, el precio previsto, incluye de manera aproximada todos los costos directos e indirectos, derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos de manera aproximada, entre otros, los gastos de administración, desplazamiento, transporte y almacenamiento de materiales, herramientas y toda clase de equipos necesarios; en general, todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA para el cabal cumplimiento de la ejecución del contrato. EL MUNICIPIO reconocerá, por consiguiente, reajuste realizado por el CONTRATISTA en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requería para la ejecución del contrato y que NO fueron previsibles al momento de la presentación de la oferta. EL CONTRATISTA está obligado a ejecutar todas las actividades, licencias, servicios y obras que resulten necesarias para la ejecución del objeto contractual, incluyendo todas aquellas no contempladas en la oferta, o en el resultado de los estudios y diseños realizados, si a ello hubiere lugar.

	PARÁGRAFO PRIMERO. La oportunidad de pago está sujeta y depende del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). **PARÁGRAFO SEGUNDO:** El último pago estará sujeto a la liquidación del contrato, para ello además de los documentos anteriormente mencionados, el supervisor debe recibir del contratista el último informe de ejecución contractual y presupuestal, con ello proyectar y solicitar la liquidación. Adicionalmente deberá remitirse informe final de supervisión suscrito por el contratista y el supervisor Este último pago estará sujeto a la suscripción del Acta de terminación y liquidación correspondiente. **PARÁGRAFO TERCERO:** Al momento de realizar la liquidación el valor final del contrato será el que resulte del cálculo del valor correspondiente a los servicios efectivamente prestados durante el plazo de ejecución, liberando a favor del MUNICIPIO la suma no ejecutada
FECHA DE CELEBRACIÓN	Tres (06) de junio de 2025
FECHA DE INICIACIÓN	Dieciséis (16) de junio de 2025
FECHA TERMINACION INCIAL	Treinta (30) de septiembre 2025
FECHA DE TERMINACION FINAL	Treinta (30) de septiembre 2025
SUPERVISIÓN	Ingeniera YESSIKA ADRIANA JIMENEZ quien se identifica con la cedula de ciudadanía No. 1.117.522.940 secretaria de Planeación- Alcaldía de Valparaíso.

1.2 DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:

El presente proyecto tiene como objeto la intervención y mejoramiento de la infraestructura física educativa en diversas sedes rurales y centros poblados del municipio de Valparaíso, departamento del Caquetá. Las intervenciones se enfocarán en la rehabilitación, adecuación y/o construcción de edificaciones escolares, con el fin de garantizar condiciones óptimas de seguridad, habitabilidad y funcionalidad.

Las sedes objeto de intervención corresponden a las siguientes localizaciones rurales:

- Vereda Águila
- Vereda Buenavista
- Vereda La Rico
- Centro poblado Playa Rica
- Centro poblado Kilómetro 18.

Imagen 1. Localización del proyecto

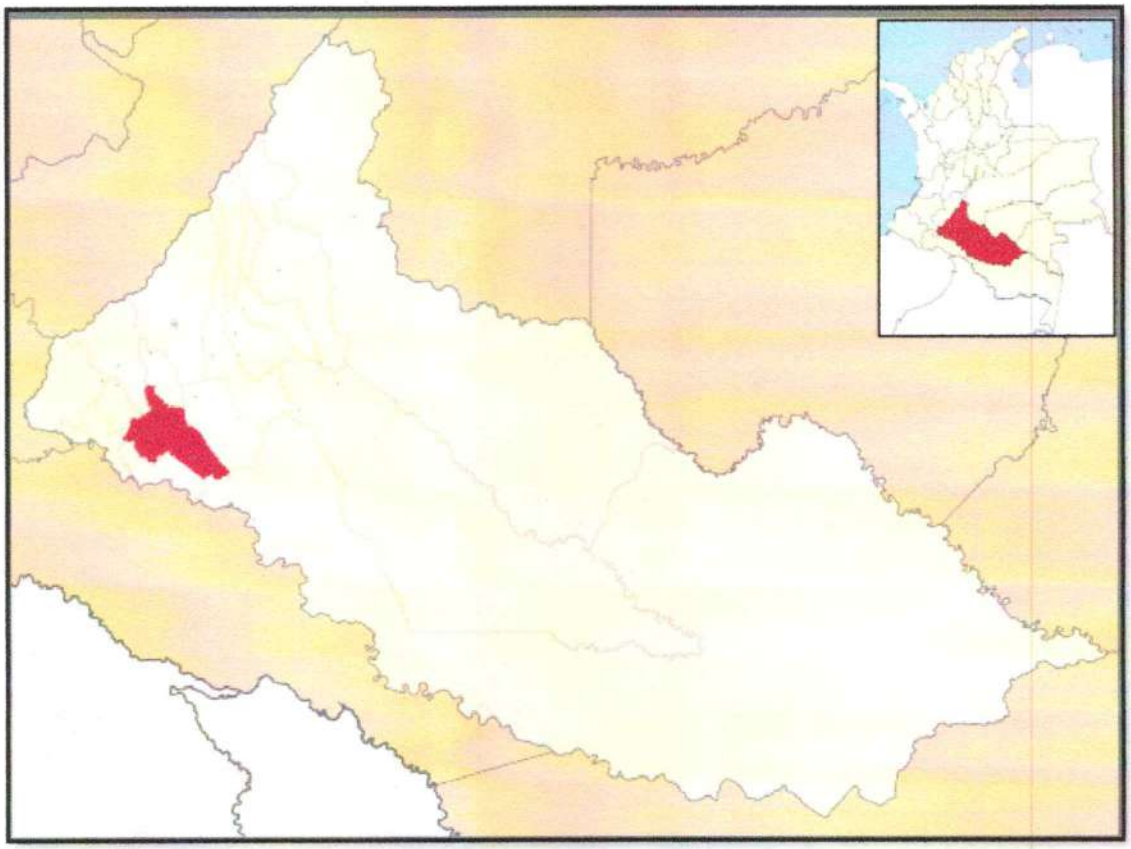


Ilustración 1 - Localización Casco Urbano Municipio de Valparaíso, Departamento de Caquetá

2. GARANTÍAS

PÓLIZA CON ACTA DE CONTRATO					
GARANTÍA	NOMBRE DE LA ASEGURADORA	NÚMERO DE PÓLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	Aseguradora Solidaria de Colombia	560 – 47 - 994000190540	29/05/2025	13/03/2026	18,117,228.20
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		560 – 47 - 994000190540	29/05/2025	13/09/2026	9,058,614.10
ESTABILIDAD DE OBRA		560 – 47 - 994000190540	29/05/2025	13/03/2026	18,117,228.20
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		560 - 74 - 994000035217	29/05/2025	10/09/2025	284,700,00.00

PÓLIZA CON ACTA DE INICIO					
GARANTÍA	NOMBRE DE LA ASEGURADORA	NÚMERO DE PÓLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	Aseguradora Solidaria de Colombia	560 - 47 994000190540	16/06/2025	04/04/2026	18,117,228.20
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		560 - 47 994000190540	16/06/2025	03/10/2028	9,058,614.10
ESTABILIDAD DE OBRA		560 - 47 994000190540	16/06/2025	04/04/2026	18,117,228.20
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		560 -74 994000035217	10/09/2025	30/09/2025	284,700,00.00

3. INFORMACIÓN TÉCNICA DE LO EJECUTADO

En la zona rural y urbana, municipio de Valparaíso- Caquetá. La alcaldía por medio de contratación pública; realiza el contrato co-003-2025, el cual tendrá objeto de Mejoramiento de la infraestructura educativa de las instituciones educativas rurales de las veredas el Águila, Buenavista, la Rico y los centros poblados de Playa Rica y Kilómetro 18 del Municipio de Valparaíso Caquetá.

3.1 ACTIVIDADES REALIZADAS

3.1.2 DESCRIPCIÓN DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS

Desde el periodo de inicio de obra hasta la fecha se ejecutaron las siguientes actividades de acuerdo con lo dispuesto en el presupuesto aprobado y con el acta de modificación No. 001.

1. IE. RURAL LA MUÑOZ SEDE ESPERANZA TROCHA 5

- 1.1 DEMOLICIÓN PISO Y/O ANDÉN CON ESPESOR DE 0.08 M

La actividad consiste en la demolición controlada de pisos o andenes existentes en concreto simple con un espesor estimado de 0.08 metros, como parte de las labores de mejoramiento en las sedes educativas rurales. Esta intervención se ejecuta manualmente o con herramientas menores, garantizando la protección de elementos estructurales, instalaciones escolares, redes de servicios y entorno inmediato. Incluye la fragmentación del concreto, la recolección del material residual y la limpieza del área intervenida, en donde las actividades fueron ejecutadas en su totalidad, siendo revisadas y aprobadas por el municipio así:

Ítem	Descripción	Contractual	Acta Modificatoria 1	Acta Parcial	Avance	Localización
1.1	Demolición piso y/o andén con espesor de 0.08 m	96 M2	82,32 M2	82,32 M2	100%	Sede Esperanza Trocha 5

Después de realizar el replanteo, entre el municipio y el contratista se hace un balance en donde se constató que la ejecución del ítem mencionado anteriormente fue de 82,32 M2, estructura que se planteó y aprobó por parte del municipio.

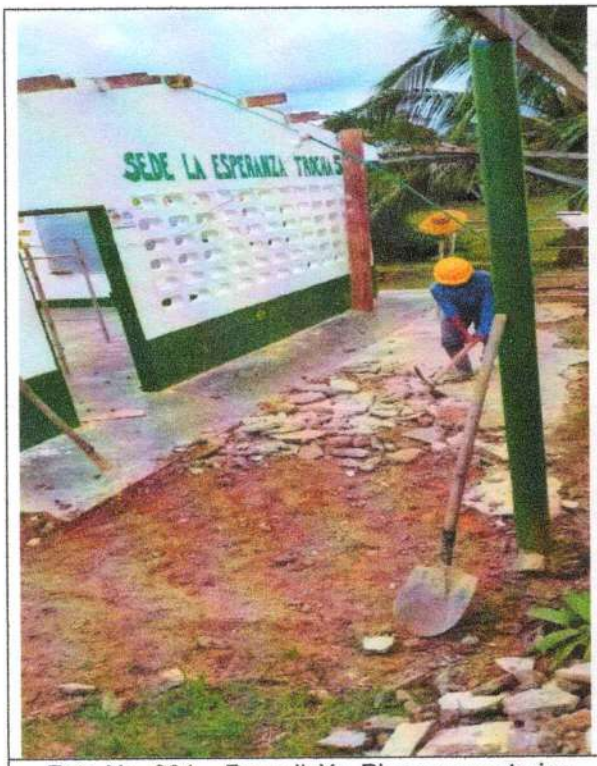


Foto No. 001 – Demolición Piso zona exterior

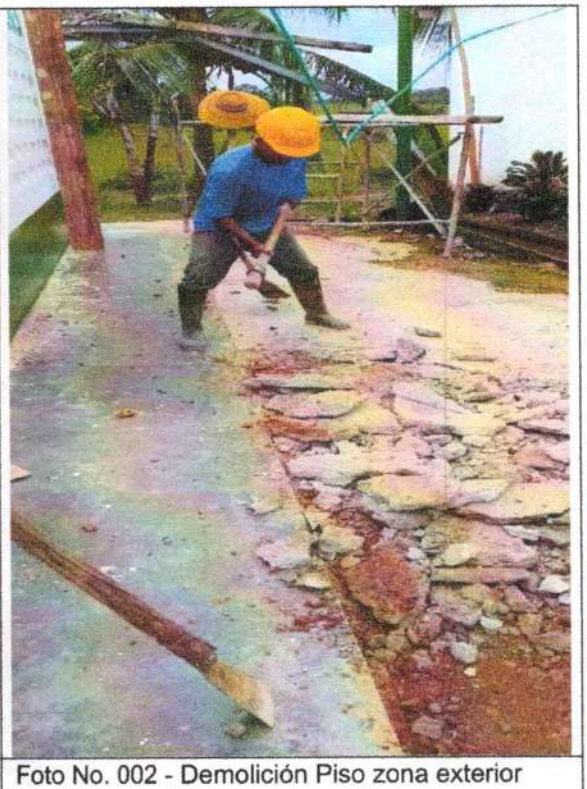


Foto No. 002 - Demolición Piso zona exterior

➢ 1.2 PISO Y/O ANDÉN EN CONCRETO 8 CM 3000 PSI

Esta actividad comprende el suministro, preparación, conformación y vaciado de una losa de concreto simple con resistencia característica de 3000 PSI y espesor de 0.08 metros (8 cm), destinada a la construcción de pisos o andenes en entornos educativos rurales. La superficie deberá ser nivelada, vibrada y acabada de acuerdo con los lineamientos técnicos establecidos, garantizando la funcionalidad, durabilidad y resistencia de la estructura. Incluye formaleta parcial con cuartones, elementos de sujeción, mezcla, colocación, curado y limpieza del área intervenida:

Ítem	Descripción	Contractual	Acta Modificatoria 1	Acta Parcial	Avance	Localización
1.2	Piso y/o andén en concreto 8 cm 3000 psi	96M2	82,32 M2	82,32M2	100%	Sede Esperanza Trocha 5

Después de realizar el replanteo, entre el municipio y el contratista se hace un balance en donde se confirmó la instalación de una losa de concreto de 8 cm de 82,32 m2, estructura que se planteó y aprobó por parte del municipio.

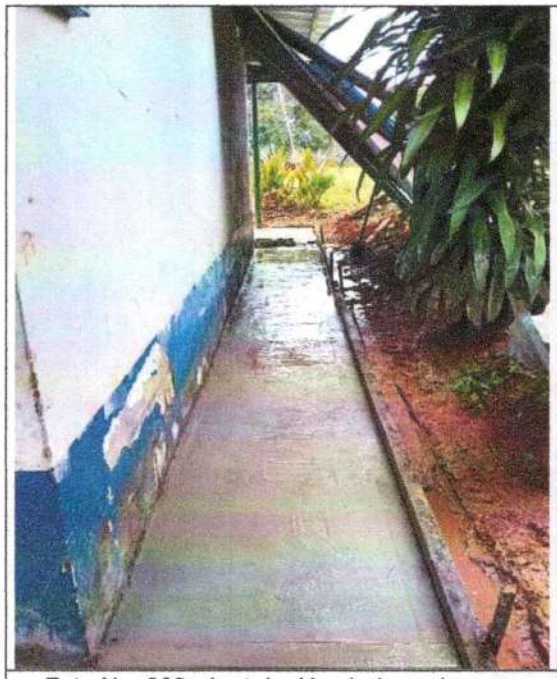


Foto No. 003 - Instalación de losa de concreto de 8 cm 3000psi

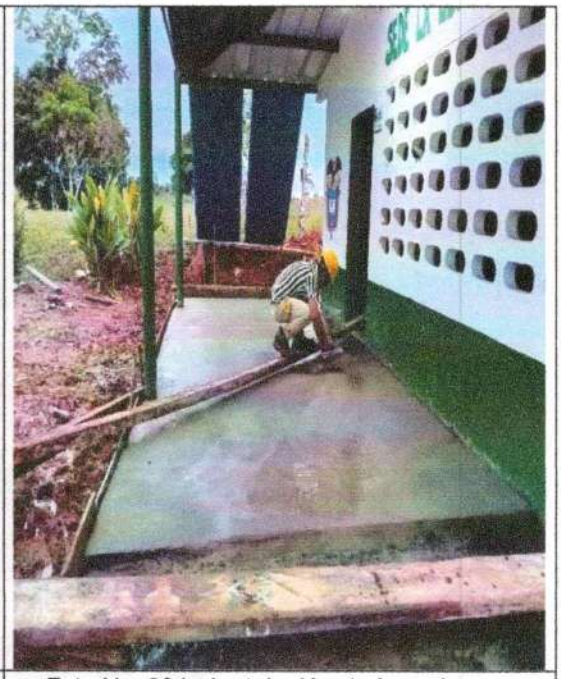


Foto No. 004 - Instalación de losa de concreto de 8 cm 3000psi

- 1.3 DESMONTE DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA MET., GALV., ZINC, FIBROCEMENTO, ETERNIT O SIMILAR, PAGADO EN M2

La actividad consiste en el desmonte controlado de estructuras y cubiertas existentes instaladas en materiales como lámina metálica galvanizada, zinc, fibrocemento, Eternit u otros materiales similares, fijados sobre entramados metálicos o de madera. El proceso implica el retiro de láminas, tornillos, fijaciones, correas o vigas menores, así como el acopio temporal y limpieza del área intervenida. Esta labor se realiza con el fin de permitir la renovación de la cubierta en edificaciones escolares rurales que presentan deterioro o condiciones inadecuadas para su funcionalidad, en donde las actividades fueron ejecutadas en su totalidad, siendo revisadas y aprobadas por el municipio así:

Item	Descripción	Contractual	Acta Modificatoria 1	Acta Parcial	Avance	Localización
1.3	Desmonte de estructura y cubierta met., galv., zinc, fibrocemento, eternit o similar, pagado en m2	120M2	130M2	130M2	100%	Sede Esperanza Trocha 5

Una vez reiterado el replanteo y realizado el recorrido, entre el municipio y el contratista se hace un balance en donde la ejecución del desmonte de estructura de cubierta fue de 130 M2, estructura que se planteó y aprobó por parte del municipio.

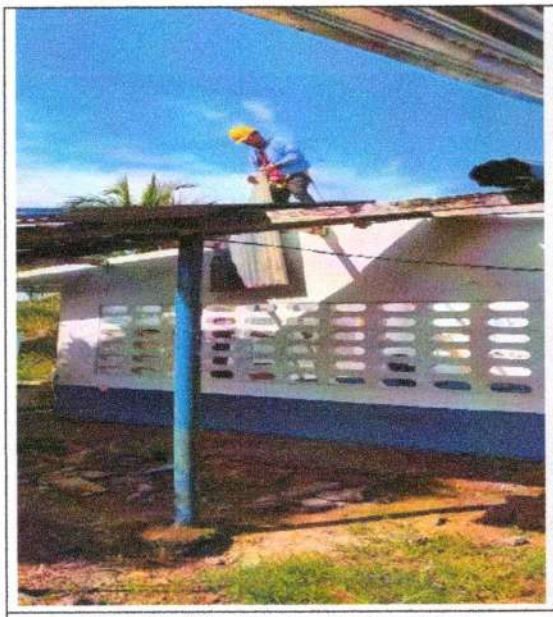


Foto No. 005 -Desmonte de cubierta



Foto No. 006 – desmonte de cubierta

- 1.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA

Esta actividad comprende el suministro, corte, armado y montaje de estructuras metálicas livianas para la conformación del soporte estructural de cubiertas en edificaciones educativas rurales. Se incluyen perfiles tipo canal, soldadura, procesos de fijación, aplicación de recubrimientos anticorrosivos y acabados de pintura según las especificaciones del diseño estructural. La actividad considera todos los elementos necesarios para el correcto anclaje, seguridad, funcionalidad y durabilidad del sistema estructural metálico, en donde las actividades fueron ejecutadas en su totalidad, siendo revisadas y aprobadas por el municipio así:

Item	Descripción	Contractual	Acta Modificatoria 1	Acta Parcial	Avance	Localización
1.4	Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta	96 M	0 M	0 M	0%	Sede Esperanza Trocha 5

Una vez realizado el recorrido entre el municipio y el contratista se hace un balance en donde se comprobó que no se realizó este ítem.

- 1.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TEJA TERMO ACÚSTICA UPVC 2.5MM BLANCO O SIMILAR (NO INCLUYE ENTRAMADO NI CABALLETE, INCLUYE TORNILLO)

La actividad comprende el suministro e instalación de teja termoacústica tipo UPVC de espesor 2.5 mm, color blanco o similar, como sistema de cubierta liviana para edificaciones escolares rurales. Incluye la colocación de tornillos con arandela de sellado, alineación, traslape y fijación de las piezas, garantizando impermeabilidad, resistencia al viento y aislamiento térmico básico. No contempla el suministro del entramado metálico ni del caballete. La actividad debe cumplir con las especificaciones técnicas del proyecto y estándares de seguridad para trabajos en altura; lo cual esta actividad fue ejecutada en su totalidad, siendo revisada y aprobada por el municipio así:

Ítem	Descripción	Contractual	Acta Modificatoria 1	Acta Parcial	Avance	Localización
1.5	Suministro e instalación de cubierta teja termo acústica upvc 2.5mm blanco o similar (no incluye entramado ni caballete, incluye tornillo)	120M2	0M2	0M2	0%	Sede Esperanza Trocha 5

Una vez realizado el recorrido entre el municipio y el contratista se hace un balance en donde se comprobó que no se realizó este ítem.

- 1.6 CABALLETE UPVC

La presente actividad consiste en el suministro e instalación del caballete UPVC como remate superior en la unión de dos faldones de cubierta conformados con teja termoacústica UPVC. Su función principal es asegurar la estanqueidad y la correcta terminación de la cubierta, evitando filtraciones de agua por la cumbrera. La instalación incluye amarras plásticas para fijación y requiere alineación, empalme, fijación mecánica y revisión final del sistema, esta actividad fue ejecutada en su totalidad, siendo revisada y aprobada por el municipio así:

Ítem	Descripción	Contractual	Acta Modificatoria 1	Acta Parcial	Avance	Localización
1.6	Caballete upvc	10M	0M	0M	0%	Sede Esperanza Trocha 5

Una vez realizado el recorrido entre el municipio y el contratista se hace un balance en donde se comprobó que no se realizó este ítem.

- 1.7 ESTUCO PLÁSTICO MURO [PASTA]

Esta actividad consiste en el suministro y aplicación de estuco plástico en pasta sobre superficies de muros interiores y/o exteriores, como acabado previo a la aplicación de pintura. Incluye la preparación de las superficies, aplicación en capas delgadas, lijado para uniformidad y limpieza final. La actividad se desarrollará en aulas, corredores, oficinas y demás áreas intervenidas en las instituciones educativas rurales, garantizando acabados lisos, adherencia adecuada y apariencia homogénea, en donde las actividades fueron ejecutadas en su totalidad, siendo revisadas y aprobadas por el municipio así:

Ítem	Descripción	Contractual	Acta Modificatoria 1	Acta Parcial	Avance	Localización
1.7	Estuco plástico muro [pasta]	64M2	0M2	0M2	0%	Sede Esperanza Trocha 5

Una vez realizado el recorrido entre el municipio y el contratista se hace un balance en donde se comprobó que no se realizó este ítem.

- 1.8 PINTURA VINILO TOPO 1

La actividad comprende el suministro y aplicación de pintura tipo vinilo de alta calidad, referencia TOPO 1 o similar, sobre superficies previamente estucadas y alistadas, en interiores y exteriores de edificaciones educativas rurales. Se debe garantizar una cobertura homogénea, acabado decorativo, buena adherencia y resistencia a condiciones ambientales. La pintura se aplicará mediante herramientas manuales como brochas y rodillos, conforme a las instrucciones del fabricante y especificaciones técnicas del proyecto, en donde las actividades fueron ejecutadas en su totalidad, siendo revisadas y aprobadas por el municipio así:

Ítem	Descripción	Contractual	Acta Modificatoria 1	Acta Final	Avance	Localización
1.8	Pintura vinilo topo 1	192 M2	81,80M2	81,80M2	100%	Sede Esperanza Trocha 5

Una vez reiterado el replanteo y realizado el recorrido, entre el municipio y el contratista se hace un balance en donde se ejecutaron 81,80 M2, estructura que se planteó y aprobó por parte del municipio.



Foto No. 007 – Pintura guarda escobas.



Foto No. 008 – Aplicación de Pintura Vinilo

3. IE. RURAL LA RICO KM 30 SEDE LA RICO

- 3.1 DESMONTE DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA MET., GALV., ZINC, FIBROCEMENTO, ETERNIT O SIMILAR, PAGADO EN M2

La actividad consiste en el desmonte controlado de estructuras y cubiertas existentes instaladas en materiales como lámina metálica galvanizada, zinc, fibrocemento, Eternit u otros materiales similares, fijados sobre entramados metálicos o de madera. El proceso implica el retiro de láminas, tornillos, fijaciones, correas o vigas menores, así como el acopio temporal y limpieza del área

intervenida. Esta labor se realiza con el fin de permitir la renovación de la cubierta en edificaciones escolares rurales que presentan deterioro o condiciones inadecuadas para su funcionalidad, en donde las actividades fueron ejecutadas en su totalidad, siendo revisadas y aprobadas por el municipio así:

Ítem	Descripción	Contractual	Acta Modificatoria 1	Acta Parcial	Avance	Localización
3.1	Desmonte de estructura y cubierta met., galv., zinc, fibrocemento, eternit o similar, pagado en m2	94,50M2	106M2	106M2	100%	Sede La Rico

Después de realizar el replanteo, entre el municipio y el contratista se confirmó la ejecución de 106 M2 de desmonte de estructura y cubierta estructura que se planteó y aprobó por parte del municipio.



Foto No. 009 – Desmonte de estructura y cubierta metálica



Foto No. 010 - Desmonte de estructura y cubierta metálica

- 3.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA

Esta actividad comprende el suministro, corte, armado y montaje de estructuras metálicas livianas para la conformación del soporte estructural de cubiertas en edificaciones educativas rurales. Se incluyen perfiles tipo canal, soldadura, procesos de fijación, aplicación de recubrimientos anticorrosivos y acabados de pintura según las especificaciones del diseño estructural. La actividad considera todos los elementos necesarios para el correcto anclaje, seguridad, funcionalidad y durabilidad del sistema estructural metálico, en donde las actividades fueron ejecutadas en su totalidad, siendo revisadas y aprobadas por el municipio así:

Ítem	Descripción	Contractual	Acta Modificatoria 1	Acta Parcial	Avance	Localización
3.2	Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta	76M	0M	0M	0%	Sede la Rico

Una vez realizado el recorrido entre el municipio y el contratista se hace un balance en donde se comprobó que no se realizó este ítem.

- 3.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TEJA TERMOACÚSTICA UPVC 2.5MM BLANCO O SIMILAR (NO INCLUYE ENTRAMADO NI CABALLETE, INCLUYE TORNILLO)

La actividad comprende el suministro e instalación de teja termoacústica tipo UPVC de espesor 2.5 mm, color blanco o similar, como sistema de cubierta liviana para edificaciones escolares rurales. Incluye la colocación de tornillos con arandela de sellado, alineación, traslape y fijación de las piezas, garantizando impermeabilidad, resistencia al viento y aislamiento térmico básico. No contempla el suministro del entramado metálico ni del caballete. La actividad debe cumplir con las especificaciones técnicas del proyecto y estándares de seguridad para trabajos en altura, en donde las actividades fueron ejecutadas en su totalidad, siendo revisadas y aprobadas por el municipio así:

Ítem	Descripción	Contractual	Acta Modificatoria 1	Acta Parcial	Avance	Localización
3.3	Suministro e instalación de cubierta teja termoacústica upvc 2.5mm blanco o similar (no incluye entramado ni caballete, incluye tornillo)	94,5M2	0M2	0M2	100%	Sede la Rico

Una vez realizado el recorrido entre el municipio y el contratista se hace un balance en donde se comprobó que no se realizó este ítem.

- 3.4 CABALLETE UPVC

La presente actividad consiste en el suministro e instalación del caballete UPVC como remate superior en la unión de dos faldones de cubierta conformados con teja termoacústica UPVC. Su función principal es asegurar la estanqueidad y la correcta terminación de la cubierta, evitando filtraciones de agua por la cumbrera. La instalación incluye amarras plásticas para fijación y requiere alineación, empalme, fijación mecánica y revisión final del sistema; lo cual esta actividad fue ejecutada en su totalidad, siendo revisada y aprobada por el municipio así:

Ítem	Descripción	Contractual	Acta Modificatoria 1	Acta Parcial	Avance	Localización
3.4	Caballete upvc	9M	0M	0M	0%	Sede La Rico

Una vez realizado el recorrido entre el municipio y el contratista se hace un balance en donde se comprobó que no se realizó este ítem.

4. IE. RURAL NIEVES ARRIBA

➢ 4.1 COLUMNA CONCRETO 3000 PSI

Esta actividad comprende el suministro, preparación y vaciado de concreto estructural con resistencia a la compresión de 3000 PSI (aproximadamente 21 MPa), para conformar columnas de soporte vertical en edificaciones escolares rurales. Incluye la instalación de formaletas temporales en madera, colocación de refuerzo, mezcla o recepción del concreto, vaciado, compactación mediante vibrado y curado posterior. El proceso debe garantizar la verticalidad, alineación, resistencia y durabilidad de las columnas como elementos fundamentales del sistema estructural, en donde las actividades fueron ejecutadas en su totalidad, siendo revisadas y aprobadas por el municipio así:

Ítem	Descripción	Contractual	Acta Modificatoria 1	Acta Parcial	Avance	Localización
4.1	Columna concreta 3000 psi	2,3M3	0M3	0M3	0%	Sede Nieves Arriba

Una vez realizado el recorrido entre el municipio y el contratista se hace un balance en donde se comprobó que no se realizó este ítem

➢ 4.2 VIGA CIMENTACIÓN CONCRETO 3000 PSI.

Esta actividad consiste en la construcción de vigas de cimentación en concreto estructural con resistencia a la compresión de 3000 PSI, como parte del sistema de cimentación superficial para edificaciones escolares. Incluye el suministro y vaciado del concreto, instalación de formaletas, colocación del acero de refuerzo (si aplica), vibrado, curado y retiro de formaletas. Las vigas se ejecutarán en condiciones de fundación controladas, garantizando la transmisión eficiente de cargas verticales a los estratos de suelo de soporte, en donde las actividades fueron ejecutadas en su totalidad, siendo revisadas y aprobadas por el municipio así:

Ítem	Descripción	Contractual	Acta Modificatoria 1	Acta Parcial	Avance	Localización
4.2	Viga cimentación concreto 3000 psi.	3,6M3	0M3	0M3	0%	Sede Nieves Arriba

Una vez realizado el recorrido entre el municipio y el contratista se hace un balance en donde se comprobó que no se realizó este ítem

- 4.3 VIGA CONCRETO-AÉREA 3000 PSI

La actividad comprende el suministro y vaciado de concreto estructural con resistencia característica de 3000 PSI, para la construcción de vigas aéreas o sobre nivel de piso en edificaciones educativas. Incluye la preparación del concreto, instalación y refuerzo de formaletas, colocación de acero (cuando se requiera), vaciado y vibrado del concreto, curado y posterior desencofrado. Estas vigas forman parte esencial del sistema estructural, permitiendo soportar cargas de entrepisos, cubiertas o cerramientos, en donde las actividades fueron ejecutadas en su totalidad, siendo revisadas y aprobadas por el municipio así:

Ítem	Descripción	Contractual	Acta Modificatoria 1	Acta Final	Avance	Localización
4.3	Viga concreto-aérea 3000 psi	3,6M3	0M3	0M3	0%	Sede Nieves Arriba

Una vez realizado el recorrido entre el municipio y el contratista se hace un balance en donde se comprobó que no se realizó este ítem.

- 4.4 DESMONTE DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA MET., GALV., ZINC, FIBROCEMENTO, ETERNIT O SIMILAR, PAGADO EN M2

La actividad consiste en el desmonte controlado de estructuras y cubiertas existentes instaladas en materiales como lámina metálica galvanizada, zinc, fibrocemento, Eternit u otros materiales similares, fijados sobre entramados metálicos o de madera. El proceso implica el retiro de láminas, tornillos, fijaciones, correas o vigas menores, así como el acopio temporal y limpieza del área intervenida. Esta labor se realiza con el fin de permitir la renovación de la cubierta en edificaciones escolares rurales que presentan deterioro o condiciones inadecuadas para su funcionalidad, en donde las actividades fueron ejecutadas en su totalidad, siendo revisadas y aprobadas por el municipio así:

Ítem	Descripción	Contractual	Acta Modificatoria 1	Acta Parcial	Avance	Localización
4.4	Desmonte de estructura y cubierta met., galv., zinc, fibrocemento, eternit o similar, pagado en m2	182M2	18M2	185 M2	100%	Sede Nieves Arriba

Una vez reiterado el replanteo y realizado el recorrido, entre el municipio y el contratista se hace un balance en donde se verifico y confirmó la ejecución de 185 M2 de desmonte de estructura y cubierta, lo anteriormente se planteó y aprobó por parte del municipio.



Foto No. 011 – Desmonte de estructura y cubierta



Foto No. 012 - Desmonte de estructura y cubierta

- 4.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA.

Esta actividad comprende el suministro, corte, armado y montaje de estructuras metálicas livianas para la conformación del soporte estructural de cubiertas en edificaciones educativas rurales. Se incluyen perfiles tipo canal, soldadura, procesos de fijación, aplicación de recubrimientos anticorrosivos y acabados de pintura según las especificaciones del diseño estructural. La actividad considera todos los elementos necesarios para el correcto anclaje, seguridad, funcionalidad y durabilidad del sistema estructural metálico, en donde las actividades fueron ejecutadas en su totalidad, siendo revisadas y aprobadas por el municipio así:

Ítem	Descripción	Contractual	Acta Modificatoria 1	Acta Final	Avance	Localización
4.5	Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta.	168 M	0 M	0 M	0%	Sede Nieves Arriba

Después de ejecutar la etapa de replanteo, entre el municipio y el contratista se hace un balance Una vez realizado el recorrido entre el municipio y el contratista se hace un balance en donde se comprobó que no se realizó este ítem.

- 4.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TEJA TERMOACÚSTICA UPVC 2.5MM BLANCO O SIMILAR (NO INCLUYE ENTRAMADO NI CABALLETE, INCLUYE TORNILLO)

La actividad comprende el suministro e instalación de teja termoacústica tipo UPVC de espesor 2.5 mm, color blanco o similar, como sistema de cubierta liviana para edificaciones escolares rurales. Incluye la colocación de tornillos con arandela de sellado, alineación, traslape y fijación de las piezas, garantizando impermeabilidad, resistencia al viento y aislamiento térmico básico. No contempla el suministro del entramado metálico ni del caballete. La actividad debe cumplir con las especificaciones técnicas del proyecto y estándares de seguridad para trabajos en altura; lo cual esta actividad fue ejecutada en su totalidad, siendo revisada y aprobada por el municipio así:

Ítem	Descripción	Contractual	Acta Modificatoria 1	Acta Final	Avance	Localización
4.6	Suministro e instalación de cubierta teja termoacústica upvc 2.5mm blanco o similar (no incluye entramado ni caballete, incluye tornillo)	182 M2	0 M2	0 M2	0%	Sede Nieves Arriba

Una vez realizado el recorrido entre el municipio y el contratista se hace un balance en donde se comprobó que no se realizó este ítem.

- 4.7 CABALLETE UPVC

La presente actividad consiste en el suministro e instalación del caballete UPVC como remate superior en la unión de dos faldones de cubierta conformados con teja termoacústica UPVC. Su función principal es asegurar la estanqueidad y la correcta terminación de la cubierta, evitando filtraciones de agua por la cumbrera. La instalación incluye amarras plásticas para fijación y requiere alineación, empalme, fijación mecánica y revisión final del sistema, esta actividad fue ejecutada en su totalidad, siendo revisada y aprobada por el municipio así:

Ítem	Descripción	Contractual	Acta Modificatoria 1	Acta Final	Avance	Localización
4.7	Caballete upvc	24M	0M	0M	0%	Sede Nieves Arriba

Una vez realizado el recorrido entre el municipio y el contratista se hace un balance en donde se comprobó que no se realizó este ítem.

- 4.8 ESTUCO PLÁSTICO MURO [PASTA]

Esta actividad consiste en el suministro y aplicación de estuco plástico en pasta sobre superficies de muros interiores y/o exteriores, como acabado previo a la aplicación de pintura. Incluye la preparación de las superficies, aplicación en capas delgadas, lijado para uniformidad y limpieza final. La actividad se desarrollará en aulas, corredores, oficinas y demás áreas intervenidas en las instituciones educativas rurales, garantizando acabados lisos, adherencia adecuada y apariencia homogénea, en donde las actividades fueron ejecutadas en su totalidad, siendo revisadas y aprobadas por el municipio así:

Ítem	Descripción	Contractual	Acta Modificatoria 1	Acta Parcial	Avance	Localización
4.8	Estuco plástico muro [pasta]	192 M2	0 M2	0 M2	0%	Sede Nieves Arriba

Una vez realizado el recorrido entre el municipio y el contratista se hace un balance en donde se comprobó que no se realizó este ítem.

- 4.9 PINTURA VINILO TOPO 1

La actividad comprende el suministro y aplicación de pintura tipo vinilo de alta calidad, referencia TOPO 1 o similar, sobre superficies previamente estucadas y alistadas, en interiores y exteriores de edificaciones educativas rurales. Se debe garantizar una cobertura homogénea, acabado decorativo, buena adherencia y resistencia a condiciones ambientales. La pintura se aplicará mediante herramientas manuales como brochas y rodillos, conforme a las instrucciones del fabricante y especificaciones técnicas del proyecto., en donde las actividades fueron ejecutadas en su totalidad, siendo revisadas y aprobadas por el municipio así:

Ítem	Descripción	Contractual	Acta Modificatoria 1	Acta Final	Avance	Localización
4.9	Pintura vinilo topo 1	192 M	244,78 M	244,78 M	100%	Sede Nieves Arriba

Después de ejecutar la etapa de replanteo, entre el municipio y el contratista se hace un balance en donde se comprobó que el suministro de Pintura vinilo topo 1 en sitio de obra a ejecutar es de 244,78 M, estructura que se planteó y aprobó por parte del municipio.



Foto No. 013 – Suministro de pintura vinilo tipo 1



Foto N0. 014 ministro de pintura vinilo tipo 1

5. IE. RURAL PLAYA RICA

- 5.1 COLUMNA CONCRETO 3000 PSI

Esta actividad comprende el suministro, preparación y vaciado de concreto estructural con resistencia a la compresión de 3000 PSI (aproximadamente 21 MPa), para conformar columnas de soporte vertical en edificaciones escolares rurales. Incluye la instalación de formaletas temporales en madera, colocación de refuerzo, mezcla o recepción del concreto, vaciado, compactación mediante vibrado y curado posterior. El proceso debe garantizar la verticalidad, alineación, resistencia y durabilidad de las columnas como elementos fundamentales del sistema estructural; lo cual esta actividad fue ejecutada en su totalidad, siendo revisada y aprobada por el municipio así:

Ítem	Descripción	Contractual	Acta Modificatoria 1	Acta Parcial	Avance	Localización
5.1	Columna concreta 3000 psi	0,75 M3	0,29 M3	0,29 M3	100%	Sede Playa Rica

Una vez reiterado el replanteo y realizado el recorrido, entre el municipio y el contratista se hace un balance en donde se comprobó la ejecución de 0,13 M3 de coluna concreto de 3000 psi en sitio de obra, estructura que se planteó y aprobó por parte del municipio.

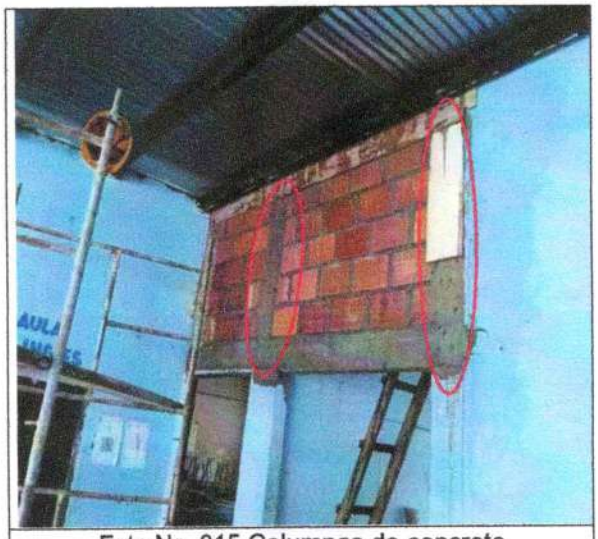


Foto No. 015 Columnas de concreto de 3000psi

- 5.2 VIGA CIMIENTACIÓN CONCRETO 3000 PSI

Esta actividad consiste en la construcción de vigas de cimentación en concreto estructural con resistencia a la compresión de 3000 PSI, como parte del sistema de cimentación superficial para edificaciones escolares. Incluye el suministro y vaciado del concreto, instalación de formaletas, colocación del acero de refuerzo (si aplica), vibrado, curado y retiro de formaletas. Las vigas se ejecutarán en condiciones de fundación controladas, garantizando la transmisión eficiente de cargas verticales a los estratos de suelo de soporte, esta actividad fue ejecutada en su totalidad, siendo revisada y aprobada por el municipio así:

Ítem	Descripción	Contractual	Acta Modificatoria 1	Acta Parcial	Avance	Localización
5.2	Viga cimientación concreto 3000 psi	1,80 M3	0,6 M3	0,6 M3	100%	Sede Playa Rica

Una vez reiterado el replanteo y realizado el recorrido, entre el municipio y el contratista se hace un balance en donde se comprobó la ejecución de 0,6 m3 de coluna concreto de 3000 psi en sitio de obra, estructura que se planteó y aprobó por parte del municipio.

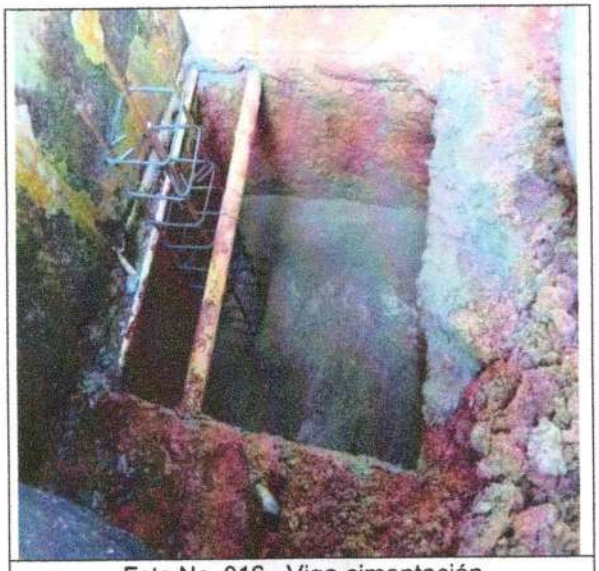


Foto No. 016 - Viga cimentación concreto 3000 psi

- 5.3 DESMONTE DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA MET., GALV., ZINC, FIBROCEMENTO, ETERNIT O SIMILAR, PAGADO EN M2

La actividad consiste en el desmonte controlado de estructuras y cubiertas existentes instaladas en materiales como lámina metálica galvanizada, zinc, fibrocemento, Eternit u otros materiales similares, fijados sobre entramados metálicos o de madera. El proceso implica el retiro de láminas, tornillos, fijaciones, correas o vigas menores, así como el acopio temporal y limpieza del área intervenida. Esta labor se realiza con el fin de permitir la renovación de la cubierta en edificaciones escolares rurales que presentan deterioro o condiciones

inadecuadas para su funcionalidad, las cuales estas actividades fueron ejecutadas en su totalidad, siendo revisadas y aprobadas por el municipio así:

Ítem	Descripción	Contractual	Acta Modificatoria 1	Acta Parcial	Avance	Localización
5.3	Desmonte de estructura y cubierta met., galv., zinc, fibrocemento, eternit o similar, pagado en m2	60 M2	56 M2	56 M2	100%	Sede Playa Rica

Después de realizar el replanteo, entre el municipio y el contratista se hace un balance en donde se constató el desmonte de estructura y cubierta en el sitio de obra de 56 M2, estructura que se planteó y aprobó por parte del municipio.

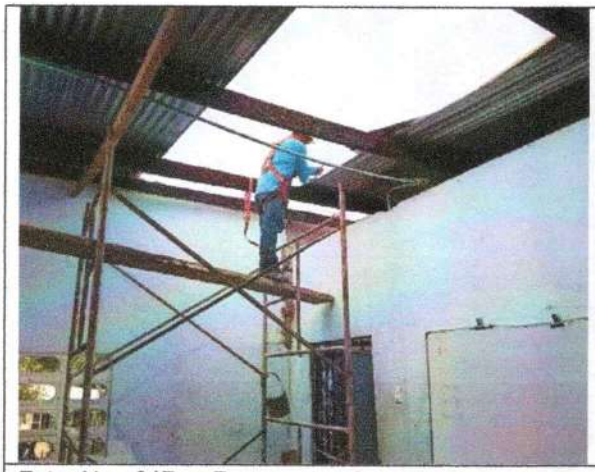


Foto No. 017 - Desmonte de estructura y cubierta

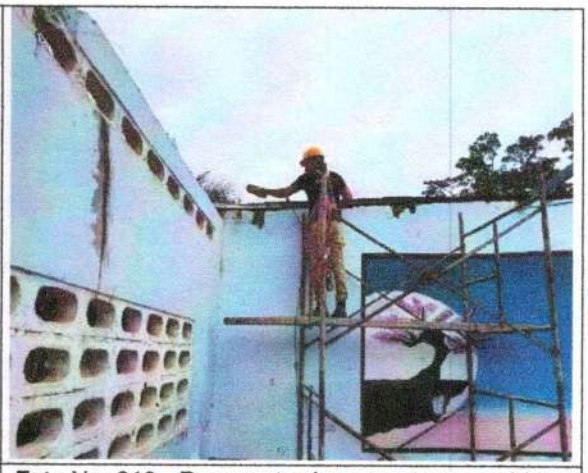


Foto No. 018 - Desmonte de estructura y cubierta

- 5.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA

Esta actividad comprende el suministro, corte, armado y montaje de estructuras metálicas livianas para la conformación del soporte estructural de cubiertas en edificaciones educativas rurales. Se incluyen perfiles tipo canal, soldadura, procesos de fijación, aplicación de recubrimientos anticorrosivos y acabados de pintura según las especificaciones del diseño estructural. La actividad considera todos los elementos necesarios para el correcto anclaje, seguridad, funcionalidad y durabilidad del sistema estructural metálico, en donde estas actividades fueron ejecutadas en su totalidad, siendo revisadas y aprobadas por el municipio así:

Ítem	Descripción	Contractual	Acta Modificatoria 1	Acta Parcial	Avance	Localización
5.4	Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta	60 M	0 M	0 M	0%	Sede Playa Rica

Una vez realizado el recorrido entre el municipio y el contratista se hace un balance en donde se comprobó que no se realizó este ítem.

- 5.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TEJA TERMOACÚSTICA UPVC 2.5MM BLANCO O SIMILAR (NO INCLUYE ENTRAMADO NI CABALLETE, INCLUYE TORNILLO)

La actividad comprende el suministro e instalación de teja termoacústica tipo UPVC de espesor 2.5 mm, color blanco o similar, como sistema de cubierta liviana para edificaciones escolares rurales. Incluye la colocación de tornillos con arandela de sellado, alineación, traslape y fijación de las piezas, garantizando impermeabilidad, resistencia al viento y aislamiento térmico básico. No contempla el suministro del entramado metálico ni del caballete. La actividad debe cumplir con las especificaciones técnicas del proyecto y estándares de seguridad para trabajos en altura, en donde las actividades fueron ejecutadas en su totalidad, siendo revisadas y aprobadas por el municipio así:

Ítem	Descripción	Contractual	Acta Modificatoria 1	Acta Parcial	Avance	Localización
5.5	Suministro e instalación de cubierta teja termoacústica upvc 2.5mm blanco o similar (no incluye entramado ni caballete, incluye tornillo)	60 M2	0 M2	0 M2	0%	Sede Playa Rica

Una vez realizado el recorrido entre el municipio y el contratista se hace un balance en donde se comprobó que no se realizó este ítem.

- 5.6 MAMPOSTERÍA EN BLOQUE N°4

La actividad corresponde a la construcción de muros mediante mampostería en bloque de concreto tipo N°4, unidos con mortero de pega dosificado 1:4 (una parte de cemento por cuatro de arena), conformando cerramientos o divisiones internas y externas de edificaciones educativas. Incluye replanteo, suministro de materiales, nivelación, ejecución del tendido de mortero, colocación de unidades, aplomado, alineado, rejuntado y limpieza final., en donde las actividades fueron ejecutadas en su totalidad, siendo revisadas y aprobadas por el municipio así:

Ítem	Descripción	Contractual	Acta Modificatoria 1	Acta Parcial	Avance	Localización
5.6	Mampostería en bloque n°4	70 M2	2,64 M2	2,64 M2	100%	Sede Playa Rica

Después de ejecutar la etapa de replanteo, entre el municipio y el contratista se hace un balance en donde se comprobó la instalación de mampostería en bloque n°4 en sitio de obra a ejecutar es de 2,64 M2, estructura que se planteó y aprobó por parte del municipio.



Foto No. 019 - Instalación mampostería en bloque n°4

➢ 5.7 CABALLETE UPVC

La presente actividad consiste en el suministro e instalación del caballete UPVC como remate superior en la unión de dos faldones de cubierta conformados con teja termoacústica UPVC. Su función principal es asegurar la estanqueidad y la correcta terminación de la cubierta, evitando filtraciones de agua por la cumbrera. La instalación incluye amarras plásticas para fijación y requiere alineación, empalme, fijación mecánica y revisión final del sistema, en donde las actividades fueron ejecutadas en su totalidad, siendo revisadas y aprobadas por el municipio así:

Ítem	Descripción	Contractual	Acta Modificatoria 1	Acta Parcial	Avance	Localización
5.7	Caballete upvc	6 M	0 M	0 M	0%	Sede Playa Rica

Una vez realizado el recorrido entre el municipio y el contratista se hace un balance en donde se comprobó que no se realizó este ítem.

IP 1 (ITEMS PREVISTOS) IE. RURAL PLAYA RICA.

- IP1.1 VIGA CONCRETO-AÉREA 3000 PSI

La actividad comprende el suministro y vaciado de concreto estructural con resistencia característica de 3000 PSI, para la construcción de vigas aéreas o sobre nivel de piso en edificaciones educativas. Incluye la preparación del concreto, instalación y refuerzo de formaletas, colocación de acero (cuando se requiera), vaciado y vibrado del concreto, curado y posterior desencofrado. Estas vigas forman parte esencial del sistema estructural, permitiendo soportar cargas de entrepisos, cubiertas o cerramientos., en donde las actividades fueron ejecutadas en su totalidad, siendo revisadas y aprobadas por el municipio así:

Ítem	Descripción	Contractual	Acta Modificatoria 1	Acta Parcial	Avance	Localización
IP1.1	Viga concreto-aérea 3000 psi	0 M3	0,22 M3	0,22 M3	100%	Sede Playa Rica

Después de ejecutar la etapa de replanteo, entre el municipio y el contratista se hace un balance en donde se comprobó la instalación de mampostería en bloque n°4 en sitio de obra a ejecutar es de 0,22 M3, estructura que se planteó y aprobó por parte del municipio.



Foto No. 020 - Instalación de viga aérea de 3000 psi

- IP1.2 PISO Y/O ANDEN EN CONCRETO 8 CM 3000 PSI

Esta actividad comprende el suministro, preparación, conformación y vaciado de una losa de concreto simple con resistencia característica de 3000 PSI y espesor de 0.08 metros (8 cm), destinada a la construcción de pisos o andenes en entornos educativos rurales. La superficie deberá ser nivelada, vibrada y acabada de acuerdo con los lineamientos técnicos establecidos, garantizando la funcionalidad, durabilidad y resistencia de la estructura. Incluye formaleta parcial con cuartones, elementos de sujeción, mezcla, colocación, curado y limpieza del área intervenida, en donde las actividades fueron ejecutadas en su totalidad, siendo revisadas y aprobadas por el municipio así:

Ítem	Descripción	Contractual	Acta Modificatoria 1	Acta Final	Avance	Localización
IP1.2	Piso y/o anden en concreto 8 cm 3000 psi	0 M2	2 M2	2 M2	100%	Sede Playa Rica

Después de ejecutar la etapa de replanteo, entre el municipio y el contratista se hace un balance en donde se comprobó la instalación de piso y/o anden en concreto de 8 cm en sitio de obra a ejecutar es de 2,00 M2, estructura que se planteó y aprobó por parte del municipio.

	
Foto No. 021 Instalación de Piso y/o anden en concreto de 8 cm 3000 psi	Foto No. 022 Instalación de Piso y/o anden en concreto de 8 cm 3000 psi

- IP1.3 DEMOLICIÓN PISO Y/O ANDÉN CON ESPESOR DE 0.08 M

La actividad consiste en la demolición controlada de pisos o andenes existentes en concreto simple con un espesor estimado de 0.08 metros, como parte de las labores de mejoramiento en las sedes educativas rurales. Esta intervención se ejecuta manualmente o con herramientas menores, garantizando la protección de elementos estructurales, instalaciones escolares, redes de servicios y entorno inmediato. Incluye la fragmentación del concreto, la recolección del material residual y la limpieza del área intervenida, en donde las actividades fueron ejecutadas en su totalidad, siendo revisadas y aprobadas por el municipio así:

Ítem	Descripción	Contractual	Acta Modificatoria 1	Acta Parcial	Avance	Localización
IP1.3	Demolición piso y/o andén con espesor de 0.08 m	0	2,00 M2	2,00 M2	100%	Sede Esperanza Trocha 5

Después de realizar el replanteo, entre el municipio y el contratista se hace un balance en donde se constató que la ejecución del ítem mencionado anteriormente fue de 82,32 M2, estructura que se planteó y aprobó por parte del municipio.

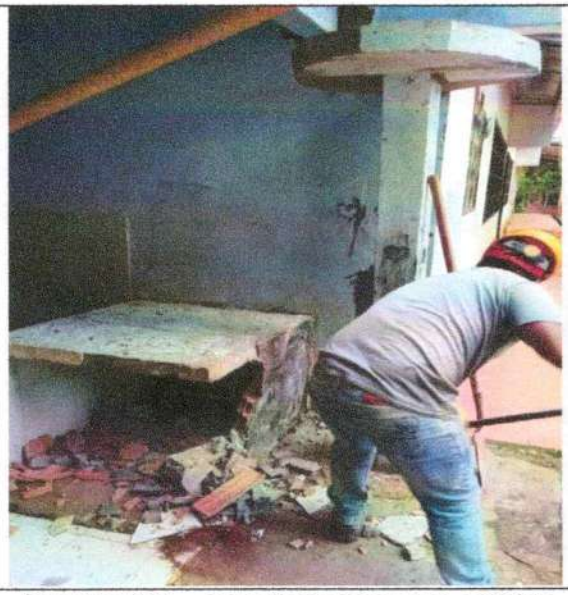


Foto No. 023 – Demolición Piso zona exterior

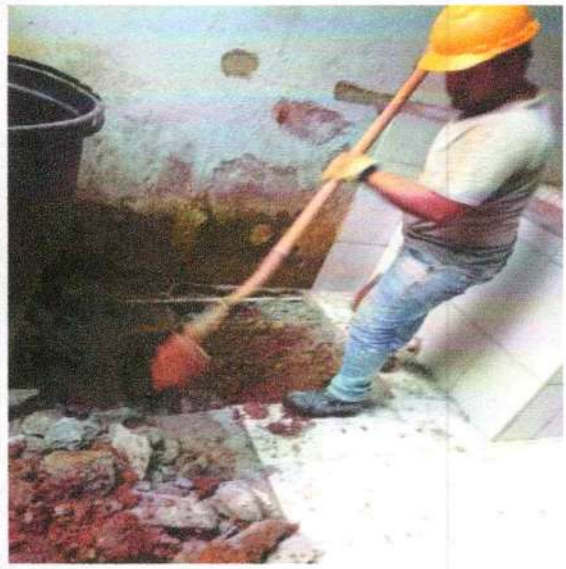




Foto No. 024 - Demolición Piso zona exterior

- IP1.4 PINTURA VINILO TOPO 1

La actividad comprende el suministro y aplicación de pintura tipo vinilo de alta calidad, referencia TOPO 1 o similar, sobre superficies previamente estucadas y alistadas, en interiores y exteriores de edificaciones educativas rurales. Se debe garantizar una cobertura homogénea, acabado decorativo, buena adherencia y resistencia a condiciones ambientales. La pintura se aplicará mediante herramientas manuales como brochas y rodillos, conforme a las instrucciones del fabricante y especificaciones técnicas del proyecto., en donde las actividades fueron ejecutadas en su totalidad, siendo revisadas y aprobadas por el municipio así:

Ítem	Descripción	Contractual	Acta Modificatoria 1	Acta Parcial	Avance	Localización
IP1.4	Pintura vinilo topo 1	0 M2	175 M2	175 M2	100%	Sede Playa Rica

Después de ejecutar la etapa de replanteo, entre el municipio y el contratista se hace un balance en donde se comprobó el suministro de pintura en vinilo tipo 1 en sitio de obra a ejecutar es de 175 M2, estructura que se planteó y aprobó por parte del municipio.

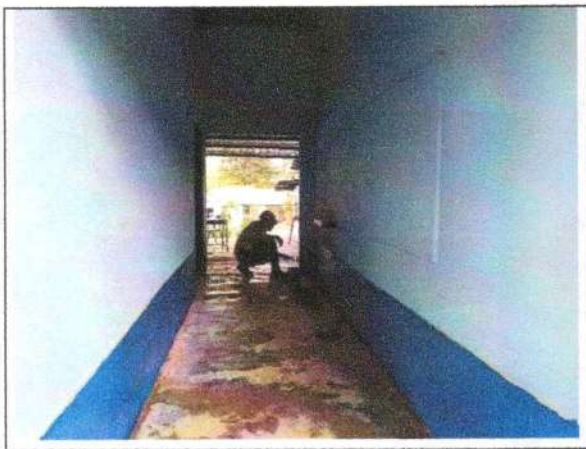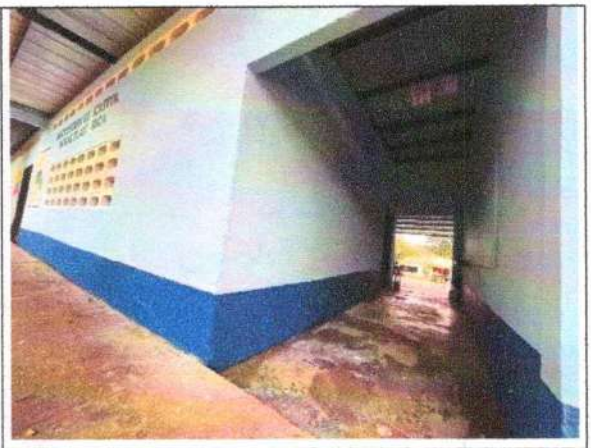	
Foto No. 025 – Suministro de pintura en vinilo topo 1	Foto No. 026 – Suministro de pintura en vinilo topo 1

ITEMS NO PREVISTOS

NP- 1 IE. RURAL LA MUÑOZ SEDE ESPERANZA TROCHA 5

- NP-1.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO RECTANGULAR 100 X 40 X 2.0M

La actividad comprende el suministro, corte, posicionamiento y montaje de tubo estructural rectangular de dimensiones 100 x 40 x 2.0 mm, en acero al carbono. Incluye labores de trazado, soldadura, fijación mecánica según diseño, y aplicación de recubrimiento anticorrosivo (primer) y pintura final conforme a las especificaciones del proyecto. El tubo se emplea como elemento estructural o de refuerzo en cubiertas, cerchas, marcos u otras estructuras metálicas, garantizando su correcto anclaje, estabilidad y durabilidad dentro del sistema constructivo, en donde estas actividades fueron ejecutadas en su totalidad, siendo revisadas y aprobadas por el municipio así:

Ítem	Descripción	Contractual	Acta Modificatoria 1	Acta Final	Avance	Localización
NP-1.2	Suministro e instalación de tubo rectangular 100 x 40 x 2.0mm	0 kg	802,47 kg	802,47 kg	100%	Sede rural Esperanza Trocha 5

Después de realizar el recorrido conjunto entre el municipio y el contratista, y de acuerdo con la inspección técnica visual, se evidenció la necesidad de suministrar e instalar 802,47 kg de tubo rectangular de 100 x 40 x 2.0 mm, debido a la ausencia o deterioro de elementos estructurales y de soporte en las zonas intervenidas. Esta medida fue planteada y aprobada por parte del municipio con el fin de garantizar la estabilidad, funcionalidad y seguridad de las estructuras complementarias dentro de la sede educativa



Foto No. 027 – Suministro e instalación de estructura metálica.



Foto No. 028 - Suministro e instalación de estructura metálica.

- NP 1.3 SUM. E INST. CUBIERTA MET. GALV. CAL. 26 PREPINTADA POR AMBAS CARAS POR EL FABRICANTE, TIPO M-1000 O SIMILAR (NO INCL. ENTRAMADO NI CABALLETE, INCL. TORNILLO), PAGADO EN m2

Esta actividad comprende el suministro e instalación de lámina metálica galvanizada calibre 26, tipo M-1000 o similar, prepintada por ambas caras por el fabricante, como sistema de cubierta liviana para edificaciones escolares rurales. Incluye la instalación mediante tornillos autoperforantes con arandela de sellado, realizando el traslape longitudinal y transversal conforme a las recomendaciones del fabricante, garantizando la correcta alineación, impermeabilidad, resistencia mecánica y protección contra la corrosión. No contempla el suministro del entramado metálico ni del caballete. La ejecución debe ajustarse a las especificaciones técnicas del proyecto y cumplir con la normativa vigente en materia de seguridad para trabajos en altura. En donde las actividades fueron ejecutadas en su totalidad, siendo revisadas y aprobadas por el municipio así:

Ítem	Descripción	Contractual	Acta Modificatoria 1	Acta Final	Avance	Localización
NP-1.3	Sum. E inst. Cubierta met. Galv. Cal. 26 prepintada por ambas caras por el fabricante, tipo m-1000 o similar (no incl. Entramado ni caballete, incl. Tornillo), pagado en m2	0	130 M2	130 M2	100%	Sede rural Esperanza Trocha 5

Después de realizar el recorrido conjunto entre el municipio y el contratista, y de acuerdo con la inspección técnica visual, se evidenció la necesidad de suministrar e instalar 130 M2 de cubierta metálica galvanizada calibre 26, debido al avanzado deterioro de la cubierta existente, la cual presentaba filtraciones, deformaciones y pérdida de capacidad de protección. Esta intervención fue planteada y aprobada por parte del municipio.

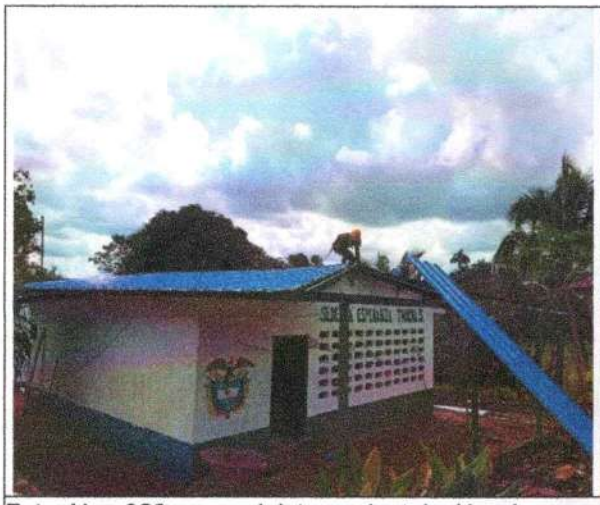


Foto No. 029 – suministro e instalación de cubierta.



Foto No. 030 - suministro e instalación de cubierta.

- NP-1.4 SUM. E INST. CABALLETE MET. GALV. CAL. 26 PARA CUBIERTA M-1000 O SIMILAR, PREPINTADO POR AMBAS CARAS POR EL FABRICANTE, PAGADO EN m

La presente actividad comprende el suministro e instalación del caballete metálico galvanizado calibre 26, tipo trapezoidal o según diseño compatible con cubierta M-1000 o similar, prepintado por ambas caras por el fabricante. Su función es servir como remate superior en la cumbrera de la cubierta, garantizando la impermeabilidad y la correcta terminación del sistema de techado. La instalación

incluye alineación, traslape, fijación mecánica con tornillos autoperforantes con arandela de sellado, sellado de juntas si aplica y revisión final del sistema. El trabajo debe realizarse cumpliendo con los estándares técnicos del proyecto, asegurando durabilidad, funcionalidad y condiciones seguras durante su ejecución, en donde las actividades fueron ejecutadas en su totalidad, siendo revisadas y aprobadas por el municipio así:

Ítem	Descripción	Contractual	Acta Modificatoria 1	Acta Parcial	Avance	Localización
NP-1.4	Sum. E inst. Caballete met. Galv. Cal. 26 para cubierta m-1000 o similar, prepintado por ambas caras por el fabricante, pagado en m	0	30,20 M	30,20 M	100%	Sede rural Esperanza Trocha 5

Después de realizar el recorrido conjunto entre el municipio y el contratista, y de acuerdo con la inspección técnica visual, se evidenció la necesidad de suministrar e instalar 30,20 M de caballetes metálicos galvanizados calibre 26, compatibles con la cubierta tipo M-1000, debido a la ausencia o deterioro de los remates existentes en la cumbrera, lo que generaba filtraciones y riesgo de daño en la estructura. Esta actividad fue planteada y aprobada por parte del municipio con el fin de garantizar la correcta terminación, impermeabilidad y durabilidad del sistema de cubierta instalado en la sede educativa.



Foto No. 031 – suministro e instalación de caballete.



Foto No. 032 - suministro e instalación de caballete.

- NP-1.5 BORDILLO EN CONCRETO 3000 PSI 10 X 20 CM .

La actividad comprende el suministro, conformación de base, nivelación, alineación e instalación de bordillo prefabricado o vaciado en sitio en concreto con una resistencia mínima de 3000 psi, con dimensiones de 10 cm de ancho por 20 cm de altura. Incluye el corte, retiro y disposición del material existente si aplica, excavación puntual, cama de apoyo en concreto pobre o mortero, relleno lateral con material seleccionado, curado, limpieza final y todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios para su correcta ejecución. La instalación debe garantizar la correcta alineación, nivelación y estabilidad del bordillo, conforme a los planos y especificaciones técnicas del proyecto y normativa vigente, en donde las actividades fueron ejecutadas en su totalidad, siendo revisadas y aprobadas por el municipio así:

Ítem	Descripción	Contractual	Acta Modificatoria 1	Acta Final	Avance	Localización
NP-1.5	Bordillo en concreto 3000 psi 10 x 20 cm	0	44,30 M	44,30 M	100%	Sede rural Esperanza Trocha 5

Después de realizar el recorrido conjunto entre el municipio y el contratista, y con base en la inspección técnica visual, se evidenció la necesidad de suministrar e instalar 44,30 M de bordillos en concreto de 10 x 20 cm, debido al deterioro, falta de alineación o ausencia total de los elementos existentes en los andenes y zonas de circulación. Esta intervención fue planteada y aprobada por parte del municipio con el objetivo de garantizar una correcta delimitación, funcionalidad y seguridad en los accesos.



Foto No. 032 – Instalación de bordillo en concreto de 10*20.

NP-2 IE. RURAL LA RICO KM 30 SEDE LA RICO

- NP-2.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20

La actividad comprende el suministro e instalación de canal en lámina galvanizada calibre 20, conformada según diseño hidráulico del proyecto, para la recolección y conducción de aguas lluvias en cubiertas o estructuras similares. Incluye el corte, conformado, transporte, montaje, nivelación, anclaje a la estructura de soporte mediante elementos de fijación adecuados (tornillos, pernos o soldadura según el caso), aplicación de sellos en juntas si se requiere, y prueba de estanqueidad. La actividad debe garantizar un adecuado escurrimiento, resistencia estructural, durabilidad frente a la corrosión y cumplimiento con las especificaciones técnicas del proyecto. Se debe seguir el protocolo de seguridad para trabajo en alturas cuando aplique, en donde las actividades fueron ejecutadas en su totalidad, siendo revisadas y aprobadas por el municipio así:

Ítem	Descripción	Contractual	Acta Modificatoria 1	Acta Parcial	Avance	Localización
NP-2.2	Suministro e instalación de canal lamina galvanizado calibre 20	0	10,00 KG	10,00 KG	100%	Sede la Rico

Durante el recorrido conjunto entre el municipio y el contratista, y conforme a la inspección técnica visual, se evidenció la necesidad de suministrar e instalar canal en lámina galvanizada calibre 20, debido a la ausencia o mal estado del sistema de recolección de aguas lluvias en la cubierta. Esta situación generaba escorrentías no controladas que afectaban las fachadas y zonas de circulación. Por tal motivo, el municipio aprobó la ejecución de esta actividad con el fin de garantizar una adecuada evacuación pluvial y preservar la integridad de las estructuras intervenidas.



Foto No. 033 – Suministro e instalación de canal metálico.

- NP-2.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO RECTANGULAR 100 X 40 X 2.0MM

La actividad comprende el suministro, corte, posicionamiento y montaje de tubo estructural rectangular de dimensiones 100 x 40 x 2.0 mm, en acero al carbono. Incluye labores de trazado, soldadura, fijación mecánica según diseño, y aplicación de recubrimiento anticorrosivo (primer) y pintura final conforme a las especificaciones del proyecto. El tubo se emplea como elemento estructural o de refuerzo en cubiertas, cerchas, marcos u otras estructuras metálicas, garantizando su correcto anclaje, estabilidad y durabilidad dentro del sistema constructivo, en donde estas actividades fueron ejecutadas en su totalidad, siendo revisadas y aprobadas por el municipio así:

Ítem	Descripción	Contractual	Acta Modificatoria 1	Acta Final	Avance	Localización
NP-2.3	Suministro e instalación de tubo rectangular 100 x 40 x 2.0mm	0	509M2	509M2	100%	Sede la Rico.

A partir de la visita técnica realizada en conjunto por el municipio y el contratista, se determinó la necesidad de incorporar 509 kg de tubo rectangular de 100 x 40 x 2.0 mm, como parte de la solución estructural requerida en las áreas intervenidas. La inspección visual permitió identificar la ausencia y el deterioro de elementos de soporte fundamentales para garantizar la funcionalidad y estabilidad de las estructuras. Esta intervención fue evaluada y aprobada por el municipio, con el objetivo de reforzar la seguridad y asegurar el correcto comportamiento de las estructuras complementarias en la sede educativa.

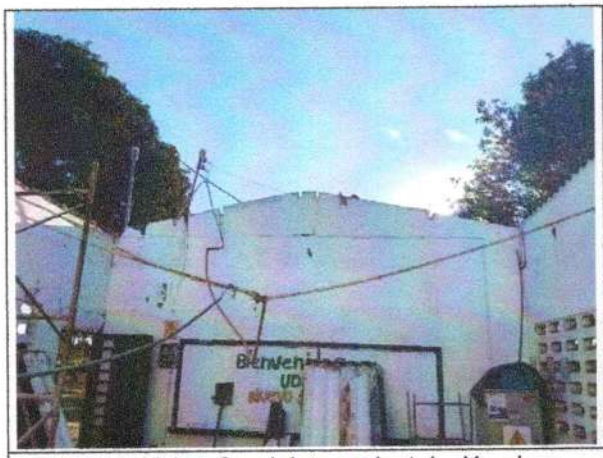


Foto No. 034 – Suministro e instalación de estructura metálica.



Foto No. 035 – Suministro e instalación de estructura metálica.

- NP-2.4 SUM. E INST. CUBIERTA MET. GALV. CAL. 26 PREPINTADA POR AMBAS CARAS POR EL FABRICANTE, TIPO M-1000 O SIMILAR (NO INCL. ENTRAMADO NI CABALLETE, INCL. TORNILLO), PAGADO EN m2.

Esta actividad comprende el suministro e instalación de lámina metálica galvanizada calibre 26, tipo M-1000 o similar, prepintada por ambas caras por el fabricante, como sistema de cubierta liviana para edificaciones escolares rurales. Incluye la instalación mediante tornillos autoperforantes con arandela de sellado, realizando el traslape longitudinal y transversal conforme a las recomendaciones del fabricante, garantizando la correcta alineación, impermeabilidad, resistencia mecánica y protección contra la corrosión. No contempla el suministro del entramado metálico ni del caballete. La ejecución debe ajustarse a las especificaciones técnicas del proyecto y cumplir con la normativa vigente en materia de seguridad para trabajos en altura. En donde las actividades fueron ejecutadas en su totalidad, siendo revisadas y aprobadas por el municipio así:

Ítem	Descripción	Contractual	Acta Modificatoria 1	Acta Final	Avance	Localización
NP-2.4	Sum. E inst. Cubierta met. Galv. Cal. 26 prepintada por ambas caras por el fabricante, tipo m-1000 o similar (no incl. Entramado ni caballete, incl. Tornillo), pagado en m2	0	106,09 M2	106,09 M2	100%	Sede la Rico

Durante la visita técnica realizada por el contratista en compañía del municipio, se identificó el deterioro avanzado de la cubierta existente, ante esta situación, se definió la necesidad de suministrar e instalar 106,09 m² de lámina metálica galvanizada calibre 26. Esta solución fue revisada y aprobada por el municipio como parte de la intervención prioritaria en la sede educativa.

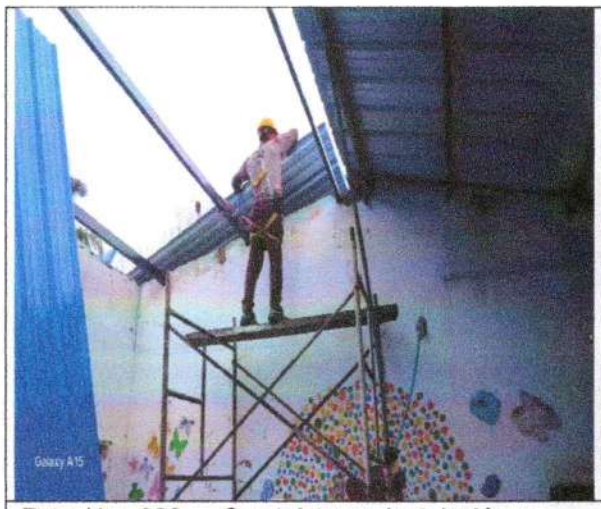


Foto No. 036 – Suministro e instalación y cubierta

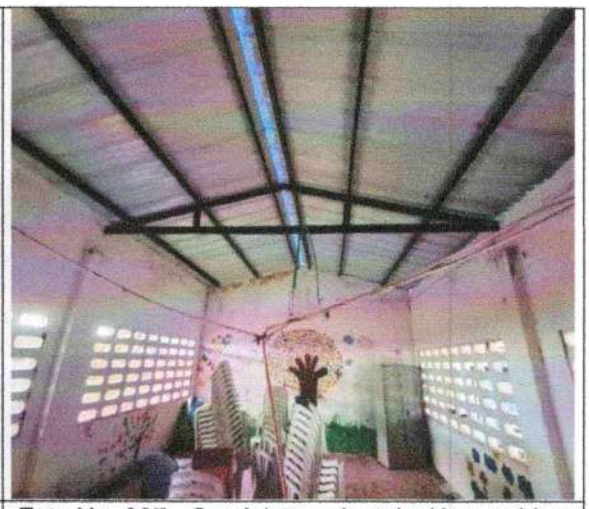


Foto No. 037 - Suministro e instalación y cubierta

- NP-2.5 SUM. E INST. CABALLETE MET. GALV. CAL. 26 PARA CUBIERTA M-1000 O SIMILAR, PREPINTADO POR AMBAS CARAS POR EL FABRICANTE, PAGADO EN m

La presente actividad comprende el suministro e instalación del caballete metálico galvanizado calibre 26, tipo trapezoidal o según diseño compatible con cubierta M-1000 o similar, prepintada por ambas caras por el fabricante. Su función es servir como remate superior en la cumbrera de la cubierta, garantizando la impermeabilidad y la correcta terminación del sistema de techado. La instalación incluye alineación, traslape, fijación mecánica con tornillos autoperforantes con

arandela de sellado, sellado de juntas si aplica y revisión final del sistema. El trabajo debe realizarse cumpliendo con los estándares técnicos del proyecto, asegurando durabilidad, funcionalidad y condiciones seguras durante su ejecución, en donde las actividades fueron ejecutadas en su totalidad, siendo revisadas y aprobadas por el municipio así:

Ítem	Descripción	Contractual	Acta Modificatoria 1	Acta Final	Avance	Localización
NP-2.5	Sum. E inst. Caballete met. Galv. Cal. 26 para cubierta m-1000 o similar, prepintada por ambas caras por el fabricante, pagado en m	0	10,30 M	10,30 M	100%	Sede la Rico

Tras realizar la inspección visual durante el recorrido conjunto entre el municipio y el contratista, se detectó la necesidad de suministrar e instalar 10,30 metros lineales de caballetes metálicos galvanizados calibre 26, adecuados para cubiertas tipo M-1000. La falta o deterioro de estos remates en la cumbrera estaba provocando filtraciones y poniendo en riesgo la integridad estructural. Por esta razón, el municipio aprobó esta intervención para asegurar una terminación adecuada, impermeabilidad y mayor durabilidad del sistema de cubierta en la sede educativa.



Foto No. 038 – Suministro e instalación de caballete metálico.



Foto No. 039 - Suministro e instalación de caballete metálico.

NP-3 IE. RURAL NIEVES ARRIBA

- NP-3.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO RECTANGULAR 100 X 40 X 2.0MM

La actividad comprende el suministro, corte, posicionamiento y montaje de tubo estructural rectangular de dimensiones 100 x 40 x 2.0 mm, en acero al carbono. Incluye labores de trazado, soldadura, fijación mecánica según diseño, y aplicación de recubrimiento anticorrosivo (primer) y pintura final conforme a las especificaciones del proyecto. El tubo se emplea como elemento estructural o de refuerzo en cubiertas, cerchas, marcos u otras estructuras metálicas, garantizando su correcto anclaje, estabilidad y durabilidad dentro del sistema constructivo, en donde estas actividades fueron ejecutadas en su totalidad, siendo revisadas y aprobadas por el municipio así:

Ítem	Descripción	Contractual	Acta Modificatoria 1	Acta Final	Avance	Localización
NP-3.2	Suministro e instalación de tubo rectangular 100 x 40 x 2.0mm.	0	769,05 M2	769,05 M2	100%	Sede Nieves Arriba

Durante la visita técnica conjunta realizada por el municipio y el contratista, se concluyó que era necesario suministrar e instalar 769,05 M2 de tubo rectangular de 100 x 40 x 2.0 mm para reforzar la estructura en las áreas intervenidas. La inspección visual evidenció la carencia y el desgaste de elementos de soporte esenciales para mantener la estabilidad y funcionalidad de las estructuras. Esta acción fue revisada y aprobada por el municipio con el propósito de garantizar la seguridad y el desempeño adecuado de las estructuras complementarias en la sede educativa.



Foto No. 040 – Suministro e instalación de tubo rectangular 100 x 40 x 2.0mm incluye anticorrosivo, pintura.

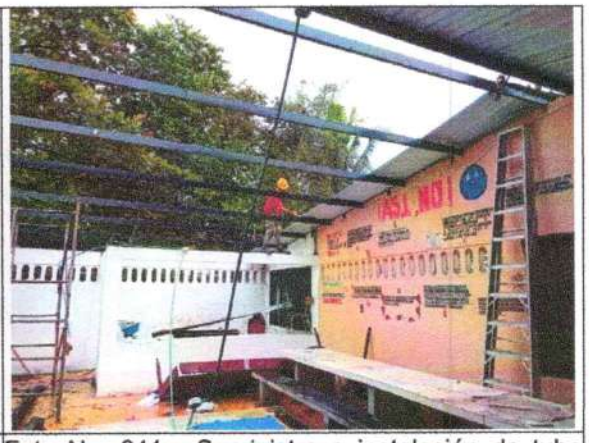


Foto No. 041 - Suministro e instalación de tubo rectangular 100 x 40 x 2.0mm incluye anticorrosivo, pintura.

- NP-3.3 SUM. E INST. CUBIERTA MET. GALV. CAL. 26 PREPINTADA POR AMBAS CARAS POR EL FABRICANTE, TIPO M-1000 O SIMILAR (NO INCL. ENTRAMADO NI CABALLETE, INCL. TORNILLO), PAGADO EN m2

Esta actividad comprende el suministro e instalación de lámina metálica galvanizada calibre 26, tipo M-1000 o similar, prepintada por ambas caras por el fabricante, como sistema de cubierta liviana para edificaciones escolares. Incluye la instalación mediante tornillos autoperforantes con arandela de sellado, realizando el traslape longitudinal y transversal, garantizando la correcta alineación, impermeabilidad, resistencia mecánica y protección contra la corrosión. No contempla el suministro del entramado metálico ni del caballete. Esta actividad fue ejecutada en su totalidad, siendo revisadas y aprobadas por el municipio así:

Ítem	Descripción	Contractual	Acta Modificatoria 1	Acta Final	Avance	Localización
NP- 3.3	Sum. E inst. Cubierta met. Galv. Cal. 26 prepintada por ambas caras por el fabricante, tipo m-1000 o similar (no incl. Entramado ni caballete, incl. Tornillo), pagado en m2	0	185 M2	185 M2	100%	Sede Nieves Arriba

Durante la inspección conjunta entre el contratista y el municipio, se constató un deterioro considerable en la cubierta existente. Por tal motivo, se estableció la necesidad de suministrar e instalar 182,23 M2 de lámina metálica galvanizada calibre 26 como acción correctiva para restaurar la funcionalidad y seguridad del sistema de cubierta. Esta intervención fue evaluada y aprobada por el municipio, considerándose una prioridad dentro de las obras en la sede educativa.

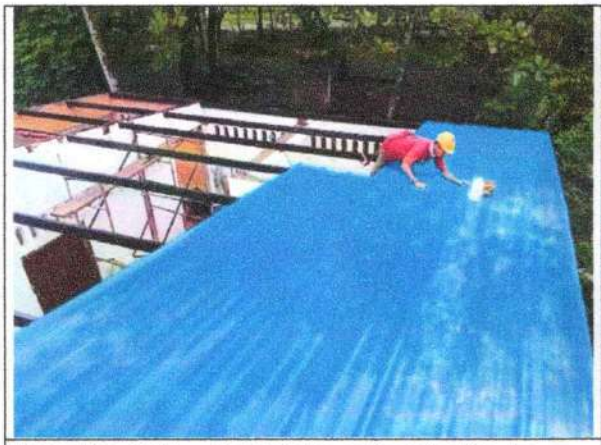


Foto No. 042 – Suministro e instalación de cubierta.



Foto No. 043 - Suministro e instalación de cubierta.

- NP- 3.4 SUM. E INST. CABALLETE MET. GALV. CAL. 26 PARA CUBIERTA M-1000 O SIMILAR, PREPINTADO POR AMBAS CARAS POR EL FABRICANTE, PAGADO EN m

La presente actividad comprende el suministro e instalación del caballete metálico galvanizado calibre 26, tipo trapezoidal o según diseño compatible con cubierta M-1000 o similar, prepintado por ambas caras por el fabricante. Su función es servir como remate superior en la cumbrera de la cubierta, garantizando la impermeabilidad y la correcta terminación del sistema de techado. La instalación incluye alineación, traslape, fijación mecánica con tornillos de juntas si aplica y revisión final del sistema. Esta actividad fue ejecutada en su totalidad, siendo revisadas y aprobadas por el municipio así:

Ítem	Descripción	Contractual	Acta Modificatoria 1	Acta Final	Avance	Localización
NP- 3.4	Sum. E inst. Caballete met. Galv. Cal. 26 para cubierta m-1000 o similar, prepintada por ambas caras por el fabricante, pagado en m	0	10,00 M	10,00 M	100%	Sede Nieves Arriba

Durante el recorrido conjunto realizado por el municipio y el contratista, la inspección visual evidenció la necesidad de suministrar e instalar 10,00 M de caballetes metálicos galvanizados calibre 26, el municipio aprobó la ejecución de esta actividad para garantizar una adecuada terminación, impermeabilidad y prolongar la vida útil del sistema de cubierta en la sede educativa.



Foto No. 044 – Instalación de caballete metálico.

➢ NP- 3.5 PAÑETE 1:4 (INCL. FILOS Y DILATACIONES), PAGADO EN m2

La actividad consiste en la ejecución del pañete fino a base de mortero cemento-arena en proporción 1:4, aplicado sobre superficies de muros o elementos verticales previamente fraguados, limpios y humedecidos. Incluye preparación de la mezcla, colocación de maestras, aplicación y afinado manual o mecánico del mortero para lograr una superficie nivelada y uniforme. Se contempla el tratamiento completo de filos, bordes, encuentros con otros elementos constructivos y la ejecución de juntas de dilatación según el diseño arquitectónico o estructural. La actividad comprende toda la mano de obra, herramientas, materiales, andamiaje y limpieza final del área intervenida, y debe ejecutarse conforme a las especificaciones técnicas del proyecto y buenas prácticas de la construcción, en donde las actividades fueron ejecutadas en su totalidad, siendo revisadas y aprobadas por el municipio así:

Ítem	Descripción	Contractual	Acta Modificatoria 1	Acta Final	Avance	Localización
NP- 3.5	Pañete 1:4 (incl. Filos y dilataciones), pagado en m2	0	23,50 M2	23,50 M2	100%	Sede Nieves Arriba

Durante la inspección técnica realizada junto al municipio y el contratista, se identificó la necesidad de aplicar 13,76 M2 de pañete en mezcla en las superficies definidas, incluyendo el tratamiento de filos y dilataciones para garantizar la continuidad y durabilidad del revestimiento. La ejecución fue aprobada por el municipio para asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad en la sede educativa.



Foto No. 047 – Instalación de pañete 1:4



Foto No. 048 – Instalación de pañete 1:4

NP- 4 IE. RURAL PLAYA RICA

- NP- 4.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO RECTANGULAR 100 X 40 X 2.0MM

La actividad comprende el suministro, corte, posicionamiento y montaje de tubo estructural rectangular de dimensiones 100 x 40 x 2.0 mm, en acero al carbono. Incluye labores de trazado, soldadura, fijación mecánica según diseño, y aplicación de recubrimiento anticorrosivo (primer) y pintura final conforme a las especificaciones del proyecto. El tubo se emplea como elemento estructural o de refuerzo en cubiertas, cerchas, marcos u otras estructuras metálicas, garantizando su correcto anclaje, estabilidad y durabilidad dentro del sistema constructivo, en donde estas actividades fueron ejecutadas en su totalidad, siendo revisadas y aprobadas por el municipio así:

Ítem	Descripción	Contractual	Acta Modificatoria 1	Acta Final	Avance	Localización
NP-4.2	Suministro e instalación de tubo rectangular 100 x 40 x 2.0 mm	0	272,55 M2	272,55 M2	100%	Sede Playa Rica

Durante la visita técnica conjunta realizada por el municipio y el contratista, se concluyó que era necesario suministrar e instalar 275,55 M2 de tubo rectangular de 100 x 40 x 2.0 mm para reforzar la estructura en las áreas intervenidas. La inspección visual evidenció la carencia y el desgaste de elementos de soporte esenciales para mantener la estabilidad y funcionalidad de las estructuras. Esta acción fue revisada y aprobada por el municipio con el propósito de garantizar la seguridad y el desempeño adecuado de las estructuras complementarias en la sede educativa.



Foto No. 049 – Instalación de estructura metálica.



Foto No. 050 - Instalación de estructura metálica.

- NP-4.3 SUM. E INST. CUBIERTA MET. GALV. CAL. 26 PREPINTADA POR AMBAS CARAS POR EL FABRICANTE, TIPO M-1000 O SIMILAR (NO INCL. ENTRAMADO NI CABALLETE, INCL. TORNILLO), PAGADO EN m2

Esta actividad comprende el suministro e instalación de lámina metálica galvanizada calibre 26, tipo M-1000 o similar, prepintada por ambas caras por el fabricante, como sistema de cubierta liviana para edificaciones escolares rurales. Incluye la instalación mediante tornillos autoperforantes con arandela de sellado, realizando el traslape longitudinal y transversal conforme a las recomendaciones del fabricante, garantizando la correcta alineación, impermeabilidad, resistencia mecánica y protección contra la corrosión En donde las actividades fueron ejecutadas en su totalidad, siendo revisadas y aprobadas por el municipio así:

Ítem	Descripción	Contractual	Acta Modificatoria 1	Acta Final	Avance	Localización
NP-4.3	Sum. E inst. Cubierta met. Galv. Cal. 26 prepintada por ambas caras por el fabricante, tipo m-1000 o similar (no incl. Entramado ni caballete, incl. Tornillo), pagado en m2	0	56,00 M2	56,00 M2	100%	Sede Playa Rica

Durante la inspección conjunta entre el contratista y el municipio, se constató un deterioro considerable en la cubierta existente. Por tal motivo, se estableció la necesidad de suministrar e instalar 56,00 M2 de lámina metálica galvanizada calibre 26 como acción correctiva para restaurar la funcionalidad y seguridad del sistema de cubierta. Esta intervención fue evaluada y aprobada por el municipio, considerándose una prioridad dentro de las obras en la sede educativa.

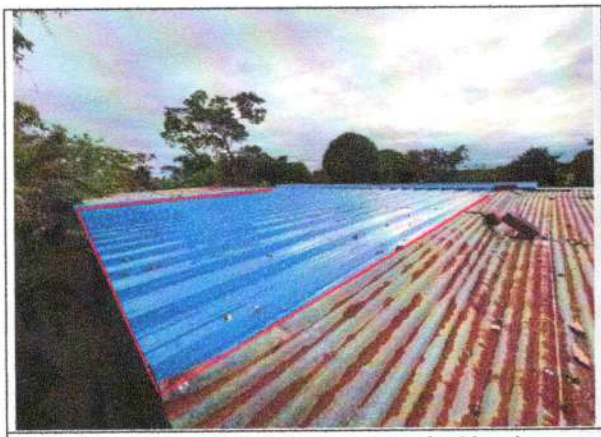


Foto No. 056 – Suministro e instalación de cubierta

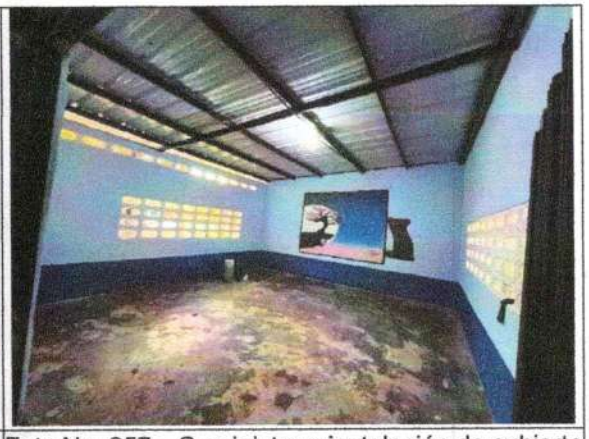


Foto No. 057 – Suministro e instalación de cubierta

- NP-4.4 SUM. E INST. CABALLETE MET. GALV. CAL. 26 PARA CUBIERTA M-1000 O SIMILAR, PREPINTADO POR AMBAS CARAS POR EL FABRICANTE, PAGADO EN m

La presente actividad comprende el suministro e instalación del caballete metálico galvanizado calibre 26, tipo trapezoidal o según diseño compatible con cubierta M-1000 o similar, prepintado por ambas caras por el fabricante. Su función es servir como remate superior en la cumbrera de la cubierta, garantizando la impermeabilidad y la correcta terminación del sistema de techado. La instalación incluye alineación, traslape, fijación mecánica con tornillos autoperforantes con arandela de sellado, sellado de juntas si aplica y revisión final del sistema, en donde las actividades fueron ejecutadas en su totalidad, siendo revisadas y aprobadas por el municipio así:

Ítem	Descripción	Contractual	Acta Modificatoria 1	Acta Final	Avance	Localización
NP-4.4	Sum. E inst. Caballete met. Galv. Cal. 26 para cubierta m-1000 o similar, prepintado por ambas caras por el fabricante, pagado en m	0	8,00 M	8,00 M	100%	Sede Paya Rica

Después de realizar la inspección conjunta entre el contratista y el municipio, se constató un deterioro considerable en la cubierta existente, evidenciado por filtraciones y pérdida de su capacidad protectora contra las condiciones climáticas. Por tal motivo, se estableció la necesidad de suministrar e instalar 8,00 M de lámina metálica galvanizada calibre 26. Esta intervención fue evaluada y aprobada por el municipio, considerándose una prioridad dentro de las obras en la sede educativa



Foto No. 058 – Suministro e instalación de caballete metálico.

- NP-4.5 PAÑETE 1:4 (INCL. FILOS Y DILATACIONES), PAGADO EN m2

La actividad consiste en la ejecución del pañete fino a base de mortero cemento-arena en proporción 1:4, aplicado sobre superficies de muros o elementos verticales previamente fraguados, limpios y humedecidos. Incluye preparación de la mezcla, colocación de maestras, aplicación y afinado manual o mecánico del mortero para lograr una superficie nivelada y uniforme. Se contempla el tratamiento completo de filos, bordes, encuentros con otros elementos constructivos y la ejecución de juntas de dilatación según el diseño arquitectónico o estructural. La actividad comprende toda la mano de obra, herramientas, materiales, andamiaje y limpieza final del área intervenida, y debe ejecutarse conforme a las especificaciones técnicas del proyecto y buenas prácticas de la construcción, en donde las actividades fueron ejecutadas en su totalidad, siendo revisadas y aprobadas por el municipio así:

Ítem	Descripción	Contractual	Acta Modificatoria 1	Acta Final	Avance	Localización
NP-4.5	Pañete 1:4 (incl. Filos y dilataciones), pagado en m2	0	9,00 M2	9,00 M2	100%	Sede Playa Rica

Durante la inspección técnica realizada junto al municipio y el contratista, se identificó la necesidad de aplicar 4,50 M2 de pañete en mezcla en las superficies definidas, incluyendo el tratamiento de filos y dilataciones para garantizar la continuidad y durabilidad del revestimiento. Esta actividad comprende la preparación, aplicación y acabado del pañete. La ejecución fue aprobada por el municipio para asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad en la sede educativa.



Foto No. 059 – Pañete 1:4 (incl. Filos y dilataciones), pagado en m2

- NP-4.6 SUM. E INST. DE ACERO ESTRUCTURAL ASTM A - 572, A - 500 G, A - 36, A - 706 (GRADO B ó C9, A - 36) O SIMILAR, (INCL. BASE ANTICORROSIVA TIPO WASH PRIMER, PINTURA ACABADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO), PAGADO EN kg

La actividad comprende el suministro, corte, armado y montaje de acero estructural según especificaciones ASTM (A572, A500 Gr., A36, A706 Grado B o C9), conforme a planos estructurales. Incluye aplicación de base anticorrosiva tipo wash primer, pintura de acabado, fijaciones (soldadas o apernadas), nivelación, y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución, en donde las actividades fueron ejecutadas en su totalidad, siendo revisadas y aprobadas por el municipio así:

Ítem	Descripción	Contractual	Acta Modificatoria 1	Acta Final	Avance	Localización
NP-4.6	Sum. E inst. De acero estructural astm a - 572, a - 500 g, a - 36, a - 706 (grado b ó c9, a - 36) o similar, (incl. Base anticorrosiva tipo wash primer, pintura acabada y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento), pagado en kg	0	146,51 KG	146,51	100%	Sede Playa Rica

Durante la visita técnica realizada entre el municipio y el contratista, se evidenció la necesidad de suministrar e instalar 146,51 KG de acero estructural para reforzar y garantizar la estabilidad de las estructuras proyectadas. Esta intervención fue aprobada por el municipio.



Foto No. 060 – Suministro e instalación de acero estructural para soporte de bigas aéreas.

- NP-4.7 RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA

La actividad consiste en el suministro, traslado, extendido y compactación de material del sitio (apto para relleno), en capas no mayores a 20 cm, utilizando compactador tipo rana. Incluye limpieza del área, humedecimiento o secado del material según necesidad, y compactación hasta alcanzar la densidad especificada en los planos o pliego técnico. El proceso debe garantizar la estabilidad del terreno para recibir estructuras u obras posteriores, cumpliendo con normas técnicas y de seguridad en obra, en donde las actividades fueron ejecutadas en su totalidad, siendo revisadas y aprobadas por el municipio así:

Ítem	Descripción	Contractual	Acta Modificatoria 1	Acta Final	Avance	Localización
NP-4.7	Relleno material sitio compactado-rana	0	1,07 M3	1,07 M3	100%	Sede Playa Rica

Durante el recorrido técnico realizado por el contratista en compañía del municipio, se identificó la necesidad de ejecutar1,07 M3 de relleno con material del sitio, debido a irregularidades en el terreno y la necesidad de nivelación para garantizar una base estable. La actividad consistió en el traslado, extendido y compactación del material en capas controladas, utilizando equipo tipo rana. Esta intervención fue aprobada por el municipio con el fin de asegurar la estabilidad del terreno para las obras proyectadas dentro de la sede educativa.

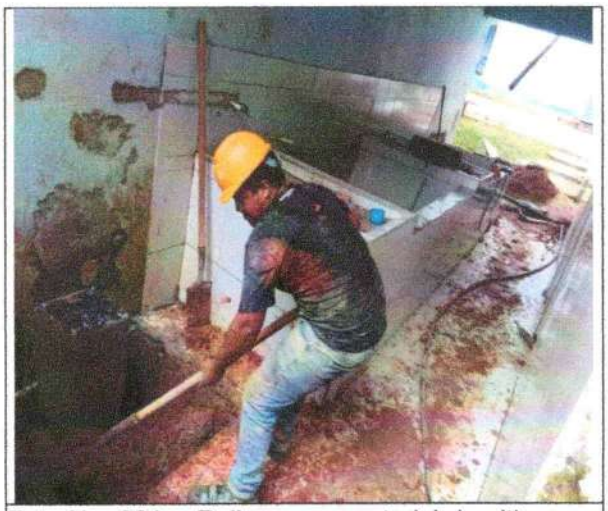


Foto No. 061 – Relleno con material de sitio compactado.

Durante el periodo de ejecución de la obra derivada del contrato de obra No. **CO-003-2025** cuyo objeto es: "**MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DE LAS VEREDAS EL AGUILA, BUENAVISTA, LA RICO Y LOS CENTROS POBLADOS DE PLAYA RICA Y KILÓMETRO 18 DEL MUNICIPIO DE VALPARAÍSO CAQUETÁ**", se desarrollaron actividades conforme a la programación de obra y al Acta Modificatoria No. 01 establecida, entre las cuales se incluyen: demolición de piso y/o andén en concreto de 8 cm de espesor (3000 PSI), desmonte de estructura y cubierta metálica en materiales como galvanizado, zinc, fibrocemento o similares, suministro e instalación de estructura metálica para cubierta, así como instalación de CUBIERTA MET. GALV. CAL. 26 PREPINTADA POR AMBAS CARAS POR EL FABRICANTE, TIPO M-1000 O SIMILAR (NO INCL. ENTRAMADO NI CABALLETE, INCL. TORNILLO), PAGADO EN m2. De igual forma se realizó la instalación de CABALLETE MET. GALV. CAL. 26 PARA CUBIERTA M-1000 O SIMILAR, PREPINTADO POR AMBAS CARAS POR EL FABRICANTE, PAGADO EN m; En cuanto a la obra estructural, se ejecutaron columnas y vigas en concreto de 3000 PSI tanto en cimentación como en elementos aéreos, mampostería en bloque N°4. Estas actividades fueron ejecutadas con el fin de garantizar la continuidad del proyecto y el cumplimiento de los objetivos contractuales establecidos.

3.2 CANTIDADES MODIFICADAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES				MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						ANTERIORES			PRESENTES				
		UND	CANT	VLR. UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-	CANT	VALOR TOTAL	+/-	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
A	**OBRA CIVIL**												
1	**IE. RURAL LA MUÑOZ SEDE ESPERANZA TROCHA 5**												
1.1	DEMOLICION PISO Y/O ANDEN E=0.08	M2	96,00	$ 9.908,15	$ 951.182,00	+			-	-13,68	-$ 135.543,00	**82,32**	$ 815.639,00
1.2	PISO Y/O ANDEN EN CONCRETO 8 CM 3000 PSI	M2	96,00	$ 62.981,47	$ 6.046.221,00	+			-	-13,68	-$ 861.587,00	**82,32**	$ 5.184.635,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES				MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						ANTERIORES			PRESENTES				
		UND	CANT	VLR. UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-	CANT	VALOR TOTAL	+/-	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
1.3	DESMONTE DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA MET., GALV., ZINC, FIBROCEMENTO, ETERNIT O SIMILAR, PAGADO EN M2	M2	120,00	$ 16.039,21	$ 1.924.705,00	+			+	10,00	$ 160.392,00	**130,00**	$ 2.085.097,00
1.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA	M	96,00	$ 50.030,37	$ 4.802.916,00	+			-	-96,00	-$ 4.802.916,00	**0,00**	$ 0,00
1.5	SUM. E INST. CUBIERTA TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2.5MM BLANCO O SIMILAR (NO INCL. ENTRAMADO NI CABALLETE, INCL. TORNILLO)	M2	120,00	$ 92.372,05	$ 11.084.646,00	+			-	-120,00	-$ 11.084.646,00	**0,00**	$ 0,00
1.6	CABALLETE UPVC	M	10,00	$ 71.052,20	$ 710.522,00	+			-	-10,00	-$ 710.522,00	**0,00**	$ 0,00
1.7	ESTUCO PLASTICO MURO [PASTA]	M2	64,00	$ 16.016,95	$ 1.025.085,00	+			-	-64,00	-$ 1.025.085,00	**0,00**	$ 0,00
1.8	PINTURA VINILO TOPO 1	M2	192,00	$ 13.706,52	$ 2.631.652,00	+			-	-110,20	-$ 1.510.459,00	**81,80**	$ 1.121.193,00
SUBTOTAL CAP. 1 IE. RURAL LA MUÑOZ SEDE ESPERANZA TROCHA 5					**$ 29.176.929,00**								

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES				MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						ANTERIORES			PRESENTES				
		UND	CANT	VLR. UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-	CANT	VALOR TOTAL	+/-	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
2	**IE. RURAL LA RICO KM30 SEDE BUENAVISTA**												
2.1	PISO Y/O ANDEN EN CONCRETO 8 CM 3000 PSI	M2	32,00	$ 62.981,47	$ 2.015.407,00	+			+	28,00	$ 1.763.481,00	**60,00**	$ 3.778.888,00
2.2	COLUMNA CONCRETO 3000 PSI	M3	1,54	$ 1.096.793,69	$ 1.689.062,00	+			-	-0,79	-$ 866.467,00	**0,75**	$ 822.595,00
2.3	VIGA CIMIENTACION CONCRETO 3000 PSI	M3	1,45	$ 990.196,17	$ 1.435.784,00				+	1,40	$ 1.386.275,00	**2,85**	$ 2.822.059,00
2.4	VIGA CONCRETO AEREA 3000 PSI	M3	1,45	$ 1.266.558,45	$ 1.836.510,00	+			-	-0,73	-$ 924.588,00	**0,72**	$ 911.922,00
2.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA	M	42,00	$ 50.030,37	$ 2.101.276,00	+			-	-42,00	-$ 2.101.276,00	**0,00**	$ 0,00
2.6	SUM. E INST. CUBIERTA TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2.5MM BLANCO O SIMILAR (NO INCL. ENTRAMADO NI CABALLETE, INCL. TORNILLO)	M2	60,00	$ 92.372,05	$ 5.542.323,00	+			-	-60,00	-$ 5.542.323,00	**0,00**	$ 0,00
2.7	CABALLETE UPVC	M	5,00	$ 70.635,28	$ 353.176,00				-	-5,00	-$ 353.176,00	**0,00**	$ 0,00
2.8	MAMPOSTERÍA EN BLOQUE N°4	M2	60,00	$ 64.684,00	$ 3.881.040,00	+			+	12,00	$ 776.208,00	**72,00**	$ 4.657.248,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES				MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						ANTERIORES			PRESENTES				
		UND	CANT	VLR. UNITARIO	VALOR TOTAL	.+ /-	CANT	VALOR TOTAL	.+ /-	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
2.9	ESTUCO PLASTICO MURO [PASTA]	M2	120,00	$ 15.600,03	$ 1.872.004,00	+			+	24,00	$ 374.401,00	**144,00**	$ 2.246.404,00
2.10	PINTURA VINILO TOPO 1	M2	120,00	$ 13.382,25	$ 1.605.870,00	+			+	24,00	$ 321.174,00	**144,00**	$ 1.927.044,00
2.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO ELECTRICO ELECTRO BOMBA	UND	1,00	$ 1.051.690,52	$ 1.051.691,00	+			-	-1,00	-$ 1.051.691,00	**0,00**	$ 0,00
SUBTOTAL CAP. 2 IE. RURAL LA RICO KM30 SEDE BUENAVISTA					**$ 23.384.143,00**								
3	**IE. RURAL LA RICO KM30 SEDE LA RICO**												
3,1	DESMONTE DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA MET., GALV., ZINC, FIBROCEMENTO, ETERNIT O SIMILAR, PAGADO EN M2	M2	94,50	$ 16.039,21	$ 1.515.705,00				+	11,59	$ 185.894,00	**106,09**	$ 1.701.600,00
3,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA	M	76,00	$ 50.030,37	$ 3.802.308,00				-	-76,00	-$ 3.802.308,00	**0,00**	$ 0,00
3,3	SUM. E INST. CUBIERTA TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2.5MM BLANCO O SIMILAR (NO INCL. ENTRAMADO NI CABALLETE, INCL. TORNILLO)	M2	94,50	$ 92.372,05	$ 8.729.159,00				-	-94,50	-$ 8.729.159,00	**0,00**	$ 0,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES				MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						ANTERIORES			PRESENTES				
		UND	CANT	VLR. UNITARIO	VALOR TOTAL	.+ /-	CANT	VALOR TOTAL	.+ /-	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
3,4	CABALLETE UPVC	M	9,00	$ 70.635,28	$ 635.718,00				-	-9,00	-$ 635.718,00	**0,00**	$ 0,00
SUBTOTAL CAP. 3 IE. RURAL LA RICO KM30 SEDE LA RICO					**$ 14.682.890,00**								
4	**IE. RURAL NIEVES ARRIBA**												
4,1	COLUMNA CONCRETO 3000 PSI	M3	2,30	$ 1.084.093,14	$ 2.493.414,00				-	-2,30	-$ 2.493.414,00	**0,00**	$ 0,00
4,2	VIGA CIMIENTO CONCRETO 3000 PSI	M3	3,60	$ 982.197,51	$ 3.535.911,00	+			-	-3,60	-$ 3.535.911,00	**0,00**	$ 0,00
4,3	VIGA CONCRETO AEREA 3000 PSI	M3	3,60	$ 1.266.558,45	$ 4.559.610,00				-	-3,60	-$ 4.559.610,00	**0,00**	$ 0,00
4,4	DESMONTE DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA MET., GALV., ZINC, FIBROCEMENTO, ETERNIT O SIMILAR, PAGADO EN M2	M2	182,00	$ 16.039,21	$ 2.919.136,00	+			+	3,00	$ 48.118,00	**185,00**	$ 2.967.254,00
4,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA	M	168,00	$ 50.030,37	$ 8.405.102,00				-	-168,00	-$ 8.405.102,00	**0,00**	$ 0,00
4,6	SUM. E INST. CUBIERTA TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2.5MM BLANCO O SIMILAR (NO INCL. ENTRAMADO NI CABALLETE, INCL. TORNILLO)	M2	182,00	$ 92.372,05	$ 16.811.713,00				-	-182,00	-$ 16.811.713,00	**0,00**	$ 0,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES				MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						ANTERIORES			PRESENTES				
		UND	CANT	VLR. UNITARIO	VALOR TOTAL	.+ /-	CANT	VALOR TOTAL	.+ /-	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
4,7	CABALLETE UPVC	M	24,00	$ 70.635,28	$ 1.695.247,00	+			-	-24,00	-$ 1.695.247,00	**0,00**	$ 0,00
4,8	ESTUCO PLASTICO MURO [PASTA]	M2	192,00	$ 15.600,03	$ 2.995.206,00	+			-	-192,00	-$ 2.995.206,00	**0,00**	$ 0,00
4,9	PINTURA VINILO TOPO 1	M2	192,00	$ 13.382,25	$ 2.569.392,00	+			+	52,78	$ 706.315,00	**244,78**	$ 3.275.707,00
SUBTOTAL CAP. 4 IE. RURAL NIEVES ARRIBA					**$ 45.984.731,00**								
5	**IE. RURAL PLAYA RICA**												
5,1	COLUMNA CONCRETO 3000 PSI	M3	0,75	$ 1.084.093,14	$ 813.070,00	+			-	-0,46	-$ 498.683,00	**0,29**	$ 314.387,00
5,2	VIGA CIMIENTO CONCRETO 3000 PSI	M3	1,80	$ 982.197,51	$ 1.767.956,00	+			-	-1,20	-$ 1.178.637,00	**0,60**	$ 589.319,00
5,3	DESMONTE DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA MET., GALV., ZINC, FIBROCEMENTO, ETERNIT O SIMILAR, PAGADO EN M2	M2	60,00	$ 16.039,21	$ 962.353,00	+			-	-4,00	-$ 64.157,00	**56,00**	$ 898.196,00
5,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA	M	60,00	$ 50.030,37	$ 3.001.822,00				-	-60,00	-$ 3.001.822,00	**0,00**	$ 0,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES				MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						ANTERIORES			PRESENTES				
		UND	CANT	VLR. UNITARIO	VALOR TOTAL	-/+	CANT	VALOR TOTAL	-/+	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
5,5	SUM. E INST. CUBIERTA TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2.5MM BLANCO O SIMILAR (NO INCL. ENTRAMADO NI CABALLETE, INCL. TORNILLO)	M2	60,00	$ 92.372,05	$ 5.542.323,00	+			-	-60,00	-$ 5.542.323,00	**0,00**	$ 0,00
5,6	MAMPOSTERÍA EN BLOQUE N°4	M2	70,00	$ 64.684,00	$ 4.527.880,00	+			-	-67,36	-$ 4.357.114,00	**2,64**	$ 170.766,00
5,7	CABALLETE UPVC	M	6,00	$ 70.635,28	$ 423.812,00				-	-6,00	-$ 423.812,00	**0,00**	$ 0,00
SUBTOTAL CAP. 5 IE. RURAL PLAYA RICA					**$ 17.039.216,00**								
6	**TRANSPORTE DE MATERIAL**												
6,1	TRANSPORTE MATERIALES PETREOS DESDE O HACIA LA OBRA ZONA RURAL	M3-KM	2616,91	$ 2.000,00	$ 5.233.820,00	+			-	2.325,07	-$ 4.650.140,00	**291,84**	$ 583.680,00
6,2	TRANSPORTE DE MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO DESDE CASCO URBANO HASTA LA OBRA ZONA RURAL	VIAJE	7,00	$ 250.000,00	$ 1.750.000,00	+			-	-2,00	-$ 500.000,00	**5,00**	$ 1.250.000,00
SUBTOTAL CAP. 6 IE. TRANSPORTE DE MATERIAL					**$ 6.983.820,00**								

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES				MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						ANTERIORES			PRESENTES				
		UND	CANT	VLR. UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-	CANT	VALOR TOTAL	+/-	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
IP 1	**ITEM PREVISTOS IE. RURAL PLAYA RICA**												
IP 1.1	VIGA CONCRETO AEREA 3000 PSI	M3	0	$ 1.266.558,45	$ 0,00	+			+	0,22	$ 278.643,00	**0,22**	$ 278.643,00
IP 1.2	PISO Y/O ANDEN EN CONCRETO 8 CM 3000 PSI	M2	0	$ 62.981,47	$ 0,00	+			+	2,00	$ 125.963,00	**2,00**	$ 125.963,00
IP 1.3	DEMOLICION ANDEN E=0,08	M2	0	$ 9.908,15	$ 0,00	+			+	2,00	$ 19.816,00	**2,00**	$ 19.816,00
IP 1.4	PINTURA VINILO TIPO 1	M2	0	$ 13.382,25	$ 0,00	+			+	175,02	$ 2.342.161,00	**175,02**	$ 2.342.161,00
SUBTOTAL CAP. ITEM PREVISTOS IE. RURAL PLAYA RICA													
NP	**NO PREVISTOS**												
NP 1	**IE. RURAL LA MUÑOZ SEDE ESPERANZA TROCHA 5**												
NP 1.1	MANTENIMIENTO DE MUROS (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES, LIMPIEZA, RESANE Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE)	M2	0	$ 14.542,00	$ 0,00	+			+	15,00	$ 218.130,00	**15,00**	$ 218.130,00
NP 1.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO RECTANGULAR 100 X 40 X 2.0MM	KG	0	$ 13.504,00	$ 0,00	+			+	802,47	$ 10.836.555,00	**802,47**	$10.836.555,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES				MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						ANTERIORES			PRESENTES				
		UND	CANT	VLR. UNITARIO	VALOR TOTAL	. + /-	CANT	VALOR TOTAL	.+ /-	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
NP 1.3	SUM. E INST. CUBIERTA MET. GALV. CAL. 26 PREPINTADA POR AMBAS CARAS POR EL FABRICANTE, TIPO M-1000 O SIMILAR (NO INCL. ENTRAMADO NI CABALLETE, INCL. TORNILLO), PAGADO EN m2	M2	0	$ 79.771,00	$ 0,00	+			+	130,00	$ 10.370.230,00	**130,00**	$10.370.230,00
NP 1.4	SUM. E INST. CABALLETE MET. GALV. CAL. 26 PARA CUBIERTA M-1000 O SIMILAR, PREPINTADO POR AMBAS CARAS POR EL FABRICANTE, PAGADO EN m	M	0	$ 69.972,20	$ 0,00	+			+	30,20	$ 2.113.160,00	**30,20**	$ 2.113.160,00
NP 1.5	BORDILLO EN CONCRETO 3000 PSI 10 X 20 CM	M	0	$ 34.687,62	$ 0,00	+			+	44,30	$ 1.536.662,00	**44,30**	$ 1.536.662,00
SUBTOTAL CAP. NP 1 IE. RURAL LA MUÑOZ SEDE ESPERANZA TROCHA 5													

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES				MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						ANTERIORES			PRESENTES				
		UND	CANT	VLR. UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-	CANT	VALOR TOTAL	+/-	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
NP 2	**IE. RURAL LA RICO KM 30 SEDE LA RICO**												
NP 2.1	MANTENIMIENTO DE MUROS (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES, LIMPIEZA, RESANE Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE)	M2	0	$ 14.542,00	$ 0,00	+			+	70,00	$ 1.017.940,00	**70,00**	$ 1.017.940,00
NP 2.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20	M	0	$ 128.843,00	$ 0,00	+			+	10,10	$ 1.301.314,00	**10,10**	$ 1.301.314,00
NP 2.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO RECTANGULAR 100 X 40 X 2.0MM	KG	0	$ 13.504,00	$ 0,00	+			+	509,30	$ 6.877.587,00	**509,30**	$ 6.877.587,00
NP 2.4	SUM. E INST. CUBIERTA MET. GALV. CAL. 26 PREPINTADA POR AMBAS CARAS POR EL FABRICANTE, TIPO M-1000 O SIMILAR (NO INCL. ENTRAMADO NI CABALLETE, INCL. TORNILLO), PAGADO EN m2	M2	0	$ 79.771,00	$ 0,00	+			+	106,09	$ 8.462.905,00	**106,09**	$ 8.462.905,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES				MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						ANTERIORES			PRESENTES				
		UND	CANT	VLR. UNITARIO	VALOR TOTAL	. + /-	CANT	VALOR TOTAL	. + /-	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
NP 2.5	SUM. E INST. CABALLETE MET. GALV. CAL. 26 PARA CUBIERTA M-1000 O SIMILAR, PREPINTADO POR AMBAS CARAS POR EL FABRICANTE, PAGADO EN m	M	0	$ 69.972,20	$ 0,00	+			+	10,30	$ 720.714,00	**10,30**	$ 720.714,00
SUBTOTAL CAP. NP 2 IE. RURAL LA RICO KM 30 SEDE LA RICO													
NP 3	**IE. RURAL NIEVES ARRIBA**												
NP 3.1	MANTENIMIENTO DE MUROS (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES, LIMPIEZA, RESANE Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE)	M2	0	$ 14.542,00	$ 0,00	+			+	123,35	$ 1.793.756,00	**123,35**	$ 1.793.756,00
NP 3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO RECTANGULAR 100 X 40 X 2.0MM	KG	0	$ 13.504,00	$ 0,00	+			+	769,05	$ 10.385.251,00	**769,05**	$10.385.251,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES				MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						ANTERIORES			PRESENTES				
		UND	CANT	VLR. UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-	CANT	VALOR TOTAL	+/-	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
NP 3.3	SUM. E INST. CUBIERTA MET. GALV. CAL. 26 PREPINTADA POR AMBAS CARAS POR EL FABRICANTE, TIPO M-1000 O SIMILAR (NO INCL. ENTRAMADO NI CABALLETE, INCL. TORNILLO), PAGADO EN m2	M2	0	$ 79.771,00	$ 0,00	+			+	185,00	$ 14.757.635,00	**185,00**	$14.757.635,00
NP 3.4	SUM. E INST. CABALLETE MET. GALV. CAL. 26 PARA CUBIERTA M-1000 O SIMILAR, PREPINTADO POR AMBAS CARAS POR EL FABRICANTE, PAGADO EN m	M	0	$ 69.972,20	$ 0,00	+			+	10,00	$ 699.722,00	**10,00**	$ 699.722,00
NP 3.5	PAÑETE 1:4 (INCL. FILOS Y DILATACIONES), PAGADO EN m2	M2	0	$ 40.615,00	$ 0,00	+			+	23,50	$ 954.453,00	**23,50**	$ 954.453,00
SUBTOTAL CAP. NP 3 IE. RURAL NIEVES ARRIBA													

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES				MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						ANTERIORES			PRESENTES				
		UND	CANT	VLR. UNITARIO	VALOR TOTAL	. + /-	CANT	VALOR TOTAL	.+ /-	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
NP 4	**IE. RURAL PLAYA RICA**												
NP 4.1	MANTENIMIENTO DE MUROS (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES, LIMPIEZA, RESANE Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE)	M2	0	$ 14.542,00	$ 0,00	+			+	40,55	$ 589.622,00	**40,55**	$ 589.622,00
NP 4.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO RECTANGULAR 100 X 40 X 2.0MM	KG	0	$ 13.504,00	$ 0,00	+			+	272,55	$ 3.680.515,00	**272,55**	$ 3.680.515,00
NP 4.3	SUM. E INST. CUBIERTA MET. GALV. CAL. 26 PREPINTADA POR AMBAS CARAS POR EL FABRICANTE, TIPO M-1000 O SIMILAR (NO INCL. ENTRAMADO NI CABALLETE, INCL. TORNILLO), PAGADO EN m2	M2	0	$ 79.771,00	$ 0,00	+			+	56,00	$ 4.467.176,00	**56,00**	$ 4.467.176,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES				MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						ANTERIORES			PRESENTES				
		UND	CANT	VLR. UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-	CANT	VALOR TOTAL	+/-	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
NP 4.4	SUM. E INST. CABALLETE MET. GALV. CAL. 26 PARA CUBIERTA M-1000 O SIMILAR, PREPINTADO POR AMBAS CARAS POR EL FABRICANTE, PAGADO EN m	M	0	$ 69.972,20	$ 0,00	+			+	8,00	$ 559.778,00	**8,00**	$ 559.778,00
NP 4.5	PAÑETE 1:4 (INCL. FILOS Y DILATACIONES), PAGADO EN m2	M2	0	$ 40.615,00	$ 0,00	+			+	9,00	$ 365.535,00	**9,00**	$ 365.535,00
NP 4.6	SUM. E INST. DE ACERO ESTRUCTURAL ASTM A - 572, A - 500 G, A - 36, A - 706 (GRADO B ó C9, A - 36) O SIMILAR, (INCL. BASE ANTICORROSIVA TIPO WASH PRIMER, PINTURA ACABADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO), PAGADO EN kg	KG	0	$ 15.488,00	$ 0,00	+			+	146,51	$ 2.269.147,00	**146,51**	$ 2.269.147,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES				MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						ANTERIORES			PRESENTES				
		UND	CANT	VLR. UNITARIO	VALOR TOTAL	. + /-	CANT	VALOR TOTAL	.+ /-	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
NP 4.7	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	M3	0	$ 31.423,30	$ 0,00	+			+	1,07	$ 33.623,00	**1,07**	$ 33.623,00
SUBTOTAL CAP. NP 4 IE. RURAL PLAYA RICA													
NP 5	**IE. RURAL LA RICO KM30 SEDE BUENAVISTA**												
NP 5.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO RECTANGULAR 100 X 40 X 2.0MM	KG	0	$ 13.504,00	$ 0,00	+			+	312,48	$ 4.219.730,00	**312,48**	$ 4.219.730,00
NP 5.2	SUM. E INST. CUBIERTA MET. GALV. CAL. 26 PREPINTADA POR AMBAS CARAS POR EL FABRICANTE, TIPO M-1000 O SIMILAR (NO INCL. ENTRAMADO NI CABALLETE, INCL. TORNILLO), PAGADO EN m2	M2	0	$ 79.771,00	$ 0,00	+			+	60,00	$ 4.786.260,00	**60,00**	$ 4.786.260,00
NP 5.3	SUM. E INST. CABALLETE MET. GALV. CAL. 26 PARA CUBIERTA M-1000 O SIMILAR, PREPINTADO POR AMBAS CARAS POR EL FABRICANTE, PAGADO EN m	M	0	$ 69.972,20	$ 0,00	+			+	6,00	$ 419.833,00	**6,00**	$ 419.833,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES				MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						ANTERIORES			PRESENTES				
		UND	CANT	VLR. UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-	CANT	VALOR TOTAL	+/-	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
NP 5.4	PAÑETE 1:4 (INCL. FILOS Y DILATACIONES), PAGADO EN m2	M2	0	$ 40.615,00	$ 0,00	+			+	72,00	$ 2.924.280,00	**72,00**	$ 2.924.280,00
SUBTOTAL CAP. NP 5 IE RURAL LA RICOKM 30 SEDE BUENAVISTA													
AJUSTE AL PESO					**$ 0,00**			**$ 0,00**			**$ 0,00**		**$ 0,00**
VALOR COSTOS INDIRECTOS SIN AIU					**$ 137.251.729,00**			**$ 0,00**			**$ 0,00**		**$ 137.251.729,00**
ADMINISTRACCIÓN				**28%**	**$ 38.430.484,00**			**$ 0,00**			**$ 0,00**		**$ 38.430.484,00**
IMPREVISTOS				**1%**	**$ 1.372.517,00**			**$ 0,00**			**$ 0,00**		**$ 1.372.517,00**
UTILIDAD				**3%**	**$ 4.117.552,00**			**$ 0,00**			**$ 0,00**		**$ 4.117.552,00**
TOTAL AIU				**32%**	**$ 43.920.553,00**			**$ 0,00**			**$ 0,00**		**$ 43.920.553,00**
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS					**$ 43.920.553,00**			**$ 0,00**			**$ 0,00**		**$ 43.920.553,00**
VALOR TOTAL OBRA FÍSICA					**$ 181.172.282,00**			**$ 0,00**			**$ 0,00**		**$ 181.172.282,00**

3.3 CANTIDADES EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES				MODIFICACION No. 01		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 01	
		UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
1	IE. RURAL LA MUÑOZ SEDE ESPERANZA TROCHA 5								
1.1	DEMOLICION PISO Y/O ANDEN E=0.08	M2	96,00	$ 9.908,15	$ 951.182,00	82,32	$ 815.639,00	82,32	$ 815.639,00
1.2	PISO Y/O ANDEN EN CONCRETO 8 CM 3000 PSI	M2	96,00	$ 62.981,47	$ 6.046.221,00	82,32	$ 5.184.635,00	82,32	$ 5.184.635,00
1.3	DESMONTE DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA MET., GALV., ZINC, FIBROCEMENTO, ETERNIT O SIMILAR, PAGADO EN M2	M2	120,00	$ 16.039,21	$ 1.924.705,00	130,00	$ 2.085.097,00	130,00	$ 2.085.097,00
1.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA	M	96,00	$ 50.030,37	$ 4.802.916,00	0,00	$ -	0,00	$ -

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES				MODIFICACION No. 01		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 01	
		UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
1.5	SUM. E INST. CUBIERTA TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2.5MM BLANCO O SIMILAR (NO INCL. ENTRAMADO NI CABALLETE, INCL. TORNILLO)	M2	120,00	$ 92.372,05	$ 11.084.646,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1.6	CABALLETE UPVC	M	10,00	$ 71.052,20	$ 710.522,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1.7	ESTUCO PLASTICO MURO [PASTA]	M2	64,00	$ 16.016,95	$ 1.025.085,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1.8	PINTURA VINILO TOPO 1	M2	192,00	$ 13.706,52	$ 2.631.652,00	81,80	$ 1.121.193,00	77,80	$ 1.066.367,00
SUBTOTAL CAP. 1 IE. RURAL LA MUÑOZ SEDE ESPERANZA TROCHA 5					**$ 29.176.929,00**		**$ 9.206.564,00**		**$ 9.151.738,00**
2	**IE. RURAL LA RICO KM30 SEDE BUENAVISTA**								
2.1	PISO Y/O ANDEN EN CONCRETO 8 CM 3000 PSI	M2	32,00	$ 62.981,47	$ 2.015.407,00	60,00	$ 3.778.888,00	0,00	$ -
2.2	COLUMNA CONCRETO 3000 PSI	M3	1,54	$1.096.793,69	$ 1.689.062,00	0,75	$ 822.595,00	0,00	$ -

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES				MODIFICACION No. 01		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 01	
		UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
2.3	VIGA CIMIENTACION CONCRETO 3000 PSI	M3	1,45	$ 990.196,17	$ 1.435.784,00	2,85	$ 2.822.059,00	0,00	$ -
2.4	VIGA CONCRETO AEREA 3000 PSI	M3	1,45	$1.266.558,45	$ 1.836.510,00	0,72	$ 911.922,00	0,00	$ -
2.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA	M	42,00	$ 50.030,37	$ 2.101.276,00	0,00	$ -	0,00	$ -
2.6	SUM. E INST. CUBIERTA TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2.5MM BLANCO O SIMILAR (NO INCL. ENTRAMADO NI CABALLETE, INCL. TORNILLO)	M2	60,00	$ 92.372,05	$ 5.542.323,00	0,00	$ -	0,00	$ -
2.7	CABALLETE UPVC	M	5,00	$ 70.635,28	$ 353.176,00	0,00	$ -	0,00	$ -
2.8	MAMPOSTERÍA EN BLOQUE N°4	M2	60,00	$ 64.684,00	$ 3.881.040,00	72,00	$ 4.657.248,00	0,00	$ -
2.9	ESTUCO PLASTICO MURO [PASTA]	M2	120,00	$ 15.600,03	$ 1.872.004,00	144,00	$ 2.246.404,00	0,00	$ -
2.10	PINTURA VINILO TOPO 1	M2	120,00	$ 13.382,25	$ 1.605.870,00	144,00	$ 1.927.044,00	0,00	$ -

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES				MODIFICACION No. 01		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 01	
		UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
2.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO ELECTRICO ELECTRO BOMBA	UND	1,00	$1.051.690,52	$ 1.051.691,00	0,00	$ -	0,00	$ -
SUBTOTAL CAP. 2 IE. RURAL LA RICO KM30 SEDE BUENAVISTA					**$ 23.384.143,00**		**$ 17.166.160,00**		**$ -**
3	**IE. RURAL LA RICO KM30 SEDE LA RICO**								
3,1	DESMONTE DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA MET., GALV., ZINC, FIBROCEMENTO, ETERNIT O SIMILAR, PAGADO EN M2	M2	94,50	$ 16.039,21	$ 1.515.705,00	106,09	$ 1.701.600,00	106,09	$ 1.701.600,00
3,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA	M	76,00	$ 50.030,37	$ 3.802.308,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,3	SUM. E INST. CUBIERTA TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2.5MM BLANCO O SIMILAR (NO INCL. ENTRAMADO NI CABALLETE, INCL. TORNILLO)	M2	94,50	$ 92.372,05	$ 8.729.159,00	0,00	$ -	0,00	$ -

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES				MODIFICACION No. 01		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 01	
		UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
3,4	CABALLETE UPVC	M	9,00	$ 70.635,28	$ 635.718,00	0,00	$ -	0,00	$ -
SUBTOTAL CAP. 3 IE. RURAL LA RICO KM30 SEDE LA RICO					**$ 14.682.890,00**		**$ 1.701.600,00**		**$ 1.701.600,00**
4	**IE. RURAL NIEVES ARRIBA**								
4,1	COLUMNA CONCRETO 3000 PSI	M3	2,30	$ 1.084.093,14	$ 2.493.414,00	0,00	$ -	0,00	$ -
4,2	VIGA CIMIENTO CONCRETO 3000 PSI	M3	3,60	$ 982.197,51	$ 3.535.911,00	0,00	$ -	0,00	$ -
4,3	VIGA CONCRETO AEREA 3000 PSI	M3	3,60	$ 1.266.558,45	$ 4.559.610,00	0,00	$ -	0,00	$ -
4,4	DESMONTE DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA MET., GALV., ZINC, FIBROCEMENTO, ETERNIT O SIMILAR, PAGADO EN M2	M2	182,00	$ 16.039,21	$ 2.919.136,00	185,00	$ 2.967.254,00	185,00	$ 2.967.254,00
4,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA	M	168,00	$ 50.030,37	$ 8.405.102,00	0,00	$ -	0,00	$ -

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES				MODIFICACION No. 01		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 01	
		UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
4,6	SUM. E INST. CUBIERTA TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2.5MM BLANCO O SIMILAR (NO INCL. ENTRAMADO NI CABALLETE, INCL. TORNILLO)	M2	182,00	$ 92.372,05	$ 16.811.713,00	0,00	$ -	0,00	$ -
4,7	CABALLETE UPVC	M	24,00	$ 70.635,28	$ 1.695.247,00	0,00	$ -	0,00	$ -
4,8	ESTUCO PLASTICO MURO [PASTA]	M2	192,00	$ 15.600,03	$ 2.995.206,00	0,00	$ -	0,00	$ -
4,9	PINTURA VINILO TOPO 1	M2	192,00	$ 13.382,25	$ 2.569.392,00	244,78	$ 3.275.707,00	244,78	$ 3.275.707,00
SUBTOTAL CAP. 4 IE. RURAL NIEVES ARRIBA					**$ 45.984.731,00**		**$ 6.242.961,00**		**$ 6.242.961,00**
5	**IE. RURAL PLAYA RICA**								
5,1	COLUMNA CONCRETO 3000 PSI	M3	0,75	$1.084.093,14	$ 813.070,00	0,29	$ 314.387,00	0,29	$ 314.387,00
5,2	VIGA CIMIENTO CONCRETO 3000 PSI	M3	1,8	$ 982.197,51	$ 1.767.956,00	0,60	$ 589.319,00	0,60	$ 589.319,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES				MODIFICACION No. 01		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 01	
		UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
5,3	DESMONTE DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA MET., GALV., ZINC, FIBROCEMENTO, ETERNIT O SIMILAR, PAGADO EN M2	M2	60,00	$ 16.039,21	$ 962.353,00	56,00	$ 898.196,00	56,00	$ 898.196,00
5,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA	M	60,00	$ 50.030,37	$ 3.001.822,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5,5	SUM. E INST. CUBIERTA TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2.5MM BLANCO O SIMILAR (NO INCL. ENTRAMADO NI CABALLETE, INCL. TORNILLO)	M2	60,00	$ 92.372,05	$ 5.542.323,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5,6	MAMPOSTERÍA EN BLOQUE N°4	M2	70,00	$ 64.684,00	$ 4.527.880,00	2,64	$ 170.766,00	2,64	$ 170.766,00
5,7	CABALLETE UPVC	M	6,00	$ 70.635,28	$ 423.812,00	0,00	$ -	0,00	$ -
	SUBTOTAL CAP. 5 IE. RURAL PLAYA RICA				**$ 17.039.216,00**		**$ 1.972.668,00**		**$ 1.972.668,00**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES				MODIFICACION No. 01		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 01	
		UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
6	**TRANSPORTE DE MATERIAL**								
6,1	TRANSPORTE MATERIALES PETREOS DESDE O HACIA LA OBRA ZONA RURAL	M3-KM	2616,91	$ 2.000,00	$ 5.233.820,00	291,84	$ 583.680,00	0,00	$ -
6,2	TRANSPORTE DE MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO DESDE CASCO URBANO HASTA LA OBRA ZONA RURAL	VIAJE	7,00	$ 250.000,00	$ 1.750.000,00	5,00	$ 1.250.000,00	0,00	$ -
SUBTOTAL CAP. 6 IE. TRANSPORTE DE MATERIAL					**$ 6.983.820,00**		**$ 1.833.680,00**		**$ -**
IP 1	**IE. RURAL PLAYA RICA**								
IP 1.1	VIGA CONCRETO AEREA 3000 PSI	M3	-	$1.266.558,45	$ -	0,22	$ 278.643,00	0,22	$ 278.643,00
IP 1.2	PISO Y/O ANDEN EN CONCRETO 8 CM 3000 PSI	M2	-	$ 62.981,47	$ -	2,00	$ 125.963,00	2,00	$ 125.963,00
IP 1.3	DEMOLICION PISO Y/O ANDEN E=0.08	M2	-	$ 9.908,15	$ -	2,00	$ 19.816,00	2,00	$ 19.816,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES				MODIFICACION No. 01		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 01	
		UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
IP 1.4	PINTURA VINILO TOPO 1	M2	-	$ 13.382,25	$ -	175,02	$ 2.342.161,00	175,02	$ 2.342.161,00
SUBTOTAL ITEM PREVISTOS IE. RURAL PLAYA RICA					**$ -**		**$ 2.766.583,00**		**$ 2.766.583,00**
NP	**NO PREVISTOS**								
NP 1	**IE. RURAL LA MUÑOZ SEDE ESPERANZA TROCHA 5**								
NP 1.1	MANTENIMIENTO DE MUROS (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES, LIMPIEZA, RESANE Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE)	M2	-	$ 14.542,00	$ -	15,00	$ 218.130,00	0,00	$ -
NP 1.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO RECTANGULAR 100 X 40 X 2.0MM	KG	-	$ 13.504,00	$ -	802,47	$ 10.836.555,00	802,47	$ 10.836.555,00
NP 1.3	SUM. E INST. CUBIERTA MET. GALV. CAL. 26 PREPINTADA POR AMBAS CARAS POR EL FABRICANTE, TIPO M-1000 O SIMILAR (NO INCL. ENTRAMADO NI CABALLETE, INCL. TORNILLO), PAGADO EN m2	M2	-	$ 79.771,00	$ -	130,00	$ 10.370.230,00	130,00	$ 10.370.230,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES				MODIFICACION No. 01		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 01	
		UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
NP 1.4	SUM. E INST. CABALLETE MET. GALV. CAL. 26 PARA CUBIERTA M-1000 O SIMILAR, PREPINTADO POR AMBAS CARAS POR EL FABRICANTE, PAGADO EN m	M	-	$ 69.972,20	$ -	30,20	$ 2.113.160,00	30,20	$ 2.113.160,00
NP 1.5	BORDILLO EN CONCRETO 3000 PSI 10 X 20 CM	M	-	$ 34.687,62	$ -	44,30	$ 1.536.662,00	44,30	$ 1.536.662,00
SUBTOTAL CAP. NP 1 IE. RURAL LA MUÑOZ SEDE ESPERANZA TROCHA 5					**$ -**		**$ 25.074.737,00**		**$ 24.856.607,00**
NP 2	**IE. RURAL LA RICO KM 30 SEDE LA RICO**								
NP 2.1	MANTENIMIENTO DE MUROS (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES, LIMPIEZA, RESANE Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE)	M2	-	$ 14.542,00	$ -	70,00	$ 1.017.940,00	0,00	$ -
NP 2.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20	M	-	$ 128.843,00	$ -	10,10	$ 1.301.314,00	10,10	$ 1.301.314,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES				MODIFICACION No. 01		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 01	
		UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
NP 2.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO RECTANGULAR 100 X 40 X 2.0MM	KG	-	$ 13.504,00	$ -	509,30	$ 6.877.587,00	509,30	$ 6.877.587,00
NP 2.4	SUM. E INST. CUBIERTA MET. GALV. CAL. 26 PREPINTADA POR AMBAS CARAS POR EL FABRICANTE, TIPO M-1000 O SIMILAR (NO INCL. ENTRAMADO NI CABALLETE, INCL. TORNILLO), PAGADO EN m2	M2	-	$ 79.771,00	$ -	106,09	$ 8.462.905,00	106,09	$ 8.462.905,00
NP 2.5	SUM. E INST. CABALLETE MET. GALV. CAL. 26 PARA CUBIERTA M-1000 O SIMILAR, PREPINTADO POR AMBAS CARAS POR EL FABRICANTE, PAGADO EN m	M	-	$ 69.972,20	$ -	10,30	$ 720.714,00	10,30	$ 720.714,00
SUBTOTAL CAP. NP 2 IE. RURAL LA RICO KM 30 SEDE LA RICO					**$ -**		**$ 18.380.460,00**		**$ 17.362.520,00**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES				MODIFICACION No. 01		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 01	
		UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
NP 3	**IE. RURAL NIEVES ARRIBA**								
NP 3.1	MANTENIMIENTO DE MUROS (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES, LIMPIEZA, RESANE Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE)	M2	-	$ 14.542,00	$ -	123,35	$ 1.793.756,00	0,00	$ -
NP 3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO RECTANGULAR 100 X 40 X 2.0MM	KG	-	$ 13.504,00	$ -	769,05	$ 10.385.251,00	769,05	$ 10.385.251,00
NP 3.3	SUM. E INST. CUBIERTA MET. GALV. CAL. 26 PREPINTADA POR AMBAS CARAS POR EL FABRICANTE, TIPO M-1000 O SIMILAR (NO INCL. ENTRAMADO NI CABALLETE, INCL. TORNILLO), PAGADO EN m2	M2	-	$ 79.771,00	$ -	185,00	$ 14.757.635,00	185,00	$ 14.757.635,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES				MODIFICACION No. 01		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 01	
		UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
NP 3.4	SUM. E INST. CABALLETE MET. GALV. CAL. 26 PARA CUBIERTA M-1000 O SIMILAR, PREPINTADO POR AMBAS CARAS POR EL FABRICANTE, PAGADO EN m	M	-	$ 69.972,20	$ -	10,00	$ 699.722,00	10,00	$ 699.722,00
NP 3.5	PAÑETE 1:4 (INCL. FILOS Y DILATACIONES), PAGADO EN m2	M2	-	$ 40.615,00	$ -	23,50	$ 954.453,00	23,50	$ 954.453,00
SUBTOTAL CAP. NP 2 IE. RURAL NIEVES ARRIBA					**$ -**		**$ 28.590.817,00**		**$ 26.797.061,00**
NP 4	**IE. RURAL PLAYA RICA**								
NP 4.1	MANTENIMIENTO DE MUROS (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES, LIMPIEZA, RESANE Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE)	M2	-	$ 14.542,00	$ -	40,55	$ 589.622,00	0,00	$ -
NP 4.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO RECTANGULAR 100 X 40 X 2.0MM	KG	-	$ 13.504,00	$ -	272,55	$ 3.680.515,00	272,55	$ 3.680.515,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES				MODIFICACION No. 01		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 01	
		UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
NP 4.3	SUM. E INST. CUBIERTA MET. GALV. CAL. 26 PREPINTADA POR AMBAS CARAS POR EL FABRICANTE, TIPO M-1000 O SIMILAR (NO INCL. ENTRAMADO NI CABALLETE, INCL. TORNILLO), PAGADO EN m2	M2	-	$ 79.771,00	$ -	56,00	$ 4.467.176,00	56,00	$ 4.467.176,00
NP 4.4	SUM. E INST. CABALLETE MET. GALV. CAL. 26 PARA CUBIERTA M-1000 O SIMILAR, PREPINTADO POR AMBAS CARAS POR EL FABRICANTE, PAGADO EN m	M	-	$ 69.972,20	$ -	8,00	$ 559.778,00	8,00	$ 559.778,00
NP 4.5	PAÑETE 1:4 (INCL. FILOS Y DILATACIONES), PAGADO EN m2	M2	-	$ 40.615,00	$ -	9,00	$ 365.535,00	9,00	$ 365.535,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES				MODIFICACION No. 01		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 01	
		UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
NP 4.6	SUM. E INST. DE ACERO ESTRUCTURAL ASTM A - 572, A - 500 G, A - 36, A - 706 (GRADO B ó C9, A - 36) O SIMILAR, (INCL. BASE ANTICORROSIVA TIPO WASH PRIMER, PINTURA ACABADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO), PAGADO EN kg	KG	-	$ 15.488,00	$ -	146,51	$ 2.269.147,00	146,51	$ 2.269.147,00
NP 4.7	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	M3	-	$ 31.423,30	$ -	1,07	$ 33.623,00	1,07	$ 33.623,00
SUBTOTAL CAP. NP 2 IE. RURAL PLAYA RICA					**$ -**		**$ 11.965.396,00**		**$ 11.375.774,00**
NP 5	**IE. RURAL LA RICO KM30 SEDE BUENAVISTA**								

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES				MODIFICACION No. 01		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 01	
		UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
NP 5.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO RECTANGULAR 100 X 40 X 2.0MM	KG	-	$ 13.504,00	$ -	312,48	$ 4.219.730,00	0,00	$ -
NP 5.2	SUM. E INST. CUBIERTA MET. GALV. CAL. 26 PREPINTADA POR AMBAS CARAS POR EL FABRICANTE, TIPO M-1000 O SIMILAR (NO INCL. ENTRAMADO NI CABALLETE, INCL. TORNILLO), PAGADO EN m2	M2	-	$ 79.771,00	$ -	60,00	$ 4.786.260,00	0,00	$ -

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES				MODIFICACION No. 01		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 01	
		UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
NP 5.3	SUM. E INST. CABALLETE MET. GALV. CAL. 26 PARA CUBIERTA M-1000 O SIMILAR, PREPINTADO POR AMBAS CARAS POR EL FABRICANTE, PAGADO EN m	M	-	$ 69.972,20	$ -	6,00	$ 419.833,00	0,00	$ -
NP 5.4	PAÑETE 1:4 (INCL. FILOS Y DILATACIONES), PAGADO EN m2	M2	-	$ 40.615,00	$ -	72,00	$ 2.924.280,00	0,00	$ -
SUBTOTAL CAP. NP 2 IE. RURAL LA RICO KM30 SEDE BUENAVISTA					**$ -**		**$ 12.350.103,00**		**$ -**
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 137.251.729,00**		**$ 137.251.729,00**		**$ 102.227.512,00**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES				MODIFICACION No. 01		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 01	
		UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
	ADMINISTRACCIÓN			28%	$ 38.430.484,00	28%	$ 38.430.484,00	28%	$ 25.556.878,00
	IMPREVISTOS			1%	$ 1.372.517,00	1%	$ 1.372.517,00	1%	$ 2.044.550,00
	UTILIDAD			3%	$ 4.117.552,00	3%	$ 4.117.552,00	3%	$ 5.111.376,00
	VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS			32%	$ 43.920.553,00	32%	$ 43.920.553,00	32%	$ 32.712.804,00
	VALOR TOTAL OBRA FÍSICA			100%	$ 181.172.282,00	100%	$ 181.172.282,00	100%	$ 134.940.316,00

SEPTIEMBRE 2025

INFORME PARCIAL DE OBRA

- En cumplimiento de lo pactado en el contrato y de acuerdo con el cronograma establecido, la obra presenta un óptimo desempeño, alcanzando el 74.84% de ejecución durante el periodo comprendido entre el 16 de junio de 2025 y el 31 de julio de 2025, respecto a las actividades programadas para dicho corte. Lo anterior corresponde al contrato de obra cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DE LAS VEREDAS EL AGUILA, BUENAVISTA, LA RICO Y LOS CENTROS POBLADOS DE PLAYA RICA Y KILOMETRO 18 DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO CAQUETA".

CONTRATO DE OBRA No. 003 DE 2025
DIANA MARCELA QUIROGA DIAS
R.L. INERCIA S.A.S
CONTRATISTA

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DE LAS VEREDAS EL AGUILA, BUENAVISTA, LA RICO Y LOS CENTROS POBLADOS DE PLAYA RICA Y KILOMETRO 18 DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO CAQUETA

ITEM		V/TOTAL PROGRAMADO	PROGRAMACIÓN FÍSICA & FINANCIERA							
			MES 1				MES 2			
			SEMANA 1 (16 JUN-22 JUN)	SEMANA 2 (23 JUN-29 JUN)	SEMANA 3 (23 MAY-29 MAY)	SEMANA 4 (30 MAY-06 JUL)	SEMANA 5 (07 JUL-13 JUL)	SEMANA 6 (14 JUL-20 JUL)	SEMANA 7 (21 JUL-27 JUL)	SEMANA 8 (28 JUL-03 AGO)
1	IE. RURAL LA MUÑOZ SEDE ESPERANZA TROCHA 6									
1.1	DEMOLICION PISO Y O ANDEN E=0.08	$ 811.638,00	$ 811.638,00							
1.2	PISO Y O ANDEN EN CONCRETO 3 CM 3000 PSI	$ 5.184.685,00	$ 5.184.685,00							
1.3	DESMONTE DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA MET., GALV., ZINC, FIBROCEMENTO, ETERNIT O SIMILAR. PAGADO EN MI	$ 2.080.097,00		$ 2.080.097,00						
1.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA	$ -		$ -	$ -					
1.5	SUM. E INST. CUBIERTA TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2.5MM BLANCO O SIMILAR (NO INCL. ENTRAMADO NI CABALLETE. INCL. TORNILLO)	$ -			$ -	$ -				
1.6	CABALLETE UPVC	$ -				$ -				
1.7	ESTUCO PLASTICO MURO [PASTA]	$ -					$ -			
1.8	PINTURA VINILO TIPO 1	$ 3.321.195,00					$ 1.321.195,00			

Página 1

2	IE. RURAL LA RICO SEDE BUENAVISTA									
2.1	PISO Y/O ANDEN EN CONCRETO 3 CM 3000 PSI	$ 3.[illegible]		$ 3.[illegible]						
2.2	COLUMNA CONCRETO 3000 PSI	$ 5.[illegible]		$ 411.295,50	$ 411.295,50					
2.3	VIGA CIMENTACION CONCRETO 3000 PSI	$ 2.822.029,00			$ 940.686,33	$ 940.686,33	$ 940.686,33			
2.4	VIGA CONCRETO AEREA 3000 PSI	$ 911.922,00			$ 303.974,00	$ 303.974,00	$ 303.974,00			
2.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA	$ -				$ -	$ -			
2.6	SUM. E INST. CUBIERTA TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2.5MM BLANCO O SIMILAR (NO INCL. ENTRAMADO NI CABALLETE. INCL. TORNILLO)	$ -					$ -	$ -		
2.7	CABALLETE UPVC	$ -						$ -		
2.8	MAMPOSTERIA EN BLOQUE N°4	$ 4.837.248,00							$ 2.328.624,00	$ 2.328.624,00
2.9	ESTUCO PLASTICO MURO [PASTA]	$ 2.245.404,00							$ 1.122.202,00	$ 1.122.202,00
2.10	PINTURA VINILO TIPO 1	$ 1.927.044,00							$ 963.522,00	$ 963.522,00
2.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO ELECTRO BOMBA	$ -							$ -	$ -

Página 1

3	IE. RURAL LA RICO KM20 SEDE LA RICO									
3,1	DESMONTE DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA MET., GALV., ZINC, FIBROCEMENTO, ETERNIT O SIMILAR, PAGADO EN M2	$ 1.701.600,00			$ 1.701.600,00					
3,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA	$ -			$ -	$ -				
3,3	SUM. E INST. CUBIERTA TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2.5MM BLANCO O SIMILAR (NO INCL. ENTRAMADO NI CABALLETE, INCL. TORNILLO)	$ -			$ -	$ -				
3,4	CABALLETE UPVC	$ -			$ -	$ -				
4	IE. RURAL NIEVES ARRIBA									
4,1	COLUMNA CONCRETO 3000 PSI	$ -						$ -	$ -	
4,2	VIGA CIMIENTO CONCRETO 3000 PSI	$ -							$ -	$ -
4,3	VIGA CONCRETO AEREA 3000 PSI	$ -								$ -
4,4	DESMONTE DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA MET., GALV., ZINC, FIBROCEMENTO, ETERNIT O SIMILAR, PAGADO EN M2	$ 2.947.254,00								
4,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA	$ -								
4,6	SUM. E INST. CUBIERTA TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2.5MM BLANCO O SIMILAR (NO INCL. ENTRAMADO NI CABALLETE, INCL. TORNILLO)	$ -								
4,7	CABALLETE UPVC	$ -								
4,8	ESTUCO PLASTICO MURO (PASTA)	$ -								
4,9	PINTURA VINILO TOPO 1	$ 5.275.737,00								

5	IE. RURAL PLAYA RICA									
5,1	COLUMNA CONCRETO 3000 PSI							$ -	$ -	$ -
5,2	VIGA CIMIENTO CONCRETO 3000 PSI	$ 314.397,00						$ 104.799,67	$ 104.799,67	$ 104.799,67
5,3	DESMONTE DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA MET., GALV., ZINC, FIBROCEMENTO, ETERNIT O SIMILAR, PAGADO EN M2	$ 588.816,00							$ 588.816,00	
5,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA	$ 889.185,00							$ 289.395,67	$ 289.395,67
5,5	SUM. E INST. CUBIERTA TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2.5MM BLANCO O SIMILAR (NO INCL. ENTRAMADO NI CABALLETE, INCL. TORNILLO)	$ -								$ -
5,6	MAMPOSTERIA EN BLOQUE N°4	$ -								
5,7	CABALLETE UPVC	$ 170.766,00								
6	TRANSPORTE DE MATERIAL									
6,1	TRANSPORTE MATERIALES PETREOS DESDE O HACIA LA OBRA ZONA RURAL	$ 583.490,00	$ 145.820,00				$ 145.820,00			
6,2	TRANSPORTE DE MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO DESDE CASCO URBANO HASTA LA OBRA ZONA RURAL	$ 1.250.000,00	$ 625.000,00	$ 625.000,00						
7	ITEMS IMPREVISTOS IE. RURAL PLAYA RICA									
7,1	VIGA CONCRETO AEREA 3000 PSI	$ 278.944,00						$ 92.981,00	$ 92.981,00	$ 92.981,00
7,2	PISO Y/O ANDEN EN CONCRETO 3 CM 3000 PSI	$ 125.953,00								
7,3	DEMOLICION PISO Y/O ANDEN E=0.08	$ 18.016,00						$ 6.005,33	$ 6.005,33	$ 6.005,33
7,4	PINTURA VINILO TOPO 1	$ 2.342.163,00								

8	NP IE RURAL LA MUÑOZ SEDE ESPERANZA TROCHA 8									
8.1	MANTENIMIENTO DE MUROS (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES, LIMPIEZA, RESANE Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE)	$ 218.150,00			$ 869.065,00	$ 106.065,00				
8.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO RECTANGULAR 100 X 40 X 2.0MM	$ 10.836.555,00		$ 5.418.277,50	$ 5.418.277,50					
8.3	SUM. E INST. CUBIERTA MET. GALV. CAL. 26 PREPINTADA POR AMBAS CARAS POR EL FABRICANTE, TIPO M-1000 O SIMILAR (NO INCL. ENTRAMADO NI CABALLETE, INCL. TORNILLO), PAGADO EN m2	$ 10.370.230,00			$ 5.185.115,00	$ 5.185.115,00				
8.4	SUN. E INST. CABALLETE MET. GALV. CAL. 20 PARA CUBIERTA M-1000 O SIMILAR, PREPINTADO POR AMBAS CARAS POR EL FABRICANTE, PAGADO EN m	$ 2.313.180,00				$ 2.313.180,00				
8.5	BORDILLO EN CONCRETO 3000 PSI 10 X 20 CM	$ 1.188.662,00							$ 594.165,50	$ 594.165,50
9	NP IE RURAL LA RICO KM 30 SEDE LA RICO									
9.1	MANTENIMIENTO DE MUROS (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES, LIMPIEZA, RESANE Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE)	$ 1.017.940,00			$ 1.017.940,00					
9.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20	$ 1.301.314,00			$ 1.301.314,00					
9.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO RECTANGULAR 100 X 40 X 2.0MM	$ 6.877.587,00			$ 3.438.793,50	$ 3.438.793,50				
9.4	SUM. E INST. CUBIERTA MET. GALV. CAL. 26 PREPINTADA POR AMBAS CARAS POR EL FABRICANTE, TIPO M-1000 O SIMILAR (NO INCL. ENTRAMADO NI CABALLETE, INCL. TORNILLO), PAGADO EN m2	$ 8.452.903,00			$ 4.226.451,50	$ 4.226.451,50				
9.5	SUN. E INST. CABALLETE MET. GALV. CAL. 26 PARA CUBIERTA M-1000 O SIMILAR, PREPINTADO POR AMBAS CARAS POR EL FABRICANTE, PAGADO EN m	$ 720.714,00			$ 360.357,00	$ 360.357,00				

10	NP IE RURAL VIEVES ARRIBA									
10.1	MANTENIMIENTO DE MUROS (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES, LIMPIEZA, RESANE Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE)	$ 1.781.758,00								$ 890.879,00
10.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO RECTANGULAR 100 X 40 X 2.0MM	$ 10.836.555,00								
10.3	SUM. E INST. CUBIERTA MET. GALV. CAL. 26 PREPINTADA POR AMBAS CARAS POR EL FABRICANTE, TIPO M-1000 O SIMILAR (NO INCL. ENTRAMADO NI CABALLETE, INCL. TORNILLO), PAGADO EN m2	$ 14.757.435,00								
10.4	SUN. E INST. CABALLETE MET. GALV. CAL. 26 PARA CUBIERTA M-1000 O SIMILAR, PREPINTADO POR AMBAS CARAS POR EL FABRICANTE, PAGADO EN m	$ 690.722,00								
10.5	PAÑETE 1:4 (INCL. FILOS Y DILATACIONES), PAGADO EN m2	$ 454.433,00								
11	NP IE RURAL PLAYA RICA									
11.1	MANTENIMIENTO DE MUROS (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES, LIMPIEZA, RESANE Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE)	$ 350.622,00							$ 204.811,50	$ 204.811,50
11.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO RECTANGULAR 100 X 40 X 2.0MM	$ 2.690.313,00							$ 1.229.939,50	$ 1.229.939,50
11.3	SUN. E INST. CUBIERTA MET. GALV. CAL. 26 PREPINTADA POR AMBAS CARAS POR EL FABRICANTE, TIPO M-1000 O SIMILAR (NO INCL. ENTRAMADO NI CABALLETE, INCL. TORNILLO), PAGADO EN m2	$ 4.467.176,00								$ 2.233.588,00
11.4	SUN. E INST. CABALLETE MET. GALV. CAL. 26 PARA CUBIERTA M-1000 O SIMILAR, PREPINTADO POR AMBAS CARAS POR EL FABRICANTE, PAGADO EN m	$ 330.778,00								
11.5	PAÑETE 1:4 (INCL. FILOS Y DILATACIONES), PAGADO EN m2	$ 365.330,00								
11.6	SUM. E INST. DE ACERO ESTRUCTURAL ASTM A - 572, A - 500 G, A - 36, A - 709 (GRADO 36 O 250, A - 36) O SIMILAR, (INCL. BASE ANTICORROSIVA TIPO WASH PRIMER, PINTURA ACABADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO), PAGADO EN kg	$ 2.369.147,00								
11.7	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	$ 33.625,00								

Página 2

12	Nº IE RURAL LA RICO KM30 SEDE BUENAVISTA									
12.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO RECTANGULAR 100 X 40 X 2.0MM	$ 4.210.720,00				$ 2.105.360,00	$ 2.105.360,00			
12.2	SUM. E INST. CUBIERTA MET. GALV. CAL. 25 PREPINTADA POR AMBAS CARAS POR EL FABRICANTE, TIPO M-1000 O SIMILAR (NO INCL. ENTRAMADO NI CABALLETE, INCL. TORNILLO). PAGADO EN m2	$ 4.701.200,00					$ 2.350.600,00	$ 2.350.600,00		
12.3	SUM. E INST. CABALLETE MET. GALV. CAL. 25 PARA CUBIERTA M-1000 O SIMILAR. PREPINTADO POR AMBAS CARAS POR EL FABRICANTE. PAGADO EN m	$ 430.888,00						$ 430.888,00		
12.4	PAÑETE 1:4 (INCL. FILOS Y DILATACIONES). PAGADO EN m2	$ 2.924.250,00						$ 1.462.140,00	$ 1.462.140,00	
SUB TOTAL CAP 1 REPOSICION DE TRAMO DE ALCANTARILLADO SANITARIO		$ 137.201.720,00	$ 6.771.184,00	$ 12.318.860,00	$ 24.438.872,33	$ 18.792.468,33	$ 7.014.703,33	$ 4.479.388,00	$ 8.576.302,80	$ 9.948.809,80

CONTRATO DE OBRA No. 003 DE 2025
DIANA MARCELA QUIROGA DÍAS
R.L. INERCIA S.A.S
CONTRATISTA

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DE LAS VEREDAS EL AGUILA, BUENAVISTA, LA RICO Y LOS CENTROS POBLADOS DE PLAYA RICA Y KILOMETRO 18 DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO CAQUETA

ITEM		V / TOTAL PROGRAMADO	PROGRAMACIÓN FÍSICA & FINANCIERA						TOTAL
			MES 3				MES 4		
			SEMANA 9 (04 AGO-10 AGO)	SEMANA 10 (11 AGO-17 AGO)	SEMANA 11 (18 AGO-24 JUL)	SEMANA 12 (25 AGO-31 AGO)	SEMANA 13 (01 SEP - 07SEP)	SEMANA 14 (08SEP - 15 SEP)	
1	IE. RURAL LA MUÑOZ SEDE ESPERANZA TROCHA 6								
1.1	DEMOLICION PISO Y O ANDEN E=0.08	$ 818.639,00							$ 818.639,00
1.2	PISO Y O ANDEN EN CONCRETO 8 CM 3000 PSI	$ 5.184.635,00							$ 5.184.635,00
1.3	DESMONTE DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA MET., GALV., ZINC, FIBROCEMENTO, ETERNIT O SIMILAR. PAGADO EN M2	$ 2.085.097,00							$ 2.085.097,00
1.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA	$ -							$ -
1.5	SUM. E INST. CUBIERTA TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2.5MM BLANCO O SIMILAR (NO INCL. ENTRAMADO NI CABALLETE, INCL. TORNILLO)	$ -							$ -
1.6	CABALLETE UPVC	$ -							$ -
1.7	ESTUCO PLASTICO MURO (PASTA)	$ -							$ -
1.8	PINTURA VINILO TOPO 1	$ 1.121.193,00							$ 1.121.193,00

Página 1

2	IE. RURAL LA RICO KM30 SEDE BUENAVISTA								$ -
2.1	PISO Y O ANDEN EN CONCRETO 8 CM 3000 PSI	$ 3.778.888,00							$ 3.778.888,00
2.2	COLUMNA CONCRETO 3000 PSI	$ 922.496,00							$ 922.496,00
2.3	VIGA CIMENTACION CONCRETO 3000 PSI	$ 2.822.088,00							$ 2.822.088,00
2.4	VIGA CONCRETO AEREA 3000 PSI	$ 911.922,00							$ 911.922,00
2.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA	$ -							$ -
2.6	SUM. E INST. CUBIERTA TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2.5MM BLANCO O SIMILAR (NO INCL. ENTRAMADO NI CABALLETE, INCL. TORNILLO)	$ -							$ -
2.7	CABALLETE UPVC	$ -							$ -
2.8	MAMPOSTERIA EN BLOQUE N°4	$ 4.697.248,00							$ 4.697.248,00
2.9	ESTUCO PLASTICO MURO (PASTA)	$ 2.246.404,00							$ 2.246.404,00
2.10	PINTURA VINILO TOPO 1	$ 1.927.044,00							$ 1.927.044,00
2.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO ELECTRICO ELECTRO BOMBA	$ -							$ -

Página 1

3	IE RURAL LA RICO KM39 SEDE LA RICO								
3.1	DESMONTE DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA MET. GALV., ZINC, FIBROCEMENTO, ETERNIT O SIMILAR, PAGADO EN M2	$ 1.701.600,00							$ 1.701.600,00
3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA	$ -							$ -
3.3	SUM. E INST. CUBIERTA TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2.10x0.BLANCO O SIMILAR (NO INCL. ENTRAMADO NI CABALLETE, INCL. TORNILLO)	$ -							$ -
3.4	CABALLETE UPVC	$ -							$ -
4	IE RURAL NIEVES ARRIBA								
4.1	COLUMNA CONCRETO 3000 PSI	$ -							$ -
4.2	VIGA CIMIENTO CONCRETO 3000 PSI	$ -							$ -
4.3	VIGA CONCRETO AEREA 3000 PSI	$ -	$ -						$ -
4.4	DESMONTE DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA MET. GALV., ZINC, FIBROCEMENTO, ETERNIT O SIMILAR, PAGADO EN M2	$ 2.967.284,00	$ 1.488.827,00	$ 1.488.827,00					$ 2.967.284,00
4.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA	$ -		$ -					$ -
4.6	SUM. E INST. CUBIERTA TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2.10x0.BLANCO O SIMILAR (NO INCL. ENTRAMADO NI CABALLETE, INCL. TORNILLO)	$ -		$ -					$ -
4.7	CABALLETE UPVC	$ -		$ -					$ -
4.8	ESTUCO PLASTICO MURO (PASTA)	$ -			$ -				$ -
4.9	PINTURA VINILO TOPO 1	$ 3.276.707,00			$ 3.276.707,00				$ 3.276.707,00

5	IE RURAL PLAYA RICA								
5.1	COLUMNA CONCRETO 3000 PSI								$ -
5.2	VIGA CIMIENTO CONCRETO 3000 PSI	$ 314.387,00							$ 314.387,00
5.3	DESMONTE DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA MET. GALV., ZINC, FIBROCEMENTO, ETERNIT O SIMILAR, PAGADO EN M2	$ 888.316,00							$ 888.316,00
5.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA	$ 598.196,00	$ 299.098,67			-			$ 598.196,00
5.5	SUM. E INST. CUBIERTA TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2.10x0.BLANCO O SIMILAR (NO INCL. ENTRAMADO NI CABALLETE, INCL. TORNILLO)	$ -	$ -						$ -
5.6	MAMPOSTERIA EN BLOQUE N°4	$ -			$ -	$ -			$ -
5.7	CABALLETE UPVC	$ 170.786,00	$ 170.786,00						$ 170.786,00
6	TRANSPORTE DE MATERIAL								
6.1	TRANSPORTE MATERIALES PETREOS DESDE O HACIA LA OBRA ZONA RURAL	$ 683.480,00	$ 345.920,00			$ 345.920,00			$ 683.480,00
6.2	TRANSPORTE DE MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO DESDE CASCO URBANO HASTA LA OBRA ZONA RURAL	$ 1.260.000,00							$ 1.260.000,00
7	ITEM PREVISTOS IE RURAL PLAYA RICA								
7.1	VIGA CONCRETO AEREA 3000 PSI	$ 278.643,00							$ 278.643,00
7.2	PISO Y/O ANDEN EN CONCRETO 3 CM 3000 PSI	$ 125.969,00	$ 63.987,67	$ 63.987,67	$ 63.987,67				$ 126.968,00
7.3	DEMOLICION PISO Y/O ANDEN E40.08	$ 19.316,00							$ 19.316,00
7.4	PINTURA VINILO TOPO 1	$ 2.342.143,00			$ 780.726,33	$ 780.726,33	$ 780.726,33		$ 2.342.143,00

Página 2

Página 2

9	NP IE. RURAL LA MUÑOZ SEDE ESPERANZA TROCHA 9								
9.1	MANTENIMIENTO DE MUROS (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES, LIMPIEZA, RESANE Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE)	$ 218.130,00							$ 218.130,00
9.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO RECTANGULAR 100 X 40 X 2.0MM	$ 10.836.666,00							$ 10.836.666,00
9.3	SUM. E INST. CUBIERTA MET. GALV. CAL. 26 PREPINTADA POR AMBAS CARAS POR EL FABRICANTE, TIPO M-1000 O SIMILAR (NO INCL. ENTRAMADO NI CABALLETE, INCL. TORNILLO). PAGADO EN m2	$ 10.370.250,00							$ 10.370.250,00
9.4	SUM. E INST. CABALLETE MET. GALV. CAL. 26 PARA CUBIERTA M-1000 O SIMILAR, PREPINTADO POR AMBAS CARAS POR EL FABRICANTE. PAGADO EN m	$ 2.113.160,00							$ 2.113.160,00
9.5	MORTERO EN CONCRETO 3000 PSI 30 X 30 CM	$ 1.436.667,00	$ 886.665,50	$ 886.665,50					$ 1.436.667,00
8	NP IE. RURAL LA RICO KM 30 SEDE LA RICO								
8.1	MANTENIMIENTO DE MUROS (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES, LIMPIEZA, RESANE Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE)	$ 1.017.840,00							$ 1.017.840,00
8.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20	$ 1.301.314,00							$ 1.301.314,00
8.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO RECTANGULAR 100 X 40 X 2.0MM	$ 6.877.387,00							$ 6.877.387,00
8.4	SUM. E INST. CUBIERTA MET. GALV. CAL. 26 PREPINTADA POR AMBAS CARAS POR EL FABRICANTE, TIPO M-1000 O SIMILAR (NO INCL. ENTRAMADO NI CABALLETE, INCL. TORNILLO). PAGADO EN m2	$ 8.462.906,00							$ 8.462.906,00
8.5	SUM. E INST. CABALLETE MET. GALV. CAL. 26 PARA CUBIERTA M-1000 O SIMILAR, PREPINTADO POR AMBAS CARAS POR EL FABRICANTE. PAGADO EN m	$ 720.714,00							$ 720.714,00
10	NP IE. RURAL NIEVES ARRIBA								
10.1	MANTENIMIENTO DE MUROS (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES, LIMPIEZA, RESANE Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE)	$ 1.793.796,00	$ 896.898,00						$ 1.793.796,00
10.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO RECTANGULAR 100 X 40 X 2.0MM	$ 10.386.261,00		$ 10.386.261,00					$ 10.386.261,00
10.3	SUM. E INST. CUBIERTA MET. GALV. CAL. 26 PREPINTADA POR AMBAS CARAS POR EL FABRICANTE, TIPO M-1000 O SIMILAR (NO INCL. ENTRAMADO NI CABALLETE, INCL. TORNILLO). PAGADO EN m2	$ 14.757.625,00		$ 14.757.625,00					$ 14.757.625,00
10.4	SUM. E INST. CABALLETE MET. GALV. CAL. 26 PARA CUBIERTA M-1000 O SIMILAR, PREPINTADO POR AMBAS CARAS POR EL FABRICANTE. PAGADO EN m	$ 696.722,00		$ 696.722,00					$ 696.722,00
10.5	PAÑETE 1:4 (INCL. FILOS Y DILATACIONES). PAGADO EN m2	$ 954.453,00			$ 954.453,00				$ 954.453,00
11	NP IE. RURAL PLAYA RICA								
11.1	MANTENIMIENTO DE MUROS (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES, LIMPIEZA, RESANE Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE)	$ 489.612,00							$ 489.612,00
11.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO RECTANGULAR 100 X 40 X 2.0MM	$ 3.950.518,00	$ 1.226.518,33						$ 3.950.518,00
11.3	SUM. E INST. CUBIERTA MET. GALV. CAL. 26 PREPINTADA POR AMBAS CARAS POR EL FABRICANTE, TIPO M-1000 O SIMILAR (NO INCL. ENTRAMADO NI CABALLETE, INCL. TORNILLO). PAGADO EN m2	$ 4.467.270,00	$ 2.233.388,00						$ 4.467.270,00
11.4	SUM. E INST. CABALLETE MET. GALV. CAL. 26 PARA CUBIERTA M-1000 O SIMILAR, PREPINTADO POR AMBAS CARAS POR EL FABRICANTE. PAGADO EN m	$ 660.776,00	$ 330.880,00	$ 330.880,00					$ 660.776,00
11.5	PAÑETE 1:4 (INCL. FILOS Y DILATACIONES). PAGADO EN m2	$ 369.636,00	$ 369.636,00						$ 369.636,00
11.6	SUM. E INST. DE ACERO ESTRUCTURAL ASTM A - 572, A - 500 G, A - 36, A - 706 (GRADO B 6 C6, A - 36) O SIMILAR. (INCL. BASE ANTICORROSIVA TIPO WASH PRIMER, PINTURA ACABADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO). PAGADO EN kg	$ 2.269.147,00	$ 2.269.147,00						$ 2.269.147,00
11.7	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-PANA	$ 88.023,00	$ 88.023,00						$ 88.023,00
12	NP IE. RURAL LA RICO KM30 SEDE BUENAVISTA								
12.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO RECTANGULAR 100 X 40 X 2.0MM	$ 4.210.730,00							$ 4.210.730,00
12.2	SUM. E INST. CUBIERTA MET. GALV. CAL. 26 PREPINTADA POR AMBAS CARAS POR EL FABRICANTE, TIPO M-1000 O SIMILAR (NO INCL. ENTRAMADO NI CABALLETE, INCL. TORNILLO). PAGADO EN m2	$ 4.756.260,00							$ 4.756.260,00
12.3	SUM. E INST. CABALLETE MET. GALV. CAL. 26 PARA CUBIERTA M-1000 O SIMILAR, PREPINTADO POR AMBAS CARAS POR EL FABRICANTE. PAGADO EN m	$ 419.838,00							$ 419.838,00
12.4	PAÑETE 1:4 (INCL. FILOS Y DILATACIONES). PAGADO EN m2	$ 2.924.280,00							$ 2.924.280,00
SUB TOTAL CAP 1 REPOSICION DE TRAMO DE ALCANTARILLADO SANITARIO		$ 137.281.729,00	$ 9.831.360,17	$ 28.622.277,17	$ 8.062.868,00	$ 926.640,33	$ 780.720,33	$ -	$ 137.281.729,00

3.4 AVANCE FISICO Y AVANCE EN TIEMPO

- **AVANCE FISICO**

PROYECTADO	EJECUTADO	PORCENTAJE DE AVANCE
$122.268.773 (67,49%)	$134.940.316,00 (74,84%)	74,84%

Para el informe de obra con fecha 31/07/2025, se ha ejecutado un 74,84% del contrato de Obra Pública por el valor de $ 134.940.316,00 pesos mcte, desarrollando un gran avance en las actividades establecida en el Contrato de Obra Pública No. 003 de 2025

GRAFICA DE EJECUCIÓN



Ilustración 2 Grafica de Ejecución

De acuerdo con la gráfica, se aprecia que el desarrollo de las actividades mantuvo un avance constante a lo largo de las semanas, logrando una ejecución que permitió dar continuidad al cronograma planteado. En la etapa inicial se estableció la base del trabajo programado, mientras que en las semanas intermedias se evidenció un mayor dinamismo en la realización de las actividades, lo que facilitó un ritmo de ejecución estable y organizado. En la fase final, las actividades alcanzaron un nivel de consolidación que permitió enfocar los esfuerzos en los procesos prioritarios, garantizando así el cumplimiento de los objetivos trazados en el plan de trabajo.

➢ AVANCE EN TIEMPO

Plazo inicial de ejecución:	Tres (03) meses
Plazo final de ejecución:	Tres (03) meses
Tiempo total transcurrido:	Un mes (1) mes y Quince Días

➢ CLIMATOLOGIA

En el periodo del presente informe se presentaron lluvias constantes, las cuales no fueron trascendentales para afectar el desarrollo y rendimiento de las actividades en el presente periodo de ejecución, se presentó un 39% de tiempo lluvioso.

Periodo del informe:	Del 6 de junio de 2025	AL	31 de julio de 2025			
CONTROL DIARIO DEL ESTADO DEL TIEMPO						
No.	FECHA Mes de junio	HORAS SOL (o sin lluvia) 6:00 am - 6:00 pm	HORAS LLUVIA 6:00 am - 6:00 pm	TIPO (A,B,C,D)	LLUVIA EN LA NOCHE SI	LLUVIA EN LA NOCHE NO	OBSERVACIONES
1	lun. - 16 junio 2025	0,00	12,00	D	X		
2	mar. - 17 junio 2025	0,00	12,00	D	X		
3	mié. - 18 junio 2025	12,00	0,00		X		
4	jue. - 19 junio 2025	0,00	12,00	C			
5	vie. - 20 junio 2025	12,00	0,00		X		
6	sáb. - 21 junio 2025	12,00	0,00				
7	dom. - 22 junio 2025	12,00	0,00			X	
8	lun. - 23 junio 2025	0,00	12,00	C	X		
9	mar. - 24 junio 2025	0,00	12,00			X	
10	mié. - 25 junio 2025	12,00	0,00			X	
11	jue. - 26 junio 2025	0,00	12,00	D		X	
12	vie. - 27 junio 2025	0,00	12,00	D		X	
13	sáb. - 28 junio 2025	12,00	0,00		X		
14	dom. - 29 junio 2025	0,00	12,00	B		X	
15	lun. - 30 junio 2025	0,00	12,00	D		X	
16	mar. - 1 julio 2025	12,00	0,00		X		
17	mié. - 2 julio 2025	12,00	0,00		X		
18	jue. - 3 julio 2025	12,00	0,00				
19	vie. - 4 julio 2025		12,00	B	X		
20	sáb. - 5 julio 2025	12,00	0,00		X		
21	dom. - 6 julio 2025	12,00	0,00			X	
22	lun. - 7 julio 2025		12,00	B		X	
23	mar. - 8 julio 2025	12,00	0,00			X	
24	mié. - 9 julio 2025	12,00	0,00			X	
25	jue. - 10 julio 2025	12,00	0,00		X		
26	vie. - 11 julio 2025	0,00	12,00	B		X	
27	sáb. - 12 julio 2025	12,00	0,00		X		
28	dom. - 13 julio 2025	12,00	0,00			X	
29	lun. - 14 julio 2025	12,00	0,00			X	
30	mar. - 15 julio 2025	0,00	12,00	D		X	
31	mié. - 16 julio 2025	12,00	0,00			X	
32	jue. - 17 julio 2025	12,00	0,00		X		
33	vie. - 18 julio 2025	0,00	12,00	D	X		
34	sáb. - 19 julio 2025	0,00	12,00	D	X		
35	dom. - 20 julio 2025	12,00	0,00		X		
36	lun. - 21 julio 2025	12,00	0,00		X		
37	mar. - 22 julio 2025	0,00	12,00	C	X		
38	mié. - 23 julio 2025	12,00	0,00			X	
39	jue. - 24 julio 2025	12,00	0,00		X		
40	vie. - 25 julio 2025	12,00	0,00			X	
41	sáb. - 26 julio 2025	0,00	12,00	C	X		
42	dom. - 27 julio 2025	12,00	0,00			X	
43	lun. - 28 julio 2025	0,00	12,00	C		X	
44	mar. - 29 julio 2025	12,00	0,00			X	
45	mié. - 30 julio 2025	12,00	0,00		X		
46	jue. - 31 julio 2025	12,00	0,00		X		
Totales		336 Horas	216 Horas				

NOTAS
El 39% del tiempo de labor fue lluvioso

Convenciones: A= Lluvia muy fuerte, B= Lluvia fuerte, C= Lluvia moderada, D= Lluvia suave



Ilustración 3 - Estado de Tiempo

4 INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

El contrato de obra CO-003-2025 denominado MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DE LAS VEREDAS EL AGUILA, BUENAVISTA, LA RICO Y LOS CENTROS POBLADOS DE PLAYA RICA Y KILOMETRO 18 DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO CAQUETA. tiene los siguientes antecedentes:

1. El contrato se celebró el nueve (09) de junio de 2025.
2. El once (11) de junio de 2025 se expidió la póliza de cumplimiento según contrato.
3. El dieciocho (11) de junio de 2025 se expidió la póliza de responsabilidad civil según contrato.
4. El inicio de la obra se realizó el día dieciséis (16) de junio de 2025.
5. El veintidós (22) de julio de 2025 se expidió la póliza de cumplimiento y la póliza de responsabilidad civil según acta de inicio.

5 INFORMACION DE CALIDAD

Como soporte de la Empresa INERCIA S.A.S definimos el control de calidad en la obra como la verificación técnica de los materiales y de su ejecución, garantizando que el proyecto cuenta con las características técnicas necesarias para evitar futuras fallas, malos metodos y deficientes prácticas constructivas. Asegurando que, se va a entregar un producto de calidad, estimando que los materiales suministrados sean los correctos. Por ende, se contemplan aspectos de suma importancia, los cuales radican en el control del proyecto, detectando y corrigiendo errores que podrían dar lugar a posteriores reducciones de niveles de seguridad, calidad y deficiencias relacionadas con la durabilidad del material, actuaciones y acciones realizadas por la empresa.


Finalmente, la empresa lleva a cabo el control de ejecución, verificando que la obra se ha construido de acuerdo a lo previsto en el proyecto, tanto con las calidades requeridas, especificaciones funcionales, caracteristicas fisicas y dimensionales.

6 INFORMACIÓN FINACIERA

Nº	CONCEPTO	VALOR	NETO COBRADO	ACUMULADO	SALDO ACTUAL
1	VALOR INICIAL	$181.172.282,00	$0	$0	$181.172.282,00
2	ACTA PARCIAL	$134.940.316,00	$134.940.316,00	$134.940.316,00	$46.231.966,00


REGISTRO FOTOGRAFICO


IE. RURAL LA MUÑOZ SEDE ESPERANZA TROCHA 5

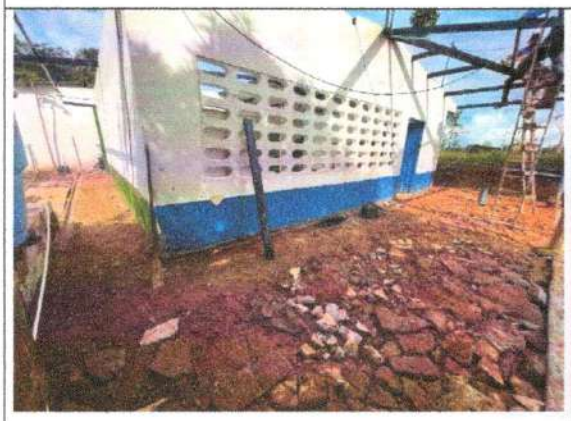







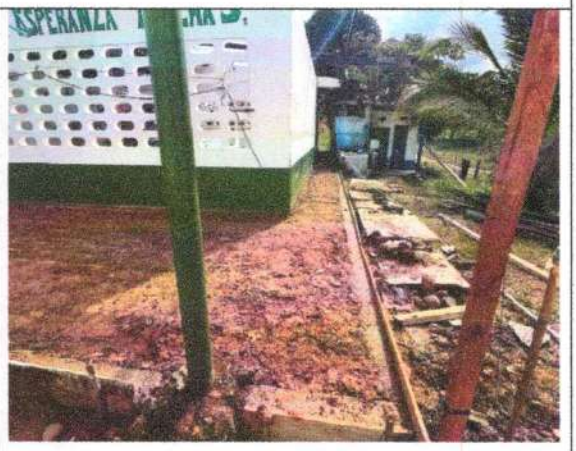

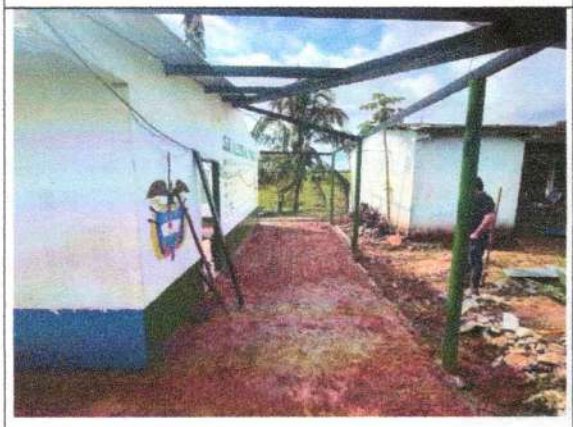




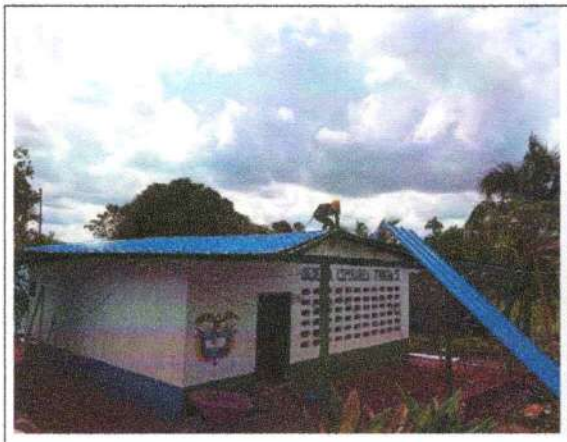

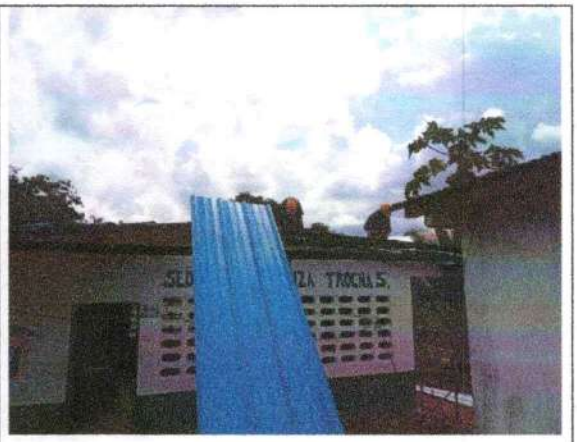

IE. RURAL LA RICO KM 30 SEDE LA RICO

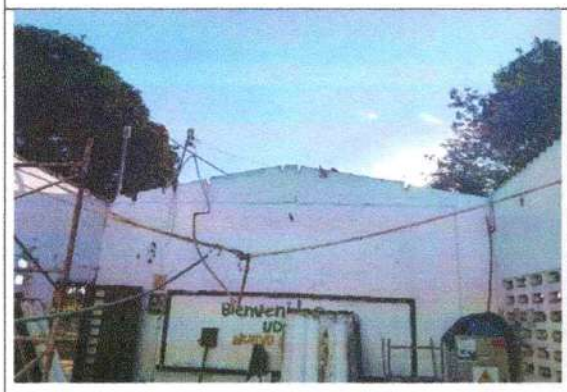













IE. RURAL NIEVES ARRIBA






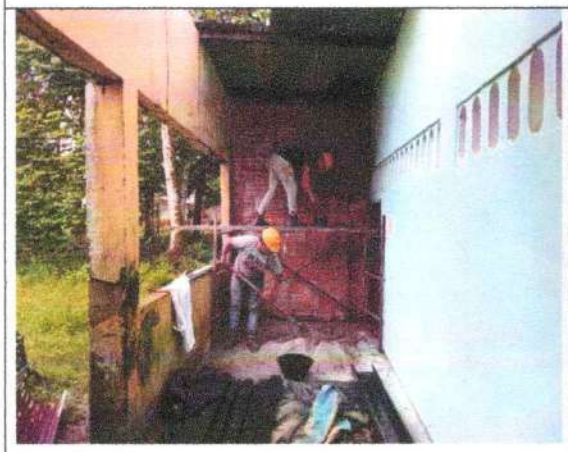



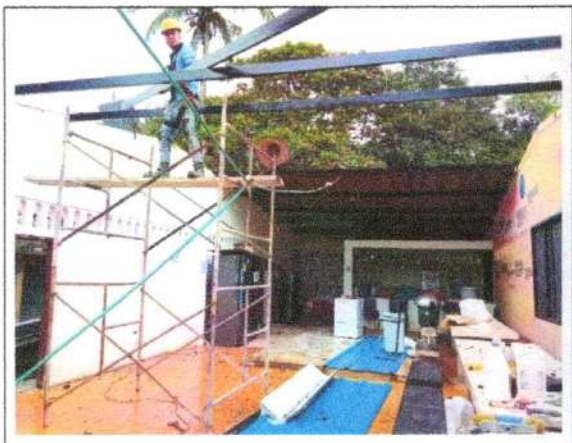


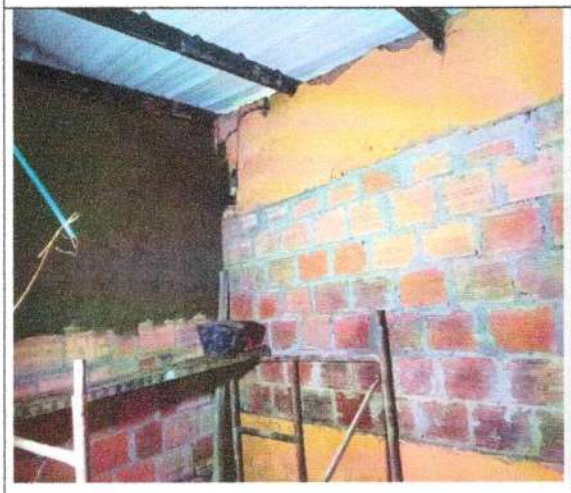





IE. RURAL PLAYA RICA



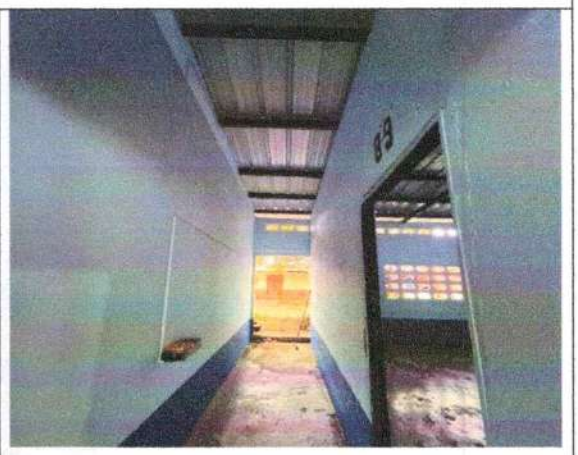


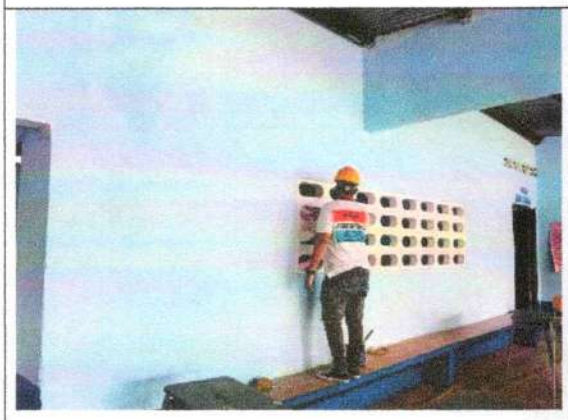








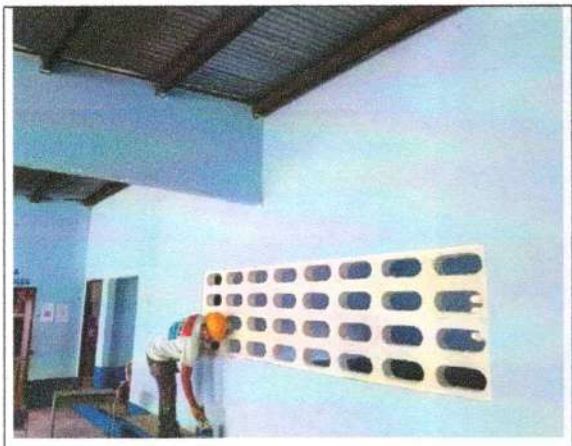

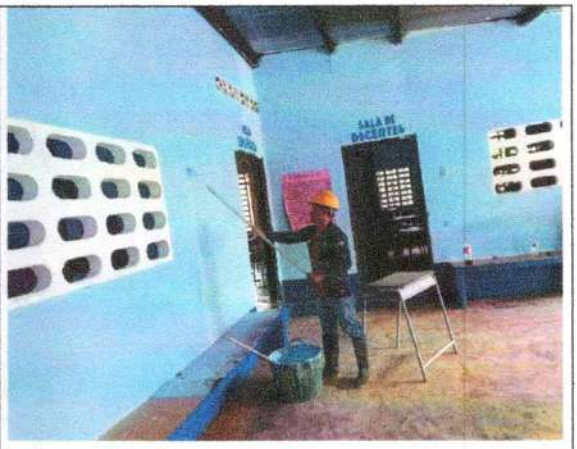
SALA DE DOCENTES









INFORME DE SST

INFORME

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROYECTO

" MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DE LAS VEREDAS EL AGUILA, BUENAVISTA, LA RICO Y LOS CENTROS POBLADOS DE PLAYA RICA Y KILOMETRO 18 DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO CAQUETA"

INFORME COMPRENDIDO DESDE EL 16 DE JUNIO DE 2025 AL 31 DE JULIO DE 2025

CONTRATISTA:

INERCIA S.A.S

PRESENTADO A:

ALCALDÍA MUNICIPAL VALPARAÍSO

ELABORO:

DIANA LORENA RAMOS LOZANO
PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. OBJETIVO 4
3. ALCANCE 4
4. DATOS DEL PROYECTO 4
5. GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 5
5.2 Capacitaciones 6
5.4 Entrega de elementos de protección personal 8
5.5 Almacenamiento de materiales. 9
6. REPORTE DE ACCIDENTES DE TRABAJO 10
7 SEÑALIZACIÓN, CERRAMIENTO Y ACCESOS A LOS FRENTES DE TRABAJO. 10
8 PLAN DE EMERGENCIA 10
9 CONCLUSIONES 11
10. ANEXOS 11

1. INTRODUCCIÓN

La Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) constituye una disciplina orientada a la prevención de lesiones y enfermedades derivadas de las condiciones laborales, así como a la protección y promoción de la salud integral de los trabajadores. Su propósito es garantizar un entorno laboral seguro, saludable y propicio para el bienestar físico, mental y social del personal.

En cumplimiento de la normatividad vigente emitida por el Ministerio de Trabajo, las organizaciones están obligadas a implementar políticas, reglamentos y procesos que fortalezcan el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Estas medidas buscan controlar los factores de riesgo que puedan afectar a trabajadores, visitantes y contratistas, asegurando el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos y promoviendo una cultura centrada en la prevención, el autocuidado y la mejora continua de las condiciones laborales.

Este documento describe el compromiso asumido por INERCIA S.A.S, estableciendo una Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual está relacionada con los diferentes procesos productivos y administrativos, además, determina el alcance del Sistema de Gestión, las responsabilidades de los diferentes participantes de la empresa ,en él presentando la información general de las actividades ejecutadas, procedimientos e instructivos generados durante la vigencia comprendida entre el 16 de junio de 2025 al 31 de julio de 2025, que permitió el desarrollo del Sistema de gestión involucrando a todos los niveles de la organización en su implementación, basados en el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar) permitiendo así mejorar los procesos con un alto desempeño en Seguridad y Salud en el Trabajo.

De acuerdo con lo anterior, INERCIA S.A.S mediante el contrato N° 003-2025 cuyo objeto es el "**MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DE LAS VEREDAS EL AGUILA, BUENAVISTA, LA RICO Y LOS CENTROS POBLADOS DE PLAYA RICA Y KILOMETRO 18 DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO CAQUETA"** velará mediante la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad Salud en el Trabajo, para lo cual se espera conseguir la máxima identificación y compromiso por parte de su personal asociado, cumpliendo con la normatividad legal vigente en seguridad y salud en el trabajo (Res. 0312 del 20 19) y decreto 1072 e 2015.

2. OBJETIVO

Evidenciar la gestión y cumplimiento con referencia a la Seguridad Salud en el Trabajo (SST), durante el periodo comprendido entre el 16 de junio de 2025 al 31 de julio de 2025, INERCIA S.A.S y su personal asociado.

3. ALCANCE

El presente informe aplica a todas y cada una de las actividades realizadas por el personal que labora en obra referentes a la Seguridad y Salud en el Trabajo.

4. DATOS DEL PROYECTO

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE VALPARAISO CAQUETÁ
CONTRATISTA.	INERCIA S.A.S
NIT:	901.048.151-1
NUMERO DE CONTRATO DE OBRA:	N° 003-2025
OBJETO DEL CONTRATO	"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DE LAS VEREDAS EL AGUILA, BUENAVISTA, LA RICO Y LOS CENTROS POBLADOS DE PLAYA RICA Y KILOMETRO 18 DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO CAQUETA"
FECHA DE INCICIO:	Dieciséis (16) de junio del 2025.
FECHA DE TERMINACION:	Treintaiuno (31) de Julio de 2025.


UBICACIÓN DE LA OBRA

Valparaíso es un municipio localizado en el departamento del Caquetá al sur de Colombia, parte de la región amazónica del país, siendo uno de los 16 municipios que conforman el departamento.

Las sedes objeto de intervención corresponden a las siguientes localizaciones rurales:

- Vereda Águila
- Vereda Buenavista
- Vereda La Rico
- Centro poblado Playa Rica
- Centro poblado Kilómetro 18.

GEOREFERENCIA

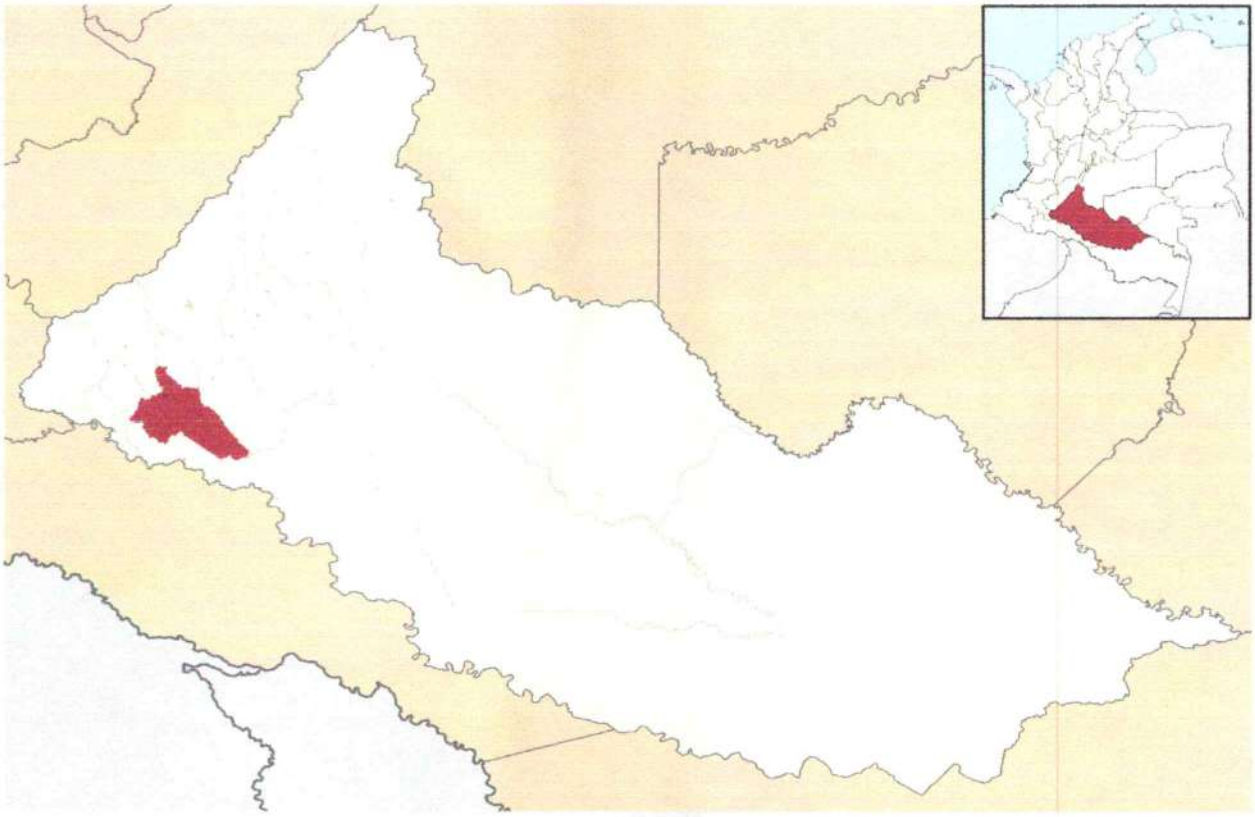

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/60/Colombia_-_Caquet%C3%A1_-_Valpara%C3%ADso.svg/1280px-Colombia_-_Caquet%C3%A1_-_Valpara%C3%ADso.svg.png

5. GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Durante el periodo comprendido entre el 16 de junio de 2025 al 31 de julio de 2025, se desarrollaron varias actividades, las cuales se describirán a continuación:

5.1 Relación del personal.

Durante el periodo comprendido entre 16 de junio de 2025 al 31 de julio de 2025, se han hecho las respectivas afiliaciones y pago al SGSSS del personal, dando cumplimiento al artículo 153 de la ley 100 de 1993, al Decreto 806 de 1998 y el Decreto 1703 de 2022. ANEXO 1. Planillas de SGSST

Tabla 1. Relación del personal en la obra

NO.	NOMBRE EMPLEADO	CC	CARGO
1	JAIRO ALBERTO GOMEZ ROA	16.185.320	**DIRECTOR DE OBRA**
2	DIANA LORENA RAMOS LOZANO	40.782.364	**PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL**
3	OSCAR MANRIQUE ORJUELA	16.189.643	**MAESTRO DE OBRA**
4	JOSE MIGUEL MELENDEZ VILLEGAS	1.102.824.834	**RESIDENTE DE OBRA**
5	YORMAN ALBERTO LABIO CONDAN	1.125.411.373	**AYUDANTE DE OBRA**
6	ALEXANDER GUZMAN SALAS	16.185.694	**AYUDANTE DE OBRA**

Fuente: Profesional_ Diana Ramos

5.2 Capacitaciones

En cumplimiento de la normatividad del DECRETO 1072 del 2015 (ARTICULO 2.2.4.6.11), se realizó capacitaciones de inducción al SG-SST, seguridad en la construcción, riesgos y peligros, manejo de herramientas, caída al mismo y diferente nivel y elaboración y socialización de ATS con alturas, con el fin de promover espacios seguros, la protección del trabajador, promover prácticas seguras en obras, prevenir lesiones por uso incorrecto de herramientas manuales y eléctricas, se estableciendo las medidas preventivas y correctivas necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores que realizan labores en alturas, minimizando riesgos laborales e impulsando el respeto de la vida hacia ellos mismos.

VER ANEXO 2. FORMATOS DE ASISTENCIA DE CAPACITACIONES.

VER ANEXO 3. FORMATOS DE INDUCCION AL SG-SST.

VER ANEXO 4. FOLLETOS.

5.3 Inspecciones de seguridad.

Con el objeto de evidenciar condiciones inseguras y prevenir incidentes y/o accidentes se evidencia a continuación las diferentes inspecciones realizadas durante el presente periodo.

VER ANEXO 5. FORMATO DE INSPECCION DE SEGURIDAD.

Relación de inspecciones realizadas.

FECHA	ASPECTO A INSPECCIONAR
20/06/2025 07/07/2025 29/07/2025	Inspección de herramienta
24/06/2025 10/07/2025 17/07/2025	Inspección de EPP
26/06/2025 23/07/2025	Inspección de botiquín

Fuente: Profesional_ Diana Ramos

A continuación, relaciono evidencias fotográficas de las inspecciones realizadas.

HERRAMIENTA





BOTIQUIN



EPP



Fuente: Profesional_ Diana Ramos

5.4 Entrega de elementos de protección personal

Con el objetivo de proteger a los trabajadores de los peligros existentes, se realizó entrega de elementos de protección y dotación al personal, tales como: guantes de nitrilo, casco, botas, pantalón y camisa.

VER ANEXO 6. FORMATO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.





Fuente: Profesional_ Diana Ramos


5.5 Almacenamiento de materiales.

Teniendo en cuenta las actividades desarrolladas en obra, se evidencia a continuación el espacio en donde se realiza de manera temporal el almacenamiento de los materiales, se encuentra ubicada dentro de la institución educativa.



Fuente: Profesional_ Diana Ramos

6. REPORTE DE ACCIDENTES DE TRABAJO

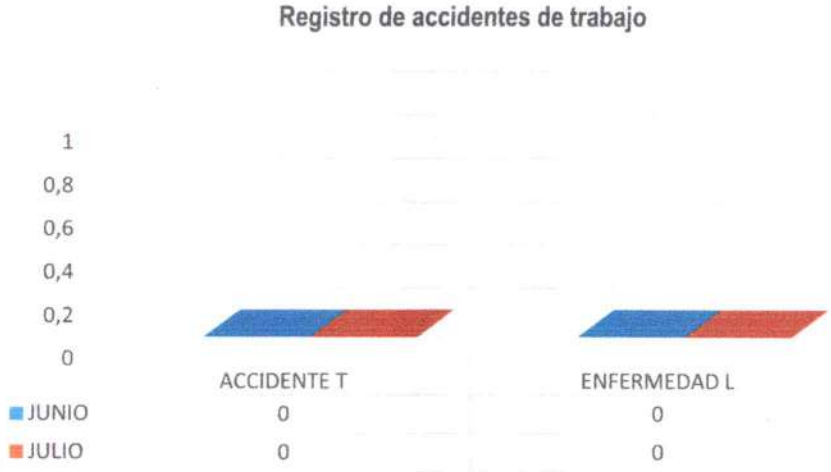

En el periodo comprendido entre el 16 de junio de 2025 al 31 de julio de 2025, no hubo reporte de accidentes de trabajo ni enfermedades laborales.

7 SEÑALIZACIÓN, CERRAMIENTO Y ACCESOS A LOS FRENTES DE TRABAJO.

Durante el presente periodo, se señalizo las áreas o sectores riesgo dentro de la obra, con el fin de prevenir la posible ocurrencia de accidentes; así mismo, se realizaron continuas jornadas para la demarcación necesaria de material o tierra producto de las excavaciones.

8 PLAN DE EMERGENCIA


Dando cumplimiento al plan de emergencias estipulado, se realizó una divulgación de los diferentes tipos de conceptos y procedimientos que se deben tener claros al momento de la ocurrencia de una situación de riesgo.

9 CONCLUSIONES

- Las actividades se han realizado en cumplimiento de la normatividad vigente.
- No se presentaron reportes de actos y condiciones inseguras.
- No se presentaron incidentes y accidentes de trabajo.
- Los trabajadores demuestran aprensión sobre el tema expuesto.
- Los materiales y herramienta menor son almacenados de manera correcta.

10. ANEXOS

ANEXO 1. SEGURIDAD SOCIAL

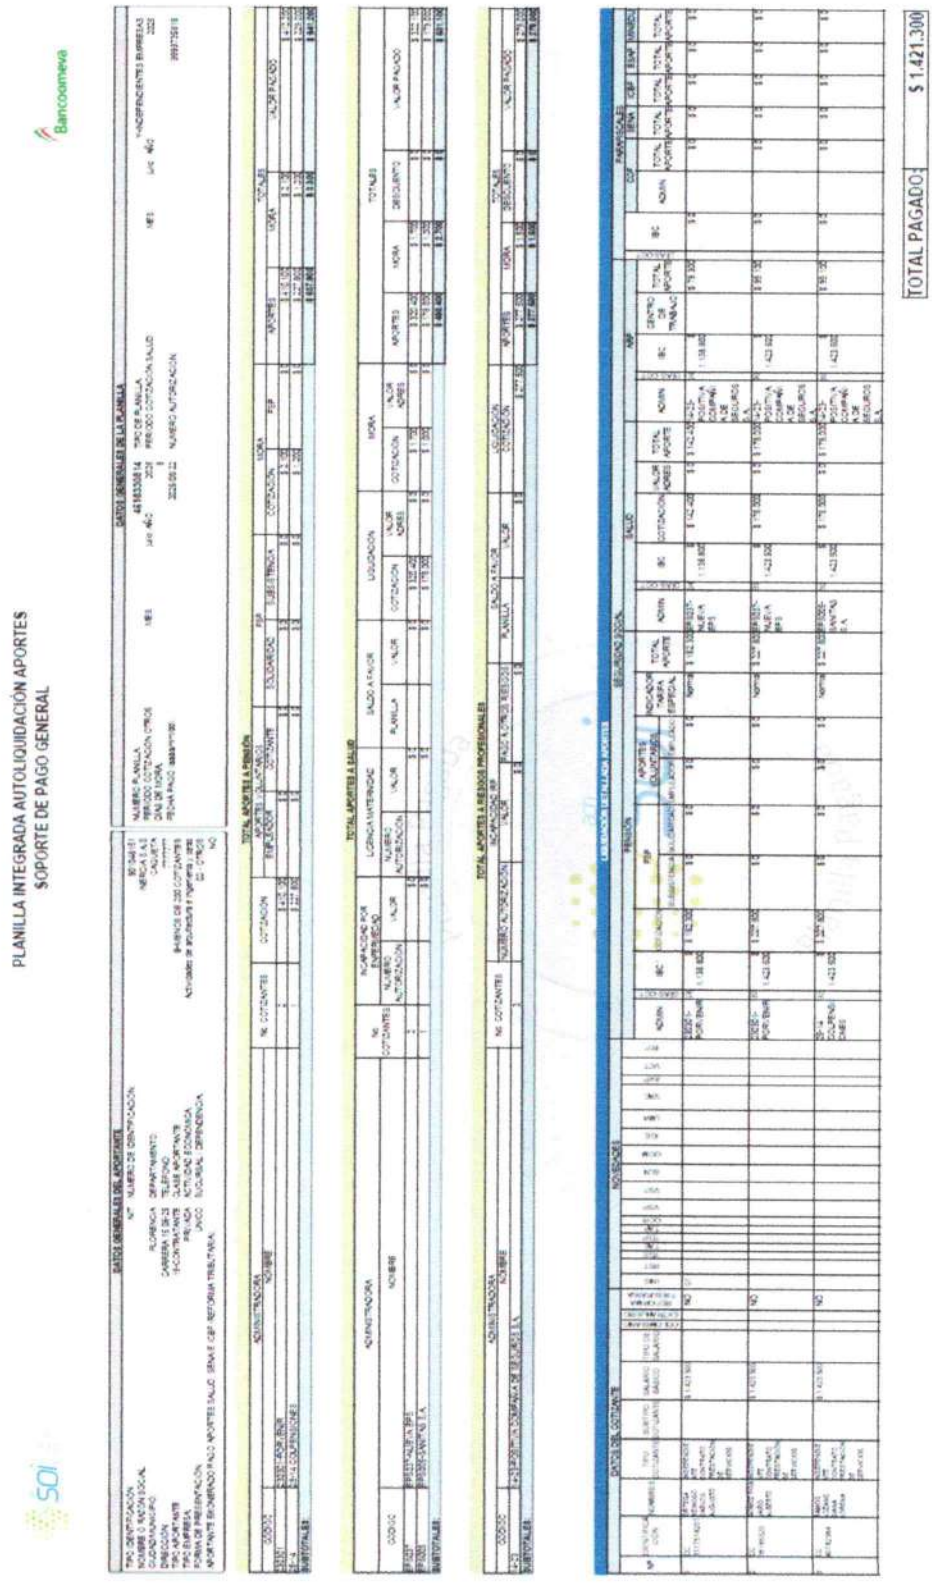

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

TOTAL PAGADO: $ 1.421.300

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE PREVIO AL PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACION	901548161
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			INERCIA S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO	FLORENCIA	DEPARTAMENTO	CAQUETA
DIRECCIÓN	CARRERA 15 09-35	TELEFONO	********
TIPO APORTANTE	31-IMPLEADOR	CLASE APORTANTE	8-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	7490-Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF, REFORMA TRIBUTARIA			S

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA		46184793	TIPO DE PLANILLA		E-IMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	Junio 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	Junio 2025
DIAS DE MORA		42			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)		2025-08-22			

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CODIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	AFILIADO	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
52001	52001-PORVENIR	1	$ 341.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.100	$ 0	$ 341.700	$ 3.100	$ 360.800
51001	51001-COLFONDOS	1	$ 144.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.600	$ 0	$ 144.200	$ 3.600	$ 147.800
SUBTOTALES:										$ 485.900	$ 12.800	$ 498.600

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR AORES	COTIZACIÓN	VALOR AORES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 93.000	$ 0	$ 3.000	$ 0	$ 93.000	$ 3.000	$ 0	$ 96.000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 28.000	$ 0	$ 900	$ 0	$ 28.000	$ 900	$ 0	$ 28.900
SUBTOTALES:													$ 121.000	$ 3.900	$ 0	$ 124.900

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	4		$ 0	$ 0		$ 0	$ 211.800	$ 211.800	$ 5.300	$ 0	$ 217.100
SUBTOTALES:									$ 211.800	$ 5.300	$ 0	$ 217.100

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CODIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
53-13	53-13-COMFACA	4	$ 121.600	$ 3.300	$ 124.900
SUBTOTALES:			$ 121.600	$ 3.300	$ 124.900

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE							NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN							SALUD						ARP													
																										FSP		APORTES VOLUNTARIOS																								
																										ADMIN	IBC	COTIZACIÓN	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	AFILIADO	EMPLEADOR	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	IBC	COTIZACIÓN	VALOR AORES	TOTAL APORTE	ADMIN	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	[illegible]	[illegible]	23/06/2025			$ 1.300.000	TyD																			52-001 - COLFONDOS	$ 900.000	$ 144.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 144.200	EPS005 - SANITAS S.A.	$ 900.000	$ 36.000	$ 0	$ 36.000	14-23 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 900.000		$ 62.700	$ 900.000	COFI3 - COMFACA	$ 36.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	[illegible]	[illegible]	23/06/2025			$ 1.425.500	TyD																			52001 - PORVENIR	$ 711.700	$ 113.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 113.900	EPS037 - NUEVA EPS	$ 711.700	$ 28.500	$ 0	$ 28.500	14-23 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 711.700		$ 49.600	$ 711.700	COFI3 - COMFACA	$ 28.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	[illegible]	[illegible]	23/06/2025			$ 1.425.500	TyD																			52001 - PORVENIR	$ 711.700	$ 113.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 113.900	EPS005 - SANITAS S.A.	$ 711.700	$ 28.500	$ 0	$ 28.500	14-23 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 711.700		$ 49.600	$ 711.700	COFI3 - COMFACA	$ 28.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	[illegible]	[illegible]	23/06/2025			$ 1.425.500	TyD																			52001 - PORVENIR	$ 711.700	$ 113.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 113.900	EPS005 - SANITAS S.A.	$ 711.700	$ 28.500	$ 0	$ 28.500	14-23 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 711.700		$ 49.600	$ 711.700	COFI3 - COMFACA	$ 28.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	$ 965.300

INERCIA S.A.S
INGENIEROS CONSULTORES

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
TIPO IDENTIFICACIÓN	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	900748151	NÚMERO PLANILLA		4618338814	TIPO DE PLANILLA		Y-INDEPENDIENTES EMPRESAS
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			INERCIA S.A.S	PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	julio AÑO 2025
CIUDAD/MUNICIPIO	FLORENCIA	DEPARTAMENTO	CAQUETA	DIAS DE MORA		8			
DIRECCIÓN	CARRERA 15 06-25	TELÉFONO	7777777	FECHA PAGO (aaaammdd)		20250822	NUMERO AUTORIZACIÓN		891735618
TIPO APORTANTE	15-CONTRATANTE	CLASE APORTANTE	8-MENOS DE 200 COTIZANTES						
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras						
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO	SUCURSAL / DEPENDENCIA	02 - OTROS						
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO						

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25301	25301 PORVENIR	2	$ 410.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.100	$ 0	$ 410.100	$ 2.100	$ 412.200
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.200	$ 0	$ 227.800	$ 1.200	$ 229.000
SUBTOTALES:										**$ 637.900**	**$ 3.300**	**$ 641.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR APORTES	COTIZACIÓN	VALOR APORTES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037 NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 320.400	$ 0	$ 1.700	$ 0	$ 320.400	$ 1.700	$ 0	$ 322.100
EPS005	EPS005 SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 1.000	$ 0	$ 178.000	$ 1.000	$ 0	$ 179.000
SUBTOTALES:													**$ 498.400**	**$ 2.700**	**$ 0**	**$ 501.100**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD RP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 277.500	$ 277.500	$ 1.500	$ 0	$ 279.000
SUBTOTALES:									**$ 277.500**	**$ 1.500**	**$ 0**	**$ 279.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																												PARAFISCALES											
N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN	COLOMBIANO EN EXTERIOR	ACTUALIZACIÓN DE IBC	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	VTE	ADMIN	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	IBC	COTIZACIÓN	VALOR APORTES	TOTAL APORTE	ADMIN	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTES	SENA TOTAL APORTES	ICBF TOTAL APORTES	ESAP TOTAL APORTES	MINEDU TOTAL APORTES
1	CC 1173142078	[illegible]	01-DEPENDIENTE 19-CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.423.500																					25301-PORVENIR	$ 1.138.800	$ 1.138.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 162.300	EPS037-NUEVA EPS	$ 1.138.800	$ 1.138.800	$ 142.400	$ 142.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 1.138.800		$ 79.800	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 96161533	[illegible]	01-DEPENDIENTE 19-CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.423.500																					25301-PORVENIR	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 1.423.500		$ 99.700	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1075[illegible]94	[illegible]	01-DEPENDIENTE 19-CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.423.500																					25-14 COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 1.423.500		$ 99.700	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 1.421.300

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	901048707
NOMBRE O RAZON SOCIAL			INERCIA S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO	FLORENCIA	DEPARTAMENTO	CAQUETA
DIRECCION	CARRERA 15 30-25	TELEFONO	7777777
TIPO APORTANTE	07-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			S

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA		46183309B1		TIPO DE PLANILLA			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio AÑO	2025	PERIODO COTIZACION SALUD	MES	agosto AÑO	2025
DIAS DE MORA		0					
FECHA PAGO (aaaa-mm-dd)		2025-08-22		NUMERO AUTORIZACIÓN			990735628

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CODIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14-COLPENSIONES	1	$ 182.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.000	$ 0	$ 182.300	$ 1.000	$ 183.300
SUBTOTALES:										$ 182.300	$ 1.000	$ 183.300

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR APREC	COTIZACIÓN	VALOR APREC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 45.600	$ 0	$ 300	$ 0	$ 45.600	$ 300	$ 0	$ 45.900
SUBTOTALES:													$ 45.600	$ 300	$ 0	$ 45.900

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN		APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0		$ 79.300	$ 79.300	$ 300	$ 0	$ 79.600
SUBTOTALES:										$ 79.300	$ 300	$ 0	$ 79.600

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF13	CCF13-COMFACA	1	$ 45.600	$ 300	$ 45.900
SUBTOTALES:			$ 45.600	$ 300	$ 45.900

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
																										PENSIÓN							SALUD						ARP															
N°	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIONES	EXTRANJERO RESIDENTE EN COLOMBIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COT	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	VST	SLN	ADMIN	DIAS COTIZADOS	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COTIZADOS	IBC	COTIZACIÓN	VALOR APREC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COTIZADOS	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTES	IBC	CCF	TARIFA	TOTAL APORTES	SENA	TARIFA	TOTAL APORTES	ICBF	TARIFA	TOTAL APORTES	ESAP	TARIFA	TOTAL APORTES	MINEDU	TARIFA	TOTAL APORTES
1	CC 7765211	PARA PARA EDGAR MAURICIO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO																				25-14 COLPENSIONES	X	30	$ 1.138.800	$ 182.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 182.300	EPS037-NUEVA EPS	X	30	$ 1.138.800	$ 45.600	$ 0	$ 45.600	14-23 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	X	30	$ 1.138.800		$ 79.300	$ 1.138.800	CCF13 COMFACA	$ 45.600	4%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 354.900

ANEXO 2. FORMATOS DE ASISTENCIA DE CAPACITACIONES.

	INERCIA S.A.S	
	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	SG-SST	
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Código: FT-SST-037 Version: 001 Fecha Aprobación: Junio2025	

pag 1

LUGAR	HORA	DD	MM	AAA
Obra - Instalaciones		16	06	25

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		
Reinducción		
Charla de seguridad		
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo		
Capacitacion	X	Elaboración y socialización de ATS con Alturas
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	yurman Alberto labio cordon	1.125.471.373	Ayudante de obra	yurman Alberto L.C
2	Alexander Guzman Salas	16.185.694	Ayudante	Alexander Guzman
3	Oscar Orjuela Enrique	16.189.643	Maestro de Obra	Oscar Orjuela T
4	Jose Miguel Melendez	1.102.824.834	Residente Obra	Jose Miguel M.
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Diana Lorena Ramos C.	

	INERCIA S.A.S	
	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	SG-SST	
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Código: FT-SST-037 Version: 001 Fecha Aprobación: Junio2025	

pag 1

LUGAR	HORA	DD	MM	AA
Obra - instalaciones	8:00 A.M	27	06	25

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		
Reinducción		
Charla de seguridad		
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo		
Capacitacion	x	Capacitación de Riesgos y peligros
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Jose Miguel Melendez	1.102.824.824	Residente de obra	Jose Miguel Melendez
2	Oscar Orgueda Manrique	16.189.643	Maestro de Obra	Oscar Orgueda
3	Alexander Guzmán Salas	1.6 .185 694.	Ayudate de obra	Alexander G. Salas
4	yarman Alberto labio condon	1.125.411.373	Ayudante de obra	yarman A. labio condon
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Diana Lorena Ramos L.	

	INERCIA S.A.S		
	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	SG-SST		
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Código: FT-SST-037		
	Version: 001		
	Fecha Aprobación: Junio2025		
	pag 1		

LUGAR	HORA	DD	MM	AA
Obra instalaciones	4:00 Pm	01	07	25

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		
Reinducción		
Charla de seguridad		
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo		
Capacitacion	X	Capacitación Manejo de herramientas
Otro		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Oscar Oyuela Manrique	16.189.643	maestro de obra	Oscar Oyuela M
2	Yorman Alberto Labio Cardon	1.125.477.373	Ayudante de obra	yorman A. labio. cardon
3	Jose Miguel Melendez	1.102.824.834	Residente de obra	Jose Miguel Melendez
4	Alexander Germán Salas	16.185.694	Ayudante de obra	Alexander G. S.
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Diana Lorena Ramos Lozano	

INERCIA S.A.S

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SG-SST

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Código: FT-SST-037
Version: 001
Fecha Aprobación: Junio2025
pag 1

LUGAR	HORA	DD	MM	AA
Obra - Instituciones	9:00 am	16	06	25

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción	X	Inducción del SG-SST
Reinducción		
Charla de seguridad		
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo		
Capacitacion		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Jairo Alberto Gomez Roa	16.185.320	Director de obra	
2	Jose miguel Melendez villegas	1078249834	Residente de obra	Jose Miguel Melendez
3	Fabio cordon Guzman, Roberto	1125.477.593	ayudante de obra	Guzman Fabio C.
4	Alexander Guzman Salas	16.185.694	ayudante obra	Alexander Guzmán
5	Oscar Oyuela Henrique	16189643	Maestro de obra	Oscar Oyuela M.
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Diana Lorena Ramos Lozano	

INERCIA S.A.S

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SG-SST

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Codigo: FT-SST-037
Version: 001
Fecha Aprobación: Junio2025
pag 1

LUGAR	HORA	DD	MM	AA
Obra — Instalaciones	10:00 A.M	28	07	25

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Induccion		
Reinduccion		
Charla de seguridad		
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo		
Capacitacion	X	Caida al mismo y diferente nivel
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Alexander Guzmán Salas	16.185.694	Ayudante	Alexander G.S
2	Oscar Oyuela Manrique	16.189.643	Fuestio de obra	Oscar Oyuela
3	yormar Alberto labio candan	1.125.411.373	Ayudante de obra	yormar A. Labio C.
4	Jose Miguel Melendez	1.702.824.834	Residente de obra	Jose Melendez
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Diana Lorena Ramos Lozano	

INERCIA S.A.S

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SG-SST

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Código: FT-SST-037
Version: 001
Fecha Aprobación: Junio2025
pag 1

LUGAR	HORA	DD	MM	AA
Obra Instalaciones	3:00 PM	15	07	25

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		
Reinducción		
Charla de seguridad		
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo		
Capacitacion	X	Seguridad en la conducción
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Oscar Orjuela Manrique	16.189.643	Maestro de Obra	Oscar Orjuela M.
2	Jose Miguel Melendez V.	1.102 824 834	Residente de obra	Jose Miguel Melendez
3	Yarman Alberto labo cardon	1.125.411.393	Ayudante de Obra	yarman labio c.
4	Alexander Guzmán erazo	16.185.694	Ayudante de obra	Alexander Guzmán
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Diana Lorena Ramos L.	

ANEXO 3. FORMATOS DE INDUCCION AL SG-SST.

INERCIA S.A.S

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO DE EVALUACION DE INDUCCION Y REINDUCCION	Codigo: FT-SST-010
	Versión: 001
	Fecha: Junio 2025

LUGAR	FRENTE DE TRABAJO	Hora	DD	MM	AA
Obras Instituciones	Obras	9:00 A.M	16	06	25

NOMBRE	Dairo Alberto Gomez Rosa	C.C	16.185.320
CARGO	Director de obra		

RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

1. Cual es la administradora de riesgos laborales a la que usted se encuntra afiliado. (Marque con una **X**)

POSITIVA — GRUPO SURA

2. Accidente de trabajo es: Suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo, y que produce en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte.

VERDADERO	X	FALSO	

3. La Seguridad y Salud en el Trabajo es la disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causas por las condiciones de trabajo.

VERDADERO	X	FALSO	

4. Marque con una X los factores de riesgo a los cuales esta expuesto en su trabajo

* Golpes, caidas, fracturas.	X
* Caidas al mismo nivel.	X
* Caidas de alturas.	
* Heridas por cortadas o punzones.	
* Lesiones de columna.	
* manipulación de cargas	
* Estrés Laboral.	
*Gripe.	X
* Accidentes de tránsito.	
* Quemaduras.	

5. Enumere por orden los pasos para reportar un accidente (1,2,3,4)

*Reportar al jefe inmediato.	1
* Prestar los primeros auxilios, si cuenta con los medios para hacerlo y el conocimiento sufici	2
* Reportar a la ARL	3
* Verificar si el accidente es de origen laboral, comunicarse de inmediato con el área de	4

6.En que lugar se encuntra publicada las politicas de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Tablero de Publicación

RANGO DE EVALUACION		RESPONSABLE DEL PROCESO EN CAMPO		
RANGO DE EVALUACION	INDUCCION			Firma:
100%	EXCELENTE	Nombre:	Diana Lorena Ramos L.	
70%	REGULAR			
40%	REPITE	Cargo:	Profesional SISO	

INERCIA S.A.S

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO DE EVALUACION DE INDUCCION Y REINDUCCION	Codigo: FT-SST-010 Versión: 001 Fecha: Junio 2025

LUGAR	FRENTE DE TRABAJO	Hora	DD	MM	AA
Instalaciones	Obra	9:00 am	16	06	24

NOMBRE	Alexander Guzmán Salas	C.C	16.195.694
CARGO	Ayudante de obra		

RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

1. Cual es la administradora de riesgos laborales a la que usted se encuntra afiliado. (Marque con una X)

POSITIVA | GRUPO SURA [X]

2. Accidente de trabajo es: Suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo, y que produce en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte.

VERDADERO	X	FALSO	

3. La Seguridad y Salud en el Trabajo es la disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causas por las condiciones de trabajo.

VERDADERO		FALSO	X

4. Marque con una X los factores de riesgo a los cuales esta expuesto en su trabajo

* Golpes, caidas, fracturas.	X
* Caídas al mismo nivel.	X
* Caídas de alturas.	X
* Heridas por cortadas o punzones.	
* Lesiones de columna.	
* manipulación de cargos	
* Estrés Laboral.	X
*Gripe.	X
* Accidentes de tránsito.	
* Quemaduras.	

5. Enumere por orden los pasos para reportar un accidente (1,2,3,4)

*Reportar al jefe inmediato	2
* Prestar los primeros auxilios, si cuenta con los medios para hacerlo y el conocimiento sufici	4
* Reportar a la ARL	1
* Verificar si el accidente es de origen laboral, comunicarse de inmediato con el área de	3

6.En que lugar se encuntra publicada las politicas de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Tablero de Publicaciones

RANGO DE EVALUACION		RESPONSABLE DEL PROCESO EN CAMPO		
RANGO DE EVALUACION	INDUCCION			Firma
100%	EXCELENTE	Nombre:	Dirma Lorena Ramos L.	
70%	REGULAR			
40%	MALO	Cargo:	Profesional SISO	

INERCIA S.A.S

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO DE EVALUACION DE INDUCCION Y REINDUCCION	Codigo: FRSST-016 Versión: 001 Fecha: Junio 2025

LUGAR	FRENTE DE TRABAJO	Hora	DD	MM	AA
Instituciones	Obra	9:00 pm	16	06	25

NOMBRE	Jose Miguel Melendez Villegas	C.C	1.102.824.884
CARGO	Residente obra		

RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

1. Cual es la administradora de riesgos laborales a la que usted se encuentra afiliado. (Marque con una **X**)

POSITIVA [X] GRUPO SURA [ ]

2. Accidente de trabajo es: Suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo, y que produce en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte.

VERDADERO	X	FALSO	

3. La Seguridad y Salud en el Trabajo es la disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causas por las condiciones de trabajo.

VERDADERO	X	FALSO	

4. Marque con una X los factores de riesgo a los cuales esta expuesto en su trabajo

* Golpes, caídas, fracturas.	X
* Caídas al mismo nivel.	X
* Caídas de alturas.	X
* Heridas por cortadas o punzones.	X
* Lesiones de columna.	
* manipulación de cargas	X
* Estrés Laboral.	X
*Gripe.	X
* Accidentes de tránsito.	
* Quemaduras.	

5. Enumere por orden los pasos para reportar un accidente (1,2,3,4)

*Reportar al jefe inmediato.	1
* Prestar los primeros auxilios, si cuenta con los medios para hacerlo y el conocimiento sufici	2
* Reportar a la ARL	3
* Verificar si el accidente es de origen laboral, comunicarse de inmediato con el área de	4

6.En que lugar se encuentra publicada las politicas de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Tablero de publicación

RANGO DE EVALUACION		RESPONSABLE DEL PROCESO EN CAMPO		
RANGO DE EVALUACION	INDUCCION			Firma:
100%	EXCELENTE	Nombre:	Diana Lorena Ramos Lozano	
70%	REGULAR			
40%	MEJOR	Cargo:	Profesional SISO	

INERCIA S.A.S

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO DE EVALUACION DE INDUCCION Y REINDUCCION	Codigo: FI-SST-010
	Version: 001
	Fecha: Junio 2025

LUGAR	FRENTE DE TRABAJO	Hora	DD	MM	AA
Instalaciones	Obra	9:00 am	16	06	25

NOMBRE	Jarmen Alberto Labio Cordon	C.C	1.117.411373
CARGO	ayudante de obra		

RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

1. Cual es la administradora de riesgos laborales a la que usted se encuntra afiliado. (Marque con una X)

POSITIVA — GRUPO SURA

2. Accidente de trabajo es: Suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo, y que produce en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte.

VERDADERO	X	FALSO	

3. La Seguridad y Salud en el Trabajo es la disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causas por las condiciones de trabajo.

VERDADERO	✓	FALSO	

4. Marque con una X los factores de riesgo a los cuales esta expuesto en su trabajo

* Golpes, caídas, fracturas.	X
* Caídas al mismo nivel.	X
* Caídas de alturas	X
* Heridas por cortadas o punzones.	X
* Lesiones de columna.	
* manipulación de cargas	X
* Estrés Laboral.	X
*Gripe	X
* Accidentes de tránsito.	
* Quemaduras.	

5. Enumere por orden los pasos para reportar un accidente (1,2,3,4)

*Reportar al jefe inmediato.	1
* Prestar los primeros auxilios, si cuenta con los medios para hacerlo y el conocimiento suficie	2
* Reportar a la ARL	3
* Verificar si el accidente es de origen laboral, comunicarse de inmediato con el área de	4

6.En que lugar se encuntra publicada las politicas de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Tablero de Publicación

RANGO DE EVALUACION		RESPONSABLE DEL PROCESO EN CAMPO		
RANGO DE EVALUACION	INDUCCION			Firma:
100%	EXCELENTE	Nombre:	Diana Lorena Ramos Lozano	
70%	REGULAR			
40%	REPETE	Cargo:	Profesional SISO	

INERCIA S.A.S

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO DE EVALUACION DE INDUCCION Y REINDUCCION	Codigo: FT-SST-010 Versión: 001 Fecha: junio 2025

LUGAR	FRENTE DE TRABAJO	Hora	DD	MM	AA
Instituciones	Obras	9:00 A.M	16	06	25

NOMBRE	Oscar Oyuela Hernandez	C.C	16.789.643
CARGO			

RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

1. Cual es la administradora de riesgos laborales a la que usted se encuntra afiliado. (Marque con una X)

POSITIVA | GRUPO SURA

2. Accidente de trabajo es: Suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo, y que produce en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte.

VERDADERO	X	FALSO	

3. La Seguridad y Salud en el Trabajo es la disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causas por las condiciones de trabajo.

VERDADERO	X	FALSO	

4. Marque con una X los factores de riesgo a los cuales esta expuesto en su trabajo

* Golpes, caidas, fracturas.	X
* Caídas al mismo nivel.	X
* Caídas de alturas.	X
* Heridas por cortadas o punzones.	X
* Lesiones de columna.	
* manipulación de cargas	X
* Estrés Laboral.	X
*Golpe.	X
* Accidentes de tránsito.	X
* Quemaduras.	

5. Enumere por orden los pasos para reportar un accidente (1,2,3,4)


*Reportar al jefe inmediato	1
* Prestar los primeros auxilios, si cuenta con los medios para hacerlo y el conocimiento sufici	2
* Reportar a la ARl	3
* Verificar si el accidente es de origen laboral, comunicarse de inmediato con el área de	4

6.En que lugar se encuntra publicada las politicas de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Tablero de Publicación

RANGO DE EVALUACION		RESPONSABLE DEL PROCESO EN CAMPO		
RANGO DE EVALUACION	INDUCCION			Firma:
100%	EXCELENTE	Nombre:	Diana Lorena Ramos Lozano	
75%	REGULAR	Cargo:	Profesional SISO	
43%	REPET			

ANEXO 4. FOLLETOS.



POLITICAS DEL SST

- Politica de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Politica de prevención del consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas.
- Politica de Elementos y Equipos de Protección Personal.
- Politica de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencia.
- Politica Ambiental.
- Politica de seguridad Vial.

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES LEY 1562 DEL 2012 (ART 1)



RESPONSABILIDAD DE LOS EMPLEADOS

- Procurar el cuidado integral de su salud.
- Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
- Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la institución.
- Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo como también el daño o desgaste de los EPP.
- Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de capacitación del SG-SST.
- Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.





OBLIGACIÓN DEL EMPLEADOR

- Definir, firmar y divulgar la política de Seguridad y Salud en el Trabajo a través de documento escrito.
- Cumplir con los requisitos legales.
- Gestionar los Peligros y Riesgos.

Implementar y desarrollar actividades de prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, así como de promoción de la salud en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), de conformidad con la



INDUCCION- REINDUCCION AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



¿QUE ES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?

La Seguridad y Salud en el Trabajo es la disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causas por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajador, que conlleva la prevención y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores Decreto 1443 de 2014.

INERCIA S.A.S
INGENIEROS CONSULTORES

CONTRATO DE OBRA N° 003-2025

" MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DE LAS VEREDAS EL AGUILA, BUENAVISTA, LA RICO Y LOS CENTROS POBLADOS DE PLAYA RICA Y KILOMETRO 18 DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO CAQUETA"

FECHA: 16 DE JUNIO DE 2025 AL 31 DE JULIO DE 2025

COMITE PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (COPASST)

Es un organismo de promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de salud ocupacional dentro de la empresa y no se ocupará por lo tanto de tramitar asuntos referentes a la relación contractual laboral propiamente dicha, los problemas de personal, disciplinarios o sindicales; ellos se ventilan en otros organismos y están sujetos a reglamentación distinta. **(Resolución 2013 de 1986, artículo 11).**

COMITE DE CONVIVENCIA LABORAL

El comité de convivencia es un conjunto de personas que laboran en una entidad pública o una empresa privada y que se encargan recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se describan situaciones que puedan constituir acoso laboral de acuerdo con lo definido en la Ley 1010 de 2006.

CLASIFICACIÓN DE CODIGO DE COLORES

Color blanco Color negro Color verde

INCIDENTE

es un suceso repentino no deseado que ocurre por las mismas causas que se presentan los accidentes, sólo que por cuestiones del azar no desencadena lesiones en las personas, daños a la propiedad, al proceso o al ambiente.

ACCIDENTE DE TRABAJO

Suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo, y que produce en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte.

ENFERMEDAD LABORAL

Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar.

Peligro – Riesgo

Cuando decimos que algo es peligroso nos estamos refiriendo a que ese algo podría tener la capacidad o la viabilidad de hacernos daño. Cuando hablamos de riesgo es la probabilidad de daño.

Condición Insegura

Situación que se presenta en el lugar de trabajo caracterizada por presencia de riesgos no controlados que pueden generar AT

Acto Inseguro

Acto que realiza un trabajador de manera insegura o inapropiada y que facilita la ocurrencia de un AT.

FACTORES DE RIESGO

Un factor de riesgo es cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o una lesión

***Físicos *Biológicos *Psicosocial**
***Naturales *Químicos *Eléctricos**
***Biomecánicos *Mecánicos *Seguridad**
***Ambiental *Locativos *Trausito**

Peligros y Riesgos







Nunca transite con las manos en los bolsillos

Evite el uso de su smartphone mientras camina

Siempre mantenga iluminación en las áreas de tránsito

Al subir o bajar de vehículos, utilice puntos de apoyo y evite llevar bolsos o mochilas en sus manos

Siempre tenga conciencia de su entorno



Mantenga las áreas de desplazamiento limpias, secas y libres de objetos

Evite correr en zonas de tránsito peatonal

Siempre utilice el pasamanos

Evite las superficies húmedas y resbaladizas

Reporte las áreas que presenten riesgos de caída

INCENDIO



- Si hay humo gatee buscando la Salida impidiendo inhalar el humo.
- Si sabe utilizar un extintor y es necesario Uselo en la forma adecuada, salga y cierre Las puertas sin seguro.

SI NO PUEDE SALIR



- Humedezca toallas o trapos para Tapar Rendijas e impedir entrada de humo.
- Cubra su boca y nariz con un trapo.
- Si entra humo abra ventanas O con cuidado rompa vidrios.
- Trate de informar su ubicación Por medio de teléfono, radio, señales Aviso escrito, ruidos o prendas de vestir.

SISMO



- Evite salir durante el movimiento Refugiese en un lugar seguro, lejos de almacenamientos, ventanas, lámparas, cuadros. Espere la orden para evacuar. Una vez en la zona de refugio Espere la Orden de reingreso.
- Si falla la electricidad no conecte Equipos hasta que mantenimiento lo indique.
- Impida el consumo de agua del acueducto.

EXPLOSION



- Evite salir corriendo, pueden caer Elementos desprendidos por la onda Explosiva, aléjese de ventanas, Cuadros, lámparas, estantes, almacenamientos, etc.
- Protéjase como en los sismos.
- Evite generar pánico.
- Si hay lesionados y esta Capacitado ayúdelos y solicite ayuda.

PAQUETES EXTRAÑOS



- Avise a su Jefe inmediato o a Seguridad. Evite generar pánico.
- Por ningún motivo toque ni Arroje nada sobre materiales Sospechosos, aléjese del sitio.
- Evite activar radios, celulares, Equipos eléctricos cerca del área, La señal puede activar el detonador.
- Si sospecha de una explosión Tiéndase boca abajo con las manos En la nuca manteniendo la boca Lo más abierta posible.

PERSONAS SOSPECHOSAS



- Identifique características De la persona: Color de cabello, contextura física, Tes de piel, Señales particulares.
- Informe a seguridad.
- no bromee.

LLAMADA DE AMENAZA



- Trate de prolongarla, pregunte: Quién, por qué y dónde capte (Voz, frases, acento, ruidos.)
- Informe a seguridad.
- No Bromee.

ALTERACIÓN DE ORDEN PUBLICO



- Suspenda actividades y siga las Instrucciones del Coordinador de Evacuación o Seguridad.
- Ante Personas extrañas, Alteradas armadas, evite actitudes Desafiantes, Siga sus indicaciones, No exponga su integridad o la de otros.

INSTRUCTIVO GENERAL PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACION



ES MEJOR ESTAR PREPARADOS PARA ALGO QUE NO SUCEDA A QUE SUCEDA ALGO PARA LO CUAL NO ESTAMOS PREPARADOS

ANTES DE LA EMERGENCIA

- Participe de las actividades, prácticas y simulacros programados por el jardín.
- Identifique a los Coordinadores de Evacuación y Brigadistas de emergencia e infórmeles oportunamente situaciones de riesgo o de peligro.
- Mantenga identificada y a mano información o elementos que tenga que llevar en la evacuación. (Asistencias - Directorios)
- Maneje correctamente equipos e instalaciones eléctricas, fuentes de calor, preserve el orden y aseo en las áreas.

DURANTE LA EMERGENCIA (DETECCIÓN Y ALARMA)

- Si usted se da cuenta de la presencia de un riesgo que pueda afectar su vida o la de los demás informe inmediatamente a un Brigadista o Coordinador de Evacuación.
- Si está entrenado y cuenta con el equipo requerido una vez de la alarma inicie el control de la emergencia, siempre y cuando su vida no este en peligro.

SALIDA

El proceso de Evacuación se iniciará cuando:

- Alerta sonido de campana (Campana)
- Evacue cuando se reciba una orden directa (Pito).

PROCEDIMIENTO GENERAL

- Conserve la calma.
- Interrumpa su labor, apague o desconecte equipos eléctricos.
- Tome documentos personales e información importante a su cargo, copias de seguridad.
- Si tiene un visitante u otra Persona que no sea del área llévelo con usted.
- Camine rápido, en silencio, sin correr tomando la salida y ruta, establecida en el plan de evacuación.
- Obedezca las instrucciones del coordinador de evacuación del área.
- En el proceso de Evacuación ayude a quien lo necesite.
- Si encuentra obstáculos en la ruta retírelos.
- Evite empujar y generar ruidos innecesarios.
- Por ningún motivo regrese ni intente mover vehículos.
- Si se encuentra en un área diferente, tome la ruta asignada del área hacia la zona de refugio y reúnase con el Personal de su área.
- Diríjase a la zona de refugio (principal o alterna) establecida en el Plan de

ZONA DE REFUGIO

Ayude a reunir al Personal de su área en el punto indicado por el Coordinador de Evacuación de área.

- Verificar que Personal está y cuál hace falta e informe al Coordinador de Evacuación del área.
- Si esta capacitado y/o entrenado ayude a Heridos y Lesionados.
- Guarde silencio y este atento a las indicaciones del Coordinador de evacuación de área o Brigadistas.
- Por ningún motivo se retire de la zona De refugio sin autorización.

REINGRESO

- Espere que el Coordinador de Evacuación de su área le indique el momento de ingresar nuevamente a su área por la ruta asignada.



"GENERALMENTE LAS PERSONAS QUE SOBREVIVEN A LOS DESASTRES NO SON LAS MAS FUERTES

5 TIPOS DE SEÑALES DE SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN

SEÑALES DE ADVERTENCIA



Su función es alertar sobre posibles peligros como gases nocivos, piso húmedos, o techos frágiles.

SEÑALES DE OBLIGACIÓN

Dan indicaciones que deben ser llevadas a cabo de forma obligatoria como el uso de casco o guantes en el sitio.



SEÑALES DE PROHIBICIÓN



Indican las acciones que deben ser evitadas, como "prohibido el paso" o "prohibido estacionarse."

SEÑALES DE SEGURIDAD

Indican acciones que deben ser realizadas en caso de emergencia. Algunos ejemplos incluyen salidas de emergencia y primeros auxilios.



SEÑALES DE EQUIPO CONTRA INCENDIOS



Indican el lugar en donde se encuentran las herramientas para extinguir fuegos, como la alarma contra incendios y extintores.

ANEXO 5. FORMATO DE INSPECCION DE SEGURIDAD.

INERCIA S.A.S

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SG-SST

FORMATO INSPECCION DE BOTIQUIN

Código: FT-SST-006
Versión: 001
Fecha Aprobación: junio 2025

Periodicidad de la Inspeccion: mensual	Fecha de inspección	26	6	2025

Area a Seccion: BODEGA — Estado B: Bueno R: Regular M: Mala

ANTISÉPTICOS					
Antiséptico	SI	NO	ESTADO	ELEMTOS ADICIONALES	OBSERVACIONES
Gel antibacterial dispensador	x		B		
Alcohol Antiseptico	x		B		
Iodine solución		x			
Jabon antibacterial	x		B		
MATERIAL DE CURACIÓN					
Gasa esteriles en paquete individual	x		B		
Esparadrapo de tela	x		B		
Micropore	x		B		
Aplicadores	x		B		
Bajalenguas	x		B		
Guantes desechables de latex	x		B		
Suero Fisiológico o Solución Salina Normal		x			
Algodón	x		B		
tapabocas	x		B		
OTROS ELEMENTOS					
Gasa oftalica algodón	x		B		
Parches oculares	x		B		
sales de rehidratación oral		x			
Cuello inmovilizador	x		B		
Vendas elásticas	x		B		
Termometro digital	x		B		
Tijeras	x		B		
Manual de primeros auxilios	x		B		
Preservativos	x		B		
Pita	x		B		
Jeringas	x		B		
Lista de telefonos de emergencia	x		B		

Página 1

CONDICIONES			
Acceso restringido o limitado al responsable			
CARACTERISTICA	SI	NO	OBSERVACIONES
Ubicación correcta	x		
En buen estado	x		
Aseada	x		
Mantenimiento periódico	x		
Organizada	x		

Observaciones / Recomendaciones Generales

Agregar los elementos faltantes.

Responsable de la Inspección

Firma:

Nombre: DIANA LORENA RAMOS LOZANO

Cargo: PROFESIONAL SST

INERCIA S.A.S	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-007
	SG-SST	
FORMATO INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL		Fecha: jun-25 Versión: 001 Pagina 1 de 1

FECHA: 24/06/2025

AREA INSPECCIONADA: Obra - instituciones

NOMBRE DE QUIEN REPORTA: Diana Lorena Ramos Lozano

No.	NOMBRE	CARGO	DEBE USAR								USA		ESTADO			NO USA POR			MEDIDAS DE CONTROL				
			A	B	C	D	E	F	G	H	SI	NO	B	R	M	NS	NP	NQ	1	2	3	4	5
1	Oscar Orjuela Enriquez	Residente de Obra	N/A	✓	✓	✓	N/A		N/A		X		✓						✓				
2	Jose miguel melendez	Residente de obra	N/A	✓	✓	✓	N/A		N/A		X		✓						✓				
3	Alexander Guzman S.	Ayudante de obra	N/A	✓	✓	✓	N/A		N/A		X		✓						✓				
4	Yarman Alberto laboc.	Ayudante de obra	N/A	✓	✓	✓	N/A		N/A		X		✓						✓				
5																							
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							

EPP FALTANTE POR PERSONA									
No	CARGO	A	B	C	D	E	F	G	H
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

DEBE USAR	ESTADO	NO USA POR	MEDIDAS DE CONTROL
A- CAMISA MANGA LARGA	B- BUENO	NS- NO SABE	1. INSTRUCCIÓN
B- CASCO CON BARBUQUEJO			
C- GUANTES			2. MOTIVACION
D- BOTAS			
E- PROTECCION RESPIRATORIA	R- REGULAR	NP- NO PUEDE	3. CAMBIO DE EPP
F- PROTECTORES AUDITIVOS			
G- GAFAS PROTECTORAS			4. MEDIDAS PENDIENTES
H- OTRO			
Cual? _____	M- MALO	NQ- NO QUIERE	5. OTRAS

OBSERVACIONES: Ninguna

FIRMA _____

RESPONSABLE DEL SG-SST

INERCIA S.A.S INGENIEROS CONSULTORES	CONTRATO DE OBRA N° 003-2025	
	" MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DE LAS VEREDAS EL AGUILA, BUENAVISTA, LA RICO Y LOS CENTROS POBLADOS DE PLAYA RICA Y KILOMETRO 18 DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO CAQUETA"	
FECHA: 16 DE JUNIO DE 2025 AL 31 DE JULIO DE 2025		PÁGINA 40 DE 50

INERCIA S.A.S	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°: FT-SST-007	
	SG-SST	
FORMATO INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Fecha: jun-25	
	Versión: 001	
	Pagina 1 de 1	

FECHA: 17/07/2025

AREA INSPECCIONADA: Obra - instituciones

NOMBRE DE QUIEN REPORTA: Diana Lorena Ramos Lozano

No.	NOMBRE	CARGO	DEBE USAR								USA		ESTADO			NO USA POR			MEDIDAS DE CONTROL				
			A	B	C	D	E	F	G	H	SI	NO	B	R	M	NS	NP	NQ	1	2	3	4	5
1	Yarman Alberto Lobo	Ayudante de obra	N/A	-	-	-	N/A		N/A		-		-						-				
2	Alexander Bimarian S.	Ayudante de obra	N/A	-	-	-	N/A		N/A		-		-						-				
3	Oscar Oviedo Manrique	Maestro de obra	N/A	-	-	-	N/A		N/A		-		-						-				
4	José Miguel Melendez	Residente de obra	N/A	-	-	-	N/A		N/A		-		-						-				
5																							
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							

EPP FALTANTE POR PERSONA										
No	CARGO	A	B	C	D	E	F	G	H
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

DEBE USAR	ESTADO	NO USA POR	MEDIDAS DE CONTROL
A- CAMISA MANGA LARGA	B- BUENO	NS- NO SABE	1. INSTRUCCIÓN
B- CASCO CON BARBUQUEJO			
C- GUANTES			2. MOTIVACION
D- BOTAS			
E- PROTECCIÓN RESPIRATORIA	R- REGULAR	NP- NO PUEDE	3. CAMBIO DE EPP
F- PROTECTORES AUDITIVOS			
G- GAFAS PROTECTORAS			4. MEDIDAS PENDIENTES
H- OTRO			
Cual? _____	M- MALO	NQ- NO QUIERE	5. OTRAS

OBSERVACIONES _____

FIRMA _____

RESPONSABLE DEL SG-SST

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
INERCIA S.A.S	FORMATO N°:	FT-SST-007
	SG-SST	
FORMATO INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Fecha:	jun-25
	Versión:	001
	Pagina 1 de 1	

FECHA: 10/07/2025
AREA INSPECCIONADA: Obra – instituciones
NOMBRE DE QUIEN REPORTA: Diana Lorena Ramos Lozano

No.	NOMBRE	CARGO	DEBE USAR								USA		ESTADO			NO USA POR			MEDIDAS DE CONTROL				
			A	B	C	D	E	F	G	H	SI	NO	B	R	M	NS	NP	NQ	1	2	3	4	5
1	José Miguel Melendez	Residente de obra	N/A	-	✓	✓	N/A		N/A		✓		✓						✓				
2	Oscar Orjuela Henrique	Maestro de Obra	N/A	-	✓	✓	N/A		N/A		✓		✓						✓				
3	Alexander Guzmán S.	Ayudante de Obra	N/A	✓	✓	✓	N/A		N/A		✓		✓						✓				
4	Yaman Alberto Fabio	Ayudante de obra	N/A	✓	✓	✓	N/A		N/A		✓		✓						✓				
5																							
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							

EPP FALTANTE POR PERSONA										
No	CARGO	A	B	C	D	E	F	G	H
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

DEBE USAR	ESTADO	NO USA POR	MEDIDAS DE CONTROL
A- CAMISA MANGA LARGA	B- BUENO	NS- NO SABE	1. INSTRUCCIÓN
B- CASCO CON BARBUQUEJO			
C- GUANTES			2. MOTIVACION
D- BOTAS			
E- PROTECCION RESPIRATORIA	R- REGULAR	NP- NO PUEDE	3. CAMBIO DE EPP
F- PROTECTORES AUDITIVOS			
G- GAFAS PROTECTORAS			4. MEDIDAS PENDIENTES
H- OTRO			
Cual? _____	M- MALO	NQ- NO QUIERE	5. OTRAS

OBSERVACIONES: Ninguno!

FIRMA _____
RESPONSABLE DEL SG-SST

INERCIA S.A.S

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SG-SST

FORMATO INSPECCION DE BOTIQUIN

Código: FT-SST-006
Versión: 001
Fecha Aprobación: junio 2025

Periodicidad de la Inspeccion: mensual	Fecha de inspección	23	7	2025

Area o Seccion: BODEGA — Estado B: Buena R: Regular M: Mala

ANTISÉPTICOS					
Antisépticos	SI	NO	ESTADO	ELEMTOS ADICIONALES	OBSERVACIONES
Gel antibacterial dispensador	x		B		
Alcohol Antiseptico	x		B		
yodinesolución	x		B		
Jaban antibacterial	x		B		
MATERIAL DE CURACIÓN					
Gasa esteriles en paquete individual	x		B		
Esparadrapo de tela	x		B		
Micropore	x		B		
Aplicadores	x		B		
Bajalenguas	x		B		
Guantes desechables de latex	x		B		
Suero Fisiológico o Solución Salina Normal	x		B		
Algodón	x		B		
Jeringas	x		B		
OTROS ELEMENTOS					
Gasa esteriles algodón	x		B		
Parches oculares	x		B		
Sales de rehidratación oral	x		B		
Cuello inmovilizador	x		B		
Vendas elásticas	x		B		
Termometro de digital	x		B		
Tijeras	x		B		
Manual de primeros auxilios	x		B		
Preservativos	x		B		
Pita	x		B		
Jeringas	x		B		
Lista de teléfonos de emergencia	x		B		

Página 1

CONDICIONES			
Acceso restringido o limitado al responsable			
CARACTERISTICA	SI	NO	OBSERVACIONES
Ubicación correcta	x		
En buen estado	x		
Dotado		x	Realizar limpieza del batiquin
Mantenimiento periódico	x		
Organizado	x		

Observaciones / Recomendaciones Generales

Realizar limpieza del batiquin

Responsable de la Inspección

Firma:

Nombre: DIANA LORENA RAMOS LOZANO

Cargo: PROFESIONAL SST

INERCIA S.A.S	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-011
	SG-SST	
FORMATO INPECCIÓN HERRAMIENTAS	Fecha:	Jun-25
	Versión	001
		Página 1 de 1

FECHA: 07/07/2025
OBRA: Obra Instituciones
AREA INSPECCIONADA: Bodega
NOMBRE DE QUIEN REPORTA: Diana Lorena Ramos Lozano

B = BUENO M = MALO N.A = NO APLICA

ITEM	DESCRIPCIÓN	N° DE HERRAMIENTAS EN EXISTENCIA	N° HERRAMIENTAS ACTIVAS	N° HERRAMIENTAS INACTIVAS	ESTADO		
A	HERRAMIENTAS MANUALES				B	M	NA
1	Se usa la adecuada al trabajo				X		
2	Se encuentran en buen estado				X		
3	Se guardan y portan adecuadamente				X		
4	Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos.				X		
B	HERRAMIENTAS DE CORTE				B	M	NA
1	Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo	1			X		
2	Los cinceles se encuentran afilados	1			X		
3	Las seguetas están correctamente instaladas y no presentan dobleces	1			X		
4	Las limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias	2			X		
5	Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes están completos	2			X		
6	Los machetes disponen de mangos y fundas	2			X		
C	HERRAMIENTAS DE GOLPE				B	M	NA
1	Se emplea el martillo adecuado según la labor	1			X		
2	Sus caras y bordes están en buen estado	1			X		
3	Su mango no está quebrado, astillado ni flojo	1			X		
D	HERRAMIENTAS DE TORSION - LLAVES				B	M	NA
1	Cuentan con llaves de pulgadas y milimétricas	2			X		
2	Se observan en la llave huellas y pelluscas	2			X		
3	Se dispone de llaves para golpear	2			X		
4	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deformadas	2			X		
5	La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado y son probadas frecuentemente	2			X		
6	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado	2			X		
7	Se dispone de herramientas que no produzcan chispas.	2			X		
E	HERRAMIENTAS ELECTRICAS	12			B	M	NA
1	Las herramientas según Las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)	2			X		
2	Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada	2			X		
3	Están limpia y lubricadas	2			X		
4	Tienen sus guardas	2			X		
5	Poseen aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas	2			X		
6	El cable y enchufe no presentan daños	2			X		
7	En los taladros se observa el mandril con golpes	2			X		
8	Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro pese taladros pequeños	3			X		
9	Las esmeriles cuentan con guardas y los soportes de los discos o piedras son los adecuados	3			X		
10	Se observa deterioro en las roscas o tornillo en las runchas abrasivas.	3			X		
11	Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde puedan ser golpeados	3			X		
F	HERRAMIENTA NEUMATICA				B	M	NA
1	Las mangueras y acoples se encuentran en buen estado	2			X		
2	Se emplean elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta	2			X		
3	Se trabaja a las presiones indicadas	2			X		
4	La herramienta es descargada al terminar.	2			X		

OBSERVACIONES

Diana Lorena Ramos Lozano
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

RESPONSABLE DEL SG-SST

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
INERCIA S.A.S	FORMATO N°:	FT-SST-011
	SG-SST	
FORMATO INPECCIÓN HERRAMIENTAS	Fecha:	jun-25
	Versión	001
		Página 1 de 1

FECHA: 29/07/25
OBRA: Obra instituciones
AREA INSPECCIONADA: Codego
NOMBRE DE QUIEN REPORTA: Diana Lorena Ramos Lozano

B = BUENO M = MALO N.A = NO APLICA

ITEM	DESCRIPCIÓN	N° DE HERRAMIENTAS EN EXISTENCIA	N° HERRAMIENTAS ACTIVAS	N° HERRAMIENTAS INACTIVAS	ESTADO		
A	HERRAMIENTAS MANUALES				B	M	NA
1	Se usó la adecuada al trabajo				X		
2	Se encuentran en buen estado				X		
3	Se guardan y portan adecuadamente				X		
4	Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos.				X		
B	HERRAMIENTAS DE CORTE				B	M	NA
1	Las cinceles no presentan su cabeza tipo hongo	1			X		
2	Los cinceles se encuentran afilados	1			X		
3	Las seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos	1			X		
4	Las limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias	3			X		
5	Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes están completos	2			X		
6	Los machetes disponen de mangos y fundas				X		
C	HERRAMIENTAS DE GOLPE				B	M	NA
1	Se emplea el martillo adecuado según la labor	2			X		
2	Sus caras y bordes están en buen estado	2			X		
3	Su mango no está quebrado, astillado ni flojo	2			X		
D	HERRAMIENTAS DE TORSION - LLAVES				B	M	NA
1	Cuentan con llaves de pulgadas y milimétricas	9			X		
2	Se observan en la llave huellas y palmicie	2			X		
3	Se dispone de llaves para golpear	1			X		
4	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas	0			X		
5	La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado y son probadas frecuentemente	2			X		
6	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado	2			X		
7	Se dispone de herramientas que no produzcan chispas	2			X		
E	HERRAMIENTAS ELECTRICAS				B	M	NA
1	Las herramientas según Las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)	2	3		X		
2	Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada	3			X		
3	Están limpia y lubricadas	3			X		
4	Tienen sus guardas	3			X		
5	Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres polos	Ninguna			X		
6	El cable y enchufe no presentan daños				X		
7	En los taladros se observa el mandril con golpes				X		
8	Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños				X		
9	Los esmeriles cuentan con guardas y los soportes de los discos o piedras son los adecuados				X		
10	Se observa dobrico en los roscas o tornillo en las ruedas abrasivas				X		
11	Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde puedan ser golpeados				X		
F	HERRAMIENTA NEUMATICA				B	M	NA
1	Las mangueras y acoples se encuentran en buen estado	1			X		
2	Se emplean elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta	1			X		
3	Se trabaja a las presiones indicadas	1			X		
4	La herramienta es descargada al terminar	1			X		

OBSERVACIONES

Diana Lorena Ramos C
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

RESPONSABLE DEL SG-SST

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
INERCIA S.A.S	FORMATO N°:	FT-SST-011
	SG-SST	
FORMATO INPECCIÓN HERRAMIENTAS	Fecha:	jun-25
	Versión	001
	Página 1 de 1	

FECHA: 20/06/2025
OBRA: Obra Instituciones
AREA INSPECCIONADA: Aulas
NOMBRE DE QUIEN REPORTA: Diana Lorena Ramos Lozano

B = BUENO M = MALO N.A = NO APLICA

ITEM	DESCRIPCIÓN	N° DE HERRAMIENTAS EN EXISTENCIA	N° HERRAMIENTAS ACTIVAS	N° HERRAMIENTAS INACTIVAS	ESTADO		
A	HERRAMIENTAS MANUALES				B	M	NA
1	Se usa la adecuada al trabajo				X		
2	Se encuentran en buen estado				X		
3	Se guardan y portan adecuadamente				X		
4	Los mangos de madera no presentan astillas, rajduras y están firmemente adheridos.				X		
B	HERRAMIENTAS DE CORTE				B	M	NA
1	Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo	1			X		
2	Los cinceles se encuentran afilados	1			X		
3	Las seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos	2			X		
4	Las limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias	2			X		
5	Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes están completos	1			X		
6	Los machetes disponen de mangos y fundas	1			X		
C	HERRAMIENTAS DE GOLPE				B	M	NA
1	Se emplea el martillo adecuado según la labor	2			X		
2	Sus caras y bordes están en buen estado	2			X		
3	Su mango no está quebrado, astillado ni flojo	2			X		
D	HERRAMIENTAS DE TORSIÓN - LLAVES				B	M	NA
1	Cuentan con llaves de pulgadas y milimétricas	11			X		
2	Se observan con la llave hueltas y polancas	2			X		
3	Se dispone de llaves para golpear	2			X		
4	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deformadas	0			X		
5	La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado y son probados frecuentemente	2			X		
6	La punta y cabo de las destornilladores se encuentran en buen estado	2			X		
7	Se dispone de herramientas que no produzcan chispas.	2			X		
E	HERRAMIENTAS ELECTRICAS				B	M	NA
1	Las herramientas según Las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)	3			X		
2	Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada	3			X		
3	Están limpia y lubricadas	3			X		
4	Tienen sus guardas	3			X		
5	Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas	3			X		
6	El cable y enchufe no presentan daños	3			X		
7	En los taladros se observa el mandil con golpez	3			X		
8	Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños	3	3		X		
9	Los esmeriles cuentan con guardas y los soportes de los discos o piedras son los adecuados	3	3		X		
10	Se observa deterioro en los rodetes o tornillo en las puestas abrasivas.	3			X		
11	Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde puedan ser golpeados	3			X		
F	HERRAMIENTA NEUMATICA				B	M	NA
1	Las mangueras y acoples se encuentran en buen estado	1			X		
2	Se emplean elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta	1			X		
3	Se trabaja a las presiones indicadas	1			X		
4	La herramienta es descargada al terminar	1			X		

OBSERVACIONES: Mantener aseo en las herramientas

Diana Lorena Ramos L.
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

RESPONSABLE DEL SG-SST

ANEXO 6. FORMATO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
INERCIA S.A.S	FORMATO N°:	FT-SST-003
	SG-SST	
FORMATO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN DE TRABAJO	Fecha: JUNIO/2025	
	Versión: 001	
	Pagina 1 de 1	

dd	mm	aaaa
16	06	25

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE: Oscar Orjuela Manrique C.C. 16.764.643

CARGO: Maestro de obra UBICACIÓN DE LA OBRA: Valparaiso

DOTACIÓN PERSONAL

	CANTIDAD	TALLA
BOTAS	1	40
PANTALON		
CAMISA MANGA LARGA		
ESCAFANDRA		

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Protector Auditivo Tipo Tapón		Protector Auditivo Tipo Orejera	
Guantes en Carnaza	1	Gafas de Seguridad	1
Guantes Hilo y PVC		Guantes para Soldador	
Guantes Dieléctricos		Careta para Soldar	
Careta para Esmerilar		Respirador Contra Gases y Vapores	
Tapabocas Prehormado		Tapabocas Industrial/desechable	
Casco	1	Barbuquejo	

FIRMAS

Diana Lorena Ramos L. — ENTREGA

Oscar Orjuela Manrique — RECIBE

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°: FT-SST-003	
	SG-SST	
FORMATO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN DE TRABAJO		Fecha: JUNIO/2025 Versión: 001 Pagina 1 de 1

dd	mm	aaaa
16	06	2025

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE: Jose Miguel Melendez C.C. 1.702.824 834

CARGO: Residente de obra UBICACIÓN DE LA OBRA: Valparaiso

DOTACIÓN PERSONAL

	CANTIDAD	TALLA
BOTAS	1	42
PANTALON		
CAMISA MANGA LARGA		
ESCAFANDRA		

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Protector Auditivo Tipo Tapón		Protector Auditivo Tipo Orejera	
Guantes en Carnaza	1	Gafas de Seguridad	1
Guantes Hilo y PVC		Guantes para Soldador	
Guantes Dieléctricos		Careta para Soldar	
Careta para Esmerilar		Respirador Contra Gases y Vapores	
Tapabocas Prehormado		Tapabocas industrial/desechable	
Casco	1	Barbuquejo	

FIRMAS

Diana Lorena Ramos L. — ENTREGA

Jose Miguel Melendez — RECIBE

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
INERCIA S.A.S	FORMATO N°: FT-SST-003	
	SG-SST	
FORMATO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN DE TRABAJO	Fecha: JUNIO/2025	
	Versión: 001	
	Pagina 1 de 1	

dd	mm	aaaa
16	06	2025

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE: Yorman Alberto Labio Cordon C.C. 1.125.411.373

CARGO: Ayudante de obra UBICACIÓN DE LA OBRA: Valparaiso

DOTACIÓN PERSONAL

	CANTIDAD	TALLA
BOTAS	1	42
PANTALON		
CAMISA MANGA LARGA		
ESCAFANDRA		

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Protector Auditivo Tipo Tapón		Protector Auditivo Tipo Orejera	
Guantes en Carnaza	1	Gafas de Seguridad	1
Guantes Hilo y PVC		Guantes para Soldador	
Guantes Dieléctricos		Careta para Soldar	
Careta para Esmerilar		Respirador Contra Gases y Vapores	
Tapabocas Prehormado		Tapabocas industrial/desechable	
Casco	1	Barbuquejo	

FIRMAS

Diana Lorena Ramos C. — ENTREGA

Yorman Alberto labio cordon — RECIBE

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
INERCIA S.A.S	FORMATO N°: FT-SST-003	
	SG-SST	
FORMATO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN DE TRABAJO	Fecha: JUNIO/2025	
	Versión: 001	
	Pagina 1 de 1	

dd	mm	aaaa
16	06	25

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE: Alexander Guzmán Galas C.C. 16.785.694

CARGO: Ayudante de obra UBICACIÓN DE LA OBRA: Valparaiso

DOTACIÓN PERSONAL

	CANTIDAD	TALLA
BOTAS	1	41
PANTALON		
CAMISA MANGA LARGA		
ESCAFANDRA		

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Protector Auditivo Tipo Tapón		Protector Auditivo Tipo Orejera	
Guantes en Carnaza	1	Gafas de Seguridad	1
Guantes Hilo y PVC		Guantes para Soldador	
Guantes Dieléctricos		Careta para Soldar	
Careta para Esmerilar		Respirador Contra Gases y Vapores	
Tapabocas Prehormado		Tapabocas Industrial/desechable	
Casco	1	Barbuquejo	

FIRMAS

Dora Lorena Parros L. — ENTREGA

Alexander Guzmán Galas — RECIBE

ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA

Carrera 15 No 06-25 B/ JUAN XXIII
EMAIL: inerciaingenierosas@gmail.com
Florencia-Caquetá

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE VALPARAÍSO
NIT. 800.050.407-1

MUNICIPIO DE VALPARAÍSO			
CONTRATO DE OBRA No.:	00 3DE 2025	FECHA DE INICIO:	16 de junio de 2025
CONTRATISTA:	INERCIA S.A.S	PAZO DE EJECUCION:	Tres (03) Meses
REPRESENTANTE LEGAL:	DIANA MARCELA QUIROGA DÍAZ	FECHA REINICIO No. 1:	N/A
NIT Y/O C.C:	26.427.423 DE NEIVA HUILA	FECHA SUSPENSIÓN No. 2:	
SUPERVISOR:	YESSIKA ADRIANA JIMÉNEZ FORERO	FECHA REINICIO No. 2:	
NIT Y/O C.C:	1.117.522.940 DE FLORENCIA CAQUETA	FECHA SUSPENSIÓN No. 3:	
CARGO:	SEC. PLANEACION E INFRAESTRCUTURA	FECHA REINICIO No. 3:	
APAYO A LA SUPERVISION:	KEVIN RUEDA SANTOS	FECHA SUSPENSIÓN No. 4:	
		FECHA REINICIO No. 4:	
VALORINICIAL:	$181.172.282,00	FECHA SUSPENSIÓN No. 5:	
VALOR ADICIONAL No .01:	$0,00	FECHA REINICIO No. 5:	
VALOR TOTAL	$181.172.282,00	FECHA DE VENCIMIENTO:	15 de septiembre de 2025

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 01

CORRESPONDIENTE AL PERIODO: DEL 16/06/25 AL 31/07/25

FECHA ACTA: 11/08/2025

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DE LAS VEREDAS EL AGUILA, BUENAVISTA, LA RICO Y LOS CENTROS POBLADOS DE PLAYA RICA Y KILOMETRO 18 DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO CAQUETA."

En la secretaria de Planeacion, Desarrollo e Infraestructura del municipio de Valparaiso - Caquetà, a los once (11) dias del mes de agosto del año 2025, se reunio la señora **DIANA MARCELA QUIROGA DÍAZ** en calidad de representante legal de **INERCIA S.A.S** como contratista de obra, la ingeniera **YESSIKA ADRIANA JIMENEZ FORERO** en calidad de **SECRETARIA DE PLANEACION, DESAROLLO E INFRAESTRUCTURA Y/O SUPERVISOR DEL CONTRATO** por parte del municipio de Valparaiso Caqueta, y el Ingeniero **KEVIN RUEDA SANTOS** Contratista de la Secretaria de Planeacion, Desarrollo e Infraestructura; para dejar constancia por medio de la presente Acta de Recibo Parcial de Obra Nº01 de las siguientes actividades, segun las condiciones que se detallan a continuacion:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES				MODIFICACION No. 01		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
A	**OBRA CIVIL**										
1	**IE. RURAL LA MUÑOZ SEDE ESPERANZA TROCHA 5**										
1.1	DEMOLICION PISO Y/O ANDEN E=0.08	M2	96,00	$ 9.908,15	$ 951.182,00	82,32	$ 815.639,00	**82,32**	$ 815.639,00	82,32	$ 815.639,00
1.2	PISO Y/O ANDEN EN CONCRETO 8 CM 3000 PSI	M2	96,00	$ 62.981,47	$ 6.046.221,00	82,32	$ 5.184.635,00	**82,32**	$ 5.184.635,00	82,32	$ 5.184.635,00
1.3	DESMONTE DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA MET., GALV., ZINC, FIBROCEMENTO, ETERNIT O SIMILAR, PAGADO EN M2	M2	120,00	$ 16.039,21	$ 1.924.705,00	130,00	$ 2.085.097,00	**130,00**	$ 2.085.097,00	130,00	$ 2.085.097,00
1.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA	M	96,00	$ 50.030,37	$ 4.802.916,00	0,00	$ -	**0,00**	$ -	0,00	$ -
1.5	SUM. E INST. CUBIERTA TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2.5MM BLANCO O SIMILAR (NO INCL. ENTRAMADO NI CABALLETE, INCL. TORNILLO)	M2	120,00	$ 92.372,05	$ 11.084.646,00	0,00	$ -	**0,00**	$ -	0,00	$ -
1.6	CABALLETE UPVC	M	10,00	$ 71.052,20	$ 710.522,00	0,00	$ -	**0,00**	$ -	0,00	$ -
1.7	ESTUCO PLASTICO MURO [PASTA]	M2	64,00	$ 16.016,95	$ 1.025.085,00	0,00	$ -	**0,00**	$ -	0,00	$ -
1.8	PINTURA VINILO TOPO 1	M2	192,00	$ 13.706,52	$ 2.631.652,00	81,80	$ 1.121.193,00	**77,80**	$ 1.066.367,00	77,80	$ 1.066.367,00
	SUBTOTAL CAP. 1 IE. RURAL LA MUÑOZ SEDE ESPERANZA TROCHA 5				**$ 29.176.929,00**		**$ 9.206.564,00**		**$ 9.151.738,00**		**$ 9.151.738,00**
2	**IE. RURAL LA RICO KM30 SEDE BUENAVISTA**									0,00	
2.1	PISO Y/O ANDEN EN CONCRETO 8 CM 3000 PSI	M2	32,00	$ 62.981,47	$ 2.015.407,00	60,00	$ 3.778.888,00	**0,00**	$ -	0,00	$ -
2.2	COLUMNA CONCRETO 3000 PSI	M3	1,54	$ 1.096.793,69	$ 1.689.062,00	0,75	$ 822.595,00	**0,00**	$ -	0,00	$ -
2.3	VIGA CIMIENTACION CONCRETO 3000 PSI	M3	1,45	$ 990.196,17	$ 1.435.784,00	2,85	$ 2.822.059,00	**0,00**	$ -	0,00	$ -
2.4	VIGA CONCRETO AEREA 3000 PSI	M3	1,45	$ 1.266.558,45	$ 1.836.510,00	0,72	$ 911.922,00	**0,00**	$ -	0,00	$ -
2.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA	M	42,00	$ 50.030,37	$ 2.101.276,00	0,00	$ -	**0,00**	$ -	0,00	$ -
2.6	SUM. E INST. CUBIERTA TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2.5MM BLANCO O SIMILAR (NO INCL. ENTRAMADO NI CABALLETE, INCL. TORNILLO)	M2	60,00	$ 92.372,05	$ 5.542.323,00	0,00	$ -	**0,00**	$ -	0,00	$ -
2.7	CABALLETE UPVC	M	5,00	$ 70.635,28	$ 353.176,00	0,00	$ -	**0,00**	$ -	0,00	$ -
2.8	MAMPOSTERÍA EN BLOQUE N°4	M2	60,00	$ 64.684,00	$ 3.881.040,00	72,00	$ 4.657.248,00	**0,00**	$ -	0,00	$ -
2.9	ESTUCO PLASTICO MURO [PASTA]	M2	120,00	$ 15.600,03	$ 1.872.004,00	144,00	$ 2.246.404,00	**0,00**	$ -	0,00	$ -
2.10	PINTURA VINILO TOPO 1	M2	120,00	$ 13.382,25	$ 1.605.870,00	144,00	$ 1.927.044,00	**0,00**	$ -	0,00	$ -
2.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO ELECTRICO ELECTRO BOMBA	UND	1,00	$ 1.051.690,52	$ 1.051.691,00	0,00	$ -	**0,00**	$ -	0,00	$ -
	SUBTOTAL CAP. 2 IE. RURAL LA RICO KM30 SEDE BUENAVISTA				**$ 23.384.143,00**		**$ 17.166.160,00**		**$ -**		**$ -**

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE VALPARAÍSO
NIT. 800.050.407-1

MUNICIPIO DE VALPARAÍSO				ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 01
CONTRATO DE OBRA No.:	00 3DE 2025	FECHA DE INICIO:	16 de junio de 2025	
CONTRATISTA:	INERCIA S.A.S	PAZO DE EJECUCION:	Tres (03) Meses	
REPRESENTANTE LEGAL:	DIANA MARCELA QUIROGA DÍAZ	FECHA REINICIO No. 1:	N/A	
NIT Y/O C.C:	26.427.423 DE NEIVA HUILA	FECHA SUSPENSIÓN No. 2:		
SUPERVISOR:	YESSIKA ADRIANA JIMÉNEZ FORERO	FECHA REINICIO No. 2:		
NIT Y/O C.C:	1.117.522.940 DE FLORENCIA CAQUETA	FECHA SUSPENSIÓN No. 3:		
CARGO:	SEC. PLANEACION E INFRAESTRCUTURA	FECHA REINICIO No. 3:		
APAYO A LA SUPERVISION:	KEVIN RUEDA SANTOS	FECHA SUSPENSIÓN No. 4:		CORRESPONDIENTE AL PERIODO: DEL 16/06/25 AL 31/07/25
		FECHA REINICIO No. 4:		
VALORINICIAL:	$181.172.282,00	FECHA SUSPENSIÓN No. 5:		
VALOR ADICIONAL No .01:	$0,00	FECHA REINICIO No. 5:		FECHA ACTA: 11/08/2025
VALOR TOTAL	$181.172.282,00	FECHA DE VENCIMIENTO:	15 de septiembre de 2025	

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DE LAS VEREDAS EL AGUILA, BUENAVISTA, LA RICO Y LOS CENTROS POBLADOS DE PLAYA RICA Y KILOMETRO 18 DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO CAQUETA."

En la secretaria de Planeacion, Desarrollo e Infraestructura del municipio de Valparaiso - Caquetá, a los once (11) dias del mes de agosto del año 2025, se reunio la señora **DIANA MARCELA QUIROGA DÍAZ** en calidad de representante legal de **INERCIA S.A.S** como contratista de obra, la ingeniera **YESSIKA ADRIANA JIMENEZ FORERO** en calidad de **SECRETARIA DE PLANEACION, DESAROLLO E INFRAESTRUCTURA Y/O SUPERVISOR DEL CONTRATO** por parte del municpio de Valparaiso Caqueta, y el Ingeniero **KEVIN RUEDA SANTOS** Contratista de la Secretaria de Planeacion, Desarrollo e Infraestructura; para dejar constancia por medio de la presente Acta de Recibo Parcial de Obra N°01 de las siguientes actividades, segun las condiciones que se detallan a continuacion:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES				MODIFICACION No. 01		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
3	**IE. RURAL LA RICO KM30 SEDE LA RICO**										
3,1	DESMONTE DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA MET., GALV., ZINC, FIBROCEMENTO, ETERNIT O SIMILAR, PAGADO EN M2	M2	94,50	$ 16.039,21	$ 1.515.705,00	106,09	$ 1.701.600,00	**106,09**	$ 1.701.600,00	106,09	$ 1.701.600,00
3,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA	M	76,00	$ 50.030,37	$ 3.802.308,00		$ -	**0,00**	$ -	0,00	$ -
3,3	SUM. E INST. CUBIERTA TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2.5MM BLANCO O SIMILAR (NO INCL. ENTRAMADO NI CABALLETE, INCL. TORNILLO)	M2	94,50	$ 92.372,05	$ 8.729.159,00	0,00	$ -	**0,00**	$ -	0,00	$ -
3,4	CABALLETE UPVC	M	9,00	$ 70.635,28	$ 635.718,00	0,00	$ -	**0,00**	$ -	0,00	$ -
	SUBTOTAL CAP. 3 IE. RURAL LA RICO KM30 SEDE LA RICO				**$ 14.682.890,00**		**$ 1.701.600,00**		**$ 1.701.600,00**		**$ 1.701.600,00**
4	**IE. RURAL NIEVES ARRIBA**										
4,1	COLUMNA CONCRETO 3000 PSI	M3	2,30	$ 1.084.093,14	$ 2.493.414,00	0,00	$ -	**0,00**	$ -	0,00	$ -
4,2	VIGA CIMIENTO CONCRETO 3000 PSI	M3	3,60	$ 982.197,51	$ 3.535.911,00	0,00	$ -	**0,00**	$ -	0,00	$ -
4,3	VIGA CONCRETO AEREA 3000 PSI	M3	3,60	$ 1.266.558,45	$ 4.559.610,00	0,00	$ -	**0,00**	$ -	0,00	$ -
4,4	DESMONTE DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA MET., GALV., ZINC, FIBROCEMENTO, ETERNIT O SIMILAR, PAGADO EN M2	M2	182,00	$ 16.039,21	$ 2.919.136,00	185,00	$ 2.967.254,00	**185,00**	$ 2.967.254,00	185,00	$ 2.967.254,00
4,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA	M	168,00	$ 50.030,37	$ 8.405.102,00	0,00	$ -	**0,00**	$ -	0,00	$ -
4,6	SUM. E INST. CUBIERTA TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2.5MM BLANCO O SIMILAR (NO INCL. ENTRAMADO NI CABALLETE, INCL. TORNILLO)	M2	182,00	$ 92.372,05	$ 16.811.713,00	0,00	$ -	**0,00**	$ -	0,00	$ -
4,7	CABALLETE UPVC	M	24,00	$ 70.635,28	$ 1.695.247,00	0,00	$ -	**0,00**	$ -	0,00	$ -
4,8	ESTUCO PLASTICO MURO [PASTA]	M2	192,00	$ 15.600,03	$ 2.995.206,00	0,00	$ -	**0,00**	$ -	0,00	$ -
4,9	PINTURA VINILO TOPO 1	M2	192,00	$ 13.382,25	$ 2.569.392,00	244,78	$ 3.275.707,00	**244,78**	$ 3.275.707,00	244,78	$ 3.275.707,00
	SUBTOTAL CAP. 4 IE. RURAL NIEVES ARRIBA				**$ 45.984.731,00**		**$ 6.242.961,00**		**$ 6.242.961,00**		**$ 6.242.961,00**
5	**IE. RURAL PLAYA RICA**										
5,1	COLUMNA CONCRETO 3000 PSI	M3	0,75	$ 1.084.093,14	$ 813.070,00	0,29	$ 314.387,00	**0,29**	$ 314.387,00	0,29	$ 314.387,00
5,2	VIGA CIMIENTO CONCRETO 3000 PSI	M3	1,8	$ 982.197,51	$ 1.767.956,00	0,60	$ 589.319,00	**0,60**	$ 589.319,00	0,60	$ 589.319,00
5,3	DESMONTE DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA MET., GALV., ZINC, FIBROCEMENTO, ETERNIT O SIMILAR, PAGADO EN M2	M2	60,00	$ 16.039,21	$ 962.353,00	56,00	$ 898.196,00	**56,00**	$ 898.196,00	56,00	$ 898.196,00
5,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA	M	60,00	$ 50.030,37	$ 3.001.822,00	0,00	$ -	**0,00**	$ -	0,00	$ -
5,5	SUM. E INST. CUBIERTA TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2.5MM BLANCO O SIMILAR (NO INCL. ENTRAMADO NI CABALLETE, INCL. TORNILLO)	M2	60,00	$ 92.372,05	$ 5.542.323,00	0,00	$ -	**0,00**	$ -	0,00	$ -
5,6	MAMPOSTERÍA EN BLOQUE N°4	M2	70,00	$ 64.684,00	$ 4.527.880,00	2,64	$ 170.766,00	**2,64**	$ 170.766,00	2,64	$ 170.766,00
5,7	CABALLETE UPVC	M	6,00	$ 70.635,28	$ 423.812,00	0,00	$ -	**0,00**	$ -	0,00	$ -
	SUBTOTAL CAP. 5 IE. RURAL PLAYA RICA				**$ 17.039.216,00**		**$ 1.972.668,00**		**$ 1.972.668,00**		**$ 1.972.668,00**
6	**TRANSPORTE DE MATERIAL**										
6,1	TRANSPORTE MATERIALES PETREOS DESDE O HACIA LA OBRA ZONA RURAL	M3-KM	2616,91	$ 2.000,00	$ 5.233.820,00	291,84	$ 583.680,00	**0,00**	$ -	0,00	$ -
6,2	TRANSPORTE DE MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO DESDE CASCO URBANO HASTA LA OBRA ZONA RURAL	VIAJE	7,00	$ 250.000,00	$ 1.750.000,00	5,00	$ 1.250.000,00	**0,00**	$ -	0,00	$ -
	SUBTOTAL CAP. 6 IE. TRANSPORTE DE MATERIAL				**$ 6.983.820,00**		**$ 1.833.680,00**		**$ -**		**$ -**

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE VALPARAÍSO
NIT. 800.050.407-1

MUNICIPIO DE VALPARAÍSO				**ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 01**
CONTRATO DE OBRA No.:	00 3DE 2025	**FECHA DE INICIO:**	16 de junio de 2025	
CONTRATISTA:	INERCIA S.A.S	**PAZO DE EJECUCION:**	Tres (03) Meses	
REPRESENTANTE LEGAL:	DIANA MARCELA QUIROGA DÍAZ	**FECHA REINICIO No. 1:**	N/A	
NIT Y/O C.C:	26.427.423 DE NEIVA HUILA	**FECHA SUSPENSIÓN No. 2:**		
SUPERVISOR:	YESSIKA ADRIANA JIMÉNEZ FORERO	**FECHA REINICIO No. 2:**		
NIT Y/O C.C:	1.117.522.940 DE FLORENCIA CAQUETA	**FECHA SUSPENSIÓN No. 3:**		
CARGO:	SEC. PLANEACION E INFRAESTRCUTURA	**FECHA REINICIO No. 3:**		
APAYO A LA SUPERVISION:	KEVIN RUEDA SANTOS	**FECHA SUSPENSIÓN No. 4:**		**CORRESPONDIENTE AL PERIODO: DEL 16/06/25 AL 31/07/25**
		FECHA REINICIO No. 4:		
OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DE LAS VEREDAS EL AGUILA, BUENAVISTA, LA RICO Y LOS CENTROS POBLADOS DE PLAYA RICA Y KILOMETRO 18 DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO CAQUETA."	**VALORINICIAL:**	$181.172.282,00	**FECHA SUSPENSIÓN No. 5:**		
	VALOR ADICIONAL No .01:	$0,00	**FECHA REINICIO No. 5:**		**FECHA ACTA: 11/08/2025**
	VALOR TOTAL	$181.172.282,00	**FECHA DE VENCIMIENTO:**	15 de septiembre de 2025	

En la secretaria de Planeacion, Desarrollo e Infraestructura del municipio de Valparaiso - Caquetà, a los once (11) dias del mes de agosto del año 2025, se reunio la señora **DIANA MARCELA QUIROGA DÍAZ** en calidad de representante legal de **INERCIA S.A.S** como contratista de obra, la ingeniera **YESSIKA ADRIANA JIMENEZ FORERO** en calidad de **SECRETARIA DE PLANEACION, DESAROLLO E INFRAESTRUCTURA Y/O SUPERVISOR DEL CONTRATO** por parte del municpio de Valparaiso Caqueta, y el Ingeniero **KEVIN RUEDA SANTOS** Contratista de la Secretaria de Planeacion, Desarrollo e Infraestructura; para dejar constancia por medio de la presente Acta de Recibo Parcial de Obra N°01 de las siguientes actividades, segun las condiciones que se detallan a continuacion:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES				MODIFICACION No. 01		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
IP 1	**IE. RURAL PLAYA RICA**										
IP 1.1	VIGA CONCRETO AEREA 3000 PSI	M3	0,00	$ 1.266.558,45	$ -	0,22	$ 278.643,00	**0,22**	$ 278.643,00	0,22	$ 278.643,00
IP 1.2	PISO Y/O ANDEN EN CONCRETO 8 CM 3000 PSI	M2	0,00	$ 62.981,47	$ -	2,00	$ 125.963,00	**2,00**	$ 125.963,00	2,00	$ 125.963,00
IP 1.3	DEMOLICION PISO Y/O ANDEN E=0.08	M2	0,00	$ 9.908,15	$ -	2,00	$ 19.816,00	**2,00**	$ 19.816,00	2,00	$ 19.816,00
IP 1.4	PINTURA VINILO TOPO 1	M2	0,00	$ 13.382,25	$ -	175,02	$ 2.342.161,00	**175,02**	$ 2.342.161,00	175,02	$ 2.342.161,00
	SUBTOTAL ITEM PREVISTOS IE. RURAL PLAYA RICA				**$ -**		**$ 2.766.583,00**		**$ 2.766.583,00**		**$ 2.766.583,00**
NP	**NO PREVISTOS**										
NP 1	**IE. RURAL LA MUÑOZ SEDE ESPERANZA TROCHA 5**										
NP 1.1	MANTENIMIENTO DE MUROS (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES, LIMPIEZA, RESANE Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE)	M2	-	$ 14.542,00	$ -	15,00	$ 218.130,00	**0,00**	$ -	0,00	$ -
NP 1.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO RECTANGULAR 100 X 40 X 2.0MM	KG	-	$ 13.504,00	$ -	802,47	$ 10.836.555,00	**802,47**	$ 10.836.555,00	802,47	$ 10.836.555,00
NP 1.3	SUM. E INST. CUBIERTA MET. GALV. CAL. 26 PREPINTADA POR AMBAS CARAS POR EL FABRICANTE, TIPO M-1000 O SIMILAR (NO INCL. ENTRAMADO NI CABALLETE, INCL. TORNILLO), PAGADO EN m2	M2	-	$ 79.771,00	$ -	130,00	$ 10.370.230,00	**130,00**	$ 10.370.230,00	130,00	$ 10.370.230,00
NP 1.4	SUM. E INST. CABALLETE MET. GALV. CAL. 26 PARA CUBIERTA M-1000 O SIMILAR, PREPINTADO POR AMBAS CARAS POR EL FABRICANTE, PAGADO EN m	M	-	$ 69.972,20	$ -	30,20	$ 2.113.160,00	**30,20**	$ 2.113.160,00	30,20	$ 2.113.160,00
NP 1.5	BORDILLO EN CONCRETO 3000 PSI 10 X 20 CM	M	-	$ 34.687,62	$ -	44,30	$ 1.536.662,00	**44,30**	$ 1.536.662,00	44,30	$ 1.536.662,00
	SUBTOTAL CAP. NP 1 IE. RURAL LA MUÑOZ SEDE ESPERANZA TROCHA 5				**$ -**		**$ 25.074.737,00**		**$ 24.856.607,00**		**$ 24.856.607,00**
NP 2	**IE. RURAL LA RICO KM 30 SEDE LA RICO**										
NP 2.1	MANTENIMIENTO DE MUROS (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES, LIMPIEZA, RESANE Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE)	M2	-	$ 14.542,00	$ -	70,00	$ 1.017.940,00	**0,00**	$ -	0,00	$ -
NP 2.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20	M	-	$ 128.843,00	$ -	10,10	$ 1.301.314,00	**10,10**	$ 1.301.314,00	10,10	$ 1.301.314,00
NP 2.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO RECTANGULAR 100 X 40 X 2.0MM	KG	-	$ 13.504,00	$ -	509,30	$ 6.877.587,00	**509,30**	$ 6.877.587,00	509,30	$ 6.877.587,00
NP 2.4	SUM. E INST. CUBIERTA MET. GALV. CAL. 26 PREPINTADA POR AMBAS CARAS POR EL FABRICANTE, TIPO M-1000 O SIMILAR (NO INCL. ENTRAMADO NI CABALLETE, INCL. TORNILLO), PAGADO EN m2	M2	-	$ 79.771,00	$ -	106,09	$ 8.462.905,00	**106,09**	$ 8.462.905,00	106,09	$ 8.462.905,00
NP 2.5	SUM. E INST. CABALLETE MET. GALV. CAL. 26 PARA CUBIERTA M-1000 O SIMILAR, PREPINTADO POR AMBAS CARAS POR EL FABRICANTE, PAGADO EN m	M	-	$ 69.972,20	$ -	10,30	$ 720.714,00	**10,30**	$ 720.714,00	10,30	$ 720.714,00
	SUBTOTAL CAP. NP 2 IE. RURAL LA RICO KM 30 SEDE LA RICO				**$ -**		**$ 18.380.460,00**		**$ 17.362.520,00**		**$ 17.362.520,00**

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE VALPARAÍSO
NIT. 800.050.407-1

MUNICIPIO DE VALPARAÍSO

CONTRATO DE OBRA No.:	00 3DE 2025	FECHA DE INICIO:	16 de junio de 2025
CONTRATISTA:	INERCIA S.A.S	PAZO DE EJECUCION:	Tres (03) Meses
REPRESENTANTE LEGAL:	DIANA MARCELA QUIROGA DÍAZ	FECHA REINICIO No. 1:	N/A
NIT Y/O C.C:	26.427.423 DE NEIVA HUILA	FECHA SUSPENSIÓN No. 2:	
SUPERVISOR:	YESSIKA ADRIANA JIMÉNEZ FORERO	FECHA REINICIO No. 2:	
NIT Y/O C.C:	1.117.522.940 DE FLORENCIA CAQUETA	FECHA SUSPENSIÓN No. 3:	
CARGO:	SEC. PLANEACION E INFRAESTRCUTURA	FECHA REINICIO No. 3:	
APAYO A LA SUPERVISION:	KEVIN RUEDA SANTOS	FECHA SUSPENSIÓN No. 4:	
		FECHA REINICIO No. 4:	
VALORINICIAL:	$181.172.282,00	FECHA SUSPENSIÓN No. 5:	
VALOR ADICIONAL No .01:	$0,00	FECHA REINICIO No. 5:	
VALOR TOTAL	$181.172.282,00	FECHA DE VENCIMIENTO:	15 de septiembre de 2025

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 01

CORRESPONDIENTE AL PERIODO: DEL 16/06/25 AL 31/07/25

FECHA ACTA: 11/08/2025

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DE LAS VEREDAS EL AGUILA, BUENAVISTA, LA RICO Y LOS CENTROS POBLADOS DE PLAYA RICA Y KILOMETRO 18 DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO CAQUETA."

En la secretaria de Planeacion, Desarrollo e Infraestructura del municipio de Valparaiso - Caquetà, a los once (11) dias del mes de agosto del año 2025, se reunio la señora **DIANA MARCELA QUIROGA DÍAZ** en calidad de representante legal de **INERCIA S.A.S** como contratista de obra, la ingeniera **YESSIKA ADRIANA JIMENEZ FORERO** en calidad de **SECRETARIA DE PLANEACION, DESAROLLO E INFRAESTRUCTURA Y/O SUPERVISOR DEL CONTRATO** por parte del municipio de Valparaiso Caqueta, y el Ingeniero **KEVIN RUEDA SANTOS** Contratista de la Secretaria de Planeacion, Desarrollo e Infraestructura; para dejar constancia por medio de la presente Acta de Recibo Parcial de Obra N°01 de las siguientes actividades, segun las condiciones que se detallan a continuacion:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES				MODIFICACION No. 01		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
NP 3	**IE. RURAL NIEVES ARRIBA**										
NP 3.1	MANTENIMIENTO DE MUROS (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES, LIMPIEZA, RESANE Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE)	M2	-	$ 14.542,00	$ -	123,35	$ 1.793.756,00	**0,00**	$ -	0,00	$ -
NP 3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO RECTANGULAR 100 X 40 X 2.0MM	KG	-	$ 13.504,00	$ -	769,05	$ 10.385.251,00	**769,05**	$ 10.385.251,00	769,05	$ 10.385.251,00
NP 3.3	SUM. E INST. CUBIERTA MET. GALV. CAL. 26 PREPINTADA POR AMBAS CARAS POR EL FABRICANTE, TIPO M-1000 O SIMILAR (NO INCL. ENTRAMADO NI CABALLETE, INCL. TORNILLO), PAGADO EN m2	M2	-	$ 79.771,00	$ -	185,00	$ 14.757.635,00	**185,00**	$ 14.757.635,00	185,00	$ 14.757.635,00
NP 3.4	SUM. E INST. CABALLETE MET. GALV. CAL. 26 PARA CUBIERTA M-1000 O SIMILAR, PREPINTADO POR AMBAS CARAS POR EL FABRICANTE, PAGADO EN m	M	-	$ 69.972,20	$ -	10,00	$ 699.722,00	**10,00**	$ 699.722,00	10,00	$ 699.722,00
NP 3.5	PAÑETE 1:4 (INCL. FILOS Y DILATACIONES), PAGADO EN m2	M2	-	$ 40.615,00	$ -	23,50	$ 954.453,00	**23,50**	$ 954.453,00	23,50	$ 954.453,00
	SUBTOTAL CAP. NP 2 IE. RURAL NIEVES ARRIBA				**$ -**		**$ 28.590.817,00**		**$ 26.797.061,00**		**$ 26.797.061,00**
NP 4	**IE. RURAL PLAYA RICA**										
NP 4.1	MANTENIMIENTO DE MUROS (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES, LIMPIEZA, RESANE Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE)	M2		$ 14.542,00	$ -	40,55	$ 589.622,00	**0,00**	$ -	0,00	$ -
NP 4.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO RECTANGULAR 100 X 40 X 2.0MM	KG		$ 13.504,00	$ -	272,55	$ 3.680.515,00	**272,55**	$ 3.680.515,00	272,55	$ 3.680.515,00
NP 4.3	SUM. E INST. CUBIERTA MET. GALV. CAL. 26 PREPINTADA POR AMBAS CARAS POR EL FABRICANTE, TIPO M-1000 O SIMILAR (NO INCL. ENTRAMADO NI CABALLETE, INCL. TORNILLO), PAGADO EN m2	M2		$ 79.771,00	$ -	56,00	$ 4.467.176,00	**56,00**	$ 4.467.176,00	56,00	$ 4.467.176,00
NP 4.4	SUM. E INST. CABALLETE MET. GALV. CAL. 26 PARA CUBIERTA M-1000 O SIMILAR, PREPINTADO POR AMBAS CARAS POR EL FABRICANTE, PAGADO EN m	M		$ 69.972,20	$ -	8,00	$ 559.778,00	**8,00**	$ 559.778,00	8,00	$ 559.778,00
NP 4.5	PAÑETE 1:4 (INCL. FILOS Y DILATACIONES), PAGADO EN m2	M2		$ 40.615,00	$ -	9,00	$ 365.535,00	**9,00**	$ 365.535,00	9,00	$ 365.535,00
NP 4.6	SUM. E INST. DE ACERO ESTRUCTURAL ASTM A - 572, A - 500 G, A - 36, A - 706 (GRADO B ó C9, A - 36) O SIMILAR, (INCL. BASE ANTICORROSIVA TIPO WASH PRIMER, PINTURA ACABADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO), PAGADO EN kg	KG		$ 15.488,00	$ -	146,51	$ 2.269.147,00	**146,51**	$ 2.269.147,00	146,51	$ 2.269.147,00
NP 4.7	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	M3		$ 31.423,30	$ -	1,07	$ 33.623,00	**1,07**	$ 33.623,00	1,07	$ 33.623,00
	SUBTOTAL CAP. NP 2 IE. RURAL PLAYA RICA				**$ -**		**$ 11.965.396,00**		**$ 11.375.774,00**		**$ 11.375.774,00**

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE VALPARAÍSO
NIT. 800.050.407-1

MUNICIPIO DE VALPARAÍSO

CONTRATO DE OBRA No.:	00 3DE 2025	FECHA DE INICIO:	16 de junio de 2025
CONTRATISTA:	INERCIA S.A.S	PAZO DE EJECUCION:	Tres (03) Meses
REPRESENTANTE LEGAL:	DIANA MARCELA QUIROGA DÍAZ	FECHA REINICIO No. 1:	N/A
NIT Y/O C.C:	26.427.423 DE NEIVA HUILA	FECHA SUSPENSIÓN No. 2:	
SUPERVISOR:	YESSIKA ADRIANA JIMÉNEZ FORERO	FECHA REINICIO No. 2:	
NIT Y/O C.C:	1.117.522.940 DE FLORENCIA CAQUETA	FECHA SUSPENSIÓN No. 3:	
CARGO:	SEC. PLANEACION E INFRAESTRCUTURA	FECHA REINICIO No. 3:	
APAYO A LA SUPERVISION:	KEVIN RUEDA SANTOS	FECHA SUSPENSIÓN No. 4:	
		FECHA REINICIO No. 4:	
VALORINICIAL:	$181.172.282,00	FECHA SUSPENSIÓN No. 5:	
VALOR ADICIONAL No .01:	$0,00	FECHA REINICIO No. 5:	
VALOR TOTAL	$181.172.282,00	FECHA DE VENCIMIENTO:	15 de septiembre de 2025

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 01

CORRESPONDIENTE AL PERIODO: DEL 16/06/25 AL 31/07/25

FECHA ACTA: 11/08/2025

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DE LAS VEREDAS EL AGUILA, BUENAVISTA, LA RICO Y LOS CENTROS POBLADOS DE PLAYA RICA Y KILOMETRO 18 DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO CAQUETA."

En la secretaria de Planeacion, Desarrollo e Infraestructura del municipio de Valparaiso - Caquetà, a los once (11) dias del mes de agosto del año 2025, se reunio la señora **DIANA MARCELA QUIROGA DÍAZ** en calidad de representante legal de **INERCIA S.A.S** como contratista de obra, la ingeniera **YESSIKA ADRIANA JIMENEZ FORERO** en calidad de **SECRETARIA DE PLANEACION, DESAROLLO E INFRAESTRUCTURA Y/O SUPERVISOR DEL CONTRATO** por parte del municipio de Valparaiso Caqueta, y el Ingeniero **KEVIN RUEDA SANTOS** Contratista de la Secretaria de Planeacion, Desarrollo e Infraestructura; para dejar constancia por medio de la presente Acta de Recibo Parcial de Obra N°01 de las siguientes actividades, segun las condiciones que se detallan a continuacion:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES				MODIFICACION No. 01		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
NP 5	**IE. RURAL LA RICO KM30 SEDE BUENAVISTA**										
NP 5.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO RECTANGULAR 100 X 40 X 2.0MM	KG		$ 13.504,00	$ -	312,48	$ 4.219.730,00	0,00	$ -		
NP 5.2	SUM. E INST. CUBIERTA MET. GALV. CAL. 26 PREPINTADA POR AMBAS CARAS POR EL FABRICANTE, TIPO M-1000 O SIMILAR (NO INCL. ENTRAMADO NI CABALLETE, INCL. TORNILLO), PAGADO EN m2	M2		$ 79.771,00	$ -	60,00	$ 4.786.260,00	0,00	$ -		
NP 5.3	SUM. E INST. CABALLETE MET. GALV. CAL. 26 PARA CUBIERTA M-1000 O SIMILAR, PREPINTADO POR AMBAS CARAS POR EL FABRICANTE, PAGADO EN m	M		$ 69.972,20	$ -	6,00	$ 419.833,00	0,00	$ -		
NP 5.4	PAÑETE 1:4 (INCL. FILOS Y DILATACIONES), PAGADO EN m2	M2		$ 40.615,00	$ -	72,00	$ 2.924.280,00	0,00	$ -		
	SUBTOTAL CAP. NP 2 IE. RURAL LA RICO KM30 SEDE BUENAVISTA				$ -		$ 12.350.103,00		$ -		
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 137.251.729,00		$ 137.251.729,00		102.227.512,00		102.227.512,00
	ADMINISTRACCIÓN			28%	$ 38.430.484,00	28%	$ 38.430.484,00	28%	25.556.878,00	28%	25.556.878,00
	IMPREVISTOS			1%	$ 1.372.517,00	1%	$ 1.372.517,00	1%	2.044.550,00	1%	2.044.550,00
	UTILIDAD			3%	$ 4.117.552,00	3%	$ 4.117.552,00	3%	5.111.376,00	3%	5.111.376,00
	VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS			32%	$ 43.920.553,00	32%	$ 43.920.553,00	32%	32.712.804,00	32%	32.712.804,00
	VALOR TOTAL OBRA FÍSICA			100%	$ 181.172.282,00	100%	$ 181.172.282,00	100%	134.940.316,00	100%	134.940.316,00

BALANCE DEL CONTRATO:

VALOR CONTRATO INICIAL:	$	181.172.282,00
VALOR CONTRATO ADICIONAL No.1:	$ 0,00	
VALOR EJECUTADO ACTA No.1:	$ 134.940.316,00	
VALOR EJECUTADO ACTA No.2:	$ 0,00	
VALOR EJECUTADO ACTA No.3:	$ 0,00	
VALOR EJECUTADO ACTA No.4:	$ 0,00	
SALDO POR EJECUTAR:	$ 46.231.966,00	
SUMAS IGUALES	**$ 181.172.282,00**	**181.172.282,00**

VALOR CONTRATO:	$	181.172.282,00
VALOR EJECUTADO A LA FECHA:	$	134.940.316,00
SALDO POR AMORTIZAR ANTICIPO:	$	0,00
SALDO POR EJECUTAR:	$	46.231.966,00
PORCENTAJE OBRA EJECUTADO		**74,48%**

ESTADO DEL ANTICIPO:

VALOR ANTICIPO:	$	0,00
VALOR ANTICIPO ADICION.	$	0,00
VALOR ANTICIPO ADICION.	$	0,00
VALOR ANTICIPO ADICION.	$	0,00
VALOR ANTICIPO ADICION.	$	0,00
AMORTIZACION EN ACTA	$ 0,00	
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00	
SUMAS IGUALES	**$ 0,00**	**0,00**

VALOR OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA:	$	134.940.316,00
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	$	0,00
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA:	**$**	**134.940.316,00**

VALOR PRESENTE ACTA EN LETRAS: : CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS M/CTE. ($ 134.940.316.oo)

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LA REPETICIÓN A COSTA SUYA DE LOS TRABAJOS QUE HAYAN QUEDADO DEFECTUOSOS POR CAUSAS QUE LE SEAN IMPUTABLES. LA MEDICIÓN DE LAS CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS SON RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR.

DIANA MARCELA QUIROGA DÍAZ
REP. LEGAL DE UNIÓN TEMPORAL GEOAMAZONÍA
CONTRATISTA

YESSIKA ADRIANA JIMÉNEZ FORERO
SECRETARIA DE PLANEACION, DESARROLLO E INFRAESTRUCTUTA Y/O SUPERVISOR DE OBRA
MUNICIPIO DE VALPARAISO CAQUETA

ING. KEVIN RUEDA SANTOS
INGENIERO CIVIL CONTRATISTA SPDI
MUNICIPIO DE VALPARAISO CAQUETA

ARPO No. 01

PREACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

Carrera 15 No 06-25 B/ JUAN XXIII
EMAIL: inerciaingenierosas@gmail.com
Florencia-Caquetá

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE VALPARAÍSO
NIT. 800.050.407-1

MUNICIPIO DE VALPARAÍSO

CONTRATO DE OBRA No.:	COP-003-2025
CONTRATISTA:	INERCIA S.A.S
NIT:	901.048.151-1
NOMBRE REP. LEGAL:	DIANA MARCELA QUIROGA DÍAZ
CEDULA REP. LEGAL:	26.427.423 DE NEIVA HUILA
SUPERVIS@R:	YESSIKA ADRIANA JIMENEZ FORERO
CEDULA SUPERVISOR:	1.117.522.940 DE FLORENCIA CAQUETA
CARGO:	SECRETARIA DE PLANEACION, DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA
VALOR INICIAL:	$181.172.282,00
VALOR ADICIONAL N° 1:	$0,00
VALOR TOTAL:	$181.172.282,00

INERCIA S.A.S
INGENIEROS CONSULTORES

PREACTAS No.01

FECHA DE EMISIÓN: 11/08/2025

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DE LAS VEREDAS EL AGUILA, BUENAVISTA, LA RICO Y LOS CENTROS POBLADOS DE PLAYA RICA Y KILOMETRO 18 DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO CAQUETA "

PRESUPUESTO:	A. OBRA FÍSICA	**LUGAR:**	ZONA RURAL DE VALPARISO - VEREDA EL AGUILA	**UNIDAD**	M2
CAPÍTULO:	1. IE. RURAL LA MUÑOZ SEDE ESPERANZA TROCHA 5	**ITEM**	1.1. DEMOLICION PISO Y/O ANDEN E=0.08	**UBICACIÓN**	SEDE ESPERANZA TROCHA 5

ESQUEMAS Y FOTOGRAFÍAS





Localización	Dimensiones			# Elementos	Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto / Espesor		
Anden Frontal	12,45	2,80			34,86
Anden Lateral Derecho	7,00	0,90			6,30
Anden Posterior	12,45	2,80			34,86
Anden Lateral Izquierdo	7,00	0,90			6,30
				Subtotal cantidad presente hoja	82,32
				Viene cantidad hoja anterior	
				TOTAL ACUMULADO	**82,32**

OBSERVACIONES:

Residente de obra: ARQ. JOSE MIGUEL MELENDEZ VILLEGAS
Mat. Profesional: A. 6372017

Director de Obra: ING. JAIRO ALBERTO GOEZ ROA
Mat. Profesional: 25202098947 CND

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE VALPARAÍSO
NIT. 800.050.407-1

MUNICIPIO DE VALPARAÍSO

CONTRATO DE OBRA No.:	COP-003-2025
CONTRATISTA:	INERCIA S.A.S
NIT:	901.048.151-1
NOMBRE REP. LEGAL:	DIANA MARCELA QUIROGA DÍAZ
CEDULA REP. LEGAL:	26.427.423 DE NEIVA HUILA
SUPERVIS@R:	YESSIKA ADRIANA JIMENEZ FORERO
CEDULA SUPERVISOR:	1.117.522.940 DE FLORENCIA CAQUETA
CARGO:	SECRETARIA DE PLANEACION, DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA
VALOR INICIAL:	$181.172.282,00
VALOR ADICIONAL N° 1:	$0,00
VALOR TOTAL:	$181.172.282,00

INERCIA S.A.S
INGENIEROS CONSULTORES

PREACTAS No.01

FECHA DE EMISIÓN: 11/08/2025

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DE LAS VEREDAS EL AGUILA, BUENAVISTA, LA RICO Y LOS CENTROS POBLADOS DE PLAYA RICA Y KILOMETRO 18 DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO CAQUETA "

PRESUPUESTO:	A. OBRA FÍSICA	**LUGAR:**	ZONA RURAL DE VALPARISO - VEREDA EL AGUILA	**UNIDAD**	M2
CAPÍTULO:	1. IE. RURAL LA MUÑOZ SEDE ESPERANZA TROCHA 5	**ITEM**	1.2. PISO Y/O ANDEN EN CONCRETO 8 CM 3000 PSI	**UBICACIÓN**	SEDE ESPERANZA TROCHA 5

ESQUEMAS Y FOTOGRAFÍAS






Localización	Dimensiones			# Elementos	Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto / Espesor		
Anden Frontal	12,45	2,80			34,86
Anden Lateral Derecho	7,00	0,90			6,30
Anden Posterior	12,45	2,80			34,86
Anden Lateral Izquierdo	7,00	0,90			6,30
Subtotal cantidad presente hoja					82,32
Viene cantidad hoja anterior					
TOTAL ACUMULADO					**82,32**

OBSERVACIONES:

Residente de obra: ARQ. JOSE MIGUEL MELENDEZ VILLEGAS
Mat. Profesional: A. 6372017

Director de Obra: ING. JAIRO ALBERTO GOEMZ ROA
Mat. Profesional: 25202098947 CND

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE VALPARAÍSO
NIT. 800.050.407-1

MUNICIPIO DE VALPARAÍSO

CONTRATO DE OBRA No.:	COP-003-2025
CONTRATISTA:	INERCIA S.A.S
NIT:	901.048.151-1
NOMBRE REP. LEGAL:	DIANA MARCELA QUIROGA DÍAZ
CEDULA REP. LEGAL:	26.427.423 DE NEIVA HUILA
SUPERVIS@R:	YESSIKA ADRIANA JIMENEZ FORERO
CEDULA SUPERVISOR:	1.117.522.940 DE FLORENCIA CAQUETA
CARGO:	SECRETARIA DE PLANEACION, DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA
VALOR INICIAL:	$181.172.282,00
VALOR ADICIONAL N° 1:	$0,00
VALOR TOTAL:	$181.172.282,00

INERCIA S.A.S
INGENIEROS CONSULTORES

PREACTAS No.01

FECHA DE EMISIÓN: 11/08/2025

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DE LAS VEREDAS EL AGUILA, BUENAVISTA, LA RICO Y LOS CENTROS POBLADOS DE PLAYA RICA Y KILOMETRO 18 DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO CAQUETA "

PRESUPUESTO:	A. OBRA FÍSICA	**LUGAR:**	ZONA RURAL DE VALPARISO - VEREDA EL AGUILA	**UNIDAD**	M2
CAPÍTULO:	1. IE. RURAL LA MUÑOZ SEDE ESPERANZA TROCHA 5	**ITEM**	1.3. DESMONTE DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA MET., GALV., ZINC, FIBROCEMENTO, ETERNIT O SIMILAR, PAGADO EN M2	**UBICACIÓN**	SEDE ESPERANZA TROCHA 5

ESQUEMAS Y FOTOGRAFÍAS





Localización	Dimensiones			Factor Expansión	Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto / Espesor		
AREA CUBIERTA TRIANGULAR					
CUBIERTA AULA (4 AGUAS) 1 FACHADA	5,00	2,90	7,25	2,00	14,50
CUBIERTA AULA (4 AGUAS) 2 POSTERIO	5,00	2,90	7,25	2,00	14,50

Localización	Dimensiones			Alto / Espesor	Medida Total
	Base Mayor	Base Menor	Alto / Espesor		
AREA CUBIERTA TRAPEZOIDAL					
CUBIERTA AULA (4 AGUAS) 3 SALON CORREDOR IZQUIERDO	13,00	7,20	5,00	50,50	50,50
CUBIERTA AULA (4 AGUAS) 3 SALON CORREDOR DERECH0	13,00	7,20	5,00	50,50	50,50

Subtotal cantidad presente hoja	130,00
Viene cantidad hoja anterior	
TOTAL ACUMULADO	**130,00**

OBSERVACIONES:

Residente de obra: ARQ. JOSE MIGUEL MELENDEZ VILLEGAS
Mat. Profesional: A. 6372017

Director de Obra: ING. JAIRO ALBERTO GIRALDO ROA
Mat. Profesional: 25202098947 CND

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE VALPARAÍSO
NIT. 800.050.407-1

MUNICIPIO DE VALPARAÍSO

CONTRATO DE OBRA No.:	COP-003-2025
CONTRATISTA:	INERCIA S.A.S
NIT:	901.048.151-1
NOMBRE REP. LEGAL:	DIANA MARCELA QUIROGA DÍAZ
CEDULA REP. LEGAL:	26.427.423 DE NEIVA HUILA
SUPERVIS@R:	YESSIKA ADRIANA JIMENEZ FORERO
CEDULA SUPERVISOR:	1.117.522.940 DE FLORENCIA CAQUETA
CARGO:	SECRETARIA DE PLANEACION, DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA
VALOR INICIAL:	$181.172.282,00
VALOR ADICIONAL N° 1:	$0,00
VALOR TOTAL:	$181.172.282,00

INERCIA S.A.S
INGENIEROS CONSULTORES

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DE LAS VEREDAS EL AGUILA, BUENAVISTA, LA RICO Y LOS CENTROS POBLADOS DE PLAYA RICA Y KILOMETRO 18 DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO CAQUETA "

PREACTAS No.01

FECHA DE EMISIÓN: 11/08/2025

PRESUPUESTO:	A. OBRA FÍSICA	**LUGAR:**	ZONA RURAL DE VALPARISO - VEREDA EL AGUILA	**UNIDAD**	M2	**UBICACIÓN**	SEDE ESPERANZA TROCHA 5
CAPÍTULO:	1. IE. RURAL LA MUÑOZ SEDE ESPERANZA TROCHA 5	**ITEM**	1.8. PINTURA VINILO TOPO 1				

ESQUEMAS Y FOTOGRAFÍAS





Localización	Dimensiones			Factor compactación	Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto / Espesor		
Paredes Laterales Internas	6,75		2,65	2,00	35,78
Paredes Frontal y Posterior Internas	7,80		2,95	2,00	46,02
Descontar Puertas	1,00		2,00	-2,00	-4,00
				Subtotal cantidad presente hoja	77,80
				Viene cantidad hoja anterior	
				TOTAL ACUMULADO	**77,80**

OBSERVACIONES:

Residente de obra: ARQ. JOSE MIGUEL MELENDEZ VILLEGAS
Mat. Profesional: A. 6372017

Director de Obra: ING. JAIRO ALBERTO GOEZ ROA
Mat. Profesional: 25202098947 CND

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE VALPARAÍSO
NIT. 800.050.407-1

MUNICIPIO DE VALPARAÍSO

CONTRATO DE OBRA No.:	COP-003-2025
CONTRATISTA:	INERCIA S.A.S
NIT:	901.048.151-1
NOMBRE REP. LEGAL:	DIANA MARCELA QUIROGA DÍAZ
CEDULA REP. LEGAL:	26.427.423 DE NEIVA HUILA
SUPERVIS@R:	YESSIKA ADRIANA JIMENEZ FORERO
CEDULA SUPERVISOR:	1.117.522.940 DE FLORENCIA CAQUETA
CARGO:	SECRETARIA DE PLANEACION, DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA
VALOR INICIAL:	$181.172.282,00
VALOR ADICIONAL N° 1:	$0,00
VALOR TOTAL:	$181.172.282,00

INERCIA S.A.S
INGENIEROS CONSULTORES

PREACTAS No.01


FECHA DE EMISIÓN: 11/08/2025

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DE LAS VEREDAS EL AGUILA, BUENAVISTA, LA RICO Y LOS CENTROS POBLADOS DE PLAYA RICA Y KILOMETRO 18 DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO CAQUETA "

PRESUPUESTO:	A. OBRA FÍSICA	**LUGAR:**	ZONA RURAL DE VALPARAISO - VEREDA LA RICO KM 30		**UNIDAD**	M2	**UBICACIÓN**	SEDE LA RICO	
CAPÍTULO:	3. IE. RURAL LA RICO KM30 SEDE LA RICO	**ITEM**	3,1. DESMONTE DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA MET., GALV., ZINC, FIBROCEMENTO, ETERNIT O SIMILAR, PAGADO EN M2	**Localización**	**Dimensiones**			**# Elementos**	**Medida Total**
					Longitud	**Ancho**	**Alto / Espesor**		
				AULA DE CLASES (2 AGUAS) 1 FACHADA	5,00	10,30		1,00	51,50
				AULA DE CLASES (2 AGUAS) 2 POSTERIOR	5,30	10,30		1,00	54,59

ESQUEMAS Y FOTOGRAFÍAS



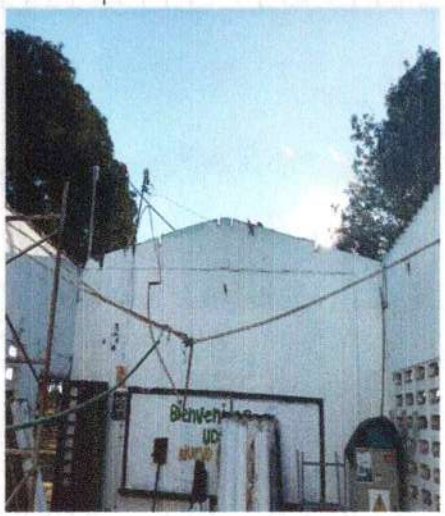

Subtotal cantidad presente hoja	106,09
Viene cantidad hoja anterior	
TOTAL ACUMULADO	**106,09**

OBSERVACIONES:

Residente de obra: ARQ. JOSE MIGUEL MELENDEZ VILLEGAS
Mat. Profesional: A. 6372017

Director de Obra: ING. JAIRO ALBERTO GOEMZ ROA
Mat. Profesional: 25202098947 CND

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE VALPARAÍSO
NIT. 800.050.407-1

MUNICIPIO DE VALPARAÍSO

CONTRATO DE OBRA No.:	COP-003-2025
CONTRATISTA:	INERCIA S.A.S
NIT:	901.048.151-1
NOMBRE REP. LEGAL:	DIANA MARCELA QUIROGA DÍAZ
CEDULA REP. LEGAL:	26.427.423 DE NEIVA HUILA
SUPERVIS@R:	YESSIKA ADRIANA JIMENEZ FORERO
CEDULA SUPERVISOR:	1.117.522.940 DE FLORENCIA CAQUETA
CARGO:	SECRETARIA DE PLANEACION, DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA
VALOR INICIAL:	$181.172.282,00
VALOR ADICIONAL N° 1:	$0,00
VALOR TOTAL:	$181.172.282,00

INERCIA S.A.S
INGENIEROS CONSULTORES

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DE LAS VEREDAS EL AGUILA, BUENAVISTA, LA RICO Y LOS CENTROS POBLADOS DE PLAYA RICA Y KILOMETRO 18 DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO CAQUETA "

PREACTAS No.01

FECHA DE EMISIÓN: 11/08/2025

PRESUPUESTO:	A. OBRA FÍSICA	**LUGAR:**	ZONA RURAL VALPARAISO - CENTRO POBLADO KM 18	**UNIDAD**	M2	**UBICACIÓN**	SEDE NIEVES ARRIBA		
CAPÍTULO:	4. IE. RURAL NIEVES ARRIBA	**ITEM**	4,4. DESMONTE DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA MET., GALV., ZINC, FIBROCEMENTO, ETERNIT O SIMILAR, PAGADO EN M2	**Localización**	**Dimensiones**			**# Elementos**	**Medida Total**
					Longitud	**Ancho**	**Alto / Espesor**		
				AULA COMEDOR ESCOLAR (2 AGUAS) 1 FACHADA	10,00	10,00		1,00	100,00
				AULA COMEDOR ESCOLAR (2 AGUAS) 2 POSTERIOR	8,50	10,00		1,00	85,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE VALPARAÍSO
NIT. 800.050.407-1

MUNICIPIO DE VALPARAÍSO

CONTRATO DE OBRA No.:	COP-003-2025
CONTRATISTA:	INERCIA S.A.S
NIT:	901.048.151-1
NOMBRE REP. LEGAL:	DIANA MARCELA QUIROGA DÍAZ
CEDULA REP. LEGAL:	26.427.423 DE NEIVA HUILA
SUPERVIS@R:	YESSIKA ADRIANA JIMENEZ FORERO
CEDULA SUPERVISOR:	1.117.522.940 DE FLORENCIA CAQUETA
CARGO:	SECRETARIA DE PLANEACION, DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA
VALOR INICIAL:	$181.172.282,00
VALOR ADICIONAL N° 1:	$0,00
VALOR TOTAL:	$181.172.282,00

INERCIA S.A.S
INGENIEROS CONSULTORES

PREACTAS No.01

FECHA DE EMISIÓN: 11/08/2025

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DE LAS VEREDAS EL AGUILA, BUENAVISTA, LA RICO Y LOS CENTROS POBLADOS DE PLAYA RICA Y KILOMETRO 18 DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO CAQUETA "

PRESUPUESTO:	A. OBRA FÍSICA	**LUGAR:**	ZONA RURAL VALPARAISO - CENTRO POBLADO KM 18	**UNIDAD**	M2	**UBICACIÓN**	SEDE NIEVES ARRIBA
CAPÍTULO:	4. IE. RURAL NIEVES ARRIBA	**ITEM**	4,9. PINTURA VINILO TOPO 1				

ESQUEMAS Y FOTOGRAFÍAS






Localización	Dimensiones Longitud	Ancho	Alto / Espesor	# Elementos	Medida Total
PARED LATERAL IZQUIERDO EXTERIOR	12,00	3,30		1,00	39,56
DESCUENTO PUERTAS	1,20	1,85		- 2,00	-4,44
MURO CORREDOR INTERNO EXTERNO - DI	2,15	3,20		2,00	13,76
MURO LATERAL IZQUIERDO CORREDOR	12,00	3,30		1,00	39,56
DESCUENTO VANO VENTANA 1	3,50	1,40		- 1,00	-4,90
DESCUENTO VANO VENTANA 2	3,85	1,40		- 1,00	-5,39
DESCUENTO VANO PUERTA	3,88	2,35		- 1,00	-9,12
MURO AERERO LATERAL IZQUIERDO CORR	0,40	2,00		2,00	1,60
COLUMNA 1 CARAS LATERAL IZQUIERDA C	0,27	1,32		2,00	0,71
COLUMNA 2 CARAS LATERAL IZQUIERDA C	0,13	1,40		2,00	0,36
COLUMNA 3 CARAS LATERAL IZQUIERDA C	0,26	1,40		2,00	0,73
FACHADA EXTERNA	6,70	2,80		1,00	18,76
DESCUENTO PUERTA 1 EXTERNO	1,20	1,90		- 2,00	-4,56
FACHADA INTERNA	6,70	2,80		1,00	18,76
DESCUENTO PUERTA 1 INTERNA	1,20	1,90		- 2,00	-4,56
PARED LATERAL DERECHA INTERNA	15,70	3,10		1,00	48,67
DESCUENTO VENTANA 1 COMEDOR	3,00	1,40		- 1,00	-4,20
DESCUENTO VENTANA 2 COCINA	2,50	1,40		- 1,00	-3,50
PARED LATERAL IZQUIERDA INTERNA	15,60	3,30		1,00	51,43
DESCUENTO PUERTAS	1,20	1,85		- 2,00	-4,44
DESCUENTO VANO PUERTA DISPENSA	1,00	2,25		1,00	2,25
PARED POSTERIOR INTERNA COCINA DISPE	8,60	2,60		1,00	22,36
MURO LATERAL IZQUIERDO DISPENSA INTI	2,25	2,95		1,00	6,64
MURO LATERAL DERECHO DISPENSA INTER	3,30	2,95		1,00	9,74
MURO DIVISIORIO COCINA 1	4,10	2,50		1,00	10,25
DESCUENTO VANO VENTANA COCINA	3,85	1,40		- 1,00	-5,39
MURO DIVISIORIO COCINA 2	2,75	2,50		2,00	13,75
DESCUENTO VANO PUERTA COCINA	0,88	2,05		- 2,00	-3,61
Subtotal cantidad presente hoja					244,78
Viene cantidad hoja anterior					
TOTAL ACUMULADO					**244,78**

OBSERVACIONES:

Residente de obra: ARQ. JOSE MIGUEL MELENDEZ VILLEGAS
Mat. Profesional: A. 6372017

Director de Obra: ING. JAIRO ALBERTO GOENZ ROA
Mat. Profesional: 25202098947 CND

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE VALPARAÍSO
NIT. 800.050.407-1

MUNICIPIO DE VALPARAÍSO

CONTRATO DE OBRA No.:	COP-003-2025
CONTRATISTA:	INERCIA S.A.S
NIT:	901.048.151-1
NOMBRE REP. LEGAL:	DIANA MARCELA QUIROGA DÍAZ
CEDULA REP. LEGAL:	26.427.423 DE NEIVA HUILA
SUPERVIS@R:	YESSIKA ADRIANA JIMENEZ FORERO
CEDULA SUPERVISOR:	1.117.522.940 DE FLORENCIA CAQUETA
CARGO:	SECRETARIA DE PLANEACION, DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA
VALOR INICIAL:	$181.172.282,00
VALOR ADICIONAL N° 1:	$0,00
VALOR TOTAL:	$181.172.282,00

INERCIA S.A.S
INGENIEROS CONSULTORES

PREACTAS No.01


FECHA DE EMISIÓN: 11/08/2025

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DE LAS VEREDAS EL AGUILA, BUENAVISTA, LA RICO Y LOS CENTROS POBLADOS DE PLAYA RICA Y KILOMETRO 18 DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO CAQUETA "

PRESUPUESTO:	A. OBRA FÍSICA	**LUGAR:**	ZONA RURAL VALPARAISO - CENTRO POBLADO PLAYA RICA	**UNIDAD**	M3	**UBICACIÓN**	SEDE PLAYA RICA	
CAPÍTULO:	5. IE. RURAL PLAYA RICA	**ITEM**	5,1. COLUMNA CONCRETO 3000 PSI					

ESQUEMAS Y FOTOGRAFÍAS



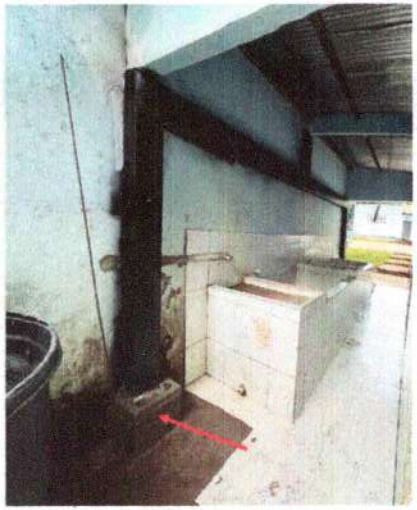

Localización	Dimensiones			# Elementos	Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto / Espesor		
PEDESTALES	0,35	0,40	1,05	2,00	0,29

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE VALPARAÍSO
NIT. 800.050.407-1

MUNICIPIO DE VALPARAÍSO

CONTRATO DE OBRA No.:	COP-003-2025
CONTRATISTA:	INERCIA S.A.S
NIT:	901.048.151-1
NOMBRE REP. LEGAL:	DIANA MARCELA QUIROGA DÍAZ
CEDULA REP. LEGAL:	26.427.423 DE NEIVA HUILA
SUPERVIS@R:	YESSIKA ADRIANA JIMENEZ FORERO
CEDULA SUPERVISOR:	1.117.522.940 DE FLORENCIA CAQUETA
CARGO:	SECRETARIA DE PLANEACION, DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA
VALOR INICIAL:	$181.172.282,00
VALOR ADICIONAL N° 1:	$0,00
VALOR TOTAL:	$181.172.282,00

INERCIA S.A.S
INGENIEROS CONSULTORES

PREACTAS No.01

FECHA DE EMISIÓN: 11/08/2025

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DE LAS VEREDAS EL AGUILA, BUENAVISTA, LA RICO Y LOS CENTROS POBLADOS DE PLAYA RICA Y KILOMETRO 18 DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO CAQUETA "

PRESUPUESTO:	A. OBRA FÍSICA	**LUGAR:**	ZONA RURAL VALPARAISO - CENTRO POBLADO PLAYA RICA	**UNIDAD**	M3	**UBICACIÓN**	SEDE PLAYA RICA
CAPÍTULO:	5. IE. RURAL PLAYA RICA	**ITEM**	5,2. VIGA CIMIENTO CONCRETO 3000 PSI				

ESQUEMAS Y FOTOGRAFÍAS



Localización	Dimensiones			# Elementos	Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto / Espesor		
ZAPATAS	1,00	1,00	0,30	2,00	0,60
Subtotal cantidad presente hoja					0,60
Viene cantidad hoja anterior					
TOTAL ACUMULADO					**0,60**

OBSERVACIONES:

Residente de obra: ARQ. JOSE MIGUEL MELENDEZ VILLEGAS
Mat. Profesional: A. 6372017

Director de Obra: ING. JAIRO ALBERTO GOEZ ROA
Mat. Profesional: 25202098947 CND

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE VALPARAÍSO
NIT. 800.050.407-1

MUNICIPIO DE VALPARAÍSO

CONTRATO DE OBRA No.:	COP-003-2025
CONTRATISTA:	INERCIA S.A.S
NIT:	901.048.151-1
NOMBRE REP. LEGAL:	DIANA MARCELA QUIROGA DÍAZ
CEDULA REP. LEGAL:	26.427.423 DE NEIVA HUILA
SUPERVIS@R:	YESSIKA ADRIANA JIMENEZ FORERO
CEDULA SUPERVISOR:	1.117.522.940 DE FLORENCIA CAQUETA
CARGO:	SECRETARIA DE PLANEACION, DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA
VALOR INICIAL:	$181.172.282,00
VALOR ADICIONAL N° 1:	$0,00
VALOR TOTAL:	$181.172.282,00

INERCIA S.A.S
INGENIEROS CONSULTORES

PREACTAS No.01


FECHA DE EMISIÓN: 11/08/2025

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DE LAS VEREDAS EL AGUILA, BUENAVISTA, LA RICO Y LOS CENTROS POBLADOS DE PLAYA RICA Y KILOMETRO 18 DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO CAQUETA "

PRESUPUESTO:	A. OBRA FÍSICA	**LUGAR:**	ZONA RURAL VALPARAISO - CENTRO POBLADO PLAYA RICA	**UNIDAD**	M2	**UBICACIÓN**	SEDE PLAYA RICA
CAPÍTULO:	5. IE. RURAL PLAYA RICA	**ITEM**	5,3. DESMONTE DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA MET., GALV., ZINC, FIBROCEMENTO, ETERNIT O SIMILAR, PAGADO EN M2				

ESQUEMAS Y FOTOGRAFÍAS



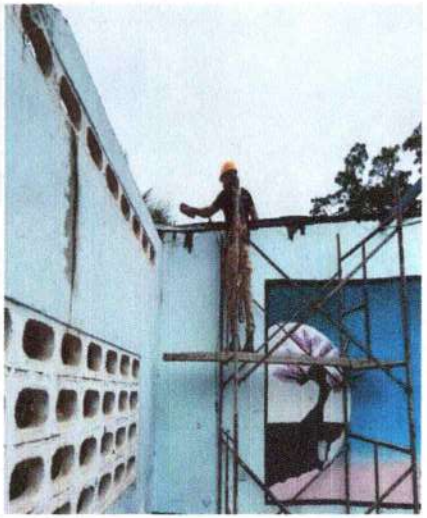

Localización	Dimensiones			# Elementos	Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto / Espesor		
Aula de matematicas (1 Agua)	7,00	8,00		1,00	56,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE VALPARAÍSO
NIT. 800.050.407-1

MUNICIPIO DE VALPARAÍSO

CONTRATO DE OBRA No.:	COP-003-2025
CONTRATISTA:	INERCIA S.A.S
NIT:	901.048.151-1
NOMBRE REP. LEGAL:	DIANA MARCELA QUIROGA DÍAZ
CEDULA REP. LEGAL:	26.427.423 DE NEIVA HUILA
SUPERVIS@R:	YESSIKA ADRIANA JIMENEZ FORERO
CEDULA SUPERVISOR:	1.117.522.940 DE FLORENCIA CAQUETA
CARGO:	SECRETARIA DE PLANEACION, DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA
VALOR INICIAL:	$181.172.282,00
VALOR ADICIONAL N° 1:	$0,00
VALOR TOTAL:	$181.172.282,00

INERCIA S.A.S
INGENIEROS CONSULTORES

PREACTAS No.01

FECHA DE EMISIÓN: 11/08/2025

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DE LAS VEREDAS EL AGUILA, BUENAVISTA, LA RICO Y LOS CENTROS POBLADOS DE PLAYA RICA Y KILOMETRO 18 DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO CAQUETA "

PRESUPUESTO:	A. OBRA FÍSICA	**LUGAR:**	ZONA RURAL VALPARAISO - CENTRO POBLADO PLAYA RICA	**UNIDAD**	M2	**UBICACIÓN**	SEDE PLAYA RICA
CAPÍTULO:	5. IE. RURAL PLAYA RICA	**ITEM**	5,6. MAMPOSTERÍA EN BLOQUE N°4				

ESQUEMAS Y FOTOGRAFÍAS



Localización	Dimensiones			# Elementos	Medida Total
	Longitud	Ancho	Peso kg/m		
PARED REPOSICION	3,00	1,50		1,00	4,50
DESCUENTO VIGUETA	6,00	0,20		-1,00	-1,20
DESCUETNO COLUMNETA	3,30	0,20		-1,00	-0,66
				Subtotal cantidad presente hoja	2,64
				Viene cantidad hoja anterior	
				TOTAL ACUMULADO	**2,64**

OBSERVACIONES:

Residente de obra: ARQ. JOSE MIGUEL MELENDEZ VILLEGAS
Mat. Profesional: A. 6372017

Director de Obra: ING. JAIRO ALBERTO GOEMEZ ROA
Mat. Profesional: 25202098947 CND

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE VALPARAÍSO
NIT. 800.050.407-1

MUNICIPIO DE VALPARAÍSO

CONTRATO DE OBRA No.:	COP-003-2025
CONTRATISTA:	INERCIA S.A.S
NIT:	901.048.151-1
NOMBRE REP. LEGAL:	DIANA MARCELA QUIROGA DÍAZ
CEDULA REP. LEGAL:	26.427.423 DE NEIVA HUILA
SUPERVIS@R:	YESSIKA ADRIANA JIMENEZ FORERO
CEDULA SUPERVISOR:	1.117.522.940 DE FLORENCIA CAQUETA
CARGO:	SECRETARIA DE PLANEACION, DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA
VALOR INICIAL:	$181.172.282,00
VALOR ADICIONAL N° 1:	$0,00
VALOR TOTAL:	$181.172.282,00

INERCIA S.A.S
INGENIEROS CONSULTORES

PREACTAS No.01

FECHA DE EMISIÓN: 11/08/2025

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DE LAS VEREDAS EL AGUILA, BUENAVISTA, LA RICO Y LOS CENTROS POBLADOS DE PLAYA RICA Y KILOMETRO 18 DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO CAQUETA "

PRESUPUESTO:	A. OBRA FÍSICA	**LUGAR:**	ZONA RURAL DE VALPARAISO - CENTRO POBLADO PLAYA RICA	**UNIDAD**	M3	**UBICACIÓN**	SEDE PLAYA RICA
CAPÍTULO:	IP 1. IE. RURAL PLAYA RICA	**ITEM**	IP 1.1. VIGA CONCRETO AEREA 3000 PSI				

ESQUEMAS Y FOTOGRAFÍAS



Localización	Dimensiones			# Elementos	Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto / Espesor		
Vigueta, Columneta - pared reposicion superior - salon de español - pasillo	11,00	0,10	0,20	1,00	0,22
			Subtotal cantidad presente hoja		0,22
			Viene cantidad hoja anterior		
			TOTAL ACUMULADO		**0,22**

OBSERVACIONES:

Residente de obra: ARQ. JOSE MIGUEL MELENDEZ VILLEGAS
Mat. Profesional: A. 6372017

Director de Obra: ING. JAIRO ALBERTO GOMEZ ROA
Mat. Profesional: 25202098947 CND

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE VALPARAÍSO
NIT. 800.050.407-1

MUNICIPIO DE VALPARAÍSO

CONTRATO DE OBRA No.:	COP-003-2025
CONTRATISTA:	INERCIA S.A.S
NIT:	901.048.151-1
NOMBRE REP. LEGAL:	DIANA MARCELA QUIROGA DÍAZ
CEDULA REP. LEGAL:	26.427.423 DE NEIVA HUILA
SUPERVIS@R:	YESSIKA ADRIANA JIMENEZ FORERO
CEDULA SUPERVISOR:	1.117.522.940 DE FLORENCIA CAQUETA
CARGO:	SECRETARIA DE PLANEACION, DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA
VALOR INICIAL:	$181.172.282,00
VALOR ADICIONAL N° 1:	$0,00
VALOR TOTAL:	$181.172.282,00

INERCIA S.A.S
INGENIEROS CONSULTORES

PREACTAS No.01

FECHA DE EMISIÓN: 11/08/2025

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DE LAS VEREDAS EL AGUILA, BUENAVISTA, LA RICO Y LOS CENTROS POBLADOS DE PLAYA RICA Y KILOMETRO 18 DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO CAQUETA "

PRESUPUESTO:	A. OBRA FÍSICA	**LUGAR:**	ZONA RURAL DE VALPARAISO - CENTRO POBLADO PLAYA RICA	**UNIDAD**	M2	**UBICACIÓN**	SEDE PLAYA RICA
CAPÍTULO:	IP 1. IE. RURAL PLAYA RICA	**ITEM**	IP 1.2. PISO Y/O ANDEN EN CONCRETO 8 CM 3000 PSI				

ESQUEMAS Y FOTOGRAFÍAS





Localización	Dimensiones			# Elementos	Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto / Espesor		
ZONA BAÑOS - ZAPATAS	1,00	1,00		2,00	2,00
Subtotal cantidad presente hoja					2,00
Viene cantidad hoja anterior					
TOTAL ACUMULADO					**2,00**

OBSERVACIONES:

Residente de obra: ARQ. JOSE MIGUEL MELENDEZ VILLEGAS
Mat. Profesional: A. 6372017

Director de Obra: ING. JAIRO ALBERTO GOMEZ ROA
Mat. Profesional: 25202098947 CND

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE VALPARAÍSO
NIT. 800.050.407-1

MUNICIPIO DE VALPARAÍSO

CONTRATO DE OBRA No.:	COP-003-2025
CONTRATISTA:	INERCIA S.A.S
NIT:	901.048.151-1
NOMBRE REP. LEGAL:	DIANA MARCELA QUIROGA DÍAZ
CEDULA REP. LEGAL:	26.427.423 DE NEIVA HUILA
SUPERVIS@R:	YESSIKA ADRIANA JIMENEZ FORERO
CEDULA SUPERVISOR:	1.117.522.940 DE FLORENCIA CAQUETA
CARGO:	SECRETARIA DE PLANEACION, DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA
VALOR INICIAL:	$181.172.282,00
VALOR ADICIONAL N° 1:	$0,00
VALOR TOTAL:	$181.172.282,00

INERCIA S.A.S
INGENIEROS CONSULTORES

PREACTAS No.01


FECHA DE EMISIÓN: 11/08/2025

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DE LAS VEREDAS EL AGUILA, BUENAVISTA, LA RICO Y LOS CENTROS POBLADOS DE PLAYA RICA Y KILOMETRO 18 DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO CAQUETA "

PRESUPUESTO:	A. OBRA FÍSICA	**LUGAR:**	ZONA RURAL DE VALPARAISO - CENTRO POBLADO PLAYA RICA	**UNIDAD**	M2	**UBICACIÓN**	SEDE PLAYA RICA
CAPÍTULO:	IP 1. IE. RURAL PLAYA RICA	**ITEM**	IP 1.3. DEMOLICION PISO Y/O ANDEN E=0.08				

ESQUEMAS Y FOTOGRAFÍAS



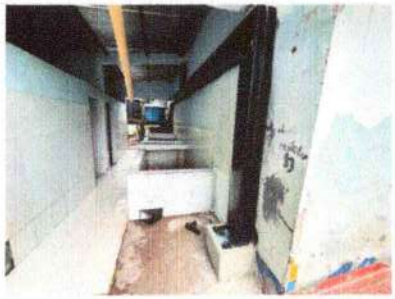

Localización	Dimensiones			# Elementos	Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto / Espesor		
ZONA BAÑOS - ZAPATAS	1,00	1,00		2,00	2,00
Subtotal cantidad presente hoja					2,00
Viene cantidad hoja anterior					
TOTAL ACUMULADO					**2,00**

OBSERVACIONES:

Residente de obra: ARQ. JOSE MIGUEL MELENDEZ VILLEGAS
Mat. Profesional: A. 6372017

Director de Obra: ING. JAIRO ALBERTO GUTIERREZ ROA
Mat. Profesional: 25202098947 CND

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE VALPARAÍSO
NIT. 800.050.407-1

MUNICIPIO DE VALPARAÍSO

CONTRATO DE OBRA No.:	COP-003-2025
CONTRATISTA:	INERCIA S.A.S
NIT:	901.048.151-1
NOMBRE REP. LEGAL:	DIANA MARCELA QUIROGA DÍAZ
CEDULA REP. LEGAL:	26.427.423 DE NEIVA HUILA
SUPERVIS@R:	YESSIKA ADRIANA JIMENEZ FORERO
CEDULA SUPERVISOR:	1.117.522.940 DE FLORENCIA CAQUETA
CARGO:	SECRETARIA DE PLANEACION, DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA
VALOR INICIAL:	$181.172.282,00
VALOR ADICIONAL N° 1:	$0,00
VALOR TOTAL:	$181.172.282,00

INERCIA S.A.S
INGENIEROS CONSULTORES


PREACTAS No.01

FECHA DE EMISIÓN: 11/08/2025

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DE LAS VEREDAS EL AGUILA, BUENAVISTA, LA RICO Y LOS CENTROS POBLADOS DE PLAYA RICA Y KILOMETRO 18 DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO CAQUETA "

PRESUPUESTO:	A. OBRA FÍSICA	**LUGAR:**	ZONA RURAL DE VALPARAISO - CENTRO POBLADO PLAYA RICA	**UNIDAD**	M2	**UBICACIÓN**	SEDE PLAYA RICA
CAPÍTULO:	IP 1. IE. RURAL PLAYA RICA	**ITEM**	IP 1.4. PINTURA VINILO TOPO 1				

ESQUEMAS Y FOTOGRAFÍAS

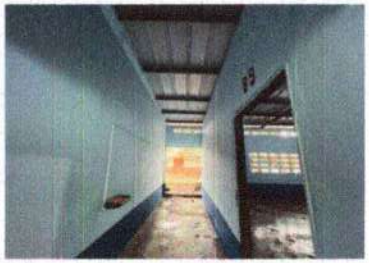




Localización	Dimensiones			# Elementos	Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto / Espesor		
Pared exterior - salones de educacion fisica - matematicas - pasillo - español	11,10		3,70		41,07
Descontar puerta - salon español	1,00		-2,00		-2,00
Descontar puerta - salon educacion fisica	1,15		-2,00		-2,30
Descontar Vano - pasillo	1,35		-2,00		-2,70
Pared interior - posterior - salon de matematicas	6,15		3,40		20,91
Pared interior - frontal - salon de matematicas	6,10		3,25		19,83
Pared interior - laterales - matematicas	6,10		3,00	2,00	36,60
Descontar puerta - salon matematicas	1,00		-2,00		-2,00
Pared laterales - pasillo	6,10		3,00		18,30
	6,10		3,40		20,74
Pared fachada - salon matematicas - pasillo	8,80		2,90		25,52
Desconatr puerta - entrada	1,50		-1,90		-2,85
Pared superior - pasillo -hacia plazoleta	1,50		1,50		2,25
Pared superiro - salon español - interno	1,10		1,50		1,65
Subtotal cantidad presente hoja					175,02
Viene cantidad hoja anterior					
TOTAL ACUMULADO					**175,02**

OBSERVACIONES:

Residente de obra: ARQ. JOSE MIGUEL MELENDEZ VILLEGAS
Mat. Profesional: A. 6372017

Director de Obra: ING. JAIRO ALBERTO GOMEZ ROA
Mat. Profesional: 25202098947 CND

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE VALPARAÍSO
NIT. 800.050.407-1

MUNICIPIO DE VALPARAÍSO

CONTRATO DE OBRA No.:	COP-003-2025
CONTRATISTA:	INERCIA S.A.S
NIT:	901.048.151-1
NOMBRE REP. LEGAL:	DIANA MARCELA QUIROGA DÍAZ
CEDULA REP. LEGAL:	26.427.423 DE NEIVA HUILA
SUPERVIS@R:	YESSIKA ADRIANA JIMENEZ FORERO
CEDULA SUPERVISOR:	1.117.522.940 DE FLORENCIA CAQUETA
CARGO:	SECRETARIA DE PLANEACION, DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA
VALOR INICIAL:	$181.172.282,00
VALOR ADICIONAL N° 1:	$0,00
VALOR TOTAL:	$181.172.282,00

INERCIA S.A.S
INGENIEROS CONSULTORES

PREACTAS No.01

FECHA DE EMISIÓN: 11/08/2025

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DE LAS VEREDAS EL AGUILA, BUENAVISTA, LA RICO Y LOS CENTROS POBLADOS DE PLAYA RICA Y KILOMETRO 18 DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO CAQUETA "

PRESUPUESTO:	A. OBRA FÍSICA	**LUGAR:**	ZONA RURAL DE VALPARISO - VEREDA EL AGUILA	**UNIDAD**	KG	**UBICACIÓN**	SEDE ESPERANZA TROCHA 5
CAPÍTULO:	NP 1. IE. RURAL LA MUÑOZ SEDE ESPERANZA TROCHA 5	**ITEM**	NP 1.2. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO RECTANGULAR 100 X 40 X 2.0MM				

ESQUEMAS Y FOTOGRAFÍAS









Localización	Dimensiones			# Elementos	Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto / Espesor		
PERFIL 1	9,75		4,34	2,00	84,63
PERFIL 2	12,50		4,34	2,00	108,50
PERFIL 3	10,70		4,34	2,00	92,88
PERFIL 4	9,20		4,34	2,00	79,86
PERFIL 5	7,90		4,34	2,00	68,57
PERFIL 6	7,10		4,34	2,00	61,63
PERFIL 7	2,80		4,34	2,00	24,30
PERFIL 8	2,75		4,34	4,00	47,74
PERFIL 9	5,50		4,34	8,00	190,96
PERFIL 10	5,00		4,34	2,00	43,40
				Subtotal cantidad presente hoja	802,47
				Viene cantidad hoja anterior	
				TOTAL ACUMULADO	**802,47**

OBSERVACIONES:

Residente de obra: ARQ. JOSE MIGUEL MELENDEZ VILLEGAS
Mat. Profesional: A. 6372017

Director de Obra: ING. JAIRO ALBERTO GOMEZ ROA
Mat. Profesional: 25202098947 CND

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE VALPARAÍSO
NIT. 800.050.407-1

MUNICIPIO DE VALPARAÍSO

CONTRATO DE OBRA No.:	COP-003-2025
CONTRATISTA:	INERCIA S.A.S
NIT:	901.048.151-1
NOMBRE REP. LEGAL:	DIANA MARCELA QUIROGA DÍAZ
CEDULA REP. LEGAL:	26.427.423 DE NEIVA HUILA
SUPERVIS@R:	YESSIKA ADRIANA JIMENEZ FORERO
CEDULA SUPERVISOR:	1.117.522.940 DE FLORENCIA CAQUETA
CARGO:	SECRETARIA DE PLANEACION, DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA
VALOR INICIAL:	$181.172.282,00
VALOR ADICIONAL N° 1:	$0,00
VALOR TOTAL:	$181.172.282,00

INERCIA S.A.S
INGENIEROS CONSULTORES

PREACTAS No.01

FECHA DE EMISIÓN: 11/08/2025

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DE LAS VEREDAS EL AGUILA, BUENAVISTA, LA RICO Y LOS CENTROS POBLADOS DE PLAYA RICA Y KILOMETRO 18 DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO CAQUETA "

PRESUPUESTO:	A. OBRA FÍSICA	**LUGAR:**	ZONA RURAL DE VALPARISO - VEREDA EL AGUILA	**UNIDAD**	M2	**UBICACIÓN**	SEDE ESPERANZA TROCHA 5
CAPÍTULO:	NP 1. IE. RURAL LA MUÑOZ SEDE ESPERANZA TROCHA 5	**ITEM**	NP 1.3. SUM. E INST. CUBIERTA MET. GALV. CAL. 26 PREPINTADA POR AMBAS CARAS POR EL FABRICANTE, TIPO M-1000 O SIMILAR (NO INCL. ENTRAMADO NI CABALLETE, INCL. TORNILLO), PAGADO EN m2				

ESQUEMAS Y FOTOGRAFÍAS





Localización	Dimensiones			# Elementos	Medida Total
	Longitud	Alto / Espesor	V. Parcial		
AREA CUBIERTA TRIANGULAR					
CUBIERTA AULA (4 AGUAS) 1 FACHADA	5,00	2,90	7,25	2,00	14,50
CUBIERTA AULA (4 AGUAS) 2 POSTERIO	5,00	2,90	7,25	2,00	14,50

Localización	Dimensiones			V. Parcial	Medida Total
	Base Mayor	Base Menor	Alto / Espesor		
AREA CUBIERTA TRAPEZOIDAL					
CUBIERTA AULA (4 AGUAS) 3 SALON CORREDOR IZQUIERDO	13,00	7,20	5,00	50,50	50,50
CUBIERTA AULA (4 AGUAS) 3 SALON CORREDOR DERECHO	13,00	7,20	5,00	50,50	50,50

OBSERVACIONES:

Subtotal cantidad presente hoja	130,00
Viene cantidad hoja anterior	
TOTAL ACUMULADO	**130,00**

Residente de obra: ARQ. JOSE MIGUEL MELENDEZ VILLEGAS
Mat. Profesional: A. 6372017

Director de Obra: ING. JAIRO ALBERTO GUEVARA
Mat. Profesional: 25202098947 CND

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE VALPARAÍSO
NIT. 800.050.407-1

MUNICIPIO DE VALPARAÍSO

CONTRATO DE OBRA No.:	COP-003-2025
CONTRATISTA:	INERCIA S.A.S
NIT:	901.048.151-1
NOMBRE REP. LEGAL:	DIANA MARCELA QUIROGA DÍAZ
CEDULA REP. LEGAL:	26.427.423 DE NEIVA HUILA
SUPERVIS@R:	YESSIKA ADRIANA JIMENEZ FORERO
CEDULA SUPERVISOR:	1.117.522.940 DE FLORENCIA CAQUETA
CARGO:	SECRETARIA DE PLANEACION, DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA
VALOR INICIAL:	$181.172.282,00
VALOR ADICIONAL N° 1:	$0,00
VALOR TOTAL:	$181.172.282,00

INERCIA S.A.S
INGENIERIA CONSULTORES

PREACTAS No.01

FECHA DE EMISIÓN: 11/08/2025

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DE LAS VEREDAS EL AGUILA, BUENAVISTA, LA RICO Y LOS CENTROS POBLADOS DE PLAYA RICA Y KILOMETRO 18 DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO CAQUETA "

PRESUPUESTO:	A. OBRA FÍSICA	**LUGAR:**	ZONA RURAL DE VALPARISO - VEREDA EL AGUILA	**UNIDAD**	M	**UBICACIÓN**	SEDE ESPERANZA TROCHA 5
CAPÍTULO:	NP 1. IE. RURAL LA MUÑOZ SEDE ESPERANZA TROCHA 5	**ITEM**	NP 1.4. SUM. E INST. CABALLETE MET. GALV. CAL. 26 PARA CUBIERTA M-1000 O SIMILAR, PREPINTADO POR AMBAS CARAS POR EL FABRICANTE, PAGADO EN m				

ESQUEMAS Y FOTOGRAFÍAS





Localización	Dimensiones			# Elementos	Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto / Espesor		
CABALLETE 1	7,40			1,00	7,40
CABALLETE 2	5,70			2,00	11,40
CABALLETE 3	5,70			2,00	11,40
			Subtotal cantidad presente hoja		30,20
			Viene cantidad hoja anterior		
			TOTAL ACUMULADO		**30,20**

OBSERVACIONES:

Residente de obra: ARQ. JOSE MIGUEL MELENDEZ VILLEGAS
Mat. Profesional: A. 6372017

Director de Obra: ING. JAIRO ALBERTO GOEMZ ROA
Mat. Profesional: 25202098947 CND

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE VALPARAÍSO
NIT. 800.050.407-1

MUNICIPIO DE VALPARAÍSO

CONTRATO DE OBRA No.:	COP-003-2025
CONTRATISTA:	INERCIA S.A.S
NIT:	901.048.151-1
NOMBRE REP. LEGAL:	DIANA MARCELA QUIROGA DÍAZ
CEDULA REP. LEGAL:	26.427.423 DE NEIVA HUILA
SUPERVIS@R:	YESSIKA ADRIANA JIMENEZ FORERO
CEDULA SUPERVISOR:	1.117.522.940 DE FLORENCIA CAQUETA
CARGO:	SECRETARIA DE PLANEACION, DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA
VALOR INICIAL:	$181.172.282,00
VALOR ADICIONAL N° 1:	$0,00
VALOR TOTAL:	$181.172.282,00

INERCIA S.A.S
INGENIEROS CONSULTORES

PREACTAS No.01

FECHA DE EMISIÓN: 11/08/2025

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DE LAS VEREDAS EL AGUILA, BUENAVISTA, LA RICO Y LOS CENTROS POBLADOS DE PLAYA RICA Y KILOMETRO 18 DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO CAQUETA "

PRESUPUESTO:	A. OBRA FÍSICA	**LUGAR:**	ZONA RURAL DE VALPARISO - VEREDA EL AGUILA	**UNIDAD**	M	**UBICACIÓN**	SEDE ESPERANZA TROCHA 5
CAPÍTULO:	NP 1. IE. RURAL LA MUÑOZ SEDE ESPERANZA TROCHA 5	**ITEM**	NP 1.5. BORDILLO EN CONCRETO 3000 PSI 10 X 20 CM				

ESQUEMAS Y FOTOGRAFÍAS



Localización	Dimensiones			# Elementos	Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto / Espesor		
FACHADA	9,70			1,00	9,70
LATERAL IZQUIERDO	12,45			1,00	12,45
LATERAL DERECHO	12,45			1,00	12,45
POSTERIOR	9,70			1,00	9,70
				Subtotal cantidad presente hoja	44,30
				Viene cantidad hoja anterior	
				TOTAL ACUMULADO	44,30

OBSERVACIONES:

Residente de obra: ARQ. JOSE MIGUEL MELENDEZ VILLEGAS
Mat. Profesional: A. 6372017

Director de Obra: ING. JAIRO ALBERTO GOEMEZ ROA
Mat. Profesional: 25202098947 CND

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE VALPARAÍSO
NIT. 800.050.407-1

MUNICIPIO DE VALPARAÍSO

CONTRATO DE OBRA No.:	COP-003-2025
CONTRATISTA:	INERCIA S.A.S
NIT:	901.048.151-1
NOMBRE REP. LEGAL:	DIANA MARCELA QUIROGA DÍAZ
CEDULA REP. LEGAL:	26.427.423 DE NEIVA HUILA
SUPERVIS@R:	YESSIKA ADRIANA JIMENEZ FORERO
CEDULA SUPERVISOR:	1.117.522.940 DE FLORENCIA CAQUETA
CARGO:	SECRETARIA DE PLANEACION, DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA
VALOR INICIAL:	$181.172.282,00
VALOR ADICIONAL N° 1:	$0,00
VALOR TOTAL:	$181.172.282,00

INERCIA S.A.S
INGENIEROS CONSULTORES


PREACTAS No.01

FECHA DE EMISIÓN: 11/08/2025

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DE LAS VEREDAS EL AGUILA, BUENAVISTA, LA RICO Y LOS CENTROS POBLADOS DE PLAYA RICA Y KILOMETRO 18 DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO CAQUETA "

PRESUPUESTO:	A. OBRA FÍSICA	**LUGAR:**	ZONA RURAL DE VALPARAISO - VEREDA LA RICO KM 30	**UNIDAD**	M	**UBICACIÓN**	SEDE LA RICO	
CAPÍTULO:	NP 2. IE. RURAL LA RICO KM 30 SEDE LA RICO	**ITEM**	NP 2.2. SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20	**Localización**	**Dimensiones**		**# Elementos**	**Medida Total**
					Longitud	**Ancho**	**Alto / Espesor**	
				Canal entrada principal	10,10		1,00	10,10

ESQUEMAS Y FOTOGRAFÍAS

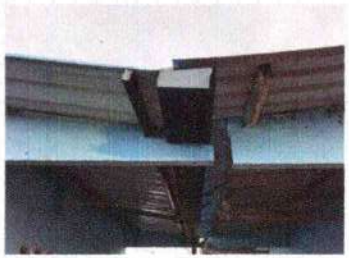



OBSERVACIONES:

Subtotal cantidad presente hoja	10,10
Viene cantidad hoja anterior	
TOTAL ACUMULADO	**10,10**

Residente de obra: ARQ. JOSE MIGUEL MELENDEZ VILLEGAS
Mat. Profesional: A. 6372017

Director de Obra: ING. JAIRO ALBERTO GOEMA ROA
Mat. Profesional: 25202098947 CND

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE VALPARAÍSO
NIT. 800.050.407-1

MUNICIPIO DE VALPARAÍSO

CONTRATO DE OBRA No.:	COP-003-2025
CONTRATISTA:	INERCIA S.A.S
NIT:	901.048.151-1
NOMBRE REP. LEGAL:	DIANA MARCELA QUIROGA DÍAZ
CEDULA REP. LEGAL:	26.427.423 DE NEIVA HUILA
SUPERVIS@R:	YESSIKA ADRIANA JIMENEZ FORERO
CEDULA SUPERVISOR:	1.117.522.940 DE FLORENCIA CAQUETA
CARGO:	SECRETARIA DE PLANEACION, DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA
VALOR INICIAL:	$181.172.282,00
VALOR ADICIONAL N° 1:	$0,00
VALOR TOTAL:	$181.172.282,00

INERCIA S.A.S
INGENIEROS CONSULTORES

PREACTAS No.01

FECHA DE EMISIÓN: 11/08/2025

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DE LAS VEREDAS EL AGUILA, BUENAVISTA, LA RICO Y LOS CENTROS POBLADOS DE PLAYA RICA Y KILOMETRO 18 DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO CAQUETA "

PRESUPUESTO:	A. OBRA FÍSICA	**LUGAR:**	ZONA RURAL DE VALPARAISO - VEREDA LA RICO KM 30	**UNIDAD**	KG	**UBICACIÓN**	SEDE LA RICO
CAPÍTULO:	NP 2. IE. RURAL LA RICO KM 30 SEDE LA RICO	**ITEM**	NP 2.3. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO RECTANGULAR 100 X 40 X 2.0MM				

ESQUEMAS Y FOTOGRAFÍAS





Localización	Dimensiones			# Elementos	Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto / Espesor		
Perfil 1 longitudinales	10,10		4,34	10,00	438,34
Perfil 2 Trasversal	16,35		4,34	1,00	70,959
				Subtotal cantidad presente hoja	509,30
				Viene cantidad hoja anterior	
				TOTAL ACUMULADO	**509,30**

OBSERVACIONES:

Residente de obra: ARQ. JOSE MIGUEL MELENDEZ VILLEGAS
Mat. Profesional: A. 6372017

Director de Obra: ING. JAIRO ALBERTO GOMEZ ROA
Mat. Profesional: 2520209894? CND

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE VALPARAÍSO
NIT. 800.050.407-1

MUNICIPIO DE VALPARAÍSO

CONTRATO DE OBRA No.:	COP-003-2025
CONTRATISTA:	INERCIA S.A.S
NIT:	901.048.151-1
NOMBRE REP. LEGAL:	DIANA MARCELA QUIROGA DÍAZ
CEDULA REP. LEGAL:	26.427.423 DE NEIVA HUILA
SUPERVIS@R:	YESSIKA ADRIANA JIMENEZ FORERO
CEDULA SUPERVISOR:	1.117.522.940 DE FLORENCIA CAQUETA
CARGO:	SECRETARIA DE PLANEACION, DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA
VALOR INICIAL:	$181.172.282,00
VALOR ADICIONAL N° 1:	$0,00
VALOR TOTAL:	$181.172.282,00

INERCIA S.A.S
INGENIEROS CONSULTORES

PREACTAS No.01

FECHA DE EMISIÓN: 11/08/2025

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DE LAS VEREDAS EL AGUILA, BUENAVISTA, LA RICO Y LOS CENTROS POBLADOS DE PLAYA RICA Y KILOMETRO 18 DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO CAQUETA "

PRESUPUESTO:	A. OBRA FÍSICA	**LUGAR:**	ZONA RURAL DE VALPARAISO - VEREDA LA RICO KM 30		**UNIDAD**	M2	**UBICACIÓN**	SEDE LA RICO
CAPÍTULO:	NP 2. IE. RURAL LA RICO KM 30 SEDE LA RICO	**ITEM**	NP 2.4. SUM. E INST. CUBIERTA MET. GALV. CAL. 26 PREPINTADA POR AMBAS CARAS POR EL FABRICANTE, TIPO M-1000 O SIMILAR (NO INCL. ENTRAMADO NI CABALLETE, INCL. TORNILLO), PAGADO EN m2					

ESQUEMAS Y FOTOGRAFÍAS





Localización	Dimensiones			# Elementos	Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto / Espesor		
AULA DE CLASES (2 AGUAS) 1 FACHADA	5,00	10,30		1,00	51,50
AULA DE CLASES (2 AGUAS) 2 POSTERIOR	5,30	10,30		1,00	54,59
Subtotal cantidad presente hoja					106,09
Viene cantidad hoja anterior					
TOTAL ACUMULADO					**106,09**

OBSERVACIONES:

Residente de obra: ARQ. JOSE MIGUEL MELENDEZ VILLEGAS
Mat. Profesional: A. 6372017

Director de Obra: ING. JAIRO ALBERTO [illegible]OEMA ROA
Mat. Profesional: 25202098947 CND

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE VALPARAÍSO
NIT. 800.050.407-1

MUNICIPIO DE VALPARAÍSO

CONTRATO DE OBRA No.:	COP-003-2025
CONTRATISTA:	INERCIA S.A.S
NIT:	901.048.151-1
NOMBRE REP. LEGAL:	DIANA MARCELA QUIROGA DÍAZ
CEDULA REP. LEGAL:	26.427.423 DE NEIVA HUILA
SUPERVIS@R:	YESSIKA ADRIANA JIMENEZ FORERO
CEDULA SUPERVISOR:	1.117.522.940 DE FLORENCIA CAQUETA
CARGO:	SECRETARIA DE PLANEACION, DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA
VALOR INICIAL:	$181.172.282,00
VALOR ADICIONAL N° 1:	$0,00
VALOR TOTAL:	$181.172.282,00

INERCIA S.A.S
INGENIEROS CONSULTORES

PREACTAS No.01


FECHA DE EMISIÓN: 11/08/2025

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DE LAS VEREDAS EL AGUILA, BUENAVISTA, LA RICO Y LOS CENTROS POBLADOS DE PLAYA RICA Y KILOMETRO 18 DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO CAQUETA "

PRESUPUESTO:	A. OBRA FÍSICA	**LUGAR:**	ZONA RURAL DE VALPARAISO - VEREDA LA RICO KM 30		**UNIDAD**	M	**UBICACIÓN**	SEDE LA RICO
CAPÍTULO:	NP 2. IE. RURAL LA RICO KM 30 SEDE LA RICO	**ITEM**	NP 2.5. SUM. E INST. CABALLETE MET. GALV. CAL. 26 PARA CUBIERTA M-1000 O SIMILAR, PREPINTADO POR AMBAS CARAS POR EL FABRICANTE, PAGADO EN m	**Localización**	**Dimensiones**			**# Elementos** / **Medida Total**
					Longitud	**Ancho**	**Alto / Espesor**	
				Caballete	10,30			1,00 / 10,30

ESQUEMAS Y FOTOGRAFÍAS



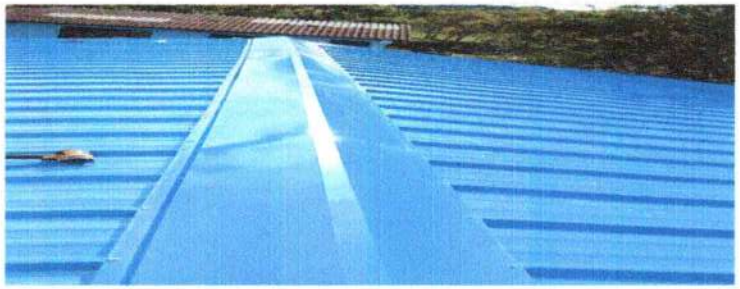

OBSERVACIONES:

Subtotal cantidad presente hoja	10,30
Viene cantidad hoja anterior	
TOTAL ACUMULADO	**10,30**

Residente de obra: ARQ. JOSE MIGUEL MELENDEZ VILLEGAS
Mat. Profesional: A. 6372017

Director de Obra: ING. JAIRO ALBERTO GOEMEZ NOA
Mat. Profesional: 25202098947 CND

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE VALPARAÍSO
NIT. 800.050.407-1

MUNICIPIO DE VALPARAÍSO

CONTRATO DE OBRA No.:	COP-003-2025
CONTRATISTA:	INERCIA S.A.S
NIT:	901.048.151-1
NOMBRE REP. LEGAL:	DIANA MARCELA QUIROGA DÍAZ
CEDULA REP. LEGAL:	26.427.423 DE NEIVA HUILA
SUPERVIS@R:	YESSIKA ADRIANA JIMENEZ FORERO
CEDULA SUPERVISOR:	1.117.522.940 DE FLORENCIA CAQUETA
CARGO:	SECRETARIA DE PLANEACION, DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA
VALOR INICIAL:	$181.172.282,00
VALOR ADICIONAL N° 1:	$0,00
VALOR TOTAL:	$181.172.282,00

INERCIA S.A.S
INGENIEROS CONSULTORES

PREACTAS No.01

FECHA DE EMISIÓN: 11/08/2025

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DE LAS VEREDAS EL AGUILA, BUENAVISTA, LA RICO Y LOS CENTROS POBLADOS DE PLAYA RICA Y KILOMETRO 18 DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO CAQUETA "

PRESUPUESTO:	A. OBRA FÍSICA	**LUGAR:**	ZONA RURAL VALPARAISO - CENTRO POBLADO KM 18	**UNIDAD**	KG	**UBICACIÓN**	SEDE NIEVES ARRIBA
CAPÍTULO:	NP 3. IE. RURAL NIEVES ARRIBA	**ITEM**	NP 3.2. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO RECTANGULAR 100 X 40 X 2.0MM				

ESQUEMAS Y FOTOGRAFÍAS





Localización	Dimensiones			# Elementos	Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto / Espesor		
Perfil 1 Transversales	10,00		4,34	17,00	737,80
Perfil 2 Longitudinales	2,40		4,34	3,00	31,25
Subtotal cantidad presente hoja					769,05
Viene cantidad hoja anterior					
TOTAL ACUMULADO					**769,05**

OBSERVACIONES:

Residente de obra: ARQ. JOSE MIGUEL MELENDEZ VILLEGAS
Mat. Profesional: A. 6372017

Director de Obra: ING. JAIRO ALBERTO GOEMEZ SOA
Mat. Profesional: 25202098947 CND

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE VALPARAÍSO
NIT. 800.050.407-1

MUNICIPIO DE VALPARAÍSO

CONTRATO DE OBRA No.:	COP-003-2025
CONTRATISTA:	INERCIA S.A.S
NIT:	901.048.151-1
NOMBRE REP. LEGAL:	DIANA MARCELA QUIROGA DÍAZ
CEDULA REP. LEGAL:	26.427.423 DE NEIVA HUILA
SUPERVIS@R:	YESSIKA ADRIANA JIMENEZ FORERO
CEDULA SUPERVISOR:	1.117.522.940 DE FLORENCIA CAQUETA
CARGO:	SECRETARIA DE PLANEACION, DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA
VALOR INICIAL:	$181.172.282,00
VALOR ADICIONAL N° 1:	$0,00
VALOR TOTAL:	$181.172.282,00

INERCIA S.A.S
INGENIEROS CONSULTORES

PREACTAS No.01

FECHA DE EMISIÓN: 11/08/2025

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DE LAS VEREDAS EL AGUILA, BUENAVISTA, LA RICO Y LOS CENTROS POBLADOS DE PLAYA RICA Y KILOMETRO 18 DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO CAQUETA "

PRESUPUESTO:	A. OBRA FÍSICA	**LUGAR:**	ZONA RURAL VALPARAISO - CENTRO POBLADO KM 18	**UNIDAD**	M2	**UBICACIÓN**	SEDE NIEVES ARRIBA	
CAPÍTULO:	NP 3. IE. RURAL NIEVES ARRIBA	**ITEM**	NP 3.3. SUM. E INST. CUBIERTA MET. GALV. CAL. 26 PREPINTADA POR AMBAS CARAS POR EL FABRICANTE, TIPO M-1000 O SIMILAR (NO INCL. ENTRAMADO NI CABALLETE, INCL. TORNILLO), PAGADO EN m2	**Localización**	**Dimensiones**			**# Elementos**	**Medida Total**
					Longitud	**Ancho**	**Alto / Espesor**		
				AULA COMEDOR ESCOLAR (2 AGUAS) 1 FACHADA	10,00	10,00		1,00	100,00
				AULA COMEDOR ESCOLAR (2 AGUAS) 2 POSTERIOR	8,50	10,00		1,00	85,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE VALPARAÍSO
NIT. 800.050.407-1

MUNICIPIO DE VALPARAÍSO

CONTRATO DE OBRA No.:	COP-003-2025
CONTRATISTA:	INERCIA S.A.S
NIT:	901.048.151-1
NOMBRE REP. LEGAL:	DIANA MARCELA QUIROGA DÍAZ
CEDULA REP. LEGAL:	26.427.423 DE NEIVA HUILA
SUPERVIS@R:	YESSIKA ADRIANA JIMENEZ FORERO
CEDULA SUPERVISOR:	1.117.522.940 DE FLORENCIA CAQUETA
CARGO:	SECRETARIA DE PLANEACION, DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA
VALOR INICIAL:	$181.172.282,00
VALOR ADICIONAL N° 1:	$0,00
VALOR TOTAL:	$181.172.282,00

INERCIA S.A.S
INGENIEROS CONSULTORES

PREACTAS No.01

FECHA DE EMISIÓN: 11/08/2025

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DE LAS VEREDAS EL AGUILA, BUENAVISTA, LA RICO Y LOS CENTROS POBLADOS DE PLAYA RICA Y KILOMETRO 18 DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO CAQUETA "

PRESUPUESTO:	A. OBRA FÍSICA	**LUGAR:**	ZONA RURAL VALPARAISO - CENTRO POBLADO KM 18	**UNIDAD**	M	**UBICACIÓN**	SEDE NIEVES ARRIBA
CAPÍTULO:	NP 3. IE. RURAL NIEVES ARRIBA	**ITEM**	NP 3.4. SUM. E INST. CABALLETE MET. GALV. CAL. 26 PARA CUBIERTA M-1000 O SIMILAR, PREPINTADO POR AMBAS CARAS POR EL FABRICANTE, PAGADO EN m				

ESQUEMAS Y FOTOGRAFÍAS





Localización	Dimensiones			# Elementos	Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto / Espesor		
Caballete	10			1,00	10
Subtotal cantidad presente hoja					10,00
Viene cantidad hoja anterior					
TOTAL ACUMULADO					10,00

OBSERVACIONES:

Residente de obra: ARQ. JOSE MIGUEL MELENDEZ VILLEGAS
Mat. Profesional: A. 6372017

Director de Obra: ING. JAIRO ALBERTO GOEMZ ROA
Mat. Profesional: 25202098947 CND

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE VALPARAÍSO
NIT. 800.050.407-1

MUNICIPIO DE VALPARAÍSO

CONTRATO DE OBRA No.:	COP-003-2025
CONTRATISTA:	INERCIA S.A.S
NIT:	901.048.151-1
NOMBRE REP. LEGAL:	DIANA MARCELA QUIROGA DÍAZ
CEDULA REP. LEGAL:	26.427.423 DE NEIVA HUILA
SUPERVIS@R:	YESSIKA ADRIANA JIMENEZ FORERO
CEDULA SUPERVISOR:	1.117.522.940 DE FLORENCIA CAQUETA
CARGO:	SECRETARIA DE PLANEACION, DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA
VALOR INICIAL:	$181.172.282,00
VALOR ADICIONAL N° 1:	$0,00
VALOR TOTAL:	$181.172.282,00

INERCIA S.A.S
INGENIERIA CONSULTORES

PREACTAS No.01

FECHA DE EMISIÓN: 11/08/2025

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DE LAS VEREDAS EL AGUILA, BUENAVISTA, LA RICO Y LOS CENTROS POBLADOS DE PLAYA RICA Y KILOMETRO 18 DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO CAQUETA "

PRESUPUESTO:	A. OBRA FÍSICA	**LUGAR:**	ZONA RURAL VALPARAISO - CENTRO POBLADO KM 18	**UNIDAD**	M2	**UBICACIÓN**	SEDE NIEVES ARRIBA
CAPÍTULO:	NP 3. IE. RURAL NIEVES ARRIBA	**ITEM**	NP 3.5. PAÑETE 1:4 (INCL. FILOS Y DILATACIONES), PAGADO EN m2				

ESQUEMAS Y FOTOGRAFÍAS





Localización	Dimensiones			# Elementos	Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto / Espesor		
Muro corredor interno externo - dispensa	2,15		3,20	2,00	13,76
MURO LATERAL DERECHO DISPENSA INTERNO	3,30		2,95	1,00	9,74
Subtotal cantidad presente hoja					23,50
Viene cantidad hoja anterior					
TOTAL ACUMULADO					**23,50**

OBSERVACIONES:

Residente de obra: ARQ. JOSE MIGUEL MELENDEZ VILLEGAS
Mat. Profesional: A. 6372017

Director de Obra: ING. JAIRO ALBERTO GOEMZ ROA
Mat. Profesional: 25202098947 CND

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE VALPARAÍSO
NIT. 800.050.407-1

MUNICIPIO DE VALPARAÍSO

CONTRATO DE OBRA No.:	COP-003-2025
CONTRATISTA:	INERCIA S.A.S
NIT:	901.048.151-1
NOMBRE REP. LEGAL:	DIANA MARCELA QUIROGA DÍAZ
CEDULA REP. LEGAL:	26.427.423 DE NEIVA HUILA
SUPERVIS@R:	YESSIKA ADRIANA JIMENEZ FORERO
CEDULA SUPERVISOR:	1.117.522.940 DE FLORENCIA CAQUETA
CARGO:	SECRETARIA DE PLANEACION, DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA
VALOR INICIAL:	$181.172.282,00
VALOR ADICIONAL N° 1:	$0,00
VALOR TOTAL:	$181.172.282,00

INERCIA S.A.S
INGENIEROS CONSULTORES

PREACTAS No.01

FECHA DE EMISIÓN: 11/08/2025

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DE LAS VEREDAS EL AGUILA, BUENAVISTA, LA RICO Y LOS CENTROS POBLADOS DE PLAYA RICA Y KILOMETRO 18 DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO CAQUETA "

PRESUPUESTO:	A. OBRA FÍSICA	**LUGAR:**	ZONA RURAL VALPARAISO - CENTRO POBLADO PLAYA RICA	**UNIDAD**	KG	**UBICACIÓN**	SEDE PLAYA RICA
CAPÍTULO:	NP 4. IE. RURAL PLAYA RICA	**ITEM**	NP 4.2. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO RECTANGULAR 100 X 40 X 2.0MM				

ESQUEMAS Y FOTOGRAFÍAS





Localización	Dimensiones			# Elementos	Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto / Espesor		
Perfil 1 - Transversales	8,00		4,34	7,00	243,04
Perfil 2 - Longitudinales	6,80		4,34	1,00	29,51
Subtotal cantidad presente hoja					272,55
Viene cantidad hoja anterior					
TOTAL ACUMULADO					**272,55**

OBSERVACIONES:

Residente de obra: ARQ. JOSE MIGUEL MELENDEZ VILLEGAS
Mat. Profesional: A. 6372017

Director de Obra: ING. JAIRO ALBERTO ACEVEDO
Mat. Profesional: 25202098947 CND

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE VALPARAÍSO
NIT. 800.050.407-1

MUNICIPIO DE VALPARAÍSO

CONTRATO DE OBRA No.:	COP-003-2025
CONTRATISTA:	INERCIA S.A.S
NIT:	901.048.151-1
NOMBRE REP. LEGAL:	DIANA MARCELA QUIROGA DÍAZ
CEDULA REP. LEGAL:	26.427.423 DE NEIVA HUILA
SUPERVIS@R:	YESSIKA ADRIANA JIMENEZ FORERO
CEDULA SUPERVISOR:	1.117.522.940 DE FLORENCIA CAQUETA
CARGO:	SECRETARIA DE PLANEACION, DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA
VALOR INICIAL:	$181.172.282,00
VALOR ADICIONAL N° 1:	$0,00
VALOR TOTAL:	$181.172.282,00

INERCIA S.A.S
INGENIEROS CONSULTORES

PREACTAS No.01

FECHA DE EMISIÓN: 11/08/2025

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DE LAS VEREDAS EL AGUILA, BUENAVISTA, LA RICO Y LOS CENTROS POBLADOS DE PLAYA RICA Y KILOMETRO 18 DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO CAQUETA "

PRESUPUESTO:	A. OBRA FÍSICA	**LUGAR:**	ZONA RURAL VALPARAISO - CENTRO POBLADO PLAYA RICA		**UNIDAD**	M2	**UBICACIÓN**	SEDE PLAYA RICA	
CAPÍTULO:	NP 4. IE. RURAL PLAYA RICA	**ITEM**	NP 4.3. SUM. E INST. CUBIERTA MET. GALV. CAL. 26 PREPINTADA POR AMBAS CARAS POR EL FABRICANTE, TIPO M-1000 O SIMILAR (NO INCL. ENTRAMADO NI CABALLETE, INCL. TORNILLO), PAGADO EN m2	**Localización**	**Dimensiones**			**# Elementos**	**Medida Total**
					Longitud	**Ancho**	**Alto / Espesor**		
				Aula de matematicas (1 Agua)	7,00	8,00		1,00	56,00

ESQUEMAS Y FOTOGRAFÍAS





OBSERVACIONES:

Subtotal cantidad presente hoja	56,00
Viene cantidad hoja anterior	
TOTAL ACUMULADO	**56,00**

Residente de obra: ARQ. JOSE MIGUEL MELENDEZ VILLEGAS
Mat. Profesional: A. 6372017

Director de Obra: ING. JAIRO ALBERTO GUEVARA
Mat. Profesional: 25202098947 CND

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE VALPARAÍSO
NIT. 800.050.407-1

MUNICIPIO DE VALPARAÍSO

CONTRATO DE OBRA No.:	COP-003-2025
CONTRATISTA:	INERCIA S.A.S
NIT:	901.048.151-1
NOMBRE REP. LEGAL:	DIANA MARCELA QUIROGA DÍAZ
CEDULA REP. LEGAL:	26.427.423 DE NEIVA HUILA
SUPERVIS@R:	YESSIKA ADRIANA JIMENEZ FORERO
CEDULA SUPERVISOR:	1.117.522.940 DE FLORENCIA CAQUETA
CARGO:	SECRETARIA DE PLANEACION, DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA
VALOR INICIAL:	$181.172.282,00
VALOR ADICIONAL N° 1:	$0,00
VALOR TOTAL:	$181.172.282,00

INERCIA S.A.S
INGENIERIA CONSULTORIA

PREACTAS No.01

FECHA DE EMISIÓN: 11/08/2025

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DE LAS VEREDAS EL AGUILA, BUENAVISTA, LA RICO Y LOS CENTROS POBLADOS DE PLAYA RICA Y KILOMETRO 18 DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO CAQUETA "

PRESUPUESTO:	A. OBRA FÍSICA	**LUGAR:**	ZONA RURAL VALPARAISO - CENTRO POBLADO PLAYA RICA		**UNIDAD**	M	**UBICACIÓN**	SEDE PLAYA RICA
CAPÍTULO:	NP 4. IE. RURAL PLAYA RICA	**ITEM**	NP 4.4. SUM. E INST. CABALLETE MET. GALV. CAL. 26 PARA CUBIERTA M-1000 O SIMILAR, PREPINTADO POR AMBAS CARAS POR EL FABRICANTE, PAGADO EN m	**Localización**	**Dimensiones**			**# Elementos** / **Medida Total**
					Longitud	**Ancho**	**Alto / Espesor**	
				Caballete Aula de matematicas (1 Agua)	8,00			1,00 / 8,00

ESQUEMAS Y FOTOGRAFÍAS





OBSERVACIONES:

Subtotal cantidad presente hoja	8,00
Viene cantidad hoja anterior	
TOTAL ACUMULADO	**8,00**

Residente de obra: ARQ. JOSE MIGUEL MELENDEZ VILLEGAS
Mat. Profesional: A. 6372017

Director de Obra: ING. JAIRO ALBERTO GOMEZ ROA
Mat. Profesional: 25202098947 CND

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE VALPARAÍSO
NIT. 800.050.407-1

MUNICIPIO DE VALPARAÍSO

CONTRATO DE OBRA No.:	COP-003-2025
CONTRATISTA:	INERCIA S.A.S
NIT:	901.048.151-1
NOMBRE REP. LEGAL:	DIANA MARCELA QUIROGA DÍAZ
CEDULA REP. LEGAL:	26.427.423 DE NEIVA HUILA
SUPERVIS@R:	YESSIKA ADRIANA JIMENEZ FORERO
CEDULA SUPERVISOR:	1.117.522.940 DE FLORENCIA CAQUETA
CARGO:	SECRETARIA DE PLANEACION, DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA
VALOR INICIAL:	$181.172.282,00
VALOR ADICIONAL N° 1:	$0,00
VALOR TOTAL:	$181.172.282,00

INERCIA S.A.S
INGENIEROS CONSULTORES

PREACTAS No.01

FECHA DE EMISIÓN: 11/08/2025

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DE LAS VEREDAS EL AGUILA, BUENAVISTA, LA RICO Y LOS CENTROS POBLADOS DE PLAYA RICA Y KILOMETRO 18 DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO CAQUETA "

PRESUPUESTO:	A. OBRA FÍSICA	**LUGAR:**	ZONA RURAL VALPARAISO - CENTRO POBLADO PLAYA RICA		**UNIDAD**	M2	**UBICACIÓN**	SEDE PLAYA RICA
CAPÍTULO:	NP 4. IE. RURAL PLAYA RICA	**ITEM**	NP 4.5. PAÑETE 1:4 (INCL. FILOS Y DILATACIONES), PAGADO EN m2	**Localización**	**Dimensiones**			**# Elementos** / **Medida Total**
					Longitud	**Ancho**	**Alto / Espesor**	
				Pared reposicion superior - salon de español - pasillo	3,00	1,50		2,00 / 9,00

ESQUEMAS Y FOTOGRAFÍAS





Subtotal cantidad presente hoja	9,00
Viene cantidad hoja anterior	
TOTAL ACUMULADO	**9,00**

OBSERVACIONES:

Residente de obra: ARQ. JOSE MIGUEL MELENDEZ VILLEGAS
Mat. Profesional: A. 6372017

Director de Obra: ING. JAIRO ALBERTO GUZMÁN ROA
Mat. Profesional: 25202098947 CND

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE VALPARAÍSO
NIT. 800.050.407-1

MUNICIPIO DE VALPARAÍSO

CONTRATO DE OBRA No.:	COP-003-2025
CONTRATISTA:	INERCIA S.A.S
NIT:	901.048.151-1
NOMBRE REP. LEGAL:	DIANA MARCELA QUIROGA DÍAZ
CEDULA REP. LEGAL:	26.427.423 DE NEIVA HUILA
SUPERVIS@R:	YESSIKA ADRIANA JIMENEZ FORERO
CEDULA SUPERVISOR:	1.117.522.940 DE FLORENCIA CAQUETA
CARGO:	SECRETARIA DE PLANEACION, DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA
VALOR INICIAL:	$181.172.282,00
VALOR ADICIONAL N° 1:	$0,00
VALOR TOTAL:	$181.172.282,00

INERCIA S.A.S
INGENIERIA Y CONSULTORIA

PREACTAS No.01

FECHA DE EMISIÓN: 11/08/2025

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DE LAS VEREDAS EL AGUILA, BUENAVISTA, LA RICO Y LOS CENTROS POBLADOS DE PLAYA RICA Y KILOMETRO 18 DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO CAQUETA "

PRESUPUESTO:	A. OBRA FÍSICA	**LUGAR:**	ZONA RURAL VALPARAISO - CENTRO POBLADO PLAYA RICA	**UNIDAD**	KG	**UBICACIÓN**	SEDE PLAYA RICA	
CAPÍTULO:	NP 4. IE. RURAL PLAYA RICA	**ITEM**	NP 4.6. SUM. E INST. DE ACERO ESTRUCTURAL ASTM A - 572, A - 500 G, A - 36, A - 706 (GRADO B ó C9, A - 36) O SIMILAR, (INCL. BASE ANTICORROSIVA TIPO WASH PRIMER, PINTURA ACABADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO), PAGADO EN kg					

ESQUEMAS Y FOTOGRAFÍAS





Localización	**Dimensiones**			**# Elementos**	**Medida Total**
	Longitud	**Ancho**	**Alto / Espesor**		
Perfil tipo C Refuerzo Muro Zona Baños	11,50		6,37	2,00	146,51
Subtotal cantidad presente hoja					146,51
Viene cantidad hoja anterior					
TOTAL ACUMULADO					**146,51**

OBSERVACIONES:

Residente de obra: ARQ. JOSE MIGUEL MELENDEZ VILLEGAS
Mat. Profesional: A. 6372017

Director de Obra: ING. JAIRO ALBERTO GOEMEZ DA
Mat. Profesional: 25202098947 CND

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE VALPARAÍSO
NIT. 800.050.407-1

MUNICIPIO DE VALPARAÍSO

CONTRATO DE OBRA No.:	COP-003-2025
CONTRATISTA:	INERCIA S.A.S
NIT:	901.048.151-1
NOMBRE REP. LEGAL:	DIANA MARCELA QUIROGA DÍAZ
CEDULA REP. LEGAL:	26.427.423 DE NEIVA HUILA
SUPERVIS@R:	YESSIKA ADRIANA JIMENEZ FORERO
CEDULA SUPERVISOR:	1.117.522.940 DE FLORENCIA CAQUETA
CARGO:	SECRETARIA DE PLANEACION, DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA
VALOR INICIAL:	$181.172.282,00
VALOR ADICIONAL N° 1:	$0,00
VALOR TOTAL:	$181.172.282,00

INERCIA S.A.S
INGENIEROS CONSULTORES

PREACTAS No.01

FECHA DE EMISIÓN: 11/08/2025

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DE LAS VEREDAS EL AGUILA, BUENAVISTA, LA RICO Y LOS CENTROS POBLADOS DE PLAYA RICA Y KILOMETRO 18 DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO CAQUETA "

PRESUPUESTO:	A. OBRA FÍSICA	**LUGAR:**	ZONA RURAL VALPARAISO - CENTRO POBLADO PLAYA RICA	**UNIDAD**	M3	**UBICACIÓN**	SEDE PLAYA RICA
CAPÍTULO:	NP 4. IE. RURAL PLAYA RICA	**ITEM**	NP 4.7. RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA				

ESQUEMAS Y FOTOGRAFÍAS





Localización	Dimensiones			# Elementos	Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto / Espesor		
Zapatas relleno	1,00	1,00	0,62	2,00	1,24
Descuento pedestal	0,35	0,40	0,62	-2,00	-0,17

INERCIA S.A.S
INGENIEROS CONSULTORES
NIT: 901.048.151-1

BITACORA DE OBRA

Carrera 15 No 06-25 B/ JUAN XXIII
EMAIL: inerciaingenierosas@gmail.com
Florencia-Caquetá

/junio/2025

Registro de lluvias : Mañana

Tarde

Personal en Obra : Director de Obra
Residente de Obra
Profesional SISSO
Maestro de Obra
Ayudantes de Obra

Maquinaria y Equipos : Cumara Fotográficas.
Cinta metrica

Actividades. Una vez se ha realizado el recorrido en las instituciones educativas con personal técnico por parte del contratante, se procede a realizar el monograma para la intervencion de la institucion Educativa La Rio, Las Nieves, Playa Rica y Las Águilas. En compañia se priorizo la Institución a intervenir

Martes
17 de junio
2025

Registro de lluvias. Mañana: Día lluvioso
Tarde: Lluvias intensas

No se registran actividades en obra, debido al exito del tiempo.

Miercoles
18 de junio
20225

Registro de lluvias: Mañana: Día parcialmente nublado
Tarde: Parcialmente Nublado

Personal en Obra: Residente de Obra
Auxiliar de Obra
Ayudantes.

Maquinaria y Equipo: Carretillas, Cutol

Se realiza seguimiento al material de ferreteria que se ha adquirido, de tal forma que este quede protegido de la lluvia. En las sedes de las Instituciones educativas.

Registro de lluvias Mañana Parcialmente Nublado
Tarde: Cielo Despejado

Personal en Obra: Residente de Obra
Maestro de Obra
Ayudantes de Obra

Maquinaria y Equipo: Cuzos ó cuñas
Martillo
Cortafrio

Actividades: En la Institucion Educativa Playa Rica se inician las labores de desmonte de la cubierta. Los materiales para la elaboración de los trabajos en la Institución Educativa han sido resguardados del sol y la lluvia. Al momento del desmonte de la cubierta se ha llegado a un acuerdo con los docentes y comunidad para resguardar - proteger los articulos y materiales de propios de la Institución.

Viernes 20 de Junio 2025	Registro de lluvias Mañana : Lluvias Tarde : Lluvias - Nublado No se desarrollan actividades por lluvias intensas
Sábado 21 de Junio 2025	Registro de lluvias Mañana : Presencia de lluvia No se desarrollan actividades por lluvias intensas
Lunes 23 de Junio 2025	Registro de lluvias: Mañana : Soleada Tarde Soleado Personal en obra: Director de obra Residente de obra Profesional SST Maestro Ayudantes. Maquinaria y Equipo : Herramientas menores Actividades: En la Institucion educativa Playa Rica se continua con el desmonte de la cubierta. Ademas se comienza con la extraccion de las zapatas de refuerzo de baños. En la Intitucion la Rico Km 30 sede La Rico se adelantan labores en la cubierta se procede al desmonte de la cubierta y se da inicio al revestimiento de los perfiles con pintura.

oites 24 de
unio 2025

Registro de lluvia: Mañana: Parcialmente nublado
Tarde: Soleado

Personal en Obra: Residente de Obra
Maestro
Ayudantes

Maquinaria y Equipos: Adamios
Herramientas menores

En la Institucion Educativa Playa Rica se procede a realizar fundición de zapatas luego de haber organizado el hierro de zapatas y pedestales. Tambien se fonden los pedestales. Luego de haber concretado con el contratante, se procede alu demdicion de algunas paredes.
Se organiza hierro para vigas y columnetas para refuerzos de muros de cachillos y parte alta de las puertas.
En la Institucion La Rico Km 30 Sede la Rico se instala la ornamentación para la cobierta y tambien se initala el canal metalico

Miercoles 25 Junio 2025

Registro de lluvias: Mañana Nublado - Lluvia suave
Tarde Despejada

Personal en obra:
Director de obra
Ingeniero Residente
Profesional SISSO
Maestro de obra
Ayudante

Maquinarias y equipos:
Herramientas menores
Andamios
Escaleras
Lutos - trompo -

Actividades
En la Institución Playa Rica se fundenlos zapatas y se organizan los perfiles para el refuerzo de los bancos.
Se procede tambien a fundir vigetas y alumitalucion de bloques. En esta actividad se incluye el suministro y vaciado del concreto, vibrado, curado y retiro de formaletas. La construcción de muros se realizo en bloque N. 4 con un mortero de relacion 1:4
Tambien se realiza fundicion de los brazos de las cachillas o muros de techo a remplazar.
Se rotulan y se limpian las paredes afectadas
En la Institución La Rica Km 30 Sede la Rica se instalo cubierta y el canal metalico.
Se rotulan y se limpian las paredes afectadas.

eves 26
e junio 2025

Registro de lluvias: Mañana Nublado
Tarde Lluvia suave

Personal en obra: Ingeniero Residente
Profesional SISSO
Maestro obra
Ayudante

Maquinaria y equipos: Herramientas menores
Andamios
Escaleras
Trompo

Actividades:
Se organizan rellenos en las zapatas. Se hacen resanes en el piso.
Se instalan perfiles de refuerzo en los baños de los niños
Se continuan con los resanes en las paredes de los salones
Se fonden columnetas y viguetas pendientes.

Viernes 27 Junio 2025

Registro de Horas Mañana Parcialmente Nublado
Tarde Soleado

Personal en Obra Ingeniero Residente de Obra
Dueño
Ayudantes

Materiales y Equipos Tiempo
Andamios
Escaleras
Lazos
Herramientas menores

Actividades:
En la Institución La Rico Km 30 de La Rico, se termina de resanar y seguidamente se aplica pintura.
También se instala el caballete UPVC como remate superior en la union de los dos faldones de la cubierta lo que evitara Filtraciones de agua por la cumbrera.
En la Institucion Playa Rica, se continua con el alicelo en las paredes Una vez los sitios han sido seleccionados por el contratante se procede a la realización de puntal
Tambien se instala la estructura - Perfiles en la cubierta
Se continua con algunos retoques de pintura.

Sabado 28 Junio 2025

Registro de lluvias Mañana Soleada
Tarde Soleada

Personal en Obra: Ingeniero Residente de Obra
Maestro
Ayudantes

Materiales y Equipos Andamio
Escaleras
Herramientas menores

Actividades.
En la Institución La Rica Km 30 Sede La Rica, se termina de instalar el caballete, verificando que la alineación fijación, empalme, fijación mecanica, instalación de amarres funcionen correctamente.
Finalmente los trabajos en la Institucion La Rica se dan por terminados.
En la Institucion Playa Rica, se continua con la instalacion de la cubierta en el salon, resanes y pintura en salon y pasillo.
En la Institución Educativa Rural Nieves Amiba se inician las bases de roturas y resanes de paredes.

Domingo 29 Junio 2025

Durante este dia No se labora.

Lunes 30 de junio 2025	Durante este dia no se labora Registro de lluvia: Mañana: lluvia continuo Tarde lluvia continuo. Debido a las continuas - frecuente lluvias registradas durante todo el dia, no se pueden adelantar trabajos en las instalaciones.
1 de julio de 2025	Registro de lluvia Mañana: lluvia continuo - Nublado Tarde: lluvia continuo - Nublado Debido a la constancia en las lluvias no se puede laborar.
Miercoles 2 de julio de 2025	Registro de. lluvias Mañana: Lluvias continuo Tarde: Nublado Personal en obra Residente de obra Albeitro Ayudantes Materiales y Equipo: Herramientas menores Debido al estado del tiempo se adelantan labores de retiro, resane y limpieza en las sede educativas.

ueves 3 de
olio 2025

Registro de lluvias

Mañana : Parcialmente Nublado
Tarde : Nublado

Personal en obra Ingeniero Director de Obra
Ingeniero Residente de Obra
Profesional SISSO
Alcalde de Obra
Ayudante de Obra

Materiales y Equipo: Herramientas menores

Actividades:
En la Institución Educativa Playa Rica se continua con los resanes y aplicación de pintura en el salon y en el pasillo.
Se instalo caballete y planches.
En la Institución educativa Rural Las Mieves Arriba se da inicio al desmonte de la cubierta.

ines 4 de
2025

Registro de lluvias Mañana: Lluvias continuas
Tarde : Lluvias constantes.

Durante el dia no se adelantaron actividades debido a la constancia en las lluvias.

Sábado 5
Julio 2025

Registro de lluvias: Mañana: Soleada
Tarde

Personal en obra: Residente de Obra
Maestro de Obra
Ayudante de Obra

Materiales y Equipos: Herramientas menores

Actividades: En la Institución Educativa Playa Rica se continua con los resanes y la pintura del salon y del pasillo.
Se instala finalmente el tabullete teniendo en cuenta la instalación de las amarras plásticas para su fijación.
En la Institución Educativa Las Nieves Arriba se continua con el desmonte de la estructura de la cubierta.

Domingo 6
Julio 2025

Durante este dia no se labora.

nes 7 de
'o 2025

Registro de lluvias Mañana: Parcialmente nublado
Tarde: Parcialmente nublado

Personal en obra: Director de obra
Residente de Obra
Profesional SISSO
Maestro de Obra
Ayudante de Obra

Materiales y Equipos: Herramientas menores

Actividades: En la institucion educativa las nieves Arriba, se continua con el desmonte del techo, seguidamente se continua con la cubierta y el entramado.
En la Institución educativa Playa Rica se comienza la pintura de los cielos y zocalo en contorno del salon.

Martes 8 de julio 2025

Registro de lluvias:

Mañana Soleado

Tarde Parcialmente nublado

Personal en obra: Director de obra
Residente de obra
Profesional SISSO
Maestro de obra
Ayudante de Obra

Materiales y Equipos - Herramiental - Maquinaria: Herramiental Menor
Andamios
Escaleras

Actividades:

En la Institucion Educativa Nieves Arriba se da inicio a la aplicación de la pintura en los perfiles.

Se rematan los perfiles o despuntan para poder lograr una nivelacion y lograr una mejor union con la soldadura.

Se continua con los resanes de paredes, lijado, corte y retoma de grietas.

Se perfilan los filos o bordes de paredes y seguidamente se pañetan los mismos.

Miercoles 9

Julio 2025

Registro de lluvias: Mañana Steady
Tarde: Steady.

Personal en Obra: Residente de Obra
Profesional SISSO
Maestro de obra
Ayudante de obra.

Maquinaria y Equipos: Herramientas menores
Andamios
Escalera.

Actividades: En la Institución Playa Rica se realizan algunos retoque o se perfecciona la aplicación de la pintura. Seguidamente se realiza aseo general en la Institución. Y las labores se dan por terminadas.
En la Institución Educativa Las Nieves Arriba, se continua con el corte, rotura y resane de paredes.
Algunas paredes se lavan para quitar lama verde.

Jueves 10 de julio 2025

Registro de lluvias

Mañana Soleado

Tarde Soleado - Nublado

Personal en obra Residente de Obra
Maestro de Obra
Ayudantes

Materiales y Equipos - Maquinaria : Herramientas menores
Andamios
Escaleras.

Actividades.

En la Institucion Educativa Las Nieves Anibo, se instala el Caballete UPVC como remate superior en la union de la cubierta evitando filtraciones de agua pa la cumbrera. Las puntas de la Caballetes son sujetadas para darle mayor agarre al techo.

Se continua con la aplicacion de estuco en la paredes que fueron puñeteadas.

Tambien se continua con el resane en otras paredes.

Viernes 11 Julio 2025

Registro de lluvias:
Mañana: Parcialmente Nublado
Tarde: Nublado

Personal en Obra: Residente de Obra
Maestro de Obra
Ayudantes.

Maquinaria y Equipos: Herramientas menores
Andamios
Escaleras
Lijas
Cuchillas.

Actividades:
En la Institución Las Nieves Arriba, se demontan puertas y ventanas. Seguidamente se lijan, limpian y perfeccionan para posteriormente ser pintadas
Se continua con los resanes y arreglos de paredes y filos.

Sabado 12 Julio 2025

Registro de Horios

Mañana:

Tarde:

Personal en Obra: Residente Obra
Maestro de Obra
Ayudante de obra

Equipos y maquinaria: Herramientas menores
Andamios
Escaleras

Actividades:
En la Institucion Educativa Las Nieves Arriba, se pintan las ventanas laterales
Se continua con los resanes en las paredes, para posteriormente ser pintadas

Domingo 13 Julio 2025

Durante este dia no se labora en las Instituciones.

Lunes 14
Julio 2025

Registro de lluvias

Mañana
Tarde

Personal en obra: Director de Obra
Residente de Obra
Auxiliar de Obra
Ayudantes.

Equipos y maquinaria: Herramientas menores
Andamios
Escaleras.

Actividades:
En la Institucion Educativa Las Nieves Arriba, se continua con la aplicacion de pintura en puertas, Ventanas y paredes.
En la Institucion Educativa Lamuñoz Sede Esperanza Trocha 5, se inician las actividades de demolicion de pisos del Corredor o parte externa.

Martes 15
Julio 2025

Registro de lluvias: Mañana: Lluvia suave
Tarde: Parcialmente Nublado

Personal en obra: Director de Obra
Residente de Obra
Profesional SO350
Maestro de Obra
Ayudante de Obra

Equipos y maquinaria: Herramientas menores

Actividades: En la institucion Educativa Las Nieves Arriba, se continua con la pintura en puertas, ventanas y paredes.
Algunas paredes son resanadas, hasta lograr su perfección.
El porton de la biblioteca se encontraba en mal estado, y fue reparado para dar seguridad al lugar.
Algunos filos de paredes son perfilados para brindar una perfección al lugar.
En la Institucion Educativa Luminza de Esperanza La Trocha 5, se continua con la demolición de pisos y nivelacion de terreno.

Miercoles 16 de julio 2025

Registro de lluvia: Mañana: Soleado
Tarde: Parcialmente Nublado.

Personal en Obra: Residente de Obra
Auxiliar de Obra
Ayudante de Obra.

Equipos y maquinaria: Herramientas menores.

Actividades:
En la Institucion Educativa Las Nieves Arriba, se continua con la pintada en paredes.
Adicionalmente se resana las juntas para posteriormente aplicar impermeabilizante en las paredes exteriores.
En la Institucion Educativa La muñoz Sede Esperanza La Tiochas, se realizan excavaciones para la instalacion de jardineras perimetrales. Ademas se continua con la demolicion de pisos

Jueves 17
Julio 2025

Registro de lluvias:
Mañana: Soleado
Tarde: Parcialmente nublado

Personal en obra: Residente de obra
Maestro de obra
Ayudantes

Maquinaria y Equipos:
Herramientas menores

Actividades: En la Institucion Educativa Los Nietos Ambar, se continua con la aplicacion de la pintura e impermeabilizacion de paredes.
En la Institucion Educativa La Honor zade Esperanza La Torcha 5 se termina la formaleteadu de zaidineles, zegidamente se fonden Ademas se da inicio a la aplicacion de pintura a los perfiles y se empalman con soldadora para posteriormente comenzar su instalacion.

Viernes 18
Julio 2025

Registro de Horas:
Mañana: Llovizna suave
Tarde: Lluvia copiosa.

Personal en Obra: Residente de Obra
Maestro de obra
Ayudantes

Maquinaria y Equipo: Herramientas menores
Andamios
Escaleras
Trompo - Mezcladora

Actividades: En la Institucion Educativa Las Nieves Arriba, se realizan algunos retoques de pintura y se continua con la impermeabilización de paredes externas.
En la Institucion Educativa La Honda Sede Esperanza La Trocha 5 se continua con la fundicion de Sardineles perimetrales y nivelizacion del terreno para la instalacion de pisos en el corredor.
Se realiza el desmonte de cobierta y enhamudos.

Sabado 14 Julio 2025

Registro de Horas: Mañana: Nublado
Tarde

Personal en Obra: Residente de Obra
Fuerte de Obra
Ayudante de Obra.

Equipos y maquinaria: Herramientas menores
Andamios
Escaleras
Trompo - mezcladora

Actividades: En la Institucion Educativa las Nieves Arriba se realiza aseo general y se da por terminado las actividades.
En la Institucion Educativa La Moñoz sede Esperanza La Tiocha S se Vacia una losa en concreto simple de 3000 PSI y espesor 008 metros
Ademas se continua con el desmonte de enramado de la cubierta.

Domingo 20 Julio 2025

Durante este dia no se labora en las Instituciones.

Lunes 21 julio 2025

Registro Horas

Mañana Sabado

Tarde: Sabado - Sabado.

Personal En Obra: Director de Obra
Residente de Obra
Profesional SISO
Maestro de obra
Ayudantes de obra.

Actividades: En la Institucion Educativa La Nueva Sede Esperanza.
La Fachada 5, se continua con la instalacion de los andenes perimetrales.
Tambien se da inicio a la instalación de entramado de perfil
se comienza con el lavado, corte, rotura y resane de paredes.

Martes 22 julio 2025

Registro de Horas: Mañana Sabado
Tarde Sabado.

Personal En Obra: Residente de Obra.
Maestro de obra
Ayudantes de Obra.

Actividades: Se continua con la instalación de los perfiles para entramado de la cubierta.
Se continua con el lavado, corte, rotura y resane de paredes.
Se concluye la instalacion de pisos en los andenes exteriores.

Miercoles 23 Julio 2025

Registro de lluvias

Mañana : Parcialmente nublado

Tarde Nublado

Personal en obra Director de obra
Residedente de obra
Profesional Sisso
Maestro de Obra
Ayudantes de obra

Equipos y Maquinaria : Herramientas menores

Actividades: En la Institucion Educativa La Aurora, sede esperanza La Trocha 5, se continua con la instalacion de perfiles para cubierta en 4 aguas.
Se continua con el lavado, retoque y resane de paredes. Se da Inicio a la instalacion de luminas o cubierta teja termoacustica upvc 2.5 mms

Jueves 24 Julio 2025

Registro de lluvias : Mañana: Despejado—soleado

Tarde Despejado

Personal en Obra: Residente de Obra
Maestro de Obra
Ayudantes de Obra

Equipos y Maquinaria: Herramientas menores
Andamios

Actividades: Se realiza retoque en la pintura de los perfiles se continua con el lavado, retoque y resane de paredes

eines 25 de Registro de lluvias: Mañana: Soleado
otiembre 2025 Tarde: Parcialmente Nublado.

Personal en obra: Residente de Obra
Maestro de Obra
Ayudantes de obra

Equipos y maquinaria: Herramientas menores.
Andamios - Escaleras

Actividades: Se continua con la instalación de la cubierta en la 2da c.
Esperanza La Tiacha 5.
Se da Inicio a la aplicación de la pintura en las paredes.

[signature]

ado 28 de Registro de lluvias: Mañana: Soleado.
e 2025 Tarde:

Personal en obra: Residente de Obra
Maestro de Obra
Ayudante de Obra

Equipos y maquinaria: Herramientas menores

Actividades: Se continua con la instalación de la cubierta. Incluyendo la colocación de tornillos con arandela de sellado, alineación, traslape y fijación de las piezas de tal forma que el área cubierta este impermeabilizada sea resistente al viento y tenga un aislamiento térmico básico.
Se continua con la aplicación de la pintura en las paredes.

[signature]

ayo 27 de
IO 2025 Durante este día no se laboro en las instalaciones.

[signature]

Lunes 28 de Julio 2025	Registro de lluvias: Mañana: Nublado Tarde Parcialmente nublado Personal en obra: Director de obra Residente de obra Profesional SSSO Hueltro de Obra Ayudante de Obra Equipos y maquinaria: Herramientas menores Actividades: Se realizan algunos retoques en las paredes pintadas Se continua con la instalacion de la cubierta
Martes 29 de Julio 2025	Registro de lluvias: Mañana: Parcialmente nublado Tarde : Llovizna suave Personal en obra: Residente de Obra Profesional SSSO Hueltro de obra Ayudante de obra Equipos y maquinaria: Herramientas menores Actividades: Se instala caballete UPVC sobre las lumbreras del techo y se continua de instalar la cubierta.

Miercoles

30 de julio 2025

Registro de Horas: Mañana: Soldado

Tarde : Soldado.

Personal en obra: Residente de Obra

Maestro de Obra

Ayudantes de Obra

Equipos y maquinaria: Herramientas menores

Andamios.

Actividades: En la Institucion Educativa La Honda, sede la Esperanza La Trocha 5 se termina de instalar el caballete. Ademas se hacen algunos retoques en la pintura.

Se realiza aseo general y se da por terminado las actividades en esta Institucion Educativa

Jueves 31 de julio 2025

Registro de Horas: Mañana: Lluvia fuerte

Tarde : Lluvia fuerte - Vendaval.

Personal en obra: Residente de Obra

Maestro de Obra

Ayudante de Obra.

Equipos y maquinaria: Herramientas menores.

Actividades: Se organizan los materiales que fueron descargados en dias anteriores. en horas de la mañana.

En horas de la tarde no se puede ingresar a la Institucion Educativa debido a las fuertes lluvias que impiden el ingreso al area.

CERTIFICADO DE MATERIALES

Carrera 15 No 06-25 B/ JUAN XXIII
EMAIL: inerciaingenierosas@gmail.com
Florencia-Caquetá

BUYER	FABRITEJAS Y LAMINAS CAQUETA SAS	CERTIFICATE NO.	LW-ZXM0207	CERTIFICATE DATE	05/08/2025
PRODUCT	PREPAINTED 55% ALUZINC STEEL COILS	INV. NO.	LWZXM20250207	S/C NO.	LWZXM20250107
STANDARD	ASTM '92, DX51D				

	COILS' No.	SIZE (MM)	QUANTITY			CHEMICAL COMPOSITION (%)								ALUMINIZINC G/M2	IMPACT TOP/BACK	T-BEND TOP/BACK	GLOSS (%)	MEK TOP/BACK	PENCIL HARDNESS	PAINT (MIC)		BENDING	QUALITY GRADE	COLOUR	
			NET WEIGHT (MT)	GROSS WEIGHT (MT)	COIL METERS	Fe	C	Si	Mn	P	S	Alt	Cu							TOP	BACK			TOP	BACK
1	250220D45	0.34*1220MM	4,342	4,352	1380	≥99.28	≤0.07	≤0.03	≤0.5	≤0.025	≤0.025	≥0.02	≤0.1	40	9J/6J	1T/2T	85	100/100	2H	20	10	6	A	RAL3020	RAL9003
2	250220D46	0.34*1220MM	4,158	4,168	1316	≥99.28	≤0.07	≤0.03	≤0.5	≤0.025	≤0.025	≥0.02	≤0.1	40	9J/6J	1T/2T	85	100/100	2H	20	10	6	A	RAL3020	RAL9003
3	250220D47	0.34*1220MM	4,484	4,494	1422	≥99.28	≤0.07	≤0.03	≤0.5	≤0.025	≤0.025	≥0.02	≤0.1	40	9J/6J	1T/2T	85	100/100	2H	20	10	6	A	RAL3020	RAL9003
4	250221C02	0.34*1220MM	4,308	4,318	1405	≥99.28	≤0.07	≤0.03	≤0.5	≤0.025	≤0.025	≥0.02	≤0.1	40	9J/6J	1T/2T	85	100/100	2H	20	10	6	A	RAL3020	RAL9003
5	250221C03	0.34*1220MM	4,184	4,194	1365	≥99.28	≤0.07	≤0.03	≤0.5	≤0.025	≤0.025	≥0.02	≤0.1	40	9J/6J	1T/2T	85	100/100	2H	20	10	6	A	RAL3020	RAL9003
6	250221C04	0.34*1220MM	4,628	4,638	1440	≥99.28	≤0.07	≤0.03	≤0.5	≤0.025	≤0.025	≥0.02	≤0.1	40	9J/6J	1T/2T	85	100/100	2H	20	10	6	A	RAL3020	RAL9003
7	250221C05	0.34*1220MM	4,550	4,560	1416	≥99.28	≤0.07	≤0.03	≤0.5	≤0.025	≤0.025	≥0.02	≤0.1	40	9J/6J	1T/2T	85	100/100	2H	20	10	6	A	RAL3020	RAL9003
8	250221D28	0.34*1220MM	4,690	4,700	1464	≥99.28	≤0.07	≤0.03	≤0.5	≤0.025	≤0.025	≥0.02	≤0.1	40	9J/6J	1T/2T	85	100/100	2H	20	10	6	A	RAL6005	RAL9003
9	250221D29	0.34*1220MM	4,692	4,702	1464	≥99.28	≤0.07	≤0.03	≤0.5	≤0.025	≤0.025	≥0.02	≤0.1	40	9J/6J	1T/2T	85	100/100	2H	20	10	6	A	RAL6005	RAL9003
10	250221D77	0.34*1220MM	4,646	4,656	1446	≥99.28	≤0.07	≤0.03	≤0.5	≤0.025	≤0.025	≥0.02	≤0.1	40	9J/6J	1T/2T	85	100/100	2H	20	10	6	A	RAL5017	RAL9003
11	250221D78	0.34*1220MM	4,564	4,574	1419	≥99.28	≤0.07	≤0.03	≤0.5	≤0.025	≤0.025	≥0.02	≤0.1	40	9J/6J	1T/2T	85	100/100	2H	20	10	6	A	RAL5017	RAL9003
12	250221D79	0.34*1220MM	4,284	4,294	1358	≥99.28	≤0.07	≤0.03	≤0.5	≤0.025	≤0.025	≥0.02	≤0.1	40	9J/6J	1T/2T	85	100/100	2H	20	10	6	A	RAL5017	RAL9003
13	250221D80	0.34*1220MM	4,388	4,398	1394	≥99.28	≤0.07	≤0.03	≤0.5	≤0.025	≤0.025	≥0.02	≤0.1	40	9J/6J	1T/2T	85	100/100	2H	20	10	6	A	RAL5017	RAL9003
14	250222C01	0.34*1220MM	4,286	4,296	1359	≥99.28	≤0.07	≤0.03	≤0.5	≤0.025	≤0.025	≥0.02	≤0.1	40	9J/6J	1T/2T	85	100/100	2H	20	10	6	A	RAL5017	RAL9003
15	250222C02	0.34*1220MM	4,348	4,358	1424	≥99.28	≤0.07	≤0.03	≤0.5	≤0.025	≤0.025	≥0.02	≤0.1	40	9J/6J	1T/2T	85	100/100	2H	20	10	6	A	RAL5017	RAL9003
16	250222C03	0.34*1220MM	4,332	4,342	1416	≥99.28	≤0.07	≤0.03	≤0.5	≤0.025	≤0.025	≥0.02	≤0.1	40	9J/6J	1T/2T	85	100/100	2H	20	10	6	A	RAL5017	RAL9003
17	250222C03	0.40*1220MM	4,350	4,350	1135	≥99.28	≤0.07	≤0.03	≤0.5	≤0.025	≤0.025	≥0.02	≤0.1	40	9J/6J	1T/2T	85	100/100	2H	20	10	6	A	RAL5017	RAL9003
18	250222C03	0.40*1220MM	4,442	4,442	1160	≥99.28	≤0.07	≤0.03	≤0.5	≤0.025	≤0.025	≥0.02	≤0.1	40	9J/6J	1T/2T	85	100/100	2H	20	10	6	A	RAL5017	RAL9003
19	250222C03	0.40*1220MM	4,450	4,450	1162	≥99.28	≤0.07	≤0.03	≤0.5	≤0.025	≤0.025	≥0.02	≤0.1	40	9J/6J	1T/2T	85	100/100	2H	20	10	6	A	RAL3001	RAL9003
20	250222C03	0.40*1220MM	4,235	4,235	1105	≥99.28	≤0.07	≤0.03	≤0.5	≤0.025	≤0.025	≥0.02	≤0.1	40	9J/6J	1T/2T	85	100/100	2H	20	10	6	A	RAL3001	RAL9003

2, LODGE THE QUALITY COMPLAINTS WITH US,IF ANY, WITHIN 1 MONTHS OF THE DELIVERY DATE.

3, SPECIFY THE CONTRACT NO. ,CERTIFICATE NO. COIL NO., SPECIFICATIONS, QUANLITY AND FLAWS OF THE PRODUCT FOR THE CONVENINCE OF COMFIRMATION AND RESOLUTION.

4, IT IS ILLEGAL TO FORGE THE QUALITY CERTIFICATE AND COPIED ONES ARE INVALID.

PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901048151
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			INERCIA S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA	DEPARTAMENTO:	CAQUETA
DIRECCIÓN:	CARRERA 15 06-25	TELÉFONO:	7777777
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4618461609	TIPO DE PLANILLA:			Y-INDEPENDIENTES EMPRESAS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	junio	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			49				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/08/25	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9993758884

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 113.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.300	$ 0	$ 113.900	$ 3.300	$ 117.200
230301	230301-PORVENIR	1	$ 113.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.300	$ 0	$ 113.900	$ 3.300	$ 117.200
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 6.600**	**$ 234.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 89.000	$ 0	$ 2.600	$ 0	$ 89.000	$ 2.600	$ 0	$ 91.600
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 89.000	$ 0	$ 2.600	$ 0	$ 89.000	$ 2.600	$ 0	$ 91.600
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 5.200**	**$ 0**	**$ 183.200**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2		$ 0	$ 0		$ 0	$ 99.200	$ 99.200	$ 2.900	$ 0	$ 102.100
SUBTOTALES:									**$ 99.200**	**$ 2.900**	**$ 0**	**$ 102.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																										PENSION								SALUD						ARP																	
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																									
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	CCF	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	TOTAL APORTE	ICBF	TOTAL APORTE	ESAP	TOTAL APORTE	MINEDU	TOTAL APORTE
1	CC 56185320	GOMEZ ROA JAIRO ALBERTO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO	16																230301-PORVENIR	15	$ 711.750	$ 113.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 113.900	EPS037-NUEVA EPS	15	$ 711.750	$ 89.000	$ 0	$ 89.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	15	$ 711.750		$ 49.600		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 40782364	RAMOS LOZANO DIANA LORENA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO	16																25-14 COLPENSIONES	15	$ 711.750	$ 113.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 113.900	EPS005-SANITAS S.A.	15	$ 711.750	$ 89.000	$ 0	$ 89.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	15	$ 711.750		$ 49.600		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 519.700

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE PREVIO AL PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901048151
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			INERCIA S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA	DEPARTAMENTO:	CAQUETA
DIRECCIÓN:	CARRERA 15 06-25	TELÉFONO:	7777777
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4618479303	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			42		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/08/22		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	3	$ 341.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.100	$ 0	$ 341.700	$ 9.100	$ 350.800
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 144.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.800	$ 0	$ 144.000	$ 3.800	$ 147.800
SUBTOTALES:										**$ 485.700**	**$ 12.900**	**$ 498.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 93.000	$ 0	$ 2.500	$ 0	$ 93.000	$ 2.500	$ 0	$ 95.500
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 28.500	$ 0	$ 800	$ 0	$ 28.500	$ 800	$ 0	$ 29.300
SUBTOTALES:													**$ 121.500**	**$ 3.300**	**$ 0**	**$ 124.800**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	4		$ 0	$ 0		$ 0	$ 211.500	$ 211.500	$ 5.600	$ 0	$ 217.100
SUBTOTALES:									**$ 211.500**	**$ 5.600**	**$ 0**	**$ 217.100**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF13	CCF13-COMFACA	4	$ 121.500	$ 3.300	$ 124.800
SUBTOTALES:			**$ 121.500**	**$ 3.300**	**$ 124.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES					
																										PENSIÓN							SALUD							ARP														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1102824634	MELENDEZ VILLEGAS JOSE MIGUEL	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI	16																231001-COLFONDOS	15	$ 900.000	$ 144.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 144.000	EPS005-SANITAS S.A.	15	$ 900.000	$ 36.000	$ 0	$ 36.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	15	$ 900.000		$ 62.700	15	$ 900.000	CCF13-COMFACA	$ 36.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1125411377	LAIRO CONDA YORMAN ALBERTO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	16																230301-PORVENIR	15	$ 711.750	$ 113.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 113.900	EPS037-NUEVA EPS	15	$ 711.750	$ 28.500	$ 0	$ 28.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	15	$ 711.750		$ 49.800	15	$ 711.750	CCF13-COMFACA	$ 28.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1018589894	GUZMAN SALAS ALEXANDER	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	16																230301-PORVENIR	15	$ 711.750	$ 113.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 113.900	EPS005-SANITAS S.A.	15	$ 711.750	$ 28.500	$ 0	$ 28.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	15	$ 711.750		$ 49.800	15	$ 711.750	CCF13-COMFACA	$ 28.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1018589643	CRUJELA MANRIQUE OSCAR	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	16																230301-PORVENIR	15	$ 711.750	$ 113.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 113.900	EPS005-SANITAS S.A.	15	$ 711.750	$ 28.500	$ 0	$ 28.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	15	$ 711.750		$ 49.800	15	$ 711.750	CCF13-COMFACA	$ 28.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 965.300

Nota: Este soporte no es válido para reclamaciones ante entidades financieras y administradoras.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901048151
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			INERCIA S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA	DEPARTAMENTO:	CAQUETA
DIRECCIÓN:	CARRERA 15 06-25	TELÉFONO:	7777777
TIPO APORTANTE:	15-CONTRATANTE	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	02 - OTROS
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		4618338814		TIPO DE PLANILLA:			Y-INDEPENDIENTES EMPRESAS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	julio	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		8					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/08/22		NÚMERO AUTORIZACIÓN:			0983735818

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	2	$ 410,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2,100	$ 0	$ 410,100	$ 2,100	$ 412,200
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,200	$ 0	$ 227,800	$ 1,200	$ 229,000
SUBTOTALES:										**$ 637,900**	**$ 3,300**	**$ 641,200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 320,400	$ 0	$ 1,700	$ 0	$ 320,400	$ 1,700	$ 0	$ 322,100
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178,000	$ 0	$ 1,000	$ 0	$ 178,000	$ 1,000	$ 0	$ 179,000
SUBTOTALES:													**$ 498,400**	**$ 2,700**	**$ 0**	**$ 501,100**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	3		$ 0	$ 0		$ 0	$ 277,500	$ 277,500	$ 1,500	$ 0	$ 279,000
SUBTOTALES:									**$ 277,500**	**$ 1,500**	**$ 0**	**$ 279,000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES							
																									PENSIÓN								SALUD								ARP								CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1117514281	ORTEGA RONDON CARLOS AUGUSTO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1,423,500				NO	97																230301-PORVENIR	24	$ 1,138,800	$ 182,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 182,300	EPS037-NUEVA EPS	24	$ 1,138,800	$ 142,400	$ 0	$ 142,400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	24	$ 1,138,800		$ 79,300	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 36185309	GOMEZ RODRIGO ALBERTO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1,423,500				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1,423,500	$ 227,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227,800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1,423,500	$ 178,000	$ 0	$ 178,000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1,423,500		$ 99,100	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 52782364	RAMOS LOZANO DIANA LORENA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1,423,500				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1,423,500	$ 227,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227,800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1,423,500	$ 178,000	$ 0	$ 178,000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1,423,500		$ 99,100	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 1.421.300

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901048151
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			INERCIA S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA	DEPARTAMENTO:	CAQUETA
DIRECCIÓN:	CARRERA 15 06-25	TELÉFONO:	7777777
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4619287114	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	agosto	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			15				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/08/29	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			993818659

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 288,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2,800	$ 0	$ 288,000	$ 2,800	$ 290,800
230301	230301-PORVENIR	3	$ 683,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6,500	$ 0	$ 683,400	$ 6,500	$ 689,900
SUBTOTALES:										**$ 971,400**	**$ 9,300**	**$ 980,700**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57,000	$ 0	$ 600	$ 0	$ 57,000	$ 600	$ 0	$ 57,600
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 186,000	$ 0	$ 1,800	$ 0	$ 186,000	$ 1,800	$ 0	$ 187,800
SUBTOTALES:													**$ 243,000**	**$ 2,400**	**$ 0**	**$ 245,400**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	4		$ 0	$ 0		$ 0	$ 422,600	$ 422,600	$ 4,100	$ 0	$ 426,700
SUBTOTALES:									**$ 422,600**	**$ 4,100**	**$ 0**	**$ 426,700**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF13	CCF13-COMFACA	4	$ 243,000	$ 2,400	$ 245,400
SUBTOTALES:			**$ 243,000**	**$ 2,400**	**$ 245,400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD							ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1102824534	MELENDEZ VILLEGAS JOSE MIGUEL	DEPEND		$ 1.800.000	FIJO			SI																	231001-COLFONDOS	30	$ 1,800,000	$ 288,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 288,000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1,800,000	$ 72,000	$ 0	$ 72,000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1,800,000		$ 125,300	30	$ 1,800,000	CCF13-COMFACA	$ 72,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1125411373	LARA CONDA YORMAN ALBERTO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1,423,500	$ 227,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227,800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1,423,500	$ 57,000	$ 0	$ 57,000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1,423,500		$ 99,100	30	$ 1,423,500	CCF13-COMFACA	$ 57,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 16185894	GUZMAN BALAS ALEXANDER	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1,423,500	$ 227,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227,800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1,423,500	$ 57,000	$ 0	$ 57,000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1,423,500		$ 99,100	30	$ 1,423,500	CCF13-COMFACA	$ 57,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 16189643	DRUJELA MANRIQUE OSCAR	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1,423,500	$ 227,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227,800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1,423,500	$ 57,000	$ 0	$ 57,000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1,423,500		$ 99,100	30	$ 1,423,500	CCF13-COMFACA	$ 57,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 1.898.200

Valparaíso, 02 septimbre 2025

Señores:
Alcaldía Valparaíso
Municipio Valparaíso

Referencia: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DE LAS VEREDAS EL AGUILA, BUENAVISTA LA RICO Y LOS CENTROS POBLADOS DE PLAYA RICA Y KILOMETRO 18 DEL MUNICIPIO DE VALPARAÍSO CAQUETÁ

Asunto: Certificado afiliaciones seguridad social personal en obra

El suscrito FERNANDO GASCA ENDO, identificado con cédula de ciudadanía No.1117510024 y Tarjeta Profesional 198384-T, en mi calidad de Contador Público de la empresa INERCIA SAS con NIT. 901048151-1 bajo la gravedad de juramento manifiesto, que la empresa se encuentra a PAZ y SALVO en el pago al sistema de seguridad social, del personal ofertado en la propuesta del contrato de la referencia.

Firma
Nombre y Apellidos FERNANDO GASCA ENDO
Identificación No.1117510024
Tarjeta Profesional: 198384-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.117.510.024

GASCA ENDO

APELLIDOS
FERNANDO

NOMBRES
FERNANDO GASCA ENDO

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 28-NOV-1989
FLORENCIA
(CAQUETA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.66 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

06-DIC-2007 FLORENCIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-4400100-00073461-M-1117510024-20080918 0003472303A 1 23774202

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

198384-T



FERNANDO
GASCA ENDO
C.C. 1117510024
RESOLUCION INSCRIPCION 1757
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

FECHA 23/12/2014

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 210550

2000[illegible]

Esta tarjeta es el unico documento que le acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 36 No. 9A - 21 Bogotá D.C.

www.ugpp.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0 4 E C 9 D 8 0 6 6 9 D 6 A 1 5

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **FERNANDO GASCA ENDO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1117510024 de FLORENCIA (CAQUETA) Y Tarjeta Profesional No 198384-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 24 días del mes de Junio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

INERCIA SAS

Oficina Principal

Direccion: CR 15 06 25 Brr. JUAN XXIII Telefono: 3134763476 - Ciudad: FLORENCIA

Nit: 901,048,151-1 Responsable de IVA - Régimen Ordinario

Cliente: 800,050,407-1 **MUNICIPIO VALPARAÍSO**
Estab:
Dirección: CL 11 3 50 **Barrio:** BRR EL CENTRO - **Ciudad:** Valparaíso,Caquetá
Telefonos: 3105730581
Correo: secretaria-hacienda@valparaiso-caqueta.gov.co

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA **FEVI-62**
Fecha Doc: **03-septiembre-2025 02:56:54 p. m.**
Vendedor: DIANA MARCELA QUIROGA DIAZ

Comentario: Primer cobro parcial contrato de obra CO-003-2025 cuyo Objeto es: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DE LAS VEREDAS EL AGUILA, BUENAVISTA LA RICO Y LOS CENTROS POBLADOS DE PLAYA RICA Y KILOMETRO 18 DEL MUNICIPIO DE VALPARAÍSO CAQUETÁ.

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Talla	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
0000107	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA			UNIDAD	1	134,940,316	0	134,940,316	0	0	134,940,316

Numero de Items: 1 - Total Productos: 1

Forma de Pago : CRÉDITO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	134,940,316	03/10/2025	62	800,050,407
Total:	**134,940,316.00**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**134,940,316**
Impuestos:	**0**
Total Factura:	**134,940,316**

Moneda: (COP)

(CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS PESOS)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Sin Impuestos	134,940,316	0

y.k.era@hotmail.com Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. DE:

Habilitación DIAN: N° 18764087888012 Vigente desde: 28/01/2025 hasta: 28/01/2026 Prefijo: FEVI Del 54 al 1000 SamitSql - Facturacion **Pag: 1 de 1**

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :6c30657e79a4028a1340fd0f503353cec1f18b30fd88dad9f1610fd20dd9acda146faa03e5e312cfa3071e4cd3f747b2 Fecha Validación: 03-septiembre-2025 02:56 p. m.

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

OK 18-09-2025 A: 10:55 Am (23)

INFORMA:

Que la empresa INERCIA SAS identificado(a) con NITPJ 9010481511 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA AHORROS No. 201259314 desde el 16 de abril de 2024, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 02 de julio de 2025, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota
