	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 14/08/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MANTENIMIENTO RUTINARIO

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE — SEMANA No.: 60,00 del 8-ago al 14-ago (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL EN EL SECTOR 6514 PAZ DE ARIPORO – LA CABUYA, PR19+0000 - PR 73+0380" LOTE 6.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EN EL SECTOR 6514 PAZ DE ARIPORO – LA CABUYA, PR19+0000 - PR 73+0380.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

SE TRATA DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAL NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS, PARA MANTENER UNA TRANSITABILIDAD SEGURA A LO LARGO DEL CORREDOR VIAL MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE PARCHEOS, BACHEOS Y/O TAPAHUECOS, ADICIONALMENTE MEDIANTE LA ROCERÍA ALTA Y BAJA, Y DEL CUIDADO DE LOS ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y RENOVACIÓN DE PINTURA EN LOS POSTES DE REFERENCA Y OTROS COMO LOS REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO. TAMBIÉN SE MANTIENE UNA PERMANENTE VIGILANCIA A LO LARGO DEL CORREDOR VIAL PARA MONITOREAR Y DETECTAR PUNTUALMENTE LOS SITIOS CRÍTICOS Y ATENDER LAS EMERGENCIAS QUE SE PRESENTEN.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 1718/2024 — VALOR INICIAL: $ 1.495.117.568,00
FECHA DE INICIO: 4/06/2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/07/2026 — VALOR ACUMULADO: $ 1.495.117.568,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: FEDERICO RAMIREZ OSORIO
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 1873 DE 2024 — VALOR INICIAL: $ 4.050.198.082,00
FECHA DE INICIO: 20/06/2024 — VALOR ADICIONES:
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/07/2024 — VALOR ACUMULADO: $ 4.050.198.082,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	SALDO EJECUTADO DEL 2024 EN 2025	2025	2026	ACUMULADO
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 484.572.777,00		$ 622.192.484	$ 388.352.307,00	$ 1.495.117.568
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 334.355.218,00	$ -	$ (139.556.433)		$ 10.661.126
	SALDO DE VIGENCIA	$ 150.217.559,00		$ 761.748.917	$ 388.352.307,00	$ 1.150.101.224
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.405.284.328		$ 1.589.794.304	$ 1.055.119.450,00	$ 2.644.913.754
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 578.691.017	$ 586.051.900			$ 586.051.900
	SALDO DE VIGENCIA	$ 826.593.311	$ 240.541.411	$ 1.589.794.304	$ 1.055.119.450,00	$ 2.885.455.165

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) ,
(Indicar valores en pesos) ,

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): ACUMULADO	$ 1.469.731.300,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.077.842.350,00	73,34%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.495.117.568,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.096.459.626,79	73,34%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 11.306.698,13	100,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 11.306.698,13	100,00%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 2025E-VUVRAZ-072251
PERIODO FACTURADO: jun-25
VALOR FACTURA: $ 51.849.374,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.050.198.082,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.164.742.917,08	28,76%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 23.650.883,92	0,58%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 23.650.883,92	0,58%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 2025E-VUVRAZ-059996
PERIODO FACTURADO: jun-25
VALOR FACTURA: $ 101.360.931,07

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

INDICADOR I/C	
En el mes:	1,95
Acumulado:	1,08

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 100%
Meta Física Ejecutada %: 100%
Avance o Atraso Físico %:

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base							Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual		Unidad	Cantidad	Vigencia		Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Manteniemiento rutinario		5 dias	12	5 dias			Prog	10			10	100,0%
							Ejec	10			10	100,0%
*							Prog					
							Ejec					
*							Prog					
							Ejec					
*							Prog					
							Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
GUADAÑAS	12	12
HERRAMIENTA MENOR	15	15
Total	27	27

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: RUTA 6514 PAZ DE ARIPORO-LA CABUYA, PR 19+0000 AL PR 73+0380
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN: N/A	PERMISO MINERO: SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO
UBICACIÓN: N/A	PERMISO MINERO: SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	10	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	10	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	10	5

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 17

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALUOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ROCERÍA MECÁNICA, LIMPIEZA DE OBRAS Y CUNETAS DESCOLES, ENCOLES, SEÑALES, MOJONES, BERMAS DESDE EL PR 38+0000 AL PR 40+0000
ROCERÍA MECÁNICA, LIMPIEZA DE OBRAS Y CUNETAS DESCOLES, ENCOLES, SEÑALES, MOJONES, BERMAS DESDE EL PR 40+0000 AL PR 42+0000

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

ROCERÍA MECÁNICA, LIMPIEZA DE OBRAS Y CUNETAS DESCOLES, ENCOLES, SEÑALES, MOJONES, BERMAS DESDE EL PR 42+0000 AL PR 44+0000

ROCERÍA MECÁNICA, LIMPIEZA DE OBRAS Y CUNETAS DESCOLES, ENCOLES, SEÑALES, MOJONES, BERMAS DESDE EL PR 44+0000 AL PR 46+0000

JORNADA DE TAPAHUECOS

OBSERVACIÓN: NOS ENCONTRAMOS EN TEMPORADA DE LLUVIAS LO CUAL GENERA UN ATRASO EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

LIMPIEZA DE CUNETAS

LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE

LIMPIEZA DE CALZADA


LIMPIEZA DE PUENTES

DESPEJE DE SEÑALIZACIÓN Y ALINEAR LAS SEÑALES QUE ESTÉN TORCIDAS.

ROCERÍA DEL PR 46+0000 AL 52+0000 PR RUTA 6514.

TAPAHUECOS

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO







LIMPIEZA DE OBRA PR 38+0680







DESPEJE DE BORDE DE VIA PR 41+0350








LIMPIEZA DE OBRA PR 40+0000





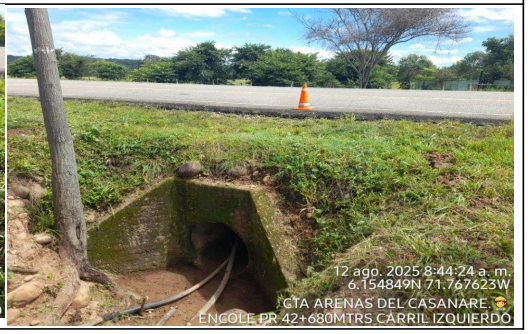

LIMPIEZA DE OBRA PR 42+0680







TAPAHUECOS PR 28+0500

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	FIRMA NOMBRE: CLAUDIA MARITZA HURTADO Matrícula Profesional No.: 19202-77236 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.
