ingeplanos
Primeros en Impresión Eco amigable

INGEPLANOS S.A.S
NIT: 900862115-1
Régimen simple
de tributación

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN N° 02
PERIODO DE 01 DE JULIO DE 2025 A 31 DE JULIO DE 2025

CONTRATO IPVO-011-2025

"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA Y SEÑALIZACIÓN, PARA LA DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"


1. INTRODUCCIÓN

Teniendo en cuenta las actividades contratadas para **"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA Y SEÑALIZACIÓN, PARA LA DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"** a continuación, se presenta informe de ejecución mensual N° 02 con corte del 01 al 31 de julio de 2025, de las actividades ejecutadas con el fin de poner en su conocimiento las mismas.

1.1 INFORME ADMINISTRATIVO

1.1.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

La ejecución del proyecto para la dotación de la nueva plaza de mercado se desarrolla en el casco urbano.

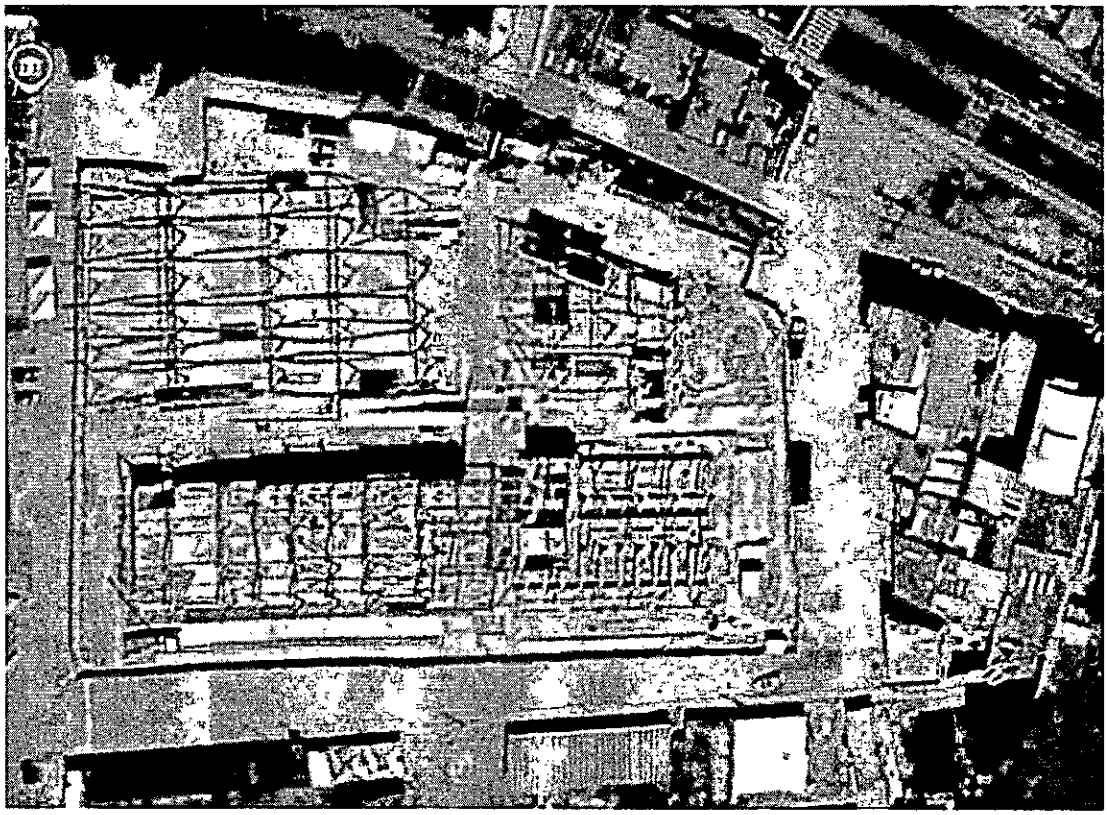

1.2 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO:

CONTRATO	IPVO-011-2025
CONTRATANTE	TIERRASUA S.A.S
CONTRATISTA	INGEPLANOS S.A.S
OBJETO	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA Y SEÑALIZACIÓN, PARA LA DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"
VALOR CONTRATO	DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS ($243.226.480,00)
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	12 DE JUNIO DE 2025
FECHA ACTA DE INICIO	20 DE JUNIO DE 2025
PLAZO INICIAL	TRES (03) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DE LA RESPECTIVA ACTA DE INICIO
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	19 DE SEPTIEMBRE DE 2025

1.3 **CONTROL ADMINISTRATIVO:** Relación el personal que intervino en la ejecución del contrato.

NOMBRE	CÉDULA
AGUIRRE LEMUS DEISY KARINA	1118572779
ARIZA RIVERA YURI ANDREA	53081028
CASTELBLANCO ROA LUIS ALEJANDRO	1057466725
GONZALEZ PEDRAZA PAULA ANDREA	1049652611

1.4 **CONTROL LEGAL** Actas generadas en la ejecución del proyecto, a la fecha se ha suscrito únicamente acta de inicio.

CONTRATO	IPVO-011-2025
CONTRATANTE	TIERRASUA S.A.S
CONTRATISTA	INGEPLANOS S.A.S
OBJETO	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA Y SEÑALIZACIÓN, PARA LA DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"
VALOR CONTRATO	DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS ($243.226.480,00)
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	12 DE JUNIO DE 2025
FECHA ACTA DE INICIO	20 DE JUNIO DE 2025
PLAZO INICIAL	TRES (03) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DE LA RESPECTIVA ACTA DE INICIO
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	19 DE SEPTIEMBRE DE 2025

1.5 CONTROL DE GARANTIAS:

GARANTIAS	VALOR	VIGENCIA		PORCENTAJE DE ASEGURAMIENTO
		DESDE	HASTA	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 243.226.480			
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 24.322.648	12/06/2025	20/03/2026	10% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	$ 12.161.324	12/06/2025	20/09/2028	5% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	$ 24.322.648	12/06/2025	20/09/2026	10% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO

1.6 ANEXOS

- Contrato firmado por las partes
- Acta de inicio firmada por las partes
- Póliza de garantías exigidas
- Aprobación de pólizas
- Correspondencia enviada y recibida a la fecha

2. CONTROL TÉCNICO

Para el corte del 31 de julio de 2025, el avance proyectado correspondía al 15 %; sin embargo, no fue posible ejecutar en campo debido a ajustes en los diseños, modificaciones en las medidas y cambios en la ubicación de algunas señales, lo que implico la necesidad de modificar el método de instalación. No obstante, durante este mes se adelantaron en taller varios de los ítems programados.

2.1 ITEMS CON OBSERVACIONES

ITEM 1.1. Diseño General



Estado: Pendiente de entrega diseño

ITEM 1.2. Paleta de Colores rostro imagen 1

Observaciones técnicas:

- Los colores especificados para el rostro no se encuentran disponibles en el mercado estándar (imagen 1)
- Solución propuesta: Impresión personalizada de colores
- Para el color verde: Se identificó una alternativa semejante disponible en el mercado (evidencia fotográfica adjunta, previamente presentada en reuniones anteriores)

Especificaciones de madera nogal: Distribución 125 x 166.6 cm (ver imagen 3)

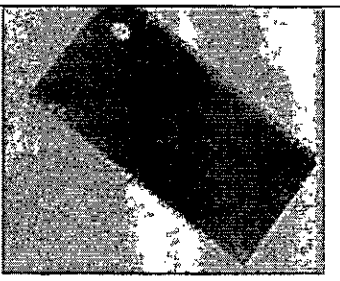IMAGEN 1	IMAGEN 2	IMAGEN 3
		

Aviso entrada bomberos elaborado acrílico con textura en madera, con relieves en acrílico y luz interior de medida 6x250mts con estructura metálica de soporte en tubo de 4x4 según diseño suministrado instalado a techo con tubo redondo y gaya de seguridad
RECOMENDACIÓN TÉCNICA: Se sugiere modificar el aviso utilizando textura en madera laminada nogal para mantener coherencia estética con las demás piezas del proyecto.

ITEM 1.3. Diseño General




Estado: Pendiente de entrega

ITEM 1.4. Diseño General

Estado: Pendiente de entrega

ITEM 1.5 Estado: Completado (evidencias fotográficas adjuntas)

Nota técnica: Para los acrílicos de color será necesaria la impresión personalizada de colores, ya que no se encuentran equivalentes en el mercado.

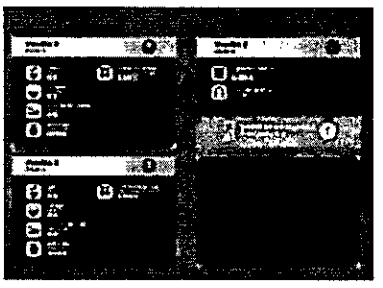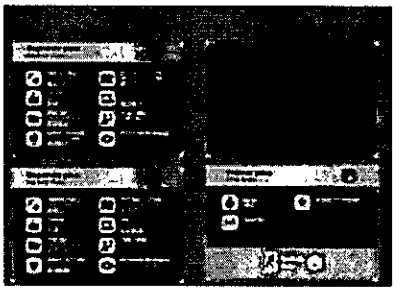ITEM 1.6 Diseño General

Estado: Pendiente de entrega

ITEM 1.7 Elemento con Especificaciones Pendientes

- Confirmación de la orientación de los brazos de anclaje
- Especificación del diseño de la parte posterior




ITEM 1.8 Corrección de Medidas

Estado: pendiente corrección de medida

Problema identificado:

- Medida contratada: 250 cm x 400 cm
- Medida del diseño recibido: 200 cm x 400 cm
- **Acción tomada:** El corte se realizó según la medida contratada (250 x 400 cm)



ITEM 1.9 Arcos con Estructura con Diseños en Foamboard

Estado: Diseño de estructura aprobado y en fabricación, pendiente envío de diseños para foamboard.

ITEM 1.10 Modificaciones de Color de Fondo

Antecedentes:


- modificaciones para el color de fondo (diseño)


Acción requerida: Envío de nuevo diseño con las modificaciones solicitadas





ITEM 1.11 Entrega Parcial de Diseños


Estado: De 100 unidades solicitadas, se entregaron 88 diseños el 25 de junio



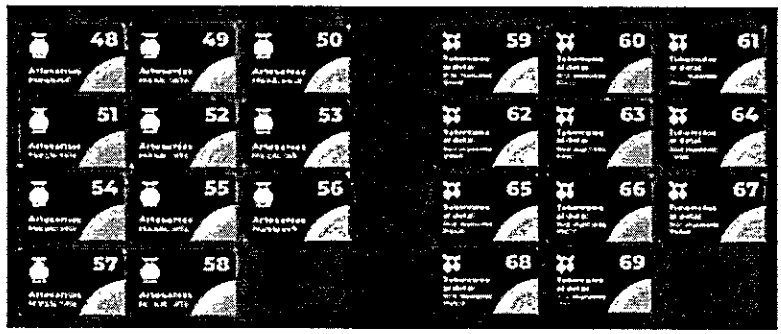








ITEM 1.12 Diseño General

Estado: Pendiente de entrega

ITEM 1.13 Compromiso de Entrega
Estado: Pendiente diseños gráficos

ITEM 1.14. Suspensión de Diseño por Ajustes


Estado: Pendiente entrega de diseños

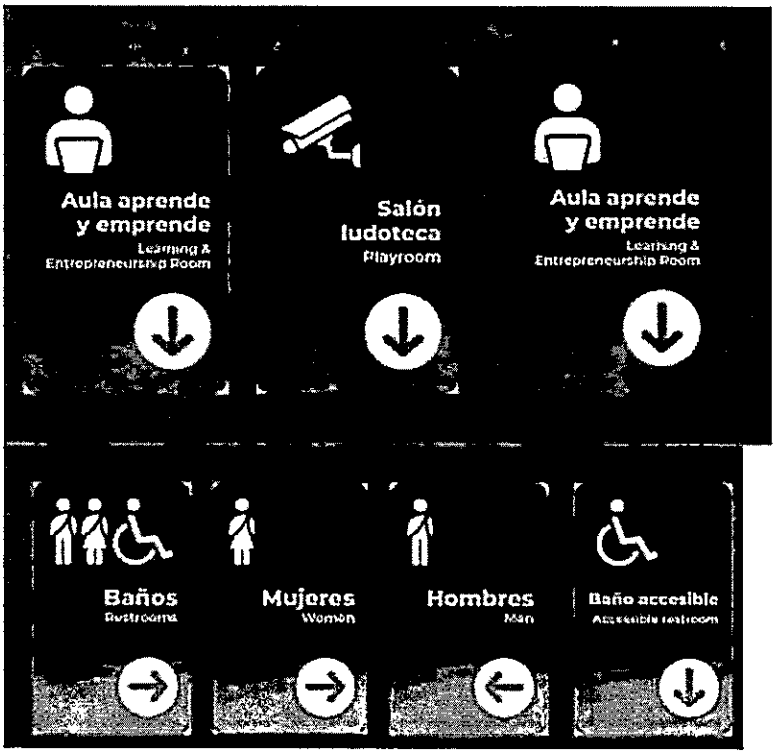


ITEM 1.15 Clarificación de Especificaciones - Señalización Plaza

- 2 unidades para zona de descargue imagen 1
- 2 unidades de la señora Araceli

ACCIÓN REQUERIDA: Especificar definitivamente qué elementos se deben realizar

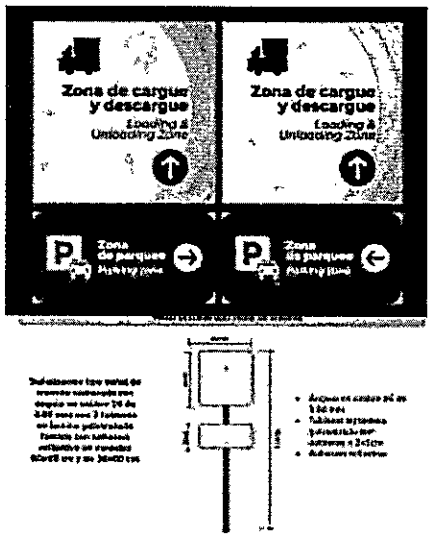


ITEM 1.16 Elementos Adicionales
Estado: Diseños pendientes de entrega
ITEM 1.17 Estos fueron los diseños que se aprobaron

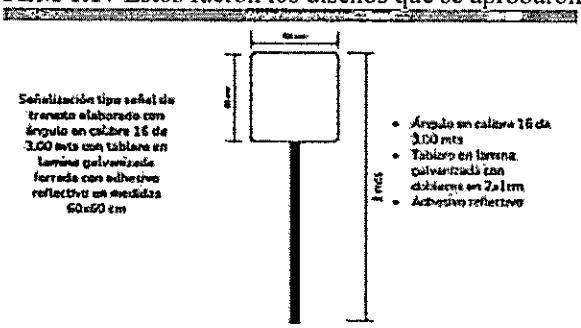



Y estos fueron los aprobados por comunicaciones





Pendiente aclarar o definir los diseños a realizar
ITEM 1.18 pendiente entrega de diseños




2.2 EVIDENCIA AVANCE EN TALLER

AVANCE EN TALLER					
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD CONTRATADA**	**CANTIDAD DE AVANCE**	**EVIDENCIA FOTOGRAFICA**
1,11	Numeración para locales en madera laminada 9mm con incrustaciones en acrílico de medidas 25x40cm instaladas en pared	UNIDAD	100	100	  

ingeplanos
Primeros en impresión Eco amigable




INGEPLANOS S.A.S
NIT: 900862115-1
Régimen simple
de tributación

1.1	Aviso abrigo elaborado en madera laminada con apliques en acrilico 2 mts ancho x 80cm alto	UNIDAD	1	1	
1.2	Aviso entrada bomberos elaborado acrilico con textura en madera, con relieves en acrilico y luz interior de medida 6x250mts con estructura metálica de soporte en tubo de 4x4 segun diseño suministrado instalado a techo con tubo redondo y grays de seguridad	UNIDAD	1	1	 
1.5	Aviso informativo en madera laminada con apliques en acrilico en relieve con luz interior de medidas 150x100cm, instalados colgados a techo con tubo redondo de 120 cm.	UNIDAD	7	7	 
1.9	ELABORACIÓN DE ARCOS	UNIDAD	11	11	

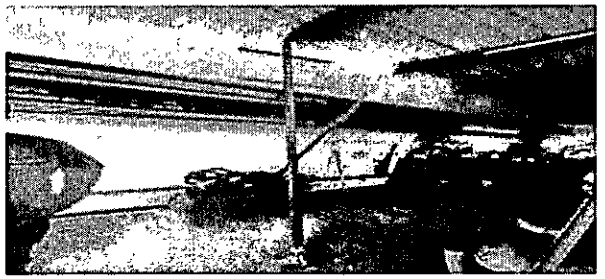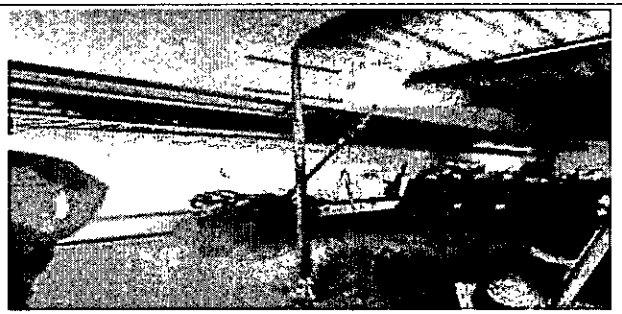
1,15	Señalización tipo señal de tránsito elaborado con ángulo en calibre 16 de 3,00 mts con 2 tableros en lámina galvanizada forrada con adhesivo reflectivo en medidas 60x60 cm y de 30x60 cm	UNIDAD	4	4	
1,16	Señalización tipo señal de tránsito elaborado con ángulo en calibre 16 de 3,00 mts con tablero en lámina galvanizada con dobleces 2x1 cm forrada con adhesivo reflectivo en medidas 2x.60m	UNIDAD	4	4	
1,17	Señalización tipo señal de tránsito elaborado con ángulo en calibre 16 de 3,00 mts con tablero en lámina galvanizada forrada con adhesivo reflectivo en medidas 60x60 cm	UNIDAD	4	4	

ingeplanos
Primeros en impresión Eco amigable

INGEPLANOS S.A.S
NIT: 900862115-1
Régimen simple
de tributación

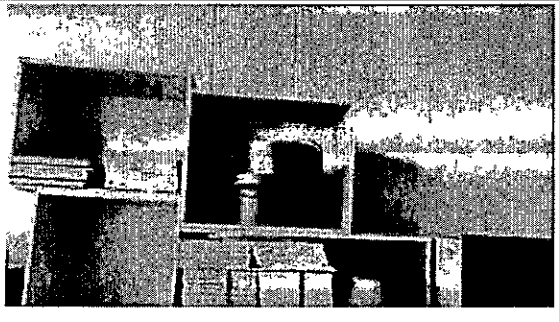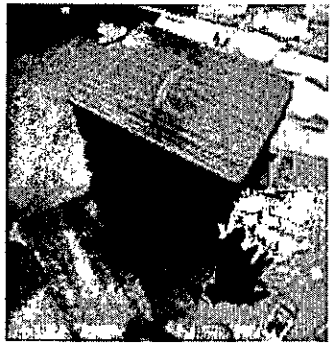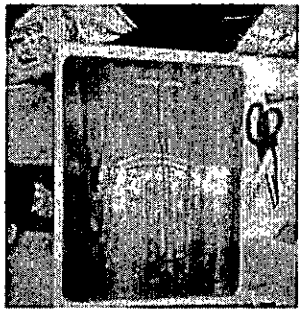1,14	Señalización de pared elaborada en madera 9mm laminada con apliques en acrilico con relieve, instalados a pared de medidas 30x40cm	UNIDAD	100	100	  

2.2 CONTROL GRAFICO DE AVANCE

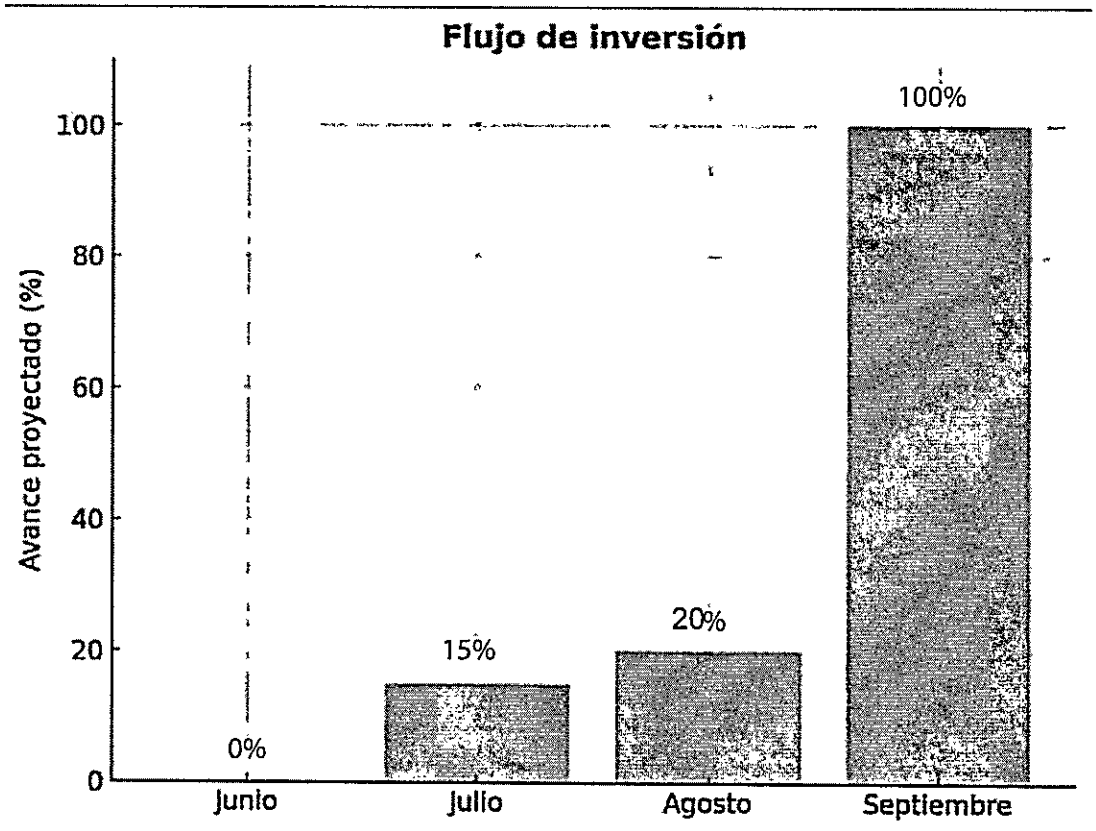

Para el mes de junio, se programa un avance del 0%, teniendo en cuenta que el acta de inicio se firmo el día 20 de junio. Durante este periodo se contempla únicamente la validación administrativa y la revisión de diseños, por lo cual no se poryecta ejecución física.

Para el mes de julio se progframa una ejecución equivalente al 15% del valor total del contrato, correspondiente al inicio de las actividades en campo.
para el mes de agosto, se proyecta avance del 5%, que sumando al acumulado al acumulado representa un 20% del contrato.

Finalmente, en el mes de septiembre se programa la entrega total del proyecto, alcanzando el 100% del valor del contrato conforme al cronograma establecido.

Tunja 03 de julio de 2025

YURI ANDREA ARIZA RIVERA
RL. INGEPLANOS S.A.S.

IPUO-088-2025-OF-025

REFERENCIA: IPUO-088 DE 2025, CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN "DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA".

ASUNTO: ACTA DE ENTREGA DE ESPACIOS DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA-BOYACÁ.

Cordial saludo,

Por medio del presente documento yo **KAREN DAYANA FLOREZ DIAZ** identificada con CC. 1.052.410.270 de Duitama, en calidad de representante legal de la empresa **INCOL INGENIEROS SAS**, en calidad de apoyo a la supervisión, me permito compartir con usted el acta de entrega de espacios de la plaza de mercado del municipio de Paipa-Boyacá para así dar inicio con actividades de suministro e instalación de los bienes adquiridos mediante su contrato -No. IPVO 011-2025.

A este documento se anexa el acta de levantamiento de espacios de acuerdo a la visita realizada en campo. Con su respectivo registro fotográfico donde se evidencia ubicación, espacio, y fecha.

FECHA	ACTO ADMINISTRATIVO	NOMBRE APODERADO DEL ESPACIO
25 Junio 2025	ACTA ENTREGA DE ESPACIOS PARA REALIZAR EL SUMINISTRO DEL INMUEBLE	YURI ANDREA ARIZA RIVERA C.C.: 53.081.028 de Bogotá

Por último, queremos recordarle el compromiso que se realizó con el contratista de obra donde se pactó que una vez finalizado el suministro e instalación de los bienes. El espacio será entregado en las mismas condiciones que se entregaron a usted. Por lo cual, le pedimos

amablemente su colaboración con el aseo y cuidado de los espacios para así llegar a un feliz término entre las partes.

Cordialmente,

PUO-088-2025-OF-25

KAREN DAYANA FLOREZ DIAZ
RL INCOL INGENIEROS SAS
NIT 901.847.609-9
SUPERVISOR IPUO-088-2025

INCOL INGENIEROS
NIT 901.847.609-9
INGENIERÍA Y OBRAS DE COLOMBIA

Gmail **INCOL INGENIEROS SAS <incol.ingenierossas@gmail.com>**

SOLICITUD RESPUESTA REQUERIMIENTOS SOLICITADOS CTO IPVO-011 DE 2025 CONTRATO IPUO-088 DE 2025 CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA

3 mensajes

INCOL INGENIEROS <incol.ingenierossas@gmail.com> 16 de junio de 2025, 3:45 p.m.
Para: ingeplanospolitica@gmail.com
CC: tecnica@tierrasua.com, gerencia@tierrasua.com

TUNJA 16 DE JUNIO DE 2025

YURI ANDREA ARIZA RIVERA
RL INGEPLANOS SAS
CONTRATISTA DE OBRA

CIUDAD

OFICIO: IPUO-088-2025-OF-003-16-06-2025

REFERENCIA: CONTRATO IPUO-088 DE 2025, CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN "DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA".

ASUNTO: SOLICITUD RESPUESTA REQUERIMIENTOS SOLICITADOS CTO IPVO-011 DE 2025

ADJUNTO OFICIO DEL ASUNTO

Cordialmente

INCOL INGENIEROS
NIT 901.847.609-9
INGENIERÍA Y OBRAS DE COLOMBIA

KAREN DAYANA FLOREZ DIAZ
Ingeniera Civil
R/L INCOL INGENIEROS SAS
NIT 901.847.609-9
Contacto: 3006264033 - 3105740450
Correo: incol.ingenierossas@gmail.com

3. IPUO-088-2025-OF-003-16-06-2025 SOLICITUD RESPUESTA REQUERIMIENTOS SOLICITADOS CTO IPVO-011 DE 2025.pdf
99K

Ingeplanos SAS <ingeplanospolitica@gmail.com> 17 de junio de 2025, 7:40 a.m.
Para: INCOL INGENIEROS <incol.ingenierossas@gmail.com>

TUNJA 17 DE JUNIO DE 2025

KAREN DAYANA FLOREZ DIAZ
RL INCOL INGENIEROS SAS
SUPERVISOR IPUO-088 DE 2025

REFERENCIA: CONTRATO IPUO-088 DE 2025, CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN "DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA".

ASUNTO: RESPUESTA REQUERIMIENTOS SOLICITADOS CTO IPVO-011 DE 2025

ADJUNTO OFICIO DEL ASUNTO
[Texto citado oculto]
--

Centro Comercial Plaza Real Oficina 113 - 114 y 115
Celular: 3154230114 - 3165763949
Tunja - Boyacá.

RESPUESTA 17:06:2025.pdf
467K


Ingeplanos SAS <ingeplanospolitica@gmail.com> 18 de junio de 2025, 4:01 p.m.
Para: INCOL INGENIEROS <incol.ingenierossas@gmail.com>

Tunja, 18 de junio de 2025


KAREN DAYANA FLOREZ DIAZ
Representante Legal
INCOL INGENIEROS SAS
NIT 901.847.609-9
Supervisor IPUO-088 DE 2025

ASUNTO: Informe de reunión para entrega de material y presentación de los materiales para el uso - Contrato IPVO-011-2025
[Texto citado oculto]

5 archivos adjuntos

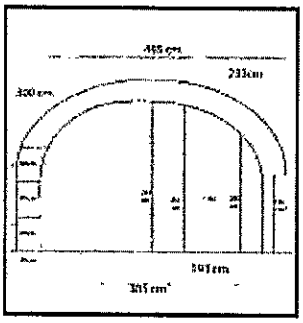

Bosquejo Arcos item 1.19.jpeg
44K




archivo entregado 17:06:2025.jpeg
53K



entregado 17:06:2025.jpeg
23K





entregado 13:06:2025.jpeg
92K

INFORME REUNION N2 17:06:2025.pdf
488K

Gmail **INCOL INGENIEROS SAS <incol.ingenierossas@gmail.com>**

PROPUESTA IPVO-011-2025

2 mensajes

Tierrasua Contratación <contratacion@tierrasua.com> 3 de junio de 2025, 11:11 a.m.
Para: incol.ingenierossas@gmail.com

Cordial saludo,

Remito la única propuesta que fue presentada al proceso de la referencia IPVO-011-2025, para que se sirvan realizar la evaluación correspondiente.

Quedo atenta a cualquier inquietud,
--

TIERRASUA®
¡Conectamos región!

Dirección Jurídica y de Contratación TIERRASUA S.A.S.
Calle 19 No. 9-35, Piso 10 Tunja (Boyacá).
contratacion@tierrasua.com

3 archivos adjuntos

13. ACTA DE CIERRE.pdf
21K

EVALUACION PRELIMINAR.docx
1287K

CO1_RANL_7923559_20250603151959.zip
12381K

INCOL INGENIEROS <incol.ingenierossas@gmail.com> 3 de junio de 2025, 4:05 p.m.
Para: opcional012348@gmail.com

[Texto citado oculto]
--

INCOL INGENIEROS
NIT 901.847.609-9
INGENIERÍA Y OBRAS DE COLOMBIA

Cordialmente

KAREN DAYANA FLOREZ DIAZ
Ingeniera Civil
R/L INCOL INGENIEROS SAS
NIT 901.847.609-9
Contacto: 3006264033 - 3105740450
Correo: incol.ingenierossas@gmail.com

3 archivos adjuntos

13. ACTA DE CIERRE.pdf
21K

EVALUACION PRELIMINAR.docx
1287K

CO1_RANL_7923559_20250603151959.zip
12381K

Tunja 22 de julio de 2025

R/L YURI ANDREA ARIZA RIVERA
INGEPLANOS SAS

IPUO-088-2025-OF-038

REFERENCIA: IPUO-088 DE 2025, CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN "DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA".

ASUNTO: SOLICITUD RADICACION INFORME DE EJECUCION MENSUAL NO.1 CONTRATO IPVO-011-2025

Cordial saludo,

Por medio del presente documento yo **KAREN DAYANA FLOREZ DIAZ** identificada con CC.1.052.410.270 de Duitama, en calidad de representante legal de la empresa **INCOL INGENIEROS SAS**. En calidad de apoyo a la supervisión del proyecto cuyo objeto es la "Dotación de la Plaza de Mercado del Municipio de Paipa, en el Departamento de Boyacá".

Me permito solicitar el informe mensual de ejecución No.1 del periodo 20 de junio de 2025 al 20 de julio de 2025 del **contrato IPVO-011-2025** cuyo objeto es "*SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA Y SEÑALIZACIÓN, PARA LA DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ*". El cual deberá de contener la siguiente información:

1. ADMINISTRATIVO
   - Contrato firmado por las partes
   - Acta de inicio
   - Póliza de garantías exigidas

2. TECNICO
   - Descripción de las actividades realizadas durante el periodo (anexar registro fotográfico)
   - Presentar el cronograma de ejecución del presupuesto contractual

3. FINANCIERO
   - Valor financiero ejecutado

NIT 901.847.609-9
INGENIERIA Y OBRAS DE COLOMBIA

- Presentar la relación de avance o atraso según cronograma de actividades a corte del periodo del informe

4. SEGURIDAD SOCIAL
   - Presentar la seguridad social del personal (planillas paga a corte de junio)

Cordialmente,

IPUO-088-2025-OF-038

KAREN DAYANA FLOREZ DIAZ
RL INCOL INGENIEROS SAS
NIT 901.847.609-9
SUPERVISOR IPUO-088 DE 2025

INCOL INGENIEROS
NIT 901.847.609-9
INGENIERÍA Y OBRAS DE COLOMBIA

Tunja 02 de julio de 2025

ARQ. OSCAR ANDRES FERNANDEZ
SUPERVISOR – AGRICULTURA

GINA CAICEDO
INTEGRACION SOCIAL

JUAN PABLO VARGAS
COMUNICACIONES

IPUO-088-2025-OF-023

REFERENCIA: IPUO-088 DE 2025, CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN "DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA".

ASUNTO: RELACION DEL ESTADO ACTUAL DE DISEÑO DEL CONTRATO IPVO 011-2025

Cordial saludo, INCOL INGENIEROS

Por medio del presente documento, La empresa **INCOL INGENIEROS SAS**, se comunica con usted para informarle que según las obligaciones adquiridas por nosotros mediante el contrato **IPUO-088-2025 CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN "DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA** con la entidad contratante **TIERRASUA SAS.** Queremos presentarle la relación del estado actual de la entrega de diseños y definición de fichas técnicas según lo abordado en el comité realizado el día 01 de julio de 2025 el cual se realizó de manera virtual con las partes involucradas del **contrato IPVO-011-2025**, cuyo objeto es "**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA Y SEÑALIZACIÓN, PARA LA DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ**".

A continuación, presentamos un resumen de lo dialogado en la reunión:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	¿SE TIENE DISEÑO?	PLAZO PARA ENTREGA DE DISEÑO	OBSERVACION REALIZADA EN COMITÉ
1,1	Aviso abrigo elaborado en madera laminada con apliques en acrílico 2 mts ancho x 80cm alto	1	NO	03 DE JULIO DE 2025	1)Inicialmente se entrego un diseño y se le informo a la señora andrea (RL INGEPLANOS) que era necesario modificar una palabra por lo que esta pendiente entrega diseño final
1,2	Aviso entrada bomberos elaborado acrílico con textura en madera, con relieves en acrílico y luz interior de medida 6x250mts con estructura metálica de soporte en tubo de 4x4 según diseño suministrado instalado a techo con tubo redondo y gaya de seguridad	1	SI		1) Contratista de suministro (andrea ariza) solicita se use acrilico transparente y se imprima la imagen de Araceli Ochoa. 2) Comunicaciones (Alejandra) solicita se manejen por capas, fondo cafe (capa 1), fondo verde (capa 2), cuerpo Araceli otra capa en tipo rompecabezas con cabello troquelado (capa 3), y letras en relieve
1,3	Aviso exterior con la frase "plaza de mercado de paipa" elaborado en lámina galvanizada encantonado con cantonera de 20cm y adosamiento a piso calibre 20 forrada con vinilo adhesivo laminado impreso a full color y recubierto con laca acrílica transparente de medidas 15mtsx1.20	1	NO	03 DE JULIO DE 2025	1) No se ha hecho entrega de aviso 2) Comunicaciones (Juan Pablo) manifiesta que si bien el contrato dice PLAZA DE MERCADO en los diseños iniciales entregados a agricultura el aviso tenia la frase PLAZA DE MERCADO + frase "ARECELI OCHOA" por lo cual comuniaciones le solicita al contratista incluya la frase "ARECELI OCHOA"en el aviso 3) Queda pendiente por aprobación de la señora Andrea (RL INGEPLANOS) aprobar dicha frase adicional

INCOL INGENIEROS INGENIERÍA Y OBRAS DE COLOMBIA

1,4	Aviso informativo en madera laminada 30mm con bordes en acrílico, apliques en acrílico en relieve con luz interior de medidas 250x150, instalados a techo con brazo en tubo redondo de 250cm de alto dividido en 3 cajas	2	NO	03 DE JULIO DE 2025	1) Comunicaciones (Alejandra) manifiesta que el aviso es muy pesado para anclado por chazo a pared por lo que se propone se incluyan blazos para anclaje adicional al implementar este tipo de brazo se mitiga el riesgo de caída y adicional que la ubicación inicial de los avisos se proyectaron sobre pared la cual actualmente tiene muralismo. 2) Pendiente por definir diseños y aprobación por la señora Andrea (RL INGEPLANOS) aprobar el cambio de anclaje.
1,5	Aviso informativo en madera laminada con apliques en acrílico en relieve con luz interior de medidas 150x100cm, instalados colgados a techo con tubo redondo de 120 cm.	7			Sin observaciones. Ya se tienen los diseños
1,6	Avisos de neón flex con base en acrílico transparente de medidas 80x50cm con las formas solicitadas	6	NO	03 DE JULIO DE 2025	1) La ubicación se definira en obra por comunicaciones
1,7	Avisos entrada tipo paleta de medidas 2x90cm elaboradas en madera laminada 30mm con apliques en acrílico en relieve con luz interna anclados a pared con dos soportes tipo brazo elaborada con tubo redondo a 30 m de la pared	8	SI		1) Discrepancias en el tamaño del aviso ya que contrato es de 2mx0,90m y comunicaciones comparte imagen de 2mx1,00. A lo que comunicaciones (alejandra) informa que se toco esta informacion en reunion con doña andrea (RL INGEPLANOS) y ella no tuvo problema con adicional 0,10m 2) Confirmacion de la orientación de los brazo (si van a la izquierda o si van a la derecha) 3) Definicion de imagen posterior del aviso

1,8	Elaboración de Aviso entrada principal en madera laminada de 30mm con bordes en acrílico con apliques en acrílico con relieve, con luz interna, instalada a techo con brazo en tubo redondo 4" calibre 16 de medidas 5mtsx2.50 (aviso de medidas 250x400cm) soporte a techo de medidas 1mts alto y guaya de seguridad	1			Sin observaciones. Ya se tienen los diseños
1,9	Elaboración de arcos en tubo cuadrado 4x4 con medidas de 4,65x3x.40 para soporte de señalización con fomboard impreso en vinilo laminado	11	NO	03 DE JULIO DE 2025	1) Ausencia de diseño del foamboar
1,1	Fabricación de logo artesanías de Boyacá para mural elaborado en acrílico nacional de 5mm con relieves en el mismo material, instalado en muro con medidas 300x150cm	1	SI		1) Discrepancia en la ejecucion del diseño es decir, la imagen suministrada por comunicaciones tiene un fondo el cual iria con la medida contratada de 3mx1,5m y sobre esta va relieve de imagen + palabras. Sin embargo en comunicaciones (alejandra) manifiesta que ellos se referian solo a la imagen + las palabras sin el fondo. y la construccion del aviso quedaria de 1,50mx1,40m. Por lo cual no cumple la medida de lo que pide el contrato.
1,11	Numeración para locales en madera laminada 9mm con incrustaciones en acrílico de medidas 25x40cm instaladas en pared	100	SI		1) Se han suministrado 88 imágenes para realizarlos con medida de 0.25mx0.40m de aviso quedan pendientes 12 unidades. 2) Adicionalmente, de los 88 avisos ya suministrados se presentan 25 unidades de avisos con otra medida de 2.80mx0.40m y el item es claro de hacer avisos con medidas de 0.25mx0.40m. 3) Pendiente por aclarar como se cobran esos avisos

INCOL INGENIEROS NIT 901.847.609-9 INGENIERÍA Y OBRAS DE COLOMBIA

1,12	Oficina psico Jurica 2x3,9mts fomboard para intervención con formas en corte laser con vinilo adhesivo laminado impreso a full color	1	NO	03 DE JULIO DE 2025	
1,13	Punto de información turística elaborado en tubo de4x4" calibre 20 de medidas 2x2mts recubierto con mdf de 9mm y vinilo laminado impreso a full color con mesón y entrepaño, punto de luz y dispensador de publicidad, elaborado en 1 sola pieza según diseño suministrado	1	NO	03 DE JULIO DE 2025	
1,14	Señalización de pared elaborada en madera 9mm laminada con apliques en acrílico con relleve, instalados a pared de medidas 30x40cm	100	SI		1) Pendiente de entregar los demas diseños de avisos ya que entregaron 34 y son 100 unidades
1,15	Señalización tipo señal de tránsito elaborado con ángulo en calibre 16 de 3,00 mts con 2 tableros en lámina galvanizada forrada con adhesivo reflectivo en medidas 60x60 cm y de 30x60 cm	4			Sin observaciones. Ya se tienen los diseños
1,16	Señalización tipo señal de tránsito elaborado con ángulo en calibre 16 de 3,00 mts con tablero en lámina galvanizada con dobleces 2x1cm forrada con adhesivo reflectivo en medidas 2x.60m	4	NO	03 DE JULIO DE 2025	
1,17	Señalización tipo señal de tránsito elaborado con ángulo en calibre 16 de 3,00 mts con tablero en lámina galvanizada forrada con adhesivo reflectivo en medidas 60x60 cm	4	NO	03 DE JULIO DE 2025	
1,18	Vinilo adhesivo ludoteca y área administrativa abrigo impreso en vinilo adhesivo a 1440 dpi a full color instalado en pared 150 m2	150	SI		1) Pendiente por definir la ubicación del vinilo y m2 cuadrados faltantes de diseño.

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA EN QUE SE COMPROMETE A CUMPLIR
Entregar todos los diseños faltantes en su totalidad	JUAN PABLO VARGAS (COMUNICACIONES)	3 DE JULIO DE 2025
Revisión de balance del contrato contractual	CONTRATACION-JURIDICA TIERRASUA	4 DE JULIO DE 2025

Al presente documento se anexa:

1) informe compartido por la señora Andrea Ariza RL de INGEPLANOS SAS, CONTRATISTA del **contrato IPVO-011-2025**, cuyo objeto es "**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA Y SEÑALIZACIÓN, PARA LA DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ**". Donde realiza la solicitud de aclaración de las fichas técnicas.
2) Se presenta acta de comité del 01 de julio de 2025.

Cordialmente,

IPUO-088-2025-OF-023

KAREN DAYANA FLOREZ DIAZ
RL INCOL INGENIEROS SAS
NIT 901.847.609-9
SUPERVISOR IPUO-088-2025

INCOL INGENIEROS
NIT 901.847.609-9
INGENIERIA Y OBRAS DE COLOMBIA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900862115	1	INGEPLANOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TUNJA	CC COMERCIAL PLAZA REAL L - 115	TUNJA-BOYACA	7432530	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1768999397	9491693731	E	2025/08/06	2025/09/11	BANCOLOMBIA	36	$1,468,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombre		ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: TUNJA (4 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (4 Afiliados)																														
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (4 Afiliados)																														
1	CC	1118572779	AGUIRRE LEMUS DEISY KARINA																		25-14	30	EPS017	30	CCF10	30	14-4	30	0.522%	30	SI
2	CC	53081028	ARIZA RIVERA YURI ANDREA																		23030 1	30	EPS005	30	CCF10	30	14-4	30	0.522%	30	SI
3	CC	1057466725	CASTELBLANCO ROA LUIS ALEJANDRO		X																23020 1	30	EPS037	30	CCF10	30	14-4	30	0.522%	30	SI
4	CC	1049652611	GONZALEZ PEDRAZA PAULA ANDREA																		23030 1	30	EPS041	30	CCF10	30	14-4	30	0.522%	30	SI
Total Afiliados(4)																														

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900862115	1	INGEPLANOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TUNJA	CC COMERCIAL PLAZA REAL L - 115	TUNJA-BOYACA	7432530	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1768999397	9491693731	E	2025/08/06	2025/09/11	BANCOLOMBIA	36	$1,468,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$943,200	$21,600	$0	$964,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$5,200	$0	$233,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$455,600	$10,400	$0	$466,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$259,800	$6,000	$0	$265,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$31,000	$800	$0	$31,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	4	$31,000	$800	$0	$31,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$225,400	$5,200	$0	$230,600
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	4	$225,400	$5,200	$0	$230,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				4	$236,000	$5,400	$0	$241,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$57,000	$1,300	$0	$58,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$65,000	$1,500	$0	$66,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$57,000	$1,300	$0	$58,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$57,000	$1,300	$0	$58,300
TOTAL				**4**	**$1,435,600**	**$33,000**	**$0**	**$1,468,600**

2025/09/11 09:13 AM
