CONSORCIO INTERVENTORES AO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 9255-2024

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, A DMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO" GRUPO 2

INFORME FINAL

Contenido

I. INTRODUCCIÓN 6
II. GENERALIDADES 8
1.1 ALCANCE GENERAL 8
1.2 LUGAR DE EJECUCIÓN 8
1.3 LOCALIZACION DEL PROYECTO 9
1.4 INFORMACION GENERAL CONTRATO DE OBRA 13
1.4 INFORMACION GENERAL CONTRATO DE INTERVENTORIA 14
1.5 Estado legal actual del contrato de obra 15
1.6 Estado legal actual del contrato de interventoría 15
III. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CONTRATO DE OBRA No. 9173-2024 16
FRENTE No. 1 CPI WAWITAKUNAPA WASI. 16
FRENTE No. 2 JARDÍN INFANTIL SAMPER MENDOZA. 24
FRENTE No. 3 JARDÍN INFANTIL NUEVOS PASOS. 35
FRENTE No. 4 JARDÍN INFANTIL ATA. 42
FRENTE No. 5 JARDÍN INFANTIL CENTRO CRECER. 45
FRENTE No. 6 JARDÍN INFANTIL CENTRO CADIS. 52
FRENTE No. 7 HOGAR DE PASO BAKATA 60
FRENTE No. 8 JARDIN INFANTIL EL TRIUNFO 69
FRENTE N. 9 MI REFUGIO 77
FRENTE N.10 SEDID 93
FRENTE N. 11 CURNN 102
IV. ESTADO FINAL DEL SEGUIMIENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL 128
V. ESTADO FINAL DEL SEGUIMIENTO DE GESTIÓN SST 129
VI. ESTADO FINAL DEL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 163
VII. ESTADO FINAL DEL EQUIPO DE TRABAJO DEL INTERVENTOR 173
VIII. ESTADO FINAL DEL SEGUIMIENTO TIEMPO DE TRABAJO 175
JORNADAS DE TRABAJO: 175
COMPORTAMIENTO DE CLIMA: 176
IX. ESTADO FINAL DE LA EVALUACIÓN Y AVANCE DEL PROYECTO 177
AVANCE FINANCIERO POR RUBRO 178
X. ESTADO FINAL DEL ASPECTO JURIDICO DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA 179
MODIFICACIONES CONTRACTUALES 179
PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS 179
XI. ESTADO FINAL DE LOS ASPECTOS CRÍTICOS DEL PROYECTO 180

INCONVENIENTES 180
SOLUCIONES 180
CONCLUSIONES 180
RECOMENDACIONES 180
XII. ANEXOS (EN MEDIO MAGNÉTICO) 181
ANEXO 1 COPIA DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBID 181
Anexo No. 2 digital componente SST Listados y listado sociodemográfico de interventoría. 202
Anexo No.3 digital componente SST Planillas de seguridad social o afiliaciones CONSORCIO INTERVENTORES AO. 203
Anexo No. 4 digital componente SST Planillas de seguridad social o afiliaciones 203
Anexo No. 5 digital componente SST Soportes de retiro de personal RB COLOMBIA S.A.S.. 204
Anexo No. 6 digital componente SST Matriz de peligros y valoración de riesgos RB COLOMBIA S.A.S. 205
Anexo No. 7 Digital componente SST Cronograma de capacitación del periodo CONSORCIO INTERVENTORES AO. 206
Anexo No.8 digital Componente SST Registro de asistencia de CONSORCIO INTERVENTORES AO 207
Anexo No. 9 digital componente SST cronograma de capacitaciones RB COLOMBIA S.A.S. . 208
Anexo No.10 digital componente SST registro de asistencia RB COLOMBIA S.A.S. 209
Anexo No. 11 digital Componente SST Matriz de accidentes e incidentes CONOSRCIO INTERVENTORES AO 210
Anexo No. 12 componente digital SST matriz de accidentes e incidentes laborales 211
Anexo 13 digital componente SST soporte de entrega de EPP y dotación RB COLOMBIA S.A.S. 212
Anexo No. 14 componente SST Saneamiento Básico Hidratación) 213
Anexo No. 15 digital componente SST Soporte de autorización para utilizar los baños para los trabajadores RB COLOMBIA S.A.S. 214
Anexo No.16 componente SST Acta de reunión del COPASST 215
Anexo No. 17 componente SST Acta de reunión del CCL RB COLOMBIA S.A.S. 216
Anexo No. 18 componente SST Matriz de Indicadores 217
Anexo No. 19 componente SST Registro de ATS según periodo del informe 218
Anexo No. 20 digital componente SST Soporte de permisos de trabajo. 219
Anexo No. 21 digital componente SST soportes de inspecciones 220
Anexo No.22 digital componente SST Listado de personal contractual de RB COLOMBIA S.A.S 221
Anexo No.23 digital componente SST Listado de personal no contractual RB COLOMBIA S.A.S 222
Anexo 24 clima 223

Anexo 25 ACTA DE OBRA 4 224
Anexo 26 RUBRO FINAL 225

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Localización frente 1 Jardín Infantil Samper Mendoza 9
Ilustración 2 Localización frente 2 Centro Día Mi Refugio 9
Ilustración 3 Localización frente 3 Centro CRECER 10
Ilustración 4 Localización frente 4 Centro Atención Distrital para la Inclusión Social – CADIS 10
Ilustración 5 Localización frente 5 Centro Único de Recepción de Niñas y Niños - CURNN 10
Ilustración 6 Localización frente 6 Hogar de Paso Bakata 11
Ilustración 7 Localización frente 7 Centro SEDID 11
Ilustración 8 Localización frente 8 Jardín Infantil Wawita Kanupa Wasi 11
Ilustración 9 Localización frente 9 Jardín El Triunfo 12
Ilustración 10 Localización frente 10 Jardín Infantil Nuevos Pasos 12
Ilustración 11 Localización frente 11 Jardín ATA 12

I. INTRODUCCIÓN

La Secretaría de Integración Social (SDIS), es la entidad del Distrito encargada de liderar y formular las políticas sociales del Distrito Capital para la integración social de las personas, las familias y las comunidades, con especial atención para aquellas que están en mayor situación de pobreza y vulnerabilidad; ejecutar las acciones que permitan la promoción, prevención, protección, rehabilitación y restablecimiento de sus derechos, mediante el ejercicio de la corresponsabilidad y la cogestión entre la familia, la sociedad y el Estado.

La Secretaría de Integración Social está presente en las 20 localidades de Bogotá, cuenta con espacios de atención y equipos especializados que atienden con calidad y calidez a la ciudadanía, en muchos casos las 24 horas; espacios que son intervenidos en su infraestructura física a través de la Subdirección de Plantas Físicas, los cuales a su vez requiere realizar las obras de mantenimiento y optimización de los inmuebles, mediante visitas, diagnósticos y ejecución de las obras correspondientes a reparaciones locativas con el fin de contar con equipamientos dignos, adecuados y seguros; así como, atender las emergencias y todas aquellas obras que se requieran, en las unidades operativas y sedes de la SDIS o donde la entidad solicite su intervención.

Es por eso que la SDIS adelantó en el mes de Noviembre de 2024, el proceso de contratación Pública No. SDIS-LP-004-2024 el cual se subdividió en 5 grupos con el fin de lograr intervenir las sedes ubicadas en las 20 localidades de la ciudad donde funciona la entidad, culminado este proceso de selección resultó adjudicatario del Grupo No. 2 la firma R.B. DE COLOMBIA S.A. identificada con NIT No. 960.004.030-1 quien el día 15 de Noviembre de 2024 suscribió el contrato de obra No. 9173-2024 cuyo objeto es REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO, por un valor inicial de MIL SESENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS ($1.068.844.500), con un plazo de ejecución inicial hasta el 31 de Diciembre de 2024, que sería ejecutado en las sedes ubicadas en las localidades de Mártires, Santafé, Candelaria, Antonio Nariño y Puente Aranda.

Así mismo con el fin de cumplir con la obligación legal de asignar una interventoría que acompañar el citado contrato de obra, la SDIS adelantó el proceso de contratación SDIS-CMA-001-2024, que también se subdividió en 5 grupos, resultando adjudicatario del grupo No. 2 el CONSORCIO INTERVENTORES AO identificado con NIT No. 901.889.907-9, integrado por las firmas PROYECTOS Y CONSULTORÍAS ORION SAS identificada con NIT No. 901.503.188-3 y ANDINA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS identificada con NIT No. 901.370.791-2, el día 26 de Noviembre de 2024 suscribió el contrato de interventoría No. 9255-2024 cuyo objeto es REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO, por un valor inicial de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL CIENTO NOVENTA PESOS M/CTE. ($365.580.190), con un plazo de ejecución inicial hasta el 31 de Diciembre de 2024.

Iniciada la ejecución tanto del contrato de obra como de interventoría, con la suscripción de las actas de inicio el día trece (13) de diciembre de 2024, se dio trámite a modificaciones en plazo y valor de ambos contratos; la modificación No. 1 del contrato de obra No. 9173-2024, consistió en una prórroga de su plazo hasta el 25 de febrero de 2025, para completar un plazo de 2,5 meses; posteriormente se dio trámite a la modificación No. 2 del contrato de obra No. 9173-2024 prorrogando el plazo hasta el 15 de abril de 2025 y adicionando un valor de TRESCIENTOS UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS ($301.758.970) para ejecutar obras en un nuevo frente denominado CURNN, quedando un valor total del contrato por la suma de MIL TRESCIENTOS SETENTA MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($ 1.370.603.470) y fecha de terminación el día 15 de abril de 2025.

Respecto al contrato de interventoría No. 9255-2024, se suscribió la modificación No. 1 extendiendo el plazo de ejecución hasta el 12 de Marzo de 2025, con el fin de cubrir el tiempo ofertado en la oferta económica del CONSORCIO INTERVENTORES AO; luego se suscribió la modificación No. 2 extendiendo el plazo de ejecución hasta el 30 de abril de 2025 y adicionando un valor de NOVENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($91.741.786), quedando un valor total del contrato por la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MC/TE ($457.321.976,00).

El contrato de obra fue ejecutado en el período comprendido entre el 13 de diciembre de 2024 y el 15 de abril de 2025, toda vez que el contrato de interventoría cuenta con un plazo de 15 días para proceder con la liquidación el período de ejecución este contrato está entre el 13 de diciembre de 2024 y el 30 de Abril de 2025.

Los frentes intervenidos a través del contrato de obra No. 9173-2024, fueron los siguientes:

1. Jardín Infantil Samper Mendoza – Localidad Mártires
2. Centro Día Mi Refugio - Localidad Mártires
3. Centro CRECER - Localidad Mártires
4. Centro Atención Distrital para la Inclusión Social CADIS - Localidad Mártires
5. Centro Único de Recepción de Niñas y Niños CURNN - Localidad Mártires
6. Hogar de paso Bakata – Localidad Puente Aranda
7. Centro de Atención a Ciudadanos Habitantes de la Calle SEDID – Localidad Puente Aranda
8. Jardín Infantil Wawita Kanupa Wasi – Localidad Santa Fé
9. Jardín Infantil El Triunfo – Localidad Santa Fé
10. Jardín Infantil Nuevos Pasos – Localidad Santa Fé
11. Jardín Infantil ATA - Localidad Santa Fé

II. GENERALIDADES

1.1 ALCANCE GENERAL

El proyecto cuyo objeto es: REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO, se realizó mediante ejecución de las siguientes fases:

FASE 1: DIAGNÓSTICO

- Elaboración de diagnósticos
- Elaboración de presupuestos
- Elaboración de cronograma

FASE 2: POS – CONSTRUCCIÓN

- Entrega de la infraestructura
- Liquidación de contratos.

1.2 LUGAR DE EJECUCIÓN

Los lugares de ejecución del presente contrato se encuentran establecidos así:

No.	NOMBRE SEDE	NOMBRE LOCALIDAD	DIRECCIÓN
1	Jardín Infantil Samper Mendoza	Localidad Mártires	Carrera 22 No. 22A-72
2	Centro Día Mi Refugio	Localidad Mártires	Carrera 18B No. 22B-40
3	Centro CRECER	Localidad Mártires	Calle 1B No. 24B-26
4	Centro Atención Distrital para la Inclusión Social - CADIS	Localidad Mártires	Calle 1B No. 24b-26
5	Centro Único de Recepción de Niñas y Niños - CURNN	Localidad Mártires	Calle 1B No. 24b-26
6	Hogar de paso Bakata	Localidad Puente Aranda	Carrera 35 No. 10-35
7	Centro de Atención a Ciudadanos Habitantes de la Calle – SEDID	Localidad Puente Aranda	Carrera 35 No. 10-23
8	Jardín Infantil Wawita Kanupa Wasi	Localidad de Santa Fé	Carrera 1 No. 33-22
9	Jardín Infantil El Triunfo	Localidad de Santa Fé	Carrera 1 BIS No. 1B-69

10	Jardín Infantil Nuevos Pasos	Localidad de Santa Fé	Calle 5A No. 26A- 17
11	Jardín Infantil ATA	Localidad de Santa Fé	Carrera 3A BIS No. 3A-02

1.3 LOCALIZACION DEL PROYECTO

A continuación, se relaciona la ubicación de las sedes a ser intervenidas



Ilustración 1 Localización frente 1 Jardín Infantil Samper Mendoza



Ilustración 2 Localización frente 2 Centro Día Mi Refugio



Ilustración 3 Localización frente 3 Centro CRECER



Ilustración 4 Localización frente 4 Centro Atención Distrital para la Inclusión Social – CADIS



Ilustración 5 Localización frente 5 Centro Único de Recepción de Niñas y Niños - CURNN

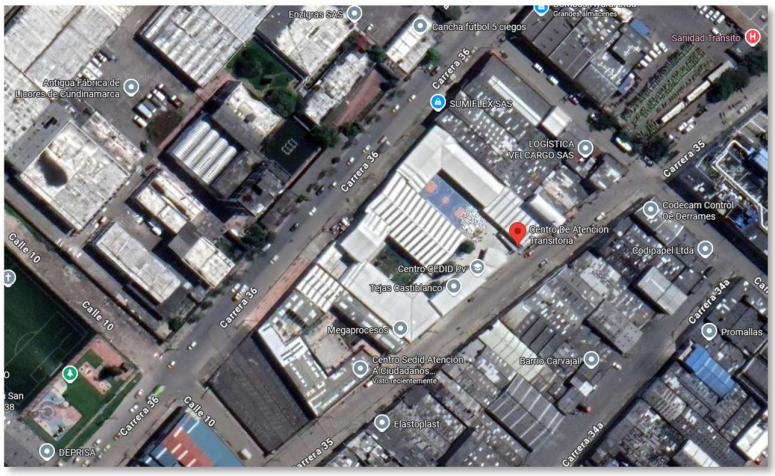


Ilustración 6 Localización frente 6 Hogar de Paso Bakata

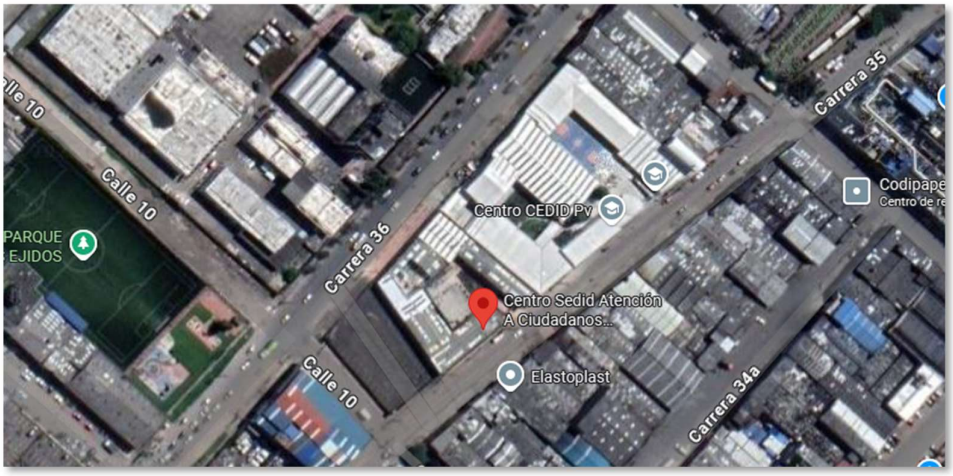


Ilustración 7 Localización frente 7 Centro SEDID



Ilustración 8 Localización frente 8 Jardín Infantil Wawita Kanupa Wasi



Ilustración 9 Localización frente 9 Jardín El Triunfo



Ilustración 10 Localización frente 10 Jardín Infantil Nuevos Pasos



Ilustración 11 Localización frente 11 Jardín ATA

1.4 INFORMACION GENERAL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No.	9173 - 2024
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO
CONTRATISTA:	R.B. COLOMBIA S.A.
NIT:	860.004.030-1
REPRESENTANTE LEGAL:	JAVIER IGNACIO RESTREPO GIRALDO
CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2024
FECHA DE INICIO:	13 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA PREVISTA DE TERMINACION INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024
PRÓRROGA No. 1:	HASTA EL 25 DE FEBRERO DE 2025 (Modificación No. 1)
PRÓRROGA No. 2:	HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2025 (Modificación No. 2)
PLAZO FINAL DEL CONTRATO:	4,10 MESES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 1.068.844.500,00
ADICION No. 1 AL CONTRATO:	$ 301.758.970,00 (Modificación No. 2)
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	$ 1.370.603.470,00
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES AO
FECHA TERMINACION:	15 DE ABRIL DE 2025

Tabla 1 RESUMEN CONTRATO DE OBRA

1.4 INFORMACION GENERAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	9255 - 2024
OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENTORES AO
NIT:	901.889.907-9
REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS ALBERTO FORERO RAMOS
CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2024
FECHA DE INICIO:	13 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA PREVISTA DE TERMINACION INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024
PRÓRROGA No. 1:	HASTA EL 12 DE MARZO DE 2025 (Modificación No. 1)
PRÓRROGA No. 2:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025 (Modificación No. 2)
PLAZO FINAL DEL CONTRATO:	4,60 MESES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 365.580.190,00
ADICION No. 1 AL CONTRATO:	$ 91.741.786,00 (Modificación No. 2)
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	$ 457.321.976,00
SUPERVISOR:	JHONNY EDWARD PADILLA ARIZA
FECHA TERMINACION:	30 DE ABRIL DE 2025

1.5 Estado legal actual del contrato de obra

Toda vez que el contrato de obra No. 9173-2024, cuenta con fecha de terminación el 15 de abril de 2025, fecha para la cual algunos frentes presentaban observaciones de detalles en acabados, por lo cual el recibo final de las obras se suscribió el día 30 de abril de 2025, acta de recibo con la cual se surtió el ajuste final de las garantías del contrato quedando en el siguiente estado

GARANTIAS CONTRACTUALES ACTUALIZADAS A ACAT DE RECIBO FINAL DE OBRA			
Póliza de Cumplimiento N°	**11-44-101240398 No. De anexo: 9**		
Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO SR		
Amparos	Desde	Hasta	Valor Asegurado
Cumplimiento	**13/12/2024**	**15/11/2025**	**$274.120.694,00**
Pago de salarios prestaciones	**13/12/2024**	**15/05/2028**	**$137.060.347,00**
Estabilidad y calidad de la obra	**30/04/2025**	**30/04/2030**	**$274.120.694,00**
*** Esto amparo tendrá una vigencia de cinco (5) años contados a partir del acta de recibo a satisfacción de las obras.**			

1.6 Estado legal actual del contrato de interventoría

El contrato de interventoría No. 9255-2024, cuenta con fecha de terminación el 30 de abril de 2025, fecha en la cual se dio el recibo final de las obras, por lo que también se suscribió el día 30 de abril de 2025, acta de recibo con la cual se surtió el ajuste final de las garantías del contrato quedando en el presente estado

GARANTIAS CONTRACTUALES ACTUALIZADAS A ACAT DE RECIBO FINAL DE OBRA			
Póliza de Cumplimiento N°	**560-47-994000184843 Anexo 6**		
Aseguradora	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		
Amparos	Desde	Hasta	Valor Asegurado
Cumplimiento	**13/12/2024**	**10/11/2025**	**$91.464.395,20**
Pago de salarios prestaciones	**13/12/2024**	**10/05/2028**	**$ 45.732.197.60**
Calidad de servicio	**13/12/2024**	**30/04/2030**	**$91.464.395,20**
*** Esto amparo tendrá una vigencia de cinco (5) años contados a partir del acta de recibo a satisfacción de las obras.**			

III. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CONTRATO DE OBRA No. 9173-2024

En el desarrollo de la ejecución del contrato de obra No. 9173, la firma R.B. COLOMBIA S.A., atendió 11 sedes, en el período comprendido entre el 13 de diciembre de 2024 y el 15 de abril de 2025, a continuación, se presenta una descripción con registro fotográfico de las actividades ejecutadas en cada frente, actividades que contaron con el acompañamiento, supervisión y recibo del CONSORCIO INTERVENTORES AO, en calidad de interventor del proyecto y ejecutor del contrato de interventoría No. 92155-2024

FRENTE No. 1 CPI WAWITAKUNAPA WASI.

El 12 de diciembre de 2024 se realizó un recorrido de inspección del inmueble con funcionarios de la Subdirección de Plantas Físicas de la Secretaría Distrital de Integración Social, interventoría y el contratista, en este recorrido se identificó la necesidad de reemplazar completamente la cubierta existente por teja Ecoroof, debido a problemas de filtraciones, humedades y la presencia de asbesto cemento, que representa un riesgo para los estudiantes, profesores y personal administrativo que usa la sede.

Las intervenciones ejecutadas para el mantenimiento y mejoramiento de la sede, se llevaron cabo sin que fuera usada por parte de la entidad contratante, así mismo para salvaguardar los pisos existentes de la edificación, se utilizaron plásticos y cartones como medidas de protección en las áreas de tránsito de los trabajadores y zonas susceptibles a la caída de materiales durante las labores, ejecutando las siguientes actividades:

1. Instalación de cerramiento en polisombra, para señalización de zona de trabajo y control de emisiones provenientes de actividades de demolición
2. Desmonte y reemplazo progresivo de la totalidad de cubierta, la cual era tejas en asbesto cemento.
3. Limpieza, mantenimiento consistente en refuerzo de soldadura, pintura de cerchas de la estructura metálica de la cubierta.
4. Verificación y adecuación de canales y bajantes de aguas lluvias, con cambio de tejas traslucidas e instalación de canal en la sala de Caminadores.
5. Instalación de dos reflectores en cada una de las cuatro fachadas y corrección de dos luminarias defectuosas al interior de la sede.
6. Aplicación de pintura Koraza en las fachadas del edificio principal.
7. Instalación de pintura tipo 1 vinilo lavable en los espacios interiores de comedor y salones.

ESTADO INICIAL INTERIOR DE LAS CUBIERTAS Y DE LOS ESPACIOS





Fotografía No. 1. Estado inicial del interior de las cubiertas

Atendiendo a la solicitud de la Secretaría de Integración Social, se procedió a sustituir todas las tejas traslúcidas del interior de la edificación por tejas opacas. Esta medida busca controlar el ingreso de luz directa al interior de esta zona, que pueda afectar el descanso de los niños que allí permanecen.



Fotografía No. 2. Estado inicial del interior sala caminadores

.

ESTADO INICIAL DE LAS LUMINARIAS





Fotografía No.3. Estado inicial de las luminarias

Se identificaron algunas lámparas necesitaban ser reubicadas y ajustadas. Así mismo, aunque los cielos rasos se encuentran en condiciones generales aceptables, fue preciso retirar parcialmente ciertas secciones para facilitar el acceso de técnicos e instaladores y asegurar una instalación adecuada de la nueva cubierta.


ESTADO DE LOS INTERIORES DE LA EDIFICACIÓN

La cocineta se renovó mediante la aplicación de pintura esmalte de alta resistencia en todos sus muros generales, lo que proporcionará un acabado uniforme, brillante y duradero, además de facilitar su limpieza y mantenimiento.




Fotografía No. 4. Estado inicial de la cocineta

En la sala de caminadores se llevó a cabo una intervención, que consistió en reemplazar las tejas actuales traslúcidas por tejas opacas del tipo Ecoroof. Además, se instaló un sistema de canalización para aguas pluviales, que incluyó la instalación de un canal y su bajante correspondiente, orientado hacia el exterior.



Fotografía No. 5. Estado inicial sala de caminadores

EJECUCIÓN OBRAS





Fotografía No. 6. Desmonte de cubierta existente



Fotografía No 7. Resane de fisuras en muros de fachadas



Fotografía No 9. Suministro e instalación de cubierta Ecorrof




Fotografía No. 10. Desmonte de cieloraso existente en aulas




Fotografía No. 11. Desmonte de salidas eléctricas en aulas



Fotografía No. 12. Resane de fisuras en muros

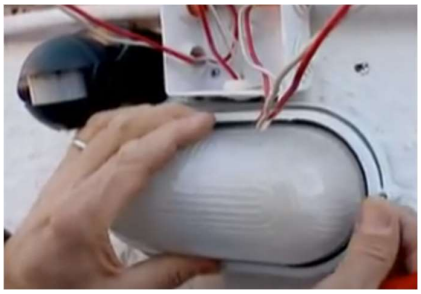

Fotografía No. 13. Suministro e instalación de lampara tipo tortuga en fachada.

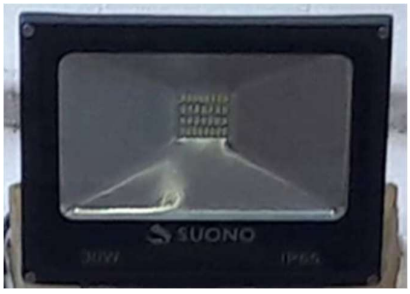

Fotografía No. 14. Suministro e instalación de reflector en fachada



Fotografía No. 15. Instalación de vinilo tipo 1 a tres manos, en muros interiores



Fotografía No. 16. Aplicación de dos manos de pintura tipo koraza para muros de fachada



Fotografía No. 17. Aplicación de pintura de aceite a 2 manos, en zonas bajas de muros interiores



Fotografía No. 18. Aplicación de esmalte sobre cerchas y estructura metálica de cubierta



Fotografía No. 19. Instalación de cieloraso en lámina de yeso en aulas



Fotografía No. 20. Instalación de nuevo flanche en lámina galvanizada calibre 26 desarrollo 0,25 m



Fotografía No. 21. Suministro e instalación de cubierta ecoroof.



Fotografía No. 22. aplicación de sellante elastómero monocomponente a base de poliuretano para ventanas o marquesinas existentes con filtraciones de agua.



Fotografía No. 23. Aseo general final y limpieza de zonas intervenidas.

FRENTE No. 2 JARDÍN INFANTIL SAMPER MENDOZA.



Fotografía No. 24. Zona intervenida en Jardín Infantil Samper Mendoza

Se realizó un primer recorrido como identificación de los problemas el día 02 de diciembre de 2024 con funcionarios de plantas físicas, interventoría, contratista encontrando lo siguiente:

Se evidenció la necesidad de hacer el cambio total de la cubierta existente por teja nueva ecoroof, del bloque oriental de dos niveles, por presentarse problemas de goteras, filtraciones y humedades por la cubierta actual, además por ser la cubierta exsitente en asbesto cemento y representar para los futuros ocupantes una continua exposición a este material al interior de la edificación.

Se hizó necesario a su vez, la verificación de la capacidad de las canales y bajantes actuales de todas las áreas de cubiertas, aunque no se ven ni en fachadas ni muros ni en cielos rasos blancos manchas de escorrentías ni reboses de aguas lluvias. Se aprecia la existencia de las bajantes y sus respectivas canales en las áreas de circulación principal de peatones.

Los pisos exteriores de la edificación se encuentran en buen estado, sin signos de deterioro ni afectaciones visibles, el piso cerámico mantiene una apariencia adecuada y no presenta señales de empozamiento, así mismo las zonas verdes están en buen estado y tampoco muestran acumulación de agua o problemas de drenaje.

Hallazgos

- En la cubierta se evidencian remiendos previos en distintos puntos, lo que indica intervenciones anteriores para mitigar filtraciones o daños.
- Se observa desgaste en la pintura exterior de las tejas, lo que puede afectar su impermeabilización y durabilidad.
- Se identifica la ausencia de una viga canal en el área de Párvulos 3, así como la falta de bajantes adecuadas para el correcto drenaje de aguas lluvias.
- Actualmente, el agua de esta zona está desaguando directamente sobre la edificación de un solo piso dentro del mismo jardín, lo que está generando humedad en las paredes de fachada.
- No se evidencian reboses ni desbordamientos de aguas lluvias en las fachadas, ya que no hay marcas visibles en los muros azules o blancos.
- Para la intervención en las cubiertas, será necesario realizar los trabajos por zonas determinadas y consecutivas, evitando la ejecución simultánea en toda la edificación.
- Se requiere un área de almacenamiento dentro de la edificación para guardar tanto el material nuevo como el de desmonte, optimizando la logística y el manejo de residuos.
- No se pudo verificar completamente la estructura de soporte de la cubierta debido a que el cielo raso existente impide el acceso a la parte interna del techo.

- Para permitir la evaluación estructural y la instalación de la nueva cubierta, será necesario desmontar parcialmente el cielo raso en algunos puntos estratégicos.

ESTADO DE LOS INTERIORES DE LA EDIFICACIÓN





Fotografía No. 25. Estado de los interiores de la edificación Jardín Infantil Samper Mendoza

El estado general de los interiores de la edificación es aceptable, con una buena presentación y sin daños aparentes. No se tiene certeza sobre la condición del espacio entre los cielos rasos y la estructura de la cubierta, lo que impide evaluar posibles afectaciones como humedades, deterioro en la soportaría metálica o acumulación de residuos.}

ACTIVIDADES REALIZADAS

En el desarrollo de la ejecución del contrato de obra No. 9173-2024, para el frente Jardín Infantil Samper Mendoza se ejecutaron obras de mantenimiento en el segundo nivel del bloque oriental en la sede, en la cual se encuentran 3 aulas, una batería sanitaria y un hall. Se cambio la cubierta en asbesto cemento por teja Ecorrof, instalación de perfiles metálicos de refuerzo para cumplir con distancias de apoyo de nueva cubierta, construcción de cuchillas nuevas sobre estructura en concreto existente, reposición de circuitos y salidas eléctricas del segundo piso, cambio de acometida eléctrica para el segundo piso, cambio de tablero eléctrico, cambio de luminarias, cambio de interruptores, cambio de cielo raso de yeso por pvc, resane y pintura de muros, instalación de canal de aguas lluvias e instalación de bajantes de aguas lluvias.



Fotografía No. 26. Instalación cerramiento en lona verde para asilar los estudiantes de la zona de tránsito y de ejecución de la obra




Fotografía No. 27. Desmonte de cubierta existente en asbesto cemento, segundo nivel bloque oriental




Fotografía No. 28. Desmonte cielo raso existente en yeso, de aulas del segundo piso del bloque oriental




Fotografía No. 29. Desmonte de salidas eléctricas existentes del segundo piso del bloque oriental



Fotografía No. 30. Reforzamiento de cuchillas de cubierta con vigas y muros en mampostería.





Fotografía No. 31. Instalación acero de refuerzo para vigas de cuchillas.





Fotografía No. 32. Instalación de muro en bloque para cuchillas de cubierta.





Fotografía No. 33. Suministro e instalación de cubierta Ecoroof.



Fotografía No. 34. Resane en muros internos e instalación de cableado estructurado.



Fotografía No. 35. Cableado nuevo y cambio de interruptor sencillo.



Fotografía No. 36. Cambio de interruptor doble.



Fotografía No. 37. Cambio de toma doble.



Fotografía No. 38. Cambio de tablero eléctrico de 12 circuitos.



Fotografía No. 39. Caja de paso y tubería metálica para circuitos de iluminación.





Fotografía No. 40. Tubería metálica Ø ½" para circuitos de iluminación.

.



Fotografía No. 41. Breaker instalado en tablero eléctrico.

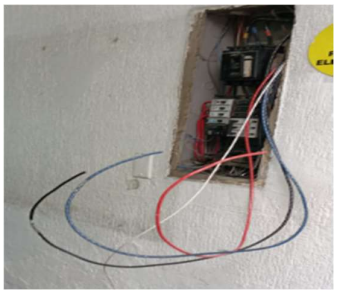

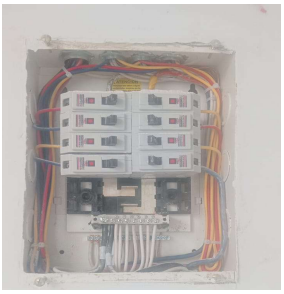

Fotografía No. 42. Suministro e instalación acometida en cable de cobre 3N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG libre de halógenos, saliendo de tablero antiguo llegando a tablero nuevo.



Fotografía No. 43. Suministro e instalación de salida para luminaria de emergencia LED



Fotografía No. 44. Suministro e instalación de luminaria de emergencia LED.




Fotografía No. 45. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED 60 X 60.



Fotografía No. 46. Suministro e instalación de luminaria tipo led hermética de sobreponer.



Fotografía No. 47. Suministro e instalación panel led circular de 18 W8” incrustar.

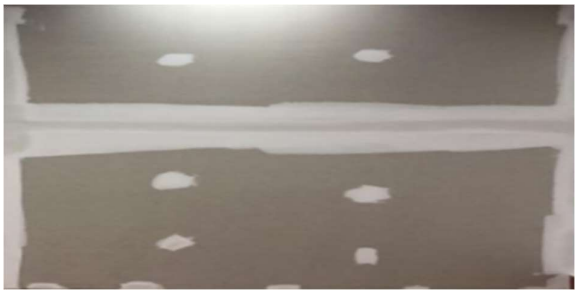

Fotografía No. 48. Construcción de muros en super board 8 MM a dos caras



Fotografía No. 49. Instalación de pintura en muros vinilo tipo 1 a tres manos en aulas de segundo piso



Fotografía No. 50. Instalación de cielo raso en pvc en aulas del segundo piso



Fotografía No. 51. Instalación de flanche en lámina galvanizada calibre 26 desarrollo 0,25 m



Fotografía No. 52. Suministro e instalación de cubierta ecoroof, sobre escalera de acceso al segundo nivel del bloque oriental



Fotografía No. 53. Instalación de cubierta nueva y refuerzos metálicos para apoyos requeridos.

FRENTE No. 3 JARDÍN INFANTIL NUEVOS PASOS.



Fotografía No. 54. Jardin Infantil Nuevos Pasos

El 2 de diciembre de 2024, se llevó a cabo un recorrido de inspección para identificar las problemáticas presentes en la infraestructura. En esta visita participaron funcionarios de plantas físicas, la interventoría y el contratista, suscribiendo el Acta No. 03, donde se registraron los siguientes hallazgos:

1. Mantenimiento de la cubierta: Se evidenció la necesidad de realizar un mantenimiento integral de la cubierta debido a la presencia de filtraciones, goteras y humedades. Estos problemas son ocasionados por deformaciones, grietas, roturas y tornillos de anclaje sueltos, lo que afecta la estanqueidad de la estructura y genera filtraciones al interior de la institución.

   En la parte posterior de la institución, se identificó un patio cubierto con teja plástica en avanzado estado de deterioro, presentando cristalización, quemaduras y deformaciones. De acuerdo con las indicaciones de la SDIS y la interventoría del proyecto, está cubierta debe ser reemplazada por tejas metálicas nuevas.

2. Vigas canales: Se encontraron vigas canales de concreto con manto de impermeabilización deteriorado y, en algunas zonas, sin manto, lo que hace indispensable su instalación. Asimismo, se requiere una limpieza general debido a la acumulación de suciedad, principalmente por excrementos de palomas y falta de mantenimiento.

3. Estructura metálica de la cubierta del patio: Es necesario reevaluar la capacidad estructural de la cubierta metálica del patio para garantizar que pueda soportar el peso de la nueva teja metálica. Se requiere la intervención de un especialista en estructuras, quien debe realizar la evaluación técnica correspondiente y determinar si es necesario reforzar o reemplazar la estructura existente.

4. Flanches metálicos: Se detectaron flanches metálicos sueltos, levantados o con secciones faltantes. Dado que se llevará a cabo el desmontaje y la instalación de una nueva estructura, será necesario retirar y reemplazar los flanches metálicos para garantizar un adecuado sellado contra filtraciones.

5. Ventanas de aluminio: Se evidenciaron filtraciones entre los marcos y los vidrios de la ventanearía en la fachada principal y posterior, debido a que los empaques han cristalizado con el tiempo. Para corregir este problema, se debe:

   - Desmontar los vidrios,
   - Instalar nuevos empaques,
   - Reinstalar los vidrios correctamente.

6. Además, se recomienda realizar una limpieza profunda de todos los vidrios de la fachada principal y posterior, ya que presentan una acumulación considerable de suciedad.






Fotografía No. 55. Estado inicial de cubierta de fachada

La intervención de este frente consistió en el mantenimiento de la cubierta, realizando una inspección detallada para identificar tejas en mal estado, procediendo a su reemplazo inmediato. Así mismo, se deben evaluaron los canales, bajantes y demás elementos que forman parte del sistema de drenaje de la cubierta, asegurando su correcto funcionamiento realizando la limpieza, y su impermeabilización con manto asfáltico (canales).También se inspeccionaron todos los tornillos de fijación de la cubierta y se procedió a su ajuste o reemplazo en caso de corrosión, desgaste o aflojamiento, garantizando así una sujeción segura y estable.



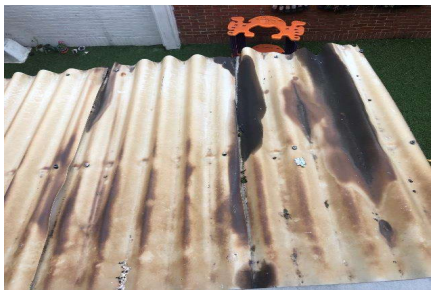

Fotografía No. 56. Estado inicial de cubierta del patio interno

Se realizó el retiro y reemplazo inmediato de la teja plástica averiada en el patio interno, ya que su estado deteriorado compromete la protección de la estructura y puede generar filtraciones o fallas en la cubierta; Se identificaron viga canales de concreto con manto de impermeabilización deteriorado y, en algunas zonas, sin manto, lo que hizo indispensable la instalación de nuevo manto asfáltico para evitar filtraciones y garantizar la correcta conducción de las aguas lluvias.

Se realizó una limpieza general de las vigas canales, ya que presentaban una acumulación significativa de basuras y restos de excremento de palomas y otros agentes contaminantes que puedan afectar la durabilidad del material.




Fotografía No. 56. Estado inicial de la estructura metálica de cubierta del patio interno

Se realizó el mantenimiento, lijado, resane, aplicación de anticorrosivo y esmalte, en la totalidad de la estructura de soporte, en concordancia con las recomendaciones del especialista estructural, la intervención garantiza mayor estabilidad, durabilidad y seguridad, además de cumplir con los requerimientos técnicos del proyecto.




Fotografía No. 57. Estado inicial de la estructura metálica de cubierta del patio interno

Se desmontaron los flanches desprendidos para permitir la instalación de nuevos flanches metálicos.

Se detectaron filtraciones en la ventanearía de aluminio de la fachada principal y posterior debido al deterioro de los empaques, los cuales se encuentran cristalizado, para solucionar el problema, es necesario hacer una limpieza profunda y aplicar sellante sobre los empaques deteriorados.





Fotografía No. 58. Estado inicial vidrios de la fachada principal y posterior.





Fotografía No. 59. Instalación de lona verde para aislar zona de trabajo en patio interior





Fotografía No. 60. Desmonte de cubierta de patio interior





Fotografía No. 61. Retiro de manto de aluminio existente sobre canales existentes





Fotografía No. 62. Mantenimiento de cubiertas existentes





Fotografía No. 63. Mantenimiento de estructura metálica de patio interno





Fotografía No. 64. Instalación de flanches metálicos en cubierta de bloque principal





Fotografía No. 64. Instalación de flanches metálicos en cubierta de bloque principal



Fotografía No. 65. Instalación de cubierta tipo Ecorrof en patio interior



Fotografía No. 66. Instalación de sellante en fachadas.

FRENTE No. 4 JARDÍN INFANTIL ATA.



Fotografía No. 67. Jardín Infantil Ata

Se realizó un primer recorrido como identificación de los problemas el día 04 de diciembre de 2024 con funcionarios de plantas físicas, interventoría y contratista, encontrando lo siguiente:

- La intervención se debe realizar en el interior de los tanques de almacenamiento de agua potable y aguas lluvias, ubicados en las zonas exteriores dentro del complejo educativo.
- Se deberá desocupar cada tanque en su totalidad, coordinando con el personal administrativo.
- Se repararán las filtraciones mediante el sellado de fisuras con productos elastoméricos a base de poliuretano.
- Para evitar filtraciones externas, se nivelará las aperturas de acceso con estructuras de concreto ancladas a la existente, reutilizando las puertas de lámina actuales.
- Los pasos metálicos de acceso serán reemplazados por pasos plásticos para evitar oxidación.
- Se verificará el sellado de tuberías, tragantes y otros elementos que interfieran con la estructura de los tanques.
- Se aplicarán pañetes impermeabilizantes en pisos, muros y techos, y pintura epóxica en el interior de cada tanque.
- Cada tanque será llenado nuevamente y sometido a pruebas de limpieza y estanqueidad para garantizar la ausencia de filtraciones y fugas.
- Se instalará un cerramiento en poli sombra de aproximadamente 25 m para delimitar el área de trabajo y controlar polvo y desperdicios.
- Solo después de vaciar los tanques se podrá determinar con exactitud la cantidad de actividades a ejecutar.

ESTADO EXTERIOR DE LOS TANQUES Y DEL ÁREA CIRCUNDANTE A NIVEL PEATONAL





Fotografía No. 68. Estado inicial del exterior de los tanques y del área circundante a nivel peatonal

- Los tanques se encuentran ubicados bajo la demarcación roja.

ESTADO ACTUAL DE LAS PUERTAS DE ACCESO





Fotografía No. 69. Estado inicial de las puertas de acceso a tanques de agua

En la cubierta de ingreso, para evitar la filtración de aguas desde el exterior al interior de cada tanque, se realizará un recalce y nivelación en concreto de las tapas de acceso; reutilizando a su vez, las mismas superficies de alfajor.

Dentro de las obras ejecutadas en los tanques de agua potable y tanque de recirculación de aguas lluvias del Jardín Infantil ATA, se instaló un cerramiento en lona verde para aislar el área de trabajo, desmonte de tapas metálicas de acceso a tanques, construcción de viga de realce en concreto con refuerzo anclado con epóxico a concreto existente para evitar el ingreso de aguas lluvias a los tanques intervenidos, limpieza y lavado de tanques, instalación de pañete impermeabilizado en superficie de muros y placas de fondo de tanques, impermeabilización de placas y muros con producto modificado con polímeros, instalación de escalera plástica y reinstalación de tapas metálicas existentes para controlar el ingreso de a los tanques intervenidos.





Fotografía No. 70. Cerramiento en lona verde con parales



Fotografía No. 71. Desmonte de puertas existentes



Fotografía No. 72. Instalación de escalera plástica al interior de los tanques



Fotografía No. 73. Instalación de pañete muro 1:3 impermeabilizado



Fotografía No. 74. Construcción de vigas en concreto reforzado para ingreso a tanques, incluye acero de refuerzo anclado con anclaje epóxico.



Fotografía No. 75. Reinstalación de tapas metálicas para ingreso de tanques.

FRENTE No. 5 JARDÍN INFANTIL CENTRO CRECER.

Se realizo un primer recorrido como identificación de los problemas el día 02 de diciembre de 2024 con funcionarios de plantas físicas, interventoría y contratista encontrando lo siguiente:

• Se evidencia la necesidad de hacer el mantenimiento total de la cubierta existente en todas sus áreas por presentar problemas de goteras y filtraciones, de igual forma se hace necesario solucionar diferentes puntos de filtraciones en muros de fachadas.

• Se evidencia que debemos impermeabilizar las canales existentes, para eliminar filtraciones.

• Instalación de pintura epóxica a media altura.

• Se deben pintar los cielos rasos.

• Rehabilitar los sensores de los fluxómetros de los sanitarios.

• Reposición de vidrios rotos en las puertas.

• Reposición de lámparas que no estén en funcionamiento.

• Realizar mantenimiento a la puerta de la Ludoteca.

• En el área de casita Simulada se debe reponer pintura, solucionar empozamiento en anden posterior con extensión de cárcamo, y se debe construir un cerramiento liso.

• Las puertas en acero inoxidable se encuentran sueltas y deben ajustarse.

• Se debe realizar ajuste a la puerta corrediza del comedor.

• La red eléctrica de la cocina se debe realizar un diagnóstico, para presentar propuesta que permita habilitar el sistema de refrigeración de los alimentos.

• Tanque de agua potable se debe realizar impermeabilización.

• Se realizará el mantenimiento de todo el sistema de cubiertas inclinadas de la sede imagen 1. Se apretarán y asegurarán tornillos, se realizará cambio de empaques donde sea requerido, se retirarán los cordones de silicona ya cristalizada y se cambiarán por nuevos. Se enderezarán flánches desplazados o desacomodados garantizando siempre, la no filtración de aguas lluvias al interior de los espacios, se retirarán hojarascas o mugre que pueda estar obstruyendo los recorridos del agua lluvia tanto en tejas como en canales.





Fotografía No. 76. Estado inicial canales y bajantes.

El Centro CRECER tuvo dentro de su alcance de ejecución tuvo el retiro de manto asfáltico dañado ubicado en las canales en concreto, reposición de manto asfáltico, reposición de vidrios en puertas de acceso a aulas, resanes de muros internos, aplicación de esmalte y vinilo tipo 1 en muros, instalación de canal galvanizada,

instalación de bajantes de aguas lluvias, construcción de cárcamos de aguas lluvias con rejilla metálica, reposición de luminarias averiadas, impermeabilización de tanque de agua potable, instalación de sellante en ventanas de fachadas y limpieza de cárcamos existentes.



Fotografía No. 77. Retiro de manto de aluminio sobre canales en concreto





Fotografía No. 78. Instalación de manto asfáltico morter plast



Fotografía No. 79. Ajuste de complemento de puerta existente




Fotografía No. 80. Desmonte de puerta en vidrio y aluminio para reubicación en acceso de archivo.



Fotografía No. 81. Cárcamo de aguas lluvias intervenido con limpieza y aseo.



Fotografía No. 82. Construcción de cárcamo en concreto de 3000psi con rejilla metálica. Fundición de placa de concreto para andén circundante a casita simulada

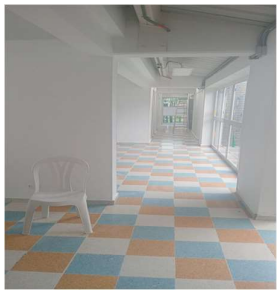

Fotografía No. 83. Intervención de muros con resanes e instalación de pintura en vinilo tipo 1 al interior de la edificación.



Fotografía No. 84. Instalación de panel LED 120 X 30 cm de sobreponer.




Fotografía No. 85. Intervención de muros con resanes e instalación de pintura en vinilo tipo 1 al interior de la edificación.



Fotografía No. 86. Intervención de muros con resanes e instalación de pintura en vinilo tipo 1 y esmalte al interior de la edificación.



Fotografía No. 87. Suministro e instalación de canal metálica en acero galvanizado en fachada posterior de aulas.



Fotografía No. 88. Suministro e instalación de bajante en pvc



Fotografía No. 89. Impermeabilización tanque agua potable.



Fotografía No. 90. Aplicación de sellante par ventanas de fachada



Fotografía No. 91. Aseo general final y limpieza.

FRENTE No. 6 JARDÍN INFANTIL CENTRO CADIS.

Se realizo un primer recorrido como identificación de los problemas el día 02 de diciembre de 2024 con funcionarios de plantas físicas, interventoría y contratista encontrando lo siguiente:

• Se evidencia la necesidad de hacer el mantenimiento total de la cubierta existente en todas sus áreas por presentarse problemas de goteras y filtraciones.

• Se debe impermeabilizar las vigas canales y las placas superiores.

• Reposición de lámparas que no estén en funcionamiento.

• Se requiere la instalación de un canal en la fachada posterior de los salones.

• Se debe realizar reposición de vidrio en la puerta de acceso a la cancha.

• En el área de la cocina se debe impermeabilizar la placa de la cubierta, cambio y reposición de anjeos, instalación de burletes en puertas.

• En el área del archivo, se debe construir un muro en drywall que lo independice del aula de sistemas, e instalando una puerta interna.

• La red eléctrica de la cocina se debe realizar un diagnóstico, para presentar propuesta que permita habilitar el sistema de refrigeración de los alimentos.

• Se debe realizar Pintura en todos los muros.

• Se realizará el mantenimiento de todo el sistema de cubiertas inclinadas de la sede. Se ajustarán y asegurarán tornillos, se cambiarán empaques donde se requiera, se retirarán cordones de silicona ya cristalizada y se cambiarán por nuevos. Se alinearán flánches desplazados o desacomodados garantizando siempre, la no filtración de aguas lluvias al interior de los espacios, se retirarán hojarascas o mugre que pueda estar obstruyendo los recorridos del agua lluvia tanto en tejas como en canales. Para la cubierta transparente del espacio principal, se realizará el mantenimiento y lavado de las tejas tanto dentro como afuera del espacio para garantizar una buena renovación e impacto visual al momento de entregar la obra. Se pintará la estructura de soporte en este espacio principal, por debajo de la cubierta.

• Para las cubiertas planas del sector del espacio principal de la sede, se retirarán los mantos existentes;, y se instalarán nuevos mantos geotextiles garantizando el buen funcionamiento de las mediacañas de cubierta y tragantes de sifones. Este cambio de manto frenará la filtración de humedad del cielo falso en el fondo de la recepción. De igual, el sector de la cubierta plana correspondiente a la cocina recibirá el mismo cambio de manto y tratamiento.

• El pañete de la imagen 4 será retirado e instalado nuevamente, el tratamiento de filtraciones de agua por el perímetro de las ventanas del edificio serán tratadas mediante cordón de sellamiento elástico de juntas, una vez se halla retirado previamente el material cristalizado o que se encuentre en deficientes condiciones.

• En la parte posterior a las aulas, se instalará una canaleta de desagüe con su respectiva bajante para recibir las aguas lluvias que vienen desde la cubierta. Se realizará en el espacio de la bodega la demolición del pañete afectado por la humedad en el muro izquierdo del espacio con su respectiva reinstalación. Se realizará la reposición del vidrio sobre la puerta de acceso que dirige hacia la cancha deportiva de la sede. También se realizará en el espacio de la cocina el cambio e instalación de angeos nuevos para las ventanillas que lo requieran.

• Para el área de archivo se instalará un muro en Drywall doble cara, el cual separará las zonas requeridas por la sede para ese espacio y recibirá el traslado de una puerta ya existente en el lugar.

• Se instalará pintura esmalte en los muros de la cocina de la sede. El tratamiento de filtraciones de agua debajo de ventanas o por los perímetros de la carpintería, se realizará mediante cordón de sellamiento elástico de juntas, una vez se halla retirado previamente el material cristalizado o que se encuentre en deficientes condiciones.

• Se realizará el cambio de luminarias en los espacios donde las lámparas estén averiadas o en deficiente funcionamiento. El diagnóstico eléctrico será fundamental para hacer la corrección adecuada en su respectivo momento.

• El aspecto general mostrado por la estructura de cubierta en el interior requiere de mantenimiento y pintura de estructuras de soporte en su espacio principal

En algunos puntos del cielo raso existente se requiere de la corrección de sus componentes. Esta es una de las vistas de alguno de los baños existentes.

Las actividades ejecutadas comprendieron el mantenimiento integral de las cubiertas en las áreas de comedor, recepción 2, aulas, pasillo y archivo, que incluyó la instalación de manto impermeabilizante, canales, impermeabilización de placas con manto y la aplicación de pintura bituminosa en los traslapos. Se llevaron a cabo además resanes y pintura en diferentes muros, la instalación de angeos en puertas y ventanas de la cocina, así como la reposición de un vidrio roto en la puerta de acceso a la cancha múltiple. Como parte de las mejoras, se construyó un nuevo muro divisor para el archivo, se trasladó la puerta del rack hacia el archivo y se realizó la pintura del muro posterior de la cancha múltiple. La correcta ejecución y finalización de estas labores



Fotografía No. 92. Retiro de manto de aluminio sobre cubiertas





Fotografía No. 93. Instalación de vidrio 5 mm con película de seguridad en puerta de salida a parque





Fotografía No. 94. Instalación de manto morter plas al - 300 3.00 mm ancho 1.10 m



Fotografía No. 95. Desmonte de todo tipo de cieloraso existente



Fotografía No. 96. Resane de muros internos.




Fotografía No. 97. Suministro e instalación de panel led 120 x 30cm de sobreponer.




Fotografía No. 98. Suministro e instalación de bala LED de 18 W.



Fotografía No. 99. Suministro y aplicación de sellador elástico, para sello de juntas de ventanas con muros en fachada.

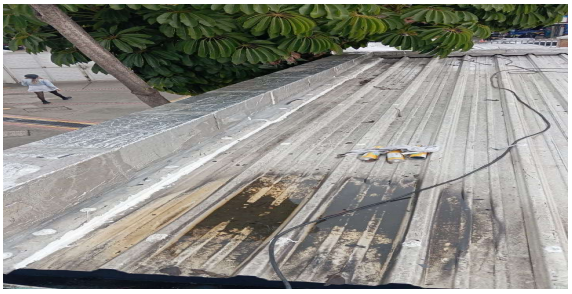

Fotografía No. 100. Aplicación de sellador elástico, para sello de juntas de manto con teja existente.

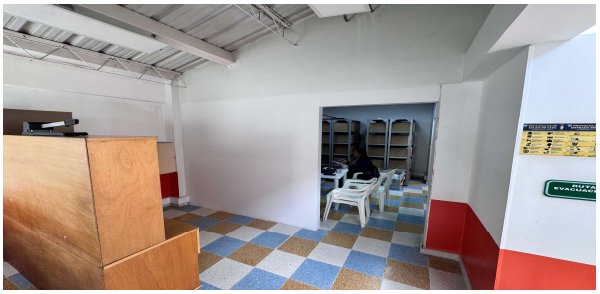

Fotografía No. 101. Construcción de muro en dry wall para cierre de área de archivo.



Fotografía No. 102. Suministro e instalación de malla (angeo), incluye ángulo de aluminio y tornillería, en ventanería de cocina.



Fotografía No. 103. Suministro e instalación de vinilo tipo 1 y esmalte en muros internos.



Fotografía No. 104. Suministro e instalación de puntura tipo koraza en muro de cerramiento de patio interno



Fotografía No. 105. Suministro e instalación de canal metálica galvanizada y bajante de aguas lluvias en PVC.



Fotografía No. 106. Suministro e instalación de canal metálica galvanizada y bajante de aguas lluvias en PVC pintada.



Fotografía No. 107. Instalación de manto morter placas en placas de cubierta.

FRENTE No. 7 HOGAR DE PASO BAKATA





Fotografía No. 108. Hogar de Paso Día Bakata entrada

Se realizó un primer recorrido como identificación de los problemas el día 12 de diciembre de 2024 con funcionarios de plantas físicas, interventoría, contratista, donde se suscribió el acta No.09 encontrando lo siguiente:

1. Se evidencia la necesidad de hacer la construcción de una zona para albergar canes.
2. Durante el recorrido se realizó la solicitud de caniles para 15 canes, bajo área cubierta.
3. La zona de caniles debe ser construida en 2 niveles, según planos entregados por la Secretaría de Integración Social.
4. Los canes más grandes serán albergados en las jaulas de nivel inferior, ya que estas serán las de mayor tamaño, y los canes pequeños estarán en los caniles de segundo nivel.
5. En planos entregados por la secretaría de integración social, la solicitud llegó para albergar 18 canes, y estos deberán ser construidos bajo área cubierta.

En la zona actual destinada a la nueva área de caniles, se procederá a demoler los muros existentes y retirar las mallas. Los caniles se construirán bajo la cubierta para maximizar el aprovechamiento del espacio dentro del hogar de paso. Asimismo, se retirará la malla eslabonada perimetral para continuar con la construcción en mampostería de los muros perimetrales hasta igualar el nivel de mampostería ya existente, y se demolerá el muro central actual para ampliar y optimizar el área interna.



Fotografía No. 109. Caniles existentes

El área asignada para aulas de dos niveles, ubicada en la zona delimitada por la malla eslabonada de los muros perimetrales, se convertirá en el emplazamiento donde se construirán dos niveles de jaulas para caninos.

Se retirarán los componentes actuales de los cubículos para perros y se instalarán nuevos de mampostería con divisiones de hasta 1.80 m de altura. Los entrepisos, de 10 cm de concreto con pendiente para desagüe, separarán las jaulas superior e inferior. Los accesos se realizarán con malla ondulada y tubo galvanizado, y cada aula contará con rejillas de ventilación laterales, además de rejillas en la tapa de las jaulas del nivel superior. Asimismo, se colocará un cerramiento permanente de malla eslabonada en los muros perimetrales para evitar el ingreso desde el exterior.



Fotografía No. 110. Malla eslabonada de los muros perimetrales

Las actividades de obra ejecutadas en el contrato de obra No. 9173-2024, se desarrollaron exclusivamente en la zona de caniles, donde se llevó a cabo la demolición de la placa existente, el retiro de las jaulas antiguas en malla galvanizada, y la demolición del muro intermedio. Posteriormente, se ejecutó la fundida del contrapiso con refuerzo en acero, así como la conexión de los desagües de las jaulas con media caña y tubería sanitaria de PVC de 4”. La nueva infraestructura incluyó la construcción de jaulas en mampostería a la vista con ladrillo estructural, el montaje de puertas metálicas en tubería con malla eslabonada, y la instalación de cerramiento perimetral alrededor de las jaulas con el mismo tipo de malla.



Fotografía No. 111. Replanteo muros divisorios caniles



Fotografía No. 112. Cerramiento en lona verde para aislar zona de trabajo



Fotografía No. 113. Demolición de acabado y alistado de piso



Fotografía No. 114. Demolición de muro en mamposteria con acabados



Fotografía No. 115. Desmonte de puertas existentes




Fotografía No. 116.Instalación de tubería PVCS 1-1/2” para desagües





Fotografía No. 117. Instalación de acero de refuerzo de 60.000 psi para placa de contrapíso y dovelas en muros de mampostería estructural





Fotografía No. 118. Instalación de redes de desagüe y fundición de placa de contrapiso



Fotografía No. 119. Alistado pendienteado de piso para caniles inferirores



Fotografía No. 120. Mediacaña en tubería PVC-S




Fotografía No. 121. Anclaje epóxico 3/8”



Fotografía No. 122. Inicio instalación mampostería en nivel inferior de caniles



Fotografía No. 123. Fundición de placa para soporte de segundo nivel de caniles

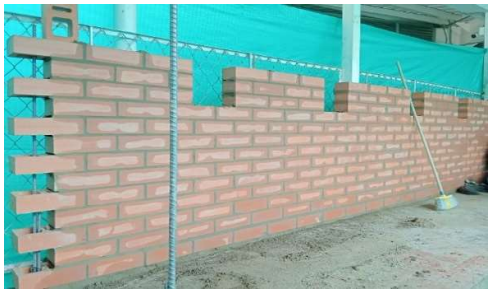



Fotografía No. 124. Muros en ladrillo para caniles





Fotografía No. 125. Construcción y fundición de placa de superior para cierre de caniles superiores

.



Fotografía No. 126. Desmonte malla eslabonada



Fotografía No. 127. Tubería PVCS 4 de caniles superiores



Fotografía No. 128. Rejilla de ventilación.



Fotografía No. 129. Rejilla de piso para desagües de caniles



Fotografía No. 130. CERRAMIENTO. HOGAR DE PASO BAKATA



Fotografía No. 131. Puerta tubo galvanizado y malla ondulada



Fotografía No. 132. Aseo final

FRENTE No. 8 JARDIN INFANTIL EL TRIUNFO



Fotografía No. 133. Fachada Jardín Infantil El Triunfo

La obra Jardín El Triunfo está ubicada en la calle 1bis No. 1B-69, en la ciudad de Bogotá, localidad de Santa Fe.

El 12 de diciembre de 2024, se llevó a cabo una inspección inicial con el objetivo de identificar los problemas presentes en la infraestructura. En este recorrido participaron funcionarios de plantas físicas, la interventoría y el contratista.

- Se evidenció la necesidad de reemplazar completamente la cubierta por una de teja metálica, debido a la presencia de filtraciones, goteras y humedades. Estos problemas son consecuencia de deformaciones, grietas y roturas en la cubierta actual, lo que está generando afectaciones en el interior de la institución.

- Se identificó que las cerchas y los elementos de apoyo de la cubierta están fabricados en material metálico y requieren mantenimiento preventivo. Las actividades incluyen limpieza, lijado en las zonas afectadas por óxido y aplicación de pintura anticorrosiva en toda la estructura.

- Se identificaron 35 luminarias de sobreponer suspendidas mediante guayas metálicas fijadas a los elementos de soporte de la cubierta. Algunas funcionan correctamente, mientras que otras no encienden o presentan intermitencia, lo que señala posibles fallas en el sistema eléctrico o en los propios dispositivos, requiriendo inspección, mantenimiento y, en caso necesario, su reemplazo.

- Se identificaron flanches metálicos con un desarrollo aproximado de 50 cm, los cuales presentan deformaciones significativas debido al desgaste por el tiempo de uso o a una posible mala manipulación. Como consecuencia, estos elementos no cumplen adecuadamente su función de conducir las aguas lluvias hacia la cubierta ni de sellar completamente contra el muro divisorio entre predios, lo que permite filtraciones.

ESTADO ACTUAL DE LAS CUBIERTAS





Fotografía No. 134. Estado inicial de las cubiertas vista superior





Fotografía No. 135. Estado inicial de las cubiertas vista inferior

Recomendaciones

- Realizar una inspección detallada de la estructura de soporte de la cubierta para evaluar su estado y garantizar su capacidad estructural antes de ejecutar el cambio de tejas.
- En las áreas donde se requiera iluminación natural, se recomienda la instalación de tejas traslúcidas para optimizar la entrada de luz.
- En el hall de acceso a la institución, es necesario reemplazar el policarbonato existente, ya que presenta deformaciones y roturas que generan riesgo para los usuarios y causan filtraciones.

ESTADO DE CERCHAS





Fotografía No. 136. Estado inicial de cerchas

Recomendaciones

- Realizar una inspección detallada de los elementos metálicos rectangulares dispuestos perpendicularmente a las cerchas, los cuales funcionan como soporte para la fijación de la teja. Se debe evaluar su estado estructural, verificar la presencia de corrosión o deformaciones y, de ser necesario, proceder con su mantenimiento.

ESTADO DE LUMINARIAS Y PARTE ELÉCTRICA





Fotografía No. 137. Estado inicial de luminarias y salidas eléctricas

Recomendaciones

- Realizar una inspección completa del sistema eléctrico, incluyendo la evaluación de cargas, cableado, tacos de control y cajas de distribución.
- Desmontar y revisar las luminarias, realizando el cambio de bombillos o el reemplazo de los dispositivos en caso de ser necesario.
- Verificar el estado de todos los tomacorrientes, asegurando su correcto funcionamiento o procediendo a su sustitución si presentan fallas.

- Identificar y señalizar adecuadamente las zonas en el tablero de control, ya que actualmente no cuentan con esta clasificación, lo que facilitará la gestión y control interno de la institución.
- Antes de determinar la cantidad de elementos a desmontar o reemplazar, se debe realizar una revisión previa y pruebas funcionales para definir el alcance de la intervención.

ESTADO DEL FLANCHE



Fotografía No. 138. Estado inicial de flanche

Recomendaciones

- Evaluar el estado de los flanches metálicos y proceder con su reparación o reemplazo para restablecer su función de conducción y sellado.
- Realizar una inspección general de las vigas canales, verificando que cuenten con las pendientes adecuadas y que sus bajantes se encuentren en óptimo estado de funcionamiento.
- Ejecutar la limpieza de estos elementos para evitar obstrucciones y garantizar un drenaje eficiente de las aguas lluvias.

En el Jardín Infantil El Triunfo, las obras iniciaron el 23 de enero de 2025 y concluyeron el 3 de marzo de 2025, fecha en la que se firma la entrega mediante el Acta de Recibido a Satisfacción de Mantenimiento. Las labores se centraron en el comedor principal, ubicado en el primer piso, en la parte posterior del predio y junto a la cancha deportiva. Allí se llevó a cabo el retiro de la cubierta existente, el resane y pintura del muro de fondo, tanto del comedor como del espacio de bodegaje, además de la reinstalación de las lámparas existentes. En el área de la cubierta inclinada del primer piso, se realizó el aseo, mantenimiento y pintura de la estructura metálica, así como la instalación de una nueva cubierta tipo Ecoroof, incluyendo el montaje de flanches metálicos, canales y bajantes para aguas lluvias, todos los trabajos fueron ejecutados conforme a los requerimientos establecidos y su finalización.

.





Fotografía No. 139. Cerramiento en lona verde con parales en madera



Fotografía No. 140. Desmonte de cubierta existente en zona de comedor





Fotografía No. 141. Desmonte de luminarias y salidas eléctricas existentes en zona de comedor



Fotografía No. 142. Ejecución de resane de fisuras en muros de comedor



Fotografía No. 143. Instalación de pintura vinilo tipo 1 a tres manos en muros de comedor



Fotografía No. 144. Mantenimiento de estructura metálica de cubierta e instalación de pintura tipo esmalte





Fotografía No. 145. Instalación de flanche en lámina galvanizada





Fotografía No. 146. Suministro e instalación de cubierta ecoroof



Fotografía No. 147. RESANE muros contra cubierta



Fotografía No. 148. Reposición de bajante PVC para aguas lluvias

FRENTE N. 9 MI REFUGIO



Fotografía No. 149. CENTRO DIA MI REFUGIO

Se realizó un primer recorrido como identificación de los problemas el día 02 de diciembre de 2024 con funcionarios de plantas físicas, interventoría, contratista encontrando lo siguiente:

PINTURA PUERTAS DE ACCESO



Fotografía No. 150. Estado inicial puertas de acceso

Puerta 1. Salida de emergencia

Puerta 2. Cuarto de desechos (con persiana de ventilación)

Puerta 3. Puerta doble de acceso peatonal

Se solicita el mantenimiento de las tres puertas, donde se evidencia la falta de pintura por las dos caras, más la reposición de vidrio roto.

CIELO RASO EN COCINETA





Fotografía No. 151 Área de cocineta carente de cielo raso

1. Instalación de Cielo Raso en Cocineta

Se identificó que el área de cocineta carece de cielo raso, por lo que se hace necesaria la instalación de este elemento. Además, se requiere bajar dos lámparas a la altura del nuevo cielo raso para garantizar una iluminación adecuada.

- Área para intervenir: 6.7 m2.
- Estructura: Instalación de cielo raso con su respectiva estructura metálica.
- Iluminación: Ajuste de altura de dos lámparas según el nivel del cielo raso.
-

2. Instalación de Media Cañas en Cocina (Muros y Techos)

Se verificó que las esquinas de la cocina presentan ángulos normales de 90 grados, con acabados en enchape de baldosa. En el techo, se encuentra instalado un cielo raso en drywall con moldura tapa luz entre el cielo raso y el muro.

Se solicita la instalación de media cañas en los siguientes puntos:

- Muros
- Techos

3. Áreas Involucradas

Dado que el área de cocina, depósito y preparación forman parte del mismo espacio de la cocina, se requiere que todas estas zonas cumplan con las mismas condiciones establecidas para la instalación de cielo raso y media caña.




Fotografía No. 152. Estado inicial cocina, zona de preparación y alacena

Se hace la aclaración sobre la esquina de la cocina, la zona de preparación y la alacena sin media caña en muros ni en techos.

AMPLIACIÓN DE CAMPANA EXTRACTORA



Fotografía No. 153. Estado inicial campana extractora

4. Ampliación de Campana Extractora

En el acta de primera visita se solicita la ampliación de la campana extractora. Sin embargo, no se especifica con claridad si la ampliación se refiere a la capacidad de extracción, el tamaño físico o algún otro aspecto técnico. Es necesario definir esta solicitud con mayor precisión para poder atenderla de manera adecuada.

5. Ventilación en Aluminio con Angeo

Se identificó una pequeña ventilación de aproximadamente 20x40 cm en el muro, actualmente con una rejilla plástica. Se solicitó la instalación de una nueva ventilación en este mismo espacio, con un marco de aluminio y angeo, garantizando una mejor circulación del aire.

6. Pintura Interior en Muros con Vinilo

Los daños en la pintura interior de los muros se deben a filtraciones de agua en las cubiertas. En algunos sitios, la humedad ha deteriorado la parte alta de los muros, por lo que será necesario intervenir estas áreas antes de proceder con la aplicación de la nueva capa de pintura en vinilo.

MANTENIMIENTO DE TODA LA CUBIERTA




Fotografía No. 154. Estado inicial cubierta vista superior




Fotografía No. 155. Estado inicial cubierta vista inferior

Se solicita el mantenimiento de la cubierta debido a filtraciones de agua, especialmente en el área del patio cubierto del primer piso, donde se ha identificado caída de agua en el centro del patio y contra los muros.

Las actividades para realizar incluyen:

- Revisión y ajuste de todos los tornillos de sujeción con los ganchos y empaques.
- Verificación del estado de las tejas, con sustitución en caso de detectar piezas en mal estado.

ESTADO DE LUMINARIAS Y PARTE ELÉCTRICA

Se encontraron luminarias de sobreponer suspendidas por guayas metálicas, atornilladas a los elementos metálicos de soporte de la cubierta o a cerchas. Algunas funcionan correctamente, mientras que otras no encienden o presentan intermitencia en los bombillos.

Las actividades para realizar incluyen:

- Revisión de todo el sistema eléctrico, incluyendo cargas, cableado, tacos de control y cajas.
- Desmonte de luminarias para su revisión, cambio de bombillos o reemplazo del elemento si es necesario.


- Revisión de todos los tomacorrientes para verificar su correcto funcionamiento y proceder a su cambio si es requerido.
- Identificación de zonas en el tablero de control, ya que actualmente no existe esta clasificación, lo que facilitará el control interno de la institución.





Fotografía No. 156. Estado inicial de luminarias y redes eléctricas

Para determinar el número de elementos a desmontar o cambiar, se deberá realizar una revisión previa con las pruebas necesarias.

Durante el periodo de ejecución del contrato de obra No. 9173-2024, en el Centro Día Mi Refugio las labores iniciaron el 21 de enero de 2025 y culminaron el 11 de marzo de 2025, fecha en la que se formalizó su entrega mediante el Acta de Recibido a Satisfacción de Mantenimiento. En cuanto a los espacios en general, se ejecutaron trabajos de pintura total en todos los muros internos de la edificación, acompañados de resanes previos para garantizar un acabado adecuado. Además, se realizó el cambio de todas las luminarias en mal estado, una jornada de aseo en todo el edificio y el lavado general de la fachada. En la zona de cubierta, se efectuó una limpieza completa del sistema, incluyendo el sellado de la tornillería para evitar filtraciones, así como la instalación de flanches nuevos que fortalecen su funcionalidad. En los baños, se llevó a cabo la adecuación de un sanitario y un lavamanos accesible para personas con movilidad reducida en el primer piso, en cumplimiento de criterios de accesibilidad universal. La escalera y su baranda fueron pintadas en su totalidad para prevenir mayores deterioros y ofrecer una superficie segura para el desplazamiento de los usuarios de la sede, así como en el cuarto piso se instala piso en cerámica en el área del balcón que está expuesto a la intemperie. Finalmente, en la cocina, se instaló media caña desde el piso hasta el techo y de pared a pared, contribuyendo a mejorar las condiciones higiénicas del área. La documentación correspondiente a la finalización de estas actividades

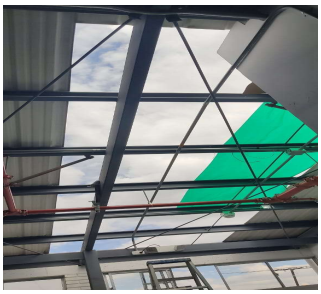Fotografía No. 157. Desmonte de cubierta traslucida existente en el cuarto piso

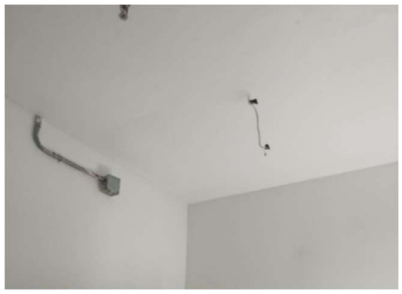

Fotografía No. 158. Desmonte de salidas eléctricas existentes





Fotografía No. 159. Mantenimiento de cubierta existente, reposición de tornillos y sellado de los mismos






Fotografía No. 160. Resane de fisuras en muros







Fotografía No. 161. Suministro e instalación de medicañas en PVC en zona de despensa y cocina



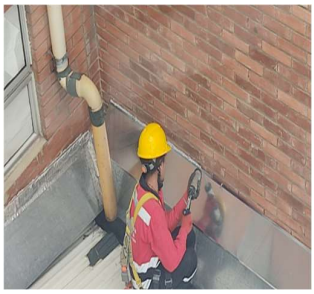


Fotografía No. 162. Suministro y aplicación de sellador elástico en mediacañas en PVC y flanches metálicos nuevos instalados en cubierta existente

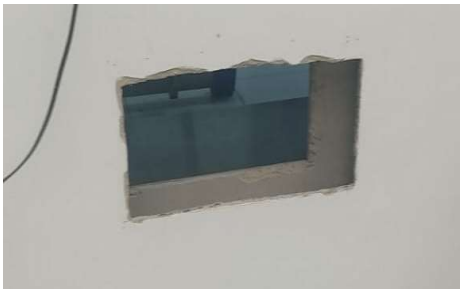

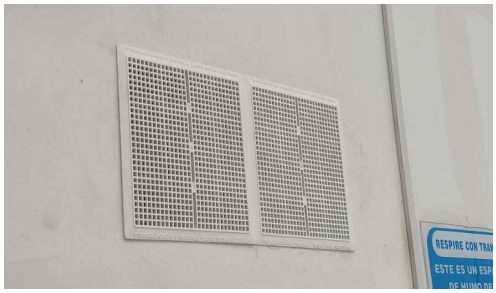

Fotografía No. 163. Apertura de vano en muro en dry wall e instalación de malla plástica para ventilación de cocina



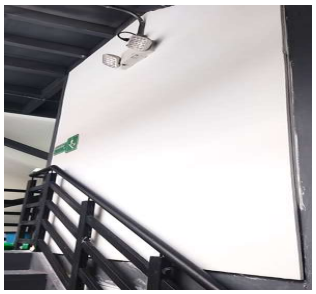

Fotografía No. 164. Aplicación de vinilo tipo 1 a tres manos en muros internos y punto fijo de escalera





Fotografía No. 165. Aplicación de esmalte sobre puertas y marcos metálicas a dos manos y dos caras en puertas de fachada, acceso primer piso




Fotografía No. 166. Aplicación de esmalte sobre puertas y marcos metálicas a dos manos y dos caras en puertas de fachada, acceso primer piso



Fotografía No. 167. Suministro e instalación de cieloraso falso en zona de cocineta primer piso

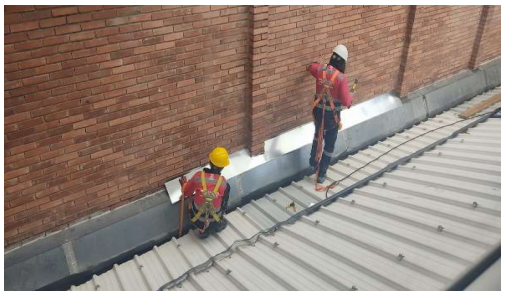



Fotografía No. 168. Instalación de flanche en lámina galvanizada sobre cubierta de piso 1





Fotografía No. 169. Suministro e instalación de cubierta ECOROOF en reposición de teja traslucida de cuarto piso



Fotografía No. 170. Desmonte aparatos sanitarios en baño primer piso para instalación de baños para personal en condición de discapacidad.



Fotografía No. 171. Lavado con hidrófugo de piedra de fachada principal



Fotografía No. 172. Resane de muros de punto fijo de escalera



Fotografía No. 173. Suministro e instalación de lavamanos para personal en condición de discapacidad, incluye grifería con sensor, primer pso



Fotografía No. 174. Interruptor doble conmutable



Fotografía No. 175. Suministro e instalación de sensor de movimiento ubicado en hall de primer piso.



Fotografía No. 176. Luminaria de emergencia tipo Mickey Mouse



Fotografía No. 177. Suministro e instalación de luminarias 60x60 repuestas por falla de las existentes



Fotografía No. 178. Suministro e instalación de panel LED circular



Fotografía No. 179. Instalación de piso en cerámica beige antideslizante en balcón de cuarto piso





Fotografía No. 180. Instalación de pintura antideslizante en superficie de escalera central



Fotografía No. 181. Suministro e instalación de guarda escoba en cerámica en zona de balcón de cuarto piso



Fotografía No. 182. Suministro e instalación de sanitario para personas de movilidad reducida, en el baño del primer piso






Fotografía No. 183. Aplicación de 3 manos de vinilo tipo 1 sobre muros internos



Fotografía No. 184. Aplicación de pintura en aceite sobre muro en cocina

Fotografía No. 185. Aplicación de esmalte sobre baranda





Fotografía No. 186. Aplicación de esmalte sobre puertas en patio interno, cuarto de bombas red contraincendio




Fotografía No. 187. Aplicación de esmalte sobre estructura metálica de punto fijo de escalera central.

ANTES 	**DESPUES** 
Fotografía No. 188. Reposición de vidrio incoloro en puerta de acceso	




Fotografía No. 189. Aseo y limpieza final

FRENTE N.10 SEDID

El contratista de obra, en el Antiguo Hogar de Paso SEDID – Puente Aranda inició actividades el 31 de enero de 2025 y finalizó el 5 de febrero de 2025, con la respectiva Acta de Recibido a Satisfacción de Mantenimiento. Las actividades se presentaron en la zona de consultorios, se llevó a cabo el mantenimiento de medias cañas sanitarias, el sellado de uniones con muros en drywall, resane y aplicación de pintura en superficies intervenidas, así como el cambio de la tubería hidrosanitaria y el montaje de nuevos lavamanos y grifería para lavaplatos. En el cuarto de basuras, se instaló un cielo raso en superboard, y se ejecutó un cerramiento superior con muros en el mismo material. En cuanto a los baños, se realizó el reemplazo de grifería y sifones en orinales y lavamanos, y se ejecutó la adecuación completa de un sanitario accesible para personas con movilidad reducida, promoviendo el cumplimiento de las normativas. Todas estas intervenciones se realizaron conforme a los requerimientos técnicos establecidos y su correcta ejecución.



Fotografía No. 190. Demolición de enchape de muros en baño intervenido

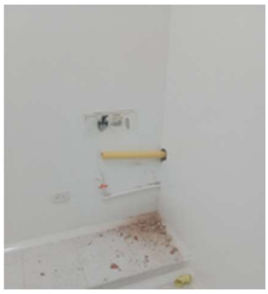



Fotografía No. 191. Desmonte y desconexión de aparatos





Fotografía No. 192. Desmonte de puertas existentes



Fotografía No. 193. Desmonte de tuberías hidrosanitarias existentes



Fotografía No. 194. Regatas en muros para instalación de nuevas redes hidrosanitarias en baño intervenido



Fotografía No. 195. TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" con su respectiva válvula de bola, para punto de agua fría a aparato sanitario



Fotografía No. 196. Reemplazo válvula flotador para sanitario existente



Fotografía No. 197. Tubería PVCS 2" para salida sanitaria en baño existente



Fotografía No. 198. Suministro e instalación de sifón plástico flexible



Fotografía No. 199. Suministro e instalación de grifería para lavaplatos, tipo cuello de ganso

.



Fotografía No. 200. Suministro e instalación de sanitario para personal en condición de movilidad reducida, incluye bizcocho, una barra en acero inoxidable abatible y otra en el mismo material fija, así como la reposición del enchape demolido



Fotografía No. 201. Suministro e instalación de lavamanos para personal en condición de discapacidad, incluye grifería con sensor



Fotografía No. 202. Suministro e instalación de salida para tomacorriente doble red regulada tipo institucional



Fotografía No. 203. Suministro e instalación de salida para pulsador de timbre eléctrico



Fotografía No. 204. Canaleta metálica para salida eléctrica regulada incluye tapa



Fotografía No. 205. Construcción de muros en super board para bodega






Fotografía No. 206. Suministro e instalación de grifería de lavamanos tipo push



Fotografía No. 207. Suministro e instalación de grifería de orinales tipo push



Fotografía No. 208. Suministro e instalación de tapa registro de 20 x 20

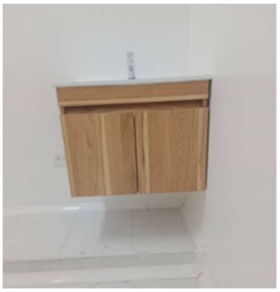

Fotografía No. 209. suministro e instalación de mueble gabinete bajo lavamanos



Fotografía No. 210. Pañete liso 1:4, con estuco plástico en área de mesón



Fotografía No. 211. Aplicación de pintura en esmalte en puerta reinstalada



Fotografía No. 212. Suministro e instalación de cieloraso falso en panel superboard



Fotografía No. 213. Suministro e instalación de cerradura de sobreponer



Fotografía No. 214. Suministro e instalación de cerrojo o tipo tejo


FRENTE N. 11 CURNN

Las actividades de obra fueron ejecutadas en el Centro Único de Recepción de Niños y niñas – CURNN, por parte del contratista en el período comprendido entre el 13 de marzo de 2025 al 15 de abril DE 2025, iniciando por la instalación de un cerramiento en el parqueadero para aislar la zona d acopio de escombros. Se intervinieron dos baños, a los cuales se les realizó la reposición de redes hidrosanitarias, placas de contrapiso, enchape piso y enchape de muros, cambio de cielo raso de dry wall a pvc, instalación de teleduchas eléctricas, instalación de divisiones en acero inoxidable, cambio de aparatos sanitarios tipo infantil y para personal de movilidad reducida incluidos lavamanos, instalación de orinales, todos los aparatos con grifería de alimentación y desagüe, cambio de acometida eléctrica desde tablero existente, construcción de salidas de iluminación y tomacorrientes, con la instalación e los respectivos aparatos eléctricos. En el baño más grande, se suministró e instaló un lavacolas en fibra de vidrio y estructura metálica a sí como un mesón en granito pulido para que sirva como cambiador.

Respecto a los espacios aledaños a los baños, los mismos fueron adaptados como dormitorios, con la intervención de desmonte de puertas existentes, pintura de muros, reinstalación de puertas en nuevo hall, construcción de mediacañas en granito pulido, reposición de luminarias e intervención de cielo raso.



Fotografía No. 215. Cerramiento en zona de parqueadero



Fotografía No. 216. Demolición de acabado y alistado de piso en baño principal



Fotografía No. 217. Demolición de muro ingreso nuevo archivo



Fotografía No. 218. Demolición de meson en baño principal



Fotografía No. 219. Demolición de enchape en baño principal



Fotografía No. 220. Desmonte aparatos sanitarios existentes



Fotografía No. 221. Desmonte de puerta ingreso archivo



Fotografía No. 222. Desmonte de ventana dormitorio 2



Fotografía No. 223. Desmonte de tubería baño principal



Fotografía No. 224. Desmonte de tubería baño secundario



Fotografía No. 225. Demolición de placa baño principal



Fotografía No. 226. Desmonte de cieloraso baño secundario



Fotografía No. 227. Desmonte divisiones metálicas de baños



Fotografía No. 228. Estado inicial placa superior tanque almacenamiento de agua potable



Fotografía No. 229. Retiro manto asfáltico cubiertas hall



Fotografía No. 230. Demolición de piso de parque infaltil



Fotografía No. 231. Corte en piso existente para construcción de rampas



Fotografía No. 232. Puente de adherencia instalado en tanque de agua potable



Fotografía No. 233. Fundición de placa de contrapiso en baño secundario



Fotografía No. 234. Construcción de columneta en baño secundario para confinamiento de muros




Fotografía No. 235. Construcción de mesón–cambiador enchapado en granito pulido



Fotografía No. 236. Dintel en dormitorios 1 y2



Fotografía No. 237. Fundición rampa ingreso principal



Fotografía No. 238. Instalación de malla electrosoldada en rampa ingreso principal



Fotografía No. 239. Instalación de acero para placa de contrapiso baño principal



Fotografía No. 240. Construcción de muro para cierre del ingreso a archivo



Fotografía No. 241. Tubería PVC sanitaria 4” baño principal



Fotografía No. 242. Tubería PVCP 1” baño principal



Fotografía No. 243. Tubería PVCP ½” baño principal



Fotografía No. 244. Punto agua fría baño secundario



Fotografía No. 245. Registro 1” baño principal



Fotografía No. 246. Registro 1/2” baño principal



Fotografía No. 247. Estado inicial de válvulas de pie de tanque de agua potable



Fotografía No. 248. Tubería PVCS 2” baño principal



Fotografía No. 249. Tubería PVCL 2” baño principal, para ventilación de red de aguas negras



Fotografía No. 250. Instalación de sifón de piso baño principal



Fotografía No. 251. Instalación sifón plástico flexible en comida enteral



Fotografía No. 252. Instalación de interruptor sencillo en baño secundario



Fotografía No. 253. Instalación de interruptor conmutable dormitorios 1 y 2



Fotografía No. 254. Instalación de sensor de movimiento baño funcionarios



Fotografía No. 255. Salida tomacorriente doble GFCI baño principal



Fotografía No. 256. Instalación de interruptor 1x20A en tablero existente



Fotografía No. 257. Instalación de interruptor 2X30A en tablero existente




Fotografía No. 258. Instalación de caja metálica en cuarto eléctrico para nueva acometida de baños existentes



Fotografía No. 259. Instalación de acometida red de iluminación para baños



Fotografía No. 260. Instalación de acometida red de eléctrica para duchas nuevas, saliendo desde tablero existente

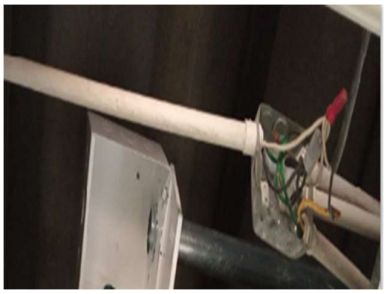

Fotografía No. 261. Construcción salida luminaria comida enteral



Fotografía No. 262. Salida luminaria de emergencia baño principal



Fotografía No. 263. Luminaria de emergencia baño principal



Fotografía No. 264. Suministro e instalación de luminaria 60x60cm farmacia



Fotografía No. 265. Suministro e instalación de luminaria 120X30CM hall ingreso dormitorios



Fotografía No. 266. Tubería IMC 2” sobre cubierta hall dormitorios



Fotografía No. 267. Instalación de alistado de piso baño principal



Fotografía No. 268. Construcción de bocapuerta en granito dormitorio 3



Fotografía No. 269. Instalación de media caña en área de farmacia



Fotografía No. 270. Instalación de sellador de juntas baño principal



Fotografía No. 271. Instalación de esquinero baño funcionarios, para protección de filo de muros



Fotografía No. 272. Suministro e instalación de ventana dormitorio 2.



Fotografía No. 273. Suministro e instalación de puerta nueva en dormitorio 3



Fotografía No. 274. Instalación de sanitario para personal de movilidad reducida en baño principal



Fotografía No. 275. Suministro e instalación de mezclador tipo cuello de ganso comida enteral



Fotografía No. 276. Instalación de tapa registro baño principal para inspección de lavacolas



Fotografía No. 277. Suministro e instalación de barra de seguridad abatible baño secundario



Fotografía No. 278. Suministro e instalación de barra de seguridad fija baño secundario



Fotografía No. 279. Instalación mueble y lavaplatos industrial



Fotografía No. 280. Suministro e instalación de división en acero inoxidable en baño secundario




Fotografía No. 281. Suministro e instalación de lavacolas baño principal



Fotografía No. 282. Instalación de pañete muros baño principal



Fotografía No. 283. Instalación de estuco muro superboard farmacia

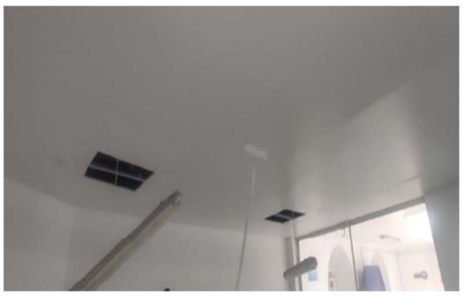

Fotografía No. 284. Instalación estuco muro sala de estar - dormitorios



Fotografía No. 285. Pintura en aceite muros sala de estar



Fotografía No. 286. Aplicación de esmalte sobre cerchas de cielo raso en área de baños



Fotografía No. 287. Instalación de estructura para cieloraso baño principal




Fotografía No. 288. Instalación de manto sobre cubierta en culatas



Fotografía No. 289. Impermeabilización muros tanque subterráneo de agua potable



Fotografía No. 290. Tratamiento de fisuras en placa superior tanque de agua potable



Fotografía No. 291. Aseo general sala de estar

IV. ESTADO FINAL DEL SEGUIMIENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL

Durante el periodo comprendido entre el 13 de diciembre de 2024 y el 30 de abril de 2025, la interventoría ambiental al Contrato No. 9173-2024 verificó la correcta implementación del Plan de Manejo Ambiental (PMA) en la optimización de infraestructura de los centros y sedes de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) – Grupo 2.

Se realizaron actividades constructivas en jardines infantiles, centros de cuidado y casas de atención, priorizando el manejo responsable de residuos y la seguridad ambiental. El contratista cumplió con la gestión de residuos de construcción y demolición (RCD) a través de gestores autorizados como GRECO y Exireciclables MC S.A.S., garantizando trazabilidad documental y disposición en sitios aprobados. Los residuos peligrosos, incluyendo tejas con asbesto y mantos asfálticos, fueron manejados bajo protocolos específicos de almacenamiento, transporte y disposición final.

La interventoría confirmó la no utilización de materiales con asbesto y el cumplimiento en la entrega de certificados de calidad de insumos, así como el control documental de vehículos empleados en la disposición de residuos. Se llevaron a cabo 60 charlas de sensibilización y socialización de buenas prácticas ambientales, fortaleciendo la cultura de sostenibilidad en las sedes intervenidas.

En cuanto a proveedores, se utilizaron insumos de ferreterías locales, minimizando impactos asociados al uso de canteras. Asimismo, no se registró el ingreso de maquinaria pesada durante la ejecución.

V. ESTADO FINAL DEL SEGUIMIENTO DE GESTIÓN SST

LISTADO DE PERSONAL DE CONSORCIO INTERVENTORES AO

La interventoría a lo largo de proyecto laboro con una mano de obra calificada de 12 trabajadores quienes aportaron su granito de arena en el desarrollo de las actividades, cumpliendo con los objetivos en materia de obra y SST. Se anexa el listado de todos los trabajadores que laboraron en el proyecto y se especifica en los retiros quienes estuvieron a lo largo de los meses. Este listado a continuación en la tabla refleja los siguientes ítems: cargos, numero, nombres, apellidos, cedula, cargo, trabajador directo, contratista, independiente y empresa.

CONSORCIO INTERVENTORES AO				LISTADO DE PERSONAL ACTUAL EN CONSORCIO INTERVENTORES AO 2025							
#	NOMBRES	APELLIDOS	CEDULA	EDAD	CARGO	DIREC	CONT	INDEP	EMPRESA	FECHADE INGRESO	FECHADE RETIRO
1	JHON ALEXANDER	ALBARRACIN MAYORGA	1.019.043.623	35	ING. RESIDENTE INTERVENTORIA	X			CONSORCIO INTERVENTORES AO	22/01/2025	30/04/2025
2	JEISSON H STALLING	CADENA OME	12.195.827	50	INSPECTOR INTERVENTORIA	X			CONSORCIO INTERVENTORES AO	28/01/2025	1/03/2025
3	PAULA ANDREA	GARZON TORO	1.013.621.964	34	INSPECTOR INTERVENTORIA	X			CONSORCIO INTERVENTORES AO	28/01/2025	30/04/2025
4	JOSE ALEXANDER	PERDOMO LEON	79.745.639	48	INSPECTOR INTERVENTORIA	X			CONSORCIO INTERVENTORES AO	22/01/2025	25/02/2025
5	JUAN CARLOS	ROJAS	1.023.873.559	51	INSPECTOR INTERVENTORIA				CONSORCIO INTERVENTORES AO	27/01/2025	7/02/2025
6	RAUL DARIO	CARVAJAL CORTES	1.032.365.948	38	INSPECTOR INTERVENTORIA	X			CONSORCIO INTERVENTORES AO	20/01/2025	12/03/2025
7	VIVIANA CAROLINA	MEDINA ROJAS	1.019.080.933	32	RESIDENTE SST INTERVENTORIA	X			CONSORCIO INTERVENTORES AO	22/01/2025	10/03/2025
8	JAMIR	GONZALEZ TIQUE	83.117.200	43	AUXILIAR SST INTERVENTORIA	X			CONSORCIO INTERVENTORES AO	31/01/2025	1/03/2025
9	KATYA ISABEL	JULIO SILGDO	1.047.459.135	32	AUXILIAR SST INTERVENTORIA	X			CONSORCIO INTERVENTORES AO	28/01/2025	25/02/2025
10	LINA YANEY	CHIVATA	33.677.433	43	AUXILIAR SST INTERVENTORIA	X			CONSORCIO INTERVENTORES AO	31/01/2025	8/02/2025
11	CINTHIA LILIANA	RESTREPO	21.022.066	34	AUXILIAR SST INTERVENTORIA	X			CONSORCIO INTERVENTORES AO	6/02/2025	25/02/2025
12	MAYERLY ESTANLY	MORILLO LOPEZ	1.042.471.937	24	AUXILIAR SST INTERVENTORIA	X			CONSORCIO INTERVENTORES AO	6/02/2025	25/02/2025
13	LUIS ALBERTO	FORERO RAMOS	79.974.079	45	DIRECTOR DE OBRA	X			CONSORCIO INTERVENTORES AO	13/12/2024	30/04/2025

Anexo No. 2 digital componente SST Listados y listado sociodemográfico de interventoría

PERSONAL QUE INGRESO EN EL PERIODO DEL INFORME CONSORCIO INTERVENTORES AO.

Para este informe final el CONSORCIO INTERVENTORES AO da un parte de todos los trabajadores que laboraron en la interventoría y que cumplieron a cabalidad con el desarrollo de actividades según el contrato de obra, el personal con que se inició la obra fue el mismo con que se terminó o algunos se retiraron según los avances de obra, por lo tanto, no hubo novedades en cambios o ingresos en el transcurso de los meses. Al igual las personas que ingresaron al inicio del proyecto se les pidió que adjuntaran la información correspondiente según las exigencias de interventoría plasmados en el reglamento interno

Para la solicitud de información de cada una de las hojas de vida es importante resaltar el adecuado anexo para el respectivo archivo digital que se relaciona de la siguiente manera.

DOCUMENTACION DEL PERSONAL ANTIGUO (PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL).

Para el periodo final CONSORCIO INTERVENTORES AO reporta mediante anexos la seguridad social de cada uno de los trabajadores durante todos los periodos de ejecución del proyecto.

Anexo No.3 digital componente SST Planillas de seguridad social o afiliaciones CONSORCIO INTERVENTORES AO.

DOCUMENTOS DEL PERSONAL ANTIGUO R.B. DE COLOMBIA S.A.

Durante la ejecución del Contrato de Obra 9173 de 2024, se contó con la participación de un total de (50) trabajadores, (15) correspondiente a Personal Contractual y (35) a Personal Operativo No Contractual.

Mes a mes (12 de diciembre de 2024 – 15 de abril de 2025), se verificó el pago de aportes al SGSS de los trabajadores previo a su ingreso y durante su participación en el proyecto, adicional a que cumplieran con los requisitos establecidos en los procedimientos de ingreso y alistamiento definidos por R.B. DE COLOMBIA S.A., y los aspectos relacionados con los pliegos de condiciones del Contrato de Obra 9173-24 para el ingreso y permanencia del personal en Frentes de Obra.

Anexo No. 4 digital componente SST Planillas de seguridad social o afiliaciones

LISTADO DEL PERSONAL RETIRADO

Para el informe final se presentan los retiros de todos los trabajadores a la fecha 30 de abril del 2025. Cumpliendo a cabalidad con el proyecto según contrato de CONSORCIO INTERVENTORES AO.

A la fecha del presente informe, se reporta el retiro de la totalidad de trabajadores que participaron en la ejecución del Contrato de Obra 9173 A

continuación, se reporta el retiro de personal Mes a Mes durante la ejecución del proyecto.

Durante el período comprendido entre el 13 de diciembre de 2024 y el 12 de enero de 2025 (Mes 1), no se reportaron retiros de personal. De igual forma, en el período del 13 de enero al 12 de febrero (Mes 2) de 2025, no se presentaron novedades en cuanto a desvinculación de personal.

Para el período comprendido entre el 13 de febrero y el 12 de marzo de 2025 (Mes 3), se reportó el retiro de cuatro (4) personas. En el período siguiente, del 13 de marzo al 15 de abril de 2025, no se registraron retiros de personal. El resto del equipo fue desvinculado para efectos del informe final de liquidación, alcanzando un total de quince (15) retiros durante el periodo de liquidación.

LISTADO DE PERSONAL RETIRADO R.B. DE COLOMBIA S.A.

Durante el período comprendido entre el 13 de diciembre de 2024 y el 12 de enero de 2025 (Mes 1), no se reportaron retiros de personal. De igual forma, en el período del 13 de enero al 12 de febrero (Mes 2) de 2025, no se presentaron novedades en cuanto a desvinculación de personal.

Para el período comprendido entre el 13 de febrero y el 12 de marzo de 2025 (Mes 3), se reportó el retiro de cuatro (4) personas. En el período siguiente, del 13 de marzo al 15 de abril de 2025, no se registraron retiros de personal. El resto del equipo fue desvinculado para efectos del informe final de liquidación, alcanzando un total de quince (15) retiros durante el periodo de liquidación.

PERSONAL RETIRADO POR PERIODO CORRESPONDIENTE			
PERIODO	**CARGO**	**NOMBRE DEL TRABAJADOR**	**NOVEDAD**
INF. 3 (13 DE FEBRERO 2025- 12 DE MARZO DE 2025) Inf. 4 (13 de marzo 2025- 13	**RESIDENTE DE OBRA**	CARLOS ATURO NAVAS SAAVEDRA	RETIRO
	PROFESIONAL AUXILIAR SST	MONICA ALEJANDRA LARA	RETIRO
	INSPECTOR DE OBRA	JHON JAIRO ROJAS REYES	RETIRO
	COODINADOR SST	PEDRO CABARCAS AVILA	RETIRO
Inf. final (14 de abril 2025- 15 de abril de 2025)	**DIRECTOR DE OBRA**	CARLOS ALBERTO PINZON CAJAMARCA	RETIRO
	RESIDENTE DE OBRA	CARLOS ATURO NAVAS SAAVEDRA	RETIRO
	RESIDENTE DE OBRA	NELSON CRISANTO BOLIVAR BARACALDO	RETIRO
	PROFESIONAL AUXILIAR SST	MONICA ALEJANDRA LARA	RETIRO
	PROFESIONAL AUXILIAR SST	IVAN DAVID GRACIA CUBILLOS	RETIRO
	COODINADOR SST	PEDRO CABARCAS AVILA	RETIRO
	INSPECTOR TECNICO	BRAYAN DAVID VELA	RETIRO
	INSPECTOR DE OBRA	JHON JAIRO ROJAS REYES	RETIRO
	PROFESIONAL AMBIENTAL	RUBEN DARIO GIRON CASTILLO	RETIRO
	ESPECIALISTA ELECTRICO	FABIAN STEVEN MORENO	RETIRO
	INGENIERO HIDRÁULICO	MARIA EUGENIA BEJARANO	RETIRO
	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	NESTOR ORLANDO BARRERO	RETIRO
	ESPECIALISTA EN CONTROL Y PROGRAMACION	YURI TATIANA PERDOMO	RETIRO
	RESIDENTE DE OBRA	MIGUEL ENRIQUE FLOREZ DIAZ	RETIRO
	COODINADOR SST	LUISA FERNANDA HERAZO CASTELLANOS	RETIRO

RELACION DE PERSONAL NO CONTRACTUAL RETIRADO

Se hace entrega de paz y salvos correspondientes y de certificación de Representante Legal en la que se reporta, por parte de las empresas subcontratistas, que se notificó al personal acerca de su derecho a la práctica de examen médico de egreso, durante el proceso de inducción tal y como lo indica el CST.

PERIODO	CONTRATISTA/ SUBCONTRATISTA	CARGO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	NOVEDAD
INF. 1 (13 DE DICIEMBRE 2024- 12 DE ENERO DE 2025)	**EN EL PRIMER PERÍODO NO SE REPORTÓ LA VINCULACIÓN DE PERSONAL DE OBRA NO CALIFICADA, DADO QUE LAS LABORES DE CONSTRUCCIÓN AÚN NO HABÍAN SIDO INICIADAS.**			
INF. 2 (13 DE ENERO 2025- 12 DE FEBRERO DE 2025)	PAAA SAS	AYUDANTE DE OBRA	MARCO STIVEN ÁLVAREZ VALENCIA	INGRESO Y RETIRO (01/02/2025)
	PAAA SAS	AYUDANTE DE OBRA	DUVAN FELIPE ÁLVAREZ VEGA	INGRESO Y RETIRO EL MISMO DIA
	PAAA SAS	AYUDANTE DE OBRA	JOSÉ SAUL AMÉZQUITA DIAZ	INGRESO Y RETIRO EL MISMO DIA
	PAAA SAS	OFICIAL OBRA	JORGE ARISMENDIS FLÓREZ ÁVILA	INGRESO Y RETIRO (01/02/2025)
	PAAA SAS	AYUDANTE OBRA	MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ JIMÉNEZ	INGRESO Y RETIRO (01/02/2025)
	PAAA SAS	AYUDANTE OBRA	LUIS ALBERTO RODRÍGUEZ VILLALOBOS	INGRESO Y RETIRO (01/02/2025)
	PAAA SAS	AYUDANTE OBRA	CÉSAR RIVAS ARTUNDUAGA	INGRESO Y RETIRO EL MISMO DIA
	PAAA SAS	AYUDANTE OBRA	ALAN DAVID ROMERO AVELLANEDA	INGRESO Y RETIRO EL MISMO DIA
	PAAA S.A.S.	AYUDANTE OBRA	FREDY ALEXANDER TORRES GARCÍA	INGRESO Y RETIRO EL MISMO DIA
	PAAA S.A.S.	OFICIAL OBRA	WILSON TRUJILLO	INGRESO Y RETIRO EL MISMO DIA
	PAAA S.A.S.	OFICIAL OBRA	LUIS MAURICIO HERRERA ARIAS	INGRESO Y RETIRO EL MISMO DIA
	JGR CONSTRUCCIONES S.A.S.	OFICIAL OBRA	RODOLFO GUACANEME RODRÍGUEZ	INGRESO Y RETIRO (12/02/2025)
	JGR CONSTRUCCIONES S.A.S.	AUXILIAR DE CONSTRUCCIÓN	KEVIN JOEL GUACANEME HERRERA	INGRESO Y RETIRO (28/01/2025)
INF. 3 (13 DE FEBRERO 2025- 12 MARZO DE 2025)	PAAA SAS	AYUDANTE OBRA	JORGE ALEJANDRO FLOREZ PÁEZ	RETIRO
	PAAA SAS	OFICIAL OBRA	CARLOS EDUARDO MARTÍNEZ MORENO	RETIRO
	JGR CONSTRUCCIONES S.A.S.	OFICIAL OBRA	SANDRA MILENA GARCÍA	RETIRO
	JGR CONSTRUCCIONES S.A.S.	OFICIAL OBRA	MILLER MONTIEL MALAMBO	RETIRO
	JGR CONSTRUCCIONES S.A.S.	ENCARGADO	SEYDI MONTIEL MALAMBO	RETIRO
	JGR CONSTRUCCIONES S.A.S.	AUXILIAR DE CONSTRUCCIÓN	JOSUÉ MAURICIO OSORIO SÁNCHEZ	RETIRO
	JGR CONSTRUCCIONES S.A.S.	AUXILIAR DE CONSTRUCCIÓN	HOOVER ANDRÉS RUÍZ GIRALDO	RETIRO
	JGR CONSTRUCCIONES S.A.S.	OFICIAL OBRA	WILSON GIOVANNI TIQUE SARMIENTO	RETIRO
	JGR CONSTRUCCIONES S.A.S.	OFICIAL OBRA	RAÚL ALFONSO CAÑÓN GARZÓN	INGRESO Y RETIRO (28/02/2025)
INF. 4 (13 DE MARZO 2025- 13 DE ABRIL DE 2025)	PAAA SAS	INSPECTOR SST	KAREN TATIANA DIAZ ORTIZ	RETIRO
	PAAA SAS	OFICIAL OBRA	JAVIER ALEXANDER GARCÍA RIVERA	RETIRO
	PAAA SAS	AYUDANTE OBRA	LIZARDO MORA GONZÁLEZ	RETIRO
	PAAA S.A.S.	OFICIAL OBRA	MIGUEL ANGEL TOVAR GÓMEZ	RETIRO

Anexo No. 5 digital componente SST Soportes de retiro de personal RB COLOMBIA S.A.S.

MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES CONSORCIO INTERVENTORES AO

La matriz de requisitos legales de CONSORCIO INTERVENTORES AO (INTERVENTORÍA) ha sido diseñada para las actividades a desarrollar en el presente contrato y será modificada cuando se requiera o cuando la norma actualice.

MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES R.B. COLOMBIA S.A

Para el periodo final RB COLOMBIA S.A.S no presento cambios en la matriz legal. El proyecto, de acuerdo con el desarrollo de actividades, presenta la normatividad vigente para la atención de las medidas de manejo en seguridad y salud en el trabajo correspondiente al Decreto 1072 del 2015 y otras que adicionen o sustituya la ley.

Durante la ejecución del Contrato de Obra No. 9173 de 2024, comprendido entre el 13 de diciembre de 2024 y el 15 de abril de 2025, no fue necesario realizar modificaciones a la Matriz de Requisitos Legales, ya que no se presentaron actualizaciones normativas ni cambios en los requerimientos contractuales. En consecuencia, se mantuvo vigente la matriz inicialmente aprobada al inicio del contrato. Mes a mes, se verificó la aplicabilidad de la Normativa contemplada inicialmente, y de los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones del Contrato de Obra 9173 de 2024.

MATRIZ IPER

MATRIZ IPER R.B. COLOMBIA S.A

La Matriz IPEVR (Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos) es una herramienta utilizada para identificar, evaluar y establecer los requisitos de seguridad y salud ocupacional en el lugar de trabajo. Durante la ejecución del Contrato de Obra 9173 de 2024 (13 de diciembre de 2024 – 15 de abril de 2025) NO se actualizó la matriz de peligros, por lo tanto, se anexa la diseñada para la implementación en el desarrollo del proyecto.

Para este informe final se da por terminado los procesos y culminados los objetivos. Se anexa la matriz en relación con cada una de las actividades de trabajo según los cargos o labores reportadas a interventoría.

Anexo No. 6 digital componente SST Matriz de peligros y valoración de riesgos RB COLOMBIA S.A.S.

PROGRAMA DE CAPACITACION

Informe final de cada una de las charlas programadas mes a mes donde se realizó una buena planificación para la buena educación sst de los trabajadores. Se cumplió con los objetivos de educar día a día mediante charlas muy significativas temas de gran importancia que le competen a los trabajadores. Se evacuaron todos los temas planificados arrojando el 100%.

CRONOGRAMA DE CHARLAS CONSORCIO INTERVENTORES AO

A lo largo del periodo se cumplió con todo el cronograma de charlas programada según los periodos de ejecución del contrato a continuación se plasmas todos los 4 cronogramas ejecutados por el CONSORCIO INTERVENTORES AO.

CRONOGRAMA DE CHARLAS DEL 13 DE DICIEMBRE AL 12 DE ENERO

ITEM	ACTIVIDAD		RESPONSABLE	POBLACION OBJETO	EVALUACION DE EFICACIA (Documentos entregables)
	FECHA	ELABORACION CRONOGRAMA DE CHARLAS DEL PROYECTO CHARLAS PREOPARACIONALES / SEGÚN PLAN DE TRABAJO -PDT- SEGURIDAD DURANTE EL DESARROLLO DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:	RESIDENTE SST	TODO EL PERSONAL DEL PROYECTO	FT-SST-CHARLAS
1	16L	BIENVENIDA A TODO EL PERSONAL DE L CONSORCIO	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-01
2	17M	DESCRIPCION DEL PROYECTO	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-02
3	18M	OBJETIVOS DEL PROYECTO	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-03
4	19J	DESCRIPCION DE CADA UNO DE LOS PUNTOS DEL PROYECTO	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-04
5	20V	SG-SST	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-05
6	21S	QUE ES UN SST	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-06
7	23L	QUE CARGO OCUPA DENTRO DE LA EMPRESA UN SST	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-07
8	24M	POR QUE NO LO DEBO LLAMAR SISO	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-08
9	25M	RESOLUCION 1072	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-09
10	26J	RESOLUCION 0312	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-10
11	27V	QUE ES SEGURIDAD SOCIAL	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-11
12	28S	ARL	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-12
13	30L	EPS	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-13
14	31M	FP	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-14
15	1M	EPP	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-15
16	2J	DOTACION	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-16
17	3V	ALTURAS	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-17
18	4S	ARNET	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-18
19	6L	PUNTOS DE ANCLAJE	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-19
20	7M	CUERDAS	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-20
21	8M	RESPONSABILIDAD EN ALTURAS	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-21
22	9J	SSTT ADMINISTRATIVO	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-22
23	10V	POR QUE DEBO LLENAR FORMATOS	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-23
24	11S	QUE ES UN ATS	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-24
25	13L	QUE ES UN PERMISO DE TRABAJO	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-25

CRONOGRAMA DE CHARLAS DEL 13 ENERO AL 12 DE FEBRERO

ITEM	ACTIVIDAD		RESPONSABLE	POBLACION OBJETO	EVALUACION DE EFICACIA (Documentos entregables)
	FECHA	ELABORACION CRONOGRAMA DE CHARLAS DEL PROYECTO CHARLAS PREOPARACIONALES / SEGÚN PLAN DE TRABAJO -PDT- SEGURIDAD DURANTE EL DESARROLLO DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:	RESIDENTE SST	TODO EL PERSONAL DEL PROYECTO	FT-SST-CHARLAS
1	13L	BIENVENIDA A TODO EL PERSONAL DE L CONSORCIO	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-01
2	14M	QUE ES UN SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-02
3	15M	QUE ESU UN RIESGO YQUE ES UN PELIGRO	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-03
4	16J	QUE HACE UN COORDINADOR SST	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-04
5	17V	QUE ES SEGURIDAD SOCIAL	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-05
6	18S	TRABAJO EN ALTURAS Y EQUIPOS	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-06
7	20L	TRABAJO EN CALIENTE	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-07
8	21M	ATS	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-08
9	22M	LA SEGURIDAD EN LA OBRA	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-09
10	23J	LA RESPONSABILIDAD	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-10
11	24V	LA PUNTUALIDAD	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-11
12	25S	PAUSA ACTIVA	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-12
13	27L	QUE SON LAS CHARLAS DIARIAS X 5 MINUTOS	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-13
14	28M	DOTACION	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-14
15	29M	EPP	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-15
16	30J	POR QUE DEBO PERMANECER EN LA OBRA	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-16
17	31V	QUE ES UN RIEGO FISICO	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-17
18	1S	QUE ES UN RIESGO BIOLOGICO	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-18
19	3L	QUE ES UN RIESGO QUIMICO	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-19
20	4M	ORDEN Y ASEO	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-20
21	5M	HORARIOS DENTRO DE LA EMPRESA	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-21
22	6J	MANUAL DE FUNCIONE	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-22
23	7V	QIUE ES UNA MATRIZ IPER	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-23
24	8S	QUE ES LA RESPONSABILIDAD	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-24
25	10L	COMO Y CUANDO DEBO USAR MI CASCO	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-25
26	11M	SEGURIDAD SOCIIAL	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-26
27	12M	QUE ES UNA ASISTENCIA	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-26

CRONOGRAMA DE CHARLAS DEL 13 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO

ITEM	ACTIVIDAD		RESPONSABLE	POBLACION OBJETO	EVALUACION DE EFICACIA (Documentos entregables)
	FECHA	ELABORACION CRONOGRAMA DE CHARLAS DEL PROYECTO CHARLAS PREOPARACIONALES / SEGÚN PLAN DE TRABAJO -PDT- SEGURIDAD DURANTE EL DESARROLLO DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:	RESIDENTE SST	TODO EL PERSONAL DEL PROYECTO	FT-SST-CHARLAS
1	13J	INVESTIGACION DE ACCIDENTES	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-01
2	14V	PREVENCION DE LAS LESIONES DE COLUMNA	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-02
3	15S	PELIGROS EN EXCAVACIONES	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-03
4	17L	BEBER Y CONDUCIR	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-04
5	18M	SEGURIDAD EN LOS TEMBLORES DE TIERRA	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-05
6	19M	RIESGOS ELECTRICOS	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-06
7	20J	CONSIENCIA AMBIENTAL	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-07
8	21V	PRIMEROS AUXILIOS DESMAYOS	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-08
9	22S	EXTINTORES DE INCENDIOS	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-09
10	24L	PRIMEROS AUXILIOS EN QUEMADURAS	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-10
11	25M	INTONXICACION CON ALIMENTOS	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-11
12	26M	PROTECCION DE LOS PIES	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-12
13	27J	CONGELACION	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-13
14	28V	AGOTAMIENTO POR CALOR	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-14
15	1S	ATAQUE DE CALOR	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-15
16	3L	PROTECCION PARA LA CABEZA	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-16
17	4M	PREVENCION DE ENFERMEDADES LABORALES	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-17
18	5M	PREVENCION DE LESIONES OSTEOMUSCULARES	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-18
19	6J	MANEJO DEL ESTRÉS LABORAL	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-19
20	7V	PAUSAS ACTIVAS	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-20
21	8S	HIGIENE POSTURAL	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-21
22	10L	USO CORRECTO DEL TAPABOCAS Y PROTECCION RESPIRATORIA	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-22
23	11M	INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-23
24	12M	HIDRATACION ADECUADA DURANTE LA JORNADA	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-24

CRONOGRAMA DE CHARLAS DEL 13 DE MARZO AL 30 ABRIL

ITEM	ACTIVIDAD		RESPONSABLE	POBLACION OBJETO	EVALUACION DE EFICACIA (Documentos entregables)
	FECHA	ELABORACION CRONOGRAMA DE CHARLAS DEL PROYECTO CHARLAS PREOPARACIONALES / SEGÚN PLAN DE TRABAJO -PDT- SEGURIDAD DURANTE EL DESARROLLO DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:	RESIDENTE SST	TODO EL PERSONAL DEL PROYECTO	FT-SST-CHARLAS
1	13J	LINEA DE EMERGENCIA 911	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-01
2	14V	INVESTIGACION DE ACCIDENTES	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-02
3	15S	PROTECCION CONTRA EL CRIMEN	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-03
4	17L	PELIGRO EN EXCAVACIONES	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-04
5	18M	BEBER Y CONDUCIR	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-05
6	19M	SEGURIDAD EN LOS TEMBLORES DE TIERRA	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-06
7	20J	RIESGOS ELECTRICOS	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-07
8	21V	CONCIENCIA AMBIENTAL	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-08
9	22S	EXTINGUIDORES DE INCENDIOS	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-09
10	24L	PREVENCION DE INCENDIOS	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-10
11	25M	PRIMEROS AUXILIOS	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-11
12	26M	PRIMEROS AUXILIOS EN ENVENAMIENTO	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-12
13	27J	INTOXICACION CON ALIMENTOS	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-13
14	28V	PROTECCION DE LOS PIES	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-14
15	29S	PROTECCION DE BRAZOS Y MANOS	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-15
16	31L	HERRAMIENTAS MANUALES	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-16
17	1M	PROTECCION PARA LA CABEZA	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-17
18	2M	AGOTAMIENTO POR CALOR	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-18
19	3J	HIPOTERMIA	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-19
20	4V	SEGURIDAD EN EL USO DE ESCALERAS	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-20
21	5S	LEVANTAMIENTO DE OBJETOS	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-21
22	7L	PROTECCION DE LA PIEL	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-22
23	8M	RESBALOS TROPESONES Y CAIDAS	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-23
24	9M	QUEMADURAS DEL SOL	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-24
25	10J	TRABAJO EN CONDICIONES DEL FRIO	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-25
26	11V	ETIQUETAS DE SEGURIDAD EN LOS PRODUCTOS QUIMICOS	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-23
27	12S	PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIAS D	RESIDENTE SST	Todo el personal del proyecto	FT-SST-CHARLAS-24

Anexo No. 7 Digital componente SST Cronograma de capacitación del periodo CONSORCIO INTERVENTORES AO.

REGISTRO DE ASISTENCIA CONSORCIO INTERVENTORES AO

Es importante destacar que las charlas equivalentes a 5 minutos por día son indispensables para la correcta ejecución del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Desde luego que después de finalizada una charla se toma un registro de asistencia que constata la participación en la ejecución del SG-SST. Este documento se anexa en la parte final del informe de actividades. En este informe final damos parte satisfactorio en cumplimiento a l sistema de gestión cumpliendo con la meta del 100%.

Anexo No.8 digital Componente SST Registro de asistencia de CONSORCIO INTERVENTORES AO

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE CHARLAS CONSORCIO INTERVENTORES AO.

Se anexan las evidencias fotográficas de cada una de las charlas, capacitaciones y pausas activas programadas según cronograma y que están inmersas en el presente informe.

CHARLAS DEL 13 DE ENERO AL 12 DE DEL FEBRERO



Imágenes de charlas, capacitaciones y pausas activas CONSORCIO INTERVENTORES AO



Imágenes de charlas, capacitaciones y pausas activas CONSORCIO INTERVENTORES AO

CHARLAS DEL 13 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO









Imágenes de charlas, capacitaciones y pausas activas CONSORCIO INTERVENTORES AO

Imágenes de charlas, capacitaciones y pausas activas CONSORCIO INTERVENTORES AO

CHARLAS DEL 13 DE MARZO AL 30 DE ABRIL









Imágenes de charlas, capacitaciones y pausas activas CONSORCIO INTERVENTORES AO

Imágenes de charlas, capacitaciones y pausas activas CONSORCIO INTERVENTORES AO

CRONOGRAMA DE CHARLAS RB COLOMBIA S.A.S.

A continuación, se presenta el cronograma de charlas que se ejecutó durante todo el proyecto discriminado por periodo: 13 de enero al 12 de febrero de 2025 (Mes 2), 13 de febrero al 12 de marzo de 2025 (Mes 3), 13 de marzo al 15 de abril de 2025 (Mes 4), incluyendo los (2) días (Periodo de Liquidación), que no fueron incluidos en el Informe de Gestión SST precedente. Por otra parte, se aclara que el cronograma de charlas se estableció desde el Mes 2 de ejecución del Contrato de Obra 9173 de 2024, por lo tanto, durante el Periodo comprendido entre el 13 de diciembre 2024 y el 12 de enero 2025 (MES 1) no se presentan soporte.

PERIODO	FRENTES DE OBRA	ACTIVIDADES PRINCIPALES	CHARLAS SEMANALES
MES 2 (13 ENE - 12 FEB)	Samper Mendoza / Cadis / Crecer / Bakata/ Mi Refugio / Nuevos pasos / Sedid	Instalación de señalización de seguridad en zonas de trabajo	**Semana 20-25 Ene:** Socialización de política SST, uso de EPP, trabajo con pulidoras, orden y aseo, buenas prácticas en cargue y descargue de material. **Semana 27-31 Ene:** Riesgos locativos, uso adecuado de EPP, herramientas, trabajo en alturas. **Semana 3-8 Feb:** Pausas activas, taller de lenguaje de señas, inspección de equipos de protección contra caídas, divulgación ATS, clasificación de residuos. **Semana 10-15 Feb:** Trabajo en caliente, uso de escaleras, procedimiento armado de andamios, divulgación ATS, uso adecuado de EPP y dotación.
MES 3 (13 FEB - 12 MAR)	Wawita / Ata / El Triunfo / Samper Mendoza / Cadis / Crecer / Bakata/ Mi Refugio / Nuevos pasos	Implementación de señalización para la gestión de residuos	**Semana 17-22 Feb:** Riesgo público, herramientas de impacto, sustancias psicoactivas, trabajo seguro en altura, puntos de acopio. **Semana 25-29 Feb:** Socialización de riesgos en mantenimiento locativo, riesgo biológico, hojas de seguridad de cementos, plan de emergencias. **Semana 3-8 Mar:** Socialización matriz de peligros, políticas SST, reglamento interno, uso adecuado de herramientas manuales. **Semana 10-15 Mar**: Inspección preoperacional de sistemas de acceso, clasificación en la fuente, divulgación de hojas de seguridad, seguridad social.
MES 4 (13 MAR - 13 ABR)	Curnn	Refuerzo en la señalización de seguridad y normativas	**Semana 31 Mar-5 Abr:** Señalización, plan de evacuación, hojas de seguridad de químicos, pausas activas. **Semana 7-12 Abr:** Programa contra caídas, puntos de anclaje, permiso de trabajo en alturas, procedimientos de emergencia y rescate. **Semana 14-15 Abr:** Estándares de seguridad en herramientas eléctricas, uso adecuado de puntos ecológicos, selección en la fuente.
PERIODO DE LIQUIDACIÓN (2 DÍAS)	General	Cierre de actividades, revisión de cumplimiento y entrega de informes finales	No aplica

Anexo No. 9 digital componente SST cronograma de capacitaciones RB COLOMBIA S.A.S.

PLAN DE CAPACITACION EJECUTADO EN EL PERIODO No. 2

CONSORCIO INTERVENTORES AO

MES / AÑO	ene-25	CONTRATO	Contrato No. 9173-2024 – GRUPO 2
SEMANA	27 AL 31 DE ENERO 2025		

N°	CHARLAS	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO	
		P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
1	QUE ES SEGURIDAD INDUSTRIAL			1	1								
2	PREVENCION DE LESIONES			1	1								

MES / AÑO	ene-25	CONTRATO	Contrato No. 9173-2024 – GRUPO 2
SEMANA	03 AL 08 DE FEBRERO 2025		

N°	CHARLAS	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO	
		P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
1	PARA QUE SIRVEN LAS PAUSAS ACTIVAS	1	1										
2	CODIGO DE COLORES CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS			1	1								
3	TALLER CENTRO CADIS (LENGUAJE DE SEÑAS)					1	1						
4	INSPECCION DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS					1	1						
5	DIVULAGACION ATS / IMPORTANCIA									1	1		

MES / AÑO	ene-25	CONTRATO	Contrato No. 9173-2024 – GRUPO 2
SEMANA	03 AL 08 DE FEBRERO 2025		

N°	CHARLAS	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO	
		P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
1	USO ADECUADO DE EPP							1	1				
2	USO ADECUADO DE HERRAMIENTAS MANUALES									1	1		

MES / AÑO	ene-25	CONTRATO	Contrato No. 9173-2024 – GRUPO 2
SEMANA	20 AL 25 DE ENERO 2025		

N°	CHARLAS	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO	
		P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
1	SOCIALIZACION POLITICA SST							1	1				
2	USO DE EPP					1	1						
3	TRABAJO CON PULIDORAS			1	1								
4	BUENAS PRACTICAS EN CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIAL									1	1		
5	ORDEN Y ASEO											1	1

MES / AÑO	ene-25	CONTRATO	Contrato No. 9173-2024 – GRUPO 2
SEMANA	27 AL 31 DE ENERO 2025		

N°	CHARLAS	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO	
		P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
1	RIESGOS LOCATIVOS							1	1				
2	USO ADECUADO DE EPP											1	1
3	USO ADECUADO DE LA HERRAMIENTAS									1	1		
4	TRABAJO EN ALTURAS / USO DE EPP					1	1						

MES / AÑO	ene-25	CONTRATO	Contrato No. 9173-2024 – GRUPO 2
SEMANA	27 AL 31 DE ENERO 2025		

N°	CHARLAS	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO	
		P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
1	RIESGOS LOCATIVOS							1	1				
2	USO ADECUADO DE EPP											1	1
3	USO ADECUADO DE LA HERRAMIENTAS									1	1		
4	TRABAJO EN ALTURAS / USO DE EPP					1	1						

MES / AÑO	mar.-25	CONTRATO	9173 de 2024
SEMANA	25 AL 29		

N°	CHARLAS	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO	
		P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
1													
2	SOCIALIZACION DE RIESGOS ACTIVIDADES MANTENIMIENTOS LOCATIVOS			1	1								
3	RIESGO BIOLOGICO					1	1						
4	SOCIALIZACION HOJAS DE SEGURIDAD CEMENTOS ARGOS Y TOPOEX							1	1				
5	SOCIALIZACION PLAN DE EMERGENCIAS									1	1		
6	SOCIALIZACIONMATRIZ PELIGROS, POLITICAS SST, REGLAMENTO INTERNO											1	1

MES / AÑO	mar.-25	CONTRATO	9173 de 2024
SEMANA	17 AL 22		

N°	CHARLAS	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO	
		P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
1	importancia dotacion	1	1										
2	uso correcto epp			1	1								
3	socializacion sustancias psicoactivas					1	1						
4	importancia del buen uso de epp para actividades demolicion							1	1				

PLAN DE CAPACITCION EJECUTADO EN EL PERIODO No. 3

MES / AÑO	mar.-25	CONTRATO	9173 de 2024
SEMANA	10 AL 15		

N°	CHARLAS	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO	
		P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
1	ORDEN Y ASEO CLASIFICACION EN LA FUENTE	1	1										
2	SOCIALIZACION USO ADECUADO ARNES			1	1								
3	QUE ES UN RIESGO QUE ES UN PELIGRO					1	1						
4	INSPECCION PREOPERACIONAL SISTEMAS DE ACCESO ESCALERA							1	1				
5	QUE ES SEGURIDAD SOCIAL									1	1		
6	QUE ES TRABAJO EN CALIENTE											1	1

MES / AÑO	feb.-01	CONTRATO	9173 de 2024
SEMANA	27 DEL 1		

N°	CHARLAS	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO	
		P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
1	pausa activas mejoramiento flexibilidad	1	1										
2	socialización permisos trabajo alturas ats preoperacionales					1	1						
3	buenas prácticas ambientales									1	1		

MES / AÑO	ene.-25	CONTRATO	9173 de 2024
SEMANA	20 DEL 31		

N°	CHARLAS	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO	
		P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
1	gestión ambiental PIGA	1	1										
2	socialización ATS actividades mantenimiento locativos			1	1								
3	uso adecuado de EPP casco, barbuquejo, botas de seguridad							1	1				
4	socialización riesgo público recorrido de ingreso y salido de centros											1	1

MES / AÑO	feb-25	CONTRATO	Contrato No. 9173-2024 – GRUPO 2
SEMANA	10 AL 15 DE FEBRERO 2025		

N°	CHARLAS	LUNES 10 FEB 2025		MARTES 11 FEB 2025		MIÉRCOLES 12 FEB 2025		JUEVES 13 FEB 2025		VIERNES 14 FEB 2025		SÁBADO 15 FEB 2025	
		P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
1	DIVULGACION HOJA DE SEGURIDAD DEL CEMENTO	1	1										
2	PROCEDIMIENTO ARMADO DE ANDAMIOS	1	1										
3	DIVULGACION ATS	1	1										
4	USO ADECUADO DE EPP Y DOTACION			1	1								

MES / AÑO	feb-25	CONTRATO	Contrato No. 9173-2024 – GRUPO 2
SEMANA	10 AL 15 DE FEBRERO 2025		

N°	CHARLAS	LUNES 10 FEB 2025		MARTES 11 FEB 2025		MIÉRCOLES 12 FEB 2025		JUEVES 13 FEB 2025		VIERNES 14 FEB 2025		SÁBADO 15 FEB 2025	
		P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
1	INSTRUCTIVO TRABAJO EN CALIENTE	1	1										
2	USO DE ESCALERAS			1	1								

MES / AÑO	feb-25	CONTRATO	Contrato No. 9173-2024 – GRUPO 2
SEMANA	10 AL 15 DE FEBRERO 2025		

N°	CHARLAS	LUNES 10 FEB 2025		MARTES 11 FEB 2025		MIÉRCOLES 12 FEB 2025		JUEVES 13 FEB 2025		VIERNES 14 FEB 2025		SÁBADO 15 FEB 2025	
		P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
1	RIESGO PUBLICO	1	1										
2	USO ADECUADO DE EPP			1	1								
3	RIESGO PSICOSOCIAL					1	1						
4	DIVULGACION HOJA DE SEGURIDAD DE CEMENTO			1	1								

MES / AÑO	feb-25	CONTRATO	Contrato No. 9173-2024 – GRUPO 2
SEMANA	17 AL 22 DE FEBRERO 2025		

N°	CHARLAS	LUNES 17 FEB 2025		MARTES 18 FEB 2025		MIÉRCOLES 19 FEB 2025		JUEVES 20 FEB 2025		VIERNES 21 FEB 2025		SÁBADO 22 FEB 2025	
		P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
1	RIESGO PUBLICO	1	1										
2	RIESGOS POR UTILIZAR HERRAMIENTAS DE IMPACTO O VIBRACION			1	1								

MES / AÑO	feb-25	CONTRATO	Contrato No. 9173-2024 – GRUPO 2
SEMANA	17 AL 22 DE FEBRERO 2025		

N°	CHARLAS	LUNES 17 FEB 2025		MARTES 18 FEB 2025		MIÉRCOLES 19 FEB 2025		JUEVES 20 FEB 2025		VIERNES 21 FEB 2025		SÁBADO 22 FEB 2025	
		P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
1	PROHIBIDO CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	1	1										
2	PORQUE DE LA PERMANENCIA EN OBRA	1	1										
3	TRABAJO SEGURO EN ALTURA			1	1								
4	IMPORTANCIA DE LA HIDRATACIÓN					1	1						
5	PUNTOS DE ACOPIO									1	1		

MES / AÑO	feb-25	CONTRATO	Contrato No. 9173-2024 – GRUPO 2
SEMANA	17 AL 22 DE FEBRERO 2025		

N°	CHARLAS	LUNES 17 FEB 2025		MARTES 18 FEB 2025		MIÉRCOLES 19 FEB 2025		JUEVES 20 FEB 2025		VIERNES 21 FEB 2025		SÁBADO 22 FEB 2025	
		P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
1	PROHIBIDO CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	1	1										
2	PORQUE DE LA PERMANENCIA EN OBRA	1	1										
3	TRABAJO SEGURO EN ALTURA			1	1								
4	IMPORTANCIA DE LA HIDRATACIÓN					1	1						
5	PUNTOS DE ACOPIO									1	1		

PLAN DE CAPACITACION EJECUTADO EN EL PERIODO No. 4

MES / AÑO	mar.-25	CONTRATO	9173 de 2024
SEMANA	25 AL 29		

N°	CHARLAS	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO	
		P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
1													
2	SOCIALIZACION DE RIESGOS ACTIVIDADES MANTENIMIENTOS LOCATIVOS			1	1								
3	RIESGO BIOLOGICO					1	1						
4	SOCIALIZACION HOJAS DE SEGURIDAD CEMENTOS ARGOS Y TOPOEX							1	1				
5	SOCIALIZACION PLAN DE EMERGENCIAS									1	1		
6	SOCIALIZACIONMATRIZ PELIGROS, POLITICAS SST, REGLAMENTO INTERNO											1	1

MES / AÑO	abril.-25	CONTRATO	9173 de 2024
SEMANA	31 AL 5		

N°	CHARLAS	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO	
		P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
1	Importancia de señalizacion	1	1										
2	Socializacion plan de evacuacion centro curnn " por avance obra metro;			1	1								
3	Socializacion hojas de seguridad sustancias quimicas soldadura PVC y limpiador PVC					1	1						
4	pausas activas relajacion muscular cuello y muñecas							1	1				

MES / AÑO	mar.-25	CONTRATO	9173 de 2024
SEMANA	25 AL 29		

N°	CHARLAS	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO	
		P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
1													
2	SOCIALIZACION DE RIESGOS ACTIVIDADES MANTENIMIENTOS LOCATIVOS			1	1								
3	RIESGO BIOLOGICO					1	1						
4	SOCIALIZACION HOJAS DE SEGURIDAD CEMENTOS ARGOS Y TOPOEX							1	1				
5	SOCIALIZACION PLAN DE EMERGENCIAS									1	1		
6	SOCIALIZACIONMATRIZ PELIGROS, POLITICAS SST, REGLAMENTO INTERNO											1	1

MES / AÑO	abril.-25	CONTRATO	9173 de 2024
SEMANA	31 AL 5		

N°	CHARLAS	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO	
		P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
1	Importancia de señalizacion	1	1										
2	Socializacion plan de evacuacion centro curnn " por avance obra metro;			1	1								
3	Socializacion hojas de seguridad sustancias quimicas soldadura PVC y limpiador PVC					1	1						
4	pausas activas relajacion muscular cuello y muñecas							1	1				

MES / AÑO	abril.-25	CONTRATO	9173 de 2024
SEMANA	7 AL 12		

N°	CHARLAS	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO	
		P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
1	SOCIALIZACION PROGRAMA CONTRA CAIDAS RB DE COLOMBIA	1	1										
2	PUNTOS ANCLAJE ACTIVIDAD IMPERMABILIZACION CUBIERTA			1	1								
3	SOCIALIZACION PERMISO ALTURAS VALIDACION IMPERMABILIZACION CUBIERTA					1	1						
4	SOCIALIZACION PROCEDIMIENTO EMERGENCIA Y RESCATE							1	1				
5	SOCIALIZACION TRABAJADOR AUTORIZADO PTA									1	1		

PLAN DE CAPACITACION EJECUTADO EN EL PERIODO 14-15 DE ABRIL

MES / AÑO		abr.-25				CONTRATO		9173 de 2024					
SEMANA		14 AL 15											
N°	CHARLAS	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO	
		P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
1	SOCIALIZACION DE ESTANDARES DE SEGURIDAD, PARA USO ADECUADO HERRAMIENTA ELECTRICA TALADRO, PULIDORA.	1	1										
2	SOCIALIZACION USO ADECUADO PUNTOS ECOLOGICOS SELECCIÓN EN LA FUENTE				1	1							

Se hace entrega de los registros de asistencia de las actividades de formación en SST ejecutadas mes a mes durante el desarrollo del Contrato de Obra 9173 de 2024.

REGISTRO DE ASISTENCIA DE CHARLAS RB COLOMBIA S.A.S.

Se relaciona el registro de asistencia de cada uno de los puntos donde intervino el personal de obra, de acuerdo con el cronograma entregado y aprobado por interventoría.

Anexo No.10 digital componente SST registro de asistencia RB COLOMBIA S.A.S.

REGISTRO FOTOGRAFICO DE CHARLAS RB COLOMBIA S.A.S.

Se anexan las evidencias fotográficas de algunas de las capacitaciones, charlas y pausas activas realizadas mes a mes según Plan de Capacitación desarrollado implementado durante la ejecución del proyecto. 13 de diciembre de 2024 y el 12 de enero de 2025 (Mes 1), 13 de enero al 12 de febrero de

2025 (Mes 2), 13 de febrero al 12 de marzo de 2025 (Mes 3), 13 de marzo al 13 de abril de 2025 (Mes 4), aclarando que para el mes No.1 no se habían iniciado labores de obra, por consiguiente, no se realizaron charlas.

ACTIVIDADES DE FORMACION SST PERIODO No. 2



ACTIVIDADES DE FORMACION SST PERIODO No. 3



ACTIVIDADES DE FORMACION SST PERIODO No. 4





REPORTE DE ACCIDENTALIDAD CONSORCIO INTERVENTORES AO

El proyecto da inicio sobre el mes de diciembre del año 2024 y de acuerdo con el periodo de informe final no se presentaron accidentes; por tal razón cabe anotar que las buenas prácticas en materia de capacitaciones han dado resultado.

En una obra con cero accidentes e incidentes, se demuestra una cultura de seguridad sólida, lo que conlleva beneficios como mayor productividad, menor costo por accidentes y una mejor reputación para la empresa.

Es importante resaltar que el índice de accidentalidad se sostiene en (0), desde sus inicios hasta el periodo final.

Anexo No. 11 digital Componente SST Matriz de accidentes e incidentes CONOSRCIO INTERVENTORES AO

REPORTE DE ACCIDENTALIDAD RB COLOMBIA S.A.S.

Durante la ejecución del Contrato de Obra 9173 de 2024 (13 de diciembre de 2024 – 15 de abril de 2025) NO se presentaron eventos relacionados con Accidentes ni Incidentes ni incapacidades de Trabajo.

La Matriz de análisis de Accidentalidad muestra el consolidado correspondiente, desde el primer periodo hasta la finalización del proyecto.

En el periodo final el contratista relaciona la evidencia de accidentalidad en cero resultado que satisface y resalta la buena ejecución del SG-SST.

Anexo No. 12 componente digital SST matriz de accidentes e incidentes laborales

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y DOTACION

ENTREGA DE EPP Y DOTACIÓN CONSORCIO INTERVENTORES AO.

Según lo proyectado en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en el transcurso del proyecto y en el informe final se cumplió a cabalidad con cada una de las actividades de entrega de elementos de protección personal y dotación para cada uno de los trabajadores del CONSORCIO INTERVENTORES AO, desde luego esta actividad fue reforzada con charlas educativas que están inmersas en el cronograma correspondiente.

SOPORTE DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN CONSORCIO INTERVENTORES AO.

Para este periodo final interventoría no hace entrega de elementos EPP ni dotación debido a que lo que se entregó en el pasado periodo aun esta bueno y en perfectas condiciones.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ENTREGA DE EPP Y DOTACIÓN CONSORCIO INTERVENTORES AO.

Para este periodo final se presenta la evidencia fotográfica de los periodos anteriores donde se hizo la entrega de la dotación.









Imágenes de entrega de dotacion CONSORCIO INTERVENTORES AO.

Imágenes de entrega de dotacion CONSORCIO INTERVENTORES AO.

ENTREGA DE EPP Y DOTACIÓN RB COLOMBIA S.A.S.

Durante el desarrollo del Contrato de Obra 9173 de 2024, y a partir del Mes No. 2 (13 de enero de 2025 – 12 de febrero de 2025), se hizo entrega de la dotación y Elementos de Protección Personal EPP necesarios para la ejecución de cada una de actividades constructivas, periodo en el que inició la Etapa de Construcción.

Se realizó la entrega de los EPP de acuerdo con la Matriz de Elementos de Protección Personal aprobada por la Interventoría para el Contrato de Obra No. 9173 de 2024 a los (50) trabajadores que estuvieron vinculados al proyecto.

Dentro de los elementos que se entregaron en los diferentes periodos tenemos:

PERIODO	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL SUMINISTRADOS	OBSERVACIONES
INF. 1 (13 DE DICIEMBRE 2024- 12 DE ENERO DE 2025)	Chaleco Reflectivo Casco de Seguridad Barbuquejo tres puntos Gafas de Seguridad Guantes de Caucho Guantes de Nitrilo Botas de Seguridad (Punta de Acero)	Para este periodo solo se hizo entrega de estos elementos ya que no se habia iniciado obra y estaban en proceso de visitas y diagnosticos
INF. 2 (13 DE ENERO 2025- 12 DE FEBRERO DE 2025)	Chaleco Reflectivo Casco de Seguridad Barbuquejo tres puntos Gafas de Seguridad Guantes de Caucho Guantes de Nitrilo Botas de Seguridad (Punta de Acero)Ropa de Trabajo (Overol) Overol Tipo Fontanero Peto de Carnaza PolainasProtectores Respiratorios para polvos Protectores Auditivos de inserción Protectores Auditivos Tipo Copa Guantes de Vaqueta Arnés para trabajos en alturas Careta tipo soldador Gafas de soldadura	Se realizó entrega de dotación a todo el personal nuevo y demás elementos necesarios para inicio de obras

INF. 3 (13 DE FEBRERO 2025- 12 MARZO DE 2025)	Chaleco Reflectivo Casco de Seguridad Barbuquejo tres puntos Gafas de Seguridad Guantes de Caucho Guantes de Nitrilo Botas de Seguridad (Punta de Acero)Ropa de Trabajo (Overol) Respiratorios para polvos Protectores Auditivos de inserción	
INF. 4 (13 DE MARZO 2025- 13 DE ABRIL DE 2025)	Chaleco Reflectivo Casco de Seguridad Barbuquejo tres puntos Gafas de Seguridad Guantes de Nitrilo Botas de Seguridad (Punta de Acero)Ropa de Trabajo (Overol) Respiratorios para polvos Protectores Auditivos de inserción	

Anexo 13 digital componente SST soporte de entrega de EPP y dotación RB COLOMBIA S.A.S.

SOPORTE DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Y DOTACIÓN RB COLOMBIA S.A.S.

Durante el desarrollo del Contrato de Obra 9173 de 2024, (13 de diciembre de 2024 – 15 de abril de 2025) cada colaborador diligenció el formato de entrega de Elementos de Protección Personal (EPP) y procedió a firmarlo, dejando constancia de la recepción conforme de los elementos asignados y su compromiso con el uso adecuado de los mismos.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ENTREGA DE EPP Y DOTACIÓN RB COLOMBIA S.A.S.

Se anexan algunas evidencias fotográficas de la entrega de Dotación y de Elementos de Protección Personal a los trabajadores que ejecutaron actividades en el Contrato de Obra 9173 de 2024.

Entrega de Dotación y EPP Mes 1 (13 de diciembre de 2024 al 12 de enero de 2025) y Mes 2 (13 de enero al 12 de febrero de 2025)



ENTREGA DE DOTACION Y EPP MES 4 (13 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO).



ENTREGA DE DOTACION Y EPP MES 4 (13 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DEL 2025).



GESTION DE RIESGOS PRIORITARIOS Y TAREAS DE ALTO RIESGO

En CONSORCIO INTERVENTORES AO (INTERVENTORIA) no es frecuente actividades rutinarias que puedan afectar la salud de los trabajadores, sin embargo, es deber del profesional SST implementar todas las alertas mediante charlas pedagógicas para evitar toda clase de anomalías que puedan perjudicar la salud de los trabajadores.

Para la debida Gestión de los Riesgos Prioritarios, R.B. DE COLOMBIA S.A. realizó el Análisis de Trabajo Seguro y la implementación de Permisos de Trabajo para la ejecución de Actividades Críticas dentro del Contrato de Obra 9173 de 2024, (13 de diciembre de 2024 – 15 de abril de 2025) como fueron los Trabajos en Alturas y Trabajos en Caliente desarrollados.

MANEJO DE CAMPAMENTOS, BODEGAS Y OFICINAS CONSORCIO INTERVENTORES AO

Para este informe final se relacionan todas las evidencias fotográficas de cada uno de los periodos donde se laboró en una oficina que disponían las diferentes sedes del proyecto.

REGISTRO FOTOGRAFICO MES 2 CAMPAMENTOS Y BODEGAS DEL 13 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO



Imágenes deoficinas CONSORCIO INTERVENTORES AO	Imágenes deoficinas CONSORCIO INTERVENTORES AO

REGISTRO FOTOGRAFICO MES 3 CAMPAMENTOS Y BODEGAS DEL 13 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO




Imágenes deoficinas CONSORCIO INTERVENTORES AO	Imágenes deoficinas CONSORCIO INTERVENTORES AO

REGISTRO FOTOGRAFICO MES 4 CAMPAMENTOS Y BODEGAS DEL 13 DE MARZO AL 30 DE ABRIL



Imágenes deoficinas CONSORCIO INTERVENTORES AO

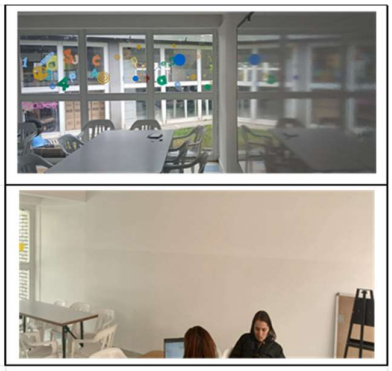

Imágenes deoficinas CONSORCIO INTERVENTORES AO

MANEJO DE CAMPAMENTOS, BODEGAS, OFICINAS RB COLOMBIA S.A.S.

Durante la ejecución del Contrato de Obra 9173 de 2024, (13 de diciembre de 2024 – 15 de abril de 2025) se reportó Mes a Mes la instalación de los diferentes campamentos y bodegas en cada uno de los Frentes de Obra intervenidos.

En cada punto se contó con la autorización de los directores de los Centros para el préstamo de un área. Se deja constancia que, durante el primer mes del período contractual, comprendido entre el 13 de diciembre de 2024 y el 12 de enero de 2025, las actividades ejecutadas correspondieron a labores administrativas, diagnóstico técnico y visitas de reconocimiento. En consecuencia, no se genera documentación soporte asociada a este ítem, al no haberse iniciado actividades operativas o de ejecución, para la instalación de oficina, bodega y uso de unidades sanitarias.



Imágenes de campamentos y bodegas RB COLOMBIA S.A.S



Imágenes de campamentos y bodegas RB COLOMBIA S.A.S

HIDRATACION RB COLOMBIA S.A.S.

Durante la ejecución del Contrato de Obra 9173 de 2024 (13 de diciembre de 2024 – 15 de abril de 2025), se proporcionó hidratación adecuada a los trabajadores, cumpliendo con los requerimientos establecidos.

RB COLOMBIA S.A. garantizó el suministro de hidratación a su personal durante la jornada laboral y en los momentos que fuera requerido a partir del Periodo No. 2 en el que se inició la ejecución de actividades constructivas.

Se anexan algunas evidencias fotográficas del suministro de hidratación durante la ejecución de actividades en el Contrato de Obra 9173 de 2024. Se deja constancia que, durante el primer mes del período contractual, comprendido entre el 13 de diciembre de 2024 y el 12 de enero de 2025, las actividades ejecutadas correspondieron a labores administrativas, diagnóstico técnico y visitas de reconocimiento. En consecuencia, no se genera documentación soporte asociada a este ítem.

MES	PERIODO	AGUA (LITROS)	No. TRABAJADORES (Operativos)
Mes 2	13 enero 2025 a 12 febrero 2025	419	29
Mes 3	13 febrero 2025 a 12 marzo 2025	582	18
Mes 4	13 marzo 2025 a 15 abril 2025	379,5	13

SUMINISTRO DE HIDRATACION MES 2 (13 ENERO AL 12 DE FEBRERO DEL 2025).

Suministro Hidratación Mes 2





SUMINISTRO DE HIDRATACION MES 3 (13 FEBRERO AL 12 DE MARZO DEL 2025).

Suministro Hidratación Mes 3



SUMINISTRO DE HIDRATACION MES 4 (13 MARZO AL 13 DE ABRIL DEL 2025).





Anexo No. 14 componente SST Saneamiento Básico Hidratación)

SUMINISTRO DE SERVICIOS SANITARIOS

La higiene en el sitio de construcción fomenta las buenas prácticas de aseo y limpieza, proporciona a los trabajadores agua potable limpia, servicios sanitarios limpios e instalaciones de lavado para el aseo personal. Estas prácticas alientan la buena higiene en el trabajador y ayudan a evitar la contaminación cruzada a efectos de salvaguardar la salud y seguridad de todos.

Las instalaciones de lavado en el sitio de trabajo permitirán a los trabajadores lavarse sus manos y evitar la contaminación cruzada antes de comer, beber, fumar o retirarse a sus casas al final del día. Los trabajadores pueden eliminar por lavado sustancias peligrosas y utilizar el área de lavado para dar servicio y descontaminar su equipo de protección individual (PPE). Esto es especialmente importante para los trabajadores que utilizan sustancias potencialmente perjudiciales como pinturas, recubrimientos, solventes u otros materiales.

Es necesario y urgente el suministro de los servicios sanitarios para todos los trabajadores de la obra. Respecto a esto es importante el aseo y el orden de los diferentes sitios con el fin de evitar enfermedades que puedan afectar la salud de los colaboradores.

Para el desarrollo del Contrato de Obra 9173 de 2024, se solicitó apoyo en cada uno de los Centros en los que se desarrollan de actividades y se obtuvo el visto bueno por parte de los directores de cada uno de los Centros intervenidos para que el personal ejecutor de actividades hiciera uso de las unidades sanitarias.

Se hace entrega de comunicado que soporta lo anterior, acta de préstamo de baños y en numeral posterior se incluye registro fotográfico correspondiente.

CANTIDAD DE UNIDADES SANITARIAS


NO.	FRENTE DE OBRA	CANTIDAD DE UNIDADES SANITARIAS
1	NUEVOS PASOS	2
2	SAMPER MENDOZA	2
3	CADIS	2
4	CENTRO CRECER	2
5	MI REFUGIO	2
6	WAWITA	2
7	ATA	2
8	EL TRIUNFO	2
9	BAKATA	2
10	SEDID	2
11	CURNN	2

Se anexan algunas evidencias fotográficas de los baños disponibles para el uso de los trabajadores, así como la cantidad por cada frente de obra, durante la ejecución de actividades en el Contrato de Obra 9173 de 2024. Se deja constancia que, durante el primer mes del período contractual, comprendido entre el 13 de diciembre de 2024 y el 12 de enero de 2025, las actividades ejecutadas correspondieron a labores administrativas, diagnóstico técnico y visitas de reconocimiento. En consecuencia, no se genera documentación soporte.


UNIDADES SANITARIAS DISPONIBLES MES 2 (13 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DEL 2025).



UNIDADES SANITARIAS DISPONIBLES MES 3 (13 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO DEL 2025).

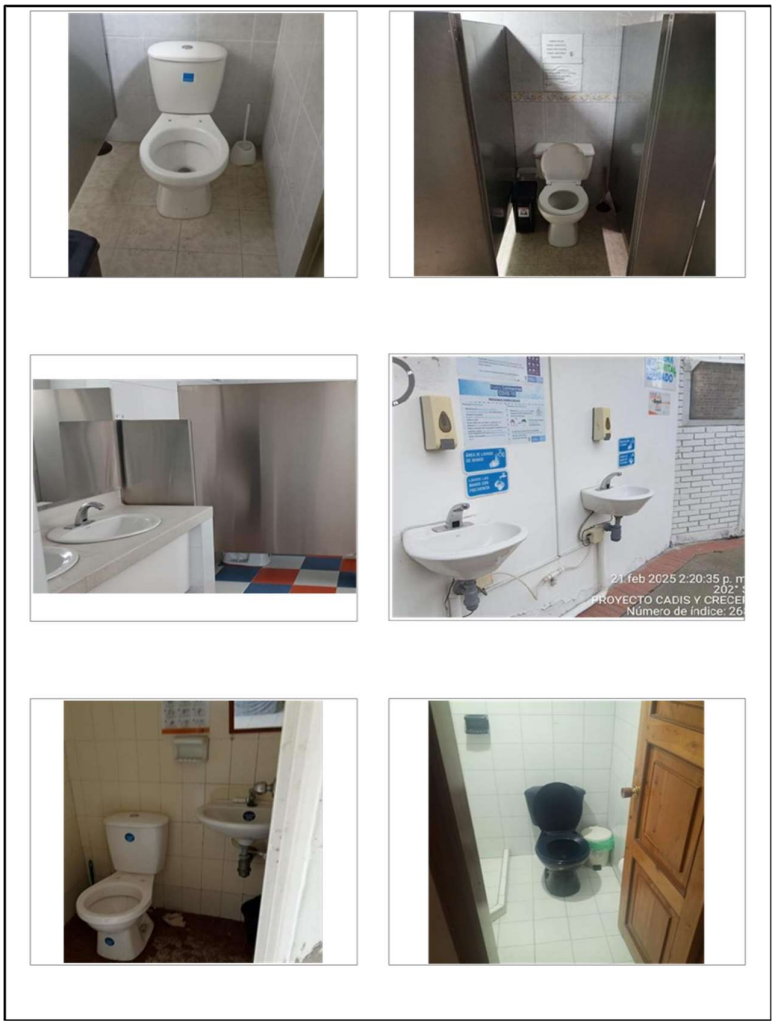

UNIDADES SANITARIAS DISPONIBLES MES 4 (13 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DEL 2025).

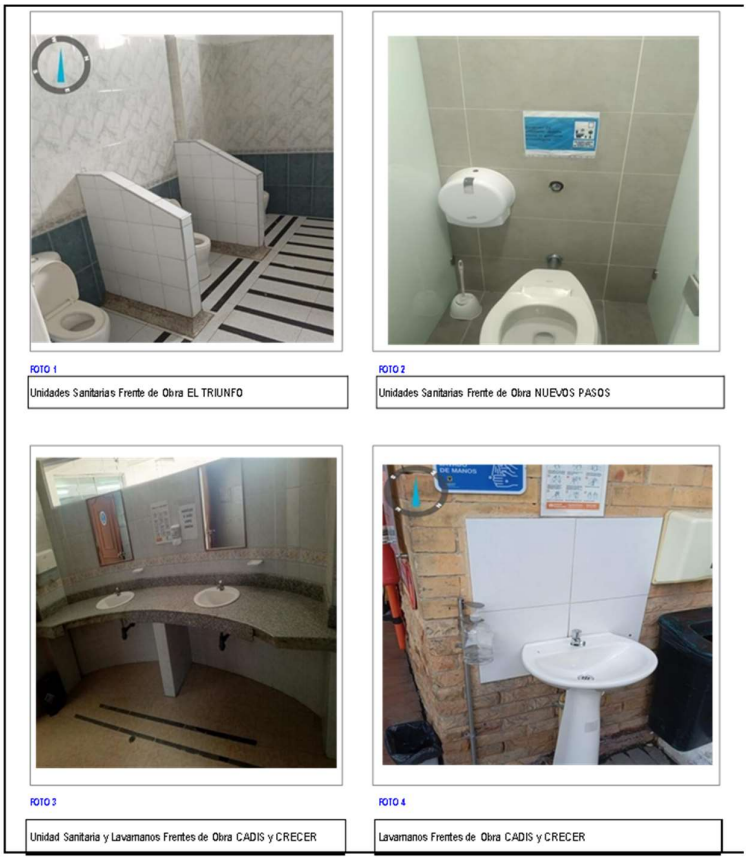

Anexo No. 15 digital componente SST Soporte de autorización para utilizar los baños para los trabajadores RB COLOMBIA S.A.S.

GESTION DE RESIDUOS

La gestión de residuos abarca todas las acciones orientadas al manejo adecuado de los desechos, desde el momento en que se generan hasta su disposición final o reutilización. Este proceso comprende la recolección, el transporte, el tratamiento de residuos peligrosos y el aprovechamiento de materiales reciclables, con el objetivo de minimizar el impacto ambiental y promover prácticas sostenibles.

Durante el desarrollo del Contrato de Obra 9173 de 2024 se instalaron puntos de acopio temporal de Residuos en los diferentes Frentes de Obra según tipo y tiempo de intervención, como se evidencia en el Registro Fotográfico de numeral posterior; por medio del Informe Mensual de Gestión Ambiental se hizo entrega de los respectivos certificados de disposición final.

Durante el primer mes del período contractual, comprendido entre el 13 de diciembre de 2024 y el 12 de enero de 2025, las actividades ejecutadas correspondieron a labores administrativas, diagnóstico técnico y visitas de reconocimiento. En consecuencia, no se realizó gestión de residuos.

Durante el segundo mes del período contractual, comprendido entre el 13 de enero y el 12 de febrero de 2025, se ejecutaron actividades relacionadas con delimitación de la zona de acopio, así como labores de orden y aseo en el área de intervención, así como el acopio, manejo y disposición adecuada de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), conforme a los lineamientos.

Durante el tercer mes del período contractual, comprendido entre el 13 de febrero y el 12 de marzo de 2025, se llevaron a cabo actividades de orden y aseo en el área de intervención, así como el acopio, manejo y disposición adecuada de Residuos de Construcción y Demolición (RCD). Adicionalmente, se realizó el retiro y gestión de Residuos Peligrosos (RESPEL). Cabe destacar que cada sede contaba con su respectivo punto ecológico, dispuesto para la segregación y almacenamiento temporal de residuos, de acuerdo con su clasificación y uso correspondiente

Durante el cuarto mes del período contractual, comprendido entre el 13 de marzo y el 15 de abril de 2025, se ejecutaron actividades de orden y aseo en el área de intervención, así como el acopio, manejo y disposición adecuada de Residuos de Construcción y Demolición (RCD). Adicionalmente, se implementaron medidas de protección mediante la cobertura con plásticos y lonas de los agregados almacenados, con el fin de evitar su contaminación, dispersión y afectación por agentes externos.

PUNTOS DE ACOPIO DE MATERIALES Y RESIDUOS MES 2 (13 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO).


Puntos de Acopio de Materiales y Residuos Mes 2





PUNTOS DE ACOPIO DE MATERIALES Y RESIDUOS MES 3 (13 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO).

Puntos de Acopio de Materiales y Residuos Mes 3

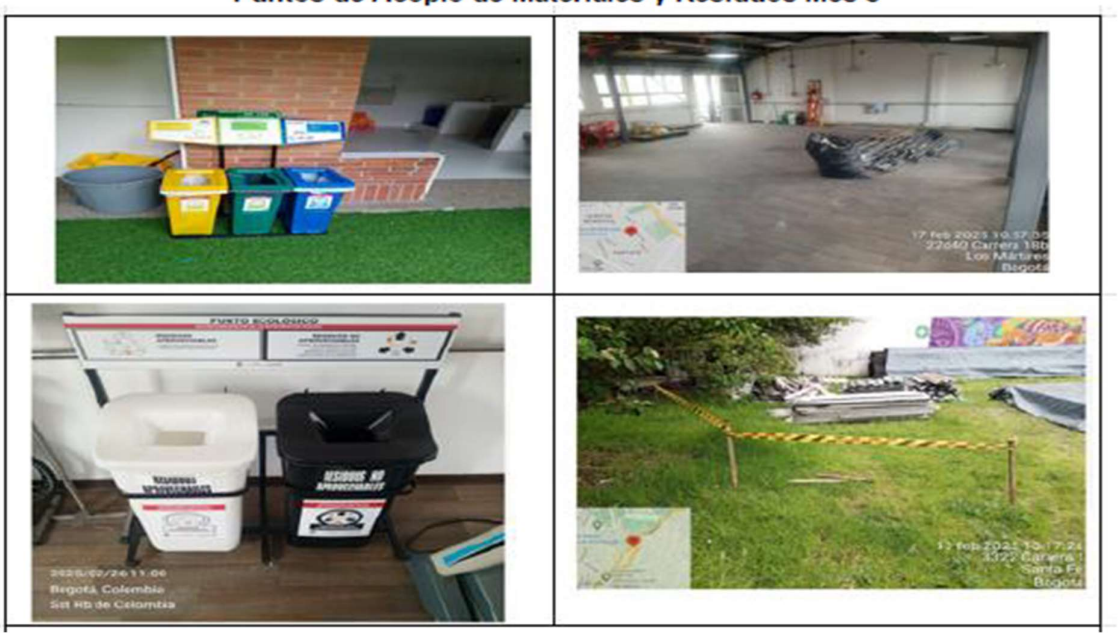

PUNTOS DE ACOPIO DE MATERIALES Y RESIDUOS MES 4 (13 DE MARZO AL 13 DE ABRIL).



COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (COPASST).

De acuerdo con la Normatividad Legal Vigente, RB DE COLOMBIA S.A. cuenta con el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST y con el Comité de Convivencia Laboral debidamente conformados y en funcionamiento.

El COPASST, es el encargado de la promoción y vigilancia de las normas en temas de seguridad y salud en el trabajo en R.B. DE COLOMBIA S.A. este comité se reúne mensualmente.

Durante el desarrollo del Contrato de obra No. 9173-2024 (13 de diciembre de 2024 – 30 de abril de 2025), se contó con el apoyo y participación del COPASST de la empresa R.B. DE COLOMBIA S.A.

De acuerdo con plazo del proyecto, el corte de cada uno de los Informes y la frecuencia de reunión del COPASST (Mensual) establecida por la Normatividad Legal Vigente, se hizo entrega de los soportes de reunión correspondientes por medio de los Informes Mensuales de Gestión SST así:

Mes 1. Acta de Reunión celebrada el 20 de diciembre de 2024 (13 de diciembre de 2024 al 12 de enero de 2025)

En la reunión del Comité de COPASST se verificó el quórum con la participación de cuatro integrantes. Se revisaron los compromisos previos y se presentó el informe final de actividades del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), destacando un avance del 98.4%.

También se socializaron aspectos administrativos y de proyectos, incluyendo asesorías, capacitaciones y diversas inspecciones realizadas en diciembre de 2024. Se analizaron accidentes laborales, concluyendo que no hubo incidentes reportados. Además, se abordó la gestión del cambio, con actualizaciones en la matriz legal y el proceso de licitación.

Finalmente, se establecieron nuevos compromisos y se formalizó el acta con las firmas de los asistentes.

Mes 2. Acta de Reunión celebrada el 20 de enero de 2025 (13 de enero al 12 de febrero de 2025)

En la reunión del Comité de COPASST, se verificó el quórum con la asistencia de cuatro integrantes. Se revisaron los compromisos anteriores, incluyendo la elaboración del Plan Anual de Trabajo y el cronograma de actividades para el año.

Se socializaron temas administrativos del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG- SST), abordando inspecciones realizadas en enero y la capacitación del personal en los proyectos de alcantarillado y de integración social. También se analizó la ausencia de accidentes laborales y se implementó una matriz de peligros y riesgos.

Finalmente, se establecieron nuevos compromisos y se formalizó el acta con las firmas de los asistentes.

Anexo No.16 componente SST Acta de reunión del COPASST

COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL (CCL).

Se cuenta con un Comité de Convivencia Laboral dando cumplimiento a la normatividad legal vigente, Resolución 652 de 2012 y Resolución 1356 de 2012. El comité se reúne cada (3) tres meses en la oficina de R.B. DE COLOMBIA S.A., y extraordinariamente cuando se presenten casos que requieran de su inmediata intervención.

Durante el desarrollo del Contrato de obra No. 9173-2024, se contó con el apoyo y participación del COPASST de la empresa R.B. DE COLOMBIA S.A.

De acuerdo con plazo del proyecto, el corte de cada uno de los Informes y la frecuencia de reunión del CCL (Trimestral) establecida por la Normatividad Legal Vigente, se hizo entrega de las certificaciones de

Representante Legal de R.B. DE COLOMBIA S.A con la información correspondiente a la reunión aplicable por medio de los Informes Mensuales de Gestión SST así:

Mes 1 (13 de diciembre de 2024 al 12 de enero de 2025) y Mes 2 (13 de enero al 12 de febrero de 2025) Certificación de Reunión celebrada el 29 de noviembre de 2024

En dicha reunión se abordaron los temas relacionados con la promoción de un ambiente de trabajo sano y el manejo de situaciones de conflicto entre los trabajadores, dicha reunión se realizó conforme a los lineamientos establecidos en el reglamento interno y en cumplimiento de los protocolos definidos para la gestión de la convivencia laboral dentro de la organización.

Mes 3 (13 de febrero al 12 de marzo de 2025) y Mes 4 (13 de marzo al 13 de abril de 2025). Certificación de Reunión celebrada el 28 de febrero de 2025

En dicha reunión se abordaron los temas relacionados con la promoción de un ambiente de trabajo sano y el manejo de situaciones de conflicto entre los trabajadores, dicha reunión se realizó conforme a los lineamientos establecidos en el reglamento interno y en cumplimiento de los protocolos definidos para la gestión de la convivencia laboral dentro de la organización.

Vale la pena aclarar que, dando cumpliendo a lo establecido en la Resolución 652 de 2012 Artículo 8 Numeral 5, el Acta de Reunión queda bajo custodia del CCL de R.B. DE COLOMBIA S.A., por tal razón, en cada uno de los Informes de Gestión SST se hizo entrega de Certificación de Representante Legal la cual contiene la información básica que soporta el cumplimiento para el debido control y seguimiento por parte de Interventoría, pero respetando la debida reserva, custodia y confidencialidad de la información.

Anexo No. 17 componente SST Acta de reunión del CCL RB COLOMBIA S.A.S.

SEGUIMIENTO DE INDICADORES AL SISTEMA SG-SST

La mejora continua constituye un componente esencial dentro de los Sistemas de Gestión, y se implementa mediante el Ciclo PHVA (Planear – Hacer – Verificar – Actuar). Cada una de estas etapas implica la realización de mediciones y controles específicos, cuyos resultados se reflejan en indicadores de gestión que permiten evaluar el desempeño y orientar las decisiones.

Los indicadores de gestión son herramientas que permiten expresar, de forma cuantitativa, el comportamiento de un proceso o el rendimiento de una organización. Al comparar estos valores con metas o referencias establecidas, es posible identificar desviaciones que requieren acciones correctivas o preventivas, con el fin de mantener o recuperar el rumbo hacia los objetivos propuestos.

Aunque en algunos casos ciertos indicadores pueden tener un enfoque cualitativo, la meta principal es que puedan medirse de manera cuantificable para facilitar su análisis y seguimiento.

Durante la ejecución del Contrato de Obra 9173 de 2024 se presentó la matriz de indicadores correspondiente, evidenciando el desarrollo de actividades conforme con los parámetros establecidos en dichos indicadores

Anexo No. 18 componente SST Matriz de Indicadores

RESULTADOS DE LOS INDICADORES DEL SG-SST

Los resultados se ven reflejados en la matriz de indicadores por parte de RB COLOMBIA S.A.S la cual se anexará para realizar su respectivo análisis.

ACCIONES PREVENTIVAS Y O CORRECTIVAS.

Cuando en el Sistema de Gestión se observa una mayor frecuencia de acciones correctivas en comparación con las preventivas, especialmente como resultado de los procesos de auditoría, se evidencia un enfoque reactivo en la gestión, en lugar de uno preventivo. Esta situación representa una oportunidad de mejora, cuyo

reto principal es avanzar hacia un modelo de gestión orientado a la prevención. Alcanzar esta fase no solo fortalece el desempeño del sistema, sino que también representa un factor diferencial en la gestión organizacional.

Por medio de las diferentes actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), se ha venido garantizando el cumplimiento normativo y el logro de los objetivos establecidos por el Sistema.

Durante la ejecución del Contrato de Obra 9173 de 2024 no se presentan eventos que requieran la generación de un Plan de Mejoramiento del SG-SST.

VI. ESTADO FINAL DEL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

SEÑALIZACIÓN DE LOS TRAMOS CORRESPONDIENTES A LA OBRA.

La señalización en una obra corresponde al conjunto de avisos visuales destinados a comunicar de manera clara y efectiva las medidas de seguridad obligatorias, los protocolos de emergencia, así como advertencias sobre riesgos presentes en el entorno laboral. Su propósito es orientar el comportamiento de los trabajadores y visitantes, previniendo incidentes y promoviendo un ambiente de trabajo seguro.

La señalización en una obra corresponde al conjunto de avisos visuales destinados a comunicar de manera clara y efectiva las medidas de seguridad obligatorias, los protocolos de emergencia, así como advertencias sobre riesgos presentes en el entorno laboral. Su propósito es orientar el comportamiento de los trabajadores y visitantes, previniendo incidentes y promoviendo un ambiente de trabajo seguro.

Se anexan algunas evidencias fotográficas de la Señalización instalada durante la ejecución del Contrato de Obra 9173 de 2024 a partir del Mes 2, ya que, durante el primer mes del período contractual, comprendido entre el 13 de diciembre de 2024 y el 12 de enero de 2025, las actividades ejecutadas correspondieron a labores administrativas, diagnóstico técnico y visitas de reconocimiento.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN.

RB COLOMBIA S.A.S adjunta evidencia fotográfica de la señalización de cada uno de los tramos intervenidos en el transcurso del desarrollo de las actividades.

Señalización instalada durante el Mes 2 (13 de enero al 12 de febrero de 2025)

Durante el Mes 2 de la obra (del 13 de enero al 12 de febrero de 2025), se realizó la instalación de señalización de seguridad en la zona de trabajo. Esto incluyó la colocación de diferentes avisos preventivos y normativos con el objetivo de garantizar la seguridad de los trabajadores y el cumplimiento de las normativas establecidas.

Entre las acciones realizadas se destacan:

- Implementación de restricciones de acceso, colocando señales como “Sólo personal autorizado” en las áreas restringidas.
- Refuerzo de normativas de seguridad, con avisos como “Prohibido fumar” y advertencias sobre riesgos eléctricos.
- Mejoramiento de rutas de evacuación, señalando de manera visible los accesos en caso de emergencia.
- Promoción de buenas prácticas, incluyendo campañas como la de una “Bogotá libre de

humo” para fomentar un entorno seguro.

Señalización instalada durante el Mes 2



Señalización instalada durante el Mes 3



SEÑALIZACION INSTALADA DURANTE EL MES 3 (13 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO).

Durante el Mes 3 de la obra (del 13 de febrero al 12 de marzo de 2025), se llevó a cabo la instalación de señalización para la gestión de residuos en la zona de trabajo. Este proceso tuvo como objetivo mejorar la segregación de desechos y fomentar prácticas sostenibles entre los trabajadores.


Entre las acciones implementadas destacan:

- Ubicación de puntos de reciclaje con contenedores diferenciados: amarillo para reciclables, verde para orgánicos y azul para no reciclables.
- Instalación de señalización educativa, con carteles explicativos sobre la correcta disposición de residuos en cada tipo de contenedor.



SEÑALIZACION INSTALADA DURANTE EL MES 4 (13 DE MARZO AL 13 DE ABRIL).

Durante el Mes 4 de la obra (del 13 de marzo al 15 de abril de 2025), se reforzó la instalación de señalización de seguridad en el área de trabajo, como cintas de peligro en las zonas necesarias.

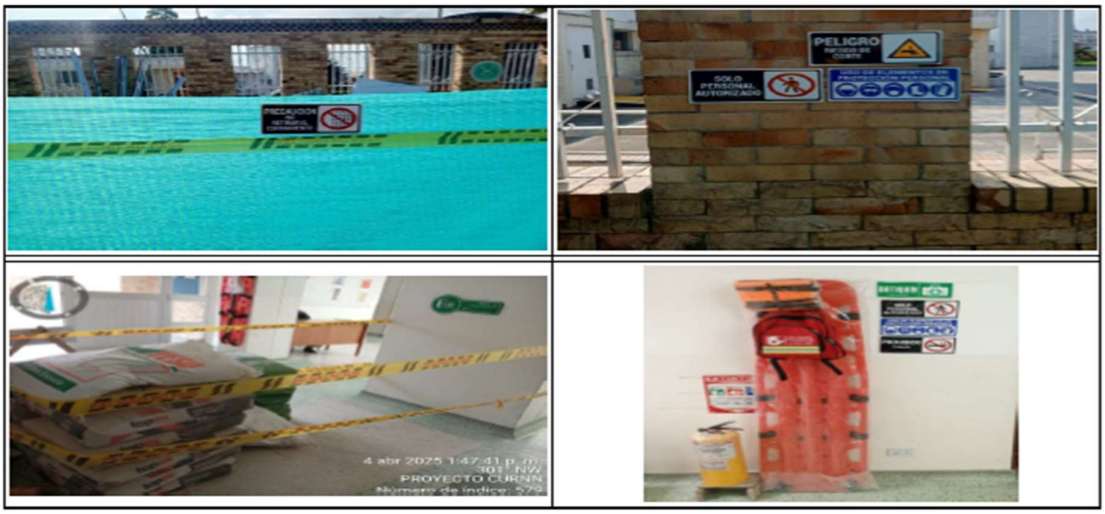

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO RB COLOMBIA S.A.S.

Análisis de trabajo seguro (ATS) es el proceso de analizar, planear y documentar por escrito y en forma detallada, completa y minuciosa la secuencia, paso a paso, de todas las actividades de un trabajo. El análisis es realizado por el equipo de trabajo del área antes de llevarlas a cabo enfocándose en detectar todos los peligros y riesgos a los que se estarán expuestos con el fin de poder controlarlos y mitigarlos, también con el fin de asegurarse de que se cuenta con todo lo necesario para que el personal lo tenga disponible (materiales, herramientas, equipo, maquinaria, etc.) antes de la realización del trabajo.

Para los inicios de cada semana y en los cambios de tramo se hacen firmar los respectivos ATS con el fin de llevar el registro y control según lo plasmado en el SG-SST.

A continuación, se reportan los ATS generados Mes a Mes durante la ejecución del proyecto, excepto en el Mes 1 en el que no se ejecutaron actividades constructivas; se incluyen los (2) días (Periodo de Liquidación), que no fueron incluidos en el Informe de Gestión SST precedente.

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO GENERADO DURANTE EL MES 2 (13 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DEL 2025).

No.	FRENTE DE OBRA	ACTIVIDAD CONSTRUCTIVA
1	JARDÍN INFANTIL TRIUNFO	RETIRO DE CUBIERTAS
2	JARDÍN INFANTIL WAWITAKUNAPAWASI	INSTALACIÓN FLANCHE
3	JARDÍN INFANTIL NUEVOS PASOS	LIMPIEZA CUBIERTA
4	CASA SABIDURÍA ADULTO MAYOR MI REFUGIO	LIMPIEZA CUBIERTA

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO GENERADOS DURANTE EL MES 3 (13 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO).

No.	FRENTE DE OBRA	ACTIVIDAD CONSTRUCTIVA
1	CDC CADIS	MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS
2	JARDÍN INFANTIL WAWITAKUNAPAWASI	LIMPIEZA ANALES DESAGÜE Y CAMBIO DE MANTO
3	JARDÍN INFANTIL NUEVOS PASOS	INSTALACIÓN DE MANTO Y LIMPIEZA DE CANALES
4	CASA SABIDURÍA ADULTO MAYOR MI REFUGIO	REPARACIÓN DE FLANCHE
5	CDC BAKATA	MAMPOSTERÍA CANALES

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO GENERADOS DURANTE EL MES 4 (13 DE MARZO AL 15 DE ABRIL).

FRENTE DE OBRA	ACTIVIDAD CONSTRUCTIVA
CURNN	RECORRIDOS DE OBRA PARA DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES A EJECUTAR
CURNN	DEMOLICIÓN DE MUROS, RETIRO RCD
CURNN	PREPARACIÓN DE MEZCLA CONCRETO, CORTE DE MATERIAL Y ARMADO DE MUROS
CURNN	INSTALACIÓN FORMALETA, PREPARACIÓN MEZCLA, FUNDICIÓN CONCRETO Y ACABADO PARA COLUMNAS DORMITORIO
CURNN	INSTALACIÓN ACCESORIOS, PULIDO, LIJADO, BRILLO Y ACABADO PISOS OFICINAS Y DORMITORIOS
CURNN	PREPARACIÓN MEZCLA, EMPAÑETE Y EMBOQUILLE PULIDO Y ACABADO PARA BAÑOS DORMITORIOS
CURNN	PREPARACIÓN MEZCLA, APLICACIÓN MEZCLA PEGACOR, CORTE MATERIAL E INSTALACIÓN DE BALDOSA PARA BAÑOS DORMITORIOS
CURNN	CORTE E INSTALACIÓN DE PERFILERÍA, INSTALACIÓN DE CIELO RASO, PREPARACIÓN MEZCLA ESTUCO, ESTUCO Y ACABADO DORMITORIOS
CURNN	DESCAPE, ESTUCO, LIJADO, LIJADO, PINTURA, ORDEN Y ASEO DORMITORIO, ACCESO A OFICINAS Y BAÑOS
CURNN	MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS Y RECUBRIMIENTO DE TORNILLERÍA
CURNN	INSTALACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN BAÑOS Y DORMITORIOS
CURNN	PREPARACIÓN DE MEZCLA CONCRETO, CORTE DE MATERIAL, INSTALACIÓN DE BALDOSA, RETOQUE CON BOQUILLA, ORDEN Y ASEO BAÑOS DORMITORIOS
CURNN	LEVANTAMIENTO DE MANTO, IMPERMEABILIZACIÓN DE PLACA, INSTALACIÓN DE MANTO, ORDEN Y ASEO CUBIERTA ÁREA ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO GENERADOS DURANTE EL PERIODO DE LIQUIDACION (14 Y 15 DE ABRIL DEL 2025)

No.	FRENTE DE OBRA	ACTIVIDAD CONSTRUCTIVA
1	CURNN	LEVANTAMIENTO DE MANTO, IMPERMEABILIZACIÓN DE PLACA, INSTALACIÓN DE MANTO, ORDEN Y ASEO
2	CURNN	TOMA DE MEDIDAS, PREPARACIÓN MEZCLA, CORTE DE MATERIALES, INSTALACIÓN DE BALDOSA, RETOQUE CON BOQUILLA, ORDEN Y ASEO
3	CURNN	TOMA DE MEDIDAS, CORTE DE MATERIALES, INSTALACIÓN DE CIELO RAZO, ESTUCO, ACABADO FINAL, ORDEN Y ASEO
4	CURNN	CORTE DE MATERIALES, INSTALACIÓN DE TUBERÍA, INSTALACIÓN DE CAJAS ELÉCTRICAS, TOMA CORRIENTES Y LUMINARIA
5	CURNN	RECORRIDO DE OBRA PARA DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES A EJECUTAR

Anexo No. 19 componente SST Registro de ATS según periodo del informe

REGISTRO FOTOGRAFICO ATS RB COLOMBIA S.A.S.

Se anexan las evidencias fotografías de trabajo seguro en los diferentes puntos intervenidos en el informe final.

IMPLEMENTACION DEL TRABAJO SEGURO MES 2 (13 ENERO AL 12 FEBERO).

Implementación Análisis de Trabajo Seguro Mes 2



IMPLEMENTACION DEL TRABAJO SEGURO MES 3 (13 FEBRERO AL 12 DE MARZO).

Implementación Análisis de Trabajo Seguro Mes 3



IMPLEMENTACION DEL TRABAJO SEGURO MES 4 (13 DE MARZO AL 12 DE ABRIL).



PERMISOS DE TRABAJO EN OBRA Y ALTURAS

Los permisos de trabajo son documentos formales emitidos por empleadores o autoridades competentes que autorizan a los trabajadores a llevar a cabo ciertas tareas específicas en el lugar de trabajo. Estos permisos son una medida de seguridad diseñada para garantizar la seguridad, minimizando el riesgo de accidentes o lesiones.

Los permisos de trabajo suelen ser necesarios para los riesgos significativos, como trabajos en altura, trabajos con maquinaria peligrosa, trabajos en espacios confinados o trabajos que involucran la manipulación

de sustancias químicas o materiales peligrosos. Antes de iniciar dichas tareas, los trabajadores deben obtener un permiso de trabajo que especifica las condiciones, precauciones y medidas de seguridad que deben seguirse durante la ejecución de la tarea.

Estos permisos suelen incluir información detallada sobre la naturaleza de la tarea, los riesgos asociados, las medidas de control necesarias, los equipos de protección personal requeridos y cualquier otra información relevante para garantizar la seguridad de los trabajadores. Además, los permisos de trabajo suelen requerir la

firma de supervisores o personas responsables para confirmar que se han tomado todas las precauciones necesarias antes de que se pueda comenzar la actividad laboral.

Se relacionan las actividades en Alturas que fueron desarrolladas durante la ejecución del Contrato de Obra 9173 de 2024, las cuales fueron informadas a la Interventoría por medio de los informes semanales de avance que se emite desde el Área Técnica del Contratista de Obra y los Informes Mensuales de Gestión SST.

Actividades Trabajo en Alturas durante el periodo No. 2 (13 de enero al 12 de febrero de 2025)

No.	FRENTE DE OBRA	ACTIVIDAD CONSTRUCTIVA
1	JARDÍN INFANTIL TRIUNFO	RETIRO DE CUBIERTAS
2	JARDÍN INFANTIL WAWITAKUNAPAWASI	INSTALACIÓN FLANCHE
3	JARDÍN INFANTIL NUEVOS PASOS	LIMPIEZA CUBIERTA
4	CASA SABIDURÍA ADULTO MAYOR MI REFUGIO	LIMPIEZA CUBIERTA

Actividades Trabajo en Alturas durante el periodo No. 3 (13 de febrero al 12 de marzo de 2025)

Anexo No. 20 digital componente SST Soporte de permisos de trabajo.

INSPECCIONES PLANEADAS

A continuación, se relacionan los equipos utilizados para el desarrollo de actividades técnicas durante la ejecución del Contrato de Obra 9173 de 2024. Mes a mes se anexaron facturas de compra y hojas de vida de los equipos empleados en cada periodo, excepto en el Mes 1 en el que no se ejecutaron actividades constructivas.

LISTADO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS						
No.	NOMBRE DEL EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	CANTIDAD	ALTURA
1	TALADRO DEMOLEDOR (1)	DEWALT	D25773-B3	593	1	
2	TALADRO DEMOLEDOR (2)	DEWALT	DW3125	235600088	1	
3	TALADRO INALAMBRICO	MAKITA	DHP487 /DHP487	811B83-5 /811B83-5	2	
4	MOTO VIBRO DE CONCRETO	WICO	MOTOR 115	211 05027	1	
5	PULIDORA	MAKITA	GA9020	315338	1	
6	PULIDORA	DEWALT	DWE4315-B2.	230400088.	1	
7	MEZCLADORA DE CONCRETO	BAUKER	2025	N/A	1	
8	SIERRA CIRCULAR	DEWALT	DWE5615-B2	009718	1	
9	ESCALERA (1)	GENERICO	AM21-103111-B	N/A	1	1.26 M
10	ESCALERA (2)	FANES	120661	120661	1	2.10 M
11	ESCALERA (3)	UBERMAN	FM42-212IA-UB	N/A	1	5.540 M

RELACION DE INSECCIONES PLANEADAS SEGÚN PERIODOS

PERIODO	INSPECCIONES	DESCRIPCIÓN	FRENTE DE OBRA
MES 2 (13 ENE - 12 FEB)	Inspección a extintores	Se verificó extintor, ubicados en área de oficina y estaban en condiciones óptimas de uso	Wawita / Samper Mendo Bakata / Crecer / Cadis / Nuev Pasos / Ata / Mi Refugio / El Triunf
	Inspección de camillas Fel	Se verificaron camillas, ubicados en área de oficina y estaban en condiciones óptimas de uso	Wawita / Samper Mendo Bakata / Crecer / Cadis / Nuev Pasos / Ata / Mi Refugio / El Triunf
	Inspección de equipos y herramientas	Se realizó la inspección preoperacional a herramientas como taladro, pulidora, martillo, maseta, compresor	Wawita / Samper Mendo Bakata / Crecer / Cadis / Nuev Pasos / Ata / Mi Refugio / El Triunf
	Inspección de mezcaldoras portatiles de concreto	Se realizó la inspección preoperacional de las mezcladoras y estaban en condiciones óptimas de uso	Bakata
	Inspección de escalera portatiles	Se verificaró escalera ubicada en área de oficina y estaban en condiciones óptimas de uso	Bakata / Samper Mendoz Crecer / Cadis
	Inspección de andamio	Se verificó andamio y estaba en condiciones optimas de uso	Wawita / El Triunfo
	Inspección de escalera	Se verificó escalera y estaban en condiciones optimas de uso	El Triunfo / Mi Refugio
	Inspección de andamio tubular	Se verificó andamio y estaba en condiciones optimas de uso	Samper Mendoza
	Inspección de soplete	Se realizó la inspección preoperacional de soplete y estaban en condiciones óptimas de uso	Crecer / Cadis
	Inspección de orden y aseo	Se realizó la inspección de orden y aseo en las sedes	Wawita / Samper Mendo Bakata / Crecer / Cadis / Nuev Pasos / Ata / Mi Refugio / El Triunf
MES 3 (13 FEB - 12 MAR)	Inspección a extintores	Se verificó extintor, ubicados en área de oficina y estaban en condiciones óptimas de uso	Wawita / Samper Mendo Bakata / Crecer / Cadis / Nuev Pasos / Ata / Mi Refugio / El Triunf
	Inspección de camillas Fel	Se verificaron camillas, ubicados en área de oficina y estaban en condiciones óptimas de uso	Wawita / Samper Mendo Bakata / Crecer / Cadis / Nuev Pasos / Ata / Mi Refugio / El Triunf
	Inspección de escalera portatiles	Se verificaró escalera ubicada en área de oficina y estaban en condiciones óptimas de uso	Wawita / Samper Mendo Crecer
	Inspección de soplete	Se realizó la inspección preoperacional de soplete y estaban en condiciones Óptimas de uso	Samper Mendoza
	Inspección de andamio tubular	Se verificó andamio y estaba en condiciones optimas de uso	Samper Mendoza
	Inspección de equipos de protección contra caídas	Se realizón inspección de arnes de cuerpo entero, eslinga sencilla y línea de vida	Wawita / Samper Mend
	Inspección de equipos y herramientas	Se realizó la inspección preoperacional a herramientas como taladro, pulidora, equipo de soldadura, compresor	Wawita / Samper Mendo Bakata / Crecer / Cadis / Nuev Pasos
	Inspección de escalera	Se verificó escalera y estaban en condiciones óptimas de uso	Wawita / Samper Mendo Nuevos Pasos / Mi Refu / Cadis / Crecer
	Inspección de orden y aseo	Se realizó la inspección de orden y aseo en las sedes	Wawita / Samper Mendo Bakata / Crecer / Cadis / Nuev Pasos / Ata / Mi Refugio / El Triunf
MES 4 (13 MAR -	Inspección de Herramientas manuales	Se verificaron herramientas manuales de emergencia ubicados en área de oficina y estaban en condiciones óptimas de uso	Curnn
	Inspección de escalera portatiles	Se verificaró escalera ubicada en área de oficina y estaban en condiciones óptimas de uso	Curnn

Anexo No. 21 digital componente SST soportes de inspecciones

SOPORTE A INSPECCIONES PLANEADAS.

R.B DE COLOMBIA S.A. anexa al presente informe los soportes de las diferentes inspecciones relacionadas en el cronograma aprobado por interventoría para la ejecución del Contrato de Obra 9173 de 2024. (13 de diciembre de 2024 – 15 de abril de 2025).

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE INSPECCIONES PROGRAMADAS POR PARTE DE RB COLOMBIA S.A.S.

Se anexan las evidencias fotográficas de algunas de las inspecciones de seguridad realizadas durante el desarrollo del Proyecto.

INSPECCIONES PROGRAMADAS MES 2 (13 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO).



INSPECCIONES PROGRAMADAS MES 3 (13 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO DEL 2025

Inspecciones de Seguridad Mes 3



INSPECCIONES PROGRAMADAS MES 4 (13 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DEL 2025).

Inspecciones de Seguridad Mes 4



VII. ESTADO FINAL DEL EQUIPO DE TRABAJO DEL INTERVENTOR

LISTADO DE PERSONAL DE CONSORCIO INTERVENTORES AO (INTERVENTORIA).

CONSORCIO INTERVENTORES AO				LISTADO DE PERSONAL ACTUAL EN CONSORCIO INTERVENTORES AO 2025							
#	NOMBRES	APELLIDOS	CEDULA	EDAD	CARGO	DIREC	CONT	INDEP	EMPRESA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
1	JHON ALEXANDER	ALBARRACIN MAYORGA	1.019.043.623	35	ING. RESIDENTE INTERVENTORIA	X			CONSORCIO INTERVENTORES AO	22/01/2025	30/04/2025
2	JEISSON H STALLING	CADENA OME	12.195.827	50	INSPECTOR INTERVENTORIA	X			CONSORCIO INTERVENTORES AO	28/01/2025	1/03/2025
3	PAULA ANDREA	GARZON TORO	1.013.621.964	34	INSPECTOR INTERVENTORIA	X			CONSORCIO INTERVENTORES AO	28/01/2025	30/04/2025
4	JOSE ALEXANDER	PERDOMO LEON	79.745.639	48	INSPECTOR INTERVENTORIA	X			CONSORCIO INTERVENTORES AO	22/01/2025	25/02/2025
5	JUAN CARLOS	ROJAS	1.023.873.559	51	INSPECTOR INTERVENTORIA				CONSORCIO INTERVENTORES AO	27/01/2025	7/02/2025
6	RAUL DARIO	CARVAJAL CORTES	1.032.365.948	38	INSPECTOR INTERVENTORIA	X			CONSORCIO INTERVENTORES AO	20/01/2025	12/03/2025
7	VIVIANA CAROLINA	MEDINA ROJAS	1.019.080.933	32	RESIDENTE SST INTERVENTORIA	X			CONSORCIO INTERVENTORES AO	22/01/2025	10/03/2025
8	JAMIR	GONZALEZ TIQUE	83.117.200	43	AUXILIAR SST INTERVENTORIA	X			CONSORCIO INTERVENTORES AO	31/01/2025	1/03/2025
9	KATYA ISABEL	JULIO SILGDO	1.047.459.135	32	AUXILIAR SST INTERVENTORIA	X			CONSORCIO INTERVENTORES AO	28/01/2025	25/02/2025
10	LINA YANEY	CHIVATA	33.677.433	43	AUXILIAR SST INTERVENTORIA	X			CONSORCIO INTERVENTORES AO	31/01/2025	8/02/2025
11	CINTHIA LILIANA	RESTREPO	21.022.066	34	AUXILIAR SST INTERVENTORIA	X			CONSORCIO INTERVENTORES AO	6/02/2025	25/02/2025
12	MAYERLY ESTANLY	MORILLO LOPEZ	1.042.471.937	24	AUXILIAR SST INTERVENTORIA	X			CONSORCIO INTERVENTORES AO	6/02/2025	25/02/2025
13	LUIS ALBERTO	FORERO RAMOS	79.974.079	45	DIRECTOR DE OBRA	X			CONSORCIO INTERVENTORES AO	13/12/2024	30/04/2025

Participación de Mujeres en el Contrato de Interventoría:

NOMBRE	CARGO
PAULA ANDRE GARZON TORO	INSPECTOR DE INTERVENTORIA
VIVIANA CAROLINA MEDINA ROJAS	RESIDENTE SST INTERVENTORIA
KATYA ISABEL JULIO	AUXILIAR SST INTERVENTORIA
LINA YANEY CHIVATA	AUXILIAR SST INTERVENTORIA
CINTHIA LILIANA RESTREPO	AUXILIAR SST INTERVENTORIA
MAYERLY ESTANLY MORILLO LOPEZ	AUXILIAR SST INTERVENTORIA
ERIKA MARCELA RAMOS SALAMANCA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
JOHANNA ANDREA FORERO RAMOS	CONTADORA

LISTADO DE PERSONAL RB COLOMBIA S.A.S.

Se presenta la relación del personal vinculado por R.B. DE COLOMBIA S.A. durante la ejecución del Contrato de Obra No. 9173-24, conforme a los requisitos establecidos en los Pliegos de Condiciones. La información detallada abarca el periodo comprendido entre el 13 de diciembre de 2024 y el 15 de abril de 2025, proporcionando un registro del personal activo e inactivo, ingreso y retiro.

Anexo No.22 digital componente SST Listado de personal contractual de RB COLOMBIA S.A.S

LISTADO MANO DE OBRA NO CALIFICADA SUBCONTRATISTAS DE LA EMPRESA JGR.

A continuación, se relaciona el personal que participó durante la ejecución del Contrato de Obra 9173- 24 como Personal No Contractual y Mano de Obra No Calificada. Esta información incluye los datos relevantes

sobre los trabajadores que desarrollaron las diferentes actividades operativas del proyecto, en función de las necesidades identificadas en cada una de sus etapas.

Mes a mes, (13 de diciembre de 2024 - 15 de abril de 2025) se verificó que dichos ingresos cumplieran con los requisitos establecidos en los procedimientos de ingreso y alistamiento definidos por R.B. DE COLOMBIA S.A., incluyendo los aspectos relacionados con los pliegos de condiciones del Contrato de Obra 9173-24 para el ingreso de personal.

Anexo No.23 digital componente SST Listado de personal no contractual RB COLOMBIA S.A.S

VIII. ESTADO FINAL DEL SEGUIMIENTO TIEMPO DE TRABAJO

JORNADAS DE TRABAJO:

El presente informe consolida la información relacionada con los diferentes frentes de obra activos en el marco del contrato, los cuales desarrollan sus labores bajo una misma jornada laboral. Todos los puntos de intervención trabajan de lunes a sábado, en un horario comprendido entre las 8:00 a. m. y las 5:00 p. m., lo cual corresponde a una jornada diurna completa de 9 horas diarias. Estos frentes están ubicados en distintas direcciones de la ciudad y abarcan centros infantiles, hogares de paso y centros de atención especializada, donde se ejecutan actividades de mejora, adecuación y mantenimiento.

FRENTE DE OBRA	DIRECCIÓN	DÍAS DE TRABAJO	HORARIO DE TRABAJO	JORNADA DE TRABAJO
CADIS	CALLE 1 # 24 B - 26	Lunes a sábado	8 AM a 5 PM	Jornada Diurna Completa
CENTRO CRECER	CALLE 1 # 24 B - 26	Lunes a sábado	8 AM a 5 PM	Jornada Diurna Completa
CENTRO MI REFUGIO	CARRERA 18b # 22 d - 40	Lunes a sábado	8 AM a 5 PM	Jornada Diurna Completa
JARDÍN INFANTIL SAMPER MENDOZA	CARRERA 22 # 22 A - 72	Lunes a sábado	8 AM a 5 PM	Jornada Diurna Completa
JARDÍN INFANTIL NUEVOS PASOS	CALLE 5 A # 26 A - 17	Lunes a sábado	8 AM a 5 PM	Jornada Diurna Completa
JARDÍN INFANTIL ATA	CARRERA 3 A Bis # 3 A - 2	Lunes a sábado	8 AM a 5 PM	Jornada Diurna Completa
JARDÍN INFANTIL EL TRIUNFO	CALLE 1 BIS # 1B - 69	Lunes a sábado	8 AM a 5 PM	Jornada Diurna Completa
CPI KAWITAKUNAPA WASI	CARRERA 1 # 33 – 22	Lunes a sábado	8 AM a 5 PM	Jornada Diurna Completa
HOGAR DE PASO BAKATA	CARRERA 35 # 10 - 35	Lunes a sábado	8 AM a 5 PM	Jornada Diurna Completa
JARDÍN INFANTIL ATA	CARRERA 35 # 10 - 35	Lunes a sábado	8 AM a 5 PM	Jornada Diurna Completa
CURNN	CARRERA 35 # 10 - 35	Lunes a sábado	8 AM a 5 PM	Jornada Diurna Completa

La jornada de trabajo establecida para todos los frentes de obra se desarrolló de manera continua desde el 13 de diciembre de 2024 hasta el 15 de abril de 2025, en un horario comprendido de lunes a sábado, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., correspondiente a una jornada diurna completa. Esta programación fue implementada desde el inicio del contrato y se mantuvo de forma constante durante toda la vigencia de la ejecución contractual.

COMPORTAMIENTO DE CLIMA:

El comportamiento climático se encuentra en el Anexo 24, correspondiente a los siguientes frentes, desde el 13 de diciembre de 2024 hasta el 15 de abril de 2025. Los días comprendidos entre el 15 y el 30 de abril de 2025 se utilizaron para organizar la liquidación del proyecto.

1. Jardín Infantil Samper Mendoza – Localidad Mártires
2. Centro Día Mi Refugio - Localidad Mártires
3. Centro CRECER - Localidad Mártires
4. Centro Atención Distrital para la Inclusión Social CADIS - Localidad Mártires
5. Centro Único de Recepción de Niñas y Niños CURNN - Localidad Mártires
6. Hogar de paso Bakata – Localidad Puente Aranda
7. Centro de Atención a Ciudadanos Habitantes de la Calle SEDID – Localidad Puente Aranda
8. Jardín Infantil Wawita Kanupa Wasi – Localidad Santa Fé
9. Jardín Infantil El Triunfo – Localidad Santa Fé
10. Jardín Infantil Nuevos Pasos – Localidad Santa Fé
11. Jardín Infantil ATA - Localidad Santa Fé

Anexo 24 clima

IX. ESTADO FINAL DE LA EVALUACIÓN Y AVANCE DEL PROYECTO

AVANCE FÍSICO

Durante el periodo comprendido entre el 13 de diciembre de 2024 y el 15 de abril de 2025, se desarrolló la ejecución física del contrato en once (11) unidades funcionales, entre las que se encuentran jardines infantiles, centros de atención y hogares de paso, distribuidos en distintas localidades del distrito. Todas las actividades se llevaron a cabo conforme a la planeación técnica, administrativa y financiera aprobada al inicio del proyecto.

Como resultado del seguimiento técnico realizado por la interventoría, se constató que el avance físico acumulado alcanzó el 100 % en la totalidad de los frentes de obra, cumpliendo así con los objetivos contractuales establecidos. Cada unidad funcional —incluyendo CADIS, CRECER, CURNN, JARDINES INFANTILES (Samper Mendoza, El Triunfo, Nuevos Pasos, ATA), MI REFUGIO, KAWITAKUNAPA WASI, BAKATA y SEDID— completó de manera satisfactoria todas las actividades programadas, en concordancia con los cronogramas establecidos y dentro del plazo de ejecución.

Este cumplimiento refleja una adecuada planificación, gestión operativa y articulación entre el contratista y la interventoría, permitiendo garantizar la cobertura de todas las metas físicas establecidas en el contrato. Además, se resalta que no fue necesario aplicar prórrogas ni ajustes mayores en el tiempo de ejecución, lo que evidencia una ejecución eficiente y conforme a lo previsto.

En conclusión, el proyecto alcanzó el 100 % de avance físico en todas las unidades funcionales, asegurando la culminación total de las intervenciones conforme a las especificaciones técnicas y contractuales, dentro del periodo pactado y sin desviaciones significativas.

	UNIDAD	CONTRACTUAL INICIAL		Duración días	Comienzo	Fin	% Programado	EJECUTADO		% Completado
		CD	CI+CD					CD	CI+CD	
1	WAWITA	$ 195.502.416,48	$ 263.419.955,97	26	21/01/2025	25/02/2025	100%	$ 194.795.602,55	$ 262.467.594,88	100%
2	BAKATA	$ 37.862.650,08	$ 51.016.134,72	22	22/01/2025	20/02/2025	100%	$ 38.908.474,10	$ 52.425.278,00	103%
3	SAMPER MENDOZA	$ 139.876.159,55	$ 188.469.137,38	18	21/01/2025	13/02/2025	100%	$ 152.025.131,44	$ 204.838.662,10	109%
4	MI REFUGIO	$ 132.106.278,77	$ 178.000.000,01	26	21/01/2025	25/02/2025	100%	$ 132.105.816,18	$ 177.999.376,72	100%
5	EL TRIUNFO	$ 53.884.068,00	$ 72.603.393,22	24	22/01/2025	24/02/2025	100%	$ 53.480.787,34	$ 72.060.012,86	99%
6	JARDIN INFANTIL NUEVOS PASOS	$ 47.317.826,80	$ 63.756.039,83	17	23/01/2025	15/02/2025	100%	$ 53.519.686,35	$ 72.112.425,39	113%
7	ATA	$ 32.402.368,38	$ 43.658.951,16	19	24/01/2025	19/02/2025	100%	$ 22.912.162,63	$ 30.871.847,93	71%
8	CRECER	$ 63.057.362,85	$ 84.963.490,70	13	27/01/2025	12/02/2025	100%	$ 39.017.755,92	$ 52.572.524,33	62%
9	CADIS	$ 69.739.831,34	$ 93.967.448,75	22	24/01/2025	24/02/2025	100%	$ 76.509.170,42	$ 103.088.456,22	110%
10	SEDID- Centro Sedid Atención A Ciudadanos Habitantes De Calle	$ 21.515.473,00	$ 28.989.948,32	23	24/01/2025	25/02/2025	100%	$ 21.515.473,00	$ 28.989.948,32	100%
11	CURNN	$ 223.956.486,55	$ 301.758.969,98	36	25/02/2025	15/04/2025	100%	$ 232.429.411,18	$ 313.175.388,62	100%
	COSTOS DIRECTOS	$ 1.017.220.921,80	$ 1.370.603.470,03					$ 1.017.219.471,11	$ 1.370.601.515,37	

COSTOS INDIRECTOS			CI	
ADMINISTRACIÓN	30,24%	$ 307.607.606,75	$ 307.607.168,06	
IMPREVISTO	0,5%	$ 5.086.104,61	$ 5.086.097,36	
UTILIDAD	4,0%	$ 40.688.836,87	$ 40.688.778,84	
SUBTOTAL COSTO INDIRECTO		$ 353.382.548,23	$ 353.382.044,26	
TOTAL		$ 1.370.603.470,00	$ 1.370.601.515,37	100,00%

Anexo 25 *ACTA DE OBRA 4*

AVANCE FINANCIERO POR RUBRO

INFORME DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS POR RUBROS	CONTRACTUAL	EJECUTADO
A - Unidades Operativas + B - Obras civiles Ascensoresy plataformas (0112 - OTRO DISTRITOS)	$ 1,192,603,470.00	$ 1,192,602,138.68
C - Casa de la Sabiduría (0144 - ESTAMPILLAS POR ADULTO MAYOR)	$ 178,000,000.00	$ 177,999,376.72
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 1,370,603,470.00	$ 1,370,601,515.41

VALOR COSTO DIRECTO ACTA # 1	A.I.U.	VALOR TOTAL ACTA # 1	SALDO DE LOS RUBROS
$ 332,892,906	$ 115,646,995	$ 448,539,901	$ 744,063,568.96
$ 29,707,139	$ 10,320,260	$ 40,027,399	$ 137,972,600.64
		$ 488,567,300	

VALOR COSTO DIRECTO ACTA # 2	A.I.U.	VALOR TOTAL ACTA # 2	SALDO DE LOS RUBROS
$ 316,667,078	$ 110,010,143	$ 426,677,221	$ 317,386,347.73
$ 101,471,837	$ 35,251,316	$ 136,723,153	$ 1,249,447.41
		$ 563,400,374.5	

VALOR COSTO DIRECTO ACTA # 3	A.I.U.	VALOR TOTAL ACTA # 3	SALDO DE LOS RUBROS
$ 182,879,815	$ 63,532,448	$ 246,412,262	$ 70,974,085.46
$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,249,447.41
		$ 246,412,262	

VALOR COSTO DIRECTO ACTA LIQUIDACIÓN	A.I.U.	VALOR TOTAL ACTA LIQUIDACIÓN	SALDO DE LOS RUBROS
$ 52,673,856	$ 18,298,898	$ 70,972,754	$ 1,331.32
$ 926,840	$ 321,984	$ 1,248,824	$ 623.28
		$ 72,221,578	

UNIDAD	ACTA LIQUIDACIÓN
JI WAWITA	$ 3,124,259.90
BAKATA	$ -
JI SAMPER MENDOZA	$ -
MI REFUGIO	$ 926,839.94
EL TRIUNFO	$ -
JI NUEVOS PASOS	$ -
ATA	$ -
CRECER	$ -
CADIS	$ -
SEDID- Centro Sedid Atención A Ciudadanos Habitantes De Calle	$ -
CURNN	$ 49,549,596.52
VALOR COSTO TOTAL DIRECTO	$ 53,600,696.36
AIU	$ 18,620,881.92
COSTO TOTAL ACTA No. 4	$ 72,221,578.28

Anexo 26 RUBRO FINAL

X. ESTADO FINAL DEL ASPECTO JURIDICO DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA MODIFICACIONES CONTRACTUALES

PRORROGA NO.1 PARA OBRA E INTERVENTORÍA

Se recibió la comunicación RB-SDIS-G2-No 005-2024 el día 16 de diciembre de 2024 de RB DE COLOMBIA SAS, de obra No. 9173-2024, solicitando una prórroga para dicho contrato, la cual fue aprobada por interventoría. En este contexto, se solicitó modificar el plazo de ejecución del contrato de obra, extendiéndolo hasta el 25 de febrero de 2025, debido a que el recurso asignado para atender ciertas localidades no se ha agotado. Además, la firma del acta de inicio se realizó el 13 de diciembre de 2024, y el proceso de ejecución requiere más tiempo debido a la necesidad de realizar diagnósticos y obtener las aprobaciones correspondientes. También, los proveedores no pueden despachar los materiales a tiempo debido al cierre del año.

Por lo tanto, se solicitó la prórroga del contrato de interventoría No. 9255-2024 por el mismo período del contrato de obra y 15 días adicionales para su cierre, con lo que la nueva fecha de terminación del contrato de interventoría sería el 12 de marzo de 2025.

PRORROGA NO.2 PARA OBRA E INTERVENTORÍA Y ADICIÓN NO.1 PARA INTERVENTORÍA:

Se recibió la comunicación RB-SDIS-G2-No 100-2024 de RB DE COLOMBIA SAS, el día 06 de febrero de 2025 del contrato de obra No. 9173-2024, solicitando la prórroga No. 2 y adición No. 1 del contrato. La solicitud fue avalada por interventoría mediante la comunicación 073-C.E.-INTERV-SDIS-9255. Se solicita la prórroga del contrato de interventoría No. 9255-2024 por 49 días adicionales, desde el 13 de marzo hasta el 30 de abril de 2025.

El contratista expone los antecedentes del contrato, señalando que la solicitud de prórroga es necesaria para continuar la ejecución de la obra en 2025. Se mencionan diversas adendas y modificaciones al cronograma del contrato en ejecución, destacando que el presupuesto del contrato ya está comprometido y se requiere una adición para cumplir con las necesidades de un frente de obra en el CURNN (Centro de Crecer), que busca mejorar la infraestructura para niños con movilidad reducida.

En este contexto, se solicitó el contratista a interventoría una adición al contrato por un valor de $301.758.970 y la prórroga del contrato de obra por 49 días, a partir del 25 de febrero de 2025.

Finalmente, el Consorcio Interventores AO indico un costo adicional de $91.741.786 para cubrir los gastos durante el período de prórroga, y solicito formalmente la modificación del contrato de obra e interventoría a la entendía contratante para cumplir con las nuevas necesidades del proyecto y garantizar la calidad de las obras.

PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS

No aplica para el presente informe

XI. ESTADO FINAL DE LOS ASPECTOS CRÍTICOS DEL PROYECTO

INCONVENIENTES

- Presencia de lluvias constantes en los frentes de obra que contemplaban en su intervención mantenimientos y cambios de cubierta.
- Imposibilidad de traslado de estudiantes de todas las sedes intervenidas.
- Falta de espacios para acopio de materiales y residuos de demolición.

SOLUCIONES

- Incremento de jornada de trabajo en horario secos, incluidos fines de semana.
- Aislamiento de zonas de trabajo en coordinación con el personal directivo de cada sede intervenida.
- Solicitud de espacios en parqueaderos, señalizando y aislando las zonas autorizadas, en concordancia con el Plan de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo.

CONCLUSIONES

- La intervención de las sedes garantizó la clausura de ingreso de aguas lluvias, ya que se sellaron goteras que estaban afectando las aulas y áreas administrativas de dichas áreas.
- El contrato de obra No. 9173-2024 permitió el retiro y reposición de cubiertas en asbesto cemento que pueden llegar a ser un factor de riesgo para la salud de estudiantes y personal administrativo de las sedes.
- La ejecución del contrato de obra No. 9173-2024, permitió mejorar las condiciones de accesibilidad a personas en condición de movilidad reducida, con la construcción de rampas y baños acondicionados con aparatos acondicionados para esta población.
- Las sedes intervenidas mejoraron su confort, con diversas obras como lo fueron resanes, pintura muros en vinilo, pintura en esmalte, reposición de aparatos eléctricos (tomas e interruptores), sellado de juntas de ventanas y enchapes entre otros.

RECOMENDACIONES

- Dar uso a las sedes intervenidas de acuerdo a los manuales de uso que elabora y entrega el contratista, con el fin de evitar daños en la infraestructura intervenida.
- Complementar la intervención de las sedes con el componente eléctrico en futuras intervenciones, ya que en la intervención del contrato de obra No. 9173-2024 los recursos no fueron suficientes para ello.
- Tomar en cuenta para futuras intervenciones en las sedes intervenidas, los diagnósticos ejecutados dentro del contrato de obra No. 9173-2024.

XII. ANEXOS (EN MEDIO MAGNÉTICO)

ANEXO 1 COPIA DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBID

RECIBIDA

No. OFICIO	ASUNTO	REMITENTE	FECHA RECIBO	MEDIO DE RECIBO	DIRIGIDO A
RB-SDIS-G2-No. 002-2024	Envío Hoja de Vida	R.B. DE COLOMBIA S.A.	28/11/2024	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 003-2024	Pólizas contrato	R.B. DE COLOMBIA S.A.	5/12/2024	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 005-2024	Solicitud de prórroga	R.B. DE COLOMBIA S.A.	5/12/2024	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 006-2024	Envío Hoja de Vida	R.B. DE COLOMBIA S.A.	16/12/2024	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 007-2024	Envío Hoja de Vida	R.B. DE COLOMBIA S.A.	16/12/2024	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 008-2024	Envío Hoja de Vida	R.B. DE COLOMBIA S.A.	17/12/2024	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 009-2024	Atención a sus comunicados : 002 CE INTERV-SDIS-9255 de diciembre 1 de 2024 011 CE INTERV-SDIS-9255 de diciembre 16 de 2024	R.B. DE COLOMBIA S.A.	17/12/2024	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 010-2024	Atención a sus comunicados : 002 CE INTERV-SDIS-9255 de diciembre 1 de 2024 011 CE	R.B. DE COLOMBIA S.A.	17/12/2024	e-mail	Consorcio Interventores AO

	INTERV-SDIS-9255 de diciembre 16 de 2024				
RB-SDIS-G2-No. 011-2024	Documentos soporte solicitud de prorroga	R.B. DE COLOMBIA S.A.	17/12/2024	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 013-2024	Plan de calidad con anexos	R.B. DE COLOMBIA S.A.	19/12/2024	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 014-2024	Envío Hoja de Vida	R.B. DE COLOMBIA S.A.	19/12/2024	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 016-2024	Componente Ambiental	R.B. DE COLOMBIA S.A.	20/12/2024	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 018-2024	Envio Análisis Precios Unitarios	R.B. DE COLOMBIA S.A.	20/12/2024	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 019-2024	Envío Hoja de Vida	R.B. DE COLOMBIA S.A.	20/12/2024	SI	NO
RB-SDIS-G2-No. 020-2024	Envío Hoja de Vida	R.B. DE COLOMBIA S.A.	26/12/2024	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 021-2024	Envío Hoja de Vida	R.B. DE COLOMBIA S.A.	27/12/2024	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 022-2024	Envío Hoja de Vida	R.B. DE COLOMBIA S.A.	27/12/2024	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 023-2024	Envío Hoja de Vida	R.B. DE COLOMBIA S.A.	27/12/2024	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 024-2024	Envío Hoja de Vida	R.B. DE COLOMBIA S.A.	27/12/2024	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 025-2024	Revisión de ítems	R.B. DE COLOMBIA S.A.	27/12/2024	e-mail	SDIS
RB-SDIS-G2-No. 026-2024	Entrega presupuestos Mi Refugio y Samper Mendoza	R.B. DE COLOMBIA S.A.	27/12/2024	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 028-2024	Envío Hoja de Vida	R.B. DE COLOMBIA S.A.	31/12/2024	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 029-2024	Entrega presupuestos ATA,	R.B. DE COLOMBIA S.A.	31/12/2024	e-mail	Consorcio Interventores AO

	KAWITA, BAKATA				
RB-SDIS-G2-No. 030-2025	Pólizas de Prorroga Contrato	R.B. DE COLOMBIA S.A.	2/01/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 031-2025	Atención a su oficio 027-C.E.-INTERV-SDIS-9255 – Hoja de Vida	R.B. DE COLOMBIA S.A.	2/01/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 032-2025	Respuesta observaciones CENTRO DIA MI REFUGIO	R.B. DE COLOMBIA S.A.	3/01/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 033-2025	Respuesta observaciones de la obra SAMPER MENDOZA	R.B. DE COLOMBIA S.A.	3/01/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 034-2025	Respuesta observaciones de la obra Jardín Infantil ATA. Oficio: 028-C.E.-INTERV-SDIS-9255	R.B. DE COLOMBIA S.A.	3/01/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 035-2025	Respuesta oficio 030-C.E.-INTERV-SDIS-9255 observaciones OBRA BAKATA	R.B. DE COLOMBIA S.A.	3/01/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 036-2025	Respuesta observaciones de la obra Wawita Kunapa Wasi. Oficio: 029-C.E.-INTERV-SDIS-9255	R.B. DE COLOMBIA S.A.	3/01/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
E2025000112	Aprobación hojas vida	SDIS	7/01/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO

	del personal interventoría .				
RB-SDIS-G2-No. 040-2025	Entrega presupuesto, cronograma y diagnostico obra Jardín infantil Nuevos Pasos	R.B. DE COLOMBIA S.A.	8/01/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 041-2025	Entrega presupuesto, cronograma y diagnostico obra Jardín infantil El Triunfo	R.B. DE COLOMBIA S.A.	8/01/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 042-2025	Entrega presupuesto, cronograma y diagnostico obra Centro Crecer	R.B. DE COLOMBIA S.A.	8/01/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 043-2025	Entrega presupuesto, cronograma y diagnostico obra CADIS	R.B. DE COLOMBIA S.A.	8/01/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 045-2025	Entrega presupuesto, cronograma y diagnostico obra ATA	R.B. DE COLOMBIA S.A.	8/01/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 048-2025	Entrega presupuesto, cronograma y diagnostico obra Centro dia Refugio	R.B. DE COLOMBIA S.A.	8/01/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 049-2025	Entrega presupuesto, cronograma y diagnostico obra Samper Mendoza	R.B. DE COLOMBIA S.A.	8/01/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO

RB-SDIS-G2-No. 035-2025	Entrega presupuesto, cronograma y diagnostico obra Bakata	R.B. DE COLOMBIA S.A.	8/01/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 039-2025	Entrega presupuesto, cronograma y diagnostico obra Kawita	R.B. DE COLOMBIA S.A.	8/01/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 039-2025	Correo electrónico proyecto	R.B. DE COLOMBIA S.A.	9/01/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 057-2024	Envío Hoja de Vida	R.B. DE COLOMBIA S.A.	9/01/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 055-2024	Respuesta a sus oficios 043-C.E.-INTERV-SDIS-9255 Revisión No. 1 DIAGNOSTICOS CADIS 042-C.E.-INTERV-SDIS-9255 Revisión No. 1 DIAGNOSTICO CENTRO CRECER 041-C.E.-INTERV-SDIS-9255 Revisión No. 1 DIAGNOSTICO JI EL TRIUNFO 040-C.E.-INTERV-SDIS-9255 Revisión No. 1 DIAGNOSTIC	R.B. DE COLOMBIA S.A.	10/01/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO

	O JI NUEVOS PASOS				
RB-SDIS-G2-No. 058-2024	Entrega de presupuestos conciliados el 10 de enero 2025.	R.B. DE COLOMBIA S.A.	10/01/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 059-2024	Envío Hoja de Vida	R.B. DE COLOMBIA S.A.	10/01/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 060-2024	Solicitud de orden de trabajo	R.B. DE COLOMBIA S.A.	13/01/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 061-2024	Presupuestos con ajustes de pintura y resanes	R.B. DE COLOMBIA S.A.	13/01/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 063-2024	Envío Hoja de Vida	R.B. DE COLOMBIA S.A.	16/01/2024	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 064-2024	Dotación proyecto	R.B. DE COLOMBIA S.A.	16/01/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 065-2024	ENTREGA DE DIAGNOSTICOS CON CRONOGRAMAS	R.B. DE COLOMBIA S.A.	16/01/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 066-2024	ENTREGA DE LISTADOS DE PERSONAL EN OBRAS	R.B. DE COLOMBIA S.A.	17/01/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 069-2024	Atención a su oficio No. 049-CE-INTERVENT-SDIS-9255	R.B. DE COLOMBIA S.A.	20/01/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 070-2024	DOCUMENTOS PARA INGRESO DE	R.B. DE COLOMBIA S.A.	21/01/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO

	PERSONAL OPERATIVO				
RB-SDIS-G2-No. 071-2024	ENTREGA DIAGNOSTICOS	R.B. DE COLOMBIA S.A.	21/01/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 073-2024	DOCUMENTOS PARA INGRESO DE PERSONAL OPERATIVO	R.B. DE COLOMBIA S.A.	22/01/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 074-2024	RELACION DE PERSONAL QUE INGRESA A OBRA DE LA EMPRESA RB DE COLOMBIA	R.B. DE COLOMBIA S.A.	22/01/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 075-2024	ENTREGA DIGNOSTICOS OBRAS	R.B. DE COLOMBIA S.A.	23/01/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 079-2024	DOCUEMNTOS INGRESO PERSONAL DE OBRA	R.B. DE COLOMBIA S.A.	23/01/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 083-2024	INGRESO DE PERSONAL A OBRA	R.B. DE COLOMBIA S.A.	27/01/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 085-2024	DOCUMENTOS PERSONAL DE OBRA	R.B. DE COLOMBIA S.A.	28/01/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 086-2024	Informe Mensual N° 1 Componente SST	R.B. DE COLOMBIA S.A.	28/01/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 087-2024	Envío Hojas de Vida	R.B. DE COLOMBIA S.A.	28/01/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 088-2024	Atención a su comunicado 056- C.E. - INTERV-SDIS-9255	R.B. DE COLOMBIA S.A.	28/01/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 089-2024	INGRESO DE PERSONAL A OBRA	R.B. DE COLOMBIA S.A.	28/01/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO

	BAKATA Y SAMPER MENDOZA				
RB-SDIS-G2-No. 091-2024	DIAGNOSTICOS Y PRESUPUESTOS CADIS Y CRECER	R.B. DE COLOMBIA S.A.	28/01/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 094-2024	Informe mensual Ambiental 01	R.B. DE COLOMBIA S.A.	1/02/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 095-2024	Presupuestos 9 obras	R.B. DE COLOMBIA S.A.	2/02/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 096-2024	CRONOGRAMAS	R.B. DE COLOMBIA S.A.	2/02/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 097-2024	FLUJO DE CAJA	R.B. DE COLOMBIA S.A.	2/02/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
S2025015342	Cronogramas de obras, contrato de obra No 9173-2024 oficio RB-SDISG2-No. 096-2025	SDIS	3/02/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
S2025015102	Respuesta oficio No E2025002806 del 27 de enero de 2025, solicitud aclaración orden de servicio.	SDIS	3/02/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 099-2024	PRESUPUESTO Y DIAGNOSTICO OBRA CURNN	R.B. DE COLOMBIA S.A.	6/02/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 100-2024	SOLICITUD PRORROGA Y ADICIÓN EN VALOR DE CONTRATO	R.B. DE COLOMBIA S.A.	7/02/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO

RB-SDIS-G2-No. 101-2024	PRESUPUESTO Y DIAGNOSTICO OBRA ACTUALIZADOS CURNN	R.B. DE COLOMBIA S.A.	8/02/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 102-2024	SOLICITUD PRORROGA Y ADICIÓN EN VALOR DE CONTRATO	R.B. DE COLOMBIA S.A.	10/02/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 105-2024	INFORME ESTRUCTURAL OBRAS	R.B. DE COLOMBIA S.A.	11/02/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 106-2024	Informe mensual Ambiental 02	R.B. DE COLOMBIA S.A.	11/02/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 108-2024	Informe Mensual N° 2 Componente SST	R.B. DE COLOMBIA S.A.	13/02/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 109-2024	Corte numero 1 con cuadro resumen	R.B. DE COLOMBIA S.A.	13/02/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 110-2024	Cantidades de obra y recomendaciones eléctricas Samper Mendoza	R.B. DE COLOMBIA S.A.	13/02/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 111-2024	Diagnósticos especialista hidrosanitario	R.B. DE COLOMBIA S.A.	16/02/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 112-2024	Diagnósticos especialista eléctrico	R.B. DE COLOMBIA S.A.	16/02/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 114-2024	Respuesta a su comunicación 077-C.E.-INTERV-SDIS-9255, Observaciones del	R.B. DE COLOMBIA S.A.	19/02/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO

	Informe SST Mensual N°1				
RB-SDIS-G2-No. 120-2024	Respuesta a su comunicación 079-C.E.-INTERV-SDIS-9255, Observaciones del Informe SST Mensual N°2	R.B. DE COLOMBIA S.A.	21/02/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 121-2024	Atención mail de SDIS de febrero 19 de 2025 Obligaciones Ambientales Contrato de Obra	R.B. DE COLOMBIA S.A.	21/02/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 122-2024	INGRESO DE PERSONAL A OBRA.	R.B. DE COLOMBIA S.A.	23/02/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 123-2024	Remisión Pago Sena Fic Acta No. 1	R.B. DE COLOMBIA S.A.	25/02/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 125-2024	INFORME ACTIVIDADES NO CONTEMPLADAS EN OBRA CURRN	R.B. DE COLOMBIA S.A.	27/02/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 126-2024	INGRESO DE PERSONAL A OBRA CURNN	R.B. DE COLOMBIA S.A.	28/02/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 127-2024	Pólizas de Prorroga y Adición Contrato	R.B. DE COLOMBIA S.A.	3/03/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 128-2024	Material Frente de Trabajo Samper Mendoza	R.B. DE COLOMBIA S.A.	5/03/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO

RB-SDIS-G2-No. 132-2024	CUADRO DE LLUVIAS OBRA WAWITA	R.B. DE COLOMBIA S.A.	6/03/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 133-2024	COMPONENTE AMBIENTAL	R.B. DE COLOMBIA S.A.	6/03/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 134-2024	Pólizas de Prorroga y Adición Contrato	R.B. DE COLOMBIA S.A.	7/03/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 135-2024					
RB-SDIS-G2-No. 136-2024					
RB-SDIS-G2-No. 137-2024	SOLICITUD DE CERRAMIENTO CURNN	R.B. DE COLOMBIA S.A.	11/03/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 138-2024					
RB-SDIS-G2-No. 139-2024					
RB-SDIS-G2-No. 140-2024	ENVIO ACTA 2 EN DIGITAL	R.B. DE COLOMBIA S.A.	11/03/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 141-2024					
RB-SDIS-G2-No. 142-2024	INFORME AMBIENTAL 03	R.B. DE COLOMBIA S.A.	13/03/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 143-2024	INFORME MENSUAL NO. 3 COMPONENTE SST	R.B. DE COLOMBIA S.A.	13/03/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 144-2024	Plan de calidad	R.B. DE COLOMBIA S.A.	14/03/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 145-2024	DEFINICION OBRAS CURNN	R.B. DE COLOMBIA S.A.	16/03/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 146-2024	OBRAS CADIS Y CRECER	R.B. DE COLOMBIA S.A.	18/03/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 147-2024	CANTIDADES NO CANCELADAS EN EL ACTA 2	R.B. DE COLOMBIA S.A.	20/03/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO

RB-SDIS-G2-No. 148-2024	ENVIO HOJA DE VIDA	R.B. DE COLOMBIA S.A.	21/03/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 149-2024	CANALES SEGUNDO PISO SAMPER MENDOZA	R.B. DE COLOMBIA S.A.	24/03/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 150-2024					
RB-SDIS-G2-No. 151-2024	COMPONENTE SST INFORMES MENSUALES	R.B. DE COLOMBIA S.A.	20/03/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 152-2024	INGRESO DE PERSONAL DE OBRA	R.B. DE COLOMBIA S.A.	26/03/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 153-2024	DOCUMETOS COORDINADOR DE ALTURAS	R.B. DE COLOMBIA S.A.	26/03/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 154-2024					
RB-SDIS-G2-No. 155-2024					
RB-SDIS-G2-No. 156-2024	SOLICITUD DE SUSPENSION DE OBRA	R.B. DE COLOMBIA S.A.	30/03/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 157-2024	DOCUMENTOS LIDER SST	R.B. DE COLOMBIA S.A.	30/03/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 158-2024					
RB-SDIS-G2-No. 159-2024	MESA DE TRABAJO AJUSTE MEMORIAS	R.B. DE COLOMBIA S.A.	31/03/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 160-2024	FILTRACIONES AGUA OBRA NUEVOS PASOS	R.B. DE COLOMBIA S.A.	31/03/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 161-2024	SEGUNDA SOLICITUF DE SUSPENSION DE OBRA	R.B. DE COLOMBIA S.A.	1/04/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 162-2024					

RB-SDIS-G2-No. 163-2024					
RB-SDIS-G2-No. 164-2024					
RB-SDIS-G2-No. 165-2024					
RB-SDIS-G2-No. 166-2024	ENTREGA DE DOCUMENTOS DIGITAL	R.B. DE COLOMBIA S.A.	7/04/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 167-2024	INFORME 1 INTEGRACION SOCIAL	R.B. DE COLOMBIA S.A.	7/04/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 168-2024	INFORME 1 SST	R.B. DE COLOMBIA S.A.	7/04/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 169-2024	ACTA 2	R.B. DE COLOMBIA S.A.	8/04/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 170-2024	INFORME MENSUAL	R.B. DE COLOMBIA S.A.	8/04/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 171-2024	INFORME SST 2	R.B. DE COLOMBIA S.A.	8/04/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 172-2024	DIAGNOSTICO OBRA COMISARIA TEUSAQILLO	R.B. DE COLOMBIA S.A.	9/04/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 173-2024	ACTA NUMERO 2	R.B. DE COLOMBIA S.A.	10/04/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 174-2024	ATENCION A SU COMUNICADO 098 -C.E-INTERV-SDIS-9255 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2025	R.B. DE COLOMBIA S.A.	10/04/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 175-2024	RELACION DE PERSONAL DE TRABAJOS FINES DE SEMANA	R.B. DE COLOMBIA S.A.	10/04/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 176-2024	IMPUESTOD DE TIMBRE	R.B. DE COLOMBIA S.A.	11/04/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 177-2024	SU OFICIO 100-C.E-INTERVE-SDIS-9255 INFORME	R.B. DE COLOMBIA S.A.	11/04/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO

	AMBIENTAL NO. 3				
RB-SDIS-G2-No. 178-2024	DIAGNOSTICO Y CRONOGRAMA TEUSAQUILLO	R.B. DE COLOMBIA S.A.	11/04/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 179-2024					
RB-SDIS-G2-No. 180-2024	ACTA 2 CON MEMORIAS CORREGIDAS SAMPER MENDOZA	R.B. DE COLOMBIA S.A.	11/04/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 181-2024	ATENCION A SU COMUNICADO 101 -C.E-INTERV-SDIS-9255 DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2025	R.B. DE COLOMBIA S.A.	12/04/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO
RB-SDIS-G2-No. 182-2024	ACTAS 9 DE OBRAS Y ACTA GENERAL	R.B. DE COLOMBIA S.A.	12/04/2025	e-mail	Consorcio Interventores AO

ENVIADA

No. OFICIO	ASUNTO	FECHA ENVIO	MEDIO ENVIO	DIRIGIDO A
001-C.E.-INTERV-SDIS-9255	REVISIÓN H.V. DIRECTOR OBRA	1/12/2024	e-mail	R.B. DE COLOMBIA S.A.
002-C.E.-INTERV-SDIS-9255	SOLICITUD DOCUMENTOS PREVIOS INICIO	1/12/2024	e-mail	R.B. DE COLOMBIA S.A.
003-C.E.-INTERV-SDIS-9255	REMISIÓN H.V. DIRECTOR DE OBRA	2/12/2024	e-mail	SDIS
004-C.E.-INTERV-SDIS-9255	REMISIÓN ACTAS DE VISITA INICIALES PARTE 1	3/12/2024	e-mail	R.B. DE COLOMBIA S.A.
005-C.E.-INTERV-SDIS-9255	REMISIÓN ACTAS DE VISITA INICIALES PARTE 2	4/12/2024	e-mail	R.B. DE COLOMBIA S.A.
006-C.E.-INTERV-SDIS-9255	REVISIÓN H.V. PERSONAL OBRA	11/12/2024	e-mail	R.B. DE COLOMBIA S.A.
007-C.E.-INTERV-SDIS-9255	REMISIÓN ACTAS DE VISITA INICIALES PARTE 3	12/12/2024	e-mail	R.B. DE COLOMBIA S.A.
008-C.E.-INTERV-SDIS-9256	H.V. EQUIPO MÍNIMO INTERVENTORÍA	15/12/2024	e-mail	SDIS
009-C.E.-INTERV-SDIS-9257	PRESUPUESTO DETALLADO Y F.M. INTERVENTORÍA	15/12/2024	e-mail	SDIS
010-C.E.-INTERV-SDIS-9258	SOLICITUD PERMISO INGRESO INTERVENTORÍA	15/12/2024	e-mail	SDIS
011-C.E.-INTERV-SDIS-9259	SEGUNDA SOLICITUD DOCUMENTOS PREVIOS INICIO	16/12/2024	e-mail	R.B. DE COLOMBIA S.A.
012-C.E.-INTERV-SDIS-9260	APROBACIÓN H.V. RESIDENTE CARLOS NAVAS	16/12/2024	e-mail	R.B. DE COLOMBIA S.A.
013-C.E.-INTERV-SDIS-9261	APROBACIÓN H.V. PROF AMBIENTAL RUBEN DARIO GIRON	17/12/2024	e-mail	R.B. DE COLOMBIA S.A.
014-C.E.-INTERV-SDIS-9262	APROBACIÓN H.V. DIR OBRA CARLOS ALBERTO PINZON	17/12/2024	e-mail	R.B. DE COLOMBIA S.A.
015-C.E.-INTERV-SDIS-9263	APROBACIÓN Y SOLICITUD DE PRÓRROGA No. 1 CTO OBRA 9173-2024			
016-C.E.-INTERV-SDIS-9264	APROBACIÓN Y SOLICITUD PRÓRROGA No. 1 INTERV			
017-C.E.-INTERV-SDIS-9265	SOLICITUD INGRESO PERSONAL DIAGNÓSTICOS	19/12/2024	e-mail	SDIS
018-C.E.-INTERV-SDIS-9265	APROBACIÓN H.V. PROF PROGRAMACIÓN YURI TATIANA PERDOMO	20/12/2024	e-mail	R.B. DE COLOMBIA S.A.
019-C.E.-INTERV-SDIS-9265	REVISIÓN PROFESIONALES OBRA ESTRUCTURAL. REDES SECAS Y SST	26/12/2024	e-mail	R.B. DE COLOMBIA S.A.
020-C.E.-INTERV-SDIS-9265	APROBACIÓN H.V. PROF REDES HÚMEDAS MARÍA EUGENIA BEJARANO BARRERA	26/12/2024	e-mail	R.B. DE COLOMBIA S.A.

021-C.E.-INTERV-SDIS-9265	CONSTANCIA REVISIÓN PÓLIZAS CTO OBRA 9173-2024	26/12/2024	e-mail	SDIS
022-C.E.-INTERV-SDIS-9265	REVISIÓN PROFESIONALES OBRA ESTRUCTURAL, RESIDENTE 2 Y AUXILIAR SST	27/12/2024	e-mail	R.B. DE COLOMBIA S.A.
023-C.E.-INTERV-SDIS-9265	APROBACIÓN H.V. INSPECTOR DE OBRA No. 1 y No. 2	27/12/2024	e-mail	R.B. DE COLOMBIA S.A.
024-C.E.-INTERV-SDIS-9265	REVISIÓN H.V. AUXILIAR SST 1, AUXILIAR SST 2, PROF REDES SECAS, INSPECTOR OBRA 3	29/12/2024	e-mail	R.B. DE COLOMBIA S.A.
025-C.E.-INTERV-SDIS-9265	REVISIÓN No. 1 PRESUPUESTO CENTRO DÍA MI REFUGIO	30/12/2024	e-mail	R.B. DE COLOMBIA S.A.
026-C.E.-INTERV-SDIS-9265	REVISIÓN No. 1 PRESUPUESTO J.I. SAMPER MENDOZA	30/12/2024	e-mail	R.B. DE COLOMBIA S.A.
027-C.E.-INTERV-SDIS-9265	REVISIÓN H.V. PROF SST, INSPECTOR DE OBRA No. 3 y No. 4	1/01/2025	e-mail	R.B. DE COLOMBIA S.A.
028-C.E.-INTERV-SDIS-9265	REVISIÓN No. 1 PRESUPUESTO ATA	1/01/2025	e-mail	R.B. DE COLOMBIA S.A.
029-C.E.-INTERV-SDIS-9265	REVISIÓN No. 1 PRESUPUESTO KAWITA	1/01/2025	e-mail	R.B. DE COLOMBIA S.A.
030-C.E.-INTERV-SDIS-9265	REVISIÓN No. 1 PRESUPUESTO BAKATA	1/01/2025	e-mail	R.B. DE COLOMBIA S.A.
031-C.E.-INTERV-SDIS-9265	CONSTANCIA REVISIÓN PÓLIZAS CTO OBRA 9173-2024	2/01/2025	Físico	SDIS
032-C.E.-INTERV-SDIS-9265	APROBACIÓN H.V. PROF SST PEDRO CABARCA	8/01/2025	e-mail	R.B. DE COLOMBIA S.A.
033-C.E.-INTERV-SDIS-9265	REVISIÓN No. 2 PRESUPUESTO J.I. SAMPER MENDOZA	5/01/2025	e-mail	R.B. DE COLOMBIA S.A.
034-C.E.-INTERV-SDIS-9265	REVISIÓN No. 1 PRESUPUESTO CENTRO DÍA MI REFUGIO	5/01/2025	e-mail	R.B. DE COLOMBIA S.A.
035-C.E.-INTERV-SDIS-9265	REVISIÓN No. 2 PRESUPUESTO ATA	5/01/2025	e-mail	R.B. DE COLOMBIA S.A.
036-C.E.-INTERV-SDIS-9265	REVISIÓN No. 2 PRESUPUESTO KAWITA	5/01/2025	e-mail	R.B. DE COLOMBIA S.A.
037-C.E.-INTERV-SDIS-9265	REVISIÓN No. 2 PRESUPUESTO BAKATA	5/01/2025	e-mail	R.B. DE COLOMBIA S.A.
038-C.E.-INTERV-SDIS-9265	SOLICITUD ENTREGA DIAGNÓSTICOS	5/01/2025	e-mail	R.B. DE COLOMBIA S.A.
039-C.E.-INTERV-SDIS-9265	H.V. EQUIPO MÍNIMO INTERVENTORÍA MEDIO FÍSICO	7/01/2025	Físico	SDIS
040-C.E.-INTERV-SDIS-9265	REVISIÓN No. 1 DIAGNÓSTICO J.I. NUEVOS PASOS	8/01/2025	e-mail	R.B. DE COLOMBIA S.A.

041-C.E.-INTERV-SDIS-9265	REVISIÓN No. 1 DIAGNÓSTICO J.I. EL TRIUNFO	8/01/2025	e-mail	R.B. DE COLOMBIA S.A.
042-C.E.-INTERV-SDIS-9265	REVISIÓN No. 1 DIAGNÓSTICO CENTRO CRECER	8/01/2025	e-mail	R.B. DE COLOMBIA S.A.
043-C.E.-INTERV-SDIS-9265	REVISIÓN No. 1 DIAGNÓSTICO CADIS	8/01/2025	e-mail	R.B. DE COLOMBIA S.A.
044-C.E.-INTERV-SDIS-9265	REVISIÓN No. 1 DIAGNÓSTICO SAMPER MENDOZA	9/01/2025	e-mail	R.B. DE COLOMBIA S.A.
045-C.E.-INTERV-SDIS-9265	REVISIÓN No. 1 DIAGNÓSTICO MI REFUGIO	9/01/2025	e-mail	R.B. DE COLOMBIA S.A.
046-C.E.-INTERV-SDIS-9265	REVISIÓN No. 1 DIAGNÓSTICO J.I. ATA	9/01/2025	e-mail	R.B. DE COLOMBIA S.A.
047-C.E.-INTERV-SDIS-9265	REVISIÓN No. 1 DIAGNÓSTICO J.I. KAWITA	9/01/2025	e-mail	R.B. DE COLOMBIA S.A.
048-C.E.-INTERV-SDIS-9265	REVISIÓN No. 1 DIAGNÓSTICO BAKATA	9/01/2025	e-mail	R.B. DE COLOMBIA S.A.
049-C.E.-INTERV-SDIS-9265	REVISIÓN H.V. INSPECTOR DE OBRA No. 3	12/01/2025	e-mail	R.B. DE COLOMBIA S.A.
050-C.E.-INTERV-SDIS-9265	APROBACIÓN H.V. INSPECTOR DE OBRA No. 3	12/01/2025	e-mail	R.B. DE COLOMBIA S.A.
051-C.E.-INTERV-SDIS-9265	SOLICITUD INGRESO PERSONAL MEDICIÓN CENTRO CRECER Y CADIS	15/01/2025	e-mail	R.B. DE COLOMBIA S.A.
052-C.E.-INTERV-SDIS-9265	H.V. EQUIPO MÍNIMO OBRA MEDIO FÍSICO		Físico	SDIS
053-C.E.-INTERV-SDIS-9265	RESPUESTA ORDENES DE SERVICIO	16/01/2024	e-mail	R.B. DE COLOMBIA S.A.
054-C.E.-INTERV-SDIS-9265	APROBACIÓN NUEVA H.V. INSPECTOR SST No. 3	16/01/2025	e-mail	R.B. DE COLOMBIA S.A.
055-C.E.-INTERV-SDIS-9265	Confirmación Dotación Contratista	17/01/2025	e-mail	R.B. DE COLOMBIA S.A.
056-C.E.-INTERV-SDIS-9265	REVISIÓN VERSIÓN 1 PLAN SST	20/01/2025	e-mail	R.B. DE COLOMBIA S.A.
057-C.E.-INTERV-SDIS-9265	REVISIÓN VERSIÓN 1 PLAN MANEJO AMBIENTAL	20/01/2025	e-mail	R.B. DE COLOMBIA S.A.
058-C.E.-INTERV-SDIS-9265	APROBACIÓN NUEVA H.V. INSPECTOR OBRA No. 1	21/01/2025	e-mail	R.B. DE COLOMBIA S.A.
059-C.E.-INTERV-SDIS-9265	REVISIÓN VERSIÓN 1 PLAN DE CALIDAD	22/01/2025	e-mail	R.B. DE COLOMBIA S.A.
060-C.E.-INTERV-SDIS-9265	REVISIÓN DIAGNÓSTICOS SAMPER MENDOZA, WAWITA Y BAKATA	22/01/2025	e-mail	R.B. DE COLOMBIA S.A.
061-C.E.-INTERV-SDIS-9265	REVISIÓN DIAGNÓSTICOS BAKATA, SAMPER MENDOZA, EL TRIUNFO, NUEVOS PASOS, EL REFUGIO, WAWITA Y ATA	22/01/2025	e-mail	R.B. DE COLOMBIA S.A.
062-C.E.-INTERV-SDIS-9265	INFORMES SEMANALES INTERVENTORIA 1 AL 7	27/01/2025	Físico	SDIS
063-C.E.-INTERV-SDIS-9265	MEDIO FÍSICO DIAGNÓSTICOS SAMPER MENDOZA, WAWITA,	27/01/2025	Físico	SDIS

	BAKATA, NUEVOS PASO, MI REFUGIO, ATA			
064-C.E.-INTERV-SDIS-9265	INFORME PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA No. 9173-2024	27/01/2025	Físico	SDIS
065-C.E.-INTERV-SDIS-9265	SOLICITUD ACLARACIÓN ORDEN DE SERVICIO	27/01/2025	Físico	SDIS
066-C.E.-INTERV-SDIS-9265	REVISION H.V. RESIDENTE OBRA DARLY BUSTOS	31/01/2025	e-mail	R.B. DE COLOMBIA S.A.
067-C.E.-INTERV-SDIS-9265	APROBACIÓN DIAGNÓSTICOS CRECER Y CADIS	31/01/2025	e-mail	R.B. DE COLOMBIA S.A.
068-C.E.-INTERV-SDIS-9265	REVISIÓN PRESUPUESTOS OFICIO RB-SDIS-G2-No. 095-2024	3/02/2025	e-mail	R.B. DE COLOMBIA S.A.
069-C.E.-INTERV-SDIS-9265	REVISIÓN PROPUESTA ELÉCTRICA SAMPER MENDOZA	5/02/2025	e-mail	R.B. DE COLOMBIA S.A.
070-C.E.-INTERV-SDIS-9265	INFORME SEMANAL INTERVENTORIA 8	6/02/2025	e-mail	SDIS
071-C.E.-INTERV-SDIS-9265	REVISIÓN PROPUESTA ELÉCTRICA MI TRIUNFO	6/02/2025	e-mail	R.B. DE COLOMBIA S.A.
072-C.E.-INTERV-SDIS-9265	RESPUESTA RAD S2025015342 CRONOGRAMAS DE OBRA	6/02/2025	e-mail	SDIS
073-C.E.-INTERV-SDIS-9265	APROBACIÓN Y SOLICITUD DE PRÓRROGA No. 2 ADICIÓN 1 CTO OBRA 9173-2024			
074-C.E.-INTERV-SDIS-9265	SOLICITUD PRÓRROGA No. 2 Y ADICIÓN 1 INTERVENTORIA			
075-C.E.-INTERV-SDIS-9265	INFORME SEMANAL INTERVENTORIA 9	13/02/2025	e-mail	SDIS
076-C.E.-INTERV-SDIS-9265	APROBACIÓN DIAGNÓSTICO CURNN	16/02/2025	e-mail	
077-C.E.-INTERV-SDIS-9265	OBSERVACIONES INFORME OBRA SST 2	17/02/2025	e-mail	
078-C.E.-INTERV-SDIS-9265	INFORME SEMANAL INTERVENTORIA 10	17/02/2025	e-mail	SDIS
079-C.E.-INTERV-SDIS-9265	REVISIÓN CANAL AGUAS LLUVIAS	17/02/2025	e-mail	R.B. DE COLOMBIA S.A.
080-C.E.-INTERV-SDIS-9265	INFORME MENSUAL NO. 1 AMBIENTAL INTERVENTORÍA	28/02/2025	e-mail	SDIS
081-C.E.-INTERV-SDIS-9265	INFORME MENSUAL NO. 1 AMBIENTAL OBRA	28/02/2025	e-mail	SDIS
082-C.E.-INTERV-SDIS-9265	SOLICITUD AJUSTE DE POLIZAS CONTRATO 9173-2024	1/03/2025	e-mail	R.B. DE COLOMBIA S.A.
083-C.E.-INTERV-SDIS-9265	INFORME MENSUAL NO. 2 AMBIENTAL OBRA	5/03/2025	e-mail	R.B. DE COLOMBIA S.A.

084-C.E.-INTERV-SDIS-9265	INFORME MENSUAL NO. 2 AMBIENTAL INTERVENTORIA	5/03/2025	e-mail	R.B. DE COLOMBIA S.A.
085-C.E.-INTERV-SDIS-9265	OBSERVACIONES INFORME MES 1 Y 2 AMBIENTAL CONTRATO 9173-2024	6/03/2025	e-mail	R.B. DE COLOMBIA S.A.
086-C.E.-INTERV-SDIS-9265	ACTA PARCIAL No. 1 CTO OBRA 9173-2024	10/03/2025	e-mail	SDIS
087-C.E.-INTERV-SDIS-9266	INFORMES SEMANALES INTERVENTORIA 11 Y 12	10/03/2025	e-mail	SDIS
088-C.E.-INTERV-SDIS-9267	RESPUESTA INFORME ACTIVIDADES NO CONTEMPLADAS CURRN	10/03/2025	e-mail	R.B. DE COLOMBIA S.A.
089-C.E.-INTERV-SDIS-9268	RESPUESTA MATERIAL CUBIERTA FRENTE SAMPER MENDOZA	10/03/2025	e-mail	R.B. DE COLOMBIA S.A.
090-C.E.-INTERV-SDIS-9269	ESTABILIDAD CANAL DE AGUA LLUVIAS SAMPER MENDOZA	26/03/2025	e-mail	SDIS
091-C.E.-INTERV-SDIS-9270	NEGACION SOLICITUD DE SUSPENSION DE OBRA	31/03/2025	e-mail	R.B. DE COLOMBIA S.A.
092-C.E.-INTERV-SDIS-9271	INFORMES SEMANLES NO. 12.13 Y 14	6/04/2025	e-mail	SDIS
093-C.E.-INTERV-SDIS-9272	INFORMES SEMANALES NO. 16 Y17	7/04/2025	e-mail	SDIS
094-C.E.-INTERV-SDIS-9273	SOLICIRUD ACCESO AL INFORME DE INTEGRACION SOCIAL	8/04/2025	e-mail	R.B. DE COLOMBIA S.A.
095-C.E.-INTERV-SDIS-9274	NEGACION A LA SEGUNDA SOLICITUD DE SUSPENSION DE OBRA	8/02/2025	e-mail	R.B. DE COLOMBIA S.A.
096-C.E.-INTERV-SDIS-9275	SOLICITUD PLAN DE CONTIGENCIA	8/04/2025	e-mail	R.B. DE COLOMBIA S.A.
097-C.E.-INTERV-SDIS-9276	APROBACION INFORME MES NO.1 SST	8/04/2025	e-mail	R.B. DE COLOMBIA S.A.
098-C.E.-INTERV-SDIS-9277	OBSERVACIONES INFORME MES NO. 1	10/04/2025	e-mail	R.B. DE COLOMBIA S.A.
099-C.E.-INTERV-SDIS-9278	OBSERVACIONES INFORME MENSUAL NO. 2 SST	10/04/2025	e-mail	R.B. DE COLOMBIA S.A.
100-C.E.-INTERV-SDIS-9279	REQUERIMIENTOS PARA INFORME NO. 3	11/04/2025	e-mail	R.B. DE COLOMBIA S.A.
101-C.E.-INTERV-SDIS-9280	OBSERVACIONES AL INFORME TECNICO MES 1 V 2	11/04/2025	e-mail	R.B. DE COLOMBIA S.A.
102-C.E.-INTERV-SDIS-9281	APROBACION INFORME MES NO. 1 TECNICO	12/04/2025	e-mail	R.B. DE COLOMBIA S.A.

Anexo No. 2 digital componente SST Listados y listado sociodemográfico de interventoría

CONSORCIO INTERVENTORES AO

LISTADO DE PERSONAL ACTUAL EN CONSORCIO INTERVENTORES AO 2025

#	NOMBRES	APELLIDOS	CEDULA	EDAD	CARGO	DIREC	CONT	INDEP	EMPRESA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	NUMERO TELEFONICO	EPS	ARL	C.C	F.P	ESTADO CIVIL	GENERO	NIVEL DE ESTUDIO	FUMA	CONSUME BEBIDAS ALCOHOLICAS	VIVIENDA PROPIA O ARRENDADA	PERSONAS A CARGO	EN CASO DE ACCIDENTE A QUIEN LLAMAR	NOMBRE	NUMERO TELEFONICO A LA PERSONA A
1	JHON ALEXANDER	ALBARRACIN MAYORGA	1.019.043.623	35	ING. RESIDENTE INTERVENTORIA	X			CONSORCIO INTERVENTORES AO	22/01/2025		3105815011	COMPENSAR	COLMENA DE SEGUROS	COLSUBSIDIO	PROTECCION		M	PREGRADO	SI	SI	PROPIA	2	MAMA		
2	JEISSONH STALLING	CADENA OME	12.195.827	50	INSPECTOR INTERVENTORIA	X			CONSORCIO INTERVENTORES AO	28/01/2025	1/03/2025	3223657132	SANITAS	COLMENA DE SEGUROS	COLSUBSIDIO	PORVENIR	CASADO	M	UNIVERSITARIO	NO	SI	ARRENDADA	4	ESPOSA	LEIDY JOHANA OSPINA CAVIEDEZ	3137087848
3	PAULA ANDREA	GARZON TORO	1.013.621.964	34	INSPECTOR INTERVENTORIA	X			CONSORCIO INTERVENTORES AO	28/01/2025		3134576582	FAMISANAR	COLMENA DE SEGUROS	COLSUBSIDIO	PORVENIR	SOLTERA	F	TECNOLOGO	SI	SI	ARRENDADA	0	MAMA	MONICA ANDREA TORO RADA	3143513759
4	JOSE ALEXANDER	PERDOMO LEON	79.745.639	48	INSPECTOR INTERVENTORIA	X			CONSORCIO INTERVENTORES AO	22/01/2025	25/02/2025	312 3800298	SALUD TOTAL	COLMENA DE SEGUROS	COLSUBSIDIO	PROTECCION		M	TECNOLOGO							
5	JUAN CARLOS	ROJAS	1.023.873.559	51	INSPECTOR INTERVENTORIA				CONSORCIO INTERVENTORES AO	27/01/2025	7/02/2025	3104657072	SALUD TOTAL	COLMENA DE SEGUROS	COLSUBSIDIO	COLPENSIONES	SOLTERA	M	PREGRADO	NO	NO	ARRENDADA				
6	RAUL DARIO	CARVAJAL CORTES	1.032.365.948	38	INSPECTOR INTERVENTORIA	X			CONSORCIO INTERVENTORES AO	20/01/2025	12/03/2025	3214248166	FAMISANAR	COLMENA DE SEGUROS	COLSUBSIDIO	PORVENIR		M	TECNOLOGO							
7	VIVIANA CAROLINA	MEDINA ROJAS	1.019.080.933	32	RESIDENTE SST INTERVENTORIA	X			CONSORCIO INTERVENTORES AO	22/01/2025	10/03/2025	3166990498	SALUD TOTAL	COLMENA DE SEGUROS	COLSUBSIDIO	PROTECCION	U-L	F	PREGRADO	NO	SI	ARRENDADA	2			
8	JAMIR	GONZALEZ TIQUE	83.117.200	43	AUXILIAR SST INTERVENTORIA	X			CONSORCIO INTERVENTORES AO	31/01/2025	1/03/2025	3112392850	NUEVA EPS	COLMENA DE SEGUROS	COLSUBSIDIO	COLFONDOS	U-L	M	POSGRADO	SI	SI	ARRENDADA	3	ESPOSA	NAUDY DAYANA RICO	3127525649
9	KATYA ISABEL	JULIO SILGDO	1.047.459.135	32	AUXILIAR SST INTERVENTORIA	X			CONSORCIO INTERVENTORES AO	28/01/2025	25/02/2025	3114067047	SANITAS	COLMENA DE SEGUROS	COLSUBSIDIO	PORVENIR		F	TECNOLOGO							
10	LINA YANEY	CHIVATA	33.677.433	43	AUXILIAR SST INTERVENTORIA	X			CONSORCIO INTERVENTORES AO	31/01/2025	8/02/2025	310 8632061	COMPENSAR	COLMENA DE SEGUROS	COLSUBSIDIO	COLFONDOS		F	TECNOLOGO							
11	CINTHIA LILIANA	RESTREPO	21.022.066		AUXILIAR SST INTERVENTORIA	X			CONSORCIO INTERVENTORES AO	6/02/2025	25/02/2025	3187648527	SANITAS	COLMENA DE SEGUROS	COLSUBSIDIO	PROTECCION	SOLTERA	F	PREGRADO	SI	NO	ARRENDADA	4	HIJA	CAROL LILIANA MONTOÑA	3113315943
12	MAYERLY ESTANLY	MORILLO LOPEZ	1.042.471.937	24	AUXILIAR SST INTERVENTORIA	X			CONSORCIO INTERVENTORES AO	6/02/2025	25/02/2025	3006321965	SALUD TOTAL	COLMENA DE SEGUROS	COLSUBSIDIO	PORVENIR	SOLTERA	F	TECNICO	NO	NO	ARRENDADA	0			
12	LUIS ALBERTO	FORERO RAMOS	79.974.079		DIRECTOR INTERVENTORIA	X			CONSORCIO INTERVENTORES AO																	
13																										
14																										
15																										
16																										

CONSORCIO INTERVENTORES AO

LISTADO DE PERSONAL ACTUAL EN CONSORCIO INTERVENTORES AO 2025

#	NOMBRES	APELLIDOS	CEDULA	EDAD	CARGO	DIREC	CONT	INDEP	EMPRESA	FECHA DE INGRESO
1	JHON ALEXANDER	ALBARRACIN MAYORGA	1.019.043.623	35	ING. RESIDENTE INTERVENTORIA	X			CONSORCIO INTERVENTORES AO	22/01/2025
2	JEISSONH STALLING	CADENA OME	12.195.827	50	INSPECTOR INTERVENTORIA	X			CONSORCIO INTERVENTORES AO	28/01/2025
3	PAULA ANDREA	GARZON TORO	1.013.621.964	34	INSPECTOR INTERVENTORIA	X			CONSORCIO INTERVENTORES AO	28/01/2025
4	JOSE ALEXANDER	PERDOMO LEON	79.745.639	48	INSPECTOR INTERVENTORIA	X			CONSORCIO INTERVENTORES AO	22/01/2025
5	JUAN CARLOS	ROJAS	1.023.873.559	51	INSPECTOR INTERVENTORIA				CONSORCIO INTERVENTORES AO	27/01/2025
6	RAUL DARIO	CARVAJAL CORTES	1.032.365.948	38	INSPECTOR INTERVENTORIA	X			CONSORCIO INTERVENTORES AO	20/01/2025
7	VIVIANA CAROLINA	MEDINA ROJAS	1.019.080.933	32	RESIDENTE SST INTERVENTORIA	X			CONSORCIO INTERVENTORES AO	22/01/2025
8	JAMIR	GONZALEZ TIQUE	83.117.200	43	AUXILIAR SST INTERVENTORIA	X			CONSORCIO INTERVENTORES AO	31/01/2025
9	KATYA ISABEL	JULIO SILGDO	1.047.459.135	32	AUXILIAR SST INTERVENTORIA	X			CONSORCIO INTERVENTORES AO	28/01/2025
10	LINA YANEY	CHIVATA	33.677.433	43	AUXILIAR SST INTERVENTORIA	X			CONSORCIO INTERVENTORES AO	31/01/2025
11	CINTHIA LILIANA	RESTREPO	21.022.066		AUXILIAR SST INTERVENTORIA	X			CONSORCIO INTERVENTORES AO	6/02/2025
12	MAYERLY ESTANLY	MORILLO LOPEZ	1.042.471.937	24	AUXILIAR SST INTERVENTORIA	X			CONSORCIO INTERVENTORES AO	6/02/2025
13	LUIS ALBERTO	FORERO RAMOS	79.974.079		DIRECTOR DE OBRA	X			CONSORCIO INTERVENTORES AO	

Anexo No.3 digital componente SST Planillas de seguridad social o afiliaciones CONSORCIO INTERVENTORES AO.

Anexo No. 4 digital componente SST Planillas de seguridad social o afiliaciones

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901889907	9	CONSORCIO INTERVENTORES AO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO INTERVENTORES AO	CR 10 NO. 18-44 P 11	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3105857598	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1367501522	9483604599	E	2025/02/04	2025/03/28	BANCO AV VILLAS	52	$1,749,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CONSORCIO INTERVENTORES AO (10 Afiliados)						$4,128,150	$1,074,000			$4,128,150	$165,300			$4,128,150	$165,300			$4,128,150	$288,100		$0	$0
Centro de Trabajo: CONSORCIO INTERVENTORES AO (10 Afiliados)						$4,128,150	$1,074,000			$4,128,150	$165,300			$4,128,150	$165,300			$4,128,150	$288,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (10 Afiliados)						$4,128,150	$1,074,000			$4,128,150	$165,300			$4,128,150	$165,300			$4,128,150	$288,100		$0	$0
1	CC	1019043623	ALBARRACIN JHON	230201	9	$427,050	$111,100	EPS008	9	$427,050	$17,100	CCF22	9	$427,050	$17,100	14-25	9	$427,050	$29,800	9	$0	$0
2	CC	12195827	CADENA JEISSONH	230301	3	$142,350	$37,100	EPS005	3	$142,350	$5,700	CCF22	3	$142,350	$5,700	14-25	3	$142,350	$10,000	3	$0	$0
3	CC	1032365948	CARVAJAL RAUL	230201	11	$521,950	$135,800	EPS017	11	$521,950	$20,900	CCF22	11	$521,950	$20,900	14-25	11	$521,950	$36,400	11	$0	$0
4	CC	33677433	CHIVATA LINA	231001	9	$427,050	$111,100	EPS008	9	$427,050	$17,100	CCF22	9	$427,050	$17,100	14-25	9	$427,050	$29,800	9	$0	$0
5	CC	1013621964	GARZON PAULA	230301	3	$142,350	$37,100	EPS017	3	$142,350	$5,700	CCF22	3	$142,350	$5,700	14-25	3	$142,350	$10,000	3	$0	$0
6	CC	83117200	GONZALEZ JAMIR	231001	1	$47,450	$12,400	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF22	1	$47,450	$1,900	14-25	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
7	CC	1047459135	JULIO KATYA	230301	29	$1,376,050	$357,800	EPS005	29	$1,376,050	$55,100	CCF22	29	$1,376,050	$55,100	14-25	29	$1,376,050	$95,800	29	$0	$0
8	CC	1019080933	MEDINA VIVIANA	230201	9	$427,050	$111,100	EPS002	9	$427,050	$17,100	CCF22	9	$427,050	$17,100	14-25	9	$427,050	$29,800	9	$0	$0
9	CC	79745639	PERDOMO JOSE	230201	9	$427,050	$111,100	EPS002	9	$427,050	$17,100	CCF22	9	$427,050	$17,100	14-25	9	$427,050	$29,800	9	$0	$0
10	CC	1023873559	RINCON JUAN	230201	4	$189,800	$49,400	EPS002	4	$189,800	$7,600	CCF22	4	$189,800	$7,600	14-25	4	$189,800	$13,300	4	$0	$0
Total			**Afiliados(10)**			$4,128,150	$1,074,000			$4,128,150	$165,300			$4,128,150	$165,300			$4,128,150	$288,100		$0	$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901889907	9	CONSORCIO INTERVENTORES AO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO INTERVENTORES AO	CR 10 NO. 18-44 P 11	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3105857598	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1367501522	9483604599	E	2025/02/04	2025/03/28	BANCO AV VILLAS	52	$1,749,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$1,074,000	$36,100	$0	$1,110,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$123,500	$4,200	$0	$127,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$432,000	$14,500	$0	$446,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$518,500	$17,400	$0	$535,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$288,100	$9,700	$0	$297,800
COLMENA	14-25	800,226,175	3	10	$288,100	$9,700	$0	$297,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$165,300	$5,600	$0	$170,900
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	10	$165,300	$5,600	$0	$170,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				10	$165,300	$5,700	$0	$171,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$34,200	$1,200	$0	$35,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$26,600	$900	$0	$27,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$1,900	$100	$0	$2,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$41,800	$1,400	$0	$43,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$60,800	$2,100	$0	$62,900
TOTAL				**10**	**$1,692,700**	**$57,100**	**$0**	**$1,749,800**

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901889907	9	CONSORCIO INTERVENTORES AO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO INTERVENTORES AO	CR 10 NO. 18-44 P 11	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3105857598	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1367520670	9483605578	E	2025/03/04	2025/03/28	BANCO AV VILLAS	24	$3,513,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CONSORCIO INTERVENTORES AO (10 Afiliados)						$8,446,100	$2,196,600			$8,446,100	$338,200			$8,446,100	$338,200			$8,446,100	$588,400		$0	$0
Centro de Trabajo: CONSORCIO INTERVENTORES AO (10 Afiliados)						$8,446,100	$2,196,600			$8,446,100	$338,200			$8,446,100	$338,200			$8,446,100	$588,400		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (10 Afiliados)						$8,446,100	$2,196,600			$8,446,100	$338,200			$8,446,100	$338,200			$8,446,100	$588,400		$0	$0
1	CC	1019043623	ALBARRACIN JHON	230201	30	$1,423,500	$370,200	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
2	CC	12195827	CADENA JEISSONH	230301	1	$47,450	$12,400	EPS005	1	$47,450	$1,900	CCF22	1	$47,450	$1,900	14-25	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
3	CC	1032365948	CARVAJAL RAUL	230201	12	$569,400	$148,100	EPS017	12	$569,400	$22,800	CCF22	12	$569,400	$22,800	14-25	12	$569,400	$39,700	12	$0	$0
4	CC	33677433	CHIVATA LINA	231001	8	$379,600	$98,700	EPS008	8	$379,600	$15,200	CCF22	8	$379,600	$15,200	14-25	8	$379,600	$26,500	8	$0	$0
5	CC	1013621964	GARZON PAULA	230301	30	$1,423,500	$370,200	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
6	CC	83117200	GONZALEZ JAMIR	231001	30	$1,423,500	$370,200	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
7	CC	1047459135	JULIO KATYA	230301	25	$1,186,250	$308,500	EPS005	25	$1,186,250	$47,500	CCF22	25	$1,186,250	$47,500	14-25	25	$1,186,250	$82,600	25	$0	$0
8	CC	1019080933	MEDINA VIVIANA	230201	10	$474,500	$123,400	EPS002	10	$474,500	$19,000	CCF22	10	$474,500	$19,000	14-25	10	$474,500	$33,100	10	$0	$0
9	CC	79745639	PERDOMO JOSE	230201	25	$1,186,250	$308,500	EPS002	25	$1,186,250	$47,500	CCF22	25	$1,186,250	$47,500	14-25	25	$1,186,250	$82,600	25	$0	$0
10	CC	1023873559	RINCON JUAN	230201	7	$332,150	$86,400	EPS002	7	$332,150	$13,300	CCF22	7	$332,150	$13,300	14-25	7	$332,150	$23,200	7	$0	$0
Total			**Afiliados(10)**			$8,446,100	$2,196,600			$8,446,100	$338,200			$8,446,100	$338,200			$8,446,100	$588,400		$0	$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901889907	9	CONSORCIO INTERVENTORES AO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO INTERVENTORES AO	CR 10 NO. 18-44 P 11	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3105857598	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1367520670	9483605578	E	2025/03/04	2025/03/28	BANCO AV VILLAS	24	$3,513,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$2,196,600	$33,100	$0	$2,229,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$468,900	$7,100	$0	$476,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$691,100	$10,400	$0	$701,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,036,600	$15,600	$0	$1,052,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$588,400	$8,900	$0	$597,300
COLMENA	14-25	800,226,175	3	10	$588,400	$8,900	$0	$597,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$338,200	$5,100	$0	$343,300
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	10	$338,200	$5,100	$0	$343,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				10	$338,200	$5,200	$0	$343,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$72,200	$1,100	$0	$73,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$79,800	$1,200	$0	$81,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$57,000	$900	$0	$57,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$79,800	$1,200	$0	$81,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$49,400	$800	$0	$50,200
TOTAL				**10**	**$3,461,400**	**$52,300**	**$0**	**$3,513,700**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901889907	9	CONSORCIO INTERVENTORES AO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO INTERVENTORES AO	CR 10 NO. 18-44 P 11	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3105857598	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1433233378	9485171819	E	2025/04/02	2025/04/25	BANCO AV VILLAS	23	$1,776,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Dias	Codigo	Días	Codigo	Días	Días	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	1019043623	ALBARRACIN MAYORGA JHON ALEXANDER																		230201	30	EPS008	30	CCF22	30	14-25	30	30	Si
2	CC	1013621964	GARZON TORO PAULA ANDREA																		230301	30	EPS017	30	CCF22	30	14-25	30	30	Si
3	CC	83117200	GONZALEZ TIQUE JAMIR																		231001	30	EPS037	30	CCF22	30	14-25	30	30	Si
Total	**Afiliados(3)**																												

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901889907	9	CONSORCIO INTERVENTORES AO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO INTERVENTORES AO	CR 10 NO. 18-44 P 11	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3105857598	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1433233378	9485171819	E	2025/04/02	2025/04/25	BANCO AV VILLAS	23	$1,776,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$1,110,600	$16,500	$0	$1,127,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$370,200	$5,500	$0	$375,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$370,200	$5,500	$0	$375,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$370,200	$5,500	$0	$375,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$297,300	$4,500	$0	$301,800
COLMENA	14-25	800,226,175	3	3	$297,300	$4,500	$0	$301,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$171,000	$2,600	$0	$173,600
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	3	$171,000	$2,600	$0	$173,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$171,000	$2,700	$0	$173,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$57,000	$900	$0	$57,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$57,000	$900	$0	$57,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$57,000	$900	$0	$57,900
TOTAL				**3**	**$1,749,900**	**$26,300**	**$0**	**$1,776,200**

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79974079		FORERO RAMOS LUIS ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLLE 31 N 13A - 51 TRRE 1 APT 2203	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4028468	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-03	1409681217	9484289739	I	2025/04/21	2025/04/14	BANCO AV VILLAS	0	$504,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	79974079	FORERO LUIS	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$0**	**$0**			**$1,423,500**	**$99,100**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$99,100	$0	$0	$99,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$99,100	$0	$0	$99,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				**1**	**$504,900**	**$0**	**$0**	**$504,900**

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901889907	9	CONSORCIO INTERVENTORES AO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO INTERVENTORES AO	CR 10 NO. 18-44 P 11	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3105857598	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1367520670	9483605578	E	2025/03/04	2025/03/28	BANCO AV VILLAS	24	$3,513,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CONSORCIO INTERVENTORES AO (10 Afiliados)						$8,446,100	$2,196,600			$8,446,100	$338,200			$8,446,100	$338,200			$8,446,100	$588,400		$0	$0
Centro de Trabajo: CONSORCIO INTERVENTORES AO (10 Afiliados)						$8,446,100	$2,196,600			$8,446,100	$338,200			$8,446,100	$338,200			$8,446,100	$588,400		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (10 Afiliados)						$8,446,100	$2,196,600			$8,446,100	$338,200			$8,446,100	$338,200			$8,446,100	$588,400		$0	$0
1	CC	1019043623	ALBARRACIN JHON	230201	30	$1,423,500	$370,200	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
2	CC	12195827	CADENA JEISSONH	230301	1	$47,450	$12,400	EPS005	1	$47,450	$1,900	CCF22	1	$47,450	$1,900	14-25	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
3	CC	1032365948	CARVAJAL RAUL	230201	12	$569,400	$148,100	EPS017	12	$569,400	$22,800	CCF22	12	$569,400	$22,800	14-25	12	$569,400	$39,700	12	$0	$0
4	CC	33677433	CHIVATA LINA	231001	8	$379,600	$98,700	EPS008	8	$379,600	$15,200	CCF22	8	$379,600	$15,200	14-25	8	$379,600	$26,500	8	$0	$0
5	CC	1013621964	GARZON PAULA	230301	30	$1,423,500	$370,200	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
6	CC	83117200	GONZALEZ JAMIR	231001	30	$1,423,500	$370,200	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
7	CC	1047459135	JULIO KATYA	230301	25	$1,186,250	$308,500	EPS005	25	$1,186,250	$47,500	CCF22	25	$1,186,250	$47,500	14-25	25	$1,186,250	$82,600	25	$0	$0
8	CC	1019080933	MEDINA VIVIANA	230201	10	$474,500	$123,400	EPS002	10	$474,500	$19,000	CCF22	10	$474,500	$19,000	14-25	10	$474,500	$33,100	10	$0	$0
9	CC	79745639	PERDOMO JOSE	230201	25	$1,186,250	$308,500	EPS002	25	$1,186,250	$47,500	CCF22	25	$1,186,250	$47,500	14-25	25	$1,186,250	$82,600	25	$0	$0
10	CC	1023873559	RINCON JUAN	230201	7	$332,150	$86,400	EPS002	7	$332,150	$13,300	CCF22	7	$332,150	$13,300	14-25	7	$332,150	$23,200	7	$0	$0
Total			**Afiliados(10)**			$8,446,100	$2,196,600			$8,446,100	$338,200			$8,446,100	$338,200			$8,446,100	$588,400		$0	$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901889907	9	CONSORCIO INTERVENTORES AO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO INTERVENTORES AO	CR 10 NO. 18-44 P 11	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3105857598	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1367520670	9483605578	E	2025/03/04	2025/03/28	BANCO AV VILLAS	24	$3,513,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$2,196,600	$33,100	$0	$2,229,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$468,900	$7,100	$0	$476,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$691,100	$10,400	$0	$701,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,036,600	$15,600	$0	$1,052,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$588,400	$8,900	$0	$597,300
COLMENA	14-25	800,226,175	3	10	$588,400	$8,900	$0	$597,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$338,200	$5,100	$0	$343,300
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	10	$338,200	$5,100	$0	$343,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				10	$338,200	$5,200	$0	$343,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$72,200	$1,100	$0	$73,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$79,800	$1,200	$0	$81,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$57,000	$900	$0	$57,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$79,800	$1,200	$0	$81,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$49,400	$800	$0	$50,200
TOTAL				**10**	**$3,461,400**	**$52,300**	**$0**	**$3,513,700**

ANEXO No. 6

PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL O AFILIACIONES RB COLOMBIA

INFORME NO.1 (13 DE DICIEMBRE DE 2024 - 12 DE ENERO DE 2025)

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860004030	1	R B DE COLOMBIA S A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SECRETARIA DE INTEGRACION	CRA 14 #75-77	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3153572345	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1198865501	9480360917	E	2025/01/10	2025/01/16	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	6	$1,084,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	79749845	NAVAS CARLOS	X																	25-14	13	$1,365,000	$218,400	EPS002	13	$1,365,000	$54,600	CCF22	13	$1,365,000	$54,600	14-4	13	$1,365,000	$95,100	13	$0	$0	Si	$422,700
2	CC	79333178	PINZON CARLOS	X																	25-14	13	$2,123,334	$339,800	EPS005	13	$2,123,334	$85,000	CCF22	13	$2,123,334	$85,000	14-4	13	$2,123,334	$147,800	13	$0	$0	Si	$657,600
Total	**Afiliados(2)**																						$3,488,334	$558,200			$3,488,334	$139,600			$3,488,334	$139,600			$3,488,334	$242,900		$0	$0		$1,080,300

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860004030	1	R B DE COLOMBIA S A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SECRETARIA DE INTEGRACION	CRA 14 #75-77	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3153572345	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1198865501	9480360917	E	2025/01/10	2025/01/16	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	6	$1,084,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$558,200	$2,100	$0	$560,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$558,200	$2,100	$0	$560,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$242,900	$1,000	$0	$243,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	2	$242,900	$1,000	$0	$243,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$139,600	$600	$0	$140,200
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	2	$139,600	$600	$0	$140,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$139,600	$700	$0	$140,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$54,600	$300	$0	$54,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$85,000	$400	$0	$85,400
TOTAL				**2**	**$1,080,300**	**$4,400**	**$0**	**$1,084,700**

INFORME NO.2 (13 DE ENERO DE 2025 - 12 DE FEBERO DE 2025)

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860004030	1	R B DE COLOMBIA S A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SECRETARIA DE INTEGRACION	CRA 14 #75-77	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3153572345	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1247112358	9481395891	E	2025/02/10	2025/02/06	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$4,875,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	79597196	BOLIVAR NELSON	X																	25-14	22	$2,310,000	$369,600	EPS008	22	$2,310,000	$92,400	CCF22	22	$2,310,000	$92,400	14-4	22	$2,310,000	$160,800	22	$0	$0	Si	$715,200
2	CC	8188597	CABARCA PEDRO										X								25-14	2	$166,667	$20,100	EPS002	2	$166,667	$0	CCF22	2	$166,667	$0	14-4	2	$166,667	$0	2	$0	$0	Si	$20,100
3	CC	8188597	CABARCA PEDRO	X																	25-14	12	$1,000,000	$160,000	EPS002	12	$1,000,000	$40,000	CCF22	12	$1,000,000	$40,000	14-4	12	$1,000,000	$69,600	12	$0	$0	Si	$309,600
4	CC	1069720530	GRACIA IVAN	X																	230301	13	$1,126,667	$180,300	EPS008	13	$1,126,667	$45,100	CCF22	13	$1,126,667	$45,100	14-4	13	$1,126,667	$78,500	13	$0	$0	Si	$349,000
5	CC	1019017753	LARA MONICA	X																	230301	17	$1,473,334	$235,800	EPS008	17	$1,473,334	$59,000	CCF22	17	$1,473,334	$59,000	14-4	17	$1,473,334	$102,600	17	$0	$0	Si	$456,400
6	CC	79749845	NAVAS CARLOS																		25-14	28	$2,940,000	$470,400	EPS002	28	$2,940,000	$117,600	CCF22	28	$2,940,000	$117,600	14-4	28	$2,940,000	$204,700	28	$0	$0	Si	$910,300
7	CC	79749845	NAVAS CARLOS											X							25-14	2	$140,000	$22,400	EPS002	2	$140,000	$5,600	CCF22	0	$0	$0	14-4	2	$140,000	$0	0	$0	$0	Si	$28,000
8	CC	79333178	PINZON CARLOS																		25-14	30	$4,900,000	$784,000	EPS005	30	$4,900,000	$196,000	CCF22	30	$4,900,000	$196,000	14-4	30	$4,900,000	$341,100	30	$0	$0	Si	$1,517,100
9	CC	1023034447	ROJAS JHON	X																	230301	8	$613,334	$98,200	EPS002	8	$613,334	$24,600	CCF22	8	$613,334	$24,600	14-4	8	$613,334	$42,700	8	$0	$0	Si	$190,100
10	CC	1014263381	VELA BRAYAN	X																	230301	16	$1,226,667	$196,300	EPS010	16	$1,226,667	$49,100	CCF22	16	$1,226,667	$49,100	14-4	16	$1,226,667	$85,400	16	$0	$0	Si	$379,900
Total	**Afiliados(8)**																						$15,896,669	$2,537,100			$15,896,669	$629,400			$15,756,669	$623,800			$15,896,669	$1,085,400		$0	$0		$4,875,700

Certificado de Aportes

Se certifica que PROTELCA INGENIEROS ARQUITECTOS LTDA identificado(a) con NI 830037322 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para RUBEN DARIO GIRON CASTILLO identificado(a) con CC 74860596

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9482075642	1316809365	E	2025-03-06	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-03	30																		$2,556,000	4%	$102,300
9482075642	1316809365	E	2025-03-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-02	30																		$2,556,000	16%	$409,000
9482075642	1316809365	E	2025-03-06	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-02	30																		$2,556,000		$0
9482075642	1316809365	E	2025-03-06	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-02	30																		$2,556,000		$0
9482075642	1316809365	E	2025-03-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-02	30																		$0	0%	$0
9482075642	1316809365	E	2025-03-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-02	30																		$0	0%	$0
9482075642	1316809365	E	2025-03-06	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-02	30																		$2,556,000	6.96%	$177,900
9482075642	1316809365	E	2025-03-06	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-02	30																		$2,556,000	4%	$102,300
9481390693	1250846557	E	2025-02-07	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-02	30							X											$2,556,000	4%	$102,300
9481390693	1250846557	E	2025-02-07	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	30							X											$2,556,000	16%	$409,000
9481390693	1250846557	E	2025-02-07	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-01	30							X											$2,556,000		$0
9481390693	1250846557	E	2025-02-07	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-01	30							X											$2,556,000		$0
9481390693	1250846557	E	2025-02-07	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-01	30							X											$0	0%	$0
9481390693	1250846557	E	2025-02-07	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-01	30							X											$0	0%	$0
9481390693	1250846557	E	2025-02-07	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	30							X											$2,556,000	6.96%	$177,900
9481390693	1250846557	E	2025-02-07	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	30							X											$2,556,000	4%	$102,300
9479265041	1183715131	E	2025-01-09	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	30																		$2,400,000	4%	$96,000
9479265041	1183715131	E	2025-01-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-12	30																		$2,400,000	16%	$384,000
9479265041	1183715131	E	2025-01-09	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-12	30																		$2,400,000		$0
9479265041	1183715131	E	2025-01-09	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-12	30																		$2,400,000		$0

Certificado de Aportes

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9479265041	1183715131	E	2025-01-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-12	30																	$0	0%	$0
9479265041	1183715131	E	2025-01-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-12	30																	$0	0%	$0
9479265041	1183715131	E	2025-01-09	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-12	30																	$2,400,000	6.96%	$167,100
9479265041	1183715131	E	2025-01-09	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-12	30																	$2,400,000	4%	$96,000

Este certificado se expide el día 2025-03-10 a las 09:14.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

El aportante **LAUMAYER COLOMBIANA COMERCIALIZADORA SAS**, identificado con **NI** número **890921335**, aportó por **FABIAN STEVEN MORENO BERMUDEZ**, identificado(a) con **CC** número **1026569128** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **1 - Dependiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2025-01** y salud **2025-02** de la siguiente manera:

CODIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARAFISCALES Y SALUD
14-11	ARL SURA												X			0		3	$0	$0	Enero - 2025	83981144	07/02/2025	S
14-11	ARL SURA							X	X							0		27	$0	$0	Enero - 2025	83981144	07/02/2025	S
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar												X			0		3	$0	$0	Enero - 2025	83981144	07/02/2025	S
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar							X	X							0		27	$0	$0	Enero - 2025	83981144	07/02/2025	S
EPS008	Compensar EPS												X			0		3	$0	$0	Febrero - 2025	83981144	07/02/2025	S
EPS008	Compensar EPS							X	X							0		27	$0	$0	Febrero - 2025	83981144	07/02/2025	S
230201	Proteccion (ING + Proteccion)												X			0		3	$2.800	$2.800	Enero - 2025	83981144	07/02/2025	S
230201	Proteccion (ING + Proteccion)							X	X							0		27	$27.100	$27.100	Enero - 2025	83981144	07/02/2025	S

El presente certificado se expide a los 7 días del mes Febrero de 2025

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 52959828

banco popular

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Nombre ó Razón Social	GRUPO GYB INGENIEROS SAS		
Tipo Identificación	NIT	Número de Identificación	900553486
Ciudad/Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
Dirección	CARRERA 53 NO 103 B-42	Teléfono	7617244
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Actividades de arquitectura e
Tipo Aportante	01-EMPLEADOR	Clase Aportante	D-APORTANTE BENEFICIARIO DE
Forma Presentación	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Número Planilla	**7959982338**	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotización Otros	enero / 2025	Periodo Cotización Salud	febrero / 2025
Dias de Mora	0	Fecha Pago	2025/02/10
Número Autorización	1256509657		

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombres	MARIA EUGENIA	Apellidos	BEJARANO BARRERA
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	52959828
Tipo cotizante	DEPEND	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			SI
Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Salario Básico	$ 3.092.096	Tipo de Salario	FIJO

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN			
Dias	30	Administradora	25-14 COLPENSIONES
Tarifa	16,000 %	IBC	$ 3.092.096
FSP - Solidaridad	$ 0	Cotización Obligatoria	$ 494.800
Aportes Voluntarios Empleador	$ 0	FSP - Subsistencia	$ 0
Indicadador tarifa especial	Normal	Aportes Voluntarios Cotizante	$ 0
		Total Aporte	**$ 494.800**

SALUD			
Dias	30	Administradora	EPS017-FAMISANAR
Tarifa	4,000 %	IBC	$ 3.092.096
Nro Incapacidad por Enf. General		Cotización Obligatoria	$ 123.700
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
Valor ADRES	$ 0	Valor	$ 0
		Total Aporte	**$ 123.700**

RIESGOS PROFESIONALES			
Dias	30	Administradora	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.
Clase de Riesgo	I	IBC	$ 3.092.096
Centro de Trabajo	1	Tarifa	0,522 %
		Total Aporte	**$ 16.200**

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

Administradora	Dias Cotizados	Tarifa	IBC	Total Aporte
CCF21-CAFAM	30	4,000 %	$ 3.092.096	$ 123.700

TOTAL PAGADO:	**$ 758.400**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900740931-1	P A A A S A S	carrera 38 78 i 35	7970496	dianycano724@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	efectivos	2	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					32	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-01	E	11/02/2025	84095722	$2.901.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	45.600	0		0		0	1	100	0	45.700	8
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	186.200	0		0		0	1	200	0	186.400	7
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	3.800	0		0		0	1	100	0	3.900	2
EPS010	EPS Sura	800088702-2	1.900	0		0		0	1	100	0	2.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	98.800	0		0		0	1	100	0	98.900	9
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	1.900	0		0		0	1	100	0	2.000	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	36.100	0		0		0	1	100	0	36.200	4

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	380.000	0	0	0	0	1	300	0	380.300	8
230301	Porvenir	800224808-8	828.100	0	0	0	0	1	600	0	828.700	16
231001	Colfondos	800227940-6	258.200	0	0	0	0	1	200	0	258.400	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	30.400	0	0	0	0	1	100	0	30.500	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	653.300				653.300	1	500	653.800			6.533	653.800	32

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	374.300	1	300	374.600	32

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900740931-1	P A A A S A S	carrera 38 78 i 35	7970496	dianycano724@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	efectivos	2	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					32	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-01	E	11/02/2025	84095722	$2.901.400	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	1	0	0	0
ICBF				
0	1	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	374.300	375.100
Pensión	4	1.496.700	1.497.900
Riesgos Laborales	1	653.300	653.800
CCF	1	374.300	374.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	13	2.898.600	2.901.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900740931-1	P A A A S A S		carrera 38 78 i 35	7970496	dianycano724@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
SUCURSAL	B – menos de 200 c	efectivos	2	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					32	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-01	E	11/02/2025	84095722	$2.901.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000213468	DIAZ ORTIZ KAREN TATIANA	1	0			S	X																230201	569.400	91.200	0	0	0	0	EPS005	569.400	22.800	14-23	569.400	5	39.700	CCF21	569.400	22.800	0	0	0	0	0
2	CC	1001174862	ROMERO AVELLANEDA ALLAN DAVID	1	0			S	X																230201	142.350	22.800	0	0	0	0	EPS002	142.350	5.700	14-23	142.350	5	10.000	CCF21	142.350	5.700	0	0	0	0	0
3	CC	1003517033	MORA GONZALEZ LIZARDO	1	0			S	X																230301	569.400	91.200	0	0	0	0	EPS017	569.400	22.800	14-23	569.400	5	39.700	CCF21	569.400	22.800	0	0	0	0	0
4	CC	1007351801	GOMEZ JIMENEZ MIGUEL ANGEL	1	0			S	X																230301	569.400	91.200	0	0	0	0	EPS005	569.400	22.800	14-23	569.400	5	39.700	CCF21	569.400	22.800	0	0	0	0	0
5	CC	1010174397	RODRIGUEZ VILLALOBOS LUIS ALBERTO	1	0			S	X																230301	284.700	45.600	0	0	0	0	EPSC34	284.700	11.400	14-23	284.700	5	19.900	CCF21	284.700	11.400	0	0	0	0	0
6	CC	1014304029	ALVAREZ VALENCIA MARCO STIVEN	1	0			S	X																230301	569.400	91.200	0	0	0	0	EPS017	569.400	22.800	14-23	569.400	5	39.700	CCF21	569.400	22.800	0	0	0	0	0
7	CC	1033744081	GARCIA RIVERA JAVIER ALEXANDER	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF21	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
8	CC	1067721019	MARTINEZ MORENO CARLOS EDUARDO	1	0			S	X																230301	379.600	60.800	0	0	0	0	EPS017	379.600	15.200	14-23	379.600	5	26.500	CCF21	379.600	15.200	0	0	0	0	0
9	CC	10938345	MASIAS LICONA LUIS EDUARDO	1	0			S		X															230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS017	47.450	1.900	14-23	47.450	5	3.400	CCF21	47.450	1.900	0	0	0	0	0
10	CC	11204921	GALEANO MUÑOZ CAMILO ANDRES	1	0			S	X	X															25-14	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS002	47.450	1.900	14-23	47.450	5	3.400	CCF21	47.450	1.900	0	0	0	0	0
11	CC	1022324123	TORRES GARCIA FREDY ALEXANDER	1	0			S	X	X															230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS017	47.450	1.900	14-23	47.450	5	3.400	CCF21	47.450	1.900	0	0	0	0	0
12	CC	1026299566	FLOREZ PAEZ JORGE ALEJANDRO	1	0			S	X																230201	474.500	76.000	0	0	0	0	EPSC34	474.500	19.000	14-23	474.500	5	33.100	CCF21	474.500	19.000	0	0	0	0	0
13	CC	1031143594	RUGELES CAMARGO STEVEN HUMBERTO	1	0			S	X	X															230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS008	47.450	1.900	14-23	47.450	5	3.400	CCF21	47.450	1.900	0	0	0	0	0
14	CC	1031180000	MONDRAGON LEON DANILO	1	0			S	X	X															230201	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS010	47.450	1.900	14-23	47.450	5	3.400	CCF21	47.450	1.900	0	0	0	0	0
15	CC	79055072	TRUJILLO WILSON	1	0			S	X																230201	569.400	91.200	0	0	0	0	EPS005	569.400	22.800	14-23	569.400	5	39.700	CCF21	569.400	22.800	0	0	0	0	0
16	CC	79907532	AMEZQUITA DIAZ JOSE SAUL	1	0			S	X	X															231001	94.900	15.200	0	0	0	0	EPSC34	94.900	3.800	14-23	94.900	5	6.700	CCF21	94.900	3.800	0	0	0	0	0
17	CC	1068972066	BAQUERO DIAZ HEIVER ANDREY	1	0			S	X	X															231001	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS017	47.450	1.900	14-23	47.450	5	3.400	CCF21	47.450	1.900	0	0	0	0	0
18	CC	1070916845	BAJONERO BUSTOS EDGAR ANDRES	1	0			S	X	X															230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS002	47.450	1.900	14-23	47.450	5	3.400	CCF21	47.450	1.900	0	0	0	0	0
19	CC	1074782025	ALVAREZ VEGA DUVAN FELIPE	1	0			S	X	X															230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS037	47.450	1.900	14-23	47.450	5	3.400	CCF21	47.450	1.900	0	0	0	0	0
20	CC	1083869658	LONDOÑO QUIMBAYO JEFERSSON	1	0			S	X	X															25-14	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS017	47.450	1.900	14-23	47.450	5	3.400	CCF21	47.450	1.900	0	0	0	0	0
21	CC	80400024	BUITRAGO PAEZ JOSE HERNANDO	1	0			S	X	X															231001	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS008	47.450	1.900	14-23	47.450	5	3.400	CCF21	47.450	1.900	0	0	0	0	0
22	CC	80497425	SASTOQUE TOVAR JAIRO HERNANDO	1	0			S	X	X															230201	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS005	47.450	1.900	14-23	47.450	5	3.400	CCF21	47.450	1.900	0	0	0	0	0
23	CC	1126124551	CONTRERAS ARRIETA VICTOR ENRIQUE	1	0			S		X															230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS005	47.450	1.900	14-23	47.450	5	3.400	CCF21	47.450	1.900	0	0	0	0	0
24	CC	12133451	PRADA FERREIRA ARNOLDO	1	0			S																	231001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF21	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
25	CC	19332924	CASTILLO GUERRERO HUGO	1	0			S	X	X															25-14	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS002	47.450	1.900	14-23	47.450	5	3.400	CCF21	47.450	1.900	0	0	0	0	0
26	CC	19483384	ESLAVA RAMIREZ GUILLERMO FERNANDO	1	0			S	X	X															25-14	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS017	47.450	1.900	14-23	47.450	5	3.400	CCF21	47.450	1.900	0	0	0	0	0
27	CC	80764127	SOTO JARAMILLO WILLIAM ORLEY	1	0			S	X	X															230201	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS002	47.450	1.900	14-23	47.450	5	3.400	CCF21	47.450	1.900	0	0	0	0	0
28	CC	91011861	PEÑA REYNALDO	1	0			S	X																230301	711.750	113.900	0	0	0	0	EPS017	711.750	28.500	14-23	711.750	5	49.600	CCF21	711.750	28.500	0	0	0	0	0
29	CC	79965611	AMEZQUITA SANCHEZ ALEJANDRO	1	0			S	X																230301	284.700	45.600	0	0	0	0	EPS002	284.700	11.400	14-23	284.700	5	19.900	CCF21	284.700	11.400	0	0	0	0	0
30	CC	80012504	RIVAS ARTUNDUAGA CESAR	1	0			S	X	X															230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPSC34	47.450	1.900	14-23	47.450	5	3.400	CCF21	47.450	1.900	0	0	0	0	0
31	CC	80064557	FLOREZ AVILA JORGE ARISMENDIS	1	0			S	X																230201	474.500	76.000	0	0	0	0	EPS002	474.500	19.000	14-23	474.500	5	33.100	CCF21	474.500	19.000	0	0	0	0	0
32	CC	80249266	SANCHEZ SANCHEZ JAIRO	1	0			S	X	X															230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS002	47.450	1.900	14-23	47.450	5	3.400	CCF21	47.450	1.900	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901022448-9	JGR CONSTRUCCIONES SAS	KR 7 C ESTE 90 D- 61 SUR	3214770772	jgrafiliaciones12@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL BOGO	001	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					18	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-01	E	12/02/2025	84145619	$4.062.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	43.700	0		0		0	0	0	0	43.700	4
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	24.700	0		0		0	0	0	0	24.700	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	83.500	0		0		0	0	0	0	83.500	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	202.100	0		0		0	0	0	0	202.100	6
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	120.000	0		0		0	0	0	0	120.000	2
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	5.700	0		0		0	0	0	0	5.700	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	68.400	0	0	0	0	0	0		68.400	3
230301	Porvenir	800224808-8	1.660.300	0	0	0	0	0	0		1.660.300	12
231001	Colfondos	800227940-6	326.500	0	0	0	0	0	0		326.500	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	90.700	0	0	0	0	0	0		90.700	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	842.800				842.800	0	0	842.800			8.428	842.800	18

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	536.700	0	0	536.700	18

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901022448-9	JGR CONSTRUCCIONES SAS		KR 7 C ESTE 90 D- 61 SUR	3214770772	jgrafiliaciones12@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL BOGO	001	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					18	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-01	E	12/02/2025	84145619	$4.062.100	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	536.700	536.700
Pensión	4	2.145.900	2.145.900
Riesgos Laborales	1	842.800	842.800
CCF	1	536.700	536.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	13	4.062.100	4.062.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901022448-9	JGR CONSTRUCCIONES SAS		KR 7 C ESTE 90 D- 61 SUR	3214770772	jgrafiliaciones12@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL BOGO	001	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					18	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-01	E	12/02/2025	84145619	$4.062.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1001167127	RUIZ GIRALDO HOOVER ANDRES	1	0			S	X																230301	142.350	22.800	0	0	0	0	EPS017	142.350	5.700	14-23	142.350	5	10.000	CCF24	142.350	5.700	0	0	0	0	0
2	CC	1001300527	GUACANEME HERRERA KEVIN JOEL	1	0			S	X	X															230301	142.350	22.800	0	0	0	0	EPS002	142.350	5.700	14-23	142.350	5	10.000	CCF24	142.350	5.700	0	0	0	0	0
3	CC	1007749607	OSORIO SANCHEZ JOSUE MAURICIO	1	0			S	X																230201	142.350	22.800	0	0	0	0	EPS017	142.350	5.700	14-23	142.350	5	10.000	CCF24	142.350	5.700	0	0	0	0	0
4	CC	1022931117	RIAÑO CULMA ANDRES MAURICIO	1	0			S	X																231001	616.850	98.700	0	0	0	0	EPS005	616.850	24.700	14-23	616.850	5	43.000	CCF24	616.850	24.700	0	0	0	0	0
5	CC	1022953822	TIQUE SARMIENTO WILSON GIOVANNI	1	0			S	X																230201	142.350	22.800	0	0	0	0	EPSC34	142.350	5.700	14-23	142.350	5	10.000	CCF24	142.350	5.700	0	0	0	0	0
6	CC	1023893873	GARCIA SANDRA MILENA	1	0			S	X																230201	142.350	22.800	0	0	0	0	EPS002	142.350	5.700	14-23	142.350	5	10.000	CCF24	142.350	5.700	0	0	0	0	0
7	CC	1069925348	NUÑEZ GUTIERREZ VICTOR FABIAN	1	0			S	X																25-14	566.667	90.700	0	0	0	0	EPS010	566.667	22.700	14-23	566.667	5	39.500	CCF24	566.667	22.700	0	0	0	0	0
8	CC	1121420005	LLANOS RIAÑO OSCAR JAVIER	1	0			S	X																230301	616.850	98.700	0	0	0	0	EPS002	616.850	24.700	14-23	616.850	5	43.000	CCF24	616.850	24.700	0	0	0	0	0
9	CC	17281204	RIAÑOS CULMA MARTIN	1	0			S																	230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS017	1.500.000	60.000	14-23	1.500.000	5	104.400	CCF24	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
10	CC	3086933	CASALLAS CASTILLO JOSE WILSON	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS041	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
11	CC	79562214	GUACANEME RODRIGUEZ RODOLFO	1	0			S	X																230301	189.800	30.400	0	0	0	0	EPS002	189.800	7.600	14-23	189.800	5	13.300	CCF24	189.800	7.600	0	0	0	0	0
12	CC	79819243	MONTIEL MALAMBO MILLER	1	0			S	X																230301	94.900	15.200	0	0	0	0	EPS010	94.900	3.800	14-23	94.900	5	6.700	CCF24	94.900	3.800	0	0	0	0	0
13	CC	80254601	MONTIEL MALAMBO SEYDI	1	0			S	X																230301	142.350	22.800	0	0	0	0	EPS017	142.350	5.700	14-23	142.350	5	10.000	CCF24	142.350	5.700	0	0	0	0	0
14	CC	1069925193	OVALLE RODRIGUEZ ABELARDO	1	0			S							X										230301	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS017	1.700.000	68.000	14-23	1.700.000	5	118.400	CCF24	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
15	CC	1069925393	OVALLE RODRIGUEZ HORACIO	1	0			S							X										230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS037	1.500.000	60.000	14-23	1.500.000	5	104.400	CCF24	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
16	CC	80489353	BARRETO MAURICIO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
17	CC	1003523504	OVALLE RODRIGUEZ JONNATHAN ESTEBAN	1	0			S							X										230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS037	1.500.000	60.000	14-23	1.500.000	5	104.400	CCF24	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
18	CC	1010218876	GOMEZ GONZALEZ YENNIFER CATERINE	1	0			S																	231001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS010	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900740931-1	P A A A S A S	carrera 38 78 i 35	7970496	dianycano724@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	efectivos	2	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					32	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-01	E	11/02/2025	84095722	$2.901.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	45.600	0		0		0	1	100	0	45.700	8
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	186.200	0		0		0	1	200	0	186.400	7
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	3.800	0		0		0	1	100	0	3.900	2
EPS010	EPS Sura	800088702-2	1.900	0		0		0	1	100	0	2.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	98.800	0		0		0	1	100	0	98.900	9
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	1.900	0		0		0	1	100	0	2.000	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	36.100	0		0		0	1	100	0	36.200	4

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	380.000	0	0	0	0	1	300	0	380.300	8
230301	Porvenir	800224808-8	828.100	0	0	0	0	1	600	0	828.700	16
231001	Colfondos	800227940-6	258.200	0	0	0	0	1	200	0	258.400	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	30.400	0	0	0	0	1	100	0	30.500	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	653.300				653.300	1	500	653.800			6.533	653.800	32

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	374.300	1	300	374.600	32

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900740931-1	P A A A S A S	carrera 38 78 i 35	7970496	dianycano724@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	efectivos / 2	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					32	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-01	E	11/02/2025	84095722	$2.901.400	

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	1	0	0	0
ICBF				
0	1	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	374.300	375.100
Pensión	4	1.496.700	1.497.900
Riesgos Laborales	1	653.300	653.800
CCF	1	374.300	374.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	13	2.898.600	2.901.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900740931-1	P A A A S A S		carrera 38 78 i 35	7970496	dianycano724@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
SUCURSAL	B – menos de 200 c	efectivos	2	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					32	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-01	E	11/02/2025	84095722	$2.901.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AYP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000213468	DIAZ ORTIZ KAREN TATIANA	1	0			S	X																230201	569.400	91.200	0	0	0	0	EPS005	569.400	22.800	14-23	569.400	5	39.700	CCF21	569.400	22.800	0	0	0	0	0
2	CC	1001174862	ROMERO AVELLANEDA ALLAN DAVID	1	0			S	X																230201	142.350	22.800	0	0	0	0	EPS002	142.350	5.700	14-23	142.350	5	10.000	CCF21	142.350	5.700	0	0	0	0	0
3	CC	1003517033	MORA GONZALEZ LIZARDO	1	0			S	X																230301	569.400	91.200	0	0	0	0	EPS017	569.400	22.800	14-23	569.400	5	39.700	CCF21	569.400	22.800	0	0	0	0	0
4	CC	1007351801	GOMEZ JIMENEZ MIGUEL ANGEL	1	0			S	X																230301	569.400	91.200	0	0	0	0	EPS005	569.400	22.800	14-23	569.400	5	39.700	CCF21	569.400	22.800	0	0	0	0	0
5	CC	1010174397	RODRIGUEZ VILLALOBOS LUIS ALBERTO	1	0			S	X																230301	284.700	45.600	0	0	0	0	EPSC34	284.700	11.400	14-23	284.700	5	19.900	CCF21	284.700	11.400	0	0	0	0	0
6	CC	1014304029	ALVAREZ VALENCIA MARCO STIVEN	1	0			S	X																230301	569.400	91.200	0	0	0	0	EPS017	569.400	22.800	14-23	569.400	5	39.700	CCF21	569.400	22.800	0	0	0	0	0
7	CC	1033744081	GARCIA RIVERA JAVIER ALEXANDER	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF21	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
8	CC	1067721019	MARTINEZ MORENO CARLOS EDUARDO	1	0			S	X																230301	379.600	60.800	0	0	0	0	EPS017	379.600	15.200	14-23	379.600	5	26.500	CCF21	379.600	15.200	0	0	0	0	0
9	CC	10938345	MASIAS LICONA LUIS EDUARDO	1	0			S		X															230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS017	47.450	1.900	14-23	47.450	5	3.400	CCF21	47.450	1.900	0	0	0	0	0
10	CC	11204921	GALEANO MUÑOZ CAMILO ANDRES	1	0			S	X	X															25-14	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS002	47.450	1.900	14-23	47.450	5	3.400	CCF21	47.450	1.900	0	0	0	0	0
11	CC	1022324123	TORRES GARCIA FREDY ALEXANDER	1	0			S	X	X															230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS017	47.450	1.900	14-23	47.450	5	3.400	CCF21	47.450	1.900	0	0	0	0	0
12	CC	1026299566	FLOREZ PAEZ JORGE ALEJANDRO	1	0			S	X																230201	474.500	76.000	0	0	0	0	EPSC34	474.500	19.000	14-23	474.500	5	33.100	CCF21	474.500	19.000	0	0	0	0	0
13	CC	1031143594	RUGELES CAMARGO STEVEN HUMBERTO	1	0			S	X	X															230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS008	47.450	1.900	14-23	47.450	5	3.400	CCF21	47.450	1.900	0	0	0	0	0
14	CC	1031180000	MONDRAGON LEON DANILO	1	0			S	X	X															230201	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS010	47.450	1.900	14-23	47.450	5	3.400	CCF21	47.450	1.900	0	0	0	0	0
15	CC	79055072	TRUJILLO WILSON	1	0			S	X																230201	569.400	91.200	0	0	0	0	EPS005	569.400	22.800	14-23	569.400	5	39.700	CCF21	569.400	22.800	0	0	0	0	0
16	CC	79907532	AMEZQUITA DIAZ JOSE SAUL	1	0			S	X	X															231001	94.900	15.200	0	0	0	0	EPSC34	94.900	3.800	14-23	94.900	5	6.700	CCF21	94.900	3.800	0	0	0	0	0
17	CC	1068972066	BAQUERO DIAZ HEIVER ANDREY	1	0			S	X	X															231001	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS017	47.450	1.900	14-23	47.450	5	3.400	CCF21	47.450	1.900	0	0	0	0	0
18	CC	1070916845	BAJONERO BUSTOS EDGAR ANDRES	1	0			S	X	X															230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS002	47.450	1.900	14-23	47.450	5	3.400	CCF21	47.450	1.900	0	0	0	0	0
19	CC	1074782025	ALVAREZ VEGA DUVAN FELIPE	1	0			S	X	X															230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS037	47.450	1.900	14-23	47.450	5	3.400	CCF21	47.450	1.900	0	0	0	0	0
20	CC	1083869658	LONDOÑO QUIMBAYO JEFERSSON	1	0			S	X	X															25-14	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS017	47.450	1.900	14-23	47.450	5	3.400	CCF21	47.450	1.900	0	0	0	0	0
21	CC	80400024	BUITRAGO PAEZ JOSE HERNANDO	1	0			S	X	X															231001	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS008	47.450	1.900	14-23	47.450	5	3.400	CCF21	47.450	1.900	0	0	0	0	0
22	CC	80497425	SASTOQUE TOVAR JAIRO HERNANDO	1	0			S	X	X															230201	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS005	47.450	1.900	14-23	47.450	5	3.400	CCF21	47.450	1.900	0	0	0	0	0
23	CC	1126124551	CONTRERAS ARRIETA VICTOR ENRIQUE	1	0			S		X															230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS005	47.450	1.900	14-23	47.450	5	3.400	CCF21	47.450	1.900	0	0	0	0	0
24	CC	12133451	PRADA FERREIRA ARNOLDO	1	0			S																	231001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF21	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
25	CC	19332924	CASTILLO GUERRERO HUGO	1	0			S	X	X															25-14	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS002	47.450	1.900	14-23	47.450	5	3.400	CCF21	47.450	1.900	0	0	0	0	0
26	CC	19483384	ESLAVA RAMIREZ GUILLERMO FERNANDO	1	0			S	X	X															25-14	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS017	47.450	1.900	14-23	47.450	5	3.400	CCF21	47.450	1.900	0	0	0	0	0
27	CC	80764127	SOTO JARAMILLO WILLIAM ORLEY	1	0			S	X	X															230201	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS002	47.450	1.900	14-23	47.450	5	3.400	CCF21	47.450	1.900	0	0	0	0	0
28	CC	91011861	PEÑA REYNALDO	1	0			S	X																230301	711.750	113.900	0	0	0	0	EPS017	711.750	28.500	14-23	711.750	5	49.600	CCF21	711.750	28.500	0	0	0	0	0
29	CC	79965611	AMEZQUITA SANCHEZ ALEJANDRO	1	0			S	X																230301	284.700	45.600	0	0	0	0	EPS002	284.700	11.400	14-23	284.700	5	19.900	CCF21	284.700	11.400	0	0	0	0	0
30	CC	80012504	RIVAS ARTUNDUAGA CESAR	1	0			S	X	X															230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPSC34	47.450	1.900	14-23	47.450	5	3.400	CCF21	47.450	1.900	0	0	0	0	0
31	CC	80064557	FLOREZ AVILA JORGE ARISMENDIS	1	0			S	X																230201	474.500	76.000	0	0	0	0	EPS002	474.500	19.000	14-23	474.500	5	33.100	CCF21	474.500	19.000	0	0	0	0	0
32	CC	80249266	SANCHEZ SANCHEZ JAIRO	1	0			S	X	X															230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS002	47.450	1.900	14-23	47.450	5	3.400	CCF21	47.450	1.900	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901022448-9	JGR CONSTRUCCIONES SAS	KR 7 C ESTE 90 D- 61 SUR	3214770772	jgrafiliaciones12@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL BOGO	001	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					18	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-01	E	12/02/2025	84145619	$4.062.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	43.700	0		0		0	0	0	0	43.700	4
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	24.700	0		0		0	0	0	0	24.700	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	83.500	0		0		0	0	0	0	83.500	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	202.100	0		0		0	0	0	0	202.100	6
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	120.000	0		0		0	0	0	0	120.000	2
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	5.700	0		0		0	0	0	0	5.700	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	68.400	0	0	0	0	0	0		68.400	3
230301	Porvenir	800224808-8	1.660.300	0	0	0	0	0	0		1.660.300	12
231001	Colfondos	800227940-6	326.500	0	0	0	0	0	0		326.500	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	90.700	0	0	0	0	0	0		90.700	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	842.800				842.800	0	0	842.800			8.428	842.800	18

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	536.700	0	0	536.700	18

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901022448-9	JGR CONSTRUCCIONES SAS		KR 7 C ESTE 90 D- 61 SUR	3214770772	jgrafiliaciones12@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL BOGO	001	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					18	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-01	E	12/02/2025	84145619	$4.062.100	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	536.700	536.700
Pensión	4	2.145.900	2.145.900
Riesgos Laborales	1	842.800	842.800
CCF	1	536.700	536.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	13	4.062.100	4.062.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901022448-9	JGR CONSTRUCCIONES SAS		KR 7 C ESTE 90 D- 61 SUR	3214770772	jgrafiliaciones12@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL BOGO	001	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					18	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-01	E	12/02/2025	84145619	$4.062.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1001167127	RUIZ GIRALDO HOOVER ANDRES	1	0			S	X																230301	142.350	22.800	0	0	0	0	EPS017	142.350	5.700	14-23	142.350	5	10.000	CCF24	142.350	5.700	0	0	0	0	0
2	CC	1001300527	GUACANEME HERRERA KEVIN JOEL	1	0			S	X	X															230301	142.350	22.800	0	0	0	0	EPS002	142.350	5.700	14-23	142.350	5	10.000	CCF24	142.350	5.700	0	0	0	0	0
3	CC	1007749607	OSORIO SANCHEZ JOSUE MAURICIO	1	0			S	X																230201	142.350	22.800	0	0	0	0	EPS017	142.350	5.700	14-23	142.350	5	10.000	CCF24	142.350	5.700	0	0	0	0	0
4	CC	1022931117	RIAÑO CULMA ANDRES MAURICIO	1	0			S	X																231001	616.850	98.700	0	0	0	0	EPS005	616.850	24.700	14-23	616.850	5	43.000	CCF24	616.850	24.700	0	0	0	0	0
5	CC	1022953822	TIQUE SARMIENTO WILSON GIOVANNI	1	0			S	X																230201	142.350	22.800	0	0	0	0	EPSC34	142.350	5.700	14-23	142.350	5	10.000	CCF24	142.350	5.700	0	0	0	0	0
6	CC	1023893873	GARCIA SANDRA MILENA	1	0			S	X																230201	142.350	22.800	0	0	0	0	EPS002	142.350	5.700	14-23	142.350	5	10.000	CCF24	142.350	5.700	0	0	0	0	0
7	CC	1069925348	NUÑEZ GUTIERREZ VICTOR FABIAN	1	0			S	X																25-14	566.667	90.700	0	0	0	0	EPS010	566.667	22.700	14-23	566.667	5	39.500	CCF24	566.667	22.700	0	0	0	0	0
8	CC	1121420005	LLANOS RIAÑO OSCAR JAVIER	1	0			S	X																230301	616.850	98.700	0	0	0	0	EPS002	616.850	24.700	14-23	616.850	5	43.000	CCF24	616.850	24.700	0	0	0	0	0
9	CC	17281204	RIAÑOS CULMA MARTIN	1	0			S																	230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS017	1.500.000	60.000	14-23	1.500.000	5	104.400	CCF24	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
10	CC	3086933	CASALLAS CASTILLO JOSE WILSON	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS041	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
11	CC	79562214	GUACANEME RODRIGUEZ RODOLFO	1	0			S	X																230301	189.800	30.400	0	0	0	0	EPS002	189.800	7.600	14-23	189.800	5	13.300	CCF24	189.800	7.600	0	0	0	0	0
12	CC	79819243	MONTIEL MALAMBO MILLER	1	0			S	X																230301	94.900	15.200	0	0	0	0	EPS010	94.900	3.800	14-23	94.900	5	6.700	CCF24	94.900	3.800	0	0	0	0	0
13	CC	80254601	MONTIEL MALAMBO SEYDI	1	0			S	X																230301	142.350	22.800	0	0	0	0	EPS017	142.350	5.700	14-23	142.350	5	10.000	CCF24	142.350	5.700	0	0	0	0	0
14	CC	1069925193	OVALLE RODRIGUEZ ABELARDO	1	0			S							X										230301	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS017	1.700.000	68.000	14-23	1.700.000	5	118.400	CCF24	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
15	CC	1069925393	OVALLE RODRIGUEZ HORACIO	1	0			S							X										230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS037	1.500.000	60.000	14-23	1.500.000	5	104.400	CCF24	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
16	CC	80489353	BARRETO MAURICIO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
17	CC	1003523504	OVALLE RODRIGUEZ JONNATHAN ESTEBAN	1	0			S							X										230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS037	1.500.000	60.000	14-23	1.500.000	5	104.400	CCF24	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
18	CC	1010218876	GOMEZ GONZALEZ YENNIFER CATERINE	1	0			S																	231001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS010	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900740931-1	P A A A S A S	carrera 38 78 i 35	7970496	dianycano724@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	efectivos	2	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					32	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-01	E	11/02/2025	84095722	$2.901.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	45.600	0		0		0	1	100	0	45.700	8
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	186.200	0		0		0	1	200	0	186.400	7
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	3.800	0		0		0	1	100	0	3.900	2
EPS010	EPS Sura	800088702-2	1.900	0		0		0	1	100	0	2.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	98.800	0		0		0	1	100	0	98.900	9
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	1.900	0		0		0	1	100	0	2.000	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	36.100	0		0		0	1	100	0	36.200	4

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	380.000	0	0	0	0	1	300	0	380.300	8
230301	Porvenir	800224808-8	828.100	0	0	0	0	1	600	0	828.700	16
231001	Colfondos	800227940-6	258.200	0	0	0	0	1	200	0	258.400	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	30.400	0	0	0	0	1	100	0	30.500	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	653.300				653.300	1	500	653.800			6.533	653.800	32

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	374.300	1	300	374.600	32

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900740931-1	P A A A S A S	carrera 38 78 i 35	7970496	dianycano724@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	efectivos / 2	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					32	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-01	E	11/02/2025	84095722	$2.901.400	

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	1	0	0	0
ICBF				
0	1	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	374.300	375.100
Pensión	4	1.496.700	1.497.900
Riesgos Laborales	1	653.300	653.800
CCF	1	374.300	374.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	13	2.898.600	2.901.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900740931-1	P A A A S A S		carrera 38 78 i 35	7970496	dianycano724@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
SUCURSAL	B – menos de 200 c	efectivos	2	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					32	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-01	E	11/02/2025	84095722	$2.901.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AYP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000213468	DIAZ ORTIZ KAREN TATIANA	1	0			S	X																230201	569.400	91.200	0	0	0	0	EPS005	569.400	22.800	14-23	569.400	5	39.700	CCF21	569.400	22.800	0	0	0	0	0
2	CC	1001174862	ROMERO AVELLANEDA ALLAN DAVID	1	0			S	X																230201	142.350	22.800	0	0	0	0	EPS002	142.350	5.700	14-23	142.350	5	10.000	CCF21	142.350	5.700	0	0	0	0	0
3	CC	1003517033	MORA GONZALEZ LIZARDO	1	0			S	X																230301	569.400	91.200	0	0	0	0	EPS017	569.400	22.800	14-23	569.400	5	39.700	CCF21	569.400	22.800	0	0	0	0	0
4	CC	1007351801	GOMEZ JIMENEZ MIGUEL ANGEL	1	0			S	X																230301	569.400	91.200	0	0	0	0	EPS005	569.400	22.800	14-23	569.400	5	39.700	CCF21	569.400	22.800	0	0	0	0	0
5	CC	1010174397	RODRIGUEZ VILLALOBOS LUIS ALBERTO	1	0			S	X																230301	284.700	45.600	0	0	0	0	EPSC34	284.700	11.400	14-23	284.700	5	19.900	CCF21	284.700	11.400	0	0	0	0	0
6	CC	1014304029	ALVAREZ VALENCIA MARCO STIVEN	1	0			S	X																230301	569.400	91.200	0	0	0	0	EPS017	569.400	22.800	14-23	569.400	5	39.700	CCF21	569.400	22.800	0	0	0	0	0
7	CC	1033744081	GARCIA RIVERA JAVIER ALEXANDER	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF21	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
8	CC	1067721019	MARTINEZ MORENO CARLOS EDUARDO	1	0			S	X																230301	379.600	60.800	0	0	0	0	EPS017	379.600	15.200	14-23	379.600	5	26.500	CCF21	379.600	15.200	0	0	0	0	0
9	CC	10938345	MASIAS LICONA LUIS EDUARDO	1	0			S		X															230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS017	47.450	1.900	14-23	47.450	5	3.400	CCF21	47.450	1.900	0	0	0	0	0
10	CC	11204921	GALEANO MUÑOZ CAMILO ANDRES	1	0			S	X	X															25-14	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS002	47.450	1.900	14-23	47.450	5	3.400	CCF21	47.450	1.900	0	0	0	0	0
11	CC	1022324123	TORRES GARCIA FREDY ALEXANDER	1	0			S	X	X															230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS017	47.450	1.900	14-23	47.450	5	3.400	CCF21	47.450	1.900	0	0	0	0	0
12	CC	1026299566	FLOREZ PAEZ JORGE ALEJANDRO	1	0			S	X																230201	474.500	76.000	0	0	0	0	EPSC34	474.500	19.000	14-23	474.500	5	33.100	CCF21	474.500	19.000	0	0	0	0	0
13	CC	1031143594	RUGELES CAMARGO STEVEN HUMBERTO	1	0			S	X	X															230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS008	47.450	1.900	14-23	47.450	5	3.400	CCF21	47.450	1.900	0	0	0	0	0
14	CC	1031180000	MONDRAGON LEON DANILO	1	0			S	X	X															230201	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS010	47.450	1.900	14-23	47.450	5	3.400	CCF21	47.450	1.900	0	0	0	0	0
15	CC	79055072	TRUJILLO WILSON	1	0			S	X																230201	569.400	91.200	0	0	0	0	EPS005	569.400	22.800	14-23	569.400	5	39.700	CCF21	569.400	22.800	0	0	0	0	0
16	CC	79907532	AMEZQUITA DIAZ JOSE SAUL	1	0			S	X	X															231001	94.900	15.200	0	0	0	0	EPSC34	94.900	3.800	14-23	94.900	5	6.700	CCF21	94.900	3.800	0	0	0	0	0
17	CC	1068972066	BAQUERO DIAZ HEIVER ANDREY	1	0			S	X	X															231001	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS017	47.450	1.900	14-23	47.450	5	3.400	CCF21	47.450	1.900	0	0	0	0	0
18	CC	1070916845	BAJONERO BUSTOS EDGAR ANDRES	1	0			S	X	X															230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS002	47.450	1.900	14-23	47.450	5	3.400	CCF21	47.450	1.900	0	0	0	0	0
19	CC	1074782025	ALVAREZ VEGA DUVAN FELIPE	1	0			S	X	X															230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS037	47.450	1.900	14-23	47.450	5	3.400	CCF21	47.450	1.900	0	0	0	0	0
20	CC	1083869658	LONDOÑO QUIMBAYO JEFERSSON	1	0			S	X	X															25-14	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS017	47.450	1.900	14-23	47.450	5	3.400	CCF21	47.450	1.900	0	0	0	0	0
21	CC	80400024	BUITRAGO PAEZ JOSE HERNANDO	1	0			S	X	X															231001	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS008	47.450	1.900	14-23	47.450	5	3.400	CCF21	47.450	1.900	0	0	0	0	0
22	CC	80497425	SASTOQUE TOVAR JAIRO HERNANDO	1	0			S	X	X															230201	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS005	47.450	1.900	14-23	47.450	5	3.400	CCF21	47.450	1.900	0	0	0	0	0
23	CC	1126124551	CONTRERAS ARRIETA VICTOR ENRIQUE	1	0			S		X															230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS005	47.450	1.900	14-23	47.450	5	3.400	CCF21	47.450	1.900	0	0	0	0	0
24	CC	12133451	PRADA FERREIRA ARNOLDO	1	0			S																	231001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF21	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
25	CC	19332924	CASTILLO GUERRERO HUGO	1	0			S	X	X															25-14	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS002	47.450	1.900	14-23	47.450	5	3.400	CCF21	47.450	1.900	0	0	0	0	0
26	CC	19483384	ESLAVA RAMIREZ GUILLERMO FERNANDO	1	0			S	X	X															25-14	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS017	47.450	1.900	14-23	47.450	5	3.400	CCF21	47.450	1.900	0	0	0	0	0
27	CC	80764127	SOTO JARAMILLO WILLIAM ORLEY	1	0			S	X	X															230201	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS002	47.450	1.900	14-23	47.450	5	3.400	CCF21	47.450	1.900	0	0	0	0	0
28	CC	91011861	PEÑA REYNALDO	1	0			S	X																230301	711.750	113.900	0	0	0	0	EPS017	711.750	28.500	14-23	711.750	5	49.600	CCF21	711.750	28.500	0	0	0	0	0
29	CC	79965611	AMEZQUITA SANCHEZ ALEJANDRO	1	0			S	X																230301	284.700	45.600	0	0	0	0	EPS002	284.700	11.400	14-23	284.700	5	19.900	CCF21	284.700	11.400	0	0	0	0	0
30	CC	80012504	RIVAS ARTUNDUAGA CESAR	1	0			S	X	X															230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPSC34	47.450	1.900	14-23	47.450	5	3.400	CCF21	47.450	1.900	0	0	0	0	0
31	CC	80064557	FLOREZ AVILA JORGE ARISMENDIS	1	0			S	X																230201	474.500	76.000	0	0	0	0	EPS002	474.500	19.000	14-23	474.500	5	33.100	CCF21	474.500	19.000	0	0	0	0	0
32	CC	80249266	SANCHEZ SANCHEZ JAIRO	1	0			S	X	X															230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS002	47.450	1.900	14-23	47.450	5	3.400	CCF21	47.450	1.900	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901022448-9	JGR CONSTRUCCIONES SAS	KR 7 C ESTE 90 D- 61 SUR	3214770772	jgrafiliaciones12@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL BOGO	001	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					18	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-01	E	12/02/2025	84145619	$4.062.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	43.700	0		0		0	0	0	0	43.700	4
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	24.700	0		0		0	0	0	0	24.700	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	83.500	0		0		0	0	0	0	83.500	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	202.100	0		0		0	0	0	0	202.100	6
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	120.000	0		0		0	0	0	0	120.000	2
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	5.700	0		0		0	0	0	0	5.700	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	68.400	0	0	0	0	0	0		68.400	3
230301	Porvenir	800224808-8	1.660.300	0	0	0	0	0	0		1.660.300	12
231001	Colfondos	800227940-6	326.500	0	0	0	0	0	0		326.500	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	90.700	0	0	0	0	0	0		90.700	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	842.800				842.800	0	0	842.800			8.428	842.800	18

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	536.700	0	0	536.700	18

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901022448-9	JGR CONSTRUCCIONES SAS		KR 7 C ESTE 90 D- 61 SUR	3214770772	jgrafiliaciones12@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL BOGO	001	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					18	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-01	E	12/02/2025	84145619	$4.062.100	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	536.700	536.700
Pensión	4	2.145.900	2.145.900
Riesgos Laborales	1	842.800	842.800
CCF	1	536.700	536.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	13	4.062.100	4.062.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901022448-9	JGR CONSTRUCCIONES SAS		KR 7 C ESTE 90 D- 61 SUR	3214770772	jgrafiliaciones12@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL BOGO	001	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					18	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-01	E	12/02/2025	84145619	$4.062.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1001167127	RUIZ GIRALDO HOOVER ANDRES	1	0			S	X																230301	142.350	22.800	0	0	0	0	EPS017	142.350	5.700	14-23	142.350	5	10.000	CCF24	142.350	5.700	0	0	0	0	0
2	CC	1001300527	GUACANEME HERRERA KEVIN JOEL	1	0			S	X	X															230301	142.350	22.800	0	0	0	0	EPS002	142.350	5.700	14-23	142.350	5	10.000	CCF24	142.350	5.700	0	0	0	0	0
3	CC	1007749607	OSORIO SANCHEZ JOSUE MAURICIO	1	0			S	X																230201	142.350	22.800	0	0	0	0	EPS017	142.350	5.700	14-23	142.350	5	10.000	CCF24	142.350	5.700	0	0	0	0	0
4	CC	1022931117	RIAÑO CULMA ANDRES MAURICIO	1	0			S	X																231001	616.850	98.700	0	0	0	0	EPS005	616.850	24.700	14-23	616.850	5	43.000	CCF24	616.850	24.700	0	0	0	0	0
5	CC	1022953822	TIQUE SARMIENTO WILSON GIOVANNI	1	0			S	X																230201	142.350	22.800	0	0	0	0	EPSC34	142.350	5.700	14-23	142.350	5	10.000	CCF24	142.350	5.700	0	0	0	0	0
6	CC	1023893873	GARCIA SANDRA MILENA	1	0			S	X																230201	142.350	22.800	0	0	0	0	EPS002	142.350	5.700	14-23	142.350	5	10.000	CCF24	142.350	5.700	0	0	0	0	0
7	CC	1069925348	NUÑEZ GUTIERREZ VICTOR FABIAN	1	0			S	X																25-14	566.667	90.700	0	0	0	0	EPS010	566.667	22.700	14-23	566.667	5	39.500	CCF24	566.667	22.700	0	0	0	0	0
8	CC	1121420005	LLANOS RIAÑO OSCAR JAVIER	1	0			S	X																230301	616.850	98.700	0	0	0	0	EPS002	616.850	24.700	14-23	616.850	5	43.000	CCF24	616.850	24.700	0	0	0	0	0
9	CC	17281204	RIAÑOS CULMA MARTIN	1	0			S																	230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS017	1.500.000	60.000	14-23	1.500.000	5	104.400	CCF24	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
10	CC	3086933	CASALLAS CASTILLO JOSE WILSON	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS041	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
11	CC	79562214	GUACANEME RODRIGUEZ RODOLFO	1	0			S	X																230301	189.800	30.400	0	0	0	0	EPS002	189.800	7.600	14-23	189.800	5	13.300	CCF24	189.800	7.600	0	0	0	0	0
12	CC	79819243	MONTIEL MALAMBO MILLER	1	0			S	X																230301	94.900	15.200	0	0	0	0	EPS010	94.900	3.800	14-23	94.900	5	6.700	CCF24	94.900	3.800	0	0	0	0	0
13	CC	80254601	MONTIEL MALAMBO SEYDI	1	0			S	X																230301	142.350	22.800	0	0	0	0	EPS017	142.350	5.700	14-23	142.350	5	10.000	CCF24	142.350	5.700	0	0	0	0	0
14	CC	1069925193	OVALLE RODRIGUEZ ABELARDO	1	0			S							X										230301	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS017	1.700.000	68.000	14-23	1.700.000	5	118.400	CCF24	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
15	CC	1069925393	OVALLE RODRIGUEZ HORACIO	1	0			S							X										230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS037	1.500.000	60.000	14-23	1.500.000	5	104.400	CCF24	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
16	CC	80489353	BARRETO MAURICIO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
17	CC	1003523504	OVALLE RODRIGUEZ JONNATHAN ESTEBAN	1	0			S							X										230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS037	1.500.000	60.000	14-23	1.500.000	5	104.400	CCF24	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
18	CC	1010218876	GOMEZ GONZALEZ YENNIFER CATERINE	1	0			S																	231001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS010	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900740931-1	P A A A S A S	carrera 38 78 i 35	7970496	dianycano724@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	efectivos	2	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					32	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-01	E	11/02/2025	84095722	$2.901.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	45.600	0		0		0	1	100	0	45.700	8
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	186.200	0		0		0	1	200	0	186.400	7
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	3.800	0		0		0	1	100	0	3.900	2
EPS010	EPS Sura	800088702-2	1.900	0		0		0	1	100	0	2.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	98.800	0		0		0	1	100	0	98.900	9
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	1.900	0		0		0	1	100	0	2.000	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	36.100	0		0		0	1	100	0	36.200	4

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	380.000	0	0	0	0	1	300	0	380.300	8
230301	Porvenir	800224808-8	828.100	0	0	0	0	1	600	0	828.700	16
231001	Colfondos	800227940-6	258.200	0	0	0	0	1	200	0	258.400	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	30.400	0	0	0	0	1	100	0	30.500	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	653.300				653.300	1	500	653.800			6.533	653.800	32

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	374.300	1	300	374.600	32

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900740931-1	P A A A S A S	carrera 38 78 i 35	7970496	dianycano724@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	efectivos / 2	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					32	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-01	E	11/02/2025	84095722	$2.901.400	

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	1	0	0	0
ICBF				
0	1	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	374.300	375.100
Pensión	4	1.496.700	1.497.900
Riesgos Laborales	1	653.300	653.800
CCF	1	374.300	374.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	13	2.898.600	2.901.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900740931-1	P A A A S A S		carrera 38 78 i 35	7970496	dianycano724@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
SUCURSAL	B – menos de 200 c	efectivos	2	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					32	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-01	E	11/02/2025	84095722	$2.901.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AYP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000213468	DIAZ ORTIZ KAREN TATIANA	1	0			S	X																230201	569.400	91.200	0	0	0	0	EPS005	569.400	22.800	14-23	569.400	5	39.700	CCF21	569.400	22.800	0	0	0	0	0
2	CC	1001174862	ROMERO AVELLANEDA ALLAN DAVID	1	0			S	X																230201	142.350	22.800	0	0	0	0	EPS002	142.350	5.700	14-23	142.350	5	10.000	CCF21	142.350	5.700	0	0	0	0	0
3	CC	1003517033	MORA GONZALEZ LIZARDO	1	0			S	X																230301	569.400	91.200	0	0	0	0	EPS017	569.400	22.800	14-23	569.400	5	39.700	CCF21	569.400	22.800	0	0	0	0	0
4	CC	1007351801	GOMEZ JIMENEZ MIGUEL ANGEL	1	0			S	X																230301	569.400	91.200	0	0	0	0	EPS005	569.400	22.800	14-23	569.400	5	39.700	CCF21	569.400	22.800	0	0	0	0	0
5	CC	1010174397	RODRIGUEZ VILLALOBOS LUIS ALBERTO	1	0			S	X																230301	284.700	45.600	0	0	0	0	EPSC34	284.700	11.400	14-23	284.700	5	19.900	CCF21	284.700	11.400	0	0	0	0	0
6	CC	1014304029	ALVAREZ VALENCIA MARCO STIVEN	1	0			S	X																230301	569.400	91.200	0	0	0	0	EPS017	569.400	22.800	14-23	569.400	5	39.700	CCF21	569.400	22.800	0	0	0	0	0
7	CC	1033744081	GARCIA RIVERA JAVIER ALEXANDER	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF21	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
8	CC	1067721019	MARTINEZ MORENO CARLOS EDUARDO	1	0			S	X																230301	379.600	60.800	0	0	0	0	EPS017	379.600	15.200	14-23	379.600	5	26.500	CCF21	379.600	15.200	0	0	0	0	0
9	CC	10938345	MASIAS LICONA LUIS EDUARDO	1	0			S		X															230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS017	47.450	1.900	14-23	47.450	5	3.400	CCF21	47.450	1.900	0	0	0	0	0
10	CC	11204921	GALEANO MUÑOZ CAMILO ANDRES	1	0			S	X	X															25-14	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS002	47.450	1.900	14-23	47.450	5	3.400	CCF21	47.450	1.900	0	0	0	0	0
11	CC	1022324123	TORRES GARCIA FREDY ALEXANDER	1	0			S	X	X															230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS017	47.450	1.900	14-23	47.450	5	3.400	CCF21	47.450	1.900	0	0	0	0	0
12	CC	1026299566	FLOREZ PAEZ JORGE ALEJANDRO	1	0			S	X																230201	474.500	76.000	0	0	0	0	EPSC34	474.500	19.000	14-23	474.500	5	33.100	CCF21	474.500	19.000	0	0	0	0	0
13	CC	1031143594	RUGELES CAMARGO STEVEN HUMBERTO	1	0			S	X	X															230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS008	47.450	1.900	14-23	47.450	5	3.400	CCF21	47.450	1.900	0	0	0	0	0
14	CC	1031180000	MONDRAGON LEON DANILO	1	0			S	X	X															230201	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS010	47.450	1.900	14-23	47.450	5	3.400	CCF21	47.450	1.900	0	0	0	0	0
15	CC	79055072	TRUJILLO WILSON	1	0			S	X																230201	569.400	91.200	0	0	0	0	EPS005	569.400	22.800	14-23	569.400	5	39.700	CCF21	569.400	22.800	0	0	0	0	0
16	CC	79907532	AMEZQUITA DIAZ JOSE SAUL	1	0			S	X	X															231001	94.900	15.200	0	0	0	0	EPSC34	94.900	3.800	14-23	94.900	5	6.700	CCF21	94.900	3.800	0	0	0	0	0
17	CC	1068972066	BAQUERO DIAZ HEIVER ANDREY	1	0			S	X	X															231001	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS017	47.450	1.900	14-23	47.450	5	3.400	CCF21	47.450	1.900	0	0	0	0	0
18	CC	1070916845	BAJONERO BUSTOS EDGAR ANDRES	1	0			S	X	X															230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS002	47.450	1.900	14-23	47.450	5	3.400	CCF21	47.450	1.900	0	0	0	0	0
19	CC	1074782025	ALVAREZ VEGA DUVAN FELIPE	1	0			S	X	X															230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS037	47.450	1.900	14-23	47.450	5	3.400	CCF21	47.450	1.900	0	0	0	0	0
20	CC	1083869658	LONDOÑO QUIMBAYO JEFERSSON	1	0			S	X	X															25-14	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS017	47.450	1.900	14-23	47.450	5	3.400	CCF21	47.450	1.900	0	0	0	0	0
21	CC	80400024	BUITRAGO PAEZ JOSE HERNANDO	1	0			S	X	X															231001	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS008	47.450	1.900	14-23	47.450	5	3.400	CCF21	47.450	1.900	0	0	0	0	0
22	CC	80497425	SASTOQUE TOVAR JAIRO HERNANDO	1	0			S	X	X															230201	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS005	47.450	1.900	14-23	47.450	5	3.400	CCF21	47.450	1.900	0	0	0	0	0
23	CC	1126124551	CONTRERAS ARRIETA VICTOR ENRIQUE	1	0			S		X															230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS005	47.450	1.900	14-23	47.450	5	3.400	CCF21	47.450	1.900	0	0	0	0	0
24	CC	12133451	PRADA FERREIRA ARNOLDO	1	0			S																	231001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF21	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
25	CC	19332924	CASTILLO GUERRERO HUGO	1	0			S	X	X															25-14	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS002	47.450	1.900	14-23	47.450	5	3.400	CCF21	47.450	1.900	0	0	0	0	0
26	CC	19483384	ESLAVA RAMIREZ GUILLERMO FERNANDO	1	0			S	X	X															25-14	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS017	47.450	1.900	14-23	47.450	5	3.400	CCF21	47.450	1.900	0	0	0	0	0
27	CC	80764127	SOTO JARAMILLO WILLIAM ORLEY	1	0			S	X	X															230201	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS002	47.450	1.900	14-23	47.450	5	3.400	CCF21	47.450	1.900	0	0	0	0	0
28	CC	91011861	PEÑA REYNALDO	1	0			S	X																230301	711.750	113.900	0	0	0	0	EPS017	711.750	28.500	14-23	711.750	5	49.600	CCF21	711.750	28.500	0	0	0	0	0
29	CC	79965611	AMEZQUITA SANCHEZ ALEJANDRO	1	0			S	X																230301	284.700	45.600	0	0	0	0	EPS002	284.700	11.400	14-23	284.700	5	19.900	CCF21	284.700	11.400	0	0	0	0	0
30	CC	80012504	RIVAS ARTUNDUAGA CESAR	1	0			S	X	X															230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPSC34	47.450	1.900	14-23	47.450	5	3.400	CCF21	47.450	1.900	0	0	0	0	0
31	CC	80064557	FLOREZ AVILA JORGE ARISMENDIS	1	0			S	X																230201	474.500	76.000	0	0	0	0	EPS002	474.500	19.000	14-23	474.500	5	33.100	CCF21	474.500	19.000	0	0	0	0	0
32	CC	80249266	SANCHEZ SANCHEZ JAIRO	1	0			S	X	X															230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS002	47.450	1.900	14-23	47.450	5	3.400	CCF21	47.450	1.900	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1007210785	JOEL ENRIQUE MENDOZA CHIQUILLO	calle 17F # 136-09	3045616	joelmendozachiquillo9@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-01	2025-01	I	21/02/2025	84324135	$118.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	41.600	0		0		0	1	100	0	41.700	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	53.200	0	0	0	0	1	100	0	53.300	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	23.200				23.200	1	100	23.300			232	23.300	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	1	0	0	0
ICBF				
0	1	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	41.600	41.700
Pensión	1	53.200	53.300
Riesgos Laborales	1	23.200	23.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	118.000	118.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1007210785	JOEL ENRIQUE MENDOZA CHIQUILLO		calle 17F # 136-09	3045616	joelmendozachiquillo9@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-01	2025-01	I	21/02/2025	84324135	$118.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1007210785	MENDOZA CHIQUILLO JOEL ENRIQUE	57	0			N	X																230301	332.150	53.200	0	0	0	0	EPS017	332.150	41.600	14-23	332.150	5	23.200		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901022448-9	JGR CONSTRUCCIONES SAS	KR 7 C ESTE 90 D- 61 SUR	3214770772	jgrafiliaciones12@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL BOGO	001	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					18	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-01	E	12/02/2025	84145619	$4.062.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	43.700	0		0		0	0	0	0	43.700	4
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	24.700	0		0		0	0	0	0	24.700	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	83.500	0		0		0	0	0	0	83.500	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	202.100	0		0		0	0	0	0	202.100	6
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	120.000	0		0		0	0	0	0	120.000	2
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	5.700	0		0		0	0	0	0	5.700	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	68.400	0	0	0	0	0	0		68.400	3
230301	Porvenir	800224808-8	1.660.300	0	0	0	0	0	0		1.660.300	12
231001	Colfondos	800227940-6	326.500	0	0	0	0	0	0		326.500	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	90.700	0	0	0	0	0	0		90.700	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	842.800				842.800	0	0	842.800			8.428	842.800	18

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	536.700	0	0	536.700	18

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901022448-9	JGR CONSTRUCCIONES SAS		KR 7 C ESTE 90 D- 61 SUR	3214770772	jgrafiliaciones12@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL BOGO	001	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					18	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-01	E	12/02/2025	84145619	$4.062.100	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	536.700	536.700
Pensión	4	2.145.900	2.145.900
Riesgos Laborales	1	842.800	842.800
CCF	1	536.700	536.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	13	4.062.100	4.062.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información
