ING. JAIME EDUARDO DUQUE GUTIERREZ
CONTRATO N. 4182.010.32.1.629-2025
REALIZAR INTERVENTORÍA A UN ESTUDIO CON ALCANCE DE DISEÑO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO - VEREDA LA GORGONA, CORREGIMIENTO LA CASTILLA

CONTRATANTE:SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL – UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP NIT.890399011-3

SUPERVISOR:UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

INFORME SEMANA No.	3	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL:	**11 AGOSTO DE 2025**	Y EL	**17 AGOSTO DE 2025**
FECHA DE ENTREGA INFORME UAESP:	**26/08/2025**	**FECHA DE SUBSANACIONES INFORME:**			

OBJETO	REALIZAR INTERVENTORÍA A UN ESTUDIO CON ALCANCE DE DISEÑO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO - VEREDA LA GORGONA, CORREGIMIENTO LA CASTILLA
LOCALIZACIÓN	VEREDA LA GORGONA CORREGIMIENTO LA CASTILLA, CALI VALLE DEL CAUCA
CONTRATISTA:	AGUDELO & GUTIERREZ INGENIERIA SAS NIT 901262497
OBJETO:	REALIZAR UN ESTUDIO CON ALCANCE DE DISEÑO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO - VEREDA LA GORGONA, CORREGIMIENTO LA CASTILLA CONTRATO N. 4182.010.26.1.350-2025

CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO DE CONSULTORIA	
CONTRATO No.:	**4182.010.32.1.629-2025**	CONTRATO No.:	**CONTRATO N. 4182.010.26.1.350-2025**
CONTRATISTA:	**JAIME EDUARDO DUQUE GUTIERREZ**	CONTRATISTA:	**AGUDELO & GUTIERREZ INGENIERIA SAS**
PLAZO INICIAL:	**HASTA 1 DE DICIEMBRE DE 2025**	PLAZO INICIAL:	**HASTA 30 NOVIEMBRE DE 2025**
FECHA DE INICIACIÓN:	**AGOSTO 1 DE 2025**	FECHA DE INICIACIÓN:	**AGOSTO 1 DE 2025**
FECHA DE SUSPENSIÓN:		FECHA DE SUSPENSIÓN:	
FECHA DE REINICIACIÓN:		FECHA DE REINICIACIÓN:	
FECHA DE TERMINACIÓN:		FECHA DE TERMINACIÓN:	
PLAZO ACTUALIZADO:		PLAZO ACTUALIZADO:	
VALOR INICIAL:	**$ 41.305.822**	VALOR INICIAL :	**$ 322.310.621**
VALOR ADICION(ES):	**$ -**	VALOR ADICION(ES):	**$ -**
VALOR ACTUALIZADO:	**$ -**	VALOR ACTUALIZADO:	**$ -**
VALOR PAGADO:	**$ -**	VALOR PAGADO:	**$ -**

2. ESTADO DE LAS GARANTÍAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE CONSULTORIA			
CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR	CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR
	DESDE	HASTA			DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/07/2025	30/05/2026	$ 8.261.164,40	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	1/08/2025	1/06/2026	$ 64.462.124,20
PAGO DE SALARIOS, P.SOCIALES E INDEM	30/07/2025	30/11/2028	$ 3.304.465,76	PAGO DE SALARIOS, P.SOCIALES E INDEM	1/08/2025	1/12/2028	$ 25.784.849,68
CALIDAD DEL SERVICIO	30/07/2025	30/11/2026	$ 8.261.164,40	CALIDAD DEL SERVICIO	1/12/2025	1/12/2026	$ 64.462.124,20

3. RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CONTRATO DE CONSULTORIA

CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR

5. REGISTRO FOTOGRAFICO



SOCIALIZACION



SOCIALIZACION




SOCIALIZACION



COMUNIDAD EN CONTRA DEL PERSONAL CONTRATISTA CONSULTOR

4. CURVA "S"

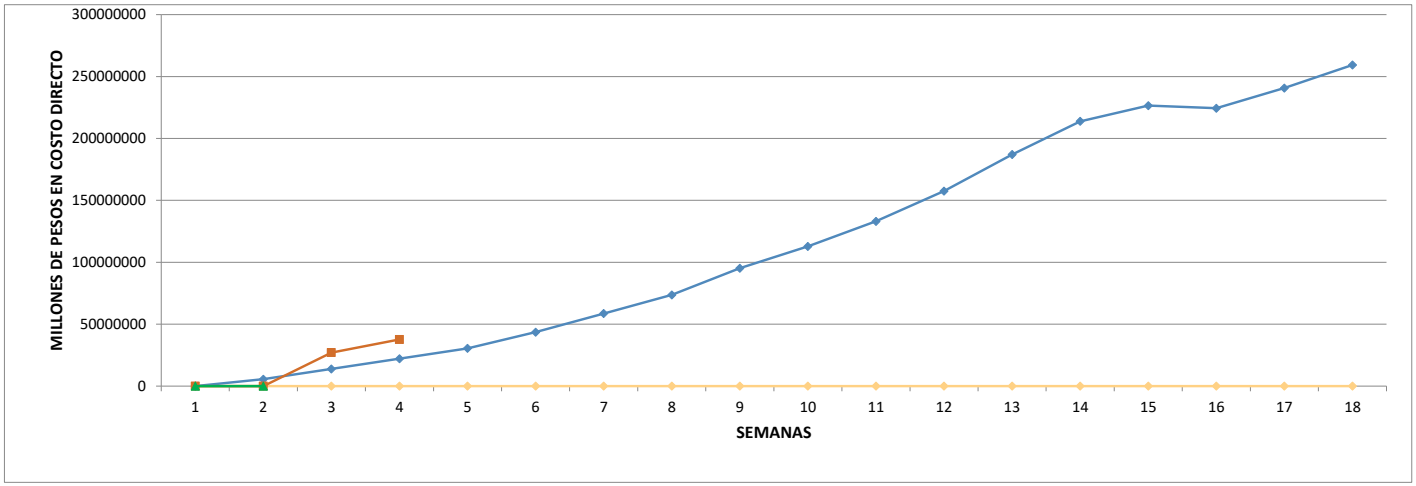

PROGRAMADO: Valor acumulado conforme a la programación vigente.

EJECUTADO: Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoria.

PAGADO: Valor acumulado efectivamente pagado al contratista.

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

Se continúa con el levantamiento topografico en las área de zona de bocatoma y zona de ubicación de planta de tratamiento. Adicional a estas actividades ejecutadas por el contratista de la consultoria se realiza socialización con la comunidad dandole a conocer el alcance del proyecto de diseño. Cabe de aclarar que en la socializacion se manifiesta alguna incorfidad por miembros de otras comunidades por el desarrollo del proyecto, hasta el punto que el día 16 de agosto miembros de la comunidad no beneficiaria del proyecto amenazaron con machetes al equipo de profesionales del contratista impidiendo el desarrollo normal del contrato.

6. PORCENTAJE DE AVANCE, COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

ha esta semana se cuenta con una avance en la ejecución del contrato del 14%

INTERVENTOR
ING. JAIME EDUARDO DUQUE GUTIERREZ
CONTRATISTA
