ING. JAIME EDUARDO DUQUE GUTIERREZ
CONTRATO N. 4182.010.32.1.629-2025
REALIZAR INTERVENTORÍA A UN ESTUDIO CON ALCANCE DE DISEÑO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO - VEREDA LA GORGONA, CORREGIMIENTO LA CASTILLA

CONTRATANTE:SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL – UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP NIT.890399011-3

SUPERVISOR:UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

INFORME SEMANA No.	4	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL:	**18 AGOSTO DE 2025**	Y EL	**24 DE AGOSTO DE 2025**
FECHA DE ENTREGA INFORME UAESP:	**26/08/2025**	**FECHA DE SUBSANACIONES INFORME:**			

OBJETO	REALIZAR INTERVENTORÍA A UN ESTUDIO CON ALCANCE DE DISEÑO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO - VEREDA LA GORGONA, CORREGIMIENTO LA CASTILLA
LOCALIZACIÓN	VEREDA LA GORGONA CORREGIMIENTO LA CASTILLA, CALI VALLE DEL CAUCA
CONTRATISTA:	AGUDELO & GUTIERREZ INGENIERIA SAS NIT 901262497
OBJETO:	REALIZAR UN ESTUDIO CON ALCANCE DE DISEÑO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO - VEREDA LA GORGONA, CORREGIMIENTO LA CASTILLA CONTRATO N. 4182.010.26.1.350-2025

CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO DE CONSULTORIA	
CONTRATO No.:	**4182.010.32.1.629-2025**	CONTRATO No.:	**CONTRATO N. 4182.010.26.1.350-2025**
CONTRATISTA:	**JAIME EDUARDO DUQUE GUTIERREZ**	CONTRATISTA:	**AGUDELO & GUTIERREZ INGENIERIA SAS**
PLAZO INICIAL:	**HASTA 1 DE DICIEMBRE DE 2025**	PLAZO INICIAL:	**HASTA 30 NOVIEMBRE DE 2025**
FECHA DE INICIACIÓN:	**AGOSTO 1 DE 2025**	FECHA DE INICIACIÓN:	**AGOSTO 1 DE 2025**
FECHA DE SUSPENSIÓN:		FECHA DE SUSPENSIÓN:	
FECHA DE REINICIACIÓN:		FECHA DE REINICIACIÓN:	
FECHA DE TERMINACIÓN:		FECHA DE TERMINACIÓN:	
PLAZO ACTUALIZADO:		PLAZO ACTUALIZADO:	
VALOR INICIAL:	**$ 41.305.822**	VALOR INICIAL :	**$ 322.310.621**
VALOR ADICION(ES):	**$ -**	VALOR ADICION(ES):	**$ -**
VALOR ACTUALIZADO:	**$ -**	VALOR ACTUALIZADO:	**$ -**
VALOR PAGADO:	**$ -**	VALOR PAGADO:	**$ -**

2. ESTADO DE LAS GARANTÍAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE CONSULTORIA			
CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR	CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR
	DESDE	HASTA			DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/07/2025	30/05/2026	$ 8.261.164,40	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	1/08/2025	1/06/2026	$ 64.462.124,20
PAGO DE SALARIOS, P.SOCIALES E INDEM	30/07/2025	30/11/2028	$ 3.304.465,76	PAGO DE SALARIOS, P.SOCIALES E INDEM	1/08/2025	1/12/2028	$ 25.784.849,68
CALIDAD DEL SERVICIO	30/07/2025	30/11/2026	$ 8.261.164,40	CALIDAD DEL SERVICIO	1/12/2025	1/12/2026	$ 64.462.124,20

3. RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CONTRATO DE CONSULTORIA

CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR

5. REGISTRO FOTOGRAFICO

INGENIERÍA	**CONTRATO No. 4182.010.26.1.350-2025**	**AGUDELO & GUTIÉRREZ INGENIERÍA S.A.S** **NIT: 901.262.497-9** **No. Contacto: 3187429326** **3113684817** **Correo electrónico:** agudeloygutierrezingenieria@gmail.com
	CORRESPONDENCIA ENVIADA	

Santiago de Cali, 21 de agosto de 2025

AGCE-P0401-035-001

Señores:
JAIME EDUARDO DUQUE GUTIÉRREZ
INTERVENTOR

REFERENCIA: CONTRATO No. 4182.010.26.1.350-2025 "REALIZAR UN ESTUDIO CON ALCANCE DE DISEÑO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO - VEREDA LA GORGONA, CORREGIMIENTO LA CASTILLA".

ASUNTO: SOLICITUD DE SUSPENSIÓN TEMPORAL – CONTRATO DE CONSULTORÍA NO. 4182.010.26.1.350-2025

Respetado ingeniero,

En mi calidad de representante legal de **AGUDELO & GUTIÉRREZ INGENIERÍA S.A.S**, contratista del

OFICIO SOLICITUD DE SUSPENSION DEL CONTRATO

SOLICITUD DE SUSPENSIÓN TEMPORAL – CONTRATO DE CONSULTORÍA NO. 4182.010.26.1.350-2025

De AGUDELO & GUTIÉRREZ INGENIERÍA
Destinatario proyectos
Fecha vie 01:33

Resumen Cabeceras Sólo texto

AGCE-P0401-035-001.pdf (~427 KB)

Cordial saludo,

Respetado Ingeniero Jaime Duque, Interventor del contrato de consultoría 4182.010.26.1.350-2025, adjunto el oficio con consecutivo AGCE-P0401-035-001, solicitando la suspensión temporal del contrato de consultoría.

Muchas gracias por la atención prestada,


Cordialmente,

AGUDELO & GUTIÉRREZ INGENIERÍA

JUAN FELIPE AGUDELO P.
Gerente Administrativo

Contácto: 318 7429326
Cll 36 A Norte # 3G - 07 Prados del Norte.

4. CURVA "S"

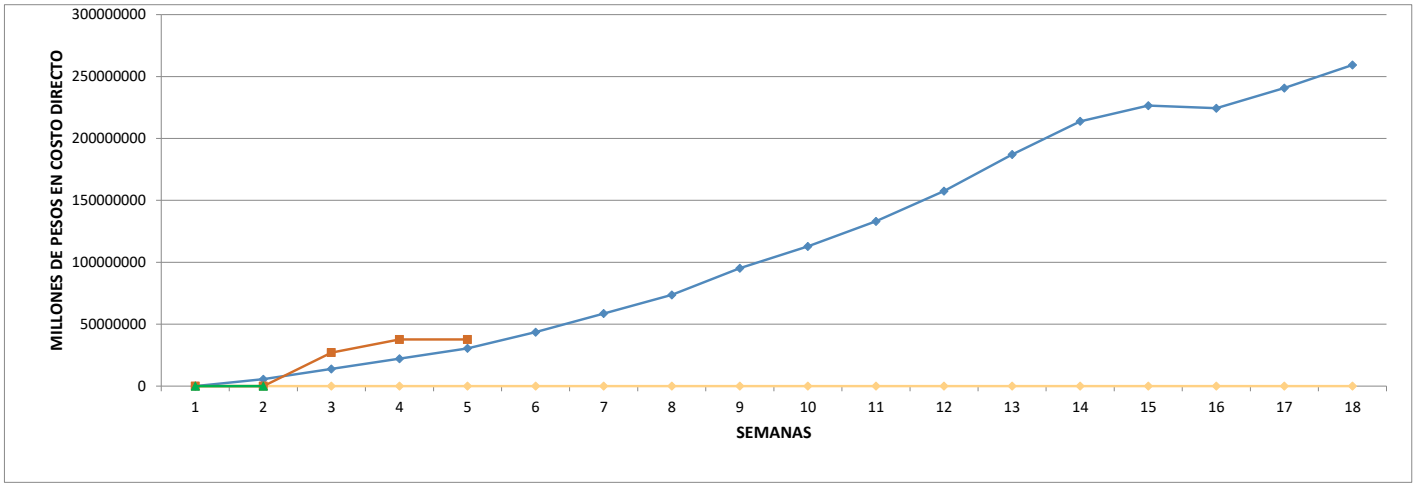

PROGRAMADO: Valor acumulado conforme a la programación vigente.

EJECUTADO: Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoria.

PAGADO: Valor acumulado efectivamente pagado al contratista.

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

En esta semana el contratista no adelanto ningun tipo de ejecución de actividades, solo procesamiento de información recolectada en campo y la cual no puede seguir adelantando debido a las amenazas de la comunidad en contra del desarrollo del proyecto, de igual manera la interventoria recibe oficio por parte del contratista solicitando la suspensión del contrato hasta tanto no se solucionen estos inconvenientes para la cual se plantea una nueva socialización por parte de la UESP, interventoria, contratista y comunidad para el día 26 de agosto en la cual se definirá la continuidad del proyecto. La interventoria y la firma constratista asistimos a comite de seguimiento en las instalaciones de la UESP donde se manifiesta esta situación que motivo la solicitud de suspensión del contrato.

6. PORCENTAJE DE AVANCE, COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

ha esta semana se cuenta con una avance en la ejecución del contrato del 14%

INTERVENTOR
ING. JAIME EDUARDO DUQUE GUTIERREZ
CONTRATISTA
