ING. JAIME EDUARDO DUQUE GUTIERREZ
CONTRATO N. 4182.010.32.1.629-2025
REALIZAR INTERVENTORÍA A UN ESTUDIO CON ALCANCE DE DISEÑO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO - VEREDA LA GORGONA, CORREGIMIENTO LA CASTILLA

CONTRATANTE:SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL – UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP NIT.890399011-3

SUPERVISOR:UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

INFORME SEMANA No.	7	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL:	**8 SEPTIEMBRE DE 2025**	Y EL	**8 DE SEPTIEMBRE DE 2025**
FECHA DE ENTREGA INFORME UAESP:	**17/09/2025**	**FECHA DE SUBSANACIONES INFORME:**			

OBJETO	**REALIZAR INTERVENTORÍA A UN ESTUDIO CON ALCANCE DE DISEÑO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO - VEREDA LA GORGONA, CORREGIMIENTO LA CASTILLA**
LOCALIZACIÓN	**VEREDA LA GORGONA CORREGIMIENTO LA CASTILLA, CALI VALLE DEL CAUCA**
CONTRATISTA:	**AGUDELO & GUTIERREZ INGENIERIA SAS** **NIT** **901262497**
OBJETO:	**REALIZAR UN ESTUDIO CON ALCANCE DE DISEÑO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO - VEREDA LA GORGONA, CORREGIMIENTO LA CASTILLA CONTRATO N. 4182.010.26.1.350-2025**

CONTRATO DE INTERVENTORIA		**CONTRATO DE CONSULTORIA**	
CONTRATO No.:	**4182.010.32.1.629-2025**	CONTRATO No.:	**CONTRATO N. 4182.010.26.1.350-2025**
CONTRATISTA:	**JAIME EDUARDO DUQUE GUTIERREZ**	CONTRATISTA:	**AGUDELO & GUTIERREZ INGENIERIA SAS**
PLAZO INICIAL:	**HASTA 1 DE DICIEMBRE DE 2025**	PLAZO INICIAL:	**HASTA 30 NOVIEMBRE DE 2025**
FECHA DE INICIACIÓN:	**AGOSTO 1 DE 2025**	FECHA DE INICIACIÓN:	**AGOSTO 1 DE 2025**
FECHA DE SUSPENSIÓN:		FECHA DE SUSPENSIÓN:	
FECHA DE REINICIACIÓN:		FECHA DE REINICIACIÓN:	
FECHA DE TERMINACIÓN:		FECHA DE TERMINACIÓN:	
PLAZO ACTUALIZADO:		PLAZO ACTUALIZADO:	
VALOR INICIAL:	**$ 41.305.822**	VALOR INICIAL :	**$ 322.310.621**
VALOR ADICION(ES):	**$ -**	VALOR ADICION(ES):	**$ -**
VALOR ACTUALIZADO:	**$ -**	VALOR ACTUALIZADO:	**$ -**
VALOR PAGADO:	**$ -**	VALOR PAGADO:	**$ -**

2. ESTADO DE LAS GARANTÍAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				**CONTRATO DE CONSULTORIA**			
CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR	CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR
	DESDE	HASTA			DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/07/2025	30/05/2026	$ 8.261.164,40	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	1/08/2025	1/06/2026	$ 64.462.124,20
PAGO DE SALARIOS, P.SOCIALES E INDEM	30/07/2025	30/11/2028	$ 3.304.465,76	PAGO DE SALARIOS, P.SOCIALES E INDEM	1/08/2025	1/12/2028	$ 25.784.849,68
CALIDAD DEL SERVICIO	30/07/2025	30/11/2026	$ 8.261.164,40	CALIDAD DEL SERVICIO	1/12/2025	1/12/2026	$ 64.462.124,20

3. RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**CONTRATO DE CONSULTORIA**

CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR


5. REGISTRO FOTOGRAFICO





PROCESAMIENTO DE INFORMACION ESTUDIO DE SUELOS

4. CURVA "S"

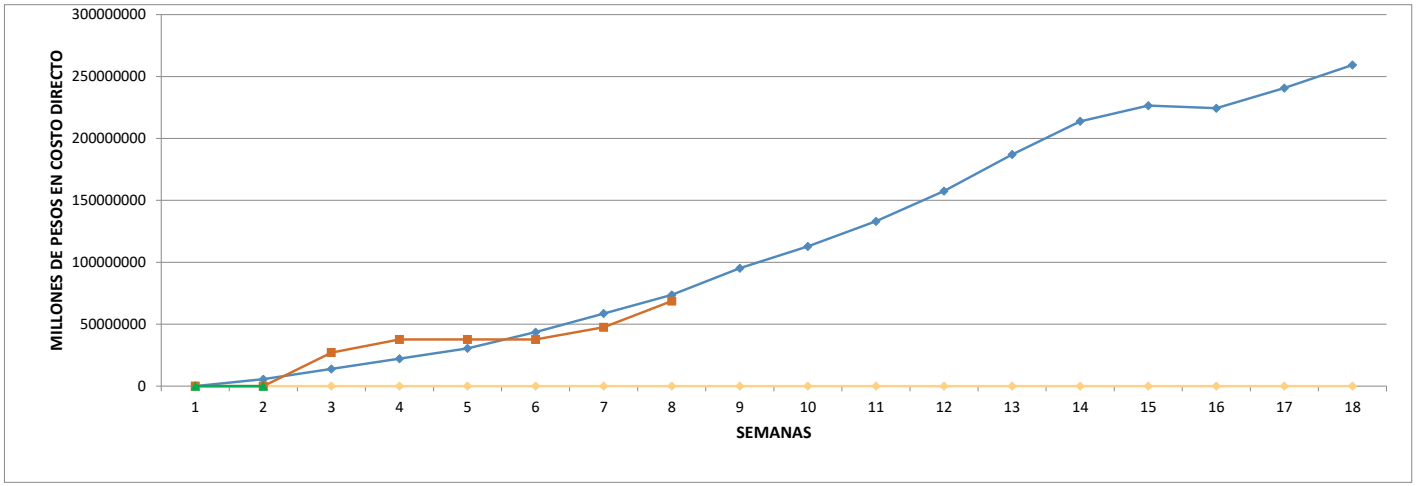

PROGRAMADO: Valor acumulado conforme a la programación vigente.

EJECUTADO: Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoria.

PAGADO: Valor acumulado efectivamente pagado al contratista.

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

El contratista culmina las actividades de procesamiento de información de la topografía y de estudio de suelos, a la espera de la definición por parte de la entidad contratante del paso a seguir para continuar con los trabajos en el terreno o la ejecución de las actividades por medio de equipos tipo dron, situaciones que se han manifestado por parte del contratista y de la interventoria del contrato en los comites desarrollados desde la fecha de ocurrencia de los hechos. En comite realizado esta semana en la UAESP se solicito acompañamiento de personería y policia para informarle de nuevo a la comunidad el alcance del proyecto y llevarlo a feliz termino cumpliendo el objeto contractual y de no llegar a ningun acuerdo se debe de realizar por equipos tipo dron.

6. PORCENTAJE DE AVANCE, COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

ha esta semana se cuenta con una avance en la ejecución del contrato del 25%

INTERVENTOR
ING. JAIME EDUARDO DUQUE GUTIERREZ
CONTRATISTA
