FORMATO		
RADICACIÓN WEB		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-DO-42	Gestión Documental	1

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

www.idu.gov.co
Calle 22 No. 6 - 27 Tel.: 3386660

Radicado No:

202552601310102

Fecha de Radicado:	09-09-2025	**Canal de Recepción**	Virtual - Formulario WEB

Remitente:	CONSORCIO MAB INGENIERIA	**Documento No.: (cc, ce, nit, pass.)**	9017840414
Dirección:	Av EL DORADO 69 76 TORRE 3 OFICINA 501	**Teléfono / Celular:**	/
Departamento:	Bogotá DC	**Municipio:**	Bogotá
Correo electrónico:	CORRESPONDENCIA@MAB.COM.CO	**No Contrato / Convenio:**	2420
Asunto:	GTC Contrato De Interventoria No Idu24202024 Alcance a la comunicacion CMI2IDU24202024150525 con radicado IDU 202552601301872 Informe Semanal No 32 comprendido entre el 26082025 y 01092025		
Anexos:	Hay 4 archivo(s) anexos a parte del radicado principal		

Al responder citar este consecutivo:
CMI-2-IDU-2420-2024-1519-25

BOGOTÁ D.C., 9 de septiembre de 2025

Arquitecto
LUIS EDUARDO QUITIAN CASTIBLANCO
Subdirector Técnico de Conservación del Subsistema de Transporte (e)
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
Calle 22 No. 6-27
BOGOTÁ

Referencia: **Contrato de Interventoría No IDU-2420-2024:** " INTERVENTORÍA A LA BRIGADA DE REACCIÓN PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS ACTIVIDADES PUNTUALES EN EL ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ DC. GRUPO 3."

Asunto: **GTC - Contrato De Interventoría No Idu-2420-2024.** Alcance a la comunicación CMI-2-IDU-2420-2024-1505-25 con radicado IDU 202552601301872. Informe Semanal No. 32 - comprendido entre el 26/08/2025 y 01/09/2025.

Respetado Arquitecto:

Mediante la presente, damos alcance a la comunicación CMI-2-IDU-2420-2024-1505-25 con radicado IDU 202552601301872 en el cual se remitió al Instituto el Informe Semanal No. 32 - comprendido entre el 26/08/2025 y 01/09/2025.Esto a razón de que, por un error involuntantio, la información suministrada mediante enlace no permitía el acceso para visualización de los archivos.

Teniendo en cuenta que el archivo en formato excel que contiene el editable del informe excede el límite permitido por la plataforma CONECTA IDU, se remite el editable del documento mediante el siguiente enlace:

https://drive.google.com/open?id=1IYjNb1SHsmN4SrMyL-JjJGkqROy2LnXl&usp=drive_fs

Cordialmente,

Martin Castro H.
MARTIN AUGUSTO CASTRO HUERTAS
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Anexo: Lo anterior en dos (2) PDF, un (1) archivo Excel y un (1) archivo formato mpp y en enlace:
https://drive.google.com/open?id=1IYjNb1SHsmN4SrMyL-JjJGkqROy2LnXl&usp=drive_fs
Elaboró: MXMR/Revisó: MACH

WWW.MAB.COM.CO
Av. El Dorado N° 69-76
Torre 3 Ofic. 501
Bogotá D.C. - Colombia
CONTACTO:

FORMATO		
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA		
CODIGO	PROCESO	VERSION
FO-CI-68	Conservación de Infraestructura	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA — **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** — **DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE**

SEMANA No. 32 (Consecutivo) **DEL** 26/8/2025 (dd-mm-aa) **AL** 1/9/2025 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 2420-2024 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** 2409-2024 (Número de Contrato)

1. DATOS GENERALES

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

BRIGADA DE REACCIÓN PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS ACTIVIDADES PUNTUALES EN EL ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. Grupo 3

CONTRATISTA OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S. (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra) **NIT** 829.000.075-1 (Escriba el NIT del Contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO MAB INGENIERIA (Escriba el nombre o razón social del interventor) **NIT** 901.784.041-4 (Escriba el NIT del Interventor)

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Valor	$ 9.192.131.471,00	Valor	$ 1.622.148.631,00
Valor Adicional 1		Valor Adicional 1	
Valor Actualizado	$ 9.192.131.471,00	Valor Actualizado	$ 1.622.148.631,00
Plazo Inicial	8 meses	Plazo Inicial	8 meses
Plazo Prórroga 1		Plazo Prorroga 1	-
Plazo Actualizado	8 meses	Plazo Actualizado	8 meses
Fecha de Iniciación	16/01/2025	Fecha de Iniciación	16/01/2025
Fecha de Terminación Inicial	15/09/2025	Fecha de Terminación Inicial	15/09/2025
Fecha de Terminación Actual	15/09/2025	Fecha de Terminación Actual	15/09/2025
No. de empleos generados	29	No. De empleos generados	23

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (E): LUIS EDUARDO QUITIÁN CASTIBLANCO (Escriba el nombre del supervisor IDU)

PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN IDU: GLORIA AMANDA ROMERO MILLAN (Escriba el nombre del profesional del Equipo de Apoyo a la supervisión)

2. AVANCES DEL CONTRATO

META FÍSICA PROGRAMADA TOTAL DEL CONTRATO

Número de radicado de remisión de parte de interventoría del alcance físico del contrato de obra 20255260109649 2 (Escriba el número del oficio radicado IDU) **de fecha** 30/07/2025 (dd-mm-aa)


TIPO DE ELEMENTO	VALOR TOTAL ($)	ÁREA (M2)	km/carril	km	Unidad
Espacio Público	$ 4.105.263.999,66	10587,17		0	83
Ciclorruta	$ 5.086.867.471,34	21877,94		9,12	121
TOTALES	$ 9.192.131.471,00	32465,11	0	9,12	204

A. AVANCE GENERAL

AVANCE FINANCIERO

	PROGRAMADO			EJECUTADO			
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	Atraso /Avance	
Total Programado (%)	3,97%	87,63%	Total Ejecutado (%)	17,02%	72,97%	-14,67%	
Total Programado ($)	$365.096.996,84	$8.055.372.419,63	Total Ejecutado ($)	$1.564.698.914,97	$6.707.063.915,53	$ -1.348.308.504,10	
DIAGNÓSTICOS	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	Atraso /Avance	
Diagnóstico Programado (%)	$0,00	0	Diagnóstico Ejecutado (%)	0	0	0%	
Diagnóstico Programado ($)	-	0	Diagnóstico Ejecutado ($)	0	0	$ -	
ESTUDIOS Y DISEÑOS	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	Atraso /Avance	
Diseño Programado (%)	0	0	Diseño Ejecutado (%)	0	0	0%	
Diseño Programado ($)	0	0	Diseño Ejecutado ($)	0	0	$ -	
OBRA	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	Atraso /Avance	
Obra Programada (%)	3,97%	87,63%	Obra Ejecutada (%)	17,02%	72,97%	-14,67%	
Obra Programada ($)	$365.096.996,84	$8.055.372.419,63	Obra Ejecutada ($)	$1.564.698.914,97	$6.707.063.915,53	$ -1.348.308.504,10	

GRAFICA DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO

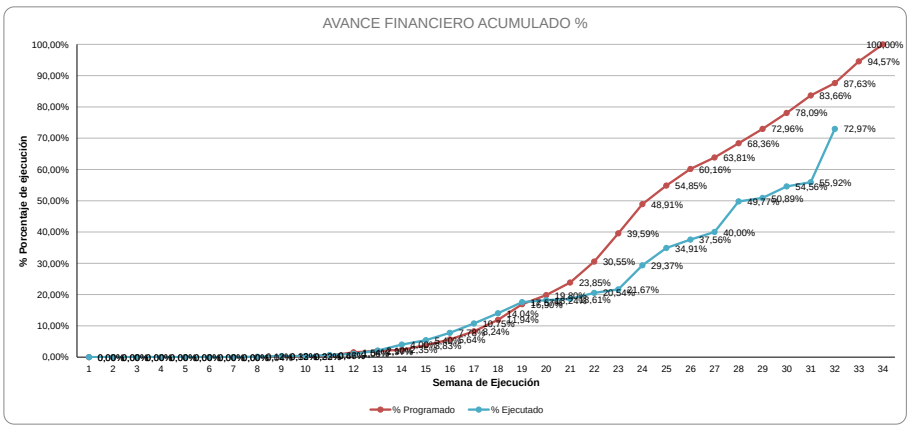

SEMANA No.	ACUMULADO FINANCIERO	
	PROGR (%)	EJEC. (%)
1	0,00%	0,00%
2	0,00%	0,00%
3	0,00%	0,00%
4	0,00%	0,00%
5	0,00%	0,00%
6	0,00%	0,00%
7	0,00%	0,00%
8	0,04%	0,12%
9	0,12%	0,33%
10	0,22%	0,33%
11	0,46%	0,67%
12	1,54%	1,06%
13	1,97%	2,10%
14	2,35%	4,00%
15	3,83%	5,40%
16	5,64%	7,78%
17	8,24%	10,75%
18	11,94%	14,04%
19	16,90%	17,57%
20	19,80%	18,24%
21	23,85%	18,61%
22	30,55%	20,54%
23	39,59%	21,67%
24	48,91%	29,37%
25	54,85%	34,91%
26	60,16%	37,56%
27	63,81%	40,00%
28	68,36%	49,77%
29	72,96%	50,89%
30	78,09%	54,56%
31	83,66%	55,92%
32	87,63%	72,97%
33	94,57%	
34	100,00%	

Análisis de la Gráfica:

Se observa en el avance financiero que el avance programado 87,63% fue mayor al ejecutado 72,97%, lo que indica una de desviación negativa del 14,67% por lo que se hace el debido llamado de atención al contratista para que tome las medidas pertinentes y así evitar que se afecte el contrato en su plazo contractual, sin embargo este reporte es sustento de la necesidad de ampliación del plazo contractual para cumplir con la meta financiera del contrato de obra.

Se evidencia que a pesar de haber realizado el ajuste a la distribución de la programación, la ejecución no es la esperada, lo cual se refleja en la desviación presentada anteriormente.

El PDT bajo el cual se realiza el seguimiento del presente informe fue remitido a la Entidad mediante comunicación CMI-2-IDU-2420-2024-1435-25 con radicado IDU 20255260124831 2 del 28 de agosto de 2025 a la espera del concepto de no objeción.

)

AVANCE FISICO

	PROGRAMADO			EJECUTADO			
CONSULTORÍA	SEMANAL	ACUMULADO	%Prog. Acum.		SEMANAL	ACUMULADO	% Ejec. Acum.
Diagnósticos Programado (m2)	N/A	N/A	N/A	Diagnósticos Ejecutado (m2)	N/A	N/A	N/A
Diagnósticos Programado (Und)	N/A	N/A	N/A	Diagnósticos Ejecutado (Und)	N/A	N/A	N/A
Diagnósticos Programado (Km)	N/A	N/A	N/A	Diagnósticos Ejecutado (Km)	N/A	N/A	N/A
Estudios y Diseños Program. (m2)	N/A	N/A		Estudios y Diseños Ejecutado (m2)	N/A	N/A	N/A
OBRA	SEMANAL	ACUMULADO	%Prog. Acum.		SEMANAL	ACUMULADO	% Ejec. Acum.
Meta Física Programada (m2)	415,27	31984,20	98,52%	Meta Física Ejecutada (m2)	388,02	28615,84	88,14%
Meta Física Programada (Km/carril)	0	0	0	Meta Física Ejecutada (Km/carril)			
Meta Física Programada (und)	0	0%	0	Meta Física Ejecutada (und)			
Meta Física Programada (km)	0	0%	0	Meta Física Ejecutada (km)			
Meta Física Programada (%)	n/a	n/a	n/a	Meta Física Ejecutada (%)	n/a	n/a	n/a

%Atraso /%Avance

%Atraso /%Avance


%Atraso /%Avance -10,38%

FORMATO		
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA		
CODIGO	PROCESO	VERSION
FO-CI-68	Conservación de Infraestructura	2

AVANCE PROJECT

Avance Programado (%) 87,63% | Avance Ejecutado (%) 72,97% | %Atraso /%Avance -14,67%

GRAFICA DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO

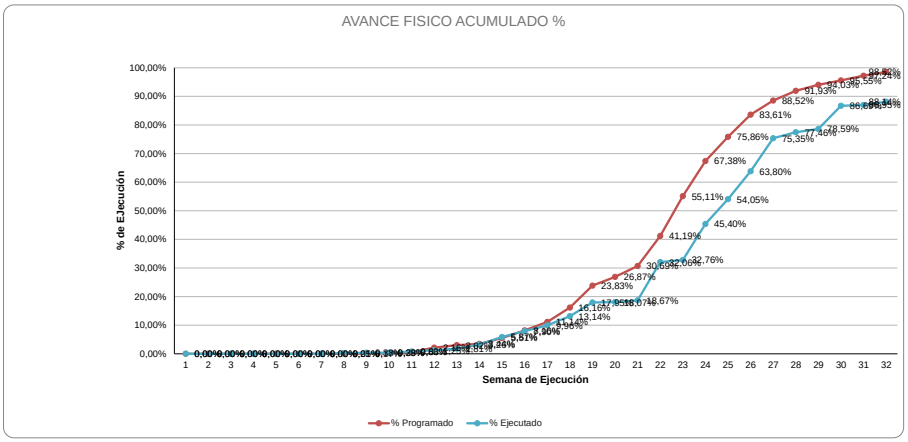

SEMANA No.	ACUMULADO FÍSICO	
	PROGR (%)	EJEC. (%)
1	0,00%	0,00%
2	0,00%	0,00%
3	0,00%	0,00%
4	0,00%	0,00%
5	0,00%	0,00%
6	0,00%	0,00%
7	0,00%	0,00%
8	0,05%	0,21%
9	0,17%	0,38%
10	0,29%	0,38%
11	0,63%	0,80%
12	2,16%	1,25%
13	3,02%	1,81%
14	3,44%	3,26%
15	5,51%	5,87%
16	8,16%	7,90%
17	11,14%	9,96%
18	16,16%	13,14%
19	23,83%	17,95%
20	26,87%	18,07%
21	30,69%	18,67%
22	41,19%	32,06%
23	55,11%	32,76%
24	67,38%	45,40%
25	75,86%	54,05%
26	83,61%	63,80%
27	88,52%	75,35%
28	91,93%	77,46%
29	94,03%	78,59%
30	95,55%	86,69%
31	97,24%	86,95%
32	98,52%	88,14%
33		

Análisis de la Gráfica:

Se evidencia en la gráfica que la metafísica de 8,200m^2 fue superada en cuanto a programación en la semana 20, de las 33 semanas del tiempo contractual lo cual refleja que se debe solicitar el ajuste a la metafísica dada la redistribución del PDT que fue aprobado.
De acuerdo con lo anterior mediante comunicación con radicado IDU 202552601096492 del 30 de julio de 2025, se solicitó actualizar la meta física del contrato de obra a 32,465,11 m^2, en función de los elementos aprobados

El PDT bajo el cual se realiza el seguimiento del presente informe fue remitido a la Entidad mediante comunicación CMI-2-IDU-2420-2024-1435-25 con radicado IDU 202552601248312 del 28 de agosto de 2025 a la espera del concepto de no objeción.

En cuanto al comportamiento de la gráfica se evidencia que se ha aumentado el porcentaje de atraso respecto a la meta física programada y aprobada para el desarrollo de las actividades, lo que genera un impacto negativo y un atraso significativo por lo cual se solicitó al contratista de obra adelantar el respectivo plan de contingencia, en esta semana se presenta una desviación negativa -10,38% a partir de la programación de 98,52% y la ejecución de 88,14%

B. ESTADO GENERAL DE LOS FRENTES DE TRABAJO EN LA SEMANA

								INFORMACIÓN DE FRENTES QUE DEBIERON INICIAR Y NO TIENEN ACTIVIDAD DE OBRA		
No	Nombre del frente	Tipo de Elemento	PK_ID (CÓDIGO DE ELEMENTO)	NOM	DESDE	HASTA	Estado	Fecha de inicio programada	Motivos por los cuales no ha iniciado	Acciones a seguir
1	CL 36 S DESDE KR 23 HASTA KR 23c	**Andén**	412985	CL 36 S	KR 23	KR 23 c	Ejecución	6-may-25	Elemento con avance físico	N/A
2	DG 46 S DESDE DG 46 S HASTA KR 50	**Andén**	410005	DG 46 S	DG 46 S	KR 50	Ejecución	10-abr-25	Elemento con avance físico	N/A
3	KR 14 DESDE CL 37 S HASTA CL 36 S	**Andén**	24131793	KR 14	CL 37 S	CL 36 S	Ejecución	23-ago-25	Elemento con avance físico	N/A

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

COMPONENTE TÉCNICO

- Mediante comunicación CMI-2-IDU-2420-2024-1452-25 radicado IDU 202552601256962 se da traslado al contratista del oficio SPMT 202531210040481 por Incumplimiento del PMT en la Calle 34 Sur entre la KR 12B y la KR 12BIS.
- Mediante comunicación CMI-2-IDU-2420-2024-1457-25 radicado IDU 202552601265772 se remite a la Entidad la solicitud exclusión del listado de elementos que no serán objeto de intervención en el marco del Contrato de Obra No. IDU 2409 de 2024, por causas tales como, interferencia de ronda hídrica de cuerpos de agua, presencia de raíces de árboles en los tramos, entre otros, tras realizar recorridos en conjunto entre el contratista y la interventoría, para el corredor de la Avenida Boyacá, entre la Autopista Sur y la Calle 26.
- Con comunicación CMI-2-IDU-2420-2024-1451-25 radicado IDU 202552601257162 se remiote a la Entidad el INFORME DE GERENCIA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025.
- Se realizan observaciones al contratista sobre la entrega del análisis de precios unitarios no previstos. NP-006, NP- 007, NP-008, NP-009 y NP-010 con la comunicación CMI-2-IDU-2420-2024-1445-25 radicado IDU No. 202552601253032
- Se entrega al Instituto el Balance N° 1 - Contrato de obra IDU 2409-2024 con comunicación CMI-2-IDU-2420-2024-1443-25 radicado IDU 202552601249212.

Tramo	frente	Dirección/Referencia
Tramo 1	1	Acera occidental (Auto sur /Av 1mayo-Av Kr 68)
	2	Madelena (Auto sur / Av Kr 68 - Kr 67) Costado Occidental y Costado Oriental
	3	Centro Mayor (Auto sur / Kr 52C - Cll 38 A sur)
	4	Albina (Auto sur / Cll 35 sur - Cll27 A su)
	5	Ciclorruta costado oriental (Av 1ra de Mayo - Madelena)
Tramo 2	1	Av. Kr 24 /Cll 52B Sur - Cll 48 C sur
	2	Av. Kr 24 / Cll 48C Sur - Cll 41 B sur
	3	Av. Kr 24 / Cll 48C Sur - Cll 41 B sur
Tramo 3	1	Cll 48 C Sur/ Kr 25 - Kr 24C
	2	Cll 48 C Sur/ Av Kr 24 - Kr 20
Tramo 4	1	Cll 36 Sur - costador sur (Av Kr 24 - Av Caracas) frentes de trabajo segmentados
	2	Cll 36 Sur - costador norte (Av Kr 24 - Av Caracas) frentes de trabajo segmentados
	3	Cll 36 Sur - costador sur (Av Kr 24 - Av Caracas) frentes de trabajo segmentados
	4	Cll 36 Sur - costador norte (Av Kr 24 - Av Caracas) frentes de trabajo segmentados
Tramo 5		Av caracas / Cll 36 sur - Dg 48 sur
Tramo 6		Av Kr 51 / Kr 70C - Tv60
Tramo7		Av Boyacá / Cll 45A sur(Autopista sur) - Av Cll 26(Av el Dorado)

COMPONENTE AMBIENTAL

1. Se realizaron recorridos diarios en obra y se mantuvo comunicación con los profesionales del contratista para la subsanación de los hallazgos en los frentes de obra y campamentos.

2. El 28 de agosto de 2025 se emitió la comunicación CMI-2-IDU-2420-2024-1429-25 (Respuesta a la comunicación OCCI-IDU-2409-898)- Cierre del apremio CMI-2-IDU-2420-2024-1168-25 relacionado con la gestión para el adecuado manejo de acopios de losetas sobre el espacio público.

3. El 28 de agosto de 2025 con la comunicación OCCI-IDU-2409-937 el contratista radicó la versión 3 del informe mensual ambiental No. 5.

4. El 29 de agosto de 2025 con la comunicación CMI-2-IDU-2420-2024-1421-25 se remitió la versión 3 del MAO aprobado por la interventoría a la entidad.

5. El 29 de agosto de 2025 con la comunicación CMI-2-IDU-2420-2024-1430-25 se dio respuesta a la comunicación 202517500884711 respecto a la solicitud a la interventoría para fortalecer e intensificar los controles y seguimiento respecto al cumplimiento, por parte del contratista, de las obligaciones relacionadas con la implementación de medidas preventivas para evitar la dispersión de material particulado y el derrame de materiales en la vía pública.

6. El 29 de agosto de 2025 on la comunicación CMI-2-IDU-2420-2024-1441-25 se dio respuesta a la comunicación OCCI-IDU-2409-896 respecto a la limpieza de la zona verde adyacente al puente de la Avenida Villavicencio.

7. El 29 de agosto de 2025 on la comunicación CMI-2-IDU-2420-2024-1442-25 se apremió al contratista por incumplimiento a las medidas establecidas en el MAO respecto al manejo ambiental en la ejecución de actividades constructivas. (Volquetas Movistar Arena).

8. El 29 de agosto de 2025 se participó en el comité integral y se expusieron las gestiones necesarias para el cumplimiento de las obligaciones ambientales.

9. El 1 de septiembre de 2025 a través de la comunicación CMI-2-IDU-2420-2024-1453-25 se dio respuesta a la comunicación OCCI-IDU-2409-937 respecto a las observaciones a la versión 2 del informe mensual ambiental No. 5 del contratista (1 al 30 de junio de 2025) - aprobación versión 3. Una vez aprobado, se procedió a complementar el informe mensual ambiental No. 5 versión 2 de interventoría para su radicación al Instituto.

COMPONENTE SST

1. 2025-08-27 - 202552601255102CMI-2-IDU-2420-2024-1431-25- SST - Contrato de Obra IDU 2409-2024 - Respuesta OCCI-IDU-2409-915 Aprobacion hoja de vida Residente SST 202552601236732 Contratista Occidental de Colombia SAS
2. 2025-08-27 -202552601237682- CMI-2-IDU-2420-2024-1415-25 Apremio presunto incumplimiento ausencia de pagos honorarios sin respuesta derechos de petición Contratista Occidental de Colombia SAS
3. 2025-08-26 - 202552601233712 -CMI-2-IDU-2420-2024-1414-25- Contrato de Obra IDU 2409-2024 - Solicitud respuesta derecho de petición con radicado IDU-202518501134402 - honorarios Freddy Hernán Garzón Prieto, Especialista en Urbanismo
4. 2025-08-26 - 202552601237632 -CMI-2-IDU-2420-2024-1411-25 -SST - Contrato de Obra IDU 2409-2024 - Respuesta OCCI-IDU-2409-920 Devolución personal hallazgos MONC RSCEJ SAS.pdf
5. 2025-08-28 - 202552601256442 - CMI-2-IDU-2420-2024-1432-25 -SST - Contrato de Obra IDU 2409-2024 - OCCI-IDU-2409-929 Observaciones Preacta SST
6. 2025-09-01 - SST - Contrato de Interventoría No IDU-2420-2024 - Respuesta 202517500847821 Documentos de vinculación inspector I Diurno y Conductor nocturno
7. 2025-08-30 - SST - Contrato de Obra IDU 2409-2024 - Traslado 202517500925801 Observaciones documentos vinculación contratista Occidental de Colombia SAS
8. 2025-08-30- SST CMI-2-IDU-2420-2024-1449-25- 202552601256852 - Contrato de Obra IDU 2409-2024 - Traslado 202517500925591 Derecho de peticion pago incompleto de parafiscales contratista Occidental de Colombia SAS
9. 2025-08-29- SST - CMI-2-IDU-2420-2024-1448-25 Contrato de Obra IDU 2409-2024 - Traslado Derecho de petición pago de liquidación horas extras y recargo nocturno Inspector SSTA nocturno. Joan Sebastián Ayala

MAQUINARIA Y VEHÍCULOS MEV

1. Se radico el informe MEV 6 V1 de interventora mediante oficio 202552601171392; La entidad emitio concepto de aprobación mediante oficio 202517500945991 del 01 de septiembre del 2025.
2. Se encuentra en elaboración el informe MEV 7 de contratista del mes de Agosto; este debe ser radicado el 6 de septiembre del 2025.
3. Se realizo llamado de atención al contratista mediante comunicación CMI-2-IDU-2420-2024-1412-25; esto por el incumplimiento en la radicación de los vehículos de transporte RCD los cales no se encuentran aprobados.
4. No se radico maquinaria nueva para ingreso esta semana,

COMPONENTE SOCIAL

Seguimiento - agosto 26 al 1 de septiembre de 2025

- Con oficio 20253870092564l del 28 de agosto de 2025 la entidad generó observaciones a los informes de actividades previas de los tramos 1, 2 y 3.
- Con oficio 20253870092573l del 28 de agosto de 2025 la entidad generó observaciones a la versión 1 del informe N°6 de interventoría.

Programa de servicio a la ciudadanía

- Se realizó verificación del funcionamiento de los canales de atención al ciudadano.
- Los días 26 y 27 de agosto de 2025 se realizaron los recorridos urbanos en los frentes de intervención activos, de acuerdo con la programación aprobada.

Programa de cultura ciudadana

- El contratista realizó la capacitación con el personal contratado el 29 de julio de 2025.

COMPONENTE DE TRANSITO

Se autoriza solicitud de renovación para:
• T1-F1 (andenes Autosur)
• T2-F2/3 (andenes Ak 24)
• T5-F1 (andenes Av. Caracas)
• Emergencia en Movistar Arena

Se radicó solicitud de PMT para:
• T3-F3 (andenes Cl 48C Sur)
• T9-F1 (ciclorrutas Av Vcio X Autosur)

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS / LEGALES

4. OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES (CAUSAS ATRASO, ETC)

OBSERVACIONES

El PDT bajo el cual se realiza el seguimiento del presente informe fue remitido a la Entidad mediante comunicación CMI-2-IDU-2420-2024-1435-25 con radicado IDU 202552601248312 del 28 de agosto de 2025 a la espera del concepto de no objeción.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

5. ANEXOS

	SI	NO
1. Cronograma en Ms Project	x	
2. Registro Fotográfico	x	
3.Anexo Registro Actividades de Obra: Conservación	x	
4. Anexo Registro Actividades de Obra: Reparaciones Puntuales		x
5. Otro		x

Cual? _____

Nota: Hacen parte integral del presente formato los Anexos: Registro Fotográfico, Registro de Obra Conservación y/o Registro de Obra Reparaciones Puntuales.

Se deja constancia que este informe fue remitido el 9/09/2025 al correo electrónico del profesional de apoyo técnico dando cumplimiento a lo establecido en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos
Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los NUEVE (Día en letras) 9 (Día en números)

días del mes de SEPTIEMBRE (Mes en letras) de 2025 (Año de firma del informe)

Martin Castro H.

(Nombre) MARTIN AUGUSTO CASTRO HUERTAS
