
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

INFORME MENSUAL 02 DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA 4600105052 de 2025

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA

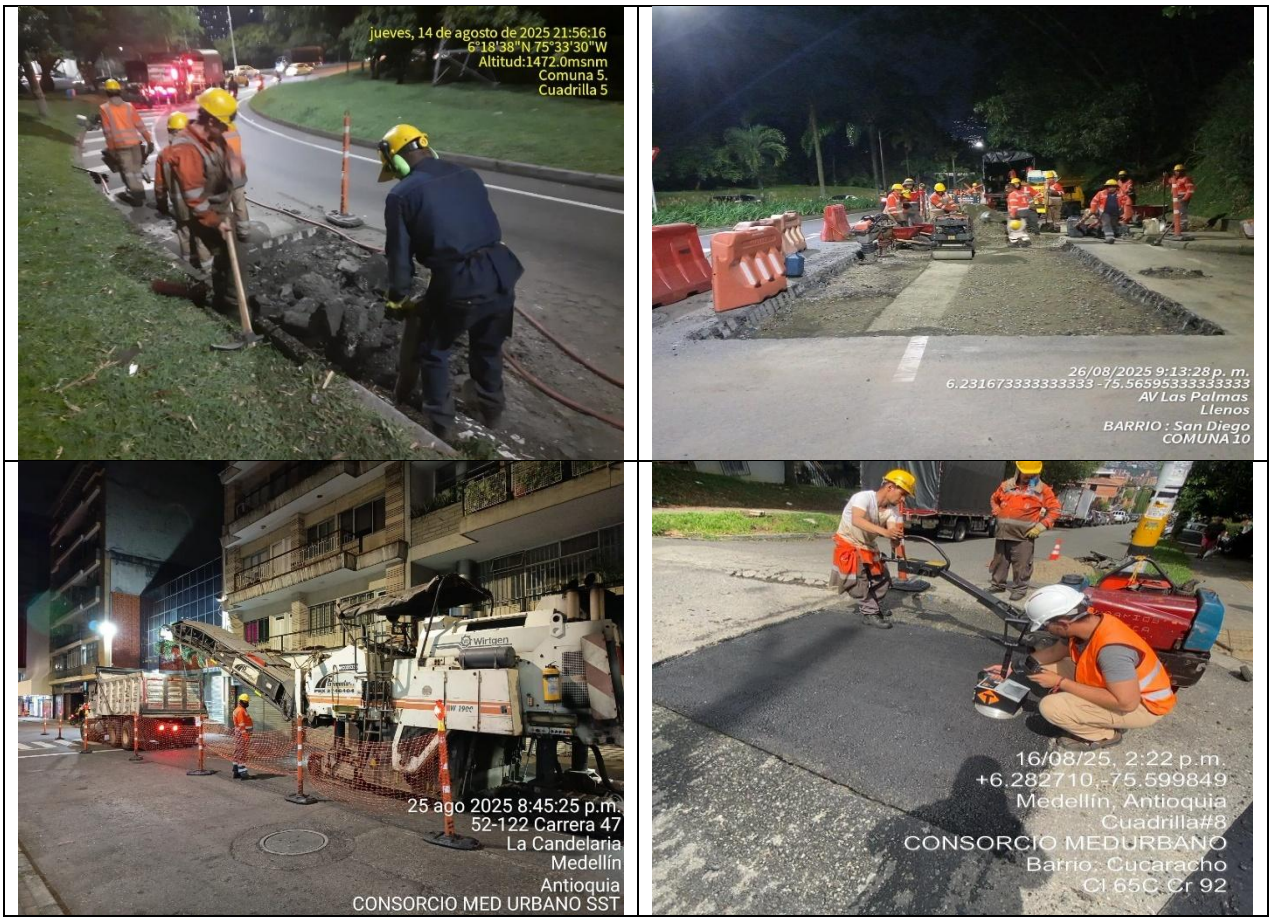

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 20005377 DE 2025
INTERVENTORÍA A LA REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA

PRESENTADO POR:

CONSORCIO MEDURBANO 20005377
Del 1 al 31 de agosto de 2025

INFORME No 02

CORRESPONDIENTE A LAS OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORIA DURANTE EL PERIODO DEL (1/08/2025) AL (31/08/2025).

TABLA DE CONTENIDO:

1. **Información General de la Obra Pública**
   - **1.1.** Descripción general de la Obra Pública
   - **1.2.** Localización de la Obra Pública
   - **1.3.** Información básica de los contratos
     - **1.3.1.** Contrato de Obra
     - **1.3.2.** Contrato de Interventoría

2. **Informe Técnico de Seguimiento al Contrato de Obra Pública**
   - **2.1.** Control de ejecución
     - **2.1.1.** Análisis de cada una de las actividades de obra programadas, de conformidad con el cronograma vigente vs actividades de obra efectivamente ejecutadas
   - **2.2.** Control y seguimiento al cumplimiento y vigencia de licencias, permisos y uso de servicios públicos
     - **2.2.1.** PMT
   - **2.3.** Seguimiento al estado del tiempo
   - **2.4.** Control del material en obra
   - **2.5.** Control de ensayos de laboratorio
   - **2.6.** Control de equipos en obra
   - **2.7.** Control de entrega y cambios de estudios y diseños

3. **Informe de monitoreo y seguimiento social, ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo, de los contratos de ejecución de Obra Pública**
   - **3.1.** Informe social
     - **3.1.1.** Actividades de la interventoría relacionadas con la verificación, monitoreo y seguimiento de la ejecución del componente social, en el contrato de ejecución de obra pública
     - **3.1.2.** Actividades de la interventoría relacionadas con la ejecución del componente social, al interior de su contrato
     - **3.1.3.** Consolidado de la gestión social
     - **3.1.4.** Observaciones, recomendaciones y conclusiones de la interventoría, con relación a las labores realizadas por el contratista de obra en el desarrollo del componente social de su contrato de ejecución de la obra pública.
   - **3.2.** Informe ambiental
     - **3.2.1.** Programas del Plan de Acción Ambiental de la Obra Pública
     - **3.2.2.** Programa de capacitaciones y/o inducciones realizadas
     - **3.2.3.** Plan de monitoreo y seguimiento (Formato indicadores)
     - **3.2.4.** Seguimiento al presupuesto ambiental (Formato vigente)

3.2.5. Observaciones, recomendaciones y conclusiones de la interventoría, con relación a las labores realizadas por el contratista de obra en el desarrollo del componente ambiental de su contrato de ejecución de obra pública

3.2.6. Actividades de la interventoría relacionadas con la ejecución del componente ambiental, al interior de su contrato.

3.3. Informe de Seguridad y Salud en el trabajo SST

3.3.1. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (contratista de obra)

3.3.1.1. Seguimiento a los hallazgos encontrados en la verificación del cumplimiento para la gestión, en el desarrollo del componente

4. Informe administrativo de seguimiento al contrato de obra pública

4.1. Control del personal del contratista de obra asociado al proyecto (administrativo y técnico) y de su pago de seguridad social integral

4.2. Control del cumplimiento de las responsabilidades del contratista de obra frente a la subcontratación

4.3. Informe de la materialización de riesgos previsibles del contrato de obra y su mitigación

4.4. Control a los compromisos definidos en los comités de obra

4.5. Correspondencia enviada y recibida

4.6. Copia de la Bitácora

5. Informe Financiero y Contable

5.1. Seguimiento financiero a la ejecución del contrato de obra

5.2. Relación de pagos y amortización de anticipo (si aplica) del contrato de obra

5.3. Control de inversión del anticipo y de los rendimientos financieros generados en el contrato de obra (si aplica)

5.4. Relación de las obligaciones en materia de impuestos y contribuciones.

5.5. Relación de los imprevistos causados, demostrados y facturados.

6. Informe Jurídico

6.1. Relación de reclamaciones

6.2. Relación de sanciones

6.3. Control al estado de las garantías del contrato de Obra

7. Registro Fotográfico del avance de la obra

8. Recomendaciones y conclusiones generales de la Interventoría sobre el desarrollo del contrato de Obra

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1 Distribución de cuadrillas. 14
Tabla 2 Resumen reportes en SIRO de agosto de 2025 16
Tabla 3 Distribución cuadrillas agosto 2025. 17
Tabla 4 Programación diaria de cuadrillas 18
Tabla 5 Atención baches mediáticos. 28
Tabla 6 Atención de baches rango 0 y rango 1, por barrio y comuna. 63
Tabla 7 Resumen de atención de baches comuna y reporte en SIRO agosto 2025. 66
Tabla 8 Atención de baches rango 3 por barrio y comuna. 68
Tabla 9 Atención de baches rango 4 por barrio y comuna. 68
Tabla 10 Resumen de Metas físicas CONSORCIO VIALMED 2025. 69
Tabla 11 Programación de obra al 31 de agosto de 2025. 70
Tabla 12 Cantidades ejecutadas al 31 de agosto de 2025. 72
Tabla 13 Gráfica programa de inversión mensual. 75
Tabla 14 Flujo de inversión mensual 76
Tabla 15 Programa de inversión acumulado 76
Tabla 16 Seguimiento inversión programada y ejecutado acumulado 78
Tabla 17 Permisos ambientales 78
Tabla 18 Manejo de residuos de construcción y demolición. 78
Tabla 19 Proveedores de materiales Pétreos. 79
Tabla 20. Relación de vehículos utilizado en el mes de agosto de 2025. 81
Tabla 21. Relación de los PMT solicitados al 31 de agosto de 2025. 81
Tabla 22 Gráfica de precipitaciones durante el mes de agosto de 2025 91
Tabla 23 Estado del tiempo mes de agosto de 2025 92
Tabla 24 Relación de ensayos de densidades rango 0 y rango 1 99
Tabla 25. Relación equipo y maquinaria mes de **agosto de 2025** 107
Tabla 26. Fórmula de trabajo mezcla asfáltica MDC-19 + RAP PAVIMENTAR S.A 112
Tabla 27. Granulometría mezcla asfáltica MDC-19 + RAP PAVIMENTAR S.A 112
Tabla 28. Dosificación de materiales para gradación MDC-19 + RAP PAVIMENTAR S.A 113
Tabla 29. Fórmula de trabajo mezcla asfáltica MDC-19 + RAP PROCOPAL S.A 114
Tabla 30. Dosificación de materiales para gradación MDC-19 + RAP PROCOPAL S.A 115
Tabla 31. Fórmula de trabajo mezcla asfáltica MSC-19 + RAP PROCOPAL S.A 116
Tabla 32. Dosificación de materiales para gradación MSC-19 + RAP PROCOPAL S.A 118
Tabla 33. Fórmula de trabajo mezcla asfáltica MAM-25 PAVIMENTAR S.A 118
Tabla 34. Dosificación de materiales para gradación MAM-25 PAVIMENTAR S.A 119
Tabla 35. Consolidado de Actas de Vecindad 121
Tabla 36. Consolidado Actas de entorno 122
Tabla 37. Relación de circulares 123
Tabla 38. Relación de volantes 124
Tabla 39. Relación de PQRS 127
Tabla 40. Indicador de PQRS 127
Tabla 41. Consolidado de socializaciones durante el mes 128
Tabla 42. Relación de CCO 129
Tabla 43. Consolidado personal vinculado mano de obra 130
Tabla 44. Consolidado de inducciones y capacitaciones al personal 130
Tabla 45. Indicador de cumplimiento capacitaciones 131
Tabla 46. Reuniones de sostenibilidad 132
Tabla 47. Recorridos sociales realizados 132
Tabla 48. Consolidado de reuniones 131
Tabla 49. Localización de las cuadrillas en el mes de agosto de 2025. 137
Tabla 50. Capacitaciones gestión ambiental 158

Tabla 51. Relación de personal vinculado al Proyecto activo durante el mes de **agosto 2025.**..... 195
Tabla 52. Relación de planillas de seguridad social presentadas **agosto 2025**..... 202
Tabla 53. Certificado de revisor fiscal actualizado del contratista:..... 202
Tabla 54. Relación de actas de reunión y comités realizados en **agosto de 2025** …….....204
Tabla 55 Relación de correspondencia enviada **agosto 2025** 206
Tabla 56 Relación correspondencia recibida **agosto 2025**..... 236
Tabla 57 Relación de la imputación del gasto 262
Tabla 58 Relación pagos realizados..... 160
Tabla 59 Relación pagos realizados por pago anticipado 266
Tabla 60 Relación de Pólizas Contrato de Obra 162

LISTADO DE FIGURAS Y GRÁFICOS

Ilustración 1. Localización planta Procopal S.A. Fuente: Google maps. 8
Ilustración 2. Localización planta Pavimentar S.A. Fuente: Google maps. 9
Ilustración 3. Localización de puntos a intervenir. Fuente: Siro Medellín baches agosto 2025. 10
Ilustración 4. Ejecución de baches con reporte de SIRO. 67
Ilustración 5. Curva granulométrica de diseño para mezcla MDC-19 + RAP PAVIMENTAR S.A. ... 113
Ilustración 6. Curva granulométrica de diseño para mezcla MDC-19 + RAP PROCOPAL S.A..... 115
Ilustración 7. Curva granulométrica de diseño para mezcla MSC-19 + RAP PROCOPAL S.A..... 117
Ilustración 8. Curva granulométrica de diseño para mezcla MAM-25 PAVIMENTAR S.A. 118

LISTADO DE ANEXOS

Anexo 2.2.1 PMT Específico CL10A entre CR 36 y CR 43D
Anexo 2.2.2 Aprobación del PMT Específico CL10A entre CR 36 y CR 43D
Anexo 2.2.3 PMT específico pompeyano en DG 65 D entre transversal 34B y calle 34
Anexo 2.2.4 Certificados de capacitaciones de auxiiliar de tránsito recibidas en el mes de agosto 2025
Anexo 2.2.5 Informe contratista de obra

Anexo 3.1.1 Programa comunicaciones e información a la comunidad, circulares
Anexo 3.1.2 Programa de comunicaciones a información a lacomunidad, volantes
Anexo 3.1.3 Programa de comunicaciones a información a lacomunidad, valla tijeras
Anexo 3.1.4 Programa de comunicaciones a información a lacomunidad, E-Card
Anexo 3.1.5 Programa de comunicaciones a información a lacomunidad, Pasacalles
Anexo 3.1.6 Programa de comunicaciones a información a lacomunidad, PQRS
Anexo 3.1.7 Participación comunitaria, Socializaciones
Anexo 3.1.8 Programa de Contratación de Mano de Obra, Consolidado empleabilidad
Anexo 3.1.9 Programa de formación comunitaria, inducciones, capacitaciones
Anexo 3.1.10 Recorridos sociales
Anexo 3.1.11 Actas de reunión

Anexo 3.2.1 Programa para el manejo de los residuos sólidos
Anexo 3.2.2 Programa para el control de emisiones atmosféricas
Anexo 3.2.3 Programa para el almacenamiento adecuado de materiales de construcción
Anexo 3.2.4 Programa para la protección del suelo
Anexo 3.2.5 Programa para el manejo de sustancias químicas peligrosas en obra

Anexo 3.2.6 Programa para el manejo de maquinaria, vehículos y equipos en la obra
Anexo 3.2.7 Programa de prevención de la contaminación de cuerpos de agua y redes de servicios públicos
Anexo 3.2.8 Programa para la gestión de la fauna y la flora
Anexo 3.2.9 Programa para el ahorro y uso eficiente de agua y energía
Anexo 3.2.10 Programa para el manejo de campamentos e instalaciones temporales
Anexo 3.2.11 Listados de asistencia, capacitaciones e inducciones
Anexo 3.2.12 Formatos de seguimiento de la Interventoria Ambiental

Anexo 3.3.1 Reglamento de higiene y seguridad industrial
Anexo 3.3.2 Medicina preventiva y del trabajo
Anexo 3.3.3 Entrega de dotación y elementos de protección personal
Anexo 3.3.4 Plan de inducciones y capacitaciones
Anexo 3.3.5 Programa de inspecciones
Anexo 3.3.6 Orden y aseo frentes de trabajo
Anexo 3.3.7 Accidentes de trabajo – Ausentismo laboral
Anexo 3.3.8 Afiliaciones sistema de Seguridad Social
Anexo 3.3.9 Seguridad Social Consorcio Vial Med 2025

Anexo 4.1.1 Certificación Parafiscales Consorcio Vial Med 2025 y Consorciados
Anexo 4.4.1 Actas de comité técnico
Anexo 4.5.1 Correspondencia enviada agosto de 2025
Anexo 4.5.2 Correspondencia recibida agosto de 2025
Anexo 4.6.1 Copia digital de las bitácoras de obra

1 INFORMACIÓN GENERAL DE LA OBRA PÚBLICA:

El proyecto de rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada es un proyecto estratégico de la Secretaría de Infraestructura Física, que busca preservar y mantener las condiciones de uso de los corredores viales del Distrito de Medellín, con el propósito de recuperar y prolongar su vida útil y garantizar las condiciones de seguridad y comodidad en el tránsito vehicular.

1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA PÚBLICA:

Este proyecto contempla como una de las actividades principales el suministro, transporte y aplicación de mezcla asfáltica para el tratamiento y atención de baches y fallos en toda la malla vial del distrito cuya intervención es necesaria para preservar y mantener las condiciones de uso de los corredores viales, estas intervenciones van desde la simple corrección de defectos superficiales en la capa de rodadura de las vías, hasta la colocación de nuevas carpetas o el reemplazo de las existentes con mezclas asfálticas y corresponde a actividades de conservación mediante mantenimiento, teniendo como insumo para la priorización de las actividades las necesidades registradas en SIRO, provenientes de los reportes de los ciudadanos mediante la aplicación ReportesMed y vía derecho de petición, previa validación y registro de la necesidad en visita técnica al lugar por personal adscrito a la Secretaría de Infraestructura Física.

Para la recuperación de los corredores viales que sirven de eje para la movilidad de la ciudad, se cuenta con el programa de MANTENIMIENTO MASIVO soportado en el Sistema de Administración Vial (SGVial o SAV), el cual se cuenta con un diagnóstico del estado de cada uno de los 23556 segmentos viales que tiene a su cargo el Distrito de Medellín, la jerarquía, área, ubicación, condiciones estructurales, condiciones de servicio y condiciones de tránsito medidas en el momento del inventario y actualizada con información recaudada de las intervenciones, información que sirve como insumo para determinar los puntos a intervenir en el contrato de acuerdo a criterios técnicos, sociales y económicos. Estas intervenciones van desde la simple corrección de defectos superficiales en la capa de rodadura, hasta la colocación de nuevas carpetas o el reemplazo de las existentes con mezclas de alto modulo en el caso de pavimentos flexibles o de un nuevo pavimento rígido en el caso de las vías en concreto que permitan recuperar su capacidad estructural mediante labores de demolición y/o fresado y repavimentación.

La aparición de BACHES (conocidos como huecos) y fallos en la malla vial del distrito, es frecuente, periódico y cada vez más recurrente; ya que la malla vial en un gran porcentaje ya cumplió su vida útil y capacidad de servicio en forma eficiente; además su deterioro es constante debido a múltiples factores externos como son: el aumento del volumen vehicular, perdida de la capacidad estructural, construcción de brechas de servicios públicos, construcción de domiciliares y obras de entidades externas, empozamientos de agua, entre otras; que conllevan a la malla vial a un deterioro progresivo que se ve reflejado en la aparición de baches (huecos), razón por la cual la Secretaría de Infraestructura Física, debe velar por la atención de manera diligente en la reparación de los mismos, mitigando el riesgo en la movilidad vehicular y el daño antijurídico.

Para la ejecución del PARCHEO DE BACHES, se deberá emplear mezcla asfáltica densa tibia MDC-19 con RAP entre el 20% y 30% que cumpla con los artículos 450.2.4 y 462 de la norma INVIAS 2022 y en particular con lo contemplado en el artículo 465 – 22. EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE.

Artículo 450.2.4 Aditivos para modificar la reología. Se permite la incorporación de productos o tecnologías que modifiquen la reología de una mezcla asfáltica elaborada con asfalto convencional o métodos tradicionales. Se permite el uso de fibras, aditivos para mezclas tibias, asfalto espumado o cualquier otra tecnología o modificador de las propiedades del concreto asfáltico, siempre y cuando se presenten informes técnicos que determinen su dosificación y se muestre evidencia de un comportamiento favorable en campo. Dichos informes deben ilustrar las mejoras obtenidas en el desempeño, en los procesos productivos, en los procesos constructivos, en la durabilidad o en las prestaciones mecánicas, al ser comparada la mezcla modificada respecto a la mezcla patrón sin incorporación de dichos productos. Además, el uso de estos productos o tecnologías debe ser respaldado con las respectivas fichas técnicas y hojas de seguridad proporcionadas por el fabricante para contar con la aprobación del interventor.

Artículo “465.1. Descripción. Este trabajo se refiere a la excavación de zonas deterioradas de un pavimento asfáltico, de acuerdo con los documentos técnicos del proyecto y las indicaciones del Interventor; incluye, también, la remoción, cargue, transporte, descargue y disposición de los materiales excavados, y la compactación del fondo de las excavaciones realizadas. 465.4 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 465.4.1 Demarcación de las áreas por excavar.

Antes de dar inicio a los trabajos de corte, el Interventor, o el Constructor bajo la supervisión de aquel, marcarán las áreas por someter a reparación, las cuales deberán abarcar las zonas dañadas del pavimento en reparación que puedan comprometer la intervención. La demarcación se efectuará haciendo uso de figuras geométricas, cuadradas o rectangulares, cuyas caras longitudinales y transversales deberán ser, respectivamente, paralelas y perpendiculares al eje de la vía.

Para la ATENCIÓN DE FALLOS, los cuales corresponden a daños en la carpeta y estructura del pavimento con fallas tipo piel de cocodrilo, hundimientos, abultamientos, ondulaciones, ahuellamientos, grietas y agrietamientos en bloque, su intervención debe garantizar una estabilidad mínima de 5 años y se realizará en cualquier tipo de vías presente en el Distrito de Medellín, que cumpla esta característica, definida y aprobada por la Interventoría, en cuyo caso deberá estar previamente aprobada y registrada en el Sistema Integral de Registro de obra – SIRO, sistema de apoyo para la toma de decisiones de la Secretaria de Infraestructura Física o soportada técnicamente por la Interventoría.

Para la ejecución del Parcheo de fallos, adicionalmente al cumplimiento de la norma INVIAS 2022 para la mezcla asfáltica, se deberá emplear maquina fresadora para el retiro del pavimento existente de acuerdo a la Norma 460-22 INVIAS 2022, el cual se realizará sobre el área y el espesor que apruebe el Interventor. En el desarrollo de la actividad, se deberán garantizar cortes rectilíneos y la utilización de maquinaria contemplada en el análisis unitario de la actividad para el retiro de la capa de pavimento fallada.

En atención al proyecto, el contratista deberá suministrar, transportar y colocar la mezcla asfáltica, pavimento rígido y adoquines en las vías del distrito (urbana y Rural), en los sitios que requieran la reparación de huecos, fallos asociados al deterioro de la malla vial. Ahora bien, para el cumplimiento de las especificaciones de la mezcla, la oportunidad, condiciones de transporte y calidad de la mezcla, para la ejecución del proyecto se debe tener en cuenta la ubicación del punto de producción de la mezcla para garantizar las condiciones de la misma y poder transpórtala a los sitios de aplicación con la calidad y oportunidad requerida, se estima, de acuerdo con la necesidad a satisfacer y condiciones de ejecución, que la ubicación planta no debería estar a una distancia más allá de 35 km del punto cero de la ciudad de Medellín, localizado en el intercambio vial de Carabineros (Autopista Norte x Calle Barranquilla).

Para la ejecución del proyecto el CONSORCIO VIALMED 2025, dispone de las plantas de mezcla de PROCOPAL S.A. y PAVIMENTAR S.A.

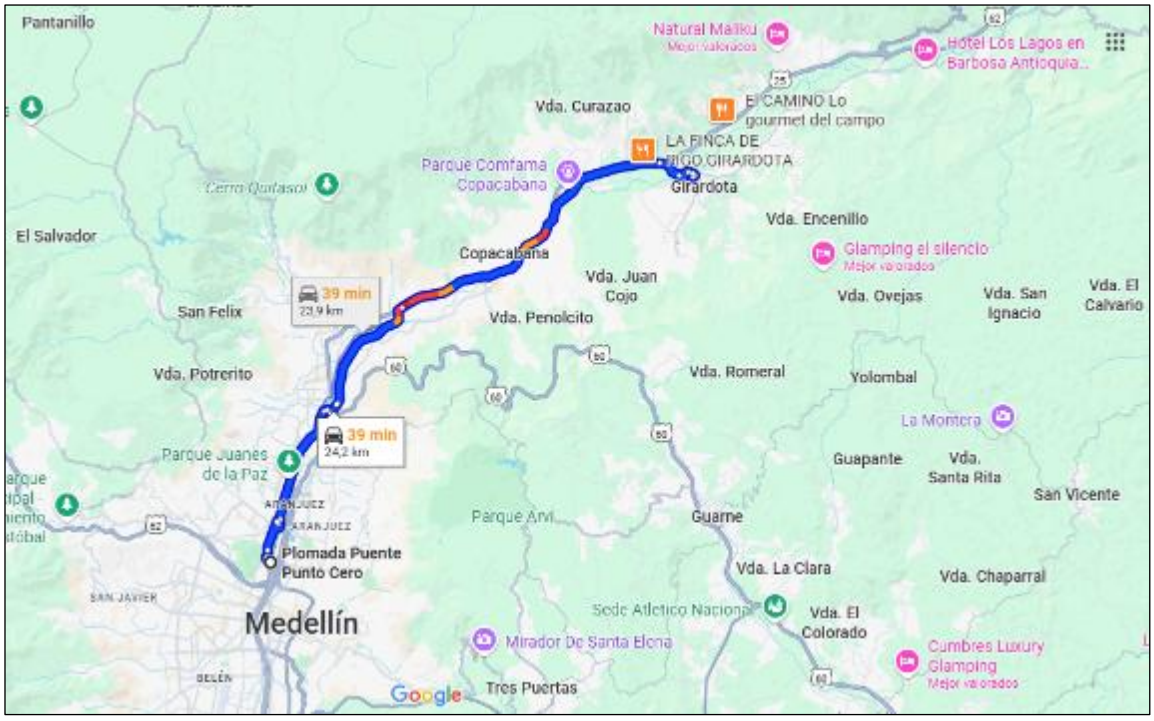


Ilustración 1. Localización planta Procopal S.A. Fuente: Google maps.



Ilustración 2. Localización planta Pavimentar S.A. Fuente: Google maps.

Para la ejecución del proyecto se deben seguir las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en los anexos del proceso, cumpliendo con la norma INVIAS que se establecen para cada una de las actividades que componen el presupuesto oficial del proyecto.

1.2 LOCALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA:

Es de anotar, que el proyecto se ejecutará a lo largo de todo el Distrito en diferentes puntos de la zona urbana y rural.

La zona de intervención se distribuye a lo largo de todo el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín en diferentes sitios de la zona urbana y rural, donde se encuentran los puntos que requieren las intervenciones asociadas con el objeto y alcance del contrato que se han venido atendiendo a la fecha con 14 frentes de trabajo simultáneos según programación con la Entidad y la Interventoría.

Durante el mes de **agosto de 2025** no se alcanzaron los 21 frentes simultáneos previstos, ya que por solicitud de la entidad contratante y según la planeación del contratista, las actividades se concentraron únicamente en la atención de baches de los rangos 0, 1, 2, 3 y 4 en jornadas diurna y nocturna. En total operaron 14 cuadrillas distribuidas así: 1 para rango 0, 10 para rango 1, 1 para rango 3 y 2 para rango 4. Las demás cuadrillas no entraron en operación, dado que las actividades de masivos, obras complementarias, señalización, vías en concreto rígido y seguridad vial están programadas para iniciar en septiembre.

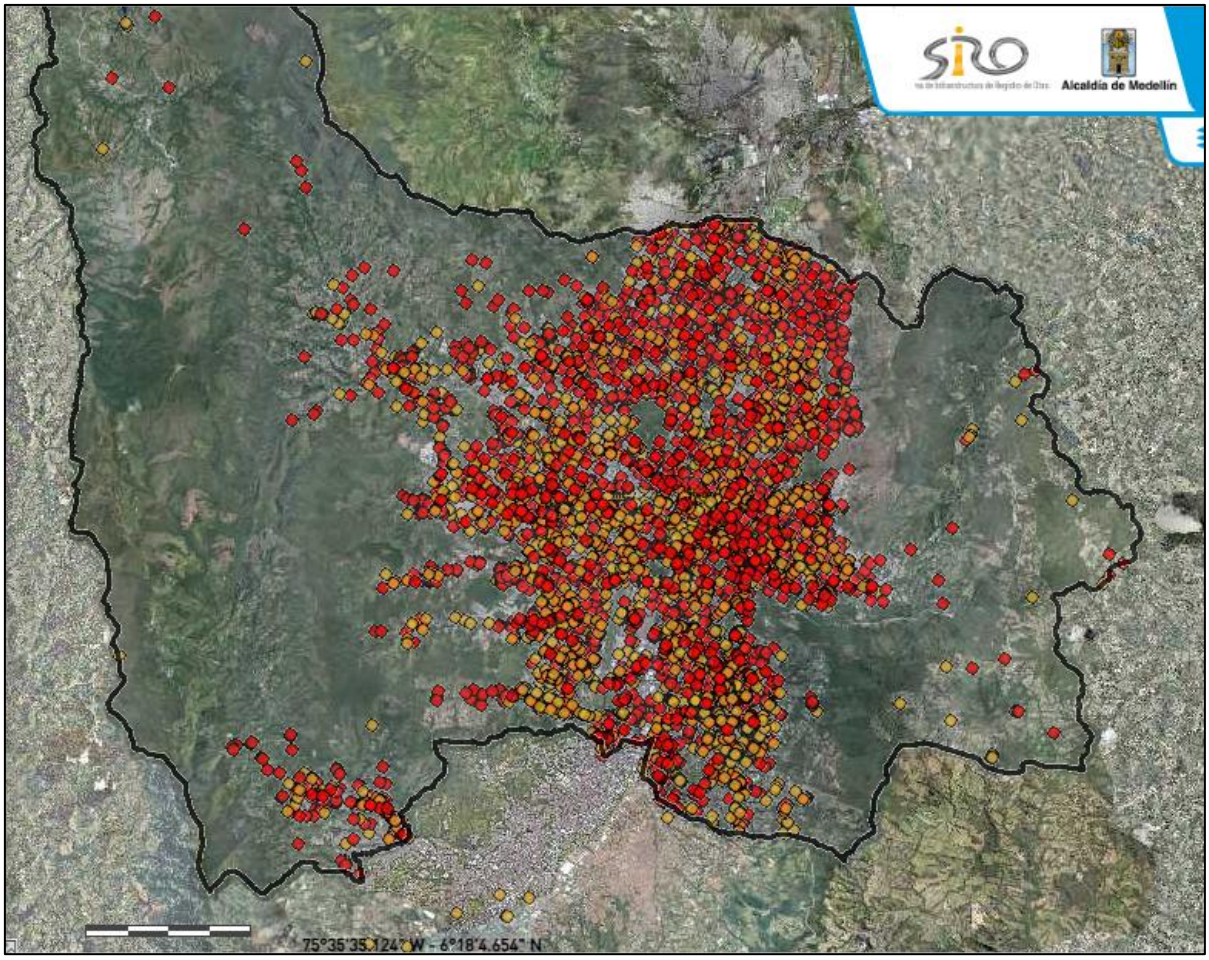


Ilustración 3. Localización de puntos a intervenir. Fuente: SIRO - Medellín baches agosto 2025.

Para definir los puntos a intervenir y orden de ejecución la Unidad de Construcción y Mantenimiento de la Secretaría de Infraestructura Física posee bases de datos del Sistema de Gestión Vial (SGVial) y del Sistema de Información de Registro de Obra (SIRO) que se utilizan como herramientas para definir, clasificar y priorizar los puntos a intervenir con el contrato en el distrito, incluyendo sus 5 corregimientos teniendo en cuenta las diferentes intervenciones asociadas con el objeto y alcance del contrato, con los criterios donde prima el interés colectivo sobre el particular, la eficiencia y la economía. Teniendo como base esta información se realiza la programación de obra diaria, para la localización de las cuadrillas.

Los puntos, frentes, sitios o zonas de intervención, que se establecen a continuación, corresponden a la planeación inicial del proyecto según viabilidad y disponible de recursos.

Para el parcheo de huecos, intervención de fallos, rehabilitación de vías, mantenimiento, construcción e instalación de infraestructura asociada como andenes, cunetas, bordillos, pasamanos, barandas, defensas viales, entre otros, se priorizará en primer lugar, es decir prioridad alta, los corredores estructurantes del distrito por la jerarquía vial y el volumen de tránsito, los cuales representan un alto riesgo para la circulación vehicular, su atención se realizará de acuerdo a los horarios y tipos de cierre autorizados en el Plan de Manejo de Tránsito.

En segundo lugar, de priorización se encuentran las vías con rutas de buses, ya que su atención para mitigar el riesgo en la circulación es prioritaria para la administración y luego todas las demás vías que se encuentran a cargo del Distrito de Medellín que está conformado por 16 comunas y 5 corregimientos.

En tercer lugar, se tiene la información de las BASE DE DATOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE REGISTRO DE OBRA “SIRO” programa que permite consultar, priorizar, visualizar, gestionar y presentar alternativas de intervención de acuerdo a los parámetros técnicos y sociales, según el tipo de obra o intervención que se requiera para dar solución a la necesidad.

En cuarto lugar, todas las demás vías del Distrito de Medellín, cuya problemática cause un impacto negativo sobre la circulación vehicular y deba ser atendida para evitar riesgos sobre la ciudadanía.

La Secretaría de Infraestructura Física podrá intervenir cualquier vía del Distrito de Medellín, que esté debidamente inventariada y diagnosticada en el Sistema de Gestión (SGVial) y que cumplan las características técnicas para ser atendida por este tipo de intervención, también atenderá las solicitudes registradas en el Sistema de Información de Registro de Obra (SIRO) en el cual se cargan los reportes de huecos realizados por la comunidad a través de la aplicación "ReportesMed" relacionadas con el mantenimiento de las vías e infraestructura asociada; Adicionalmente, cualquier inclusión de vía, deberá estar soportada por una visita de campo realizadas por personal adscrito a la Secretaría de Infraestructura Física o la Interventoría; podrán atenderse vías cuyas condiciones puedan generar en el corto plazo riesgos o dificultades para la movilidad vehicular; las cuales deben estar soportadas por un informe técnico elaborado por la Interventoría y avalado por la Supervisión.

En aquellas vías donde al momento de realizar las intervenciones sea necesario cubrir cámaras de inspección o válvulas con el fin de mejorar la rasante del segmento vial, se deberá realizar el realce de estos elementos de acuerdo a lo estipulado en las Normas y Especificaciones Generales de Construcción de las Empresas Públicas de Medellín.

NOTA: La Secretaría de Infraestructura Física podrá modificar o adicionar los sitios de acuerdo con las características de las obras a intervenir y con las prioridades detectadas al momento del desarrollo del contrato y al criterio técnico; así mismo la Secretaría de Infraestructura Física cuenta con herramientas de gestión que permite determinar el deterioro estructural de las diferentes vías que conforman la malla vial de la ciudad, con la cual pueden priorizarse el mantenimiento de los diferentes segmentos viales, garantizando la optimización de los recursos y la atención de vías que por decisiones técnicas en el desarrollo del mismo requieran una inversión prioritaria.

1.3 INFORMACIÓN BÁSICA DE LOS CONTRATOS:

1.3.1 Contrato De Obra:

NÚMERO DEL CONTRATO:	4600105052 de 2025
OBJETO:	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIALMED 2025: - CONSTRUCTORA PRISMA 54 S.A.S (80%) - INGEALQUIPOS S.A.S (20%)
NIT:	901.949.183
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:	Diego León Puerta Villegas C.C 98.523.266 de Itagüí.
DIRECCIÓN CONTRACTUAL:	Transversal 33 Sur No 32D-25, Envigado Ant.
TELÉFONOS DE CONTACTO:	300-2023109
EMAIL:	admon1.vialmed2025@gmail.com
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	21/07/2025
PLAZO INICIAL:	Cuatro (4.0) meses
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	21/11/2025
VALOR INICIAL:	Treinta y Nueve Mil Cuatrocientos Tres Millones Novecientos Veinticuatro Mil Ochocientos Treinta y Siete pesos Moneda Legal ($39.403.924.837) Incluido AIU DEL 27.03%, equivalentes a 27.681,015 SMLMV2025
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:	N/A

1.3.2 Contrato De Interventoría:

NÚMERO DEL CONTRATO:	4600105322 de 2025
OBJETO:	Interventoría a la rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.
CONTRATISTA:	CONSORCIO MED URBANO 20005377: -CONSTRUCCIONES E INVERSIONES ASOCIATIVAS S.A.S (65%) -MARÍA CATALINA OCHOA ÁLVAREZ (35%)
CÉDULA O NIT:	901.964.293
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:	Andrea Alzate Rendón C.C 43.184.154
DIRECCIÓN CONTRACTUAL:	CL 29 # 41-105 OF 1206

TELÉFONOS DE CONTACTO:	3146262793 - 6043205229
EMAIL:	consorciomedurbano@gmail.com
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	21/07/2025
PLAZO INICIAL:	Ciento Treinta y Cinco (135) días calendario.
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	3/12/2025
SUSPENSIONES A LA FECHA	N/A
VALOR INICIAL:	Mil Ochocientos Cincuenta y Ocho Millones Setecientos Setenta y Un Mil Ciento Un pesos M.L ($1.858.771.101) IVA Incluido con un factor multiplicador (FM) ajustado de 1.80
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:	N/A

2 INFORME TÉCNICO DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE LA OBRA PÚBLICA:

2.1 CONTROL DE EJECUCIÓN:

Desde el pliego de condiciones y estudios previos del proceso 0070007715 este proyecto contempla la implementación de 21 cuadrillas de trabajo para la ejecución de las actividades objeto y alcance del contrato 4600105052 de 2025, entre las cuales se encuentran principalmente: parcheo de huecos rango 0, de 0,5 a 5 ton/jornada en horario diurno, parcheo de huecos rango 1, de 9,1 a 12,5 ton/jornada en horarios diurno y nocturno, parcheo de huecos rango 2, de 12,51 a 16 ton/jornada, rango 3, de 8 a 19,99 m^3/jornada, rango 4, de 20 a 50 m^3/jornada en horarios diurno y nocturno, rehabilitación en horarios diurno y nocturno, obras complementarias, sellados de grietas, concretos, adoquines, realces, señalización vial, barandas, defensas y pasamanos.

Durante la ejecución de este segundo periodo, el Contratista de Obra ha venido implementando hasta 15 cuadrillas de trabajo, distribuidas de la siguiente manera:

TABLA 1. DISTRIBUCIÓN DE CUADRILLAS

(1 al 31 de agosto de 2025)

RANGO 0: De 0,5 a 5 Ton/Jornada. Horario diurno	CUADRILLA 2
RANGO 1: De 9,1 a 12,5 Ton/Jornada. Horario diurno	CUADRILLA 3
	CUADRILLA 6
	CUADRILLA 7
	CUADRILLA 8
	CUADRILLA 9
	CUADRILLA 10
	CUADRILLA 11
	CUADRILLA 12
RANGO 1: De 9,1 a 12,5 Ton/Horario nocturno	CUADRILLA 4
	CUADRILLA 5
RANGO 3: De 8 a 19,99 m^3/Jornada. Horario diurno	CUADRILLA 14
RANGO 4: De 20 a 50 m^3/Jornada. Horario diurno	CUADRILLA 15
RANGO 4: De 20 a 50 m^3/Jornada. Horario nocturno	CUADRILLA 16

Los tecnólogos de interventoría que aún no tienen frente de obra asignado han venido adelantando visitas técnicas con el fin de verificar los puntos que serán intervenidos, de acuerdo con los listados suministrados por la Supervisión y la información registrada en el aplicativo SIRO. Adicionalmente, han contribuido en la identificación de nuevos tramos, generando reportes en aquellos sectores donde aún no se han definido claramente los puntos a intervenir, con el propósito de facilitar la programación y ejecución de las actividades correspondientes.

La Secretaría de Infraestructura Física para el presente contrato cuenta con la implementación de uso de diferentes plataformas donde se suministra las actividades relacionadas con labores de parcheo y pavimentación de la malla vial de la ciudad. Estos aplicativos son Reportes Med, Sistema de Información de Registro de Obra (SIRO), APK Gestión de Baches, Formulario Seguimiento de Baches y Sistema de Gestión Vial (SGVIAL).

La aplicación Reportes Med tiene como función el reporte que todo ciudadano puede realizar sobre el estado de las vías en Medellín y toda el área Metropolitana, solicitando así que sean atendidos baches o mantenimiento masivo de estas. Para esta app se cuenta con registro fotográfico que evidencia del estado actual de la vía y a su vez luego de realizar el reporte se genera un código Id Bache o consecutivo arrojado por esta, para que con las cuadrillas dispuestas por el contrato se de atención oportuna a la solicitud presentada por la comunidad.

Por otro lado, el Sistema de Información de Registro de Obra (SIRO), permite revisar los reportes que se encuentran ya generados por la app Reportes Med o por ella misma. En este aplicativo se evidencia además los segmentos viales donde se encuentran ubicados cada consecutivo, junto con toda la información y registro fotográfico del bache que será programado para su pronta atención. En Siro se encuentra el módulo Baches activo tanto para Interventoría como para el contratista, con el fin que ambos trabajen sobre él; la interventoría como revisor y el contratista como ejecutor de las actividades realizadas durante el contrato de mantenimiento de la malla vial.

Para el trabajo en campo, se ha dispuesto de una APK llamada Gestión de Baches donde los tecnólogos de interventoría tienen acceso a identificar los reportes en estado Aceptado o Reportado, que se encuentran en un búfer de búsqueda entre 150 m a 200 m de su lugar de ubicación. Además, esta plataforma permite que en tiempo real se cambie el estado del bache de Aceptado a Ejecutado y que al finalizar las actividades de parcheo se suba el registro fotográfico final de cada Id Bache o consecutivo trabajado en la jornada.

Para este año el contrato de mantenimiento de la malla vial de la ciudad implementó un Formulario de Seguimiento de Baches (Share Point) para que el contratista en conjunto con la interventoría ingrese toda la información relacionada con los diferentes baches que ejecuten durante la programación de obra. En este formulario se deberá registrar cada Id Siro con el Tecnólogo de Obra responsable de dicha cuadrilla, así como las cantidades y el tipo de figura trabajada en campo sea simple o compuesta. Estos datos irán a una base de datos donde la interventoría aprobará, rechazará o anulará el Id ingresado y así poder dar paso al suministro de esta información al módulo de Baches en la plataforma SIRO por parte del contratista donde el ejecutará cada consecutivo con su respectiva cantidad en toneladas, inversión según ítem del presupuesto de obra y contrato de obra actual.

Por último, el Sistema de Gestión Vial (SGVIAL), será manejado por el contratista donde suministrará toda la información y registro fotográfico relacionado con los segmentos viales atendidos por Rango 3, Rango 4, Pavimentación y obras complementarias durante el contrato.

En cuanto a la alcaldía con la ayuda de Siro, le permite realizar un seguimiento usando el número del contrato de obra para tener conocimiento de cuantos baches son atendidos diariamente, detallando su ubicación como comuna, barrio y coordenadas; además de contar con un registro fotográfico del estado en cómo queda la vía después de la actividad realizada.

La supervisión del contrato informa al contratista y a la interventoría que todos los baches que se realicen en campo deben contar con ID Siro, es por esto que los baches que no cuenten con este consecutivo se deberán crear en la plataforma Reportes Med con el correo creado por la interventoría "*consorciomedurbano@gmail.com"* para dicha solicitud.

Para el inicio del contrato se cuenta con una base de datos entregada por el contratista que fue exportada por la plataforma SIRO con un total de dos mil quinientos sesenta y cuatro (2564) baches en las diferentes comunas de la ciudad de Medellín. Este reporte fue generado con datos entre el 1 de enero al 8 de julio del presente año. En el mes de **agosto de 2025** se han logrado ejecutar 1040 baches en las diferentes comunas de la ciudad de Medellín, y un acumulado de 1315 baches.

Se genera el reporte en Siro para el periodo de **agosto de 2025**, dando el siguiente consolidado por comunas.

Tabla 2 Resumen reportes en SIRO de **agosto de 2025**

ZONA	COMUNA/BARRIO		REPORTES Enero - Jul 2025	Período julio 2025 Ejecutados	REPORTES ago-25	Período agosto 2025 Ejecutados	Total, Reportes Acumulados Ejecutados	Total, Reportes Activos
1	1	Popular	107	0	22	1	1	128
	2	Santa Cruz	79	0	81	79	79	81
	3	Manrique	199	4	129	0	4	324
	4	Aranjuez	62	0	70	55	55	77
2	5	Castilla	200	31	61	71	102	159
	6	Doce de Octubre	75	0	5	0	0	80
	7	Robledo	195	35	81	91	126	150
3	8	Villa Hermosa	140	8	46	7	15	171
	9	Buenos Aires	125	12	51	40	52	124
	10	La Candelaria	274	31	143	99	130	287
4	11	Laureles-Estadio	113	19	102	96	115	100
	12	La América	70	10	49	35	45	74
	13	San Javier	78	1	61	40	41	98

5	**14**	EL Poblado	269	37	142	125	162	249
6	**15**	Guayabal	100	22	131	127	149	82
	16	Belén	256	34	96	60	94	258
Corregimientos y veredas	**50**	San Sebastián de Palmitas	5	0	3	0	0	8
	60	San Cristóbal	91	4	79	39	43	127
	70	AltaVista	35	0	78	54	54	59
	80	San Antonio de Prado	65	0	18	16	16	67
	90	Santa Elena	26	27	11	5	32	5
		Total=	**2564**	**275**	**1459**	**1040**	**1315**	**2708**

Durante el mes de **agosto de 2025**, el Contratista de Obra desplegó hasta 14 cuadrillas para la ejecución de actividades programadas, distribuidas de la siguiente manera: 1 cuadrilla en atención de baches con rango 0, 8 cuadrillas en rango 1 en jornada diurna, 2 cuadrillas en rango 1 en jornada nocturna, 1 cuadrilla en rango 3 jornada diurna, 1 cuadrilla en rango 4 jornada diurna y 1 cuadrilla en rango 4 jornada nocturna. No obstante, el Contratista manifestó que los procesos de contratación de mano de obra han resultado dispendiosos, en cumplimiento de las políticas de calidad establecidas por el CONSORCIO VIALMED 2025 y sus empresas consorciadas, lo cual ha generado dificultades para la oportuna vinculación de nuevo personal al proyecto.

A corte del 31/08/2025 se cuenta con la siguiente distribución de cuadrillas implementadas:

Tabla 3 Distribución cuadrillas **agosto de 2025**

Tipo de Intervención	**# Cuadrillas**	**En ejecución mes de agosto 2025**
Rango 0 (de 0,5 a 5 Ton/Jornada)	1	Diurna: C2
Rango 1 (de 9,1 a 12,5 Ton/jornada)	10	Diurnas C3, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12
		Nocturna: C4, C5
Rango 3 (de 8 a 19,99 m^3/jornada)	1	Diurnas: C14
Rango 4 (de 20 a 50 m^3/jornada)	2	Diurnas: C15
		Nocturna: C16
Total, Cuadrillas	14	Cuadrillas

A continuación, se relaciona la programación diaria de las cuadrillas dispuestas entre el 01 y el 31 de agosto de 2025:

Tabla 4 Programación diaria de cuadrillas:

FECHA (DD/MM/AAAA	CUADRILLA	JORNADA (DIURNA/ NOCTURNA)	TON	TIPO DE MEZCLA	ID - SIRO	CÓDIGO SEGMENTO VIAL	LOCALIZACION / DIRECCION (INICIO LABORES o PRINCIPAL)	COMUNA	BARRIO
1/08/2025	1	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	157458	5003873	CL 10D 30A - 201	14	LAS LOMAS No. 1
1/08/2025	2	DIURNA	5	MDC-19 (TIBIA) + RAP	158446	2000343	CR 52 CON CL 12 A SUR	15	GUAYABAL
1/08/2025	3	DIURNA	8	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PENDIENTE	7001131	CR 40 ESTE 56 - 487	90	SANTA ELENA - VEREDA MAZO
1/08/2025	4	DIURNA	5	MDC-19 (TIBIA) + RAP	143155	4003557	TV 78 65 - 14	5	EL PROGRESO
1/08/2025	5	NOCTURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	158475	4004281	CL 53 # 51 - 38	10	LA CANDELARIA
1/08/2025	6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1/08/2025	7	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	158548	5002674	CL 80-49	4	CAMPO VALDÉS No. 1
1/08/2025	8	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	156559	4001405	CR 43D 11 - 47	14	MANILA
1/08/2025	9	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	157236	4000558	CR 92 CON CL 43	12	EL DANUBIO

FECHA (DD/MM/AAAA	CUADRILLA	JORNADA (DIURNA/ NOCTURNA)	TON	TIPO DE MEZCLA	ID - SIRO	CÓDIGO SEGMENTO VIAL	LOCALIZACION / DIRECCION (INICIO LABORES o PRINCIPAL)	COMUNA	BARRIO
4/08/2025	1	NOCTURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	158120	4003460	CR 48C CL 12 SUR - 148	14	SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES
4/08/2025	2	DIURNA	5	MDC-19 (TIBIA) + RAP	157108	2002277	CL 62 CON CR 80 Y LUEGO CONTINUAR POR LA VIA DE LOS 4.1 KM (SENTIDO ORIENTE -OCCIDENTE)	7	ROBLEDO
4/08/2025	3	DIURNA	12	MDC-19 (TIBIA) + RAP	157990	4004875	CR 44 CON CL 39	10	SAN DIEGO
4/08/2025	4	DIURNA	5	MDC-19 (TIBIA) + RAP	142707	200223	CR 65 75B - 16	5	EL PROGRESO
4/08/2025	5	NOCTURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	158528	1000092	CR 64 CON CL 58, BAJO EL PUENTE HORACIO TORO	7	UNIVERSIDAD NACIONAL
4/08/2025	6	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	158548	5002674	CL 80 CON CR 49	4	CAMPO VALDÉS No. 1
4/08/2025	7	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	151153	4003960	CL 65C 90-90	7	CUCARACHO
4/08/2025	8	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	151166	5010097	CL 2 SUR CR 20	14	LOS NARANJOS
4/08/2025	9	DIURNA	12	MDC-19 (TIBIA) + RAP	158675	5009317	CL 32 B 83 - 62	16	LAS MERCEDES

FECHA (DD/MM/AAAA	CUADRILLA	JORNADA (DIURNA/ NOCTURNA)	TON	TIPO DE MEZCLA	ID - SIRO	CÓDIGO SEGMENTO VIAL	LOCALIZACION / DIRECCION (INICIO LABORES o PRINCIPAL)	COMUNA	BARRIO
5/08/2025	1	NOCTURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PENDIENTE	VARIOS	AV. REGIONAL ENTRE CL 25 (EDIFICIOS BANCOLOMBIA) Y CL 33 -	14	BARRIO COLOMBIA
5/08/2025	2	DIURNA	5	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PENDIENTE	VARIOS	CL 62 CON CR 80 Y LUEGO CONTINUAR POR LA VIA DE LOS 4.1 KM (SENTIDO ORIENTE -OCCIDENTE)	7	ROBLEDO
5/08/2025	3	DIURNA	12	MDC-19 (TIBIA) + RAP	158388	2000500	CL 49 # 20B - 50	9	ALEJANDRO ECHAVARRÍA
5/08/2025	4	DIURNA	5	MDC-19 (TIBIA) + RAP	158567	2000206	CR 65 59 - 38	7	NUEVA VILLA DEL ABURRÁ
5/08/2025	5	NOCTURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	152739	VARIAS	AV. REGIONAL ENTRE CL 46 Y CL 67 - VÍA RÁPIDA	10	CORAZÓN DE JESÚS
5/08/2025	6	DIURNA	12	MDC-19 (TIBIA) + RAP	154881	4001572	CR 80A CON CR 32	16	MIRAVALLE
5/08/2025	7	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	151153	4003960	CL 65C 90-90	7	CUCARACHO
5/08/2025	8	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	151166	5010097	CL 2 SUR CR 20	14	LOS NARANJOS
5/08/2025	9	DIURNA	12	MDC-19 (TIBIA) + RAP	158675	5009317	CL 32 B 83 - 62	16	LAS MERCEDES

FECHA (DD/MM/AAAA	CUADRILLA	JORNADA (DIURNA/ NOCTURNA)	TON	TIPO DE MEZCLA	ID - SIRO	CÓDIGO SEGMENTO VIAL	LOCALIZACION / DIRECCION (INICIO LABORES o PRINCIPAL)	COMUNA	BARRIO
6/08/2025	1	NOCTURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PENDIENTE	VARIOS	AV. REGIONAL ENTRE CL 25 (EDIFICIOS BANCOLOMBIA) Y CL 33 - VÍA RÁPIDA	14	BARRIO COLOMBIA
6/08/2025	2	DIURNA	5	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PENDIENTE	VARIOS	VIA DE LOS 4.1 KM (SENTIDO ORIENTE - OCCIDENTE) -INICIA EN LA ENTRADA A BLANQUIZAL	7	ROBLEDO
6/08/2025	3	DIURNA	12	MDC-19 (TIBIA) + RAP	158596	4004595	CR 20B 47 -112	9	LOS CERROS EL VERGEL
6/08/2025	4	DIURNA	5	MDC-19 (TIBIA) + RAP	157803	2000719	AV. 80 CON CL 15A SENTIDO NORTE - SUR	16	LA GLORIA
6/08/2025	5	NOCTURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	157404	1000134	CR 49 CL 4SUR+6, AUTOPISTA SUR, VÍA RAPIDA (DEBAJO DEL PUENTE DE LA 4 SUR) SENTIDO NORTE-SUR	14	LA AGUACATALA
6/08/2025	6	DIURNA	12	MDC-19 (TIBIA) + RAP	152469	5009610	CL 32C 81B - 78	16	NUEVA VILLA DE ABURRÁ
6/08/2025	7	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	158805	4003961	CL 65C 90-10	7	CUCARACHO
6/08/2025	8	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	151205	5003591	CR 36 7 - 32	14	LA FLORIDA
6/08/2025	9	DIURNA	12	MDC-19 (TIBIA) + RAP	158714	4000602	CL 38 CR 94	12	CAMPO ALEGRE

FECHA (DD/MM/AAAA	CUADRILLA	JORNADA (DIURNA/ NOCTURNA)	TON	TIPO DE MEZCLA	ID - SIRO	CÓDIGO SEGMENTO VIAL	LOCALIZACION / DIRECCION (INICIO LABORES o PRINCIPAL)	COMUNA	BARRIO
8/08/2025	1	NOCTURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	158509	4003310	CL 9 SUR 53 - 71	15	LA COLINA
8/08/2025	2	DIURNA	5	MDC-19 (TIBIA) + RAP	152457	2002601	CR 80 CON CL 44, SENTIDO SUR-NORTE	12	LOS PINOS
8/08/2025	3	DIURNA	12	MDC-19 (TIBIA) + RAP	155388	5002918	CL 86 49B - 46	4	LA PIÑUELA
8/08/2025	4	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	157007	5014901	CL 83 86 - 11	7	EL DIAMANTE
8/08/2025	5	NOCTURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	153307	1000114	CR 58 65 - 402, AVENIDA REGIONAL, CALZADA RÁPIDA, SENTIDO SUR- - NORTE	10	EL CHAGUALO
8/08/2025	6	DIURNA	12	MDC-19 (TIBIA) + RAP	158941	5009617	CL 32 E # 81A - 29	16	NUEVA VILLA DE ABURRÁ
8/08/2025	7	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	158841	4003984	CL 76 CON CR 87A	7	PALENQUE
8/08/2025	8	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	141286	5003682	CL 3B SUR 30 - 80	14	LOS NARANJOS
8/08/2025	9	DIURNA	12	MDC-19 (TIBIA) + RAP	158932	5005104	CL 42C 90 - 37	12	E L DANUBIO

FECHA (DD/MM/AAAA	CUADRILLA	JORNADA (DIURNA/ NOCTURNA)	TON	TIPO DE MEZCLA	ID - SIRO	CÓDIGO SEGMENTO VIAL	LOCALIZACION / DIRECCION (INICIO LABORES o PRINCIPAL)	COMUNA	BARRIO
11/08/2025	1	NOCTURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	158996	2001620	CR 62 44 - 526. AV. REGIONAL CALZADA RÁPIDA SENTIDO SUR-NORTE.	10	CORAZÓN DE JESÚS
11/08/2025	2	DIURNA	5	MDC-19 (TIBIA) + RAP	153335	2001315	CL 58 54 - 199, DESDE EL PUENTE HORACIO TORO HACIA EL DEPRIMIDO DE LA MINORISTA, SENTIDO OCCIDENTE - ORIENTE	10	EL CHAGUALO
11/08/2025	3	DIURNA	12	MDC-19 (TIBIA) + RAP	155390	5002992	CR 49A 87 - 73	4	LA PIÑUELA
11/08/2025	4	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	156426	6000806	CL 47 SUR 55 - 136 - ANTIGUA VÍA SAN ANTONIO DE PRADO	80	SAN ANTONIO DE PRADO
11/08/2025	5	NOCTURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	157404	1000134	CR 50 CL 4SUR+6, AUTOPISTA SUR, VÍA RAPIDA (DEBAJO DEL PUENTE DE LA 4 SUR) SENTIDO NORTE-SUR	14	LA AGUACATALA
11/08/2025	6	DIURNA	12	MDC-19 (TIBIA) + RAP	157938	5001398	CR 69 30A - 381, MITIGAR BACHE EN CL 30A CON CR 65	16	ROSALES
11/08/2025	7	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	156844	4003963	CL 65C 91 - 198	7	CUCARACHO
11/08/2025	8	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	138089	5003948	CR 43B 10 - 70	14	MANILA
11/08/2025	9	DIURNA	12	MDC-19 (TIBIA) + RAP	158935	5004892	CL 42C 90 50	12	E L DANUBIO
11/08/2025	10	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	158399	5000754	CR 80AA 36 - 38	11	LAS ACACIAS

FECHA (DD/MM/AAAA	CUADRILLA	JORNADA (DIURNA/ NOCTURNA)	TON	TIPO DE MEZCLA	ID - SIRO	CÓDIGO SEGMENTO VIAL	LOCALIZACION / DIRECCION (INICIO LABORES o PRINCIPAL)	COMUNA	BARRIO
12/08/2025	1	NOCTURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	154081	5003650	CR 42 ENTRE CL 8 Y CL 10	14	POBLADO
12/08/2025	2	DIURNA	5	MDC-19 (TIBIA) + RAP	155027	2000723	CR 80 20A - 64	16	SAN BERNARDO
12/08/2025	3	DIURNA	12	MDC-19 (TIBIA) + RAP	155390	5002992	CR 74 CON CL 112 CR 74 # 113 - 29 CR 74 # 115 - 03 CL 116 74 - 13	5	TEJELO
12/08/2025	4	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	158447	6000202	CR 55 48 SUR - 04 - ANTIGUA VÍA SAN ANTONIO DE PRADO	80	SAN ANTONIO DE PRADO
12/08/2025	5	NOCTURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	159038	2001630	CR 59 55 - 504 (AV. REGIONAL, CALZADA RÁPIDA, SECTOR PLAZA MINORISTA). SENTIDO SUR - NORTE	10	SAN BENITO
12/08/2025	6	DIURNA	12	MDC-19 (TIBIA) + RAP	154428	5001397	CL 32 69 - 25	16	ROSALES
12/08/2025	7	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PENDIENTE	PENDIENTE	CR 103 CL 69	60	ÁREA DE EXPANSIÓN PAJARITO
12/08/2025	8	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	157212	5003440	CR 37A 1 SUR - 138	14	POBLADO
12/08/2025	9	DIURNA	12	MDC-19 (TIBIA) + RAP	159080	5004701	CR 89 43-61	12	E L DANUBIO
12/08/2025	10	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	158814	7000125	CR 112 13 - 05	70	ALTAVISTA (BUGA - PATIO BONITO)

FECHA (DD/MM/AAAA	CUADRILLA	JORNADA (DIURNA/ NOCTURNA)	TON	TIPO DE MEZCLA	ID - SIRO	CÓDIGO SEGMENTO VIAL	LOCALIZACION / DIRECCION (INICIO LABORES o PRINCIPAL)	COMUNA	BARRIO
13/08/2025	1	NOCTURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	157797	5003651	CR 42 ENTRE CL 89Y CL 10	14	POBLADO
13/08/2025	2	DIURNA	5	MDC-19 (TIBIA) + RAP	152457	2002601	AV 80 CON CR 44	12	LOS PINOS
13/08/2025	3	DIURNA	12	MDC-19 (TIBIA) + RAP	155650	5016127	CR 75 115 - 17	5	FLORENCIA
13/08/2025	4	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	158465	6000291	CL 43A 42 - 82- ANTIGUA VÍA SAN ANTONIO DE PRADO	80	SAN ANTONIO DE PRADO
13/08/2025	5	NOCTURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	155833	5008514	CR 59 55 - 504 (AV. REGIONAL, CALZADA RÁPIDA, ENTRE CL 58 (PUENTE HORACIO TORO) Y CL 67 (PUENTE DE BARRANQUILLA)). SENTIDO SUR - NORTE	10	EL CHAGUALO
13/08/2025	6	DIURNA	12	MDC-19 (TIBIA) + RAP	157372	5000090	CL 26 65B 35	15	TRINIDAD
13/08/2025	7	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	145859	7001090	CL 65 CR 97	60	ÁREA DE EXPANSIÓN PAJARITO
13/08/2025	8	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	140195	4001412	CR 43B 14 - 51	14	VILLA CARLOTA
13/08/2025	9	DIURNA	12	MDC-19 (TIBIA) + RAP	149770	4000467	CL 34B 118 86	13	EL CORAZÓN
13/08/2025	10	DIURNA	12	MDC-19 (TIBIA) + RAP	126358	4003169	CL 18 110A 121	70	ALTAVISTA SECTOR CENTRAL

FECHA (DD/MM/AAAA	CUADRILLA	JORNADA (DIURNA/ NOCTURNA)	TON	TIPO DE MEZCLA	ID - SIRO	CÓDIGO SEGMENTO VIAL	LOCALIZACION / DIRECCION (INICIO LABORES o PRINCIPAL)	COMUNA	BARRIO
14/08/2025	1	NOCTURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	158265	5003651	CR 42 ENTRE CL 9 Y CL 10	14	POBLADO
14/08/2025	2	DIURNA	5	MDC-19 (TIBIA) + RAP	157886	4003030	CR 43 30 - 45	10	SAN DIEGO
14/08/2025	3	DIURNA	12	MDC-19 (TIBIA) + RAP	157829	2000077	CR 52 108 -14	2	LA FRANCIA
14/08/2025	4	DIURNA	5	MDC-19 (TIBIA) + RAP	141128	6000137	CL 41 SUR CON 81	80	SAN ANTONIO DE PRADO
14/08/2025	5	NOCTURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	159286	N.R.	CR 62D 113A-49 - 19	5	TOSCANA
14/08/2025	6	DIURNA	12	MDC-19 (TIBIA) + RAP	159266	5000145	CL 26 CR 65C	15	TRINIDAD
14/08/2025	7	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	158498	7000298	CL 65C CR 95	60	ÁREA DE EXPANSIÓN PAJARITO
14/08/2025	8	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	158727	4001613	CR 32 CL 1A SUR S - 22	14	LOS NARANJOS
14/08/2025	9	DIURNA	12	MDC-19 (TIBIA) + RAP	149767	4000467	CL 34B 118 106	13	EL CORAZÓN
14/08/2025	10	DIURNA	12	MDC-19 (TIBIA) + RAP	158822	7000112	CR 109 14 9	70	ALTAVISTA SECTOR CENTRAL
14/08/2025	11	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	157632	5004240	CL 38A 80 - 78	11	LORENA

FECHA (DD/MM/AAAA	CUADRILLA	JORNADA (DIURNA/ NOCTURNA)	TON	TIPO DE MEZCLA	ID - SIRO	CÓDIGO SEGMENTO VIAL	LOCALIZACION / DIRECCION (INICIO LABORES o PRINCIPAL)	COMUNA	BARRIO
15/08/2025	1	NOCTURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	149760	1000005	CL 9 50 - 99	15	GUAYABAL
15/08/2025	2	DIURNA	5	MDC-19 (TIBIA) + RAP	159305	4000355	CR 87 ENTRE CL 47DD Y CL 47F	12	SANTA LUCÍA
15/08/2025	3	DIURNA	12	MDC-19 (TIBIA) + RAP	152902	2000086	CR 52 120 - 40	2	LA FRONTERA
15/08/2025	4	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	158457	6000224	CL 38A SUR 65D-32	80	SAN ANTONIO DE PRADO
15/08/2025	5	NOCTURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	159374	1000055	CR 64A CON CL 78	5	TRICENTENARIO
15/08/2025	6	DIURNA	12	MDC-19 (TIBIA) + RAP	158174	6000347	CL 63 CON CR 144	60	TRAVESÍAS
15/08/2025	7	DIURNA	12	MDC-19 (TIBIA) + RAP	159357	2001583	CR 89 CL 65 - ANTIGUA VÍA AL MAR	7	CUCARACHO
15/08/2025	8	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	124568	5003874	CL 10 D CON CR 30A	14	LAS LOMAS No. 1
15/08/2025	9	DIURNA	12	MDC-19 (TIBIA) + RAP	1456881	N.R.	CR 130 CL 34B	70	EL CORAZÓN - EL MORRO
15/08/2025	10	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	158823	7000098	CR 104AC 18 - 6	70	ALTAVISTA SECTOR CENTRAL
15/08/2025	11	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	157632	5004240	CL 38A 80 - 78	11	LORENA

FECHA (DD/MM/AAAA	CUADRILLA	JORNADA (DIURNA/ NOCTURNA)	TON	TIPO DE MEZCLA	PLANTA	ID - SIRO	CÓDIGO SEGMENTO VIAL	LOCALIZACION / DIRECCION (INICIO LABORES o PRINCIPAL)	COMUNA	BARRIO
16/08/2025	1	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
16/08/2025	2	DIURNA	5	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PAVIMENTAR S.A.	159259	4001149	CR 80 38 24	11	LORENA
16/08/2025	3	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PAVIMENTAR S.A.	159434	2001760	CR 52 117 - 10	2	LA FRONTERA
16/08/2025	4	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PAVIMENTAR S.A.	159300	5016125	CR 75 113 - 23	5	FLORENCIA
16/08/2025	5	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
16/08/2025	6	DIURNA	12	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PAVIMENTAR S.A.	159378	6000347	CL 63 CON CR 144	60	TRAVESÍAS
16/08/2025	7	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PAVIMENTAR S.A.	156843	N.R.	CL 66 93 - 08	7	CUCARACHO
16/08/2025	8	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PAVIMENTAR S.A.	157579	4002528	CR 24D 16 - 50 FRENTE A LA PARROQUIA BEATO MARIANO DE JESÚS EUSE HOYOS	14	ALTOS DEL POBLADO
16/08/2025	9	DIURNA	12	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PAVIMENTAR S.A.	154113	7000890	CL 34B 128 - 186	70	EL CORAZÓN - EL MORRO
16/08/2025	10	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PAVIMENTAR S.A.	158825	4003162	CL 18 96 -42	70	ALTAVISTA LA ESPERANZA
16/08/2025	11	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

FECHA (DD/MM/AAAA	CUADRILLA	JORNADA (DIURNA/ NOCTURNA)	TON	TIPO DE MEZCLA	ID - SIRO	CÓDIGO SEGMENTO VIAL	LOCALIZACION / DIRECCION (INICIO LABORES o PRINCIPAL)	COMUNA	BARRIO
19/08/2025	1	DIURNA	12	MDC-19 (TIBIA) + RAP	158706	4004477	CL 43BB CR 120B-150	13	EDUARDO SANTOS
19/08/2025	2	DIURNA	5	MDC-19 (TIBIA) + RAP	159259	5000861	CL 53A 79A-41	11	LOS COLORES
19/08/2025	3	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	140783	2000074	CR 52 106A - 107	2	ANDALUCÍA
19/08/2025	4	NOCTURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	156596	4003181	CR 47 53 - 15	10	LA CANDELARIA
19/08/2025	5	NOCTURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	159204	1000112	CR 58 # 65 - 46	10	EL CHAGUALO
19/08/2025	6	DIURNA	12	MDC-19 (TIBIA) + RAP	156869	7000290	CR 143A 62B - 108	60	LAS PLAYAS
19/08/2025	7	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	151318	4003963	CL 65 C 91 99	60	ÁREA DE EXPANSIÓN PAJARITO
19/08/2025	8	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	155390	5002992	CR 49A 87 - 73	4	LA PIÑUELA
19/08/2025	9	DIURNA	12	MDC-19 (TIBIA) + RAP	157076	7000892	CL 34B 128 - 231	70	EL CORAZÓN - EL MORRO
19/08/2025	10	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	158827	4003150	CL 18 89D - 29	70	ALTAVISTA LA ESPERANZA
19/08/2025	11	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	154959	5004260	CR 80A CON CL 40 Y CL 41# 80A-07	11	LORENA
19/08/2025	12	DIURNA	100	MSC-19 (TIBIA) + RAP	POR DEFINIR	5011139	CL 45C ENTRE CL 46 Y CR 21	9	MIRAFLORES
19/08/2025	13	DIURNA	80	MSC-19 (TIBIA) + RAP	151743	5007024	CR 69 ENTRE CL 95 Y CL 96	5	CASTILLA

FECHA (DD/MM/AAAA	CUADRILLA	JORNADA (DIURNA/ NOCTURNA)	TON	TIPO DE MEZCLA	ID - SIRO	CÓDIGO SEGMENTO VIAL	LOCALIZACION / DIRECCION (INICIO LABORES o PRINCIPAL)	COMUNA	BARRIO
20/08/2025	1	DIURNA	12	MDC-19 (TIBIA) + RAP	158863	4004546	CR 120B CL 43BA-19	13	EDUARDO SANTOS
20/08/2025	2	DIURNA	5	MDC-19 (TIBIA) + RAP	158228	5000863	CR 79A 53 - 15	11	LOS COLORES
20/08/2025	3	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	158108	5013515	CR 52 CON CL 109B	2	LA FRANCIA
20/08/2025	4	NOCTURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	159355	4003181	CR 47 53 - 20	10	LA CANDELARIA
20/08/2025	5	NOCTURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	159560	2001149	CR 63 # 101C - 21 AV. REGIONAL SENTIDO SUR-NORTE	5	BELALCAZAR
20/08/2025	6	DIURNA	12	MDC-19 (TIBIA) + RAP	156869	7000290	CR 143A 62B - 142	60	LAS PLAYAS
20/08/2025	7	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	159265	5019001	CR 102 68 - 37	60	ÁREA DE EXPANSIÓN PAJARITO
20/08/2025	8	DIURNA	12	MDC-19 (TIBIA) + RAP	157902	3000391	CR 49 89A - 14	4	LA PIÑUELA
20/08/2025	9	DIURNA	12	MDC-19 (TIBIA) + RAP	145262	5019186	CL 34B CON CR 125	70	EL CORAZÓN EL MORRO
20/08/2025	10	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	158910	7000819	CL 5 SUR 90 -201	70	ALTAVISTA ELJARDÍN
20/08/2025	11	DIURNA	12	MDC-19 (TIBIA) + RAP	159262	4001143	CR 80 36 - 37	11	LAS ACACIAS
20/08/2025	15	DIURNA	120	MSC-19 (TIBIA) + RAP	POR DEFINIR	5011139	CL 45C ENTRE CL 46 Y CR 21	9	MIRAFLORES
20/08/2025	16	DIURNA	100	MSC-19 (TIBIA) + RAP	POR DEFINIR	5007024	CR 69 ENTRE CL 95 Y CL 96	5	CASTILLA

FECHA (DD/MM/AAAA	CUADRILLA	JORNADA (DIURNA/ NOCTURNA)	TON	TIPO DE MEZCLA	ID - SIRO	CÓDIGO SEGMENTO VIAL	LOCALIZACION / DIRECCION (INICIO LABORES o PRINCIPAL)	COMUNA	BARRIO
21/08/2025	1	DIURNA	12	MDC-19 (TIBIA) + RAP	158865	4000654	CR 120B CL 43BA-19	13	EDUARDO SANTOS
21/08/2025	2	DIURNA	5	MDC-19 (TIBIA) + RAP	154118	4004190	CR 39 CON CL 58	10	BOSTON
21/08/2025	3	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	157610	2000077	CR 52 # 108 - 27	2	LA FRANCIA
21/08/2025	4	NOCTURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	155128	5007532	CR 47 53 - 03	10	LA CANDELARIA
21/08/2025	5	NOCTURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	159560	2001149	CR 63 # 101C - 21 AV. REGIONAL SENTIDO SUR-NORTE	5	BELALCAZAR
21/08/2025	6	DIURNA	11	MDC-19 (TIBIA) + RAP	157253	4000769	CR 53 # 12AA S - 26	16	LA COLINA
21/08/2025	7	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	154961	4003936	CL 64 ENTRE CR 94B Y CR 94C	7	CUCARACHO
21/08/2025	8	DIURNA	12	MDC-19 (TIBIA) + RAP	152951	5010866	CR 9A # 49B - 10	9	BARRIOS DE JESÚS
21/08/2025	9	DIURNA	12	MDC-19 (TIBIA) + RAP	159618	5019186	CL 34B # 125 - 170	70	EL CORAZÓN EL MORRO
21/08/2025	10	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	158914	7000013	CL 5 SUR 99 - 675	70	ALTAVISTA EL JARDÍN
21/08/2025	11	DIURNA	11	MDC-19 (TIBIA) + RAP	159643	3000317	CL # 39D 73 - 152	11	LAURELES
21/08/2025	12	DIURNA	11	MDC-19 (TIBIA) + RAP	157325	4000671	CL 6 # 50EE - 30	15	CRISTO REY
21/08/2025	15	DIURNA	118	MSC-19 (TIBIA) + RAP	-	-	CL 45C ENTRE CL 46 Y CR 21	9	MIRAFLORES
21/08/2025	16	DIURNA	95	MSC-19 (TIBIA) + RAP	-	-	CL 95 ENTRE CR 68 Y CR 69 CR 69 ENTRE CL 95 Y CL 96	5	CASTILLA

FECHA (DD/MM/AAAA	CUADRILLA	JORNADA (DIURNA/ NOCTURNA)	TON	TIPO DE MEZCLA	ID - SIRO	CÓDIGO SEGMENTO VIAL	LOCALIZACION / DIRECCION (INICIO LABORES o PRINCIPAL)	COMUNA	BARRIO
22/08/2025	1	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	158854	4003071	CR 125 CL 54-152	60	LA LOMA
22/08/2025	2	DIURNA	5	MDC-19 (TIBIA) + RAP	149589	5019539	CR 44 ENTRE CL 18 Y CL 25.	14	VILLA CARLOTA
22/08/2025	3	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	159653	2000080	CR 52 109B - 40	2	LA FRANCIA
22/08/2025	4	NOCTURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	145291	4003186	CR 47 ENTRE AV. ORIENTAL Y CL 57	10	VILLA NUEVA
22/08/2025	5	NOCTURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	159720	2001389	CL 10 CR 48 - 35 SENTIDO OCCIDENTE - ORIENTE	14	MANILA
22/08/2025	6	DIURNA	11	MDC-19 (TIBIA) + RAP	152177	5009372	CR 53 CON 13A SUR	16	LA COLINA
22/08/2025	7	DIURNA	12	MDC-19 (TIBIA) + RAP	159686	5029834	CR 77 CON CL 63	7	SAN GERMÁN
22/08/2025	8	DIURNA	12	MDC-19 (TIBIA) + RAP	158312	4004916	CL 16A SUR # 30A-94 CL 16A SUR ENTRE CR 25 Y AV. EL POBLADO	14	SAN LUCAS
22/08/2025	9	DIURNA	12	MDC-19 (TIBIA) + RAP	157078	4000463	CL 34B 116D-25	13	EL CORAZÓN
22/08/2025	10	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	157149	7000820	CL 5 SUR CR 90 - 457	70	ALTAVISTA EL JARDÍN
22/08/2025	11	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	158068	5009419	CL 2B 75D - 29 CL 1 SUR 75DA - 229	16	LA MOTA
22/08/2025	12	DIURNA	11	MDC-19 (TIBIA) + RAP	157325	4000671	CL 6 SUR 50EE - 30	15	CRISTO REY
22/08/2025	15	DIURNA	60	MSC-19 (TIBIA) + RAP	-	-	CL 45C ENTRE CL 46 Y CR 21	9	MIRAFLORES
22/08/2025	16	DIURNA	75	MSC-19 (TIBIA) + RAP	-	-	CL 95 ENTRE CR 68 Y CR 69	5	CASTILLA

FECHA (DD/MM/AAAA	CUADRILLA	JORNADA (DIURNA/ NOCTURNA)	TON	TIPO DE MEZCLA	ID - SIRO	CÓDIGO SEGMENTO VIAL	LOCALIZACION / DIRECCION (INICIO LABORES o PRINCIPAL)	COMUNA	BARRIO
25/08/2025	1	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	154251	6000010	CL 55 A 125 32	60	LA LOMA
25/08/2025	2	DIURNA	5	MDC-19 (TIBIA) + RAP	159543	5003952	CR 42 B 31 - 11	10	SAN DIEGO
25/08/2025	3	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	159841	2000874	CR 52 100 76	2	SANTA CRUZ
25/08/2025	4	NOCTURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	158718	2000427	CL 49 ENTRE CR 53 Y CR 56	10	SAN BENITO
25/08/2025	5	NOCTURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	159289	1000128	CR 59 88 - 20	4	MORAVIA
25/08/2025	6	DIURNA	12	MDC-19 (TIBIA) + RAP	152171	5001025	CR 50D 1 SUR - 14	15	CRISTO REY
25/08/2025	7	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	150967	4003910	CL 72 CON CR 91D + 100 M	7	PALENQUE
25/08/2025	8	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	144533	5009438	CR 49 CL 89A (MITIGAR: CR 48 72 - 17)	4	LA PIÑUELA
25/08/2025	9	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	151015	4000461	CL 34B 113D - 219	13	EL CORAZÓN
25/08/2025	10	DIURNA	12	MDC-19 (TIBIA) + RAP	155274	5011248	CR 25 49 - 9	9	ALEJANDRO ECHAVARRÍA
25/08/2025	11	DIURNA	12	MDC-19 (TIBIA) + RAP	158894	5007584	CR 80 34 - 17	11	LAURELES
25/08/2025	12	DIURNA	12	MDC-19 (TIBIA) + RAP	157926	4001137	CR 50B 5 SUR - 41	15	CRISTO REY
25/08/2025	15	DIURNA	116	MSC-19 (TIBIA) + RAP	-	-	CR 22 ENTRE CL 45 Y CL 48	9	MIRAFLORES
25/08/2025	16	NOCTURNA	110	MSC-19 (TIBIA) + RAP	-	-	CR 47 ENTRE CL 52 Y CL 53	10	LA CANDELARIA

FECHA (DD/MM/AAAA	CUADRILLA	JORNADA (DIURNA/ NOCTURNA)	TON	TIPO DE MEZCLA	ID - SIRO	CÓDIGO SEGMENTO VIAL	LOCALIZACION / DIRECCION (INICIO LABORES o PRINCIPAL)	COMUNA	BARRIO
26/08/2025	1	DIURNA	11	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PENDIENTE POR DEFINIR	PENDIENTE POR DEFINIR	CL 55A 125A - 162	60	LA LOMA
26/08/2025	2	DIURNA	5	MDC-19 (TIBIA) + RAP	149589	5019539	CR 44 ENTRE CL 18 Y CL 25 (PENDIENTE POR DEFINIR)	14	VILLA CARLOTA
26/08/2025	3	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PENDIENTE POR DEFINIR	PENDIENTE POR DEFINIR	CR 55 CON CL 95	4	PALERMO
26/08/2025	4	NOCTURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	159828	4001381	CR 44 ENTRE CL 25 Y CL 30	14	BARRIO COLOMBIA
26/08/2025	5	NOCTURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	141448	4003552	CR 64A CON CL 78	5	TERMINAL DE TRANSPORTE
26/08/2025	6	DIURNA	12	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PENDIENTE POR DEFINIR	5001025	CR 50D 1 SUR - 14	15	CRISTO REY
26/08/2025	7	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	159935	2001536	CL 63 103E - 44	7	SANTA MARGARITA
26/08/2025	8	DIURNA	11	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PENDIENTE POR DEFINIR	5009438	CR 49 CL 89A	4	LA PIÑUELA
26/08/2025	9	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	140019	4000464	CL 34B CON 116D	13	EL CORAZÓN
26/08/2025	10	DIURNA	12	MDC-19 (TIBIA) + RAP	157787	5008194	CL 47 33 - 106	9	BUENOS AIRES
26/08/2025	11	DIURNA	12	MDC-19 (TIBIA) + RAP	159947	5000714	CL 34 80A - 69	11	LAS ACACIAS
26/08/2025	12	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PENDIENTE POR DEFINIR	PENDIENTE POR DEFINIR	CL 3 SUR 50C-38	15	CRISTO REY
26/08/2025	15	DIURNA	116	MSC-19 (TIBIA) + RAP	-	-	CR 22 ENTRE CL 45 Y CL 48	9	MIRAFLORES
26/08/2025	16	NOCTURNA	110	MSC-19 (TIBIA) + RAP	-	-	CR 47 ENTRE CL 52 Y CL 53	10	LA CANDELARIA

FECHA (DD/MM/AAAA	CUADRILLA	RANGO	JORNADA (DIURNA/ NOCTURNA)	TON	TIPO DE MEZCLA	ID - SIRO	CÓDIGO SEGMENTO VIAL	LOCALIZACION / DIRECCION (INICIO LABORES o PRINCIPAL)	COMUNA	BARRIO
27/08/2025	1	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
27/08/2025	2	0	DIURNA	5	MDC-19 (TIBIA) + RAP	149589	5019539	CR 44 ENTRE CL 18 Y CL 25	14	VILLA CARLOTA
27/08/2025	3	1	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	157836	5013581	CR 49B ENTRE CL 106 Y CL 107	2	ANDALUCÍA
27/08/2025	4	1	NOCTURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	159828	4001381	CR 44 ENTRE CL 25 Y CL 30	14	BARRIO COLOMBIA
27/08/2025	5	1	NOCTURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	159994	1000114	CR 58 CON CL 67	10	LA CANDELARIA
27/08/2025	6	1	DIURNA	12	MDC-19 (TIBIA) + RAP	159816	4000862	CL 29 65 - 16	15	TRINIDAD
27/08/2025	7	1	DIURNA	12	MDC-19 (TIBIA) + RAP	159936	2001531	CL 63 98B - 143	60	ÁREA DE EXPANSIÓN PAJARITO
27/08/2025	8	1	DIURNA	11	MDC-19 (TIBIA) + RAP	156637	5002342	CR 47B CON CL 98A	2	SANTA CRUZ
27/08/2025	9	1	DIURNA	11	MDC-19 (TIBIA) + RAP	151012	5018736	CL 34B 115A - 34	13	EL CORAZÓN
27/08/2025	10	1	DIURNA	12	MDC-19 (TIBIA) + RAP	159990	5008319	CL 57 29 - 28	8	SUCRE
27/08/2025	11	1	DIURNA	12	MDC-19 (TIBIA) + RAP	156650	4000408	CL 35 80B - 25	11	LAS ACACIAS
27/08/2025	12	1	DIURNA	11	MDC-19 (TIBIA) + RAP	160029	5000038	CL 4 SUR 51B - 35	15	CRISTO REY
27/08/2025	14	3	DIURNA	40	MSC-19 (TIBIA) + RAP	155858	2000735	CR 81 30A - 27	16	BELÉN
27/08/2025	15	4	DIURNA	106	MSC-19 (TIBIA) + RAP	-	-	CR 22 ENTRE CL 45 Y CL 48	9	MIRAFLORES
27/08/2025	16	4	NOCTURNA	110	MSC-19 (TIBIA) + RAP	-	-	CR 47 ENTRE CL 52 Y CL 53	10	LA CANDELARIA

FECHA (DD/MM/AAAA	CUADRILLA	RANGO	JORNADA (DIURNA/ NOCTURNA)	TON	TIPO DE MEZCLA	ID - SIRO	CÓDIGO SEGMENTO VIAL	LOCALIZACION / DIRECCION (INICIO LABORES o PRINCIPAL)	COMUNA	BARRIO
28/08/2025	1	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
28/08/2025	2	0	DIURNA	5	MDC-19 (TIBIA) + RAP	159683	4000728	CR 51 ENTRE CL 6 SUR Y CL 12 SUR	14	VILLA CARLOTA
28/08/2025	3	1	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	POR DEFINIR	5012464	CR 31 ENTRE CL 102B Y CL 104 ENTRADA A CARPINELO (ANTES DE LA ESTACIÓN SANTO DOMINGO)	15	GUAYABAL
28/08/2025	4	1	NOCTURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	159786	4001372	CL 24 ENTRE CR 43F Y CR 43 G	14	BARRIO COLOMBIA
28/08/2025	5	1	NOCTURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	160117	2001120	CR 64AA 113A - 25	5	TOSCANA
28/08/2025	6	1	DIURNA	12	MDC-19 (TIBIA) + RAP	157367	5000088	CL 26 65A - 59	15	TRINIDAD
28/08/2025	7	1	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	128789	4004312	CL 80 CON CR 88	7	AURES No. 02
28/08/2025	8	1	DIURNA	11	MDC-19 (TIBIA) + RAP	160104	5009596	CR 49 CON CL 98	2	LA ROSA
28/08/2025	9	1	DIURNA	11	MDC-19 (TIBIA) + RAP	151168	4000459	CL 34B 113D - 91	13	EL CORAZÓN
28/08/2025	10	1	DIURNA	11	MDC-19 (TIBIA) + RAP	122607	4001473	CR 30 CON CL 10	14	LAS LOMAS No. 01
28/08/2025	11	1	DIURNA	12	MDC-19 (TIBIA) + RAP	160124	3000296	CR 76 CON CL 35	11	LAURELES
28/08/2025	12	1	DIURNA	12	MDC-19 (TIBIA) + RAP	145398	2001672	CL 6 SUR 51 - 64	15	CRISTO REY
28/08/2025	14	3	DIURNA	45	MSC-19 (TIBIA) + RAP	155858	2000735	CR 81 30A - 27	16	BELÉN
28/08/2025	15	4	DIURNA	118	MSC-19 (TIBIA) + RAP	-	-	CR 22 ENTRE CL 45 Y CL 48	9	MIRAFLORES
28/08/2025	16	4	NOCTURNA	110	MSC-19 (TIBIA) + RAP	-	-	CR 47 CON CL 52	10	LA CANDELARIA

FECHA (DD/MM/AAAA	CUADRILLA	RANGO	JORNADA (DIURNA/ NOCTURNA)	TON	TIPO DE MEZCLA	ID - SIRO	CÓDIGO SEGMENTO VIAL	LOCALIZACION / DIRECCION (INICIO LABORES o PRINCIPAL)	COMUNA	BARRIO
29/08/2025	2	0	DIURNA	5	MDC-19 (TIBIA) + RAP	122607	4001473	CL 30 CON CR 10 CONTINUAR POR TV. INFERIOR Y SEGUIR HASTA CL 16A SUR ENTRE CR 34 Y CR 43A.	14	LAS LOMAS No. 01
29/08/2025	3	1	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	157003	4003019	CL 118B 42E - 46 Y ENTRE CL 118 # 42E 22 Y CL 118 # 42E - 95	1	POPULAR
29/08/2025	4	1	NOCTURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	143497	4001373	CL 24 ENTRE CR 43F Y CR 43 G	14	BARRIO COLOMBIA
29/08/2025	5	1	NOCTURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	160049	1000125	CR 62 80C - 178	4	MORAVIA
29/08/2025	6	1	DIURNA	12	MDC-19 (TIBIA) + RAP	160180	-	CR 65E 26 - 73	15	TRINIDAD
29/08/2025	7	1	DIURNA	11	MDC-19 (TIBIA) + RAP	160126	2001530	CL 63 98 - 52	60	ÁREA DE EXPANSIÓN PAJARITO
29/08/2025	8	1	DIURNA	11	MDC-19 (TIBIA) + RAP	160178	4002064	CL 95 47 50	4	BERLÍN
29/08/2025	9	1	DIURNA	11	MDC-19 (TIBIA) + RAP	160157	4000460	CL 34B 113D 75	13	EL CORAZÓN
29/08/2025	10	1	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	157747	5007845	CR 28A 42 - 63	9	LA MILAGROSA
29/08/2025	11	1	DIURNA	12	MDC-19 (TIBIA) + RAP	151576	5029830	TV 53A 65 10	11	CARLOS E. RESTREPO
29/08/2025	12	1	DIURNA	12	MDC-19 (TIBIA) + RAP	160154	2000705	CL 6 SUR 50FF - 13	15	GUAYABAL
29/08/2025	14	3	DIURNA	45	MSC-19 (TIBIA) + RAP	155858	2000735	CR 81 30A - 27	16	BELÉN
29/08/2025	15	4	DIURNA	100	MSC-19 (TIBIA) + RAP	-	-	DG 75 ENTRE TV 39CA Y TV 39CB	11	LAURELES
29/08/2025	16	4	NOCTURNA	105	MSC-19 (TIBIA) + RAP	-	-	CR 47 CON CL 52	10	LA CANDELARIA

FECHA (DD/MM/AAAA	CUADRILLA	RANGO	JORNADA (DIURNA/ NOCTURNA)	TON	TIPO DE MEZCLA	ID - SIRO	CÓDIGO SEGMENTO VIAL	LOCALIZACION / DIRECCION (INICIO LABORES o PRINCIPAL)	COMUNA	BARRIO
30/08/2025	15	4	DIURNA	80	MSC-19 (TIBIA) + RAP	-	-	DG 75 ENTRE TV 39CA Y TV 39CB	11	LAURELES


Para el mes de **agosto de 2025** la supervisión envía correos electrónicos al email registrado de la interventoría, así como mensajes al chat de WhatsApp de la dirección del mismo, solicitando la atención de baches que requieren atención de forma inmediata.

Estos reportes son el punto de partida de cada una de las jornadas de las cuadrillas vinculadas al proyecto, y son la base para la realización de las actividades en las diferentes comunas, que se deben ir ampliando de acuerdo con los reportes de SIRO y la inspección que hacen los tecnólogos en campo.

En este periodo se atendieron los siguientes baches mediáticos, **tabla 5**:



CR 44 x CL 39

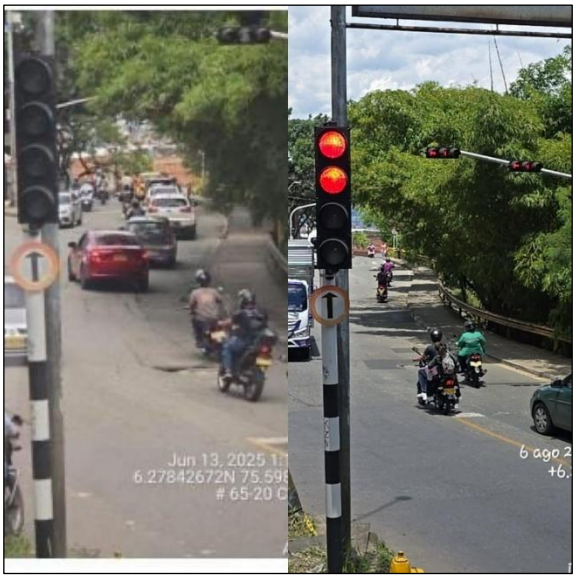

CR 89 x CR 65


cocodrilo, las cuales requieren labores de mantenimiento correctivo. Asimismo, se observó afectación en un tramo de la cuneta en concreto rígido ubicada en el costado de la vía. (Ver registro fotográfico).

Foto 1. obsérvese el bache o fallo de pavimento en la carpeta asfáltica

Barrio	Observacion	Estado	Registro Fotografico
	Sede comunal Caunces 1	Área = 11*1,7=16,6 m2	

CR 9A # 49B7



CR 81A x CL 32C



CL 65 # 89-77



CR 53 x CL 49



CR 64A x CL 80



CR 43C x CL 5



CR 90C x CR 65C



AV 80 x CR 67



CR 48C x CL 12 Sur



CR 48C x CL 12 Sur



AV 80 x CR 67



CR 50 FF x CL9 Sur



CR 72 x CL 17



CR 32 x CL 9 Sur



CR 87A x CL 76



DG 75B x CL 32BB



CR 50FF X CL 7 Sur



CR 50FF x CL 8 Sur



CL 32B # 83-39



CL 43 x CR 76



CL 65C x CR 97



CL 49 x CR 20B y CR 21



CR 38 x CL 5 SUR



CR 38 x CL 5 SUR



CL 9 SUR x CR 53



CR 74 x CL 112




CR 74 # 113-37



CR 74 # 115-03



CL 97 x CR 68

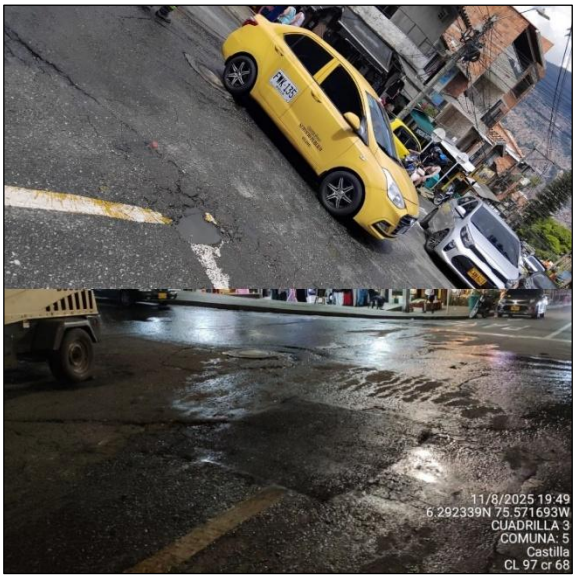

CR 70 x CL 95



CR 70 x CL 95




CL 94 x CR 68



CL 96 x CR 68



CR 43 # 30-45

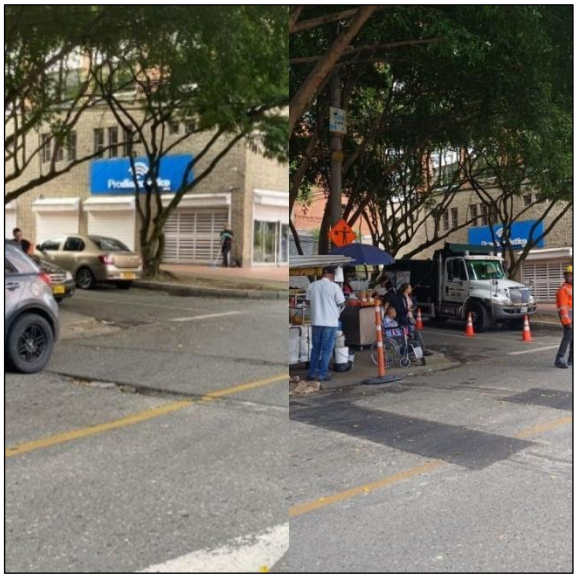

CR 43 # 30-11



CR 42A x CL30



CR 72 x CL 17



CL 65C x CR 97



CR 96E x CL 66F



CL 38 x CR 77



CL 103 X CL 69



CL 63 x CR144



CL 53A x 79-53



CL 53A # 79A-41



CL 38 x CR 77



CR 80 # 38-24



CR 80 # 37-39



CL 37 # 80-21



CR 80 # 34B - 24



CR 80 # 34 B 52



CR 43D # 11 - 02



AV GUAYABAL x CL 25



CR 80 # 36 - 37



CR 46 x CL 52



CR 46 x CL52



CR 82 x CL47D



CR 66B x CL 32C



DG74A x CL33




CR 96E x CL 66F



CL 82 x CL47D



CL 103 X CL 69

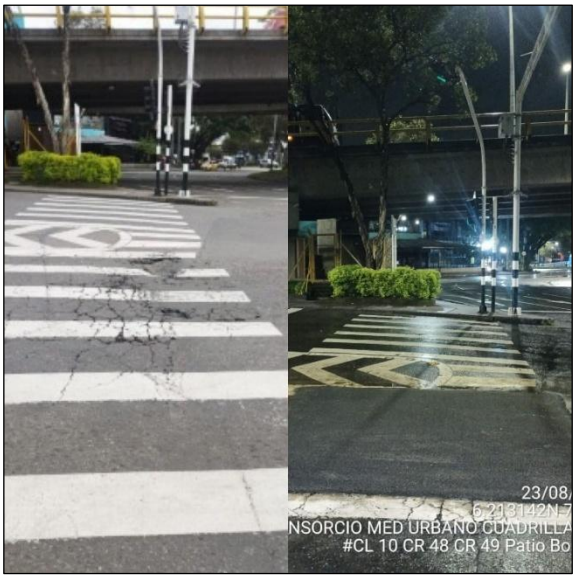

GLORIETA CL 10 x AV LAS VEGAS



CL 77 x CL 63



CR 46 x CL 50



CR 46 # 50 - 28



CR 29 x CL 5



CL 31 x CR 42B



CR 48A x CL 72



CL 39 x CR 44



CR 52 x CL 108



CR 52 # 117-62



CR 52 # 117-99



CR 52 x CL 120A



CR 52 x CL 109A



CR 52 # 100C - 46



CR 52 x CL 105AA



CL 43A Sur # 73 - 10



CL 43A Sur # 72 - 72



CR 72 # 40A Sur 56



CL 38B Sur CR 69



AV 33 # 46 - 21



CR 9A x CL 49B



CR 30 x CL 10



CR 27 # 20 SUR 12



CR 42 A # 30 C 24



CR 65 x CL 80



CL 39 x CR 44



CR 52 x CL 108



CR 52 # 117-62



CR 52 # 117-99



CR 52 x CL 120A



CR 52 x CL 109A



CR 52 # 100C - 46



CR 52 x CL 105AA



CL 43A Sur # 73 - 10



CL 43A Sur # 72 - 72



CR 72 # 40A Sur 56



CL 38B Sur CR 69



AV 33 # 46 - 21



CR 9A x CL 49B



CR 30 x CL 10



CR 27 # 20 SUR 12



CR 42 A # 30 C 24



CR 65 x CL 80



DG 55 # 55-71



CL 64BD # 117H 27



CL 64BD # 117H-23



CL 64BF # 117C-43



CL 64BD # 117H-46



CL 64 x CR 117F



CL 12 Sur x CR 44



CL 12 Sur x CR 44



CL 12 Sur x CR 44



CL 12 Sur x CR 44




CL 12 Sur x CR 44



CR 39 # 85A - 36



CL 44 # 31-33

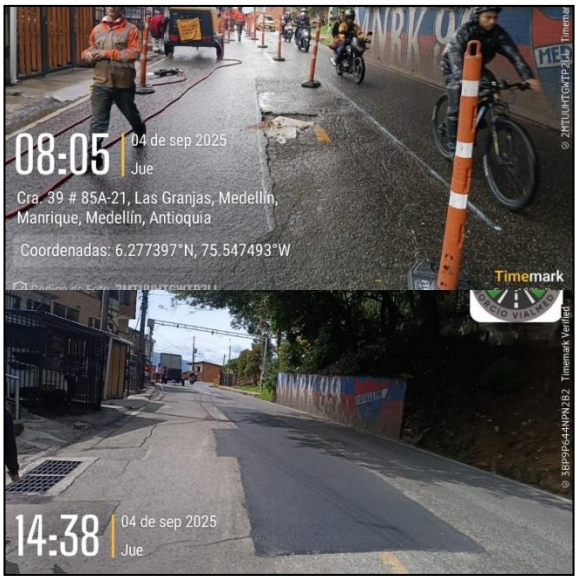


CR 39 # 85A 21



AV SAN JUAN x CR 70



AV SAN JUAN x CR 70

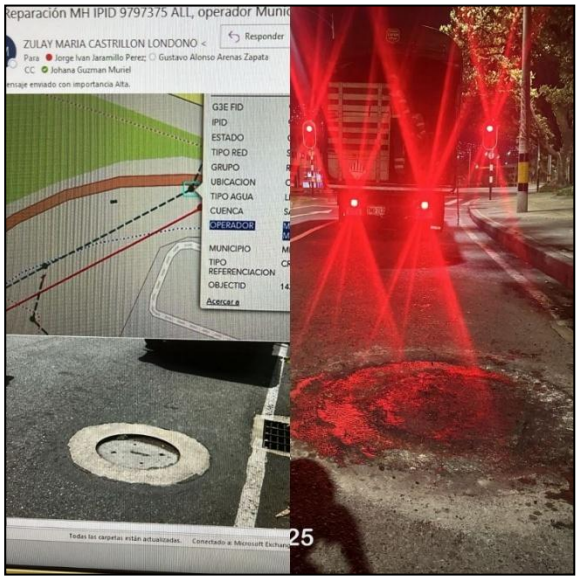

CL 44 x CR 59



CR 32 x CL 51



CR 43 A x CL 34



CL 34B x CR 125




CL 34B # 128-186



CL 34B # 118-86



CL 34B # 116D-19

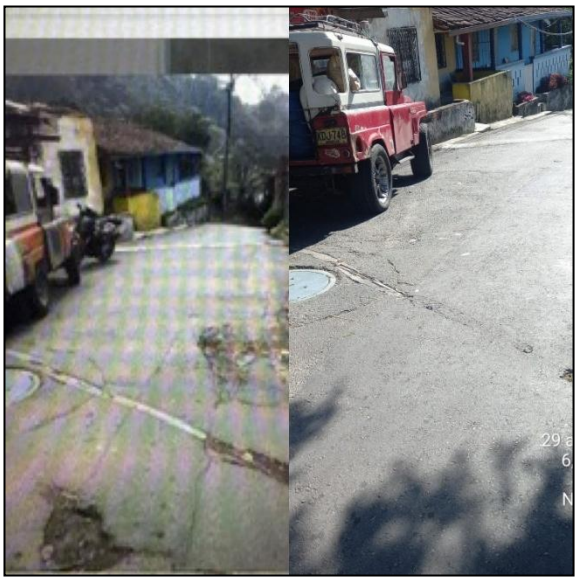

CR 130 x CL 34B



CL 34B # 115A-28



CL 34B # 119A-21



CL 34B # 119A-43



CL 34B # 113D 233




CL 34B # 113D-219



AV SAN JUAN x CR 74



TRANS SUPERIOR x AV. PALMAS

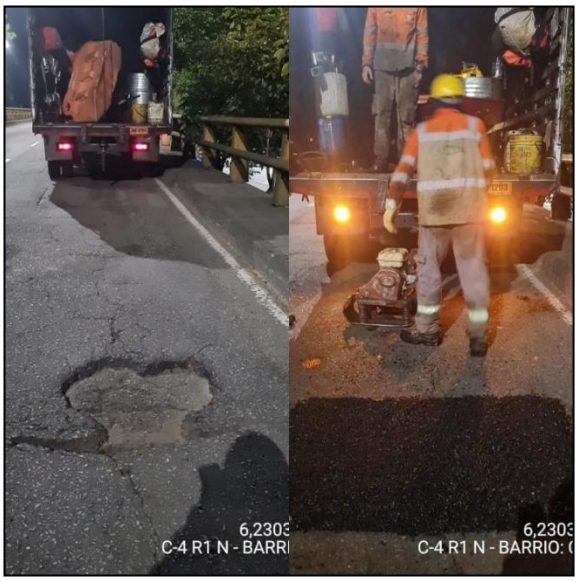

AV GUAYABAL x CL 29C



CL 63 x CR 103E

Durante este periodo de trabajo, el contratista CONSORCIO VIALMED 2025 ha brindado respuesta oportuna con evidencia fotográfica de la ejecución de las actividades de parcheo de baches mediáticos cuando es solicitada por la interventoría y/o la supervisión. Además, mediante control de los residentes de interventoría se ha mantenido al día las atenciones que se les presta a cada uno de los baches priorizados en las fechas enviadas.

Durante el mes de **agosto de 2025** la supervisión priorizo actividades de bacheo que cumplen las condiciones de rango 1, dado que esta característica es la de mayor cantidad reportada en las plataformas y aplicaciones de la alcaldía con relación al estado de las vías que conforman la malla vial de la Alcaldía de Medellín Distrito de ciencia y tecnología.

Durante el mes de **agosto de 2025**, para la ejecución de actividades de bacheo con rango 1, el contratista de obra ha implementado en campo **diez cuadrillas de obra**, las cuales atienden direcciones en las diferentes comunas que fueron programadas mediante visita de campo por el personal de la Secretaría de Infraestructura Física en compañía de la interventoría, además de reportes de Siro.

En la ejecución del Parcheo de baches, se ha instalado mezcla asfáltica densa tibia MDC-19 con RAP entre el 20% y 30% como se corrobora en los informes presentados por el contratista en los certificados de calidad de las plantas que suministran la mezcla asfáltica, estos soportes se dejan reflejados en los anexos del plan de calidad del presente informe.

En la siguiente tabla, se aprecia el resumen de intervenciones de baches con rango 0 y rango 1:

Tabla 6 Atención de Baches rango 0 y rango 1 por barrio y comuna.

Zona	Comuna / Barrio		Rango	Área	# Baches	Volumen m3	Toneladas	Inversión $/ton
Zona 1 - Nororiental	1	Granizal	Rango 1 Diurno	1,00	1	0,04	0,10	$ 93.073
		La Esperanza No.2	Rango 1 Diurno	34,51	1	2,76	6,63	$ 6.170.747
		El Compromiso	Rango 1 Diurno	8,58	2	1,41	3,38	$ 3.145.871
	2	Andalucia	Rango 1 Diurno	30,76	5	4,17	10,02	$ 9.325.924
		La Francia	Rango 1 Diurno	101,00	21	14,94	35,88	$ 33.394.628
		La Frontera	Rango 1 Diurno	92,29	23	13,70	32,88	$ 30.602.436
		La Rosa	Rango 1 Diurno	28,76	2	4,60	11,04	$ 10.275.271
		Moscú No.1	Rango 1 Diurno	38,16	5	4,62	11,09	$ 10.321.806
		Popular	Rango 1 Diurno	28,78	5	4,17	10,01	$ 9.316.617
		Santa Cruz	Rango 1 Diurno	79,04	15	10,68	25,62	$ 23.845.325
	4	Berlin	Rango 1 Diurno	35,09	6	4,59	11,00	$ 10.238.041
		Brasilia	Rango 1 Diurno	28,61	4	4,17	10,00	$ 9.307.310
		Campo Valdés	Rango 1 Diurno	35,18	4	4,13	9,91	$ 9.223.545
		La Piñuela	Rango 1 Diurno	173,90	30	23,84	57,19	$ 53.228.505
		Moravia	Rango 1 Nocturno	48,35	5	8,38	20,11	$ 19.581.187
		Universidad de Antioquia	Rango 1 Nocturno	53,86	6	4,24	10,18	$ 9.912.308
Zona 2 - Noroccidental	5	Castilla	Rango 0	3,10	1	0,28	0,67	$ 850.304
			Rango 1 Diurno	30,86	7	5,02	12,05	$ 11.215.309
		Cementerio universal	Rango 0	17,90	4	1,43	3,43	$ 4.353.047

		El Progreso	Rango 0	9,16	2	0,58	1,39	$ 1.764.063
		Florencia	Rango 1 Diurno	67,02	14	9,17	22,01	$ 20.485.389
		Héctor Abad Gómez	Rango 1 Nocturno	0,11	1	0,01	0,03	$ 29.211
		Oleoducto	Rango 1 Nocturno	15,25	4	1,26	3,03	$ 2.950.323
		Tejelo	Rango 1 Diurno	34,88	7	5,01	12,01	$ 11.178.080
		Terminal de Transporte	Rango 0	28,28	9	2,00	4,79	$ 6.079.037
			Rango 1 Nocturno	57,49	4	8,40	20,17	$ 19.639.609
		Toscana	Rango 1 Nocturno	98,00	16	13,10	31,46	$ 30.632.729
		Tricentenario	Rango 1 Nocturno	48,91	3	6,19	14,86	$ 14.469.242
	7	Aures No.2	Rango 1 Diurno	31,28	3	4,18	10,03	$ 9.335.233
		Cucaracho	Rango 1 Diurno	202,41	25	28,43	68,08	$ 63.364.168
		Ecoparque Cerro El Volador	Rango 0	4,55	1	0,41	0,98	$ 1.243.728
		El Diamante	Rango 1 Diurno	33,62	7	4,19	10,07	$ 9.372.461
		Fuente Clara	Rango 0	21,75	8	2,50	6,00	$ 7.614.660
		La Pola	Rango 1 Diurno	15,23	2	1,37	3,29	$ 3.062.105
		Monteclaro	Rango 1 Diurno	30,06	4	4,17	10,01	$ 9.316.618
		Nueva Villa de la Iguaná	Rango 0	5,13	2	0,46	1,11	$ 1.408.712
		Pajarito	Rango 1 Diurno	41,70	3	4,17	10,01	$ 9.316.617
		Palenque	Rango 1 Diurno	25,05	2	4,26	10,23	$ 9.521.378
		Robledo	Rango 0	20,14	11	2,44	5,88	$ 7.462.368
		San Germán	Rango 1 Diurno	64,36	7	8,88	21,31	$ 19.833.876
		Santa Margarita	Rango 1 Diurno	112,03	10	13,80	33,10	$ 30.807.196
		Universidad Nacional	Rango 1 Nocturno	51,83	5	4,55	10,93	$ 10.642.585
Zona 3 - Centro oriental	8	Sucre	Rango 1 Diurno	35,06	7	5,01	12,01	$ 11.178.079
	9	Alejandro Echavarría	Rango 1 Diurno	59,00	10	9,99	24,01	$ 22.346.852
		Barrios de Jesús	Rango 1 Diurno	88,18	7	9,49	22,78	$ 21.202.053
		Buenos Aires	Rango 1 Diurno	37,31	7	5,02	12,04	$ 11.206.001
		El Salvador	Rango 1 Diurno	33,28	4	4,07	9,76	$ 9.083.936
		La Milagrosa	Rango 1 Diurno	34,13	5	4,18	10,05	$ 9.353.848
		Los Cerros El vergel	Rango 1 Diurno	32,92	7	5,03	12,05	$ 11.215.310
	10	Boston	Rango 0	4,32	2	0,43	1,03	$ 1.307.183
		Corazón de Jesús	Rango 1 Nocturno	50,26	7	8,20	19,69	$ 19.172.231
		El Chagualo	Rango 0	23,88	10	2,01	4,83	$ 6.129.802
			Rango 1 Nocturno	101,48	12	15,86	38,07	$ 37.068.913
		Guayaquil	Rango 1 Nocturno	27,13	4	3,14	7,55	$ 7.351.466
		La Candelaria	Rango 0	0,70	2	0,06	0,15	$ 190.367
			Rango 1 Nocturno	93,98	25	13,27	31,83	$ 30.993.001
		Los Ángeles	Rango 0	5,63	1	0,79	1,89	$ 2.398.618
		Perpetuo Socorro	Rango 1 Nocturno	66,70	6	8,77	21,07	$ 20.515.944
		San Benito	Rango 1 Nocturno	56,27	7	5,19	12,45	$ 12.122.615
		San Diego	Rango 0	33,35	10	5,29	12,71	$ 16.130.388
			Rango 1 Diurno	34,81	6	5,01	12,03	$ 11.196.694
			Rango 1 Nocturno	25,51	1	5,10	12,25	$ 11.927.874
		Villa Nueva	Rango 1 Nocturno	36,17	6	4,89	11,74	$ 11.431.284

Zona 4 - Centro occidental	11	Carlos E. Restrepo	Rango 0	9,27	2	0,83	2,02	$ 2.563.603
			Rango 1 Diurno	41,61	5	4,99	11,97	$ 11.140.850
			Rango 1 Nocturno	0,71	1	0,09	0,20	$ 194.741
		Las Acacias	Rango 0	9,85	4	1,18	2,83	$ 3.591.581
			Rango 1 Diurno	213,00	33	27,22	65,32	$ 60.795.346
		Laureles	Rango 0	14,27	5	1,62	3,91	$ 4.962.221
			Rango 1 Diurno	96,39	14	14,19	34,07	$ 31.710.006
		Lorena	Rango 0	6,38	3	0,74	1,78	$ 2.259.015
			Rango 1 Diurno	71,97	8	9,35	22,43	$ 20.876.297
		Los Colores	Rango 0	49,99	20	5,39	12,93	$ 16.409.595
		Los Conquistadores	Rango 0	0,49	1	0,02	0,06	$ 76.147
	12	Campo Alegre	Rango 1 Diurno	41,99	4	5,01	12,03	$ 11.196.693
		El Danubio	Rango 1 Diurno	137,88	15	19,28	46,26	$ 43.055.615
		Ferrini	Rango 0	0,42	1	0,03	0,08	$ 101.529
		La América	Rango 0	4,04	4	0,68	1,63	$ 2.068.649
		Los Pinos	Rango 0	7,18	5	1,09	2,62	$ 3.325.069
		Santa Lucia	Rango 0	15,70	6	2,02	4,86	$ 6.167.874
	13	Eduardo Santos	Rango 1 Diurno	75,85	6	10,03	24,06	$ 22.393.389
		El Corazón	Rango 1 Diurno	243,81	31	40,45	97,08	$ 90.355.365
		El Pesebre	Rango 0	6,14	3	1,02	2,44	$ 3.096.629
Zona 5 - Suroriental	14	Altos del Poblado	Rango 1 Diurno	30,36	5	4,17	10,01	$ 9.316.617
		Barrio Colombia	Rango 0	16,47	7	2,02	4,84	$ 6.142.494
			Rango 1 Nocturno	81,97	13	10,92	26,22	$ 25.530.518
		El Poblado	Rango 1 Diurno	37,05	4	4,16	9,98	$ 9.288.695
			Rango 1 Nocturno	102,31	19	12,60	30,22	$ 29.425.334
		La Florida	Rango 1 Diurno	37,49	6	4,22	10,14	$ 9.437.612
		Las Lomas No.1	Rango 0	24,71	9	1,09	2,61	$ 3.312.379
			Rango 1 Diurno	97,15	7	9,19	22,04	$ 20.513.312
		Las Lomas No.2	Rango 1 Diurno	20,83	5	2,76	6,62	$ 6.161.439
		Los Naranjos	Rango 1 Diurno	112,39	13	14,01	33,63	$ 31.300.482
		Manila	Rango 1 Diurno	73,07	13	9,13	21,89	$ 20.373.703
		Patio Bonito	Rango 1 Nocturno	9,00	1	1,26	3,02	$ 2.940.586
		San Lucas	Rango 0	6,16	1	0,92	2,22	$ 2.817.424
			Rango 1 Diurno	41,34	5	5,02	12,05	$ 11.215.308
		Santa María de los Ángeles	Rango 1 Nocturno	32,24	4	4,18	10,03	$ 9.766.252
		Villa Carlota	Rango 0	17,92	6	2,01	4,83	$ 6.129.800
			Rango 1 Diurno	26,47	5	3,45	8,27	$ 7.697.145
			Rango 1 Nocturno	10,31	2	1,39	3,34	$ 3.252.171
Zona 6 - Suroccidental	15	Campo amor	Rango 1 Nocturno	21,22	3	2,96	7,09	$ 6.903.561
		Cristo Rey	Rango 0	1,60	1	0,22	0,54	$ 685.319
			Rango 1 Diurno	232,77	38	28,85	69,21	$ 64.415.889
			Rango 1 Nocturno	32,98	3	4,14	9,95	$ 9.688.354
		El Rodeo	Rango 1 Nocturno	21,60	1	3,67	8,81	$ 8.578.332
		Guayabal	Rango 0	35,52	14	4,25	10,21	$ 12.957.613

			Rango 1 Diurno	66,94	9	8,77	21,06	$ 19.601.195
		La Colina	Rango 0	5,55	2	0,60	1,45	$ 1.840.210
			Rango 1 Diurno	96,00	19	14,25	34,20	$ 31.830.999
			Rango 1 Nocturno	2,47	1	0,49	1,19	$ 1.158.708
		Santa Fe	Rango 1 Diurno	0,84	1	0,05	0,12	$ 111.688
			Rango 1 Nocturno	32,30	3	4,20	10,09	$ 9.824.674
		Trinidad	Rango 1 Diurno	193,67	32	25,00	59,98	$ 55.825.247
	16	El Nogal Los Almendros	Rango 0	2,52	1	0,25	0,60	$ 761.466
		El Rincón	Rango 1 Diurno	13,31	4	1,58	3,79	$ 3.527.471
		La Gloria	Rango 0	20,25	8	2,00	4,80	$ 6.091.730
		La Loma de los Bernal	Rango 0	3,00	1	0,27	0,65	$ 824.922
		La Mota	Rango 0	4,00	1	0,40	0,96	$ 1.218.346
			Rango 1 Diurno	17,47	2	2,60	6,24	$ 5.807.762
		Las Mercedes	Rango 1 Diurno	26,93	2	3,93	9,42	$ 8.767.486
		Las Playas	Rango 0	23,33	6	2,27	5,44	$ 6.903.959
		Nueva Villa del Aburrá	Rango 1 Diurno	163,81	18	14,26	34,19	$ 31.821.695
		Rosales	Rango 0	2,19	2	0,18	0,44	$ 558.409
			Rango 1 Diurno	81,25	15	10,05	24,13	$ 22.458.540
Corregimiento San Cristóbal	60	AE Pajarito	Rango 1 Diurno	134,90	13	17,02	40,85	$ 38.020.362
		La Loma	Rango 1 Diurno	117,09	16	17,97	43,14	$ 40.151.738
		La Loma	Rango 0	1,40	1	0,07	0,17	$ 215.749
		Las Playas	Rango 1 Diurno	63,92	7	9,32	22,37	$ 20.820.453
		Travesías	Rango 1 Diurno	48,46	2	5,70	13,69	$ 12.741.707
Corregimiento Altavista	70	Altavista	Rango 1 Diurno	31,36	4	4,17	10,01	$ 9.316.617
		Altavista Sector Central	Rango 1 Diurno	65,46	7	10,10	24,23	$ 22.551.613
		Buga Patio Bonito	Rango 1 Diurno	66,21	6	8,01	19,23	$ 17.897.957
		El Corazón El Morro	Rango 1 Diurno	158,74	22	25,10	60,24	$ 56.067.234
		El Jardín	Rango 1 Diurno	108,53	14	12,30	29,51	$ 27.465.871
		La Esperanza	Rango 1 Diurno	30,76	1	4,15	9,97	$ 9.279.388
Corregimiento San Antonio de Prado	80	San Antonio de Prado	Rango 0	14,02	3	1,86	4,46	$ 5.660.230
			Rango 1 Diurno	75,85	13	10,27	24,64	$ 22.933.211
Corregimiento Santa Elena	90	Mazo	Rango 1 Diurno	8,30	2	1,13	2,70	$ 2.512.974
		Piedra Gorda	Rango 1 Diurno	20,50	3	2,24	5,38	$ 5.007.332
Total=				**6639,23**	**1040**	**869,94**	**2087,65**	**$ 2.001.220.597**

Tabla 7 Resumen de atención de baches comuna y reporte en SIRO **agosto 2025**

ZONA	COMUNA/BARRIO		Baches Ejecutados agosto 2025	
			Id Siro Agosto	Id Siro Acumulado
1	1	Popular	1	1
	2	Santa Cruz	79	79

	3	Manrique	0	4
	4	Aranjuez	55	55
2	5	Castilla	71	102
	6	Doce de Octubre	0	0
	7	Robledo	91	126
3	8	Villa Hermosa	7	15
	9	Buenos Aires	40	52
	10	La Candelaria	99	130
4	11	Laureles – Estadio	96	115
	12	La América	35	45
	13	San Javier	40	41
5	14	El Poblado	125	162
6	15	Guayabal	127	149
	16	Belén	60	94
Corregimientos y Veredas	50	San Sebastián de Palmitas	0	0
	60	San Cristóbal	39	43
	70	AltaVista	54	54
	80	San Antonio de Prado	16	16
	90	Santa Elena	5	32
TOTAL			**1040**	**1315**

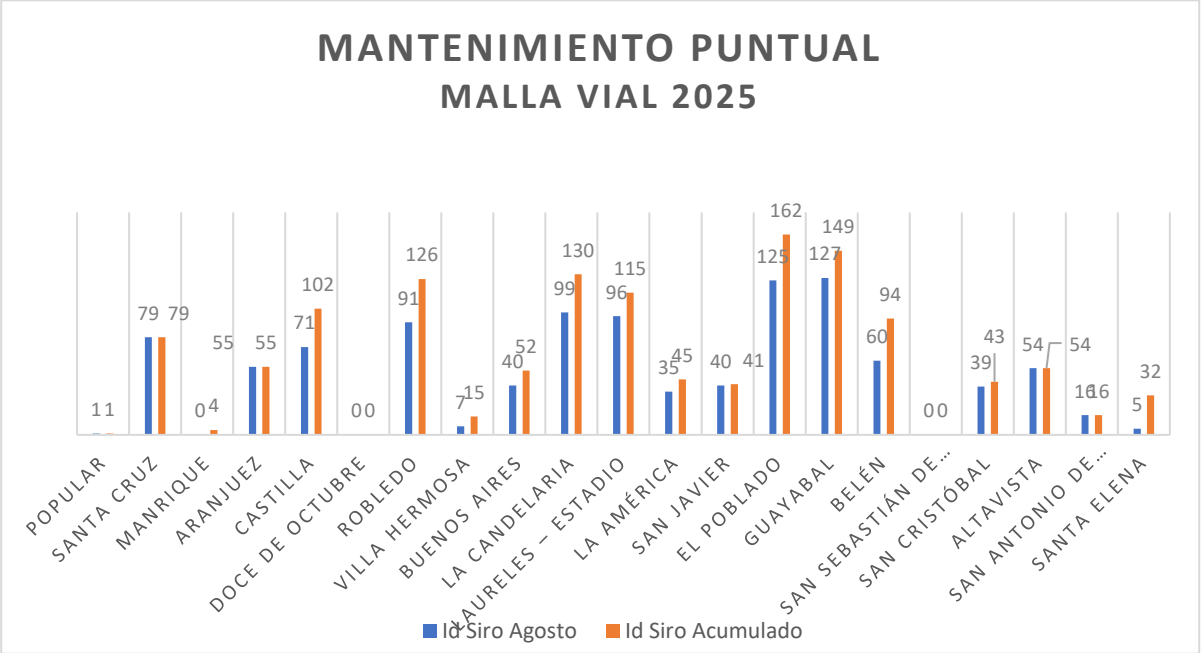


Ilustración 4 Ejecución de baches con reporte de SIRO

Para el mantenimiento puntual con mezcla asfáltica semidensa tibia MSC-19 con RAP, entre el 20% y el 30%, durante el mes de **agosto de 2025** con Rango 3, se intervinieron las siguientes direcciones:

En la siguiente tabla, se aprecia el resumen de intervenciones rango 3:

Tabla 8 Atención de baches rango 3 por barrio y comuna.

Zona	Comuna / Barrio		Rango	Área	Volumen M3	Toneladas	Inversión $/m3
Zona 6 - Suroccidental	16	Belén	Rango 3	338,1524	54,11	130,39	$ 100.213.615
			Total =	**338,1524**	**54,11**	**130,39**	**$ 100.213.615**

Para el mantenimiento puntual con mezcla asfáltica semidensa tibia MSC-19 con RAP, entre el 20% y el 30%, durante el mes de **agosto de 2025** con Rango 4, se intervinieron las siguientes direcciones:

En la siguiente tabla, se aprecia el resumen de intervenciones rango 4:

Tabla 9 Atención de baches rango 4 por barrio y comuna.

Zona	Comuna / Barrio		Rango	Área	Volumen m^3	Toneladas	Inversión $/m^3$
Zona 2 - Noroccidental	5	Castilla	Rango 4 Diurno	1524,95	155,63	375,09	$ 280.896.899
Zona 3 - Centro oriental	9	Miraflores	Rango 4 Diurno	3811,93	369,01	889,24	$ 666.026.886
	10	La Candelaria	Rango 4 Nocturno	2197,22	219,73	529,52	$ 406.008.964
Zona 4 - Centro occidental	11	Laureles	Rango 4 Diurno	777,80	62,23	149,96	$ 112.319.052
			Total =	**8311,89**	**806,60**	**1943,81**	**$ 1.465.251.801**

2.1.1 Análisis de cada una de las actividades de obra programadas, de conformidad con el cronograma vigente vs actividades de obra efectivamente ejecutadas:

Desde los estudios previos y pliegos de condiciones del proceso de licitación No. 70007715 de 2025, se informan las metas físicas a cumplir en el contrato, a las cuales se les hará el debido seguimiento para su cumplimiento.

Durante el mes de **agosto de 2025**, se realizaron principalmente actividades relacionadas con la atención de baches en Rango 0, Rango 1, Rango 3, Rango 4, obras complementarias y actividades de señalización, demarcación de marcas viales y líneas con pintura acrílica.

Tabla 10 Resumen de Metas físicas CONSORCIO VIALMED 2025.

Intervención	Metas Físicas			Ejecutado a agosto 2025	Porcentaje de cumplimiento
Rangos	Inversión agosto 31/2025	%	Cantidad Ton / m3	Cantidad Ton / m3	Cantidad ton / m3
Rango 0: De 0.5 a 5 Ton/Jornada.	$156.772.412	35,29%	123,53	124,24	35,50%
Rango 1: De 9.1 a 12,5 Ton/Jornada diurna	$2.731.750.234	31,76%	2935,06	1590,06	17,21%
Rango 1: De 9.1 a 12,5 Ton/Jornada nocturna	$118.537.878	14,49%	121,74	375,59	44,71%
Rango 2: De 12.51 a 16 Ton/Jornada.	$193.243.904	20,00%	224,00	0,00	0,00%
Rango 3: De 8 a 19.99 m3/Jornada.	$370.407.000	14,29%	200,00	54,11	3,87%
Rango 4: De 20 a 50 m3/Jornada. Horario diurno.	$721.992.800	14,29%	400,00	586,87	20,96%
Rango 4: De 20 a 50 m3/Jornada. Horario nocturno.	$184.776.300	14,29%	100,00	219,73	31,39%

Fuente: Presentación CONSORCIO VIALMED 2025, Presupuesto contractual y seguimiento de obra.

El CONSORCIO VIALMED 2025 aporto la programación de obra el día 21/07/2025, y de acuerdo a la programación presentada se tiene el siguiente seguimiento de obra:

Durante este periodo se ha cumplido el 34,16% del plazo total de ejecución, mientras que el avance físico alcanza el 11,04% y la inversión ejecutada asciende al 11,14%. Según la programación del contratista, al **31 de agosto de 2025** se debía alcanzar un avance físico acumulado del 17,38%, por lo que se registra un atraso del 6,34%.

Ante esta situación, se ha solicitado al contratista nuevamente la implementación total de las cuadrillas necesarias para la ejecución de las obras, considerando que el próximo periodo contempla una inversión significativamente mayor.

Tabla 11 Programación de obra acumulado al **31 de agosto de 2025**

ITEM	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Presupuesto	Estado programado al 31 de agosto	
						Avance acumulado de obra programado	Avance acumulado programado en inversión
	MALLA VIAL 2025.	**90 días**	**lun 21/07/25**	**vie 21/11/25**	**$ 37.396.028.081,00**	**18%**	**$ 6.499.276.128**
	Inicio	0 días	lun 21/07/25	lun 21/07/25	$ 0,00	100%	
1.1	PRELIMINARES	80 días	lun 28/07/25	vie 14/11/25	$ 67.312.000,00	31%	$ 21.035.000
1.2.1	**Mantenimiento puntual con mezcla asfáltica densa tibia MDC-19 con RAP entre el 20% y 30%**	**90 días**	**lun 21/07/25**	**vie 21/11/25**	**$ 10.828.273.820,00**	**26%**	
1.2.1.1	Rango 0: De 0,5 a 5 Ton/Jornada. Horario diurno	85 días	lun 21/07/25	vie 14/11/25	$ 444.188.500,00	35%	$ 156.772.412
1.2.1.2	Rango 1: De 9.1 a 12.5 Ton/Jornada. Horario diurno.	90 días	lun 21/07/25	vie 21/11/25	$ 8.599.954.440,00	32%	$ 2.731.750.234
1.2.1.3	Rango 1: De 9.1 a 12.5 Ton/Jornada. Horario nocturno.	80 días	lun 28/07/25	vie 14/11/25	$ 817.911.360,00	14%	$ 118.537.878
1.2.1.4	Rango 2: De 12.51 a 16 Ton/Jornada.	85 días	lun 21/07/25	vie 14/11/25	$ 966.219.520,00	20%	$ 193.243.904
1.2.2	**Mantenimiento puntual con mezcla asfáltica Semidensa tibia MSC-19 con RAP entre el 20% y 30%**	**70 días**	**lun 18/08/25**	**vie 21/11/25**	**$ 8.940.232.700,00**	**14%**	
1.2.2.1	Rango 3: De 8 a 19.99 m3/Jornada.	70 días	lun 18/08/25	vie 21/11/25	$ 2.592.849.000,00	14%	$ 370.407.000
1.2.2.2	Rango 4: De 20 a 50 m3/Jornada. Horario diurno.	70 días	lun 18/08/25	vie 21/11/25	$ 5.053.949.600,00	14%	$ 721.992.800
1.2.2.3	Rango 4: De 20 a 50 m3/Jornada. Horario nocturno.	70 días	lun 18/08/25	vie 21/11/25	$ 1.293.434.100,00	14%	$ 184.776.300
1.3	**OTRAS ACTIVIDADES DE PAVIMENTACIÓN**	**65 días**	**lun 18/08/25**	**vie 14/11/25**	**$ 10.317.156.486,00**	**15%**	
1.3.1	Suministro, transporte y aplicación de mezcla asfáltica tibia Semidensa MSC-25 con RAP entre el 20% y 30%	65 días	lun 18/08/25	vie 14/11/25	$ 93.338.658,00	15%	$ 14.359.794
1.3.2	Suministro y aplicación de mezcla asfáltica discontinua tibia SMA (Stone Mastic Asphalt)	65 días	lun 18/08/25	vie 14/11/25	$ 469.348.530,00	15%	**$ 72.207.466**
1.3.3	Suministro y aplicación de mezcla asfáltica tibia de alto módulo MAM-19 y/o MAM-25, que cumpla con el capitulo 450-22 de la norma INVIAS 2022 y utilizar asfalto modificado con polímeros. HORARIO DIURNO	65 días	lun 18/08/25	vie 14/11/25	$ 510.585.320,00	15%	**$ 78.551.588**

1.3.4	Suministro y aplicación de mezcla asfáltica tibia de alto módulo MAM-19 y/o MAM-25, que cumpla con el capítulo 450-22 de la norma INVIAS 2022 y utilizar asfalto modificado con polímeros. HORARIO NOCTURNO	65 días	lun 18/08/25	vie 14/11/25	$ 4.648.621.320,00	15%	**$ 715.172.511**
1.3.5	Suministro y aplicación de mezcla asfáltica tibia adicionada con Fibra sintéticas de aramida y poliolefina tipo Semidensa MSC-25 Y/O MSC-19. HORARIO DIURNO	65 días	lun 18/08/25	vie 14/11/25	$ 432.962.530,00	15%	**$ 66.609.620**
1.3.6	Suministro y aplicación de mezcla asfáltica tibia adicionada con Fibra sintéticas de aramida y poliolefina tipo Semidensa MSC-25 Y/O MSC-19. HORARIO NOCTURNO	65 días	lun 18/08/25	vie 14/11/25	$ 3.943.294.110,00	15%	**$ 606.660.632**
1.3.7	Suministro, transporte y colocación de mezcla asfáltica MDC-19 para construcion de resaltos. Compactada con medios mecánicos. Incluye riego de liga y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según detalle SIF	65 días	lun 18/08/25	vie 14/11/25	$ 219.006.018,00	15%	**$ 33.693.234**
1.4	**OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA PAVIMENTACIÓN**	**69 días**	**lun 18/08/25**	**jue 20/11/25**	**$ 924.146.731,00**	**13%**	
1.4.1, 1.4.2	Fresado de vías con maquina fresadora que posea equipo de cargue del material fresado a la volqueta (conveyor).	65 días	lun 18/08/25	vie 14/11/25	$ 727.356.350,00	15%	$ 111.900.977
1.4.3, 1.4.4	Sellado de grietas, aplicación de sello CON O SIN ruteado de grieta de 16 mm de espesor por 19 mm de profundidad con banda de sobre-ancho de 3 pulgadas.	24 días	lun 20/10/25	jue 20/11/25	$ 53.356.000,00	0%	$ 0
1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 1.4.8, 1.4.9, 1.4.10	Demoliciones y corte carpeta asfáltica, llenos con fresado, transporte fresado, cargue y disposición final	65 días	lun 18/08/25	vie 14/11/25	$ 143.434.381,00	15%	$ 22.066.828
1.5	**REALCES**	65 días	lun 18/08/25	vie 14/11/25	$ 297.332.781,00	15%	$ 45.743.505
1.6	**ENSAYOS Y DISEÑOS**	84 días	lun 28/07/25	jue 20/11/25	$ 178.194.496,00	30%	$ 53.034.076
2	**MANTENIMIENTO DE VÍAS EN CONCRETO Y ADOQUÍN**	20 días	lun 1/09/25	vie 26/09/25	$ 1.105.450.814,00	0%	$ 0
3	**OBRAS COMPLEMENTARIAS (DEMOLICIONES, ACTIVIDADES EN CONCRETO Y PREFABRICADOS, ACEROS, REDES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, MANTENIMIENTO REPARACIONES Y SUMINISTROS, REALCES, BOTADA)**	20 días	lun 1/09/25	vie 26/09/25	$ 698.412.831,00	0%	$ 0
4	**ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y SEÑALIZACIÓN**	**69 días**	**lun 18/08/25**	**jue 20/11/25**	**$ 4.039.515.422,00**	**7%**	

4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8	**SEÑALIZACIÓN (DEMARCACIÓN DE MARCAS VIALES Y LÍNEAS CON PINTURA PLÁSTICO EN FRÍO O ACRÍLICA, BORRADO DE MARCAS VIALES)**	65 días	lun 18/08/25	vie 14/11/25	$ 2.349.884.811,00	8%	$ 180.760.370
4.2, 4.3, 4.4	**BARANDAS, DEFENSAS Y PASAMANOS**	4 días	lun 17/11/25	jue 20/11/25	$ 1.689.630.611,00	0%	$ 0
	Fin	0 días	vie 21/11/25	vie 21/11/25	$ 0,00	0%	
					VALOR ACUMULADO:		**$ 6.499.276.128**
					VALOR CORTE DE OBRA MES:		$ 5.833.337.744

A continuación, se presentan las cantidades de obra ejecutadas y conciliadas entre el contratista e interventoría que soportan el acta parcial de obra No.2, con corte al 31 de agosto de 2025:

Tabla 12 Cantidades ejecutadas al 31 de agosto de 2025

		ACTA N°2 (1 al 31 de Agosto)		ACUMULADO	
ÍTEM DE PAGO	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
1.2	**ACTIVIDADES DE PAVIMENTACIÓN POR RANGOS**				
1.2.1.1	Rango 0: De 0,5 a 5 Ton/Jornada. Horario diurno	124,24	$ 157.674.226,00	212,03	$ 269.089.393,00
1.2.1.2	Rango 1: De 9.1 a 12.5 Ton/Jornada. Horario diurno.	1590,06	$ 1.479.918.134,00	1918,57	$ 1.785.672.575,00
1.2.1.3	Rango 1: De 9.1 a 12.5 Ton/Jornada. Horario nocturno.	375,59	$ 365.713.485,00	458,31	$ 446.258.280,00
1.2.1.4	Rango 2: De 12.51 a 16 Ton/Jornada.		$ -	0,00	$ -
1.2.2.1	Rango 3: De 8 a 19.99 m3/Jornada.	54,11	$ 100.221.733,00	54,11	$ 100.221.733,0000
1.2.2.2	Rango 4: De 20 a 50 m3/Jornada. Horario diurno.	586,87	$ 1.059.292.092,00	586,87	$ 1.059.292.092,0000
1.2.2.3	Rango 4: De 20 a 50 m3/Jornada. Horario nocturno.	219,73	$ 406.012.881,00	219,73	$ 406.012.881,0000
1.3	**OTRAS ACTIVIDADES DE PAVIMENTACIÓN**				

1.3.7	Suministro, transporte y colocación de mezcla asfáltica MDC-19 para construcción de resaltos. Compactada con medios mecánicos. Incluye riego de liga y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según detalle SIF	2,75	$ 6.091.464,00	4,86	$ 10.759.168,0000
1.4	**OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA PAVIMENTACIÓN**				
1.4.5	Demolición de carpeta asfáltica cualquier espesor. Incluye picada en tamaños máximos de 40 cm, acopio, cargue y transporte a la planta de reciclaje de la SIF y botada del material que no se pueda recuperar.	16,53	$ 545.473,00	16,53	$ 545.473,0000
1.4.7	Transporte, aplicación y compactación de llenos con material reciclado de fresado de pavimento; compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del Próctor Modificado. Incluye transporte desde la planta del Municipio de Medellín. Medido en sitio.	23,40	$ 1.917.911,00	23,40	$ 1.917.911,0000
1.4.8	Transporte de material fresado desde el punto de acopio indicado por la interventoría hasta la planta de producción de mezcla para ser empleado en mezclas con RAP		$ -	13452,08	$ 23.204.838,0000
1.4.9	Pago de derechos para disposición final de residuos de construcción, demolición y/o tierra, en sitio autorizado por la Autoridad Ambiental.	1274,67	$ 10.491.827,00	1608,67	$ 13.240.981,0000
2.2	**MOVIMIENTOS DE TIERRA, EXCAVACIONES Y LLENOS**				
2.2.1	EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo de 0-2 m, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³. Incluye transporte interno del material proveniente de las excavaciones al sitio donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. No incluye entibado ni botada del material.	2,10	$ 136.788,00	2,10	$ 136.788,0000
2.2.4	Suministro, transporte, colocación y compactación de Base granular Clase A, reacomodada con MEDIOS MECÁNICOS y compactada al 98% del ensayo Proctor modificado, que cumpla con el artículo 330-22 de la norma INVIAS 2022. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado.	23,78	$ 5.965.234,00	23,78	$ 5.965.234,0000
	OBRAS COMPLEMENTARIAS				
3.1	**PRELIMINARES**				
3.1.3	Desobstrucción y limpieza de sumideros, incluye limpieza de tuberías hasta el MH más cercano, retiro y botada de material sobrante.	15,00	$ 3.236.400,00	23,00	$ 4.962.480,0000
	IMPORTE DE ACEROS Y MALLAS				
3.4	**REDES HIDRAÚLICAS Y SANITARIAS**				
3.4.2	Suministro, transporte e instalación de GEOTEXTIL NT 2500 tipo Pavco para filtro o equivalente. Incluye suministro y transporte de los materiales, traslapos y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño del filtro.	18,00	$ 266.958,00	18,00	$ 266.958,0000

	ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y SEÑALIZACIÓN				
4.1	**SEÑALIZACIÓN**				
4.1.2	Suministro y aplicación de pintura acrílica para marcas viales (flechas direccionales, flechas de fin de carril, textos, pares, triángulos ceda el paso, diamantes ceda el paso, textos de zona escolar entre otros). TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO.	9,28	$ 351.359,00	32,78	$ 1.241.116,0000
4.1.4	Suministro y aplicación de pintura acrílica para demarcación de LÍNEA de 0.12M para canalización continua o segmentada, berma, agujas, celdas de estacionamiento entre otras. HORARIO NOCTURNO.	24,00	$ 201.936,00	24,00	$ 201.936,0000
4.1.6	Suministro y aplicación de pintura acrílica para demarcación de LÍNEA DE 0.40M para pasos peatonales, líneas de resalto, líneas de pare, entre otras. TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO	5,27	$ 106.886,00	5,27	$ 106.886,0000

SUBTOTAL OBRAS	**COSTO CON AIU**	**$ 3.598.144.787,00**	**COSTO CON AIU**	**$ 4.129.096.723,00**
	COSTO DIRECTO	**$ 2.832.515.773,44**	**COSTO DIRECTO**	**$ 3.250.489.430,00**
	DESCUENTO IMPREVISTOS	**-$ 32.504.894,30**		**-$ 32.504.894,30**
	DESCUENTO POLIZA	**-$ 109.138.173,00**		
		$ 765.629.013,56	**AIU**	**$ 878.607.293,00**
SUBTOTAL OBRAS				
Destinación pago de Reajustes y Factor prestacional del AIU no exonerados				**$ -**
Inversión Socio-Ambiental e Implementación PMT-bioseguridad - Gasto Reembolsable -		**$ 112.446.422,37**		**$ 185.719.734,37**
Pólizas - Gasto Reembolsable-		**$ 109.138.173,00**		**$ 109.138.173,00**
VALOR TOTAL	**TOTAL ACTA N°2**	**$ 3.678.086.315,06**		**$ 4.391.449.736,06**

Al corte del **31 de agosto de 2025**, el Plan de Inversión debería encontrarse en un avance acumulado del 17,38%; no obstante, el avance real reportado es del 11,04%, lo que evidencia un atraso de 6,34 % frente a la programación inicial.

Este atraso es motivo de gran preocupación, ya que compromete el cumplimiento de las metas establecidas y genera un riesgo significativo para el desarrollo del contrato.

Medidas de Contingencia del Contratista: con el fin de contrarrestar esta situación, el contratista ha planteado e iniciado la implementación de las siguientes acciones:

Ingreso de una cuadrilla de rango 3 en el mes de septiembre.
Ingreso de dos cuadrillas de rango 4, una de ellas destinada a actividades de rehabilitación en el sector de El Poblado.
Vinculación de tres cuadrillas de obras complementarias, para reforzar frentes específicos.
Ingreso proyectado de dos cuadrillas adicionales de masivos o rehabilitación de pavimento para la tercera semana de septiembre.

Observaciones de la Interventoría: si bien las medidas propuestas constituyen un esfuerzo por recuperar el atraso, es indispensable que se traduzcan en un incremento real en los rendimientos y en la recuperación de la curva programada en el menor tiempo posible. La interventoría hará seguimiento permanente a la implementación de estas acciones, solicitando al contratista un plan de acción actualizado, en el cual se especifiquen cronogramas, recursos y responsables para garantizar el cumplimiento oportuno de las metas del contrato.

El CONSORCIO VIALMED 2025 aporto el flujo de inversión el día 21/07/2025 por valor a invertir mes a mes, y de acuerdo con la programación presentada.

A continuación, se presenta el programa y el flujo de inversión vigentes al **31 de agosto de 2025:**

Tabla 13 Gráfica programa de inversión mensual.

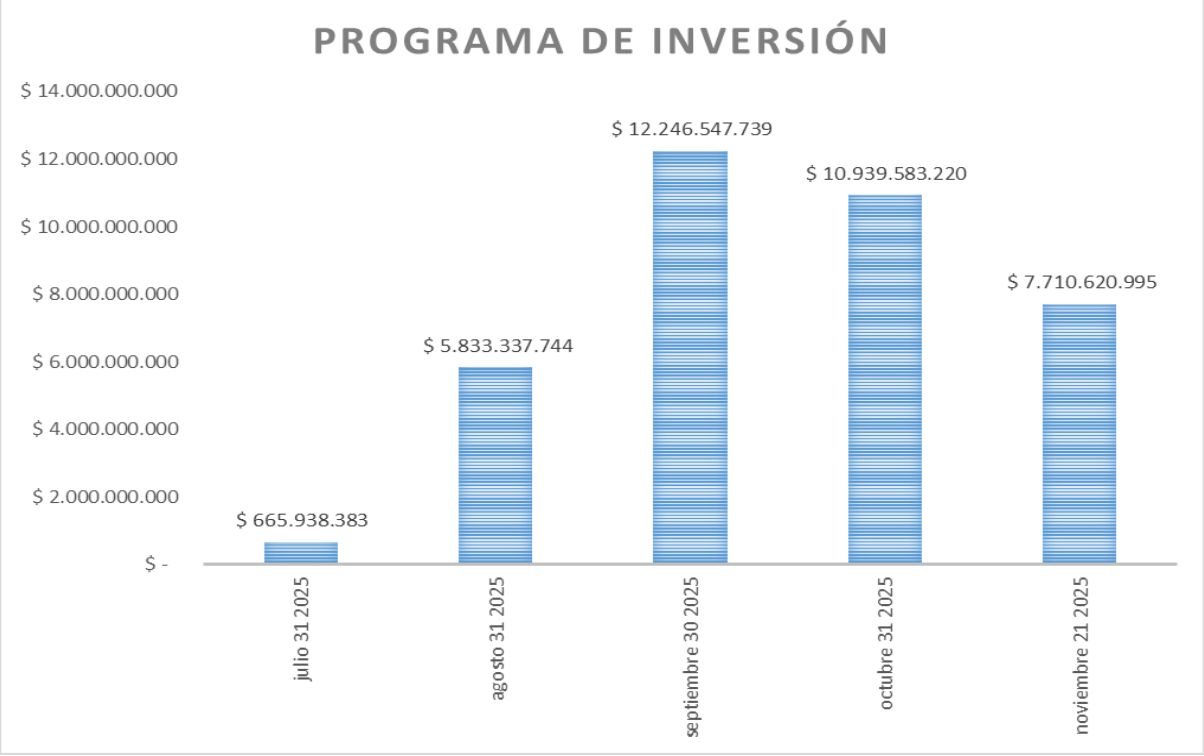


Tabla 14 Flujo de inversión mensual

OBJETO DEL CONTRATO:	**MANTENIMIENTO MALLA VIAL 2025**			
Fecha inicio: 21/07/2025	Fecha fin: 21/11/2025	**LÍNEA BASE DE INVERSIÓN**		
Período	LÍNEA BASE V1		SEGUIMIENTO	
	Inversión programada mensual	Inversión programada acumulada V1	Inversión ejecutada mensual	Inversión ejecutada acumulada V1
Inicio	$ 0	$ 0		
Julio 31 de 2025	$ 665.938.383	$ 665.938.383	$ 530.951.936	$ 530.951.936
Agosto 31 de 2025	$ 5.833.337.744	$ 6.499.276.128	$ 3.598.144.787	$ 4.129.096.723
Septiembre 30 de 2025	$ 12.246.547.739	$ 18.745.823.867		
Octubre 31 de 2025	$ 10.939.583.220	$ 29.685.407.086		
Noviembre 21 de 2025	$ 7.710.620.995	$ 37.396.028.081		

Tabla 15 Programa de inversión acumulado


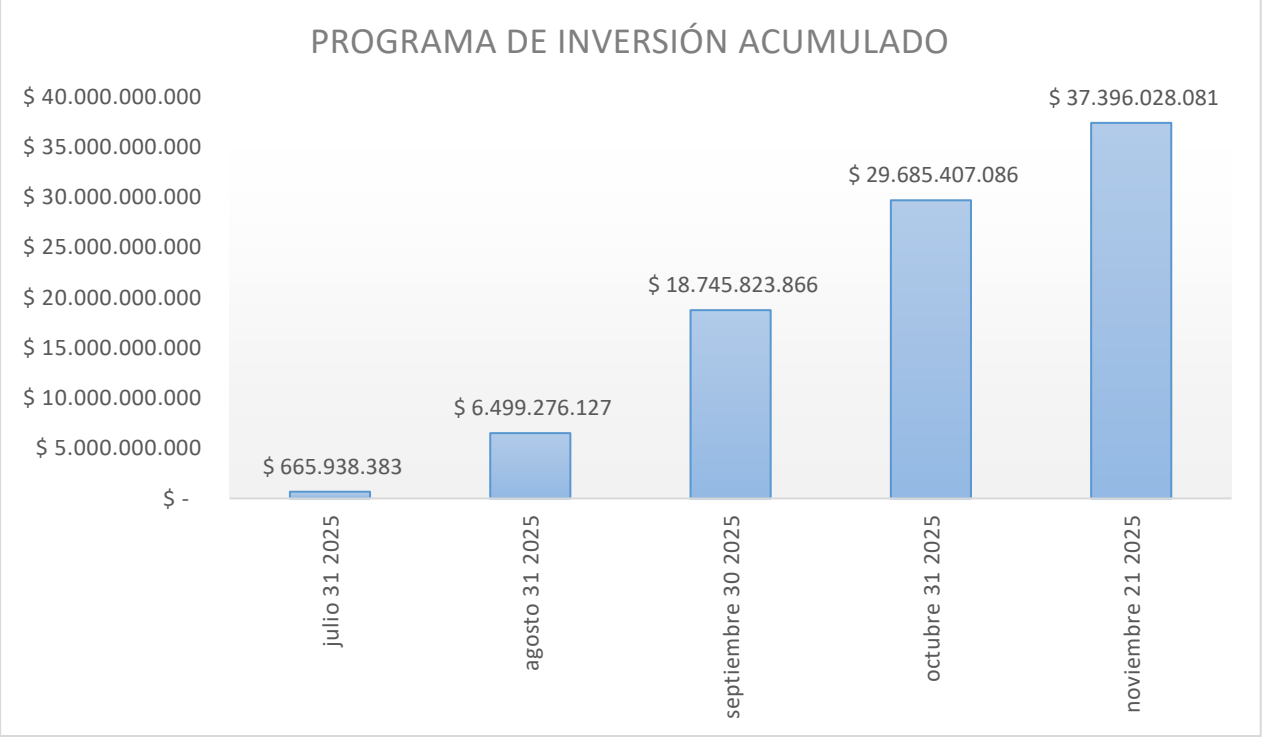


Tabla 16 Seguimiento inversión programada y ejecutado acumulada

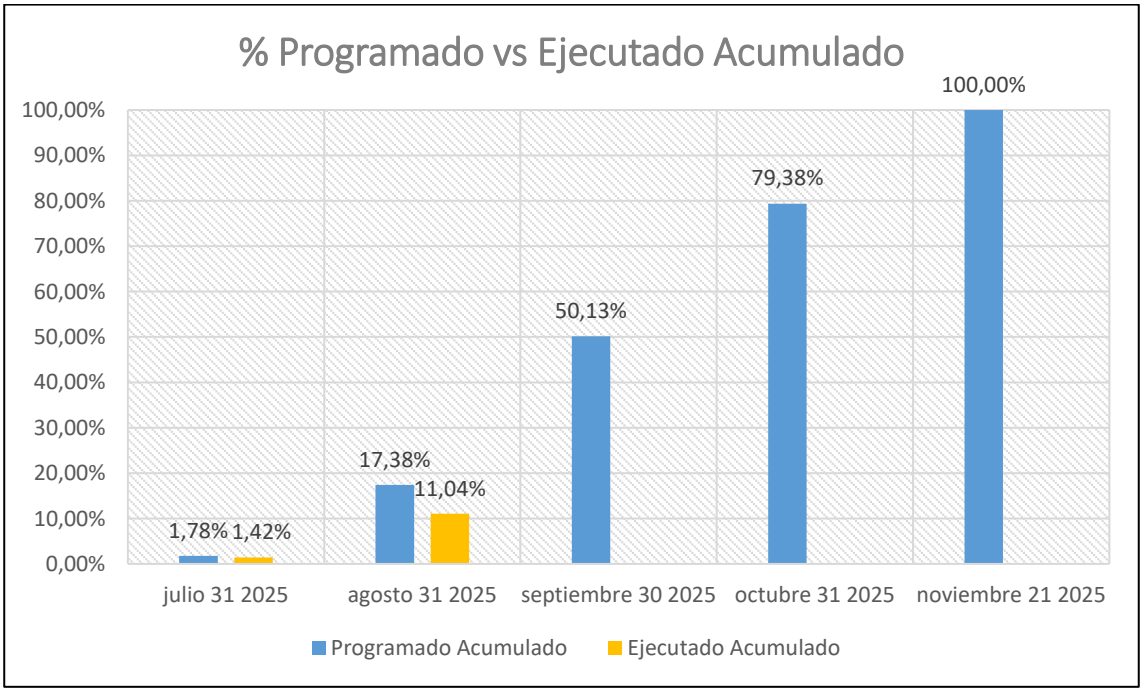

2.2 CONTROL Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO Y VIGENCIA DE LICENCIAS, PERMISOS Y USO DE SERVICIOS PÚBLICOS:

Permisos Ambientales.

Para la ejecución del Contrato de Obra No. 4600105052 de 2025 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA y de acuerdo con la evaluación de impactos relacionados en el PASAO en el periodo reportado en el siguiente informe, no fueron necesarios trámites de permisos ambientales ante la Autoridad Ambiental competente Área metropolitana del Valle de Aburra – AMVA u otra entidad ambiental, situación que sigue vigente para la ejecución del contrato durante el mes de **agosto de 2025**.

Para el periodo de referencia, la interventoría realiza el respectivo control y seguimiento al cumplimiento de cada uno de los programas contenidos en el PASAO de obra y a la normatividad ambiental vigente para la ejecución de proyectos de infraestructura, enfatizando el componente vial, manejo de sumideros.

Tabla 17 Permisos ambientales.

Tipo de permiso	No Resolución y fecha	Fecha de vencimiento	Observaciones
PASAO	N.A.	N.A	Una vez aprobadas la realización de las correcciones con base en las observaciones de la interventoría del documento PASAO, se envía la versión final mediante OFICIO No.014 4600105322 de 2025, a la supervisión.
Aprovechamiento forestal	N.A	N.A	De acuerdo a las actividades contempladas para la ejecución de la obra no es necesario tramitar Permiso de aprovechamiento Forestal; sin embargo, se hace recomendación al contratista sobre la importancia de la protección de raíces con el fin de no afectar los árboles. Así mismo, no hay autorización de intervención o aprovechamiento forestal en este momento.
Ocupación de cauce	N.A	N.A	No es necesario tramitar permiso de ocupación de cauce ante las autoridades competentes. No se contempla la ejecución de actividades constructivas en cercanías o inmediaciones de cauces.
Concesión de aguas	N.A	N.A	De acuerdo con las actividades contempladas para la ejecución de la obra de concesión de aguas ante las autoridades competentes; sin embargo, la empresa contratista obtuvo **PERMISO** por parte de EPM para tomar agua de los hidrantes que se encuentren en cada una de las cuadrillas en operación. Este permiso se encuentra en el informe presentado por el contratista. En el mes de agosto de 2025, se renovó el permiso, se obtuvo la autorización de epm para continuar con el uso de hidrantes, se encuentra pendiente el reporte del consumo y facturación de dicho recurso por la utilización de hidrantes.
Vertimientos	N.A	N.A	De acuerdo a las actividades contempladas para la ejecución de la obra no requiere permiso de vertimientos ante las autoridades competentes.

Tabla 18 Manejo de residuos de construcción y demolición.

Sitios de Disposición Final	Dirección	No de Resolución Ambiental
PROCOPAL	Autopista Norte Kilómetro 25, Entrada a Girardota	AN282022-8
PAVIMENTAR	Vereda Ancón Norte	AN282022-11

Tabla 19 Proveedores de materiales Pétreos.

Tipo de material	Nombre del proveedor y/o comercializador	Certificado RUCOM	Resolución Ambiental	Título Minero
Material Pétreo pavimentos	PAVIMENTAR S.A	HJHH-01	Resolución N°130AN-1406-15107 del 9 de junio de 2014: Por la cual se otorga un permiso de emisiones atmosféricas, el cual se otorga por un término de cinco (5) años (vigencia junio de 2019). • Resolución N°130AN-1405-15088 DEL 27 DE MAYO DE 2014, “Por la cual se adopta una decisión”. Se amplía el termino de vigencia del Plan de Manejo Ambiental por un tiempo igual al de la duración o vida útil del proyecto. • Resolución 160AN-RES2006-3162 del 09 de junio de 2020: “Por la cual se prorroga un permiso” Resuelve: “Artículo 1°: Prorrogar el permiso de emisiones atmosféricas para la emisión de gases contaminantes por fuentes fijas y para la emisión fugitiva o dispersa de contaminantes por actividades de explotación minera a cielo abierto, para el procesamiento de mezcla asfáltica y el beneficio de materiales pétreos…” La prórroga del presente permiso se otorga por un término de cinco (5) años contados a partir del 26 de junio de 2019. Ubicada en el Municipio de Copacabana - Sector Ancón Norte Carrera 103 #46-65 Autopista Norte. (Licencia ambiental contrato de concesión Minera Pavimentar).	GALK-09

			• Oficio con consecutivo 2207-2024, en el cual se solicita la Renovación de un Permiso de Emisiones Atmosféricas a la Corporación Autónoma Regional del centro de Antioquia.	
Material Pétreo pavimentos	PROCOPAL S.A.	Contrato de concesión minera N° 6871	Resolución N°130AN-1109-12530, por la cual se otorga una licencia ambiental a la sociedad PROCOPAL S.A del 29 de septiembre de 2011, para las actividades mineras de montaje, construcción, extracción o captación de los minerales yacentes en el suelo y subsuelo del área de interés minero, transporte interno, cierre y abandono de los materiales de construcción, amparados en el contrato de concesión minera N° 6871. La presente Licencia Ambiental se otorga por la vida útil del proyecto, esto es 24 años. Resolución N° 160 AN-RES1705-2658 del 20 de mayo de 2017, por el cual se prorroga un permiso de emisiones, el cual se renueva por un término de (5) cinco años, contados a partir de esta resolución (mayo 2022). Radicado N°160AN-COE2208-29292, Correo de la oficina Territorial Aburra Norte – CORANTIOQUIA, Continuidad al trámite de prórroga del permiso de emisiones.	H525005

Fuente: anexos PASAO.

Tabla 20. Relación de vehículos utilizado en el mes de **agosto de 2025**.

Consecutivo	TIPO DE VEHÍCULO	PLACA	MODELO	VIGENCIA SEGURO OBLIGATORIO	CERTIFICADO EMISIÓN DE GASES / REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA		Aprobado S/N
					Fecha	CDA	
1	VOLQUETA	GTY061	2020	17/10/2025	17/10/2025	CDA DIAGNOSTIMAX	SI
2	VOLQUETA	TTO095	2013	25/10/2025	27/10/2025	CENTRO DE DIAGNOSTICO LOS BUCAROS S.A.S	SI
3	VOLQUETA	WLW714	2015	13/7/2026	8/7/2026	CDA LOS BUCAROS	SI
4	VOLQUETA	SSZ557	2012	18/2/2026	18/2/2026	CDA DIAGNOSTIMAX	SI
5	VOLQUETA	SNZ150	2015	24/5/2026	20/6/2026	CDA DIAGNOSTIMAX	SI
6	VOLQUETA	TDZ899	2013	9/12/2025	17/7/2026	CDA DIAGNOSTIMAX	SI
7	VOLQUETA	UVL600	2013	30/11/2025	28/8/2025	CDA DIAGNOSTIMAX	SI
8	VOLQUETA	TJZ 305	2015	23/1/2026	17/6/2026	CDA DIAGNOSTIMAX	SI
9	VOLQUETA	SMV 676	2012	7/9/2025	22/5/2026	IVESUR COLOMBIA - MEDELLIN	SI
10	VOLQUETA	SMV 677	2012	7/9/2025	6/6/2026	IVESUR COLOMBIA - MEDELLIN	SI
11	VOLQUETA	SNR969	2013	27/7/2025	19/9/2025	COMERCIALIZADOREA SERVISUPER LTDA	SI
12	VOLQUETA	EQX167	2015	9/7/2026	7/7/2026	C.D.A LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	SI
13	CAMION	ESP 079	2018	3/4/2026	5/4/2026	CDA LA POSESION S.A.S.	SI
14	CAMION	SVO 420	2012	16/9/2026	8/9/2025	CDA DE ITAGUI	SI
15	CAMION	WCS 338	2014	17/7/2026	18/7/2026	CDA AUTOMAS MEDELLIN LA 10	SI
16	CAMION	TTT 997	2013	10/10/2025	20/1/2026	CDA AUTOMAS MEDELLIN LA 10	SI
17	CAMION	SZP 329	2012	25/10/2025	23/9/2025	CDA AUTOMAS MEDELLIN LA 10	SI
18	CAMION	TNG 712	2010	4/4/2026	11/1/2026	CDA AUTOMAS MEDELLIN LA 10	SI
19	CAMION	GTX 043	2020	30/1/2026	1/2/2026	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO SUR S.A.S	SI
20	CAMION	TRI 504	2012	21/7/2026	18/7/2026	CDA AUTOMAS MEDELLIN LA 10	SI
21	CAMION	TSZ 903	2013	16/12/2025	13/6/2026	CDA AUTOMAS MEDELLIN LA 10	SI
22	VOLQUETA	EQX188	2015	16/07/2026	12/08/2026	C.D.A LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	SI
23	VOLQUETA	WEX535	2013	6/09/2025	9/09/2025	C.D.A LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	SI
24	CAMION	WCV774	2014	4/10/2025	3/09/2025	CENTRO DE DIAGNOSTICO LOS BUCAROS S.A.S	SI

Consecutivo	TIPO DE VEHÍCULO	PLACA	MODELO	VIGENCIA SEGURO OBLIGATORIO	CERTIFICADO EMISIÓN DE GASES / REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA		Aprobado S/N
					Fecha	CDA	
25	VOLQUETA	ZNM449	2015	23/02/2026	7/06/2025	C.D.A LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	SI
26	VOLQUETA	STH139	2013	28/06/2026	26/07/2026	CDA SAN GERMAN S.A.S	SI
27	VOLQUETA	UQE121	2012	22/11/2025	25/11/2025	C.D.A LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	SI
28	VOLQUETA	ZNM196	2015	21/07/2026	31/07/2026	C.D.A LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	SI
29	VOLQUETA	TMP284	2013	17/07/2026	19/07/2026	C.D.A LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	SI
30	CAMIÓN ESTACAS	EKU971	2006	11/04/2026	21/04/2026	C.D.A LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	SI
31	CAMION ESTACAS	TMX834	2007	16/03/2026	21/01/2026	C.D.A LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	SI
32	CAMIÓN TANQUE	GTX054	2020	28/01/2026	6/02/2026	C.D.A LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	SI
33	CAMIÓN TANQUE	TEK016	2013	14/03/2026	11/07/2026	REVISION PLUS CDA DEL MAGDALENA MEDIO	SI
34	CAMIÓN TANQUE IRRIGADOR	VKK868	1999	31/10/2025	12/12/2025	C.D.A LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	NO
35	CAMIÓN TANQUE IRRIGADOR	WLX298	2016	12/12/2025	12/10/2025	C.D.A LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	SI
36	TRACTO CAMIÓN	TRF399	2008	27/12/2025	10/01/2026	C.D.A LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	SI
37	TRACTO CAMIÓN	TRF400	2008	26/12/2025	30/07/2026	C.D.A LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	SI
38	VOLQUETA DOBLE TROQUE	EQW848	2015	3/05/2026	19/06/2026	C.D.A LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	SI
39	VOLQUETA DOBLE TROQUE	EQW849	2015	3/05/2026	27/05/2026	C.D.A LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	SI
40	VOLQUETA DOBLE TROQUE	EQW857	2015	3/05/2026	11/06/2026	C.D.A LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	SI
41	VOLQUETA DOBLE TROQUE	SNQ565	2012	19/08/2026	24/01/2026	C.D.A LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	SI
42	VOLQUETA DOBLE TROQUE	SNZ330	2015	25/05/2026	10/06/2026	C.D.A LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	SI
43	VOLQUETA DOBLE TROQUE	SNZ331	2015	26/05/2026	28/07/2026	C.D.A LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	SI

Consecutivo	TIPO DE VEHÍCULO	PLACA	MODELO	VIGENCIA SEGURO OBLIGATORIO	CERTIFICADO EMISIÓN DE GASES / REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA		Aprobado S/N
					Fecha	CDA	
44	VOLQUETA DOBLE TROQUE	STY652	2011	14/03/2026	19/12/2025	C.D.A LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	SI
45	VOLQUETA DOBLE TROQUE	TRF301	2008	28/09/2025	16/12/2025	C.D.A LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	SI
46	VOLQUETA DOBLE TROQUE	TRF302	2008	28/09/2025	20/09/2020	C.D.A LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	SI
47	VOLQUETA DOBLE TROQUE	TRF304	2008	28/09/2025	8/11/2025	C.D.A LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	SI
48	VOLQUETA DOBLE TROQUE	TRF426	2008	6/02/2026	13/02/2026	C.D.A LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	SI
49	VOLQUETA DOBLE TROQUE	TRF427	2008	6/02/2026	5/03/2026	C.D.A LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	SI
50	VOLQUETA DOBLE TROQUE	TRF429	2008	8/09/2025	2/09/2025	C.D.A LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	SI
51	VOLQUETA DOBLE TROQUE	TRF430	2008	30/01/2026	5/06/2026	C.D.A LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	SI
52	VOLQUETA DOBLE TROQUE	TRF432	2008	25/07/2026	24/07/2026	C.D.A LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	SI
53	VOLQUETA DOBLE TROQUE	TRK250	2013	7/07/2026	28/09/2025	CDA LA CEJA	SI
54	VOLQUETA DOBLE TROQUE	TRK251	2013	26/06/2026	22/07/2026	C.D.A LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	SI
55	VOLQUETA DOBLE TROQUE	TRK254	2013	26/06/2026	27/06/2027	C.D.A LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	SI
56	VOLQUETA DOBLE TROQUE	TRK330	2013	10/07/2026	8/11/2025	C.D.A LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	SI
57	CAMION VOLCO	KAI128	1946	31/07/2026	5/06/2026	CDA SUROESTE S.A.S.	NO
58	VOLQUETA PLATON	KBD209	1955	16/06/2026	29/06/2026	C.D.A LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	NO
59	CAMIÓN	IAT466	2015	17/12/2025	29/07/2026	COMERCIALIZADORA SERVISUPER LTDA	SI
60	VOLQUETA (REPOTENCIACIÓN 21-07-2025)	TMG156	1997	3/12/2025	17/10/2025	CENTRO DE DIAGNOSTICOS LOS BUCAROS	SI

Consecutivo	TIPO DE VEHÍCULO	PLACA	MODELO	VIGENCIA SEGURO OBLIGATORIO	CERTIFICADO EMISIÓN DE GASES / REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA		Aprobado S/N
					Fecha	CDA	
61	VOLQUETA	TFW399	2011	17/06/2026	15/06/2026	COMERCIALIZADORA SERVISUPER LTDA	SI
62	AUTOMOVIL	KPQ732	2022	15/07/2026	NO APLICA	NO APLICA	SI
63	VOLQUETA	SMV677	2012	7/09/2025	6/06/2026	IVESUR COLOMBIA - MEDELLIN	SI
64	VOLQUETA	SMV676	2012	7/09/2025	22/05/2026	IVESUR COLOMBIA - MEDELLIN	SI
65	VOLQUETA	SMX568	2012	29/05/2026	6/06/2026	IVESUR COLOMBIA - MEDELLIN	SI
66	VOLQUETA	TRL738	2014	2/12/2025	28/02/2026	IVESUR COLOMBIA - MEDELLIN	SI
67	VOLQUETA	TRL740	2014	8/11/2025	16/01/2026	IVESUR COLOMBIA - MEDELLIN	SI
68	VOLQUETA	TAP993	2012	14/02/2026	26/06/2026	COMERCIALIZADORA SERVISUPER LTDA	SI
69	AUTOMOVIL	GHY406	2020	25/01/2026	10/01/2026	CDA LOS BUCAROS	SI
70	VOLQUETA	SXY151	2011	8/04/2026	6/06/2026	CDA AUTOMAS MEDELLIN LA 10	SI

Fuente: anexos Informe Ambiental

2.2.1 PMT (Plan De Manejo De Tránsito)

En cumplimiento a sus obligaciones contractuales indicadas en el numeral 4. de la Cláusula 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA, en el que se indica *"Formular y ejecutar el Plan de Manejo de Tránsito y las especificaciones técnicas y normatividad vigente, previa aprobación por parte de la Secretaría de Movilidad del Distrito Especial"*, el Consorcio Vialmed 2025 radicó el 17 de julio del presente año ante la secretaría de movilidad del municipio de Medellín, el Plan de Manejo de Tránsito General validado previamente por la interventoría para su posterior implementación. Mediante la resolución No. 202510238348 del 21 de julio, fue aprobada este PMT, y posteriormente ajustada el día 22 de julio, para incluir las intervenciones en horarios nocturnos. Esta resolución de aprobación otorga una vigencia desde el 22 de julio al 22 de noviembre del presente año, y ha sido la guía de seguimiento y control de la implementación de la señalización de obras para las intervenciones en rangos 0, 1, 2 y 3.

En intervenciones particulares con alto impacto a la movilidad ha sido necesaria la elaboración de Planes de Manejo de Tránsito específicos que detallen el tipo de señalización a implementar, cierres, desvíos, planes de divulgación entre otros. Para el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de agosto del presente año, se requirió la realizar la solicitud de aprobación de los PMT específicos en:

- Calle 10 entre carreras 36 y 43D, el cual fue aprobado por la secretaría de movilidad del municipio de Medellín mediante respuesta con No. de radicado 202530411393.

- Ejecución de resalto pompeyano sobre la Dg 65D entre Tv 34B y Cl 3, el cual fue aprobado por la secretaría de movilidad del municipio de Medellín mediante respuesta con No. de radicado 202530430652.

Por otra parte, se tiene que, para el periodo del presente informe de interventoría, el contratista de obra, el Consorcio VialMed 2025, ejecutó parte del presupuesto contractual del proyecto dentro del rubro de *"Inversión Socio-Ambiental e Implementación PMT-bioseguridad - Gasto Reembolsable"* los elementos indicados en la siguiente tabla, los cuales fueron debidamente evaluados por la interventoría:

Cantidades ejecutadas y cobradas en Acta No.1 dentro del rubro *Inversión Socio-Ambiental e Implementación PMT-bioseguridad - Gasto Reembolsable:*

ITEM	UN.	CANT.	VR UNI.	VR TOTAL
Señales informativas. Dimensiones y características según lo establecido por el Manual de Señalización Vial 2015. Vías secundarias. 60x60 *	un	42	$ 174.675	$ 7.336.350
Señales reglamentarias. Dimensiones y características según lo establecido por el Manual de Señalización Vial 2015. Vías secundarias. 60x60 *	un	42	$ 173.348	$ 7.280.616
Señales preventivas. Dimensiones y características según lo establecido por el Manual de Señalización Vial 2015. vías secundarias. 60x60 *	un	126	$ 174.675	$ 22.009.050
Paleta de PARE y SIGA. Dimensiones y características según lo establecido por el Manual de Señalización Vial 2015 - Numeral 4.10.5 *	un	31	$ 42.080	$ 1.304.480
Maletín (2,0 x 1,0 m) *	un	26	$ 289.274	$ 7.521.124
Balizas (1,4 m) *	un	350	$ 28.201	$ 9.870.350
Conos (0,90 m de altura, material plástico color naranja, lámina reflectiva tipo III ó IV) *	un	86	$ 54.922	$ 4.723.292
Barricadas con franjas reflectivas tipo 3 con 1,50m alto y 2,40m de ancho *	un	50	$ 213.041	$ 10.652.050
Cinta Señalización Naranja (calibre 4, rollo por 500 m)	un	0	$ 39.228	$ 0
Malla plástica naranja (polietileno de alta densidad, rollo por 50 m, ancho 1,40 m)	m	1.400	$ 1.840	$ 2.576.000
Teleras 1,35m x 0,90 m	un	0	$ 21.040	$ 0
Capacitación y entrenamiento para auxiliares de tránsito para obras en vías	un	0	$ 233.558	$ 0
SUBTOTAL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO				**$ 73.273.312**

Cantidades ejecutadas y cobradas en Acta No.2 dentro del rubro *Inversión Socio-Ambiental e Implementación PMT-bioseguridad - Gasto Reembolsable:*

ITEM	UN.	CANT	VR UNIT	VR TOTAL
Señales informativas. Dimensiones y características según lo establecido por el Manual de Señalización Vial 2015. Vías secundarias. 60x60 *	un	0,00	$ 174.675,00	$ 0
Señales reglamentarias. Dimensiones y características según lo establecido por el Manual de Señalización Vial 2015. Vías secundarias. 60x60 *	un	0,00	$ 173.348,00	$ 0

Señales preventivas. Dimensiones y características según lo establecido por el Manual de Señalización Vial 2015. vías secundarias. 60x60 *	un	0,00	$	174.675,00	$ 0
Paleta de PARE y SIGA. Dimensiones y características según lo establecido por el Manual de Señalización Vial 2015 - Numeral 4.10.5 *	un	11,00	$	42.080,00	$ 462.880
Maletín (2,0 x 1,0 m) *	un	16,00	$	289.274,00	$ 4.628.384
Balizas (1,4 m) *	un	0,00	$	28.201,00	$ 0
Conos (0,90 m de altura, material plástico color naranja, lámina reflectiva tipo III ó IV) *	un	124,00	$	54.922,00	$ 6.810.328
Barricadas con franjas reflectivas tipo 3 con 1,50m alto y 2,40m de ancho *	un	0,00	$	213.041,00	$ 0
Cinta Señalización Naranja (calibre 4, rollo por 500 m)	un	50,00	$	39.228,00	$ 1.961.400
Malla plástica naranja (polietileno de alta densidad, rollo por 50 m, ancho 1,40 m)	m	700,00	$	1.840,00	$ 1.288.000
Teleras 1,35m x 0,90 m	un	84,00	$	21.040,00	$ 1.767.360
Capacitación y entrenamiento para auxiliares de tránsito para obras en vías	un	42,00	$	233.558,00	$ 9.809.436
Subtotal Señalización y Desvíos					**$ 26.727.788**

Lo indicado en las dos tablas anteriores totalizan el presupuesto acumulado de $100’001.100.

En el mes de **agosto de 2025** se realizaron las siguientes actividades con respecto al área de Manejo de tránsito:

Se realizó acompañamiento en los diferentes frentes de obra, donde se verificó la adecuada implementación del esquema de señalización vertical y dispositivos de canalización de tráfico, los cuales se estuvo ajustando con los esquemas completos y dispositivos de canalización de tránsito requeridos.

Se hizo llamado de atención al contratista de obra, por la falta de entrega completa y oportuna de las certificaciones de capacitación de los auxiliares de tránsito que laboraban en campo, quienes realizaron control de tráfico sin la debida aprobación de la interventoría, esta información fue entregada de manera parcial, y los anexos faltantes serán subsanados dentro del informe de interventoría próximo. A la fecha del presente informe de interventoría, el Consorcio VialMed hizo entrega de 7 certificaciones mientras que en campo se tuvieron 11 auxiliares de tránsito realizando control vehicular.

Del mismo modo, se realizó llamado de atención al contratista de obra por la falta de oportunidad en la pintura de las marcas viales intervenidas durante la ejecución de parcheos, las cuales deberían ser restituidas con pintura acrílica al día siguiente de realizada la rehabilitación de la carpeta asfáltica y 30 días después en pintura plástica en frío. En la siguiente tabla se relacionan las marcas viales intervenidas durante el mes de agosto:

DIRECCIÓN	FECHA EJECUCIÓN	COMUNA	RANGO	SEÑALIZACIÓN A REPONER
CL 79 # 48A-11	1-ago	Manrique	1	Flecha de frente y doble giro
CL 80 48A-91	1-ago	Manrique	1	Línea de detención y líneas paso peatonal
Cra 90 10c-65	4-ago	Robledo	1	Flecha de frente
CL 32B # 83 - 38	5-ago	Belén	1	2 líneas paso peatonal
CR 76 CL 43	5-ago	Laureles	1	Línea de PARE y 2 líneas paso peatonal
CL 43 CR 77	5-ago	Laureles	1	4 Líneas paso peatonal
CR 36 #7-18	6-ago	Poblado	1	Flecha solo giro

DIRECCIÓN	FECHA EJECUCIÓN	COMUNA	RANGO	SEÑALIZACIÓN A REPONER
CR 90 # 43 – 61	11-ago	La América	1	2 líneas paso peatonal
CR 80aa CL 36 07	11-ago	Laureles	0	Flecha giro y frente, y línea separadora de carril (amarilla
CRA 42 CL 8-15	12-ago	Poblado	1	Prohibido parquear
CRA 53 FIN PUENTE CL113A+280 INICIO PUENTE CL 120	14-ago	Castilla	1	Achurado
Cra 49 cl 9	14-ago	Poblado	0	Paso peatonal (3 líneas)
Cra 49 cl 9-79	14-ago	Poblado	0	1 línea detención
cl 32 1a sur-22	14-ago	Poblado	1	Señal 30km/h+achurado
Tv Inferior Cr 10B+5	14-ago	Poblado	1	Flecha de frente
CRA 41 CL 10A	14-ago	Poblado	0	3 Líneas paso peatonal
CR 41 # 10 - 21	14-ago	Poblado	0	Prohibido parquear
CRA 74 ENTRE CL 113 Y CL 116	14-ago	12 de Octubre	1	Pictograma zona escolar+flecha frente y doble giro+ Línea eje+paso peatonal+línea de detención+triángulo resalto
Cra63 101C-58	15-ago	Castilla	1	Paso peatonal
CR 49A 87- 118	19-ago	Aranjuez	1	Flecha de frente
CL 45C CON CL 46	19-ago	Buenos Aires	4	Texto PARE y flecha doble giro
Cr 69 entre Cl 95 y Cl 96	20-ago	Castilla	4	Según esquema
CR 99 64B-68	20-ago	San Cristobal	1	Flecha doble giro
CR 80 CLL 36-34	20-ago	Laureles	1	Prohibido parquear
CR 52 CL 102 - 06	21-ago	Santa Cruz	1	Reductor de velocidad (resalto)
CL 93EA CRA61 CR 63	21-ago	Castilla	0	Velocidad máxima 60km/h
CR 53 12AA SUR-23	21-ago	Guayabal	1	Pictograma zona escolar
CR 53 12AA SUR-3	21-ago	Guayabal	1	Texto Zona Escolar
CR 53 12AA SUR-27	21-ago	Guayabal	1	Flecha de frente
CL 95 CRA 68 CR 69	21-ago	Castilla	4	Según esquema
CL CR 48 CR 49	22-ago	Poblado	1	4 Líneas paso peatonal
CR 41 10-21	22-ago	Poblado	1	Paso peatonal
CL 2B 75D -29	22-ago	Belén	1	Flecha de frente
CR 53 12AA SUR-23	22-ago	Guayabal	1	Texto Zona Escolar+ línea de borde
CL 12 SUR 53 - 71	22-ago	Guayabal	1	Flecha de solo giro + línea de eje
CL 6 SUR 50EE-30	22-ago	Guayabal	1	2 líneas paso peatonal+ línea de detención
CL 45C CON CR 21	22-ago	Buenos Aires	4	Texto PARE y flecha doble giro
CR 63 101C-15	23-ago	Castilla	1	5 líneas de paso peatonal
CL 63 CR 76-15	23-ago	Robledo	1	Paso peatonal+ línea de detención
CL 35 75A-94	23-ago	Laureles	1	3 Líneas paso peatonal
CRA 77 & CL 35	23-ago	Laureles	1	Flecha de frente
CR 52 CL 99 - 24	25-ago	Santa Cruz	1	Paso peatonal (cebra)
CR 47 CL 53 Y CL 50	25-ago	La Candelaria	4	Según esquema rango 4
DG 75 ENTRE TV 39CA Y TV 39CD	30-ago	Laureles	4	Según esquema rango 4

En relación con los trámites de radicación y aprobación de PMT relacionados con la Construcción, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada, se tiene para el periodo que comprende el presente informe de interventoría, los siguientes:

Tabla 21 Relación de los PMT solicitados al **31 de agosto de 2025**

Consecutivo	Tipo De Cierre	Dirección	Fecha Inicio	Fecha Final	Hora Inicio	Hora Final	Fecha Aprobación PMT	Estado	Actividad
1	PARCIAL	Vías arterías e intervenciones de cruces semafóricos			21:00	04:00	Res2025102 38348	Aprobado	PMT GENERAL

Consecutivo	Tipo De Cierre	Dirección	Fecha Inicio	Fecha Final	Hora Inicio	Hora Final	Fecha Aprobación PMT	Estado	Actividad
		Vías con presencia transporte público diferentes de vías arterías	22 julio de 2025	22 nov de 2025	20:00	04:00	Del 21/07/2025		
		Carril de Metroplús			00:00	04:00			
		Vías con presencia transporte público diferentes de vías arterías			07:00	15:00			
		Vías con presencia transporte público en zonas residenciales, y Vías sin presencia transporte público			07:00	17:00			
2	PARCIAL	Calle 10A entre carrera 36 y 43D. COSTADO NORTE	29 agosto 2025	14 octubre 2025	9:00	16:00	Res2025304 11393 Del 29/08/2025	Aprobado	PMT ESPECÍFICO
		Calle 10A entre carrera 36 y 43D. COSTADO SUR							
3	PARCIAL	Diagonal 65D entre Transversal 34B y calle 34. AMBOS COSTADOS	08 de sept de 2025	21 de sept de 2025	24 horas	24 horas	N/A	En trámite	PMT ESPECÍFICO

Se adjuntan al presente informe los siguientes anexos:

Anexo 2.2-1: PMT Específico Cl10A entre Cr36 - Cr43D

Anexo 2.2-2: Aprobación del PMT Específico Cl10A entre Cr36 - Cr43D

Anexo 2.2-3: PMT Específico Pompeyano en Dg 65D entre Transversal 34B y calle 34

Anexo 2.2-4: Certificaciones de capacitaciones de auxiliar de tránsito recibidas en el mes de agosto.

Anexo 2.2-5 Informe Contratista de Obra

A continuación, se presenta registro fotográfico de algunos de los frentes intervenidos durante el periodo del presente informe:

Evidencia fotográfica de PMT en algunos frentes de intervención



15 ago 2025 2:20:32 p.m.
+6.2779N -75.5986W
Cr 89 CL 65
Antigua Vía Mar
Cuadrilla #7
Comuna 7
Bache #1 Después


16/08/25, 9:41 a.m.
+6.245965,-75.599916
Carrera 80 37-53
Medellín 050031
Antioquia
Colombia
Altitud:1513.8meter
Velocidad:0.0km/h


16 de agosto de 2025, 9:37:31 a.m.
+6.212884,-75.556100
Cl 16 Cr 24D
Altos del Poblado
Cuadrilla 8


19/08/25, 1:50 p.m.
+6.291049,-75.572847
CONSORCIO MED URBANO,
CR 69 CL 95 Y CL 96, CASTILLA,C13.


21/08/25, 7:56 a.m.
+6.290348,-75.573070
CONSORCIO MED URBANO,
CL 95 CR 68 Y CR 69, CASTILLA,C16.

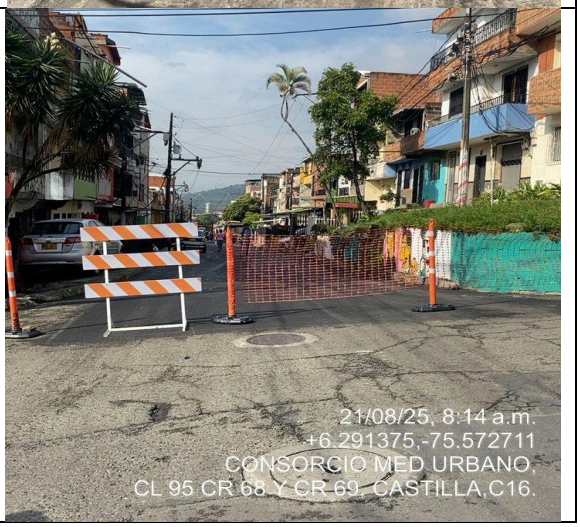
21/08/25, 8:14 a.m.
+6.291375,-75.572711
CONSORCIO MED URBANO,
CL 95 CR 68 Y CR 69, CASTILLA,C16.


25/08/25, 8:01 p.m.
+6.251125,-75.564689
CONSORCIO MED URBANO,
CR 47 CL 52 Y CL 53, LA CANDELARIA ,C16.


25 ago 2025 8:32:12 p.m.
#53-10 Carrera 47
La Candelaria
Medellín
Antioquia
CONSORCIO MED URBANO SST


26 ago 2025 10:59:23 a.m.
Medellín
Antioquia
CONSORCIO MED URBANO SST


26/08/25, 8:26 a.m.
+6.206375,-75.583245
(Cuadrilla#6) CONSORCIO MEDURBANO
Barrio: Cristo Rey
Cl 1 sur Cr 50G - 09


31/07/2025 8:15:48 a. m.
+6,2225N -75,5695W
19-127 Carrera 43A
Villa Carlota
Poblado
#Cuadrilla 8 #CONSORCIO MED URBANO


19 ago. 2025 10:31:25 a. m.
6,291168N 75,572808W
Malla Vial

2.3 SEGUIMIENTO AL ESTADO DEL TIEMPO:

Desde el punto de vista climático se asume que el área del Valle de Aburrá, en la que se ubica la Ciudad de Medellín y en la cual se desarrolla el proyecto, presenta características homogéneas y comportamiento similar a lo largo de los diferentes periodos secos o de lluvias a través del año. Sin embargo, es posible diferenciar circunstancias específicas de acuerdo la ubicación geográfica en la ciudad. Para una descripción más específica en cada uno de los frentes en que se fue laborando se puede remitir a la descripción consignada en la bitácora de obra o informe diario por cuadrilla que es diligenciado por el tecnólogo inspector dispuesto por la Interventoría en cada una de éstas.

Sin embargo, para ilustrar de una manera práctica el estado del tiempo, más específicamente el régimen de lluvias, la temperatura máxima y mínima que se presentó en la ciudad, en la tabla y gráficos siguientes, se presenta el Cuadro “Estado del Tiempo” correspondiente al mes de **agosto de 2025**, en el cual se discriminan a diario la precipitación en mm y la temperatura en grados Celsius **(°C)**, de acuerdo con los promedios para la ciudad en el periodo correspondiente.

Para el periodo reportado, correspondiente al mes de **agosto de 2025**, se observa un periodo predominantemente lluvioso, pero que no han presentado mayores contratiempos a causa de los efectos climáticos.

En resumen, tenemos que, durante este período se presentaron lluvias 17 días del mes, siendo los días más fuertes el 10, 17, 20 y 22 respectivamente; desde el 1 hasta el 31 de agosto de 2025 se presentó una precipitación acumulada de 172,70 mm, la temperatura máxima promedio fue de 28,45°C y la temperatura mínima promedio de 17,82°C.

Tabla 22 Gráfica de precipitaciones, temperaturas máximas y mínimas durante el mes de **agosto de 2025**

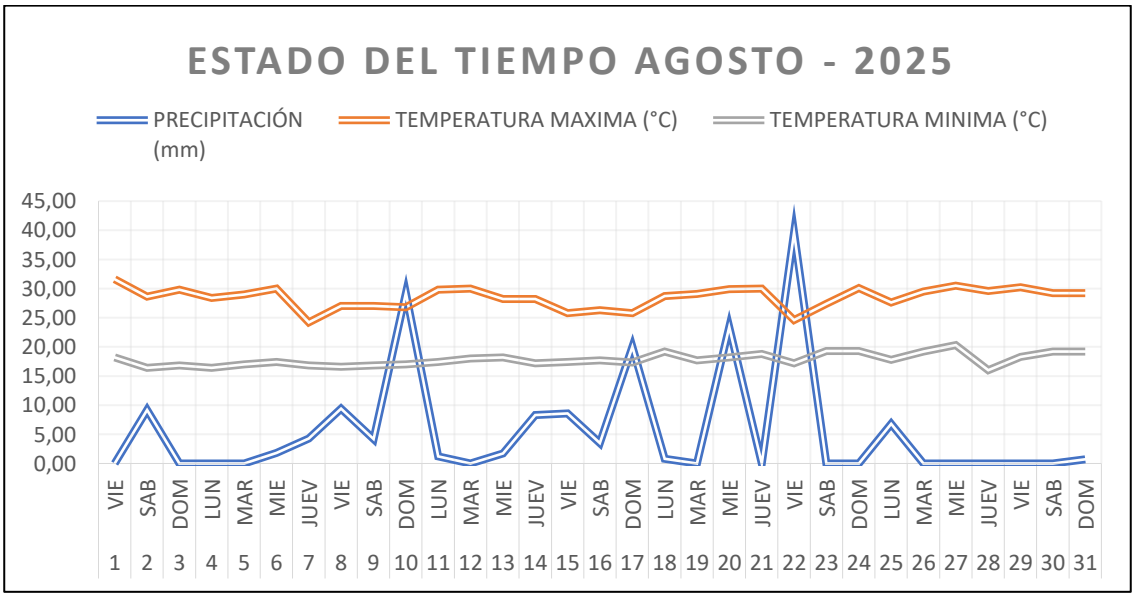


Tabla 23 Estado del tiempo mes de **agosto de 2025**

CONSORCIOMEDURBANO 20005377	**"INTERVENTORIA A LA REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA"**	Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

ESTADO DEL TIEMPO PARA LA CIUDAD DE MEDELLIN

PERIODO: DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

DIA DE LA SEMANA		PRECIPITACIÓN (mm)	TEMPERATURA MAXIMA (°C)	TEMPERATURA MINIMA (°C)
1	VIE	0,00	31,60	18,20
2	SAB	9,20	28,60	16,40
3	DOM	0,00	29,80	16,80
4	LUN	0,00	28,40	16,40
5	MAR	0,00	29,00	17,00
6	MIE	1,80	30,00	17,40
7	JUEV	4,30	24,20	16,80
8	VIE	9,40	27,00	16,60
9	SAB	4,20	27,00	16,80
10	DOM	29,20	26,80	17,00
11	LUN	1,20	29,80	17,40
12	MAR	0,00	30,00	18,00
13	MIE	1,70	28,20	18,20
14	JUEV	8,30	28,20	17,20
15	VIE	8,60	25,80	17,40
16	SAB	3,50	26,30	17,70
17	DOM	20,00	25,80	17,30
18	LUN	0,80	28,70	19,20
19	MAR	0,00	29,10	17,70
20	MIE	23,40	29,90	18,20
21	JUEV	0,00	30,00	18,80
22	VIE	39,60	24,60	17,20
23	SAB	0,00	27,40	19,30
24	DOM	0,00	30,10	19,30
25	LUN	6,80	27,60	17,80
26	MAR	0,00	29,50	19,20
27	MIE	0,00	30,50	20,30
28	JUEV	0,00	29,60	16,00
29	VIE	0,00	30,20	18,30
30	SAB	0,00	29,20	19,20
31	DOM	0,70	29,20	19,20
PRECIPITACIÓN ACUMULADA (mm)		**172,70**		
TEMPERATURAS PROMEDIO (°C)			**28,45**	**17,82**

2.4 CONTROL DEL MATERIAL EN OBRA:

De acuerdo con lo estipulado en el contrato de obra N° 4600105052 de 2025 en la CLÁUSULA 9 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA numeral 50, establece que: *"El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los quince (15) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato".*

Considerando lo anterior, el contratista Consorcio VialMed 2025 mediante comunicado N° CVM-002-2025 de fecha de radicado 30 de julio de 2025 realizó la entrega del plan de calidad en su versión N° 1.

Surtido el proceso de revisión de la versión N° 1 del plan de calidad por parte de la Interventoría, se realizó a través de correo electrónico de fecha 15 de agosto de 2025 las siguientes observaciones al Contratista:

- ✓ Incluir en el anexo 9 Plan de inspección y ensayos, un resumen con la relación de cantidad y periodicidad de extracción de núcleos para las actividades de extensión de mezcla asfáltica clasificado por rangos 0, 1, 2, 3, 4 y masivos; teniendo en cuenta lo tratado en mesas de trabajo o reuniones con la Interventoría y la normatividad aplicable al proyecto.

- ✓ Relacionar el nombre de la Interventoría en la tabla N° 1 Información del proyecto.

- ✓ Actualizar la tabla N° 3 Equipos asignados, incluyendo la relación de la maquinaria mínima del proyecto según el Anexo 1 Anexo Técnico y el alcance de las actividades a desarrollar con el contrato de obra N° 4600105252 de 2025. Describir las especificaciones de los equipos, modelo, serie, capacidad, tipo, potencia y/o si es repotenciado.

- ✓ Ajustar la tabla N° 4 Proveedores, relacionando los nombres de los proveedores con los que actualmente el Consorcio Vial Med 2025 tienen relación comercial para la ejecución del proyecto. También ajustar la descripción del título de la columna 3, el plan de inspección y ensayos se describe en el anexo 9.

A la fecha de corte del presente informe, el contratista no ha efectuado la entrega del plan de calidad atendiendo las observaciones de la Interventoría.

En el plan de calidad se documentan los procesos que se implementarán en el proyecto cuyo objeto es "REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA", con el fin de gestionar la calidad durante todas las etapas de su ciclo de vida, de manera que se pueda asegurar el cumplimiento de todos los objetivos planteados. En el documento se definen procedimientos, procesos y sistemas de gestión que deberán ser puestos en práctica por el equipo del Consorcio VialMed 2025.

Los objetivos del plan de calidad están enfocados específicamente en:

- ✓ Garantizar que todos los entregables del proyecto se lleven a cabo de conformidad con los requisitos del Cliente.
- ✓ Definir metodologías y procedimientos para llevar a cabo la planeación, la ejecución, el seguimiento y control, la mejora continua y la entrega del Proyecto a satisfacción del Cliente.

Anexo al plan de calidad, se encuentra las listas de procedimientos e instructivos que se implementarán en la gestión de la calidad durante el desarrollo del contrato, resumidos de la siguiente manera:

- ✓ Requisitos contractuales, normativos y legales. Anexo 2 - CVM-GP-FT-54 Matriz rastreabilidad de requisitos.
- ✓ Selección de personal. Anexo 3 - CVM-GTH-PD-01 Procedimiento de gestión de talento.
- ✓ Inducciones y capacitaciones. Anexo 4 - Formatos de inducciones y de registro de capacitación.
- ✓ Evaluación del personal. Anexo 5 - CVM-GTH-FT-17 Evaluación de Personal Operativo y Evaluación de personal administrativo.
- ✓ Mantenimientos preventivos a maquinaria y equipos. Anexo 6 - CVM-GI-SST-PR-06 Programa de mantenimiento.
- ✓ Compras y adquisiciones. Anexo 7 - CVM-GC PD-01 Procedimiento gestión compras.
- ✓ Dotación de cuadrillas con herramientas. Anexo 8 - CMVGI-CA-PD-01 Procedimiento planificación de recursos.
- ✓ Revisión de requisitos relacionados con el cliente. Anexo 9 – Plan de inspección y ensayos.
- ✓ Lecciones aprendidas. Anexo 11 - CVM-GP-FT-52 Formato de Lección Aprendida.
- ✓ Auditorías internas. Anexo 12 - CVM-GI-GM-PD-03 Procedimiento Auditoría Interna y Anexo 13 - CVM-GI-GM-PD-04 Procedimiento de Acciones, Correctivas, Preventivas y de Mejora.
- ✓ Gestión de no conformidades. Anexo 14 - CVM-GI-CA-PD-16 Procedimiento Control Salidas No Conformes y Anexo 15 - CVM-GI-GM-FT-06 Registro y seguimiento de Acciones ACPM.
- ✓ Producción y provisión del servicio. Anexo 16 - Caracterización de procedimientos e instructivos, Anexo 17 - CVM-GI-CA-FT-15 Matriz de control de calidad y alcance del proyecto, Anexo - 18 FORMATOS/Lista de liberación actividades constructivas y Anexo 19 PRESUPUESTO.
- ✓ Gestión de la información documentada. Anexo 21 - CVM-GI-GM-FT-08 Listado Maestro de Información Documentada todos los procesos.
- ✓ Gestión del cambio asociados al alcance del proyecto. Anexo 22. CVM-GI-GM-PD-02 Procedimiento Gestión del Cambio, CVM-GI-CA-FT-20 Formato para el registro de gestión del cambio en calidad.
- ✓ Control de procesos para la identificación trazabilidad del producto. Anexo 23 - CVM-GI-CA-I-03 Instructivo para el diligenciamiento de la bitácora de obra y Anexo 16 “PROCESO CONSTRUCTIVO Y INSTRUCTIVOS”.
- ✓ Enfoque del cliente (expectativas). Anexo 24 - CVM-GI-CA-FT-05 Encuesta de satisfacción del cliente.

A través de comunicado N° CVM-036-2025 de fecha 8 de agosto de 2025 y con asunto *"Informe Mensual de Calidad 1 al 31 de Julio",* el contratista Consorcio VialMed 2025 informó sobre el seguimiento al cumplimiento de los requisitos de calidad del contrato de obra N° 4600105052 de 2025, describiendo los controles y actividades realizadas durante el mes de julio de 2025 en pro de garantizar que los trabajos en ese periodo se lleven a cabo dentro del marco de las especificaciones, diseños y calidad esperada. También hizo entrega del informe mensual de calidad N° 2 correspondiente al mes de agosto de 2025.

Con el fin cumplir con lo descrito, la Interventoría verifica que el contratista realiza un permanente control sobre la calidad de los materiales e insumos requeridos para la ejecución de las actividades objeto del contrato y se efectúan los siguientes controles en obra:

- ✓ Inspección visual previa a la instalación corroborando la limpieza del área a intervenir realizada por cada cuadrilla.
- ✓ Recepción de tiquetes o remisiones de cada volqueta para corroborar tipo de mezcla y cantidad de despacho diariamente, en el cual se evidencia la hora de salida de la planta de todos los vehículos.
- ✓ Hora de llegada de las volquetas a los frentes de obra, hora de inicio de riego y fin de riego.
- ✓ Toma de temperatura antes y durante la instalación de la mezcla y verificación de la temperatura de salida de la mezcla asfáltica.
- ✓ Al principio y al final de la jornada se toma el respectivo registro fotográfico para la presentación de informes diarios, semanales y mensuales, para luego subir a la plataforma del SGVial y SIRO.
- ✓ Revisión de la documentación de controles de calidad internos diarios a las mezclas asfálticas entregadas.
- ✓ Para este periodo se realizó la instalación de mezcla MDC-19 (Tibia) con RAP en rangos 0 y 1; y MSC-19 (Tíbia) con RAP para rango 3 y 4.
- ✓ El material de RAP es suministrado por el Municipio de Medellín, y transportado por el Consorcio VIALMED 2025 desde las instalaciones de la planta localizada en la calle 30 hacia las plantas de PROCOPAL S.A y PAVIMENTAR S.A.

2.5 CONTROL DE ENSAYOS DE LABORATORIO:

La calidad de los insumos se realizó con base en los soportes entregados por el contratista, mediante el aporte de los ensayos y certificados de calidad realizados en las plantas de Pavimentar S.A y Procopal S.A y sus laboratorios internos, también acorde a los certificados de asfalto aportados por el proveedor MPI y ECOPETROL; informes de resultados de ensayos a los agregados; certificados de la Emulsión asfáltica por la firma CRL-1 CB COLBITUMEN Colombiana de Bitumen S.A.S e informes de resultados de laboratorio realizados a núcleos extraídos a las mezclas asfálticas que fueron aplicadas durante el mes de julio y agosto de 2025.

Los resultados del control diario de laboratorio realizados a las mezclas asfálticas y los cuadros de revisión de las especificaciones, se incluyen en el Anexo N° 1 del informe del plan de calidad

del mes de agosto de 2025 suministrado por el contratista, el cual se adjunta al presente informe de Interventoría.

De acuerdo a los resultados obtenidos de los ensayos diarios de mezcla asfáltica tipo MDC-19 + RAP suministradas por Pavimentar S.A y Procopal S.A, además de la verificación de la fórmula de trabajo, se concluye que las mezclas instaladas en el mes de **agosto de 2025** cumplen con los parámetros de diseños y especificaciones del INVIAS.

2.5.1 Certificados Mezclas

Se realizó seguimiento a las mezclas asfálticas suministradas según lo define el artículo 450 de la norma INVIAS 2022 para NT3; para ello el contratista entregó a la interventoría los certificados de calidad de la mezcla asfáltica MDC-19 + RAP (Tibia) aplicada en las intervenciones a nivel de rango 0 y 1, y mezcla asfáltica MSC-19 + RAP (Tibia) en rango 3 y 4 durante el mes de **agosto de 2025.**

Los certificados de calidad se relacionan a continuación:

Planta PAVIMENTAR S.A:

- ✓ MDC-19 + RAP TIBÍA INV 2022 del 1 al 30 de agosto de 2025.
- ✓ MSC-19 + RAP TIBÍA INV 2022 del 19 al 30 de agosto de 2025.

Planta PROCOPAL S.A:

- ✓ CC F-17 MDC-19 TIBIA + RAP TIBÍA INV 2022 del **1 al 30 de agosto de 2025**.

2.5.2 Certificado de calidad para el asfalto

Se realizó seguimiento al cemento asfaltico suministrado por Ecopetrol y MPI, según lo define el artículo 410 de la norma INVIAS 2022.

- ✓ Certificado de calidad para el asfalto AC-30 son aportados, entregados por Ecopetrol como proveedor de asfalto para la producción de mezcla asfáltica en la planta PAVIMENTAR S.A, mes de agosto de 2025.
- ✓ Certificado de calidad para el asfalto MPI 60-70 normalizado, para la producción de mezclas asfálticas en la planta PROCOPAL S.A, mes de agosto de 2025.

2.5.3 TSR Evaluación de la susceptibilidad al agua de las mezclas de concreto asfáltico utilizando la prueba de tracción indirecta.

- ✓ Certificado de evaluación de la susceptibilidad al agua de la mezcla de concreto asfáltico MDC-19 + RAP Tibia y MSC-19 + RAP Tibia producida por la planta PAVIMENTAR S.A, de fecha 19 de agosto de 2025.

- ✓ Certificado de evaluación de la susceptibilidad al agua de la mezcla de concreto asfáltico MDC-19 + RAP Tibia producida por la planta PROCOPAL S.A, de fechas 6, 11, 20 y 26 de agosto de 2025.

2.5.4 Certificado de calidad para la emulsión asfáltica

Se realizó seguimiento a los certificados de emulsión asfáltica, para ello el contratista suministró a la interventoría los siguientes certificados de calidad:

- ✓ Proveedor CB COLBITUMEN Colombiana de Bitumen S.A.S, producto emulsión CRL-1.

- ✓ Proveedor Asfaltos y Emulsiones de Colombia S.A.S, producto emulsión CRR-1.

2.5.5 Certificado de calidad para la Señalización vial

Durante el presente periodo no se realizó trabajos asociados a la aplicación de pintura plástica en frio para señalización vial, por lo anterior, no se reporta la ejecución de pruebas de campo en trabajos de pintura y no se adjunta certificados de calidad.

2.5.6 Resultados de extracción de núcleos en campo y ensayos densidades

Para realizar el control de la compactación de las mezclas asfálticas aplicadas durante el mes de julio y agosto de 2025, se calculó el grado de compactación a partir de los resultados de los ensayos de densidad en terreno y la densidad máxima de la mezcla asfáltica obtenida en laboratorio de las plantas de producción.

De acuerdo a los anterior, se efectuó extracción de núcleos sobre baches ejecutados en las jornadas de rango 0 y 1, como se describe en la siguiente tabla:

Tabla 24 Relación de ensayos de densidades – Rango 0 y 1.

N° NUCLEO	DIRECCIÓN	N° CUADRILLA	FECHA DE EJECUCIÓN	TIPO INTERVENCIÓN	TIPO DE MEZCLA	RESULTADOS				
						Densidad (Kg/m3)	Densidad briqueta (Kg/m3)	% compactación	Rango cumplimiento	Observación
1	Cl 48 # 39-96 (sentido E-O)	1	23-jul-25	Bache	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2353,0	2405,0	97,8%	≥93	Cumple
2	Cl 46 # 39-69 O- E	1	22-jul-25	Bache	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2362,0	2406,0	98,2%	≥93	Cumple
3	Cl 11B # 34-160 (sentido O-E)	1	30-jul-25	Bache	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2377,0	2402,0	99,0%	≥93	Cumple
4	Cl 10B # 28-146	1	29-jul-25	Bache	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2344,0	2406,0	97,4%	≥93	Cumple
5	Av. 80 x Cl 15 (Calzada oriental, carril derecho, en la bifurcación hacia Cl 16 despué de ingreso colegio La Inmaculada)	2	22-jul-25	Bache	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2398,0	2406,0	99,7%	≥93	Cumple
6	Cl 31A x Cr 78 (Sobre la cicloruta en la interección de ambas vías)	2	24-jul-25	Bache	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2329,0	2402,0	97,0%	≥93	Cumple
7	Cr 80 # 20A - 178 (Calzada oriental, carril izquierdo, cerca al separador)	2	30-jul-25	Bache	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2452,0	2402,0	102,1%	≥93	Cumple
8	Cr 52 # 6 Sur - 91 (Calzada occidental Av Guayabal carril derecho, cerca al ochave del giro derecho hacia Continental Gold)	2	29-jul-25	Bache	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2419,0	2406,0	100,5%	≥93	Cumple

N° NUCLEO	DIRECCIÓN	N° CUADRILLA	FECHA DE EJECUCIÓN	TIPO INTERVENCIÓN	TIPO DE MEZCLA	RESULTADOS				
						Densidad (Kg/m3)	Densidad briqueta (Kg/m3)	% compactación	Rango cumplimiento	Observación
9	Cr 117C #64BG-52	3	22-jul-25	Bache	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2422,0	2406,0	100,7%	≥93	Cumple
10	Cl 68 #86-52	3	23-jul-25	Bache	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2418,0	2405,0	100,5%	≥93	Cumple
11	Cr 22 Este #9B - 101	3	29-jul-25	Bache	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2344,0	2406,0	97,4%	≥93	Cumple
12	Cl 19 #35-956	3	30-jul-25	Bache	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2372,0	2402,0	98,8%	≥93	Cumple
13	Cr 64AA x Cl 113 + 43 m (primera intervención, Sentido S-N, Junto a franja paisajismo movilidad, entrada Terpel)	4	24-jul-25	Bache	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2317,0	2402,0	96,5%	≥93	Cumple
14	Cr 64C x Cl 67 + 350 m (Sentido N-S, Adyacente a MH, Argos al Occidnete Primax al oriente)	4	25-jul-25	Bache	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2503,0	2403,0	104,2%	≥93	Cumple
15	Cl 53 #71A - 80 (esquina Tortas del Gordo, sobre ciclo ruta, sentido E-W)	4	30-jul-25	Bache	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2372,0	2402,0	98,8%	≥93	Cumple
16	Cr 65 #80 + 70m (primera intervención sentido N-S, entrada cementerio Universal, junto a parada de bus)	4	1-ago-25	Bache	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2352,0	2405,0	97,8%	≥93	Cumple
17	Cl 49A # 55A - 37	5	24-jul-25	Bache	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2369,0	2402,0	98,6%	≥93	Cumple

N° NUCLEO	DIRECCIÓN	N° CUADRILLA	FECHA DE EJECUCIÓN	TIPO INTERVENCIÓN	TIPO DE MEZCLA	RESULTADOS				
						Densidad (Kg/m3)	Densidad briqueta (Kg/m3)	% compactación	Rango cumplimiento	Observación
18	Cr 56A #59A-14	5	26-jul-25	Bache	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2344,0	2405,0	97,5%	≥93	Cumple
19	Cr 46 x Cl 46 + 33m (Av Oriental sentido S-N, paradero de buses)	5	29-jul-25	Bache	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2360,0	2406,0	98,1%	≥93	Cumple
20	Cr 35 x Cl 18-14 m (Av Las Palmas sentido Or-Occ)	5	30-jul-25	Bache	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2368,0	2402,0	98,6%	≥93	Cumple
21	Cr 85 #68B-10	6	24-jul-25	Bache	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2389,0	2442,0	97,8%	≥93	Cumple
22	Cr 86 #68A-10	6	25-sep-25	Bache	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2424,0	2464,0	98,4%	≥93	Cumple
25	Cr 63 # 48-95	7	29-jul-25	Bache	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2361,0	2406,0	98,1%	≥93	Cumple
26	Cr 89C #68A-178	7	31-jul-25	Bache	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2400,0	2454,0	97,8%	≥93	Cumple
27	Cl 19 #43B-166	8	31-jul-25	Bache	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2374,0	2454,0	96,7%	≥93	Cumple
28	Cr 43D #11-47	8	1-ago-25	Bache	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2435,0	2446,0	99,6%	≥93	Cumple
29	Cr 48C # 12S-148 sentido S-N	1	4-ago-25	Bache	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2354,0	2403,0	98,0%	≥93	Cumple
30	Cl 9S # 53-71 sentido E-O	1	8-ago-25	Bache	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2355,0	2402,0	98,0%	≥93	Cumple
31	Av. 80 x Cl 59 (Calzada occidental (Sentido norte-sur) en Av.	2	4-ago-25	Bache	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2352,0	2403,0	97,9%	≥93	Cumple

N° NUCLEO	DIRECCIÓN	N° CUADRILLA	FECHA DE EJECUCIÓN	TIPO INTERVENCIÓN	TIPO DE MEZCLA	RESULTADOS				
						Densidad (Kg/m3)	Densidad briqueta (Kg/m3)	% compactación	Rango cumplimiento	Observación
	80 sobre carril izquierdo)									
32	Cr 72 # 17 - 16 (Bache de forma compuesta)	2	8-ago-25	Bache	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2356,0	2402,0	98,1%	≥93	Cumple
33	Cl 39 x Cr 44	3	4-ago-25	Bache	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2353,0	2403,0	97,9%	≥93	Cumple
34	Cl 49 # 20B - 21	3	6-ago-25	Bache	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2357,0	2397,0	98,3%	≥93	Cumple
35	Cr 65 x Cl80 -26 m (Primera intervención, Sentido N-S, entrada cementerio Universal, junto a ciclovia, junto a demarcación giro a la derecha, carril izquierdo)	4	4-ago-25	Bache	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2424,0	2403,0	100,9%	≥93	Cumple
36	Cr 65 #49 - 41 - 17m (Primera intervención, sentido N-S, entrada Universiad Nacional, después de paso peatonal, carril derecho)	4	5-ago-25	Bache	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2456,0	2402,0	102,2%	≥93	Cumple
37	Cr 61 entre Cl 48 y 49 (Tercera intervención, en la Av. Regional calzada rápida, frente a la estación libertadores de bomberos, sentido Sur-Norte)	5	5-ago-25	Bache	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2365,0	2399,0	98,6%	≥93	Cumple

N° NUCLEO	DIRECCIÓN	N° CUADRILLA	FECHA DE EJECUCIÓN	TIPO INTERVENCIÓN	TIPO DE MEZCLA	RESULTADOS				
						Densidad (Kg/m3)	Densidad briqueta (Kg/m3)	% compactación	Rango cumplimiento	Observación
38	Cr 64A x Cl 80 + 600 (Primera intervención, en el paradero de buses de la terminal del norte por la Av. Regional)	5	6-ago-25	Bache	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2340,0	2397,0	97,6%	≥93	Cumple
39	Cl 80 x Cr 49	6	4-ago-25	Bache	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2429,0	2458,0	98,8%	≥93	Cumple
40	Cl 32C # 81B - 99	6	6-ago-25	Bache	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2413,0	2445,0	98,7%	≥93	Cumple
41	Cr 90 # 65C-10 + 90m (Primera intervencion subiendo)	7	4-ago-25	Bache	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2450,0	2458,0	99,7%	≥93	Cumple
42	Cr 90 #65C-10 (Entrada a la unidad residencial Mirador Barcelona)	7	6-ago-25	Bache	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2425,0	2445,0	99,2%	≥93	Cumple
43	Cl 2 #20-22	8	5-ago-25	Bache	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2476,0	2452,0	101,0%	≥93	Cumple
44	Cl 3B Sur #29C-135	8	8-ago-25	Bache	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2397,0	2439,0	98,3%	≥93	Cumple
45	Cl 32B # 83A24	9	4-ago-25	Bache	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2405,0	2458,0	97,8%	≥93	Cumple
46	Cl 38 #94 - 10	9	6-ago-25	Bache	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2439,0	2445,0	99,8%	≥93	Cumple
47	Cl 8 cl 42-73 Sentido O-E	1	12-ago-25	Bache	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2433,0	2402,0	101,3%	≥93	Cumple
48	Cr 52 cl 14-107	1	15-ago-25	Bache	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2345,0	2408,0	97,4%	≥93	Cumple

N° NUCLEO	DIRECCIÓN	N° CUADRILLA	FECHA DE EJECUCIÓN	TIPO INTERVENCIÓN	TIPO DE MEZCLA	RESULTADOS				
						Densidad (Kg/m3)	Densidad briqueta (Kg/m3)	% compactación	Rango cumplimiento	Observación
49	Cl 18 # 83-310 (Cebra peatonal frente Aparta casas unidas zona C)	2	12-ago-25	Bache	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2385,0	2410,0	99,0%	≥93	Cumple
50	Cl 30 # 42A-21 (Frente al ingreso de Torres de San Diego)	2	14-ago-25	Bache	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2384,0	2403,0	99,2%	≥93	Cumple
51	Cr 75 #115 - 13	3	13-ago-25	Bache	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2438,0	2407,0	101,3%	≥93	Cumple
52	Cr 52 #120 - 4	3	15-ago-25	Bache	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2402,0	2404,0	99,9%	≥93	Cumple
53	Cl 47 sur Cr 58 - 33M (Primera intervención, Sentido O-E, San Antonio de prado, intervención sobre reductor de velocidad, A 36M de Ensitar SAS Sentido E-O)	4	11-ago-25	Bache	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2406,0	2408,0	99,9%	≥93	Cumple
54	Cl 113 #75 - 103 (Primera intervención, Sentido O-E, Carril izquierdo, barrio florencia, Entre Panadería y Farmacia)	4	16-ago-25	Bache	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2383,0	2438,0	97,7%	≥93	Cumple
55	Av Regional calzada rapida sentido sur-norte. 300m antes de la Cl 58 (Puente Horacio Toro)	5	12-ago-25	Bache	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2371,0	2402,0	98,7%	≥93	Cumple

N° NUCLEO	DIRECCIÓN	N° CUADRILLA	FECHA DE EJECUCIÓN	TIPO INTERVENCIÓN	TIPO DE MEZCLA	RESULTADOS				
						Densidad (Kg/m3)	Densidad briqueta (Kg/m3)	% compactación	Rango cumplimiento	Observación
	(Fente a la plaza minorista)									
56	Cr 63 #101C-4 (Av Regional sentido Sur-Norte)	5	15-ago-25	Bache	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2343,0	2408,0	97,3%	≥93	Cumple
57	Cr 69 # 30A - 59	6	11-ago-25	Bache	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2449,0	2461,0	99,5%	≥93	Cumple
58	Cr 65C # 25 - 96	6	14-ago-25	Bache	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2407,0	2462,0	97,8%	≥93	Cumple
59	Cl 65C #97-45	7	14-ago-25	Bache	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2460,0	2462,0	99,9%	≥93	Cumple
60	Cl 65BB #95-67	7	15-ago-25	Bache	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2415,0	2445,0	98,8%	≥93	Cumple
61	CL10A #41A-37, Cerca al Carulla Poblado	8	11-ago-25	Bache	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2397,0	2461,0	97,4%	≥93	Cumple
62	Cr24D CL16-50, Mas debajo de la Parroquia Beato Marinano	8	16-ago-25	Bache	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2460,0	2438,0	100,9%	≥93	Cumple
63	Cl 34B Cr 128 - 86	9	16-ago-25	Bache	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2444,0	2438,0	100,2%	≥93	Cumple
64	Cl 34B Cr 118 - 112	9	14-ago-25	Bache	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2399,0	2462,0	97,4%	≥93	Cumple
65	CR 80AA CL 36-57	10	11-ago-25	Bache	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2425,0	2461,0	98,5%	≥93	Cumple
66	CR 112 CL 13-20	10	12-ago-25	Bache	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2399,0	2452,0	97,8%	≥93	Cumple

N° NUCLEO	DIRECCIÓN	N° CUADRILLA	FECHA DE EJECUCIÓN	TIPO INTERVENCIÓN	TIPO DE MEZCLA	RESULTADOS				
						Densidad (Kg/m3)	Densidad briqueta (Kg/m3)	% compactación	Rango cumplimiento	Observación
67	CLL 36 #80A-21	11	15-ago-25	Bache	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2406,0	2445,0	98,4%	≥93	Cumple
68	CLL 36 80A-02	11	15-ago-25	Bache	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2387,0	2445,0	97,6%	≥93	Cumple

2.6 CONTROL DE EQUIPOS EN OBRA:

De acuerdo con lo establecido en el Anexo 1 – Anexo Técnico, capitulo 7, Maquinaría Mínima del Proyecto, el CONSORCIO VIALMED 2025 se compromete a contar con el equipo mínimo requerido para la ejecución del contrato, relacionado a continuación:

- ✓ Planta productora de Mezcla asfáltica.
- ✓ Compresores.
- ✓ Pulidoras manuales.
- ✓ Vibro compactadores.
- ✓ Ranas y/o placas vibratorias.
- ✓ Concretadoras.
- ✓ Cortadoras de elementos metálicos.
- ✓ Cortadoras para pavimento.
- ✓ Volquetas.
- ✓ Plantas Eléctricas.
- ✓ Taladros percutores.
- ✓ Hincadora.
- ✓ Pulidoras.
- ✓ Soplador.
- ✓ Equipo imprimador.
- ✓ Carro tanque de agua.
- ✓ Ruteadora.
- ✓ Vibrador eléctrico.

Para la ejecución de actividades en el mes de **agosto de 2025**, el contratista Consorcio VialMed 2025 cuenta en obra con el siguiente listado equipos y maquinaría.

Tabla 25. Relación equipo y maquinaria mes de **agosto de 2025**

NOMBRE	DATOS DE MAQUINARIA.			
	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIAL
CANGURO	APISONADOR	MIKASA	MXT-60HF	D7863
CANGURO	APISONADOR	MIKASA	MT65HAF	D1136
CANGURO	APISONADOR	MIKASA	MT65H	L 6687
CANGURO	APISONADOR	TORRE BELLO	2007	165907
CONCRETADORA	DE 1,5 BULTOS	FECON	12F-T	81101
CONCRETADORA	DE 1,5 BULTOS	FECON ACPM	9F-T	81703
CONCRETADORA	DE 1,5 BULTOS	FECON	N/A	N/A
CORTADORA DE PISO	GASOLINA	HONDA	EMZST-080	FHNXS3892AB
EQUIPOS DE SOLDADURA	150 MHP DE CAPACIDAD	SKYMAX	SKYMAX 1550	60974
EQUIPOS DE SOLDADURA	155 MHP DE CAPACIDAD	SWEISS	INVERSOR	N/A

NOMBRE	DATOS DE MAQUINARIA.			
	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIAL
EQUIPOS DE SOLDADURA	260 MHP DE CAPACIDAD	SKYARC	2650	R 82
PULIDORA	4,1/2"	DEWALT	DWE 4314B3	DWE 4314B3
PULIDORA	4,1/2"	DEWALT	DWE 4314B3	DWE 4314B3
PULIDORA	9"	DEWALT	DWE 4579B3	69882
PULIDORA	9"	DEWALT	DWE 4579-B4	69881
PULIDORA	9"	BOSCH	200063	N/A
SOPLADORA PISTOLA	DE AIRE	MAKITA	UB1103	PA6-GF30
SOPLADORA PISTOLA	DE AIRE	STANLEY	STPT600-B3	N/A
TALADRO	DEMOLEDOR	ELITE	DH7531	033240100DH75310008
TALADRO	DEMOLEDOR	ELITE	DH7531	033240200DH75310222
TALADRO	ROTOMARTILLO	SIEFKEN	3009	033200100SD30090068
TALADRO	ROTOMARTILLO	SIEFKEN	3009	03321010SD30090077
TALADRO	ROTOMARTILLO	BOSCH	N/A	3611 C32 161
TALADRO	ROTOMARTILLO	BOSCH	HAMMER	509000284
TALADRO MANDRIL	MANDRIL DE 1/2"	DEWALT	DW505C-B3	202229-2SN0292
TALADRO MANDRIL	MANDRIL DE 1/2"	DEWALT	DW 505CB3	N58465
TALADRO MANDRIL	MANDRIL DE 1/2"	DEWALT	DWE 508S-B3	N482740
TRONZADORAS	ELECTRICA	ELITE	CS1425	CS1425
TRONZADORAS	ELECTRICA	DEWALT	D2830-B3	D2830-B3
VENITIN O HALA BOBO	RODILLO CON MOTOR	DOOSAN	TAMAYA 200	N/A
VIBRADOR ELECTRICO	DE AGUJA	WYCO	N/A	N/A
VIBRADOR ELECTRICO	DE AGUJA	WYCO	2509-037	N/A
VIBRADOR ELECTRICO	ESTANDAR	WYCO	N/A	N/A
VIBRADOR ELECTRICO	ESTANDAR	WYCO	N/A	N/A
VIBRO COMPACTADOR TIPO RANA	TIPO RANA	INZU	TOYAMA	N/A
VIBRO COMPACTADOR TIPO RANA	TIPO RANA	INZU	TOYAMA	N/A
Compresor 1 Doosan	COMPRESOR	DOOSAN	Ref C185WKUB modelo 2014,	4670000UIYE04, 7EG4503
Compresor 2 Doosan	COMPRESOR	DOOSAN	Ref C185WKUB modelo 2014	466050UHYE04, 7EG4496
Compresor 3 Doosan	COMPRESOR	DOOSAN	Ref C185WWK modelo 2012	444362UGWE04, CG0995
Compresor 4 KAESER	COMPRESOR	KAESER	M31	Motor WKA0N0758E5129174
Finisher AP800D	FINISHER	CATERPILLAR	AP 800D - 2007	A5P00216 - CATAP800KA5P00216
Finisher vogele	FINISHER	VOGELE	Súper 1303-3 Modelo: 2018	No.Serie 15110285 , No. Motor: 12256284

NOMBRE	DATOS DE MAQUINARIA.			
	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIAL
FRESADORA N1	FRESADORA	WIRTGEN	W100 - 2014	Serial 11100121
FRESADORA N2.	FRESADORA	WIRTGEN	W100 - 2018	SERIE:11100217 - TCD 2012 L04/06
FRESADORA Y TERMINADORA	FRESADORA	WIRTGEN	W100 - 2012	11100008
	PAVIMENTADORA	ATLAS COPCO DYNAPC	SD2500W	10002013P0G001437
Vibrocompactador para mezclas asfálticas	Vibrocompactador para mezclas asfálticas	Hamm	Referencia Hamm HD 75k Año 2016	Motor: H1871516 Chasis 11916618
VIBRO COMPACTADOR HAMM HD 90	VIBRO COMPACTADOR	HAMM	HD90 - 2018	NO REGISTRA
Rodillo compactador de neumáticos	Rodillo compactador de neumáticos	HAMM	HAMM HP 280, - 2019	Motor: 12466021 CHASIS: WGH0H249LHAA00068
MINI CARGADOR NEW HOLLAND	MINICARGADOR NEW HOLLAND	NEW HOLLAND	d Linea L218A Modelo 2020	Chasis JAF0L218HKM472337
MOTONIVELADORA	Fiat Allis 65b Modelo 1985 Placa ZPX 52 Motor 237526 Chasis 75A0294	FIAT	Allis 65b Modelo 1985 Placa ZPX 52	Motor 237526 Chasis 75A02943
RETRO EXCAVADORA PEM 82B	RETROEXCAVADORA	NEW HOLLAND	2009	N8GH20533
RETRO EXCAVADORA PFX 97 B	RETROEXCAVADORA Retroexcavadora New Holland-B95b	NEW HOLLAND	2009	NÚMERO DE SERIE: N8GH20522 NÚMERO DE MOTOR: 00585829
RODILLO MANUAL	Rodillo Vibratorio combinado RD40- 130C	WACKER NEUSON	2018	NO HAY INFORMACIÓN
RODILLO RD 40	Rodillo Vibratorio combinado RD40- 130C	WACKER NEUSON	2018	NO HAY INFORMACIÓN
TANQUE IRRIGADOR	Tanque irrigador de asfalto de 250 T sobre trailer	Leeboy	2014	NO HAY INFORMACIÓN
VIBRO CA 15	Vibrocompactador Cilindro Dinapac r Placa DFK05	DYNAPAC	1984	Serie: CA15A1406D25
VIBRO SD 70	Vibrocompactador Ingersol Rand	Ingersol Rand	NO REGISTRA	Chasis:46387270
COMPACTADOR DE PAVIMENTOS DYNAPAC-ATLAS COPCO CA150D	COMPACTADOR DE PAVIMENTOS DYNAPAC-A	Dynapac	CA-150D	10008104P0B003921
COMPRESOR KAESER M50	COMPRESOR PORTÁTIL M50 (1253)	KAM | Kama	M50	1253

NOMBRE	DATOS DE MAQUINARIA.			
	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIAL
FRESADORA W100	FRESADORA WIRTGEN W-100 (21086)	WIR | Wirtgen	2012	11100008
TERMINADORA ASFALTICA DYNAPAC F121-4W	F121-4W	DYN | Dynapac	2006	654486
COMPACTADOR DE LLANTAS INGERSOLL RAN	Compactadores de Llantas	INR | Ingersoll Rand	1990.	5148 S
COMPACTADOR DE PAVIMENTO ATLAS COPCO CC3800	CC3800	: DYN | Dynapac	2015	10000319V0E002519
COMPRESOR DE TORNILLO KAESER M50 (11194)	M50	KAE | KAESER	2015	1194
FRESADORA WIRTGEN W-1000 (ZAP 51A)	W-1000	WIR | Wirtgen	2006	5100734
TERMINADORA ASFÁLTICA VOGELE SUPER 1	SUPER 1303-3	WIR | Wirtgen	2015	11110238
COMPRESOR DOSSAN C185	COMPRESOR DOSSAN C185	DOSSAN	NO REGISTRA	NO REGISTRA
MARMITA DE IMPRIMACIÓN	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PLACA VIBRATORIA	PLACA VIBRATORIA 45X50 TIPO FECON	NO REGISTRADO	NO REGISTRADO	NO REGISTRADO
RODILLO COMPACTADOR	RODILLO	INGERSOLL RAND	DX 60	NO REGISTRADO
COMPRESOR DE AIRE	COMPRESOR DE AIRE	ATLAS COPCO	NO INFORMADO	APP462631
RODILLO JALA BOBO	RODILLO	HUSQVARNA	NO INFORMADO	20221200021
RETRO PEM 82B	RETROEXCAVDADORA	NEW HOLLAND	2009	N8GH20533
RODILLO RD 40	RODILLO COMPACTADOR	WACKER NEUSON	2018	WNCR0701EHAA00271

El listado de equipos y maquinaría relacionados en la tabla anterior para la ejecución de actividades en el mes de **agosto de 2025**, cumple con la relación del equipo mínimo requerido que el contratista debe disponer en obra para el desarrollo de las obras objeto del presente contrato.

2.7 CONTROL DE ENTREGA Y CAMBIOS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:

La entidad hizo entrega las especificaciones técnicas y anexos aplicables al proyecto de acuerdo al alcance del contrato, los cuales se encuentran en los documentos del contrato, específicamente en el ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO: REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA.

2.7.1 Diseños de Mezclas Asfálticas

Al inicio del proyecto, el CONSORCIO VIALMED 2025 aportó la documentación relacionada con diseños de mezcla asfáltica tipo MDC-19 + RAP a utilizar en proyecto para rangos de 0 a 2, los cuales fueron revisados por la Interventoría.

En resumen, los diseños de mezclas asfálticas aprobadas por la Interventoría a través de la firma INTEINSA PAVIMENTOS a la fecha son las siguientes:

- **MDC-19 + RAP de la planta PAVIMENTAR S.A.**

El diseño presentado cumple con los requerimientos del artículo 450-22 Mezclas asfálticas en caliente de gradación continua (Concreto asfáltico), en cuanto a las propiedades de los agregados y el asfalto que hacen parte de la mezcla asfáltica.

Surtido el proceso de revisión del diseño por la empresa INTEINSA PAVIMENTOS, se requirió al contratista ajustar los diseños de acuerdo a las siguientes observaciones:

- ✓ En el informe, numeral 2.2.3 Astec Warm Mix System, mencionan los beneficios de la mezcla asfáltica tibia y como se logra, pero en ninguna otra parte del diseño indican que la mezcla es tibia, inclusive las temperaturas a las que hacen referencia en el numeral 3.1 Fabricación de briquetas Marshall, corresponden a las de una mezcla asfáltica convencional, por lo anterior es importante que aclaren si este diseño corresponde a mezcla tibia o no.
- ✓ Para la verificación del diseño preliminar, la especificación del Invías en el numeral 450.4.2.2.2, estipula que se deben realizar los ensayos que se enuncian a continuación, estos ensayos no se presentan en los diseños de las mezclas: Resistencia a la deformación plástica (INV E-756-13); módulo complejo (UNE-EN 12697-26 Anexo D) y leyes de fatiga (INV E-808, INV E-784, UNE-EN 12697-24).

Las observaciones en mención fueron remitidas al contratista por medio de correo electrónico de fecha 29 de julio de 2025, respuesta a los comunicados CVM-011 -2025 y CVM-013-2025.

Procedencia de los materiales:

- ✓ La planta de mezclas objeto del presente diseño posee cuatro subtipos de agregados: Triturado 3/4", Arena de trituración, Arena Procesada de planta Copacabana (Antioquia)

y material fresado suministrado por el municipio de Medellín el cual es triturado y clasificado en planta para su uso industrial.

- ✓ Como ligante asfáltico se ha usado asfalto 60/70.

La Fórmula de Trabajo queda definida por los siguientes parámetros:

Tabla 16. Fórmula de trabajo mezcla asfáltica MDC-19 + RAP PAVIMENTAR S.A

Parámetro	Especificación Invias artículo 450-22
Contenido óptimo de asfalto (%)	5,2
Densidad Bulk (g/cm3)	2.464
Estabilidad (N)	14514
Flujo (mm)	2,9
Estabilidad/Flujo (kN/mm)	4,96
Vacíos con aire (%)	4,9
Vacíos en los agregados (%)	16,4
Vacíos llenos con asfalto (%)	70,3
Relación llenante/ligante efectivo	0,97
Concentración real del llenante	0,277
Espesor promedio de película de asfalto	8
Gravedad específica máxima	2.589

Tabla 27. Granulometría mezcla asfáltica MDC-19 + RAP PAVIMENTAR S.A

Tamiz	Combinación	Especificación		Tolerancias	
3/4”	**100**	100	100	100	100
1/2”	**88,5**	80	95	84	92
3/8”	**78,6**	70	88	75	83
No. 4	**53,7**	49	65	50	58
No. 10	**37,1**	29	45	34	40
No. 40	**19,6**	14	25	17	23
No. 80	**10,7**	8	17	8	14
No. 200	**5,5**	4	8	4	7,5

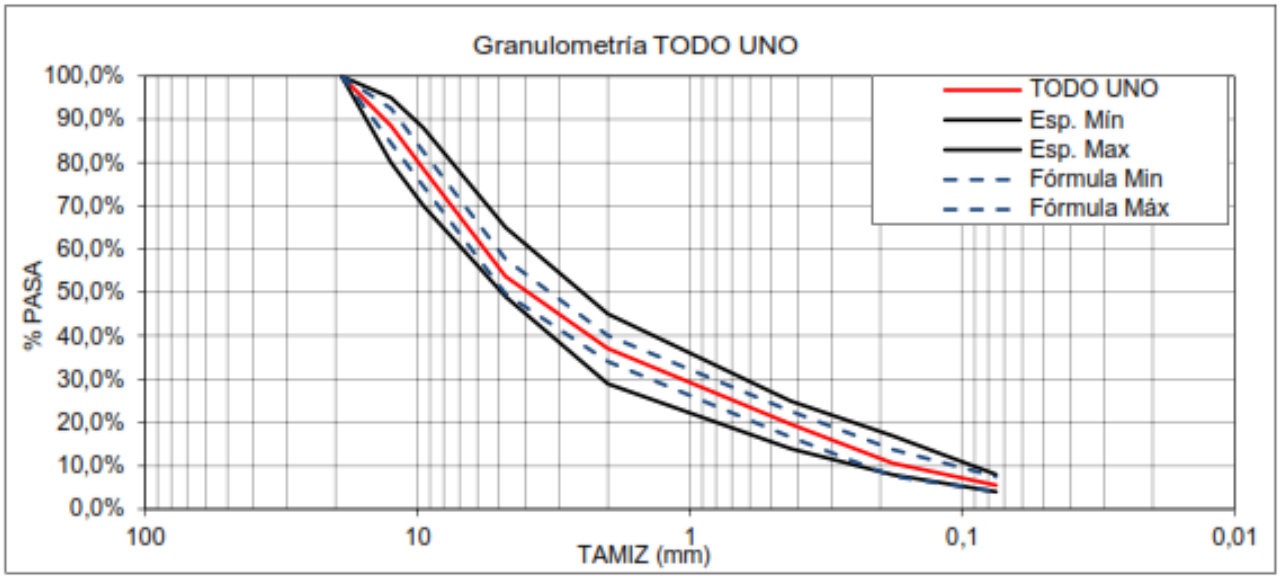


Ilustración 5 Curva granulométrica de diseño para mezcla MDC-19 + RAP PAVIMENTAR S.A

Tabla 28. Dosificación de materiales para gradación MDC-19 + RAP PAVIMENTAR S.A

Material	Triturado de 3/4"	Arena triturada	Arena procesada	Material fresado
Dosificación	22%	35%	28%	15%

- **MDC-19 + RAP de la planta PROCOPAL S.A.**

El diseño presentado cumple con los requerimientos del artículo 450-22 Mezclas asfálticas en caliente de gradación continua (Concreto asfáltico), en cuanto a las propiedades de los agregados y el asfalto que hacen parte de la mezcla asfáltica.

Una vez revisado el diseño por la empresa INTEINSA PAVIMENTOS, se requirió al contratista ajustar los diseños de acuerdo a las siguientes observaciones:

- ✓ En cuanto a los parámetros de diseño, el rango tomado para los vacíos con aire fue entre 3% y 5%, el Invías emitió fe de errata, donde este rango debe ser entre 4% y 6%, por lo tanto, en el diseño se debe realizar el ajuste en cuanto a este parámetro y determinar si afecta o no la obtención del contenido óptimo de asfalto de la mezcla.
- ✓ Para la verificación del diseño preliminar, la especificación del Invías en el numeral 450.4.2.2.2, estipula que se deben realizar los ensayos que se enuncian a continuación,

estos ensayos no se presentan en los diseños de las mezclas: Resistencia a la deformación plástica (INV E-756-13); Módulo complejo (UNE-EN 12697-26 AnexoD) y Leyes de fatiga (INV E-808, INV E-784, UNE-EN 12697-24).

Las observaciones en mención fueron remitidas al contratista por medio de correo electrónico de fecha 29 de julio de 2025, respuesta a los comunicados CVM-011 -2025 y CVM-013-2025.


Procedencia de los materiales:

- ✓ Asfalto: Cemento asfáltico de penetración 60/70 normalizado, suministrado por MPI con aditivo reductor de temperatura (MT) y aditivo mejorador de adherencia.
- ✓ Materiales pétreos: Procopal, planta Girardota.

La Fórmula de Trabajo queda definida por los siguientes parámetros:

Tabla 29. Fórmula de trabajo mezcla asfáltica MDC-19 + RAP PROCOPAL S.A

Parámetro	***Fórmula de trabajo***	***Especificación INVÍAS Mezcla Tibia MDC-19 Rodadura - Art. 450-22/462-22***	
		Tránsito NT2	***Tránsito NT3***
Número de golpes por cara	***75***	*75*	*75*
Contenido óptimo de asfalto total (%CAME), %	***5.6%***		
Contenido de asfalto 60-70 MT a adicionar (%MBA), %	***4.85%***		
Contenido de asfalto que aporta el RAP (%MBR)	***0.75%***		
Gravedad específica bulk de la mezcla	***2.420***	-	-
Gravedad específica teórica máxima	***2.530***	-	-
Estabilidad Marshall	***11896 N***	*≥ 7500 N*	*≥ 9000 N*
Fluencia	***3.37 mm***	*2 mm-4 mm*	*2 mm-3.5 mm*
Vacíos con aire	***4.4%***	*3% - 5%*	*3% - 5%*
Vacíos en los agregados minerales	***15.8%***	*≥ 15%*	*≥ 15%*
Vacíos llenos con asfalto	***72.4%***	*65% - 78%*	*65% - 75%*
Relación llenante/ligante efectivo	***1.19***	*0.8 a 1.2*	*0.8 a 1.2*
Relación estabilidad/flujo	***3.5 kN/mm***	*3 a 5 kN/mm*	*3 a 6 kN/mm*
Espesor promedio de película de asfalto	*8 μm*	*≥ 7.5 μm*	*≥ 7.5 μm*
Adherencia, resistencia retenida en tracción indirecta	***83%***	*≥ 80%*	*≥ 80%*

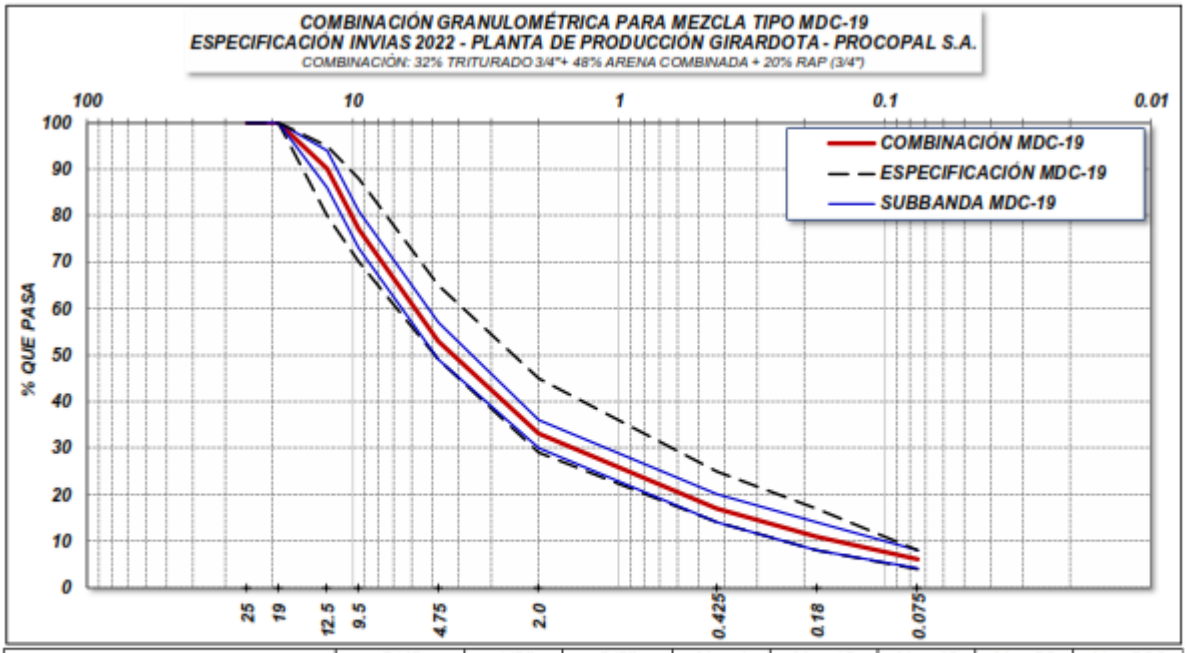

Tamiz	3/4"	1/2"	3/8"	No. 4	No. 10	No. 40	No. 80	No. 200
	19	12.5	9.5	4.75	2.0	0.425	0.18	0.075
% que pasa	**100**	**90**	**77**	**53**	**33**	**17**	**11**	**6.1**
MDC-19 Límite inferior	100	80	70	49	29	14	8	4
MDC-19 Límite superior	100	95	88	65	45	25	17	8

Ilustración 6 Curva granulométrica de diseño para mezcla MDC-19 + RAP PROCOPAL S.A

Tabla 30. Dosificación de materiales para gradación MDC-19 + RAP PROCOPAL S.A

Material	***Triturado ¾"***	***Arena mezclada***	***Material reciclado -RAP ¾"***
Proporciones	***32%***	***48%***	***20%***

- **MSC-19 + RAP de la planta PROCOPAL S.A.**

El diseño presentado cumple con los requerimientos del artículo 450-22 Mezclas asfálticas en caliente de gradación continua (Concreto asfáltico), en cuanto a las propiedades de los agregados y el asfalto que hacen parte de la mezcla asfáltica.

Una vez revisado el diseño por la empresa INTEINSA PAVIMENTOS, se requirió al contratista ajustar los diseños de acuerdo a las siguientes observaciones:

- ✓ En cuanto a los parámetros de diseño, el rango tomado para los vacíos con aire fue entre 3% y 5%, el Invías emitió fe de errata, donde este rango debe ser entre 4% y 6%, por lo tanto, en el diseño se debe realizar el ajuste en cuanto a este parámetro y determinar si afecta o no la obtención del contenido óptimo de asfalto de la mezcla.

- ✓ Para la verificación del diseño preliminar, la especificación del Invías en el numeral 450.4.2.2.2, estipula que se deben realizar los ensayos que se enuncian a continuación, estos ensayos no se presentan en los diseños de las mezclas: Resistencia a la deformación plástica (INV E-756-13); Módulo complejo (UNE-EN 12697-26 Anexo D) y Leyes de fatiga (INV E-808, INV E-784, UNE-EN 12697-24)).

Las observaciones en mención fueron remitidas al contratista por medio de correo electrónico de fecha 29 de julio de 2025, respuesta a los comunicados CVM-011 -2025 y CVM-013-2025.

Procedencia de los materiales:

- ✓ Asfalto: Cemento asfáltico normalizado 60-70 aditivado M.T. (reductor de temperatura) + 0.8% M.A. (mejorador de adherencia), suministrado por MPI.


- ✓ Materiales pétreos: Procopal, planta Girardota.

La Fórmula de Trabajo queda definida por los siguientes parámetros:

Tabla 31. Fórmula de trabajo mezcla asfáltica MSC-19 + RAP PROCOPAL S.A

Parámetro	***Fórmula de trabajo***	***Especificación INVÍAS Mezcla Tibia MSC-19 Rodadura - Art. 450-22/462-22***	
		Tránsito NT2	***Tránsito NT3***
Número de golpes por cara	***75***	*75*	*75*
Contenido óptimo de asfalto total (%CAME), %	***5.5%***		
Contenido de asfalto 60-70 MT a adicionar (%MBA), %	***4.74%***		
Contenido de asfalto que aporta el RAP (%MBR)	***0.76%***		
Gravedad específica bulk de la mezcla	***2.400***	-	-
Gravedad específica teórica máxima	***2.516***	-	-
Estabilidad Marshall	***11182 N***	*≥ 7500 N*	*≥ 9000 N*
Fluencia	***3.38 mm***	*2 mm-4 mm*	*2 mm-3.5 mm*

Parámetro	***Fórmula de trabajo***	***Especificación INVÍAS Mezcla Tibia MSC-19 Rodadura - Art. 450-22/462-22***	
		Tránsito NT2	***Tránsito NT3***
Vacíos con aire	***4.6%***	*3% - 5%*	*3% - 5%*
Vacíos en los agregados minerales	***16.7%***	*≥ 15%*	*≥ 15%*
Vacíos llenos con asfalto	***72.3%***	*65% - 78%*	*65% - 75%*
Relación llenante/ligante efectivo	***1.06***	*0.8 a 1.2*	*0.8 a 1.2*
Relación estabilidad/flujo	***3.3 kN/mm***	*3 a 5 kN/mm*	*3 a 6 kN/mm*
Espesor promedio de película de asfalto	*9 µm*	*≥ 7.5 µm*	*≥ 7.5 µm*
Adherencia, resistencia retenida en tracción indirecta	***86%***	*≥ 80%*	*≥ 80%*

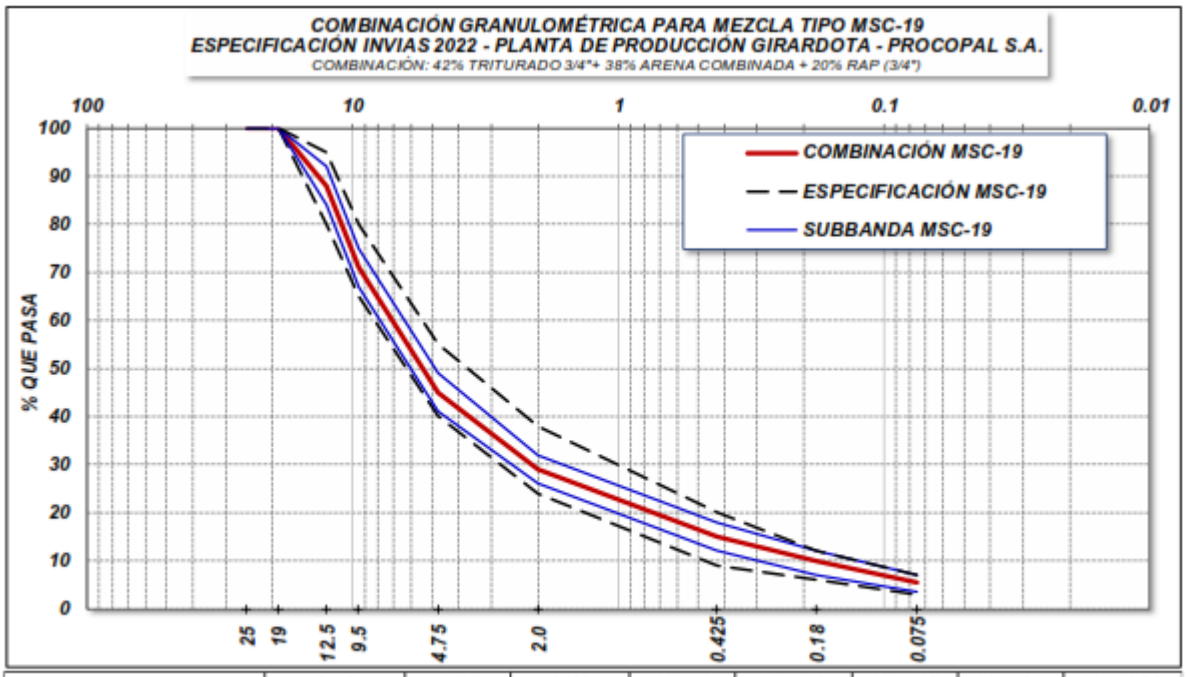

Tamiz	3/4"	1/2"	3/8"	No. 4	No. 10	No. 40	No. 80	No. 200
	19	12.5	9.5	4.75	2.0	0.425	0.18	0.075
% que pasa	**100**	**88**	**71**	**45**	**29**	**15**	**10**	**5.5**

Ilustración 7 Curva granulométrica de diseño para mezcla MSC-19 + RAP PROCOPAL S.A

Tabla 32. Dosificación de materiales para gradación MSC-19 + RAP PROCOPAL S.A

Material	Triturado de 3/4"	Arena triturada	Arena procesada	Material fresado
Dosificación	30%	30%	15%	25%

El contratista CONSORCIO VIALMED 2025 realizó igualmente la entrega del diseño de la mezcla asfáltica tibia tipo MAM-25 producida por la empresa PAVIMENTAR S.A, la cual cumple con los requerimientos del artículo 450-22 Mezclas asfálticas en caliente de gradación continua (Concreto asfáltico), en cuanto a las propiedades de los agregados y el asfalto que hacen parte de la mezcla asfáltica.

- **MAM-25 de la planta PAVIMENTAR S.A.**

Procedencia de los materiales:

- ✓ La planta de mezclas objeto del presente diseño posee cuatro subtipos de agregados: Triturado 1", Arena de trituración, Arena Procesada y Filler aportado por el extractor de finos de la planta Astec y producto de los finos en exceso de los materiales que integran la mezcla de la planta Copacabana (Antioquia).

- ✓ Como ligante asfáltico se ha usado asfalto CAM-1.

La Fórmula de Trabajo queda definida por los siguientes parámetros:

Tabla 33. Fórmula de trabajo mezcla asfáltica MAM-25 PAVIMENTAR S.A

Parámetro	Especificación Invias artículo 450-22
Contenido óptimo de asfalto (%)	5
Densidad Bulk (g/cm3)	2.473
Estabilidad (N)	16537
Flujo (mm)	2,7
Estabilidad/Flujo (kN/mm)	6,1
Vacíos con aire (%)	4,6
Vacíos en los agregados (%)	16,1
Vacíos llenos con asfalto (%)	70,8
Relación llenante/ligante efectivo	1,3
Concentración real del llenante	0,33
Espesor promedio de película de asfalto (µm)	8,1
Gravedad específica máxima	2.593

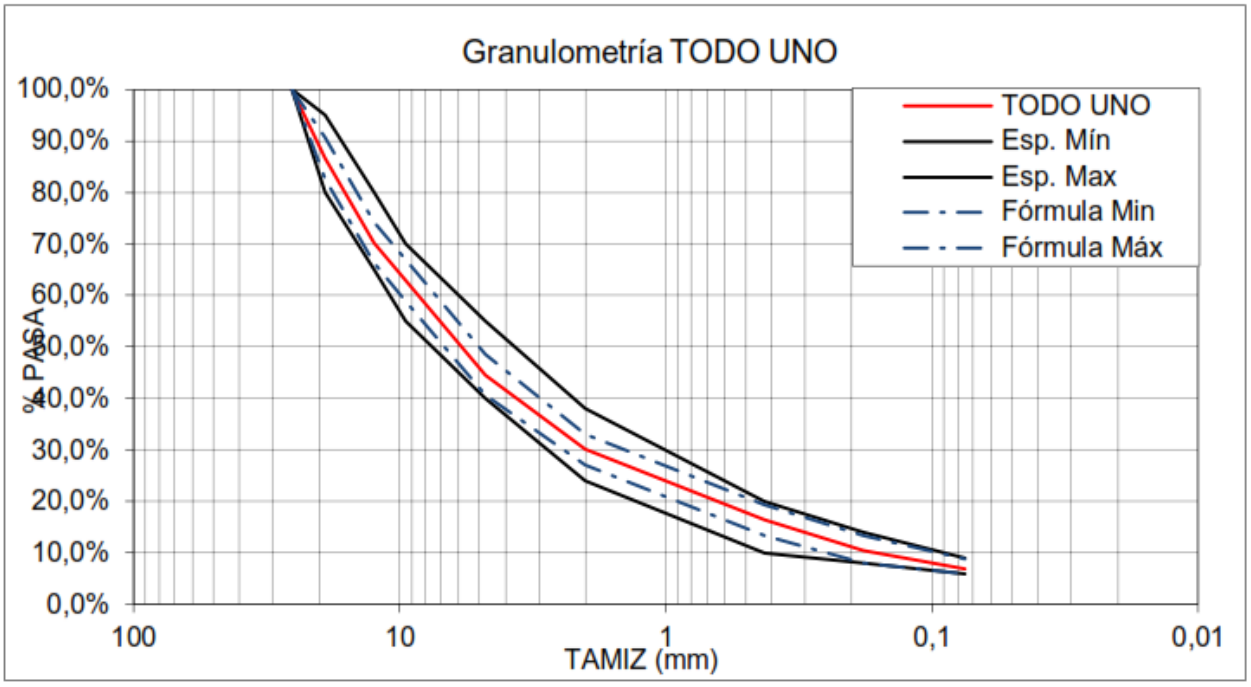


Ilustración 8 Curva granulométrica de diseño para mezcla MAM-25 PAVIMENTAR S.A

Tabla 2. Dosificación de materiales para gradación MAM -25 PAVIMENTAR S.A

Material	Triturado de 1"	Arena triturada	Arena procesada	Filler Planta Astec
Dosificación	45%	39%	13%	2,8%

Para la ejecución del contrato en las actividades relacionadas con pavimentación, la Secretaría de Infraestructura Física cuenta con varias alternativas de diseño, para tramos y corredores de vías que requieren rehabilitación de la estructura. Estas alternativas fueron elaboradas por la firma Inteinsa Pavimentos y son relacionadas a continuación:

- ✓ Rediseño de la rehabilitación de la intersección de la calle 50 “Av Colombia” con la carrera 52 “Carabobo” Medellín, Antioquia.
- ✓ Estudio y diseño de alternativas de rehabilitación del corredor Avenida Poblado entre calle 10 y calle 7 sur Medellín, Antioquia.
- ✓ Estudio y diseño de alternativas de rehabilitación de la calle 10A entre carreras 36 y 43D.
- ✓ Estudio y diseño de alternativas de rehabilitación de la avenida regional entre puente guayaquil y avenida 33 Medellín, Antioquia.

3 INFORME DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, DE LOS CONTRATOS DE EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA:

A continuación relacionamos las actividades ejecutadas por parte de la Interventoría en cumplimiento de la ejecución del contrato de obra, supervisando todo lo concerniente al cumplimiento de la Normatividad Ambiental vigente en el país , el cumplimiento del PASAO en aspectos ambientales , sociales y SST; en el periodo ejecutado se pudo verificar que no se han ocasionado impactos ambientales de mayor relevancia sobre el medio ambiente, los recursos naturales y la comunidad del área de influencia del proyecto.

3.1 INFORME SOCIAL:

Actividades de la interventoría relacionadas con la verificación, monitoreo y seguimientode la ejecución del componente social, en el contrato de ejecución de obra pública.

Para la entrega de informes por parte del equipo social del contratista, se acordó que se hará el corte al 25 de cada mes, con el fin de dar cumplimiento en la entrega del informe a interventoría.

3.1.1. ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORÍA RELACIONADAS CON LA VERIFICACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL, EN EL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA

Desde el componente social de la interventoría se realiza el seguimiento y la verificación del cumplimiento del Plan de Acción Socio Ambiental, propuesto por el contratista de obra, el Consorcio VIALMED 2025, este plan de acción constituye un instrumento básico para la gestión social que debe cumplirse durante las actividades constructivas de la "**REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA"** evitándose de esta forma, alteraciones ambientales, sociales y laborales en el marco del proyecto.

Seguimiento al plan de gestión social en obra: Periodo reportado del 1 de agosto al 31 de agosto del 2025

En el documento "PASAO" se plasmaron las diferentes estrategias y actividades sociales que se desarrollan durante la ejecución del proyecto Malla Vial en los diferentes programas, los cuales se relacionan a continuación.

Seguimiento etapa previa al inicio de obra: Acompañamiento y verificación del levantamiento de actas de vecindad y entorno.

Actas de Vecindad:

El área técnica del contratista se encargó en este periodo de identificar las viviendas a las cuales se les levantaría el acta de vecindad, además de realizar el registro fotográfico y el diligenciamiento del formato. Desde el área social tanto de la interventoría como del contratista se realizó un acercamiento inicial a los propietarios e inquilinos, donde se les informó sobre las actividades de obra y el procedimiento de actas de vecindad, se explicó el objetivo de esta y se procedió a agendar cita de levantamiento del acta. El día del levantamiento del acta, se acompañó a los técnicos en el diligenciamiento del formato del acta de vecindad.

El Consorcio VIALMED2025 en este periodo realizó levantamiento de actas de vecindad de la siguiente manera:

Tabla 35. Consolidado de Actas de Vecindad.

CONSOLIDADO DE ACTAS DE VECINDAD			
Ubicación (dirección del frente)	**Frente #**	**Cantidad**	**Fecha de levantamiento**
Buenos aires-calle 45 con carrera 2oc	15	24	14/08/2025
Buenos aires-carrera 22 con cale 45	15	14	22/08/2025
Calle 95 con carrera 68	16	36	15/08/2025
Carrera 69 con calle 95	16	41	16/08/2025
TOTAL		**115**	

Observación: El contratista de obra en el informe mensual agosto no presentó los formatos diligenciados de cada una de las actas levantadas, presentó registros fotográficos. Por tal motivo los anexos digitales de los formatos de las actas de vecindad levantadas en este periodo se presentarán a la entidad contratante cuando el contratista de obra aporte la información completa.

Actas de Entorno: Con esta actividad se pretende garantizar el bienestar de la comunidad, sus inmuebles y su entorno; además de evitar futuras reclamaciones que no tengan que ver con los trabajos ejecutados. La interventoría realizó el respectivo acompañamiento al diligenciamiento de esta actividad por el área técnica del contratista y de la interventoría para su respectiva verificación y cumplimiento.

En **agosto de 2025** el contratista Consorcio VialMed 2025**,** realizó levantamiento de actas de entorno de la siguiente manera:

Tabla 36. Consolidado Actas de Entorno.

CONSOLIDADO DE ACTAS DE ENTORNO			
Corregimiento/o dirección	**Frente #**	**Fecha de realización**	**Observación general de lo encontrado**
Calle 45C entre la calle 46 y carrera 21-Miraflores-Buenos Aires	15	19/08/2025	N/A
Carrera 22 entre calle 45 a carrera 23-Miraflores-Buenos Aires	15	22/08/2025	Accesos a Parqueaderos con Afectaciones
Carrera 47 entre calle 53 y 52-Candelaria	16	25/08/2025	N/A
Carrera 68 entre calle 45 y 96. Calle 95 entre carrera 69 y 68 Castilla	16	20/08/2025	N/A

Observación: El contratista de obra en el informe mensual de agosto no presentó los formatos diligenciados de cada una de las actas de entorno levantadas, presentó registros fotográficos. Por tal motivo los anexos digitales de los formatos de las actas levantadas en este periodo se presentarán a la entidad contratante cuando el contratista de obra aporte la información completa.

Programa de Información y Comunicación a la Comunidad:

Con el objetivo de posibilitar la información y participación de los ciudadanos en las diversas actividades programadas por el contratista, en este periodo se diseñaron piezas informativas físicas y digitales, las cuales fueron entregadas a la comunidad ubicada en la zona de influencia directa del proyecto. Con el fin de que estén informados de aspectos relevantes e importantes de las obras de mantenimiento que se vienen adelantando. Las piezas comunicacionales son revisadas oportunamente por la interventoría y enviadas a la supervisión y el área de comunicaciones de la secretaría de infraestructura física del Distrito de Medellín para su revisión y aprobación.

Para este periodo se realizó el diseño de varias Circulares Informativas, por el contratista y la interventoría realizó su respectiva revisión. También se diseñó la propuesta de un afiche genérico que será instalado en los lugares estratégicos de las diferentes comunas donde se esté trabajando.

Igualmente, el contratista definió un Plan de Divulgación en dos niveles y se definieron las piezas comunicacionales y acciones a ejecutar en cada caso. Se realizó la impresión de 3.000 volantes generales sobre las actividades de obra.

Se realizaron las entregas de piezas comunicativas que se relaciona a continuación, las cuales fueron entregadas de acuerdo con la dinámica de la obra. La interventoría realizó el acompañamiento en la entrega de cada una de estas piezas a la comunidad.

Piezas Comunicacionales generadas en este periodo.

Tabla 37. Relación de circulares:

Nro.	FECHA	Dirección	Frente De Obra	Circulares Impresas
1	15/08/2025	Castilla: Carrera 69 entre calles 95 y 96. Calle 95 entre carreras 68 y 69	15	100
2	20/08/2025	Guayabal La Colina: Carrera 53 x 12AA sur	6	100
3	21/08/2025	Corregimiento San Cristóbal, vereda La Loma Carrera 125 con calle 54, Calle 54 con carrera 121	1	100
4	22/08/2025	Buenos Aires - El Vergel, carrera 21 entre calles 45C y 46, carrera 22 entre calles 44 y 46	15	100
5	22/08/2025	Centro Carrera 47 (Sucre) entre calles 53 Maracaibo y 52 La Playa, calle 53 Maracaibo entre carreras 46 Av. Oriental y 47 Sucre.	16	100
6	29/08/2025	El Poblado, Calle 10A entre carreras 36 y 43D Av. El Poblado	16	100
7	29/08/2025 30/08/2025	El Poblado Calle 10A entre carreras 36 y 43D Av. El Poblado	16	200
8	29/08/2025	Guayabal Cristo Rey	2	100
		Total, circulares: 8		900

Ver anexo 3.1.1 Programa comunicación e información a la comunidad: 2. Circulares.

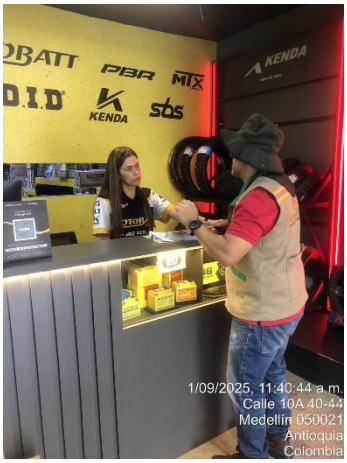
	
Circular diseñada y entregada en El Poblado	Entrega de la circular informativa

Tabla 38. Relación de volantes:


No	Fecha	Dirección	Frente de obra	Volantes
1	28/08/2025	Laureles Segundo Parque	15	100
2	28/08/2025	El Poblado Calle 5 Sur – Loma Los González	15	100
3	29/08/2025 30/08/2025	El Poblado Calle 10A	16	100
		Total, volantes:		300

Ver anexo 3.1.2 Programa comunicación e información a la comunidad: 3. Volantes.

	
Volante general de actividades de obra	Entrega de volante en Buenos Aires

Valla Tijera de obra:

Pieza de comunicación externa de 1x1mt doble cara que contiene los elementos básicos del contrato: descripción y correo electrónico. El contratista garantiza que la pieza permanezca instalada en los frentes de trabajo que están activos. La interventoría realizó seguimiento de la instalación de la valla en cada uno de los frentes de obra. Durante este periodo la valla tijera estuvo presente en 16 frentes de obra.

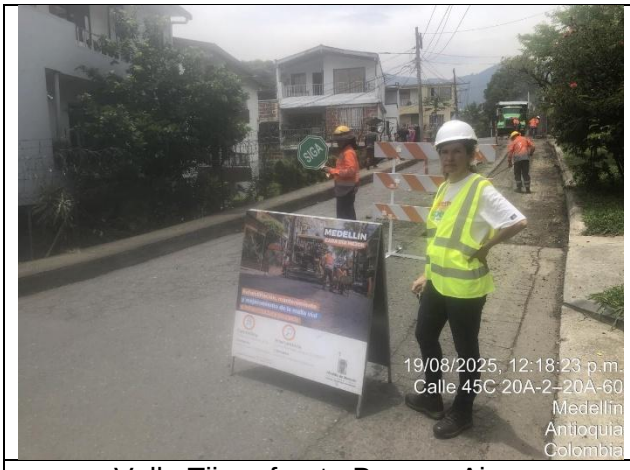	
Valla Tijera frente Buenos Aires	Valla Tijera cuadrilla 11 Laureles

Ver anexo: 3.1.3 Programa comunicación e información a la comunidad: 4. Valla Tijeras.
E-Card: Durante el periodo **agosto de 2025** se compartió una E-Card con los residentes del sector de la Loma de los González quienes fueron contactados por WhatsApp.

El Poblado Calle 5 Sur – Loma Los González; Frente #15 Entrega 28 agosto	

Ver anexo 3.1.4 Programa comunicación e información a la comunidad: 5. E Card

Pasacalle: Se realizó la Instalación de un pasacalle correspondiente a la intervención de Rango 4 (masivo) en la Calle 10A entre carreras 36 y 43D. La pieza contó con las siguientes características: lona impresa full color, tamaño: 90 cms de alto x 9 mts de ancho. Instalado en el cruce de la calle 10A con carrera 34. Incluye su producción, instalación y desinstalación.



Pasacalle: Calle 10A entre carreras 36 y 43D

Ver anexo 3.1.5 Programa comunicación e información a la comunidad: 6. Pasacalles.

Subprograma de resolución de conflictos:

PQRS:

Esta estrategia es un subprograma enmarcado en el programa de comunicación e información, se relaciona con la instalación del buzón de sugerencias y la oficina de atención a la comunidad, línea telefónica (3112412362) y el correo electrónico mallavialmedellin2025@gmail.com, a través de los cuales se canalizarán las peticiones, quejas, reclamos o sugerencias (PQRS) y demás situaciones con comunidad que requieran atención directa por parte del proyecto.

Para la recepción de PQRS, el contratista dispone de los formatos establecidos por la entidad contratante y se contemplan los plazos establecidos para cada una de las situaciones que se presenten. En el mes de **agosto 2025** se realizó atención 2 PQRS y el cierre de 2 PQRS a través de correo Electrónico, las cuales se relaciona a continuación:

Tabla 39. Relación de PQRS:

No	Fecha	Ciudadano	Tipo de Atención	Descripción	Estado
1	31/07/2025	María Paula Arbeláez – Atención.	Queja	Manchas de ropa y vehículo con emulsión	En proceso
2	31/07/2025	Angy Plata	Queja	Daño de puerta de vidrio en establecimiento comercial	Cerrada
3	5/08/2025	Carmen Hernández Bedoya	Solicitud	Solicitud de intervención Malla Vial en zona del sector donde reside.	Cerrada
4	21/08/2025	Nora Quintana	Queja	Afectaciones físicas a 2 menores de edad. Con material de obra	Cerrada

Tabla 40. Indicador de PQRS

Indicador	
Estado	Atención de PQRSD
En proceso	Nro. Total de Atenciones Brindadas 3 = 75 % Nro. Total de Atenciones Recibidas 4

Ver anexo 3.1.6 Programa comunicación e información a la comunidad: 7. PQRS

Programa participación comunitaria: El objetivo de este programa es garantizar que la comunidad tenga la oportunidad de participación, mediante acciones de información, consulta y concertaciones permanentes, durante el desarrollo de la obra.


Reunión de Inicio de Obra: En este periodo no se realizaron reuniones con la comunidad debido a que las actividades constructivas de obra fueron clasificadas como: mediáticas y rango 0 y 1 estas condiciones no requieren Reuniones con la comunidad. Estas reuniones se realizarán cuando las intervenciones tengan un periodo de tiempo mayor a un mes.

Socializaciones: Durante el periodo correspondiente a este informe se realizaron permanentes visitas a los frentes de obra y se han realizado diferentes socializaciones puerta a puerta para informar sobre las actividades de obra.

Tabla 41. Consolidado de socializaciones durante el mes:

No	Fecha	Dirección	Actividad	No. Participantes	Desarrollo
1	13/08/2025	Carrera 21 con calle 45-Buenos Aires	Socialización Inicio de Obra	6	Entrega de Circular-Puerta a Puerta
2	20/08/2025	Carrera 53 con calle 12 A y B	Socialización Inicio de Obra	12	Entrega de Circular-Puerta a Puerta
3	21/08/2025	Belencito Corazón	Parqueo de Vehículos	3	Entrega de Circular-Puerta a Puerta
4	22/08/2025	Carrera 22 con calle 45-Buenos Aires	Socialización Inicio de Obra y realización de actas de vecindad	30	Entrega de Circular-Puerta a Puerta
5	22/08/2025	Carrera 47 con la calle 52-Candelaria	Socialización Inicio de Obra	13	Entrega de Circular-Puerta a Puerta
6	28/08/2025	Calle 5 Sur con carrera 35 a la 42-Poblado	Socialización Inicio de Obra	21	Entrega de Circular-Puerta a Puerta
7	28/08/2025	Transversal 39 con 74-Laureles	Socialización Inicio de Obra	12	Entrega de Circular-Puerta a Puerta
8	29/08/2025	Calle 10ª con carrera 36 a la 43	Socialización Inicio de Obra y de actas de vecindad	25	Entrega de Circular-Puerta a Puerta
9	29/08/2025	Carrera 50B con calle 55-Cristo Rey	Socialización Inicio de Obra	5	Entrega de Circular-Puerta a Puerta
10	29/08/2025	Sector Las Violetas	Socialización Inicio de Obra	4	Entrega de Circular-Puerta a Puerta
11	29/08/2025	Sector Las Violetas	Socialización Inicio de Obra	1	Entrega de 10 Circulares-Socialización

Ver anexo 3.1.7 Participación comunitaria: 1. Socializaciones.

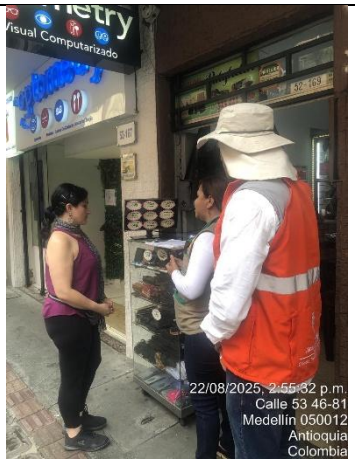	
Socialización con la comunidad en la calle 10A El Poblado, sobre inicio de actividades de obra.	**Socialización con la comunidad en el barrio La Candelaria sobre inicio de actividades de obra.**

Comité Ciudadano de Obra: Durante el periodo reportado no se han conformado los CCO. Estos se conformarán cuando las actividades de obra duren un mes o más en un frente de obra.

Tabla 42. Relación de CCO

Comuna	Fecha	Hora	Lugar	Tema	Asistentes
NA	NA	NA	NA	NA	NA

Programa de la Contratación de Mano de Obra Local

El programa busca la inserción de mano de obra de la zona de influencia directa del proyecto en las obras con el objetivo de promover el desarrollo local y la apropiación del proyecto.

Generación de empleo: A la fecha se han contratado **254** personas, incluyendo los retiros hasta el 30 de agosto. Personal activo trabajando hasta el 30 de agosto son 218 personas, de las cuales 178 son personal operativo y las otras 40 son personal administrativo. Como se evidencia en el cuadro y formato anexo se reportan 27 mujeres contratadas de las cuales 9 están en los cargos de ayudante o auxiliar de tránsito. De la Zona de influencia tenemos 165 personas.

Tabla 43. Consolidado Personal Vinculado Mano de Obra:

Total, de personal vinculado por Mano de Obra Calificada y No Calificada Activa.		**Total, de personal vinculado por género**	
Mano de Obra Calificada	40	Mujeres	27
Mano de Obra No Calificada	178	Hombres	191
Empleos generados en el área de influencia	165	**TOTAL**	218
Total, Personal Vinculado Activo	218		

Ver anexo 3.1.8 Programa de la Contratación de Mano de Obra: Consolidado Empleabilidad.

Programa de Formación y Capacitación:

El contratista garantiza al personal en obra un espacio mensual en el que reciba información relacionada con las actividades de obra. En este periodo se realizaron capacitaciones con el tema de: Relaciones Interpersonales, en diferentes frentes de obra, adicionalmente se realizó una inducción al personal que va ingresando al proyecto, de la siguiente manera:

Tabla 44. Consolidado de inducciones y capacitaciones al personal:

Nro.	**Fecha**	**Frente de obra**	**Personas Capacitadas**	**Tema**
1	04/08/2025	Administrativo	6	Inducción: Programas del área social
2	05/08/2025	10	13	Relaciones Interpersonales
3	5/08/2025	5	11	Relaciones Interpersonales
4	12/08//2025	7	10	Relaciones Interpersonales
5	13/08/2025	4	11	Relaciones Interpersonales
6	19/08/2025	15	9	Relaciones Interpersonales
7	21/08/2025	6	11	Relaciones Interpersonales
8	23/08/2025	2	10	Relaciones Interpersonales

Tabla 45. Indicador de cumplimiento capacitaciones:

Cumplimiento capacitaciones
Nro. Capacitaciones Programadas 8 = 100% Nro. Capacitaciones Realizadas 8

Ver Anexo 3.1.9 Programa de Formación Comunitaria: 1. Inducciones, 2. Capacitaciones.

	
Capacitación al personal de obra: Cuadrilla 5.	Capacitación al personal de obra: Cuadrilla 7

Programa de Sostenibilidad y Calidad de la Obra:

Con el objetivo de fomentar la apropiación de las obras, de establecer canales comunicacionales, permitir el acercamiento a los grupos de interés y la creación de conciencia ciudadana respecto al cuidado y conservación de la infraestructura del espacio público, el contratista de desarrollará capacitaciones a grupos poblacionales que participen activa y voluntariamente de los diferentes espacios de encuentro que se generen desde el área social del proyecto y se apersonen de las obras ejecutadas. En este periodo no se han realizado actividades de sostenibilidad.

Tabla 46. Reuniones de sostenibilidad

Nro.	Fecha	comuna	Personas Capacitadas	Tema	Cumplimiento capacitaciones
NA	NA	NA	NA	NA	Nro. Capacitaciones Programadas 0 = 100% Nro. Capacitaciones Realizadas 0
Total, Personas capacitadas			NA	NA	

Actividades de la interventoría relacionadas con la ejecución del componente social, al interior del contrato.

Recorridos de seguimiento a la gestión social en la obra

El componente social de la interventoría realizó recorridos por los diferentes frentes de obra para hacer seguimiento a la gestión social en obra y dar recomendaciones sobre los aspectos relacionados con la mitigación de impactos a la comunidad.

Con la profesional social por parte de la Alcaldía de Medellín, se realizaron 3 recorridos por los diferentes frentes de obra para revisar las actividades del componente social: como piezas comunicacionales, atención a la comunidad, entre otras, como se describe a continuación.

Tabla 47. Recorridos Sociales realizados:

Semana	Observaciones
13/08/2025	Recorrido social de obra: CUADRILLA 10 - Barrio Trinidad Comuna 15, Cuadrilla 6- Corregimiento de AltaVista, Medellín. verificación de instalación de vallas tijeras y lonas para vehículos del contratista. Acompañamiento en campo en gestión social.
21/08/2025	Recorrido social de obra: CUADRILLA 11 – Laureles, Buenos Aires y Castilla. verificación de instalación de vallas tijeras y lonas para vehículos del contratista. Acompañamiento en campo en gestión social.
28/08/2025	Recorrido social de obra: en los frentes de obra ubicados en Belén la Palma cuadrilla 14 y en Laureles sector Santa Teresita cuadrilla 12. verificación de instalación de vallas tijeras y lonas para vehículos del contratista. Acompañamiento en campo en gestión social.

Anexos 3.1.10 Recorridos sociales.

	
Recorrido social por el frente de obra del barrio Castilla	Recorrido social por el frente de obra del barrio Miraflores.

Reuniones con el contratista / supervisión.

En el periodo reportado, se realizaron las siguientes reuniones con el equipo social y comunicacional del contratista y la profesional social de la SIF.

Contratista.

- ✓ 11 de agosto de 2025, reunión con la profesional social de la entidad contratante.
- ✓ 28 de agosto de 2025, reunión con comunicadora y profesional social de la entidad contratante.

Tabla 48. Consolidado de reuniones.

Fecha	Lugar	Tema	Participantes
11/08/2025	Piso 9, Alcaldía de Medellín	Se revisó desde el componente social las actividades ejecutadas en campo y las actividades a desarrollar durante el mes de agosto del 2025. Tratando los temas: - Carteleras, Informativas y Buzón PQRS. - Presupuesto social. Reuniones con la Comunidad: Programa de Sostenibilidad Frentes de Obra Masivos.	Margarita Mejía-Profesional social, Alcaldía de Medellín. Interventoría: Catalina Martínez, Luisa Restrepo, Contratista: Víctor Vargas Rodríguez, Doriela Ospina Marulanda. Asney García.

28/08/2025	Piso 9, Alcaldía de Medellín	con el objetivo Coordinar divulgación de PMT y socialización de los frentes masivos. Importancia de la divulgación del PMT. Propuesta de plan de divulgación Responsabilidades del proyecto y la Alcaldía Gestión de insumos y bases de datos. Instrucciones de interventoría.	Vanesa Tobón, comunicadora Secretaría de Infraestructura, Alcaldía de Medellín. Interventoría: Catalina Martínez, Luisa Restrepo, Contratista: Víctor Vargas

Anexos 3.1.11 Actas de reunión.



28/08/2025. Reunión con comunicaciones de la SIF

3.1.2. Actividades de la Interventoría Relacionadas con la Ejecución del Componente Social, al Interior de su Contrato.

A continuación, se describen las actividades de la interventoría desde el componente social, para dar cumplimiento con lo estimado por la Guía de Manejo Socioambiental y demás normas vigentes.

Programa	Descripción de la actividad	Relación del anexo
	En este mes se realizó el diseño de las siguientes piezas comunicativas: 8. Circulares. 1. E Card. 1. Volante. 1. Pasacalle.	**Anexo. 1.** Programa de Información y

Información y comunicación a la comunidad.	16. Vallas Tijeras. Las piezas comunicacionales son revisadas por la interventoría y enviadas a la supervisión y el área de comunicaciones de la secretaría de infraestructura física del Distrito de Medellín para su revisión y aprobación. Asimismo, la interventoría, realizó el acompañamiento para la entrega e instalación de la pieza para la comunidad.	comunicación a la comunidad: 2. Circulares. 3. Volantes. 4. Valla Tijeras. 5. Pasacalle. 6. E Card.
Subprograma de resolución de conflictos	La interventoría realizó el seguimiento a las PQRS recibidas en el contrato por las actividades de obra, se realizó alertas al contratista para realizar su respectivo cierre de acuerdo con los tiempos estipulados, establecidos en guía socioambiental. En el mes de agosto se recibieron 2 PQRS y se realizó el cierre de otras 2, recibidas en el mes de julio del 2025.	**Anexo. 1.** Programa de Información y comunicación a la comunidad: 7. PQRS
Participación comunitaria	Se realizaron 11 socializaciones puerta a puerta, con la entrega de circular informativa en diferentes frentes de obra. La interventoría realizó el respectivo acompañamiento al contratista para la socialización con la comunidad. Evidenciando el cumplimiento de la actividad.	**Anexo 2.** Programa de Participación Comunitaria: 1. Socializaciones.
Contratación de mano de obra local	Para este periodo se reportaron 169 personas de mano de obra local, representando el 75% del total del personal contratado. La interventoría realiza el seguimiento a este personal, garantizando que se cumpla con porcentaje solicitado por la Alcaldía de Medellín.	**Anexo 3.** Programa de la Contratación Mano de obra: Consolidado de Empleabilidad**.** Listado de personal contratado.
Capacitación y formación	Durante este periodo se realizó por parte del contratista 8 capacitaciones al personal de obra y una inducción al personal administrativo. La interventoría acompaño algunas de las capacitaciones, evidenciando su cumplimiento en el tema tratado: Relaciones Interpersonales.	**Anexo 4.** Programa Formación Comunitaria: 1. Inducciones. 2. Capacitaciones.
Sostenibilidad y calidad de la obra	Dado que el contrato no ha superado el 50% de ejecución. Esta actividad se realizará en los próximos meses.	

3.1.3. CONSOLIDADO DE LA GESTIÓN SOCIAL:

GESTION SOCIAL EN OBRA - APLICACIÓN GMSA																						
PERIODO DEL INFORME	CARTELERAS	BUZÓN	PIEZAS COMUNICACIONALES	REUNIÓN INICIO		REUNIÓN AVANCE		REUNIÓN FINAL		COMITÉ CIUDADANO DE OBRA – CCO		RECORRIDOS CON COMUNIDAD		PQRS ATENDIDAS	PQRS X ATENDER	CONTRATACIÓN DE M.O.	CONTRATACIÓN DE M.O. LOCAL	CAPACITACIONES		ACTIVIDADES DE SOSTENIBILIDAD		INFORMES
				# Reuniones	# Asistentes	# Reuniones	# Asistentes	# Reuniones	# Asistentes	# CCO	# Asistentes	# Recorridos	# Asistentes					# Recorridos	# Asistentes	# Actividades	# Asistentes	
Mes 1	0	0	27	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2	2	102	87	1	21	NA	NA	1
Mes 2	0	0	34	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2	2	118	163	7	81	NA	NA	1
Mes 3																						

3.1.4. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES DE LA INTERVENTORÍA, CON RELACIÓN A LAS LABORES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA EN EL DESARROLLO DEL COMPONENTE SOCIAL DE SU CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.

Desde el componente social de la interventoría se reitera la importancia de mantener una comunicación asertiva y constante entre los componentes técnico y social del contratista de obra. Se ha evidenciado en campo que en algunos frentes de obra en rangos 0, 1, 2 y 3 se inician actividades sin informar oportunamente desde el área técnica al área social para hacer un proceso de divulgación en la zona, desconociendo en algunos casos, que previamente debe adelantarse un proceso de socialización con la comunidad. Esta situación genera especial preocupación en frentes de obra ubicados sobre vías de alto tránsito, con fuerte actividad comercial, educativa, o industrial.

3.2 INFORME AMBIENTAL:

A continuación relacionamos las actividades ejecutadas por la empresa contratista Consorcio VIALMED 2025 en el periodo del mes de **agosto 2025,** la Interventoría supervisó todo lo concerniente al cumplimiento de la Normatividad Ambiental vigente en el país, el cumplimiento del PASAO, la guía de manejo socio ambiental para la construcción de obras de infraestructura pública del municipio de Medellín; de igual manera se pudo verificar que no se han ocasionado impactos ambientales de mayor relevancia sobre el medio ambiente, los recursos naturales, las redes de servicios públicos, y la comunidad del área de influencia del proyecto. Esto en concordancia con el tipo de proyecto, de acuerdo con la clasificación de la guía.

3.2.1 Programas Del Plan De Acción Ambiental De La Obra Pública:

Durante el periodo reportado se contó con las siguientes cuadrillas:

Tabla 49. Localización de las cuadrillas en el mes **agosto de 2025.**

CUADRILLA	BARRIO - COMUNA
1	SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES - 14 BARRIO COLOMBIA - 14 LA COLINA - 15 POBLADO - 14 CORAZON DE JESUS - 10 GUAYABAL - 15 EDUARDO SANTOS - 13 LA LOMA - 60
2	ROBLEDO - 7 SAN BERNARDO - 16 CHAGUALO - 10 LOS PINOS - 12 SAN DIEGO - 10 SANTA LUCIA - 12 LORENA - 11 LOS COLORES - 11 VILLA CARLOTA - 14
3	SAN DIEGO - 10 ALEJANDRO ECHAVARRIA - 9 LOS CERROS - 9 TEJELO - 5 LA PIÑUELA - 4 FLORENCIA - 5 LA FRANCIA - 2 LA FRONTERA - 2 ANDALUCIA - 2 SANTA CRUZ - 3 PALERMO - 4
4	EL PROGRESO - 5 NUEVA VILLA - 16 LA GLORIA - 16 DIAMANTE - 7 SAN ANTONIO DE PRADO - 80 FLORENCIA - 5 LA CANDELARIA - 10 VILLA NUEVA - 10

CUADRILLA	BARRIO - COMUNA
	SAN BENITO - 10 BARRIO COLOMBIA - 14
5	UNIVERSIDAD NACIONAL - 7 CORAZON DE JESUS - 10 LA AGUACATALA - 14 CHAGUALO - 10 SAN BENITO - 10 TOSCANA - 5 TRICENTENARIO - 5 BELARCAZAR - 5 MANILA - 14 MORAVIA - 4 TERMINAL DE TRANSPORTE - 5 LA CANDELARIA - 10
6	CAMPO VALDÉS No. 1 - 4 MIRAVALLE - 16 NUEVA VILLA DE ABURRA - 16 ROSALES - 16 TRINIDAD - 15 TRAVESIAS - 60 LAS PLAYAS - 60 LA COLINA - 15 CRISTO REY - 15
7	CUCARACHO - 7 PALENQUE - 7 AREA EXP PAJARITO - 60 SAN GERMAN - 7 SANTA MARGARITA - 7
8	LOS NARANJOS - 14 LA FLORIDA - 14 POBLADO - 14 MANILA - 14 VILLA CARLOTA - 14 LAS LOMAS - 14 ALTO DEL POBLADO - 14 LA PIÑUELA - 4 SAN LUCAS - 14 EL POMAR - 3 SANTA CRUZ - 3
9	LAS MERCEDES - 16 CAMPO ALEGRE - 12 EL DANUBIO - 12 EL CORAZON - 13 EL MORRO - 70
10	ALTAVISTA - 70 EL SALVADOR - 10 ALEJANDRO ECHAVARRIA - 9 BUENOS AIRES - 9 SUCRE - 8
11	LORENA - 11 LAS ACACIAS - 11 LA MOTA - 16 LAURELES - 11
12	CRISTO REY - 15
13	No ha iniciado actividades.
14	BELÉN - 16
15	MIRAFLORES - 9
16	CASTILLA - 5 LA CANDELARIA - 10

ACTIVIDADES DE OBRA DEL PERIODO.

- Demolición de pavimento con martillo neumático y compresor, generación y disposición de rcd.
- Aplicación de emulsión para pavimento.
- Instalación de mezcla asfáltica - actividades de pavimentación.
- Retiro de pavimento en mal estado, por medio mecánico operación de fresadora.
- Aplicación de pavimento por medio mecánico finisher.
- Instalación de señalización para manejo de tránsito y control de movilidad.
- Aplicación de pintura para señalización horizontal.
- Operación de equipos y maquinaria.
- Actividades de manejo Ambiental para aplicación del PASAO y la Guía de Manejo socio Ambiental

Programa	Gestión de la Interventoría	Soporte	Anexo O Formatos
1. Programa para el manejo de los residuos sólidos (comunes, especiales y peligrosos)	Para el periodo de referencia, desde el área ambiental de la Interventoría se realizó seguimiento de las obligaciones establecidas en la ficha de manejo Ambiental, con respecto al correcto manejo de residuos sólidos, se verificó la instalación de los puntos ecológicos en cada uno de los frentes de obra dando cumplimiento a las 4 canecas de color negro, blanco, verde y rojo tal como lo estípula el Decreto 2184 de 2019. Para algunas cuadrillas como la 12 y la 16, eventualmente se solicitó al contratista realizar la provisión de las respectivas bolsas de colores, lo cual fue tramitado por el contratista para dar cumplimiento a esta solicitud. En referencia al manejo de los residuos sólidos que se generan, la disposición final se maneja de la siguiente manera: ● Los residuos sólidos no aprovechables son almacenados temporalmente en las instalaciones de las oficinas de CONSORCIO VIAL MED y entregadas a la EMPRESA VARIAS DE MEDELLIN. Se reportan en el Informe del contratista se reporta 50 kg residuos no aprovechables (ordinarios), para el mes de agosto de 2025.	 **Puntos ecológicos instalados en las cuadrillas**	**Anexo.** **3.2.1.** Planilla de Residuos Sólidos. Planilla de entrega de residuos peligrosos. Planilla de manejo de escombros se encuentra en el informe ambiental contratista. Se entregan remisiones Se entrega certificación de las escombreras del mes de julio de 2025.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Programa	Gestión de la Interventoría	Soporte	Anexo O Formatos
	Los residuos reciclables serán almacenados hasta obtener un volumen considerable para ser entregados a proveedores que realicen actividad de recuperación y reciclaje, o en su defecto a recuperadores de lo cual el contratista deberá hacer la respectiva acta soporte de entrega. Se reportaron 25 kg de reciclable o aprovechable, 50 kg de residuos ordinarios y un total de 75 kg generadores en el mes, reportados en el formato de planilla de generación de residuos sólidos. El contratista reporta disposición de residuos líquidos el mes de agosto por 8,47 m^3 en PTAR San Fernando, ubicada en el distrito de Medellín. Según soporte de recolección suministrado por el contratista, al cual adjunta soporte de entrega de vertimiento en planta de tratamiento de aguas residuales. ● Para el periodo de referencia, el contratista no reporta la disposición de Residuos peligrosos, la información será reportada en el siguiente informe o cuando el contratista haga el reporte de acuerdo con la generación y disposición final de estos residuos. No se entrega reporte de respel.	     **Generación de escombros.**	


Programa	Gestión de la Interventoría	Soporte	Anexo O Formatos
	En lo que respecta al manejo de RCD se manejaron de la siguiente manera: **Escombro: 2553,2 metros cúbicos** Los materiales fueron entregados a PROCOPAL y pavimentar (Procopal SAS 676,2 m3 y en Pavimentar aproximadamente 1,877 m3). **Los acopios de rcd se encontraron generalmente cubiertos con lona o plástico. Eventualmente se solicitó el cubrimiento con plástico de los acopios de rcd, sin embargo, fue acatado oportunamente.** El contratista entrega Certificación de disposición final de RCD mes vencido, por tanto, la de este periodo quedaría pendiente para validar el próximo informe.		
2. Programa para el control de emisiones atmosféricas	Los vehículos que transportaban el material contaban con su respectiva carpa de protección, para evitar dispersión del material particulado. Se verifico la información correspondiente a SOAT, Técnico mecánica, matricula, los cuales se relacionan en planilla control de vehículos y su respectivo anexo. Se realizó seguimiento a la oportuna disposición de RCD generado en los diferentes puntos	  Cubrimiento de carga de volquetas. Las volquetas cumplen con la revisión tecnico mecánica y de emisiones de gases vigente.	**Anexo. 3.2.2**. **No aplica.** **No se entrega información.**

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Programa	Gestión de la Interventoría	Soporte	Anexo O Formatos
	intervenidos, los cuales se retiraron al finalizar la atención de los frentes de trabajo. 4 5 El material de escombro generado fue transportado al finalizar la jornada; por tal sentido en el transcurso del día es debidamente protegido con plástico negro o plástico, para evitar dispersión. En algunos casos, se solicitó el cubrimiento de estos acopios con lona.	      **Protección de escombros, verificación de información y Carpado de volquetas.**	

Programa	Gestión de la Interventoría	Soporte	Anexo O Formatos
		  Actividades de generación de ruido. Entrega de protección auditiva a la comunidad.	
3. Programa para el almacenamiento adecuado de materiales de construcción.	La interventoría ambiental, realizó la respectiva verificación de ingreso de materiales en obra provenientes de canteras certificadas y aprobadas previamente por la interventoría, de acuerdo con lo reportado para el PASAO. Para el periodo de referencia, ingresaron a obra **4182,85 Ton de mezcla asfáltica, distribuidos de la siguiente manera: 978,14ton suministrados por Procopal y 3204,71ton por Pavimentar.** No se generaron acopios temporales de materiales de obra ya que el material se consume en la misma jornada de trabajo programada, generalmente el material requerido para los frentes de obra, permanece dentro de la volqueta, hasta que sea descargado para su uso, esto permite conservar la calidad y temperatura del material, es importante destacar que, en cada frente de trabajo, se contó con la	**Transporte de materiales.**    	**Anexo 3.2.3. Remisiones de materiales ingresados en cada cuadrilla.** **Se entrega planilla de materiales del mes de agosto de 2025.** **Se entrega certificación de las canteras del mes de julio de 2025.**

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Programa	Gestión de la Interventoría	Soporte	Anexo O Formatos
	respectiva señalización y aislamiento del sitio puntual de intervención, en algunos casos puntuales, la interventoría solicitó el retiro de elementos acopiados por los colaboradores en andenes, zonas verdes y bases de árboles, para lo cual el contratista reforzó el tema en los frentes de trabajo. Los materiales suministrados para las actividades constructivas fueron llevados por medio de volquetas, debidamente carpadas e identificadas con el proyecto.	  **Transporte y acopio de materiales.**   **Remisiones de materiales.** **Remisiones de materiales**	
4. Programa para la protección del suelo	Durante el desarrollo de actividades, la interventoría realizó el respectivo seguimiento a la protección del suelo, para lo cual cabe destacar que no se realizaron afectaciones directas al mismo ya que el contratista cubrió con plástico las áreas para descargue de mezcla asfáltica, como protección para evitar afectación con áreas de pavimento en buen estado. El contratista provisionó sus frentes de trabajo con bandeja para manejo de químicos, evitando posibles derrames directos al	 	**Anexo 3.2.4. No aplica. No se incluye información.**

Programa	Gestión de la Interventoría	Soporte	Anexo O Formatos
	suelo, o áreas de pavimento en buen estado. Adicionalmente los derrames accidentales ocurridos fueron atendidos oportunamente. Adicionalmente se realizó la protección del pavimento con plastilona, un material que evita que la mezcla asfáltica deteriore el pavimento de las vías donde se requiere material tal como se ilustra en las imágenes. Esto evita que se solidifique la mezcla sobre el pavimento en buen estado. El contratista realizó el retiro de elementos acopiados en algunos frentes de trabajo en las zonas verdes en cumplimiento de la solicitud de esta interventoría ambiental. La interventoría ambiental se apoya en los Tecnólogos de obra civil, para tramitar requerimientos o solicitudes de la interventoría ambiental en cada una de las cuadrillas.	  **Protección del suelo realizado por el contratista**	
5. Programa para el manejo de sustancias químicas peligrosas en obra	Las sustancias químicas se acopiaron en bandejas provistas para evitar derrame de estas. La interventoría realizó seguimiento a la rotulación de productos químicos de las cuadrillas visitadas, garantizando el cambio por deterioro, adicionalmente la publicación del protocolo de atención de derrames en cada una de las cuadrillas activas, por medio de un código	 	**Anexo 3.2.5**. Formato de Planilla de control de sustancias químicas. se entrega hojas de datos de seguridad de las sustancias químicas utilizadas en el periodo.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Programa	Gestión de la Interventoría	Soporte	Anexo O Formatos
	QR. En los frentes de obra normalmente se encuentra con sustancias químicas como combustibles y emulsión (reportadas en el formato de utilización de sustancias químicas). Se verifica el estado de los recipientes, si se encuentran rotulados, bien cerrados, y se inspeccionan las áreas donde se utilizó dichas sustancias, verificando si hay derrames accidentales, y corroborando si hay disponible kit antiderrames. La interventoría solicita tener especial cuidado en el trasvase de productos químicos para evitar posibles derrames. Se verificó en campo la provisión del respectivo kit para atención de derrames. Para la cuadrilla 8 y 2, se solicitó verificación de compresores que estaban presentando pequeños derrames de aceite, el contratista realice limpieza de los puntos afectados. Los residuos contaminados con este tipo de productos, serán acopiados por el contratista en su bodega principal ubicada en la Carrera 55B #72a-154, Edificio Catleya y dispuestos por la empresa ASEI y ASCRUDOS, las certificaciones de disposición final	    **Evidencia del manejo de sustancias peligrosas**	


Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Programa	Gestión de la Interventoría	Soporte	Anexo O Formatos
	de residuos peligrosos se encuentran pendiente.		
6. Programa para el manejo de maquinaria, vehículos y equipos en la obra	Haciendo seguimiento a lo planteado en el programa dentro del PASAO de obra, la interventoría realizó lo siguiente: ● Se verificó la documentación de la maquinaria, vehículos y equipos que se están utilizando, en el **ANEXO 3.2.6.** Se encuentra la documentación presentada. ● Se solicitó al contratista realizar entrega de las respectivas fichas técnicas y hoja de vida de los diferentes equipos empleados en obra. Se ha entregado información de manera parcializada. Teniendo en cuenta la presentación del contratista del Plan de calidad, el cual consiste en las medidas que en cumplimiento del contratista, respaldan la buenas ejecución de las obras, en cuanto a materiales de calidad garantizada, equipos en buen estado y óptimas condiciones de funcionamiento y personal capacitado y entrenado que pueda realizar las actividades conforme su requerimiento técnico y acabados, así entonces , la interventoría realizó el respectivo control a que los vehículos, equipos y maquinaria empleados no fueran equipos mayores a 20 años, en caso de ser repotenciados se tomó la fecha de dicho proceso. En el	     	**Anexo 3.2.6**. Maquinaria: Se entrega información de la maquinaria en cada una de las cuadrillas. Se entrega listado de equipos y maquinaria, pero no es acorde al formato. La interventoría solicitó la entrega de la información en el formato correspondiente, haciendo caso omiso a dicha solicitud. Vehículos: se entrega documentos de vehículos utilizados en la ejecución del contrato y la información se encuentra en el formato correspondiente.

Programa	Gestión de la Interventoría	Soporte	Anexo O Formatos
	periodo se encontró una volqueta repotenciada. Los equipos y maquinaria con edad superior a 20 años, se solicitó documento de repotenciación, hasta entonces no estaban autorizados. El contratista entrega informe de plan de calidad, donde evidencia el cumplimiento del mismo. Se hizo entrega de la información relacionada con la maquinaria y vehículos. La información de la maquinaria no se presenta en el formato correspondiente.	  **Manejo de maquinaria y equipos**	
7. Programa de prevención de la Contaminación de Cuerpos de Agua y Redes de Servicios Públicos	Durante el periodo, la interventoría verificó que las unidades móviles usadas por el contratista pertenecían al proveedor **Comercializadora SYE y CIA S.A.S.;** la cual cuenta con los permisos pertinentes para llevar a cabo este tipo de actividad, adicionalmente se revisó la información correspondiente a lo siguiente: ● Recibo control de descargue de Aguas Residuales en la PTAR San Fernando. ● Resolución YG5969 donde se lleva a cabo la descarga de las aguas Residuales, en la planta de aguas residuales san Fernando.	   	**Anexo 3.2.7.:** Certificado de recolección de aguas residuales. Certificado de vertimiento en planta de tratamiento de aguas residuales del 1 al 15 de agosto de 2025 y del 16 al 31 de agosto de 2025.

Programa	Gestión de la Interventoría	Soporte	Anexo O Formatos
	En campo, se realizó seguimiento al mantenimiento de las 11 USM, el cual se debe realizar 2 veces por semana. Se verificó la respectiva protección de los sumideros aledaños a los frentes de trabajo, se realiza seguimiento a instrucción de que en rangos 0 a 3, solo se realiza protección y limpieza de lo generado por la obra, en caso de estar colmatados serán reportados a EPM; en rangos superiores el contratista deberá realizar el respectivo mantenimiento del sumidero, independiente si el mismo se encontraba colmatado previo a las intervenciones. En el frente de Castilla cuadrilla 16, y en acompañamiento de la supervisión, se revisaron algunos sumideros que se encontraron colmatados, estos sumideros contaban con rejilla o canastilla para retención de sólidos, se hizo la limpieza de los sumideros de esta cuadrilla, se indica al contratista que debe realizar el reporte a EPM, para verificar el funcionamiento de la red de aguas lluvias de estos sumideros.	    **Actividades de mantenimiento en las unidades sanitarias portátiles en la obra.**  	


Programa	Gestión de la Interventoría	Soporte	Anexo O Formatos
		    **Protección de sumideros y limpieza de sumideros**	
8. Programa para la gestión de la fauna y flora	A la fecha para el desarrollo del contrato, no se cuenta con permisos para intervenciones forestales. El contratista deberá capacitar a su personal, en el manejo de fauna que se pudiese llegar a encontrar en los diferentes frentes de trabajo. La interventoría indica tanto a su equipo de trabajo como al del contratista que está prohibida la intervención de raíces que se puedan llegar a encontrar, de llegarse a presentar estas situaciones, deberán ser	 	**Anexo 3.2.8. No Aplica**

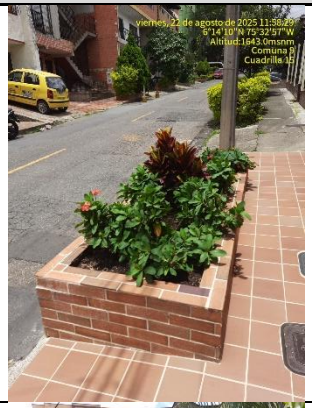Programa	Gestión de la Interventoría	Soporte	Anexo O Formatos
	reportadas a la supervisión ambiental de la SIF. De igual manera la interventoría verificó en campo que no hubiese afectaciones a las especies arbóreas que se encontraban en el área de influencia del proyecto. Se realizó registro fotográfico de las zonas verdes y de los árboles frentes de Castilla y Miraflores, como soporte en caso de que se hiciera una afectación por las actividades ejecutadas.	    **Registro de árboles cerca de los frentes de obra antes del inicio de actividades.**	

Programa	Gestión de la Interventoría	Soporte	Anexo O Formatos
9. Programa para el ahorro y uso eficiente de agua y energía	Se solicitó al contratista los permisos tramitados en EPM para uso de hidrantes de acuerdo a la cuadrilla que laboro en cada sector; además se solicitó medidor de caudal que se conecta al hidrante para verificar el caudal captado y utilizado, en el periodo de referencia el contratista realiza actualización de permisos por temas de facturación. Se recomienda a la empresa contratista hacer un uso eficiente del agua, en todas las cuadrillas y en oficinas.	     	**Anexo 3.2.9.** **Formato de consumo de agua y energía.** Documentación presentada por el contratista referente a la utilización de hidrantes, renovación. Facturas del pago de consumo energía.

Programa	Gestión de la Interventoría	Soporte	Anexo O Formatos
		  **Verificación de la instalación de medidor de caudal Recipientes para agua. Carrotanque.**	
10. Programa para el manejo de campamentos e instalaciones temporales	De acuerdo con la dinámica de trabajo, el contratista cuenta con camiones que hacen las veces de campamento móvil dado que en ellos se almacenan los diferentes elementos y equipos a implementar en el desarrollo de actividades de la jornada laboral, además, cuentan con su bodega principal en Carrera 55B #72a-154, Edificio Catleya, Itagüí, Antioquia. Desde la Interventoría se solicitó al contratista realizar actividades de orden y aseo a los camiones, con el fin de brindar buenas condiciones de almacenamiento y de esta manera también evitar que se presenten accidentes laborales y conservar condiciones de higiene. Se realizó visita de interventoría a la bodega del contratista. Acá se almacenan temporalmente los	   	**Anexo 3.2.10**. Se entrega listado de asistencia de capacitaciones. Se incluye el informe ambiental de actividades realizado por el contratista. No se entrega información de pago de arriendo de oficinas y bodegas.

Programa	Gestión de la Interventoría	Soporte	Anexo O Formatos
	residuos peligrosos (RESPEL), hasta el momento no se ha hecho disposición final de estos, por lo que se hará el reporte una vez se informe sobre dicha disposición. en cumplimiento de la Guía Para la Gestión de residuos Peligrosos del Área Metropolitana del valle de Aburrá, la interventoría por medio de solicitud de la supervisión de la SIF, solicitará los soportes correspondientes sobre la gestión de los mismos, los indicados en la misma guía.	    **Campamentos móviles**  **Andenes despejados.**  **Señalización vertical instalada.**	

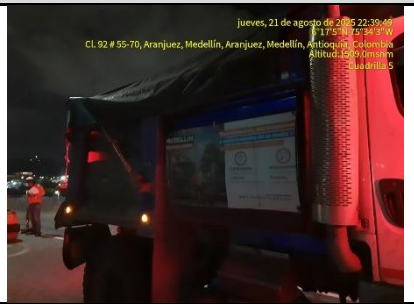Programa	Gestión de la Interventoría	Soporte	Anexo O Formatos
		  **Identificación de vehículos y volquetas.**     Visita de inspección de interventoría de bodega central del contratista.	

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia


Formatos del contratista entregados a la interventoría		
Nombre del Anexo	**Cumplimiento**	
	Si	**No**
Informe Mensual del Contratista	X	
Automotores utilizados en obra	X	
Consumo de agua y energía	X	
Control de sustancias químicas	X	
Maquinaria y equipo	X	
Planillas de escombro	X	
Planilla de residuos sólidos	X	
Registro de Capacitaciones	X	
Registro de tala y trasplante	No aplica	
Suministro de material de construcción	X	

Calificaciones Mensual de la Gestión y Desempeño del Contratista
En términos generales la empresa contratista viene dando cumplimiento a lo estipulado en el Documento PASAO; sin embargo, en el periodo de referencia, se realizaron observaciones en referencia al manejo de sustancias químicas y protección de sumideros
Calificaciones Mensual de la Gestión y Desempeño del Contratista
A continuación, se relaciona el promedio de Evaluación Ambiental por semanas. Semana 4: 92% El promedio de Evaluación Ambiental acumulado para el mes de **agosto** -2025 fue del 92% **Ver el Anexo 3.2.10-3**
Evaluación Del Desempeño Ambiental

Componente	**Porcentaje De Cumplimiento**
Gestión Socio-Ambiental Contractual	94%
Programa Manejo De Residuos Sólidos	96%
Manejo De Residuos Especiales De Construcción	94%
Programa Para El Control De Emisiones Atmosféricas	91%
Programa De Uso Y Almacenamiento De Materiales De Construcción	84%
Programa Para La Protección Del Suelo	100%
Programa Para El Manejo De Sustancias Química Peligrosas	96%
Programa De Manejo De Maquinaria, Equipos Y Vehículos	**86%**
Programa De Prevención De La Contaminación De Cuerpo De Agua Y Redes	91%
Gestión Fauna Y Flora	100%
Ahorro Y Uso Eficiente De Agua Y Energía	97%
Manejo De Campamentos E Instalaciones Temporales	92%
CUMPLIMIENTO DEL COMPONENTE AMBIENTAL	**92%**

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

En términos generales la empresa contratista ha dado cumplimiento a las obligaciones establecidas en el PASAO; sin embargo, es pertinente que se mejoren aspectos relevantes específicamente en relación a la protección de sumideros, protección de suelo y manejo de maquinaria y equipos.
En cuanto al porcentaje del 84% Programa De Uso Y Almacenamiento De Materiales De Construcción, se le hará seguimiento para verificar el mejoramiento de condiciones y de manejo del programa, para garantizar el cumplimiento del mismo, se hará seguimiento a las medidas y se reforzará con las observaciones en campo para toma de acción inmediata.

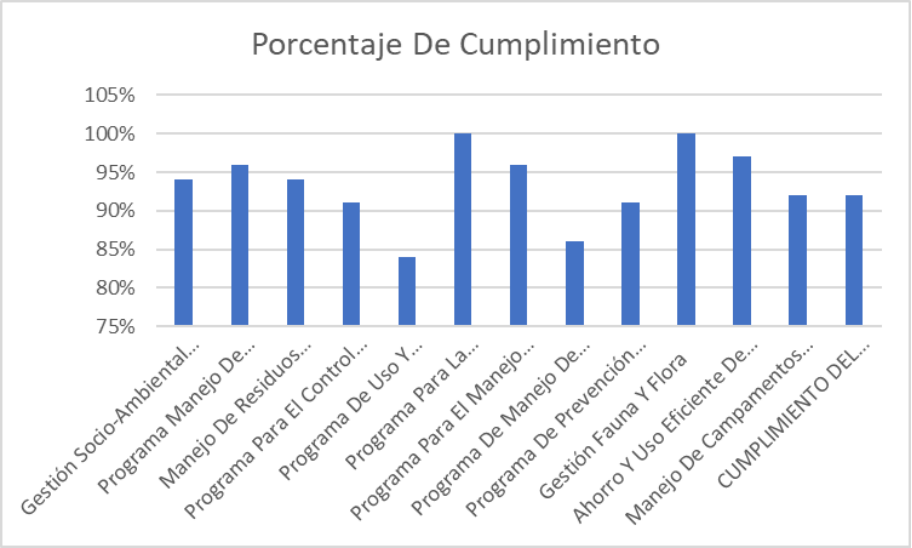

3.2.2 PROGRAMA DE CAPACITACIONES Y/O INDUCCIONES REALIZADAS.

Capacitar al personal en temas ambientales es de suma importancia ya que ellos son los que ejecutan las actividades en obra que de no realizarse de manera adecuada pueda dar a lugar a que se presenten impactos ambientales de carácter permanente; se superviso que el contratista realizara en un lenguaje de sencillo entendimiento y de manera participativa con el fin de lograr que los trabajadores identificaran la importancia del cumplimiento de la Normatividad Ambiental

Tabla 50. Capacitaciones gestión ambiental.

FECHA	TEMA	CANT.PERSONAS	CUADRILLA
25-8-2025	Manejo de residuos sólidos – protección de sumideros.	9	12
25-8-2025	Manejo de residuos sólidos – protección de sumideros.	9	12
27-8-2025	Manejo de residuos sólidos – protección de sumideros.	15	9
27-8-2025	Manejo de residuos sólidos – protección de sumideros.	12	9
23-8-2025	Manejo de residuos sólidos – protección de sumideros	10	2
23-8-2025	Manejo de residuos sólidos – protección de sumideros	10	2

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Sin fecha	**Manejo de residuos sólidos – protección de sumideros**	**11**	**4**
13-8-2025	**Manejo de residuos sólidos – protección de sumideros**	**11**	**4**
8-8-2025	**Manejo de residuos sólidos – protección de sumideros**	**10**	**5**
21-8-2025	**Manejo de residuos sólidos – protección de sumideros**	**11**	**6**
21-8-2025	**Manejo de residuos sólidos – protección de sumideros**	**11**	**6**
12-8-2025	**Manejo de residuos sólidos – protección de sumideros**	**10**	**7**
12-8-2025	**Manejo de residuos sólidos – protección de sumideros**	**10**	**7**
21-8-2025	**Manejo de residuos sólidos – protección de sumideros**	**9**	**1**
21-8-2025	**Manejo de residuos sólidos – protección de sumideros**	**9**	**11**
19-8-2025	**Relaciones interpersonales – recomendaciones con la comunidad. Temas ambientales.**	**9**	**15**
19-8-2025	**Manejo de residuos sólidos – protección de sumideros**	**14**	**16**
19-8-2025	**Manejo de residuos sólidos – protección de sumideros**	**13**	**16**
Sin fecha.	**Manejo residuos.**	**6**	**Oficina consorcio.**
Sin fecha.	**Manejo de residuos sólidos.**	**6**	**Oficina.**
22-8-2025	**Recorderis medidas ambientales pasao.**	**30**	**Oficina.**
		235	

Anexo 3.2.11. Listados de asistencia capacitación e inducciones.





Capacitaciones dirigidas al personal en las diferentes cuadrillas

3.2.3 PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO (FORMATO INDICADORES)

Los Formatos de Interventoría se encuentra el formato de indicadores de Gestión Ambiental, se encuentran relacionados a continuación:

Anexo	Titulo.
3.2.1.	Programa para el manejo de los residuos sólidos (comunes, especiales y peligrosos)
3.2.2.	Programa para el almacenamiento adecuado de materiales de construcción.
3.2.3.	Programa para el control de emisiones atmosféricas

3.2.4.	Programa para la protección del suelo
3.2.5.	Programa para el manejo de sustancias químicas peligrosas en obra
3.2.6.	Programa para el manejo de maquinaria, vehículos y equipos en la obra
3.2.7.	Programa de prevención de la Contaminación de Cuerpos de Agua y Redes de Servicios Públicos
3.2.8.	Programa para la gestión de la fauna y flora
3.2.9.	Programa para el ahorro y uso eficiente de agua y energía
3.2.10.	Programa para el manejo de campamentos e instalaciones temporales
3.2.11.	Formatos ambientales de la interventoría.

3.2.4 Seguimiento al Presupuesto Ambiental (Formato Vigente).

En este periodo el contratista se reporta inversión ambiental ejecutada:
Valor Presupuesto $ 572.064.162,00
Valor cobrado en Acta 2: $ 63.106.160,37

APLICACIÓN DE GUÍA SOCIOAMBIENTAL									
ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACTA - 2				
GESTIÓN AMBIENTAL					CANTIDAD	VALOR ACTA	CANTIDAD DISPONIBLE	VALOR DISPONIBLE	OBSERVACIONES
Manejo de residuos sólidos									
Canecas de 5 gl con tapa y debidamente rotuladas (Tres recipientes reciclables, ordinario y especiales)	Juego	30,00	$ 177.257,00	$ 5.317.710,00	28	$ 4.963.196,00	2,00	$ 354.514,00	
Canecas metálica de 55 gl con tapa, pintadas de acuerdo los colores según la Resol N° 2184 de 2019, debidamente rotuladas (Tres recipientes: no aprovechables, aprovechables y orgánicos aprovechables)*	Juego		$ 569.254,00	$ -					

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

APLICACIÓN DE GUÍA SOCIOAMBIENTAL									
ITEM	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**ACTA - 2**				
GESTIÓN AMBIENTAL					**CANTIDAD**	**VALOR ACTA**	**CANTIDAD DISPONIBLE**	**VALOR DISPONIBLE**	**OBSERVACIONES**
Bolsas plásticas para los frentes de obra color negro (residuos no aprovechables), según Resolución No. 2184 de 2019 (Tamaño 90*115) - (Calibre 1,6)	un	2200,00	$ 703,00	$ 1.546.600,00	1000	$ 703.000,00	$ 1.200,00	$ 843.600,00	
Bolsas plásticas para los frentes de obra color blanco (residuos aprovechables) según Resolución No. 2184 de 2019 (Tamaño 90*115) - (Calibre 1,6)	un	2200,00	$ 717,00	$ 1.577.400,00	1000	$ 717.000,00	$ 1.200,00	$ 860.400,00	
Bolsas plásticas para los frentes de obra color verde (residuos orgánicos aprovechables) según Resolución No. 2184 de 2019 (Tamaño 90*115) - (Calibre 1,6)	un	2200,00	$ 646,00	$ 1.421.200,00	1000	$ 646.000,00	$ 1.200,00	$ 775.200,00	
Bolsas plásticas para los frentes de obra color rojo (residuos peligrosos) (Tamaño 90*115) - (Calibre 1,6)	un	1500,00	$ 1.091,00	$ 1.636.500,00	1000	$ 1.091.000,00	500,00	$ 545.500,00	
Recolección y disposición de residuos sólidos peligrosos por parte de una empresa autorizada. (Incluye Transporte). Mínimo por recolección - 50 Kg.	kg	2100,00	$ 5.302,00	$ 11.134.200,00					
Recolección de residuos de Madera por parte de una empresa autorizada	m3	21,00	$ 52.141,00	$ 1.094.961,00					

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

APLICACIÓN DE GUÍA SOCIOAMBIENTAL									
ITEM	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**ACTA - 2**				
GESTIÓN AMBIENTAL					**CANTIDAD**	**VALOR ACTA**	**CANTIDAD DISPONIBLE**	**VALOR DISPONIBLE**	**OBSERVACIONES**
Kit aseo y limpieza en obra (pala y cepillo carretero)	un	30,00	$ 63.810,00	$ 1.914.300,00	16	$ 1.020.960,00	14,00	$ 893.340,00	
Bascula colgante industrial digital capacidad máxima 300 Kg *	un	21,00	$ 88.537,00	$ 1.859.277,00	2	$ 177.074,00	19,00	$ 1.682.203,00	
Señalización en sitios de disposición temporal de residuos. (Rotulado plastificado (Dimensiones: 50x35 cm, bond 90 gr, tintas 4x0, incluye producción y diseño). Debe permanecer durante la duración de la obra. Se estiman tres cambios *	Global	63,00	$ 12.624,00	$ 795.312,00	16	$ 201.984,00	47,00	$ 593.328,00	
Maquinaria, vehículos y equipo en obra									
Lona banner, 13 onzas para vehículo (volqueta o camión) de 1,5m x 0,8m con doblez repísado 3 cm por el contorno y ojaletes 1 en cada esquina, impresión inkjet resistente a la intemperie según diseño del Manual de Identidad del Municipio.	un	58,00	$ 36.820,00	$ 2.135.560,00	58	$ 2.135.560,00			
Manejo de sustancias químicas.									

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

APLICACIÓN DE GUÍA SOCIOAMBIENTAL									
ITEM	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**ACTA - 2**				
GESTIÓN AMBIENTAL					**CANTIDAD**	**VALOR ACTA**	**CANTIDAD DISPONIBLE**	**VALOR DISPONIBLE**	**OBSERVACIONES**
Kit de emergencia para derrames químicos de 10 galones. Incluye bolsa con arena, caneca de 10 galones, bolsas plásticas, pala pequeña, guantes y mascarilla para concentración de partículas y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento).	un	21,00	$ 263.357,00	$ 5.530.497,00	21	$ 5.530.497,00	0,00	$ -	
Estiba de contención de 55 litros fabricada en polietileno de alta densidad, para almacenamiento de sustancias químicas *	un	21,00	$ 448.898,00	$ 9.426.858,00	16	$ 7.182.368,00	5,00	$ 2.244.490,00	
Uso y almacenamiento adecuado de materiales de construcción									
Teleras 1,35m x 0,90 m para construcción de acopios	un	42	$ 21.040,00	$ 883.680,00					
Plástico Negro, calibre 4 y ancho de 2 m.	kg	2100	$ 8.732,00	$ 18.337.200,00	150	$ 1.309.800,00	1950,00	$ 17.027.400,00	
Cinta Señalización Naranja (calibre 4, rollo por 500 m) para adecuación o provisión de senderos peatonales y demarcación de áreas de trabajo	un	200	$ 39.228,00	$ 7.845.600,00	28	$ 1.098.384,00	172,00	$ 6.747.216,00	
Balizas (Alto 1,4m) Base negra *	un	150	$ 28.201,00	$ 4.230.150,00	150	$ 4.230.150,00	0,00	$ -	

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

APLICACIÓN DE GUÍA SOCIOAMBIENTAL									
ITEM	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**ACTA - 2**				
GESTIÓN AMBIENTAL					**CANTIDAD**	**VALOR ACTA**	**CANTIDAD DISPONIBLE**	**VALOR DISPONIBLE**	**OBSERVACIONES**
Señalización de zonas de acopio (Rotulado plastificado (Dimensiones: 50x35 cm, bond 90 gr, tintas 4x0, incluye producción y diseño). Debe permanecer durante la duración de la obra. Se estiman tres cambios	Estimado	63	$ 12.624,00	$ 795.312,00	63	$ 795.312,00	0,00	$ -	
Control de emisiones atmosféricas									
Manguera multicapa con refuerzo textil interior y exterior para trabajo pesado. Incluye accesorios de conexión y regulación de agua - Pistola -.	m	1050,00	$ 9.927,00	$ 10.423.350,00					
Cubierta para la concretadora. Incluye largueros y plástico	un	2,00	$ 92.221,00	$ 184.442,00					
Protector auditivo de inserción - desechable (uso de la comunidad)	un	12000,00	$ 1.623,00	$ 19.476.000,00	4000	$ 6.492.000,00	8000,00	$ 12.984.000,00	
Protección del suelo									
Plastilona de 650 gr de 2 x2 para la protección del suelo durante el proceso de aplicación de mezcla asfáltica.	un	30,00	$ 80.478,00	$ 2.414.340,00	16	$ 1.287.648,00	14,00	$ 1.126.692,00	
Manejo de campamento e instalaciones temporales									

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

APLICACIÓN DE GUÍA SOCIOAMBIENTAL									
ITEM	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**ACTA - 2**				
GESTIÓN AMBIENTAL					**CANTIDAD**	**VALOR ACTA**	**CANTIDAD DISPONIBLE**	**VALOR DISPONIBLE**	**OBSERVACIONES**
Señalización para campamento o instalaciones temporales (Rotulado plastificado (Dimensiones: 50x35 cm, bond 90 gr, tintas 4x0, incluye producción y diseño). Debe permanecer durante la duración de la obra. Se estiman tres cambios.	Global	63,00	$ 12.624,00	$ 795.312,00	20	$ 252.480,00	43,00	$ 542.832,00	
Balizas para adecuación o provisión de senderos peatonales 1,4 m base negra*	un	370,00	$ 28.201,00	$ 10.434.370,00	370	$ 10.434.370,00	0,00	$ -	
Cinta Señalización Naranja (calibre 4, rollo por 500 m) para adecuación o provisión de senderos peatonales y demarcación de áreas de trabajo	un	200,00	$ 39.228,00	$ 7.845.600,00					
Tela mixta y multisombra por 2 metro de ancho.	m	500,00	$ 1.679,00	$ 839.500,00					
Tela cerramiento color verde polipropileno de 2,10 m de ancho.	m	300,00	$ 3.679,00	$ 1.103.700,00					
Prevención de contaminación de cuerpos de agua de redes de servicios públicos									
Malla tipo polisombra color azul para proteger sumideros	m	2100,00	$ 2.020,00	$ 4.242.000,00	300	$ 606.000,00	1800,00	$ 3.636.000,00	
Alquiler de baño estándar con 2 limpieza por semana (Zona rural)	mes	25,00	$ 993.566,00	$ 24.839.150,00	0,37	$ 364.307,53	22,63	$ 22.487.710,47	
					2	$ 1.987.132,00		$	
Alquiler de baño estándar con 2	mes	99,00	$ 725.227,00	$ 71.797.473,00	1,83	$ 1.329.582,83	88,17	$ 63.940.847,17	

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

APLICACIÓN DE GUÍA SOCIOAMBIENTAL									
ITEM	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**ACTA - 2**				
GESTIÓN AMBIENTAL					**CANTIDAD**	**VALOR ACTA**	**CANTIDAD DISPONIBLE**	**VALOR DISPONIBLE**	**OBSERVACIONES**
limpieza por semana (Zona urbana)					9	$ 6.527.043,00			
Gestión de la fauna y la flora									
Malla tipo polisombra color azul para protección de 1,50 m de ancho para protección de árboles	m	1000	$ 2.020,00	$ 2.020.000,00	100	$ 202.000,00	900	$ 1.818.000,00	
Estacón en madera común fijación vertical diámetro 0,10 m x 2,80 m de alto	un	70,00	$ 10.457,00	$ 731.990,00			70	$ 731.990,00	
Personal para brigada Ambiental y Apoyo de PMT									
Reconocimiento de personal para labores de brigada ambiental y Apoyo en la implementación del PMT	hr	24192,00	$ 9.486,00	$ 229.485.312,00	192	$ $ 1.821.312,00	24.000,00	$ $ 227.664.000,00	
TOTAL				**$ 572.064.162,00**		**$ 63.106.160,37**			

En el anexo correspondiente se encuentra el detalle de la inversión ejecutado con base en la inversión ejecutada. En el anexo 3.2.10. PROGRAMA PARA EL MANEJO DE CAMPAMENTOS E INSTALACIONES TEMPORALES.

3.2.5 Observaciones, recomendaciones y conclusiones de la interventoría, con relación a las labores realizadas por el contratista de obra en el desarrollo del componente ambiental de su contrato de ejecución de obra pública.

De acuerdo con las actividades llevadas a cabo en el mes de **agosto de 2025** se realizaron las siguientes recomendaciones al contratista:

- ✓ Protección de sumideros de todos los frentes de obra, en algunos casos se debe realizar limpieza de sumideros.
- ✓ Rotulación e identificación de sustancias químicas utilizadas en las actividades constructivas.
- ✓ Manejo general de residuos en el frente de obra, utilizar adecuadamente los puntos ecológicos, los cuales fueron evidenciados en los frentes de obra.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

- ✓ Mantenimiento periódico de los baños móviles.
- ✓ Entrega de soportes de repotenciación de equipos, fichas técnicas y hojas de vida de equipo y maquinaria.

Adicionalmente, la interventoría teniendo presente los recorridos realizados en campo, tanto por la interventoría como por la supervisión ambiental de la SIF, reforzar lo siguiente:

- Mantener una correcta señalización en los frentes de trabajo.
- Instalación de puntos ecológicos, y aseo general de camiones y frentes de obra.
- Aseo y mantenimiento continuo de unidades móviles sanitarias,
- Prevenir correctamente los derrames y ser atendidos oportunamente, contar con insumos para la atención de derrames.
- Cada cuadrilla debe contar con protección auditiva para distribuir a la comunidad afectada.
- Protección de sumideros.
- Señalización y hojas de seguridad de los productos químicos utilizados en los frentes.
- Capacitaciones ambientales e inducciones al personal operativo y administrativo.
- Cubrimiento de acopios de materiales y escombros.
- Reporte oportuno de maquinaria, equipos y vehículos.
- Identificación de volquetas, y vehículos con el pendón del contrato.
- Velar el cumplimiento del pmt en los frentes y cuadrillas.
- Evitar el desperdicio de materiales.
- Seguimiento al consumo de agua, energía y combustibles.
- Evitar el uso de zonas verdes para acopios.
- Protección de zonas verdes con mamparas o lonas.
- Control de emisiones de emulsión por aspersión para evitar impactos en fachadas, inmuebles, personas y otros vehículos.
- Entre otros impactos que se han identificado en las actividades.

3.2.6. ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORÍA RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE AMBIENTAL, AL INTERIOR DE SU CONTRATO.

Con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones contractuales que tiene la Interventoría en el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones que debe cumplir la empresa contratista en la ejecución de las medidas de manejo contenidas en el PASAO, a continuación, relacionamos las actividades realizadas los profesionales ambientales, adscritos al presente contrato.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia


- Se elaboró y envió acta de recorrido ambiental, realizado el 05/08/25, en la cual se describen los hallazgos identificados en las cuadrillas visitadas. Adicional al acta, se envía informe de visita emitido por la supervisión ambiental de la SIF.
- Se envió correo electrónico el 12 de agosto de 2025, referente al PROGRAMA DE CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS. PROTECCIÓN AUDITIVA, para lo cual se solicita al contratista entrega de protectores auditivos a la comunidad aledaña a los frentes de trabajo, según necesidad (contemplados en la inversión ambiental).
- Se envió comunicado OFICIO No.016– 4600105322 de 2025 del 13 de agosto de 2025, con requerimientos ambientales, plan de calidad y PMT, dando cumplimiento normativo legal ambiental, para el manejo propio de la ejecución de la obra, dentro de los lineamientos de la guía de manejo socio ambiental del municipio de Medellín, condiciones contractuales, entre otras consideraciones.
- Recorrido de verificación aspectos ambientales en obra en compañía supervisión ambiental SIF el 20 de agosto; se envía informe de visita generado por la supervisión en el cual se evidencian los hallazgos encontrados en los frentes visitados.
- Se envió correo electrónico 22 de agosto de 2025, en relación con fallas en equipos en obra.
- Se envía por correo electrónico 20 de agosto de 2025, informe correspondiente al mes de Julio a la supervisión ambiental en el cual se atendieron las observaciones realizadas al mismo para el 22 de agosto de 2025.
- Articulación con el contratista actividades de gestión ambiental para la correcta implementación del PASAO y el cumplimiento de la Guía Socio Ambiental para la construcción de obras de infraestructura pública del municipio de Medellín.
- Seguimiento a los compromisos adquiridos en reuniones con Supervisión técnica y ambiental de la SIF.
- Velar por la correcta aplicación de la legislación ambiental.
- Evaluar procedimientos constructivos o medidas de manejo ambiental que sugiera el contratista de construcción y que impliquen un cambio a lo establecido en el PASAO.
- Atender las solicitudes de información, visitas de inspección y cualquier actividad que programen las partes interesadas en el manejo ambiental del proyecto.
- Realizar una evaluación continua a lo largo del proyecto y reportar periódicamente sobre los avances y resultados de la aplicación del PASAO.
- Elaboración de informes mensuales, evaluaciones semanales, informes semanales y demás formatos establecidos por la supervisión del contrato.

A continuación, algunas actividades desarrolladas por la interventoría ambiental en campo.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia



Revisión de señalización de los frentes de obra.

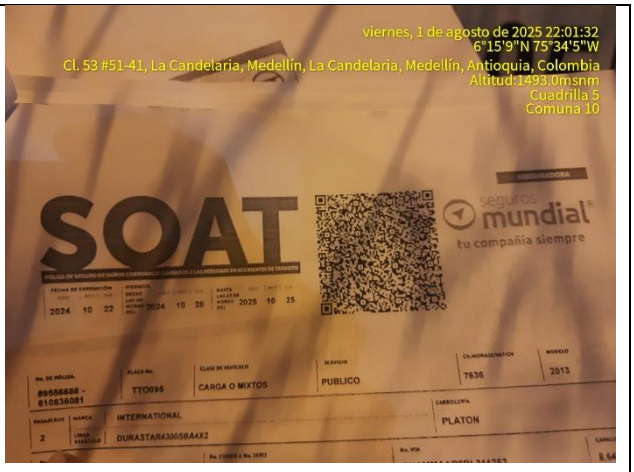

Seguimiento y verificación de interventoría de los vehículos reportados por el contratista.



Verificación de atención de derrames accidentales.



Solicitudes de la interventoría con respecto a la utilización de zonas verdes y árboles en la ocupación de estas zonas con elementos de obra.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

 Seguimiento al desempeño de equipos.	 Acompañamiento en reconocimiento de frentes de trabajo para identificación de impactos ambientales.
Recorridos realizados en las diferentes cuadrillas	
 Recorrido ambiental realizado por la supervisión de la sif y la interventoría en los frentes de obra.	 Recorrido nocturno, por los frentes de obra.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

	
Recorrido en el frente de obra ingenieros ambientales de Interventoría y Contratista.	Reunión de conciliación de cantidades del presupuesto Ambiental del acta 1.

Anexos 3.2.12. Formatos de seguimiento de la Interventoría Ambiental.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

3.3. INFORME DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO - SST:

El presente informe mensual del componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) se elaboró en cumplimiento de las obligaciones contractuales y normativas vigentes. Este numeral tiene como objetivo proporcionar una visión detallada e integra del estado actual de las actividades relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo, así como los avances y retos encontrados durante el período de **agosto del 2025**.

El componente de SST en el proyecto "Rehabilitación, Mantenimiento y mejoramiento de la Malla Vial e infraestructura asociada de la Ciudad de Medellín" tiene la misión de asegurar la calidad integral de las actividades desarrolladas, buscando establecer mecanismos de control efectivos que garanticen el cumplimiento de los objetivos establecidos por el ente contratante. La labor del interventor es proactiva y preventiva, abarcando desde la verificación del cumplimiento normativo hasta la implementación de mejoras continúas en los procedimientos y protocolos de seguridad y salud en el trabajo.

De acuerdo con el objeto del contrato y las obligaciones específicas de la interventoría, este informe incluye una revisión detallada de la aplicación de la seguridad y salud dentro del Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario para la Obra (PASAO), el control, seguimiento y la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones contempladas en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019. Además, se presentan las acciones correctivas y preventivas adoptadas, los hallazgos relevantes y las recomendaciones para mejorar la gestión de SST en el proyecto.

Este informe es una herramienta clave para la toma de decisiones informadas y la mejora continua de las condiciones de trabajo, contribuyendo así a la seguridad y bienestar de todos los trabajadores involucrados en el proyecto. El alcance del informe abarca todas las actividades de Rehabilitación, Mantenimiento y mejoramiento de la Malla Vial e infraestructura asociada ejecutadas durante este periodo, incluyendo la identificación y gestión de riesgos laborales, la implementación de capacitaciones y la supervisión del cumplimiento de los estándares del SG-SST establecidos.

3.3.1. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SG-SST (CONTRATISTA DE OBRA)

La interventoría realizará una descripción de las actividades de monitoreo y seguimiento realizadas para verificar el desarrollo, cumplimiento normativo y ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo por parte del contratista de Obra Pública de acuerdo con la guía de manejo socio ambiental para la obra pública.

Debe incluir copia de los anexos referentes a la gestión del contratista, requeridos en el Documento Específico DE-GETH Lineamientos de Contratación Referente al Cumplimiento de Requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo -SG-SST.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATISTA				
Nombre del responsable de Seguridad y Salud en el trabajo del Contratista:	**Francy Milena Escobar Morales**	**No Licencia en SST:**	**2017060667104**	
Nombre de la empresa:	**Consorcio Vialmed 2025**	**NIT:**	**901949183-1**	
Nombre del responsable de Seguridad y Salud en el trabajo de la empresa de interventoría:	**Luis Norberto León Álvarez**	**No Licencia en SST:**	**2025060179372**	**Fecha de realización del informe: 30/08/25**
Seleccione el número correspondiente al valor de cada ítem valorado, como se explica a continuación: **C (cumple) - 5 puntos:** Si se cuenta con la evidencia que soporte la acción del ítem requerido **NC (no cumple) - 0 puntos:** Si no cuenta con la evidencia o cuenta con la evidencia parcial o incompleta sobre el ítem requerido **NA (no aplica) - 5 puntos:** Si lo solicitado en el ítem requerido no hace parte del objeto contractual				
Nota 1: Cada uno de los ítems a verificar están justificados en las normas nacionales que rigen el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo vigentes a la fecha y estas pueden ser susceptibles a modificaciones o variaciones de acuerdo con lo que establezca el Gobierno Nacional.				

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

ETAPA CONTRACTUAL											
No.	**Requisito Normativo**	**Periodicidad**	**Ítem a verificar**	**Evidencia**	**C**	**NC**	**NA**	**Observaciones**	**PLAN DE ACCIÓN**		
					5	**0**	**5**		**DESCRIPCION**	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1	Resolución 0312/2019	Al iniciar el contrato, teniendo en cuenta la fecha de emisión por parte de la ARL.	Se cuenta con la certificación de ARL y Ministerio de Trabajo para el cumplimiento de estándares mínimos, con vigencia inferior a un año.	Certificado de Estándares mínimos emitido por ARL. Certificado de Estándares mínimos emitido por Min Trabajo.	5			Se adjuntas los soportes de certificados de ARL y Min trabajo. Se adjuntan los soportes del SG-SST son los aportados de la empresa consorciada IngeAlquipos			
2	Resolución 0312/2019 Resolución 4927/2016	Al iniciar el contrato (tener en cuenta si se cambia de responsable de SG-SST volver a solicitar los documentos)	La empresa cuenta con un responsable del SG-SST, con licencia para prestar servicios de SST y curso de 50 horas o el curso de 20 horas de actualización.	Licencia de SST y certificado del curso de las 50 horas vigente o su actualización: Profesional, especialista o magister en SST con Licencia vigente en seguridad y salud en el trabajo. Curso de 50 horas en SST y/o 20 horas.	5			Se adjunta hv de profesional SST del Consorcio			
3	Decreto 1072/ 2015, 2.2.4.6.15 - 2.2.4.6.16- 2.2.4.6.23 - 2.2.4.6.24.	Al iniciar y durante el contrato	Se tienen identificados los peligros, evaluados y valorados los riesgos laborales, por medio de una matriz, con las medidas de intervención y soportes que demuestren la implementación de los mismos, en el personal que se encuentra ejecutando el contrato.	Documento de la IPEVR y evidencias de los controles implementados. Nota: Deberá ser específico del proyecto que se viene a ejecutar al Distrito de Medellín.	5			Se adjunta matriz IPEVR de acuerdo a la naturaleza del contrato			

4	Decreto 1072/201 2.2.4.6.8 N°6, 7 y 8. 2.2.4.6.16.	Al iniciar el contrato	Se tiene un plan de trabajo y un plan de formación del SG-SST firmado por el representante legal y el responsable de SST para las actividades de ejecución del contrato.	Documento de plan de trabajo y plan de formación con sus respectivas firmas. Con firma del Representante Legal y el responsable del SG-SST. Soporte y evidencias de las actividades, formaciones y capacitaciones del personal que ejecuta el proyecto. Resultado de la auditoría del SG-SST y de la rendición de cuentas. Vigencia inferior a un año.	5			Se adjunta plan de trabajo 2025 y resultado de auditorías y rendición de cuentas			
5	C.S. del T. Art. 104-125 Ley 1010/2006 Ley 962/ 2005	Al iniciar el contrato	Se cuenta con: Las políticas del SG-SST Reglamento Interno de Trabajo. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. Actualizados, con sus respectivos soportes de publicación y divulgación.	Documentos actualizados de las políticas, reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, soporte de socialización con el personal que ejecuta el proyecto y evidencia de publicación en los centros de trabajo donde se ejecuta el proyecto con el Distrito de Medellín.	5			Se adjuntas políticas reglamento y las socializaciones se encuentran en los formatos de inducción de ingreso			
6	Resolución 1401/2007 Resolución 0312/2019 Decreto 1072/2015	Mensual, si se presentan eventos.	Se reportan y se investigan todos los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales, ocurridos dentro de la ejecución del contrato de obra.	Documento soporte del reporte del incidente o accidente de trabajo, enfermedad laboral y la respectiva investigación.	5			Se tiene las investigaciones de los accidentes reportados			
7	Resolución 1401/2007	Mensual, si se presentan eventos.	Se cuenta con las evidencias del cumplimiento de las recomendaciones emitidas en las investigaciones de accidentes de trabajo.	Evidencias de cumplimiento de los planes de acción de los incidentes y accidentes de trabajo, ocurridos durante la ejecución del contrato.	5			Se adjuntan las lecciones aprendidas en el archivo correspondiente al accidente			

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

8	Ley 1295/1994 Art 21 lit.g, Resolución 2400/1979, Resolución 1401/2007, Decreto 1072/2015 Art 2.2.4. 6..11, Parágrafo 1 y 2, Art 2.2.4.6.12 Numeral 6, Art 2.2.4.6.13 Núm. 4	Al iniciar el contrato y si se presentan ingreso de personal nuevo durante la ejecución del contrato.	Se tiene los registros de inducción y reinducción en SST (peligros de acuerdo con la actividad a desarrollar y prevención de accidentes de trabajo y enfermedad laboral)	Registros de inducción y reinducción del personal que ejecuta el proyecto durante la ejecución del contrato.	5			Se adjunta carpeta de registro de inducción			
9	Resolución 2013/1986 Art. 1,3, 11 y 14 lit. K, Decreto 1295/1994 Art. 35 y 63 y Parágrafo, Decreto 1072/2015 Art 2.2.4.6.8 y 2.2.4.6.12 Núm. 10.	Al iniciar el contrato	La empresa cuenta con la conformación y operatividad del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST y actas de reunión.	Registros de conformación y operación del COPASST, registros de las inspecciones, actas de reunión de los últimos tres (3) meses y socialización de los resultados de las mediciones ambientales	5			Se relacionan las convocatorias de conformación del Copasst y Cocola. En el mes de septiembre se realizarán las elecciones pertinentes, ya que se cuente con la mayoría de personal ingresado			
10	Resolución 652/2012 Resolución 1356/2012.	Al iniciar el contrato	La empresa cuenta con la conformación y operatividad del Comité de Convivencia Laboral CCL y actas de reunión.	Registro y/o acta de conformación del CCL, listados de asistencia de las reuniones e informe de rendición de cuentas del CCL.	5			Los documentos se adjuntan con los del item 9			

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

11	Decreto 1072/2015 Art 2.2.4.6.25. Núm. 1 al 13 Parágrafo 1 y 2.	Durante el contrato	Se cuenta con plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias y desastres, conformación de una brigada de emergencias capacitada para atender cualquiera situación de emergencia y se cuenta con inventario de recursos, PON divulgados a todo el personal y registros de simulacros de evacuación.	Evidencias de actividades del plan de emergencias del proyecto en ejecución con el Distrito de Medellín durante la ejecución del contrato, recursos de emergencia, registros de simulacros de evacuación y evidencias de capacitación.	5			Se cuenta con plan de emergencias, los elementos de emergencia en los vehículos de todos los frentes de trabajo: extintor, botiquín, camilla y silbatos. Para el simulacro de evacuación se tiene programada conformación de brigada y participación en simulacro			
12	Ley 9/1979 Art. 15, 80 y 84, Ley 1562/2012 Art 21 lit c y d, Decreto 1072/2015 Art. 2.2.4.6.12 Núm. 14.	Al iniciar el contrato y durante la ejecución del contrato	Se tienen evidencias de los resultados de las inspecciones a los sitios y puestos de trabajo, equipos de protección personal y herramientas de Seguridad y Salud en el Trabajo, con sus respectivas evidencias.	Registros de inspecciones periódicas realizadas durante la ejecución del contrato y seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones. Plan de mantenimiento.	5			Se adjuntas registro de inspecciones del mes de agosto de todos los integrantes del Consorcio Vialmed			
13	Decreto 1295/1994 Art. 21 lit c y d, Decreto 1072/ 2015 Art 2.2.4.2.2.20	Al iniciar el contrato	Se cuenta con el análisis estadístico de accidentes de trabajo y enfermedades laborales del personal adscrito al contrato de obra y constancia de las medidas adoptadas para disminuir la tasa de accidentalidad o enfermedades profesionales.	Informe de los análisis de accidentalidad, indicadores epidemiológicos del mes anterior a la fecha del informe y registro de las intervenciones realizadas.	5			Se adjunta formato de indicadores			

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

14	Resolución 1843/2025 Art. 8 Decreto 1072/2015 Art. 2.2.4.2.2.18	Al iniciar el contrato (solo una vez).	Se realiza a los trabajadores que ejecutan el contrato las respectivas evaluaciones médicas ocupacionales obligatorias, incluyendo la evaluación de preingreso, evaluaciones periódicas, la de egreso, la de retorno laboral, la de seguimiento o control, y la evaluación por cambio de ocupación. Cuando aplique cada una de estas.	Resultado de las evaluaciones médicas ocupacionales obligatorias, incluyendo: La evaluación de preingreso Evaluaciones periódicas Evaluación de egreso Evaluación de retorno laboral Evaluación de seguimiento o control Evaluación por cambio de ocupación.	5			Se adjuntan los resultados de evaluaciones médicas			
15	Decreto 1072 de 2015, articulo 2.2.4.6.28, numeral 4	Al iniciar el contrato y durante la ejecución del contrato	Comunicar a todos los trabajadores los contenidos de los peligros a los cuales se exponen realizando las tareas asignadas dentro de las instalaciones del proyecto de obra.	Registros de asistencias.	5			Se adjunta formato de asistencia a inducción			
16	Ley 9/1979 Art. 122; Resolución 2400/1979 Art. 176 a 201, Decreto 1072/2015 Art. 2.2.4.6.12 Núm. 8 y 2.2.4.6.24 Núm. 5.	Al iniciar el contrato y durante la ejecución del contrato	Se cuenta con los registros de entrega de elementos de protección personal, utilizados en la ejecución del contrato, con sus respectivas fichas técnicas y registros de capacitación.	Registros de entrega de elementos de protección personal firmados por cada trabajador, evidencias de capacitación y seguimiento para su uso (listas de chequeo, inspecciones, registros fotográficos, otros) durante la ejecución del contrato.	5			Se adjunta soporte de entrega de EPP			

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

17	Ley 1295/1994 Art 21 lit. g, Resolución 2400/1979, Resolución 1401/2007, Decreto 1072/2015 Art 2.2.4. 6..11, Parágrafo 1 y 2, Art 2.2.4.6.12 Núm. 6, Art 2.2.4.6.13 Núm. 4	Al iniciar el contrato y si se presentan ingreso de personal nuevo durante la ejecución del contrato.	Se cuenta con los registros de entrenamiento específico según el cargo u oficio, para la actividad que va a desarrollar el trabajador.	Registros de entrenamiento antes y durante la ejecución del contrato (cargo y/o oficio)	5			Se adjuntan los certificados de los controladores viales			
18	Código Sustantivo del Trabajo (CST). Ley 2101 de 2021 Resolución 3031 DE 2023	Cada vez que se actualice el permiso ante Min. Trabajo	Se cuenta con permiso para trabajo suplementario (horas extras) actualizado.	Autorización vigente del Ministerio del Trabajo y lista de los cargos autorizados	5			Se adjunta soporte de permiso para trabajo suplementario			
19	Resolución 5492 de 2024 Decreto 1347 de 2021	Al iniciar el contrato y durante la ejecución del contrato	Se tiene documentado y en operación el Sistema de Gestión de Seguridad para la Prevención de Accidentes Mayores – SGSPAM.	Acciones implementadas en la ejecución del contrato para el Sistema de Gestión de Seguridad para la Prevención de Accidentes Mayores - SGSPAM.			5	No se realizan trabajos con sustancias que generen accidentes de gran impacto o tareas de alto riesgo			
20	Ley 1523 de 2012 Decreto 2157 De 2017	Al iniciar el contrato y durante la ejecución del contrato	Se tiene documentado y en operación el plan de gestión del riesgo de desastres de las entidades públicas y privadas (PGRDEPP)	Documento y evidencias de las actividades desarrolladas en el plan de gestión del riesgo de desastres de las entidades públicas y privadas (PGRDEPP)	5			Los soportes se adjuntan en el ítem 11			

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

21	Decreto 1072 del 2015	Al iniciar el contrato y durante la ejecución del contrato	La empresa cuenta con los Sistemas de Vigilancia Epidemiológica de los diferentes factores de riesgo.	Documento de los sistemas de vigilancia epidemiológica, evidencias de implementación y seguimiento a indicadores.	5			Se adjunta el programa de SVE conservación auditiva	|		

PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL LEY 2050 DE 2020 EN CONCORDANCIA CON LA RESOLUCIÓN 20223040040595 DE 2022											
No.	**Requisito Normativo**	**Periodicidad**	**Ítem a verificar**	**Evidencia**	**C**	**NC**	**NA**	**Observaciones**	**PLAN DE ACCIÓN**		
					5	**0**	**5**		**DESCRIPCION**	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1	Resolución 40595 de 2022 Min Transporte, Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito) Ley 2251 de 2022 Decreto 1430 de 2022 Ley 2050 /2020 Decreto 1072 de 2015	Al iniciar el contrato (solo una vez)	Se cuenta con el Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV	Documentos que soporten el diseño e implementación del PESV.	5			Se adjunta el documento del PESV			
2	Resolución 40595 de 2022 Decreto 1072 de 2015	Al iniciar el contrato y según cronograma	Competencia y plan anual de formación	Certificado y/o registros de capacitación.	5			Se adjunta inducción que contiene lo solicitado			
3	Resolución 40595 de 2022 Decreto 1072 de 2015	Al iniciar el contrato (solo una vez)	Plan de preparación y respuesta ante emergencias viales	Documento y socialización del Plan de preparación y respuesta ante emergencias viales	5			Se adjunta documento solicitado de acuerdo con el contratista mayoritario dado			

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

								que este tiene la mayor experiencia en la ejecución de estas actividades.			
4	Resolución 40595 de 2022 Decreto 1072 de 2015	Mensual	Mantenimiento y control de vehículos y equipos	Certificado de mantenimientos preventivos, correctivos y de mejora. Cronograma.	5			Se adjuntan formatos de preoperacionales diligenciados del mes de agosto			
5	Resolución 40595 de 2022 Decreto 1072 de 2015	Mensual (se entrega la totalidad de las listas de chequeo preoperacionales)	Inspecciones preoperacionales de vehículos y equipos	Registro de resultados de inspecciones preoperacionales, en caso de incumplimiento, el respectivo soporte de mantenimiento y/o reparación.	5			Se adjunta soporte de preoperacionales de equipos			
6	Resolución 40595 de 2022 Decreto 1072 de 2015	Al iniciar el contrato (solo una vez)	Se cuenta con el reporte del PESV a la entidad competente	Radicado o soporte de respectivo reporte.			5	N.A.			
7	Resolución 40595 de 2022 Decreto 1072 de 2015	Al inicio del contrato	Auditoria Anual	Informe de auditoría y plan de mejoramiento.			5	N.A.			

PROGRAMA DE RIESGO QUÍMICO											
No.	**Requisito Normativo**	**Periodicidad**	**Ítem a verificar**	**Evidencia**	**C**	**NC**	**NA**	**Observaciones**	**PLAN DE ACCIÓN**		
					5	**0**	**5**		**DESCRIPCION**	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1	Ley 55/1993, Ley 320/1996, Decreto 1496/2018 Art 33, Resolución 773 2021	Al iniciar el contrato (solo una vez)	Se tiene elaborado un protocolo o guía que garantice la compra de productos químicos o agrícolas con el cumplimiento de fichas de datos de seguridad (16 ítem) y etiquetado del SGA	Documento, guía, protocolo o procedimiento	5			Se adjunta documento Matriz de riesgo químico			
2	Ley 55/1993, Ley 320/1996, Decreto 1496/2018 Art 33, Resolución 773 2021	Al iniciar el contrato y mensual según cronograma	Se cuenta en la obra con los registros de implementación del Sistema globalmente armonizado SGA	Documento, Programa y registros o evidencias de implementación.	5			Se adjunta registro fotográfico en campo de SGA y kit de derrames			
3	Ley 55/1993, Ley 320/1996, Decreto 1496/2018 Art 33, Resolución 773 2021	Mensual y según cronograma	Los recipientes de las sustancias químicas usabas en la obra están etiquetados según el SGA	Informe de evidencia fotográfica o inspección de seguridad	5			Se adjunta registro fotográfico en campo con el item 2			
4	Ley 55/1993, Ley 320/1996, Decreto 1496/2018 Art 33, Resolución 773 2021	Al iniciar el contrato (solo una vez)	La empresa realiza el transporte de mercancías peligrosas, según lo estipulado en el Decreto 1609 de 2002	Certificado o permiso para el transporte de mercancías peligrosas.			5	Se transportan en vehículos de trabajo cantidades mínimas del producto a utilizar y los vehículos cuentan con la señalización de la			



Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

								NFPA y kit de antiderrames			
5	Decreto 1609 de 2002	Al iniciar el contrato y mensual según cronograma	El personal que realiza el transporte de sustancias químicas cuenta con curso de transporte y manejo de Mercancías Peligrosas (60 horas) y/o Actualización transporte y manejo de Mercancías Peligrosas (20 horas)	Certificados de transporte y manejo de Mercancías Peligrosas (60 horas) y/o Actualización transporte y manejo de Mercancías Peligrosas (20 horas)			5	Se transportan en vehículos de trabajo cantidades mínimas del producto a utilizar y los vehículos cuentan con la señalización de la NFPA y kit de antiderrames			
6	Decreto 1609 de 2002	Al iniciar el contrato y mensual según cronograma	El vehículo donde se transportan sustancias químicas peligrosas se encuentra señalizado con la clasificación de mercancías peligrosas, número de Naciones Unidas y número CAS.	Evidencia fotográfica de los vehículos			5	No se utilizan vehículos específicos para el transporte de sustancias químicas. Cuando la empresa requiere realizar intervenciones grandes, cuentan con un vehículo interno para el traslado y aplicación (emulsión asfáltica)			

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

7	Ley 55/1993, Ley 320/1996, Decreto 1496/2018 Art 33, Resolución 773 2021	Trimestral	La empresa da cumplimiento a las obligaciones como destinatario de los químicos	Certificado de disposición de residuos	5			La empresa cuenta con un proveedor certificado por parte de la interventoría el cual realiza la recolección de los Respel y presenta su respectivo certificado de disposición final de residuos			
8	Ley 55/1993, Ley 320/1996, Decreto 1496/2018 Art 33, Resolución 773 2021	Al iniciar el contrato y mensual según cronograma	Se cuenta con planes operativos normalizados para el control de derrames químicos	Documento, Procedimiento y registro de socialización	5			Se adjunta documento de PON y se socializa con el personal en las charlas de seguridad diarias en campo			
9	Resolución 2467 de 2022 del Ministerio de Trabajo	Al iniciar el contrato y durante la ejecución del contrato	Se cuenta con el Reglamento de Higiene y Seguridad para la Prevención y el Control del Riesgo por Exposición a Sílice Cristalina Respirable.	Controles implementados para el riesgo por Exposición a Sílice Cristalina Respirable según las mediciones ambientales.			5	N.A.			

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

PUNTAJE TOTAL	C	NC	NA
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	**100%**		
CONVENCIONES: ≥ 90% - OPTIMO < 90% NO CUMPLE - SE GENERA INTERVENCIÓN INMEDIATA Y PLAN DE MEJORAMIENTO			
Nombre del Profesional -SST de la interventoría: **LUIS NORBERTO LEON ALVAREZ**	**Nombre del Profesional SST del Contratista:** **FRANCY MILENA ESCOBAR MORALES**		
C.C. 70.902.445	**C.C. 43.100.537**		
FIRMA 	**FIRMA** 		

GESTION SST INTERVENTORIA			
Programa	**Gestión de la Interventoría**	**Soporte**	**Anexo o Formatos**
Reglamento de higiene y seguridad industrial	Se observa en campo el cumplimiento del contratista en la divulgación y capacitación del reglamento de higiene y seguridad industrial de todo el personal que ingresa a obra a través de la inducción. El contratista presenta los certificados del cumplimiento del sistema de gestión en SST de las empresas que conforman el Consorcio Vialmed emitidos por las respectivas ARL. Se evidencia que en este periodo se realizan reunión del comité con los grupos conformados por las empresas del consocio los comités y brigadas se estarán conformado el próximo mes para tener participación de la mayoría de personal que vinculado al contrato, por el momento se cuenta con los	 	Anexo 3.3.1

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Medicina preventiva y del trabajo	A través de la revisión realizada por la interventoría a la documentación del contratista, se verifica el cumplimiento de la realización de los exámenes médicos de ingreso para el todo el personal nuevo y periódicos para el personal antiguo de la empresa. Se realiza revisión de las hojas de seguridad de los productos químicos manejados por el contratista. (ACPM, Asfalto, Emulsión, Propano, Gasolina, pinturas y solventes). Adicional se observa que las dichas fichas se encuentran publicadas en los camiones y son socializadas a los trabajadores.	 	Anexo 3.3.2
Entrega de dotación y elementos de protección personal	En los recorridos realizados por los diferentes frentes de obra en el periodo y mediante la revisión de documentación la interventoría ha evidenciado que el contratista realiza la respectiva entrega de dotación y elementos de protección personal a cada trabajador por frente periódicamente o cuando requiera reposición.	 	Anexo 3.3.3
Plan de Inducciones y Capacitaciones	Se evidencia que la gestión SST del contratista realiza la inducción en SST, donde se socializan los peligros y riesgos de las actividades desarrolladas, normas de seguridad, entre otros temas. Se evidencia por parte del contratista la capacitación mensual programada; así como también la charla de seguridad por frente del trabajo. En temas como: Uso adecuado de los EPP, Prevención del riesgo público, Autocuidado, Comunicación asertiva.	 	Anexo 3.3.4
Programa de Inspecciones	Durante los recorridos realizados por los diferentes frentes de obra y el acompañamiento por parte de la interventoría en las actividades de SST en obra, se verifica que el personal SST del contratista realizó el diligenciamiento de los formatos de inspección de áreas locativas, orden y aseo y preoperacionales establecidos para verificar el estado de los equipos, maquinas, herramientas y recursos de emergencia por frente.	 	Anexo 3.3.5
Orden y aseo frentes de trabajo	La interventoría evidencia un buen comportamiento por partes del contratista en orden y aseo en los frentes de trabajo	 	Anexo 3.3.6

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Accidentes de trabajo – Ausentismo laboral	En el periodo correspondiente al mes de agosto se presentó 1 accidentes de trabajo. (golpe en extremidad inferior derecha fue atendido y reportado a la ARL, en este periodo se tienen 23 días de ausentismos por AT		Anexo 3.3.7
Afiliaciones sistema Seguridad Social	Desde la interventoría se realiza la revisión de las afiliaciones y planillas de seguridad social del personal de obra que ingresa y se encuentra activo; así como también la documentación de egreso periodo reportado.		Anexo 3.3.8

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

PERSONAL ACTIVO CONSORCIO VIALMED 2025					
CONSORCIO VIALMED 2025					
#	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
1	NATALIA ANDREA CALDERÓN VÁSQUEZ	1.017.209.286	DIRECTORA DE OBRA	4/07/2025	ACTIVO
2	LUIS ALEJANDRO CASTRO ROQUE	1.053.842.729	RESIDENTE DE OBRA	21/07/2025	ACTIVO
3	CARLOS ARTURO TORO GÓMEZ	1.039.446.342	RESIDENTE DE OBRA	21/07/2025	ACTIVO
4	JUAN GUILLERMO RODRIGUEZ GÓMEZ	71.584.643	RESIDENTE DE OBRA	14/07/2025	ACTIVO
5	VICTOR HUGO VARGAS RODRIGUEZ	70.694.470	LIDER COMUNICACIONES	21/07/2025	ACTIVO
6	WILLIAM HUMBERTO TOBÓN RESTREPO	98.507.113	TÉCNOLOGO EN OBRAS CIVILES	21/07/2025	ACTIVO
7	WILSON ALBERTO SERNA CARO	15.264.416	TÉCNOLOGO EN OBRAS CIVILES	21/07/2025	ACTIVO
8	SANTIAGO HENAO MEJÍA	1.007.253.881	INGENIERO OBRAS CIVILES	7/07/2025	ACTIVO
9	SEBASTIÁN POSADA GARCÍA	1.036.633.297	PROFESIONAL PMT	21/07/2025	ACTIVO
10	FRANCY MILENA ESCOBAR MORALES	43.100.537	PROFESIONAL SST	21/07/2025	ACTIVO
11	ASNEY DEL CARMEN GARCÍA AGAMEZ	50.909.309	PROFESIONAL SOCIAL	21/07/2025	ACTIVO
12	DORIELA AMPARO OSPINA MARULANDA	43.169.267	PROFESIONAL SOCIAL	21/07/2025	ACTIVO
13	ELSA MARÍA POLO CUELLO	1.082.862.061	PROFESIONAL AMBIENTAL	8/07/2025	ACTIVO
14	ANDRÉS FELIPE REYES MARÍN	1.059.703.439	TECNÓLOGO EN OBRAS CIVILES	23/07/2025	ACTIVO
15	JUAN PABLO OCHOA BENJUMEA	1.036.687.717	TECNÓLOGO EN OBRAS CIVILES	23/07/2025	ACTIVO
16	MANUEL FERNANDO DELGADO VALLEJO	1.036.669.125	TECNÓLOGO EN OBRAS CIVILES	23/07/2025	ACTIVO
17	PIEDAD MARÍA CASTRO CELIS	43.108.123	TECNÓLOGO EN OBRAS CIVILES	24/07/2025	ACTIVO
18	DANIELA RESTREPO GONZÁLEZ	1.036.938.945	PROFESIONAL AMBIENTAL	21/07/2025	ACTIVO
19	ANGELA MARIA ARISTIZABAL GIRALDO	32.140.755	RESIDENTE ADMINISTRATIVA	18/07/2025	ACTIVO
20	ALEJANDRO MANUEL RIQUEME GUEVARA	1.067.096.996	TECNÓLOGO EN OBRAS CIVILES	28/07/2025	ACTIVO
21	ARLEY SANTIAGO SUÁREZ MARULANDA	1.040.745.565	TECNÓLOGO EN OBRAS CIVILES	28/07/2025	ACTIVO
22	CLAUDIA MILENA COLLAZOS VILLA	43.145.348	TECNÓLOGA SST	28/07/2025	ACTIVO
23	DIANA MARCELA JARAMILLO RAMÍREZ	43.904.939	TECNÓLOGA EN OBRAS CIVILES	28/07/2025	ACTIVO
24	MARIA ISABEL PÉREZ MONTES	1.128.271.702	TECNÓLOGA ADMINISTRATIVA	28/07/2025	ACTIVO
25	GISELA MARIA ATENCIA NAVARRO	1.066.513.588	TECNÓLOGA SST	29/07/2025	ACTIVO
26	SAMUEL OROZCO NORIEGA	1.037.664.653	TECNÓLOGO EN OBRAS CIVILES	29/07/2025	ACTIVO
27	JAIME ALONSO VERA RODRIGUEZ	98.627.697	TECNÓLOGO EN OBRAS CIVILES	24/07/2025	ACTIVO
28	LUIS DANIEL DE LA ROSA VISBAL	1.082.942.983	TECNÓLOGO EN OBRAS CIVILES	10/08/2025	ACTIVO
29	ANDY ANAYA NIETO	1.073.972.876	TECNÓLOGO EN OBRAS CIVILES	4/08/2025	ACTIVO
30	FEDERICO AGUDELO MONCADA	1.004.519.462	TECNÓLOGO EN OBRAS CIVILES	10/08/2025	ACTIVO
31	EMI TATIANA ARBELAEZ ORTIZ	1.152.691.705	TÉCNICA ADMINISTRATIVA	10/08/2025	ACTIVO
32	LINA MARIA OCAMPO GÓMEZ	1.152.215.568	RESIDENTE DE OBRA	11/08/2025	ACTIVO
33	ELKIN HERNANDO MORA PUERTA	98.495.085	TECNÓLOGO EN OBRAS CIVILES	11/08/2025	ACTIVO

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

34	LUISA MARIA BERMUDEZ CANO	1.000.538.542	TECNÓLOGO EN OBRAS CIVILES	15/08/2025	ACTIVO
35	LIZETH JULIANA ALZATE ARBOLEDA	1.037.073.873	TECNÓLOGO EN OBRAS CIVILES	14/08/2025	ACTIVO
36	DANIEL ACUÑA GOMEZ	1.065.009.003	RESIDENTE DE OBRA	16/08/2025	ACTIVO
37	KATERINE HERNANDEZ CHAURRA	4.554.382	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	19/08/2025	ACTIVO
38	SANTIAGO HIGUITA VALENCIA	1.037.776.106	TECNÓLOGO EN OBRAS CIVILES	24/07/2025	ACTIVO
39	SANTIAGO GARCIA SALAZAR	1.001.477.477	TECNÓLOGO EN OBRAS CIVILES	28/07/2025	30/07/2025
40	JUAN PABLO CASTAÑO GARCÍA	1.017.244.168	TECNÓLOGO EN OBRAS CIVILES	28/07/2025	31/07/2025
ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS					
#	**NOMBRE**	**IDENTIFICACIÓN**	**CARGO**	**FECHA DE INGRESO**	**FECHA DE RETIRO**
41	SIMON URAN JARAMILLO	1.025.885.254	AYUDANTE	18/07/2025	ACTIVO
42	YADIRL JENRY PEREA IBARGUEN	1.023.628.277	AYUDANTE	18/07/2025	ACTIVO
43	DIEGO CANO MANCO	1.000.885.407	LIGADOR	21/07/2025	ACTIVO
44	JOSÉ MANUEL LOZANO HERNANDEZ	78.698.878	AYUDANTE	21/07/2025	ACTIVO
45	SERGIO EUSTAQUIO PEREA BENITEZ	10.199.838	LIGADOR	18/07/2025	ACTIVO
46	JOHAN FABIAN ROMERO HERRERA	1.006.700.443	AYUDANTE	21/07/2025	ACTIVO
47	JAVIER MANUEL SOTO AVILEZ	10.998.746	RASTRILLERO	21/07/2025	ACTIVO
48	JULIAN ALONSO GALEANO RIOS	1.001.226.018	RASTRILLERO	21/07/2025	ACTIVO
49	FABER DUVAN QUIROZ CHAVARRIA	71.218.539	AYUDANTE	21/07/2025	ACTIVO
50	SEBASTIAN VELASQUEZ CUADRADO	1.216.720.990	AYUDANTE	21/07/2025	ACTIVO
51	JOSE NILSEN SALDARRIAGA	70.326.052	AYUDANTE	21/07/2025	ACTIVO
52	ARNOL ARLEY ARANGO PARRA	1.035.234.678	AYUDANTE	21/07/2025	ACTIVO
53	ALBEIRO ANTONIO MORA GONZALES	1.128.388.502	RASTRILLERO	21/07/2025	ACTIVO
54	RESTREPO	1.000.654.446	AYUDANTE	21/07/2025	ACTIVO
55	JHONIER ESTHITH CACERES CORDOBA	1.003.931.398	AYUDANTE	21/07/2025	ACTIVO
56	JOSE ARBEY DUQUE DUARTE	1.017.208.758	RASTRILLERO	21/07/2025	ACTIVO
57	SEBASTIAN MURILLO RIVAS	1.007.053.871	AYUDANTE	21/07/2025	ACTIVO
58	LEIMAR PEREZ AREIZA	1.044.150.803	AYUDANTE	21/07/2025	ACTIVO
59	JUAN DAVID VANEGAS	1.001.545.570	RASTRILLERO	21/07/2025	ACTIVO
60	MARLON MARTINEZ SUAREZ	1.066.572.966	AYUDANTE	21/07/2025	ACTIVO
61	MIGUEL ANGEL GUERRA USUGA	1.037.628.049	RASTRILLERO	21/07/2025	ACTIVO
62	VICTOR ALFONSO CORDOBA ESPINOSA	1.027.954.723	AYUDANTE	21/07/2025	ACTIVO
63	ALBEIRO ANTONIO SUAREZ MENDOZA	8.438.422	AYUDANTE	21/07/2025	ACTIVO
64	JUAN DAVID PALACIOS QUINTO	1.193.232.928	AYUDANTE	21/07/2025	ACTIVO
65	JHONNY ALEXANDER LONDOÑO MONTOYA	98.698.748	AYUDANTE	21/07/2025	ACTIVO
66	LEIVER PADILLA OSORIO	11.166.305	AYUDANTE	21/07/2025	ACTIVO
67	REINALDO LOPERA	3.663.335	AYUDANTE	21/07/2025	ACTIVO
68	JORGE ANDRES MOSQUERA GOMEZ	1.076.818.653	LIGADOR	21/07/2025	ACTIVO
69	JUAN DAVID SANMARTIN CARDONA	1.017.191.272	OPERARIO DE EQUIPO	21/07/2025	ACTIVO

70	YOVANNY CUESTA ORTIZ	1.078.117.258	RASTRILLERO	21/07/2025	ACTIVO
71	JUAN ESTEBAN MURILLO ALVAREZ	1.045.497.637	AYUDANTE	21/07/2025	ACTIVO
72	FRANCISCO TOBON TOBON	1.026.147.320	LIGADOR	21/07/2025	ACTIVO
73	JHON JAIRO VALENCIA MORENO	1.077.436.701	AYUDANTE	21/07/2025	ACTIVO
74	EDUARDO ENRIQUE MESA RODRIGUEZ	3.840.411	AYUDANTE	21/07/2025	ACTIVO
75	DEIVI PINO RAMIREZ	100.090.533	AYUDANTE	21/07/2025	ACTIVO
76	LAURA NARANJO RENDÓN	1.039.454.020	AUXILIAR SST	23/07/2025	ACTIVO
77	NELSON DE JESÚS SERNA	98.462.729	OPERARIO DE EQUIPO	14/11/2025	ACTIVO
78	ROBLERTO CARLOS VASQUEZ LOPEZ	1.040.743.189	AYUDANTE	6/03/2025	ACTIVO
79	BIERMER SMITH ZAPATA	1.214.720.397	LIGADOR	28/07/2025	ACTIVO
80	JAIME ALEXIS SERNA RIVERA	98.711.003	AYUDANTE	28/07/2025	ACTIVO
81	SEBASTIAN SANCHEZ	1.128.457.928	AYUDANTE	28/07/2025	ACTIVO
82	JOHAN STIVEN RENTERIA OSPINA	1.010.170.674	AYUDANTE	28/07/2025	ACTIVO
83	MATEO MOASQUERA MOSQUERA	1.025.648.141	AYUDANTE	28/07/2025	ACTIVO
84	ALVARO OSORIO GARRCES	8.012.790	AYUDANTE	28/07/2025	ACTIVO
85	YAIR ANTONIO ASPRILLA VALENCIA	11.803.214	AYUDANTE	28/07/2025	ACTIVO
86	DIEGO ANDRES VILLA RIOS	98.713.744	LIGADOR	28/07/2025	ACTIVO
87	BRAYAN DE JESUS QUINTO PALACIOS	1.216.729.783	LIGADOR	28/07/2025	ACTIVO
88	ALAIN DE JESUS JULIO GARCIA	1.074.712.086	AYUDANTE	28/07/2025	ACTIVO
89	JOSE BERNARDO CORREA CABAS	1.074.717.158	AYUDANTE	28/07/2025	ACTIVO
90	OSCAR DARIO ZAPATA	98.653.743	AYUDANTE	28/07/2025	ACTIVO
91	LUIS CARLOS MONSALVE	1.129.532.636	AYUDANTE	28/07/2025	ACTIVO
92	JOHNA ESTIBEN QUINTERO FONNEGRA	98.703.083	RASTRILLERO	28/07/2025	ACTIVO
93	JAIME ALBERTO CHICA PULGARIN	1.128.415.899	AYUDANTE	28/07/2025	ACTIVO
94	ADELIS MONTERO MEDINA	1.712.248	AYUDANTE	28/07/2025	ACTIVO
95	PEDRO LUIS ROBLES CHARRIS	1.082.405.869	AYUDANTE	28/07/2025	ACTIVO
96	LUIS EMIRO MOSQUERA OREJUELA	82.360.601	RASTRILLERO	28/07/2025	ACTIVO
97	ALDAIR JOSE CALLE CASTILLO	1.066.749.749	LIGADOR	28/07/2025	ACTIVO
98	LUIS CARLOS CASTILLO QUEJADA	1.017.207.858	AYUDANTE	28/07/2025	ACTIVO
99	SANTIAGO MUÑOZ RODRIGUEZ	1.020.492.897	AYUDANTE	28/07/2025	ACTIVO
100	ALEXANDER MOSQUERA MORENO	1.146.443.436	AYUDANTE	28/07/2025	ACTIVO
101	JHON JAIME HERRERA TABORDA	15.511.716	ENCARGADO DE CUADRILLA	29/07/2025	ACTIVO
102	JOSE ALE VILLALOBOS HERNANDEZ	1.063.149.719	AYUDANTE	29/07/2025	ACTIVO
103	DAVID ESNEIDER ZAPATA ARBOLEDA	1.001.249.839	AYUDANTE	29/07/2025	ACTIVO
104	VICTOR ALFONSO MEJIA MARIN	1.096.188.968	AYUDANTE	21/07/2025	ACTIVO
105	CRISTIAN ALEJANDRO JIMENEZ CASTAÑO	1.099.552.574	AYUDANTE	21/07/2025	ACTIVO
106	DILAN YESID LEMUS PADILLA	1.007.210.881	LIGADOR	21/07/2025	ACTIVO
107	JUAN CARLOS ORTEGA	1.115.747.149	AYUDANTE	1/08/2025	ACTIVO

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

108	ELKIN DAVID CASIANNI OZUNA	1.101.497.577	LIGADOR	1/08/2025	ACTIVO
109	JAIDER DAVID PEREZ LEÓN	1.063.289.035	AYUDANTE	1/08/2025	ACTIVO
110	OMAR ALEJANDRO MONROY	1.121.921.526	AYUDANTE	1/08/2025	ACTIVO
111	JOSE DAVISD QUEJADA BOHORQUEZ	1.033.989.402	AYUDANTE	1/08/2025	ACTIVO
112	JHOSUA MIRA RENDÓN	1.000.554.344	AYUDANTE	1/08/2025	ACTIVO
113	CARLOS ANDRES CARMONA	1.037.674.225	AYUDANTE	1/08/2025	ACTIVO
114	EDISON DE JESUS SANCHEZ HINCAPIE	15.512.265	AYUDANTE	1/08/2025	ACTIVO
115	JOSE LUIS ZUÑIGA BEDOYA	1.001.901.166	AYUDANTE	4/08/2025	ACTIVO
116	JOSE ORLANDO MENDOZA	1.150.177	AYUDANTE	4/08/2025	ACTIVO
117	ESNEIDER CERQUERA ESCUDERO	1.023.624.189	AYUDANTE	4/08/2025	ACTIVO
118	JOSE ANGEL JULIO SILGADO	1.003.654.788	AYUDANTE	4/08/2025	ACTIVO
119	JHOAN ALBERTO HIGUITA HERNANDEZ	1.039.701.632	AYUDANTE	4/08/2025	ACTIVO
120	JORLETH CONTRERAS ARRIETA	1.044.911.952	AYUDANTE	4/08/2025	ACTIVO
121	CRISTIAN JOB PADILLA CALLE	1.193.127.048	AYUDANTE	4/08/2025	ACTIVO
122	JHON MARIO CONTRERAS	1.003.308.840	AYUDANTE	4/08/2025	ACTIVO
123	HUGO DE JESUS RIOS FRANCO	71.630.405	AYUDANTE	4/08/2025	ACTIVO
124	BRAYAN USUGA GUISAO	1.001.133.444	AYUDANTE	4/08/2025	ACTIVO
125	WILMAR ALEXANDER SANCHEZ OROZCO	1.017.122.975	AYUDANTE	4/08/2025	ACTIVO
126	JOSE RUFINO MOSQUERA MOSQUERA	71.740.265	RASTRILLERO	20/08/2025	ACTIVO
127	ÁNDRES FELIPE MISAS MENESÉS	1.001.510.330	AYUDANTE	23/08/2025	ACTIVO
128	LUIS FELIPE ARBOLEDA JARAMILLO	1.037.647.785	AYUDANTE	25/08/2025	ACTIVO
129	JEIMAR QUICENO HERNANDEZ	1.216.717.092	AYUDANTE	25/08/2025	ACTIVO
130	DEILER SANCHEZ ALDANA	1.028.009.980	AYUDANTE	25/08/2025	ACTIVO
131	YEFERSON CORREA SALAZAR	1.214.733.258	AYUDANTE	25/08/2025	ACTIVO
132	JAIR MIGUEL MARTINEZ	1.046.532.090	AYUDANTE	25/08/2025	ACTIVO
133	MAURICIO ROMAÑA CORDOBA	1.038.807.107	AYUDANTE	25/08/2025	ACTIVO
134	MARICELLY RINCON USUGA	1.001.610.190	AYUDANTE VIAL	25/08/2025	ACTIVO
135	ANA YARLENY AGUIRRE GALEANO	21.590.352	AUXILIAR VIAL	26/08/2025	ACTIVO
136	JAIME ERNEY CARMONA ZAPATA	1.045.422.465	AYUDANTE	26/08/2025	ACTIVO
137	JOSE DE LOS SANTOS ISAZA ISAZA	1.017.122.511	AYUDANTE	26/08/2025	ACTIVO
138	HECTOR DUVAN VELEZ DURAN	1.152.468.090	AYUDANTE	26/08/2025	ACTIVO
139	JAVIER ENRIQUE MEJIA HERNANDEZ	98.615.271	AYUDANTE	26/08/2025	ACTIVO
140	JHON ALEXANDER SEPULVEDA ALVAREZ	1.148.698.123	AYUDANTE	26/08/2025	ACTIVO
141	YOHANDRIZ JOSE ACOSTA MONTERO	6.105.357	AYUDANTE	26/08/2025	ACTIVO
142	LUIS ALBERTO PANIAGUA SERNA	1.128.403.289	AYUDANTE	26/08/2025	ACTIVO
143	JHON JAIRO ZAPATA PATIÑO	71.366.318	SST	28/08/2025	ACTIVO
144	JUAN FERNADO CUESTA CORDOBA	4.809.323	RASTRILLERO	28/08/2025	ACTIVO
145	VICTÓR ALFONSO GARCÍA GARCÍA	1.017.174.581	AYUDANTE	21/07/2025	RETIRADO
146	JHON DEIVYS CARO SALCEDO	1.002.318.088	AYUDANTE	21/07/2025	RETIRADO
147	SEBASTIAN ÁNDRES CASTAÑEDA VERA	1.234.988.790	AYUDANTE	28/07/2025	RETIRADO
148	MICHAEL ALONSO HERNANDÉZ MONTOYA	1.000.192.309	AYUDANTE	28/07/2025	RETIRADO

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

149	WILMER DURANGO OQUENDO	1.001.669.589	AYUDANTE	28/07/2025	RETIRADO
150	FRANCISCO HINESTROZA MOSQUERA	101.718.080	AYUDANTE	28/07/2025	RETIRADO
151	JADER GARCÍA VILORIA	1.101.460.360	LIGADOR	28/07/2025	RETIRADO
152	JAIME ALEXIS SERNA RIVERA	98.711.003	RASTRLLERO	11/008/2025	RETIRADO
153	ALBEIRO DE JESUS GALLEGO VELASQUEZ	98.662.317	LIGUERO	11/008/2025	RETIRADO
154	JAVIER ESTIVEN SOSA PEREZ	1.018.228.217	AYUDANTE	11/008/2025	RETIRADO
155	EDGAR ELIECER JIMENEZ	98.713.483	AYUDANTE	11/008/2025	RETIRADO
156	YONATAN ORLANDO PADILLA CIPRIAN	1.133.839.901	AYUDANTE	11/008/2025	RETIRADO
157	JHORMAN ANDRES VELASQUEZ ORTIZ	1.146.440.589	AYUDANTE	11/008/2025	RETIRADO
158	WILDER ANDRES PIEDRAHITA RESTREPO	1.007.054.147	AYUDANTE	11/008/2025	RETIRADO
159	ALFONSO RAMIREZ ISAZA	70.137.414	AYUDANTE	11/008/2025	RETIRADO
160	GALEANO RIOS DANIEL SANTIAGO	1.001.226.017	RASTRLLERO	14/08/2025	RETIRADO
161	CALLE CASTILLO JOSE ALDAIR	1.066.749.749	LIGERO	28/07/2025	RETIRADO
162	CORDOBA CAICEDO WILSON KEVIN	1.077.424.059	AYUDANTE	14/08/2025	RETIRADO
163	DURANGO ESPINAL RUBEN DARIO	1.020.467.610	AYUDANTE	14/08/2025	RETIRADO
164	URVETA POLO TONY ENRIQUE	1.045.720.703	AYUDANTE	14/08/2025	RETIRADO
165	VELASQUEZ RESTREPO SERGIO ANDRES	1.036.678.702	AYUDANTE	14/08/2025	RETIRADO
166	AGUALIMPIA RAMIREZ KANER FRANCISCO	1.017.176.467	AYUDANTE	14/08/2025	RETIRADO
167	GOMEZ MAZO JULIAN	8.161.526	AYUDANTE	14/08/2025	RETIRADO
168	MEJIA PALENCIA JOSE DANIEL	1.100.550.956	AYUDANTE	14/08/2025	RETIRADO
PAVIMENTAR					
	NOMBRE	**IDENTIFICACIÓN**	**CARGO**	**FECHA DE INGRESO**	**FECHA DE RETIRO**
169	ALONSO DE JESÚS PANIAGUA ZAPATA	71.709.895	AYUDANTE DE OBRA	23/07/2025	ACTIVO
170	CARLOS MARIO RIVERA VILLA	71.696.781	AYUDANTE DE OBRA	23/07/2025	ACTIVO
171	DIEGO LUIS LÓPEZ PÉREZ	1.068.807.795	RASTRILLERO	23/07/2025	ACTIVO
172	GILBERTO DE JESÚS COLORADO TABORDA	98.534.353	ENCARGADO DE CUADRILLA	23/07/2025	ACTIVO
173	JESÚS ALBERTO FLORES CASTILLO	PPT 3.489.433	AYUDANTE DE OBRA	23/07/2025	ACTIVO
174	LUIS ENOBER PARRA SOSA	70.631.869	RASTRILLERO	23/07/2025	ACTIVO
175	SANDRO ALBERTO URIBE LONDOÑO	8.014.121	LIGADOR	23/07/2025	ACTIVO
176	VICTOR MANUEL GALLO GUTIERREZ	98.504.348	AYUDANTE DE OBRA	23/07/2025	ACTIVO
177	OSCAR DE JESÚS GÚZMAN	70.851.766	AYUDANTE DE OBRA	19/08/2025	ACTIVO
178	JHON MARIO VELASQUEZ	98.572.408	RASTRILLERO	19/08/2025	ACTIVO
179	WILMAN GUISAO	1.020.445.841	TORNILLERO	19/08/2025	ACTIVO
180	DANIEL DANILO PAYA RES	1.066.741.466	LIGUERO	19/08/2025	ACTIVO
181	DARY NEL ORTEGA	1.069.463.280	AYUDANTE DE OBRA	19/08/2025	ACTIVO
182	GUSTAVO QUINTANA	98.700.124	AYUDANTE DE OBRA	19/08/2025	ACTIVO
183	JONATAN ALEICES MAYA	1.037.594.243	RASTRILLERO	19/08/2025	ACTIVO
184	NAISIR PADILLA	1.102.874.885	AYUDANTE DE OBRA	19/08/2025	ACTIVO

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

185	JHAN CARLO ZAPATA	1.036.134.685	AYUDANTE DE OBRA	19/08/2025	ACTIVO
186	ALEJANDRO MORALES GALLEGO	1.152.687.179	AYUDANTE DE OBRA	8/08/2025	ACTIVO
187	JORGE ELIECER ALVAREZ MORENO	1.128.480.832	AYUDANTE DE OBRA	8/08/2025	ACTIVO
188	LEÓN DARÍO QUICENO MARIN	1.148.144.870	AYUDANTE DE OBRA	13/08/2025	ACTIVO
189	LUIS ALBERTO PALENCIA FUENTES	1.128.325.346	AYUDANTE DE OBRA	8/08/2025	ACTIVO
190	DEIMER MANUEL OVIEDO SIMANCA	1193044969	OPERADOR TERMINADORA	19/08/2025	ACTIVO
191	ALEXANDER CHARRY MENDEZ	98504477	OPERADOR FRESADORA	19/08/2025	ACTIVO
192	WILLIAM DE JESUS QUINTERO RAMIREZ	15428462	OPERADOR COMPACTADOR DE SUELOS	19/08/2025	ACTIVO
193	JOHN FREDY RAMIREZ ZAPATA	15537255	OPERADOR COMPRESOR	19/08/2025	ACTIVO
194	FABIAN MENDOZA GONZALES	1.148.194.201	AYUDANTE DE OBRA	26/08/2025	ACTIVO
195	JHON ANDERSSON MARMOL PEDROZA	1000393631	INGENIERO ENCARGADO	11/08/2025	RETIRADO
196	JERMUS LEVIS ARRIETA ORDOÑEZ	92537764	AYUDANTE DE OBRA	11/08/2025	RETIRADO
197	ESNEIDER DAVID CAMACHO BAENA	1001034638	AYUDANTE DE OBRA	11/08/2025	RETIRADO
198	ORLANDO BOCAREJO LOZANO	79667345	RASTRILLERO	11/08/2025	RETIRADO
199	EDGAR LEÓN MEJIA MANCO	1128433501	LIGUERO	11/08/2025	RETIRADO
200	JOEL DE JESÚS MURILLO	15325940	AYUDANTE DE OBRA	11/08/2025	RETIRADO
201	JHOJAN ESTIBER MORENO	1066529769	AYUDANTE DE OBRA	11/08/2025	RETIRADO
202	OSCAR DE JESÚS GÚZMAN	70851766	AYUDANTE DE OBRA	11/08/2025	RETIRADO
203	JESÚS ÁNGEL ATEHORTUA	98468534	RASTRILLERO	11/08/2025	RETIRADO
204	ARGEMIRO DE JESÚS HRARRA QUIROZ	15518738	AYUDANTE DE OBRA	11/08/2025	RETIRADO

INGEALQUIPOS

#	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
205	HÉCTOR DE JESÚS ARRIETA REDONDO	79.681.977	CONTROLADOR DE TRANSITO	19/08/2025	ACTIVO
206	GERALDO CHIRINOS	4.925.682	CONTROLADOR DE TRANSITO	19/08/2025	ACTIVO
207	ENESTEBANA BELLO VELASQUEZ	1.045.420.278	CONTROLADOR DE TRANSITO	19/08/2025	ACTIVO
208	YANETH ORTIZ MANJARRREZ	1.002.488.066	CONTROLADOR DE TRANSITO	23/08/2025	ACTIVO
209	LEIDIANA PONCE	42.783.825	CONTROLADOR DE TRANSITO	22/08/2025	ACTIVO
210	LEIDY VIVIANA ZAPATA VELEZ	1.128.443.316	CONTROLADOR DE TRANSITO	22/08/2025	ACTIVO
211	LEIDY JOHANA USUGA USUGA	1.017.208.034	CONTROLADOR DE TRANSITO	22/08/2025	ACTIVO
212	SIGIFREDO ALONSO CORREA CORREA	15.508.295	AYUDANTE	21/08/2025	ACTIVO
213	CARLOS JULIAN ENRIQUE MAYA	1.123.318.880	AYUDANTE	21/08/2025	ACTIVO
214	DANIEL STIVEN LONDOÑO JARAMILLO	1.017.259.833	AYUDANTE	21/08/2025	ACTIVO
215	JHON JAIRO LONDOÑO LONDOÑO	15.295.849	RASTRILLERO	21/08/2025	ACTIVO
216	SERGIO ARLEY LONDOÑO ROLDAN	71.318.418	RASTRILLERO	21/08/2025	ACTIVO
217	JAIME ALBERTO RESTREPO CASTAÑEDA	98.711.536	AYUDANTE	21/08/2025	ACTIVO
218	JHON FREDY CRUZ HERNANDEZ	1.006.846.636	AYUDANTE	21/08/2025	ACTIVO
219	NEIVER CAMILO MUÑOZ OBANDO	1.006.843.648	AYUDANTE	21/08/2025	ACTIVO
220	RUTH MERY AGUIRRE LOPEZ	43.553.135	CONTROLADOR DE TRANSITO	26/08/2025	ACTIVO

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

221	DIANA JIMENA GALVIS CAICEDO	1.020.402.479	CONTROLADOR DE TRANSITO	27/08/2025	ACTIVO
222	PAOLA NOHEMI AGUIRRE LOPÉZ	43.553.681	CONTROLADOR DE TRANSITO	27/08/2025	ACTIVO
223	NATALIA ANDREA JIMENEZ GUERRA	1.020.439.288	CONTROLADOR DE TRANSITO	27/08/2025	ACTIVO
224	OSCAR ELIAS MORALES CORDOBA	98.637.028	CONDUCTOR VEHICULO	28/08/2025	ACTIVO
HUARGO					
#	**NOMBRE**	**IDENTIFICACIÓN**	**CARGO**	**FECHA DE INGRESO**	**FECHA DE RETIRO**
225	CARLOS MARIO MONTOYA OSSA	8126125	CONDUCTOR VEHICULO	26/08/2025	ACTIVO

Anexo 3.3.9 Seguridad Social Consorcio Vial Med 2025

3.3.1.1. SEGUIMIENTO A LOS HALLAZGOS ENCONTRADOS EN LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO PARA LA GESTIÓN, EN EL DESARROLLO DEL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATISTA.

La interventoría formula el plan de acción correspondiente a los ítems identificados con un NO CUMPLE (NC), y desarrollará a continuación el seguimiento para el cumplimiento de este.

NUMERAL	SUBCOMPONENTE	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO
9	Resolución 2013/1986 Art. 1,3, 11 y 14 lit. K, Decreto 1295/1994 Art. 35 y 63 y Parágrafo, Decreto 1072/2015 Art 2.2.4.6.8 y 2.2.4.6.12 Núm. 10	Convocatorias de conformación del Copasst y Cocola. En el mes de septiembre se realizarán las elecciones pertinentes, ya que se cuente con la mayoría de personal ingresado (pendiente para entregar en septiembre).	

4. INFORME ADMINISTRATIVO DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA:

4.1. CONTROL DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA ASOCIADO AL PROYECTO (ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO) Y DE SU PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL.

A continuación, se relaciona el personal del contratista asociado al proyecto, adicional se hace verificación del estado de afiliación de cada colaborador, los soportes de afiliación del personal nuevo y los documentos de paz y salvos de personal retirado están consignados en los anexos del numeral 3.3 de la gestión SST.

Tabla 51. Relación de personal vinculado al proyecto activo durante el mes de **agosto 2025.**

PERSONAL ACTIVO CONSORCIO VIALMED 2025					
CONSORCIO VIALMED 2025					
#	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
1	NATALIA ANDREA CALDERÓN VÁSQUEZ	1.017.209.286	DIRECTORA DE OBRA	4/07/2025	ACTIVO
2	LUIS ALEJANDRO CASTRO ROQUE	1.053.842.729	RESIDENTE DE OBRA	21/07/2025	ACTIVO
3	CARLOS ARTURO TORO GÓMEZ	1.039.446.342	RESIDENTE DE OBRA	21/07/2025	ACTIVO
4	JUAN GUILLERMO RODRIGUEZ GÓMEZ	71.584.643	RESIDENTE DE OBRA	14/07/2025	ACTIVO
5	VICTOR HUGO VARGAS RODRIGUEZ	70.694.470	LIDER COMUNICACIONES	21/07/2025	ACTIVO
6	WILLIAM HUMBERTO TOBÓN RESTREPO	98.507.113	TÉCNOLOGO EN OBRAS CIVILES	21/07/2025	ACTIVO
7	WILSON ALBERTO SERNA CARO	15.264.416	TÉCNOLOGO EN OBRAS CIVILES	21/07/2025	ACTIVO
8	SANTIAGO HENAO MEJÍA	1.007.253.881	INGENIERO OBRAS CIVILES	7/07/2025	ACTIVO
9	SEBASTIÁN POSADA GARCÍA	1.036.633.297	PROFESIONAL PMT	21/07/2025	ACTIVO
10	FRANCY MILENA ESCOBAR MORALES	43.100.537	PROFESIONAL SST	21/07/2025	ACTIVO
11	ASNEY DEL CARMEN GARCÍA AGAMEZ	50.909.309	PROFESIONAL SOCIAL	21/07/2025	ACTIVO
12	DORIELA AMPARO OSPINA MARULANDA	43.169.267	PROFESIONAL SOCIAL	21/07/2025	ACTIVO
13	ELSA MARÍA POLO CUELLO	1.082.862.061	PROFESIONAL AMBIENTAL	8/07/2025	ACTIVO
14	ANDRÉS FELIPE REYES MARÍN	1.059.703.439	TECNÓLOGO EN OBRAS CIVILES	23/07/2025	ACTIVO
15	JUAN PABLO OCHOA BENJUMEA	1.036.687.717	TECNÓLOGO EN OBRAS CIVILES	23/07/2025	ACTIVO
16	MANUEL FERNANDO DELGADO VALLEJO	1.036.669.125	TECNÓLOGO EN OBRAS CIVILES	23/07/2025	ACTIVO
17	PIEDAD MARÍA CASTRO CELIS	43.108.123	TECNÓLOGO EN OBRAS CIVILES	24/07/2025	ACTIVO
18	DANIELA RESTREPO GONZÁLEZ	1.036.938.945	PROFESIONAL AMBIENTAL	21/07/2025	ACTIVO
19	ANGELA MARIA ARISTIZABAL GIRALDO	32.140.755	RESIDENTE ADMINISTRATIVA	18/07/2025	ACTIVO
20	ALEJANDRO MANUEL RIQUEME GUEVARA	1.067.096.996	TECNÓLOGO EN OBRAS CIVILES	28/07/2025	ACTIVO
21	ARLEY SANTIAGO SUÁREZ MARULANDA	1.040.745.565	TECNÓLOGO EN OBRAS CIVILES	28/07/2025	ACTIVO
22	CLAUDIA MILENA COLLAZOS VILLA	43.145.348	TECNÓLOGA SST	28/07/2025	ACTIVO
23	DIANA MARCELA JARAMILLO RAMÍREZ	43.904.939	TECNÓLOGA EN OBRAS CIVILES	28/07/2025	ACTIVO
24	MARIA ISABEL PÉREZ MONTES	1.128.271.702	TECNÓLOGA ADMINISTRATIVA	28/07/2025	ACTIVO

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

PERSONAL ACTIVO CONSORCIO VIALMED 2025					
CONSORCIO VIALMED 2025					
#	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
25	GISELA MARIA ATENCIA NAVARRO	1.066.513.588	TECNÓLOGA SST	29/07/2025	ACTIVO
26	SAMUEL OROZCO NORIEGA	1.037.664.653	TECNÓLOGO EN OBRAS CIVILES	29/07/2025	ACTIVO
27	JAIME ALONSO VERA RODRIGUEZ	98.627.697	TECNÓLOGO EN OBRAS CIVILES	24/07/2025	ACTIVO
28	LUIS DANIEL DE LA ROSA VISBAL	1.082.942.983	TECNÓLOGO EN OBRAS CIVILES	10/08/2025	ACTIVO
29	ANDY ANAYA NIETO	1.073.972.876	TECNÓLOGO EN OBRAS CIVILES	4/08/2025	ACTIVO
30	FEDERICO AGUDELO MONCADA	1.004.519.462	TECNÓLOGO EN OBRAS CIVILES	10/08/2025	ACTIVO
31	EMI TATIANA ARBELAEZ ORTIZ	1.152.691.705	TÉCNICA ADMINISTRATIVA	10/08/2025	ACTIVO
32	LINA MARIA OCAMPO GÓMEZ	1.152.215.568	RESIDENTE DE OBRA	11/08/2025	ACTIVO
33	ELKIN HERNANDO MORA PUERTA	98.495.085	TECNÓLOGO EN OBRAS CIVILES	11/08/2025	ACTIVO
34	LUISA MARIA BERMUDEZ CANO	1.000.538.542	TECNÓLOGO EN OBRAS CIVILES	15/08/2025	ACTIVO
35	LIZETH JULIANA ALZATE ARBOLEDA	1.037.073.873	TECNÓLOGO EN OBRAS CIVILES	14/08/2025	ACTIVO
36	DANIEL ACUÑA GOMEZ	1.065.009.003	RESIDENTE DE OBRA	16/08/2025	ACTIVO
37	KATERINE HERNANDEZ CHAURRA	4.554.382	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	19/08/2025	ACTIVO
38	SANTIAGO HIGUITA VALENCIA	1.037.776.106	TECNÓLOGO EN OBRAS CIVILES	24/07/2025	ACTIVO
39	SANTIAGO GARCIA SALAZAR	1.001.477.477	TECNÓLOGO EN OBRAS CIVILES	28/07/2025	30/07/2025
40	JUAN PABLO CASTAÑO GARCÍA	1.017.244.168	TECNÓLOGO EN OBRAS CIVILES	28/07/2025	31/07/2025
ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS					
#	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
41	SIMON URAN JARAMILLO	1.025.885.254	AYUDANTE	18/07/2025	ACTIVO
42	YADIRL JENRY PEREA IBARGUEN	1.023.628.277	AYUDANTE	18/07/2025	ACTIVO
43	DIEGO CANO MANCO	1.000.885.407	LIGADOR	21/07/2025	ACTIVO
44	JOSÉ MANUEL LOZANO HERNANDEZ	78.698.878	AYUDANTE	21/07/2025	ACTIVO
45	SERGIO EUSTAQUIO PEREA BENITEZ	10.199.838	LIGADOR	18/07/2025	ACTIVO
46	JOHAN FABIAN ROMERO HERRERA	1.006.700.443	AYUDANTE	21/07/2025	ACTIVO
47	JAVIER MANUEL SOTO AVILEZ	10.998.746	RASTRILLERO	21/07/2025	ACTIVO
48	JULIAN ALONSO GALEANO RIOS	1.001.226.018	RASTRILLERO	21/07/2025	ACTIVO
49	FABER DUVAN QUIROZ CHAVARRIA	71.218.539	AYUDANTE	21/07/2025	ACTIVO
50	SEBASTIAN VELASQUEZ CUADRADO	1.216.720.990	AYUDANTE	21/07/2025	ACTIVO
51	JOSE NILSEN SALDARRIAGA	70.326.052	AYUDANTE	21/07/2025	ACTIVO
52	ARNOL ARLEY ARANGO PARRA	1.035.234.678	AYUDANTE	21/07/2025	ACTIVO
53	ALBEIRO ANTONIO MORA GONZALES	1.128.388.502	RASTRILLERO	21/07/2025	ACTIVO
54	RESTREPO	1.000.654.446	AYUDANTE	21/07/2025	ACTIVO
55	JHONIER ESTHITH CACERES CORDOBA	1.003.931.398	AYUDANTE	21/07/2025	ACTIVO
56	JOSE ARBEY DUQUE DUARTE	1.017.208.758	RASTRILLERO	21/07/2025	ACTIVO
57	SEBASTIAN MURILLO RIVAS	1.007.053.871	AYUDANTE	21/07/2025	ACTIVO

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

PERSONAL ACTIVO CONSORCIO VIALMED 2025					
CONSORCIO VIALMED 2025					
#	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
58	LEIMAR PEREZ AREIZA	1.044.150.803	AYUDANTE	21/07/2025	ACTIVO
59	JUAN DAVID VANEGAS	1.001.545.570	RASTRILLERO	21/07/2025	ACTIVO
60	MARLON MARTINEZ SUAREZ	1.066.572.966	AYUDANTE	21/07/2025	ACTIVO
61	MIGUEL ANGEL GUERRA USUGA	1.037.628.049	RASTRILLERO	21/07/2025	ACTIVO
62	VICTOR ALFONSO CORDOBA ESPINOSA	1.027.954.723	AYUDANTE	21/07/2025	ACTIVO
63	ALBEIRO ANTONIO SUAREZ MENDOZA	8.438.422	AYUDANTE	21/07/2025	ACTIVO
64	JUAN DAVID PALACIOS QUINTO	1.193.232.928	AYUDANTE	21/07/2025	ACTIVO
65	JHONNY ALEXANDER LONDOÑO MONTOYA	98.698.748	AYUDANTE	21/07/2025	ACTIVO
66	LEIVER PADILLA OSORIO	11.166.305	AYUDANTE	21/07/2025	ACTIVO
67	REINALDO LOPERA	3.663.335	AYUDANTE	21/07/2025	ACTIVO
68	JORGE ANDRES MOSQUERA GOMEZ	1.076.818.653	LIGADOR	21/07/2025	ACTIVO
69	JUAN DAVID SANMARTIN CARDONA	1.017.191.272	OPERARIO DE EQUIPO	21/07/2025	ACTIVO
70	YOVANNY CUESTA ORTIZ	1.078.117.258	RASTRILLERO	21/07/2025	ACTIVO
71	JUAN ESTEBAN MURILLO ALVAREZ	1.045.497.637	AYUDANTE	21/07/2025	ACTIVO
72	FRANCISCO TOBON TOBON	1.026.147.320	LIGADOR	21/07/2025	ACTIVO
73	JHON JAIRO VALENCIA MORENO	1.077.436.701	AYUDANTE	21/07/2025	ACTIVO
74	EDUARDO ENRIQUE MESA RODRIGUEZ	3.840.411	AYUDANTE	21/07/2025	ACTIVO
75	DEIVI PINO RAMIREZ	100.090.533	AYUDANTE	21/07/2025	ACTIVO
76	LAURA NARANJO RENDÓN	1.039.454.020	AUXILIAR SST	23/07/2025	ACTIVO
77	NELSON DE JESÚS SERNA	98.462.729	OPERARIO DE EQUIPO	14/11/2025	ACTIVO
78	ROBLERTO CARLOS VASQUEZ LOPEZ	1.040.743.189	AYUDANTE	6/03/2025	ACTIVO
79	BIERMER SMITH ZAPATA	1.214.720.397	LIGADOR	28/07/2025	ACTIVO
80	JAIME ALEXIS SERNA RIVERA	98.711.003	AYUDANTE	28/07/2025	ACTIVO
81	SEBASTIAN SANCHEZ	1.128.457.928	AYUDANTE	28/07/2025	ACTIVO
82	JOHAN STIVEN RENTERIA OSPINA	1.010.170.674	AYUDANTE	28/07/2025	ACTIVO
83	MATEO MOASQUERA MOSQUERA	1.025.648.141	AYUDANTE	28/07/2025	ACTIVO
84	ALVARO OSORIO GARRCES	8.012.790	AYUDANTE	28/07/2025	ACTIVO
85	YAIR ANTONIO ASPRILLA VALENCIA	11.803.214	AYUDANTE	28/07/2025	ACTIVO
86	DIEGO ANDRES VILLA RIOS	98.713.744	LIGADOR	28/07/2025	ACTIVO
87	BRAYAN DE JESUS QUINTO PALACIOS	1.216.729.783	LIGADOR	28/07/2025	ACTIVO
88	ALAIN DE JESUS JULIO GARCIA	1.074.712.086	AYUDANTE	28/07/2025	ACTIVO
89	JOSE BERNARDO CORREA CABAS	1.074.717.158	AYUDANTE	28/07/2025	ACTIVO
90	OSCAR DARIO ZAPATA	98.653.743	AYUDANTE	28/07/2025	ACTIVO
91	LUIS CARLOS MONSALVE	1.129.532.636	AYUDANTE	28/07/2025	ACTIVO
92	JOHNA ESTIBEN QUINTERO FONNEGRA	98.703.083	RASTRILLERO	28/07/2025	ACTIVO

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

PERSONAL ACTIVO CONSORCIO VIALMED 2025					
CONSORCIO VIALMED 2025					
#	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
93	JAIME ALBERTO CHICA PULGARIN	1.128.415.899	AYUDANTE	28/07/2025	ACTIVO
94	ADELIS MONTERO MEDINA	1.712.248	AYUDANTE	28/07/2025	ACTIVO
95	PEDRO LUIS ROBLES CHARRIS	1.082.405.869	AYUDANTE	28/07/2025	ACTIVO
96	LUIS EMIRO MOSQUERA OREJUELA	82.360.601	RASTRILLERO	28/07/2025	ACTIVO
97	ALDAIR JOSE CALLE CASTILLO	1.066.749.749	LIGADOR	28/07/2025	ACTIVO
98	LUIS CARLOS CASTILLO QUEJADA	1.017.207.858	AYUDANTE	28/07/2025	ACTIVO
99	SANTIAGO MUÑOZ RODRIGUEZ	1.020.492.897	AYUDANTE	28/07/2025	ACTIVO
100	ALEXANDER MOSQUERA MORENO	1.146.443.436	AYUDANTE	28/07/2025	ACTIVO
101	JHON JAIME HERRERA TABORDA	15.511.716	ENCARGADO DE CUADRILLA	29/07/2025	ACTIVO
102	JOSE ALE VILLALOBOS HERNANDEZ	1.063.149.719	AYUDANTE	29/07/2025	ACTIVO
103	DAVID ESNEIDER ZAPATA ARBOLEDA	1.001.249.839	AYUDANTE	29/07/2025	ACTIVO
104	VICTOR ALFONSO MEJIA MARIN	1.096.188.968	AYUDANTE	21/07/2025	ACTIVO
105	CRISTIAN ALEJANDRO JIMENEZ CASTAÑO	1.099.552.574	AYUDANTE	21/07/2025	ACTIVO
106	DILAN YESID LEMUS PADILLA	1.007.210.881	LIGADOR	21/07/2025	ACTIVO
107	JUAN CARLOS ORTEGA	1.115.747.149	AYUDANTE	1/08/2025	ACTIVO
108	ELKIN DAVID CASIANNI OZUNA	1.101.497.577	LIGADOR	1/08/2025	ACTIVO
109	JAIDER DAVID PEREZ LEÓN	1.063.289.035	AYUDANTE	1/08/2025	ACTIVO
110	OMAR ALEJANDRO MONROY	1.121.921.526	AYUDANTE	1/08/2025	ACTIVO
111	JOSE DAVISD QUEJADA BOHORQUEZ	1.033.989.402	AYUDANTE	1/08/2025	ACTIVO
112	JHOSUA MIRA RENDÓN	1.000.554.344	AYUDANTE	1/08/2025	ACTIVO
113	CARLOS ANDRES CARMONA	1.037.674.225	AYUDANTE	1/08/2025	ACTIVO
114	EDISON DE JESUS SANCHEZ HINCAPIE	15.512.265	AYUDANTE	1/08/2025	ACTIVO
115	JOSE LUIS ZUÑIGA BEDOYA	1.001.901.166	AYUDANTE	4/08/2025	ACTIVO
116	JOSE ORLANDO MENDOZA	1.150.177	AYUDANTE	4/08/2025	ACTIVO
117	ESNEIDER CERQUERA ESCUDERO	1.023.624.189	AYUDANTE	4/08/2025	ACTIVO
118	JOSE ANGEL JULIO SILGADO	1.003.654.788	AYUDANTE	4/08/2025	ACTIVO
119	JHOAN ALBERTO HIGUITA HERNANDEZ	1.039.701.632	AYUDANTE	4/08/2025	ACTIVO
120	JORLETH CONTRERAS ARRIETA	1.044.911.952	AYUDANTE	4/08/2025	ACTIVO
121	CRISTIAN JOB PADILLA CALLE	1.193.127.048	AYUDANTE	4/08/2025	ACTIVO
122	JHON MARIO CONTRERAS	1.003.308.840	AYUDANTE	4/08/2025	ACTIVO
123	HUGO DE JESUS RIOS FRANCO	71.630.405	AYUDANTE	4/08/2025	ACTIVO
124	BRAYAN USUGA GUISAO	1.001.133.444	AYUDANTE	4/08/2025	ACTIVO
125	WILMAR ALEXANDER SANCHEZ OROZCO	1.017.122.975	AYUDANTE	4/08/2025	ACTIVO
126	JOSE RUFINO MOSQUERA MOSQUERA	71.740.265	RASTRILLERO	20/08/2025	ACTIVO
127	ÁNDRES FELIPE MISAS MENESÉS	1.001.510.330	AYUDANTE	23/08/2025	ACTIVO

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

PERSONAL ACTIVO CONSORCIO VIALMED 2025					
CONSORCIO VIALMED 2025					
#	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
128	LUIS FELIPE ARBOLEDA JARAMILLO	1.037.647.785	AYUDANTE	25/08/2025	ACTIVO
129	JEIMAR QUICENO HERNANDEZ	1.216.717.092	AYUDANTE	25/08/2025	ACTIVO
130	DEILER SANCHEZ ALDANA	1.028.009.980	AYUDANTE	25/08/2025	ACTIVO
131	YEFERSON CORREA SALAZAR	1.214.733.258	AYUDANTE	25/08/2025	ACTIVO
132	JAIR MIGUEL MARTINEZ	1.046.532.090	AYUDANTE	25/08/2025	ACTIVO
133	MAURICIO ROMAÑA CORDOBA	1.038.807.107	AYUDANTE	25/08/2025	ACTIVO
134	MARICELLY RINCON USUGA	1.001.610.190	AYUDANTE VIAL	25/08/2025	ACTIVO
135	ANA YARLENY AGUIRRE GALEANO	21.590.352	AUXILIAR VIAL	26/08/2025	ACTIVO
136	JAIME ERNEY CARMONA ZAPATA	1.045.422.465	AYUDANTE	26/08/2025	ACTIVO
137	JOSE DE LOS SANTOS ISAZA ISAZA	1.017.122.511	AYUDANTE	26/08/2025	ACTIVO
138	HECTOR DUVAN VELEZ DURAN	1.152.468.090	AYUDANTE	26/08/2025	ACTIVO
139	JAVIER ENRIQUE MEJIA HERNANDEZ	98.615.271	AYUDANTE	26/08/2025	ACTIVO
140	JHON ALEXANDER SEPULVEDA ALVAREZ	1.148.698.123	AYUDANTE	26/08/2025	ACTIVO
141	YOHANDRIZ JOSE ACOSTA MONTERO	6.105.357	AYUDANTE	26/08/2025	ACTIVO
142	LUIS ALBERTO PANIAGUA SERNA	1.128.403.289	AYUDANTE	26/08/2025	ACTIVO
143	JHON JAIRO ZAPATA PATIÑO	71.366.318	SST	28/08/2025	ACTIVO
144	JUAN FERNADO CUESTA CORDOBA	4.809.323	RASTRILLERO	28/08/2025	ACTIVO
145	VICTÓR ALFONSO GARCÍA GARCÍA	1.017.174.581	AYUDANTE	21/07/2025	RETIRADO
146	JHON DEIVYS CARO SALCEDO	1.002.318.088	AYUDANTE	21/07/2025	RETIRADO
147	SEBASTIAN ÁNDRES CASTAÑEDA VERA	1.234.988.790	AYUDANTE	28/07/2025	RETIRADO
148	MICHAEL ALONSO HERNANDÉZ MONTOYA	1.000.192.309	AYUDANTE	28/07/2025	RETIRADO
149	WILMER DURANGO OQUENDO	1.001.669.589	AYUDANTE	28/07/2025	RETIRADO
150	FRANCISCO HINESTROZA MOSQUERA	101.718.080	AYUDANTE	28/07/2025	RETIRADO
151	JADER GARCÍA VILORIA	1.101.460.360	LIGADOR	28/07/2025	RETIRADO
152	JAIME ALEXIS SERNA RIVERA	98.711.003	RASTRLLERO	11/008/2025	RETIRADO
153	ALBEIRO DE JESUS GALLEGO VELASQUEZ	98.662.317	LIGUERO	11/008/2025	RETIRADO
154	JAVIER ESTIVEN SOSA PEREZ	1.018.228.217	AYUDANTE	11/008/2025	RETIRADO
155	EDGAR ELIECER JIMENEZ	98.713.483	AYUDANTE	11/008/2025	RETIRADO
156	YONATAN ORLANDO PADILLA CIPRIAN	1.133.839.901	AYUDANTE	11/008/2025	RETIRADO
157	JHORMAN ANDRES VELASQUEZ ORTIZ	1.146.440.589	AYUDANTE	11/008/2025	RETIRADO
158	WILDER ANDRES PIEDRAHITA RESTREPO	1.007.054.147	AYUDANTE	11/008/2025	RETIRADO
159	ALFONSO RAMIREZ ISAZA	70.137.414	AYUDANTE	11/008/2025	RETIRADO
160	GALEANO RIOS DANIEL SANTIAGO	1.001.226.017	RASTRLLERO	14/08/2025	RETIRADO
161	CALLE CASTILLO JOSE ALDAIR	1.066.749.749	LIGERO	28/07/2025	RETIRADO
162	CORDOBA CAICEDO WILSON KEVIN	1.077.424.059	AYUDANTE	14/08/2025	RETIRADO
163	DURANGO ESPINAL RUBEN DARIO	1.020.467.610	AYUDANTE	14/08/2025	RETIRADO
164	URVETA POLO TONY ENRIQUE	1.045.720.703	AYUDANTE	14/08/2025	RETIRADO
165	VELASQUEZ RESTREPO SERGIO ANDRES	1.036.678.702	AYUDANTE	14/08/2025	RETIRADO

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

PERSONAL ACTIVO CONSORCIO VIALMED 2025					
CONSORCIO VIALMED 2025					
#	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
166	AGUALIMPIA RAMIREZ KANER FRANCISCO	1.017.176.467	AYUDANTE	14/08/2025	RETIRADO
167	GOMEZ MAZO JULIAN	8.161.526	AYUDANTE	14/08/2025	RETIRADO
168	MEJIA PALENCIA JOSE DANIEL	1.100.550.956	AYUDANTE	14/08/2025	RETIRADO
PAVIMENTAR					
	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
169	ALONSO DE JESÚS PANIAGUA ZAPATA	71.709.895	AYUDANTE DE OBRA	23/07/2025	ACTIVO
170	CARLOS MARIO RIVERA VILLA	71.696.781	AYUDANTE DE OBRA	23/07/2025	ACTIVO
171	DIEGO LUIS LÓPEZ PÉREZ	1.068.807.795	RASTRILLERO	23/07/2025	ACTIVO
172	GILBERTO DE JESÚS COLORADO TABORDA	98.534.353	ENCARGADO DE CUADRILLA	23/07/2025	ACTIVO
173	JESÚS ALBERTO FLORES CASTILLO	PPT 3.489.433	AYUDANTE DE OBRA	23/07/2025	ACTIVO
174	LUIS ENOBER PARRA SOSA	70.631.869	RASTRILLERO	23/07/2025	ACTIVO
175	SANDRO ALBERTO URIBE LONDOÑO	8.014.121	LIGADOR	23/07/2025	ACTIVO
176	VICTOR MANUEL GALLO GUTIERREZ	98.504.348	AYUDANTE DE OBRA	23/07/2025	ACTIVO
177	OSCAR DE JESÚS GÚZMAN	70.851.766	AYUDANTE DE OBRA	19/08/2025	ACTIVO
178	JHON MARIO VELASQUEZ	98.572.408	RASTRILLERO	19/08/2025	ACTIVO
179	WILMAN GUISAO	1.020.445.841	TORNILLERO	19/08/2025	ACTIVO
180	DANIEL DANILO PAYA RES	1.066.741.466	LIGUERO	19/08/2025	ACTIVO
181	DARY NEL ORTEGA	1.069.463.280	AYUDANTE DE OBRA	19/08/2025	ACTIVO
182	GUSTAVO QUINTANA	98.700.124	AYUDANTE DE OBRA	19/08/2025	ACTIVO
183	JONATAN ALEICES MAYA	1.037.594.243	RASTRILLERO	19/08/2025	ACTIVO
184	NAISIR PADILLA	1.102.874.885	AYUDANTE DE OBRA	19/08/2025	ACTIVO
185	JHAN CARLO ZAPATA	1.036.134.685	AYUDANTE DE OBRA	19/08/2025	ACTIVO
186	ALEJANDRO MORALES GALLEGO	1.152.687.179	AYUDANTE DE OBRA	8/08/2025	ACTIVO
187	JORGE ELIECER ALVAREZ MORENO	1.128.480.832	AYUDANTE DE OBRA	8/08/2025	ACTIVO
188	LEÓN DARÍO QUICENO MARIN	1.148.144.870	AYUDANTE DE OBRA	13/08/2025	ACTIVO
189	LUIS ALBERTO PALENCIA FUENTES	1.128.325.346	AYUDANTE DE OBRA	8/08/2025	ACTIVO
190	DEIMER MANUEL OVIEDO SIMANCA	1193044969	OPERADOR TERMINADORA	19/08/2025	ACTIVO
191	ALEXANDER CHARRY MENDEZ	98504477	OPERADOR FRESADORA	19/08/2025	ACTIVO
192	WILLIAM DE JESUS QUINTERO RAMIREZ	15428462	OPERADOR COMPACTADOR DE SUELOS	19/08/2025	ACTIVO
193	JOHN FREDY RAMIREZ ZAPATA	15537255	OPERADOR COMPRESOR	19/08/2025	ACTIVO
194	FABIAN MENDOZA GONZALES	1.148.194.201	AYUDANTE DE OBRA	26/08/2025	ACTIVO
195	JHON ANDERSSON MARMOL PEDROZA	1000393631	INGENIERO ENCARGADO	11/08/2025	RETIRADO
196	JERMUS LEVIS ARRIETA ORDOÑEZ	92537764	AYUDANTE DE OBRA	11/08/2025	RETIRADO
197	ESNEIDER DAVID CAMACHO BAENA	1001034638	AYUDANTE DE OBRA	11/08/2025	RETIRADO

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

PERSONAL ACTIVO CONSORCIO VIALMED 2025					
CONSORCIO VIALMED 2025					
#	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
198	ORLANDO BOCAREJO LOZANO	79667345	RASTRILLERO	11/08/2025	RETIRADO
199	EDGAR LEÓN MEJIA MANCO	1128433501	LIGUERO	11/08/2025	RETIRADO
200	JOEL DE JESÚS MURILLO	15325940	AYUDANTE DE OBRA	11/08/2025	RETIRADO
201	JHOJAN ESTIBER MORENO	1066529769	AYUDANTE DE OBRA	11/08/2025	RETIRADO
202	OSCAR DE JESÚS GÚZMAN	70851766	AYUDANTE DE OBRA	11/08/2025	RETIRADO
203	JESÚS ÁNGEL ATEHORTUA	98468534	RASTRILLERO	11/08/2025	RETIRADO
204	ARGEMIRO DE JESÚS HRARRA QUIROZ	15518738	AYUDANTE DE OBRA	11/08/2025	RETIRADO
INGEALQUIPOS					
#	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
205	HÉCTOR DE JESÚS ARRIETA REDONDO	79.681.977	CONTROLADOR DE TRANSITO	19/08/2025	ACTIVO
206	GERALDO CHIRINOS	4.925.682	CONTROLADOR DE TRANSITO	19/08/2025	ACTIVO
207	ENESTEBANA BELLO VELASQUEZ	1.045.420.278	CONTROLADOR DE TRANSITO	19/08/2025	ACTIVO
208	YANETH ORTIZ MANJARRREZ	1.002.488.066	CONTROLADOR DE TRANSITO	23/08/2025	ACTIVO
209	LEIDIANA PONCE	42.783.825	CONTROLADOR DE TRANSITO	22/08/2025	ACTIVO
210	LEIDY VIVIANA ZAPATA VELEZ	1.128.443.316	CONTROLADOR DE TRANSITO	22/08/2025	ACTIVO
211	LEIDY JOHANA USUGA USUGA	1.017.208.034	CONTROLADOR DE TRANSITO	22/08/2025	ACTIVO
212	SIGIFREDO ALONSO CORREA CORREA	15.508.295	AYUDANTE	21/08/2025	ACTIVO
213	CARLOS JULIAN ENRIQUE MAYA	1.123.318.880	AYUDANTE	21/08/2025	ACTIVO
214	DANIEL STIVEN LONDOÑO JARAMILLO	1.017.259.833	AYUDANTE	21/08/2025	ACTIVO
215	JHON JAIRO LONDOÑO LONDOÑO	15.295.849	RASTRILLERO	21/08/2025	ACTIVO
216	SERGIO ARLEY LONDOÑO ROLDAN	71.318.418	RASTRILLERO	21/08/2025	ACTIVO
217	JAIME ALBERTO RESTREPO CASTAÑEDA	98.711.536	AYUDANTE	21/08/2025	ACTIVO
218	JHON FREDY CRUZ HERNANDEZ	1.006.846.636	AYUDANTE	21/08/2025	ACTIVO
219	NEIVER CAMILO MUÑOZ OBANDO	1.006.843.648	AYUDANTE	21/08/2025	ACTIVO
220	RUTH MERY AGUIRRE LOPEZ	43.553.135	CONTROLADOR DE TRANSITO	26/08/2025	ACTIVO
221	DIANA JIMENA GALVIS CAICEDO	1.020.402.479	CONTROLADOR DE TRANSITO	27/08/2025	ACTIVO
222	PAOLA NOHEMI AGUIRRE LOPÉZ	43.553.681	CONTROLADOR DE TRANSITO	27/08/2025	ACTIVO
223	NATALIA ANDREA JIMENEZ GUERRA	1.020.439.288	CONTROLADOR DE TRANSITO	27/08/2025	ACTIVO
224	OSCAR ELIAS MORALES CORDOBA	98.637.028	CONDUCTOR VEHICULO	28/08/2025	ACTIVO
HUARGO					
#	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
225	CARLOS MARIO MONTOYA OSSA	8126125	CONDUCTOR VEHICULO	26/08/2025	ACTIVO

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Tabla 52. Relación de planillas de seguridad social presentadas **agosto 2025**.

Razón social	Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el periodo
Consorcio Vial Med	JULIO	79594227	$ 137.400	$ 549.400	$ 239.000	$ 1.057.200
Consorcio Vial Med	AGOSTO	80541329	$ 5.607.700	$ 21.715.600	$ 9.742.500	$ 42.657.400
IngeAlquipos S.A.S	AGOSTO	80371185	$ 644.200	$ 2.585.300	$ 1.120.700	$ 4.994.400
Prisma 54 S.A.S	AGOSTO	80381463	$ 193.600	$ 744.300	$ 336.900	$ 1.498400

Tabla 53. Certificado de revisor fiscal actualizado del contratista:

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento
19/09/2025	Últimos seis meses (6) meses	Catherine Rua Correa Contadora Pública T.P N.° 285453 Consorcio VualMed 2025
19/09/2025	Últimos seis meses (6) meses	Karina Paola Mármol Noriega Revisora Fiscal T.P N.° 95553 -T Prisma 54 S.A.S
19/09/2025	Últimos seis meses (6) meses	Karina Paola Mármol Noriega Revisora Fiscal T.P N.° 95553 -T IngeAlquipos S.A.S

Anexo 4.4.1 Certificación parafiscales Consorcio Vial Med 2025 y consorciados.

4.2. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA DE OBRA FRENTE A LA SUBCONTRATACIÓN:

En relación a la subcontratación, el Consorcio VialMed 2025 a través de comunicado de fecha 21 de julio de 2025, solicitó al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, aprobación para subcontratar varias actividades del contrato de obra N° 4600105252 de 2025 a la empresa constructora Estructuras y Pavimentos S.A.S, actividades relacionadas a continuación:

- ✓ Rango 0: De 0,5 a 5 Ton/Jornada Horario diurno.
- ✓ Rango 1: De 9,1 a 12,5 Ton/Jornada Horario diurno.
- ✓ Rango 1: De 9,1 a 12,5 Ton/Jornada Horario nocturno.
- ✓ Rango 2: De 12,51 a 16 Ton/Jornada.
- ✓ Rango 3: De 8 a 19,99 m3/Jornada.
- ✓ Rango 4: De 20 a 50m3/Jornada Horario diurno.

- ✓ Rango 4: De 20 a 50m3/Jornada Horario nocturno.

El contratista Consorcio VialMed 2025 describe en el comunicado la pertinencia de subcontratar las actividades antes mencionadas, toda vez que considera que la empresa Estructuras y Pavimentos S.A.S cuenta con los recursos técnicos suficientes de personal idóneo y la maquinaria necesaria para la ejecución de las actividades. Así mismo, cuenta con la capacidad financiera para asumir los gastos de ejecución del mismo mientras se ejecuta el acta de obra, como lo demuestra los índices de liquides y capacidad de endeudamiento reportados, y a la experiencia y trayectoria que tiene en el mercado para cumplir a cabalidad las exigencias del presente contrato.

Mediante comunicado número 001 de fecha 21 de julio de 2025, en atención a la solicitud del contratista Consorcio VialMed 2025 para la subcontratación de actividades específicas relacionadas con la instalación de mezcla asfáltica, la Interventoría de acuerdo a la cláusula 20 del contrato de obra N° 4600105252 de 2025 que cita “la subcontratación requiere autorización expresa de la entidad contratante o su interventoría delegada, sin que ello implique la liberación de responsabilidad del contratista frente al cumplimiento integral de las obligaciones contractuales”; y según decreto 1082 de 2015, artículos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.2.9 y habiendo revisado la documentación requerida anexa al comunicado del contratista del 9 de julio de 2025, considera viable la subcontratación con la empresa Estructuras y Pavimentos S.A.S exclusivamente para la ejecución de las actividades relacionadas con el suministro e instalación de mezcla asfáltica en los rangos antes descritos; sin embargo, esta aprobación está condicionada a la presentación de otros documentos:

- ✓ Contrato de subcontratación firmado.
- ✓ Pólizas de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual que incluyan al subcontratista o póliza propia con los mismos amparos.
- ✓ Plan detallado de ejecución de actividades, articulado con el cronograma general del contrato principal.
- ✓ Certificación de no inhabilidades del subcontratista.

Finalmente, la supervisión designada para el contrato de Interventoría N° 4600105322 de 2025, basándose en los motivos expuestos por la interventoría Consorcio Medurbano 20005377 mediante comunicado N° 001 de fecha 21 de julio de 2025, consideró viable que el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín apruebe que el contratista Consorcio VialMed 2025 subcontrate a la empresa Estructuras y Pavimentos S.A.S para las actividades de mezcla asfáltica; como lo expone en su oficio dirigido al Secretario de Infraestructura.

Cabe anotar que, al **31 de agosto de 2025**, el contratista no ha hecho entrega de la totalidad de la documentación. En caso de presentarse incumplimientos, deficiencias en la ejecución o riesgos asociados, la Interventoría podrá solicitar la modificación o terminación del subcontrato, según lo estipulado en la cláusula 20 del contrato principal.

4.3. INFORME DE LA MATERIALIZACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO DE OBRA Y SU MITIGACIÓN:

A la fecha no ha sido necesario realizar implementación de la matriz de riesgos establecida para el proyecto.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

4.4. CONTROL A LOS COMPROMISOS DEFINIDOS EN LOS COMITÉS DE OBRA:

Tabla 54. Relación de actas de reunión y comités realizados en agosto de 2025

Fecha	N° de Acta	Tipo de Acta	Componente	Lugar	Participantes	Temas Tratados	Compromisos Adquiridos
05/08/2025	2	Acta de comité	Técnico	Campamento Interventoría	Distrito Especial de Ciencia y Tecnología de Medellín Contratista Consorcio Vialmed 2025 Interventoría Consorcio Med Urbano 20005376	Revisión compromisos acta de comité anterior, formato empleabilidad, cantidad de cuadrillas activas, pruebas de campo y laboratorio, formula de trabajo, atención baches.	✓ Ajustar organigrama del contrato de obra incluyendo número de contacto de los profesionales. ✓ Ajustar el organigrama de Interventoría asignando al residente N° 1 las cuadrillas de masivos. ✓ Presentar informe del mes de julio de 2025. ✓ Incorporar a la obra personal femenino para funciones de para y siga. ✓ Entrega de plan de calidad. ✓ Dotar al personal de obra con uniformes y chalecos de acuerdo al manual de imagen de la entidad. ✓ Presentar diseños y recomendaciones técnicas para la calle 10A, la Colinita y Sucre entre calles 52 y 57. ✓ Incluir en el informe mensual de interventoría un capítulo específico asociado solo al cumplimiento o no de los descrito en el plan de calidad, dificultades, inconvenientes, que falta, entre otros temas que considere la Interventoría.
19/08/2025	3	Acta de comité	Técnico	Virtual	Distrito Especial de Ciencia y Tecnología de Medellín Contratista Consorcio Vialmed 2025 Interventoría Consorcio Med Urbano 20005376	Revisión compromisos acta de comité anterior, Atención de baches, Resultado de ensayos de laboratorio, Vías a intervenir con rehabilitación.	✓ Ajustar organigrama del contrato de obra. ✓ Subsanar observaciones realizadas al acta de obra N° 1. ✓ Presentar informe del mes de julio de 2025. ✓ Presentar acta de obra N° 1 y factura. ✓ Presentar acta de costos N° 1 y factura. ✓ Presentar diseños y recomendaciones técnicas para la calle 10A y la Colinita. ✓ Visitar barrio Buenos Aires para definir alcance de constricción de cárcamos.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Fecha	N° de Acta	Tipo de Acta	Componente	Lugar	Participantes	Temas Tratados	Compromisos Adquiridos
							✓ Presentar APU de obra extra para realce de cámaras de inspección con inclusión de aditivos acelerantes de concreto y/o propuesta de reconocimiento del aditivo acelerante.
26/08/2025	4	Acta de comité	Técnico	Virtual	Distrito Especial de Ciencia y Tecnología de Medellín Contratista Consorcio Vialmed 2025 Interventoría Consorcio Med Urbano 20005376	Revisión compromisos acta de comité anterior, Atención de baches, Resalto atención AAA la calle 30 x Cra 89DB, plataforma SIRO.	✓ PMT de la calle 10ª y de los pompeyanos. ✓ Visitar la calle 10ª para levantamiento en el trayecto donde la rasante se aumenta 16 cms. ✓ Iniciar trabajos en la calle 30 x Cra 89db. ✓ Llenos de hueco en la quebrada la Minita. ✓ Visita a las Vegas entre calles 12 sur y 20 sur. ✓ Visita a San Cristóbal.

Anexo 4.4.1 Actas de comité técnico

4.5. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA:

Tabla 55. Relación de correspondencia enviada **agosto 2025**

REGISTRO CORRESPONDENCIA		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**Consecutivo**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**Documentos adjuntos**	**Elabora**
4/8/2025	emAIL	Raquel Vanessa Vargas Builes Ingeniera ambiental. Profesional ambiental de Interventoría. Jorge Luis Monsalve Montiel. Ingeniero Ambiental - Especialista en Gerencia Ambiental. Profesional Ambiental de Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Daniela Restrepo Elsa María Polo	Daniela Restrepo <ambiental2.vialmed2025@gmail.com> Cc: Natalia Calderón <directora.vialmed2025@gmail.com>, "ambientalvialmed2025@gmail.com" <ambientalvialmed2025@gmail.com>, lucia.hincapie@medellin.gov.co	Gestión Ambiental	Observaciones ambiental del documento PASAO.	V3_Malla_vial_30072025VF-20250804.docx 1489K	Jorge Luis Monsalve
4/8/2025	emAIL	Raquel Vanessa Vargas Builes Ingeniera ambiental. Profesional ambiental de Interventoría. Jorge Luis Monsalve Montiel. Ingeniero Ambiental - Especialista en Gerencia Ambiental. Profesional Ambiental de Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Gabriel Jaime Cardona Londoño Lucía Hincapié	Gabriel Jaime Cardona Londoño <gabriel.cardona@medellin.gov.co> Cc: "lucia.hincapie@medellin.gov.co" <lucia.hincapie@medellin.gov.co>	Gestión Ambiental	acta de reunión ambiental SIF - INTERVENTORÍA Y CONTRATISTA.	FO-GINF-055ActadeReunin-V4_5 Ambi 20250724.docx	Jorge Luis Monsalve
4/8/2025	emAIL	interventoría	consorciomedurbano@gmail.com	Gabriel Jaime Cardona Londoño Natalia Calderón	<gabriel.cardona@medellin.gov.co>, <directora.vialmed2025@gmail.com>	Técnico	Acta de reunión N° 1	Comité de obra N° 1 29-07-2025 V2 OK.docx	Jorge Luis Monsalve

REGISTRO CORRESPONDENCIA		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**Consecutivo**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**Documentos adjuntos**	**Elabora**
4/8/2025	emAIL	Raquel Vanessa Vargas Builes Ingeniera ambiental. Profesional ambiental de Interventoría. Jorge Luis Monsalve Montiel. Ingeniero Ambiental - Especialista en Gerencia Ambiental. Profesional Ambiental de Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Elsa Maria Polo Cuello	<ambientalvialmed2025@gmail.com> Cc: Natalia Calderón <directora.vialmed2025@gmail.com>, profesionalsst.vialmed2025@gmail.com, "ambiental2.vialmed2025@gmail.com" <ambiental2.vialmed2025@gmail.com>	Gestión Ambiental	Re: Documentación Volquetas	No Aplica	Jorge Luis Monsalve
4/8/2025	emAIL	Luisa Fernanda Restrepo María Catalina Martínez Romero Profesionales Sociales Interventoría CONSORCIO MEDURBANO 20005377	consorciomedurbano@gmail.com	Asney Garcia Doriela Ospina M Profesionales Sociales	Malla vial 2025 <mallavialmedellin2025@gmail.com>	Gestión Social	Observaciones al documento "PASAO" Componente social	V3_Malla_vial_30072025VF.docx	Jorge Luis Monsalve
4/8/2025	emAIL	Luis N. León Alvarez SST Interventoria	consorciomedurbano@gmail.com	interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión SST	Aprobación are SST del PASAO	No Aplica	Jorge Luis Monsalve
4/8/2025	emAIL	Maria Alejandra Arango Dávila	consorciomedurbano@gmail.com	Gabriel Jaime Cardona Londoño Juan Camilo Patino Amortegui	<gabriel.cardona@medellin.gov.co>, <juanc.patino@medellin.gov.co>	Técnico	Funcionamiento APK	fotografías incluidas en este documento.	Jorge Luis Monsalve
4/8/2025	emAIL	Maria Alejandra Arango Dávila	consorciomedurbano@gmail.com	Gabriel Jaime Cardona Londoño Juan Camilo	<gabriel.cardona@medellin.gov.co>, <juanc.patino@medellin.gov.co>	Técnico	Re: Funcionamiento APK	No Aplica	Jorge Luis Monsalve

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

REGISTRO CORRESPONDENCIA		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**Consecutivo**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**Documentos adjuntos**	**Elabora**
				Patino Amortegui					
4/8/2025	emAIL	Luisa Fernanda Restrepo María Catalina Martínez Romero Profesionales Sociales Interventoría CONSORCIO MEDURBANO 20005377	consorciomedurbano@gmail.com	Asney Garcia Doriela Ospina M Profesionales Sociales	mallavialmedellin2025@gmail.com	Gestión Social	Re: Informe y programación Semanal	Cronograma semanal_ del 4 al 09 de Agosto 2025_R.Int.docx	Jorge Luis Monsalve
4/8/2025	emAIL	Luisa Fernanda Restrepo María Catalina Martínez Romero Profesionales Sociales Interventoría CONSORCIO MEDURBANO 20005377	consorciomedurbano@gmail.com	Margarita Mejia	margarita.mejia@medellin.gov.co Cc <mallavialmedellin2025@gmail.com>	Gestión Social	Informe semanal N°2 y cronograma semanal	Cronograma semanal_ del 4 al 09 de Agosto 2025_R.Int.docx 987K Informe semanal social N°2_ Julio 28 al 2 de agosto 2025_R.Intv.docx 1239K	Jorge Luis Monsalve
5/8/2025	emAIL	CONSORCIO MEDURBANO 20005377	consorciomedurbano@gmail.com	Gabriel Jaime Cardona Londoño	gabriel.cardona@medellin.gov.co	Técnico	Organigrama contrato de Intevrentoría N° 46000105322 de 2025	Organigrama Int Consorcio Med Urbano.pdf 44K Organigrama Int Consorcio Med Urbano.xlsx 70K	Jorge Luis Monsalve

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

REGISTRO CORRESPONDENCIA		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**Consecutivo**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**Documentos adjuntos**	**Elabora**
5/8/2025	emAIL	Lilia Bermudez	consorciomedurbano@gmail.com	Gabriel Jaime Cardona Londoño	gabriel.cardona@medellin.gov.co	Técnico	Solicitud aprobación hoja de vida tecnólogo Juan Gmo Posada- novedad personal	22. Juan Guillermo Posada Rodríguez.pdf	Jorge Luis Monsalve
5/8/2025	emAIL	Luisa Fernanda Restrepo María Catalina Martínez Romero Profesionales Sociales Interventoría CONSORCIO MEDURBANO 20005377	consorciomedurbano@gmail.com	Natalia Calderón Directora de Obra Consorcio Vialmed 2025 Asney García Doriela Ospina M Profesionales Sociales Consorcio Vialmed 2025	Malla vial 2025 <mallavialmedellin2025@gmail.com>, Natalia Calderón <directora.vialmed2025@gmail.com>	Gestión Social	Re: Empleabilidad	No Aplica	Jorge Luis Monsalve
5/8/2025	emAIL	CONSORCIO MEDURBANO 20005377	consorciomedurbano@gmail.com	Gabriel Jaime Cardona Londoño	gabriel.cardona@medellin.gov.co	Técnico	Organigrama contrato de Interventoría N° 46000105322 de 2025 Ajustado	Organigrama Int Consorcio Med Urbano OK.pdf 44K Organigrama Int Consorcio Med Urbano OK.xlsx 70K	Jorge Luis Monsalve
5/8/2025	emAIL	CONSORCIO MEDURBANO 20005377	consorciomedurbano@gmail.com	Gabriel Jaime Cardona Londoño Natalia Calderón	Gabriel Jaime Cardona Londoño <gabriel.cardona@medellin.gov.co>, Natalia Calderón <directora.vialmed2025@gmail.com>	Técnico	Acta de comité N° 1 de fecha 29 de julio	Comité de obra N° 1 29-07-2025 V3 OK.pdf 316K Asistencia comité 1 29-07-2025.pdf 964K	Jorge Luis Monsalve

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

REGISTRO CORRESPONDENCIA		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**Consecutivo**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**Documentos adjuntos**	**Elabora**
5/8/2025	emAIL	Cristian David Correa Alvarado Ingeniero Residente de Interventoría	consorciomedurbano@gmail.com	Natalia Calderón Directora de Obra Consorcio Vialmed 2025	directora.vialmed2025@gmail.com	Técnico	Re: Transporte RAP	FRESADO_PLANTA_MUNICIPIO.xlsx 8038K	Jorge Luis Monsalve
5/8/2025	emAIL	CONSORCIO MEDURBANO 20005377	consorciomedurbano@gmail.com	no registra	obrasjuan28@gmail.com	Técnico	RV: Puntos Santo Domingo	StoDomingo_080725.pdf	Jorge Luis Monsalve
5/8/2025	emAIL	CONSORCIO MEDURBANO 20005377	consorciomedurbano@gmail.com	Natalia Calderón Directora de Obra Consorcio Vialmed 2025	directora.vialmed2025@gmail.com	Técnico	Re: Direcciones extracción de núcleos	No Aplica	Jorge Luis Monsalve
5/8/2025	emAIL	María Catalina Ochoa Alvarez Interventoría	consorciomedurbano@gmail.com	Gabriel Jaime Cardona Londoño Juan Camilo Patino Amortegui	Gabriel Jaime Cardona Londoño <gabriel.cardona@medellin.gov.co>, Juan Camilo Patino Amortegui <juanc.patino@medellin.gov.co>	Técnico	Fwd: Solicitud para intervenir la malla vial	20250529_175638.jpg 529K 20250529_175607.jpg 550K 20250529_175601.jpg 398K 20250529_175622.jpg 340K 20250529_175631.jpg 371K 20250529_175616.jpg 421K 20250529_17562	Jorge Luis Monsalve

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

REGISTRO CORRESPONDENCIA		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**Consecutivo**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**Documentos adjuntos**	**Elabora**
								4.mp4 2048K	
6-8-2025	emAIL	CONSORCIO MEDURBANO 20005377	consorciomedurbano@gmail.com	Gabriel Cardona	gabriel.cardona@medellin.gov.co	Técnico	Re: Solicitud para intervenir la malla vial	No Aplica	Jorge Luis Monsalve
6-8-2025	emAIL	Lilia Bermudez	consorciomedurbano@gmail.com	Gabriel Cardona	gabriel.cardona@medellin.gov.co	Técnico	Solicitud información factura del pago anticipado.	No Aplica	Jorge Luis Monsalve
6-8-2025	emAIL	Lilia Bermudez	consorciomedurbano@gmail.com	Gabriel Cardona	gabriel.cardona@medellin.gov.co	Técnico	Re: Solicitud información factura del pago anticipado.	No Aplica	Jorge Luis Monsalve
5/08/2025	emAIL	Luisa Fernanda Restrepo María Catalina Martínez Romero Profesionales Sociales Interventoría CONSORCIO MEDURBANO 20005377	consorciomedurbano@gmail.com	Natalia Calderón Directora de Obra Doriela Ospina M Profesionales Sociales Consorcio Vialmed 2025	directora.vialmed2025@gmail.com, mallavialmedellin2025@gmail.com	Gestión Social	Re: Oficio CVM-030-2025 Informe mensual social Julio	INF_SOC_1_JUL_ CONSORCIO VIALMED 2025.docx	Jorge Luis Monsalve
6/8/2025	emAIL	Luisa Fernanda Restrepo María Catalina Martínez Romero Profesionales Sociales Interventoría	consorciomedurbano@gmail.com	Natalia Calderón Directora de Obra Asney García Doriela Ospina M	directora.vialmed2025@gmail.com, mallavialmedellin2025@gmail.com	Gestión Social	Re: Oficio CVM-030-2025 Informe mensual social Julio	INF_SOC_1_JUL_ CONSORCIO VIALMED 2025_R.Int.docx	Jorge Luis Monsalve

REGISTRO CORRESPONDENCIA		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**Consecutivo**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**Documentos adjuntos**	**Elabora**
		CONSORCIO MEDURBANO 20005377		Profesionales Sociales Consorcio Vialmed 2025					
6/8/2025	emAIL	interventoría	consorciomedurbano@gmail.com	Gabriel Cardona	gabriel.cardona@medellin.gov.co	Técnico	Re: Solicitud para intervenir la malla vial	No Aplica	Jorge Luis Monsalve
6/8/2025	emAIL	Luisa Fernanda Restrepo María Catalina Martínez Romero Profesionales Sociales Interventoría CONSORCIO MEDURBANO 20005377	consorciomedurbano@gmail.com	Natalia Calderón Directora de Obra Consorcio Vialmed 2025 Asney García Doriela Ospina M Profesionales Sociales Consorcio Vialmed 2025	mallavialmedellin2025@gmail.com> Natalia Calderón <directora.vialmed2025@gmail.com	Técnico	Fwd: Solicitud para intervenir la malla vial	No Aplica	Jorge Luis Monsalve
6/8/2025	emAIL	Maria Alejandra Arango Dávila	consorciomedurbano@gmail.com	Gabriel Jaime Cardona Londoño Juan Camilo Patino Amortegui	<gabriel.cardona@medellin.gov.co>,<juanc.patino@medellin.gov.co> alexander.vargas@medellin.gov.co	Técnico	Fallas aplicativos SIF	No Aplica	Jorge Luis Monsalve

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

REGISTRO CORRESPONDENCIA		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**Consecutivo**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**Documentos adjuntos**	**Elabora**
6/8/2025	emAIL	María Catalina Ochoa Alvarez Interventoría CONSORCIO MEDURBANO 20005377	consorciomedurbano@gmail.com	Natalia Calderón Gabriel Jaime Cardona Londoño	directora.vialmed2025@gmail.com, gabriel.cardona@medellin.gov.co	Técnico	Aprobación oficio aclaratorio con solicitud de subcontratación	Oficio No.011 - Agosto 06 del 2025 - Aprobación Subcontratos.pdf	Jorge Luis Monsalve
6/8/2025	emAIL	María Catalina Ochoa Alvarez Interventoría CONSORCIO MEDURBANO 20005377	consorciomedurbano@gmail.com	Natalia Calderón	directora.vialmed2025@gmail.com	Técnico	Re: Organigrama de obra V1	No Aplica	Jorge Luis Monsalve
6/8/2025	emAIL	Luisa Fernanda Restrepo María Catalina Martínez Romero Profesionales Sociales Interventoría CONSORCIO MEDURBANO 20005377	consorciomedurbano@gmail.com	Gabriel Jaime Cardona L Supervisor Secretaría de Infraestructura Física Alcaldía de Medellín Margarita Mejía Profesional Social Secretaría de Infraestructura Física	gabriel.cardona@medellin.gov.co, margarita.mejia@medellin.gov.co	Gestión Social	Envío informe semanal de Empleabilidad, del 28 de julio al 02 de agosto del 2025	Empleabilidad MALLA VIAL_28-02 AGOSTO.xlsx	Jorge Luis Monsalve
6/8/2025	emAIL	Raquel Vanessa Vargas Builes Ingeniera ambiental. Profesional ambiental de Interventoría. Jorge Luis Monsalve Montiel.	consorciomedurbano@gmail.com	Lucía Hincapié	lucia.hincapie@medellin.gov.co	Gestión Ambiental	acta de recorrido ambiental 5-8-2025. MALLA VIAL.	FO-GINF-055ActadeReunin-V4_5 Ambi #3 (SIF) Malla Vial.docx	Jorge Luis Monsalve

REGISTRO CORRESPONDENCIA		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**Consecutivo**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**Documentos adjuntos**	**Elabora**
		Ingeniero Ambiental - Especialista en Gerencia Ambiental. Profesional Ambiental de Interventoría. CONSORCIO MED URBANO 20005377. INTERVENTORÍA DE OBRA.							
6/8/2025	emAIL	Raquel Vanessa Vargas Builes Ingeniera ambiental. Profesional ambiental de Interventoría. Jorge Luis Monsalve Montiel. Ingeniero Ambiental - Especialista en Gerencia Ambiental. Profesional Ambiental de Interventoría. CONSORCIO MED URBANO 20005377. INTERVENTORÍA DE OBRA.	consorciomedurbano@gmail.com	Natalia Calderón	Natalia Calderón <directora.vialmed2025@gmail.com> Cc: Gabriel Jaime Cardona Londoño <gabriel.cardona@medellin.gov.co>, "ambiental2.vialmed2025@gmail.com" <ambiental2.vialmed2025@gmail.com>, "ambientalvialmed2025@gmail.com" <ambientalvialmed2025@gmail.com>	Gestión Ambiental	Re: Oficio CVM-029-2025 Informe mensual ambiental	formatos ambientales contratista.zip 582K	Jorge Luis Monsalve
6/8/2025	emAIL	María Catalina Ochoa Alvarez Interventoría CONSORCIO MEDURBANO 20005377	consorciomedurbano@gmail.com	Natalia Calderón	Malla vial 2025 <mallavialmedellin2025@gmail.com> Cc: Natalia Calderón <directora.vialmed2025@gmail.com>, Gabriel Jaime Cardona Londoño <gabriel.cardona@medellin.gov.co>	Técnico	Re: CIRCULARES PARA INICIO PUNTOS MASIVOS VIZCAYA Y CALLE 10A	No Aplica	Jorge Luis Monsalve

REGISTRO CORRESPONDENCIA		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**Consecutivo**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**Documentos adjuntos**	**Elabora**
6/8/2025	emAIL	María Catalina Ochoa Alvarez Interventoría CONSORCIO MEDURBANO 20005377	consorciomedurbano@gmail.com	Natalia Calderón	Natalia Calderón <directora.vialmed2025@gmail.com> Cc: Gabriel Jaime Cardona Londoño <gabriel.cardona@medellin.gov.co>	Técnico	Oficio No.012 - Agosto 06 del 2025 - Solicitud cumplimiento ingreso cuadrillas adicionales	Oficio No.012 - Agosto 06 del 2025 - Solicitud cumplimiento ingreso cuadrillas adicionales.pdf 654K	Jorge Luis Monsalve
6/8/2025	emAIL	LILIA M BERMÚDEZ Residente Administrativa	consorciomedurbano@gmail.com	Maria Catalina Ochoa	cata8aa@gmail.com	Técnico	Acta No.1 Interventoría para su revisión.	1. Copia de Acta No.1 mes julio del 2025.xlsx	Jorge Luis Monsalve
6/8/2025	emAIL	María Catalina Ochoa Alvarez Interventoría CONSORCIO MEDURBANO 20005377	consorciomedurbano@gmail.com	Natalia Calderón	directora.vialmed2025@gmail.com	Técnico	Firma Formato aprobacion PASAO	1. Aprobación del PASAO V3 30-09-19 - pasao malla vial 2025-2[1].docx	Jorge Luis Monsalve
6/8/2025	emAIL	interventoría	consorciomedurbano@gmail.com	no registra	obrasjuan28@gmail.com	Técnico	Fwd: INTERVENCIONES MASIVAS A REALZIAR POR LA SIF	No Aplica	Jorge Luis Monsalve
8/08/2025	emAIL	Luis N. León Alvarez SST Interventoria	consorciomedurbano@gmail.com	Natalia Calderón	directora.vialmed2025@gmail.com	Gestión SST	Re: Oficio CVM-035-2025 Informe mensual SST Julio	No Aplica	Jorge Luis Monsalve
8/08/2025	emAIL	LILIA M. BERMÚDEZ Residente Administrativa	consorciomedurbano@gmail.com	Natalia Calderón	directora.vialmed2025@gmail.com	Técnico	Aprobación hojas de vida oficio CVM-034-2025	Oficio No.013 - Agosto 08 del 2025 - Aprobación hojas de vida.pdf 276K EVALUACION PROFESIONALES_MALLA VIALMED 2025 V7.xlsx 199K Hoja de vida Andy	Jorge Luis Monsalve

REGISTRO CORRESPONDENCIA		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**Consecutivo**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**Documentos adjuntos**	**Elabora**
								Nieto.pdf 2036K 35. Tecnologo Civil 17 Lina Ocampo.rar 2974K 33. Tecnologa Admon 2 Emi Tatiana Árbeláez.rar 6354K 34. Tecnologo Civil 16 Federico Agudelo.rar 5978K	
8/08/2025	emAIL	MARÍA CATALINA OCHOA ÁLVAREZ. CONSORCIO MED URBANO 20005377. INTERVENTORÍA DE OBRA.	consorciomedurbano@gmail.com	Gabriel Jaime Cardona Londoño	gabriel.cardona@medellin.gov.co	Técnico	ASUNTO: Entrega de Plan de Acción Socio Ambiental en Obra – PASAO, para el contrato de referencia.	Oficio No.014 - Agosto 08 del 2025 - ENTREGA PASAO.pdf PASAO	Jorge Luis Monsalve
8/08/2025	emAIL	Raquel Vanessa Vargas Builes Ingeniera ambiental. Profesional ambiental de Interventoría. Jorge Luis Monsalve Montiel. Ingeniero Ambiental - Especialista en Gerencia Ambiental. Profesional Ambiental de Interventoría. CONSORCIO MED URBANO 20005377. INTERVENTORÍA DE OBRA.	consorciomedurbano@gmail.com	Elsa Maria Polo Cuello Daniela Restrepo	ambiental2.vialmed2025@gmail.com" <ambiental2.vialmed2025@gmail.com>, "ambientalvialmed2025@gmail.com" <ambientalvialmed2025@gmail.com> Cc: Natalia Calderón <directora.vialmed2025@gmail.com>	Gestión Ambiental	Informe de visita #1.	INFORME VISITA 1. 05-08-2025.pdf 987K	Jorge Luis Monsalve

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

REGISTRO CORRESPONDENCIA		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**Consecutivo**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**Documentos adjuntos**	**Elabora**
8/08/2025	emAIL	Yulanis M Sierra Bolaño Especialista PMT Consorcio Med Urbano	consorciomedurbano@gmail.com	Gabriel Jaime Cardona Londoño	Gabriel Jaime Cardona Londoño <gabriel.cardona@medellin.gov.co> Cc: Natalia Calderón <directora.vialmed2025@gmail.com>	PMT	Validación PMT Específico en Cl10xCra30	Oficio No.015 - Agosto 08 del 2025 - Validación PMT Cl10xCr30.pdf 885K Anexo A.Plano de Señalización_1de 2.pdf 1231K Anexo B.Plano de Señalización_2de 2.pdf 1234K PMT CALLE 10 ENTRE CRA 30 Y 32B.pdf 3554K	Jorge Luis Monsalve
9/8/2025	emAIL	Luis N. León Alvarez SST Interventoria	consorciomedurbano@gmail.com	Natalia Calderón	directora.vialmed2025@gmail.com	Gestión SST	Re: Oficio CVM-038-2025 Documentación personal operativo Subcontratista Estructuras y Pavimentos Frentes 10	No Aplica	Jorge Luis Monsalve
11/8/2025	emAIL	María Catalina Ochoa Alvarez INTERVENTORÍA CONSORCIO MED URBANO 20005377	consorciomedurbano@gmail.com	Luis Alejandro Castro Roque	residente2.vialmed2025@gmail.com	Técnico	Re: PROGRAMACIÓN DE OBRA VIALMED 11-08-2025	No Aplica	Jorge Luis Monsalve
11/8/2025	emAIL	Yulanis M Sierra Bolaño Especialista PMT Consorcio Med Urbano	consorciomedurbano@gmail.com	Natalia Calderón	directora.vialmed2025@gmail.com	PMT	Ruta para programación de intervenciones de la malla vial	No Aplica	Jorge Luis Monsalve

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

REGISTRO CORRESPONDENCIA		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**Consecutivo**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**Documentos adjuntos**	**Elabora**
11/8/2025	emAIL	Raquel Vanessa Vargas Builes Ingeniera ambiental. Profesional ambiental de Interventoría. Jorge Luis Monsalve Montiel. Ingeniero Ambiental - Especialista en Gerencia Ambiental. Profesional Ambiental de Interventoría. CONSORCIO MED URBANO 20005377. INTERVENTORÍA DE OBRA.	consorciomedurbano@gmail.com	Elsa Maria Polo Cuello	Elsa Maria Polo Cuello <ambientalvialmed2025@gmail.com> Cc: "ambiental2.vialmed2025@gmail.com" <ambiental2.vialmed2025@gmail.com>, Natalia Calderón <directora.vialmed2025@gmail.com>	Técnico	Re: SOPORTE VOLQUETAS	No Aplica	Jorge Luis Monsalve
11/8/2025	emAIL	interventoría	consorciomedurbano@gmail.com	Natalia Calderón	directora.vialmed2025@gmail.com	Técnico	Re: Factura Pago anticipado	No Aplica	Jorge Luis Monsalve
11/8/2025	emAIL	María Catalina Ochoa. Interventoría CONSORCIO MEDURBANO 20005377	consorciomedurbano@gmail.com	Gabriel Jaime Cardona Natalia Calderón	Gabriel Jaime Cardona Londoño <gabriel.cardona@medellin.gov.co>, Natalia Calderón <directora.vialmed2025@gmail.com>	Técnico	Borrador acta de comité de obra N° 2	2 - Comité de obra N° 2 05-08-2025 OK.docx	Jorge Luis Monsalve
11/8/2025	emAIL	Luisa Fernanda Restrepo María Catalina Martínez Romero Profesionales Sociales Interventoría CONSORCIO MEDURBANO 20005377	consorciomedurbano@gmail.com	Natalia Calderón	Malla vial 2025 <mallavialmedellin2025@gmail.com>, Natalia Calderón <directora.vialmed2025@gmail.com>	Gestión Social	Fwd: PROPUESTA CONTRATISTA AFICHE PROYECTO	No Aplica	Jorge Luis Monsalve

REGISTRO CORRESPONDENCIA		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**Consecutivo**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**Documentos adjuntos**	**Elabora**
11/8/2025	emAIL	Luisa Fernanda Restrepo María Catalina Martínez Romero Profesionales Sociales Interventoría CONSORCIO MEDURBANO 20005377	consorciomedurbano@gmail.com	Gabriel Jaime Cardona L Supervisor Secretaría de Infraestructura Física Alcaldía de Medellín Margarita Mejía Profesional Social Secretaría de Infraestructura Física	Gabriel Jaime Cardona Londoño <gabriel.cardona@medellin.gov.co> margarita.mejia@medellin.gov.co	Gestión Social	Envío informe semanal de Empleabilidad, del 2 al 9 de agosto del 2025	Registro Empleabilidad MALLA VIAL_21-26 JUL.xlsx	Jorge Luis Monsalve
11/8/2025	emAIL	Luisa Fernanda Restrepo María Catalina Martínez Romero Profesionales Sociales Interventoría CONSORCIO MEDURBANO 20005377	consorciomedurbano@gmail.com	Margarita Mejía Profesional Social Secretaría de Infraestructura Física	margarita.mejia@medellin.gov.co	Gestión Social	Informe semanal y cronograma	Informe Semanal Social N°3 _del 04 al 09 de agosto del 2025_R.Int.docx 1513K Cronograma semanal social_ del 11 al 16 de Agosto 2025_R.Int .docx 987K	Jorge Luis Monsalve
12/8/2025	emAIL	María Catalina Ochoa. Interventoría CONSORCIO MEDURBANO 20005377	consorciomedurbano@gmail.com	Gabriel Jaime Cardona Londoño Juan Camilo Patino Amortegui	Gabriel Jaime Cardona Londoño <gabriel.cardona@medellin.gov.co>, Juan Camilo Patino Amortegui <juanc.patino@medellin.gov.co>	Técnico	Informe Baches mediáticos atendidos Ago 04 al 11 de 2025	3. INFORME BACHES MEDIÁTICOS AGO 11 2025.pdf	Jorge Luis Monsalve

REGISTRO CORRESPONDENCIA		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**Consecutivo**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**Documentos adjuntos**	**Elabora**
11/08/2025	emAIL	Maria Alejandra Arango Davila	consorciomedurbano@gmail.com	Gabriel Jaime Cardona Londoño Juan Camilo Patino Amortegui	Gabriel Jaime Cardona Londoño <gabriel.cardona@medellin.gov.co>, Juan Camilo Patino Amortegui <juanc.patino@medellin.gov.co> Cc: alexander.vargas@medellin.gov.co	Técnico	Fallas SIRO	No Aplica	Jorge Luis Monsalve
12/08/2025	emAIL	Maria Alejandra Arango Davila	consorciomedurbano@gmail.com	Gabriel Jaime Cardona Londoño Juan Camilo Patino Amortegui	Gabriel Jaime Cardona Londoño <gabriel.cardona@medellin.gov.co>, Juan Camilo Patino Amortegui <juanc.patino@medellin.gov.co> Cc: alexander.vargas@medellin.gov.co	Técnico	Re: Fallas SIRO	No Aplica	Jorge Luis Monsalve
12/08/2025	emAIL	Maria Catalina Martínez Romero. Trabajadora Social. Profesional Social de Interventoría. Raquel Vanessa Vargas Builes. Ingeniera ambiental. Profesional ambiental de Interventoría. Jorge Luis Monsalve Montiel. Ingeniero Ambiental - Especialista en Gerencia Ambiental. Profesional Ambiental de Interventoría. CONSORCIO MED URBANO 20005377. INTERVENTORÍA DE OBRA.	consorciomedurbano@gmail.com	Elsa Maria Polo Cuello Daniela Restrepo Natalia Cardona Lucía Hincapié Margarita Mejía.	"ambiental2.vialmed2025@gmail.com" <ambiental2.vialmed2025@gmail.com>, "ambientalvialmed2025@gmail.com" <ambientalvialmed2025@gmail.com>, Natalia Calderón <directora.vialmed2025@gmail.com>, Malla vial 2025 <mallavialmedellin2025@gmail.com>, margarita.mejia@medellin.gov.co , "lucia.hincapie@medellin.gov.co" <lucia.hincapie@medellin.gov.co>	Gestión Ambiental	PROGRAMA DE CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS. PROTECCIÓN AUDITIVA.	No Aplica	Jorge Luis Monsalve

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

REGISTRO CORRESPONDENCIA		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**Consecutivo**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**Documentos adjuntos**	**Elabora**
13/08/2025	emAIL	"Raquel Vanessa Vargas Builes Ingeniera ambiental. Profesional ambiental de Interventoría. Jorge Luis Monsalve Montiel. Ingeniero Ambiental - Especialista en Gerencia Ambiental. Profesional Ambiental de Interventoría. CONSORCIO MED URBANO 20005377. INTERVENTORÍA DE OBRA. "	consorciomedurbano@gmail.com	Elsa Maria Polo Cuello	ambientalvialmed2025@gmail.com	Gestión Ambiental	Re: Documentos volquetas	No Aplica	Jorge Luis Monsalve
13/08/2025	emAIL	María Catalina Ochoa Alvarez Interventoría CONSORCIO MEDURBANO 20005377	consorciomedurbano@gmail.com	Gabriel Jaime Cardona Londoño	gabriel.cardona@medellin.gov.co	Técnico	Valor acta 01 interventoría y pago anticipado	No Aplica	Jorge Luis Monsalve
13/08/2025	emAIL	Raquel Vanessa Vargas Builes. Ingeniera ambiental. Profesional ambiental de Interventoría. Jorge Luis Monsalve Montiel. Ingeniero Ambiental - Especialista en Gerencia Ambiental. Profesional Ambiental de Interventoría. CONSORCIO MED URBANO 20005377.	consorciomedurbano@gmail.com	Natalia Calderón	Natalia Calderón <directora.vialmed2025@gmail.com> Cc: Gabriel Jaime Cardona Londoño <gabriel.cardona@medellin.gov.co>	Gestión Ambiental	Oficio 16 Requerimientos ambientales, Plan de calidad y PMT	Oficio No.016 - Agosto 13 del 2025 - Requerimientos ambientales, Plan de calidad y PMT.pdf 184K	Jorge Luis Monsalve

REGISTRO CORRESPONDENCIA		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**Consecutivo**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**Documentos adjuntos**	**Elabora**
		INTERVENTORÍA DE OBRA.							
13/08/2025	emAIL	Luisa Fernanda Restrepo María Catalina Martínez Romero Profesionales Sociales Interventoría CONSORCIO MEDURBANO 20005377	consorciomedurbano@gmail.com	Asney García Doriela Ospina M Profesionales Sociales Consorcio Vialmed 2025 Natalia Calderón Directora de Obra Consorcio Vialmed 2025	mallavialmedellin2025@gmail.com> Cc: Natalia Calderón <directora.vialmed2025@gmail.com>, margarita.mejia@medellin.gov.co	Técnico	Fwd: RECORRIDO FRENTES DE OBRA-OBSERVACIONES -Contrato Malla Vial	no Aplica	Jorge Luis Monsalve
14/08/2025	emAIL	Luis N. León Alvarez SST Interventoria	consorciomedurbano@gmail.com	Natalia Calderón	directora.vialmed2025@gmail.com	Gestión SST	Re: Oficio CVM-039-2025 Documentación personal operativo Subcontratista Estructuras y Pavimentos Frente 11	no Aplica	Jorge Luis Monsalve
14/08/2025	emAIL	interventoría	consorciomedurbano@gmail.com	Natalia Calderón	directora.vialmed2025@gmail.com	Técnico	Re: Núcleos semana 3 (4 al 8 de agosto)	no Aplica	Jorge Luis Monsalve
14/08/2025	emAIL	Raquel Vanessa Vargas Builes Ingeniera ambiental. Profesional ambiental de Interventoría. Jorge Luis Monsalve	consorciomedurbano@gmail.com	Elsa María Polo Cuello Daniela Restrepo Natalia Calderón	ambientalvialmed2025@gmail.com" <ambientalvialmed2025@gmail.com>, "ambiental2.vialmed2025@gmail.com" <ambiental2.vialmed2025@gmail.com>	Gestión Ambiental	Actividades de irrigación de emulsión.	no Aplica	Jorge Luis Monsalve

REGISTRO CORRESPONDENCIA		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**Consecutivo**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**Documentos adjuntos**	**Elabora**
		Montiel. Ingeniero Ambiental - Especialista en Gerencia Ambiental. Profesional Ambiental de Interventoría. CONSORCIO MED URBANO 20005377. INTERVENTORÍA DE OBRA. Referencia: Contrato No. 4600105322 de 2025 "INTERVENTORÍA A LA REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA"			Cc: Natalia Calderón <directora.vialmed2025@gmail.com>				
14/08/2025	emAIL	interventoría	consorciomedurbano@gmail.com	Gabriel Jaime Cardona Londoño	gabriel.cardona@medellin.gov.co	Técnico	Re: BACHES LAS ACACIAS, SAN BENITO Y LOMA DE LOS BERNAL	no Aplica	Jorge Luis Monsalve
14/08/2025	emAIL	LILIA M. BERMÚDEZ Residente Administrativa	consorciomedurbano@gmail.com	Gabriel Jaime Cardona Londoño	gabriel.cardona@medellin.gov.co	Técnico	Acta No.1 mes de julio para su revisión y aprobación.	1. Copia de Acta No.1 mes julio del 2025.xlsx 542K Soportes acta no.1.rar 21464K	Jorge Luis Monsalve
15/08/2025	emAIL	LILIA M. BERMÚDEZ Residente Administrativa	consorciomedurbano@gmail.com	Gabriel Jaime Cardona Londoño	gabriel.cardona@medellin.gov.co	Técnico	Re: Acta No.1 mes de julio para su revisión y aprobación.	1. Certificado parafiscales y discapacitado..pdf 1560K	Jorge Luis Monsalve

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

REGISTRO CORRESPONDENCIA		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**Consecutivo**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**Documentos adjuntos**	**Elabora**
15/08/2025	emAIL	Luisa Fernanda Restrepo María Catalina Martínez Romero Profesionales Sociales Interventoría CONSORCIO MEDURBANO 20005377	consorciomedurbano@gmail.com	Natalia Calderón	Malla vial 2025 <mallavialmedellin2025@gmail.com> Cc: <directora.vialmed2025@gmail.com>	Gestión Social	Fwd: PROPUESTA DISEÑO VOLANTE GENÉRICO	no Aplica	Jorge Luis Monsalve
15/08/2025	emAIL	Luis N. León Álvarez Profesional SST Interventoría. CONSORCIO MED URBANO 20005377	consorciomedurbano@gmail.com	Natalia Calderón	directora.vialmed2025@gmail.com>	Técnico	Re: Acta Julio	no Aplica	Jorge Luis Monsalve
15/08/2025	emAIL	María Catalina Ochoa. Interventoría CONSORCIO MEDURBANO 20005377	consorciomedurbano@gmail.com	Gabriel Jaime Cardona Londoño	gabriel.cardona@medellin.gov.co	Técnico	Re: REPORTE SIRO MALLA VIAL 2025	no Aplica	Jorge Luis Monsalve
16/08/2025	emAIL	María Catalina Ochoa. Interventoría CONSORCIO MEDURBANO 20005377	consorciomedurbano@gmail.com	Natalia Calderón	directora.vialmed2025@gmail.com>	PMT	Oficio No.017 - Agosto 16 del 2025 - Requerimiento Controladores Viales	Oficio No. 017.	María Catalina Ochoa Alvarez
18/08/2025	emAIL	María Catalina Ochoa. Interventoría CONSORCIO MEDURBANO 20005377	consorciomedurbano@gmail.com	obrasjuan28@gmail.com	obrasjuan28@gmail.com	Técnico	Diseño mezcla tibia MSC-19+RAP Planta Pavimentar	Documento de diseño de mezcla tibia	Juan José Bermúdez

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

REGISTRO CORRESPONDENCIA		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**Consecutivo**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**Documentos adjuntos**	**Elabora**
18/08/2025	emAIL	Luis N, León Álvarez	consorciomedurbano@gmail.com	Milena Escobar	profesionalsst.vialmed2025@gmail.com	Gestión SST	Ingreso de personal cuadrilla Pavimentar	No Aplica	Luis Norberto León
18/08/2025	emAIL	Luis N, León Álvarez	consorciomedurbano@gmail.com	Milena Escobar	profesionalsst.vialmed2025@gmail.com	Gestión SST	Ingreso de personal cuadrilla Pavimentar	No Aplica	Luis Norberto León
18/08/2025	emAIL	María Catalina Ochoa.	consorciomedurbano@gmail.com	Natalia Calderón	directora.vialmed2025@gmail.com	Técnico	Presentación de acta de obra para tener en cuenta	No Aplica	María Catalina Ochoa Alvarez
19/08/2025	emAIL	María Catalina Ochoa.	consorciomedurbano@gmail.com	Gabriel Jaime Cardona Londoño , Juan Camilo Patino Amortegui, Natalia Calderón	<gabriel.cardona@medellin.gov.co>, Juan Camilo Patino Amortegui <juanc.patino@medellin.gov.co>, Natalia Calderón <directora.vialmed2025@gmail.com>	Técnico	Informe semanal Agosto 18 Baches mediáticos atendidos	Informe de baches mediáticos	María Catalina Ochoa Alvarez
19/08/2025	emAIL	María Catalina Ochoa.	consorciomedurbano@gmail.com	Gabriel Jaime Cardona Londoño , Juan Camilo Patino Amortegui, Natalia Calderón	<gabriel.cardona@medellin.gov.co>, Juan Camilo Patino Amortegui <juanc.patino@medellin.gov.co>, Natalia Calderón <directora.vialmed2025@gmail.com>	Técnico	Informes recorrido Rango 3 y Vías en concreto	Informes recorrido Rango 3 y Vías en concreto	María Catalina Ochoa Alvarez
19/08/2025	emAIL	Luisa Fernanda Restrepo María Catalina Martínez Romero	consorciomedurbano@gmail.com	Margarita Mejía	margarita.mejia@medellin.gov.co	Gestión Social	Informe semanal y cronograma social SOCIALES	Informe semanal y cronograma social SOCIALES	Luisa Restrepo
20/08/2025	emAIL	Luisa Fernanda Restrepo María Catalina Martínez Romero	consorciomedurbano@gmail.com	Gabriel Jaime Cardona Londoño ,	gabriel.cardona@medellin.gov.co	Gestión Social	Envío informe semanal de Empleabilidad: Malla Vial, del 9 al 12 de agosto del 2025	informe semanal de Empleabilidad: Malla Vial, del 9 al 12 de agosto del 2025	María Catalina Martínez

REGISTRO CORRESPONDENCIA		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**Consecutivo**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**Documentos adjuntos**	**Elabora**
20/08/2025	emAIL	Luisa Fernanda Restrepo María Catalina Martínez Romero	consorciomedurbano@gmail.com	Gabriel Jaime Cardona Londoño ,	gabriel.cardona@medellin.gov.co	Gestión Social	Solicitud de envío de Documento PASAO versión final con el presupuesto social y Plan de divulgación (Plan de Manejo de Tránsito (PMT) aprobado por la Secretaría de Infraestructura de la Alcaldía de Medellín.	No Aplica	María Catalina Martínez
18/08/2025	emAIL	Luis N, León Álvarez	consorciomedurbano@gmail.com	Milena Escobar	profesionalsst.vialmed2025@gmail.com	Gestión SST	Aprobación de ingreso a laborar en el contrato	No Aplica	Luis Norberto León
20/08/2025	emAIL	María Catalina Ochoa.	consorciomedurbano@gmail.com	Natalia Calderón <directora.vialmed2025@gmail.com>	directora.vialmed2025@gmail.com	Técnico	Núcleos semana 4 (11 al 16 de agosto)	No Aplica	María Catalina Ochoa Alvarez
20/08/2025	emAIL	YULANIS MARIET SIERRA BOLAÑO	consorciomedurbano@gmail.com	SEBASTIAN POSADA	laboratoriodemovilidad@gmail.com, directora.vialmed2025@gmail.com	PMT	Requerimiento de controladores viales en frentes de obra	OFICIO No.019 4600105322 de 2025	Yulanis Sierra
20/08/2025	emAIL	Raquel Vanessa Vargas Builes, Jorge Luis Monsalve Montiel.	consorciomedurbano@gmail.com	Elsa Maria Polo Cuello	ambientalvialmed2025@gmail.com	Gestión Ambiental	Respuesta: Maquinaria Fo 16	No aplica	Jorge Luis Monsalve

REGISTRO CORRESPONDENCIA		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**Consecutivo**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**Documentos adjuntos**	**Elabora**
20/08/2025	emAIL	Raquel Vanessa Vargas Builes, Jorge Luis Monsalve Montiel.	consorciomedurbano@gmail.com	Lucia Hincapie	lucia.hincapie@medellin.gov.co	Gestión Ambiental	Visita de obra Malla vial 2025	Informe de Visita de obra Malla vial 2025	Jorge Luis Monsalve
20/08/2025	emAIL	Raquel Vanessa Vargas Builes, Jorge Luis Monsalve Montiel.	consorciomedurbano@gmail.com	Elsa Maria Polo Cuello	ambientalvialmed2025@gmail.com	Gestión Ambiental	Respuesta: Complemento vehículos para los frentes Buenos Aires y Castilla	No aplica	Jorge Luis Monsalve
20/08/2025	emAIL	Luis N, León Álvarez	consorciomedurbano@gmail.com	Milena Escobar	profesionalsst.vialmed2025@gmail.com	Gestión SST	Aprobación de ingreso a laborar en el contrato	No Aplica	Luis Norberto León
21/08/2025	emAIL	Raquel Vanessa Vargas Builes, Jorge Luis Monsalve Montiel.	consorciomedurbano@gmail.com	Elsa Maria Polo Cuello	ambientalvialmed2025@gmail.com	Gestión Ambiental	Visita de obra Malla vial 2025	Informe de Visita de obra Malla vial 2025	Jorge Luis Monsalve
21/08/2025	emAIL	Raquel Vanessa Vargas Builes, Jorge Luis Monsalve Montiel.	consorciomedurbano@gmail.com	Natalia Calderón <directora.vialmed2025@gmail.com> Cc: Gabriel Jaime Cardona Londoño <gabriel.cardona@medellin.gov.co>	Natalia Calderón <directora.vialmed2025@gmail.com> Cc: Gabriel Jaime Cardona Londoño <gabriel.cardona@medellin.gov.co>	Gestión Ambiental	Respuesta comunicado radicado OFICIO No.016 4600105322 de 2025	No Aplica	Jorge Luis Monsalve
20/08/2025	emAIL	Luis N, León Álvarez	consorciomedurbano@gmail.com	Milena Escobar	profesionalsst.vialmed2025@gmail.com	Gestión SST	Aprobación de ingreso a laborar en el contrato	No Aplica	Luis Norberto León

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

REGISTRO CORRESPONDENCIA		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**Consecutivo**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**Documentos adjuntos**	**Elabora**
21/08/2025	emAIL	Luisa Fernanda Restrepo María Catalina Martínez Romero	consorciomedurbano@gmail.com	Malla vial 2025, Margarita Mejía	mallavialmedellin2025@gmail.com> margarita.mejia@medellin.gov.co	Gestión Social	Solicitud de actividades de divulgación y de información a la comunidad en el próximo frente de obra rango 4: CR 22 ENTRE CL 45 Y CR 24	No Aplica	María Catalina Martínez
21/08/2025	emAIL	Luisa Fernanda Restrepo María Catalina Martínez Romero	consorciomedurbano@gmail.com	Malla vial 2025, Margarita Mejía	mallavialmedellin2025@gmail.com> margarita.mejia@medellin.gov.co	Gestión Social	SOLICITUD DE APROBACIÓN PIEZA IMANTADO VEHÍCULOS	Diseño: PIEZA IMANTADO VEHÍCULOS	Luisa Restrepo
22/08/2025	emAIL	Luisa Fernanda Restrepo María Catalina Martínez Romero	consorciomedurbano@gmail.com	Margarita Mejía	margarita.mejia@medellin.gov.co	Gestión Social	Envío borrador del documento informe mensual social del mes de julio del 2025	Borrador del documento informe mensual social del mes de julio del 2025	María Catalina Martínez
22/08/2025	emAIL	María Catalina Ochoa.	consorciomedurbano@gmail.com	Natalia Calderón, Gabriel Jaime Cardona Londoño	directora.vialmed2025@gmail.com> gabriel.cardona@medellin.gov.co>	Técnico	Acta de obra 01 revisada y aprobada	Acta de obra 01	María Catalina Ochoa Alvarez
22/08/2025	emAIL	María Catalina Ochoa.	consorciomedurbano@gmail.com	Gabriel Jaime Cardona Londoño <gabriel.cardona@medellin.gov.co>, Juan Camilo Patino Amortegui <juanc.patino@medellin.gov.co>	Gabriel Jaime Cardona Londoño <gabriel.cardona@medellin.gov.co>,	Técnico	Fallas Reportes Med y Siro	No Aplica	María Catalina Ochoa Alvarez

REGISTRO CORRESPONDENCIA		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**Consecutivo**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**Documentos adjuntos**	**Elabora**
22/08/2025	emAIL	María Catalina Ochoa.	consorciomedurbano@gmail.com	Natalia Calderón <directora.vialmed2025@gmail.com>	Natalia Calderón <directora.vialmed2025@gmail.com>	Técnico	Porfavor ajustar salario Tecnólogo	No Aplica	María Catalina Ochoa Alvarez
22/08/2025	emAIL	Luis N, León Álvarez	consorciomedurbano@gmail.com	Milena Escobar	profesionalsst.vialmed2025@gmail.com	Gestión SST	Aprobación de ingreso a laborar en el contrato	No Aplica	Luis Norberto León
22/08/2025	emAIL	Raquel Vanessa Vargas Builes, Jorge Luis Monsalve Montiel.	consorciomedurbano@gmail.com	Daniela Restrepo <ambiental2.vialmed2025@gmail.com	Daniela Restrepo <ambiental2.vialmed2025@gmail.com	Gestión Ambiental	Respuesta: Vehiculos y equipos frente 12	No Aplica	Jorge Luis Monsalve
22/08/2025	emAIL	Raquel Vanessa Vargas Builes, Jorge Luis Monsalve Montiel.	consorciomedurbano@gmail.com	Daniela Restrepo <ambiental2.vialmed2025@gmail.com	Daniela Restrepo <ambiental2.vialmed2025@gmail.com	Gestión Ambiental	Vehículos Aprobados	Documento: Control de interventoría Vehículos aprobados	Jorge Luis Monsalve
22/08/2025	emAIL	Raquel Vanessa Vargas Builes, Jorge Luis Monsalve Montiel.	consorciomedurbano@gmail.com	Daniela Restrepo <ambiental2.vialmed2025@gmail.com	Daniela Restrepo <ambiental2.vialmed2025@gmail.com	Gestión Ambiental	Fallas en equipos y maquinaria - Emisiones de gases de equipos.	videos de equipos con altas emisiones de gases oscuras.	Jorge Luis Monsalve
22/08/2025	EMAIL	Maria Catalina Ochoa Álvarez	consorciomedurbano@gmail.com	Gabriel Cardona	Gabriel Jaime Cardona Londoño <gabriel.cardona@medellin.gov.co> Natalia Calderón <directora.vialmed2025@gmail.com>, Ángela Aristizábal <mallavial2025@gmail.com>, william.buitrago@medellin.gov.co , Alexander Vargas Holguín <alexander.vargas@medellin.gov.co>,	Técnico	Traslado de observaciones del contratista – Error SIRO y HuecosMed	correo enviado por contratista y evidencia gráfica para su revisión. Agradezco la gestión frente a este tema,	María Catalina Ochoa Alvarez

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

REGISTRO CORRESPONDENCIA		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**Consecutivo**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**Documentos adjuntos**	**Elabora**
					giovanny.galeano@medellin.gov.co, monical.velez@medellin.gov.co				
23/08/2025	emAIL	Luis N, León Álvarez	consorciomedurbano@gmail.com	Milena Escobar	profesionalsst.vialmed2025@gmail.com	Gestión SST	Aprobación de ingreso a laborar en el contrato	No Aplica	Luis Norberto León
24/08/2025	emAIL	YULANIS MARIET SIERRA BOLAÑO	consorciomedurbano@gmail.com	Gabriel Cardona	Gabriel Jaime Cardona Londoño <gabriel.cardona@medellin.gov.co> Natalia Calderón <directora.vialmed2025@gmail.com>, Ángela Aristizábal <mallavial2025@gmail.com>, william.buitrago@medellin.gov.co , Alexander Vargas Holguín <alexander.vargas@medellin.gov.co>, giovanny.galeano@medellin.gov.co, monical.velez@medellin.gov.co	PMT	Observaciones a PMT propuesto para la intervención de la Cl10A x (Cr36-Cr43D)	Documento: Observaciones a PMT propuesto para la intervención de la Cl10A x (Cr36-Cr43D)	Yulanis Sierra
25/08/2025	emAIL	María Catalina Ochoa.	consorciomedurbano@gmail.com	Natalia Calderón <directora.vialmed2025@gmail.com>, Gabriel Jaime Cardona Londoño	Natalia Calderón <directora.vialmed2025@gmail.com>, Gabriel Jaime Cardona Londoño <gabriel.cardona@medellin.gov.co>	Técnico	Acta de comité de obra N° 3	Acta de comité de obra N° 3	María Catalina Ochoa Alvarez
25/08/2025	emAIL	María Catalina Ochoa.	consorciomedurbano@gmail.com	Natalia Calderón <directora.vialmed2025@gmail.com>, Gabriel Jaime	Natalia Calderón <directora.vialmed2025@gmail.com>, Gabriel Jaime Cardona Londoño <gabriel.cardona@medellin.gov.co>	Técnico	Revisión Subcontratos suministrados	No Aplica	María Catalina Ochoa Alvarez

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

REGISTRO CORRESPONDENCIA		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**Consecutivo**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**Documentos adjuntos**	**Elabora**
				Cardona Londoño					
25/08/2025	emAIL	María Catalina Ochoa.	consorciomedurbano@gmail.com	Natalia Calderón <directora.vialmed2025@gmail.com>, Gabriel Jaime Cardona Londoño	Natalia Calderón <directora.vialmed2025@gmail.com>, Gabriel Jaime Cardona Londoño <gabriel.cardona@medellin.gov.co>	Técnico	Informe mensual 01 Julio 2025 Malla Vial 2025	Informe mensual 01 Julio 2025 Malla Vial 2025	María Catalina Ochoa Alvarez
25/08/2025	emAIL	María Catalina Ochoa.	consorciomedurbano@gmail.com	Natalia Calderón <directora.vialmed2025@gmail.com>, Gabriel Jaime Cardona Londoño	Natalia Calderón <directora.vialmed2025@gmail.com>, Gabriel Jaime Cardona Londoño <gabriel.cardona@medellin.gov.co>	Técnico	Observaciones: Programación semana 25 al 30 de agosto	No Aplica	María Catalina Ochoa Alvarez
25/08/2025	emAIL	María Catalina Ochoa.	consorciomedurbano@gmail.com	Gabriel Jaime Cardona Londoño	<gabriel.cardona@medellin.gov.co>	Técnico	Informe mensual 01 julio 2025 Malla Vial 2025	Informe mensual 01 Julio 2025 Malla Vial 2025	María Catalina Ochoa Alvarez
25/08/2025	emAIL	María Catalina Ochoa.	consorciomedurbano@gmail.com	Gabriel Jaime Cardona Londoño	<gabriel.cardona@medellin.gov.co>	Técnico	Informe # 5, baches mediaticos	Informe # 5, baches mediaticos	María Catalina Ochoa Alvarez
25/08/2025	emAIL	Luisa Fernanda Restrepo María Catalina Martínez Romero	consorciomedurbano@gmail.com	Margarita Mejía	margarita.mejia@medellin.gov.co	Gestión Social	Informe semanal y cronograma social SOCIALES	Informe semanal y cronograma social SOCIALES	Luisa Restrepo
25/08/2025	emAIL	Luisa Fernanda Restrepo María Catalina Martínez Romero	consorciomedurbano@gmail.com	Margarita Mejía	margarita.mejia@medellin.gov.co	Gestión Social	Envío informe semanal de Empleabilidad: Malla Vial, del 18 al 23 de agosto del 2025 SOCIALES	Informe semanal de Empleabilidad: Malla Vial, del 18 al 23 de agosto del 2025 SOCIALES	María Catalina Martínez

REGISTRO CORRESPONDENCIA		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**Consecutivo**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**Documentos adjuntos**	**Elabora**
26/08/2025	emAIL	Raquel Vanessa Vargas Builes, Jorge Luis Monsalve Montiel.	consorciomedurbano@gmail.com	Daniela Restrepo <ambiental2.vialmed2025@gmail.com	Daniela Restrepo <ambiental2.vialmed2025@gmail.com	Gestión Ambiental	Respuesta: Documentos Volqueta TFW 399	nO Aplica	Jorge Luis Monsalve
26/08/2025	emAIL	Luisa Fernanda Restrepo María Catalina Martínez Romero	consorciomedurbano@gmail.com	Comunicaciones SIF, Margarita Mejía	Comunicaciones SIF <publicistasif@gmail.com> margarita.mejia@medellin.gov.co , Malla vial 2025 <mallavialmedellin2025@gmail.com>	Gestión Social	Circular socialización inicio de obra	Circular socialización inicio de obra	Luisa Restrepo
26/08/2025	emAIL	Luis N, León Álvarez	consorciomedurbano@gmail.com	Milena Escobar	profesionalsst.vialmed2025@gmail.com	Gestión SST	Aprobación de ingreso a laborar en el contrato	No Aplica	Luis Norberto León
26/08/2025	emAIL	Luis N, León Álvarez	consorciomedurbano@gmail.com	Milena Escobar	profesionalsst.vialmed2025@gmail.com	Gestión SST	Aprobación de ingreso a laborar en el contrato	No Aplica	Luis Norberto León
26/08/2025	emAIL	Raquel Vanessa Vargas Builes, Jorge Luis Monsalve Montiel.	consorciomedurbano@gmail.com	Daniela Restrepo <ambiental2.vialmed2025@gmail.com	Daniela Restrepo <ambiental2.vialmed2025@gmail.com	Gestión Ambiental	Documentos Automóvil KPQ 732	nO Aplica	Jorge Luis Monsalve
26/08/2025	emAIL	YULANIS MARIET SIERRA BOLAÑO	consorciomedurbano@gmail.com	Gabriel Cardona	Gabriel Jaime Cardona Londoño <gabriel.cardona@medellin.gov.co> Natalia Calderón <directora.vialmed2025@gmail.com>, Ángela Aristizábal <mallavial2025@gmail.com>, william.buitrago@medellin.gov.co , Alexander Vargas Holguín <alexander.vargas@medellin.gov.co>, giovanny.galeano@medellin.gov.	Gestión Ambiental	envío PMT de la Cl10x(Cr36-Cr43D) aprobado por parte de la interventoría para su correspondiente radicación ante la secretaría de movilidad del municipio de Medellín.	PMT General Planos PMT, calle 10	Yulanis Sierra

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

REGISTRO CORRESPONDENCIA		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**Consecutivo**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**Documentos adjuntos**	**Elabora**
					co, monical.velez@medellin.gov.co				
26/08/2025	emAIL	Luisa Fernanda Restrepo María Catalina Martínez Romero	consorciomedurbano@gmail.com	Malla Vial 2025	mallavialmedellin2025@gmail.com	Gestión Social	Aprobación de piezas comunicacionales: Circular socialización inicio de actividades 2. Circular actas de fachada 3. Circular retiro de vehículos	Circular socialización inicio de actividades 2. Circular actas de fachada 3. Circular retiro de vehículos	Luisa Restrepo
26/08/2025	emAIL	María Catalina Ochoa.	consorciomedurbano@gmail.com	Gabriel Jaime Cardona Londoño	<gabriel.cardona@medellin.gov.co>	Técnico	Siros ejecutados en otro contrato-Informe Agosto 23 2025	Archivo excel: Siros ejecutados en otro contrato-Informe Agosto 23 2025	María Catalina Ochoa Alvarez
27/08/2025	emAIL	Luisa Fernanda Restrepo María Catalina Martínez Romero	consorciomedurbano@gmail.com	Malla Vial 2025	mallavialmedellin2025@gmail.com	Gestión Social	Envío de formatos de actas de Entorno y de Vecindad actualizados por la Alcaldía de Medellín	formatos actualizados de actas de Entorno y de Vecindad (FOGEOPActadevecindad_V4 y FOGEOPActadeentorno_V4) por la Alcaldía de Medellín	María Catalina Martínez
27/08/2025	emAIL	Raquel Vanessa Vargas Builes, Jorge Luis Monsalve Montiel.	consorciomedurbano@gmail.com	Daniela Restrepo <ambiental2.vialmed2025@gmail.com	Daniela Restrepo <ambiental2.vialmed2025@gmail.com	Gestión Ambiental	Revisión: Documentación Volquetas	NO Aplica	Jorge Luis Monsalve
27/08/2025	emAIL	Raquel Vanessa Vargas Builes, Jorge Luis Monsalve Montiel.	consorciomedurbano@gmail.com	Daniela Restrepo <ambiental2.vialmed2025@gmail.com	Daniela Restrepo <ambiental2.vialmed2025@gmail.com	Gestión Ambiental	Envío listado de vehículos aprobados	NO Aplica	Jorge Luis Monsalve

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

REGISTRO CORRESPONDENCIA		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**Consecutivo**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**Documentos adjuntos**	**Elabora**
27/08/2025	emAIL	Luis N, León Álvarez	consorciomedurbano@gmail.com	Milena Escobar	profesionalsst.vialmed2025@gmail.com	Gestión SST	Aprobación de ingreso a laborar en el contrato	No Aplica	Luis Norberto León
27/08/2025	emAIL	Luis N, León Álvarez	consorciomedurbano@gmail.com	Milena Escobar	profesionalsst.vialmed2025@gmail.com	Gestión SST	Aprobación de ingreso a laborar en el contrato	No Aplica	Luis Norberto León
27/08/2025	emAIL	Raquel Vanessa Vargas Builes, Jorge Luis Monsalve Montiel.	consorciomedurbano@gmail.com	Daniela Restrepo <ambiental2.vialmed2025@gmail.com	Daniela Restrepo <ambiental2.vialmed2025@gmail.com	Gestión Ambiental	Aprobación: Documentos volqueta TAP993	No Aplica	Jorge Luis Monsalve
27/08/2025	emAIL	Luisa Fernanda Restrepo María Catalina Martínez Romero	consorciomedurbano@gmail.com	Malla Vial 2025	mallavialmedellin2025@gmail.com	Gestión Social	Envío de diseño de pasacalles para implementar el día viernes 29 de agosto del 2025, en la calle 10 A entre carreras 36 y 43D, avenida el Poblado.	diseño de pasacalles para implementar el día viernes 29 de agosto del 2025,	María Catalina Martínez
27/09/2025	EMAIL	María Catalina Ochoa.	consorciomedurbano@gmail.com	Gabriel Jaime Cardona Londoño	gabriel.cardona@medellin.gov.co	Técnico	Informe Mensual No1.	Informe Mensual No1. con anexos	María Catalina Ochoa Alvarez
28/08/2025	emAIL	Luis N, León Álvarez	consorciomedurbano@gmail.com	Milena Escobar	profesionalsst.vialmed2025@gmail.com	Gestión SST	Aprobación de ingreso a laborar en el contrato	No Aplica	Luis Norberto León
28/08/2025	emAIL	Raquel Vanessa Vargas Builes, Jorge Luis Monsalve Montiel.	consorciomedurbano@gmail.com	Daniela Restrepo <ambiental2.vialmed2025@gmail.com	Daniela Restrepo <ambiental2.vialmed2025@gmail.com	Gestión Ambiental	PASAO MALLA VÍAL 2025, final con los ajustes correspondiente al presupuesto socioambiental.	PASAO MALLA VÍAL 2025: Versión final	Jorge Luis Monsalve

REGISTRO CORRESPONDENCIA		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**Consecutivo**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**Documentos adjuntos**	**Elabora**
28/08/2025	emAIL	Raquel Vanessa Vargas Builes, Jorge Luis Monsalve Montiel.	consorciomedurbano@gmail.com	Daniela Restrepo <ambiental2.vialmed2025@gmail.com	Daniela Restrepo <ambiental2.vialmed2025@gmail.com	Gestión Ambiental	Revisión: Documentación Volquetas	NO Aplica	Jorge Luis Monsalve
28/08/2025	emAIL	Luisa Fernanda Restrepo María Catalina Martínez Romero	consorciomedurbano@gmail.com	Gabriel Jaime Cardona Londoño	gabriel.cardona@medellin.gov.co	Gestión Social	Comparto el informe semanal de empleabilidad, semana del 18 al 23 de agosto del 2025.	informe semanal de empleabilidad, semana del 18 al 23 de agosto del 2025.	María Catalina Martínez
28/08/2025	emAIL	Luis N, León Álvarez	consorciomedurbano@gmail.com	Milena Escobar	profesionalsst.vialmed2025@gmail.com	Gestión SST	Aprobación de ingreso a laborar en el contrato	No Aplica	Luis Norberto León
28/08/2025	emAIL	Luisa Fernanda Restrepo María Catalina Martínez Romero	consorciomedurbano@gmail.com	Malla Vial 2025	mallavialmedellin2025@gmail.com	Gestión Social	Envío algunas observaciones al recorrido realizado el día de hoy (28/08/2025) del componente social, en los frentes de obra ubicados en Belén la Palma cuadrilla 14 y en Laureles sector Santa Teresita cuadrilla 12.	No Aplica	María Catalina Martínez
29/08/2025	emAIL	Luis N, León Álvarez	consorciomedurbano@gmail.com	Milena Escobar	profesionalsst.vialmed2025@gmail.com	Gestión SST	Aprobación de ingreso a laborar en el contrato	No Aplica	Luis Norberto León
29/09/2025	EMAIL	María Catalina Ochoa.	consorciomedurbano@gmail.com	Juan Camilo Patino Amortegui	juanc.patino@medellin.gov.co	Técnico	Registro de visitas: duplicidad de ID, contratos ejecutados y SIRO R3-R4	No Aplica	María Catalina Ochoa Alvarez

REGISTRO CORRESPONDENCIA		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**Consecutivo**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**Documentos adjuntos**	**Elabora**
30/08/2025	emAIL	Luis N, León Álvarez	consorciomedurbano@gmail.com	Milena Escobar	profesionalsst.vialmed2025@gmail.com	Gestión SST	Aprobación de ingreso a laborar en el contrato	No Aplica	Luis Norberto León

Anexo 4.5.1 Correspondencia enviada **agosto de 2025**

Tabla 56. Relación correspondencia recibida **agosto 2025**

EMAIL		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**eMAIL**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**documentos adjuntos**	**RECIBE**
1/08/2025	EMAIL	Natalia Calderon	directora.vialmed2025@gmail.com	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión SST	Personal de apoyo a frentes activos	HERRERA TABORDAJHON JAIME.rar 1020K CASIANNI OZUNA ELKIN DAVID.rar 1412K MONROY HUMOA OMAR ALEJANDRO.rar 1511K CARMONA GARCIA CARLOS ANDRES.rar 1370K MIRA RONDON JHOSUA.rar 1546K ORTEGA JUAN CARLOS.rar 1577K PEREZ LEON JAIDER DAVID.rar 1413K QUEJADA BOHORQUEZ JOSE DAVID.rar 1297K VILLALOBOS HERNANDEZ JOSE ALEJANDRO.rar 1532K	Jorge Luis Monsalve

EMAIL		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**eMAIL**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**documentos adjuntos**	**RECIBE**
								SANCHEZ HINCAPIE EDINSON DE JESUS.rar 1496K ZAPATA ARBOLEDA DAVID ESNEIDER.rar 1309K	
1/08/2025	EMAIL	Gabriel Cardona	gabriel.cardona@medellin.gov.co	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	Libro3.xlsx	Libro3.xlsx	Jorge Luis Monsalve
1/08/2025	EMAIL	Gabriel Cardona	gabriel.cardona@medellin.gov.co	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	RV: Informe frente a gestiones pago impuesto timbre contrato 4600105052	no aplica	Jorge Luis Monsalve
1/08/2025	EMAIL	Gabriel Cardona	gabriel.cardona@medellin.gov.co	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	baches mediáticos	BACHES NEDIATICOS PAJARITO Y CUCARACHO 31072025.pdf	Jorge Luis Monsalve
1/08/2025	EMAIL	Gabriel Cardona	gabriel.cardona@medellin.gov.co	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	Anexo complementario al diseño de la calle 50	Anexos-I-623-01-03.zip	Jorge Luis Monsalve
1/08/2025	EMAIL	Asney Garcia Doriela Ospina M	mallavialmedellin2025@gmail.com	Maria Catalina Martinez Romero Luisa Restrepo.	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión Social	Informe mensual-Julio 2025	Inf Julio 2025.zip	Jorge Luis Monsalve
1/08/2025	EMAIL	Natalia Calderón	directora.vialmed2025@gmail.com	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión SST	Personal de apoyo a frentes activos	HERRERA TABORDAJHON JAIME.rar CASIANNI OZUNA ELKIN DAVID.rar MONROY HUMOA OMAR ALEJANDRO.rar CARMONA GARCIA CARLOS ANDRES.rar MIRA RONDON JHOSUA.rar ORTEGA JUAN CARLOS.rar PEREZ LEON JAIDER DAVID.rar QUEJADA BOHORQUEZ JOSE DAVID.rar VILLALOBOS HERNANDEZ JOSE ALEJANDRO.rar	Luis Norberto León

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

EMAIL		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**eMAIL**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**documentos adjuntos**	**RECIBE**
								SANCHEZ HINCAPIE EDINSON DE JESUS.rar ZAPATA ARBOLEDA DAVID ESNEIDER.rar	
1/08/2025	EMAIL	Víctor Vargas Rodríguez - Comunicador	mallavialmedellin2025@gmail.com	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión Social	PROPUESTA E-CARD PROYECTO MALLA VIAL	Propuesta e_card Juntas de Acción Comunal_baja.pdf	Jorge Luis Monsalve
1/08/2025	EMAIL	Gabriel Cardona	gabriel.cardona@medellin.gov.co	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	RV: BACHES MEDIÁTICOS 01082025	BACHES MEDIÁTICOS 01082025 (1).pdf	Jorge Luis Monsalve
1/08/2025	EMAIL	Elsa Maria Polo Daniela Restrepo	ambiental2.vialmed2025@gmail.com	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión Ambiental	Envío de Informe Semanal Ambiental	INF_AMB_SEMANAL_1_JULIO.pdf INF_AMB_SEMANAL_1_JULIO.docx	Jorge Luis Monsalve
1/08/2025	EMAIL	Natalia Calderón	directora.vialmed2025@gmail.com	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión Ambiental	Oficio CVM-029-2025 Informe mensual ambiental Julio	ANEXOS.rar INF_AMB_1_JUL.pdf	Jorge Luis Monsalve
2-8-2025	EMAIL	Luis Alejandro Castro Roque Ingeniero Civil	residente2.vialmed2025@gmail.com	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	PROGRAMACIÓN DE OBRA VIALMED 04-08-2025	MAPA JORNADA 04-08-2025.txt PROGRAMACIÓN DIARIA 04-08-2025.xlsx	Jorge Luis Monsalve
4/08/2025	EMAIL	Natalia Calderón Directora de Obra	directora.vialmed2025@gmail.com	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión SST	Oficio CVM-031-2025 Documentación personal operativo Subcontratista Estructuras y Pavimentos Frentes 6	Oficio CVM-031-2025 Documentación personal operativo Subcontratista Estructuras y Pavimentos Frentes 6.pdf FRENTE 6.rar	Jorge Luis Monsalve
4/08/2025	EMAIL	Gabriel Jaime Cardona Londoño	gabriel.cardona@medellin.gov.co	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	RV: Informe técnico huecos vía Carambolas y Bello Oriente, Comuna 3 - Reporte Mesa interinstitucional	20250801 IT HUECOS BELLO ORIENTE.pdf	Jorge Luis Monsalve
4/08/2025	EMAIL	Elsa Maria Polo	ambientalvialmed2025@gmail.com	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión Ambiental	Re: Acta de reunión ambiental (24-07-2025). (SIF - INTERVENTORÍA - CONTRATISTA).	FO-GINF-055ActadeReunin-V4_5 Ambi 20250724.docx	Jorge Luis Monsalve
4/08/2025	EMAIL	Elsa Maria Polo	ambientalvialmed2025@gmail.com	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión Ambiental	Documentación Camiones	CARPETA #1 CAMION ESP079.rar CARPETA #11 CAMION HECTOR MORENO.rar	Jorge Luis Monsalve

EMAIL		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**eMAIL**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**documentos adjuntos**	**RECIBE**
4/08/2025	EMAIL	Asney Garcia Doriela Ospina M Profesionales Sociales Consorcio Vialmed 2025	mallavialmedellin2025@gmail.com	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión Social	Informe y programación Semanal	2-04 Agosto a 09 de Agosto 2025.docx 2-28 de Julio al 2 de agosto 2025.docx	Jorge Luis Monsalve
4/08/2025	EMAIL	Lucia Hincapie Martinez	lucia.hincapie@medellin.gov.co	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión Ambiental	acta de reunión ambiental SIF - INTERVENTORÍA Y CONTRATISTA.	FO-GINF-055ActadeReunin-V4_5 Ambi 20250724.pdf	Jorge Luis Monsalve
4/08/2025	EMAIL	Natalia Calderón	directora.vialmed2025@gmail.com	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión SST	Personal apoyo Frente 1	ZUÑIGA BEDOYA JOSE LUIS.rar CERQUERA ESCUDERO ESNEIDER.rar MENDOZA ORLANDO JOSE.rar	Jorge Luis Monsalve
4/08/2025	EMAIL	Natalia Calderón	directora.vialmed2025@gmail.com	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	Re: Acta de reunión N° 1	no aplica	Jorge Luis Monsalve
4/08/2025	EMAIL	Gabriel Jaime Cardona Londoño	gabriel.cardona@medellin.gov.co	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	RE: Funcionamiento APK	no aplica	Jorge Luis Monsalve
4/08/2025	EMAIL	Natalia Calderón	directora.vialmed2025@gmail.com	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	Organigrama de obra V1	Organigrama V1.pdf	Jorge Luis Monsalve
4/08/2025	EMAIL	Luis Alejandro Castro Roque Ingeniero Civil	Residente2.vialmed2025@gmail.com	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	PROGRAMACIÓN DE OBRA VIALMED 05-08-2025	MAPA JORNADA 05-08-2025.txt PROGRAMACIÓN DIARIA 05-08-2025.xlsx	Jorge Luis Monsalve
4/08/2025	EMAIL	Natalia Calderón	directora.vialmed2025@gmail.com	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	Transporte RAP	FRESADO_ PLANTA_ MUNICIPIO.xlsx	Jorge Luis Monsalve
5/08/2025	EMAIL	Margarita Maria Mejía Galeano	margarita.mejia@medellin.gov.co	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión Social	Formatos entrega de circulares	01formatos SOCIALES CONTRATISTAS SIN LOGO.xls	Jorge Luis Monsalve

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

EMAIL		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**eMAIL**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**documentos adjuntos**	**RECIBE**
5/08/2025	EMAIL	Gabriel Jaime Cardona Londoño	gabriel.cardona@medellin.gov.co	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	RE: Borradores cartas subcontratos	no aplica	Jorge Luis Monsalve
5/08/2025	EMAIL	Gabriel Jaime Cardona Londoño	gabriel.cardona@medellin.gov.co	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	RV: INTERVENCION CALLE COLOMBIA CON CARABOBO	no aplica	Jorge Luis Monsalve
5/08/2025	EMAIL	Gabriel Jaime Cardona Londoño	gabriel.cardona@medellin.gov.co	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	apu sika PARA REALCE	20241215 SIKA Home Center.jpg 20241204 Entrega APU Realces Sumideros y Cámaras.pdf 20241213 Relacion de apus v1.pdf 220K	Jorge Luis Monsalve
5/08/2025	EMAIL	Gabriel Jaime Cardona Londoño	gabriel.cardona@medellin.gov.co	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	RV: Puntos Santo Domingo	StoDomingo_080725.pdf	Jorge Luis Monsalve
5/08/2025	EMAIL	Asney Garcia Doriela Ospina M Profesionales Sociales	mallavialmedellin2025@gmail.com	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión Social	Re: Oficio CVM-030-2025 Informe mensual social Julio	INF_SOC_1_JUL_ CONSORCIO VIALMED 2025.docx	Jorge Luis Monsalve
5/08/2025	EMAIL	Luis Alejandro Castro Roque Ingeniero Civil	residente2.vialmed2025@gmail.com	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	PROGRAMACIÓN DE OBRA VIALMED 06-08-2025	MAPA JORNADA 06-08-2025.txt PROGRAMACIÓN DIARIA 06-08-2025.xlsx PROGRAMACIÓN DIARIA 06-08-2025.xlsx	Jorge Luis Monsalve
5/08/2025	EMAIL	Natalia Calderón	directora.vialmed2025@gmail.com	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	Direcciones extracción de núcleos	SOLICITUD EXTRACCION NÚCLEOS MALLA VIAL 2025.xlsx	Jorge Luis Monsalve
5/08/2025	EMAIL	Víctor Vargas Rodríguez Comunicador	mallavialmedellin2025@gmail.com	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión Social	CONJUNTO DE E-CARD (de socialización y de cierre vial)	E-Card base cierre de vías.pdf E-Card JAC Tacita de Plata.pdf	Jorge Luis Monsalve
5/08/2025	EMAIL	Natalia Calderón	directora.vialmed2025@gmail.com	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	Oficio CVM-033-2025 PASAO Versión Final	V3_Malla_vial_30072025VF-Final.pdf Oficio CVM-033-2025 PASAO Versión Final.pdf	Jorge Luis Monsalve
5/08/2025	EMAIL	No firma.	mallavialmedellin2025@gmail.com	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión Social	Fwd: Solicitud para intervenir la malla vial	20250529_175638.jpg 20250529_175607.jpg 20250529_175601.jpg	Jorge Luis Monsalve

EMAIL		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**eMAIL**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**documentos adjuntos**	**RECIBE**
								20250529_175622.jpg 20250529_175631.jpg 20250529_175616.jpg 20250529_175624.mp4	
5/08/2025	EMAIL	Gabriel Jaime Cardona Londoño	gabriel.cardona@medellin.gov.co	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	entregables de un acta de pago	3 20240805_MEMORIAS_ ACTA_01.pdf 4 20240805_MEMORIAS_ PMT.pdf 4 20240805_MEMORIAS_COBRO_COMUNICACIONES.pdf 6 CERTIFICADO parafiscales Consorcio Malla Vial Julio 2024.pdf ACTA 1 MALLA VIAL 2024.pdf 1 0014.24 MEDcertificado parafiscales acta de obra01 SIF.pdf 2 20240805 ACTA 1 MALLA VIAL 2024-1.pdf 7. Soportes de la Administración Septiembre.pdf 10 2024 Certificado SS CMV.pdf 6.1 Planilla SS_73590745_Consorcio.pdf	Jorge Luis Monsalve
6/08/2025	EMAIL	Gabriel Jaime Cardona Londoño	gabriel.cardona@medellin.gov.co	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	RE: Solicitud información factura del pago anticipado.	no aplica	Jorge Luis Monsalve
6/08/2025	EMAIL	Gabriel Jaime Cardona Londoño	gabriel.cardona@medellin.gov.co	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión Social	RV: Solicitud para intervenir la malla vial	cadena de correos.	Jorge Luis Monsalve

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

EMAIL		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**eMAIL**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**documentos adjuntos**	**RECIBE**
6/08/2025	EMAIL	Natalia Calderón	directora.vialmed2025@gmail.com	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	Oficio CVM-034-2025 Hojas de vida Tecnólogos de obra, Tecnólogo administrativo y Residente de obra Parte 4	EVALUACION PROFESIONALES_MALLA VIALMED 2025 V7.xlsx 211K 3.2 Residente N° 5 Andy Javier Anaya Nieto.rar 2596K 35. Tecnologo Civil 17 Lina Ocampo.rar 2974K 34. Tecnologo Civil 16 Federico Agudelo.rar 5978K 33. Tecnologa Admon 2 Emi Tatiana Árbeláez.rar 6354K Oficio CVM-034-2025 Hojas de vida Tecnólogos de obra, Tecnólogo administrativo y Residente de obra. Parte 4.pdf 122K	Jorge Luis Monsalve
6/08/2025	EMAIL	Natalia Calderón	directora.vialmed2025@gmail.com	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	Diseños mezcla MSC-19+FIBRA y MAM-25 Planta Pavimentar	DISEÑO MEZCLA MSC-19 NT3 ASFALTO 60-70 + FIBRA 21-08-2024 (1).pdf 3587K DISEÑO MEZCLA MAM-25 NT3 CAM-1 09-09-2024 (1).pdf 6064K	Jorge Luis Monsalve
4/08/2025	EMAIL	Asney Garcia Doriela Ospina M Profesionales Sociales Consorcio Vialmed 2025	mallavialmedellin2025@gmail.com	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión Social	Empleabilidad	Registro de Empleabilidad-28 de julio al 02 agosto.xlsx	Jorge Luis Monsalve
6/08/2025	EMAIL	Asney Garcia Doriela Ospina M Profesionales Sociales Consorcio Vialmed 2025	mallavialmedellin2025@gmail.com	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión Social	Re: Empleabilidad	Registro de Empleabilidad-28 de julio al 02 agosto.xlsx	Jorge Luis Monsalve

EMAIL		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**eMAIL**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**documentos adjuntos**	**RECIBE**
5/08/2025	EMAIL	Natalia Calderón	directora.vialmed2025@gmail.com	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	Oficio CVM-032-2025 Complemento a oficios CVM-005-2025 y CVM-008-2025	Oficio CVM-032-2025 Complemento a oficios CVM-005-2025 y CVM-008-2025.pdf 116K Solicitud Subcontratación Procopal V2.pdf 393K Solicitud Subcontratación Pavimentar SA V2.pdf 394K Solicitud Subcontratación EyP V2.pdf 359K	Jorge Luis Monsalve
6/08/2025	EMAIL	Natalia Calderón	directora.vialmed2025@gmail.com	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	Re: Oficio CVM-032-2025 Complemento a oficios CVM-005-2025 y CVM-008-2025	Solicitud Subcontratación EyP V2.pdf 381K Solicitud Subcontratación Procopal V2.pdf 413K Solicitud Subcontratación Pavimentar SA V2.pdf 416K	Jorge Luis Monsalve
6/08/2025	EMAIL	Gabriel Jaime Cardona Londoño	gabriel.cardona@medellin.gov.co	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	RV: INTERVENCIONES MASIVAS A REALZIAR POR LA SIF	RE: Proyectos Distrito Medellín para articulación con la SMM.eml	Jorge Luis Monsalve
6/08/2025	EMAIL	Luis Alejandro Castro Roque Ingeniero Civil	Residente2.vialmed2025@gmail.com	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	PROGRAMACIÓN DE OBRA VIALMED 08-08-2025	MAPA JORNADA 08-08-2025.txt 1K PROGRAMACIÓN DIARIA 08-08-2025.xlsx 14K	Jorge Luis Monsalve
8/08/2025	EMAIL	Natalia Calderón	directora.vialmed2025@gmail.com	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión SST	Oficio CVM-035-2025 Informe mensual SST Julio	Oficio CVM-035-2025 Informe mensual SST Julio.pdf 118K INFORME #1 CONSORCIO VIALMED 2025 JULIO.pdf 1265K	Jorge Luis Monsalve
8/08/2025	EMAIL	Vanessa Tobón comunicaciones SIF.	publicistasif@gmail.com	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión Social	Re: PROPUESTA CONTRATISTA AFICHE PROYECTO	no aplica	Jorge Luis Monsalve

EMAIL		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**eMAIL**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**documentos adjuntos**	**RECIBE**
8/08/2025	EMAIL	Víctor Vargas Rodríguez Comunicador Consorcio VialMed 2025	mallavialmedellin2025@gmail.com	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión Social	PROPUESTA CIRCULARES CON OBSERVACIONES APLICADAS	Circular de Obra - Calle 10A.pptx 247K Circular de Obra - Vizcaya.pptx 247K	Jorge Luis Monsalve
8/08/2025	EMAIL	gabriel cardona	gabriel.cardona910@gmail.com	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	Re: Hoja de cálculo compartida contigo: "FORMATO BACHES EJECUTADOS"	FORMATO BACHES EJECUTADOS	Jorge Luis Monsalve
8/08/2025	EMAIL	Gabriel Jaime Cardona Londoño	gabriel.cardona@medellin.gov.co	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión Social	RV: CIRCULARES PARA INICIO PUNTOS MASIVOS VIZCAYA Y CALLE 10A	cadena de correos.	Jorge Luis Monsalve
8/08/2025	EMAIL	Lucia Hincapie Martinez	lucia.hincapie@medellin.gov.co	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión Ambiental	Acta e informe visita	INFORME VISITA 1. 05-08-2025.pdf 987K FO-GINF-055ActadeReunin-V4_5 Ambi #3 (SIF) Malla Vial.pdf 383K	Jorge Luis Monsalve
8/08/2025	EMAIL	Natalia Calderón	directora.vialmed2025@gmail.com	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	Re: Firma Formato aprobacion PASAO	1. Aprobación del PASAO V3 30-09-19 - pasao malla vial 2025-2.docx 521K	Jorge Luis Monsalve
8/08/2025	EMAIL	Natalia Calderón	directora.vialmed2025@gmail.com	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	Oficio CVM-036-2025 Informe Mensual de Calidad 1 al 31 de Julio	1. INFORME MENSUAL DE CALIDAD JULIO 2025.pdf 1343K Oficio CVM-036-2025 Informe Mensual de Calidad 1 al 31 de Julio.pdf 118K ANEXOS.rar 8866K	Jorge Luis Monsalve
8/08/2025	EMAIL	Natalia Calderón	directora.vialmed2025@gmail.com	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	PMT	PMT Calle 10 entre Carrera 30 y 32b	Anexo A.Plano de Señalización_1de2.pdf 1071K Anexo B.Plano de Señalización_2de2.pdf 1077K PMT CALLE 10 ENTRA CRA 30 Y 32B.pdf 3408K	Jorge Luis Monsalve

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

EMAIL		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**eMAIL**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**documentos adjuntos**	**RECIBE**
8/08/2025	EMAIL	Natalia Calderón	directora.vialmed2025@gmail.com	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	PMT	Re: PMT Calle 10 entre Carrera 30 y 32b	Anexo B.Plano de Señalización_2de2.pdf 1069K Anexo A.Plano de Señalización_1de2.pdf 1066K PMT CALLE 10 ENTRE CRA 30 Y 32B.pdf 3429K	Jorge Luis Monsalve
9/08/2025	EMAIL	Equipo social contratista	mallavialmedellin2025@gmail.com	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión Social	Aceptado: Reunión equipo social lun 11 de ago de 2025 10am - 11am (COT) (consorciomedurbano@gmail.com)	no aplica	Jorge Luis Monsalve
9/08/2025	EMAIL	Natalia Calderón	directora.vialmed2025@gmail.com	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión SST	Oficio CVM-038-2025 Documentación personal operativo Subcontratista Estructuras y Pavimentos Frentes 10	Oficio CVM-038-2025 Documentación personal operativo Subcontratista Estructuras y Pavimentos Frentes 10.pdf 123K FRENTE 10.rar 25410K	Jorge Luis Monsalve
9/08/2025	EMAIL	Asney Garcia Doriela Ospina M Profesionales Sociales Consorcio Vialmed 2025	mallavialmedellin2025@gmail.com	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión Social	SOCIAL-Cuadro de Empleabilidad	Registro de Empleabilidad-04 al 09 agosto.xlsx	Jorge Luis Monsalve
10/08/2025	EMAIL	ÁNGELA ARISTIZÁBAL	mallavial2025@gmail.com	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	1. CANTIDADES CORREGIDAS JULIO 2025	1. JULIO SHAREPOINT APROBADO.xlsx 29K 1. MATRIZ JULIO 2025 OK.xlsx 118K	Jorge Luis Monsalve
11/08/2025	EMAIL	Gabriel Jaime Cardona Londoño	gabriel.cardona@medellin.gov.co	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	Contrato malla Vial 2025- seguimiento cuadrillas.	no aplica	Jorge Luis Monsalve

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

EMAIL		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**eMAIL**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**documentos adjuntos**	**RECIBE**
11/08/2025	EMAIL	Gabriel Jaime Cardona Londoño	gabriel.cardona@medellin.gov.co	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	PMT	RE: Validación PMT Específico en Cl10xCra30	fotografías dentro del comunicado	Jorge Luis Monsalve
11/08/2025	EMAIL	Gabriel Jaime Cardona Londoño	gabriel.cardona@medellin.gov.co	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	RV: Consulta Intervenciones De EPM	cadena de correos. Consulta3 MASIVOS y otros_jul_2025.kmz 4K	Jorge Luis Monsalve
11/08/2025	EMAIL	Equipo social contratista	mallavialmedellin2025@gmail.com	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión Social	Re: CIRCULARES PARA INICIO PUNTOS MASIVOS VIZCAYA Y CALLE 10A	cadena de correos	Jorge Luis Monsalve
11/08/2025	EMAIL	Asney Garcia Doriela Ospina M Profesionales Sociales Consorcio Vialmed 2025	mallavialmedellin2025@gmail.com	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión Social	Social. informe semanal y cronograma de actividades	3-Cronograma semanal_ del 11 al 16 de Agosto 2025_R.Int - copia.docx 987K 3. Formato -Informe Semanal Social - 2025- Contratistas -.docx 1659K	Jorge Luis Monsalve
11/08/2025	EMAIL	Elsa Maria Polo Cuello Profesional Ambiental.	ambientalvialmed2025@gmail.com	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión Ambiental	SOPORTE VOLQUETAS	Volqueta PLACA STH 139.pdf 5737K Volqueta PLACA ZNM 196.pdf 1283K Volqueta PLACA ZNM 449.pdf 1159K Volqueta PLACA UQE 121.pdf 5612K	Jorge Luis Monsalve
4/08/2025	EMAIL	Elsa Maria Polo Cuello Profesional Ambiental.	ambientalvialmed2025@gmail.com	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión Ambiental	Documentación Volquetas	12. CONDUCTOR ESNEIDER GARCIA PLACA EQX 188.pdf 9715K 13. CONDUCTOR JEFERSON LOPERA PLACA WEX 535.pdf 9469K	Jorge Luis Monsalve

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

EMAIL		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**eMAIL**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**documentos adjuntos**	**RECIBE**
11/08/2025	EMAIL	Alexander Vargas Holguín	alexander.vargas@medellin.gov.co	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	RE: Fallas SIRO	no aplica	Jorge Luis Monsalve
11/08/2025	EMAIL	DANIELA RESTREPO	ambiental2.vialmed2025@gmail.com	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión Ambiental	Re: Oficio CVM-029-2025 Informe mensual ambiental Julio	INF_AMB_1_JUL_V2_obsF.docx 1862K INF_AMB_1_JUL_V2_obsF.pdf 1991K CORRECCIONES INFORME JULIO.xlsx 14K	Jorge Luis Monsalve
11/08/2025	EMAIL	Elsa Maria Polo Daniela Restrepo Residentes Ambientales.	ambiental2.vialmed2025@gmail.com	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión Ambiental	Fwd: Envío de Informe Semanal Ambiental_2_agosto2025	INF_AMB_SEMANAL_2_Agosto.pdf 1211K INF_AMB_SEMANAL_2_Agosto.docx 2522K	Jorge Luis Monsalve
11/08/2025	EMAIL	Elsa Maria Polo Daniela Restrepo Residentes Ambientales.	ambiental2.vialmed2025@gmail.com	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión Ambiental	Envío de Informe Semanal Ambiental_3_agosto2025	INF_AMB_SEMANAL_3_Agosto.pdf 1043K INF_AMB_SEMANAL_3_Agosto.docx 2270K	Jorge Luis Monsalve
11/08/2025	EMAIL	Natalia Calderón	directora.vialmed2025@gmail.com	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	Fwd: Factura Pago anticipado	07 - FE 1 - Factura pago anticipado - Consorcio VialMed.pdf 49K 1.1.5 RUT Ingealquipos 18JUL25.pdf 303K 1.1.5 RUT Prisma 54 18JUL25.pdf 263K RUT Consorcio VIALMED 2025.pdf 285K	Jorge Luis Monsalve
11/08/2025	EMAIL	Natalia Calderón	directora.vialmed2025@gmail.com	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	Re: Transporte RAP	WhatsApp Image 2025-08-11 at 3.15.27 PM.jpeg 113K	Jorge Luis Monsalve

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

EMAIL		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**eMAIL**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**documentos adjuntos**	**RECIBE**
11/08/2025	EMAIL	Luis Alejandro Castro Roque Ingeniero Civil	residente2.vialmed2025@gmail.com	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	PROGRAMACIÓN DE OBRA VIALMED 12-08-2025	MAPA JORNADA 12-08-2025.txt 1K PROGRAMACIÓN DIARIA 12-08-2025.xlsx 14K	Jorge Luis Monsalve
8/08/2025	EMAIL	Luis Alejandro Castro Roque Ingeniero Civil	residente2.vialmed2025@gmail.com	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	PROGRAMACIÓN DE OBRA VIALMED 11-08-2025	PROGRAMACIÓN DIARIA 11-08-2025.xlsx	Jorge Luis Monsalve
11/08/2025	EMAIL	Luis Alejandro Castro Roque Ingeniero Civil	residente2.vialmed2025@gmail.com	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	Re: PROGRAMACIÓN DE OBRA VIALMED 11-08-2025	PROGRAMACIÓN DIARIA 11-08-2025.xlsx	Jorge Luis Monsalve
11/08/2025	EMAIL	Víctor Vargas Rodríguez Comunicador Consorcio VialMed 2025	mallavialmedellin2025@gmail.com	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión Social	PROPUESTA DISEÑO VOLANTE GENÉRICO	V_1 Propuesta Volante.pdf 248K	Jorge Luis Monsalve
11/08/2025	EMAIL	Ángela Aristizábal	mallavial2025@gmail.com	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	Listado de Tecnólogos en Obra para Alimentación de Base de Datos	2. Listado Residentes y Tecnologos de Obra 30072025.xlsx	Jorge Luis Monsalve
12/08/2025	EMAIL	Víctor Vargas Rodríguez Comunicador Consorcio VialMed 2025	mallavialmedellin2025@gmail.com	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión Social	CAMBIO CARÁTULA PLANTILLA PRESENTACIONES	V_1 Plantilla Presentación Oficial.pptx	Jorge Luis Monsalve
12/08/2025	EMAIL	Gabriel Jaime Cardona Londoño	gabriel.cardona@medellin.gov.co	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	BACHES MEDIÁTICOS 12/08/2025	BACHES MEDIÁTICOS 12082025.pdf 1892K	Jorge Luis Monsalve

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

EMAIL		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**eMAIL**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**documentos adjuntos**	**RECIBE**
12/08/2025	EMAIL	Gabriel Jaime Cardona Londoño	gabriel.cardona@medellin.gov.co	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	modelo de acta	Acta No.3 Septiembre del 2024 V2.xlsx 371K ACTA PARCIAL Nro03 SEP_4600102110.pdf 9521K	Jorge Luis Monsalve
12/08/2025	EMAIL	Natalia Calderón	directora.vialmed2025@gmail.com	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	Núcleos semana 3 (4 al 8 de agosto)	SOLICITUD EXTRACCION NÚCLEOS MALLA VIAL 2025 (2).xlsx 37K	Jorge Luis Monsalve
12/08/2025	EMAIL	Luis Alejandro Castro Roque Ingeniero Civil	residente2.vialmed2025@gmail.com	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	MAPA JORNADA 13-08-2025.txt 1K PROGRAMACIÓN DIARIA 13-08-2025.xlsx 14K	PROGRAMACIÓN DE OBRA VIALMED 13-08-2025	Jorge Luis Monsalve
13/8/2025	EMAIL	Elsa Maria Polo Cuello Ingeniera Ambiental	ambientalvialmed2025@gmail.com	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión Ambiental	Documentos volquetas	DOCUMENTOS CONDUCTOR HAROLD LÓPEZ PLACA TMP 284.pdf 9482K	Jorge Luis Monsalve
13/8/2025	EMAIL	Víctor Vargas Rodríguez Comunicador Consorcio VialMed 2025	mallavialmedellin2025@gmail.com	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión Social	ARCHIVO EDITABLE LONA VOLQUETAS + CAMIONES	V_1 Lona Volqueta-Camión.ai	Jorge Luis Monsalve
13/8/2025	EMAIL	alcaldía de medellin.	reportesmed@medellin.gov.co	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	ALCALDÍA DE MEDELLÍN - BACHES Y HUECOS. ESTADO: REPORTADO	cadena de correos.	Jorge Luis Monsalve
13/8/2025	EMAIL	alcaldía de medellin.	reportesmed@medellin.gov.co	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	ALCALDIA DE MEDELLIN - REPORTE DE HUECOS. ESTADO: Ejecutado	cadena de correos	Jorge Luis Monsalve
13/8/2025	EMAIL	Víctor Vargas Rodríguez Comunicador Consorcio VialMed 2025	mallavialmedellin2025@gmail.com	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión Social	CIRCULARES DE SOCIALIZACIÓN	Circular de Obra 001- Buenos Aires_Socialización.pptx 247K Circular de Obra 002- Castilla_Socialización.pptx 247K	Jorge Luis Monsalve

EMAIL		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**eMAIL**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**documentos adjuntos**	**RECIBE**
13/8/2025	EMAIL	Gabriel Jaime Cardona Londoño	gabriel.cardona@medellin.gov.co	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	RV: BACHES MEDIÁTICOS 13/08/2025	BACHES MEDIÁTICOS 13082025.pdf	Jorge Luis Monsalve
13/8/2025	EMAIL	Gabriel Jaime Cardona Londoño	gabriel.cardona@medellin.gov.co	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	RV: Oficio Firmado	202530377929.pdf	Jorge Luis Monsalve
13/8/2025	EMAIL	Margarita Maria Mejía Galeano	margarita.mejia@medellin.gov.co	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión Social	RECORRIDO FRENTES DE OBRA-OBSERVACIONES - Contrato Malla Vial		Jorge Luis Monsalve
13/8/2025	EMAIL	Luis Alejandro Castro Roque Ingeniero Civil	residente2.vialmed2025@gmail.com	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	PROGRAMACIÓN DE OBRA VIALMED 14-08-2025	PROGRAMACIÓN DIARIA 14-08-2025.xlsx	Jorge Luis Monsalve
13/8/2025	EMAIL	Natalia Calderón	directora.vialmed2025@gmail.com	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	Acta Julio	1. Acta Julio.rar	Jorge Luis Monsalve
13/8/2025	EMAIL	Natalia Calderón	directora.vialmed2025@gmail.com	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	Oficio CVM-039-2025 Documentación personal operativo Subcontratista Estructuras y Pavimentos Frente 11	FRENTE 11.rar Oficio CVM-039-2025 Documentación personal operativo Subcontratista Estructuras y Pavimentos Frente 11.pdf	Jorge Luis Monsalve
14/08/2025	EMAIL	Gabriel Jaime Cardona Londoño	gabriel.cardona@medellin.gov.co	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	revisar la vía loma del indio	548.202510245646_RESPUESTA_MAURICIO ALVAREZ.docx	Jorge Luis Monsalve
14/08/2025	EMAIL	Natalia Calderón	directora.vialmed2025@gmail.com	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	Re: Borrador acta de comité de obra N° 2	2 - Comité de obra N° 2 05-08-2025 OK.docx	Jorge Luis Monsalve
14/08/2025	EMAIL	Gabriel Jaime Cardona Londoño	gabriel.cardona@medellin.gov.co	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión SST	Inicio actividades de Pompeyanos y otras	no aplica	Jorge Luis Monsalve

EMAIL		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**eMAIL**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**documentos adjuntos**	**RECIBE**
15/08/2025	EMAIL	Gabriel Jaime Cardona Londoño	gabriel.cardona@medellin.gov.co	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión SST	listado de baches para ser atendidos NO SON MEDIATICOS	no aplica	María Catalina Ochoa Alvarez
15/08/2025	EMAIL	Gabriel Jaime Cardona Londoño	gabriel.cardona@medellin.gov.co	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión SST	Oboservaciones: Acta No.1 mes de julio para su revisión y aprobación.	no aplica	María Catalina Ochoa Alvarez
15/08/2025	EMAIL	Ángela Aristizábal	consorciomedurbano@gmail.com,	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	Reporte SIRO Malla vial 2025 (Error en creación de baches en SIRO)	no aplica	María Catalina Ochoa Alvarez
15/08/2025	EMAIL	Gabriel Jaime Cardona Londoño	gabriel.cardona@medellin.gov.co	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión SST	RV: REPORTE SIRO MALLA VIAL 2025	no aplica	María Catalina Ochoa Alvarez
15/08/2025	EMAIL	Gabriel Jaime Cardona Londoño	gabriel.cardona@medellin.gov.co	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión SST	Aprobación Acta de comité dos.	Acta de comité de obra # 2	María Catalina Ochoa Alvarez
16/08/2025	EMAIL	Malla vial 2025	mallavialmedellin2025@gmail.com	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión Social	Cuadro de Empleabilidad Semanal comprendida del 09 al 16 de agosto 2025	Cuadro de Empleabilidad Semanal comprendida del 09 al 16 de agosto 2025	María Catalina Martínez
17/08/2025	EMAIL	Elsa Maria Polo Daniela Restrepo Residentes Ambientales.	ambiental2.vialmed2025@gmail.com	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión Ambiental	Documentos de personal de Pvimentar	Documentos de personal de Pvimentar	Jorge Luis Monsalve
18/08/2025	EMAIL	RESIDENTE 2 VIALMED	residente2.vialmed2025@gmail.com	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	Adjunto envío programación de obra Consorcio VialMed del 19-08-2025.	Adjunto envío programación de obra Consorcio VialMed del 19-08-2025.	María Catalina Ochoa Alvarez

EMAIL		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**eMAIL**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**documentos adjuntos**	**RECIBE**
18/08/2025	EMAIL	Natalia Calderón	directora.vialmed2025@gmail.com	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	Diseño mezcla tibia MSC-19+RAP Planta Pavimentar	Diseño mezcla tibia MSC-19+RAP Planta Pavimentar	María Catalina Ochoa Alvarez
18/08/2025	EMAIL	Milena Escobar	profesionalsst.vialmed2025@gmail.com	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión SST	Ingreso de personal cuadrilla Pavimentar	Ingreso de personal cuadrilla Pavimentar	Luis Norberto León
19/08/2025	EMAIL	Elsa Maria Polo Daniela Restrepo Residentes Ambientales.	ambiental2.vialmed2025@gmail.com	Raquel Vanessa Vargas Builes Jorge Luis Monsalve Montiel.	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión Ambiental	Envío de Informe Semanal Ambiental_3_agosto2025	INF_AMB_SEMANAL_4_Agosto.pdf INF_AMB_SEMANAL_4_Agosto.docx	Jorge Luis Monsalve
19/08/2025	EMAIL	Elsa Maria Polo Cuello	ambientalvialmed2025@gmail.com	Raquel Vanessa Vargas Builes Jorge Luis Monsalve Montiel.	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión Ambiental	EQUIPOS Fo11	Fo11.rar	Jorge Luis Monsalve
19/08/2025	EMAIL	Malla vial 2025	mallavialmedellin2025@gmail.com	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión Social	Social: Informe semanal: 11 al 16 de agosto 2025	Social: Informe semanal: 11 al 16 de agosto 2025	Luisa Restrepo
19/08/2025	EMAIL	Gabriel Jaime Cardona Londoño	gabriel.cardona@medellin.gov.co	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	Solicitud de atención de baches mediáticos, para su remisión a Interventoría, gracias.	baches mediáticos,	María Catalina Ochoa Alvarez
19/08/2025	EMAIL	Gabriel Jaime Cardona Londoño	gabriel.cardona@medellin.gov.co	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	adjunto relación de costos de posibles intervenciones masivas para contrato de malla vial.	DISEÑOS MALLA VIAL 2025	María Catalina Ochoa Alvarez
19/08/2025	EMAIL	Malla vial 2025	mallavialmedellin2025@gmail.com	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión Social	Cronograma: 18 de agosto al 23 de agosto	Cronograma: 18 de agosto al 23 de agosto	Luisa Restrepo

EMAIL		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**eMAIL**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**documentos adjuntos**	**RECIBE**
19/08/2025	EMAIL	Natalia Calderón	directora.vialmed2025@gmail.com	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	Acta modificada del mes de julio del 2025	Acta modificada del mes de julio del 2025	María Catalina Ochoa Alvarez
19/08/2025	EMAIL	Natalia Calderón	directora.vialmed2025@gmail.com	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	Programación semana 18 al 23 de agosto	Programación semana 18 al 23 de agosto	María Catalina Ochoa Alvarez
19/08/2025	EMAIL	Milena Escobar	profesionalsst.vialmed2025@gmail.com	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión SST	Documentos para personal de ingreso al cargo de rastrillero por la empresa Ingealquipos.	Documentos para personal de ingreso al cargo de rastrillero por la empresa Ingealquipos.	Luis Norberto León
19/08/2025	EMAIL	Natalia Calderón	directora.vialmed2025@gmail.com	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	Resultados núcleos Julio	Resultados núcleos Julio	María Catalina Ochoa Alvarez
20/08/2025	EMAIL	RESIDENTE 2 VIALMED	residente2.vialmed2025@gmail.com	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	PROGRAMACIÓN DE OBRA VIALMED 20-08-2025	PROGRAMACIÓN DE OBRA VIALMED 20-08-2025	María Catalina Ochoa Alvarez
20/08/2025	EMAIL	Elsa Maria Polo Daniela Restrepo Residentes Ambientales.	ambiental2.vialmed2025@gmail.com	Raquel Vanessa Vargas Builes Jorge Luis Monsalve Montiel.	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión Ambiental	Vehiculos y equipos frente 12.	Vehiculos y equipos frente 12.	Jorge Luis Monsalve
20/08/2025	EMAIL	Natalia Calderón	directora.vialmed2025@gmail.com	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	Núcleos semana 4 (11 al 16 de agosto)	Núcleos semana 4 (11 al 16 de agosto)	María Catalina Ochoa Alvarez
20/08/2025	EMAIL	Elsa Maria Polo Daniela Restrepo Residentes Ambientales.	ambiental2.vialmed2025@gmail.com	Raquel Vanessa Vargas Builes Jorge Luis Monsalve Montiel.	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión Ambiental	Complemento vehículos para los frentes Buenos Aires y Castilla	Complemento vehículos para los frentes Buenos Aires y Castilla	Jorge Luis Monsalve
20/08/2025	EMAIL	Gabriel Jaime Cardona Londoño	gabriel.cardona@medellin.gov.co	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	Reporte bache: La dirección es CL 2B #75D-29, barrio La Mota, comuna 16 Belén.	Derecho de petición de la solicitud de atención de bache	María Catalina Ochoa Alvarez

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

EMAIL		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**eMAIL**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**documentos adjuntos**	**RECIBE**
20/08/2025	EMAIL	Lucia Hincapie Martinez	lucia.hincapie@medellin.gov.co	Raquel Vanessa Vargas Builes Jorge Luis Monsalve Montiel.	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión Ambiental	Documento de Visita ambiental de obra Malla vial 2025	Documento de Visita ambiental de obra Malla vial 2025	Jorge Luis Monsalve
20/08/2025	EMAIL	Natalia Calderón	directora.vialmed2025@gmail.com	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	Oficio CVM-041-2025 Respuesta comunicado radicado OFICIO No.016 4600105322 de 2025	Oficio CVM-041-2025 Respuesta comunicado radicado OFICIO No.016 4600105322 de 2025	María Catalina Ochoa Alvarez
20/08/2025	EMAIL	Gabriel Jaime Cardona Londoño	gabriel.cardona@medellin.gov.co	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	BACHES MEDIÁTICOS 20/08/2025	BACHES MEDIÁTICOS 20/08/2025	María Catalina Ochoa Alvarez
20/08/2025	EMAIL	RESIDENTE 2 VIALMED	residente2.vialmed2025@gmail.com	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	PROGRAMACIÓN DE OBRA VIALMED 21-08-2025	PROGRAMACIÓN DE OBRA VIALMED 21-08-2025	María Catalina Ochoa Alvarez
20/08/2025	EMAIL	Milena Escobar	profesionalsst.vialmed2025@gmail.com	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión SST	Documentos para ingreso de personal	Documentos para ingreso de personal	Luis Norberto León
20/08/2025	EMAIL	Milena Escobar	profesionalsst.vialmed2025@gmail.com	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión SST	Documentos para ingreso de personal	Documentos para ingreso de personal	Luis Norberto León
20/08/2025	EMAIL	Elsa Maria Polo Daniela Restrepo Residentes Ambientales.	ambiental2.vialmed2025@gmail.com	Raquel Vanessa Vargas Builes Jorge Luis Monsalve Montiel.	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión Ambiental	Maquinaria Fo 16	Documentos:Maquinaria Fo 16	Jorge Luis Monsalve
21/08/2025	EMAIL	Gabriel Jaime Cardona Londoño	gabriel.cardona@medellin.gov.co	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	PROGRAMACIÓN SEMANAL CUADRILLAS SEMANA 5.xlsx	PROGRAMACIÓN SEMANAL CUADRILLAS SEMANA 5.xlsx	María Catalina Ochoa Alvarez
21/08/2025	EMAIL	Natalia Calderón	directora.vialmed2025@gmail.com	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	documentación del Subcontrato con la empresa Estructuras y Pavimentos.	documentación del Subcontrato con la empresa Estructuras y Pavimentos.	María Catalina Ochoa Alvarez
21/08/2025	EMAIL	Milena Escobar	profesionalsst.vialmed2025@gmail.com	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión SST	Documentos para ingreso de personal	Documentos para ingreso de personal	Luis Norberto León

EMAIL		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**eMAIL**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**documentos adjuntos**	**RECIBE**
21/08/2025	EMAIL	Gabriel Jaime Cardona Londoño	gabriel.cardona@medellin.gov.co	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	RV: CONSULTA EPM VIAS A INTERVENIR EN RANGO 4	no aplica	María Catalina Ochoa Alvarez
21/08/2025	EMAIL	Malla vial 2025	mallavialmedellin2025@gmail.com	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión Social	SOLICITUD DE APROBACIÓN PIEZA IMANTADO VEHÍCULOS	PIEZA IMANTADO VEHÍCULOS	María Catalina Martínez
21/08/2025	EMAIL	RESIDENTE 2 VIALMED	residente2.vialmed2025@gmail.com	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	PROGRAMACIÓN DE OBRA VIALMED 22-08-2025	PROGRAMACIÓN DE OBRA VIALMED 22-08-2025	María Catalina Ochoa Alvarez
21/08/2025	EMAIL	Natalia Calderón	directora.vialmed2025@gmail.com	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	Oficio CVM-042-2025 Acta de obra N°1	Acta de obra N°1 y anexos.	María Catalina Ochoa Alvarez
22/08/2025	EMAIL	Gabriel Jaime Cardona Londoño	gabriel.cardona@medellin.gov.co	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	Para el acta 2 se deberán sanear dos aspectos del acta 1	Control de pagos	María Catalina Ochoa Alvarez
22/08/2025	EMAIL	Gabriel Jaime Cardona Londoño	gabriel.cardona@medellin.gov.co	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	RV: CONSULTA EPM VIAS SANTO DOMINGO SAVIO Y BELLO ORIENTE y VILLAHERMOSA	No aplica	María Catalina Ochoa Alvarez
22/08/2025	EMAIL	Milena Escobar	profesionalsst.vialmed2025@gmail.com	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión SST	Documentos para ingreso de personal	Documentos para ingreso de personal	Luis Norberto León
22/08/2025	EMAIL	RESIDENTE 2 VIALMED	residente2.vialmed2025@gmail.com	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	PROGRAMACIÓN DE OBRA VIALMED 23-08-2025	PROGRAMACIÓN DE OBRA VIALMED 23-08-2025	María Catalina Ochoa Alvarez
23/08/2025	EMAIL	Milena Escobar	profesionalsst.vialmed2025@gmail.com	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión SST	Documentos para ingreso de personal	Documentos para ingreso de personal	Luis Norberto León

EMAIL		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**eMAIL**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**documentos adjuntos**	**RECIBE**
23/08/2025	EMAIL	Malla vial 2025	mallavialmedellin2025@gmail.com	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión Social	Cuadro de Empleabilidad Semanal comprendida del 18 al 23 de agosto 2025	Cuadro de Empleabilidad Semanal comprendida del 18 al 23 de agosto 2025	María Catalina Martínez
25/08/2025	EMAIL	Milena Escobar	profesionalsst.vialmed2025@gmail.com	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión SST	Documentos para ingreso de personal	Documentos para ingreso de personal	Luis Norberto León
25/08/2025	EMAIL	RESIDENTE 2 VIALMED	residente2.vialmed2025@gmail.com	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	programación de obra modificada Consorcio VialMed del 25-08-2025.	programación de obra Consorcio VialMed del 25-08-2025.	María Catalina Ochoa Alvarez
25/08/2025	EMAIL	Malla vial 2025	mallavialmedellin2025@gmail.com	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión Social	SOLICITUD APROBACIÓN CIRCULAR PREVENTIVA PARQUEO DE VEHÍCULOS	CIRCULAR PREVENTIVA PARQUEO DE VEHÍCULOS	Luisa Restrepo
25/08/2025	EMAIL	Natalia Calderón	directora.vialmed2025@gmail.com	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	Programación semanal de cuadrillas 25 al 30 de agosto	Programación semana 25 al 30 de agosto	María Catalina Ochoa Alvarez
25/08/2025	EMAIL	Malla vial 2025	mallavialmedellin2025@gmail.com	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión Social	Social. Informe semanal y cronograma de actividades	Social. Informe semanal y cronograma de actividades	María Catalina Martínez
25/08/2025	EMAIL	Gabriel Jaime Cardona Londoño	gabriel.cardona@medellin.gov.co	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	RV: SOLICITUD DE ATENCIÓN VÍA EN CONCRETO - BELÉN LAS VIOLETAS	No aplica	María Catalina Ochoa Alvarez
25/08/2025	EMAIL	Malla vial 2025	mallavialmedellin2025@gmail.com	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión Social	REVISIÓN MODELOS CIRCULARES PARA SOCIALIZACIÓN	MODELOS CIRCULARES PARA SOCIALIZACIÓN	Luisa Restrepo

EMAIL		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**eMAIL**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**documentos adjuntos**	**RECIBE**
25/08/2025	EMAIL	Malla vial 2025	mallavialmedellin2025@gmail.com	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión Social	Respuesta: Solicitud de actividades de divulgación y de información a la comunidad en el próximo frente de obra rango 4: CR 22 ENTRE CL 45 Y CR 24	Registro de entrega de piezas comunicacionales	Luisa Restrepo
25/08/2025	EMAIL	Elsa Maria Polo Daniela Restrepo Residentes Ambientales.	ambiental2.vialmed2025@gmail.com	Raquel Vanessa Vargas Builes Jorge Luis Monsalve Montiel.	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión Ambiental	Documentos Volqueta TMG 156	Documentos Volqueta TMG 156	Jorge Luis Monsalve
25/08/2025	EMAIL	Cristian David Correa Alvarado	ing.cristiancorrea@gmail.com	consorciomedurbano@gmail.com	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	Fwd: SOLICITUDES MEDIÁTICAS PENDIENTES	Fwd: SOLICITUDES MEDIÁTICAS PENDIENTES	María Catalina Ochoa Alvarez
25/08/2025	EMAIL	Natalia Calderón	directora.vialmed2025@gmail.com	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	Diseño SMA de planta Pavimentar	Diseño SMA de planta Pavimentar	María Catalina Ochoa Alvarez
25/08/2025	EMAIL	Elsa Maria Polo Daniela Restrepo Residentes Ambientales.	ambiental2.vialmed2025@gmail.com	Raquel Vanessa Vargas Builes Jorge Luis Monsalve Montiel.	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión Ambiental	Envío de Informe Semanal Ambiental_4_agosto2025	Informe Semanal Ambiental_4_agosto2025	Jorge Luis Monsalve
25/08/2025	EMAIL	Gabriel Jaime Cardona Londoño	gabriel.cardona@medellin.gov.co	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	RV: SOLICITUD DE REVISIÓN DE VÍA EN LAURELES PARA ATENDER EN RANGO 4	No aplica	María Catalina Ochoa Alvarez
25/08/2025	EMAIL	Natalia Calderón	directora.vialmed2025@gmail.com	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	Programación inicial vías rango 3	No aplica	María Catalina Ochoa Alvarez

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

EMAIL		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**eMAIL**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**documentos adjuntos**	**RECIBE**
25/08/2025	EMAIL	Elsa Maria Polo Daniela Restrepo Residentes Ambientales.	ambiental2.vialmed2025@gmail.com	Raquel Vanessa Vargas Builes Jorge Luis Monsalve Montiel.	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión Ambiental	Documentos Volqueta TFW 399	Documentos Volqueta TFW 399	Jorge Luis Monsalve
26/08/2025	EMAIL	Elsa Maria Polo Daniela Restrepo Residentes Ambientales.	ambiental2.vialmed2025@gmail.com	Raquel Vanessa Vargas Builes Jorge Luis Monsalve Montiel.	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión Ambiental	Documentos Automóvil KPQ 732	Documentos Automóvil KPQ 732	Jorge Luis Monsalve
26/08/2025	EMAIL	Milena Escobar	profesionalsst.vialmed2025@gmail.com	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión SST	Documentos para ingreso de personal	Documentos para ingreso de personal	Luis Norberto León
26/08/2025	EMAIL	Milena Escobar	profesionalsst.vialmed2025@gmail.com	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión SST	Documentos para ingreso de personal	Documentos para ingreso de personal	Luis Norberto León
26/08/2025	EMAIL	Natalia Calderón	directora.vialmed2025@gmail.com	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	Oficio CVM-033-2025 PASAO Versión Final PASAO	Oficio CVM-033-2025 PASAO Versión Final PASAO	María Catalina Ochoa Alvarez
26/08/2025	EMAIL	Milena Escobar	profesionalsst.vialmed2025@gmail.com	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión SST	Documentos para ingreso de personal	Documentos para ingreso de personal	Luis Norberto León
26/08/2025	EMAIL	Elsa Maria Polo Daniela Restrepo Residentes Ambientales.	ambiental2.vialmed2025@gmail.com	Raquel Vanessa Vargas Builes Jorge Luis Monsalve Montiel.	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión Ambiental	Maquinaria Fo 14	Documentos: Maquinaria Fo 14	Jorge Luis Monsalve
26/08/2025	EMAIL	Elsa Maria Polo Daniela Restrepo Residentes Ambientales.	ambiental2.vialmed2025@gmail.com	Raquel Vanessa Vargas Builes Jorge Luis Monsalve Montiel.	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión Ambiental	documentos de las volquetas: SMV 677 SMV 676 SMX 568 TRL 738 TRL 740	documentos de las volquetas: SMV 677 SMV 676 SMX 568 TRL 738 TRL 740	Jorge Luis Monsalve

EMAIL		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**eMAIL**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**documentos adjuntos**	**RECIBE**
26/08/2025	EMAIL	Milena Escobar	profesionalsst.vialmed2025@gmail.com	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión SST	Documentos para ingreso de personal	Documentos para ingreso de personal	Luis Norberto León
25/08/2025	EMAIL	Malla vial 2025	mallavialmedellin2025@gmail.com	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión Social	REVISÓN PASACALLES	Diseño de PASACALLES	Luisa Restrepo
27/08/2025	EMAIL	Natalia Calderón	directora.vialmed2025@gmail.com	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	Resultados núcleos 4 al 8 de agosto	Resultados núcleos 4 al 8 de nagosto	María Catalina Ochoa Alvarez
27/08/2025	EMAIL	Gabriel Jaime Cardona Londoño	gabriel.cardona@medellin.gov.co	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	RV: PQRSD 202510267402 / CIUDADANO	No aplica	María Catalina Ochoa Alvarez
27/08/2025	EMAIL	Gabriel Jaime Cardona Londoño	gabriel.cardona@medellin.gov.co	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	Frentes priorizados con PP 2025	Frentes priorizados con PP 2025	María Catalina Ochoa Alvarez
27/08/2025	EMAIL	Elsa Maria Polo Daniela Restrepo Residentes Ambientales.	ambiental2.vialmed2025@gmail.com	Raquel Vanessa Vargas Builes Jorge Luis Monsalve Montiel.	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión Ambiental	Documentos vehículo GHY 406	Documentos vehículo GHY 406	Jorge Luis Monsalve
27/08/2025	EMAIL	Milena Escobar	profesionalsst.vialmed2025@gmail.com	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión SST	Documentos para ingreso de personal	Documentos para ingreso de personal	Luis Norberto León
27/08/2025	EMAIL	Elsa Maria Polo Daniela Restrepo Residentes Ambientales.	ambiental2.vialmed2025@gmail.com	Raquel Vanessa Vargas Builes Jorge Luis Monsalve Montiel.	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión Ambiental	DOCUMENTOS CONDUCTOR Y VEHICULO SXY 151	DOCUMENTOS CONDUCTOR Y VEHICULO SXY 151	Jorge Luis Monsalve
28/08/2025	EMAIL	Gabriel Jaime Cardona Londoño	gabriel.cardona@medellin.gov.co	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	Intervenciones en la ladera comuna 8	Intervenciones en la ladera comuna 8	María Catalina Ochoa Alvarez

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

EMAIL		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**eMAIL**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**documentos adjuntos**	**RECIBE**
28/08/2025	EMAIL	Natalia Calderón	directora.vialmed2025@gmail.com	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	Oficio CVM-045-2025 PMT Especifico Pompeyano en Diagonal 65D entre Transversal 34B y Calle 34	Oficio CVM-045-2025 PMT Especifico Pompeyano en Diagonal 65D entre Transversal 34B y Calle 34	María Catalina Ochoa Alvarez
28/08/2025	EMAIL	Milena Escobar	profesionalsst.vialmed2025@gmail.com	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión SST	documentos de personal para ingreso: 1. Santiago Higuita CC 1.037.776.106 para el cargo de técnologo.	documentos de personal para ingreso: 1. Santiago Higuita CC 1.037.776.106 para el cargo de técnologo.	Luis Norberto León
28/08/2025	EMAIL	Gabriel Jaime Cardona Londoño	gabriel.cardona@medellin.gov.co	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	Observaciones en recorrido Malla Vial - SOCIAL	No Aplica	María Catalina Ochoa Alvarez
29/08/2025	EMAIL	Milena Escobar	profesionalsst.vialmed2025@gmail.com	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión SST	Documentos para ingreso de: 1. Oscar Elias Morales Cordoba CC 98.637.028 al cargo de conductor	Documentos para ingreso de: 1. Oscar Elias Morales Cordoba CC 98.637.028 al cargo de conductor	Luis Norberto León
29/08/2025	EMAIL	Milena Escobar	profesionalsst.vialmed2025@gmail.com	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión SST	Envío SS para intervención urgente en la vía San Cristóbal.	Envío SS para intervención urgente en la vía San Cristóbal.	Luis Norberto León
29/08/2025	EMAIL	Gabriel Jaime Cardona Londoño	gabriel.cardona@medellin.gov.co	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	RV: SOLICITUD DE REPARACIÓN POMPEYANOS EN ADOQUIN - ANDALUCÍA- POBLADO	No Aplica	María Catalina Ochoa Alvarez
29/08/2025	EMAIL	Malla vial 2025	mallavialmedellin2025@gmail.com	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión Social	Pasacalles_Alta Calle 10A_Lunes_01_09_2025	Diseño de Pasacalles_Alta Calle 10A_Lunes_01_09_2025	Luisa Restrepo

EMAIL		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**eMAIL**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**documentos adjuntos**	**RECIBE**
29/08/2025	EMAIL	Malla vial 2025	mallavialmedellin2025@gmail.com	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión Social	INFORME ESTADO TIJERAS CORTE A 29 DE AGOSTO	INFORME ESTADO TIJERAS CORTE A 29 DE AGOSTO	Luisa Restrepo
29/08/2025	EMAIL	Milena Escobar	profesionalsst.vialmed2025@gmail.com	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión SST	Adjunto documentos de personal para ingreso: 1. Juan Guillermo Granda Correa CC 71.722.964 para el cargo de conductor 2. Luis Felipe Zapata Hincapie CC 1.152.213.342 para el cargo de conductor	Adjunto documentos de personal para ingreso: 1. Juan Guillermo Granda Correa CC 71.722.964 para el cargo de conductor 2. Luis Felipe Zapata Hincapie CC 1.152.213.342 para el cargo de conductor	Luis Norberto León
30/08/2025	EMAIL	Malla vial 2025	mallavialmedellin2025@gmail.com	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión Social	EVIDENCIAS SOCIALIZACIÓN CALLE 5 SUR	No Aplica	Luisa Restrepo
30/08/2025	EMAIL	Elsa Maria Polo Daniela Restrepo Residentes Ambientales.	ambiental2.vialmed2025@gmail.com	Raquel Vanessa Vargas Builes Jorge Luis Monsalve Montiel.	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión Ambiental	Documentos maquinaria vehículos y equipo Fo. Calle 5 sur	Documentos maquinaria vehículos y equipo Fo. Calle 5 sur	Jorge Luis Monsalve
30/08/2025	EMAIL	Malla vial 2025	mallavialmedellin2025@gmail.com	Interventoría.	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión Social	Cuadro de Empleabilidad Semanal comprendida del 25 al 30 de agosto 2025	Cuadro de Empleabilidad Semanal comprendida del 25 al 30 de agosto 2025	María Catalina Martínez
30/08/2025	EMAIL	Elsa Maria Polo Daniela Restrepo Residentes Ambientales.	ambiental2.vialmed2025@gmail.com	Raquel Vanessa Vargas Builes Jorge Luis Monsalve Montiel.	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión Ambiental	infomacion del camion WLY295, para su revision y aprobacion	Documentos del camion WLY295, para su revision y aprobacion	Jorge Luis Monsalve

Anexo 4.5-2 Correspondencia recibida **agosto de 2025.**

4.6. COPIA DE LA BITÁCORA:

Durante este periodo se diligenciaron las bitácoras de obra en las cuales se hace la descripción de las actividades llevadas a cabo en los frentes de obra priorizados, y se detallan las observaciones realizadas al contratista o los cometarios y/o cambios propuestos por la supervisión en los recorridos de obra, en las bitácoras se detallan los esquemas de las intervenciones realizadas. Se anexa copia de las bitácoras del mes de **agosto de 2025.**

Anexo 4.6.1 Copia digital de las bitácoras de obra.

5. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Este Proyecto se encuentra registrado en el banco de Programas y Proyectos del Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín y cuenta con las viabilidades social, ambiental y económica que exige la normatividad para darle aval a estos proyectos los cuales han sido revisados y aprobados por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital en el siguiente Proyecto: Código BPIN: 2024050010142 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.

5.1 SEGUIMIENTO FINANCIERO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA:

5.1.1 Imputación presupuestal

El contrato de obra N° 4600105052 de 2025, cuenta con los recursos disponibles para su ejecución por parte del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, mediante la siguiente información presupuestal: CDP N° 4000120693 por valor de $ 42.428.847.850.

Tabla 57. Relación de la Imputación del gasto

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
11000025 Recursos del Crédito 2025	74100000	23201010010302	240092	4000120693	5100008576	5100008576

A la fecha de corte del presente informe, correspondiente al segundo mes del contrato de obra, el Contratista ha presentado el acta de obra No. 1 correspondiente a las actividades ejecutadas durante el mes de julio de 2025 por un valor de $ 713.363.421, equivalente al 1,81% del valor total del Contrato, y el acta de obra No. 2 para el período de **agosto de 2025**, por un valor total de $3.678.086.315, lo que representa el 9,33%. A la fecha, se cuenta con una inversión acumulada de $4.391.449.736 o sea, el 11,14% del total de los recursos del contrato.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

5.2 RELACIÓN DE PAGOS Y AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO (SI APLICA) DEL CONTRATO DE OBRA:

Al 31 de agosto de 2025, se ha realizado pagos por parte del Distrito al Contratista Consorcio Vial Med 2025 así:

Tabla 58. Relación pagos realizados

No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	Valor Facturado	Acumulado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
	$ 39.403.924.837	FC-1	22/07/2025	$ 394.039.248	$ 394.039.248	$ 39.009.885.589	1,00%
		FC-2	20/08/2025	$ 713.363.421	$ 1.107.402.669	$ 38.296.522.168	2,81%

Durante el mes de **agosto 2025** se presenta el Acta Parcial de Obra No 2, con las siguientes cantidades de obra conciliadas previamente entre el contratista e interventoría:

		ACTA N°2 (1 al 31 de Agosto)		ACUMULADO	
ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1.2	**ACTIVIDADES DE PAVIMENTACIÓN POR RANGOS**				
1.2.1.1	Rango 0: De 0,5 a 5 Ton/Jornada. Horario diurno	124,24	$ 157.674.226,00	212,03	$ 269.089.393,00
1.2.1.2	Rango 1: De 9.1 a 12.5 Ton/Jornada. Horario diurno.	1590,06	$ 1.479.918.134,00	1918,57	$ 1.785.672.575,00
1.2.1.3	Rango 1: De 9.1 a 12.5 Ton/Jornada. Horario nocturno.	375,59	$ 365.713.485,00	458,31	$ 446.258.280,00
1.2.1.4	Rango 2: De 12.51 a 16 Ton/Jornada.		$ -	0,00	$ -
1.2.2.1	Rango 3: De 8 a 19.99 m3/Jornada.	54,11	$ 100.221.733,00	54,11	$ 100.221.733,0000
1.2.2.2	Rango 4: De 20 a 50 m3/Jornada. Horario diurno.	586,87	$ 1.059.292.092,00	586,87	$ 1.059.292.092,0000
1.2.2.3	Rango 4: De 20 a 50 m3/Jornada. Horario nocturno.	219,73	$ 406.012.881,00	219,73	$ 406.012.881,0000
1.3	**OTRAS ACTIVIDADES DE PAVIMENTACIÓN**				
1.3.7	Suministro, transporte y colocación de mezcla asfáltica MDC-19 para construcion de resaltos. Compactada con medios mecánicos. Incluye riego de liga y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según detalle SIF	2,75	$ 6.091.464,00	4,86	$ 10.759.168,0000

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

1.4	**OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA PAVIMENTACIÓN**				
1.4.5	Demolición de carpeta asfáltica cualquier espesor. Incluye picada en tamaños máximos de 40 cm, acopio, cargue y transporte a la planta de reciclaje de la SIF y botada del material que no se pueda recuperar.	16,53	$ 545.473,00	16,53	$ 545.473,0000
1.4.7	Transporte, aplicación y compactación de llenos con material reciclado de fresado de pavimento; compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del Próctor Modificado. Incluye transporte desde la planta del Municipio de Medellín. Medido en sitio.	23,40	$ 1.917.911,00	23,40	$ 1.917.911,0000
1.4.8	Transporte de material fresado desde el punto de acopio indicado por la interventoria hasta la planta de producción de mezcla para ser empleado en mezclas con RAP		$ -	13452,08	$ 23.204.838,0000
1.4.9	Pago de derechos para disposición final de residuos de construcción, demolición y/o tierra, en sitio autorizado por la Autoridad Ambiental.	1274,67	$ 10.491.827,00	1608,67	$ 13.240.981,0000
2.2	**MOVIMIENTOS DE TIERRA, EXCAVACIONES Y LLENOS**				
2.2.1	EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo de 0-2 m, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³. Incluye transporte interno del material proveniente de las excavaciones al sitio donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. No incluye entibado ni botada del material.	2,10	$ 136.788,00	2,10	$ 136.788,0000
2.2.4	Suministro, transporte, colocación y compactación de Base granular Clase A, reacomodada con MEDIOS MECÁNICOS y compactada al 98% del ensayo Proctor modificado, que cumpla con el artículo 330-22 de la norma INVIAS 2022. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado.	23,78	$ 5.965.234,00	23,78	$ 5.965.234,0000
	OBRAS COMPLEMENTARIAS				
3.1	**PRELIMINARES**				
3.1.3	Desobstrucción y limpieza de sumideros, incluye limpieza de tuberías hasta el MH más cercano, retiro y botada de material sobrante.	15,00	$ 3.236.400,00	23,00	$ 4.962.480,0000
	IMPORTE DE ACEROS Y MALLAS				
3.4	**REDES HIDRAÚLICAS Y SANITARIAS**				
3.4.2	Suministro, transporte e instalación de GEOTEXTIL NT 2500 tipo Pavco para filtro o equivalente. Incluye suministro y transporte de los materiales, traslapos y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño del filtro.	18,00	$ 266.958,00	18,00	$ 266.958,0000
	ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y SEÑALIZACIÓN				

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

4.1	**SEÑALIZACIÓN**				
4.1.2	Suministro y aplicación de pintura acrílica para marcas viales (flechas direccionales, flechas de fin de carril, textos, pares, triángulos ceda el paso, diamantes ceda el paso, textos de zona escolar entre otros). TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO.	9,28	$ 351.359,00	32,78	$ 1.241.116,0000
4.1.4	Suministro y aplicación de pintura acrílica para demarcación de LÍNEA de 0.12M para canalización continua o segmentada, berma, agujas, celdas de estacionamiento entre otras. HORARIO NOCTURNO.	24,00	$ 201.936,00	24,00	$ 201.936,0000
4.1.6	Suministro y aplicación de pintura acrílica para demarcación de LÍNEA DE 0.40M para pasos peatonales, líneas de resalto, líneas de pare, entre otras. TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO	5,27	$ 106.886,00	5,27	$ 106.886,0000

SUBTOTAL OBRAS	**COSTO CON AIU**	**$ 3.598.144.787,00**	**COSTO CON AIU**	**$ 4.129.096.723,00**
	COSTO DIRECTO	**$ 2.832.515.773,44**	**COSTO DIRECTO**	**$ 3.250.489.430,00**
	DESCUENTO IMPREVISTOS	**-$ 32.504.894,30**		**-$ 32.504.894,30**
	DESCUENTO POLIZA	**-$ 109.138.173,00**		
		$ 765.629.013,56	**AIU**	**$ 878.607.293,00**
SUBTOTAL OBRAS				
Destinación pago de Reajustes y Factor prestacional del AIU no exonerados				**$ -**
Inversión Socio-Ambiental e Implementación PMT-bioseguridad - Gasto Reembolsable -		**$ 112.446.422,37**		**$ 185.719.734,37**
Pólizas - Gasto Reembolsable-		**$ 109.138.173,00**		**$ 109.138.173,00**
VALOR TOTAL	**TOTAL ACTA N°2**	**$ 3.678.086.315,06**		**$ 4.391.449.736,06**

Para la ejecución del contrato de obra N° 4600105252 DE 2025, con objeto “REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA”, no se otorgó anticipo por parte del Distrito. Sin embargo, se otorgó al contratista a título de pago anticipado un valor equivalente al uno [1%] por ciento del valor básico del contrato. El pago anticipado se regirá por las condiciones señaladas en la CLAUSULA 6 ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO de Minuta del Contrato.

Este pago, se entregó bajo las siguientes condiciones:

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

- ✓ La entidad, otorgará un pago anticipado correspondiente al 1 % del valor total del contrato, con la finalidad de garantizar la caja de los proponentes en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Legislativo 175 de 2025, relacionado con la reactivación del impuesto de Timbre Nacional.

- ✓ El contratista al facturar el segundo pago descontará del total a pagar por parte de la Entidad Contratante la suma correspondiente al pago anticipado y en caso de que el valor facturado no sea suficiente, dicho descuento se realizará en las subsiguientes facturas hasta abarcar la totalidad del valor del pago anticipado entregado por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín al contratista.

- ✓ La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no están supeditadas en ningún caso a la entrega del pago anticipado.

- ✓ La finalidad del pago anticipado correspondiente al uno (1%) por ciento del valor total del contrato, es garantizar la caja de los proponentes en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 175 de 2025, relacionado con la reactivación del impuesto de Timbre Nacional.

Considerando lo anterior, se realizó un pago anticipado al contratista Consorcio VialMed 2025 por valor de $ 394.039.248.

Tabla 59. Relación pagos realizados por pago anticipado

No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	Valor Facturado	Acumulado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
	$ 39.403.924.837	FE-1	22/07/2025	$ 394.039.248	$ 394.039.248	$ 39.009.885.589	1%.

5.3 CONTROL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO Y DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL CONTRATO DE OBRA (SI APLICA):

Para la ejecución del contrato de obra N° 4600105052 DE 2025, con objeto “REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA”, no se otorgó anticipo por parte del Distrito.

5.4 RELACIÓN DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES:

En la CLAUSULA 5 VALOR DEL CONTRATO, están relacionados claramente los valores de las retenciones, impuestos, tasas y contribuciones aplicables al contrato 4600105052 de 2025, así:

- ✓ Contribución especial para la seguridad: Equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato antes de IVA, de conformidad con la Ley 1738 del 18 de diciembre de 2014.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

- ✓ Retención en la Fuente: Corresponde al pago anticipado del Impuesto de Renta.

- ✓ Gravamen a los movimientos financieros: Equivalente al cuatro por mil (4#) del valor total del contrato. Se debe considerar la deducción del 50% de que trata el Artículo 115 del Estatuto Tributario.

- ✓ Impuesto de Industria y Comercio: Recae sobre las actividades industriales, comerciales, de servicios y financieras que se realicen en la jurisdicción del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, su tarifa corresponde al millaje establecido, según su actividad, en el artículo 71 del Acuerdo 93 de 2023.

- ✓ Estampilla Universidad de Antioquia: Correspondiente al 1% de los valores efectivamente pagados por concepto del contrato antes de IVA, de conformidad con lo establecido en los artículos 288 y 289 del Acuerdo 93 de 2023.

- ✓ Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor: Equivalente al 2% de los valores efectivamente pagados por concepto del contrato antes de IVA, de conformidad con los artículos 273 y 274 del Acuerdo 93 de 2023.

- ✓ Estampilla Pro-Cultura: Equivalente al 0,5% de los valores efectivamente pagados por concepto del contrato antes de IVA, de conformidad con los artículos 254 y 255 del Acuerdo 93 de 2023.

- ✓ Tasa Pro-Deporte y Recreación: Equivalente al 1,3% del valor total del contrato de conformidad con el artículo 206 del Acuerdo 93 de 2023.

- ✓ Estampilla para la Justicia Familiar: Equivalente al 2% de cada cuenta que se pague al contratista, antes de IVA, de conformidad con el artículo 313 del Acuerdo 93 de 2023.

- ✓ Impuesto de Timbre Nacional: Correspondiente al 0,5% del valor del contrato antes de IVA, de conformidad con el Decreto legislativo 0175 de 2025 que modifica temporalmente el parágrafo 2 del artículo 519 del Estatuto Tributario.

La relación de retenciones causadas asociadas al cobro del acta de obra N° 1 se relacionará en el informe mensual de interventoría N° 3.

5.5 RELACIÓN DE LOS IMPREVISTOS CAUSADOS, DEMOSTRADOS Y FACTURADOS:

A la fecha no se han presentado imprevistos que requieran ser reconocidos por la entidad contratante al Consorcio VialMed 2025.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

6 INFORME JURÍDICO:

6.1 RELACIÓN DE RECLAMACIONES:

Hasta la fecha no se ha reportado ninguna reclamación, controversia o acuerdo.

6.2 RELACION DE SANCIONES:

Hasta la fecha no se ha realizado ninguna multa, sanción, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento

6.3 CONTROL AL ESTADO DE LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA:

A continuación, se presenta el cuadro acumulativo con los datos identificativos del estado de todas y cada una de las coberturas que amparan a la entidad relacionada con la ejecución del contrato de obra.

Tabla 60. Relación de Pólizas Contrato de Obra

Nombre Asegurador	No. Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha aprobación Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Garantías Actualizadas al inicio del contrato de obra - 21/07/2025						
Seguros Mundial	M-100266709 Anexo 4 del	Cumplimiento	21/07/2025	21/05/2026		$3.940.392.483,70
		Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	21/07/2025	21/11/2028		$1.970.196.241,85
		Pago anticipado	21/07/2025	21/05/2026		$394.039.248,37
		Estabilidad de la obra	21/11/2025	21/11/2030		$3.940.392.483,70
	M-100066947 Anexo 4 del 22/07/2025	Responsabilidad Civil Extracontractual	10/06/2025	21/11/2025		$1.970.196.241,85

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

7 REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DE LA OBRA:

	
Cuadrilla 1 CR 120B # 49-80 antes bacheo	Cuadrilla 1 CR 120B # 49-80 después bacheo
	
Cuadrilla 1 CL 55A # 125A-40 antes bacheo	Cuadrilla 1 CL 55A # 125A-40 después bacheo

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

	
Cuadrilla 2 CR 43 # 30-9 antes bacheo	Cuadrilla 2 CR 43 # 30-9 después bacheo
	
Cuadrilla 2 CR 44 # 19-56 antes bacheo	Cuadrilla 2 CR 44 # 19-56 después bacheo


Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

	
Cuadrilla 3 CL 49 # 20B-50 antes bacheo	Cuadrilla 3 CL 49 # 20B-50 después bacheo
	
Cuadrilla 3 CR 31A # 102B-31 antes bacheo	Cuadrilla 3 CR 31A # 102B-31 después bacheo

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

	
Cuadrilla 4 CR 65 # 80-30 antes bacheo	Cuadrilla 4 CR 65 # 80-30 después bacheo
	
Cuadrilla 4 CL 49 CON CR 54 Y 55A antes bacheo	Cuadrilla 4 CL 49 CON CR 54 Y 55A después bacheo

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

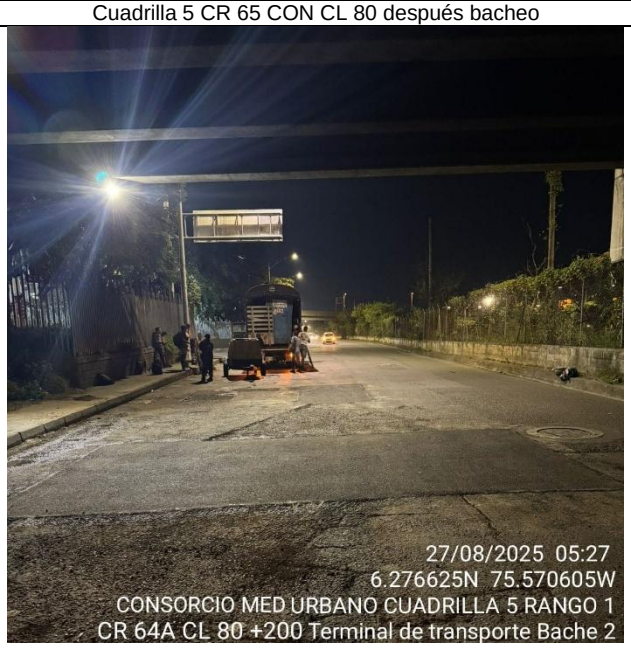	
Cuadrilla 5 CR 65 CON CL 80 antes bacheo	Cuadrilla 5 CR 65 CON CL 80 después bacheo
	
Cuadrilla 5 CR 64A CON CL 80 antes bacheo	Cuadrilla 5 CR 64A CON CL 80 después bacheo

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

	
Cuadrilla 6 CL 12C SUR # 53-71 antes bacheo	Cuadrilla 6 CL 12C SUR # 53-71 después bacheo
	
Cuadrilla 6 CR 65E # 25A-135 antes bacheo	Cuadrilla 6 CR 65E # 25A-135 después bacheo

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia



Cuadrilla 7 CL 80 # 48A-15 antes bacheo




Cuadrilla 7 CL 80 # 48A-15 después bacheo





Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Cuadrilla 7 CL 65 # 97-47 antes bacheo	Cuadrilla 7 CL 65 # 97-47 después bacheo

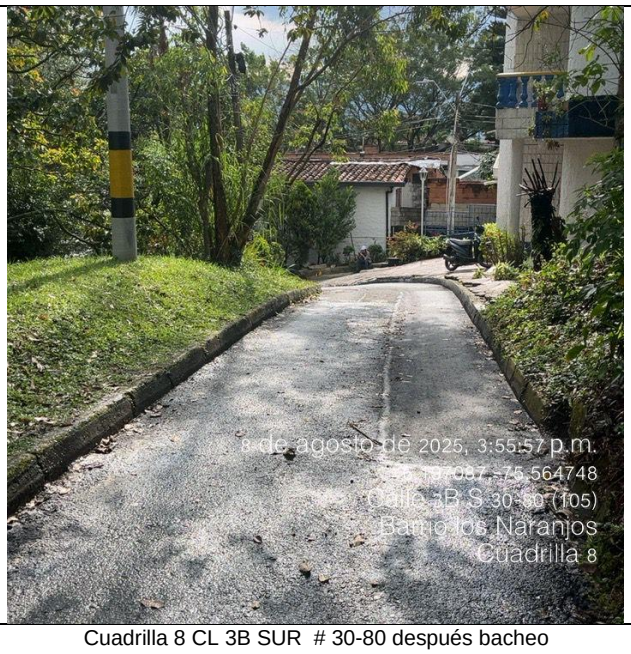	
Cuadrilla 8 CL 3B SUR # 30-80 antes bacheo	Cuadrilla 8 CL 3B SUR # 30-80 después bacheo

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

	
Cuadrilla 8 CR 49 # 98-19 antes bacheo	Cuadrilla 8 CR 49 # 98-19 después bacheo

	
Cuadrilla 9 CL 34 # 118D-211 antes bacheo	Cuadrilla 9 CL 34 # 118D-211 después bacheo

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

	
Cuadrilla 9 CR 34B # 113D-52 antes bacheo	Cuadrilla 9 CR 34B # 113D-52 después bacheo

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Cuadrilla 10 CR 112 # 14-113 antes bacheo	Cuadrilla 10 CR 112 # 14-113 después bacheo
	
Cuadrilla 10 CR 49 # 25-112 antes bacheo	Cuadrilla 10 CR 49 # 25-112 después bacheo

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

	
Cuadrilla 11 Cl 35 ENTRE DG 75A Y 77 antes bacheo	Cuadrilla 11 Cl 35 ENTRE DG 75A Y 77 después bacheo
	
Cuadrilla 11 TV 53A CON CR 65 antes bacheo	Cuadrilla 11 TV 53A CON CR 65 después bacheo

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

	
Cuadrilla 12 Cl 5 SUR # 50EE -32 antes bacheo	Cuadrilla 12 Cl 5 SUR # 50EE -32 después bacheo
	
Cuadrilla 12 CL 6 SUR # 50FF-13 antes bacheo	Cuadrilla 12 CL 6 SUR # 50FF-13 después bacheo

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

	
Cuadrilla 14 CR 81 # 30A-27 Rango 3 antes	Cuadrilla 14 CR 81 # 30A-27 Rango 3 después
	
Cuadrilla 15 CR 22 ENTRE CL 45 Y 47 Rango 4 antes	Cuadrilla 15 CR 22 ENTRE CL 45 Y 47 Tango 4 después

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

	
Cuadrilla 16 Cl 95 ENTRE CR 68 Y 69 Rango 4 antes	Cuadrilla 16 Cl 95 ENTRE CR 68 Y 69 Rango 4 después

8 RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES GENERALES DE LA INTERVENTORÍA SOBRE EL DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA:

Durante el mes de **agosto de 2025**, el Contratista de Obra desplegó hasta 14 cuadrillas de trabajo para la ejecución de actividades programadas, principalmente en atención de baches con rango 0, rango 1, rango 3, rango 4, obras complementarias y señalización (demarcación con plástico en frío).

Las intervenciones se continúan priorizado de acuerdo con las solicitudes mediáticas emitidas por la Supervisión, complementadas con los reportes generados a través de la plataforma SIRO. No obstante, la Interventoría ha instado al Contratista a acelerar el ingreso de nuevas cuadrillas, en cumplimiento de los compromisos contractuales establecidos, con el fin de optimizar los tiempos de respuesta y cobertura del proyecto.

En el periodo evaluado, mes de **agosto de 2025**, se evidencia que los materiales y procesos usados en las actividades de bacheo, están bajo la normativa y estándares de calidad que los rige.

Entre el **1 y el 31 de agosto de 2025**, se realizaron labores de mantenimiento puntual en un total de **1040 baches**, para un acumulado a la fecha de **1315 baches** utilizando mezcla asfáltica densa tibia tipo MDC-19 con incorporación de material reciclado (RAP).

Durante este período de trabajo, la inversión financiera es de $3.678.086.315, lo que representa el 9,33% del valor total del contrato, en cual se incluye una inversión socio ambiental e implementación del PMT y bioseguridad por valor de $112.446.422.

Estas actividades evidencian un avance importante en la atención de puntos críticos de la malla vial, permitiendo mejorar las condiciones de transitabilidad y seguridad en los segmentos intervenidos, en cumplimiento con los objetivos establecidos para esta etapa del contrato.

La Interventoría y la supervisión del contrato han estado al pendiente. Haciendo seguimiento de la programación y rendimientos del contratista de tal forma que se garanticen los avances adecuados para este periodo.


Los diferentes frentes de obra cuentan con sus respectivas vallas tijera en buenas condiciones, los vehículos del Contratista tienen su lona informativa, dando cumplimiento al Manual de imagen del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.

Se ha llevado a cabo una evaluación continua, mediante la cual se ha verificado el cumplimiento de los objetivos establecidos en el PASAO, hasta la fecha de elaboración del presente informe.

En el periodo reportado todo el personal se mantuvo afiliado al sistema general de seguridad social; así como estuvo recibiendo capacitación, elementos de protección personal y dotación.

Desde el componente SST, se ha recomendado al Contratista ejecutar los planes de acción derivados de la investigación de los accidentes de trabajo presentados en este periodo. Igualmente, continuar con la realización de los pre operacionales e inspecciones de los frentes de trabajo para identificar posibles riesgos y corregir cualquier situación inadecuada que se presente.

Atentamente,



CAMILO ANDRÉS ÁNGEL SALDARRIAGA
Director de Interventoría
CONSORCIO MEDURBANO 2025
Matricula profesional: 05202-50289
Fecha de elaboración: septiembre 15 de 2025

Elaboro **María Alejandra Arango Dávila** Residente Administrativa Interventoría	**Elaboro** **Cristian David Correa Alvarado** Residente Civil de Interventoría	**Elaboro** **María Catalina Ochoa A.** Residente Civil de Interventoría
Elaboro **María Catalina Martínez R.** Profesional Social de Interventoría	**Elaboro** **Jorge Luis Monsalve Montiel** Residente Ambiental de Interventoría	**Elaboro** **Luis Norberto Álvarez León** Residente SST de Interventoría

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia
