BITÁCORA DE OBRA

sst, 1 profesional social, 1 director, 2 inspectores
Actividades: fundida de concreto preenzolado
1.16 AL para pavimento frente detrás ed.
Compactada para 37 ml.
Actividad: fundida de rampa con concreto hecho
en obra andén carrera 11 y 12 costado
oriental.
Pelusa: compactación y nivelación de subbase
granular. Instalación de formaletas para pavimento.
Alcances: demolición y cargue y retiro de
pavimento existente. (15 ml)
Diana Lara
Ord.

REG. FOTOGRAFICO

3 DE JULIO 2025 (JUEVES)


PERSONAL: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE, 1 PROFESIONAL SST, 1 PROFESIONAL SOCIAL, 1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2 CELADORES, 2 OBLIGADOS, 12 AYUDANTES, 1 CONDUCTOR, 1 OPERADOR DE RETROEXCAVADORA, 3 ROBOTILLEROS.

EQUIPO: 1 VIBROCOMPACTADOR, 1 RETROEXCAVADORA, 1 PLANTA, 2 MOTOBOMBAS DE CORDADO, VIBRADOR DE CONCRETO, PLANTA ELECTRICA, CUADRILLA DE ASERRADO, HERRAMIENTA MENOR

* ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO
* ACTIVIDADES:
  - COMPOSTELA: CONTINUA INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR, SE REALIZAN CORTES A PAVIMENTO VACIADO AYER
  - GUANDADA: INSTALACIÓN DE ADOQUIN ENTRE CALLES 11 Y 13 ENTRE CARRERAS. SE REALIZA TOMA DE DENSIDADES PARA AVANCE DE LAS INTERVENTORIAS OBTENIENDO RESULTADOS SATISFACTORIOS. SE PROGRAMA TOMA DE DENSIDADES PARA PARTE DEL CONTRATISTA PARA MAÑANA 4 DE JULIO. AÚN NO SE TIENE CLARIDAD ACERCA DE

CUANDO SE REALIZARÁ VACIADO DE CONCRETO, TAMPOCO SE SABE SI SERÁ HECHO EN OBRA O PREFABRICADO. SE INSTA AL CONTRATISTA A MEJORAR LOS DIMENSIONES EN LA SOLUCIÓN DEL CONTRATO.

- LA OBLUSA: CORTE Y COMPACTACIÓN DE SUBRASO GRANULAR, SE INICIA INSTALACIÓN DE FORMALETA PARA VACIADO DE PAVIMENTO MR-42 ACELERADO. SE REALIZAN OBSERVACIONES ACERCA DEL METODO CONSTRUCTIVO, PUES A CRITERIO DE LA INTERVENTORÍA ESTÁ OCASIONANDO RETRASOS QUE GENERAN ATRASOS INJUSTIFICADOS. CANCELAN EL VACIADO QUE ESTABA PROGRAMADO PARA EL 4 DE JULIO POR DISPONIBILIDAD DE LA PLANTA PREMEZCLADORA. SE INSTA AL CONTRATISTA A EMPLEAR VACIADO DE CONCRETO HECHO EN OBRA. SE ESPERA RESPUESTA.
- ALCANTARILLA: EXCAVACIÓN DE CAJA PARA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO, SE ENCUENTRA MATERIAL SATURADO Y AL RETIRAR EL RELLENO, SE AUTORIZA REALIZAR SUSTITUCIÓN MANUAL. EL INSPECTOR HA ACOMPAÑADO DICHA ACTIVIDAD PARA GARANTIZAR LAS DIMENSIONES INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR PARA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO, EN COMITE DE OBRA SE AUTORIZÓ CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE CONFINAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DEBIDO AL PASO DE VEHICULOS DE CARGA A UN ACCESO DE MATERIAL DE PRÉSTAMO LATERAL. DICHA ESTRUCTURA ESTARÍA CONFINADO POR UN BORDILLO ALTO DE 40 CM, REFORZADO CON 4 VARILLAS N. 4 1/2" Y FLEJES DE 3/8" CADA 25 CM. Y DONDE GUARDARA EL NIVEL DEL PAVIMENTO:



FLEJES DE 3/8"
VARILLAS DE 4 1/2"

DE ESTE PUNTO EXISTE UN TOMA QUE CORRESPONDE AL BARDA PARCIAL DE LA ACCACIDA, UN USUARIO HA INVADIDO APROXIMADAMENTE 25 CM DE VIA Y CONSTRUYÓ UN ANTOJARDIN, SIN EMBARGO, AL MOMENTO DE LA INTERVENTORIA NO EXISTEN FACILIDADES PARA CONCRETO Y SU PLANTA REALIZAN SOLO LO DECORDADO POR LA CALIDAD.

* EL CONTRATISTA PRESENTA CARTA SOLICITANDO CAMBIO DE RESIDENTE DE OBRA, SE SUSPENDE AL CAMBIO DE DIRECCION QUE OCURRIÓ EN EL TRANSCURSO DE LA SEMANA. SE REALIZA ENTREGA ENTRE RESIDENTE ENTRANTE Y SALIENTE.

Sandra O.
Residente

RES. INTERVENTORIA

04 DE JULIO 2025 (VIERNES)

*PERSONAL: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE, 1 SOCIAL, 1 AMBIENTAL, 1 SST, 2 MAESTROS, 1 OPERARIO DE MAQUINARIA, 3 OFICIALES 17 AYUDANTES, 3 RESPALDADORES.

* EQUIPO: 1 VIBRO COMPACTADOR, 1 CARMIX, 1 MINICARGADOR, 1 RANA, 1 VIBRADOR DE CONCRETO, 1 PLANTA ELECTRICA, HERRAMIENTA MENOR.

* CLIMA: SOLEADO CON LLOVIZNAS AISLADAS.

* ACTIVIDADES:

- COMPOSTELA: CONTINUA CORTE Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR, INSTALACIÓN DE FORMALETA PARA VACIADO DE PAVIMENTO MR-42, SE PROGRAMA PARA EL 7 DE JULIO, LUNES.
- LA AVANZADA: INSTALACIÓN DE ARMADO EN CALLE 28 ENTRE CARRERAS 11 Y 13, DERECHA. SE TOMAN DESPACHOS POR PARTE DEL CONTRATISTA ENTRE CALLES 11 Y 12 PARA RESULTADOS SATISFACTORIOS, CON EL CONTRATISTA REALIZA SOLICITUD FORMAL

PARA REALIZAR VACIADO DE ARDÉN EN HORARIO NOCTURNO. SE REVISA EL DOCUMENTO Y SE VALIDA QUE CUMPLE CON LO REQUERIDO Y ES AUTORIZADA LA ACTIVIDAD POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA PARA REALIZAR VACIADO DE ARDÉN ESTAMPADO CON CONCRETO PREMEZCLADO. SE REALIZA ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.

- LA PALOMA: CORTE Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR, SE INICIA INSTALACIÓN DE FORMALETA PARA VACIADO DE PAVIMENTO MR-42 ACELERADO A 7 DÍAS. SE TIENE PROGRAMADO Y AUTORIZADO, POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA, INSTALACIÓN DE PAVIMENTO MR-42 ACELERADO A 7 DÍAS DESDE DE LAS 4 PM DEL SÁBADO 5 DE JULIO.
- ALCAZALES: INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR PARA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO.

Res. Obra

R. Interventoría.

05 DE JULIO 2025 (SÁBADO)

* PERSONAL: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE, 1 SOCIAL, 1 SST, 1 AMBIENTAL, 2 MAESTROS, 3 OFICIALES, 17 AYUDANTES, 3 ACOPLADORES, 1 CONDUCTOR DE CAMIONETA, 1 ORDENADOR DE MEZCLADORAS.
* EQUIPO: 1 MEZCLADORA, 1 CARMIX, 1 VIBROCOMPACTADOR, 1 RANA, 1 VIBRADOR DE CONCRETO, 1 PLANTA ELÉCTRICA, 1 REGLA VIBRATORIA.
* ACTIVIDADES: - COMUNIDELA: CONTINUA CORTE Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR, INSTALACIÓN DE FORMALETA PARA VACIADO DE PAVIMENTO, SE PROGRAMA PARA 7 DE JULIO.
- AVANZADA: CORTE DE APROBADO ENTRE CALLES 11 Y 13 CARRIL DERECHA, ENCOFRADO PARA VACIADO DE ARDÉN.
- LA PALOMA: INSTALACIÓN DE FORMALETA, ACERO DE REFUERZO PARA FRANJA LATERAL, INSTALACIÓN DE CANASTILLAS Y DOWELS DE 1/8", PAVIMENTO MR-42 ACELERADO A 7 DÍAS. DE

- ALCANTARILLADO: INSTALACIÓN DE SUMIDERO CONEXIÓN PARA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

* SE SOLICITA AL CONTRATISTA AGILIZAR APERTURA DE NUEVOS FRENTES DE OBRA, PUES A LA FECHA CUENTA CON SOLO 4 Y SU OBLIGACIÓN CONTRACTUAL ES TENER AL MENOS 6 FRENTES EN SIMULTANEO. SE CUENTA CON PUNTOS AUTORIZADOS PARA APERTURA.

SE TIENE PENDIENTO DEFINICION ACERCA DE LA INTERVENTORIA EN SAN IGNACIO. LA SUPERVISIÓN AÚN NO ENTREGA DISEÑOS SEGÚN VISITA DEL PASADO 27 DE JUNIO.

SMNG
Residente

Ppr. INTERVENTORIA

7 DE JULIO 2025 (LUNES)

* PERSONAL: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE, 1 SOCIAL Y AMBIENTAL, 1 SST, 2 FIERREROS, 8 OFICIALES, 17 AYUDANTES, 1 CONDUCTOR, 1 OPERARIO RETROEXCAVADORA, 3 ROBOTIZADORES.

* EQUIPO: 1 VIBROCOMPACTADOR, 1 CAMIONETA, 1 RETROEXCAVADORA, 2 MEZCLAS, 1 PLANTA ELECTRICA, 1 VIBRADOR ALMACENADO, 1 REGLA VIBRATORIA, 1 CORTADORA DE PAVIMENTO, HERRAMIENTA MENOR

* DIA SOLDADO

* ACTIVIDADES: - CONFORMACIÓN INSTALACIÓN DE PAVIMENTO MR-42 ACOPLADO A 7 DIAS SUMINISTRADO POR ANDES, INSTALACIÓN DE CANASTILLAS Y DOVELAS.

- ANDENADA: CARGO DE AFIRMADO PARA VACIADO DE ANDEN. ENCOFRADO. SE SOLICITA NUEVAMENTE LA SEÑALIZACIÓN DE OBRA CONSTANTE QUE LA COMUNIDAD NO VIOLENTE LA CINTA Y POR LO TANTO, PROCURANDO CUMPLIR CON LA SEÑALIZACIÓN SE UNE CON NUDOS, FRECUENTAS SUMINISTRADO CINTA NUEVA.

- PELUSA: INSTALACIÓN DE CANASTILLAS, DOVELAS Y CONCRETO MR-42 ACOPLADO A 7 DIAS EN PUNTO INTERMEDIO, CONTRA DE

PAVIMENTO VACIADO EL SABADO 5 DE JULIO

- ALCALDIAS: NO HAY ACTIVIDADES DE OBRA. SE SOLICITA AL CONTRATISTA NO ABANDONAR EL FRENTE, SI BIEN ESPERAN CONFIRMACIÓN DE CONCRETOS PARA FECHA DE VACIADO, NO SE DEBE DEJAR SIN INTERVENCIÓN ALGUNA. SE LE RECUERDA QUE DEBE CONSTRUIR UN BORDILLO DE CONFINAMIENTO QUE HUBO LA CONSTRUYENDO.
- ENTRADA COLEGIO MANUELA BELTRAN (CALLE 10 # 123-43) SE REALIZA DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ENCONTRANDOSE UNA MEZCLA ENTRE CONCRETO HIDRÁULICO Y CONCRETO ASFÁLTICO. SE INICIA RETIRO DE ESCOMBROS.

* SE SOLICITA AL CONTRATISTA NO ABRIR FRENTES SI NO CUENTA CON LA LOGISTICA SUFICIENTE PARA COMPLETAR SU EJECUCIÓN.
* SE RECITERA EL COMPROMISO DE CONTAR CON AL MENOS 6 FRENTES DE EJECUCIÓN SIMULTANEA.
* CONTINÚA LA ESPERA DE LOS DISEÑOS Y DEFINICIONES TECNICAS DE LA EJECUCIÓN DE SAN IGNACIO CALLE 29 CRA 11.

MARTES 08 DE JULIO 2025

* PERSONAL: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE, 1 AMBIENTAL, 1 SOCIAL, 1 SST, 2 MAESTROS, 1 OPERARIO DE MAQUINARIA, 6 OFICIALES, 17 AYUDANTES, 1 CONDUCTOR, 3 RETROEXCAVADORAS.
* DIA SOLEADO
* EQUIPO: 1 MINICARGADOR, 2 PLANAS, 1 PLANA ELECTRICA, 1 VIBRADOR DE PAVIMENTO, HERRAMIENTA MENOR
* ACTIVIDADES: SE INICIA ENCOFRADO DE SARDINEL Y SE PREPARA LA SUPERFICIE PARA CONSTRUCCIÓN DE SOBREANCHO EN EMPALME CON CALLE EXISTENTE, CONTINÚA LA ESPERA DE LA TAPA QUE SUMINISTRARÁ AGUAS DE MANIZALES - CON IVOS TOLA!
* AVANZADA: CONTINÚA LIMPIO Y ENCOFRADO PARA VACIADO DE ANDEN. SE PROGRAMAN TOMAS DE DENSIDADES PARA EL

- LA ROLUSA: LOS VIAJACIÓN DE CAMIONES, DOVELAS Y CONCRETO MR-42 ACELERADO A 7 DÍAS SUMINISTRADO POR CONCRETOS GJG, EN EL TRAMO INTERMEDIO. SE REALIZAN CORTES A PAVIMENTO VACIADO EL 5 DE JULIO. SE REALIZA JORNADA DE ORADO Y ASEO. SE PROGRAMA VACIADO DEL ÚLTIMO TRAMO PARA SÁBADO 12 DE JULIO.
- ALCANTARAS: COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR, SE TOMA DENSIDAD POR PARTE DEL CONTRATISTA, SE REALIZAN CORTES EN CONCRETOS ANTIGUOS PARA FUTURA LA ADHERENCIA DEL PAVIMENTO NUEVO. INSTALACIÓN DE LATERALES PARA VACIADO DE PAVIMENTO, SE PROGRAMA VACIADO PARA EL 12 DE JULIO.
- ENTRADA A COLEGIO SE REALIZA EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE. SE AUTORIZA DEMOLICIÓN SARDINEL EN MAL ESTADO PARA FUTURA LA ESTÉTICA DE LA OBRA NUEVA. SE PRESENTA DAÑO EN TUBERÍA DE ACUEDUCTO DOMICILIARIO FRENTE A VIVIENDA # 128-55, AL MOMENTO EL DAÑO SE APRECIA TUBERÍA QUE ANTIEVA, SE CONSUMEN AGUAS DE MANIZALES MEDIANTE LLAMADA TELEFÓNICA POR EL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA PARA QUE PROGRAMEN VISITA Y DETERMINEN SI SE REALIZA CAMBIO EN LA RED O SOLO LA DOMICILIARIA. ACUDE PERSONAL OPERATIVO DE AGUAS DE MANIZALES, REPARAN DEJAN EL DAÑO Y COMENTAN QUE NO SE REALIZARÁ NINGUNA OTRA INTERVENCIÓN.

* CONTINÚA VIGENCIA DE DISEÑOS DE SAN IGNACIO Y DETERMINACIÓN ALCANCE INTERVENTORÍA, ESPECIALMENTE PARA PERSONAL DE RED DE ALCANTARILLADO ANTIGUA.

*

R. INTERVENTORÍA

MIERCOLES 09 DE JULIO 2025

* PERSONAL: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE, 1 SOCIAL, 1 AMBIENTAL, 1 SST, 2 MAESTROS, 6 OFICIALES, 18 AYUDANTES, 1 OPERARIO, 1 CONDUCTOR, 3 RETROEXCAVADORAS.
* EQUIPO: 1 MINICARGADORA, 1 PLANTA ELECTRICA, 3 PLANTAS,

2 MEZCLADORAS, 2 VIBRADORES, 1 CONTADORA, HORMIGONERA MENOR.

* ACTIVIDADES: - COMPOSTELA: EXCAVADO Y VACIADO DE SOLERA EL, SE INSTALA RESTO DE REFUERZO DE SOLERA DE ESCALERA CALLE ANTIGUA. CONTINÚA ESPERA PARA SUMINISTRO DE TIERRA DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN.

- AVANCADA: CONTINÚA CORTE DE ARMADO DE MUROS CLAS. EJES 12 Y 13 SE TOMAN DIMENSIONES POR EL CONTRATISTA.

- RELUSA: NO HAY ACTIVIDADES.

- ALCAZARES: NO HAY ACTIVIDADES, SE QUEDA PROGRAMADO VACIADO DE ANILLO PARA 12 DE JULIO.

- CENTRO A CULTIO: EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO, NIVEL DE SOTANOS, INICIA INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR.

- CRA 7C CALLE 12 B (CANDÉN CALLE LARGA): INICIA DEMOLICIÓN DE ANDÉN EXISTENTE.

J. L. V. O
Res. Obra

RES. INSTRUMENTACIÓN.

JUEVES 10 DE JULIO 2025

* PERSONAL: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE, 1 SOCIAL, 1 AMBIENTAL, 1 SST, 2 MAESTROS, 6 OFICIALES, 18 AYUDANTES, 1 ORDENADO, 1 CONDUCTOR, 3 PERFORADORES.

* DIA SOLEADO, LLUVIAS LEVES AISLADAS.

* EQUIPOS: 1 RETROEXCAVADORA, 1 RETRO FRONTAL, 3 PLANTAS, 2 VIBRADORES, 2 MEZCLADORAS, 1 CONTADORA, HORMIGONERA MENOR.

* ACTIVIDADES: - COMPOSTELA: CONTINÚA ARMADO DE ACERO DE PLACA DE SUMIDERO, CONTINÚA OBRA GRIS MUROS DE MAMPOSTERÍA SUMINISTRO DE TIERRA PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN. VACIADO DE SARDINEL

- AVANZADA CORTE DE ARMADO, TOMA DE DIMENSIONES POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA. VACIADO DE MANGA PARA MUROS CON MOVILIDAD REQUERIDA ENTRE EJES 11 Y 12, DERECHA.

- ALCAZANES: NO HAY ACTIVIDADES

- TORRALBA COLOSIO: RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, INSTALACIONES DE SUBBASE GRANULAR.

- ANDRÉS CALLEJA: CONTINÚA DEMOLICIÓN DE ANDÉN, INICIA EXCAVACIONES PARA INSTALACIÓN DE ARMADA

R. OBRA

R. INTERVENTORÍA

VIERNES 11 DE JULIO 2025

* PERSONAL: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE AMBIENTAL, 1 SOCIAL, 1 SST, 2 MAESTROS, 1 ALMACENISTA, 1 CONDUCTOR, 6 OFICIALES, 18 AYUDANTES, 3 OPERADORES.

* EQUIPO: 1 MINICARGADOR, 1 PLANTA ELÉCTRICA, 3 MARTILLOS, 2 VIBROCOMPACTADORES, 1 COMPACTADORA, HERRAMIENTA MENOR.

* ACTIVIDADES: - COMPOSTELA: SIN ACTIVIDADES

- AVENTADA: CONTRATISTA DE ARMADO LLEGANDO A CAJA 13, VACIADO DE MUROS DE ACCESO CAJA 12. CONTINÚA COLOCACIÓN DE ACEROS DE MUROS DE CAJAS 11 Y 12

- LA POSADA: VACIADO DE MUROS INTERMEDIOS CON CONCRETO PREMEZCLADO ACELERADO A 7 DÍAS SUMINISTRADO POR CONCRETOS LEÓN. INSTALACIÓN DE CAMPANILLAS Y DUCTOS.

- ALCATRACES: SIN ACTIVIDADES

- TORRALBA COLOSIO: COMPACTACIÓN Y CORTE DE SUBBASE GRANULAR, SE AUTORIZA INSTALACIÓN DE FUNDACIÓN PARA VACIADO DE CONCRETO.

- ANDRÉS CALLEJA: SE RECIBE SUBBASE Y SE AUTORIZA INSTALACIÓN DE ARMADO, INICIA LA ACTIVIDAD CONTRATISTA CON MARCA.

* CONTINÚA ESPERA DE LA ENTREGA DE TARA PARA CÁMARAS DE INSPECCIÓN DE COMPOSTELA.

* EL CONTRATISTA PROGRAMA VACIADO EN COLOSIO PARA PRÓXIMO LUNES 14 DE JULIO.

R. OBRA

R. INTERVENTORÍA

SÁBADO 12 DE JULIO 2025

* PERSONAL: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE, 1 AMBIENTAL, 1 SOCIAL, 1 SST, 2 MAESTROS, 6 OFICIALES, 18 AYUDANTES, 3 REGULADORES, 1 CONDUCTOR, 1 ORDENANZA
* EQUIPO: 1 MINICARGADOR, 1 PLANTA ELECTRICA, 2 MOTOSIERRAS, 2 VIBRADORES, 3 PALAS, 1 CONTADORA, HERRAMIENTA MENOR.
* ACTIVIDADES: - COMPOSTELA: CONCRETADO DE SARDINEL, INSTALACIÓN DE POSTE PARA PARADA DE CÁMARA DE INSPECCIÓN, HOY LLEGÓ LA TAPA AL ENCARGO DE OBRA. SE PLANEA RETIRAR VIERNES 18 DE JULIO.
- AVANZADA: VACIADO DE ALCOR ESTRUCTURADO ENTRE CALLES 12 Y 13
- LA ROCUSA: NO HAY ACTIVIDADES
- ALCAZANES: INSTALACIÓN DE CANASTILLAS, DOVELAS, ARMADO MR-42 ACOPLADO A 7 DÍAS SUMINISTRADO POR CONCRETOS GTE.
- ENTRADA COLEGIO: SE TOMAN DENSIDADES POR CONTRATISTA E INTERVENTORÍA OBTENIENDO RESULTADOS SATISFACTORIOS. AUNQUE EL CONTRATISTA TIENE PLANEADO PARA EL MARTES 15 DE JULIO, SE LE RECOMIENDA NO PLANEAR POSIBLE AMPLIACIÓN DEL ENFRIO DE OBRA, SE TOMAN MEDIDAS PARA CUANTIFICAR VACIO Y SE ESPERA PERMISIÓN PARA PARO DE LA ENTIDAD.
- ALCÓN CALLE LARGA: CONTINÚA INSTALACIÓN DE ACERO.

* SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA NO CURAR CON PLÁSTICOS LA SUBBASE INSTALADA UNA VEZ SE HAYA SELLADO, SINO SE RECOMIENDA HUMEDECERLA Y DEJAR EXPUESTA AL SOL, ESTO PARA MEJORAR COMPACTACIÓN, AUNQUE SE PRESENTEN LLUVIAS FUERTES.

RES. OBRA

RES. INTERVENTORÍA.

LUNES 14 DE JULIO 2025

* PERSONAL: 2 MAESTROS, 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE, 1 SOCIAL 1 AMBIENTAL, 4 OFICIALES, 15 AYUDANTES, 1 CONDUCTOR, 1 ORDENANZA

* EQUIPO: 1 CAMIÓN, 1 RETROEXCAVADORA, 2 MEZCLADORAS, 2 VIBRADORES, 3 MANOS, 1 PLANTA ELECTRICA, 1 COMPRESOR, HERRAMIENTA MENOR

* ACTIVIDADES: - COMPOSTELA: VACIADO DE CONCRETO F'C=21 ACELERADO A 7 DÍAS, ACERO DE REFUERZO, INSTALACIÓN DE TAPA EN CÁMARA DE INSPECCIÓN.

- AVANZADA: CONTOS EN ANDÉN CONSTRUIDO, CONFORMACIÓN PUNTO FIJO SEGÚN DE ANDENES

- LA POLUSA: INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO EN PLANO FALTANTE, VACIADO DE CONCRETO F'C=21 ACELERADO A 7 DÍAS) PAVIMENTOS, CONCRETOS 656, IGUAL QUE EN COMPOSTELA, SE DAN PENDIENTES CONTOS Y SELLOS. SE SOLICITO AL CONTRATISTA REALIZAR ORDEN Y ASEO EN LA ZONA.

- ALCAZARES: CONTOS EN ANDÉN INSTALADO EL PASADO SÁBADO 12 DE JULIO. SE SOLICITA AL CONTRATISTA INTERVENTORIA PAVIMENTO EL BORDILLODO CONFINAMIENTO, SIN EMBARGO NO SE APLICARIAN ACTIVIDADES PARA HOY.

- ENTRADA AL COLEGIO: NO HAY ACTIVIDADES. EL CONTRATISTA ACATA LA RECOMENDACIÓN DE LA INTERVENTORÍA Y NO REALIZA VACIADO DE CONCRETO, SIN EMBARGO EXPRESA SU PREOCUPACIÓN POR LA DEMORA EN LA DEFINICIÓN ACERCA DE LA INTERVENCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD, POR ELLO GENERA UNA DEMORA NO IMPUTABLE AL CONTRATISTA.

- ANDEN CALLE LARGA: SE TOMAN DENSIDADES PARA PARTE DEL CONTRATISTA, SIN EMBARGO NO ARROJAN BUENOS RESULTADOS Y NO SE AUTORIZA VACIADO DE CONCRETO. SE REALIZAN LOS CORRECTIVOS Y RECOMPACTACIÓN DEL AFIRMADO MULTADO, EN HORAS DE LA TARDE SE TOMAN NUEVAMENTE DENSIDADES OBTENIENDO RESULTADOS SATISFACTORIOS Y SE AUTORIZA VACIADO A PARTIR DE LAS 4PM. SE INSTALA CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI CON TROMPO CONCRETOS LTDA, PARA ANDEN ESTAMPADO.

- EN LOS PUNTOS CRA 10 CALLE 11B (CASA DE LA CULTURA) Y EN LA CALLE 12 CRA 13 (ANTIGUA IGLESIA) ARROJOS CON CHIPAO, SE INSTALA SONDALIZACIÓN SUBSIÓN PMT PARA

INICIO DE ACTIVIDADES.

* DÍA SOLEADO:
* CONTINUA ESPERA PARA ENTREGA DE DISEÑOS EL SAN LORENZO.
* CONTINÚA ESPERA PERMISO DE INTERVENCIÓN EN LA ENTRADA DEL COLEGIO MARCO FIDEL SUAREZ.

Sin V.O
Dra. Obra

Arq. INTERVENTORÍA.

*MARTES 15 DE JULIO 2025
* PERSONAL: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE, 1 SST, 1 AMBIENTAL, 1 SOCIAL, 1 CONDUCTOR, 1 OPERARIO, 2 MAESTROS, 5 OFICIALES, 19 AYUDANTES, 3 ARMADORES.
* EQUIPO: 1 MINICARGADOR, 2 RETROEXCAVADORAS, 2 VIBRADORES, PLANTA ELECTRICA, COMPACTADORA, HERRAMIENTA MENOR, 3 PALAS.
* D/A SOLEADO
* ACTIVIDADES: - COMPOSTURA: VACIADO DE SARDINEL MARGEN DERECHA, LIMPIEZA DE VÍA, CONFORMACIÓN DE AFIRMADO PARA CONSTRUCCIÓN DE ANDÉN.
- AVANZADA: VACIADO DE ANDÉN ESTAMPADO ENTRE EJES 12 Y 13 DERECHA Y ENTRE EJES 11 Y 12 IZQUIERDA, SE COMPLETA ASÍ LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ANDENES AUTORIZADOS EN LA ZONA. FALTA COMPLETAR LLENOS DE CONFORMACIÓN PARAS DE LOS ANDENES, ASEO GENERAL, SE SOLICITA ESPECIAL CUIDADO CON LA LIMPIEZA DE LOS SUMIDEROS.
- LAPOSA: FALTA COMPLETAR LOS CORTES EN EL TRAMO INTERVENIDO, SELLOS, ORDEN Y ASEO. SE SOLICITA PLAN DE ABANDONO.
- ALCAZANOS: SE RETIRA FORMALETA DE PAVIMENTO CONSTRUIDO, INICIA EXCAVACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE SARDINEL AUTORIZADO.
- ENTRADA ALCALDÍA: NO HAY ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS DEBIDO A LA ESPERA DE DEFINICIÓN ALCALDÍA DE INTERVENCIÓN FRENTE LA PUERTA DEL COLEGIO. EN HORAS DE LA TARDE SE RECIBE NOTICIA AUTORIZANDO DICHA INTERVENCIÓN.

[illegible] DE AFIRMADO

DE PAVIMENTO EXISTENTE.

* EN LA CALLE 12 CON 7E SE INSTALA SEÑALIZACIÓN SOBRE PIST.

JOHN
Residente

RES. INTERVENTORÍA

MIERCOLES 16 DE JULIO 2025

* PERSONAL: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE, 1 AMBIENTAL, 1 SOCIAL, 1 SST, 2 MAESTROS, 5 OFICIALES, 15 AYUDANTES, 1 CONDUCTOR, 1 ALMACENISTA, 3 ABOGADOS.
* EQUIPO: 1 MINICARGADOR, 3 RANAS, 2 MEZCLADORAS, 2 VIBRADORES, 1 PLANTA ELECTRICA, 1 COMPACTADORA, HERRAMIENTA MENOR
* DÍA SOLEADO
* ACTIVIDADES: - CARRERA 7: VACIADO DE ANDEN MARGEN IZQUIERDA,
  - AVANZADA: DESENCOFRADO DE FORMALETA INSTALADA, CONFORMACIÓN ATAGUIAS DE ANDENES, RETIRO DE SEÑALIZACIÓN INICIA LIMPIEZA GENERAL.
  - LA PERLA: SE REALIZARON ACTIVIDADES A ULTIMO TRAMO CONSTRUIDO Y CORTES LONGITUDINALES, SE RETIRA SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA. SE REALIZARON LABORES LIMPIEZA GENERAL DEL TRAMO Y COMPLETAR INSTALACIÓN DE SELLOS.
  - ALEMANIA: SIN ACTIVIDADES. SE NOTIFICA AL CONTRATISTA REALIZAR CONSTRUCCIÓN DE BORDILLO.
* ENTRADA A COLEGIO: USO DE AUTORIZADA INTERVENCIÓN HASTA LA PUERTA DEL COLEGIO SE PROCEDE CON DEMOLICIÓN DE CONCRETO EXISTENTE E INICIO DE EXCAVACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE VÍA. SE SOLICITA TENER EXTREMO CUIDADO CON LOS SUMIDEROS PRESENTES EN LA ZONA.
  - CARRERA 7 CALLE 12: SE INSTALA AFIRMADO EN LA MARGEN IZQUIERDA, SE REALIZA DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN EN MARGEN DERECHA.
  - CALLE 10 CRA 11B: EXCAVACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE ANDENES NUEVO. DURANTE LA DEMOLICIÓN DEL PAVIMENTO SE VEN AFECTADAS UNAS TUBERIAS DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO

DO LA VIVIENDA CALLE 12 # 10-54, SE SOLICITA VISITA DE AGUAS DE MANIZALES, LA ATIENDEN, PERO ARGUYEN QUE LA ACOMETIDA LA DEBE REVISAR EL CONTRATISTA POR HABER SIDO AFECTADA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. SE REALIZA VISITA CON EL INGENIERO FERNEY PATIÑO, APOYO A LA SUPERVISIÓN, Y SE AUTORIZA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CAJA DE INSPECCIÓN QUE RECIBIRÁ LA TUBERÍA DE LA CASA Y SE CANALIZARÁ DESDE ALLÍ CON TUBERÍA NOVAFORT CORRUGADA DE 6", HASTA LA RED PRINCIPAL PROCURANDO QUE LA RED PRINCIPAL SE ENCUENTRA AL COSTADO DERECHO SENTIDO CALLE 12 A CALLE 11, AL ENCONTRAR LA TUBERÍA PRINCIPAL SE DETERMINARÁ LA LONGITUD PUESTO QUE SE PREVÉ MUY SUPERFICIAL.

- CALLE 12 CRA 7C: HA SIDO INSTALADA SEÑALIZACIÓN SOGUÍ PAT, SIN EMBARGO NO SE AUTORIZA REALIZAR CORTES NI INICIAR DEMOLICIÓN HASTA NO TENER DEFINIDO EL ALCANCE FÍSICO DEBIDO A LA RESTRICCIÓN PRESUPUESTAL IMPUESTA POR LA ENTIDAD.

EN HORAS DE LA TARDE SE REALIZA RECORRIDO EN COMPAÑÍA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN, INGENIERO FERNEY PATIÑO, CON EL FIN DE RECIBIR NUEVOS PUNTOS PARA EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN EN EL SECTOR DE SANCANCIO VIEJO, SE VISITAN:

1. LA VÍA DESDE LA CALLE 9A HASTA LA VÍA QUE CONDUCE A LA CABAÑA: REALIZAR RECORRIDO DE UN TRAMO DE APROXIMADAMENTE 800m Y 4m DE ALTURA, SE DEBE REALIZAR RECORRIDO DETALLADO PARA DEFINIR ÁREAS MÁS CRÍTICAS PARA LA INTERVENCIÓN.
2. (SEGÚN GOOGLE MAPS) CALLE 9A CRA 4, BATIENDO POR LAS PLACA HUELLAS EXISTENTES HASTA TERMINARLAS, A PARTIR DE AHÍ SE DEBE CONECTAR CON OTRO TRAMO EXISTENTE CONSTRUYENDO PLACAHUELLAS TIPO INVIAS, SE DEBE REALIZAR PRESUPUESTO PARA AJUSTARLO AL MONTO ASIGNADO POR LA ENTIDAD PARA ESE PUNTO Y ADEMÁS DE ALLÍ SE DETERMINARÁ RECORRIDO A CONSTRUIR.
3. [illegible] HASTA ABAJO POR LAS HUELLAS EXISTENTES,

LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVO TIPO ANDÉN O ESCALAS AJUSTANDO AL PRESUPUESTO ASIGNADO.

* DESPUES DE LAS 5PM SE REALIZA REUNIÓN CON EL CISCO DE SAN JOSÉ CON LIDERES COMUNALES Y SUPERVISIÓN PARA DETERMINAR LAS INTERVENCIONES FALTANTES EN EL BARRIO OTRA. SE REALIZA RECORRIDO CONJUNTO Y SE DETERMINA EVALUAR PREVIA INTERVENCIÓN:

1. UN ANDÉN PARA INTERVENIR CON LOSAS DE PAVIMENTO ENTRE CRA 16 CALLE 31 (CAI) Y VIVIENDA CON NOMENCLATURA 15-17.
2. SE IDENTIFICA "EL CUARTO PASAJE" UBICADO EN CALLE 31 CRA 12A PARA INTERVENCIÓN DE PASAMANOS SOBRE LAS ESCALAS EXISTENTES EMPEZANDO A MANO IZQUIERDA, SE DETERMINA QUE SE INSTALEN SOBRE LAS ESCALAS DEBIDO AL MAL ESTADO DEL ANDÉN. Y OTRO TRAMO AL FINAL DEL PASAJE SOBRE CRA 12A.
3. ANDÉN CALLE 31 #11-69 DONDE SE REQUIERE EVALUAR E INTERVENIR LA CONSTRUCCIÓN DEL ANDÉN NUEVO. SE HACE ÉNFASIS EN LA SUPERVISIÓN, SEGÚN LO OBSERVADO EN EL SITIO QUE UNA PARTE DEL ANDÉN SOBRANTE UN POCO Y A PESAR DE LAS ESCALAS, POR LO QUE NO SE RECOMIENDA INTERVENIR ESE TRAMO Y DEL OTRO EXTREMO SE APRECIAN ROCAS QUE NO SON FÁCILES DE RETIRAR Y QUE TAMBIÉN PUEDEN GENERAR INESTABILIDAD AL TALUD Y UN SOBRE COSTO PARA LA INTERVENCIÓN DICHO ANDÉN.
4. SOCIALIZAR JABÓN, REGLAMENTO VIVIENDA.

SANO
Rol. Obra

Vos. Interventoría.

JUEVES
~~VIERNES~~ 17 DE JULIO 2025

* PERSONAL: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE, 1 AMBIENTAL, 1 SOCIAL, 1 SST, 2 MAESTROS, 5 OFICIALES, 15 AYUDANTES, 1 CONDUCTOR, 1 OPERARIO, 3 RESIDENTES.
* EQUIPO: 1 MINICARGADOR, 3 MARTAS, 2 MEZCLADORAS, 2 VIBRADORES, 1 PLANTA ELECTRICA, 1 COMPACTADOR, HERRAMIENTA MENOR.
* DÍA SOLDADO
* ACTIVIDADES: - CONTRATISTA: ENCERRADO PARA VACIADO DE SARDINEL, FORMALETAS PARA INSTALACIÓN DE PILOTES PARA SARDINEL.

- LA POLUSA : SIN ACTIVIDADES
- ~~AVANZADA~~ AVANZADA : SIN ACTIVIDADES; SE RECOMIENDA COMPLETAR LIMPIEZA GENERAL, ESPECIAL CUIDADO CON TODOS LOS SUMIDEROS Y COMPLETAR CONEXIONES ATRAS DE ANDENES CONSTRUIDOS
- ALCAZANES: SIN ACTIVIDADES: SE HACE PRECISIONANTE LA FALTA DE DILIGENCIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL BORDILLO DE CONFINAMIENTO, ESPECIALMENTE AQUI QUE SERÁ CONSTRUIDO CON CONCRETO DE 3000 PSI SIN ACELERANTE, POR LO QUE OBLIGARÍA A UN CURADO DE 28 DÍAS DEL TRAMO DEL SARDINEL, AL TRATARSE DE UNA VÍA ESTRECHA Y QUE ESTE QUEDARÁ A NIVEL DEL PAVIMENTO, ES POSIBLE QUE SEA VER AFECTADO AÚN EL PASO VEHICULAR.
- ENTRADA A COLEGIO: DEMOLICIÓN DE CONCRETO FALTANTE, EXCAVACIÓN PARA CAJA DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
- ANDENES CALLE LARGA: INSTALACIÓN DE ACERO AL ANDÉN MARGEN DERECHA.
- CRA 10 CALLE 11B: EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO:
- CALLE 12 CRA 7C: UNA VEZ REVISADO EL ALCANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD SE DEMARCA LA ZONA A INTERVENIR, SE SOLICITA QUE SEAN UTILIZADAS BALIZAS PLÁSTICAS PARA DEMARCACIÓN DE ZONA DE TRABAJO PREVIO INICIO DE DEMOLICIÓN. AÚN NO SE INICIAN ACTIVIDADES.
- SE REALIZA VISITA CON EL CONTRATISTA AL SITIO DENOMINADO EL JAZMIN (JUNTO A CISCO DE SAN JOSÉ) PARA SU EVALUACIÓN PRESUPUESTAL, SE TOMAN MEDIDAS EN CAMPO.

* SE REALIZA VISITA EN COMPAÑÍA DE RESIDENTE DE OBRA Y PROFESIONAL SST DE LA INTERVENTORÍA AL PUENTO OLIVARES EN EL BARRIO EL OCASO (POR SOLICITUD DE LA SUPERVISIÓN) PARA APRECIAR POSIBLES POSIBLES ACTIVIDADES A REALIZAR. LA INSPECCIÓN A LOS ESTRIBOS DEL PUENTE. EN LA VISITA SOLICITAN.

UN DESCENSO A LOS FONDOS DONDE SON TOMANDO TODAS LAS MEDIDAS DE TRABAJO EN ALTURAS, POR LO QUE SE REQUIERE REPROGRAMAR LA VISITA Y TOMAR LAS MEDIDAS Y ACOMPAÑAMIENTO NECESARIOS. SE RECOMIENDA INVITAR A LA SUPERVISIÓN PARA QUE PRESENCIEN DE MANERA COMPLETA LA INSPECCIÓN REQUERIDA.

* EN HORAS DE LA TARDE SE PRESENTÓ LA NOVEDAD QUE EL PERSONAL OPERATIVO SE RETIRA DE LOS FRENTES DE OBRA ARGUMENTANDO QUE NO HAN RECIBIDO EL PAGO DE LA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE JULIO. SE ENVÍA OFICIO REQUIRIENDO AL CONTRATISTA PONERSE AL DÍA CON LOS PAGOS. DE MANERA INFORMAL EL DIRECTOR DE OBRA COMUNICA QUE YA HAN COMPLETADO TODOS LOS PAGOS SE SOLICITA QUE RESPONDAN EL OFICIO DE MANERA FORMAL.

VIERNES 18 DE JULIO 2025

* PERSONAL: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE, 1 AMBIENTAL, 1 SOCIAL, 1 SST, 2 MAESTROS, 5 OFICIALES, 11 AYUDANTES, 1 CONDUCTOR, 1 OPERARIO
* EQUIPO: 1 CARGADOR, 2 MEZCLADORAS, 2 VIBRADORES, 1 PLANTA ELECTRICA, 1 COMPACTADORA, 3 BARRAS, HERRAMIENTA MENOR.
* DÍA SOLEADO.
* ACTIVIDADES: - CONTRATISTA:
- CONTRATISTA: ENCOFRADO Y VACIADO DE SARDINEL IZQUIERDO.
- AVANZADA: SIN ACTIVIDADES.
- LA PELUSA: SIN ACTIVIDADES.
- ALCAZARES: SIN ACTIVIDADES.
- ENTRADA AL COLEGIO: INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR
- ANDEN CALLE LARGA: INSTALACIÓN DE APUNTALADO, FORMALETA PARA VACIADO DE ANDÉN, SE AUTORIZA INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA, ENTRADA GARAGE MARCON DONCHA.
- CRA 10 CALLE 118: EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO; ARRIBO UN NUEVO TUBO DE ALCANTARILLADO EN CONCRETO, SE REPORTA A LA ENTIDAD Y SE SOLICITA

NUEVA VISITA DE AGUAS DE CIUDAD LOS PARA TOMAR MEDIDAS ACERCA DEL CAMBIO DE TUBERÍA. SE ESPERA RESPUESTA POR PARTE DE AGUAS DE CIUDAD LOS.

- CALLE 12 CRA 7C: INICIA DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO.

* CONTINÚA ESPERA DE ENTREGA DE DISEÑOS PARA SER IGNACIO POR PARTE DE LA ENTIDAD.

N.O
Pas Obm

INSPECTOR

SÁBADO 19 DE JULIO 2025

* PERSONAL: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE, 1 SST, 1 AMBIENTAL, 1 SOCIAL, 2 MAESTROS, 5 OFICIALES, 11 AYUDANTES, 1 CONDUCTOR, 1 ALMACÉN.
* EQUIPO: 1 MINICARGADOR, 2 RETROEXCAVADORAS, 2 VIBROCOMPACTADORES, 1 PLANTA ELÉCTRICA, 1 COMPRESOR, 3 MANGAS, HERRAMIENTA MENOR.
* DÍA SOLEADO
* ACTIVIDADES: ENCOFRADO DE SARDINEL MARGEN DERECHA, INSTALACIÓN DE REFUERZO PARA ANDÉN MARGEN IZQUIERDA. SE RESTITUYE PASO PEATONAL SOBRE AVENIDA BERMANDO ARANGO Y SE HABILITA EL CRUCE POR LA VÍA NUEVA DEJANDO DEBIDAMENTE CERRADO EL ACCESO A LA VÍA NUEVA.
- AVANZADA: SIN ACTIVIDADES
- LA ACLUSA: SIN ACTIVIDADES
- ALCAZARES: SIN ACTIVIDADES. YA CUMPLIÓ LOS 7 DÍAS DE VACIADO EL PAVIMENTO. NO SE HA CONSTRUIDO EL ANDÉN.
- CALLE 10 # 123-45, ENTRADA A COLEGIO: CONTINÚA INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR.
- ANDÉN CALLE LARGA: INSTALACIÓN DE REFUERZO PARA ANDÉN MARGEN DERECHA
- CALLE 10 CRA 11B: SIN ACTIVIDADES. CONTINÚA ESPERA DE DEFINICIÓN DE INTERVENCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD Y/O AGUAS DE CIUDAD LOS, ACERCA DE LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN ENCONTRADOS.

LUNES 21 DE JULIO 2025

* PERSONAL: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE, 1 SOCIAL, 1 AMBIENTAL, 1 SST, 2 MAESTROS, 5 OFICIALES, 11 AYUDANTES, 1 CONDUCTOR, 1 CADENERO 2 NOCTURNOS
* EQUIPO: 1 MINICARGADOR, 2 RETROEXCAVADORAS, 2 VIBRADORES, 1 PLANTA ELECTRICA, 1 COMPACTADORA, 3 MANOS, HERRAMIENTA MENOR.
* DÍA SOLEADO
* ACTIVIDADES: - COMPOSTELA: SE TOMAN DENSIDADES Y SE REALIZA VACIADO DE ANDEN COSTADO IZQUIERDO.
- AVANZADA: SIN ACTIVIDADES
- LA POLUSA: SIN ACTIVIDADES
- ALCAZARES: SIN ACTIVIDADES
- ENTRADA AL COLEGIO: SE CONTINUÓA CON INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR PARA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO, SE TOMAN DENSIDADES PERO NO ARROJAN RESULTADOS OPTIMOS, SE RECOMIENDA HUMEDECER, COMPACTAR NUEVAMENTE Y REPROGRAMAR TOMA DE DENSIDADES. EN SEMANAS ANTERIORES SE LES HA SUGERIDO CAMBIAR EQUIPO DE COMPACTACIÓN POR UN EQUIPO DE MEJORES CARACTERISTICAS, ESPECIALMENTE PARA VIAS VEHICULARES, ESTO PARA MEJORAR RENDIMIENTOS, SIN EMBARGO NO ACATAN LA SUGERENCIA.
- ANDEN CALLE LARGA: VACIADO DE TRAMO FALTANTE EN MARGEN IZQUIERDA, QUEDA PENDIENTE VACIADO DE TRAMO DERECHA
- CAMINO CALLE 11B: SIN ACTIVIDADES. EN HORAS DE LA TARDE SE PRESENTA FUNCIONARIO DE AGUAS DE MANIZALES EN COMPAÑIA DE SUBCONTRATISTA QUE INSTALARÍA LA TUBERIA DE ALCANTARILLADO. SE COMPROMETE A ENVIAR PLANOS PARA QUE LA ALCALDÍA MUNICIPAL TOME LA DECISIÓN DE COMO INTERVENIR EL SITIO.
- CALLE 12 CON 7C: EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE. SE ENCUENTRAN TUBERIAS DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO EN LA ZONA, SE ESPERA DIRECTRIZ DE AGUAS DE MANIZALES PARA DETERMINAR QUE HACER.
* CONTINÚA OBRAS DE LOS ALPES DE SAN DIEGO

QUE DEBE ENTREGAR LA ALCALDÍA.

INC

Ro. obra

NOS. CONTRATADA.

MARTES 22 DE JULIO 2025

* PERSONAL: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE, 1 AMBIENTAL, 1 SOCIAL, 1 SST, 2 MAESTROS, 5 OFICIALES, 10 AYUDANTES, 1 CONDUCTOR, 1 ORNATO, 4 ALCALDADORES.
* EQUIPO: 1 MINICARGADOR, 2 MEZCLADORAS, 2 VIBRADORES, 1 PLANTA ELECTRICA, 1 COMPRESORA, 3 PONYS, HERRAMIENTA MENOR.
* DÍA SOLEADO
* ACTIVIDADES: - CONTRATISTA: VACIADO DE SARDINEL COSTADO DERECHO Y ORDAS EN LA LLEGADA A AVENIDA BERMUDO ANANGO.
- AVANZADA: SIN ACTIVIDADES
- LA ESCLUSA: SIN ACTIVIDADES
- ALCAZARES: SIN ACTIVIDADES.
- ENTRADA AL COLEGIO: COMPACTACION DE SUBBASE GRANULAR
- ANDEN CALLE LARGA: VACIADO DE ANDÉN MARGEN DERECHA, INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA.
- CALLE 10 CRA 11B: SIN ACTIVIDADES. SE NOTIFICA CONTRATACION POR CONTAMINACION DE AGUAS DE MANIZALES, SE NOTIFICA A LA ENTIDAD, SE ESPERA INSTRUCCIONES.
- CALLE 12 CRA 7C: SIN ACTIVIDADES. SE ESPERA VISITA POR PARTE DE AGUAS DE MANIZALES POR CONEXIONES DOMICILIARIAS ENCONTRADAS.
- CALLE 4 ENTRE CRAS 8 Y 9: SE INSTALA SEÑALIZACION SEGUN PMT, SE INICIA LABOR SOCIAL PREVIO AL INICIO DE ACTIVIDADES.
* ES PREOCUPANTE LA FALTA DE CELERIDAD DE LA SUPERVISION EN LA TOMA DE DECISIONES EN CUANTO A LA INTERVENCION DE TUBERIAS DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO ENCONTRADAS EN LOS [illegible]

MIÉRCOLES 23 DE JULIO 2025

* PERSONAL: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE, 1 SOCIAL, 1 AMBIENTAL, 1 SST, 2 CAPATACES, 5 OFICIALES, 10 AYUDANTES, 10 PEONARIO, 1 CONDUCTOR, 4 ABOLICADORES.
* EQUIPO: 1 MINICARGADOR, 1 PLANTA ELECTRICA, 3 ADAMS, 2 MEZCLADORAS, 2 VIBRADORES, HERRAMIENTA MENOR.
* DÍA SOLDADO:
* ACTIVIDADES: - COMPOSTELA: DESENCOFRADO DE SARDINEL, LIMPIEZA.
  - AVANZADA: SIN ACTIVIDADES, CONTINÚA PENDIENTE LIMPIEZA GENERAL Y CONFORMACIÓN ATRAS DE ANDENES.
  - LA ROSA: SIN ACTIVIDADES, SE INSTA AL CONTRATISTA A COLOCAR SELLOS, ASEO Y HABILITAR LA VÍA AL PÚBLICO.
  - ALCAZARES: SE INSTALA ACERO DE REFUERZO Y SE REALIZA VACIADO DE CONCRETO DE 3000 PSI ACELERADO A 3 DÍAS
  - ENTRADA COLEGIO: SE TOMAN DENSIDADES OBTENIENDO RESULTADOS ADECUADOS A LO SOLICITADO, SE AUTORIZA VACIADO DE PANTALLA MR-42 ACELERADO A 7 DÍAS, SE PROGRAMA INICIAL VACIADO EL DIA DE MAÑANA. SE INICIA INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO EN PUNTOS AUTORIZADOS.
  - ANDENES CALLE LARGA: CORTES, LIMPIEZA Y CONFORMACIÓN ATRAS DE MURO IZQUIERDO.
  - CALLE 10 CRA 11B: SIN ACTIVIDADES, AÚN NO SE TIENEN NOTICIAS ACERCA DE METODO DE INTERVENCIÓN DE TUBERÍAS ENCONTRADAS.
  - CALLE 12 CRA 7C: SE REALIZA EXCAVACIÓN MANUAL POR SOLICITUD DEL ENCARGADO DE REDES DE AGUAS DE MANZANOS, ALOJANDO TAPARRILLA, LAMA CHEQUEO Y POSIBLE CAMBIO DE CODOS. SE ENCUENTRA TUBERÍA DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO DOMICILIARIO DE COLGADO. SE ESPERA INDICACIONES DE INTERVENCIÓN.
  - CALLE 9 ENTRE CRAS 8 Y 9: SE REALIZAN CORTES TRANSVERSALES PREVIO A INICIO DE DEMOLICIÓN.
  - CALLE 12A CRA 13 (CASA ESQUINA DE CHIPAO): SE REALIZA DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN Y SE INICIA INSTALACIÓN DE ACERO PARA ANDÉN.

* CONTENIDA PRECAUCION POR FALTA DE COLCHONADO POR PARTE DE LA ALCALDIA DE MANIZALES EN LA TOMA DE DECISIONES DE CORTE A LA INTERVENCION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ENCONTRADAS, EN LA ENTREGA DE DISEÑOS PARA INTERVENCION DE SAN IGNACIO.

2 UN.O
Resp. Obra


RES. INTERVENTORIA

JUEVES 24 DE JULIO 2025


* PERSONAL: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE, 1 SOCIAL, 1 AMBIENTAL, 1 SST, 2 MAESTROS, 5 OFICIALES, 10 AYUDANTES, 4 ACOMPAÑANTES, 1 CONDUCTOR, 1 ALMACENISTA.
* EQUIPO: 1 MINICARGADOR, 1 PLANTA ELECTRICA, 1 CORTADORA, 3 PALAS, 2 MEZCLADORAS, 2 VIBRADORES, HERRAMIENTA MENOR.
* DIA SOLEADO.
* ACTIVIDADES: - COMPOSTELA: SIN ACTIVIDADES, ESTAN PENDIENTES CORTES DE ANDEN Y SARDINELES, PASADOS EN LA MANTENDAJA.
- AVANZADA: SIN ACTIVIDADES
- LA ALCAZA: SE COMPLETAN SELLOS, SE NOTA SEÑALIZACION FALTANTE, ASEO Y APERTURA DE VIA.
- ALCAZARES: SIN ACTIVIDADES
- ENTRADA A COLEGIO: INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO, CANASTILLAS, DOVELAS, CONCRETO MR-42 ALCANZADO 17 MPA, CANAL IZQUIERDO FALTANDO.
- ANDENES CALLEJUELA: SE HAN TERMINADO LOS ANDENES AUTORIZADOS, SIN EMBARGO SE ESPERA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ENTIDAD PARA INTERVENCION DE UN NUEVO TRAMO SOLICITADO POR LA COMUNIDAD.
- CRA 10 CALLE 11A: SIN ACTIVIDADES. SE TIENE VISITA POR PARTE DE REPRESENTANTE DE AGUAS DE MANIZALES Y CONTRATISTA UNIFICADO, SE INDICA QUE POR ESTOS CONTRATOS SE HARAN EXCAVACIONES, DESCUBRIENDO CONSTRUCCION DE CAJAS Y LLAVES, EL CONTRATISTA EXTERNO SOLO INSTALARA TUBERIAS NECESARIAS.
- CALLE 12 CRA 7C: DURANTE EXCAVACION MANUAL SE

AGUAS DE MANIOBRAS Y CONTRATISTA EXPONEN, SE ESCUCHA SUGUIN EL MISMO CONTENIDO QUE EL PUNTO ANTERIOR.

- CALLE 4 ENTRE CRAS 8 Y 9: INICIA DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE
- CALLE 12A CRA 13: INSTALACIÓN DE AFIRMADO PARA ANDÉN, SE REALIZA REVISIÓN DEL ALCANCE DEL PUNTO Y SE DETERMINA QUE SE DEBE DEMOLER UN TRAZO DE PLACA EXISTENTE Y FALLADA, SIN INTERVENIR LAS ESCALAS, DEBIDO A ESTO SE REQUIERE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTRUCTURA DE CONTENCIÓN ASÍ:

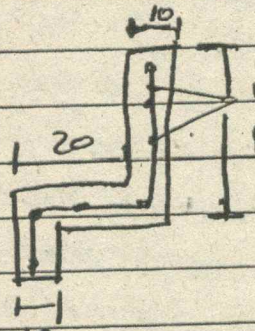

ESTA ESTRUCTURA TENDRÁ UNA VISTA EN PLANTA ASÍ:

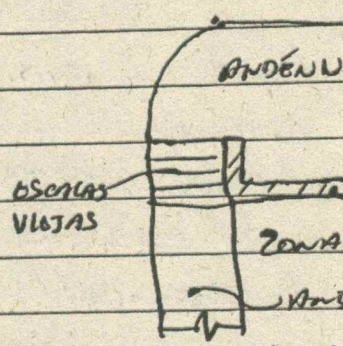

SOBRE ESTA ESTRUCTURA SE INSTALARÁN BOSARIANOS.

S.G.V.O
RO. OBRA

RES. INTERVENTORÍA.

VIERNES 25 DE JULIO 2025

* PERSONAL: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE, 1 SOCIAL, 1 AMBIENTAL, 1 SST, 2 MAESTROS, 10 AYUDANTES, 5 OFICIALES, 1 CONDUCTOR, 1 OPERADOR, 4 ROBUSTIADORES.
* EQUIPO: 1 MINICARGADOR, 1 PLANTA ELÉCTRICA, 2 VIBROCOMPACTADORES, 2 VIBRADORES, 3 MEZCLADORAS, 1 COMPRESOR, HERRAMIENTA MENOR, REGLA VIBRATORIA

* DIA SOLEADO, LLUVIA DISCADA DE 1:15 A 1:45PM.
* ACTIVIDADES: - COMPOSTELA: SOTRUCHANA PERSONAL HACIENDO QUE REALIZA PERFORACIÓN EN LOS TALUDES Y ACOMODA EL MATERIAL SOBRE EL RELLENO CONSTRUIDO, AL SOLICITAR EL PERMISO DE AHÍ, DICEN QUE HASTA EL MARTES UNA VEZ SE HABILITE LA VÍA.

NO HAY ACTIVIDADES DE OBRA.

- AVANZADA: NO HAY ACTIVIDADES
- ALCAZARES: NO HAY ACTIVIDADES.
- ENTRADA AL COLEGIO: INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DOBLE PARRILLA EN PISO QUE CONTIENE CÁMARAS DE INSPECCIÓN. INSTALACIÓN DE CUNETAS, BOLEAS, CONCRETO MR-42 ACOLLADO. A 7 DÍAS. FINALIZA INSTALACIÓN DE CUNETA
- ANDENES CALLE LARGA: CONTINUA ESPERA ACERCA DE DEFINICIÓN DE CONSTRUCCIÓN O NO DE ANDEN SOLICITADO POR LA COMUNIDAD.
- CALLE 10 CRA 11B: SIN ACTIVIDADES.
- CALLE 12 CRA 7C: SIN ACTIVIDADES.
- CALLE 9 ENTRE CRAS 8 Y 9: RETIRO DE ESCOMBROS.
- CALLE 12A CRA 13: INSTALACION DE CONCRETO PARA ANDEN, ACERO DE REFUERZO PARA BORDILLO.

Rio Obre

INS. INTERVENTORIA.

SABADO 26 DE JULIO 2025

* PERSONAL: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE, 1 AMBIENTAL, 1 SOCIAL, 1 SST, 4 ROCULADORES, 1 CONDUCTOR, 2 MAESTROS, 5 OFICIALES, 10 AYUDANTES, 1 OPERARIO.
* DIA SOLEADO, LLUVIAS EN LA TARDE
* EQUIPO: 1 RETROEXCAVADORA, 1 PLANTA ELECTRICA, 3 RANAS, 1 COMPACTADORA, 2 MOTOSIERRAS, 2 VIBRADORES, HERRAMIENTA MENOR.
* ACTIVIDADES: - COMPOSTELA: SIN ACTIVIDADES.
- AVANZADA: SIN ACTIVIDADES

RETIRO Y VACIADO DE SARDINEL.

- ANDEN CALLE LLANOS: SIN ACTIVIDAD, SIN AUTORIZACIÓN DE INTERVENCIÓN POR LA ENTIDAD.
- CRA 10 CALLE 11B: EXCAVACIÓN TUBERÍAS ALCANTARILLADO.
- CALLE 12 CRA 7C: EXCAVACIÓN TUBERÍAS ALCANTARILLADO.
- CALLE 12 A CRA 8: EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURA DE CONTENCIÓN.

S.M.O
Dir. obra

INS. INTERVENTORÍA.

LUNES 28 DE JULIO 2025

* PERSONAL: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE, 1 SOCIAL, 1 AMBIENTAL, 1 SST, 2 MAESTROS, 5 OFICIALES, 10 AYUDANTES, 4 ADOCULADORES, 1 CONDUCTOR, 1 OPERARIO.
* EQUIPO: 1 MINICARGADOR, 2 MEZCLADORAS, 2 VIBRADORES, 3 PALAS, 1 PLANTA ELECTRICA, 1 COMPRESORA, HERRAMIENTA MENOR
* ACTIVIDADES: - CAMPOSTOLA: ORDEN Y ASEO.
  - AVANZADA: CONFORMACIÓN PALAS DE ANDENES.
  - ALCANTARILLAS: CONFORMACIÓN PALAS DE SARDINEL. SE DA APERTURA A LA VÍA. DE MANERA PARCIAL.
  - ENTRADA AL COLEGIO: ORDEN Y ASEO.
  - ANDENES CALLE LLANOS: SIN ACTIVIDADES. CONTINÚA ESPERA DE AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD PARA INTERVENCIÓN DE TRAMO DE ANDÉN SOLICITADO POR LA COMUNIDAD. YA SE PRESENTÓ PRESUPUESTO.
  - CRA 10 CALLE 11B: CONTINÚA ESPERA PARA CAMBIO DE TUBERÍAS DE ALCANTARILLADO. SE REALIZAN DEMOLICIONES DE ANDÉN Y EXCAVACIONES PARA CAJAS DE INSPECCIÓN.
  - CALLE 12 CRA 7C: INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR. CONTINÚA ESPERA PARA CAMBIO DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO.
  - CALLE 4 ENTRE CRAS 8 Y 9: EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS PAVIMENTO. SE ENCUENTRA TUBERÍA DOMICILIARIA DE ACUEDUCTO, SE REPORTA A AGUAS DE MANIZALES Y

SE OBSERVA LA VISITA PARA CAMBIO O MANIPULACIÓN PARA PROFUNDIZACIÓN.

- DIA SOLEADO
- SE REALIZA RECORRIDO CON EL INGENIERO FEDEY PATIÑO, APOYO A LA SUPERVISIÓN, PARA ENTREGA DE 8 NUEVOS PUNTOS EN SECTORES VILLAPINZÓN (3), LA LINDA (1), MARRUECHICO (1), ALCANZARES (1), QUINTA HISPANIA (2)
- LA INTERVENTORÍA MUESTRA SU PREOCUPACIÓN POR LA POCA PRESENCIA DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA, ESTO DEBIDO A QUE SE HAN ENTREGADO NUMEROSOS FRENTES DE OBRA Y SOLO CUENTAN CON 10 PERSONAS (AYUDANTES). ES CLARO QUE EXISTEN 2 PUNTOS "FRENADOS" POR LA DEMORA DE LA ENTIDAD PARA SOLUCIONAR EL TEMA DE SERVIDUMBRES DE ALCANTARILLADO, SIN EMBARGO, HAY OTROS FRENTES QUE SE HAN VISTO ABANDONADOS PARA SUPLIR ESTA FALENCIA DE PERSONAL AL CONCENTRARLO EN UN SOLO PUNTO.

J.M.V.O
Ppal. obra

RES. INTERVENTORÍA

MARTES 29 DE JULIO 2025

- PERSONAL: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE, 1 INSPECTOR, 1 SST, 1 AMBIENTAL, 1 SOCIAL, 2 MAESTROS, 5 OFICIALES, 11 AYUDANTES, 4 ACOMPAÑANTES, 1 CAPATAZ, 1 CONDUCTOR
- EQUIPO: 1 MINICARGADOR, 2 MEZCLADORAS, 2 VIBRADORES, 3 PLANTAS, 1 PLANTA ELECTRICA, 1 COMPACTADOR, HERRAMIENTA MENOR.
- ACTIVIDADES: - CONTRATISTA: SIN ACTIVIDADES, PERSONAL BAJANDO.
  - AVANZADA: SIN ACTIVIDADES, PERSONAL COMPLETA UNOS MESES DE ANDÉN SUPERIOR.
  - ENTRADA A COLEGIO: SE HACEN OBSERVACIONES A LOS SARDINELES CONSTRUIDOS EL PASADO SÁBADO PUESTO AQUE NO DEJARON LAS RAMPAS DE ACCESOS VEHICULARES, SE RECUERDA QUE HACER LAS RESPECTIVAS DEMOLICIONES Y RECONSTRUCCIONES PARA EL INGRESO Y SALIDA

DE LA MISMA DOC CONSTA, QUE EVIDENTEMENTE TRANSITADO POR EL PAVIMENTO UBICADO DE MODO [illegible] VIERNES 25 DE JULIO Y 2 MAS PARCIALES SUMAN 6L, SE INFORMA AL CONTRATISTA QUE LA RESPONSABILIDAD DE PROTEGER LA OBRA HASTA SU RECIBO DEFINITIVO, ES EXCLUSIVAMENTE DE ÉL Y DE ANTICIPARSE ALGUNA FALLA O ACCIDENTE QUE SEA CONSECUENCIA DE SU CULPA, ESTO POR NO CONTAR CON LA DEBIDA SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIÓN DEFICIENTE.

- ANDENES CALLE 12A: SON ACTIVIDADES LOS ANDENES AUTORIZADOS SE HAN TERMINADO, SE ESPERA AUTORIZACIÓN PARA PASO DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA PARA, SOLICITANDO QUE UNA APROBACIÓN, PARA SU INTERVENCIÓN.
- CASA DE LA VECINA: SE RECIBE NOTICIA QUE LLEGARON LOS INSTALADORES DE LA TUBERÍA Y SE PROCEDE CON LA DEMOLICIÓN DE TUBERÍA VIEJA Y EXCAVACIÓN REQUERIDA. EN HORAS DE LA TARDE INICIA EL CAMBIO.
- CALLE 12 CRA 7C: DE HORAS DE LA MAÑANA SE REALIZA EL CAMBIO DE LA TUBERÍA DE ALCANTARILLADO, SE PROCEDE CON LLENO E INSTALACIÓN DE SUMIDERO RAPIDULAR.
- CALLE 9 ENTRE 8 Y 9: EXCAVACIÓN PARA CAJA DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO, SE ENCUENTRA DURANTE LA EXCAVACIÓN UNA SUSTANCIA DE BASURAS ESCOMBROS, SUELO TIPO ARCILLA, POSTERIORMENTE SE ENCUENTRA SATURADO, SE RECOMIENDA NUEVA SUSTITUCIÓN DE LOSA CON ACERO Y PROTEGER LA OBRA CON PLÁSTICO MIENTRAS SE INSTALA Y SUELA LA SUBBASE GRANULAR.
- CALLE 12A CRA 13: SE INICIA VACIADO DEL CONCRETO SIN CUMPLIR CON LA DOSIFICACIÓN, POR LO QUE SE SUSPENDE EL VACIADO Y SE ORDENA EL RETIRO DEL CONCRETO, SE MANTIENE EL DISEÑO QUE SE HABÍA EXPLICADO AL RESIDENTE Y ENCARGADO RESPECTIVO. SE INFORMA LA SOLICITUD AL CONTRATISTA DE NO EJECUTAR ACTIVIDADES DE CONCRETO SIN LA AUTORIZACIÓN PREVIA DE LA INTERVENTORÍA. SE REALIZA VACIADO DE LA RAMPA DE ACCESO A LA IGLESIA, NIVELANDO CON MALLA

ELECTROSOLDADA.

- CALLE 31 CARR 12, CUARTO PASAJE, ESCALAS: SE REALIZA INSTALACIÓN DE RAMPLON EN EL TRAMO DE LAS ESCALAS, QUEDA PENDIENTE ACTIVIDADES DE PINTURA Y CONTINUAR CON EL TRAZADO DEFINIDO CON LA SUPERVISIÓN EN LA PARTE ALTA DE LAS ESCALAS Y AL FINAL DEL PASAJE.

EN RECORRIDO REALIZADO CON EL INGENIERO FERNEY PATIÑO INDICÓ QUE TODOS LOS VADOS DEBEN SER REFORZADOS CON MALLA ELECTROSOLDADA Y ACCESOS VEHICULARES, CON DOBLE MALLA. COMENTA QUE ESTA INSTRUCCIÓN SE HABÍA REALIZADO DESDE EL RECORRIDO INICIAL

* DIEZ SOLEADO

Mgs. INTERVENTORÍA.

Ing. obra

MIERCOLES 30 DE JULIO 2025

* PERSONAL: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE, 1 INSPECTOR, 1 SST, 1 SOCIAL, 1 AMBIENTAL, 2 MAESTROS, 5 OFICIALES, 11 AYUDANTES, 1 CONDUCTOR, 1 OPERARIO, 4 RECUADRADAS.
* EQUIPO: 1 MINICARGADOR, 2 RETROEXCAVADORAS, 2 VIBRADORES, 1 PLANTA ELECTRICA, 1 COMPACTADORA, 3 RANAS, 1 DENTIN, HERRAMIENTA MENOR.
* ACTIVIDADES: - COMPOSTELA: SIN ACTIVIDADES.
- ALVARADA: SIN ACTIVIDADES
- REGRESO A COLEGIO: SIN ACTIVIDADES: SE CONTINUA SEÑALIZACIÓN.
- ANDENES CALLE LARGA: EN HORAS DE LA TARDE SE RECIBE AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN PARA APERTURA DE OTRO TRAMO DE ANDÉN SOLICITADO POR PROPIETARIA EN ESQUINA CALLE 12A CRA 8.
- CASA DE LA CULTURA: SE REALIZA CAMBIO FALTANTE POR PARTE DE CONTRATISTA DE AGUAS DE MANIZALES, INSTALAN 2 TUBOS DE 6" Y UNA SILLETA DE 4"x6", SE CONSTRUYEN CAJAS DE INSPECCIÓN SOLICITADAS SOBRE ANDÉN, SE [illegible] SE RECOGIENDA

PRESENCIA DE PIEDRAS QUE PUEDEN ROMPER LAS TUBERÍAS, EN CASO DE DAÑO ESTAS, DEBEN SER REPUESTO A COSTAS DE ÉL.
- CALLE 12 CRA 7C: INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR, EXCAVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CAJA DOMICILIARIA
- CRA 9 ENTRE 8 Y 9: INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR.
- CALLE 12A CRA 13: VACIADO DE ANDÉN Y MUNDETO NO REFORZADO CON ACERO DE 1/2".
- CALLE 31 CRA 12 - CUARTO PASAJE - GALAN: INICIAN ACTIVIDAD DE PINTURA EN BARANDA INSTALADA.
* DÍA SOLEADO.

RES. INTERVENTORÍA.

SMLO
R-S. Obra

JUEVES 31 DE JULIO 2025
* PERSONAL: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE, 1 INSPECTOR, 1 AMBIENTAL, 1 SOCIAL, 1 SST, 2 MAESTROS, 11 AYUDANTES, 1 CONDUCTOR, 4 OPERADORES.
* EQUIPO: 1 MINICARGADORES, 1 BONITON, 3 RANAS, 1 CONTADORA, 1 PLANTA ELECTRICA, 2 VIBRADORES, 2 COMPACTADORAS, HERRAMIENTA MENOR.
* DÍA SOLEADO; LLUVIAS EN LA NOCHE
* ACTIVIDADES: - COMPOSTELA: SIN ACTIVIDADES, FALTA INSTALACIÓN DE BARANDA, CONTINÚA ESPERA DE VISITA DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD PARA DEFINIR SEÑALIZACIÓN PREVIO A LA APERTURA OFICIAL DE LA VÍA.
- SAN IGNACIO: SIN ACTIVIDADES, PENDIENTE COMPLETAR ESPESOR ATRAS DE ANDÉN SUPERIOR.
- CALLE 10 # 123-43 (CONTIGUO COLEGIO): DEMOLICIÓN PARA CORRECCIÓN DE RAMPAS VEHICULARES. SE NOTIFICA AL CONTRATISTA REALIZAR COMPLETAMIENTO DEL ASEO DE LA ZONA.
- CRA 7C CALLE 123 (ANDENES CALLE IMSA): INICIA DEMOLICIÓN DE ANDÉN UBICADO EN CALE 123 CRA 8.
- CRA 10 CALLE 11B: INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR.

EL CONTRATISTA REALIZARA PASO VEHICULAR SOBRE LA SUBBASE GRANULAR, SE DA VISTO BUENO PARA ESTO EN PRO DE IDENTIFICAR POSIBLES FALLOS EN LA SUBRASANTE DEBIDO A SUELOS ENCONTRADOS, SIN EMBARGO, SE HACE LA OBSERVACION ACERCA DE LAS TUBERIAS INSTALADAS, EL PASO DE LAS BUSETAS PODRIA ROMPERLAS, EN CASO DE DAÑO ASI, DEBE SER REPARADO A COSTAS DE EL.

- CALLE 12 CRA 7C: INSTALACION DE SUBBASE GRANULAR, SE ADECUAN RAMPAS DE ACCESO CON SUBBASE PARA PASO VEHICULAR, SE REALIZA SOCIALIZACION DEL PVET, SE INICIA DESCAPOTE DE COTA CARRIL. EL CONTRATISTA HABILITA EL PASO VEHICULAR SOBRE LA SUBBASE, SE DA VISTO BUENO PARA ESTO EN PRO DE IDENTIFICAR POSIBLES FALLOS EN LA SUBRASANTE DEBIDO A LOS SUELOS ENCONTRADOS, SIN EMBARGO, SE HACE LA OBSERVACION ACERCA DE LAS TUBERIAS INSTALADAS, EL PASO DE VEHICULOS PODRIA ROMPERLAS, EN CASO DE DAÑO ASI, DEBE SER REPARADO A COSTAS DE EL.
- CALLE 9 CRAS 8 Y 9: INSTALACION Y COMPACTACION DE SUBBASE GRANULAR.
- CALLE 12A CARRIL 3: SIN ACTIVIDADES.
- CALLE 31 CARRIL 4 CARRIL RASAJE: CONTINUAN ACTIVIDADES DE PINTURA EN BARANDA INSTALADA.

SE SOLICITA AL CONTRATISTA REALIZAR ORDEN Y ASEO EN LOS DIFERENTES FRENTES, ASI MISMO SE SOLICITA QUE ESTA ACTIVIDAD SEA COTIDIANA Y NO SOLO CUANDO SE REALICE LA INTERVENTORIA. SE INSTA AL CONTRATISTA A INICIAR NUEVOS FRENTES DE OBRA, PUES EL PLAZO CONTRACTUAL DISMINUYE RAPIDAMENTE Y NO SE APRECIA SUFICIENTE EJECUCION PARA CUMPLIR CON EL CONTRATO SUSCRITO LA ALCALDIA DE MANIZALES.

S.V.O.

Res. Obra

RESIDENTE INTERVENTORIA

VIERNES 01 DE AGOSTO 2025

* PERSONAL: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE, 1 INSPECTOR, 1 AMBIENTAL, 1 SOCIAL, 1 SST, 2 MAESTROS, 5 OFICIALES, 11 AYUDANTES, 4 ALBAÑILES, 1 CONDUCTOR, 2 OPERARIOS.
* EQUIPO: 2 RETROEXCAVADORAS, 2 MEZCLADORAS, 2 VIBRADORES, 1 PLANTA ELECTRICA, 3 MARAS, 1 BOMBIN, 1 COMPACTADORA, HERRAMIENTA MENOR
* DÍA SOLICITADO:
* ACTIVIDADES: - CONSTRUCTORA: SIN ACTIVIDADES. SE REALIZA RECORRIDO EN COMPAÑÍA DEL CONTRATISTA FERNEY PATIÑO (APOYO A LA SUPERVISIÓN) WILLIAM PEREZ (SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA), JUAN DAVID ARANGO ARIAS (SECRETARÍA DE MOVILIDAD), CONSTATAR SE INDICA QUE POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD SE INSTALARÁ LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL QUE CONSTA DE: AL INICIO DEL TRAMO FLECHAS QUE INDICAN LA REDUCCIÓN DE LA CALZADA, AL FINAL DEL TRAMO UNA CEBRA Y UN PARE. A CARGO DEL CONTRATO DE OBRA AUTORIZAN LA INSTALACIÓN DE DOS SEÑALES VERTICALES, AL INICIO DEL TRAMO LA SEÑAL DE REDUCCIÓN DE CALZADA AL LADO IZQUIERDO SOBRE EL POSTE DE CONCRETO EXISTENTE Y AL FINAL DEL TRAMO UNA SEÑAL DE PARE AL LADO DERECHO.
SE REALIZA RECORRIDO CON EL CONTRATISTA PATIÑO PARA REVISAR DETALLES PREVIO AL RECIBO DE LA OBRA CONSTRUIDA, ENCONTRANDOSE QUE AÚN LES FALTAN COSAS PARA TERMINAR, ANCLAJES DE SARDINELES, CORTE DE PAVIMENTO EN LA PARTE ALTA, INSTALACIÓN DE SELLO EN EL CORTE QUE SE CONSTRUYÓ, LAS ESCALAS CONSTRUIDAS (2), ELEMENTALIDAD EN LA PARTE BAJA, JUNTO A LA AVENIDA Y LA INSTALACIÓN DE LA BARANDA. ENTRE OTROS DETALLES PEQUEÑOS.
- AVANZADA: SIN ACTIVIDADES.
- CALLE 10 # 129-43: SIN ACTIVIDADES. SE SOLICITA COMPLEMENTAR EL ASEO DE LA ZONA Y REALIZAR LOS ANCLAJES NECESARIOS DE LOS SARDINELES Y LIMPIEZA DE LAS JUNTAS CON GRAMA O CEPILLO DE ACERO
- CRA 7C CALLE 128: EXCAVACIÓN E INSTALACIÓN DE APOYAN

EN ANDÉN UBICADO EN CALLE 12B CRA 8, AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN.

- CRA 10 CALLE 11B: INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR, SE CONSTRUYEN LAS TAPAS PARA LAS CAJAS DE INSPECCIÓN, SE SOLICITA LA CORRECCIÓN DE LAS CAÑUELAS CONSTRUIDAS.
- CALLE 12 CRA 7C: FINALIZA DEMOLICIÓN DEL TRAMO AUTORIZADO. CON EL DESVIO VEHICULAR SE EMPIEZAN A IDENTIFICAR FALLOS DE LA SUBRASANTE, TIPO PIEL DE COCODRILO Y ACOLCHONAMIENTO), LO QUE SUPONE HUMEDAD Y BAJA CAPACIDAD PORTANTE DEL SUELO, CONTINUARÁ LA INSPECCIÓN MIENTRAS SE PROCEDE CON LAS ACTIVIDADES DEL TRAMO DEMOLIDO.
- CALLE 9 ENTRE 8 Y 9: INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR. EL CONTRATISTA HABILITA PASO VEHICULAR SOBRE LA SUBBASE INSTALADA, SE DA VISTO BUENO EN PO DE IDENTIFICAR POSIBLES FALLOS EN LA SUBRASANTE DEBIDO A LOS SUELOS ENCONTRADOS, SIN EMBARGO, SE HACE LA OBSERVACIÓN ACERCA DE LAS TUBERÍAS DEL SECTOR, EL PASO DE LAS RUSETAS PODRÍA ROMPERLAS, EN CASO DE DAÑO A ESTAS, DEBE SER REPARADA A COSTAS DE ÉL.
- CALLE 12A CRA 13: SIN ACTIVIDADES: SE SOLICITA REALIZAR UN BARRIDO COMPLETO POR LA PRESENCIA DE POLVO QUE PUEDE GENERAR CAIDA DE PERSONAS. SE VISITA EL PUNTO CON EL INGENIERO RATIÑO, SE APRECIA UNA OBRA BIEN TERMINADA Y SE INDICAN ALGUNOS CORTES FALTANTES. FALTA INSTALAR LA BARANDA.
- CALLE 31 CRA 12: SIN ACTIVIDADES TECNICAS.

SE NOTIFICA AL CONTRATISTA REALIZAR ORDEN Y ASEO EN LOS DIFERENTES FRENTES, SE SOLICITA INGRESO DE POR LO MENOS UNA MUJER A LA MANO OBRA NO, POR NORMA Y OBLIGACIÓN CONTRACTUAL, SE REQUIERE CONTRATAR UNA MUJER POR CADA 10 HOMBRES, SE HACE ÉNFASIS EN QUE CON EL INGRESO

DEL PERSONAL, SE ESCUCHAN LOS COMENTARIOS QUE SI NO RECIBEN EL PAGO DE LA QUINCENA EN LO QUE QUEDA DEL DÍA, MAÑANA NO TRABAJARÁN.

RES. INTERVENTORÍA.

RES. OBRA

SÁBADO 02 DE AGOSTO 2025

* PERSONAL: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE, 2 MAESTROS, 3 OFICIALES, 1 SST, 1 AMBIENTAL, 1 SOCIAL, 2 INSPECTOR, 1 CONDUCTOR, 2 PEONES, 4 ROSCADORES, 6 AYUDANTES.
* EQUIPO: 2 MINICARGADORES, 2 PLANAS, 1 BONITO, 2 MOTOSIERRAS, 2 VIBRADORES, HERRAMIENTA MENOR, 1 CORTADORA, 1 PLANTA ELECTRICA.
* MAÑANA SOLEADA, LLUVIA CUARTO DE HORAS DE LA TARDE
* ACTIVIDADES: - COMPOSTELA: SIN ACTIVIDADES.
  - AVANZADA: SIN ACTIVIDADES
  - CALLE 10 # 12B-48: SIN ACTIVIDADES. SE SOLICITA COMPLETAR EL ASEO DE LA ZONA Y NIVELAR LOS ASENTOS NECESARIOS EN LOS SUMIDEROS Y LIMPIEZA DE LAS 10 PAS.
  - CRA 7C CALLE 12B: INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE ADOQUIN.
  - CRA 10 CALLE 11B: SIN ACTIVIDADES
  - CALLE 12 CRA 7C: RETIRO DE MATERIAL DE DEMOLICIÓN
  - CRA 9 ENTRE 8 Y 9: DEMOLICIÓN DE CANAL DERECHO, SENTIDO CRA 8 A 9. RETIRO DE MATERIAL DEMOLIDO.
  - CALLE 12 CRA 13: SIN ACTIVIDADES
* SE NOTIFICA AL CONTRATISTA REALIZAR LIMPIEZA Y ASEO DE LOS FRENTES INTERVENIDOS.
* FALTA PERSONAL ADMINISTRATIVO, AL PARECER POR FALTA DE PAGO DE LA QUINCENA ANUNCIO EL DIRECTOR DE OBRA INDICA QUE SE HAN REALIZADO A TIEMPO.

RES. INTERVENTORÍA.
