K&J T.I. & CONSTRUCCIONES S.A.S.
N.I.T.: 901450685-3
Régimen Común

INFORME PARCIAL DEL CONTRATO CO1.PCCNTR.8144146

OBJETO

CONTRATAR LA INSTALACIÓN DE REJAS DE SEGURIDAD, PELÍCULA ADHESIVA MICROPERFORADA, LIMPIEZA DE FACHADA Y OTROS DETALLES ELÉCTRICOS Y DE MUROS EN LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE MEDELLÍN ZONA SUR



CO1.PCCNTR.8144146

01 de septiembre 2025
MEDELLÍN CUNDINAMARCA

Correo: soporte.ticonstrucciones@gmail.com
No. Cel.: 312 5356 383
Dirección: CR 11 A 7 B 126, Melgar Tolima

K&J T.I. & CONSTRUCCIONES S.A.S.
N.I.T.: 901450685-3
Régimen Común

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO	CO1.PCCNTR.8144146
INFORME	PARCIAL
CONTRATANTE	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
CONTRATISTA	K&J TI & CONSTRUCCIONES SAS
OBJETO	CONTRATAR LA INSTALACIÓN DE REJAS DE SEGURIDAD, PELÍCULA ADHESIVA MICROPERFORADA, LIMPIEZA DE FACHADA Y OTROS DETALLES ELÉCTRICOS Y DE MUROS EN LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE MEDELLÍN ZONA SUR.
VALOR DEL CONTRATO	$ 17.131.698,35
LOCALIZACIÓN	Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín Zona Sur Carrera 48 No. 24 - 46
FECHA DE INICIO	05 de agosto 2025
FECHA DE EJECUCIÓN	05 de septiembre 2025
SUPERVISOR	JHONSON MARTINEZ MONTOYA
INTERVENTOR	N/A

K&J T.I. & CONSTRUCCIONES S.A.S.
N.I.T.: 901450685-3
Régimen Común

PRESUPUESTO

FORMATO OFERTA ECONÓMICA						
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UN**	**CANT**	**VR. UNITARIO OFERTADO**	**SUBTOTAL**	**VALOR CAPÍTULO**
1	**PRELIMINARES**					**$ 120,000.00**
1.3	DESMONTE DE MURO EN DRYWALL	m²	10.00	$ 12,000.00	$ 120,000.00	
2	**CARPINTERIA METALICA**					**$ 8,733,000.00**
2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PELICULA MICROPERFORADA CON LOGOS INSTITUCIONALES	m²	51.00	$ 32,000.00	$ 1,632,000.00	
2.2	REJA TIPO BANCO	m²	45.00	$ 155,600.00	$ 7,002,000.00	
2.3	CERRADURA DE SEGURIDAD PARA OFICINA	Und	1.00	$ 99,000.00	$ 99,000.00	
3	**MUROS**					**$ 998,000.00**
3.1	MURO PANEL YESO DOBLE CARA E=12CM. Incluye terminado en pintura tipo 1 de alta calidad	m²	10.00	$ 99,800.00	$ 998,000.00	
4	**CONCRETOS Y MORTEROS**					**$ 160,000.00**
4.1	PAÑETE MUROS 1:3 E=3CM. Incluye filos y dilataciones	m²	5.00	$ 32,000.00	$ 160,000.00	
5	**FACHADAS**					**$ 2,338,300.00**
5.1	LAVADO DE FACHADA E HIDRÓFUGO	m²	70.00	$ 25,690.00	$ 1,798,300.00	
5.2	LAVADO DE FACHADA	m²	45.00	$ 12,000.00	$ 540,000.00	
6	**RED ELÉCTRICA**					**$ 834,000.00**
6.1	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA RED NORMAL. Promedio 5 ml	Und	15.00	$ 55,600.00	$ 834,000.00	
TOTAL COSTOS DIRECTOS						**$ 13,183,300.00**
	ADMINISTRACIÓN				**$ 0.23**	**$ 3,032,159.00**
	IMPREVISTOS				**$ 0.01**	**$ 131,833.00**
	UTILIDAD				**$ 0.05**	**$ 659,165.00**

Correo: soporte.ticonstrucciones@gmail.com
No. Cel.: 312 5356 383
Dirección: CR 11 A 7 B 126, Melgar Tolima

	IVA SOBRE LA UTILIDAD	$ 0.19	$ 125,241.35
VALOR TOTAL OBRA			$ 17,131,698.35

ACTIVIDADES EJECUTADAS A LA FECHA.

1.3. DESMONTE DE MURO EN DRYWALL.

Cantidad

unidad	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada
m^2	10	10

Localización
Fachada de comedor.

Causa
Daño por humedad, afectación de canal pluvial.

Registro fotográfico
Antes



Durante



2.2. REJA TIPO BANCO

Cantidad

unidad	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada
m^2	45	48

Con el fin de adecuar el diseño, solicitado por la entidad, el consumo de material y mano de obra e cuadrilla soldador, se aumento en 3 m^2, como acuerdo.

Localización

Fachada de comedor.

Causa

Ingreso forzado, zona de ingreso para robos anteriormente, alta inseguridad en la zona

Registro fotográfico

Antes


11 ago 2025 14:55:56
6,2272N 75,5750W ±2,50m
El Poblado
Medellín
Antioquia
Altitud:1595.2msnm
Velocidad:1.5km/h
#K&J T.I CONSTRUCCIONES


11 ago 2025 14:56:42
6,2271N 75,5750W ±2,00m
20 - 115 Carrera 48
El Poblado
Medellín
Antioquia
Altitud:1560.0msnm
Velocidad:1.5km/h
#K&J T.I CONSTRUCCIONES

Durante


16 ago 2025 16:07:21
6,2273N 75,5746W ±8,10m
24-96 Carrera 48
El Poblado
Medellín
Antioquia
Altitud:1466.5msnm
Velocidad:0.0km/h
#K&J T.I CONSTRUCCIONES


16 ago 2025 16:15:20
6,2274N 75,5748W ±8,10m
24-56 Carrera 48
El Poblado
Medellín
Antioquia
Altitud:1558.7msnm
Velocidad:0.0km/h
#K&J T.I CONSTRUCCIONES


17 ago 2025 4:02:57
6,2270N 75,5745W ±62,25m
24-106 Carrera 48
El Poblado
Medellín
Antioquia
Altitud:1507.1msnm
#K&J T.I CONSTRUCCIONES


17 ago 2025 1:42:43
6,2272N 75,5747W ±5,60m
106 Carrera 48
El Poblado
Medellín
Antioquia
Altitud:1565.7msnm
Velocidad:0.9km/h
#K&J T.I CONSTRUCCIONES

2.2. CERRADURA DE SEGURIDAD PARA OFICINA

Cantidad

unidad	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada
UND	1	1

Localización

Puerta principal del ordenador de gasto publico

Causa

Durante la instalación de la puerta en vidrio templado 10 mm, omitieron la apertura de los orificios para la cerradura, dado que la puerta es corrediza, no es posible una cerradura sobre el vidrio, si no en el perfil inferior con empotramiento al piso.

Registro fotográfico

Antes



3.1 MURO PANEL YESO DOBLE CARA E=12CM. Incluye terminado en pintura tipo 1 de alta calidad

Cantidad


unidad	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada
m^2	10	10

La cara interna del muro se instaló DRYWALL, y en la exterior que se encuentra expuesta a la intemperie se recomendó super board 4 mm, con estuco plástico para las juntas.

Localización
Fachada de comedor.

Causa
Area desmontada.

Registro fotográfico
Antes

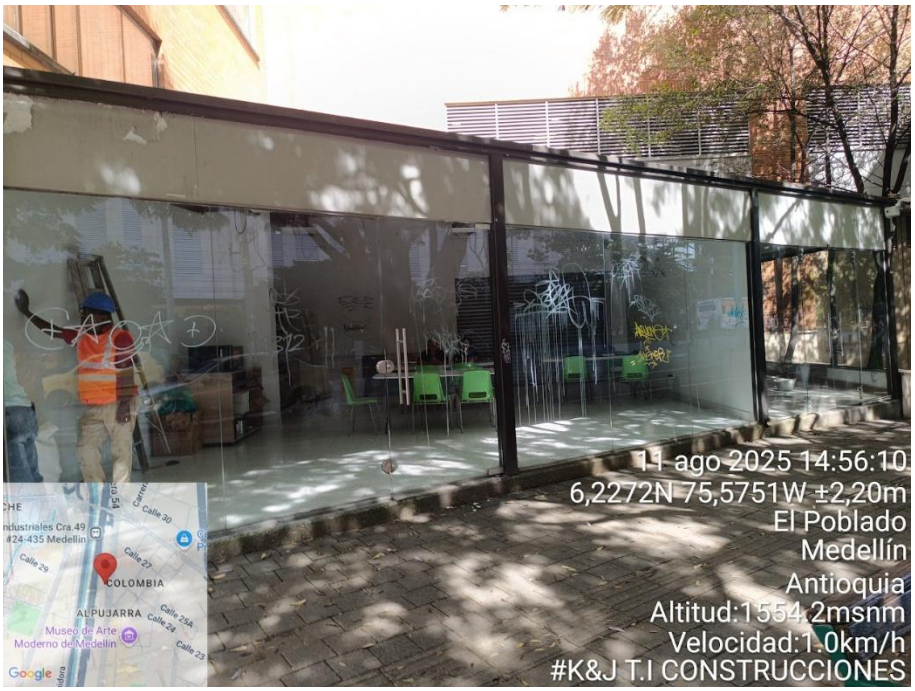



Después



Correo: soporte.ticonstrucciones@gmail.com
No. Cel.: 312 5356 383
Dirección: CR 11 A 7 B 126, Melgar Tolima

4.1 PAÑETE MUROS 1:3 E=3CM. Incluye filos y dilataciones

Cantidad

unidad	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada
m^2	5	5

La cara interna dell muro se instalo DRYWALL, y en la exterior que se encuentra expuesta a la intemperie se recomendó super board 4 mm, con estuco plástico para las juntas.

Localización
Comedor

Causa
Humedad y raíces de árbol

Registro fotográfico
Antes





Durante



Después



Correo: soporte.ticonstrucciones@gmail.com
No. Cel.: 312 5356 383
Dirección: CR 11 A 7 B 126, Melgar Tolima



5.1 LAVADO DE FACHADA E HIDRÓFUGO

Cantidad

unidad	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada
m^2	70	95

Se realizo la limpieza ladrillo y piedra muñeca presente, la cantidad inicial era solo de ladrillo, pero la entidad solicito realizar el lavado y aplicación de hidrófugo, sobre la piedra muñeca.

Localización


Fachada de la edificación.

Causa

Protestas sociales, baja iluminación e inseguridad en las calles, uso como punto de descanso de personal indigente.

Registro fotográfico

Antes

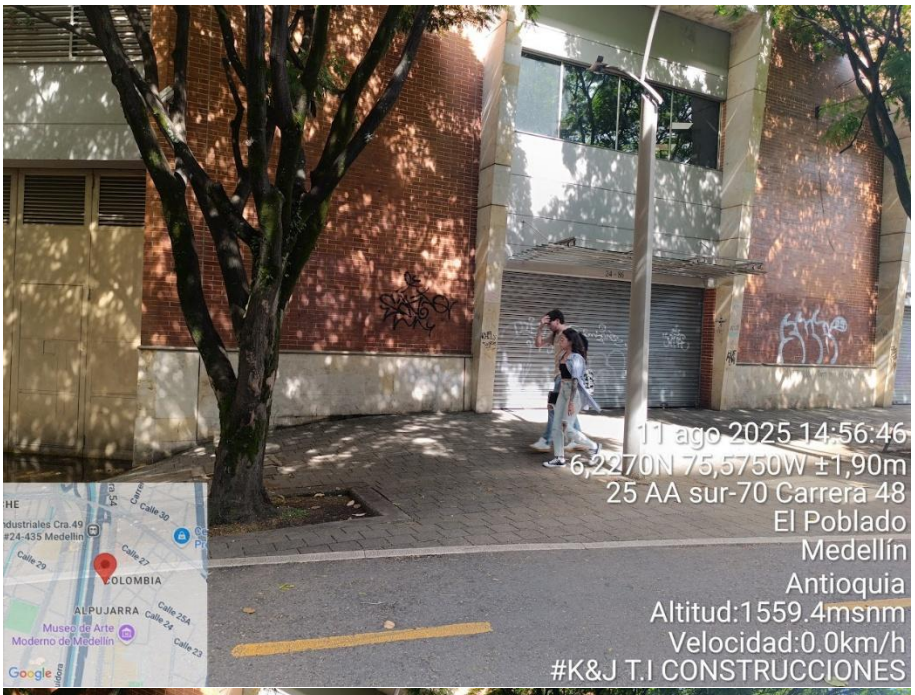




11 ago 2025 14:57:08
6,2269N 75,5749W ±1,90m
25 AA sur-70 Carrera 48
El Poblado
Medellín
Antioquia
Altitud:1564.8msnm
Velocidad:2.0km/h
#K&J T.I CONSTRUCCIONES



11 ago 2025 14:57:35
6,2268N 75,5751W ±3,60m
76 Carrera 48
El Poblado
Medellín
Antioquia
Altitud:1563.5msnm
Velocidad:0.3km/h
#K&J T.I CONSTRUCCIONES

Durante


12 ago 2025 19:25:40
6,2270N 75,5753W ±7,00m
24-86 Carrera 48
El Poblado
Medellín
Antioquia
Altitud:1513.4msnm
Velocidad:0.7km/h
#K&J T.I CONSTRUCCIONES


12 ago 2025 19:26:02
6,2271N 75,5754W ±2,20m
20 - 115 Carrera 48
El Poblado
Medellín
Antioquia
Altitud:1493.0msnm
Velocidad:0.0km/h
#K&J T.I CONSTRUCCIONES


12 ago 2025 19:26:39
6,2269N 75,5752W ±2,10m
25 AA sur-70 Carrera 48
El Poblado
Medellín
Antioquia
Altitud:1526.4msnm
Velocidad:0.0km/h
#K&J T.I CONSTRUCCIONES
COLOMBIA
ALPUJARRA
Museo de Arte Moderno de Medellín

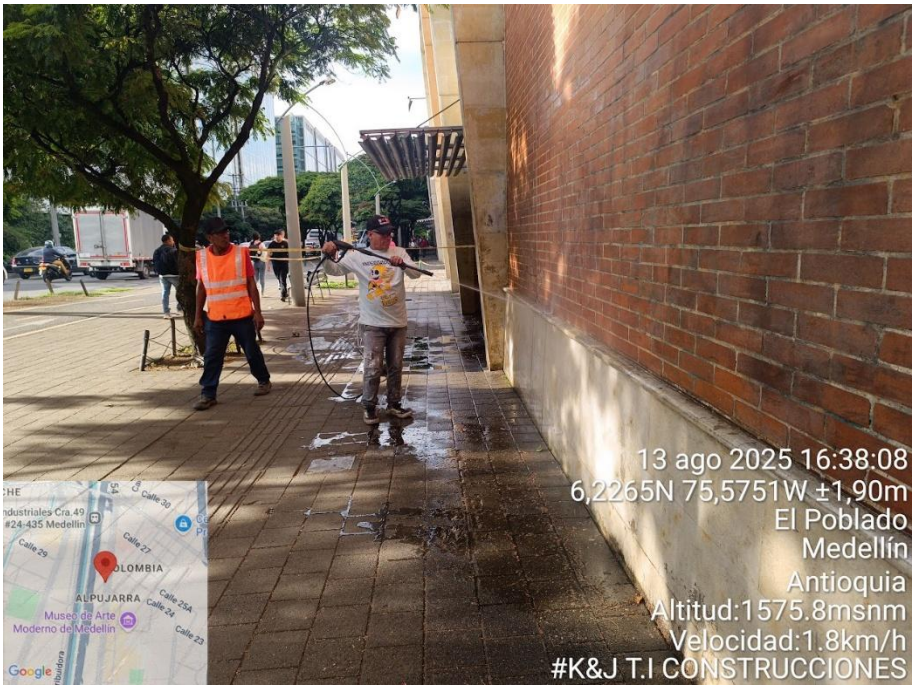
13 ago 2025 16:38:08
6,2265N 75,5751W ±1,90m
El Poblado
Medellín
Antioquia
Altitud:1575.8msnm
Velocidad:1.8km/h
#K&J T.I CONSTRUCCIONES

Después


BRONCO
MAPEI
BRONCOHIDRÓFUGO
Hidrófugo transparente
www.mapei.com/co
14 ago 2025 11:41:07
6,2267N 75,5753W ±5,40m
48-15 Calle 24
El Poblado
Medellín
Antioquia
Altitud:1524.1msnm
Velocidad:1.4km/h
#K&J T.I CONSTRUCCIONES


14 ago 2025 11:40:56
6,2267N 75,5753W ±6,50m
48-15 Calle 24
El Poblado
Medellín
Antioquia
Altitud:1461.0msnm
Velocidad:2.0km/h
#K&J T.I CONSTRUCCIONES


13 ago 2025 16:36:16
6,2271N 75,5749W ±4,50m
20 - 115 Carrera 48
El Poblado
Medellín
Antioquia
Altitud:1603.6msnm
Velocidad:0.3km/h
#K&J T.I CONSTRUCCIONES
COLOMBIA
ALPUJARRA
Museo de Arte Moderno de Medellín
Google





5.2 LAVADO DE FACHADA

Cantidad

unidad	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada
m^2	45	45

Localización

Fachada de comedor

Causa

Grafitis por protestas sociales, baja iluminación e inseguridad en las calles, uso como punto de descanso de personal indigente.

Registro fotográfico

Antes


11 ago 2025 14:55:56
6,2272N 75,5750W ±2,50m
El Poblado
Medellín
Antioquia
Altitud:1595.2msnm
Velocidad:1.5km/h
#K&J T.I CONSTRUCCIONES
COLOMBIA
ALPUJARRA
Museo de Arte Moderno de Medellín
Google


11 ago 2025 14:56:26
6,2271N 75,5751W ±2,20m
20 - 115 Carrera 48
El Poblado
Medellín
Antioquia
Altitud:1557.4msnm
Velocidad:1.9km/h
#K&J T.I CONSTRUCCIONES
COLOMBIA
ALPUJARRA
Museo de Arte Moderno de Medellín
Google


11 ago 2025 14:56:42
6,2271N 75,5750W ±2,00m
20 - 115 Carrera 48
El Poblado
Medellín
Antioquia
Altitud:1560.0msnm
Velocidad:1.5km/h
#K&J T.I CONSTRUCCIONES

Durante


12 ago 2025 9:48:12
6,2272N 75,5748W ±54,99m
24- 104 Carrera 48
El Poblado
Medellín
Antioquia
Altitud:1507.3msnm
#K&J T.I CONSTRUCCIONES


12 ago 2025 11:32:53
6,2267N 75,5750W ±4,90m
El Poblado
Medellín
Antioquia
Altitud:1571.4msnm
Velocidad:0.0km/h
#K&J T.I CONSTRUCCIONES

Después





ÍTEMS NO PREVISTOS CRÍTICOS

Para la ejecución de los ítems 1.3, 2.2, 3.1 y 4.1, se realizaron trabajos adicionales no previstos en la zona de comedor, con la aprobación de la entidad debido a problemas detectados. El estado de la cubierta presentaba deficiencias por falta de mantenimiento preventivo y correctivo en elementos como las tejas, el canal y los bajantes; se evidenció que el tiempo sin mantenimiento impedía garantizar la durabilidad de los ítems contractuales, motivo por el cual la entidad autorizó su intervención. Esta información se ampliará posteriormente.

NP1. LIMPIEZA DE CUBIERTA, COMEDOR, INCLUYE RECOLECCIÓN DE MATERIAL VEGETAL

Cantidad

unidad	Cantidad ejecutada
m^2	78

Localización
Cubierta de comedor

Causa
Acumulación de material vegetal (hojas y ramas), material particulado y basura arrogada desde la calle.


Registro fotográfico
Antes




Durante





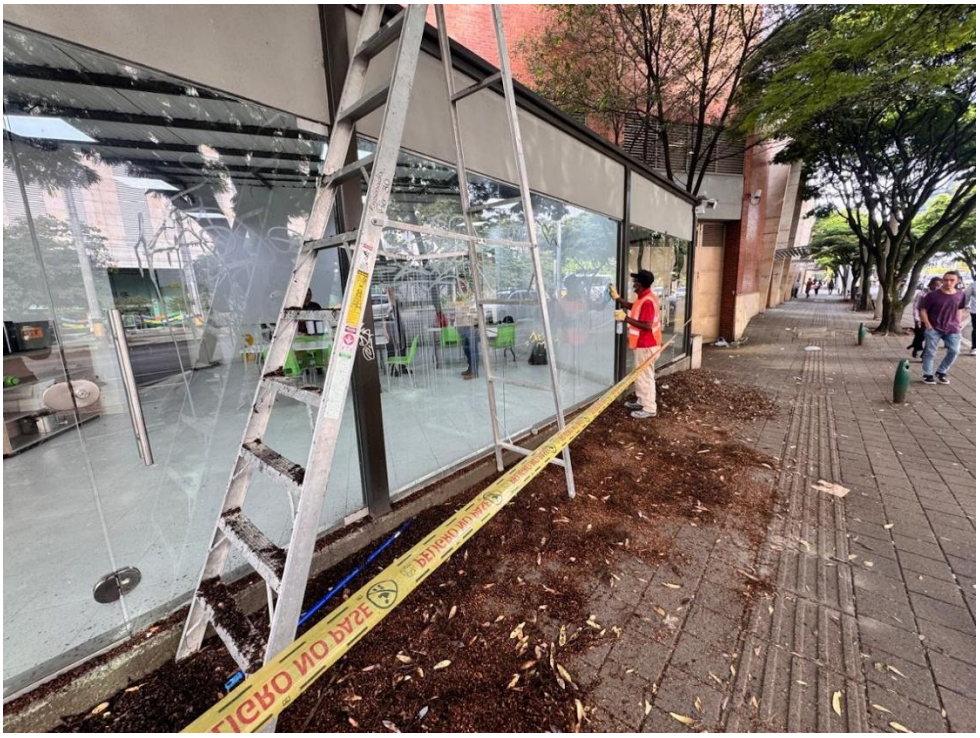

Después

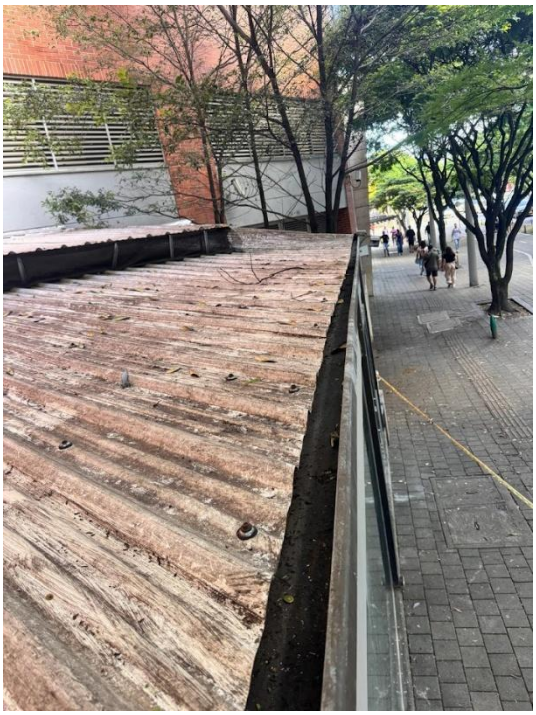

Correo: soporte.ticonstrucciones@gmail.com
No. Cel.: 312 5356 383
Dirección: CR 11 A 7 B 126, Melgar Tolima

NP2. SONDEO DE BAJANTES DE AGUAS PLUVIALES

Cantidad

unidad	Cantidad ejecutada
m^2	6

Localización

Cubierta de comedor

Causa

Acumulación de material vegetal (hojas y ramas), material particulado y basura arrogada desde la calle.

Registro fotográfico

Antes







Durante



Correo: soporte.ticonstrucciones@gmail.com
No. Cel.: 312 5356 383
Dirección: CR 11 A 7 B 126, Melgar Tolima

Después

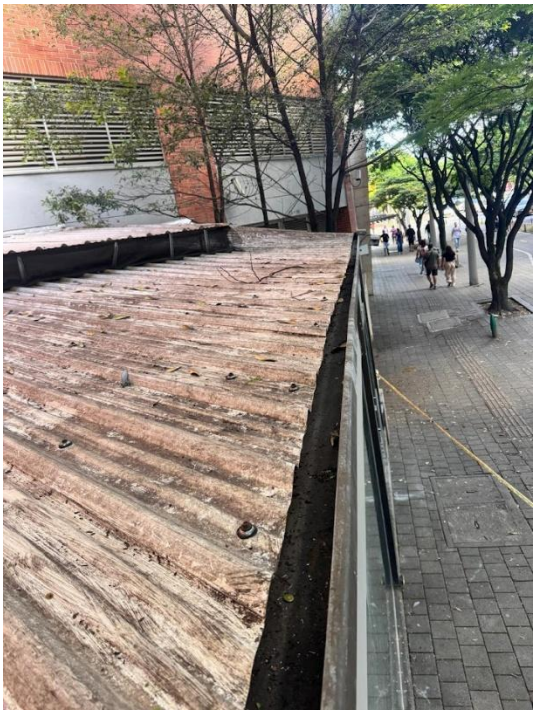

NP3. LIMPIEZA DE CANAL, INCLUYE RECOLECCIÓN DE MATERIAL VEGETAL

Cantidad

unidad	Cantidad ejecutada
m	12.2

Localización

Canal cubierta de comedor

Causa

Acumulación de material vegetal (hojas y ramas), material particulado y basura arrogada desde la calle.

Registro fotográfico

Antes



Correo: soporte.ticonstrucciones@gmail.com
No. Cel.: 312 5356 383
Dirección: CR 11 A 7 B 126, Melgar Tolima





Durante



Correo: soporte.ticonstrucciones@gmail.com
No. Cel.: 312 5356 383
Dirección: CR 11 A 7 B 126, Melgar Tolima

Después

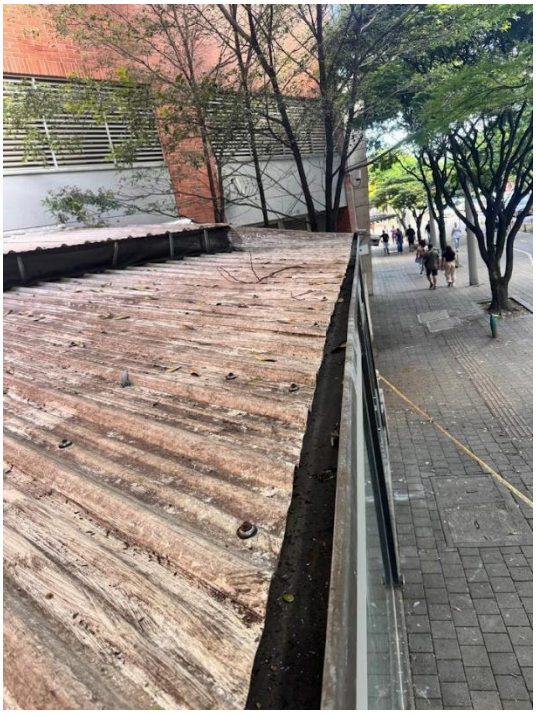

NP4. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE DE 3 PULGADAS EN TUBERÍA PVC-S, INCLUYE, ACCESORIOS Y CORTE DE TUBERÍA METÁLICA

Cantidad

unidad	Cantidad ejecutada
m	3

Localización

Canal de cubierta de comedor

Causa

La canal contaba con solo dos bajantes de 3”, lo cual no era suficiente debido a la acumulación del material vegetal y basura presente en la cubierta.


Registro fotográfico

Antes


11 ago 2025 14:56:09
6,2272N 75,5751W ±2,20m
El Poblado
Medellín
Antioquia
Altitud:1555.1msnm
Velocidad:1.0km/h
#K&J T.I CONSTRUCCIONES

Después


BAJANTE
NUEVA

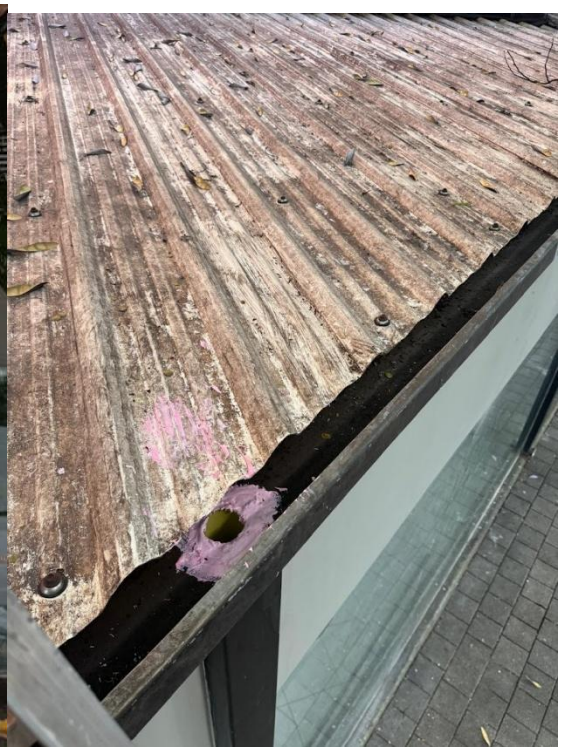

NP5. ESTRUCTURA METÁLICA PARA FIJACIÓN DE REJA TIPO BANCARIA

Cantidad

unidad	Cantidad ejecutada
m	15.60

Localización

Fachada interna comedor parte superior

Causa

La reja bancaria requiere una estructura metálica superior como soporte. La estructura existente no está diseñada para fijar un elemento interno de este tipo.

Registro fotográfico

Antes



Durante





Después

Correo: soporte.ticonstrucciones@gmail.com
No. Cel.: 312 5356 383
Dirección: CR 11 A 7 B 126, Melgar Tolima





Correo: soporte.ticonstrucciones@gmail.com
No. Cel.: 312 5356 383
Dirección: CR 11 A 7 B 126, Melgar Tolima

NP6. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CANAL PLUVIAL, ZONA COMEDOR

Cantidad

unidad	Cantidad ejecutada
Und	1

Localización

Canal de comedor

Causa

La canal, presenta una mala instalación de manto asfaltico, filtración en la tapa del mismo canal.

Registro fotográfico

Antes



Después



NP7. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PELÍCULA SANDBLASS

Cantidad

unidad	Cantidad ejecutada
m^2	18.72

Localización

Fachada de comedor

Causa

Moderar el área visible en zonas de fechada, sin dañar la estética de esta.

Registro fotográfico

Antes




Durante



Correo: soporte.ticonstrucciones@gmail.com
No. Cel.: 312 5356 383
Dirección: CR 11 A 7 B 126, Melgar Tolima



Después

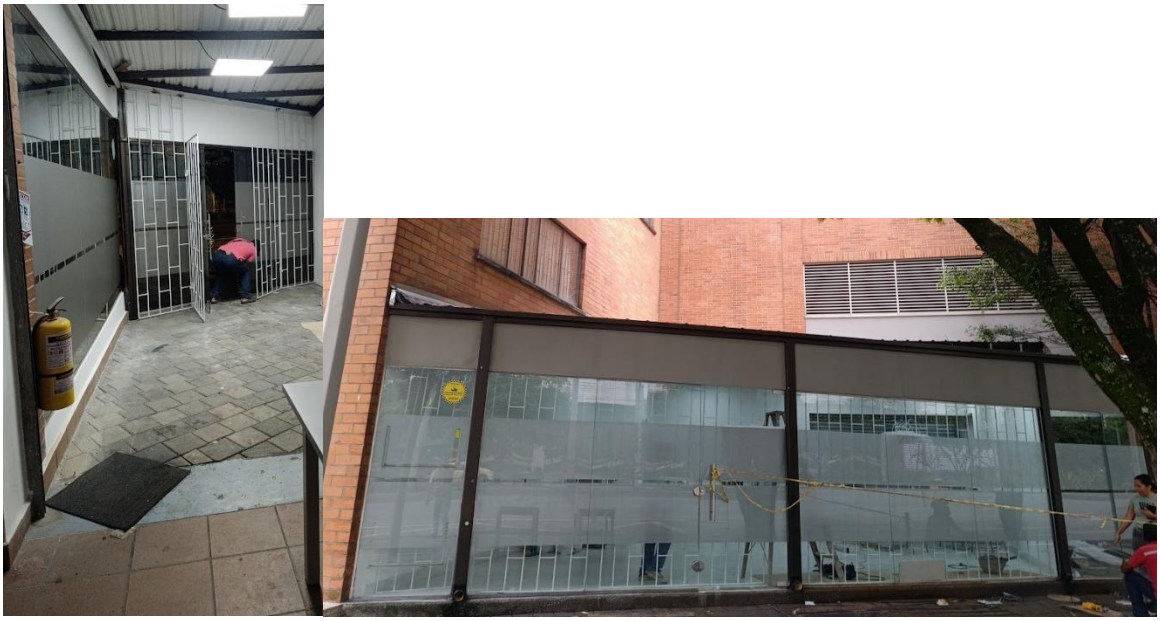

Correo: soporte.ticonstrucciones@gmail.com
No. Cel.: 312 5356 383
Dirección: CR 11 A 7 B 126, Melgar Tolima

K&J T.I. & CONSTRUCCIONES S.A.S.
N.I.T.: 901450685-3
Régimen Común

BALANCE DE MENORES Y MAYORES

CONTRACTUAL						CANTIDADES			VALORES			RESUMEN		VALOR TOTAL CAPITULO
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	MAYORES	MENORES	NO PREVISTAS	MAYORES	MENORES	NO PREVISTAS	CANTIDAD TOTAL DEFINITIVA	VALOR TOTAL	
1	**PRELIMINARES**													**$ 120,000.00**
1.3	DESMONTE DE MURO EN DRYWALL	m²	10.00	$ 12,000.00	120,000.00	0.00	0.00		$ -	0.00		10.00	$ 120,000.00	
2	**CARPINTERIA METALICA**													
2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PELICULA MICROPERFORADA CON LOGOS INSTITUCIONALES	m²	51.00	$ 32,000.00	1,632,000.00	0.00	51.00		$ -	1,632,000.00		0.00	$ -	**$ 7,567,800.00**
2.2	REJA TIPO BANCO	m²	45.00	$ 155,600.00	7,002,000.00	3.00	0.00		$ 466,800.00	0.00		48.00	$ 7,468,800.00	
2.3	CERRADURA DE SEGURIDAD PARA OFICINA	Und	1.00	$ 99,000.00	99,000.00	0.00	0.00		$ -	0.00		1.00	$ 99,000.00	
3	**MUROS**													**$ 998,000.00**
3.1	MURO PANEL YESO DOBLE CARA E=12CM. Incluye terminado en pintura tipo 1 de alta calidad	m²	10.00	$ 99,800.00	998,000.00	0.00	0.00		$ -	0.00		10.00	$ 998,000.00	
4	**CONCRETOS Y MORTEROS**													**$ 160,000.00**
4.1	PAÑETE MUROS 1:3 E=3CM. Incluye filos y dilataciones	m²	5.00	$ 32,000.00	160,000.00	0.00	0.00		$ -	0.00		5.00	$ 160,000.00	
5	**FACHADAS**	Und												**$ 2,872,550.00**

Correo: soporte.ticonstrucciones@gmail.com
No. Cel.: 312 5356 383
Dirección: CR 11 A 7 B 126, Melgar Tolima

5.1	LAVADO DE FACHADA E HIDRÓFUGO	m^2	70.00	$ 25,690.00	1,798,300.00	25.00	0.00		$ 642,250.00	0.00		95.00	$ 2,440,550.00	
5.2	LAVADO DE FACHADA	m^2	45.00	$ 12,000.00	540,000.00	0.00	9.00		$ -	108,000.00		36.00	$ 432,000.00	
6	**RED ELÉCTRICA**													**$ -**
6.1	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA RED NORMAL. Promedio 5 ml	Und	15.00	$ 55,600.00	834,000.00	0.00	15.00		$ -	834,000.00		0.00	$ -	
	NO PREVISTOS													**$ 2,715,761.60**
NP 1	LIMPIEZA DE CUBIERTA, COMEDOR, INCLUYE RECOLECCIÓN DE MATERIAL VEGETAL	m^2		$ 15,380.00				78.00			1,199,640.00	78.00	$ 1,199,640.00	
NP 2	SONDEO DE BAJANTES DE AGUAS PLUVIALES, CUBIERTA CAFETERÍA	m		$ 30,513.00				6.00			183,078.00	6.00	$ 183,078.00	
NP 3	LIMPIEZA DE CANAL, INCLUYE RECOLECCIÓN DE MATERIAL VEGETAL	m		$ 13,031.00				12.20			158,978.20	12.20	$ 158,978.20	
NP 4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE DE 3 PULGADAS EN TUBERÍA PVC-S, INCLUYE, ACCESORIOS Y CORTE DE TUBERÍA METÁLICA	m		$ 30,895.00				3.00			92,685.00	3.00	$ 92,685.00	
NP 5	ESTRUCTURA METÁLICA PARA FIJACIÓN DE REJA TIPO BANCARIA	m		$ 27,809.00				15.60			433,820.40	15.60	$ 433,820.40	
NP 6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CANAL PLUVIAL, ZONA COMEDOR	Und		$ 29,800.00				1.00			29,800.00	1.00	$ 29,800.00	
NP 7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PELÍCULA SANDBLASS	m2		$ 33,000.00				18.72			617,760.00	18.72	$ 617,760.00	

Correo: soporte.ticonstrucciones@gmail.com
No. Cel.: 312 5356 383
Dirección: CR 11 A 7 B 126, Melgar Tolima

	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**13,183,300.00**				**1,109,050.00**	**2,574,000.00**	**2,715,761.60**			**$ 14,434,111.60**
	ADMINISTRACIÓN		**23%**		3,032,159.00				255,081.50	592,020.00	624,625.17			$ 3,319,845.67
	IMPREVISTOS		**1%**		131,833.00				11,090.50	25,740.00	27,157.62			$ 144,341.12
	UTILIDAD		**5%**		659,165.00				55,452.50	128,700.00	135,788.08			$ 721,705.58
	IVA SOBRE UTILIDAD				125,241.35				10,535.98	24,453.00	25,799.74			$ 137,124.06
	COSTO TOTAL OBRA				17,131,698.35				1,441,210.48	3,344,913.00	3,529,132.20			$ 18,757,128.02
	VALOR TOTAL OBRA				**17,131,698.35**				**$ 1,441,210.48**	**$ 3,344,913.00**	**$ 3,529,132.20**			**$ 18,757,128.02**
	SALDO POR AJUSTAR													**$ 1,625,429.67**

Correo: soporte.ticonstrucciones@gmail.com
No. Cel.: 312 5356 383
Dirección: CR 11 A 7 B 126, Melgar Tolima

RECOMENDACIONES

- Solicitar el corte de árboles en las materas de la fachada de comedor. No es adecuado para el poco espacio de la matera.



- Solicitar la poda de arboles para la ciudad de Medellín seria https://www.emvarias.com.co/emvarias.
- Durante la ejecución del contrato se evidencio que el área es usada para hurto en horas de la noche, si es posible mejor la iluminación.

CONTROL DE CALIDAD

Deposición de residuos (escombros): todo material como resultante de demolición, desperdicio de insumos, entre otros serán retirados de forma adecuado y transportados, por vehículos aptos para la tarea.

SEGURIDAD INDUSTRIAL

No se ha presentado ningún accidente. Se han utilizado las respectivas recomendaciones y normatividades de la ARL respectiva y la utilización de los EPP.



ING. JOSE EDUARDO PEÑA FIAGA
REPRESENTANTE LEGAL
K&J T.I.& CONSTRUCCIONES S.A.S
