Alcaldia Municipal de Envigado	FORMATO	Código: PT-F-028
	INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión: 03
		Pagina: 1 de 3

INFORME No.:	2	FECHA DEL INFORME:	martes, 23 de septiembre de 2025

CONTRATO DE OBRA

Contrato No:	ENV-09-09-1546-25	Objeto:	Urgencia manifiesta mediante resolución 20250018013 del 09-05-2025 para la estabilización de taludes y obras accesorias en el Sector de Santa Catalina en el Municipio de Envigado
Contratista:	CONSTRUVERTICAL S.A.S.		
NIT:	900494143-9		

DATOS CONTRATO PRINCIPAL:	Valor Inicial:	$ 2.981.333.162	Plazo Inicial:	149	dias	Fecha suscripción:	01-08-25
DATOS ADICIÓN / MODIFICACIÓN No.1:	Valor:		Plazo:			Fecha suscripción:	
DATOS ADICIÓN / MODIFICACIÓN No.2:	Valor:		Plazo:			Fecha suscripción:	
DATOS ADICIÓN / MODIFICACIÓN No.3:	Valor:		Plazo:			Fecha suscripción:	
DATOS ADICIÓN / MODIFICACIÓN No.3:	Valor:		Plazo:			Fecha suscripción:	
ACTA DE SUSPENSIÓN No.1:		ACTA DE REINICIO No.1:		ACTA DE SUSPENSIÓN No.2:		ACTA DE REINICIO No.2:	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 2.981.333.162		PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:	5	Meses		
Fecha de iniciación:	lunes, 4 de agosto de 2025		Fecha de vencimiento:	martes, 30 de diciembre de 2025			


POLIZAS DEL CONTRATO

COMPAÑÍA	CLASE GARANTIA	POLIZA No.	VALOR	VENCIMIENTO		
				DIA	MES	AÑO
Liberty Seguros	Cumplimiento	2071875	$ 596.266.632,00	30	6	2026
Liberty Seguros	Garantía de pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales	2071875	$ 596.266.632,00	30	12	2028
Liberty Seguros	Estabilidad y calidad de la obra	2071875	$ 596.266.632,00	30	12	2030
Liberty Seguros	Responsabilidad Civil Extracontractual	2071886	$ 569.400.000,00	30	12	2025

AVANCES DEL CONTRATO

GRAFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

	%PROGRAMADO	%EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	20,00%	22,09%	**2,09%**
Durante el periodo	20,00%	41,74%	**21,74%**
Acumulad Actual	40,00%	63,83%	**23,83%**

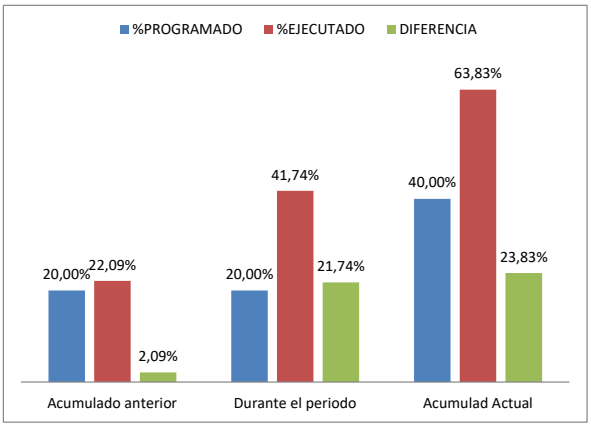

PROGRAMADO

	Mensual	Acumulado
Obra Programada (%)	20,00%	40,00%
Valor de la Obra	$ 596.266.632	$ 1.192.533.265

EJECUTADO

	Mensual	Acumulado
Obra física ejecutada (%)	41,74%	63,83%
Valor de la Obra	$ 1.244.426.578	$ 1.902.873.781

DATOS FINANCIEROS

V.r CONTRATO:	$ 2.981.333.162
Vr. TOTAL PAGADO EN ACTAS:	$ 1.902.873.781
SALDO POR PAGAR CONTRATO:	$ 1.078.459.381
Vr. ANTICIPO:	$ 0
TOTAL AMORTIZADO ANTICIPO:	$ 0
SALDO POR AMORTIZAR ANTICIPO:	$ 0

ACTA No.	TOTAL BRUTO	AMORTIZ. ANTICIPO	TOTAL NETO	% EJECUCIÓN	FECHA DEL ACTA
1	$ 658.447.203	$ 0	$ 658.447.203	22,09%	14-08-25
2	$ 1.244.426.578	$ 0	$ 1.244.426.578	41,74%	23-09-25
TOTALES	$ 1.902.873.781	$ -	$ 1.902.873.781	63,83%	

SEGUIMIENTO CONTABLE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

MES DE PAGO	VALOR	CONCEPTO	MES DE PAGO	VALOR	CONCEPTO	MES DE PAGO	VALOR	CONCEPTO
Agosto	$ 658.447.203	Acta No.1						
Septiembrre	$ 1.244.426.578	Acta No.2						

SEGUIMIENTO DOCUMENTACIÓN Y REQUERIMIENTOS TECNICOS Y DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Responder si se cuenta con la documentación al día:			
Estudios y diseños:	SI	Se realizan reuniones de seguimiento al Contrato y se encuentran debidamente documentadas?	SI
Planos de obra:	SI	Se da cumplimiento a los requerimientos establecidos por la autoridad ambiental?	SI
Especificaciones técnicas	SI	La autoridad ambiental competente emitió los permisos necesarios para el inicio de las obras?	N.A.
Permisos y Licencias:	SI	Se da cumplimiento a las Normas de salud Ocupacional y Seguridad Industrial?	SI
Bitácora:	SI	Se da cumplimiento a las Normas de Trabajo en altura?	SI
		El personal se encuentra afiliado al Sistema de Seguridad Social?	SI

Empleos Directos:	16	Hombres:	14	Mujeres:	2	Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:	53

CONTRATO DE SUMINISTRO

DESCRIPCION DEL ITEM	CANTIDADES EJECUTADAS	VALOR EJECUTADO	RECIBO A SATISFACIÓN	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Se revisa cumplimiento de obligaciones parafiscales	Se entrega por parte del contratista el certificado de paz y salvo en seguridad social integral, salarios y parafiscales.

SEGUIMIENTO Y OBSERVACIONES AL DESARROLLO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

PENDIENTES POR PARTE DEL CONTRATISTA:

Se realizaron actividades según los diseños presentados, continuar con actividades de obra, presentar programación de actividades.

PENDIENTES POR PARTE DEL SUPERVISOR:

Continuar realizando seguimiento a la ejecución de las actividades y tramitar los respectivos pagos.

PENDIENTES POR PARTE DEL MUNICIPIO Y/O OTRAS ENTIDADES

Tramitar la presente cuenta de cobro y Realizar el desembolso de los recursos.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES EN EL CONTRATO

Estudios y diseños (Geotecnico, Hidraulico e Hidroligico y estructural)
Localización, trazado y replanteo de áreas a intervenir.
Seguimiento a centinelas para alerta temprana.
Sellado temporal con cal
Excavación de canales principales y ramales
Instalación de geomembrana en canales principales.
Construcción de filtros.
Entibados en madera.
Ejecución de obra transversal.
Perforación y demolición de rocas.
Construcción de sendero peatonales y señalización del mismo.
Excavación de pilas drenantes.
Intalación de acero en pilas drenantes.
Vaciado de pilas drenantes.
Llenos y compactación.
Adecuación de terreno y perforación para drenes.
Construcción de cerramiento en malla eslabonada.
Vaciado de cunetas.
Adecuaciones e instalación de tarabita.
Uso de bomba sumergible.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL SIGUIENTE MES EN EL CONTRATO



Se realizaron actividades según los diseños presentados, continuar con actividades de obra.

OBSERVACIONES GENERALES:
Avance, retrasos, decisiones, compromisos, logros, dificultades, aspectos administrativos, jurídicos, técnicos o financieros

Se inicia y realiza entrega de los diseños.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Se legalizo el contrato y se da inicio a las actividades preliminares del contrato.



DATOS DEL SUPERVISOR		FIRMA:
TIPO DE SUPERVISOR:	INTERNO	
NOMBRES Y APELLIDOS:	GUSTAVO ADOLFO RENDON RODAS	
CARGO:	SUPERVISOR	
DEPENDENCIA / EMPRESA:	OBRAS PUBLICAS	
TIPO DE SUPERVISOR:	INTERNO	
NOMBRES Y APELLIDOS:	JUAN JOSÉ ROJAS OCHOA	
CARGO:	CONTRATISTA	
DEPENDENCIA / EMPRESA:	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	

REGISTRO FOTOGRAFICO





Fecha: Agosto 2025
Descripción: Seguimiento a centinelas para alerta temprana.

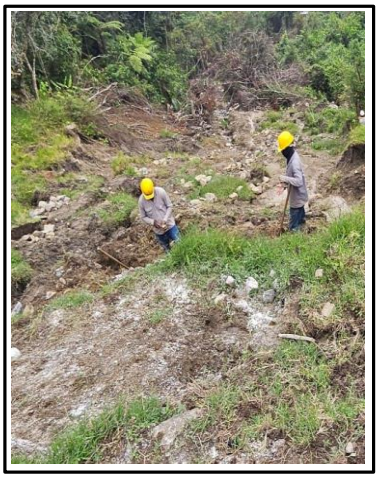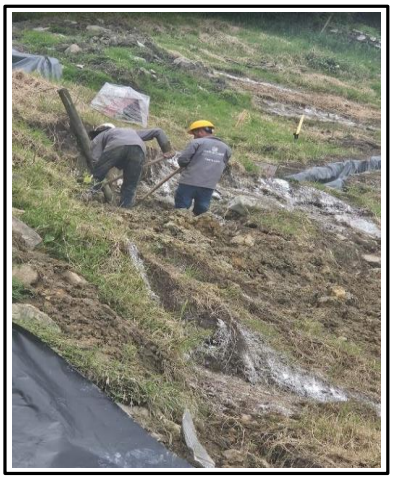Fecha: Agosto 2025
Descripción: Sellado temporal con cal de grietas





Fecha: Agosto 2025
Descripción: Excavación de canales principales y ramales






Fecha: Agosto 2025
Descripción: Instalación de geomembrana en canales .






Fecha: Agosto 2025
Descripción: Construcción de filtros.



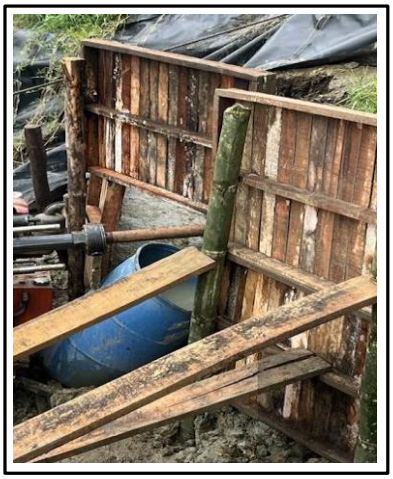


Fecha: Agosto 2025
Descripción: Entibados en madera.



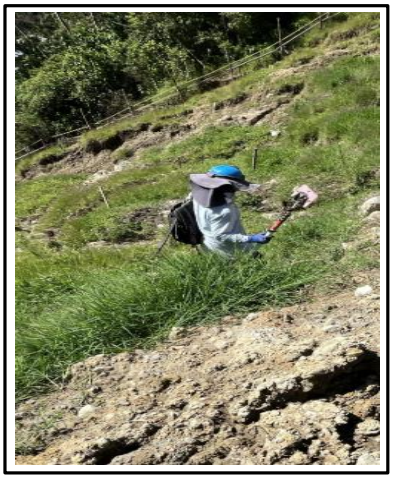


Fecha: Agosto 2025
Descripción: Topografia.

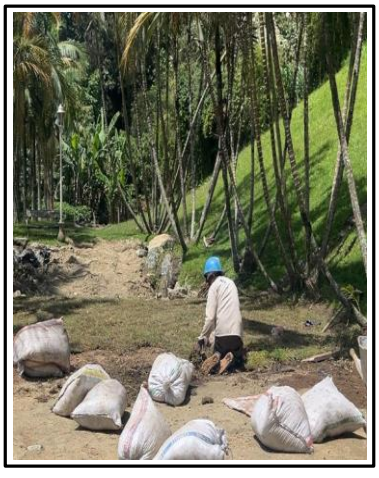



Fecha: Agosto 2025
Descripción: Siembra de grama.



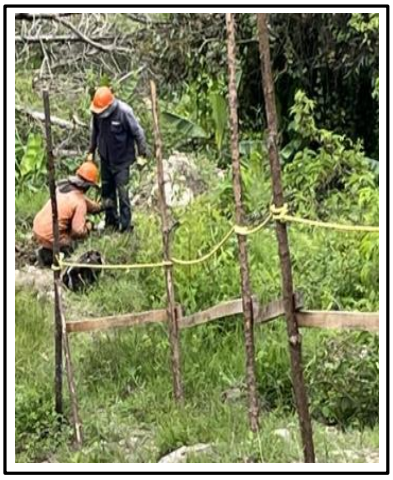


Fecha: Agosto 2025
Descripción: Construcción de sendero peatonales y señalización del mismo.






Fecha: Agosto 2025
Descripción: Excavación de pilas drenantes, incluye demolición de roca.

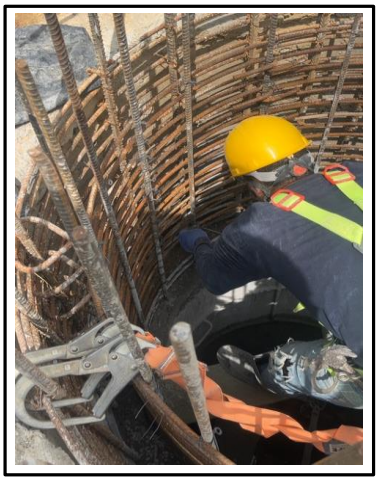



Fecha: Agosto 2025
Descripción: Intalación de acero de pilas drenantes.

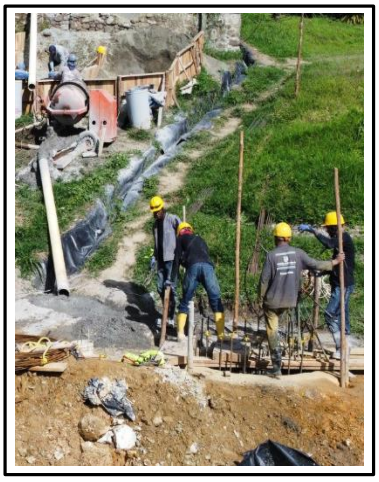




Fecha: Agosto 2025
Descripción: Vaciado de pilas drenantes.






Fecha: Agosto 2025
Descripción: Llenos y compactación.

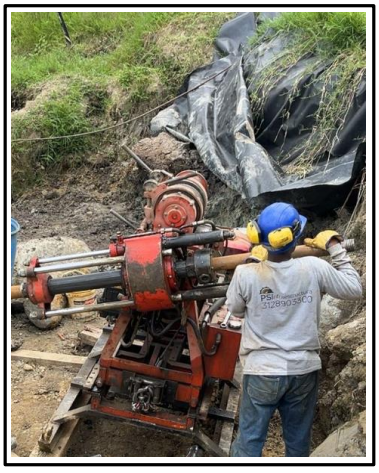
Fecha: Agosto 2025
Descripción: Adecuación de terreno y perforación para drenes.



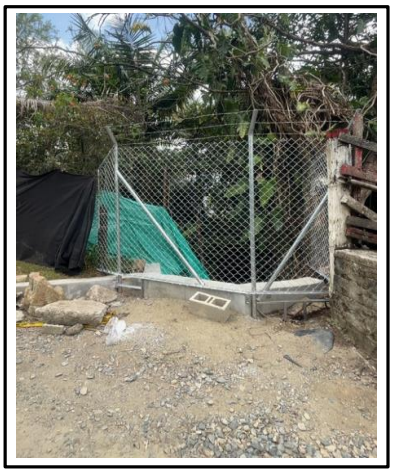

Fecha: Agosto 2025
Descripción: Construcción de cerramiento en malla eslabonada.





Fecha: Agosto 2025
Descripción: Adecuaciones e instalación de tarabita.
