Outlook

Solicitud de radicación KO INICIO PROYECTO CORANTIOQUIA - contrato190-CNT2507-184 UNE EPM Telecomunicaciones S.A

Desde Marleny Vélez Cárdenas <mvelez@corantioquia.gov.co>
Fecha Jue 14/08/2025 14:17
Para Centro de Administracion de Documentos -CAD- CORANTIOQUIA <cad@corantioquia.gov.co>

3 archivos adjuntos (9 MB)
KO Cliente CORANTIOQUIA.pdf; Cronograma detallado de trabajo - CORANTIOQUIA.xlsm; 1152186014.pdf;

Muy buenas tardes compañeros,

Me pueden hacer el favor de colaborarme con la radicación de la presentación de inicio, cronograma del proyecto y los datos del técnico que estará asignado al proyecto.
Cordialmente,

Marleny Vélez Cárdenas
Profesional Universitario
Subdirección Administrativa y Financiera
GIT Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
mvelez@corantioquia.gov.co
Tel: 493 88 88 ext: 1127
Carrera 65 No. 44A – 32
www.corantioquia.gov.co

CORANTIOQUIA
COMUNICACIONES OFICIALES EXTERNAS
UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.
Fecha: 15-ago-2025 07:43 AM Pág: 3
Anexos: 31 PÁGINAS
Archivar en: 190-CNT2507-184/UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A./190-CD2507-
Radicado por: Carlos Mauricio Cuervo Vanegas

180-COE2508-29186
Favor citar este número al responder

CORANTIOQUIA

De: Maria Del Pilar Osorio Alvarez <maria.osorio@tigo.com.co>
Enviado el: miércoles, 13 de agosto de 2025 6:44 p. m.
Para: IBEFT MAYERLLY RODRIGUEZ VELANDIA <irodrvel@mail.tigo.com.co>; Marleny Vélez Cárdenas <mvelez@corantioquia.gov.co>; Maria Del Pilar Osorio Alvarez <maria.osorio@tigo.com.co>
CC: Diego Alejandro Balbin Perez <Diego.BalbinP@tigo.com.co>; Diego Alejandro Madrid Roman <Diego.Madrid@tigo.com.co>; Ricardo Quintero Rativa <Ricardo.Quintero@tigo.com.co>
Asunto: KO INICIO PROYECTO CORANTIOQUIA
Importancia: Alta

Buen día,

Acorde al KO de inicio realizado el 11-agosto en la sede, adjunto la siguiente información:

- Presentación de inicio
- Cronograma del proyecto
- Datos del técnico que estará asignado al proyecto:

JUAN DAVID GUTIERREZ TAMAYO

CC 1.152.186.014

Los datos de la PM que quedará a cargo en mi ausencia son: IBEFT MAYERLLY RODRIGUEZ VELANDIA irodrvel@mail.tigo.com.co 317 4314337.

@IBEFT MAYERLLY RODRIGUEZ VELANDIA estará al frente del proyecto para cualquier cosa que necesitemos.

Como próximos pasos del proyecto tenemos:

1. Reserva/instalación/gestión equipos FORTI en las sedes @Maria Del Pilar Osorio Alvarez / @IBEFT MAYERLLY RODRIGUEZ VELANDIA
2. Compartir la configuración en VERSA @Maria Del Pilar Osorio Alvarez / @IBEFT MAYERLLY RODRIGUEZ VELANDIA
3. Agendar sesión técnica inicial con especialista Janus @Maria Del Pilar Osorio Alvarez / @IBEFT MAYERLLY RODRIGUEZ VELANDIA
4. Agendar las reuniones de seguimiento @Maria Del Pilar Osorio Alvarez / @IBEFT MAYERLLY RODRIGUEZ VELANDIA
5. Contacto de cada sede en el archivo @mvelez@corantioquia.gov.co
6. Gestión de permisos en cada una de las sedes desde el 15-agosto hasta el 19-septiembre.

Estaremos compartiendo avances de los puntos pendientes mencionados. Gracias

Saludos,

Maria del Pilar Osorio Alvarez
Especialista de Proyectos y Soluciones
Gerencia de Operaciones B2B – Implementación
Dirección de Experiencia y Transformación B2B
maria.osorio@tigo.com.co
Celular: (57) 301 601 23 99
Dirección: Carrera 48 # 20 - 45 • Centro Empresarial Rivana • Piso 14
Código Postal: 050021
Medellín - Colombia



Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co, en donde puede conocer sus derechos constitucionales y legales así como la forma de ejercerlos. Con mucho gusto atenderemos todas sus observaciones, consultas o reclamos en: protecciondedatos@corantioquia.gov.co.



Kickoff externo

Corantioquia

Migración versa a forti

11-ago-2025

tigo business

Agenda

1. Objetivo
2. Equipo de trabajo
3. Alcance técnico
4. Cronograma proyecto
5. Plan comunicaciones
6. Facturación



Objetivo


Divulgar y acordar con el cliente el alcance, los hitos, el equipo de trabajo, las comunicaciones, las compras, las responsabilidades, los riesgos y los acuerdos de pago del proyecto



Equipo de trabajo

Equipo de trabajo y rol que desempeñan para la implementación del requerimiento

Equipo de trabajo

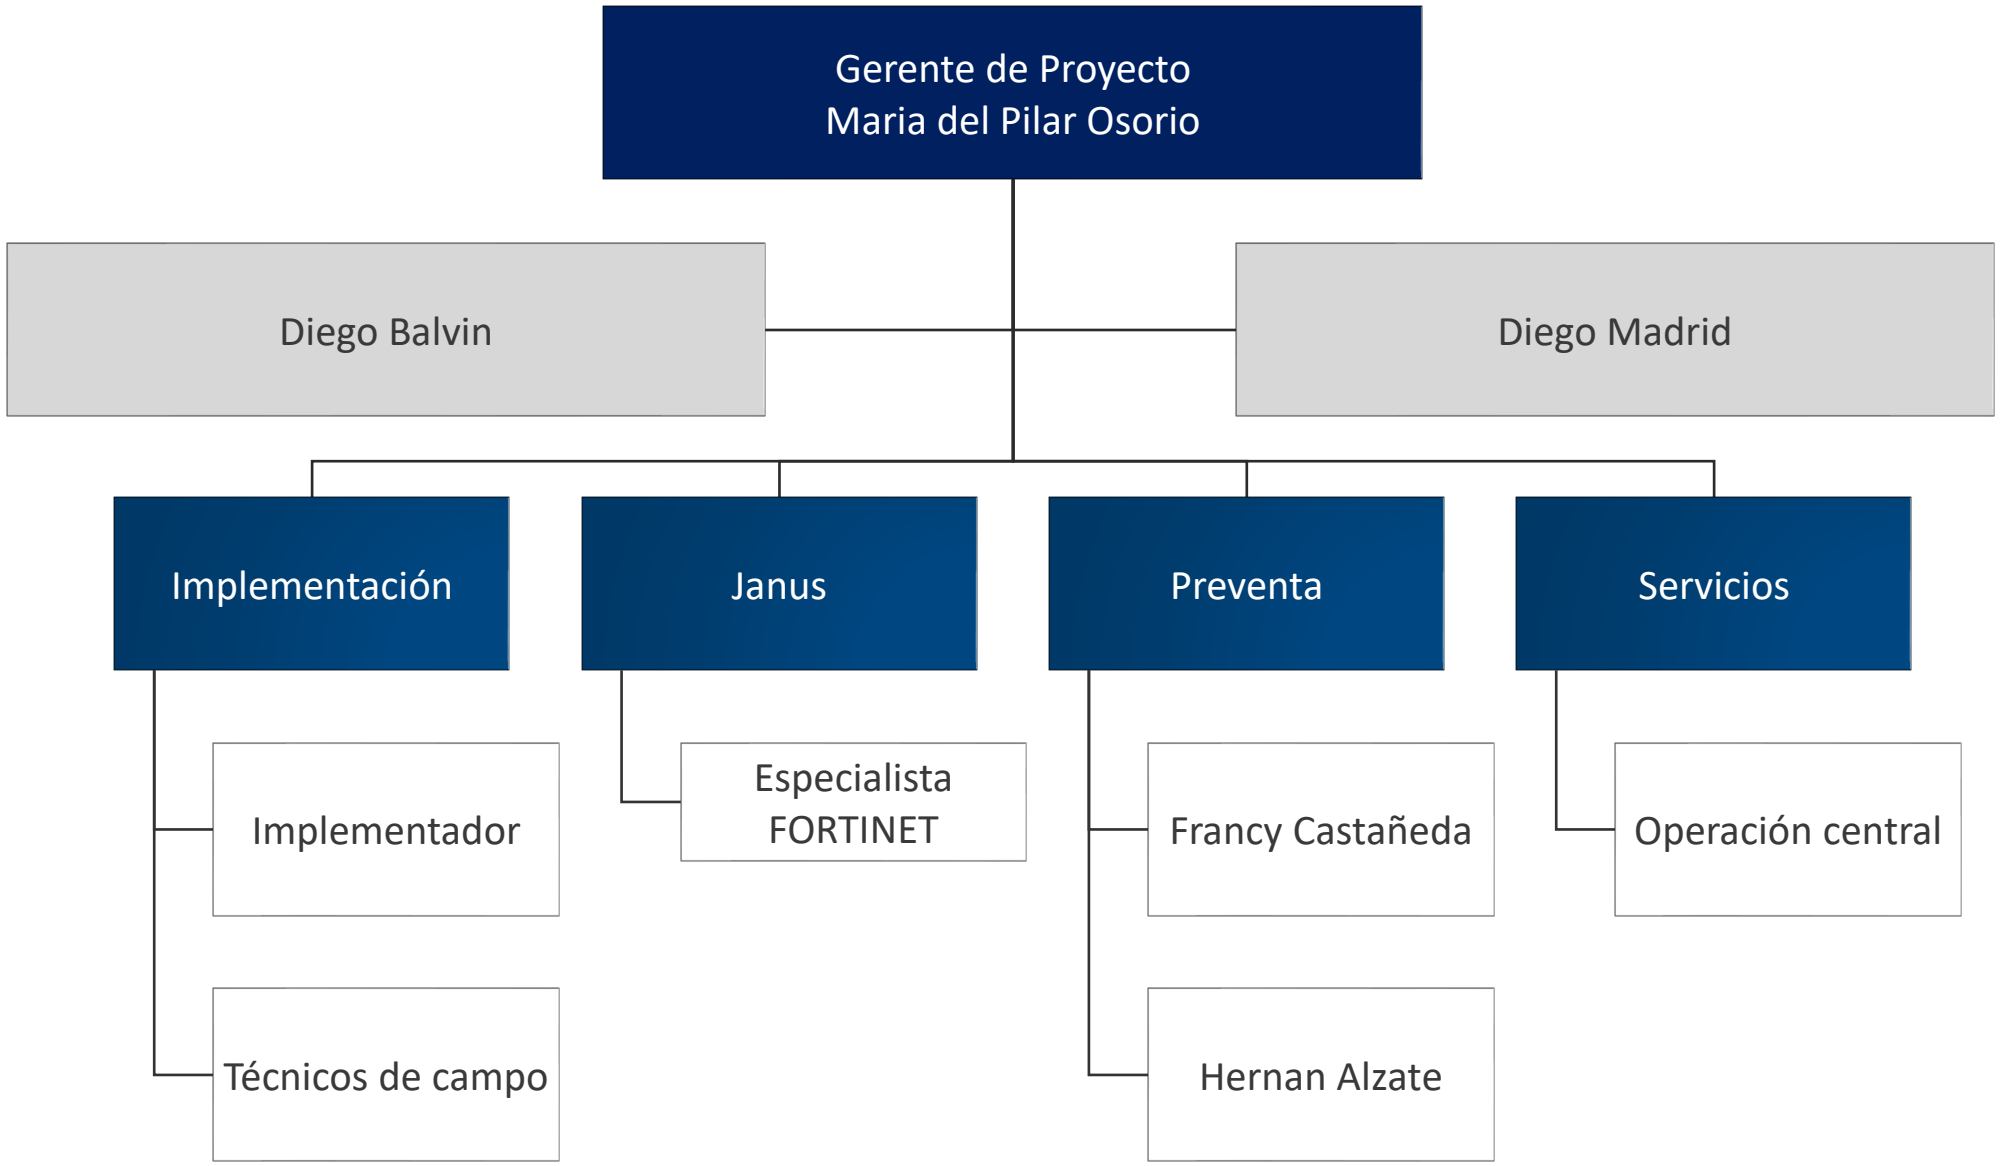




Divulgar y acordar con el cliente el alcance, los hitos, el equipo de trabajo, las comunicaciones, las compras, las responsabilidades, los riesgos y los acuerdos de pago del proyecto

Alcance del requerimiento

Alcance de requerimiento

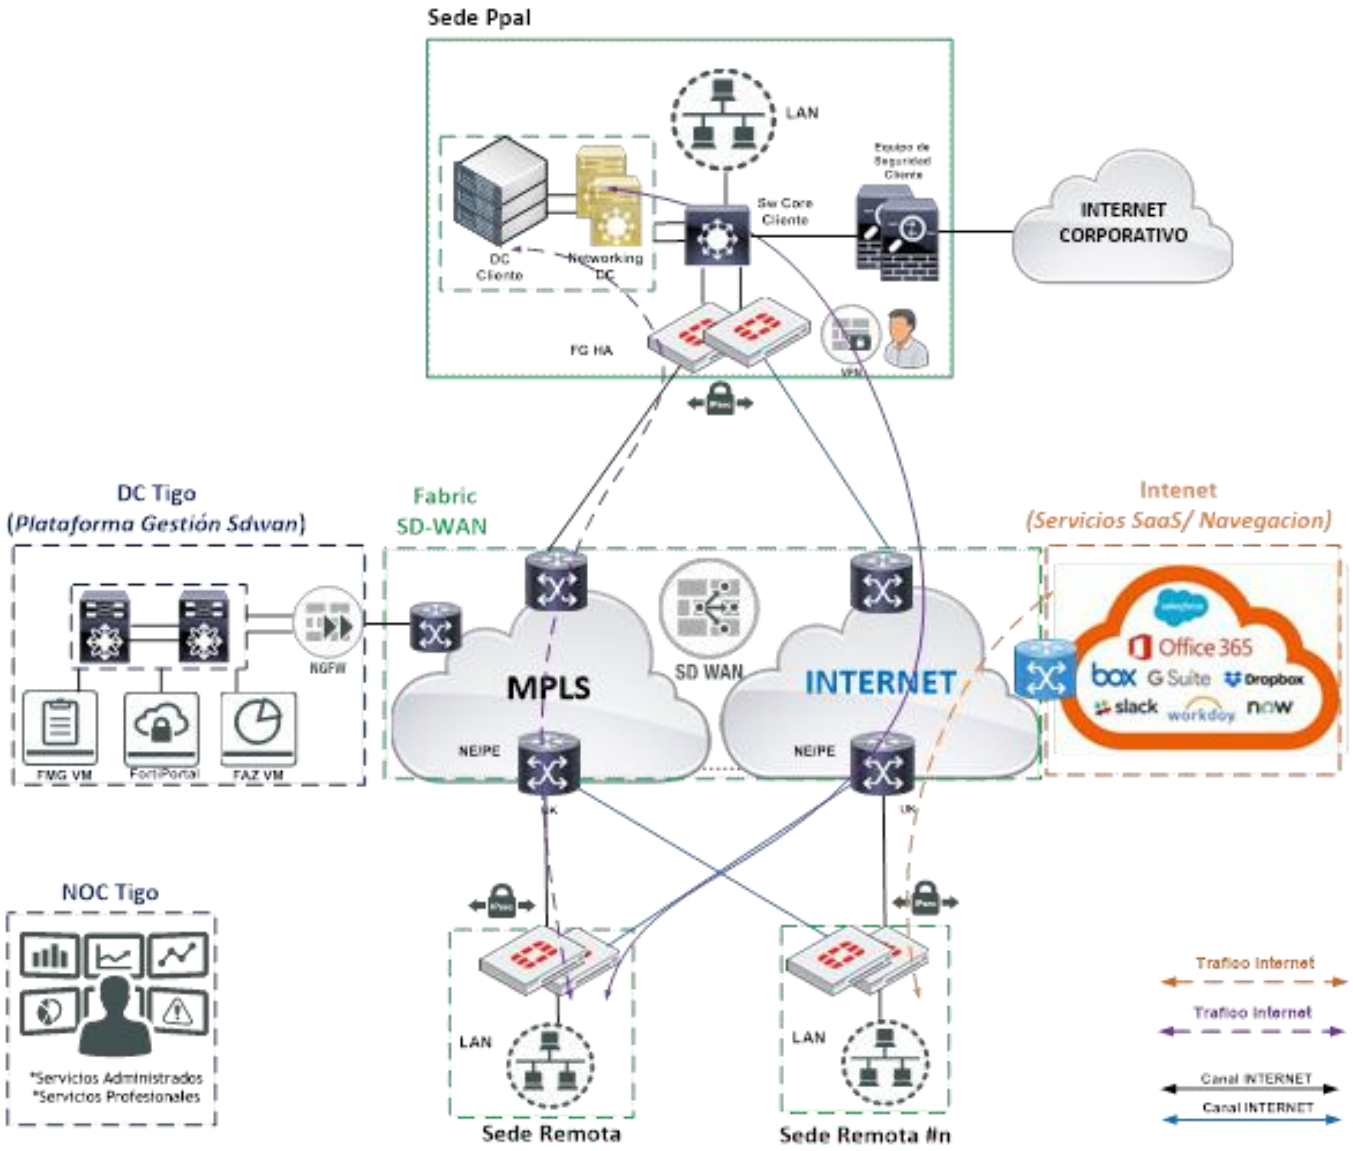

Alcance de requerimiento

Ciudad	Dirección	Cantidad de usuarios	Canal 1 MPLS BW	Tecnología MPLS	Canal 2 Internet BW	Tecnología Internet	Referencia	Cantidad equipos SDWAN
Medellín	Carrera 65 No. 44 A 32 Medellín	250-300	120	FO METRO	120	FO METRO	FG120G	2
Caucasia	Calle 9A No. 24-03 Barrio El Triángulo	30-40	30	GPON	30	FO METRO EDATEL	FG60F	2
Santa Rosa de Osos	Carrera 28 A No. 32-17 Piso 3 Terminal de Transporte	30-40	30	RADIO TERCERO	30	FO METRO EDATEL	FG60F	2
Andes	Carrera 50 # 51-39 Andes, Antioquia	30-40	30	RADIO TERCERO	12	FO METRO	FG60F	2
Santa fe de Antioquia	Calle 11 # 10-39 Santa Fe de Antioquia	30-40	30	GPON	30	FO METRO EDATEL	FG60F	2
Jericó	Carrera 3 No. 5-28 Jericó, Antioquia	30-40	30	RADIO TERCERO	12	FO METRO EDATEL	FG60F	2
Santa Elena	Portón: 6.214663, -75.506748, casa: 6.219679, -75.508683	5 usuarios	12	FO METRO	12	FO METRO	FG60F	2
Vegachí	Carrera 49 No. 49 - 25. Vegachí, Antioquia	30-40	30	RADIO TERCERO	12	FO METRO EDATEL	FG60F	2
El Bagre	Carrera 46C # 49B-27	2 usuarios	NA	NA	30	FO METRO EDATEL	FG60F	1



Escalamientos

Nivel de escalamiento para la resolución de inconvenientes y/o conflictos en la etapa de implementación.

Escalamiento

CONTACTOS TIGO - IMPLEMENTACIÓN				
NIVEL ESCALAMIENTO	**NOMBRE COMPLETO**	**CARGO**	**CORREO**	**CELULAR**
Nivel 1	Maria del Pilar Osorio	PM Gobierno	maria.osorio@tigo.com.co	3016012399
Nivel 2	Ricardo Quintero	Supervisor Gobierno	Ricardo.Quintero@tigo.com.co	3004433021
Nivel 3	Adriana Lopez	Gerente Operaciones B2B	Adriana.Lopez.D@tigo.com.co	3102900319
Nivel 4	Juan Carlos Lopez Candamil	Director Operaciones B2B	Juan.C.Lopez@tigo.com.co	3209640055



Diagrama de hitos con las actividades más relevantes para la implementación del requerimiento y/o cronograma detallado del proyecto.

Plan de trabajo

Highlight

Fecha de Inicio Contrato: 12-julio-2025

Duración contrato:	12 meses
Duración implementación:	2 meses
Duración operación:	10 meses

Avances y próximos pasos


Internet ➔ 5-ago
- Verificación enlaces: BW y estabilidad

Equipos➔ 15-agosto
- 17 equipos en 9 sedes
- Instalación equipos en sedes x internet


Conectividad➔ 10-sep
- Red propia y terceros UK

Sede ppal VHUB➔ 25-agosto
- Configuración en sede ppal

Sedes remotas➔ 17-septiembre
- Migración de sedes (8 sedes)

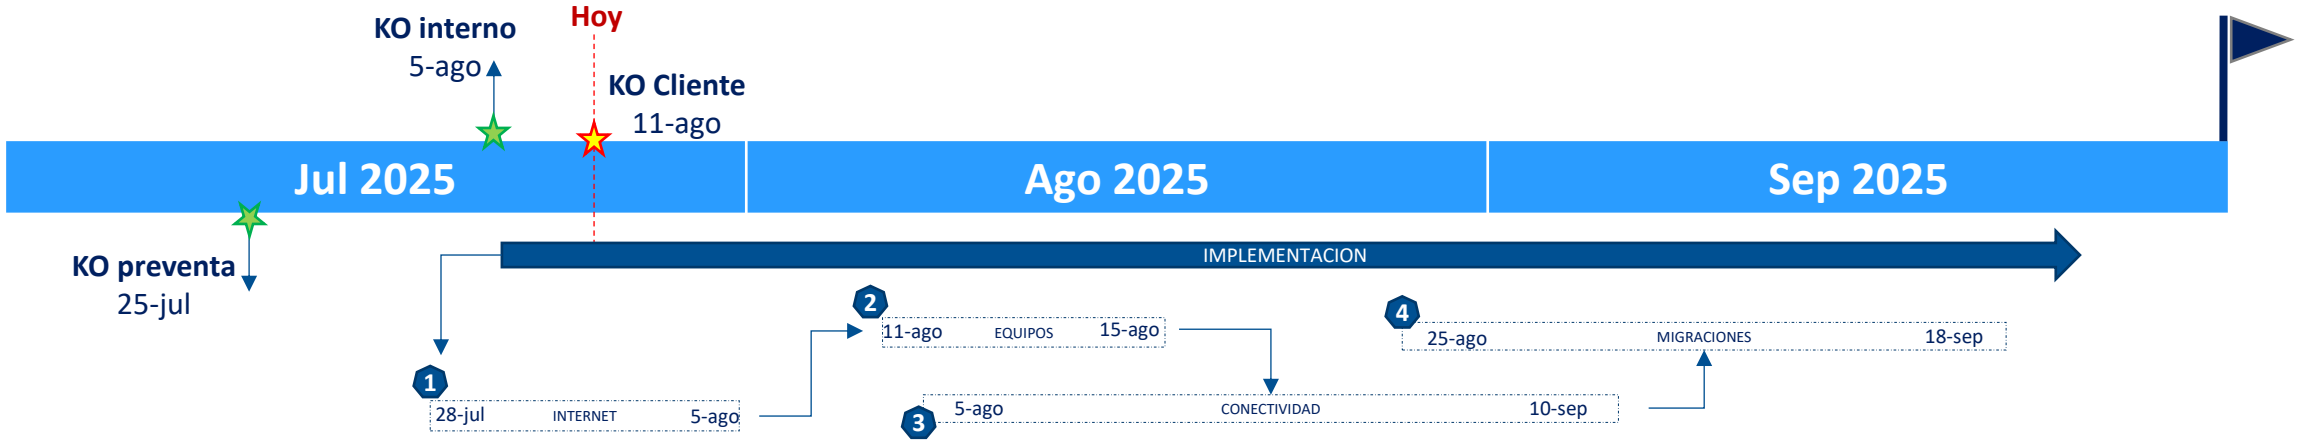

Cronograma proyecto

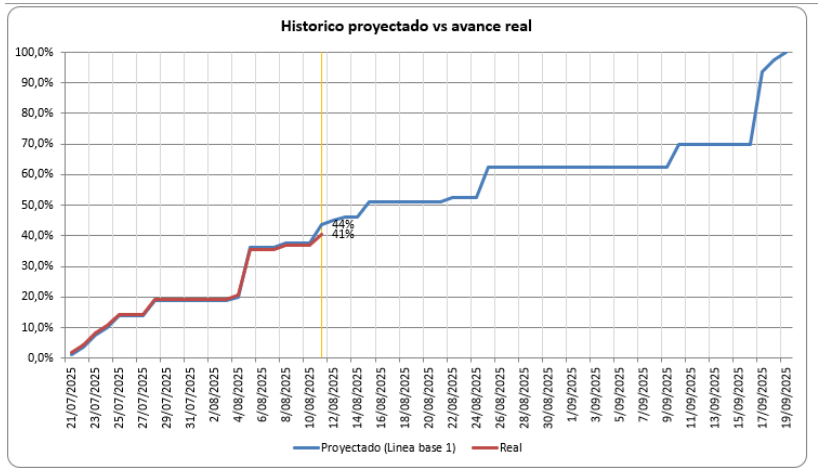

PEND. EQUIPO	3
3ros. UK	4
EN PRECABLEADO	2
INSTALACIÓN	0
CLIENTE	0
ACCESO	0
ENTREGADAS	0

No.	Categoria	Cantidad Planeada	% Planeado	% Avance Real	Performance
	Performance igual a 100% Performance entre 90% y 100% Performance entre 0% y 90%	80	44%	41%	93%
1	Inicio	11	100%	100%	100%
2	Planeación	10	100%	100%	100%
3	Ejecución	56	25%	21%	82%
4	Monitoreo y Control	1	0%	0%	0%
5	Cierre	2	0%	0%	0%

No	Categoria (2 o 3 nivel de la EDT)	Entregable	Planeado		Avance - Seguimiento		
			Fecha Planeada	Cantidad de entregables requerido	Fecha Cierre (Fecha del ultimo avanc	Cantidad de entregables aprobado	Avance a la fecha
1	Inicio	Migración versa a forti	21/07/2025	1	21/07/2025	1	100%
2	Inicio	Inicio	22/07/2025	1	22/07/2025	1	100%
11	Inicio	Cierre inicio	25/07/2025	1	25/07/2025	1	100%
12	Planeación	Planeación	28/07/2025	1	28/07/2025	1	100%
21	Planeación	Cierre planeación	11/08/2025	1	11/08/2025	1	100%
22	Ejecución	Ejecución	18/09/2025	1			0%
23	Ejecución	Equipos	15/08/2025	17			0%
26	Ejecución	Sesion técnica interna	11/08/2025	1			0%
27	Ejecución	Sesion técnica con cliente	12/08/2025	1			0%
28	Ejecución	Creación VDOM y asociación ADOM	13/08/2025	1			0%
29	Ejecución	Enlaces	10/09/2025	2	0/01/1900	1	50%
30	Ejecución	*Verificación internet*	5/08/2025	9	5/08/2025	9	100%
40	Ejecución	*Verificación conectividad*	10/09/2025	8	0/01/1900		0%
49	Ejecución	Instalación y gestión equipos	22/08/2025	17			0%
50	Ejecución	*MIGRACIONES SDWAN*	17/09/2025	1	0/01/1900		0%
51	Ejecución	*SEDE PPAL (VHUB - HA)*	25/08/2025	1			0%
59	Ejecución	*SEDES ALTERNAS*	17/09/2025	8			0%
75	Ejecución	Ajustar la plantilla de seguridad	17/09/2025	8			0%
76	Ejecución	ESTABILIZACIÓN SERVICIO	17/09/2025	9			0%
77	Ejecución	Cierre Ejecución	18/09/2025	1			0%
78	Monitoreo y Control	Reuniones seguimiento cliente	18/09/2025	6			0%
79	Cierre	Revision documentacion	19/09/2025	1			0%
80	Cierre	Actualizacion MF y cierre proyecto	19/09/2025	1			0%



Entregables

Entregables internos para cumplir con los entregables mínimos al cliente para la aceptación a satisfacción de la implementación

Entregables

Componente EDT	Entregable	Criterio de Aceptación	Responsable	Fecha de Entrega
Inicio	✓ Contrato cliente	1. Firmado por el cliente	Ventas	12-jul-2025
Planeación	✓ Cronograma	1. Fecha de entrega 2. Componentes de entrega	Soluciones	11-ago-2025
	✓ Plan de comunicaciones	1. Información de contactos proyecto	Soluciones	11-ago-2025
	✓ Matriz de riesgos	1. Cuantificación y valoración riesgos	Soluciones	11-ago-2025
	✓ Kickoff interno y externo	1. Resumen proyecto 2. Fechas de entregables	Soluciones	11-ago-2025
Ejecución	✓ Documentación técnica implementación ✓ Capacitaciones	1. Firma cliente aceptación servicio a satisfacción	Soluciones	Al finalizar la implementación
Seguimiento	✓ Informes de avance	1. Detalle de la implementación y avances proyecto	Soluciones	Durante el proyecto
Cierre	✓ Cierre del proyecto	1. Solicitud cierre y facturación 2. Entrega servicios	Soluciones/Servicios	Al finalizar proyecto



Comunicaciones

Políticas de comunicaciones internas y reuniones requeridas para la ejecución y seguimiento de la implementación del requerimiento

Comunicaciones

Políticas de comunicaciones

- Toda la comunicación con el cliente debe ser canalizada con el Project Manager asignado del proyecto
- La información del proyecto debe ser almacenada en el repositorio y los drive en línea que se acuerden durante la implementación con el cliente

Reunión inicio y cierre implementación

Asistentes: TODO el equipo
Frecuencia: inicio y fin del proyecto (11-ago y 19-sep)

Reuniones de seguimiento

Asistentes: TODO el equipo
Frecuencia: semanal



Riesgos

Matriz con los riesgos mas importantes que tienen como responsables internos la ejecución de planes de acción para mitigarlos.

Riesgos

Riesgo	Impacto potencial	Acción preventiva	Plan de contingencia	Responsable
Disponibilidad personal cliente durante la implementación	Retrasos por validaciones tardías, sesiones reprogramadas	✓ Acordar disponibilidad desde el kickoff con compromisos firmados ✓ Agendar reuniones clave con antelación y bloqueos en calendario	✓ Escalar a nivel gerencial en caso de inasistencia ✓ Reasignar sesiones según prioridades del cronograma	Cliente
Disponibilidad personal TIGO durante la implementación	Bloqueos por falta de aprobaciones, accesos o soporte	✓ Validar disponibilidad de TIGO en el cronograma oficial ✓ Establecer canal directo con contacto designado TIGO	✓ Escalamiento a gerencia de soporte TIGO ✓ Sustitución temporal del recurso si hay ausencias prolongadas	PM TIGO



Acuerdos de pago

Acuerdo de pagos del cliente de acuerdo a lo contratado alineado a la oferta económica presentada.

Facturación

Descripción	Meses	Cantidad	Valor Mensual Antes de IVA	IVA (19%)	Valor Mensual IVA Incluido	Valor Total IVA Incluido
SDWAN sede Principal Medellin	12	1	$ 4.956.434	$ 941.722	$ 5.898.156	$ 70.777.878
SDWAN Caucasia	12	1	$ 2.122.750	$ 403.323	$ 2.526.073	$ 30.312.870
SDWAN Santa Rosa de Osos	12	1	$ 2.168.508	$ 412.017	$ 2.580.525	$ 30.966.299
SDWAN Andes	12	1	$ 1.990.720	$ 378.237	$ 2.368.957	$ 28.427.482
SDWAN Santa Fe de Antioquia	12	1	$ 2.122.750	$ 403.323	$ 2.526.073	$ 30.312.870
SDWAN Jericó	12	1	$ 1.990.720	$ 378.237	$ 2.368.957	$ 28.427.482
SDWAN Santa Elena	12	1	$ 1.862.425	$ 353.861	$ 2.216.286	$ 26.595.429
SDWAN Vegachí	12	1	$ 1.990.720	$ 378.237	$ 2.368.957	$ 28.427.482
SDWAN El Bagre	12	1	$ 1.250.000	$ 237.500	$ 1.487.500	$ 17.850.000
Internet Dedicado 300 Mbps Sede Principal	12	1	$ 6.965.185	$ 1.323.385	$ 8.288.570	$ 99.462.842
Total			$ 27.420.212	$ 5.209.840	$ 32.630.053	$ 391.560.632
Moneda			Pesos Colombianos (COP)			



Control del documento

Control de versiones

Control del documento

Fecha	Versión	Comentarios	Elaborado por	Cargo
25-jul-2025	1.0	Creación del documento	Maria del Pilar Osorio Alvarez	Esp. De proyectos

GRACIAS

tigo business

tigo business

Cronograma de Hitos

Dirección de Operaciones B2B

Información	Reservada
Codificación	F02.V2

No	Categoria (2 o 3 nivel de la EDT)	Entregable	Planeado		Avance - Seguimiento			Estado	Responsable	Observaciones/Comentarios	Soporte
			Fecha Planeada	Cantidad de entregables requeridos	Fecha Cierre (Fecha del último avance)	Cantidad de entregables aprobados	Avance a la fecha				
1	Inicio	Migración versa a forti	21/07/2025	1	21/07/2025	1	100%	Entregado a Tiempo	PM TIGO		
2	Inicio	Inicio	22/07/2025	1	22/07/2025	1	100%	Entregado a Tiempo	PM TIGO		
11	Inicio	Cierre inicio	25/07/2025	1	25/07/2025	1	100%	Entregado a Tiempo	PM TIGO		
12	Planeación	Planeación	28/07/2025	1	28/07/2025	1	100%	Entregado a Tiempo	PM TIGO		
21	Planeación	Cierre planeación	11/08/2025	1	11/08/2025	1	100%	Entregado a Tiempo	PM TIGO		
22	Ejecución	Ejecución	18/09/2025	1			0%	En Proceso	PM TIGO		
23	Ejecución	Equipos	15/08/2025	17			0%	En Proceso	PM TIGO		
24	Ejecución	Reserva equipos	11/08/2025	17	11/08/2025	17	100%	Entregado a Tiempo	PM TIGO		
25	Ejecución	Traslado equipos ciudades	15/08/2025	17			0%	En Proceso	INVENTARIOS TIGO		
26	Ejecución	Sesion técnica interna	11/08/2025	1			0%	Vencido	PM TIGO / EQUIPO		
27	Ejecución	Sesion técnica con cliente	12/08/2025	1			0%	Vencido	PM TIGO / EQUIPO		
28	Ejecución	Creación VDOM y asociación ADOM	13/08/2025	1			0%	Vencido	JANUS TIGO		
29	Ejecución	Enlaces	10/09/2025	2	0/01/1900	1	50%	En Proceso con Avances	IMPLEMENTADOR TIGO		
30	Ejecución	*Verificación internet*	5/08/2025	9	5/08/2025	9	100%	Entregado a Tiempo	IMPLEMENTADOR TIGO		
40	Ejecución	*Verificación conectividad*	10/09/2025	8	0/01/1900		0%	*Revisar porque hay Fecha de Cierre*	IMPLEMENTADOR TIGO		
49	Ejecución	Instalación y gestión equipos	22/08/2025	17			0%	En Proceso	IMPLEMENTADOR TIGO		
50	Ejecución	*MIGRACIONES SDWAN*	17/09/2025	1	0/01/1900		0%	*Revisar porque hay Fecha de Cierre*	EQUIPO TIGO / CLIENTE		
51	Ejecución	*SEDE PPAL (VHUB - HA)*	25/08/2025	1			0%	En Proceso	EQUIPO TIGO / CLIENTE		
52	Ejecución	Validación gestión remota equipo en sede	25/08/2025	1			0%	En Proceso	EQUIPO TIGO / CLIENTE		
53	Ejecución	Configuración y ajustes en sede ppal (SCRIPTS)	25/08/2025	1			0%	En Proceso	EQUIPO TIGO / CLIENTE		
54	Ejecución	Verificación conexión a tecnología versa (LAN cliente	25/08/2025	1			0%	En Proceso	EQUIPO TIGO / CLIENTE		
55	Ejecución	Configuración FORTI: Ajustes de enrutamiento sobre	25/08/2025	1			0%	En Proceso	EQUIPO TIGO / CLIENTE		
56	Ejecución	Pruebas cliente en sede (checklist cliente)	25/08/2025	1			0%	En Proceso	EQUIPO TIGO / CLIENTE		
57	Ejecución	Rollback en caso de que la migracion no sea efectiva	25/08/2025	1			0%	En Proceso	EQUIPO TIGO / CLIENTE		
58	Ejecución	ESTABILIZACIÓN SERVICIO	25/08/2025	1			0%	En Proceso	EQUIPO TIGO / CLIENTE		
59	Ejecución	*SEDES ALTERNAS*	17/09/2025	8			0%	En Proceso	EQUIPO TIGO / CLIENTE		
60	Ejecución	*Previo a la VM*	17/09/2025	8			0%	En Proceso	EQUIPO TIGO / CLIENTE		
61	Ejecución	Revisión conexión equipos versa	17/09/2025	8			0%	En Proceso	EQUIPO TIGO / CLIENTE		
62	Ejecución	Revision cableado	17/09/2025	8			0%	En Proceso	EQUIPO TIGO / CLIENTE		
63	Ejecución	Checklist de pruebas antes de la migración (ver	17/09/2025	8			0%	En Proceso	EQUIPO TIGO / CLIENTE		
64	Ejecución	*Durante la VM*	17/09/2025	8			0%	En Proceso	EQUIPO TIGO / CLIENTE		
65	Ejecución	Retirar enrutamiento estático sobre versa	17/09/2025	8			0%	En Proceso	EQUIPO TIGO / CLIENTE		
66	Ejecución	Retira enrutamiento desde el UTM	17/09/2025	8			0%	En Proceso	EQUIPO TIGO / CLIENTE		
67	Ejecución	Reconectar conexión LAN hacia VERSA	17/09/2025	8			0%	En Proceso	EQUIPO TIGO / CLIENTE		
68	Ejecución	Validar operatividad servicio	17/09/2025	8			0%	En Proceso	EQUIPO TIGO / CLIENTE		
69	Ejecución	Ingreso a aplicativos	17/09/2025	8			0%	En Proceso	EQUIPO TIGO / CLIENTE		
70	Ejecución	Validación navegación páginas institucionales	17/09/2025	8			0%	En Proceso	EQUIPO TIGO / CLIENTE		
71	Ejecución	Acceso al recurso compartido red institucional	17/09/2025	8			0%	En Proceso	EQUIPO TIGO / CLIENTE		
72	Ejecución	Velocidad de navegación (test)	17/09/2025	8			0%	En Proceso	EQUIPO TIGO / CLIENTE		
73	Ejecución	Verificación conexión telefonía IP	17/09/2025	8			0%	En Proceso	EQUIPO TIGO / CLIENTE		
74	Ejecución	Validación con usuarios aleatorios (pruebas fina	17/09/2025	8			0%	En Proceso	EQUIPO TIGO / CLIENTE		
75	Ejecución	Ajustar la plantilla de seguridad	17/09/2025	8			0%	En Proceso	EQUIPO TIGO / CLIENTE		
76	Ejecución	ESTABILIZACIÓN SERVICIO	17/09/2025	9			0%	En Proceso	EQUIPO TIGO / CLIENTE		
77	Ejecución	Cierre Ejecución	18/09/2025	1			0%	En Proceso	EQUIPO TIGO / CLIENTE		
78	Monitoreo y Control	Reuniones seguimiento cliente	18/09/2025	6			0%	En Proceso	TODO EL EQUIPO		
79	Cierre	Revision documentacion	19/09/2025	1			0%	En Proceso	PM TIGO		
80	Cierre	Actualizacion MF y cierre proyecto	19/09/2025	1			0%	En Proceso	PM TIGO		

validar subir backup periodico de 12Tb

Nombre sede (LAT: 41.6200221)	Coordenadas	CONTACTO SEDE	Cantidad ensartes	BW_SUPL1	MEDIO_SUPL1	BW_INT	MEDIO_INT	EQUIPO	SOLICITUDES SINTRAN			ESTADO SEDE?	ENLACES									EMPRESA TOTAL SERVICIO	TARIFA	Unidades	FACTURACIÓN CLIENTE	OBSERVACIONES PM	PROVEEDORES				DIRECCIONAMIENTO						
									RMC SEDE/DEA CIUDAD	RMC A/B	RMC EQUIPOS		ENLACES YA DE BAJA			ENLACES				INSTALACIONES Y PRUEBAS																	
													Fecha solicitud	Fecha alta	Cumplen 30 días?	Realizados	Entrega secretaria	Completados	Fecha solicitud	Fecha alta (Cartuna /)	Completados																	
Medalla_Plata	Carrera 65 Sur, 44 A 52 Medellín		1Gb/Gb	1:20	EGAETB2	1:10	FO METRO	4244.22			0000000000000000	Pdte. Alcance	5 ago-25	Cago 25	si	L	Ida	Ida	L	29 ago-25	2/10/25	4.444.444		1		No	1.43.52.242.4	74.062	1.43.52.2.77.52	ACC-52.2.77.52	ACC-30729660			NED-Jeda/Jeda01-10-7-2.1.60	NED-Jeda/Jeda01-10-7-2.1.60		60	Sistema_GlobalEthiplex_Medalla_Plata_Vo1.20250521
Cartella	Calle 94 Sur, 23 A 07 Barrio El Triángulo		1Gb/Gb	1:20	1:Pr/a	1:10	FO METRO	4447.22	agendar presentación		0000000000000000	Pdte.	5 ago-25	Cago 25	si	L			L	29 ago-25	2/10/25	5.111.111.724		1		1:Pr/a	1.43.52.2.78.52	74.062	1.43.52.2.78.52	ACC-52.2.78.52	ACC-30729660		Jeda01	NED-Jeda/Jeda01-10-7-2.1.60	NED-Jeda/Jeda01-10-7-2.1.60		60	Sistema_GlobalEthiplex_Cartella_Vo1.20250521
Santa Rosa de Lima	Carrera 48 Nro. 51-17 Piso 4 Terminal de Transportes		1Gb/Gb	1:20	Radio Hd Tdi/Gbps	1:10	FO METRO	4447.23			0000000000000000	Pdte. Alcance	10 ene-25	dd/m/a						15 ene-25	dd/m/a	5.1 mlls 724		1		1:Radio Hd Tdi/Gbps	1.43.52.2.77.54	1:Rd/Gbp	1:Radio Hd Tdi/Gbps	ACC-52.2.77.54	ACC-30729660			NED-Jeda/Jeda01-10-7-2.1.60	NED-Jeda/Jeda01-10-7-2.1.60		60	Sistema_GlobalEthiplex_SantaRosa.txt
Prado	Carrera 70 #51-18 Medellín, Antioquia		1Gb/Gb	1:20	Radio Hd Tdi/Gbps	1:10	FO METRO	4447.23			0000000000000000	Pdte. Alcance	10 ene-25	dd/m/a						15 ene-25	dd/m/a	5.1 mlls 724		1		1:Radio Hd Tdi/Gbps	1.43.52.2.78.54	1:Rd/Gbp	1:Radio Hd Tdi/Gbps	ACC-52.2.78.54	ACC-30729660			NED-Jeda/Jeda01-10-7-2.1.60	NED-Jeda/Jeda01-10-7-2.1.60		60	Sistema_GlobalEthiplex_Prado_Vo1.20250521
Santa Rosa de Lima	Calle 51 #44-53 Santa Fe de Antioquia		1Gb/Gb	1:20	1:Pr/a	1:10	FO METRO	4447.22	agendar presentación		0000000000000000	Pdte.	5 ago-25	Cago 25	si	L			L	29 ago-25	2/10/25	5.111.111.724		1		1:Pr/a	1.43.52.2.78.52	74.062	1.43.52.2.78.52	ACC-52.2.78.52	ACC-30729660		Jeda01	NED-Jeda/Jeda01-10-7-2.1.60	NED-Jeda/Jeda01-10-7-2.1.60		60	Sistema_GlobalEthiplex_SantaRosa.txt
Jeda01	Carrera 5 No. 7-39 Jeda01, Antioquia		1Gb/Gb	1:20	FO Hdt	1:2	FO METRO	4447.22			0000000000000000	Pdte. Alcance	10 ene-25	dd/m/a						15 ene-25	dd/m/a	5.1 mlls 724		1		1:Radio Hd Tdi/Gbps	1.43.52.2.78.52	1:Rd/Gbp	1:Radio Hd Tdi/Gbps	ACC-52.2.78.52	ACC-30729660			NED-Jeda/Jeda01-10-7-2.1.60	NED-Jeda/Jeda01-10-7-2.1.60		60	Sistema_GlobalEthiplex_Jeda.txt
Santa Elena	Diestro A 2 Jeda01 , 75 1647ab , casa 3 (1647),		1 cuarto	1:2	EGAETB2	1:2	FO METRO	4447.22			0000000000000000	Pdte. Alcance	5 ago-25	Cago 25	si	L	Ida	Ida	L	29 ago-25	2/10/25	1.1 mlls 421		1		No	1.43.52.242.68	1:EGAETB2	1.43.52.2.77.52	ACC-52.2.77.52	ACC-30729660			NED-Jeda/Jeda01-10-7-2.1.60	NED-Jeda/Jeda01-10-7-2.1.60		60	Sistema_GlobalEthiplex_SantaElena.txt
Vegalid	Carrera 49 Nro. 84 - 27, Vegalid, Antioquia		1Gb/Gb	1:20	Radio Hd Tdi/Gbps	1:10	FO METRO	4447.23			0000000000000000	Pdte. Alcance	10 ene-25	dd/m/a						15 ene-25	dd/m/a	5.1 mlls 724		1		1:Radio Hd Tdi/Gbps	1.43.52.2.78.54	1:Rd/Gbp	1:Radio Hd Tdi/Gbps	ACC-52.2.78.54	ACC-30729660			NED-Jeda/Jeda01-10-7-2.1.60	NED-Jeda/Jeda01-10-7-2.1.60		60	Sistema_GlobalEthiplex_Vegalid.txt
Fagus	Chalet 1 Cl 44A 27		1Gb/Gb	1:20	1:Pr/a	1:10	FO METRO	4447.22			0000000000000000	Pdte. Alcance	5 ago-25	Cago 25	si	L	Ida	Ida	L	29 ago-25	2/10/25	1.1 mlls 424		1		No	1.43.52.242.4	74.062	1.43.52.2.77.52	ACC-52.2.77.52	ACC-30729660			NED-Jeda/Jeda01	NED-Jeda/Jeda01		60	Sistema_GlobalEthiplex_Fagus.txt

CONCATENADO	FECHA_REVISI	NOTA	PM_IMPLEME	IMPLEMENTA	NOMBRE_CLI	SUBPRODUCT	ID_SERVICIO	IDENTIFICADO	OPERADOR	RESPONSABLE	DIAS_INGRES	WAN	VRF_NUEVA	VRF	RD	TIPO_ENRUTA	SISTEMA_AUT	NODO_INTER	INTERFACE_V	FECHA_INSTA	ESTADO_PEDI	FECHA_CRONOGRAMA
14360791413	45877,5394		Maria del Pila	Diana Johana	CORPORACIO	30 Mb	ACCESO-8069	NUBE-8462		BACK	ACTIVA	8									Pendiente	
14360791422	45877,5394		Maria del Pila	Diana Johana	CORPORACIO	82650185	SERPRO-4730	SERCOM-45071		BACK	ACTIVA	8									Pendiente	
14360791423	45877,5394		Maria del Pila	Diana Johana	CORPORACIO	82650185	SERPRO-4730	SERCOM-45071		BACK	ACTIVA	8									Pendiente	


TIPO SERVICIO	IDENTIFICADOR	SEDE	DIRECCIÓN SEDE	BW	
Conectividad	ACCESO-52535	Andes	CR 50 CL 51 -39	12 MB	SOLICITAR RETIRO
Internet	ACP-3664480	Andes	CR 50 CL 51 -39	12 MB	OK
Conectividad	ACCESO-52692	Caucasia	Calle 9A No. 24-03	30 MB	SOLICITAR RETIRO
Internet	ACP-3664540	Caucasia	Calle 9A No. 24-03	30 MB	OK
Conectividad	ACCESO-52952	Centro PPAL	CR 65 # 44 A- 32	120 MB	OK
Internet	ACP-3659680	Centro PPAL	CR 65 # 44 A- 32	120 MB	OK
Internet dedicado	ACCESO-10718	Centro PPAL	CR 65 # 44 A- 32	300 MB	OK
Conectividad	ACCESO-52693	Jericó	Carrera 3 No. 5-28	12 MB	SOLICITAR RETIRO
Internet	ACP-3664328	Jericó	Carrera 3 No. 5-28	12 MB	OK
Conectividad	ACCESO-52830	Santa-Elena	6.214663, -75.506 Santa-Elena	12 MB	OK
Internet	ACP-3687482	Santa-Elena	6.214663, -75.506 Santa-Elena	12 MB	OK
Conectividad	ACCESO-52696	Santa-Fe-de-Antioquia	Calle 11 # 10-39	30 MB	SOLICITAR RETIRO
Internet	ACP-3683773	Santa-Fe-de-Antioquia	Calle 11 # 10-39	30 MB	OK
Conectividad	ACCESO-52695	Santa-Rosa-de-Osos	CR 28 A CL 32 -17	12 MB	SOLICITAR RETIRO
Internet	ACP-3683783	Santa-Rosa-de-Osos	CR 28 A CL 32 -17	12 MB	OK
Conectividad	ACCESO-52694	Vegachí	Carrera 49 No. 49-25	12 MB	SOLICITAR RETIRO
Internet	ACP-3683774	Vegachí	Carrera 49 No. 49-25	12 MB	OK
Internet	214091236	EL BAGRE	CR 46 C CL 49 B -27	30 MB	OK

Resumen Cronograma de Hitos

Dirección de Operaciones B2B

Información	Reservada
Codificación	F02.V2

Nombre del Proyecto	Migracion Versa a FORTI
Cliente	CORANTIOQUIA
Fecha de Reporte	13/08/2025

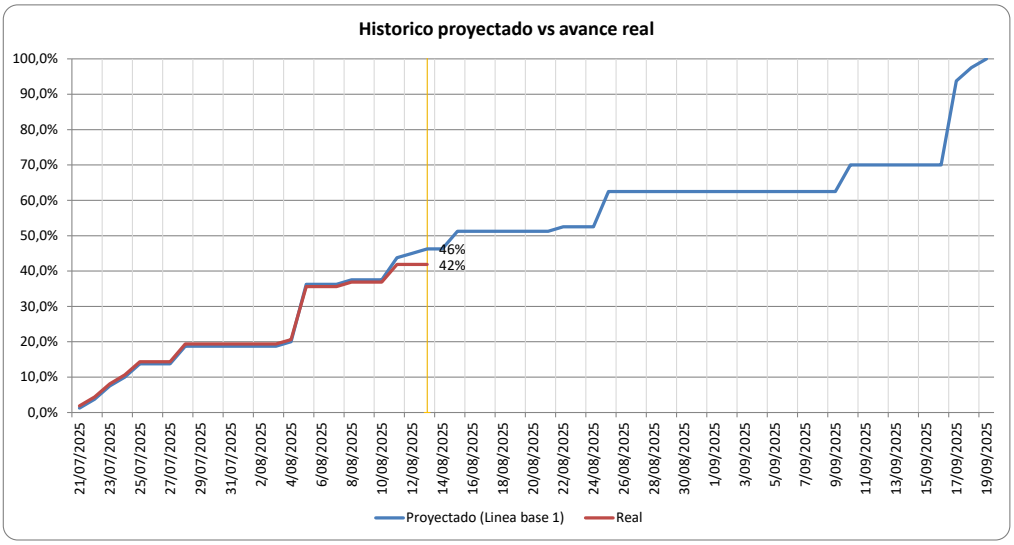

PEND. EQUIPO	3
3ros. UK	4
EN PRECABLEADO	2
INSTALACIÓN	0
CLIENTE	0
ACCESO	0
ENTREGADAS	0

No.	Categoria	Cantidad Planeada	% Planeado	% Avance Real	Performance
	Performance igual a 100% Performance entre 90% y 100% Performance entre 0% y 90%	80	46%	42%	91%
1	Inicio	11	100%	100%	100%
2	Planeación	10	100%	100%	100%
3	Ejecución	56	29%	22%	78%
4	Monitoreo y Control	1	0%	0%	0%
5	Cierre	2	0%	0%	0%
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Novedades	
1	AMPLIACIONES: 100%
2	SERVERS MIGRADOS A CLOUD 360: 0%
3	SEDES MIGRADAS A SDWAN FORTINET: 0%
4	

Alertas			
No.	**Descripción**	**Plan Propuesto**	**Responsable**
1			
2			
3			
4			

Certificados de Aportes

Se certifica que EMTELCO SAS identificado(a) con NI 800237456 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JUAN DAVID GUTIERREZ TAMAYO identificado(a) con CC 1152186014

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
9488781821	1621075492	E	2025-07-11	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-07	29									X									4%	$82,900
9488781821	1621075492	E	2025-07-11	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-07	1										X								0%	$0
9488781821	1621075492	E	2025-07-11	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-06	29									X									16%	$331,300
9488781821	1621075492	E	2025-07-11	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-06	1										X								12%	$8,400
9488781821	1621075492	E	2025-07-11	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-06	29									X										$0
9488781821	1621075492	E	2025-07-11	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-06	1										X									$0
9488781821	1621075492	E	2025-07-11	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-06	29									X										$0
9488781821	1621075492	E	2025-07-11	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-06	1										X									$0
9488781821	1621075492	E	2025-07-11	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-06	29									X									0%	$0
9488781821	1621075492	E	2025-07-11	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-06	1										X								0%	$0
9488781821	1621075492	E	2025-07-11	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-06	29									X									0%	$0
9488781821	1621075492	E	2025-07-11	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-06	1										X								0%	$0
9488781821	1621075492	E	2025-07-11	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-06	29									X									2.436%	$50,500
9488781821	1621075492	E	2025-07-11	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-06	1										X								0%	$0
9488781821	1621075492	E	2025-07-11	CCF	CCF04	COMFAMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-06	29									X									4%	$82,900
9488781821	1621075492	E	2025-07-11	CCF	CCF04	COMFAMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-06	1										X								0%	$0

Este certificado se expide el día 2025-07-15 a las 09:27.
